CONTRATO DE INTERVENTORÍA-No. 312-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023-ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJERCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS E INPLAYCO SAS-BIC Nit: 860524168-8

INFORME SEMANAL No. 24 DE INTERVENTORIA

OBJETO: "CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTEN DEL PROCESO NO. -295-LP CENACINGENIEROS-2023, CUYO OBJETO ES REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023

CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO CENAC TEATRO 2023

BOGOTÁ, SEPTIEMBRE 2024

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL No. 24

DIA	7	MES	10	AÑO	2024

SEMANA N°	24	DEL	23 DE SEPTIEMBRE 2024	AL	29 DE SEPTIEMBRE 2024
FECHA INICIO :	20/12/2023	FECHA TERMINO :	15/12/2024		

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023				
INTERVENTOR	INPLAYCO SAS - BIC	NIT O C.C.	860524168 8	CONTRATO N°	314
CONTRATISTA	CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	NIT O C.C.	901.759.617-0	CONTRATO N°	272

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS			ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO	
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO	PORCENTAJE DE EJECUCION EJECUTADO	ACTIVIDADES	MOTIVOS
CAP 1. PRELIMINARES	100,00%	98,00%	MANTENIMIENTO MONUMENTO	ACTIVIDAD SE REALIZARA UNA VEZ SE HAYAN TERMINADO TODAS LAS ACTIVIDADES DE FACHADAS Y ANDENES
C-2 CIMIENTOS	100%	100,00%		
S-3 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS	100%	98,00%		
PB-4 PISOS-BASES-RELLENOS	100%	50,00%		
EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO	100%	90,00%	S. E.I. DE PUNTOS DE ANCLAJE DE CUBIERTA	ACTIVIDAD QUE SE REVISARA DENTRO DEL BALANCE No.12 PARA SU EJECUCIÓN
M-6 MAMPOSTERÍA	100%	83,00%		
H-7 INSTALACIONES HIDRÁULICAS	100%	98,00%		
H-7B RED CONTRAINCENDIOS	17%	91,00%		
IE-8 INSTALACIONES ELECTRICAS	100%	55,00%	CORTE DE SELLOS TABLEROS ELECTRICOS	EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN TRAMITE ANTE LA ENTIDAD CODENSA
PR-9 PAÑETES Y RESANES	100%	88,00%		
CB-10 CUBIERTAS	100%	70,00%	INSTALACION DE EXTRACTORES EOLICOS	
CR-11 CIELORASOS	100%	50,00%		
PA-12 PISOS - ACABADOS	100%	50,00%		
E-13 ENCHAPES Y ACCESORIOS	100%	40,00%		
V-14 VIDRIOS Y ESPEJOS	0%	0,00%		
AS-15 APARATOS SANITARIOS	100%	50,00%		
MA-16 CARPINTERÍA EN MADERA, MUEBLES EN CONCRETO Y AMOBLAMIENTO	100%	50,00%		
ME-17 CARPINTERÍA METALICA Y EN ALUMINIO	100%	60,00%		LAS SILLAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE PRODUCIÓN
CE-18 CERRADURAS	100%	0,00%		
PI-19 PINTURA	100%	20,00%		
EE-20 EQUIPOS ESPECIALES	100%	50,00%		LOS EQUIPOS ESPECIALES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE TRASPORTACIÓN
OE-21 OBRAS EXTERIORES	100%	0,00%		
AG-22 ASEO GENERAL	100%	30,00%		
VP-23 VIAS Y PAVIMENTOS	0%	0,00%		
SC-25 RED DE SEGURIDAD Y CONTROL, CABLEADO ESTRUCTURADO	100%	40,00%	S.E.I. Y PUESTA DE FUNCIONAMIENTO DE FIBRA OPTICA MULTIMODO A 12 HILOS	LA SUPERVISIÓN A LA FECHA NO HA DEFINIDO EL PUNTO DE CONEXIÓN
TOTALES	89%	54,44%		

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I.U.	VR.TOTAL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA 24	ACUMULADO
	$ 6.376.826.519,54	SEMANAL	$296.188.147,63	$ 3.739.810.063,34	4,11%	44,54%
		% semanal	3,79%	AVANCE DE OBRA	7,64%	
		ACUMULADO	$4.081.137.237,44			
		% acumulado	52,18%			

SUSPENSIÓN No. 1	del 6 de marzo al 1 de julio del 2024
VALOR CONTRATO ADICION No. 1	$ 1.444.120.780,24
VALOR TOTAL CON ADICIÓN	$ 7.820.947.300,78

NOTA: Con base al la nueva programacion de obra el contratista presenta un avance del 7,64%

IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA


		CONTRATISTA			
DIA	FECHA	OPERATIVOS/FABRICACIÓN	ADMINISTRATIVOS	INTERVENTORIA	TOTAL
LUNES	23/09/2024	45	4	2	51,00
MARTES	24/09/2024	45	4	2	51,00
MIERCOLES	25/09/2024	45	5	3	53,00
JUEVES	26/09/2024	45	4	2	51,00
VIERNES	27/09/2024	45	4	2	51,00
SABADO	28/09/2024	45	2	1	48,00
DOMINGO	29/09/2024	0	0	0	0,00

V.ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)

FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
23/09/2024	SOLEADO	SOLEADO	
24/09/2024	SOLEADO	SOLEADO	
25/09/2024	SOLEADO	SOLEADO	NO
26/09/2024	SOLEADO	SOLEADO	
27/09/2024	SOLEADO	SOLEADO	
28/09/2024	LLOVIIZNA	SOLEADO	
29/09/2024	SOLEADO	SOLEADO	

VI. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)

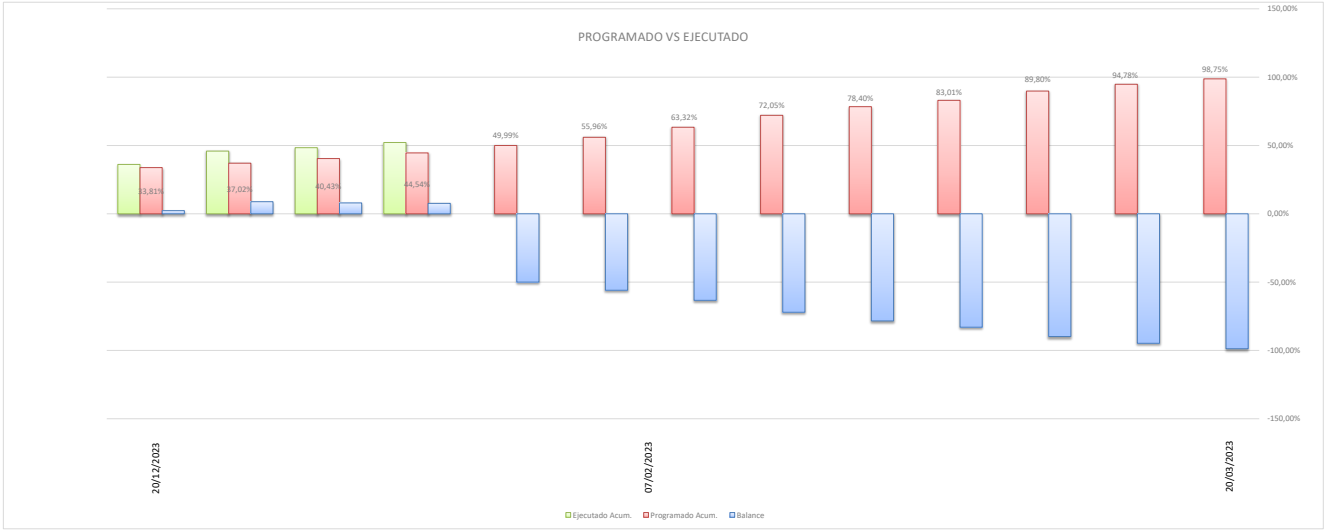

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL No. 24

Página: 1 de

DIA	7	MES	10	AÑO	2024

SEMANA Nº		24		DEL	23 DE SEPTIEMBRE 2024				AL	29 DE SEPTIEMBRE 2024				
Semana	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**
Fecha	**8/09/2024**	**15/09/2024**	**22/09/2024**	**29/09/2024**	**6/10/2024**	**13/10/2024**	**20/10/2024**	**27/10/2024**	**3/11/2024**	**10/11/2024**	**17/11/2024**	**24/11/2024**	**1/12/2024**	**8/12/2024**
Progr. Semanal	3,32%	3,22%	3,40%	4,11%	5,45%	5,97%	7,36%	8,73%	6,34%	4,62%	6,79%	4,97%	3,97%	1,08%
Programado Acum.	33,81%	37,02%	40,43%	44,54%	49,99%	55,96%	63,32%	72,05%	78,40%	83,01%	89,80%	94,78%	98,75%	99,83%
Ejec. Semanal	3,18%	9,75%	2,51%	3,79%										
Ejecutado Acum.	36,12%	45,87%	48,38%	52,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Balance	2,31%	8,85%	7,95%	7,63%	-49,99%	-55,96%	-63,32%	-72,05%	-78,40%	-83,01%	-89,80%	-94,78%	-98,75%	-99,83%

VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

NOVEDADES

CALIDAD		MATERIALES	EQUIPOS
ASPECTOS DE OBRA CIVIL	**ACTIVIDADES EJECUTADAS -SEMANA**		
PROGRAMACION AJUSTADA	El contratista de obra hace entrega de la programación y el flujo de caja ajustados con cierre a la fecha del 15 de diciembre del 2024.		
OBRA CIVIL	Se realiza fundida de piso en baño de hombres 1er psio		
	Se realizan resanes del las regatas electtricas		
	Se realiza excavacion para bordillos de rampa de acceso		
TANQUE DE ALMACENAMIENTO.	El contratista realiza replanteo y da inicio al levantamiento de mamposteria		
	Se le solicita a contratista dar celeridad con el proceso de construccion de la cuarto de bombas ya que han trascurrido una semna a partir del recibo del diseño.		
ESCALERAS DE EMERGENCIA	El contratista de obra avanza el cordon de soldadura de las huellas de la escalera		
	Se le soliicta al contratista dar celeridad a la actividad de acabado de la escalera de emergencia.		
REDES ELECTRICAS	El contratista de obra solicita colaboracion a la supervisión mediante comité de obra para obtener comunicación con el prestador de servicio para dar celeridad al tramite de retiro de sellos de los tableros principales		
	El contratista de obra realiza la instalacion de la bandeja tipo malla en area de camerinos-mezaninne		
REDES HIDROSANITARIAS	El contratista de obra presenta un avance de instalacion de las redes hidrosanitarias en un 95%.		
SISTEMA RCI	El contratista de obra programa las puebas de la red para la semana 25 en el area de vestibulo y distribuidor		
	Durante la instalacion del panel acustico de cielo, se realiza la instalacion de los splinter para el sistema de rci del area de mezannine del auditorio		
CIELO RASO	El contratista de obra realiza actividades de instalacion de lamina de dry wall en remate de tarima		
	Se le solicita al contratista dar celeridad a las ejecuciones de la cuadrilla de cielo raso ya que se evidencia que varios espacios se encuentran estructurados pero no se encuentran avanzados en la activiad.		
FACHADAS	El dia 23 de septiembre se evidencia ingreso de enchape de muros de fachada. No ingresa enchape de antepechos.		
	Se le solicita al contratista dar celeridad con el tramite de adquisición del insumo.		
ENCHAPES	El contratista de obra continua con destronque de piso en el area de cafetin sur		
	El contratista de obra continua con la instalacion del enchape de muro del baño de mujeres del 1er piso. Se le solicita mejorar el proceso de instalacion de la ceramica ya que algunas piezas no se encuentran plomadas y por lo tanto se presenta imperfecciones.		
	Se continua con la fundida del piso de granito blanco del distribuidor del 1er piso		
	Se continua con emboquillado de piso en el area de cuarto tecnico del tercer piso y adjuntos		
	Se continua con la instalacion de enchape de muro en el baño de 2 piso. Se le recuerda al contratista que antes de continuar con la elaboracion se debe realizar la apertura del vano para la iluminacion natural del baño de mujeres		
	Se da inicio a instalacon de enchape de piso en area de baños de hombres del 1er nivel y de area de bodega		
	Se inicia destronque de piso de baños de mujeres del 1er nivel		
SISTEMA ACUSTICO	Se evidencia quedan inicio a la instalacion del sistema en el area del cielo raso- costado oriental.		
	La interventoria solicita al contratista de obra notificar las fechas de ingreso a campo del material faltante del sistema acustico.		
TAPETE	Se solicita al contratista de obra notificar la fecha de ingreso del tapete en rollo para las escaleras de los camerinos.		
SILLAS	el contratista de obra No ha presentado el replanteo de la ubicación de las sillas para su aprobación. Se aclara que ya se verificio en sitio y se acordo la modulacion y la espacialidad de las sillas.		
	Se solicita al contratista de obra programar visita para la semna 26 a planta de produccion para revision del sistema de confeccion de la silleteria del auditorio.		
EQUIPOS ESPECIALES	El contratista de obra notifica a la interventoria de la ruta de trasporte de los equipos. Llegada a sitio en la ultima semana del mes de noviembre.		
VOZ Y DATOS	El contratista de obra presenta contrato y facturacion de los altavoces tipo line array		
	A la fecha no se ha tenido respuesta por parte del encargado del coing de la ubicación del punto de conexión de la fibra optica.		
ORDEN Y ASEO	Se evidencia que el contratista de obra realiza levantamiento de escombros y limpieza general del teatro.		
ASPECTOS ADMINISRATIVOS	**ACTIVIDADES EJECUTADAS -SEMANA**		
Gestión de comunicaciones	1. Se realiza comite de obra No. 23 2. se entrega informe semanal No. 23 3. Se espera respuesta por parte de la supervisión de punto de conexion a fibra optica.		
Interventoría- Listado de personal	El personal de interventoria se encuentra al dia con la documentación de parafiscales		
Contratista-Listado de personal	La interventoria realiza revisión del personal administrativo y operativos los cuales pasan el control interno (curso de alturas) y documentación de parafiscales al dia.		
	La interventoria solicita al contratista de obra incrementar las cuadrillas de obra civil para dar avance a las ejecuciones de acabados de piso, cielo raso y enchapes y pintura.		
NOTA	La interventoria reitera al contratista de obra realizar el incremento del personal en el frente de cielo rasos ya que se evidencia que varios espacios no han avanzado en la ejecucion por falta de personal.		

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL No. 24

Página: 1 de	DIA	7	MES	10	AÑO	2024

SEMANA Nº	24		DEL	23 DE SEPTIEMBRE 2024	AL	29 DE SEPTIEMBRE 2024

ASPECTOS FINANCIEROS	ACTIVIDADES EJECUTADAS -SEMANA		
ACTA DE CORTE No.1	Se remite acta de corte No. 1 por valor de $1.659.412.087,39. desde el 25 de julio y a la fecha no se ha efectuado el pago.		
ACTA DE CORTE No. 2	Se remite acta de corte No. 2 por valor de $917.126.075,82. el 5 de septiembre del año en curso. Con corte a semana 20- al 2 de septiembre		
ACTA DE CORTE No. 3	Para el dia viernes 27 de septiembre se realiza radicacion del corte No 3 a la supervisión del contrato		
COMPRA DE INSUMOS	El contratista de obra emite informe de plan de manejo de anticipo del mes de septiembre y con este se cierra en ceros la entrega total del anticipo.		

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL No. 24

Código:		**Versión:**			**Página:**		
SEMANA N°	24	**DEL**	23 DE SEPTIEMBRE 2024	**AL**	29 DE SEPTIEMBRE 2024		
FECHA INICIO :	2012/2023	**FECHA TERMINO :**	15/12/2024				

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023				
INTERVENTOR	INPLAYCO SAS - BIC	**NIT O C.C.**	860524168 8	**CONTRATO N°**	314
CONTRATISTA	CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	**NIT O C.C.**	901.759.617-0	**CONTRATO N°**	272

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO










UBICACIÓN:	**DISTRIBUIDOR**	**UBICACIÓN:**	**BAÑOS MUJERES 1ER PISO**	**UBICACIÓN:**	**CAFETINES**
ACTIVIDAD	SE CONTINUA CON LA FUNDIDA DE PISO EN GRANITO	**ACTIVIDAD**	SE CONTINUA INSTALACION DE ENCHAPE DE MURO	**ACTIVIDAD**	DESTRONQUE DE PISO





UBICACIÓN:	**AUDITORIO**	**UBICACIÓN:**	**CUARTO DE SONIDO**	**UBICACIÓN:**	**SOTANO**
ACTIVIDAD	ESTRUCTURACION DE MURO SUR	**ACTIVIDAD**	EMBOQUILLADO DE PISO EN GRANITO	**ACTIVIDAD**	1RA MANO DE PINTURA





UBICACIÓN:	**ESCALERAS DE EMERGENCIA**	**UBICACIÓN:**	**AUDITORIO**	**UBICACIÓN:**	**BAÑOS 2DO PISO**
ACTIVIDAD	SE CONTINUA CON EL CORDON DE SOLDADURA	**ACTIVIDAD**	INSTALACION DE PANEL DE CIELO RASO ACUSTICO	**ACTIVIDAD**	INSTALACIÓN ENCHAPE DE MURO






UBICACIÓN:	**BAÑO HOMBRES 1ER PISO**	**UBICACIÓN:**	**EXTERIOR**	**UBICACIÓN:**	**TANQUE DE ALMACENAMIENTO**
ACTIVIDAD	DESMONTE DE DIVISIONES DE BAÑO	**ACTIVIDAD**	PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA PARA PANEL ACUSTICO	**ACTIVIDAD**	LEVANTAMIENTO DE MAMPOSTERIA


UBICACIÓN:	**TARIMA**	**UBICACIÓN:**	**MEZANNINE**	**UBICACIÓN:**	**BAÑO 1ER PISO MUJERES**
ACTIVIDAD	INSTALACION DE REMATE EN DRY WALL PARA CIELO RASO	**ACTIVIDAD**	MANTENIMIENTO DE FRONTAL EN MADERA	**ACTIVIDAD**	DESTRONQUE DE PISO

 		 			
UBICACIÓN:	**BAÑO HOMBRES 1ER PISO**	**UBICACIÓN:**	**FACHADA ORIENTAL**	**UBICACIÓN:**	**TEATRO**
ACTIVIDAD	PUNDIDA DE PISO	**ACTIVIDAD**	INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE MURO	**ACTIVIDAD**	INGRESA DIVISIONES DE ACERO INOXIDABLE
					
UBICACIÓN:	**BAÑO HOMBRES 1ER PISO**	**UBICACIÓN:**	**EXTERIOR**	**UBICACIÓN:**	**DISTRIBUIDOR 1ER PISO**
ACTIVIDAD	INSTALACIÓN PISO GRANITO	**ACTIVIDAD**	FUNDIDA DE ANDEN	**ACTIVIDAD**	RESANE REGATAS ELECTRICAS

INFORME SEMANAL No. 24

CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO CENAC TEATRO 2023

BOGOTÁ, SEPTIEMBRE 2024

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL								INFORME SEMANAL N°24	
Página: 1 de			DIA	7	MES	OCTUBRE	AÑO	2024	

SEMANA N°	24	DEL	23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	AL	29 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA INICIO :	20/12/2023	FECHA TERMINO :	15/12/2024		

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023				
INTERVENTOR	INPLAYCO SAS - BIC	NIT O C.C.	860524168 8	CONTRATO N°	314
CONTRATISTA	CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	NIT O C.C.	901.759.617-0	CONTRATO N°	272

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS			ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO	
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO	PORCENTAJE DE EJECUCION EJECUTADO	ACTIVIDADES	MOTIVOS
P-1. PRELIMINARES	81,00%	97,00%	MANTEMIMIENTO DE MONUMENTO	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARA A LO ULTIMO DEL PROYECTO
C-2 CIMIENTOS	100%	100,00%		
S-3 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS	98%	99,00%		
PB-4 PISOS-BASES-RELLENOS	0%	0,00%		
EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO	44%	92,00%	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE ANCLAJE PARA INSPECCION CUBIERTA	
M-6 MAMPOSTERÍA	100%	90,00%	LEVANTE DE MAMPOSTERIA EN CUARTO DE BOMBA	SE ESTA REALIZANDO ESTA ACTIVIDAD
H-7 INSTALACIONES HIDRÁULICAS	100%	100,00%		
H-7B RED CONTRAINCENDIOS	92%	95,00%		
IE-8 INSTALACIONES ELECTRICAS	48%	70,00%		
PR-9 PAÑETES Y RESANES	100%	98,00%	PAÑETE EN EL CUARTO DE BOMBAS	
CB-10 CUBIERTAS	70%	75,00%	INSTALACIÓN DE EXTRACTORES EOLICOS EN CUBIERTA INCLUYE TRABAJOS DE CANAL Y SELLO PARA EVITAR EL PASO DEL AGUA.	
CR-11 CIELORASOS	0%	38,00%		
PA-12 PISOS - ACABADOS	15%	78,00%		
E-13 ENCHAPES Y ACCESORIOS	63%	65,00%	MANTEMIENTO GENERAL DE MURO	
V-14 VIDRIOS Y ESPEJOS	0%	0,00%		
AS-15 APARATOS SANITARIOS	0%	5,00%		
MA-16 CARPINTERÍA EN MADERA, MUEBLES EN CONCRETO Y AMOBLAMIENTO	57%	45,00%		

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL							INFORME SEMANAL N°24	
Página: 1 de			DIA	7	MES	OCTUBRE	AÑO	2024

SEMANA N°	24	DEL	23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		AL	29 DE SEPTIEMBRE DE 2024
ME-17 CARPINTERÍA METALICA Y EN ALUMINIO			0%	0,00%		
CE-18 CERRADURAS			0%	0,00%		
PI-19 PINTURA			10%	20,00%		
EE-20 EQUIPOS ESPECIALES			57%	65,00%		
OE-21 OBRAS EXTERIORES			0%	63,00%		
AG-22 ASEO GENERAL			0%	0,00%		
VP-23 VIAS Y PAVIMENTOS			0%	0,00%		
SC-25 RED DE SEGURIDAD Y CONTROL, CABLEADO ESTRUCTURADO			12%	30,00%	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FIBRA OPTICA MULTIMODO DE 12 HILOS T	POR PARTE DE LA ENTIDAD NO SE HA DEFINIDO EL PUNTO DE CONECIÓN DE LA FIBRA
TOTALES			42%	53,00%		

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I.U.	VR.TOTAL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO ANTICIPO	VR. POR EJECUTAR DEL ANTICIPO	AVANCE DE INVERSION	PROGRAMADO	EJECUTADO
	6.376.826.519,54	3.068.998.539,36	3.307.827.980,18	SEMANA 24	$ 321.787.976,85	$ 296.188.147,63
Costo directo	5.237.209.690,82		5.237.209.690,82			
VALOR CONTRATO ADICION No. 1	$ 1.444.120.781,24	$ 7.820.947.300,78		ACUMULADO	$ 3.483.504.307,00	$ 4.081.137.237,44
Porcentaje Resumen (avance (+) o retraso (-))	NOTA: EL CONTRATISTA LLEVA UN ADELANTO DEL 7,64% DE ACUERDO AL VALOR CONTRACTUAL MAS ADICIÓN			PORCENTAJE	44,54%	52,18%
				ADELANTO	7,64%	

IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA


PERSONAL - ADMINISTRATIVO	CANTIDAD	PERSONAL - OPERATIVO	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1	ENCARGADO	5
RESIDENTE DE OBRA	1	OFICIAL	8
SST	1	AYUDANTE	20
AMBIENTAL	1	FABRICACIÓN	12
ALMACENISTA	1		
TOTAL DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	5	TOTAL PERSONAL OPERATIVO	45

V.ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	23/09/2024	SOLEADO	SOLEADO	SI [ ] NO [X]
	24/09/2024	SOLEADO	SOLEADO	
	25/09/2024	SOLEADO	SOLEADO	
	26/09/2024	SOLEADO	SOLEADO	
	27/09/2024	SOLEADO	SOLEADO	
	28/09/2024	SOLEADO	SOLEADO	
	29/09/2024	SOLEADO	SOLEADO	

PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO: 70%

VI. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)

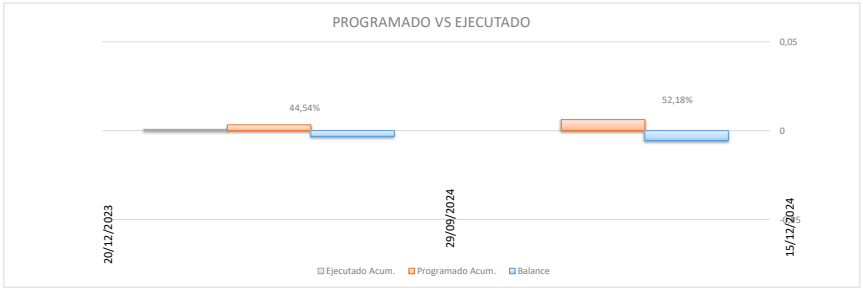

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL N°24

Página: 1 de				**DIA**	7	**MES**	OCTUBRE	**AÑO**	2024			

SEMANA N°		24	**DEL**	23 DE SEPTIEMBRE DE 2024				**AL**	29 DE SEPTIEMBRE DE 2024				
Semana	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**
Fecha	**14/07/2024**	**21/07/2024**	**28/07/2024**	**4/08/2024**	**11/08/2024**	**18/08/2024**	**25/08/2024**	**1/09/2024**	**8/09/2024**	**15/09/2024**	**22/09/2024**	**29/09/2024**	**6/10/2024**
Progr. Semanal	2,36%	2,61%	2,41%	2,11%	1,99%	2,17%	3,05%	3,11%	3,32%	3,22%	3,40%	4,11%	5,45%
Programado Acum.	13,02%	15,63%	18,04%	20,15%	22,14%	24,32%	27,33%	30,48%	33,81%	37,02%	40,43%	44,54%	49,99%
Ejec. Semanal	2,22%	2,31%	0,29%	2,05%	1,31%	1,04%	1,43%	3,19%	3,18%	9,75%	2,51%	3,79%	0,00%
Ejecutado Acum.	21,32%	23,63%	23,92%	25,97%	27,28%	28,32%	29,75%	32,94%	36,12%	45,87%	48,38%	52,18%	0,00%
Balance	8,30%	8,00%	5,88%	5,82%	5,14%	4,00%	2,42%	2,46%	2,31%	8,85%	7,95%	7,64%	-49,99%

VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

1- Según reprogramación se lleva un porcentaje acumulado programado de 44,54 % vs un porcentaje acumulado ejecutado del 52,18% esto para un adelanto del 7,64%

2-las actividades de esta semana son :Se continua con las instalaciones de velas y rociadores, se continua con la instalación de tubería de sonido, se continua con la instalaciones electricas, se continua con la instalación de cielo raso en pvc, se continua con estuco y pintura en muros de sotano y camerinos , se continua con la instalación de enchape de los muros de fachadas, se continua con la fundida de mediascañas y guardaescoba en granito, se continua con la fundida de granito en el primer piso , se continua con la instalación de muros y cielo raso en acustica, se continua con los enchapes de muros en los baños, se continua con la soldadura de la escalera de emergencia.

3- aún no se reciben las actas de comité se le pide encarecidamente a la interventoria remitirla al contratista para ver los compromisos adquiridos. se pide nuevamente que envien las actas N° 12, 13 , 14, 15, 16, 17 , 18 ,19 , 20 , 21 , 22 y 23 . se le pide mas celeridad en las entregas de las actas.

4- hasta la fecha no tenemos los informes bimensuale y informes semanales aprobados por la interventoría, se le pide mas celeridad en a las aprobaciones de los informes

REALIZÓ

FIRMA DEL DIRECTOR O RESIDENTE DE OBRA

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	INFORME SEMANAL No. 24

Código:		**Versión:**		**Fecha de Emisión:**			
SEMANA N°	24	**DEL**	23/09/2024	**AL**	29/09/2024		
FECHA INICIO :	**20/12/2023**	**FECHA TERMINO :**	**15/12/2024**				
I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA							
OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023**						
INTERVENTOR	**INPLAYCO SAS - BIC**		**NIT O C.C.**	**860524168 8**	**CONTRATO N°**	**314**	
CONTRATISTA	**CONSORCIO CENAC TEATRO 2023**		**NIT O C.C.**	**901.759.617-0**	**CONTRATO N°**	**272**	

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO




UBICACIÓN:	AUDITORIO
COMENTARIOS:	MANTENIMIENTO DE PASAMANOS EN MADERA



UBICACIÓN:	BAÑOS DE MUJERES
COMENTARIOS:	RESTRINCTORES ANTI SISMICO





UBICACIÓN:	CAMERINOS PRIMER PISO
COMENTARIOS:	TRASLADO DE TABLEROS ELECTRICOS




UBICACIÓN:	AUDITORIO
COMENTARIOS:	CALOCACIÓN DE ESTRUCTURA PARA MUROS ACUSTICO




UBICACIÓN:	BAÑO EXISTENTE DE HOMBRES
COMENTARIOS:	INSTALACIÓN DENTABLETA GRANO MARMOL





UBICACIÓN:	PRIMER PISO TRIPLE ALTURA
COMENTARIOS:	CIELO RASO EN SUPER BOARD

UBICACIÓN:	TERRAZAS
COMENTARIOS:	ENCHAPE DE MUROS




UBICACIÓN:	TERCER PISO CUARTO DE SONIDO
COMENTARIOS:	ENCHAPE DE PISO EN BALDOSA GRANO MARMOL

UBICACIÓN:	BAÑO PRIMER PISO DE MUJERES
COMENTARIOS:	DESTRONCADA DE MEDIAS CAÑAS EN BAÑO DE MUJERES




UBICACIÓN:	
COMENTARIOS:	

ANEXO No. 2 - Registro fotográfico ambiental

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	INFORME SEMANAL

Código:		Versión:		Fecha de Emisión:		Página:
SEMANA N°	24	DEL	23 DE SEPTIEMBRE	AL		29 DE SEPTIEMBRE
FECHA INICIO :	20/12/2023	FECHA TERMINO :	16/12/2024			

I. IDENTIFICACION DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA NO. 272-CENACINGENIEROS-2023 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y CONSORCIO CENAC TEATRO 2023. "REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023"				
INTERVENTOR	INPLAYCO SAS	NIT O C.C.	860 524 16-8	CONTRATO Nº	314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	NIT O C.C.	901 759 617 - 0	CONTRATO Nº	272-CENANCINGENIEROS-2023

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO AMBIENTAL



UBICACIÓN:	INTERIOR TEATRO
COMENTARIOS:	SENALIZACION Y DEMARCACION



UBICACIÓN:	INTERIOR DEL TEATRO
COMENTARIOS:	SENALIZACION Y DEMARCACION



UBICACIÓN:	CAMPAMENTO DEL CONTRATISTA
COMENTARIOS:	SENALIZACION Y DEMARCACION



UBICACIÓN:	INTERIOR DEL TEATRO DEL TEATRO
COMENTARIOS:	ORDEN Y ASEO OBRA



UBICACIÓN:	CAMPAMENTO CONTRATISTA
COMENTARIOS:	CLASIFICACION RESIDUOS



UBICACIÓN:	SUR ORIENTE DEL TEATRO
COMENTARIOS:	



UBICACIÓN:	CAMPAMENTO CONTRATISTA
COMENTARIOS:	ASEO BAÑOS



UBICACIÓN:	CAMPAMENTO CONTRATISTA
COMENTARIOS:	ASEO BAÑOS



UBICACIÓN:	COSTADO NOROCCIDENTE DEL TEATRO
COMENTARIOS:	ORDEN Y ASEO PUNTOS DE ACOPIO

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ANEXO No. 3 – Registro fotográfico SST

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	INFORME SEMANAL

Código:		Versión:		Fecha de Emisión:		Página:
SEMANA N°	24	DEL	23 DE SEPTIEMBRE	AL		29 DE SEPTIEMBRE
FECHA INICIO :	20/12/2023	FECHA TERMINO :	15/12/2024			

I. IDENTIFICACION DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA NO. 272-CENACINGENIEROS-2023 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y CONSORCIO CENAC TEATRO 2023. "REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023"				
INTERVENTOR	INPLAYCO SAS	NIT O C.C.	860 524 16-8	CONTRATO N°	314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	NIT O C.C.	901 759 617 - 0	CONTRATO N°	272-CENANCINGENIEROS-2023

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO



UBICACIÓN:	CAMPAMENTOS CONTRATISTA
COMENTARIOS:	PAUSAS ACTIVAS



UBICACIÓN:	INTERIOR TEATRO
COMENTARIOS:	PAUSAS ACTIVAS



UBICACIÓN:	CAMPAMENTOS
COMENTARIOS:	ENSAYO PARTICIPACION SIMULACRO DISTRITAL



UBICACIÓN:	CAMPAMENTOS CONTRATISTA
COMENTARIOS:	ENTREGA DE EPP



UBICACIÓN:	CAMPAMENTOS CONTRATISTA
COMENTARIOS:	ENTREGA DE EPP



UBICACIÓN:	CAMPAMENTOS CONTRATISTA
COMENTARIOS:	ORDEN Y ASEO DE EPP



UBICACIÓN:	INTERIOR DEL TEATRO
COMENTARIOS:	JORNADA DE ASEO OBRA



UBICACIÓN:	INTERIOR TEATRO
COMENTARIOS:	USO CORRECTO DE EPP



UBICACIÓN:	INTERIOR TEATRO
COMENTARIOS:	TRABAJO EN ALTURAS

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ANEXO No. 4 BITACORA

Pisos - cielos - iluminación para utilizar el espacio como almacenaje de insumos (puertas/material acustico entre otros). Ingresa a campo material de Sistema acustico = cielo raso y panel acustico ranurado (Aprox 200 m2.)

21.09.24.
Clima Soleado.
personal contratista.
Director de Obra, Residente de Obra, Residente SST, Almacenista
Apoyos SST (2) Operativos , Fabricación (12)
Personal Interventoria.
Residente Interventoria, Residente SST
El contratista continua con actividades de destronque de piso en area del cafetin norte. Se le Solicita al contratista dar celeridad a las actividades correspondientes del baño de hombres por piso. (En este espacio Se requiere el desmonte de los divisions de baño para poder realizar el remplazo de las piezas de enchape afectadas, adicional/norte Se debe iniciar con el aislado de piso.
El contratista continua con actividades de estructuración en el area del auditorio. Se le solicita al contratista dar celeridad con las actividades de cielo raso, en Sotano baños y vestibulo. Se realiza aseo

23.09.24
Clima: Soleado
Personal Contratista
Director de Obra, Residente de Obra, Residente SST, Almacenista
apoyos SST (2) Operativos , Fabricación (12)
Personal Interventoria
Residente Interventoria, Residente SST.
Se evidencia las siguientes actividades: Continuación

de fundida de paso granito blanco en area de distribudor, Se continua con actividades de emboquillado de enchape de muro en baño de mujeres 1er piso - Se le reverdo al contratista ajusta bs piezas del muro Oriental mal instaladas, Se avanza con la estructuración del cielo raso del area de distribuidor del 2 piso. y es caleras interiores.. Se le Solicita al contratista realizar el arreglo a las albardillas de la terraza de 2 y 3 piso (desportillados). En el auditorio Se continua con actividades de Estructuración de muros (sor). Se da inicio a instalación de panel de cielo raso (panel acustico). El contratista termina con la instalación del enchape de piso del cuarto tecnico, Se le recomienda tener cuidado con los bordes de las piezas por temas de desportillamiento. Se le Solicita al contratista dar inicio con las actividades de levantamiento de mamposteria del cuarto de bombas.

25.09.24.

Clima: Soleado

Personal del contratista.

Director de Obra; Residente de Obra, Residente SST, Almacenista Apoyo SST (2), Operativos , Fabricación (12)

Personal Interventoria.

Residente Interventoria, Residente SST


Mediante recorrido Se evidencia actividades de boquilla de paso en el area del 3er nivel. Se le insiste al contratista evacuar el escombro del baño del 3er nivel, antes de continuar con actividades del paso. Se le Solicita al contratista informar la fecha de ingreso del manto asfaltico para las terrazas.. En el auditorio Se continua con actividades de montaje de cielo raso, Se le Solicita al contratista tener cuidado en las uniones ya que Se evidencias parches (fuera de instalación).. Se continua con el ultimo tramo

de la estructura del muro Sor. En el area de Salon se evidencia que el contratista realizo la 1era mano de pintura en muros, se Solicita dar celeridad con la instalacion del cielo un poc del espacio.

25.09.24.
Clima: Calido.
Personal Contratista:
Director de Obra, Residente de Obra, Residente SST, Almacenista
Apoyos SST (2) Operativos, fabricantes (12)
Personal Interventoria.
Residente Interventoria, Residente SST.
Se realizo comite de obr el 26 de Septiembre. En recorrido.
Se evidencia continuacion de actividades de cordon de Soldadura en escalera de emergencia. Se evidencia continuacion de instalacion de cielo raso en area de auditorio, Se revisa con el contratista los listones de union de los elemento. y Se corrobora la especialidad. El contratista continua con actividades de electronique de paso en el cafetin del costado Norte. El contratista avanza con la instalacion del enchape de muro del baño de hombres del 2do piso, Se le recuerda al contratista revisar el proceso de enchape ya que el muro divisorio es nuevo y por lo tanto el enchape no debe verse con Sobresaltos. - No se ha realizado el vano para la ventilacion del baño de mujeres. El contratista realiza el repinteo de los muros del tanque de almacenamiento (cuarto de bombas). El contratista realiza el desmonte de las divisiones de baño de hombres del 4to piso. Se le insiste al contratista con la inclusion del personal de la cuadrilla de cielo raso ya que se evidencia que no se ha avanzado con las ejecuciones en las diferentes area. Se Solicita realizar aseo y cubrir las puertas de emergencia para evitar el ingreso de polvo que pueda afectar el Sistema acustico.

· 26.09.24.
Clima: Soleado.
Personal Contratista:
Director de obra, Residente de Obra, Residente SST, Almacenista
Apoyos SST (2), Residente Ambiental, Operativos, fabricantes
Personal Interventoria.
Director Interventoria, Residente Interventoria, Residente SST.
- Se realiza comite de obra No 23 con la Supervisión del contrato. La interventoria presenta el avance de obra y presenta la muestra de piso antideslizante para el area de Sotano., la cual fue aprobada por la Supervisión del contrato. Se adjunta la información en acta de comite. Durante recorrido Se evidencia que continuan con las diferentes actividades = actividades de Soldadura en escalera de emergencia, levantamiento de mampostería de cuarto de bombas, excavación para bordillos de rampa de acceso, actividades de destronque de pasos, montajes de laminas de dry wal en 2 nivel. y continuación del montaje del Sistema austico auditorio.. - Se firma acta por los presentes.

27.09.24
Clima: Soleado
Personal Contratista:
Director de Obra, Residente de Obra, Residente SST, Almacenista
Apoyos SST (2) operativos, fabricantes (12)
Personal Interventoria
Residente Interventoria, Residente SST.
Mediante recorrido se le Solicita al contratista dar celeridad con las actividades de alto riesgo, y pintura. Se evidencia que esta la cuadrilla con menos personal y que debe avanzar con los acabados de las diferentes areas estructuras. Se evidencia la instalación del remate en

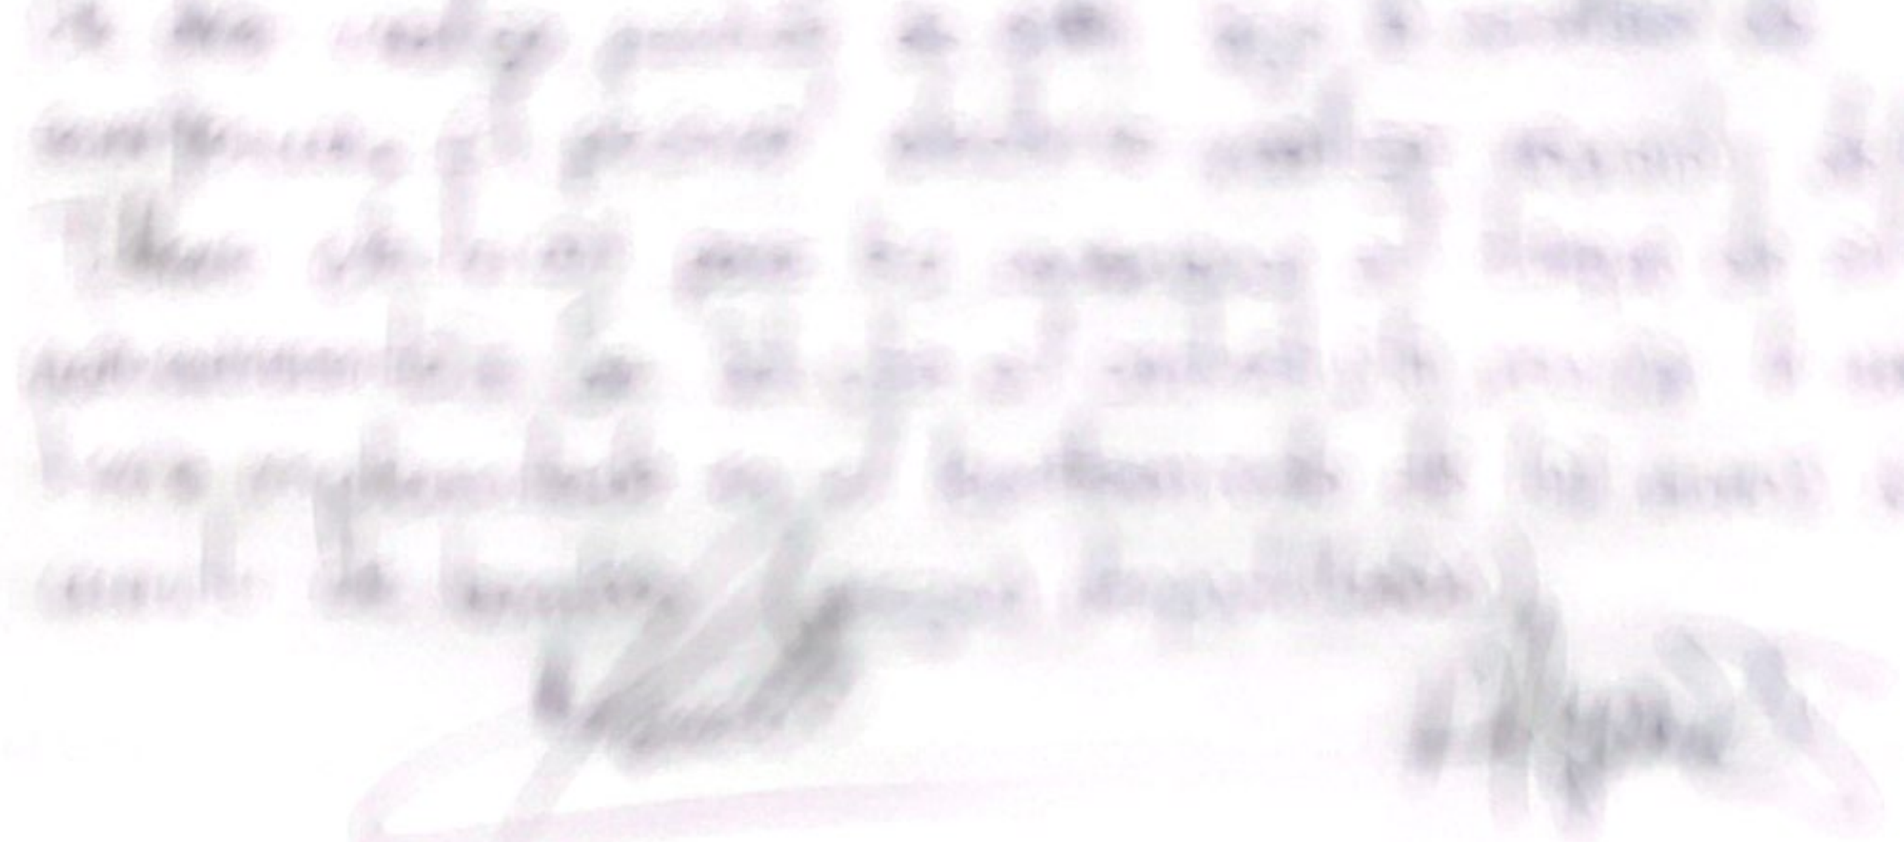

Scanned with CamScanner

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ANEXO No. 5 – Listado personal

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	CONTROL MENSUAL DE PERSONAL

Página: 1 de

DIA	MES	AÑO

FECHA DE REPORTE	DD	29	MM	09	AA	2024

I. IDENTIFICACIÓN

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y INPLAYCO SAS – BIC Nit: 860524168 8.				
INTERVENTOR	INPLAYCO SAS	**NIT O C.C.**	860 52416-8	**CONTRATO N°**	314-COADE-DICRECENACINGENIEROS-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	**NIT O C.C.**	901.759.617- 0	**CONTRATO N°**	272-CENANCINGENIEROS-2023

I. CONTROL DE PERSONAL DE OBRA

IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL			ENTIDAD DE AFILIACIÓN Y N° AFILIACIÓN			FECHA DE ENTRADA			FECHA DE SALIDA		
	N° DE C.C.	**CARGO**	**EPS**	**PENSIÓN**	**ARP**	**DD**	**MM**	**AA**	**DD**	**MM**	**AA**

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	CONTROL MENSUAL DE PERSONAL

NOMBRE												
LUIS ALEJANDRO LEAL CAÑON	79.557.593	DIRECTOR DE OBRA DE INTERVENTORIA	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	4	7	2024			
ALEJANDRA CEPEDA MURCIA	52.860.139	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	SANITAS	PROTECCION	POSITIVA	4	7	2024			
MIGUEL ANTONIO ORTEGON	79.555.964	RESIDENTE DE INTERVENTORIA SSTA	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	4	7	2024			
CONSORCIO CENAC TEATRO 2023											
JOSE LEONEL RODRIGUEZ ORTIZ	79.387.420	DIRECTOR DE OBRA	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	26	12	23			
JONATHAN NAVARRO GUTIERREZ	1.065.657.611	RESIDENTE DE OBRA	SANITAS	PORVENIR	SURA	26	12	23			
OLGA LUCIA LONDOÑO SALCEDO	52.192.680	PROFESIONAL SST	COMPENSAR	COLFONDOS	SURA	09	01	24			
ESNERITH ARIAS LEON	1.032.474.181	PROFESIONAL AMBIENTAL	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	26	12	23			
HERLIN MELVIN MONTENEGRO ROA	72.241.066	ALMACENISTA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA	28	12	23			

DIA **MES** **AÑO**

I. CONTROL DE PERSONAL DE OBRA

IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL			ENTIDAD DE AFILIACIÓN Y N° AFILIACIÓN			FECHA DE ENTRADA			FECHA DE SALIDA		
NOMBRE	N° DE C.C.	CARGO	EPS	PENSIÓN	ARP	DD	MM	AA	DD	MM	AA

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	CONTROL MENSUAL DE PERSONAL

SUBCONTRATISTA Y&H CONSTRUOBRAS											
YEIMER BOADA ROBLES	1.026.562.467	CONTRATISTA	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA	09	01	24			
YEIMY DANIELA GONZALEZ MARTINEZ	1.069.749574	INSPECTOR SST	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	02	07	24			
GABRIEL ANGEL MANOSALVA VELASQUEZ	1.064.712.262	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	05	01	24			
YOSMAN ANDRES TAMAYO DIAZ	1.004.808.987	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	06	01	24			
JAVIER ALBERTO ESMITH SUAREZ	1.098.821.481	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA	15	01	24	06	08	2024
JEAN CARLOS GUETTE PALOMINO	1.043.844.401	AYUDANTE DE OBRA	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	15	01	24			
ALEXANDER DAVID BARRIOS CABEZA	1.127.574.114	AYUDANTE	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	29	02	24	06	08	2014
JESUS DANIEL RUIZ PALOMINO	1.043.847.553	AYUDANTE	MTUALSER	PORVENIR	SURA	02	07	24			
JOSE ALFREDO RADA DIAZ	1.044.616.896	AYUDANTE	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA	02	07	24			
JORGE LUIS SARABIA ESCORCIA	1.127.587.970	AYUDANTE	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	11	07	24			
YONIER ANDRES MANOSALVA SALAZAR	1.005.027.434	AYUDANTE	COOSALUD	PROTECCIÓN	SURA	18	07	24			
FREDY PARAMO VEGA	1.151.188.874	AYUDANTE	CAJACOPI	PORVENIR	SURA	24	07	24	06	08	2024
PABLO JULIO LEAL HERNANDEZ	1.030.061.067	OFICIAL	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	06	05	24	02	08	2024
SUBCONTRATISTA FACTOR DE POTENCIA											
ALLIXON KATHERINE CANDIA GALICIA	1.106.896.255	INSOECTOR SST	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	02	07	24			
JOSE LUIS RODRIGUEZ CHICO	1.126.244.256	OFICIAL	FAMISANAR	PROTECCIÓN	POSITIVA	02	07	24			
NESTOR YESID GARCIA ROJAS	1.012.396.404	AYUDANTE	SANITAS	PROTECCIÓN	POSITIVA	02	07	24			
JORGE IVAN ROJAS SERRANO	1.102.445.280	AYUDANTE	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	02	07	24			
JORGE DANILO LOZADA CASTRILLON	14.323.463	AYUDANTE	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	02	07	24			
VICTOR ALFONSO YAÑES YAÑES	5.932.841	AYUDANTE	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	02	07	24			
SUBCONTRATISTA HODROSANITARIOS											
LUZ MARINA SUANCHA VIRGUEZ	52.396.671	INSOECTOR SST	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	BOLIVAR	02	07	24			
JORGE LUIS PEREZ CABALLERO	1.043.840.586	OFICIAL	ALIANZA SALUD	PORVENIR	BOLIVAR	02	07	24			

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	CONTROL MENSUAL DE PERSONAL

JUAN DAVID MARTINEZ PEÑA	1.019.017.850	AYUDANTE	SANITAS	PORVENIR	BOLIVAR	02	07	24	31	07	2024
LEONARDO VILLAREAL GUZMAN	1.051.828.087	AYUDANTE	MUTUALSER	PORVENIR	BOLIVAR	02	07	24	27	07	2024
JOSE ALBERTO HERNANDEZ MARTINEZ	1.073.813.547	AYUDANTE	SALIUD TOTAL	COLFONDOS	BOLIVAR	02	07	24			
OSCAR EDUARDO MARTINEZ HERNANDEZ	1.063.164.889	AYUDANTE	SALUD TOTAL	PORVENIR	BOLIVAR	02	07	24			
MANUEL ANTONIO MARRUGO HERNANDEZ	6.811.735	AYUDANTE	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	BOLIVAR	02	07	24			
JOSE JOAQUIN MENDOZA HERNANDEZ	8.539.714	AYUDANTE	COODSALUD	COLFONDOS	BOLIVAR	02	07	24			

DIA **MES** **AÑO**

SUBCONTRATISTA OSWALDO CHAPARRO PISOS											
YEIMY DANIELA GONZALEZ MARTINEZ	1.069.749574	INSPECTOR SST	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	02	07	24			
JOSE OSWALDO CHAPARRO DAZA	79.323.582	ENCARGADO	SALUD TOTAL	PROTECCIÓN	POSITIVA	15	07	24			
EDISON OSWALDO CHAPARRO LOAIZA	1.013.679.750	OFICIAL	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	15	07	24			
CARLOS ARTURO GUERRERO FERNANDEZ	1.024.552.963	AYUDANTE	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	15	07	24			
CRISTIAN CAMILO MUÑOZ REYES	1.033.767.086	AYUDANTE	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	POSITIVA	03	08	24			
SUBCONTRATISTA GRUPO MOLINA S.A.S. PISO MADERAS											
ALLIXON KATHERINE CANDIA GALICIA	1.106.896.255	INSPECTOR SST	SALUD TOTAL								
LUIS ALBERTO MAYORQUIN AMADO	1.023.860.838	OFICIAL	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	31	07	24			
LUIS MOLINA		ENCARGADO									
SUBCONTRATISTA METEX ESTRUCTURA METALICA											

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	CONTROL MENSUAL DE PERSONAL

JAIRO MANUEL SAAVEDRA ROJAS	8.050.865	OFICIAL	SURA	SURA	POSITIVA	31	07	24			
JORGE ELIECER CASCAVITA ROJAS	79.425.359	ENCARGADO	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	2	09	24			
DANIEL LOZANO OSORIO	79.409.054	AYUDANTE	COMPENSALUD	PORVENIR	POSITIVA	07	09	24			
SUBCONTRATISTA 90 GRADOS DRYWALL											
YEIMY DANIELA GONZALEZ MARTINEZ	1.069.749574	INSPECTOR SST	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	09	08	24			
NELSON GARNICA JIMENEZ	79.328.622	OFICIAL	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	09	08	24			
ROGER GARNICA BARBOSA	1.026.272.247	AYUDANTE	COMPENSAR	PROTECCIÓN	POSITIVA	09	08	24			
EINER GARNICA BARBOSA	1.026.289.680	AYUDANTE	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	09	08	24			
SUBCONTRATISTA HK3 INGENIEROS											
YEIMY DANIELA GONZALEZ MARTINEZ	1.069.749574	INSPECTOR SST	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	26	08	24			
GABRIEL HERNANDEZ GALEANO	79.420.400	OFICIAL	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	26	08	24			
CARLOS ALBERTO CANO RUA	1.023.865.994	INSTALADOR	COMPENSAR	PROTECCIÓN	POSITIVA	26	08	24			
ADRIAN KOWASKY CONTRERAS DIAZ	1.030.542.685	INSTALADOR	SANITAS	PROTECCIÓN	POSITIVA	26	08	24			

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	CONTROL MENSUAL DE PERSONAL

ALVARO ANDRES BALLESTEROS OCAMPO	1.022.331.655	INSTALADOR	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	26	08	24			
MAURICIO CONTRERAS CONTRERAS	79.125.839	INSTALADOR	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	26	08	24			
ANGELO FABIEN TORRES CANCINO	80.176.917	INSTALADOR	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	26	08	24			
DANIEL HUMBERTO RODRIGUEZ TEJADA	80.019.003	INSTALADOR	FAMISANAR	PROTECCIÓN	POSITIVA	26	08	24			
CAMILO GRANADOS		ENCARGADO	FAMISANAR	PROTECCIÓN		26	08	24			

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ANEXO No. 6 – Documentos SST

INPLAYCO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES	**INFORME SEMANAL SST-MA**	Código:	
		Versión:	Pág.
		Vigente desde:	

FECHA	2 DE OCTUBRE 2024	INFORME No	24	DEL	23/09/2024	AL	29/09/2024

1. INFORMACION GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y INPLAYCO SAS – BIC Nit: 860524168 8.

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No:	314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES
FECHA DE INICIO:	20 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	18 DE MARZO DE 2024
PRORROGA 1:	N/A
PRORROGA 2:	N/A
PLAZO ACTUALIZADO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	18 DE MARZO DE 2024
VALOR INICIAL:	$ 524.033.402,49
VALOR ADICIÓN 1:	1,444,120,181,24
VALOR ADICIÓN 2:	N/A
VALOR ACTUALIZADO	7,820,947,300,78

2. AVANCE SST-MA

2.1. Actividades Realizadas en la semana

Actividades realizadas	Cantidad	Observaciones
revisión documentación	1	se revisó la documentación del personal del contratista, en sus áreas hidráulicas, eléctricas, civil, permisos de trabajo, ats, inspecciones preoperacionales, verificación de asistencia personal a obra
revisión informes semanales contratista	1	se revisa el informe del contratista, para su posterior aprobación
Asistencia a comité y visitas programadas	1	Se asiste a comité y se acompaña a recorrido del mismo y a las demás visitas de la Cenac.
inspecciones preoperacionales	15	Inspecciones de herramientas de mano, EPCC, taladros eléctricos e inalámbricos, pulidora, herramientas menores y equipos eléctricos, equipo de soldadura, locativas, Epp, tronzadora, andamios, escaleras, roscadora, ranuradora
Se realiza pañete de paredes, dilataciones en pisos del teatro zona interna y externa, Recoger escombro proveniente de las actividades de pañete.	6	Demarcación del área de trabajo, Charlas de seguridad, pausas activas, ATS, Inspección preoperacional de los equipos y herramientas a utilizar, uso de EPP como son: guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo, protectores auditivos de copa y tapa bocas
Alistamiento de pisos como: barrerlo, recoger material con pala y moverlo en carretillas a los sitios de acopio de escombro, realizar instalación de estructura para fundir pisos.	10	Usar los EPP guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo y herramientas, tapa bocas, personal certificado y capacitación en trabajo seguro de alturas, protección auditiva, pausas activas, charlas ocupacionales, demarcación del área de trabajo.
Alistamiento de perfilería metálica e instalación en techo, dejar zonas aseadas y en orden	6	Demarcación del área de trabajo, Charla de seguridad, pausas activas, ATS, Inspección preoperacional de los equipos y herramientas a utilizar, uso de EPP como son: guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo, protectores auditivos de copa y tapa bocas.
Alistamiento de perfilería metálica e instalación en para la escalera de emergencias	6	Demarcación del área de trabajo, Charla de seguridad, pausas activas, ATS, Inspección preoperacional de los equipos y herramientas a utilizar, uso de EPP como son: guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo, protectores auditivos de copa y tapa bocas.
Montaje de estructura para Drywall y estucado de paredes	3	Demarcación del área de trabajo, Charla de seguridad, pausas activas, ATS, Inspección preoperacional de los equipos y herramientas a utilizar, uso de EPP como son: guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo, tapa bocas.
Armado de andamio, armado de tubería PVC, montaje de tubería RCI, excavación, instalación de tubería PVC	11	Usar los EPP guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo y herramientas, tapa bocas, personal certificado y capacitación en trabajo seguro de alturas, protección auditiva, pausas activas, charlas ocupacionales. Inspección de equipos. Lecturas hojas de seguridad de productos químicos
Mantenimiento e inspecciones de Herramientas menores, extensiones y equipos eléctricos, Corte, Doblaje, prolongación e instalación de tuberías en EMT, PVC, cajas eléctricas, derivación de cableado eléctrico, cableado para red de datos, Regatas en paredes, Arme y Desarme de andamios, Orden y Aseo	11	Firma de ATS, e inspecciones de equipos eléctricos, extensiones eléctricas, escaleras y herramientas menores, firma de trabajos en Alturas, Firma de permiso para trabajos en caliente, firma de preoperacional de taladros, rotomartillo y pulidoras, firma de preoperacional de andamios e inspección de eslingas y arnés.

2.2. Temas de capacitación- charla contratista

Actividades realizadas	Cantidad	Observaciones
1. Yo te quiero por eso te cuido y socialización ATS. 2. Primeros auxilios como primer respondiente, uso del extintor y como inmovilizar una persona en camilla. **3.** Socialización del simulacro distrital que es el 2 de octubre a las 10:00 am, silbato para evacuación. 4. Socialización en cuidados y respeto a la señalización minimizando riesgos. **5.** Cuidado manos. **6.** Mantener áreas de trabajo en orden y aseo.	6	Se realiza para personal administrativo y operativo
1.Pausas activas 2.Charla por día simulacro 3.Cuidado de manos 4.Inspeccion de equipos 5.Pausas activas de las manos	5	Se realiza para personal administrativo y operativo
Peligros del mal uso de pulidoras Organización de extensiones Protección de Caídas- Andamios Clasificación de Basuras	4	Se realiza para personal administrativo y operativo
Total, capacitaciones	**15**	

2.3. Manejo integral de residuos

Meta del proyecto RCD (t)							
	Escombro (t)	**Porcentaje cumplimiento RCD (t)**	**Agua (m3)**	**Madera (t)**	**Gravilla (t)**	**Arena (t)**	**Otros (t)**
Semanal	7	0	0	0	0	0	0
Mensual (acumulada)	67	0	0	0	0	8	14
Total, proyecto	**581**	**0**	**0**	**1.5**	**0**	**2.4**	**1.4**

2.4. Medidas de manejo ambiental

Programa	Cantidad	Descripción
No. 1-1 Manejo de emisiones atmosféricas y ruido	1	••Se realizo las inspecciones de los equipos y maquinarias. •Se cubrió el material de construcción (arena amarilla, grava, arena de rio, piedra rajón), evitando el arrastre por la acción del aire y del agua. • Se realizo seguimiento a los vehículos que ingresaron hasta la fecha al proyecto para la disposicion de RCD, residuos especiales. •Se realizo limpieza de las áreas de cargue de RCD.
No. 1-2. Manejo de aguas residuales y aguas lluvias.	1	Para el presente informe, no se llevaron a cabo actividades
No. 1-3. Manejo de residuos sólidos.	1	•Se realizo jornadas de aseo con el fin de mantener las instalaciones de trabajo limpiar y adecuadas para el desarrollo de las actividades programadas. •Se hace recolección de los residuos sólidos en los puntos ecológicos y los contenedores disponibles en el proyecto. •Se realizo limpieza y orden de los puntos de acopio temporal
No. 1-4. Señalización.	1	•Se realizo mantenimiento a la señalización de prohibición, advertencia y obligación, cabe aclarar que la señalización se instala de acuerdo con las condiciones de desarrollo de las actividades que se ejecutan en el proyecto.
No. 1-5. Instalación y operación de campamentos.	1	• Se adelanto jornada de aseo por parte de los subcontratistas en cada uno de los campamentos.
No. 1-6. Manejo operación de maquinaria, equipos y vehículos.	1	•Se realizó las inspecciones de los equipos y maquinarias.
No. 1-7. Manejo recolección, transporte y disposicion de RCD.	1	Se realiza seguimiento sobre la gestión de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) generados hasta la fecha. Retiro de RCD (t) Semana: 7 Retiro de RCD (t) Acumulado: 581
No. 1-8. Manejo de materiales de construcción no pétreos.	1	Se realiza seguimiento de los materiales de construcción no pétreos
No. 1-9. Manejo de materiales granulares.	1	Para el presente informe, no se llevaron a cabo actividades.
No. 1-10. Manejo de residuos líquidos, combustibles, aceites y sustancias químicas.	1	Para el presente informe, no se llevaron a cabo actividades.
No. 1-11 Manejo y disposicion de residuos peligrosos.	1	Para el presente informe, no se llevaron a cabo actividades.

2.5. Personal en obra

Profesionales INTERVENTORIA	Profesionales CONTRATISTA	Obra	Total	% de personal	
				Femenino	Masculino
3	5	32	40	7.3	92.7

2.6. Indicadores

	Ausentismo enfermedad laboral (días)	Ausentismo accidente laboral (días)	Ausentismo incidente laboral (días)	Ausentismo por accidentes de trabajo personal operativo (días)
Semanal	0	0	0	0
Mensual (acumulada)	0	0	0	0
Total, proyecto	**0**	**0**	**0**	**0**

2.7. Accidentalidad

	Casos con daño a propiedad	Incidente ambiental	Accidente ambiental	Incidentes laborales	Accidentes laborales	Fatalidades
Semanal	0	0	0	0	0	0
Mensual (acumulada)	0	0	0	1	0	0
Total, proyecto	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**

3.8. Conclusiones y recomendaciones

En la presente semana se asiste a comité de obra, asi como al recorrido del mismo, se continúan actividades como trabajo en alturas, en caliente, para la realización de la escalera metálica del costado sur occidente del teatro, ingresa nuevo personal de HK3 ingeniería, para esta semana se culmina con un total de 5 profesionales y 32 operarios en obra, 12 en planta para un total de 44 operativos y 3 administrativos de interventoría con un porcentaje de 7.3% personal femenino y 92.7% personal masculino, se mantiene el promedio, todos los trabajadores contaron con sus EPP correspondientes, se realiza disposicion de RCD 7 t, para un total de obra de 581 t, se realizaron jornadas de orden y aseo, para este periodo no se presentaron accidentes ni incidentes, se hacen nuevamente observaciones al contratista del uso de andamios y escaleras, se hacen recorridos con la profesional residente SST del contratista, realizando mantenimiento de señalización y demarcación de las diferentes áreas de trabajo.

ELABORO



MIGUEL ANTONIO ORTEGON
INTERVENTOR AMBIENTAL - SST
C.C.79,555,964
INPLAYCO S.A.S
