CONTRATO DE INTERVENTORÍA-No. 314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023-ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJERCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS E INPLAYCO SAS-BIC Nit: 860524168-8

INFORME SEMANAL No. 33 DE INTERVENTORIA

OBJETO: "CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTEN DEL PROCESO NO. -295-LP CENACINGENIEROS-2023, CUYO OBJETO ES REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023

CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO CENAC TEATRO 2023

BOGOTÁ, NOVIEMBRE 2024

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL No. 33

Página: 1 de

DIA	4	MES	12	AÑO	2024

SEMANA N°	33	DEL	25 DE NOVIEMBRE 2024	AL	1 DE DICIEMBRE 2024
FECHA INICIO :	20/12/2023	FECHA TERMINO :	15/12/2024		

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023				
INTERVENTOR	INPLAYCO SAS - BIC	NIT O C.C.	860524168 8	CONTRATO N°	314
CONTRATISTA	CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	NIT O C.C.	901.759.617-0	CONTRATO N°	272

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS			ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO	
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO	PORCENTAJE DE EJECUCION EJECUTADO	ACTIVIDADES	MOTIVOS
CAP 1. PRELIMINARES	100,00%	100,00%	MANTENIMIENTO MONUMENTO	ACTIVIDAD SE REALIZARA UNA VEZ SE HAYAN TERMINADO TODAS LAS ACTIVIDADES DE FACHADAS Y ANDENES
C-2 CIMIENTOS	100,00%	100,00%		
S-3 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS	100,00%	100,00%		
PB-4 PISOS-BASES-RELLENOS	100,00%	98,00%		
EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO	100,00%	100,00%		
M-6 MAMPOSTERÍA	100,00%	100,00%		
H-7 INSTALACIONES HIDRÁULICAS	100,00%	100,00%		
H-7B RED CONTRAINCENDIOS	100,00%	100,00%		
IE-8 INSTALACIONES ELECTRICAS	100,00%	98,00%		
PR-9 PAÑETES Y RESANES	100,00%	99,00%		
CB-10 CUBIERTAS	100,00%	99,00%	INSTALACION DE EXTRACTORES EOLICOS	
CR-11 CIELORASOS	100,00%	98,00%		
PA-12 PISOS - ACABADOS	100,00%	98,00%		
E-13 ENCHAPES Y ACCESORIOS	100,00%	98,00%		
V-14 VIDRIOS Y ESPEJOS	100,00%	90,00%		
AS-15 APARATOS SANITARIOS	100,00%	98,00%		
MA-16 CARPINTERÍA EN MADERA, MUEBLES EN CONCRETO Y AMOBLAMIENTO	100,00%	85,00%		
ME-17 CARPINTERÍA METALICA Y EN ALUMINIO	100,00%	99,00%		
CE-18 CERRADURAS	100,00%	80,00%		
PI-19 PINTURA	100,00%	95,00%		
EE-20 EQUIPOS ESPECIALES	100,00%	95,00%		LOS EQUIPOS ESPECIALES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE TRASPORTACIÓN
OE-21 OBRAS EXTERIORES	100,00%	90,00%		
AG-22 ASEO GENERAL	100,00%	50,00%		
VP-23 VIAS Y PAVIMENTOS	100,00%	0,00%		NO SE REALIZA ESTA ACTIVIDAD
SC-25 RED DE SEGURIDAD Y CONTROL, CABLEADO ESTRUCTURADO	100,00%	98,00%	S.E.I. Y PUESTA DE FUNCIONAMIENTO DE FIBRA OPTICA MULTIMODO A 12 HILOS	LA SUPERVISIÓN A LA FECHA NO HA DEFINIDO EL PUNTO DE CONEXIÓN
TOTALES	100%	90,72%		

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I.U.	VR.TOTAL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO		VR. POR EJECUTAR
	$ 6.376.826.519,54	SEMANAL	$248.097.432,10	$ 392.793.714,72
		% semanal	3,17%	
		ACUMULADO	$7.428.153.586,06	
		% acumulado	94,98%	

AVANCE DE INVERSION	SEMANA 33	ACUMULADO
	3,97%	98,75%
AVANCE DE OBRA		-3,77%

SUSPENSIÓN No. 1	del 6 de marzo al 1 de julio del 2024
VALOR CONTRATO ADICION No. 1	$ 1.444.120.780,24
VALOR TOTAL CON ADICIÓN	$ 7.820.947.300,78

NOTA: Con base en la nueva programacion de obra el contratista presenta un atraso del -3,77%

IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA


		CONTRATISTA			
DIA	FECHA	OPERATIVOS/FABRICACIÓN	ADMINISTRATIVOS	INTERVENTORIA	TOTAL
LUNES	25/11/2024	37	4	2	43,00
MARTES	26/11/2024	37	4	2	43,00
MIERCOLES	27/11/2024	37	5	3	45,00
JUEVES	28/11/2024	37	4	2	43,00
VIERNES	29/11/2024	37	4	2	43,00
SABADO	30/11/2024	37	2	1	40,00
DOMINGO	1/12/2024	0	0	0	0,00

V.ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)

FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
25/11/2024	SOLEADO	SOLEADO	
26/11/2024	SOLEADO	SOLEADO	
27/11/2024	SOLEADO	SOLEADO	
28/11/2024	SOLEADO	SOLEADO	
29/11/2024	SOLEADO	SOLEADO	
30/11/2024	SOLEADO	SOLEADO	
1/12/2024	SOLEADO	SOLEADO	

VI. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)

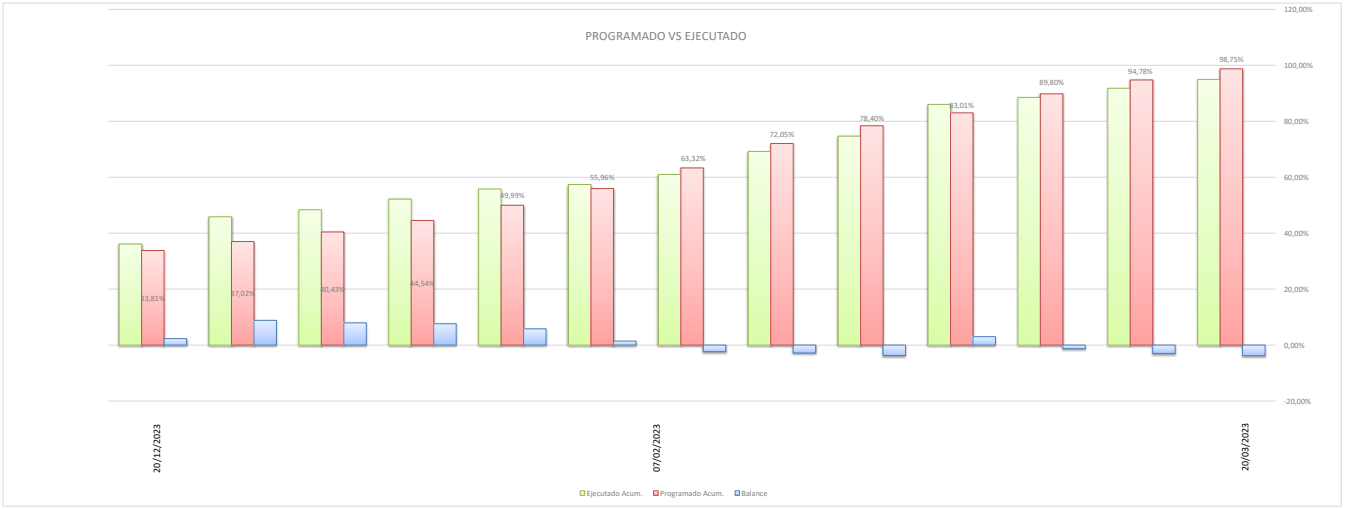

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL No. 33

Página: 1 de

DIA	4	MES	12	AÑO	2024

SEMANA N°	33		DEL	25 DE NOVIEMBRE 2024				AL	1 DE DICIEMBRE 2024				
Semana	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**
Fecha	**8/09/2024**	**15/09/2024**	**22/09/2024**	**29/09/2024**	**6/10/2024**	**13/10/2024**	**20/10/2024**	**27/10/2024**	**3/11/2024**	**10/11/2024**	**17/11/2024**	**24/11/2024**	**1/12/2024**	**8/12/2024**
Progr. Semanal	3,32%	3,22%	3,40%	4,11%	5,45%	5,97%	7,36%	8,73%	6,34%	4,62%	6,79%	4,97%	3,97%	1,08%
Programado Acum.	33,81%	37,02%	40,43%	44,54%	49,99%	55,96%	63,32%	72,05%	78,40%	83,01%	89,80%	94,78%	98,75%	99,83%
Ejec. Semanal	3,18%	9,75%	2,51%	3,79%	3,64%	1,59%	3,37%	8,24%	5,45%	11,35%	2,50%	3,27%	3,17%	
Ejecutado Acum.	36,12%	45,87%	48,38%	52,17%	55,81%	57,40%	60,99%	69,23%	74,68%	86,03%	88,53%	91,80%	94,97%	94,97%
Balance	2,31%	8,85%	7,95%	7,63%	5,82%	1,44%	-2,33%	-2,82%	-3,72%	3,02%	-1,27%	-2,98%	-3,77%	-4,85%

VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

NOVEDADES

CALIDAD		MATERIALES	EQUIPOS
ASPECTOS DE OBRA CIVIL	**ACTIVIDADES EJECUTADAS -SEMANA**		
PROGRAMACION AJUSTADA	El contratista de obra hace entrega de la programación y el flujo de caja ajustados con cierre a la fecha del 15 de diciembre del 2024.		
OBRA CIVIL	Se realiza afinado de pasos de escalera de acceso en el costado norte y sur		
	Se realiza instalación de mamposteria mazisa en fachada norte (acceso oriental)		
	Se realiza fundida de anden en la zona baja de la escalera de emergencia para dar terminado final		
	Se realiza construcción de caja electrica (tanque de almacenamiento) y caja de aguas lluvias (taquilla)		
CUARTO DE BOMBAS	Se realiza la construcción de caja electrica		
	A la fecha no se ha dado respuesta por parte de la supervision del contrato respecto al acabado de los muros del cuarto de bombas.		
ESCALERAS DE EMERGENCIA	Se da acabado a la aplicación de la pintura negra. Se le solicita al contratista de obra señalizar la zona y prohibir el paso peatonal.		
REDES ELECTRICAS	Se concluye con la instalación de las acometidas por parte de la cuadrilla electrica		
	Por parte de la supervisión no se ha dado respuesta frente a la entrega del medidor desmontado por parte del personal de codensa.		
	el contratista de obra continua con la adecuacion del espacio del traslado de los tableros electricos del 2 al 3er piso del para del camerino sur.		
REDES HIDROSANITARIAS	El contratista continua con la instalación de los splinters del area de mezannine, se realiza actividad en junto con el avance de la instalación del cielo raso acustico en madera lisa.		
	Se realiza instalacion de aparatos sanitarios en baños mixtos del 2do piso y de camerino sur		
CIELO RASO	El contratista de obra no a dado continuidad a la actividad de instalacion de lamina de dry wall bajo el antepecho de la fachada sur. Se solicita concluir con la actividad		
	Nota: se le ha solicitado de manera recurrente al contratista de obra dar celeridad al acabdado (pintura del cielo raso perteneciente al area de vestibulo y distribuidor del 1er piso) dado que se evidencia que la cuadrilla solo cuenta con dos operarios y el rendimiento es minimo.		
FACHADAS	El contratista termina actividades de arreglo y pintura de acabado de albardillas de las 3 terrazas.		
	El contratista a tenido que parar las actividades de enchape de antepechos dado que las condiciones climaticas no han permitido dar continuidad.		
TERRAZAS	El contratista de obra realiza imprimación de terrazas del 3 y 4 piso para posterior instalación del manto asfaltico.		
ENCHAPES	El contratista de obra da inicio al cambio de enchape de muro afectado en el baño d hombres del 1er piso		
	El contratista de obra realizó alistado de piso en area de tarima para realizar posterior fundida de piso en granito blanco.		
PINTURA	Se continua con el estuco del area de los baños de mujeres y la primera mano de pintura. Adicionalmente se continuan con labores de pintura en el area de vestibulo y distribuidor.		
CARPINTERIA METALICA	El contratista de obra da inicio a la fabricacion e instalación de la ventaneria que comprente el teatro		
SISTEMA ACUSTICO	Nuevamente se le recuerda al contratista de obra que el acabado de los muros y el acabado del cielo raso acustico debe ser uniforme, la misma tonalidad se debe presentar en las cuatro caras; lo anterior, debido a que se evidencia que hay algunas secciones que se ven de un tono mas oscuro y por lo tanto no se ve uniforme. Adicionalmente se le solicita ajustar la seccion donde se encuentra ubicada la franja de iluminacion tipo led del cielo raso ya que se evidencia que los cortes presentados no se encuentran empatados con la junta que atraviesa lonjitudinalmente todo el cielo raso, lo cual se debe ajustar.		
	El contratista de obra informa que no llegara todo el material faltante si no hasta el 3 de diciembre, por lo que se evidencia que no se cumplira con la entregadel espacio estipulada para el dia 4 de dieciembre.		
OBSERVACIONES	Se le realiza llamado de atencion al contratista de obra dado que a la fecha es claro que no va a culminar con las labores estipuladas para el area de auditorio. Adicionalmente, se le ha solicitado repetidamente al contratista realizar brigadas de aseo para poder evidenciar claramente el avance de obra.		
	Teniendo en cuenta que se encuentra a 2 semanas de culminar con el tiempo contractual del termino del contrato, se le informa al contratista que es importante remitir la solicitud de suspension dado que se evidencia que por factores de llegada de equipos especiales y retrasos en ejecucion de actividades, no se va a llegar a termino para el dia 15 de diceimbre .		
	A la fecha no se tiene respuesta por parte de la supervisión del contrato de la aprobacion o desestimiento del balance de obra No 12, ni tampoco la autorización para las obras adicionales solicitadas por el General Sepulveda.		
ASPECTOS ADMINISRATIVOS	**ACTIVIDADES EJECUTADAS -SEMANA**		
Gestión de comunicaciones	1.se entrega informe semanal No. 32 2. se realiza comité de obra No 31 3. Se espera respuesta por parte de la supervisión de punto de conexion a fibra optica.		
Interventoría- Listado de personal	El personal de interventoria se encuentra al dia con la documentación de parafiscales		
Contratista-Listado de personal	La interventoria realiza revisión del personal administrativo y operativos los cuales pasan el control interno (curso de alturas) y documentación de parafiscales al dia.		
	La interventoria solicita al contratista de obra incrementar las cuadrillas de cielo rasos y pintura y acustica, se debe dar celeridad con los acabados de las areas de sotano, vestibulo y baños de 1er y 2do piso y auditorio		

| FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL | | |

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL No. 33

Código:		**Versión:**		**Página:**	
SEMANA N°	33 **DEL**	25 DE NOVIEMBRE 2024	**AL**	1 DE DICIEMBRE 2024	
FECHA INICIO :	**20/12/2023**	**FECHA TERMINO :**	**15/12/2024**		

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023**				
INTERVENTOR	**INPLAYCO SAS - BIC**	**NIT O C.C.**	**860524168 8**	**CONTRATO N°**	**314**
CONTRATISTA	**INPLAYCO SAS - BIC**	**NIT O C.C.**	**901.759.617-0**	**CONTRATO N°**	**272**

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO








UBICACIÓN:	**BAÑOS MIXTOS**	**UBICACIÓN:**	**FACHADA ORIENTAL**	**UBICACIÓN:**	**ESCALERA DE EMERGENCIA**
ACTIVIDAD	INSTALACION DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE	**ACTIVIDAD**	INSTALACIÓN DE ENCHAPE ANTEPECHO	**ACTIVIDAD**	APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO





UBICACIÓN:	**FACHADA NORTE**	**UBICACIÓN:**	**TABLERO PRINCIPAL**	**UBICACIÓN:**	**ESCALERA DE EMERGENCIAS**
ACTIVIDAD	ACABADO DE PINTURA EN CIELO RASO	**ACTIVIDAD**	INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS-CABLEADO	**ACTIVIDAD**	APLICACIÓN DE PINTURA DE ACABADO NEGRO-ESMALTE









UBICACIÓN:	**MEZANNINE**	**UBICACIÓN:**	**COSTADO NORTE-AUDITORIO**	**UBICACIÓN:**	**BAÑOS MIXTOS Y 3ER PISO**
ACTIVIDAD	INSTALACION DE PANEL ACUSTICO DE MURO-SECCION INCLINADA	**ACTIVIDAD**	INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA SECCION INCLINADA	**ACTIVIDAD**	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS





UBICACIÓN:	**BAÑOS MUJERES 1ER PISO**	**UBICACIÓN:**	**EXTERIOR**	**UBICACIÓN:**	**TEATRO**
ACTIVIDAD	INSTALACION DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE	**ACTIVIDAD**	ALISTADO DE CONTRAHUELLAS-ESCALERAS DE ACCESO	**ACTIVIDAD**	FABRICACION E INSTALACION DE CARPINTERIA METALICA-VENTANERIA




UBICACIÓN:	BAÑO HOMBRES 1ER PISO
ACTIVIDAD	INSTALACION DE ENCHAPE DE MURO





UBICACIÓN:	MEZANNINE
ACTIVIDAD	CONSTRUCCION DE POYO




UBICACIÓN:	CAMPAMENTO
ACTIVIDAD	INGRESO DE MATERIAL PIEDRA MUÑECA



UBICACIÓN:	TANQUE DE ALMACENAMIENTO
ACTIVIDAD	CONSTRUCCIÓN DE CAJA ELECTRICA

UBICACIÓN:	AUDITORIO
ACTIVIDAD	INSTALACIÓN DE ULTIMO TRAMO DE CIELO RASO




UBICACIÓN:	EXTERIOR
ACTIVIDAD	INSTALACIÓN DE MAMPOSTERIA




UBICACIÓN:	TAQUILLA
ACTIVIDAD	CONSTRUCCION DE CAJA DE AGUAS LLUVIAS Y ALISTADO DE PISO



UBICACIÓN:	CUARTO DE SONIDO
ACTIVIDAD	DESTRONQUE DE PISO





UBICACIÓN:	FACHADA SUR
ACTIVIDAD	NIVELACIÓN DE PASOS DE ESCALERA-ALISTADO



UBICACIÓN:	BAÑO CAMERINO SUR
ACTIVIDAD	INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS



UBICACIÓN:	TERRAZAS
ACTIVIDAD	IMPRIMACIÓN DE TERRAZAS DEL 3Y 4 PISO

UBICACIÓN:	ACCESO
ACTIVIDAD	INSTALACIÓN DE PIEDRA MU{ÑECA

ANEXO No. 2 - Registro fotográfico ambiental

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	INFORME SEMANAL

Código:		Versión:	Fecha de Emisión:		Página:
SEMANA N°	33	DEL 25 DE NOVIEMBRE		AL	01 DE DICIEMBRE
FECHA INICIO :	20/12/2023	FECHA TERMINO :	17/12/2024		

I. IDENTIFICACION DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA NO. 272-CENACINGENIEROS-2023 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y CONSORCIO CENAC TEATRO 2023. "REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023"				
INTERVENTOR	INPLAYCO SAS	NIT O C.C.	860 524 16-8	CONTRATO Nº	314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	NIT O C.C.	901 759 617 - 0	CONTRATO Nº	272-CENANCINGENIEROS-2023

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO AMBIENTAL



UBICACIÓN:	INTERIOR TEATRO
COMENTARIOS:	SENALIZACION



UBICACIÓN:	CAMPAMENTO CONTRATISTA
COMENTARIOS:	SENALIZACION



UBICACIÓN:	INTERIOR TEATRO
COMENTARIOS:	SENALIZACION



UBICACIÓN:	INTERIOR TEATRO
COMENTARIOS:	SENALIZACION



UBICACIÓN:	SUR OCCIDENTE TEATRO
COMENTARIOS:	SENALIZACION



UBICACIÓN:	INTERIOR TEATRO
COMENTARIOS:	ORDEN Y ASEO



UBICACIÓN:	SUR ORIENTE DEL TEATRO
COMENTARIOS:	JORNADA DE ASEO



UBICACIÓN:	INTERIOR DEL TEATRO
COMENTARIOS:	JORNADA DE ASEO



UBICACIÓN:	INTERIOR TEATRO
COMENTARIOS:	ASEO BAÑOS

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ANEXO No. 3 – Registro fotográfico SST

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	INFORME SEMANAL

Código:		Versión:	Fecha de Emisión:		Página:
SEMANA N°	33	DEL 25 DE NOVIEMBRE	AL	01 DE DICIEMBRE	
FECHA INICIO :	20/12/2023	FECHA TERMINO :	15/12/2024		

I. IDENTIFICACION DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA NO. 272-CENACINGENIEROS-2023 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y CONSORCIO CENAC TEATRO 2023. "REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023"				
INTERVENTOR	INPLAYCO SAS	NIT O C.C.	860 524 16-8	CONTRATO Nº	314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	NIT O C.C.	901 759 617 - 0	CONTRATO Nº	272-CENANCINGENIEROS-2023

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO



UBICACIÓN:	CAMPAMENTO DE CONTRATISTA
COMENTARIOS:	COMITÉ DE OBRA



UBICACIÓN:	INTERIOR TEATRO
COMENTARIOS:	RECORRIDO DE OBRA



UBICACIÓN:	INTERIOR TEATRO
COMENTARIOS:	RECORRIDO DE OBRA



UBICACIÓN:	INTERIOR TEATRO
COMENTARIOS:	VISITA GENERAL SEPULVEDA



UBICACIÓN:	INTERIOR DEL TEATRO
COMENTARIOS:	VISITA GENERAL SEPULVEDA



UBICACIÓN:	SUR OCCIDENTE DEL TEATRO
COMENTARIOS:	RECORRIDO DE OBRA



UBICACIÓN:	INTERIOR TEATRO
COMENTARIOS:	PAUSAS ACTIVAS



UBICACIÓN:	INTERIOR TEATRO
COMENTARIOS:	PAUSAS ACTIVAS



UBICACIÓN:	INTERIOR TEATRO
COMENTARIOS:	PAUSAS ACTIVAS

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ANEXO No. 4 BITACORA

23.11.24.
Nota: Se realiza visita por parte del 2do Comandante del Ejercito, el Gral Sepulveda y el General Nacho, quienes realizaron recorrido donde el General sepulveda pidio informacion sobre la obra a lo cual el Ingeniero Jhonathan residente del contratista brindo el recorrido de obra, haciendo enfasis en el interior del teatro, como fue ajustico, techo y pendes, perfiles, boffer, a lo que el general Sepulveda solicito reunion con el Ingeniero de sonido el dia Lunes 25 en la tarde o el martes 26 a primera hora, el General Sepulveda solicito que se le entregara la cotizacion de la instalacion de la pantalla led junto con la estructura que lo soportara, el sonido Faltante, nomenclatura Fotoluminiscente de la silleteria, iluminacion y soporte, el telon y obras complementarias, resaltando que se debería tomar la decision sobre esta cotizacion la semana siguiente a la visita, quedando por programar la reunion con el general sepulveda

25.11.24.
Clima: Soleado.
Personal Contratista:
Director de Obra, Residente de Obra, Residente SST.
Apoyos SST (2) Almacenista, Maestro, Operarios.
Personal Interventoría
Residente Interventoría, Residente SST.
Mediante recorrido de Obra se evidencia que el contratista de Obra realiza instalación de panel yeso en la pared del costado Sur del auditorio. En la cafeteria del 2 piso costado Sur se observa que el drywall del muro presenta ondulaciones debido al ingreso de agua desde el 3er piso. Se solicita al contratista realizar el remplazo de la pieza y volver a darle terminado. Se observa inicio a la instalacion de las divisiones de baño en

el baño de mujeres del 1er piso y en el baño mixto del 2do nivel; No se ha instalado el cielo raso de esta area y se le solicita al contratista celeridad al proceso. Se continua con la instalación del enchape de antepecho de la fachada Oriental.. Se da continuidad al la pintura anticorrosiva de la escalera de emergencia.. La cuadrilla de pintura continua en el area de distribucion con actividades de estuco y lijado; se solicita agilizar con la actividad en el area.. Ingresa material y equipos para instalacion de Ventaneria. Se continua con la instalacion de los acometidas electricas - tablero principal. Se realiza instalacion de estructura para cielo raso exterior en fachada Sur. Se realiza instalacion de aparato Sanitario en baño mixto. para prueba.

Alejandro

26.11.24
clima: Soleado.
Personal Contratista
Director de Obra, Residente de Obra, Residente SST.
Apoyos SST (2), Maestro, Almacenista, Operativos.
Personal Interventoría
Residente Interventoría, Residente SST.
Se da inicio a pintura de acabado final - Negra en escalera de Emergencia. Se realiza visita de la Supervisión del Contrato. junto con el personal de la CONSTRUCTORA - Arq. Nelson pinzon. Se revisa nuevamente la condiciones de la tarima. y las actividades necesarias para la Solicitud realizado por el General. Seguidamente el contratista hace entrega de informe de estudio de Sonido para analisis por parte del equipo de revisión:

por parte del Subcontratista se vuelve a presentar la exposición donde se observa el detalle de las zonas afectadas por el bajo Sistema de Sonido y las mejoras que se obtendrían con el equipo nuevo Solicitado. Se realiza Solicitud de escombros. Se observa de las contrahuellas de las escaleras de acceso para la posterior instalación de la piedra nuviteca. El personal acústico de cielo se encuentra instalando la estructura de la falsa en el costado norte, mientras el personal en tierra continua con el armado (estructura) de los paneles del cielo raso, para su instalación el día viernes.

Nota: Se queda pendiente reunión con el General para revisar las actividades adicionales. Se espera fecha.

27-11-24

Clima: Soleado.

Personal: Contratista:

Residente de obra, Residente SST, Almacenista, Tecnico Inspector SST (1) Operativos obra 24, en planta 12 total 36

Personal Interventoría

Residente Interventoría, Residente SSTHA

En recorrido de obra se evidencian actividades de trabajo en altura por parte de: HKB Ingeniería en el interior del teatro con la instalación de techo y paredes así como el personal de instalación del drywall, las demas actividades como son obra civil, instalación de pisos, eléctrico, hidráulico y techos, realizan trabajos a nivel todos cuentan con sus EPP, en la jornada no se presentaron accidentes ni incidentes.

28-11-24

Clima: Soleado

Personal Contratista

Director de obra, Residente sst, Residente de obra, Almacenista

Pocero, Inspector sst (1) Operativos 24 en obra, en planta

12 total 36

Personal Interventoría

Residente Interventoría, Residente SSTHS

En recorrido de obra se evidencia la continuación del día anterior tanto en el interior por HKS Ingeniería en techo y pendas como en el exterior por los demas contratistas en trabajos a nivel se da comienzo a las actividades de impermeabilizacion de terrazas, todos los trabajadores cuentan con sus epp correspondientes a las actividades radicadas, no se presentaron accidentes ni incidentes laborales

Vigilo C.Int.SSTHS.

29-11-24

Clima: Soleado

Personal Contratista

Residente de obra, Residente sst, Almacenista, Pocero

Inspector sst (1) Operativos en obra 29, en planta 12

para un total Ob. 41

Personal Interventoría

Residente de Interventoría, Residente SSTHS

En compañía del Personal sst del contratista se realiza recorrido, donde se evidencian las actividades de trabajo en alturas por parte de HKS Ingeniería radicando techo y pendes al interior del techo, en su parte exterior se. esta terminando de pintar la escalera de emergencias, instalacion de drywall y pisos asi como obra civil las cuales son actividades a nivel todos cuentan con sus epp en la jornada no se presentaron incidentes, ni accidentes

30-11-24

Clima : Soleado
Personal Contratista
Residente de obra, Almacenista, Maestro, Inspector sst (1)
Operativos en obra 27 en planta 12, 39 en total.
Personal Interventoría
Residente Interventoría, Residente sstma
en recorrido realizado, se tiene continuidad de las actividades por HKS Ingenieria al interior del teatro como trabajos en altura en techo y paredes, así como los de instalacion de drywall y trabajos a nivel las demas actividades, obra civil, hidraulicos electricos e instaladores de divisiones de baños en aluminio, todos con sus EPP durante la jornada no se presentaron accidentes ni incidentes

Claudia Ortiz sstma

02-12-24

Clima: Soleado
Personal Contratista
Director de obra, Residente de obra, Residente sst, Almacenista, Maestro, Inspector sst(1) Operativos en obra 33, en planta 12. total 45
Personal Interventoría
Residente Interventoría, Residente sstma.
Se realiza recorrido de obra con personal del contratista donde se evidencian las siguientes actividades con trabajo en alturas HKS Ingenieros al interior del teatro en techo y paredes, instalacion de drywall y pintura, trabajos en caliente en la instalacion del monto en el tercer piso, las demas actividades se realizan a nivel como es mamposteria destronchado de pisos, hidraulicos, electricos e instalacion de pisos al exterior del teatro en las escaleras de la entrada principal, en la jornada no se presentaron accidentes ni incidentes laborales, todo el personal con los EPP correspondientes a sus actividades

Miguel Ortiz sstma

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ANEXO No. 5 – Listado personal

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	CONTROL MENSUAL DE PERSONAL

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE REPORTE	01	12	2024

I. CONTROL DE PERSONAL DE OBRA

IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL	ENTIDAD DE AFILIACIÓN Y N° AFILIACIÓN	FECHADE ENTRADA	FECHADE SALIDA

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	CONTROL MENSUAL DE PERSONAL

	Nº DE C.C.	CARGO	EPS	PENSION	ARP	DD	MM	AA	DD	MM	AA

I. IDENTIFICACIÓN					
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y INPLAYCO SAS – BIC Nit: 860524168 8.				
INTERVENTOR	INPLAYCO SAS	**NIT O C.C.**	860 52416-8	**CONTRATO N°**	314-COADE-DICRECENACINGENIEROS-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	**NIT O C.C.**	901.759.617- 0	**CONTRATO N°**	272-CENANCINGENIEROS-2023

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	CONTROL MENSUAL DE PERSONAL

NOMBRE												
LUIS ALEJANDRO LEAL CAÑON	79.557.593	DIRECTOR DE OBRA DE INTERVENTORIA	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	4	7	2024			
ALEJANDRA CEPEDA MURCIA	52.860.139	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	SANITAS	PROTECCION	POSITIVA	4	7	2024			
MIGUEL ANTONIO ORTEGON	79.555.964	RESIDENTE DE INTERVENTORIA SSTA	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	4	7	2024			
CONSORCIO CENAC TEATRO 2023											
JOSE LEONEL RODRIGUEZ ORTIZ	79.387.420	DIRECTOR DE OBRA	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	26	12	23			
JONATHAN NAVARRO GUTIERREZ	1.065.657.611	RESIDENTE DE OBRA	SANITAS	PORVENIR	SURA	26	12	23			
OLGA LUCIA LONDOÑO SALCEDO	52.192.680	PROFESIONAL SST	COMPENSAR	COLFONDOS	SURA	09	01	24			
ESNERITHARIAS LEON	1.032.474.181	PROFESIONAL AMBIENTAL	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	26	12	23			
HERLIN MELVIN MONTENEGRO ROA	72.241.066	ALMACENISTA	SALUDTOTAL	COLPENSIONES	SURA	28	12	23			

DIA **MES** **AÑO**

I. CONTROL DE PERSONAL DE OBRA

IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL	ENTIDAD DE AFILIACIÓN Y N° AFILIACIÓN	FECHADE ENTRADA	FECHA DE SALIDA

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

CONTROL MENSUAL DE PERSONAL

NOMBRE	Nº DE C.C.	CARGO	EPS	PENSION	ARP	DD	MM	AA	DD	MM	AA
SUBCONTRATISTAY&H CONSTRUOBRAS											
YEIMER BOADA ROBLES	1.026.562.467	CONTRATISTA	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA	09	01	24			
YEIMY DANIELA GONZALEZ MARTINEZ	1.069.749574	INSPECTOR SST	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	02	07	24			
GABRIEL ANGEL MANOSALVA VELASQUEZ	1.064.712.262	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	05	01	24			
YOSMAN ANDRES TAMAYO DIAZ	1.004.808.987	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	06	01	24			
JAVIER ALBERTO ESMITH SUAREZ	1.098.821.481	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA	15	01	24	06	08	2024
JEAN CARLOS GUETTE PALOMINO	1.043.844.401	AYUDANTE DE OBRA	SALUDTOTAL	PORVENIR	SURA	15	01	24			
ALEXANDER DAVID BARRIOS CABEZA	1.127.574.114	AYUDANTE	SALUDTOTAL	PORVENIR	SURA	29	02	24	06	08	2014
JESUS DANIEL RUIZ PALOMINO	1.043.847.553	AYUDANTE	MTUALSER	PORVENIR	SURA	02	07	24			
JOSE ALFREDO RADA DIAZ	1.044.616.896	AYUDANTE	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA	02	07	24			
JORGE LUIS SARABIA ESCORCIA	1.127.587.970	AYUDANTE	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	11	07	24			
YONIER ANDRES MANOSALVA SALAZAR	1.005.027.434	AYUDANTE	COOSALUD	PROTECCIÓN	SURA	18	07	24			
FREDY PARAMO VEGA	1.151.188.874	AYUDANTE	CAJACOPI	PORVENIR	SURA	24	07	24	06	08	2024
PABLO JULIO LEAL HERNANDEZ	1.030.061.067	OFICIAL	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	06	05	24	02	08	2024
SUBCONTRATISTAFACTOR DE POTENCIA											
ALLIXON KATHERINE CANDIA GALICIA	1.106.896.255	INSOECTOR SST	SALUDTOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	02	07	24			
JOSE LUIS RODRIGUEZ CHICO	1.126.244.256	OFICIAL	FAMISANAR	PROTECCIÓN	POSITIVA	02	07	24			
NESTOR YESID GARCIA ROJAS	1.012.396.404	AYUDANTE	SANITAS	PROTECCIÓN	POSITIVA	02	07	24			
JORGE IVAN ROJAS SERRANO	1.102.445.280	AYUDANTE	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	02	07	24			

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	CONTROL MENSUAL DE PERSONAL

JORGE DANILO LOZADA CASTRILLON	14.323.463	AYUDANTE	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	02	07	24			
VICTOR ALFONSO YAÑES YAÑES	5.932.841	AYUDANTE	SALUDTOTAL	PORVENIR	POSITIVA	02	07	24			
SUBCONTRATISTA HODROSANITARIOS											
LUZ MARINA SUANCHA VIRGUEZ	52.396.671	INSOECTOR SST	SALUDTOTAL	COLPENSIONES	BOLIVAR	02	07	24			
JORGE LUIS PEREZ CABALLERO	1.043.840.586	OFICIAL	ALIANZA SALUD	PORVENIR	BOLIVAR	02	07	24			
JUAN DAVID MARTINEZ PEÑA	1.019.017.850	AYUDANTE	SANITAS	PORVENIR	BOLIVAR	02	07	24	31	07	2024
LEONARDO VILLAREAL GUZMAN	1.051.828.087	AYUDANTE	MUTUALSER	PORVENIR	BOLIVAR	02	07	24	27	07	2024
JOSE ALBERTO HERNANDEZ MARTINEZ	1.073.813.547	AYUDANTE	SALIUD TOTAL	COLFONDOS	BOLIVAR	02	07	24			
OSCAR EDUARDO MARTINEZ HERNANDEZ	1.063.164.889	AYUDANTE	SALUDTOTAL	PORVENIR	BOLIVAR	02	07	24			
MANUEL ANTONIO MARRUGO HERNANDEZ	6.811.735	AYUDANTE	SALUDTOTAL	COLPENSIONES	BOLIVAR	02	07	24			
JOSE JOAQUIN MENDOZA HERNANDEZ	8.539.714	AYUDANTE	COODSALUD	COLFONDOS	BOLIVAR	02	07	24			

DIA **MES** **AÑO**

SUBCONTRATISTAOSWALDO CHAPARRO PISOS											
YEIMY DANIELA GONZALEZ MARTINEZ	1.069.749574	INSPECTOR SST	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	02	07	24			
JOSE OSWALDO CHAPARRO DAZA	79.323.582	ENCARGADO	SALUDTOTAL	PROTECCIÓN	POSITIVA	15	07	24			
EDISON OSWALDO CHAPARRO LOAIZA	1.013.679.750	OFICIAL	SALUDTOTAL	PORVENIR	POSITIVA	15	07	24			
CARLOS ARTURO GUERRERO FERNANDEZ	1.024.552.963	AYUDANTE	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	15	07	24			
CRISTIAN CAMILO MUÑOZ REYES	1.033.767.086	AYUDANTE	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	POSITIVA	03	08	24			

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	CONTROL MENSUAL DE PERSONAL

SUBCONTRATISTAGRUPO MOLINA S.A.S. PISO MADERAS												
ALLIXON KATHERINE CANDIA GALICIA	1.106.896.255	INSPECTOR SST	SALUDTOTAL									
LUIS ALBERTO MAYORQUIN AMADO	1.023.860.838	OFICIAL	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	31	07	24				
LUIS MOLINA		ENCARGADO										
SUBCONTRATISTAMETEX ESTRUCTURA METALICA												
JAIRO MANUEL SAAVEDRA ROJAS	8.050.865	OFICIAL	SURA	SURA	POSITIVA	31	07	24				
JORGE ELIECER CASCAVITA ROJAS	79.425.359	ENCARGADO	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	2	09	24				
DANIEL LOZANO OSORIO	79.409.054	AYUDANTE	COMPENSALUD	PORVENIR	POSITIVA	07	09	24				
SUBCONTRATISTA 90 GRADOS DRYWALL												
YEIMY DANIELA GONZALEZ MARTINEZ	1.069.749574	INSPECTOR SST	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	09	08	24				
NELSON GARNICA JIMENEZ	79.328.622	OFICIAL	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	09	08	24				
ROGER GARNICA BARBOSA	1.026.272.247	AYUDANTE	COMPENSAR	PROTECCIÓN	POSITIVA	09	08	24				
EINER GARNICA BARBOSA	1.026.289.680	AYUDANTE	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	09	08	24				

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	CONTROL MENSUAL DE PERSONAL

SUBCONTRATISTA HK3 INGENIEROS												
YEIMY DANIELA GONZALEZ MARTINEZ	1.069.749574	INSPECTOR SST	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	26	08	24				
GABRIEL HERNANDEZ GALEANO	79.420.400	OFICIAL	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	26	08	24				
CARLOS ALBERTO CANO RUA	1.023.865.994	INSTALADOR	COMPENSAR	PROTECCIÓN	POSITIVA	26	08	24				
ADRIAN KOWASKY CONTRERAS DIAZ	1.030.542.685	INSTALADOR	SANITAS	PROTECCIÓN	POSITIVA	26	08	24				

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

CONTROL MENSUAL DE PERSONAL

ALVARO ANDRES BALLESTEROS OCAMPO	1.022.331.655	INSTALADOR	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	26	08	24			
MAURICIO CONTRERAS CONTRERAS	79.125.839	INSTALADOR	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	26	08	24			
ANGELO FABIEN TORRES CANCINO	80.176.917	INSTALADOR	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	26	08	24			
DANIEL HUMBERTO RODRIGUEZ TEJADA	80.019.003	INSTALADOR	FAMISANAR	PROTECCIÓN	POSITIVA	26	08	24			
CAMILO GRANADOS		ENCARGADO	FAMISANAR	PROTECCIÓN		26	08	24			

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ANEXO No. 6 – Documentos SST

INPLAYCO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES	**INFORME SEMANAL SST-MA**	Código: Versión: Pág. Vigente desde:

FECHA	4 DE DICIEMBRE 2024	INFORME No	33	DEL	25/11/2024	AL	01/12/2024

1. INFORMACION GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y INPLAYCO SAS – BIC Nit: 860524168 8.

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No:	314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES
FECHA DE INICIO:	20 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	18 DE MARZO DE 2024
PRORROGA 1:	N/A
PRORROGA 2:	N/A
PLAZO ACTUALIZADO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	18 DE MARZO DE 2024
VALOR INICIAL:	$ 524.033.402,49
VALOR ADICIÓN 1:	1,444,120,181,24
VALOR ADICIÓN 2:	N/A
VALOR ACTUALIZADO	7,820,947,300,78

2. AVANCE SST-MA

2.1. Actividades Realizadas en la semana

Actividades realizadas	Cantidad	Observaciones
revisión documentación	1	se revisó la documentación del personal del contratista, en sus áreas hidráulicas, eléctricas, civil, permisos de trabajo, ats, inspecciones preoperacionales, verificación de asistencia personal a obra
revisión informes semanales contratista	1	se revisa el informe del contratista, para su posterior aprobación
Asistencia a comité y visitas programadas	1	Se asiste a comité y se acompaña a recorrido del mismo y a las demás visitas de la Cenac.
inspecciones preoperacionales	15	Inspecciones de herramientas de mano, EPCC, taladros eléctricos e inalámbricos, pulidora, herramientas menores y equipos eléctricos, equipo de soldadura, locativas, Epp, tronzadora, andamios, escaleras, roscadora, ranuradora
Se realiza fundida en cubierta de cuarto eléctrico, mezcla de cemento manual, construcción de la caseta se instalan ladrillos en la parte derecha de la caseta, fundida de piso, lado izquierdo del cuarto eléctrico, e instalación de bloque en caseta de tanque.	6	Demarcación del área de trabajo, Charlas de seguridad, pausas activas, ATS, Inspección preoperacional de los equipos y herramientas a utilizar, uso de EPP como son: guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo, protectores auditivos de copa y tapa bocas
Montaje de láminas en Drywall para techo, proceso de estucado, lijado. proceso de pintura en techos de Drywall, proceso de pintura en paredes	6	Usar los EPP guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo y herramientas, tapa bocas, personal certificado y capacitación en trabajo seguro de alturas, protección auditiva, pausas activas, charlas ocupacionales, demarcación del área de trabajo.
Alistamiento de material hacia el área de trabajo, preparación de mezclas, se realiza proceso de pulir pisos, Cortar enchape, arme y desarme de andamios para hacer la instalación de enchape en fachada piso 3, emboquillada de separación de enchape proceso de enchape en fachadas es en alturas	6	Demarcación del área de trabajo, Charla de seguridad, pausas activas, ATS, Inspección preoperacional de los equipos y herramientas a utilizar, uso de EPP como son: guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo, protectores auditivos de copa y tapa bocas.
Armado de andamio, armado de tubería PVC, montaje de tubería RCI, excavación, instalación de tubería PVC.	5	Demarcación del área de trabajo, Charla de seguridad, pausas activas, ATS, Inspección preoperacional de los equipos y herramientas a utilizar, uso de EPP como son: guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo, protectores auditivos de copa y tapa bocas.
Corte, Doblaje, prolongación e instalación de tuberías en EMT, PVC, cajas eléctricas, derivación de cableado eléctrico, cableado para red de datos, Regatas en paredes	8	Demarcación del área de trabajo, Charla de seguridad, pausas activas, ATS, Inspección preoperacional de los equipos y herramientas a utilizar, uso de EPP como son: guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo, tapa bocas.
Montaje de descansos y contra huella en hierro en las escaleras de emergencias	2	Usar los EPP guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo y herramientas, tapa bocas, personal certificado y capacitación en trabajo seguro de alturas, protección auditiva, pausas activas, charlas ocupacionales. Inspección de equipos. Lecturas hojas de seguridad de productos químicos
Instalación de perfileria en techos, junto con la madera y frescasa, instalación de muros en madera, cableado de sonido	4	Demarcación del área de trabajo, Charla de seguridad, pausas activas, ATS, Inspección pre operacional de los equipos y herramientas a utilizar, uso de EPP como son: guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo, protectores auditivos de copa y tapa bocas.

2.2. Temas de capacitación- charla contratista

Actividades realizadas	Cantidad	Observaciones
*Avisar a tu SST o jefe cuando te sientes mal *Quienes son los Vigías y para que estan *Pausas activas de estiramiento muscular *Capacitación en seguridad Vial ciclas motos *Estiramiento de músculos pausas activas.	5	Se realiza para personal administrativo y operativo,
*importancia de las inspecciones de seguridad *riesgo ambiental *Que es enfermedad laboral *Cultura del cuidado *Trabajo en equipo orden y aseo en el lugar de trabajo	5	Se realiza para personal administrativo y operativo,
*Sonido acústico *Campaña cuidado de la cabeza *Pre infarto *Orden y Aseo	4	Se realiza para personal administrativo y operativo,
Total, capacitaciones	**14**	

2.3. Manejo integral de residuos

Meta del proyecto RCD (t)							
	Escombro (t)	**Porcentaje cumplimiento RCD (t)**	**Agua (m3)**	**Madera (t)**	**Gravilla (t)**	**Arena (t)**	**Otros (t)**
Semanal	0	0	0	0	0	0	0
Mensual (acumulada)	0	0	0	0	0	0	0
Total, proyecto	**581**	**0**	**0**	**1.5**	**0**	**2.4**	**1.4**

2.4. Medidas de manejo ambiental

Programa	Cantidad	Descripción
No. 1-1 Manejo de emisiones atmosféricas y ruido	4	••Se realizo las inspecciones de los equipos y maquinarias. •Se cubrió el material de construcción (arena amarilla, grava, arena de rio, piedra rajón), evitando el arrastre por la acción del aire y del agua. • Se realizo seguimiento a los vehículos que ingresaron hasta la fecha al proyecto para la disposicion de RCD, residuos especiales. •Se realizo limpieza de las áreas de cargue de RCD.
No. 1-2. Manejo de aguas residuales y aguas lluvias.	1	Para el presente informe, no se llevaron a cabo actividades
No. 1-3. Manejo de residuos sólidos.	4	•Se realizó jornadas de aseo con el fin de mantener las instalaciones de trabajo limpiar y adecuadas para el desarrollo de las actividades programadas. •Se hace recolección de los residuos sólidos en los puntos ecológicos y los contenedores disponibles en el proyecto. •Se realizó limpieza y orden del punto de acopio temporal
No. 1-4. Señalización.	2	•Se realizo mantenimiento a la señalización de prohibición, advertencia y obligación, cabe aclarar que la señalización se instala de acuerdo con las condiciones de desarrollo de las actividades que se ejecutan en el proyecto.
No. 1-5. Instalación y operación de campamentos.	1	• Se adelanto jornada de aseo por parte de los subcontratistas en cada uno de los campamentos.
No. 1-6. Manejo operación de maquinaria, equipos y vehículos.	1	•Se realizó las inspecciones de los equipos y maquinarias.
No. 1-7. Manejo recolección, transporte y disposicion de RCD.	1	Se realiza seguimiento sobre la gestión de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) generados hasta la fecha. Retiro de RCD (m3) Semana: 0 Retiro de RCD (m3) Acumulado: 581
No. 1-8. Manejo de materiales de construcción no pétreos.	1	Se realiza seguimiento de los materiales de construcción no pétreos
No. 1-9. Manejo de materiales granulares.	1	Para el presente informe, no se llevaron a cabo actividades.
No. 1-10. Manejo de residuos líquidos, combustibles, aceites y sustancias químicas.	1	Se realiza seguimiento de los productos/sustancias que se utilizan en las actividades que se desarrollan.
No. 1-11 Manejo y disposicion de residuos peligrosos.	1	Para el presente informe, no se llevaron a cabo actividades.

2.5. Personal en obra

Profesionales INTERVENTORIA	Profesionales CONTRATISTA	Obra	Total	% de personal	
				Femenino	Masculino
3	3	33	39	4.3	95.7

2.6. Indicadores

	Ausentismo enfermedad laboral (días)	Ausentismo accidente laboral (días)	Ausentismo incidente laboral (días)	Ausentismo por accidentes de trabajo personal operativo (días)
Semanal	0	0	0	0
Mensual (acumulada)	0	0	0	0
Total, proyecto	**0**	**0**	**0**	**0**

2.7. Accidentalidad

	Casos con daño a propiedad	Incidente ambiental	Accidente ambiental	Incidentes laborales	Accidentes laborales	Fatalidades
Semanal	0	0	0	0	0	0
Mensual (acumulada)	0	0	0	1	0	0
Total, proyecto	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**

3.8. Conclusiones y recomendaciones

En la presente semana se asiste a comité de obra, asi como al recorrido del mismo, se continúan actividades como trabajo en alturas, en caliente, para la realización de la escalera metálica del costado sur occidente del teatro, donde se continua con la instalación de pasamanos y contra huella, se realizan trabajos a nivel como es la instalación de pisos, para esta semana se culmina con un total de 3 profesionales y 33 operarios en obra y 12 operativos en planta para un total de 45 operativos y 3 administrativos de interventoría con un porcentaje de 4.3% personal femenino y 95.7% personal masculino, se mantiene el promedio, todos los trabajadores contaron con sus EPP correspondientes, no se realiza disposicion de RCD, para un total de obra de 581 m3, se realizaron jornadas de orden y aseo, para este periodo no se presentaron accidentes ni incidentes, se hacen nuevamente observaciones al contratista del uso de andamios y escaleras, se hacen recorridos con la profesional residente SST del contratista, realizando mantenimiento de señalización y demarcación de las diferentes áreas de trabajo.

ELABORO



MIGUEL ANTONIO ORTEGON
INTERVENTOR AMBIENTAL - SST
C.C.79,555,964
INPLAYCO S.A.S
