CONTRATO DE INTERVENTORÍA-No. 314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023-ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJERCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS E INPLAYCO SAS-BIC Nit: 860524168-8

INFORME SEMANAL No. 36 DE INTERVENTORIA

OBJETO: "CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTEN DEL PROCESO NO. -295-LP CENACINGENIEROS-2023, CUYO OBJETO ES REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023

CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO CENAC TEATRO 2023

BOGOTÁ, ABRIL 2024

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL No. 36

Página: 1 de

DIA	9	MES	5	AÑO	2025

SEMANA N°	36		DEL	14 DE ABRIL 2025	AL	AL 22 DE ABRIL 2025
FECHA INICIO :	20/12/2023		FECHA TERMINO :	22/04/2025		Se suspendio la obra entre el 12 de diciembre 2024 al 10 de abril 2025

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023				
INTERVENTOR	INPLAYCO SAS - BIC	NIT O C.C.	860524168 8	CONTRATO N°	314
CONTRATISTA	CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	NIT O C.C.	901.759.617-0	CONTRATO N°	272

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS			ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO	
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO	PORCENTAJE DE EJECUCION EJECUTADO	ACTIVIDADES	MOTIVOS
CAP 1. PRELIMINARES	100,00%	100,00%		
C-2 CIMIENTOS	100,00%	100,00%		
S-3 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS	100,00%	100,00%		
PB-4 PISOS-BASES-RELLENOS	100,00%	100,00%		
EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO	100,00%	100,00%		
M-6 MAMPOSTERÍA	100,00%	100,00%		
H-7 INSTALACIONES HIDRÁULICAS	100,00%	100,00%		
H-7B RED CONTRAINCENDIOS	100,00%	100,00%		
IE-8 INSTALACIONES ELECTRICAS	100,00%	100,00%		
PR-9 PAÑETES Y RESANES	100,00%	100,00%		
CB-10 CUBIERTAS	100,00%	100,00%		
CR-11 CIELORASOS	100,00%	100,00%		
PA-12 PISOS - ACABADOS	100,00%	100,00%		
E-13 ENCHAPES Y ACCESORIOS	100,00%	100,00%		
V-14 VIDRIOS Y ESPEJOS	100,00%	100,00%		
AS-15 APARATOS SANITARIOS	100,00%	100,00%		
MA-16 CARPINTERÍA EN MADERA, MUEBLES EN CONCRETO Y AMOBLAMIENTO	100,00%	100,00%		
ME-17 CARPINTERÍA METALICA Y EN ALUMINIO	100,00%	100,00%		
CE-18 CERRADURAS	100,00%	100,00%		
PI-19 PINTURA	100,00%	100,00%		
EE-20 EQUIPOS ESPECIALES	100,00%	100,00%		
OE-21 OBRAS EXTERIORES	100,00%	100,00%		
AG-22 ASEO GENERAL	100,00%	100,00%		
VP-23 VIAS Y PAVIMENTOS	0,00%	0,00%		
SC-25 RED DE SEGURIDAD Y CONTROL, CABLEADO ESTRUCTURADO	100,00%	100,00%		
TOTALES	100,00%	100,00%		

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I.U.	VR.TOTAL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO		VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA 36	ACUMULADO
	$ 6.376.826.519,54	SEMANAL	$ 3.128.378,92	$ 0,00		1,61%	100,00%
		% semanal	0,04%		AVANCE DE OBRA	0,00%	
		ACUMULADO	$7.820.947.300,78				
SUSPENSIÓN No. 1	del 6 de marzo al 1 de julio del 2024	% acumulado	100,00%				
SUSPENSIÓN No. 2	del 12 de diciembre 2024 al 10 de abril del 2025	NOTA: Con base en la nueva programacion de obra el contratista presenta el 100% de ejecucion del presupuesto de obra.					
VALOR CONTRATO ADICION No. 1	$ 1.444.120.780,24						
VALOR TOTAL CON ADICIÓN	$ 7.820.947.300,78						


IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA

		CONTRATISTA			
DIA	FECHA	OPERATIVOS/FABRICACIÓN	ADMINISTRATIVOS	INTERVENTORIA	TOTAL
LUNES	14/04/2025	10	3	2	15,00
MARTES	15/04/2025	10	3	2	15,00
MIERCOLES	16/04/2025	10	5	3	18,00
JUEVES	17/04/2025	10	5	2	17,00
VIERNES	18/04/2025	10	5	1	16,00
SABADO	19/04/2025	10	4	1	15,00
DOMINGO	20/04/2025	0	0	0	0,00

V.ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	
	14/04/2025	SOLEADO	SOLEADO	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	15/04/2025	SOLEADO	SOLEADO	
	16/04/2025	SOLEADO	SOLEADO	NO HUBO AFECTACIONES Y SE PUDO TERMINAR CON LAS ACTIVIDADES PENDIENTES.
	17/04/2025	SOLEADO	SOLEADO	
	18/04/2025	NUBLADO	6	
	19/04/2025	2	NUBLADO	
	20/04/2025	NUBLADO	6	

VI. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)

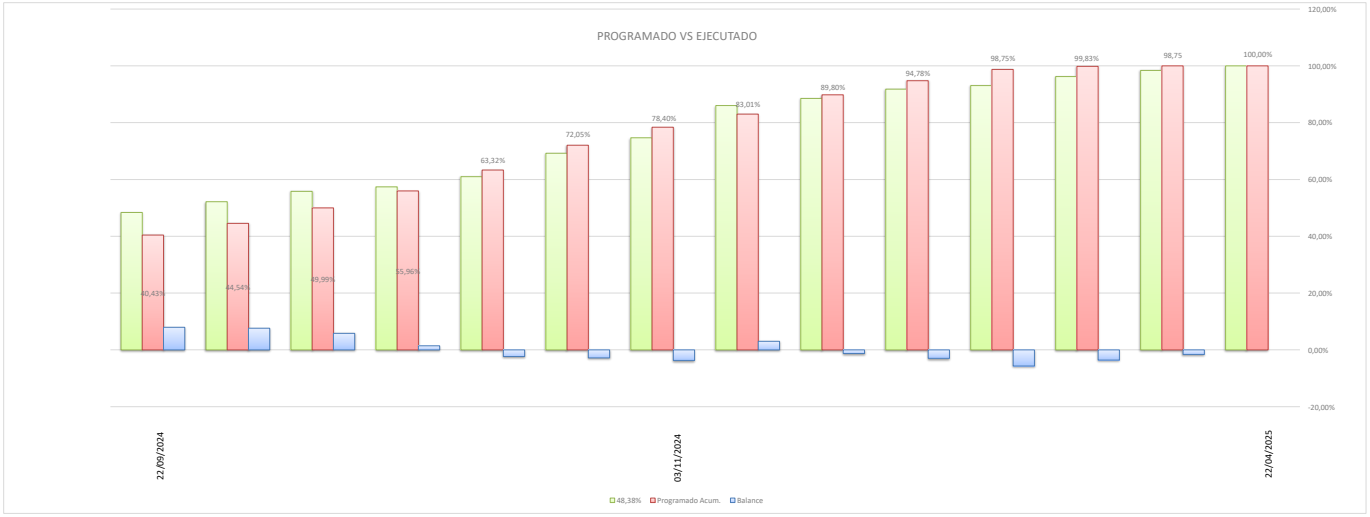

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL No. 36

Página: 1 de

DIA	9	MES	5	AÑO	2025

SEMANA Nº		36		DEL	14 DE ABRIL 2025				AL	AL 22 DE ABRIL 2025				
Semana	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**
Fecha	**22/09/2024**	**29/09/2024**	**6/10/2024**	**13/10/2024**	**20/10/2024**	**27/10/2024**	**3/11/2024**	**10/11/2024**	**17/11/2024**	**24/11/2024**	**1/12/2024**	**8/12/2024**	**13/04/2025**	**22/04/2025**
Progr. Semanal	3,40%	4,11%	5,45%	5,97%	7,36%	8,73%	6,34%	4,62%	6,79%	4,97%	3,97%	1,08%	0,17%	1,61%
Programado Acum.	40,43%	44,54%	49,99%	55,96%	63,32%	72,05%	78,40%	83,01%	89,80%	94,78%	98,75%	99,83%	100,00%	100,00%
Ejec. Semanal	2,51%	3,79%	3,64%	1,59%	3,37%	8,24%	5,45%	11,35%	2,50%	3,27%	1,26%	3,18%	2,15%	1,61%
Ejecutado Acum.	48,38%	52,17%	55,81%	57,40%	60,99%	69,23%	74,68%	86,03%	88,53%	91,80%	93,06%	96,24%	98,39%	100,00%
Balance	7,95%	7,63%	5,82%	1,44%	-2,33%	-2,82%	-3,72%	3,02%	-1,27%	-2,98%	-5,69%	-3,59%	-1,61%	0,00%

VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

NOVEDADES

CALIDAD		MATERIALES	EQUIPOS
ASPECTOS DE OBRA CIVIL	**ACTIVIDADES EJECUTADAS -SEMANA**		
PROGRAMACION AJUSTADA	El contratista de obra hace entrega de la programación y el flujo de caja ajustados con cierre a la fecha del 22 de abril del 2025, luego de una prorroga de 10 dias que habia solicitado el contratista con el fin de poder dar por terminado la ejecucion de las actividades pendientes luego de la suspension que terminó el 10 de abril de 2025.		
OBRA CIVIL	Se deja terminado la instalacion del total de las sillas y el tapete.		
	Se completa el total de las instalciones de aparatos sanitarios en los baños y queda terminado el piso en granito de la escalera y cafeteria.		
	Se deja terminado la instalacion de todo el piso exterior de las losas en piedra muñeca.		
	Se termina la instalación de guardaescoba en madera, manteniento de muros en todo el proyecto, se deja instalación de ventanas en todo el proyecto.		
CUARTO DE BOMBAS	Se hace la instalacion del equipo de bombeo de la red contraincendio quedanto terminado los accesorios que se fabricaron a medida.		
	Se termina la cubierta del cuarto de bombas con sus flanches y canal.		
ESCALERAS DE EMERGENCIA	Se deja terminada la escalera metalica.		
REDES ELECTRICAS	Toda la red esta instalada y se inician pruebas de iluminacion y aparatos electricos		
	Por parte de la supervisión no se dío respuesta frente a la entrega del medidor desmontado por parte del personal de codensa continua la misma situacion.		
	Se deja terminado el cuarto tecnico del mezanine indicando que no hay ups para el componente de sonido porque no es contractual.		
REDES HIDROSANITARIAS	Toda la red hidrosanitaria queda terminada y lista para hacer las pruebas de presion en cuanto se programe al tecnico del contratista para esta actividad.		
CIELO RASO	Todo el cielo raso queda terminado en cuanto a estructura y acabo de la pintura.		
FACHADAS	Se deja terminado todo los remates de enchapes de fachada y queda pendiente el retiro del cerramiento en cuanto tome la custodia la unidad beneficiada.		
TERRAZAS	Todas las terrazas quedan terminadas con la instalacion del manto		
ENCHAPES	Todos los enchapes quedan terminados queda por hacer el aseo y verificacion de detalles que puedan surgir por la unidad beneficiada.		
PINTURA	Se termina toda la aplicación de pintura en los muros y queda pendiente la revision de aseo y detalles que puedan surgir por la unidad beneficiada.		
CARPINTERIA METALICA	Toda la carpinteria metalica esta terminada e instalada.		
SISTEMA ACUSTICO	Todo el sistema de paneles acusticos del aditorio queda terminado pero hay unos pendientes como es la capacitacion del equipo de sonido.		
OBSERVACIONES	Se debe dejar todo completamente aseado y a la espera del retiro del cerramiento en cuanto la unidad beneficiada tome la custodia.		
	Se realizó una solicitud de suspension del contrato entre el 12 de diciembre de 2024 al 10 de abril de 2025, reiniciando el 11 de abril de 2025 con una prorroga hasta el 22 de abril con el fin de poder terminar actividades pendientes para entrega de la obra.		
	Se informa a la entidad que a la fecha de este informe en el mes de abril, no ha habido pac para pagos tanto de obra como de interventoria evidenciando un desequilibrio economico.		
ASPECTOS ADMINISRATIVOS	**ACTIVIDADES EJECUTADAS -SEMANA**		
Gestión de comunicaciones	1.Se entrega informe semanal No. 36 2. se realiza prorroga No. 2 al contrato de obra e interventoria. 3. Se espera respuesta por parte de la supervisión de punto de conexion a fibra optica.		
Interventoría- Listado de personal	El personal de interventoria se encuentra al dia con la documentación de parafiscales		
Contratista-Listado de personal	La interventoria realiza revisión del personal administrativo y operativos los cuales pasan el control interno (curso de alturas) y documentación de parafiscales al dia.		
	Se evidencia el esfuerzo que tuvo el contratista para terminar las actividaes que se entregaron con el obstaculo de la falta del recurso enconomico que ha venido reclamando.		

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL No. 36

Página: 1 de

DIA	9	MES	5	AÑO	2025

SEMANA Nº	36	DEL	14 DE ABRIL 2025	AL	AL 22 DE ABRIL 2025

ASPECTOS FINANCIEROS	ACTIVIDADES EJECUTADAS -SEMANA		
ACTA DE CORTE No.1	Se remite acta de corte No. 1 por valor de $1.659.412.087,39. desde el 25 de julio y ya esta pagado		
ACTA DE CORTE No. 2	Se remite acta de corte No. 2 por valor de $917.126.075,82. el 5 de septiembre del año en curso. Ya esta pagado		
ACTA DE CORTE No. 3	Para el dia viernes 27 de septiembre se realiza radicacion del corte No 3 y ya esta pagado.		
ACTA DE CORTE No.4	Para el dia Martes de 26 octubre se realiza radicacion del corte No 4 a la supervisión del contrato por un valor de $34.470.892,08 y ya esta pagado.		
ACTA DE CORTE No.5	Se remite acta de corte No. 5 por valor de $ 1.790.459.642,48 el dia 6 de noviembre del año en curso y esta continua pendiente de pago.		
ACTA DE CORTE No.6	Se remite corte No 6 por un valor de $1.890.332.072,03 el dia 20 de noviembre del año en curso y esta continua pendiente de pago.		

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL No. 36

Código:			**Versión:**	9		**Página:**	
SEMANA N°	36	**DEL**	14 DE ABRIL 2025		**AL**	22 DE ABRIL 2025	
FECHA INICIO :	20/12/2023	**FECHA TERMINO :**	22/04/2025		Se suspendio la obra entre el 12 de diciembre 2024 al 10 de abril 2025		

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023				
INTERVENTOR	INPLAYCO SAS - BIC	**NIT O C.C.**	860524168 8	**CONTRATO N°**	314
CONTRATISTA	INPLAYCO SAS - BIC	**NIT O C.C.**	901.759.617-0	**CONTRATO N°**	272

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO









UBICACIÓN:	**BAÑOS PRIMER PISO**	**UBICACIÓN:**	**FACHADA ORIENTAL**	**UBICACIÓN:**	**PLANTA ELECTRICA**
ACTIVIDAD	INSTALACION DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE Y ESPEJOS	**ACTIVIDAD**	TERMINACION DE PISO	**ACTIVIDAD**	TERMINADA










UBICACIÓN:	**FACHADA NORTE**	**UBICACIÓN:**	**TANQUE DE AGUA**	**UBICACIÓN:**	**FACHADA SUR**
ACTIVIDAD	TERMINADA	**ACTIVIDAD**	ASEO Y LIMPIEZA POCETA	**ACTIVIDAD**	TERMINACION DE PIEDRA MUÑECA






UBICACIÓN:	**MEZANNINE**	**UBICACIÓN:**	**COSTADO NORTE-AUDITORIO**	**UBICACIÓN:**	**MEZANNINE**
ACTIVIDAD	PANEL ACUSTICO DE MURO-SECCION INCLINADA TERMINADO	**ACTIVIDAD**	ESTRUCTURA PARA SECCION INCLINADA CON ILUMINACION TERMINADA	**ACTIVIDAD**	ALINEACION DE SILLAS TERMINADO


UBICACIÓN:	**CAMERINO SOTANO**	**UBICACIÓN:**	**CAMERINO PISO 1**	**UBICACIÓN:**	**CAMERINO MEZANINE**
ACTIVIDAD	REMATE TERMINADO	**ACTIVIDAD**	TERMINADO DE ALFOMBRA	**ACTIVIDAD**	TERMINADO GUARDA ESCOBA


UBICACIÓN:	BAÑOS CAMERINO 1ER PISO
ACTIVIDAD	PUERTAS TERMINADAS



UBICACIÓN:	TARIMA
ACTIVIDAD	MADERA ACABADO FINAL




UBICACIÓN:	HALL DE ACCESO
ACTIVIDAD	TERMINADO



UBICACIÓN:	HALL ACCESO PISO 2
ACTIVIDAD	TERMINADO



UBICACIÓN:	TARIMA
ACTIVIDAD	MADERA TERMINADA



UBICACIÓN:	EXTERIOR
ACTIVIDAD	PIEDRA MUÑECA TERMINADA EN ACCESO




UBICACIÓN:	TAQUILLA
ACTIVIDAD	TERMINADA



UBICACIÓN:	CUARTO DE SONIDO
ACTIVIDAD	TERMINADO



UBICACIÓN:	FACHADA SUR
ACTIVIDAD	MURO PARA VALVULA DE RCI TERMINADA EN SUPERBOARD




UBICACIÓN:	CUARTO DE BOMBAS
ACTIVIDAD	INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO.



UBICACIÓN:	TERRAZAS
ACTIVIDAD	FACHADA ORIENTAL TERMINADA



UBICACIÓN:	PLANTA ELECTRICA
ACTIVIDAD	EQUIPO INSTALADO

ANEXO No. 2 - Registro fotográfico ambiental

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL							INFORME SEMANAL No. 36
Código:			Versión:		Fecha de Emisión:		Pagina:
SEMANA Nº	36	DEL	14 DE ABRIL		AL		22 DE ABRIL
FECHA INICIO :	20/12/2023		FECHA TERMINO :	22/04/2025			

I. IDENTIFICACION DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA NO. 272-CENACINGENIEROS-2023 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y CONSORCIO CENAC TEATRO 2023. "REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023"				
INTERVENTOR	INPLAYCO SAS	NIT O C.C.	860 524 16-8	CONTRATO Nº	314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	NIT O C.C.	901 759 617 - 0	CONTRATO Nº	272-CENANCINGENIEROS-2023

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO AMBIENTAL



UBICACIÓN:	NOR OCCIDENTE DEL TEATRO
COMENTARIOS:	SEÑALIZACION



UBICACIÓN:	NOR OCCIDENTE DEL TEATRO
COMENTARIOS:	SEÑALIZACION



UBICACIÓN:	CAMPAMENTO CONTRATISTA
COMENTARIOS:	SEÑALIZACION



UBICACIÓN:	CAMPAMENTO CONTRATISTA
COMENTARIOS:	ORDEN Y ASEO



UBICACIÓN:	SUR OCCIDENTE TEATRO
COMENTARIOS:	ORDEN Y ASEO



UBICACIÓN:	NOR ORIENTE DEL TEATRO
COMENTARIOS:	ORDEN Y ASEO



UBICACIÓN:	SUR ORIENTE DEL TEATRO
COMENTARIOS:	JORNADA DE ASEO



UBICACIÓN:	SUR ORIENTE DEL TEATRO
COMENTARIOS:	JORNADA DE ASEO



UBICACIÓN:	CAMPAMENTO TEATRO
COMENTARIOS:	ASEO BAÑOS

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ANEXO No. 3 – Registro fotográfico SST

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL								INFORME SEMANAL No. 36
Código:			Versión:		Fecha de Emisión:			Página:
SEMANA Nº	36	DEL	14 DE ABRIL			AL		22 DE ABRIL
FECHA INICIO :	20/12/2023		FECHA TERMINO :	22/04/2025				

I. IDENTIFICACION DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA NO. 272-CENACINGENIEROS-2023 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y CONSORCIO CENAC TEATRO 2023. "REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023"				
INTERVENTOR	INPLAYCO SAS	NIT O C.C.	860 524 16-8	CONTRATO Nº	314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	NIT O C.C.	901 759 617 - 0	CONTRATO Nº	272-CENANCINGENIEROS-2023

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO



UBICACIÓN:	CAMPAMENTO DE CONTRATISTA
COMENTARIOS:	INSPECCION EQUIPOS



UBICACIÓN:	CAMPAMENTO DE CONTRATISTA
COMENTARIOS:	INSPECCION EQUIPOS



UBICACIÓN:	CAMPAMENTO DE CONTRATISTA
COMENTARIOS:	INSPECCION EQUIPOS



UBICACIÓN:	INTERIOR TEATRO
COMENTARIOS:	INSPECCION DE EXTENCIONES ELECTRICAS



UBICACIÓN:	NOR ORIENTE DEL TEATRO
COMENTARIOS:	TRABAJO EN ALTURAS



UBICACIÓN:	NOR OCCIDENTE DEL TEATRO
COMENTARIOS:	RECOGIDA RCD



UBICACIÓN:	INTERIOR TEATRO
COMENTARIOS:	TRABAJO EN ALTURAS



UBICACIÓN:	INTERIOR TEATRO
COMENTARIOS:	TRABAJO EN ALTURAS



UBICACIÓN:	INTERIOR TEATRO
COMENTARIOS:	TRABAJO EN ALTURAS

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ANEXO No. 4 – Bitácora de obra

obra gris, tampoco se ve avance en el baño de hombres donde se debe arreglar tubería sanitaria y a la fecha no se a realizado la reparación, por lo tanto se ha retrazado la instalación del enchape de muro.
Se le solicita nuevamente el personal de aseo.

Interventor.

10. 12. 24
Clima: Soleado
personal Contratista
1 Director de obra, 1 Residente de obra, 1 Residente SST,
1 almacenista
operativos. 10
personal interventoria
1 Residente INTV. 1 Residente SST.
Continuan avanzando las actividades de paneles acusticos en muros, se hacen actividades de instalacion de granito en escalera y cadelera, se hace instalacion de un area de piedra morteca en los escalones del exterior, se inicia instalacion del tapeta en area del Mezanin, y continua el tendido de cada uno de los espacios del sotano debajo de la tarima en la zona de camerinos, se repara la tuberia sanitaria en baño de hombres del piso 1 para poder terminar el instalado de enchape en muros.

Interventor.

11. 12. 24.
Clima Soleado.
personal Contratista.
1 Director de obra, 1 Residente de SST. 1 almacenista
Operativos. 10
personal Interventoria.
1 Residente de interventoria, 1 Residente SST
Se informa. que llegaron los equipos RCI a Bogotá, planta eléctrica y equipo de presión, se deja la instalacion de toda la iluminación led de todo el teatro, continua la instalacion de piedra marmeca en escaleras del exterior, se deja terminado la instalación del 90% del granito de escalera interna, se termina el enchape en 2ma de camerinos en muros y cielo rasos, se dejan terminado la instalacion de paneles acusticos para dar inicio ala limpieza general y revision de detalles de instalación. Continua la instalación del tapete.
En vista que a la fecha continua la falta de pago de las acta 5 y 6 y el proyecto no llega al 100% por esta situacion se da inicio por parte del contratista a la solicitud de suspension del contrato de obra.

Interventor.

12. 12. 24.
Clima parcialmente Nublado.
personal Contratista
1 Director de obra, 1 Residente de obra, 1 almacenista
operativos 10

para este día se continuan con actividades de instalacion de tapete, piedra muteca en escalera exterior, remates en camerinos, se hace instalaccion de sanitarios en baños de piso 1.

Deacuerdo a la solicitud del contratista de suspender la obra por falta de pago de parte de la entidad contratante se aprueba dicha suspension a partir del dia de hoy 12 de diciembre de 2024 hasta que se supere el fin que la ha motivado.

Se adora que el contratista ha decidido realizar actividades en el tiempo de suspension de la obra bajo su propio riesgo y responsabilidad con el fin de no impactar las labores negativamente, que se queden ejecutar. la Interventoria manifesta que toda actividad que se realiza en una obra suspendida, corre a cuenta propia del contratista y asume cualquier riesgo que se pueda presentar en dicho proceso.

Interventor.

10.04.2024
Clima parcialmente nublado
personal contratista
1 Director de obra, 1 Residente de obra
1 almacenista
operadores 10
personal interventoria.
1 Director de obra, 1 Residente SST.
El proyecto estuvo suspendido desde el 12.12.24

hasta el dia de hoy deacuerdo a la solicitud del contratista, por la falta de pago de las actas de obra No 5 y 6 del mes de noviembre de 2024, que al dia de hoy no han sido canceladas, sin embargo en vista que esta situacion es una afectacion y detrimento economico, se decidio en comun acuerdo activar el contrato de obra e interventoria con el fin de hacer la entrega del proyecto, a la cual el contratista presenta una solicitud de prorroga al contrato de 20 dias. que finalmente se autorizan 12 dias por parte de esta interventoria para la terminacion y entrega de la obra la cual se debe entrega el 22 de abril / 2025.
Se deja finalmente aprobado la terminacion de obra para el dia 22.04.25.

Interventor.

22.04.2025.

Nota: Este dia se hace reunion en el proyecto entre contratista, interventoria y supervision del proyecto con el fin de hacer recorrido y revision de las obras y su estado actual con el fin de evaluar las cordiones de acabo de calidad evidenciando que hay varios detalles por rematar adecuadamente y se deja como motivo acuerdo que los termine en esta semana para visita de entrega el proximo 28 de abril / 2025.

Interventor.

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ANEXO No. 5 – Listado personal

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	CONTROL MENSUAL DE PERSONAL

	DIA		MES		AÑO	
FECHA DE REPORTE	**DD**	**08**	**MM**	**12**	**AA**	**2024**

I. CONTROL DE PERSONAL DE OBRA

IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL	ENTIDAD DE AFILIACIÓN Y N° AFILIACIÓN	FECHADE ENTRADA	FECHADE SALIDA

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	CONTROL MENSUAL DE PERSONAL

	Nº DE C.C.	CARGO	EPS	PENSION	ARP	DD	MM	AA	DD	MM	AA

I. IDENTIFICACIÓN					
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y INPLAYCO SAS – BIC Nit: 860524168 8.				
INTERVENTOR	INPLAYCO SAS	**NIT O C.C.**	860 52416-8	**CONTRATO N°**	314-COADE-DICRECENACINGENIEROS-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	**NIT O C.C.**	901.759.617- 0	**CONTRATO N°**	272-CENANCINGENIEROS-2023

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	CONTROL MENSUAL DE PERSONAL

NOMBRE												
LUIS ALEJANDRO LEAL CAÑON	79.557.593	DIRECTOR DE OBRA DE INTERVENTORIA	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	4	7	2024			
ALEJANDRA CEPEDA MURCIA	52.860.139	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	SANITAS	PROTECCION	POSITIVA	4	7	2024			
MIGUEL ANTONIO ORTEGON	79.555.964	RESIDENTE DE INTERVENTORIA SSTA	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	4	7	2024			
CONSORCIO CENAC TEATRO 2023											
JOSE LEONEL RODRIGUEZ ORTIZ	79.387.420	DIRECTOR DE OBRA	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	26	12	23			
JONATHAN NAVARRO GUTIERREZ	1.065.657.611	RESIDENTE DE OBRA	SANITAS	PORVENIR	SURA	26	12	23			
OLGA LUCIA LONDOÑO SALCEDO	52.192.680	PROFESIONAL SST	COMPENSAR	COLFONDOS	SURA	09	01	24			
ESNERITHARIAS LEON	1.032.474.181	PROFESIONAL AMBIENTAL	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	26	12	23			
HERLIN MELVIN MONTENEGRO ROA	72.241.066	ALMACENISTA	SALUDTOTAL	COLPENSIONES	SURA	28	12	23			

DIA **MES** **AÑO**

I. CONTROL DE PERSONAL DE OBRA

IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL	ENTIDAD DE AFILIACIÓN Y N° AFILIACIÓN	FECHADE ENTRADA	FECHADE SALIDA

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

CONTROL MENSUAL DE PERSONAL

NOMBRE	Nº DE C.C.	CARGO	EPS	PENSION	ARP	DD	MM	AA	DD	MM	AA
SUBCONTRATISTAY&H CONSTRUOBRAS											
YEIMER BOADA ROBLES	1.026.562.467	CONTRATISTA	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA	09	01	24			
YEIMY DANIELA GONZALEZ MARTINEZ	1.069.749574	INSPECTOR SST	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	02	07	24			
GABRIEL ANGEL MANOSALVA VELASQUEZ	1.064.712.262	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	05	01	24			
YOSMAN ANDRES TAMAYO DIAZ	1.004.808.987	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	06	01	24			
JAVIER ALBERTO ESMITH SUAREZ	1.098.821.481	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA	15	01	24	06	08	2024
JEAN CARLOS GUETTE PALOMINO	1.043.844.401	AYUDANTE DE OBRA	SALUDTOTAL	PORVENIR	SURA	15	01	24			
ALEXANDER DAVID BARRIOS CABEZA	1.127.574.114	AYUDANTE	SALUDTOTAL	PORVENIR	SURA	29	02	24	06	08	2014
JESUS DANIEL RUIZ PALOMINO	1.043.847.553	AYUDANTE	MTUALSER	PORVENIR	SURA	02	07	24			
JOSE ALFREDO RADA DIAZ	1.044.616.896	AYUDANTE	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA	02	07	24			
JORGE LUIS SARABIA ESCORCIA	1.127.587.970	AYUDANTE	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	11	07	24			
YONIER ANDRES MANOSALVA SALAZAR	1.005.027.434	AYUDANTE	COOSALUD	PROTECCIÓN	SURA	18	07	24			
FREDY PARAMO VEGA	1.151.188.874	AYUDANTE	CAJACOPI	PORVENIR	SURA	24	07	24	06	08	2024
PABLO JULIO LEAL HERNANDEZ	1.030.061.067	OFICIAL	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	06	05	24	02	08	2024
SUBCONTRATISTAFACTOR DE POTENCIA											
ALLIXON KATHERINE CANDIA GALICIA	1.106.896.255	INSOECTOR SST	SALUDTOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	02	07	24			
JOSE LUIS RODRIGUEZ CHICO	1.126.244.256	OFICIAL	FAMISANAR	PROTECCIÓN	POSITIVA	02	07	24			
NESTOR YESID GARCIA ROJAS	1.012.396.404	AYUDANTE	SANITAS	PROTECCIÓN	POSITIVA	02	07	24			
JORGE IVAN ROJAS SERRANO	1.102.445.280	AYUDANTE	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	02	07	24			

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	CONTROL MENSUAL DE PERSONAL

JORGE DANILO LOZADA CASTRILLON	14.323.463	AYUDANTE	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	02	07	24			
VICTOR ALFONSO YAÑES YAÑES	5.932.841	AYUDANTE	SALUDTOTAL	PORVENIR	POSITIVA	02	07	24			
SUBCONTRATISTA HODROSANITARIOS											
LUZ MARINA SUANCHA VIRGUEZ	52.396.671	INSOECTOR SST	SALUDTOTAL	COLPENSIONES	BOLIVAR	02	07	24			
JORGE LUIS PEREZ CABALLERO	1.043.840.586	OFICIAL	ALIANZA SALUD	PORVENIR	BOLIVAR	02	07	24			
JUAN DAVID MARTINEZ PEÑA	1.019.017.850	AYUDANTE	SANITAS	PORVENIR	BOLIVAR	02	07	24	31	07	2024
LEONARDO VILLAREAL GUZMAN	1.051.828.087	AYUDANTE	MUTUALSER	PORVENIR	BOLIVAR	02	07	24	27	07	2024
JOSE ALBERTO HERNANDEZ MARTINEZ	1.073.813.547	AYUDANTE	SALIUD TOTAL	COLFONDOS	BOLIVAR	02	07	24			
OSCAR EDUARDO MARTINEZ HERNANDEZ	1.063.164.889	AYUDANTE	SALUDTOTAL	PORVENIR	BOLIVAR	02	07	24			
MANUEL ANTONIO MARRUGO HERNANDEZ	6.811.735	AYUDANTE	SALUDTOTAL	COLPENSIONES	BOLIVAR	02	07	24			
JOSE JOAQUIN MENDOZA HERNANDEZ	8.539.714	AYUDANTE	COODSALUD	COLFONDOS	BOLIVAR	02	07	24			

DIA **MES** **AÑO**

SUBCONTRATISTAOSWALDO CHAPARRO PISOS											
YEIMY DANIELA GONZALEZ MARTINEZ	1.069.749574	INSPECTOR SST	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	02	07	24			
JOSE OSWALDO CHAPARRO DAZA	79.323.582	ENCARGADO	SALUDTOTAL	PROTECCIÓN	POSITIVA	15	07	24			
EDISON OSWALDO CHAPARRO LOAIZA	1.013.679.750	OFICIAL	SALUDTOTAL	PORVENIR	POSITIVA	15	07	24			
CARLOS ARTURO GUERRERO FERNANDEZ	1.024.552.963	AYUDANTE	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	15	07	24			
CRISTIAN CAMILO MUÑOZ REYES	1.033.767.086	AYUDANTE	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	POSITIVA	03	08	24			

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	CONTROL MENSUAL DE PERSONAL

SUBCONTRATISTAGRUPO MOLINA S.A.S. PISO MADERAS												
ALLIXON KATHERINE CANDIA GALICIA	1.106.896.255	INSPECTOR SST	SALUDTOTAL									
LUIS ALBERTO MAYORQUIN AMADO	1.023.860.838	OFICIAL	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	31	07	24				
LUIS MOLINA		ENCARGADO										
SUBCONTRATISTAMETEX ESTRUCTURA METALICA												
JAIRO MANUEL SAAVEDRA ROJAS	8.050.865	OFICIAL	SURA	SURA	POSITIVA	31	07	24				
JORGE ELIECER CASCAVITA ROJAS	79.425.359	ENCARGADO	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	2	09	24				
DANIEL LOZANO OSORIO	79.409.054	AYUDANTE	COMPENSALUD	PORVENIR	POSITIVA	07	09	24				
SUBCONTRATISTA 90 GRADOS DRYWALL												
YEIMY DANIELA GONZALEZ MARTINEZ	1.069.749574	INSPECTOR SST	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	09	08	24				
NELSON GARNICA JIMENEZ	79.328.622	OFICIAL	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	09	08	24				
ROGER GARNICA BARBOSA	1.026.272.247	AYUDANTE	COMPENSAR	PROTECCIÓN	POSITIVA	09	08	24				
EINER GARNICA BARBOSA	1.026.289.680	AYUDANTE	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	09	08	24				

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

CONTROL MENSUAL DE PERSONAL

SUBCONTRATISTA HK3 INGENIEROS												
YEIMY DANIELA GONZALEZ MARTINEZ	1.069.749574	INSPECTOR SST	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	26	08	24				
GABRIEL HERNANDEZ GALEANO	79.420.400	OFICIAL	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	26	08	24				
CARLOS ALBERTO CANO RUA	1.023.865.994	INSTALADOR	COMPENSAR	PROTECCIÓN	POSITIVA	26	08	24				
ADRIAN KOWASKY CONTRERAS DIAZ	1.030.542.685	INSTALADOR	SANITAS	PROTECCIÓN	POSITIVA	26	08	24				

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

CONTROL MENSUAL DE PERSONAL

ALVARO ANDRES BALLESTEROS OCAMPO	1.022.331.655	INSTALADOR	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	26	08	24			
MAURICIO CONTRERAS CONTRERAS	79.125.839	INSTALADOR	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	26	08	24			
ANGELO FABIEN TORRES CANCINO	80.176.917	INSTALADOR	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	26	08	24			
DANIEL HUMBERTO RODRIGUEZ TEJADA	80.019.003	INSTALADOR	FAMISANAR	PROTECCIÓN	POSITIVA	26	08	24			
CAMILO GRANADOS		ENCARGADO	FAMISANAR	PROTECCIÓN		26	08	24			

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ANEXO No. 6 – Documentos SST

INPLAYCO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES	**INFORME SEMANAL SST-MA**	Código:
		Versión: Pág.
		Vigente desde:

FECHA	23 DE DICIEMBRE 2024	INFORME No	36	DEL	14/04/2025	AL	22/04/2025

1. INFORMACION GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y INPLAYCO SAS – BIC Nit: 860524168 8.

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No:	314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES
FECHA DE INICIO:	20 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	18 DE MARZO DE 2024
PRORROGA 1:	N/A
PRORROGA 2:	N/A
PLAZO ACTUALIZADO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	18 DE MARZO DE 2024
VALOR INICIAL:	$ 524.033.402,49
VALOR ADICIÓN 1:	1,444,120,181,24
VALOR ADICIÓN 2:	N/A
VALOR ACTUALIZADO	7,820,947,300,78

2. AVANCE SST-MA

2.1. Actividades Realizadas en la semana

Actividades realizadas	Cantidad	Observaciones
revisión documentación	1	se revisó la documentación del personal del contratista, en sus áreas hidráulicas, eléctricas, civil, permisos de trabajo, ats, inspecciones preoperacionales, verificación de asistencia personal a obra
revisión informes semanales contratista	1	se revisa el informe del contratista, para su posterior aprobación
Asistencia a comité y visitas programadas	1	Se asiste a comité y se acompaña a recorrido del mismo y a las demás visitas de la Cenac.
inspecciones preoperacionales	15	Inspecciones de herramientas de mano, EPCC, taladros eléctricos e inalámbricos, pulidora, herramientas menores y equipos eléctricos, equipo de soldadura, locativas, Epp, tronzadora, andamios, escaleras, roscadora, ranuradora
FACTOR DE POTENCIA G&E Corte, Doblaje, prolongación e instalación de tuberías en EMT, PVC, cajas eléctricas, derivación de cableado eléctrico, cableado para red de datos, Regatas en paredes	6	Demarcación del área de trabajo, Charlas de seguridad, pausas activas, ATS, Inspección preoperacional de los equipos y herramientas a utilizar, uso de EPP como son: guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo, protectores auditivos de copa y tapa bocas
CARLOS MONTOYA Montaje de láminas en Drywall para techo, proceso de estucado, lijado. proceso de pintura en techos de Drywall, proceso de pintura en paredes	6	Usar los EPP guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo y herramientas, tapa bocas, personal certificado y capacitación en trabajo seguro de alturas, protección auditiva, pausas activas, charlas ocupacionales, demarcación del área de trabajo.
CHAPARRO: Alistamiento de material hacia el área de trabajo, preparación de mezclas, se realiza proceso de pulir pisos, Cortar enchape, arme y desarme de andamios para hacer la instalación de enchape en fachada piso 3, emboquillada de separación de enchape proceso de enchape en fachadas es en alturas.	6	Demarcación del área de trabajo, Charla de seguridad, pausas activas, ATS, Inspección preoperacional de los equipos y herramientas a utilizar, uso de EPP como son: guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo, protectores auditivos de copa y tapa bocas.
90 GRADOS: Montaje de láminas en Drywall para techo, proceso de estucado, lijado. proceso de pintura en techos de Drywall, proceso de pintura en paredes.	5	Demarcación del área de trabajo, Charla de seguridad, pausas activas, ATS, Inspección preoperacional de los equipos y herramientas a utilizar, uso de EPP como son: guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo, protectores auditivos de copa y tapa bocas.
Y&H CONSTRUOBRAS Obra civil como pañetar y perfilar	8	Demarcación del área de trabajo, Charla de seguridad, pausas activas, ATS, Inspección preoperacional de los equipos y herramientas a utilizar, uso de EPP como son: guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo, tapa bocas.
METEX Alistamiento en pintura de las escaleras de emergencia	2	Usar los EPP guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo y herramientas, tapa bocas, personal certificado y capacitación en trabajo seguro de alturas, protección auditiva, pausas activas, charlas ocupacionales. Inspección de equipos. Lecturas hojas de seguridad de productos químicos
HK3 INGENIERIA Alistamiento de los muros y techo de la parte interna del teatro	4	Demarcación del área de trabajo, Charla de seguridad, pausas activas, ATS, Inspección pre operacional de los equipos y herramientas a utilizar, uso de EPP como son: guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo, protectores auditivos de copa y tapa bocas.
VENTANAS Alistamiento de marcos para las ventanas del teatro	1	Demarcación del área de trabajo, Charla de seguridad, pausas activas, ATS, Inspección pre operacional de los equipos y herramientas a utilizar, uso de EPP como son: guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo, protectores auditivos de copa y tapa bocas.
DIVISIONES BAÑOS Instalación de las divisiones de los baños	1	Demarcación del área de trabajo, Charla de seguridad, pausas activas, ATS, Inspección pre operacional de los equipos y herramientas a utilizar, uso de EPP como son: guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo, protectores auditivos de copa y tapa bocas.
MARMOL Instalación de la piedra muñeca en el piso externo del teatro	1	Demarcación del área de trabajo, Charla de seguridad, pausas activas, ATS, Inspección pre operacional de los equipos y herramientas a utilizar, uso de EPP como son: guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo, protectores auditivos de copa y tapa bocas.
TECNICOS HIDRAULICOS Montaje de tubería RCI, instalación de tubería; instalación de sanitarios y arreglos provisionales	4	Demarcación del área de trabajo, Charla de seguridad, pausas activas, ATS, Inspección pre operacional de los equipos y herramientas a utilizar, uso de EPP como son: guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo, protectores auditivos de copa y tapa bocas.

2.2. Temas de capacitación- charla contratista

Actividades realizadas	Cantidad	Observaciones
*Avisar a tu SST o jefe cuando te sientes mal *Quienes son los Vigías y para que estan *Pausas activas de estiramiento muscular *Capacitación en seguridad Vial ciclas motos *Estiramiento de músculos pausas activas.	5	Se realiza para personal administrativo y operativo,
*importancia de las inspecciones de seguridad *riesgo ambiental *Que es enfermedad laboral *Cultura del cuidado *Trabajo en equipo orden y aseo en el lugar de trabajo	5	Se realiza para personal administrativo y operativo,
*Sonido acústico *Campaña cuidado de la cabeza *Pre infarto *Orden y Aseo	4	Se realiza para personal administrativo y operativo,
Total, capacitaciones	**14**	

2.3. Manejo integral de residuos

Meta del proyecto RCD (t)							
	Escombro (t)	**Porcentaje cumplimiento RCD (t)**	**Agua (m3)**	**Madera (t)**	**Gravilla (t)**	**Arena (t)**	**Otros (t)**
Semanal	0	0	0	0	0	0	0
Mensual (acumulada)	7	0	0	0	0	0	0
Total, proyecto	**588**	**0**	**0**	**1.5**	**0**	**2.4**	**1.4**

2.4. Medidas de manejo ambiental

Programa	Cantidad	Descripción
No. 1-1 Manejo de emisiones atmosféricas y ruido	4	••Se realizo las inspecciones de los equipos y maquinarias. •Se cubrió el material de construcción (arena amarilla, grava, arena de rio, piedra rajón), evitando el arrastre por la acción del aire y del agua. • Se realizo seguimiento a los vehículos que ingresaron hasta la fecha al proyecto para la disposicion de RCD, residuos especiales. •Se realizo limpieza de las áreas de cargue de RCD.
No. 1-2. Manejo de aguas residuales y aguas lluvias.	1	Para el presente informe, no se llevaron a cabo actividades
No. 1-3. Manejo de residuos sólidos.	4	•Se realizó jornadas de aseo con el fin de mantener las instalaciones de trabajo limpiar y adecuadas para el desarrollo de las actividades programadas. •Se hace recolección de los residuos sólidos en los puntos ecológicos y los contenedores disponibles en el proyecto. •Se realizó limpieza y orden del punto de acopio temporal
No. 1-4. Señalización.	2	•Se realizo mantenimiento a la señalización de prohibición, advertencia y obligación, cabe aclarar que la señalización se instala de acuerdo con las condiciones de desarrollo de las actividades que se ejecutan en el proyecto.
No. 1-5. Instalación y operación de campamentos.	1	• Se adelanto jornada de aseo por parte de los subcontratistas en cada uno de los campamentos.
No. 1-6. Manejo operación de maquinaria, equipos y vehículos.	1	•Se realizó las inspecciones de los equipos y maquinarias.
No. 1-7. Manejo recolección, transporte y disposicion de RCD.	1	Se realiza seguimiento sobre la gestión de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) generados hasta la fecha. Retiro de RCD (m3) Semana: 0 Retiro de RCD (m3) Acumulado: 588
No. 1-8. Manejo de materiales de construcción no pétreos.	1	Se realiza seguimiento de los materiales de construcción no pétreos
No. 1-9. Manejo de materiales granulares.	1	Para el presente informe, no se llevaron a cabo actividades.
No. 1-10. Manejo de residuos líquidos, combustibles, aceites y sustancias químicas.	1	Se realiza seguimiento de los productos/sustancias que se utilizan en las actividades que se desarrollan.
No. 1-11 Manejo y disposicion de residuos peligrosos.	1	Para el presente informe, no se llevaron a cabo actividades.

2.5. Personal en obra

Profesionales INTERVENTORIA	Profesionales CONTRATISTA	Obra	Total	% de personal	
				Femenino	Masculino
3	3	22	28	2.3	96.7

2.6. Indicadores

	Ausentismo enfermedad laboral (días)	Ausentismo accidente laboral (días)	Ausentismo incidente laboral (días)	Ausentismo por accidentes de trabajo personal operativo (días)
Semanal	0	0	0	0
Mensual (acumulada)	0	0	0	0
Total, proyecto	**0**	**0**	**0**	**0**

2.7. Accidentalidad

	Casos con daño a propiedad	Incidente ambiental	Accidente ambiental	Incidentes laborales	Accidentes laborales	Fatalidades
Semanal	0	0	0	0	0	0
Mensual (acumulada)	0	0	0	1	0	0
Total, proyecto	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**

3.8. Conclusiones y recomendaciones

En la presente semana se asiste a comité de obra, asi como al recorrido del mismo, se continúan actividades como trabajo en alturas, en caliente, para la realización de la escalera metálica del costado sur occidente del teatro, donde se continua con la instalación de pasamanos y contra huella, se realizan trabajos a nivel como es la instalación de pisos, para esta semana se culmina con un total de 3 profesionales y22 operarios en obra, para un total de 25 operativos y 3 administrativos de interventoría con un porcentaje de 2.3% personal femenino y 96.7% personal masculino, se mantiene el promedio, todos los trabajadores contaron con sus EPP correspondientes, no se realiza disposicion de RCD, para un total de obra de 588 m3, se realizaron jornadas de orden y aseo, para este periodo no se presentaron accidentes ni incidentes, se hacen nuevamente observaciones al contratista del uso de andamios y escaleras, se hacen recorridos con la profesional residente SST del contratista, realizando mantenimiento de señalización y demarcación de las diferentes áreas de trabajo.

ELABORO



MIGUEL ANTONIO ORTEGON
INTERVENTOR AMBIENTAL - SST
C.C.79,555,964
INPLAYCO S.A.S
