	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	Código: GCT-F-27
	PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN	Versión: V1
		Fecha: 29/04/2025
	FORMATO INFORME DE SUPERVISOR	Página 1 de 18

Villavicencio, 28/09/2026

Doctora:
ALBA AURORA COLINA
JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN
Alcaldía Municipal de Villavicencio
Ciudad.

Ref.: ORDEN DE SERVICIO N° 006 DEL 16 DE ABRIL DE 2026
CONTRATO N°. 2141 DE 14 DE MAYO DE 2026, N°. DEL PROCESO EN SECOP 2144-2026,
PERIODO No. 2 DEL 03 DE JULIO DE 2026 AL 24 DE AGOSTO DE 2026.

OBJETIVO DEL INFORME: Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al municipio de Villavicencio acerca del desarrollo del mismo verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la Ley 1474 de 2011 y demás normativa aplicable.

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No. Y FECHA DEL CONTRATO (incluir el número del proceso en SECOP)	ORDEN DE SERVICIO N°006 DEL 16 DE ABRIL DE 2026. CONTRATO 2141 DE 14 DE MAYO DE 2026.
PUBLICADO EN (Marque con X)	SECOP I _____ Ó SECOP II __X
CLASE DE CONTRATO:	OBRA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	MEYAN S.A R/L BALTAZAR EDUARDO MESA RESTREPO
No. DE IDENTIFICACIÓN	NIT:80013586-1 C.C.70119730
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y PROTECCION, SECTOR PORFIA, RIO OCOA Y REALIZAR ACCIONES DE REDUCCION, MITIGACION, DESCOLMATACION EN LOS DIFRERENTES PUNTOS CRITICOS AFECTADOS PRO LA TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META."
NOMBRE DEL SUPERVISOR CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: (De todos los que haya tenido, empezando por el vigente)	JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ C.C.17.326.435 de Villavicencio.
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN:	14/05/2026
CONDICIONES INICIALES	
VALOR DEL CONTRATO (letras y número):	SEISCIENTOS OCHO MILLONES VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($608.024.149,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	60 DIAS
FECHA DE INICIO:	16/04/2026 ORDEN DE SERVICIO 26/05/2026 ACTA DE INICIO LEGALIZACIÓN
FECHA DE TERMINACIÓN:	15/06/2026 SEGÚN VIGENCIA DE ORDEN DE SERVICIO 25/07/2026 SEGÚN ACTA DE INICIO LEGALIZACION

9

MODIFICACIONES:			
CESIÓN:	N.A.	FECHA:	N.A.
VALOR DE ADICIÓN:	N.A.	FECHA:	N.A.
NUEVO VALOR DEL CONTRATO: (INICIAL + ADICIÓN)	N.A.		
PRORROGAS	No. 01, Por 30 días Orden de servicio	FECHA:	12/06/2026
	No. 02, Por 30 días OD+ Contrato	FECHA:	14/07/2026
TOTAL, PLAZO DE EJECUCIÓN (INICIAL + PRÓRROGAS)	NOVAVENTA (90) DIAS		
SUSPENSIONES	FECHA: N/A		
REINICIOS:	N/A	FECHA:	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO:	24/08/2026		

2. **DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** Teniendo en cuenta que mediante acto administrativo del 14/05/2026, notificado personalmente con fecha 14/05/2026 y en plataforma SECOP II se me designó como SUPERVISOR del contrato de la referencia, me permito presentar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente al **PERIODO N° 02 del 03/07/2026 al 24/08/2026** de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Interventoría y Supervisión adoptado mediante Decreto No. 1000-21/293, vigente desde el 19 de julio de 2016.

El día 16 de abril de 2026 en el Municipio de Villavicencio – Meta, se expedición de la ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO No. 006 de 2026 adjudicado a la empresa MEYAN S.A identificada con NIT No. 800.143586-1 y representada legalmente por el señor BALTAZAR EDUARDO MESA RESTREPO, identificado con cédula de ciudadanía No. 70.119.730, la ejecución del proyecto cuyo objeto corresponde a la "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN, SECTOR PORFIA RIO OCOA Y REALIZAR ACCIONES DE REDUCCIÓN, MITIGACIÓN, DESCOLMATACIÓN EN LOS DIFERENTES PUNTOS CRÍTICOS AFECTADOS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"

El día 14 de mayo de 2026, se suscribe el contrato de obra No. 2141 de 2026 a través del SECOP II entre JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ designado como supervisor, identificado con cedula de ciudadanía No. 17.326.435 en su carácter de jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo y BALTAZAR EDUARDO MESA RESTREPO identificado con Cedula de ciudadanía No. 70.119.730 en calidad de representante legal de MEYAN S.A. con NIT No. 800.143586-1 en su condición de contratista.

El contrato se suscribió inicialmente por un valor de **$608.024.149** Al corte del Informe N°01 presentado el 17 de julio de 2026, donde se reportó una ejecución del **57,95%,** equivalente a **$352.348.920.** Al corte del presente Informe N°02 se realiza el reporte de la ejecución por el **42,05%** del presupuesto original, correspondiente a el saldo **$ 255.675.229.**

Las cantidades contractuales del contrato 2141-2026 son las que se relaciona en la siguiente tabla.


ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V.UNIT	V. TOTAL
1,1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	189,00	$ 40.426	$ 7.640.510
1,2	MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA 6" AUTOCEBANTE DIESEL	DIA	10,00	$ 286.850	$ 2.868.500
1,3	CANALIZACIÓN RÍO (TIPO EXCAVADORA ORUGADA) 20T	HR	800,00	$ 367.950	$ 294.360.000
1,4	CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES RECUBRIMIENTO PVC TRIPLE TORSION GALVANIZADO MINIMO 245 GRAMOS TIPO DE APERTURA 8X10 DIAMETRO ALAMBRE 3MM CALIBRE 12 Y DIAMETRO DE ARISTA 3,8 MEDIDAS: 2X1X1	M3	420,00	$ 362.600	$ 152.292.000
				VALOR TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 457.161.014**
				VALOR TOTAL AIU (33%)	**$ 150.863.135**
				VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 608.024.149**

TABLA 1. Descripción tabla de Cantidades iniciales Contrato N° 2141-2026

Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista en el presente periodo, que corresponden a un porcentaje de avance ejecutado total del 100%:

SECTOR PORFIA (CALLE 61 SUR)

LOCALIZACION DE ACTIVIDADES

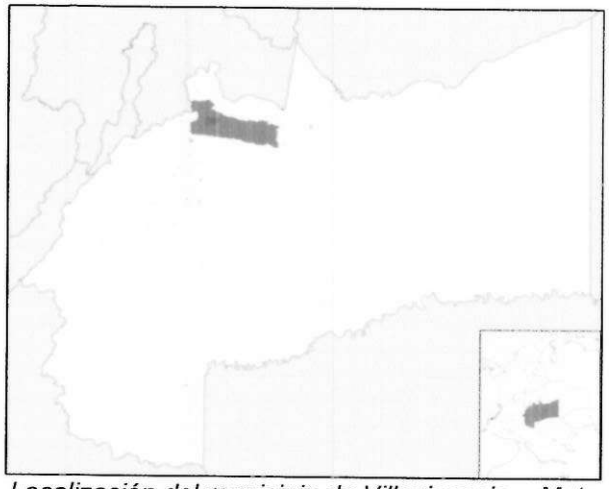

Localización del municipio de Villavicencio – Meta



Imagen satelital Google Earth del sector Porfía (Calle 61 Sur) – Rio Ocoa

PUNTO DE REFERENCIA	LATITUD X	LONGITUD Y
Coordenadas Sector Porfía (Calle 61 Sur)	4° 4'47.31"N	73°40'30.50"O

TABLA 2. Punto de referencia Sector Porfía (Calle 61 Sur)

ACTIVIDAD No. 1, ÍTEM 1.1.

EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE

Descripción del avance:

Durante las jornadas de seguimiento y control técnico en sitio, la supervisión verificó la ejecución de las actividades de excavación mecánica en el sector Porfía (Calle 61 Sur). Se constató que estas labores tuvieron como objetivo principal definir e implantar los niveles de cimentación y adecuar la huella de desplante proyectada para la construcción de la estructura de protección correspondiente al espolón en gaviones de redireccionamiento.


En el desarrollo de las labores de inspección, se constató la remoción y perfilado del terreno por debajo del lecho del río, validando que el proceso permitiera alcanzar la rasante de cimentación requerida para la colocación segura de la primera capa de gaviones, garantizando la estabilidad de la matriz ante los fenómenos de socavación e infiltración. De igual manera, la supervisión constató que, debido a las condiciones morfológicas y a la inestabilidad propia del material en el sector de intervención, el contratista ejecutó labores de sobre excavación adicionales fuera de las líneas teóricas de diseño para garantizar el saneamiento de la huella y la seguridad de la maniobra; no obstante, se precisa que dicho excedente fue asumido en su totalidad por el contratista y no se incluye dentro de los volúmenes de

cobro.


Como resultado del proceso de seguimiento, medición y revisión en campo, la supervisión certifica que las actividades fueron ejecutadas de conformidad con los requerimientos técnicos y las secciones geométricas del proyecto, validando para el presente período un volumen cobrable de 189,00 m³ de excavación mecánica en conglomerado, correspondientes a las siguientes dimensiones verificadas en sitio:

- Sección excavada: 18,90 m de longitud × 5,00 m de ancho, con una profundidad de excavación de 2,00m.


PERFIL DE LA SECCION DE EXCAVACION

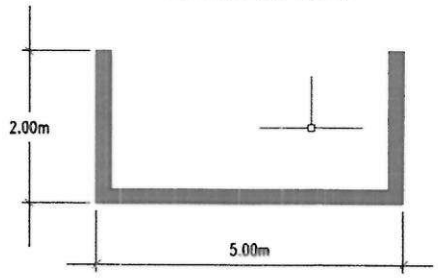

VISTA EN ISOMETRICO SECCION DE EXCAVACION

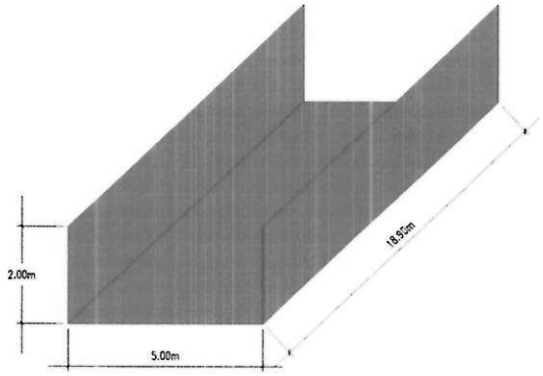

Anexos y Evidencias:

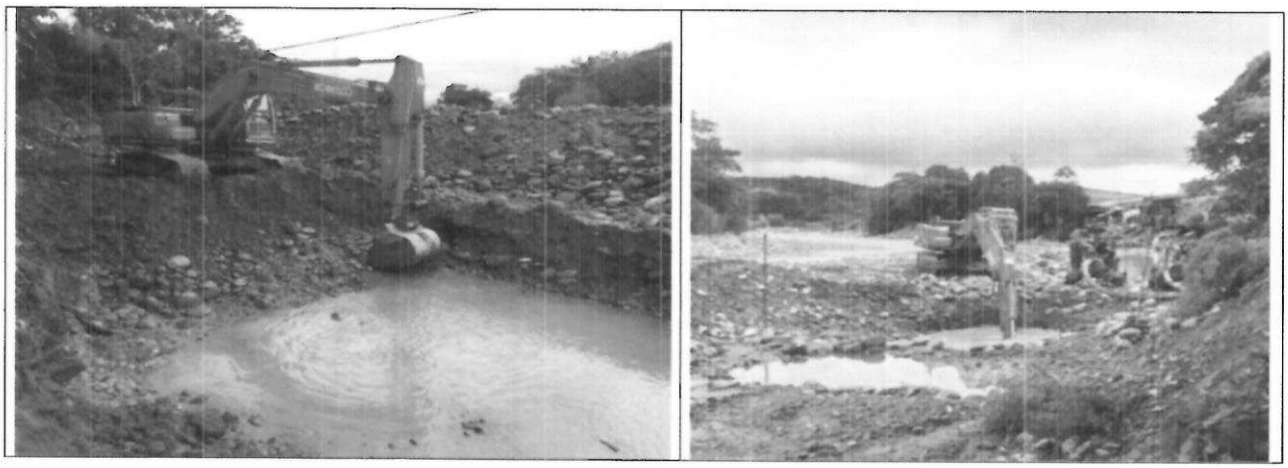

13



Excavación Mecánica sector Porfía (Calle 61 Sur) – Rio Ocoa

ACTIVIDAD No. 2, ÍTEM 1.2.

MANEJO DE AGUA CON MOTOBOMBA 6" AUTOCEBANTE DIESEL

Descripción del avance:

En el desarrollo de las actividades de seguimiento y control técnico, la supervisión verificó la necesidad operativa de implementar sistemas de bombeo en el sector Porfía (Calle 61 Sur) para el control y evacuación de aguas en el frente de trabajo. Esta condición obedeció a que las labores de excavación para la huella de cimentación del espolón en gaviones se ejecutaron a cotas por debajo del nivel freático y de la rasante del flujo de agua, lo que generó filtraciones continuas por presión de poros provenientes del afluente hacia la zona de desplante.

Durante las visitas de inspección en campo, la supervisión evidenció que el bombeo permanente fue determinante para mantener el fondo de la excavación en condiciones óptimas, evitando la saturación del suelo de soporte y el lavado de finos. Esta labor garantizó una base de cimentación estable y permitió adelantar con seguridad el adecuado proceso constructivo de armado, llenado y tensionado de las canastas de gavión correspondientes a los niveles inferiores de la estructura.

Como resultado del proceso la supervisión constató y registró la operación continua de dos (2) motobombas de 6" autocebantes a diésel trabajando simultáneamente, certificando un tiempo acumulado cobrable de diez (10) días de servicio distribuido en las siguientes fechas validadas en sitio:

- 05/08/2026: 2 UND
- 06/08/2026: 2 UND
- 07/08/2026: 2 UND
- 08/08/2026: 2 UND
- 10/08/2026: 2 UND

14

Anexos y Evidencias:



Manejo de agua con motobomba 6" sector Porfía (Calle 61 Sur) – Rio Ocoa

ACTIVIDAD No. 3, ÍTEM 1.3.

CANALIZACION RIO (TIPO EXCAVADORA ORUGADA) 20T

Descripción del avance:

Durante las actividades de seguimiento, inspección y control en campo, la supervisión verificó la ejecución de las labores de canalización, dragado y adecuación del cauce mediante el uso de maquinaria pesada tipo excavadora sobre orugas (20 t). Se constató que, a diferencia del período reportado anterior, la totalidad de los rendimientos de este ítem se concentraron estratégicamente en el sector Porfía (Calle 61 Sur) para mitigar amenazas por socavación y preparar operativamente el frente de trabajo para la ejecución del espolón en gaviones.

En el desarrollo de las visitas de inspección en sitio, la supervisión constató la ejecución de tres frentes operativos de canalización:

- Margen derecha (Aguas arriba): Se verificaron las labores de dragado y conformación de un jarillón de protección orientado a contener el empuje del afluente, resguardando la banca de

15

la margen e implementando una plataforma de acceso segura para el tránsito pesado de volquetas cargadas con material pétreo.

- Tramo en curva (Área de intervención): Se constató la reorientación controlada del flujo hídrico recostando el caudal hacia la margen izquierda. Esto permitió la conformación de un jarillón perimetral de aislamiento para ejecutar las labores de excavación y cimentación en condiciones de seguridad hidráulica.
- Se registró la intervención inmediata de la maquinaria tras el evento de crecida por fuertes lluvias que afectó parcialmente la geometría del jarillón, verificando labores de reconformación, refuerzo y reacomodación de material para restituir la sección de protección y garantizar la estabilidad del área de obra.



Imagen satelital Google Earth Canalización sector Porfía (Calle 61 Sur) – Rio Ocoa

DESCRIPCIÓN	COORDENADAS INTERVENCION	LATITUD	LONGITUD
CANALIZACION RIO (TIPO EXCAVADORA ORUGADA) 20T	COORDENADA INICIAL	4° 4'45.57"N	73°40'36.09"O
	COORDENADA FINAL	4° 4'50.83"N	73°40'29.08"O

TABLA 3. Coordenadas iniciales y finales Canalización Sector Porfía (Calle 61 Sur)

De acuerdo con los registros y la verificación realizada en sitio, la supervisión certifica que el contratista dio cumplimiento a las especificaciones técnicas definidas para esta actividad, validando un tiempo total de operación de ochenta (80) horas de trabajo de maquinaria tipo excavadora de orugas durante el período reportado.

Anexos y Evidencias:



Canalización rio (tipo excavadora orugada) 20t sector Porfía (Calle 61 Sur) – Rio Ocoa

ACTIVIDAD No. 4, ÍTEM 1.4.

CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES RECUBRIMIENTO PVC TRIPLE TORSION GALVANIZADO MINIMO 245 GRAMOS TIPO DE APERTURA 8X10 DIAMETRO ALAMBRE 3MM CALIBRE 12 Y DIAMETRO DE ARISTA 3,8 MEDIDAS: 2X1X1

Descripción del avance:

Durante las actividades de seguimiento, inspección y control en campo, la supervisión verificó la construcción de la estructura de protección y control hidráulico en el sector Porfía (Calle 61 Sur). Dicha intervención consistió en la conformación de un espolón de redireccionamiento en gaviones, proyectado geométricamente con una longitud de 20,00 metros y una altura de seis (6) niveles verticales en la punta interactúa con el afluente, y una altura de cinco (5) niveles en el resto de la estructura conforme a las directrices de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres (OGRD).


Esta estructura fue concebida con el objetivo principal de redirigir el flujo del afluente hacia la zona central del cauce, alejándolo de la margen derecha. Con esta maniobra hidrodinámica se disipa el impacto directo de la corriente, reduciendo la presión hidrostática ejercida sobre la banca y mitigando

17

los procesos de socavación lateral y erosión en el sector. En el desarrollo de las visitas técnicas en sitio, la supervisión evidenció el correcto armado, figurado, llenado, acomodación, alineación y amarre final de las canastas de gavión por parte del equipo técnico y la mano de obra del contratista.


Como resultado del control volumétrico en campo, la supervisión certifica que la obra alcanzó el tope de las cantidades contractuales establecidas. Es importante aclarar que, debido a los ajustes y precisiones de diseño realizados en sitio por los ingenieros de la OGRD para adaptar la estructura a la morfología real del lecho, la distribución volumétrica disponible permitió completar la estructura en su totalidad hasta el quinto (5) nivel, registrando un avance de 8,00 metros lineales en el sexto (6) nivel, alcanzando un volumen total ejecutado a satisfacción de cuatrocientos veinte metros cúbicos (420,00 m³) de gaviones.

Ante esta condición de agotamiento del techo presupuestal contractual, la supervisión deja asentado que para lograr un desempeño hidrodinámico óptimo se sugiere gestionar la culminación del tramo faltante en el cuerpo superior de gaviones. De este modo se evitará que la discontinuidad geométrica en la corona pueda generar turbulencias o dinámicas imprevistas del flujo durante eventos de crecida.

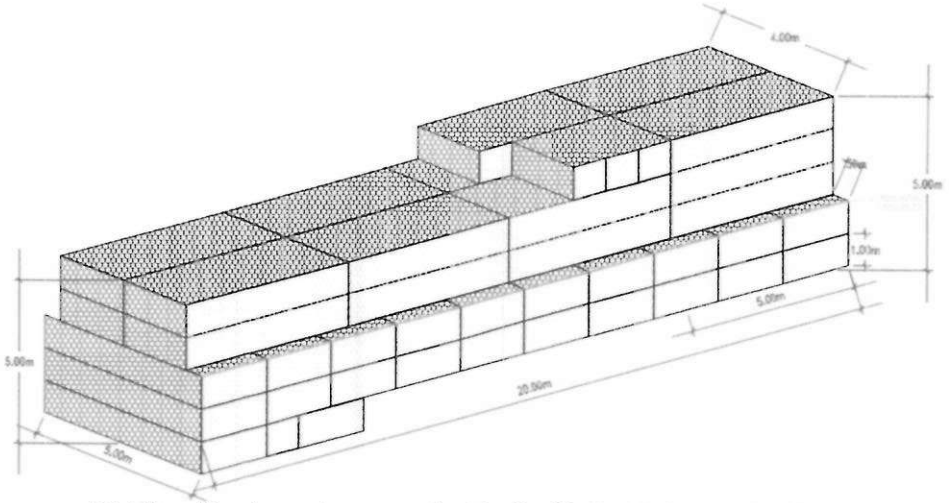

Distribución de gaviones sector Porfía (Calle 61 Sur) – Rio Ocoa

Anexos y Evidencias:

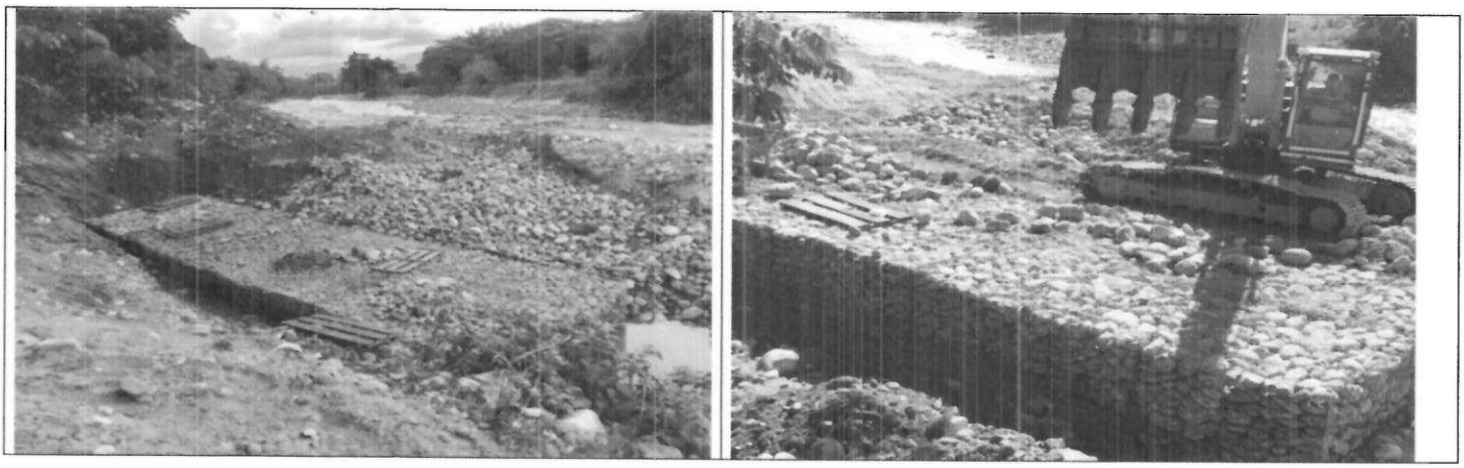



Construcción de gaviones recubrimiento PVC *sector Porfía (Calle 61 Sur) – Rio Ocoa*

AVANCE TÉCNICO Y DESARROLLO DEL PROYECTO

En el cuadro detallado de balance de obra se evidencian las actividades ejecutadas por el Contratista en el periodo comprendido entre el 03 de julio de 2026 y el 24 de agosto de 2026, así mismo dichas actividades son descritas a continuación:

CONDICIONES INICIALES						PRESENTE ACTA		CANTIDADES ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V.UNIT	V. TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL
1,1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	189	$ 40.426	$ 7.640.510	189,00	$ 7.640.514,00	189	$ 7.640.510
1,2	MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA 6" AUTOCEBANTE DIESEL	DIA	10	$286.850	$ 2.868.500	10,00	$ 2.868.500,00	10	$ 2.868.500
1,3	CANALIZACIÓN RÍO (TIPO EXCAVADORA ORUGADA) 20T	HR	800	$367.950	$ 294.360.000	80,00	$ 29.436.000,00	800	$ 294.360.000
1,4	CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES RECUBRIMIENTO PVC TRIPLE TORSION GALVANIZADO MINIMO 245 GRAMOS TIPO DE APERTURA 8X10 DIAMETRO ALAMBRE 3MM CALIBRE 12 Y DIAMETRO DE ARISTA 3,8 MEDIDAS: 2X1X1	M3	420,00	$362.600	$ 152.292.000	420,00	$ 152.292.000,00	420,00	$ 152.292.000
	VALOR TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 457.161.014**		**$ 192.237.014**		**$ 457.161.014**
	VALOR TOTAL AIU (33%)				**$ 150.863.135**		**$ 63.438.214,62**		**$ 150.863.135**
	VALOR TOTAL CONTRATO				**$ 608.024.149**		**$ 255.675.228**		**$ 608.024.149**

TABLA 4. Cantidades ejecutadas presente informe

En el periodo comprendido entre el 03 de julio de 2026 y el 24 de agosto de 2026 Se reporta un avance físico del proyecto del 100.00%

3. EVALUACION Y REEVALAUACIÓN DEL CONTRATISTA

RANGO DE CALIFICACIÓN	
EXCELENTE	El contratista superó las especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios.
BUENA	El contratista cumplió las especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios.
REGULAR	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades que no son graves, ni se considera que incumplió el mismo.
NO CUMPLE	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades graves y se considera que incumplió el mismo.

EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA	CALIFICACIÓN
CUMPLIMIENTO (Oportunidad en la entrega de los productos o servicios; Atención a compromisos adquiridos)	**BUENA**
CALIDAD (Grado en el que el producto o servicio cumple las necesidades y expectativas contractuales)	**BUENA**
COMUNICACIÓN (Comunicación asertiva durante la ejecución del contrato)	**BUENA**
EVALUACIÓN GENERAL (Percepción general sobre el producto y/o servicio suministrado)	**BUENA**

4. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: Certifico que teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre dicho aspecto, verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y ARL) correspondiente al respectivo periodo así: Si el contratista es pensionado indicar el número de resolución correspondiente y anexar copia del documento.

Mes de Cotizado	Pensión JULIO y salud AGOSTO
Fecha de Pago	24/08/2026
Número de Planilla	9509794032
IBC SALUD	$ 190´828.960
Valor pagado en SALUD	$ 7´599.600
IBC PENSION	$ 141´792.838
Valor pagado en PENSIÓN	$ 22´838.300
IBC ARL	$ 190´828.960
Valor pagado en ARL	$ 9´507.000

Mes de Cotizado	Pensión AGOSTO y salud SEPTIEMBRE
Fecha de Pago	18/09/2026
Número de Planilla	9510952391
IBC SALUD	$ 180´091.703
Valor pagado en SALUD	$ 7´205.400
IBC PENSION	$ 130´457.563
Valor pagado en PENSIÓN	$ 24´662.300
IBC ARL	$ 180´091.703
Valor pagado en ARL	$ 8´463.800

Anexo las planillas en físico de los meses mencionados julio y agosto del 2026.

5. **CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN MANEJADA POR EL CONTRATISTA**: Certifico que el contratista hizo entrega en medio magnético y físico de los archivos y documentos y demás información manejada resultante durante el presente periodo de ejecución.

6. **CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN:**

Certifico que el contratista dio cumplimiento a los requisitos y lineamientos establecidos por el Sistema Integrado de Gestión de la siguiente manera:

Sistema de Gestión aplicable	Requisito	Cumplió / No Cumplió
Calidad	Usó la documentación vigente establecida aplicable el desarrollo de las obligaciones contractuales.	cumplió
Seguridad y Salud en el Trabajo	Participó de las actividades programadas en SST.	cumplió
	Realizó las obligaciones contractuales utilizando los elementos de protección personal o protocolos de bioseguridad.	cumplió
	En el desarrollo de sus actividades no incurrió en actividades de riesgo sin el cumplimiento de las medidas y protocolos necesarios.	cumplió
Documental	La documentación que generó el contratista está acorde a los lineamientos normativos en materia archivística y política de gestión documental de la entidad.	cumplió
Seguridad y Privacidad de la Información	Se manejó reserva de la información utilizada para el desarrollo de sus obligaciones.	cumplió
	Se garantizó la integridad y disponibilidad de la información generada de la gestión contractual.	cumplió
Medio Ambiente	El desarrollo de las obligaciones contractuales está acorde a los lineamientos normativos vigentes.	cumplió

7. **BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA.** El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:


CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	FECHA	%
ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$ 352.348.920 COP	N/A	17/04/2026 al 02/07/2026	57.95%
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$ 255.675.229 COP	N/A	03/07/2026 al 24/08/2026	42.05%
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 0.00 COP	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 608.024.149 COP	N/A	17/04/2026 al 24/08/2026	100%

22

8. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

Con base en todo lo expuesto, el suscrito SUPERVISOR certifica que durante el **PERIODO N°. 02** comprendido entre el **03 de julio de 2026 al 24 de agosto de 2026,** el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social integral y en consecuencia, autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($255.675.229 COP).** El presente informe se encuentra cargado en la plataforma SECOP II.

ANEXOS:
Soportes de pago de la planilla seguridad social
Planillas Horómetros



NOMBRE DEL SUPERVISOR:
JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ
CARGO DEL SUPERVISOR: JEFE OFICINA GESTION DEL RIESGO
TELÉFONO DEL SUPERVISOR: 3217371942

23

ANEXOS

SOPORTE PAGO DE SEGUIRIDAD SOCIAL JULIO 2026

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800143586	1	MEYAN S.A	A - 200 O MAS COTIZANTES	MEYAN CASANARE	CALLE 153 6 22	BOGOTA-BOGOTA D.E	3124337305	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	760833316	95087940132	E	2026-08-24	2026-08-24	BANCO DE BOGOTA	0	$47.469.400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificacion	Nombre																	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: MEYAN CASANARE (66 Afiliados)																				$141.792.83	$22.846.300			$180.838.50	$7.536.800			$180.304.67	$7.524.500			$180.838.50	$6.567.200					$47.469.400

SOPORTE PAGO DE SEGUIRIDAD SOCIAL AGOSTO 2026

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800143586	1	MEYAN S.A	A - 200 O MAS COTIZANTES	MEYAN CASANARE	CALLE 153 6 22	BOGOTA-BOGOTA D.E	3124337305	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-09	665641622	95109932391	E	2026-09-18	2026-09-18	BANCO DE BOGOTA	0	$43.671.400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificacion	Nombre																	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: MEYAN CASANARE (62 Afiliados)																				$130.457.50	$21.024.200			$180.091.70	$7.205.400			$181.862.67	$6.978.000			$180.091.70	$6.463.800					$43.671.400



24

PLANILLA HOROMETROS






REGISTRO HORAS TRABAJADAS

PROYECTO CONTRATO 2141 -2026
EQUIPO MAQUINARA KOMATSU 200
OPERARIO LUIS MALDONADO

Tipo de lluvia	
	Leve
	Moderadas
	Fuertes

Fecha	Horometro inicial	Horometro final	Fracción de horas	Foto Horometros		Sector Intervenido	Actividades realizadas	Registro fotografico	
27-jul-26	13.330.00	13.336.00	6.00			PORFIA CALLE 61 SUR	ACTIVIDADES DE CORRECION DE CAUSE CANALIZACION Y DESCOLMATACION CONFORMACION DE JARILLON SOBRE LA MARGEN DERECHA		
28-jul-26	13.336.00	13.340.00	4.00			PORFIA CALLE 61 SUR	ACTIVIDADES DE CORRECION DE CAUSE CANALIZACION Y DESCOLMATACION CONFORMACION DE JARILLON SOBRE LA MARGEN DERECHA		
29-jul-26	13.340.00	13.349.00	9.00			PORFIA CALLE 61 SUR	ACTIVIDADES DE CORRECION DE CAUSE CANALIZACION Y DESCOLMATACION CONFORMACION DE JARILLON SOBRE LA MARGEN DERECHA		
30-jul-26	13.349.00	13.358.00	9.00			PORFIA CALLE 61 SUR	ACTIVIDADES DE CORRECION DE CAUSE CANALIZACION Y DESCOLMATACION CONFORMACION DE JARILLON SOBRE LA MARGEN DERECHA		
31-jul-26	13.358.00	13.368.00	10.00			PORFIA CALLE 61 SUR	ACTIVIDADES DE CORRECION DE CAUSE CANALIZACION Y DESCOLMATACION CONFORMACION DE JARILLON SOBRE LA MARGEN DERECHA		
1-ago-26	13.368.00	13.373.00	5.00			PORFIA CALLE 61 SUR	ACTIVIDADES DE CORRECION DE CAUSE CANALIZACION Y DESCOLMATACION CONFORMACION DE JARILLON SOBRE LA MARGEN DERECHA		
2-ago-26	13.373.00	13.373.00	-			PORFIA CALLE 61 SUR	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES		
3-ago-26	13.373.00	13.380.00	7.00			PORFIA CALLE 61 SUR	ACTIVIDADES DE CORRECION DE CAUSE CANALIZACION Y DESCOLMATACION CONFORMACION DE JARILLON SOBRE LA MARGEN DERECHA		
4-ago-26	13.380.00	13.382.00				PORFIA CALLE 61 SUR	USO DE LA MAQUINARIA PARA EXCAVACION ESPOLON DE REDIRECIONAMIENTO		

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	Código: GCT-F-27
	PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN	Versión: V1
		Fecha: 29/04/2025
	FORMATO INFORME DE SUPERVISOR	Página 18 de 18

Fecha	Horometro inicial	Horometro final	Fracción de horas	Foto Horometros	Sector Intervenido	Actividades realizadas	Registro fotografico
5-ago-26	13.382,00	13.389,00		 	PORFIA CALLE 61 SUR	USO DE LA MAQUINARIA PARA EXCAVACION ESPOLON DE REDIRECIONAMIENTO	 
6-ago-26	13.389,00	13.395,00		 	PORFIA CALLE 61 SUR	USO DE LA MAQUINARIA PARA EXCAVACION ESPOLON DE REDIRECIONAMIENTO	 
7-ago-26	13.395,00	13.403,00		 	PORFIA CALLE 61 SUR	USO DE LA MAQUINARIA PARA EXCAVACION ESPOLON DE REDIRECIONAMIENTO	 
8-ago-26	13.403,00	13.411,00		 	PORFIA CALLE 61 SUR	USO DE LA MAQUINARIA PARA EXCAVACION ESPOLON DE REDIRECIONAMIENTO	 
9-ago-26	13.411,00	13.418,00	7,00	 	PORFIA CALLE 61 SUR	ACTIVIDADES DE CORRECION DE CAUSE CANALIZACION Y DESCOLMATACION CONFORMACION DE JARILLON SOBRE LA MARGEN DERECHA	 
10-ago-26	13.418,00	13.426,00	8,00	 	PORFIA CALLE 61 SUR	ACTIVIDADES DE CORRECION DE CAUSE CANALIZACION Y DESCOLMATACION CONFORMACION DE JARILLON SOBRE LA MARGEN DERECHA	 
11-ago-26	13.426,00	13.437,00	11,00	 	PORFIA CALLE 61 SUR	ACTIVIDADES DE CORRECION DE CAUSE CANALIZACION Y DESCOLMATACION CONFORMACION DE JARILLON SOBRE LA MARGEN DERECHA	 
12-ago-26	13.437,00	13.441,00	4,00	 	PORFIA CALLE 61 SUR	ACTIVIDADES DE CORRECION DE CAUSE CANALIZACION Y DESCOLMATACION CONFORMACION DE JARILLON SOBRE LA MARGEN DERECHA	 
	TOTAL HORAS		80,00				

SUPERVISOR DESIGNADO
JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ
JEFE DE OFICINA DE GESTION DE RIESGOS
