CONSORCIO REDES VIALES
NIT. 902.052.366 - 5

Alcaldía de Ibagué
Secretaria de Infraestructura
Radicación de Documentos

Ibagué, 31 de julio de 2026.

Hora: 11:29am
Funcionario:
Folios: 2 carpetas 299 folios

Señores
ALCALDÍA DE IBAGUÉ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Ing. FREDY ANDRES RINCON POLANIA
Supervisor
Ibagué – Tolima

REFERENCIA: Contrato de Interventoría No. 2381 del 8 de abril de 2026.

Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION, OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ACTIVIDADES DE RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y LOTE 2."

Asunto: Entrega del informe mensual Nº 3 del "CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº 2381 DE 2026 – CONSORCIO REDES VIALES"

Cordial saludo, Ingeniero:

En calidad de representante legal de **CONSORCIO REDES VIALES**, me permito allegar informe Nº 3 mensual CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº 2381 DE 2026, cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION, OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ACTIVIDADES DE RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y LOTE 2."**

Cordialmente,

LIZETH MARCELA CIFUENTES TORRES
C.C No. 1.110.451.305 de Ibagué
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO REDES VIALES

Anexo: Dos carpetas (299 folios)

CONSORCIO REDES VIALES
NIT. 902.052.366 - 5

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº 2381 DE 2026

TERCER INFORME MENSUAL

DEL 22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2026

CONSORCIO REDES VIALES

JULIO 2026

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº 2381 DEL 8 ABRIL DE 2026



CONSORCIO REDES VIALES

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2381 DEL 8 ABRIL 2026 CELEBRADO ENTRE ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ, GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y CONSORCIO REDES VIALES

INFORME MENSUAL N° 3

SUPERVISOR	FREDY ANDRES RINCON POLANIA	ENTIDAD	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO INTERVENTORIA

CONTRATO INTERVENTORIA No.	2381 DEL 8 ABRIL	**DE**	2026
OBJETO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION, OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ACTIVIDADES DE RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y LOTE 2.	**PERIODO DEL INFORME**	Entre 21 de junio de 2026 Al 21 de julio del 2026
CONTRATISTA	CONSORCIO REDES VIALES	**NIT**	902.052.366-5
REPRESENTANTE LEGAL	LIZETH MARCELA CIFUENTES TORRES	**C.C**	1.110.451.305 de Ibagué

FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A)	8 de Abril de 2026
FECHA DE INICIO (D/M/A)	22 de Abril del 2026
PLAZO INICIAL	Catorce (14) meses a partir del acta de inicio
PLAZO ADICIONAL (No.1) (D/M/A):	N/A
PLAZO ADICIONAL (No.2) (D/M/A):	N/A
PLAZO ADICIONAL (No.3) (D/M/A):	N/A
PLAZO TOTAL	Catorce (14) meses a partir del acta de inicio
VALOR INICIAL	MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS ($1.745.585.891,00)
VALOR ADICIONAL (SI APLICA)	*N/A*
VALOR TOTAL	MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL

	OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS ($1.745.585.891,00)
2. INFORMACIÓN CONTRATO DE (OBRA LOTE 1)	
CONTRATO DE OBRA No.	2379 DEL 2026
OBJETO	CONSTRUCCION, OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1.
CONTRATISTA : CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL SALADO 2026	
REPRESENTANTE LEGAL : LUIS RICARDO ORTIGOZA GONZALEZ	
FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A)	8 de abril de 2026
FECHA DE INICIO (D/M/A)	23 de abril del 2026
PLAZO INICIAL	Diez (10) meses a partir del acta de inicio
PLAZO ADICIONAL (No.1) (D/M/A): (Si aplica)	N/A
PLAZO ADICIONAL (No.2) (D/M/A):	N/A
PLAZO ADICIONAL (No.3) (D/M/A):	N/A
PLAZO TOTAL	Diez (10) meses a partir del acta de inicio
VALOR INICIAL	CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE PESOS ($14.435.674.120) M/CTE
VALOR ADICIONAL No.1) (D/M/A): (si aplica)	*N/A*
VALOR TOTAL	CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE PESOS ($14.435.674.120) M/CTE
INFORMACIÓN CONTRATO DE (OBRA LOTE 2)	
CONTRATO DE OBRA No.	2380 DEL 2026
OBJETO	CONSTRUCCION, OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 2.
CONTRATISTA : CONSORCIO OBRAS ESPECIALES HIDROSANITARIAS IBAGUÉ	
REPRESENTANTE LEGAL : DIDIER PORTELA TORRES	
FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A)	8 de abril de 2026

FECHA DE INICIO (D/M/A)	22 de Abril del 2026
PLAZO INICIAL	Catorce (14) meses a partir del acta de inicio
PLAZO ADICIONAL (No.1) (D/M/A): (Si aplica)	N/A
PLAZO ADICIONAL (No.2) (D/M/A):	N/A
PLAZO ADICIONAL (No.3) (D/M/A):	N/A
PLAZO TOTAL	Catorce (14) meses a partir del acta de inicio
VALOR INICIAL	VEINTE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS ($20.475.924.186)
VALOR ADICIONAL No.1) (D/M/A): (si aplica)	*N/A*
VALOR TOTAL	VEINTE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS ($20.475.924.186)

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El *presente proyecto que tiene por objetivo* "**CONSTRUCCION, OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ LOTE 1 Y LOTE 2**", se encuentra ubicado en la ciudad de Ibagué, sector comprendido entre la calle 103 y 171 del corredor vial denominado Avenida Ambala, dividido en dos lotes así:

El Lote No. 1 comprende la reposición y modernización de las redes de acueducto y alcantarillado, junto con la rehabilitación integral de la infraestructura vial, en el tramo comprendido entre la calle 103 y la calle 125.

El Lote No. 2 comprende exclusivamente la reposición y modernización de las redes de acueducto y alcantarillado en el tramo comprendido entre la calle 125 y la calle 171, en una longitud aproximada de cuatro (4) kilómetros.



Imagen Google Maps

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

De acuerdo con las competencias legales se ha priorizado por la administración municipal la intervención integral comprendiendo la optimización y mejoramiento de redes de acueducto y alcantarillado en conjunto con la recuperación y pavimentación de la malla vial del sector comprendido entre la calle 103 y 171 del corredor vial denominado Avenida Ambala, ilustrado en la siguiente imagen:



La intervención integral en el sector priorizado ha sido estructurada a partir de las condiciones existentes del sistema de alcantarillado y acueducto en la zona aunado al mismo estado de la malla vial.

La ejecución del presente proyecto se justifica técnicamente en la necesidad de garantizar la continuidad, eficiencia y sostenibilidad de los servicios de acueducto y alcantarillado, teniendo en cuenta el estado actual de la infraestructura existente y los diagnósticos técnicos realizados sobre la misma. En efecto, el sistema de acueducto y alcantarillado objeto de intervención se encuentra conformado, en su gran mayoria, por redes construidas en asbesto-cemento, concreto y PVC gris correspondiente a tecnologías anteriores, materiales que, por su antigüedad superior a cinco (5) décadas y por las condiciones propias de operación, presentan falencias estructurales, hidráulicas y de estanqueidad, reflejadas en fallas recurrentes, roturas, infiltraciones, exfiltraciones y disminución de la capacidad de conducción.

5. DESCRIPCION DEL AVANCE MENSUAL DE OBRA

A continuación se relacionan las actividades ejecutadas mediante e periodo comprendido para este informe mensual N°1 :


LOTE 1: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL SALADO 2026

SEMANAS: DEL 21 JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2026 "CONSTRUCCION, OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ACTIVIDADES DE

RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ LOTE 1"

- **Demolición de pisos y andenes de concreto**

Durante el periodo reportado se ejecutaron actividades de demolición de pisos y andenes de concreto existentes dentro de las áreas requeridas para la construcción del proyecto. Las labores comprendieron el corte, fragmentación, levantamiento y retiro del concreto, utilizando herramientas y equipos adecuados para garantizar una intervención controlada y segura. Asimismo, se realizó la recolección, cargue, transporte y disposición final del material producto de la demolición en sitios autorizados, dejando las áreas intervenidas limpias y en condiciones aptas para la ejecución de las actividades constructivas posteriores .

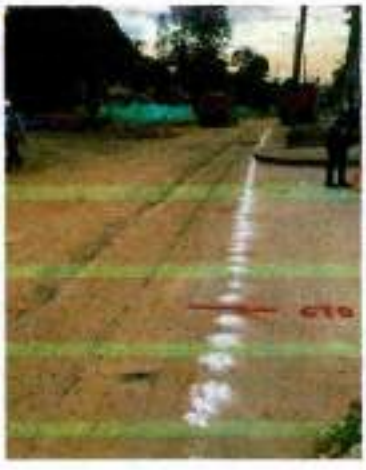


- **Cargue, transporte y disposición final de sobrantes en escombrera autorizada**

Se realizó el cargue mecánico del material sobrante producto de las actividades de excavación, demolición u cajeo , disponiéndolo en vehículos de transporte adecuados para su movilización. Posteriormente, el material fue trasladado hasta una escombrera autorizada por la autoridad ambiental competente, garantizando su disposición final conforme a la normativa ambiental vigente. Durante la ejecución de la actividad se verificó el cubrimiento de las volquetas para evitar la dispersión de material durante el recorrido, el cumplimiento de las rutas de transporte establecidas y la presentación de los respectivos soportes de disposición final, con el fin de asegurar la trazabilidad y el manejo ambientalmente adecuado de los residuos de construcción y demolición (RCD).











- **Excavación a máquina(cajeo)**

Se ejecutó la excavación mecánica para el cajeo de la estructura vial, utilizando maquinaria adecuada para la remoción controlada del material existente. La actividad tuvo como finalidad conformar la caja de la vía hasta las cotas establecidas en los diseños, permitiendo la posterior construcción de la estructura del pavimento, conformada por las capas de base granular y losa de concreto.

Durante la ejecución se controlaron las dimensiones del cajeo, las cotas de excavación, la pendiente longitudinal y transversal, así como la adecuada disposición del material excavado. El material apto fue acopiado para su posible reutilización, mientras que el material sobrante o no apto fue cargado, transportado y dispuesto en una escombrera autorizada, de conformidad con las especificaciones técnicas y la normativa ambiental vigente.





- **CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE – CBR 95% ZONA URBANA**

Durante el periodo objeto del informe se realizó **la** conformación, nivelación y compactación de la subrasante en el tramo vial intervenido, de acuerdo con las cotas, pendientes y sección transversal establecidas para el proyecto.

Previamente se efectuó la revisión y adecuación de la superficie resultante del cajeo, retirando material suelto, zonas inestables y material que no cumpliera con las condiciones requeridas. Posteriormente, se procedió a la homogeneización y perfilado de la superficie, realizando los ajustes necesarios para garantizar la geometría proyectada



- **ACERO DE REFUERZO FIGURADO E INSTALADO PDR: 60**

Durante el periodo se realizó el suministro, figurado, corte, doblado e instalación de acero de refuerzo PDR-60 para la construcción de los sumideros, de acuerdo con las dimensiones, diámetros, espaciamientos y detalles establecidos en los planos y especificaciones técnicas del proyecto.

El acero fue dispuesto y amarrado en obra, garantizando su correcta ubicación, alineación, separación y estabilidad antes del vaciado del concreto







- **SUMIDERO EN CONCRETO 3.000 PSI, INCLUYE REJILLA VIBROCOMPACTADA DE 1,05 x 0,46 M**

Durante el periodo se ejecutó la construcción de sumideros en concreto de resistencia de 3.000 PSI, destinados a la captación y conducción de las aguas lluvias provenientes de la superficie de la vía, de acuerdo con las dimensiones, cotas y especificaciones establecidas en el proyecto.

La actividad comprendió la preparación y adecuación del área, instalación del acero de refuerzo previamente figurado y armado, conformación de formaleta y vaciado del concreto de 3.000 PSI, garantizando la correcta geometría, niveles, pendientes y dimensiones de la estructura. Durante el proceso se realizó la colocación y compactación del concreto mediante medios mecánicos, procurando una adecuada consolidación y evitando la presencia de vacíos o segregación.






ACUEDUCTO

Durante el periodo se ejecutó la instalación de tubería de 4 y 8 pulgadas para la red de acueducto, incluyendo las actividades preliminares de excavación mecánica y/o manual de la zanja, conformación del fondo de excavación e instalación de lecho de arena para garantizar el adecuado apoyo y protección de la tubería. La actividad comprendió el suministro, transporte, instalación, alineación y unión de los tramos de tubería, verificando las condiciones de nivelación y pendiente requeridas para su correcto funcionamiento hidráulico.

Una vez finalizada la instalación de la red, se realizaron las pruebas hidráulicas correspondientes, con el fin de verificar la hermeticidad, resistencia y correcto comportamiento de la tubería instalada, dejando

registro de los resultados obtenidos para su validación y aprobación conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.


- **Excavaciones a máquina en material común y Conglomerado de 0 a 2 m**







- **Suministro e Instalación Lecho en Arena Para Tubería**

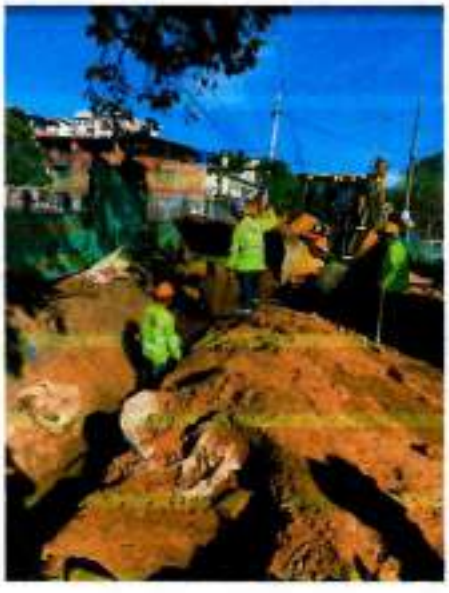



- **Tuberia de 4"**




- **Tuberia de 8"**





- **FILTRO EN GEODRÉN TUBULAR DE 4" – H = 0,60 M**

Durante el periodo se ejecutó la actividad correspondiente al suministro e instalación de filtro en geodrén tubular de 4" de diámetro y altura de 0,60 m, destinado a facilitar la captación, conducción y evacuación de aguas de infiltración, contribuyendo al adecuado manejo del drenaje en la estructura vial. La actividad comprendió la preparación y adecuación del área de instalación, suministro del geodrén tubular y su colocación en la ubicación definida en el proyecto, garantizando su correcta disposición, continuidad, alineación y conexión con el sistema de drenaje previsto.





- **CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION D=1,2M**

Durante el período evaluado se ejecutaron actividades correspondientes a la construcción de estructuras de inspección para la red de alcantarillado, incluyendo la conformación del cuerpo del pozo mediante la construcción de cilindro en ladrillo con espesor de muro de 0,30 m, garantizando las condiciones de resistencia y estabilidad requeridas para la estructura.

Las actividades fueron ejecutadas siguiendo los procedimientos constructivos establecidos, verificando la correcta alineación, nivelación y dimensiones de la estructura para su posterior integración al sistema de alcantarillado.





LOTE 2: CONSORCIO OBRAS ESPECIALES HIDROSANITARIAS IBAGUÉ

SEMANAS: DEL 22 JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2026 "CONSTRUCCION, OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ LOTE 2"

Durante el desarrollo del cada proceso constructivo dentro del proyecto se realiza el adecuado acompañamiento por parte de la interventoría **CONSORCIO REDES VIALES** al contratista de obra, donde las actividades diarias son controladas y verificadas por parte de la interventoría.

- **CERCA EN TELA VERDE H=2,10 M**

Se ejecutaron actividades correspondientes al suministro e instalación de cerca en tela verde con una altura de 2,10 m, destinada al cerramiento y delimitación de las áreas de intervención del proyecto, instalación de postes de soporte (Guadua) y fijación de tela verde, garantizando su adecuada estabilidad y alineación.





- **CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES EN ESCOMBRERA AUTORIZADA**

Durante el periodo reportado se realizaron las actividades de cargue mecánico de materiales sobrantes provenientes de las labores de excavación, demolición y adecuación de las áreas de intervención. El material fue cargado en vehículos de transporte apropiados y trasladado hasta una escombrera autorizada, cumpliendo con los requisitos ambientales y normativos vigentes para su disposición final.







- **SUMINISTRO DE RECEBO EN ZANJA COMPACTADO CADA 15 CM POR MEDIO MECÁNICO -ALCANTARILLADO**

Durante el período reportado se ejecutaron actividades de suministro, extendido y compactación de material de recebo para el relleno de zanjas, de acuerdo con los espesores y especificaciones técnicas establecidas en el proyecto. Los trabajos incluyeron la colocación del material en capas sucesivas de 15 cm de espesor y su respectiva compactación mediante equipo mecánico, garantizando la densidad y estabilidad requeridas.








- **EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL COMÚN Y CONGLOMERADO DE 0 A 2,00 M**

Durante el periodo reportado se ejecutaron actividades de excavación mecánica en material común y conglomerado con profundidades entre 0 y 2,00 metros, requeridas para la construcción de las obras proyectadas. Los trabajos comprendieron la remoción y extracción del material existente mediante maquinaria especializada, conformando las zanjas y excavaciones de acuerdo con las dimensiones requeridas.









- **EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMÚN Y CONGLOMERADO DE 0 A 2,00 M**

Durante el período reportado se ejecutaron actividades de excavación manual en material común y conglomerado con profundidades entre 0 y 2,00 metros, requeridas para la construcción de las obras proyectadas. Los trabajos comprendieron la remoción y extracción del material existente mediante maquinaria especializada, conformando las zanjas y excavaciones de acuerdo con las dimensiones requeridas




- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PLÁSTICA O LISA PVC PARED ESTRUCTURAL – ALCANTARILLADO**

Durante el período objeto de seguimiento, el contratista ejecutó actividades correspondientes a la construcción de la red de alcantarillado sanitario (aguas residuales), continuando con la instalación con tubería de PVC de 33" Posteriormente, el trazado continuó mediante la instalación de tubería PVC de 20" y 10" de acuerdo con los diseños y especificaciones técnicas del proyecto. De manera complementaria, se realizaron las conexiones domiciliarias de alcantarillado sanitario mediante la instalación de tubería PVC de 6", garantizando la vinculación de los predios beneficiados a la red principal construida


TUBERÍA DE DIÁMETRO DE 33"









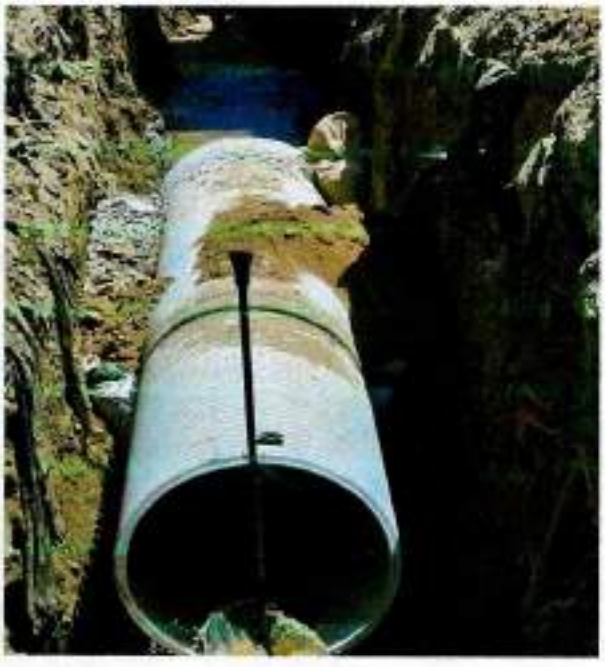


Mz 14 casa 8 etapa 4 Barrio villa café
coonsorcioredesviales@gmail.com
3134797775
Ibagué – Tolima

TUBERÍA DE DIÁMETRO DE 10"



TUBERÍA DE DIÁMETRO DE 6"



- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN LECHO EN GRAVA PARA CAMA DE TUBERÍA D= 1/2 A ¾**

Durante el período informado se ejecutó el suministro, transporte, extendido y conformación del lecho en grava con granulometría 3/4", dispuesto en el fondo de la excavación como soporte de la tubería instalada. La actividad se desarrolló garantizando un espesor uniforme, la correcta nivelación y el adecuado apoyo continuo de la tubería, con el fin de distribuir las cargas, facilitar el drenaje y evitar esfuerzos puntuales que puedan afectar su comportamiento estructural.











- **CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN D=1,2 M**

Durante el período evaluado se ejecutaron actividades correspondientes a la construcción de estructuras de inspección para la red de alcantarillado, incluyendo la conformación del cuerpo del pozo mediante la construcción de cilindro en ladrillo con espesor de muro de 0,30 m, garantizando las condiciones de resistencia y estabilidad requeridas para la estructura.

De igual manera, se realizó la construcción del cono de reducción con una altura de 0,65 m, elemento que permite la transición entre el diámetro del cilindro y la boca de acceso, conforme a las especificaciones técnicas y diseños aprobados para el proyecto.
Las actividades fueron ejecutadas siguiendo los procedimientos constructivos establecidos, verificando la correcta alineación, nivelación y dimensiones de la estructura para su posterior integración al sistema de alcantarillado.






- **ENTIBADO TIPO 1A (DISCONTINUO EN MADERA)**

Durante el período reportado se verificó la ejecución de actividades correspondientes a la instalación de entibado Tipo 1A (discontinuo en madera) en los frentes de excavación de la obra. La interventoría realizó seguimiento y control a la correcta disposición de tablones, largueros y puntales de madera, verificando que el sistema de sostenimiento temporal fuera instalado de acuerdo con las condiciones del terreno, la profundidad de la excavación y los requerimientos de seguridad establecidos en las especificaciones técnicas del proyecto.





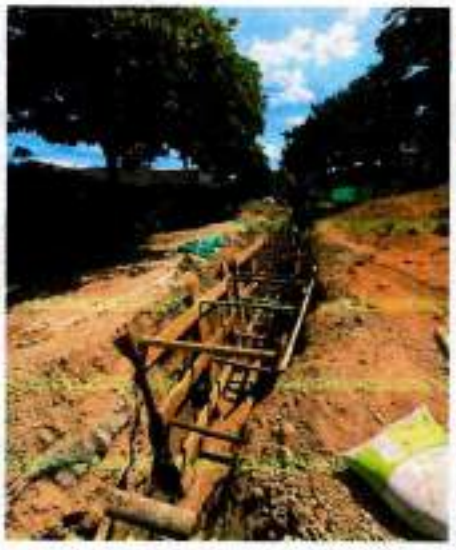


ACUEDUCTO

Durante el periodo se ejecutó la instalación de tubería de 3 pulgadas para la red de acueducto, incluyendo las actividades preliminares de excavación mecánica y/o manual de la zanja, conformación del fondo de excavación e instalación de lecho de arena para garantizar el adecuado apoyo y protección de la tubería. La actividad comprendió el suministro, transporte, instalación, alineación y unión de los tramos de tubería, verificando las condiciones de nivelación y pendiente requeridas para su correcto funcionamiento hidráulico.





- **FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO, INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL**

Durante el periodo las actividades ejecutadas se ajusten a los requerimientos del proyecto, el contratista y la interventoría realizan la verificación del área de fresado realizado sobre la carpeta asfáltica existente en los tramos intervenidos del lote 2, ubicados en la zona urbana del municipio de Ibagué. durante la inspección de campo se revisan las profundidades de fresado, la uniformidad de la superficie y las condiciones de ejecución de la actividad, constatando que los trabajos no fueron desarrollados. el contratista inicio fresado de aproximadamente 439,24 m3 en total.









6. ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PARA EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA DURANTE EL PERIODO

CONTROL Y SEGUIMIENTO ACTIVIDADES OPERATIVAS	En este periodo de tiempo se adelantaron las siguientes actividades: En el periodo comprendido entre el mes de mayo a junio del 2026 el contratista de obra ha adelantado obras correspondientes a los capítulos de: 1. Actividades preliminares, Obras de explanación y movimiento de tierras, instalación de aceros para obras exteriores, reposición de acueducto bajo las condiciones y especificaciones técnicas entregadas por la entidad contratante en el desarrollo del contrato de obra Nº 2379 -2026 y el contrato de obra Nº 2380- 2026. Las actividades realizadas por la interventoría en el periodo a que hace referencia el presente informe son las siguientes: • Revisión técnica de planos y diseños hidrosanitarios, modelación hidráulica, topográficos, diseño pavimentos. • Revisión del presupuesto conforme a la propuesta económica. • Revisión de la programación y ajustes a la misma con base en los diagramas de la propuesta. • Control permanente del personal de la obra que cuente con su respectiva seguridad social e implementos de se seguridad personal (EPP). • Se realiza acompañamiento a formulación de actas de vecindad. • Cumplimiento de cada una de las cláusulas del contrato (pliego de condiciones, especificaciones técnicas, análisis unitarios, presupuesto). • En todas las actividades que se desarrollaron se exigió estricto cumplimiento al contratista de todas las sugerencias y diseños entregados por la entidad.

	• Estudiar y recomendar los cambios que se consideren convenientes y necesarios, en acuerdo con el contratista y la supervisión de la Gerencia de Proyectos Estratégicos. • Aprobar o rechazar los materiales y sus procesos de elaboración, mediante certificados de calidad de los materiales, como también el control de calidad tomando muestras para ensayos de laboratorios de concretos para medir resistencia de concretos de acuerdo a sus especificaciones técnicas y calidad de obra. • Informar al contratista y la secretaria de infraestructura mediante oficio del avance de la obra y cumplimientos del cronograma de obra. • Informar al contratista la utilización de señalización de seguridad como señales de evacuación , señales de obligación, prohibición, peligro, auxilio (botiquín, camilla, lavaojos) y señalización de equipos contraincendios además de contar con un punto de hidratación, puntos de encuentro, los medios o canales de comunicación que se tienen con los trabajadores o personal externo que ingrese a la obra o proyecto (Carteleras, Medevac, folletos, etc.) ,respectivos en los sitios de la obra, las cuales se están llevando a cabo. • Verificación y seguimiento a cumplimiento de la instalación de valla informativa del proyecto. • Informar y llevar cumplimiento a lo establecido en la aprobación del plan de manejo de tránsito (PMT), aprobado por la autoridad competente. • Acompañamiento permanente en obra, para dar soluciones y acciones de mejora en el desarrollo de la misma. • Llevar registro fotográfico; se toma registro fotográfico diario de las actividades ejecutas. Anexo 14 - registro fotográfico.

	Anexo Formato 6.1 INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA
CONTROL Y SEGUIMIENTO A ENSAYO DE LABORATORIOS	Durante el periodo objeto del presente informe se realizaron ensayos de densidad en campo sobre los materiales utilizados en el relleno y conformación de zanjas, con el propósito de verificar el cumplimiento de los niveles de compactación establecidos en las especificaciones técnicas del proyecto, garantizando así la calidad y estabilidad de las obras ejecutadas.
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE FINANCIERO	Estado financiero actual: **CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°2381-2026**

Valor Contractual + Adicional	:	$1.745.585.891,00
Valor Anticipo	:	$ 0,00
Valor por amortizar	:	$ 0,00
Valor ejecutado	:	$ 0,00
% Ejecutado	:	0,00%
Valor Actas Pagadas	:	$ 0,00

Estado financiero actual: **CONTRATO DE OBRA N°2379-2026**

Valor Contractual+ Adicional	:	$14.435.674.120,00
Valor Anticipo	:	$ 4.330,702,236
Valor por Amortizar	:	$ 0,00
Valor ejecutado estimado del Periodo	:	$ 551,384,463.41
Valor total ejecutado acumulado	:	$1,732,894,526.67
% Programado	:	13.86%
% Ejecutado	:	12.00 %
Valor Actas Pagadas	:	$ 0,00

Estado financiero actual: **CONTRATO DE OBRA N°2380-2026**

Valor Contractual+ Adicional	:	$20.475.924.186,00
Valor Anticipo	:	$6.412.777.255,80
Valor por Amortizar	:	$6.412.777.255,80
Valor ejecutado estimado del Periodo	:	$2.518.655.700,98
Valor total ejecutado acumulado	:	$ 4.538.764.924,77
% Programado	:	8,88%
% Ejecutado	:	22,17%
Valor Actas Pagadas	:	$ 0,00

CONTROL DE TIEMPOS DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS:

A continuación se detalla los tiempos de ejecución para cada uno de los contratos de obra:

LOTE 1: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL SALADO 2026

CUADRO TIEMPO DE EJECUCION CONTRATO LOTE 1		
TIEMPO INICIAL	TIEMPO TRANSCURRIDO	TIEMPO POR EJECUTAR
300	90	210



LOTE 2: CONSORCIO OBRAS ESPECIALES HIDROSANITARIAS IBAGUÉ

CUADRO TIEMPO DE EJECUCION CONTRATO LOTE 2		
TIEMPO INICIAL	TIEMPO TRANSCURRIDO	TIEMPO POR EJECUTAR
420	90	330



CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PERSONAL	**Anexo Formato 6.4** CONTROL DEL PERSONAL CONTRATISTA E INTERVENTOR
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE EQUIPOS	La interventoría verifico los modelos de la maquinaria y equipos utilizados por la **CONSORCIO OBRAS ESPECIALES HIDROSANITARIAS IBAGUÉ,** y del **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL SALADO 2026,** con el objetivo de garantizar el cumplimiento vigencias de documentación de los equipos tales como **SOAT** y **TM.** Para este periodo se utilizó la siguiente maquinarias equipos: ***LOTE 1: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL SALADO 2026*** • VOLQUETAS   • EQUIPOS DE TOPOGRAFIA (NIVEL Y ESTACION TOTAL)  

- VIBROCOMPATADOR



- RETROEXCAVADORA





- COMPACTADOR DE SUELOS(SALTARIN)



- MEZCLADOR DE CONCRETO



- DEMOLEDOR



LOTE 2: CONSORCIO OBRAS ESPECIALES HIDROSANITARIAS IBAGUÉ

- *EXCAVADORAS ORUGA Y PAJARITA*









- *COMPACTADOR DE SUELOS(SALTARIN)*



- VOLQUETAS





- EQUIPOS DE TOPOGRAFIA (NIVEL Y ESTACION TOTAL)







- MINICARGADOR



- TRONZADORA Y PILIDORAS





- MIXERS



- VIBROCOMPACTADOR



	• FRESADORA  Anexo Formato 6.5 **CONTROL DE EQUIPOS**
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES	Para este periodo se realizaron actividades de suministro de materiales pétreos, tuberías y concretos. El contratista y la interventoría revisaron diseños, planos y otros aspectos del estado actual de las instalaciones. 







Mz 14 casa 8 etapa 4 Barrio villa café
coonsorcioredesviales@gmail.com
3134797775
Ibagué – Tolima

LOTE 1

DENSIDADES EN CAMPO: Se realiza toma de densidades en campo sobre los llenos en excavaciones a zanjas de tuberías sanitarias:





PROCTOR MODIFICADO: Se realiza laboratorios materiales en campo tales como el recebo grueso y fino utilizados en los relleno de excavaciones.





LOTE 2

DENSIDADES EN CAMPO: Se realiza toma de densidades en campo sobre los llenos en excavaciones a zanjas de tuberías sanitarias:











ENSAYO RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS: se tomaron muestras a concretos fundidos en el desarrollo de las actividades y se realizó ensayos de resistencia a los mismos.





Mz 14 casa 8 etapa 4 Barrio villa café
coonsorcioredesviales@gmail.com
3134797775
Ibagué – Tolima

	 
CONTROL Y SEGUIMIENTO A APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	El contratista ha cumplido con la entrega de todos los E.P.P, las dotaciones al personal que labora en la obra como su casco, botas, guantes, tapa oídos, gafas, pantalón y camisa. Anexo - **Planillas de pago de seguridad social (Junio2026)**
RELACION DE ACTAS REALIZADAS estas actas son las de justificación/adición/suspensión o parciales o las de comités	Para este periodo no se generaron pagos parciales. Pero realizaron actas de mesas técnicas de obra. **REGISTRO FOTOGRÁFICO A MESAS TÉCNICAS**  





7. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL TIEMPO

LOTE 1: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL SALADO 2026

Durante el periodo objeto del presente informe, las condiciones meteorológicas en el área de intervención fueron predominantemente soleadas y secas, sin presencia de lluvias, lo que permitió desarrollar las actividades de obra de manera continua y sin afectaciones asociadas a condiciones climáticas adversas.

LOTE 2: CONSORCIO OBRAS ESPECIALES HIDROSANITARIAS IBAGUÉ

Durante este perdido se realizaron activades con normalidad predominantemente soleadas y secas, favorables para la ejecución de las actividades constructivas con normalidad.

Anexo Formato 7.1 CONTROL DIARIO DEL ESTADO DEL TIEMPO

8. SEGUIMIENTO AL AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS DE LA OBRA

LOTE 1								
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	INFORME 3		
1	PRELIMINARES							
1.03	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	M2	4500.00	$ 30,542.20	$ 137,439,900.00	126.00	$	3,848,317.20
1.04	CARGUE DE SOBRANTES A MAQUINA	M3	19418.55955	$ 8,748.285	$ 169,879,093.23	2385.33	$	20,867,512.76
1.05	DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES EN ESCOMBRERA AUTORIZADA	M3	19418.55955	$ 6,935.50	$ 134,677,419.76	2385.33	$	16,543,429.34
1.06	TRANSPORTE DE SOBRANTES	m3/km	27477261763 25	$ 1,950.00	$ 535,806,604.38	33752.36	$	65,817,111.10
				Subtotal	**$ 1,870,447,015.71**	**38649.016 92**	**$**	**107,076,370.40**
2	OBRAS DE EXPLANACION Y MOVIMIENTO DE TIERRAS							

AS

2.01	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 URBANA	M2	13500.00	$ 5,704.40	$ 77,009,400.00	6660.00	$	37,991,304.00
2.03	EXCAVACION A MAQUINA(CAJEO)	M3	7560.00	$ 24,622.00	$ 186,142,320.00	604.80	$	14,891,385.60
				Subtotal	**$ 269,032,240.00**	**2494.8**		**$ 52,882,689.60**
3	**OBRAS DE PAVIMENTACIÓN**							
3.01	SUMINISTRO, EXTENSIÓN Y COMPACTACION (BASE - GRANULAR TIPO A MEDIO MECANICO)	M3/COMP	2025.00	$ 155,359.10	$ 314,602,177.50	256.50	$	39,849,609
3.06	TRASPORTE DE MATERIALES PETREOS	m3/km	105750.422505	$ 1,950.00	$ 206,213,323.88	15480.21	$	30,186,408.77
				Subtotal	**$ 5,596,787,444.35**	**15736.70962**	**$**	**70,036,017.92**
4	**ACERO**							
4.01	ACERO DE REFUERZO FIGURADO E INSTALADO PDR: 60	KG	70339.253	$ 10,114.00	$ 711,411,204.84	443.72	$	4,487,800.26
				Subtotal	**$ 711,411,204.84**	**443.7216**	**$**	**4,487,800.26**
5	**DEMARCACIÓN Y PROTECCIÓN VIAL Y PEATONAL**							
				Subtotal	**$ 163,852,159.64**	**-**	**$**	**-**

6	**OBRAS EXTERIORES**							
6.01	GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	M2	14250.00	$ 14,654.592392819 2	$ 208,827,941.60	1805.00	$	26,451,539.27
6.02	FILTRO EN GEODREN 4" DE H=0.60 MTS TUBULAR	ML	1040.00	$ 198,287.40966666 7	$ 206,218,906.05	68.00	$	13,483,543.86
6.06	Sumidero en concreto 3.000 PSI (Incluye rejilla vibro compactada de 1,05x0,46)	UND.	60.00	$ 1,194,852.997	$ 71,691,179.82	12.00	$	14,338,235.96
				Subtotal	**$ 1,572,124,555.41**	**$ 1,885.00**	**$**	**54,273,319.09**
7	**ILUMINARIA**							
				Subtotal	**$ 1,498,134,175.20**	**0**	**$**	**-**
8	**REPOSICIÓN ACUEDUCTO**							
8.1	**PRELIMINARES ACUEDUCTO**							
8.11	Suministro de Recebo en zanja compactado c/ 15 Cms. Medio mecánico (no incluye transporte)	m3/comp	705.732	$ 69,690.40	$ 49,182,745.37	416.52	$	29,027,478.86
				Subtotal	**$ 49,182,745.37**	**416.52048**	**$**	**29,027,478.86**
8.2	**EXCAVACIONES A MAQUINA 0-2 MTS**							

8.21	Excavaciones a maquina en material común y Conglomerado de 0 a 2 m	m3	1323.144	$ 31,494.00	$ 41,671,097.14	956.64	$	30,128,420.16
				Subtotal	**$ 41,671,097.14**	**956.64**	**$**	**30,128,420.16**
8.3	**EXAVACIONES A MANO 0 - 2 MTS**							
				Subtotal	**$ 12,738,927.60**	**0**	**$**	**-**
8.4	**SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS**							
				Subtotal	**$ 45,702,854.05**	**0**	**$**	**-**
8.5	**OTROS**							
8.52	Suministro e Instalacion Lecho en Arena Para Tuberia (No Incluye transporte)	m3	514.556	$ 98,867.788262222 2	$ 50,873,013.66	241.21	$	23,848,323.88
				Subtotal	**$ 55,760,237.66**	**241.21**	**$**	**23,848,323.88**
8.6	**SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC UNION MECANICA PRESION RDE 21**							
8.61	De Diametro 4"	ml	780.00	$ 95,560.457393834 6	$ 74,537,156.77	809.00	$	77,308,410.03
8.63	De Diametro 8"	ml	640.00	$ 326,798.18102604 4	$ 209,150,835.86	250.00	$	81,699,545.26

				Subtotal	**$ 319,913,208.93**	**1059**	**$**	**159,007,955.29**
9	**REPOSICIÓN ALCANTARILLADO**							
9.1	**PRELIMINARES ALCANTARILLADO**							
9.11	Suministro de Recebo en zanja compactado c/ 15 Cms. Medio mecánico (no incluye transporte)	m3/comp	3105.23	$ 69,690.40	$ 216,404,720.79	91.96	$	6,408,755.25
				Subtotal	**$ 216,404,720.79**	**91.96**	**$**	**6,408,755.25**
9.2	**EXCAVACIÓN A MAQUINA**							
9.21	Excavaciones a maquina en material común y Conglomerado de 0 a 2 m	m3	3602.4095	$ 31,494.00	$ 113,454,284.79	98.37	$	3,098,064.78
9.22	Excavaciones a maquina en material común y conglomerada de 2 a 4 m	m3	796.20	$ 52,371.00	$ 41,697,790.20			
				Subtotal	**$ 155,152,074.99**	**98.37**	**$**	**3,098,064.78**
9.3	**EXCAVACIÓN A MANO**							
9.31	Excavaciones a mano en material común de 0 a 2 m	m3	742.50	$ 47,920.00	$ 35,580,600.00	31.65	$	1,516,668.00
				Subtotal	**$ 43,999,213.50**	**31.65**	**$**	**1,516,668.00**

9.4	**SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PLASTICA O LISA PVC PARED ESTRUCTURAL - NTC 3722-1, NTC - 5070, NTC - 4764**							
9.41	De Diametro 6"	ml	660.00	$ 84,714.3848865882	$ 55,911,494.03	27.70	$	2,346,588.46
				Subtotal	**$ 1,056,223,310.93**	**27.7**	**$**	**2,346,588.46**
9.5	**CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION D=1,2M**							
9.58	Caja de inspección 60 x 60 x 100 Cmts en Ladrillo, concreto de 2500 PSI y tapa reforzada en concreto de 3000 PSI	und	60.00	$ 549,946.00	$ 32,996,760.00	7.00	$	3,849,622.00
				Subtotal	**$ 163,553,100.00**	**$ 7.00**	**$**	**3,849,622.00**
9.6	**OTROS**							
9.65	Suministro e Instalacion Lecho en Grava para Cama de Tuberia D= 1/2 a 3/4 (No Incluye transporte)	m3	552.1725	$ 148,937.00	$ 82,238,915.63	11.57	$	1,723,217.76
9.68	Entibado Tipo 1A (Discontinuo en Madera)	m2	6297.60	$ 37,684.0472146197	$ 237,319,055.74	44.40	$	1,673,171.70
				Subtotal	**$ 363,685,480.38**	**$ 55.97**	**$**	**3,396,389.46**
				SUBTOTAL OBRAS	**$ 14,205,775,766.49**		**$**	**551,384,463.41**

Mz 14 casa 8 etapa 4 Barrio villa café
coonsorcioredesviales@gmail.com
3134797775
Ibagué – Tolima

	Plan de Manejo Ambiental (PMA) y Plan de Gestion Social (PGS)	$ 66,964,954.00		
	Plan de Manejo de Transito (PMT)	$ 162,990,178.00		
	VALOR TOTAL	$ 14,435,730,898.49		
PORCENTAJE EJECUCION PERIODO % = 3.82%				

Mz 14 casa 8 etapa 4 Barrio villa café
coonsorcioredesviales@gmail.com
3134797775
Ibagué – Tolima

CONSORCIO REDES VIALES NIT. 902.082.366 - 5	FORMATO	CODIGO	F23
		VERSIÓN	1
	INFORME INTERVENTORÍA	VIGENCIA	ABRIL 2026

LOTE 2								
ÍTEM	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN PRESUPUESTO OFICIAL					CANTIDADES ACUMULADAS	
	PARTIDAS DE PAGO	UNIDAD	CANTIDAD	V/R UNIT.	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
	OBRA						
8	**REPOSICIÓN ACUEDUCTO**						
8,1	**PRELIMINARES ACUEDUCTO**						
8,11	Suministro de Recebo en zanja compactado c/ 15 Cms. Medio mecánico (no incluye transporte)	m3/comp	3.128,560	$ 69.690,40	$ 218.030.597,82	0,00	$ 0,00
8,12	Cargue de Sobrantes a Maquina	m3	12.089,376	$ 8.748,29	$ 105.761.306,72	0,00	$ 0,00
8,13	Disposicion Final de Sobrantes en Escombrera Autorizada	m3	12.089,376	$ 6.935,50	$ 83.845.867,25	0,00	$ 0,00
8,14	Transporte de Sobrantes	m3/km	163.206,576	$ 1.950,00	$ 318.252.823,20	0,00	$ 0,00
8,15	Transporte Materiales Petreos	m3/km	64.261,025	$ 1.950,00	$ 125.308.999,53	0,00	$ 0,00
	SUBTOTAL				**$ 851.199.594,52**		**$ 0,00**
8,2	**EXCAVACIONES A MAQUINA**						
8,21	Excavaciones a maquina en material común y Conglomerado de 0 a 2 m	m3	7.684,320	$ 31.494,00	$ 242.009.974,08	0,00	$ 0,00
	SUBTOTAL				**$ 242.009.974,08**		**$ 0,00**
8,3	**EXAVACIONES A MANO 0 - 2 MTS**						
8,31	Excavaciones a mano en material común de 0 a 2 m	m3	1.130,640	$ 47.920,00	$ 54.180.268,80	8,68	$ 415.945,60
8,32	Excavaciones a mano en conglomerado de 0 a 2 m	m3	484,560	$ 56.691,00	$ 27.470.190,96	0,00	$ 0,00
	SUBTOTAL				**$ 81.650.459,76**		**$ 415.945,60**

52

8,4	**SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS**						
8,41	Suministro e Instalacion Collar de Derivacion PVC de 3" X 1/2"	und	180,000	$ 77.305,00	$ 13.914.900,00	0,00	$ 0,00
8,42	Suministro e Instalacion Collar de Derivacion PVC de 4" X 1/2"	und	170,000	$ 80.794,00	$ 13.734.980,00	0,00	$ 0,00
8,43	Suministro e Instalacion Collar de Derivacion PVC de 6" X 1/2"	und	205,000	$ 154.009,00	$ 31.571.845,00	0,00	$ 0,00
8,44	Suministro e Instalacion de registro de incorporacion 1/2" Bronce	und	555,000	$ 68.226,00	$ 37.865.430,00	0,00	$ 0,00
8,45	Suministro e Instalacion Valvula de Bola PVC 1/2" Lisa o Roscada	und	555,000	$ 34.309,00	$ 19.041.495,00	0,00	$ 0,00
8,46	Suministro e Instalación de Union PF + UAD 1/2"	und	555,000	$ 25.126,00	$ 13.944.930,00	0,00	$ 0,00
8,47	Suministro e Instalación Tuberia Acometida Domiciliaria PF + UAD Polietileno 1/2"	ml	4.065,000	$ 10.209,00	$ 41.499.585,00	0,00	$ 0,00
8,48	Suministro e instalación de acople universal HD R1 de 3"	und	20,000	$ 347.708,00	$ 6.954.160,00	0,00	$ 0,00
8,49	Suministro e instalacion Acople Universal HD R1 de 4"	und	22,000	$ 374.584,00	$ 8.240.848,00	0,00	$ 0,00
8,50	Suministro e instalacion Acople Universal HD R1 de 6"	und	26,000	$ 675.201,00	$ 17.555.226,00	0,00	$ 0,00
8,51	Suministro e instalacion Acople Universal HD R1 de 8"	und	12,000	$ 850.774,76	$ 10.209.297,06	0,00	$ 0,00
8,52	Suministro e instalacion Acople Universal HD R1 de 10"	und	4,000	$ 1.380.123,00	$ 5.520.492,00	0,00	$ 0,00
8,53	Suministro e instalacion Acople Universal HD R1 de 12"	und	4,000	$ 1.457.473,48	$ 5.829.893,90	0,00	$ 0,00
	SUBTOTAL				**$ 225.883.081,98**		**$ 0,00**
8,5	**OTROS**						
8,51	CERCA EN TELA VERDE H=2,10 M	ML	8.228,000	$ 12.918,51	$ 106.283.514,99	2700,90	$ 34.891.606,49

8.5.2	Suministro de valla informativa de piso según diseño	und	12,000	$ 610.903,00	$ 7.330.836,00	12,00	$ 7.330.836,00
8.5.3	Suministro e Instalacion Lecho en Arena Para Tuberia (No Incluye transporte)	m3	371,000	$ 98.867,79	$ 36.679.949,45	0,00	$ 0,00
	SUBTOTAL				**$ 150.304.300,44**		**$ 42.222.444,49**
8,6	**SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC UNION MECANICA PRESION RDE 21**						
8,6 1	De diametro 3"	ml	2.519,000	$ 76.352,23	$ 192.331.279,76	0,00	$ 0,00
8,6 2	De Diametro 4"	ml	2.231,000	$ 95.580,46	$ 213.195.380,45	0,00	$ 0,00
8,6 3	De Diametro 6"	ml	3.775,000	$ 203.512,45	$ 768.259.503,09	0,00	$ 0,00
8,6 4	De Diametro 8"	ml	1.867,000	$ 326.798,18	$ 644.772.587,77	0,00	$ 0,00
8,6 5	De Diametro 10"	ml	150,000	$ 494.091,85	$ 74.113.778,04	0,00	$ 0,00
8,6 6	De Diametro 12"	ml	163,000	$ 689.810,84	$ 112.439.166,66	0,00	$ 0,00
	SUBTOTAL				**$ 1.905.111.675,76**		**$ 0,00**
9	**REPOSICIÓN ALCANTARILLADO**						
9,1	**PRELIMINARES ALCANTARILLADO**						
9,1 1	Suministro de Recebo en zanja compactado c/ 15 Cms. Medio mecánico (no incluye transporte)	m3/comp	19.759,490	$ 69.690,40	$ 1.377.046.761,90	7510,86	$ 523.434.837,74
9,1 2	Cargue de Sobrantes a Maquina	m3	38.445,576	$ 8.748,29	$ 336.332.855,84	12306,84	$ 107.683.743,77
9,1 3	Disposicion Final de Sobrantes en Escombrera Autorizada	m3	38.445,576	$ 6.935,50	$ 266.639.292,35	12306,84	$ 85.354.088,82

9,14	Transporte de Sobrantes	m3/km	519.015,276	$ 1.950,00	$ 1.012.079.788,20	180910,46	$ 352.775.397,00
9,15	Transporte Materiales Petreos	m3/km	421.162,556	$ 1.950,00	$ 821.266.984,40	71027,81	$ 138.504.229,50
9,16	Rotura de Pavimento Flexible	m3	533,530	$ 154.024,69	$ 82.176.795,16	124,45	$ 19.168.373,21
9,17	Fresado de Pavimento Asfaltico, incluye transporte y disposicion final	m3	3.800,400	$ 144.591,43	$ 549.505.260,74	439,24	$ 63.510.338,58
9,18	Sardinel en concreto de 2500 PSI fundido en sitio seccion trapezoidal de (0,15 - 0,20) h=0,40m	ml	110,000	$ 76.424,00	$ 8.406.640,00	0,00	$ 0,00
9,19	Bordillo de Pieza Prefabricadas en Concreto, Incluye la Preparacion de la Superficie de Apoyo	ml	110,000	$ 103.281,00	$ 11.360.910,00	0,00	
9,20	Anden en concreto de 2500 PSI e = 0,10 m	m2	170,000	$ 99.655,00	$ 16.975.350,00	0,00	$ 0,00
	SUBTOTAL				**$ 4.481.790.638,57**		**$ 1.290.411.008,82**
9,2	**EXCAVACIÓN A MAQUINA**						
9,21	Excavaciones a maquina en material común y Conglomerado de 0 a 2 m	m3	17.416,470	$ 31.494,00	$ 548.514.219,10	5847,49	$ 184.160.820,82
9,22	Excavaciones a maquina en material común y conglomerada de 2 a 4 m	m3	5.718,330	$ 52.370,89	$ 299.474.031,41	2294,50	$ 120.165.007,11
	SUBTOTAL				**$ 847.988.250,51**		**$ 304.325.827,93**
9,3	**EXCAVACIÓN A MANO**						
9,31	Excavaciones a mano en material común de 0 a 2 m	m3	4.723,560	$ 47.920,00	$ 226.352.516,00	263,50	$ 12.626.920,00
9,32	Excavaciones a mano en conglomerado de 0 a 2 m	m3	1.181,840	$ 56.691,00	$ 66.988.353,24	0,00	$ 0,00
	SUBTOTAL				**$ 293.340.869,24**		**$ 12.626.920,00**

Mz 14 casa 8 etapa 4 Barrio villa café
coonsorcioredesviales@gmail.com
3134797775
Ibagué – Tolima

9,4	**SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PLASTICA O LISA PVC PARED ESTRUCTURAL - NTC 3722-1, NTC - 5070, NTC - 4764**						
9,41	De Diametro 6"	ml	4.555,000	$ 84.714,38	$ 385.874.023,16	292,70	$ 24.795.900,46
9,42	De Diametro 8"	ml	1.275,000	$ 122.898,56	$ 156.696.666,10	0,00	$ 0,00
9,43	De Diametro 10"	ml	1.804,000	$ 165.043,75	$ 264.730.175,71	421,75	$ 69.607.201,75
9,44	De Diametro 12"	ml	363,000	$ 222.456,72	$ 80.752.516,65	0,00	$ 0,00
9,45	De Diametro 14"	ml	78,000	$ 323.865,62	$ 25.261.533,65	0,00	$ 0,00
9,46	De Diametro 16"	ml	308,000	$ 399.148,76	$ 122.937.817,31	0,00	$ 0,00
9,47	De Diametro 20"	ml	168,000	$ 628.588,16	$ 105.602.814,39	213,20	$ 134.015.000,17
9,48	De Diametro 24"	ml	51,000	$ 851.481,82	$ 43.425.573,00	0,00	$ 0,00
9,49	De Diametro 27"	ml	283,000	$ 1.001.753,05	$ 283.496.113,69	0,00	$ 0,00
9,50	De Diametro 33"	ml	2.346,000	$ 1.697.939,14	$ 3.983.365.224,81	1269,18	$ 2.154.990.398,99
9,51	De Diametro 36"	ml	969,000	$ 2.273.190,81	$ 2.202.721.896,29	30,50	$ 69.332.319,81
9,52	De Diametro 39"	ml	225,000	$ 3.098.186,16	$ 697.092.335,09	0,00	$ 0,00
9,53	De Diametro 42"	ml	73,000	$ 3.618.992,58	$ 264.196.456,66	0,00	$ 0,00
	SUBTOTAL				**$ 8.616.142.170,41**		**$ 2.452.740.821,18**

Mz 14 casa 8 etapa 4 Barrio villa café
coonsorcioredesviales@gmail.com
3134797775
Ibagué – Tolima

9,6	**CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION D=1,2M**						
9,6 1	Base y cañuela en concreto de 3.000 PSI e = 0,30 M	und	137,000	$ 706.456,00	$ 96.647.472,00	9,00	$ 6.349.104,00
9,6 2	Pañete interior	ml	246,600	$ 161.891,00	$ 39.922.320,60	6,00	$ 1.295.128,00
9,6 3	Cilindro en ladrillo e = 0,30 M	ml	246,600	$ 849.491,00	$ 209.484.480,60	8,00	$ 6.795.928,00
9,6 4	Cono de reducción H = 0,65 M	und	137,000	$ 762.938,00	$ 104.522.606,00	10,00	$ 7.629.380,00
9,6 5	Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo C/40 cm	und	531,000	$ 31.292,00	$ 16.616.052,00	68,00	$ 2.127.856,00
9,6 6	Suministro e instalación de Arotapa Completa Vibrocompactada	und	137,000	$ 1.055.497,00	$ 144.603.089,00	4,00	$ 4.221.988,00
9,6 7	Suministro e Instalacion de Tapa para Arotapa Vibrocompactada	und	137,000	$ 752.707,00	$ 103.120.859,00	3,00	$ 2.258.121,00
9,6 8	Caja de inspección 60 x 60 x 100 Cmts en Ladrillo, concreto de 2500 PSI y tapa reforzada en concreto de 3000 PSI	und	555,000	$ 549.946,00	$ 305.220.030,00	0,00	$ 0,00
	SUBTOTAL				**$ 1.020.136.809,20**		**$ 30.677.505,00**
9,7	**OTROS**						
9,7 1	Suministro e Instalacion de Kit Silla Yee 8"X 6" PVC Incluye Agarraderas Caucho y Adherencia	und	200,000	$ 314.662,00	$ 62.972.400,00	0,00	$ 0,00
9,7 2	Suministro e Instalacion de Kit Silla Yee 10"X 6" PVC Incluye Agarraderas Caucho y Adherencia	und	240,000	$ 346.995,00	$ 83.278.800,00	39,00	$ 13.532.805,00
9,7 3	Suministro e Instalacion de Kit Silla Yee 12"X 6" PVC Incluye Agarraderas Caucho Y adherencia	und	25,000	$ 484.544,00	$ 12.113.600,00	0,00	$ 0,00
9,7 4	Suministro e Instalacion de Silla Yee 14"X 6" PVC Incluye Caucho y Adherencia	und	15,000	$ 539.941,75	$ 8.099.126,28	0,00	$ 0,00
9,7 5	Suministro e Instalacion de Silla Yee 16"X 6" PVC Incluye Caucho y Adherencia	und	20,000	$ 583.096,51	$ 11.661.970,29	0,00	$ 0,00

45

9,76	Suministro e Instalacion de Silla Yee 20"X 6" PVC Incluye Caucho y Adherencia	und	55,000	$ 883.935,17	$ 48.616.434,22	9,00	$ 7.955.416,51
9,77	Suministro e Instalacion Lecho en Grava para Cama de Tuberia D= 1/2 a 3/4 (No Incluye transporte)	m3	3.764,590	$ 148.937,00	$ 560.686.740,83	649,54	$ 96.741.114,53
9,78	Manejo de Aguas Con Diametros de 8" a 12"	glb	4,000	$ 796.120,00	$ 3.184.480,00	0,00	$ 0,00
9,79	Manejo de Aguas con diametros de 12" a 24"	glb	7,000	$ 1.520.940,00	$ 10.646.580,00	1,00	$ 1.520.940,00
9,80	Entibado Tipo 1A (Discontinuo en Madera)	m2	16.855,600	$ 37.884,05	$ 627.650.416,79	7366,72	$ 277.306.351,92
9,81	Sumidero en concreto 3.000 PSI (Incluye rejilla vibro compactada de 1,05x0,46)	und	25,000	$ 1.194.853,00	$ 29.871.325,00	0,00	$ 0,00
9,82	Señales provisional movil para obra tipo tripode incluye tablero	und	24,000	$ 345.326,00	$ 8.287.824,00	24,00	$ 8.287.824,00
	SUBTOTAL				**$ 1.467.069.697,41**		**$ 405.344.451,96**
	SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				**$ 15.525.098.093,76**		**$ 3.491.357.634,44**
	ADMINISTRACION			**24%**	**$ 3.726.023.542,50**		**$ 837.925.832,27**
	IMPREVISTOS			**1%**	**$ 155.250.980,94**		**$ 34.913.576,34**
	UTILIDAD			**5%**	**$ 776.254.904,69**		**$ 174.567.881,72**
	VALOR TOTAL OBRAS				**$ 20.182.627.521,89**		**$ 4.538.764.924,77**
	AJUSTE AL PESO				**$ 0,00**		**$ 0,00**
	VALOR TOTAL OBRAS				**$ 20.182.627.521,89**		**$ 4.538.764.924,77**

	Plan de Manejo Ambiental (PMA) y Plan de Gestion Social (PGS)		$ 73.907.154,00		
	Plan de Manejo de Transito (PMT)		$ 219.477.498,00		
	PORCENTAJE EJECUCION ACUMULADO %		$ 20.476.012.173,89		22,17%

Mz 14 casa 8 etapa 4 Barrio villa café
coonsorcioredesviales@gmail.com
3134797775
Ibagué – Tolima

9. CONTROL DE ANTICIPO - OBRA

LOTE 1. CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL SALADO 2026

BALANCE DE ANTICIPO		
VALOR DEL ANTICIPO	$4.330,702,236	
VALOR AMORT. ANTICIPO ACTA 01		$ 0,00
VALOR AMORT. ANTICIPO ACTA 02		$ 0,00
VALOR AMORT. ANTICIPO ACTA 03		$ 0,00
VALOR AMORT. ANTICIPO ACTA 04		$ 0,00
VALOR AMORT. ANTICIPO ACTA 05		$ 0,00
VALOR POR AMORTIZAR		$4.330,702,236
SUMAS IGUALES	$4.330,702,236	$4.330,702,236

LOTE 2. CONSORCIO OBRAS ESPECIALES HIDROSANITARIAS IBAGUÉ

BALANCE DE ANTICIPO		
VALOR DEL ANTICIPO	$6.412.777.255,80	
VALOR AMORT. ANTICIPO ACTA 01		$ 0,00
VALOR AMORT. ANTICIPO ACTA 02		$ 0,00
VALOR AMORT. ANTICIPO ACTA 03		$ 0,00
VALOR AMORT. ANTICIPO ACTA 04		$ 0,00
VALOR AMORT. ANTICIPO ACTA 05		$ 0,00
VALOR POR AMORTIZAR		$6.412.777.255,80
SUMAS IGUALES	$6.412.777.255,80	$6.412.777.255,80

10. RELACION DE PERSONAL - INTERVENTORIA

PROFESIONAL	CARGO
DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ	DIRECTOR INTERVENTORIA
LUIS FRANCISCO ESPAÑA	INGENIERO RESIDENTE
HECTOR MANUEL LOZADA MURCIA	INGENIERO RESIDENTE

JHON ALEXANDER PEDREROS CRUZ	AUXILIAR DE INTERVENTORIA
MARIANA ANDREA MARTINEZ HERNANDEZ	AUXILIAR DE INTERVENTORIA
HEYDY CATERINE MARIN GUZMAN	PROFESIONAL EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO SST
MARIAN KATERINE MUÑOZ ROJAS	PROFESIONAL EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO SST
LAURA MILENA ESPAÑA RAMIREZ	PROFESIONAL SOCIAL
NIYIRETH DUEÑAS MORALES	PROFESIONAL FINANCIERO - CONTABLE
CARLOS ESTEBAN REYES MUÑOZ	ESPACIALISTA EN ESTRUCTURAS
GERMAN MONSALVE SÁENZ	ESPECIALISTA HIDRAULICO
JULIAN DARIO LINCE ALZATE	ESPECIALISTA ELECTRICTO
DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ	ESPECIALISTA PAVIMENTOS
ANGIE LORENA BERJAN TRIANA	TOPOGRAFO INSPECTOR
OCTAVIO AUGUSTO MURCIA CALDERON	TOPOGRAFO INSPECTOR
LUIS FERNANDO CORTES ALZATE	CADENERO
WILLINGTON DIAZ MONTIEL	CADENERO
DAIRO DUEÑAS MORALES	ESPECIALISTA GEOTECNIA
CLAUDIA ALICIA ALFARO DE LOS RIOS	ESPECIALISTA AMBIENTAL
LEONARDO ANTONIO BASTIDAS MAHECHA	ESPECIALISTA EN DERECHO

11. RELACIÓN DE PAGOS

TIPO DE PAGO (Acta No./Anticipo)	**No. COMPROBANTE**	**FECHA**

12. RELACIÓN DE PAGOS DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL - INTERVENTORIA

PERSONAL	PENSIÓN	SALUD	CCF	ARL	PARAFISCALES
HECTOR MANUEL MURCIA	$720.000	$562.500	$180.000	$313.200	$225.000
LUIS FRANCISCO ESPAÑA	$720.000	$562.500	$180.000	$313.200	$225.000
JHON ALEXANDER PEDREROS	$1.120.000	$875.000	$280.000	$487.200	$350.000
MARIANA MARTINEZ HERNANDEZ	$640.000	$500.000	$160.000	$278.400	$200.000
ANGIE LORENA BERJAN	$480.000	$375.000	$120.000	$208.800	$150.000
OCTAVIO AUGUSTO MURCIA	$480.000	$375.000	$120.000	$208.800	$150.000
LAURA MILENA ESPAÑA	$432.000	$337.500	$108.000	$188.000	$135.000
HEIDY CATERINE MARIN	$640.000	$500.000	$160.000	$278.400	$200.000
MARIAN KATERINE MUÑOZ	$640.000	$500.000	$160.000	$278.400	$200.000

13. POLIZAS DE GARANTIA - INTERVENTORIA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (D/M/A):	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (D/M/A):	HASTA (D/M/A):
SEGUROS DEL ESTADO S.A	21-44-101495801	2	23 de Abril 2026	Cumplimiento del contrato	22/04/2026	22/10/2027
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	22/04/2026	22/06/2030
				Calidad del servicio	22/06/2027	22/06/2032

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ANEXO	FECHA DE EMISIÓN (D/M/A):	VIGENCIA	
				DESDE (D/M/A):	HASTA (D/M/A):

14. REGISTRO FOTOGRAFICO

- Anexo Formato **14.1 FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**

15. ANEXOS

- Formato **15.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA** generada durante el periodo).
- Anexo **15.2** Copia de la bitácora de obra.
- Anexo **15.3** Soportes de pago a aportes a seguridad social integral (EPS-ARP-AFP)
- Anexo **15.4 INFORME COMPONENTE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO**
- Anexo **15.5 INFORME COMPONENTE AMBIENTAL**
- Anexo **15.6 INFORME COMPONENTE GESTION SOCIAL**
- Anexo **15.7 INFORME COMPONENTE TOPOGRAFICO**
- Anexo **15.8** Certificados de materiales utilizados en obra
- Anexo **15.9 INFORME COMPONENTE ELÉCTRICO**
- Anexo **15.10 INFORME COMPONENTE ESTRUCTURAL**
- Anexo **15.11 INFORME COMPONENTE PAVIMENTOS**

16. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

16.1 Aspectos Técnicos y de Control de Calidad

- **Monitoreo del Lote 1 (Contrato de Obra No. 2379 del 2026):** Se constató la ejecución física enfocada en demoliciones de concreto (4,500m2) programados), excavaciones mecánicas para cajeo de vía (604.80 m3) ejecutados en el periodo), así como la extensión del geodrén tubular de 4" (68.00 ml) y el armado e instalación de 443.72 kg de acero de refuerzo PDR-60 para la fundición de 12 sumideros en concreto de 3,000 PSI.

- **Ensayos de Laboratorio y Compactación:** Se validaron los niveles de compactación en campo mediante el método del cono y arena en zanjas de redes sanitarias ejecutadas por *Ingeolab SAS*, reportando porcentajes de compactación del terreno entre el 93.3% y el 96.4%, los cuales se encuentran alineados a las curvas del ensayo Proctor Modificado de la cantera Totumo (densidad seca máxima de 1.996 g/cm3 para recebo fino y 2.045 g/cm3 para recebo grueso).

- **Control del Concreto en Lote 2:** Para el Contrato de Obra No. 2380 del 2026, la interventoría avaló los ensayos de resistencia a la compresión de cilindros tomados en el Tramo 2 y Muro PZ 1 (ejecutados por *Ingeolab SAS*), confirmando que las mezclas de3,000 PSI (diseño de 210 kg/cm2) y 4,000 PSI (diseño de 280 kg/cm2) alcanzaron un óptimo desempeño de rotura a los 7 y 14 días, registrando hasta un 115% de la resistencia esperada.

16.2 Control de Tiempos y Programación

- **Alertas de Rendimiento en Lote 1:** Transcurridos 90 días de los 300 días calendario del plazo inicial, el Consorcio Infraestructura Vial Salado 2026 registra un **tiempo transcurrido del 30%**. Técnicamente se evidencia un desfase físico-financiero crítico: el avance programado para el periodo debía ser del 13.86%, pero el avance real ejecutado acumulado se situó en el **12.00%**. Se recomienda formalmente al contratista incrementar los frentes de trabajo mecánicos y de personal para corregir este retraso del -1.86% antes de agotar los 210 días restantes.

- **Rendimiento Excepcional en Lote 2:** Con 90 días transcurridos de un plazo total de 420 días calendario (21.4% del tiempo), el Consorcio Obras Especiales Hidrosanitarias Ibagué registra un avance programado del 8.88% frente a un **avance real ejecutado acumulado del 22.17%**. Esto representa un sobrecumplimiento del +13.29% impulsado por la rapidez en la instalación de tuberías de alcantarillado estructurado (como el diámetro de 33" con 1,269.18 ml instalados). Se aconseja mantener este ritmo de cajeo y relleno aprovechando las condiciones climáticas secas reportadas en la zona.

16.3 Gestión Financiera y de Anticipos

- **Amortización de Recursos:** La interventoría confirma que el estado financiero de los anticipos asignados se encuentra en un **0% de amortización** debido a que no se han generado ni pagado actas parciales de obra durante este periodo.

- **Saldos por Amortizar:** Los saldos en las cuentas bancarias destinadas a los anticipos se mantienen intactos y bajo estricta vigilancia de la interventoría, totalizando **$4,330,702,236.00** para el Lote 1 y **$6,412,777,255.80** para el Lote 2. Se insta a los contratistas a radicar los cortes de obra correspondientes para iniciar los descuentos de ley y las amortizaciones técnicas en las próximas actas.

16.4 Recomendaciones de Seguridad Industrial (SST) y Componente Social

- **Garantia de Sostenibilidad Laboral:** Se corroboró mediante planillas de control que el contratista cumple con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral del personal operativo (salud, pensión, ARL, CCF y parafiscales). Se exige de manera perentoria mantener el suministro y uso obligatorio de los Elementos de Protección Personal (EPP) y la señalización móvil tipo trípode en los frentes abiertos sobre la Avenida Ambalá para mitigar el riesgo de accidentes peatonales o vehiculares.

- **Plan de Manejo de Tránsito (PMT):** Ante el alto volumen de excavaciones a cielo abierto y el cargue continuo de sobrantes en volquetas deblotroque (como las unidades Kenworth, Fotón y Hino identificadas en las inspecciones de equipos), se solicita al contratista del Lote 2 optimizar los canales de desvío aprobados por la Secretaria de Movilidad, asegurando que las actividades de fresado asfáltico (439.24 m3) en el periodo) no bloqueen los accesos a los sectores comerciales y de grandes superficies (como el supermercado Tiendas Ara del sector).

ING. LIZETH MARCELA CIFUENTES TORRES
FIRMA R.L CONSORCIO REDES VIALES

ING. FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ
FIRMA ING. RESIDENTE

CONSORCIO REDES VIALES
NIT. 902.052.366 - 5

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº 2381 DE 2026

6.1 Informe ejecutivo mensual de interventoría - LOTE 1

CONSORCIO REDES VIALES

	6.1 INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Versión	Código	
Alcaldía Municipal Ibagué	CONSTRUCCION, OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ACTIVIDADES DE RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y LOTE 2	1		

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORME No.	3	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	21 de Junio al 21 de Julio de 2026
OBJETO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION, OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ACTIVIDADES DE RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y LOTE 2		
LOCALIZACIÓN	IBAGUE - TOLIMA		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	2381 del 8 de Abril de 2026	CONTRATO No.:	2379 del 8 Abril de 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO REDES VIALES	CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL SALADO 2026
PLAZO INICIAL:	Catorce (14) Meses	PLAZO INICIAL:	Diez (10) Meses
PLAZO ADICIONAL:	N/A	PLAZO ADICIONAL:	N/A
FECHA DE INICIACIÓN:	Veinte (20) de Abril 2026	FECHA DE INICIACIÓN:	Veinte (20) de Abril 2026
*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A	*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	Treinta (30) de Noviembre de 2027	FECHA DE TERMINACIÓN:	Veinte (20) de Febrero de 2026
PLAZO ACTUALIZADO:	Catorce (14) Meses	PLAZO ACTUALIZADO:	Diez (10) Meses
VALOR INICIAL:	$ 1.745.988.891,00	VALOR INICIAL:	$ 14.435.674.120,00
VALOR ADICIONE(S):	$ -	VALOR ADICIONE(S):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.745.988.891,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 14.435.674.120,00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 1.745.988.891,00	VALOR POR PAGAR:	$ 14.435.674.120,00

2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS


CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR ASEGURADO	CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR ASEGURADO
POLIZA Nº 21-44-101485801	DESDE	HASTA		**POLIZA Nº I - 100055345**	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	22/04/26	22/10/27	$ 174.398.590,00	CUMPLIMIENTO	23/04/26	23/06/27	$ 1.443.567.412,00
PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	22/04/26	22/06/30	$ 87.279.295,00	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	23/04/26	23/06/27	$ 4.330.702.236,00
CALIDAD DEL SERVICIO	22/06/27	22/06/32	$ 349.117.179,00	PRESTACIONES SOCIALES	23/04/26	23/02/30	$ 721.783.706,00
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	23/02/27	23/02/32	$ 2.887.134.824,00
POLIZA Nº				**POLIZA Nº I -100014515**			
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL				RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	23/04/26	23/02/27	$ 721.783.706,00

3. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE OBRA		
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
Acta parcial 01			Anticipo		$ 4.330.702.236,00
Acta parcial 02			Acta parcial 01		
Acta parcial 03			Acta parcial 02		
Acta parcial 04			Acta parcial 03		
			Acta parcial 04		

67

4. CURVA "S"

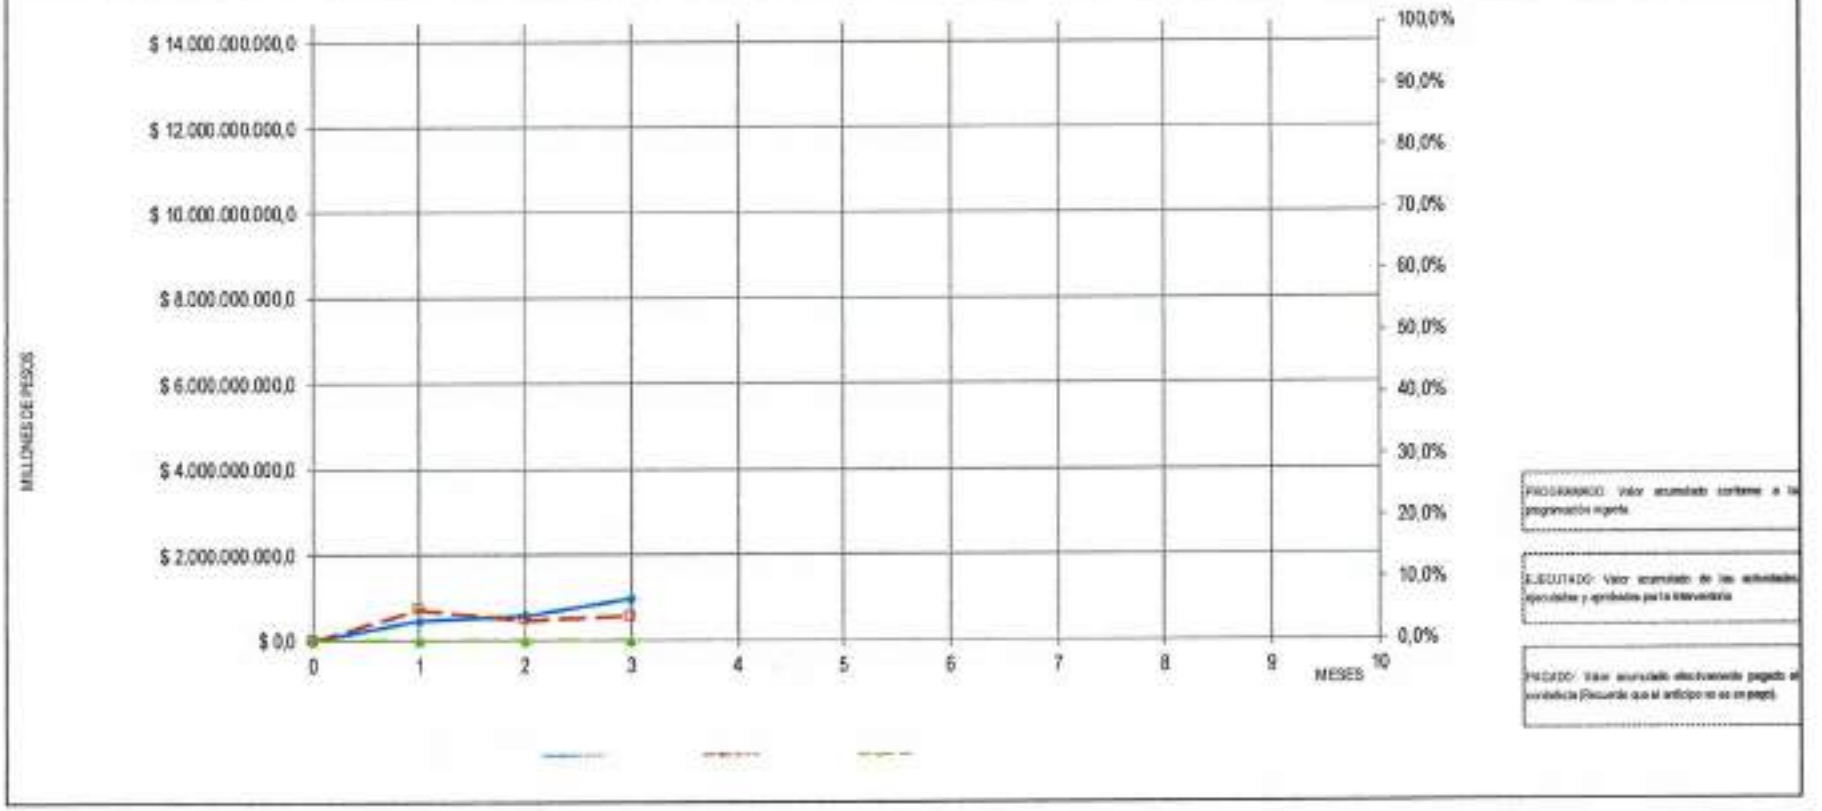

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

6. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Los trabajos se continuan realizando con bajo rendimiento en todas las actividades contractuales.

LIZETH MARCELA CIFUENTES TORRES
R.L. CONSORCIO REDES VIALES

68

CONSORCIO REDES VIALES
NIT. 902.052.366 - 5

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº 2381 DE 2026

6.1 Informe ejecutivo mensual de interventoría - LOTE 2

CONSORCIO REDES VIALES

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORME No.	3	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	21 de Junio al 21 de Julio de 2026
OBJETO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION, OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ACTIVIDADES DE RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y LOTE 2.		
LOCALIZACIÓN	IBAGUE - TOLIMA		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	2381 del 8 de Abril de 2026	CONTRATO No.:	2380 del 8 Abril de 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO REDES VIALES	CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS ESPECIALES HIDROSANITARIAS IBAGUE
PLAZO INICIAL:	Catorce (14) Meses	PLAZO INICIAL:	Catorce (14) Meses
PLAZO ADICIONAL	N/A	PLAZO ADICIONAL	N/A
FECHA DE INICIACIÓN:	Veinte (20) de Abril 2026	FECHA DE INICIACIÓN:	Veinte (20) de Abril 2026
*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A	*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	Treinta (30) de Noviembre de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	Veinte (20) de Febrero de 2028
PLAZO ACTUALIZADO:	Catorce (14) Meses	PLAZO ACTUALIZADO:	Catorce (14) Meses
VALOR INICIAL :	$ 1.745.565.891,00	VALOR INICIAL :	$ 20.475.924.186,00
VALOR ADICION(ES):	$ -	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.745.565.891,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 20.475.924.186,00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 1.745.565.891,00	VALOR POR PAGAR:	$ 20.475.924.186,00

2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS


CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR ASEGURADO	CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR ASEGURADO
POLIZA Nº 21-44-101405801	DESDE	HASTA		**POLIZA Nº 25- 44- 101213356**	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	22/04/26	22/10/27	$ 174.558.590,00	CUMPLIMIENTO	22/04/26	22/12/27	$ 2.047.592.418,60
PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	22/04/26	22/06/30	$ 87.279.295,00	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	22/04/26	22/12/27	$ 6.124.777.255,80
CALIDAD DEL SERVICIO	22/09/27	22/06/32	$ 349.117.179,00	PRESTACIONES SOCIALES	22/04/26	22/09/30	$ 1.023.796.209,00
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	5 años		$ 4.095.184.837,20
POLIZA Nº				**POLIZA Nº 25- 40- 101095707**			
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL				RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	22/04/26	22/09/27	$ 1.023.796.209,30

3. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE OBRA		
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
Acta parcial 01			Anticipo		$ 6.412.777.255,80
Acta parcial 02			Acta parcial 01		
Acta parcial 03			Acta parcial 02		
Acta parcial 04			Acta parcial 03		
			Acta parcial 04		

	INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Versión	Código
Alcaldía Municipal Ibagué	CONSTRUCCION, OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ACTIVIDADES DE RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y LOTE 2	1	

4. CURVA "S"

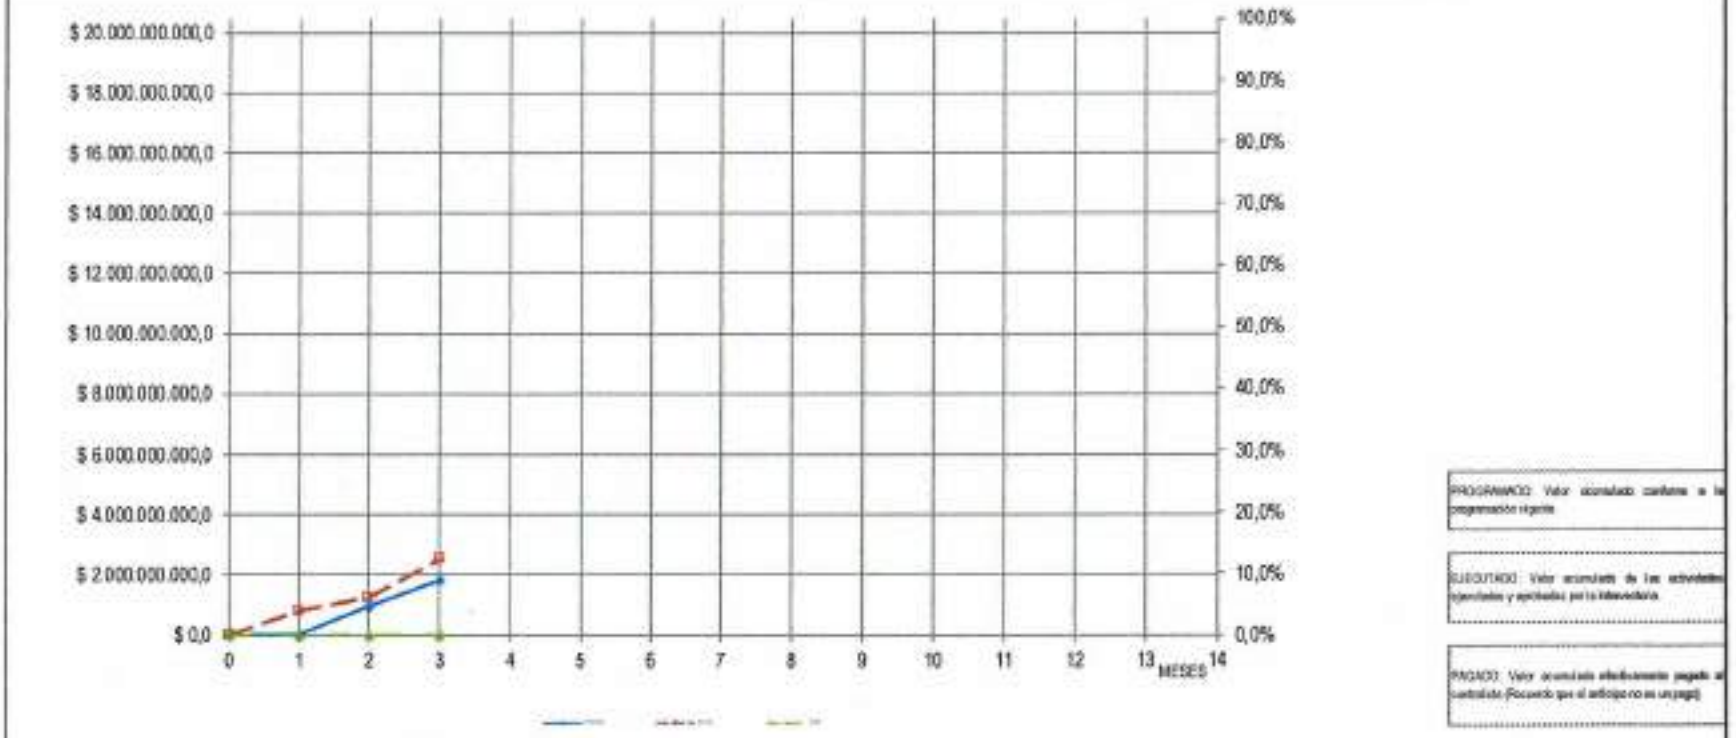

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

6. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Los trabajos se continuan realizando con bajo rendimiento en todas las actividades contractuales.

LIZETH MARCELA CIFUENTES TORRES
R.L. CONSORCIO REDES VIALES

74

CONSORCIO REDES VIALES
NIT. 902.052.366 - 5

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº 2381 DE 2026

6.4 CONTROL DEL PERSONAL CONTRATISTA LOTE 1

CONSORCIO REDES VIALES

Alcaldía de IBAGUÉ

CONTROL DE PERSONAL DEL CONTRATISTA

CONSORCIO REDES VIALES
NIT. 902.052.366 - 5

CONTRATO OBRA: 2380 DEL 08 DE ABRIL DE 2026

CONTRATO INTERVENTORIA: 2381 DEL 08 DE ABRIL DE 2026

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS ESPECIALES HIDROSANITARIAS IBAGUÉ

INTERVENTOR: CONSORCIO REDES VIALES

OBJETO: CONSTRUCCION, OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 2

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION, OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ACTIVIDADES DE RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y LOTE 2.

TRAMO		CARGO	JUNIO 2026								JULIO 2026																					
			23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
LOTE 2	1	INGENIERO RESIDENTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	AUXILIAR DE INGENIERIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	3	SST	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	4	SOCIAL	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	5	TOPOGRAFIA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	6	AMBIENTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	MAESTRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	OFICIAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	9	AYUDANTE	15	15	15	15	15	15	15	15	20	22	22	22	22	22	22	22	24	24	25	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	29
	10	AUXILIAR DE TRAFICO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
SUBTOTAL			27	27	26	26	26	26	26	26	31	33	33	33	33	33	33	33	37	37	38	40	40	41	41	41	41	41	41	41	41	43
TOTAL PERIODO																																

OBSERVACIONES

Vo.Bo.

REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORÍA /

CONSORCIO REDES VIALES
NIT. 902.052.366 - 5

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº 2381 DE 2026

6.4 CONTROL DEL PERSONAL CONTRATISTA LOTE 2

CONSORCIO REDES VIALES

Alcaldía de IBAGUÉ

CONTROL DE PERSONAL DEL CONTRATISTA

CONSORCIO REDES VIALES
NIT. 902.052.366 - 5

CONTRATO OBRA: 2379 DEL 08 DE ABRIL DE 2026	**CONTRATO INTERVENTORIA:** 2381 DEL 08 DE ABRIL DE 2026
CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL SALADO 2026	**INTERVENTOR:** CONSORCIO REDES VIALES
OBJETO: CONSTRUCCION, OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1	**OBJETO:** INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION, OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ACTIVIDADES DE RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y LOTE 2.

TRAMO		CARGO	JUNIO 2026								JULIO 2026																						
			23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
LOTE 1	1	INGENIERO RESIDENTE	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	2	AUXILIAR DE INGENIERIA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	3	SST	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	4	SOCIAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	5	TOPOGRAFIA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	6	AMBIENTAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	7	MAESTRO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	8	OFICIAL	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	9	AYUDANTE	19	19	19	19	19	19	19	19	22	22	22	22	22	22	22	22	22	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
	10	AUXILIAR DE TRAFICO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
SUBTOTAL			40	40	40	40	40	40	40	40	43	43	43	43	43	43	43	43	43	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
TOTAL PERIODO																																

OBSERVACIONES

Vo.Bo.

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA /

CONSORCIO REDES VIALES
NIT. 902.052.366 - 5

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº 2381 DE 2026

6.5 CONTROL MAQUINARIA Y EQUIPOS CONTRATISTA - LOTE 1

CONSORCIO REDES VIALES

CONTROL DE EQUIPOS DEL CONTRATISTA

CONTRATO OBRA: 2379 DEL 08 DE ABRIL DE 2026

CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL SALADO 2026

OBJETO: CONSTRUCCION, OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1

CONTRATO INTERVENTORIA: 2351 DEL 08 DE ABRIL DE 2026

INTERVENTOR: CONSORCIO REDES VIALES

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION, OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ACTIVIDADES DE RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y LOTE 2.

OBRA		EQUIPO TIPO, MARCA, CAPACIDAD	(A) ORIGEN	(B) ESTADO	JUNIO 2026								JULIO 2026																					
					23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
MAQUINARIA																																		
LOTE 1	1	RETROEXCAVADORA	P	B	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	2	EXCAVADORA	P	B	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	3	VIBRO COMPACTADOR	P	B	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	4	SALTARIN - CANGURO	P	B	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	5	FRESADORA	P	B	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	6	COMPRESOR	P	B	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Vo.Bo.

REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA /

CONSORCIO REDES VIALES
NIT. 902.052.366 - 5

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº 2381 DE 2026

6.5 CONTROL MAQUINARIA Y EQUIPOS CONTRATISTA - LOTE 2

CONSORCIO REDES VIALES

CONTROL DE EQUIPOS DEL CONTRATISTA

CONTRATO OBRA: 2380 DEL 08 DE ABRIL DE 2026

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS ESPECIALES HIDROSANITARIAS IBAGUÉ

OBJETO: CONSTRUCCION, OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 2

CONTRATO INTERVENTORIA: 2381 DEL 08 DE ABRIL DE 2026

INTERVENTOR: CONSORCIO REDES VIALES

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION, OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ACTIVIDADES DE RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y LOTE 2.

OBRA		EQUIPO TIPO, MARCA, CAPACIDAD	(A) ORIGEN	(B) ESTADO	JUNIO 2026								JULIO 2026																					
					23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
MAQUINARIA																																		
LOTE 2	1	RETROEXCAVADORA	A	B	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	EXCAVADORA	P	B	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	3	MEZCLADORA	A	B	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	4	SALTARIN - CANGURO	P	B	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	5	FRESADORA	A	B	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	6	PULIDORA	P	B	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Vo.Bo.

REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORÍA /

CONSORCIO REDES VIALES
NIT. 902.052.366 - 5

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº 2381 DE 2026

7.1 Control diario del estado del tiempo - LOTE 1

CONSORCIO REDES VIALES

	7.1 CONTROL DIARIO DEL ESTADO DEL TIEMPO	Versión	Código	
Alcaldía Municipal Ibagué	CONSTRUCCION, OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ACTIVIDADES DE RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y LOTE 2	1		

INFORMACIÓN GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL: 21 JUNIO AL 21 JULIO 2026 PLAZO: DIEZ (10) MESES

CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL SALADO 2026 — CONTRATO No. 2379 del 8 Abril de 2026

INTERVENTOR: CONSORCIO REDES VIALES — CONTRATO No. 2381 del 8 Abril de 2026

ESTADO DEL TIEMPO

FECHA	JUNIO										JULIO																		OBSERVACIONES
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
MAÑANA	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
TARDE	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	

CUADRO DE CONVENCIONES	
TIEMPO SECO	SC
DIA SOLEADO	S
LLOVIZNAS	LI
LLUVIAS FUERTES	LL

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

Durante el periodo objeto del presente informe, las condiciones meteorológicas en el área de intervención fueron predominantemente soleadas y secas, sin presencia de lluvias, lo que permitió desarrollar las actividades de obra de manera continua y sin afectaciones asociadas a condiciones climáticas adversas.

LIZETH MARCELA CIFUENTES TORRES
R.L. CONSORCIO REDES VIALES

81

CONSORCIO REDES VIALES
NIT. 902.052.366 - 5

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº 2381 DE 2026

7.1 Control diario del estado del tiempo - LOTE 2

CONSORCIO REDES VIALES

	7.1 CONTROL DIARIO DEL ESTADO DEL TIEMPO	Versión	Código	
Alcaldía Municipal Ibagué	CONSTRUCCION, OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ACTIVIDADES DE RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y LOTE 2	1		

INFORMACIÓN GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL: 21 JUNIO AL 21 JULIO 2026 PLAZO: CATORCE (14) MESES

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS ESPECIALES HIDROSANITARIAS IBAGUÉ — CONTRATO No. 2380 del 8 Abril de 2026

INTERVENTOR: CONSORCIO REDES VIALES — CONTRATO No. 2381 del 8 Abril de 2026

ESTADO DEL TIEMPO

FECHA	JUNIO										JULIO																			OBSERVACIONES
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
MAÑANA	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
TARDE	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	

CUADRO DE CONVENCIONES	
TIEMPO SECO	SC
DIA SOLEADO	S
LLOVIZNAS	LL
LLUVIAS FUERTES	LL

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA: Durante este perdido se realizaron actividades con normalidad predominantemente soleadas y secas, favorables para la ejecución de las actividades constructivas con normalidad.

LIZETH MARCELA CIFUENTES TORRES
R.L. CONSORCIO REDES VIALES

CONSORCIO REDES VIALES
NIT. 902.052.366 - 5

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº 2381 DE 2026

14.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO. -LOTE 1

CONSORCIO REDES VIALES

NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION, OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ACTIVIDADES DE RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y LOTE 2
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	IBAGUE - TOLIMA
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA No.:	CONSORCIO REDES VIALES
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	2381 del 8 de Abril de 2026
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL SALADO 2026
CONTRATO DE OBRA No.:	2379 del 8 de Abril de 2026

LOTE 1

- **DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO**







Registro fotográfico de ejecución del proyecto. INFORME No 3

- **CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES EN ESCOMBRERA AUTORIZADA**








-EXCAVACIÓN A MÁQUINA(CAJEO)





Registro fotográfico de ejecución del proyecto. INFORME No 3

- **CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE – CBR 95% ZONA URBANA**



- **ACERO DE REFUERZO FIGURADO E INSTALADO PDR: 60**





- **SUMIDERO EN CONCRETO 3.000 PSI, INCLUYE REJILLA VIBROCOMPACTADA DE 1,05 x 0,46 M**






Registro fotográfico de ejecución del proyecto. INFORME No 3

ACUEDUCTO

- **EXCAVACIONES A MÁQUINA EN MATERIAL COMÚN Y CONGLOMERADO DE 0 A 2 M**











Registro fotográfico de ejecución del proyecto. INFORME No 3

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LECHO EN ARENA PARA TUBERÍA





- **TUBERIA DE 4"**




Registro fotográfico de ejecución del proyecto. INFORME No 3

- **TUBERIA DE 8"**





- **FILTRO EN GEODRÉN TUBULAR DE 4" – H = 0,60 M**





- **CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION D=1,2M**





Registro fotográfico de ejecución del proyecto. INFORME No 3

CONSORCIO REDES VIALES
NIT. 902.052.366 - 5

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº 2381 DE 2026

14.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO. -LOTE 2

CONSORCIO REDES VIALES

NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION, OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ACTIVIDADES DE RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y LOTE 2
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	IBAGUE - TOLIMA
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA No.:	CONSORCIO REDES VIALES
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	2381 del 8 de Abril de 2026
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO OBRAS ESPECIALES HIDROSANITARIAS IBAGUÉ
CONTRATO DE OBRA No.:	2380 del 8 de Abril de 2026

LOTE 2

- **CERRAMIENTO EN TELA VERDE H= 2.10**





- **CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES EN ESCOMBRERA AUTORIZADA**








- **SUMINISTRO DE RECEBO EN ZANJA COMPACTADO CADA 15 CM POR MEDIO MECÁNICO -ALCANTARILLADO**









Registro fotográfico de ejecución del proyecto. INFORME No 3

- **EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL COMÚN Y CONGLOMERADO DE 0 A 2,00 M**







- **EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMÚN Y CONGLOMERADO DE 0 A 2,00 M**





Registro fotográfico de ejecución del proyecto. INFORME No 3

- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PLÁSTICA O LISA PVC PARED ESTRUCTURAL**

TUBERÍA DE DIÁMETRO DE 33"



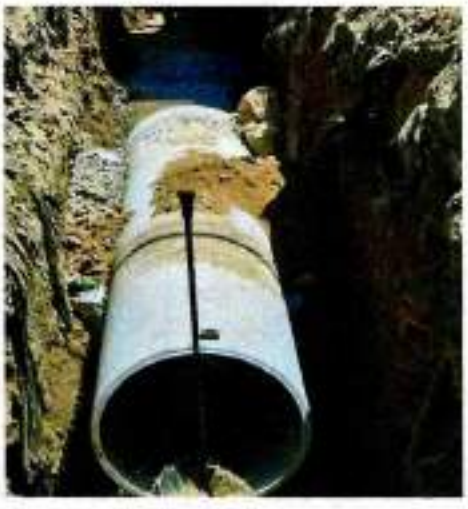

Registro fotográfico de ejecución del proyecto. INFORME No 3







TUBERÍA DE DIÁMETRO DE 10"

TUBERÍA DE DIÁMETRO DE 6"





Registro fotográfico de ejecución del proyecto. INFORME No 3

- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN LECHO EN GRAVA PARA CAMA DE TUBERÍA D= 1/2 A ¾**








- **CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN D=1,2M**





Registro fotográfico de ejecución del proyecto. INFORME No 3

- **ENTIBADO TIPO 1A (DISCONTINUO EN MADERA)**







ACUEDUCTO TUBERIA 3"





Registro fotográfico de ejecución del proyecto. INFORME No 3

- **FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO, INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL**






Registro fotográfico de ejecución del proyecto. INFORME No 3

CONSORCIO REDES VIALES
NIT. 902.052.366 - 5

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº 2381 DE 2026

15.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

CONSORCIO REDES VIALES

	15.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	Versión	Código	
Alcaldía Municipal Ibagué	CONSTRUCCION, OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ACTIVIDADES DE RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y LOTE 2	1		

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA PERIODO DEL: 21 Junio al 21 julio de 2026
NUMERO DE CONTRATO:	2381 del 06 Abril de 2025
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION, OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ACTIVIDADES DE RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y LOTE 2.
CONTRATISTAS:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL SALADO 2026 - CONSORCIO OBRAS ESPECIALES HIDROSANITARIAS IBAGUÉ
INTERVENTOR:	CONSORCIO REDES VIALES
SUPERVISOR:	FREDY PINCON

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
22/06/26		Solicitud cambio de tapa de vito expuestas en pavimentos	CONSORCIO REDES VIALES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
22/06/26	OFICIO- CRV-056-2026 LOTE 2	Respuesta a oficio de fecha 19 junio 2026 -Respuesta a Requerimientos técnicos OFICIO CRV-052-2026 LOTE 2	CONSORCIO REDES VIALES	CONSORCIO OBRAS ESPECIALES HIDROSANITARIAS IBAGUÉ
23/06/26	OFICIO- CRV-057-2026 LOTE 2	Requerimiento por incumplimientos el PMT aprobado y afectaciones a la movilidad peatonal	CONSORCIO REDES VIALES	CONSORCIO OBRAS ESPECIALES HIDROSANITARIAS IBAGUÉ
23/06/26	OFICIO- CRV-058-2026 LOTE 2	Solicitud de atención a requerimientos ambientales	CONSORCIO REDES VIALES	CONSORCIO OBRAS ESPECIALES HIDROSANITARIAS IBAGUÉ
23/06/26	OFICIO- CRV-059-2026 LOTE 2	Respuesta y viabilidad técnica condicionada a la propuesta de construcción de rampa de ubicación/ancho temporal — Costado izquierdo Av. Ambalá entre calles 153 y 155 (Lote 2).	CONSORCIO REDES VIALES	CONSORCIO OBRAS ESPECIALES HIDROSANITARIAS IBAGUÉ
23/06/26	OFICIO- CRV-060-2026 LOTE 1	Convocatoria a recorrido de obra para revisión y definición de temas relacionados con la red de acueducto Fase 1	CONSORCIO REDES VIALES	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL SALADO 2026
24/06/26	OFICIO-CNS-026-2026	Ratificación URGENTE de solicitud de suministro del ISM, y precisa técnicos para el suministro e instalación de la red de acueducto complementario entre la Calle 153 y la Calle 152.	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL SALADO 2026	CONSORCIO REDES VIALES
24/06/26	OFICIO-CNS-029-2026	Poder especial de representación	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL SALADO 2026	CONSORCIO REDES VIALES
24/06/26		Solicitud urgente de punto provisional de recolección de residuos por contingencia de obra y cierre vial en la calzada de Ibagué sector de la Avenida Ambalá, comprendido entre las calles 156 y 153.	CONSORCIO OBRAS ESPECIALES HIDROSANITARIAS IBAGUE	INTERASEO E.A. E.S.P.
25/06/26	OFICIO- CRV-061-2026 LOTE 1	Ejecución de la red de acueducto complementario de 12" – Acueducto Complementario Fase 1.	CONSORCIO REDES VIALES	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL SALADO 2026
27/06/26	OFICIO CNS-031-2026	Solicitud de definición de acometidas domiciliarias de acueducto para conexión a la red instalada en el sector Fontanilla	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL SALADO 2026	CONSORCIO REDES VIALES
27/06/26	OFICIO CNS-032-2026	Reclamación contractual formal por incumplimiento de obligaciones a cargo del Municipio, relativas a la planeación, interferencia no prevista del Contrato GML No. 105 de 2026, afectación del frente de obra Calle 153 - 152 con Avenida Ambalá, solicitud de restablecimiento de la ecuación económica y solicitud de indemnización integral de perjuicios o terminación anticipada bi-determinada.	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL SALADO 2026	GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
30/06/26	OFICIO- CRV-062-2026 LOTE 1	Solicitud de entrega del Informe No. 2 de avance de obra y requerimiento de documentación técnica pendiente.	CONSORCIO REDES VIALES	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL SALADO 2026
30/06/26	OFICIO- CRV-063-2026 LOTE 2	Solicitud de entrega del Informe No. 2 de avance de obra y requerimiento de observaciones y documentación técnica pendientes.	CONSORCIO REDES VIALES	CONSORCIO OBRAS ESPECIALES HIDROSANITARIAS IBAGUÉ
10/07/26	OFICIO- CRV-064-2026 LOTE 2	Reiteración de requerimiento e implementación inmediata de medidas correctivas.	CONSORCIO REDES VIALES	CONSORCIO OBRAS ESPECIALES HIDROSANITARIAS IBAGUÉ
14/07/26	OFICIO- CRV-065-2026 LOTE 2	Solicitud de implementación inmediata de medidas para el control de emisiones de material particulado (polvo).	CONSORCIO REDES VIALES	CONSORCIO OBRAS ESPECIALES HIDROSANITARIAS IBAGUÉ
14/07/26	OFICIO- CRV-066-2026 LOTE 2	Reiteración de solicitud de presentación de los Informes Mensuales Ambientales No. 1 y No. 2.	CONSORCIO REDES VIALES	CONSORCIO OBRAS ESPECIALES HIDROSANITARIAS IBAGUÉ
14/07/26	OFICIO- CRV-067-2026 LOTE 2	Convocatoria urgente a mesa técnica – revisión seguimiento a programación de obras.	CONSORCIO REDES VIALES	CONSORCIO OBRAS ESPECIALES HIDROSANITARIAS IBAGUÉ
14/07/26	OFICIO- CRV-068-2026 LOTE 2	Socialización, traslado y notificación de determinaciones técnicas avaladas en la Mesa de Trabajo y reinicio de obra del 10 de julio de 2026 – Contrato de Obra Lote 2.	CONSORCIO REDES VIALES	CONSORCIO OBRAS ESPECIALES HIDROSANITARIAS IBAGUÉ
15/07/26	OFICIO- CRV-069-2026 LOTE 2	Observaciones al Informe Mensual SST No. 2 y requerimiento de cumplimiento.	CONSORCIO REDES VIALES	CONSORCIO OBRAS ESPECIALES HIDROSANITARIAS IBAGUÉ

Firma:

Nombre: LIZETH MARCELA CIFUENTES TORRES
R.L. CONSORCIO REDES VIALES

CONSORCIO REDES VIALES
NIT. 902.052.366 - 5

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº 2381 DE 2026

15.2 BITACORA OBRA

CONSORCIO REDES VIALES

	Excavacion para tubera de acueducto, se realizo instalacion de cuatro tubos de 6" para acueducto. frente al conjunto Fontanella, se notifica por parte de interventoria la no aprobacion de dicha tubera debido a que no fue lo que se definio durante el recorrido
19/06/2026 Mariana Martinez Ing Civil Interventoria	Excavación, instalación llenó y compactado para Tubera de 16" red residual. Se realiza sobre excavación debido a que por el tramo se encontro tubo de cemento de 8" de acueducto que interfere en la instalación de la tubera 16.10+6 Demolición de pozo existente de red residual, autorizado previamente la suspensión -Excavacion manual para instalación de domiciliaria residual tubera de 6" - 1 Tubo.
	* Demolicion de concreto de orden para Ubicación de caja Sanitaria
	* Apiques para ubicación de tubo de acueducto de 8" * Limpieza y excavacion manual de zanja para red de acueducto * Se hizo retiro de tubería de 6" de red de acueducto que no fue autorizado por interventoria No se realizo trabajo de campo el dia 20 de junio Por festivo a elecciones Presidenciales se extendio horario del 16 al 19 de junio de 7:00 AM a 5:00PM
21/06/2026	Excavación, instalacion llenó y compactado para red residual tubera de 16" 2 Tubos
	Apique para ubicación de red de acueducto
Mariana Martinez Ing civil Interventoria	Excavacion manual para zanja de red de acueducto
	Fundida de caja domiciliaria

Scanned with CamScanner

23/06/2026	Armado de acero con varilla de 1/2 longitudinal a cada 4 y 3/4 transversal, cada 20cm, se engrapa y funde dos cajas de sumideros - se solicita diseño de mezcla
	Realizacion de apiques para exploracion de linea de acueducto
	Se realiza instalacion de tres valvulas en red de acueducto existente ubicadas así: KO+003 - Valvula 4" KO+309 - Valvula 4" KO+575 - Valvula 6"
	Excavacion, instalacion llenos y compactado para tubera de 16" de red de alcantarillado 3163 - Fundida de tapas para cajas domiciliarias - Se realiza reparacion a tubera de red de aguas lluvias instalada posteriormente, se excavo y se realizo dado
24/06/2026	Excavación, instalacion, llenos y compactado para tubera de 16" de red residual, se instala silla ye para domiciliaria 17 m
	Se realizaron apiques por la zona de lote 2 masa para ubicar red de acueducto de 12", se halla caja electrica de celsia y tubera de asbesto cemento de 4" de agua y una tubera de gas
	Resane de pozo 9A de red residual
	Excavacion manual para pozo 3A de red de lluvias e instalacion de tubera de 18" para sumideros 2 Und

Mariano Martinez
Ing. Civil
Interventoria

Scanned with CamScanner

Excavacion manual para red de acueducto
Fuertes lluvias durante la mañana hasta la 10:30 am

25/06/2026 Excavacion, instalacion, lleno y compactacion de 7.1m de tubería de 16" de red residual, se instala silla Te

Excavacion para instalación de tubería de 14" desde el pozo del lote 3 hasta la red residual. se cuenta para instalacion la construccion de un nuevo pozo debido a que el planteamiento inicial se interfiere con la caja electrica halada y la tubería de 12" de acueducto que atraviesa el sector.

Ing Residente Constructora

Continuacion de excavacion manual para red de acueducto, se realizo instalación de tubería de 4" para acueducto desde la abscisa K0+110 al K0+230 instalacion de doble tubería haciendo reposicion a lo excavado, se realizo prueba de presion hidrostatica se encargo al contratista realizar informe de prueba a interventoria, y entrega.

Ing Civil Interventoria

Construccion de pozo 3A de red de aguas lluvias

Nota: se extendio horario de trabajo hasta la 1:00 pm a consecuencia de la pruebas realizadas a la tubería de acueducto

26/06/2026 Excavacion para tubería de 16" de red residual se halla un pozo que se encontraba tapado con la carpeta asfaltica, se halla tubo de 6" de domiciliaria, y durante la excavacion se halla tubo de 10" correspondiente a una domiciliaria sanitaria del separador subterraneo, no se encontraba conectado con silla ye si no directamente a la red. se encuentra tambien 3 redes domiciliarias de acueducto

Scanned with CamScanner

	2 de 3/4 1 en manguera de 1/2, se verifica con los materiales de los predios cumpliendo
	Instalacion de tubo de 14" red residual del lote a pozo 1 tubo
	Construccion de pozo 19 de red de lluvias
	Ubicacion de caja domiciliaria -Excavacion manual para red de acueducto, se realiza instalacion de doble tuberia de 4" hasta la casa KOT300
27/06/2026	Limpieza de pozos y terminacion de pozo 19 de red agua lluvias
	-Excavacion, instalacion y llenado para tuberia de 14" de red residual desde el lote a pozo 1 tubo
	-Relleno de zanja de excavacion de red de acueducto de 4", se realiza compactacion -Excavacion manual para ubicacion de red domiciliaria, se deja constancia de que segun recorrido y oficio enviado al contratista se notifica realizar exposicion de tuberia de 6" de acueducto para verificar conexiones existentes a esta, para con ello programar visita conel ICBF y confirmar cambio de diametro de tuberia segun lo indicado se remite informacion al contratista
30/06/2026	Excavacion, instalacion y llenado para tuberia de 14" de red residual desde lote a pozo y excavacion manual para pozo 1 tubo -Excavacion, instalacion y llenado para tuberia de 16" de red residual, se aprueba la construccion de un

Scanned with CamScanner

	pozo debido a la domiciliaria que proviene de subpozo en 10", se realiza inspección de caja hallandose tres tubos de entrada 2 de 10" y uno de 8" para lo cual no existe comercialmente silla ye de 10 a 16" para hacer la instalación a red de reposición, realiza reconstrucción de pozo existente 1 tubo
	-Excavación mecanica para red de acueducto desde la abscisa K0+105 a K0+145
	-Excavación manual para caja domiciliaria
	-Continuación limpieza de pozos
	-Apiques para continuar tratado de red de acueducto existente
Mariana Martinez Ing Civil Interventoria	-Armado de acero para sumideros del pozo 7 y soldado
	-Se retiene por parte del contratista aprobación por parte del Ibal (notificación a interventoria) para pozo existente de aguas lluvias en barrio promidas para realizar conexión a la red pluvial construida
	Nota: Para el dia de hoy se tenia programado recorrido con Contratista de la fase 5 de acueducto complementario con interventoria, se hace comunicación con personal quien manifiesta no inicio de labores hasta firma el acta de inicio.
01/03/2016	Excavación, instalación y llano para tubería de 16"
Alcalde mejia Ing civil contratista	de red residual, se hizo instalación de dos silla ye 16 x 8
	Excavación manual para caja domiciliaria y clavadura de ondas para domiciliaria
	-Continuación de excavación y perfilación manual para pozo de red residual (Conexión al Lote)

Scanned with CamScanner

Oswaldo Mejia Ing Civil Contratista	Excavacion, instalacion y lleno de Tuberia de 14" de red residual de pozo existente en lote a red residual. Se hace conexion de tuberia a pozo, se realizo desmonte de cerca y poste en concreto existente en el lote para poder realizar las actividades. — Pag 5
Maritza Martinez Ing Civil Interventoria	Excavacion manual y mecanica para red de acueducto se informa a contratista por parte de interventoria la conexion de tres puntos hidraulicos en el lote Zamosa en manguera de 3/4 distribuir en cada esquina y en el centro del lote. Folio 479 a 480
Oswaldo Mejia Ing Civil Contratista	Realizacion de armado de acero, fundido de solado y concreto para sumideros 2 sumideros - Realizacion de apiques en la 115 para ubicacion y reconocimiento de cajas de inspección de telecomunicaciones - Solado para pozo de red residual
Oswaldo Mejia Ing Civil Contratista	Excavacion manual para pozo de descole de red residual en la 115 - Limpieza de pozos aguas lluvias - Continuacion de excavacion manual para domiciliaria y localizacion de caja domiciliaria - Reconstruccion de pozo de red residual - Lleno y compactacion de pozos de red de lluvias y pozo de red residual - Solado para pozo sanitario (conexion del lote) - Excavacion manual y mecanica para red de acueducto - Armado de acero para Sumidero, e instalacion de Solado 4 sumideros

Scanned with CamScanner

03/07/2026 Residente de obra Ing Civil Contratista	Armado de acero para sumideros y fundida de sumideros - Excavacion mecanica y manual para red de acueducto de 4" - Excavación, instalacion y llenado para tubería de 10" para sumidero en pozo 11 de red de lluvias - Excavacion manual para pozo residual calle 115 y demolicion de anclajes - Cajeo de via desde la abscisa K0+630 a K0+690 - Retiro de postes y luminarias por paso de instalaciones - Relleno y compactacion de red sanitaria y pozos.
01/07/2026 Residente de obra Ing Civil Contratista. Maquinaria Ing auxiliar	Inicio de construccion de pozo residual conexion de lote 2 casa a red principal - Continuacion de cajeo desde la abscisa K0+690 a K0+710 - Excavacion, instalacion y llenado para tubería de 10" de red pluvial a sumideros - Corte y figurado de acero para sumideros - aplicación de solados para sumideros - Excavacion manual y mecanica para red de acueducto de 4" - Continuacion de excavación manual para pozo en la 115 - Limpieza de terreno
06/07/2026 Residente de obra Ing Civil Contratista. Ing civil en formación	Fundido de concreto para sumideros y figurado y armado de acero. - instalacion de tubería de 4" para red de acueducto se realizo pruebas hidrostaticas y de presion 2.1F - 5.1F Replanteo de via para cajeo desde la abscisa K0+630 a K0+710, se continuo con actividades de cajeo en este tramo

Scanned with CamScanner

Auxiliar de Ing Civil Contratista	Nota: Se extiende la jornada de trabajo hasta las 2:30 pm debido a la instalacion y prueba de tubería para la red de acueducto, finalizada la jornada y actividades se abren valvulas dejando habilitado el servicio de agua en la Comunidad.
07/09/2026 Marco Manuel Ing Civil Interventoria	Replanteo de perfil vial desde la abscisa k0+830 A k0+830
Auxiliar de Ing Civil Contratista	Continuación de Cajeo - Demolicion de vial en concreto Sintplata - Terminacion de Construccion de pozo red Sanitaria (Dd cole a red principal) - Llano y compactacion de zanja para tubería de 4" de acueducto -
08/09/2026. Marco Manuel Ing Civil Interventoria	Inicio de Construccion de pozo red residual (Todavia) - Continuacion de excavacion manual para domiciliaria de la 113 a la 115
Auxiliar de Ing Civil Contratista	- Excavacion, instalacion, llano y compactacion de tubería de 10" para Sanitarias 2 tubos - Figurado y armado de acero para Sanitarias - Vaciado de Concreto para Sanitario 1 - Terminación de Cajeo hasta la abscisa k0+830 - Demolicion de anclajes en Concreto
09/09/2026	Continuación excavacion manual para instalación de Tubería para desde de red residual en la calle 115
Auxiliar de Ing Civil Contratista	- Demolicion de anclajes existentes frente el sector de Sintplata - Excavacion manual para instalacion de tubería de 6" para red residual (domiciliaria) 1 tubo - Inicio de excavacion para conexión de pozo existente en la calle 106 bajo pronides a red residual, se realiza dicha conexion por diferencia de cotas desde el una reunion que se obtuvo entre la comunidad y el

Scanned with CamScanner

Oswaldo mejia ing civil contratista

Ibal, para la cual indicaron realizar la conexion del pozo a la red en construcción.
- Continuacion de construccion pozo para red residual frente al sector de Simplatex
- Vaciado de concreto para sumidero

Nota: Se realizo recorrido de obra con el ingeniero medina y David funcionarios del Ibal para determinar actividades correspondientes a la red de acueducto por lo cual se determino lo siguiente:

Yolanda Hernandez Ing civil Interventoria

- Marcar (arreglo de tubería) existente en la via frente a la calle 110; Desmontar la valvula instalada por contratista que se coloco provisionalmente para los cierres con el fin de efectuar el cambio de tubería existente, montar el accesorio en T con reducción de tubería a 4".
- Desplazar la valvula existente de 12" y profundizar la red con el fin de dar cumplimiento a la normatividad

- Demoler la ventana existente de la calle 110 esquina al especial y trasladar y reponer tubería de 8" de acueducto al medio de la red residual y la red pluvial construida hasta la 115. La T existente de la calle 115 trasladarla para que no interfiera con la linea de descole de la red pluvial

Oswaldo mejia ing civil contratista.

- Hacer Cambio de las valvulas existentes de 3" y 4" de la calle 115
- Observacion: Realizo el cambio de todos los accesorios y valvulas y deja localizado en los planos record para que el Ibal entregue información en los bases de datos de ellos. Hacer llegar a interventoria las pruebas hidroestaticas del cambio de tubería realizado desde la abscisa 110+110 a la K0+575

Scanned with CamScanner

10/07/2016 - Excavación e instalacion y llena para tubera de 10" entre pozo de bocacalle 106 a red residual 1 Tubo lagui
- Excavacion, instalación y llena para tubera de 6" red residual domiciliaria 2 tubos
- Relleno y compactacion de excavacion de red residual de 6" para domiciliaria
- Demolicion de andenes
- Instalacion de tubera de 16" para red residual desde la 115 1 tubo
- Adecuacion de sendero peatonal para acceso a viviendas frente a sumpicha

Oswaldo mejia Ing civil contratista

Nota: Se realizo recorrido con el ingeniero Fredy Rincon el cual realizo aprobacion junto con interventoria, construccion de cuna

+ Fernandez

- Se solicito al contratista realizar implantacion topografica del tubo 30 masa con el perfil vial con el fin de verificar area de afectacion para andenes
- Se solicita ir avanzando en pozos, cunuelo e instalacion de pozos en los pozos para programar inspeccion en coordinacion con el Tbol
- Entregar por parte del contratista los resultados de las pruebas hidrostaticas de la red de acueducto desde la abscisa K0+110 a la K0+175

+ Alvaro Ing civil interventoria

Cristian Mejia Ing civil contratista

11/07/2016 Relleno de zanja de tubera de 16" de red residual en desde de la calle 115
- Continuacion de relleno y compactacion de excavacion para domiciliarios
- Limpieza y cargue de material sobrante en la calle 115
- Construccion de cunuelos para pozos de red de lluvias
- Construccion de cuna

Alvaro Ing interventoria

Scanned with CamScanner

14/03/2016 Osvaldo Meza Ing Civil Contratista Yhonny Martinez Ing Civil Interventoria	Excavacion, instalacion y llenado para tubo de 16" red residual 1 Tubo - Terminacion de construccion de pozo residual frente la Surtiplaza - Vaciado de concreto para sumidero - Vaciado de concreto y continuacion de construccion de cajo. - Limpieza y lavado de pozos - Instalacion de tapaderas para casa domiciliaria. - Realizacion de apiques para localizacion de red de acueducto de la 112 a la 115 - Reparacion de pozo red residual existente. Nota: ingreso de personal de contacto para fase 5 de acueducto complementario - Se realiza profundizacion de red electrica del sector surtiplaza
15/03/2016 Osvaldo Meza Ing Civil Contratista Yhonny Martinez Ing Civil Interventoria	Excavacion, instalacion y llenado para tubos de 16' de red residual - Replanteo para red de acueducto de 8" desde la calle 110 hasta la 115. Red que se trasladara con aprobacion del Ibal entre la linea de red residual y red pluvial - Realizacion de inspeccion de pozos y tubos de la red residual y red pluvial con videorobot para parte del Ibal. Solicito interventoria los resultados y reporte de la inspecion para aprobacion y validacion de redes - Continuacion de apique (Aprox 10 m sobre costado izquierdo de via de la 112 a la 115 para localizacion de red de acueducto existente de 4' - Excavacion manual para S de acueducto de 8" - Vaciado de concreto para casas domiciliarias

Scanned with CamScanner

Oswaldo Mejia Ing Civil Contratista

- Vaciado de concreto para sumideros 3
- Limpieza de terreno
- Limpieza de pozos

Nota: Se recibe inicio de instalación de Tubería de 12" HD para Acueducto Complementario Fase 5 Contrato N° 106 de 2026 que tiene como objeto: "Contratar las Obras necesarias para la construcción de la Fase 5 del Acueducto Complementario del Municipio de Ibagué" Es de aclarar que el presente contrato no tiene alcance dentro del contrato de obra Sin embargo interfiere en las actividades y en la conformación de la estructura de la vía para lo cual como interventoría se solicita hacer llegar los certificados de materiales y pruebas correspondientes

Honorio Hernandez Ing Civil Interventoría

16/07/2026

Oswaldo Mejia Ing Civil Contratista

- Limpieza de Tubería y pozos
- Armado de acero y vaciado de concreto para pozos Sumideros
- Continuación de inspección de pozos y tubería de red residual y red pluvial en video robot por parte de la empresa Ibal. Se deja constancia que al momento de dicha inspección los pozos no se encuentran totalmente acabados, hace falta panete, instalación de pozos y Cañuelas en algunas, Se recomienda por parte de interventoría recibir dichas actividades con prontitud y hacer entrega de informe de inspección
- Inicio de Excavación mecánica para red de acueducto de 8" y 3" desde la 115 hacia arriba
- Continuación de excavación manual para acueducto de 8"

Honorio Hernandez Ing Civil Interventoría

Scanned with CamScanner

Oscar Alejo Mejía Ing Civil Contratista	Se realizo recorrido de obra con el supervisor del Contrato el ing Freddy Rincon y el ingeniero Marco Matheus Saavedra Secretario de Infraestructura durante el recorrido se dejaron lo siguiente - Verificar documentos legales del propietario de lote zanja con el fin de hacer tramite para afectacion de area que se requiere para ejecución de obra, se hace comunicación con representante para indicar actividad a ejecutar. la entidad se encargara de realizar documento legal para formalizar la ejecución de actividades - Se requiere programar reunion con representante (Arquitecto) de la universidad Cooperativa para coordinar actividad de traslado de cerca viva, tramite que realizara la entidad - En coordinación con supervision se requiere el contratista entrega de pruebas hidrostaticas e inspección de todos robot de red residual y pluvial - Se solicita al contratista una modelacion hidraulica desde la 115 a la 125 por entrega a interventoria con el fin de definir diametro de tuberia
Yohana Hoffmet Ing Civil Interventoria	
12/09/2016	Excavacion mecanica e instalación de tubería de 8" y 3" para red de acueducto - Excavacion manual para empalme de tubería de 8" en la 112 - Excavación manual para domiciliaria en la 115 red de Suministro - Se realizo reunion en el area social y los habitantes del costado izquierdo de la calle 112 a la 115 para socializar tema de desmonte de jardines para ejecucion y construccion de andenes
Oscar Mejía Ing Civil Contratista	
Yohana Hoffmet Ing Civil Interventoria	

Scanned with CamScanner

21/09/2016	Honorario Ing. civil interventor	Instalación de tubería de 8" y 3" para red de acueducto Se realizo llenó y compactacion de zanja - Se realizo traslado de cerca con postes de concreto y alambre de pua cada cuatro metros sobre el lote zanjado - Excavacion manual para domiciliarias de acueducto - Actividades de replanteo de eje de via de la calle 115 a la calle 125 - Replanteo para instalacion de filtro en geodren - Actividades de señalizacion de excavacion y pozos
22/09/2016	Honorario Ing. civil interventor	- Continuacion de desplazamiento de cerca de lote - Se inicia Excavacion mecanica para instalacion de filtro en geodren 4" de H=0.60 mts sobre anden lateral colindante al lote zanjado - Excavacion manual para domiciliarias de acueducto desde la 111 a la 115 - Excavación mecanica para reposicion de tubería de 4" de acueducto desde la 115 y 111
23/09/2016	Honorario Ing. civil interventor	-Instalacion de filtro geodren sector lote zanjado -Continuacion de excavacion mecanica para red de acueducto de la 115 a la 112 costado derecho - Se realizo pruebas hidrostaticas para tubería de 3" y 8" desde la abscisa K0+590 a K0+840, se solicito al Contratista hacer llegar informe y resultados de las pruebas a la interventoria como parte del proceso de calidad y seguimiento -Excavacion manual para tubería de domiciliarias de Acueducto sector Santander - Continuacion de traslado y desmonte de cerca con postes y alambre del lote zanjado - Limpieza de pozos y tubería.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO REDES VIALES
NIT. 902.052.366 - 5

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº 2381 DE 2026

15.3 SEGURIDAD SOCIAL REDES VIALES

CONSORCIO REDES VIALES

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901052364	5	CONSORCIO REDES VIALES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO REDES VIALES	AC 14 CA 6 CTP 4 VILLA CAFE	IBAGUE-TOLIMA	3134787775	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	9509152589	9509152584	E	2026/07/16	2026/08/13	BANCO DE BOGOTA	28	$17,992,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	rtp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1112500919	MEDINA TRIANA JORGE LOREDA							X										230601	30	$3,000,000	$480,000	EPS017	30	$3,000,000	$375,000	CCF50	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$206,000	30	$3,000,000	$150,000	No	$1,331,000
2	CC	65780085	ESPAÑA RAMIREZ LAURA MILENA							X										230601	30	$2,700,000	$432,000	EPS002	30	$2,700,000	$337,500	CCF50	30	$2,700,000	$108,000	14-11	30	$2,700,000	$185,000	30	$2,700,000	$135,000	No	$1,200,500
3	CC	93595180	ESPAÑA RAMIREZ LUIS FRANCISCO																	25-14	30	$4,500,000	$720,000	EPS005	30	$4,500,000	$562,500	CCF50	30	$4,500,000	$180,000	14-11	30	$4,500,000	$313,200	30	$4,500,000	$225,000	No	$2,000,700
4	CC	93591551	GOMEZ ARNOLDO																	25-14	30	$2,060,000	$329,600	EPS037	30	$2,060,000	$257,500	CCF50	30	$2,060,000	$82,400	14-11	30	$2,060,000	$143,400	30	$2,060,000	$103,000	No	$915,900
5	CC	1110471637	VIZCAYA AMERICA HECTOR MANUEL																	230601	30	$4,500,000	$720,000	EPS005	30	$4,500,000	$562,500	CCF50	30	$4,500,000	$180,000	14-11	30	$4,500,000	$313,200	30	$4,500,000	$225,000	No	$2,000,700
6	CC	1234643154	MARIN OSPINA WILBY CATERINE																	25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$500,000	CCF50	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	$278,400	30	$4,000,000	$200,000	No	$1,778,400
7	CC	1110073589	MARTINEZ HERNANDEZ MARIANA ANDREA																	230601	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$500,000	CCF50	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	$278,400	30	$4,000,000	$200,000	No	$1,778,400
8	CC	1110809413	MUÑOZ BOLAS MARIA KATERINE																	230601	30	$4,000,000	$640,000	ESS062	30	$4,000,000	$500,000	CCF50	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	$278,400	30	$4,000,000	$200,000	No	$1,778,400
9	CC	93810462	GARCIA CALDERON OCTAVIO ALEXANDRO							E										25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS002	30	$3,000,000	$375,000	CCF50	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$3,000,000	$150,000	No	$1,333,800
10	CC	1113434043	PEDREROS CRUZ JHON ALEXANDER																	230601	30	$7,000,000	$1,120,000	EPS009	30	$7,000,000	$875,000	CCF50	30	$7,000,000	$280,000	14-11	30	$7,000,000	$487,200	30	$7,000,000	$350,000	No	$3,112,200
Total			Afiliados(10)																			$38,760,000	$6,201,600			$38,760,000	$4,845,000			$38,760,000	$1,550,400			$38,760,000	$2,697,800		$38,760,000	$1,938,000		$17,232,800

2026/08/13 12:20 PM

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900351366	5	CONSORCIO REDES VIALES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO REDES VIALES	AC 14 CA 8 ETP 4 VILLA CAFE	IBAGUE-TOLIMA	3134797275	no

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	9509152589	9509152589	E	2026/07/14	2026/08/13	BANCO DE BOGOTA	28	$17,592,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VA
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$6,201,600	$129,200					$0	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$1,200,000	$25,000	$0	$0	$0	$0	$0	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$2,169,600	$45,200	$0	$0	$0	$0	$0	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$2,832,000	$59,000	$0	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$2,697,800	$56,200					$0	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$2,697,800	$56,200	$0	$0	$0	$0	$0	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$1,550,400	$32,300					$0	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	10	$1,550,400	$32,300	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				10	$4,845,000	$101,200					$0	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$500,000	$10,500	$0	$0	$0	$0	$0	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$375,000	$7,900	$0	$0	$0	$0	$0	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$257,500	$5,400	$0	$0	$0	$0	$0	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$1,212,500	$25,300	$0	$0	$0	$0	$0	
SANITAS	EPS009	800,251,440	6	4	$2,500,000	$52,100	$0	$0	$0	$0	$0	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$1,162,800	$24,200					$0	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	10	$1,162,800	$24,200	$0	$0	$0	$0	$0	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$775,200	$16,200					$0	
SENA	PASENA	899,999,034	1	10	$775,200	$16,200	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				10	$17,232,800	$359,300	$0	$0	$0	$0	$0	

OR A PAGAR
$6,330,800
$1,225,000
$2,214,800
$2,891,000
$2,754,000
$2,754,000
$1,582,700
$1,582,700
$4,946,200
$510,500
$382,900
$262,900
$1,227,800
$2,552,100
$1,167,000
$1,167,000
$791,400
$791,400
$17,592,100

2026/08/13 12:20 PM

CONSORCIO REDES VIALES
NIT. 902.052.366 - 5

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº 2381 DE 2026

15.4 INFORME SST N°3 CONSORCIO REDES VIALES

CONSORCIO REDES VIALES

Alcaldía de IBAGUÉ

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO No. 3

MUNICIPIO DE IBAGUE

CONTRATO 2381 DEL 08 DE ABRIL DE 2026

23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DE 2026



INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION, OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ACTIVIDADES DE RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y LOTE 2."

Dirección: Mz 14 Casa 8 Etapa 4 B/ Villa Cafe
Correo Electrónico: contratosadmon153@gmail.com
Celular: 3206427670
Ciudad: Ibagué – Tolima

122

CONSORCIO REDES VIALES
RL. LIZETH MARCELA CIFUENTES TORRES
NIT. 902.052.366-5

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION, OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ACTIVIDADES DE RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y LOTE 2."

Versión 1.0

CONTRATO 2381 DEL 08 DE ABRIL DE 2026

23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DE 2026

IBAGUÉ, TOLIMA

REALIZO:	APROBÓ:
Nombre: HEYDY CATERINE MARIN Profesional SST Interventoría Firma: _____ Fecha: 22 DE JULIO DE 2026	Nombre: Ing. LIZETH MARCELA CIFUENTES R/L CONSORCIO REDES VIALES Interventoría Firma: _____ Fecha: 22 DE JULIO DE 2026

Dirección: Mz 14 Casa 8 Etapa 4 B/ Villa Cafe
Correo Electrónico: contratosadmon153@gmail.com
Celular: 3206427670
Ciudad: Ibagué – Tolima

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción
2. Antecedentes
3. Objetivos
4. Aspectos administrativos
5. Aspectos básicos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo
6. Verificación informe de gestión del SG-SST de contratista.
7. Programa de seguridad industrial y salud en el trabajo.
8. Subprograma de medicina preventiva y del trabajo.
9. Avance capacitaciones, charlas.
10. Subprograma de higiene y seguridad industrial.
11. Avance de actividades.
12. Consolidado de charlas.
13. Reporte e investigación de accidentes de trabajo.
14. Exámenes de ingreso y retiro.
15. Indicadores de seguridad y salud en el trabajo.
16. Observaciones y conclusiones SST.
17. Anexos.

1. INTRODUCCIÓN

En el presente informe se presentan los resultados de las actividades y acciones adelantadas para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el **contrato de interventoría N.º 2381 del 08 de abril de 2026** suscrito entre **MUNICIPIO DE IBAGUE** y el **CONSORCIO REDES VIALES**, con el objeto de **INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION, OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ACTIVIDADES DE RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y LOTE 2."** su representante legal la ingeniera **LIZETH MARCELA CIFUENTES TORRES.** La cual cumple sus obligaciones del contrato como interventor de los **contratos de obra N.º 2379 del 08 de abril de 2026** suscrito entre el **MUNICIPIO DE IBAGUE** Y **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL SALADO 2026**, con el objeto de **"CONSTRUCCION, OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1.",** representado legalmente por el ingeniero **LUIS RICARDO ORTIGOZA GONZALEZ.** Al igual que el **contrato de obra N° 2380 del 08 de abril de 2026** suscrito entre el **MUNICIPIO DE IBAGUE** Y **CONSORCIO OBRAS ESPECIALES HIDROSANITARIAS IBAGUE,** con el objeto de **"CONSTRUCCION, OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 2.",** representado legalmente por el ingeniero **DIDIER PORTELA TORRES.** De la misma forma, nos permitimos incluir una serie de documentos y anexos que soportan la correcta ejecución y control del proyecto en mención, ajustado y modificado con base en las condiciones iniciales y en las necesidades de los tramos viales objeto de la presente intervención, por parte del contratista, cumpliendo con las especificaciones técnicas y normatividad vigente, para la intervención del proyecto.

Para ello se incluye en el presente documento de seguimiento las actividades derivadas del proyecto, en lo referente al cumplimiento técnico, administrativo, financiero y ambiental, establecido durante el periodo en cuestión, a fin de garantizar el desarrollo y alcance de la meta física propuesta en el marco de los contratos de obra N.º 2379 y 2380 del 08 de abril de 2026.

Así mismo, se presentan las labores paralelas que ha llevado a cabo la interventoría, durante el presente periodo, dando cumplimiento a las labores establecidas contractualmente y ciñéndose a lo descrito en los términos de referencia, propuesta, manual de interventoría, especificaciones y demás documentos.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2. Antecedentes.

La intervención integral en el sector priorizado se ha planteado con base en las condiciones actuales del sistema de alcantarillado y acueducto en la zona, así como en el estado de la malla vial existente.

La ejecución de este proyecto se respalda técnicamente en la necesidad de asegurar la continuidad, eficiencia y sostenibilidad de los servicios de acueducto y alcantarillado, considerando el estado actual de la infraestructura y los diagnósticos técnicos realizados sobre ella.

En particular, el sistema de acueducto y alcantarillado a intervenir está conformado, en su mayoría, por redes construidas en asbesto–cemento, concreto y PVC gris, materiales correspondientes a tecnologías antiguas. Debido a su vida útil superior a cincuenta (50) años y a las condiciones de operación, estas redes presentan deficiencias estructurales, hidráulicas y de estanqueidad, evidenciadas en fallas frecuentes, roturas, infiltraciones, exfiltraciones y una disminución de la capacidad de conducción.

3. Objetivos

Objetivo de la interventoría: El objetivo de este informe para el periodo comprendido es reportar al MUNICIPIO DE IBAGUE, el estado actual de la obra, con relación a los aspectos en seguridad y salud en el trabajo y componente ambiental, verificando el cumplimiento de la Resolución 0312 del 13 de febrero de 2019, por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST.

Alcance de la interventoría: Evaluar la planificación, desarrollo y aplicación del SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG – SST).

Criterios de la interventoría:

- ✓ Resolución 0312 del 13 de febrero de 2019.
- ✓ Decreto 1072 de 2015.
- ✓ Ley 2251 de 2022.
- ✓ Plan de trabajo.
- ✓ Plan de capacitación.
- ✓ Matriz de identificación de peligros y riesgos.
- ✓ Plan de respuesta ante emergencias.
- ✓ Programa de orden y aseo.

Asesor SST de interventoría:
Heydy Caterine Marín Guzmán

Frentes de trabajo:
- ✓ LOTE 1
- ✓ LOTE 2

Actividades de la interventoría SST

Las siguientes son las actividades desarrolladas por la interventoría, en la supervisión a los contratistas en la implementación del SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO y AMBIENTAL, se hace la exigencia a los contratistas el cumplimiento de la normatividad legal vigente colombiana con respecto al personal directamente vinculado y subcontratistas durante el periodo.

4. Aspectos administrativos:
- ✓ Se solicita a los contratistas el cumplimiento de lo establecido en el SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO entregado a esta interventoría.
- ✓ Se verifica y solicita la entrega y reposición de dotación y elementos de protección individual firmada por los trabajadores, requerida según actividad realizada.
- ✓ Se solicita el pago de la seguridad social del personal en general, contratista y subcontratistas para verificación del cumplimiento de las obligaciones.
- ✓ Se solicita documentación requerida para ingreso a obra del contratista y subcontratista.
- ✓ De igual modo se solicita y orienta al contratista hacer implementación del SG-SST según lo contempla este con respecto al manejo de los subcontratistas vinculados en el proceso de ejecución del objeto del contrato (inducciones, verificación de seguridad social vigente, pre operacionales de maquinaria, verificación de la documentación de la maquinaria y personal, charlas de seguridad, inspecciones de las áreas y equipos a utilizar) cada actividad va soportada con registro fotográfico de parte del contratista, con el fin de dar cumplimiento al SG-SST.

5. Aspectos básicos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo Verificación de documentación del personal.

Se verifica que el personal con ingreso para este periodo cuente con la documentación completa para poder iniciar actividades sin ningún inconveniente como:

- ✓ Hojas de vida
- ✓ Antecedentes disciplinarios.
- ✓ Certificaciones que acrediten las competencias para poder desempeñar el cargo para el que fue contrato.

Verificación de seguridad social.

- ✓ Se verifican las afiliaciones a la seguridad social del personal nuevo del contratista y subcontratistas (ARL, EPS, AFP, CCF) para el personal con ingreso para este periodo.
- ✓ Se verifica que la planilla de seguridad social se encuentre vigente con su respectivo pago para el periodo en curso (ARL, EPS, AFP, CCF).

Verificación del programa de inducción y re inducción.

Se solicita demostrar que el personal ha realizado el proceso de inducción al ser personal nuevo y de re inducción para personal antiguo con el contratista o que ha estado ausente un tiempo mayor a 08 días, esto se hace mediante un formato
que debe cumplir con unas características, entre ellas dar a conocer al personal las políticas y generalidades de la empresa, reglamentos internos y en SST, riesgos a los que se encuentra expuesto entre otros aspectos.

Supervisión en la prevención de accidentes en cuanto a: Riesgo y prevención.

Verificación de la notificación inicial de riesgos que incluya las medidas de prevención y que estas sean acordes al riesgo contemplado tanto en obra como en la matriz de riesgos asociada al SG-SST del contratista, de igual modo la verificación de las diferentes condiciones en que labora el personal, si cuentan con los debidos controles de prevención para la mitigación de enfermedades y accidentes de trabajo.

Inspecciones que realiza la interventoría:

En los frentes de trabajo la interventoría realiza un seguimiento al cumplimiento del cronograma de inspecciones para el periodo (periódicas, no planeadas, continúas y especiales), según lo amerite la actividad ejecutada, dado el caso de presentarse algún tipo de accidente, se cuente con las medidas acordes y requeridas, para ello hace seguimiento a:

- ✓ Supervisión y seguimiento a inspecciones de dotación y EPI del personal. (verificación de estado para su debido reemplazo).
- ✓ Supervisión y seguimiento a inspecciones de área de trabajo, con el fin de evidenciar si existen los controles pertinentes y adecuados propuestos por el contratista para la prevención de la aparición de accidentes y enfermedades laborales.

- ✓ Supervisión y seguimiento a inspección de equipos y herramientas: mediante la solicitud de los registros pre operacionales e inspecciones diligenciadas de acuerdo al cronograma de inspecciones dentro del SG-SST y así mismo evidenciar el cumplimiento de este.

Entrega de EPI y Dotación

- ✓ Se exige el suministro de dotación industrial a todo el personal en obra (Camisa, pantalón y botas de seguridad).
- ✓ Se exige el suministro de los elementos de protección individual (EPI), según lo demande la matriz de EPI relacionada en el SG-SST de cada contratista y lo amerite la tarea que se está ejerciendo por parte del trabajador.

Control de herramienta y equipo:
El equipo contemplado por el contratista durante el periodo, los cuales siempre deben de operar en óptimas condiciones

Programa de capacitaciones: Se solicita al contratista la implementación del programa que evidencie la capacitación al personal con charlas de 05 minutos diarias, capacitaciones por parte de ARL y demás entes según sea el requerimiento del trabajo.

Señalización: Se exige a los contratistas la implementación del programa de manejo de tránsito y requerimientos del contrato, donde se deben de instalar en cada frente de obra elementos de seguridad vial con el fin de garantizar la seguridad en las vías, tales como: conos, reductores de velocidad, pasa vías y señalización preventiva e informativa; señalización de peligro de áreas de riesgo como sumideros, excavaciones, alcantarillados, etc.

Demarcación: Se exige cerramiento en obra que delimite los espacios a intervenir evitando el ingreso de personal ajeno a esta, se debe de realizar en de tela verde, también se exige en cerramiento y/o demarcación de zonas que generen un alto riesgo a la comunidad y al personal dentro de obra, y la debida demarcación de vías de acceso peatonal.

Suministro de hidratación: Se busca que todo el personal activo en obra, en los diferentes frentes de trabajo cuenten con hidratación teniendo en cuenta que las actividades se realizan a campo abierto y están expuestos a las altas temperaturas que presentan la ciudad de Ibagué

Condiciones de higiene: Se exige condiciones de higiene aptas en campamentos y unidades sanitarias adecuadas para el uso del personal.

Verificación de exámenes ocupacionales: Se solicita demostrar que al personal vinculado se le ha practicado los debidos exámenes ocupacionales según sea el caso, cumpliendo con lo contemplado en el sub programa de medicina preventiva, con el objetivo de tener conocimiento del estado de salud del trabajador actual al ingreso y así mismo si está apto para desempeñar el cargo para el que fue contratado.
Exámenes periódicos según lo contemplado en el profesiograma para evidenciar qué consecuencias tiene en el trabajador la exposición a los agentes encontrados en su entorno laboral y como control de algún diagnóstico que evidencia si realmente las medidas que se tomaron han dado resultado en el estado de salud del trabajador demostrando mejoría.
Examen de egreso, este se debe realizar al personal cuando se dé por terminado el contrato o para la labor que fue contratado, que logre evidenciar el estado de salud con el que el trabajador es retirado.

Realización de capacitaciones: Se verifica que se realice capacitaciones sobre buenos hábitos, vida saludable, lavado de manos, alimentación saludable, que promueven la salud en el los trabajadores.

Programa de Orden y Aseo: Se solicita el registro sea fotográfico o documental de la implementación del programa en las áreas de trabajo (plazas intervenidas), campamentos, unidades sanitarias; bien sea de manera periódica y por medio de brigadas de orden y aseo

Programa de vigilancia epidemiológica: Se verifica por medio de inspecciones a los puestos de trabajo para conocer los riesgos que puedan generar alguna patología laboral y solicitar la intervención del contratista. Revisando qué medidas se han adoptado para la mitigación de estos riesgos.

Enfermedades: Reporte de las enfermedades del ausentismo relacionado con la aparición de enfermedades de origen común y laboral y relacione el ausentismo. De igual manera se solicita las medidas preventivas y correctivas tomadas en cuenta por el contratista dado el caso.

Accidentalidad: Se solicita al contratista que al presentarse un accidente debe de anexar el FURAT y la investigación pertinente al caso de accidente, más la relación de ausentismo por este caso. De igual manera se solicita las medidas preventivas y correctivas tomadas en cuenta por el contratista dado el caso.

6. VERIFICACION INFORME DE GESTION DEL CONTRATISTA LOTE 1 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

GENERALIDADES DEL CONTRATO LOTE 1	
CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL SALADO 2026 NIT. 902.052.357-9
No. CONTRATO:	2379 DEL 08 DE ABRIL DE 2026
OBJETO DE CONTRATO	"CONSTRUCCION, OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1".
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS RICARDO ORTIGOZA GONZALEZ
CLASE DE RIESGO	V
ARL	SURA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE IBAGUE

A continuación, se describen las actividades ejecutadas en obra durante el periodo: Del 23 de junio al 22 de julio de 2026 por parte de **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL SALADO 2026:**

- Mantenimiento de cerramiento perimetral
- Adecuación de senderos peatonales
- Instalación de tubería de acueducto y alcantarillado
- Nivelación y compactación de terreno
- Conformación de base
- Construcción de pozos y sumideros

✓ **Personal activo Lote 1**

Tabla de Relación del listado del personal contratista y subcontratista activo hasta la fecha:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL SALADO 2026				
#	NOMBRE	CEDULA	CARGO	A/R
1	Jaime Alexander Ortigoza Giraldo	1.110.539.630	Ingeniero director	Activo
2	Jorge Alberto Ramos Salazar	79.893.182	Profesional Ambiental	Activo
3	Juan Daniel Moya Robayo	3.192.972	Especialista en geotecnia	Activo
4	Diego Andrés Diaz Diaz	5.824.544	Especialista en Pavimentos	Activo
5	Diana Patricia Giraldo Moreno	51.724.999	Profesional social	Activo
6	Gloria Astrid López Sánchez	65.753.684	Profesional SST	Activo
7	Guillermo Alfonso Jauregui	14.230.337	Ingeniero residente	**Retirado 30-06-26**
8	Diego Alejandro Reyes Afanador	1.152.686.000	Ingeniero Residente	Activo
9	Ricardo José Ortigoza Giraldo	1.110.587.017	Ingeniero Residente	Activo
10	Oswaldo Meza Riveros	1.110.563.222	Ingeniero Residente	Activo
11	Juan Felipe Giraldo Méndez	1.005.814.894	Ingeniero Auxiliar	Activo
12	Vicki del Pilar Martinez Montalvo	1.109.004.977	Topógrafa	Activo
13	Ana Gabriel Gutiérrez Martinez	1.105.691.750	Ingeniero Auxiliar	Activo
14	José Javier Carrillo Marin	93.387.024	Maestro	Activo
15	Fabian Alexis Acosta Aranzalez	11.686.106	Auxiliar SST	Activo
16	Yohana Andrea Rondon Ortiz	1.109.386.176	Auxiliar SST	Activo
17	Fabian Ricardo García	93.397.946	Auxiliar de trafico	Activo
18	Paula Julieth Maya Fernández	1.110.549.340	Auxiliar de trafico	Activo
19	Jeimi Ximena Reyes Ramírez	1.234.645.140	Auxiliar de trafico	Activo
20	José Samuel Torres Gómez	6.009.657	Ayudante	Activo
21	Jhorman Alexis Arciniegas Monar	1.115.738.905	Ayudante	Activo
22	Yiber Ascensio Jiménez	1.106.774.146	Ayudante	Activo
23	Reynaldo Antonio Bustamante Mercado	1.043.872.183	Ayudante	Activo
24	Dabian José Campos Estaba	6.846.683	Ayudante	Activo
25	Alberto Espejo Nieto	93.366.223	Ayudante	Activo
26	Janier Enrique Gamero García	1.042.962.252	Ayudante	**Retirado 30-06-26**
27	Abel Guillermo Grisales Salgado	14.395.686	Auxiliar de trafico	Activo
28	María Fernanda López Vergara	1.088.284.311	Ayudante	Activo
29	José Yesid Méndez Guzman	3.004.896	Oficial	Activo
30	German Reyes Cardozo	10.272.086	Cadenero	Activo
31	Didier Andrés Sandoval	1.015.995.113	Oficial	Activo
32	Jhon James Silva Mondragon	1.110.577.219	Ayudante	Activo
33	Edilson Steven Torres Silva	1.110.574.633	Ayudante	Activo
34	Gerson Fabian Villamizar Bastos	1.094.280.457	Ayudante	Activo
35	Heider Arles Bonilla Arias	1.005.815.606	Ayudante	Activo
36	Iván Santiago Bonilla Arias	1.025.522.135	Ayudante	Activo
37	Diego Alejandro Garica Diaz	1.110.235.933	Ayudante	**Retirado 09-07-26**

38	Ángel Alberto Luna Oyola	1.006.005.362	Ayudante	Activo
39	Daniel Ernesto Rodríguez García	1.069.741.290	Ayudante	Activo
40	Juan David Flórez Ortiz	1.104.939.753	Ayudante	**Retirado 15-07-26**
41	Melquieced Torres Bastos	10.186.467	Ayudante	Activo
42	Nelson Eduardo Aldana Sánchez	1.075.224.186	Ayudante	Activo
43	Aristófano Galeano peña	88.231.495	Oficial	Activo
44	Johan Sebastián Casallas	1.110.461.421	Ayudante	Activo
45	Pedro Luis Angulo	1.130.655.168	Ayudante	Activo
46	Andrés Felipe Sosa Ocampo	1.000.457.849	Ayudante	Activo
47	Diego Alejandro Reyes Afanador	1.152.686.000	Ing residente	Activo
48	Ancizar Álzate Gallego	93.409.469	Ayudante	**Nuevo**
49	Luis Alberto Lozano Rodríguez	14.239.870	Oficial	**Nuevo**
50	Hernando Viedman Hurtado	76341553	Ayudante	**Nuevo**
51	Nelson Enrique Hegidio Valencia	13.991.520	Ayudante	**Nuevo**

PERSONAL LOTE 1

A la fecha de corte del informe desde el 23 de junio al 22 de julio de 2026 **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL SALADO 2026** registra cincuenta y un (51) trabajadores vinculados como activos. Entre otros subcontratistas.

✓ **RELACION MAQUINARIA Y EQUIPO LOTE 1:**

RELACION MAQUINARIA MES DE JUNIO - JULIO.

N°	NOMBRE DEL EQUIPO	MARCA	MODELO	PLACA/ SERIAL	PROPIO/ALQUILADO
1	Excavadora de oruga	Hitachi		120 zaxis	Propio
2	Excavadora de oruga	Hyundai		150 LC-9 robex	Propio
3	Retroexcavadora	Hyundai		H940c	Propio
4	Retroexcavadora	Case		416E	Propio
5	Fresadora	Writgen		W 100 – FR14	Alquilado
6	Vibro compactador	Ingersoll		SD 70 DA	Propio
7	Compresor	Ingersoll	2018		Propio
8	Carrotanque agua			MFV172	Alquilado

7. ROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO	
OBJETIVO	– Controlar la implementación del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo que oferto **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL SALADO 2026** de acuerdo a la normatividad legal vigente. – Verificar el cumplimiento al control oportuno de los riesgos y al desarrollo de las actividades propuestas por **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL SALADO 2026** para resguardar, mantener y mejorar las condiciones de salud individual y colectiva de los trabajadores que forman parte del Contratista. – Verificar el cumplimiento a la ejecución de los subprogramas de medicina preventiva y del trabajo, higiene industrial y seguridad industrial que se desarrollen en la ejecución del contrato. – Garantizar mediante la gestión del Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo ambientes de trabajo saludables y seguros para los trabajadores, la comunidad, los equipos, las máquinas y la propiedad. – Identificar, analizar y controlar los riesgos que se generen en cada actividad constructiva y operativa, dentro del contrato. – Controlar la implementación de los planes de acción propuestos en la matriz general de riesgos. – Identificar permanentemente los peligros, riesgos y las condiciones inseguras presentes en el desarrollo de las actividades constructivas que puedan llegar a afectar trabajadores y tomar acciones preventivas inmediatas que controlen en forma significativa dichos riesgos. – Verificar y garantizar el cumplimiento a la normatividad en salud, seguridad y medicina laboral vigente.
RIESGOS A MANEJAR	– Accidentes e incidentes laborales. – Accidentes de tránsito. – Enfermedades laborales – Salud pública. – Incumplimiento de requisitos legales. – Factores de riesgo identificados. – Emergencias y contingencias naturales y generadas por el proyecto.
8. SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO	
OBJETIVO	El sub programa de Medicina Preventiva y del Trabajo, tiene como fin la prevención, promoción y control de las condiciones de salud de los trabajadores frente a los factores de riesgo laborales,

	desarrollando las actividades encaminadas a garantizar el bienestar físico, mental y social de las personas, protegiéndolas de los factores de riesgo ocupacionales, ubicándolos en un puesto de trabajo acorde con sus condiciones psicofísicas y manteniéndolos en aptitud de producción laboral.
RIESGOS A MANEJAR	- Enfermedades profesionales y de salud pública. - Ambientes de trabajo inseguros - Riesgos ocupacionales identificados en la matriz de peligros - Ausentismo

9. AVANCE DE ACTIVIDADES CAPACITACIONES, CHARLAS

Capacitaciones

Se realizan 2 capacitaciones al personal durante el periodo del 23 de junio al 22 de julio de 2026.

Pausas Activas: El contratista inicia implementación de pausas activas durante los periodos de trabajo diario en obra.



Afiliaciones al sistema de seguridad social

El contratista y subcontratista realiza las afiliaciones a todo el personal nuevo en seguridad social, realiza el pago oportuno de la seguridad social del personal antiguo.

Ausentismo: Para el periodo comprendido del 23 de junio al 22 de julio del 2026, no se generaron casos de ausentismo laboral.
Accidentalidad: Para el periodo no se presentaron accidentes de trabajo.

10. SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

OBJETIVO	Identificar permanentemente los factores de riesgo que pueden ser causa de accidentes de trabajo y de enfermedades laborales; establecer las causas potenciales y reales que los generan; Formular medidas de control, efectuar el seguimiento de estos, para prevenir su ocurrencia.
RIESGOS A MANEJAR	– Accidentes e incidentes de trabajo. – Enfermedades laborales. – Factores de riesgo inherentes a las actividades de obra. – Condiciones ambientales peligrosas. – Condiciones higiénico sanitarias inadecuadas

11. AVANCE DE ACTIVIDADES

Señalización de obra.
En los frentes de obra se realizó instalación de las siguientes señalizaciones:

- Ubicación y distribución de PMT
- Cerramiento perimetral
- Señalización y demarcación de áreas de trabajo







Dirección: Mz 14 Casa 8 Etapa 4 B/ Villa Cafe
Correo Electrónico: contratosadmon153@gmail.com
Celular: 3206427670
Ciudad: Ibagué – Tolima

Plan de Emergencias

El contratista realiza el plan de emergencia y conformación de brigada de emergencias, a su vez organizan ubicación de elementos de emergencia tales como (botiquín, extintor, camilla, kit anti derrames), en oficina y maquinaria de obra.



Brigadas de emergencia

Se realiza la conformación de brigada de emergencia en el proyecto.

Se socializa todas las funciones de la brigada y sus responsabilidades, se elige el líder de la brigada, se forman los grupos de apoyo: Brigada de evacuación y búsqueda, brigada de primeros auxilios, brigada contra incendios.

REINALDO BOTAMANTE
Integrantes de Brigada contra incendios:

- -COORDINADOR

Jhorman Arciniegas
Integrantes Brigada de primeros Auxilios:

- -COORDINADOR

Jhorman Arciniegas
Integrantes Brigada de Evacuación y búsqueda:

- -COORDINADOR

E.P.P.

- ✓ El contratista ha realizado entrega de EPP a sus trabajadores de manera regular.
- ✓ Se realizan inspecciones de EPP.
- ✓ El contratista hace cambio y reposición de EPP de manera regular durante el periodo del 23 de junio al 22 de julio de 2026.







Inspecciones

Durante el periodo el contratista realizo inspección de la vía, maquinaria y equipo, herramientas manuales, equipos de emergencia, EPP, orden y aseo.

Interventoría realizo inspecciones en cada frente de trabajo, realizando las observaciones pertinentes para tomar acciones correctivas.














Actividades de Capacitación

El contratista realiza 4 inducciones al personal nuevo en obra.
Se realizan 2 Capacitaciones en el mes de julio.

Medicina preventiva

Se llevaron a cabo jornadas de pausas activas y jornada de hábitos y vida saludable.

ACTIVIDADES Del 23 de junio al 22 de julio de 2026	UNIDADES
ACCIDENTES LABORALES	0
REPORTES DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS	0
INSPECCIONES GENERALES	3
INSPECCIONES MAQUINARIA Y VEHICULOS	40
ENTREGA EPP	40
ENTREGA DOTACION	4
INDUCCIONES	4
EXAMENES DE INGRESO	4
EXAMENES DE EGRESO	0
RETIROS	4
ANALISIS DE TRABAJO (ATS)	36
CHARLAS DE SEGURIDAD	25
PERMISOS DE TRABAJO	0
CAPACITACIONES	2

12. CONSOLIDADO DE CHARLAS DE SEGURIDAD

Del 23 de junio al 22 de julio del 2026

FECHA	TEMAS DE CHARLAS DE SEGURIDAD
23-06-2026	Importancia de las pausas activas en el trabajo
24-06-2026	Uso seguro de conos, vallas y paletas de pare y siga
25-06-2026	Cultura de seguridad y autocuidado
27-06-2026	Riesgos generales en excavaciones profundas
30-06-2026	Uso adecuado de casco
01-07-2026	Investigación y reporte de incidentes y accidentes
02-07-2026	Condiciones climáticas y seguras en vías
03-07-2026	Uso y mantenimiento correcto de EPPS
04-07-2026	Riesgos generales en excavaciones profundas
06-07-2026	Prevención de lesiones de espalda al levantar cargas pesadas
07-07-2026	Planificación preventiva y supervisión en excavaciones
08-07-2026	Medidas de prevención antes de utilizar pulidora
09-07-2026	Orden y limpieza en zona de trabajo
10-07-2026	Consumo de alcohol y sustancias psicoactivas
11-07-2026	Uso correcto de EPPS en trabajo de excavación
14-07-2026	Prevención y control del ruido
15-07-2026	Los riesgos a exposición solar y medidas de protección
16-07-2026	Cultura de seguridad y autocuidado
17-07-2026	Uso seguro de conos, vallas y paletas de pare y siga
21-07-2026	Analizar los peligros relacionados con cada maquinaria
22-07-2026	Riesgos generales en excavaciones profundas

CAPACITACIONES EN EL PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DEL 2026

FECHA	*TEMA CAPACITACION*	*DURACION*	*PERSONAS CAPACITADAS*
09-07-2026	Movilidad segura prevención de accidentes	40mn	29
23-07-2026	Uso de manejo de extintores	40mn	26

Pausas Activas

Se realizan pausas activas y calistenias a todo el personal en el periodo del 23 de junio al 22 de julio del 2026. Además de entrega de hidratación.






13. Reporte e investigación de accidentes de trabajo.

Al corte del 23 de junio al 22 de julio del 2026 no se presentó ningún accidente de trabajo.

Fecha	Descripción del Evento	Estado de la investigación
N/A	N/A	N/A

14. Relación exámenes de ingreso y retiro

EXAMENES EN EL PERIODO		
CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS	**INGRESO**	**RETIRO**
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL SALADO 2026	4	

15. INDICADORES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Según lo determina la Resolución 0312 de 2019 en el Art. 30. Indicadores Mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo. A partir del año 2019, las empresas anualmente llevarán un registro de los indicadores de SST, donde se determinará: frecuencia de accidentalidad, severidad de accidentalidad, ausentismo por causa médica, e índice de lesiones incapacitantes de accidentes de trabajo.

✓ **FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD**

Periodo	N° de A.T en el mes	N° de días perdidos	N° de colaboradores	Acumulado índice de frecuencia
23 de junio al 22 de julio del 2026	0	0	51	**0**

El índice de frecuencia fue 0, lo que significa que, al no presentarse accidentes de trabajo en el periodo, en CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL SALADO 2026 equivale a 0 accidentes por cada millón de horas – hombre trabajadas.

✓ **SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD**

Periodo	N° días de incapacidad por AT	N° de días cargados en el mes	N° de colaboradores en el periodo	IS
23 de junio al 22 de julio del 2026	0	30	51	0
El índice de severidad obtenido es 0 ya que no se presentaron accidentes de trabajo en el periodo.				

✓ **AUSENTISMO POR CAUSA MEDICA**

Periodo	N° de días de ausencia por incapacidad medica laboral o común en el mes	N° de trabajadores en el periodo	N° de días programados durante el periodo
23 de junio al 22 de julio del 2026	0	51	30
Durante el periodo comprendido del 23 de junio al 22 de julio del 2026hubo 0% de ausentismo por causa de incapacidad medica laboral.			

✓ **INCIDENCIA ENFERMEDAD LABORAL**

Periodo	N° casos nuevos de enfermedad laboral	N° de colaboradores en el mes
23 de junio al 22 de julio del 2026	0	51
No se presentaron casos de enfermedades laborales durante el periodo.		

6. VERIFICACION INFORME DE GESTION DEL CONTRATISTA LOTE 2 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

GENERALIDADES DEL CONTRATO LOTE 2	
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS ESPECIALES HIDROSANITARIAS IBAGUÉ NIT. 902.052.376-9
No. CONTRATO:	2380 DEL 08 DE ABRIL DE 2026
OBJETO DE CONTRATO	"CONSTRUCCION, OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 2.".
REPRESENTANTE LEGAL	DIDIER PORTELA TORRES
CLASE DE RIESGO	V
ARL	SURA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE IBAGUE

A continuación, se describen las actividades ejecutadas en obra durante el periodo: Del 23 de junio al 22 de julio de 2026 por parte de **CONSORCIO OBRAS ESPECIALES HIDROSANITARIAS IBAGUÉ:**

- Excavación e instalación de tubería
- Relleno y compactación
- Construcción de pozos
- Instalación de cerramiento perimetral
- Fresado

✓ **Personal activo Lote 2**

Tabla de Relación del listado del personal contratista y subcontratista activo hasta la fecha:

CONSORCIO OBRAS ESPECIALES HIDROSANITARIAS IBAGUÉ				
#	NOMBRE	CEDULA	CARGO	A/R
1	Sebastián Alcides Caro Montealegre	1.032.470.471	Ingeniero Residente	Activo
2	Manuel Alexander Palacios	93.125.420	Topógrafo	Activo
3	Didier Felipe Portela Galindo	1.110.560.167	Director	Activo
4	Manuel Esteban Rodríguez Camello	1.110.602.571	Cadenero	Activo
5	Claudia Liseth Rodríguez Ramírez	1.006.116.401	Ingeniera auxiliar	Activo
6	Johan Andrés Cortes Rincón	1.005.827.011	Auxiliar de trafico	Activo
7	Angelica Montes León	65.779.213	Profesional SST	Activo
8	Leidy Vanessa Prieto Poloche	1.108.829.748	Auxiliar SST	Activo
9	Laura Catalina Pérez Jacome	1.020.769.939	Residente Social	Activo
10	Edison Lozano Peña	5.824.101	Operador	Activo
11	Jaidi Andrade Castro	65.775.094	Auxiliar de trafico	Activo
12	Wilmar Oswaldo Salamanca	1.110.498.976	Auxiliar de trafico	Activo
13	Cindy Tatiana Castaño	1.110.499.981	Auxiliar de trafico	Activo
14	David Alexis Arteaga	1.016.005.816	Topógrafo	**Nuevo**
15	María Valentina Morales	1.007.428.080	Residente Social	**Nuevo**
16	Norby Alexandra Hernández	1.110.478.745	Auxiliar SST	**Nuevo**

SUBCONTRATISTA DIEGO JAVIER GONZALEZ BAZURDO				
#	NOMBRE	CEDULA	CARGO	A/R
1	Nelson Enrique Amórtegui Agatón	1.005.780.853	Ayudante de obra	Activo
2	Jhon Jairo Naicipa	6.014.565	Ayudante de obra	Activo
3	Carlos Julio Moreno Giraldo	93.391.513	Ayudante de obra	Activo
4	Julio Cesar Roa Cubillos	1.110.473.038	Ayudante de obra	Activo
5	Jhon Faber García Ortega	1.006.125.356	Ayudante de obra	Activo
6	Felipe Antonio Salguero Naranjo	93.358.340	Ayudante de obra	Activo
7	Iduvin Darío Galeano Carrillo	14.239.504	Ayudante de obra	Activo
8	Erils José Barrios Collazo	7.227.763	Ayudante de obra	Activo
9	Darío Bernal Moreno	14.273.068	Ayudante de obra	Activo
10	Yohan Camilo Osorio Daza	1.005.856.213	Ayudante de obra	Activo
11	Fabian José Cordoba Ospino	1.122.403.914	Ayudante de obra	Activo
12	Luis Miguel Peña Villalobos	1.105.611.456	Ayudante de obra	Activo
13	Héctor Javier Peña Villalobos	1.105.610.411	Ayudante de obra	Activo
14	Saul Hernández Ospina	14.240.350	Ayudante de obra	Activo
15	Juan Carlos Flórez Martínez	14.296.420	Ayudante de obra	Activo
16	Diego Fernando Pachon	1.110.487.863	Ayudante de Obra	**Retirado 24-06-26**
17	Antonio Escalona Valladares	5.200.627	Ayudante de obra	Activo

SUBCONTRATISTA JAIME SUAREZ GUZMAN				
#	NOMBRE	CEDULA	CARGO	A/R
1	Jaime Suarez	14.232.370	Ayudante de obra	Activo
2	Kevin Suarez	1.106.226.188	Ayudante de obra	Activo
3	Jerson Suarez	1.005.699.832	Ayudante de obra	Activo
4	Geovani Restrepo	5.822.722	Ayudante de obra	Activo
5	John Lozano	93.239.758	Ayudante de obra	Activo
6	Fabian Valencia	1.054.553.134	Ayudante de obra	Activo
7	Henry Valencia Mendoza	71.980.452	Oficial	Activo
8	Jorge Castillo	1.103.116.392	Ayudante de obra	Activo
9	Juan Carlos Ramírez	1.110.580.386	Ayudante de obra	Activo
10	Yeisson Sánchez Manrique	11.449.504	Ayudante de obra	Activo
11	Yeferson Estiven Ospina Reinoso	1.005.933.216	Ayudante de obra	Activo
12	Faider Andrés Cubides Sabogal	1.110.517.559	Ayudante de obra	Activo
13	Jeferson Agudelo	93.100.222	Ayudante de obra	Activo

PERSONAL LOTE 2

A la fecha de corte del informe desde el 23 de junio al 22 de julio de 2026 **CONSORCIO OBRAS ESPECIALES HIDROSANITARIAS IBAGUÉ** registra cuarenta y seis (46) trabajadores vinculados como activos. Entre otros subcontratistas.

✓ **RELACION MAQUINARIA Y EQUIPO LOTE 2:**

RELACION MAQUINARIA MES DE JUNIO - JULIO.

N°	NOMBRE DEL EQUIPO	MARCA	MODELO	PLACA/ SERIAL	PROPIO/ALQUILADO
1	Retroexcavadora	Case	580		Propio
2	Excavadora	Komatsu	200-6 LC		Propio
3	Excavadora	Komatsu	PC 120		Propio
4	Excavadora	Doosan	DX 220 LC		Alquilado
5					

16. ROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO	
OBJETIVO	–Controlar la implementación del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo que oferto **CONSORCIO OBRAS ESPECIALES HIDROSANITARIAS IBAGUÉ** de acuerdo a la normatividad legal vigente.

	- Verificar el cumplimiento al control oportuno de los riesgos y al desarrollo de las actividades propuestas por **CONSORCIO OBRAS ESPECIALES HIDROSANITARIAS IBAGUÉ** para resguardar, mantener y mejorar las condiciones de salud individual y colectiva de los trabajadores que forman parte del Contratista. - Verificar el cumplimiento a la ejecución de los subprogramas de medicina preventiva y del trabajo, higiene industrial y seguridad industrial que se desarrollen en la ejecución del contrato. - Garantizar mediante la gestión del Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo ambientes de trabajo saludables y seguros para los trabajadores, la comunidad, los equipos, las máquinas y la propiedad. - Identificar, analizar y controlar los riesgos que se generen en cada actividad constructiva y operativa, dentro del contrato. - Controlar la implementación de los planes de acción propuestos en la matriz general de riesgos. - Identificar permanentemente los peligros, riesgos y las condiciones inseguras presentes en el desarrollo de las actividades constructivas que puedan llegar a afectar trabajadores y tomar acciones preventivas inmediatas que controlen en forma significativa dichos riesgos. - Verificar y garantizar el cumplimiento a la normatividad en salud, seguridad y medicina laboral vigente.
RIESGOS A MANEJAR	- Accidentes e incidentes laborales. - Accidentes de tránsito. - Enfermedades laborales - Salud pública. - Incumplimiento de requisitos legales. - Factores de riesgo identificados. - Emergencias y contingencias naturales y generadas por el proyecto.
17.SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO	
OBJETIVO	El sub programa de Medicina Preventiva y del Trabajo, tiene como fin la prevención, promoción y control de las condiciones de salud de los trabajadores frente a los factores de riesgo laborales, desarrollando las actividades encaminadas a garantizar el bienestar físico, mental y social de las personas, protegiéndolas de los factores de riesgo ocupacionales, ubicándolos en un puesto de

	trabajo acorde con sus condiciones psicofísicas y manteniéndolos en aptitud de producción laboral.
RIESGOS A MANEJAR	– Enfermedades profesionales y de salud pública. – Ambientes de trabajo inseguros – Riesgos ocupacionales identificados en la matriz de peligros – Ausentismo

18. AVANCE DE ACTIVIDADES CAPACITACIONES, CHARLAS

Capacitaciones

Se realizan 3 capacitaciones al personal durante el periodo del 23 de junio al 22 de julio de 2026.

Pausas Activas: El contratista en el mes de julio menciona en el informe el inicio de pausas activas como se había acordado anteriormente, pero no se ha presentado evidencia de registro fotográfico y documental.





Afiliaciones al sistema de seguridad social

El contratista y subcontratista realiza las afiliaciones a todo el personal nuevo en seguridad social, realiza el pago oportuno de la seguridad social del personal antiguo.

Ausentismo: Para el periodo comprendido del 23 de junio al 22 de julio del 2026, no se generaron casos de ausentismo laboral.

Accidentalidad: Para el periodo no se presentaron accidentes de trabajo.

19. SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

OBJETIVO	Identificar permanentemente los factores de riesgo que pueden ser causa de accidentes de trabajo y de enfermedades laborales; establecer las causas potenciales y reales que los generan;

	Formular medidas de control, efectuar el seguimiento de estos, para prevenir su ocurrencia.
RIESGOS A MANEJAR	– Accidentes e incidentes de trabajo. – Enfermedades laborales. – Factores de riesgo inherentes a las actividades de obra. – Condiciones ambientales peligrosas. – Condiciones higiénico sanitarias inadecuadas

20. AVANCE DE ACTIVIDADES

Señalización de obra.

En los frentes de obra se realizó instalación de las siguientes señalizaciones:

- Cerramiento perimetral deficiente
- Señalización y demarcación de áreas de trabajo deficientes
- **Observación: desde el inicio de actividades no se ha instalado señalización acorde al PMT aprobado.**







Dirección: Mz 14 Casa 8 Etapa 4 B/ Villa Cafe
Correo Electrónico: contratosadmon153@gmail.com
Celular: 3206427670
Ciudad: Ibagué – Tolima

Plan de Emergencias

El contratista realiza el plan de emergencia, organizan ubicación de elementos de emergencia tales como (botiquín, extintor, camilla) en oficina.

En cuanto a la maquinaria de obra, se subsano la falencia de botiquines ya que el contratista hace entrega de estos a cada maquinaria. Actualmente la maquinaria tiene aún los extintores vencidos, no se han subsanado totalmente las observaciones realizadas por la interventoría.

Aun no se implementa distribución y ubicación de señalización rutas de evacuación.

Brigadas de emergencia

brigada de emergencia en el proyecto.

BRIGADISTAS EVACUACIÓN: Enuncie los brigadistas de emergencias activos:

Tabla 1 Integrantes de Brigadistas activos

Nombre	Apellido	Celular	Correo electronico	ROL BRIGADA DE EVACUACION
Leidy Vanessa	Poloche	320 3332705	leidyvpoloche@gmail.com	Coord. Brigada
Nelson Enrique	Amórtegui Agatón	3003940570	amortegui.chili@gmail.com	Coord. apoyo
Jhon Jairo	Naicipa	3170431696		Brigadista
Carlos Julio	Moreno Giraldo	3115191476		Coord. apoyo
Julio Cesar	Roa Cubillos	3115162076		Brigadista
Jhon Faber	García Ortega	3103293089		Brigadista
Felipe Antonio	Salgueron Naranjo	3108083465		Brigadista
Yilmar Alexander	Varón Bohórquez	3213687007	Milevaron071721@gmail.com	Coord. apoyo
Iduvin Dario	Galeano Carrillo	3142625811	Dariogaleano1998123@gmail.com	Brigadista
Erlis Jose	Barrios Collazo	3118116367	adiwabarrios@gmail.com	Brigadista
Dairo	Bernal Moreno	3123963163		Brigadista
German	Flores Carrillo			Brigadista

PRIMEROS AUXILIOS: brigadistas de emergencias activos:

NOMBRES	APELLIDOS	Celular	CORREO ELECTRÓNICO	ROLL PRIMEROS AUXILIOS
Wilmar	Salamanca	311 8233667		Coord. Brigada
Miguel Andrey	Bocanegra Pérez			Coord. apoyo
Johan Manuel	Montenegro González	3108031138		Brigadista
José Oliverio	Quimbayo Bernal			Brigadista
Juan Diego	Viña Viña			Brigadista
Fabian José	Córdoba Ospino	3187210279	joseospino@gmail.com	Brigadista
Yohan Camilo	Osorio Daza	3213350935		Brigadista
Fabian	Valencia Cuadros	3118147681	fu3234453@gmail.com	Brigadista
Jonathan David	Valencia Cuadros	3214210504		Brigadista
Luis Miguel	Peña Villalobos	3005178321	luisbrs614@gmail.com	Coord. apoyo
Héctor Javier	Peña Villalobos	3214084136		Brigadista
Juan Darwin	Cardona González	3172764210		Brigadista

E.P.P.

- ✓ El contratista ha realizado entrega de EPP a sus trabajadores de manera regular.
- ✓ El contratista hace cambio y reposición de EPP de manera regular durante el periodo de 23 de junio al 22 de julio de 2026.









Inspecciones

Durante el periodo el contratista realizo inspección de equipos de emergencia, maquinaria y equipo.

Interventoría realizo inspecciones en cada frente de trabajo, realizando las observaciones pertinentes para tomar acciones correctivas.



Actividades de Capacitación

El contratista realiza 9 inducciones al personal nuevo y antiguo en obra.

Se realizan 4 capacitaciones en el mes de junio y julio.

Medicina preventiva

No se llevaron a cabo jornadas de pausas activas y jornada de hábitos y vida saludable.

ACTIVIDADES Del 23 de junio al 22 de julio de 2026	UNIDADES
ACCIDENTES LABORALES	0
REPORTES DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS	0
INSPECCIONES GENERALES	2
INSPECCIONES MAQUINARIA Y VEHICULOS	40
ENTREGA EPP	40
ENTREGA DOTACION	19
INDUCCIONES	9
EXAMENES DE INGRESO	11
EXAMENES DE EGRESO	0
RETIROS	1
ANALISIS DE TRABAJO (ATS)	24
CHARLAS DE SEGURIDAD	20
PERMISOS DE TRABAJO	0
CAPACITACIONES	3

21. CONSOLIDADO DE CHARLAS DE SEGURIDAD

Del 23 de junio al 22 de julio del 2026

FECHA	TEMAS DE CHARLAS DE SEGURIDAD
01-07-2026	Uso correcto de los EPP
02-07-2026	Riesgo de derrumbes en excavación
03-07-2026	Trabajo seguro alrededor de maquinaria pesada
04-07-2026	Orden y aseo en el frente de trabajo
06-07-2026	Hidratación y prevención del estrés por calor
07-07-2026	Actos inseguros y condiciones inseguras
08-07-2026	Señalización y delimitación del área de trabajo
09-07-2026	Trabajo seguro es espacios confinados
10-07-2026	Riesgo por redes de servicios públicos
11-07-2026	Manipulación manual de cargas
12-07-2026	Prevención de caídas al mismo nivel
13-07-2026	Plan de emergencias y rutas de evacuación
14-07-2026	Manejo adecuado de residuos en la obra
15-07-2026	Protección del medio ambiente durante la excavación
16-07-2026	Control del polvo y del ruido
17-07-2026	Convivencia y respeto en el lugar de trabajo
18-07-2026	Seguridad vial en zonas de obra
21-07-2026	Cuidado de la comunidad vecina

22-07-2026	Prevención de picaduras, mordeduras y riesgo biológico
23-07-2026	Cultura del autocuidado
24-07-2026	Condiciones climáticas: temperatura alta
25-07-2026	Control de emisiones de material particulado (polvo)
28-07-2026	Manejo y almacenamiento de cemento y agregados
29-07-2026	Manejo de residuos peligrosos

CAPACITACIONES EN EL PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DEL 2026

FECHA	*TEMA CAPACITACION*	*DURACION*	*PERSONAS CAPACITADAS*
14-07-2026	Manejo de residuos – control de derrames	30 mm	18
22-07-2026	Protección ambiental	30 mm	17
29-07-2026	Consumo de alcohol y drogas	30 mm	17

Pausas Activas

No se realizan pausas activas y calistenias al personal en el periodo del 23 de junio al 22 de julio del 2026.

22. Reporte e investigación de accidentes de trabajo.

Al corte del 23 de junio al 22 de julio del 2026 no se presentó ningún accidente de trabajo.

Fecha	Descripción del Evento	Estado de la investigación
N/A	N/A	N/A

23. Relación exámenes de ingreso y retiro

EXAMENES EN EL PERIODO		
CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS	**INGRESO**	**RETIRO**
DIEGO JAVIER GONZALEZ	0	
CONSORCIO OBRAS ESPECIALES HIDROSANITARIAS IBAGUE	11	

24. INDICADORES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Según lo determina la Resolución 0312 de 2019 en el Art. 30. Indicadores Mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo. A partir del año 2019, las empresas anualmente llevarán un registro de los indicadores de SST, donde se determinará: frecuencia de accidentalidad, severidad de accidentalidad, ausentismo por causa médica, e índice de lesiones incapacitantes de accidentes de trabajo.

✓ **FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD**

Periodo	N° de A.T en el mes	N° de días perdidos	N° de colaboradores	Acumulado índice de frecuencia
23 de junio al 22 de julio del 2026	0	0	46	**0**
El índice de frecuencia fue 0, lo que significa que, al no presentarse accidentes de trabajo en el periodo, en CONSORCIO OBRAS ESPECIALES HIDROSANITARIAS IBAGUÉ equivale a 0 accidentes por cada millón de horas – hombre trabajadas.				

✓ **SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD**

Periodo	N° días de incapacidad por AT	N° de días cargados en el mes	N° de colaboradores en el periodo	IS
23 de junio al 22 de julio del 2026	0	30	46	**0**
El índice de severidad obtenido es 0 ya que no se presentaron accidentes de trabajo en el periodo.				

✓ **AUSENTISMO POR CAUSA MEDICA**

Periodo	N° de días de ausencia por incapacidad medica laboral o común en el mes	N° de trabajadores en el periodo	N° de días programados durante el periodo
23 de junio al 22 de julio del 2026	0	46	30
Durante el periodo comprendido del 23 de junio al 22 de julio del 2026, hubo 0% de ausentismo por causa de incapacidad medica laboral.			

✓ **INCIDENCIA ENFERMEDAD LABORAL**

Periodo	N° casos nuevos de enfermedad laboral	N° de colaboradores en el mes
23 de junio al 22 de julio del 2026	0	46
No se presentaron casos de enfermedades laborales durante el periodo.		

HEYDY CATERINE MARIN GUZMAN
Profesional SST

MARIAN KATERINE MUÑOZ
Profesional SST

CONSORCIO REDES VIALES
NIT. 902.052.366 - 5

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº 2381 DE 2026

ANEXO 15.4 - PAGO SS PERSONAL INTERVENTORIA.

CONSORCIO REDES VIALES

MUNICIPIO DE IBAGUÉ

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA No: 2070 Y 2350 DEL 08 DE ABRIL DE 2020

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 25/06/2020 AL 02/07/2020

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 2301 DEL 08 DE ABRIL DE 2020

NOMBRE ARL: SURA

CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL SALACO 2020

PROYECTO: CONSTRUCCION, OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2

INTERVENTOR: CONSORCIO REDES IBAGUE

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFENALCO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | JUNIO 2020 | | | | | | | | JULIO 2020 | | | | | | | |

CONSORCIO REDES VIALES
NIT. 902.052.366 - 5

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº 2381 DE 2026

ANEXO 15.4 - PAGO SS PERSONAL CONTRATISTA LOTE 1.

CONSORCIO REDES VIALES

IBAGUÉ

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. [illegible]

MES Y AÑO DEL INFORME ACTUAL: [illegible]

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. [illegible]

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL SALADO 2020

CONSTRUCCIÓN, OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PEDALES DE ACCESO AL CICLOPARQUELANDIA Y AUTOPISTAS DE RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO AFECTADO POR LA OBRA LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ - LOTE 1

CONSORCIO RIOS VIALES

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL


| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | JUNIO 2024 | | | | | | | JULIO 2024 | | | | | | |

CONSORCIO REDES VIALES
NIT. 902.052.366 - 5

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº 2381 DE 2026

ANEXO 15.4 - PAGO SS PERSONAL CONTRATISTA LOTE 2.

CONSORCIO REDES VIALES

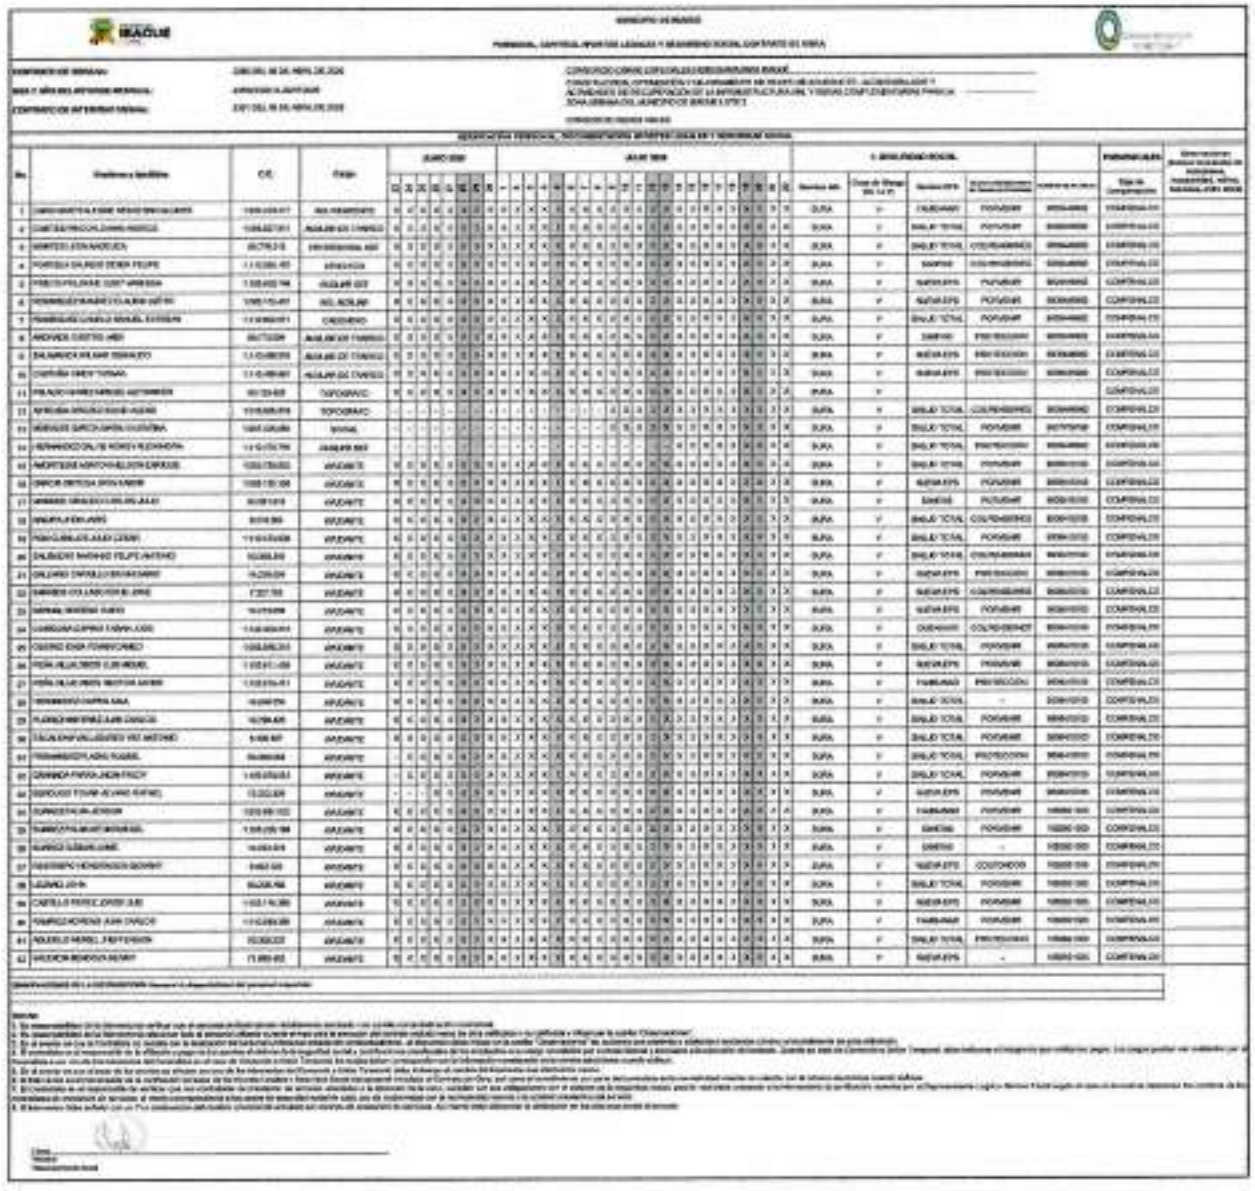

166

CONSORCIO REDES VIALES
NIT. 902.052.366 - 5

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº 2381 DE 2026

15.5 INFORME AMBIENTAL Nº3 - CONSORCIO REDES VIALES

CONSORCIO REDES VIALES

Alcaldía Municipal Ibagué

ibagué capital musical

ALCALDIA DE IBAGUE

GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ

INFORME AMBIENTAL DE INTERVENTORIA No 02

21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2026

CONTRATO 2381 DEL 08 DE ABRIL DE 2026



CONSORCIO REDES VIALES

R.L LIZETH MARCELA CIFIENTES

NIT 902.052.366-5

IBAGUÉ, TOLIMA

Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

168

1. INTRODUCCION

El presente documento presenta las acciones realizadas por parte del contratista de obra para dar cumplimiento al PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, dentro del desarrollo de los siguientes Contratos de Obra descritos a continuación:

Contrato de obra N° 2379 del 08 de abril de 2026, cuyo objeto es "CONSTRUCCION, OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ACTIVIDADES DE RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1"

Contrato de obra N° 2380 del 08 de abril de 2026, cuyo objeto es "CONSTRUCCION, OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ACTIVIDADES DE RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 2"

En el mismo sentido, se suscribió el Contrato de Interventoría 2381 del 08 de abril de 2026, con el CONSORCIO REDES VIALES, cuyo objeto es "CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION, OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ACTIVIDADES DE RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y LOTE 2."

Este documento tiene como objetivo describir las actividades y acciones enfocadas a la gestión ambiental, teniendo en cuenta los impactos ambientales que se puedan generar. Estos son particulares de cada proyecto y dependen del tipo de actividad y las características socio económicas, físico, bióticas y culturales del área donde se desarrolla el proyecto.

Respecto a lo anterior la interventoría tiene la obligación realizar el seguimiento del cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, los procedimientos técnicos y ambientales que se deben tener en cuenta en la gestión ambiental del presente proyecto, donde se definen las medidas de manejo mínimas que deben ser implementadas y complementadas por el contratista de acuerdo con el tipo de obra a desarrollar.

2. Descripción del Proyecto

2.1. Localización general del Proyecto

El presente proyecto que tiene por objetivo "CONSTRUCCION, OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE", se encuentra ubicado en la ciudad de Ibagué, contempla la intervención de la malla vial del sector comprendido entre la calle 103 y 171 del corredor vial denominado Avenida Ambala.

En total, se prevé intervenir aproximadamente en el Lote 1 tramo comprendido entre la calle 103 y la calle 125, con una longitud aproximada de 1.500 metros lineales y un área estimada de intervención de 13.500 m2 y Lote 2 tramo comprendido entre la calle 125 y la calle 171, en una longitud aproximada de cuatro (4) kilómetros, sin intervención sobre la estructura del pavimento.



Imagen No 1: Localización del municipio de Ibagué
Fuente: Google.



Imagen No 2: Distribucion comunas del municipio de Ibagué
Fuente: Anexo Tecnico proceso licitación de Obra.

El proyecto de la referencia está localizado en la Ciudad de Ibagué, departamento del Tolima.



3. Justificación del proyecto

La ejecución del presente proyecto se sustenta en la necesidad de intervenir el sector comprendido entre la calle 103 y 171 del corredor vial denominado Avenida Ambala en el municipio de Ibagué, con el objetivo de generar beneficios tangibles para la comunidad y la infraestructura urbana. Una vez ejecutadas las obras, se espera lograr:

- ✓ El goce y disfrute del espacio público por parte de los habitantes del municipio.
- ✓ El mejoramiento de la calidad de vida de los sectores intervenidos gracias a una mayor facilidad para la movilidad y el acceso a los servicios públicos.
- ✓ La disminución de la vulnerabilidad del sistema vial y la optimización del tráfico vehicular en el municipio.
- ✓ La reducción del riesgo de afectaciones sanitarias, al garantizar superficies adecuadas para la evacuación de aguas lluvias, disminuyendo la incidencia de infecciones respiratorias y

enfermedades relacionadas con polvo o barro.

- ✓ El fortalecimiento de instrumentos que aseguren el manejo y control eficiente del tránsito en la zona.
- ✓ El impulso al desarrollo regional mediante una infraestructura de transporte que fomente la conectividad y competitividad local.

Los beneficios esperados abarcan impactos positivos a nivel local, regional y macroeconómico, cerrando brechas de infraestructura y potenciando la competitividad territorial. De igual forma, la modernización de las vías contribuirá a dinamizar la economía local, reducir costos de transporte, mejorar la conectividad y favorecer el desarrollo integral del municipio.

4. OBJETIVOS

Garantizar las gestiones ambientales se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en la normatividad legal vigente nacional, evitando así que se generen impactos negativos significativos contra el Medio Ambiente y los Recursos Naturales Potencialmente Renovables.

Fortalecer el seguimiento y control ambiental de las actividades desarrollas dentro de la obra, además de unificar criterios para la evaluación y seguimiento a los programas establecidos en el Plan de Manejo Ambiental "PMA"

Supervisar los lineamientos para hacer un adecuado manejo de los programas del PMA, que se apliquen en las distintas etapas de ejecución y cierre de los contratos. Minimizando los riesgos de alteración de la calidad de los suelos, agua y aire, así como la afectación a la salud humana.

5. MARCO LEGAL

El ministerio del medio ambiente creado bajo la ley 99 de diciembre de 1993, específicamente bajo decreto 1753 del 3 de agosto de 1994 y decreto 2041 del 15 de octubre de 2014, quien define y reglamenta los estudios de impacto ambiental.

Basados en análisis y estudios realizados para impactos previsibles, se tomaron en cuenta las siguientes leyes, decretos, resoluciones y acuerdos, de los cuales se pueden formular acciones contempladas en el plan de gestión ambiental.

NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE	
Ley 99 de 1993 (sus decretos reglamentarios 1753 de 1994 y 2041 de 2014)	Planificación de los proyectos, criterios ambientales a tener en cuenta durante el diseño, construcción y operación de los mismos. Clasificación de los proyectos, definición de competencias de las autoridades.
Decreto 1753 de 1994	Por el cual se reglamentan parcialmente los títulos VIII y XII de la ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales.
Decreto 2041 de 2014	Por el cual se reglamenta el título VIII de la ley 1993 sobre licencias ambientales.
Decreto 1594 de 1994	Regula la utilización del agua. Prevención de la contaminación del recurso agua.
Decreto 1913 de 06 de agosto de 2002	Por el cual reglamenta la ley 142 de 1994, la ley 632 de 2000 y la ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el decreto ley 2811 de 1974 y la ley 99 de 1993 en relación con la gestión integral de residuos sólidos.
Decreto 901 de 1997	Reglamenta y establece las tasas retributivas.
Ley 142 de 1994	Establece el régimen de los servicios públicos.
Decreto 2104 de 1983 y decreto 1713 de 2002	Manejo integral de residuos sólidos.

Decreto ley 2811 de 1974	Protección del recurso suelo y de la fauna y flora (permisos y aprovechamiento)
Decreto 475 de 1998	Normas técnicas de calidad del agua potable.
Resolución 472 de 2017	Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición RCD y se dictan otras disposiciones.
Decreto 1076 de 2015	Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible.

6. GENERALIDADES

INTERVENTOR	CONSORCIO REDES VIALES
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	2381 del 08 de abril de 2026
OBJETO DE INTERVENTORIA	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION, OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ACTIVIDADES DE RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y LOTE 2."

LOTE 1

INTERVENTOR	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL SALADO 2026
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	2379 del 08 de abril de 2026
OBJETO DE INTERVENTORIA	"CONSTRUCCION, OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1."

LOTE 2

INTERVENTOR	CONSORCIO OBRAS ESPECIALES HIDROSANITARIAS IBAGUÉ
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	2380 del 08 de abril de 2026
OBJETO DE INTERVENTORIA	"CONSTRUCCION, OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 2."

7. ACTIVIDADES REALIZADAS

El contratista realizo las siguientes actividades dentro del periodo comprendido entre el 21 de junio al 20 de julio de 2026.

- El contratista manifiesta inducción ambiental al nuevo personal durante el periodo comprendido del 21 de junio al 20 de julio de 2026.
- Implementación del PMT y PAGA.
- Se instalaron señales temporales en obra para actividades realizadas en campo.
- Instalación de punto ecológico en obra.
- Charlas y capacitaciones ambientales.
- Inspección pre operacional de maquinaria y vehículos.
- Orden y aseo general de la obra.
- Señalización y demarcación.
- Protección acopio materiales de obra.

8. PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL

Para la ejecución del proyecto "CONSTRUCCION, OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y LOTE 2" Los contratistas realiza el PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA), en el cual el contratista realiza la adaptación con respecto a las condiciones de ejecución del proyecto; los cuales se tuvieron en cuenta los siguientes programas:

- Programa 1: Gestión del proyecto.
- Programa 2: Manejo actividades constructivas.
- Programa 3: Gestión recurso hídrico y atmosférica.
- Programa 4: Biodiversidad y servicios ecosistémicos.
- Programa 5: Manejo de instalaciones temporales, de maquinaria y equipos.
- Programa 6: Programa de gestión social.

Con lo anterior se realiza una descripción de cada uno de los programas con sus respectivos proyectos que lo integran el PAGA y dan cumplimiento a la política ambiental.

8.1 PROGRAMA 1. GESTIÓN DEL PROYECTO

8.1.1 Subprograma 1. Conformación del Grupo de Gestión Ambiental

Para el cumplimiento y desarrollo de las acciones propuestas en cada programa, el contratista designa para el grupo de gestión ambiental a los siguientes profesionales:

- **LOTE 1**

CARGO	NOMBRE
Ingeniero Director de Obra	Jaime Alexander Ortigoza Giraldo
Residente de Obra	Guillermo Jauregui
	Oswaldo Meza
Topógrafo	Luis Enrique Garay
	Viky Martínez
Especialista Hidraulico y Ambiental	Jorge Alberto Ramos
Profesional Ambiental en Campo	Angela Johana Vanegas

- **LOTE 2**

CARGO	NOMBRE
Ingeniero Director de Obra	Manuel Alexander Palacio Gomez
Residente de Obra	Didier Felipe Portela
Topógrafo	Johan Ivan Zapata Lopez
Especialista Ambiental	Laura Millan

Conformación de grupo de gestión social y ambiental	
Profesionales propuestos / Profesionales contratados *100	
No. Profesionales Propuestos.	7
No. Profesionales Contratados.	7
% de cumplimiento	100%

8.1.2. Subprograma 2. Charlas y capacitaciones del personal de obra

Se evidencia por parte del contratista que durante el periodo reportado comprendido entre el 21 de junio al 20 dejulio no se realizaron charlas por parte de los profesionales Ambiental y Profesional SST.

Inducción ambiental al personal de obra	
Personal vinculado / Inducciones realizadas*100	
No. Personal vinculado.	0
No. Inducciones realizadas.	0
% de cumplimiento	0%

- Se realizaron charlas ambientales con una intensidad de 10 min / 40 min en los siguientes temas.

✓ Orden y Aseo en el Área de Trabajo.
✓ Manejo de los materiales de construcción.
✓ Adecuado manejo de señalización.
✓ Conservación de los recursos.
✓ Precaución con los Efectos del Cambio Climático.
✓ Manejo de los residuos sólidos.

- Se realizaro capacitacion ambiental con una intensidad en el siguiente tema.

FECHA	TEMA	N° ASISTENTES
14-07-2026	Contaminación Ambiental.	36









Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

8.1.3. subprograma 3. Cumplimiento de los Requisitos Legales

Los impactos a manejar:

- Conflictos con la comunidad e instituciones.
- Requerimientos de la junta de acción comunal.
- Requerimientos de la autoridad competente.

De acuerdo a las características del proyecto y el lugar donde se ejecuta la obra se realizaron las siguientes solicitudes:

RECURSO	TIPO DE PERMISO	JUSTIFICACIÓN
AGUA	Agua superficial	Para el suministro de agua se realizará mediante la empresa de acueducto y alcantarillado Ibal, líquido que es transportado mediante carrotanque al punto de obra para el almacenamiento de agua para las actividades constructivas.
	Ocupación de Cauce	No se requiere permiso de ocupación de cauce teniendo en cuenta que se realizara el mejoramiento de vías urbanas ya establecidas.
	Vertimientos	Se realizará la gestión con los propietarios de predios para el préstamo y/o alquiler de unidades sanitarias las cuales cuentan con sistema de alcantarillado.
FLORA	Aprovechamiento forestal	No se requiere, el componente arbóreo no se verá afectado.
SUELO	Materiales de Construcción	El suministro de materiales de construcción será por un tercero los cuales cuentan con la documentación.
	Manejo y Disposición de RCD	Para el manejo de disposición de RCD se dispondrá sobre el lote El Palmar ubicado en la hacienda el Zorros del municipio de Ibagué.
	Manejo y Disposición de Residuos Sólidos Convencionales	Los residuos sólidos serán entregados a la empresa de servicios públicos del Municipio de Ibague para su disposición final. (Interaseo).

Subprograma 3. Cumplimiento de los Requisitos Legales	
Permisos requeridos / Permisos obtenidos*100	
No. Permisos requeridos.	0
No. Permisos obtenidos.	0
% de cumplimiento	0%

8.2 PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

8.2.1. Subprograma 1. Manejo Integral de Materiales de Construcción.

- Medidas de manejo de materiales pétreos

  El material granular requerido en la obra para este periodo fue suministrado por un tercero, es transportado en volquetas debidamente carpadas para mitigar la polución y derrame de los materiales desde su punto de partida hasta el punto destino. El material es ubicado en un área específica de obra sin obstaculizar los trabajos ni afectar el tránsito vehicular; este material es destinado para la conformación de la vía.

  - **Lote 1**





Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

- **Lote 2**





- Medidas de manejo para prefabricado:
  El proyecto ha requerido de materiales prefabricados, tubería en, formaletas, acero, geotextil, sardineles y entre otros, los cuales han sido descargados en sitios temporales de almacenamiento de los frentes de obra.

- **Lote 1**





- **Lote 2**





Subprograma 1. Manejo Integral de Materiales de Construcción.	
Medidas programadas/ Medidas implementadas*100	
No. Medidas programadas.	2
No. Medidas implementadas.	2
% de cumplimiento	100%

8.2.2. Subprograma 2. Señalización frente de obra y sitios de obra.

Para este periodo el contratista ha realizado la señalización del sector intervenido, donde se ha realizado la delimitación del área de trabajo; con tela verde, cinta de demarcación con franjas amarillas y negras, también se han localizado barreras, de igual modo se ha realizado la señalización vertical de tipo preventiva, reglamentaria e informativa en la vía.

- **LOTE 1**









- **LOTE 2**









Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

8.2.3. Subprograma 4. Manejo y disposición final de escombros y lodos.

Durante este periodo se ha verificado que el contratista ha realizado almacenamiento temporal de los sobrantes o escombros en los frentes de trabajo adecuadamente y en su mayoría de veces es retirado inmediatamente del frente. Por otra parte, el transporte de material de excavación se realiza en volquetas sencillas y doble troques las cuales se encuentran en buenas condiciones y con su documentación al día.









8.2.4. Subprograma 4. Manejo de residuos de convenciones solidos especiales.

IMPACTOS

- Contaminación del aire
- Contaminación del agua
- Contaminación del suelo
- Afectación cobertura Vegetal


ACCIONES

Para el adecuado manejo de residuos sólidos el contratista cuenta con puntos ecológicos con sus respectivas bolsas de colores según la norma.







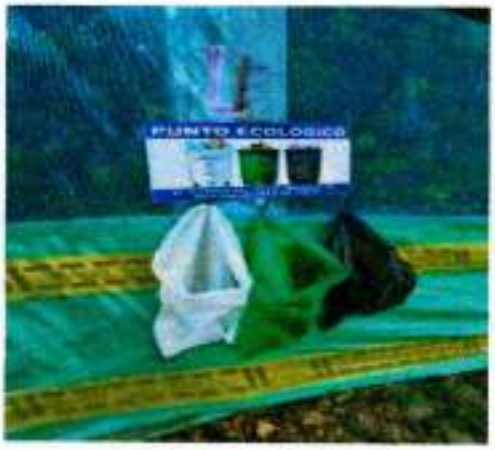









Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

8.3 PROGRAMA 3. GESTIÓN RECURSO HÍDRICO Y ATMOSFÉRICA

8.3.1. Subprograma 1. Seguimiento Y Control Al Manejo De Aguas Superficiales.

Para la hidratación del personal se realiza por medio de agua en bolsa apta para el consumo la cual es adquirida en empresa del municipio en las que se requiera el abastecimiento de agua, esta misma es suministrada y pagada a un proveedor utilizado carrotanques y/o comunidad aledaña a la obra.

Para el desarrollo de las actividades de obra el en las que se requiera el abastecimiento de agua, esta misma es suministrada por un carrotanque y/o comunidad aledaña a la obra.

8.3.2. Subprograma 2. Manejo de líquidos domésticos e industriales.

El contratista cuenta con campamentos, donde se hace el empleo de la batería sanitaria, la cual se encuentran conectada a un sistema de alcantarillado. Como compromisos adquiridos por el contratista y trabajadores está el adecuado uso de esta y mantener el área aseada y ordenada.



Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

8.4 PROGRAMA 4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

8.4.1. Subprograma 3. seguimiento, control y monitoreo a la Protección De Ecosistemas Estratégicos O Sostenibles.

Durante el periodo el área de influencia directa del proyecto no se cuenta con un ecosistema sensible. De igual forma de manera constante se realizaron recorridos de verificación del contorno de la obra con el objetivo de hacer recolección de residuos y/o material si se observan, esto con el fin de generar protección de las fuentes hídricas por efecto de escorrentia y el componente de flora y fauna del entorno al proyecto.

9.2PROGRAMA 5. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES, DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

9.2.1 Subprograma 1. Seguimiento, Control Y Monitoreo A La Instalación, Funcionamiento Y Desmantelamiento De Campamentos Y Sitios De Acopio Temporales.

Para la ejecución de las obras el contratista cuenta con un campamento ubicado en cada frente de trabajo, donde se almacenan las herramientas, equipos menores, dotación y EPP, Equipos de Emergencias.





Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

9.2.2 Subprograma 2. Manejo de maquinaria, equipos y vehículos.

Para este periodo se constató que el contratista conto con la siguiente maquinaria y equipo en los frentes de obra.

- Excavadora de oruga.
- Vibro compactador doble rodillo.
- Vibro compavtador de llanta.
- Motoniveladora.
- Compresor.
- Finisher.
- Fresadora.
- Retroexcavadora sobre llantas.
- Carro tanque de agua.
- Volquetas.

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

- Realizar el mantenimiento permanente de todos los elementos utilizados para la demarcación de la obra, como el cerramiento de todas las áreas de trabajo delimitando completamente el sitio de la obra con tela verde o cinta de demarcación

- La presentación oportuna de los informes ambientales es fundamental para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, facilitar el seguimiento de los compromisos ambientales y demostrar una gestión responsable de los recursos naturales. Además, la entrega dentro de los plazos establecidos permite a las autoridades competentes evaluar de manera adecuada el desempeño ambiental, prevenir posibles incumplimientos y fortalecer la transparencia y la confianza entre las partes involucradas.

- Los materiales pétreos se deben almacenarse en forma adecuada en los sitios seleccionados para tal fin, confinarse y cubrirse con polietileno o con otro material, con el objeto de prevenir la generación de impactos ambientales por la emisión de material particulado a la atmósfera o arrastre de materiales a los cuerpos de agua.

Ing. YUSSI SIERRA SALAZAR
Ingeniera Ambiental
Elaboro

Ing. LIZETH MARCELA CIFIENTES
R/L. Consorcio Redes Viales
Aprobo
