ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO**	**CÓDIGO**	MS-GP-FR-034
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	**VERSIÓN**	1
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	**FECHA**	29/10/2025

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSULTORES DONOVAN S.A.S	CONSULTORES DONOVAN SAS	**FECHA**	jueves, 24 de septiembre de 2026	**SEMANA No.**	**35**	DEL	**17-sep-26**	AL	**24-sep-26**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR VIAL VERGARA A NOCAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	Corredor Vergara - Nocaima

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**	
CONTRATO No.:	ICCU-CTO-1624- 2025	**CONTRATO No.:**	ICCU-CTO-1586- 2025
PLAZO INICIAL:	NUEVE (9) MESES	**PLAZO INICIAL:**	NUEVE (9) MESES
CONTRATISTA:	CONSULTORES DONOVAN SAS	**CONTRATISTA:**	OPEN INGENIERIA S.A.S.
FECHA DE INICIACIÓN:	26 de enero de 2026	**FECHA DE INICIACIÓN:**	26 de enero de 2026
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N/A	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N/A
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N/A	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	25 de octubre de 2026	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	25 de octubre de 2026
PLAZO ACTUALIZADO:	272 días	**PLAZO ACTUALIZADO:**	272 días
PLAZO TRANSCURRIDO:	241 días	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	241 días
VALOR INICIAL :	$ 970.900.948	**VALOR INICIAL :**	$ 7.943.403.636
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 970.900.948	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 7.943.403.636
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 970.900.948	**VALOR POR PAGAR:**	$ 7.943.403.636
VALOR ANTICIPO:	$ 293.717.933,83	**VALOR ANTICIPO:**	$ 1.588.680.727,20
SUPERVISOR:	MARIA DEL PILAR SUAREZ MONZÓN	**INTERVENTOR**	CONSULTORES DONOVAN SAS

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

A continuación, se relacionan las actividades realizadas durante la semana:

-Se realizó actividades de excavación, instalación de tubería 12" para conexión pozo existente a pozo nuevo y relleno para red de alcantarillado en tramo 1.
-Se realizó actividades de excavación para subrasante entre las abscisas K0+010 a K0+100 en tramo 1.
-Se realizó actividades de construcción de filtro costado derecho entre las abscisas K0+060 a K0+117 en tramo 1.
-El 10 de septiembre se realizó actividades de demolición, excavación, instalación de tubería de 36” en concreto y relleno para construcción de alcantarilla ubicada en la abscisa K0+058 del tramo 1.
-Se realizó actividades de figurado de acero y vaciado de concreto de losa para construcción de alcantarilla ubicada en abscisa K0+303 en tramo 2.
-Se realizó actividades de vaciado de concreto para muros de disipador de alcantarilla ubicada en la abscisa K0+925 en tramo 2.
-Se realizó actividades de relleno y construcción de filtro en muro 2 ubicado en las abcisas K0+280 a K0+310 del tramo 2.

-De acuerdo con la programación V8 aprobada por la interventoría, se tiene un avance acumulado programado del 87% y un avance fisico acumulado ejecutado del 57%. De acuerdo con el avance físico del contrato, se presenta un atraso del 30%,

-El avance financiero programado acumulado del contrato es del 85,13% que corresponde a $ 6.762.273.007, el avance financiero ejecutado acumulado del contrato es del 44,98% que corresponde a $ 3.561.209.871 respecto al flujo de caja se presenta un atraso del 40,15% correspondiente a que el contratista no ha iniciado con las actividades de: Construcción de muros de contención e instalación de geotextil y subbase granular en tramo1.

CORRESPONDENCIA ENVIADA

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-349-2026 del 17 de septiembre de 2026 remitió al ICCU Remisión informe semanal N.34 – Actividades realizadas del 10 de septiembre de 2026 al 17 de septiembre de 2026.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-350-2026 del 17 de septiembre de 2026 remitió al ICCU Alcance a oficio DON-1624-ICCU-329-2026 Remisión plan de cargas hasta finalización de plazo contractual contrato ICCU-CTO-1624-2025.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-351-2026 del 18 de septiembre de 2026 remitió al ICCU Remisión informe técnico mensual N.7 de las gestiones realizadas por la interventoría durante el periodo del 1 de agosto de 2026 al 31 de agosto de 2026.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-352-2026 del 21 de septiembre de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S Respuesta a comunicado OFC-ICCU-1586-2025-289 “Entrega del informe técnico No.7 V1” Aprobación – Contrato de obra 1586-2025.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-353-2026 del 22 de septiembre de 2026 remitió al ICCU Alcance a oficio DON-1624-ICCU-350-2026 Solicitud de prorroga y adición para el contrato de interventoría ICCU-CTO-1624-2025.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-354-2026 del 24 de septiembre de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S Aprobación del informe mensual SST N°7 V2 del contratista - Respuesta a su comunicado OFC-ICCU-1586-2025-305 Entrega del informe del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo - SG-SST No.7 V2.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-296 del 17 de septiembre de 2026, remitió Entrega del Diseño Estructural del Muro No. 1 de contención – Alcance al comunicado OFC- ICCU-1586-2025-202.

- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-297 del 18 de septiembre de 2026, remitió Socialización de avance del CONTRATO ICCU-1586-2025.

- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-298 del 18 de septiembre de 2026, remitió Socialización de avance del CONTRATO ICCU-1586-2025.

- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-299 del 18 de septiembre de 2026, remitió Socialización de avance del CONTRATO ICCU-1586-2025.

- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-300 del 18 de septiembre de 2026, remitió Socialización de avance del CONTRATO ICCU-1586-2025.

- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-301 del 18 de septiembre de 2026, remitió Socialización de avance del CONTRATO ICCU-1586-2025.

- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-302 del 18 de septiembre de 2026, remitió Socialización de avance del CONTRATO ICCU-1586-2025.

- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-303 del 18 de septiembre de 2026, remitió Entrega y solicitud de aprobación del Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2.

- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-304 del 23 de septiembre de 2026, remitió Respuesta a solicitud - Alternativa para el manejo del sistema radicular de individuo arbóreo.

- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-305 del 23 de septiembre de 2026, remitió Entrega del Informe del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST No. 7 V2 - Respuesta al comunicado DON-1624-ICCU-348-2026.

- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-306 del 24 de septiembre de 2026, remitió Entrega del diseño en tierra armada.

- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-307 del 24 de septiembre de 2026, Entrega del personal de mano de obra calificada.

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	TRAMO 1 1.1-EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	5-ago-26	15-ago-26	11			no iniciado	no iniciado	no iniciado
2	TRAMO 1 2.4-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	18-ago-26	31-ago-26	14			no iniciado	no iniciado	no iniciado
3	TRAMO 1 2.6-SUBBASE GRANULAR	18-ago-26	31-ago-26	14			no iniciado	no iniciado	no iniciado
4	TRAMO 1 2.7-RIEGO DE IMPRIMACION	28-sep-26	3-oct-26	6					
5	TRAMO 1 2.9-MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	28-sep-26	3-oct-26	6					
6	TRAMO 1 4.2-CONCRETOS CLASE D, f´c =4000 PSI (BASES)	18-ago-26	26-ago-26	9			no iniciado	no iniciado	no iniciado
7	TRAMO 1 4.3-CONCRETOS CLASE D, f´c =4000 PSI (ELEVACIONES)	21-ago-26	5-sep-26	16			no iniciado	no iniciado	no iniciado
8	TRAMO 1 4.4-SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	13-ago-26	30-sep-26	49			no iniciado	no iniciado	no iniciado
9	TRAMO 1 4.5-RELLENO PARA ESTRUCTURAS (AFIRMADO)	14-ago-26	18-ago-26	5			no iniciado	no iniciado	no iniciado
10	TRAMO 1 4.6-MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	3-ago-26	8-ago-26	6			no iniciado	no iniciado	no iniciado
11	TRAMO 1 4.8-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	3-ago-26	8-ago-26	6			no iniciado	no iniciado	no iniciado
12	TRAMO 1 4.9-TUBERÍA DRENAJE PVC 110	3-ago-26	8-ago-26	6			no iniciado	no iniciado	no iniciado
13	TRAMO 1 5.2-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	6-ago-26	6-ago-26	1			no iniciado	no iniciado	no iniciado
14	TRAMO 1 5.3-CONCRETOS CLASE D, f´c =4000 psi (BASES)	13-ago-26	15-ago-26	3			no iniciado	no iniciado	no iniciado
15	TRAMO 1 5.4-CONCRETOS CLASE D, f´c =4000 PSI (ELEVACIONES)	18-ago-26	22-ago-26	5			no iniciado	no iniciado	no iniciado
16	TRAMO 1 5.5-SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	10-ago-26	12-ago-26	3			no iniciado	no iniciado	no iniciado
17	TRAMO 1 5.7-CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 3500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	16-sep-26	30-sep-26	15					
18	TRAMO 1 5.8-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	8-ago-26	15-ago-26	8			no iniciado	no iniciado	no iniciado
19	TRAMO 1 5.9-TUBERÍA DRENAJE PVC 110	8-ago-26	15-ago-26	8			no iniciado	no iniciado	no iniciado
20	TRAMO 1 5.10-MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	8-ago-26	15-ago-26	8			no iniciado	no iniciado	no iniciado
21	TRAMO 1 6.1-LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	13-oct-26	24-oct-26	12					
22	TRAMO 1 6.2-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES	13-oct-26	24-oct-26	12					
23	TRAMO 1 6.6-DEFENSA METÁLICA	13-oct-26	24-oct-26	12					
24	TRAMO 1 6.7-SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.90X0.90M, POSTE 3.5M	13-oct-26	24-oct-26	12					
25	TRAMO 1 NP-01-CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	18-ago-26	9-oct-26	53			no iniciado	no iniciado	no iniciado
26	TRAMO 1 NP-02-DREN EN TUBERÍA PVC SANITARIA, D=4"	5-ago-26	14-ago-26	10			no iniciado	no iniciado	no iniciado
27	TRAMO 1 NP-06-CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	14-sep-26	30-sep-26	17					
28	TRAMO 1 NP-07-BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA Y CEMENTO	31-ago-26	21-sep-26	22					
29	TRAMO 1 NP-10-PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	18-ago-26	19-ago-26	2			no iniciado	no iniciado	no iniciado
30	TRAMO 1 NP-11-CUBIERTA POZO D=1.7M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	28-ago-26	29-ago-26	2					
31	TRAMO 1 NP-12-CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.38M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	20-ago-26	26-ago-26	7			no iniciado	no iniciado	no iniciado
32	TRAMO 1 NP-13-PILOTE EN CONCRETO DE 4000 PSI, DIÁMETRO EXTERNO 1.8M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	27-abr-26	11-jul-26	76	6-may-26	11-jul-26	66	10	0
33	TRAMO 1 NP-20-SUMINISTRO Y CONFORMACIÓN DE ESTRUCTURAS ESCALONADAS Y COLCHONES DE ENROCADO COMO ELEMENTOS DE REVESTIMIENTO Y DISIPACIÓN DE ENERGÍA EN LOS DESCOLES	18-ago-26	24-oct-26	68			no iniciado	no iniciado	no iniciado

Plazo del proyecto: 81 días

** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION


AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	78,26%	44,48%	-33,78%
Durante el periodo	6,87%	0,49%	-6,38%
Acumulado Actual	85,13%	44,98%	-40,15%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
272 días	242,00	30 días	-109,22

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO

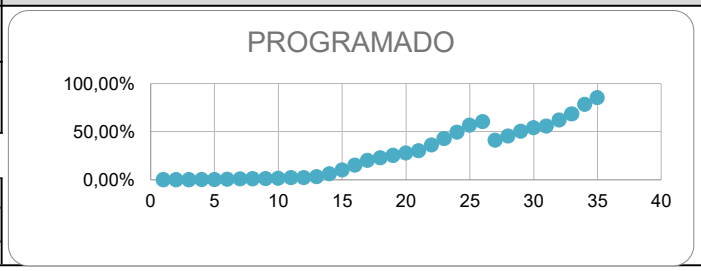

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO


AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 6.216.433.268	$ 3.522.008.214	57%
Durante el periodo	$ 6.762.273.007	$ 3.561.209.871	53%
Acumulado Actual	$ 12.978.706.275	$ 7.083.218.085	55%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-45%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO

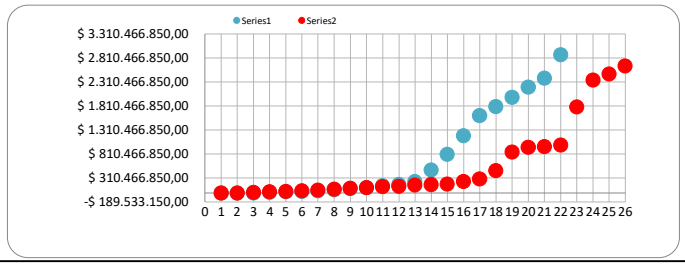


AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 1.944.545.211	$ -	0%
Durante el periodo	$ 2.001.737.717	$ -	0%
Acumulado Actual	$ 3.946.282.928	$ -	0%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-100%

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

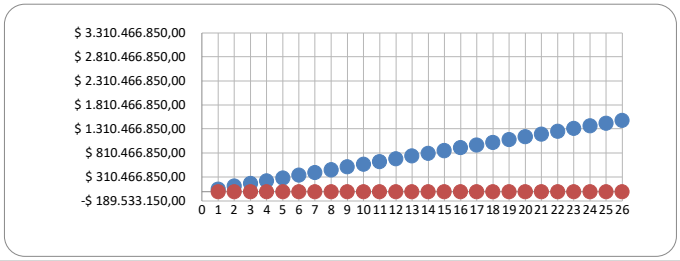

4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

Durante el periodo evaluado, la Interventoría desarrolló actividades de seguimiento, revisión documental y control del componente ambiental del proyecto, orientadas al cumplimiento de las obligaciones contractuales y de los lineamientos establecidos por la Supervisión Ambiental del ICCU, así:

- Durante el periodo reportado, la Interventoría realizó seguimiento a la respuesta emitida por la Corporación Autónoma Regional – CAR, relacionada con el reporte trimestral de gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) correspondiente al proyecto, verificando los aspectos pendientes de atención y las acciones requeridas para su correspondiente seguimiento.

- El día 22 de septiembre de 2026, un funcionario de la CAR se presentó en el área de intervención y realizó visita al proyecto, la cual fue atendida por los profesionales del contratista. Durante la visita se efectuó la correspondiente verificación en campo por parte de la autoridad ambiental.

- El día 23 de septiembre de 2026, mediante oficio OFC-ICCU-1586-2025-304, el contratista remitió a la Interventoría la propuesta para el confinamiento radicular del individuo arbóreo Ficus, para su respectiva evaluación y/o emisión de concepto favorable. A la fecha de elaboración del presente informe, los componentes Ambiental y Técnico de la Interventoría se encuentran adelantando el análisis integral de la propuesta presentada, considerando las condiciones particulares del individuo arbóreo y su interacción con la estructura de la vía en construcción.

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Entregables sociales

La interventoría refiere que los informes mensuales 1 al 7 del componente social del contratista se encuentran revisados y aprobados por interventoría. Igualmente, los informes mensuales sociales del 1 al 7 de interventoría se encuentran avalados por el ICCU.

El 22 de septiembre de 2026, la interventoría participo en el comité social N.º 8, a través del cual se reporto el avance de la gestión social del contrato.

Subprograma de información y divulgación:

La interventoría informa que los PSI del contrato se encuentran instalados y actualizados en el punto SAU del contrato y en las alcaldías municipales de Nocaima y Vergara Cundinamarca con el volante de invitación a la reunión de avance del contrato.

El 18 de septiembre de 2026, el contratista remitió a las alcaldías, personerías y concejos municipales de Nocaima y Vergara Cundinamarca las invitaciones a la reunión de avance del contrato y se espera para la otra semana, realizar la socialización en los predios.

El 18 de septiembre de 2026, la interventoría recibió del contratista la PPT para la reunión de avance, la cual fue revisada y objetada por interventoría el 22 de septiembre de 2026.

El 18 de septiembre de 2026, la interventoría remitió al ICCU el volante de cierre vial por 24 horas, el cual se encuentra pendiente a la fecha.

La reunión de avance del contrato se encuentra proyectada para el 7 de octubre de 2026.

Subprograma de servicio a la ciudadanía:
La interventoría informa que el Punto SAU físico, se encuentra ubicado en el balneario Casa Palma tramo 2 K0+030, con atención presencial los días Martes y miércoles de 9:00AM a 4:30 PM. Así mismo relaciona los canales de atención virtual, tales como: Línea móvil 3122229350 y el ccorreo electrónico socialcto1586@gmail.com.

PQRSD: La interventoría informa que a la fecha se han recibido cinco PQRSD, de las cuales 4 se encuentran cerradas y una abierta.

PQRSD 5: Fue allegada al ICCU por parte de la señora Dahiana Giraldo, quien solicito información general del estado del proyecto y los documentos contractuales del contratista e interventoría. La atención de la PQR se encuentra en trámite por parte del contratista.

Subprograma de MONC con enfoque de género:
La interventoría refiere que el porcentaje de cumplimiento para el personal MONCL es del 50% sobre el 30% requerido, el porcentaje de mujeres es del 21% sobre el 5% requerido 0% para personas en proceso de reintegración o reincorporación, dado a que según consulta con la agencia nacional de reintegración-ACN, no hay presencia de este tipo de personas en el área de influencia del contrato.

Programa de cultura vial y participación ciudadana:
La interventoría refiere que a la fecha se han realizado 5 reuniones con el comité de participación ciudadana y se encuentra programado el comité de participación N.º 6 para el 30 de septiembre de 2026 mediante recorrido de obra, tal cual lo solicitado por la comunidad en el comité anterior.

Respecto a los talleres de cultura ciudadana, se informa que a la fecha se ha realizado un taller de cultura vial y se encuentran programados los talleres de cultura ciudadana N.º 2 y 3, para el 14 y 15 de octubre de 2026, con apoyo de la Secretaria de Movilidad. Con estos dos últimos talleres, se daría cumplimiento a los requerimientos contractuales.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

Durante el periodo evaluado, la interventoría adelantó actividades de seguimiento, revisión y articulación institucional en el marco del componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), conforme a las obligaciones contractuales y la normativa vigente aplicable, así:

Reporte de Accidentalidad: Para la semana reportada en el presente informe NO se presentaron accidentes en interventoría ni contratista.

Personal de interventoría: Personal presentado y aprobado por la supervision del ICCU.

Personal de contratista:

-31. trabajadores en obra, aprobados por interventoría.

Durante el presente periodo el contratista allega de la documentación de vinculación del personal contractual de plantilla minima para revisión y aprobación, la cual se encuentra en revision por la interventoría.

- El día 21 de septiembre de 2026, el equipo COPASST del ICCU adelantó visita de auditoría al proyecto vial, realizando recorrido de obra, verificación y solicitud de documentación relacionada con el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo. Durante la visita fueron identificadas y comunicadas algunas observaciones. De acuerdo con lo manifestado por el profesional del ICCU encargado de la visita, estas serán formalizadas mediante informe dentro de los 15 días siguientes, para su respectiva atención y seguimiento.

- El día 23 de septiembre de 2026, mediante oficio OFC-ICCU-1586-2025-305, el contratista remitió a la Interventoría la atención y subsanación de las observaciones realizadas al Informe Mensual SST N.° 7, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 y el 31 de agosto de 2026, presentando para revisión la Versión N.° 2 del informe.

- Una vez adelantada la revisión integral del Informe Mensual SST N.° 7 – V2, junto con sus respectivos anexos y soportes, la Interventoría verificó la atención de las observaciones previamente formuladas y emitió concepto de aprobación del informe mediante oficio DON-1624-ICCU-354-2026 del 24 de septiembre de 2026.

- El día 24 de septiembre de 2026, la Interventoría estructuró y remitió a la Supervisión SST del ICCU el Informe Mensual SST N.° 7 de la Interventoría, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 y el 31 de agosto de 2026, junto con sus respectivos anexos y soportes, mediante oficio DON-1624-ICCU-355-2026, para su correspondiente revisión y/o aprobación por parte de la entidad.

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD
El plan de calidad se encuentra aprobado por parte de la interventoria
8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS
Durante la semana no se presentaron situaciones problematicas
8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)
N/A
8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL
N/A
8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO
N/A
8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS
N/A
8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)
N/A
8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)
N/A
8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)
N/A
8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)
N/A

9. PLAN DE ACCION RESULTADO DEL ANALISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAIZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA PROGRAMADA**
N/A		
N/A		

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

- Durante el periodo evaluado se evidencia la continuidad en el desarrollo de actividades técnicas en campo, incluyendo construcción de disipadores de energía, construcción de filtro y relleno para el muro 2 del tramo 2, excavación para la subrasante, construccion de filtro y red de alcantarillado en tramo 1.

- Durante el periodo reportado, la Interventoría realizó seguimiento a los requerimientos y actuaciones relacionadas con la gestión de RCD ante la CAR, incluyendo la visita efectuada por la autoridad ambiental al proyecto. Así mismo, se recibió y se encuentra en proceso de revisión integral la propuesta de confinamiento radicular del individuo arbóreo Ficus, cuyo análisis está siendo adelantado conjuntamente por los componentes Ambiental y Técnico, teniendo en cuenta las condiciones del árbol y de la estructura vial proyectada.

- Al corte de este semanal los informes mensuales del contratista e interventoría se encuentran aprobados del 1 al 7. Asimismo, se realizó el comité social N° 8 y se ha avenido avanzando en los preliminares para la reunión de avance del contrato a realizar el 7 de octubre de 2026. U. A la fecha el contratista cumple con el porcentaje de mano de obra no calificada local y de mujeres.

- Durante el periodo reportado, se realizó seguimiento al componente SST mediante la visita de auditoría adelantada por el COPASST del ICCU y la atención de las observaciones formuladas al Informe Mensual SST N.° 7. Una vez verificada la subsanación presentada por el contratista, la Interventoría aprobó la Versión N.° 2 del informe y posteriormente remitió el Informe Mensual SST N.° 7 de la Interventoría a la Supervisión SST del ICCU para su revisión y/o aprobación.

-De acuerdo con la programación V8 aprobada por la interventoría, se tiene un avance acumulado programado del 87% y un avance fisico acumulado ejecutado del 57%. De acuerdo con el avance físico del contrato, se presenta un atraso del 30%,

-El avance financiero programado acumulado del contrato es del 85,13% que corresponde a $ 6.762.273.007, el avance financiero ejecutado acumulado del contrato es del 44,98% que corresponde a $ 3.561.209.871 respecto al flujo de caja se presenta un atraso del 40,15% correspondiente a que el contratista no ha iniciado con las actividades de: Construcción de muros de contención e instalación de geotextil y subbase granular en tramo1.

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Imagen 1. Construcción de disipador de energía tramo 2.



Imagen 2. Excavación para la subrasante tramo 1.



Imagen 3. Construcción de filtro en tramo 1.



Imagen 4. Relleno y construcción de filtro en muro 2, tramo 2.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JUAN DIEGO ARENAS
