EDTB
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE **EL BAGRE**

El Bagre, Antioquia 17 de febrero 2026 **S.O -016-2026**

Señores:
MUNICIPIO DE EL BAGRE

CARLOS ANDRES ARRIETA GOMEZ
Secretario de Obras Públicas
Municipio de El Bagre

REF. RELACIÓN CUENTA DE COBRO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 537-2024

Mediante la presente hago llegar a su despacho la cuenta de cobro del contrato interadministrativo de mandato sin representación **No 537-2024,** celebrado entre el MUNICIPIO DE EL BAGRE y la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE EDTB, cuyo objeto es: MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VÍAS TERCIARIAS QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA EL PERICO Y VEREDA EL REAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VÍAS TERCIARIAS QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA EL PERICO Y VEREDA EL REAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE.

Atentamente,

FRANKLIN JOHAN CABARCAS MÉNDEZ
Cc. 1040501037
Gerente encargado

EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE **EL BAGRE**

El Bagre Antioquia, 17/02/2026

Cuenta de cobro 004

MUNICIPIO DE EL BAGRE
NIT 890.984.221-2

DEBE A:

EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE
NIT 901526561-7

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y CUATRO CON VEINTISIETE (CENTAVOS ($387.871.014.61)

POR CONCEPTO DE:

Contrato interadministrativo de mandato sin representación **No 537-2024** para **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA CONTRATACION DE LA MANO DE OBRA PARA LA MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VÍAS TERCIARIAS QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA EL PERICO Y VEREDA EL REAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE.**

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VÍAS TERCIARIAS QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA EL PERICO Y VEREDA EL REAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL *CONVENIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE.*

Favor consignar en la cuenta de **ahorros** No.**705-000016-18 de BANCOLOMBIA** por *concepto de obra la cifra de* ***$366.851.812.61***

Favor consignar en la cuenta de **ahorros** No. **705-000006-23 de BANCOLOMBIA**, por concepto de honorarios la cifra de **$21.019.202.00**

Atentamente,

FRANKLIN JOHAN CABARCAS MÉNDEZ
Cc. 1.040.501.037
Gerente encargado

EMPRESA PARA EL DESARROLLO

Actividad Económica Principal 4290
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 1011

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764101749463 de 19/11/2025 - 19/11/2027 autoriza FE - 1,001 a FE - 10,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	29/12/2025 14:56
Fecha de Vencimiento	29/03/2026 14:56
Fecha de Validación	29/12/2025 14:56
Forma de Pago	Crédito 90 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE - EDTB
Nombre Comercial	EDTB
NIT	901526561
Obligación	IVA
Email	gerenciaedtb@gmail.com
Teléfono	3135431359
Dirección Fiscal	CL 50 47 A 19, EL BAGRE, (ANTIOQUIA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	MUNICIPIO DE EL BAGRE
Nombre Comercial	
NIT	890984221
Obligación	NO APLICA
Email	hacienda@elbagre-antioquia.gov.co
Teléfono	
Dirección	
Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	011	HONORARIOS ACTA 1 Y FINAL AL CONVENIO 537-2024 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VÍAS TERCIARIAS QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA EL PERICO Y VEREDA EL REAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL *MARCO DEL CONVENIO ENTRE LA* GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE	1	EA	$17,663,195.00	IVA 19%	$17,663,195.00	$21,019,202.00

Subtotal	$17,663,195.00
IVA 19%	$3,356,007.00
Total a Pagar	**$21,019,202.00**

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: fc380b2792939328a2860e7e19c8491dc615fcdeb2514ecee0147e580260cb7f9087e98347b2ee72b95bb84abdd32067

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

Bancolombia

www.bancolombia.com.co

El Bagre 27/03/2025

BANCOLOMBIA S.A. informa que, a la fecha de emisión **EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE Nit 901526561** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene los siguientes productos en estado activo:

Nombre Producto	N.º Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta Ahorro "Conv 537-2024 Placa Huella -Vias Terciarias"	705-000016-18	2025/03/27	Activa

anteriormente.

*Si desea verificar la información de esta constancia, puede comunicarse a la línea de atención al cliente en: Bogotá: (601) 343 00 00, Medellín (604) 510 90 00, Cali (602) 554 05 05, Barranquilla (605) 361 88 88, Cartagena (605) 693 44 00, Bucaramanga (607 697 25 25, Pereira (606) 340 12 13, a nivel nacional: 018000912345; desde España: 900 995 717 y Estados Unidos: 1866 379 9714. Defensor del Consumidor Financiero: María Adelayda Calle Correa, de lunes a viernes entre 8:00 a.m. a 12 p.m. y 2:00 p.m. a 5:00 p.m. línea gratuita 01 8000 52 2622, teléfonos (604) 3561225, correo electrónico defensor@bancolombia.com.co, o en la: Carrera 48 #18 A 14, Edificio FIC48, Piso 11, Medellín.

BANCOLOMBIA.
El Bagre - Of. 705 El Bagre
Director(a) de Servicio al Cliente N° 300
Cedula N° 22749401

LILIANA HERNANDEZ SERPA.
Subgerente Sucursal El Bagre
Zona Sinú y Sabanas
El Bagre – Colombia
lipherna@bancolombia.com.co

Bancolombia

Certificado Bancario

Martes, 13 de agosto de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE - EDTB** identificado(a) con NIT **901526561**, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	*No. Producto*	*Fecha Apertura*	*Estado*
CUENTA DE AHORRO	705-000006-23	2021/10/08	A ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortes Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO

Bancolombia

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901526561	7	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	BARRIO BIJAO CRA 49A 48A 56	EL BAGRE-ANTIOQUIA	8370220	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1486068330	9485267747	E	2025/05/15	2025/05/16	BANCOLOMBIA	1	$6,731,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
																				$2,710,600						$2,117,600	
																				$2,003,100						$1,564,900	
																				$2,003,100						$1,564,900	
						$4,689,559	No	Fijo	PORVENIR	30	$4,689,559	16%	SIN RIESGO	$750,400	$0	$0	$0	$0	$0	$750,400		NUEVA E.P.S.	30	$4,689,559	12.5%	$586,200	
						$5,417,496	No	Fijo	PROTECCION	30	$5,417,496	16%	SIN RIESGO	$866,800	$0	$0	$0	$0	$0	$866,800		COOSALUD MOVILIDAD	30	$5,417,496	12.5%	$677,200	
						$2,411,773	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,411,773	16%	SIN RIESGO	$385,900	$0	$0	$0	$0	$0	$385,900		COOSALUD MOVILIDAD	30	$2,411,773	12.5%	$301,500	
																				$707,500						$552,700	
																				$707,500						$552,700	
						$4,421,584	No	Fijo	PORVENIR	30	$4,421,584	16%	SIN RIESGO	$707,500	$0	$0	$0	$0	$0	$707,500		NUEVA E.P.S.	30	$4,421,584	12.5%	$552,700	
																				$2,710,600						$2,117,600	

2025/05/16 10:48 a.m.

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Dias	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$2,117,600						$677,700						$373,200				$339,000		$508,400		$0		$0	
	$1,564,900						$500,800						$65,400				$250,500		$375,700		$0		$0	
	$1,564,900						$500,800						$65,400				$250,500		$375,700		$0		$0	
$0	$586,200		COMFAMA	30	$4,689,559	4%	$187,600	ARL SURA	30	$4,689,559	0.522%	1	$24,500	30	$4,689,559	2%	$93,800	3%	$140,700	0%	$0	0%	$0	No
$0	$677,200		COMFAMA	30	$5,417,496	4%	$216,700	ARL SURA	30	$5,417,496	0.522%	1	$28,300	30	$5,417,496	2%	$108,400	3%	$162,600	0%	$0	0%	$0	No
$0	$301,500		COMFAMA	30	$2,411,773	4%	$96,500	ARL SURA	30	$2,411,773	0.522%	1	$12,600	30	$2,411,773	2%	$48,300	3%	$72,400	0%	$0	0%	$0	No
	$552,700						$176,900						$307,800				$88,500		$132,700		$0		$0	
	$552,700						$176,900						$307,800				$88,500		$132,700		$0		$0	
$0	$552,700		COMFAMA	30	$4,421,584	4%	$176,900	ARL SURA	30	$4,421,584	6.96%	5	$307,800	30	$4,421,584	2%	$88,500	3%	$132,700	0%	$0	0%	$0	No
	$2,117,600						$677,700						$373,200				$339,000		$508,400		$0		$0	

2025/05/16 10:48 a.m.

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901526561	7	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	BARRIO BIJAO CRA 49A 48A 56	EL BAGRE-ANTIOQUIA	8370220	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1486068330	9485267747	E	2025/05/15	2025/05/16	BANCOLOMBIA	1	$6,731,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$2,710,600	$1,900	$0	$2,712,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$1,843,800	$1,300	$0	$1,845,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$866,800	$600	$0	$867,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$373,200	$300	$0	$373,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$373,200	$300	$0	$373,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$677,700	$500	$0	$678,200
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	4	$677,700	$500	$0	$678,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$2,117,600	$1,500	$0	$2,119,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$978,700	$700	$0	$979,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$1,138,900	$800	$0	$1,139,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$508,400	$400	$0	$508,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	$508,400	$400	$0	$508,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$339,000	$300	$0	$339,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	$339,000	$300	$0	$339,300
TOTAL				4	$6,726,500	$4,900	$0	$6,731,400

2025/05/16 10:48 a.m.

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901526561	7	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	BARRIO BIJAO CRA 49A 48A 56	EL BAGRE-ANTIOQUIA	8370220	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1561431140	9486685184	E	2025/06/16	2025/06/17	BANCOLOMBIA	1	56,731,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO								NOVEDADES																														
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-fr	Fecha Inicio vac-fr	Fecha Fin vac-fr	avp	vct					
Sucursal: PRINCIPAL (4 Afiliados)																																						
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2(3 Afiliados)																																						
Ciudad: EL BAGRE Depto: ANTIOQUIA(3 Afiliados)																																						
1	CC	1040501037	CABARCAS MENDEZ FRANKLIN JOHAN	Dependiente	0	No	No																																
2	CC	1047447127	CORREA ARGOTA RAFAEL DE JESUS	Dependiente	0	No	No																																
3	CC	1040516383	SOGAMOSO RAMOS EVYS DAILANA	Dependiente	0	No	No																																
Centro de Trabajo: PRINCIPAL(1 Afiliados)																																						
Ciudad: EL BAGRE Depto: ANTIOQUIA(1 Afiliados)																																						
4	CC	8364481	NISPERUZA LOPEZ DOIVER ANTONIO	Dependiente	0	No	No																																
Total			**Afiliados(4)**																																				

2025/06/26 10:21 a. m.

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
																				$2,710,600						$2,117,600	
																				$2,003,100						$1,564,900	
																				$2,003,100						$1,564,900	
						$4,689,559	No	Fijo	PORVENIR	30	$4,689,559	16%	SIN RIESGO	$750,400	$0	$0	$0	$0	$0	$750,400		NUEVA E.P.S.	30	$4,689,559	12.5%	$586,200	
						$5,417,496	No	Fijo	PROTECCION	30	$5,417,496	16%	SIN RIESGO	$866,800	$0	$0	$0	$0	$0	$866,800		COOSALUD MOVILIDAD	30	$5,417,496	12.5%	$677,200	
						$2,411,773	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,411,773	16%	SIN RIESGO	$385,900	$0	$0	$0	$0	$0	$385,900		COOSALUD MOVILIDAD	30	$2,411,773	12.5%	$301,500	
																				$707,500						$552,700	
						$4,421,584	No	Fijo	PORVENIR	30	$4,421,584	16%	SIN RIESGO	$707,500	$0	$0	$0	$0	$0	$707,500		NUEVA E.P.S.	30	$4,421,584	12.5%	$552,700	
																				$2,710,600						$2,117,600	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES									
C	Total	EPS Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Dias	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotizacion SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$2,117,600						$677,700						$373,200				$339,000		$508,400		$0		$0	
	$1,564,900						$500,800						$65,400				$250,500		$375,700		$0		$0	
	$1,564,900						$500,800						$65,400				$250,500		$375,700		$0		$0	
$0	$586,200		COMFAMA	30	$4,689,559	4%	$187,600	ARL SURA	30	$4,689,559	0.522%	1	$24,500	30	$4,689,559	2%	$93,800	3%	$140,700	0%	$0	0%	$0	No
$0	$677,200		COMFAMA	30	$5,417,496	4%	$216,700	ARL SURA	30	$5,417,496	0.522%	1	$28,300	30	$5,417,496	2%	$108,400	3%	$162,600	0%	$0	0%	$0	No
$0	$301,500		COMFAMA	30	$2,411,773	4%	$96,500	ARL SURA	30	$2,411,773	0.522%	1	$12,600	30	$2,411,773	2%	$48,300	3%	$72,400	0%	$0	0%	$0	No
	$552,700						$176,900						$307,800				$88,500		$132,700		$0		$0	
	$552,700						$176,900						$307,800				$88,500		$132,700		$0		$0	
$0	$552,700		COMFAMA	30	$4,421,584	4%	$176,900	ARL SURA	30	$4,421,584	6.96%	5	$307,800	30	$4,421,584	2%	$88,500	3%	$132,700	0%	$0	0%	$0	No
	$2,117,600						$677,700						$373,200				$339,000		$508,400		$0		$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901526561	7	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	BARRIO BIJAO CRA 49A 48A 56	EL BAGRE-ANTIOQUIA	8370220	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	156143140	9486685184	E	2025/06/16	2025/06/17	BANCOLOMBIA	1	$6,731,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$2,710,600	$1,800	$0	$2,712,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$1,843,800	$1,200	$0	$1,845,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$866,800	$600	$0	$867,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$373,200	$300	$0	$373,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$373,200	$300	$0	$373,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$677,700	$500	$0	$678,200
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	4	$677,700	$500	$0	$678,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$2,117,600	$1,500	$0	$2,119,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$978,700	$700	$0	$979,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$1,138,900	$800	$0	$1,139,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$508,400	$400	$0	$508,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	$508,400	$400	$0	$508,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$339,000	$300	$0	$339,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	$339,000	$300	$0	$339,300
TOTAL				4	$6,726,500	$4,800	$0	$6,731,300

2025/06/26 10:21 a. m.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901526561	7	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	BARRIO BIJAO CRA 49A 48A 56	EL BAGRE-ANTIOQUIA	8370220	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1638628159	9488467660	E	2025/07/14	2025/07/18	BANCOLOMBIA	4	$6,743,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (4 Afiliados)						$16,940,412	$2,710,600			$16,940,412	$2,117,600			$16,940,412	$677,700			$16,940,412	$373,200		$16,940,412	$847,400
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (3 Afiliados)						$12,518,828	$2,003,100			$12,518,828	$1,564,900			$12,518,828	$500,800			$12,518,828	$65,400		$12,518,828	$626,200
Ciudad: EL BAGRE Depto: ANTIOQUIA (3 Afiliados)						$12,518,828	$2,003,100			$12,518,828	$1,564,900			$12,518,828	$500,800			$12,518,828	$65,400		$12,518,828	$626,200
1	CC	1040501037	CABARCAS FRANKLIN	230301	30	$4,689,559	$750,400	EPS037	30	$4,689,559	$586,200	CCF04	30	$4,689,559	$187,600	14-11	30	$4,689,559	$24,500	30	$4,689,559	$234,500
2	CC	1047447122	CORREA RAFAEL	230201	30	$5,417,496	$866,800	ESSC24	30	$5,417,496	$677,200	CCF04	30	$5,417,496	$216,700	14-11	30	$5,417,496	$28,300	30	$5,417,496	$271,000
3	CC	1040516383	SOGAMOSO EVYS	230301	30	$2,411,773	$385,900	ESSC24	30	$2,411,773	$301,500	CCF04	30	$2,411,773	$96,500	14-11	30	$2,411,773	$12,600	30	$2,411,773	$120,700
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$4,421,584	$707,500			$4,421,584	$552,700			$4,421,584	$176,900			$4,421,584	$307,800		$4,421,584	$221,200
Ciudad: EL BAGRE Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						$4,421,584	$707,500			$4,421,584	$552,700			$4,421,584	$176,900			$4,421,584	$307,800		$4,421,584	$221,200
4	CC	8364481	HISPERUZA DOIVER	230301	30	$4,421,584	$707,500	EPS037	30	$4,421,584	$552,700	CCF04	30	$4,421,584	$176,900	14-11	30	$4,421,584	$307,800	30	$4,421,584	$221,200
Total		**Afiliados(4)**				$16,940,412	$2,710,600			$16,940,412	$2,117,600			$16,940,412	$677,700			$16,940,412	$373,200		$16,940,412	$847,400

2025/08/11 09:50 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901526561	7	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	BARRIO BIJAO CRA 49A 48A 56	EL BAGRE-ANTIOQUIA	8370220	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1638628159	9488467660	E	2025/07/14	2025/07/18	BANCOLOMBIA	4	$6,743,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$2,710,600	$6,800	$0	$2,717,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$1,843,800	$4,600	$0	$1,848,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$866,800	$2,200	$0	$869,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$373,200	$1,000	$0	$374,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$373,200	$1,000	$0	$374,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$677,700	$1,700	$0	$679,400
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	4	$677,700	$1,700	$0	$679,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$2,117,600	$5,400	$0	$2,123,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$978,700	$2,500	$0	$981,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$1,138,900	$2,900	$0	$1,141,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$508,400	$1,300	$0	$509,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	$508,400	$1,300	$0	$509,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$339,000	$900	$0	$339,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	$339,000	$900	$0	$339,900
TOTAL				4	$6,726,500	$17,100	$0	$6,743,600

2025/08/11 09:50 AM

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901526561	7	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	BARRIO BIJAO CRA 49A 48A 56	EL BAGRE-ANTIOQUIA	8370220	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1716609040	9489598834	E	2025/08/15	2025/08/21	BANCOLOMBIA	6	$6,752,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotizacion Voluntaria Empleador	Cotizacion Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
																				$2,710,600						$2,117,600	
																				$2,003,100						$1,564,900	
																				$2,003,100						$1,564,900	
						$4,689,559	No	Fijo	PORVENIR	30	$4,689,559	16%	SIN RIESGO	$750,400	$0	$0	$0	$0	$0	$750,400		NUEVA E.P.S.	30	$4,689,559	12.5%	$586,200	
						$5,417,496	No	Fijo	PROTECCION	30	$5,417,496	16%	SIN RIESGO	$866,800	$0	$0	$0	$0	$0	$866,800		COOSALUD MOVILIDAD	30	$5,417,496	12.5%	$677,200	
						$2,411,773	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,411,773	16%	SIN RIESGO	$385,900	$0	$0	$0	$0	$0	$385,900		COOSALUD MOVILIDAD	30	$2,411,773	12.5%	$301,500	
																				$707,500						$552,700	
																				$707,500						$552,700	
						$4,421,584	No	Fijo	PORVENIR	30	$4,421,584	16%	SIN RIESGO	$707,500	$0	$0	$0	$0	$0	$707,500		NUEVA E.P.S.	30	$4,421,584	12.5%	$552,700	
																				$2,710,600						$2,117,600	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Dias	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$2,117,600						$677,700						$373,200				$339,000		$508,400		$0		$0	
	$1,564,900						$500,800						$65,400				$250,500		$375,700		$0		$0	
	$1,564,900						$500,800						$65,400				$250,500		$375,700		$0		$0	
$0	$586,200		COMFAMA	30	$4,689,559	4%	$187,600	ARL SURA	30	$4,689,559	0.522%	1	$24,500	30	$4,689,559	2%	$93,800	3%	$140,700	0%	$0	0%	$0	No
$0	$677,200		COMFAMA	30	$5,417,496	4%	$216,700	ARL SURA	30	$5,417,496	0.522%	1	$28,300	30	$5,417,496	2%	$108,400	3%	$162,600	0%	$0	0%	$0	No
$0	$301,500		COMFAMA	30	$2,411,773	4%	$96,500	ARL SURA	30	$2,411,773	0.522%	1	$12,600	30	$2,411,773	2%	$48,300	3%	$72,400	0%	$0	0%	$0	No
	$552,700						$176,900						$307,800				$88,500		$132,700		$0		$0	
	$552,700						$176,900						$307,800				$88,500		$132,700		$0		$0	
$0	$552,700		COMFAMA	30	$4,421,584	4%	$176,900	ARL SURA	30	$4,421,584	6.96%	5	$307,800	30	$4,421,584	2%	$88,500	3%	$132,700	0%	$0	0%	$0	No
	$2,117,600						$677,700						$373,200				$339,000		$508,400		$0		$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901526561	7	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	BARRIO BIJAO CRA 49A 48A 56	EL BAGRE-ANTIOQUIA	8370220	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1716609040	9489598834	E	2025/08/15	2025/08/21	BANCOLOMBIA	6	$6,752,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$2,710,600	$10,400	$0	$2,721,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$1,843,800	$7,100	$0	$1,850,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$866,800	$3,300	$0	$870,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$373,200	$1,500	$0	$374,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$373,200	$1,500	$0	$374,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$677,700	$2,600	$0	$680,300
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	4	$677,700	$2,600	$0	$680,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$2,117,600	$8,200	$0	$2,125,800
COOSALUD MOVILIDAD	ES5C24	900,226,715	3	2	$978,700	$3,800	$0	$982,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$1,138,900	$4,400	$0	$1,143,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$508,400	$2,000	$0	$510,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	$508,400	$2,000	$0	$510,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$339,000	$1,300	$0	$340,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	$339,000	$1,300	$0	$340,300
TOTAL				4	$6,726,500	$26,000	$0	$6,752,500

2025/09/18 10:18 a. m.

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901526561	7	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	BARRIO BIJAO CRA 49A 48A 56	EL BAGRE-ANTIOQUIA	8370220	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1786218121	9491038079	E	2025/09/12	2025/09/18	BANCOLOMBIA	6	$6,752,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO								NOVEDADES																													
No.	Tipo Id	No Id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicacion en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vct
Sucursal: PRINCIPAL (4 Afiliados)																																					
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2(3 Afiliados)																																					
Ciudad: EL BAGRE Depto: ANTIOQUIA(3 Afiliados)																																					
1	CC	1040501037	CABARCAS MENDEZ FRANKLIN JOHAN	Dependiente	0	No	No																														
2	CC	1047447122	CORREA ARGOTA RAFAEL DE JESUS	Dependiente	0	No	No																														
3	CC	1040516383	SOGAMOSO RAMOS EYYS DALLANA	Dependiente	0	No	No																														
Centro de Trabajo: PRINCIPAL(1 Afiliados)																																					
Ciudad: EL BAGRE Depto: ANTIOQUIA(1 Afiliados)																																					
4	CC	8364481	HISPERUZA LOPEZ DOIVER ANTONIO	Dependiente	0	No	No																														
Total	**Afiliados(4)**																																				

2025/09/18 10:17 a. m.

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotizacion Voluntaria Empleador	Cotizacion Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$2,710,600						$2,117,600	
																				$2,003,100						$1,564,900	
																				$2,003,100						$1,564,900	
						$4,689,559	No	Fijo	PORVENIR	30	$4,689,559	16%	SIN RIESGO	$750,400	$0	$0	$0	$0	$0	$750,400		NUEVA E.P.S.	30	$4,689,559	12.5%	$586,200	
						$5,417,496	No	Fijo	PROTECCION	30	$5,417,496	16%	SIN RIESGO	$866,800	$0	$0	$0	$0	$0	$866,800		COOSALUD MOVILIDAD	30	$5,417,496	12.5%	$677,200	
						$2,411,773	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,411,773	16%	SIN RIESGO	$385,900	$0	$0	$0	$0	$0	$385,900		COOSALUD MOVILIDAD	30	$2,411,773	12.5%	$301,500	
																				$707,500						$552,700	
																				$707,500						$552,700	
						$4,421,584	No	Fijo	PORVENIR	30	$4,421,584	16%	SIN RIESGO	$707,500	$0	$0	$0	$0	$0	$707,500		NUEVA E.P.S.	30	$4,421,584	12.5%	$552,700	
																				$2,710,600						$2,117,600	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES									
C	Total	EPS Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Dias	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotizacion SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotizacion MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$2,117,600						$677,700						$373,200				$339,000		$508,400		$0		$0	
	$1,564,900						$500,800						$65,400				$250,500		$375,700		$0		$0	
	$1,564,900						$500,800						$65,400				$250,500		$375,700		$0		$0	
$0	$586,200		COMFAMA	30	$4,689,559	4%	$187,600	ARL SURA	30	$4,689,559	0.522%	1	$24,500	30	$4,689,559	2%	$93,800	3%	$140,700	0%	$0	0%	$0	No
$0	$677,200		COMFAMA	30	$5,417,496	4%	$216,700	ARL SURA	30	$5,417,496	0.522%	1	$28,300	30	$5,417,496	2%	$108,400	3%	$162,600	0%	$0	0%	$0	No
$0	$301,500		COMFAMA	30	$2,411,773	4%	$96,500	ARL SURA	30	$2,411,773	0.522%	1	$12,600	30	$2,411,773	2%	$48,300	3%	$72,400	0%	$0	0%	$0	No
	$552,700						$176,900						$307,800				$88,500		$132,700		$0		$0	
	$552,700						$176,900						$307,800				$88,500		$132,700		$0		$0	
$0	$552,700		COMFAMA	30	$4,421,584	4%	$176,900	ARL SURA	30	$4,421,584	6.96%	5	$307,800	30	$4,421,584	2%	$88,500	3%	$132,700	0%	$0	0%	$0	No
	$2,117,600						$677,700						$373,200				$339,000		$508,400		$0		$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901526561	7	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	BARRIO BIJAO CRA 49A 48A 56	EL BAGRE-ANTIOQUIA	8370220	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1786218121	9491038079	E	2025/09/12	2025/09/18	BANCOLOMBIA	6	$6,752,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$2,710,600	$10,300	$0	$2,720,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$1,843,800	$7,000	$0	$1,850,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$866,800	$3,300	$0	$870,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$373,200	$1,500	$0	$374,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$373,200	$1,500	$0	$374,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$677,700	$2,600	$0	$680,300
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	4	$677,700	$2,600	$0	$680,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$2,117,600	$8,000	$0	$2,125,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$978,700	$3,700	$0	$982,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$1,138,900	$4,300	$0	$1,143,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$508,400	$2,000	$0	$510,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	$508,400	$2,000	$0	$510,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$339,000	$1,300	$0	$340,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	$339,000	$1,300	$0	$340,300
TOTAL				4	$6,726,500	$25,700	$0	$6,752,200

2025/09/18 10:17 a. m.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901526561	7	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	BARRIO BIJAO CRA 49A 48A 56	EL BAGRE-ANTIOQUIA	8370220	SI

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (4 Afiliados)						$12,967,582	$2,075,000			$12,967,582	$1,621,000			$12,967,582	$518,800			$12,967,582	$352,500		$12,967,582	$648,700
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (3 Afiliados)						$8,545,998	$1,367,500			$8,545,998	$1,068,300			$8,545,998	$341,900			$8,545,998	$44,700		$8,545,998	$427,500
Ciudad: EL BAGRE Depto: ANTIOQUIA (3 Afiliados)						$8,545,998	$1,367,500			$8,545,998	$1,068,300			$8,545,998	$341,900			$8,545,998	$44,700		$8,545,998	$427,500
1	CC	1040501037	CABARCAS FRANKLIN	230301	30	$4,689,559	$750,400	EPS037	30	$4,689,559	$586,200	CCF04	30	$4,689,559	$187,600	14-11	30	$4,689,559	$24,500	30	$4,689,559	$234,500
2	CC	1047447122	CORREA RAFAEL	230201	8	$1,444,666	$231,200	ESSC24	8	$1,444,666	$180,600	CCF04	8	$1,444,666	$57,800	14-11	8	$1,444,666	$7,600	8	$1,444,666	$72,300
3	CC	1040516383	SOGAMOSO EVYS	230301	30	$2,411,773	$385,900	ESSC24	30	$2,411,773	$301,500	CCF04	30	$2,411,773	$96,500	14-11	30	$2,411,773	$12,600	30	$2,411,773	$120,700
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$4,421,584	$707,500			$4,421,584	$552,700			$4,421,584	$176,900			$4,421,584	$307,800		$4,421,584	$221,200
Ciudad: EL BAGRE Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						$4,421,584	$707,500			$4,421,584	$552,700			$4,421,584	$176,900			$4,421,584	$307,800		$4,421,584	$221,200
4	CC	8364481	HISPERUZA DOIVER	230301	30	$4,421,584	$707,500	EPS037	30	$4,421,584	$552,700	CCF04	30	$4,421,584	$176,900	14-11	30	$4,421,584	$307,800	30	$4,421,584	$221,200
Total	**Afiliados(4)**					$12,967,582	$2,075,000			$12,967,582	$1,621,000			$12,967,582	$518,800			$12,967,582	$352,500		$12,967,582	$648,700

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1856186753	94932626 44	E	2025/10/15	2025/10/16	BANCOLOMBIA	1	$5,219,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$2,075,000	$1,400	$0	$2,076,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$1,843,800	$1,200	$0	$1,845,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$231,200	$200	$0	$231,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$352,500	$300	$0	$352,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$352,500	$300	$0	$352,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$518,800	$400	$0	$519,200
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	4	$518,800	$400	$0	$519,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$1,621,000	$1,000	$0	$1,622,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$482,100	$300	$0	$482,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$1,138,900	$700	$0	$1,139,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$389,200	$300	$0	$389,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	$389,200	$300	$0	$389,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$259,500	$200	$0	$259,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	$259,500	$200	$0	$259,700
TOTAL				4	$5,216,000	$3,600	$0	$5,219,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901526561	7	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	BARRIO BIJAO CRA 49A 48A 56	EL BAGRE-ANTIOQUIA	8370220	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1912273408	9494525297	E	2025/11/18	2025/11/07	BANCOLOMBIA	0	$4,486,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS						PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (4 Afiliados)																						$12,076,498	$1,932,400			$12,076,498	$1,263,300			$12,076,498	$483,200			$12,076,498		$347,900		$9,178,137	$459,200		$4,486,000
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (3 Afiliados)																						$7,654,914	$1,224,900			$7,654,914	$710,600			$7,654,914	$306,300			$7,654,914		$40,100		$4,756,553	$238,000		$2,519,900
Ciudad: EL BAGRE Depto: ANTIOQUIA (3 Afiliados)																						$7,654,914	$1,224,900			$7,654,914	$710,600			$7,654,914	$306,300			$7,654,914		$40,100		$4,756,553	$238,000		$2,519,900
1	CC	1040501037	CABARCAS FRANKLIN	X																	23030 1	15	$2,344,780	$375,200	EPS037	15	$2,344,780	$293,100	CCF04	15	$2,344,780	$93,800	14-11	15	$2,344,780	0.5225	$12,300	15	$2,344,780	$117,300	No	$891,700
2	CC	78589897	GENEZ JOSE	X																	23030 1	15	$2,898,361	$463,800	EPS042	15	$2,898,361	$116,000	CCF04	15	$2,898,361	$116,000	14-11	15	$2,898,361	0.5225	$15,200	15	$0	$0	Si	$711,000
3	CC	1040516383	SOGAMOSO EVYS																		23030 1	30	$2,411,773	$385,900	ESSC24	30	$2,411,773	$301,500	CCF04	30	$2,411,773	$96,500	14-11	30	$2,411,773	0.5225	$12,600	30	$2,411,773	$120,700	No	$917,200
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$4,421,584	$707,500			$4,421,584	$552,700			$4,421,584	$176,900			$4,421,584		$307,800		$4,421,584	$221,200		$1,966,100
Ciudad: EL BAGRE Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																						$4,421,584	$707,500			$4,421,584	$552,700			$4,421,584	$176,900			$4,421,584		$307,800		$4,421,584	$221,200		$1,966,100
4	CC	8364481	NISPERUZA DOIVER																		23030 1	30	$4,421,584	$707,500	EPS037	30	$4,421,584	$552,700	CCF04	30	$4,421,584	$176,900	14-11	30	$4,421,584	6.9601	$307,800	30	$4,421,584	$221,200	No	$1,966,100
Total Afiliados(4)																						$12,076,498	$1,932,400			$12,076,498	$1,263,300			$12,076,498	$483,200			$12,076,498		$347,900		$9,178,137	$459,200		$4,486,000

2025/11/07 03:39 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901526561	7	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	BARRIO BIJAO CRA 49A 48A 56	EL BAGRE-ANTIOQUIA	8370220	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1912273408	9494525297	E	2025/11/18	2025/11/07	BANCOLOMBIA	0	$4,486,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$1,932,400	$0	$0	$1,932,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,932,400	$0	$0	$1,932,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$347,900	$0	$0	$347,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$347,900	$0	$0	$347,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$483,200	$0	$0	$483,200
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	4	$483,200	$0	$0	$483,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$1,263,300	$0	$0	$1,263,300
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$116,000	$0	$0	$116,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$301,500	$0	$0	$301,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$845,800	$0	$0	$845,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$275,500	$0	$0	$275,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$275,500	$0	$0	$275,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$183,700	$0	$0	$183,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$183,700	$0	$0	$183,700
TOTAL				4	$4,486,000	$0	$0	$4,486,000

2025/11/07 03:39 PM

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901526561	7	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	BARRIO BIJAO CRA 49A 48A 56	EL BAGRE-ANTIOQUIA	8370220	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	*Salud*	*Pago*	*Planilla*	*Planilla*	*Límite*	*Pago*	*Banco*	*Dias Mora*	*Valor*
2025-12	2026-01	2079006572	9497205843	E	2026/01/16	2026/01/13	BANCOLOMBIA	0	$6,726,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$2,710,600	$0	$0	$2,710,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$2,710,600	$0	$0	$2,710,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$373,200	$0	$0	$373,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$373,200	$0	$0	$373,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$677,700	$0	$0	$677,700
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	4	$677,700	$0	$0	$677,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$2,117,600	$0	$0	$2,117,600
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$677,200	$0	$0	$677,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$301,500	$0	$0	$301,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$1,138,900	$0	$0	$1,138,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$508,400	$0	$0	$508,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	*PAICBF*	*899,999,239*	*2*	*4*	*$508,400*	*$0*	*$0*	*$508,400*
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$339,000	$0	$0	$339,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	$339,000	$0	$0	$339,000
TOTAL				4	$6,726,500	$0	$0	$6,726,500

2026/01/13 03:53 PM

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO N.º: CONV 537 - 2024

FECHA DEL CONTRATO	23 DE DICIEMBRE DE 2024
CONTRATO	CONV-537-2024
CONTRATISTA	**EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE- EDTB**
NIT O DOCUMENTO DEL CONTRATISTA	901.526.561-7
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA CONTRATAR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VÍAS TERCIARIAS QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA EL PERICO Y VEREDA EL REAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE
VALOR DEL CONTRATO	**SEISCIENTOS DOCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS M/L ($612.782.000,00)**
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	20 DE ENERO DE 2025
Nº DE CRP	01995
Nº DE CDP	01021
ACTA DE SUSPENSIÓN	N/A
ACTA DE REINICIO	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL	20 DE JULIO DE 2025

CONTRATO	
VALOR DE OTRO SI	N/A
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO	**SEISCIENTOS DOCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS M/L ($612.782.000,00)**
VALOR EJECUTADO	**DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/L. ($224.910.984,87).**
SALDO DEL CONTRATO	**TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINCE PESOS CON TRECE CENTAVOS M/L ($387.871.015,13)**
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	18 DE JULIO DE 2025

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

a) EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

RUBRO	VALOR A CANCELAR ($)
2.3.2.02.02.005	$ 612.782.000,00

b) VALOR ANTICIPO: $0

c) VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO EN ACTA FINAL: $0

d) VALOR EJECUTADO ACTA N° 1: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/L. ($224.910.984,87).

e) VALOR A PAGAR N° 2 y FINAL: TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINCE PESOS CON TRECE CENTAVOS M/L. ($387.871.015,13)

f) CONCEPTO DEL SUPERVISOR:

ATRIBUTO EVALUADO	CONCEPTO DEL DESEMPEÑO
ATENCIÓN	Dentro del plan de desarrollo 2024-2027, el Municipio de El Bagre es la entidad responsable del diseño, construcción, reparación y mantenimiento de la infraestructura pública y de brindar condiciones adecuadas realizando la construcción de obras de remodelación, mantenimiento, mejoras y ampliación que permitan garantizar la calidad en las infraestructuras de los espacios locativos que se tengan a cargo. También se tiene priorizar prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo del territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de los habitantes y cumplir con las demás funciones que le asigne la constitución y la Ley.
OPORTUNIDAD	Dentro del plan de gobierno se encuentra la línea estratégica fortalecimiento de vías, para el cumplimiento de los fines misionales de la Administración Municipal es importante realizar mejoramiento mediante construcción de placa huella en las vías terciarias que comunica de la cabecera municipal a la vereda el perico y vereda el real, zona rural del municipio de el bagre, departamento de Antioquia, en el marco del convenio entre la gobernación de Antioquia y el municipio de el bagre, con el fin de mejorar las condiciones de transitabilidad, conectividad y accesibilidad de los habitantes del sector, facilitando el desarrollo social y económico del territorio y garantizando un transporte más seguro, especialmente en temporadas de alta pluviosidad.

CALIDAD	Se verifica que las obras realizadas cumplan con las normas técnicas mínimas exigidas
INFRAESTRUCTURA EMPLEADA	Mano de obra calificada, mano de obra no calificada, equipos y herramienta menor.

Ver capítulo 6.1 del Manual de Contratación

Se firma a los dieciocho (18) días del mes de julio de 2025.

CARLOS ANDRÉS ARRIETA GÓMEZ
C.C. Nº 1.128.280.527
Secretario De Obras Públicas
Supervisor

NOTA: Ver evidencia anexada en el informe del contratista.

ACTA DE OBRA PÚBLICA No 2 Y FINAL

CONTRATO	CONV-537–2024
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA
CONTRATISTA	**EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE- EDTB**
NIT O DOCUMENTO DEL CONTRATISTA	901.526.561-7
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA CONTRATAR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VÍAS TERCIARIAS QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA EL PERICO Y VEREDA EL REAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE
VALOR DEL CONTRATO	**SEISCIENTOS DOCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS M/L ($612.782.000,00)**
VALOR DE OTRO SI	N/A
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO	**SEISCIENTOS DOCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS M/L ($612.782.000,00)**
SUPERVISOR	**CARLOS ANDRES ARRIETA GOMEZ** Secretario De Obras Públicas
PLAZO DE EJECUCIÓN	SEIS (06) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
FECHA DE INICIO	20 DE ENERO DE 2025

En el Municipio de El Bagre - Antioquia, a los dieciocho (18) días del mes de julio del año dos mil veinticinco (2025), se reunieron en el municipio de El Bagre **CARLOS ANDRES ARRIETA GOMEZ**, Secretario de Obras Públicas Municipal en calidad de Supervisores de la Obra y **RAFAEL DE JESUS CORREA ARGOTA**, representando a la **EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE-EDTB**, en calidad de contratista, con el propósito de suscribir ACTA NUMERO DOS Y FINAL del contrato en referencia y recibir a satisfacción las obras y actividades contratadas, el avance financiero de obras a la fecha es del 100%, tal como lo dicta cuadro anexo a la presente el cual refleja las siguientes condiciones de pago:

VALOR DEL CONTRATO:	$612.782.000,00
VALOR ANTICIPO (0,0%):	$ 0,00
VALOR OTRO SI:	$ 0,00
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO:	$612.782.000,00
VALOR COBRADO ACTA COBRO N°1:	$224.910.984,87
VALOR A AMORTIZAR POR ANTICIPO:	$ 0,00
VALOR A PAGAR ACTA COBRO N°2 Y FINAL:	**$387.871.015,13**
VALOR EJECUTADO TOTAL:	$612.782.000,00

VALOR A PAGAR EN LETRAS SON: **TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINCE PESOS CON TRECE CENTAVOS M/L. ($387.871.015,13).** Valor que corresponde a un avance del 63,30%. y un acumulado del 100%

Para mayor constancia firman los que en ella intervinieron a los 18 días del mes julio del 2025.

CARLOS ANDRES ARRIETA GOMEZ
Secretario De Obras Públicas.
Supervisor.

Rafael Correa Argoto

EDTB.
NIT: 901.526.565-7.
Representante Legal
RAFAEL DE JESUS CORREA ARGOTA
C.C. N°1.47.447.122.
Contratista

Firma: Franklin O.	**Firma:**
Elaboró: Franklin Oliveros Julio **Cargo:** Apoyo secretaria de obras públicas. **Dependencia:** Secretaría de Planeación.	**Revisó:** Carlos Andrés Arrieta Gómez **Cargo:** secretario De Obras Públicas **Dependencia:** Secretaría De Obras Públicas

ACTA DE RECIBO

CONTRATO	CONV-537-2024
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA
CONTRATISTA	**EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE- EDTB**
NIT O DOCUMENTO DEL CONTRATISTA	901.526.561-7
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA CONTRATAR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VÍAS TERCIARIAS QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA EL PERICO Y VEREDA EL REAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE
VALOR DEL CONTRATO	**SEISCIENTOS DOCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS M/L ($612.782.000,00)**
VALOR DE OTRO SI	N/A
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO	**SEISCIENTOS DOCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS M/L ($612.782.000,00)**
SUPERVISOR	**CARLOS ANDRES ARRIETA GOMEZ** Secretario De Obras Públicas
PLAZO DE EJECUCIÓN	SEIS (06) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
FECHA DE INICIO	20 DE ENERO DE 2025

El día dieciocho (18) de julio del año 2025 en las oficinas de la Secretaría de Obras Publicas se reunieron los señores, **EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRIOTORIAL**

DEL BAGRE – EDTB , identificado con el **NIT N°901526561-7,** representada legalmente por **RAFAEL DE JESUS CORREA ARGOTA**, en calidad de contratista del contrato de obra **N.º CONV-308-2025** y el señor **CARLOS ANDRES ARRIETA GOMEZ** - Secretario De Obras Públicas, en calidad de SUPERVISOR del contrato de la referencia, y en representación del municipio con el propósito de proceder al recibo y entrega final del contrato en mención**.**

Las partes intervinientes de común acuerdo hemos realizado una conciliación así: Se entrega y recibe a entera satisfacción el objeto de la presente acta de conformidad con las especificaciones y cantidades expresas en el presupuesto contractual, que hace parte integral del contrato.

En consecuencia, los supervisores hacen constar que lo estipulado en el contrato **N.º CONV-357-2024** ha sido entregado por el CONTRATISTA y recibido a entera satisfacción.

No siendo más el objeto de la presente acta, se da por terminada y se firma por quienes en ella han intervenido en el municipio de El Bagre, Antioquia, luego de leída y aprobada.

CARLOS ANDRES ARRIETA GOMEZ
Secretario De Obras Públicas.
Supervisor.

Rafael Correa Argota

EDTB.
NIT: 901.526.565-7.
Representante Legal
RAFAEL DE JESUS CORREA ARGOTA
C.C. N°1.47.447.122.
Contratista

Firma:	Firma:
Elaboró: Franklin Oliveros Julio **Cargo:** Apoyo secretaria de obras públicas. **Dependencia:** Secretaría de Planeación.	**Revisó:** Carlos Andrés Arrieta Gómez **Cargo:** Secretario De Obras Públicas **Dependencia:** Secretaría De Obras Públicas

ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO

EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE **EL BAGRE**

Fecha presente Acta: 17/2/2026 **F-GC-005**

Acta de Liquidación de Contrato No.: CONV-537-2024

Objeto del Contrato:

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA CONTRATAR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VÍAS TERCIARIAS QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA EL PERICO Y VEREDA EL REAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE

Contratista: **EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE - EDTB**

No. de Identificación Contraista: **901.526.561-7**

Valor: **$612.782.000,00**

Valor en letras: **SEISCIENTOS DOCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS**

Plazo inicial: SEIS (6)MESES fecha de inicio 20/1/2025 fecha de recibido 18/7/2025

Orden de obra o servicio adicional: N/A

Iniciación de obra o servicio adicional: N/A

En el Municipio de El Bagre Antioquia, a los diecisiete (17) días del mes de febrero de 2026, se reunieron en la Secretaría de Obras Publicas, el señor **MARCO TRESPALACIO BULLOSO,** en calidad de **ALCALDE MUNICIPAL**, **CARLOS ANDRES ARRIETA GOMEZ** identificado con cedula de ciudadanía No.**1.128.280.527** en calidad de Secretario de Obras Publicas y **SUPERVISOR** del contrato, **EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE (EDTB),** identificado con **NIT N° 901.526.561-7,** representada legalmente por **FRANKLIN JOHAN CABARCAS MÉNDEZ** identificado con **C.C. N° 1.040.501.037** en calidad de **CONTRATISTA**, con el fin de suscribir el **ACTA DE LIQUIDACION FINAL,** en donde se reciben las obras a **entera satisfaccion** por parte del muncipio, de conformidad con el detalle que a continuación se describe según el Contrato de Obra publica No.**CONV-537-2024**

Valor inicial del Contrato: $612.782.000,00

Otro si: $ 0 Valor final: $ 0

La obra ejecutada fueron liquidadas mediante las siguientes actas de pago:
Acta N°1 : $ 224.910.984,87 Acta N° 2 y final $387.871.015,13 Acta N° 3

Adicionales NO PAGADOS: N/A

Anticipo: $ 0

Valores pendientes por cancelar: $387.871.015,13

Saldo: $387.871.015,13

Valor obra o Servicio Adicional: 0

Los firmantes de la presente acta dejan las siguientes constancias:

DEL CONTRATISTA

Que el contratista garantiza la calidad de todos y de cada uno de los elementos empleados en los trabajos.

Que el Contratista garantiza su responsabilidad ante los trabajadores que tuvo en la ejecución del presente contratos, por sueldos, jornales, honorarios y todas las prestaciones sociales.

Que el Contratista se responsabiliza exclusivamente ante terceros por cualquier queja o reclamación que estos puedan presentar directa o indirectamente a la entidad.

Que a partir de la fecha cesa la responsabilidad del contratista por los daños que sean ocasionados por terceros al contrato.

El contratista manifiesta recibir a satisfacción la liquidación del contrato, razón por la cual renuncia a favor del Municipio de El Bagre, a las Acciones judiciales posteriores a esta acta, que se deriven del citado contrato

DE LAS GARANTIAS:

Que el contratista otorga las garantías enumeradas en el contrato según poliza de garantia del mismo.

DEL MUNICIPIO

Que el municipio deja constancia que por no contar con los recursos suficientes para pagar las obras extras, estas seran asumidas por el contratista

NOTA: El valor inicial del contrato fue SEISCIENTOS DOCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS Durante su ejecución no se realizó ajustes de adición ni dinero por lo cual el valor final del contrato es de ($ 612.782.000,00)

Sin otro motivo firman los que intervinieron:

MARCO TRESPALACIO BULLOSO
Alcalde Municipal

CARLOS ANDRES ARRIETA GOMEZ
Supervisor
Secretario de Obras publicas

FRANKLIN JOHAN CABARCAS MÉNDEZ
R/L EDTB (E)
Contratista

Firma:	**Firma:**	**Firma:**
Elaboró: Franklin Oliveros Julio **Cargo:** Apoyo S.O.P. **Dependencia:** Secretaría de Obras Publicas	**Revisó:** Carlos Andrés Arrieta Gómez **Cargo:** Secretario de Obras Publicas **Dependencia:** Secretaría de Obras Publicas	**Visto Bueno:** Ana Maria Garcia Zapata **Cargo:** asesora juridica **Dependencia:** Secretaría General y de Gobierno

INFORME SUPERVISION N° 2 Y FINAL

DIRECCION TECNICA EDTB

CONTRATO: 012 - 2025

CONTRATO	012 de 2025
CONTRATANTE	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE - EDTB
NIT	901.526.561-7
CONTRATISTA	CASBIM S.A.S.
NIT	901.577.286-4
OBJETO	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VÍAS TERCIARIAS QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA EL PERICO Y VEREDA EL REAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE
VALOR	QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON TRECE CENTAVOS ($ 552.273.837,13) INCLUIDO EL A.U. Y DEMÁS COSTOS A QUE HAYA LUGAR
PLAZO INICIAL	CUATRO (04) MESES
VALOR COBRADO EN ACTA N° 1.	DOSCIENTOS VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/CTE. ($222.658.362,30). INCLUIDO EL A.U. Y DEMÁS COSTOS A QUE HAYA LUGAR.
SALDO DEL CONTRATO	TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($329.615.474,83). INCLUIDO EL A.U. Y DEMÁS COSTOS A QUE HAYA LUGAR.
LOCALIZACION	MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

a) EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

RUBRO	VALOR PARA CANCELAR ($)
2.3.2.02.02.005	$ 552.273.837,13
CDP	00015 - 10/02/2025
CRP	00022-25/02/2025

b) VALOR ANTICIPO: $0

EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

VALOR A PAGADO ACTA # 1: DOSCIENTOS VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/CTE. ($ 222.658.362,30).

VALOR A PAGAR ACTA # 2 Y FINAL: TRECIENTOS VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS M/CTE. ($327.362.852,26).

VALOR TOTAL EJECUTADO: QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON TRECE CENTAVOS M/CTE. ($552.273.837,13)

CONCEPTO DEL INTERVENTOR:

ATRIBUTO EVALUADO	CONCEPTO DEL DESEMPEÑO
ATENCIÓN	Dentro del plan de desarrollo 2024-2027, el Municipio de El Bagre es la entidad responsable del diseño, construcción, reparación y mantenimiento de la infraestructura pública y de brindar condiciones adecuadas realizando la construcción de obras de remodelación, mantenimiento, mejoras y ampliación que permitan garantizar la calidad en las infraestructuras de los espacios locativos que se tengan a cargo. También se tiene priorizar prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo del territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de los habitantes y cumplir con las demás funciones que le asigne la constitución y la Ley.
OPORTUNIDAD	Dentro del plan de gobierno se encuentra la línea estratégica fortalecimiento de vías, para el cumplimiento de los fines misionales de la Administración Municipal es importante realizar mejoramiento mediante construcción de placa huella en las vías terciarias que comunica de la cabecera municipal a la vereda el perico y vereda el real, zona rural del municipio de el bagre, departamento de Antioquia, en el marco del convenio entre la gobernación de Antioquia y el municipio de el bagre, con el fin de mejorar las condiciones de transitabilidad, conectividad y accesibilidad de los habitantes del sector, facilitando el desarrollo social y económico del territorio y garantizando un transporte más seguro, especialmente en temporadas de alta pluviosidad.
CALIDAD	Se verifica que las obras realizadas cumplan con las normas técnicas mínimas exigidas
INFRAESTRUCTURA EMPLEADA	Mano de obra calificada, mano de obra no calificada, equipos y herramienta menor.

Ver capítulo 6.1 del Manual de Contratación

Se firma el 26 de junio de 2025

EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE **EL BAGRE**

Doiver Nisperuza.

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
C.C. 8.364.481
Supervisor

NOTA: Ver evidencia anexada en el informe del contratista.

ACTA LITERAL
ACTA CORTE N° 2 y FINAL

CONTRATO	012-2025
CONTRATANTE	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE (EDTB) (901.526.561-7)
CONTRATISTA	CASBIM S.A.S. 901.577.286-4
OBJETO	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VÍAS TERCIARIAS QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA EL PERICO Y VEREDA EL REAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE
VALOR INICIAL	QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON TRECE CENTAVOS ($ 552.273.837,13) INCLUIDO EL A.U. Y DEMÁS COSTOS A QUE HAYA LUGAR
VALOR FINAL	QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON TRECE CENTAVOS ($ 552.273.837,13) INCLUIDO EL A.U. Y DEMÁS COSTOS A QUE HAYA LUGAR
SUPERVISOR	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ DIRECTOR TÉCNICO
PLAZO	CUATRO (04) MESES
ACTA DE INICIO	VEINTISEIS (26) DE FEBRERO DE 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN	VEINTISEIS (26) DE JUNIO DE 2025

En el Municipio de El Bagre - Antioquia, a los (26) día del mes de junio del año dos mil veinticinco (2025), se reunieron en el municipio de El Bagre **DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ**, Director Técnico en calidad de Supervisor de la obra y **CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA,** representando a **CASBIM S.A.S.** en calidad de contratista, con el propósito de suscribir ACTA 2 Y FINAL del contrato en referencia con actividades verificadas y soportadas en el acta de cobro numérica N° 2 Y FINAL, la cual representa una ejecución financiera del 100% y una ejecución física del 100%, tal como lo dicta cuadro anexo a la presente el cual refleja las siguientes condiciones de pago:

EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

VALOR DEL CONTRATO:	$552.273.837,13
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	$0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$552.273.837,13
VALOR ANTICIPO (00,0%):	$0,00
VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO (00,0%):	$0,00
VALOR A PAGAR ACTA COBRO N° 2 Y FINAL:	$327.362.852,26

TRECIENTOS VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS M/CTE. ($ 327.362.852,26).

Valor que corresponde a un avance físico del 59,28%

VALOR A PAGADO ACTA COBRO N° 1:	(40.72%)	$224.910.984,87
VALOR A PAGAR ACTA COBRO N° 2 Y FINAL:	(59,28%)	$327.362.852,26
VALOR TOTAL ACUMULADO EJECUTADO:	(100%)	$552.273.837,13

Para mayor constancia firman los que en ella intervinieron a los (26) días del mes de junio del 2025.

EDTB EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
Director técnico.
Supervisor

CRISTHAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA
CASBIM S.A.S.
Contratista

Intervinieron en el Documento:

Firma: Evis Sogamoso.	**Firma:** Doiver Nisperuza.
Elaboró Evis Dallana Sogamoso Ramos **Cargo:** Secretaria ejecutiva	**Revisó** Doiver Nisperuza López **Cargo:** Director Técnico

FECHA DEL CONTRATO	14 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATO	N° 012-2025
CONTRATISTA	CASBIM
NIT O DOCUMENTO DEL CONTRATISTA	901.577.826
OBJETO DEL CONTRATO	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO *MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA* EN LAS VÍAS TERCIARIAS QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA EL PERICO Y VEREDA EL REAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE.
VALOR DEL CONTRATO	QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON TRECE CENTAVOS ($552.273.837,13).
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	26 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN *DEL CONTRATO*	VENTISEIS (26) JUNIO 2025
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO	QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON TRECE CENTAVOS ($552.273.837,13)
VALOR EJECUTADO ACTA 1	DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($224.910.984,87)
VALOR EJECUTADO ACTA 2 Y FINAL	TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS ($327.362.852.26)
SALDO A FAVOR:	N/A
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	26 DE JUNIO DE 2025

En el Municipio de El Bagre a los veintiséis (26) día del mes de junio de 2025, en las oficinas de **EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE – EDTB,** se reunion el señor **CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHIVITA,** actuando en

representación de **CASBIM S.A.S. con Nit.** 901.577.286-4, como contratista de obra **No 012-2025** según objeto en referencia y el señor **DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ**, en calidad de SUPERVISOR del contrato de la referencia, y en representación de la **EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE - EDTB** con el propósito de proceder al recibo y entrega final del contrato en mención. Las partes intervinientes de común acuerdo hemos realizado una conciliación así: Se entrega y recibe a entera satisfacción el objeto de la presente acta de conformidad con las especificaciones ha sido entregado por el contratista y recibido a entera satisfacción.

Para constancia se firma por quienes han intervenido en el municipio de El Bagre Antioquia, una vez aprobada.

CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHIVITA
CASBIM S.A.S
Contratista

Doiver Nisperuza.
DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
Supervisor

Intervinieron en el documento:

Firma: Evis Sogamoso.	Firma: Doiver Nisperuza.
Elaboró: Evis Dallana Sogamoso **Cargo:** Secretaria Ejecutivo	**Revisó:** Doiver Nisperuza **Cargo:** Director Técnico **Dependencia:** Dirección Técnica

ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO

DIRECCION TECNICA EDTB

Fecha presente Acta: 17/2/2026

F-DT-012

Acta de Liquidación de Contrato No.: 012-2025

Objeto del Contrato:

Mano de obra y suministros de materiales para el mejoramiento mediante construcción de placa huella en las vías terciarias que comunica de la cabecera municipal a la vereda El Perico y vereda El Real, zona rural del municipio de El Bagre, departamento de Antioquia, en el marco del convenio entre la Gobernación de Antioquia y el municipio de El Bagre.

Contratista: CASBIM S.A.S

No. de Identificación Contraista: 901526561-7

Valor: $ 552,273,837.13

Valor en letras: Quinientos cincuenta y dos millones doscientos setenta y tres mil ochocientos treinta y siete pesos con trece centavos.

Plazo: 04 MESES Fecha de inicio: 26/2/2025 Fecha de recibo: 26/6/2025

Orden de obra o servicio adicional: 0.00

Iniciación de obra o servicio adicional: N/A

En el Municipio de El Bagre Antioquia, a los diecisiete (17) días del mes de febrero de 2026, se reunieron en las oficinas de la Dirección Tecnica de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE (EDTB), el señor **FRANKLIN JOHAN CABARCAS MENDEZ,** en calidad de **GERENTE GENERAL ENCARGADO DE LA EDTB**, **DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ** identificado con cedula de ciudadanía No.8.364.481, en calidad de DIRECTOR TECNICO y **SUPERVISOR** del contrato, la empresa **CASBIM SAS,** identificado con **NIT N°901.577.286-4 ,** representada legalmente por **CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA** calidad de **CONTRATISTA**, con el fin de suscribir el **ACTA DE LIQUIDACION FINAL,** en donde se reciben las obras a **entera satisfaccion** por parte de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE (EDTB), de conformidad con el detalle que a continuación se describe según el Contrato de Obra publica **No. 012 DE 2025.**

Valor final del Contrato: $ 552,273,837.13

La obra ejecutada fueron liquidadas mediante las siguientes actas de pago:
Anticipo $ 0.00 Acta N° 1: $ 224,910,984.87 Acta N° 2 Y FINAL : $ 327,362,852.26

Adicionales NO PAGADOS: $ -

Anticipo: $ 0

Valores pendientes por cancelar: $ 327,362,852.26

Saldo: $ 327,362,852.26

Valor obra o Servicio Adicional: $ 0

Viene del Acta de recibo final del contrato de obra publica 012 de 2025

Los firmantes de la presente acta dejan las siguientes constancias:

DEL CONTRATISTA

Que el contratista garantiza la calidad de todos y de cada uno de los elementos empleados en los trabajos.

Que el Contratista garantiza su responsabilidad ante los trabajadores que tuvo en la ejecución del presente contratos, por sueldos, jornales, honorarios y todas las prestaciones sociales.

Que el Contratista se responsabiliza exclusivamente ante terceros por cualquier queja o reclamación que estos puedan presentar directa o indirectamente a la entidad.

Que a partir de la fecha cesa la responsabilidad del contratista por los daños que sean ocasionados por terceros al contrato.

El contratista manifiesta recibir a satisfacción la liquidación del contrato, razón por la cual renuncia a favor del Municipio de El Bagre, a las Acciones judiciales posteriores a esta acta, que se deriven del citado contrato

DE LAS GARANTÍAS:

Que el contratista otorga las garantías enumeradas en el contrato según poliza de garantia del mismo.

EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE (EDTB)

Que la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE (EDTB), deja constancia que por no contar con los recursos suficientes para pagar las obras extras, estas seran asumidas por el contratista

NOTA: Durante su ejecución NO se realizó ajustes de dinero por lo cual el valor final del contrato es de $ 552.273.837,13

Sin otro motivo firman los que intervinieron:

FRANKLIN JOHAN CABARCAS MENDEZ
GERENTE GENERAL

CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA
Rte. Legal CASBIM SAS
Contratista

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
Supervisor
DIRECTOR TECNICO

Firma: Evis Sogamoso.	**Firma:** Doiver Nisperuza.	**Firma:**
Elaboró: Evis Dayana Sogamoso **Cargo:** Secretaria Ejecutiva	**Revisó:** Doiver Nisperuza **Cargo:** Director Técnico	**Visto Bueno:** Franklin Johan Cabarcas Méndez **Cargo:** Gerente General (E)

	ACTA PARCIAL 1	**CONTRATO No. 012-2025** **OBJETO:** MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VÍAS TERCIARIAS QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA EL PERICO Y VEREDA EL REAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE		**CONTRATISTA:** CASBIM INGENIERIA S.A.S **INTERVENTOR:** INSUCORP S.A.S **SUPERVISOR EDTB:** DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ	**FECHA DE LA PRESENTE ACTA:** 15/05/2025

		CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICATORIO No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N° 1		FALTANTE POR EJECUTAR		ACUMULADO EJECUTADO		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	VALOR	% - POR EJECUTAR	CANTIDAD	VR. TOTAL	% EJECUTADO
1.1	**TRABAJOS PRELIMINARES**															
1.1.1	Conformación de la calzada existente	M2	5000,00	$ 5.766,50	$ 28.832.499,00	-1745,00	-$ 10.062.542,00	3255,00	$ 18.769.957,00	1515,00	$ 8.736.247,19	10.033.709,81	53,46%	1515,00	$ 8.736.247,19	47%
1.2	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**															
1.2.1	Excavacion para la explanación Placa Huella	M3	825,00	$ 22.458,00	$ 18.527.850,00	-172,23	-$ 3.867.941,34	652,77	$ 14.659.908,66	298,32	$ 6.699.670,56	7.960.238,10	54,30%	298,32	$ 6.699.670,56	46%
1.2.2	Excavacion Manual (Viga Riostra)	M3	100,20	$ 47.900,00	$ 4.799.580,00	-79,8	-$ 3.822.420,00	20,40	$ 977.160,00	9,50	$ 455.050,00	522.110,00	53,43%	9,50	$ 455.050,00	47%
1.2.3	Transporte de material	M3-Km	0,00	$ 15.101,56	$ -	5977,18	$ 90.264.757,34	5977,18	$ 90.264.757,00	3392,40	$ 51.230.560,66	39.034.196,34	43,24%	3392,40	$ 51.230.560,66	57%
1.3	**CAPAS GRANULARES**															
1.3.1	Subbase o material similar para placa huella y cunetas	M3	673,31	$ 123.916,41	$ 83.434.155,00	-185,06	-$ 22.931.970,00	488,25	$ 60.502.185,00	227,25	$ 28.160.003,32	32.342.181,68	53,46%	227,25	$ 28.160.003,32	47%
1.4	**PAVIMENTO EN PLACA HUELLA**															
1.4.1	Concreto clase D (210 Kg/cm2)	M3	179,55	$ 405.505,00	$ 72.808.423,00	-14,31	-$ 5.802.777,00	165,24	$ 67.005.646,00	76,95	$ 31.203.609,75	35.802.036,25	53,43%	76,95	$ 31.203.609,75	47%
1.4.2	Concreto clase G (Ciclópeo -210 Kg/cm2)	M3	179,55	$ 360.955,00	$ 64.809.470,00	-14,31	-$ 5.165.266,00	165,24	$ 59.644.204,00	76,95	$ 27.775.487,25	31.868.716,75	53,43%	76,95	$ 27.775.487,25	47%
1.4.3	Viga Riostra de Concreto Clase D (0,30 x 0,20 x 5,0 mts)	M3	100,20	$ 395.347,00	$ 39.613.769,00	-100,20	-$ 39.613.769,00	0,00	$ -		$ -	0,00	0,00%	0,00	$ -	100%
1.4.4	Bordillo de Concreto Vaciado IN SITU	M3	120,00	$ 408.325,00	$ 48.999.000,00	-41,88	-$ 17.100.651,00	78,12	$ 31.898.349,00		$ -	31.898.349,00	100,00%	0,00	$ -	0%
1.4.5	Cuneta de Concreto Vaciada IN SITU	M3	165,00	$ 380.335,00	$ 62.755.275,00	-57,58	-$ 21.899.689,00	107,42	$ 40.855.586,00		$ -	40.855.586,00	100,00%	0,00	$ -	0%
1.4.6	Acero de refuerzo grado 60 para Placa huella	KG	7789,90	$ 2.213,00	$ 17.239.048,70	8965,01	$ 19.839.571,14	16754,91	$ 37.078.619,84	7355,93	$ 16.278.667,92	20.799.951,92	56,10%	7355,93	$ 16.278.667,92	44%
NP	**NO PREVISTOS**															
1.4.3	Viga Riostra de Concreto Clase D (0,30 x 0,20 x 5,0 mts)	M3		$ 395.347,00		51,00	$ 20.162.697,00	51,00	$ 20.162.697,00	23,75	$ 9.389.491,25	10.773.205,75	53,43%	23,75	$ 9.389.491,25	47%

VALOR COSTOS DIRECTOS		**$ 441.819.069,70**	**-$ 0,00**	**$ 441.819.069,70**	**$ 179.928.787,90**		**$ 179.928.787,90**		
AIU	25,00%	$ 110.454.767,43	-$ 0,00	$ 110.454.767,43	$ 44.982.196,97		$ 44.982.196,97		
VALOR TOTAL OBRA		**$ 552.273.837,13**	**-$ 0,00**	**$ 552.273.837,13**	**$ 224.910.984,87**	40,72%	**$ 224.910.984,87**	**40,72%**	

R/L CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA
CASBIM S.A.S.
CONTRATISTA DE OBRA

R/L JORGE HERNAN RINCON MARQUEZ
INSUCORP S.A.S
INTERVENTOR

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
DIRECTOR TÉCNICO
SUPERVISIÓN

ACTA 2 Y FINAL	**CONTRATO No. 012-2025** **OBJETO:** MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VÍAS TERCIARIAS QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA EL PERICO Y VEREDA EL REAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE			**CONTRATISTA:** CASBIM INGENIERIA S.A.S **INTERVENTOR:** INSUCORP S.A.S **SUPERVISOR EDTB:** DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ	**FECHA DE LA PRESENTE ACTA:** 26/06/2025

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICATORIO No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N° 1		ACTA 2 Y FINAL		ACUMULADO EJECUTADO		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	% EJECUTAD
1.1	**TRABAJOS PRELIMINARES**															
1.1.1	Conformación de la calzada existente	M2	5000,00	$ 5.766,50	$ 28.832.499,00	-1745,00	-$ 10.062.542,00	3255,00	$ 18.769.957,00	1515,00	$ 8.736.247,19	1.740,00	$ 10.033.709,64	3255,00	$ 18.769.956,82	100%
1.2	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**															
1.2.1	Excavacion para la explanación Placa Huella	M3	825,00	$ 22.458,00	$ 18.527.850,00	-172,23	-$ 3.867.941,34	652,77	$ 14.659.908,66	298,32	$ 6.699.670,56	354,45	$ 7.960.238,10	652,77	$ 14.659.908,66	100%
1.2.2	Excavacion Manual (Viga Riostra)	M3	100,20	$ 47.900,00	$ 4.799.580,00	-79,8	-$ 3.822.420,00	20,40	$ 977.160,00	9,50	$ 455.050,00	10,90	$ 522.110,00	20,40	$ 977.160,00	100%
1.2.3	Transporte de material	M3-Km	0,00	$ 15.101,56	$ -	5977,18	$ 90.264.757,34	5977,18	$ 90.264.757,00	3392,40	$ 51.230.560,66	2.584,78	$ 39.034.216,72	5977,18	$ 90.264.777,38	100%
1.3	**CAPAS GRANULARES**															
1.3.1	Subbase o material similar para placa huella y cunetas	M3	673,31	$ 123.916,41	$ 83.434.155,00	-185,06	-$ 22.931.970,00	488,25	$ 60.502.185,00	227,25	$ 28.160.003,32	261,00	$ 32.342.182,03	488,25	$ 60.502.185,35	100%
1.4	**PAVIMENTO EN PLACA HUELLA**															
1.4.1	Concreto clase D (210 Kg/cm2)	M3	179,55	$ 405.505,00	$ 72.808.423,00	-14,31	-$ 5.802.777,00	165,24	$ 67.005.646,00	76,95	$ 31.203.609,75	88,29	$ 35.802.036,45	165,24	$ 67.005.646,20	100%
1.4.2	Concreto clase G (Ciclópeo -210 Kg/cm2)	M3	179,55	$ 360.955,00	$ 64.809.470,00	-14,31	-$ 5.165.266,00	165,24	$ 59.644.204,00	76,95	$ 27.775.487,25	88,29	$ 31.868.716,95	165,24	$ 59.644.204,20	100%
1.4.3	Viga Riostra de Concreto Clase D (0,30 x 0,20 x 5,0 mts)	M3	100,20	$ 395.347,00	$ 39.613.769,00	-100,20	-$ 39.613.769,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	100%
1.4.4	Bordillo de Concreto Vaciado IN SITU	M3	120,00	$ 408.325,00	$ 48.999.000,00	-41,88	-$ 17.100.651,00	78,12	$ 31.898.349,00		$ -	78,12	$ 31.898.349,00	78,12	$ 31.898.349,00	100%
1.4.5	Cuneta de Concreto Vaciada IN SITU	M3	165,00	$ 380.335,00	$ 62.755.275,00	-57,58	-$ 21.899.689,00	107,42	$ 40.855.586,00		$ -	107,42	$ 40.855.585,70	107,42	$ 40.855.585,70	100%
1.4.6	Acero de refuerzo grado 60 para Placa huella	KG	7789,90	$ 2.213,00	$ 17.239.048,70	8965,01	$ 19.839.571,14	16754,9	$ 37.078.619,84	7355,93	$ 16.278.667,92	9.398,97	$ 20.799.931,47	16754,90	$ 37.078.599,39	100%
NP	**NO PREVISTOS**															
1.4.3	Viga Riostra de Concreto Clase D (0,30 x 0,20 x 5,0 mts)	M3		$ 395.347,00		51,00	$ 20.162.697,00	51,00	$ 20.162.697,00	23,75	$ 9.389.491,25	27,25	$ 10.773.205,75	51,00	$ 20.162.697,00	100%

VALOR COSTOS DIRECTOS		**$ 441.819.069,70**	**-$ 0,00**	**$ 441.819.069,70**	**$ 179.928.787,90**	**$ 261.890.281,81**	**$ 441.819.069,70**	
AIU	25,00%	$ 110.454.767,43	-$ 0,00	$ 110.454.767,43	$ 44.982.196,97	$ 65.472.570,45	$ 110.454.767,43	
VALOR TOTAL OBRA		**$ 552.273.837,13**	**-$ 0,00**	**$ 552.273.837,13**	**$ 224.910.984,87**	**$ 327.362.852,26**	**$ 552.273.837,13**	**100,00%**

R/L CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA
CASBIM S.A.S.
CONTRATISTA DE OBRA

R/L JORGE HERNAN RINCON MARQUEZ
INSUCORP S.A.S
INTERVENTOR

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
DIRECTOR TÉCNICO
SUPERVISIÓN

EDTB EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE	**ACTA DE MODIFICACION N° 1** **BALANCE DE OBRA**	**CONTRATO No. 012-2025 OBJETO:** MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VÍAS TERCIARIAS QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA EL PERICO Y VEREDA EL REAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE	CONTRATISTA DE OBRA: **CASBIM S.A.S** INTERVENTORIA: **INSUCORP SAS** SUPERVISOR: **DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ**	FECHA: 02 DE MAYO 2025

CONDICIONES ORIGINALES						**MODIFICACIÓN 1**			**CONDICIONES ACTUALIZADAS**	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDA	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	+/-	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
1.1	**TRABAJOS PRELIMINARES**									
1.1.1	Conformación de la calzada existente	M2	5000,00	$ 5.766	$ 28.832.499,00	-	-1.745,00	-$ 10.062.542,00	3.255,00	$ 18.769.957,00
1.2	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**									
1.2.1	Excavacion para la explanación Placa Huella	M3	825,00	$ 22.458	$ 18.527.850,00	-	-172,23	-$ 3.867.941,00	652,77	$ 14.659.909,00
1.2.2	Excavacion Manual (Viga Riostra)	M3	100,20	$ 47.900	$ 4.799.580,00	-	-79,80	-$ 3.822.420,00	20,40	$ 977.160,00
1.2.3	Transporte de material	M3-Km	0,00	$ 15.102	$ 0,00	+	5.977,18	$ 90.264.757,00	5.977,18	$ 90.264.757,00
1.3	**CAPAS GRANULARES**									
1.3.1	Subbase o material similar para placa huella y cunetas	M3	673,31	$ 123.916	$ 83.434.155,49	-	-185,06	-$ 22.931.970,14	488,25	$ 60.502.185,35
1.4	**PAVIMENTO EN PLACA HUELLA**									
1.4.1	Concreto clase D (210 Kg/cm2)	M3	179,55	$ 405.505	$ 72.808.423,00	-	-14,31	-$ 5.802.777,00	165,24	$ 67.005.646,00
1.4.2	Concreto clase G (Ciclópeo -210 Kg/cm2)	M3	179,55	$ 360.955	$ 64.809.470,00	-	-14,31	-$ 5.165.266,00	165,24	$ 59.644.204,00
1.4.3	Viga Riostra de Concreto Clase D (0,30 x 0,20 x 5,0 mts)	M3	100,20	$ 395.347	$ 39.613.769,00	-	-100,20	-$ 39.613.769,00	0,00	$ 0,00
1.4.4	Bordillo de Concreto Vaciado IN SITU	M3	120,00	$ 408.325	$ 48.999.000,00	-	-41,88	-$ 17.100.651,00	78,12	$ 31.898.349,00
1.4.5	Cuneta de Concreto Vaciada IN SITU	M3	165,00	$ 380.335	$ 62.755.275,00	-	-57,58	-$ 21.899.689,00	107,42	$ 40.855.586,00
1.4.6	Acero de refuerzo grado 60 para Placa huella	KG	7789,90	$ 2.213	$ 17.239.048,70	+	8.965,01	$ 19.839.571,14	16.754,91	$ 37.078.619,84
NP	**NO PREVISTOS**									
NP1	Viga Riostra de Concreto Clase D (0,20 x 0,25 x 5,0 mts)	M3	-	$ 395.347	$ -	+	51,00	$ 20.162.697,00	51,00	$ 20.162.697,00

VALOR COSTOS DIRECTOS		$ 441.819.069,70	$ 0,00	$ 441.819.069,70
AIU	**25,00%**	$ 110.454.767,43	$ 0,00	$ 110.454.767,43
VALOR TOTAL OBRA		$ 552.273.837,13	$ 0,00	$ 552.273.837,13

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
DIRECTOR TÉCNICO
Supervisor

CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA
CASBIM S.A.S
Contratista de Obra

JORGE HERNAN RINCON MARQUEZ
INSUCORP SAS
Interventoría

EDTB

EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE **EL BAGRE**

FECHA DE ACTUALIZACION	16/05/2025
LONGITUD DE LA PLACA HUELLA (M)	651,0
ANCHO DE LA CALZADA (m)	5
LONGITUD A BOTADERO (Km)	6,69

CONTRATO No. 012-2025 **OBJETO: MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VÍAS TERCIARIAS QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA EL PERICO Y VEREDA EL REAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE**

CALCULO DE ACTUALIZACION DE CANTIDADES DE OBRA

	Longitud Tramo	*Ancho*
Tramos de vías ancho 5,0mt	*651,00*	*5,00*
Tramos de vías ancho 7,5 m (en curvas por sobre ancho de 2,5 m)	*0,00*	*7,50*
Longitud de placa huella (Metros)	***651,00***	

CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE — Unidad: M2

	Long. de Vía	Ancho de calzada	Area (m2)
Tramos de vías ancho 5,0mt	*651,00*	*5,00*	3255,00

	longitud promedio sobre ancho	Ancho sobre ancho	Area (m2)
	0,00	*0,00*	0,00
		TOTAL	***3255,00***

EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES — Unidad: M3

	Longitud	CARTERA REAL	CARTERA L CANO	Volumen (m3)
Tramos de vías ancho 5,0mt	*651,00*	*298,32*	*354,45*	652,77
			TOTAL	***652,77***

EXCAVACIÓN MANUAL (VIGAS RIOSTRAS) — Unidad: M3

Long. de Vía	No. De Vigas	Ancho	Largo de viga	Prof. despues de excavacion	Volumen (m3)
651,00	*204,00*	*0,20*	*5,00*	*0,10*	20,40
				TOTAL	***20,40***

TRANSPORTE DE MATERIAL — Unidad: M3.KM

Descripcion material	Volumen en sitio	Factor Expansión	Distancia Prom. (km)	Transporte (m3)
Excavacion para la explanación El Real	*298,32*	*1,29*	*8,46*	*3264,55*
Excavacion Manual (Viga Riostra) El Relal	*9,50*	*1,29*	*8,46*	*103,96*
Excavacion para la explanación Luis Cano	*354,45*	*1,29*	*5,52*	*2530,84*
Excavacion Manual (Viga Riostra) Luis Cano	*10,90*	*1,29*	*5,52*	*77,83*
			TOTAL	**5977,18**

.Factor de expansion de 28,9%

SUBBASE GRANULAR CLASE C — Unidad: M3

	Longitud	Ancho de calzada	Profundidad	Volumen (m3)
Tramos de vías ancho 5,0mt	*651,00*	*5,00*	*0,15*	488,25
				488,25

PLACA HUELLA DE CONCRETO HIDRÁULICO — Unidad: M3

	Longitud	Area losas	Cant / según ml	Cant. Elementos	Espesor	Vol (m3)
Tramos de vías ancho 5,0mt	*651,00*	*2,70*	204,00	2,00	0,15	165,24
					TOTAL	**165,24**

CONCRETO CICLOPEO PARA PLACA HUELLA — Unidad: M3

	Long. de Vía	Area franja central (3*0,9)	Area franja concreto Laterales (0,45*3)	Espesor	No. De franjas Laterales	Cant. / según ml	Vol (m3)
Tramos de vías ancho 5,0mt	*651,00*	*2,70*	*1,35*	*0,15*	2,00	204,00	165,24
						TOTAL	**165,24**

VIGA RIOSTRA DE CONCRETO CLASE D (0,20 x 0,25 M) — Unidad: M3

Long. de Vía	No. De Vigas	Ancho	Altura Adicional (m)	Longitud	Volumen (m3)
651,00	*204,00*	*0,20*	*0,25*	*5,00*	51,00
				TOTAL	***51,00***

EDTB

EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE **EL BAGRE**

BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO			Unidad:	M3
	Long. de Via (Total)	Cantidad bordillo x ml	Volumen x ml	Volumen total (m3)
Tramos de vías ancho 5,0mt	651,00	2,00	0,060	78,12
			TOTAL	78,12

CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO			Unidad:	M3
	Long. de Via	Ancho	Profundidad	Volumen (m3)
Lado Derecho	651,00	0,55	0,15	53,71
Lado Izquierdo	651,00	0,55	0,15	53,71
			TOTAL	107,42

ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa				Unidad:	KG
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA CONTRATAR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VIAS TERCIARIAS QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL CORREGIMIENTO DE PUERTO LOPEZ Y VEREDA LA CORONA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA Y EL	Longitud	No. De franjas	Acero x metro	Peso Kg/mt	Peso (Kg)
Acero longitudinal Placa - #4	651,00	2,00	7,20	0,56	5249,66
Acero transversal Placa - #2	651,00	2,00	3,00	0,25	976,50
Acero longitudinal Cuneta - #4	651,00	2,00	3,60	0,56	2624,83
Acero transversal Cuneta - #2	651,00	2,00	1,65	0,25	537,08
Acero longitudinal Bordillo - #4	651,00	2,00	2,50	0,56	1822,80
Acero transversal Bordillo - #3	651,00	2,00	1,80	0,56	1312,42
				TOTAL	12523,12
	No. de vigas	Longitud	Acero x metro	Peso Kg/mt	Peso (Kg)
Acero longitudinal Viga riostra 5 m - #4	204,00	5,20	4,00	0,56	2376,19
Acero transversal Viga riostra 5 m - #2	204,00	5,20	7,00	0,25	1856,40
				TOTAL	4232,59
				TOTAL REFUERZO TRAMO	16754,91
				TOTAL ACERO	16.754,91

Alineación: Alineamiento Sobre el Eje (EL REAL)			
Grupo de líneas de muestreo: SECCIONES			
P.K. inicial: 0+000.000			
P.K. final: 0+303.000			
P.K.	**Área de excavación (m2)**	**Volumen de excavación (m3)**	**Vol. excavación acumul. (m3)**
0+000.000	0,850	0,000	0,000
0+010.000	0,850	8,510	8,510
0+020.000	0,750	8,000	16,510
0+030.000	0,830	7,910	24,420
0+040.000	0,820	8,260	32,680
0+050.000	0,990	9,080	41,760
0+060.000	0,880	9,350	51,110
0+070.000	0,870	8,710	59,820
0+080.000	0,890	8,780	68,600
0+090.000	0,910	8,990	77,590
0+100.000	0,830	8,680	86,270
0+110.000	0,930	8,800	95,070
0+120.000	1,020	9,770	104,840
0+130.000	1,030	10,270	115,110
0+140.000	0,870	9,510	124,620
0+150.000	0,870	8,710	133,330
0+160.000	1,000	9,370	142,700
0+170.000	1,310	11,570	154,270
0+180.000	0,850	10,820	165,090
0+190.000	1,550	12,020	177,110
0+200.000	1,500	15,270	192,380
0+210.000	0,660	10,790	203,170
0+220.000	0,240	4,500	207,670
0+230.000	0,760	5,020	212,690
0+240.000	0,590	6,720	219,410
0+250.000	1,080	8,360	227,770
0+260.000	1,260	11,670	239,440
0+270.000	1,600	14,280	253,720
0+280.000	1,630	16,140	269,860
0+290.000	1,450	15,360	285,220
0+300.000	0,580	10,080	295,300
0+303.000	0,170	3,020	**298,320**

Alineación: Alineamiento Sobre el Eje (Luis Cano - Perico)			
Grupo de líneas de muestreo: SECCIONES			
P.K. inicial: 0+000.000			
P.K. final: 0+391.327			
P.K.	**Área de excavación (m2)**	**Volumen de excavación (m3)**	**Vol. excavación acumul. (m3)**
0+000.000	0,810	0,000	0,000
0+010.000	0,870	8,390	8,390
0+020.000	0,740	8,010	16,400
0+030.000	0,740	7,410	23,810
0+040.000	1,040	8,930	32,740
0+050.000	1,010	10,230	42,970
0+060.000	0,890	9,490	52,460
0+070.000	0,900	8,980	61,440
0+080.000	0,820	8,610	70,050
0+090.000	0,800	8,130	78,180
0+100.000	0,970	8,860	87,040
0+110.000	0,570	7,840	94,880
0+120.000	0,440	5,140	100,020
0+130.000	1,270	8,610	108,630
0+140.000	1,890	15,790	124,420
0+150.000	0,920	14,060	138,480
0+160.000	1,240	10,800	149,280
0+170.000	0,970	11,050	160,330
0+180.000	1,150	10,620	170,950
0+190.000	1,590	13,750	184,700
0+200.000	0,950	12,730	197,430
0+210.000	1,050	9,970	207,400
0+220.000	0,910	9,790	217,190
0+230.000	1,070	9,930	227,120
0+240.000	1,230	11,560	238,680
0+250.000	1,010	11,220	249,900
0+260.000	1,220	11,130	261,030
0+270.000	1,150	11,830	272,860
0+280.000	1,140	11,440	284,300
0+290.000	1,090	11,160	295,460
0+300.000	0,890	9,910	305,370
0+310.000	0,910	9,010	314,380
0+320.000	1,270	10,990	325,370
0+330.000	1,090	11,810	337,180
0+340.000	0,860	9,760	346,940
0+348.000	0,810	7,510	**354,450**

CASBIM SAS
NIT 901.577.286-4
CR 3 Este 22-01
Tel: (601) 3132151584
Chía - Colombia
admin@casbim.com.co
https://www.casbim.com.co/

Factura electrónica de venta
No. FE 17

Señores	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE - EDTB		
NIT	901.526.561-7	**Teléfono**	(601) 3136264937 - Ext. 000
Dirección	CL 50 47A 19	**Ciudad**	El Bagre - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/11/2025, 09:50
Expedición	13/11/2025, 15:36
Vencimiento	13/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Conformación de la calzada existente	1,765.00	5,766.50	10,177,872.50
2	Excavacion para la explanación Placa Huella	525.55	22,458.00	11,802,801.90
3	Excavacion Manual (Viga Riostra)	28.75	47,900.00	1,377,125.00
4	Transporte Volqueta con cargue, transporte y llevada de material	1.00	49,314,725.90	49,314,725.90
5	Subbase o material similar para placa huella y cunetas	349.31	123,916.41	43,285,241.18
6	Concreto clase D (210 Kg/cm2)	93.50	405,505.00	37,914,717.50
7	Concreto clase G (Ciclópeo -210 Kg/cm2)	93.15	360,955.00	33,622,958.25
8	Bordillo de Concreto Vaciado IN SITU	41.40	408,325.00	16,904,655.00
9	Cuneta de Concreto Vaciada IN SITU	56.93	380,335.00	21,652,471.55
10	Acero de refuerzo grado 60 para Placa huella	11,058.06	2,213.00	24,471,486.78
11	Viga Riostra de Concreto Clase D (0,20 x 0,25 x 5,0 mts)	28.75	395,347.00	11,366,226.25

Total items: 11

Valor en Letras:
Trescientos veintisiete millones trescientos sesenta y dos mil ochocientos cincuenta y dos pesos m/cte con veintiséis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-11-13 por $ 327,362,852.26

Total Bruto	261,890,281.81
Administración 19.05%	49,890,098.69
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 5.00%	13,094,514.09
IVA 19%	2,487,957.68
Total a Pagar	327,362,852.26

Observaciones:
Consignar a la cuenta de ahorros Bancolombia No. 33800004863 a nombre de CASBIM S.A.S.

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764088238130 aprobado en 20250203 prefijo FE desde el número 9 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: db9f8c5b3fe8c7d9cba16dad0f68f0987f1c61bc2cd14e98ad15b98dfe3571ebbad4a42829c878b4b6d3170e6aad7404

CASBIM SAS
. NIT 901.577.286-4
CR 3 Este 2201
Tel. (601) 3132151584
Chía - Colombia

Nota Crédito
No. 2 4

Fecha Nota Crédito	2025-12-10
Factura de Venta	FE-17
Generación	10/12/2025, 09:03
Expedición	10/12/2025, 09:03
Vencimiento	13/11/2025

Señores	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE - EDTB		
NIT	901.526.561-7	**Teléfono**	(601) 3136264937
Dirección	CL 50 47A 19	**Ciudad**	El Bagre - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Conformación de la calzada existente	1,765.00	10,274,562.29
2	Excavacion para la explanación Placa Huella	525.55	11,914,928.52
3	Excavacion Manual (Viga Riostra)	28.75	1,390,207.69
4	Transporte Volqueta con cargue, transporte y llevada de material	1.00	49,783,215.80
5	Subbase o material similar para placa huella y cunetas	349.31	43,696,450.97
6	Concreto clase D (210 Kg/cm2)	93.50	38,274,907.32
7	Concreto clase G (Ciclópeo -210 Kg/cm2)	93.15	33,942,376.35
8	Bordillo de Concreto Vaciado IN SITU	41.40	17,065,249.22
9	Cuneta de Concreto Vaciada IN SITU	56.93	21,858,170.03
10	Acero de refuerzo grado 60 para Placa huella	11,058.06	24,703,965.90
11	Viga Riostra de Concreto Clase D (0,20 x 0,25 x 5,0 mts)	28.75	11,474,205.40

Total Items: 11

Valor en Letras:
Trescientos veintisiete millones trescientos sesenta y dos mil ochocientos cincuenta y dos pesos m/cte con veintisiete cent.

Condiciones de Pago:
Instrumento de pago no definido - Cruce de vencimiento - Cuota No. 001 vence el 2025-11-13 por $ 327,362,852.27

Total Bruto	261,890,261.81
Administración 19.05%	49,890,098.69
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 5.00%	13,094,514.09
IVA 19%	2,487,957.68
Total	327,362,852.27

Observaciones:

CUDE: 44ca196fda42683276e7044f9117613f7d2f2f22ff555845ace6a2c70cc4a3e8e3bf1e6bb5e6bbf04ddff3dbf1d856b2f2c
CUFE factura: db9d5c5b3fe8c7d9cba16da0d68b0887f1c61bc2cd14c38ad15b98dfc3571ebbad4a42829c378b4b5d3170e6aad7404

Fabricante, Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vive en el XML

ACTA NUMÉRICA N° 2 Y FINAL

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA CONTRATAR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VIAS TERCIARIAS QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA EL PERICO Y VEREDA EL REAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE.

COSTO DIRECTO (SEGÚN INFORME CORTE 2 Y FINAL - ANEXO)		$	261.890.281,81
TOTAL A.I.U.	25%	$	65.472.570,45
TOTAL OBRA		$	327.362.852,26
TOTAL INTERVENTORIA (SEGÚN INFORME CORTE 1 Y FINAL - ANEXO)		$	39.488.960,34
VALOR TOTAL		$	366.851.812,60
HONORARIOS	2,98%	$	17.663.195,41
IVA SOBRE LOS HONORARIOS	19%	$	3.356.007,13
COSTO TOTAL PROYECTO		$	387.871.015,13
COSTO TOTAL DEL PROYECTO		$	387.871.015,13

CARLOS ANDRES ARRIETA GOMEZ
Secretario De Obras Públicas.
Supervisor.

Rafael Correa Argota
RAFAEL DE JESUS CORREA ARGOTA
Representante Legal EDTB
Contratista

ACTA DE MODIFICACION N° 1

CONTRATO	012-2025
CONTRATANTE	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE - EDTB
NIT	901526561-7
CONTRATISTA	CASBIM S.A.S.
NIT	901.577.286-4
REPRESENTANTE LEGAL	CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA
OBJETO	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VÍAS TERCIARIAS QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA EL PERICO Y VEREDA EL REAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE
VALOR	QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON TRECE CENTAVOS ($ 552.273.837,13) INCLUIDO EL A.U. Y DEMÁS COSTOS A QUE HAYA LUGAR
INTERVENTORIA	INSUCORP SAS
NIT	901.526.561-7
REPRESENTANTE LEGAL	JORGE HERNAN RINCON MARQUEZ
SUPERVISOR	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ DIRECTOR TÉCNICO
PLAZO	CUATRO (4) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
ACTA DE INICIO	VEINTISEIS (26) DE FEBRERO DE 2025.
FECHA DE ERMINACIÓN	VEINTISEIS (26) DE JUNIO DE 2025
LOCALIZACIÓN	MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

En el Municipio de El Bagre - Antioquia, a los dos (02) días del mes de mayo del año dos mil veinticinco (2025), se reunieron en el municipio de El Bagre DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ, director técnico en calidad de Supervisor de la obra, CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA, representando a CASBIM S.A.S. en calidad de contratista, JORGE HERNAN RINCON MARQUEZ representando a INSUCORP SAS en calidad de interventor con el propósito de suscribir ACTA DE MODIFICACION 1 del contrato en referencia.

CONSIDERANDO:

Que las cantidades de obra propuestas en las obras no contempladas son aproximadas y que estas cantidades están sujetas a modificaciones durante el desarrollo de la obra.

Calle 50 # 47A-19 gerenciaedtb@gmail.com

Que las cantidades de obra pueden aumentar o disminuir de acuerdo con las condiciones y modificaciones que se realicen.

Que en la realización de balance y cuantificando la meta física se identificó que algunos ítems no tenían la suficiente cantidad para tener un alcance uniforme de placa huella

Que por de concepto técnico la dimensión de la viga riostra es de (0.2 x 0.25 m), por lo que se modifica este item, suprimiendo el de las condiciones originales (item 1.4.3), por un item no previsto el cual tendrá el mismo valor unitario en la misma unidad de medida del inicial.

Que durante la ejecución y desarrollo del contrato, la Interventoría dio concepto favorable y el supervisor de la obra aprobación de las mayores cantidades, quedando esta información en las memorias de cantidades anexas a la presente acta.

Que las adiciones y modificaciones a las cantidades de obra son parte de la presente acta y se encuentran en forma detallada en cuadro anexo.

Que por solicitud del contratista en visita de obra realizada se observó que dentro de las condiciones iníciales no se tubo en cuenta la cantidad de material producto de la excavación a acarrear para su correcta disposición final, el cual en el estudio previo estaba contemplado que sería a cargo del municipio de El Bagre con su banco de maquinarias, pero por las condiciones de disponibilidad de estos (afectación de todas las vías rurales por ola invernal) no fue posible por lo que el contratista debió hacerse cargo de realizar dicha actividad, la cual se encuentra creada (Item 1.2.3) pero con cantidad cero en las condiciones contractuales iniciales, por lo que no fue necesario crear un ítem no previsto.

Que el sitio de disposición final o ZODME queda a 8450 m de distancia promedio del tramo de El Real y 5470 del tramo Luis Cano

Que por lo anteriormente expuesto e identificando que los ítems de conformación (item 1.1.1), bordillos (item 1.4.4) y cunetas (item 1.4.5) contemplaban un alcance mayor a los demás item, se unifico la meta física para la ejecución de este contrato de placa huella y quedo de la siguiente manera:

CABECERA MUNICIPAL - VEREDA EL REAL	303 ml
VEREDA LUIS CANO- VEREDA EL PERICO	348 ml
TOTAL, META FISICA DEL PROYECTO	**651 ml**

Que la información resultante de la presente acta se tomara como base para recibir las obras del proyecto y elaborar y recibir las posteriores actas parciales de obra, acta final y la liquidación del contrato.

Calle 50 # 47A-19 gerenciaedtb@gmail.com

ACUERDAN:

Modificar las cantidades de algunos ítems según memorias y cuadro de cantidades anexos a la presente acta.

Que no habrá una adición presupuestal al contrato de obra de la referencia

Que no habrá adición en tiempo quedando como fecha programada de terminación el 26 de junio de 2025

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA
CASBIM S.A.S
Contratista de Obra

JORGE HERNAN RINCON MARQUEZ
INSUCORP SAS
Interventoría

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
DIRECTOR TÉCNICO
Supervisor

Anexos:
Memorias de cantidades para alcanzar metafísica
Cuadro de balance de cantidades

Calle 50 # 47A-19 gerenciaedtb@gmail.com

COMITÉ DE OBRA

CASBIM INGENIERÍA

Oficina Principal: Carrera 3 Este N° 22-01
Chía, Cundinamarca

c.suarez@cambim.com.co
NIT: 901.577.286-4

	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	EDTB EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE
OBJETO	**MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VÍAS TERCIARIAS QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA EL PERICO Y VEREDA EL REAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE**	

COMITÉ N°	1	**FECHA:**	miércoles, 26 de febrero de 2025
CONTRATISTA:	**CASBIM S.A.S.**	**DIRECCION Y TELEFONO:**	Carrera 3 Este N° 22-01, Chía Cundinamarca
INTERVENTORÍA:	**INSUCORP S.A.S.**	**DIRECCION Y TELEFONO:**	CL 14 24 36 - Av. Libertador - Santa Marta, Magdalena.
SUPERVISOR SUPERVISOR ALCALDIA :	**CARLOS ANDRES ARRIETA GOMEZ**	**DIRECCION Y TELEFONO:**	OFICINA SECRETARIA OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO EL BAGRE, CEL 312 797 26 00
DIRECTOR TECNICO EDTB:	**DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ**	**DIRECCION Y TELEFONO:**	CALLE 50 #47A-19 SEGUNDO PISO 3232283612

LISTADO DE ASISTENCIA AL COMITÉ

N°	(a) NOMBRES	(b) REPRESENTA A:
1	CARLOS ANDRES ARRIETA GOMEZ	SUPERVISOR (ALCALDIA)
2	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE
3	CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA	CASBIM S.A.S.
4	JORGE HERNAN RINCON MARQUEZ	INSUCORP S.A.S.
5		

ORDEN DEL DÍA

N°	(c) ASUNTO	(d) ESTADO	(e) COMPROMISO / OBSERVACIONES	(f) FECHA DE COMPROMISO	(g) RESPONSABLE
1	INICIO DE OBRA	REALIZADO	SE REALIZÓ ACTA DE INICIO - COMENTANDO DETALLES DEL PROYECTO	26 DE FEBRERO DE 2025	CONTRATISTA Y SUPERVISOR
2	ENTREGA DEL SITIO DE OBRA POR PARTE DE LA ADMINISTRACION TERRITORIAL	REALIZADO	SE HACE ENTREGA DEL SITIO DE OBRA POR PARTE DE LA EDTB AL CONTRATISTA - CORRESPONDIENTE AL TRAMO DE VIA "EL REAL" Y AL TRAMO "LUIS CANO", QUEDANDO PENDIENTE EL TRAMO "PERICO"	26 DE FEBRERO DE 2025	CONTRATISTA Y SUPERVISOR
	PROGRAMACION DE COMITES DE OBRA	ACORDADO	SE ACORDO REALIZAR COMITES TECNICOS DE OBRA LOS VIERNES CADA 15 DIAS	14 DE MARZO	CONTRATISTA Y SUPERVISORES
	ACTAS DE VECIDAD	ACORDADO	EL CONTRATISTA ADVIRTIÓ QUE DENTRO DE LOS TRAMOS ENTREGADOS NO HAY ESTRUCTURAS VECINAS CON POSIBLES AFECTACIONES EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES POR LO QUE NO ES NECESARIO LA REALIZACIÓN DE ACTAS VECINDAD, EL SUPERVISOR DE LA EDTB SOLICITA QUE ESTO QUEDE PLASMADO EN COMUNICADO ESCRITO Y REALIZA LA ACLARACIÓN QUE LAS ACTAS DE VECINDAD SIRVEN COMO SOPORTE ANTE POSIBLES RECLAMACIONES	14 DE MARZO	CONTRATISTA Y SUPERVISORES
	BALANCE Y ALCANCE DE LAS OBRAS	PROGRAMADO	POR PARTE DEL SUPERVISOR DE LA EDTB SE SOLICITA AL CONTRATISTA QUE REALICE BALANCE DE OBRAS PARA PROXIMO COMITÉ	14 DE MARZO	CONTRATISTA

APROBACION DEL ACTA

Firma

Nombre: CARLOS ANDRES ARRIETA GOMEZ
Cargo: SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
Empresa : ALCALDIA MUNICIPAL

Firma

Nombre: CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
Empresa : CASBIM S.A.S.

Firma

Nombre: DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
Cargo: DIRECTOR TECNICO
Empresa : EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

Firma

Nombre: JORGE HERNAN RINCON MARQUEZ
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
Empresa : INSUCORP S.A.S.

	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	EDTB EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE
OBJETO	**MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VÍAS TERCIARIAS QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA EL PERICO Y VEREDA EL REAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE**	

COMITÉ N°	2	**FECHA:**	viernes, 14 de marzo de 2025
CONTRATISTA:	**CASBIM S.A.S.**	**DIRECCION Y TELEFONO:**	Carrera 3 Este N° 22-01, Chía Cundinamarca
INTERVENTORÍA:	**INSUCORP S.A.S.**	**DIRECCION Y TELEFONO:**	CL 14 24 36 - Av. Libertador - Santa Marta, Magdalena.
SUPERVISOR SUPERVISOR ALCALDIA :	**CARLOS ANDRES ARRIETA GOMEZ**	**DIRECCION Y TELEFONO:**	OFICINA SECRETARIA OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO EL BAGRE, CEL 312 797 26 00
DIRECTOR TECNICO EDTB:	**DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ**	**DIRECCION Y TELEFONO:**	CALLE 50 #47A-19 SEGUNDO PISO 3232283612

LISTADO DE ASISTENCIA AL COMITÉ

N°	(a) NOMBRES	(b) REPRESENTA A:
1	CARLOS ANDRES ARRIETA GOMEZ	SUPERVISOR (ALCALDIA)
2	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE
3	CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA	CASBIM S.A.S. (CONSTRATISTA DE OBRA)
4	JORGE HERNAN RINCON MARQUEZ	INSUCORP S.A.S. (INTERVENTORÍA)
5		

ORDEN DEL DÍA

En cumplimiento del seguimiento técnico al Contrato de Obra No. 012-2025, se llevó a cabo el presente Comité Técnico con el fin de analizar una situación identificada por la Interventoría en el desarrollo de sus funciones durante la revisión y verificación de los diseños entregados por el contratista de obra.

Primero: El día 13 de marzo de 2025, el Contratista de Obra hizo entrega oficial del levantamiento topográfico y revision del diseño vial correspondiente a los 303 metros de placa huella a ejecutar en la vereda El Real. Dichos diseños fueron elaborados conforme a los lineamientos técnicos establecidos en la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales del Programa Colombia Rural, y cumplen con las especificaciones y normativas vigentes.

Segundo: La Interventoría, tras la revisión técnica de los documentos, identificó una diferencia entre las dimensiones de los ítems 1.2.2 "Excavacion Manual (Viga Riostra)" y 1.4.3 "Viga Riostra de Concreto Clase D (0,30 x 0,20 x 5,0 mts)" contemplados en el presupuesto original del contrato y las dimensiones requeridas en el diseño presentado por el contratista de obra. Dicha diferencia se sustenta con el documento técnico "DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL DE PLACA HUELLA." el cual se presenta a los asistentes al Comité Técnico.

Tercero: Según lo dispuesto en el diseño técnico, las vigas riostras necesarias para la correcta ejecución del proyecto deben tener las siguientes dimensiones: 0,20 metros de ancho x 0,25 metros de profundidad x 5,0 metros de longitud, lo cual difiere de los ítems inicialmente previstos. Esta diferencia impide la ejecución del ítem conforme a los requerimientos técnicos, generando la necesidad de crear un nuevo ítem no previsto que se ajuste a las condiciones reales de la obra.

Cuarto: En consecuencia, la Interventoría recomienda formalmente la inclusión de un nuevo ítem no previsto en el contrato de obra, con las dimensiones correctas de la viga riostra (0,20 x 0,25 x 5,0 m), con el fin de asegurar la ejecución adecuada de la estructura, conforme a los principios de planeación técnica, economía y eficiencia de la contratación pública. Adicionalmente, modificar la cantidad inicialmente calculada para el ítem 1.2.2 "Excavacion Manual (Viga Riostra)" la cual disminuye su valor teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado.

Quinto: El supervisor de la Alcaldía y el supervisor de la EDTB, una vez analizada la justificación técnica presentada por la Interventoría y revisados los documentos aportados por el contratista de obra, APRUEBA la solicitud de creación del nuevo ítem no previsto, dejando constancia de que su inclusión es necesaria, técnica y jurídicamente viable dentro del alcance contractual, y no representa un cambio del objeto del contrato ni de su naturaleza, sino una adecuación técnica para su correcta ejecución.

Sexto: Es importante precisar que, aunque se presenta una modificación en las dimensiones físicas de la viga riostra con respecto al ítem 1.4.3 inicialmente incluido en el presupuesto del contrato, el valor del análisis de precios unitarios (APU) correspondiente no se ve afectado, en la medida en que el ítem fue calculado con base en metros cúbicos (m³) de concreto. En este orden de ideas, se acepta que el valor del APU del ítem No Previsto es de $395.347 por m3.

Septimo: Teniendo en cuenta la reducción del valor del contrato por los cambios realizados, se hace necesario realizar una revisión del ítem 1.4.6 "Acero de refuerzo grado 60 para Placa huella" con el fin de aumentar la cantidad inicialmente prevista, la cual no es suficiente para la ejecución total del contrato de obra. Por esta razón, la Interventoría recomienda aumentar dicha cantidad a 11.134,78 Kg.

Octavo: Se finaliza el Comité Técnico con la aprobación del ítem No Previsto y de la modificación de las cantidades de los items mencionados el cual se incluirá en el contato de la siguiente manera:

No.	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR UNITARIO
1.2.2	Excavacion Manual (Viga Riostra)	M3	83,5	$ 47.900,00
1.4.3	Viga Riostra de Concreto Clase D (0,30 x 0,20 x 5,0 mts)	M3	0	$ 395.347,00
1.4.6	Acero de refuerzo grado 60 para Placa huella	KG	11134,78	$ 2.213,00
NP1	Viga Riostra de Concreto Clase D (0,20 x 0,25 x 5,0 mts)	M3	83,5	$ 395.347,00

ACTA DE COMITÉ TÉCNICO

EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

OBJETO	**MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VÍAS TERCIARIAS QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA EL PERICO Y VEREDA EL REAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE**

COMITÉ N°	3	**FECHA:**	viernes, 28 de marzo de 2025
CONTRATISTA:	**CASBIM S.A.S.**	**DIRECCION Y TELEFONO:**	Carrera 3 Este N° 22-01, Chía Cundinamarca
INTERVENTORÍA:	**INSUCORP S.A.S.**	**DIRECCION Y TELEFONO:**	CL 14 24 36 - Av. Libertador - Santa Marta, Magdalena.
SUPERVISOR SUPERVISOR ALCALDIA :	**CARLOS ANDRES ARRIETA GOMEZ**	**DIRECCION Y TELEFONO:**	OFICINA SECRETARIA OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO EL BAGRE, CEL 312 797 26 00
DIRECTOR TECNICO EDTB:	**DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ**	**DIRECCION Y TELEFONO:**	CALLE 50 #47A-19 SEGUNDO PISO 3232283612

LISTADO DE ASISTENCIA AL COMITÉ

N°	(a) NOMBRES	(b) REPRESENTA A:
1	CARLOS ANDRES ARRIETA GOMEZ	SUPERVISOR (ALCALDIA)
2	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE
3	CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA	CASBIM S.A.S.
4	JORGE HERNAN RINCON MARQUEZ	INSUCORP S.A.S.
5		

ORDEN DEL DÍA

N°	(c) ASUNTO	(d) ESTADO	(e) COMPROMISO / OBSERVACIONES	(f) FECHA DE COMPROMISO	(g) RESPONSABLE
1	SEGUIMIENTO AL ESTADO DE LA OBRA	REALIZADO	SE REALIZO REUNION DE SEGUIMIENTO AL ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA, CONCLUYENDO QUE SE CONTINUA CON UN 8% DE ATRAZO	28 DE MARZO DE 2025	INTERVENTORIA
2	BALANCE DE OBRAS, SOLICITUD DE ITEM NO PREVISTO PARA INCLUIR EL TRANSPORTE	REALIZADO	EL CONTRATISTA REALIZO BALANCE DE OBRA DONDE SE INCLUYO ITEM PARA EL MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION, SOLICITO LA APROBACION DE ITEM NO PREVISTO, LA INTERVENTORIA ADVIRTIO QUE YA ESTE ITEM SE ENCUENTRA INCLUIDO EN CONDICIONES INICIALES POR LO QUE NO ES NECESARIO TENERLO ENCUENTA DENTRO DE LOS ITEM NO PREVISOS, EL CONTRATISTA SOLICITA QUE ESTE ITEM TENGA UN MAYOR VALOR DEBIDO A QUE DENTRO DEL RECORRIDO HAY UN PUENTE EL CUAL NO ES ACTO PARA VOLQUETAS, ENCARECIENDO CONSIDERABLEMETE ESTA ACTIVIDAD, LO QUE NO ES APROBADO YA QUE SE REITERA QUE ESTE ITEM YA SE ENCONTRABA DENTRO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES.	28 DE MARZO DE 2025	CONTRATISTA DE OBRA, INTERVENTORIA Y SUPERVISORES
3	APROBACION ITEM NP PARA TRANSPORTE	NO APROBADO	SE CONTINUA CON EL ITEM CONTEMPLADO EN LAS CONDICIONES INICIALES	28 DE MARZO DE 2025	SUPERVISORES

APROBACION DEL ACTA

Firma

Nombre: CARLOS ANDRES ARRIETA GOMEZ
Cargo: SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
Empresa : ALCALDIA MUNICIPAL

Firma

Nombre: CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
Empresa : CASBIM S.A.S.

Firma DOIVER NISPERUZA.

Nombre: DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
Cargo: DIRECTOR TECNICO
Empresa : EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

Firma

Nombre: JORGE HERNAN RINCON MARQUEZ
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
Empresa : INSUCORP S.A.S.

	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	EDTB EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE
OBJETO	**MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VÍAS TERCIARIAS QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA EL PERICO Y VEREDA EL REAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE**	

COMITÉ N°	4	**FECHA:**	11/04/2025
CONTRATISTA:	**CASBIM S.A.S.**	**DIRECCION Y TELEFONO:**	Carrera 3 Este N° 22-01, Chía Cundinamarca
INTERVENTORÍA:	**INSUCORP S.A.S.**	**DIRECCION Y TELEFONO:**	CL 14 24 36 - Av. Libertador - Santa Marta, Magdalena.
SUPERVISOR SUPERVISOR ALCALDIA :	**CARLOS ANDRES ARRIETA GOMEZ**	**DIRECCION Y TELEFONO:**	OFICINA SECRETARIA OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO EL BAGRE, CEL 312 797 26 00
DIRECTOR TECNICO EDTB:	**DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ**	**DIRECCION Y TELEFONO:**	CALLE 50 #47A-19 SEGUNDO PISO 3232283612

LISTADO DE ASISTENCIA AL COMITÉ

N°	(a) NOMBRES	(b) REPRESENTA A:
1	CARLOS ANDRES ARRIETA GOMEZ	SUPERVISOR (ALCALDIA)
2	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE
3	CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA	CASBIM S.A.S.
4	JORGE HERNAN RINCON MARQUEZ	INSUCORP S.A.S.
2		

ORDEN DEL DÍA

N°	(c) ASUNTO	(d) ESTADO	(e) COMPROMISO / OBSERVACIONES	(f) FECHA DE COMPROMISO	(g) RESPONSABLE
1	SEGUMIENTO AL AVANCE	REALIZADO	SE REALIZÓ REUNIÓN DE SEGUIMIENTO AL ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA, CONCLUYENDO QUE SE CONTINUA CON UN 16% DE ATRASO	11 DE ABRIL DE 2025	CONTRATISTA Y SUPERVISOR
2	ACTA MODIFICATORIA 1	ACORDADO	AUNQUE YA SE REALIZARON ACUERDOS ENCUANTO LOS LINEAMIENTOS PARA HACER BALANCE DE OBRAS Y DELIMITAR EL ALCANCE FISICO DEL CONTRATO, ESTO ES NECESARIO QUE QUEDE EN ACTA DE	25 DE ABRIL DE 2025	CONTRATISTA Y INTERVENTOR
3	PLAN DE CHOQUE PARA AJUSTAR LO EJECUTADO CON LO PROGRAMADO	ACORDADO	LA INTERVENTORIA SOLICITA AL CONTRATISTA REALIZAR PLAN PARA LOGRAR TERMINAR DENTRO DE LA FECHA PREVISTA	25 DE ABRIL DE 2025	CONTRATISTA

APROBACION DEL ACTA

Firma	Firma
Nombre: CARLOS ANDRES ARRIETA GOMEZ	Nombre: CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA
Cargo: SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS	Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
Empresa : ALCALDIA MUNICIPAL	Empresa : CASBIM S.A.S.
Firma	Firma
Nombre: DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ	Nombre: JORGE HERNAN RINCON MARQUEZ
Cargo: DIRECTOR TECNICO	Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
Empresa : EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE	Empresa : INSUCORP S.A.S.

ACTA DE COMITÉ TÉCNICO

EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

OBJETO	**MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VÍAS TERCIARIAS QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA EL PERICO Y VEREDA EL REAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE**

COMITÉ N°	5	**FECHA:**	25/04/2025
CONTRATISTA:	**CASBIM S.A.S.**	**DIRECCION Y TELEFONO:**	Carrera 3 Este N° 22-01, Chía Cundinamarca
INTERVENTORÍA:	**INSUCORP S.A.S.**	**DIRECCION Y TELEFONO:**	CL 14 24 36 - Av. Libertador - Santa Marta, Magdalena.
SUPERVISOR SUPERVISOR ALCALDIA :	**CARLOS ANDRES ARRIETA GOMEZ**	**DIRECCION Y TELEFONO:**	OFICINA SECRETARIA OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO EL BAGRE, CEL 312 797 26 00
DIRECTOR TECNICO EDTB:	**DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ**	**DIRECCION Y TELEFONO:**	CALLE 50 #47A-19 SEGUNDO PISO 3232283612

LISTADO DE ASISTENCIA AL COMITÉ

N°	(a) NOMBRES	(b) REPRESENTA A:
1	CARLOS ANDRES ARRIETA GOMEZ	SUPERVISOR (ALCALDIA)
2	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE
3	CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA	CASBIM S.A.S.
4	JORGE HERNAN RINCON MARQUEZ	INSUCORP S.A.S.
2		

ORDEN DEL DÍA

N°	(c) ASUNTO	(d) ESTADO	(e) COMPROMISO / OBSERVACIONES	(f) FECHA DE COMPROMISO	(g) RESPONSABLE
1	SEGUMIENTO AL AVANCE	REALIZADO	SE REALIZÓ REUNIÓN DE SEGUIMIENTO AL ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA, CONCLUYENDO QUE SE CONTINUA CON UN 12% DE ATRASO	25 DE ABRIL DE 2025	CONTRATISTA Y SUPERVISOR
2	ACTA MODIFICATORIA 1	ACORDADO	LA INTERVENTORIA SOLICITA AL CONTRATISTA, BASARSE EN LOS FORMATOS	2 DE MAYO DE 2025	CONTRATISTA
3	PLAN DE CHOQUE PARA AJUSTAR LO EJECUTADO CON LO PROGRAMADO	SEGUIMIENTO	EL CONTRATISTA ABRIO OTRO FRENTE DE TRABAJO EN EL SECTRO LUIS CANO - PERICO, INICIANDO CON LA TOPOGRAFIA Y ZONA PARA ALMACENAR MATERIAL, ADICIONALMENTE EL CONTRATISTA PLANEA TRAER UN CARMIX DE 4M3	9 DE MAYO DE 2025	CONTRATISTA

APROBACION DEL ACTA

Firma

Nombre: CARLOS ANDRES ARRIETA GOMEZ
Cargo: SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
Empresa : ALCALDIA MUNICIPAL

Firma

Nombre: CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
Empresa : CASBIM S.A.S.

Firma

Nombre: DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
Cargo: DIRECTOR TECNICO
Empresa : EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

Firma

Nombre: JORGE HERNAN RINCON MARQUEZ
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
Empresa : INSUCORP S.A.S.

	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	EDTB EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE
OBJETO	**MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VÍAS TERCIARIAS QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA EL PERICO Y VEREDA EL REAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE**	

COMITÉ N°	6	**FECHA:**	9/05/2025
CONTRATISTA:	**CASBIM S.A.S.**	**DIRECCION Y TELEFONO:**	Carrera 3 Este N° 22-01, Chía Cundinamarca
INTERVENTORÍA:	**INSUCORP S.A.S.**	**DIRECCION Y TELEFONO:**	CL 14 24 36 - Av. Libertador - Santa Marta, Magdalena.
SUPERVISOR SUPERVISOR ALCALDIA :	**CARLOS ANDRES ARRIETA GOMEZ**	**DIRECCION Y TELEFONO:**	OFICINA SECRETARIA OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO EL BAGRE, CEL 312 797 26 00
DIRECTOR TECNICO EDTB:	**DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ**	**DIRECCION Y TELEFONO:**	CALLE 50 #47A-19 SEGUNDO PISO 3232283612

LISTADO DE ASISTENCIA AL COMITÉ

N°	(a) NOMBRES	(b) REPRESENTA A:
1	CARLOS ANDRES ARRIETA GOMEZ	SUPERVISOR (ALCALDIA)
2	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE
3	CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA	CASBIM S.A.S.
4	JORGE HERNAN RINCON MARQUEZ	INSUCORP S.A.S.
2		

ORDEN DEL DÍA

N°	(c) ASUNTO	(d) ESTADO	(e) COMPROMISO / OBSERVACIONES	(f) FECHA DE COMPROMISO	(g) RESPONSABLE
1	SEGUMIENTO AL AVANCE	REALIZADO	SE REALIZÓ REUNIÓN DE SEGUIMIENTO AL ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA, CONCLUYENDO QUE SE CONTINUA CON UN 25% DE ATRASO	9 DE MAYO DE 2025	CONTRATISTA Y SUPERVISOR
2	ACTA AVANCE 1	PROGRAMADO	EL ENTE CONTRATANTE COMPARTE LISTA DE CHEQUEO PARA ACTAS DE AVANCE DE OBRAS, SE ACUERDA PROGRAMAR LA REALIZACION DE ACTA DE AVANCE DE OBRAS PARA COBRO N°1	15 DE MAYO DE 2025	CONTRATISTA Y INTERVENTORIA
3	PLAN DE CHOQUE PROGRAMACION	SEGUIMIENTO	EL CONTRATISTA ABRIO OTRO FRENTE DE TRABAJO EN EL SECTOR LUIS CANO - PERICO, YA SE INICIA LABORES DE EXCAVACION, FIGURACION DE ACERO	15 DE MAYO DE 2025	CONTRATISTA

APROBACION DEL ACTA

Firma

Nombre: CARLOS ANDRES ARRIETA GOMEZ
Cargo: SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
Empresa : ALCALDIA MUNICIPAL

Firma

Nombre: CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
Empresa : CASBIM S.A.S.

Firma

Nombre: DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
Cargo: DIRECTOR TECNICO
Empresa : EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

Firma

Nombre: JORGE HERNAN RINCON MARQUEZ
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
Empresa : INSUCORP S.A.S.

	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	EDTB EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE
OBJETO	**MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VÍAS TERCIARIAS QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA EL PERICO Y VEREDA EL REAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE**	

COMITÉ N°	7	**FECHA:**	23/05/2025
CONTRATISTA:	**CASBIM S.A.S.**	**DIRECCION Y TELEFONO:**	Carrera 3 Este N° 22-01, Chía Cundinamarca
INTERVENTORÍA:	**INSUCORP S.A.S.**	**DIRECCION Y TELEFONO:**	CL 14 24 36 - Av. Libertador - Santa Marta, Magdalena.
SUPERVISOR SUPERVISOR ALCALDIA :	**CARLOS ANDRES ARRIETA GOMEZ**	**DIRECCION Y TELEFONO:**	OFICINA SECRETARIA OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO EL BAGRE, CEL 312 797 26 00
DIRECTOR TECNICO EDTB:	**DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ**	**DIRECCION Y TELEFONO:**	CALLE 50 #47A-19 SEGUNDO PISO 3232283612

LISTADO DE ASISTENCIA AL COMITÉ

N°	(a) NOMBRES	(b) REPRESENTA A:
1	CARLOS ANDRES ARRIETA GOMEZ	SUPERVISOR (ALCALDIA)
2	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE
3	CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA	CASBIM S.A.S.
4	JORGE HERNAN RINCON MARQUEZ	INSUCORP S.A.S.
2		

ORDEN DEL DÍA

N°	(c) ASUNTO	(d) ESTADO	(e) COMPROMISO / OBSERVACIONES	(f) FECHA DE COMPROMISO	(g) RESPONSABLE
1	SEGUMIENTO AL AVANCE	REALIZADO	SE REALIZÓ REUNIÓN DE SEGUIMIENTO AL ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA, CONCLUYENDO QUE SE CONTINUA CON UN 14% DE ATRASO	23 DE MAYO DE 2025	CONTRATISTA Y SUPERVISOR
2	PLAN DE CHOQUE PROGRAMACION	SEGUIMIENTO	PESE A LOS CONTRATIEMPOS DE TIEMPO, EL CONTRATISTA HA RECUPERADO TIEMPO Y SE ENCUENTRA DENTRO DE LO POSIBLE EN CUMPLIR EL PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	23 DE MAYO DE 2025	CONTRATISTA

APROBACION DEL ACTA

Firma	Firma
Nombre: CARLOS ANDRES ARRIETA GOMEZ	Nombre: CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA
Cargo: SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS	Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
Empresa : ALCALDIA MUNICIPAL	Empresa : CASBIM S.A.S.
Firma	Firma
Nombre: DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ	Nombre: JORGE HERNAN RINCON MARQUEZ
Cargo: DIRECTOR TECNICO	Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
Empresa : EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE	Empresa : INSUCORP S.A.S.

	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	EDTB EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE
OBJETO	**MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VÍAS TERCIARIAS QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA EL PERICO Y VEREDA EL REAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE**	

COMITÉ N°	8	**FECHA:**	6/06/2025
CONTRATISTA:	**CASBIM S.A.S.**	**DIRECCION Y TELEFONO:**	Carrera 3 Este N° 22-01, Chía Cundinamarca
INTERVENTORÍA:	**INSUCORP S.A.S.**	**DIRECCION Y TELEFONO:**	CL 14 24 36 - Av. Libertador - Santa Marta, Magdalena.
SUPERVISOR SUPERVISOR ALCALDIA :	**CARLOS ANDRES ARRIETA GOMEZ**	**DIRECCION Y TELEFONO:**	OFICINA SECRETARIA OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO EL BAGRE, CEL 312 797 26 00
DIRECTOR TECNICO EDTB:	**DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ**	**DIRECCION Y TELEFONO:**	CALLE 50 #47A-19 SEGUNDO PISO 3232283612

LISTADO DE ASISTENCIA AL COMITÉ

N°	(a) NOMBRES	(b) REPRESENTA A:
1	CARLOS ANDRES ARRIETA GOMEZ	SUPERVISOR (ALCALDIA)
2	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE
3	CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA	CASBIM S.A.S.
4	JORGE HERNAN RINCON MARQUEZ	INSUCORP S.A.S.
2		

ORDEN DEL DÍA

N°	(c) ASUNTO	(d) ESTADO	(e) COMPROMISO / OBSERVACIONES	(f) FECHA DE COMPROMISO	(g) RESPONSABLE
1	SEGUMIENTO AL AVANCE	REALIZADO	SE REALIZÓ REUNIÓN DE SEGUIMIENTO AL ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA, CONCLUYENDO QUE SE CONTINUA CON UN 5% DE ATRASO	06 DE JUNIO DE 2025	CONTRATISTA Y SUPERVISOR
2	PLAN DE CHOQUE PROGRAMACION	SEGUIMIENTO	EL CONTRATISTA HA RECUPERADO TIEMPO Y SE ENCUENTRA DENTRO DE LO POSIBLE EN CUMPLIR EL PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	7 DE JUNIO DE 2025	CONTRATISTA

APROBACION DEL ACTA

Firma	Firma
Nombre: CARLOS ANDRES ARRIETA GOMEZ	Nombre: CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA
Cargo: SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS	Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
Empresa : ALCALDIA MUNICIPAL	Empresa : CASBIM S.A.S.
Firma	Firma
Nombre: DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ	Nombre: JORGE HERNAN RINCON MARQUEZ
Cargo: DIRECTOR TECNICO	Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
Empresa : EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE	Empresa : INSUCORP S.A.S.

ACTA DE COMITÉ TÉCNICO

EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

OBJETO	**MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VÍAS TERCIARIAS QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA EL PERICO Y VEREDA EL REAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE**

COMITÉ N°	9	**FECHA:**	20/06/2025
CONTRATISTA:	**CASBIM S.A.S.**	**DIRECCION Y TELEFONO:**	Carrera 3 Este N° 22-01, Chía Cundinamarca
INTERVENTORÍA:	**INSUCORP S.A.S.**	**DIRECCION Y TELEFONO:**	CL 14 24 36 - Av. Libertador - Santa Marta, Magdalena.
SUPERVISOR SUPERVISOR ALCALDIA :	**CARLOS ANDRES ARRIETA GOMEZ**	**DIRECCION Y TELEFONO:**	OFICINA SECRETARIA OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO EL BAGRE, CEL 312 797 26 00
DIRECTOR TECNICO EDTB:	**DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ**	**DIRECCION Y TELEFONO:**	CALLE 50 #47A-19 SEGUNDO PISO 3232283612

LISTADO DE ASISTENCIA AL COMITÉ

N°	(a) NOMBRES	(b) REPRESENTA A:
1	CARLOS ANDRES ARRIETA GOMEZ	SUPERVISOR (ALCALDIA)
2	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE
3	CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA	CASBIM S.A.S.
4	JORGE HERNAN RINCON MARQUEZ	INSUCORP S.A.S.
2		

ORDEN DEL DÍA

N°	(c) ASUNTO	(d) ESTADO	(e) COMPROMISO / OBSERVACIONES	(f) FECHA DE COMPROMISO	(g) RESPONSABLE
1	SEGUMIENTO AL AVANCE	REALIZADO	SE REALIZÓ REUNIÓN DE SEGUIMIENTO AL ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA, CONCLUYENDO QUE SE CONTINUA CON UN 2% DE ATRASO	20 DE JUNIO DE 2025	CONTRATISTA Y SUPERVISOR
2	PLAN DE CHOQUE PROGRAMACION	SEGUIMIENTO	EL CONTRATISTA HA RECUPERADO TIEMPO Y SE ENCUENTRA DENTRO DE LO POSIBLE EN CUMPLIR EL PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	20 DE JUNIO DE 2025	CONTRATISTA
3	ACTA FINAL	PROGRAMADO	EL ENTE CONTRATANTE COMPARTE LISTA DE CHEQUEO PARA ACTAS DE AVANCE DE OBRAS Y REQUISITOS PARA LIQUIDAR, SE ACUERDA PROGRAMAR LA REALIZACION DE ACTA DE AVANCE DE OBRAS FINAL	26 DE JUNIO DE 2025	CONTRATISTA

APROBACION DEL ACTA

Firma

Nombre: CARLOS ANDRES ARRIETA GOMEZ
Cargo: SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
Empresa : ALCALDIA MUNICIPAL

Firma

Nombre: CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
Empresa : CASBIM S.A.S.

Firma

Nombre: DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
Cargo: DIRECTOR TECNICO
Empresa : EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

Firma

Nombre: JORGE HERNAN RINCON MARQUEZ
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
Empresa : INSUCORP S.A.S.

MEMORIAS DE CANTIDADES

CASBIM INGENIERÍA

Oficina Principal: Carrera 3 Este N° 22-01
Chía, Cundinamarca

c.suarez@cambim.com.co
NIT: 901.577.286-4

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	CASBIM S.A.S. - 901.577.286-4	**N° CONTRATO DE OBRA**	012-2025	**DE**	2025	pag.	1	de	1
OBJETO:	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VÍAS TERCIARIAS QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA EL PERICO Y VEREDA EL REAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE							
INTERVENTORÍA	INSUCORP S.A.S. - NIT: 901.896.620-1	**N° CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	013-2025	**DE**	2025				
SUPERVISOR	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ								

CAPÍTULO	1.1	TRABAJOS PRELIMINARES
SUB CAPÍTULO	1.1.1	Conformación de la calzada existente

ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN	CORTE No.	FECHA
1.1.1	M2	Conformación de la calzada existente	LUIS CANO - PERICO	2 Y FINAL	26/06/2025

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTURA	CANT.	MEDIDA TOTAL
Longitud de vía	348,00				
Ancho de Calzada		5,00			
Área de calzada	348,00	5,00			1.740,00
				Subtotal	1740,00

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA







OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

R/L CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA
CASBIM S.A.S.
CONTRATISTA DE OBRA

QUIEN RECIBE:

R/L JORGE HERNAN RINCON MARQUEZ
INSUCORP S.A.S.
INTERVENTORÍA

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
DIRECTOR TÉCNICO
SUPERVISIÓN

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	CASSIM S.A.S. - 901.577.286-4	Nº CONTRATO DE OBRA	012-2025	DE	2025	pag.	1	de	1
OBJETO:	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VÍAS TERCIARIAS QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA EL PERICO Y VEREDA EL REAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE								
INTERVENTORÍA	INSUCORP S.A.S. - NIT: 901.896.620-1	Nº CONTRATO DE INTERVENTORÍA	013-2025	DE	2025				
SUPERVISOR	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ								

CAPÍTULO	1.2	MOVIMIENTOS DE TIERRA			
SUB CAPÍTULO	1.2.1	Excavacion para la explanación Placa Huella			
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN	CORTE No.	FECHA
1.2.1	M3	Excavacion para la explanación Placa Huella	LUIS CANO - PERICO	2 Y FINAL	26/06/2025

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANT.	
Longitud de vía	348,00				
Ancho de Calzada + 0,5		5,50			
Profundidad					
Volumen de excavación (en cartera topografica Luis cano)	348,00	5,50	-	354,45	354,45
				Subtotal	354,45

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA









OBSERVACIONES

Se ajusta el valor de la excavacion por faltante 48,34 m3 por cobrar según cartera topografica El Real - Se anexa carteras Topograficas del tramo El Real y Luis Cano - Perico

QUIEN ENTREGA

R/L CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA
CASSIM S.A.S.
CONTRATISTA DE OBRA

QUIEN RECIBE:

R/L JORGE HERNAN RINCON MARQUEZ
INSUCORP S.A.S.
INTERVENTORÍA

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
DIRECTOR TÉCNICO
SUPERVISIÓN

Alineación: Alineamiento Sobre el Eje (Luis Cano - Perico)			
Grupo de líneas de muestreo: SECCIONES			
P.K. inicial: 0+000.000			
P.K. final: 0+391.327			
P.K.	**Área de excavación (m2)**	**Volumen de excavación (m3)**	**Vol. excavación acumul. (m3)**
0+000.000	0,810	0,000	0,000
0+010.000	0,870	8,390	8,390
0+020.000	0,740	8,010	16,400
0+030.000	0,740	7,410	23,810
0+040.000	1,040	8,930	32,740
0+050.000	1,010	10,230	42,970
0+060.000	0,890	9,490	52,460
0+070.000	0,900	8,980	61,440
0+080.000	0,820	8,610	70,050
0+090.000	0,800	8,130	78,180
0+100.000	0,970	8,860	87,040
0+110.000	0,570	7,840	94,880
0+120.000	0,440	5,140	100,020
0+130.000	1,270	8,610	108,630
0+140.000	1,890	15,790	124,420
0+150.000	0,920	14,060	138,480
0+160.000	1,240	10,800	149,280
0+170.000	0,970	11,050	160,330
0+180.000	1,150	10,620	170,950
0+190.000	1,590	13,750	184,700
0+200.000	0,950	12,730	197,430
0+210.000	1,050	9,970	207,400
0+220.000	0,910	9,790	217,190
0+230.000	1,070	9,930	227,120
0+240.000	1,230	11,560	238,680
0+250.000	1,010	11,220	249,900
0+260.000	1,220	11,130	261,030
0+270.000	1,150	11,830	272,860
0+280.000	1,140	11,440	284,300
0+290.000	1,090	11,160	295,460
0+300.000	0,890	9,910	305,370
0+310.000	0,910	9,010	314,380
0+320.000	1,270	10,990	325,370
0+330.000	1,090	11,810	337,180
0+340.000	0,860	9,760	346,940
0+348.000	0,810	7,510	**354,450**

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	CASBIM S.A.S. - 901.577.286-4	Nº CONTRATO DE OBRA	012-2025	DE	2025	pag.	1	de	1
OBJETO:	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VÍAS TERCIARIAS QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA EL PERICO Y VEREDA EL REAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE								
INTERVENTORÍA	INSUCORP S.A.S. - NIT: 901.896.620-1	Nº CONTRATO DE INTERVENTORÍA	013-2025	DE	2025				
SUPERVISOR	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ								


CAPÍTULO	1.2	MOVIMIENTOS DE TIERRA
SUB CAPÍTULO	1.2.2	Excavacion Manual (Viga Riostra)

ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN	CORTE No.	FECHA
1.2.2	M3	Excavacion Manual (Viga Riostra)	LUIS CANO - PERICO	2 Y FINAL	26/06/2025

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANT.	
No. De Vigas				109,00	
Ancho de viga		0,20			
Largo de viga	5,00				
Profundidad de viga			0,10		
Excavacion Manual (Viga Riostra)	5,00	0,20	0,10	109,00	**10,90**
				Subtotal	10,90

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA



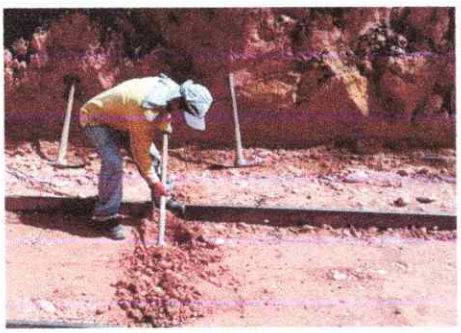



OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

R/L CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA
CASBIM S.A.S.
CONTRATISTA DE OBRA

QUIEN RECIBE:

R/L JORGE HERNAN RINCON MARQUEZ
INSUCORP S.A.S.
INTERVENTORÍA

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
DIRECTOR TÉCNICO
SUPERVISIÓN

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	CASBIM S.A.S. - 901.577.286-4	**Nº CONTRATO DE OBRA**	012-2025	**DE**	2025	pag.	1	de	1
OBJETO:	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VÍAS TERCIARIAS QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA EL PERICO Y VEREDA EL REAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE								
INTERVENTORÍA	INSUCORP S.A.S. - NIT: 901.896.620-1	**Nº CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	013-2025	**DE**	2025				
SUPERVISOR	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ								

CAPÍTULO	1.2	MOVIMIENTOS DE TIERRA
SUB CAPÍTULO	1.2.3	Transporte de material

ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN	CORTE No.	FECHA
1.2.3	M3-Km	Transporte de material	LUIS CANO - PERICO	2 Y FINAL	26/06/2025

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES LARGO	FACTOR	F. EXPACION	CANT.	MEDIDA TOTAL
Distacia de acarreo desde el centro del tramo	5,52				
Excavacion Explanacion en Luis Cano - Perico				354,45	
Excavacion viga riostra en Luis Cano - Perico				10,90	
Factor de Expansión			1,28		
Transporte de material	5,52	-	1,28	365,35	2.584,78
				Subtotal	2584,78

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA





OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

R/L CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA
CASBIM S.A.S.
CONTRATISTA DE OBRA

QUIEN RECIBE:

R/L JORGE HERNAN RINCON MARQUEZ
INSUCORP S.A.S.
INTERVENTORÍA

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
DIRECTOR TÉCNICO
SUPERVISIÓN

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	CASBIM S.A.S. - 901.577.286-4	**N° CONTRATO DE OBRA**	012-2025	**DE**	2025	pag.	1	de	1
OBJETO:	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VÍAS TERCIARIAS QUE COMUNICA DE LA CASECERA MUNICIPAL A LA VEREDA EL PERICO Y VEREDA EL REAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE							
INTERVENTORÍA	INSUCORP S.A.S. - NIT: 901.896.820-1	**N° CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	013-2025	**DE**	2025				
SUPERVISOR	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ								

CAPÍTULO	1.3	CAPAS GRANULARES
SUB CAPÍTULO	1.3.1	Subbase o material similar para placa huella y cunetas


ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN	CORTE No.	FECHA
1.3.1	M3	Subbase o material similar para placa huella y cunetas	LUIS CANO - PERICO	2 Y FINAL	26/06/2025

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTURA	CANT.	MEDIDA TOTAL
Longitud de vía	348,00				
Ancho de Calzada		5,00			
Profundidad de excavación			0,15		
Factor de expansión				1,00	
Volumen subbase	348,00	5,00	0,15		261,00
				Subtotal	261,00

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA





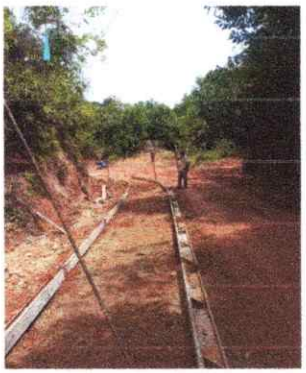



OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

R/L CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA
CASBIM S.A.S.
CONTRATISTA DE OBRA

QUIEN RECIBE:

R/L JORGE HERNAN RINCON MARQUEZ
INSUCORP S.A.S.
INTERVENTORÍA

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
DIRECTOR TÉCNICO
SUPERVISIÓN

EDTB
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO


CONTRATISTA DE OBRA:	CASBIM S.A.S. - 901.577.286-4	**Nº CONTRATO DE OBRA**	012-2025	**DE**	2025	pag.	1	de	1
OBJETO:	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VÍAS TERCIARIAS QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA EL PERICO Y VEREDA EL REAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE								
INTERVENTORÍA	INSUCORP S.A.S. - NIT: 901.896.620-1	**Nº CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	013-2025	**DE**	2025				
SUPERVISOR	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ								

CAPÍTULO	1.4	PAVIMENTO EN PLACA HUELLA
SUB CAPÍTULO	1.4.1	Concreto clase D (210 Kg/cm2)

ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN	CORTE No.	FECHA
1.4.1	M3	Concreto clase D (210 Kg/cm2)	LUIS CANO - PERICO	2 Y FINAL	26/06/2025


ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTURA	CANT.	MEDIDA TOTAL
Longitud de elemento	3,00				
Ancho de franja		0,90			
No. De franjas				218,00	
Espesor			0,15		
Volumen de concreto	3,00	0,90	0,15	218,00	**88,29**
				Subtotal	88,29

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA







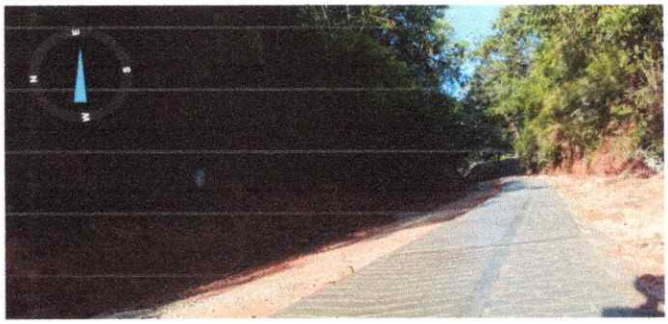

OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

R/L CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA
CASBIM S.A.S.
CONTRATISTA DE OBRA

QUIEN RECIBE:

R/L JORGE HERNAN RINCON MARQUEZ
INSUCORP S.A.S.
INTERVENTORÍA

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
DIRECTOR TÉCNICO
SUPERVISIÓN

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	CASBIM S.A.S. - 901.577.286-4	**N° CONTRATO DE OBRA**	012-2025	**DE**	2025	pag.	1	de	1
OBJETO:	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VÍAS TERCIARIAS QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA EL PERICO Y VEREDA EL REAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE								
INTERVENTORÍA	INSUCORP S.A.S. - NIT: 901.896.620-1	**N° CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	013-2025	**DE**	2025				
SUPERVISOR	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ								

CAPÍTULO	1.4	PAVIMENTO EN PLACA HUELLA			
SUB CAPÍTULO	1.4.2	Concreto clase G (Ciclópeo -210 Kg/cm2)			
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
1.4.2	M3	Concreto clase G (Ciclópeo -210 Kg/cm2)	LUIS CANO - PERICO	2 Y FINAL	26/06/2025

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANT.	
Longitud de vía	3,00				
Franja Central		0,90		109,00	
Franjas laterales		0,45		218,00	
Espesor			0,15		
Volumen Franja central	3,00	0,90	0,15	109,00	44,15
Volumen Franjas Laterales	3,00	0,45	0,15	218,00	44,15
				Subtotal	88,29

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA











OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

R/L CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA
CASBIM S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

QUIEN RECIBE:

R/L JORGE HERNAN RINCON MARQUEZ
INSUCORP S.A.S
INTERVENTORÍA

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
DIRECTOR TÉCNICO
SUPERVISIÓN

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	CASBIM S.A.S. - 901.577.286-4	**Nº CONTRATO DE OBRA**	012-2025	**DE**	2025	pag.	1	de	1
OBJETO:	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VÍAS TERCIARIAS QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA EL PERICO Y VEREDA EL REAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE							
INTERVENTORÍA	INSUCORP S.A.S. - NIT: 901.896.620-1	**Nº CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	013-2025	**DE**	2025				
SUPERVISOR	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ								

CAPÍTULO	1.4	PAVIMENTO EN PLACA HUELLA
SUB CAPÍTULO	1.4.3	Viga Riostra de Concreto Clase D (0,30 x 0,20 x 5,0 mts)

ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN	CORTE No.	FECHA
1.4.3	M3	Viga Riostra de Concreto Clase D (0,30 x 0,20 x 5,0 mts)	LUIS CANO - PERICO	2 Y FINAL	26/06/2025

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANT.	
No. De Vigas				109,00	
Ancho de viga		0,20			
Largo de viga	5,00				
Profundidad de viga			0,25		
Volumen concreto viga riostra	5,00	0,20	0,25	109,00	**27,25**
				Subtotal	**27,25**

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA







OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

RIL CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA
CASBIM S.A.S.
CONTRATISTA DE OBRA

QUIEN RECIBE:

RIL JORGE HERNAN RINCON MARQUEZ
INSUCORP S.A.S.
INTERVENTORÍA

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
DIRECTOR TÉCNICO
SUPERVISIÓN

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	CASBIM S.A.S. - 901.577.286-4	**N° CONTRATO DE OBRA**	012-2025	**DE**	2025	pag.	1	de	1
OBJETO:	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VÍAS TERCIARIAS QUE COMUNICA DE LA CASECERA MUNICIPAL A LA VEREDA EL PERICO Y VEREDA EL REAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE							
INTERVENTORÍA	INSUCORP S.A.S. - NIT: 901.896.620-1	**N° CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	013-2025	**DE**	2025				
SUPERVISOR	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ								

CAPÍTULO	1.4	PAVIMENTO EN PLACA HUELLA
SUB CAPÍTULO	1.4.4	Bordillo de Concreto Vaciado IN SITU

ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN	CORTE No.	FECHA
1.4.4	M3	Bordillo de Concreto Vaciado IN SITU	VEREDA EL REAL Y TRAMO LUIS CANO - PERICO	2 Y FINAL	26/06/2025

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES LARGO	VOLUMEN	CANT.	MEDIDA TOTAL
Longitud de vía El Real	303,00			
Longitud de vía Luis Cano	348,00			
No. De bordillos			2,00	
Volumen de bordillos x ml		0,05		
Volumen de bordillos	651,00	0,05	2,00	**58,59**
			Subtotal	**58,59**

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA









OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

R/L CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA
CASBIM S.A.S.
CONTRATISTA DE OBRA

QUIEN RECIBE:

R/L JORGE HERNAN RINCON MARQUEZ
INSUCORP S.A.S.
INTERVENTORÍA

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
DIRECTOR TÉCNICO
SUPERVISIÓN

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	CASBIM S.A.S. - 901.577.286-4	Nº CONTRATO DE OBRA	012-2025	DE	2025	pag.	1	de	1
OBJETO:	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VÍAS TERCIARIAS QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA EL PERICO Y VEREDA EL REAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE							
INTERVENTORÍA	INSUCORP S.A.S. - NIT: 901.896.620-1	Nº CONTRATO DE INTERVENTORÍA	013-2025	DE	2025				
SUPERVISOR	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ								


CAPÍTULO	1.4	PAVIMENTO EN PLACA HUELLA
SUB CAPÍTULO	1.4.5	Cuneta de Concreto Vaciada IN SITU

ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN	CORTE No.	FECHA
1.4.5	M3	Cuneta de Concreto Vaciada IN SITU	VEREDA EL REAL Y TRAMO LUIS CANO PERICO	2 Y FINAL	26/06/2025

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANT.	
Longitud de vía El Real	303,00				
Longitud de vía Luis Cano	348,00				
Ancho de cuneta		0,55			
Espesor			0,15		
No. De cunetas				2,00	
Volumen cunetas	651,00	0,55	0,15	2,00	**107,42**
		84,61	22,81		
				Subtotal	107,42

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA











OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

R/L CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA
CASBIM S.A.S.
CONTRATISTA DE OBRA

QUIEN RECIBE:

R/L JORGE HERNAN RINCON MARQUEZ
INSUCORP S.A.S.
INTERVENTORÍA

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
DIRECTOR TÉCNICO
SUPERVISIÓN

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO


CONTRATISTA DE OBRA:	CASBIM S.A.S. - 901.577.286-4	**Nº CONTRATO DE OBRA**	012-2025	**DE**	2025	**pag.**	1	**de**	1
OBJETO:	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VÍAS TERCIARIAS QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA EL PERICO Y VEREDA EL REAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE								
INTERVENTORÍA	INSUCORP S.A.S. - NIT: 901.896.620-1	**Nº CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	013-2025	**DE**	2025				
SUPERVISOR	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ								

CAPÍTULO	1.4	PAVIMENTO EN PLACA HUELLA
SUB CAPÍTULO	1.4.6	Acero de refuerzo grado 60 para Placa huella

ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN	CORTE No.	FECHA
1.4.6	KG	Acero de refuerzo grado 60 para Placa huella	TRAMO EL REAL y TRAMO LUIS CANO	2 Y FINAL	26/06/2025

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO		DIMENSIONES LARGO	No. De franjas	Acero x metro	Peso Kg/ml	MEDIDA TOTAL
	ABS					
TRAMO LUIS CANO	K0 - K348					
Acero longitudinal Placa	K0 - K348	348,00	2,00	7,20	0,56	2.806,27
Acero transversal Placa	K0 - K348	348,00	2,00	3,00	0,56	1.169,28
Acero longitudinal Cuneta	K0 - K348	348,00	2,00	3,60	0,56	1.403,14
Acero transversal Cuneta	K0 - K348	348,00	2,00	1,65	0,56	643,10
Acero longitudinal Bordillo	K0 - K348	348,00	2,00	2,50	0,56	974,40
Acero transversal Bordillo	K0 - K348	348,00	2,00	1,80	0,25	313,20
ACERO VIGAS RIOTRIAS LUIS CANO		No. De Vigas	Longitud	Acero x metro	Peso Kg/ml	
Acero longitudinal Viga riostra 5 m - #4	K0 - K348	109,00	5,20	4,00	0,56	1.269,63
Acero transversal Viga riostra 5 m - #2	K0 - K348	109,00	5,20	7,00	0,25	991,90
TRAMO EL REAL	K0 - K303					
Acero longitudinal Cuneta	K234,8-K303	68,20	2,00	3,60	0,56	274,07
Acero transversal Cuneta	K234,8-K303	68,20	2,00	1,65	0,56	125,82
Acero longitudinal Bordillo	K0 - K303	303,0	2,00	2,50	0,56	848,40
Acero transversal Bordillo	K0 - K303	303,0	2,00	1,80	0,25	272,70
					Subtotal	**11091,71**

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

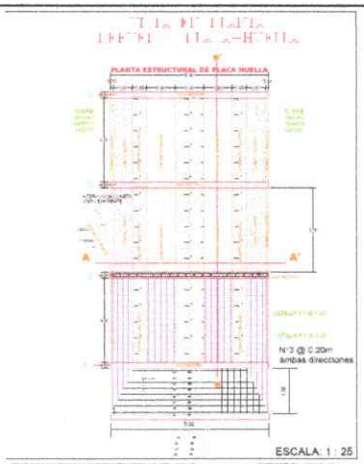





OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

RIL CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA
CASBIM S.A.S.
CONTRATISTA DE OBRA

QUIEN RECIBE

RIL JORGE HERNAN RINCON MARQUEZ
INSUCORP S.A.S.
INTERVENTORÍA

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
DIRECTOR TÉCNICO
SUPERVISIÓN

INFORME No. 2 Y FINAL

CONTRATO OBRA 012-2025

OBJETO: MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VÍAS TERCIARIAS QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA EL PERICO Y VEREDA EL REAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE

EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE – EDTB

INFORME FINAL

16 de mayo de 2025 al 26 de junio de 2025

EL BAGRE, JUNIO 2025

CASBIM INGENIERÍA

El Bagre, Antioquia – 26 de junio de 2025

Señores.
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE – EDTB
DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
Supervisor contrato de la obra.

Cordial saludo,

Yo, CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.069.853.386 de Junín Cundinamarca, obrando en calidad de representante legal de la sociedad CASBIM S.A.S. con NIT 901.577.286-4, en calidad de contratista de obra a cargo de la ejecución del contrato de obra No. 012-2025 y cuyo objeto contractual es la **MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VÍAS TERCIARIAS QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA EL PERICO Y VEREDA EL REAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE,** me permito entregar de manera formal el informe de cuenta No 2 y final periodo comprendido entre el 16 de mayo de 2025 y el 26 de junio de 2025.

Atentamente,

CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA
No. 1.069.853.386 de Junín Cundinamarca
REPRESENTANTE LEGAL
CASBIM S.A.S.
NIT. 901.577.286-4
CONTRATISTA OBRA

Contenido

1. INTRODUCCION 4
2. FICHA TECNICA DE LA OBRA 5
2.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO No 012-2025. 5
3. GENERALIDADES. 6
3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 6
3.1.1. Localización y Ubicación del proyecto. 6
3.1.2 Topografía. 6
3.1.3 Climatología. 6
4. POLIZAS CONTRACTUALES. 7
4.1. Póliza de cumplimiento. 7
4.2. Póliza de responsabilidad civil. 7
5. ACTIVIDADES EJECUTADAS. 8
6. USO DE MAQUINARIA 9
7. PERSONAL CONTRATO DE LA OBRA. 9
8. CONDICIONES CLIMATICAS. 10
9. CONTROL DE CALIDAD. 10
10. ACTAS DE COMITÉ. 10
11. ASPECTO ECONOMICO 11
11.1. Avance Físico. 11
11.2. Avance financiero. 11
12. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL. 11
13. SEGUIMIENTO A LA INVERSION DE ANTICIPO. 11
14. CONCLUSIONES. 12
REGISTRO FOTOGRAFICO Y ANEXOS 13

1. INTRODUCCION

El presente informe tiene por objeto describir el desarrollo del contrato para la **MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VÍAS TERCIARIAS QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA EL PERICO Y VEREDA EL REAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE,** en el periodo comprendido entre el 16 de mayo de 2025 y el 26 de junio de 2025.

Las actividades reportadas en el presente informe fueron ejecutadas en la vereda Luis Cano mediante la construcción de 300 metros de placa huella, los cuales han sido terminados en su totalidad.

El día 26 de febrero de 2025, se reunieron los señores: **DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ** director técnico de la **EDTB**, en representación de la **EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE – EDTB** y **CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA**, identificado con la cédula de ciudadanía **No. 1.069.853.386 de Junín Cundinamarca**, obrando en calidad de representante legal de la sociedad **CASBIM S.A.S.** con **NIT 901.577.286-4,** con el fin de dar inicio a las labores y actividades correspondientes al presente contrato.

2. FICHA TECNICA DE LA OBRA

2.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO No 012-2025.


CONTRATO No.	012-2025
CONTRATISTA	CASBIM S.A.S.
CC/N.I. T CONTRATISTA	901.577.286-4
OBJETO	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VÍAS TERCIARIAS QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA EL PERICO Y VEREDA EL REAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE.
VALOR	QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON TRECE CENTAVOS ($ 552.273.837,13) INCLUIDO EL A.U. Y DEMÁS COSTOS A QUE HAYA LUGAR.
PLAZO DE EJECUCION	CUATRO (04) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIO	26 DE FEBRERO DE 2025

3. GENERALIDADES.

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

3.1.1. Localización y Ubicación del proyecto.

El proyecto se localiza en el departamento de Antioquia, en el municipio de El Bagre. Se encuentra ubicado en la subregión del Bajo Cauca. Limita por el norte con el municipio de Nechí, por el noroeste con Caucasia, por el suroeste con Zaragoza, por el sureste con Segovia y al oriente con el departamento de Bolívar.

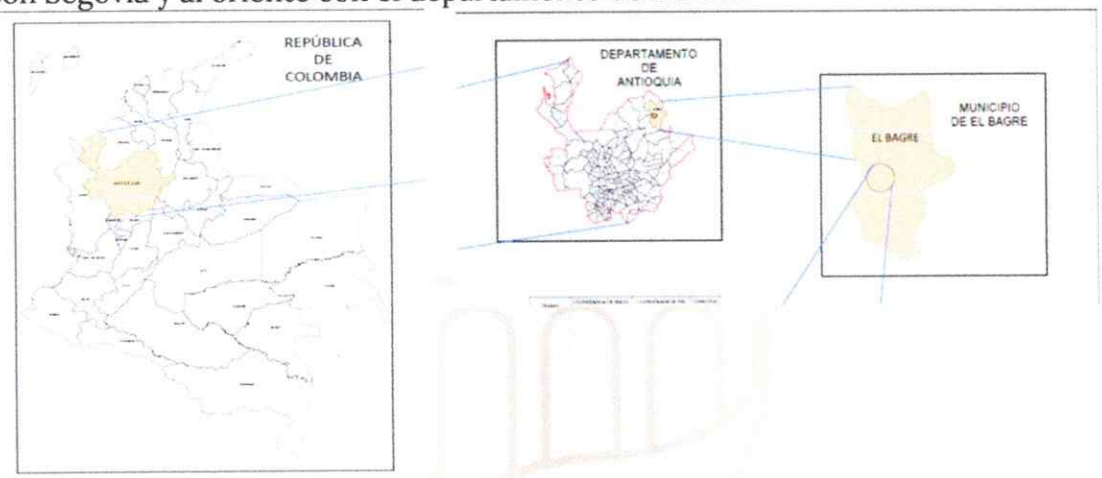

3.1.2 Topografía.

El municipio de El Bagre presenta una topografía predominantemente plana hacia el sur y el occidente, y ligeramente quebrada hacia el oriente. Entre sus principales accidentes orográficos se destacan el cerro El Almendro y los altos Urudurú y Urabá. El territorio es atravesado por diversos cuerpos hídricos que desembocan en el río Nechí, entre los que se encuentran los ríos Amacerí, Torcoral y Bagre, así como las quebradas Ucurú, Villa y Urapá.

Geográficamente, El Bagre se ubica entre la parte baja de la cuenca del río Nechí y la Serranía de San Lucas, y en su territorio se identifican tres formas principales de superficie terrestre: planicie aluvial, colinas y montañas. Las planicies y colinas han sido intervenidas significativamente por actividades de minería aluvial desarrolladas principalmente por la empresa Mineros S.A., mientras que las colinas también han sido afectadas por procesos de degradación vinculados a la minería a mediana escala.

3.1.3 Climatología.

El Bagre se encuentra en una zona de vida caracterizada como Bosque Húmedo Tropical (bh-T) y, en menor proporción, Bosque Muy Húmedo Premontano (bmh-PM), lo cual explica su alta pluviosidad anual. El régimen climático presenta una estación seca

moderadamente prolongada, seguida de una temporada de lluvias que se extiende aproximadamente desde el mes de abril hasta noviembre, con breves pausas secas entre julio y agosto.

Gracias a su ubicación biogeográfica, el municipio posee una notable riqueza forestal y biodiversidad, factores que justificaron su inclusión dentro de la Reserva Forestal del Río Magdalena, establecida por la Ley 2ª de 1959. En este sentido, el ordenamiento del territorio rural se rige por el Plan de Ordenación Forestal de la jurisdicción de CORANTIOQUIA, el cual determina usos del suelo predominantemente orientados a la protección y producción sostenible.

Es relevante señalar que la existencia de esta figura jurídica de área protegida, sumada a la clasificación de amplias zonas del municipio como baldíos nacionales, ha dificultado históricamente el acceso legal a la tierra para múltiples comunidades asentadas en el territorio. La ausencia de títulos de propiedad ha limitado de manera significativa las oportunidades de desarrollo económico y social para estos habitantes.

4. POLIZAS CONTRACTUALES.

4.1. Póliza de cumplimiento.

AMPARO	NO. PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HAST
CUMPLIMIENTO	PÓLIZA No. I-100041666 emitida por Seguros Mundial	$110.454.767,43	25/02/2025	25/12/2025
PRESTACIONES SOCIALES		$55.227.383,71	25/02/2025	25/06/2028
ESTABILIDAD DE LA OBRA		$165.682.151,14	25/06/2025	25/06/2030

4.2. Póliza de responsabilidad civil.

AMPARO	NO. PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HAST
AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	PÓLIZA No. I-100010339 emitida por	$284.700.000,00	25/02/2025	25/06/2025
PATRONAL		$284.700.000,00	25/02/2025	25/06/2025

CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	Seguros Mundial	$284.700.000,00	25/02/2025	25/06/2025
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		$284.700.000,00	25/02/2025	25/06/2025

5. ACTIVIDADES EJECUTADAS.

En el periodo comprendido entre el 16 de abril de 2025 y el 26 de junio de 2025, se han realizado las siguientes actividades.

- Se culminaron a las actividades en el primer tramo a intervenido.
- Se termino de construir las cunetas y los bordillos en el tramo El Real.
- Se da inicio y se culminaron las actividades en el segundo tramo a intervenir.
- Las actividades que se reportan en el presente informe corresponden a la ejecución principalmente en la vereda Luis Cano.
- Se llevaron a cabo a la ejecución y finalización de las siguientes actividades, las cuales se incluyeron en el acta de corte No. 2.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	ACTA N° 1	ACTA 2 Y FINAL	ACUMULADO EJECUTADO	
				CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	% EJECUTADO
1.1	**TRABAJOS PRELIMINARES**						
1.1.1	Conformación de la calzada existente	M2	3255,00	1515,00	1.740,00	3255,00	100%
1.2	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**						
1.2.1	Excavacion para la explanación Placa Huella	M3	652,77	298,32	354,45	652,77	100%
1.2.2	Excavacion Manual (Viga Riostra)	M3	20,40	9,50	10,90	20,40	100%
1.2.3	Transporte de material	M3-Km	5977,18	3392,40	2.584,78	5977,18	100%
1.3	**CAPAS GRANULARES**						
1.3.1	Subbase o material similar para placa huella y cunetas	M3	488,25	227,25	261,00	488,25	100%
1.4	**PAVIMENTO EN PLACA HUELLA**						
1.4.1	Concreto clase D (210 Kg/cm2)	M3	165,24	76,95	88,29	165,24	100%
1.4.2	Concreto clase G (Ciclópeo -210 Kg/cm2)	M3	165,24	76,95	88,29	165,24	100%
1.4.3	Viga Riostra de Concreto Clase D (0,30 x 0,20 x 5,0 mts)	M3	0,00		0,00	0,00	100%
1.4.4	Bordillo de Concreto Vaciado IN SITU	M3	78,12		78,12	78,12	100%
1.4.5	Cuneta de Concreto Vaciada IN SITU	M3	107,42		107,42	107,42	100%
1.4.6	Acero de refuerzo grado 60 para Placa huella	KG	16754,9	7355,93	9.398,97	16754,90	100%
NP	**NO PREVISTOS**						
1.4.3	Viga Riostra de Concreto Clase D (0,30 x 0,20 x 5,0 mts)	M3	51,00	23,75	27,25	51,00	100%

6. USO DE MAQUINARIA

Durante el periodo se menciona los equipos, herramientas y maquinarias que se han utilizado en la ejecución de la obra.

DESCRIPCION MAQUINARIA, EQUIPOS Y/O HERRAMIENTA MENOR	CANTIDAD
Retroexcavadora	1
Carmix de 4m3	1
Vibro compactador	1
Mezcladora o trompo	1
Equipo Topográfico. (Estación Total)	1
Herramienta menor.	1

7. PERSONAL CONTRATO DE LA OBRA.

Para la ejecución del contrato se tiene en cuenta un personal calificado y no calificado, como lo describe la siguiente tabla.

PERSONAL
(1) Director De Obra - Ingeniero Civil
(1) Residente De Obra - Ingeniero Civil
(1) SST
(1) Secretaria
(1) Topógrafo
(1) Oficial
(6) Ayudantes De Obra

8. CONDICIONES CLIMATICAS.

Para el presente periodo, el clima en la zona de ejecución ha sido favorable. Se han presentado días soleados y momentos de lluvia, sin embargo, estos no han afectado la ejecución.

9. ENSAYOS DE LABORATORIO.

Para el presente periodo, se anexan los resultados correspondientes a cilindros y viguetas falladas a los 7, 14 y 28 días.

10. ACTAS DE COMITÉ.

Las actas que se han realizado en este tiempo de ejecución se reflejan en la siguiente tabla.

ACTAS DE COMITES		
Fecha	**Descripción**	**Asunto**
26/02/2025	Comité No. 1	Inicio De Obra/Entrega Sitio De Obra
14/03/2025	Comité No. 2	Aprobación de ítem no previsto/transporte
28/03/2025	Comité No. 3	Balance de obras
11/04/2025	Comité No. 4	Seguimiento al estado de la obra/plan de choque por retraso
25/04/2025	Comité No. 5	Protocolizar modificación 1
9/05/2025	Comité No. 6	Corte parcial N°1 para el contrato de Obra.
23/05/2025	Comité No. 7	Atraso y recuperación de tiempo
6/06/2025	Comité No. 8	Atraso y recuperación de tiempo
20/06/2025	Comité No. 9	Recuperación de tiempo perdido/ Acta final de obra

11. ASPECTO ECONOMICO

11.1. Avance Físico.

Se presenta un estado actual con un porcentaje de avance físico acumulado del 100%

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 552.273.837,13
VALOR ACTA DE CORTE No 1	$ 224.910.984,87
VALOR ACTA DE CORTE No 2 Y FINAL	$ 327.362.852,26
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 552.273.837,13

11.2. Avance financiero.

Para el periodo comprendido entre el 16 de mayo de 2025 y el 26 de junio de 2025, se presenta acta de cobro No 2 y final, por un valor de **TRECIENTOS VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS M/CTE. ($ 327.362.852,26).** Se adjunta acta.

12. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL.

El contratista cumple con las afiliaciones legales y pagos relacionados con la seguridad social para el personal contratado, de acuerdo estipulado con la norma vigente colombiana, establecido en la ley 100 1993, como soporte se adjunta planilla pagada de la seguridad social y parafiscales correspondiente a la fecha, del personal afiliado, el cual ejecuta el contrato de obra.

13. SEGUIMIENTO A LA INVERSION DE ANTICIPO.

El contrato de obra 012-2025, no contempla desembolso de anticipo.

14. CONCLUSIONES.

- Este informe recopila los detalles del acta de corte No. 2 y final para el periodo comprendido entre el 26 de febrero de 2025 y el 26 de abril de 2025, del contrato de obra por un valor de **TRECIENTOS VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS M/CTE. ($ 327.362.852,26).**
- El acta de inicio de obra se suscribió el día 26 de febrero de 2025.
- El presente informe corresponde a la ejecución de 651 metros de placa huella en la vereda El Real y tramo Luis Cano – Perico, completando el 100% del alcance físico del contrato de obra.

Atentamente,

CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA
No. 1.069.853.386 de Junín Cundinamarca
REPRESENTANTE LEGAL
CASBIM S.A.S.
NIT. 901.577.286-4
CONTRATISTA OBRA

REGISTRO FOTOGRAFICO Y ANEXOS













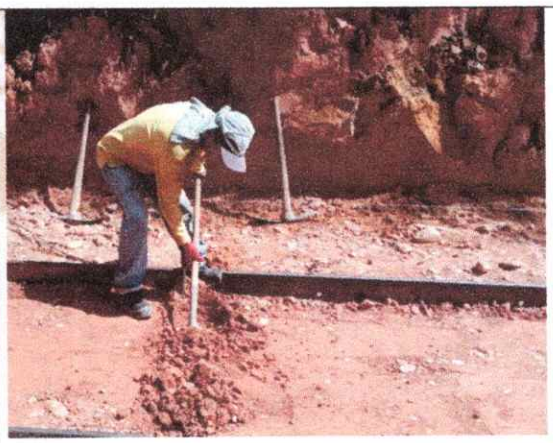

Oficina Principal: Carrera 3 Este N° 22-01
Chía, Cundinamarca

c.suarez@cambim.com.co
NIT: 901.577.286-4



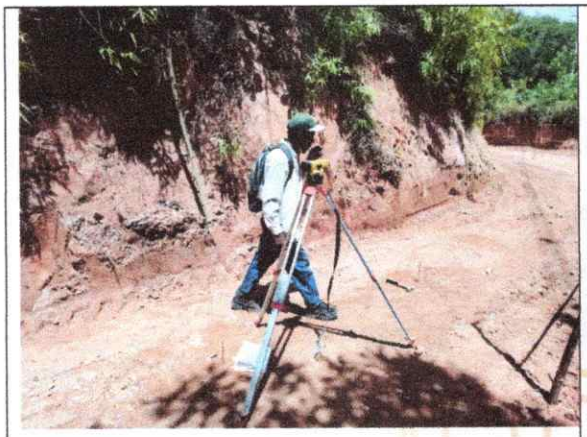




VIA CERRADA





















Oficina Principal: Carrera 3 Este N° 22-01
Chía, Cundinamarca

c.suarez@cambim.com.co
NIT: 901.577.286-4





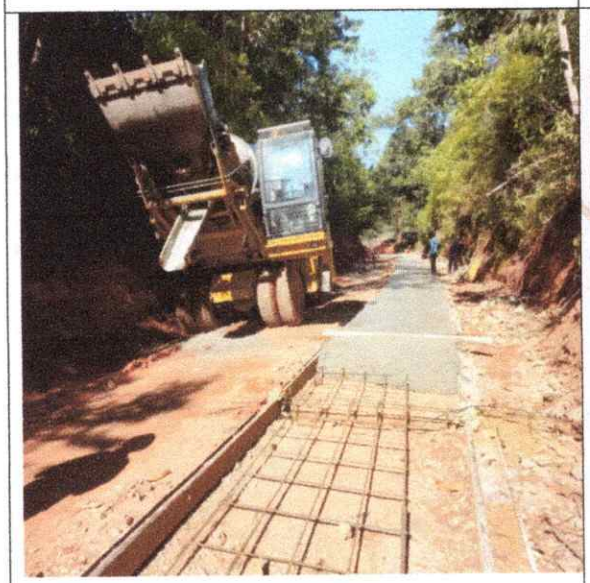

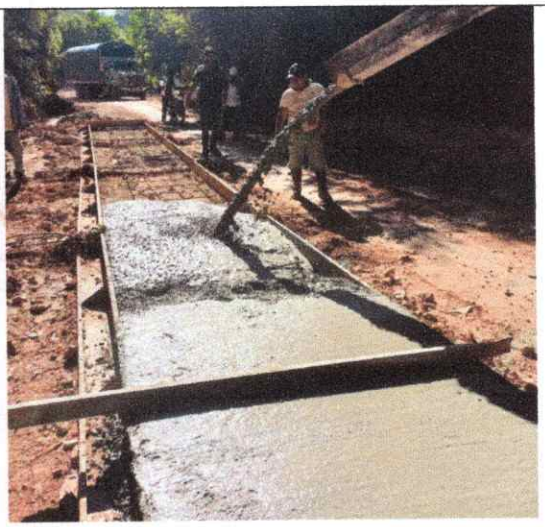


Oficina Principal: Carrera 3 Este N° 22-01
Chía, Cundinamarca

c.suarez@cambim.com.co
NIT: 901.577.286-4






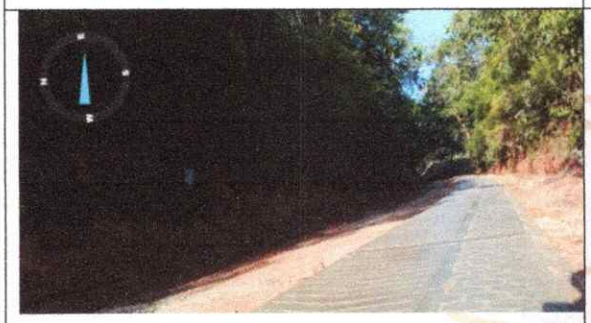





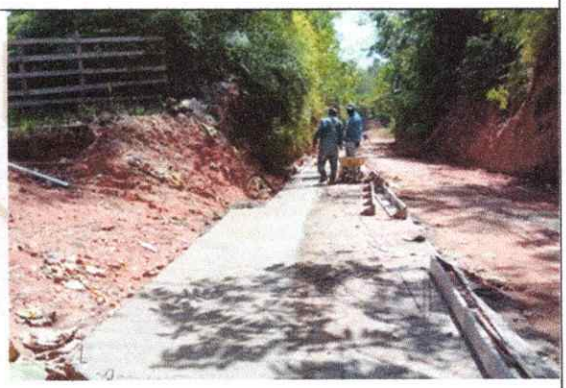

Oficina Principal: Carrera 3 Este N° 22-01
Chía, Cundinamarca

c.suarez@cambim.com.co
NIT: 901.577.286-4
























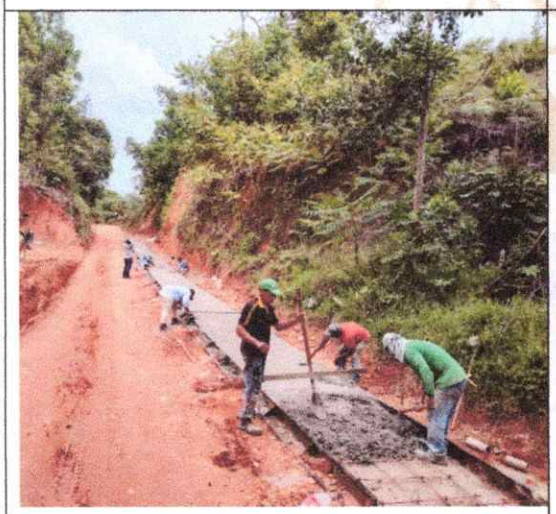

















Oficina Principal: Carrera 3 Este N° 22-01
Chía, Cundinamarca

c.suarez@cambim.com.co
NIT: 901.577.286-4

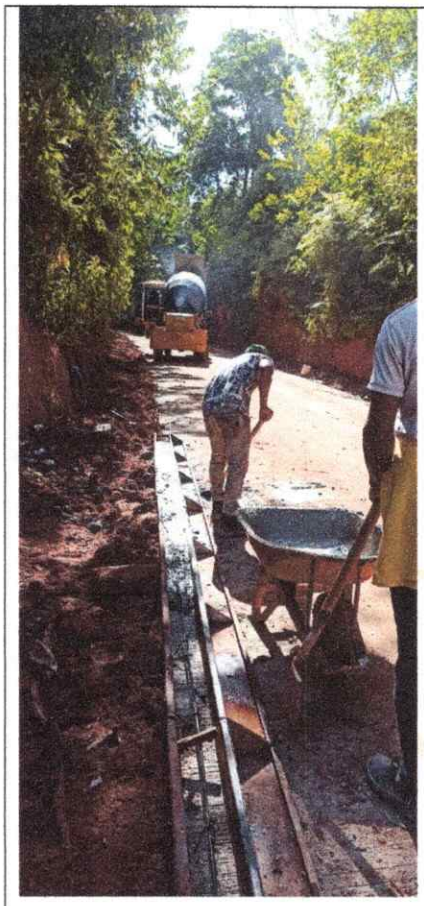

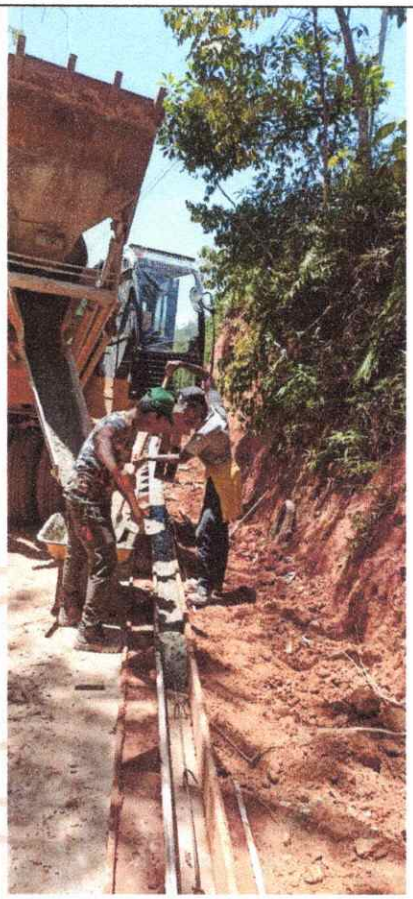









CASBIM INGENIERÍA

CONTRATO OBRA 012 - MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VÍAS TERCIARIAS QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA EL PERICO Y VEREDA EL REAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE

INFORME DE OBRA PARA SUSTENTACION MODIFICATORIA N°.1

FECHA. 02 DE MAYO DE 2025.

ELABORADO POR CONTRATISTA DE OBRA

PRESENTADO A:

EDTB – EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE.

EDTB
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE **EL BAGRE**

BAGRE – ANTIOQUIA

2025

TABLA DE CONTENIDO.

1. Introducción 3
2. Descripción a las características técnicas del proyecto 4
   2.1. Principales características técnicas del proyecto 4
3. Justificación del proyecto. 5
4. Localización del proyecto. 6
   4.1. Localización general 6
   4.2. Localización especifica 7
5. Ficha técnica el contrato de obra 8
6. Cantidades según Presupuesto de obra contractual 9
7. Justificación para la solicitud de modificatoria al presupuesto inicial del proyecto. 11
   7.1. Presupuesto de obra modificado 11
      7.1.1. Item NO PREVISTO 12
8. Conclusiones y recomendaciones. 27

1. Introducción.

El presente informe tiene por objeto describir el desarrollo del contrato para la MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VÍAS TERCIARIAS QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA EL PERICO Y VEREDA EL REAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, en el periodo comprendido entre el 26 de febrero de 2025 y el 08 de junio de 2025.

Este contrato se ejecuta mediante contrato de obra número CO-012-2025, que es celebrado entre la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE (EDTB) y de la sociedad CASBIM S.A.S. con NIT 901.577.286-4, representada por CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.069.853.386 de Junín Cundinamarca, obrando en calidad de representante legal

El propósito de este informe es sustentar la solicitud de modificación a las condiciones contractuales iniciales, proporcionando un análisis detallado de los ajustes necesarios con base en la ejecución real del proyecto. En este sentido, se describen las actividades que han experimentado variaciones su cantidad, tras realizar el balance de obra y teniendo en cuenta la modificación N° 1.

CASBIM INGENIERÍA

2. Descripción a las características técnicas del proyecto

2.1 Principales características del proyecto

Las vías terciarias, debido a su localización geográfica, superficie de rodadura, diseño geométrico, tránsito, geotecnia, hidrología y otros aspectos, suelen presentar un rápido deterioro a medida que pasa el tiempo, esto debido a la falta de un mantenimiento rutinario (Manual de Diseño Geométrico" Ministerio de Transporte - INVIAS 2008), generando así dificultad e inseguridad para las personas que hacen uso diario de ellas.

De acuerdo con la solicitud presentada por la ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL BAGRE, la empresa para el desarrollo territorial de El Bagre "EDTB" realizo proceso de contratación de "MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VIAS TERCIARIAS QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA EL PERICO Y VEREDA EL REAL ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE".

El método de diseño que se utilizará será el especificado en "Cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales PROGRAMA COLOMBIA RURAL", de acuerdo con la cual el pavimento con Placa-huella constituye una solución para vías terciarias de carácter veredal que presentan un volumen de tránsito bajo con muy pocos buses y camiones al día siendo los automóviles, los camperos y las motocicletas el mayor componente del flujo vehicular.

CASBIM INGENIERÍA

3. Justificación del proyecto

Las justificaciones para hacer este tipo de proyectos de pavimento rígido en placa huella son:

Ofrecer permanentemente condiciones de circulación satisfactorias durante un amplio período de servicio.

No requerir acciones de mantenimiento diferentes a la limpieza de las obras de drenaje y la rocería de las zonas laterales.


No requerir mayores modificaciones a la geometría de la vía existente ya que por condiciones de rugosidad de la superficie de este tipo de pavimento, la velocidad de los vehículos tiende a ser muy baja. Es pertinente manifestar que la baja velocidad es un control implícito de la accidentalidad.

Reducir los costos de construcción y mantenimiento respecto a los mismos.

4. Localización del proyecto.

Localización general.

El proyecto se localiza en el departamento de Antioquia, en el municipio de El Bagre. Se encuentra ubicado en la subregión del Bajo Cauca. Limita por el norte con el municipio de Nechí, por el noroeste con Caucasia, por el suroeste con Zaragoza, por el sureste con Segovia y al oriente con el departamento de Bolívar.

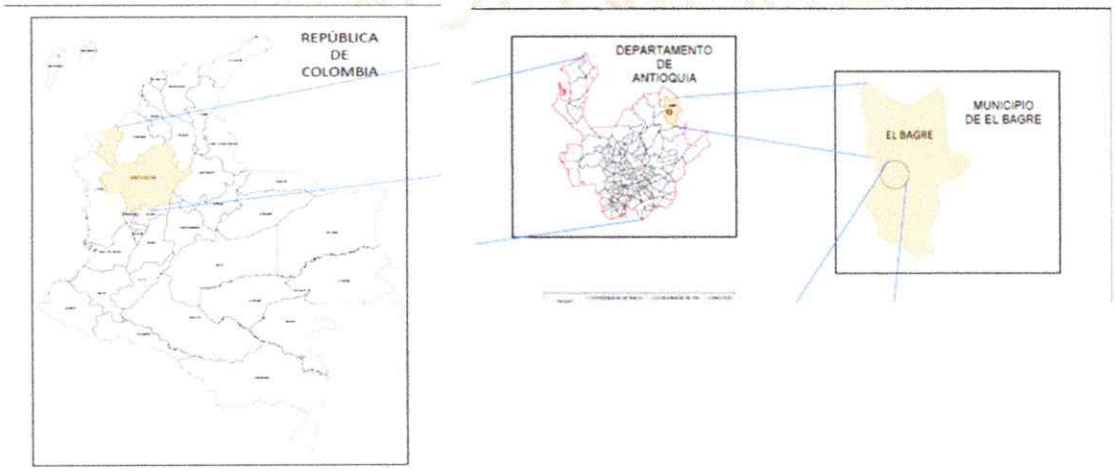

Localización especifica.

Tramo El Real



Tramo Luis cano – Perico



5. Ficha técnica el contrato de obra

CONTRATO No.	012-2025
CONTRATISTA	CASBIM S.A.S.
CC/N.I. T CONTRATISTA	901.577.286-4
OBJETO	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VÍAS TERCIARIAS QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA EL PERICO Y VEREDA EL REAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE.
VALOR	QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON TRECE CENTAVOS ($ 552.273.837,13) INCLUIDO EL A.U. Y DEMÁS COSTOS A QUE HAYA LUGAR.
PLAZO DE EJECUCION	CUATRO (04) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIO	26 DE FEBRERO DE 2025

6. Cantidades según Presupuesto de obra contractual

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL
1.1	**TRABAJOS PRELIMINARES**		
1.1.1	Conformación de la calzada existente	M2	5.000,00
1.2	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**		
1.2.1	Excavación para la explanación Placa Huella	M3	825,00
1.2.2	Excavación Manual (Viga Riostra)	M3	100,20
1.3	**CAPAS GRANULARES**		
1.3.1	Subbase o material similar para placa huella y cunetas	M3	673,31
1.4	**PAVIMENTO EN PLACA HUELLA**		
1.4.1	Concreto clase D (210 Kg/cm2)	M3	179,55
1.4.2	Concreto clase G (Ciclópeo -210 Kg/cm2)	M3	179,55
1.4.3	Viga Riostra de Concreto Clase D (0,30 x 0,20 x 5,0 mts)	M3	100,20
1.4.4	Bordillo de Concreto Vaciado IN SITU	M3	120,00
1.4.5	Cuneta de Concreto Vaciada IN SITU	M3	165,00
1.4.6	Acero de refuerzo grado 60 para Placa huella	KG	7.789,90

7. Justificación para la solicitud de modificatoria de mayores y menores cantidades e ítem no previsto.

Que las cantidades de obra propuestas en las obras no contempladas son aproximadas y que estas cantidades están sujetas a modificaciones durante el desarrollo de la obra.

Que las cantidades de obra pueden aumentar o disminuir de acuerdo con las condiciones y modificaciones que se realicen.

Que en la realización de balance y cuantificando la meta física se identificó que algunos ítems no tenían la suficiente cantidad para tener un alcance uniforme de placa huella

Que por de concepto técnico la dimensión de la viga riostra es de (0.2 x 0.25 m), por lo que se modifica este item, suprimiendo el de las condiciones originales (item 1.4.3), por un item no previsto el cual tendrá el mismo valor unitario en la misma unidad de medida del inicial.

Que por las condiciones de disponibilidad de la maquinaria del municipio debido a que estas se encuentran en emergencias debido a la afectación de todas las vías rurales por ola invernal no fue posible que el municipio se isiera carg de transportar el material proveniente de la excavación por lo que debimos asumir la realización de esta actividad, la cual se encuentra creada (Item 1.2.3) pero con cantidad cero en las condiciones contractuales iniciales, por lo que no fue necesario crear un ítem no previsto.

La Zona de Disposición de Materiales Excedentes o Zona de Manejo de Escombros y Material de Excavación (ZODME). Se refiere a un lugar autorizado donde se deposita de forma segura el material, Es el antiguo relleno sanitario en la vereda Las Sardinas


Que el sitio de disposición final o ZODME queda a 8460 m de distancia promedio del tramo de El Real y 5520 del tramo Luis Cano, según siguientes esquemas:

Para tramo El Real



Distancia acarreo El Real: 8,31km+(0,303km/2) = 8,46 km

Para tramo Luis Cano – Perico

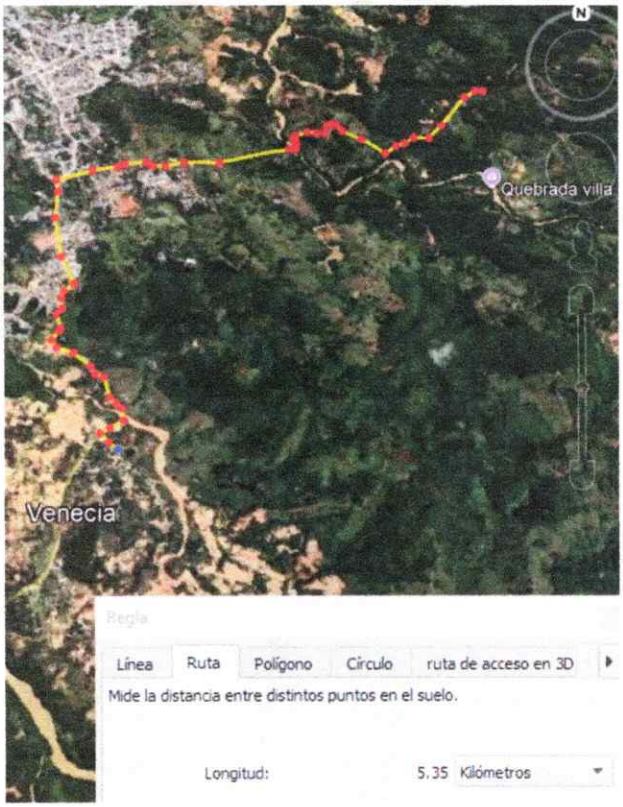

Distancia acarreo Luis Cano: 5,35km+(0,348km/2): 5,52 km

Se identificando que los ítems de conformación (item 1.1.1), bordillos (item 1.4.4) y cunetas (item 1.4.5) contemplaban un alcance mayor a los demás item, se unifico la meta física para la ejecución de este contrato de placa huella y quedo de la siguiente manera:

Se reestablece la meta física teniendo en cuenta el balance de obras y sin lograr adición presupuestal.

CABECERA MUNICIPAL – VEREDA EL REAL	303 ml
VEREDA LUIS CANO– VEREDA EL PERICO	348 ml
TOTAL, META FISICA DEL PROYECTO	**651 ml**

CASBIM INGENIERÍA

CASBIM INGENIERÍA

Presupuesto de obra modificado (balance de obras)

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIÓN 1			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	+/-	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
1.1	**TRABAJOS PRELIMINARES**									
1.1.1	Conformación de la calzada existente	M2	5000,00	$ 5.766	$ 28.832.499,00	-	- 1.745,00	-$ 10.062.542,00	3.255,00	$ 18.769.957,00
1.2	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**									
1.2.1	Excavacion para la explanación Placa Huella	M3	825,00	$ 22.458	$ 18.527.850,00	-	-172,23	-$ 3.867.941,00	652,77	$ 14.659.909,00
1.2.2	Excavacion Manual (Viga Riostra)	M3	100,20	$ 47.900	$ 4.799.580,00	-	-79,80	-$ 3.822.420,00	20,40	$ 977.160,00
1.2.3	Transporte de material	M3-Km	0,00	$ 15.102	$ 0,00	+	5.977,18	$ 90.264.757,00	5.977,18	$ 90.264.757,00
1.3	**CAPAS GRANULARES**									
1.3.1	Subbase o material similar para placa huella y cunetas	M3	673,31	$ 123.916	$ 83.434.155,49	-	-185,06	-$ 22.931.970,14	488,25	$ 60.502.185,35
1.4	**PAVIMENTO EN PLACA HUELLA**									
1.4.1	Concreto clase D (210 Kg/cm2)	M3	179,55	$ 405.505	$ 72.808.423,00	-	-14,31	-$ 5.802.777,00	165,24	$ 67.005.646,00
1.4.2	Concreto clase G (Ciclópeo -210 Kg/cm2)	M3	179,55	$ 360.955	$ 64.809.470,00	-	-14,31	-$ 5.165.266,00	165,24	$ 59.644.204,00
1.4.3	Viga Riostra de Concreto Clase D (0,30 x 0,20 x 5,0 mts)	M3	100,20	$ 395.347	$ 39.613.769,00	-	-100,20	-$ 39.613.769,00	0,00	$ 0,00
1.4.4	Bordillo de Concreto Vaciado IN SITU	M3	120,00	$ 408.325	$ 48.999.000,00	-	-41,88	-$ 17.100.651,00	78,12	$ 31.898.349,00
1.4.5	Cuneta de Concreto Vaciada IN SITU	M3	165,00	$ 380.335	$ 62.755.275,00	-	-57,58	-$ 21.899.689,00	107,42	$ 40.855.586,00
1.4.6	Acero de refuerzo grado 60 para Placa huella	KG	7789,90	$ 2.213	$ 17.239.048,70	+	8.965,01	$ 19.839.571,14	16.754,91	$ 37.078.619,84
NP	**NO PREVISTOS**									
NP1	Viga Riostra de Concreto Clase D (0,20 x 0,25 x 5,0 mts)	M3	-	$ 395.347	$ -	+	51,00	$ 20.162.697,00	51,00	$ 20.162.697,00

VALOR COSTOS DIRECTOS		$ 441.819.069,70	$ 0,00	$ 441.819.069,70
AIU	**25,00%**	$ 110.454.767,43	$ 0,00	$ 110.454.767,43
VALOR TOTAL OBRA		$ 552.273.837,13	$ 0,00	$ 552.273.837,13

CASBIM INGENIERÍA

Ítem NO PREVISTO

NP1	Viga Riostra de Concreto Clase D (0,20 x 0,25 x 5,0 mts)	M3	$ 395.347

Inicialmente se tenía contemplado el item con la misma unidad de medida y el mismo valor, cambiando solo el nombre por las nuevas dimensiones de la viga riostra.

CASBIM INGENIERÍA

Conclusiones y recomendaciones

Las cantidades de algunos ítems se modificaron según memorias y cuadro de cantidades del acta de modificación.

No es necesario hacer adición presupuestal al contrato de obra

No es necesario adición en tiempo quedando como fecha programada de terminación el 26 de junio de 2025

Atentamente,

CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA
No. 1.069.853.386 de Junín
R.L **CASBIM SAS**
CONTRATISTA

CASBIM INGENIERÍA

CERTIFICACIÓN ACTAS DE VECINDAD

VEREDA EL REAL Y TRAMO LUIS CANO - PERICO

El Bagre, Antioquia – 28 de febrero de 2025

Yo, CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.069.853.386 de Junín Cundinamarca, obrando en calidad de representante legal de la sociedad CASBIM S.A.S. con NIT 901.577.286-4, en calidad de contratista de obra a cargo de la ejecución del contrato de obra No. 012-2025 y cuyo objeto contractual es la **MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VÍAS TERCIARIAS QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA EL PERICO Y VEREDA EL REAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE,** certifico que:

1. Se realizó el respectivo recorrido técnico del tramo de intervención previo al inicio de las actividades de obra en la Vereda El Real y tramo Luis cano - Perico
2. Durante dicho recorrido se verificó que no existen viviendas, predios habitados o construcciones colindantes al área directa de intervención del proyecto.
3. Por lo anterior, no fue posible ni procedente la elaboración de actas de vecindad individuales con propietarios o residentes, debido a la inexistencia de inmuebles cercanos que puedan verse afectados por las obras.
4. Esta certificación se expide para dejar constancia formal del estado inicial del área intervenida, en cumplimiento de los lineamientos contractuales y como medida preventiva ante cualquier eventualidad o reclamación futura.

Atentamente,

CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA
No. 1.069.853.386 de Junín Cundinamarca
REPRESENTANTE LEGAL
CASBIM S.A.S.
NIT. 901.577.286-4
CONTRATISTA OBRA

CERTIFICADOS DE CALIDAD

Oficina Principal: Carrera 3 Este N° 22-01
Chía, Cundinamarca

c.suarez@cambim.com.co
NIT: 901.577.286-4

Arenera Santa Clara

Minería segura, sostenible y socialmente responsable

Caucasia, 25 junio de 2025

A QUIEN INTERESE

ASUNTO: CERTIFICACIÓN CANTIDAD Y TIPO DE MATERIAL

ARENERA SANTA CLARA SAS con NIT 901.011.176-3 con título minero vigente No 7414

CERTIFICA QUE:

SE SUMINISTRARON MATERIALES AL PROYECTO: **"MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VÍAS TERCIARIAS QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA EL PERICO Y VEREDA EL REAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE"**

A nombre de la empresa contratista: **CASBIM S.A.S. con NIT 901.577.286-4, según contrato de obra No. 012-2025**

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO
660	M3 (metro cubico)	SUBBASE
300	M3 (metro cubico)	ARENA
450	M3 (metro cubico)	GRAVA

Atentamente

Francisco Andres M.A
Representante Legal Arenera
Arenera Santa Clara SAS
NIT 901.011.176-3

DENSIDAD EN EL SITIO

N° 002

OBRA: MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VÍAS TERCIARIAS QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA EL PERICO Y VEREDA EL REAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE

CONTRATISTA: CASBIM S.A.S. con NIT 901.577.286-4

INTERVENTORIA: INSUCORP S.A.S. con NIT 901.577.286-5

CONTRATANTE: EDTB

MATERIAL: SUBBASE

FECHA: 12/03/2025

DATOS DEL ENSAYO - TRAMO LUIS CANO - PERICO

N° de Ensayo	D	1	2	3	4
Abcisa del Ensayo / Carril	D	0+050/CENTR	K0+150/DER	K0+220/IZQ	K0+320/DER
Ubicación en el carril (I o E o D)	D	I	I	I	I
Profundidad (m)	D	0,15	0,1	0,1	0,10
Densidad de la arena auxiliar (g/cm³)	D	1,46	1,46	1,46	1,46
Constante del cono (g)	D	1640	1640	1640	1640
Peso frasco + cono + arena inicial (g)	D	6360	6325	6280	6190
Peso frasco + cono + arena restante (g)	D	3050	2980	2560	2960
Peso arena del hueco (g)	C	1670	1705	2080	1590
Volumen total del hueco (cm³)	C	1143,84	1167,81	1424,66	1089,04
Peso húmedo material del hueco (g)	D	2550	2510	3150	2390
Densidad húmeda de campo (g/cm³)	C	2,229	2,149	2,211	2,195
Húmedad de campo (%)	D	8,60	7,90	7,90	9,40
Peso del suelo seco (g)	C	2348,07	2326,23	2919,37	2184,64
Densidad seca de campo (g/cm³)	C	2,05	1,99	2,05	2,01
Densidad seca máxima (g/cm³)	D	**2,07**	**2,07**	**2,07**	**2,07**
Húmedad óptima (%)	D	**8**	**8**	**8**	**8**
Grado de compactación (%)	C	99,17	96,23	98,99	96,91
		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

REMBERTO DIAZ

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

Yeisy Montero E

ING. RESIDENTE INTERVENTORIA

LAB-M&C S.A.S.
LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL
NIT: 900.861.030-5

Sede principal: Oficina y Laboratorio Transversal 1 N° 26 -19 Barrio El Carmen, Caucasia – Antioquia – Colombia
Cel: 311 382 6388 – 312 252 3441.
Email: lab.suelos015@hotmail.com – laboratorio.suelos15@gmail

PROYECTO:	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VÍAS TERCIARIAS QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA EL PERICO Y VEREDA EL REAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE			**NORMA:**	INV E-410/NTC 673
CONTRATISTA:	CASBIM S.A.S.	**INTERVENTORIA:**	INSUCORP S.A.S.	**INFORME No:**	4
LOCALIZACION:	VEREDA EL REAL			**FECHA INFORME:**	01-jul-25
DESCRIPCION:	CONCRETO DE 3000 PSI.				
FECHA DE RECIBO:	JUNIO 2025			**RESISTENCIA DE DISEÑO:**	3000 PSI

LOCALIZACION Y No DE MUESTRA	FECHA DE TOMA	No DE COLINDRO	DIAS DE CURADO	FECHA DE ROTURA	TIPO DE CEMENTO	DIAMETRO (mm)	ALTURA (cm)	AREA (cm^2)	VOLUMEN (cm3)	PESO (gr)	DENSIDAD (Gr/cm^3)	CARGA APLICADA (KN)	CARGA APLICADA (Kg)	RESISTENCIA A LA FECHA		RESISTENCIA ESTIMADA A LOS 28 DIAS (P.S.I.)	PORCENTAJE CON RESPECTO A f'c	TIPO DE FALLA DEL CILINDRO				
														(Kg/cm^2)	P.S.I							
HUELLA – LC001 – K+015 D	30-may-25	1	7	6-jun-25	ARGOS	150,2	30	177,2	5315,6	13698	2,577	233,8	23841	134,55	1914,22	3000	63,81%					X
HUELLA – LC001 – K+015 D	30-may-25	2	14	13-jun-25	ARGOS	150,3	30	177,4	5322,7	13699	2,574	330,6	33712	190,01	2703,16	3000	90,11%	X				
HUELLA – LC002 – K+070 D	3-jun-25	3	7	10-jun-25	ARGOS	150,1	30,1	177,0	5326,2	13700	2,572	236,9	24157	136,52	1942,19	3000	64,74%		X			
HUELLA – LC002 – K+070 D	3-jun-25	4	14	17-jun-25	ARGOS	150,2	30,1	177,2	5333,3	13701	2,569	345,7	35252	198,95	2830,39	3000	94,35%	X				
HUELLA – LC003 – K+160 D	4-jun-25	5	7	11-jun-25	ARGOS	150,4	30,2	177,7	5365,3	13702	2,554	240,6	24534	138,10	1964,66	3000	65,49%	X				
HUELLA – LC003 – K+160 D	4-jun-25	6	14	18-jun-25	ARGOS	150,1	30,2	177,0	5343,9	13703	2,564	346,1	35292	199,45	2837,45	3000	94,58%					X

EJECUTO:	REVISO:	RECIBIO:	Vo -Bo:
LAB - M&C S.A.S ORIGINAL			
AUXILIAR LAB. SEBASTIAN CAMAÑO LOPEZ	AREA DE CALIDAD: LAB. FREDDY ALBERTO CANO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA

LAB-M&C S.A.S.
LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL
NIT: 900.861.030-5

Sede principal: Oficina y Laboratorio Transversal 1 N° 26 -19 Barrio El Carmen, Caucasia – Antioquia – Colombia
Cel: 311 382 6388 – 312 252 3441.
Email: lab.suelos015@hotmail.com – laboratorio.suelos15@gmail

PROYECTO:	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VÍAS TERCIARIAS QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA EL PERICO Y VEREDA EL REAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE			**NORMA:**	INV E-410/NTC 673
CONTRATISTA:	CASBIM S.A.S.	**INTERVENTORIA:**	INSUCORP S.A.S.	**INFORME No:**	4
LOCALIZACION:	VEREDA EL REAL			**FECHA INFORME:**	01-jul-25
DESCRIPCION:	CONCRETO DE 3000 PSI.			**RESISTENCIA DE DISEÑO:**	3000 PSI
FECHA DE RECIBO:	JUNIO 2025				

LOCALIZACION Y No DE MUESTRA	FECHA DE TOMA	No DE COLINDRO	DIAS DE CURADO	FECHA DE ROTURA	TIPO DE CEMENTO	DIAMETRO (mm)	ALTURA (cm)	AREA (cm^2)	VOLUMEN (cm3)	PESO (gr)	DENSIDAD (gr/cm^3)	CARGA APLICADA (KN)	CARGA APLICADA (kg)	RESISTENCIA A LA FECHA		RESISTENCIA ESTIMADA A LOS 28 DIAS (P.S.I.)	PORCENTAJE CON RESPECTO A $f'c$	TIPO DE FALLA DEL CILINDRO				
														(Kg/cm^2)	P.S.I							
HUELLA – LC004 – K+040 D	5-jun-25	7	7	12-jun-25	ARGOS	150,2	30,3	177,2	5368,7	13704	2,553	249,1	25401	143,36	2039,49	3000	67,98%					X
HUELLA – LC005 – K+070 D	6-jun-25	8	7	13-jun-25	ARGOS	150,3	30,23	177,4	5363,5	13705	2,555	249,7	25462	143,51	2041,68	3000	68,06%	X				
CUNETA – LC005 – K+090 D	16-jun-25	9	7	23-jun-25	ARGOS	150	30,2	176,7	5336,8	13706	2,568	249,3	25422	143,86	2046,57	3000	68,22%					X
CUNETA – LC005 – K+180 D	18-jun-25	10	7	25-jun-25	ARGOS	150,1	30,1	177,0	5326,2	13707	2,574	250,2	25513	144,18	2051,23	3000	68,37%					X
BORDILLO – LC005 – K+210 D	22-jun-25	11	7	29-jun-25	ARGOS	150,2	30,2	177,2	5351,0	13708	2,562	253,3	25829	145,78	2073,88	3000	69,13%		X			

EJECUTO:	REVISO:	RECIBIO:	Vo -Bo:
LAB - M&C S.A.S ORIGINAL			
AUXILIAR LAB. SEBASTIAN CAMAÑO LOPEZ	AREA DE CALIDAD: LAB. FREDDY ALBERTO CANO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA

LAB-M&C S.A.S.
LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL
ESTUDIO DE SUELO & CONCRETO Y ASFALTO
NIT: 900.881.030-5

Transversal 1 - N° 26 - 19 Barrio El Carmen, Caucasia – Antioquia - Colombia, CEL - 311 382 6388 - 312 252 3441 - 310 531 6759.

PROYECTO:	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VÍAS TERCIARIAS QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA EL PERICO Y VEREDA EL REAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE			NORMA:	INV -E 410 -013
CONTRATISTA:	CASBIM S.A.S.	INTERVENTORIA:	INSUCORP S.A.S.	INFORME No:	5
LOCALIZACION:	VEREDA EL REAL				
DESCRIPCION:	DISEÑO DE CONCRETO DE 3000 PSI			FECHA INFORME:	01-jul-25
FECHA DE RECIBO:	16-jun-25			RESISTENCIA DE DISEÑO:	3000 PSI

LOCALIZACION Y No DE MUESTRA	FECHA DE TOMA	No DE VIGA	DIAS DE CURADO	FECHA DE ROTURA	TIPO DE CEMENTO	LUZ LIBRE ENTRE APOYOS (cm)	ANCHO DE LA VIGA (cm)	ALTURA DE LA VIGA (cm)	CARGA APLICADA (KN)	P= CARGA EN (kg)	MR: MODULO DE ROTURA (kg/cm2)	MR DE DISEÑO (kg/cm2)	PORCENTAJE DE DESARROLLO
VIGA RIOSTRA – LU006 – K+110 D	12-jun-25	1	7	19-jun-25	ARGOS	45.0	15.0	15.0	20,3	2070,0	20,6	30	68,69%
VIGA RIOSTRA – LU006 – K+110 D	12-jun-25	2	14	26-jun-25	ARGOS	45.0	15.0	15.0	26,1	2661,4	27,1	30	90,33%

OBSERVACIONES:

EJECUTO:	REVISO:	RECIBIO:	Vo -Bo:
LAB - M&C. S.A.S. ORIGINAL			
AUXILIAR LAB. SEBASTIAN CAMAÑO	AREA DE CALIDAD: LAB. FREDDY ALBERTO CANO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA

BITACORA

CASBIM INGENIERÍA

BITACORA

1. **Miércoles, 26 de febrero de 2025**
   - **Actividades Desarrolladas:**
     - Se hace entrega del sitio de obra por parte de la EDTB al contratista de obra.
     - Se realiza socialización del proyecto a la comunidad.
   - **Firmas**

Remberto Diaz	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

2. **Jueves, 27 de febrero de 2025**
   - **Actividades Desarrolladas:**
     - Reconocimiento y levantamiento de información del terreno por parte del equipo de trabajo del contratista de obra.
     - Identificación de puntos críticos y condiciones del entorno.
   - **Firmas**

Remberto Diaz	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

3. **Viernes, 28 de febrero de 2025**
   - **Actividades Desarrolladas:**
     - Elaboración y organización del plan de trabajo del proyecto, con definición de fases y responsables.
   - **Firmas**

Remberto Diaz	Yeisy Montero E

REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

4. **Lunes, 03 de marzo de 2025**
   - **Actividades Desarrolladas:**
     - Proceso de selección y contratación de personal, asegurando cumplimiento de normativas laborales y de seguridad.
     -
     - Definición de roles y responsabilidades dentro del equipo de trabajo.
   - **Firmas**

REMBERTO DIAZ	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

5. **Martes, 04 de marzo de 2025**
   - **Actividades Desarrolladas:**
     - Evaluación y selección de proveedores.
     - Identificación y adecuación del lugar destinado para el acopio de materiales
   - **Firmas**

REMBERTO DIAZ	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

6. **Miércoles, 05 de marzo de 2025**
   - **Actividades Desarrolladas:**
     - Visita a obra
     - -Charla con comunidad de Vereda El Real.
   - **Firmas**

Remberto Diaz	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

7. **Jueves, 06 de marzo de 2025**
   - **Actividades Desarrolladas:**
     - Definición de bodega
     - Medición y gestión de alcance placa huella Vereda El Real
   - **Firmas**

Remberto Diaz	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

8. **Viernes, 07 de marzo de 2025**
   - **Actividades Desarrolladas:**
     - Organización de trabajo Vereda El Real.
     - Contratación de topografía.
     - Contratación de diseñador vial.
   - **Firmas**

Remberto Diaz	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

9. **Lunes, 10 de marzo de 2025**
   - **Actividades Desarrolladas:**
     - Ejecución de levantamiento topográfico de 303 metros de placa huella en Vereda El Real.

- **Firmas**

REMBERTO DIAZ	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

10. **Martes, 11 de marzo de 2025**
    - **Actividades Desarrolladas:**
        - Procesamiento de información topográfica.
    - **Firmas**

REMBERTO DIAZ	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

11. **Miércoles, 12 de marzo de 2025**
    - **Actividades Desarrolladas:**
        - Diseño vial de 303 metros de placa huella Vereda El Real conforme a normativa técnica.
    - **Firmas**

REMBERTO DIAZ	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

12. **Jueves, 13 de marzo de 2025**
    - **Actividades Desarrolladas:**
        - Finalización y remisión de Diseño vial de 303 metros de placa huella Vereda El Real conforme a normativa técnica.
    - **Firmas**

Remberto Diaz	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

13. **Viernes, 14 de marzo de 2025**
    - **Actividades Desarrolladas:**
        - Recibo y acopio de cemento remitido por la Gobernación de Antioquia.
    - **Firmas**

Remberto Diaz	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

14. **Lunes, 17 de marzo de 2025**
    - **Actividades Desarrolladas:**
        - Traslado de maquinaria vía fluvial para escarificación y acopio de material en Vereda El Real.
    - **Firmas**

Remberto Diaz	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

15. **Martes, 18 de marzo de 2025**
    - **Clima:** Soleado
    - **Horario:** 7 a.m. a 12m y 1 p.m. a 4 p.m.
    - **Actividades Desarrolladas:**
        - Acopio de material granular en Vereda El Real.
    - **Firmas**

Remberto Diaz	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

16. **Miércoles, 19 de marzo de 2025**
    - **Clima:** Soleado
    - **Horario:** 7 a.m. a 12m y 1 p.m. a 4 p.m.
    - **Actividades Desarrolladas:**
        - Acopio de material granular en Vereda El Real.
        - Traslado de cemento de Bodega a frente de obra Vereda El Real.
    - **Firmas**

Remberto Diaz	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

17. **Jueves, 20 de marzo de 2025**
    - **Clima:** Soleado
    - **Horario:** 7 a.m. a 12m y 1 p.m. a 4 p.m.
    - **Actividades Desarrolladas:**
        - Acopio de material granular en Vereda El Real.
        - Traslado de cemento de Bodega a frente de obra Vereda El Real.
        - Localización y replanteo de placa huella.
    - **Firmas**

Remberto Diaz	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

18. **Viernes, 21 de marzo de 2025**
    - **Clima:** Soleado
    - **Horario:** 7 a.m. a 12m y 1 p.m. a 4 p.m.
    - **Actividades Desarrolladas:**
        - Se realizó Abscisado de 303 metros de placa huella en Vereda El Real.
        - Traslado y alistamiento de madera para encofrado.
    - **Firmas**

REMBERTO DIAZ	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

19. **Sábado, 22 de marzo de 2025**
    - **Clima:** Soleado
    - **Horario:** 7 a.m. a 1 p.m.
    - **Actividades Desarrolladas:**
        - Se hizo desvió para tráfico de vehículos.
        - Se habilitó paso para cantera, instalando tubo en el caño y 6 viajes de volqueta.
        - Se acopiaron 5 viajes de arena para fundición.
    - **Firmas**

REMBERTO DIAZ	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

20. **Martes, 25 de marzo de 2025**
    - **Clima:** Soleado
    - **Horario:** 7 a.m. a 12m y 1 p.m. a 4 p.m.
    - **Actividades Desarrolladas:**
        - Acopio de material (arena) hasta el día de hoy 25 viajes.
        - Se conformó el bombeo de vía, 40 mts.
        - Se hicieron dos plazas para acopio de material (arena).

- Se colocaron niveles de loza (35 mtrs)

- **Firmas**

REMBERTO DIAZ	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

21. Miércoles, 26 de marzo 2025

- **Clima:** Soleado
- **Horario:** 7 a.m. a 12m y 1 p.m. a 4 p.m.
- **Actividades Desarrolladas:**
  - Acopio de material (arena) hasta el día de hoy 32 viajes.
  - Se cortó hierro de 3/8 y 1/4.
  - Se hicieron dos plazas para acopio de material (arena).
  - Se colocaron niveles de loza (26 m).
  - Se armaron 8 vigas riostras.
- **Firmas**

REMBERTO DIAZ	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

22. Jueves, 27 de marzo 2025

- **Clima:** Soleado
- **Horario:** 7 a.m. a 12m y 1 p.m. a 4 p.m.
- **Actividades Desarrolladas:**
  - Se cortó hierro de 3/8 y 1/4.
  - Se enrielaron 19 m lineales para fundir.
  - Se armaron 12 vigas riostras.
- **Firmas**

Remberto Diaz	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

23. Viernes, 28 de marzo 2025

- **Clima:** Soleado
- **Horario:** 7 a.m. a 12m y 1 p.m. a 4 p.m.
- **Actividades Desarrolladas:**
  - Se cortó hierro de 3/8 y 1/4.
  - Se encofraron y armaron 22 placas para fundir.
  - Se instalaron 8 vigas riostras.
  - Se colorado cotas de loza (75 m lineales)
- **Firmas**

Remberto Diaz	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

24. Sábado, 29 de marzo 2025

- **Clima:** Soleado
- **Horario:** 7 a.m. a 12m
- **Actividades Desarrolladas:**
  - Se encofraron y armaron 34 placas para fundir.
  - Se instalaron 5 vigas riostras.
  - Se cortó madera para tapas de huellas.
  - Se trasladó piedra en carro moto.
  - Se cortaron excedentes de vigas riostras.
- **Firmas**

Remberto Diaz	Yeisy Montero E

REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

25. Lunes, 31 de marzo 2025

- **Clima:** Soleado
- **Horario:** 7 a.m. a 12m y 1 p.m. a 4 p.m.
- **Actividades Desarrolladas:**
  - Se encofraron y armaron 38 placas para fundir.
  - Se instalaron 5 vigas riostras.
  - 61 ml armados.
  - Se cortaron excedentes de vigas riostras.
- **Firmas**

REMBERTO DIAZ	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

26. Martes, 01 de abril 2025

- **Clima:** Lluvioso - Soleado
- **Horario:** 7 a.m. a 12m y 1 p.m. a 4 p.m.
- **Actividades Desarrolladas:**
  - Se encofraron y armaron 44 placas para fundir.
  - Se instalaron 6 vigas riostras.
  - Se cortaron excedentes de vigas riostras.
  - Se almacenaron 120 bultos de cemento.
  - Se acopió piedra para fundir .
- **Firmas**

REMBERTO DIAZ	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

27. **Miércoles, 02 de abril 2025**
    - **Clima:** Soleado
    - **Horario:** 7 a.m. a 12m y 1 p.m. a 4 p.m.
    - **Actividades Desarrolladas:**
        - Se realiza fundida de 40 ml de huellas y vigas riostras.
    - **Firmas**

Remberto Diaz	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

28. **Jueves, 03 de abril 2025**
    - **Clima:** Lluvioso - Soleado
    - **Horario:** 7 a.m. a 12m y 1 p.m. a 4 p.m.
    - **Actividades Desarrolladas:**
        - Se acopió gravilla para fundir.
        - Se acopió cemento 57 bultos.
        - Se fundieron 35 metros lineales de lozas.
    - **Firmas**

Remberto Diaz	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

29. **Viernes, 04 de abril 2025**
    - **Clima:** Soleado
    - **Horario:** 7 a.m. a 12m y 1 p.m. a 4 p.m.
    - **Actividades Desarrolladas:**
        - Se acopió gravilla para fundir.
        - Se acopió cemento.
        - Se fundieron 30 metros lineales de lozas cíclope.
        - Se encofraron 24 metros lineales de lozas y riostras.
    - **Firmas**

Remberto Diaz	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

30. Sábado, 05 de abril 2025

- **Clima:** Soleado
- **Horario:** 7 a.m. a 12m
- **Actividades Desarrolladas:**
  - Se acopió gravilla para fundir.
  - Se acopió cemento.
  - Se encofraron 20 metros lineales de lozas.
  - Se desencofraron lozas fundidas.
- **Firmas**

Remberto Diaz	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

31. Lunes, 07 de abril 2025

- **Clima:** Soleado
- **Horario:** 7 a.m. a 12m y 1 p.m. a 4 p.m.
- **Actividades Desarrolladas:**
  - Se acopió gravilla para fundir.
  - Se acopió cemento (105 bultos)
  - Se encofraron 100 metros lineales de cunetas.
  - Se encofraron 50 m de lozas.
  - Se cortó hierro de 3/8.
  - Se armaron 45 vigas riostras.
- **Firmas**

Remberto Diaz	Yeisy Montero E

REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

32. Martes, 08 de abril 2025

- **Clima:** Soleado
- **Horario:** 7 a.m. a 12m y 1 p.m. a 4 p.m.
- **Actividades Desarrolladas:**
  - Amarre de acero a 22 cunetas
  - Amarre de acero de 26 huellas
  - Acopio de material granular para concreto (piedra)
  - Acarreo de cemento
  - Acarreo de acero 150 und de 3/8
  - Acarreo de material arena para preparación de subbase
  - Enrielamiento de cuneta, huella y ciclopeo
  - Relleno y compactación con subbase
  - Ampliación de calzada con maquinaria (100 MTS)
- **Firmas**

REMBERTO DIAZ	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

33. Miércoles, 09 de abril 2025

- **Clima:** Soleado
- **Horario:** 7 a.m. a 12m y 1 p.m. a 4 p.m.
- **Actividades Desarrolladas:**
  - 6.93 M3 concreto fundido para cunetas
  - 4.05 M3 concreto fundido para huella
  - 2.02 M3 concreto fundido para ciclopeo
  - 2 M3 concreto fundido para viga riostra
  - Transporte interno de material granular para vaciado (piedra, arena)
- **Firmas**

Remberto Diaz	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

34. Jueves, 10 de abril de 2025

- **Clima:** Soleado
- **Horario:** 7 a.m. a 12m y 1 p.m. a 4 p.m.
- **Actividades Desarrolladas:**
  - Desencofre de 25 placas de cunetas
  - Desencofre de 10 placas de huella y ciclopeo de .45
  - Colocación de rieles y figuración de acero para 27 cunetas
- **Firmas**

Remberto Diaz	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

35. Viernes, 11 de abril de 2025

- **Clima:** Soleado
- **Horario:** 7 a.m. a 12m y 1 p.m. a 4 p.m.
- **Actividades Desarrolladas:**
  - Fundición de 6.93 M3 de concreto para cunetas
  - Fundición de 0.93 M3 de concreto para viga riostra
  - Acarreo de piedra
  - Movimiento interno de arena y piedra con maquinaria
  - Verificación de replanteo y niveles con la cuadrilla topográfica
  - Conformación de calzada y riego de subbase sobre calzada
  - Figuración de acero para 8 placa de huella incluye organización del terreno
- **Firmas**

Remberto Diaz	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

36. Sábado, 12 de abril de 2025

- **Clima:** Soleado
- **Horario:** 7 a.m. a 12m y 1 p.m. a 4 p.m.
- **Actividades Desarrolladas:**
  - Fundición de 9.72 M3 de concreto para huella
  - Fundición de 4.86 M3 de concreto para ciclópeo
  - Fundición de 2.81 M3 de concreto para viga riostra
  - Amarre de acero para 8 huella
  - Acarreo de cemento y piedra para vaciado
  - Movimiento interno de material granular para vaciado (piedra y arena)
- **Firmas**

Remberto Diaz	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

37. Lunes, 14 de abril 2025

- **Clima:** Soleado
- **Horario:** 7 a.m. a 12m y 1 p.m. a 4 p.m.
- **Actividades Desarrolladas:**
  - Acarreo de cemento y acero desde bodega hasta la obra
  - Corte de acero (170 varilla)
  - Replanteo y nivelación de terreno para placa huella, manual
  - Acondicionamiento y movimiento de material sobrante de excavaciones
  - Enrielamiento y figuración de 26 losa huella y ciclopeo de .45
  - Reubicación y Acondicionamiento de bodega para herramientas menores
  - Reubicación lugar de captación de agua para vaciado
- **Firmas**

Remberto Diaz	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

38. Martes, 15 de abril 2025

- **Clima:** Soleado
- **Horario:** 7 a.m. a 12m y 1 p.m. a 4 p.m.
- **Actividades Desarrolladas:**
  - Fundición de 9.72 M3 de concreto para huella
  - Fundición de 4.86 M3 de concreto para ciclopeo
  - Fundición de 2.81 M3 de concreto para viga riostra
  - Acarreo de piedra para vaciado
- **Firmas**

Remberto Diaz	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

39. Miércoles, 16 de abril 2025

- **Clima:** Soleado
- **Horario:** 7 a.m. a 12m y 1 p.m. a 4 p.m.
- **Actividades Desarrolladas:**
  - Fundición de 8.51 M3 de concreto para ciclopeo
  - Corte de acero transversal para huella y de flejes de viga riostra
- **Firmas**

Remberto Diaz	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

40. Lunes, 21 de abril 2025

- **Clima:** Soleado
- **Horario:** 7 a.m. a 12m y 1 p.m. a 4 p.m.
- **Actividades Desarrolladas:**
  - Colocación de rieles pasa 22 placas de huella, 22 placa de ciclopeo de .45 mt de ancho
  - Adecuación de terreno (excavaciones) para 35 cunetas
  - Figuración y amarre de 20 viga riostra
- **Firmas**

REMBERTO DIAZ	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

41. Martes, 22 de abril 2025

- **Clima:** Soleado
- **Horario:** 7 a.m. a 12m y 1 p.m. a 4 p.m.
- **Actividades Desarrolladas:**
  - Amarre y figuración de 8 viga riostra
  - Colocación de rieles a 29 losa de cuneta, con acero long
  - Excavación de 11 viga riostra y colocación de acero
  - Figuración y amarre de acero de 22 placas de huella
  - Adecuación de terreno (excavaciones y relleno) para 22 placa huella y placa ciclopeo de .45 mt
  - Acarreó de piedra para vaciado
- **Firmas**

REMBERTO DIAZ	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

42. Miércoles, 23 de abril 2025

- **Clima:** Soleado

- **Horario:** 7 a.m. a 12m y 1 p.m. a 4 p.m.
- **Actividades Desarrolladas:**
  - Fundición de 8.91 M3 de concreto para huella
  - Fundición de 4.46 M3 de concreto para ciclopeo
  - Fundición de 2.16 M3 de concreto para viga riostra
  - Amarre de acero transversal de 25 placas de cuneta
  - Acarreo de piedra para vaciado
  - Acarreo de 72 bultos de cemento
- **Firmas**

REMBERTO DIAZ	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

43. Jueves, 24 de abril 2025

- **Clima:** Soleado
- **Horario:** 7 a.m. a 12m y 1 p.m. a 4 p.m.
- **Actividades Desarrolladas:**
  - Fundición de 9.13 M3 de concreto para cunetas
  - Fundición de 1.22 M3 de concreto para viga riostra
  - Acarreo de cemento y acero 1/4
  - Figuración de ganchos para cunetas
  - Fundida de 100 metros lineales de bordillos
- **Firmas**

REMBERTO DIAZ	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

44. Viernes, 25 de abril 2025

- **Clima:** Soleado
- **Horario:** 7 a.m. a 12m y 1 p.m. a 4 p.m.
- **Actividades Desarrolladas:**

- Fundición de 4.46 M3 de concreto para ciclopeo
- Colocación de rieles a 29 losa de cuneta.
- Corte y figuración de acero para 29 cuneta
- Excavación y organización de terreno para 12 cunetas
- Replanteo de 30 ml de terreno para placa huella, (topografía)
- Acarreo de acero 3/8
- Acarreo de piedra para vaciado
- Fundición de 100 metros lineales de bordillos

- **Firmas**

REMBERTO DIAZ	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

45. Sábado, 26 de abril 2025

- **Clima:** Soleado
- **Horario:** 7 a.m. a 12m y 1 p.m. a 4 p.m.
- **Actividades Desarrolladas:**
  - fundición de 5.98 M3 de concreto para cunetas
  - Fundición de 0.80 M3 de concreto para viga riostra
  - Amarre de acero para 4 placas de cuentas
  - Acarreo de cemento
  - Acarreo interno de arena en carro moto
  - Finalización de huellas para 303 metros lineales en la Vereda El Real.
  - Finalización de concreto ciclopeo para 303 metros lineales en la Vereda El Real.
  - Finalización de cunetas para 303 metros lineales en la Vereda El Real.
  - Finalización de bordillos para 303 metros lineales en la Vereda El Real.
- **Firmas**

REMBERTO DIAZ	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

46. Lunes, 28 de abril 2025

- **Clima:** Soleado
- **Horario:** 7 a.m. a 12m y 1 p.m. a 4 p.m.
- **Actividades Desarrolladas:**
  - Recorrido y establecimiento de sitios de acopio tramo Luis cano
- **Firmas**

REMBERTO DIAZ	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

47. Martes, 29 de abril de 2025

- **Actividades Desarrolladas:**
  - Procesamiento de información topográfica tramo Luis cano
- **Firmas**

REMBERTO DIAZ	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

48. Miércoles, 30 de abril de 2025

- **Actividades Desarrolladas:**
  - Diseño vial de 303 metros de placa huella Vereda El Real conforme a normativa técnica.
- **Firmas**

REMBERTO DIAZ	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

49. Jueves, 1 de mayo de 2025

- **Actividades Desarrolladas:**
  - Finalización y remisión de Diseño vial de placa huella Vereda Luis Cano - Perico conforme a normativa técnica.
- **Firmas**

Remberto Diaz	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

50. Viernes, 2 de mayo de 2025

- **Actividades Desarrolladas:**
  - acopio de cemento remitido por la Gobernación de Antioquia.
- **Firmas**

Remberto Diaz	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

51. Lunes, 5 de mayo de 2025

- **Actividades Desarrolladas:**
  - Traslado de maquinaria vía escarificación y acopio de material en Vereda Luis cano.
- **Firmas**

Remberto Diaz	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

52. Martes, 6 de mayo de 2025

- **Clima:** Soleado
- **Horario:** 7 a.m. a 12m y 1 p.m. a 4 p.m.
- **Actividades Desarrolladas:**
  - Acopio de material granular en Vereda Luis Cano - Perico.
- **Firmas**

Remberto Diaz	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

53. Miércoles, 7 de mayo de 2025

- **Clima:** Soleado
- **Horario:** 7 a.m. a 12m y 1 p.m. a 4 p.m.
- **Actividades Desarrolladas:**
  - Acopio de material granular en Vereda Luis Cano - Perico.
  - Traslado de cemento de Bodega a frente de obra Vereda Luis Cano - Perico.
- **Firmas**

Remberto Diaz	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

54. Jueves, 8 de mayo de 2025

- **Clima:** Soleado
- **Horario:** 7 a.m. a 12m y 1 p.m. a 4 p.m.
- **Actividades Desarrolladas:**
  - Acopio de material granular en Vereda Luis Cano - Perico.
  - Traslado de cemento de Bodega a frente de obra Vereda Luis Cano - Perico.
  - Localización y replanteo de placa huella.
- **Firmas**

Remberto Diaz	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

55. Viernes, 9 de mayo de 2025

- **Clima:** Soleado
- **Horario:** 7 a.m. a 12m y 1 p.m. a 4 p.m.
- **Actividades Desarrolladas:**
  - Se realizó Abscisado de 303 metros de placa huella en Vereda Luis Cano - Perico.
  - Traslado y alistamiento de madera para encofrado.
- **Firmas**

Remberto Diaz	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

56. Sábado, 10 de mayo de 2025

- **Clima:** Soleado
- **Horario:** 7 a.m. a 1 p.m.
- **Actividades Desarrolladas:**
  - Se hizo desvió para tráfico de vehículos.
  - Se habilitó paso para cantera, instalando tubo en el caño y 6 viajes de volqueta.
  - Se acopiaron 5 viajes de arena para fundición.
- **Firmas**

Remberto Diaz	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

57. lunes, 12 de mayo de 2025

- **Clima:** Soleado
- **Horario:** 7 a.m. a 1 p.m.
- **Actividades Desarrolladas:**
  - Se hizo desvió para tráfico de vehículos.
  - Se habilitó paso para cantera, instalando tubo en el caño y 6 viajes de volqueta.
  - Se acopiaron 5 viajes de arena para fundición.
- **Firmas**

Remberto Diaz	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

58. Martes, 13 de mayo de 2025

- **Clima:** Soleado
- **Horario:** 7 a.m. a 12m y 1 p.m. a 4 p.m.
- **Actividades Desarrolladas:**
  - Acopio de material (arena) hasta el día de hoy 25 viajes.
  - Se conformó el bombeo de vía, 40 mts.
  - Se hicieron dos plazas para acopio de material (arena).
  - Se colocaron niveles de loza (35 mtrs)
- **Firmas**

Remberto Diaz	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

59. Miércoles, 14 de mayo 2025

- **Clima:** Soleado
- **Horario:** 7 a.m. a 12m y 1 p.m. a 4 p.m.
- **Actividades Desarrolladas:**
  - Acopio de material (arena) hasta el día de hoy 32 viajes.

- Se cortó hierro de 3/8 y 1/4.
- Se hicieron dos plazas para acopio de material (arena).
- Se colocaron niveles de loza (26 m).
- Se armaron 8 vigas riostras.

- **Firmas**

Remberto Diaz	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

60. Jueves, 15 de mayo 2025

- **Clima:** Soleado
- **Horario:** 7 a.m. a 12m y 1 p.m. a 4 p.m.
- **Actividades Desarrolladas:**
  - Se cortó hierro de 3/8 y 1/4.
  - Se enrielaron 19 m lineales para fundir.
  - Se armaron 12 vigas riostras.
- **Firmas**

Remberto Diaz	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

61. Viernes, 16 de mayo 2025

- **Clima:** Soleado
- **Horario:** 7 a.m. a 12m y 1 p.m. a 4 p.m.
- **Actividades Desarrolladas:**
  - Se cortó hierro de 3/8 y 1/4.
  - Se encofraron y armaron 22 placas para fundir.
  - Se instalaron 8 vigas riostras.
  - Se colorado cotas de loza (75 m lineales)
- **Firmas**

Remberto Diaz	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

62. Sábado, 17 de mayo 2025

- **Clima:** Soleado
- **Horario:** 7 a.m. a 12m
- **Actividades Desarrolladas:**
  - Se encofraron y armaron 34 placas para fundir.
  - Se instalaron 5 vigas riostras.
  - Se cortó madera para tapas de huellas.
  - Se trasladó piedra en carro moto.
  - Se cortaron excedentes de vigas riostras.
- **Firmas**

Remberto Diaz	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

63. Lunes, 19 de mayo 2025

- **Clima:** Soleado
- **Horario:** 7 a.m. a 12m y 1 p.m. a 4 p.m.
- **Actividades Desarrolladas:**
  - Se encofraron y armaron 38 placas para fundir.
  - Se instalaron 5 vigas riostras.
  - 61 ml armados.
  - Se cortaron excedentes de vigas riostras.
- **Firmas**

Remberto Diaz	Yeisy Montero E

REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

64. Martes, 20 de mayo 2025

- **Clima:** Lluvioso - Soleado
- **Horario:** 7 a.m. a 12m y 1 p.m. a 4 p.m.
- **Actividades Desarrolladas:**
  - Se encofraron y armaron 44 placas para fundir.
  - Se instalaron 6 vigas riostras.
  - Se cortaron excedentes de vigas riostras.
  - Se almacenaron 120 bultos de cemento.
  - Se acopió piedra para fundir .
- **Firmas**

REMBERTO DIAZ	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

65. Miércoles, 21 de mayo 2025

- **Clima:** Soleado
- **Horario:** 7 a.m. a 12m y 1 p.m. a 4 p.m.
- **Actividades Desarrolladas:**
  - Se realiza fundida de 40 ml de huellas y vigas riostras.
- **Firmas**

REMBERTO DIAZ	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

66. Jueves, 22 de mayo 2025

- **Clima:** Lluvioso - Soleado

- **Horario:** 7 a.m. a 12m y 1 p.m. a 4 p.m.
- **Actividades Desarrolladas:**
  - Se acopió gravilla para fundir.
  - Se acopió cemento 57 bultos.
  - Se fundieron 35 metros lineales de lozas.
- **Firmas**

REMBERTO DIAZ	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

67. Viernes, 23 de mayo 2025

- **Clima:** Soleado
- **Horario:** 7 a.m. a 12m y 1 p.m. a 4 p.m.
- **Actividades Desarrolladas:**
  - Se acopió gravilla para fundir.
  - Se acopió cemento.
  - Se fundieron 30 metros lineales de lozas cíclope.
  - Se encofraron 24 metros lineales de lozas y riostras.
- **Firmas**

REMBERTO DIAZ	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

68. Sábado, 24 de mayo 2025

- **Clima:** Soleado
- **Horario:** 7 a.m. a 12m
- **Actividades Desarrolladas:**
  - Se acopió gravilla para fundir.
  - Se acopió cemento.
  - Se encofraron 20 metros lineales de lozas.
  - Se desencofraron lozas fundidas.

- **Firmas**

REMBERTO DIAZ	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

69. Lunes, 26 de mayo 2025

- **Clima:** Soleado
- **Horario:** 7 a.m. a 12m y 1 p.m. a 4 p.m.
- **Actividades Desarrolladas:**
  - Se acopió gravilla para fundir.
  - Se acopió cemento (105 bultos)
  - Se encofraron 100 metros lineales de cunetas.
  - Se encofraron 50 m de lozas.
  - Se cortó hierro de 3/8.
  - Se armaron 45 vigas riostras.
- **Firmas**

REMBERTO DIAZ	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

70. Martes, 27 de mayo 2025

- **Clima:** Soleado
- **Horario:** 7 a.m. a 12m y 1 p.m. a 4 p.m.
- **Actividades Desarrolladas:**
  - Amarre de acero a 22 cunetas
  - Amarre de acero de 26 huellas
  - Acopio de material granular para concreto (piedra)
  - Acarreo de cemento
  - Acarreo de acero 150 und de 3/8
  - Acarreo de material arena para preparación de subbase
  - Enrielamiento de cuneta, huella y ciclopeo

- Relleno y compactación con subbase
- Ampliación de calzada con maquinaria (100 MTS)

- **Firmas**

REMBERTO DIAZ	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

71. **Miércoles, 28 de mayo 2025**
    - **Clima:** Soleado
    - **Horario:** 7 a.m. a 12m y 1 p.m. a 4 p.m.
    - **Actividades Desarrolladas:**
        - 6.93 M3 concreto fundido para cunetas
        - 4.05 M3 concreto fundido para huella
        - 2.02 M3 concreto fundido para ciclopeo
        - 2 M3 concreto fundido para viga riostra
        - Transporte interno de material granular para vaciado (piedra, arena)
    - **Firmas**

REMBERTO DIAZ	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

72. **Jueves,29 de mayo de 2025**
    - **Clima:** Soleado
    - **Horario:** 7 a.m. a 12m y 1 p.m. a 4 p.m.
    - **Actividades Desarrolladas:**
        - Desencofre de 25 placas de cunetas
        - Desencofre de 10 placas de huella y ciclopeo de .45
        - Colocación de rieles y figuración de acero para 27 cunetas
    - **Firmas**

Remberto Diaz	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

73. Viernes, 30 de mayo de 2025

- **Clima:** Soleado
- **Horario:** 7 a.m. a 12m y 1 p.m. a 4 p.m.
- **Actividades Desarrolladas:**
  - Fundición de 6.93 M3 de concreto para cunetas
  - Fundición de 0.93 M3 de concreto para viga riostra
  - Acarreo de piedra
  - Movimiento interno de arena y piedra con maquinaria
  - Verificación de replanteo y niveles con la cuadrilla topográfica
  - Conformación de calzada y riego de subbase sobre calzada
  - Figuración de acero para 8 placa de huella incluye organización del terreno
- **Firmas**

Remberto Diaz	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

74. Sábado, 31 de mayo de 2025

- **Clima:** Soleado
- **Horario:** 7 a.m. a 12m y 1 p.m. a 4 p.m.
- **Actividades Desarrolladas:**
  - Fundición de 9.72 M3 de concreto para huella
  - Fundición de 4.86 M3 de concreto para ciclópeo
  - Fundición de 2.81 M3 de concreto para viga riostra
  - Amarre de acero para 8 huella
  - Acarreo de cemento y piedra para vaciado
  - Movimiento interno de material granular para vaciado (piedra y arena)
- **Firmas**

Remberto Diaz	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

75. Lunes, 2 de junio 2025

- **Clima:** Soleado
- **Horario:** 7 a.m. a 12m y 1 p.m. a 4 p.m.
- **Actividades Desarrolladas:**
  - Acarreo de cemento y acero desde bodega hasta la obra
  - Corte de acero (170 varilla)
  - Replanteo y nivelación de terreno para placa huella, manual
  - Acondicionamiento y movimiento de material sobrante de excavaciones
  - Enrielamiento y figuración de 26 losa huella y ciclopeo de .45
  - Reubicación y Acondicionamiento de bodega para herramientas menores
  - Reubicación lugar de captación de agua para vaciado
- **Firmas**

Remberto Diaz	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

76. Martes, 3 de junio 2025

- **Clima:** Soleado
- **Horario:** 7 a.m. a 12m y 1 p.m. a 4 p.m.
- **Actividades Desarrolladas:**
  - Fundición de 9.72 M3 de concreto para huella
  - Fundición de 4.86 M3 de concreto para ciclopeo
  - Fundición de 2.81 M3 de concreto para viga riostra
  - Acarreo de piedra para vaciado
- **Firmas**

Remberto Diaz	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

77. **Miércoles, 4 de junio 2025**
    - **Clima:** Soleado
    - **Horario:** 7 a.m. a 12m y 1 p.m. a 4 p.m.
    - **Actividades Desarrolladas:**
        - Fundición de 8.51 M3 de concreto para ciclopeo
        - Corte de acero transversal para huella y de flejes de viga riostra
    - **Firmas**

Remberto Diaz	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

78. **Jueves, 5 de junio de 2025**
    - **Clima:** Soleado
    - **Horario:** 7 a.m. a 12m y 1 p.m. a 4 p.m.
    - **Actividades Desarrolladas:**
        - Desencofre de 25 placas de cunetas
        - Desencofre de 10 placas de huella y ciclopeo de .45
        - Colocación de rieles y figuración de acero para 27 cunetas
    - **Firmas**

Remberto Diaz	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

79. Viernes, 6 de junio de 2025

- **Clima:** Soleado
- **Horario:** 7 a.m. a 12m y 1 p.m. a 4 p.m.
- **Actividades Desarrolladas:**
  - Fundición de 6.93 M3 de concreto para cunetas
  - Fundición de 0.93 M3 de concreto para viga riostra
  - Acarreo de piedra
  - Movimiento interno de arena y piedra con maquinaria
  - Verificación de replanteo y niveles con la cuadrilla topográfica
  - Conformación de calzada y riego de subbase sobre calzada
  - Figuración de acero para 8 placa de huella incluye organización del terreno
- **Firmas**

REMBERTO DIAZ	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

80. Sábado, 7 de junio de 2025

- **Clima:** Soleado
- **Horario:** 7 a.m. a 12m y 1 p.m. a 4 p.m.
- **Actividades Desarrolladas:**
  - Fundición de 9.72 M3 de concreto para huella
  - Fundición de 4.86 M3 de concreto para ciclópeo
  - Fundición de 2.81 M3 de concreto para viga riostra
  - Amarre de acero para 8 huella
  - Acarreo de cemento y piedra para vaciado
  - Movimiento interno de material granular para vaciado (piedra y arena)
- **Firmas**

REMBERTO DIAZ	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

81. Lunes, 9 de junio 2025

- **Clima:** Soleado
- **Horario:** 7 a.m. a 12m y 1 p.m. a 4 p.m.
- **Actividades Desarrolladas:**
  - Colocación de rieles pasa 22 placas de huella, 22 placa de ciclopeo de .45 mt de ancho
  - Adecuación de terreno (excavaciones) para 35 cunetas
  - Figuración y amarre de 20 viga riostra
- **Firmas**

REMBERTO DIAZ	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

82. Martes, 10 de junio 2025

- **Clima:** Soleado
- **Horario:** 7 a.m. a 12m y 1 p.m. a 4 p.m.
- **Actividades Desarrolladas:**
  - Amarre y figuración de 8 viga riostra
  - Colocación de rieles a 29 losa de cuneta, con acero long
  - Excavación de 11 viga riostra y colocación de acero
  - Figuración y amarre de acero de 22 placas de huella
  - Adecuación de terreno (excavaciones y relleno) para 22 placa huella y placa ciclopeo de .45 mt
  - Acarreó de piedra para vaciado
- **Firmas**

REMBERTO DIAZ	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

83. Miércoles, 11 de junio 2025

- **Clima:** Soleado
- **Horario:** 7 a.m. a 12m y 1 p.m. a 4 p.m.
- **Actividades Desarrolladas:**
  - Fundición de 8.91 M3 de concreto para huella
  - Fundición de 4.46 M3 de concreto para ciclopeo
  - Fundición de 2.16 M3 de concreto para viga riostra
  - Amarre de acero transversal de 25 placas de cuneta
  - Acarreo de piedra para vaciado
  - Acarreo de 72 bultos de cemento
- **Firmas**

REMBERTO DIAZ	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

84. Jueves, 12 de junio de 2025

- **Clima:** Soleado
- **Horario:** 7 a.m. a 12m y 1 p.m. a 4 p.m.
- **Actividades Desarrolladas:**
  - Desencofre de 25 placas de cunetas
  - Desencofre de 10 placas de huella y ciclopeo de .45
  - Colocación de rieles y figuración de acero para 27 cunetas
- **Firmas**

REMBERTO DIAZ	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

85. Viernes, 13 de junio de 2025

- **Clima:** Soleado

- **Horario:** 7 a.m. a 12m y 1 p.m. a 4 p.m.
- **Actividades Desarrolladas:**
  - Fundición de 6.93 M3 de concreto para cunetas
  - Fundición de 0.93 M3 de concreto para viga riostra
  - Acarreo de piedra
  - Movimiento interno de arena y piedra con maquinaria
  - Verificación de replanteo y niveles con la cuadrilla topográfica
  - Conformación de calzada y riego de subbase sobre calzada
  - Figuración de acero para 8 placa de huella incluye organización del terreno
- **Firmas**

Remberto Diaz	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

86. Sábado, 14 de junio de 2025

- **Clima:** Soleado
- **Horario:** 7 a.m. a 12m y 1 p.m. a 4 p.m.
- **Actividades Desarrolladas:**
  - Fundición de 9.72 M3 de concreto para huella
  - Fundición de 4.86 M3 de concreto para ciclópeo
  - Fundición de 2.81 M3 de concreto para viga riostra
  - Amarre de acero para 8 huella
  - Acarreo de cemento y piedra para vaciado
  - Movimiento interno de material granular para vaciado (piedra y arena)
- **Firmas**

Remberto Diaz	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

87. Lunes, 16 de junio 2025

- **Clima:** Soleado
- **Horario:** 7 a.m. a 12m y 1 p.m. a 4 p.m.
- **Actividades Desarrolladas:**
  - Acarreo de cemento y acero desde bodega hasta la obra
  - Corte de acero (170 varilla)
  - Replanteo y nivelación de terreno para placa huella, manual
  - Acondicionamiento y movimiento de material sobrante de excavaciones
  - Enrielamiento y figuración de 26 losa huella y ciclopeo de .45
  - Reubicación y Acondicionamiento de bodega para herramientas menores
  - Reubicación lugar de captación de agua para vaciado
- **Firmas**

Remberto Diaz	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

88. Martes, 17 de junio 2025

- **Clima:** Soleado
- **Horario:** 7 a.m. a 12m y 1 p.m. a 4 p.m.
- **Actividades Desarrolladas:**
  - Fundición de 9.72 M3 de concreto para huella
  - Fundición de 4.86 M3 de concreto para ciclopeo
  - Fundición de 2.81 M3 de concreto para viga riostra
  - Acarreo de piedra para vaciado
- **Firmas**

Remberto Diaz	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

89. Miércoles, 18 de junio 2025

- **Clima:** Soleado
- **Horario:** 7 a.m. a 12m y 1 p.m. a 4 p.m.

- **Actividades Desarrolladas:**
  - Fundición de 8.51 M3 de concreto para ciclopeo
  - Corte de acero transversal para huella y de flejes de viga riostra
- **Firmas**

REMBERTO DIAZ	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

90. Jueves, 19 de junio 2025

- **Clima:** Soleado
- **Horario:** 7 a.m. a 12m y 1 p.m. a 4 p.m.
- **Actividades Desarrolladas:**
  - Fundición de 9.13 M3 de concreto para cunetas
  - Fundición de 1.22 M3 de concreto para viga riostra
  - Acarreo de cemento y acero 1/4
  - Figuración de ganchos para cunetas
  - Fundida de 100 metros lineales de bordillos
- **Firmas**

REMBERTO DIAZ	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

91. Viernes, 20 de junio 2025

- **Clima:** Soleado
- **Horario:** 7 a.m. a 12m y 1 p.m. a 4 p.m.
- **Actividades Desarrolladas:**
  - Fundición de 4.46 M3 de concreto para ciclopeo
  - Colocación de rieles a 29 losa de cuneta.
  - Corte y figuración de acero para 29 cuneta
  - Excavación y organización de terreno para 12 cunetas
  - Replanteo de 30 ml de terreno para placa huella, (topografía)
  - Acarreo de acero 3/8
  - Acarreo de piedra para vaciado

- Fundición de 100 metros lineales de bordillos

- **Firmas**

REMBERTO DIAZ	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

92. Sábado, 21 de junio 2025

- **Clima:** Soleado
- **Horario:** 7 a.m. a 12m y 1 p.m. a 4 p.m.
- **Actividades Desarrolladas:**
  - fundición de 5.98 M3 de concreto para cunetas
  - Fundición de 0.80 M3 de concreto para viga riostra
  - Amarre de acero para 4 placas de cuentas
  - Acarreo de cemento
  - Acarreo interno de arena en carro moto
  - Finalización de huellas para 303 metros lineales en la Vereda Luis Cano - Perico.
  - Finalización de concreto ciclopeo para 303 metros lineales en la Vereda Luis Cano - Perico.
  - Finalización de cunetas para 303 metros lineales en la Vereda Luis Cano - Perico.
  - Finalización de bordillos para 303 metros lineales en la Vereda Luis Cano - Perico.
- **Firmas**

REMBERTO DIAZ	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

93. lunes, 23 de junio 2025

- **Clima:** Soleado
- **Horario:** 7 a.m. a 12m y 1 p.m. a 4 p.m.
- **Actividades Desarrolladas:**
  - Fundición de 9.13 M3 de concreto para cunetas

- Fundición de 1.22 M3 de concreto para viga riostra
- Acarreo de cemento y acero 1/4
- Figuración de ganchos para cunetas
- Fundida de 100 metros lineales de bordillos

- **Firmas**

Remberto Diaz	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

94. martes, 24 de junio 2025

- **Clima:** Soleado
- **Horario:** 7 a.m. a 12m y 1 p.m. a 4 p.m.
- **Actividades Desarrolladas:**
  - Fundición de 9.13 M3 de concreto para cunetas
  - Fundición de 1.22 M3 de concreto para viga riostra
  - Acarreo de cemento y acero 1/4
  - Figuración de ganchos para cunetas
  - Fundida de 100 metros lineales de bordillos
- **Firmas**

Remberto Diaz	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

95. Miercoles, 25 de junio 2025

- **Clima:** Soleado
- **Horario:** 7 a.m. a 12m y 1 p.m. a 4 p.m.
- **Actividades Desarrolladas:**
  - Fundición de 4.46 M3 de concreto para ciclopeo
  - Colocación de rieles a 29 losa de cuneta.
  - Corte y figuración de acero para 29 cuneta
  - Excavación y organización de terreno para 12 cunetas

- Replanteo de 30 ml de terreno para placa huella, (topografía)
- Acarreo de acero 3/8
- Acarreo de piedra para vaciado
- Fundición de 100 metros lineales de bordillos

- **Firmas**

REMBERTO DIAZ	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

96. jueves, 26 de junio 2025

- **Clima:** Soleado
- **Horario:** 7 a.m. a 12m y 1 p.m. a 4 p.m.
- **Actividades Desarrolladas:**
  - fundición de 5.98 M3 de concreto para cunetas
  - Fundición de 0.80 M3 de concreto para viga riostra
  - Amarre de acero para 4 placas de cuentas
  - Acarreo de cemento
  - Acarreo interno de arena en carro moto
  - Finalización de huellas para 348metros lineales en la Vereda Luis Cano - Perico.
  - Finalización de concreto ciclopeo para 348 metros lineales en la Vereda Luis Cano - Perico.
  - Finalización de cunetas para 348 metros lineales en la Vereda Luis Cano - Perico.
  - Finalización de bordillos para 348 metros lineales en la Vereda Luis Cano - Perico.
- **Firmas**

REMBERTO DIAZ	Yeisy Montero E
REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO RESIDENTE DE OBRA CASBIM S.A.S.	**YEISY KARINA MONTERO ESCAÑO** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INSUCORP S.A.S.

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA

Oficina Principal: Carrera 3 Este N° 22-01
Chía, Cundinamarca

c.suarez@cambim.com.co
NIT: 901.577.286-4

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901577286	4	CASBIM S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 3 # 22-01	CHIA-CUNDINAMARCA	7700000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1278933839	9481704194	E	2025/02/20	2025/02/19	BANCOLOMBIA	0	$1,143,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$996,450	$39,900			$1,423,500		$99,100		$996,450	$49,900		$594,700
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$996,450**	**$39,900**			**$1,423,500**		**$99,100**		**$996,450**	**$49,900**		**$594,700**
Ciudad: CHIA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$996,450**	**$39,900**			**$1,423,500**		**$99,100**		**$996,450**	**$49,900**		**$594,700**
1	CC	1069853386	SUAREZ CRISTIAN										X							23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF24	30	$996,450	$39,900	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$996,450	$49,900	No	$594,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PUERTO CLAVER (1 Afiliados)																					$1,233,700	$197,400			$1,233,700	$154,300			$1,233,700	$49,400			$1,233,700		$85,900		$1,233,700	$61,800		$548,800
Centro de Trabajo: PROYECTO PUERTO CLAVER (1 Afiliados)																					**$1,233,700**	**$197,400**			**$1,233,700**	**$154,300**			**$1,233,700**	**$49,400**			**$1,233,700**		**$85,900**		**$1,233,700**	**$61,800**		**$548,800**
Ciudad: EL BAGRE Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																					**$1,233,700**	**$197,400**			**$1,233,700**	**$154,300**			**$1,233,700**	**$49,400**			**$1,233,700**		**$85,900**		**$1,233,700**	**$61,800**		**$548,800**
2	CC	1038114626	LONDOÑO JOHAN	X																23030 1	26	$1,233,700	$197,400	EPS042	26	$1,233,700	$154,300	CCF03	26	$1,233,700	$49,400	14-11	26	$1,233,700	6.960%	$85,900	26	$1,233,700	$61,800	No	$548,800
Total		**Afiliados(2)**																			$2,657,200	$425,200			$2,657,200	$332,300			$2,230,150	$89,300			$2,657,200		$185,000		$2,230,150	$111,700		$1,143,500

2025/03/18 07:56 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901577286	4	CASBIM S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 3 # 22-01	CHIA-CUNDINAMARCA	7700000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1278933839	9481704194	E	2025/02/20	2025/02/19	BANCOLOMBIA	0	$1,143,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$425,200	$0	$0	$425,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$197,400	$0	$0	$197,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$185,000	$0	$0	$185,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$185,000	$0	$0	$185,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$89,300	$0	$0	$89,300
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1	$49,400	$0	$0	$49,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$39,900	$0	$0	$39,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$332,300	$0	$0	$332,300
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$154,300	$0	$0	$154,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$67,000	$0	$0	$67,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$67,000	$0	$0	$67,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$44,700	$0	$0	$44,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$44,700	$0	$0	$44,700
TOTAL				2	$1,143,500	$0	$0	$1,143,500

2025/03/18 07:56 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901577286	4	CASBIM S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 3 # 22-01	CHIA-CUNDINAMARCA	7700000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1428790609	9484387885	E	2025/04/22	2025/04/23	BANCOLOMBIA	1	$3,962,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																														
Ciudad: CHIA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																														
1	CC	1057589424	PATIÑO RINCON DERLY LIESSELLE	X																23030 1	30	EPS002	30	CCF24	30	14-11	30	6.960%	30	No

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PUERTO CLAVER (1 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: PROYECTO PUERTO CLAVER (1 Afiliados)																														
Ciudad: EL BAGRE Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																														
2	CC	98674268	HERNANDEZ COLON YOVER JULIAN																	23030 1	30	EPS037	30	CCF03	30	14-11	30	6.960%	30	No

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: GOBERNACIÓN EL BAGRE (9 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: GOBERNACION EL BAGRE (9 Afiliados)																														
Ciudad: EL BAGRE Depto: ANTIOQUIA (9 Afiliados)																														
3	CC	1192776147	DIAZ CORDERO REMBERTO SEGUNDO	X																23030 1	6	EPS048	6	CCF03	6	14-11	6	6.960%	6	No
4	CC	1001682363	ECHAVARRIA DANIEL CAMILO	X																23030 1	6	EPS037	6	CCF03	6	14-11	6	6.960%	6	No
5	CC	1038114626	LONDOÑO ARTEAGA JOHAN SEBASTIAN																	23030 1	30	EPS042	30	CCF03	30	14-11	30	6.960%	30	No
6	CC	11032952	MARTINEZ PEREIRA EDUIN	X																23030 1	6	ESSC24	6	CCF03	6	14-11	6	6.960%	6	No
7	CC	1001684265	RAMOS BERTEL LUIS MANUEL	X																23030 1	6	ESSC24	6	CCF03	6	14-11	6	6.960%	6	No
8	CC	8204595	ROBLEDO MOSQUERA JOMIN SICAR	X																23030 1	6	ESSC24	6	CCF03	6	14-11	6	6.960%	6	No
9	CC	1072670901	RUIZ UMBARILA LAURA VALENTINA	X																23030 1	26	EPS005	26	CCF03	26	14-11	26	6.960%	26	No
10	CC	1040514527	SIERRA MONTESINO YEISON ANTONIO	X																23020 1	7	ESSC24	7	CCF03	7	14-11	7	6.960%	7	No
11	CC	1069853386	SUAREZ CHITIVA CRISTIAN ALBERTO																	23020 1	30	EPS005	30	CCF03	30	14-11	30	6.960%	30	No
Total			**Afiliados(11)**																											

2025/04/23 10:54 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901577286	4	CASBIM S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 3 # 22-01	CHIA-CUNDINAMARCA	7700000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1428790609	9484387885	E	2025/04/22	2025/04/23	BANCOLOMBIA	1	$3,962,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				11	$1,424,200	$1,000	$0	$1,425,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$1,143,200	$800	$0	$1,144,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$281,000	$200	$0	$281,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$619,900	$500	$0	$620,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	$619,900	$500	$0	$620,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				11	$356,300	$300	$0	$356,600
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	10	$299,300	$200	$0	$299,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$57,000	$100	$0	$57,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				11	$1,112,800	$1,100	$0	$1,113,900
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$178,000	$200	$0	$178,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	$148,400	$100	$0	$148,500
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$62,500	$100	$0	$62,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$213,600	$200	$0	$213,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$178,000	$200	$0	$178,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$332,300	$300	$0	$332,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$267,700	$200	$0	$267,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	11	$267,700	$200	$0	$267,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$178,200	$200	$0	$178,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	11	$178,200	$200	$0	$178,400
TOTAL				11	$3,959,100	$3,300	$0	$3,962,400

2025/04/23 10:54 AM

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901577286	4	CASBIM S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 3 # 22-01	CHIA-CUNDINAMARCA	7700000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03		9483392213	E	2025/03/20			5	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)

Centro de Trabajo: PRINCIPAL(1 Afiliados)

Ciudad: CHIA Depto: CUNDINAMARCA(1 Afiliados)

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Irl	Fecha Inicio Irl	Fecha Fin Irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$227,800						$178,000	
																				$227,800						$178,000	
																				$227,800						$178,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PROTECCION	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		SANITAS	30	$1,423,500	12.5%	$178,000	

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Irl	Fecha Inicio Irl	Fecha Fin Irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$379,700						$296,700	
																				$379,700						$296,700	
																				$379,700						$296,700	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	20	$949,000	16%	SIN RIESGO	$151,900	$0	$0	$0	$0	$0	$151,900		NUEVA E.P.S.	20	$949,000	12.5%	$118,700	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		COOSALUD EPS	30	$1,423,500	12.5%	$178,000	

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Irl	Fecha Inicio Irl	Fecha Fin Irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$98,700						$77,200	
																				$98,700						$77,200	
																				$98,700						$77,200	
						$1,423,500	No	Fijo	COLFONDOS	13	$616,850	16%	SIN RIESGO	$98,700	$0	$0	$0	$0	$0	$98,700		COOSALUD MOVILIDAD	13	$616,850	12.5%	$77,200	
																				$706,200						$551,900	

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$178,000						$57,000						$99,100				$28,500		$42,800		$0		$0	
	$178,000						$57,000						$99,100				$28,500		$42,800		$0		$0	
	$178,000						$57,000						$99,100				$28,500		$42,800		$0		$0	
$0	$178,000		COMPENSAR	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$1,423,500	2%	$28,500	3%	$42,800	0%	$0	0%	$0	No

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$296,700						$95,000						$165,200				$47,500		$71,300		$0		$0	
	$296,700						$95,000						$165,200				$47,500		$71,300		$0		$0	
	$296,700						$95,000						$165,200				$47,500		$71,300		$0		$0	
$0	$118,700		COMFENALCO ANTIOQUIA	20	$949,000	4%	$38,000	ARL SURA	20	$949,000	6.96%	5	$66,100	20	$949,000	2%	$19,000	3%	$28,500	0%	$0	0%	$0	No
$0	$178,000		COMFENALCO ANTIOQUIA	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$1,423,500	2%	$28,500	3%	$42,800	0%	$0	0%	$0	No

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$77,200						$24,700						$43,000				$12,400		$18,600		$0		$0	
	$77,200						$24,700						$43,000				$12,400		$18,600		$0		$0	
	$77,200						$24,700						$43,000				$12,400		$18,600		$0		$0	
$0	$77,200		COMFENALCO ANTIOQUIA	13	$616,850	4%	$24,700	ARL SURA	13	$616,850	6.96%	5	$43,000	13	$616,850	2%	$12,400	3%	$18,600	0%	$0	0%	$0	No
	$551,900						$176,700						$307,300				$88,400		$132,700		$0		$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901577286	4	CASBIM S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 3 # 22-01	CHIA-CUNDINAMARCA	7700000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03		9483392213	E	2025/03/20			5	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$706,200	$2,400	$0	$708,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$98,700	$400	$0	$99,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$379,700	$1,200	$0	$380,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$800	$0	$228,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$307,300	$1,000	$0	$308,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$307,300	$1,000	$0	$308,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$176,700	$600	$0	$177,300
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	3	$119,700	$400	$0	$120,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$57,000	$200	$0	$57,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				4	$551,900	$1,900	$0	$553,800
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$178,000	$600	$0	$178,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$77,200	$300	$0	$77,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$118,700	$400	$0	$119,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$600	$0	$178,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$132,700	$500	$0	$133,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	$132,700	$500	$0	$133,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$88,400	$300	$0	$88,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	$88,400	$300	$0	$88,700
TOTAL				4	$1,963,200	$6,700	$0	$1,969,900

2025/03/25 02:05 p.m.

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901577286	4	CASBIM S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 3 # 22-01	CHIA-CUNDINAMARCA	7700000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1696602587	9490245073	E	2025/06/20	2025/08/12	BANCOLOMBIA	53	$6,348,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

Sucursal: PRINCIPAL (3 Afiliados)

Centro de Trabajo: PRINCIPAL(3 Afiliados)

Ciudad: CHIA Depto: CUNDINAMARCA(3 Afiliados)

EMPLEADO									NOVEDADES																														
No.	Tipo Id	No Id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha Ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vct						
1	CC	1057589424	PATIÑO RINCON DERLY LIESSELLE	Dependiente	0	No	No				X	2025/05/30																												
2	CC	1072670901	RUIZ UMBARILA LAURA VALENTINA	Dependiente	0	No	No																																
3	CC	1069853386	SUAREZ CHITIVA CRISTIAN ALBERTO	Dependiente	0	No	No																																

Sucursal: GOBERNACIÓN EL BAGRE (7 Afiliados)

Centro de Trabajo: GOBERNACION EL BAGRE(7 Afiliados)

Ciudad: EL BAGRE Depto: ANTIOQUIA(7 Afiliados)

EMPLEADO									NOVEDADES																														
No.	Tipo Id	No Id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha Ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vct						
4	CC	1192776147	DIAZ CORDERO REMBERTO SEGUNDO	Dependiente	0	No	No				X	2025/05/12																												
5	CC	1001682363	ECHAVARRIA DANIEL CAMILO	Dependiente	0	No	No																																
6	CC	1038114626	LONDOÑO ARTEAGA JOHAN SEBASTIAN	Dependiente	0	No	No																																
7	CC	11032952	MARTINEZ PEREIRA EDUIN	Dependiente	0	No	No																																
8	CC	76700195	PEREZ PEREZ JOSE RICARDO	Dependiente	0	No	No				X	2025/05/30																												
9	CC	1001684265	RAMOS BERTEL LUIS MANUEL	Dependiente	0	No	No																																
10	CC	8204595	ROBLEDO MOSQUERA JOMIN SICAR	Dependiente	0	No	No																																

Total Afiliados(10)

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Irl	Fecha Inicio Irl	Fecha Fin Irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$682,400						$534,000	
																				$683,400						$534,000	
																				$683,400						$534,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		SANITAS	30	$1,423,500	12.5%	$178,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		SANITAS	30	$1,423,500	12.5%	$178,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PROTECCION	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		SANITAS	30	$1,423,500	12.5%	$178,000	

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Irl	Fecha Inicio Irl	Fecha Fin Irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$1,526,800						$1,193,000	
																				$1,526,800						$1,193,000	
																				$1,526,800						$1,193,000	
						$2,500,000	No	Fijo	PORVENIR	12	$1,000,000	16%	SIN RIESGO	$160,000	$0	$0	$0	$0	$0	$160,000		EPS MUTUAL SER	12	$1,000,000	12.5%	$125,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		NUEVA E.P.S.	30	$1,423,500	12.5%	$178,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		COOSALUD EPS	30	$1,423,500	12.5%	$178,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		COOSALUD MOVILIDAD	30	$1,423,500	12.5%	$178,000	
						$1,423,500	No	Fijo	COLFONDOS	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		COOSALUD MOVILIDAD	30	$1,423,500	12.5%	$178,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		COOSALUD MOVILIDAD	30	$1,423,500	12.5%	$178,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		COOSALUD EPS	30	$1,423,500	12.5%	$178,000	
																				$2,210,200						$1,727,000	

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$534,000						$171,000						$297,300				$85,500		$128,400		$0		$0	
	$534,000						$171,000						$297,300				$85,500		$128,400		$0		$0	
	$534,000						$171,000						$297,300				$85,500		$128,400		$0		$0	
$0	$178,000		CAFAM	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$1,423,500	2%	$28,500	3%	$42,800	0%	$0	0%	$0	No
$0	$178,000		CAFAM	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$1,423,500	2%	$28,500	3%	$42,800	0%	$0	0%	$0	No
$0	$178,000		CAFAM	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$1,423,500	2%	$28,500	3%	$42,800	0%	$0	0%	$0	No

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$1,193,000						$382,000						$664,200				$191,000		$286,800		$0		$0	
	$1,193,000						$382,000						$664,200				$191,000		$286,800		$0		$0	
	$1,193,000						$382,000						$664,200				$191,000		$286,800		$0		$0	
$0	$125,000		COMFENALCO ANTIOQUIA	12	$1,000,000	4%	$40,000	ARL SURA	12	$1,000,000	6.96%	5	$69,600	12	$1,000,000	2%	$20,000	3%	$30,000	0%	$0	0%	$0	No
$0	$178,000		COMFENALCO ANTIOQUIA	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$1,423,500	2%	$28,500	3%	$42,800	0%	$0	0%	$0	No
$0	$178,000		COMFENALCO ANTIOQUIA	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$1,423,500	2%	$28,500	3%	$42,800	0%	$0	0%	$0	No
$0	$178,000		COMFENALCO ANTIOQUIA	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$1,423,500	2%	$28,500	3%	$42,800	0%	$0	0%	$0	No
$0	$178,000		COMFENALCO ANTIOQUIA	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$1,423,500	2%	$28,500	3%	$42,800	0%	$0	0%	$0	No
$0	$178,000		COMFENALCO ANTIOQUIA	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$1,423,500	2%	$28,500	3%	$42,800	0%	$0	0%	$0	No
$0	$178,000		COMFENALCO ANTIOQUIA	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$1,423,500	2%	$28,500	3%	$42,800	0%	$0	0%	$0	No
	$1,727,000						$553,000						$961,500				$276,500		$415,200		$0		$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901577286	4	CASBIM S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 3 # 22-01	CHIA-CUNDINAMARCA	7700000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1696602587	9490245073	E	2025/06/20	2025/08/12	BANCOLOMBIA	53	$6,348,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$2,210,200	$73,700	$0	$2,283,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$7,600	$0	$235,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$1,754,600	$58,500	$0	$1,813,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$7,600	$0	$235,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$961,500	$32,100	$0	$993,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$961,500	$32,100	$0	$993,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				10	$553,000	$18,500	$0	$571,500
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	3	$171,000	$5,700	$0	$176,700
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	7	$382,000	$12,800	$0	$394,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				10	$1,727,000	$57,700	$0	$1,784,700
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	$356,000	$11,900	$0	$367,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$534,000	$17,800	$0	$551,800
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$125,000	$4,200	$0	$129,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$6,000	$0	$184,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$534,000	$17,800	$0	$551,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$415,200	$13,900	$0	$429,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	10	$415,200	$13,900	$0	$429,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$276,500	$9,300	$0	$285,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	10	$276,500	$9,300	$0	$285,800
TOTAL				10	$6,143,400	$205,200	$0	$6,348,600

2025/08/12 03:34 p. m.

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901577286	4	CASBIM S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 3 # 22-01	CHIA-CUNDINAMARCA	7700000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1514377701	9486765771	E	2025/05/21	2025/05/29	BANCOLOMBIA	8	$7,992,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Irl	Fecha Inicio Irl	Fecha Fin Irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$683,400						$534,000	
																				$683,400						$534,000	
																				$683,400						$534,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		SALUD TOTAL	30	$1,423,500	12.5%	$178,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		SANITAS	30	$1,423,500	12.5%	$178,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PROTECCION	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		SANITAS	30	$1,423,500	12.5%	$178,000	

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Irl	Fecha Inicio Irl	Fecha Fin Irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$2,176,900						$1,700,900	
																				$2,176,900						$1,700,900	
																				$2,176,900						$1,700,900	
						$2,500,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,500,000	16%	SIN RIESGO	$400,000	$0	$0	$0	$0	$0	$400,000		EPS MUTUAL SER	30	$2,500,000	12.5%	$312,500	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		NUEVA E.P.S.	30	$1,423,500	12.5%	$178,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	24	$1,138,800	16%	SIN RIESGO	$182,300	$0	$0	$0	$0	$0	$182,300		NUEVA E.P.S.	24	$1,138,800	12.5%	$142,400	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		COOSALUD EPS	30	$1,423,500	12.5%	$178,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		COOSALUD MOVILIDAD	30	$1,423,500	12.5%	$178,000	
						$1,423,500	No	Fijo	COLFONDOS	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		COOSALUD MOVILIDAD	30	$1,423,500	12.5%	$178,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		COOSALUD MOVILIDAD	30	$1,423,500	12.5%	$178,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		COOSALUD EPS	30	$1,423,500	12.5%	$178,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PROTECCION	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		COOSALUD MOVILIDAD	30	$1,423,500	12.5%	$178,000	
																				$2,860,300						$2,234,900	

2025/05/29 12:29 p. m.

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$534,000						$171,000						$297,300				$85,500		$128,400		$0		$0	
	$534,000						$171,000						$297,300				$85,500		$128,400		$0		$0	
	$534,000						$171,000						$297,300				$85,500		$128,400		$0		$0	
$0	$178,000		CAFAM	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$1,423,500	2%	$28,500	3%	$42,800	0%	$0	0%	$0	No
$0	$178,000		CAFAM	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$1,423,500	2%	$28,500	3%	$42,800	0%	$0	0%	$0	No
$0	$178,000		CAFAM	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$1,423,500	2%	$28,500	3%	$42,800	0%	$0	0%	$0	No

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$1,700,900						$544,600						$947,000				$272,300		$408,800		$0		$0	
	$1,700,900						$544,600						$947,000				$272,300		$408,800		$0		$0	
	$1,700,900						$544,600						$947,000				$272,300		$408,800		$0		$0	
$0	$312,500		COMFENALCO ANTIOQUIA	30	$2,500,000	4%	$100,000	ARL SURA	30	$2,500,000	6.96%	5	$174,000	30	$2,500,000	2%	$50,000	3%	$75,000	0%	$0	0%	$0	No
$0	$178,000		COMFENALCO ANTIOQUIA	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$1,423,500	2%	$28,500	3%	$42,800	0%	$0	0%	$0	No
$0	$142,400		COMFENALCO ANTIOQUIA	24	$1,138,800	4%	$45,600	ARL SURA	24	$1,138,800	6.96%	5	$79,300	24	$1,138,800	2%	$22,800	3%	$34,200	0%	$0	0%	$0	No
$0	$178,000		COMFENALCO ANTIOQUIA	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$1,423,500	2%	$28,500	3%	$42,800	0%	$0	0%	$0	No
$0	$178,000		COMFENALCO ANTIOQUIA	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$1,423,500	2%	$28,500	3%	$42,800	0%	$0	0%	$0	No
$0	$178,000		COMFENALCO ANTIOQUIA	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$1,423,500	2%	$28,500	3%	$42,800	0%	$0	0%	$0	No
$0	$178,000		COMFENALCO ANTIOQUIA	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$1,423,500	2%	$28,500	3%	$42,800	0%	$0	0%	$0	No
$0	$178,000		COMFENALCO ANTIOQUIA	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$1,423,500	2%	$28,500	3%	$42,800	0%	$0	0%	$0	No
$0	$178,000		COMFENALCO ANTIOQUIA	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$1,423,500	2%	$28,500	3%	$42,800	0%	$0	0%	$0	No
$0	$178,000		COMFENALCO ANTIOQUIA	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$1,423,500	2%	$28,500	3%	$42,800	0%	$0	0%	$0	No
	$2,234,900						$715,600						$1,244,300				$357,800		$537,200		$0		$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901577286	4	CASBIM S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 3 # 22-01	CHIA-CUNDINAMARCA	7700000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1514377701	9486765771	E	2025/05/21	2025/05/29	BANCOLOMBIA	8	$7,992,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				12	$2,860,300	$15,100	$0	$2,875,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$1,200	$0	$229,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$2,176,900	$11,500	$0	$2,188,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$455,600	$2,400	$0	$458,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$1,244,300	$6,600	$0	$1,250,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	$1,244,300	$6,600	$0	$1,250,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				12	$715,600	$3,800	$0	$719,400
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	3	$171,000	$900	$0	$171,900
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	9	$544,600	$2,900	$0	$547,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				12	$2,234,900	$12,000	$0	$2,246,900
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	$356,000	$1,900	$0	$357,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	$712,000	$3,800	$0	$715,800
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$312,500	$1,700	$0	$314,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$320,400	$1,700	$0	$322,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$178,000	$1,000	$0	$179,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$356,000	$1,900	$0	$357,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$537,200	$2,900	$0	$540,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	12	$537,200	$2,900	$0	$540,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$357,800	$1,900	$0	$359,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	12	$357,800	$1,900	$0	$359,700
TOTAL				12	$7,950,100	$42,300	$0	$7,992,400

2025/05/29 12:29 p. m.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901577286	4	CASBIM S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 3 # 22-01	CHIA-CUNDINAMARCA	7700000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1724691553	9490643236	E	2025/07/18	2025/08/25	BANCOLOMBIA	38	$4,061,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (2 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (2 Afiliados)																														
Ciudad: CHIA Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados)																														
1	CC	1072670901	RUIZ UMBARILA LAURA VALENTINA																	23030 1	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	No
2	CC	1069853386	SUAREZ CHITIVA CRISTIAN ALBERTO																	23020 1	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	No

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: GOBERNACIÓN EL BAGRE (4 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: GOBERNACION EL BAGRE (4 Afiliados)																														
Ciudad: EL BAGRE Depto: ANTIOQUIA (4 Afiliados)																														
3	CC	1001682363	ECHAVARRIA DANIEL CAMILO																	23030 1	30	EPS037	30	CCF03	30	14-11	30	6.960%	30	No
4	CC	1038114626	LONDOÑO ARTEAGA JOHAN SEBASTIAN																	23030 1	30	EPS042	30	CCF03	30	14-11	30	6.960%	30	No
5	CC	11032952	MARTINEZ PEREIRA EDUIN																	23030 1	30	ESSC24	30	CCF03	30	14-11	30	6.960%	30	No
6	CC	1001684265	RAMOS BERTEL LUIS MANUEL																	23030 1	30	ESSC24	30	CCF03	30	14-11	30	6.960%	30	No
Total	**Afiliados(6)**																													

2025/08/25 10:39 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901577286	4	CASBIM S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 3 # 22-01	CHIA-CUNDINAMARCA	7700000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1724691553	9490643236	E	2025/07/18	2025/08/25	BANCOLOMBIA	38	$4,061,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$1,427,000	$34,200	$0	$1,461,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,199,200	$28,700	$0	$1,227,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$5,500	$0	$233,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$620,800	$14,900	$0	$635,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$620,800	$14,900	$0	$635,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$357,000	$8,700	$0	$365,700
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	2	$114,000	$2,800	$0	$116,800
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	4	$243,000	$5,900	$0	$248,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$1,115,000	$26,900	$0	$1,141,900
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$225,000	$5,400	$0	$230,400
COOSALUD MOVILIDAD	ES5C24	900,226,715	3	2	$356,000	$8,600	$0	$364,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$4,300	$0	$182,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$356,000	$8,600	$0	$364,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$268,000	$6,500	$0	$274,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	6	$268,000	$6,500	$0	$274,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$178,500	$4,300	$0	$182,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	6	$178,500	$4,300	$0	$182,800
TOTAL				6	$3,966,300	$95,500	$0	$4,061,800

2025/08/25 10:39 AM
