GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA

FRENTE DE TRABAJO

ALVARADO

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

JUNIO DEL 2026

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

JUNIO DEL 2026

OBJETO
CONTRATO NO.3034 DE 2026

"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA".

FRENTE DE TRABAJO ALVARADO

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

JUNIO DEL 2026

INTEGRANTES

SUPERVISOR DE CAMPO
RETROEXCAVADORA NUEVA #12
VOLQUETA #44

ING. DIANA GALLEGO
WALTER SIERRA
BRANKELI CASTAÑEDA

FRENTE DE TRABAJO ALVARADO

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

JUNIO DEL 2026

VIA INTERVENIDA

CUMANA-VERACRUZ

FRENTE DE TRABAJO ALVARADO

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

JUNIO DEL 2026

MAQUINARIA EN OPERACIÓN





FRENTE DE TRABAJO ALVARADO

TOTAL, ACTIVIDADES REALIZADAS ALVARADO: CUMANA-VERACRUZ CONFORMACIÓN DE VÍA

FECHA	ABSCISA		LONGITUD	ANCHO	VOLUMEN
	DE	A			
01/06/2026	K0+000	K0+166	166	3	498
02/06/2026	K0+166	K0+332	166	3	498
03/06/2026	K0+332	K0+498	166	3	498
10/06/2026	K0+498	K0+664	166	3	498
11/06/2026	K0+664	K0+830	166	3	498
12/06/2026	K0+830	K0+996	166	3	498
16/06/2026	K0+996	K1+162	166	3	498
17/06/2026	K1+162	K1+328	166	3	498
18/06/2026	K1+328	K1+494	166	3	498
19/06/2026	K1+494	K1+660	166	3	498
22/06/2026	K1+660	K1+826	166	3	498
23/06/2026	K1+826	K1+992	166	3	498
24/06/2026	K1+992	K2+158	166	3	498
25/06/2026	K2+158	K2+324	166	3	498
30/06/2026	K2+324	K2+500	176	3	528
TOTAL CONFORMACIÓN DE LA VÍA					7.500

FRENTE DE TRABAJO ALVARADO

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

JUNIO DEL 2026

TOTAL, ACTIVIDADES REALIZADAS

MUNICIPIO	KILOMETROS (KM)
ALVARADO: CUMANA-VERACRUZ	2,5
TOTAL, CONFORMACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA	**2,5 KM**

FRENTE DE TRABAJO ALVARADO

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 7

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FRENTE DE TRABAJO ALVARADO

JUNIO 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

MUNICIPIO DE ALVARADO

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026

INFORME MENSUAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 3
3. LOCALIZACIÓN 4
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 5
5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES 5
   5.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN 5
6. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO 6
   6.1 PERSONAL UTILIZADO 6
   6.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA 6
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO 7
   8.1 ACTIVIDADES EN ALVARADO: CUMINA-VERACRUZ 7

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo dar a conocer los aspectos relevantes de la gestión de la maquinaria pesada y volquetas de la Gobernación del Tolima y la maquinaria de la unión nacional de gestión de riesgo de desastres, en la realización y atención de emergencias viales, puntos críticos y mantenimiento de la red vial del Municipio de Alvarado – Tolima.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto a realizar consta del mantenimiento de puntos críticos de la red vial en la zona del Municipio de Alvarado, con el kit de la maquinaria de la Gobernación del Tolima.

Se realizará el mantenimiento a las diferentes vías que comunica el Municipio con las veredas y así proveer una superficie de rodamiento adecuada, con el fin de facilitar el diario vivir a la comunidad.


Esta es una obra que representa un gran aporte para la comunidad del sector, adicionalmente, en este caso no sólo se benefician los que actualmente residen cerca, sino que se favorece la capacidad para todos los propietarios de los municipios, teniendo en cuenta que es una zona de desarrollo agrícola y de crecimiento turístico.

3. LOCALIZACIÓN

El proyecto principalmente se encuentra ubicado en el país de Colombia oficialmente República de Colombia, es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur que se encuentra constituido en un estado unitario, social y democrático de derecho cuya forma de gobierno es presidencialista. Es una república que está organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados y el Distrito capital de Bogotá, sede del gobierno nacional.

En Colombia, exactamente en el departamento del Tolima que es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, forman la República de Colombia. Su capital es Ibagué. Está ubicado en el centro-oeste del país, en la región andina, limitando al norte con Caldas, al este con Cundinamarca, al sur con Huila y Cauca, y al oeste con Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. El río Magdalena atraviesa Tolima de sur a norte.

Alvarado municipio de Colombia, en el departamento del Tolima, ubicado a 20 minutos de la ciudad de Ibagué. Productor agrícola de arroz, aguacate, café, caña panelera y cacao. Los cultivos van desde la agricultura tradicional hasta la más altamente calificada.

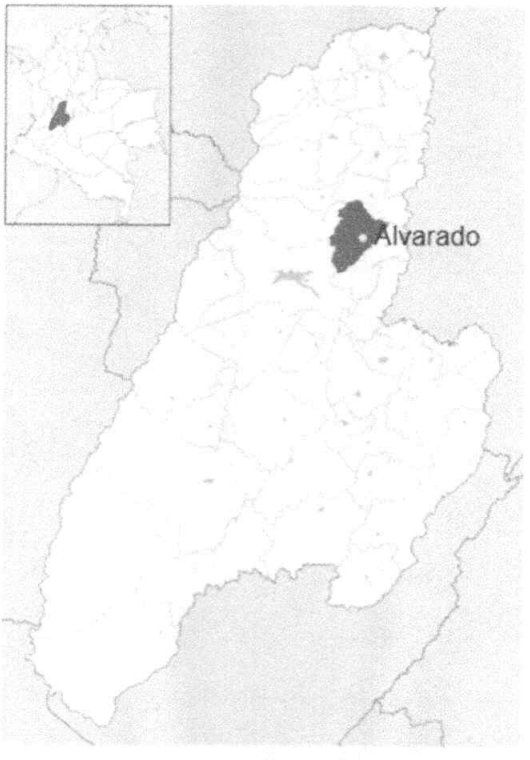

Localización de Alvarado en Tolima

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MANTEMINIENTO VIAL
Conformación de la red vía.

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido se realizaron las actividades de mantenimiento, destinados primordialmente a la recuperación de la vía, limpieza mecánica, reconstrucción de cunetas, extensión de material de afirmado y atención de puntos críticos.

Las actividades se realizaron con el apoyo de maquinaria amarilla por parte de la Gobernación del departamento (una retroexcavadora y una volqueta).

Durante el periodo comprendido se realizan las actividades de mejoramiento y parcheo de la vía, cargue y descargue de material de afirmado para la recuperación de la banca en las veredas Cumina y Veracruz.

Para finalizar, en el periodo transcurrido del mes se conformaron 2,5 km de vía en las veredas mencionadas anteriormente; el estado del tiempo y las condiciones climáticas no fueron favorables y se presentaron precipitaciones con un total de 10 horas en el mes.

5.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

De conformidad con las actividades realizadas en el municipio se conformaron 2,5 km de vía correspondientes al municipio de Alvarado:

FECHA	MUNICIPIO	TOTAL KM
Del 01/06/2026 al 30/06/2026	ALVARADO: CUMINA-VERACRUZ	2,5
TOTAL, CONFORMACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA		2,5 KM

6. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO

6.1 PERSONAL UTILIZADO

CARGO	PROFESION	NOMBRE
SUPERVISOR	INGENIERO CIVIL	DIANA GALLEGO
OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	WALTER SIERRA
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	BRANKELI CASTAÑEDA

6.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

Para realizar las labores durante este periodo se empleó el kit de maquinaria pesada como:


MAQUINARIA	NUMERO	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	12	1
VOLQUETA	44	1

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

8.1 ACTIVIDADES EN ALVARADO: CUMINA-VERACRUZ



CUMINA-VERACRUZ

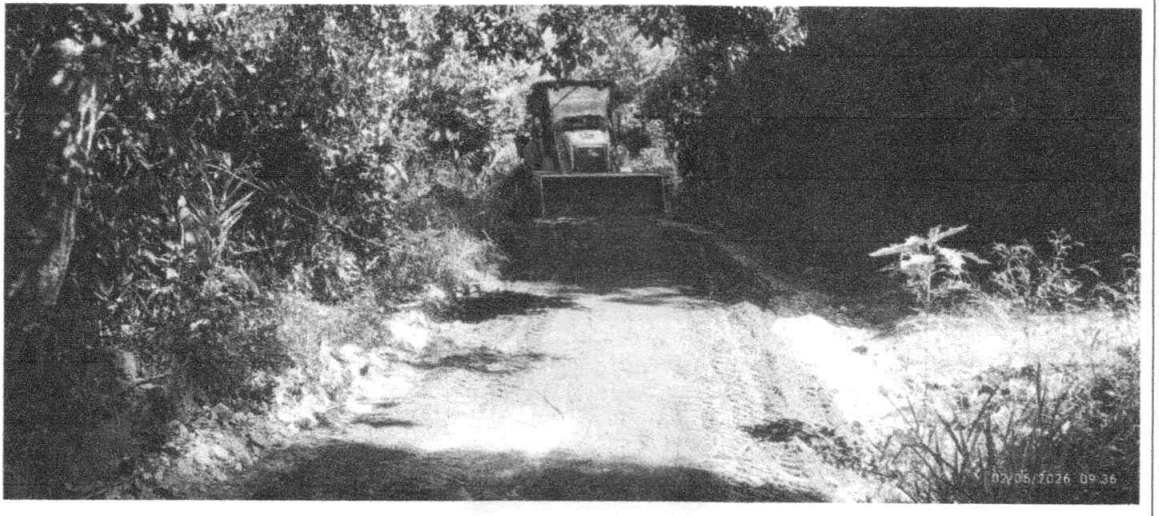

CUMINA-VERACRUZ

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



CUMINA-VERACRUZ



CUMINA-VERACRUZ



CUMINA-VERACRUZ




CUMINA-VERACRUZ

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



CUMINA-VERACRUZ

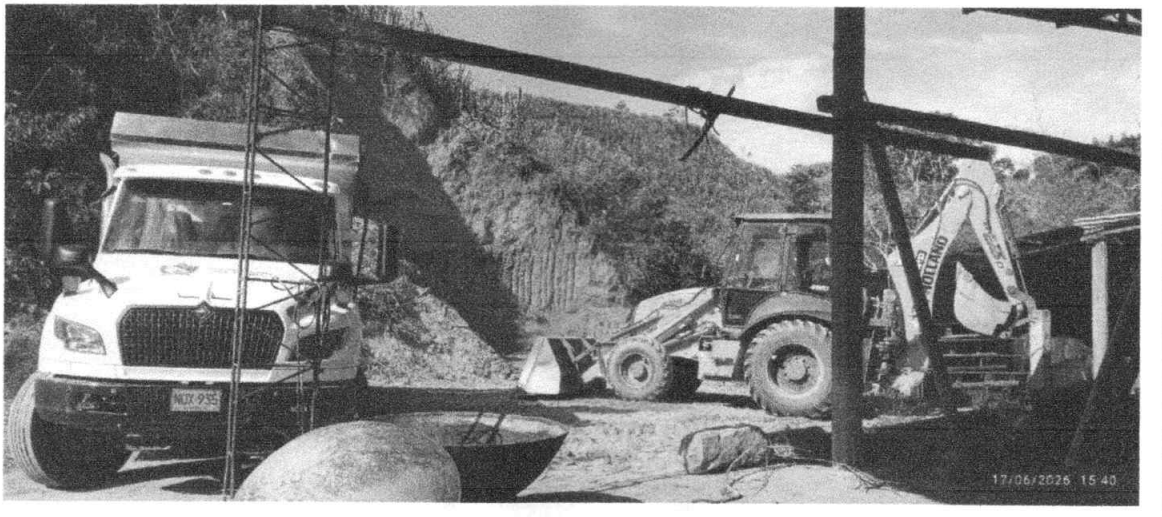

CUMINA-VERACRUZ

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA




CUMINA-VERACRUZ




CUMINA-VERACRUZ



CUMINA-VERACRUZ

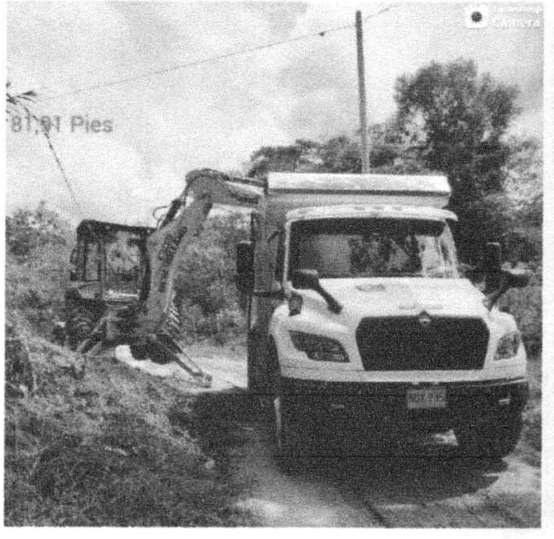

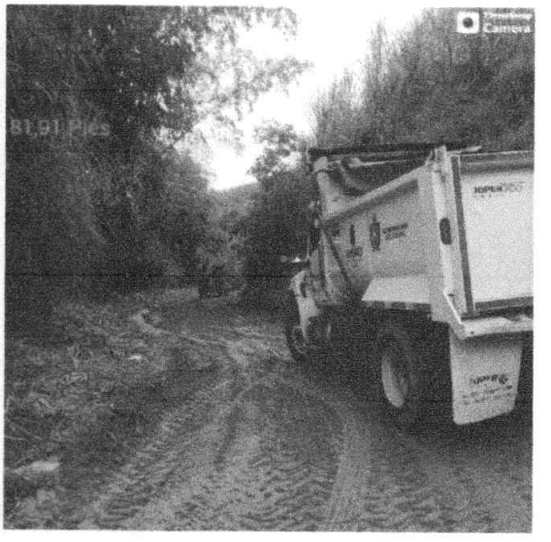

CUMINA-VERACRUZ

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA





CUMINA-VERACRUZ



CUMINA-VERACRUZ


UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

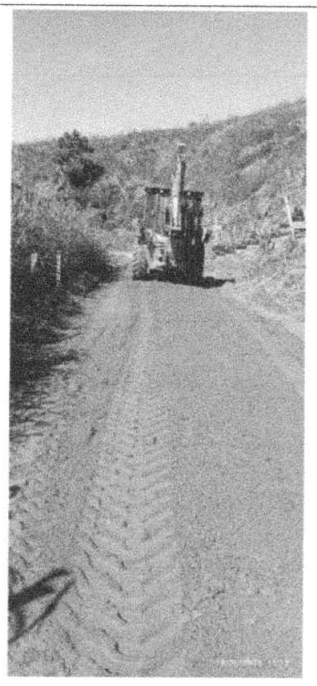


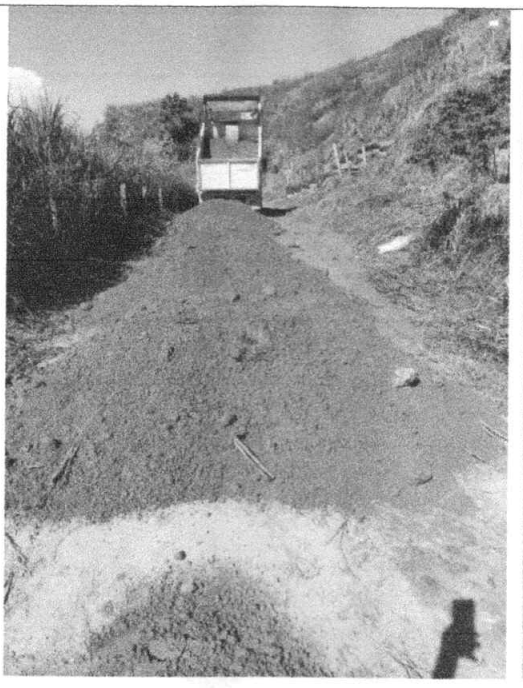




CUMINA-VERACRUZ

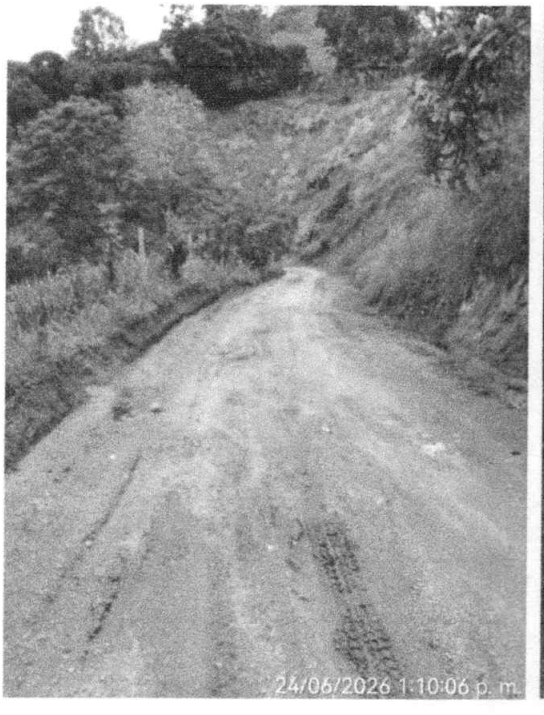

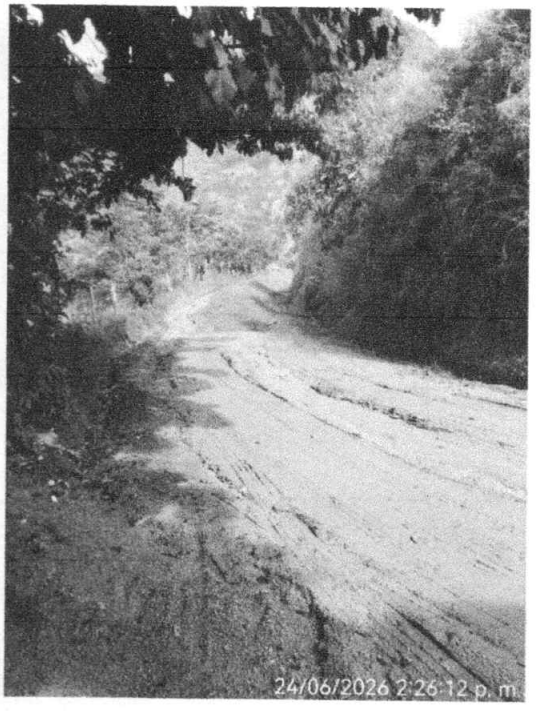


CUMINA-VERACRUZ


UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

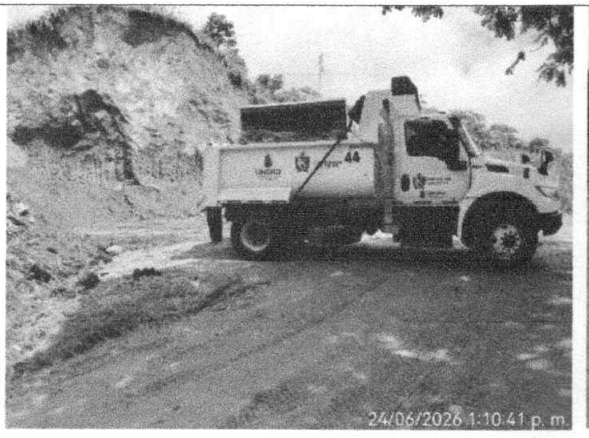



CUMINA-VERACRUZ

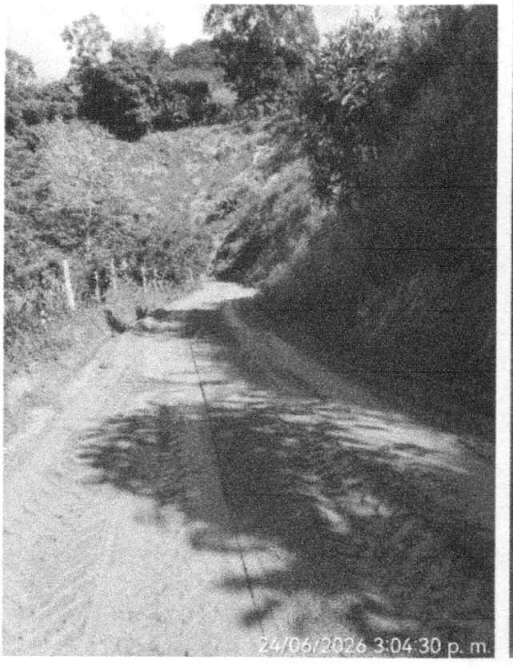

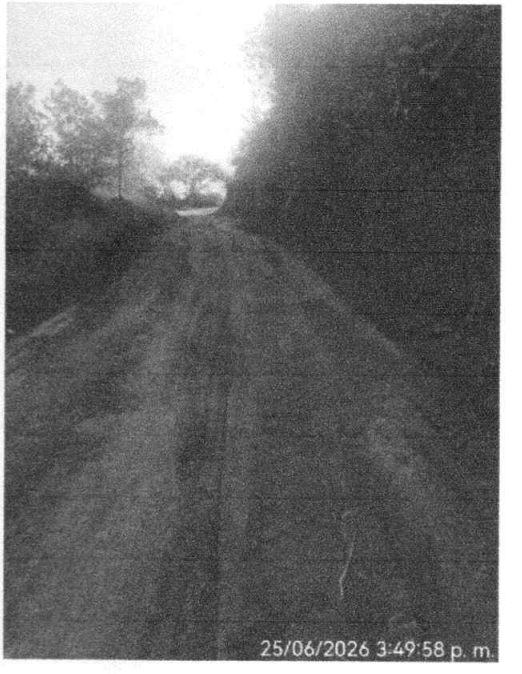

CUMINA-VERACRUZ

Diana Gallego

DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS
SUPERVISORA DE CAMPO

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO. 3034 DE 2026 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACION DEL TOLIMA

CARRETERA: CUMINA-VERACRUZ				MUNICIPIO: ALVARADO		
CONFORMACIÓN DE LA VÍA SIN COMPACTAR				UNIDAD M2		7.500
FECHA	ABSCISA		LONGITUD	ANCHO	VOLUMEN	OBSERVACIONES
	DE	A				
01/06/2026	K0+000	K0+166	166	3	498	Se laboro Normalmente.
02/06/2026	K0+166	K0+332	166	3	498	Se laboro Normalmente.
03/06/2026	K0+332	K0+498	166	3	498	Se laboro Normalmente.
10/06/2026	K0+498	K0+664	166	3	498	Se laboro Normalmente.
11/06/2026	K0+664	K0+830	166	3	498	Se laboro Normalmente.
12/06/2026	K0+830	K0+996	166	3	498	Se laboro Normalmente.
16/06/2026	K0+996	K1+162	166	3	498	Se laboro Normalmente.
17/06/2026	K1+162	K1+328	166	3	498	Se laboro Normalmente.
18/06/2026	K1+328	K1+494	166	3	498	Se laboro Normalmente.
19/06/2026	K1+494	K1+660	166	3	498	Se laboro Normalmente.
22/06/2026	K1+660	K1+826	166	3	498	Se laboro Normalmente.
23/06/2026	K1+826	K1+992	166	3	498	Se laboro Normalmente.
24/06/2026	K1+992	K2+158	166	3	498	Se laboro Normalmente.
25/06/2026	K2+158	K2+324	166	3	498	Se laboro Normalmente.
30/06/2026	K2+324	K2+500	176	3	528	Se laboro Normalmente.
TOTAL CONFORMACIÓN DE LA VÍA					7.500	
TOTAL CONFORMACIÓN DE LA VÍA SIN COMPACTAR					7.500	

Vo.Bo. Supervisora contrato 3034 DE 2026

Firma: Diana Gallego

Nombre: Diana M. Gallego C.

c.c. 38.210.237

Vo.Bo. Coordinador contrato 3034 DE 2026

Firma:

Nombre: Jeison Giovanni Alvis Lozano

c.c. 1.110.512.907

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 7

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

ACTAS DE COMUNIDAD

FRENTE DE TRABAJO ALVARADO

JUNIO 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

1485

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOB-M-007C
CONTRATO 3034 DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

AUTORIZACIÓN PARA RESGUARDO DE LA MAQUINARIA

Yo, Mariano Lerma, con Cédula de Ciudadanía N° 73.488.951, Por medio del presente documento, y en calidad de Administrador, del predio _____ de la vereda _____, del municipio Alvarado autorizo al Ingeniero (a) Jesus A. Ariza quien en representación del contrato 3034 de Abril de 2026 la (UNIÓN TEMPORAL MARV 7), cuyo objeto es "CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA". Para estacionar y resguardar la maquinaria del mantenimiento de las vías como son:

Volqueta #44,
Retroexcavadora #12,
Motoniveladora _____,
Cargador _____,
Vibrocompactador _____,
Excavadora _____,

Con el compromiso de velar por el buen estado y la seguridad de los mismos durante la permanencia en el predio y no permitir el acceso o manipulación de la maquinaria a personal ajeno y/o sin autorización únicamente del Ingeniero Supervisor.

Esta autorización se expide para la Ejecución del contrato 3034 de 2026 y así mismo declaro la posesión del predio para emitir la presente autorización.

Firma Administrador o Propietario	**Pdte. Junta de acción Comunal (testigo)**
C.C. No. 73.488.951	**C.C. No.**

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 7

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

PREOPERACIONALES EQUIPO

FRENTE DE TRABAJO ALVARADO

JUNIO 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

4486

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 01 DE JUNIO AL 03 DE JUNIO 2026			
CONTRATO	3034 DE 2026	**PLACA: NQX 935**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	44	**MODELO: 2026**	**FRENTE DE TRABAJO: ALVARADO**
INSPECCIONADO POR:	**ING. DIANA GALLEGO**		**LOCALIZACION: CUMINA-VERACRUZ**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00											
	KILOMETRAJE INICIAL	7320		7362		7404											
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		**OBSERVACIONES**	
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M		
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X											
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X											
	Caja de Herramienta	X		X		X											
	Tacos	X		X		X											
	Gato	X		X		X											
	Linterna recargable	X		X		X											
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X											
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X											
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X											
	Nivel del aceite	X		X		X											
	Soportes motor	X		X		X											
	Estado del exhosto	X		X		X											
	Estado del switche de encendido	X		X		X											
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X											
	De trabajo traseras	X		X		X											
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X											
	Stop Traseros	X		X		X											
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X											
	Espejos laterales	X		X		X											
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X											
	Pito Normal	X		X		X											
	Frenos de Servicio	X		X		X											
	Freno de emergencia	X		X		X											
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X											
	Cinturones de Seguridad	X		X		X											
	Estado de la puertas	X		X		X											
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X											
	Limpia brisas	X		X		X											
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X											
	Estado de los asientos	X		X		X											
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X											
	Velocímetro	X		X		X											
	Batería y cables	X		X		X											
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X											
	Repuesto	X		X		X											
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X											
	Estado de correas	X		X		X											
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X											
	Radiador	X		X		X											
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X											
	Mangueras	X		X		X											
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X											
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X											
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X											
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X											
	Estado de empaques del volco	X		X		X											
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00											
	KILOMETRAJE FINAL	7362		7404		7445											

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Frankelp Castro	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 10 DE JUNIO AL 12 DE JUNIO 2026			
CONTRATO	3034 DE 2026	**PLACA: NQX 935**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	44	**MODELO: 2026**	**FRENTE DE TRABAJO: ALVARADO**
INSPECCIONADO POR:	**ING. DIANA GALLEGO**		**LOCALIZACION: CUMINA-VERACRUZ**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN					**7:00**		**7:00**		**7:00**							
	KILOMETRAJE INICIAL					7445		7487		7529							
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**	
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**		
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín					X		X		X							
	Kit de contingencia según listado adjunto					X		X		X							
	Caja de Herramienta					X		X		X							
	Tacos					X		X		X							
	Gato					X		X		X							
	Linterna recargable					X		X		X							
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina					X		X		X							
ESTADO GENERAL	Estado del motor					X		X		X							
	Estado del Tangue de combustible					X		X		X							
	Nivel del aceite					X		X		X							
	Soportes motor					X		X		X							
	Estado del exhosto					X		X		X							
	Estado del switche de encendido					X		X		X							
LUCES	De Trabajo delanteras					X		X		X							
	De trabajo traseras					X		X		X							
	Direccionales Delanteras Y Traseras					X		X		X							
	Stop Traseros					X		X		X							
CABINA	Espejo Retrovisor					X		X		X							
	Espejos laterales					X		X		X							
	Alarma (o pito) de Retroceso					X		X		X							
	Pito Normal					X		X		X							
	Frenos de Servicio					X		X		X							
	Freno de emergencia					X		X		X							
	Dirección/suspensión(Terminales).					X		X		X							
	Cinturones de Seguridad					X		X		X							
	Estado de la puertas					X		X		X							
	Vidrio frontal en buen estado.					X		X		X							
	Limpia brisas					X		X		X							
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco					X		X		X							
	Estado de los asientos					X		X		X							
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).					X		X		X							
	Velocímetro					X		X		X							
	Batería y cables					X		X		X							
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos					X		X		X							
	Repuesto					X		X		X							
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas					X		X		X							
	Estado de correas					X		X		X							
	Caja de cambios en buen estado.					X		X		X							
	Radiador					X		X		X							
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)					X		X		X							
	Mangueras					X		X		X							
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)					X		X		X							
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco					X		X		X							
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco					X		X		X							
	tornillos de seguridad para el cierre del volco					X		X		X							
	Estado de empaques del volco					X		X		X							
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN					**5:00**		**5:00**		**5:00**							
	KILOMETRAJE FINAL					7487		7529		7570							

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Reinaldo Cruz	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

4488

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 16 DE JUNIO AL 19 DE JUNIO 2026

CONTRATO	3034 DE 2026	**PLACA: NQX 935**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	44	**MODELO: 2026**	**FRENTE DE TRABAJO: ALVARADO**
INSPECCIONADO POR:	**ING. DIANA GALLEGO**		**LOCALIZACION: CUMINA-VERACRUZ**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN			7:00		7:00		7:00		7:00							
	KILOMETRAJE INICIAL			7570		7612		7654		7695							
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**			
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**		**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín			X		X		X		X							
	Kit de contingencia según listado adjunto			X		X		X		X							
	Caja de Herramienta			X		X		X		X							
	Tacos			X		X		X		X							
	Gato			X		X		X		X							
	Linterna recargable			X		X		X		X							
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina			X		X		X		X							
ESTADO GENERAL	Estado del motor			X		X		X		X							
	Estado del Tangue de combustible			X		X		X		X							
	Nivel del aceite			X		X		X		X							
	Soportes motor			X		X		X		X							
	Estado del exhosto			X		X		X		X							
	Estado del switche de encendido			X		X		X		X							
LUCES	De Trabajo delanteras			X		X		X		X							
	De trabajo traseras			X		X		X		X							
	Direccionales Delanteras Y Traseras			X		X		X		X							
	Stop Traseros			X		X		X		X							
CABINA	Espejo Retrovisor			X		X		X		X							
	Espejos laterales			X		X		X		X							
	Alarma (o pito) de Retroceso			X		X		X		X							
	Pito Normal			X		X		X		X							
	Frenos de Servicio			X		X		X		X							
	Freno de emergencia			X		X		X		X							
	Dirección/suspensión(Terminales).			X		X		X		X							
	Cinturones de Seguridad			X		X		X		X							
	Estado de la puertas			X		X		X		X							
	Vidrio frontal en buen estado.			X		X		X		X							
	Limpia brisas			X		X		X		X							
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco			X		X		X		X							
	Estado de los asientos			X		X		X		X							
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).			X		X		X		X							
	Velocímetro			X		X		X		X							
	Batería y cables			X		X		X		X							
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos			X		X		X		X							
	Repuesto			X		X		X		X							
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas			X		X		X		X							
	Estado de correas			X		X		X		X							
	Caja de cambios en buen estado.			X		X		X		X							
	Radiador			X		X		X		X							
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)			X		X		X		X							
	Mangueras			X		X		X		X							
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)			X		X		X		X							
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco			X		X		X		X							
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco			X		X		X		X							
	tornillos de seguridad para el cierre del volco			X		X		X		X							
	Estado de empaques del volco			X		X		X		X							
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN			5:00		5:00		5:00		5:00							
	KILOMETRAJE FINAL			7612		7654		7695		7737							

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:** Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Fanibelt Cantor	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

PIRMA COORDINADOR

LL184

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 22 DE JUNIO AL 25 DE JUNIO 2026

CONTRATO	3034 DE 2026	**PLACA: NQX 935**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	44	**MODELO: 2026**	**FRENTE DE TRABAJO: ALVARADO**
INSPECCIONADO POR:	**ING. DIANA GALLEGO**		**LOCALIZACION: CUMINA-VERACRUZ**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00									
	KILOMETRAJE INICIAL	7737		7779		7821		7862									
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**	
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**		
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X									
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X									
	Caja de Herramienta	X		X		X		X									
	Tacos	X		X		X		X									
	Gato	X		X		X		X									
	Linterna recargable	X		X		X		X									
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X									
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X									
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X									
	Nivel del aceite	X		X		X		X									
	Soportes motor	X		X		X		X									
	Estado del exhosto	X		X		X		X									
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X									
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X									
	De trabajo traseras	X		X		X		X									
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X									
	Stop Traseros	X		X		X		X									
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X									
	Espejos laterales	X		X		X		X									
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X									
	Pito Normal	X		X		X		X									
	Frenos de Servicio	X		X		X		X									
	Freno de emergencia	X		X		X		X									
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X									
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X									
	Estado de la puertas	X		X		X		X									
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X									
	Limpia brisas	X		X		X		X									
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X									
	Estado de los asientos	X		X		X		X									
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X									
	Velocímetro	X		X		X		X									
	Batería y cables	X		X		X		X									
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X									
	Repuesto	X		X		X		X									
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X									
	Estado de correas	X		X		X		X									
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X									
	Radiador	X		X		X		X									
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X									
	Mangueras	X		X		X		X									
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X									
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X									
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X									
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X									
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X									
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00									
	KILOMETRAJE FINAL	7779		7821		7862		7904									

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Brandell Castro	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI (X) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

4490

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 30 DE JUNIO 2026

CONTRATO	3034 DE 2026	**PLACA: NQX 935**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	44	**MODELO: 2026**	**FRENTE DE TRABAJO: ALVARADO**
INSPECCIONADO POR:	**ING. DIANA GALLEGO**		**LOCALIZACION: CUMINA-VERACRUZ**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN			7:00													
	KILOMETRAJE INICIAL			7904													
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**	
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**		
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín			X													
	Kit de contingencia según listado adjunto			X													
	Caja de Herramienta			X													
	Tacos			X													
	Gato			X													
	Linterna recargable			X													
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina			X													
ESTADO GENERAL	Estado del motor			X													
	Estado del Tanque de combustible			X													
	Nivel del aceite			X													
	Soportes motor			X													
	Estado del exhosto			X													
	Estado del switche de encendido			X													
LUCES	De Trabajo delanteras			X													
	De trabajo traseras			X													
	Direccionales Delanteras Y Traseras			X													
	Stop Traseros			X													
CABINA	Espejo Retrovisor			X													
	Espejos laterales			X													
	Alarma (o pito) de Retroceso			X													
	Pito Normal			X													
	Frenos de Servicio			X													
	Freno de emergencia			X													
	Dirección/suspensión(Terminales).			X													
	Cinturones de Seguridad			X													
	Estado de la puertas			X													
	Vidrio frontal en buen estado.			X													
	Limpia brisas			X													
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco			X													
	Estado de los asientos			X													
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).			X													
	Velocímetro			X													
	Batería y cables			X													
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos			X													
	Repuesto			X													
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas			X													
	Estado de correas			X													
	Caja de cambios en buen estado.			X													
	Radiador			X													
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)			X													
	Mangueras			X													
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)			X													
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco			X													
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco			X													
	tornillos de seguridad para el cierre del volco			X													
	Estado de empaques del volco			X													
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN			5:00													
	KILOMETRAJE FINAL			7947													

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:** Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Brayler Cortés	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 **MODELO:** **RETRO NUEVA #12** **MARCA:** **NEW HOLLAND**

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO **LOCALIZACION:** **CUMINA-VERACRUZ** **FRENTE DE TRABAJO:** **ALVARADO**

PERIODO: 01 DE JUNIO AL 03 DE JUNIO 2026 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	575		580		584									
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X									
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X									
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X									
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X									
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X									
	* De trabajo traseras	2	X		X		X									
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X									
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X									
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X									
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X									
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X									
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X									
	Alarma de retroceso	1	X		X		X									
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X									
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X									
	Palancas de mando	2	X		X		X									
	Pedales	Todos	X		X		X									
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X									
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X									
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X									
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X									
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X									
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X									
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X									
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X									
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X									
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X									
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X									
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X									
	Sistema de Dirección	1	X		X		X									
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X									
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X									
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		580		584		588									
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:		walter sierra		walter sierra		walter sierra									
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:		Diana G.		Diana G.		Diana G.									
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

4442

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 **MODELO:** **RETRO NUEVA #12** **MARCA:** **NEW HOLLAND**

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO **LOCALIZACION:** **CUMINA-VERACRUZ** **FRENTE DE TRABAJO:** **ALVARADO**

PERIODO: 10 DE JUNIO AL 12 DE JUNIO 2026 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL					588		592		597					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2					X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2					X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2					X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2					X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2					X		X		X					
	* De trabajo traseras	2					X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1					X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1					X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1					X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1					X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos					X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1					X		X		X					
	Alarma de retroceso	1					X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2					X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1					X		X		X					
	Palancas de mando	2					X		X		X					
	Pedales	Todos					X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo					X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos					X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos					X		X		X					
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2					X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1					X		X		X					
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas					X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas					X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1					X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2					X		X		X					
	Mandos de levante del brazo	2					X		X		X					
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos					X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo					X		X		X					
	Sistema de Dirección	1					X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas						X		X		X					
	* Huellas en buen estado	4					X		X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL						592		597		601					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:						walter sierra		walter sierra		walter sierra					
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:						Diana G.		Diana G.		Diana G.					
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 **MODELO:** **RETRO NUEVA #12** **MARCA:** **NEW HOLLAND**

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO **LOCALIZACION:** **CUMINA-VERACRUZ** **FRENTE DE TRABAJO:** **ALVARADO**

PERIODO: 16 DE JUNIO AL 19 DE JUNIO 2026 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL			601		605		610		614					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2			X		X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2			X		X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2			X		X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2			X		X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2			X		X		X		X					
	* De trabajo traseras	2			X		X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1			X		X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1			X		X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1			X		X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1			X		X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos			X		X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1			X		X		X		X					
	Alarma de retroceso	1			X		X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2			X		X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1			X		X		X		X					
	Palancas de mando	2			X		X		X		X					
	Pedales	Todos			X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			X		X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos			X		X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos			X		X		X		X					
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2			X		X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1			X		X		X		X					
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas			X		X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas			X		X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1			X		X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2			X		X		X		X					
	Mandos de levante del brazo	2			X		X		X		X					
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos			X		X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo			X		X		X		X					
	Sistema de Dirección	1			X		X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas				X		X		X		X					
	* Huellas en buen estado	4			X		X		X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL				605		610		614		618					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:				walter sierra		walter sierra		walter sierra		walter sierra					
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:				Diana G.		Diana G.		Diana G.		Diana G.					
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

4494

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 **MODELO:** **RETRO NUEVA #12** **MARCA:** **NEW HOLLAND**

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO **LOCALIZACION:** **CUMINA-VERACRUZ** **FRENTE DE TRABAJO:** **ALVARADO**

PERIODO: 22 DE JUNIO AL 25 DE JUNIO 2026 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	618		622		627		631							
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X							
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X							
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X							
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X							
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X							
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X							
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X							
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X							
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X							
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X							
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X							
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X							
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X							
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X							
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X							
	Palancas de mando	2	X		X		X		X							
	Pedales	Todos	X		X		X		X							
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X							
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X							
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X							
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X							
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X							
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X							
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X							
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X							
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X							
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X							
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X							
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X							
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X							
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X							
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X							
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		622		627		631		635							
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:		walter sierra		walter sierra		walter sierra		walter sierra							
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:		Diana G.		Diana G.		Diana G.		Diana G.							
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

4495

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 **MODELO:** RETRO NUEVA #12 **MARCA:** NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO **LOCALIZACION:** CUMINA-VERACRUZ **FRENTE DE TRABAJO:** ALVARADO

PERIODO: 30 DE JUNIO 2026 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL			635											
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2			X											
	* De trabajo delanteras	2			X											
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2			X											
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2			X											
	* De stop y señal trasera	2			X											
	* De trabajo traseras	2			X											
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1			X											
	* Cinturón de seguridad	1			X											
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1			X											
	Asiento (dispositivo de giro)	1			X											
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos			X											
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1			X											
	Alarma de retroceso	1			X											
	Escaleras y apoyos de acceso	2			X											
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1			X											
	Palancas de mando	2			X											
	Pedales	Todos			X											
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			X											
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos			X											
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos			X											
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2			X											
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1			X											
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas			X											
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas			X											
	* Freno de emergencia en buen estado	1			X											
	Estado general (desgarrador/balde)	2			X											
	Mandos de levante del brazo	2			X											
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos			X											
	Compartimiento del motor aseado	Completo			X											
	Sistema de Dirección	1			X											
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas				X											
	* Huellas en buen estado	4			X											
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL				640											
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:				[signature]											
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:				[signature]											
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

[signature]
FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026				
	HOROMETRO	575	580	584				
Cada 10 horas o diariamente	Freno de servicio - Revisar	✓	✓	✓				
	Frreno de estacionamiento - Revisar	✓	✓	✓				
	Fusibles y bombillas - Revisar	✓	✓	✓				
	Funcionalidad de mandos y luces - Revisar	✓	✓	✓				
	Tension de correa del ventilador / alternador - Revisar	✓	✓	✓				
	Correa de compresor de aire acondicionado - Revisar	✓	✓	✓				
	Nivel de aceite del motor - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓				
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓				
	Nivel de liquido refrigerante - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓				
	Nivel de aceite hidraulico (tanque hidraulico) - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓				
	Nivel de combustible - Revisar	✓	✓	✓				
	Indicador de obstrucción - Revisar	✓	✓	✓				
	Filtro de aire - Limpiar (De ser necesario)	✓	✓	✓				
	Puntos de engrase - Lubricar	✓	✓	✓				
	Drenaje filtro de combustible (filtro separador de agua) - Revisar	✓	✓	✓				
	Filtro de aire de motor - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓				
	Cartucho de seguridad - Revisar (Cambiar	✓	✓	✓				
	Presion de neumaticos - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓				
	Condensador sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓				
	Filtro de polen - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓				
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓				
	Nivel de electrolito de bateria - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓				
	Soporte del eje trasero - Revisar / Ajustar	✓	✓	✓				
	Dientes del balde - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓				
	Holgura del balde - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO

RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026				
	HOROMETRO	575	580	584				
Cada 10 horas o diariamente	Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓				
	Pedales - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓				
	Sistema de frenos - Revisar	✓	✓	✓				
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓				
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓				
	Condensador de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓				
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓				
	Cinturon de seguridad - Revisar	✓	✓	✓				
	Espejos - Revisar	✓	✓	✓				
	Alarma de reversa - Revisar	✓	✓	✓				
	Vidrio de ventanas - Limpiar	✓	✓	✓				
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar	✓	✓	✓				
	Cableado electrico - Revisar	✓	✓	✓				
	Limpiaparabrisas - Revisar	✓	✓	✓				
	Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓				

OBSERVACIONES:

Walter Sierra

FIRMA DE OPERADOR

Nombre: WALTER SIERRA

Diana Gallego

FIRMA SUPERVISOR

Nombre: DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)			10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026		
	HOROMETRO			588	592	597		
Cada 10 horas o diariamente	Freno de servicio - Revisar			✓	✓	✓		
	Frreno de estacionamiento - Revisar			✓	✓	✓		
	Fusibles y bombillas - Revisar			✓	✓	✓		
	Funcionalidad de mandos y luces - Revisar			✓	✓	✓		
	Tension de correa del ventilador / alternador - Revisar			✓	✓	✓		
	Correa de compresor de aire acondicionado - Revisar			✓	✓	✓		
	Nivel de aceite del motor - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓		
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓		
	Nivel de liquido refrigerante - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓		
	Nivel de aceite hidraulico (tanque hidraulico) - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓		
	Nivel de combustible - Revisar			✓	✓	✓		
	Indicador de obstrucción - Revisar			✓	✓	✓		
	Filtro de aire - Limpiar (De ser necesario)			✓	✓	✓		
	Puntos de engrase - Lubricar			✓	✓	✓		
	Drenaje filtro de combustible (filtro separador de agua) - Revisar			✓	✓	✓		
	Filtro de aire de motor - Revisar (Cambiar)			✓	✓	✓		
	Cartucho de seguridad - Revisar (Cambiar			✓	✓	✓		
	Presion de neumaticos - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓		
	Condensador sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓		
	Filtro de polen - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓		
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓		
	Nivel de electrolito de bateria - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓		
	Soporte del eje trasero - Revisar / Ajustar			✓	✓	✓		
	Dientes del balde - Revisar (Cambiar)			✓	✓	✓		
	Holgura del balde - Revisar (Ajustar)			✓	✓	✓		

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)			10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026		
	HOROMETRO			588	592	597		
Cada 10 horas o diariamente	Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)			✓	✓	✓		
	Pedales - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓		
	Sistema de frenos - Revisar			✓	✓	✓		
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓		
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓		
	Condensador de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓		
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓		
	Cinturon de seguridad - Revisar			✓	✓	✓		
	Espejos - Revisar			✓	✓	✓		
	Alarma de reversa - Revisar			✓	✓	✓		
	Vidrio de ventanas - Limpiar			✓	✓	✓		
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar			✓	✓	✓		
	Cableado electrico - Revisar			✓	✓	✓		
	Limpiaparabrisas - Revisar			✓	✓	✓		
	Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)			✓	✓	✓		

OBSERVACIONES:

Walter Sierra
FIRMA DE OPERADOR
Nombre: WALTER SIERRA

Diana Gallego
FIRMA SUPERVISOR
Nombre: DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

4500

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)		16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026		
	HOROMETRO		601	605	610	614		
Cada 10 horas o diariamente	Freno de servicio - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Frreno de estacionamiento - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Fusibles y bombillas - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Funcionalidad de mandos y luces - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Tension de correa del ventilador / alternador - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Correa de compresor de aire acondicionado - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite del motor - Revisar / Nivelar		✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar		✓	✓	✓	✓		
	Nivel de liquido refrigerante - Revisar / Nivelar		✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite hidraulico (tanque hidraulico) - Revisar / Nivelar		✓	✓	✓	✓		
	Nivel de combustible - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Indicador de obstrucción - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Filtro de aire - Limpiar (De ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Puntos de engrase - Lubricar		✓	✓	✓	✓		
	Drenaje filtro de combustible (filtro separador de agua) - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Filtro de aire de motor - Revisar (Cambiar)		✓	✓	✓	✓		
	Cartucho de seguridad - Revisar (Cambiar		✓	✓	✓	✓		
	Presion de neumaticos - Revisar / Nivelar		✓	✓	✓	✓		
	Condensador sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Filtro de polen - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar		✓	✓	✓	✓		
	Nivel de electrolito de bateria - Revisar / Nivelar		✓	✓	✓	✓		
	Soporte del eje trasero - Revisar / Ajustar		✓	✓	✓	✓		
	Dientes del balde - Revisar (Cambiar)		✓	✓	✓	✓		
	Holgura del balde - Revisar (Ajustar)		✓	✓	✓	✓		

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)		16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026		
	HOROMETRO		601	605	610	614		
Cada 10 horas o diariamente	Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)		✓	✓	✓	✓		
	Pedales - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Sistema de frenos - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Condensador de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Cinturon de seguridad - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Espejos - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Alarma de reversa - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Vidrio de ventanas - Limpiar		✓	✓	✓	✓		
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Cableado electrico - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Limpiaparabrisas - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)		✓	✓	✓	✓		

OBSERVACIONES:

Walter Sierra
FIRMA DE OPERADOR
Nombre: WALTER SIERRA

Diana Gallego
FIRMA SUPERVISOR
Nombre: DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT GOBERNACIÓN DEL TOLIMA RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	VERSION	1
		PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026			
	HOROMETRO	618	622	627	631			
Cada 10 horas o diariamente	Freno de servicio - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Frreno de estacionamiento - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Fusibles y bombillas - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Funcionalidad de mandos y luces - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Tension de correa del ventilador / alternador - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Correa de compresor de aire acondicionado - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de aceite del motor - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de liquido refrigerante - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de aceite hidraulico (tanque hidraulico) - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de combustible - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Indicador de obstrucción - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Filtro de aire - Limpiar (De ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Puntos de engrase - Lubricar	✓	✓	✓	✓			
	Drenaje filtro de combustible (filtro separador de agua) - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Filtro de aire de motor - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓	✓			
	Cartucho de seguridad - Revisar (Cambiar	✓	✓	✓	✓			
	Presion de neumaticos - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓			
	Condensador sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Filtro de polen - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de electrolito de bateria - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓			
	Soporte del eje trasero - Revisar / Ajustar	✓	✓	✓	✓			
	Dientes del balde - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓	✓			
	Holgura del balde - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓			

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026			
	HOROMETRO	618	622	627	631			
Cada 10 horas o diariamente	Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓			
	Pedales - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Sistema de frenos - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Condensador de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Cinturon de seguridad - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Espejos - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Alarma de reversa - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Vidrio de ventanas - Limpiar	✓	✓	✓	✓			
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Cableado electrico - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Limpiaparabrisas - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓			

OBSERVACIONES:

Walter sierra
FIRMA DE OPERADOR
Nombre: WALTER SIERRA

Diana Gallego
FIRMA SUPERVISOR
Nombre: DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

U504

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)		30/06/2026					
	HOROMETRO		635					
Cada 10 horas o diariamente	Freno de servicio - Revisar		✓					
	Frreno de estacionamiento - Revisar		✓					
	Fusibles y bombillas - Revisar		✓					
	Funcionalidad de mandos y luces - Revisar		✓					
	Tension de correa del ventilador / alternador - Revisar		✓					
	Correa de compresor de aire acondicionado - Revisar		✓					
	Nivel de aceite del motor - Revisar / Nivelar		✓					
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar		✓					
	Nivel de liquido refrigerante - Revisar / Nivelar		✓					
	Nivel de aceite hidraulico (tanque hidraulico) - Revisar / Nivelar		✓					
	Nivel de combustible - Revisar		✓					
	Indicador de obstrucción - Revisar		✓					
	Filtro de aire - Limpiar (De ser necesario)		✓					
	Puntos de engrase - Lubricar		✓					
	Drenaje filtro de combustible (filtro separador de agua) - Revisar		✓					
	Filtro de aire de motor - Revisar (Cambiar)		✓					
	Cartucho de seguridad - Revisar (Cambiar		✓					
	Presion de neumaticos - Revisar / Nivelar		✓					
	Condensador sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)		✓					
	Filtro de polen - Revisar (Limpiar)		✓					
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar		✓					
	Nivel de electrolito de bateria - Revisar / Nivelar		✓					
	Soporte del eje trasero - Revisar / Ajustar		✓					
	Dientes del balde - Revisar (Cambiar)		✓					
	Holgura del balde - Revisar (Ajustar)		✓					

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO

RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)		30/06/2026					
	HOROMETRO		635					
Cada 10 horas o diariamente	Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)		✓					
	Pedales - Revisar (Limpiar)		✓					
	Sistema de frenos - Revisar		✓					
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)		✓					
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)		✓					
	Condensador de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)		✓					
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)		✓					
	Cinturon de seguridad - Revisar		✓					
	Espejos - Revisar		✓					
	Alarma de reversa - Revisar		✓					
	Vidrio de ventanas - Limpiar		✓					
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar		✓					
	Cableado electrico - Revisar		✓					
	Limpiaparabrisas - Revisar		✓					
	Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)		✓					

OBSERVACIONES:

Walter Sierra

FIRMA DE OPERADOR

Nombre: WALTER SIERRA

Diana Gallego

FIRMA SUPERVISOR

Nombre: DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 7

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

FRENTE DE TRABAJO ALVARADO

JUNIO 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

FRENTE ALVARADO								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE
5	2-jun-26	12:35:20	133288	**188,253**	$ 2.251.506,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#1	FRENTE ALVARADO
45	13-jun-26	12:38:09	133979	**57,446**	$ 688.778,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#36	FRENTE ALVARADO
85	20-jun-26	13:02:03	134385	**120,929**	$ 1.449.939,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#1	FRENTE ALVARADO

TOTAL MES	366,628
TOTAL ACPM	366,628

CONSUMO MES	216,628
REMANENTE PARA JULIO	150,000

4509

VERSION 1	GOB-M-014	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

MUNICIPIO: ALVARADO VEREDA : CUMINÁ-VERACRUZ COORDINADOR: JEISON GIOVANNI ALVIS LOZAN

VIA: CUMINÁ-VERACRUZ

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONE
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES (1)		MARTES (2)		MIERCOLES (3)		JUEVES (4)		VIERNES (5)		SABADO (6)		DOMINGO (7)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	VOLQUETA	44	BRANKELI CASTAÑEDA			14												14,000
2	RETROEXCAVADORA	12	WALTER SIERRA			19												19,000
																		0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONE
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (8)		MARTES (9)		MIERCOLES (10)		JUEVES (11)		VIERNES (12)		SABADO (13)		DOMINGO (14)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	VOLQUETA	44	BRANKELI CASTAÑEDA							18								18,000
2	RETROEXCAVADORA	12	WALTER SIERRA									12						12,000
																		0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONE
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (15)		MARTES (16)		MIERCOLES (17)		JUEVES (18)		VIERNES (19)		SABADO (20)		DOMINGO (21)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	VOLQUETA	44	BRANKELI CASTAÑEDA			12,628				24		15						51,628
2	RETROEXCAVADORA	12	WALTER SIERRA			18				18		24						60,000
																		0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONE
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (22)		MARTES (23)		MIERCOLES (24)		JUEVES (25)		VIERNES (26)		SABADO (27)		DOMINGO (28)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	VOLQUETA	44	BRANKELI CASTAÑEDA															0,000
2	RETROEXCAVADORA	12	WALTER SIERRA					18										18,000
																		0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONE
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (29)		MARTES (30)		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	VOLQUETA	44	BRANKELI CASTAÑEDA			24												24,000
2	RETROEXCAVADORA	12	WALTER SIERRA															0,000
																		0,000

216,628

OBSERVACIONES: Remanente 150,000 gls para el mes de julio.

VoBo COORDINADOR:

FRENTE DE TRABAJO ALVARADO					
MES JUNIO 2026					
Maquina	N° Interno	Consumo Mensual ACPM (GL)	Kilometraje/ Horometro Inicial	Kilometraje/Horometro Final	Promedio Consumo (Hr/Km x GL)
VOLQUETA	44	107,628	7320	7947	0,17
RETROEXCAVADORA	12	109,000	575	640	1,69
		216,628			

ERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOB-M-012A
CONTRATO 3034 DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Alvarado
FECHA : 02/06/2026

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 4210 del 11 de Noviembre del 2025 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 3034 del 09 de Abril de 2026 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Alvarado la cantidad de 188,253 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 02 de junio del 2026.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 3034 de 2026.
MARV 7

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

ING. Stephanie Lara Hernández
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

ING. Diana Marcela Gallego Campos
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

distracom

IA(1)
Remision de Venta
No. REFK 133288
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Agentes Retenedores de IVA A
rt. 437-2 E.T.NExentos De Re
teica Art 86 Acdo 015 De 20
21
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibagu
TEL:3137434826

Fecha remision:	2026/06/02
Vencimiento.	2026/07/02
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOI
Contrato	OC 154985
Nit:	8001136.2
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	261161
Placa:	
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora Ini:	12:35:20
Hora Fin:	12:51:26
Combustible:	DIESEL
Volumen:	188.2530
Precio:	$11960
Total:	$2251506
Panel:	MFA976
Lad/Man/Pos:	2/1/8
Dispositivo:	RBHAND283-01
Empleado:	FRANCY YOMARA ROD
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Alvarado

Nombre:

ERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOB-M-012A
CONTRATO 3034 DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Alvarado
FECHA : 13/06/2026

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 4210 del 11 de Noviembre del 2025 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 3034 del 09 de Abril de 2026 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Alvarado la cantidad de 57,446 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 13 de junio del 2026.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 3034 de 2026.
MARV 7

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

ING. Stephanie Lara Hernández
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

Diana Gallego

ING. Diana Marcela Gallego Campos
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 133979

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracome.triunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

Agentes Retenedores de IVA A

rt. 437-2 [illegible] Exentos De Re

teic[illegible]do 015 De 20

[illegible] EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision 2026/06/13

Vencimiento 2026/07/13

Naturaleza Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL

Contrato: CC 154985

Nit: 800113672

Direccion CR 3 CL 11 ED GO

Telefono 2611616

Placa: [redacted]

Kilometros 0

Hora Ini 12:38:09

Hora Fin 12:47:30

Combustible DIESEL

Volumen 57.4460

Precio $11990

Total: $688778

Panel: MFA976

Lad/Man/Pos: 1/1/7

Dispositivo: RBHAND283-01

Empleado: LUISA FERNANDA GA

Emp. Apoyo: DEVIA BUSTOS LEONE

Validado: ID Electronico

Entrego:

Alvarado UH3C

Recibi:

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOB-M-012A
CONTRATO 3034 DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Alvarado
FECHA : 20/06/2026

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 4210 del 11 de Noviembre del 2025 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 3034 del 09 de Abril de 2026 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Alvarado la cantidad de 120,929 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 20 de junio del 2026.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 3034 de 2026.
MARV 7

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

ING. Stephanie Lara Hernández
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

ING. Diana Marcela Gallego Campos
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 134385

Distribucion y Transporte d C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyente:

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

Agentes Retenedores de IVA A

rt. 437-2 E.T.NExentos De Re

teica Art 86 Acdo 015 De 20

21

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 # A 01

Ibag e

TEL:3137434826

Fecha remision:	2026/06/20
Vencimiento:	2026/07/20
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL D
Contrato:	OC 154 85
Nit:	800113 72
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611 16
Placa:	ALBARADO
Kilometros:	0
Hora Ini:	13:02 03
Hora Fin:	13:13 51
Combustible:	DIESEL
Volumen:	120.9290
Precio:	$11990
Total:	$1449939
Panel:	MFA976
Lad/Man/Pos:	2/1/8
Dispositivo:	RBHAND283 01
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M
Emp. Apoyo:	DEVIA BUSTOS LE N
Validado:	ID Electron co

Entrego: Alcalde

Recibi:

Nombre:
