La Jagua de Ibirico, 03 de abril de 2026.

Doctor.
EDGAR ISAAC BELEÑO QUIROZ.
Jefe de la Oficina de Contratación.
Alcaldía Municipal de La Jagua de Ibirico – Cesar.

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 244 – 2025
PERIODO FINAL
Del 31 de diciembre de 2025 al 02 de abril de 2026.

OBJETIVO: Mantener informado al Municipio de La Jagua de Ibirico sobre el desarrollo del contrato objeto de este informe, presentar evidencias sobre su ejecución y verificar que las actividades se hayan ejecutado con la calidad requerida e idónea y en los términos adecuados.

1 INFORMACIÓN DEL CONTRATO

ID DEL CONTRATO EN SECOP	CO1.PCCNTR.8005035
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE CONSULTORÍA
NÚMERO DEL CONTRATO	244 DE 24 DE JUNIO DE 2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO – CESAR
CONTRATISTA	FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA REGION Y EL PAIS FUNDECERP
SUPERVISOR	SECRETARIO DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL – MAHER SANTOS SOSA
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO Y APALANCAMIENTO MICROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR
VALOR CONTRATO	$ 115.684.585,20 COP
PLAZO TOTAL	NUEVE (09) MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE INICIO	01 DE JULIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	02 DE ABRIL DE 2026

2. DESARROLLO DEL CONTRATO:

Mediante la CLAUSULA SÉPTIMA – SUPERVISION fui designado como Supervisor del contrato objeto de este informe; así, en cumplimiento de las funciones establecidas en el manual de supervisión, me permito informar el desarrollo correspondiente al PERIODO FINAL en los siguientes aspectos:

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

ACTIVIDADES EJECUTADES: LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN FUERON LAS SIGUIENTES:

A. Se constato por parte de la supervisión que el contratista que ejecuto las

Calle 5 No. 5-35 - La Jagua de Ibirico – Cesar
alcaldia@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co

obligaciones técnicas, administrativas, financieras, legales o jurídicas las cuales emanan del contrato de consultoría 244 de 2025 en una forma idónea.

B. Se superviso que el contratista aportara dentro de los informes de ejecución la documentación debida y necesaria para cumplir con las obligaciones del contrato.

C. Se superviso que el contratista aporto los soportes necesarios que referencian el pago de los costos directos del contrato (personal inmerso en la oferta y en la ejecución).

D. Se superviso el pago de las planillas de seguridad social integral del personal inmerso en los costos directos de la oferta económica.

E. Se superviso que el contratista aporto los soportes necesarios que referencian el pago de los costos indirectos del contrato (ítems que no tienen relación con el personal sino con los demás costos).

F. Se superviso que el contratista ejecutara las obligaciones o actividades no mencionadas en los ítems anteriores cumpliendo así con el total de las obligaciones, tanto las generales como las específicas las cuales emanan del contrato suscrito entre las partes de las que se relacionan en la expedición de este documento.

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES:


Se verificó el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARL) correspondiente a los periodos ejecutados por parte del personal subcontratista:

PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO EJECUTADO: 100.00 %

GRAFICA AVANCE TIEMPO



GRAFICA AVANCE FINANCIERO 100.00 %

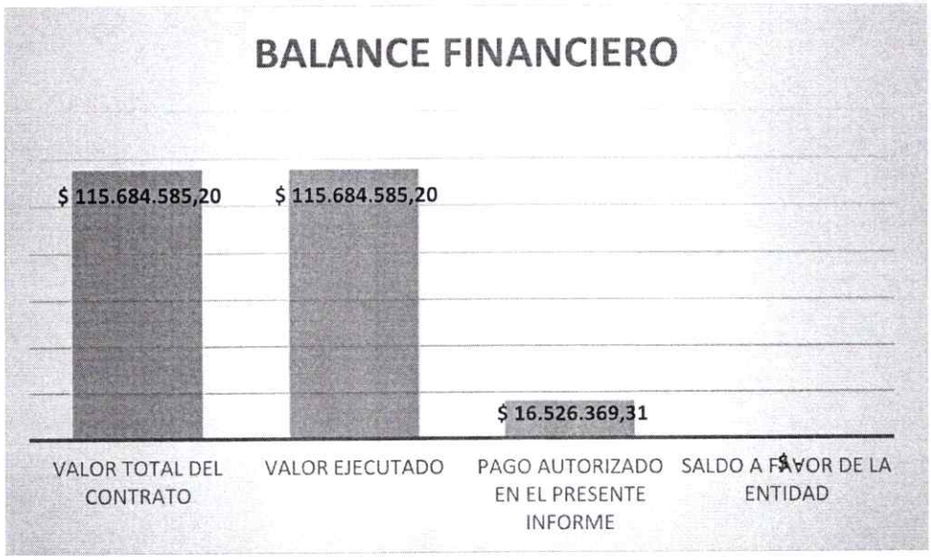

4 AVANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR	FECHA EGRESO	%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 115.684.585.20	N/A	100%
ANTICIPO	N/A	N/A	N/A
PRIMER PAGO	$ 16.526.369.31	N/A	14.29%
SEGUNDO PAGO	$ 16.526.369.31	N/A	14.29%
TERCER PAGO	$ 16.526.369.31	N/A	14.29%
CUARTO PAGO	$ 16.526.369.31	N/A	14.29%
QUINTO PAGO	$ 16.526.369.31	N/A	14.29%
SEXTO PAGO	$ 16.526.369.31	N/A	14.29%
SEPTIMO PAGO (acta de liquidacion)	$ 16.526.369.31	N/A	14.29%
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME (acta de liquidacion)	$ 16.526.369.31	N/A	14.29%
SALDO EJECUTADO POR EL CONTRATISTA	$ 115.684.585.20	N/A	100 %
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (lo que falta por ejecutar)	$ 0	N/A	0.0 %

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo a la información anteriormente relacionada, como supervisor certifico que durante el **PERIODO FINAL** comprendido entre el **31 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 02 DE ABRIL DE 2026,** el contratista cumplió a cabalidad con la entrega total del suministro objeto del contrato además todas las obligaciones pactadas y cumplió con el pago del sistema de seguridad social integral.

Calle 5 No. 5-35 - La Jagua de Ibirico – Cesar
alcaldia@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co

Por lo anterior se autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de **DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M.C. ($ 16.526.369,31).**

MAHER SANTOS SOSA
Secretario de Planeación y Desarrollo Económico
Municipio de La Jagua de Ibirico

Proyectó:	**MAHER SANTOS SOSA** Secretario de Planeación y Desarrollo Económico Municipal	
Revisó:	**MAHER SANTOS SOSA** Secretario de Planeación y Desarrollo Económico Municipal	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento, cuyo contenido se encuentra ajustado a las disposiciones legales vigentes, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.		
