6. REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripción de la fotografía:
Apertura de caja.



Descripción de la fotografía:
Imprimación con emulsión asfáltica.



Descripción de la fotografía:
Instalación y extensión de MDC-19.



Descripción de la fotografía:
Compactación de MDC-19

TIERRASUA ¡Conectamos región!	INFORME DE AVANCE SEMANAL	3

1. INFORMACION GENERALL

1.1 FECHA DE INFORME	29	5	2026	1.2 SEMANA: Del 25/05/2026 hasta 29/05/2026			
1.3 CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.8562435.3827			1.6 CONTRATO INTERVENTORIA No.	N/A		
1.4 CONTRATISTA:	TIERRASUA S.A.S.			1.7 SUPERVISOR:	GOBERNACIÓN DE BOYACÁ		
1.5 FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	DD	MM	AAAA	1.8 FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	DD	MM	AAAA
	12	9	2026				

1.9 OBJETO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y TIERRASUA S.A.S. PARA EL APOYO AL MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS


2.1 ESTADO DEL TIEMPO	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo
	Nublado	Soleado	Lluvioso	Soleado	Soleado	N/A	N/A

2.2 DESCRIPCION: *(Describir brevemente las actividades ejecutadas y localización).* INTERVENCIÓN CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL EN EL CORREDOR 55BY07 DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ, CONSISTENTES EN EL CORTE Y DEMOLICIÓN DE LAS ÁREAS AFECTADAS, EXCAVACIÓN *Y RETIRO DEL MATERIAL DETERIORADO, RESTITUCIÓN DE LA CAPA DE BASE GRANULAR, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES A INTERVENIR, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1, SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA MDC-19 PARA LA EJECUCIÓN DE PARCHEOS, LAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARON ENTRE LOS K7+955,90 Y K7+743.*

3. CONTROL DE PLAZOS Y AVANCE DE EJECUCIÓN

3.1 PLAZO CONTRATO DE OBRA	4	Meses	3.3 PLAZO CONTRATO INTERVENTORIA	N/A	
3.2 PLAZO TRANSCURRIDO	0,613	Meses	3.4 PLAZO TRANSCURRIDO	N/A	

% PROGRAMADO DE OBRA	6,43%
% AVANCE DE OBRA	6,52%
% DE ATRASO	-0,09%
% PLAZO TRANSCURRIDO OBRA	15,33%
% PLAZO TRANSCURRIDO INTERVENTORIA	N/A

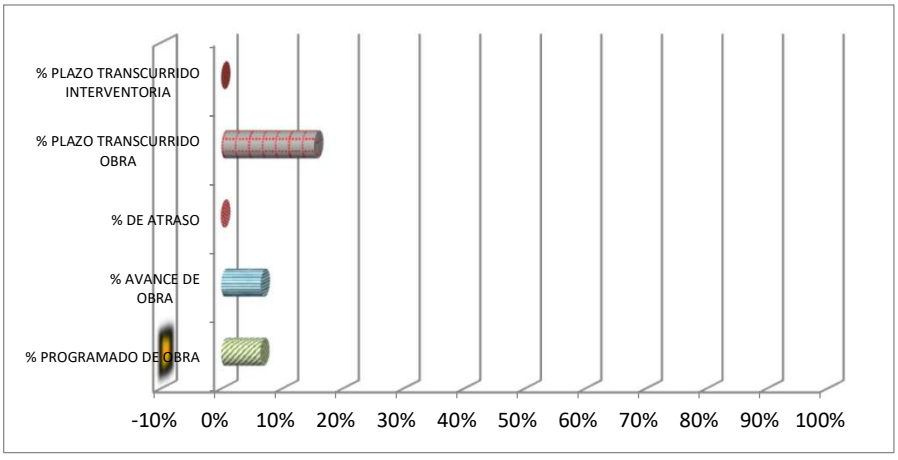

4. CONTROL Y SEGUIMIENTO

4.1 OBSERVACIONES

En caso de posibles atrasos indique las causas y el responsable.

EL PROYECTO NO PRESENTA RETRASO.

4.2 COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL EJECUTOR

En caso de retrasos, por favor describir los compromisos, acciones correctivas y el tiempo previsto para subsanar.

NO SE PRESENTAN COMPROMISOS NI ACCIONES CORRECTIVAS EN LA PROGRAMACIÓN

4.3 ACCIONES REALIZADAS

En caso de retrasos, por favor describir los compromisos, acciones correctivas y el tiempo previsto para subsanar.

SIN NOVEDAD.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripción de la fotografía:
Apertura de caja.



Descripción de la fotografía:
Imprimación con emulsión asfáltica.



Descripción de la fotografía:
Instalación y extensión de MDC-19.



Descripción de la fotografía:
Instalación sobrecarpeta.

4.4.4. Tramo: 55BY08 Pantano de Vargas – Firavitoba y 61BYA paso por Firavitoba

Cel: 316 8174458
gerencia@tierrasua.com
Calle 19 N.9-35 Piso 10 Tunja/Boyacá

TIERRASUA ¡Conectamos región!	INFORME DE AVANCE SEMANAL	1

1. INFORMACION GENERALL

1.1 FECHA DE INFORME	15	5	2026	1.2 SEMANA: Del 13/05/2026 hasta 15/05/2026			
1.3 CONVENIO No.	CO1.PCCNTR.8562435.3827			1.6 CONTRATO INTERVENTORIA No.	N/A		
1.4 EJECUTOR:	TIERRASUA S.A.S.			1.7 INTERVENTOR:	N/A		
1.5 FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	DD	MM	AAAA	1.8 FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	DD	MM	AAAA
	12	9	2026				

1.9 OBJETO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y TIERRASUA S.A.S. PARA EL APOYO AL MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS


2.1 ESTADO DEL TIEMPO	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo
	N/A	N/A	Soleado	Soleado	Soleado	N/A	N/A

2.2 DESCRIPCION: (Describir brevemente las actividades ejecutadas y localización). INTERVENCION CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL EN EL SECTOR 55BY08 PANTANO DE VARGAS-FIRAVITOBA, BARRIDO Y SOPLADO DE PUNTOS A INTERVENIR, IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRR-1, ACTIVIDADES DE RENIVELACION CON SUMINISTRO E INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA MDC-19 PARA PARCHEO, LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS CON RECTIFICACION DE SALIDAS Y DECOLES INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA ZONA DE VIA, ACTIVIDADES DESARROLADAS ENTRE LOS PR 8+200 AL 5+300 ALTO DE CURIES - FIRAVITOBA

3. CONTROL DE PLAZOS Y AVANCE DE EJECUCIÓN

3.1 PLAZO CONTRATO DE OBRA	4	Meses	3.3 PLAZO CONTRATO INTERVENTORIA	N/A	
3.2 PLAZO TRANSCURRIDO	0,025	Meses	3.4 PLAZO TRANSCURRIDO	N/A	

% PROGRAMADO DE OBRA	2,42%
% AVANCE DE OBRA	1,75%
% DE ATRASO	0,67%
% PLAZO TRANSCURRIDO OBRA	0,63%
% PLAZO TRANSCURRIDO INTERVENTORIA	N/A

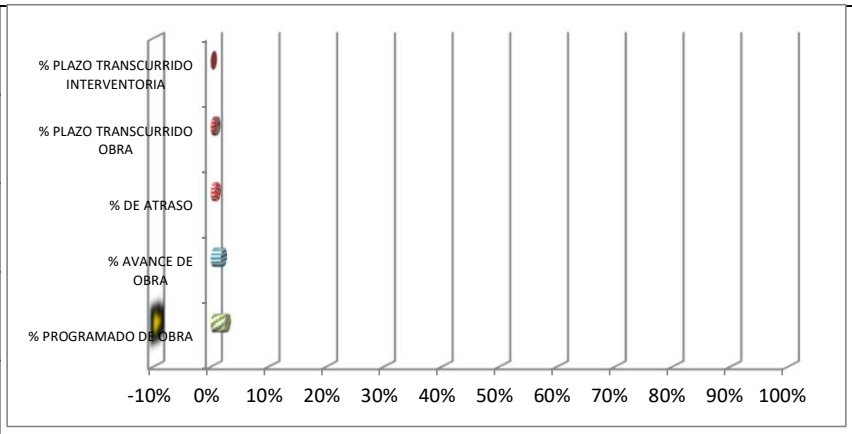

4. CONTROL Y SEGUIMIENTO

4.1 OBSERVACIONES

En caso de posibles atrasos indique las causas y el responsable.

EL PROYECTO PRESENTA RETRASO DE 0,67%, CORRESPONDIENTES A OPTIMIZACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN DE FRENTES DE TRABAJO Y RECURSOS DISPONIBLES.

4.2 COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL EJECUTOR

En caso de retrasos, por favor describir los compromisos, acciones correctivas y el tiempo previsto para subsanar.

EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS Y EL MONITOREO PERMANENTE DEL CRONOGRAMA.

4.3 ACCIONES REALIZADAS

N/A

6. REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripción de la fotografía:

Limpieza de Cunetas revestidas



Descripción de la fotografía:

Imprimacion con emulsion asfaltica CRR-1 o similar



Descripción de la fotografía:

Renivelacion con mezcla asfaltica para parcheo



Descripción de la fotografía:

Compactacion de la mezcla asfaltica para parcheo

TIERRASUA ¡Conectamos región!	INFORME DE AVANCE SEMANAL	2

1. INFORMACION GENERALL

1.1 FECHA DE INFORME	23	5	2026	1.2 SEMANA: Del 19/05/2026 hasta 23/05/2026			
1.3 CONVENIO No.	CO1.PCCNTR.8562435.3827			1.6 CONTRATO INTERVENTORIA No.	N/A		
1.4 EJECUTOR:	TIERRASUA S.A.S.			1.7 INTERVENTOR:	N/A		
1.5 FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	DD	MM	AAAA	1.8 FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	DD	MM	AAAA
	12	9	2026				

1.9 OBJETO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y TIERRASUA S.A.S. PARA EL APOYO AL MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS


2.1 ESTADO DEL TIEMPO	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo
	N/A	Soleado	Soleado	Soleado	Soleado	Nublado	N/A

2.2 DESCRIPCION: (Describir brevemente las actividades ejecutadas y localización). INTERVENCION CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL EN EL SECTOR 55BY08 PANTANO DE VARGAS-FIRAVITOBA, BARRIDO Y SOPLADO DE PUNTOS A INTERVENIR, IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRR-1, ACTIVIDADES DE RENIVELACION CON SUMINISTRO E INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA MDC-19 PARA PARCHEO, LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS CON RECTIFICACION DE SALIDAS Y DECOLES INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA ZONA DE VIA, ACTIVIDADES DESARROLADAS ENTRE LOS PR 8+200 AL 5+300 ALTO DE CURIES - FIRAVITOBA

3. CONTROL DE PLAZOS Y AVANCE DE EJECUCIÓN

3.1 PLAZO CONTRATO DE OBRA	4	Meses	3.3 PLAZO CONTRATO INTERVENTORIA	N/A	
3.2 PLAZO TRANSCURRIDO	0,387	Meses	3.4 PLAZO TRANSCURRIDO	N/A	

% PROGRAMADO DE OBRA	4,84%
% AVANCE DE OBRA	3,50%
% DE ATRASO	1,34%
% PLAZO TRANSCURRIDO OBRA	9,68%
% PLAZO TRANSCURRIDO INTERVENTORIA	N/A

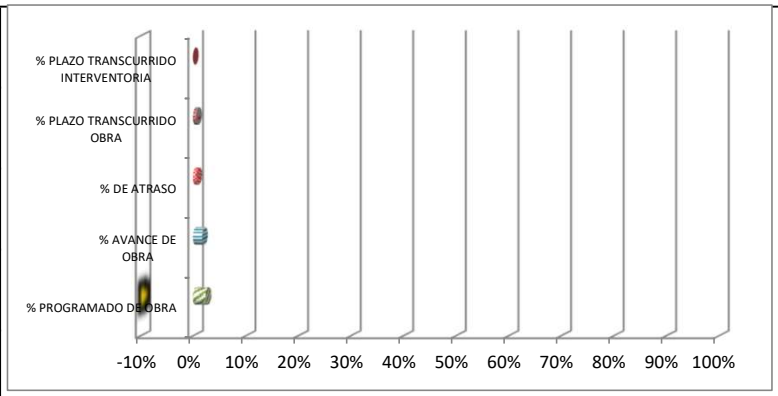

4. CONTROL Y SEGUIMIENTO

4.1 OBSERVACIONES

En caso de posibles atrasos indique las causas y el responsable.

EL PROYECTO PRESENTA RETRASO DE 1,34%, CORRESPONDIENTES A OPTIMIZACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN DE FRENTES DE TRABAJO Y RECURSOS DISPONIBLES.

4.2 COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL EJECUTOR

En caso de retrasos, por favor describir los compromisos, acciones correctivas y el tiempo previsto para subsanar.

EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS Y EL MONITOREO PERMANENTE DEL CRONOGRAMA.

4.3 ACCIONES REALIZADAS

N/A

6. REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripción de la fotografía:
Soplado y barrido de puntos a renivelar



Descripción de la fotografía:
Imprimacion con emulsion asfaltica CRR-1 o similar



Descripción de la fotografía:
Limpieza de cunetas revestidas



Descripción de la fotografía:
Renivelacion y compactación de la mezcla asfaltica para parcheo

TIERRASUA ¡Conectamos región!	INFORME DE AVANCE SEMANAL	3

1. INFORMACION GENERALL

1.1 FECHA DE INFORME	**29**	**5**	**2026**	**1.2 SEMANA: Del 25/05/2026 hasta 29/05/2026**			
1.3 CONVENIO No.	**CO1.PCCNTR.8562435.3827**			**1.6 CONTRATO INTERVENTORIA No.**	**N/A**		
1.4 EJECUTOR:	**TIERRASUA S.A.S.**			**1.7 INTERVENTOR:**	**N/A**		
1.5 FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	DD	MM	AAAA	**1.8 FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA**	DD	MM	AAAA
	12	**9**	**2026**				

1.9 OBJETO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y TIERRASUA S.A.S. PARA EL APOYO AL MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS


2.1 ESTADO DEL TIEMPO	**Lunes**	**Martes**	**Miercoles**	**Jueves**	**Viernes**	**Sabado**	**Domingo**
	Soleado	Soleado	Soleado	Soleado	Soleado	N/A	N/A

2.2 DESCRIPCION: (Describir brevemente las actividades ejecutadas y localización). INTERVENCION CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL EN EL SECTOR 55BY08 PANTANO DE VARGAS-FIRAVITOBA, BARRIDO Y SOPLADO DE PUNTOS A INTERVENIR, IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRR-1, ACTIVIDADES DE RENIVELACION CON SUMINISTRO E INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA MDC-19 PARA PARCHEO, LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS CON RECTIFICACION DE SALIDAS Y DECOLES INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA ZONA DE VIA, ACTIVIDADES DESARROLADAS ENTRE LOS PR 8+200 AL 5+300 ALTO DE CURIES - FIRAVITOBA

3. CONTROL DE PLAZOS Y AVANCE DE EJECUCIÓN

3.1 PLAZO CONTRATO DE OBRA	**4**	Meses	**3.3 PLAZO CONTRATO INTERVENTORIA**	**N/A**	
3.2 PLAZO TRANSCURRIDO	**0,613**	Meses	**3.4 PLAZO TRANSCURRIDO**	**N/A**	

% PROGRAMADO DE OBRA	**7,26%**
% AVANCE DE OBRA	**4,67%**
% DE ATRASO	**2,59%**
% PLAZO TRANSCURRIDO OBRA	**15,32%**
% PLAZO TRANSCURRIDO INTERVENTORIA	**N/A**

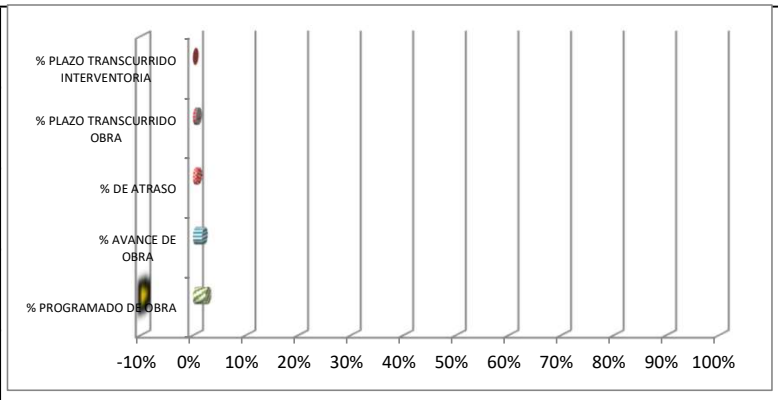

4. CONTROL Y SEGUIMIENTO

4.1 OBSERVACIONES

En caso de posibles atrasos indique las causas y el responsable.

EL PROYECTO PRESENTA RETRASO DE 2,59%, CORRESPONDIENTES A OPTIMIZACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN DE FRENTES DE TRABAJO Y RECURSOS DISPONIBLES.

4.2 COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL EJECUTOR

En caso de retrasos, por favor describir los compromisos, acciones correctivas y el tiempo previsto para subsanar.

EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS Y EL MONITOREO PERMANENTE DEL CRONOGRAMA.

4.3 ACCIONES REALIZADAS

N/A

6. REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripción de la fotografía:

Apertura mecánica y retiro de sobrantes



Descripción de la fotografía:

Reposicion, extendida y compactaciôn de base Granular.



Descripción de la fotografía:

Limpieza de cunetas revestidas



Descripción de la fotografía:

Renivelacion y compactación de la mezcla asfaltica para parcheo

4.5. Formatos de seguimiento de ejecución de obra

TIERRASUA S.A.S
Cel: 316 8174458
gerencia@tierrasua.com
Calle 19 N.9-35 Piso 10 Tunja/Boyacá

4.5.1. Tramo: 60BY15 cruce 6009 - Soracá - Ia y – Tunja

TIERRASUA S.A.S
Cel: 316 8174458
gerencia@tierrasua.com
Calle 19 N.9-35 Piso 10 Tunja/Boyacá

TIERRASUA
¡Conectamos mejor!

CANTIDADES DE PARCHEO

Estimado [ ] Efectuado [ ]

OBRA: Mantenimiento y mejoramiento de la vía con código 608415 en el municipio de Soracá | **Fecha** 20-05-2026

Fecha	Parche	Ubicaciòn		Lado			Dimensiones (m)			Volumenes (m3)			Area de	Volumen Mezcla
	No.	Abcisa Inicio	Abcisa Final	Izq.	Eje	Der	Largo	Ancho	Espesor	Excavacion	Subbase	Base	Liga (m2)	Asfaltica (m3)
22-05-26	1	K0+010.6	K0+018.32	X	X	X	7.72	6.13	0.10	4.73			47.32	4.73
22-05-26	2	K0+018.5	K0+026.9	X	X		8.40	4	0.10	3.36			33.60	3.36
22-05-26	3	K0+043.9	K0+046.57			X	2.67	2.06	0.10	0.55			5.50	0.55
22-05-26	4	K0+070.3	K0+072.4			X	2.10	2.62	0.10	0.55			5.50	0.55
22-05-26	5	K0+085.3	K0+089.96			X	4.66	2.62	0.10	1.22			12.21	1.22
22-05-26	6	K0+094.8	K0+098.3			X	3.50	2.60	0.10	0.91			9.10	0.91
Totales													113.23	11.32

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre	Natalia Sanchez D.	**Nombre**	Mario Paulo Villamil Bautista	**Nombre**	Steeven René Rojas Acero
Cargo	Residente Obra	**Cargo**	Ing. Civil Residente	**Cargo**	Apoyo Supervision Gob. Boyacá
Firma	Natalia S.	**Firma**		**Firma**	

Vo.Bo.
Nombre:
Firma:
Cargo

Scanned with CamScanner

TIERRASUA

CONTROL DE MATERIALES

(RECIBO)

CONTRATO/PLANTA: 3827 de 2025

FECHA: 20-05-26 TIPO DE MATERIAL (Origen): MDC -19

N° DE VIAJE	N° DE VALE	HORA DE LLEGADA	ABSCISA DE DECARGUE	VOLQUETA PLACA	VOLUMEN		FIRMA DEL CONDUCTOR
					VIAJE	ACUMULADO	
1	3746	10:15am	K01010.6	POWE15	7	7	Epimenio Garcío
2	3747	11:00am	K01010.6	OCM236	6.5	13.5	Luis Sanobria

RECIBIDO POR

REVISO

APROBO

Vo.Bo.
Nombre:
Firma:
Cargo

Scanned with

TIERRASUA

REPORTE DE TEMPERATURAS

Contrato No: 3827 de 2025 | Fecha: 20-05-2026

ACTIVIDAD	UBICACIÓN			VOLQUETA			HORA			TEMPERATURA (°C)				ELABORACIÓN DE BRIQUETAS	
	de	a	lado	No. Vale	Cubo Suelto (m3)	Placa No.	Salida	Llega	Extendida	Planta	Recepción	Extendida	Compactación	Cantidad	Identificación
Instalación MDC-19	K0+010.6	K0+098.3	IZQ DER	3746	7	POW815	9:40 am	10:15am	10:23am	160	155	141	121		
Instalación MDC-19	K0+010.6	K0+098.3	IZQ DER	3747	6.5	OCM236	10:25am	11:00am	11:05 am	160	156	144	120		

TOTAL (M3) SUELTOS EN PLANTA: 13.5

NOTA: Verificar en todos los vales de control de materiales despachados de la planta de asfalto, la temperatura de salida de la mezcla.

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre:	Natalia Sanchez Dueñas	María Paula Villamil Bautista	Steeven René Rojas Acero
Cargo:	Residente de Obra	Ing. Civil Residente	Apoyo Supervisión Gob. Boyacá
Firma:	Natalia S.D.C.		

Vo.Bo.
Nombre:
Firma:
Cargo

Scanned with CamScanner

TIERRASUA
¡Conectamos regiones!


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Mantenimiento y mejoramiento de la vía con código 60B415 en el municipio de Soracá

ACTIVIDAD : Instalación de mezcla asfáltica **FECHA :** 22-05-2026

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Mario Paulo Villamil

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

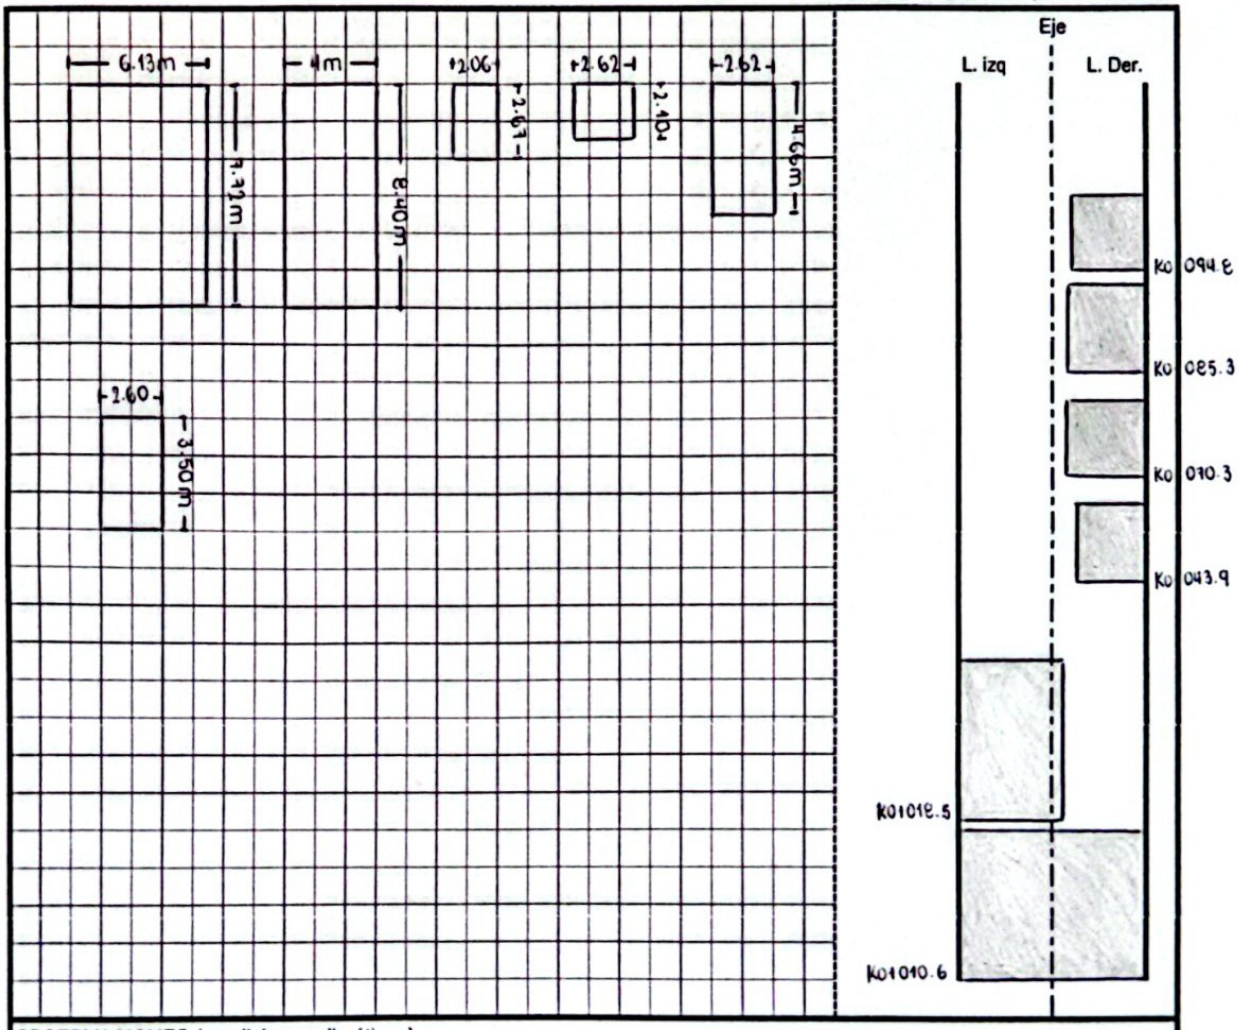

OBSERVACIONES:(condiciones climáticas)

Día soleado

FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO

Vo.Bo.
Nombre: Natalia Sánchez Dueñas
Firma:
Cargo: Residente de Obra.

Scanned with

TIERRASUA

CANTIDADES DE PARCHEO

Estimado [ ] Efectuado [ ]

OBRA: Mantenimiento y mejoramiento de la vía con código 608415 en el municipio de Soracá | **Fecha** 25-05-2026

Fecha	Parche	Ubicaciòn		Lado			Dimensiones (m)			Volumenes (m3)			Area de	Volumen Mezcla
	No.	Abcisa Inicio	Abcisa Final	Izq.	Eje	Der	Largo	Ancho	Espesor	Excavacion	Subbase	Base	Liga (m2)	Asfaltica (m3)
25-05-26	7	KO+115	KO+121.66			X	6.66	2	0.10	1.33			13.32	1.33
25-05-26	8	KO+125.8	KO+134.15			X	8.35	2.84	0.10	2.37			23.71	2.37
25-05-26	9	KO+152.7	KO+163.15	X	X	X	10.45	6.05	0.10	6.32			63.22	6.32
28-05-26	10	KO+038.8	KO+051.65	X	X		12.85	4	0.10	5.14			51.40	5.14
30-05-26	11	KO+051.65	KO+110.65	X	X		59	3.60	0.10	21.24			212.40	21.24
Totales													364.05	36.40

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre	Natalia Sanchez Dueñas	**Nombre**	María Paula Villamil Bautista	**Nombre**	Steeven René Rojas Acero
Cargo	Residente Obra	**Cargo**	Ing. Civil Residente	**Cargo**	Apoyo Supervisión Gob. Boyacá
Firma	Natalia S.D.A.	**Firma**		**Firma**	

Vo.Bo.
Nombre:
Firma:
Cargo

Scanned with CamScanner

TIERRASUA
¡Conectamos regiones!

CONTROL DE MATERIALES

(RECIBO)

CONTRATO/PLANTA: 3827 de 2025

FECHA: 25-05-26 TIPO DE MATERIAL (Origen): MDC - 19

N° DE VIAJE	N° DE VALE	HORA DE LLEGADA	ABSCISA DE DECARGUE	VOLQUETA PLACA	VOLUMEN		FIRMA DEL CONDUCTOR
					VIAJE	ACUMULADO	
1	3760	11:55 am	K0+115	POWE76	7	7	Epimenio Garcia
2	3765	1:05 pm	K0+115	OCM236	5.2	12.2	Luis Sanabria
3	3791	1:04 pm	K0+038 E	TDL394	12	24.2	Pablo Bautista
4	3797	9:45 am	K0+051.65	XRJ013	7	31.2	Luis Soso
5	3799	10:45 am	K0+051.65	UG4967	13	44.2	Danilo Amado

RECIBIDO POR

REVISO

APROBO

Vo.Bo.
Nombre:
Firma:
Cargo

Scanned with

TIERRASUA

CONTROL DE MATERIALES

(RECIBO)

CONTRATO/PLANTA: 3E27 de 2025

FECHA: 25-05-26 TIPO DE MATERIAL (Origen): Base (Santa Lucía)

N° DE VIAJE	N° DE VALE	HORA DE LLEGADA	ABSCISA DE DECARGUE	VOLQUETA PLACA	VOLUMEN		FIRMA DEL CONDUCTOR
					VIAJE	ACUMULADO	
1	7201	5:00 pm		OCM236	7	7	Luis Sanabria

RECIBIDO POR

REVISO

APROBO

Vo.Bo.
Nombre:
Firma:
Cargo

Scanned with

TIERRASUA

REPORTE DE TEMPERATURAS

Contrato No: 3823 de 2025 | Fecha: 25-05-2026

ACTIVIDAD	UBICACIÓN			VOLQUETA			HORA			TEMPERATURA (°C)				ELABORACIÓN DE BRIQUETAS	
	de	a	lado	No. Vale	Cubo Suelto (m3)	Placa No.	Salida	Llega	Extendida	Planta	Recepción	Extendida	Compactación	Cantidad	Identificación
Instalación MDC-19	K0+115	K0+163.15	IZQ DER	3760	7	POWE75	11:22 am	11:55am	12:07pm	160	156	144	119		
Instalación MDC-19	K0+115	K0+163.15	IZQ DER	3765	5.2	OCM236	12:33pm	1:05 pm	1:10 pm	160	156	144	120		
Instalación MDC-19	K0+038.E	K0+051.65	IZQ Eje	3791	12	TOL394	12:20pm	1:04pm	1:30 pm	160	156	141	120		
Instalación MDC-19	K0+051.65	K0+110.65	IZQ Eje	3797	7	XRJ073	9:00am	9:45am	9:53 am	160	156	148	120		
Instalación MDC-19	K0+051.65	K0+110.65	IZQ Eje	3799	13	UG4967	9:52am	10:45am	10:51am	160	155	147	119		

TOTAL (M3) SUELTOS EN PLANTA: 44.2

NOTA: Verificar en todos los vales de control de materiales despachados de la planta de asfalto, la temperatura de salida de la mezcla.

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre:	Natalia Sanchez Duenas	María Paula Villamil Bautista	Steeven René Rojas Acero
Cargo:	Residente de Obra	Ing. Civil Residente	Apoyo Supervisión Gab Depart
Firma:	Natalia S.D.		

Vo.Bo.
Nombre:
Firma:
Cargo

Scanned with CamScanner

TIERRASUA


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Mantenimiento y mejoramiento de la vía con código 60B415 en el municipio de Soracá

ACTIVIDAD: Instalación de mezcla asfáltica **FECHA:** 25-05-2026

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: María Paula Villamil

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

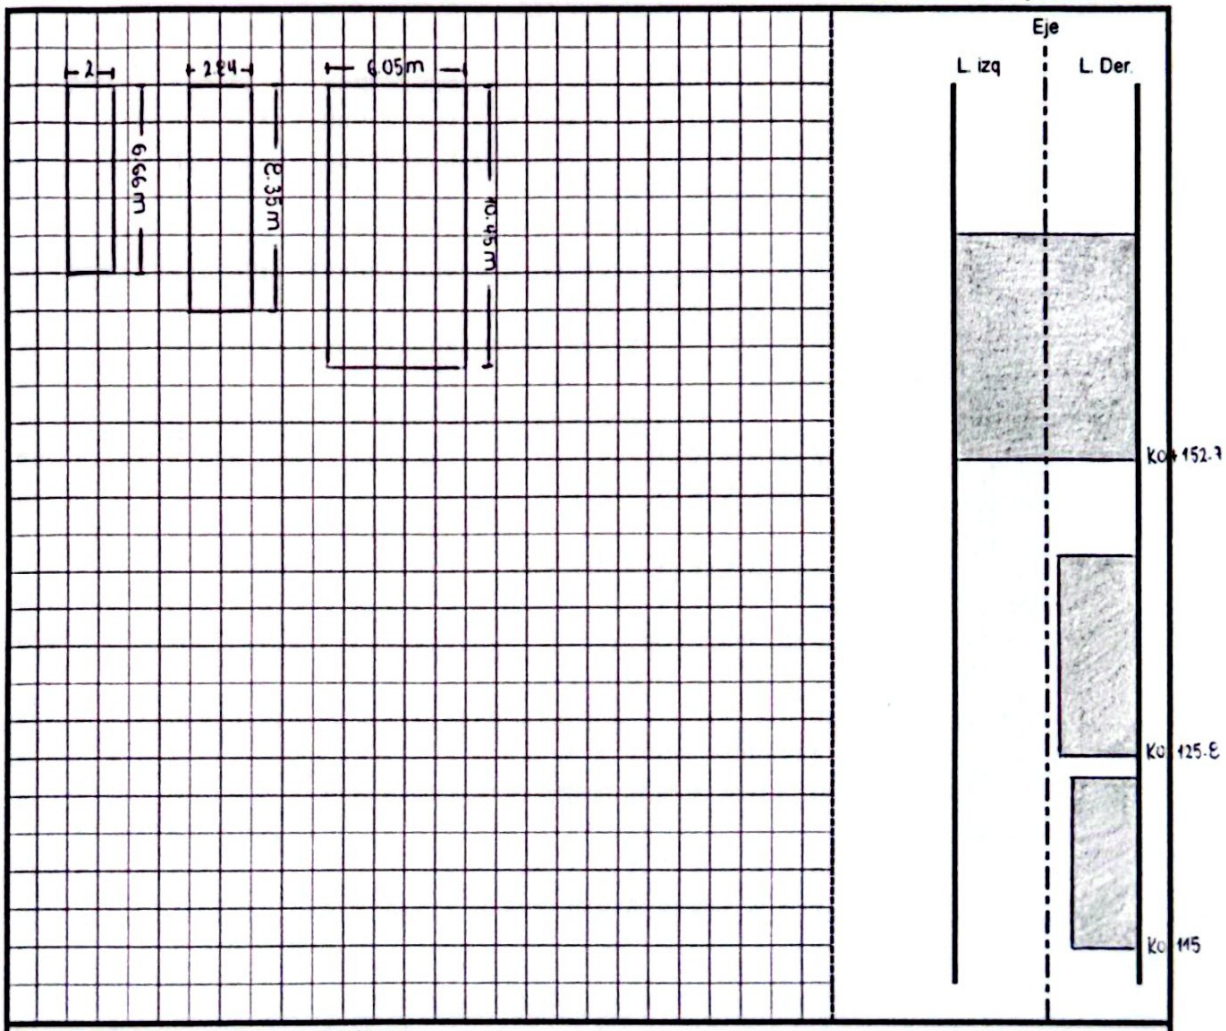

OBSERVACIONES:(condiciones climáticas)

Dió con lloviznas

FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO

Vo.Bo.
Nombre: Natalia Sánchez Dueñas
Firma:
Cargo Residente Obra

Scanned with

TIERRASUA


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Mantenimiento y mejoramiento de la vía con código 608415 en el municipio de Soracá

ACTIVIDAD: Instalación de mezcla asfáltica **FECHA:** 28-05-2026

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Mario Paula Villamil

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

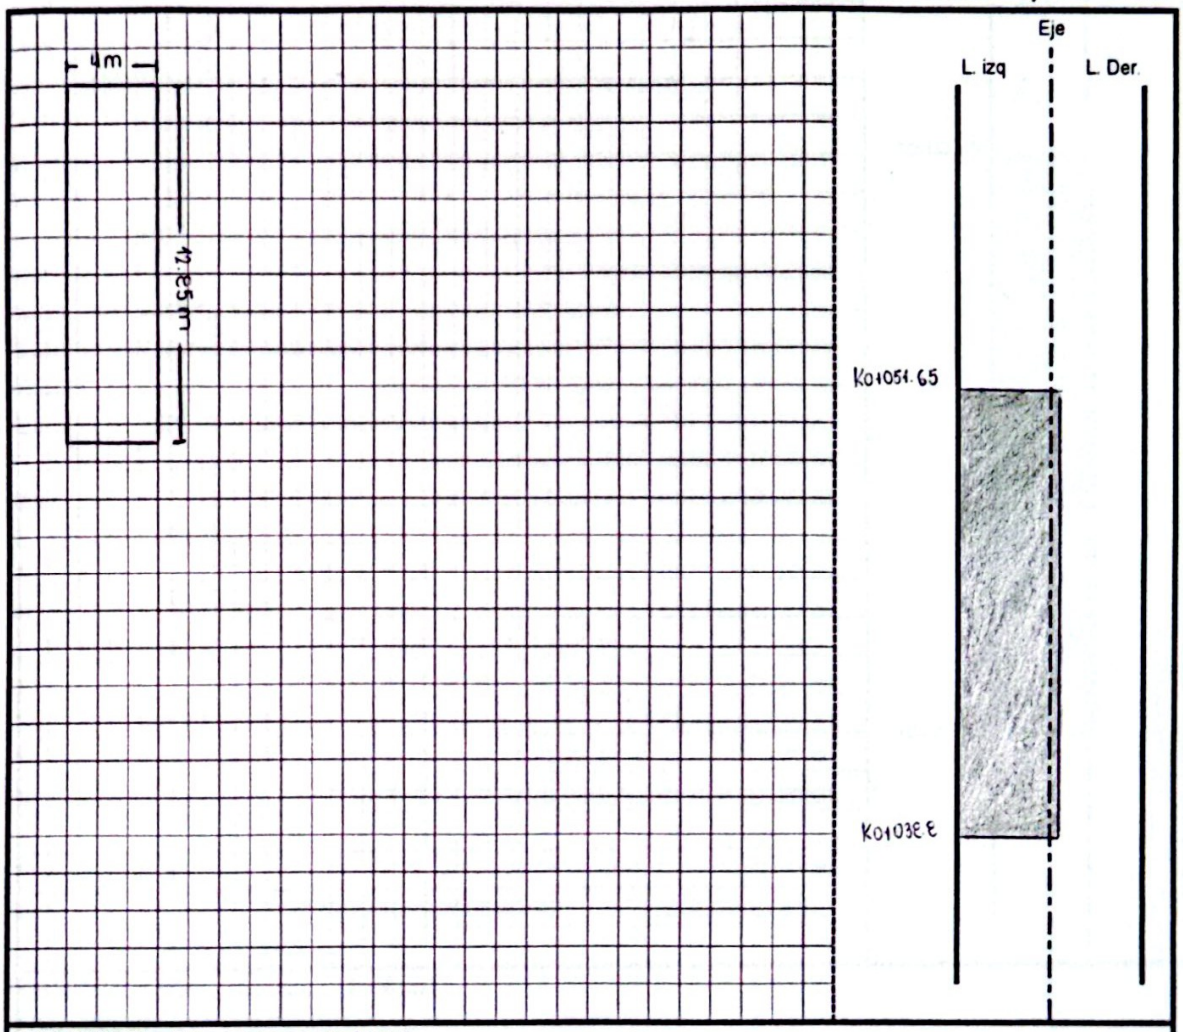

OBSERVACIONES:(condiciones climáticas)

Día con clima variado

FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO

Vo.Bo.

Nombre: Natalia Sanchez Dueñas

Firma:

Cargo: Natalia S. Dueñas
Residente Obra

Scanned with

TIERRASUA
¡Conectamos regiones!


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Mantenimiento y mejoramiento de la vía con código 60By15 en el municipio de Soracá

ACTIVIDAD : Instalación de mezcla asfáltica **FECHA :** 30-05-2026

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: María Paula Villamil

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

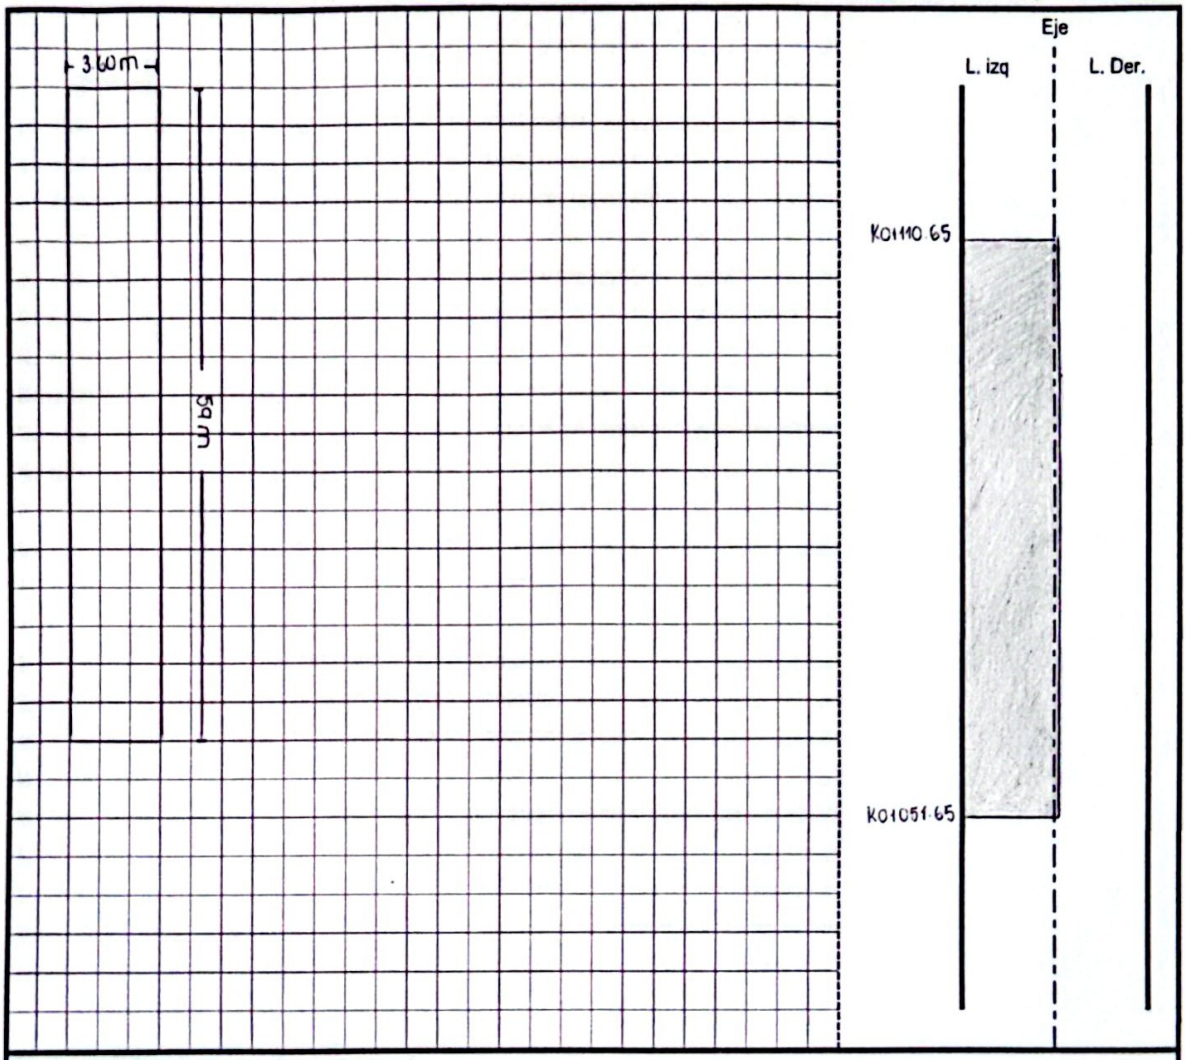

OBSERVACIONES:(condiciones climáticas)

Día soleado

FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO

Vo.Bo.
Nombre: Natalia Sánchez Dueñas
Firma:
Cargo Residente Obra.

Scanned with

4.5.2. Tramo: 55BY14 cruce ruta 5502 – Oicatá – Chivatá

TIERRASUA
Conectamos regiones


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: 3827 de 2025 BTS - Oicatá - Chivatá

ACTIVIDAD : Cajeo e Instalación de sobrecarpeta **FECHA :** 07/05/26

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Pablo Sierra

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

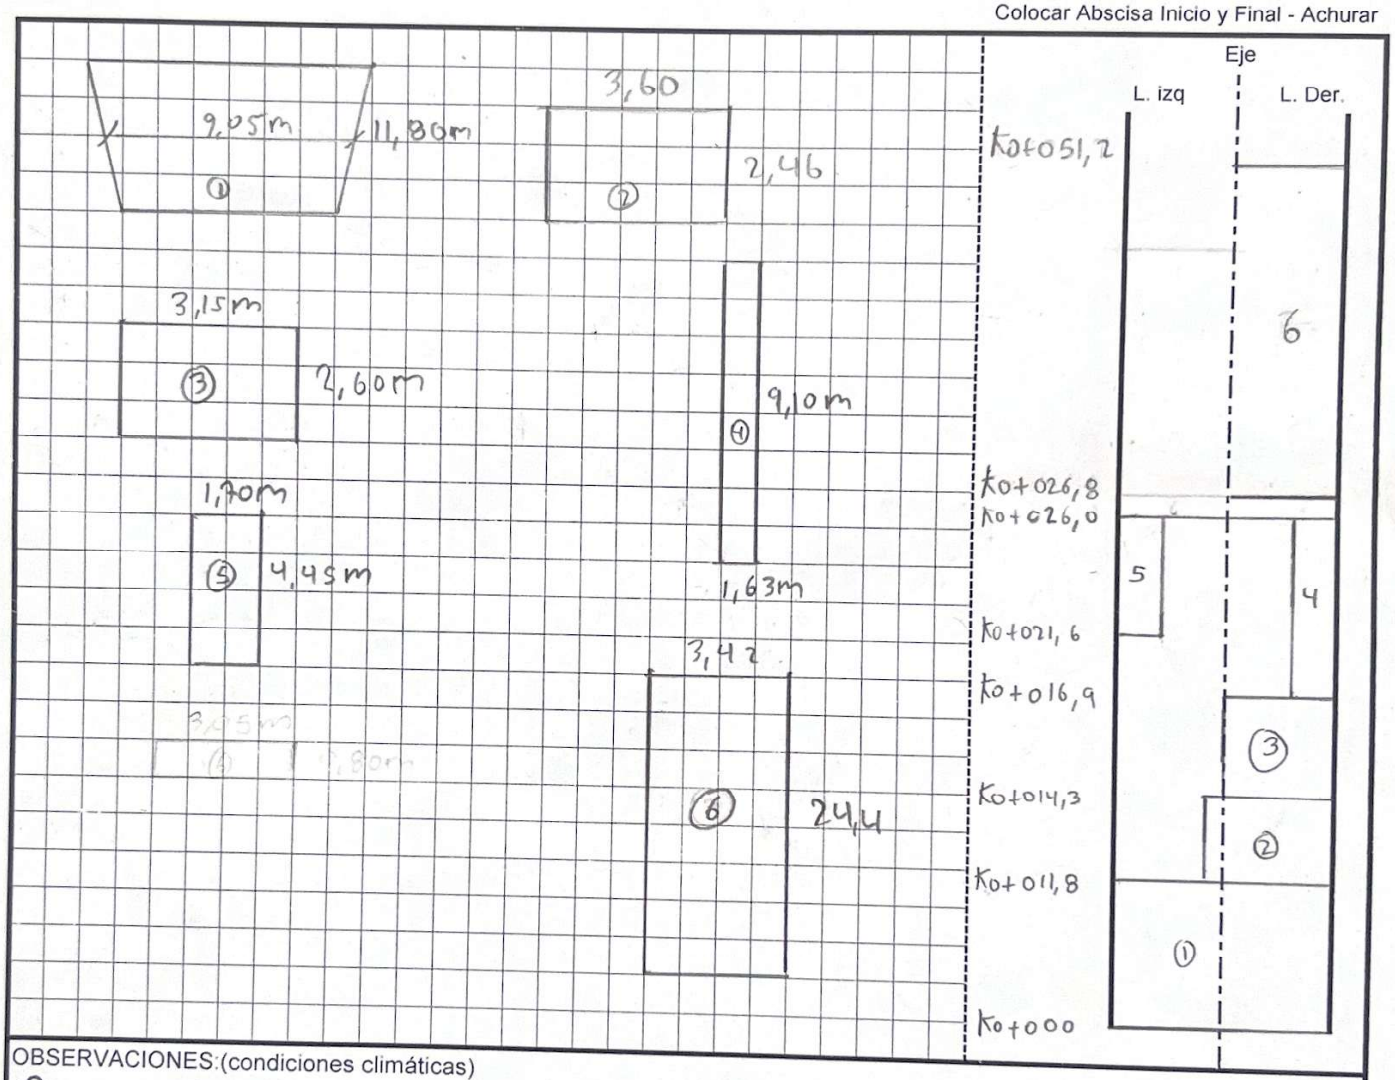

OBSERVACIONES:(condiciones climáticas)

Dia soleado con presencia de nubes



FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO

CANTIDADES DE PARCHEO / FRESADO / ASFALTO

OBRA: Convenio 3827 de 2025 BTS-Oicatá-Chivatá

Fecha	P	F	A	Ubicaciòn		Lado			Dimensiones (m)			Área de Liga / Emulsión	Volumenes (m3)			
				Abcisa I.	Abcisa F.	Izq.	Eje	Der.	Largo	Ancho	Espesor		Excavacion	Subbase	Bas	Asfalto
7/05/2026			X	K0+000	K0+011,8	X	X	X	11,8	9,05	0,08	106,79				8,54
7/05/2026			X	K0+011,8	K0+014,3		X	X	2,46	3,6	0,035	8,86				0,31
7/05/2026			X	K0+014,3	K0+016,9			X	2,6	3,15	0,035	8,19				0,29
7/05/2026			X	K0+016,9	K0+026			X	9,1	1,63	0,035	14,83				0,52
7/05/2026			X	K0+021,6	K0+026	X			4,45	1,7	0,035	7,57				0,26
7/05/2026			X	**K0+011,8**	**K0+026,8**	**X**	**X**	**X**	**15**	**6,3**	**0,04**	**55,06**				2,20
7/05/2026			X	K0+026,8	K0+051,2	X	X	X	24,4	3,42	0,075	83,45				6,26
7/05/2026	X			K0+000	K0+011,8	X	X	X	11,8	9,05	0,035					
7/05/2026	X			K0+011,8	K0+014,3		X	X	2,5	3,6	0,035					
7/05/2026	X			K0+014,3	K0+016,9		X	X	2,6	3,15	0,035					
7/05/2026	X			K0+016,9	K0+026			X	9,1	1,63	0,035					
7/05/2026	X			K0+021,6	K0+026	X			4,45	1,7	0,035					
7/05/2026	X			K0+026,8	K0+051,2		X	X	24,4	3,42	0,035					
Totales																18,38


Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre	Pablo Esteban Sierra Moreno	**Nombre**	Rafael Camilo Suarez Suarez	**Nombre**	N/A
Cargo	Ing. apoyo supervisión	**Cargo**	Ing. apoyo supervisión	**Cargo**	N/A
Firma		**Firma**		**Firma**	

TIERRASUA ¡Conectamos región!	CONTROL DE MATERIALES

Contrato No:Convenio 3827 de 2025 BTS-Oicatá-Chivatá

FECHA	MATERIAL	ABSCISA	HORA DE LLEGADA	VOLQUETA			TEMPERATURA (°C)		ELABORACIÓN DE BRIQUETAS
				N° VALE	PLACA	VOLUMEN	EXT.	COM.	Cantidad
7/05/2026	Asfalto	K0+000	11:40	6373	QKM380	12	155	110	N/A
7/05/2026	Asfalto	K0+035	12:05	6374	OCM218	7	155	100	N/A
7/05/2026	Asfalto	K0+026,8	12:10	6375	OCM217	7	160	95	N/A
TOTAL ASFALTO SUELTO						26			

NOTA: Verificar en todos los vales de control de materiales despachados de la planta de asfalto, la temperatura de salida de la mezcla.

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre:	Pablo E. Sierra Moreno	**Nombre:**	Rafael Camilo Suarez Suarez	**Nombre:**	N/A
Cargo:	Ing. apoyo supervisión	**Cargo:**	Ing. apoyo supervisión	**Cargo:**	N/A
Firma:		**Firma:**		**Firma:**	

TIERRASUA


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: 3827 de 2025 BTS-Oicatá - Chivatá

ACTIVIDAD : Parcheo y Sobrecarpeta **FECHA :** 08-05-26

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Pabb Sierra

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

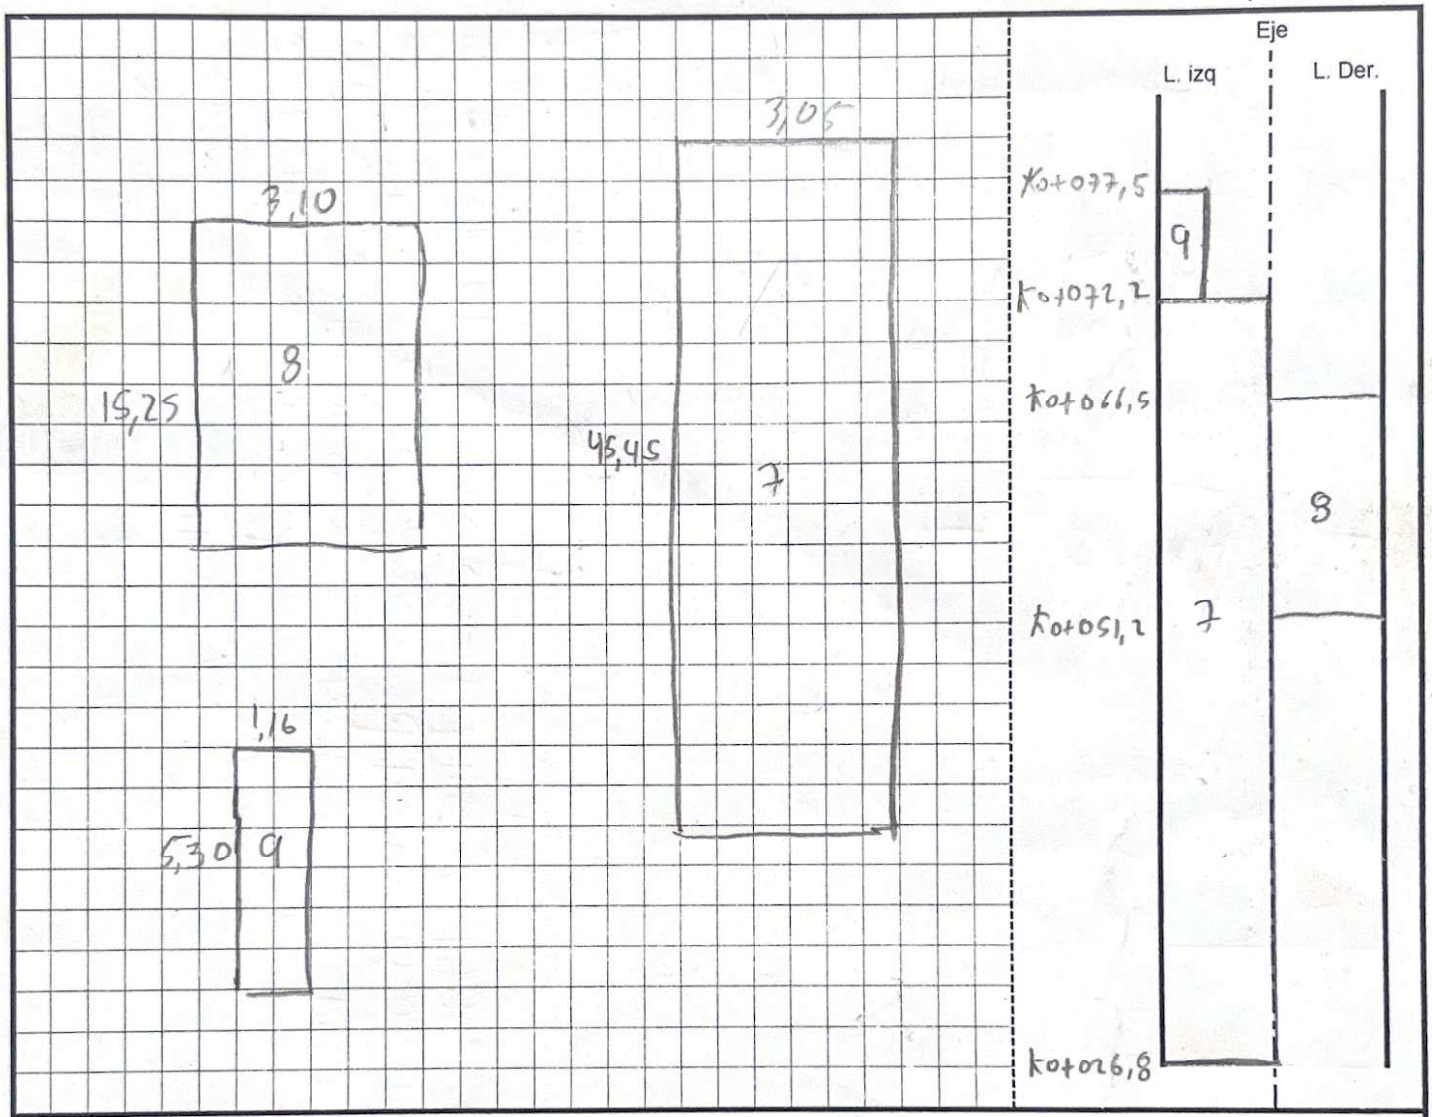

OBSERVACIONES:(condiciones climáticas)

Dia soleado con presencia de nubes

FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO

TIERRASUA


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: 3827 de 2025 BTS- Oicatá-Chivata

ACTIVIDAD : Parches e instalacion de sobrecarpeta FECHA : 08-05-26

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Pablo Sierra

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

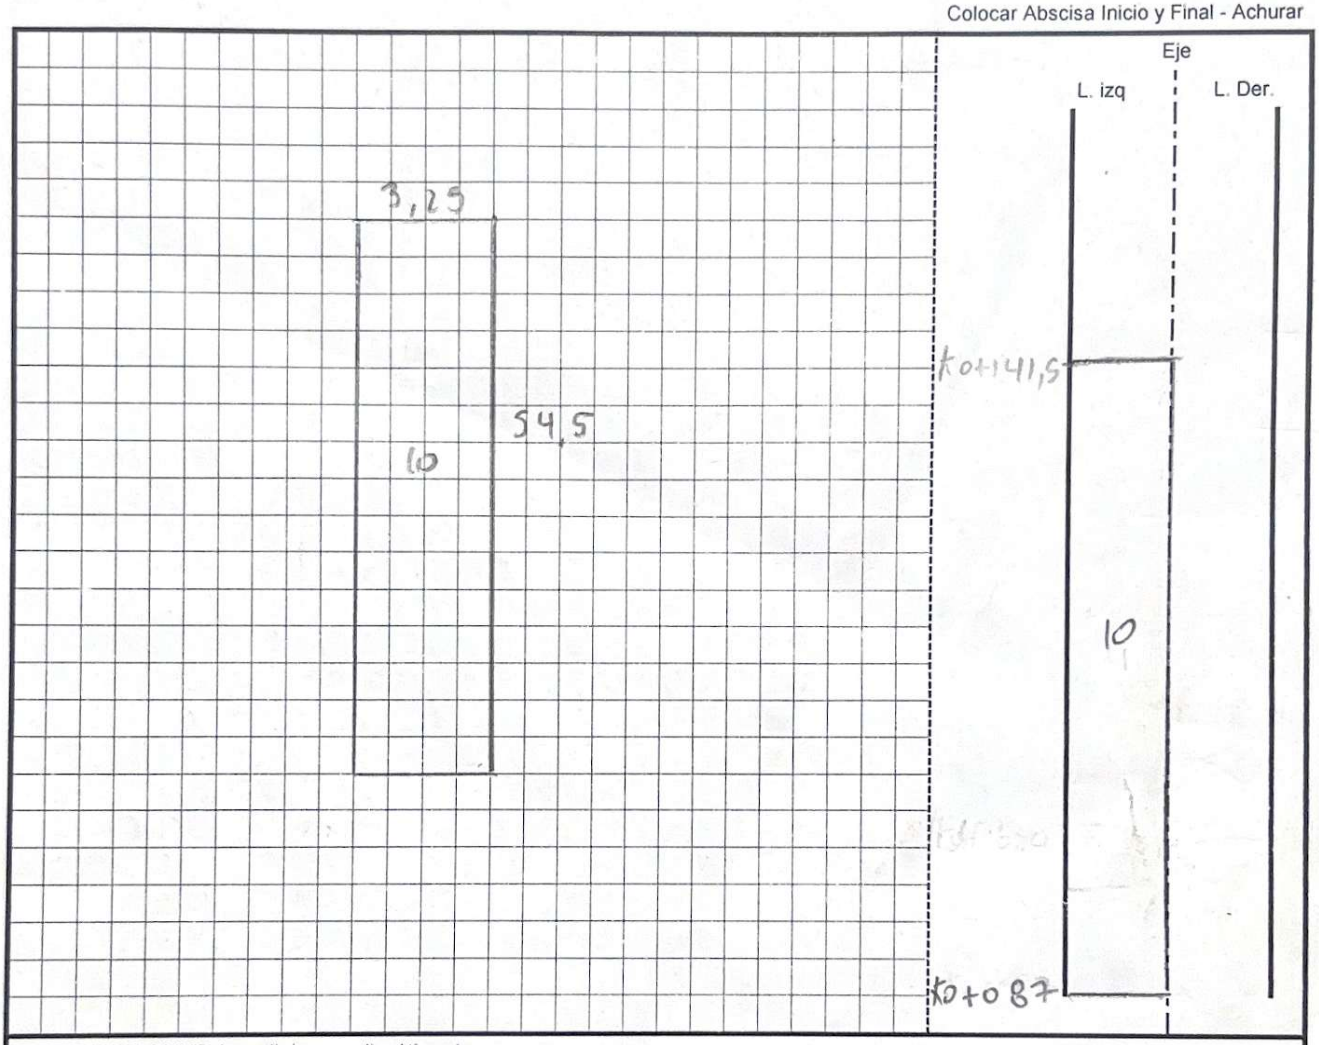

OBSERVACIONES:(condiciones climáticas)

Dia soleado con presencia de nubes

FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO

CANTIDADES DE PARCHEO / FRESADO / ASFALTO

OBRA: Convenio 3827 de 2025 BTS-Oicatá-Chivatá

Fecha	P	F	A	Ubicaciòn		Lado			Dimensiones (m)			Área de Liga / Emulsión	Volumenes (m3)			
				Abcisa I.	Abcisa F.	Izq.	Eje	Der.	Largo	Ancho	Espesor		Excavacion	Subbase	Bas	Asfalto
8/05/2026			X	K0+026,8	K0+072,2	X	X		45,45	3,05	0,06	138,62				8,87
8/05/2026			X	K0+051,2	K0+066,5		X	X	15,25	3,1	0,035	47,28				1,65
8/05/2026			X	K0+072,2	K0+077,5	X			5,3	1,16	0,035	6,15				0,22
8/05/2026			X	K0+087	K0+141,5	X	X		54,5	3,25	0,036	177,13				6,38
8/05/2026			X	K0+026,8	K0+141,5	X	X		114,7	3,15	0,04	361,31				14,45
8/05/2026			X	K0+051,2	K0+101,4		X	X	50,2	3,15	0,04	158,13				6,33
8/05/2026	X			K0+026,8	K0+072,2	X	X		45,45	3,05	0,035					
8/05/2026	X			K0+051,2	K0+066,5			X	15,25	3,1	0,035					
8/05/2026	X			K0+072,2	K0+077,5	X			5,3	1,16	0,035					
8/05/2026	X			K0+087	K0+141,5	X			54,5	3,25	0,035					
Totales																37,90


Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre	Pablo Esteban Sierra Moreno	**Nombre**	Rafael Camilo Suarez Suarez	**Nombre**	N/A
Cargo	Ing. apoyo supervisión	**Cargo**	Ing. apoyo supervisión	**Cargo**	N/A
Firma		**Firma**		**Firma**	

TIERRASUA ¡Conectamos región!	CONTROL DE MATERIALES

Contrato No:Convenio 3827 de 2025 BTS-Oicatá-Chivatá

FECHA	MATERIAL	ABSCISA	HORA DE LLEGADA	VOLQUETA			TEMPERATURA (°C)		ELABORACIÓN DE BRIQUETAS
				N° VALE	PLACA	VOLUMEN	EXT.	COM.	Cantidad
8/05/2026	Asfalto	K0+026,8	11:29	6376	OCM218	7	150	120	N/A
8/05/2026	Asfalto	K0+057	11:45	6377	QKM380	12	140	115	N/A
8/05/2026	Asfalto	K0+093	1:45	6379	OCM218	7	120	110	N/A
8/05/2026	Asfalto	K0+115	1:55	6380	QKM380	8	120	110	N/A
8/05/2026	Asfalto	K0+066,5	1:25	6378	SOO022	14	120	108	N/A
TOTAL ASFALTO SUELTO						48			

NOTA: Verificar en todos los vales de control de materiales despachados de la planta de asfalto, la temperatura de salida de la mezcla.

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre:	Pablo E. Sierra Moreno	**Nombre:**	Rafael Camilo Suarez Suarez	**Nombre:**	N/A
Cargo:	Ing. apoyo supervisión	**Cargo:**	Ing. apoyo supervisión	**Cargo:**	N/A
Firma:		**Firma:**		**Firma:**	

TIERRASUA
Conectamos regiones


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Convenio 3827 de 2025 DTS - Oicatá - Chivatá

ACTIVIDAD: Fresado e instalación de carpeta **FECHA:** 09/05/26

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Ing. Pablo Sierra

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

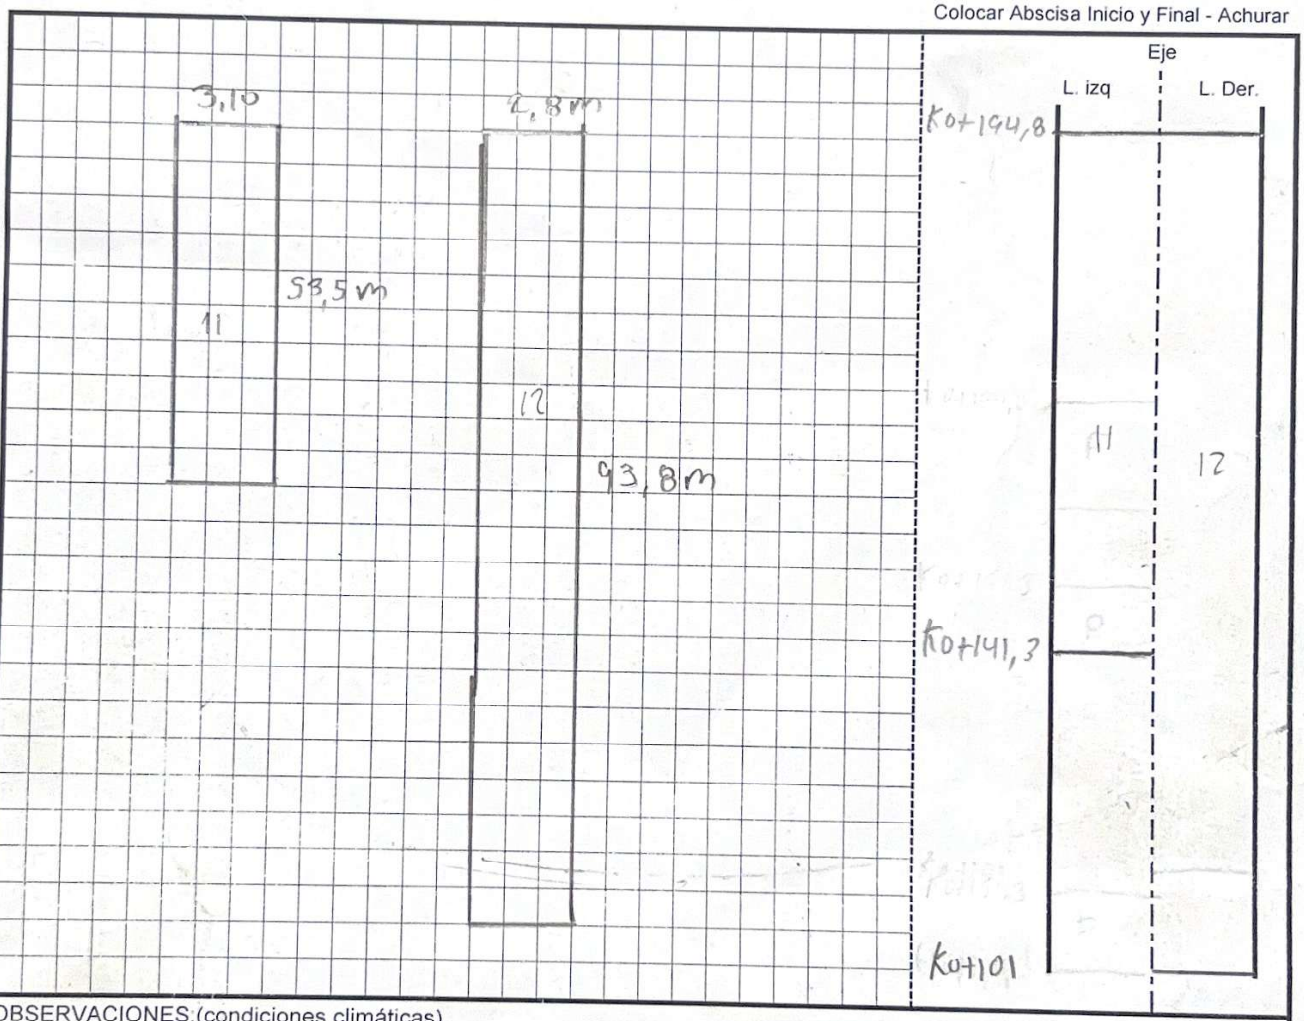

OBSERVACIONES:(condiciones climáticas)

Fue un dia soleado con poca presencia de nubes



FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO

CANTIDADES DE PARCHEO / FRESADO / ASFALTO

OBRA: Convenio 3827 de 2025 BTS-Oicatá-Chivatá

Fecha	P	F	A	Ubicaciòn		Lado			Dimensiones (m)			Área de Liga / Emulsión	Volumenes (m3)			
				Abcisa I.	Abcisa F.	Izq.	Eje	Der.	Largo	Ancho	Espesor		Excavacion	Subbase	Bas	Asfalto
9/05/2026			X	K0+141,3	K0+194,8	X	X		53,5	3,1	0,085	165,85				14,10
9/05/2026			X	K0+101	K0+194,8		X	X	93,8	2,8	0,085	262,64				22,32
9/05/2026		X		K0+141,3	K0+194,8	X	X		53,5	3,1	0,05					
9/05/2026		X		K0+101	K0+194,8			X	93,5	2,8	0,05					
Totales																36,42


Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre	Pablo Esteban Sierra Moreno	**Nombre**	Rafael Camilo Suarez Suarez	**Nombre**	N/A
Cargo	Ing. apoyo supervisión	**Cargo**	Ing. apoyo supervisión	**Cargo**	N/A
Firma		**Firma**		**Firma**	

TIERRASUA ¡Conectamos región!	CONTROL DE MATERIALES

Contrato No:Convenio 3827 de 2025 BTS-Oicatá-Chivatá

FECHA	MATERIAL	ABSCISA	HORA DE LLEGADA	VOLQUETA			TEMPERATURA (°C)		ELABORACIÓN DE BRIQUETAS
				N° VALE	PLACA	VOLUMEN	EXT.	COM.	Cantidad
9/05/2026	Asfalto	K0+141,3	11:25	6381	SOO022	14	120	120	N/A
9/05/2026	Asfalto	K0+185	12:10	6383	OCM218	7	140	120	N/A
9/05/2026	Asfalto	K0+113	11:50	6382	TWO366	13	116	112	N/A
9/05/2026	Asfalto	K0+160	12:40	6384	QKM380	12	108	106	N/A
TOTAL ASFALTO SUELTO						46			

NOTA: Verificar en todos los vales de control de materiales despachados de la planta de asfalto, la temperatura de salida de la mezcla.

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre:	Pablo E. Sierra Moreno	**Nombre:**	Rafael Camilo Suarez Suarez	**Nombre:**	N/A
Cargo:	Ing. apoyo supervisión	**Cargo:**	Ing. apoyo supervisión	**Cargo:**	N/A
Firma:		**Firma:**		**Firma:**	

TIERRASUA
¡Conectamos regiones!


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: 3827 de 2025 BTS-Oriente-Chivatá

ACTIVIDAD: Parcheo e instalación de sobrecarpeta FECHA: 11/05/26

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Pablo Sierra

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

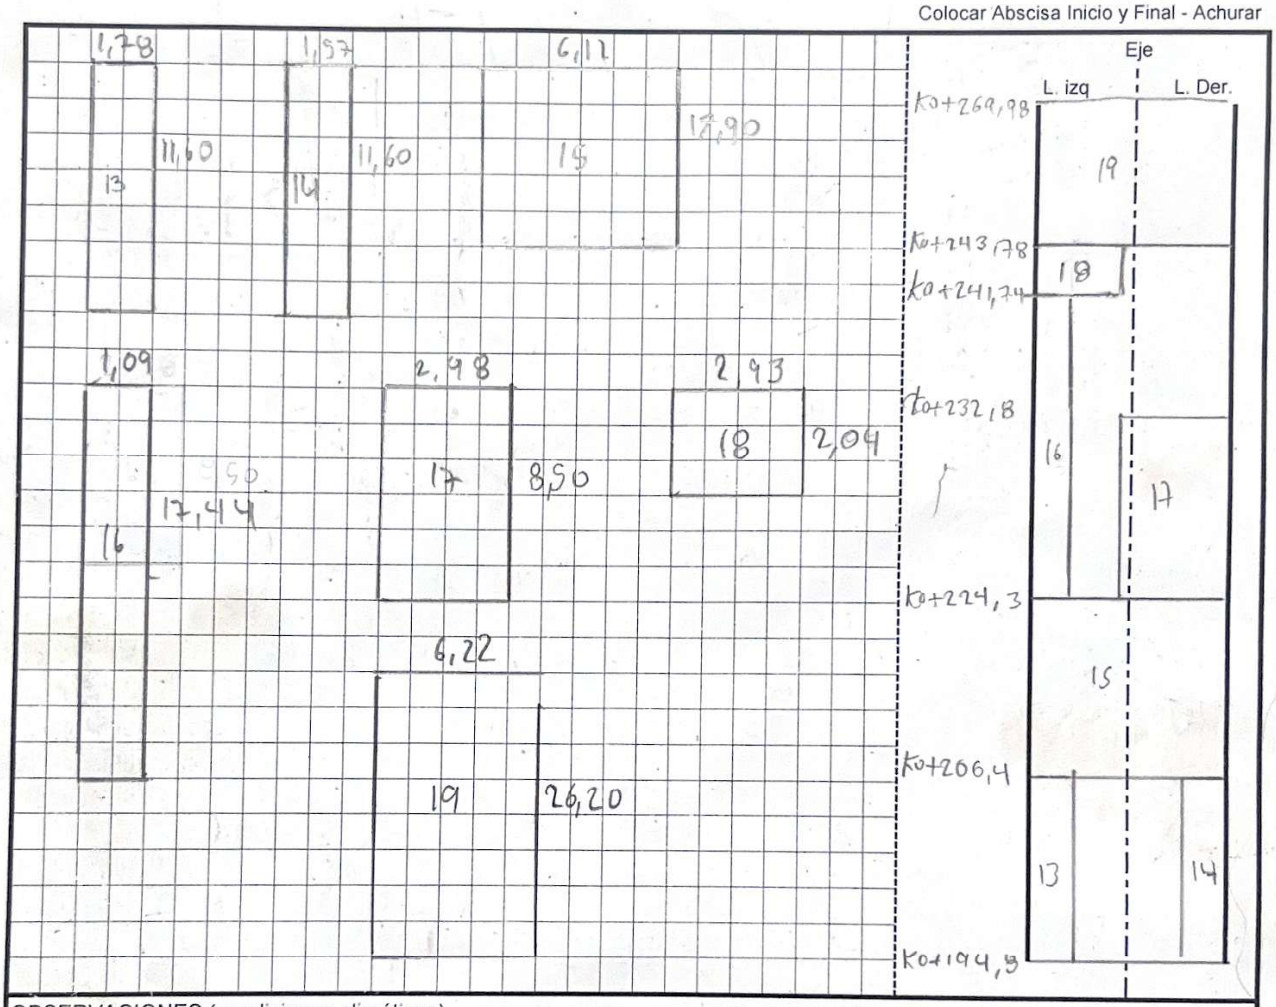

OBSERVACIONES:(condiciones climáticas)

Día nublado con lluvizna en parte del día

FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO

TIERRASUA
Conectamos regiones


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: 3927 de 2025 BTJ-Oiraté - Chivatá

ACTIVIDAD: Perfileo e instalación de sobrecarpeta FECHA: 11/05/26

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Pablo Sierra

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

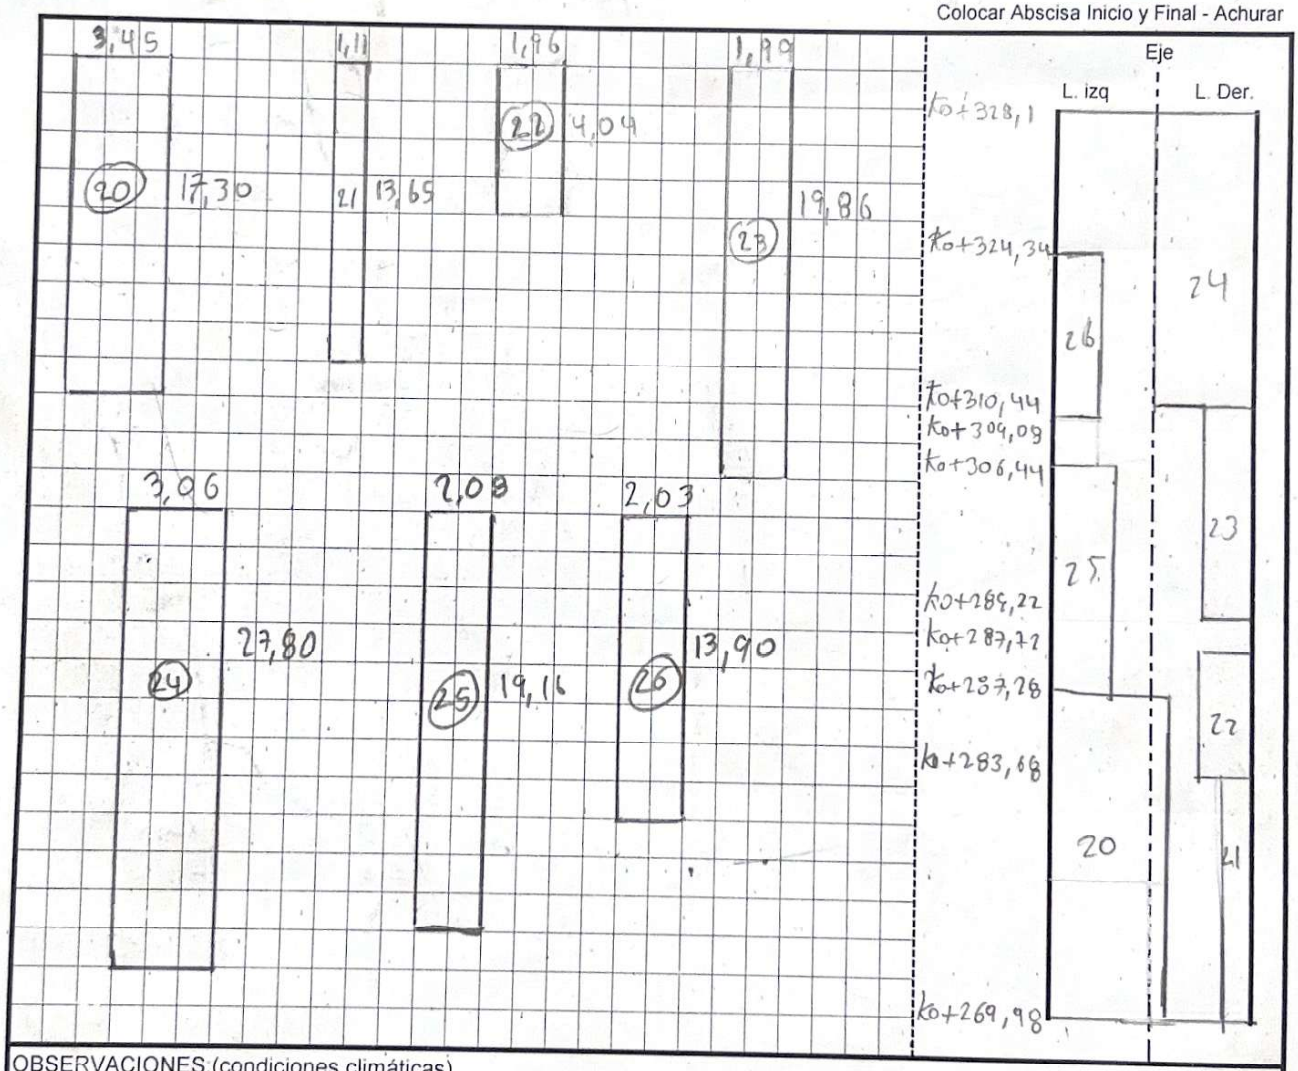

OBSERVACIONES (condiciones climáticas)

Dia nublado con lloviza en parte del dia

FIRMA QUIEN ELABORO


FIRMA INGENIERO

TIERRASUA

CANTIDADES DE PARCHEO / FRESADO / ASFALTO

OBRA: Convenio 3827 de 2025 BTS-Oicatá-Chivatá

Fecha	P	F	A	Ubicaciòn		Lado			Dimensiones (m)			Área de Liga / Emulsión	Volumenes (m3)			
				Abcisa I.	Abcisa F.	Izq.	Eje	Der.	Largo	Ancho	Espesor		Excavacion	Subbase	Bas	Asfalto
11/05/2026			X	K0+194,8	K0+206,4			X	11,60	1,57	0,04	18,21				0,73
11/05/2026			X	K0+206,4	K0+224,3	X	X	X	17,9	6,12	0,05	109,55				5,48
11/05/2026			X	K0+224,3	K0+232,8		X	X	8,5	2,98	0,04	25,33				1,01
11/05/2026			X	K0+243,78	K0+269,98	X	X	X	26,2	6,22	0,025	162,96				4,07
11/05/2026			X	K0+269,98	K0+283,68			X	13,65	1,11	0,035	15,15				0,53
11/05/2026			X	K0+283,68	K0+287,28			X	4,04	1,96	0,04	7,92				0,32
11/05/2026			X	K0+289,22	K0+309,08			X	19,86	1,99	0,04	39,52				1,58
11/05/2026			X	K0+309,08	K0+328,1		X	X	19,02	3,06	0,045	58,20				2,62
11/05/2026			X	K0+194,8	K0+328,1		X	X	133,3	3,1	0,035	413,23				14,46
11/05/2026		X		K0+194,8	K0+206,4	X			11,6	1,78	0,04					
11/05/2026		X		K0+194,8	K0+206,4			X	11,6	1,57	0,04					
11/05/2026		X		K0+206,4	K0+224,3	X	X	X	17,9	6,12	0,05					
11/05/2026		X		K0+224,3	K0+241,74	X			17,44	1,09	0,035					
11/05/2026		X		K0+224,3	K0+232,8		X	X	8,5	2,98	0,04					
11/05/2026		X		K0+241,74	K0+243,78	X	X		2,04	2,93	0,05					
11/05/2026		X		K0+243,78	K0+269,98	X	X	X	26,2	6,22	0,05					
11/05/2026		X		K0+269,98	K0+287,28	X	X		17,3	3,45	0,06					
11/05/2026		X		K0+269,98	K0+283,68			X	13,65	1,11	0,035					
11/05/2026		X		K0+283,68	K0+287,28			X	4,04	1,96	0,04					
11/05/2026		X		K0+289,22	K0+309,08			X	19,86	1,99	0,04					
11/05/2026		X		K0+309,08	K0+328,1		X	X	19,02	3,06	0,045					
11/05/2026		X		K0+287,28	K0+306,44	X			19,16	2,08	0,05					
11/05/2026		X		K0+310,44	K0+324,34	X			13,9	2,03	0,055					
Totales																30,80


Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre	Pablo Esteban Sierra Moreno	**Nombre**	Rafael Camilo Suarez Suarez	**Nombre**	N/A
Cargo	Ing. apoyo supervisión	**Cargo**		**Cargo**	N/A
Firma		**Firma**		**Firma**	

TIERRASUA ¡Conectamos región!	CONTROL DE MATERIALES

Contrato No:Convenio 3827 de 2025 BTS-Oicatá-Chivatá

FECHA	MATERIAL	ABSCISA	HORA DE LLEGADA	VOLQUETA			TEMPERATURA (°C)		ELABORACIÓN DE BRIQUETAS
				N° VALE	PLACA	VOLUMEN	EXT.	COM.	Cantidad
11/05/2026	Asfalto	K0+194,8	2:10	6392	OCM213	7	130	118	N/A
11/05/2026	Asfalto	K0+217	2:40	6393	QKM380	12	128	112	N/A
11/05/2026	Asfalto	K0+260	2:58	6394	OCM218	7	134	110	N/A
11/05/2026	Asfalto	K0+283	3:30	6395	SOO022	12,5	124	116	N/A
TOTAL ASFALTO SUELTO						38,5			

NOTA: Verificar en todos los vales de control de materiales despachados de la planta de asfalto, la temperatura de salida de la mezcla.

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre:	Pablo E. Sierra Moreno	**Nombre:**	Rafael Camilo Suarez Suarez	**Nombre:**	N/A
Cargo:	Ing. apoyo supervisión	**Cargo:**	Ing. apoyo supervisión	**Cargo:**	N/A
Firma:		**Firma:**		**Firma:**	

TIERRASUA


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: 3827 de 2025 DTS-Oicatá-Chivatá

ACTIVIDAD: Fresado e instalación de sobrecarpeta FECHA: 12/05/26

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Pablo Sierra

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

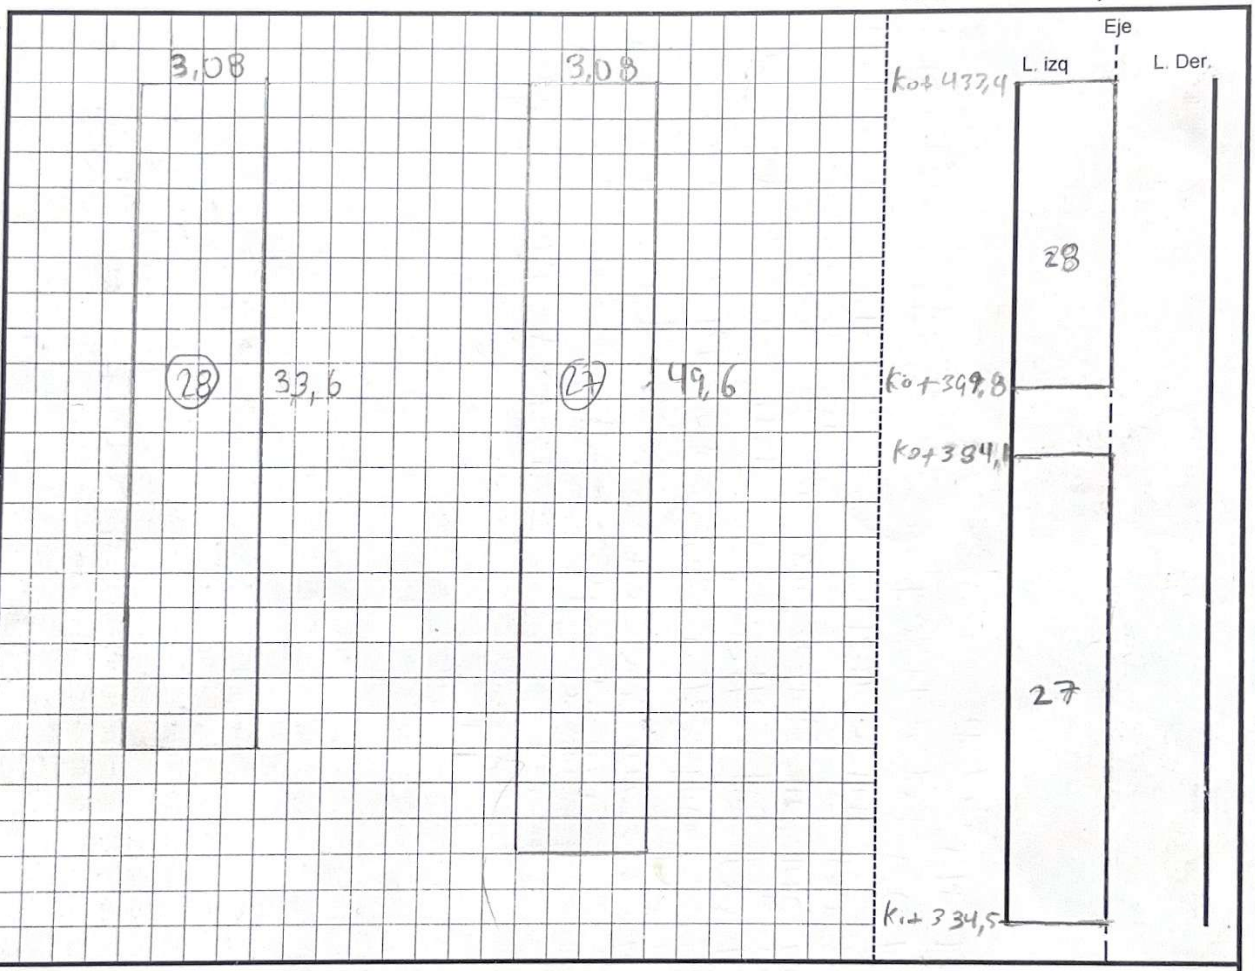

OBSERVACIONES:(condiciones climáticas)

Día soleado con presencia de nubes

FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO

TIERRASUA
¡Conectamos regiones!


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: 3827 de 2025 BTS-Oicatá-Chivatá

ACTIVIDAD : Parcheo, fresado e instalación de Sobrecapa **FECHA :** 12/09/26

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Pablo Sierra

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

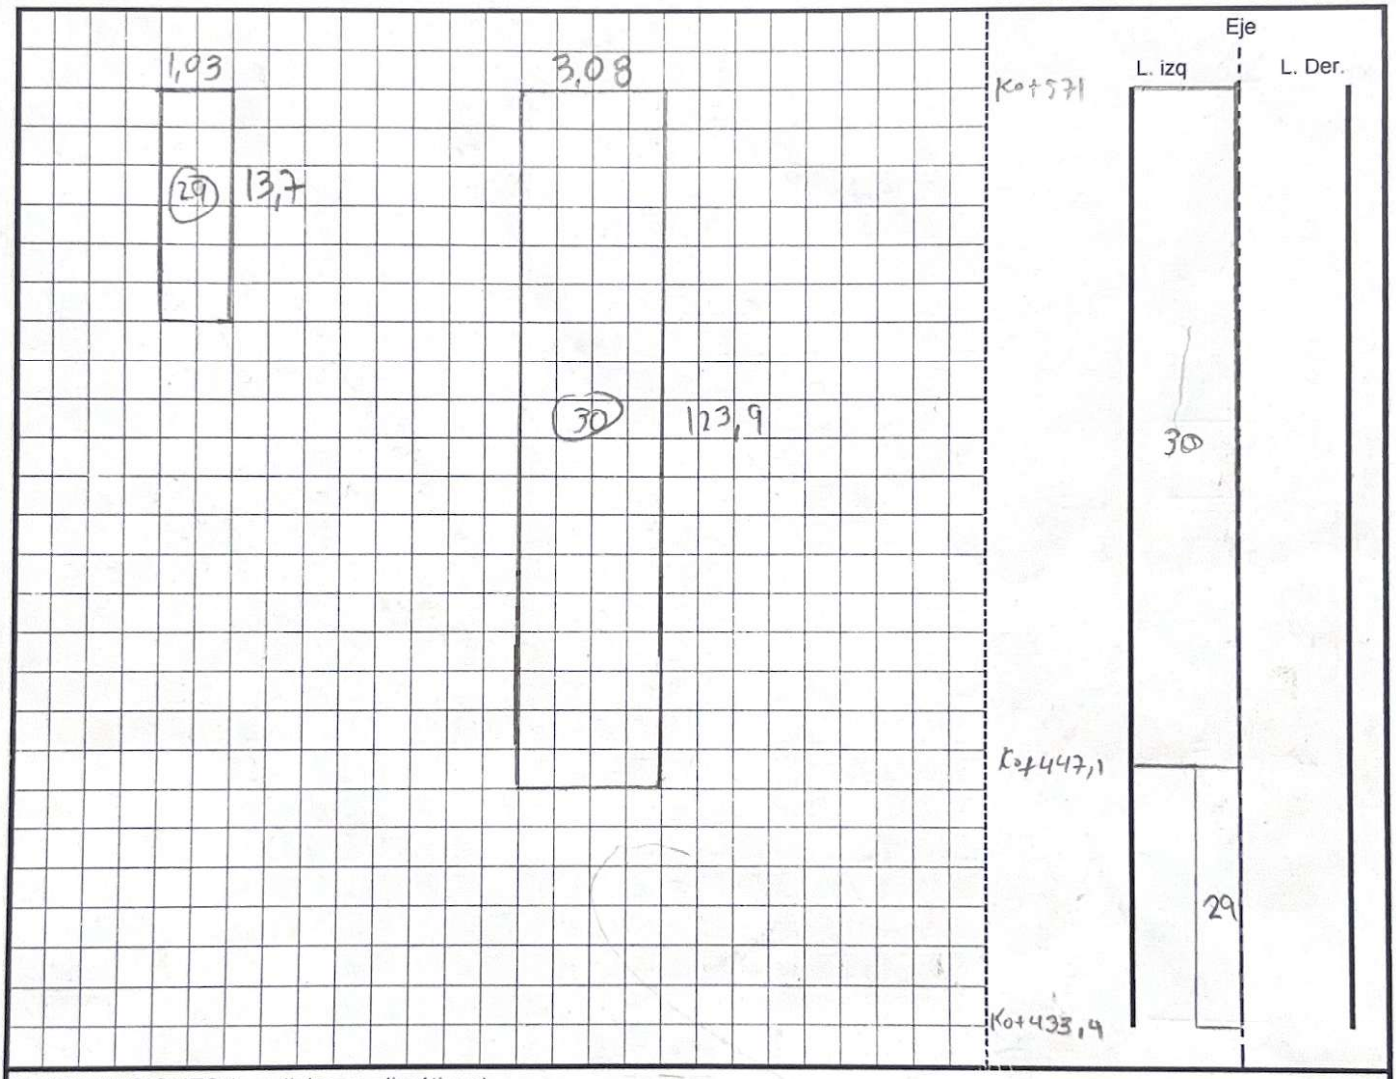

OBSERVACIONES:(condiciones climáticas)

Día soleado con presencia de nubes


FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO

TIERRASUA	CANTIDADES DE PARCHEO / FRESADO / ASFALTO

OBRA: Convenio 3827 de 2025 BTS-Oicatá-Chivatá

Fecha	P	F	A	Ubicaciòn		Lado			Dimensiones (m)			Área de Liga / Emulsión	Volumenes (m3)			
				Abcisa I.	Abcisa F.	Izq.	Eje	Der.	Largo	Ancho	Espesor		Excavacion	Subbase	Bas	Asfalto
12/05/2026			X	K0+194,8	K0+206,4	X			11,60	1,78	0,04	20,65				0,83
12/05/2026			X	K0+224,3	K0+241,74	X			17,44	1,09	0,04	19,01				0,76
12/05/2026			X	K0+241,74	K0+243,78	X	X		2,04	2,93	0,04	5,98				0,24
12/05/2026			X	K0+243,78	K0+269,98	X	X		26,2	3,11	0,04	81,48				3,26
12/05/2026			X	K0+269,98	K0+287,28	X	X		17,3	3	0,04	51,90				2,08
12/05/2026			X	K0+287,28	K0+306,44	X			19,16	2,08	0,04	39,85				1,59
12/05/2026			X	K0+310,44	K0+324,34	X			13,9	2,03	0,04	28,22				1,13
12/05/2026			X	**K0+194,8**	**K0+487**	X	X		292,2	3,08	0,042	899,98				37,80
12/05/2026			X	K0+334,5	K0+384,1	X	X		49,6	3,08	0,045	152,77				6,87
12/05/2026			X	K0+399,8	K0+433,4	X	X		33,6	3,08	0,04	103,49				4,14
12/05/2026			X	K0+433,4	K0+447,1	X			13,7	1,03	0,04	14,11				0,56
12/05/2026			X	K0+447,1	K0+487	X	X		39,9	3,08	0,04	122,89				4,92
12/05/2026		X		K0+334,5	K0+384,1	X	X		49,6	3,08	0,03					
12/05/2026		X		K0+399,8	K0+433,4	X	X		33,6	3,08	0,05					
12/05/2026		X		K0+433,4	K0+447,1		X		13,7	1,03	0,05					
12/05/2026		X		K0+447,1	K0+571	X	X		123,9	3,08	0,085					
Totales																64,18

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre	Pablo Esteban Sierra Moreno	**Nombre**	Rafael Camilo Suarez Suarez	**Nombre**	N/A
Cargo	Ing. apoyo supervisión	**Cargo**	Ing. apoyo supervisión	**Cargo**	N/A
Firma		**Firma**		**Firma**	

TIERRASUA
¡Conectamos región!

CONTROL DE MATERIALES

Contrato No: CONVENIO 3827 DE 2025 BTS-OICATÁ-CHIVATÁ

FECHA	MATERIAL	ABSCISA	HORA DE LLEGADA	VOLQUETA			TEMPERATURA (°C)		ELABORACIÓN DE BRIQUETAS
				N° VALE	PLACA	VOLUMEN	EXT.	COM.	Cantidad
12/05/2026	Asfalto	K0+194,8	9:30	6396	SOO022	14	120	118	N/A
12/05/2026	Asfalto	K0+255	9:58	6398	QKM380	12	132	120	N/A
12/05/2026	Asfalto	K0+308	10:15	6399	OCM213	7	130	110	N/A
12/05/2026	Asfalto	K0+335	10:30	6400	OCM218	7	130	120	N/A
12/05/2026	Asfalto	K0+360	2:55	6408	SOO022	14	138	120	N/A
12/05/2026	Asfalto	K0+402	3:20	6409	QKM380	12	134	111	N/A
12/05/2026	Asfalto	K0+438	3:35	6410	OCM213	7	115	108	N/A
12/05/2026	Asfalto	K0+460	4:02	6411	OCM218	7	138	120	N/A
TOTAL ASFALTO SUELTO						80			

NOTA: Verificar en todos los vales de control de materiales despachados de la planta de asfalto, la temperatura de salida de la mezcla.

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre:	Pablo E. Sierra Moreno	Nombre:	Rafael Camilo Suarez Suarez	Nombre:	N/A
Cargo:	Ing. apoyo supervisión	Cargo:	Ing. apoyo supervisión	Cargo:	N/A
Firma:		Firma:		Firma:	

TIERRASUA


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Convenio 3827 de 2025 Oicatá-Chivatá-BTS

ACTIVIDAD: fresado e instalación de Sobrecarpeta FECHA: 13/05/26

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Pablo Sierra

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

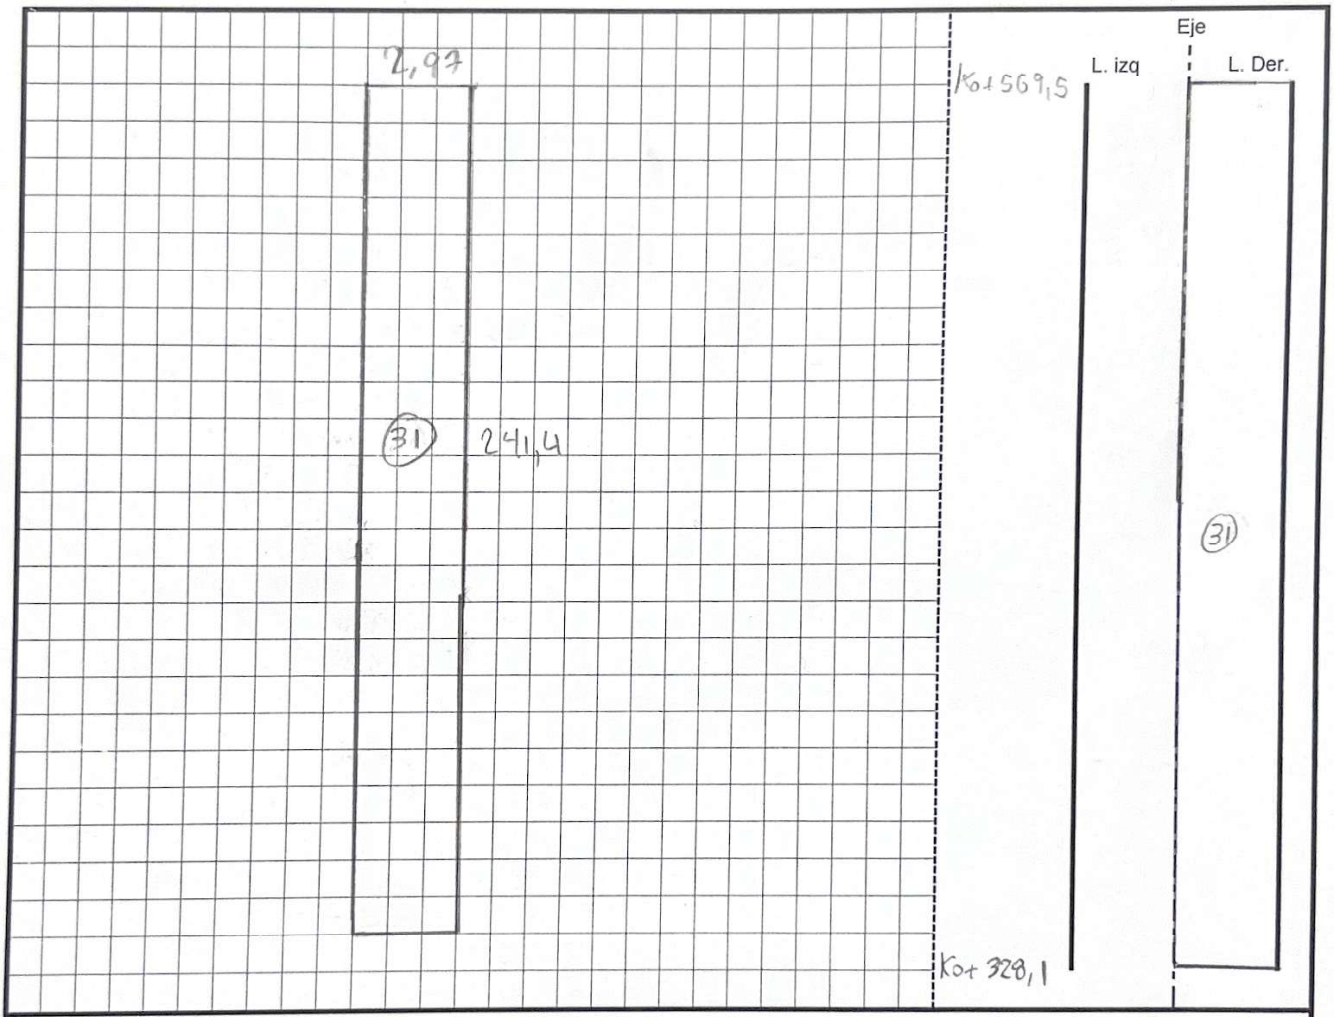

OBSERVACIONES:(condiciones climáticas)

Dia nublado con llovizna en parte del dia

FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO

TIERRASUA
¡Conectamos regiones!


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Convenio 3827 de 2025 BTS-Oicatá-Chivatá

ACTIVIDAD: fresado e instalación de sobrecarpeta **FECHA:** 13/05/26

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Edib Sierra

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

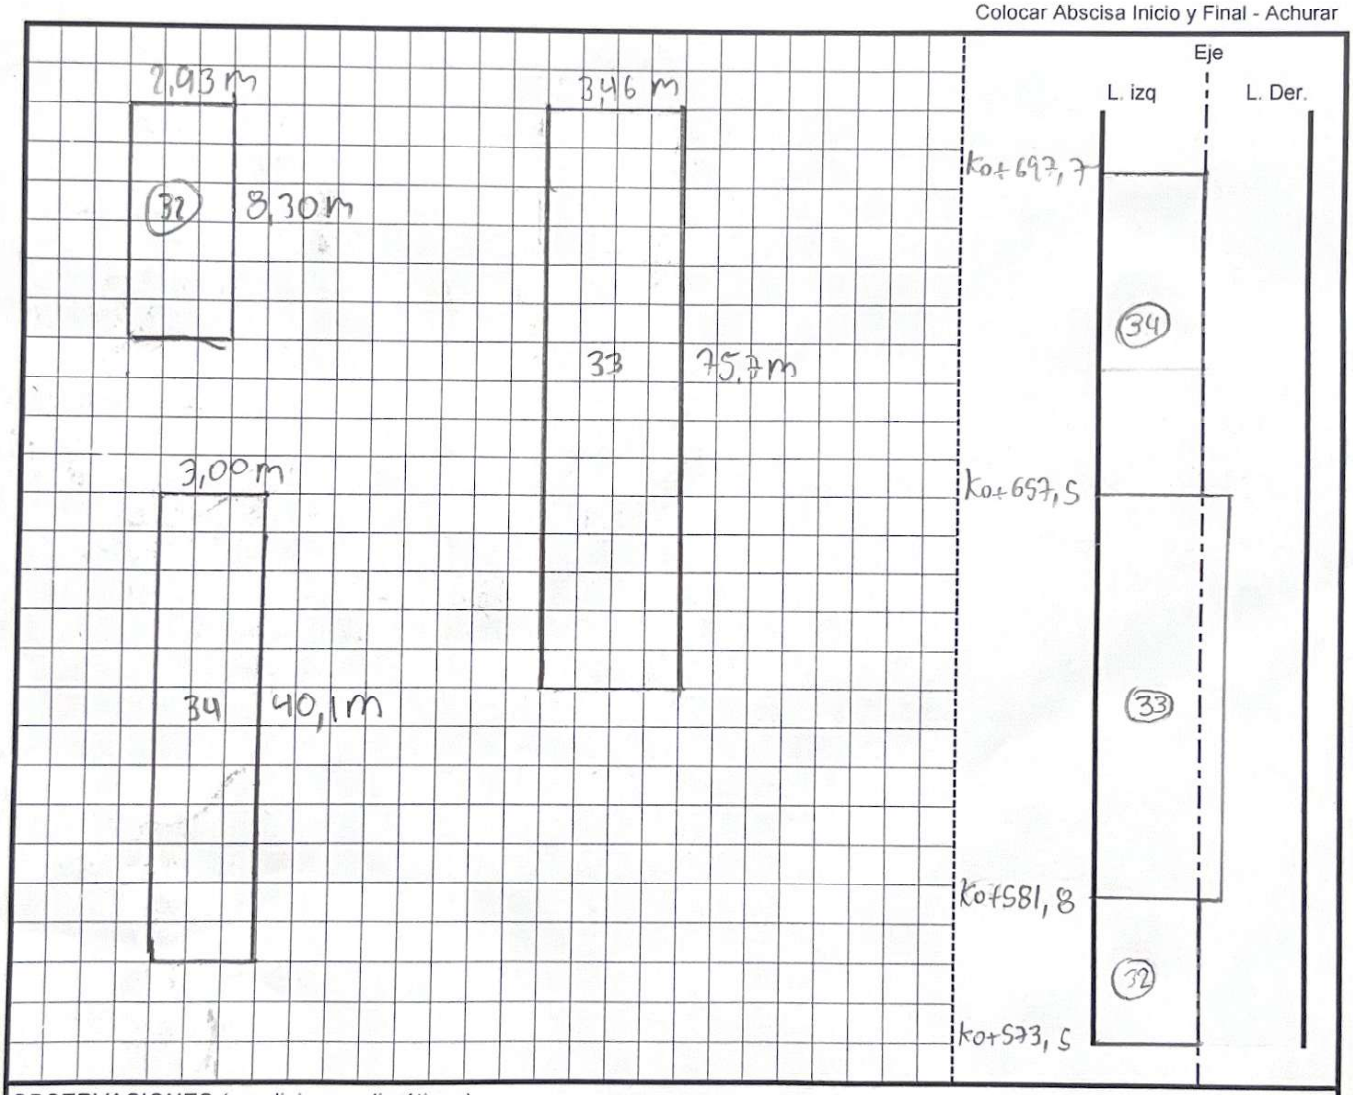

OBSERVACIONES: (condiciones climáticas)

Dia nublado con partes del dia con llovizna


FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO

CANTIDADES DE PARCHEO / FRESADO / ASFALTO

OBRA: Convenio 3827 de 2025 BTS-Oicatá-Chivatá

Fecha	P	F	A	Ubicaciòn		Lado			Dimensiones (m)			Área de Liga / Emulsión	Volumenes (m3)			
				Abcisa I.	Abcisa F.	Izq.	Eje	Der.	Largo	Ancho	Espesor		Excavacion	Subbase	Bas	Asfalto
13/05/2026			X	K0+328,1	K0+455		X	X	126,90	3,05	0,08	387,05				29,03
13/05/2026			X	K0+455	K0+487		X	X	32	3	0,06	96,00				5,76
13/05/2026			X	K0+487	K0+571	X	X	X	84	6,15	0,05	516,60				25,83
13/05/2026			X	K0+573	K0+592,3	X	X		19,3	3,3	0,05	63,69				3,18
13/05/2026		X		K0+328,1	K0+569,5		X	X	2,97	241,4	0,08					
13/05/2026		X		K0+573,5	K0+581,8	X	X		2,93	8,3	0,075					
13/05/2026		X		K0+581,8	K0+657,5	X	X		3,46	75,7	0,08					
13/05/2026		X		K0+657,5	K0+697,6	X	X		3	40,1	0,075					
Totales																63,80


Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre	Pablo Esteban Sierra Moreno	**Nombre**	Rafael Camilo Suarez Suarez	**Nombre**	N/A
Cargo	Ing. apoyo supervisión	**Cargo**	Ing. apoyo supervisión	**Cargo**	N/A
Firma		**Firma**		**Firma**	

	CONTROL DE MATERIALES

Contrato No:Convenio 3827 de 2025 BTS-Oicatá-Chivatá

FECHA	MATERIAL	ABSCISA	HORA DE LLEGADA	VOLQUETA			TEMPERATURA (°C)		ELABORACIÓN DE BRIQUETAS
				N° VALE	PLACA	VOLUMEN	EXT.	COM.	Cantidad
13/05/2026	Asfalto	K0+328,1	9:55	6412	SOO022	14	125	115	N/A
13/05/2026	Asfalto	K0+373	10:20	6413	QKM380	12	130	108	N/A
13/05/2026	Asfalto	K0+414	10:40	6414	OCM218	7	144	124	N/A
13/05/2026	Asfalto	K0+457,6	12:50	6418	THZ021	14	136	118	N/A
13/05/2026	Asfalto	K0+495	2:52	6422	SOO022	14	132	110	N/A
13/05/2026	Asfalto	K0+520	3:20	6423	QKM380	12	124	110	N/A
13/05/2026	Asfalto	K0+561	3:54	6424	OCM218	7	132	116	N/A
TOTAL ASFALTO SUELTO						80			

NOTA: Verificar en todos los vales de control de materiales despachados de la planta de asfalto, la temperatura de salida de la mezcla.

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre:	Pablo E. Sierra Moreno	Nombre:	Rafael Camilo Suarez Suarez	Nombre:	N/A
Cargo:	Ing. apoyo supervisión	Cargo:	Ing. apoyo supervisión	Cargo:	N/A
Firma:		Firma:		Firma:	

TIERRASUA


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Convenio 3927 de 2025 BTS-Oicatá-Chivatá

ACTIVIDAD: Fresado e instalación de Sobrecarpeta FECHA: 15/05/26

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Pablo Sierra

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

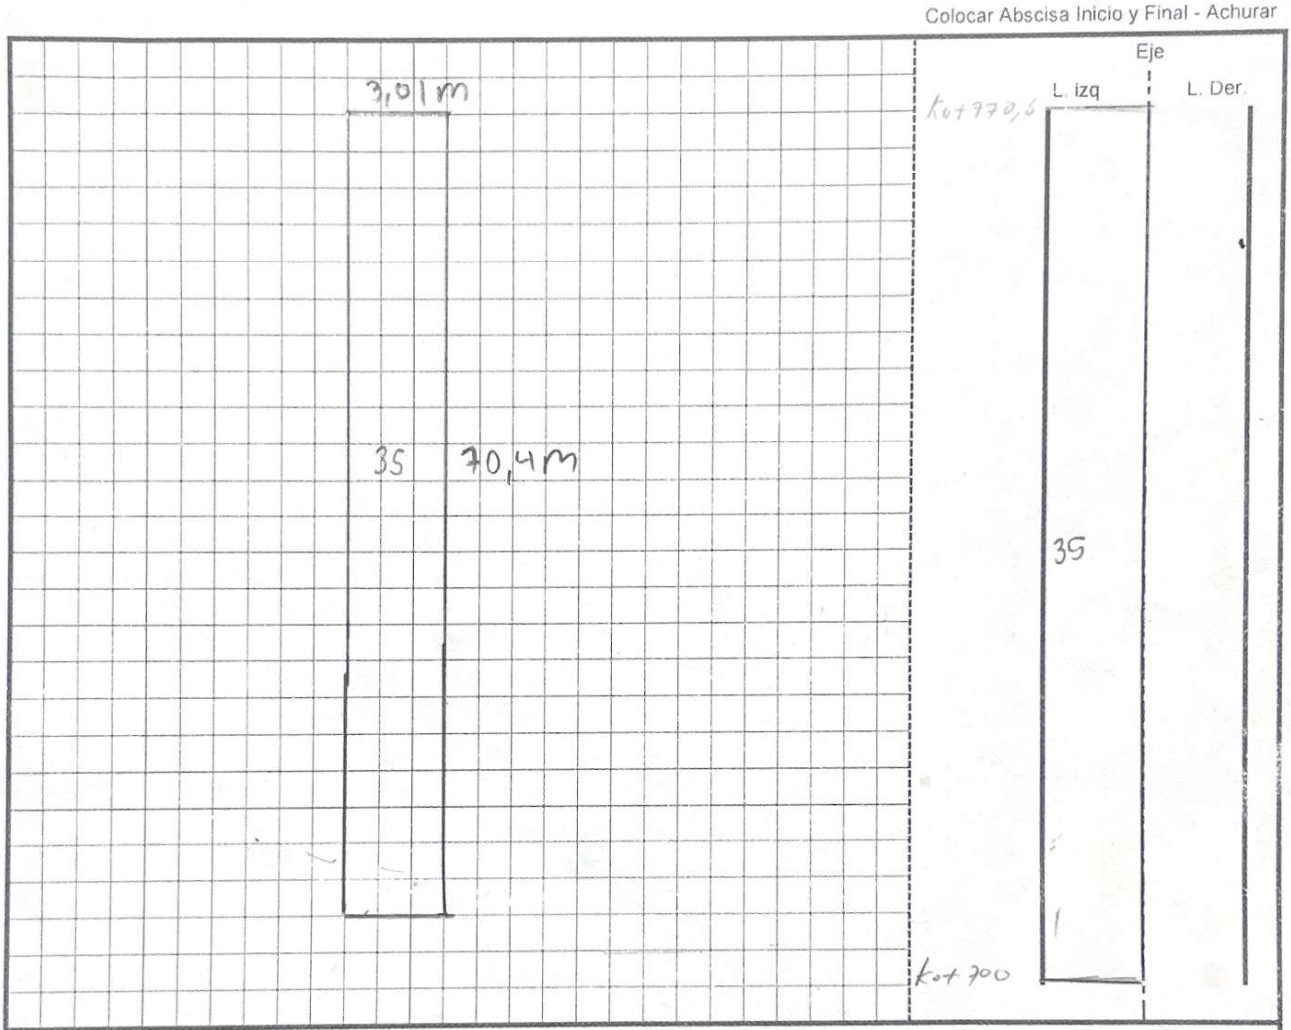

OBSERVACIONES: (condiciones climáticas)

Día soleado sin presencia de nubes


FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO

TIERRASUA	CANTIDADES DE PARCHEO / FRESADO / ASFALTO

OBRA: Convenio 3827 de 2025 BTS-Oicatá-Chivatá

Fecha	P	F	A	Ubicaciòn		Lado			Dimensiones (m)			Área de Liga / Emulsión	Volumenes (m3)			
				Abcisa I.	Abcisa F.	Izq.	Eje	Der.	Largo	Ancho	Espesor		Excavacion	Subbase	Bas	Asfalto
15/05/2026			X	K0+592,9	K0+657,8	X	X		64,90	3,55	0,075	230,40				17,28
15/05/2026			X	K0+657,8	K0+726,6	X	X		68,8	3,12	0,075	214,66				16,10
15/05/2026		X		K0+700	K0+770,4	X	X		70,4	3,01	0,095					
Totales																33,38


Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre	Pablo Esteban Sierra Moreno	Nombre	Rafael Camilo Suarez Suarez	Nombre	N/A
Cargo	Ing. apoyo supervisión	Cargo	Ing. apoyo supervisión	Cargo	N/A
Firma		Firma		Firma	

TIERRASUA ¡Conectamos región!	CONTROL DE MATERIALES

Contrato No:Convenio 3827 de 2025 BTS-Oicatá-Chivatá

FECHA	MATERIAL	ABSCISA	HORA DE LLEGADA	VOLQUETA			TEMPERATURA (°C)		ELABORACIÓN DE BRIQUETAS
				Nº VALE	PLACA	VOLUMEN	EXT.	COM.	Cantidad
15/05/2026	Asfalto	K0+592,9	11:52	6436	THZ021	14	140	128	N/A
15/05/2026	Asfalto	K0+639	12:24	6437	QKM380	12	138	123	N/A
15/05/2026	Asfalto	K0+675	12:30	6438	QLQ002	7	134	120	N/A
15/05/2026	Asfalto	K0+701	1:20	6440	OCM235	7	130	122	N/A
TOTAL ASFALTO SUELTO						40			

NOTA: Verificar en todos los vales de control de materiales despachados de la planta de asfalto, la temperatura de salida de la mezcla.

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre:	Pablo E. Sierra Moreno	Nombre:	Rafael Camilo Suarez Suarez	Nombre:	N/A
Cargo:	Ing. apoyo supervisión	Cargo:	Ing. apoyo supervisión	Cargo:	N/A
Firma:		Firma:		Firma:	

TIERRASUA
Conectamos regiones


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Convenio 3827 de 2025 BTS-Oicatá-Chivatá

ACTIVIDAD: Fresado e instalación de Sobrecarpeta FECHA: 19/05/26

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Pablo Sierra

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

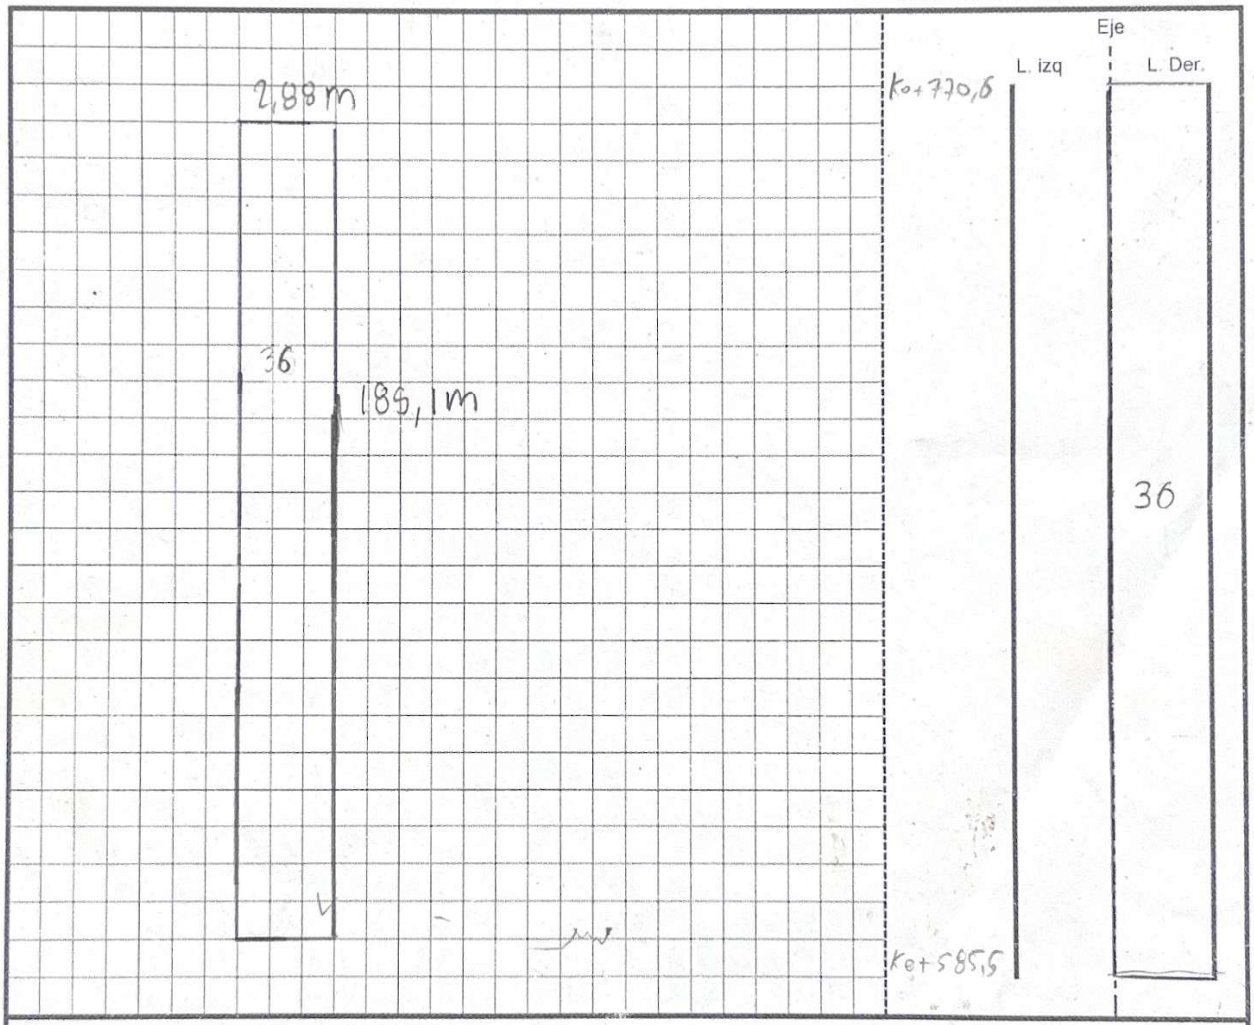

OBSERVACIONES (condiciones climáticas)

Dia Soleado con presencia de nubes

FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO

TIERRASUA
¡Conectamos regiones!


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Convenio 3827 de 2025 BTS-Oicatá -Chivatá

ACTIVIDAD: Fresado e instalación de Sobrecarpeta FECHA: 19/05/26

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Pablo Sierra

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

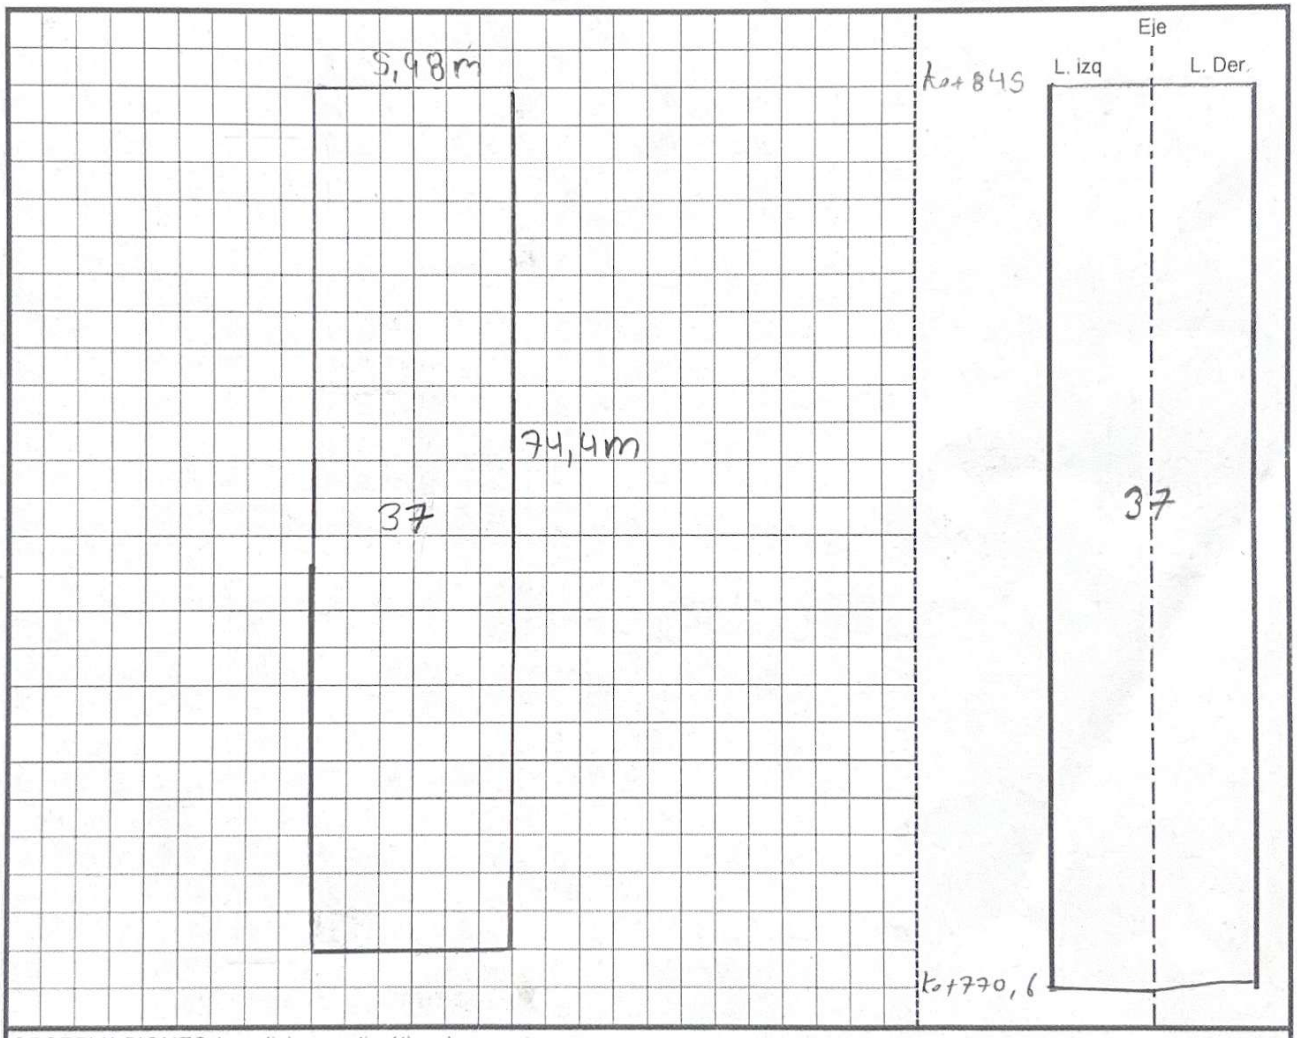

OBSERVACIONES: (condiciones climáticas)

Dia soleado con presencia de nubes

FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO

CANTIDADES DE PARCHEO / FRESADO / ASFALTO

OBRA: Convenio 3827 de 2025 BTS-Oicatá-Chivatá

Fecha	P	F	A	Ubicaciòn		Lado			Dimensiones (m)			Área de Liga / Emulsión	Volumenes (m3)			
				Abcisa I.	Abcisa F.	Izq.	Eje	Der.	Largo	Ancho	Espesor		Excavacion	Subbase	Bas	Asfalto
19/05/2026			X	K0+441,1	K0+457,4		X	X	16,30	3,16	0,075	51,51				3,86
19/05/2026			X	K0+486,5	K0+585,4	X	X	X	98,9	6,1	0,04	603,29				24,13
19/05/2026			X	K0+585,4	K0+593	X	X		7,6	3,1	0,035	23,56				0,82
19/05/2026			X	K0+585,4	K0+599		X	X	13,6	3	0,075	40,80				3,06
19/05/2026		X		K0+585,5	K0+770,6		X	X	185,1	2,88	0,065					
19/05/2026		X		K0+770,6	K0+845	X	X	X	74,4	5,98	0,065					
Totales																31,88


Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre	Pablo Esteban Sierra Moreno	Nombre	Rafael Camilo Suarez Suarez	Nombre	N/A
Cargo	Ing. apoyo supervisión	Cargo	Ing. apoyo supervisión	Cargo	N/A
Firma		Firma		Firma	

TIERRASUA ¡Conectamos región!	CONTROL DE MATERIALES

Contrato No:Convenio 3827 de 2025 BTS-Oicatá-Chivatá

FECHA	MATERIAL	ABSCISA	HORA DE LLEGADA	VOLQUETA			TEMPERATURA (°C)		ELABORACIÓN DE BRIQUETAS
				Nº VALE	PLACA	VOLUMEN	EXT.	COM.	Cantidad
19/05/2026	Asfalto	K0+441,1	1:30	6447	QKM380	12	130	116	N/A
19/05/2026	Asfalto	K0+524	2:25	6449	QLQ002	7	136	120	N/A
19/05/2026	Asfalto	K0+575	4:20	6453	OCM227	7	136	124	N/A
19/05/2026	Asfalto	K0+486,5	3:30	6451	SOO022	14	128	114	N/A
TOTAL ASFALTO SUELTO						40			

NOTA: Verificar en todos los vales de control de materiales despachados de la planta de asfalto, la temperatura de salida de la mezcla.

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre:	Pablo E. Sierra Moreno	Nombre:	Rafael Camilo Suarez Suarez	Nombre:	N/A
Cargo:	Ing. apoyo supervisión	Cargo:	Ing. apoyo supervisión	Cargo:	N/A
Firma:		Firma:		Firma:	

TIERRASUA


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Convenio 3827 de 2025 BTS - Oicatá - Chivatá

ACTIVIDAD: Fresado e instalación de Sobrecarpeta FECHA: 20/05/26

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Pablo Sierra

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

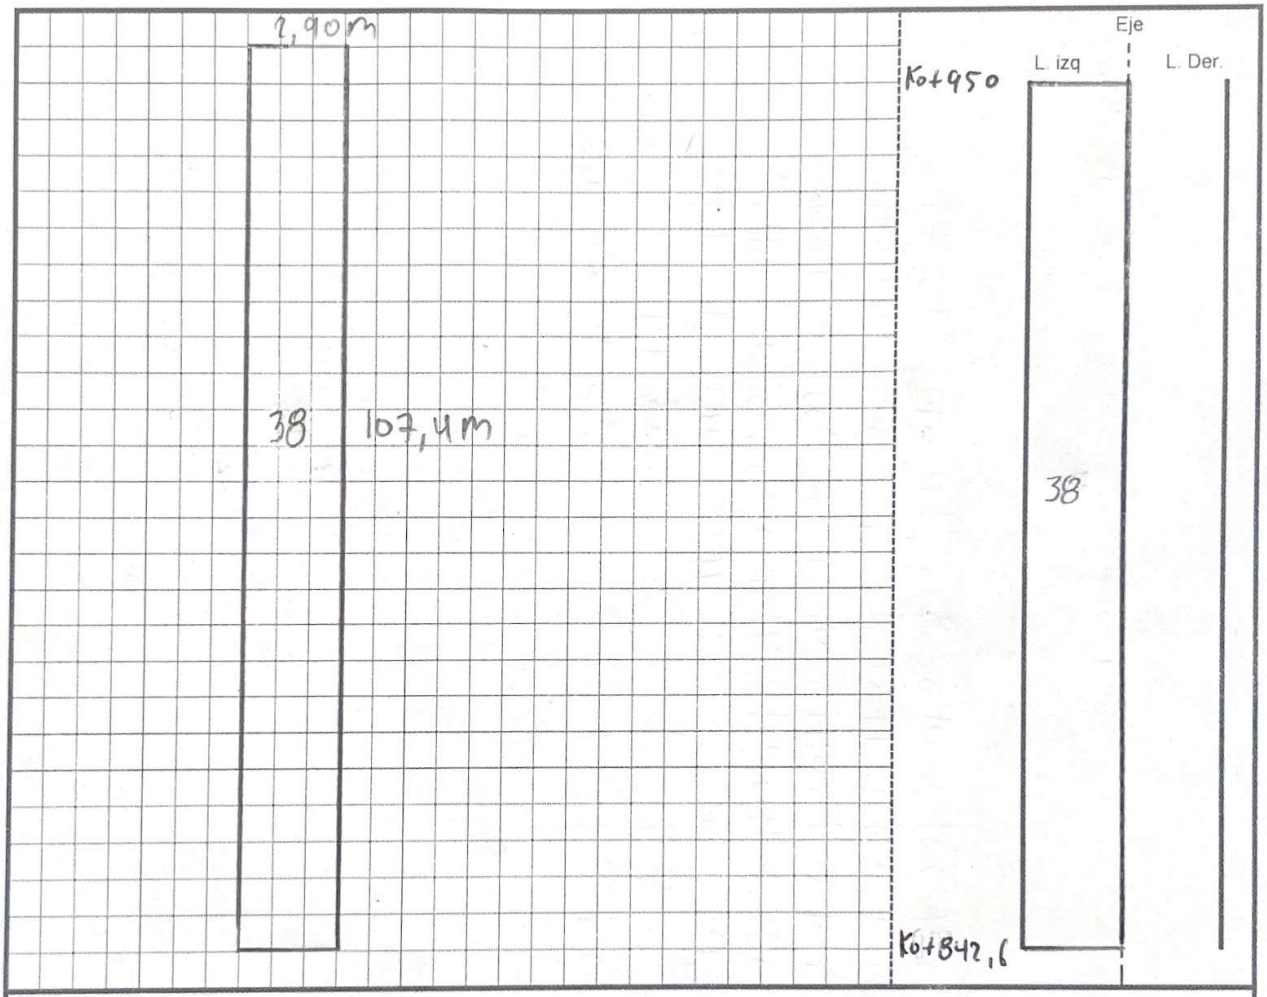

OBSERVACIONES: (condiciones climáticas)

Dia Nublado con poca llovizna

FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO

TIERRASUA
Conectamos regiones


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Convenio 3827 de 2025 BTJ - Oicatá - Chivatá

ACTIVIDAD: Fresado e instalación de Sobrecarpeta FECHA: 20/05/26

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Pablo Sierra

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

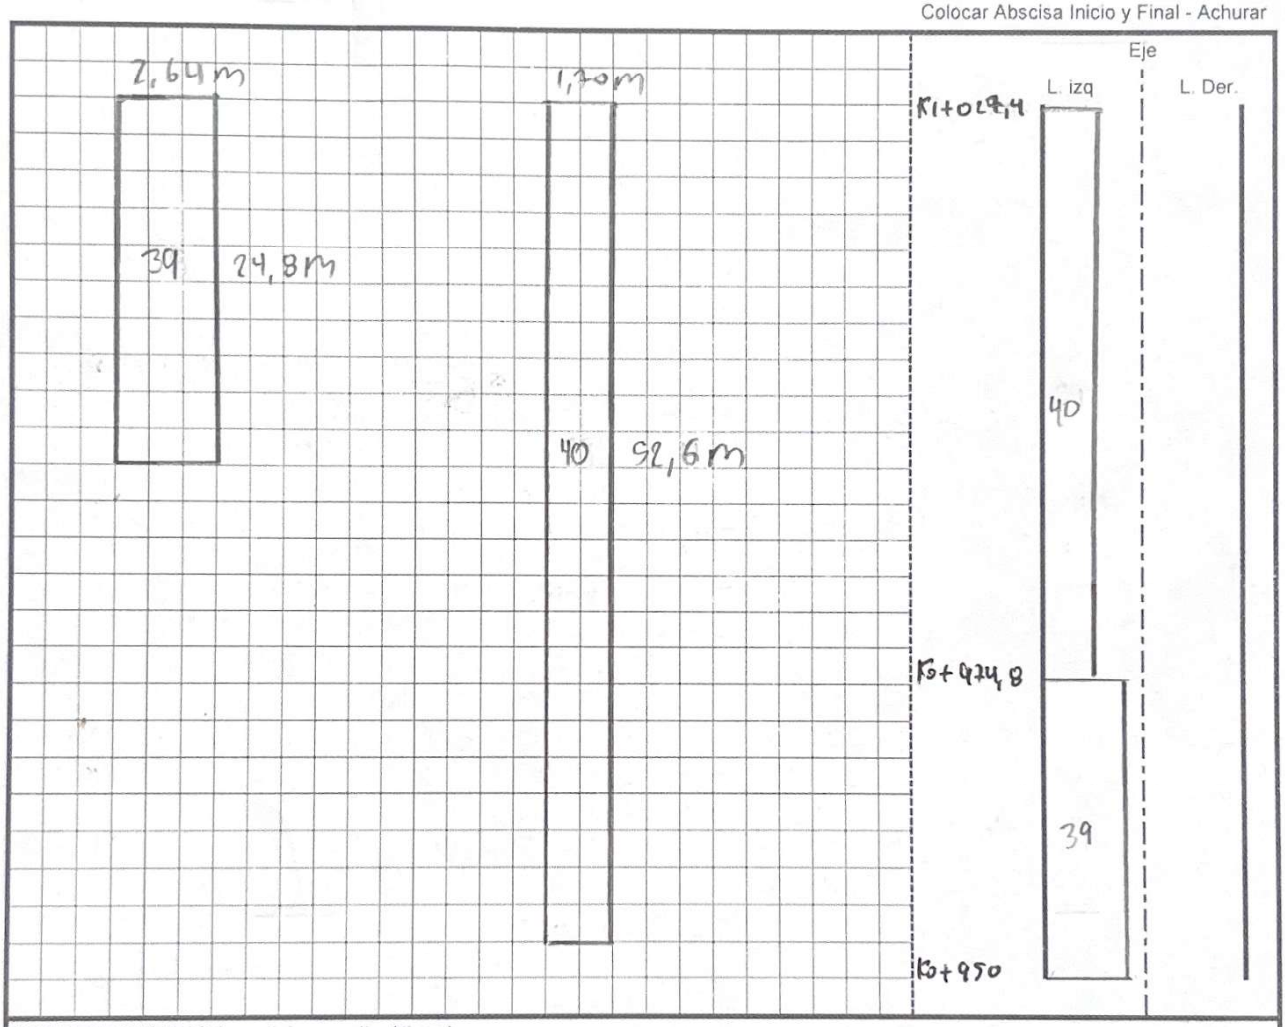

OBSERVACIONES (condiciones climáticas)

Dia Nublado con poca lluvizna



FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO

CANTIDADES DE PARCHEO / FRESADO / ASFALTO

OBRA: Convenio 3827 de 2025 BTS-Oicatá-Chivatá

Fecha	P	F	A	Ubicaciòn		Lado			Dimensiones (m)			Área de Liga / Emulsión	Volumenes (m3)			
				Abcisa I.	Abcisa F.	Izq.	Eje	Der.	Largo	Ancho	Espesor		Excavacion	Subbase	Bas	Asfalto
20/05/2026			X	K0+599	K0+842,8		X	X	243,80	2,90	0,075	707,02				53,03
20/05/2026			X	K0+726,8	K0+760	X	X		33,2	2,98	0,075	98,94				7,42
20/05/2026		X		K0+842,6	K0+950	X	X		107,4	2,9	0,07					
20/05/2026		X		K0+950	K0+974,8	X	X		24,8	2,64	0,07					
20/05/2026		X		K0+974,8	K1+027,4	X			52,6	1,7	0,07					
Totales																60,45


Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre	Pablo Esteban Sierra Moreno	**Nombre**	Rafael Camilo Suarez Suarez	**Nombre**	N/A
Cargo	Ing. apoyo supervisión	**Cargo**	Ing. apoyo supervisión	**Cargo**	N/A
Firma		**Firma**		**Firma**	

TIERRASUA ¡Conectamos región!	CONTROL DE MATERIALES

Contrato No:

FECHA	MATERIAL	ABSCISA	HORA DE LLEGADA	VOLQUETA			TEMPERATURA (°C)		ELABORACIÓN DE BRIQUETAS
				N° VALE	PLACA	VOLUMEN	EXT.	COM.	Cantidad
20/05/2026	Asfalto	K0+599	8:58	6457	QKM380	12	128	118	N/A
20/05/2026	Asfalto	K0+654	9:32	6454	SOO022	14	130	118	N/A
20/05/2026	Asfalto	K0+709	10:30	6461	OCM227	7	134	102	N/A
20/05/2026	Asfalto	K0+741	11:05	6463	QLQ002	7	140	128	N/A
20/05/2026	Asfalto	K0+774	1:35	6468	QKM380	12	132	120	N/A
20/05/2026	Asfalto	K0+829	2:05	6469	SOO022	14	134	122	N/A
20/05/2026	Asfalto	K0+730	2:25	6470	QLQ002	7	146	130	N/A
TOTAL ASFALTO SUELTO						73			

NOTA: Verificar en todos los vales de control de materiales despachados de la planta de asfalto, la temperatura de salida de la mezcla.

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre:	Pablo E. Sierra Moreno	Nombre:	Rafael Camilo Suarez Suarez	Nombre:	N/A
Cargo:	Ing. apoyo supervisión	Cargo:	Ing. apoyo supervisión	Cargo:	N/A
Firma:		Firma:		Firma:	

TIERRASUA


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Convenio 3827 de 2025 BTS-Oiatá - Chivatá

ACTIVIDAD: Fresado e instalación de Sobrecarpeta FECHA: 21/05/26

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Pablo Sierra

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

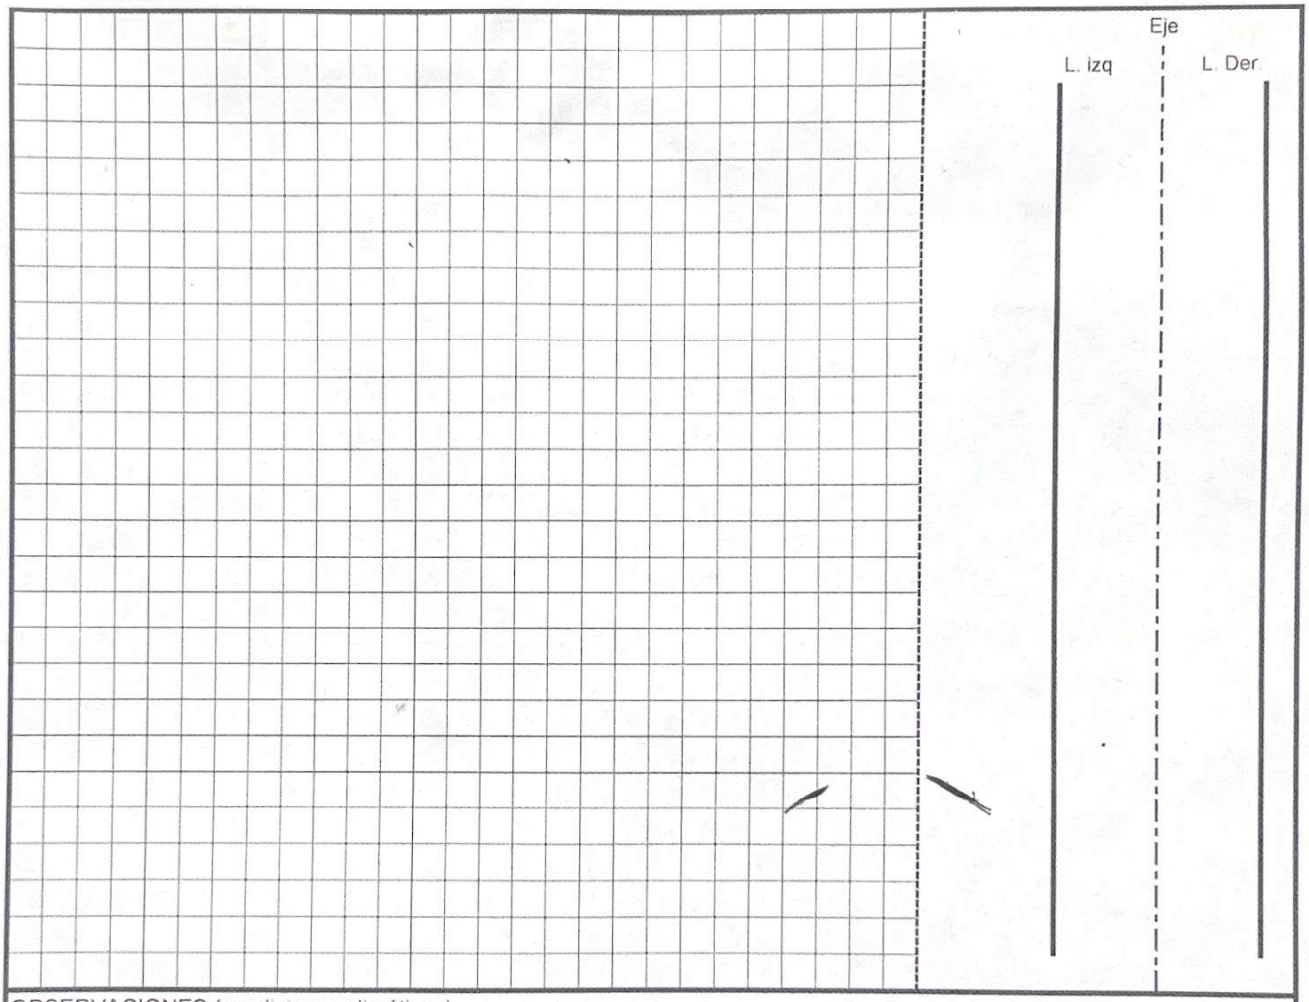

OBSERVACIONES (condiciones climáticas)

Dia lluvioso por lo cual no se realizo actividades de Fresado y se deja claro que el contratista instala y extiende la carpeta en condiciones humedas con el compromiso de reparar en caso de daño por condiciones


FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO

CANTIDADES DE PARCHEO / FRESADO / ASFALTO

OBRA: Convenio 3827 de 2025 BTS-Oicatá-Chivatá

Fecha	P	F	A	Ubicaciòn		Lado			Dimensiones (m)			Área de Liga / Emulsión	Volumenes (m3)			
				Abcisa I.	Abcisa F.	Izq.	Eje	Der.	Largo	Ancho	Espesor		Excavacion	Subbase	Bas	Asfalto
21/05/2026			X	K0+760	K0+915,5	X	X		155,50	2,70	0,076	419,85				31,91
Totales																31,91


Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre	Pablo Esteban Sierra Moreno	**Nombre**	Rafael Camilo Suarez Suarez	**Nombre**	N/A
Cargo	Ing. apoyo supervisión	**Cargo**	Ing. apoyo supervisión	**Cargo**	N/A
Firma		**Firma**		**Firma**	

TIERRASUA ¡Conectamos región!	CONTROL DE MATERIALES

Contrato No:Convenio 3827 de 2025 BTS-Oicatá-Chivatá

FECHA	MATERIAL	ABSCISA	HORA DE LLEGADA	VOLQUETA			TEMPERATURA (°C)		ELABORACIÓN DE BRIQUETAS
				N° VALE	PLACA	VOLUMEN	EXT.	COM.	Cantidad
21/05/2026	Asfalto	K0+760	10:10	6474	QLQ002	7	138	124	N/A
21/05/2026	Asfalto	K0+840	10:40	6475	QKM380	12	154	132	N/A
21/05/2026	Asfalto	K0+890	11:00	6476	OCM227	7	138	124	N/A
21/05/2026	Asfalto	K0+787,2	11:35	6477	SOO022	14	154	136	N/A
TOTAL ASFALTO SUELTO						40			

NOTA: Verificar en todos los vales de control de materiales despachados de la planta de asfalto, la temperatura de salida de la mezcla.

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre:	Pablo E. Sierra Moreno	**Nombre:**	Rafael Camilo Suarez Suarez	**Nombre:**	N/A
Cargo:	Ing. apoyo supervisión	**Cargo:**	Ing. apoyo supervisión	**Cargo:**	N/A
Firma:		**Firma:**		**Firma:**	

TIERRASUA
(Conectamos regiones)


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Convenio 3827 de 2025 BTS-Olivos - Chivotes

ACTIVIDAD: fresado e instalación de Sobrecarpeta FECHA: 22/05/26

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Pablo Sperra

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

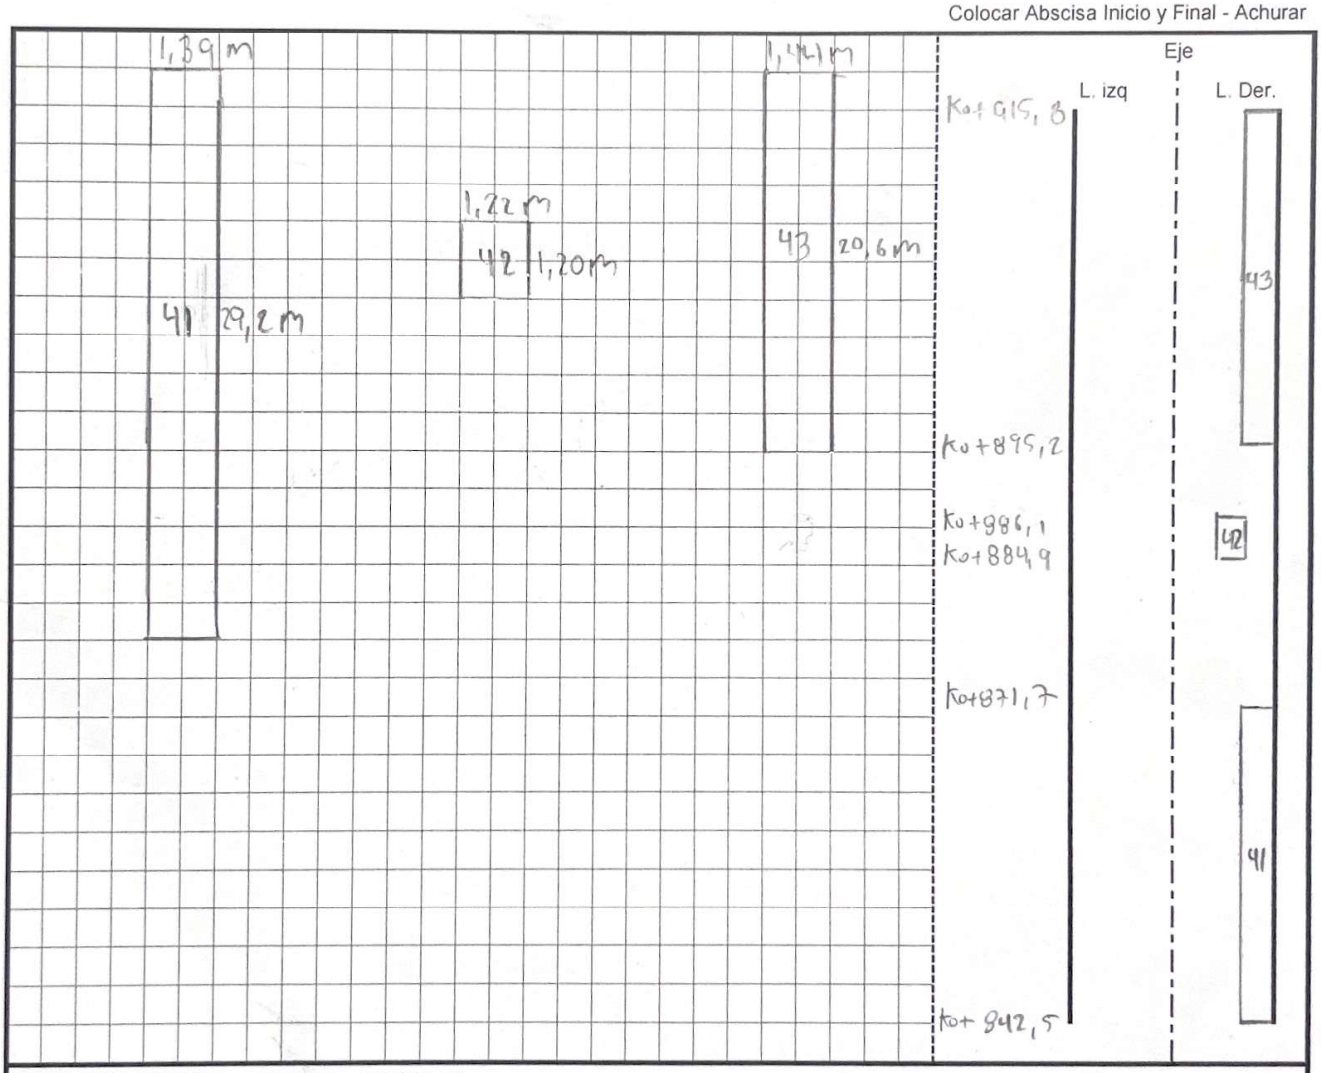

OBSERVACIONES: (condiciones climáticas)

Dia nublado

FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO

TIERRASUA
¡Conectamos regiones!


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Convenio 3827 de 2025 BTS - Oicatá - Chivatá

ACTIVIDAD: fresado e instalacion de sobrecarpeta FECHA: 22/05/26

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Pablo Sierra

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

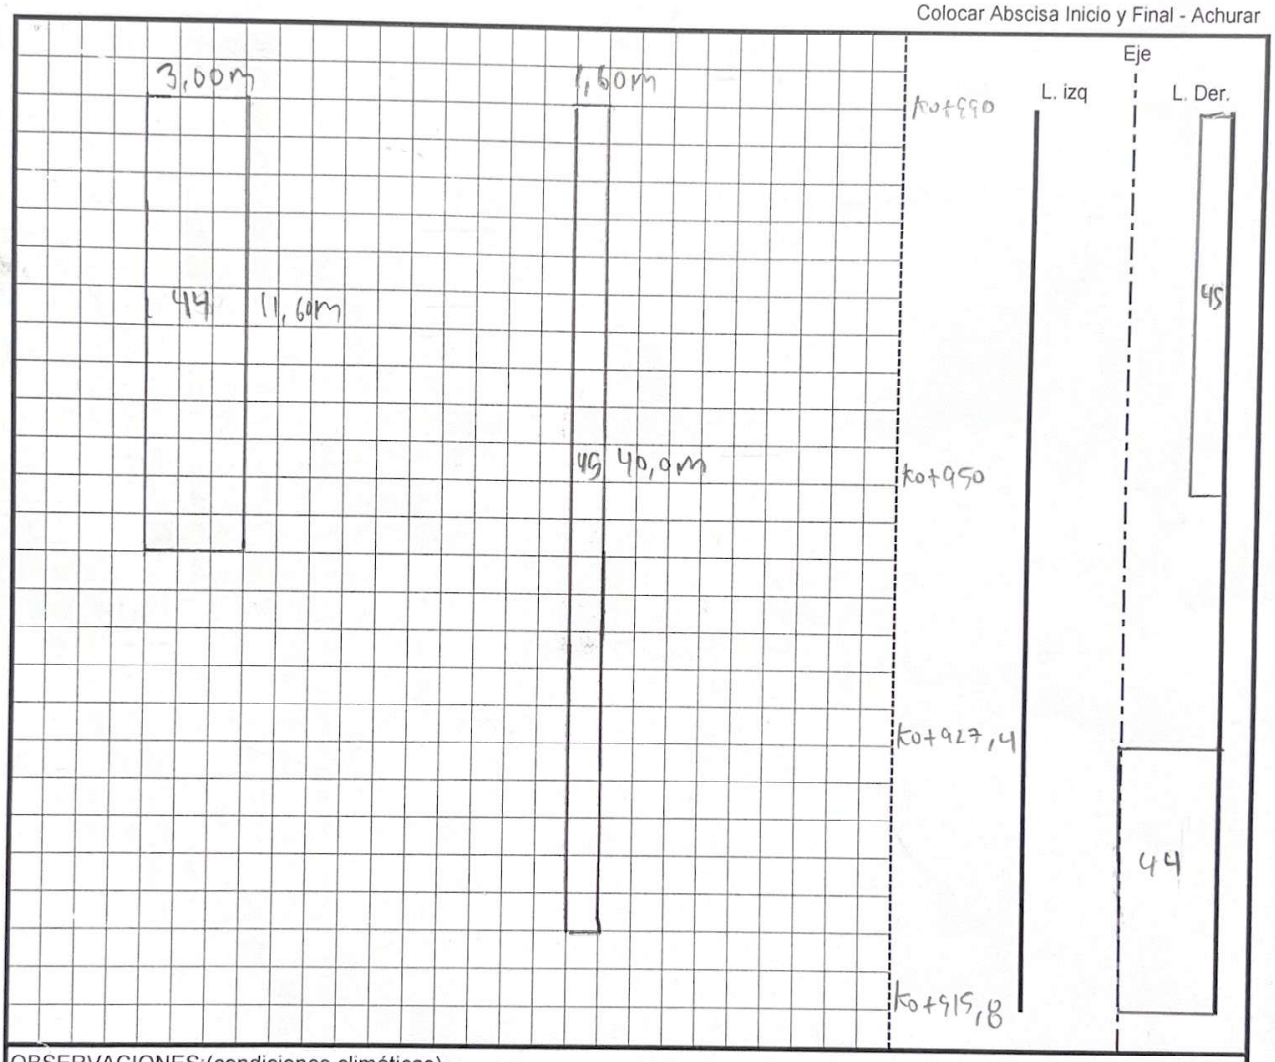

OBSERVACIONES: (condiciones climáticas)

Dia nublado

FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO

TIERRASUA


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Convenio 3827 de 2025 BTJ - Oicatá - Chivatá

ACTIVIDAD: Fresado e instalación de Sobrecarpeta FECHA: 22/05/26

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Pablo Sierra

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

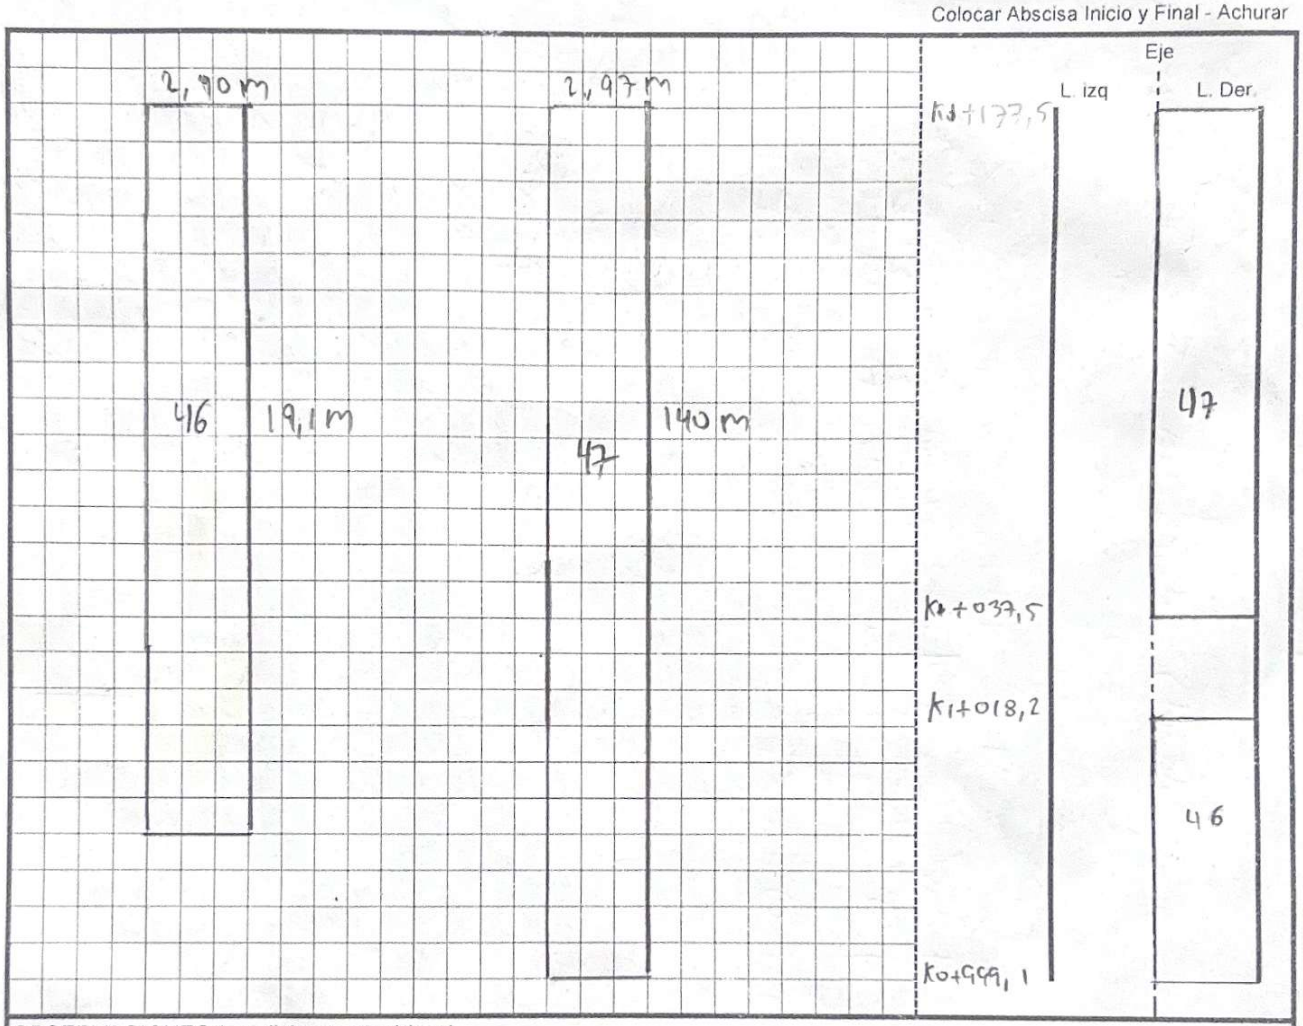

OBSERVACIONES (condiciones climáticas)

Día nublado


FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO

TIERRASUA	CANTIDADES DE PARCHEO / FRESADO / ASFALTO

OBRA: Convenio 3827 de 2025 BTS-Oicatá-Chivatá

Fecha	P	F	A	Ubicaciòn		Lado			Dimensiones (m)			Área de Liga / Emulsión	Volumenes (m3)			
				Abcisa I.	Abcisa F.	Izq.	Eje	Der.	Largo	Ancho	Espesor		Excavacion	Subbase	Bas	Asfalto
22/05/2026			X	K0+842,5	K0+871,7			X	29,20	1,39	0,035	40,59				1,42
22/05/2026			X	K0+884,9	K0+886,6			X	1,20	1,22	0,035	1,46				0,05
22/05/2026			X	K0+895,2	K0+915,8			X	20,60	1,44	0,035	29,66				1,04
22/05/2026			X	K0+915,1	K0+927,4		X	X	11,60	3,00	0,04	34,80				1,39
22/05/2026			X	K0+950	K0+969,3			X	19,30	1,60	0,04	30,88				1,24
22/05/2026			X	**K0+842,5**	**K0+969,3**		X	X	126,80	3,00	0,04	380,40				15,22
22/05/2026			X	K0+915,4	K1+037,5	X	X		122,10	2,90	0,075	354,09				26,56
22/05/2026		X		K0+842,5	K0871,7			X	29,20	1,39	0,035					
22/05/2026		X		K0+884,9	K0+886,1		X	X	1,20	1,22	0,035					
22/05/2026		X		K0+895,2	K0+915,8			X	20,60	1,44	0,035					
22/05/2026		X		K0+915,8	K0+927,4		X	X	11,60	3,00	0,035					
22/05/2026		X		K0+950	K0+990		X	X	40,00	1,60	0,035					
22/05/2026		X		K0+999,1	K1+018,2			X	19,10	2,90	0,035					
22/05/2026		X		K1+037,5	K1+177,5		X	X	140,00	2,97	0,035					
Totales																46,91


Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre	Pablo Esteban Sierra Moreno	**Nombre**	Rafael Camilo Suarez Suarez	**Nombre**	N/A
Cargo	Ing. apoyo supervisión	**Cargo**	Ing. apoyo supervisión	**Cargo**	N/A
Firma		**Firma**		**Firma**	

TIERRASUA ¡Conectamos región!	CONTROL DE MATERIALES

Contrato No: Convenio 3827 de 2025 BTS-Oicatá-Chivatá

FECHA	MATERIAL	ABSCISA	HORA DE LLEGADA	VOLQUETA			TEMPERATURA (°C)		ELABORACIÓN DE BRIQUETAS
				N° VALE	PLACA	VOLUMEN	EXT.	COM.	Cantidad
22/05/2026	Asfalto	K0+915	10:00	6481	SOO022	14	150	134	N/A
22/05/2026	Asfalto	K0+969,5	10:35	6483	QLQ002	7	129	115	N/A
22/05/2026	Asfalto	K0+995	10:15	6482	OCM227	7	120	108	N/A
22/05/2026	Asfalto	K0+842,5	10:55	6484	QKM380	12	132	120	N/A
22/05/2026	Asfalto	K0+882	3:42	6489	QLQ002	7	142	118	N/A
22/05/2026	Asfalto	K0+910	4:11	6490	QKM380	12	138	120	N/A
TOTAL ASFALTO SUELTO						59			

NOTA: Verificar en todos los vales de control de materiales despachados de la planta de asfalto, la temperatura de salida de la mezcla.

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre:	Pablo E. Sierra Moreno	**Nombre:**	Rafael Camilo Suarez Suarez	**Nombre:**	N/A
Cargo:	Ing. apoyo supervisión	**Cargo:**	Ing. apoyo supervisión	**Cargo:**	N/A
Firma:		**Firma:**		**Firma:**	

TIERRASUA
Conectamos regiones


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Convenio 3827 de 2025 BTS-Oicatá - Chivatá

ACTIVIDAD: Instalación de sobre carpeta FECHA: 23/05/26

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Pablo Sierra

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

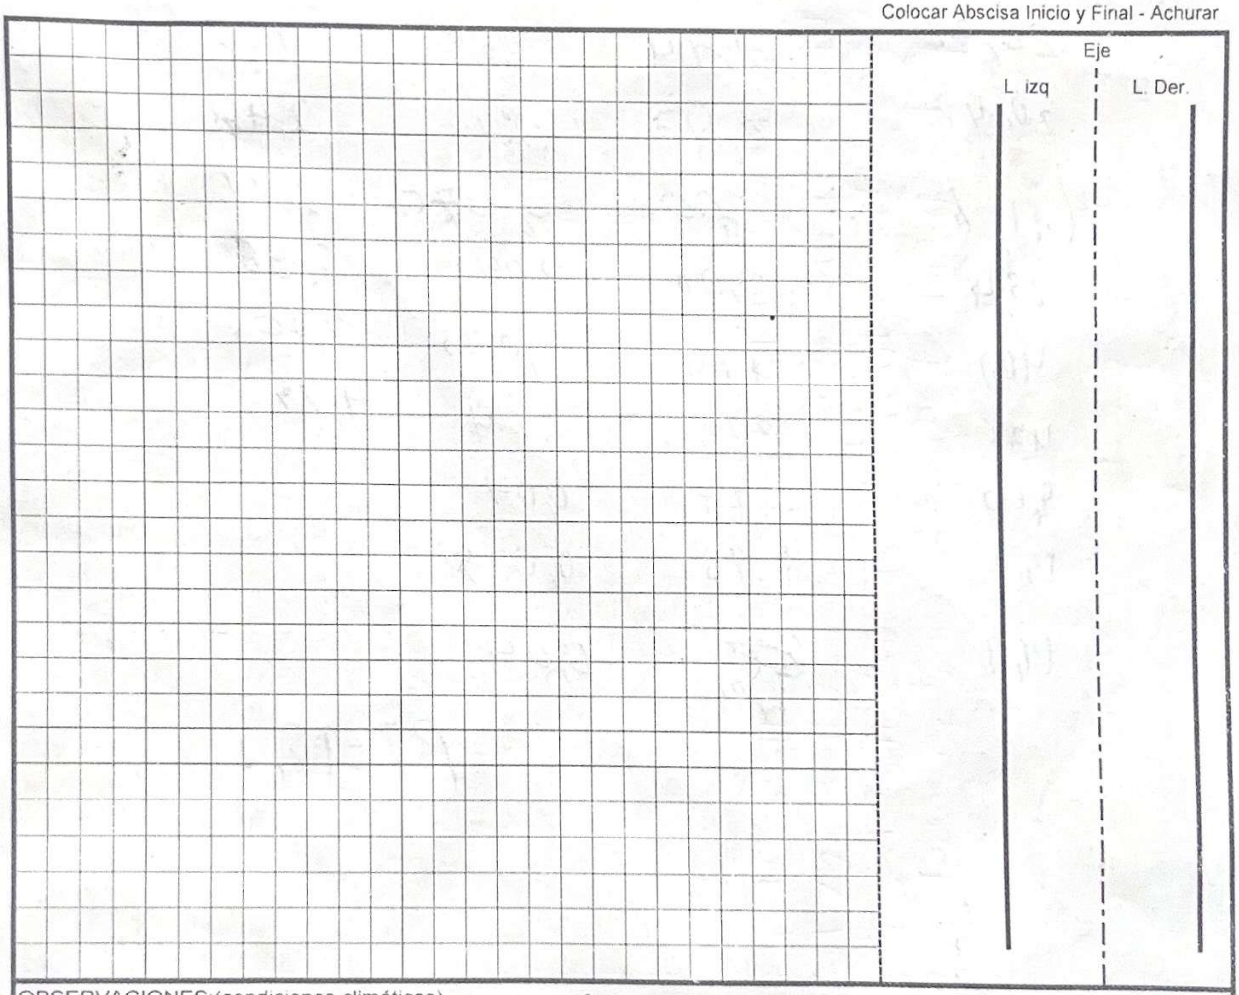

OBSERVACIONES: (condiciones climáticas)

Parte del dia soleado y parte nublado con llovizna suave, en esta fecha no se Free


FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO

TIERRASUA	CANTIDADES DE PARCHEO / FRESADO / ASFALTO

OBRA: Convenio 3827 de 2025 BTS-Oicatá-Chivatá

Fecha	P	F	A	Ubicaciòn		Lado			Dimensiones (m)			Área de Liga / Emulsión	Volumenes (m3)			
				Abcisa I.	Abcisa F.	Izq.	Eje	Der.	Largo	Ancho	Espesor		Excavacion	Subbase	Bas	Asfalto
23/05/2026			X	K0+959,55	K0+990			X	30,45	1,60	0,035	48,72				1,71
23/05/2026			X	K0+999,1	K1+018,2			X	19,10	2,00	0,035	38,20				1,34
23/05/2026			X	K1+038	K1+121,7		X	X	83,70	3,00	0,035	251,10				8,79
23/05/2026			X	**K0+969,5**	**K1+121,7**		X	X	152,20	3,00	0,043	456,60				19,63
Totales																31,46


Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre	Pablo Esteban Sierra Moreno	**Nombre**	Rafael Camilo Suarez Suarez	**Nombre**	N/A
Cargo	Ing. apoyo supervisión	**Cargo**	Ing. apoyo supervisión	**Cargo**	N/A
Firma		**Firma**		**Firma**	

TIERRASUA ¡Conectamos región!	CONTROL DE MATERIALES

Contrato No:Convenio 3827 de 2025 BTS-Oicatá-Chivatá

FECHA	MATERIAL	ABSCISA	HORA DE LLEGADA	VOLQUETA			TEMPERATURA (°C)		ELABORACIÓN DE BRIQUETAS
				N° VALE	PLACA	VOLUMEN	EXT.	COM.	Cantidad
23/05/2026	Asfalto	K0+969,5	8:50	6491	OCM227	7	150	130	N/A
23/05/2026	Asfalto	K0+995	9:10	6492	SOO022	14	152	138	N/A
23/05/2026	Asfalto	K1+051	9:30	6493	OCM217	7	126	110	N/A
23/05/2026	Asfalto	K1+078	9:50	6494	QKM380	12	140	122	N/A
TOTAL ASFALTO SUELTO						40			

NOTA: Verificar en todos los vales de control de materiales despachados de la planta de asfalto, la temperatura de salida de la mezcla.

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre:	Pablo E. Sierra Moreno	**Nombre:**	Rafael Camilo Suarez Suarez	**Nombre:**	N/A
Cargo:	Ing. apoyo supervisión	**Cargo:**	Ing. apoyo supervisión	**Cargo:**	N/A
Firma:		**Firma:**		**Firma:**	

TIERRASUA
Conectamos regiones


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Convenio 3827 de 2025 BTS-Oicatá-Chivatá

ACTIVIDAD: fresado de carpeta existente FECHA: 25-05-26

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Rgb Sierra

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

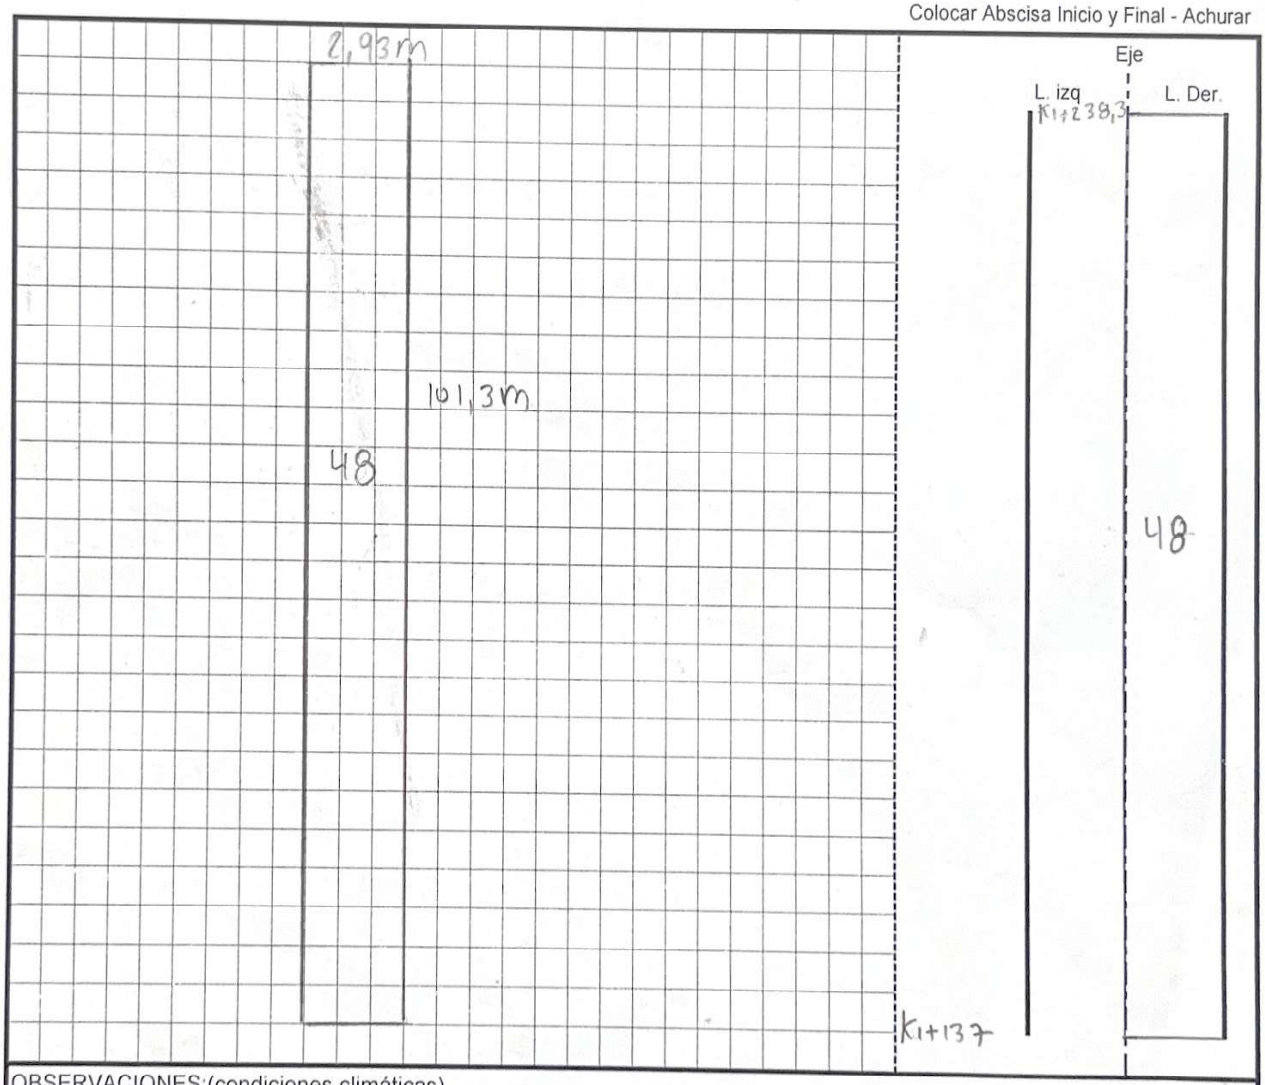

OBSERVACIONES: (condiciones climáticas)

Día nublado con poca llovizna

FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO

TIERRASUA
¡Conectamos regiones!


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Convenio 3827 de 2025 DTS-Oicatá-Chivatá

ACTIVIDAD : fresado de carpeta existente FECHA : 25/05/26

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Pablo sierra

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

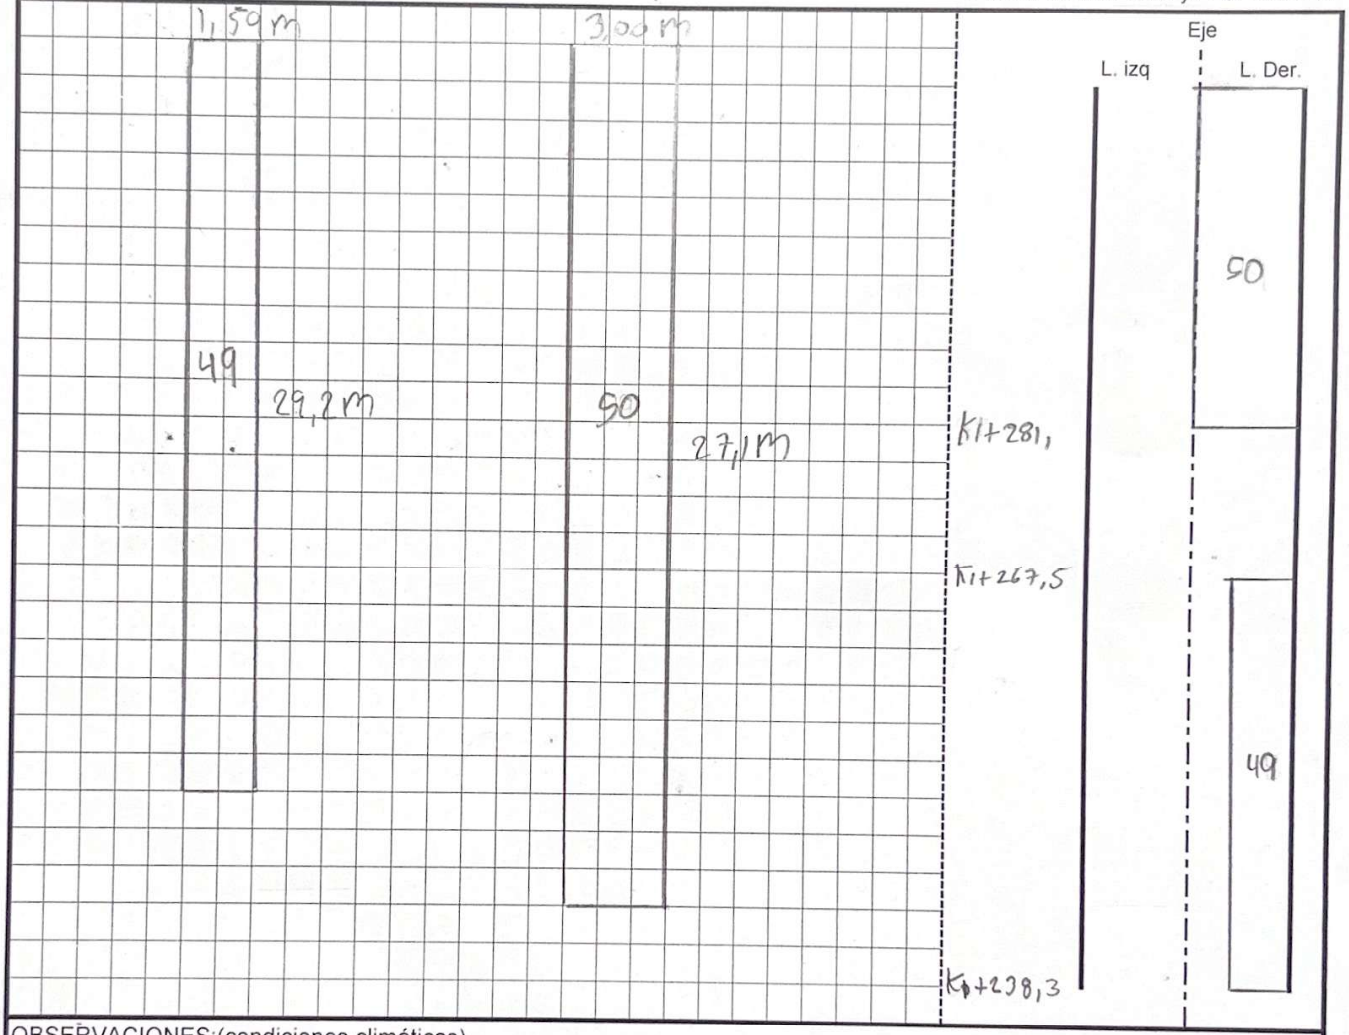

OBSERVACIONES:(condiciones climáticas)

Dia nublado con poca llovizna



FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO

TIERRASUA	CANTIDADES DE PARCHEO / FRESADO / ASFALTO

OBRA: Convenio 3827 de 2025 BTS-Oicatá-Chivatá

Fecha	P	F	A	Ubicaciòn		Lado			Dimensiones (m)			Área de Liga / Emulsión	Volumenes (m3)			
				Abcisa I.	Abcisa F.	Izq.	Eje	Der.	Largo	Ancho	Espesor		Excavacion	Subbase	Bas	Asfalto
25/05/2026		X		K1+137	K1+238,3		X	X	101,30	2,93	0,05					0,00
25/05/2026		X		K1+238,3	K1+267,5			X	29,20	1,59	0,06					0,00
25/05/2026		X		K1+281,3	K1+308,4		X	X	27,10	3,00	0,06					0,00
Totales																0,00

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre	Pablo Esteban Sierra Moreno	Nombre	Rafael Camilo Suarez Surez	Nombre	N/A
Cargo	Ing. apoyo supervisión	Cargo	Ing. apoyo supervisión	Cargo	N/A
Firma		Firma		Firma	

TIERRASUA
(Conectamos regiones)


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Convenio 3827 de 2025 BTS-Oiba-Chiva

ACTIVIDAD : Fresado e instalación de sobrecarpeta FECHA : 26/05/26

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Pablo Sierra

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

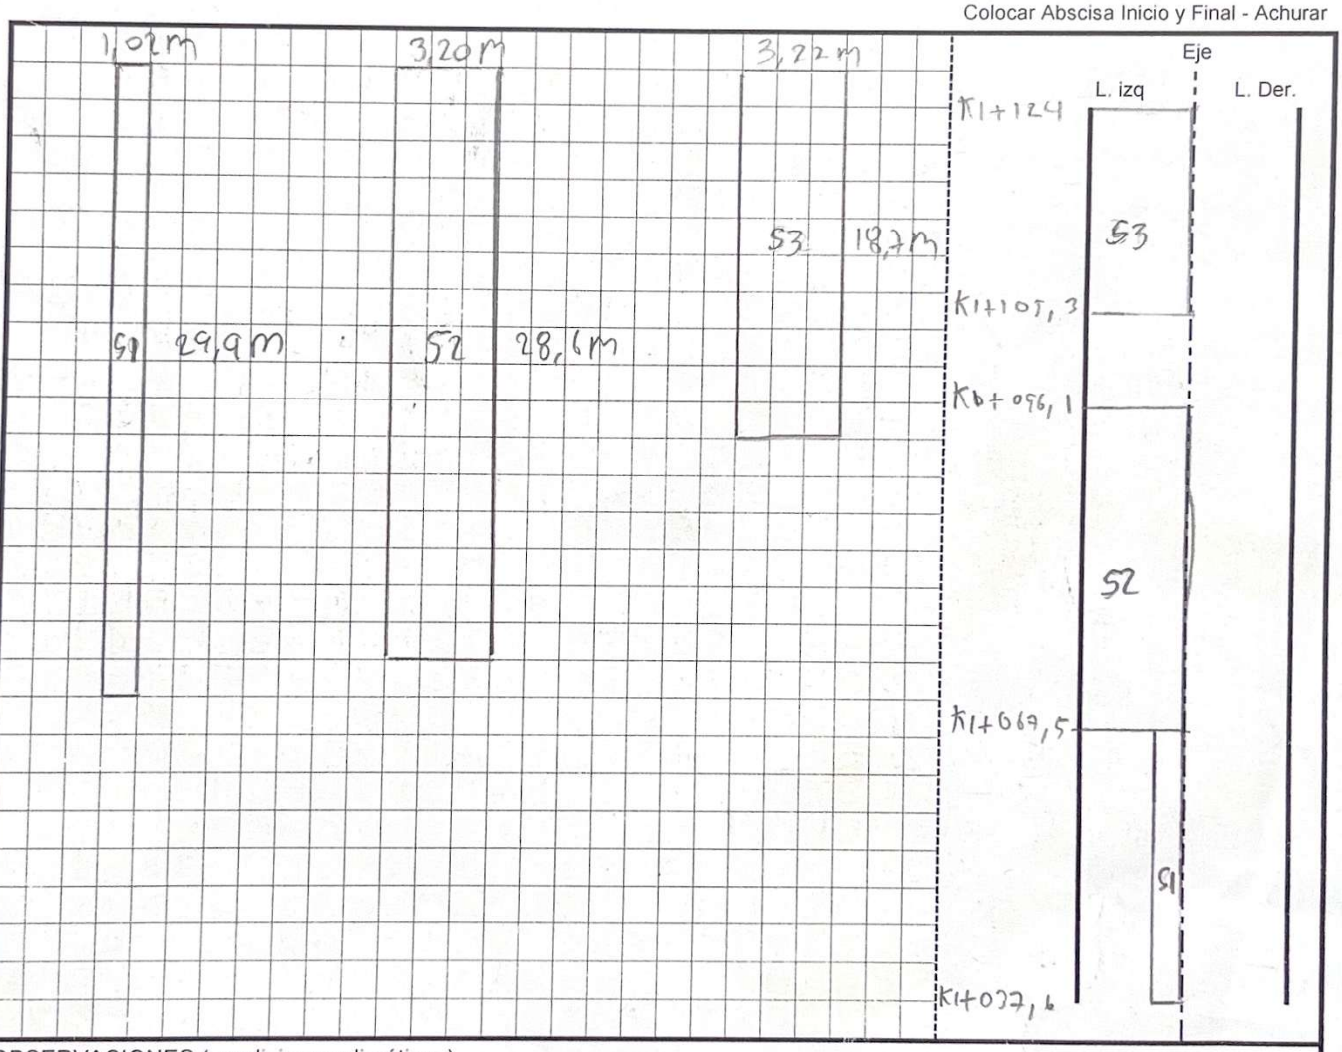

OBSERVACIONES:(condiciones climáticas)

Día soleado con nubes

FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO

TIERRASUA
¡Conectamos regiones!


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Convenio 3827 de 2025 BTS - Oiatá - Chivatá

ACTIVIDAD: Fresado e instalación de Sobrecarpeta FECHA: 26/05/26

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Zeb Sierra

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

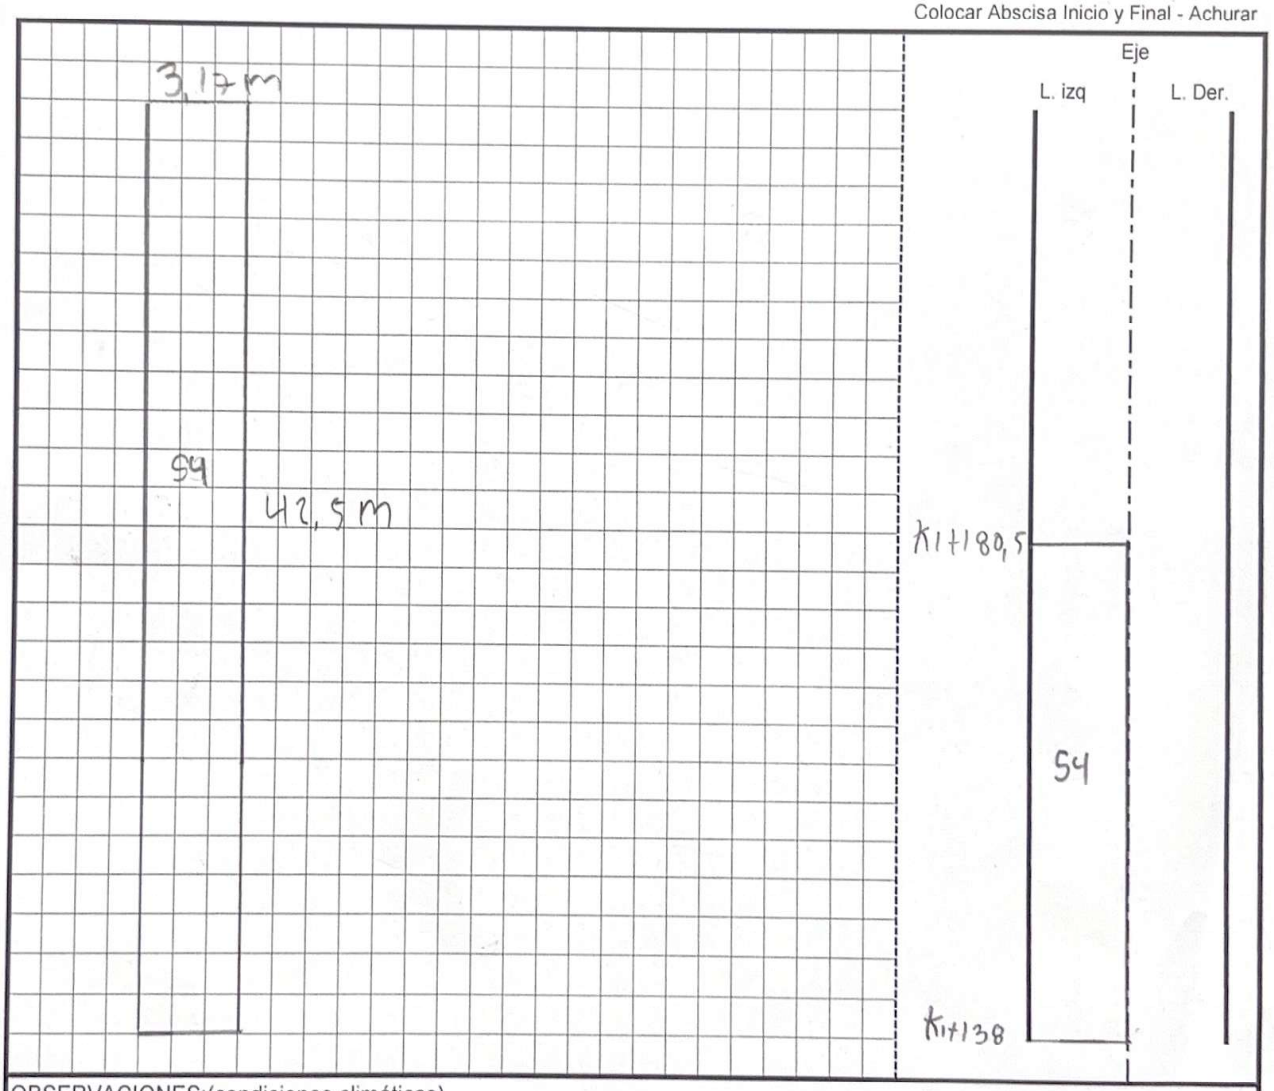

OBSERVACIONES:(condiciones climáticas)

Dia soleado con nubes

FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO

CANTIDADES DE PARCHEO / FRESADO / ASFALTO

OBRA: Convenio 3827 de 2025 BTS-Oicatá-Chivatá

Fecha	P	F	A	Ubicaciòn		Lado			Dimensiones (m)			Área de Liga / Emulsión	Volumenes (m3)			
				Abcisa I.	Abcisa F.	Izq.	Eje	Der.	Largo	Ancho	Espesor		Excavacion	Subbase	Bas	Asfalto
26/05/2026			X	**K1+121,2**	**K1+263,2**		**X**	**X**	**142,00**	**3,07**	**0,04**	435,94				17,44
26/05/2026			X	K1+121,2	K1+238,3		X	X	117,10	2,93	0,037	343,10				12,69
26/05/2026			X	K1+238,3	K1+263,2			X	24,90	1,59	0,035	39,59				1,39
26/05/2026		X		K1+037,6	K1+067,5		X		29,90	1,02	0,07					
26/05/2026		X		K1+067,5	K1+096,1	X	X		28,60	3,20	0,07					
26/05/2026		X		K1+105,3	K1+124	X	X		18,70	3,22	0,07					
26/05/2026		X		K1+138	K1+180,5	X	X		42,50	3,17	0,07					
Totales																31,52


Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre	Pablo Esteban Sierra Moreno	**Nombre**	Rafael Camilo Suarez Suarez	**Nombre**	N/A
Cargo	Ing. apoyo supervisión	**Cargo**	Ing. apoyo supervisión	**Cargo**	N/A
Firma		**Firma**		**Firma**	

TIERRASUA ¡Conectamos región!	CONTROL DE MATERIALES

Contrato No:Convenio 3827 de 2025 BTS-Oicatá-Chivatá

FECHA	MATERIAL	ABSCISA	HORA DE LLEGADA	VOLQUETA			TEMPERATURA (°C)		ELABORACIÓN DE BRIQUETAS
				N° VALE	PLACA	VOLUMEN	EXT.	COM.	Cantidad
26/05/2026	Asfalto	K1+121,2	11:59	6499	QKM379	12	138	120	N/A
26/05/2026	Asfalto	K1+159	12:17	6500	QLQ002	7	140	126	N/A
26/05/2026	Asfalto	K1+189	12:50	6501	S00022	14	142	132	N/A
26/05/2026	Asfalto	K1+235	1:02	6502	OCM217	7	128	112	N/A
TOTAL ASFALTO SUELTO						40			

NOTA: Verificar en todos los vales de control de materiales despachados de la planta de asfalto, la temperatura de salida de la mezcla.

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre:	Pablo E. Sierra Moreno	Nombre:	Rafael Camilo Suarez Suarez	Nombre:	N/A
Cargo:	Ing. apoyo supervisión	Cargo:	Ing. apoyo supervisión	Cargo:	N/A
Firma:		Firma:		Firma:	

TIERRASUA


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Convenio 3827 de 2025 BTJ - Oicatá - Chivatá

ACTIVIDAD: fresado e instalacion de sobrecarpeta FECHA: 27/05/26

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Pablo Sierra

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

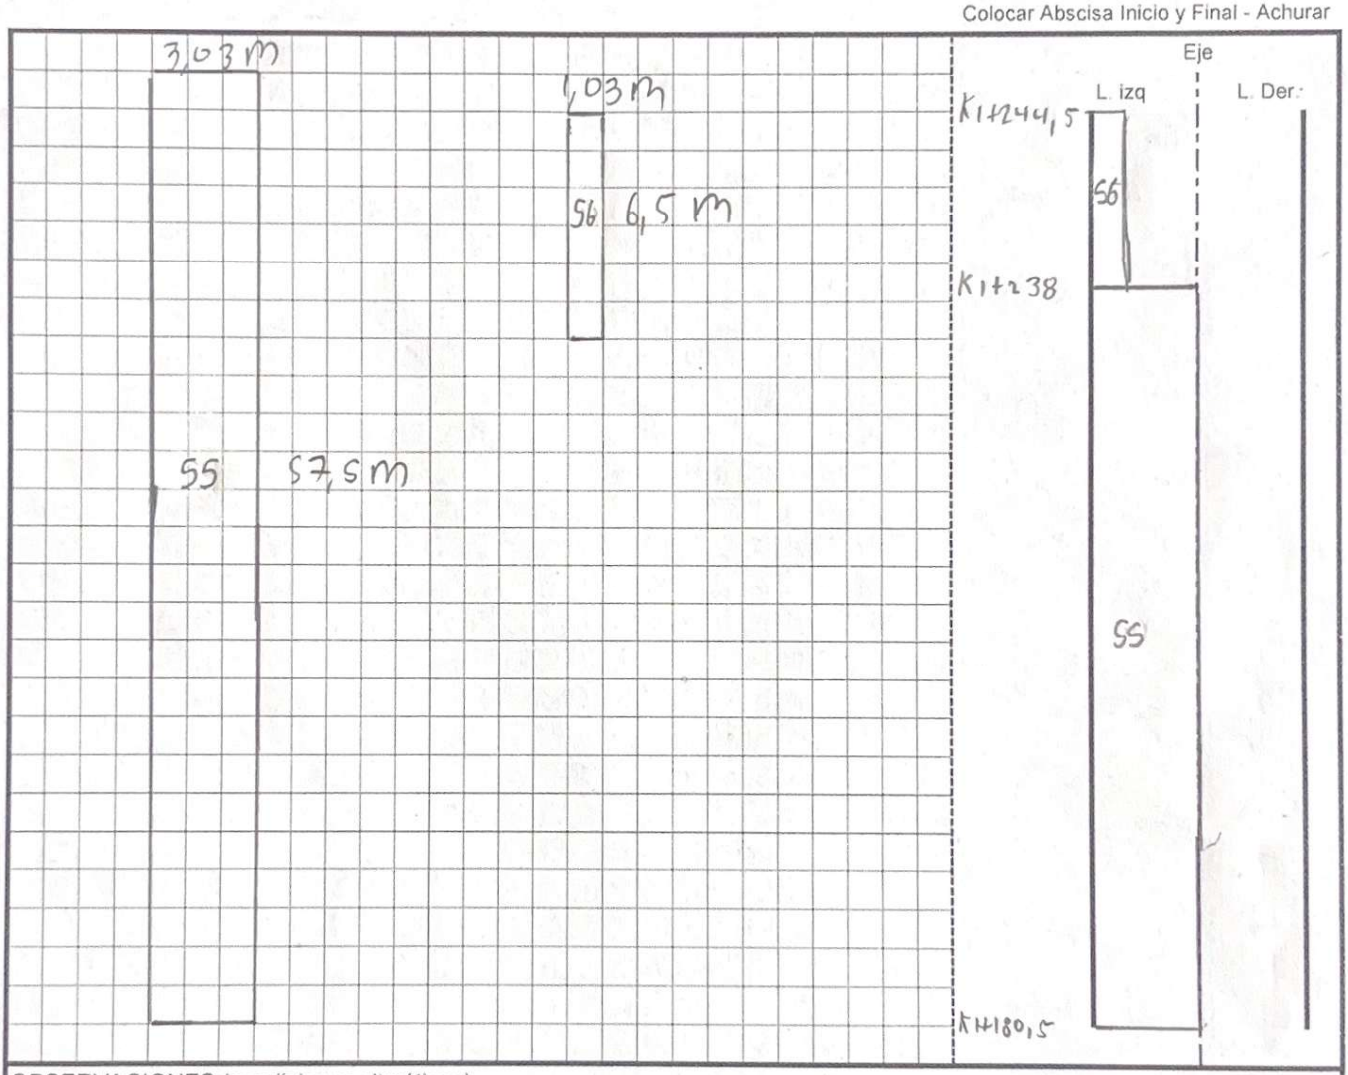

OBSERVACIONES (condiciones climáticas)

Dia soleado con presencia de nubes

FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO

TIERRASUA
¡Conectamos regiones!


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Convenio 3817 de 2025 BTS-Oiba-Chivata

ACTIVIDAD: fresado e instalacion de sobrecarpeta FECHA: 27/05/26

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Pablo Sierra

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

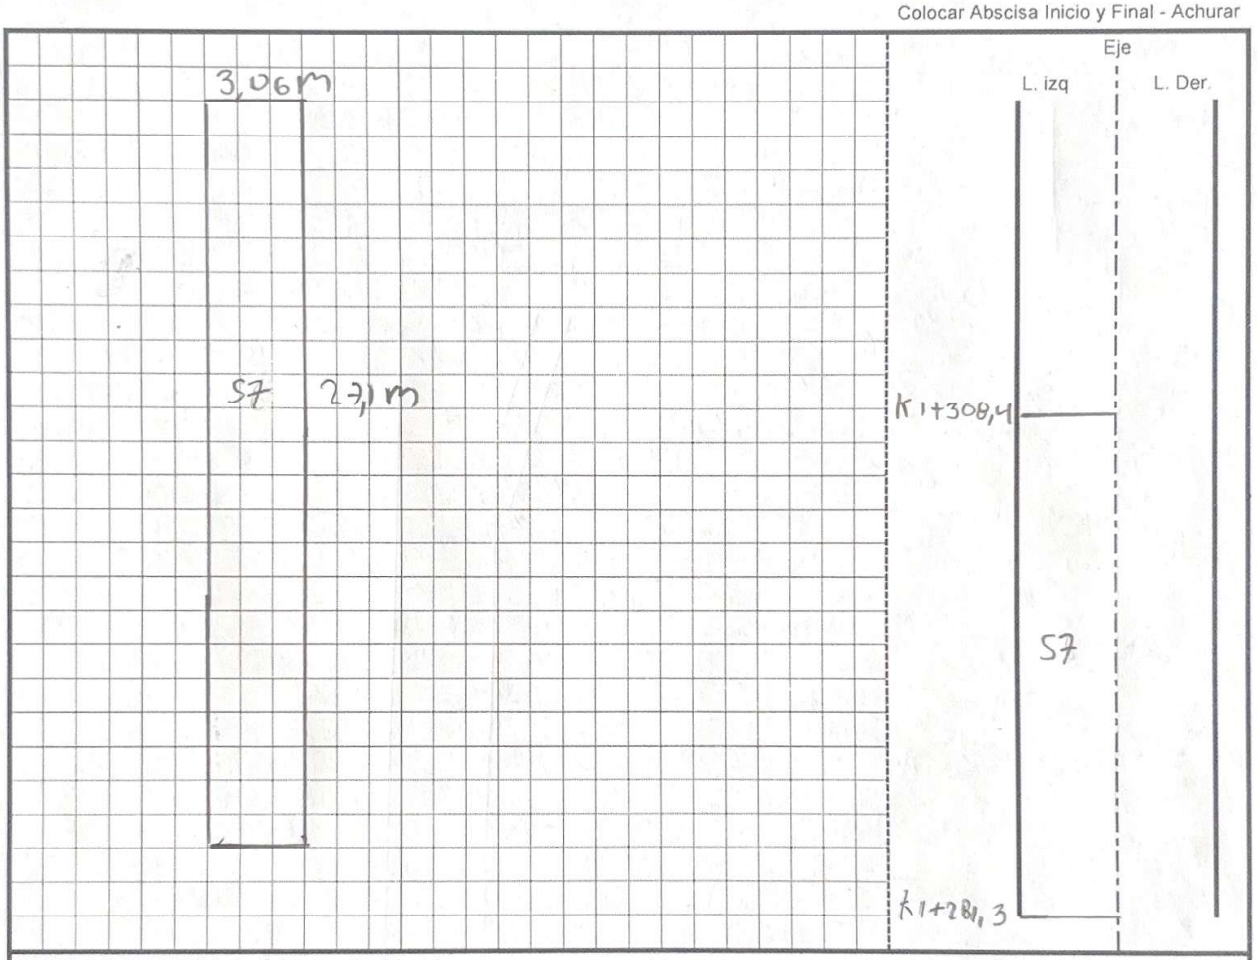

OBSERVACIONES:(condiciones climáticas)

Dia soleado con presencia de nubes


FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO

CANTIDADES DE PARCHEO / FRESADO / ASFALTO

OBRA: CONVENIO 3827 DE 2025 BTS-OICATÁ-CHIVATÁ

Fecha	P	F	A	Ubicaciòn		Lado			Dimensiones (m)			Área de Liga / Emulsión	Volumenes (m3)			
				Abcisa I.	Abcisa F.	Izq.	Eje	Der.	Largo	Ancho	Espesor		Excavacion (m2)	Subbase	Base	Asfalto
27/05/2026			X	**K1+037,8**	**K1+281**	**X**	**X**		**243,20**	**3,20**	**0,045**					35,02
27/05/2026			X	K1+037,8	K1+067,5		X		29,70	1,02	0,04	30,29				1,21
27/05/2026			X	K1+067,5	K1+096,1	X	X		28,60	3,20	0,04	91,52				3,66
27/05/2026			X	K1+105,3	K1+124	X	X		18,70	3,20	0,04	59,84				2,39
27/05/2026			X	K1+138	K1+238	X	X		100,00	3,10	0,043	310,00				13,33
27/05/2026			X	K1+238	K1+244,5	X			6,50	1,03	0,04	6,70				0,27
27/05/2026		X		K1+180,5	K1+238	X	X		57,50	3,03	0,04					
27/05/2026		X		K1+238	K1+244,5	X			6,50	1,03	0,04					
27/05/2026		X		K1+281,3	K1+308,4	X	X		27,10	3,06	0,04					
Totales																55,88

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre	Pablo Esteban Sierra Moreno	**Nombre**	Rafael Camilo Suarez Suarez	**Nombre**	N/A
Cargo	Ing. apoyo supervision	**Cargo**	Ing. apoyo supervision	**Cargo**	N/A
Firma		**Firma**		**Firma**	


TIERRASUA
¡Conectamos región!

CONTROL DE MATERIALES

Contrato No: CONVENIO 3827 DE 2025 BTS-OICATÁ-CHIVATÁ

FECHA	MATERIAL	ABSCISA	HORA DE LLEGADA	VOLQUETA			TEMPERATURA (°C)		ELABORACIÓN DE BRIQUETAS
				N° VALE	PLACA	VOLUMEN	EXT.	COM.	Cantidad
27/05/2026	asfalto	K1+037,9	9:30	6505	OCM217	7	150	124	N/A
27/05/2026	asfalto	K1+058,5	8:30	6503	QKM379	12	132	118	N/A
27/05/2026	asfalto	K1+095	9:02	6504	SOO022	14	138	116	N/A
27/05/2026	asfalto	K1+135	9:40	6506	QLQ002	7	152	132	N/A
27/05/2026	asfalto	K1+180	3:00	6507	QKM379	12	150	130	N/A
27/05/2026	asfalto	k1+221	3:20	6508	SOO022	14	152	128	N/A
27/05/2026	base	valle	9:30	N/A	THZ021	14	N/A	N/A	N/A
27/05/2026	base	valle	9:55	N/A	THZ021	14	N/A	N/A	N/A
27/05/2026	base	valle	10:15	N/A	THZ021	14	N/A	N/A	N/A
27/05/2026	base	valle	10:37	N/A	THZ021	14	N/A	N/A	N/A
27/05/2026	base	valle	10:58	N/A	QLQ002	7	N/A	N/A	N/A
TOTAL ASFALTO SUELTOS						66			

NOTA: Verificar en todos los vales de control de materiales despachados de la planta de asfalto, la temperatura de salida de la mezcla.

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre:	Pablo E. Sierra Moreno	**Nombre:**	Rafael Camilo Suarez Suarez	**Nombre:**	N/A
Cargo:	Ing. Apoyo supervision	**Cargo:**	Ing. Apoyo supervision	**Cargo:**	N/A
Firma:		**Firma:**		**Firma:**	

TIERRASUA
Conectamos regiones


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Convenio 3827 de 2021 BTS - Diagonal - Chinatá

ACTIVIDAD: Fresado e instalación de Sobrecarpeta FECHA: 28/05/26

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Pablo Sierra

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

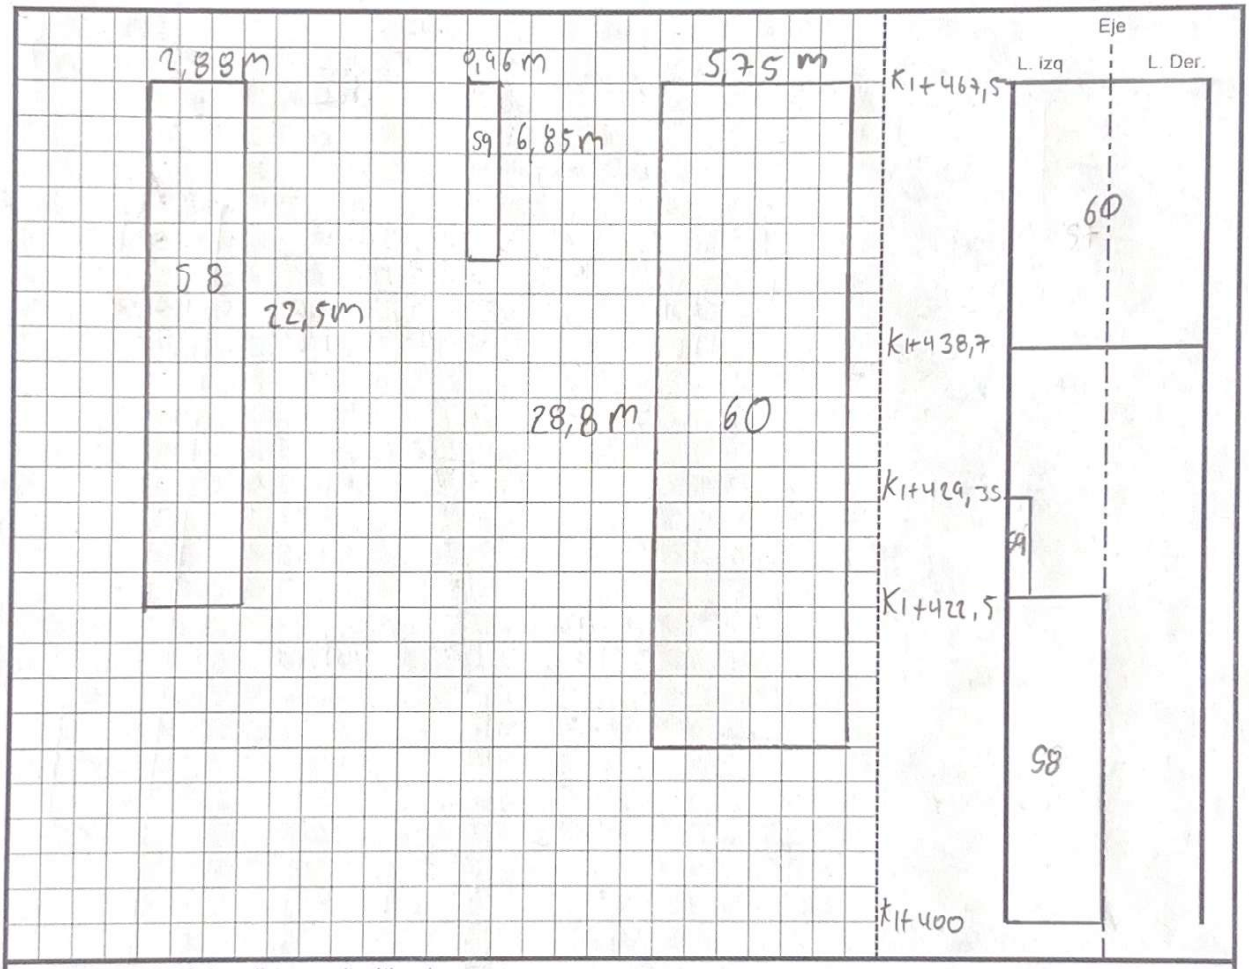

OBSERVACIONES (condiciones climáticas)

Día soleado y despejado

FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO

TIERRASUA
¡Conectamos regiones!


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Convenio 3827 de 2025 BTS- Oicatá - Chivatá

ACTIVIDAD: Parcheo de carpeta existente FECHA: 28/05/26

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Pablo Sierra

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

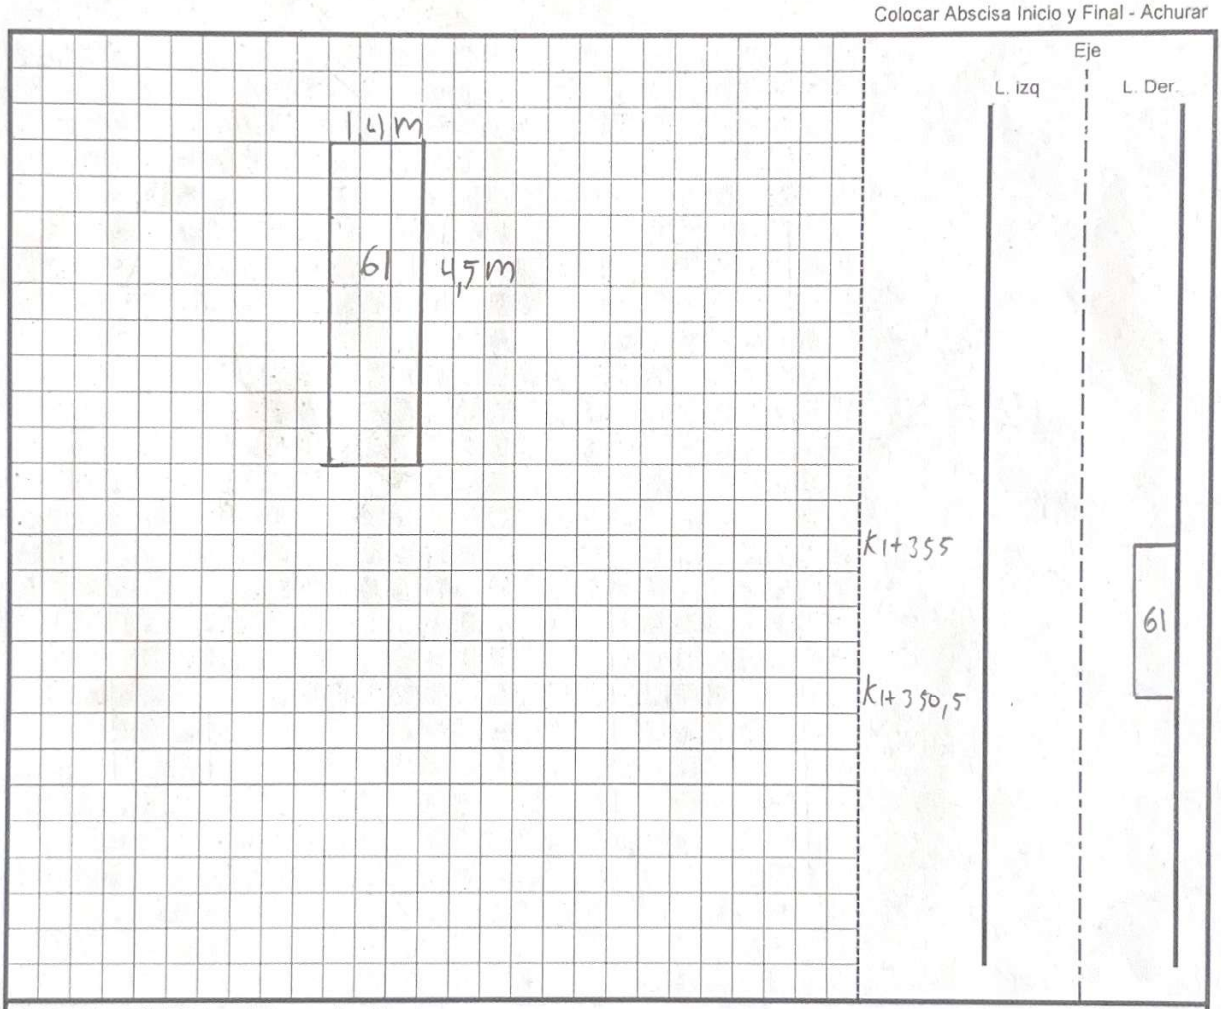

OBSERVACIONES: (condiciones climáticas)

Dia soleado


FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO

CANTIDADES DE PARCHEO / FRESADO / ASFALTO

OBRA: CONVENIO 3827 DE 2025 BTS-OICATÁ-CHIVATÁ

Fecha	P	F	A	Ubicaciòn		Lado			Dimensiones (m)			Área de Liga / Emulsión	Volumenes (m3)			
				Abcisa I.	Abcisa F.	Izq.	Eje	Der.	Largo	Ancho	Espesor		Excavacion	Subbase	Base	Asfalto
28/05/2026			X	**K1+263,4**	**K1+356**		**X**	**X**	**92,60**	**2,99**	**0,05**					**13,84**
28/05/2026			X	K1+281,2	K1+308,4		X	X	27,20	2,99	0,05	81,33				4,07
28/05/2026			X	K1+350,5	K1+355			X	4,50	1,40	0,06	6,30				0,38
28/05/2026			X	**K1+279**	**K1+381,7**	**X**	**X**		**102,70**	**3,00**	**0,043**					**13,25**
28/05/2026			X	K1+279	K1+308,4	X	X		29,40	3,00	0,05	88,20				4,41
28/05/2026	X			K1+350,5	K1+355			X	4,50	1,40	0,05		0,32			0,32
28/05/2026		X		K1+400	K1+422,5	X	X		22,50	2,88						
28/05/2026		X		K1+422,5	K1+423,46	X			0,96	6,85						
28/05/2026		X		K1+438,7	K1+467,5	X	X	X	28,80	5,75						
Totales													0,32			36,26

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre	Pablo Esteban Sierra Moreno	**Nombre**	Rafael Camilo Suarez Suarez	**Nombre**	N/A
Cargo	Ing. Apoyo supervisión	**Cargo**	Ing. Apoyo supervisión	**Cargo**	N/A
Firma		**Firma**		**Firma**	


TIERRASUA
¡Conectamos región!

CONTROL DE MATERIALES

Contrato No: CONVENIO 3827 DE 2025 BTS-OICATÁ-CHIVATÁ

FECHA	MATERIAL	ABSCISA	HORA DE LLEGADA	VOLQUETA			TEMPERATURA (°C)		ELABORACIÓN DE BRIQUETAS
				N° VALE	PLACA	VOLUMEN	EXT.	COM.	Cantidad
28/05/2026	asfalto	K1+263,4	8:10	6509	SWO366	12	142	102	N/A
28/05/2026	asfalto	K1+304	8:30	6510	SOO022	12	140	100	N/A
28/05/2026	asfalto	K1+279	12:40	6511	SWO366	12	150	128	N/A
28/05/2026	asfalto	K1+304	1:07	6512	SOO022	12	152	124	N/A
28/05/2026	base	N/A	9:00	N/A	OCM-217	7	N/A	N/A	N/A
28/05/2026	base	N/A	9:42	N/A	OCM-217	7	N/A	N/A	N/A
28/05/2026	base	N/A	10:08	N/A	OCM-217	7	N/A	N/A	N/A
28/05/2026	base	N/A	9:06	N/A	QLQ-002	7	N/A	N/A	N/A
28/05/2026	base	N/A	9:20	N/A	THZ-021	14	N/A	N/A	N/A
28/05/2026	base	N/A	9:50	N/A	THZ-021	14	N/A	N/A	N/A
28/05/2026	base	N/A	10:22	N/A	THZ-021	14	N/A	N/A	N/A
28/05/2026	base	N/A	10:50	N/A	THZ-021	14	N/A	N/A	N/A
28/05/2026	base	N/A	9:50	N/A	QKM-379	12	N/A	N/A	N/A
28/05/2026	base	N/A	9:38	N/A	QLQ-002	7	N/A	N/A	N/A
20/05/2026	agregado	N/A	9:30	N/A	SBV159	7	N/A	N/A	N/A
20/05/2026	arena	N/A	10:42	N/A	SBV159	7	N/A	N/A	N/A
28/05/2026	TOTAL ASFALTO SUELTO					48			

NOTA: Verificar en todos los vales de control de materiales despachados de la planta de asfalto, la temperatura de salida de la mezcla.

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre:	Pablo E. Sierra Moreno	Nombre:	Rafael Camilo Suarez Suarez	Nombre:	N/A
Cargo:	Ing. Apoyo supervision	Cargo:	Ing. Apoyo supervision	Cargo:	N/A
Firma:		Firma:		Firma:	

TIERRASUA
¡Conectamos regiones!


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Convenio 3827 de 2025 BTS-Oicatá - Chivatá

ACTIVIDAD: Fresado e instalación de sobre carpeta FECHA: 29/05/26

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Zoilo Sierra

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

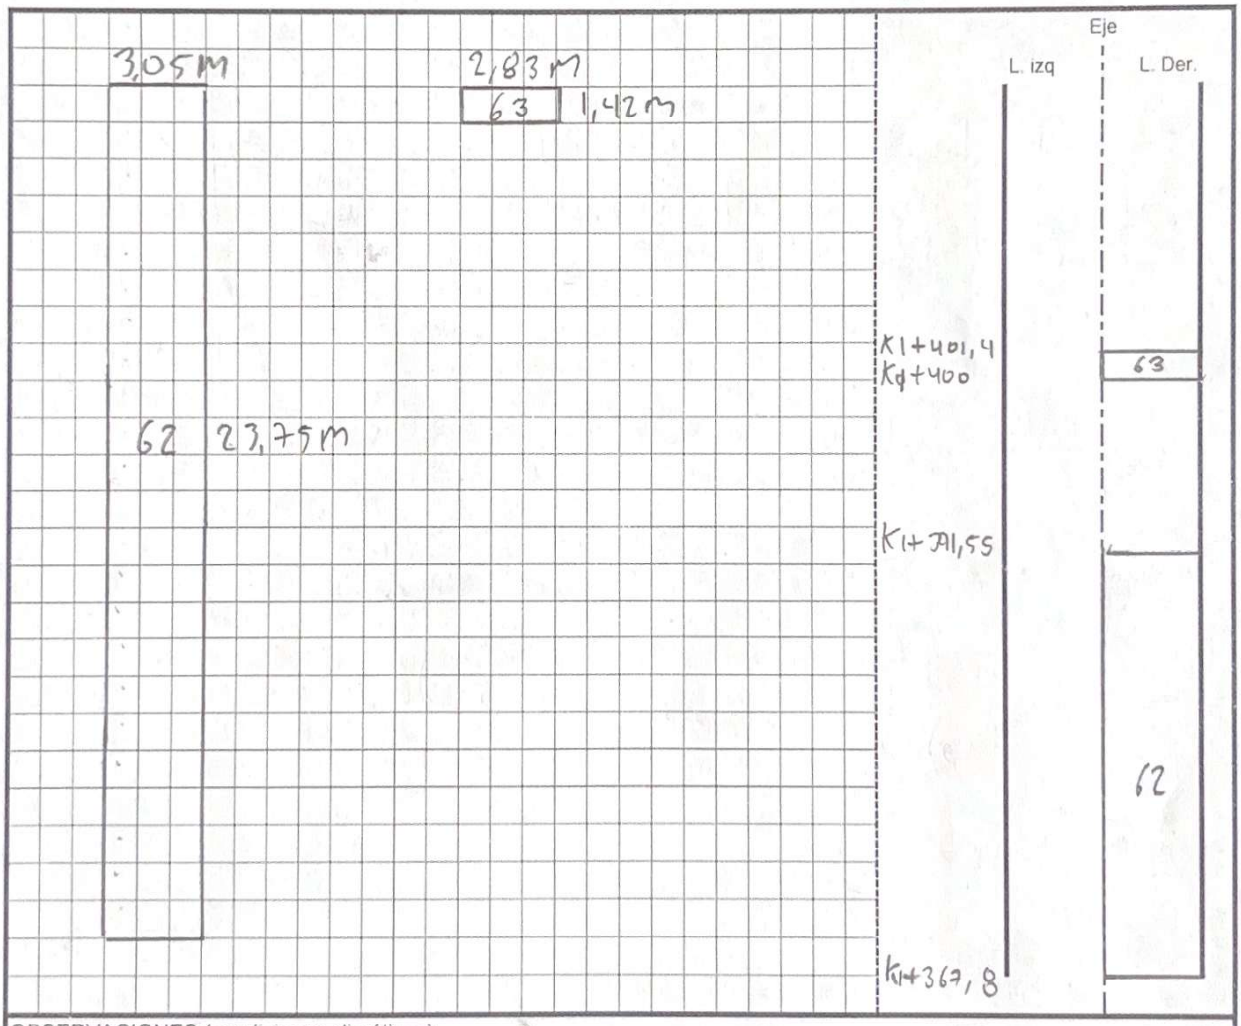

OBSERVACIONES: (condiciones climáticas)

Día soleado con presencia de nubes

FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO

TIERRASUA
¡Conectamos regiones!


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Convenio 3827 de 2027 BTS-Ubaté-Chinatá

ACTIVIDAD: fresado e instalación de Sobrecarpeta FECHA: 29/05/26

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Felipe Sierra

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

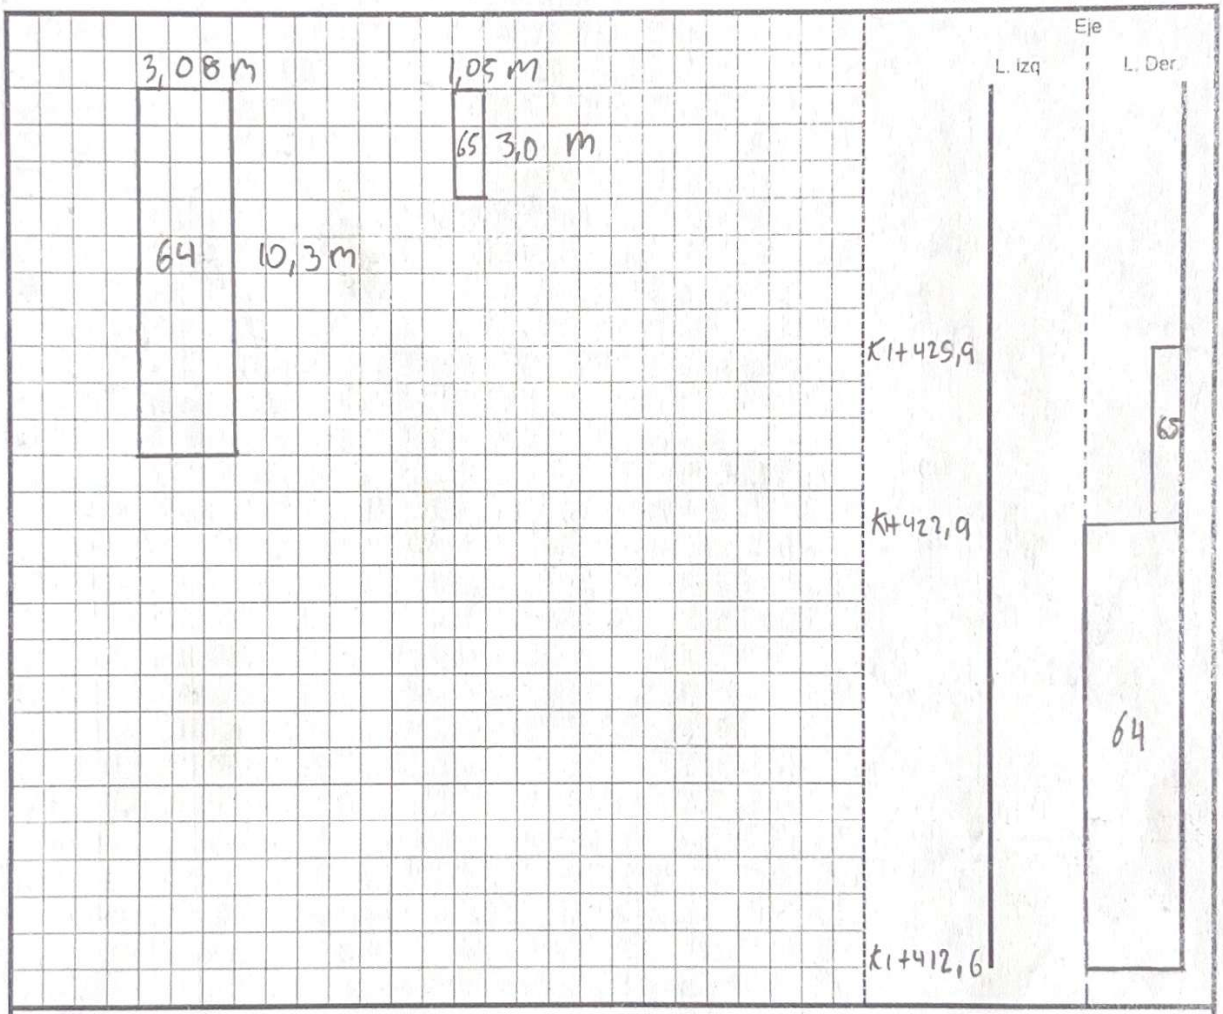

OBSERVACIONES: (condiciones climáticas)

Día soleado con presencia de nubes


FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO

CANTIDADES DE PARCHEO / FRESADO / ASFALTO

OBRA: CONVENIO 3827 DE 2025 BTS-OICATÁ-CHIVATÁ

Fecha	P	F	A	Ubicaciòn		Lado			Dimensiones (m)			Área de Liga / Emulsión	Volumenes (m3)			
				Abcisa I.	Abcisa F.	Izq.	Eje	Der.	Largo	Ancho	Espesor		Excavacion (m2)	Subbase	Base	Asfalto
29/05/2026			X	**K1+377,7**	**K1+467,5**	**X**			**89,8**	**3,07**	**0,045**					12,41
29/05/2026			X	K1+400	K1+422,5	X	X		22,5	3,07	0,04	69,08				2,76
29/05/2026			X	K1+422,5	K1+429,35	X			3,85	0,96	0,04	3,70				0,15
29/05/2026			X	K1+438,7	K1+467,5	X	X		28,8	5,75	0,045	165,60				7,45
29/05/2026			X	K1+367,8	K1+391,55		X	X	23,75	2,9	0,04	68,88				2,76
29/05/2026			X	K1+400	K1+401,4		X	X	47,8	3,11	0,04	148,66				5,95
29/05/2026			X	**K1+355,7**	**K1+403,5**		**X**	**X**	**23,75**	**3,05**	**0,04**					2,90
29/05/2026		X		K1+367,8	K1+391,55		X	X	23,75	3,05	0,05					
29/05/2026		X		K1+400	K1+401,4		X	X	1,42	2,835	0,05					
29/05/2026		X		K1+412,6	K1+422,9		X	X	10,3	3,08	0,05					
29/05/2026		X		K1+422,9	K1+425,9			X	3,00	1,05	0,05					
Totales																34,37

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre	Pablo Esteban Sierra Moreno	**Nombre**	Rafael Camilo Suarez Suarez	**Nombre**	N/A
Cargo	Ing. Apoyo supervisión	**Cargo**	Ing. Apoyo supervisión	**Cargo**	N/A
Firma		**Firma**		**Firma**	


TIERRASUA
¡Conectamos región!

CONTROL DE MATERIALES

Contrato No: CONVENIO 3827 DE 2025 BTS-OICATÁ-CHIVATÁ

FECHA	MATERIAL	ABSCISA	HORA DE LLEGADA	VOLQUETA			TEMPERATURA (°C)		ELABORACIÓN DE BRIQUETAS
				N° VALE	PLACA	VOLUMEN	EXT.	COM.	Cantidad
29/05/2026	asfalto	K1+377,7	10:00	6513	SOO022	14	140	122	N/A
29/05/2026	asfalto	K1+428	11:10	6514	THZ021	14	130	110	N/A
29/05/2026	asfalto	K1+365	12:40	6520	SOO022	12	138	122	N/A
TOTAL ASFALTO SUELTO						40			

NOTA: Verificar en todos los vales de control de materiales despachados de la planta de asfalto, la temperatura de salida de la mezcla.


Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre:	Pablo E. Sierra Moreno	Nombre:	Rafael Camilo Suarez Suarez	Nombre:	N/A
Cargo:	Ing. Apoyo supervisión	Cargo:	Ing. Apoyo supervisión	Cargo:	N/A
Firma:		Firma:		Firma:	

TIERRASUA ¡Conectamos región!	CONTROL DE MATERIALES

Contrato No: Convenio 3827 de 2025 BTS-Oicatá-Chivatá


FECHA	MATERIAL	ABSCISA	HORA DE LLEGADA	VOLQUETA			TEMPERATURA (°C)		ELABORACIÓN DE BRIQUETAS
				N° VALE	PLACA	VOLUMEN	EXT.	COM.	Cantidad
30/05/2026	base	valle	8:45	N/A	QKM379	12	N/A	N/A	N/A
30/05/2026	base	valle	8:54	N/A	QLQ002	7	N/A	N/A	N/A
30/05/2026	base	valle	8:56	N/A	OCM217	7	N/A	N/A	N/A
30/05/2026	base	valle	10:35	N/A	QKM379	12	N/A	N/A	N/A
30/05/2026	base	valle	10:37	N/A	QLQ002	7	N/A	N/A	N/A
30/05/2026	base	valle	11:10	N/A	OCM217	7	N/A	N/A	N/A

NOTA: Verificar en todos los vales de control de materiales despachados de la planta de asfalto, la temperatura de salida de la mezcla.

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre:	Pablo E. Sierra Moreno	Nombre:	Rafael Camilo Suarez Suarez	Nombre:	N/A
Cargo:	Ing. Apoyo supervisión	Cargo:	Ing. Apoyo supervisión	Cargo:	N/A
Firma:		Firma:		Firma:	

4.5.3. Tramo: 55BY07 cruce ruta 55 – Sotaquirá

TIERRASUA S.A.S
Cel: 316 8174458
gerencia@tierrasua.com
Calle 19 N.9-35 Piso 10 Tunja/Boyacá

			CONTROL DE MATERIALES			
CONTRATO NUMERO:			CO1.PCCNTR.8562435.3827 - TRAMO 55BY07 CRUCE RUTA 55 - RAMAL A SOTAQUIRÁ			
FECHA	MATERIAL	HORA DE LLEGADA	REFERENCIA		TEMPERATURA ©	
			# VALE	VOLUMEN	EXT.	COM.
15/05/2026	MEZCLA ASFALTICA	10:25 a. m.	52517	12	131	119
19/05/2026	MEZCLA ASFALTICA	10.50 am	52595	13	132	118
20/05/2026	MEZCLA ASFALTICA	10.10 am	52653	7	130	117
20/05/2026	MEZCLA ASFALTICA	10.40 am	52660	13	130	117
21/05/2026	MEZCLA ASFALTICA	9:55 a.m	52722	7	131	115
21/05/2026	MEZCLA ASFALTICA	10:15 a. m.	52731	12	131	114
22/05/2026	MEZCLA ASFALTICA	9:40 a. m.	52766	7	133	113
22/05/2026	MEZCLA ASFALTICA	10.05 am	52776	12	131	113
23/05/2026	MEZCLA ASFALTICA	8:50 a. m.	52797	14	130	112
23/05/2026	MEZCLA ASFALTICA	9:10 a. m.	52798	14	132	114
23/05/2026	MEZCLA ASFALTICA	9:20 a. m.	52799	14	133	114
23/05/2026	MEZCLA ASFALTICA	9:35 a.m	52800	14	132	117
23/05/2026	MEZCLA ASFALTICA	10:00 a. m.	52801	14	133	117
23/05/2026	MEZCLA ASFALTICA	10:20 a. m.	52802	14	133	116
23/05/2026	MEZCLA ASFALTICA	10:35 a. m.	52806	12	134	118
23/05/2026	MEZCLA ASFALTICA	11:00 a. m.	52807	7	133	117
23/05/2026	MEZCLA ASFALTICA	11:20 a. m.	52809	6	132	116
23/05/2026	MEZCLA ASFALTICA	11:45 a. m.	52811	14	133	113
25/05/2026	MEZCLA ASFALTICA	9.40 AM	52825	7	131	113
25/05/2026	MEZCLA ASFALTICA	10:05 a.m	52819	12	130	112
26/05/2026	MEZCLA ASFALTICA	9:55 a. m.	52874	7	132	114
26/05/2026	MEZCLA ASFALTICA	10:10 a. m.	52878	12	133	114
27/05/2026	MEZCLA ASFALTICA	10:05 a. m.	52949	7	132	117
27/05/2026	MEZCLA ASFALTICA	10:25 a. m.	52944	12	133	117
28/05/2026	MEZCLA ASFALTICA	8:35 a. m.	52975	18	133	116
28/05/2026	MEZCLA ASFALTICA	9:00 a. m.	52976	18	134	118
28/05/2026	MEZCLA ASFALTICA	9:20 a. m.	52989	6	133	117
28/05/2026	MEZCLA ASFALTICA	9:35 a. m.	52993	7	132	116
28/05/2026	MEZCLA ASFALTICA	10:00 a. m.	52997	12	130	112
29/05/2026	MEZCLA ASFALTICA	9:34 a.m	53053	18	132	114
29/05/2026	MEZCLA ASFALTICA	9:47 a.m	53032	18	133	114
29/05/2026	MEZCLA ASFALTICA	10:02 a.m	53059	6	132	117
29/05/2026	MEZCLA ASFALTICA	10:18 a. m.	53069	7	133	117
29/05/2026	MEZCLA ASFALTICA	10:32 a.m	53070	12	133	116
NOTA: Verificar en todos los vales de control de materiales despachados de la planta la temperatura de la mezcla.						
Elaboro			Aprobo			
Nombre:	FABIAN DAVID SUAREZ		**Nombre:**	RAFAEL CAMILO SUAREZ		
Cargo:	APOYO A LA SUPERVISION TIERRASUA		**Cargo:**	APOYO A LA SUPERVISION TIERRASUA		
Firma:			**Firma:**			

TIERRASUA


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Mantenimiento y mejoramiento de la via con codigo 5538407 cauce ruta 55 rumal-Sotaquira

ACTIVIDAD : Remoción y apertura mecanica y requinteo HPC-14 **FECHA :** 15-05-26

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Fabian Suarez.

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

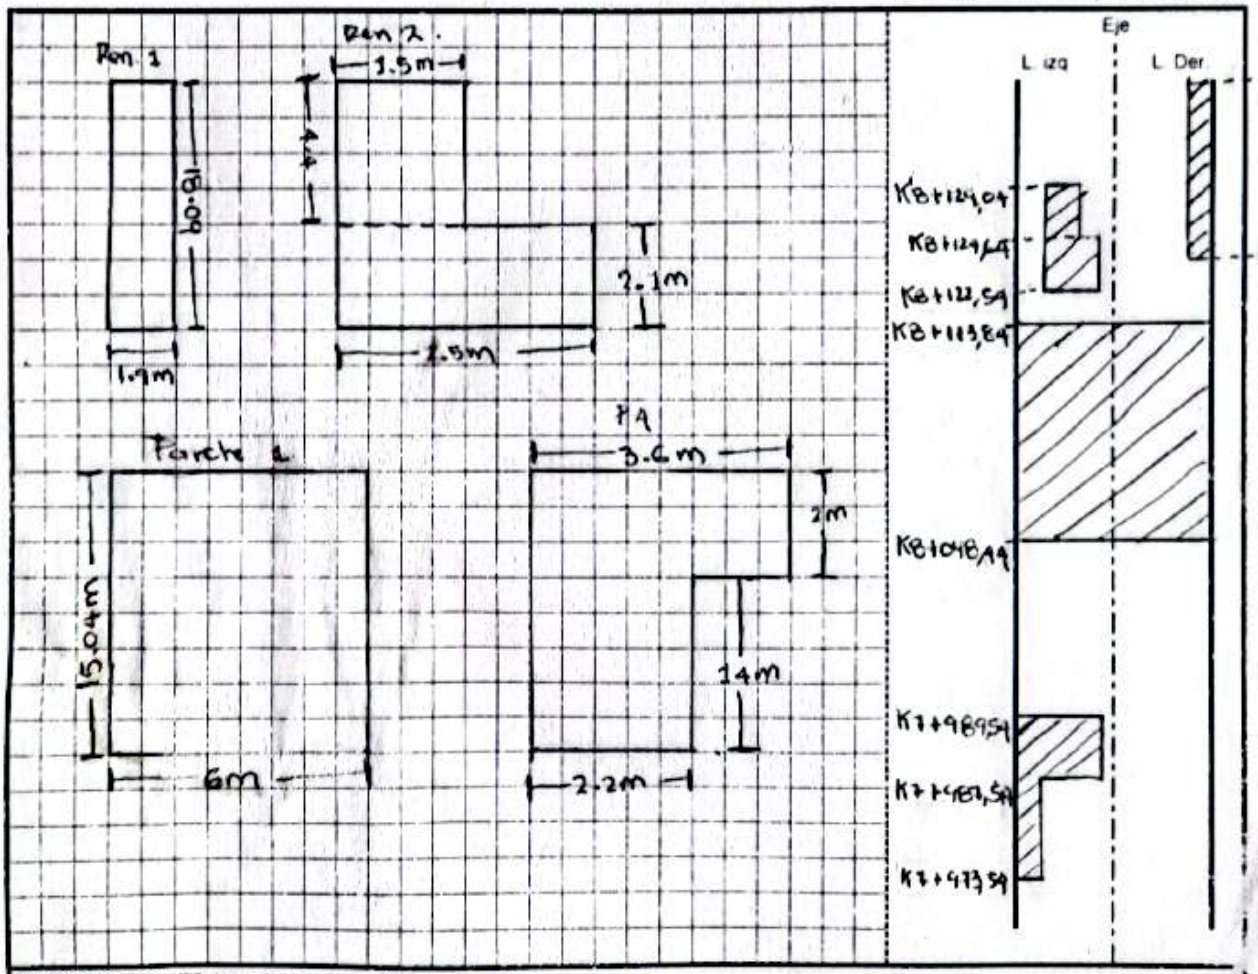

OBSERVACIONES (condiciones climáticas)

Dia Soleado

FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO APOYO A LA SUPERVISION

Vo.Bo.
Nombre Camilo Suarez
Firma
Cargo Apoyo Supervision

Powered by CamScanner

TIERRASUA


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Mantenimiento y mejoramiento de la vía codigo 550707 cruce ruta 55 rumal - Saboyaca

ACTIVIDAD: Corte apertura mecanica y remocion MDC-14 **FECHA:** 19 - 05 - 26

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Fabian Suarez

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

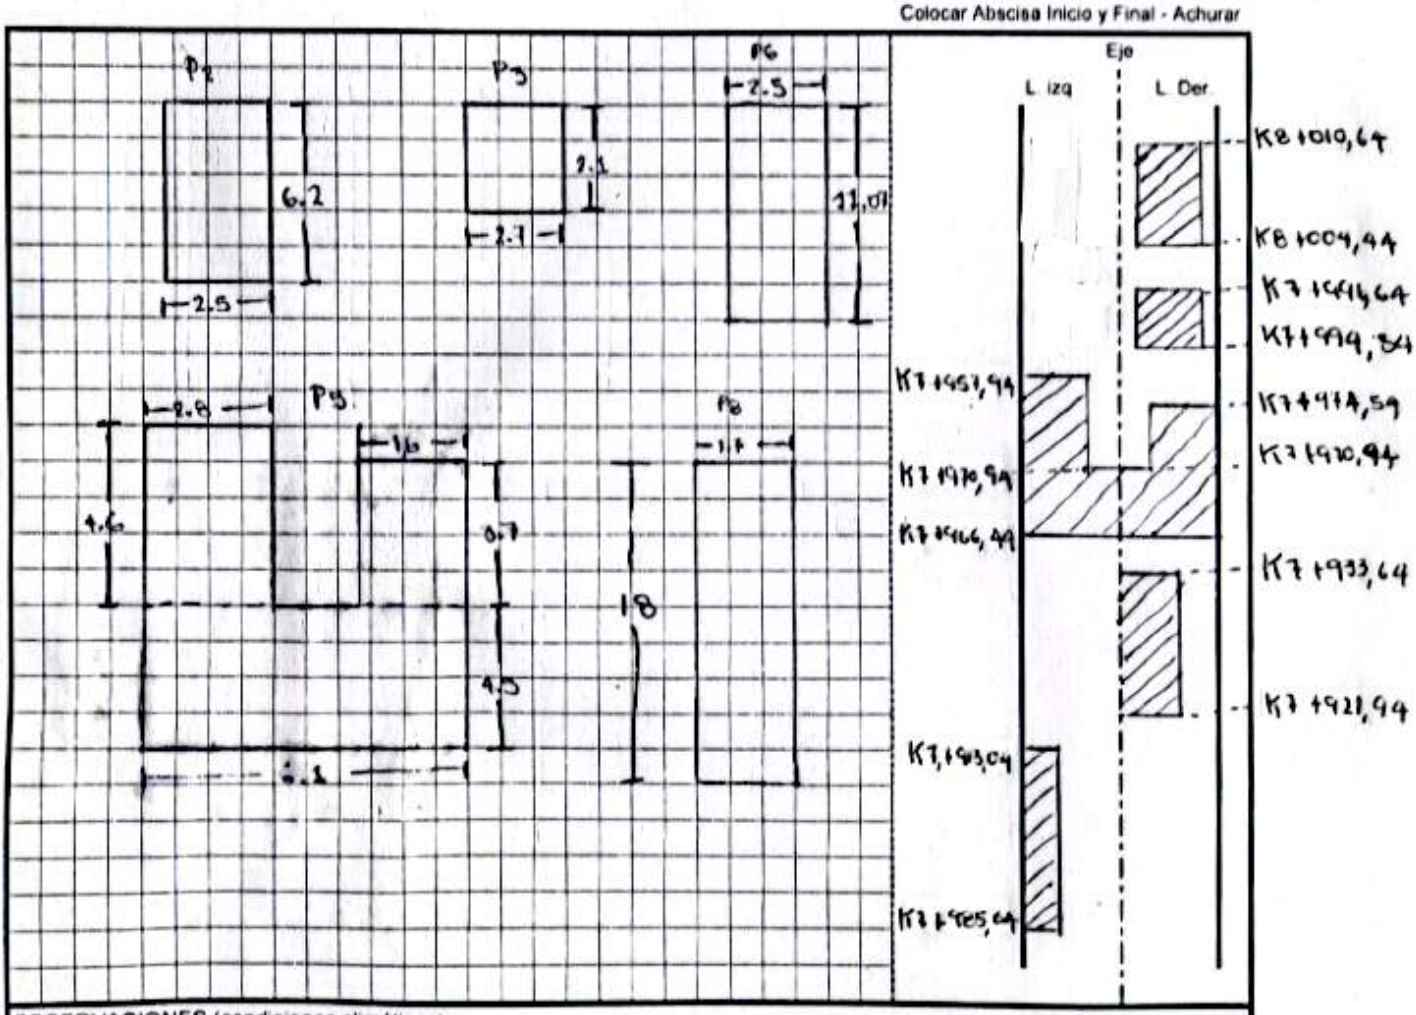

OBSERVACIONES (condiciones climáticas)

Dia Soleado.

FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO APOYO A LA SUPERVISION

Vo.Bo.

Nombre: Camilo Suarez

Firma:

Cargo Apoyo Supervisión

Powered by CamScanner

TIERRASUA


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Mantenimiento y mejoramiento de la via codigo 558401 cruce ruta rumal - Sotaquira

ACTIVIDAD : Corte, apertura mecanico y reperfilado MDC-19. **FECHA :** 20-05-26

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Fabian Suárez

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

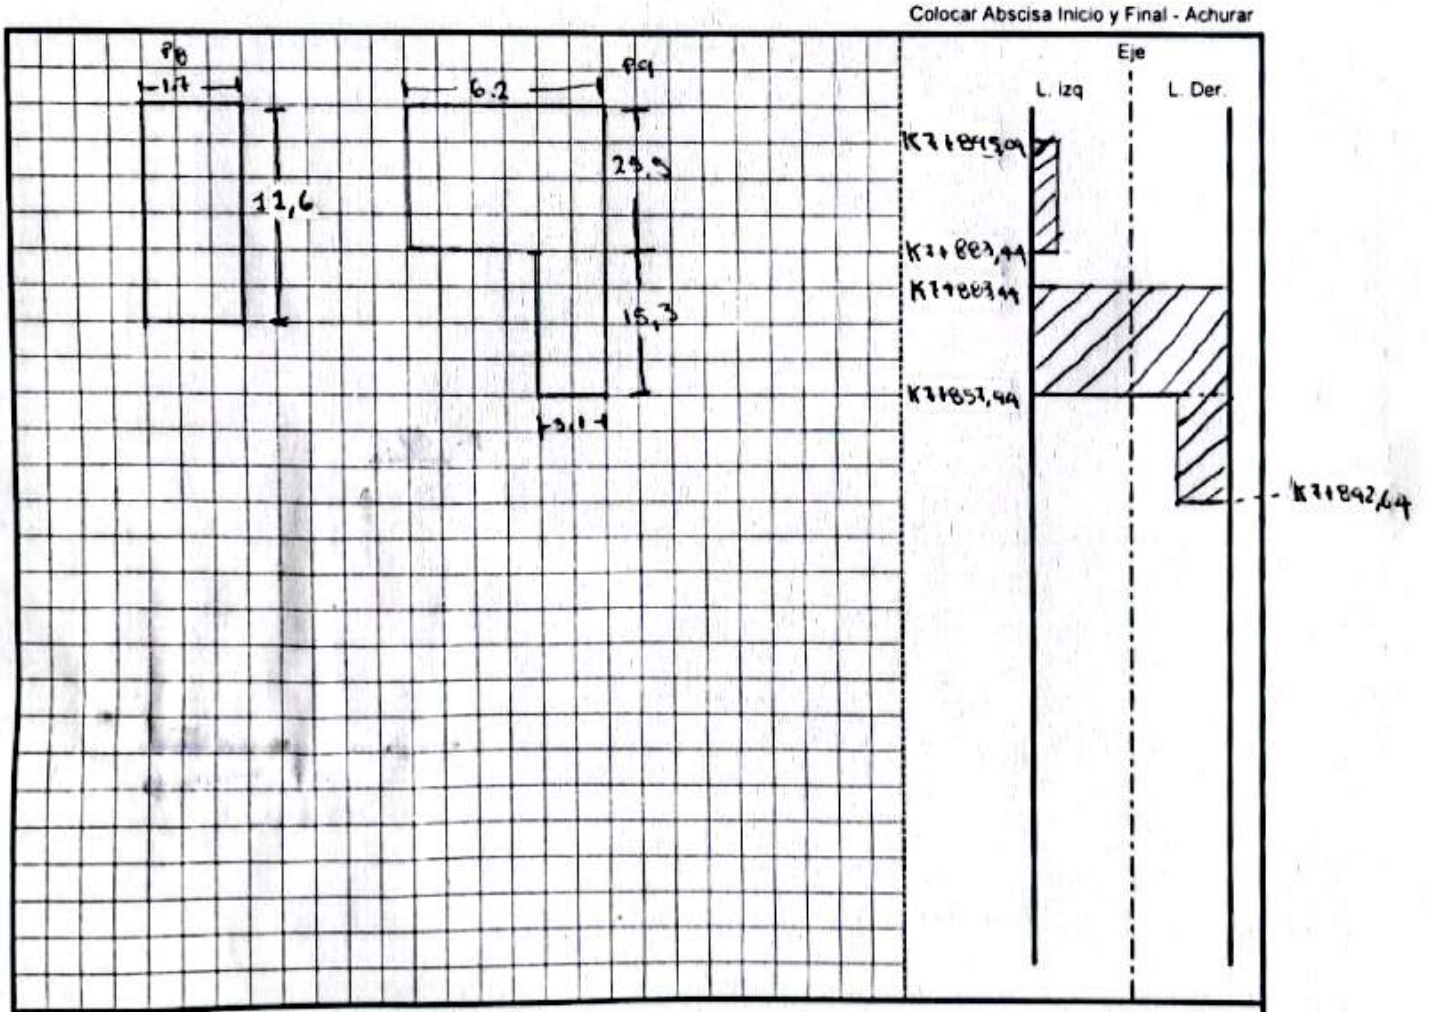

OBSERVACIONES (condiciones climáticas)

Dia Soleado

FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO APOYO A LA SUPERVISIÓN

Vo.Bo.
Nombre Camilo Suarez
Firma
Cargo Apoyo supervisión

Powered by CamScanner

TIERRASUA


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Mantenimiento y mejoramiento de la via codigo 558407 sector ruta ramal - Sabaneta

ACTIVIDAD : Corte, apertura mecanica y repunteo HDC-19 **FECHA :** 21-05-26

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Fabian Suárez

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

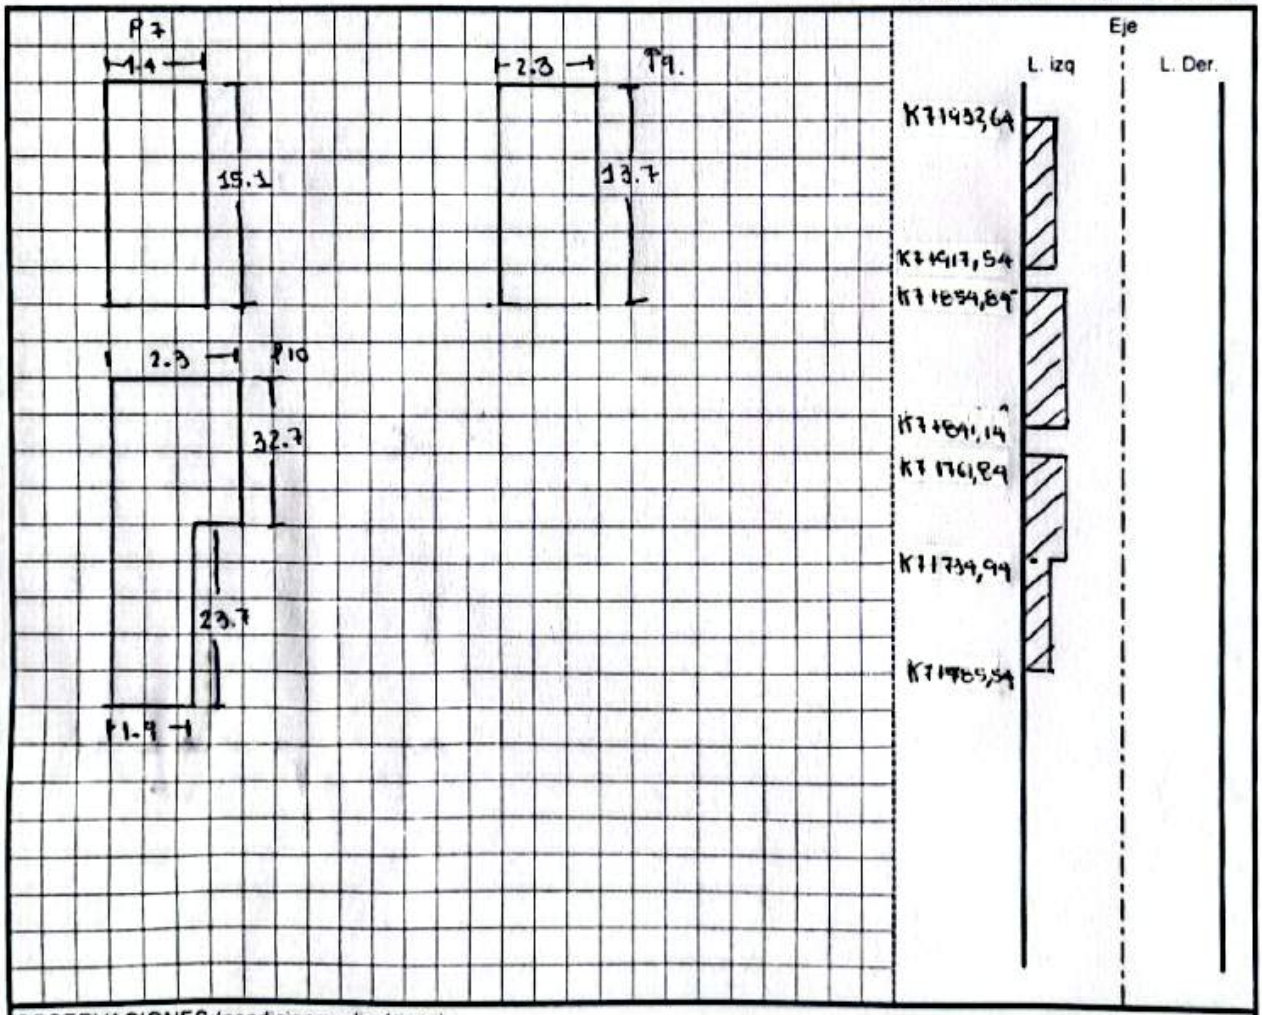

OBSERVACIONES (condiciones climáticas)

Dia Nublado, lluvias torrenciales por ciclos

FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO APOYO A LA SUPERVISION.

Vo.Bo.
Nombre: Camilo Suarez
Firma:
Cargo Apoyo Supervisión

Powered by CamScanner

TIERRASUA


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Mantenimiento y mejoramiento de la via codigo 55B407 ccucf cumul-Soleyuico

ACTIVIDAD: Corte, apertura mecanica y reperfil MPC-99 **FECHA:** 22-05-26

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Fabian Suárez

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

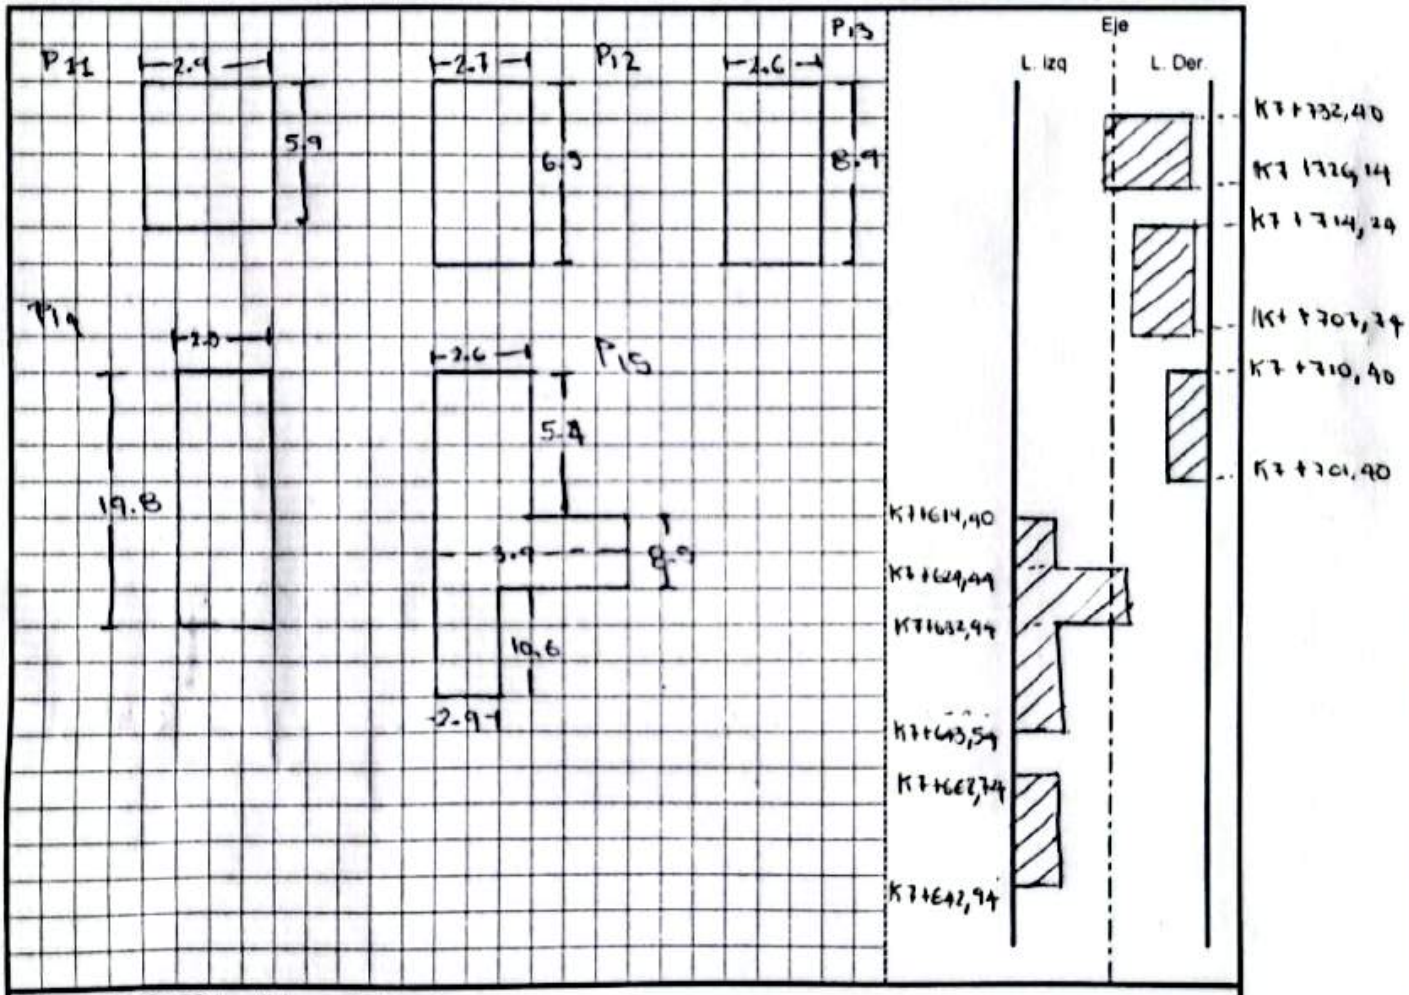

OBSERVACIONES (condiciones climáticas)

Dia soleado

FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO APOYO A LA SUPERVISION

Vo.Bo.
Nombre: Camilo Suárez
Firma:
Cargo Apoyo supervisión

Powered by CamScanner

TIERRASUA
¡Conectamos región!


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Mantenimiento y mejoramiento de la vía código 550407 cruce ruta cumul - Sotaguivo

ACTIVIDAD: Suministro e instalación de asfalto (reinvelación) **FECHA:** 23-05-26

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Fabian Suarez

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

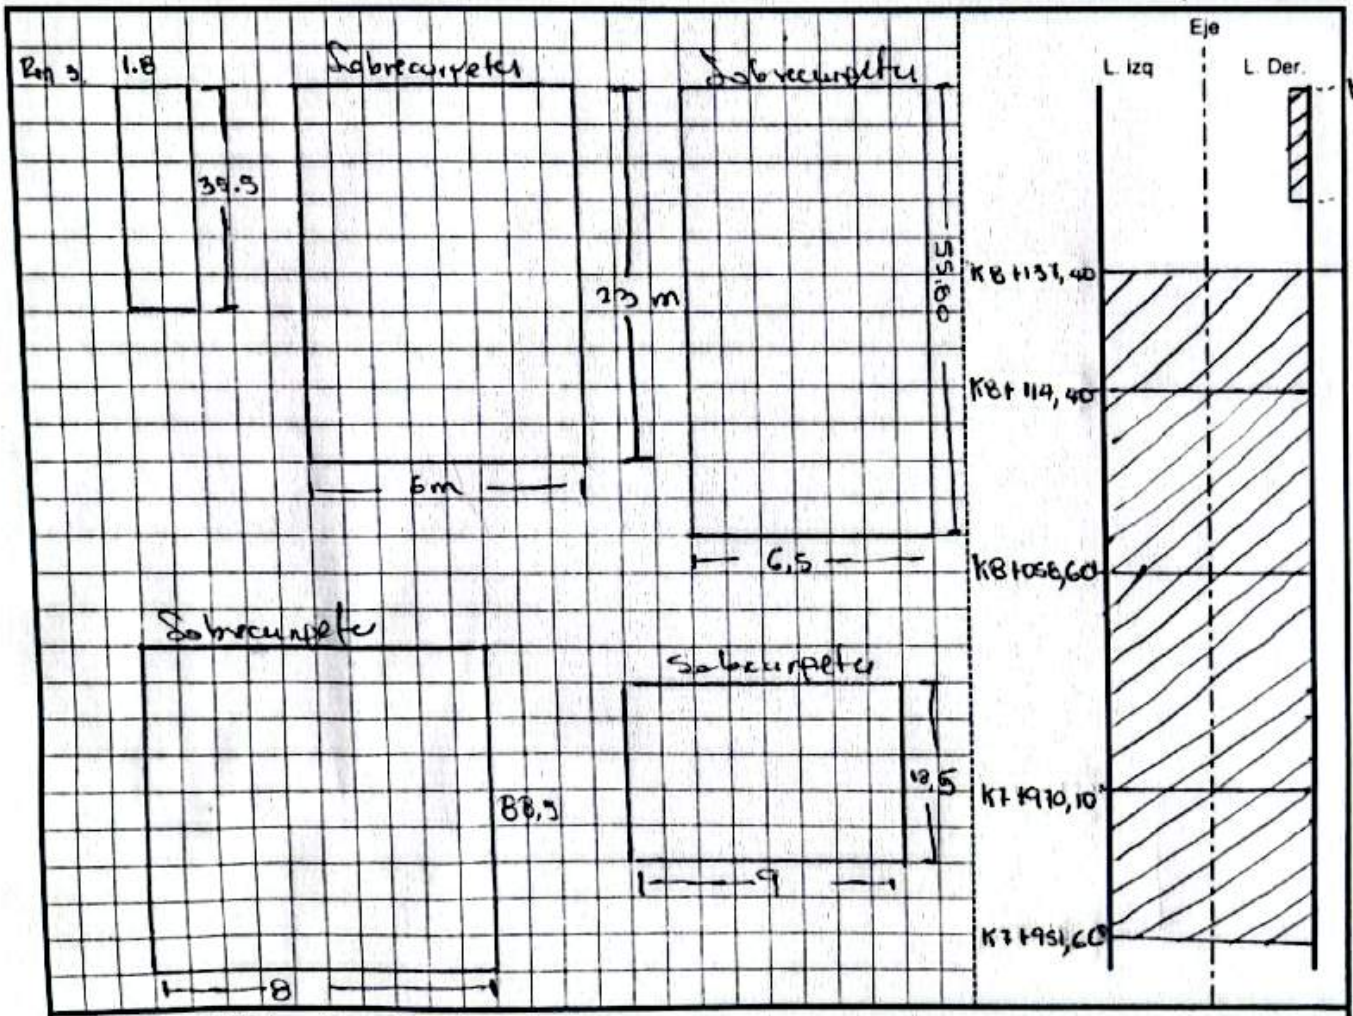

OBSERVACIONES (condiciones climáticas)

Mañana soleada, tarde con lluvias intensas por ratos

FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO APOYO A LA SUPERVISION

Vo.Bo.
Nombre: Camilo Suárez
Firma:
Cargo: Apoyo supervisión

Powered by CamScanner

TIERRASUA


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Mejoramiento y mantenimiento de la vía codigo 550407 cruce ruta 55 ramal - Sotaquirá

ACTIVIDAD: Apertura mecanica, suministro instalacion cafe **FECHA:** 25-05-26

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Fabian Suarez

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

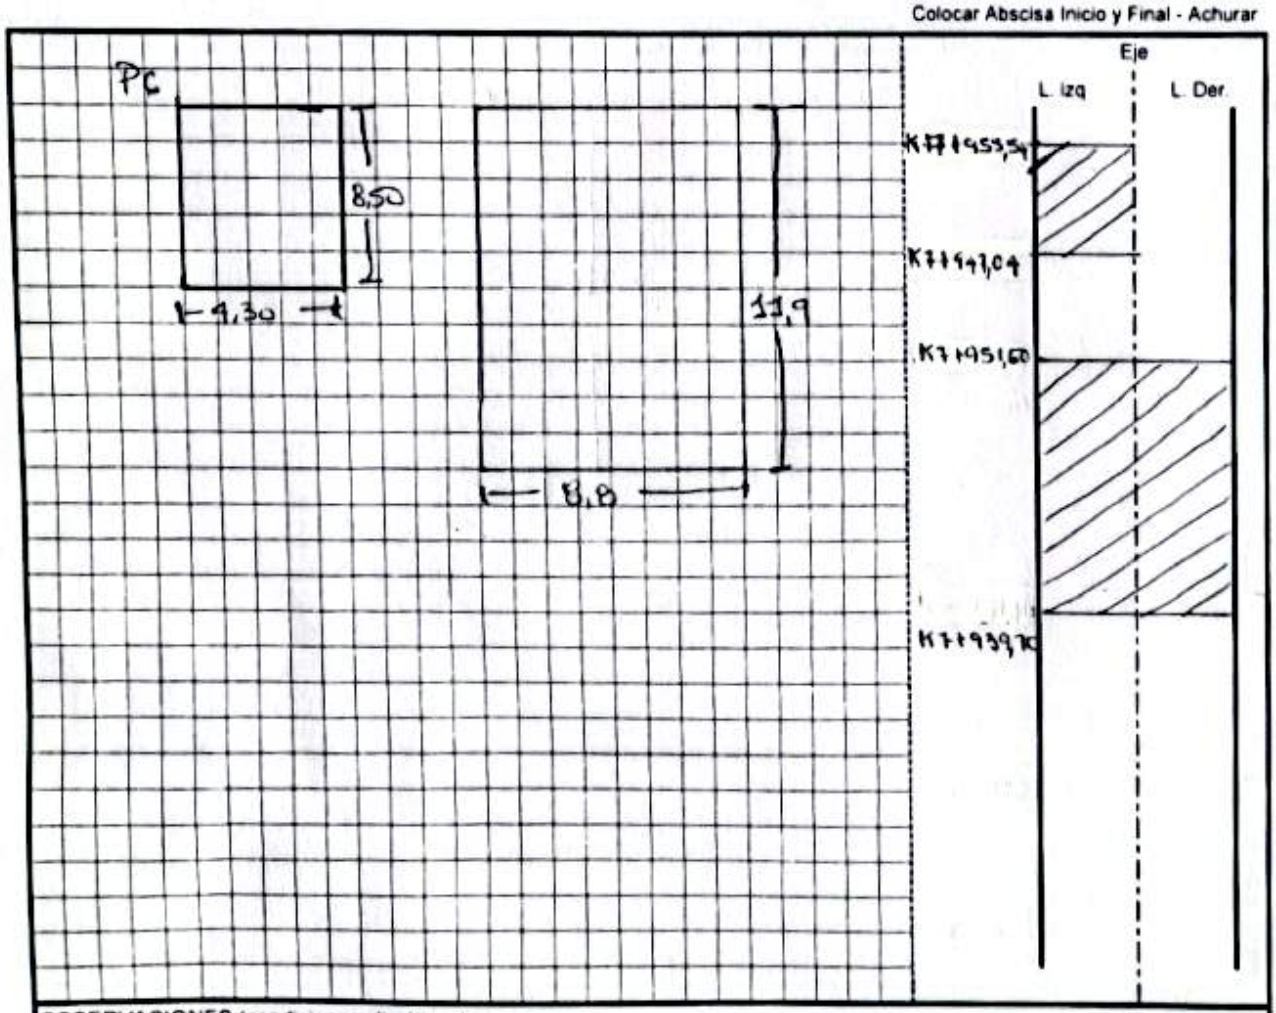

OBSERVACIONES (condiciones climáticas)

Dia nublado con alta intensidad pluviometrica

FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO APOYO A LA SUPERVISION

Vo.Bo.
Nombre Camilo Suárez
Firma
Cargo Apoyo Supervisión

Powered by CamScanner

TIERRASUA


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Mejoramiento y mantenimiento de la vía codigo 55B407 cruce ruta 55 carmul - Salagarra

ACTIVIDAD: Apertura mecanica, suministro asfalto cruce. **FECHA:** 26-05-26

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Fabian Suarez

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

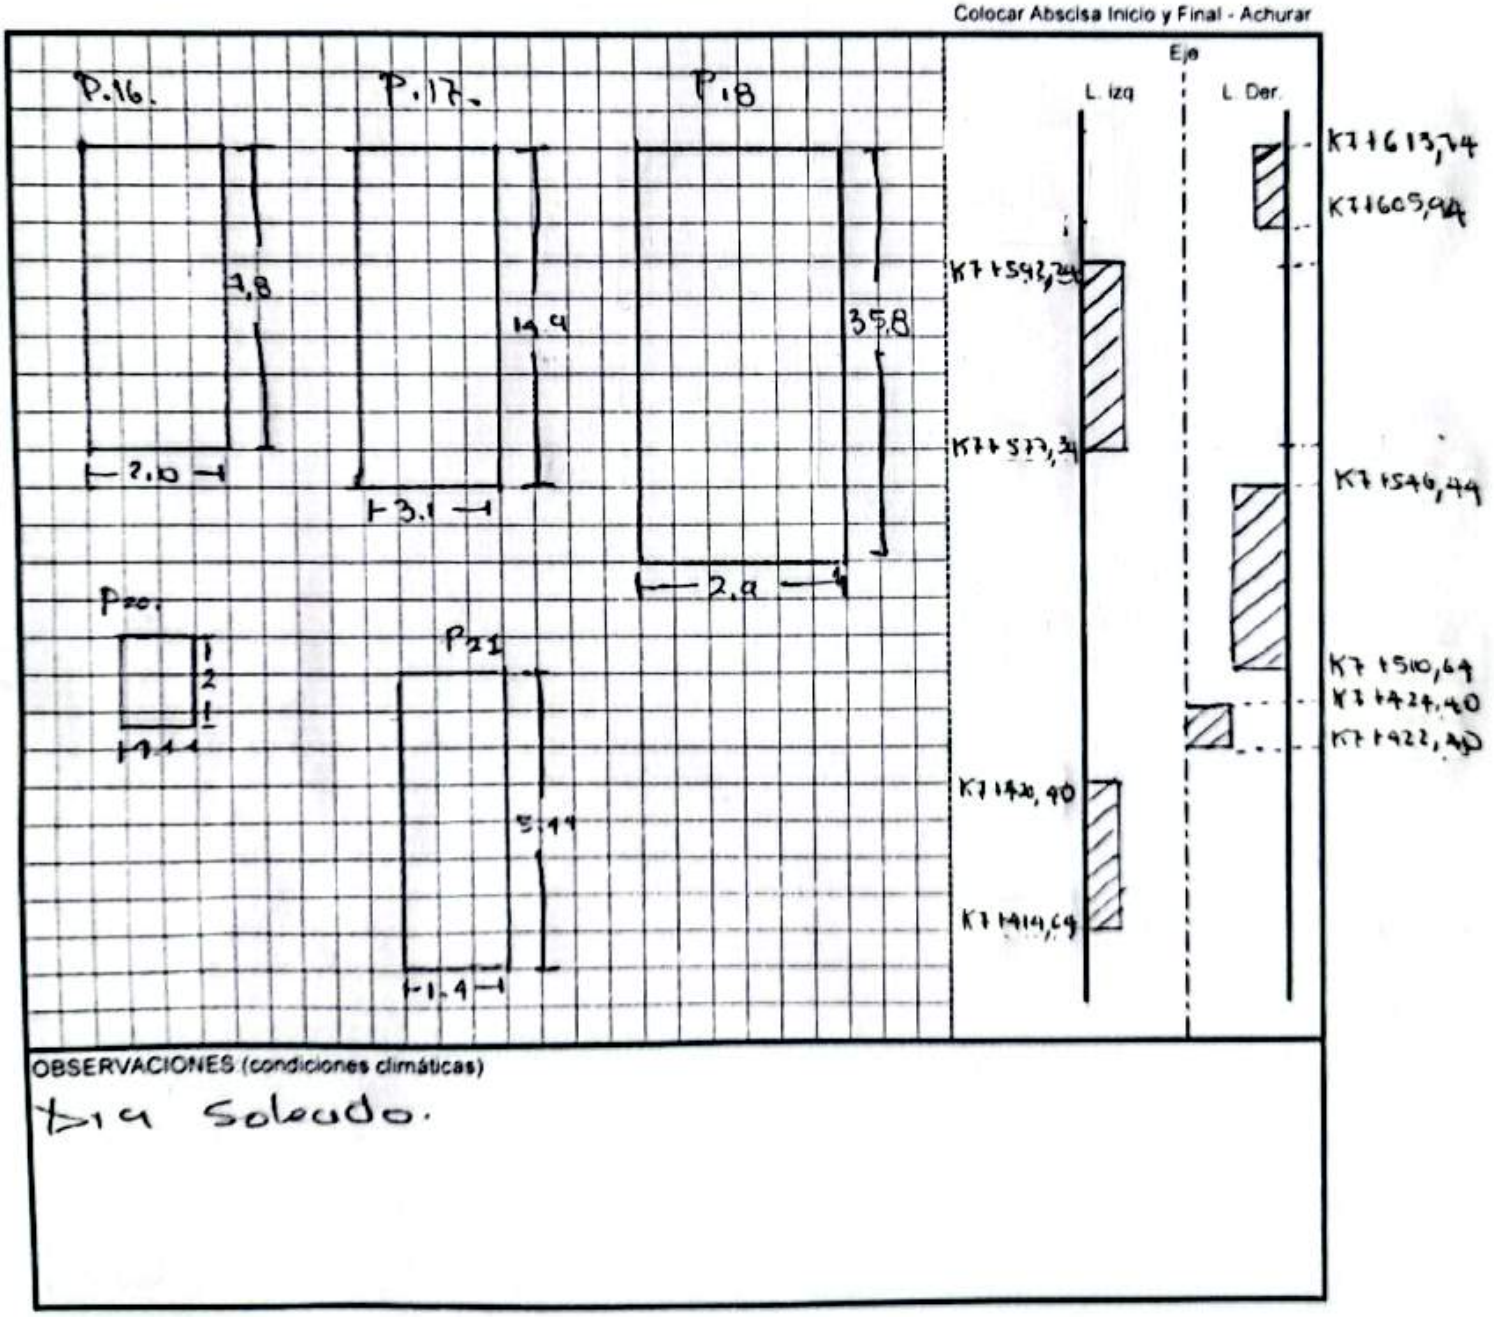

OBSERVACIONES (condiciones climáticas)

Dia Soleado.

FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO APOYO A LA SUPERVISION

Vo.Bo.
Nombre: Camilo Suarez
Firma:
Cargo: Apoyo supervisión

Powered by CamScanner

TIERRASUA


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Mejoramiento y mantenimiento de la vía código 5504 07 tramo 55 ramal - Sotaquira

ACTIVIDAD: Apertura mecanica, suministro instalacion geotil **FECHA:** 21-05-16

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Fabian Suárez

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

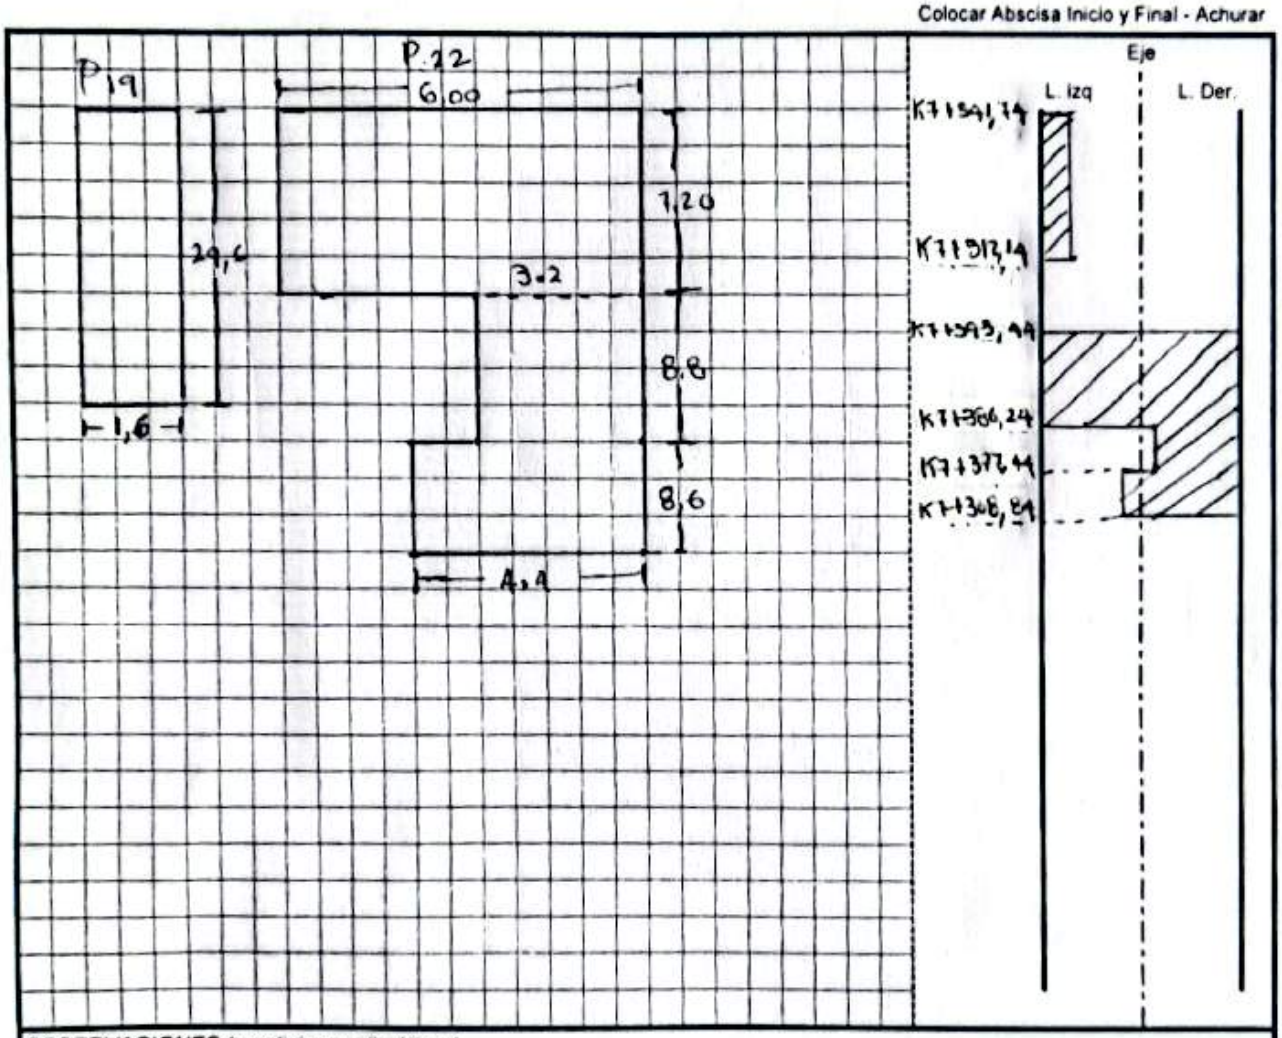

OBSERVACIONES (condiciones climáticas)

Mañana lluviosa por ratos y tarde despejado.

FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO APOYO A LA SUPERVISION

Vo.Bo.
Nombre: Camilo Suárez
Firma:
Cargo Apoyo supervisión

Powered by CamScanner

TIERRASUA


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Mejoramiento y mantenimiento de la vía codigo 558407 Cruce ruta 55 rumal - Sotaquira

ACTIVIDAD : Apertura mecanica, instalación mezcla asfaltica **FECHA :** 28-05-26

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Fabian Suarez.

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

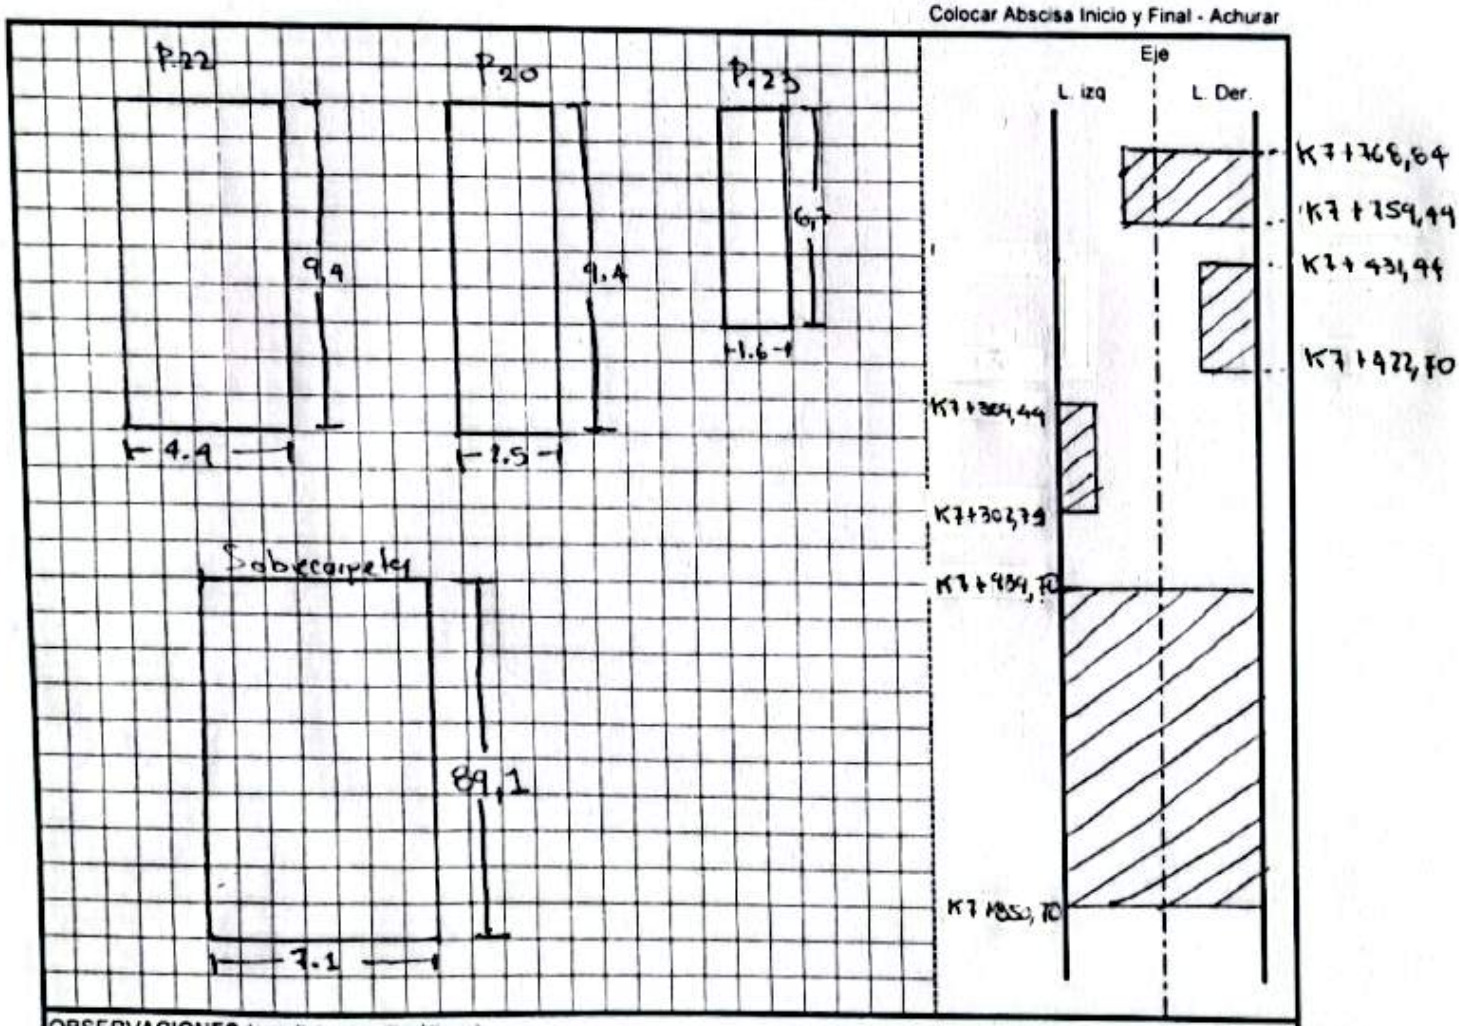

OBSERVACIONES (condiciones climáticas)

Dia soleado

FIRMA QUIÉN ELABORO

FIRMA INGENIERO APOYO A LA SUPERVISIÓN

Vo.Bo.
Nombre: Camilo Suárez
Firma:
Cargo: Apoyo supervisión

Powered by CamScanner

TIERRASUA


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Mejoramiento y mantenimiento a la vía código 5505407 sector ruta 55 ramal-Sotaquira

ACTIVIDAD: Suministro e instalación mezcla asfáltica MDC-19. **FECHA:** 29-05-26

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Fabian Suárez

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

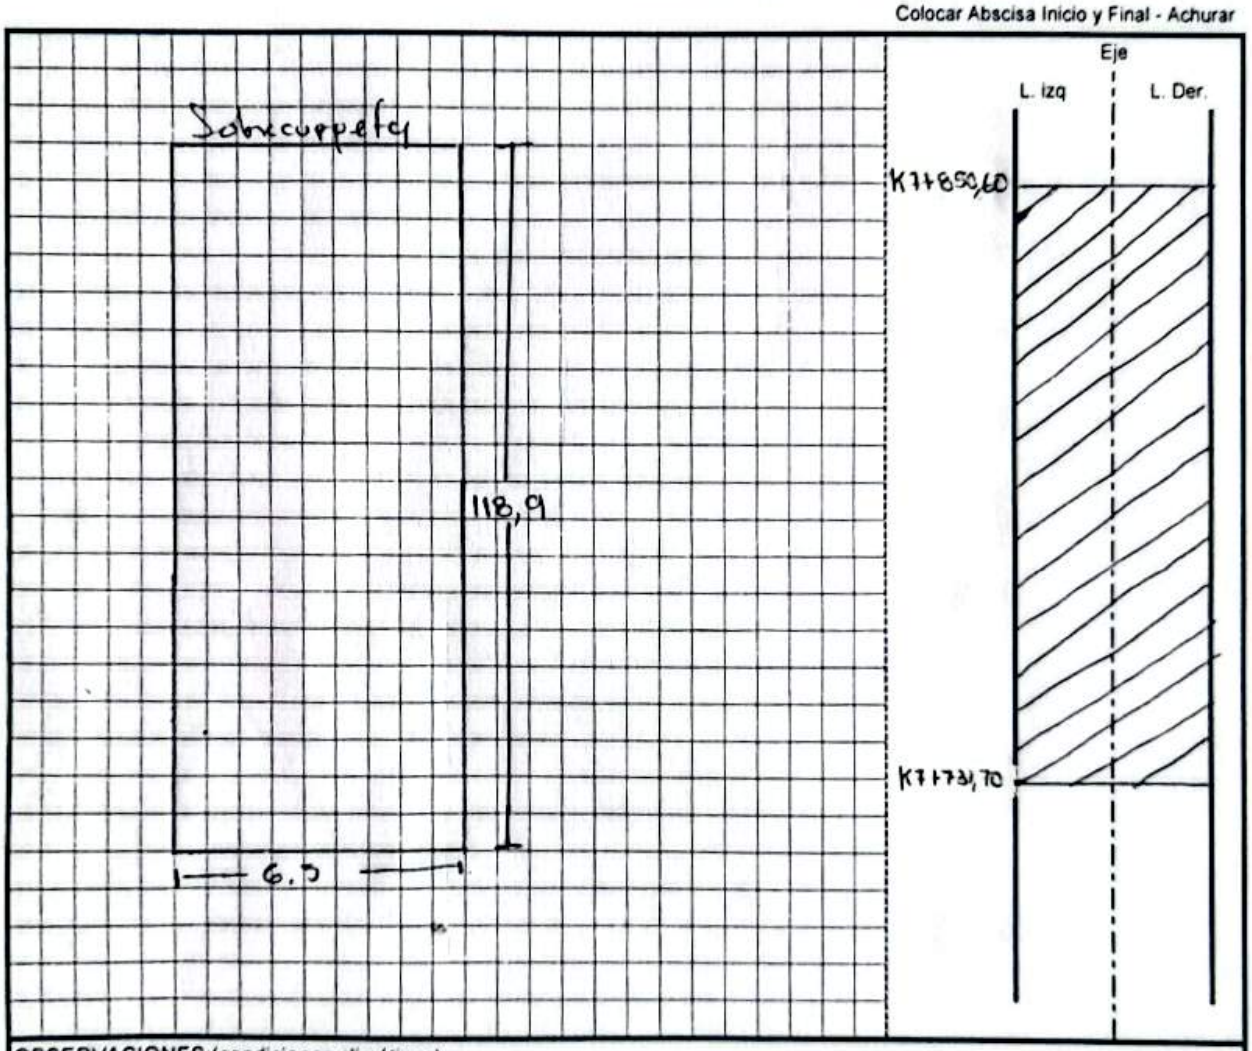

OBSERVACIONES (condiciones climáticas)

Dia soleado

FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO APOYO A LA SUPERVISION

Vo.Bo.
Nombre: Camilo Suarez
Firma:
Cargo: Apoyo Supervisión

Powered by CamScanner

4.5.4. Tramo: 55BY08 Pantano de Vargas – Firavitoba y 61BYA paso por Firavitoba

TIERRASUA S.A.S
Cel: 316 8174458
gerencia@tierrasua.com
Calle 19 N.9-35 Piso 10 Tunja/Boyacá

TIERRASUA

CANTIDADES DE PARCHEO

Estimado Efectuado

OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS CON CÓDIGOS 61BYA (PASO POR FIRAVITOBA) - 55BY08 (PANTANO DE VARGAS-FIRAVITOBA), EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Fecha 13-05/2026

Fecha	Parche	Ubicación		Lado			Dimensiones (m)			Volumenes (m3)			Area de	Volumen Mezcla
	No.	Abcisa Inicio	Abcisa Final	Izq.	Eje	Der	Largo	Ancho	Espesor	Excavacion	Subbase	Base	Liga (m2)	Asfaltica (m3)
13/05/2026	RN1	PR8+150	PR8+148	X			1.80	0.75	0.10				1.35	0.14
13/05/2026	RN2	PR8+148	PR8+146		X		1.90	0.70	0.10				1.33	0.13
13/05/2026	RN3	PR8+146	PR8+144			X	1.70	0.80	0.08				1.36	0.11
13/05/2026	RN4	PR8+144	PR8+142		X		1.85	0.75	0.08				1.3875	0.11
13/05/2026	RN5	PR8+142	PR8+140	X			1.95	0.70	0.08				1.365	0.11
13/05/2026	RN6	PR8+140	PR8+138		X		1.75	0.78	0.08				1.365	0.11
13/05/2026	RN7	PR8+138	PR8+136		X		1.80	0.74	0.08				1.332	0.11
13/05/2026	RN8	PR8+136	PR8+134	X			1.90	0.72	0.08				1.368	0.11
13/05/2026	RN9	PR8+134	PR8+132	X			1.70	0.79	0.08				1.343	0.11
13/05/2026	RN10	PR8+132	PR8+130		X		1.85	0.73	0.08				1.3505	0.11
13/05/2026	RN11	PR8+130	PR8+128			X	1.95	0.69	0.08				1.3455	0.11
13/05/2026	RN12	PR8+128	PR8+126		X		1.75	0.77	0.08				1.3475	0.11
13/05/2026	RN13	PR8+126	PR8+124		X		1.80	0.75	0.08				1.35	0.11
13/05/2026	RN14	PR8+124	PR8+122		X		1.90	0.71	0.08				1.349	0.11
13/05/2026	RN15	PR8+122	PR8+120		X		1.70	0.80	0.08				1.36	0.11
13/05/2026	RN16	PR8+120	PR8+118	X			1.85	0.74	0.08				1.369	0.11
13/05/2026	RN17	PR8+118	PR8+116		X		1.95	0.70	0.08				1.365	0.11
13/05/2026	RN18	PR8+116	PR8+114		X		1.75	0.78	0.10				1.365	0.14
13/05/2026	RN19	PR8+114	PR8+112			X	1.80	0.75	0.10				1.35	0.14
13/05/2026	RN20	PR8+112	PR8+110	X			1.90	0.70	0.10				1.33	0.13
13/05/2026	RN21	PR8+110	PR8+108		X		1.70	0.80	0.10				1.36	0.14
13/05/2026	RN22	PR8+108	PR8+106	X			1.85	0.75	0.10				1.3875	0.14
13/05/2026	RN23	PR8+106	PR8+104		X		1.95	0.70	0.10				1.365	0.14
13/05/2026	RN24	PR8+104	PR8+102	X			1.75	0.77	0.10				1.3475	0.13
13/05/2026	RN25	PR8+102	PR8+100		X		1.80	0.75	0.10				1.35	0.14
13/05/2026	RN26	PR8+100	PR8+98	X			1.90	0.71	0.10				1.349	0.13
13/05/2026	RN27	PR8+98	PR8+96		X		1.70	0.80	0.10				1.36	0.14
13/05/2026	RN28	PR8+96	PR8+94	X			2.50	1.85	0.10				4.625	0.46
13/05/2026	RN29	PR7+450	PR7+448		X		2.20	1.75	0.08				3.85	0.31
13/05/2026	RN30	PR7+445	PR7+443	X			2.40	1.68	0.08				4.032	0.32
13/05/2026	RN31	PR7+440	PR7+438		X		2.30	1.94	0.09				4.462	0.40
13/05/2026	RN32	PR7+435	PR7+433	X			2.40	1.84	0.09				4.416	0.40
13/05/2026	RN33	PR7+430	PR7+428		X		2.40	1.74	0.09				4.176	0.38
13/05/2026	RN34	PR7+425	PR7+423	X			2.30	1.50	0.09				3.45	0.31
13/05/2026	RN35	PR7+420	PR7+418		X		2.40	1.98	0.09				4.752	0.43
13/05/2026	RN36	PR7+415	PR7+413	X			2.20	2.10	0.09				4.62	0.42
13/05/2026	RN37	PR7+410	PR7+408		X		2.60	1.87	0.09				4.862	0.44
13/05/2026	RN38	PR7+405	PR7+403	X			1.95	1.59	0.09				3.1005	0.28
13/05/2026	RN39	PR7+400	PR7+398		X		1.78	1.40	0.09				2.492	0.22
13/05/2026	RN40	PR7+395	PR7+393	X			2.36	1.70	0.09				4.012	0.36
13/05/2026	RN41	PR7+390	PR7+388		X		2.47	1.60	0.09				3.952	0.36
13/05/2026	RN42	PR7+385	PR7+383	X			2.90	1.80	0.09				5.22	0.47
13/05/2026	RN43	PR7+380	PR7+378		X		1.86	0.75	0.09				1.395	0.13
13/05/2026	RN44	PR7+375	PR7+373	X			2.50	1.00	0.08				2.5	0.20
13/05/2026	RN45	PR7+370	PR7+368		X		2.80	0.90	0.08				2.52	0.20
13/05/2026	RN46	PR7+365	PR7+363	X			2.40	1.05	0.08				2.52	0.20
13/05/2026	RN47	PR7+360	PR7+358		X		2.60	0.95	0.08				2.47	0.20
13/05/2026	RN48	PR7+355	PR7+353	X			2.70	0.95	0.08				2.565	0.21
13/05/2026	RN49	PR7+350	PR7+348		X		2.50	1.00	0.08				2.5	0.20
13/05/2026	RN50	PR7+345	PR7+343	X			2.80	0.90	0.08				2.52	0.20
13/05/2026	RN51	PR7+340	PR7+338		X		2.40	1.05	0.08				2.52	0.20
13/05/2026	RN52	PR7+335	PR7+333	X			2.60	0.95	0.08				2.47	0.20
13/05/2026	RN53	PR7+330	PR7+328		X		2.70	0.95	0.08				2.565	0.21
13/05/2026	RN54	PR7+325	PR7+323	X			2.50	1.00	0.08				2.5	0.20
13/05/2026	RN55	PR7+320	PR7+318		X		2.80	0.90	0.08				2.52	0.20
13/05/2026	RN56	PR7+315	PR7+313	X			2.40	1.05	0.08				2.52	0.20
13/05/2026	RN57	PR7+310	PR7+308		X		2.60	0.95	0.08				2.47	0.20
13/05/2026	RN58	PR7+305	PR7+303	X			2.70	0.95	0.08				2.565	0.21
13/05/2026	RN59	PR7+300	PR7+298		X		2.50	1.00	0.08				2.5	0.20
13/05/2026	RN60	PR7+295	PR7+293	X			2.80	0.90	0.08				2.52	0.20
13/05/2026	RN61	PR7+290	PR7+288		X		2.40	1.05	0.08				2.52	0.20
13/05/2026	RN62	PR7+285	PR7+283	X			2.60	0.95	0.08				2.47	0.20
13/05/2026	RN63	PR7+280	PR7+278		X		2.70	0.95	0.08				2.565	0.21
13/05/2026	RN64	PR7+275	PR7+273	X			2.50	1.00	0.08				2.5	0.20
13/05/2026	RN65	PR7+270	PR7+268		X		2.80	0.90	0.08				2.52	0.20
13/05/2026	RN66	PR7+265	PR7+263			X	2.40	1.05	0.08				2.52	0.20
13/05/2026	RN67	PR7+260	PR7+258			X	2.60	0.95	0.08				2.47	0.20
13/05/2026	RN68	PR7+255	PR7+253		X		2.70	0.95	0.08				2.565	0.21

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre	Edwin Alejandro Laverde Patiño	Vo.Bo. Rafael Camilo Suárez Suárez	Javier Andrés Fagua Torres
Cargo	Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.	Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.	Apoyo a la supervisión GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
Firma			


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS CON CÓDIGOS 61BYA (PASO POR FIRAVITOBA) - 55BY08 (PANTANO DE VARGAS-FIRAVITOBA), EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

ACTIVIDAD :	RENIVELACION " PARCHEO"	**FECHA : 13-05/2026**

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Edwin Alejandro Laverde Patiño

Colocar Abscisa PR8+150 y PR7+253

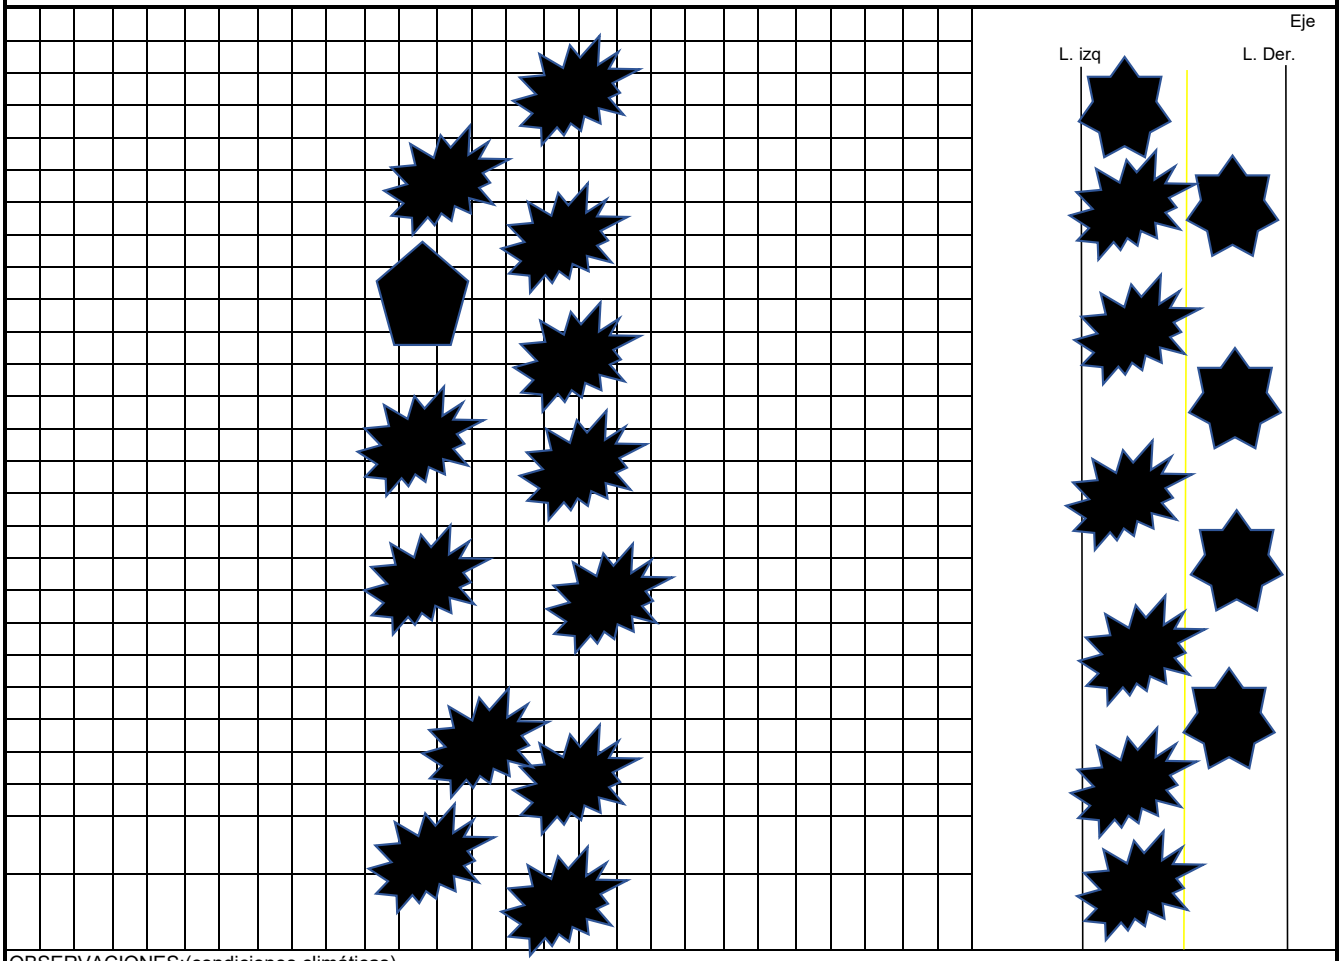

OBSERVACIONES:(condiciones climáticas)

FIRMA QUIEN ELABORO

Nombre: Edwin Alejandro Laverde Patiño
NApoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.

FIRMA INGENIERO

Nombre: Javier Andrés Fagua Torres
Apoyo a la supervisión GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

CANTIDADES DE PARCHEO

Estimado Efectuado

OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS CON CÓDIGOS 61BYA (PASO POR FIRAVITOBA) - 55BY08 (PANTANO DE VARGAS-FIRAVITOBA), EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Fecha 14-05/2026

Fecha	Parche	Ubicaciòn		Lado			Dimensiones (m)			Volumenes (m3)			Area de	Volumen Mezcla
	No.	Abcisa Inicio	Abcisa Final	Izq.	Eje	Der	Largo	Ancho	Espesor	Excavacion	Subbase	Base	Liga (m2)	Asfaltica (m3)
14/05/2026	RN69	PR8+150	PR8+148	X			2.50	1.00	0.08				2.5	0.20
14/05/2026	RN70	PR8+148	PR8+146		X		2.80	0.90	0.08				2.52	0.20
14/05/2026	RN71	PR8+146	PR8+144			X	2.40	1.05	0.08				2.52	0.20
14/05/2026	RN72	PR8+144	PR8+142		X		2.60	0.95	0.08				2.47	0.20
14/05/2026	RN73	PR8+142	PR8+140	X			2.70	0.95	0.08				2.565	0.21
14/05/2026	RN74	PR8+140	PR8+138		X		2.50	1.00	0.08				2.5	0.20
14/05/2026	RN75	PR8+138	PR8+136		X		2.80	0.90	0.08				2.52	0.20
14/05/2026	RN76	PR8+136	PR8+134	X			2.40	1.05	0.08				2.52	0.20
14/05/2026	RN77	PR8+134	PR8+132	X			2.60	0.97	0.08				2.522	0.20
14/05/2026	RN78	PR8+132	PR8+130		X		2.70	0.98	0.08				2.646	0.21
14/05/2026	RN79	PR8+130	PR8+128			X	2.50	1.20	0.08				3	0.24
14/05/2026	RN80	PR8+128	PR8+126		X		2.80	0.90	0.08				2.52	0.20
14/05/2026	RN81	PR8+126	PR8+124		X		2.40	1.05	0.08				2.52	0.20
14/05/2026	RN82	PR8+124	PR8+122		X		2.60	0.98	0.08				2.548	0.20
14/05/2026	RN83	PR8+122	PR8+120		X		2.56	0.97	0.09				2.4832	0.22
14/05/2026	RN84	PR8+120	PR8+118	X			2.50	1.00	0.08				2.5	0.20
14/05/2026	RN85	PR8+118	PR8+116		X		2.80	0.90	0.08				2.52	0.20
14/05/2026	RN86	PR8+116	PR8+114		X		2.40	1.05	0.08				2.52	0.20
14/05/2026	RN87	PR8+114	PR8+112			X	2.70	0.95	0.08				2.565	0.21
14/05/2026	RN88	PR8+112	PR8+110	X			2.60	1.00	0.08				2.6	0.21
14/05/2026	RN89	PR8+110	PR8+108		X		2.50	1.00	0.08				2.5	0.20
14/05/2026	RN90	PR8+108	PR8+106	X			2.80	0.90	0.08				2.52	0.20
14/05/2026	RN91	PR8+106	PR8+104		X		2.40	1.05	0.08				2.52	0.20
14/05/2026	RN92	PR8+104	PR8+102	X			2.70	0.95	0.08				2.565	0.21
14/05/2026	RN93	PR8+102	PR8+100		X		2.60	1.00	0.08				2.6	0.21
14/05/2026	RN94	PR8+100	PR8+98	X			2.50	1.00	0.08				2.5	0.20
14/05/2026	RN95	PR8+98	PR8+96		X		2.80	0.90	0.08				2.52	0.20
14/05/2026	RN96	PR8+96	PR8+94	X			2.40	1.05	0.08				2.52	0.20
14/05/2026	RN97	PR7+450	PR7+448		X		2.70	0.95	0.08				2.565	0.21
14/05/2026	RN98	PR7+445	PR7+443	X			2.60	1.00	0.08				2.6	0.21
14/05/2026	RN99	PR7+440	PR7+438		X		2.50	1.00	0.08				2.5	0.20
14/05/2026	RN100	PR7+435	PR7+433	X			2.80	0.90	0.08				2.52	0.20
14/05/2026	RN101	PR7+430	PR7+428		X		2.40	1.05	0.08				2.52	0.20
14/05/2026	RN102	PR7+425	PR7+423			X	2.70	0.95	0.08				2.565	0.21
14/05/2026	RN103	PR7+420	PR7+418		X		2.60	1.00	0.08				2.6	0.21
14/05/2026	RN104	PR7+415	PR7+413		X		2.50	1.00	0.08				2.5	0.20
14/05/2026	RN105	PR7+410	PR7+408		X		2.80	0.90	0.08				2.52	0.20
14/05/2026	RN106	PR7+405	PR7+403			X	2.40	1.05	0.08				2.52	0.20
14/05/2026	RN107	PR7+400	PR7+398		X		2.70	0.95	0.08				2.565	0.21
14/05/2026	RN108	PR7+395	PR7+393	X			2.60	1.00	0.08				2.6	0.21
14/05/2026	RN109	PR7+390	PR7+388		X		2.50	1.00	0.08				2.5	0.20
14/05/2026	RN110	PR7+385	PR7+383		X		2.80	0.90	0.08				2.52	0.20
14/05/2026	RN111	PR7+380	PR7+378		X		2.40	1.05	0.08				2.52	0.20
14/05/2026	RN112	PR7+375	PR7+373	X			2.70	0.95	0.08				2.565	0.21
14/05/2026	RN113	PR7+370	PR7+368		X		2.60	1.00	0.08				2.6	0.21
14/05/2026	RN114	PR7+365	PR7+363	X			2.50	1.00	0.08				2.5	0.20
14/05/2026	RN115	PR7+360	PR7+358		X		2.80	0.90	0.08				2.52	0.20
14/05/2026	RN116	PR7+355	PR7+353	X			2.40	1.05	0.08				2.52	0.20
14/05/2026	RN117	PR7+350	PR7+348		X		2.70	0.95	0.08				2.565	0.21
14/05/2026	RN118	PR7+345	PR7+343	X			2.60	1.00	0.08				2.6	0.21
14/05/2026	RN119	PR7+340	PR7+338			X	2.50	1.00	0.08				2.5	0.20

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre	Edwin Alejandro Laverde Patiño	**Nombre**	Vo.Bo. Rafael Camilo Suárez Suárez	**Nombre**	Javier Andrés Fagua Torres
Cargo	Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.	**Cargo**	Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.	**Cargo**	Apoyo a la supervisión GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
Firma		**Firma**		**Firma**	


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS CON CÓDIGOS 61BYA (PASO POR FIRAVITOBA) - 55BY08 (PANTANO DE VARGAS-FIRAVITOBA), EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

ACTIVIDAD :	RENIVELACION " PARCHEO"	**FECHA : 14-05/2026**

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Edwin Alejandro Laverde Patiño

Colocar Abscisa PR8+150 y PR7+253

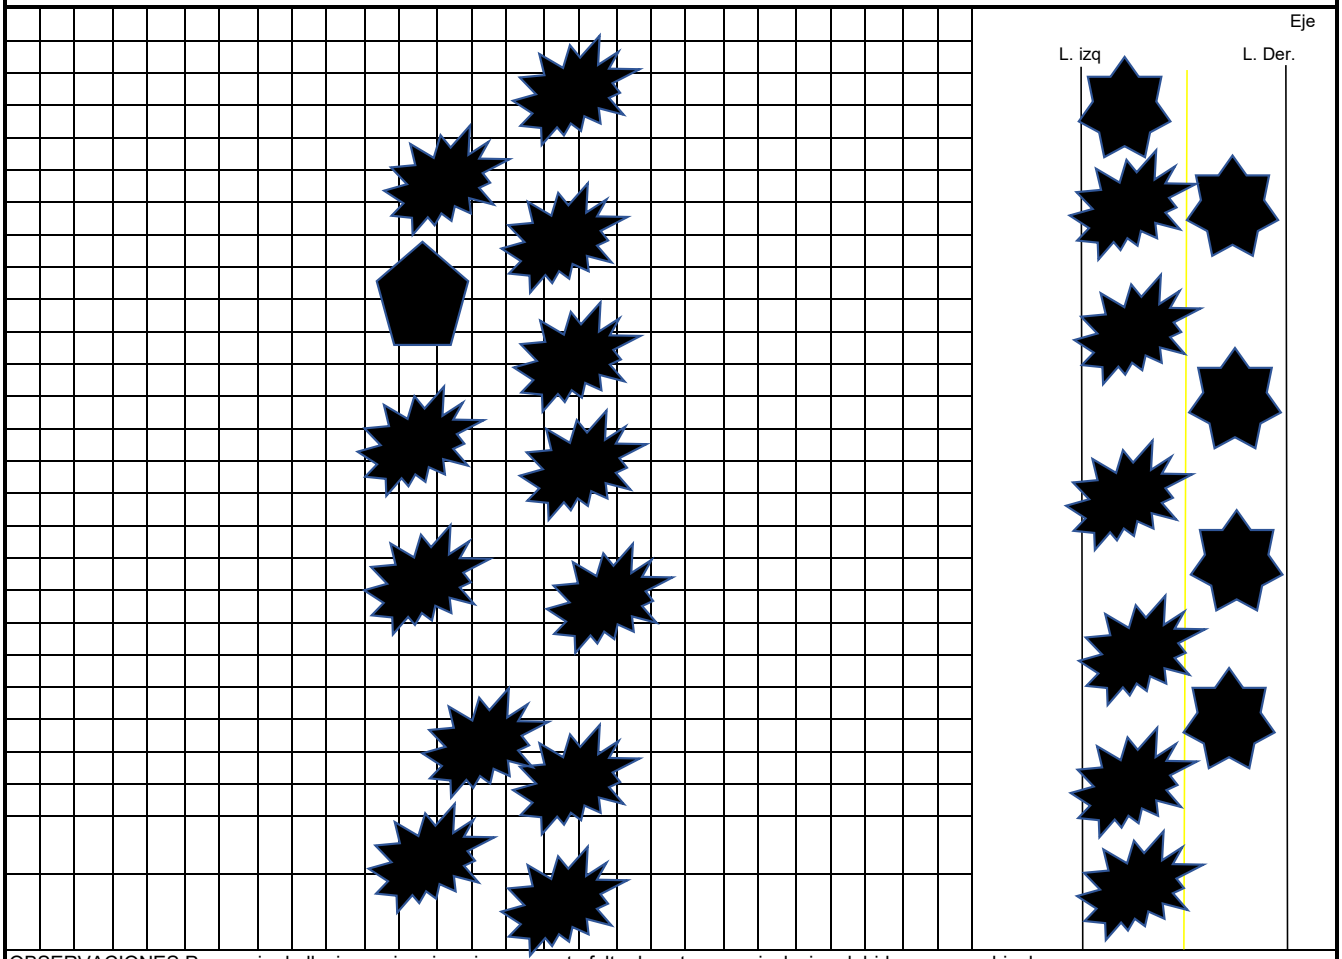

OBSERVACIONES:Presencia de llovisnas, imprimacion presenta falta de esta en renivelacion debido a paso vehicular

FIRMA QUIEN ELABORO

Nombre: Edwin Alejandro Laverde Patiño
Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.

FIRMA INGENIERO

Nombre: Javier Andrés Fagua Torres
Apoyo a la supervisión GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

CANTIDADES DE PARCHEO

Estimado Efectuado

OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS CON CÓDIGOS 61BYA (PASO POR FIRAVITOBA) - 55BY08 (PANTANO DE VARGAS-FIRAVITOBA), EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Fecha 14-05/2026

Fecha	Parche	Ubicaciòn		Lado			Dimensiones (m)			Volumenes (m3)			Area de	Volumen Mezcla
	No.	Abcisa Inicio	Abcisa Final	Izq.	Eje	Der	Largo	Ancho	Espesor	Excavacion	Subbase	Base	Liga (m2)	Asfaltica (m3)
15/05/2026	RN120	PR7+100	PR7+097	X			2.80	0.90	0.08				2.52	0.20
15/05/2026	RN121	PR7+097	PR7+094		X		2.40	1.23	0.08				2.952	0.24
15/05/2026	RN122	PR7+094	PR7+091			X	2.70	1.10	0.08				2.97	0.24
15/05/2026	RN123	PR7+091	PR7+088		X		2.60	1.00	0.08				2.6	0.21
15/05/2026	RN124	PR7+088	PR7+085	X			2.50	1.00	0.08				2.5	0.20
15/05/2026	RN125	PR7+085	PR7+082		X		2.80	0.90	0.08				2.52	0.20
15/05/2026	RN126	PR7+082	PR7+079			X	2.40	1.05	0.08				2.52	0.20
15/05/2026	RN127	PR7+079	PR7+076		X		2.70	0.95	0.08				2.565	0.21
15/05/2026	RN128	PR7+076	PR7+073	X			2.60	1.20	0.08				3.12	0.25
15/05/2026	RN129	PR7+073	PR7+070	X			2.75	1.10	0.08				3.025	0.24
15/05/2026	RN130	PR7+070	PR7+067			X	2.90	0.95	0.08				2.755	0.22
15/05/2026	RN131	PR7+067	PR7+064		X		3.80	1.80	0.10				6.84	0.68
15/05/2026	RN132	PR7+064	PR7+061	X			4.00	1.70	0.10				6.8	0.68
15/05/2026	RN133	PR7+061	PR7+058		X		3.60	1.90	0.10				6.84	0.68
15/05/2026	RN134	PR6+995	PR6+992		X		3.90	1.80	0.10				7.02	0.70
15/05/2026	RN135	PR6+992	PR6+987	X			4.10	1.70	0.10				6.97	0.70
15/05/2026	RN136	PR6+989	PR6+982			X	3.70	1.85	0.10				6.845	0.68
15/05/2026	RN137	PR6+986	PR6+977		X		4.00	1.75	0.10				7	0.70
15/05/2026	RN138	PR6+983	PR6+972			X	3.80	1.80	0.10				6.84	0.68
15/05/2026	RN139	PR6+980	PR6+967	X			4.20	1.65	0.10				6.93	0.69
15/05/2026	RN140	PR6+977	PR6+962		X		3.90	1.80	0.10				7.02	0.70
15/05/2026	RN141	PR6+974	PR6+957	X			4.00	1.70	0.10				6.8	0.68

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre	Edwin Alejandro Laverde Patiño	**Nombre**	Vo.Bo. Rafael Camilo Suárez Suárez	**Nombre**	Javier Andrés Fagua Torres
Cargo	Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.	**Cargo**	Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.	**Cargo**	Apoyo a la supervisión GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
Firma		**Firma**		**Firma**	


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS CON CÓDIGOS 61BYA (PASO POR FIRAVITOBA) - 55BY08 (PANTANO DE VARGAS-FIRAVITOBA), EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

ACTIVIDAD :	RENIVELACION " PARCHEO"	**FECHA : 14-05/2026**

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Edwin Alejandro Laverde Patiño

Colocar Abscisa PR7+100 y PR6+957

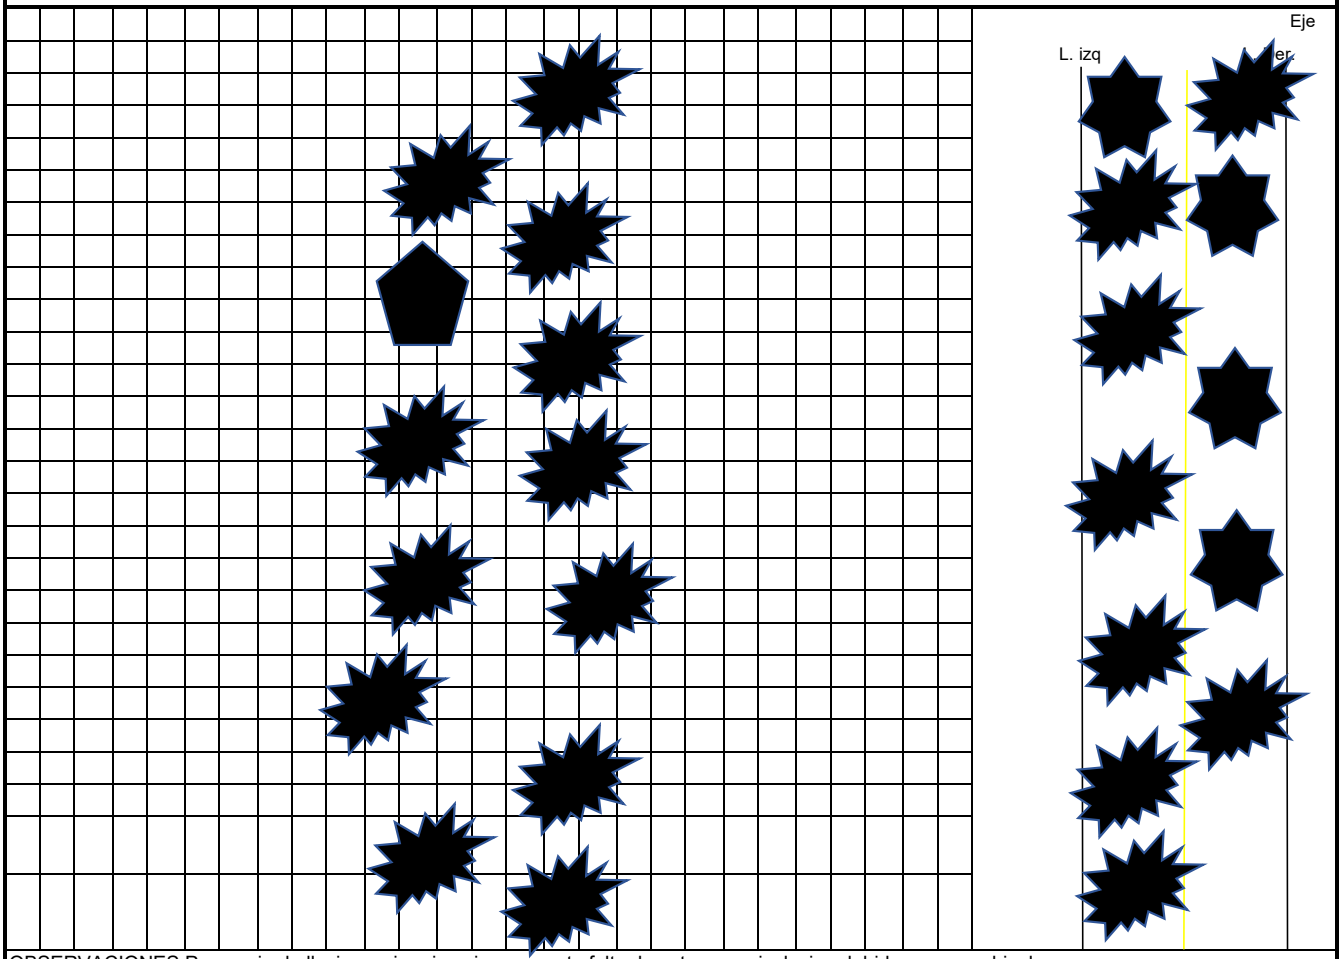

OBSERVACIONES:Presencia de llovisnas, imprimacion presenta falta de esta en renivelacion debido a paso vehicular

FIRMA QUIEN ELABORO

Nombre: Edwin Alejandro Laverde Patiño
Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.

FIRMA INGENIERO

Nombre: Javier Andrés Fagua Torres
Apoyo a la supervisión GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

CANTIDADES DE PARCHEO

Estimado Efectuado

OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS CON CÓDIGOS 61BYA (PASO POR FIRAVITOBA) - 55BY08 (PANTANO DE VARGAS-FIRAVITOBA), EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Fecha 19-05/2026

Fecha	Parche	Ubicaciòn		Lado			Dimensiones (m)			Volumenes (m3)			Area de	Volumen Mezcla
	No.	Abcisa Inicio	Abcisa Final	Izq.	Eje	Der	Largo	Ancho	Espesor	Excavacion	Subbase	Base	Liga (m2)	Asfaltica (m3)
19/05/2026	RN142	PR6+957	PR6+954	X			2.80	0.90	0.08				2.52	0.20
19/05/2026	RN143	PR6+953	PR6+949		X		2.40	1.23	0.08				2.952	0.24
19/05/2026	RN144	PR6+949	PR6+944			X	2.70	1.10	0.08				2.97	0.24
19/05/2026	RN145	PR6+945	PR6+939		X		2.60	1.00	0.08				2.6	0.21
19/05/2026	RN146	PR6+941	PR6+934	X			2.50	1.00	0.08				2.5	0.20
19/05/2026	RN147	PR6+937	PR6+929		X		2.80	0.90	0.08				2.52	0.20
19/05/2026	RN148	PR6+933	PR6+924			X	2.40	1.05	0.08				2.52	0.20
19/05/2026	RN149	PR6+929	PR6+919		X		2.70	0.95	0.08				2.565	0.21
19/05/2026	RN150	PR6+925	PR6+914	X			2.60	1.20	0.08				3.12	0.25
19/05/2026	RN151	PR6+921	PR6+909	X			2.75	1.10	0.08				3.025	0.24
19/05/2026	RN152	PR6+917	PR6+904			X	2.90	0.95	0.08				2.755	0.22
19/05/2026	RN153	PR6+850	PR6+846		X		3.80	1.80	0.10				6.84	0.68
19/05/2026	RN154	PR6+843	PR6+838	X			4.00	1.70	0.10				6.8	0.68
19/05/2026	RN155	PR6+836	PR6+830		X		3.60	1.90	0.10				6.84	0.68
19/05/2026	RN156	PR6+829	PR6+822		X		3.90	1.80	0.10				7.02	0.70
19/05/2026	RN157	PR6+822	PR6+814	X			4.10	1.70	0.10				6.97	0.70
19/05/2026	RN158	PR6+815	PR6+806			X	3.70	1.85	0.10				6.845	0.68
19/05/2026	RN159	PR6+808	PR6+798		X		4.00	1.75	0.10				7	0.70
19/05/2026	RN160	PR6+801	PR6+790			X	3.80	1.80	0.10				6.84	0.68
19/05/2026	RN161	PR6+794	PR6+782	X			4.20	1.65	0.10				6.93	0.69
19/05/2026	RN162	PR6+787	PR6+774		X		3.90	1.80	0.10				7.02	0.70
19/05/2026	RN163	PR6+780	PR6+766	X			4.00	1.70	0.10				6.8	0.68
19/05/2026	RN164	PR6+773	PR6+758	X			4.00	1.75	0.10				7	0.70
19/05/2026	RN165	PR6+766	PR6+750			X	3.90	1.80	0.10				7.02	0.70
19/05/2026	RN166	PR6+759	PR6+742		X		4.20	1.80	0.10				7.56	0.76
19/05/2026	RN167	PR6+752	PR6+734			X	3.70	1.95	0.10				7.215	0.72
19/05/2026	RN168	PR6+745	PR6+726	X			4.15	1.70	0.10				7.055	0.71
19/05/2026	RN169	PR6+738	PR6+718		X		3.20	1.60	0.10				5.12	0.51
19/05/2026	RN170	PR6+731	PR6+710	X			3.10	1.65	0.10				5.115	0.51

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre	Edwin Alejandro Laverde Patiño	**Nombre**	Vo.Bo. Rafael Camilo Suárez Suárez	**Nombre**	Javier Andrés Fagua Torres
Cargo	Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.	**Cargo**	Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.	**Cargo**	Apoyo a la supervisión GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
Firma		**Firma**		**Firma**	


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS CON CÓDIGOS 61BYA (PASO POR FIRAVITOBA) - 55BY08 (PANTANO DE VARGAS-FIRAVITOBA), EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

ACTIVIDAD :	RENIVELACION " PARCHEO"	**FECHA : 19-05/2026**

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Edwin Alejandro Laverde Patiño

PR6+957y PR6+710

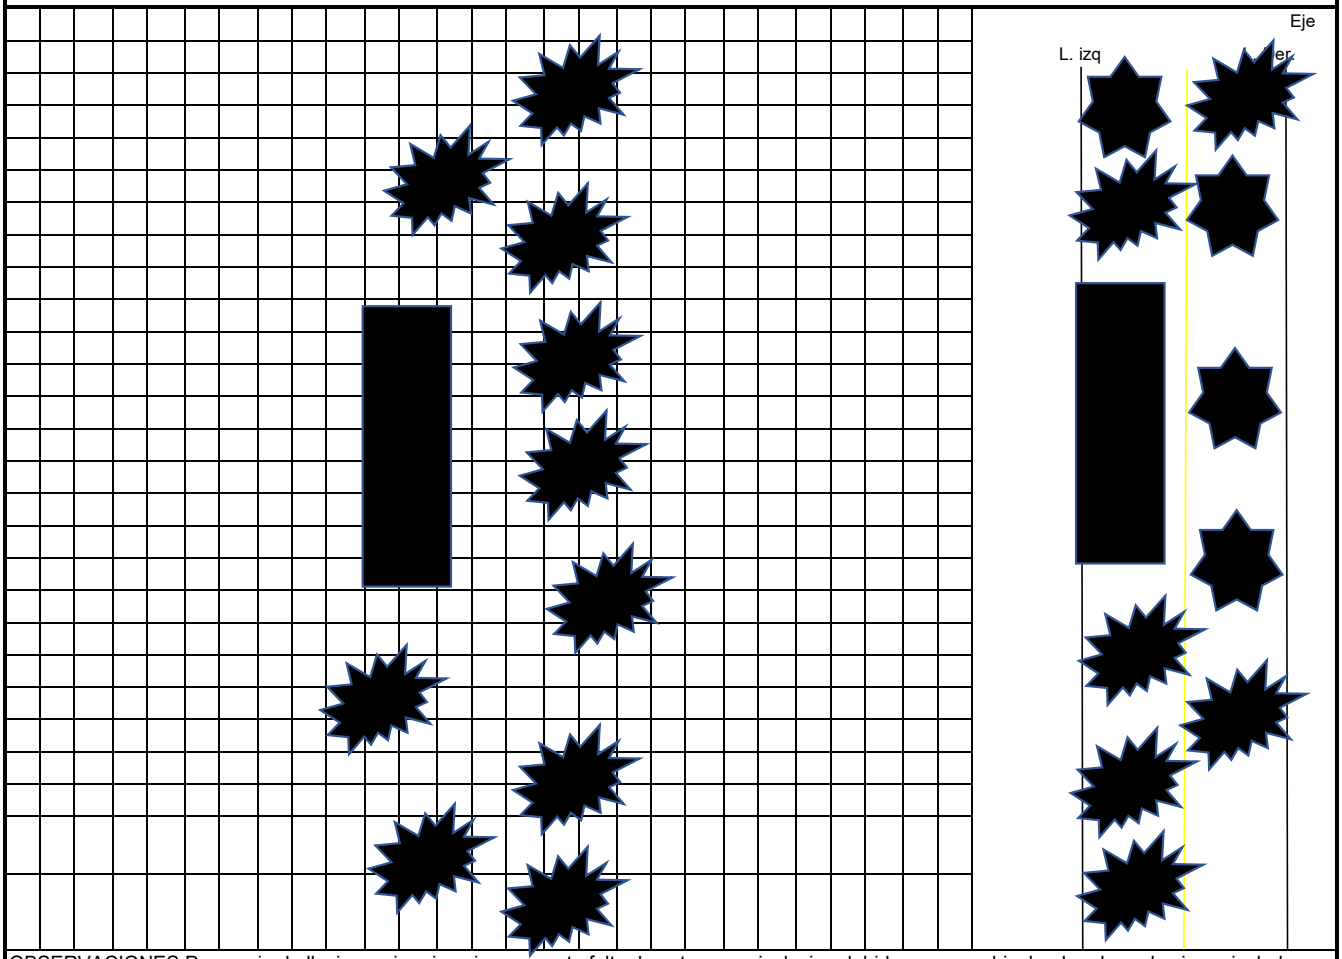

OBSERVACIONES:Presencia de llovisnas, imprimacion presenta falta de esta en renivelacion debido a paso vehicular, hombros de via renivelados con mezcla asfaltica

FIRMA QUIEN ELABORO

Nombre: Edwin Alejandro Laverde Patiño
Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.

FIRMA INGENIERO

Nombre: Javier Andrés Fagua Torres
Apoyo a la supervisión GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

CANTIDADES DE PARCHEO

Estimado Efectuado

OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS CON CÓDIGOS 61BYA (PASO POR FIRAVITOBA) - 55BY08 (PANTANO DE VARGAS-FIRAVITOBA), EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Fecha 20-05/2026

Fecha	Parche	Ubicaciòn		Lado			Dimensiones (m)			Volumenes (m3)			Area de	Volumen Mezcla
	No.	Abcisa Inicio	Abcisa Final	Izq.	Eje	Der	Largo	Ancho	Espesor	Excavacion	Subbase	Base	Liga (m2)	Asfaltica (m3)
20/05/2026	RN171	PR6+445	PR6+441	X			3.30	1.70	0.10				5.61	0.56
20/05/2026	RN172	PR6+435	PR6+431		X		3.25	1.60	0.10				5.2	0.52
20/05/2026	RN173	PR6+425	PR6+421			X	3.15	1.80	0.10				5.67	0.57
20/05/2026	RN174	PR6+415	PR6+411		X		3.20	1.60	0.10				5.12	0.51
20/05/2026	RN175	PR6+405	PR6+401	X			3.10	1.85	0.10				5.735	0.57
20/05/2026	RN176	PR6+395	PR6+391		X		3.30	1.55	0.10				5.115	0.51
20/05/2026	RN177	PR6+385	PR6+381			X	3.25	1.58	0.10				5.135	0.51
20/05/2026	RN178	PR6+375	PR6+371		X		3.15	1.62	0.10				5.103	0.51
20/05/2026	RN179	PR6+365	PR6+361	X			3.20	1.60	0.10				5.12	0.51
20/05/2026	RN180	PR6+355	PR6+351	X			3.10	1.65	0.10				5.115	0.51
20/05/2026	RN181	PR6+345	PR6+341			X	3.30	1.55	0.10				5.115	0.51
20/05/2026	RN182	PR6+335	PR6+331		X		3.25	1.58	0.10				5.135	0.51
20/05/2026	RN183	PR6+325	PR6+321	X			3.15	1.62	0.10				5.103	0.51
20/05/2026	RN184	PR6+315	PR6+311		X		3.20	1.60	0.10				5.12	0.51
20/05/2026	RN185	PR6+305	PR6+301		X		3.10	1.65	0.10				5.115	0.51
20/05/2026	RN186	PR5+202	PR5+198	X			3.30	1.55	0.10				5.115	0.51
20/05/2026	RN187	PR5+150	PR6+147			X	3.25	1.58	0.10				5.135	0.51
20/05/2026	RN188	PR5+98	PR5+199		X		3.15	1.62	0.10				5.103	0.51
20/05/2026	RN189	PR5+46	PR6+148			X	3.20	1.60	0.10				5.12	0.51
20/05/2026	RN190	PR4+780	PR4+777	X			3.10	1.65	0.10				5.115	0.51
20/05/2026	RN191	PR4+781	PR4+778		X		3.30	1.55	0.10				5.115	0.51
20/05/2026	RN192	PR4+782	PR4+779	X			3.25	1.58	0.10				5.135	0.51
20/05/2026	RN193	PR4+783	PR4+780	X			3.15	1.62	0.10				5.103	0.51
20/05/2026	RN194	PR4+784	PR4+781			X	3.20	1.60	0.10				5.12	0.51
20/05/2026	RN195	PR4+785	PR4+782		X		3.10	1.65	0.10				5.115	0.51
20/05/2026	RN196	PR4+786	PR4+783			X	3.30	1.55	0.10				5.115	0.51
20/05/2026	RN197	PR4+787	PR4+784	X			3.25	1.58	0.10				5.135	0.51
20/05/2026	RN198	PR4+788	PR4+785		X		3.15	1.62	0.10				5.103	0.51

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre	Edwin Alejandro Laverde Patiño	**Nombre**	Vo.Bo. Rafael Camilo Suárez Suárez	**Nombre**	Javier Andrés Fagua Torres
Cargo	Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.	**Cargo**	Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.	**Cargo**	Apoyo a la supervisión GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
Firma		**Firma**		**Firma**	


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS CON CÓDIGOS 61BYA (PASO POR FIRAVITOBA) - 55BY08 (PANTANO DE VARGAS-FIRAVITOBA), EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

ACTIVIDAD :	RENIVELACION " PARCHEO"	**FECHA : 20-05/2026**

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Edwin Alejandro Laverde Patiño

PR6+445y PR4+785

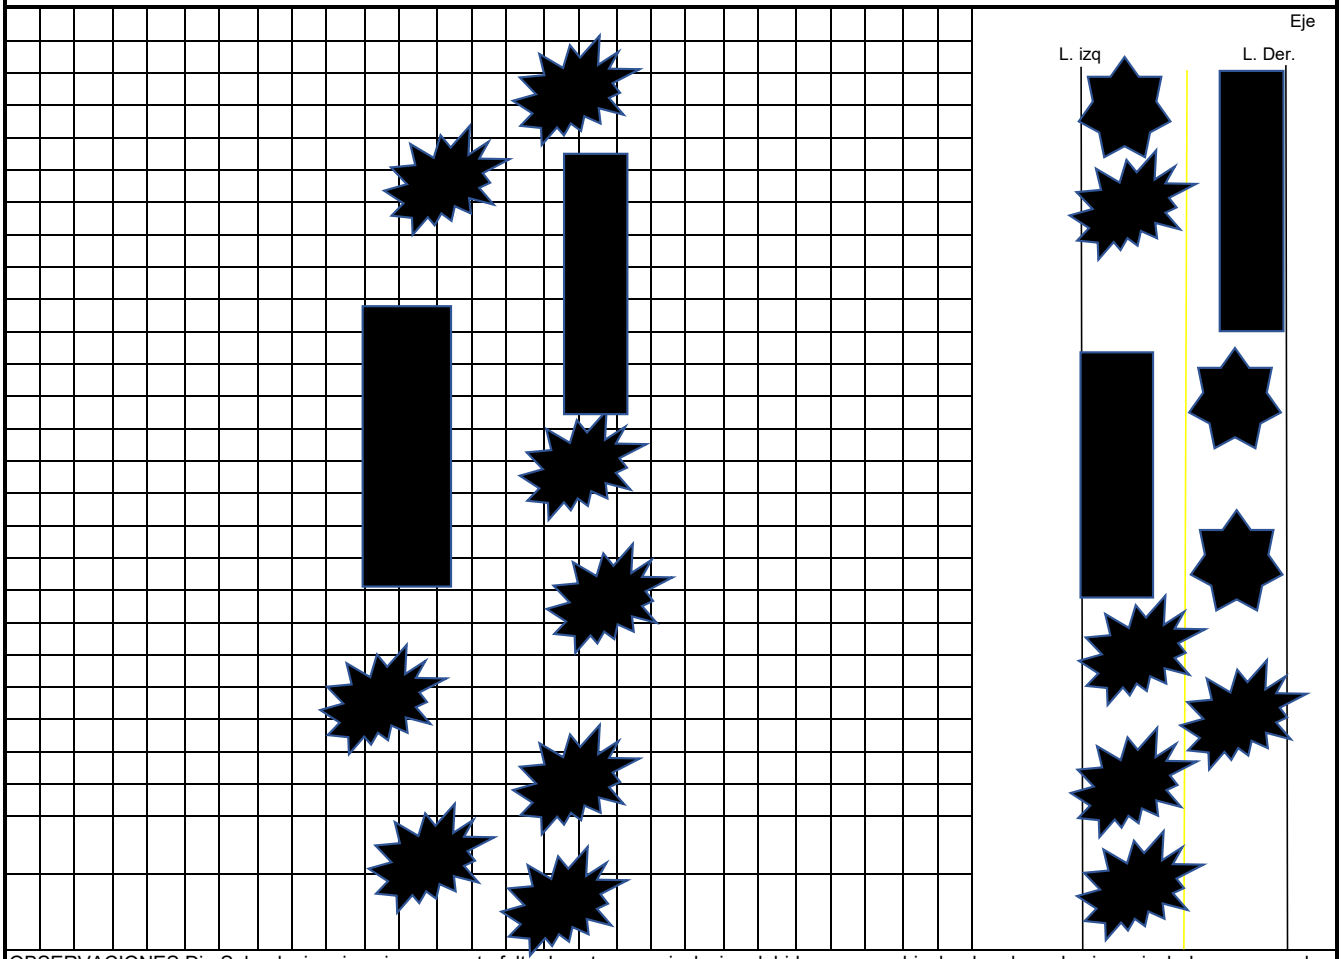

OBSERVACIONES:Dia Soleado, imprimacion presenta falta de esta en renivelacion debido a paso vehicular, hombros de via renivelados con mezcla asfaltica

FIRMA QUIEN ELABORO

Nombre: Edwin Alejandro Laverde Patiño
Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.

FIRMA INGENIERO

Nombre: Javier Andrés Fagua Torres
Apoyo a la supervisión GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

CANTIDADES DE PARCHEO

Estimado Efectuado

OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS CON CÓDIGOS 61BYA (PASO POR FIRAVITOBA) - 55BY08 (PANTANO DE VARGAS-FIRAVITOBA), EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Fecha 21-05/2026

Fecha	Parche	Ubicaciòn		Lado			Dimensiones (m)			Volumenes (m3)			Area de	Volumen Mezcla
	No.	Abcisa Inicio	Abcisa Final	Izq.	Eje	Der	Largo	Ancho	Espesor	Excavacion	Subbase	Base	Liga (m2)	Asfaltica (m3)
21/05/2026	RN199	PR4+250	PR4+246			X	3.20	1.60	0.10				5.12	0.51
21/05/2026	RN200	PR4+240	PR4+236	X			2.95	1.69	0.10				4.9855	0.50
21/05/2026	RN201	PR4+230	PR4+226		X		5.20	1.50	0.09				7.8	0.70
21/05/2026	RN202	PR4+220	PR4+216			X	5.80	1.40	0.09				8.12	0.73
21/05/2026	RN203	PR4+210	PR4+206		X		6.00	1.45	0.09				8.7	0.78
21/05/2026	RN204	PR4+200	PR4+196		X		5.50	1.55	0.09				8.525	0.77
21/05/2026	RN205	PR4+190	PR4+186	X			6.20	1.40	0.09				8.68	0.78
21/05/2026	RN206	PR4+180	PR4+176		X		5.70	1.50	0.09				8.55	0.77
21/05/2026	RN207	PR3+870	PR3+865		X		5.90	1.45	0.09				8.555	0.77
21/05/2026	RN208	PR3+860	PR3+855	X			6.10	1.50	0.09				9.15	0.82
21/05/2026	RN209	PR3+850	PR3+845			X	5.60	1.55	0.09				8.68	0.78
21/05/2026	RN210	PR3+840	PR3+835		X		5.80	1.50	0.09				8.7	0.78
21/05/2026	RN211	PR3+830	PR3+825	X			6.00	1.55	0.09				9.3	0.84
21/05/2026	RN212	PR3+530	PR3+525		X		4.90	3.20	0.09				15.68	1.41
21/05/2026	RN213	PR3+300	PR3+295		X		5.80	3.40	0.09				19.72	1.77
21/05/2026	RN214	PR3+280	PR3+276	X			3.40	3.20	0.09				10.88	0.98
21/05/2026	RN215	PR3+260	PR3+253			X	6.20	2.90	0.09				17.98	1.62
21/05/2026	RN216	PR3+240	PR3+237		X		4.50	2.80	0.09				12.6	1.13

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre	Edwin Alejandro Laverde Patiño	**Nombre**	Vo.Bo. Rafael Camilo Suárez Suárez	**Nombre**	Javier Andrés Fagua Torres
Cargo	Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.	**Cargo**	Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.	**Cargo**	Apoyo a la supervisión GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
Firma		**Firma**		**Firma**	


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS CON CÓDIGOS 61BYA (PASO POR FIRAVITOBA) - 55BY08 (PANTANO DE VARGAS-FIRAVITOBA), EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

ACTIVIDAD :	RENIVELACION " PARCHEO"	**FECHA : 21-05/2026**

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Edwin Alejandro Laverde Patiño

PR6+445y PR4+785

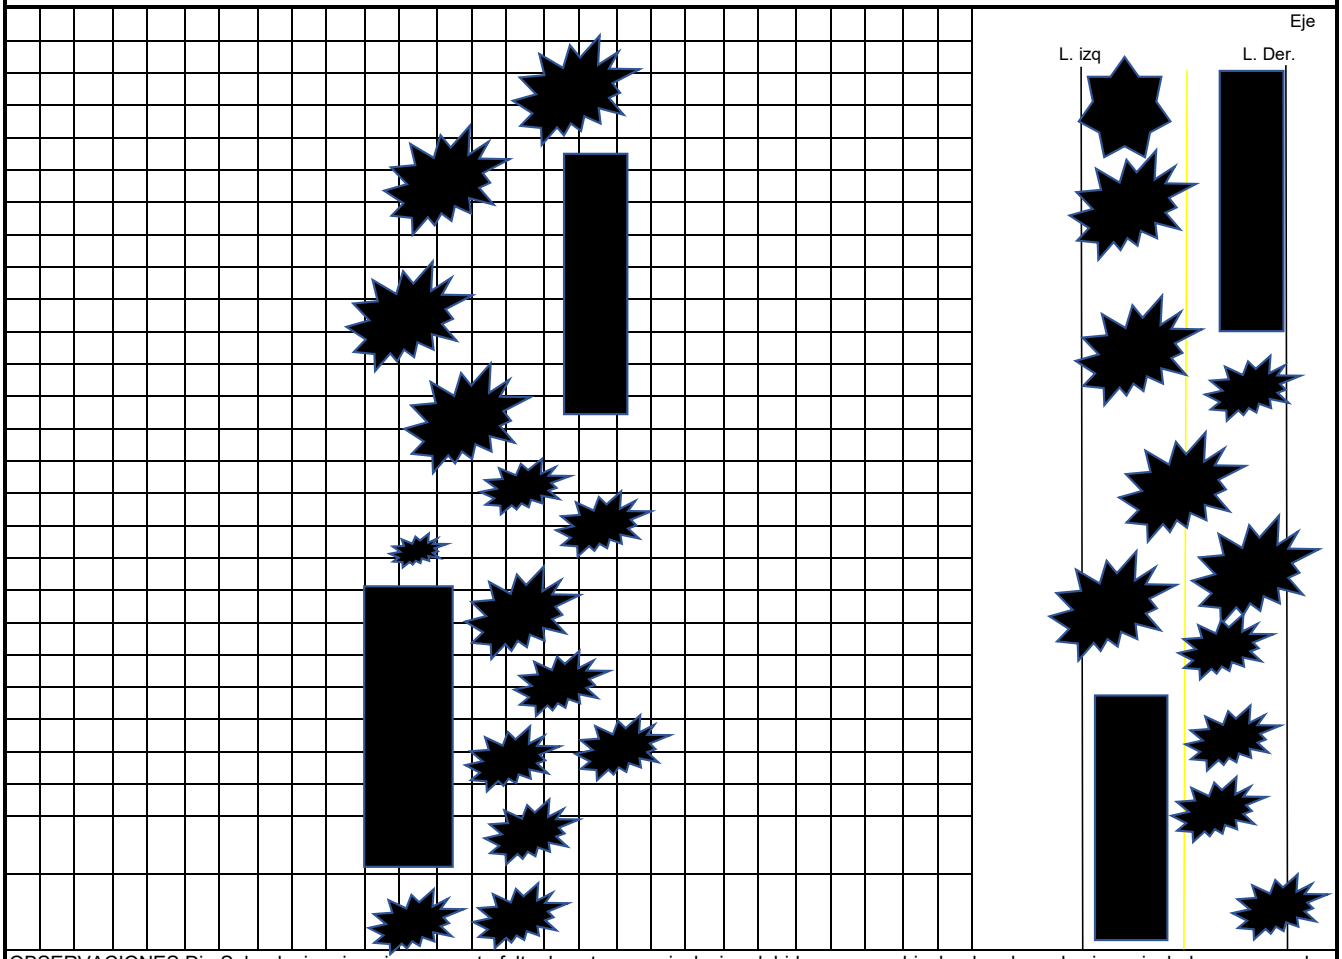

OBSERVACIONES:Dia Soleado, imprimacion presenta falta de esta en renivelacion debido a paso vehicular, hombros de via renivelados con mezcla asfaltica

FIRMA QUIEN ELABORO

Nombre: Edwin Alejandro Laverde Patiño
Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.

FIRMA INGENIERO

Nombre: Javier Andrés Fagua Torres
Apoyo a la supervisión GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

CANTIDADES DE PARCHEO

Estimado Efectuado

OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS CON CÓDIGOS 61BYA (PASO POR FIRAVITOBA) - 55BY08 (PANTANO DE VARGAS-FIRAVITOBA), EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Fecha 22-05/2026

Fecha	Parche	Ubicaciòn		Lado			Dimensiones (m)			Volumenes (m3)			Area de	Volumen Mezcla
	No.	Abcisa Inicio	Abcisa Final	Izq.	Eje	Der	Largo	Ancho	Espesor	Excavacion	Subbase	Base	Liga (m2)	Asfaltica (m3)
22/05/2026	RN217	PR3+235	PR3+229			X	5.50	2.90	0.09				15.95	1.44
22/05/2026	RN218	PR3+229	PR3+224	X			4.80	3.00	0.09				14.4	1.30
22/05/2026	RN219	PR3+223	PR3+220		X		2.90	1.98	0.09				5.742	0.52
22/05/2026	RN220	PR3+217	PR3+212			X	5.45	1.55	0.10				8.4475	0.84
22/05/2026	RN221	PR3+211	PR3+206		X		4.20	2.80	0.10				11.76	1.18
22/05/2026	RN222	PR3+205	PR3+202		X		3.50	2.10	0.10				7.35	0.74
22/05/2026	RN223	PR3+199	PR3+194	X			5.74	2.20	0.10				12.628	1.26
22/05/2026	RN224	PR3+193	PR3+187		X		5.10	3.80	0.10				19.38	1.94
22/05/2026	RN225	PR3+187	PR3+184		X		3.40	3.20	0.10				10.88	1.09
22/05/2026	RN226	PR3+181	PR3+177	X			3.10	3.10	0.10				9.61	0.96
22/05/2026	RN227	PR3+175	PR3+171			X	3.60	3.00	0.10				10.8	1.08

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre	Edwin Alejandro Laverde Patiño	**Nombre**	Vo.Bo. Rafael Camilo Suárez Suárez	**Nombre**	Javier Andrés Fagua Torres
Cargo	Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.	**Cargo**	Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.	**Cargo**	Apoyo a la supervisión GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
Firma		**Firma**		**Firma**	


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS CON CÓDIGOS 61BYA (PASO POR FIRAVITOBA) - 55BY08 (PANTANO DE VARGAS-FIRAVITOBA), EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

ACTIVIDAD :	RENIVELACION " PARCHEO"	**FECHA : 22-05/2026**

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Edwin Alejandro Laverde Patiño

PR3+235 y PR3+171

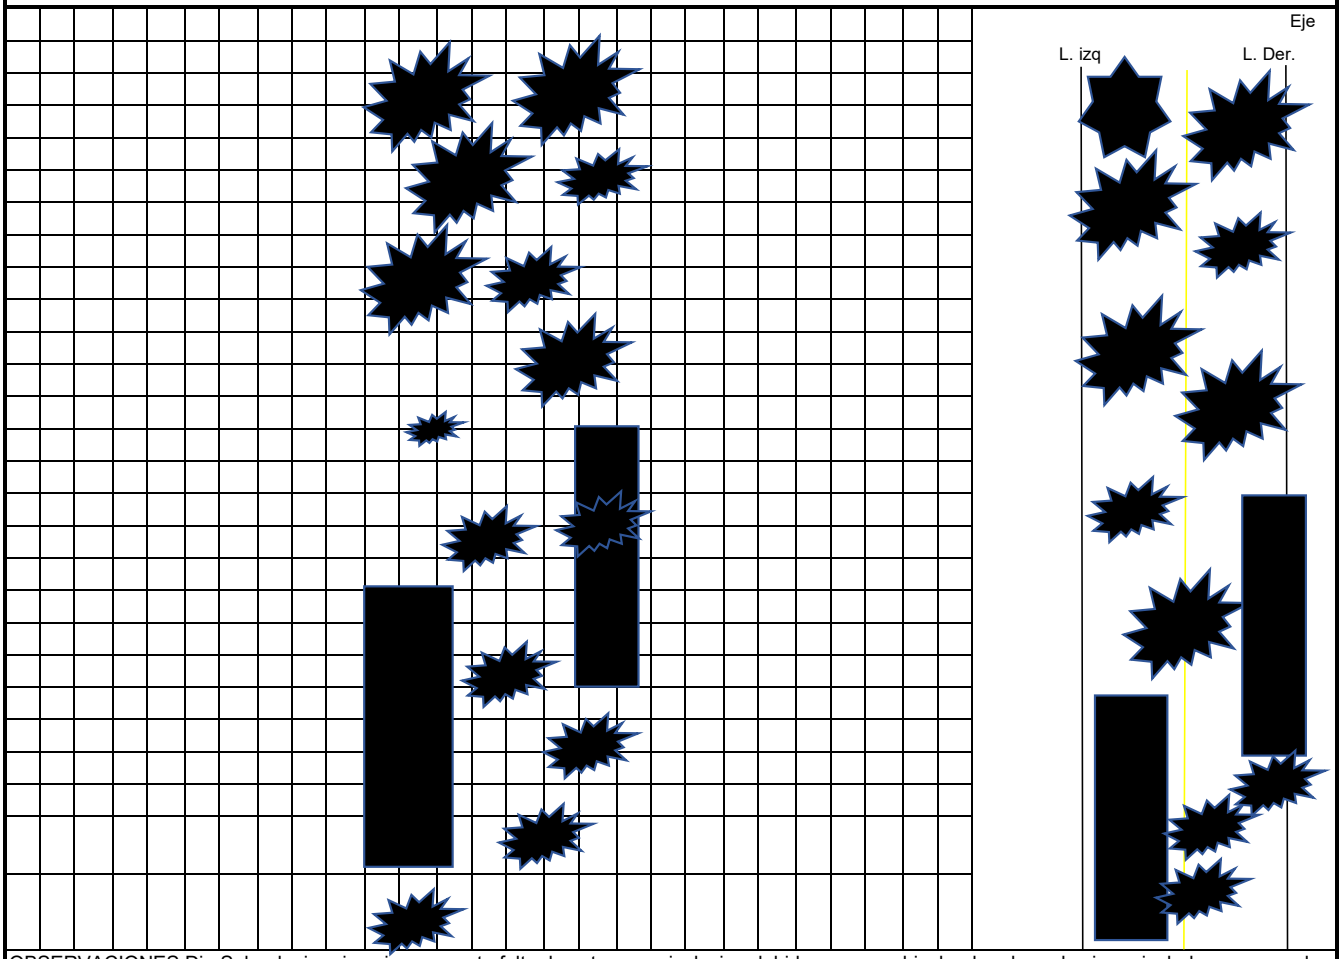

OBSERVACIONES:Dia Soleado, imprimacion presenta falta de esta en renivelacion debido a paso vehicular, hombros de via renivelados con mezcla asfaltica

FIRMA QUIEN ELABORO

Nombre: Edwin Alejandro Laverde Patiño
Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.

FIRMA INGENIERO

Nombre: Javier Andrés Fagua Torres
Apoyo a la supervisión GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

CANTIDADES DE PARCHEO

Estimado Efectuado

OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS CON CÓDIGOS 61BYA (PASO POR FIRAVITOBA) - 55BY08 (PANTANO DE VARGAS-FIRAVITOBA), EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Fecha 23-05/2026

Fecha	Parche	Ubicaciòn		Lado			Dimensiones (m)			Volumenes (m3)			Area de	Volumen Mezcla
	No.	Abcisa Inicio	Abcisa Final	Izq.	Eje	Der	Largo	Ancho	Espesor	Excavacion	Subbase	Base	Liga (m2)	Asfaltica (m3)
23/05/2026	RN227	PR1+954	PR1+950			X	3.60	3.00	0.10				10.8	1.08
23/05/2026	RN228	PR1+700	PR1+683	X			17.00	2.70	0.10				45.9	4.59
23/05/2026	RN229	PR1+652	PR1+632		X		19.61	2.60	0.10				50.986	5.10
23/05/2026	RN230	PR1+600	PR1+581			X	18.90	2.70	0.10				51.03	5.10

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre	Edwin Alejandro Laverde Patiño	**Nombre**	Vo.Bo. Rafael Camilo Suárez Suárez	**Nombre**	Javier Andrés Fagua Torres
Cargo	Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.	**Cargo**	Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.	**Cargo**	Apoyo a la supervisión GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
Firma		**Firma**		**Firma**	


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS CON CÓDIGOS 61BYA (PASO POR FIRAVITOBA) - 55BY08 (PANTANO DE VARGAS-FIRAVITOBA), EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

ACTIVIDAD :	RENIVELACION " PARCHEO"	**FECHA : 23-05/2026**

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Edwin Alejandro Laverde Patiño

PR1+954 y PR1+581

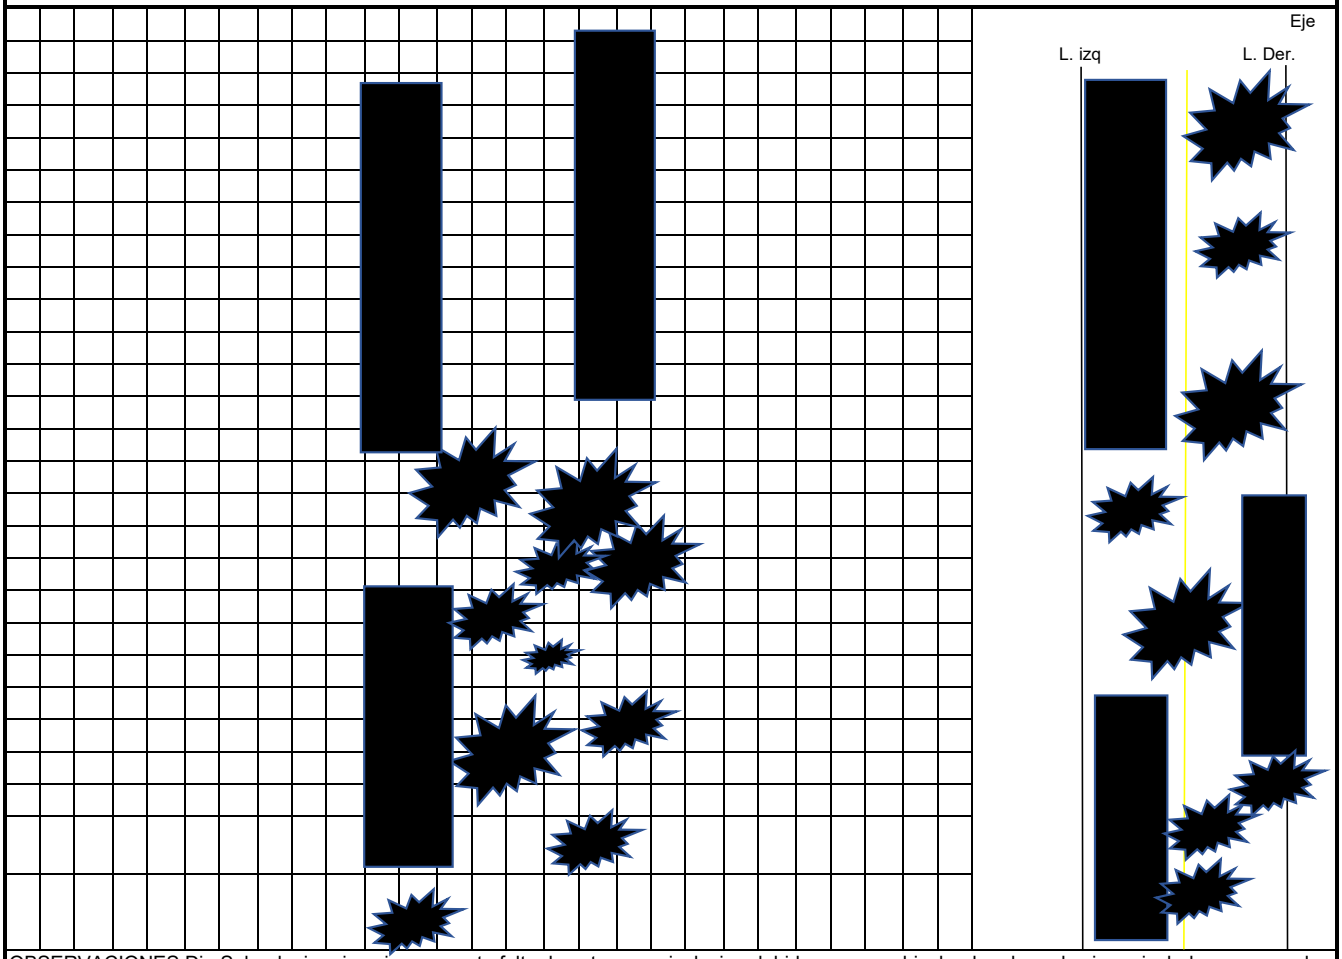

OBSERVACIONES:Dia Soleado, imprimacion presenta falta de esta en renivelacion debido a paso vehicular, hombros de via renivelados con mezcla asfaltica

FIRMA QUIEN ELABORO
Nombre: Edwin Alejandro Laverde Patiño
Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.

FIRMA INGENIERO
Nombre: Javier Andrés Fagua Torres
Apoyo a la supervisión GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

CANTIDADES DE PARCHEO

Estimado Efectuado

OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS CON CÓDIGOS 61BYA (PASO POR FIRAVITOBA) - 55BY08 (PANTANO DE VARGAS-FIRAVITOBA), EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Fecha 25-05-2026

Fecha	Parche	Ubicaciòn		Lado			Dimensiones (m)			Volumenes (m3)			Area de	Volumen Mezcla
	No.	Abcisa Inicio	Abcisa Final	Izq.	Eje	Der	Largo	Ancho	Espesor	Excavacion	Subbase	Base	Liga (m2)	Asfaltica (m3)
25/05/2026	RN231	PR12+954	PR12+967			X	12.50	2.90	0.09				36.25	3.26
25/05/2026	RN232	PR13+445	PR13+455	X			10.80	3.10	0.09				33.48	3.01
25/05/2026	RN233	PR13+446	PR13+456		X		11.80	3.15	0.10				37.17	3.72
25/05/2026	RN234	PR13+510	PR13+515			X	5.20	1.80	0.10				9.36	0.94
25/05/2026	RN235	PR13+511	PR13+516		X		5.80	1.70	0.10				9.86	0.99
25/05/2026	RN236	PR13+512	PR13+517	X			6.00	1.60	0.10				9.6	0.96
25/05/2026	RN237	PR13+513	PR13+518		X		5.50	1.90	0.10				10.45	1.05
25/05/2026	RN238	PR13+514	PR13+519		X		5.90	1.55	0.10				9.145	0.91

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre	Edwin Alejandro Laverde Patiño	**Nombre**	Vo.Bo. Rafael Camilo Suárez Suárez	**Nombre**	Javier Andrés Fagua Torres
Cargo	Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.	**Cargo**	Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.	**Cargo**	Apoyo a la supervisión GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
Firma		**Firma**		**Firma**	


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS CON CÓDIGOS 61BYA (PASO POR FIRAVITOBA) - 55BY08 (PANTANO DE VARGAS-FIRAVITOBA), EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

ACTIVIDAD :	RENIVELACION " PARCHEO"	**FECHA : 23-05/2026**

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Edwin Alejandro Laverde Patiño

PR12+954 yPR13+519

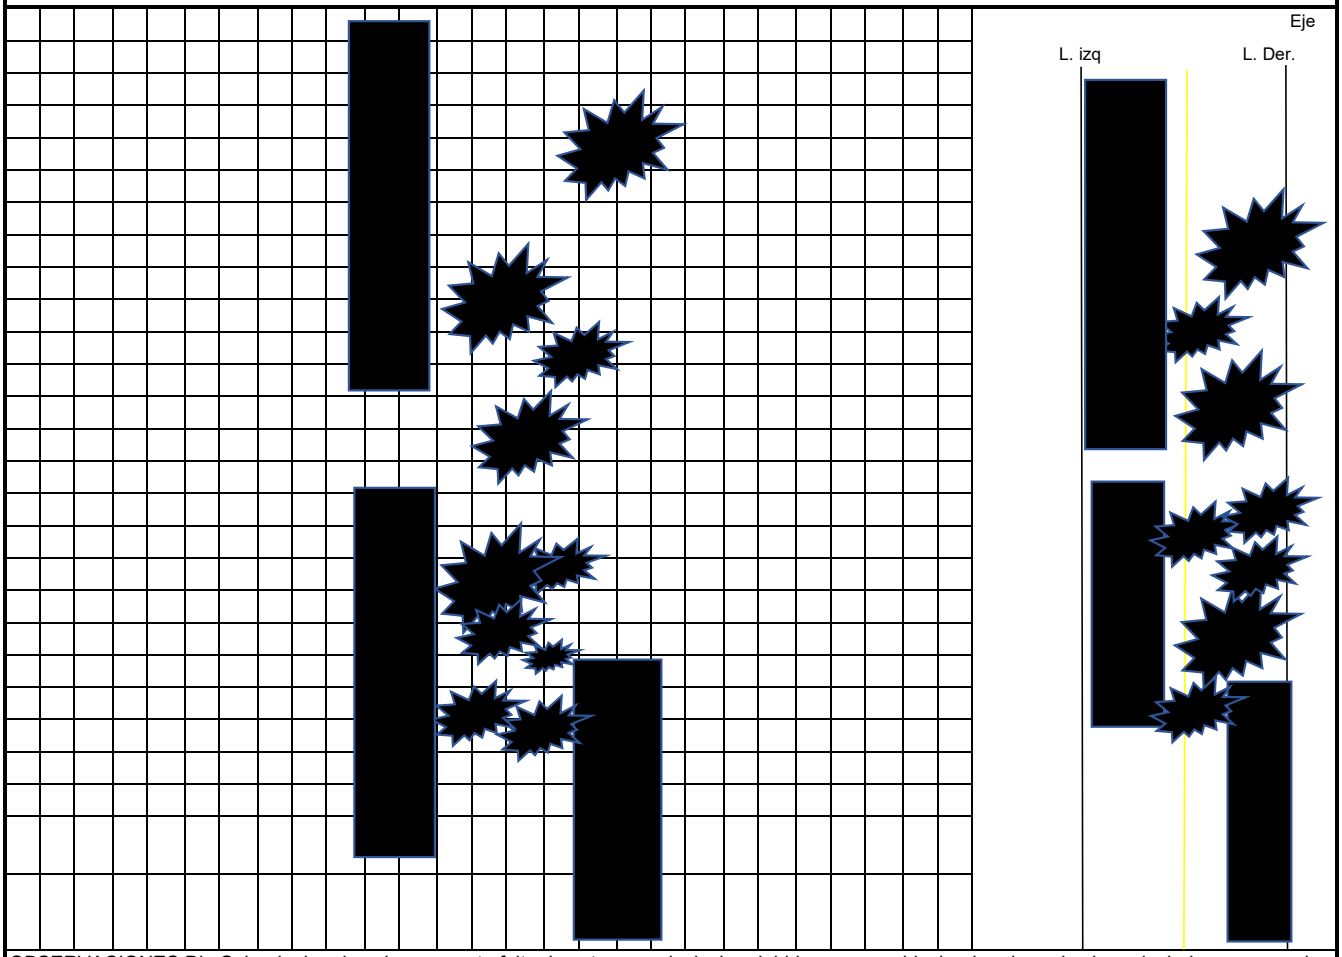

OBSERVACIONES:Dia Soleado, imprimacion presenta falta de esta en renivelacion debido a paso vehicular, hombros de via renivelados con mezcla asfaltica

FIRMA QUIEN ELABORO

Nombre: Edwin Alejandro Laverde Patiño
Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.

FIRMA INGENIERO

Nombre: Javier Andrés Fagua Torres
Apoyo a la supervisión GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

CANTIDADES DE PARCHEO

Estimado Efectuado

OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS CON CÓDIGOS 61BYA (PASO POR FIRAVITOBA) - 55BY08 (PANTANO DE VARGAS-FIRAVITOBA), EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Fecha 26-05-2026

Fecha	Parche	Ubicaciòn		Lado			Dimensiones (m)			Volumenes (m3)			Area de	Volumen Mezcla
	No.	Abcisa Inicio	Abcisa Final	Izq.	Eje	Der	Largo	Ancho	Espesor	Excavacion	Subbase	Base	Liga (m2)	Asfaltica (m3)
26/05/2026	RN238	PR13+130	PR13+135.9			X	5.90	1.55	0.10				9.145	0.91
26/05/2026	RN239	PR13+140	PR13+145.55	X			5.55	1.50	0.10				8.325	0.83
26/05/2026	RN240	PR13+150	PR13+155		X		4.50	2.50	0.10				11.25	1.13
26/05/2026	RN241	PR13+160	PR13+163,3			X	8.80	2.90	0.10				25.52	2.55
26/05/2026	RN242	PR13+170	PR13+148		X		4.90	2.50	0.10				12.25	1.23
26/05/2026	RN243	PR13+180	PR13+186,6	X			6.60	2.90	0.10				19.14	1.91
26/05/2026	RN244	PR13+190	PR13+194,5		X		4.50	1.90	0.10				8.55	0.86
26/05/2026	RN245	PR13+200	PR13+204,3	X			4.30	1.80	0.10				7.74	0.77
26/05/2026	P	K13+040	PR13+044,3	X			4.30	3.00	0.10				12.9	1.29

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre	Edwin Alejandro Laverde Patiño	**Nombre**	Vo.Bo. Rafael Camilo Suárez Suárez	**Nombre**	Javier Andrés Fagua Torres
Cargo	Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.	**Cargo**	Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.	**Cargo**	Apoyo a la supervisión GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
Firma		**Firma**		**Firma**	


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS CON CÓDIGOS 61BYA (PASO POR FIRAVITOBA) - 55BY08 (PANTANO DE VARGAS-FIRAVITOBA), EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

ACTIVIDAD :	RENIVELACION " PARCHEO"	**FECHA : 26-05/2026**

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Edwin Alejandro Laverde Patiño

PR12+954 yPR13+519

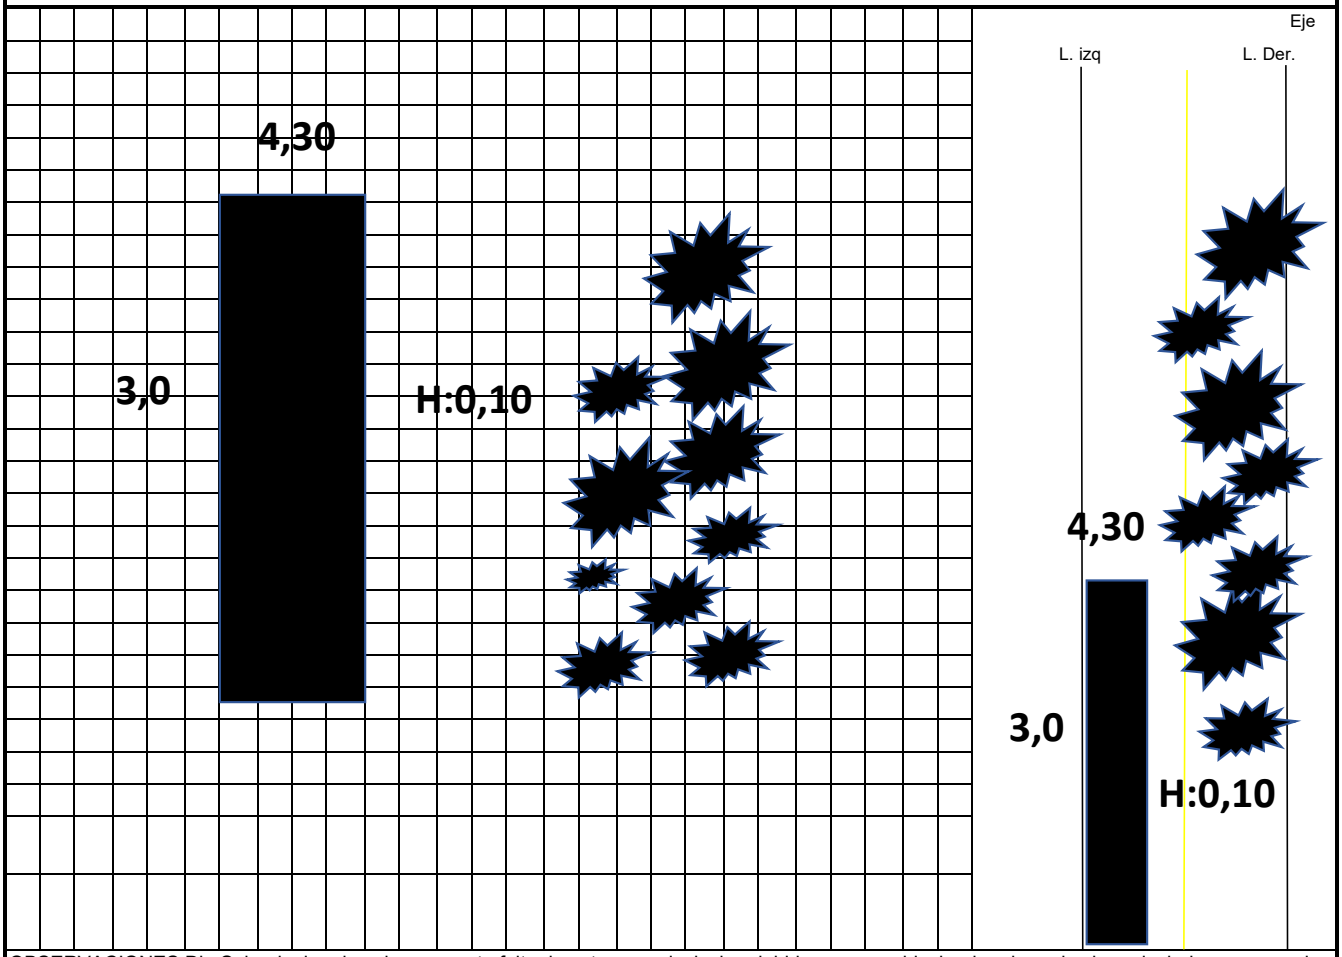

OBSERVACIONES:Dia Soleado, imprimacion presenta falta de esta en renivelacion debido a paso vehicular, hombros de via renivelados con mezcla asfaltica

FIRMA QUIEN ELABORO

Nombre: Edwin Alejandro Laverde Patiño
Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.

FIRMA INGENIERO

Nombre: Javier Andrés Fagua Torres
Apoyo a la supervisión GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

CANTIDADES DE PARCHEO

Estimado Efectuado

OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS CON CÓDIGOS 61BYA (PASO POR FIRAVITOBA) - 55BY08 (PANTANO DE VARGAS-FIRAVITOBA), EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. | **Fecha** 27-05-2026

Fecha	Parche	Ubicaciòn		Lado			Dimensiones (m)			Volumenes (m3)			Area de	Volumen Mezcla
	No.	Abcisa Inicio	Abcisa Final	Izq.	Eje	Der	Largo	Ancho	Espesor	Excavacion	Subbase	Base	Liga (m2)	Asfaltica (m3)
27/05/2026	RN246	PR14+200	PR14+207,8			X	7.80	2.20	0.10				17.16	1.72
27/05/2026	RN247	PR14+210	PR14+214,5	X			4.50	2.80	0.10				12.6	1.26
27/05/2026	RN248	PR14+220	PR14+205,3		X		5.03	2.00	0.10				10.06	1.01
27/05/2026	RN249	PR14+230	PR14+232,5			X	2.80	1.20	0.08				3.36	0.27
27/05/2026	RN250	PR14+240	PR14+243		X		3.00	1.20	0.08				3.6	0.29
27/05/2026	RN251	PR14+250	PR14+252,9	X			2.90	1.10	0.08				3.19	0.26
27/05/2026	RN252	PR14+260	PR14+263,1		X		3.10	1.00	0.08				3.1	0.25
27/05/2026	RN253	PR14+270	PR14+272,85	X			2.85	1.12	0.08				3.192	0.26
27/05/2026	RN254	PR14+280	PR14+283,	X			3.00	1.07	0.08				3.21	0.26
27/05/2026	RN255	PR14+290	PR14+292,95			X	2.95	1.08	0.08				3.186	0.25
27/05/2026	RN256	PR14+300	PR14+303,05	X			3.05	1.05	0.08				3.2025	0.26
27/05/2026	RN257	PR14+310	PR14+312,8			X	2.80	1.10	0.08				3.08	0.25
27/05/2026	RN258	PR14+320	PR14+323		X		3.00	1.05	0.08				3.15	0.25
27/05/2026	RN259	PR14+330	PR14+332,9	X			2.90	1.10	0.08				3.19	0.26
27/05/2026	RN260	PR14+340	PR14+343,1		X		3.10	1.00	0.08				3.1	0.25
27/05/2026	RN261	PR14+350	PR14+352,85		X		2.85	1.12	0.08				3.192	0.26
27/05/2026	RN262	PR14+360	PR14+363		X		3.00	1.07	0.08				3.21	0.26
27/05/2026	P	PR13+300	PR13+310,3	X			10.30	2.05	0.10				21.115	2.11
27/05/2026	P	PR13+550	PR13+555,3	X			5.30	1.20	0.10				6.36	0.64

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre	Edwin Alejandro Laverde Patiño	**Nombre**	Vo.Bo. Rafael Camilo Suárez Suárez	**Nombre**	Javier Andrés Fagua Torres
Cargo	Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.	**Cargo**	Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.	**Cargo**	Apoyo a la supervisión GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
Firma		**Firma**		**Firma**	


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS CON CÓDIGOS 61BYA (PASO POR FIRAVITOBA) - 55BY08 (PANTANO DE VARGAS-FIRAVITOBA), EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

ACTIVIDAD :	RENIVELACION " PARCHEO"	**FECHA : 27-05-2026**

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Edwin Alejandro Laverde Patiño

PR12+954 yPR13+519

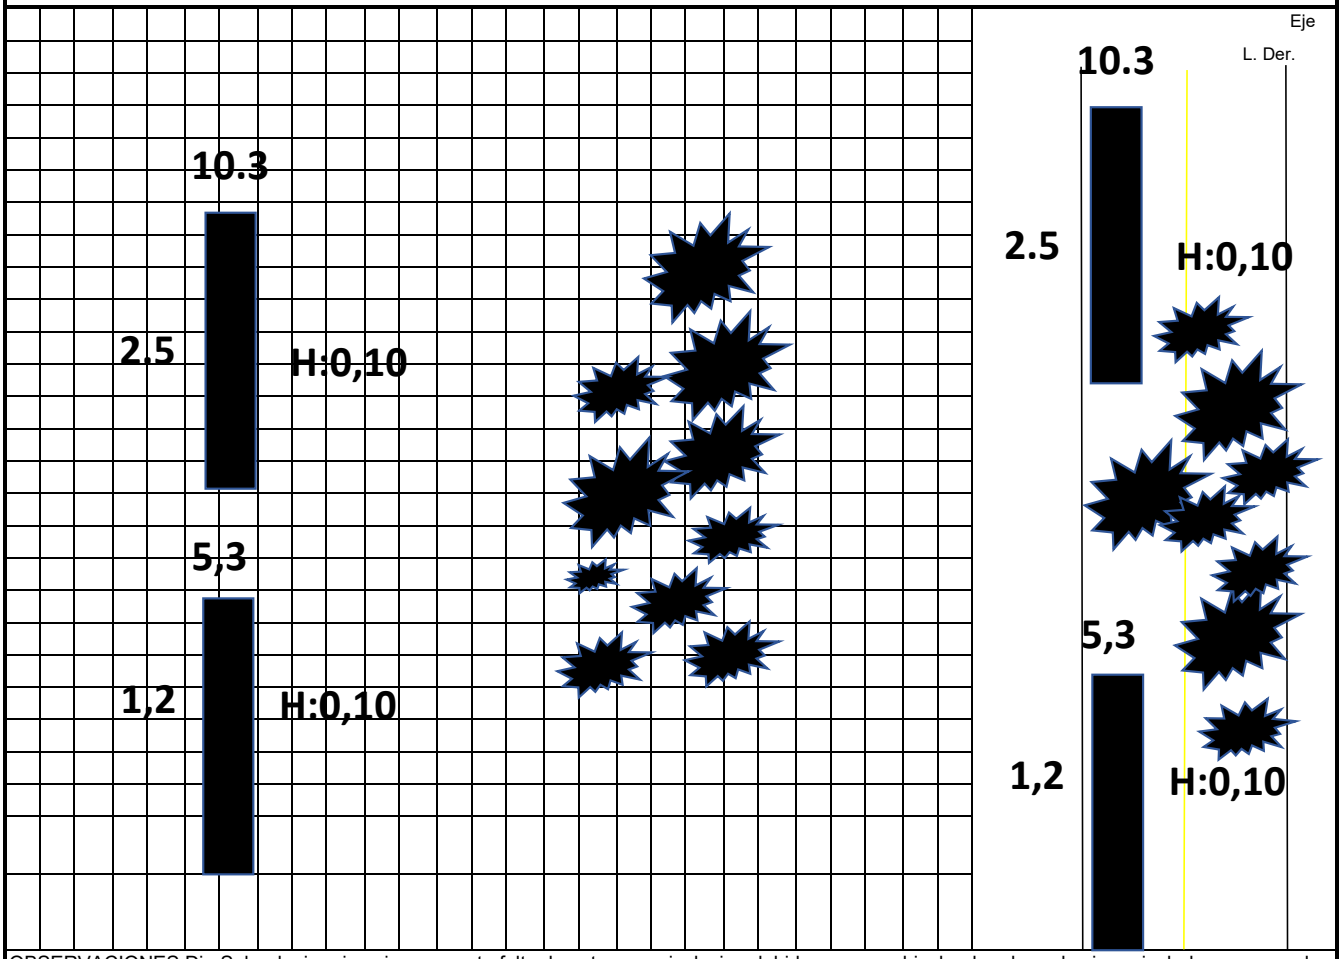

OBSERVACIONES:Dia Soleado, imprimacion presenta falta de esta en renivelacion debido a paso vehicular, hombros de via renivelados con mezcla asfaltica

FIRMA QUIEN ELABORO
Nombre: Edwin Alejandro Laverde Patiño
Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.

FIRMA INGENIERO
Nombre: Javier Andrés Fagua Torres
Apoyo a la supervisión GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

CANTIDADES DE PARCHEO

Estimado Efectuado

OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS CON CÓDIGOS 61BYA (PASO POR FIRAVITOBA) - 55BY08 (PANTANO DE VARGAS-FIRAVITOBA), EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Fecha 28-05-2026

Fecha	Parche	Ubicaciòn		Lado			Dimensiones (m)			Volumenes (m3)			Area de	Volumen Mezcla
	No.	Abcisa Inicio	Abcisa Final	Izq.	Eje	Der	Largo	Ancho	Espesor	Excavacion	Subbase	Base	Liga (m2)	Asfaltica (m3)
28/05/2026	RN263	PR14+363	PR14+366			X	2.95	1.08	0.08				3.186	0.25
28/05/2026	RN264	PR14+370	PR14+373	X			3.05	1.05	0.08				3.2025	0.26
28/05/2026	RN265	PR14+377	PR14+380		X		2.80	1.10	0.08				3.08	0.25
28/05/2026	RN266	PR14+384	PR14+387			X	3.00	1.05	0.08				3.15	0.25
28/05/2026	RN267	PR14+391	PR14+394		X		2.90	1.10	0.08				3.19	0.26
28/05/2026	RN268	PR14+398	PR14+401	X			3.10	1.00	0.08				3.1	0.25
28/05/2026	RN269	PR14+405	PR14+408		X		2.85	1.20	0.08				3.42	0.27
28/05/2026	RN270	PR14+412	PR14+415	X			3.00	1.07	0.08				3.21	0.26
28/05/2026	RN271	PR14+419	PR14+422	X			2.95	1.08	0.08				3.186	0.25
28/05/2026	RN272	PR14+426	PR14+429			X	3.05	1.05	0.08				3.2025	0.26
28/05/2026	RN273	PR14+433	PR14+436	X			2.80	1.10	0.08				3.08	0.25
28/05/2026	RN274	PR14+440	PR14+443			X	3.00	1.05	0.08				3.15	0.25
28/05/2026	RN275	PR14+447	PR14+450		X		2.90	1.10	0.08				3.19	0.26
28/05/2026	RN276	PR14+454	PR14+457	X			3.10	1.00	0.08				3.1	0.25
28/05/2026	RN277	PR14+461	PR14+464		X		2.85	1.12	0.08				3.192	0.26
28/05/2026	RN278	PR14+468	PR14+471		X		3.00	1.10	0.08				3.3	0.26
28/05/2026	RN279	PR14+475	PR14+478		X		2.95	1.10	0.08				3.245	0.26
28/05/2026	RN280	PR14+482	PR14+485	X			3.15	1.20	0.08				3.78	0.30

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre	Edwin Alejandro Laverde Patiño	**Nombre**	Vo.Bo. Rafael Camilo Suárez Suárez	**Nombre**	Javier Andrés Fagua Torres
Cargo	Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.	**Cargo**	Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.	**Cargo**	Apoyo a la supervisión GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
Firma		**Firma**		**Firma**	


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS CON CÓDIGOS 61BYA (PASO POR FIRAVITOBA) - 55BY08 (PANTANO DE VARGAS-FIRAVITOBA), EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

ACTIVIDAD :	RENIVELACION " PARCHEO"	**FECHA : 28-05-2026**

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Edwin Alejandro Laverde Patiño

PR14+363 y PR14+485

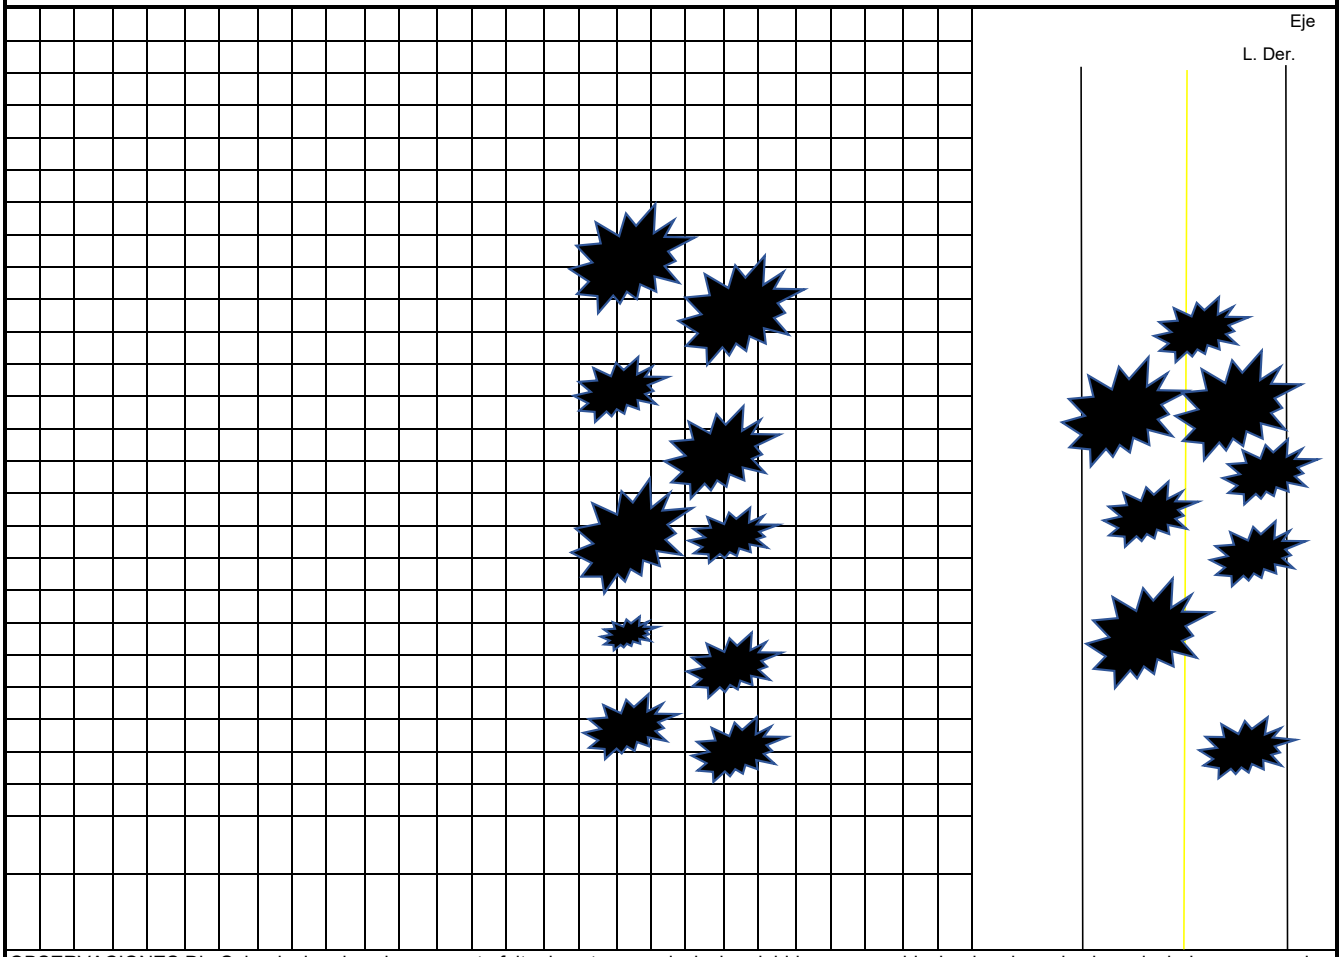

OBSERVACIONES:Dia Soleado, imprimacion presenta falta de esta en renivelacion debido a paso vehicular, hombros de via renivelados con mezcla asfaltica

FIRMA QUIEN ELABORO

Nombre: Edwin Alejandro Laverde Patiño
Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.

FIRMA INGENIERO

Nombre: Javier Andrés Fagua Torres
Apoyo a la supervisión GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

4.6. Bitácora de obra

Cel: 316 8174458
gerencia@tierrasua.com
Calle 19 N.9-35 Piso 10 Tunja/Boyacá

4.6.1. Tramo: 60BY15 cruce 6009 - Soracá - la y - Tunja

TIERRASUA S.A.S

Cel: 316 8174458
gerencia@tierrasua.com
Calle 19 N.9-35 Piso 10 Tunja/Boyacá

TIERRASUA	**BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES**
Fecha	20 de mayo de 2026
Hora	7:00 a.m - 4:30 p.m
Clima	Lloviznas
Sector	Vía con código 60BY15 en el municipio de Soracá
Personal	• Ingeniera residente de TierraSua • Ingeniera residente de Orbeing • Ingeniero pasante de Orbeing • Cuadrilla de obra
Maquinaria	• Cortadora de pavimento con disco diamantado • Retroexcavadora • Volquetas • Tanque irrigador de asfalto • Finisher • Vibrocompactador • Rodillo neumático
Actividades ejecutadas	Durante la jornada se ejecutaron actividades de corte y apertura de caja sobre la abscisa K0+010.6 correspondiente a calzada completa. Asimismo, se realizó el corte de la caja ubicada en la abscisa K0+018.5 sobre el carril izquierdo, como actividad preliminar para la delimitación del área y preparación de las condiciones requeridas para su posterior intervención. Posteriormente, sobre la caja intervenida, se adelantaron labores de conformación y adecuación de las capas de soporte, realizando procesos de compactación mediante vibrocompactador con el propósito de garantizar adecuadas condiciones de densificación, estabilidad y capacidad estructural de la superficie expuesta, asegurando condiciones favorables para las actividades posteriores de pavimentación. Una vez finalizado el proceso de compactación, se procedió con la aplicación de imprimación con el fin de proteger la superficie intervenida y minimizar posibles afectaciones derivadas de la infiltración de agua. Considerando que para esta jornada no se tenía programada la instalación de mezcla asfáltica y que la caja permanecería abierta durante horario nocturno, se realizó la disposición temporal del área mediante la conformación de una transición o rampa provisional, permitiendo mantener condiciones adecuadas de transitabilidad vehicular. La implementación de esta medida preventiva tuvo como objetivo disminuir cambios bruscos de nivel generados por la intervención ejecutada, reducir afectaciones a la movilidad y mitigar riesgos asociados a posibles incidentes o siniestros viales derivados de las condiciones temporales del frente de obra.
PMT	Desde el componente PMT (Plan de Manejo de Tránsito), se implementó la señalización preventiva y de canalización mediante instalación de conos (5), maletines (2), señales preventivas (3) y personal con paletas regulando el tránsito vehicular, garantizando condiciones seguras de movilidad y control operacional durante el desarrollo de las actividades. Asimismo, se realizaron verificaciones periódicas para garantizar la correcta ubicación, estabilidad y visibilidad de los dispositivos de señalización instalados.
Seguridad y Salud en el Trabajo	En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), se efectuó inspección preoperacional de equipos y maquinaria, verificación del uso adecuado de elementos de protección personal (EPP), identificación y socialización de riesgos asociados a actividades de corte, compactación y tránsito de maquinaria, así como seguimiento a las condiciones de seguridad, orden y aseo dentro del frente de trabajo.

Firma Ingeniero de TierraSua	Firma Ingeniero de Apoyo de Supervisión Gobernación de Boyacá

TIERRASUA ¡Conectamos región!	**BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES**
Fecha	21 de mayo de 2026
Hora	7:00 a.m - 4:30 p.m
Clima	Lluvioso
Sector	Vía con código 60BY15 en el municipio de Soracá
Personal	• Ingeniera residente de TierraSua • Ingeniera residente de Orbeing • Ingeniero pasante de Orbeing • Cuadrilla de obra
Maquinaria	• Cortadora de pavimento con disco diamantado • Retroexcavadora • Volquetas • Tanque irrigador de asfalto • Finisher • Vibrocompactador • Rodillo neumático
Actividades ejecutadas	Durante el desarrollo de la jornada se adelantaron labores de corte, apertura e intervención de las cajas localizadas en las abscisas K0+043.9, K0+070.3, K0+085.3 y K0+094.8 correspondientes al carril derecho. Las actividades comprendieron remoción del material existente, adecuación de las áreas de trabajo y preparación de la estructura para etapas posteriores de rehabilitación. Posteriormente se aplicó imprimación sobre las superficies intervenidas con el fin de conservar las condiciones del área expuesta y contribuir a la protección de las capas estructurales mientras se realizaban las actividades subsiguientes. No obstante, debido a las condiciones climáticas registradas durante la jornada y la presencia de humedad sobre la superficie de trabajo, no fue técnicamente viable ejecutar la instalación de mezcla asfáltica, teniendo en cuenta las implicaciones que estas condiciones generan sobre la adherencia y desempeño del material. En consideración a que las cajas quedarían expuestas durante horario nocturno, se implementó una disposición temporal mediante conformación de rampas de transición que permitieran mantener condiciones adecuadas de movilidad y disminuir riesgos asociados a desniveles o cambios abruptos en la superficie de rodadura.
PMT	En materia de PMT se mantuvo la implementación de dispositivos de canalización y control de tránsito mediante conos (5), maletines (2), señales preventivas (3) y auxiliares con paletas regulando el flujo vehicular, efectuando además seguimiento constante a las condiciones operativas del frente de trabajo.
Seguridad y Salud en el Trabajo	Desde SST se desarrollaron actividades de inspección enfocadas en riesgos asociados a superficies húmedas, tránsito de maquinaria y circulación de personal, complementadas con verificaciones al uso de elementos de protección y condiciones generales de seguridad.

Firma Ingeniero de TierraSua	Firma Ingeniero de Apoyo de Supervisión Gobernación de Boyacá

TIERRASUA ¡Conectamos región!	**BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES**
Fecha	22 de mayo de 2026
Hora	7:00 a.m - 4:30 p.m
Clima	Soleado
Sector	Vía con código 60BY15 en el municipio de Soracá
Personal	• Ingeniera residente de TierraSua • Ingeniera residente de Orbeing • Ingeniero pasante de Orbeing • Cuadrilla de obra
Maquinaria	• Cortadora de pavimento con disco diamantado • Retroexcavadora • Volquetas • Tanque irrigador de asfalto • Finisher • Vibrocompactador • Rodillo neumático
Actividades ejecutadas	Durante la jornada se realizó una nueva aplicación de imprimación sobre las áreas intervenidas en días anteriores localizadas en las abscisas K0+010.6, K0+018.5, K0+043.9, K0+070.3, K0+085.3 y K0+094.8, considerando que el tránsito vehicular presente en el sector había generado desprendimiento parcial de la emulsión aplicada previamente. Posteriormente, se desarrollaron actividades de instalación y compactación de mezcla asfáltica en las áreas intervenidas, alcanzando un total de 11.32 m³ compactos. De manera complementaria, se efectuó únicamente el corte de cajas para futuras intervenciones sobre las abscisas K0+038.8 (carril izquierdo), K0+115 (carril derecho), K0+123.2 (carril izquierdo), K0+125.8 (carril izquierdo), K0+135.2 (calzada completa), K0+142.8 (carril izquierdo) y K0+152.7 (calzada completa). Durante la ejecución se realizó acompañamiento y seguimiento técnico permanente a las actividades desarrolladas, verificando niveles, espesores y uniformidad superficial del material colocado. Adicionalmente, se efectuó seguimiento y control de las temperaturas de recepción, extendido y compactación de la mezcla asfáltica, verificando el cumplimiento de los rangos técnicos requeridos para garantizar condiciones adecuadas de trabajabilidad, compactación y desempeño del material colocado. Las actividades de densificación iniciaron mediante el uso de rodillo vibratorio para alcanzar compactación inicial y posteriormente se ejecutó el proceso de sellado y acabado mediante rodillo neumático, permitiendo obtener una superficie homogénea y condiciones adecuadas para su puesta en servicio.
PMT	Desde PMT se mantuvo la implementación de dispositivos de regulación y canalización vehicular mediante conos (5), maletines (2), señales preventivas (3) y personal con paletas regulando el tránsito, permitiendo desarrollar las actividades constructivas sin generar afectaciones significativas a la movilidad del sector.
Seguridad y Salud en el Trabajo	Por otra parte, desde SST se realizó acompañamiento continuo a las actividades ejecutadas, haciendo seguimiento a riesgos asociados a maquinaria pesada, temperaturas elevadas y manipulación de mezcla asfáltica caliente, además de verificar el cumplimiento de medidas de seguridad establecidas.

Firma Ingeniero de TierraSua	Firma Ingeniero de Apoyo de Supervisión Gobernación de Boyacá

TIERRASUA	**BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES**
Fecha	25 de mayo de 2026
Hora	7:00 a.m - 4:30 p.m
Clima	Lloviznas
Sector	Vía con código 60BY15 en el municipio de Soracá
Personal	• Ingeniera residente de TierraSua • Ingeniera residente de Orbeing • Ingeniero pasante de Orbeing • Cuadrilla de obra
Maquinaria	• Cortadora de pavimento con disco diamantado • Retroexcavadora • Volquetas • Tanque irrigador de asfalto • Vibrocompactador • Rodillo neumático
Actividades ejecutadas	Durante la jornada se ejecutaron actividades de apertura e instalación de mezcla asfáltica en las abscisas K0+115 (carril derecho), K0+125.8 (carril derecho) y K0+152.7 correspondiente a calzada completa. Las condiciones de intervención presentaron diferentes exigencias operativas, considerando que las dos primeras actividades se desarrollaron sobre un único carril, mientras que la intervención sobre la abscisa K0+152.7 requirió manejo sobre la totalidad de la sección vial. Inicialmente se ejecutaron actividades de retiro del material deteriorado, adecuación y preparación de las áreas intervenidas, garantizando condiciones apropiadas para la instalación del material de reposición. Posteriormente, se realizó la colocación y compactación de mezcla asfáltica, alcanzando un total de 10.03 m^3 compactos. Durante la ejecución se efectuó supervisión técnica continua del proceso constructivo, realizando seguimiento a niveles, espesores, alineamientos y condiciones geométricas finales de las áreas rehabilitadas. De manera complementaria, se efectuó seguimiento y control a las temperaturas de la mezcla asfáltica durante las etapas de descargue, extendido y compactación, verificando el cumplimiento de los rangos establecidos para garantizar condiciones adecuadas de trabajabilidad, compactación y calidad final del material colocado. Las labores de compactación fueron ejecutadas mediante el uso secuencial de rodillo vibratorio y rodillo neumático, permitiendo alcanzar una adecuada densificación y uniformidad superficial.
PMT	Desde el componente PMT, se mantuvieron implementadas medidas de regulación vehicular mediante conos (5), maletines (2), señales preventivas (3) y personal con paletas regulando el tránsito, realizando especial control en la intervención correspondiente a calzada completa, con el propósito de garantizar condiciones seguras de movilidad y minimizar afectaciones a los usuarios de la vía.
Seguridad y Salud en el Trabajo	En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), se realizaron inspecciones enfocadas en condiciones operativas de maquinaria, verificación del uso adecuado de elementos de protección personal y seguimiento permanente a los riesgos asociados a tránsito vehicular, operación de equipos y ejecución simultánea de actividades dentro del frente de trabajo.

Firma Ingeniero de TierraSua

Firma Ingeniero de Apoyo de Supervisión Gobernación de Boyacá

TIERRASUA ¡Conectamos región!	**BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES**
Fecha	26 de mayo de 2026
Clima	N/A
Personal	N/A
Maquinaria	N/A
Actividades ejecutadas	Durante la jornada se suspendieron las actividades físicas programadas en el frente de trabajo, considerando que no se contó con la disponibilidad de vibrocompactador para la ejecución de las labores de compactación requeridas. La ausencia de este equipo impedía garantizar condiciones adecuadas de densificación y estabilidad en las capas de soporte, situación que no permitía asegurar una base estructural óptima para la posterior instalación de mezcla asfáltica y el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas para la intervención.
PMT	
Seguridad y Salud en el Trabajo	

Firma Ingeniero de TierraSua

Firma Ingeniero de Apoyo de Supervisión Gobernación de Boyacá

TIERRASUA ¡Conectamos región!	**BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES**
Fecha	27 de mayo de 2026
Clima	N/A
Personal	N/A
Maquinaria	N/A
Actividades ejecutadas	Durante la jornada se suspendieron las actividades físicas programadas en el frente de trabajo, considerando que no se contó con la disponibilidad de vibrocompactador para la ejecución de las labores de compactación requeridas. La ausencia de este equipo impedía garantizar condiciones adecuadas de densificación y estabilidad en las capas de soporte, situación que no permitía asegurar una base estructural óptima para la posterior instalación de mezcla asfáltica y el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas para la intervención.
PMT	
Seguridad y Salud en el Trabajo	

Firma Ingeniero de TierraSua	Firma Ingeniero de Apoyo de Supervisión Gobernación de Boyacá
