TIERRASUA


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Mantenimiento y mejoramiento de la vía con código 608415 en el municipio de Soacá

ACTIVIDAD: Instalación de mezcla asfáltica **FECHA:** 19-06-2026

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: María Paula Villamil

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

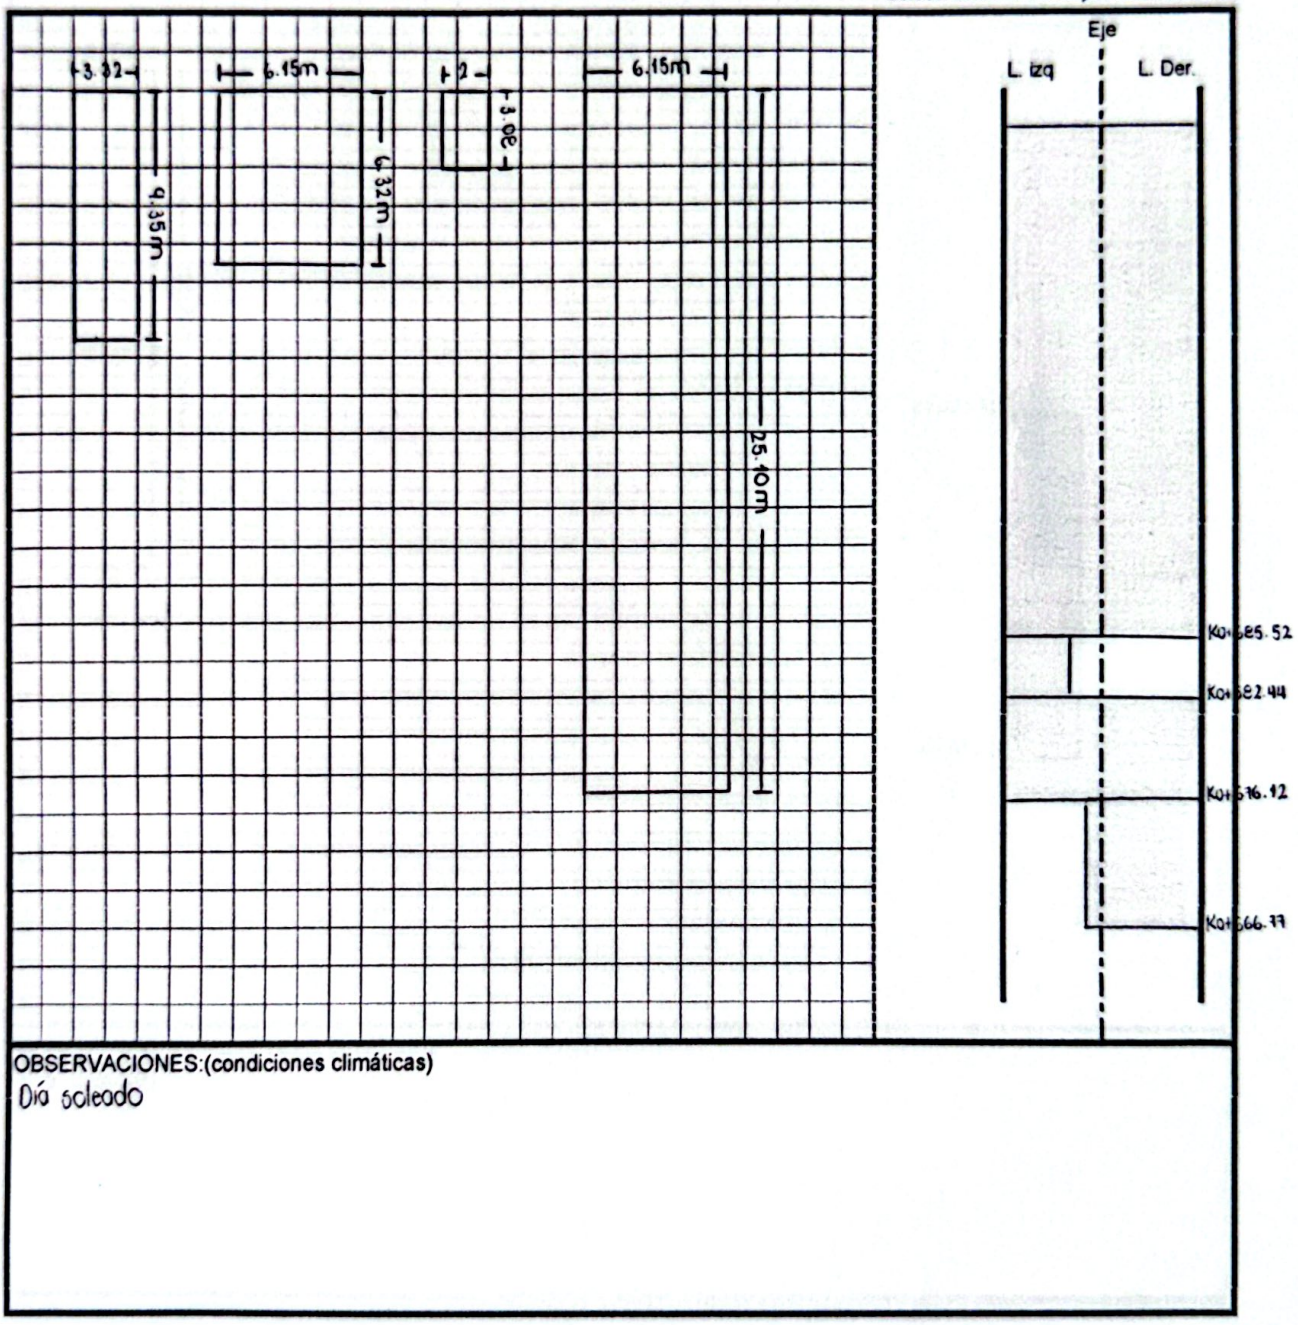

OBSERVACIONES:(condiciones climáticas)
Día soleado

FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO
Steeven René Rojas Acero
Apoyo Supervision DDIV

Vo.Bo.
Nombre: Natalia Sanchez Dueñas
Firma:
Cargo Residente Obra.

Scanned with CamScanner

TIERRASUA


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Mantenimiento y mejoramiento de la vía con código 608415 en el municipio de Sáchica

ACTIVIDAD: Instalación de sobrecarpeta **FECHA:** 10-06-2026

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: María Paula Villamil

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

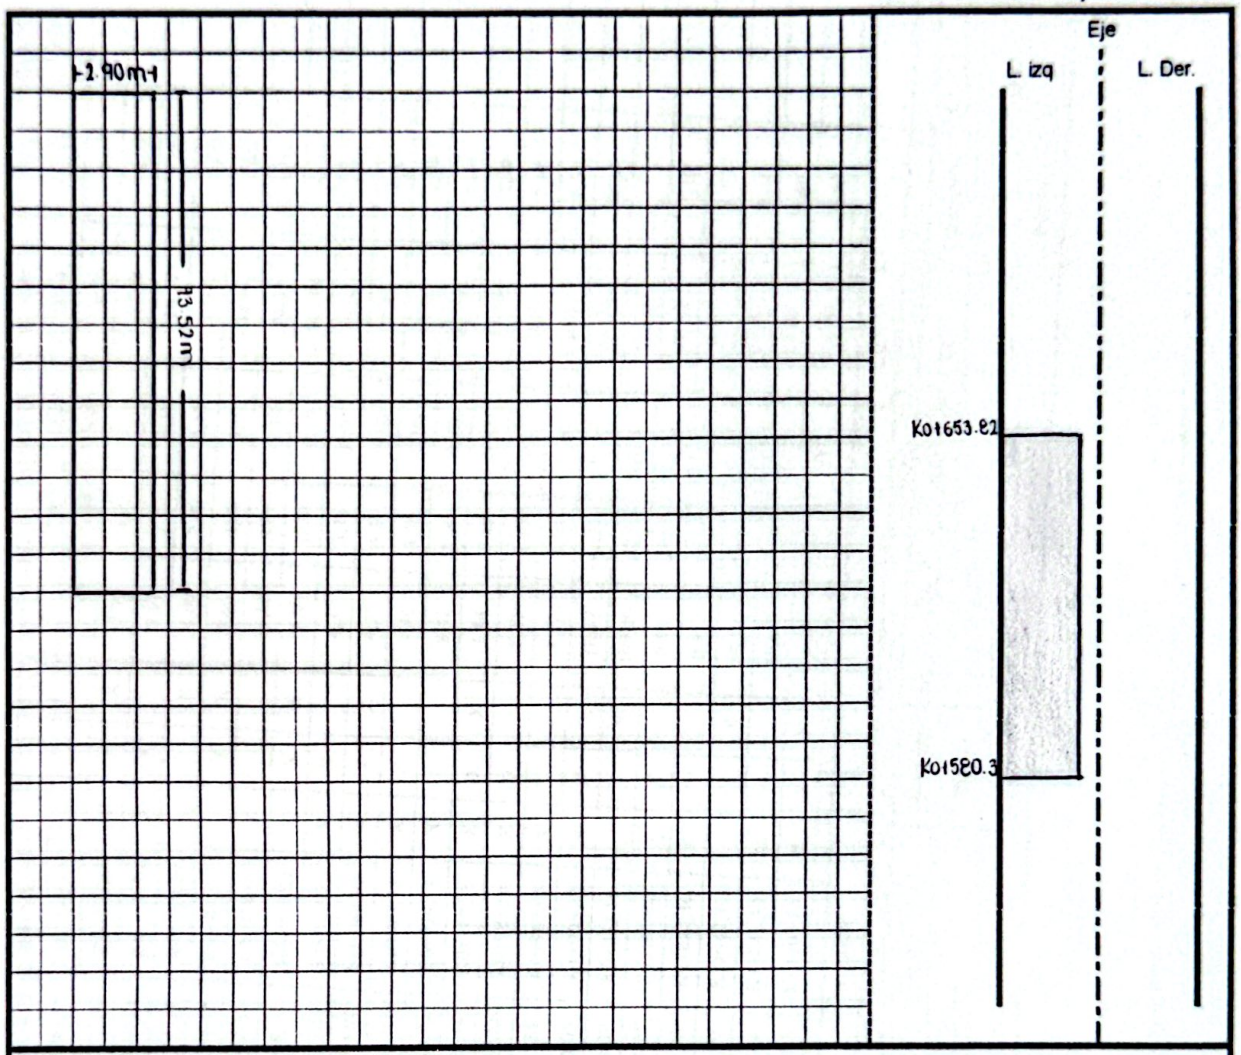

OBSERVACIONES:(condiciones climáticas)

Día soleado

FIRMA QUIEN ELABORO

Vo.Bo.
Nombre: Natalia Sánchez Dueñas
Firma:
Cargo Residente SSPG Obra.

FIRMA INGENIERO

Steeven René Rojas Acero
Apoyo Supervisión DDIV

Scanned with CamScanner

TIERRASUA

CANTIDADES DE PARCHEO / FRESADO / ASFALTO

OBRA: Mantenimiento y mejoramiento de la via con código 60BY15 en el municipio de Soracá

Fecha	P	F	A	Ubicaciòn		Lado			Dimensiones (m)			Área de Liga / Emulsión	Volumenes (m3)			
				Abcisa I.	Abcisa F.	Izq.	Eje	Der.	Largo	Ancho	Espesor		Excavación	Subbase	Base	Asfalto
22/06/2026	X		X	K0+718,50	K0+724,00		X	X	5,50	3,38	0,10	18,59	1,86			1,86
22/06/2026	X		X	K0+737,73	K0+742,07	X	X		4,34	1,47	0,10	6,38	0,64			0,64
22/06/2026	X		X	K0+738,73	K0+742,88			X	4,15	1,96	0,10	8,13	0,81			0,81
22/06/2026	X		X	K0+748,77	K0+759,92	X			11,15	2,40	0,10	26,76	2,68			2,68
22/06/2026	X		X	K0+759,92	K0+767,64	X	X	X	7,72	6,15	0,10	47,48	4,75			4,75
22/06/2026	X		X	K0+767,64	K0+772,54	X	X		4,90	3,30	0,10	16,17	1,62			1,62
22/06/2026	X		X	K0+775,34	K0+780,34			X	5,00	2,00	0,10	10,00	1,00			1,00
22/06/2026	X		X	K0+780,34	K0+784,00		X	X	3,66	4,00	0,10	14,64	1,46			1,46
23/06/2026	X		X	K0+926,60	K0+938,40	X			11,80	3,06	0,10	36,11	9,03		5,42	3,61
23/06/2026	X		X	K0+938,40	K0+955,20	X	X	X	16,80	6,30	0,10	105,84	26,46		15,88	10,58
23/06/2026	X		X	K0+955,20	K0+959,57	X	X		4,37	3,45	0,10	15,08	3,77		2,26	1,51
23/06/2026	X		X	K0+959,57	K0+963,92	X	X	X	4,35	6,30	0,10	27,41	6,85		4,11	2,74
23/06/2026	X		X	K0+963,92	K0+967,32	X	X		3,40	3,50	0,10	11,90	2,98		1,79	1,19
24/06/2026	X		X	K0+970,82	K0+979,14	X			8,32	3,00	0,10	24,96	6,24		3,74	2,50
24/06/2026	X		X	K0+979,14	K0+980,98	X	X	X	1,84	6,30	0,10	11,59	2,90		1,74	1,16
24/06/2026	X		X	K0+980,98	K0+983,68	X	X		2,70	3,86	0,10	10,42	2,61		1,56	1,04
24/06/2026	X		X	K0+983,68	K0+987,05	X			3,37	3,09	0,10	10,41	2,60		1,56	1,04
24/06/2026	X		X	K0+987,05	K1+005,22	X	X	X	18,17	6,25	0,10	113,56	28,39		17,03	11,36
25/06/2026			X	K0+661,30	K0+762,16			X	100,86	3,25	0,05	327,80				16,39
26/06/2026	X		X	K1+017,30	K1+020,00	X	X		2,70	4,00	0,10	10,80	2,70		1,62	1,08
26/06/2026	X		X	K1+020,00	K1+022,36	X			2,36	2,00	0,10	4,72	1,18		0,71	0,47
26/06/2026	X		X	K1+022,90	K1+042,30			X	19,40	1,80	0,10	34,92	8,73		5,24	3,49
26/06/2026	X		X	K1+031,50	K1+042,30	X			10,80	1,80	0,10	19,44	4,86		2,92	1,94
26/06/2026	X		X	K1+042,30	K1+060,49	X	X	X	18,19	6,30	0,10	114,60	28,65		17,19	11,46
Totales												1027,70			82,76	86,38

	Elaboró	Revisó		Aprobó
Nombre	Natalia Sánchez Dueñas	Nombre	María Paula Villamil Bautista	Nombre	Steeven René Rojas Acero
Cargo	Residente de Obra	Cargo	Ing. Residente	Cargo	Apoyo Supervisión Gob. Boy
Firma	Natalia S.D.C.	Firma		Firma	

Scanned with CamScanner

TIERRASUA

CONTROL DE MATERIALES

Contrato No: 3827 de 2025

FECHA	MATERIAL	ABSCISA	HORA DE LLEGADA	VOLQUETA			TEMPERATURA (°C)		OBSERV.	ELABORACIÓN DE BRIQUETAS
				Nº VALE	PLACA	VOLUMEN	EXT.	COM.		Cantidad
22/06/2026	MDC-19	K0+718,50	10:37	3927	OCM 236	7	146	110		
22/06/2026	MDC-19	K0+718,50	12:00	3931	SOO 09	11	147	113		
23/06/2026	BASE	K0+926,60	7:00	7203	OCM 236	7				
23/06/2026	BASE	K0+926,60	7:30	7204	OCM 225	7				
23/06/2026	BASE	K0+926,60	10:20	7205	OCM 225	6				
23/06/2026	BASE	K0+926,60	11:00	7206	TDL 394	10				
23/06/2026	MDC-19	K0+926,60	11:00	3936	OCM 236	7,5	148	116		
23/06/2026	MDC-19	K0+926,60	12:10	3939	UQY 967	13,5	150	118		
24/06/2026	BASE	K0+970,82	7:00	7207	OCM 236	7				
24/06/2026	BASE	K0+970,82	8:15	7208	OCM 225	7				
24/06/2026	BASE	K0+970,82	10:30	7209	TDL 394	10				
24/06/2026	BASE	K0+970,82	11:50	7210	OCM 225	6				
24/06/2026	MDC-19	K0+970,82	11:55	3948	OCM 236	7	149	115		
24/06/2026	MDC-19	K0+970,82	12:16	3949	TDL 394	14,2	150	117		
25/06/2026	MDC-19	K0+661,30	11:20	3955	OCM 236	7	145	110		
25/06/2026	MDC-19	K0+661,30	12:30	3958	SOR 197	13	146	113		
26/06/2026	BASE	K1+017,30	7:00	7211	OCM 236	7				
26/06/2026	BASE	K1+017,30	8:30	7212	OCM 225	7				
26/06/2026	BASE	K1+017,30	9:20	7213	TDL 394	12				
26/06/2026	BASE	K1+017,30	11:40	7214	OCM 225	7				
26/06/2026	MDC-19	K1+017,30	11:43	3968	OCM 236	8	145	110		
26/06/2026	MDC-19	K1+017,30	12:15	3970	TDL 394	14,5	146	114		
						195,7				

NOTA: Verificar en todos los vales de control de materiales despachados de la planta de asfalto, la temperatura de salida de la mezcla.

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre:	Natalia Sánchez	Nombre:	María Paula Villamil	Nombre:	Steeven René Rojas Acero
Cargo:	Residente de Obra	Cargo:	Ing. Residente	Cargo:	Apoyo Supervisión Gob. Boy.
Firma:	Natalia Sánchez	Firma:		Firma:	

Scanned with CamScanner

TIERRASUA


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Mantenimiento y mejoramiento de la vía con código 60B415 en el municipio de Soracá

ACTIVIDAD : Instalación de mezcla asfáltica **FECHA :** 22-06-2026

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: María Paula Villamil

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

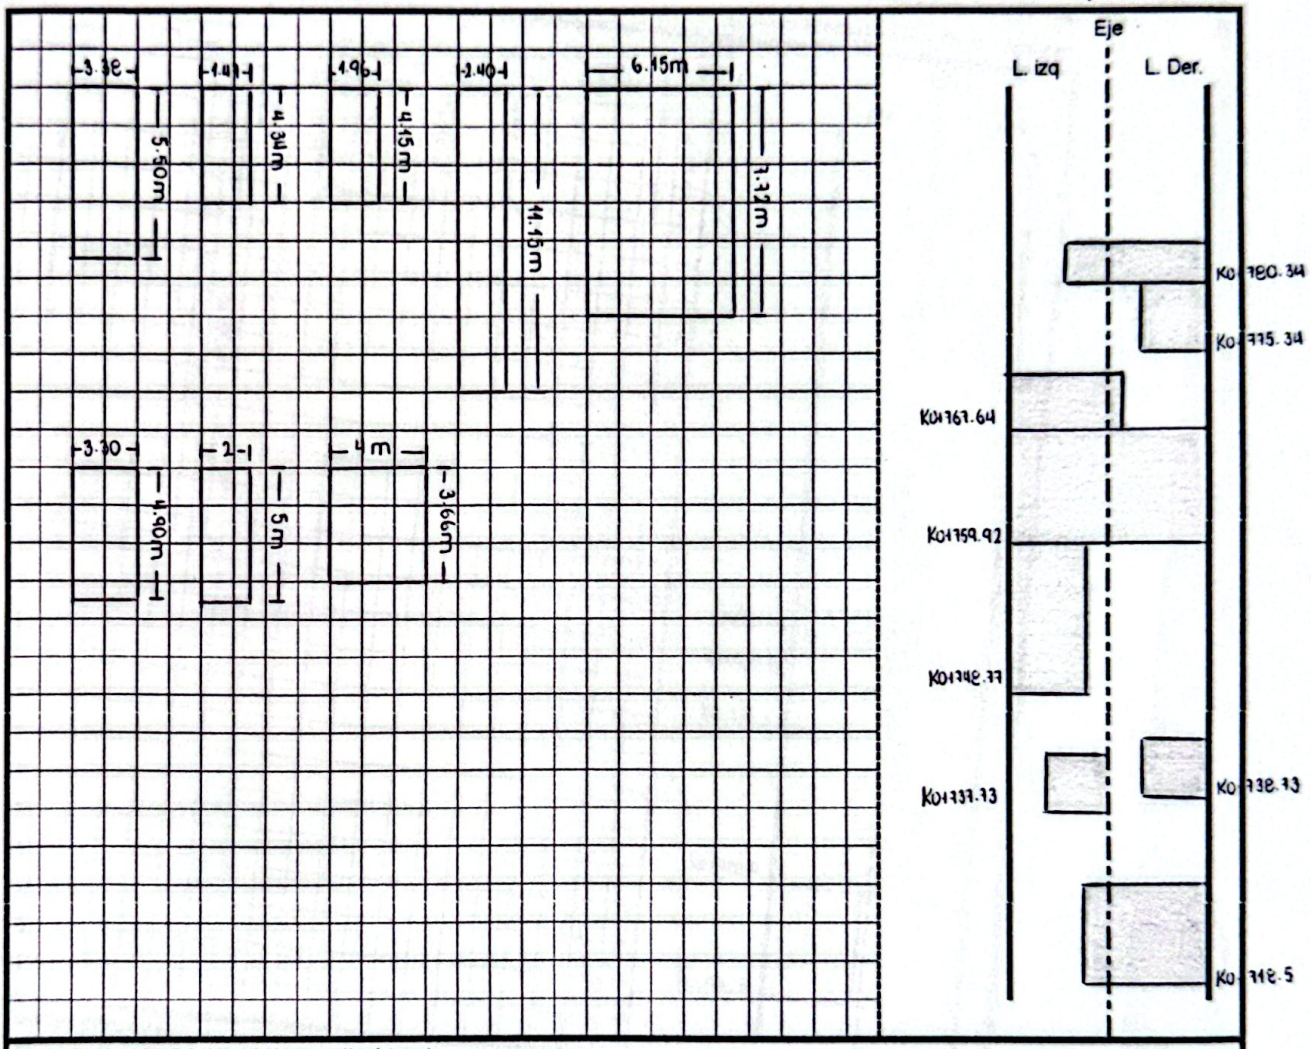

OBSERVACIONES:(condiciones climáticas)

Día soleado

FIRMA QUIEN ELABORO

Vo.Bo.
Nombre: Natalia Sánchez Dueñas
Firma: Natali. 3300
Cargo Residente Obra.

FIRMA INGENIERO

Steeven René Rojas Acero
Apoyo Supervisión DDIV

Scanned with CamScanner

TIERRASUA


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Mantenimiento y mejoramiento de la vía con código 608415 en el municipio de Soracá

ACTIVIDAD : Instalación de base granular y mezcla asfáltica **FECHA :** 23-06-2026

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: María Paula Villamil

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

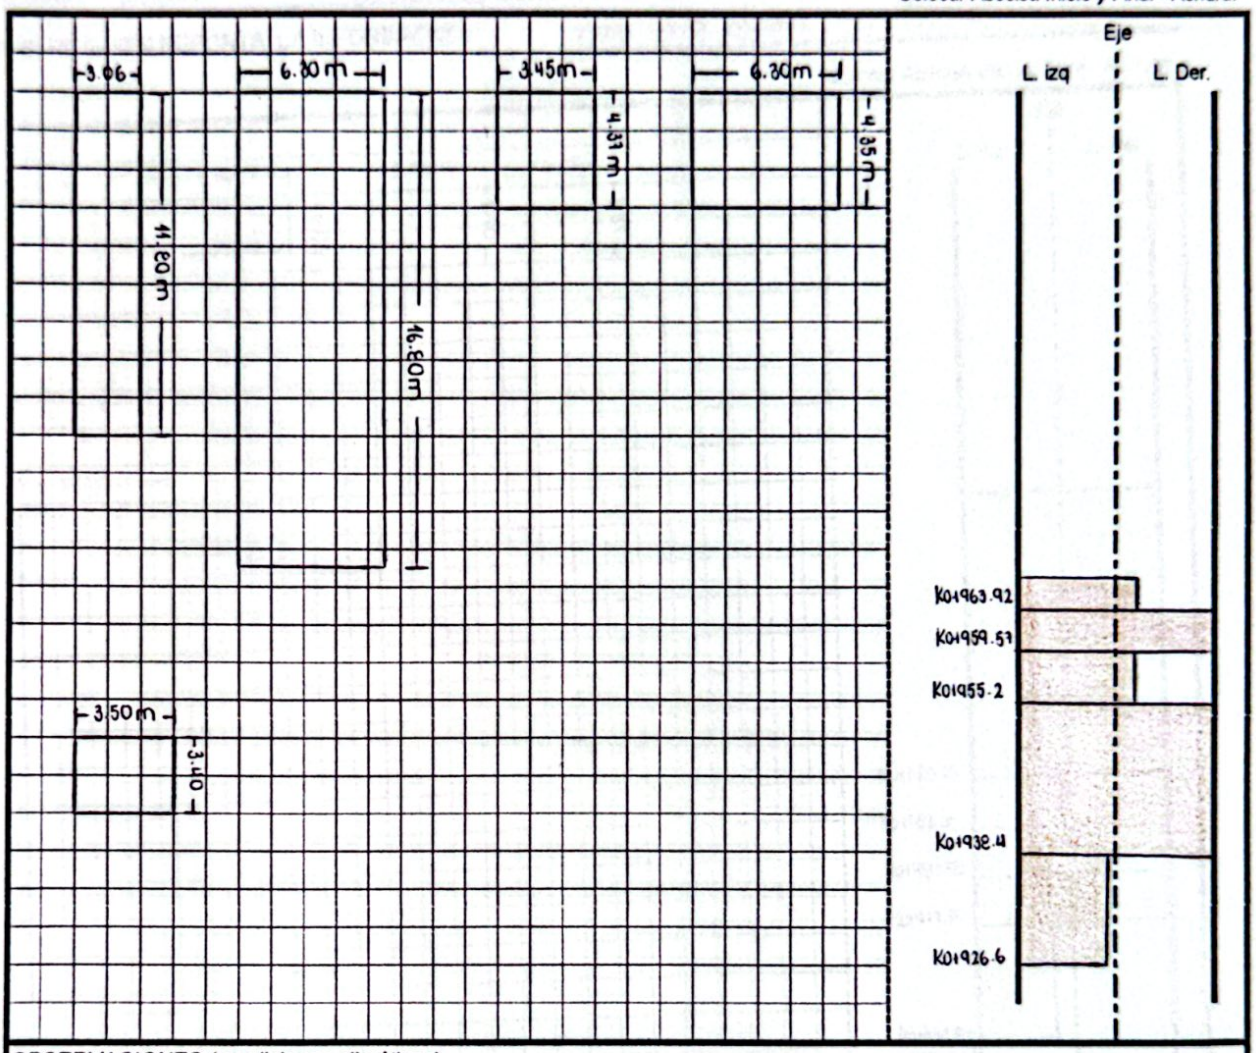

OBSERVACIONES:(condiciones climáticas)

Día soleado

FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO

Steeven René Rojas Acero
Apoyo Supervisión DDIV

Vo.Bo.
Nombre: Natalia Sánchez Dueñas
Firma:
Cargo Residente Obra

Scanned with CamScanner

TIERRASUA


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Mantenimiento y mejoramiento de la vía con código 608415 en el municipio de Soracá

ACTIVIDAD: Instalación de base granular y mezcla asfáltica **FECHA:** 24-06-2026

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: María Paula Villamil

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

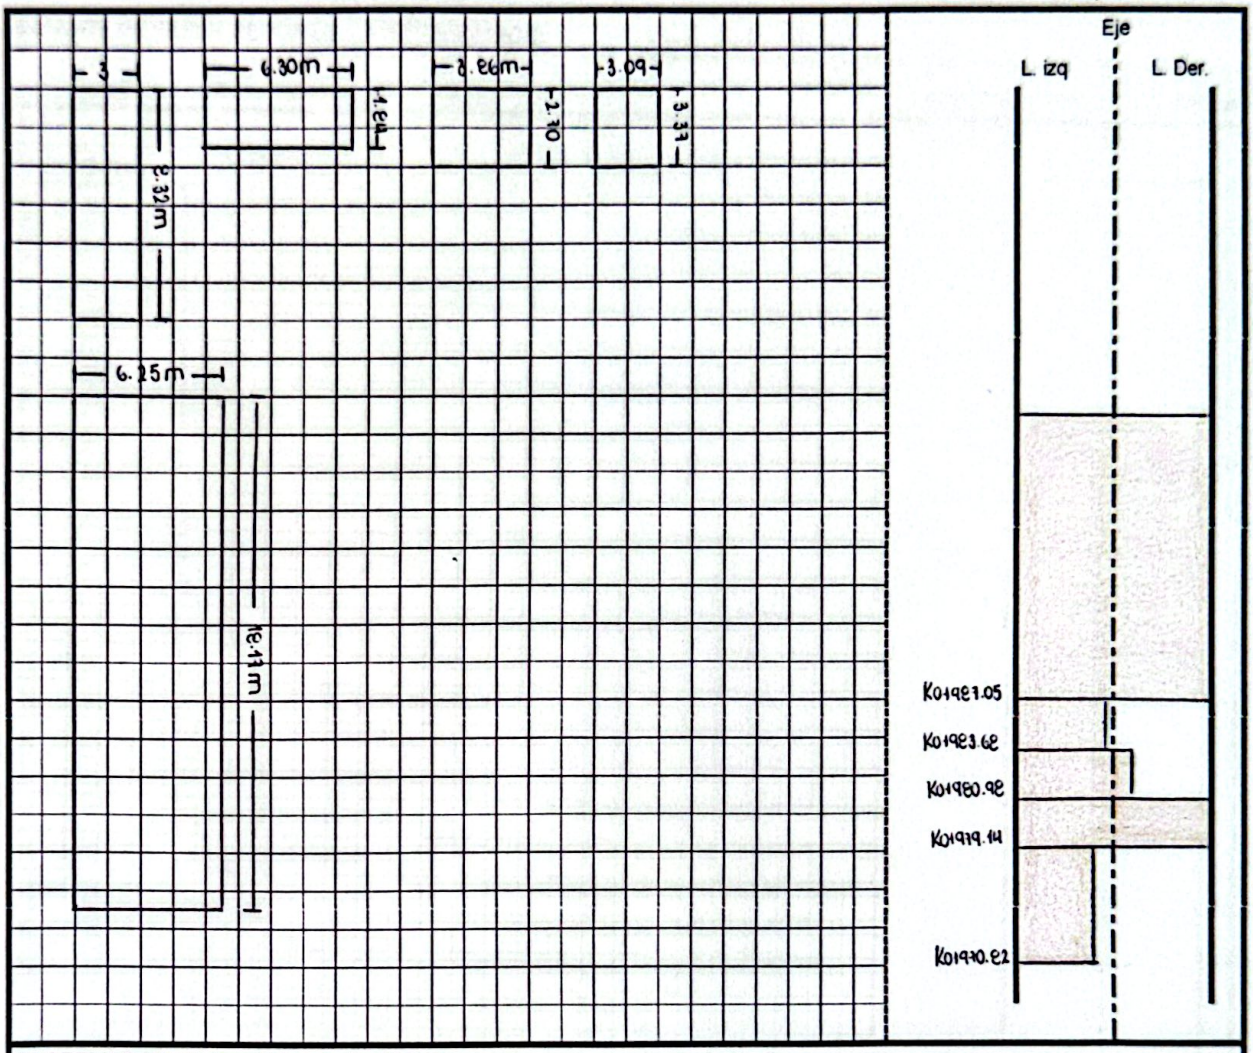

OBSERVACIONES:(condiciones climáticas)

Día soleado

FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO

Steeven René Rojas Acero
Apoyo Supervisión DDIV

Vo.Bo.
Nombre: Natalia Sanchez Dueñas
Firma:
Cargo Residente Obra.

Scanned with CamScanner

TIERRASUA


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Mantenimiento y mejoramiento de la vía con código 60By15 en el municipio de Soracá

ACTIVIDAD : Instalación de sobrecarpeta **FECHA :** 15-06-2026

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: María Paula Villamil

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

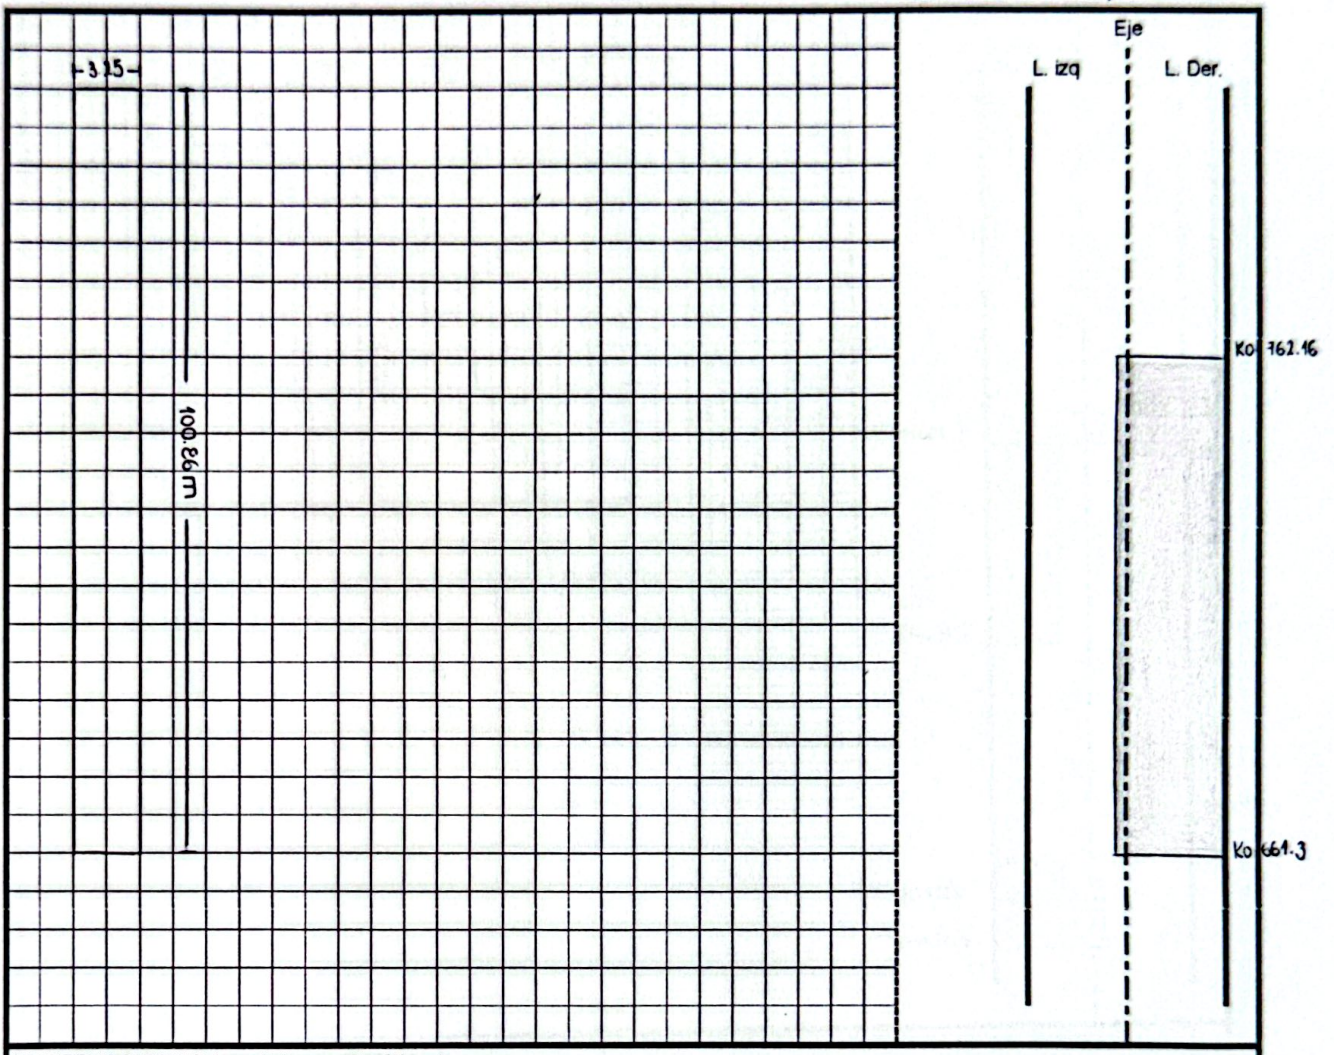

OBSERVACIONES:(condiciones climáticas)
Día nublado con leves lluvias

FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO
Steeven René Rojas Acero
Apoyo Supervisión DDIV

Vo.Bo.
Nombre: Natalia Sánchez Dueñas
Firma:
Cargo Residente Obra.

Scanned with CamScanner

TIERRASUA


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Mantenimiento y mejoramiento de la vía con código 608415 en el municipio de Soracá

ACTIVIDAD: Instalación de base granular y mezcla asfáltica **FECHA:** 26-06-2026

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: María Paula Villamil

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

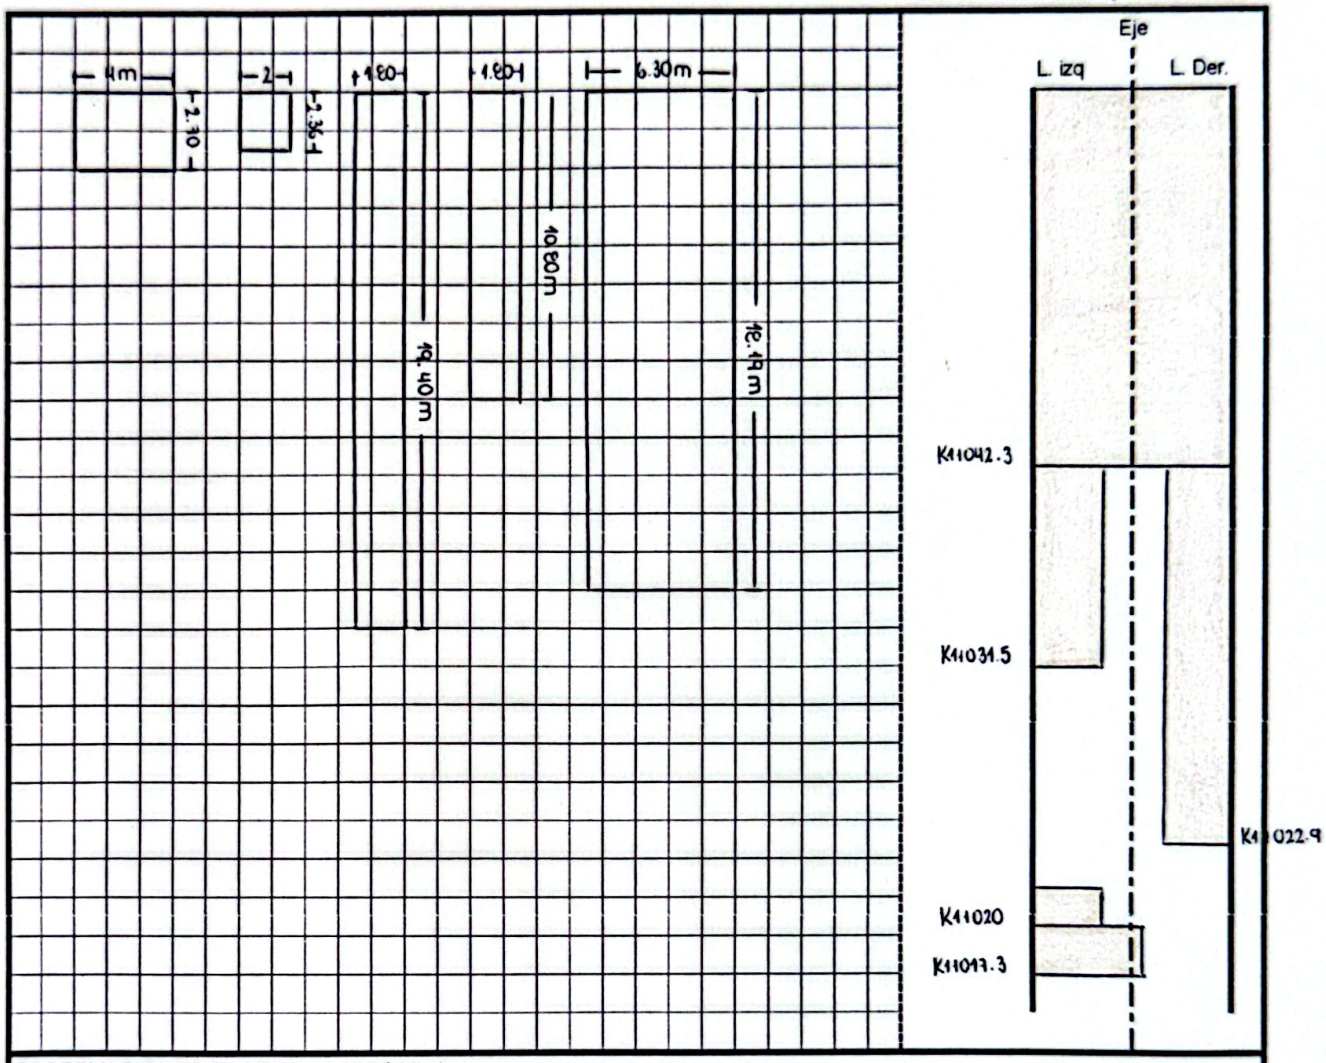

OBSERVACIONES:(condiciones climáticas)

Dió soleado

FIRMA QUIEN ELABORO

Vo.Bo.
Nombre: Natalia Sánchez Dueñas
Firma:
Cargo Residente Obra.

FIRMA INGENIERO

Steeven René Rojas Acero
Apoyo Supervisión DDIV

Scanned with CamScanner

4.5.2. Tramo: 55BY14 cruce ruta 5502 – Oicatá – Chivatá

Cel: 316 8174458
gerencia@tierrasua.com
Calle 19 N.9-35 Piso 10 Tunja/Boyacá


TIERRASUA
¡Conectamos región!

CONTROL DE MATERIALES

Contrato No: CONVENIO 3827 DE 2025 BTS-OICATÁ-CHIVATÁ

FECHA	MATERIAL	ABSCISA	HORA DE LLEGADA	VOLQUETA			TEMPERATURA (°C)		ELABORACIÓN DE BRIQUETAS
				N° VALE	PLACA	VOLUMEN	EXT.	COM.	Cantidad
1/06/2026	base	Valle	9:00	N/A	QKM379	12	N/A	N/A	N/A
1/06/2026	base	Valle	9:40	N/A	QLQ002	7	N/A	N/A	N/A
1/06/2026	base	Valle	9:41	N/A	OCM217	7	N/A	N/A	N/A
1/06/2026	base	Valle	9:48	N/A	SBV159	7	N/A	N/A	N/A
1/06/2026	base	Valle	10:30	N/A	QKM379	12	N/A	N/A	N/A
1/06/2026	base	Valle	10:50	N/A	SOO022	14	N/A	N/A	N/A
1/06/2026	base	Valle	2:30	N/A	SOO022	14	N/A	N/A	N/A
1/06/2026	base	Valle	10:59	N/A	THZ021	14	N/A	N/A	N/A
1/06/2026	base	Valle	2:40	N/A	THZ021	14	N/A	N/A	N/A
1/06/2026	base	Valle	3:02	N/A	WLQ157	14	N/A	N/A	N/A
1/06/2026	base	Valle	3:20	N/A	WLQ157	14	N/A	N/A	N/A
1/06/2026	base	Valle	3:32	N/A	TAW523	14	N/A	N/A	N/A
1/06/2026	base	Valle	3:50	N/A	TAW523	14	N/A	N/A	N/A
TOTAL						157			

NOTA: Verificar en todos los vales de control de materiales despachados de la planta de asfalto, la temperatura de salida de la mezcla.

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre:	Pablo Esteban Sierra Moreno	Nombre:	Rafael Camilo Suarez Suarez	Nombre:	N/A
Cargo:	Ing. Apoyo supervisión	Cargo:	Ing. Apoyo supervisión	Cargo:	N/A
Firma:		Firma:		Firma:	

TIERRASUA
¡Conectamos regiones!


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Convenio 3827 de 2025 BTS - Oicata - Chivata

ACTIVIDAD: fresado de sobrecarpeta existente FECHA: 02/06/26

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Pablo Sierra

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

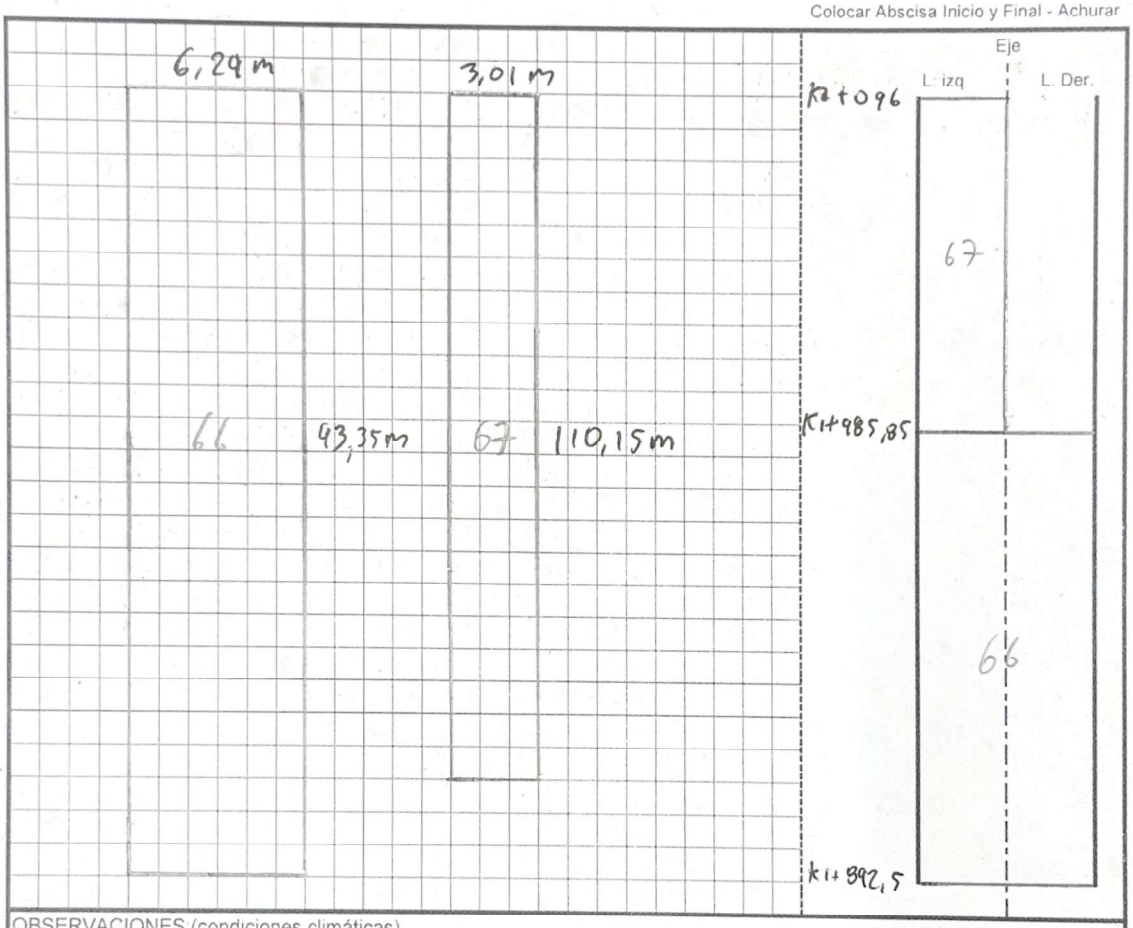

OBSERVACIONES (condiciones climáticas)

Dia soleado con poca presencia de nubes


FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO

CANTIDADES DE PARCHEO / FRESADO / ASFALTO

OBRA: Convenio 3827 de 2025 BTS-Oicatá-Chivatá

Fecha	P	F	A	Ubicaciòn		Lado			Dimensiones (m)			Área de Liga / Emulsión	Volumenes (m3)			
				Abcisa I.	Abcisa F.	Izq.	Eje	Der.	Largo	Ancho	Espesor		Excavacion	Subbase	Base	Asfalto
2/06/2026		X		K1+892,5	K1+985,85	X	X	X	93,35	6,29	0,035	587,17				
2/06/2026		X		K1+985,85	K2+096	X	X		110,15	3,01	0,035	331,55				
Totales												918,72				

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre	Pablo E. Sierra Moreno	Nombre	Rafael Camilo Suarez Suarez	Nombre	N/A
Cargo	Ing. apoyo supervisión	Cargo	Ing. apoyo supervisión	Cargo	N/A
Firma		Firma		Firma	

TIERRASUA


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Convenio 3827 de 2021 PTS-Oiba - Chivatá

ACTIVIDAD : Fresado e instalación de sobrecarpeta FECHA : 03/06/26

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Pablo Sierra

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

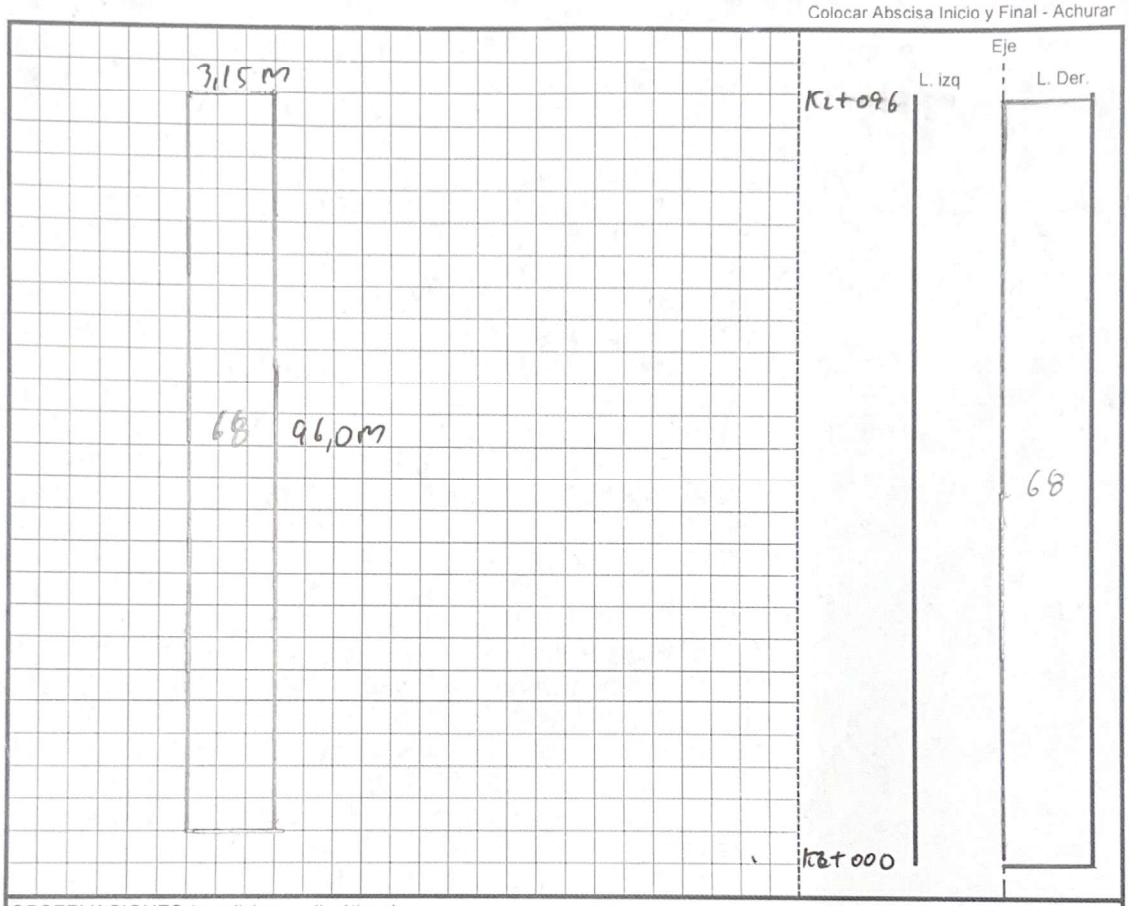

OBSERVACIONES (condiciones climáticas)

Dia soleado con pocas nubes

FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO

TIERRASUA

CANTIDADES DE PARCHEO / FRESADO / ASFALTO

OBRA: Convenio 3827 de 2025 BTS-Oicatá-Chivatá

Fecha	P	F	A	Ubicaciòn		Lado			Dimensiones (m)			Área de Liga / Emulsión	Volumenes (m3)			
				Abcisa I.	Abcisa F.	Izq.	Eje	Der.	Largo	Ancho	Espesor		Excavacion	Subbase	Base	Asfalto
3/06/2026			X	**K1+403,2**	**K1+467,5**		**X**	**X**	**64,30**	**2,95**	**0,047**	**65,51**				**8,92**
3/06/2026			X	K1+412,6	K1+422,9		X	X	10,30	3,08	0,05	31,72				1,59
3/06/2026			X	K1+422,5	K1+423,55			X	0,96	3	0,05	2,88				0,14
3/06/2026			X	K1+438,7	K1+467,5		X	X	28,80	3,11	0,045	89,57				4,03
3/06/2026			X	K1+892,5	K1+966,7	X	X		74,2	2,95	0,076	218,89				16,64
3/06/2026		X		K2+000	K2+096		X	X	96	3,15	0,035					
Totales												343,06				31,31


Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre	Pablo Esteban Sierra Moreno	**Nombre**	Rafael Camilo Suarez Suarez	**Nombre**	N/A
Cargo	Ing. apoyo Supervisión	**Cargo**	Ing. apoyo Supervisión	**Cargo**	N/A
Firma		**Firma**		**Firma**	

TIERRASUA ¡Conectamos región!	**CONTROL DE MATERIALES**

Contrato No:CONVENIO 3827 DE 2025 BTS-OICATÁ-CHIVATÁ

FECHA	MATERIAL	ABSCISA	HORA DE LLEGADA	VOLQUETA			TEMPERATURA (°C)		ELABORACIÓN DE BRIQUETAS
				N° VALE	PLACA	VOLUMEN	EXT.	COM.	Cantidad
3/06/2026	asfalto	K1+403,2	10:30	6528	QKM379	12	146	122	N/A
3/06/2026	asfalto	k1+450	10:49	6530	OCM213	7	144	126	N/A
3/06/2026	asfalto	k1+890	11:20	6531	SOO022	14	142	120	N/A
3/06/2026	asfalto	K1+930	11:35	6532	QLQ002	7	138	118	N/A
3/06/2026	Piedra rajon	alcantarilla	12:40	N/A	OCM217	7	N/A	N/A	N/A
TOTAL ASFALTO SUELTO						40			


NOTA: Verificar en todos los vales de control de materiales despachados de la planta de asfalto, la temperatura de salida de la mezcla.

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre:	Pablo E. Sierra Moreno	**Nombre:**	Rafael Camilo Suarez Suarez	**Nombre:**	N/A
Cargo:	Ing. Apoyo supervisión	**Cargo:**	Ing. Apoyo supervisión	**Cargo:**	N/A
Firma:		**Firma:**		**Firma:**	

CANTIDADES DE PARCHEO / FRESADO / ASFALTO

OBRA: Convenio 3827 de 2025 BTS-Oicatá-Chivatá

Fecha	P	F	A	Ubicaciò		Lado			Dimensiones (m)			Área de Liga / Emulsión	Volumenes (m3)			
				Abcisa I.	Abcisa F.	Izq.	Eje	Der.	Largo	Ancho	Espesor		Excavacion	Subbase	Bas	Asfalto
4/06/2026			X	K1+966,7	K2+096	X	X		129,30	2,98	0,077	385,31				29,67
4/06/2026			X	**K1+950**	**K2+096**		**X**	**X**	**146,0**	**3,25**	**0,042**	**65,77**				19,93
4/06/2026			X	K2+000	K2+096		X	X	96,0	3,1	0,04	297,60				11,90
4/06/2026			X	K1+950	K1+985,85		X	X	35,85	3,1	0,04	111,14				4,45
Totales												794,05				65,95


Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre	Pablo Esteban Sierra Moreno	**Nombre**	Rafael Camilo Suarez Suarez	**Nombre**	N/A
Cargo	Ing. Apoyo supervisión	**Cargo**	Ing. Apoyo supervisión	**Cargo**	N/A
Firma		**Firma**		**Firma**	

TIERRASUA ¡Conectamos región!	CONTROL DE MATERIALES

Contrato No: CONVEMIO 3827 DE 2025 BTS-OICAT-CHIVATÁ

FECHA	MATERIAL	ABSCISA	HORA DE LLEGADA	VOLQUETA			TEMPERATURA (°C)		ELABORACIÓN DE BRIQUETAS
				N° VALE	PLACA	VOLUMEN	EXT.	COM.	Cantidad
4/06/2026	Asfalto	K1+966,7	9:20	6536	QKM379	12	150	132	N/A
4/06/2026	Asfalto	K2+005	10:12	6538	SOO022	14	146	128	N/A
4/06/2026	Asfalto	K2+050	10:37	6539	OCM213	7	156	128	N/A
4/06/2026	Asfalto	K2+070	10:45	6540	QLQ002	7	152	130	N/A
4/06/2026	Asfalto	K2+096	11:00	6541	OCM217	7	154	132	N/A
4/06/2026	Asfalto	K2+073	12:20	6544	QKM379	12	156	126	N/A
4/06/2026	Asfalto	K2+015	12:40	6546	SOO022	14	152	122	N/A
4/06/2026	Asfalto	K1+986	1:00	6548	OCM213	7	156	132	N/A
4/06/2026	Asfalto	K1+970	1:10	6549	QLQ002	2	144	120	N/A
TOTAL ASFALTO SUELTO						82			



NOTA: Verificar en todos los vales de control de materiales despachados de la planta de asfalto, la temperatura de salida de la mezcla.

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre:	Pablo E. Sierra Moreno	Nombre:	Rafael Camilo Suarez Suarez	Nombre:	N/A
Cargo:	Ing. apoyo supervisión	Cargo:	Ing. apoyo supervisión	Cargo:	N/A
Firma:		Firma:		Firma:	

CANTIDADES DE PARCHEO / FRESADO / ASFALTO

OBRA: CONVENIO 3827 DE 2025 BTS-OICATÁ-CHIVATÁ

Fecha	P	F	A	Ubicación		Lado			Dimensiones (m)			Área de Liga / Emulsión	Volumenes (m3)			
				Abcisa I.	Abcisa F.	Izq.	Eje	Der.	Largo	Ancho	Espesor		Excavacion	Subbase	Base	Asfalto
5/06/2026			X	K1+742	K1+892,5	X	X		150,20	3,10	0,082	465,62				38,18
Totales												465,62				38,18


Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre	Pablo Esteban Sierra Moreno	**Nombre**	Rafael Camilo Suarez Suarez	**Nombre**	N/A
Cargo	Ing. Apoyo Supervisión	**Cargo**	Ing. Apoyo Supervisión	**Cargo**	N/A
Firma		**Firma**		**Firma**	

TIERRASUA ¡Conectamos región!	CONTROL DE MATERIALES

Contrato No: CONVENIO 3827 DE 205 BTS-OICATÁ-CHIVATÁ

FECHA	MATERIAL	ABSCISA	HORA DE LLEGADA	VOLQUETA			TEMPERATURA (°C)		ELABORACIÓN DE BRIQUETAS
				N° VALE	PLACA	VOLUMEN	EXT.	COM.	Cantidad
5/06/2026	Asfalto	K1+892,5	9:00	6551	QKM379	12	138	118	N/A
5/06/2026	Asfalto	K1+855	10:00	6553	SOO022	14	150	130	N/A
5/06/2026	Asfalto	K1+810	10:30	6555	OCM213	7	146	128	N/A
5/06/2026	Asfalto	K1+792	11:00	6556	QLQ002	7	148	128	N/A
5/06/2026	Asfalto	K1+767	11:25	6558	OCM217	7	152	130	N/A
TOTAL ASFALTO SUELTO						47			

NOTA: Verificar en todos los vales de control de materiales despachados de la planta de asfalto, la temperatura de salida de la mezcla.

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre:	Pablo E. Sierra Moreno	**Nombre:**	Rafael Camilo Suarez Suarez	**Nombre:**	N/A
Cargo:	Ing. Apoyo supervisión	**Cargo:**	Ing. Apoyo supervisión	**Cargo:**	N/A
Firma:		**Firma:**		**Firma:**	

TIERRASUA


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Convenio 382 de 2025 BTS-Oiba-Chivata

ACTIVIDAD: Fresado e instalación de sobrecarpeta FECHA: 09/06/26

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Pedro Sierra

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

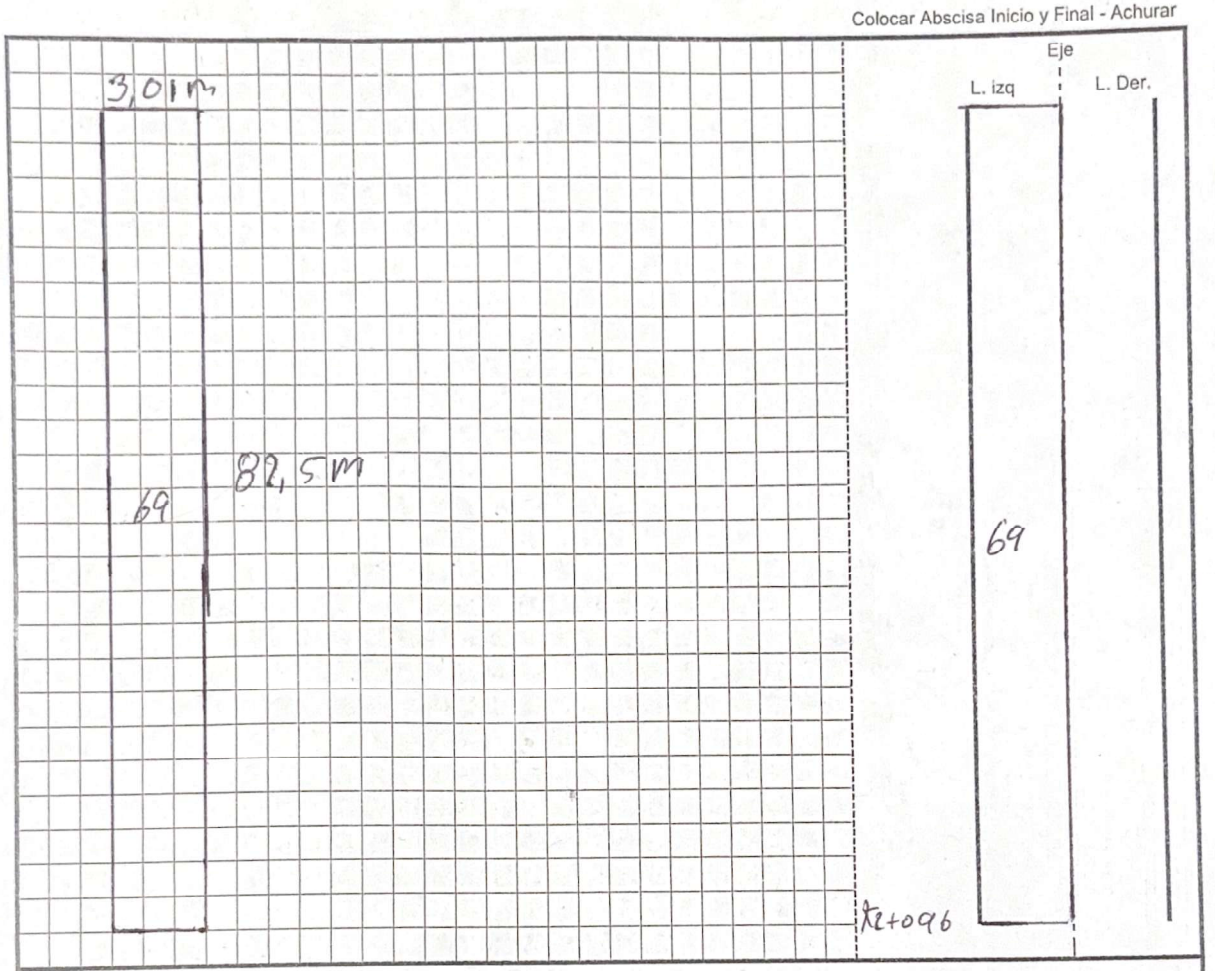

OBSERVACIONES:(condiciones climáticas)

Día soleado con presencia de nubes

FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO

CANTIDADES DE PARCHEO / FRESADO / ASFALTO

OBRA: Convenio 3827 de 2025 BTS-Oicatá-Chivatá

Fecha	P	F	A	Ubicaciòn		Lado			Dimensiones (m)			Área de Liga / Emulsión	Volumenes (m3)			
				Abcisa I.	Abcisa F.	Izq.	Eje	Der.	Largo	Ancho	Espesor		Excavacion	Subbase	Base	Asfalto
9/06/2026			X	K1+892,5	K1+950		X	X	57,50	3,00	0,080	172,50				13,80
9/06/2026			X	K1+787,8	K1+892,5		X	X	104,70	3,00	0,080	314,10				25,13
9/06/2026		X		K2+096	K2+178,5	X	X		82,50	3,01	0,035	248,33				
Totales												734,93				38,93

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre	Pablo Esteban Sierra Moreno	**Nombre**	Rafael Camilo Suarez Suarez	**Nombre**	N/A
Cargo	Ing. Apoyo supervisión	**Cargo**	Ing. Apoyo supervisión	**Cargo**	N/A
Firma		**Firma**		**Firma**	


TIERRASUA
¡Conectamos región!

CONTROL DE MATERIALES

Contrato No: CONVENIO 3827 DE 2025 BTS-OICATÁ-CHIVATÁ

FECHA	MATERIAL	ABSCISA	HORA DE LLEGADA	VOLQUETA			TEMPERATURA (°C)		ELABORACIÓN DE BRIQUETAS
				N° VALE	PLACA	VOLUMEN	EXT.	COM.	Cantidad
9/06/2026	Asfalto	K1+950	10:55	6559	OCM213	7	148	124	N/A
9/06/2026	Asfalto	K1+920	11:07	6560	QLQ002	7	156	120	N/A
9/06/2026	Asfalto	K1+890	12:05	6562	QKM379	12	150	118	N/A
9/06/2026	Asfalto	K1+872,5	12:58	6564	OCM217	7	144	126	N/A
9/06/2026	Asfalto	K1+810	2:31	6567	QLQ002	7	132	110	N/A
9/06/2026	Asfalto	K1+852,5	2:35	6566	SOO022	14	148	122	N/A
TOTAL SUELTOS ASFALTO						54			

NOTA: Verificar en todos los vales de control de materiales despachados de la planta de asfalto, la temperatura de salida de la mezcla.

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre:	Pablo E. Sierra Moreno	**Nombre:**	Rafael Camilo Suarez Suarez	**Nombre:**	N/A
Cargo:	Ing. Apoyo supervisión	**Cargo:**	Ing. Apoyo supervisión	**Cargo:**	N/A
Firma:		**Firma:**		**Firma:**	

TIERRASUR


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Convenio 3827 de 2025 BTS-Oicatá-Chivatá

ACTIVIDAD: fresado e instalación de Sobrecarpeta FECHA: 10/06/26

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Alb Sierra

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

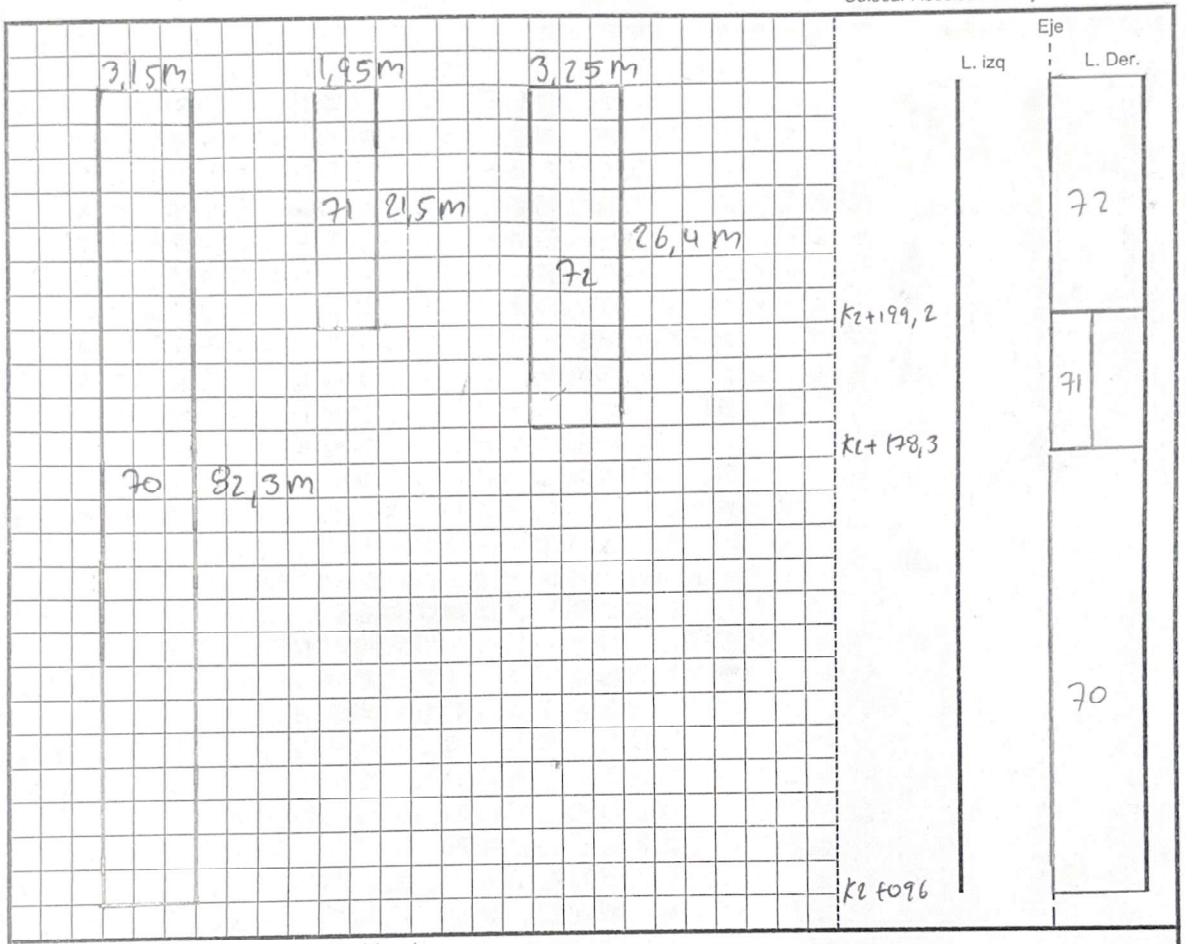

OBSERVACIONES:(condiciones climáticas)

Dia soleado

FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO

TIERRASUA


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Convenio 3827 de 2025 BID - Oicatá - Chivatá

ACTIVIDAD : Fresado e instalacion de Sobrecarpeta FECHA : 10/06/26

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Pablo Sierra

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

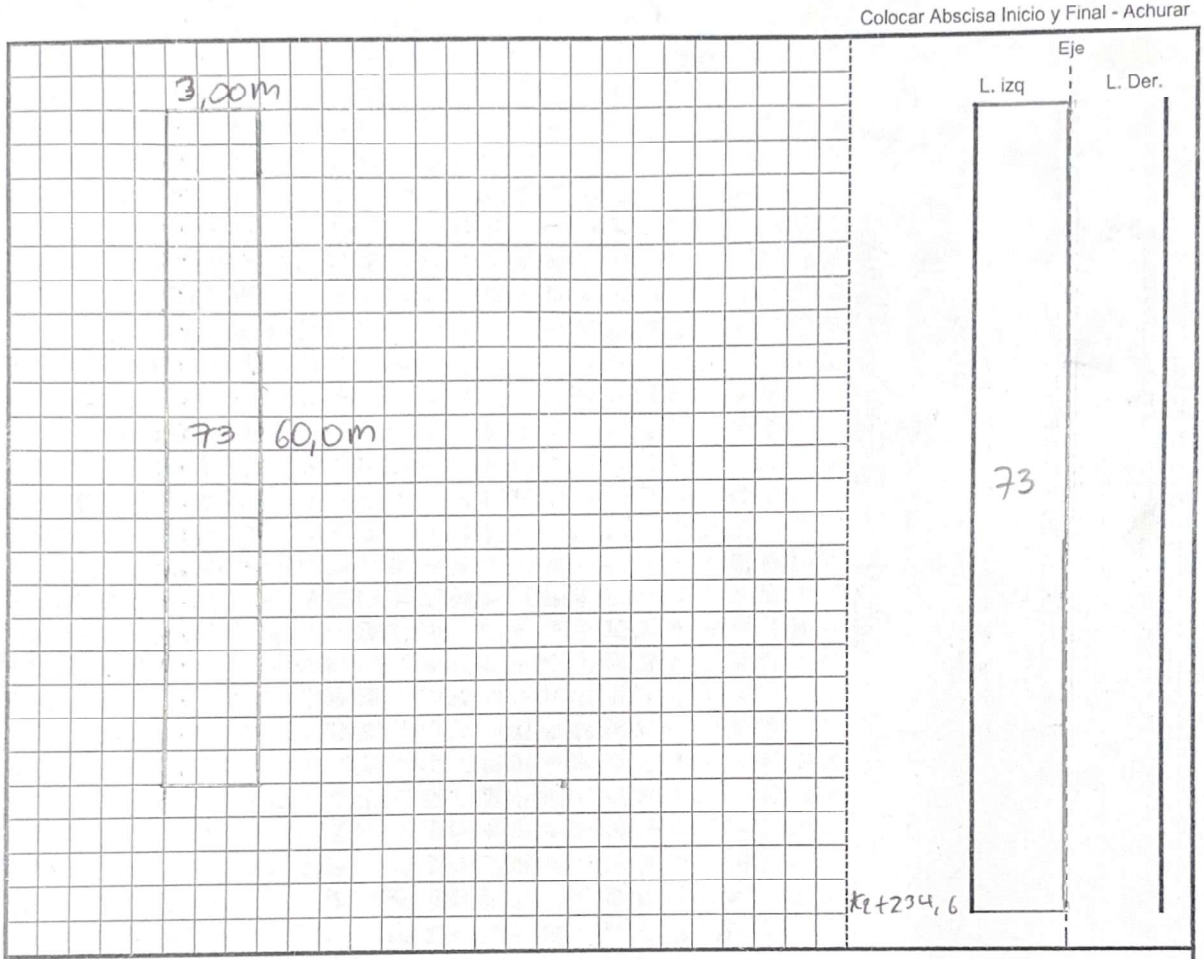

OBSERVACIONES:(condiciones climáticas)

Dia Soleado


FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO

TIERRASUA	CANTIDADES DE PARCHEO / FRESADO / ASFALTO

OBRA: Convenio 3827 de 2025 BTS-Oicatá-Chivatá

Fecha	P	F	A	Ubicaciò		Lado			Dimensiones (m)			Área de Liga / Emulsión	Volumenes (m3)			
				Abcisa I.	Abcisa F.	Izq.	Eje	Der.	Largo	Ancho	Espesor		Excavacion	Subbase	Bas	Asfalto
10/06/2026			X	K1+668,9	K1+787,8		X	X	118,90	3,08	0,084	366,21				30,76
10/06/2026			X	K1+514,3	K1+620,3		X	X	106,00	3,03	0,085	321,18				27,30
10/06/2026		X		K2+096	K2+178,3		X	X	82,30	3,15	0,035					
10/06/2026		X		K2+178,3	K2+199,2		X	X	21,50	1,95	0,035					
10/06/2026		X		K2+199,2	K2+225,6		X	X	26,40	3,25	0,035					
10/06/2026		X		K2+234,6	K2+294,6	X	X		60,00	3,00	0,035					
Totales												687,39				58,06


Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre	Pablo Esteban Sierra Moreno	**Nombre**	Rafael Camilo Suarez Suarez	**Nombre**	N/A
Cargo	Ing. Residente supervisión	**Cargo**	Ing. Residente supervisión	**Cargo**	N/A
Firma		**Firma**		**Firma**	

TIERRASUA ¡Conectamos región!	CONTROL DE MATERIALES

Contrato No: CONVENIO 3827 DE 2025 BTS-OICATÁ-CHIVATÁ

FECHA	MATERIAL	ABSCISA	HORA DE LLEGADA	VOLQUETA			TEMPERATURA (°C)		ELABORACIÓN DE BRIQUETAS
				N° VALE	PLACA	VOLUMEN	EXT.	COM.	Cantidad
10/06/2026	Asfalto	K1+787,8	9:24	6568	QKM379	12	152	138	N/A
10/06/2026	Asfalto	K1+750	9:28	6569	SOO022	14	148	134	N/A
10/06/2026	Asfalto	K1+710	9:30	6570	OCM213	7	150	128	N/A
10/06/2026	Asfalto	K1+685	9:36	6572	QLQ002	7	154	136	N/A
10/06/2026	Asfalto	K1+660	9:39	6573	OCM217	7	150	126	N/A
10/06/2026	Asfalto	K1+633	11:56	6578	QKM379	12	154	128	N/A
10/06/2026	Asfalto	K1+580	12:30	6579	SOO022	14	152	126	N/A
TOTAL SUELTOS ASFALTO						73			

NOTA: Verificar en todos los vales de control de materiales despachados de la planta de asfalto, la temperatura de salida de la mezcla.

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre:	Pablo E. Sierra Moreno	**Nombre:**	Rafael Camilo Suarez Suarez	**Nombre:**	N/A
Cargo:	Ing. Apoyo supervisión	**Cargo:**	Ing. Apoyo supervisión	**Cargo:**	N/A
Firma:		**Firma:**		**Firma:**	

TIERRASUA


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Convenio 3827 de 2023 UTS-Oiratá-Chivatá

ACTIVIDAD : Fresado e instalación de sobrecarpeta FECHA : 11/06/26

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Pablo Sierra

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

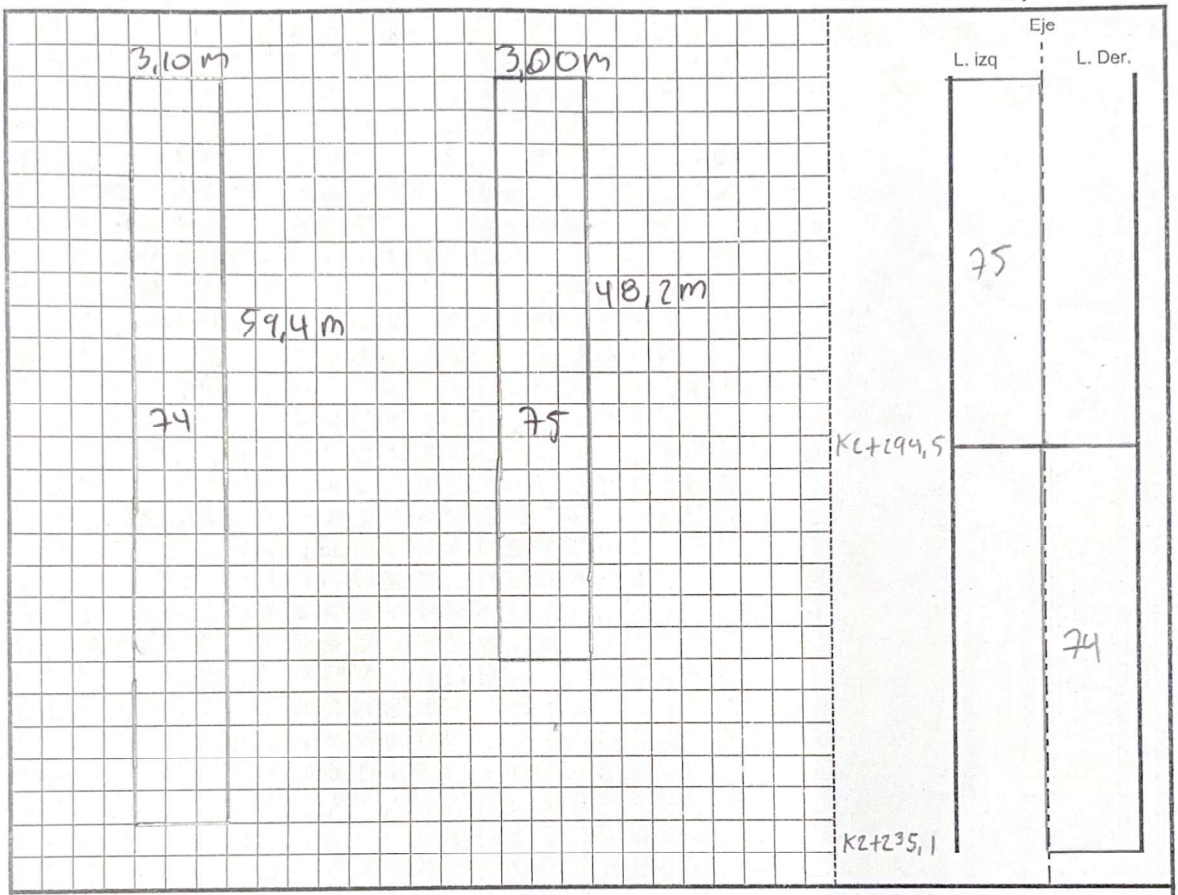

OBSERVACIONES:(condiciones climáticas)

Dra soleado

FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO

TIERRASUA
¡Conectamos regiones!


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Convenio 3827 de 2025 BTS-Oicatá-Chivatá

ACTIVIDAD: Fresado e instalación de sobrecarpeta FECHA: 11/06/26

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Pablo Sierra

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

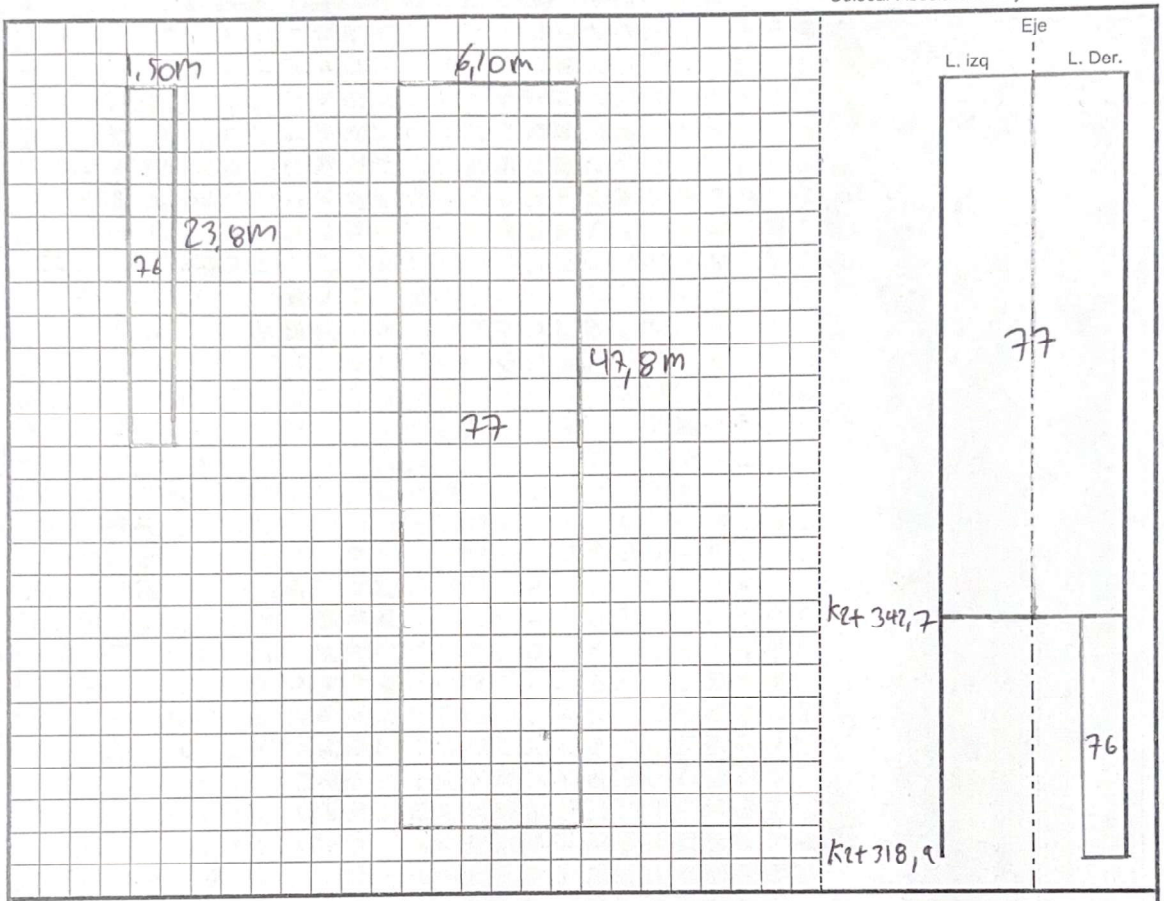

OBSERVACIONES:(condiciones climáticas)

Dia soleado

FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO

TIERRASUA


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Convenio 3827 de 2025 BTS - Olaya - Chinchiná

ACTIVIDAD: Fresado e instalación de Sobrecarpeta FECHA: 11/06/26

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Pablo Sierra

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

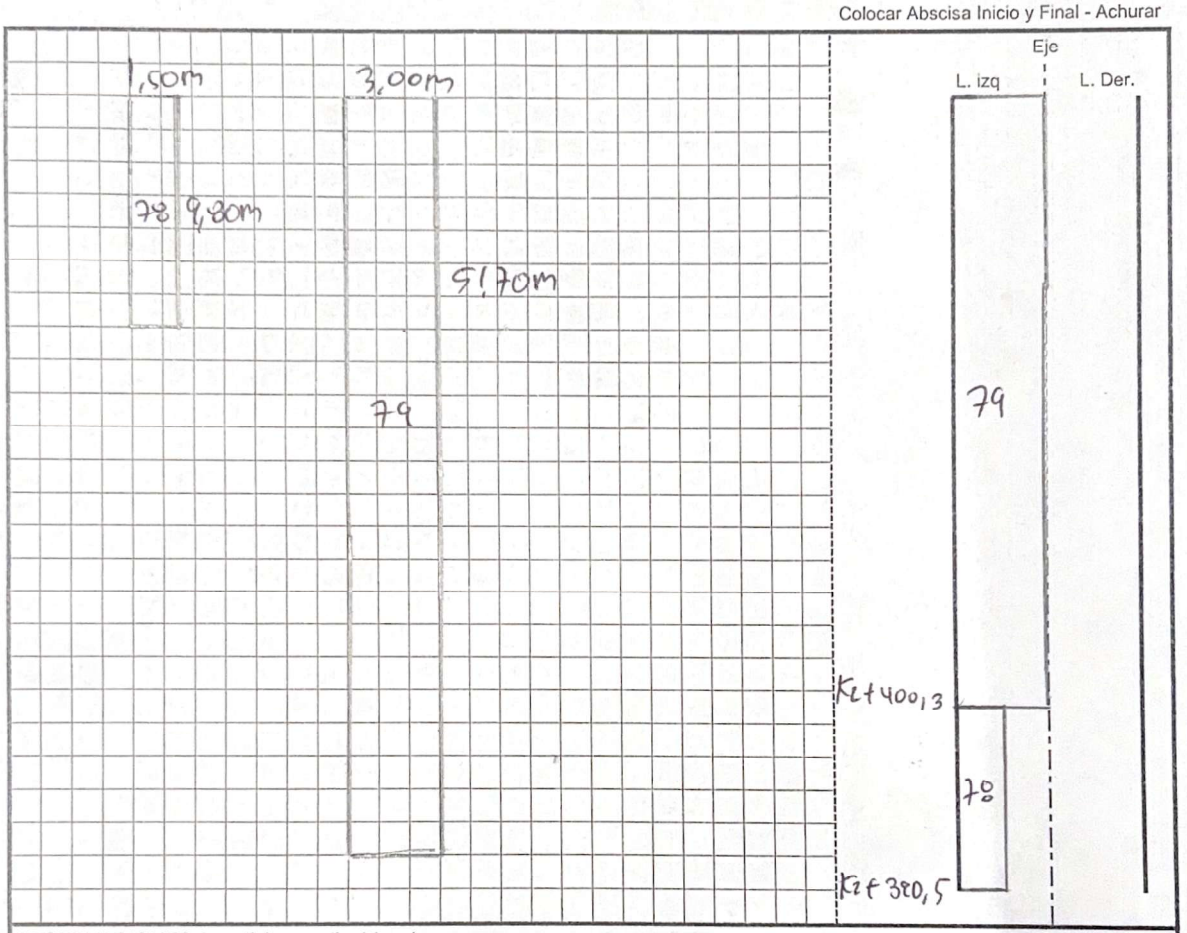

OBSERVACIONES:(condiciones climáticas)

Día soleado

FIRMA QUIEN ELABORO


FIRMA INGENIERO

TIERRASUA

CANTIDADES DE PARCHEO / FRESADO / ASFALTO

OBRA: Convenio 3827 de 2025 BTS-Oicatá-Chivatá

Fecha	P	F	A	Ubicaciò		Lado			Dimensiones (m)			Área de Liga / Emulsión	Volumenes (m3)			
				Abcisa I.	Abcisa F.	Izq.	Eje	Der.	Largo	Ancho	Espesor		Excavacion	Subbase	Bas	Asfalto
11/06/2026			X	K1+666,5	K1+742	X	X		75,50	3,4	0,087	247,64				22,33
11/06/2026			X	K1+500	K1+622,5	X	X		122,50	3,28	0,087	371,18				34,96
11/06/2026			X	K1+500	K1+514,3		X	X	14,30	3,03	0,085	43,33				3,68
11/06/2026			X	K2+096	K2+133,5	X	X		37,50	2,95	0,077	110,63				8,52
11/06/2026		X		K2+235,1	K2+294,5		X	X	59,40	3,10	0,035					
11/06/2026		X		K2+294,5	K2+342,7	X	X		48,20	3,00	0,035					
11/06/2026		X		K2+318,9	K2+342,7			X	23,80	1,50	0,035					
11/06/2026		X		K2+342,7	K2+390,5	X	X	X	47,80	6,10	0,035					
11/06/2026		X		K2+390,5	K2+400,3	X			9,80	1,50	0,035					
11/06/2026		X		K2+390,5	K2+452			X	61,50	1,55	0,035					
11/06/2026		X		K2+400,3	K2+452	X	X		51,70	3,00	0,035					
Totales												772,77				69,49


Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre	Pablo Esteban Sierra Moreno	**Nombre**	Rafael Camilo Suarez Suarez	**Nombre**	N/A
Cargo	Ing. apoyo supervisión	**Cargo**	Ing. apoyo supervisión	**Cargo**	N/A
Firma		**Firma**		**Firma**	

TIERRASUA ¡Conectamos región!	CONTROL DE MATERIALES

Contrato No: CONVENIO 3827 DE 2025 BTS-OICATÁ-CHIVATÁ

FECHA	MATERIAL	ABSCISA	HORA DE LLEGADA	VOLQUETA			TEMPERATURA (°C)		ELABORACIÓN DE BRIQUETAS
				N° VALE	PLACA	VOLUMEN	EXT.	COM.	Cantidad
11/06/2026	Asfalto	K1+666	8:13	6580	SOO022	14	154	138	N/A
11/06/2026	Asfalto	K1+710	8:42	6581	QKM379	12	152	130	N/A
11/06/2026	Asfalto	K1+500	8:59	6582	OCM217	7	156	132	N/A
11/06/2026	Asfalto	K1+526	9:22	6583	OCM213	7	150	130	N/A
11/06/2026	Asfalto	K1+555	9:42	6584	QLQ002	7	154	132	N/A
11/06/2026	Asfalto	K1+580	12:05	6589	SOO022	14	148	128	N/A
11/06/2026	Asfalto	K1+610	12:30	6590	QKM379	12	148	130	N/A
11/06/2026	Asfalto	K1+510	1:15	6592	OCM217	7	154	126	N/A
11/06/2026	Asfalto	K2+102	12:51	6591	OCM213	7	154	128	N/A
TOTAL SUELTOS ASFALTO						87			

NOTA: Verificar en todos los vales de control de materiales despachados de la planta de asfalto, la temperatura de salida de la mezcla.

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre:	Pablo E. Sierra Moreno	**Nombre:**	Rafael Camilo Suarez Suarez	**Nombre:**	N/A
Cargo:	Ing. Apoyo supervision	**Cargo:**	Ing. Apoyo supervision	**Cargo:**	N/A
Firma:		**Firma:**		**Firma:**	

TIERRASUA


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Convenio 3827 de 2025 BTS-Oiba-Chivata

ACTIVIDAD: Fresado e instalación de sobrecarpeta FECHA: 12/06/26

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Pablo Sierra

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

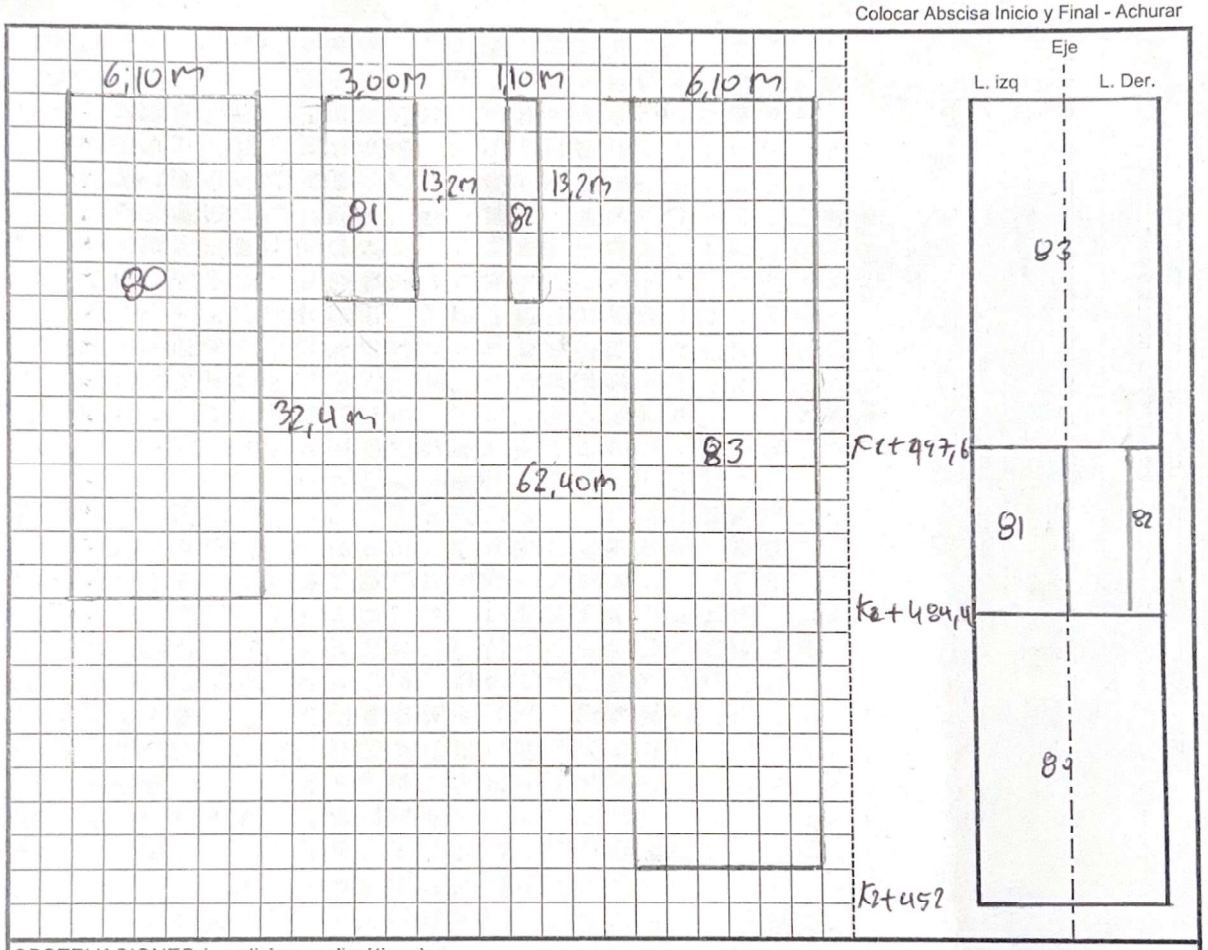

OBSERVACIONES:(condiciones climáticas)

Día soleado

FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO

TIERRASUA


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Convenio 3927 de 2025 BTS - Oicatá - Chivatá

ACTIVIDAD : Fresado e instalación de sobrecarpeta FECHA : 12/06/26

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Pablo Sierra

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

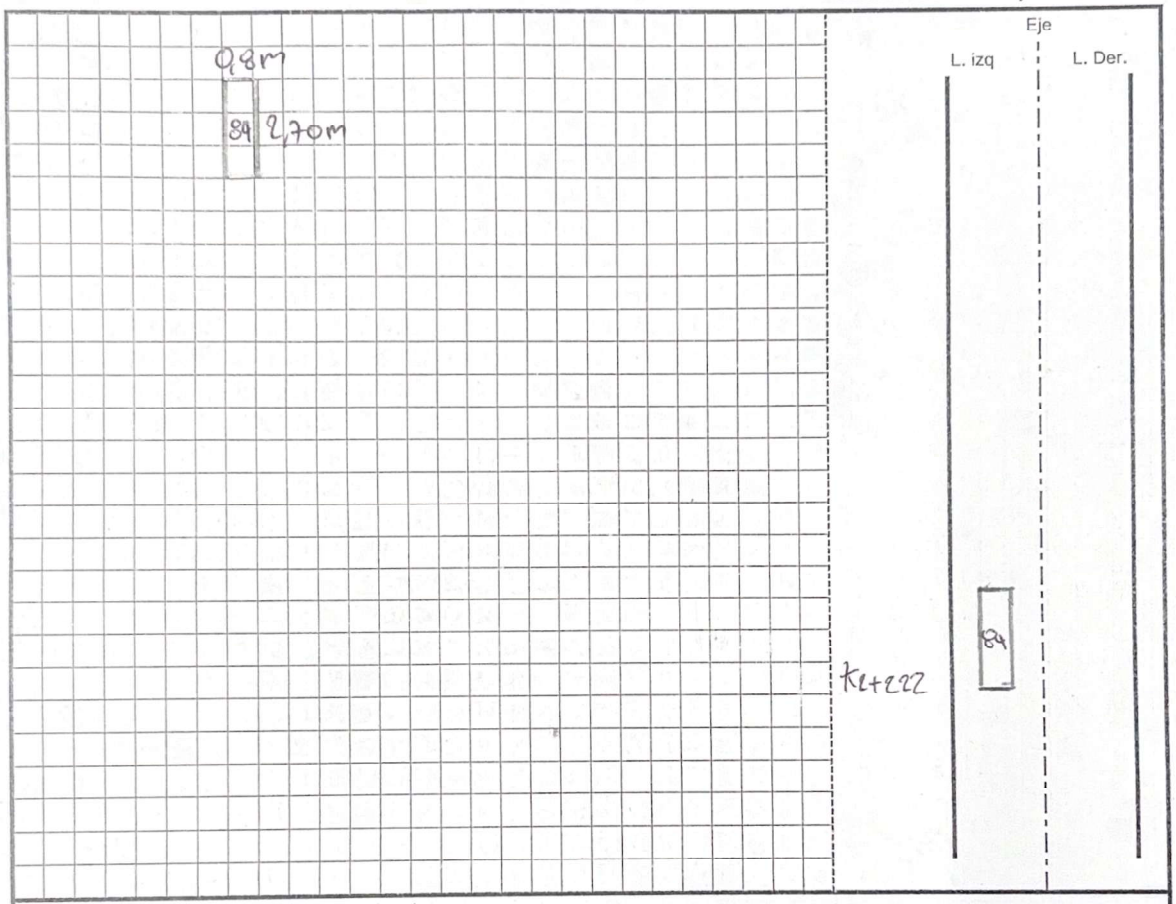

OBSERVACIONES:(condiciones climáticas)

Día soleado


FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO

TIERRASUA	CANTIDADES DE PARCHEO / FRESADO / ASFALTO

OBRA: Convenio 3827 de 2025 BTS-Oicatá-Chivatá

Fecha	P	F	A	Ubicaciò		Lado			Dimensiones (m)			Área de Liga / Emulsión	Volumenes (m3)			
				Abcisa I.	Abcisa F.	Izq.	Eje	Der.	Largo	Ancho	Espesor		Excavacion	Subbase	Bas	Asfalto
12/06/2026			X	**K2+096**	**K2+292,7**		**X**	**X**	**196,70**	**3,28**	**0,042**	**86,31**				27,10
12/06/2026			X	K2+096	K2+178,3		X	X	82,30	3,15	0,042	259,25				10,89
12/06/2026			X	K2+178,3	K2+199,2		X	X	21,50	1,95	0,040	41,93				1,68
12/06/2026			X	K2+199,2	K2+225,6		X	X	26,40	3,25	0,042	85,80				3,60
12/06/2026			X	K2+234,6	K2+292,7		X	X	57,30	3,00	0,042	171,90				7,22
12/06/2026			X	**K2+133,5**	**K2+280**	**X**	**X**		**146,50**	**3,45**	**0,045**	**239,47**				22,74
12/06/2026			X	K2+133,5	K2+178,3	X	X		37,50	3,10	0,042	116,25				4,88
12/06/2026			X	K2+222	K2+224,7	X			2,70	0,80	0,030	2,16				0,06
12/06/2026			X	K2+234,6	K2+280	X	X		45,40	3,25	0,042	147,55				6,20
12/06/2026		X		K2+452	K2+484,4	X	X	X	32,40	6,10	0,035					
12/06/2026		X		K2+484,4	K2+497,6	X	X		13,20	3,00	0,035					
12/06/2026		X		K2+484,4	K2+497,6			X	13,20	1,10	0,035					
12/06/2026		X		K2+497,6	K2+560	X	X	X	62,40	6,10	0,035					
12/06/2026	X			K2+222	K2+224,7	X			2,70	0,80	0,035					
Totales												1150,60				84,37

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre	Pablo Esteban Sierra Moreno	**Nombre**	Rafael Camilo Suarez Suarez	**Nombre**	N/A
Cargo	Ing. apoyo supervisión	**Cargo**	Ing. apoyo supervisión	**Cargo**	N/A
Firma		**Firma**		**Firma**	


TIERRASUA
¡Conectamos región!

CONTROL DE MATERIALES

Contrato No: CONVENIO 3827 DE 2025 BTS-OICATÁ-CHIVATÁ

FECHA	MATERIAL	ABSCISA	HORA DE LLEGADA	VOLQUETA			TEMPERATURA (°C)		ELABORACIÓN DE BRIQUETAS
				N° VALE	PLACA	VOLUMEN	EXT.	COM.	Cantidad
12/06/2026	Asfalto	K2+096	8:15	6593	QKM379	12	150	130	N/A
12/06/2026	Asfalto	K2+125	8:52	6595	THZ021	14	158	134	N/A
12/06/2026	Asfalto	K2+176	9:25	6596	SOO022	14	140	124	N/A
12/06/2026	Asfalto	K2+222	9:58	6597	QLQ002	7	148	128	N/A
12/06/2026	Asfalto	K2+244	10:25	6598	OCM213	7	150	136	N/A
12/06/2026	Asfalto	K2+264	10:30	6599	OCM217	7	146	124	N/A
12/06/2026	Asfalto	K2+133	1:10	6605	QKM379	12	146	120	N/A
12/06/2026	Asfalto	K2+166	1:20	6606	THZ021	14	144	118	N/A
12/06/2026	Asfalto	K2+225	1:43	6607	SOO022	14	146	120	N/A
TOTAL SUELTOS ASFALTO						101			

NOTA: Verificar en todos los vales de control de materiales despachados de la planta de asfalto, la temperatura de salida de la mezcla.

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre:	Pablo E. Sierra Moreno	**Nombre:**	Rafael Camilo Suarez Suarez	**Nombre:**	N/A
Cargo:	Ing. apoyo supervisión	**Cargo:**	Ing. apoyo supervisión	**Cargo:**	N/A
Firma:		**Firma:**		**Firma:**	

TIERRASUA


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Convenio 3827 de 2025 BTJ-Ojeda-Chiveta

ACTIVIDAD : Fresado e instalación de sobrecarpeta FECHA : 16/06/26

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Pablo Serna

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

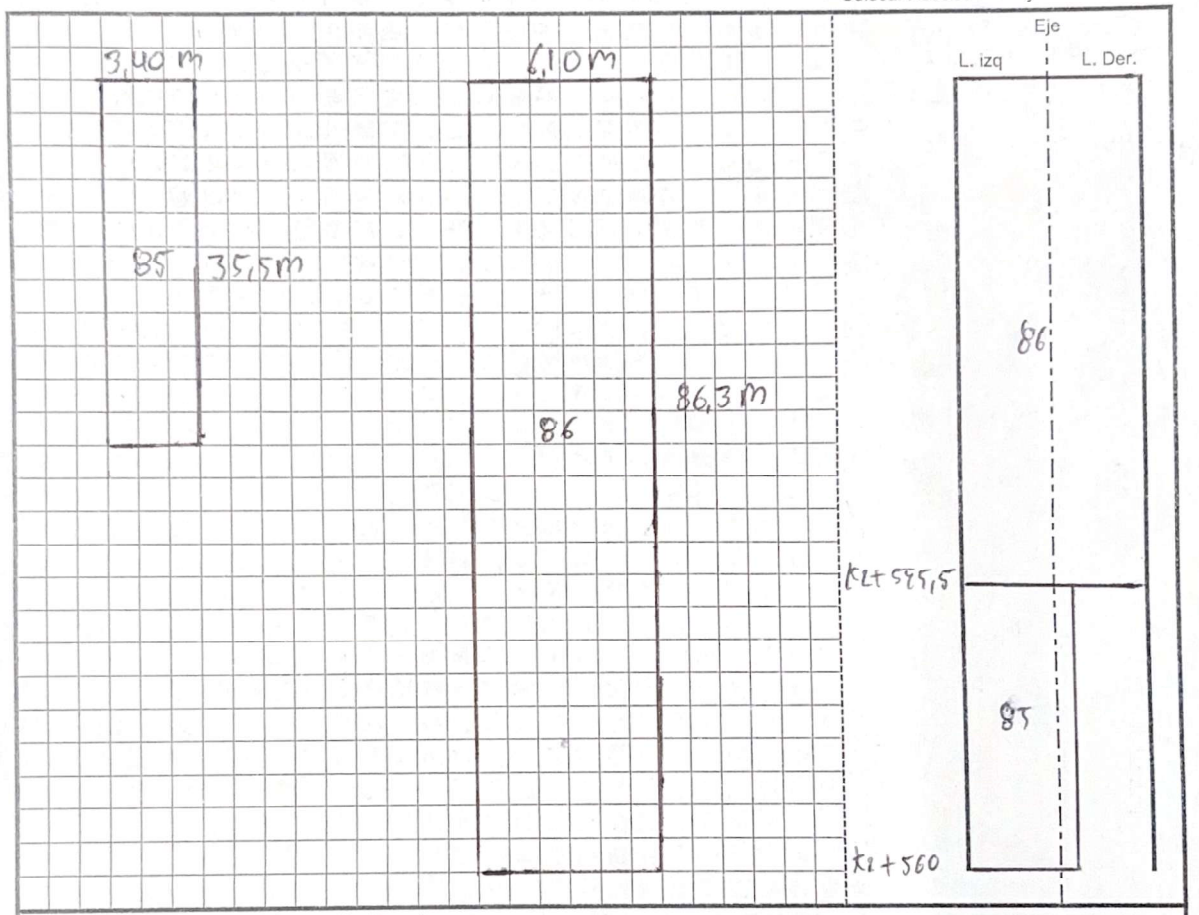

OBSERVACIONES:(condiciones climáticas)

Día nublado con llovizna

FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO

TIERRASUA


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Convenio 387 de 2025 BTS-Oicatá-Chivatá

ACTIVIDAD: Fresado e instalación de Sobrecarpeta FECHA: 16/06/25

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Pablo Sierra

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

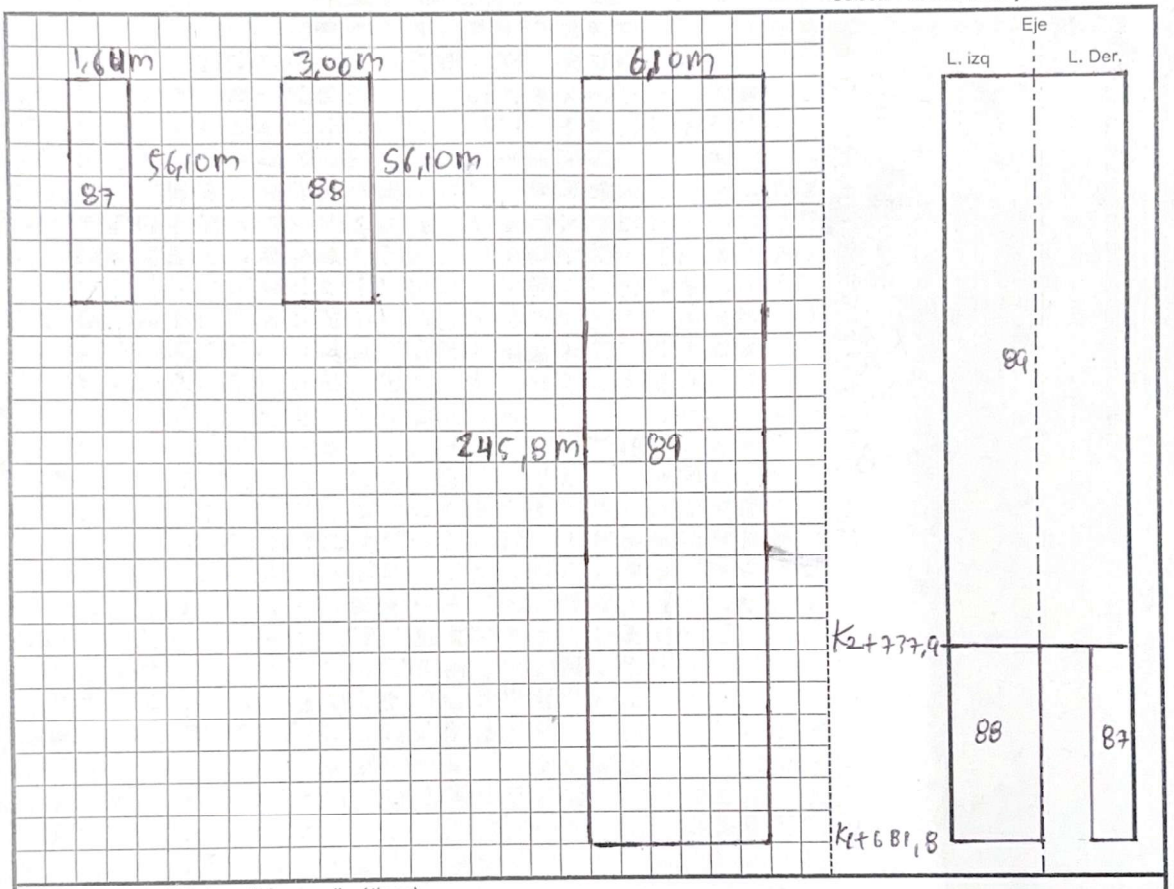

OBSERVACIONES:(condiciones climáticas)

Día Nublado con lloviznas


FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO

CANTIDADES DE PARCHEO / FRESADO / ASFALTO

OBRA: Convenio 3827 de 2025 BTS-Oicatá-Chivatá

Fecha	P	F	A	Ubicaciò		Lado			Dimensiones (m)			Área de Liga / Emulsión	Volumenes (m3)			
				Abcisa I.	Abcisa F.	Izq.	Eje	Der.	Largo	Ancho	Espesor		Excavacion	Subbase	Bas	Asfalto
16/06/2026			X	**K2+280**	**K2+462,4**	**X**	**X**		**182,40**	**2,85**	**0,04**	**30,84**				20,79
16/06/2026			X	K2+294,5	K2+342,7	X	X		48,20	3,00	0,037	144,60				5,35
16/06/2026			X	K2+342,7	K2+390,5	X	X		47,80	3,00	0,035	143,40				5,02
16/06/2026			X	K2+390,5	K2+400,3	X			9,80	1,50	0,035	14,70				0,51
16/06/2026			X	K2+400,3	K2+452	X	X		51,70	3,00	0,037	155,10				5,74
16/06/2026			X	K2+452	K2+462,4	X	X		10,40	3,00	0,035	31,20				1,09
16/06/2026			X	**K2+291,9**	**K2+474**		**X**	**X**	**182,10**	**3,15**	**0,040**	42,07				22,94
16/06/2026			X	K2+235,1	K2+294,5		X	X	59,40	3,10	0,035	184,14				6,44
16/06/2026			X	K2+318,9	K2+342,7			X	23,80	1,50	0,035	35,70				1,25
16/06/2026			X	K2+342,7	K2+390,5	X	X	X	47,80	3,10	0,040	148,18				5,93
16/06/2026			X	K2+390,5	K2+452			X	61,50	1,55	0,035	95,33				3,34
16/06/2026			X	K2+452	K2+474	X	X	X	22,00	3,10	0,035	68,20				2,39
16/06/2026		X		K2+560	K2+595,5	X	X		35,50	3,40	0,035					4,22
16/06/2026		X		K2+595,5	K2+681,8	X	X	X	86,30	6,10	0,035					
16/06/2026		X		K2+681,8	K2+737,9			X	56,10	1,64	0,035					
16/06/2026		X		K2+681,8	K2+737,9	X	X		56,10	3,00	0,035					
16/06/2026		X		K2+737,9	K2+983,7	X	X	X	245,80	6,10	0,035					
Totales																85,02

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre	Pablo Esteban Sierra Moreno	**Nombre**	Rafael Camilo Suarez Suarez	**Nombre**	N/A
Cargo	Ing. apoyo supervisión	**Cargo**	Ing. apoyo supervisión	**Cargo**	N/A
Firma		**Firma**		**Firma**	


TIERRASUA
¡Conectamos región!

CONTROL DE MATERIALES

Contrato No: CONVENIO 3827 DE 2025 BTS-OICATÁ-CHIVATÁ

FECHA	MATERIAL	ABSCISA	HORA DE LLEGADA	VOLQUETA			TEMPERATURA (°C)		ELABORACIÓN DE BRIQUETAS
				N° VALE	PLACA	VOLUMEN	EXT.	COM.	Cantidad
16/06/2026	Asfalto	K2+280	8:33	6608	QKM379	12	150	124	N/A
16/06/2026	Asfalto	K2+316	9:05	6609	THZ021	14	152	120	N/A
16/06/2026	Asfalto	K2+360	9:40	6610	SOO022	14	148	130	N/A
16/06/2026	Asfalto	K2+402	10:00	6611	OCM213	7	150	128	N/A
16/06/2026	Asfalto	K2+425	10:15	6612	QLQ002	7	150	132	N/A
16/06/2026	Asfalto	K2+448	1:30	6617	QKM379	12	146	130	N/A
16/06/2026	Asfalto	K2+340	2:02	6619	THZ021	14	148	122	N/A
16/06/2026	Asfalto	K2+396	2:24	6620	SOO022	14	156	138	N/A
16/06/2026	Asfalto	K2+445	2:50	6621	OCM213	7	142	128	N/A
TOTAL SUELTOS ASFALTO						101			

NOTA: Verificar en todos los vales de control de materiales despachados de la planta de asfalto, la temperatura de salida de la mezcla.

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre:	Pablo E. Sierra Moreno	**Nombre:**	Rafael Camilo Suarez Suarez	**Nombre:**	N/A
Cargo:	Ing. apoyo supervisión	**Cargo:**	Ing. apoyo supervisión	**Cargo:**	N/A
Firma:		**Firma:**		**Firma:**	

TIERRASUA


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Convenio 3817 de 2025 BTJ - Oicatá - Chivatá

ACTIVIDAD : Fresado e instalacion de Sobrecarpeta FECHA : 17/6/26

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Pablo Sierra

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

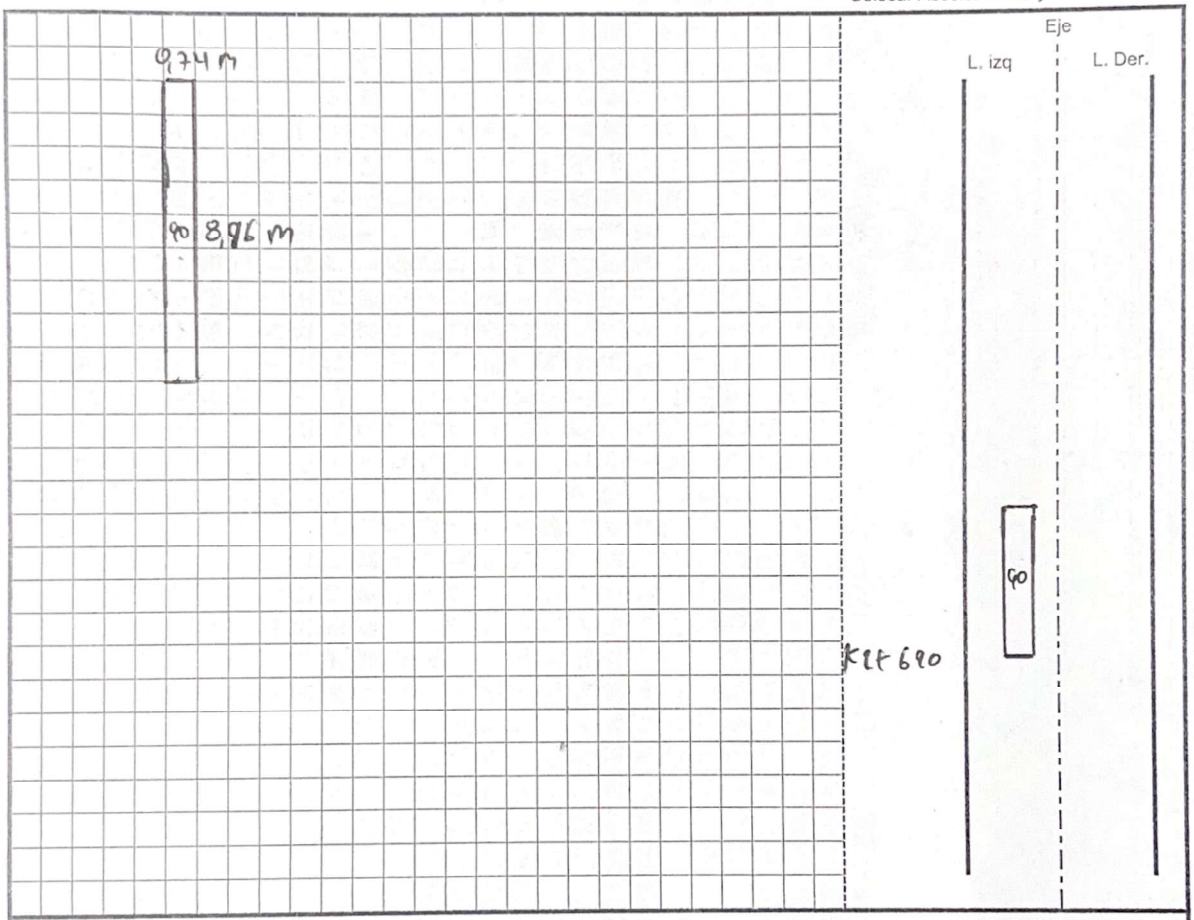

OBSERVACIONES:(condiciones climáticas)

Dia Nublado con llovizna


FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO

TIERRASUA	CANTIDADES DE PARCHEO / FRESADO / ASFALTO

OBRA: Convenio 3827 de 2025 BTS-Oicatá-Chivatá

Fecha	P	F	A	Ubicaciò		Lado			Dimensiones (m)			Área de Liga / Emulsión	Volumenes (m3)			
				Abcisa I.	Abcisa F.	Izq.	Eje	Der.	Largo	Ancho	Espesor		Excavacion	Subbase	Bas	Asfalto
17/06/2026			X	**K2+462,4**	**K2+620**	**X**	**X**		**157,60**	**3,05**	**0,041**	**62,96**				19,71
17/06/2026			X	K2+462,4	K2+484,4	X	X		22,00	3,05	0,036	67,10				2,42
17/06/2026			X	K2+484,4	K2+497,6	X	X		13,20	3,00	0,035	39,60				1,39
17/06/2026			X	K2+497,6	K2+560	X	X		62,40	3,05	0,035	190,32				6,66
17/06/2026			X	K2+560	K2+595,5	X	X		35,50	3,40	0,037	120,70				4,47
17/06/2026			X	K2+595,5	K2+620	X	X		24,50	3,05	0,036	74,73				2,69
17/06/2026			X	**K2+474**	**K2+734**		**X**	**X**	**260,00**	**3,17**	**0,041**	324,43				33,79
17/06/2026			X	K2+474	K2+484,4		X	X	10,40	3,05	0,035	31,72				1,11
17/06/2026			X	K2+484,4	K2+497,6			X	13,20	1,10	0,035	14,52				0,51
17/06/2026			X	K2+497,6	K2+560		X	X	62,40	3,05	0,035	190,32				6,66
17/06/2026			X	K2+595,5	K2+734		X	X	86,30	3,05	0,040	263,22				10,53
17/06/2026	X			K2+690	K2+698,96	X	X		8,96	0,74	0,270					
Totales																89,93

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre	Pablo Esteban Sierra Moreno	**Nombre**	Rafael Camilo Suarez Suarez	**Nombre**	N/A
Cargo	Ing. apoyo supervisión	**Cargo**	Ing. apoyo supervisión	**Cargo**	N/A
Firma		**Firma**		**Firma**	


TIERRASUA
¡Conectamos regiones!

CONTROL DE MATERIALES

Contrato No: CONVENIO 3827 DE 2025 BTS-OICATÁ-CHIVATÁ

FECHA	MATERIAL	ABSCISA	HORA DE LLEGADA	VOLQUETA			TEMPERATURA (°C)		ELABORACIÓN DE BRIQUETAS
				N° VALE	PLACA	VOLUMEN	EXT.	COM.	Cantidad
17/06/2026	Asfalto	K2+462	9:00	6622	TAW523	14	150	132	N/A
17/06/2026	Asfalto	K2+502	9:25	6623	QKM379	12	148	130	N/A
17/06/2026	Asfalto	K2+545	9:43	6624	THZ021	14	148	128	N/A
17/06/2026	Asfalto	K2+586	10:05	6625	SOO022	14	150	134	N/A
17/06/2026	Asfalto	K2+474	10:30	6626	OCM213	7	152	134	N/A
17/06/2026	Asfalto	K2+497	10:44	6627	QLQ002	7	144	126	N/A
17/06/2026	Asfalto	K2+535	11:05	6628	OCM217	7	142	122	N/A
17/06/2026	Asfalto	k2+590	12:00	6632	THZ021	14	150	130	N/A
17/06/2026	Asfalto	K2+638	11:38	6630	QKM379	12	152	130	N/A
17/06/2026	Asfalto	K2+685	11:25	6629	TAW523	13	148	134	N/A
17/06/2026	recebo	alcantarilla	12:50	N/A	OCM213	7	N/A	N/A	N/A
17/06/2026	Base	alcantarilla	1:20	N/A	OCM217	7	N/A	N/A	N/A
TOTAL SUELTOS ASFALTO						114			

NOTA: Verificar en todos los vales de control de materiales despachados de la planta de asfalto, la temperatura de salida de la mezcla.

Elaboró		:		Aprobó	
Nombre:	Pablo E. Sierra Moreno	**Nombre:**	Rafael Camilo Suarez Suarez	**Nombre:**	N/A
Cargo:	Ing, apoyo supervisión	**Cargo:**	Ing, apoyo supervisión	**Cargo:**	N/A
Firma:		**Firma:**		**Firma:**	

TIERRASUA
¡Conectamos regiones!


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Convenio 3827 de 2025 BTJ - Oicatá - Chivatá

ACTIVIDAD: Fresado e instalación de Sobre carpeta FECHA: 18/01/26

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Pablo Sierra

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

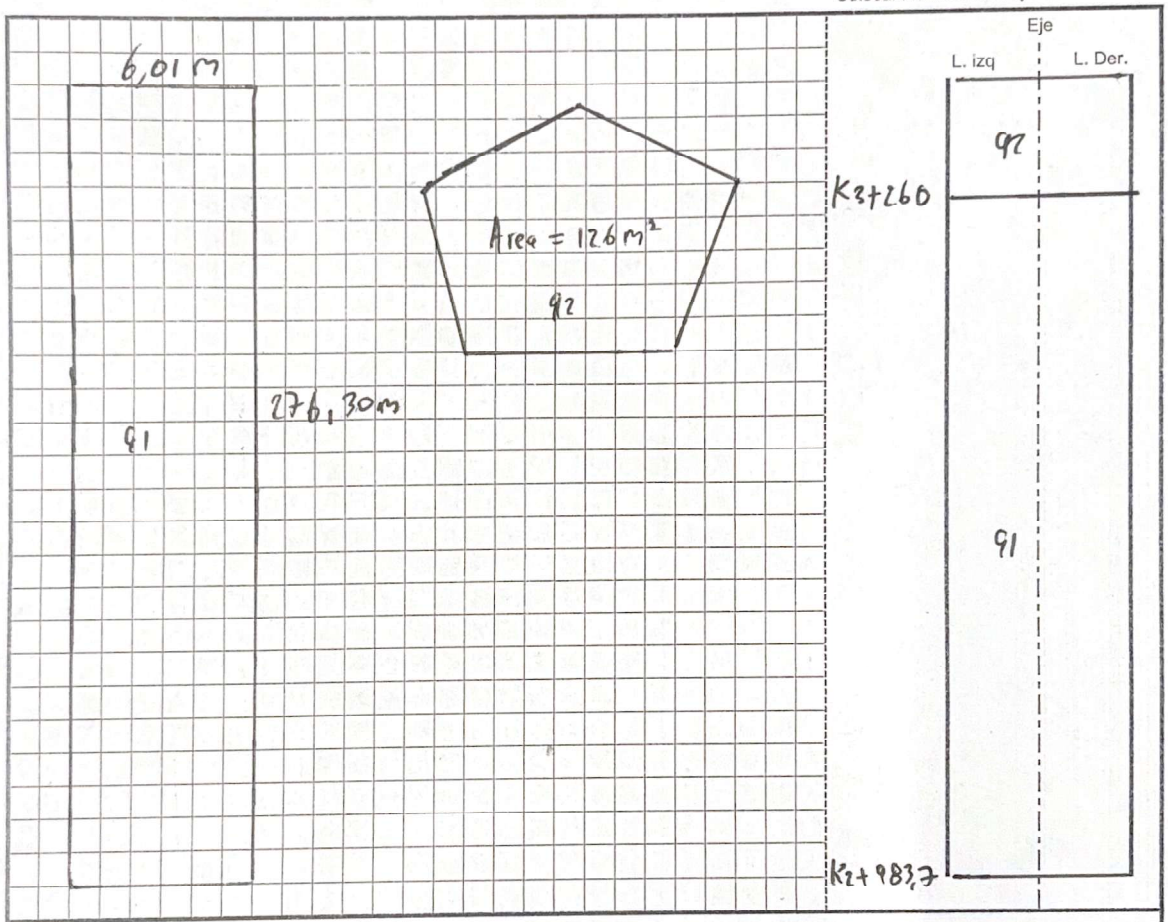

OBSERVACIONES:(condiciones climáticas)

Día soleado con presencia de Nubes


FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO

CANTIDADES DE PARCHEO / FRESADO / ASFALTO

OBRA: Convenio 3827 de 2025 BTS-Oicatá-Chivatá

Fecha	P	F	A	Ubicaciò		Lado			Dimensiones (m)			Área de Liga / Emulsión	Volumenes (m3)			
				Abcisa I.	Abcisa F.	Izq.	Eje	Der.	Largo	Ancho	Espesor		Excavacion	Subbase	Bas	Asfalto
18/06/2026			X	**K2+620**	**K2+854,1**	**X**	**X**		**234,1**	**3,07**	**0,04**	**7,487**				28,75
18/06/2026			X	K2+620	K2+681,8		X		61,80	3,05	0,035	188,49				6,60
18/06/2026			X	K2+681,8	K2+737,9	X	X		56,10	3,00	0,035	168,30				5,89
18/06/2026			X	K2+737,9	K2+854,1	X	X		116,20	3,05	0,035	354,41				12,40
18/06/2026			X	**K2+734**	**K2+976**		**X**	**X**	**242,00**	**3,00**	**0,075**					54,45
18/06/2026		X		K2+983,7	K3+260	X	X	X	276,30	6,01	0,035					
18/06/2026		X		K3+260	K3+270	X	X	X	126,00	1,00	0,035					
Totales																108,09

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre	Pablo Esteban Sierra Moreno	**Nombre**	Rafael Camilo Suarez Suarez	**Nombre**	N/A
Cargo	Ing. apoyo supervisión	**Cargo**	Ing. apoyo supervisión	**Cargo**	N/A
Firma		**Firma**		**Firma**	


TIERRASUA
¡Conectamos región!

CONTROL DE MATERIALES

Contrato No: CONVENIO 3827 DE 2025 BTS-OICATÁ-CHIVATÁ

FECHA	MATERIAL	ABSCISA	HORA DE LLEGADA	VOLQUETA			TEMPERATURA (°C)		ELABORACIÓN DE BRIQUETAS
				N° VALE	PLACA	VOLUMEN	EXT.	COM.	Cantidad
18/06/2026	Asfalto	K2+620	8:55	6635	QKM379	12	156	130	N/A
18/06/2026	Asfalto	K2+660	9:30	6636	TAW523	14	150	128	N/A
18/06/2026	Asfalto	K2+703	10:07	6637	THZ021	14	148	132	N/A
18/06/2026	Asfalto	K2+747	10:40	6638	SOO022	14	150	126	N/A
18/06/2026	Asfalto	K2+790	11:10	6640	QLQ002	7	146	122	N/A
18/06/2026	Asfalto	K2+822	11:38	6639	OCM213	7	146	120	N/A
18/06/2026	Asfalto	K2+734	1:00	6643	QKM379	12	148	124	N/A
18/06/2026	Asfalto	K2+770	1:30	6645	TAW523	14	148	118	N/A
18/06/2026	Asfalto	K2+825	3:20	6647	THZ021	14	152	130	N/A
18/06/2026	Asfalto	K2+875	3:53	6649	SOO022	14	154	134	N/A
18/06/2026	Asfalto	K2+909	4:13	6650	OCM213	7	150	128	N/A
18/06/2026	Asfalto	K2+939	4:30	6651	QLQ002	7	148	128	N/A
TOTAL SUELTOS ASFALTO						136			

NOTA: Verificar en todos los vales de control de materiales despachados de la planta de asfalto, la temperatura de salida de la mezcla.

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre:	Pablo E. Sierra Moreno	Nombre:	Rafael Camilo Suarez Suarez	Nombre:	N/A
Cargo:	Ing. apoyo supervisión	Cargo:	Ing. apoyo supervisión	Cargo:	N/A
Firma:		Firma:		Firma:	

TIERRASUA
¡Conectamos regiones!


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Convenio 3827 de 2025 BTS - Oiatá - Chivata

ACTIVIDAD: fresado e instalación de parches FECHA: 18/06/26

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Pablo Sierra

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

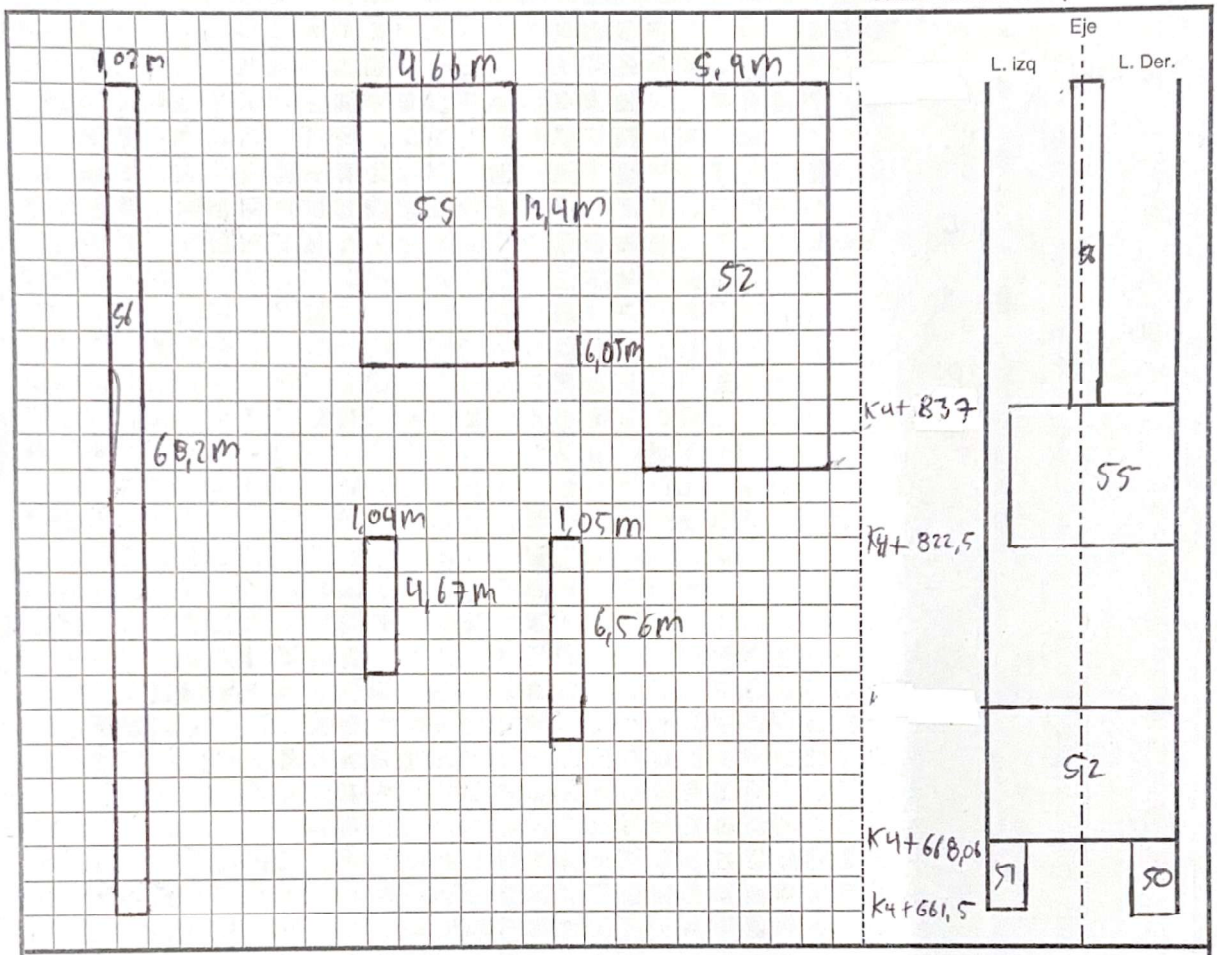

OBSERVACIONES:(condiciones climáticas)

Dia soleado

FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO

TIERRASUA


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Convenio 3827 de 2025 BTS - Oicata - Chivata

ACTIVIDAD: Fresado e instalación de Parches FECHA: 18/06/26

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Fdo Sperra

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

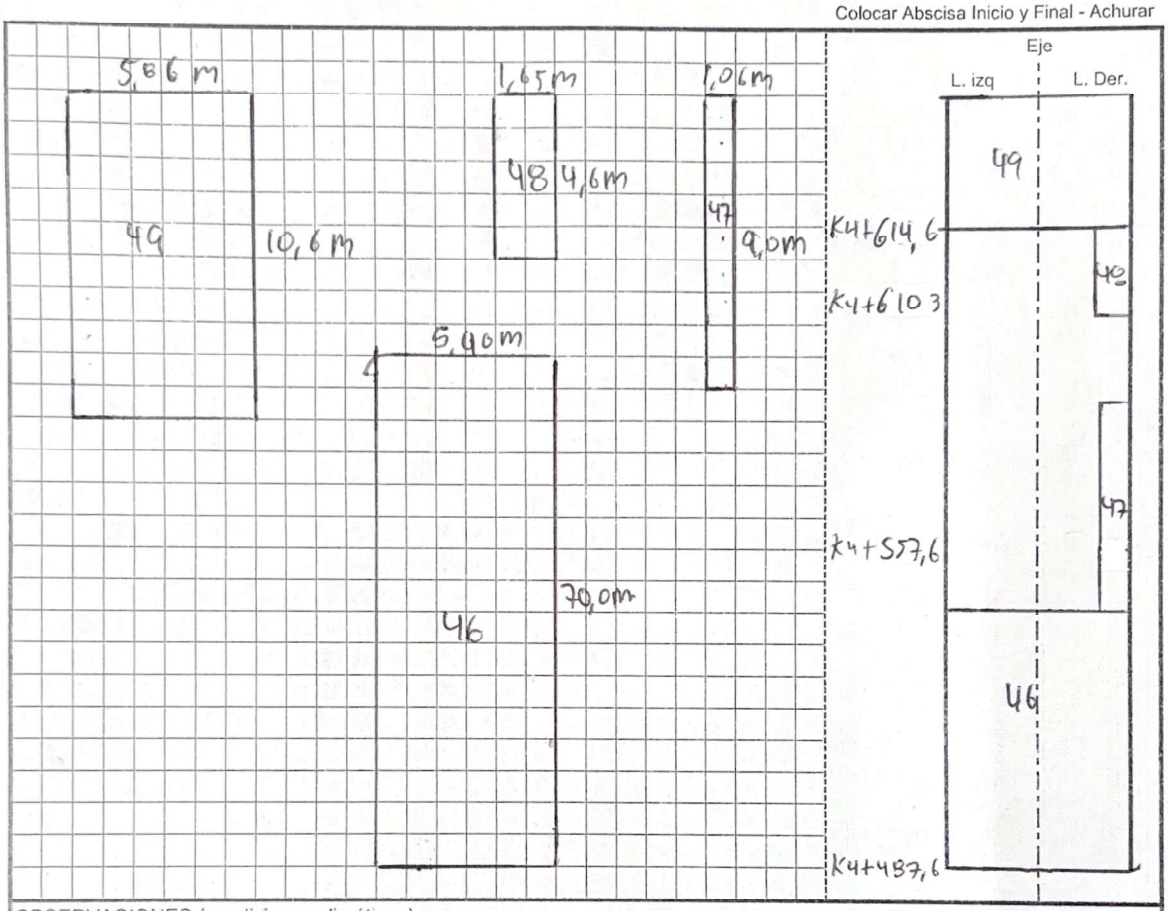

OBSERVACIONES:(condiciones climáticas)

Dia Soleado


FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO

TIERRASUA	CANTIDADES DE PARCHEO / FRESADO / ASFALTO

OBRA: Convenio 3827 de 2025 BTS-Oicatá-Chivatá


Fecha	P	F	A	Ubicaciò		Lado			Dimensiones (m)			Área de Liga / Emulsión	Volumenes (m3)			
				Abcisa I.	Abcisa F.	Izq.	Eje	Der.	Largo	Ancho	Espesor		Excavacion	Subbase	Bas	Asfalto
18/06/2026		X		K4+834,9	k4+903,1		X		68,2	1,02	0,07					
18/06/2026		X		K4+822,5	K4+834,9	X	X	X	12,40	4,66	0,07					
18/06/2026		X		K4+668,06	K4+684,1	X	X	X	16,05	5,90	0,07					
18/06/2026		X		K4+663,3	K4+668,06	X			4,76	1,04	0,07					
18/06/2026		X		K4+661,5	K4+668,06			X	6,56	1,05	0,07					
18/06/2026		X		K4+614,6	K4+625,2	X	X	X	10,60	5,86	0,07					
18/06/2026		X		K4+610	K4+614,6			X	4,60	1,65	0,07					
18/06/2026		X		K4+557,6	K4+567,6			X	9	1,06	0,07					
18/06/2026		X		K4+487,6	K4+557,6	X	X	X	70	5,90	0,07					
Totales												0,00				0,00

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre	Pablo Esteban Sierra Moreno	**Nombre**	Rafael Camilo Suarez Suarez	**Nombre**	N/A
Cargo	Ing. apoyo supervisión	**Cargo**	Ing. apoyo supervisión	**Cargo**	N/A
Firma		**Firma**		**Firma**	

TIERRASUA	CANTIDADES DE PARCHEO / FRESADO / ASFALTO

OBRA: Convenio 3827 de 2025 BTS-Oicatá-Chivatá

Fecha	P	F	A	Ubicaciò		Lado			Dimensiones (m)			Área de Liga / Emulsión	Volumenes (m3)			
				Abcisa I.	Abcisa F.	Izq.	Eje	Der.	Largo	Ancho	Espesor		Excavacion	Subbase	Bas	Asfalto
19/06/2026			X	K2+854,1	K3+080	X	X		225,9	3,00	0,075	677,7				50,83
19/06/2026			X	K2+976	K3+120,8		X	X	144,80	3,05	0,075	441,64				33,12
Totales												1119,34				83,95


Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre	Pablo Esteban Sierra Moreno	Nombre	Rafael Camilo Suarez Suarez	Nombre	N/A
Cargo	Ing. apoyo supervisión	Cargo	Ing. apoyo supervisión	Cargo	N/A
Firma		Firma		Firma	

TIERRASUA ¡Conectamos región!	CONTROL DE MATERIALES

Contrato No: CONVENIO 3827 DE 2025 BTS-OICATÁ-CHIVATÁ

FECHA	MATERIAL	ABSCISA	HORA DE LLEGADA	VOLQUETA			TEMPERATURA (°C)		ELABORACIÓN DE BRIQUETAS
				N° VALE	PLACA	VOLUMEN	EXT.	COM.	Cantidad
19/06/2026	Asfalto	K2+854	10:00	6652	TAW523	14	150	132	N/A
19/06/2026	Asfalto	K2+900	10:30	6654	THZ021	14	154	130	N/A
19/06/2026	Asfalto	K2+943	11:38	6656	SOO022	14	152	132	N/A
19/06/2026	Asfalto	K2+990	12:22	6658	QLQ002	7	150	128	N/A
19/06/2026	Asfalto	K3+025	12:40	6659	OCM213	7	148	122	N/A
19/06/2026	Asfalto	K2+976	1:23	6661	WLQ157	14	148	120	N/A
19/06/2026	Asfalto	K3+000	1:40	6660	OCM217	7	150	132	N/A
19/06/2026	Asfalto	K3+048	2:30	6663	THZ021	14	152	130	N/A
19/06/2026	Asfalto	K3+082	2:00	6662	TAW523	14	154	136	N/A
TOTAL SUELTOS ASFALTO						105			


NOTA: Verificar en todos los vales de control de materiales despachados de la planta de asfalto, la temperatura de salida de la mezcla.

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre:	Pablo E. Sierra Moreno	Nombre:	Rafael Camilo Suarez Suarez	Nombre:	N/A
Cargo:	Ing. apoyo supervisión	Cargo:	Ing. apoyo supervisión	Cargo:	N/A
Firma:		Firma:		Firma:	

CANTIDADES DE PARCHEO / FRESADO / ASFALTO

OBRA: Convenio 3827 de 2025 BTS-Oicatá-Chivatá

Fecha	P	F	A	Ubicac		Lado			Dimensiones (m)			Área de Liga / Emulsión	Volumenes (m3)			
				Abcisa I.	Abcisa F.	Izq.	Eje	Der.	Largo	Ancho	Espesor		Excavacion	Subbase	Ba	Asfalto
22/06/2026			X	K3+080	K3+150	X	X		70	2,89	0,075	202,3				15,17
Totales												202,30				15,17



Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre	Pablo Esteban Sierra Moreno	**Nombre**	Rafael Camilo Suarez Suarez	**Nombre**	N/A
Cargo	Ing. apoyo supervisión	**Cargo**	Ing. apoyo supervisión	**Cargo**	N/A
Firma		**Firma**		**Firma**	

TIERRASUA ¡Conectamos región!	CONTROL DE MATERIALES

Contrato No: CONVENIO 3827 DE 2025 BTS-OICATÁ-CHIVATÁ

FECHA	MATERIAL	ABSCISA	HORA DE LLEGADA	VOLQUETA			TEMPERATURA (°C)		ELABORACIÓN DE BRIQUETAS
				N° VALE	PLACA	VOLUMEN	EXT.	COM.	Cantidad
22/06/2026	Asfalto	K3+080	3:10	6664	OCM213	7	150	130	N/A
22/06/2026	Asfalto	K3+110	4:10	6666	QKM379	12	154	134	N/A
TOTAL SUELTOS ASFALTO						19			


NOTA: Verificar en todos los vales de control de materiales despachados de la planta de asfalto, la temperatura de salida de la mezcla.

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre:	Pablo E. Sierra Moreno	Nombre:	Rafael Camilo Suarez Suarez	Nombre:	N/A
Cargo:	Ing. apoyo supervisión	Cargo:	Ing. apoyo supervisión	Cargo:	N/A
Firma:		Firma:		Firma:	

TIERRASUA	CANTIDADES DE PARCHEO / FRESADO / ASFALTO

OBRA: Convenio 3827 de 2025 BTS-Oicatá-Chivatá

Fecha	P	F	A	Ubicaciò		Lado			Dimensiones (m)			Área de Liga / Emulsión	Volumenes (m3)			
				Abcisa I.	Abcisa F.	Izq.	Eje	Der.	Largo	Ancho	Espesor		Excavacion	Subbase	Bas	Asfalto
23/06/2026			X	K3+150	K3+260	X	X		110	2,93	0,075	322,3				24,17
23/06/2026			X	K3+120,8	K3+260		X	X	139,2	2,91	0,075	405,072				30,38
23/06/2026			X	K3+260	K3+270	X	X	X			0,075	130				9,75
Totales												857,37				64,30

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre	Pablo Esteban Sierra Moreno	Nombre	Rafael Camilo Suarez Suarez	Nombre	N/A
Cargo	Ing. apoyo supervisión	Cargo	Ing. apoyo supervisión	Cargo	N/A
Firma		Firma		Firma	

TIERRASUA
¡Conectamos región!

CONTROL DE MATERIALES

Contrato No: CONVENIO 3827 DE 2025 BTS-OICATÁ-CHIVATÁ

FECHA	MATERIAL	ABSCISA	HORA DE LLEGADA	VOLQUETA			TEMPERATURA (°C)		ELABORACIÓN DE BRIQUETAS
				N° VALE	PLACA	VOLUMEN	EXT.	COM.	Cantidad
23/06/2026	Asfalto	K3+150	9:35	6668	QKM379	12	150	130	N/A
23/06/2026	Asfalto	K3+190	10:55	6670	SOO022	14	156	132	N/A
23/06/2026	Asfalto	K3+240	11:39	6672	OCM213	7	152	132	N/A
23/06/2026	Asfalto	K3+120,8	11:50	6673	QLQ002	7	150	128	N/A
23/06/2026	Asfalto	K3+145	12:10	6674	OCM217	7	148	130	N/A
23/06/2026	Asfalto	K3+187	12:30	6675	QKM379	12	152	138	N/A
23/06/2026	Asfalto	K3+225	1:00	6676	SOO022	14	156	136	N/A
23/06/2026	Asfalto	K3+260	1:30	6677	OCM213	7	154	134	N/A
TOTAL SUELTOS ASFALTO						80			


NOTA: Verificar en todos los vales de control de materiales despachados de la planta de asfalto, la temperatura de salida de la mezcla.

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre:	Pablo E. Sierra Moreno	**Nombre:**	Rafael Camilo Suarez Suarez	**Nombre:**	N/A
Cargo:	Ing. apoyo supervisión	**Cargo:**	Ing. apoyo supervisión	**Cargo:**	N/A
Firma:		**Firma:**		**Firma:**	

TIERRASUA	CANTIDADES DE PARCHEO / FRESADO / ASFALTO

OBRA: Convenio 3827 de 2025 BTS-Oicatá-Chivatá

Fecha	P	F	A	Ubicaciò		Lado			Dimensiones (m)			Área de Liga / Emulsión	Volumenes (m3)			
				Abcisa I.	Abcisa F.	Izq.	Eje	Der.	Largo	Ancho	Espesor		Excavacion	Subbase	Bas	Asfalto
24/06/2026			X	K4+679,21	K4+684,1		X	X	4,9	2,85	0,077	13,97				1,08
24/06/2026			X	K4+668,06	K4+679,21	X	X	X	11,15	2,85	0,077	31,78				2,45
24/06/2026			X	K4+663,3	K4+668,06	X			4,76	1,04	0,076	4,95				0,38
24/06/2026			X	K4+661,5	K4+668,06			X	6,56	1,05	0,077	6,89				0,53
24/06/2026			X	K4+614,6	K4+625,2	X	X	X	10,6	5,86	0,078	62,12				4,85
24/06/2026			X	K4+610	K4+614,6			X	4,6	1,65	0,077	7,59				0,58
24/06/2026			X	K4+557,6	K4+567,6			X	9	1,06	0,079	9,54				0,75
24/06/2026			X	K4+487,6	K4+557,6	X	X	X	70	5,90	0,075	413,00				30,98
Totales																41,59

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre	Pablo E. Sierra Moreno	Nombre	Rafael Camilo Suarez Suarez	Nombre	N/A
Cargo	Ing. apoyo supervisión	Cargo	Ing. apoyo supervisión	Cargo	N/A
Firma		Firma		Firma	

TIERRASUA
¡Conectamos región!

CONTROL DE MATERIALES

Contrato No: CONVENIO 3827 DE 2025 BTS-OICATÁ-CHIVATÁ

FECHA	MATERIAL	ABSCISA	HORA DE LLEGADA	VOLQUETA			TEMPERATURA (°C)		ELABORACIÓN DE BRIQUETAS
				N° VALE	PLACA	VOLUMEN	EXT.	COM.	Cantidad
24/06/2026	Asfalto	k4+679,21	9:35	6678	QKM379	12	150	130	N/A
24/06/2026	Asfalto	K4+612	11:06	6682	QLQ002	7	152	134	N/A
24/06/2026	Asfalto	K4+490	10:35	6680	OCM213	7	154	130	N/A
24/06/2026	Asfalto	K4+510	11:35	6683	OCM217	7	150	122	N/A
24/06/2026	Asfalto	K4+525	1:10	6686	QKM379	12	152	120	N/A
24/06/2026	Asfalto	K4+545	4:50	6687	QLQ002	7	148	118	N/A
TOTAL SUELTOS ASFALTO						52			

NOTA: Verificar en todos los vales de control de materiales despachados de la planta de asfalto, la temperatura de salida de la mezcla.

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre:	Pablo E. Sierra Moreno	**Nombre:**	Rafael Camilo Suarez Suarez	**Nombre:**	N/A
Cargo:	Ing. Apoyo supervision	**Cargo:**	Ing. Apoyo supervision	**Cargo:**	N/A
Firma:		**Firma:**		**Firma:**	

TIERRASUA


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Convenio 3824 de 2025 PTS-Oriente-Chipaque

ACTIVIDAD: Fresado e instalación de parches FECHA: 25/06/26

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Pablo Sierra

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

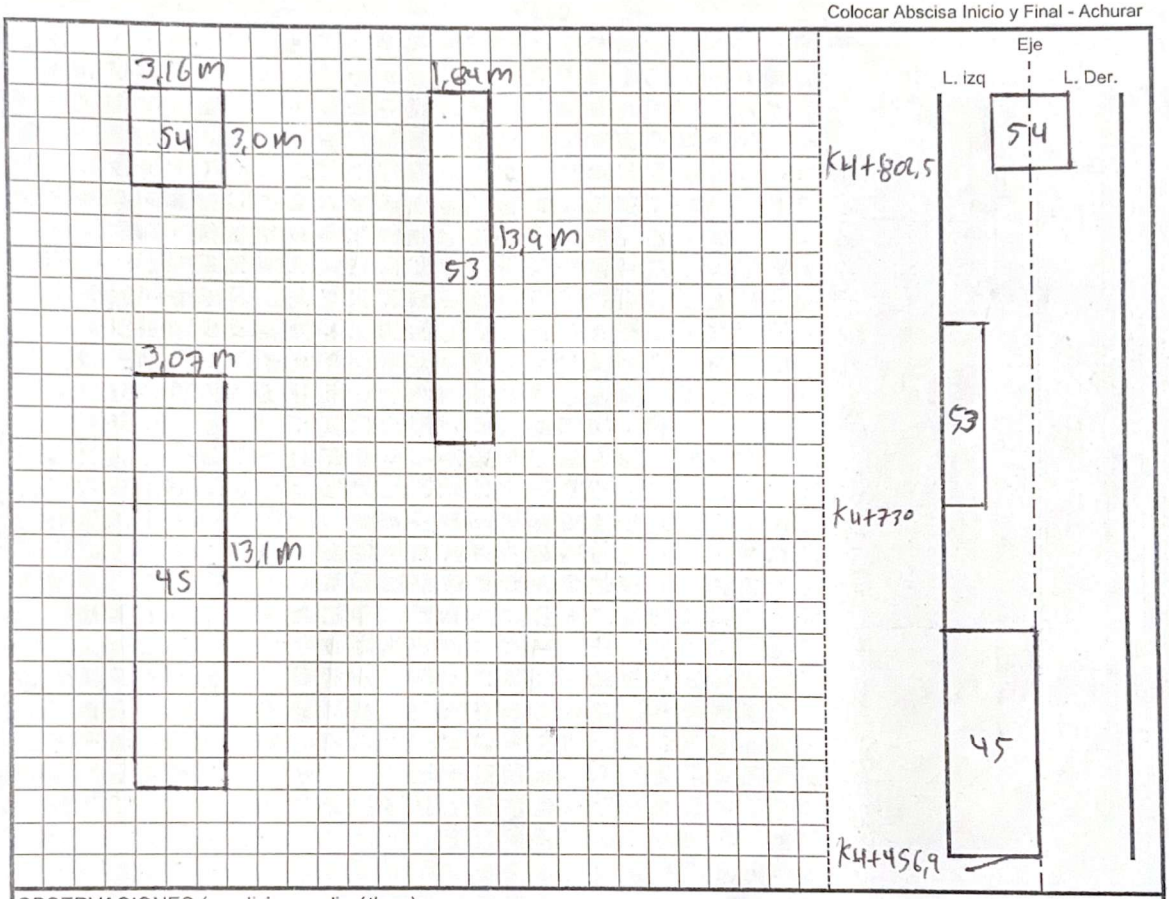

OBSERVACIONES:(condiciones climáticas)

Día nublado


FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO

TIERRASUA	CANTIDADES DE PARCHEO / FRESADO / ASFALTO

OBRA: Convenio 3827 de 2025 BTS-Oicatá-Chivatá

Fecha	P	F	A	Ubicaciò		Lado			Dimensiones (m)			Área de Liga / Emulsión	Volumenes (m3)			
				Abcisa I.	Abcisa F.	Izq.	Eje	Der.	Largo	Ancho	Espesor		Excavacion	Subbase	Bas	Asfalto
25/06/2026	X			K4+456,9	K4+470	X			13,1	3,07	0,13					
25/06/2026	X			K4+730	K4+743,9	X			13,9	1,84	0,07					
25/06/2026	X			K4+802,5	K4+806,1	X			3,6	3,16	0,07					
Totales																


Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre	Pablo E. Sierra Moreno	Nombre	Rafael Camilo Suarez Suarez	Nombre	N/A
Cargo	Ing. Apoyo supervision	Cargo	Ing. Apoyo supervision	Cargo	N/A
Firma		Firma		Firma	

TIERRASUA ¡Conectamos región!	CONTROL DE MATERIALES

Contrato No: CONVENIO 3827 DE 2025 BTS-OICATÁ-CHIVATÁ

FECHA	MATERIAL	ABSCISA	HORA DE LLEGADA	VOLQUETA			TEMPERATURA (°C)		ELABORACIÓN DE BRIQUETAS
				N° VALE	PLACA	VOLUMEN	EXT.	COM.	Cantidad
25/06/2026	Base	Valle	10:20	N/A	OCM213	7	N/A	N/A	N/A
25/06/2026	Recebo	Valle	10:30	N/A	QLQ002	7	N/A	N/A	N/A
TOTAL SUELTOS ASFALTO									


NOTA: Verificar en todos los vales de control de materiales despachados de la planta de asfalto, la temperatura de salida de la mezcla.

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre:	Pablo E. Sierra Moreno	Nombre:	Rafael Camilo Suarez Suarez	Nombre:	N/A
Cargo:	Ing. Apoyo supervision	Cargo:	Ing. Apoyo supervision	Cargo:	N/A
Firma:		Firma:		Firma:	

CANTIDADES DE PARCHEO / FRESADO / ASFALTO

OBRA: Convenio 3827 de 2025 BTS-Oicatá-Chivatá

Fecha	P	F	A	Ubicac		Lado			Dimensiones (m)			Área de Liga / Emulsión	Volumenes (m3)			
				Abcisa I.	Abcisa F.	Izq.	Eje	Der.	Largo	Ancho	Espesor		Excavacion	Subbase	Ba	Asfalto
26/06/2026			X	K4+834,9	k4+903,1		X		68,2	1,02	0,075	69,564				5,22
26/06/2026			X	K4+822,5	K4+834,9	X	X	X	12,40	4,66	0,075	57,784				4,33
26/06/2026			X	K4+802,5	K4+806,1		X		3,6	3,16	0,075	11,376				0,85
26/06/2026			X	K4+730	K4+743,9	X			13,9	1,84	0,06	25,576				1,05
26/06/2026			X	K4+679,21	K4+684,1	X	X		4,9	2,85	0,075	13,965				1,53
26/06/2026			X	K4+456,9	K4+470	X			9,5	3,07	0,075	29,165				2,19
Totales																15,17

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre	Pablo E. Sierra Moreno	**Nombre**	Rafael Camilo Suarez Suarez	**Nombre**	N/A
Cargo	Ing. Apoyo supervision	**Cargo**	Ing. Apoyo supervision	**Cargo**	N/A
Firma		**Firma**		**Firma**	

TIERRASUA ¡Conectamos región!	CONTROL DE MATERIALES

Contrato No: CONVENIO 3827 DE 2025 BTS-OICATÁ-CHIVATÁ

FECHA	MATERIAL	ABSCISA	HORA DE LLEGADA	VOLQUETA			TEMPERATURA (°C)		ELABORACIÓN DE BRIQUETAS
				N° VALE	PLACA	VOLUMEN	EXT.	COM.	Cantidad
26/06/2026	asfalto	K4+903,1	11:00	6692	QKM379	12	152	130	N/A
26/06/2026	asfalto	K4+804	11:28	6693	OCM213	7	148	128	N/A
TOTAL SUELTOS ASFALTO						19			

NOTA: Verificar en todos los vales de control de materiales despachados de la planta de asfalto, la temperatura de salida de la mezcla.

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre:	Pablo E. Sierra Moreno	**Nombre:**	Rafael Camilo Suarez Suarez	**Nombre:**	N/A
Cargo:	Ing. Apoyo supervision	**Cargo:**	Ing. Apoyo supervision	**Cargo:**	N/A
Firma:		**Firma:**		**Firma:**	

TIERRASUA
Conectamos región


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Convenio 3827 de 2025 BTS-Oiata-Chivatá

ACTIVIDAD: Apertura e instalación de parches FECHA: 30/06/26

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Pablo Sierra

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

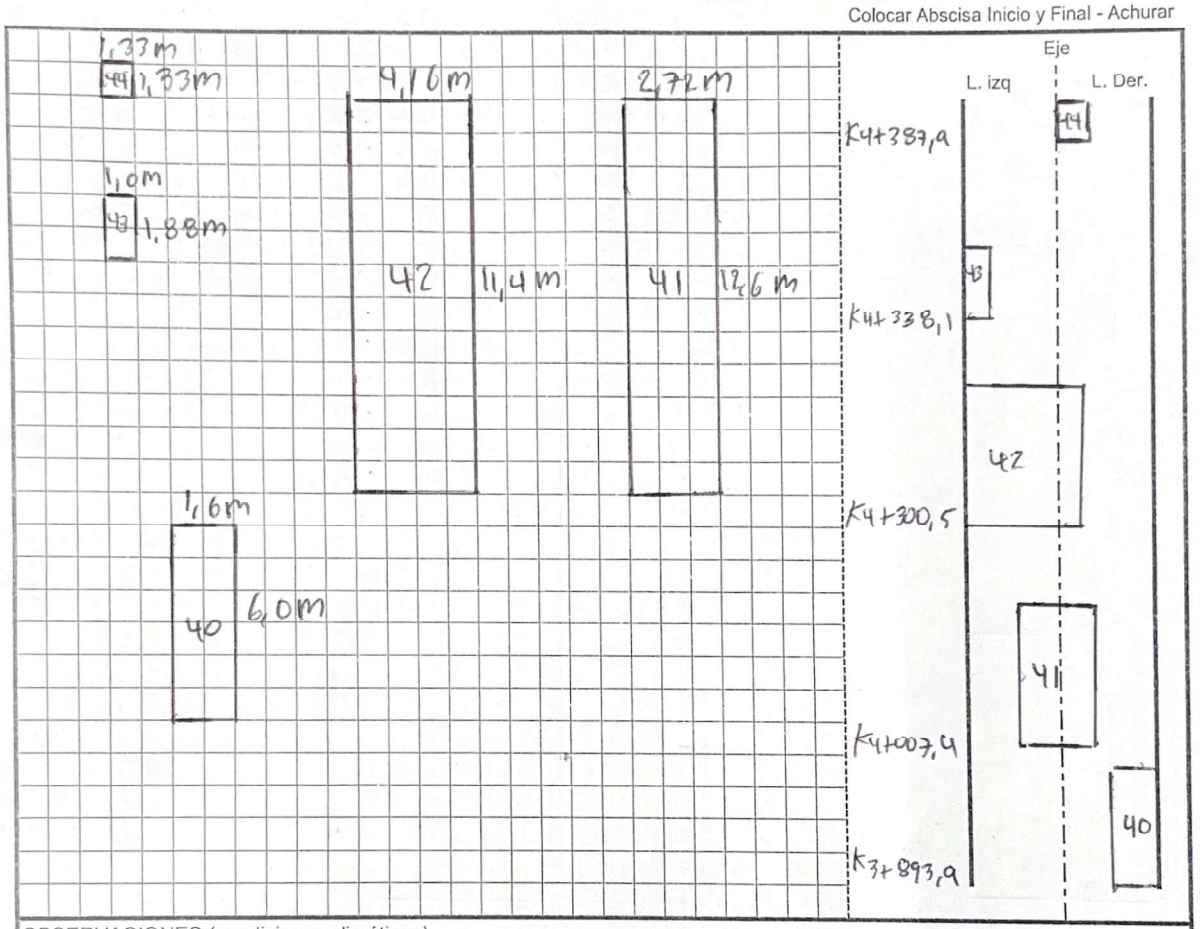

OBSERVACIONES:(condiciones climáticas)

Dia Soleado

FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO

TIERRASUA


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Convenio 387 de 2015 BTS- Oicatá -Chivatá

ACTIVIDAD : Apertura e instalación de parches FECHA : 30/06/26

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Pablo Sierra

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

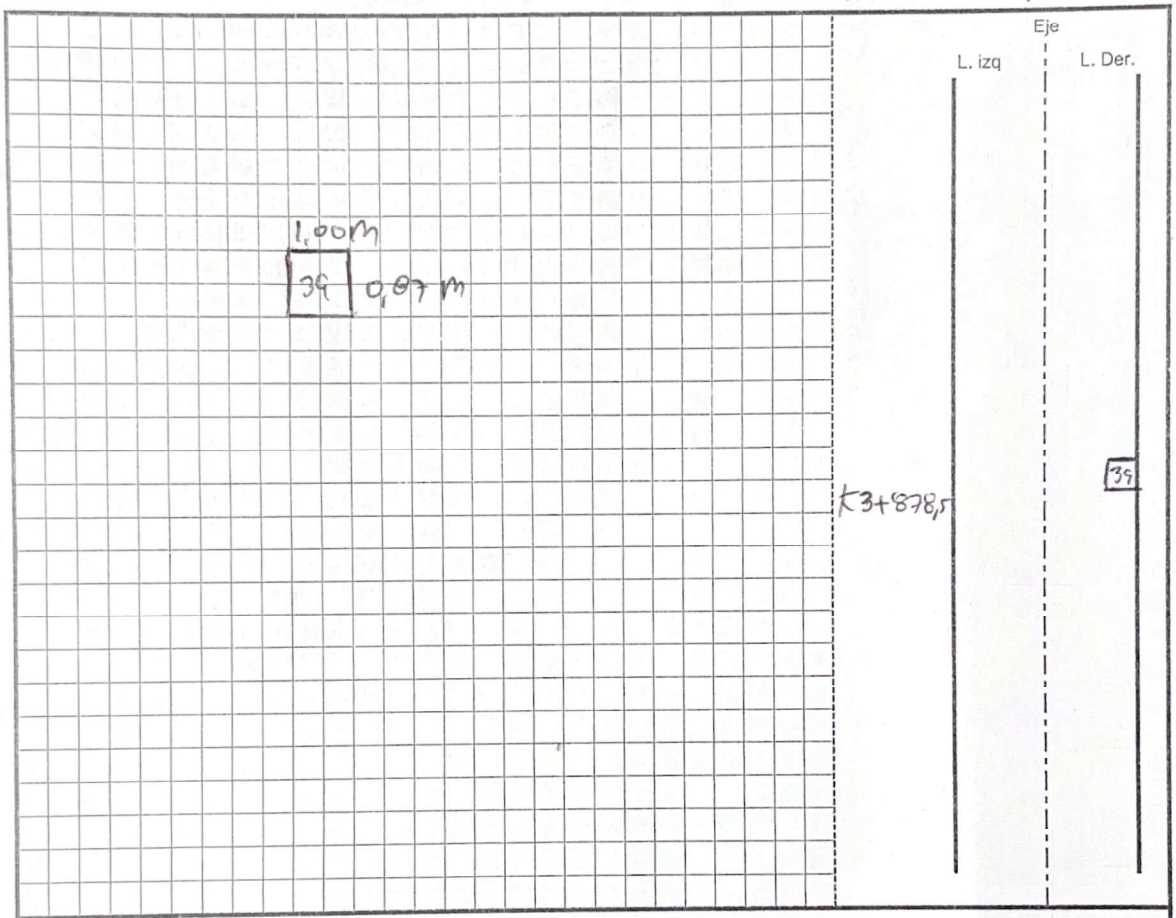

OBSERVACIONES:(condiciones climáticas)

Ok Soleado

FIRMA QUIEN ELABORO


FIRMA INGENIERO

TIERRASUA ¡Conectamos región!	CONTROL DE MATERIALES

Contrato No: CONVENIO 3827 DE 2025 BTS-OICATÁ-CHIVATÁ

FECHA	MATERIAL	ABSCISA	HORA DE LLEGADA	VOLQUETA			TEMPERATURA (°C)		ELABORACIÓN DE BRIQUETAS
				N° VALE	PLACA	VOLUMEN	EXT.	COM.	Cantidad
30/06/2026	Base	alcantarilla	8:40	N/A	QKM379	12	N/A	N/A	N/A
30/06/2026	Base	alcantarilla	8:58	N/A	QLQ002	5	N/A	N/A	N/A
30/06/2026	Base	alcantarilla	9:19	N/A	QLQ003	7	N/A	N/A	N/A
TOTAL SUELTOS ASFALTO									


NOTA: Verificar en todos los vales de control de materiales despachados de la planta de asfalto, la temperatura de salida de la mezcla.

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre:	Pablo E. Sierra Moreno	Nombre:	Rafael Camilo Suarez Suarez	Nombre:	N/A
Cargo:	Ing. Apoyo supervision	Cargo:	Ing. Apoyo supervision	Cargo:	N/A
Firma:		Firma:		Firma:	

TIERRASUA	CANTIDADES DE PARCHEO / FRESADO / ASFALTO

OBRA: Convenio 3827 de 2025 BTS-Oicatá-Chivatá

Fecha	P	F	A	Ubicaciò		Lado			Dimensiones (m)			Área de Liga / Emulsión	Volumenes (m3)			
				Abcisa I.	Abcisa F.	Izq.	Eje	Der.	Largo	Ancho	Espesor		Excavacion	Subbase	Bas	Asfalto
30/06/2026	X			K4+387,9	K4+389,23	X	X		1,33	1,33	0,07					
30/06/2026	X			K4+338,1	K4+340	X			1,88	1,00	0,07					
30/06/2026	X			K4+300,5	K4+311,9		X	X	11,4	4,16	0,2					
30/06/2026	X			K4+007,4	K4+020		X	X	12,6	2,72	0,2					
30/06/2026	X			K3+893,9	K3+900		X	X	6,1	1,60	0,07					
30/06/2026	X			K3+878,5	K3+879,4			X	0,87	1,00	0,07					
Totales												0,00				

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre	Pablo E. Sierra Moreno	**Nombre**	Rafael Camilo Suarez Suarez	**Nombre**	N/A
Cargo	Ing. Apoyo supervision	**Cargo**	Ing. Apoyo supervision	**Cargo**	N/A
Firma		**Firma**		**Firma**	



4.5.3. Tramo: 55BY07 cruce ruta 55 – Sotaquirá

Cel: 316 8174458
gerencia@tierrasua.com
Calle 19 N.9-35 Piso 10 Tunja/Boyacá

			CONTROL DE MATERIALES			
CONTRATO NUMERO:			CO1.PCCNTR.8562435.3827 - TRAMO 55BY07 CRUCE RUTA 55 - RAMAL A SOTAQUIRÁ			
FECHA	MATERIAL	HORA DE LLEGADA	REFERENCIA		TEMPERATURA ©	
			# VALE	VOLUMEN	EXT.	COM.
1/06/2026	BASE GRANULAR	8:30 a.m	53100	20	N/A	N/A
1/06/2026	BASE GRANULAR	8:47 a.m	53099	14	N/A	N/A
1/06/2026	BASE GRANULAR	9:04 a. m.	53098	20	N/A	N/A
1/06/2026	BASE GRANULAR	9:20 a. m.	13791	20	N/A	N/A
1/06/2026	BASE GRANULAR	9:50 a.m	53104	12	N/A	N/A
2/06/2026	MEZCLA ASFALTICA	11:00 a.m	53160	18	131	114
2/06/2026	MEZCLA ASFALTICA	11:08 a.m	53165	7	133	113
2/06/2026	MEZCLA ASFALTICA	11:17 a.m	53166	7	131	113
2/06/2026	MEZCLA ASFALTICA	11:35 a.m	53168	12	130	112
2/06/2026	MEZCLA ASFALTICA	11:48 a.m	53162	18	132	114
2/06/2026	MEZCLA ASFALTICA	12:05 a.m	53170	14	133	114
2/06/2026	PIEDRA RAJON	11.40 a.m	53161	14	N/A	N/A
3/06/2026	BASE GRANULAR	10.20 a.m	53189	20	N/A	N/A
3/06/2026	PIEDRA RAJON	11:40 a.m	53190	20	N/A	N/A
3/06/2026	PIEDRA RAJON	12:05 a.m	53193	12	N/A	N/A
4/06/2026	BASE GRANULAR	9:45 a.m	53214	20	N/A	N/A
4/06/2026	PIEDRA RAJON	10:05 a. m.	53215	12	N/A	N/A
4/06/2026	BASE GRANULAR	10:20 a. m.	53220	7	N/A	N/A
4/06/2026	BASE GRANULAR	2:40 p. m.	53233	12	N/A	N/A
4/06/2026	BASE GRANULAR	3:10 p.m	53237	7	N/A	N/A
10/06/2026	BASE GRANULAR	6:55 a. m.	53357	20	N/A	N/A
10/06/2026	BASE GRANULAR	7:00 a.m	53358	20	N/A	N/A
10/06/2026	BASE GRANULAR	7:00 a.m	53359	20	N/A	N/A
10/06/2026	BASE GRANULAR	7:08 a. m.	53361	20	N/A	N/A
10/06/2026	BASE GRANULAR	10:30 a. m.	53380	7	N/A	N/A
10/06/2026	BASE GRANULAR	10:45 a. m.	53382	12	N/A	N/A
10/06/2026	BASE GRANULAR	11:00 a. m.	53383	7	N/A	N/A
10/06/2026	BASE GRANULAR	11:48 a.m.	53287	20	N/A	N/A
10/06/2026	BASE GRANULAR	12.05 p.m	53388	20	N/A	N/A
10/06/2026	BASE GRANULAR	12:25 p. m.	53390	20	N/A	N/A
10/06/2026	BASE GRANULAR	12:40 p. m.	53391	20	N/A	N/A
10/06/2026	BASE GRANULAR	1:00 p.m	1625	7	N/A	N/A
10/06/2026	BASE GRANULAR	1:50 p. m.	1626	7	N/A	N/A
10/06/2026	BASE GRANULAR	2:25 p. m.	1628	12	N/A	N/A
10/06/2026	BASE GRANULAR	4:15 p.m.	1630	7	N/A	N/A
11/06/2026	BASE GRANULAR	7:00 a.m	53409	20	N/A	N/A
11/06/2026	BASE GRANULAR	7:05 a. m.	53410	20	N/A	N/A
11/06/2026	BASE GRANULAR	7:09 a. m.	53411	20	N/A	N/A
11/06/2026	BASE GRANULAR	7:14 a. m.	53412	20	N/A	N/A
11/06/2026	BASE GRANULAR	9:05 a. m.	53430	7	N/A	N/A
11/06/2026	BASE GRANULAR	9:35 a. m.	53432	12	N/A	N/A
11/06/2026	BASE GRANULAR	9:43 a. m.	53433	7	N/A	N/A
11/06/2026	BASE GRANULAR	10:55 a. m.	53436	20	N/A	N/A
11/06/2026	BASE GRANULAR	11:07 a. m.	53437	20	N/A	N/A
11/06/2026	BASE GRANULAR	11:21 a. m.	53438	20	N/A	N/A
11/06/2026	BASE GRANULAR	12:45 p. m.	53444	14	N/A	N/A
11/06/2026	BASE GRANULAR	1:10 p.m	53455	7	N/A	N/A
11/06/2026	BASE GRANULAR	1:55 p.m	53459	12	N/A	N/A
11/06/2026	BASE GRANULAR	3:05 p. m.	53484	20	N/A	N/A
11/06/2026	BASE GRANULAR	3:20 p. m.	53485	20	N/A	N/A
11/06/2026	BASE GRANULAR	3:40 p. m.	53486	20	N/A	N/A
11/06/2026	BASE GRANULAR	4:00 p. m.	53488	14	N/A	N/A
11/06/2026	BASE GRANULAR	4:25 p. m.	53492	20	N/A	N/A
12/06/2026	BASE GRANULAR	7:00 a. m.	53518	20	N/A	N/A
12/06/2026	BASE GRANULAR	7:05 a. m.	53519	20	N/A	N/A
12/06/2026	BASE GRANULAR	7:09 a. m.	53520	20	N/A	N/A
12/06/2026	BASE GRANULAR	7:13 a. m.	53521	20	N/A	N/A
12/06/2026	BASE GRANULAR	7:20 a. m.	53522	14	N/A	N/A
12/06/2026	BASE GRANULAR	9:35 a. m.	53526	7	N/A	N/A
12/06/2026	BASE GRANULAR	9:55 a. m.	53527	12	N/A	N/A
12/06/2026	BASE GRANULAR	10:17 a. m.	53529	20	N/A	N/A
12/06/2026	BASE GRANULAR	10:32 a. m.	53530	20	N/A	N/A
12/06/2026	BASE GRANULAR	11:12 a. m.	53531	20	N/A	N/A
12/06/2026	BASE GRANULAR	11:31 a. m.	53532	20	N/A	N/A
12/06/2026	BASE GRANULAR	1:08 p. m.	53547	20	N/A	N/A
12/06/2026	BASE GRANULAR	1:24 p. m.	53550	20	N/A	N/A
12/06/2026	BASE GRANULAR	1:50 p. m.	53553	20	N/A	N/A
12/06/2026	BASE GRANULAR	2:15 a. m.	53552	7	N/A	N/A
12/06/2026	BASE GRANULAR	2:34 p. m.	53554	12	N/A	N/A
12/06/2026	BASE GRANULAR	1:31 p. m.	53557	20	N/A	N/A
12/06/2026	BASE GRANULAR	4:32 p. m.	53576	20	N/A	N/A
12/06/2026	BASE GRANULAR	4:36 p. m.	53577	20	N/A	N/A
12/06/2026	BASE GRANULAR	4:42 p. m.	53578	20	N/A	N/A
12/06/2026	BASE GRANULAR	4:36 p. m.	53577	20	N/A	N/A
12/06/2026	BASE GRANULAR	4:42 p. m.	53578	20	N/A	N/A
12/06/2026	BASE GRANULAR	5:15 p. m.	53579	20	N/A	N/A
16/06/2026	BASE GRANULAR	7:00 a. m.	53592	20	N/A	N/A
16/06/2026	BASE GRANULAR	7:07 a. m.	53595	20	N/A	N/A
16/06/2026	BASE GRANULAR	7:12 a. m.	53596	20	N/A	N/A
16/06/2026	BASE GRANULAR	9:53 a. m.	53605	14	N/A	N/A
16/06/2026	BASE GRANULAR	10:09 a. m.	53607	7	N/A	N/A
16/06/2026	BASE GRANULAR	10:16 a. m.	53608	12	N/A	N/A
16/06/2026	BASE GRANULAR	10:50 a. m.	1632	20	N/A	N/A
16/06/2026	BASE GRANULAR	11:15 a. m.	1633	20	N/A	N/A
16/06/2026	BASE GRANULAR	11:37 a. m.	1634	20	N/A	N/A
16/06/2026	BASE GRANULAR	12:05 p.m	1637	20	N/A	N/A
16/06/2026	BASE GRANULAR	1:30 p.m	1638	12	N/A	N/A
16/06/2026	BASE GRANULAR	1:40 p.m	1639	7	N/A	N/A
16/06/2026	BASE GRANULAR	1:45 p.m	1640	20	N/A	N/A
16/06/2026	BASE GRANULAR	1:53 p.m	53639	20	N/A	N/A
16/06/2026	BASE GRANULAR	3:50 p. m.	53641	20	N/A	N/A
16/06/2026	BASE GRANULAR	4:02 p. m.	53657	20	N/A	N/A
16/06/2026	BASE GRANULAR	4:32 p. m.	1646	20	N/A	N/A
16/06/2026	BASE GRANULAR	4:40 p.m	1648	20	N/A	N/A
17/06/2026	BASE GRANULAR	7:00 a. m.	53703	20	N/A	N/A
17/06/2026	BASE GRANULAR	7:05 a. m.	53704	20	N/A	N/A
17/06/2026	BASE GRANULAR	7:10 a. m.	53705	20	N/A	N/A
17/06/2026	BASE GRANULAR	7:15 a. m.	53706	20	N/A	N/A
17/06/2026	BASE GRANULAR	7:20 a. m.	53707	14	N/A	N/A
17/06/2026	BASE GRANULAR	7:25 a. m.	53708	14	N/A	N/A
17/06/2026	BASE GRANULAR	9:40 a. m.	53714	7	N/A	N/A
17/06/2026	BASE GRANULAR	10:00 a. m.	53716	12	N/A	N/A
17/06/2026	BASE GRANULAR	11:00 a. m.	53717	20	N/A	N/A
17/06/2026	BASE GRANULAR	11:05 a. m.	53722	20	N/A	N/A
17/06/2026	BASE GRANULAR	11:10 a. m.	53723	20	N/A	N/A
17/06/2026	BASE GRANULAR	11:20 a. m.	53724	20	N/A	N/A
17/06/2026	BASE GRANULAR	11:25 a. m.	53731	20	N/A	N/A
17/06/2026	BASE GRANULAR	1:15 P.m	53732	7	N/A	N/A
17/06/2026	BASE GRANULAR	1:25 P.M	53734	12	N/A	N/A
17/06/2026	BASE GRANULAR	2:15 p.M	53739	20	N/A	N/A

17/06/2026	BASE GRANULAR	2:20 P.m	53741	20	N/A	N/A
17/06/2026	BASE GRANULAR	2:25 P.m	53744	20	N/A	N/A
17/06/2026	BASE GRANULAR	2:30 P.m	3751	20	N/A	N/A
17/06/2026	BASE GRANULAR	2:40 P.m	3752	20	N/A	N/A
18/06/2026	BASE GRANULAR	7:00 a. m.	53775	14	N/A	N/A
18/06/2026	BASE GRANULAR	7:05 a. m.	53777	20	N/A	N/A
18/06/2026	BASE GRANULAR	7:10 a. m.	53778	20	N/A	N/A
18/06/2026	BASE GRANULAR	7:15 a. m.	53779	20	N/A	N/A
18/06/2026	BASE GRANULAR	7:20 a. m.	53780	14	N/A	N/A
18/06/2026	BASE GRANULAR	9:26 a. m.	53787	7	N/A	N/A
18/06/2026	BASE GRANULAR	10:30 p. m.	53795	20	N/A	N/A
18/06/2026	BASE GRANULAR	10:35 a. m.	53796	20	N/A	N/A
18/06/2026	BASE GRANULAR	11:05 a. m.	53797	20	N/A	N/A
18/06/2026	BASE GRANULAR	11:10 a. m.	3759	20	N/A	N/A
18/06/2026	BASE GRANULAR	11:20 a. m.	3760	20	N/A	N/A
18/06/2026	BASE GRANULAR	11:25 a. m.	3761	20	N/A	N/A
18/06/2026	BASE GRANULAR	1:15 P.m	3758	12	N/A	N/A
18/06/2026	BASE GRANULAR	1:25 P.M	53788	12	N/A	N/A
22/06/2026	BASE GRANULAR	7:00 a. m.	53904	20	N/A	N/A
22/06/2026	BASE GRANULAR	7:05 a. m.	53905	20	N/A	N/A
22/06/2026	BASE GRANULAR	7:10 a. m.	53907	20	N/A	N/A
22/06/2026	BASE GRANULAR	7:15 a. m.	53912	12	N/A	N/A
22/06/2026	BASE GRANULAR	7:20 a. m.	53913	7	N/A	N/A
22/06/2026	BASE GRANULAR	7:25 a. m.	53915	7	N/A	N/A
22/06/2026	BASE GRANULAR	9:40 a. m.	53927	7	N/A	N/A
22/06/2026	BASE GRANULAR	10:00 a. m.	53931	12	N/A	N/A
22/06/2026	BASE GRANULAR	11:00 a. m.	53930	7	N/A	N/A
23/06/2026	BASE GRANULAR	11:05 a. m.	53957	20	N/A	N/A
23/06/2026	BASE GRANULAR	11:10 a. m.	53958	20	N/A	N/A
23/06/2026	BASE GRANULAR	11:20 a. m.	53959	20	N/A	N/A
23/06/2026	BASE GRANULAR	11:25 a. m.	53960	20	N/A	N/A
23/06/2026	BASE GRANULAR	1:15 P.m	53961	7	N/A	N/A
23/06/2026	BASE GRANULAR	1:25 P.M	53962	12	N/A	N/A
23/06/2026	BASE GRANULAR	2:15 p.M	53965	7	N/A	N/A
23/06/2026	BASE GRANULAR	2:20 P.m	53968	7	N/A	N/A
23/06/2026	BASE GRANULAR	2:25 P.m	53971	7	N/A	N/A
23/06/2026	BASE GRANULAR	2:30 P.m	53973	12	N/A	N/A
23/06/2026	BASE GRANULAR	2:40 P.m	53985	20	N/A	N/A
23/06/2026	BASE GRANULAR	2:45 P.M	53987	20	N/A	N/A
24/06/2026	BASE GRANULAR	7:00 a. m.	54008	20	N/A	N/A
24/06/2026	BASE GRANULAR	7:07 a. m.	54009	20	N/A	N/A
24/06/2026	BASE GRANULAR	7:12 a. m.	54035	7	N/A	N/A
24/06/2026	BASE GRANULAR	9:53 a. m.	54037	20	N/A	N/A
24/06/2026	BASE GRANULAR	10:09 a. m.	54038	20	N/A	N/A
24/06/2026	BASE GRANULAR	10:16 a. m.	54039	7	N/A	N/A
24/06/2026	BASE GRANULAR	10:50 a. m.	54040	12	N/A	N/A
24/06/2026	BASE GRANULAR	11:15 a. m.	3773	7	N/A	N/A
24/06/2026	BASE GRANULAR	11:37 a. m.	3775	14	N/A	N/A
24/06/2026	BASE GRANULAR	12:05 p.m	3776	20	N/A	N/A
24/06/2026	BASE GRANULAR	1:30 p.m	3777	14	N/A	N/A
24/06/2026	BASE GRANULAR	1:40 p.m	3781	20	N/A	N/A
24/06/2026	BASE GRANULAR	1:45 p.m	3784	14	N/A	N/A
24/06/2026	BASE GRANULAR	1:53 p.m	3785	14	N/A	N/A
24/06/2026	BASE GRANULAR	2:15 p.M	3783	12	N/A	N/A
24/06/2026	BASE GRANULAR	2:20 P.m	54084	20	N/A	N/A
24/06/2026	BASE GRANULAR	2:25 P.m	54085	20	N/A	N/A
24/06/2026	BASE GRANULAR	2:30 P.m	3790	7	N/A	N/A
25/06/2026	BASE GRANULAR	7:05 a. m.	54106	7	N/A	N/A
25/06/2026	BASE GRANULAR	7:10 a. m.	54110	7	N/A	N/A
25/06/2026	BASE GRANULAR	7:15 a. m.	54111	12	N/A	N/A
25/06/2026	BASE GRANULAR	7:20 a. m.	3796	7	N/A	N/A
25/06/2026	BASE GRANULAR	7:25 a. m.	3797	7	N/A	N/A
25/06/2026	BASE GRANULAR	9:40 a. m.	3799	12	N/A	N/A
26/06/2026	MEZCLA ASFALTICA	2:45 P.M	54154	7	133	113
26/06/2026	MEZCLA ASFALTICA	3:55 P.m	54157	12	131	113
30/06/2026	MEZCLA ASFALTICA	9:00 a. m.	54198	14	133	118
30/06/2026	MEZCLA ASFALTICA	9:20 a. m.	54200	14	132	117
30/06/2026	MEZCLA ASFALTICA	9:40 a. m.	54202	14	133	117
30/06/2026	MEZCLA ASFALTICA	10:00 a. m.	54207	14	131	118
30/06/2026	MEZCLA ASFALTICA	10:30 a. m.	54212	7	131	116
30/06/2026	MEZCLA ASFALTICA	10:50 a. m.	54209	14	131	119
30/06/2026	MEZCLA ASFALTICA	11:15 a. m.	54211	14	132	118
30/06/2026	MEZCLA ASFALTICA	11:30 a. m.	54214	7	130	117
30/06/2026	MEZCLA ASFALTICA	11:45 a. m.	54215	8	130	117
30/06/2026	MEZCLA ASFALTICA	11:59 a. m.	54217	12	131	115

NOTA: Verificar en todos los vales de control de materiales despachados de la planta la temperatura de la mezcla.

Elaboro		**Aprobo**	
Nombre:	**FABIAN DAVID SUAREZ**	**Nombre:**	**RAFAEL CAMILO SUAREZ**
Cargo:	**APOYO A LA SUPERVISION TIERRASUA**	**Cargo:**	**APOYO A LA SUPERVISION TIERRASUA**
Firma:		**Firma:**	

TIERRASUA


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Mejoramiento y mantenimiento de la via codigo 5505107 (INCE ruta 55 (rumal - Sogamoso)

ACTIVIDAD: Demolicion huipeta asfaltica **FECHA:** 01-06-26

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Fabian Suarez

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

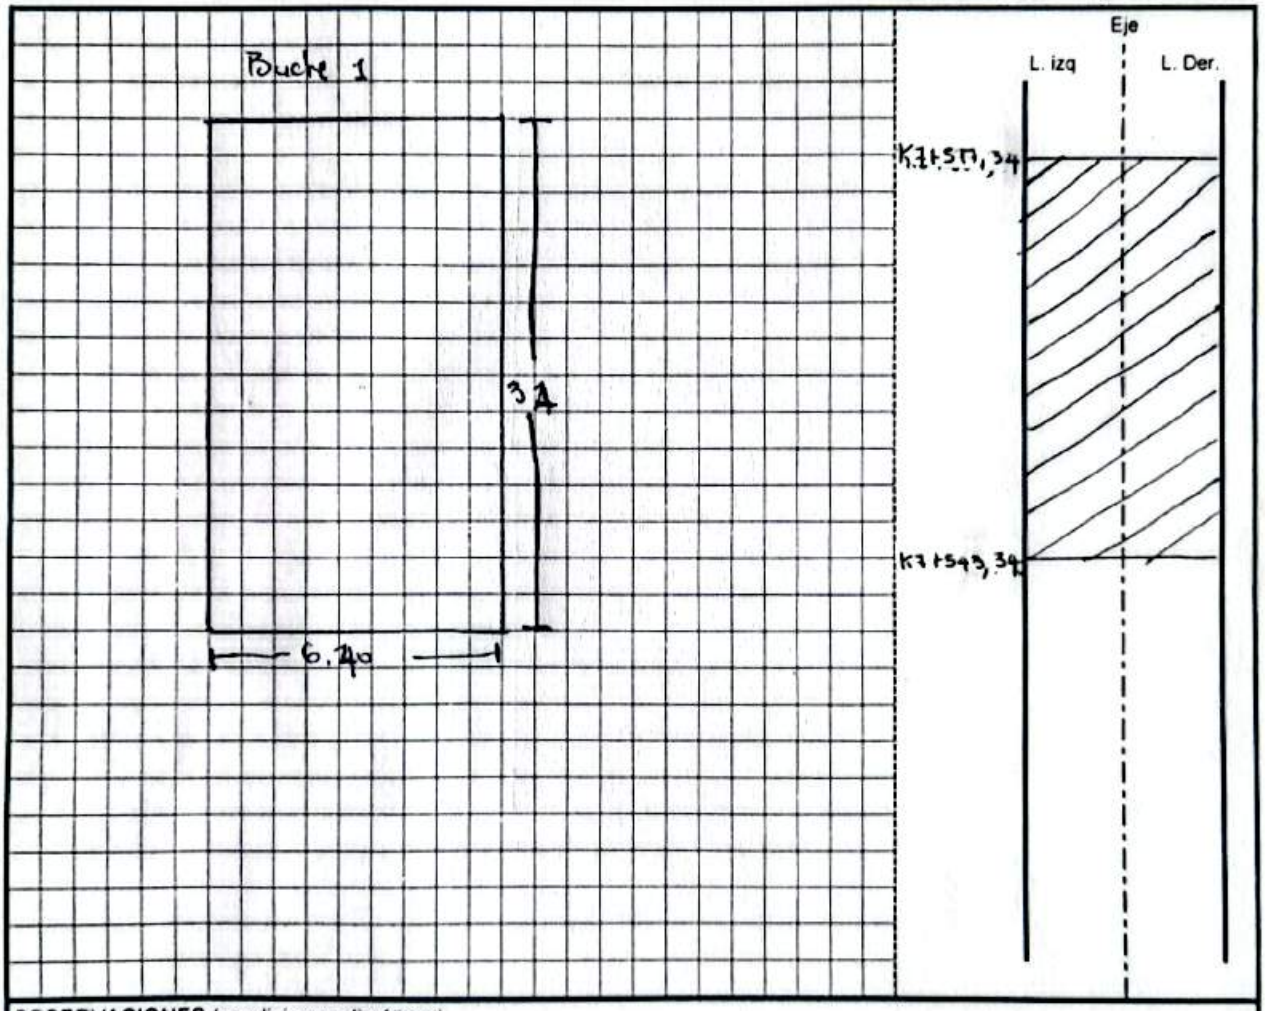

OBSERVACIONES (condiciones climáticas)

Dia Soleado.

FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO APOYO A LA SUPERVISIÓN

Vo.Bo.
Nombre: Camilo Suárez
Firma:
Cargo: Apoyo supervisión

Powered by CamScanner

TIERRASUA


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Mejoramiento y mantenimiento a la vía radigo 550407 cruce ruta 55 rumul - Soluquilla

ACTIVIDAD: Extracción material grupo B1 Instalación Asfalto **FECHA:** 02-06-26

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Fabian Suárez

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

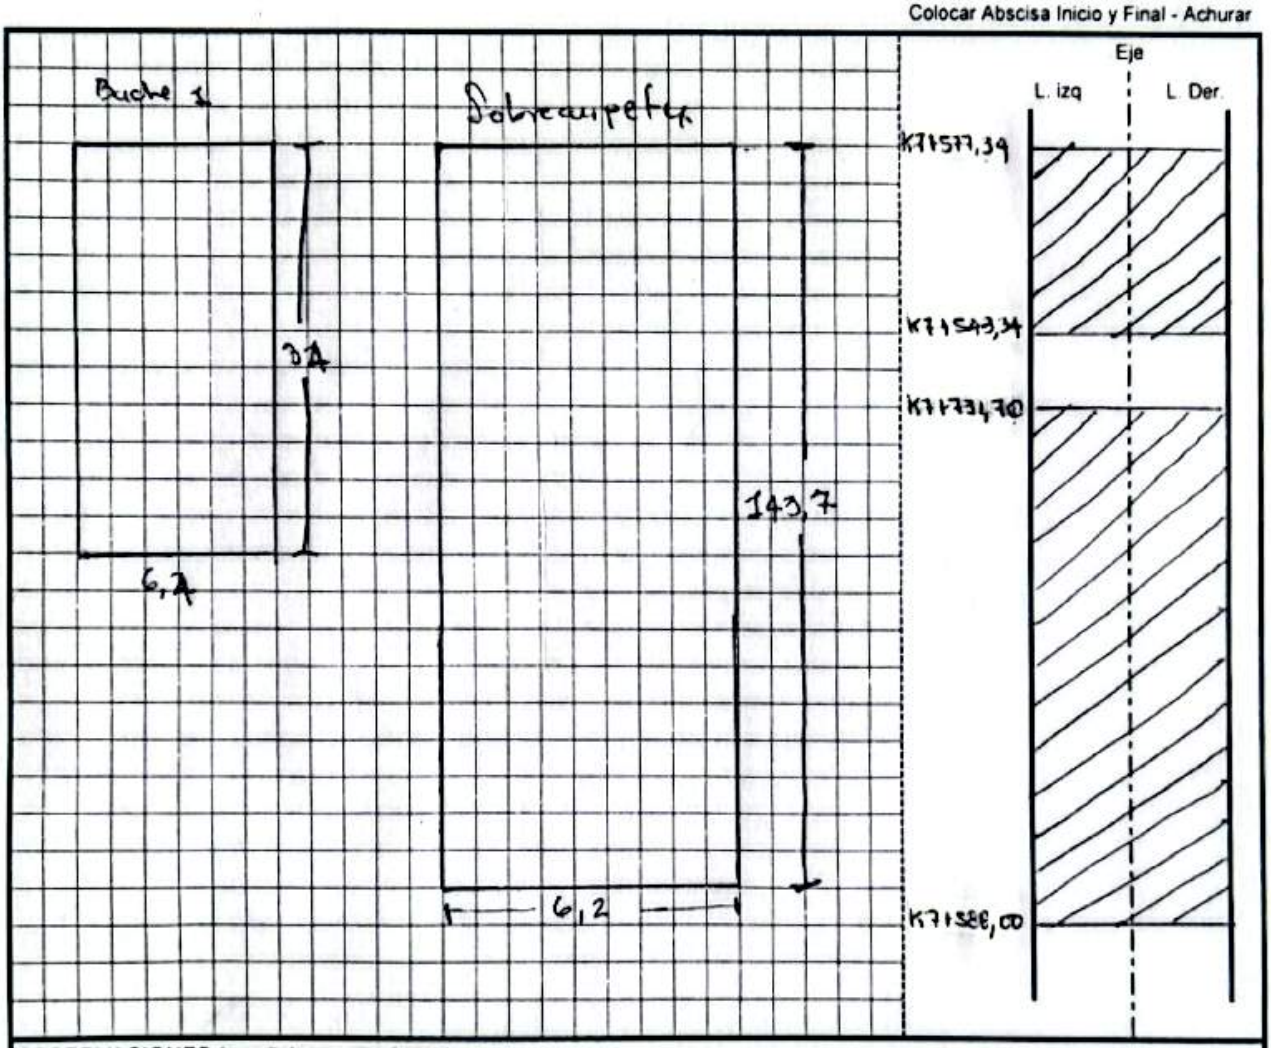

OBSERVACIONES (condiciones climáticas)

Dia Soleado.

FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO APOYO A LA SUPERVISION

Vo.Bo.
Nombre: Camilo Suárez
Firma:
Cargo: Apoyo supervisión

Powered by CamScanner

TIERRASUA


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Mejoramiento y mantenimiento de la vía todrgo 550107 cruce ruta 55 ramal-Solaquira

ACTIVIDAD: Remplazo Material apoyo por base granular **FECHA:** 03-06-26

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Fabian Suárez

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

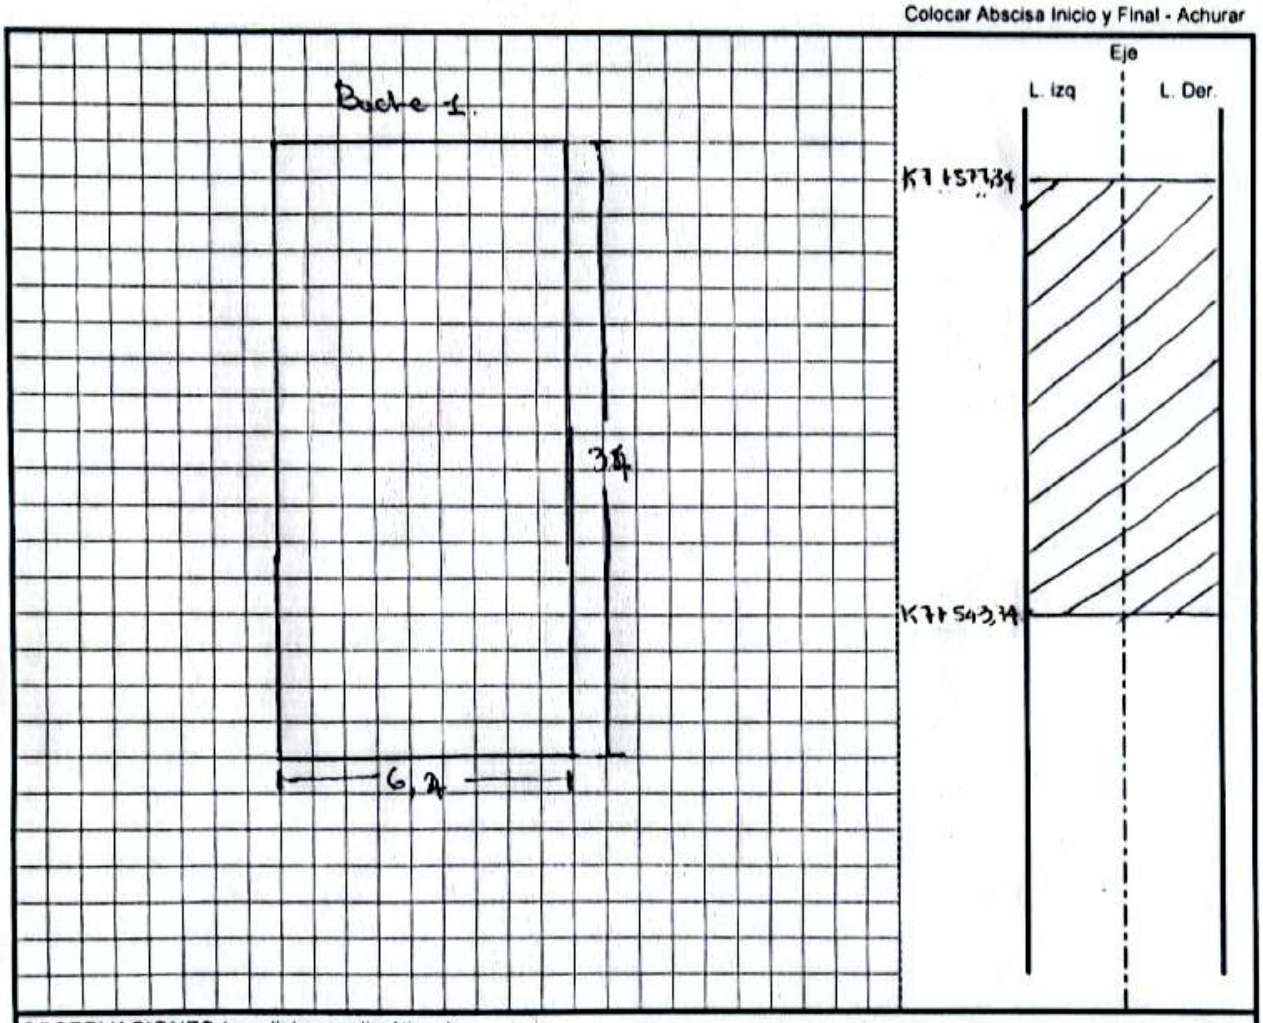

OBSERVACIONES (condiciones climáticas)

Dia soleado

FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO APOYO A LA SUPERVISION

Vo.Bo.
Nombre: Camilo Suárez
Firma:
Cargo Apoyo supervisión

Powered by CamScanner

TIERRASUA


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Mejoramiento y mantenimiento de la via tramo 5501+07 cruce ruta 95 ramal - Saterigua

ACTIVIDAD: Suministro reemplazo base. **FECHA:** 04-06-26

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Fabian Suárez

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

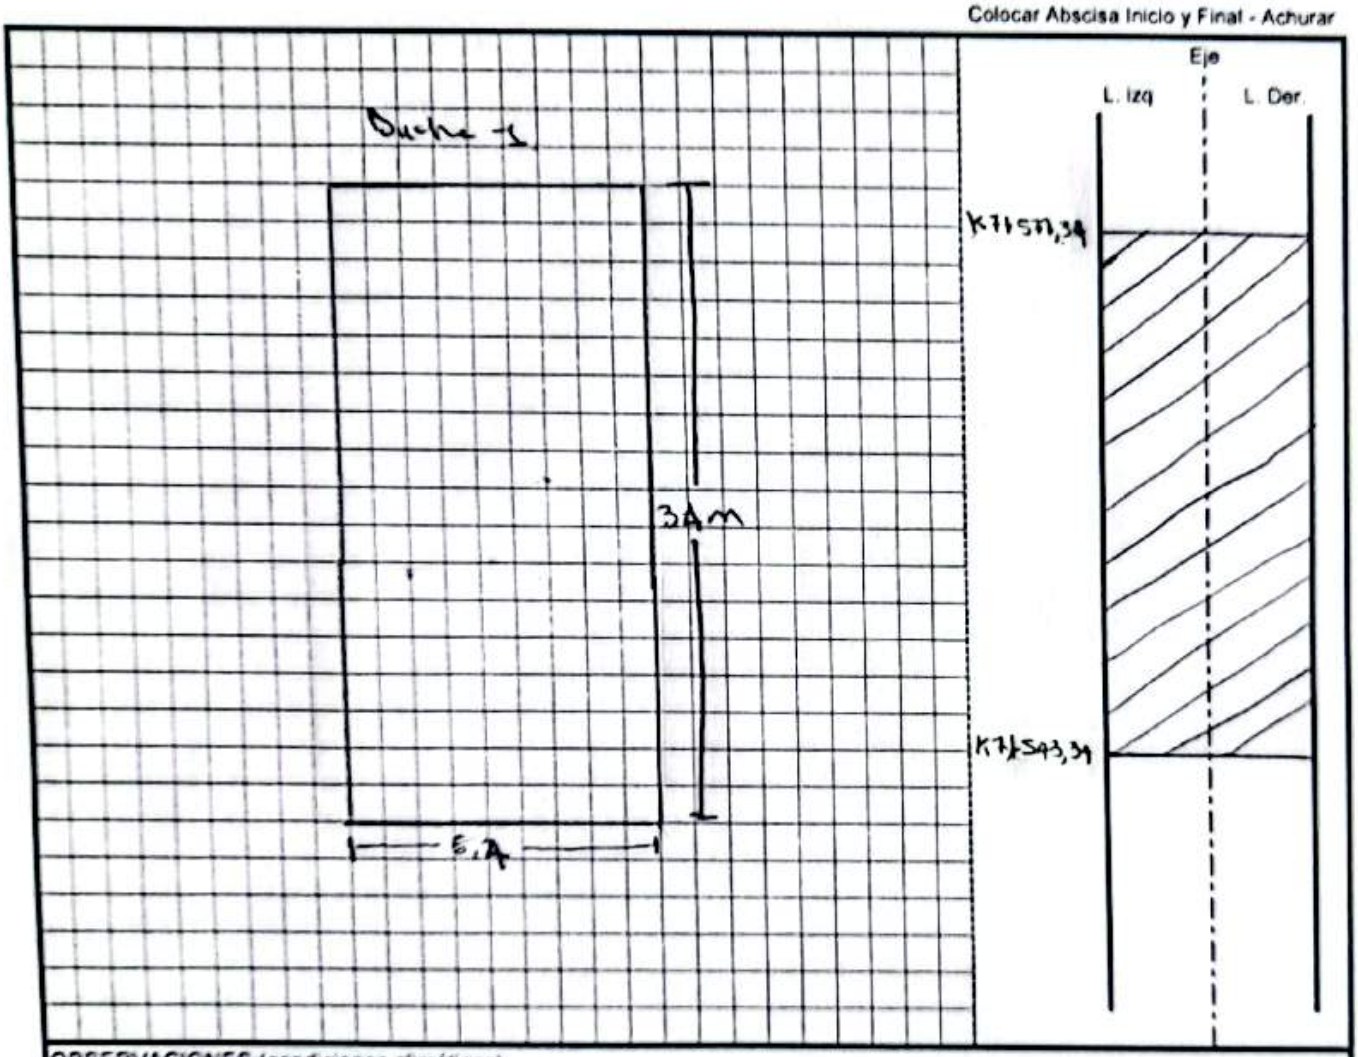

OBSERVACIONES (condiciones climáticas)

Dia soleado.

FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO APOYO A LA SUPERVISIÓN

Vo.Bo.
Nombre: Camilo Suárez
Firma:
Cargo Apoyo supervisión

Powered by CamScanner

TIERRASUA


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Mejoramiento y mantenimiento de la via codigo 550407 Cruce ruta 55 Rumal - Sotaqueira

ACTIVIDAD : Limpieza de cuneta | **FECHA :** 05-06-26

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Fabian Suarez

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

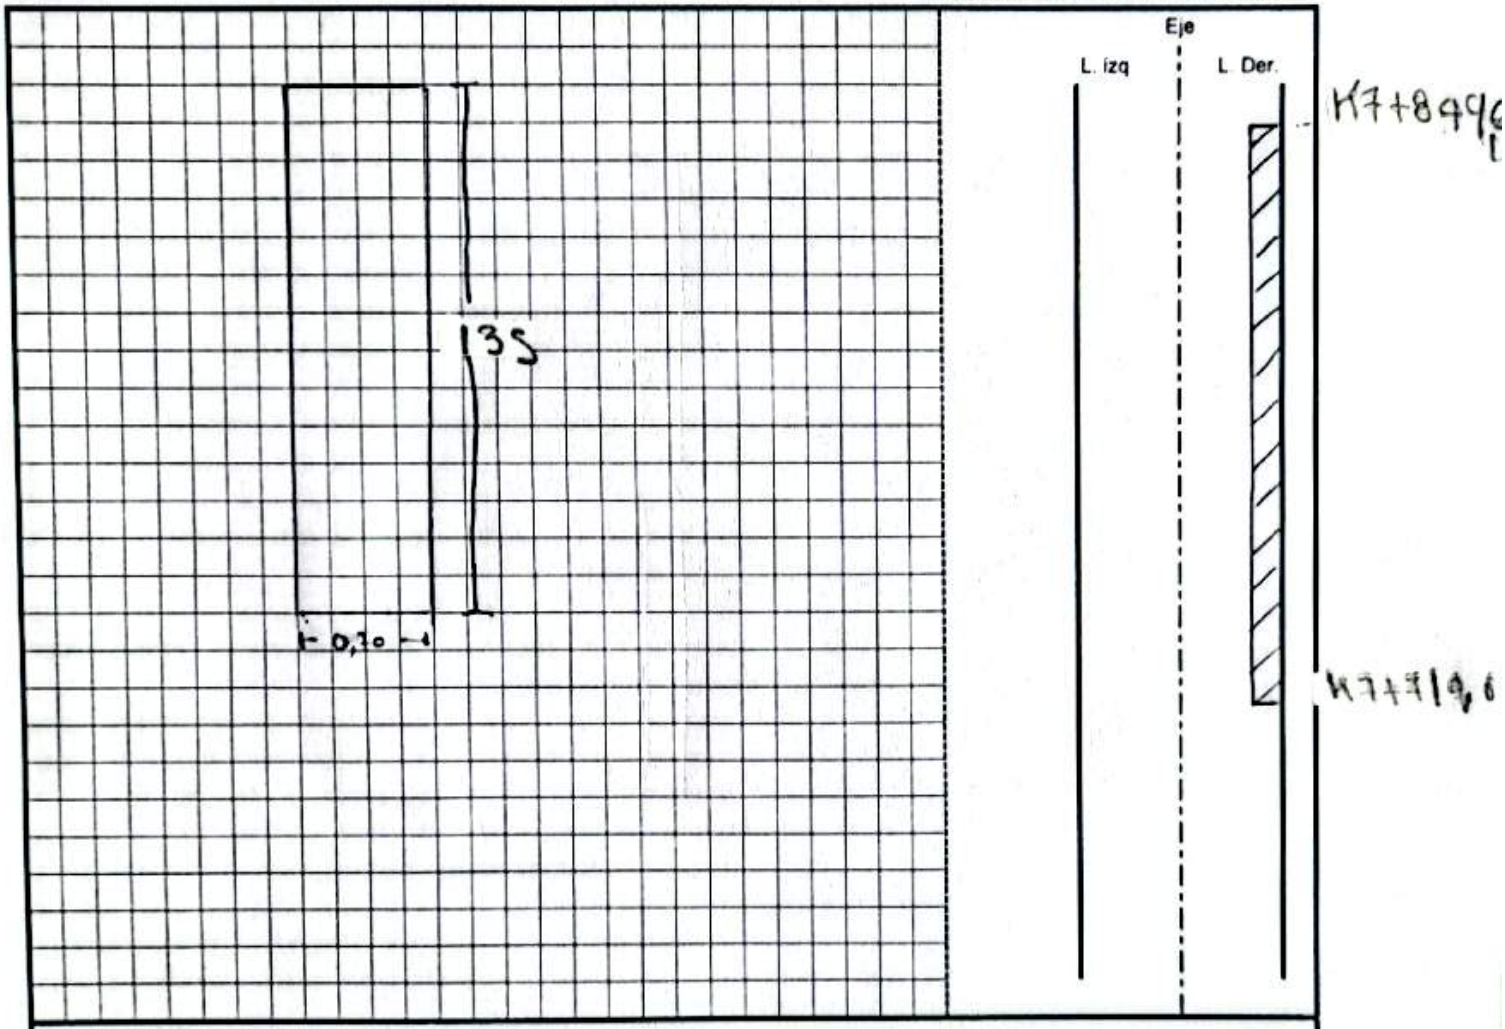

OBSERVACIONES (condiciones climáticas)

Dia Soleado

FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO APOYO A LA SUPERVISION

Vo.Bo.
Nombre Camilo Suarez
Firma:
Cargo Apoyo Supervisión

Powered by CamScanner

TIERRASUA
¡Conectamos regiones!


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Mejoramiento y mantenimiento de la vía Código 5506107 Ruta 55 Rumichaca - Sotaquira

ACTIVIDAD: Limpieza de cunetas **FECHA:** 09-06-26

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Fabian Suárez

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

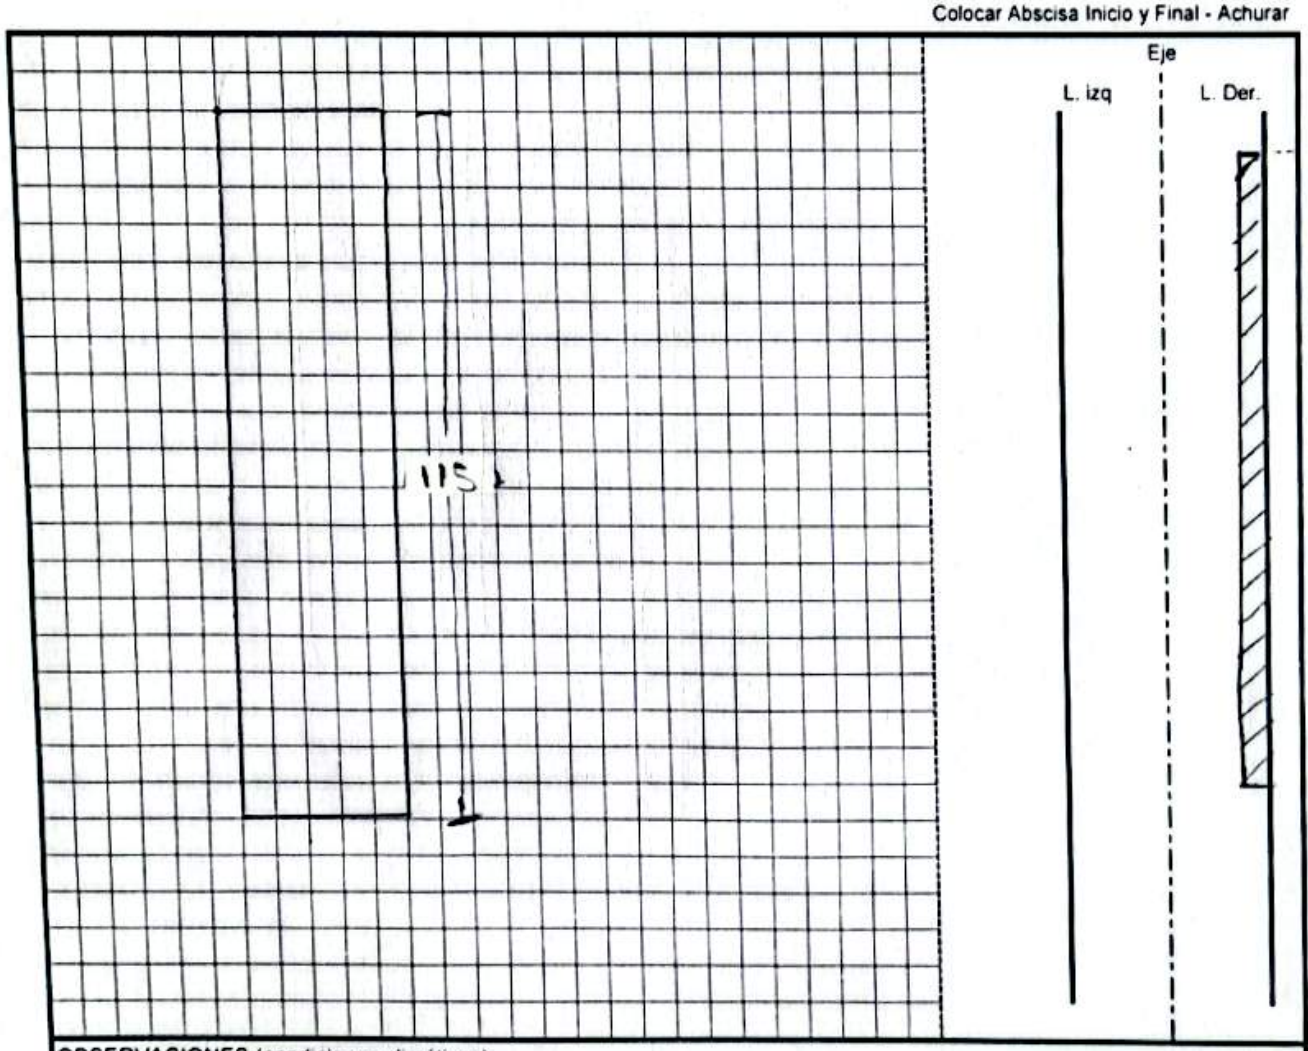

OBSERVACIONES (condiciones climáticas)

Dia Soleado, tarde nublada con lluvias intensas.

FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO APOYO A LA SUPERVISIÓN

Vo.Bo.
Nombre: Camilo Suarez
Firma:
Cargo: Apoyo supervisión

Powered by CamScanner

TIERRASUA


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Mejoramiento y mantenimiento de la vía codigo 558107 cruce ruta 55 Damul-Salaquica

ACTIVIDAD : Instalación de base granular. **FECHA :** 10-06-26

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Fabian Suarez

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

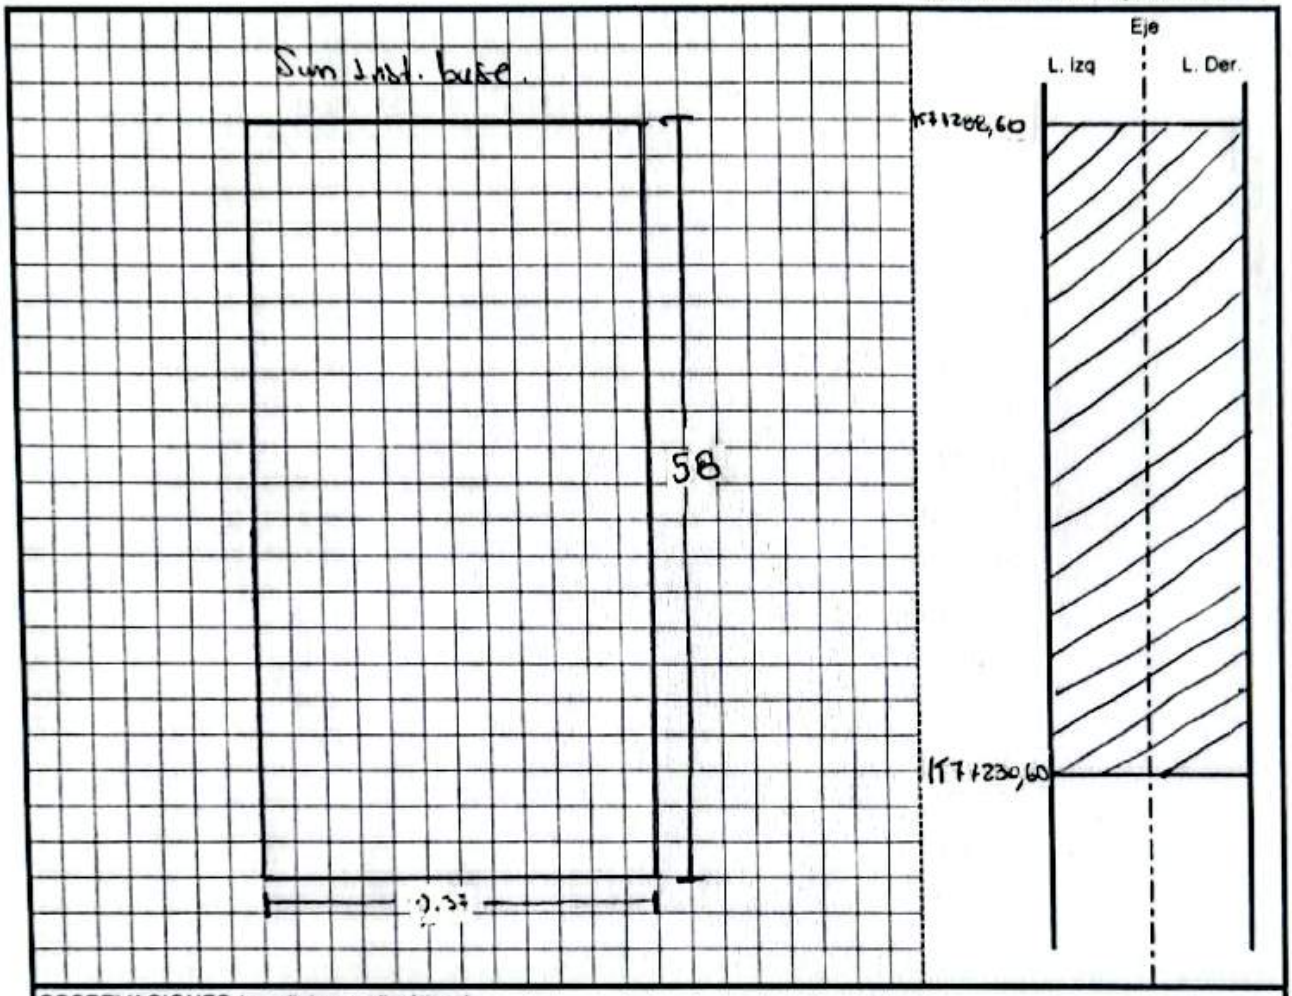

OBSERVACIONES (condiciones climáticas)

Dia Soleado.

FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO APOYO A LA SUPERVISIÓN

Vo.Bo.
Nombre: Camilo Suárez
Firma:
Cargo Apoyo Supervisión.

Powered by CamScanner

TIERRASUA


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Mejoramiento y mantenimiento de la vía codigo 5SB407 cruce ruta 55 Rumal - Sotaqui

ACTIVIDAD: Suministro instalación de bordé. **FECHA:** 11-06-26

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Fabian Suarez

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

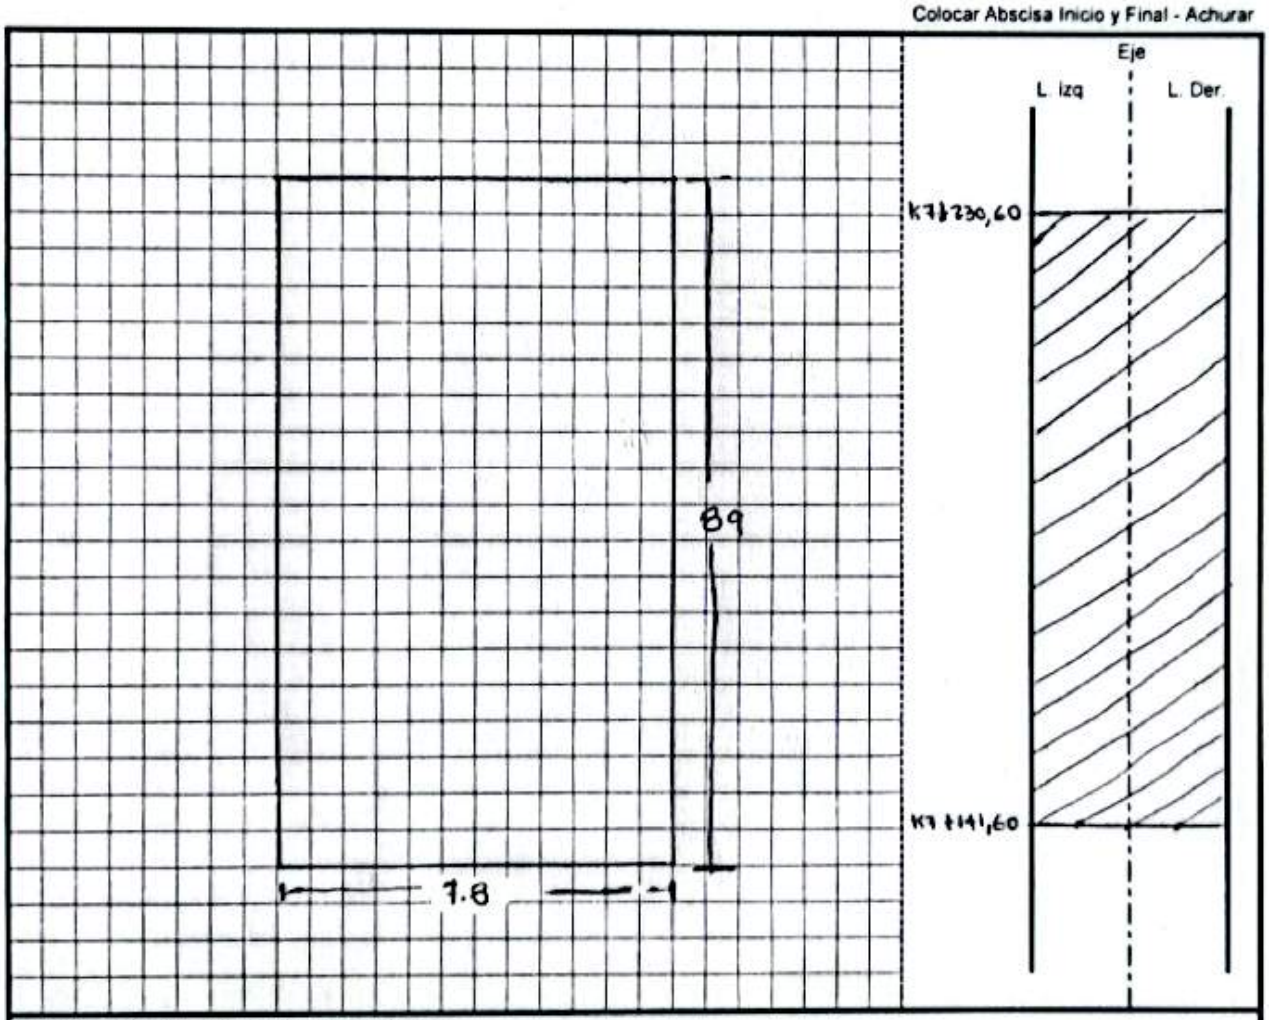

OBSERVACIONES (condiciones climáticas)

Dia soleado

FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO APOYO A LA SUPERVISIÓN

Vo.Bo.
Nombre: Camilo Suárez
Firma:
Cargo: Apoyo supervisión

Powered by CamScanner

TIERRASUA


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Mejoramiento y mantenimiento de la vía rodigo 550107 entre ruta 55 Dumul - Sotaqui14

ACTIVIDAD : Suministro instalación de tubo **FECHA :** 17-06-26

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Fabian Suárez

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

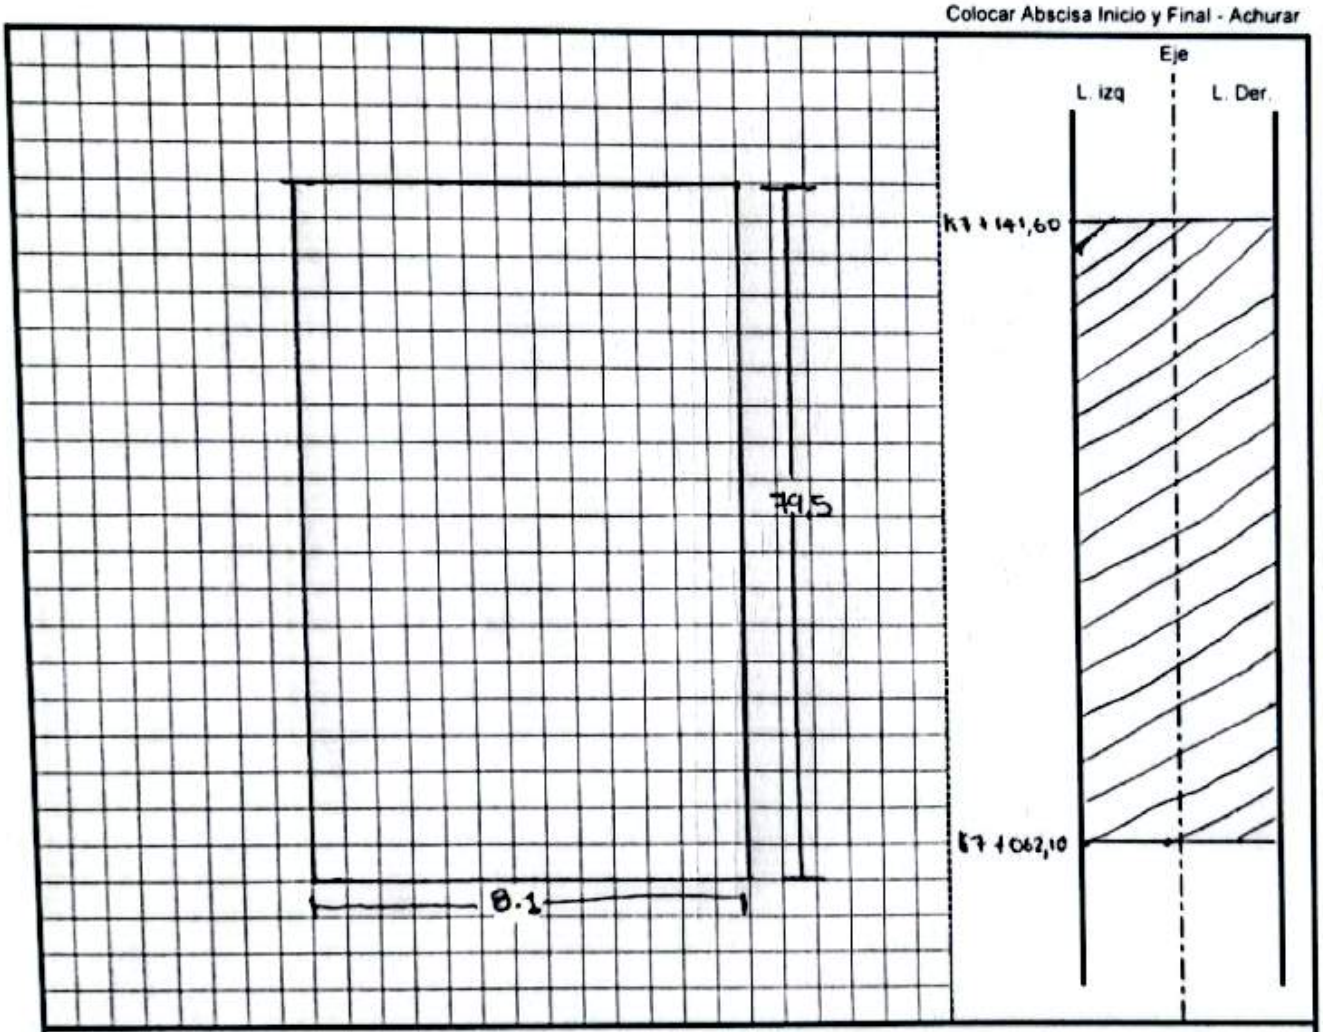

OBSERVACIONES (condiciones climáticas)

Maquina sale de turde con normalidad

FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO APOYO A LA SUPERVISIÓN

Vo.Bo
Nombre: Camilo Suárez
Firma:
Cargo: Apoyo supervisión

Powered by CamScanner

TIERRASUA


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Mejoramiento y mantenimiento de la vía codigo 55B107 cruce ruta 55 - Rumul - Solaqvita

ACTIVIDAD : Suministro Instalacion de base. FECHA : 16-06-26

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Fabian Suarez

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

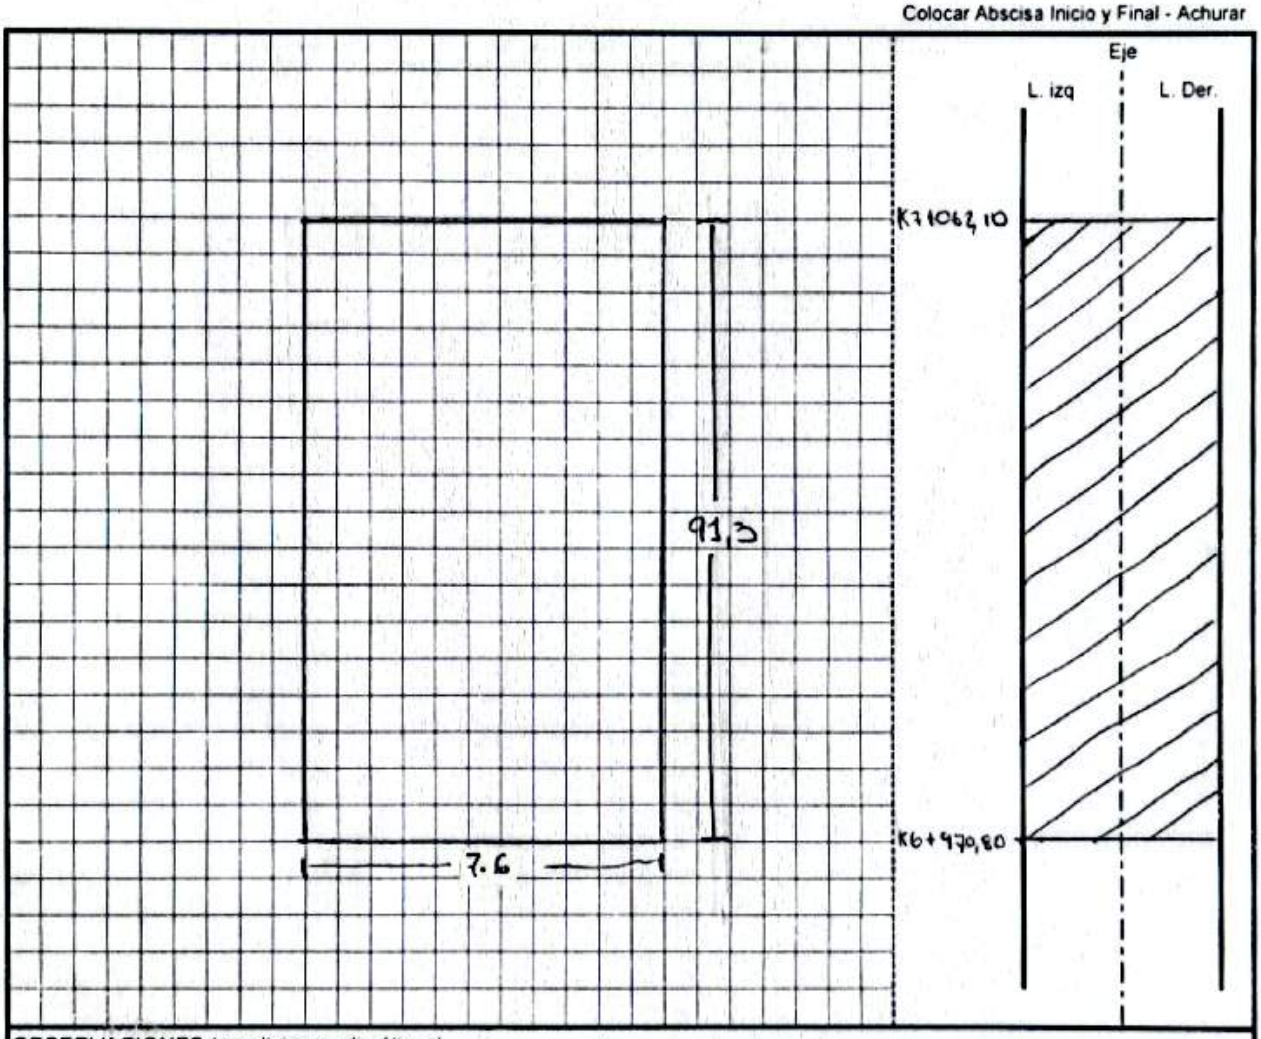

OBSERVACIONES (condiciones climáticas)

Dia Soleado

FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO

Vo.Bo.
Nombre Camilo Suarez
Firma
Cargo Apoya supervisión

Powered by CamScanner

TIERRASUA


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Mejoramiento y mantenimiento de la via codigo 550107 trocha 55 Ramal - Sotaquira.

ACTIVIDAD: Suministro e instalación de base. **FECHA:** 17-06-26

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Fabian Suarez.

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

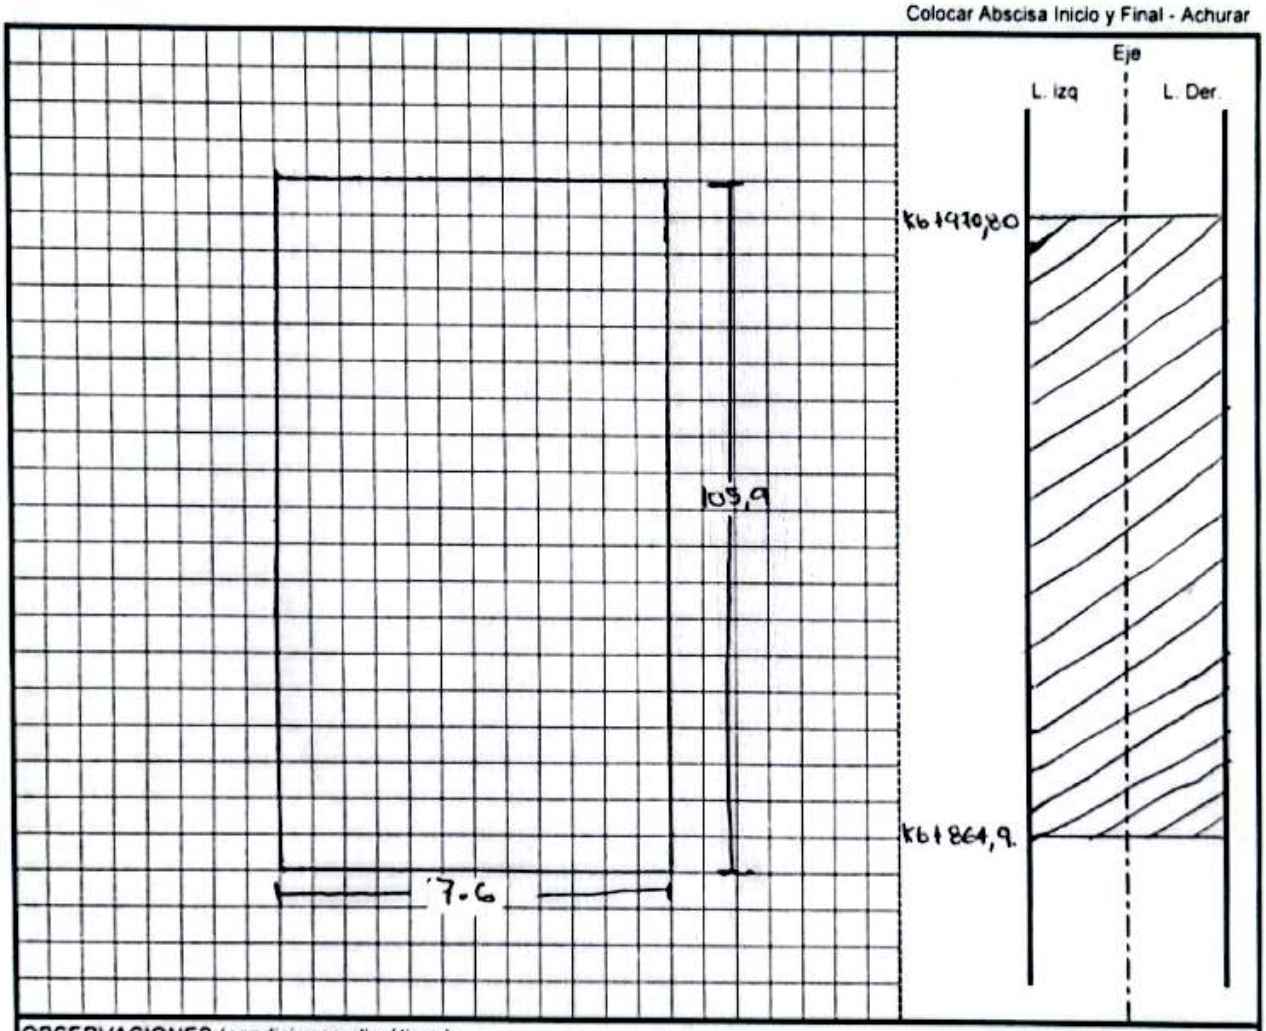

OBSERVACIONES (condiciones climáticas)

Dia soleado, tarde con lloviznas leves.

FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO

Vo.Bo.
Nombre: Camilo Suarez
Firma:
Cargo: Apoyo supervisión

Powered by CamScanner

TIERRASUA


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Mejoramiento y mantenimiento de la via codigo 558407 cruce ruta 55 Rumal - Sokiquira

ACTIVIDAD: Suministro e instalación de base **FECHA:** 18-06-26

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Fabian Suarez.

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

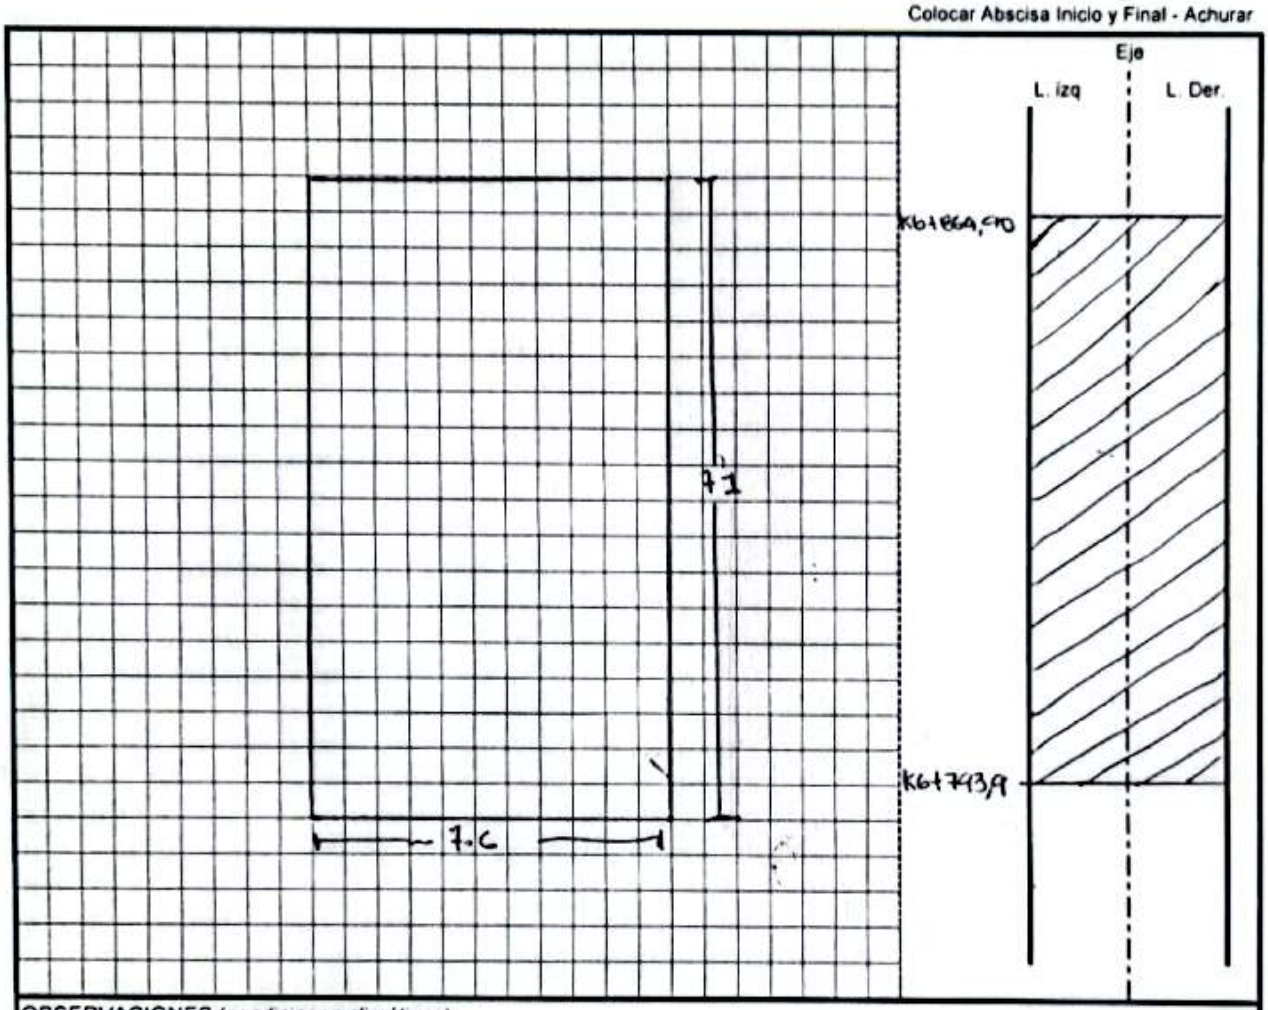

OBSERVACIONES: (condiciones climáticas)

Dia Soleado

FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO

Vo.Bo.
Nombre: Camilo Suárez
Firma:
Cargo: Apoyo Supervisión

Powered by CamScanner

TIERRASUA


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Mejoramiento y mantenimiento de la vía codigo 558407 cruce ruta 55 Rumal-Solaquina

ACTIVIDAD : Suministro, instalación y cerco de base granular **FECHA:** 22-06-26

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Fabian Suarez

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

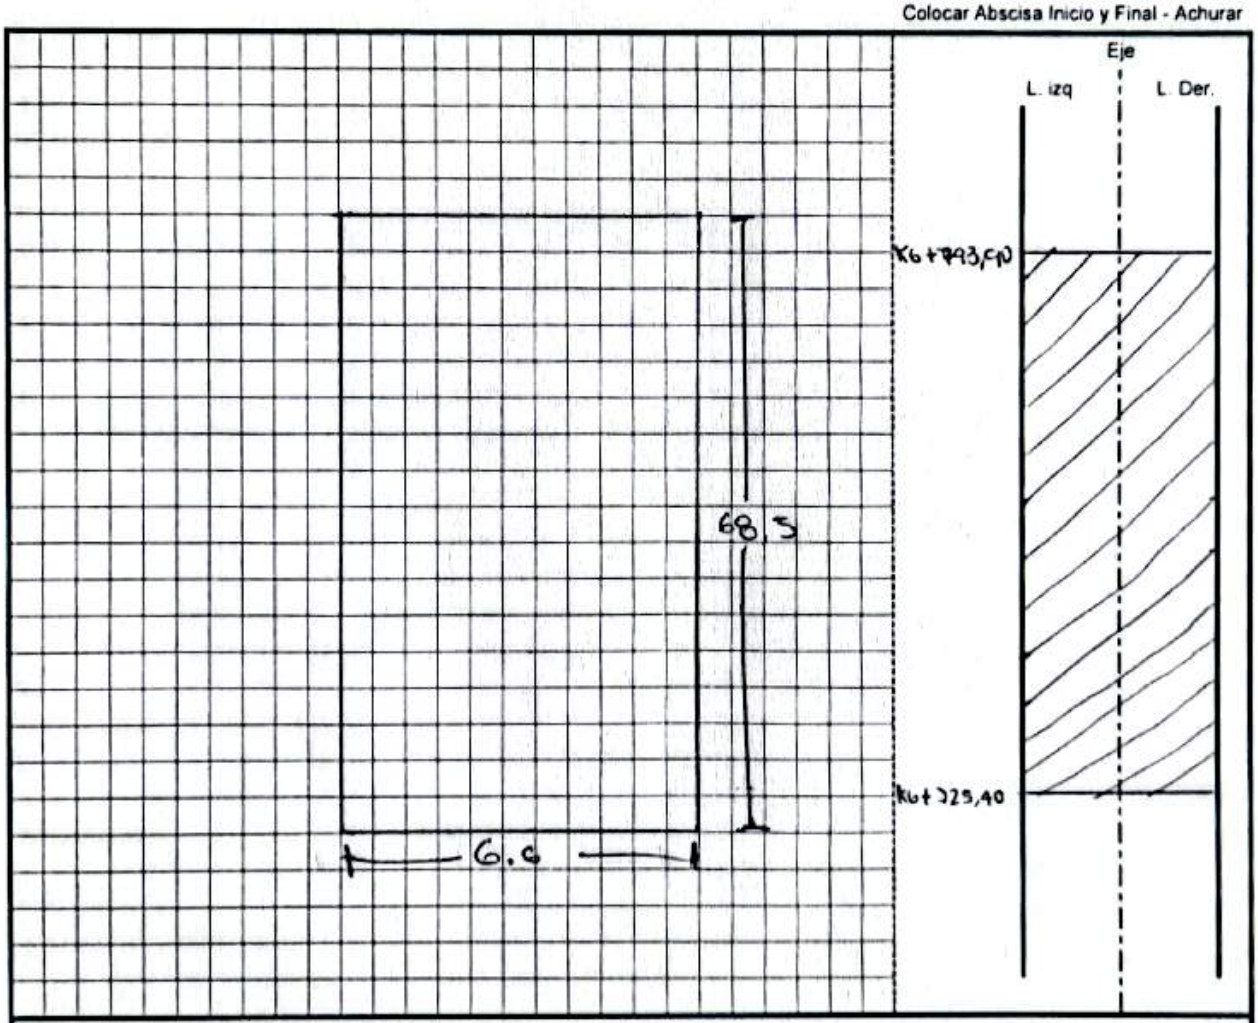

OBSERVACIONES (condiciones climáticas)

Dia Soleado

FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO

Vo.Bo.
Nombre: Camilo Suarez
Firma:
Cargo: Apoyo supervisión

Powered by CamScanner

TIERRASUA


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Mejoramiento y mantenimiento de la vía codigo 558407 cruce ruta 55 Rumul-Sotaqueira

ACTIVIDAD : Suministro, instalación y cerco de base granular **FECHA :** 23-06-26

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Fabian Suárez

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

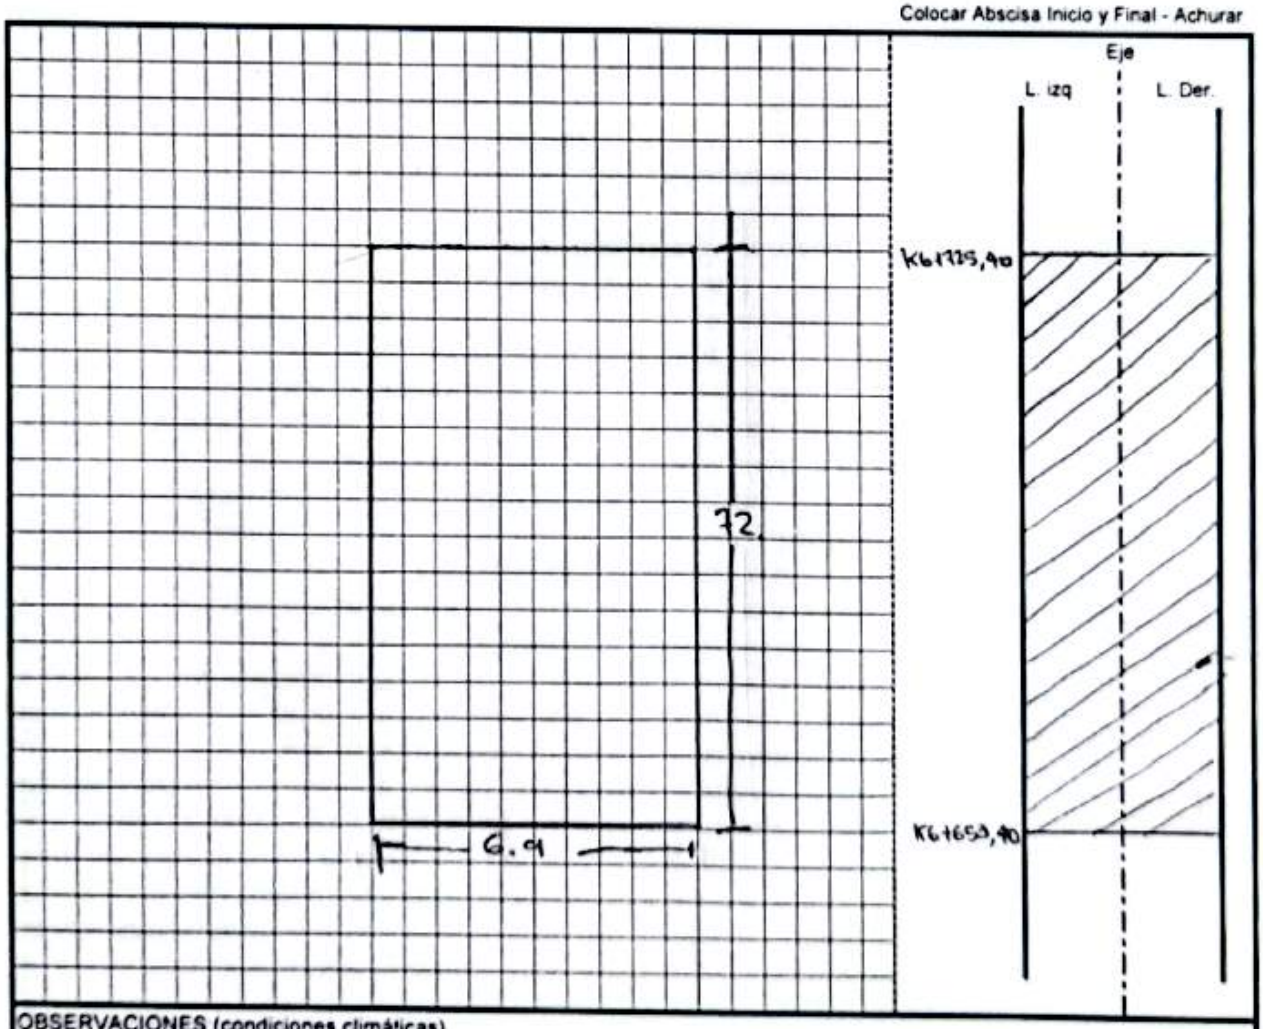

OBSERVACIONES (condiciones climáticas)

Dia Soleado

FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO

Vo.Bo.
Nombre: Camilo Suarez
Firma:
Cargo Apoyo supervisión

Powered by CamScanner

TIERRASUA


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Mejoramiento y mantenimiento de la vía código 5504 01 en el tramo Rumal - Solapa circ

ACTIVIDAD: Suministro, instalación y cerro de base granular FECHA: 24-06-26

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Fabian Suarez

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

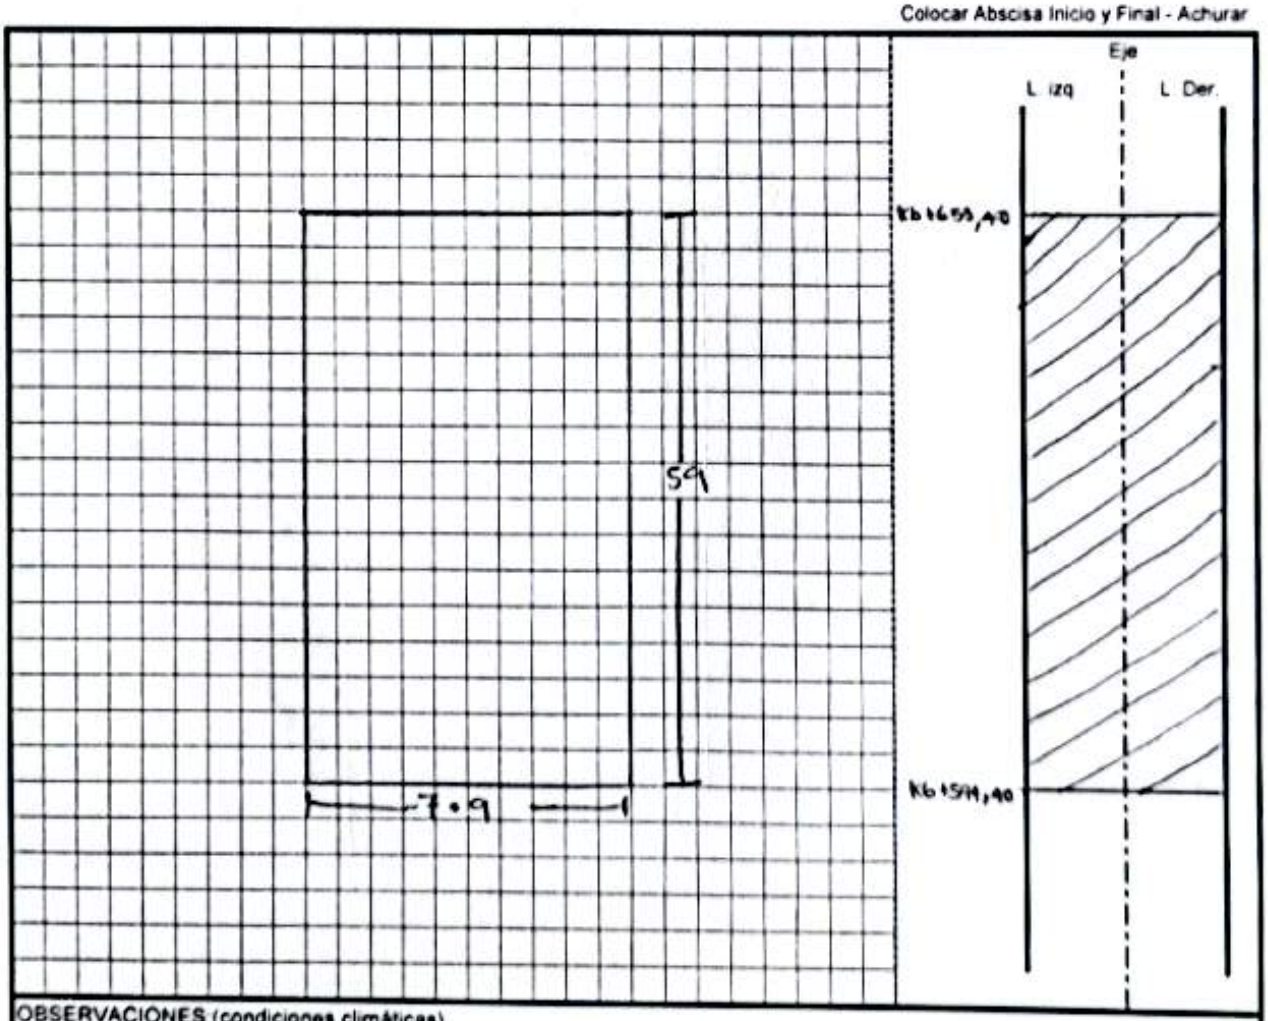

OBSERVACIONES (condiciones climáticas)

Dia Soleado

FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO

Vo.Bo.
Nombre: Camilo Suárez
Firma
Cargo Apoyo supervisión

Powered by CamScanner

TIERRASUA


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Mejoramiento y mantenimiento de la vía codigo 5504 07 cruce ruta 55 Ramal - Saladero

ACTIVIDAD: Suministro instalación y cargo base granular FECHA: 25-06-26

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Fabian Suarez

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

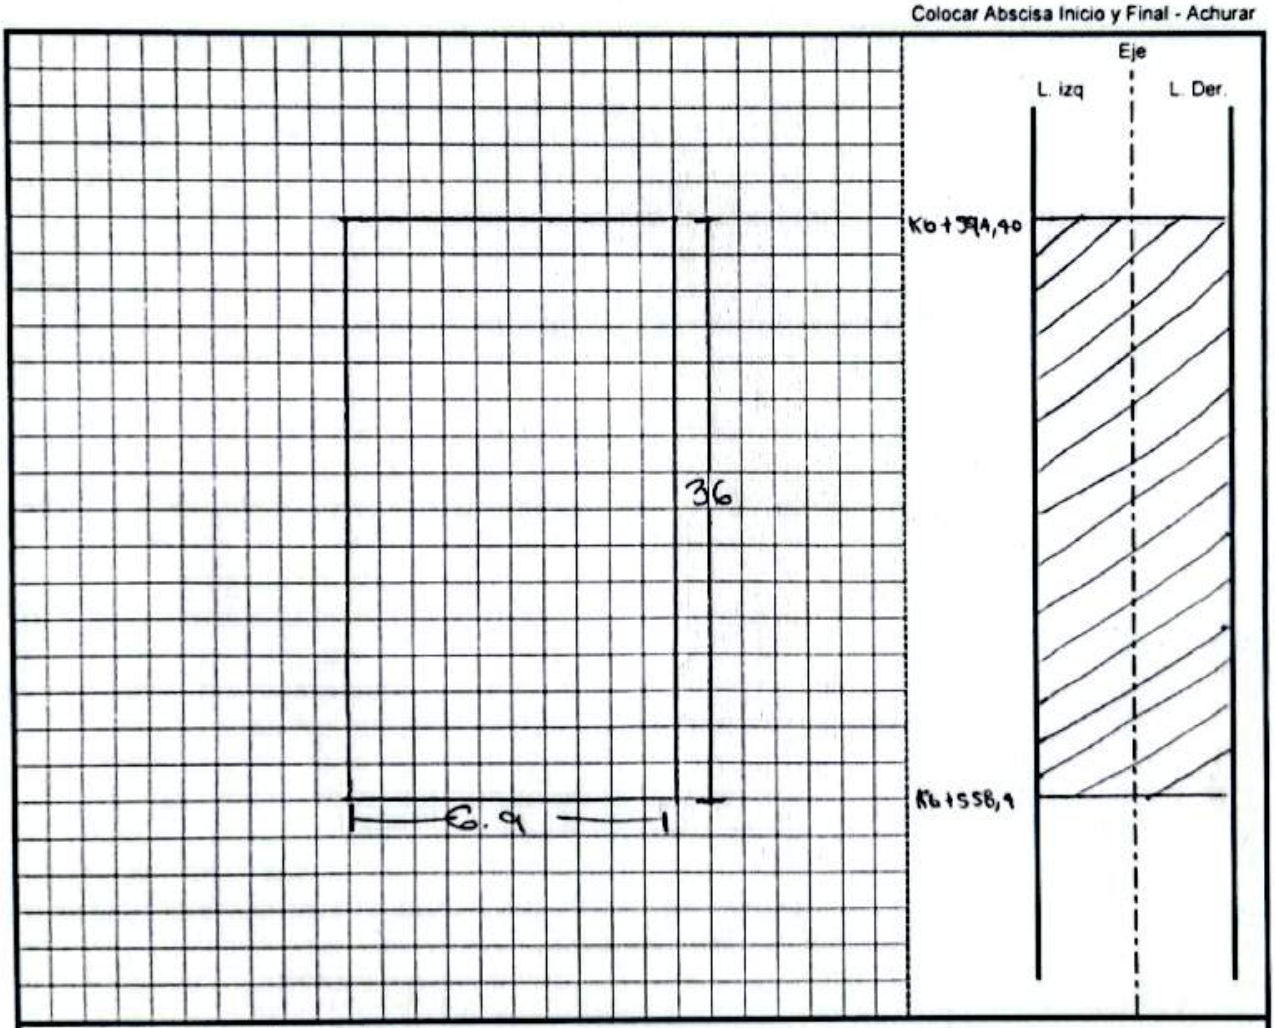

OBSERVACIONES (condiciones climáticas)

Dia Soleado.

FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO

Vo.Bo.
Nombre Camilo Suarez
Firma:
Cargo Apoyo supervisión

Powered by CamScanner

TIERRASUA


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Mejoramiento y mantenimiento de la via codigo 5508407 cruce ruta 55 Rumul - Sobaquita

ACTIVIDAD : Suministro y acarreo de base, instalacion de mezcla para parche **FECHA :** 26 - 06 - 26

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Fabian Suarez

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

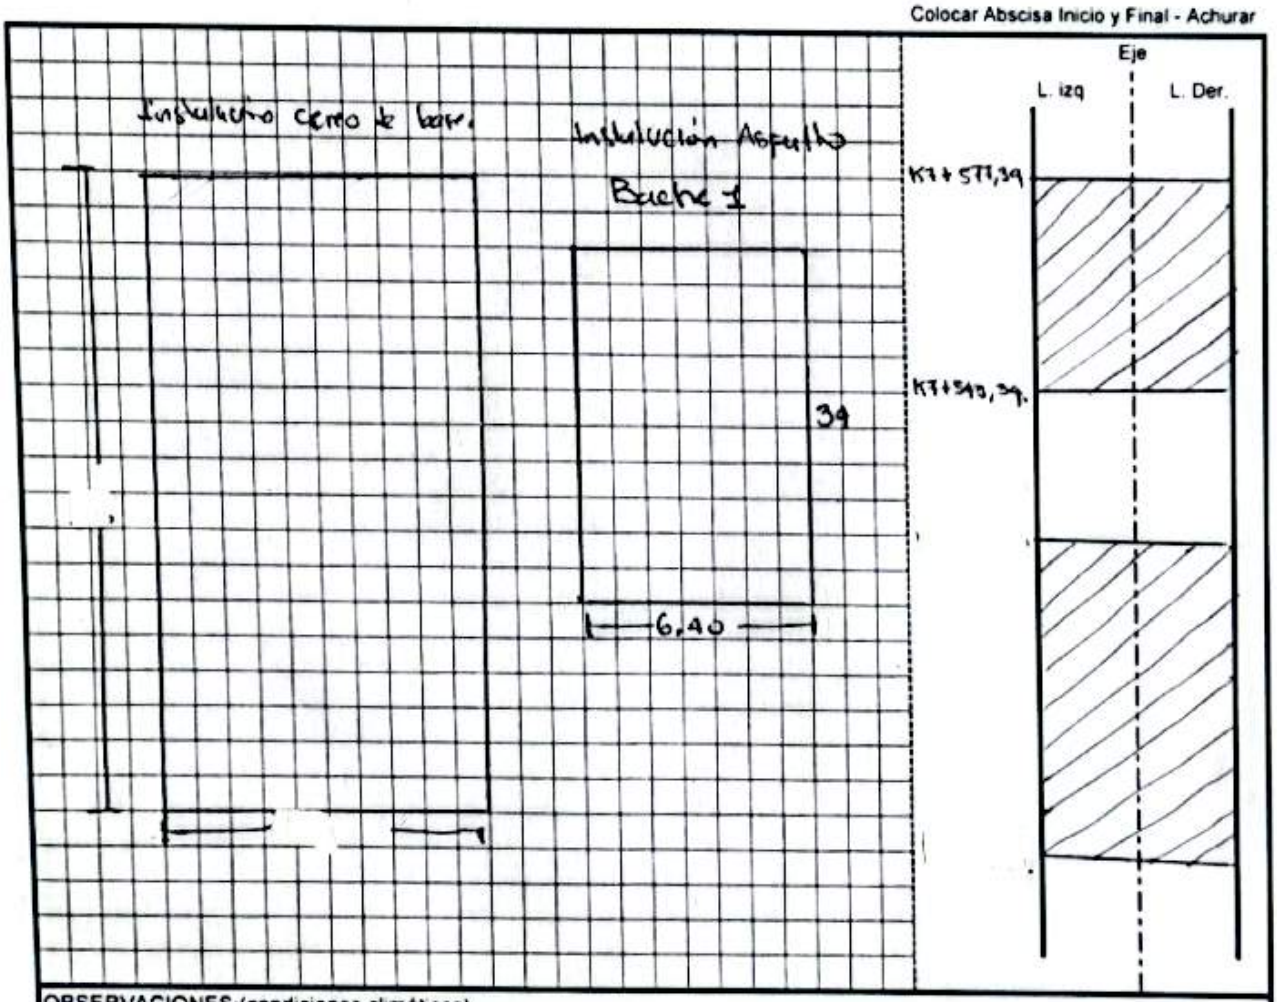

OBSERVACIONES (condiciones climáticas)

Dia soleado.

FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO

Vo.Bo.
Nombre: Camilo Suárez
Firma:
Cargo Apoyo supervisión

Powered by CamScanner

TIERRASUA


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: Mejoramiento y mantenimiento de la vía codigo 55BY07 cruce ruta 55 Rumal - Soluquira

ACTIVIDAD: Suministro e instalación de mezcla asfaltica MDC-19 FECHA: 30-06-26

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Fabian Suarez.

Colocar Abscisa Inicio y Final - Achurar

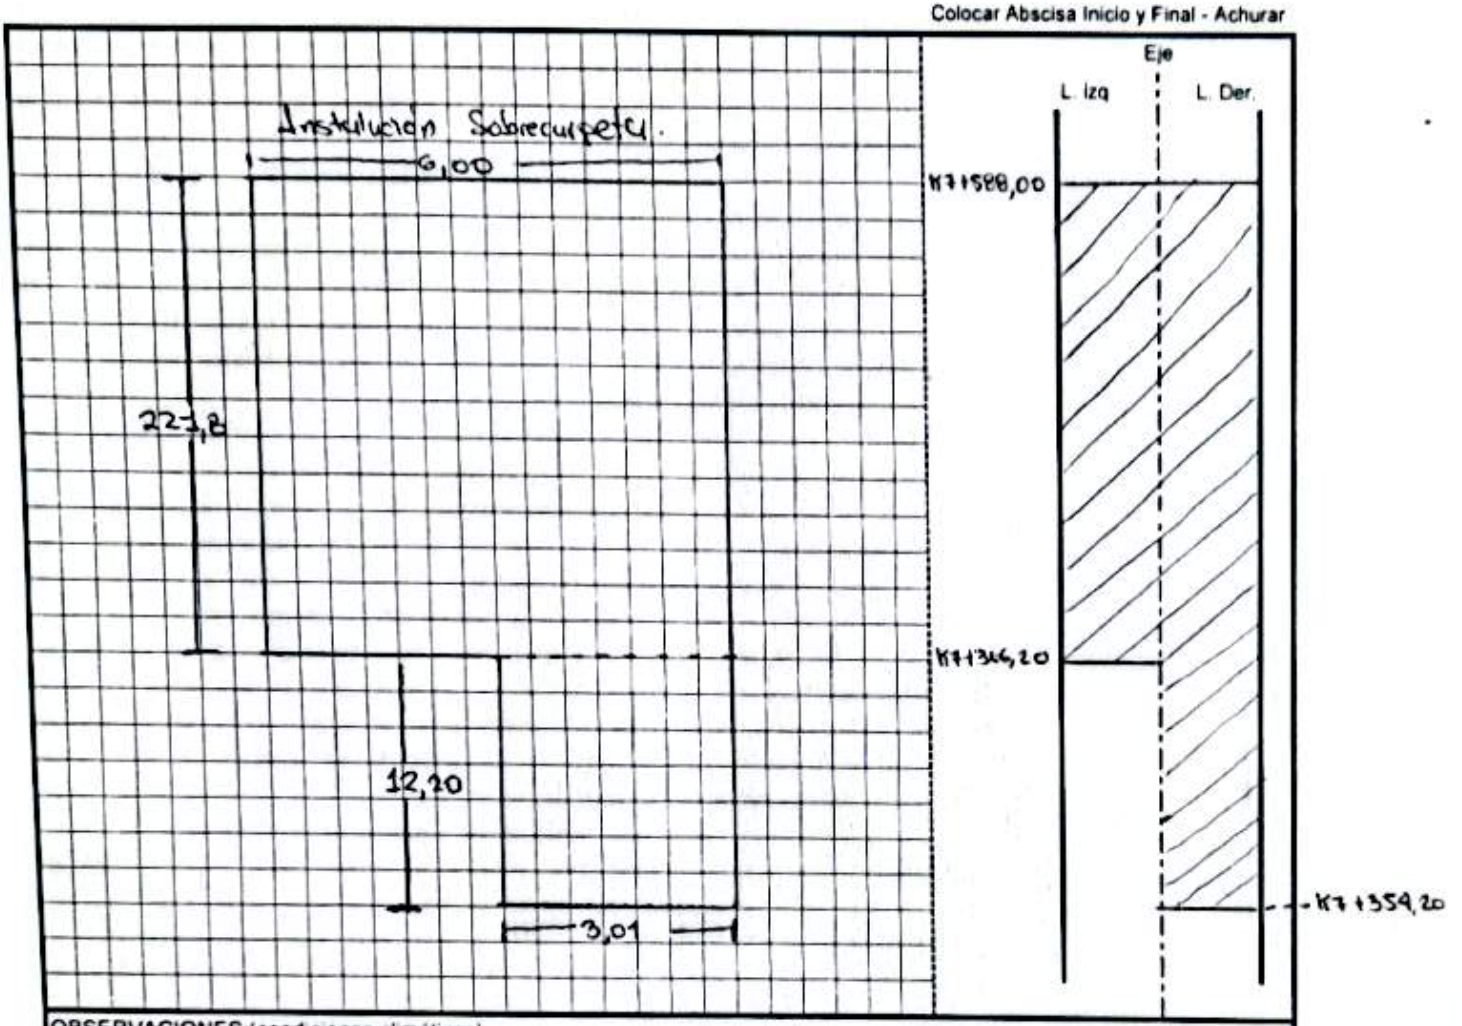

OBSERVACIONES (condiciones climáticas)

Mañana soleada, tarde con lluvias moderadas.

FIRMA QUIEN ELABORO

FIRMA INGENIERO

Vo.Bo.
Nombre: Camilo Suárez
Firma:
Cargo: Apoyo Supervisión

Powered by CamScanner

4.5.4. Tramo: 55BY08 Pantano de Vargas – Firavitoba y 61BYA paso por Firavitoba


TIERRASUA S.A.S
Cel: 316 8174458
gerencia@tierrasua.com
Calle 19 N.9-35 Piso 10 Tunja/Boyacá

CANTIDADES DE PAVIMENTO SOBRE CARPETA

Contrato No:MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS CON CÓDIGOS 61BYA (PASO POR FIRAVITOBA) - 55BY08 (PANTANO DE VARGAS-FIRAVITOBA), EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Fecha : 1/6/2026

Fecha	Ubicacion		Lado		Dimensiones (m)			Area Liga(m2)	Volumen Mezcla (m3)
	Abcisa Inicio	Abcisa Final	Izq.	Der	Ancho	Largo	Espesor		
1/6/2026	K8+169	K7+965	X		204	3.51	0.05	716.04	35.802
1/6/2026	K8+173,50	K8+007,75		X	165.75	3.04	0.05	503.88	25.194

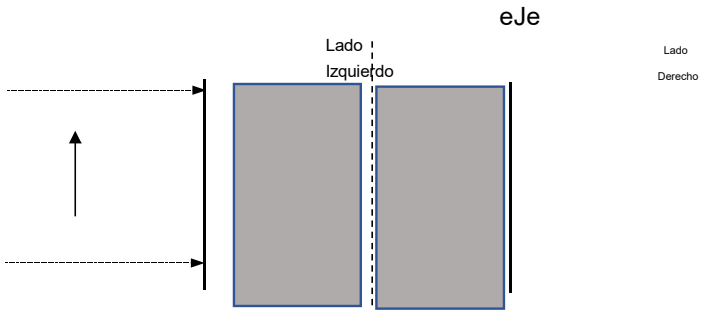

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre:	Edwin Alejandro Laverde Patiño	**Nombre:**	Vo.Bo. Rafael Camilo Suárez Suárez	**Nombre:**	Javier Andrés Fagua Torres
Cargo:	Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.	**Cargo:**	Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.	**Cargo:**	Apoyo a la supervisión GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
Firma:		**Firma:**		**Frima**	


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS CON CÓDIGOS 61BYA (PASO POR FIRAVITOBA) - 55BY08 (PANTANO DE VARGAS-FIRAVITOBA), EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

ACTIVIDAD :	RENIVELACION " PARCHEO"	**FECHA : 1/6/2026**

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Edwin Alejandro Laverde Patiño

PR14+363 y PR14+485

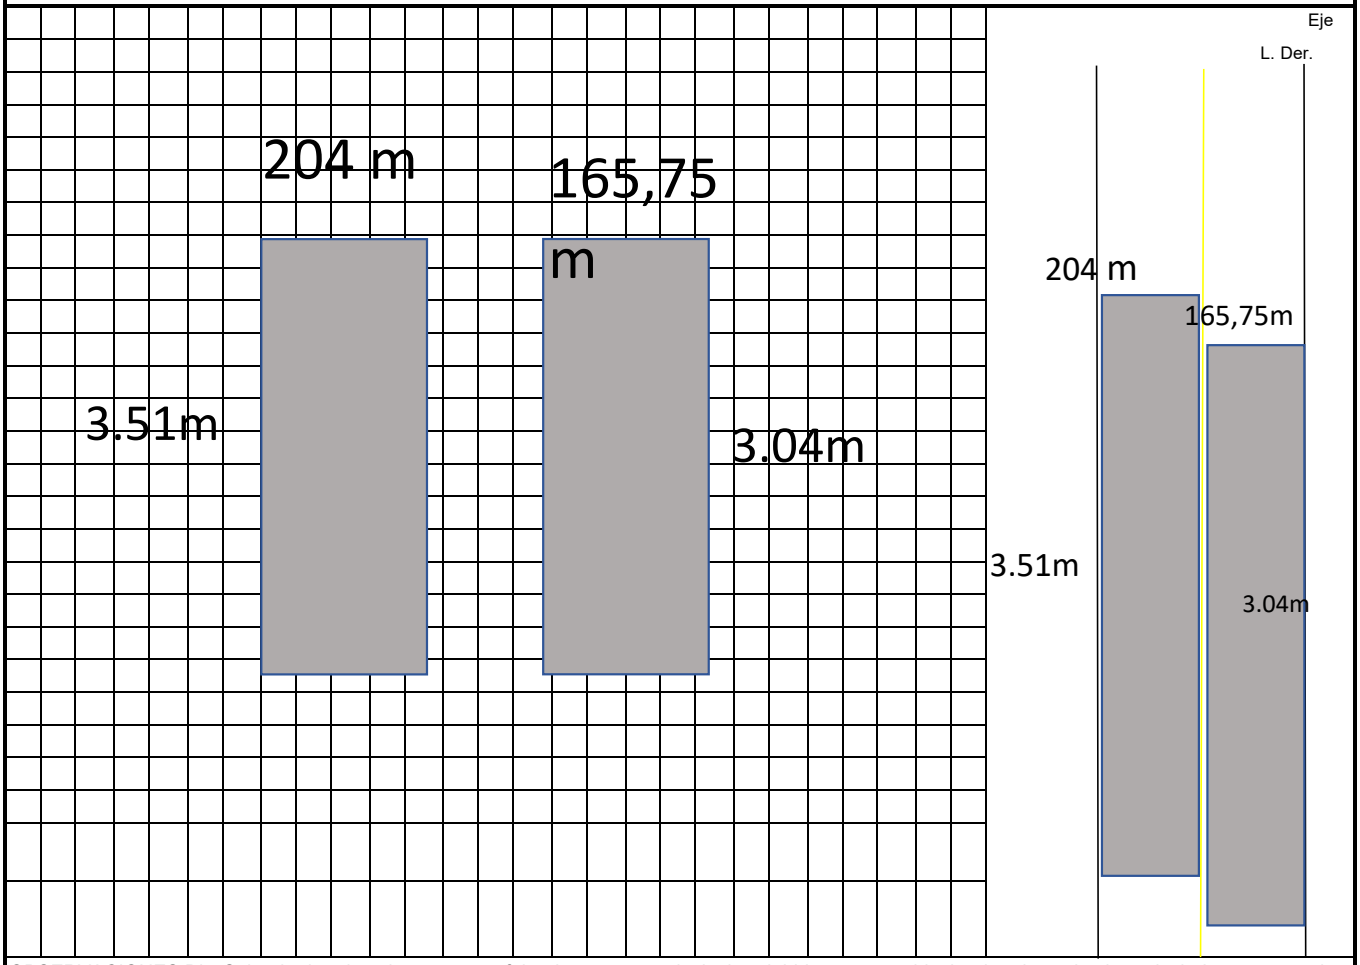

OBSERVACIONES:Dia Soleado, imprimacion presenta falta de esta en renivelacion debido a paso vehicular, hombros de via renivelados con mezcla asfaltica

FIRMA QUIEN ELABORO

Vo.Bo.
Nombre: Edwin Alejandro Laverde Patiño :
Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.

FIRMA INGENIERO


Vo.Bo.
Nombre: Javier Andrés Fagua Torres
Apoyo a la supervisión GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

CANTIDADES DE PAVIMENTO INSTALACION DE CARPETA

Contrato No:MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS CON CÓDIGOS 61BYA (PASO POR FIRAVITOBA) - 55BY08 (PANTANO DE VARGAS-FIRAVITOBA), EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Fecha : 2/6/2026

Fecha	Ubicacion		Lado		Dimensiones (m)			Area Liga(m2)	Volumen Mezcla (m3)
	Abcisa Inicio	Abcisa Final	Izq.	Der	Ancho	Largo	Espesor		
2/6/2026	K7+965	K7+735	X		230	3.05	0.05	701.5	35.075
2/6/2026	K8+007,75	K7+834,85		X	172.9	3	0.05	518.7	25.935

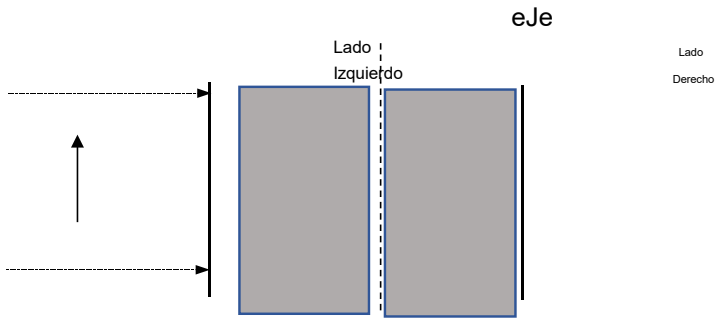

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre:	Edwin Alejandro Laverde Patiño	**Nombre:**	Vo.Bo. Rafael Camilo Suárez Suárez	**Nombre:**	Javier Andrés Fagua Torres
Cargo:	Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.	**Cargo:**	Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.	**Cargo:**	Apoyo a la supervisión GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
Firma:		**Firma:**		**Frima**	


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS CON CÓDIGOS 61BYA (PASO POR FIRAVITOBA) - 55BY08 (PANTANO DE VARGAS-FIRAVITOBA), EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

ACTIVIDAD :	INSTALACION DE CARPETA ASFALTICA MCD19	**FECHA : 2/6/2026**

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Edwin Alejandro Laverde Patiño

K8+007,75 y K7+735

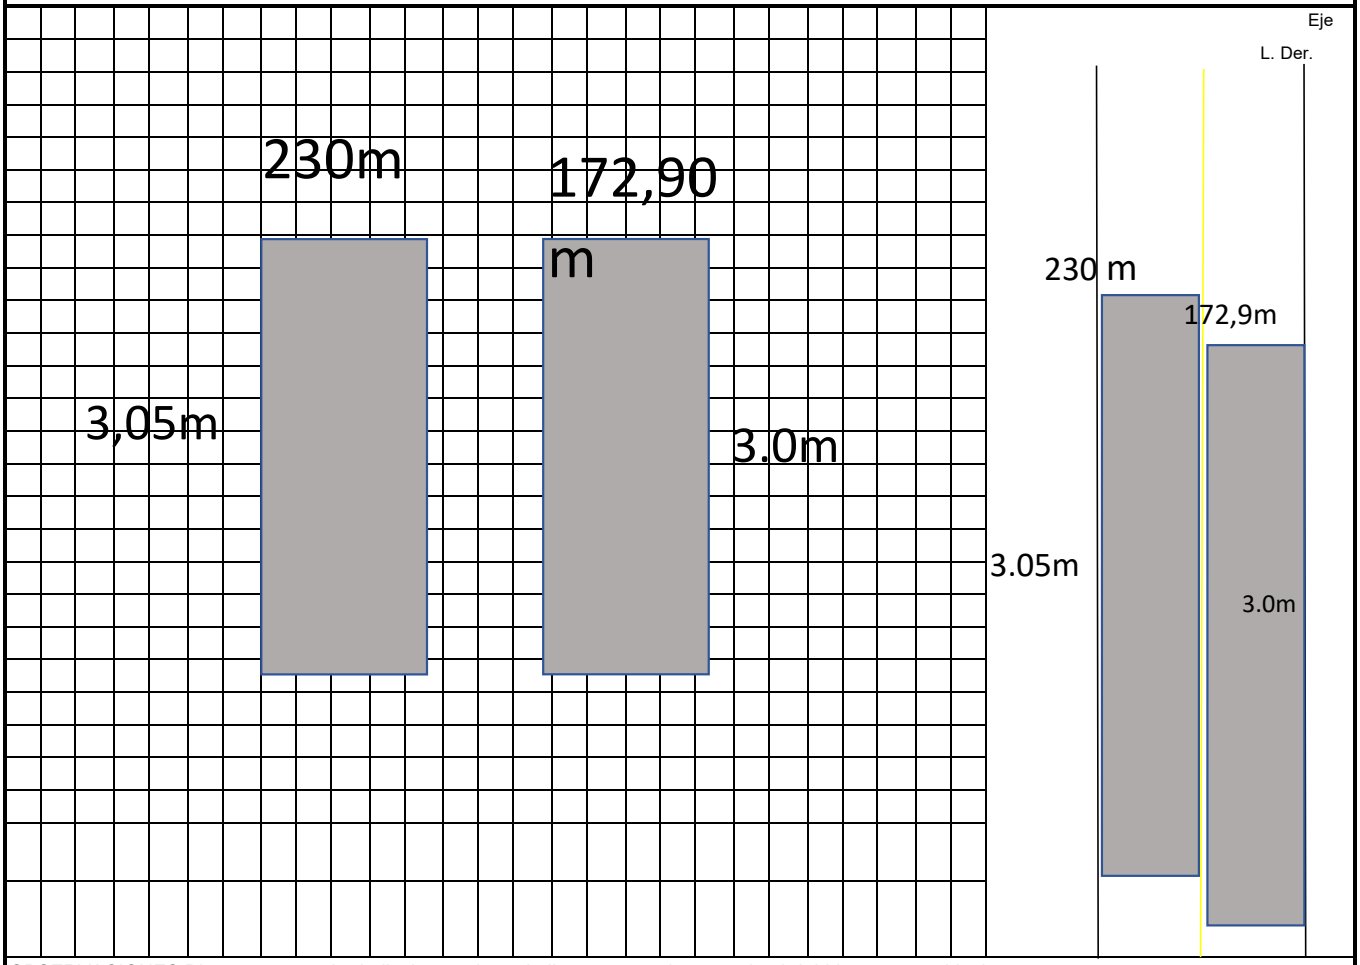

OBSERVACIONES:Dia con presencia de llovisnas, riego de liga presenta levantamienti debido a paso vehicula,

FIRMA QUIEN ELABORO

Vo.Bo.
Nombre: Edwin Alejandro Laverde Patiño :
Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.

FIRMA INGENIERO


Vo.Bo.
Nombre: Javier Andrés Fagua Torres
Apoyo a la supervisión GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

CANTIDADES DE PAVIMENTO INSTALACION DE CARPETA

Contrato No:MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS CON CÓDIGOS 61BYA (PASO POR FIRAVITOBA) - 55BY08 (PANTANO DE VARGAS-FIRAVITOBA), EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Fecha : 3/6/2026

Fecha	Ubicacion		Lado		Dimensiones (m)			Area Liga(m2)	Volumen Mezcla (m3)
	Abcisa Inicio	Abcisa Final	Izq.	Der	Ancho	Largo	Espesor		
3/6/2026	K7+735	K7+545,50	X		189.5	2.94	0.05	557.13	27.8565
3/6/2026	K7+834,85	K7+527,15		X	307.7	2.89	0.05	889.253	44.46265

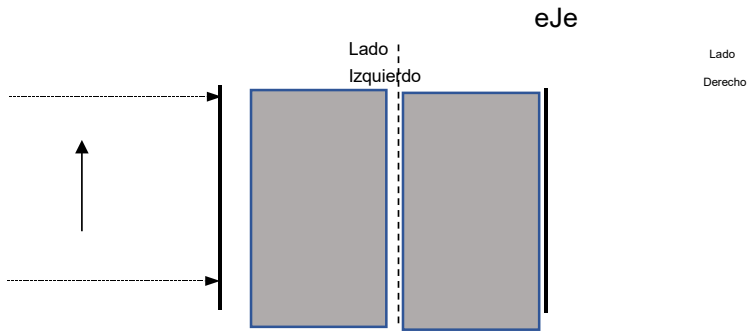

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre:	Edwin Alejandro Laverde Patiño	**Nombre:**	Vo.Bo. Rafael Camilo Suárez Suárez	**Nombre:**	Javier Andrés Fagua Torres
Cargo:	Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.	**Cargo:**	Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.	**Cargo:**	Apoyo a la supervisión GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
Firma:		**Firma:**		**Frima**	


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS CON CÓDIGOS 61BYA (PASO POR FIRAVITOBA) - 55BY08 (PANTANO DE VARGAS-FIRAVITOBA), EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

ACTIVIDAD :	INSTALACION DE CARPETA ASFALTICA MCD19	**FECHA : 3/6/2026**

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Edwin Alejandro Laverde Patiño

K7+834,85 y K7+527,15

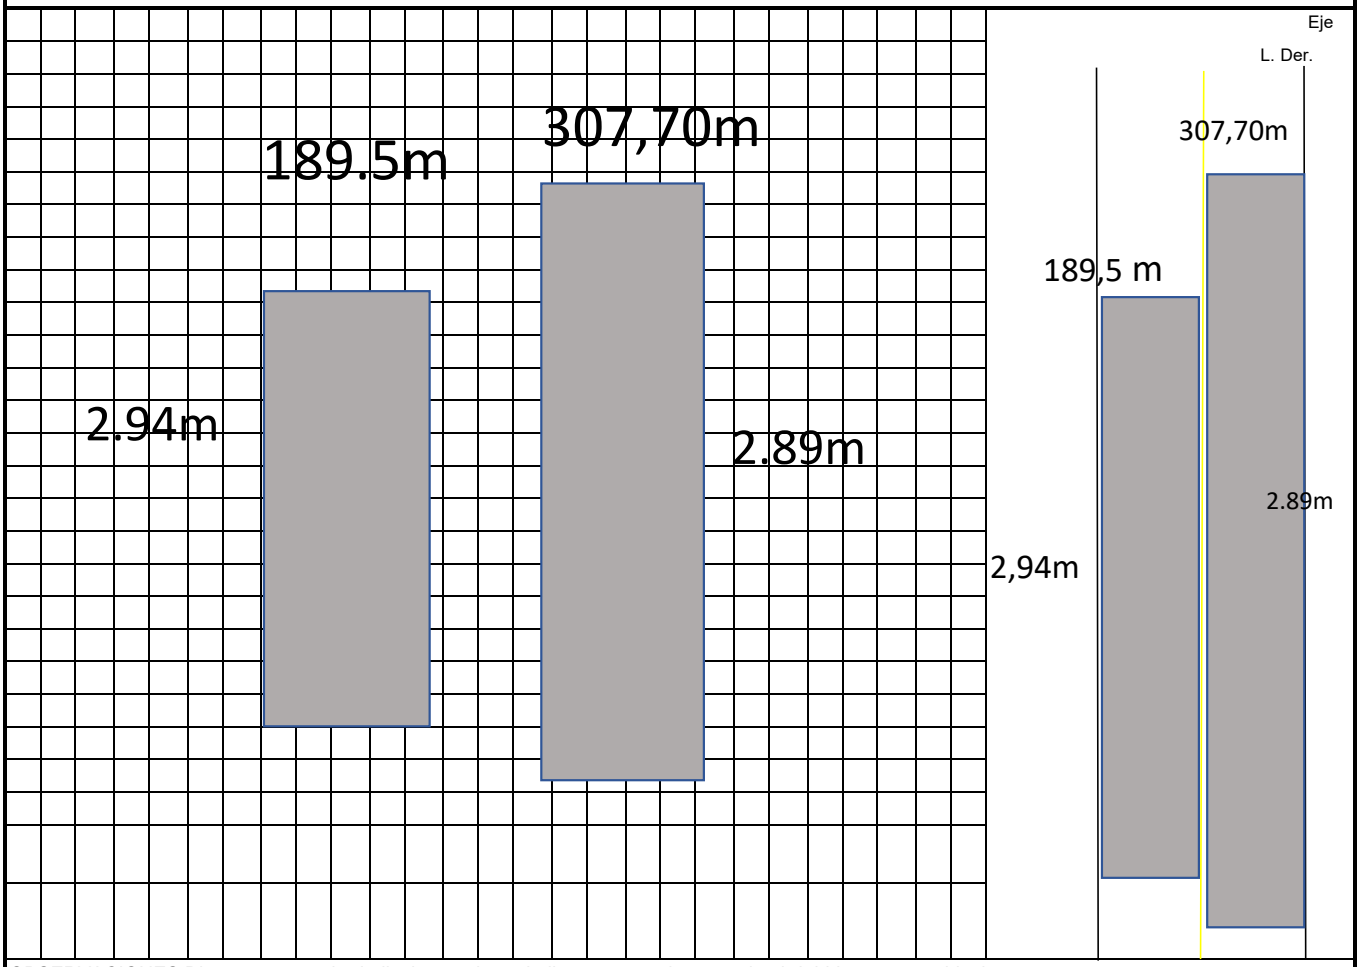

OBSERVACIONES:Dia con presencia de llovisnas, riego de liga presenta levantamienti debido a paso vehicula,

FIRMA QUIEN ELABORO

Vo.Bo.
Nombre: Edwin Alejandro Laverde Patiño :
Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.

FIRMA INGENIERO


Vo.Bo.
Nombre: Javier Andrés Fagua Torres
Apoyo a la supervisión GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

CANTIDADES DE PAVIMENTO INSTALACION DE CARPETA

Contrato No:MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS CON CÓDIGOS 61BYA (PASO POR FIRAVITOBA) - 55BY08 (PANTANO DE VARGAS-FIRAVITOBA), EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Fecha : 4/6/2026

Fecha	Ubicacion		Lado		Dimensiones (m)			Area Liga(m2)	Volumen Mezcla (m3)
	Abcisa Inicio	Abcisa Final	Izq.	Der	Ancho	Largo	Espesor		
4/6/2026	K7+545,50	K7+286,30	X		259.2	3	0.05	777.6	38.88
4/6/2026	K7+527,15	K7+301,05		X	226.1	2.96	0.05	669.256	33.4628

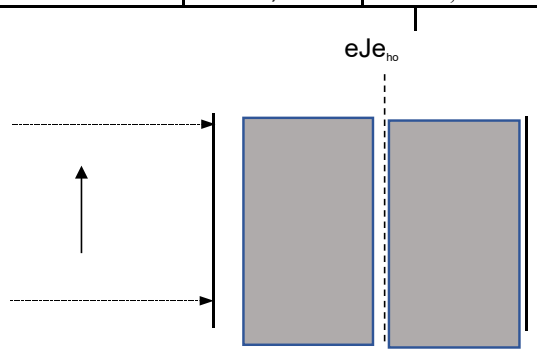

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre:	Edwin Alejandro Laverde Patiño	**Nombre:**	Vo.Bo. Rafael Camilo Suárez Suárez	**Nombre:**	Javier Andrés Fagua Torres
Cargo:	Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.	**Cargo:**	Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.	**Cargo:**	Apoyo a la supervisión GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
Firma:		**Firma:**		**Frima**	


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS CON CÓDIGOS 61BYA (PASO POR FIRAVITOBA) - 55BY08 (PANTANO DE VARGAS-FIRAVITOBA), EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

ACTIVIDAD :	INSTALACION DE CARPETA ASFALTICA MCD19	**FECHA : 4/6/2026**

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Edwin Alejandro Laverde Patiño

K7+545,50 y K7+286,30

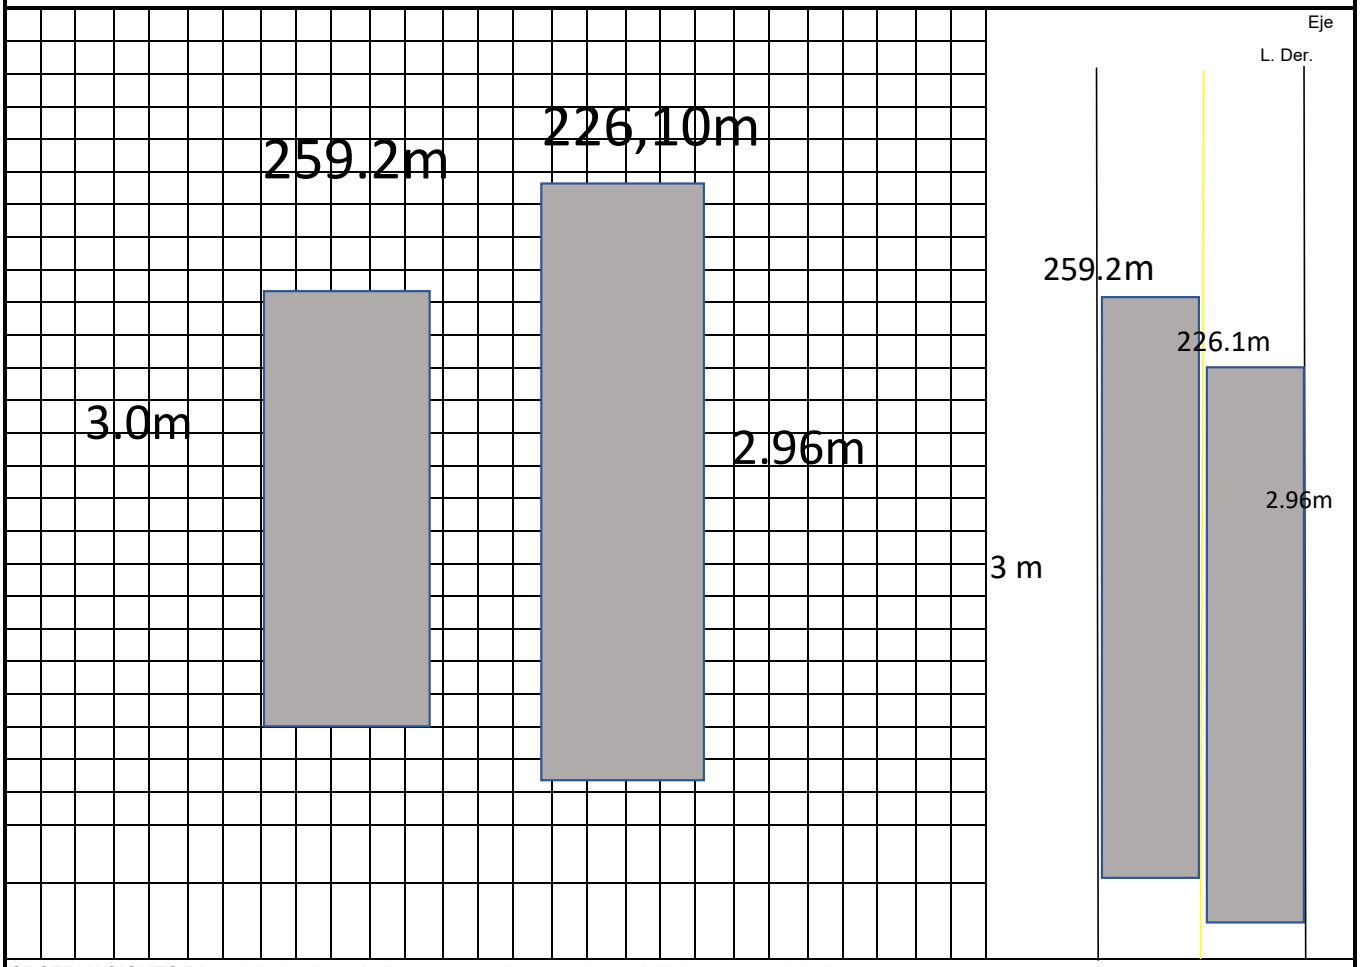

OBSERVACIONES:Dia nublado, riego de liga presenta levantamiento debido a paso vehicula,

FIRMA QUIEN ELABORO

Vo.Bo.
Nombre: Edwin Alejandro Laverde Patiño :
Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.

FIRMA INGENIERO


Vo.Bo.
Nombre: Javier Andrés Fagua Torres
Apoyo a la supervisión GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

CANTIDADES DE PAVIMENTO INSTALACION DE CARPETA

Contrato No:MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS CON CÓDIGOS 61BYA (PASO POR FIRAVITOBA) - 55BY08 (PANTANO DE VARGAS-FIRAVITOBA), EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Fecha : 5/6/2026

Fecha	Ubicacion		Lado		Dimensiones (m)			Area Liga(m2)	Volumen Mezcla (m3)
	Abcisa Inicio	Abcisa Final	Izq.	Der	Ancho	Largo	Espesor		
5/6/2026	K7+286,30	K7+087,80	X		198.5	3	0.05	595.5	29.775
5/6/2026	K7+301,05	K7+088,40		X	212.65	2.94	0.05	625.191	31.25955

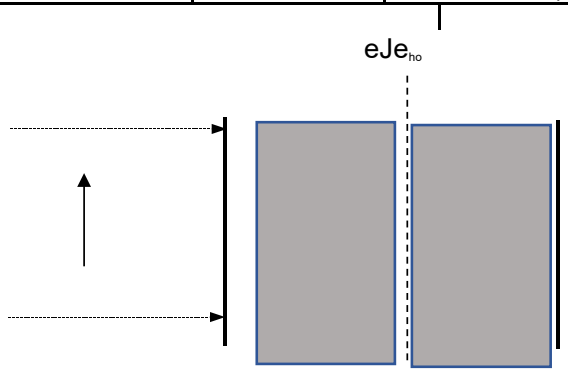

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre:	Edwin Alejandro Laverde Patiño	**Nombre:**	Vo.Bo. Rafael Camilo Suárez Suárez	**Nombre:**	Javier Andrés Fagua Torres
Cargo:	Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.	**Cargo:**	Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.	**Cargo:**	Apoyo a la supervisión GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
Firma:		**Firma:**		**Frima**	


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES


OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS CON CÓDIGOS 61BYA (PASO POR FIRAVITOBA) - 55BY08 (PANTANO DE VARGAS-FIRAVITOBA), EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

ACTIVIDAD :	INSTALACION DE CARPETA ASFALTICA MCD19	**FECHA : 5/6/2026**

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Edwin Alejandro Laverde Patiño

K7+301,05 - K7+088,40

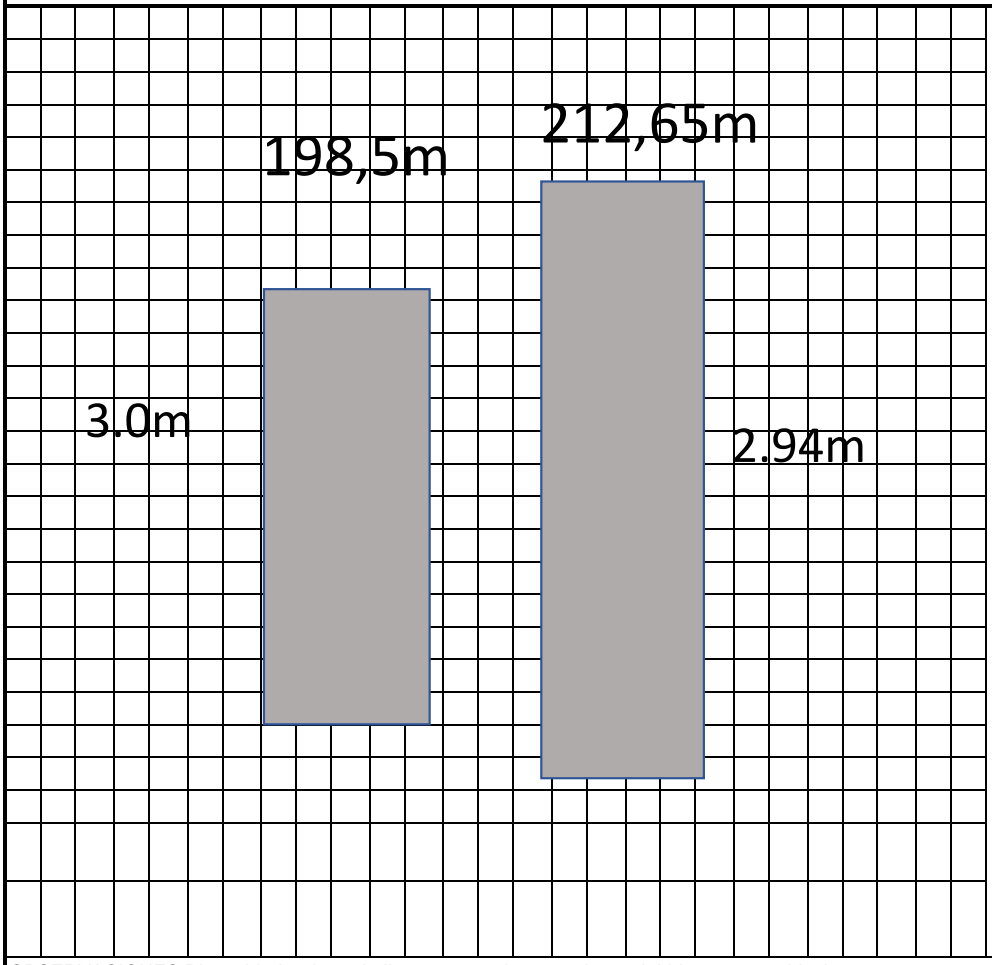

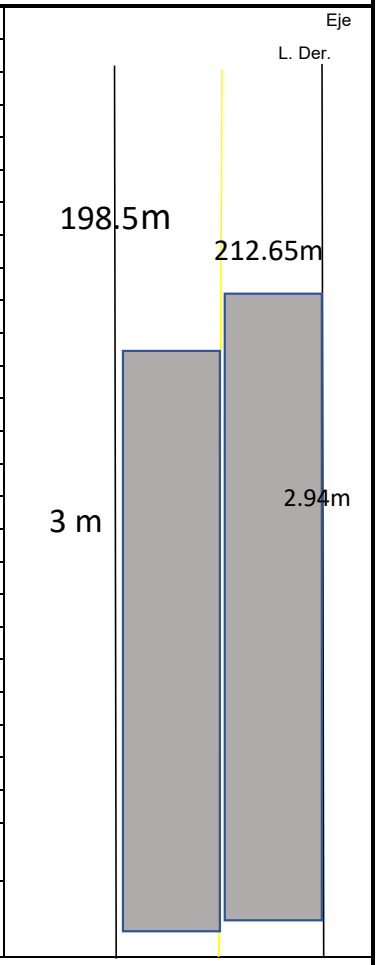

OBSERVACIONES:Dia nublado, riego de liga presenta levantamiento debido a paso vehicula,

FIRMA QUIEN ELABORO

Vo.Bo.
Nombre: Edwin Alejandro Laverde Patiño :
Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.

FIRMA INGENIERO


Vo.Bo.
Nombre: Javier Andrés Fagua Torres
Apoyo a la supervisión GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

CANTIDADES DE PAVIMENTO INSTALACION DE CARPETA

Contrato No:MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS CON CÓDIGOS 61BYA (PASO POR FIRAVITOBA) - 55BY08 (PANTANO DE VARGAS-FIRAVITOBA), EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Fecha : 9/6/2026

Fecha	Ubicacion		Lado		Dimensiones (m)			Area Liga(m2)	Volumen Mezcla (m3)
	Abcisa Inicio	Abcisa Final	Izq.	Der	LARGO	ANCHO	Espesor		
9/6/2026	K7+087,80	K6+919,80	X		168	2.98	0.05	500.64	25.032
9/6/2026	K7+088,40	K6+947,40		X	141	2.92	0.05	411.72	20.586

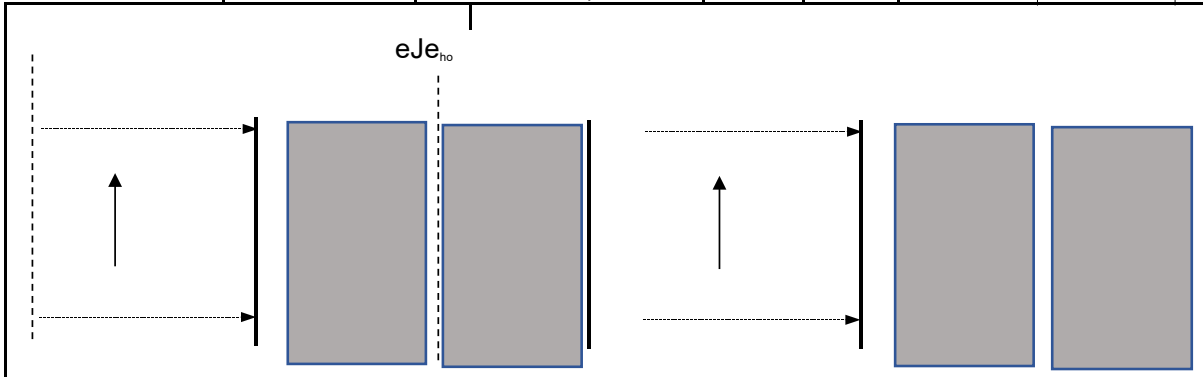

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre:	Edwin Alejandro Laverde Patiño	**Nombre:**	Vo.Bo. Rafael Camilo Suárez Suárez	**Nombre:**	Javier Andrés Fagua Torres
Cargo:	Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.	**Cargo:**	Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.	**Cargo:**	Apoyo a la supervisión GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
Firma:		**Firma:**		**Frima**	


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS CON CÓDIGOS 61BYA (PASO POR FIRAVITOBA) - 55BY08 (PANTANO DE VARGAS-FIRAVITOBA), EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

ACTIVIDAD :	INSTALACION DE CARPETA ASFALTICA MCD19	**FECHA : 10/6/2026**

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Edwin Alejandro Laverde Patiño

INICIO: K7+087,80 FIN: K6+919,80 DER, INICIO: K7+088,40 FIN: K6+947,40 IZQ.

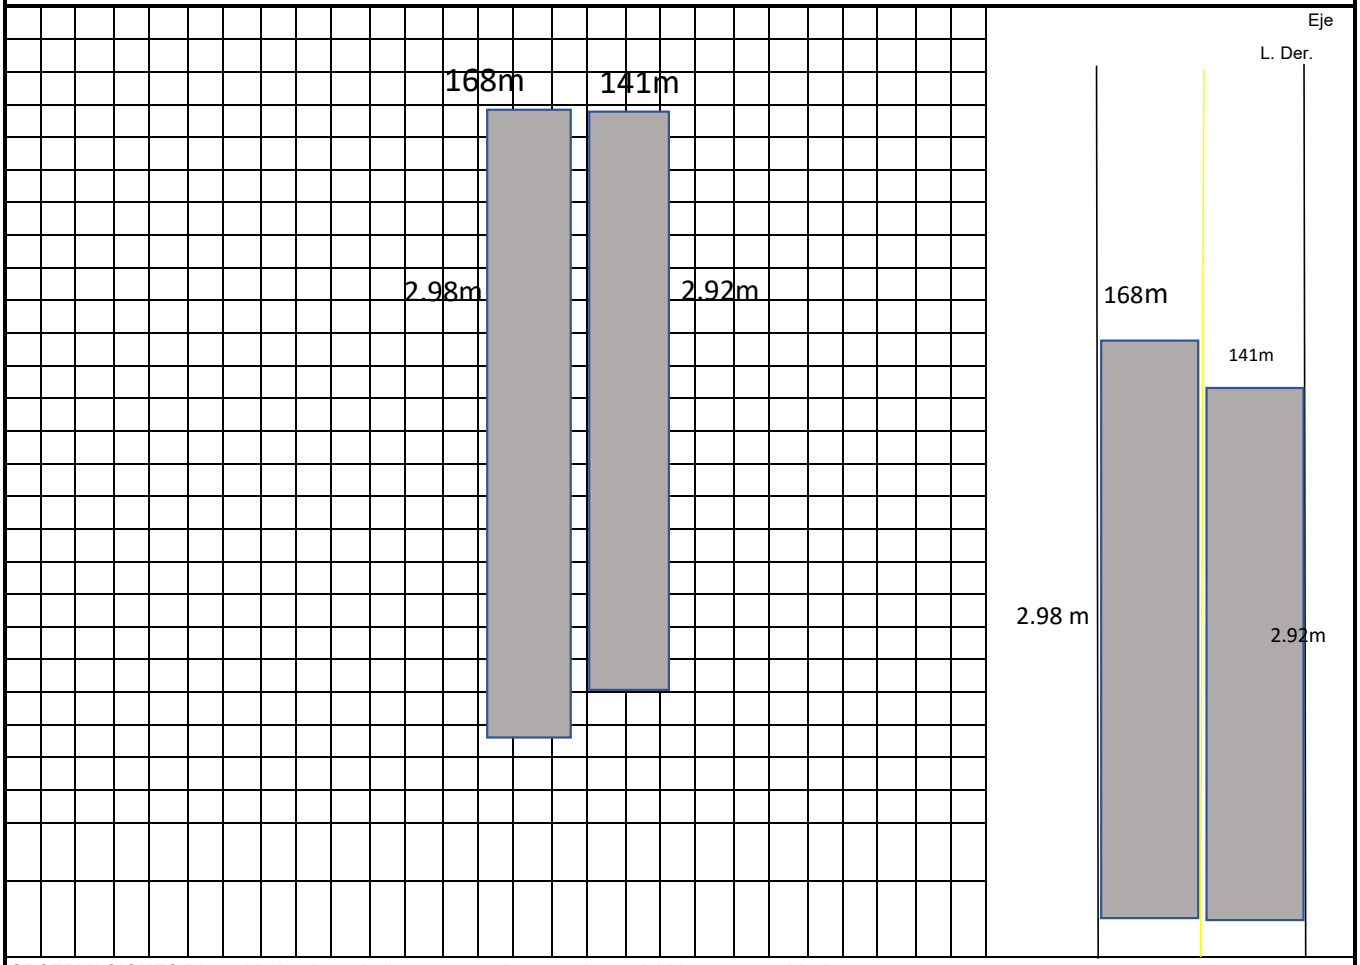

OBSERVACIONES:Dia nublado, riego de liga presenta levantamiento debido a paso vehicula,

FIRMA QUIEN ELABORO

Vo.Bo.
Nombre: Edwin Alejandro Laverde Patiño :
Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.

FIRMA INGENIERO


Vo.Bo.
Nombre: Javier Andrés Fagua Torres
Apoyo a la supervisión GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

CANTIDADES DE PAVIMENTO INSTALACION DE CARPETA

Contrato No:MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS CON CÓDIGOS 61BYA (PASO POR FIRAVITOBA) - 55BY08 (PANTANO DE VARGAS-FIRAVITOBA), EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Fecha : 9/6/2026

Fecha	Ubicacion		Lado		Dimensiones (m)			Area Liga(m2)	Volumen Mezcla (m3)
	Abcisa Inicio	Abcisa Final	Izq.	Der	LARGO	ANCHO	Espesor		
10/6/2026	K6+919,80	K6+730,80	X		189	3	0.05	567	28.35
10/6/2026	K6+947,40	K6+717		X	230.4	2.85	0.05	656.64	32.832
10/6/2026	K8+169	K8+394	X		225	3.05	0.05	686.25	34.3125
10/6/2026	K8+173,50	K8+394,50		X	221	3.06	0.05	676.26	33.813

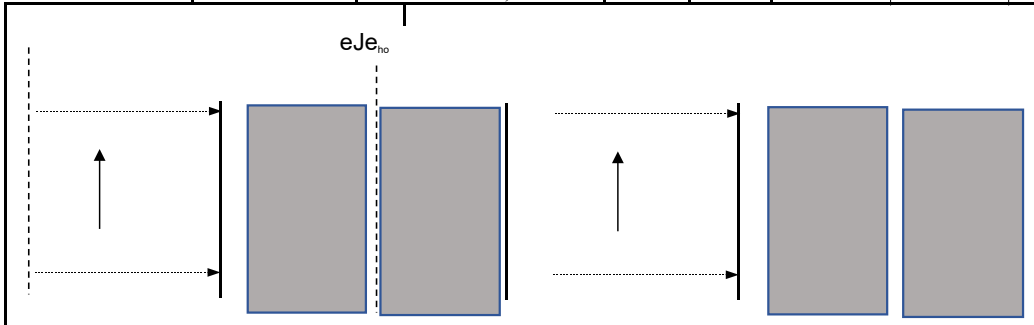

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre:	Edwin Alejandro Laverde Patiño	**Nombre:**	Vo.Bo. Rafael Camilo Suárez Suárez	**Nombre:**	Javier Andrés Fagua Torres
Cargo:	Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.	**Cargo:**	Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.	**Cargo:**	Apoyo a la supervisión GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
Firma:		**Firma:**		**Frima**	


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES


OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS CON CÓDIGOS 61BYA (PASO POR FIRAVITOBA) - 55BY08 (PANTANO DE VARGAS-FIRAVITOBA), EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

ACTIVIDAD :	INSTALACION DE CARPETA ASFALTICA MCD19	**FECHA : 10/6/2026**

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Edwin Alejandro Laverde Patiño

K6+947,40 - K6+717 / K8+169 - K8+394

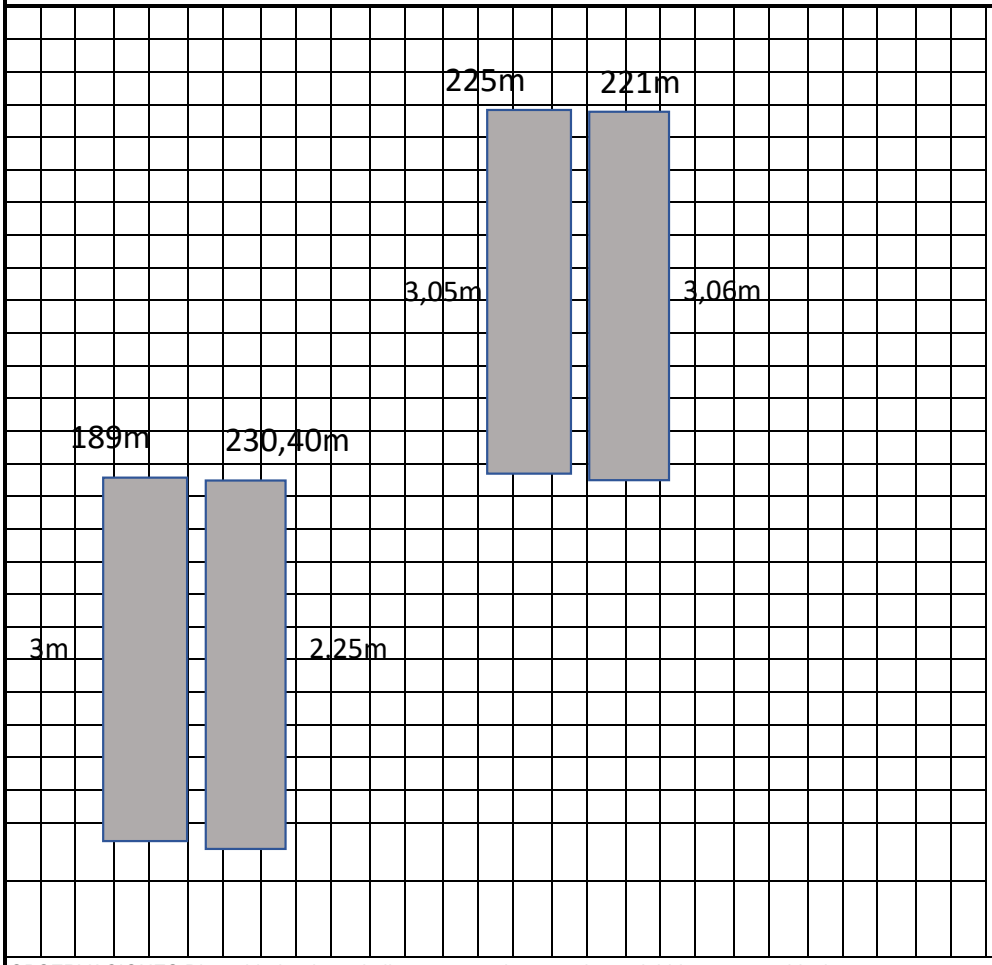

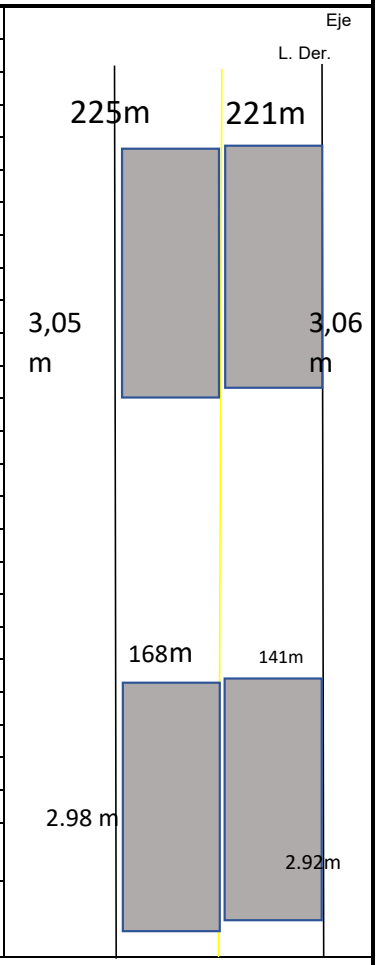

OBSERVACIONES:Dia nublado, riego de liga presenta levantamiento debido a paso vehicula,

FIRMA QUIEN ELABORO

Vo.Bo.
Nombre: Edwin Alejandro Laverde Patiño :
Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.

FIRMA INGENIERO


Vo.Bo.
Nombre: Javier Andrés Fagua Torres
Apoyo a la supervisión GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

CANTIDADES DE PAVIMENTO INSTALACION DE CARPETA

Contrato No:MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS CON CÓDIGOS 61BYA (PASO POR FIRAVITOBA) - 55BY08 (PANTANO DE VARGAS-FIRAVITOBA), EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Fecha : 11/6/2026

Fecha	Ubicacion		Lado		Dimensiones (m)			Area Liga(m2)	Volumen Mezcla (m3)
	Abcisa Inicio	Abcisa Final	Izq.	Der	LARGO	ANCHO	Espesor		
11/6/2026	K6+730,80	K6+536,70	X		194.1	3	0.05	582.3	29.115
11/6/2026	K6+717	K6+496,60		X	220.4	2.89	0.05	636.956	31.8478
11/6/2026	K8+394	K8+700,50	X		306.5	3	0.05	919.5	45.975
11/6/2026	K8+394,50	K8+543		X	148.5	3	0.05	445.5	22.275

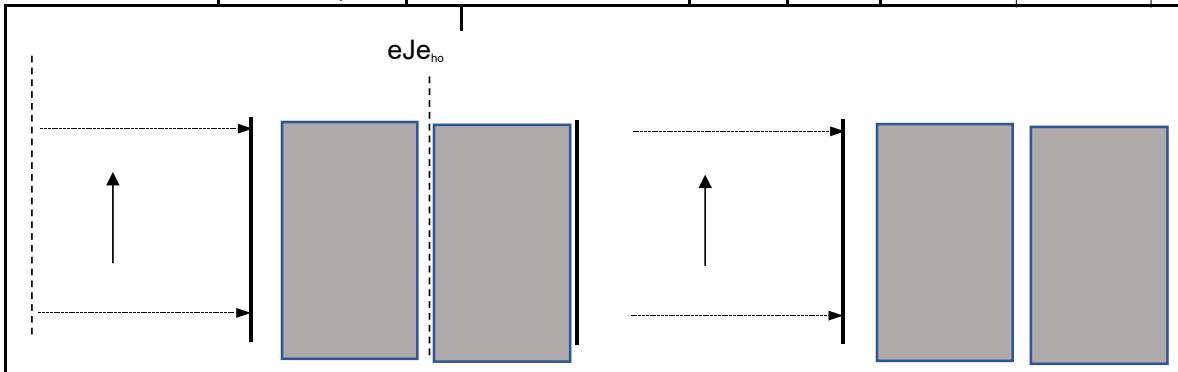

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre:	Edwin Alejandro Laverde Patiño	**Nombre:**	Vo.Bo. Rafael Camilo Suárez Suárez	**Nombre:**	Javier Andrés Fagua Torres
Cargo:	Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.	**Cargo:**	Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.	**Cargo:**	Apoyo a la supervisión GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
Firma:		**Firma:**		**Frima**	


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS CON CÓDIGOS 61BYA (PASO POR FIRAVITOBA) - 55BY08 (PANTANO DE VARGAS-FIRAVITOBA), EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

ACTIVIDAD :	INSTALACION DE CARPETA ASFALTICA MCD19	**Fecha : 11/6/2026**

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Edwin Alejandro Laverde Patiño

K6+947,40 - K6+717 / K8+169 - K8+394

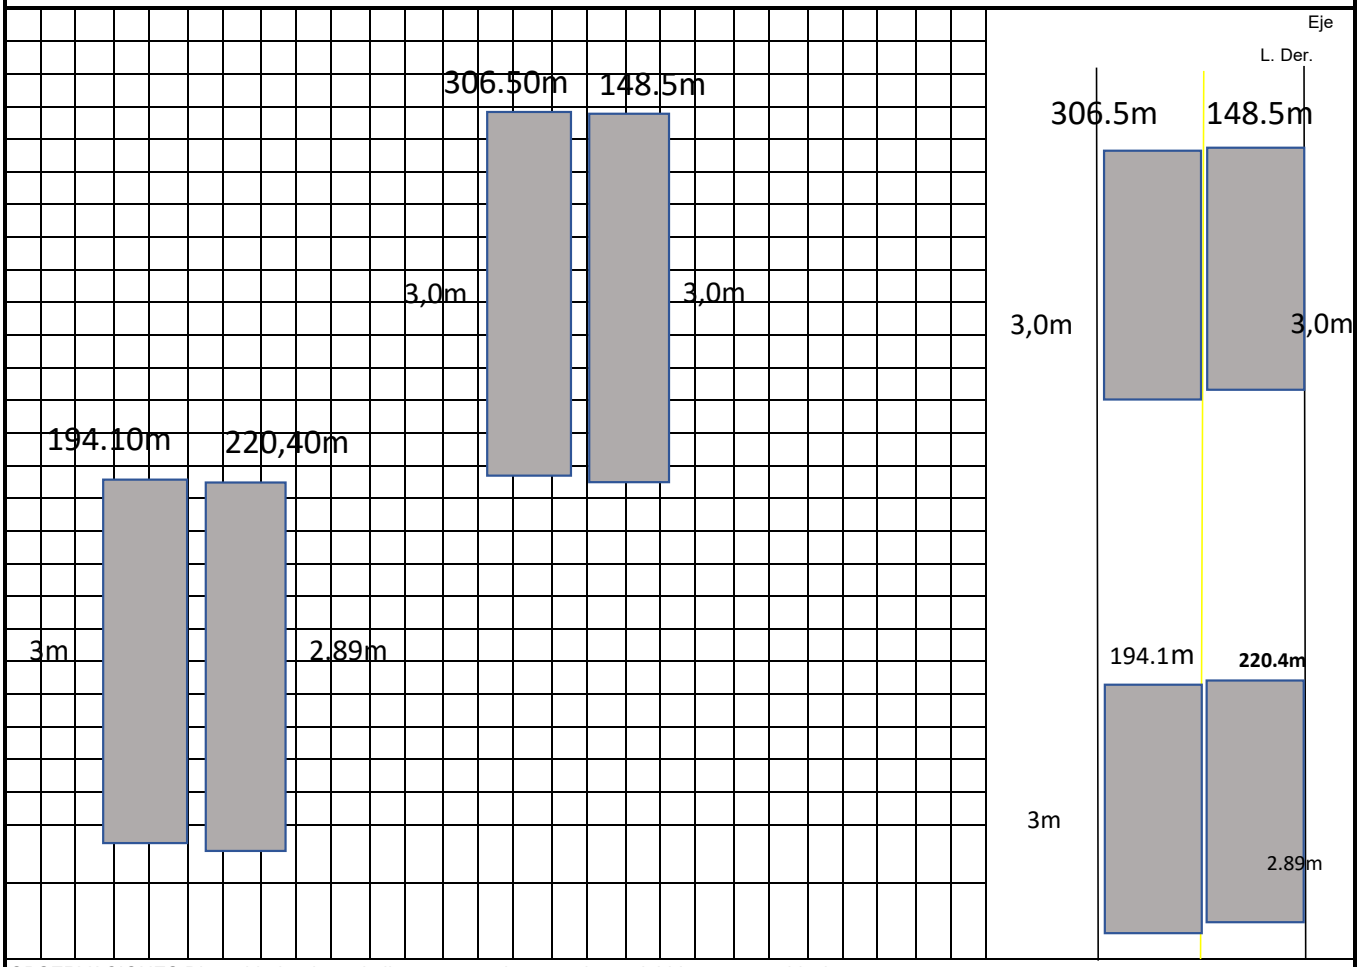

OBSERVACIONES:Dia nublado, riego de liga presenta levantamiento debido a paso vehicula,

FIRMA QUIEN ELABORO

Vo.Bo.
Nombre: Edwin Alejandro Laverde Patiño :
Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.

FIRMA INGENIERO


Vo.Bo.
Nombre: Javier Andrés Fagua Torres
Apoyo a la supervisión GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

CANTIDADES DE PAVIMENTO INSTALACION DE CARPETA

Contrato No:MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS CON CÓDIGOS 61BYA (PASO POR FIRAVITOBA) - 55BY08 (PANTANO DE VARGAS-FIRAVITOBA), EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Fecha : 12/6/2026

Fecha	Ubicacion		Lado		Dimensiones (m)			Area Liga(m2)	Volumen Mezcla (m3)
	Abcisa Inicio	Abcisa Final	Izq.	Der	LARGO	ANCHO	Espesor		
12/6/2026	K6+536	K6+341,9	X		194.1	3	0.05	582.3	29.115
12/6/2026	K6+496	K6+276.2		X	220.4	2.88	0.05	634.752	31.7376
12/6/2026	K8+700,5	K8+847,2	X		146.7	3.1	0.05	454.77	22.7385
12/6/2026	K8+543	K8+826,8		X	283.8	3.2	0.05	908.16	45.408

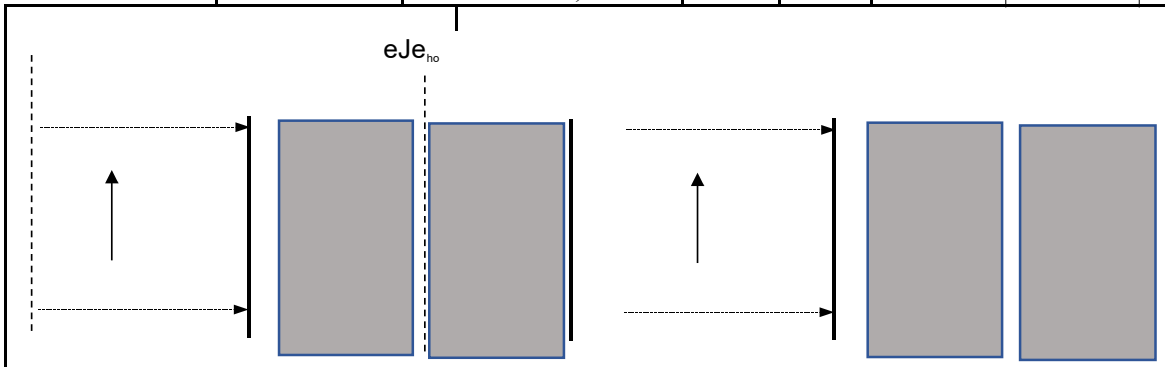

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre:	Edwin Alejandro Laverde Patiño	**Nombre:**	Vo.Bo. Rafael Camilo Suárez Suárez	**Nombre:**	Javier Andrés Fagua Torres
Cargo:	Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.	**Cargo:**	Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.	**Cargo:**	Apoyo a la supervisión GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
Firma:		**Firma:**		**Frima**	


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES


OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS CON CÓDIGOS 61BYA (PASO POR FIRAVITOBA) - 55BY08 (PANTANO DE VARGAS-FIRAVITOBA), EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

ACTIVIDAD :	INSTALACION DE CARPETA ASFALTICA MCD19	**Fecha : 12/6/2026**

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Edwin Alejandro Laverde Patiño

K6+536 - K6+276.2 / K8+700,5 - K8+826,8

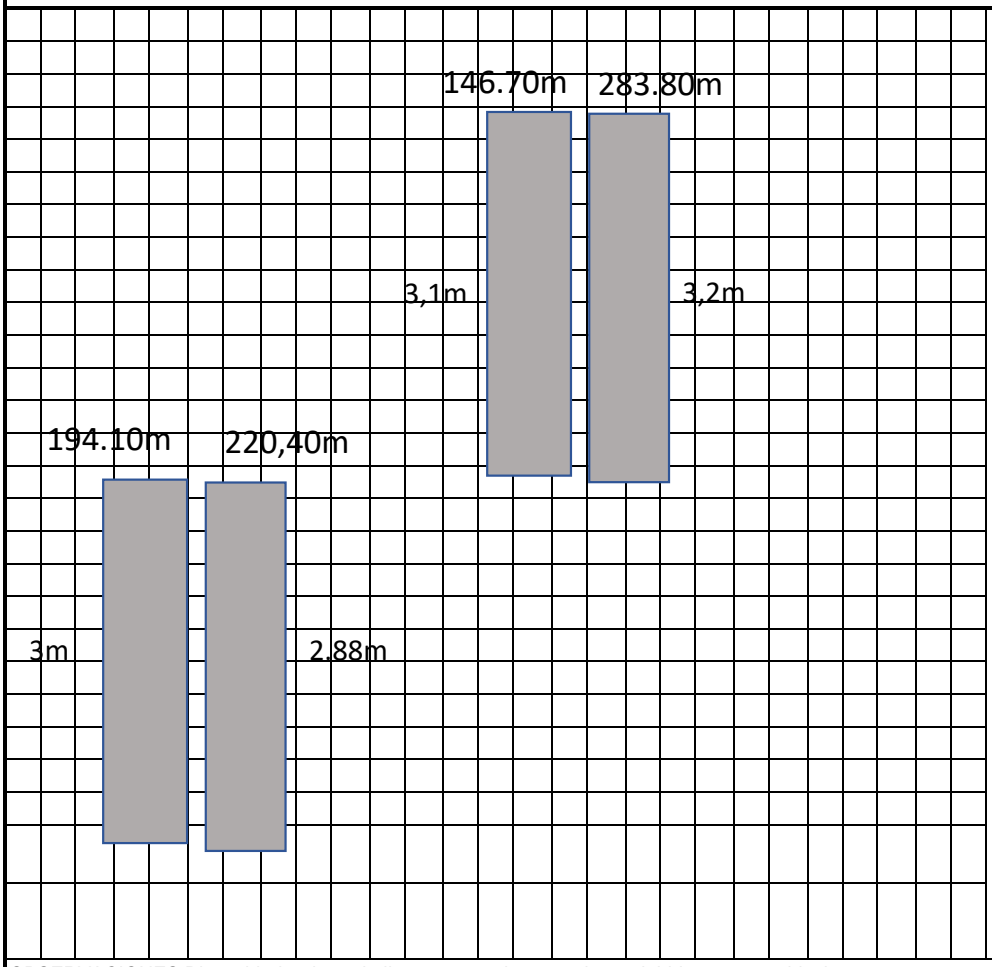

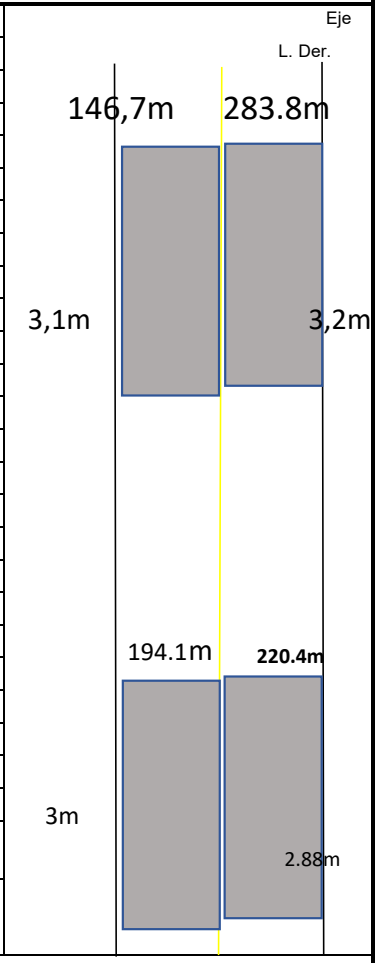

OBSERVACIONES:Dia nublado, riego de liga presenta levantamiento debido a paso vehicula,

FIRMA QUIEN ELABORO

Vo.Bo.
Nombre: Edwin Alejandro Laverde Patiño :
Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.

FIRMA INGENIERO


Vo.Bo.
Nombre: Javier Andrés Fagua Torres
Apoyo a la supervisión GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

CANTIDADES DE PAVIMENTO INSTALACION DE CARPETA

Contrato No:MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS CON CÓDIGOS 61BYA (PASO POR FIRAVITOBA) - 55BY08 (PANTANO DE VARGAS-FIRAVITOBA), EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Fecha : 16/6/2026

Fecha	Ubicacion		Lado		Dimensiones (m)			Area Liga(m2)	Volumen Mezcla (m3)
	Abcisa Inicio	Abcisa Final	Izq.	Der	LARGO	ANCHO	Espesor		
16/6/2026	K6+341,9	K6+159,6	X		182.3	2.5	0.05	455.75	22.7875
16/6/2026	K6+276,2	K5+962		X	314.2	2.43	0.05	763.506	38.1753
16/6/2026	K8+847,2	K9+070.3	X		223.1	3.08	0.05	687.148	34.3574
16/6/2026	K8+826,8	K9+046.5		X	219.7	3.09	0.05	678.873	33.94365

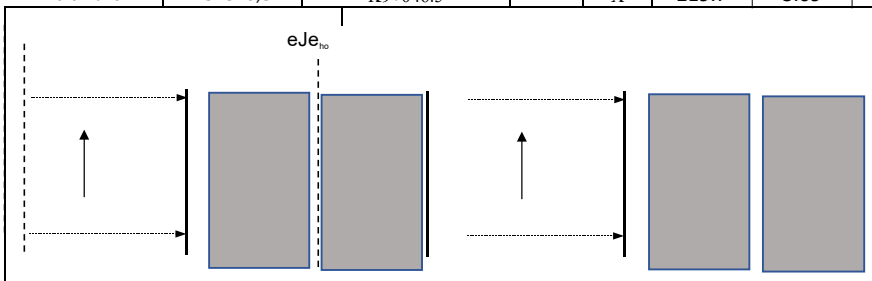

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre:	Edwin Alejandro Laverde Patiño	**Nombre:**	Vo.Bo. Rafael Camilo Suárez Suárez	**Nombre:**	Javier Andrés Fagua Torres
Cargo:	Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.	**Cargo:**	Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.	**Cargo:**	Apoyo a la supervisión GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
Firma:		**Firma:**		**Frima**	


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS CON CÓDIGOS 61BYA (PASO POR FIRAVITOBA) - 55BY08 (PANTANO DE VARGAS-FIRAVITOBA), EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

ACTIVIDAD :	INSTALACION DE CARPETA ASFALTICA MCD19	**Fecha : 16/6/2026**

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Edwin Alejandro Laverde Patiño

K6+341,9- K5+962 / K8+826,8 - K9+046.5

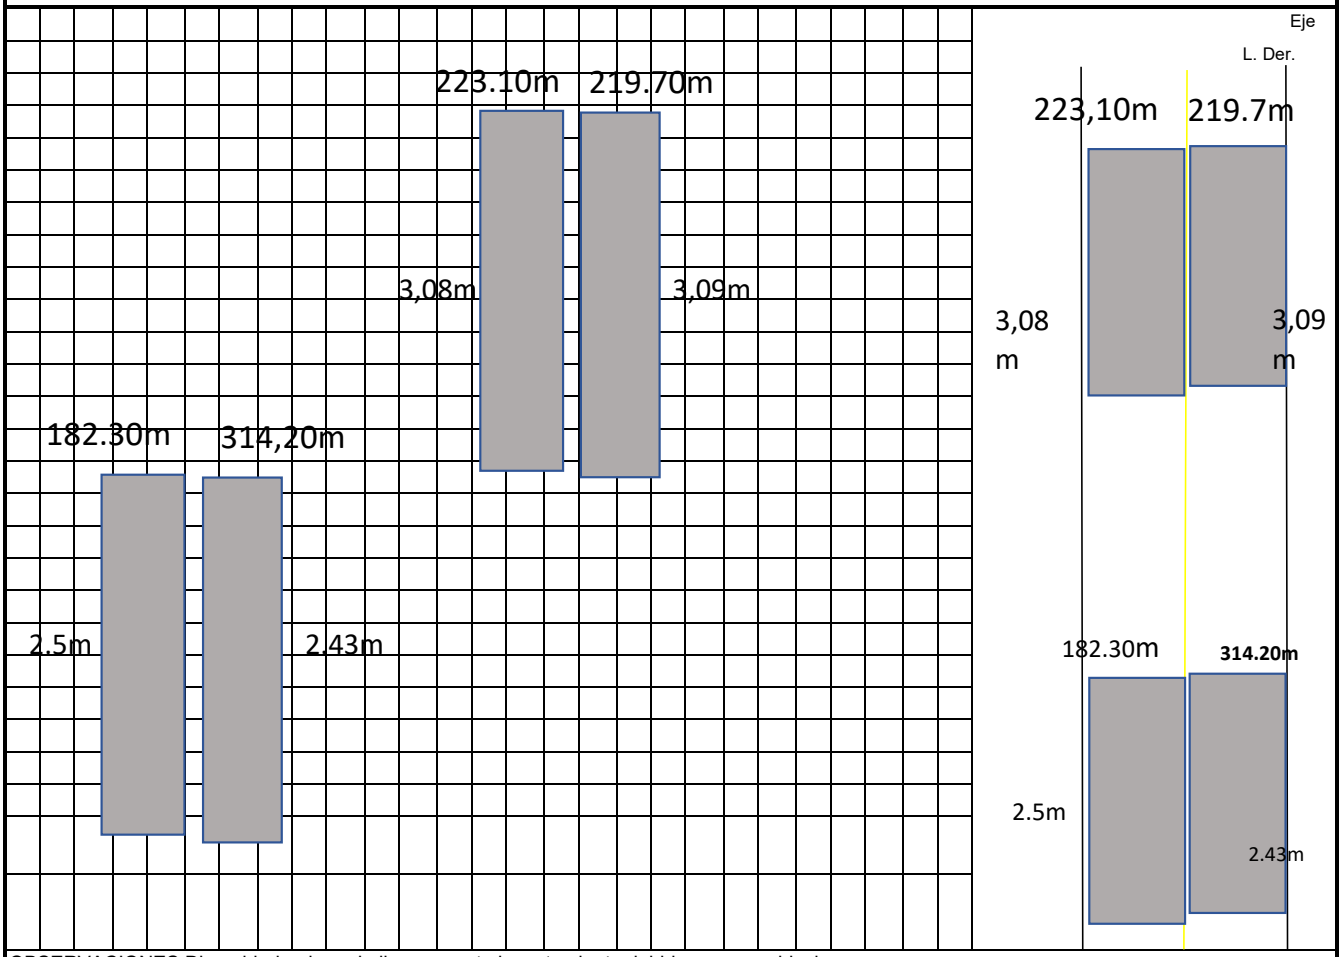

OBSERVACIONES:Dia nublado, riego de liga presenta levantamiento debido a paso vehicula,

FIRMA QUIEN ELABORO

Vo.Bo.
Nombre: Edwin Alejandro Laverde Patiño :
Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.

FIRMA INGENIERO


Vo.Bo.
Nombre: Javier Andrés Fagua Torres
Apoyo a la supervisión GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

CANTIDADES DE PAVIMENTO INSTALACION DE CARPETA

Contrato No:MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS CON CÓDIGOS 61BYA (PASO POR FIRAVITOBA) - 55BY08 (PANTANO DE VARGAS-FIRAVITOBA), EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Fecha : 17/6/2026

Fecha	Ubicacion		Lado		Dimensiones (m)			Area Liga(m2)	Volumen Mezcla (m3)
	Abcisa Inicio	Abcisa Final	Izq.	Der	LARGO	ANCHO	Espesor		
17/6/2026	K6+159.6	K5+830.6	X		329	2.5	0.05	822.5	41.125
17/6/2026	K5+962	K5+788.6		X	173.4	2.29	0.05	397.086	19.8543
17/6/2026	K9+070.3	K9+301.4	X		231.1	3.1	0.05	716.41	35.8205
17/6/2026	K9+046.5	K9+249.8		X	203.3	3.2	0.05	650.56	32.528

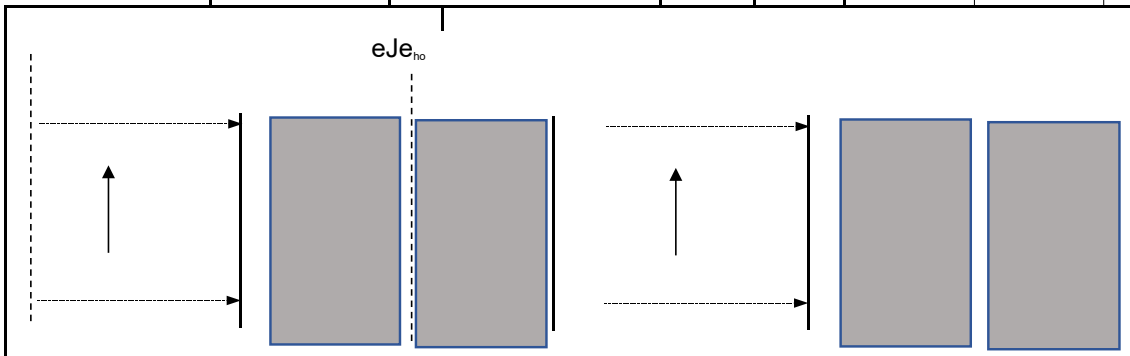

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre:	Edwin Alejandro Laverde Patiño	**Nombre:**	Vo.Bo. Rafael Camilo Suárez Suárez	**Nombre:**	Javier Andrés Fagua Torres
Cargo:	Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.	**Cargo:**	Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.	**Cargo:**	Apoyo a la supervisión GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
Firma:		**Firma:**		**Frima**	


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS CON CÓDIGOS 61BYA (PASO POR FIRAVITOBA) - 55BY08 (PANTANO DE VARGAS-FIRAVITOBA), EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

ACTIVIDAD :	INSTALACION DE CARPETA ASFALTICA MCD19	**Fecha : 17/6/2026**

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Edwin Alejandro Laverde Patiño

K6+159.6- K5+788.6 / K9+046.5 - K9+301.4

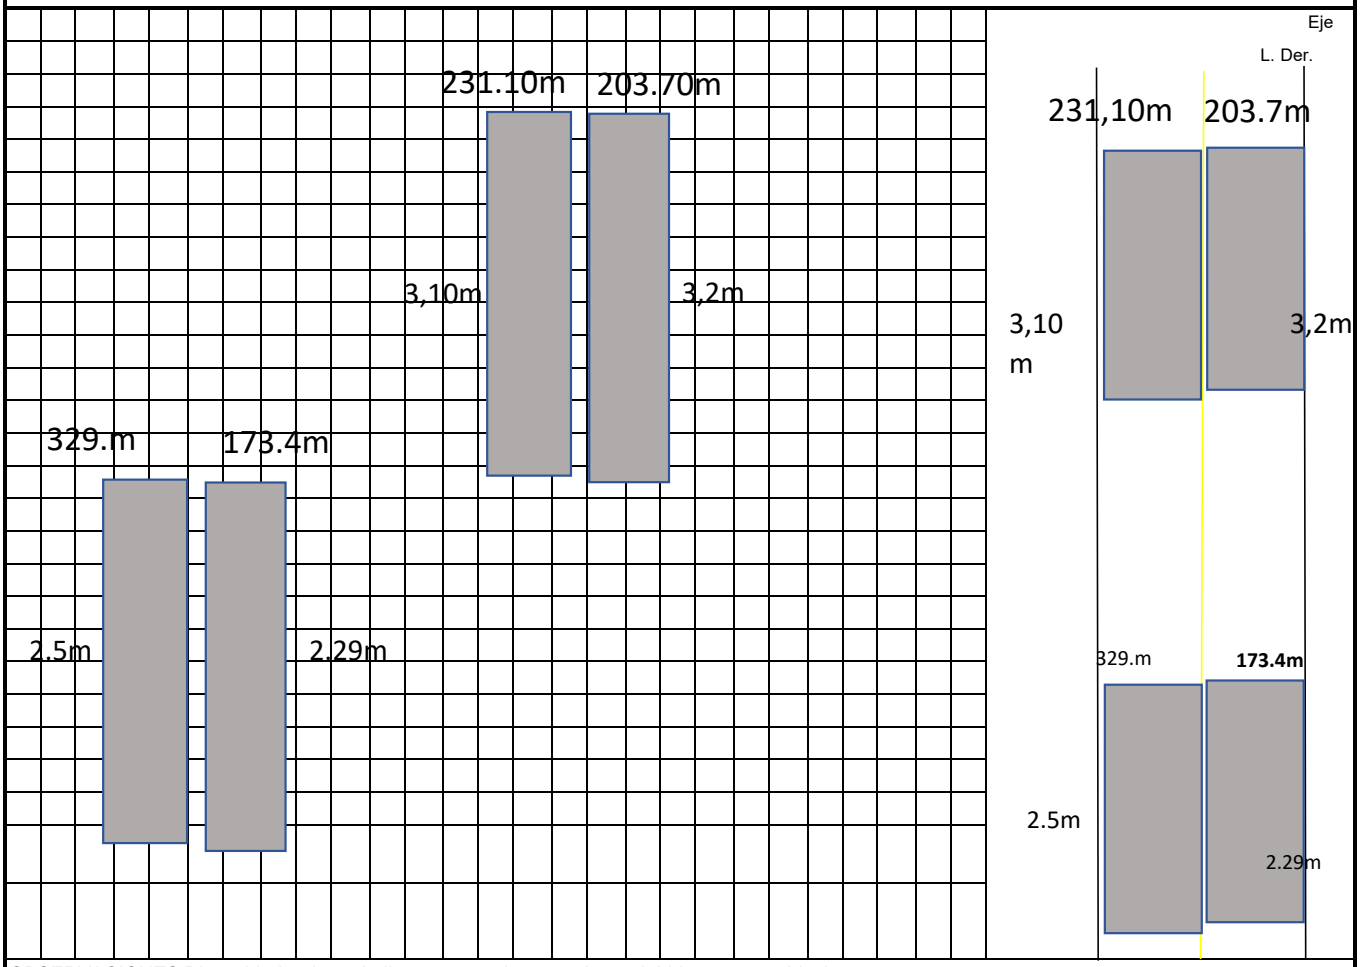

OBSERVACIONES:Dia nublado, riego de liga presenta levantamiento debido a paso vehicula,

FIRMA QUIEN ELABORO

Vo.Bo.
Nombre: Edwin Alejandro Laverde Patiño :
Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.

FIRMA INGENIERO


Vo.Bo.
Nombre: Javier Andrés Fagua Torres
Apoyo a la supervisión GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

CANTIDADES DE PAVIMENTO INSTALACION DE CARPETA

Contrato No:MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS CON CÓDIGOS 61BYA (PASO POR FIRAVITOBA) - 55BY08 (PANTANO DE VARGAS-FIRAVITOBA), EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Fecha : 18/6/2026

Fecha	Ubicacion		Lado		Dimensiones (m)			Area Liga(m2)	Volumen Mezcla (m3)
	Abcisa Inicio	Abcisa Final	Izq.	Der	LARGO	ANCHO	Espesor		
18/6/2026	K5+830.6	K5+634	X		196	2.39	0.05	468.44	23.422
18/6/2026	K5+788.6	K5+488.9		X	299.7	2.55	0.05	764.235	38.21175
18/6/2026	K9+301.4	K9+498.2	X		229.1	3.15	0.05	721.665	36.08325
18/6/2026	K9+249.8	K9+446.6		X	196.8	3.2	0.05	629.76	31.488

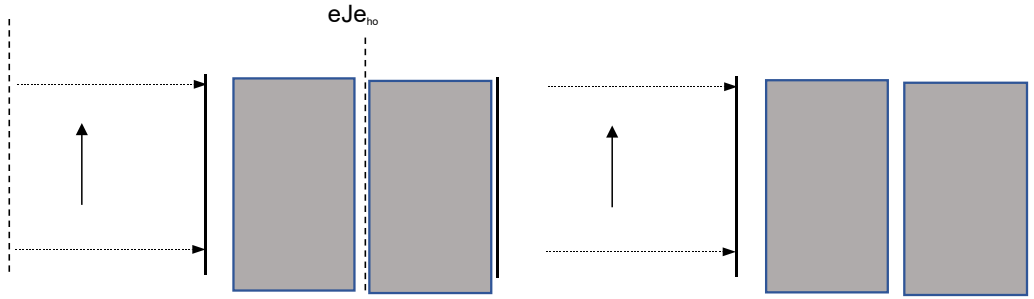

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre:	Edwin Alejandro Laverde Patiño	**Nombre:**	Vo.Bo. Rafael Camilo Suárez Suárez	**Nombre:**	Javier Andrés Fagua Torres
Cargo:	Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.	**Cargo:**	Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.	**Cargo:**	Apoyo a la supervisión GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
Firma:		**Firma:**		**Frima**	


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS CON CÓDIGOS 61BYA (PASO POR FIRAVITOBA) - 55BY08 (PANTANO DE VARGAS-FIRAVITOBA), EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

ACTIVIDAD :	INSTALACION DE CARPETA ASFALTICA MCD19	**Fecha : 18/6/2026**

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Edwin Alejandro Laverde Patiño

K5+830.6- K5+488.9 / K9+249.8 - K9+498.2

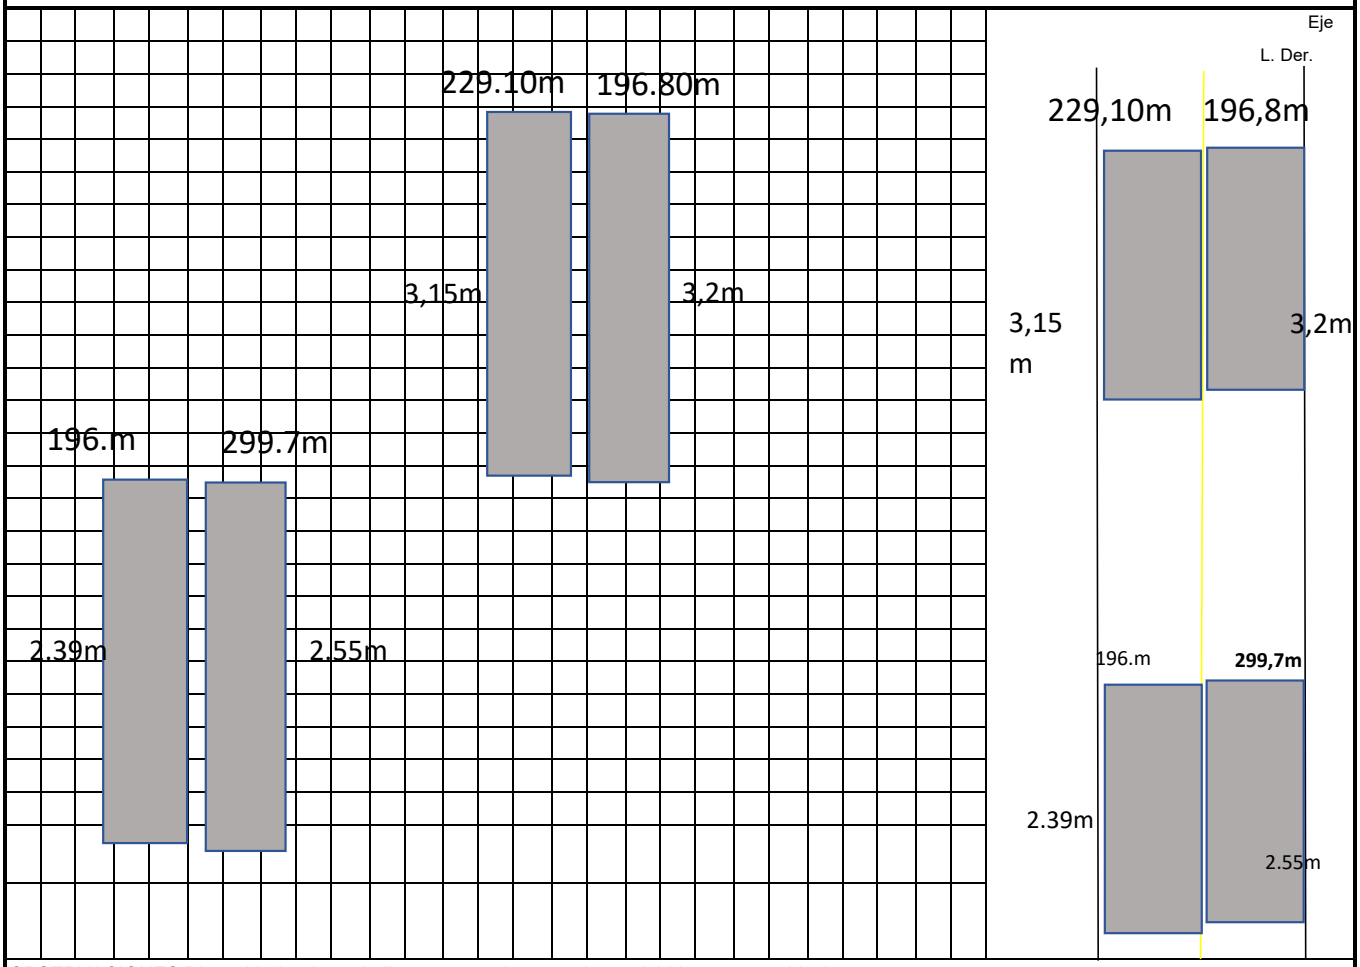

OBSERVACIONES:Dia nublado, riego de liga presenta levantamiento debido a paso vehicula,

FIRMA QUIEN ELABORO

Vo.Bo.
Nombre: Edwin Alejandro Laverde Patiño :
Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.

FIRMA INGENIERO


Vo.Bo.
Nombre: Javier Andrés Fagua Torres
Apoyo a la supervisión GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

CANTIDADES DE PAVIMENTO INSTALACION DE CARPETA

Contrato No:MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS CON CÓDIGOS 61BYA (PASO POR FIRAVITOBA) - 55BY08 (PANTANO DE VARGAS-FIRAVITOBA), EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Fecha : 19/6/2026

Fecha	Ubicacion		Lado		Dimensiones (m)			Area Liga(m2)	Volumen Mezcla (m3)
	Abcisa Inicio	Abcisa Final	Izq.	Der	LARGO	ANCHO	Espesor		
19/6/2026	K5+634	K5+397	X		237	2.35	0.05	556.95	27.8475
19/6/2026	K5+488.9	K5+230.9		X	258	2.55	0.05	657.9	32.895
19/6/2026	K9+498.2	K9+789.6	X		291.4	3.1	0.05	903.34	45.167
19/6/2026	K9+446.6	K9+596.3		X	149.7	3.1	0.05	464.07	23.2035

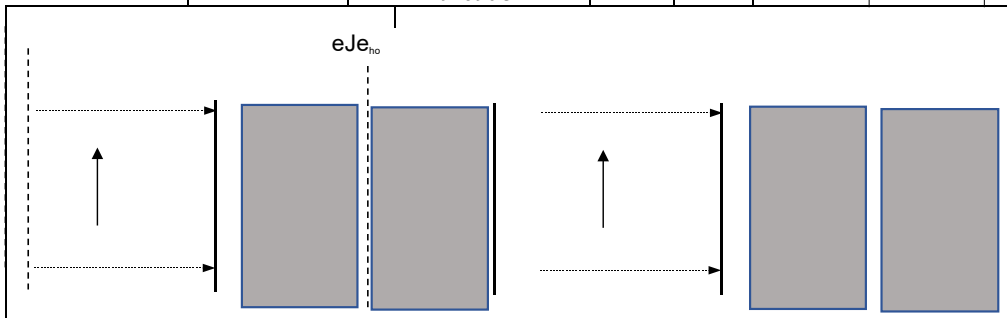

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre:	Edwin Alejandro Laverde Patiño	**Nombre:**	Vo.Bo. Rafael Camilo Suárez Suárez	**Nombre:**	Javier Andrés Fagua Torres
Cargo:	Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.	**Cargo:**	Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.	**Cargo:**	Apoyo a la supervisión GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
Firma:		**Firma:**		**Frima**	


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS CON CÓDIGOS 61BYA (PASO POR FIRAVITOBA) - 55BY08 (PANTANO DE VARGAS-FIRAVITOBA), EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

ACTIVIDAD :	INSTALACION DE CARPETA ASFALTICA MCD19	**Fecha : 19/6/2026**

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Edwin Alejandro Laverde Patiño

K5+634 - K5+230.9 / K9+498.2 -K9+789.6

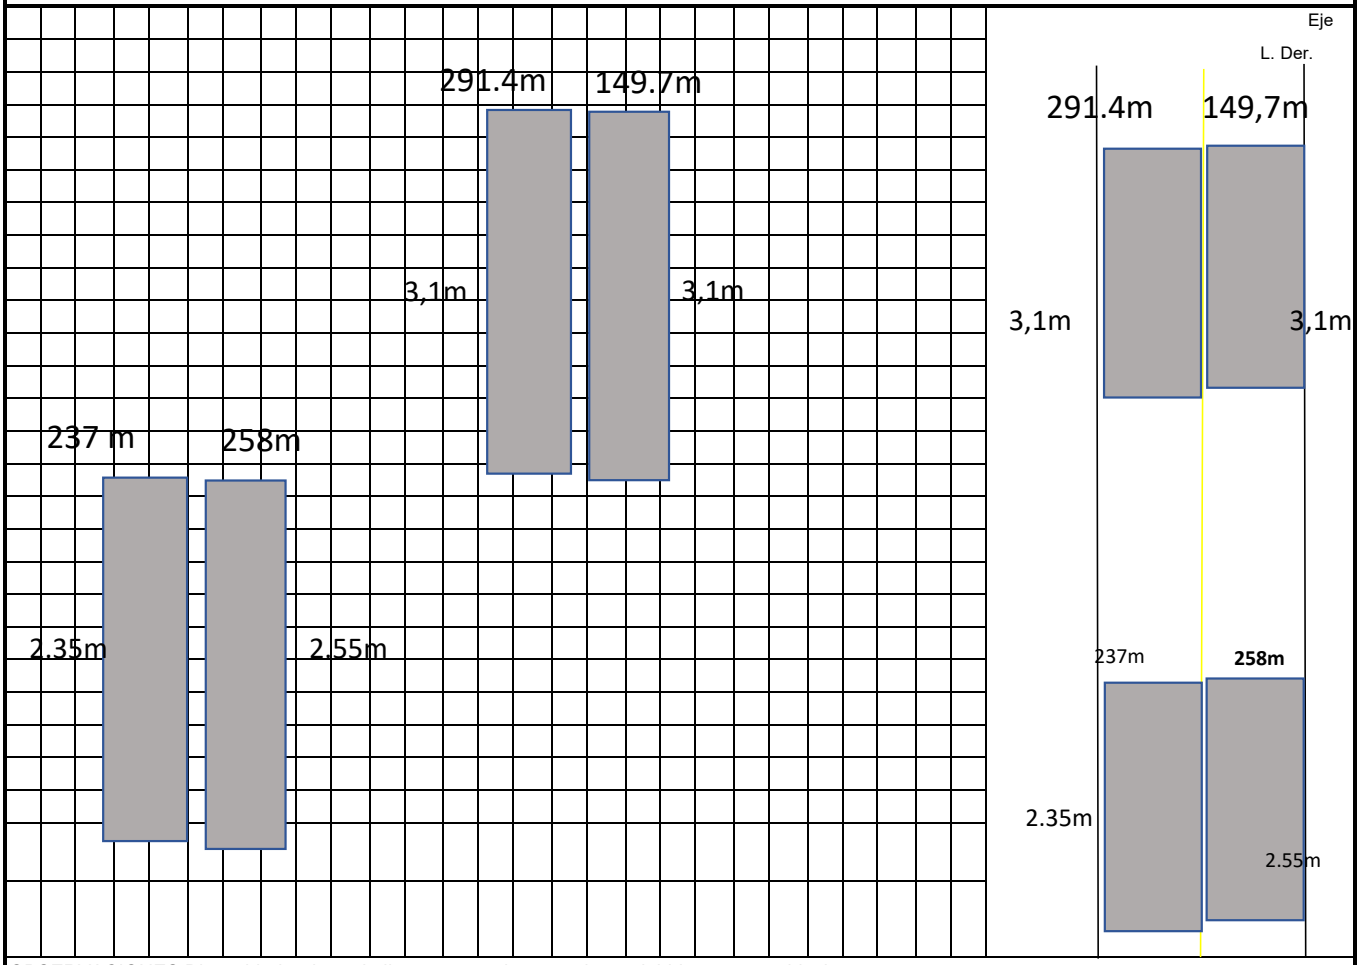

OBSERVACIONES:Dia nublado, riego de liga presenta levantamiento debido a paso vehicula,

FIRMA QUIEN ELABORO

Vo.Bo.
Nombre: Edwin Alejandro Laverde Patiño :
Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.

FIRMA INGENIERO


Vo.Bo.
Nombre: Javier Andrés Fagua Torres
Apoyo a la supervisión GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

CANTIDADES DE PAVIMENTO INSTALACION DE CARPETA

Contrato No:MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS CON CÓDIGOS 61BYA (PASO POR FIRAVITOBA) - 55BY08 (PANTANO DE VARGAS-FIRAVITOBA), EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Fecha : 22/6/2026

Fecha	Ubicacion		Lado		Dimensiones (m)			Area Liga(m2)	Volumen Mezcla (m3)
	Abcisa Inicio	Abcisa Final	Izq.	Der	LARGO	ANCHO	Espesor		
22/6/2026	K5+397	K5+091.3	X		305.7	2.5	0.05	764.25	38.2125
22/6/2026	K5+230.9	K5+036.9		X	194	2.35	0.05	455.9	22.795
22/6/2026	K9+789.6	K10+099.8	X		310.2	3.05	0.05	946.11	47.3055
22/6/2026	K9+596.3	K9+733.3		X	137	3.06	0.05	419.22	20.961

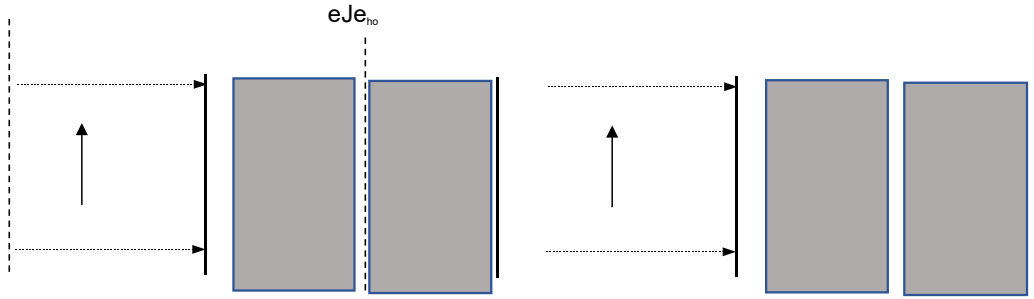

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre:	Edwin Alejandro Laverde Patiño	**Nombre:**	Vo.Bo. Rafael Camilo Suárez Suárez	**Nombre:**	Javier Andrés Fagua Torres
Cargo:	Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.	**Cargo:**	Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.	**Cargo:**	Apoyo a la supervisión GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
Firma:		**Firma:**		**Frima**	


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES


OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS CON CÓDIGOS 61BYA (PASO POR FIRAVITOBA) - 55BY08 (PANTANO DE VARGAS-FIRAVITOBA), EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

ACTIVIDAD :	INSTALACION DE CARPETA ASFALTICA MCD19	**Fecha : 22/6/2026**

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Edwin Alejandro Laverde Patiño

K5+634 - K5+230.9 / K9+498.2 -K9+789.6

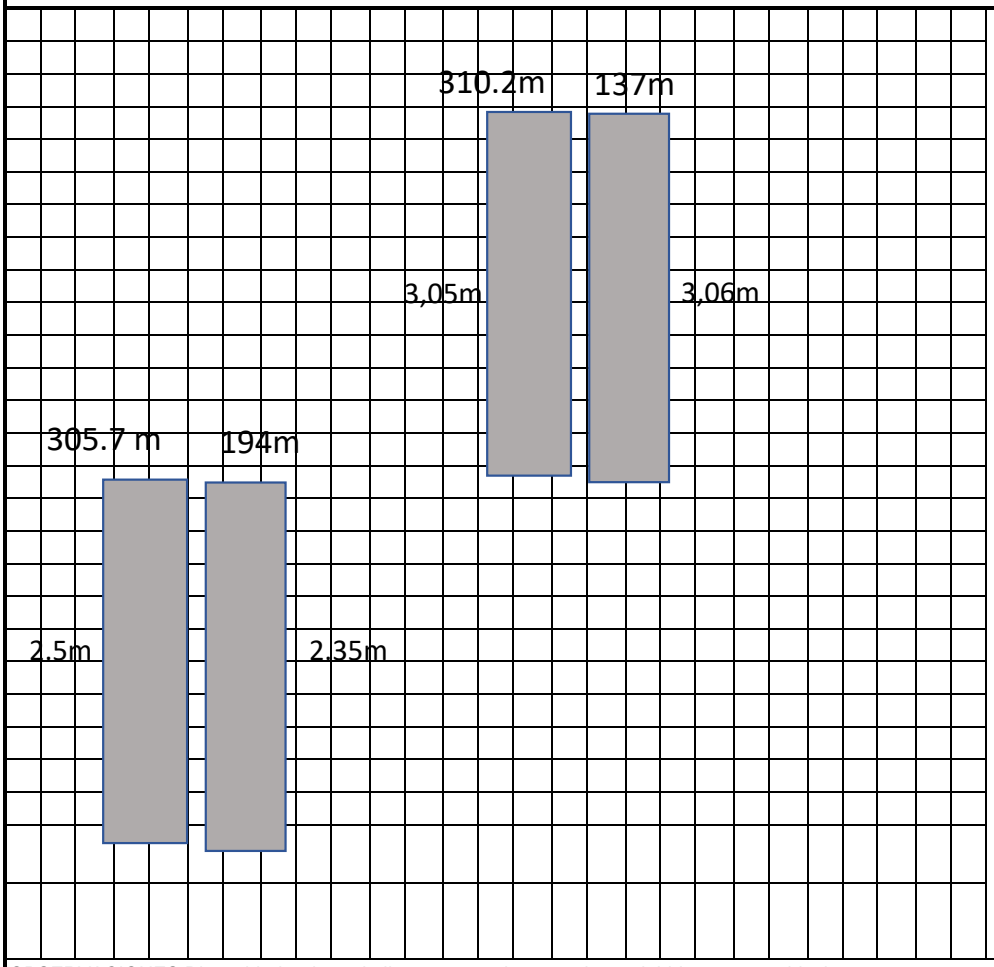

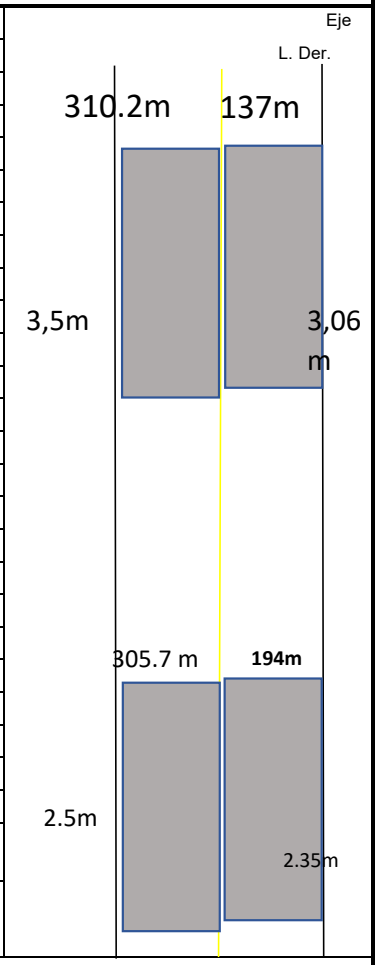

OBSERVACIONES:Dia nublado, riego de liga presenta levantamiento debido a paso vehicula,

FIRMA QUIEN ELABORO

Vo.Bo.
Nombre: Edwin Alejandro Laverde Patiño :
Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.

FIRMA INGENIERO


Vo.Bo.
Nombre: Javier Andrés Fagua Torres
Apoyo a la supervisión GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

CANTIDADES DE PAVIMENTO INSTALACION DE CARPETA

Contrato No:MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS CON CÓDIGOS 61BYA (PASO POR FIRAVITOBA) - 55BY08 (PANTANO DE VARGAS-FIRAVITOBA), EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Fecha : 23/6/2026

Fecha	Ubicacion		Lado		Dimensiones (m)			Area Liga(m2)	Volumen Mezcla (m3)
	Abcisa Inicio	Abcisa Final	Izq.	Der	LARGO	ANCHO	Espesor		
23/6/2026	K5+091.3	K4+935.3	X		156	2.92	0.05	455.52	22.776
23/6/2026	K5+036.9	K4+755.9		X	281	2.72	0.05	764.32	38.216
23/6/2026	K10+099.8	K10+254	X		154.2	3	0.05	462.6	23.13
23/6/2026	K9+733.3	K10+037.9		X	304.6	2.95	0.05	898.57	44.9285

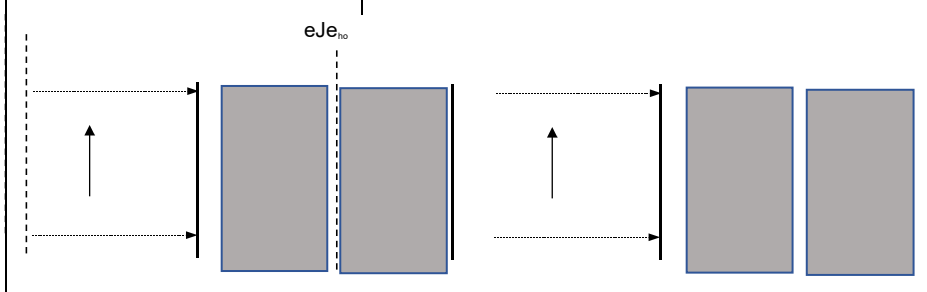

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre:	Edwin Alejandro Laverde Patiño	**Nombre:**	Vo.Bo. Rafael Camilo Suárez Suárez	**Nombre:**	Javier Andrés Fagua Torres
Cargo:	Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.	**Cargo:**	Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.	**Cargo:**	Apoyo a la supervisión GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
Firma:		**Firma:**		**Frima**	


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS CON CÓDIGOS 61BYA (PASO POR FIRAVITOBA) - 55BY08 (PANTANO DE VARGAS-FIRAVITOBA), EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

ACTIVIDAD :	INSTALACION DE CARPETA ASFALTICA MCD19	**Fecha : 23/6/2026**

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Edwin Alejandro Laverde Patiño

K5+091.3 - K4+935.3 / K9+733.3 - K10+037.9

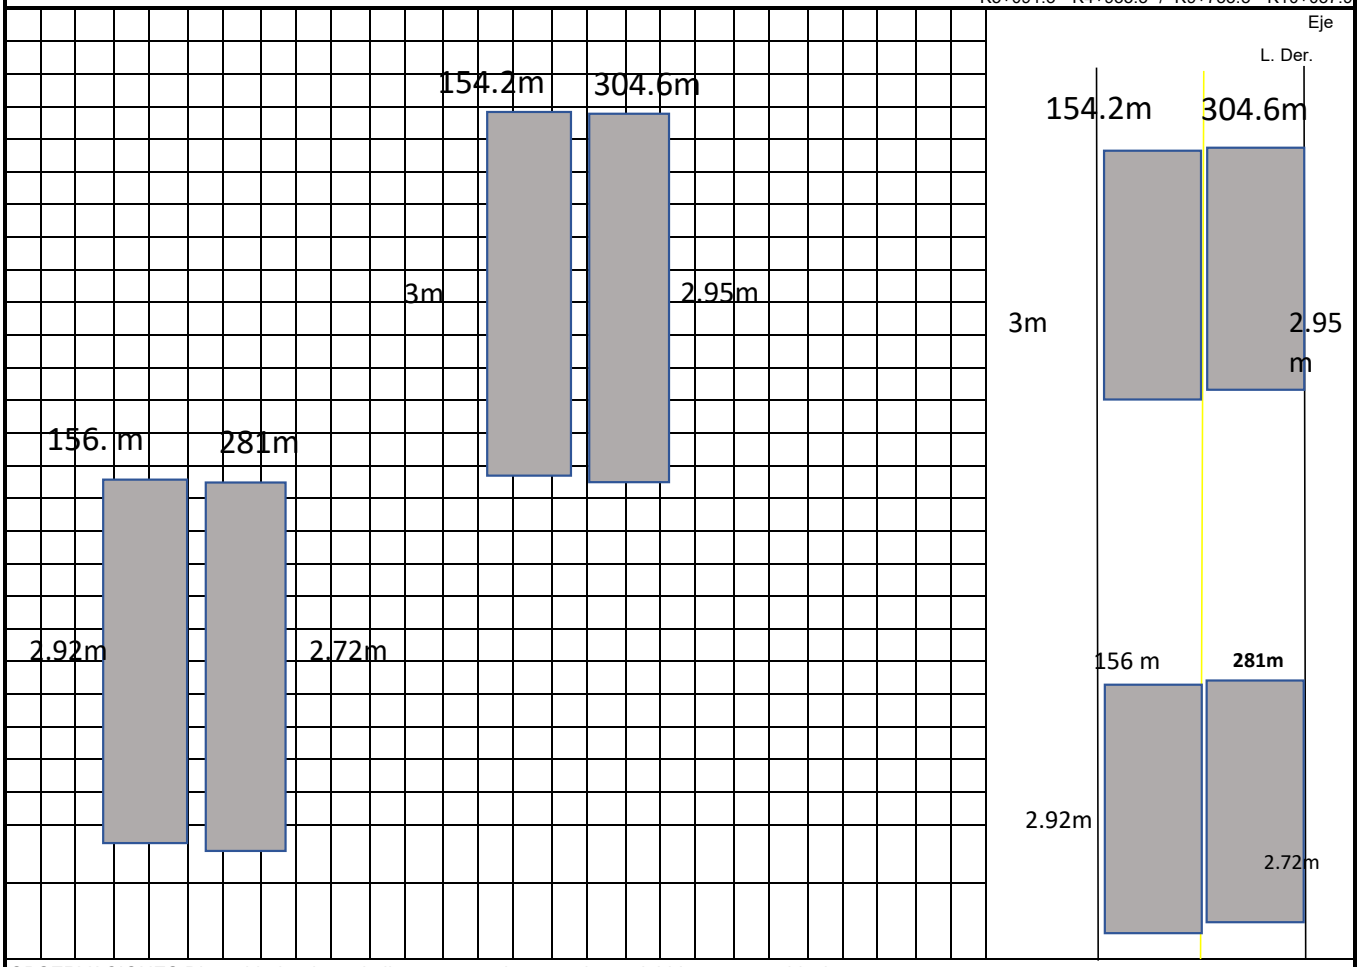

OBSERVACIONES:Dia nublado, riego de liga presenta levantamiento debido a paso vehicula,

FIRMA QUIEN ELABORO

Vo.Bo.
Nombre: Edwin Alejandro Laverde Patiño :
Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.

FIRMA INGENIERO


Vo.Bo.
Nombre: Javier Andrés Fagua Torres
Apoyo a la supervisión GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

CANTIDADES DE PAVIMENTO INSTALACION DE CARPETA

Contrato No:MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS CON CÓDIGOS 61BYA (PASO POR FIRAVITOBA) - 55BY08 (PANTANO DE VARGAS-FIRAVITOBA), EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Fecha : 24/6/2026

Fecha	Ubicacion		Lado		Dimensiones (m)			Area Liga(m2)	Volumen Mezcla (m3)
	Abcisa Inicio	Abcisa Final	Izq.	Der	LARGO	ANCHO	Espesor		
24/6/2026	K10+254	K10+405	X		151	2.95	0.05	445.45	22.2725
24/6/2026	K10+037,9	K10+343.6		X	305.7	3	0.05	917.1	45.855
24/6/2026	K4+953.3	K4+797.3	X		156	2.71	0.05	422.76	21.138
24/6/2026	K4+755.9	K4+524.3		X	231.6	2.46	0.05	569.736	28.4868

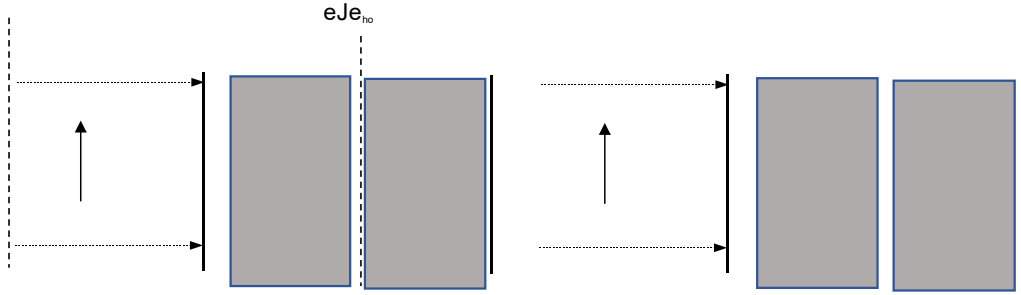

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre:	Edwin Alejandro Laverde Patiño	**Nombre:**	Vo.Bo. Rafael Camilo Suárez Suárez	**Nombre:**	Javier Andrés Fagua Torres
Cargo:	Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.	**Cargo:**	Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.	**Cargo:**	Apoyo a la supervisión GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
Firma:		**Firma:**		**Frima**	


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS CON CÓDIGOS 61BYA (PASO POR FIRAVITOBA) - 55BY08 (PANTANO DE VARGAS-FIRAVITOBA), EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

ACTIVIDAD :	INSTALACION DE CARPETA ASFALTICA MCD19	**Fecha : 24/6/2026**

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Edwin Alejandro Laverde Patiño

INICIO: K4+953.3FIN: -K4+797.3 DER, INICIO: K4+755.9 FIN: K4+524.3i ZQ.

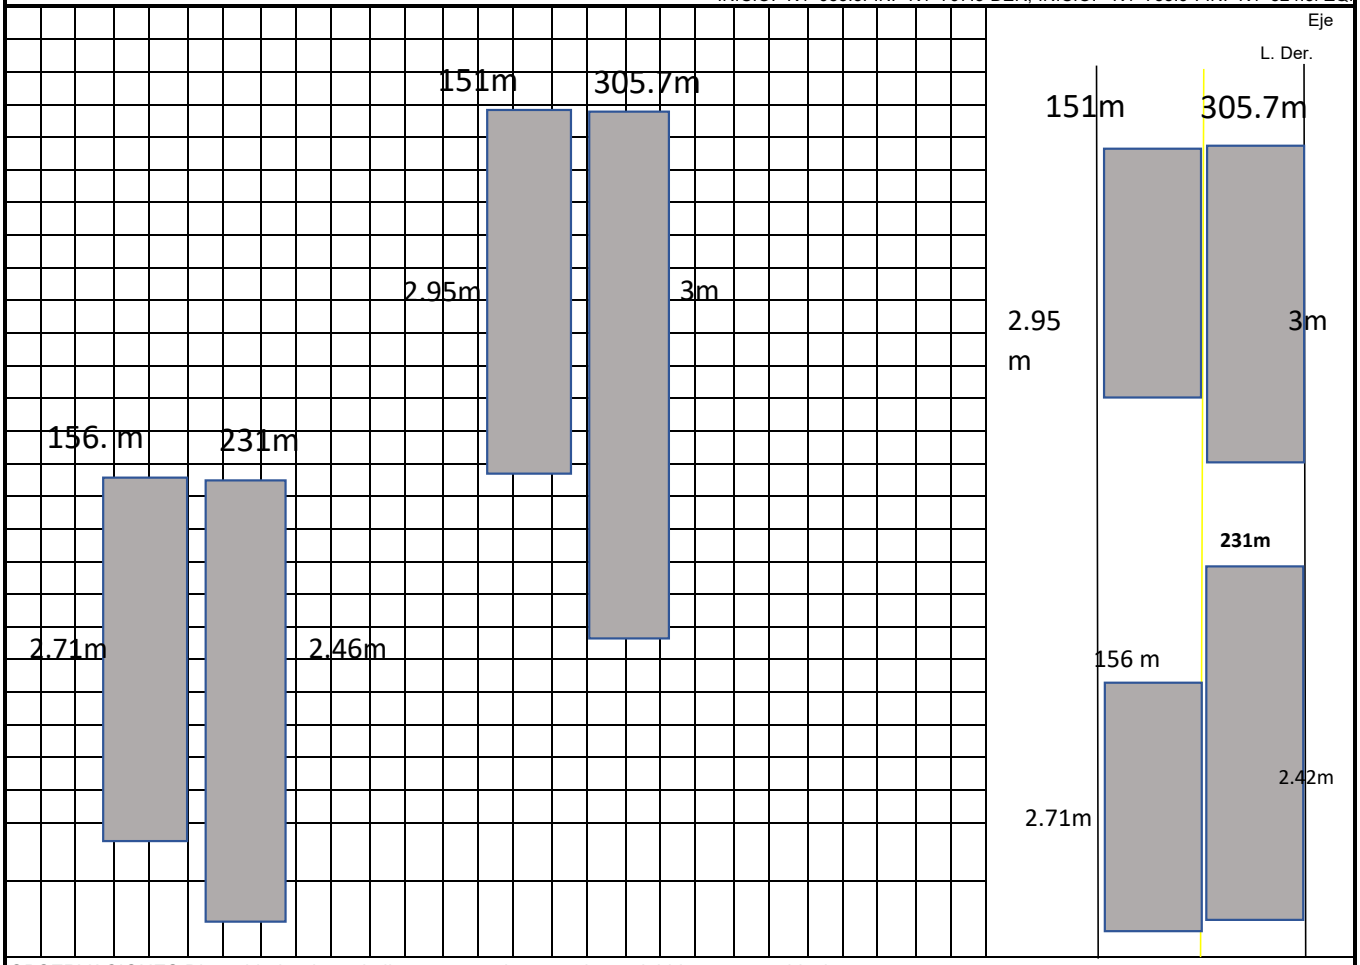

OBSERVACIONES:Dia nublado, riego de liga presenta levantamiento debido a paso vehicula,

FIRMA QUIEN ELABORO

Vo.Bo.
Nombre: Edwin Alejandro Laverde Patiño :
Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.

FIRMA INGENIERO


Vo.Bo.
Nombre: Javier Andrés Fagua Torres
Apoyo a la supervisión GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

CANTIDADES DE PAVIMENTO INSTALACION DE CARPETA

Contrato No:MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS CON CÓDIGOS 61BYA (PASO POR FIRAVITOBA) - 55BY08 (PANTANO DE VARGAS-FIRAVITOBA), EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Fecha : 25/6/2026

Fecha	Ubicacion		Lado		Dimensiones (m)			Area Liga(m2)	Volumen Mezcla (m3)
	Abcisa Inicio	Abcisa Final	Izq.	Der	LARGO	ANCHO	Espesor		
25/6/2026	K4+797,3	K4+613.3	X		184	2.61	0.05	480.24	24.012
25/6/2026	K4+524,3	K4+382.3		X	142	2.71	0.05	384.82	19.241
25/6/2026	K4+613.3	K4+491,8	X		121.5	2.65	0.05	321.975	16.09875
25/6/2026	K10+405	K10+519		X	114	2.9	0.05	330.6	16.53
25/6/2026	K10+343.6	K10+546.6	X		203	3	0.05	609	30.45

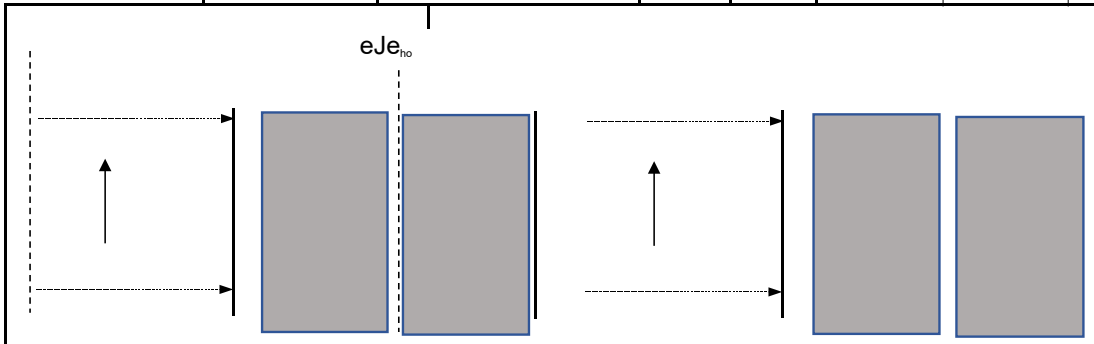

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre:	Edwin Alejandro Laverde Patiño	**Nombre:**	Vo.Bo. Rafael Camilo Suárez Suárez	**Nombre:**	Javier Andrés Fagua Torres
Cargo:	Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.	**Cargo:**	Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.	**Cargo:**	Apoyo a la supervisión GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
Firma:		**Firma:**		**Frima**	


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS CON CÓDIGOS 61BYA (PASO POR FIRAVITOBA) - 55BY08 (PANTANO DE VARGAS-FIRAVITOBA), EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

ACTIVIDAD :	INSTALACION DE CARPETA ASFALTICA MCD19	**Fecha : 25/6/2026**

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Edwin Alejandro Laverde Patiño

INICIO: K4+797,3 .3 FIN: K4+613.3 DER, INICIO: K4+524,3 FIN: K4+382.3 ZQ. INICIO: K4+613.3 .3 FIN: K4+491,8 DER

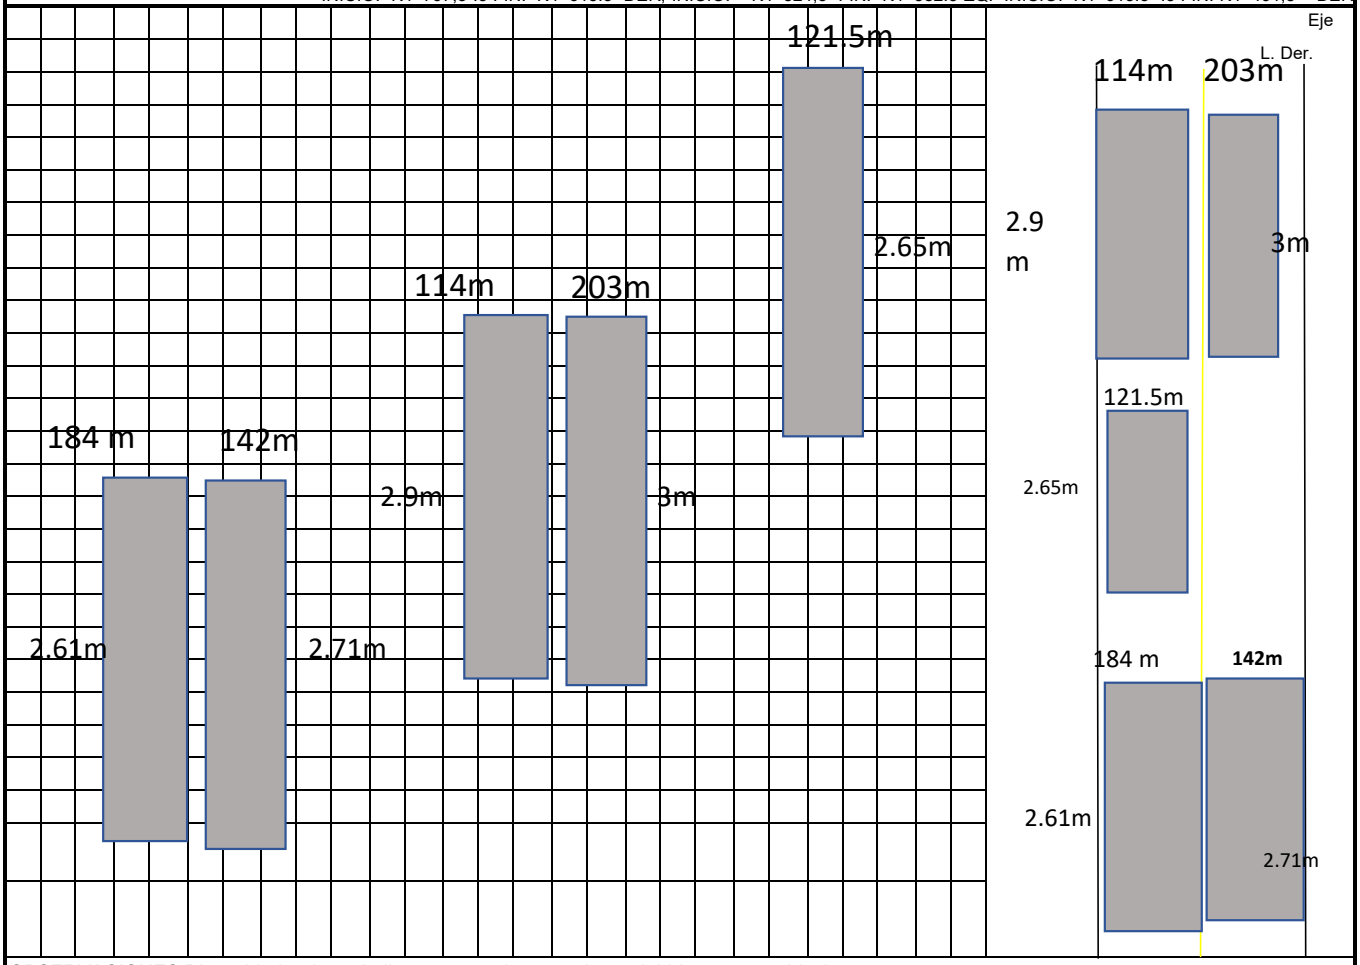

OBSERVACIONES:Dia nublado, riego de liga presenta levantamiento debido a paso vehicula,

FIRMA QUIEN ELABORO

Vo.Bo.
Nombre: Edwin Alejandro Laverde Patiño :
Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.

FIRMA INGENIERO


Vo.Bo.
Nombre: Javier Andrés Fagua Torres
Apoyo a la supervisión GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

CANTIDADES DE PAVIMENTO INSTALACION DE CARPETA

Contrato No:MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS CON CÓDIGOS 61BYA (PASO POR FIRAVITOBA) - 55BY08 (PANTANO DE VARGAS-FIRAVITOBA), EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Fecha : 26/6/2026

Fecha	Ubicacion		Lado		Dimensiones (m)			Area Liga(m2)	Volumen Mezcla (m3)
	Abcisa Inicio	Abcisa Final	Izq.	Der	LARGO	ANCHO	Espesor		
26/6/2026	K13+275	K13+431	X		156	2.5	0.05	390	19.5
26/6/2026	K13+275	K13+431		X	156	2.8	0.05	436.8	21.84
26/6/2026	K13+466	K13+505	X		39.6	2.5	0.05	99	4.95
26/6/2026	K13+466	K13+500,3		X	34.3	2.5	0.05	85.75	4.2875

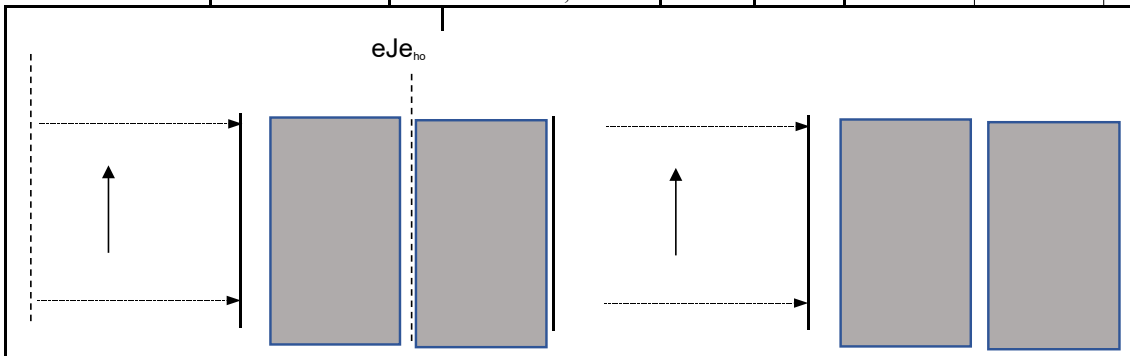

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre:	Edwin Alejandro Laverde Patiño	**Nombre:**	Vo.Bo. Rafael Camilo Suárez Suárez	**Nombre:**	Javier Andrés Fagua Torres
Cargo:	Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.	**Cargo:**	Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.	**Cargo:**	Apoyo a la supervisión GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
Firma:		**Firma:**		**Frima**	


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS CON CÓDIGOS 61BYA (PASO POR FIRAVITOBA) - 55BY08 (PANTANO DE VARGAS-FIRAVITOBA), EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

ACTIVIDAD :	INSTALACION DE CARPETA ASFALTICA MCD19	**Fecha : 26/6/2026**

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACION: Edwin Alejandro Laverde Patiño

K13+275 -K13+431 / K13+466 -K13+505

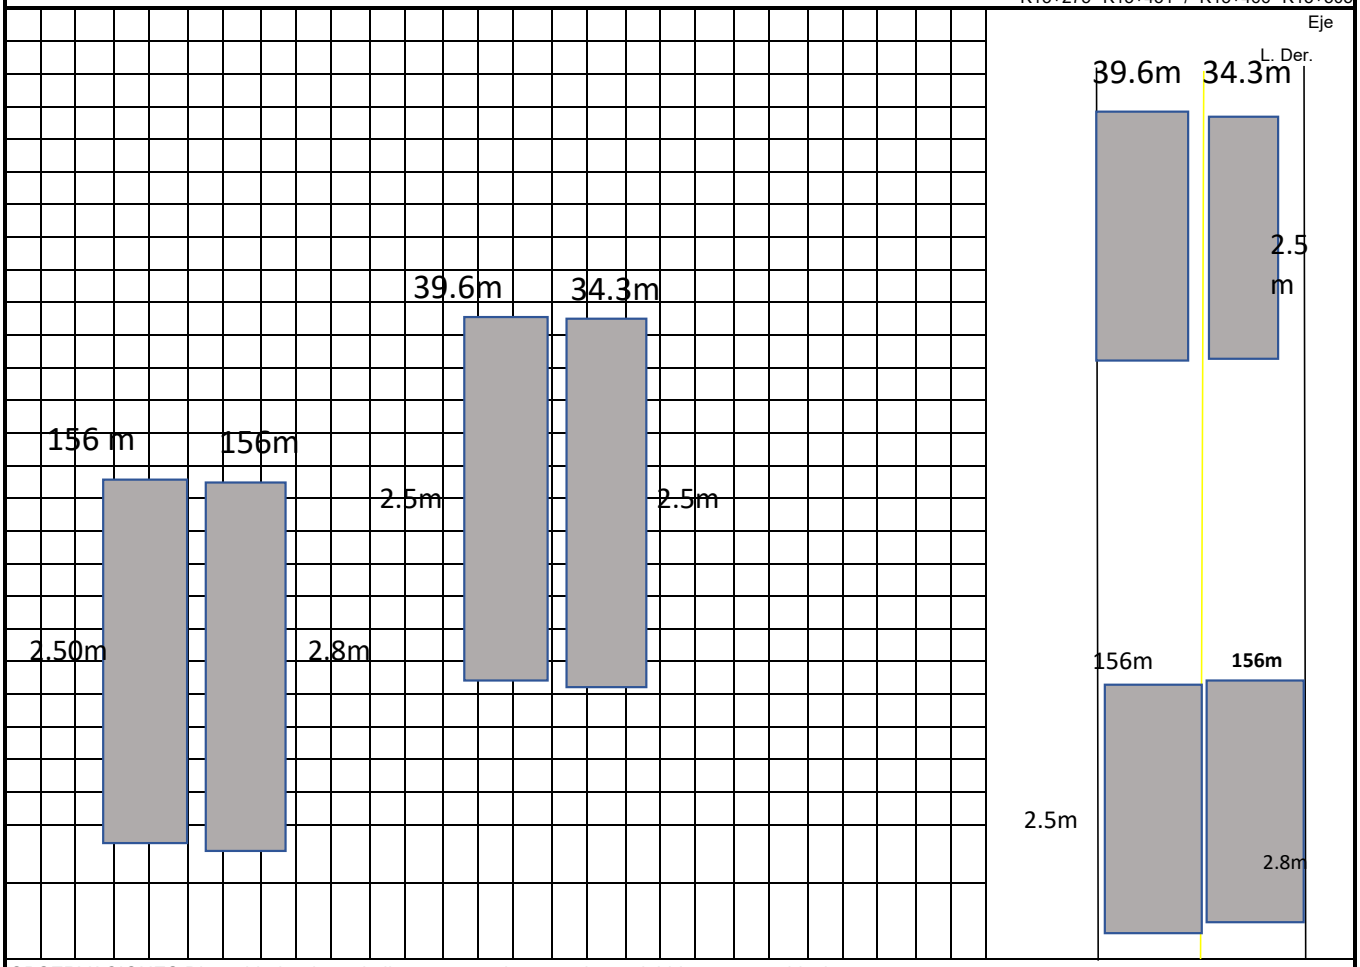

OBSERVACIONES:Dia nublado, riego de liga presenta levantamiento debido a paso vehicula,

FIRMA QUIEN ELABORO

Vo.Bo.
Nombre: Edwin Alejandro Laverde Patiño :
Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.

FIRMA INGENIERO

Vo.Bo.
Nombre: Javier Andrés Fagua Torres
Apoyo a la supervisión GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

4.6. Bitácora de obra

Cel: 316 8174458
gerencia@tierrasua.com
Calle 19 N.9-35 Piso 10 Tunja/Boyacá


4.6.1. Tramo: 60BY15 cruce 6009 - Soracá - la y - Tunja

Cel: 316 8174458
gerencia@tierrasua.com
Calle 19 N.9-35 Piso 10 Tunja/Boyacá

TIERRASUA ¡Conectamos región!	**BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES**
Fecha	01 de junio de 2026
Hora	7:30 a.m - 4:30 p.m
Clima	Soleado con leves lloviznas
Sector	Vía con código 60BY15 en el municipio de Soracá
Personal	• Ingeniera residente de TierraSua • Ingeniera residente de Orbeing • Ingeniero pasante de Orbeing • Cuadrilla de obra
Maquinaria	• Cortadora de pavimento con disco diamantado • Retroexcavadora • Volquetas • Tanque irrigador de asfalto • Finisher • Vibrocompactador • Rodillo neumático
Actividades ejecutadas	Durante la jornada se ejecutaron actividades de rehabilitación vial mediante reparcheo localizado en diferentes sectores de la vía. Inicialmente se realizó el trazado y corte perimetral de las áreas deterioradas, seguido de la apertura de las cajas ubicadas en las abscisas K0+123.2 (izquierda), K0+135.2 (calzada completa), K0+142.8 (izquierda), K0+164.9 (izquierda), K0+165.54 (eje), K0+172.2 (derecha), K0+176.6 (izquierda), K0+180.3 (izquierda) y K0+187.6 (eje). Posteriormente se efectuó el retiro, cargue y disposición del material producto de la excavación, además de la limpieza manual de las superficies intervenidas con el fin de eliminar material suelto y garantizar adecuadas condiciones para la instalación de la estructura de pavimento. Una vez conformada el área de trabajo, se realizó la verificación, nivelación y compactación de la base existente mediante vibrocompactador, asegurando una superficie uniforme y estable para la colocación de la mezcla asfáltica. Posteriormente se aplicó imprimación sobre la base preparada para mejorar la adherencia entre capas y favorecer el correcto desempeño del material instalado. Seguidamente se ejecutó el suministro, extendida y conformación de mezcla asfáltica en caliente en cada una de las cajas intervenidas. Posteriormente, se realizó la compactación inicial de la mezcla mediante vibrocompactador de rodillo, seguida del sellado y acabado superficial con compactador neumático, con el fin de garantizar la adecuada densificación, cierre de vacíos y correcta adherencia entre la mezcla instalada y el pavimento existente. Adicionalmente, se ejecutó únicamente el corte de la caja localizada en la abscisa K0+195.9 (derecha), dejando delimitada el área de intervención para la posterior apertura y rehabilitación de la estructura afectada.
PMT	Se implementó y mantuvo el Plan de Manejo de Tránsito mediante la instalación de conos (6), maletines (2), señales preventivas y auxiliares de tránsito en el frente de trabajo, con el propósito de canalizar el tránsito vehicular, advertir a los usuarios sobre las actividades en ejecución y garantizar condiciones seguras tanto para los trabajadores como para la circulación de vehículos y peatones en la zona intervenida.
Seguridad y Salud en el Trabajo	Se dio cumplimiento a las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) mediante la verificación permanente del uso adecuado de elementos de protección personal (EPP), inspección de las condiciones del frente de trabajo y control de riesgos asociados a las actividades ejecutadas con maquinaria y mezcla asfáltica en caliente. Asimismo, se realizó seguimiento al tránsito de vehículos y personal dentro del área intervenida, garantizando condiciones seguras para trabajadores y terceros durante el desarrollo de las actividades.



Firma Ingeniero de TierraSua



Firma Ingeniero de Apoyo de Supervisión Gobernación de Boyacá


TIERRASUA ¡Conectamos región!	**BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES**
Fecha	02 de junio de 2026
Hora	7:00 a.m - 4:30 p.m
Clima	Soleado con leves lloviznas
Sector	Vía con código 60BY15 en el municipio de Soracá
Personal	• Ingeniera residente de TierraSua • Ingeniera residente de Orbeing • Ingeniero pasante de Orbeing • Cuadrilla de obra
Maquinaria	• Cortadora de pavimento con disco diamantado • Retroexcavadora • Volquetas • Tanque irrigador de asfalto • Finisher • Vibrocompactador • Rodillo neumático
Actividades ejecutadas	Durante la jornada se realizó la apertura e instalación de mezcla asfáltica en la caja previamente cortada ubicada en la abscisa K0+195.9 (carril derecho). Asimismo, se ejecutó el corte, apertura e instalación de mezcla asfáltica en las cajas localizadas en las abscisas K0+202.5 (calzada completa), K0+207.7 (carril izquierdo), K0+222.38 (carril izquierdo) y K0+279.2 (carril derecho). Inicialmente se efectuó el corte perimetral de las cajas que no contaban con intervención previa, garantizando la delimitación de las áreas de intervención. Posteriormente, se realizó la apertura mecánica de las cajas con apoyo de retroexcavadora, seguida de la recolección y limpieza manual del material suelto y sobrantes generados durante la actividad. Una vez conformada y limpia la superficie, se procedió al acondicionamiento de la base mediante el uso de vibrocompactador tipo rodillo, con el fin de garantizar las condiciones adecuadas para la posterior aplicación de imprimación. Posteriormente, se ejecutó la imprimación de las áreas intervenidas y se realizó la instalación y extendida de mezcla asfáltica en caliente, verificando temperaturas de llegada, extendida y compactación de la mezcla, así como niveles y empalmes con la carpeta existente. Finalmente, se realizó el proceso de compactación de la mezcla asfáltica, efectuando inicialmente el pisado con rodillo vibratorio y posteriormente el sellado y compactación final con vibrocompactador neumático, garantizando la adecuada densificación y terminación superficial de las áreas intervenidas.
PMT	Se implementó y mantuvo el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) mediante la instalación de conos (6), maletines (2) y señales preventivas (5) en el área intervenida. Adicionalmente, se ubicó personal con paletas pare/siga en la parte superior e inferior del tramo en intervención, orientando el tránsito vehicular y controlando el paso alternado, con el fin de garantizar condiciones seguras de movilidad para los usuarios de la vía y el personal operativo durante el desarrollo de las actividades.
Seguridad y Salud en el Trabajo	Se dio cumplimiento a las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) mediante la realización de charla de seguridad antes del inicio de labores, inspección de las condiciones del área de trabajo y verificación permanente del uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). Asimismo, se efectuó seguimiento a las actividades ejecutadas con maquinaria y durante la manipulación e instalación de mezcla asfáltica en caliente, con el fin de prevenir incidentes y garantizar condiciones seguras para el personal operativo y terceros.

Firma Ingeniero de TierraSua	Firma Ingeniero de Apoyo de Supervisión Gobernación de Boyacá


TIERRASUA ¡Conectamos región!	**BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES**
Fecha	03 de junio de 2026
Hora	7:00 a.m - 4:30 p.m
Clima	Soleado
Sector	Vía con código 60BY15 en el municipio de Soracá
Personal	• Ingeniera residente de TierraSua • Ingeniera residente de Orbeing • Ingeniero pasante de Orbeing • Cuadrilla de obra
Maquinaria	• Cortadora de pavimento con disco diamantado • Retroexcavadora • Volquetas • Tanque irrigador de asfalto • Finisher • Vibrocompactador • Rodillo neumático
Actividades ejecutadas	Durante la jornada se ejecutaron actividades de corte, apertura e instalación de mezcla asfáltica en las cajas localizadas en las abscisas K0+285,9, K0+304,35, K0+312,45, K0+320,97 y K0+348,75 sobre el carril izquierdo, así como en la abscisa K0+350.75 correspondiente a calzada completa, de acuerdo con las áreas programadas para intervención. Se destaca que en la caja ubicada en la abscisa K0+285.9 fue necesario realizar renivelación con material de base, considerando que se retiró la totalidad del material deteriorado existente debido al empozamiento de agua y al mal estado estructural del parche previamente ejecutado en dicho sector. Inicialmente se efectuó el corte perimetral de las áreas intervenidas, seguido de la apertura mecánica de las cajas mediante apoyo de retroexcavadora, retiro de material sobrante y limpieza manual de las superficies, garantizando condiciones adecuadas para la conformación de la estructura de pavimento. Posteriormente, se realizó el acondicionamiento y nivelación de la base mediante compactación con rodillo vibratorio, seguido de la aplicación de imprimación para favorecer la adherencia entre capas y permitir la posterior instalación de la mezcla asfáltica en caliente. Finalmente, se ejecutó el proceso de compactación de la mezcla asfáltica, realizando inicialmente el pisado con rodillo vibratorio y posteriormente el sellado y compactación final mediante vibrocompactador neumático, garantizando una adecuada terminación superficial y densificación de las áreas intervenidas. Adicionalmente, durante la jornada se realizaron cortes perimetrales en diferentes sectores programados, con el propósito de dejar delimitadas las cajas previstas para las próximas jornadas de intervención.
PMT	Se realizó la implementación y seguimiento del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) mediante la ubicación de señalización preventiva, conos (6) y maletines (2) en los frentes de intervención. De igual forma, se efectuó control vehicular con apoyo de personal portando paletas pare/siga en ambos extremos del tramo intervenido, permitiendo la circulación controlada y segura de los usuarios durante la ejecución de las actividades. Adicionalmente, se recibió visita por parte del ingeniero especialista en PMT de la entidad ejecutora, quien realizó verificación de las medidas implementadas y seguimiento a las condiciones de manejo de tránsito en el frente de obra.
Seguridad y Salud en el Trabajo	Se realizó supervisión permanente de las condiciones de seguridad en el frente de obra, verificando el uso correcto de los elementos de protección personal (EPP) y el adecuado desarrollo de las labores con maquinaria y equipos de compactación. Adicionalmente, se contó con la visita del ingeniero SST por parte del contratista, quien realizó capacitación al personal operativo y desarrolló actividades enfocadas en la prevención de riesgos y fortalecimiento de las condiciones de seguridad durante la jornada.

Firma Ingeniero de TierraSua	Firma Ingeniero de Apoyo de Supervisión Gobernación de Boyacá

TIERRASUA ¡Conectamos región!	**BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES**
Fecha	04 de junio de 2026
Hora	6:00 a.m - 3:00 p.m
Clima	Soleado
Sector	Vía con código 60BY15 en el municipio de Soracá
Personal	• Ingeniera residente de TierraSua • Ingeniera residente de Orbeing • Ingeniero pasante de Orbeing • Cuadrilla de obra
Maquinaria	• Cortadora de pavimento con disco diamantado • Retroexcavadora • Volquetas • Tanque irrigador de asfalto • Finisher • Vibrocompactador • Rodillo neumático
Actividades ejecutadas	Durante la jornada se ejecutaron actividades de corte, apertura e instalación de mezcla asfáltica en las cajas ubicadas en las abscisas K0+445.7 correspondiente a calzada completa, K0+460.95 sobre el carril izquierdo, K0+469.45 sobre el carril izquierdo y K0+476.85 sobre el carril derecho, correspondientes a zonas previamente identificadas con deterioro estructural del pavimento. Inicialmente se realizó el corte perimetral de las áreas intervenidas, seguido de la apertura mecánica de las cajas mediante apoyo de retroexcavadora, retiro y cargue de material sobrante, así como limpieza manual de las superficies, garantizando condiciones adecuadas para la posterior conformación de la estructura de pavimento. Posteriormente, se efectuó el acondicionamiento de las cajas intervenidas mediante compactación de la base existente con rodillo vibratorio y aplicación de imprimación, permitiendo la adecuada adherencia para la instalación de la mezcla asfáltica en caliente. Finalmente, se llevó a cabo el proceso de compactación de la mezcla asfáltica, realizando inicialmente el pisado con rodillo vibratorio y posteriormente el sellado y compactación final mediante vibrocompactador neumático, garantizando la adecuada densificación y terminación superficial de las áreas intervenidas.
PMT	Se realizó la implementación y seguimiento mediante la instalación de señalización preventiva y de desvío (5), así como la ubicación de conos (7) y maletines (2) en el sector intervenido. De igual manera, se efectuó regulación del tránsito vehicular mediante auxiliares con paletas pare/siga, permitiendo el paso alternado y seguro de los usuarios durante el desarrollo de las actividades.
Seguridad y Salud en el Trabajo	Se efectuó inspección de las condiciones de seguridad en el frente de obra, verificación del uso adecuado de elementos de protección personal por parte del personal operativo, socialización de riesgos asociados a las actividades ejecutadas y seguimiento al cumplimiento de las medidas preventivas establecidas para el desarrollo seguro de la jornada.



Firma Ingeniero de TierraSua



Firma Ingeniero de Apoyo de Supervisión Gobernación de Boyacá

TIERRASUA ¡Conectamos región!	**BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES**
Fecha	05 de junio de 2026
Hora	7:00 a.m - 4:00 p.m
Clima	Lloviznas
Sector	Vía con código 60BY15 en el municipio de Soracá
Personal	• Ingeniera residente de TierraSua • Ingeniera residente de Orbeing • Ingeniero pasante de Orbeing • Cuadrilla de obra
Maquinaria	• Cortadora de pavimento con disco diamantado • Retroexcavadora • Volquetas • Tanque irrigador de asfalto • Finisher • Vibrocompactador • Rana compactadora • Rodillo neumático
Actividades ejecutadas	Durante la jornada, y pese a las condiciones climáticas adversas presentadas en el sector, se logró ejecutar actividades de corte, apertura e instalación de mezcla asfáltica en las cajas ubicadas en las abscisas K0+354.1 correspondiente a calzada completa, K0+368.5 sobre el carril derecho, K0+374.6 sobre el eje de la vía, K0+421.04 sobre el carril derecho y K0+422.54 sobre el carril izquierdo, correspondientes a zonas previamente identificadas con deterioro estructural del pavimento. Inicialmente se realizó el corte perimetral de las áreas intervenidas, seguido de la apertura mecánica de las cajas mediante apoyo de retroexcavadora, retiro de material sobrante y limpieza manual de las superficies. Durante la apertura de las cajas se evidenció la presencia de dos capas de pavimento asfáltico (carpeta sobre carpeta), condición que incrementó la dificultad en las labores de excavación, fragmentación y retiro de escombros. En la abscisa K0+354.1 fue necesario realizar renivelación mediante aporte de material de base, considerando el hundimiento existente en el sector, el cual se evidenció con mayor claridad una vez retirada la carpeta asfáltica deteriorada. De igual manera, en la abscisa K0+368.5 se evidenciaba previamente a la intervención la presencia de empozamiento de agua en el sector. Durante la excavación y retiro de la carpeta asfáltica existente se identificó saturación del material granular de soporte, condición que posiblemente se encontraba asociada a deficiencias en el manejo de escorrentía superficial proveniente de la ciclorruta ubicada al costado derecho de la vía, pues al momento de la intervención se evidenció deterioro del sardinel que separa la ciclorruta de la calzada, permitiendo la migración e infiltración del agua lluvia que circulaba superficialmente sobre la ciclorruta hacia la estructura del pavimento, afectando las condiciones de soporte de la capa granular. Adicionalmente, durante la excavación y extracción del material saturado se evidenció la posible presencia de material arcilloso a una profundidad aproximada de 45 cm, motivo por el cual fue necesario realizar aporte y conformación de material de base para restablecer las condiciones estructurales del área intervenida. Posteriormente, se realizó la compactación e imprimación de las áreas intervenidas, garantizando la adherencia entre capas para la posterior instalación de la mezcla asfáltica en caliente. Seguidamente, se efectuó la instalación, extendida y conformación de la mezcla asfáltica, realizando durante la actividad seguimiento y control a las temperaturas de recepción, extendida y compactación, así como verificación de niveles y empalmes con la carpeta existente. Finalmente, se ejecutó el proceso de compactación de la mezcla asfáltica mediante pisado inicial con rodillo vibratorio y compactación final con vibrocompactador neumático, garantizando la adecuada terminación superficial y densificación de las áreas intervenidas.
PMT	En cuanto al Plan de Manejo de Tránsito (PMT), durante la jornada se mantuvo la señalización temporal requerida en el área de intervención mediante la disposición de señales preventivas (3) y de desvío (2), así como la ubicación estratégica de conos (6) y maletines (2) para canalización del tránsito. Adicionalmente, se realizó control de movilidad mediante auxiliares con paletas pare/siga, permitiendo la circulación alternada de vehículos de manera organizada y segura mientras se desarrollaban las actividades constructivas.
Seguridad y Salud en el Trabajo	Respecto a Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), se efectuó supervisión continua de las condiciones operativas y de seguridad en el frente de intervención, verificando el cumplimiento de las medidas preventivas establecidas para las actividades de corte, excavación, instalación y compactación de mezcla asfáltica. Así mismo, se realizó seguimiento al uso adecuado de elementos de protección personal y a las condiciones del área de trabajo, especialmente debido a las condiciones climáticas presentadas durante la jornada.

Firma Ingeniero de TierraSua	Firma Ingeniero de Apoyo de Supervisión Gobernación de Boyacá

TIERRASUA ¡Conectamos región!	**BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES**
Fecha	06 de junio de 2026
Hora	7:00 a.m - 12:00 p.m
Clima	Soleado
Sector	Vía con código 60BY15 en el municipio de Soracá
Personal	• Ingeniera residente de TierraSua • Ingeniero pasante de Orbeing • Cuadrilla de obra
Maquinaria	• Sopladora
Actividades ejecutadas	Durante la jornada se realizaron actividades de limpieza manual de cunetas a lo largo del tramo de intervención, retirando material sedimentado, residuos vegetales y demás elementos que pudieran afectar el adecuado drenaje superficial de la vía. Asimismo, se efectuó el traslado y alistamiento de los elementos requeridos para la instalación de la valla informativa del proyecto en el sitio previamente definido para su ubicación. Sin embargo, dicha actividad no pudo ser ejecutada debido a que la valla suministrada no correspondía a la destinada para el proyecto, situación que fue identificada durante la verificación previa a su instalación.
PMT	Se realizó la demarcación y señalización temporal de las áreas de trabajo mediante la ubicación estratégica de conos (7), maletines (2) y señales preventivas (5), con el fin de advertir a los usuarios de la vía sobre la presencia de personal y actividades de mantenimiento, garantizando condiciones seguras para la circulación vehicular y peatonal.
Seguridad y Salud en el Trabajo	Se efectuó la verificación de las condiciones de seguridad del personal antes del inicio de las labores, haciendo seguimiento al uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP), la identificación de riesgos asociados a las actividades desarrolladas y la socialización de las medidas preventivas requeridas para la ejecución segura de los trabajos.

Firma Ingeniero de TierraSua	Firma Ingeniero de Apoyo de Supervisión Gobernación de Boyacá


TIERRASUA ¡Conectamos regiones!	**BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES**
Fecha	09 de junio de 2026
Hora	7:00 a.m - 4:30 p.m
Clima	Lloviznas
Sector	Vía con código 60BY15 en el municipio de Soracá
Personal	• Ingeniera residente de TierraSua • Ingeniera residente de Orbeing • Ingeniero pasante de Orbeing • Cuadrilla de obra
Maquinaria	• Sopladora • Volquetas • Tanque irrigador de asfalto • Finisher • Vibrocompactador • Rodillo neumático
Actividades ejecutadas	Durante la jornada se realizaron actividades de limpieza manual de cunetas a lo largo del tramo intervenido, así como la limpieza general de aproximadamente 130 metros lineales de vía (calzada completa) a partir de la abscisa K0+000, retirando material particulado, residuos y demás elementos presentes sobre la superficie. Una vez finalizadas las labores de preparación y acondicionamiento del área, se procedió con la instalación, extensión y compactación de 21,31 m³ de mezcla asfáltica en caliente para la conformación de una sobrecarpeta de 5 cm de espesor en el carril derecho, realizando seguimiento a las condiciones de colocación y compactación del material.
PMT	Se implementó la señalización temporal correspondiente mediante la ubicación de señales preventivas (5), conos (7) y maletines (2) para la delimitación del área de trabajo. Adicionalmente, se dispuso personal con paletas pare/siga para regular el tránsito vehicular a través del sector intervenido, garantizando una circulación controlada y segura de los usuarios de la vía durante la ejecución de las actividades programadas.
Seguridad y Salud en el Trabajo	Se efectuó seguimiento permanente a las condiciones de seguridad del frente de trabajo, verificando el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP), la identificación de riesgos asociados a las actividades ejecutadas y el cumplimiento de las medidas preventivas establecidas, con el fin de proteger la integridad del personal y de terceros presentes en el área de intervención.

Firma Ingeniero de TierraSua	Firma Ingeniero de Apoyo de Supervisión Gobernación de Boyacá


TIERRASUA ¡Conectamos región!	**BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES**
Fecha	10 de junio de 2026
Hora	6:00 a.m - 6:00 p.m
Clima	Soleado
Sector	Vía con código 60BY15 en el municipio de Soracá
Personal	• Ingeniera residente de TierraSua • Ingeniera residente de Orbeing • Ingeniero pasante de Orbeing • Cuadrilla de obra
Maquinaria	• Sopladora • Volquetas • Tanque irrigador de asfalto • Finisher • Vibrocompactador • Rodillo neumático
Actividades ejecutadas	Durante la jornada se realizaron actividades de limpieza en los sectores programados para la instalación de sobrecarpeta asfáltica. En el carril izquierdo se efectuó la limpieza del tramo comprendido entre las abscisas K0+000 y K0+250; sin embargo, entre las abscisas K0+000 y K0+129 fue necesario repetir esta actividad debido a la acumulación de polvo y material suelto ocasionada por el tránsito vehicular posterior a las labores ejecutadas el día anterior. De igual manera, se realizó la limpieza del tramo comprendido entre las abscisas K0+129 y K0+245 del carril derecho, garantizando condiciones adecuadas de la superficie para la posterior colocación de la mezcla asfáltica. Posteriormente, se llevó a cabo la instalación de la sobrecarpeta asfáltica sobre los reparcheos ejecutados previamente, interviniendo el tramo comprendido entre las abscisas K0+000 y K0+250 del carril izquierdo y entre las abscisas K0+129 y K0+245 del carril derecho. Las actividades incluyeron el suministro, extendido, nivelación y compactación de la mezcla asfáltica, efectuando seguimiento a las temperaturas de recepción, extendido y compactación, así como verificación permanente de las condiciones de acabado y uniformidad de la capa instalada.
PMT	Se realizó la demarcación y aislamiento del frente de trabajo mediante la instalación de maletines (2), conos (7) y señales preventivas (5). Adicionalmente, se contó con auxiliares de tránsito equipados con paletas pare/siga, quienes orientaron y regularon la circulación vehicular durante la ejecución de las actividades, garantizando el tránsito seguro de los usuarios por la zona de intervención.
Seguridad y Salud en el Trabajo	Se verificó el uso adecuado de los elementos de protección personal por parte de todo el personal vinculado a la actividad y se realizó seguimiento permanente al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas para los trabajos de pavimentación. Asimismo, se mantuvo control sobre las condiciones operativas del frente de obra, la correcta utilización de equipos y herramientas, y el manejo de mezcla asfáltica a altas temperaturas, garantizando el desarrollo seguro de las actividades durante toda la jornada.

Firma Ingeniero de TierraSua	Firma Ingeniero de Apoyo de Supervisión Gobernación de Boyacá

TIERRASUA ¡Conectamos región!	**BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES**
Fecha	11 de junio de 2026
Hora	7:00 a.m - 5:00 p.m
Clima	Soleado
Sector	Vía con código 60BY15 en el municipio de Soracá
Personal	• Ingeniera residente de TierraSua • Ingeniera residente de Orbeing • Ingeniero pasante de Orbeing • Cuadrilla de obra
Maquinaria	• Cortadora de pavimento con disco diamantado • Retroexcavadora • Volquetas • Tanque irrigador de asfalto • Finisher • Vibrocompactador • Rodillo neumático
Actividades ejecutadas	Se realizó el corte perimetral y la apertura de las cajas localizadas en las abscisas K0+529.4 (carril derecho), K0+542.0 (carril izquierdo), K0+548.4 (carril derecho), K0+553.9 (calzada completa) y K0+569.72 (carril izquierdo). Posteriormente, se efectuó la recolección y retiro del material resultante de la apertura, así como la limpieza de las áreas intervenidas. Una vez acondicionada la superficie, se realizó la aplicación de imprimación para garantizar la adecuada adherencia entre las capas del pavimento. Seguidamente, se ejecutó el suministro, extendido y nivelación de mezcla asfáltica en caliente en los sectores intervenidos. Finalmente, se llevó a cabo la compactación mediante rodillo vibratorio y compactador neumático hasta alcanzar las condiciones de densificación y acabado requeridas. Como parte del control de calidad, se realizó el seguimiento y registro de las temperaturas de llegada, extendido y compactación de la mezcla asfáltica, verificando el cumplimiento de los parámetros establecidos y efectuando supervisión permanente durante todo el proceso constructivo.
PMT	Se implementó el Plan de Manejo de Tránsito mediante la instalación de señales preventivas (5), conos (7) y maletines (2) en los accesos al frente de trabajo. Debido al cierre total del tramo objeto de intervención, se contó con el apoyo de dos auxiliares de tránsito portando paletas pare/siga, quienes realizaron el control y direccionamiento de los usuarios hacia las rutas de desvío definidas, garantizando condiciones seguras de movilidad durante la ejecución de las actividades.
Seguridad y Salud en el Trabajo	Se efectuó la socialización de riesgos y actividades programadas antes del inicio de la jornada, verificando el uso adecuado de los elementos de protección personal por parte de todo el personal. Asimismo, se realizó seguimiento permanente a las condiciones de seguridad durante las labores de corte, apertura de cajas, manipulación de mezcla asfáltica en caliente y operación de maquinaria y equipos, con el fin de prevenir incidentes y garantizar la seguridad de los trabajadores.




Firma Ingeniero de TierraSua




Firma Ingeniero de Apoyo de Supervisión Gobernación de Boyacá

TIERRASUA ¡Conectamos región!	**BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES**
Fecha	12 de junio de 2026
Hora	7:00 a.m - 5:00 p.m
Clima	Nublado con lluvias moderadas
Sector	Vía con código 60BY15 en el municipio de Soracá
Personal	• Ingeniera residente de TierraSua • Ingeniera residente de Orbeing • Ingeniero pasante de Orbeing • Cuadrilla de obra
Maquinaria	• Cortadora de pavimento con disco diamantado • Retroexcavadora • Volquetas • Tanque irrigador de asfalto • Finisher • Vibrocompactador • Rodillo neumático
Actividades ejecutadas	Durante la jornada se realizaron las actividades de corte perimetral y apertura de las cajas correspondientes a las abscisas K0+569.72 (carril derecho) y K0+579.47 (calzada completa). Posteriormente, se efectuó la limpieza de las áreas intervenidas y la recolección del material producto de la apertura. Debido a las condiciones climáticas presentadas durante la jornada, únicamente fue posible ejecutar la instalación de mezcla asfáltica en la caja ubicada en la abscisa K0+569.72. Para ello, se realizó la aplicación de imprimación, seguida del suministro, extendido y nivelación de la mezcla asfáltica en caliente. Finalmente, se efectuó la compactación mediante rodillo vibratorio y compactador neumático hasta obtener las condiciones requeridas de densificación y acabado. Como parte de los controles de calidad, se realizó el seguimiento y registro de las temperaturas de llegada, extendido y compactación de la mezcla asfáltica instalada, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas aplicables. Debido a que la caja localizada en la abscisa K0+579.47 permaneció abierta al finalizar la jornada, se efectuó su adecuación temporal mediante la instalación de material de protección, con el propósito de advertir a los usuarios de la vía y minimizar riesgos durante el horario nocturno.
PMT	Durante la ejecución de las actividades se realizó seguimiento permanente a la señalización instalada y a las condiciones de circulación en las zonas aledañas al frente de trabajo. Adicionalmente, se mantuvo el cierre del tramo intervenido con apoyo de dos auxiliares de tránsito, quienes coordinaron los desvíos requeridos para garantizar la movilidad y seguridad de los usuarios.
Seguridad y Salud en el Trabajo	Se efectuó inspección continua de las condiciones de trabajo, prestando especial atención a los riesgos derivados de las condiciones climáticas registradas durante la jornada. Igualmente, se verificó el estado de los equipos utilizados y se mantuvo control sobre las áreas intervenidas para prevenir incidentes asociados a superficies húmedas y excavaciones abiertas.



Firma Ingeniero de TierraSua



Firma Ingeniero de Apoyo de Supervisión Gobernación de Boyacá
