enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	**INFORME SUPERVISIÓN**

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:	01 de octubre de 2026
PERIODO DEL INFORME	01 de septiembre de 2026 al 30 de septiembre de 2026
NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA VEINTEAVA Y VIGESIMOPRIMERA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
CONTRATO O CONVENIO MARCO:	223004
CLIENTE:	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

	NOMBRE SUPERVISOR	No. CONTRATO	FECHA INICIO SUPERVISIÓN	FECHA FINAL SUPERVISIÓN
SUPERVISORES ANTERIORES	**Elkin Jose Doria Plaza**	2024674	01 de noviembre de 2024	26 de diciembre de 2024
	Alvaro de la Candelaria Viloria Romero		27 de diciembre de 2024	Hasta finalización o cierre el contrato
	Jaher Enrique Mendoza Tirado	2025450	6 de marzo 2025	27 de junio 2025
	Leidy Tatiana Tirado Parra (Supervisora Social)	2025599	11 de julio de 2025	17 de septiembre de 2025
	Jaher Enrique Mendoza Tirado	2025450	17 de julio de 2025	27 de julio de 2025
	Carlos Andres Bravo		28 de julio de 2025	Hasta finalización o cierre el contrato
	Jaher Enrique Mendoza Tirado	2025450	29 de julio de 2025	27 de agosto de 2025
	Jaher Enrique Mendoza Tirado	2025450	26 de agosto de 2025	27 de septiembre de 2025
	Jaher Enrique Mendoza Tirado	2025450	27 de septiembre de 2025	27 de octubre de 2025
	Daniel Aristides Heredia Useche	2025448	28 de octubre de 2025	26 de noviembre de 2025
	Daniel Aristides Heredia Useche	2025857	08 de enero de 2026	17 de enero de 2026
	Daniel Aristides Heredia Useche	2026073	15 de febrero 2026	27 de julio 2026
SUPERVISIÓN ACTUAL	**Daniel Aristides Heredia Useche**	20261168	13 de agosto 2026	13 de noviembre 2026

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA (OBJETO DE SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL POR PARTE DEL INTERVENTOR)

NÚMERO DEL CONTRATO OBRA:	2240170
OBJETO CONTRACTUAL:	CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DE LA SEXTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.
CONTRATISTA:	CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA S.A.S.
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO OBRA:	Termiando Anticipadamente con Incumplimiento de Obligaciones
PLAZO INICIAL:	CINCO PUNTO CINCO (5.5) MESES
VALOR INICIAL:	$ 6.681.506.747,12
FECHA DE INICIO:	03 DE DICIEMBRE DE 2024

	No. NOVEDAD	TIPO DE NOVEDAD	FECHA SUSCRIPCIÓN	PLAZO NOVEDAD	VALOR	OBSERVACIÓN
NOVEDADES CONTRACTUALES (Organizadas Cronológicamente)	1	*Suspensión*	*28 de diciembre de 2024*	*Cuarenta y cinco (45) días*	*N.A.*	*N.A.*
	2	*Prórroga a la suspensión*	*10 de febrero de 2025*	*Tres (3) meses*	*N.A.*	*N.A.*
	3	*Suspensión*	*12 de mayo de 2025*	*treinta (30) días*	*N.A.*	*Se reinicio y se suspendio el mismo día*
	4	*Prórroga a la suspensión*	*10 de junio de 2025*	*quince (15) días*	*N.A.*	*N.A.*
	5	*Reinicio*	*26 de junio de 2025*	*N.A.*	*N.A.*	*Se termina el 15 de noviembre de 2025*
	6	*Terminación Anticipada*	*12 de noviembre de 2025*	*N.A.*	*N.A.*	*N.A.*

PLAZO ACTUALIZADO (INCLUIDO PRÓRROGAS Y/O SUSPENSIONES):	CINCO PUNTO CINCO (5.5) MESES
VALOR ACTUALIZADO (INCLUIDO ADICIONES Y/O REDUCCIONES):	$ 6.681.506.747,12
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	12 DE NOVIEMBRE DE 2025
% AVANCE PROGRAMADO FISICO:	100%
% AVANCE EJECUTADO FISICO:	0%

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (OBJETO DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DESIGNADA POR ENTERRITORIO)	
NÚMERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	2240176
OBJETO CONTRACTUAL:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA SEXTA ORDEN DE SERVICIO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.
CONTRATISTA:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO INTERVENTORÍA:	Suspendido
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES
VALOR INICIAL:	$ 373.305.032,92
FECHA DE INICIO:	3 DE DICIEMBRE DE 2024


	No. NOVEDAD	TIPO DE NOVEDAD	FECHA SUSCRIPCIÓN	PLAZO NOVEDAD	VALOR	OBSERVACIÓN
NOVEDADES CONTRACTUALES	1	*Suspensión*	*28 de diciembre de 2024*	*45 días*	*N.A.*	*N.A.*
	2	*Prórroga a la suspensión*	*10 de febrero de 2025*	*Tres (3) meses*	*N.A.*	*N.A.*
	3	*Suspensión*	*12 de mayo de 2025*	*treinta (30) días*	*N.A.*	*Se reinicio y se suspendio el mismo día*
	4	*Prórroga a la suspensión*	*10 de junio de 2025*	*quince (15) días*	*N.A.*	*N.A.*
	5	*Reinicio*	*26 de junio de 2025*	*N.A.*	*N.A.*	*N.A.*
	6	*Suspensión*	*12 de noviembre de 2025*	*Tres (3) meses*	*N.A.*	*N.A.*
	7	*Prórroga a la suspensión*	*12 de febrero de 2026*	*Cuatro (4) meses*	*N.A.*	*N.A.*

PLAZO ACTUALIZADO (INCLUIDO PRÓRROGAS Y/O SUSPENSIONES):	SEIS (6) MESES
VALOR ACTUALIZADO (INCLUIDAS ADICIONES):	$ 373.305.032,92
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	02 DE JULIO DE 2026
DATOS DE LA FASE O ETAPA DEL CONTRATO DE OBJETO SUPERVISIÓN (Para contratos que se desarrollan en varias fases)	
FASE 1	
DENOMINACIÓN DE LA ETAPA:	
VALOR DE LA FASE O ETAPA	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	
FECHA DE INICIO:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	
FASE 2	
DENOMINACIÓN DE LA ETAPA:	
VALOR DE LA FASE O ETAPA	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	
FECHA DE INICIO:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	
Si no le aplican fases, indicar no aplica. Incluir las fases que requieran incluir, en caso de tener más de 2 fases.	
BALANCE FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATOS	
CONTRATO OBRA	
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	$ 6.681.506.747,12
TOTAL PAGADO A LA FECHA:	$ 0,00
SALDO PENDIENTE POR PAGAR:	$ 6.681.506.747,12
ANTICIPO GIRADO	$ 0,00
ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA	$ 0,00
ANTICIPO POR AMORTIZAR	$ 0,00
% EJECUCIÓN FINANCIERA	0,00%
CONTRATO INTERVENTORÍA	
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	$ 373.305.032,92
TOTAL PAGADO A LA FECHA:	$ 0,00
SALDO PENDIENTE POR PAGAR:	$ 373.305.032,92
% EJECUCIÓN FINANCIERA	0,00%

BALANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% AVANCE PROGRAMADO	**100,0%**
% AVANCE EJECUTADO	**0,0%**
NÚMERO DE PROYECTOS	**1,00**

FRENTE 1	
MUNICIPIO	**REPELÓN, ATLÁNTICO**
NOMBRE DEL FRENTE	ABURRÁ SUR
% PROGRAMADO	**100%**
% EJECUTADO	**0%**
% TOLERANCIA	**5%**
% ATRASO	**100%**
CUMPLIMIENTO	**0%**

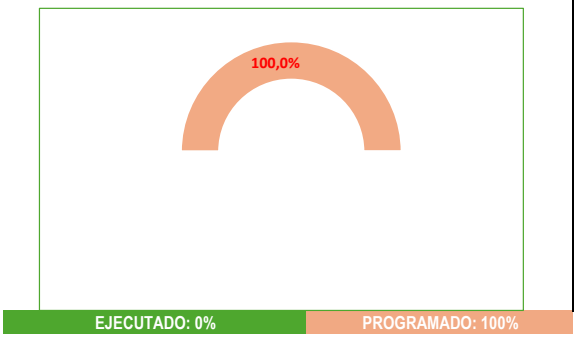

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL MES REPORTADO





RELACIÓN DE GARANTÍAS

CONTRATO DE OBRA

Ultima póliza aprobada	PÓLIZA NO.	Aseguradora	Amparo	Vigencia (fecha)	Valor Aseg.	Fecha expedición	Aprobación
CUMPLIMIENTO PARTICULAR	B-100052135	SEGUROS MUNDIAL	CUMPLIMIENTO	28 de diciembre de 2024 hasta el 15 de julio de 2026	$ 2.004.452.024	18 de julio de 2025	5 de agosto de 2025
CUMPLIMIENTO PARTICULAR	B-100052135	SEGUROS MUNDIAL	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	28 de diciembre de 2024 hasta el 15 de julio de 2026	$ 1.301.885.725	18 de julio de 2025	5 de agosto de 2025
CUMPLIMIENTO PARTICULAR	B-100052135	SEGUROS MUNDIAL	PRESTACIONES SOCIALES	28 de diciembre de 2024 hasta el 15 de noviembre de 2028	$ 334.075.337	18 de julio de 2025	5 de agosto de 2025
CUMPLIMIENTO PARTICULAR	B-100052135	SEGUROS MUNDIAL	CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	15 de noviembre de 2025 hasta el 15 de noviembre de 2026	$ 668.150.675	18 de julio de 2025	5 de agosto de 2025
CUMPLIMIENTO PARTICULAR	B-100052135	SEGUROS MUNDIAL	ESTABILIDAD DE LA OBRA	15 de noviembre de 2025 hasta el 15 de noviembre de 2028	$ 2.004.452.024	18 de julio de 2025	5 de agosto de 2025
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	B-100014053	SEGUROS MUNDIAL	AMPARO BÁSICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	12 de septiembre de 2024 al 15 de noviembre de 2025	$ 1.336.301.349	18 de julio de 2025	5 de agosto de 2025
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	B-100014053	SEGUROS MUNDIAL	PATRONAL	12 de septiembre de 2024 al 15 de noviembre de 2025	$ 1.336.301.349	18 de julio de 2025	5 de agosto de 2025
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	B-100014053	SEGUROS MUNDIAL	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	12 de septiembre de 2024 al 15 de noviembre de 2025	$ 1.336.301.349	18 de julio de 2025	5 de agosto de 2025
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	B-100014053	SEGUROS MUNDIAL	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	12 de septiembre de 2024 al 15 de noviembre de 2025	$ 1.336.301.349	18 de julio de 2025	5 de agosto de 2025
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	B-100014053	SEGUROS MUNDIAL	R.C. CRUZADA	12 de septiembre de 2024 al 15 de noviembre de 2025	$ 668.150.674	18 de julio de 2025	5 de agosto de 2025
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	B-100014053	SEGUROS MUNDIAL	CONTAMINACIÓN ACCIDENTAL	12 de septiembre de 2024 al 15 de noviembre de 2025	$ 1.336.301.349	18 de julio de 2025	5 de agosto de 2025
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	B-100014053	SEGUROS MUNDIAL	GASTOS MEDICOS	12 de septiembre de 2024 al 15 de noviembre de 2025	$ 200.000.000	18 de julio de 2025	5 de agosto de 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Última póliza aprobada	PÓLIZA NO.	Aseguradora	Amparo	Vigencia (fecha)	Valor Aseg.	Fecha expedición	Aprobación
CUMPLIMIENTO PARTICULAR	21-45-101458329	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CUMPLIMIENTO	03 de diciembre de 2024 al 02 de agosto de 2026	$ 111.991.510	22 de julio de 2025	25 de julio de 2025
CUMPLIMIENTO PARTICULAR	21-45-101458329	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	03 de diciembre de 2024 al 02 de diciembre de 2028	$ 37.330.504	22 de julio de 2025	25 de julio de 2025
CUMPLIMIENTO PARTICULAR	21-45-101458329	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CALIDAD DEL SERVICIO	02 de junio de 2025 al 05 de junio de 2028	$ 111.991.510	22 de julio de 2025	25 de julio de 2025
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	21-40-101239959	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	03 de julio de 2024 hasta el 02 de diciembre de 2025	$ 325.000.000	09 de julio de 2025	25 de julio de 2025
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	85-40-101059748	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	03 de julio de 2024 hasta el 02 de diciembre de 2025	$ 325.000.000	09 de julio de 2025	25 de julio de 2025
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	85-40-101059748	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	03 de julio de 2024 hasta el 02 de diciembre de 2025	$ 325.000.000	09 de julio de 2025	25 de julio de 2025
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	85-40-101059748	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	03 de julio de 2024 hasta el 02 de diciembre de 2025	$ 325.000.000	09 de julio de 2025	25 de julio de 2025
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	85-40-101059748	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	03 de julio de 2024 hasta el 02 de diciembre de 2025	$ 325.000.000	09 de julio de 2025	25 de julio de 2025
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	85-40-101059748	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	03 de julio de 2024 hasta el 02 de diciembre de 2025	$ 325.000.000	09 de julio de 2025	25 de julio de 2025

VISITAS TÉCNICAS DEL PERIODO (En caso de presentarse)

FECHA DE LA VISITA:

PROYECTO:

OBJETO O MOTIVO DE LA VISITA:

OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS:

La ultima visita que se realizó se llevó a cabo el 6 de noviembre de 2025 al 7 de noviembre de 2025.

REUNIONES DE SEGUIMIENTO

FECHA:
ASUNTO:
PARTICIPANTES:
OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS:

FECHA:
ASUNTO:
PARTICIPANTES:
OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS:

Link Drive con las actas de reunión del periodo:

APROBACIÓN INFORMES DE INTERVENTORÍA

INFORME MENSUAL

CONSECUTIVO INFORME MENSUAL	PERIODO INFORME APROBADO	RADICADO DE INTERVENTORÍA	COMUNICADO DE APROBACIÓN

OBSERVACIONES: *Se han realizado los respectivos comunicados para adelantar la aprobación de los informes mensuales*

RELACIÓN DE LAS COMUNICACIONES REMITIDAS

FECHA	RADICADO	ASUNTO	DESTINATARIO
25/09/2026	202651010161332	Respuesta al Radicado No. 202621010022051 – Correcciones Informe Bimestral No.11, periodo comprendido entre el 09 de septiembre has el 09 de noviembre de 2025.	DANIEL ARISTIDES HEREDIA USECHE
24/09/2026	202651010160772	Respuesta al Radicado No. 202621010022051 – Correcciones Informe Bimestral No.11, periodo comprendido entre el 09 de septiembre has el 09 de noviembre de 2025. Contrato Interadministrativo de Gerencia Integral de Proyectos No.1632 de 2023 (Numeración ENTerritorio S.A. 223004)	DANIEL ARISTIDES HEREDIA USECHE
08/09/2026	202651010149512	Observaciones Informes semanales – No. 66 al 70 con corte del 05/07/2026 al 02/08/2026. Contrato Interadministrativo de Gerencia Integral de Proyectos No.1632 de 2023 (Numeración ENTerritorio S.A. 223004)	DANIEL ARISTIDES HEREDIA USECHE
08/09/2026	202651010149432	Observaciones Informes semanales – No. 66 al 70 con corte del 05/07/2026 al 02/08/2026. Contrato Interadministrativo de Gerencia Integral de Proyectos No.1632 de 2023 (Numeración ENTerritorio S.A. 223004	DANIEL ARISTIDES HEREDIA USECHE
03/09/2026	202651010145922	Contrato No. 2240176 - Solicitud Adición y Prorroga en Tiempo - Orden de servicio No. 2240176	DANIEL ARISTIDES HEREDIA USECHE
09/09/2026	202621010024371	Cuarto llamado al requerimiento No. 202621010006741 del 27 de marzo de 2026, radicado No. 202621010014501 del 01 de junio del 2026 y 202621010022611 del 19 de agosto de 2026 solicitando la información del proyecto de Conexiones Intradomiciliarias de Agua Potable y Saneamiento Básico en el Municipio de Repelón, Atlántico – Contratista CONSTRUIRÉ S.A.S. – Contrato de Obra No. 2240170.	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING S.A.S
09/09/2026	202621010024381	Reiteración de requerimiento de documentación para cierre y liquidación contractual – Contrato de Obra No. 2240170.	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING S.A.S
17/09/2026	202621010025311	Respuesta al oficio No. 2026EE0049031 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio bajo el número de radicado ENTerritorio S.A. 202651010132912 del 12 de agosto de 2026 cuyo asunto es "Respuesta, Radicado No. 202621010018491 ENTerritorio S.A de 07 de julio 2026, "Observaciones Informes semanales – No. 50 con corte del 15/03/2026 al No.60 con corte del 24/05/2025. Contrato Interadministrativo de Gerencia Integral de Proyectos No. 1632 de 2023 (Numeración ENTerritorio S.A. 223004)", y respuesta al oficio No. 2026EE0054201 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio bajo el número de radicado ENTerritorio S.A. 202651010149512 del 09 de septiembre de 2026 cuyo asunto es "Observaciones Informes semanales – No. 66 al 70 con corte del 05/07/2026 al 02/08/2026. Contrato Interadministrativo de Gerencia Integral de Proyectos No.1632 de 2023 (Numeración ENTerritorio S.A. 223004)".	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
21/09/2026	202621010025911	Requerimiento de cumplimiento de requisitos previos para el reinicio del contrato de interventoría No. 2240176.	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING S.A.S
30/09/2026	202621010026731	Remisión Informe Bimestral No. 14 – Periodo 15 de mayo al 14 de julio de 2026	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

PROCESOS DE INCUMPLIMIENTO Y ACCIONES JUDICIALES

FECHA	RADICADO	ASUNTO	ESTADO
10 DE OCTUBRE DE 2025	20252200025979	Inicio de presunto incumplimiento para el Contrato No. 2240170	En Proceso

RESPUESTAS A ENTES DE CONTROL

FECHA	RADICADO	ASUNTO

CONTROL DE UNIDADES

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	BARRIOS	UNIDADES EJECUTADAS	INTRADOMICILIARIAS	DOMICILIARIAS
ATLÁNTICO	REPELÓN	LAS CLARITAS	0	0	0
ATLÁNTICO	REPELÓN	MARCOS LOPERA	0	0	0
ATLÁNTICO	REPELÓN	SAN MIGUEL	0	0	0
ATLÁNTICO	REPELÓN	LA FE	0	0	0
ATLÁNTICO	REPELÓN	CENTRAL	0	0	0
ATLÁNTICO	REPELÓN	PORVENIR	0	0	0
ATLÁNTICO	REPELÓN	BETANIA	0	0	0

COMPONENTE SOCIAL

Durante el periodo objeto del presente informe, no se adelantaron actividades desde el componente social relacionadas con el proyecto de Repelón, Atlántico.

COMPONENTE AMBIENTAL

Se realizó el oficio de remisión de los informes para que se entregue toda la documentación faltante para verificar el componente ambiental mediante el radicado No. 202621010006741 del 23 de marzo de 2026.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR AL CONTRATO OBJETO DE SUPERVISIÓN
Durante el periodo correspondiente al mes de septiembre de 2026, en el marco de las actividades de supervisión del Contrato Interadministrativo de Gerencia Integral de Proyectos No. 1632 de 2023, con numeración ENTerritorio S.A. No. 223004, se adelantaron diferentes actuaciones orientadas al seguimiento técnico, administrativo y contractual del contrato, así como a la atención de los requerimientos formulados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT y al avance de las actividades asociadas a la contratación derivada. *En materia de seguimiento y control contractual, durante el periodo se realizaron actuaciones relacionadas con la revisión y atención de las observaciones formuladas a los informes semanales del contrato, correspondientes a los informes No. 66 al 70, con corte entre el 05 de julio y el 02 de agosto de 2026. En este sentido, se efectuó la consolidación y remisión de las respuestas correspondientes, procurando atender las observaciones formuladas y fortalecer la trazabilidad de las actuaciones adelantadas en desarrollo del Contrato Interadministrativo.* *Así mismo, se dio continuidad a la atención de las observaciones relacionadas con informes de periodos anteriores, particularmente frente a las correcciones requeridas al Informe Bimestral No. 11, correspondiente al periodo comprendido entre el 09 de septiembre y el 09 de noviembre de 2025. Estas actuaciones estuvieron encaminadas a complementar y precisar la información requerida, con el propósito de contar con una documentación contractual debidamente soportada y consistente con las actividades desarrolladas durante el periodo objeto de seguimiento.* *De igual manera, se atendieron los requerimientos formulados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio mediante los oficios relacionados con las observaciones a los informes semanales Nos. 50 al 60 y Nos. 66 al 70. La gestión adelantada permitió consolidar las respuestas institucionales correspondientes y continuar con el proceso de revisión y seguimiento de la información reportada en el marco del Contrato Interadministrativo.* *En relación con la Orden de Servicio No. 2240176, correspondiente al contrato de interventoría, durante el periodo se adelantaron las gestiones relacionadas con la solicitud de adición y prórroga en tiempo, así como el requerimiento de cumplimiento de los requisitos previos necesarios para su eventual reinicio. Estas actuaciones estuvieron orientadas a garantizar que, una vez se superen las condiciones que dieron lugar a la suspensión y se encuentren formalizados los instrumentos requeridos, la interventoría pueda continuar desarrollando sus actividades de seguimiento y control sobre la ejecución de la contratación derivada.* *Por otra parte, frente al Contrato de Obra No. 2240170, correspondiente al proyecto de Conexiones Intradomiciliarias de Agua Potable y Saneamiento Básico en el municipio de Repelón, Atlántico, durante el mes de septiembre se efectuaron nuevas actuaciones de requerimiento dirigidas a obtener la información pendiente del proyecto y la documentación necesaria para avanzar en las actividades de cierre y liquidación contractual. En particular, se realizó un nuevo requerimiento de información y se reiteró la solicitud de documentación para el cierre y liquidación del contrato, evidenciando la continuidad del seguimiento por parte de la supervisión frente a los asuntos pendientes de consolidación documental.* *En cuanto al seguimiento general del Contrato Interadministrativo, el 30 de septiembre de 2026 se realizó la remisión al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio del Informe Bimestral No. 14, correspondiente al periodo comprendido entre el 15 de mayo y el 14 de julio de 2026. Esta actuación permitió dar continuidad al mecanismo de seguimiento y reporte establecido para el contrato, consolidando la información relacionada con la gestión desarrollada durante el periodo correspondiente.* *En términos generales, las actuaciones adelantadas durante septiembre de 2026 estuvieron dirigidas a fortalecer el seguimiento y control del Contrato Interadministrativo No. 1632 de 2023, atender oportunamente los requerimientos y observaciones formulados por el Ministerio, consolidar la información contractual y avanzar en las actividades necesarias para el cierre de contratos derivados que presentan asuntos pendientes.* *Como resultado del seguimiento efectuado, se concluye que durante el periodo se mantuvo la gestión de supervisión sobre los diferentes componentes del contrato, con especial énfasis en la atención de observaciones de los informes de seguimiento, el fortalecimiento de la información contractual, la gestión asociada al reinicio y continuidad de la interventoría No. 2240176 y el seguimiento a las actividades de cierre y liquidación del Contrato de Obra No. 2240170.* *Finalmente, se considera necesario mantener durante los siguientes periodos el seguimiento a los compromisos y requerimientos pendientes, especialmente aquellos relacionados con la atención integral de las observaciones formuladas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la consolidación de los informes de seguimiento, el cumplimiento de los requisitos para el reinicio de la Orden de Servicio No. 2240176 y la obtención de la documentación requerida para el cierre y liquidación del Contrato de Obra No. 2240170, con el propósito de continuar avanzando en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato Interadministrativo No. 1632 de 2023.*

Elaboró:

Daniel Heredia U

Nombre: Daniel Aristides Heredia Useche

Supervisor

VoBo	Nombre	Firma
Gestor del Contrato Interadministrativo	Javier Camilo Barbosa Castañeda	J CAMILO BARBOSA C
Apoyo Técnico a la Supervisión	N/A	
Apoyo Financiero	Diana Carolina Melo Plazas	
Apoyo Juridico	Ana Milena Potes Mazuera	
Apoyo Social	Liz Karine Guiza Solano	
Apoyo Ambiental (cuando aplique)	N/A	
