INFORME DE AVANCE DE OBRA No. 10

19 de agosto – 18 de septiembre de 2026

CONVENIO No. SEMS-ES-CA-057-2025

PROYECTO

“Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para ampliar la cobertura del servicio de gas combustible por redes, a través de la construcción del sistema de distribución y la financiación del cargo por conexión y la red interna, para usuarios del municipio de Silvania del departamento de Cundinamarca.”

ACTA DE INICIO 19 DE NOVIEMBRE DE 2025

INFORME DE AVANCE DE OBRA No. 10

19 de agosto – 18 de septiembre de 2026

CONVENIO No. SEMS-ES-CA-057-2025

PROYECTO

“Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para ampliar la cobertura del servicio de gas combustible por redes, a través de la construcción del sistema de distribución y la financiación del cargo por conexión y la red interna, para usuarios del municipio de Silvania del departamento de Cundinamarca.”

ACTA DE INICIO 19 DE NOVIEMBRE DE 2025

INFORME DE AVANCE DE OBRA No. 10

19 de agosto – 18 de septiembre de 2026

1. INTRODUCCIÓN 4
2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 5
OBJETO DEL CONVENIO 5
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 5
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 6
4. ALCANCE DEL PROYECTO. 7
5. INFORMACIÓN SOBRE PERSONAL EN OBRA 10
6.1 CONTRATISTA 25
6.2 SUPERVISIÓN 25
6.3 INTERVENTOR 25
7. DATOS DEL CONVENIO 26
8. ACTAS DEL CONTRATO 27
9. CONTROL DE POLIZAS 27
10. CONCLUSIONES 28
ANEXOS 29

TABLAS

Tabla 1 Ejecución Décimo Informe 8
Tabla 2 Red Construida 9
Tabla 3 Afiliaciones 9
Tabla 5 Personal Técnico y Operativo 10
Tabla 6 Cronograma de Obra 11

Figura 1 Avance de Afiliaciones 9

1. INTRODUCCIÓN

Durante el desarrollo de las actividades previstas en el convenio No. SEMS-ES-CA-057-2025, celebrado entre el Departamento de Cundinamarca – Secretaría De Energía Y Minería Sostenible y Distriservicios S.A.S. E.S.P para la transferencia de recursos destinados a subsidios para usuarios del servicio de gas combustible por redes. Iniciando la realización de la obra el 19 de noviembre de 2025.

El presente Informe de Avance de Obra, correspondiente al periodo comprendido entre el 19 de agosto al 18 de septiembre de 2026, expone las actividades programadas, así como el desarrollo y control asumido para su ejecución, conforme a los parámetros establecidos en el proyecto cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para ampliar la cobertura del servicio de gas combustible por redes, a través de la construcción del sistema de distribución y la financiación del cargo por conexión y la red interna, para usuarios del municipio de Silvania del departamento de Cundinamarca.”

El convenio No. SEMS-ES-CA-057-2025, se suscribió entre el Departamento de Cundinamarca – Secretaría De Energías Y Minería Sostenible y el representante legal de DISTRISERVICIOS SAS ESP. Hernán Darío Huertas Murcia con Número de Cedula: 1.070.584.730 de Girardot Cundinamarca, para la gasificación de las veredas: Noruega Alta, San Luis Alto, Jalisco, Victoria Alta, Agua Bonita y Santa Rita Alta que beneficiarán a 1.033 familias de usuarios residenciales del municipio de Silvania, Cundinamarca.

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

OBJETO DEL CONVENIO

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de ampliar la cobertura del servicio de gas combustible por redes en el municipio de Silvania, departamento de Cundinamarca. Para ello se desarrollará la construcción del sistema de distribución y la financiación del cargo por conexión y la red interna, beneficiando directamente a los usuarios del territorio.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Ejecutar las actividades previstas conforme a los parámetros establecidos en el convenio No. SEMS-ES-CA-057-2025, suscrito entre el Departamento de Cundinamarca – Secretaría De Energías Y Minería Sostenible y Distriservicios S.A.S. E.S.P para transferencia de recursos destinados a subsidios para usuarios del servicio de gas combustible por redes.

2. Generar beneficio tangible para la comunidad de las veredas Noruega Alta, San Luis Alto, Jalisco, Victoria Alta, Agua Bonita y Santa Rita Alta del Municipio de Silvania, mejorando la calidad de vida de la población.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La limitada cobertura del servicio de gas combustible por redes en la zona rural del municipio de Silvania, Cundinamarca, ha generado que las veredas Noruega Alta, San Luis Alto, Jalisco, Victoria Alta, Agua Bonita y Santa Rita Alta no cuenten con este servicio esencial. Como alternativas, la población ha recurrido al uso de biomasa (leña), estufas eléctricas, equipos a gasolina o ACPM, y gas licuado de petróleo (GLP) en cilindros, el cual se comercializa a un costo elevado y con tiempos de suministro prolongados.

Ante esta situación, el proyecto tiene como objetivo aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para ampliar la cobertura del servicio de gas combustible por redes, mediante la construcción del sistema de distribución y la financiación del cargo por conexión y de la red interna, beneficiando directamente a los usuarios del municipio de Silvania, departamento de Cundinamarca.

4. ALCANCE DEL PROYECTO.

El convenio No. SEMS-ES-CA-057-2025 **"CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES Y REDES INTERNAS PARA SUMINISTRO DE GLP EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SILVANIA, CUNDINAMARCA".** Se ha ejecutado de acuerdo con las especificaciones establecidas.

Durante el periodo correspondiente al presente informe se avanzó en la construcción de la red de distribución, logrando:

3.16 km de tubería de polietileno de ¾'' en zona verde

0.39 km de tubería de polietileno de ¾'' en calzada concreto

3.05 km de tubería de polietileno de 1'' en zona verde

0.52 km de tubería de polietileno de 1'' en calzada concreto

Total construido en el corte: 7.12 km

Estas intervenciones corresponden a la red de distribución, alcanzando un total de 32,21 km de red construida hasta la fecha, lo que representa aproximadamente un 42.65% de avance físico en la ejecución del sistema de distribución del proyecto.

EJECUCIÓN DÉCIMO INFORME						
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad por SEMS	Cantidad por Distriservicios ESP	Cantidad parcial ejecutada	Cantidad total ejecutada
1	CONEXIONES A USUARIOS RESIDENCIALES ESTRATO 1					
1.1	Acometida / Derecho de Conexión	Und	0	0	0	343
2	RED INTERNA A USUARIOS RESIDENCIALES ESTRATO 1					
2.1	Red interna a usuarios residenciales estrato 1 (hasta 35 metros)	Und	0		0	343
3	REDES DE DISTRIBUCIÓN					
3.1	Tubería de Polietileno de 3/4" en Andén Concreto	Km	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Tubería de Polietileno de 3/4" en Zona Verde	Km	0,00	3,16	3,16	22,32
3.3	Tubería de Polietileno de 3/4" en Calzada Concreto	Km	0,00	0,39	0,39	2,32
3.4	Tubería de Polietileno de 1" en Zona Verde	Km	0,00	3,05	3,05	4,02
3.5	Tubería de Polietileno de 1" en Andén Concreto	Km	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Tubería de Polietileno de 1" en Calzada Concreto	Km	0,00	0,52	0,52	3,55
4	PASOS ESPECIALES					
4.1	Paso especial 30 – 35 metros	Und	0	0	0	1
4.2	Paso especial 15 – 20 metros	Und	0	0	0	2
4.3	Paso especial 10 – 15 metros	Und	0	1	1	9

4.4	Paso especial 5 – 10 metros	Und	0	1	1	18
4.5	Paso especial 0 – 5 metros	Und	0	8	8	69
5	ESTACION DE ALMACENAMIENTO					
5.1	Estación de almacenamiento de 4000 GL	Und	0	0	0	1

Tabla 1 Ejecución Décimo Informe

Las redes del sistema de distribución se encuentran debidamente georreferenciadas en la ubicación indicada, y documentadas en los planos anexos, lo que garantiza la trazabilidad y el control de la obra.

Consolidado Red Construida		
Diámetro	Descripción	Aporte Distriservicios Longitud (m)
3/4"	Zona Verde	3160.0
3/4"	Calzada Concreto	390.0
1"	Zona Verde	3050
1"	Calzada Concreto	520.0
Total		**7120**

Tramo	Diámetro	Descripción	Longitud (m)	Vereda	Coordenadas UTM (18N)				Aporte
					Inicio tramo		Final tramo		
					Norte	Este	Norte	Este	
T01-T02	1"	Zona Verde	258	Aguabonita	490143.48	573749.12	489925.15	573620.98	Distriservicios
T02-T03	1"	Calzada Concreto	129	Aguabonita	489925.15	573620.98	489866.70	573517.92	Distriservicios
T03-T04	1"	Zona Verde	196	Aguabonita	489866.70	573517.92	489715.02	573565.60	Distriservicios
T04-T05	1"	Calzada Concreto	70	Aguabonita	489715.02	573565.60	489679.42	573625.56	Distriservicios
T05-T06	1"	Zona Verde	800	Aguabonita	489679.42	573625.56	489151.10	574024.12	Distriservicios
T07-T08	3/4"	Zona Verde	546	Aguabonita	490923.13	571825.92	491218.77	571883.77	Distriservicios
T09-T10	1"	Calzada Concreto	215	Aguabonita	491219.62	573372.22	491356.88	573272.28	Distriservicios
T10-T11	1"	Zona Verde	1318	Aguabonita	491356.88	573272.28	491847.65	572801.36	Distriservicios
T11-T12	1"	Calzada Concreto	106	Aguabonita	491847.65	572801.36	491947.62	572771.49	Distriservicios
T12-T13	1"	Zona Verde	478	Aguabonita	491947.62	572771.49	491903.63	572435.53	Distriservicios
T14-T15	3/4"	Zona Verde	23	Aguabonita	491967.72	572752.35	491985.86	572766.17	Distriservicios
T15-T16	3/4"	Calzada Concreto	42	Aguabonita	491985.86	572766.17	492024.59	572783.38	Distriservicios
T16-T17	3/4"	Zona Verde	40	Aguabonita	492024.59	572783.38	492061.65	572797.27	Distriservicios
T17-T18	3/4"	Calzada Concreto	78	Aguabonita	492061.65	572797.27	492138.28	572805.19	Distriservicios
T19-T20	3/4"	Zona Verde	230	Aguabonita	492194.98	572866.75	492098.38	573042.45	Distriservicios
T18-T21	3/4"	Zona Verde	1000	Aguabonita	492138.28	572805.19	492967.73	572934.59	Distriservicios
T21-T22	3/4"	Calzada Concreto	160	Aguabonita	492967.73	572934.59	493099.97	572980.46	Distriservicios
T22-T23	3/4"	Zona Verde	110	Aguabonita	493099.97	572980.46	493201.15	573019.71	Distriservicios

T23-T24	3/4"	Calzada Concreto	110	Aguabonita	493201.15	573019.71	493266.83	572946.15	Distriservicios
T24-T25	3/4"	Zona Verde	1211	Aguabonita	493266.83	572946.15	493489.69	573601.13	Distriservicios

Tabla 2 Red Construida

AVANCE EN AFILIACIONES DE USUARIOS

A la fecha del presente informe se han realizado un total de 689 afiliaciones de usuarios al servicio, representando el 66.70% del total del convenio. De este grupo, 116 usuarios cuentan con un avance constructivo en sus instalaciones internas.

AFILIACIONES SILVANIA - CUNDINAMARCA				
VEREDA	VENTAS SIN CONSTRUIR	CONSTRUCCION SOLO INTERNA	CON SERVICIO	TOTAL VENTAS
AGUA BONITA	35	58	343	436
SANTA RITA ALTA	34			34
VICTORIA ALTA	83			83
JALISCO	78	58		136
TOTAL	**230**	**116**	**343**	**689**

Tabla 3 Afiliaciones

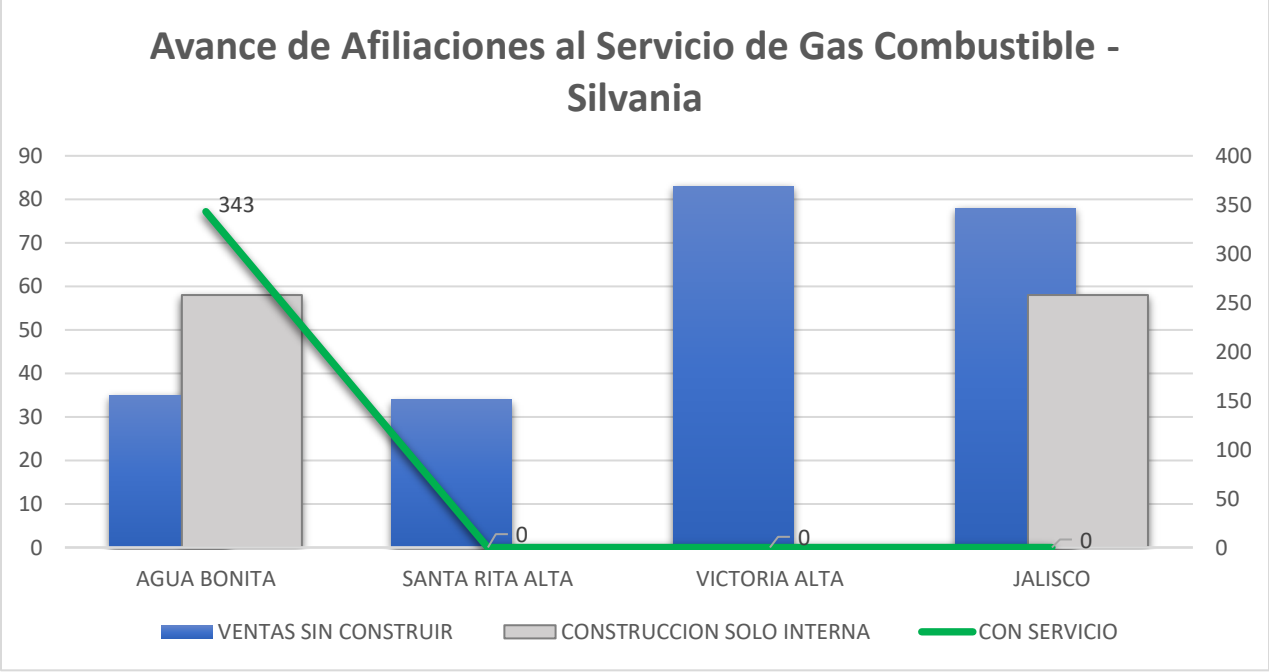


Figura 1 Avance de Afiliaciones

5. INFORMACIÓN SOBRE PERSONAL EN OBRA

Para la ejecución del convenio No. SEMS-ES-CA-057-2025 "**Construcción De Conexiones Y Redes Internas Para Suministro De GLP En La Zona Rural Del Municipio De Silvania, Cundinamarca**". Se ha dispuesto personal técnico y operativo especializado, con el fin de garantizar el cumplimiento de las actividades constructivas y administrativas previstas.

El recurso humano asignado comprende:

N°	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	CARGO
1	MONROY	LOZANO	LUIS	ENRIQUE	INGENIERO RESIDENTE
2	VASALLO		LEONARDO		AUDITOR INTERNO
3	RIVERA		EUCLIDES		PEGADOR
4	LOZANO		JHON	MARIO	OPERADOR DE MÁQUINA
5	RIVERA	ALAYON	MARLON		AUXILIAR DE OBRA
6	HERNANDEZ	ALVAREZ	FERNANDO		AUXILIAR DE CAMPO
7	ADAMES		JUAN	CARLOS	AUXILIAR DE OBRA
8	ADAMES	ANGARITA	MICHAEL		AUXILIAR DE OBRA
9	GONZALEZ		JOSÉ	GREGORIO	AUXILIAR DE OBRA
10	LOZANO		NÉSTOR	EDUARDO	OPERADOR DE MÁQUINA
11	ROJAS		WILTON	ALEJANDRO	AUXILIAR DE OBRA
12	ADAMES		JOSE	MANUEL	AUXILIAR DE OBRA
13	VILLARAGA		JOSÉ DEL	MARMEN	AUXILIAR DE OBRA
14	LEÓN	PINZÓN	LUIS	ALONSO	AUXILIAR DE OBRA

Tabla 4 Personal Técnico y Operativo

Cronograma general de actividades inicial:

CRONOGRAMA DE OBRA - 13 MESES																			
PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES Y REDES INTERNAS PARA SUMINISTRO DE GLP EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SILVANIA, CUNDINAMARCA"						MES													
Ítem	Actividad	Cantidad	Unidad	Días	Aportante	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	PRECONTRACTUALES	1	ud	30		1													
RED DE DISTRIBUCIÓN - UNIDADES CONSTRUCTIVAS HOMOLOGADAS POR LA CREG																			
1	Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Anden Concreto	0.32	Km	390	Distriservicios SAS ESP	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
2	Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona Verde	54.35	Km	390	Distriservicios SAS ESP	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	
3	Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Calzada Concreto	6.66	Km	390	Distriservicios SAS ESP	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	
4	Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Zona Verde	7.76	Km	390	Distriservicios SAS ESP	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	
5	Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Anden Concreto	0.02	Km	390	Distriservicios SAS ESP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	Tubería de Polietileno de 1 pulg. En Calzada Concreto	6.41	Km	390	Distriservicios SAS ESP	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	
RED DE DISTRIBUCIÓN - UNIDADES CONSTRUCTIVAS NO HOMOLOGADAS POR LA CREG																			
Ítem	Actividad	Cantidad	Unidad	Días	Aportante														
7	Estación almacenamiento de GLP de 4000 galones (todo incluido)	2	Und	60	Distriservicios SAS ESP		1	1											
8	Paso especial 30 - 35 metros	1	Und	30	Distriservicios SAS ESP		1												
9	Paso especial 15 - 20 metros	2	Und	60	Distriservicios SAS ESP			1	1										
10	Paso especial 10 - 15 metros	11	Und	330	Distriservicios SAS ESP		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
11	Paso especial 5 - 10 metros	21	Und	330	Distriservicios SAS ESP		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1		
12	Paso especial 0 - 5 metros	82	Und	330	Distriservicios SAS ESP		7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8		
CONEXIONES E INTERNAS																			
Ítem	Actividad	Cantidad	Unidad	Días	Aportante														
13	Otorgamiento del servicio a usuarios (todo incluido)	1033	Ud	360	Gobernación de Cundinamarca (Secretaria de Energía y Minería Sostenible)		80	80	80	80	83	90	90	90	90	90	90	90	
14	Liquidación	1	GLB	30														1	

Tabla 5 Cronograma de Obra

Avance de obra sobre el cronograma general de actividades:

CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES Y REDES INTERNAS PARA SUMINISTRO DE GLP EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SILVANIA, CUNDINAMARCA						MES							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	1				2			
APORTE SECRETARÍA DE ENERGÍAS Y MINERÍA SOSTENIBLE DE CUNDINAMARCA						PROGRAMADO		EJECUTADO		PROGRAMADO		EJECUTADO	
1	CONEXIONES A USUARIOS RESIDENCIALES ESTRATO 1					Und	V/Total	Und	V/Total	Und	V/Total	Und	V/Total
1.1	ACOMETIDA	UND	1033	$ 930 155	$ 960 850 115	0	$ -	0	$ -	80	$ 74 412 400.00	0	$ -
						Porc.	0.00%	Porc.	0.00%	Porc.	0.97%	Porc.	0.00%
2	RED INTERNA A USUARIOS RESIDENCIALES ESTRATO 1 (HASTA 35 METROS)												
2.1	Red interna a usuarios residenciales estrato 1 (hasta 35 metros)	UND	1033	$ 651 109	$ 672 595 597	0	$ -	0	$ -	80	$ 52 088 720.00	0	$ -
TOTAL APORTE SECRETARÍA DE ENERGÍAS Y MINERÍA SOSTENIBLE					$ 1 633 445 712	Porc.	0.00%	Porc.	0.00%	Porc.	0.68%	Porc.	0.00%
APORTE DISTRISERVICIOS SAS ESP													
3	RED INTERNA A USUARIOS RESIDENCIALES ESTRATO 1 (HASTA 35 METROS)												
3.1	Red interna a usuarios residenciales estrato 1 (hasta 35 metros)	UND	1033	$ 1 346 296	$ 1 390 723 768	0	$ -	0	$ -	80	$ 107 703 680.00	0	$ -
						Porc.	0.00%	Porc.	0.00%	Porc.	1.41%	Porc.	0.00%
4	REDES DE DISTRIBUCIÓN												
4.1	Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Anden Concreto	Km	0.32	$ 69 113 827	$ 22 116 425	0.02	$ 1 382 276.54	0	$ -	0.02	$ 1 382 276.54	0	$ -
						Porc.	0.02%	Porc.	0.00%	Porc.	0.02%	Porc.	0.00%
4.2	Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona Verde	Km	54.35	$ 25 273 434	$ 1 373 611 116	4.18	$ 105 642 952.46	0	$ -	4.18	$ 105 642 952.46	0.53	$ 13 394 919.81
						Porc.	1.38%	Porc.	0.00%	Porc.	1.38%	Porc.	0.18%
4.3	Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Calzada Concreto	Km	6.66	$ 97 972 177	$ 652 494 698	0.51	$ 49 965 810.23	0	$ -	0.51	$ 49 965 810.23	0	$ -
						Porc.	0.65%	Porc.	0.00%	Porc.	0.65%	Porc.	0.00%
4.4	Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Zona Verde	Km	7.76	$ 28 789 350	$ 223 405 353	0.60	$ 17 273 609.79	0	$ -	0.60	$ 17 273 609.79	0	$ -
						Porc.	0.23%	Porc.	0.00%	Porc.	0.23%	Porc.	0.00%
4.5	Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Anden Concreto	Km	0.02	$ 72 594 439	$ 1 451 889	0.001	$ 72 594.44	0	$ -	0.001	$ 72 594.44	0	$ -
						Porc.	0.001%	Porc.	0.00%	Porc.	0.001%	Porc.	0.00%

4.6	Tubería de Polietileno de 1 pulg. En Calzada Concreto	Km	6.41	$ 101 292 175	$ 649 282 841	0.49	$ 49 633 165.71	0	$ -	0.49	$ 49 633 165.71	0	$ -
						Porc.	0.65%	Porc.	0.00%	Porc.	0.65%	Porc.	0.00%
5	**ESTACION DE ALMACENAMIENTO**												
5.1	EGLP2000 - Estación de GLP de 4000 galones	UND	2	$ 136 608 805	$ 273 217 610	0	$ -	0	$ -	1	$ 136 608 805.02	0	$ -
						Porc.	0.00%	Porc.	0.00%	Porc.	1.79%	Porc.	0.00%
5.2	Predio de estación de almacenamiento	UND	1	$ 70 000 000	$ 70 000 000	0	$ -	0	$ -	1	$ 70 000 000.00	0	$ -
						Porc.	0.00%	Porc.	0.00%	Porc.	0.92%	Porc.	0.00%
6	**PASOS ESPECIALES**												
6.1	Paso especial 30 - 35 metros	UND	1	$ 8 741 286	$ 8 741 286	0	$ -	0	$ -	1	$ 8 741 286.07	0	$ -
						Porc.	0.00%	Porc.	0.00%	Porc.	0.11%	Porc.	0.00%
6.2	Paso especial 15 - 20 metros	UND	2	$ 6 427 475	$ 12 854 951	0	$ -	0	$ -		$ -	0	$ -
						Porc.	0.00%	Porc.	0.00%	Porc.	0.00%	Porc.	0.00%
6.3	Paso especial 10 - 15 metros	UND	11	$ 5 794 533	$ 63 739 858	0	$ -	0	$ -	1	$ 5 794 532.52	0	$ -
						Porc.	0.00%	Porc.	0.00%	Porc.	0.08%	Porc.	0.00%
6.4	Paso especial 5 - 10 metros	UND	21	$ 4 458 223	$ 93 622 683	0	$ -	0	$ -	2	$ 8 916 446.00	0	$ -
						Porc.	0.00%	Porc.	0.00%	Porc.	0.12%	Porc.	0.00%
6.5	Paso especial 0 - 5 metros	UND	82	$ 3 162 922	$ 259 359 640	0	$ -	0	$ -	7	$ 22 140 457.11	0	$ -
						Porc.	0.00%	Porc.	0.00%	Porc.	0.29%	Porc.	0.00%
AIU				25.00%	$ 908 474 588		$ 55 992 602		$ -		$ 101 542 984		$ 3 348 730
						Porc.	0.73%	Porc.	0.00%	Porc.	1.33%	Porc.	0.04%
TOTAL REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS COMBUSTIBLE CONSTRUIDAS					**$ 4 612 372 938**		**$ 279 963 011**		**$ -**		**$ 577 714 920**		**$ 16 743 650**
TOTAL APORTE DISTRISERVICIOS SAS ESP					**$ 6 003 096 706**		**$ 279 963 011**		**$ -**		**$ 685 418 600**		**$ 16 743 650**
COSTO TOTAL					**$ 7 636 542 418**		**$ 279 963 011**		**$ -**		**$ 811 919 720**		**$ 16 743 650**

VALOR TOTAL PROGRAMADO MENSUAL	**$ 279 963 011**				**$ 811 919 720**		
% PROGRAMADO MENSUAL	3.67%				10.63%		
% PROGRAMADO ACUMULADO	**3.67%**				**14.30%**		
VALOR TOTAL EJECUTADO MENSUAL			**$ -**				**$ 16 743 650**
% EJECUTADO MENSUAL			0.00%				0.22%
% EJECUTADO ACUMULADO			**0.00%**				**0.22%**

CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS SAS ESP

NIT. 901.105.922 - 6

DISTRISERVICIOS ESP
INGENIERÍA, DISEÑO Y CONSTRUCCION

CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES Y REDES INTERNAS PARA SUMINISTRO DE GLP EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SILVANIA, CUNDINAMARCA						MES							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	3				4			
APORTE SECRETARÍA DE ENERGÍAS Y MINERÍA SOSTENIBLE DE CUNDINAMARCA						PROGRAMADO		EJECUTADO		PROGRAMADO		EJECUTADO	
1	CONEXIONES A USUARIOS RESIDENCIALES ESTRATO 1					Und	V/Total	Und	V/Total	Und	V/Total	Und	V/Total
1.1	ACOMETIDA	UND	1033	$ 930 155	$ 960 850 115	80	$ 74 412 400.00	0	$ -	80	$ 74 412 400.00	0	$ -
						Porc.	0.97%	Porc.	0.00%	Porc.	0.97%	Porc.	0.00%
2	RED INTERNA A USUARIOS RESIDENCIALES ESTRATO 1 (HASTA 35 METROS)												
2.1	Red interna a usuarios residenciales estrato 1 (hasta 35 metros)	UND	1033	$ 651 109	$ 672 595 597	80	$ 52 088 720.00	0	$ -	80	$ 52 088 720.00	0	$ -
TOTAL APORTE SECRETARÍA DE ENERGÍAS Y MINERÍA SOSTENIBLE					$ 1 633 445 712	Porc.	0.68%	Porc.	0.00%	Porc.	0.68%	Porc.	0.00%
APORTE DISTRISERVICIOS SAS ESP													
3	RED INTERNA A USUARIOS RESIDENCIALES ESTRATO 1 (HASTA 35 METROS)												
3.1	Red interna a usuarios residenciales estrato 1 (hasta 35 metros)	UND	1033	$ 1 346 296	$ 1 390 723 768	80	$ 107 703 680.00	0	$ -	80	$ 107 703 680.00	0	$ -
						Porc.	1.41%	Porc.	0.00%	Porc.	1.41%	Porc.	0.00%
4	REDES DE DISTRIBUCIÓN												
4.1	Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Anden Concreto	Km	0.32	$ 69 113 827	$ 22 116 425	0.02	$ 1 382 276.54	0	$ -	0.02	$ 1 382 276.54	0	$ -
						Porc.	0.02%	Porc.	0.00%	Porc.	0.02%	Porc.	0.00%
4.2	Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona Verde	Km	54.35	$ 25 273 434	$ 1 373 611 116	4.18	$ 105 642 952.46	0.82	$ 20 724 215.56	4.18	$ 105 642 952.46	1.52	$ 38 415 619.08
						Porc.	1.38%	Porc.	0.27%	Porc.	1.38%	Porc.	0.50%
4.3	Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Calzada Concreto	Km	6.66	$ 97 972 177	$ 652 494 698	0.51	$ 49 965 810.23	0.2	$ 19 594 435.38	0.51	$ 49 965 810.23	0.21	$ 20 574 157.15
						Porc.	0.65%	Porc.	0.26%	Porc.	0.65%	Porc.	0.27%
4.4	Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Zona Verde	Km	7.76	$ 28 789 350	$ 223 405 353	0.60	$ 17 273 609.79	0.48	$ 13 818 887.83	0.60	$ 17 273 609.79	0.04	$ 1 151 573.99
						Porc.	0.23%	Porc.	0.18%	Porc.	0.23%	Porc.	0.02%
4.5	Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Anden Concreto	Km	0.02	$ 72 594 439	$ 1 451 889	0.001	$ 72 594.44	0	$ -	0.001	$ 72 594.44	0	$ -
						Porc.	0.001%	Porc.	0.000%	Porc.	0.001%	Porc.	0.000%
4.6	Tubería de Polietileno de 1 pulg. En Calzada Concreto	Km	6.41	$ 101 292 175	$ 649 282 841	0.49	$ 49 633 165.71	0	$ -	0.49	$ 49 633 165.71	2.06	$ 208 661 880.35
						Porc.	0.65%	Porc.	0.00%	Porc.	0.65%	Porc.	2.73%
5	ESTACION DE ALMACENAMIENTO												

DISTRISERVICIOS SAS ESP

WhatsApp 317 3915546 - línea de atención 302 2610970

Calle 21 5bis 21 oficina 301 Edificio Las Ceibas

Neiva, Huila.

servicioalcliente@distriserviciosesp.com

www.distriserviciosesp.com

5.1	EGLP2000 - Estación de GLP de 4000 galones	UND	2	$ 136 608 805	$ 273 217 610	1	$ 136 608 805.02	0	$ -	0	$ -	1	$ 136 608 805.02
						Porc.	**1.79%**	**Porc.**	**0.00%**	**Porc.**	**0.00%**	**Porc.**	**1.79%**
5.2	Predio de estación de almacenamiento	UND	1	$ 70 000 000	$ 70 000 000		$ -	0	$ -		$ -	1	$ 70 000 000.00
						Porc.	**0.00%**	**Porc.**	**0.00%**	**Porc.**	**0.00%**	**Porc.**	**0.92%**
6	**PASOS ESPECIALES**												
6.1	Paso especial 30 - 35 metros	UND	1	$ 8 741 286	$ 8 741 286		$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
						Porc.	**0.00%**	**Porc.**	**0.00%**	**Porc.**	**0.00%**	**Porc.**	**0.00%**
6.2	Paso especial 15 - 20 metros	UND	2	$ 6 427 475	$ 12 854 951	1	$ 6 427 475.30	0	$ -	1	$ 6 427 475.30	0	$ -
						Porc.	**0.08%**	**Porc.**	**0.00%**	**Porc.**	**0.08%**	**Porc.**	**0.00%**
6.3	Paso especial 10 - 15 metros	UND	11	$ 5 794 533	$ 63 739 858	1	$ 5 794 532.52	0	$ -	1	$ 5 794 532.52	0	$ -
						Porc.	**0.08%**	**Porc.**	**0.00%**	**Porc.**	**0.08%**	**Porc.**	**0.00%**
6.4	Paso especial 5 - 10 metros	UND	21	$ 4 458 223	$ 93 622 683	2	$ 8 916 446.00	0	$ -	2	$ 8 916 446.00	0	$ -
						Porc.	**0.12%**	**Porc.**	**0.00%**	**Porc.**	**0.12%**	**Porc.**	**0.00%**
6.5	Paso especial 0 - 5 metros	UND	82	$ 3 162 922	$ 259 359 640	7	$ 22 140 457.11	0	$ -	7	$ 22 140 457.11	0	$ -
						Porc.	**0.29%**	**Porc.**	**0.00%**	**Porc.**	**0.29%**	**Porc.**	**0.00%**
AIU				25.00%	$ 908 474 588		$ 100 964 531		$ 13 534 385		$ 66 812 330		$ 101 353 009
						Porc.	**1.32%**	**Porc.**	**0.18%**	**Porc.**	**0.87%**	**Porc.**	**1.33%**
TOTAL REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS COMBUSTIBLE CONSTRUIDAS					**$ 4 612 372 938**		**$ 504 822 656**		**$ 67 671 923**		**$ 334 061 650**		**$ 576 765 044**
TOTAL APORTE DISTRISERVICIOS SAS ESP					**$ 6 003 096 706**		**$ 612 526 336**		**$ 67 671 923**		**$ 441 765 330**		**$ 576 765 044**
COSTO TOTAL					**$ 7 636 542 418**		**$ 739 027 456**		**$ 67 671 923**		**$ 568 266 450**		**$ 576 765 044**

VALOR TOTAL PROGRAMADO MENSUAL							**$ 739 027 456**				**$ 568 266 450**		
% PROGRAMADO MENSUAL							9.68%				7.44%		
% PROGRAMADO ACUMULADO							**23.98%**				**31.42%**		
VALOR TOTAL EJECUTADO MENSUAL									**$ 67 671 923**				**$ 576 765 044**
% EJECUTADO MENSUAL									0.89%				7.55%
% EJECUTADO ACUMULADO									**1.11%**				**8.66%**

CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS SAS ESP

NIT. 901.105.922 - 6

DISTRISERVICIOS ESP
INGENIERÍA, DISEÑO Y CONSTRUCCION

CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES Y REDES INTERNAS PARA SUMINISTRO DE GLP EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SILVANIA, CUNDINAMARCA						MES							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	5				6			
APORTE SECRETARÍA DE ENERGÍAS Y MINERÍA SOSTENIBLE DE CUNDINAMARCA						PROGRAMADO		EJECUTADO		PROGRAMADO		EJECUTADO	
1	CONEXIONES A USUARIOS RESIDENCIALES ESTRATO 1					Und	V/Total	Und	V/Total	Und	V/Total	Und	V/Total
1.1	ACOMETIDA	UND	1033	$ 930 155	$ 960 850 115	80	$ 74 412 400.00	56	$ 52 088 680.00	83	$ 77 202 865.00	56	$ 52 088 680.00
						Porc.	0.97%	Porc.	0.68%	Porc.	1.01%	Porc.	0.68%
2	RED INTERNA A USUARIOS RESIDENCIALES ESTRATO 1 (HASTA 35 METROS)												
2.1	Red interna a usuarios residenciales estrato 1 (hasta 35 metros)	UND	1033	$ 651 109	$ 672 595 597	80	$ 52 088 720.00	56	$ 36 462 104.00	83	$ 54 042 047.00	56	$ 36 462 104.00
TOTAL APORTE SECRETARÍA DE ENERGÍAS Y MINERÍA SOSTENIBLE					$ 1 633 445 712	Porc.	0.68%	Porc.	0.48%	Porc.	0.71%	Porc.	0.48%
APORTE DISTRISERVICIOS SAS ESP													
3	RED INTERNA A USUARIOS RESIDENCIALES ESTRATO 1 (HASTA 35 METROS)												
3.1	Red interna a usuarios residenciales estrato 1 (hasta 35 metros)	UND	1033	$ 1 346 296	$ 1 390 723 768	80	$ 107 703 680.00	56	$ 75 392 576.00	83	$ 111 742 568.00	56	$ 75 392 576.00
						Porc.	1.41%	Porc.	0.99%	Porc.	1.46%	Porc.	0.99%
4	REDES DE DISTRIBUCIÓN												
4.1	Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Anden Concreto	Km	0.32	$ 69 113 827	$ 22 116 425	0.02	$ 1 382 276.54	0	$ -	0.02	$ 1 382 276.54	0	$ -
						Porc.	0.02%	Porc.	0.00%	Porc.	0.02%	Porc.	0.00%
4.2	Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona Verde	Km	54.35	$ 25 273 434	$ 1 373 611 116	4.18	$ 105 642 952.46	3.06	$ 77 336 706.83	4.18	$ 105 642 952.46	4.77	$ 120 554 278.29
						Porc.	1.38%	Porc.	1.01%	Porc.	1.38%	Porc.	1.58%
4.3	Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Calzada Concreto	Km	6.66	$ 97 972 177	$ 652 494 698	0.51	$ 49 965 810.23	0.55	$ 53 884 697.30	0.51	$ 49 965 810.23	0.1	$ 9 797 217.69
						Porc.	0.65%	Porc.	0.71%	Porc.	0.65%	Porc.	0.13%
4.4	Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Zona Verde	Km	7.76	$ 28 789 350	$ 223 405 353	0.60	$ 17 273 609.79	0	$ -	0.60	$ 17 273 609.79	0	$ -
						Porc.	0.23%	Porc.	0.00%	Porc.	0.23%	Porc.	0.00%
4.5	Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Anden Concreto	Km	0.02	$ 72 594 439	$ 1 451 889	0.001	$ 72 594.44	0	$ -	0.001	$ 72 594.44	0	$ -
						Porc.	0.001%	Porc.	0.000%	Porc.	0.001%	Porc.	0.000%
4.6	Tubería de Polietileno de 1 pulg. En Calzada Concreto	Km	6.41	$ 101 292 175	$ 649 282 841	0.49	$ 49 633 165.71	0.84	$ 85 085 426.94	0.49	$ 49 633 165.71	0.13	$ 13 167 982.74
						Porc.	0.65%	Porc.	1.11%	Porc.	0.65%	Porc.	0.17%
5	ESTACION DE ALMACENAMIENTO												
5.1	EGLP2000 - Estación de GLP de 4000 galones	UND	2	$ 136 608 805	$ 273 217 610	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
						Porc.	0.00%	Porc.	0.00%	Porc.	0.00%	Porc.	0.00%

5.2	Predio de estación de almacenamiento	UND	1	$ 70 000 000	$ 70 000 000	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
						Porc.	0.00%	Porc.	0.00%	Porc.	0.00%	Porc.	0.00%
6	**PASOS ESPECIALES**												
6.1	Paso especial 30 - 35 metros	UND	1	$ 8 741 286	$ 8 741 286	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
						Porc.	0.00%	Porc.	0.00%	Porc.	0.00%	Porc.	0.00%
6.2	Paso especial 15 - 20 metros	UND	2	$ 6 427 475	$ 12 854 951	0	$ -	1	$ 6 427 475.30	0	$ -	1	$ 6 427 475.30
						Porc.	0.00%	Porc.	0.08%	Porc.	0.00%	Porc.	0.08%
6.3	Paso especial 10 - 15 metros	UND	11	$ 5 794 533	$ 63 739 858	1	$ 5 794 532.52	3	$ 17 383 597.56	1	$ 5 794 532.52	1	$ 5 794 532.52
						Porc.	0.08%	Porc.	0.23%	Porc.	0.08%	Porc.	0.08%
6.4	Paso especial 5 - 10 metros	UND	21	$ 4 458 223	$ 93 622 683	2	$ 8 916 446.00	2	$ 8 916 446.00	2	$ 8 916 446.00	7	$ 31 207 561.00
						Porc.	0.12%	Porc.	0.12%	Porc.	0.12%	Porc.	0.41%
6.5	Paso especial 0 - 5 metros	UND	82	$ 3 162 922	$ 259 359 640	7	$ 22 140 457.11	11	$ 34 792 146.89	7	$ 22 140 457.11	18	$ 56 932 604.00
						Porc.	0.29%	Porc.	0.46%	Porc.	0.29%	Porc.	0.75%
AIU				25.00%	$ 908 474 588		$ 65 205 461		$ 70 956 624		$ 65 205 461		$ 60 970 413
						Porc.	0.85%	Porc.	0.93%	Porc.	0.85%	Porc.	0.80%
TOTAL REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS COMBUSTIBLE CONSTRUIDAS					**$ 4 612 372 938**		**$ 326 027 306**		**$ 354 783 121**		**$ 326 027 306**		**$ 304 852 064**
TOTAL APORTE DISTRISERVICIOS SAS ESP					**$ 6 003 096 706**		**$ 433 730 986**		**$ 430 175 697**		**$ 437 769 874**		**$ 380 244 640**
COSTO TOTAL					**$ 7 636 542 418**		**$ 560 232 106**		**$ 518 726 481**		**$ 569 014 786**		**$ 468 795 424**

VALOR TOTAL PROGRAMADO MENSUAL							**$ 560 232 106**				**$ 569 014 786**		
% PROGRAMADO MENSUAL							7.34%				7.45%		
% PROGRAMADO ACUMULADO							**38.75%**				**46.20%**		
VALOR TOTAL EJECUTADO MENSUAL									**$ 518 726 481**				**$ 468 795 424**
% EJECUTADO MENSUAL									6.79%				6.14%
% EJECUTADO ACUMULADO									**15.45%**				**21.59%**

CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS SAS ESP

NIT. 901.105.922 - 6

DISTRISERVICIOS ESP
INGENIERÍA, DISEÑO Y CONSTRUCCION

CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES Y REDES INTERNAS PARA SUMINISTRO DE GLP EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SILVANIA, CUNDINAMARCA						MES							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	7				8			
APORTE SECRETARÍA DE ENERGÍAS Y MINERÍA SOSTENIBLE DE CUNDINAMARCA						PROGRAMADO		EJECUTADO		PROGRAMADO		EJECUTADO	
1	CONEXIONES A USUARIOS RESIDENCIALES ESTRATO 1					Und	V/Total	Und	V/Total	Und	V/Total	Und	V/Total
1.1	ACOMETIDA	UND	1033	$ 930 155	$ 960 850 115	90	$ 83 713 950.00	111	$ 103 247 205.00	90	$ 83 713 950.00	0	$ -
						Porc.	1.10%	Porc.	1.35%	Porc.	1.10%	Porc.	0.00%
2	RED INTERNA A USUARIOS RESIDENCIALES ESTRATO 1 (HASTA 35 METROS)												
2.1	Red interna a usuarios residenciales estrato 1 (hasta 35 metros)	UND	1033	$ 651 109	$ 672 595 597	90	$ 58 599 810.00	111	$ 72 273 099.00	90	$ 58 599 810.00	0	$ -
TOTAL APORTE SECRETARÍA DE ENERGÍAS Y MINERÍA SOSTENIBLE					$ 1 633 445 712	Porc.	0.77%	Porc.	0.95%	Porc.	0.77%	Porc.	0.00%
APORTE DISTRISERVICIOS SAS ESP													
3	RED INTERNA A USUARIOS RESIDENCIALES ESTRATO 1 (HASTA 35 METROS)												
3.1	Red interna a usuarios residenciales estrato 1 (hasta 35 metros)	UND	1033	$ 1 346 296	$ 1 390 723 768	90	$ 121 166 640.00	111	$ 149 438 856.00	90	$ 121 166 640.00	0	$ -
						Porc.	1.59%	Porc.	1.96%	Porc.	1.59%	Porc.	0.00%
4	REDES DE DISTRIBUCIÓN												
4.1	Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Anden Concreto	Km	0.32	$ 69 113 827	$ 22 116 425	0.02	$ 1 382 276.54	0	$ -	0.02	$ 1 382 276.54	0	$ -
						Porc.	0.02%	Porc.	0.00%	Porc.	0.02%	Porc.	0.00%
4.2	Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona Verde	Km	54.35	$ 25 273 434	$ 1 373 611 116	4.18	$ 105 642 952.46	2.15	$ 54 337 882.25	4.18	$ 105 642 952.46	1.99	$ 50 294 132.87
						Porc.	1.38%	Porc.	0.71%	Porc.	1.38%	Porc.	0.66%
4.3	Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Calzada Concreto	Km	6.66	$ 97 972 177	$ 652 494 698	0.51	$ 49 965 810.23	0.45	$ 44 087 479.61	0.51	$ 49 965 810.23	0.16	$ 15 675 548.31
						Porc.	0.65%	Porc.	0.58%	Porc.	0.65%	Porc.	0.21%
4.4	Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Zona Verde	Km	7.76	$ 28 789 350	$ 223 405 353	0.60	$ 17 273 609.79	0	$ -	0.60	$ 17 273 609.79	0.15	$ 4 318 402.45
						Porc.	0.23%	Porc.	0.00%	Porc.	0.23%	Porc.	0.06%
4.5	Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Anden Concreto	Km	0.02	$ 72 594 439	$ 1 451 889	0.001	$ 72 594.44	0	$ -	0.001	$ 72 594.44	0	$ -
						Porc.	0.001%	Porc.	0.000%	Porc.	0.001%	Porc.	0.000%
4.6	Tubería de Polietileno de 1 pulg. En Calzada Concreto	Km	6.41	$ 101 292 175	$ 649 282 841	0.49	$ 49 633 165.71	0	$ -	0.49	$ 49 633 165.71	0	$ -
						Porc.	0.65%	Porc.	0.00%	Porc.	0.65%	Porc.	0.00%

CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS SAS ESP

NIT. 901.105.922 - 6

DISTRISERVICIOS ESP
INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION

5	**ESTACION DE ALMACENAMIENTO**												
5.1	EGLP2000 - Estación de GLP de 4000 galones	UND	2	$ 136 608 805	$ 273 217 610	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
						Porc.	**0.00%**	**Porc.**	**0.00%**	**Porc.**	**0.00%**	**Porc.**	**0.00%**
5.2	Predio de estación de almacenamiento	UND	1	$ 70 000 000	$ 70 000 000	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
						Porc.	**0.00%**	**Porc.**	**0.00%**	**Porc.**	**0.00%**	**Porc.**	**0.00%**
6	**PASOS ESPECIALES**												
6.1	Paso especial 30 - 35 metros	UND	1	$ 8 741 286	$ 8 741 286	0	$ -	1	$ 8 741 286.07	0	$ -	0	$ -
						Porc.	**0.00%**	**Porc.**	**0.11%**	**Porc.**	**0.00%**	**Porc.**	**0.00%**
6.2	Paso especial 15 - 20 metros	UND	2	$ 6 427 475	$ 12 854 951	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
						Porc.	**0.00%**	**Porc.**	**0.00%**	**Porc.**	**0.00%**	**Porc.**	**0.00%**
6.3	Paso especial 10 - 15 metros	UND	11	$ 5 794 533	$ 63 739 858	1	$ 5 794 532.52	4	$ 23 178 130.08	1	$ 5 794 532.52	0	$ -
						Porc.	**0.08%**	**Porc.**	**0.30%**	**Porc.**	**0.08%**	**Porc.**	**0.00%**
6.4	Paso especial 5 - 10 metros	UND	21	$ 4 458 223	$ 93 622 683	2	$ 8 916 446.00	7	$ 31 207 561.00	2	$ 8 916 446.00	1	$ 4 458 223.00
						Porc.	**0.12%**	**Porc.**	**0.41%**	**Porc.**	**0.12%**	**Porc.**	**0.06%**
6.5	Paso especial 0 - 5 metros	UND	82	$ 3 162 922	$ 259 359 640	7	$ 22 140 457.11	18	$ 56 932 604.00	8	$ 25 303 379.56	7	$ 22 140 457.11
						Porc.	**0.29%**	**Porc.**	**0.75%**	**Porc.**	**0.33%**	**Porc.**	**0.29%**
AIU				25.00%	$ 908 474 588		$ 65 205 461		$ 54 621 236		$ 65 996 192		$ 24 221 691
						Porc.	**0.85%**	**Porc.**	**0.72%**	**Porc.**	**0.86%**	**Porc.**	**0.32%**
TOTAL REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS COMBUSTIBLE CONSTRUIDAS					**$ 4 612 372 938**		**$ 326 027 306**		**$ 273 106 179**		**$ 329 980 959**		**$ 121 108 455**
TOTAL APORTE DISTRISERVICIOS SAS ESP					**$ 6 003 096 706**		**$ 447 193 946**		**$ 422 545 035**		**$ 451 147 599**		**$ 121 108 455**
COSTO TOTAL					**$ 7 636 542 418**		**$ 589 507 706**		**$ 598 065 339**		**$ 593 461 359**		**$ 121 108 455**

VALOR TOTAL PROGRAMADO MENSUAL							**$ 589 507 706**				**$ 593 461 359**		
% PROGRAMADO MENSUAL							7.72%				7.77%		
% PROGRAMADO ACUMULADO							**53.92%**				**61.70%**		
VALOR TOTAL EJECUTADO MENSUAL									**$ 598 065 339**				**$ 121 108 455**
% EJECUTADO MENSUAL									7.83%				1.59%
% EJECUTADO ACUMULADO									**29.42%**				**31.01%**

CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS SAS ESP

NIT. 901.105.922 - 6

DISTRISERVICIOS ESP
INGENIERÍA, DISEÑO Y CONSTRUCCION

CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES Y REDES INTERNAS PARA SUMINISTRO DE GLP EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SILVANIA, CUNDINAMARCA						MES							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	9				10			
APORTE SECRETARÍA DE ENERGÍAS Y MINERÍA SOSTENIBLE DE CUNDINAMARCA						PROGRAMADO		EJECUTADO		PROGRAMADO		EJECUTADO	
1	CONEXIONES A USUARIOS RESIDENCIALES ESTRATO 1					Und	V/Total	Und	V/Total	Und	V/Total	Und	V/Total
1.1	ACOMETIDA	UND	1033	$ 930 155	$ 960 850 115	90	$ 83 713 950.00	120	$ 111 618 600.00	90	$ 83 713 950.00	0	$ -
						Porc.	1.10%	Porc.	1.46%	Porc.	1.10%	Porc.	0.00%
2	RED INTERNA A USUARIOS RESIDENCIALES ESTRATO 1 (HASTA 35 METROS)												
2.1	Red interna a usuarios residenciales estrato 1 (hasta 35 metros)	UND	1033	$ 651 109	$ 672 595 597	90	$ 58 599 810.00	120	$ 78 133 080.00	90	$ 58 599 810.00	0	$ -
TOTAL APORTE SECRETARÍA DE ENERGÍAS Y MINERÍA SOSTENIBLE					$ 1 633 445 712	Porc.	0.77%	Porc.	1.02%	Porc.	0.77%	Porc.	0.00%
APORTE DISTRISERVICIOS SAS ESP													
3	RED INTERNA A USUARIOS RESIDENCIALES ESTRATO 1 (HASTA 35 METROS)												
3.1	Red interna a usuarios residenciales estrato 1 (hasta 35 metros)	UND	1033	$ 1 346 296	$ 1 390 723 768	90	$ 121 166 640.00	120	$ 161 555 520.00	90	$ 121 166 640.00	0	$ -
						Porc.	1.59%	Porc.	2.12%	Porc.	1.59%	Porc.	0.00%
4	REDES DE DISTRIBUCIÓN												
4.1	Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Anden Concreto	Km	0.32	$ 69 113 827	$ 22 116 425	0.02	$ 1 382 276.54	0	$ -	0.02	$ 1 382 276.54	0	$ -
						Porc.	0.02%	Porc.	0.00%	Porc.	0.02%	Porc.	0.00%
4.2	Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona Verde	Km	54.35	$ 25 273 434	$ 1 373 611 116	4.18	$ 105 642 952.46	4.32	$ 109 181 233.17	4.18	$ 105 642 952.46	3.16	$ 79 864 050.19
						Porc.	1.38%	Porc.	1.43%	Porc.	1.38%	Porc.	1.05%
4.3	Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Calzada Concreto	Km	6.66	$ 97 972 177	$ 652 494 698	0.51	$ 49 965 810.23	0.26	$ 25 472 766.00	0.51	$ 49 965 810.23	0.39	$ 38 209 149.00
						Porc.	0.65%	Porc.	0.33%	Porc.	0.65%	Porc.	0.50%
4.4	Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Zona Verde	Km	7.76	$ 28 789 350	$ 223 405 353	0.60	$ 17 273 609.79	0.3	$ 8 636 804.89	0.60	$ 17 273 609.79	3.05	$ 87 807 516.43
						Porc.	0.23%	Porc.	0.11%	Porc.	0.23%	Porc.	1.15%
4.5	Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Anden Concreto	Km	0.02	$ 72 594 439	$ 1 451 889	0.001	$ 72 594.44	0	$ -	0.001	$ 72 594.44	0	$ -
						Porc.	0.001%	Porc.	0.000%	Porc.	0.001%	Porc.	0.000%
4.6	Tubería de Polietileno de 1 pulg. En Calzada Concreto	Km	6.41	$ 101 292 175	$ 649 282 841	0.49	$ 49 633 165.71	0	$ -	0.49	$ 49 633 165.71	0.52	$ 52 671 930.96
						Porc.	0.65%	Porc.	0.00%	Porc.	0.65%	Porc.	0.69%
5	ESTACION DE ALMACENAMIENTO												
5.1	EGLP2000 - Estación de GLP de 4000 galones	UND	2	$ 136 608 805	$ 273 217 610	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
						Porc.	0.00%	Porc.	0.00%	Porc.	0.00%	Porc.	0.00%

5.2	Predio de estación de almacenamiento	UND	1	$ 70 000 000	$ 70 000 000	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
						Porc.	0.00%	Porc.	0.00%	Porc.	0.00%	Porc.	0.00%
6	**PASOS ESPECIALES**												
6.1	Paso especial 30 - 35 metros	UND	1	$ 8 741 286	$ 8 741 286	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
						Porc.	0.00%	Porc.	0.00%	Porc.	0.00%	Porc.	0.00%
6.2	Paso especial 15 - 20 metros	UND	2	$ 6 427 475	$ 12 854 951	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
						Porc.	0.00%	Porc.	0.00%	Porc.	0.00%	Porc.	0.00%
6.3	Paso especial 10 - 15 metros	UND	11	$ 5 794 533	$ 63 739 858	1	$ 5 794 532.52	0	$ -	1	$ 5 794 532.52	1	$ 5 794 532.52
						Porc.	0.08%	Porc.	0.00%	Porc.	0.08%	Porc.	0.08%
6.4	Paso especial 5 - 10 metros	UND	21	$ 4 458 223	$ 93 622 683	2	$ 8 916 446.00	0	$ -	2	$ 8 916 446.00	1	$ 4 458 223.00
						Porc.	0.12%	Porc.	0.00%	Porc.	0.12%	Porc.	0.06%
6.5	Paso especial 0 - 5 metros	UND	82	$ 3 162 922	$ 259 359 640	8	$ 25 303 379.56	7	$ 22 140 457.11	8	$ 25 303 379.56	8	$ 25 303 379.56
						Porc.	0.33%	Porc.	0.29%	Porc.	0.33%	Porc.	0.33%
AIU				25.00%	$ 908 474 588		$ 65 996 192		$ 41 357 815		$ 65 996 192		$ 73 527 195
						Porc.	0.86%	Porc.	0.54%	Porc.	0.86%	Porc.	0.96%
TOTAL REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS COMBUSTIBLE CONSTRUIDAS					**$ 4 612 372 938**		**$ 329 980 959**		**$ 206 789 076**		**$ 329 980 959**		**$ 367 635 977**
TOTAL APORTE DISTRISERVICIOS SAS ESP					**$ 6 003 096 706**		**$ 451 147 599**		**$ 368 344 596**		**$ 451 147 599**		**$ 367 635 977**
COSTO TOTAL					**$ 7 636 542 418**		**$ 593 461 359**		**$ 558 096 276**		**$ 593 461 359**		**$ 367 635 977**

VALOR TOTAL PROGRAMADO MENSUAL	**$ 593 461 359**				**$ 593 461 359**		
% PROGRAMADO MENSUAL	7.77%				7.77%		
% PROGRAMADO ACUMULADO	**69.47%**				**77.24%**		
VALOR TOTAL EJECUTADO MENSUAL			**$ 558 096 276**				**$ 367 635 977**
% EJECUTADO MENSUAL			7.31%				4.81%
% EJECUTADO ACUMULADO			**38.32%**				**43.13%**

CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS SAS ESP

NIT. 901.105.922 - 6

DISTRISERVICIOS ESP
INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION

CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES Y REDES INTERNAS PARA SUMINISTRO DE GLP EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SILVANIA, CUNDINAMARCA						MES				MES	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	11		12		13	
APORTE SECRETARÍA DE ENERGÍAS Y MINERÍA SOSTENIBLE DE CUNDINAMARCA						PROGRAMADO		PROGRAMADO		PROGRAMADO	
1	CONEXIONES A USUARIOS RESIDENCIALES ESTRATO 1					Und	V/Total	Und	V/Total	Und	V/Total
1.1	ACOMETIDA	UND	1033	$ 930 155	$ 960 850 115	90	$ 83 713 950.00	90	$ 83 713 950.00	90	$ 83 713 950.00
						Porc	1.10%	Porc	1.10%	Porc	1.10%
2	RED INTERNA A USUARIOS RESIDENCIALES ESTRATO 1 (HASTA 35 METROS)										
2.1	Red interna a usuarios residenciales estrato 1 (hasta 35 metros)	UND	1033	$ 651 109	$ 672 595 597	90	$ 58 599 810.00	90	$ 58 599 810.00	90	$ 58 599 810.00
TOTAL APORTE SECRETARÍA DE ENERGÍAS Y MINERÍA SOSTENIBLE					$ 1 633 445 712	Porc	0.77%	Porc	0.77%	Porc	0.77%
APORTE DISTRISERVICIOS SAS ESP											
3	RED INTERNA A USUARIOS RESIDENCIALES ESTRATO 1 (HASTA 35 METROS)										
3.1	Red interna a usuarios residenciales estrato 1 (hasta 35 metros)	UND	1033	$ 1 346 296	$ 1 390 723 768	90	$ 121 166 640.00	90	$ 121 166 640.00	90	$ 121 166 640.00
						Porc	1.59%	Porc	1.59%	Porc	1.59%
4	REDES DE DISTRIBUCIÓN										
4.1	Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Anden Concreto	Km	0.32	$ 69 113 827	$ 22 116 425	0.02	$ 1 382 276.54	0.02	$ 1 382 276.54	0.08	$ 5 529 106.15
						Porc	0.02%	Porc	0.02%	Porc	0.07%
4.2	Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona Verde	Km	54.35	$ 25 273 434	$ 1 373 611 116	4.18	$ 105 642 952.46	4.18	$ 105 642 952.46	4.19	$ 105 895 686.80
						Porc	1.38%	Porc	1.38%	Porc	1.39%
4.3	Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Calzada Concreto	Km	6.66	$ 97 972 177	$ 652 494 698	0.51	$ 49 965 810.23	0.51	$ 49 965 810.23	0.54	$ 52 904 975.53
						Porc	0.65%	Porc	0.65%	Porc	0.69%
4.4	Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Zona Verde	Km	7.76	$ 28 789 350	$ 223 405 353	0.60	$ 17 273 609.79	0.60	$ 17 273 609.79	0.56	$ 16 122 035.80
						Porc	0.23%	Porc	0.23%	Porc	0.21%
4.5	Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Anden Concreto	Km	0.02	$ 72 594 439	$ 1 451 889	0.001	$ 72 594.44	0.001	$ 72 594.44	0.008	$ 580 755.51
						Porc	0.001%	Porc	0.001%	Porc	0.008%
4.6	Tubería de Polietileno de 1 pulg. En Calzada Concreto	Km	6.41	$ 101 292 175	$ 649 282 841	0.49	$ 49 633 165.71	0.49	$ 49 633 165.71	0.53	$ 53 684 852.71
						Porc	0.65%	Porc	0.65%	Porc	0.70%
5	ESTACION DE ALMACENAMIENTO										
5.1	EGLP2000 - Estación de GLP de 4000 galones	UND	2	$ 136 608 805	$ 273 217 610	0	$ -	0	$ -	0	$ -
						Porc.	0.00%	Porc.	0.00%	Porc.	0.00%

DISTRISERVICIOS SAS ESP

WhatsApp 317 3915546 - línea de atención 302 2610970
Calle 21 5bis 21 oficina 301 Edificio Las Ceibas
Neiva, Huila.
servicioalcliente@distriserviciosesp.com
www.distriserviciosesp.com

5.2	Predio de estación de almacenamiento	UND	1	$ 70 000 000	$ 70 000 000	0	$ -	0	$ -	0	$ -
						Porc.	**0.00%**	**Porc.**	**0.00%**	**Porc.**	**0.00%**
6	**PASOS ESPECIALES**										
6.1	Paso especial 30 - 35 metros	UND	1	$ 8 741 286	$ 8 741 286	0	$ -	0	$ -	0	$ -
						Porc.	**0.00%**	**Porc.**	**0.00%**	**Porc.**	**0.00%**
6.2	Paso especial 15 - 20 metros	UND	2	$ 6 427 475	$ 12 854 951	0	$ -	0	$ -	0	$ -
						Porc.	**0.00%**	**Porc.**	**0.00%**	**Porc.**	**0.00%**
6.3	Paso especial 10 - 15 metros	UND	11	$ 5 794 533	$ 63 739 858	1	$ 5 794 532.52	1	$ 5 794 532.52	0	$ -
						Porc.	**0.08%**	**Porc.**	**0.08%**	**Porc.**	**0.00%**
6.4	Paso especial 5 - 10 metros	UND	21	$ 4 458 223	$ 93 622 683	2	$ 8 916 446.00	1	$ 4 458 223.00	0	$ -
						Porc.	**0.12%**	**Porc.**	**0.06%**	**Porc.**	**0.00%**
6.5	Paso especial 0 - 5 metros	UND	82	$ 3 162 922	$ 259 359 640	8	$ 25 303 379.56	8	$ 25 303 379.56	0	$ -
						Porc.	**0.33%**	**Porc.**	**0.33%**	**Porc.**	**0.00%**
AIU				25.00%	$ 908 474 588		$ 65 996 192		$ 64 881 636		$ 58 679 353
						Porc.	**0.86%**	**Porc.**	**0.85%**	**Porc.**	**0.77%**
TOTAL REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS COMBUSTIBLE CONSTRUIDAS					**$ 4 612 372 938**		**$ 329 980 959**		**$ 324 408 180**		**$ 293 396 766**
TOTAL APORTE DISTRISERVICIOS SAS ESP					**$ 6 003 096 706**		**$ 451 147 599**		**$ 445 574 820**		**$ 414 563 406**
COSTO TOTAL					**$ 7 636 542 418**		**$ 593 461 359**		**$ 587 888 580**		**$ 556 877 166**

VALOR TOTAL PROGRAMADO MENSUAL	**$ 593 461 359**		**$ 587 888 580**		**$ 556 877 166**
% PROGRAMADO MENSUAL	7.77%		7.70%		7.29%
% PROGRAMADO ACUMULADO	**85.01%**		**92.71%**		**100.00%**
VALOR TOTAL EJECUTADO MENSUAL					
% EJECUTADO MENSUAL					
% EJECUTADO ACUMULADO					

En este décimo avance de obra se evidencia, de acuerdo con el cronograma de actividades establecido para el proyecto, la ejecución programada de 90 instalaciones de usuarios gasificados, 5.80 km de red de distribución y la construcción de 11 pasos especiales, representando una proyección de ejecución de obra física por valor de **$593.461.359,00,** equivalente a un **7.77%** de avance físico de obra en este corte y a un **77.24%** de avance general.

Por otra parte, durante el periodo reportado, se realizó la construcción de 120 instalaciones de usuarios gasificados, 7.12 km de red de distribución y la construcción de 10 pasos especiales.

Las actividades anteriormente descritas representan una ejecución total por valor de **$367.635.977,00**, equivalente a un **4.81%** de avance físico de obra en el corte y a un **43.13%** de avance general. En consecuencia, se evidencia un retraso de lo programado en el mes, reflejando un **2.96%** por debajo de lo estipulado en el cronograma de actividades de obra para el periodo evaluado y en cuanto al avance general, se evidencia un retraso del **34.11%,** este retraso se debe a la temporada de lluvia registrada en los inicios de ejecución del proyecto.

6. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATO

6.1 CONTRATISTA

Las actividades para desarrollar están a cargo de DISTRISERVICIOS SAS ESP por el representante legal, Hernán Darío Huertas Murcia con número de cédula: 1.070.584.730 de Girardot, Cundinamarca.

6.2 SUPERVISIÓN

Quien realiza la supervisión es don Fredy Humberto García Rodríguez con número de cédula: 79.863.146, profesional del área de la Secretaría de Energías y Minería Sostenible.

6.3 INTERVENTOR

No aplica.

7. DATOS DEL CONVENIO

CONVENIO No.:	**CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. SEMS-ES-CA-057-2025 CELEBRADO ENTRE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE ENERGÍAS Y MINERÍA SOSTENIBLE Y CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS SAS**
CONTRATISTA O PARTE DEL CONVENIO:	CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS SAS ESP (DISTRISERVICIOS SAS ESP)
NIT	901105922-6
REPRESENTANTE LEGAL:	HERNAN DARIO HUERTAS MURCIA
CÉDULA:	1.070.584.730 GIRARDOT – CUNDINAMARCA
OBJETO DEL CONTRATO:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para ampliar la cobertura del servicio de gas combustible por redes, a través de la construcción del sistema de distribución y la financiación del cargo por conexión y la red interna, para usuarios del municipio de Silvania del departamento de Cundinamarca.
VALOR TOTAL DEL CONVENIO:	**$ 7.636.542.418** Siete mil seiscientos treinta y seis millones quinientos cuarenta y dos mil cuatrocientos dieciocho pesos m/cte.
VALOR APORTE SEMS:	**$ 1.633.445.712** Mil seiscientos treinta y tres millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil setecientos doce pesos m/cte.
VALOR APORTE DISTRISERVICIOS	**$ 6.003.096.706** Seis mil tres millones noventa y seis mil setecientos seis pesos m/cte.
PLAZO:	Trece (13) meses
FECHA DE INICIO:	19 de noviembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de diciembre de 2026

8. ACTAS DEL CONTRATO

Las actas legales suscritas para la obra:

ACTA INICIO OBRA:	19 de noviembre de 2025

9. CONTROL DE POLIZAS

Se relaciona en la tabla Control de pólizas:

GARANTIAS	**ASEGURADORA:**	**No POLIZA**		
	Seguros Generales Suramericana S. A	4391146 y 013001042939		
	PRODUCTO	SUMA ASEGURADA	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
	1. SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	**$ 871.860.834**	19/11/2025	13/01/2030
	2. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO	**$ 711.750.000**	19/11/2025	13/01/2027

Expedidas por la compañía **SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.**

NIT: 890.903.407-9

10. CONCLUSIONES

1. Las obras y construcciones se desarrollaron siguiendo los parámetros de ley, las Normas Técnicas Colombianas NTC 3728, NTC 3853 y NTC 3853, además de los manuales de instalación del fabricante de la tubería (Extrucol).

2. A la fecha de este informe, la obra presenta un avance general del 43,13% con respecto al 77,24% proyectado en el cronograma del proyecto.

3. En cuanto a los usuarios a beneficiar, hasta la fecha se lleva un total de 689 afiliaciones a usuarios (66.70%) de los cuales 116 se han realizado un avance constructivo de instalaciones internas (11.23%) y un total de 343 usuarios gasificados (33.20%).

4. Referente a la red de distribución, se construyó en el corte 7.12 km para un total de 32,21 km de red construida hasta la fecha, representando un 42,65% de avance.



HERNAN DARIO HUERTAS MURCIA
Representante legal
DISTRISERVICIOS SAS ESP.

ANEXOS

1. REGISTRO FOTOGRAFICO RED DE DISTRIBUCIÓN










24/08/2026 4:29:51 p. m.
4.4443616666666665N 74.33903166666667W
Unnamed Road
Silvania
Cundinamarca
Altitud:2160.0msnm
Velocidad:0.0km/h
Distriservicios EsP.
Número de índice: 1813

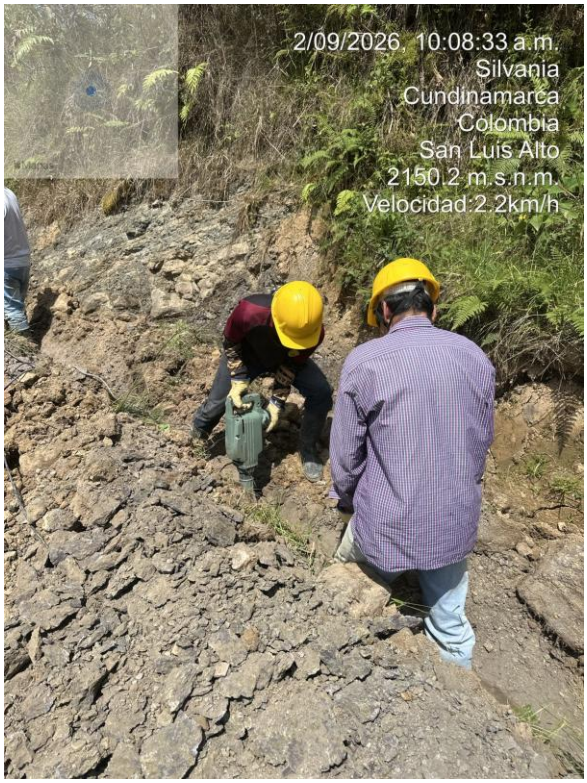

24/08/2026 3:52:40 p. m.
Unnamed Road
Silvania
Cundinamarca


26/08/2026 9:35:40 a. m.
4.4466041N 74.3398048W
Unnamed Road
Silvania
Cundinamarca
Altitud:2137.8msnm
Distriservicios EsP.
Número de índice: 1864


26/08/2026 3:02:15 p. m.
4.44605N 74.33970500000001W
Unnamed Road
Silvania
Cundinamarca
Altitud:2133.6msnm
Velocidad:1.4km/h
Distriservicios EsP.
Número de índice: 1895


28/08/2026 2:18:22 p. m.
4.4491961N 74.3416448W
Unnamed Road
Silvania
Cundinamarca
Altitud:2134.7msnm
Distriservicios EsP.
Número de índice: 1972

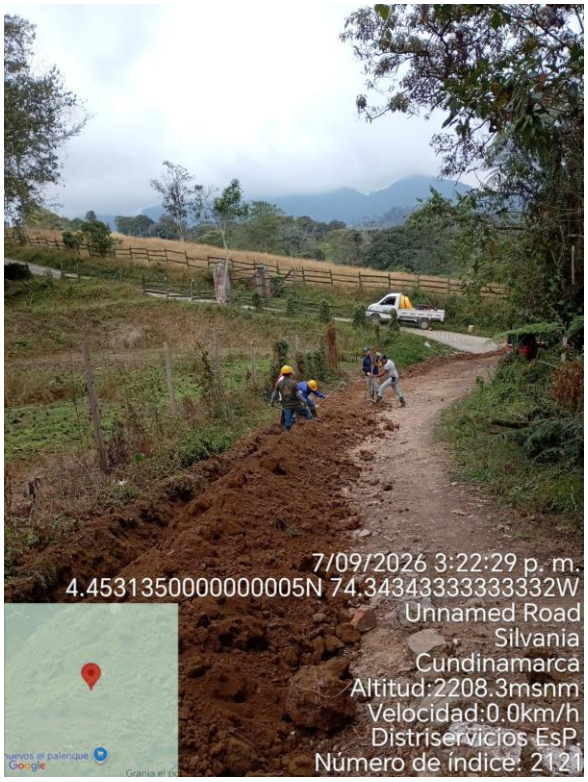

31/08/2026 3:31:32 p. m.
Altitud:2309.4msnm
Distriservicios EsP.
Número de índice: 1996


2/09/2026, 10:08:33 a.m.
Silvania
Cundinamarca
Colombia
San Luis Alto
2150.2 m.s.n.m.
Velocidad:2.2km/h


4/09/2026 3:05:43 p. m.
4.452686666666667N 74.342963333333333W
Altitud:2200.7msnm
Velocidad:0.4km/h
Distriservicios EsP.
Número de índice: 2072


8/09/2026 2:24:01 p. m.
4.45465N 74.34373000000001W
Unnamed Road
Silvania
Cundinamarca
Altitud:2245.7msnm
Velocidad:1.6km/h
Distriservicios EsP.
Número de índice: 2150

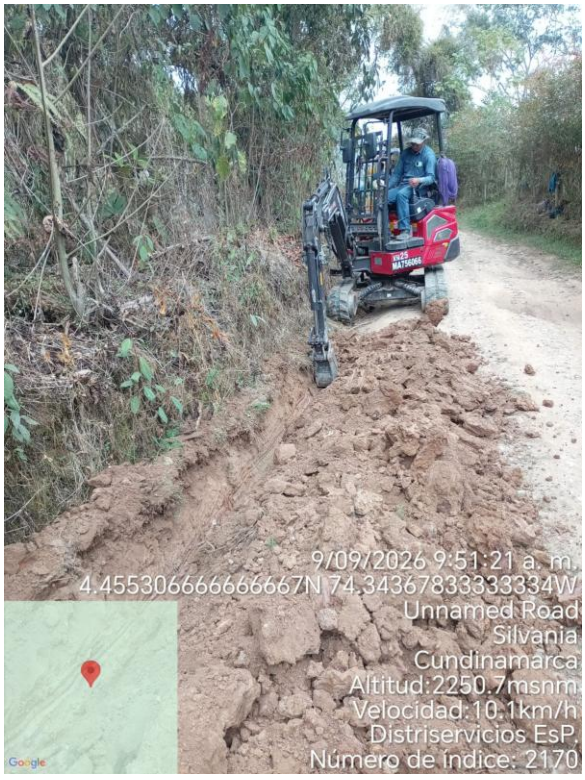

7/09/2026 2:47:12 p. m.
Distriservicios EsP.
Número de índice: 2115


7/09/2026 3:22:29 p. m.
4.4531350000000005N 74.34343333333332W
Unnamed Road
Silvania
Cundinamarca
Altitud:2208.3msnm
Velocidad:0.0km/h
Distriservicios EsP.
Número de índice: 2121


4/09/2026 11:20:21 a. m.
4.45266N 74.34303166666668W
Altitud:2220.5msnm
Velocidad:0.4km/h
Distriservicios EsP.
Número de índice: 2061


8/09/2026 2:23:47 p. m.
4.4545866666666667N 74.343705W
Unnamed Road
Silvania
Cundinamarca
Altitud:2242.1msnm
Velocidad:2.2km/h
Distriservicios EsP.
Número de índice: 2149

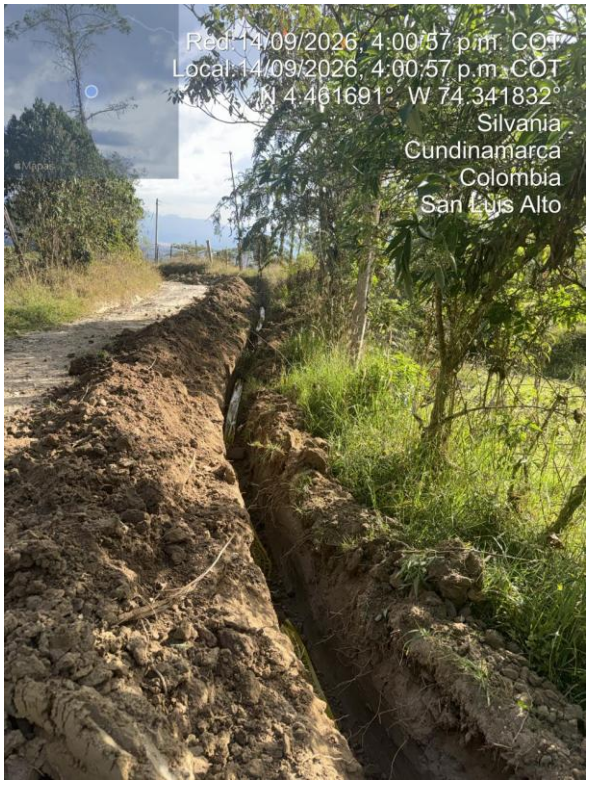

9/09/2026 10:10:15 a. m.
4.4547216666666667N 74.343766666666667W
Unnamed Road
Silvania
Cundinamarca
Altitud:2245.2msnm
Velocidad:0.0km/h
Distriservicios EsP.
Número de índice: 2174


9/09/2026 9:51:21 a. m.
4.4553066666666667N 74.343678333333334W
Unnamed Road
Silvania
Cundinamarca
Altitud:2250.7msnm
Velocidad:10.1km/h
Distriservicios EsP.
Número de índice: 2170

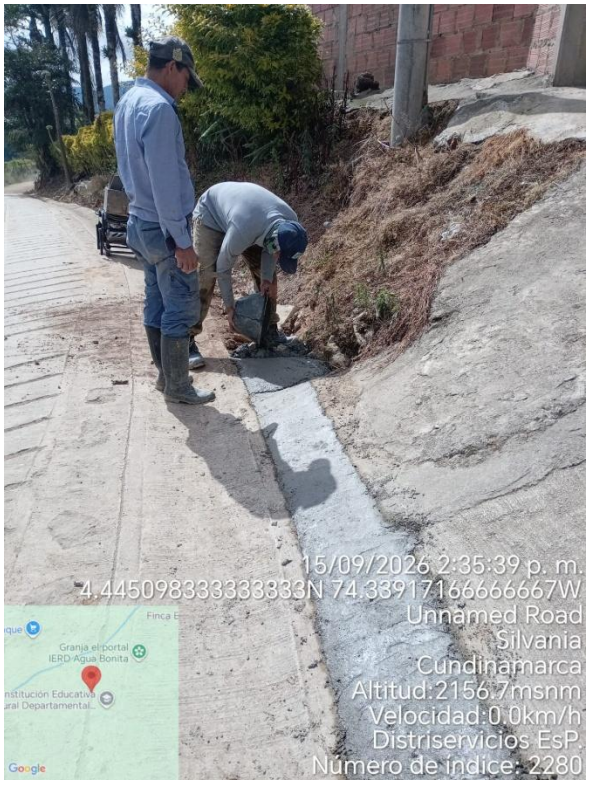

9/09/2026 1:39:22 p. m.
4.4558816666666665N 74.343625W
Unnamed Road
Silvania
Cundinamarca
Altitud:2274.3msnm
Velocidad:1.2km/h
Distriservicios EsP.
Número de índice: 2188


Red:14/09/2026, 1:27:30 p.m. COT
Local:14/09/2026, 1:27:30 p.m. COT
N 4.461086°, W 74.342034°
Silvania
Cundinamarca
Colombia
San Luis Alto

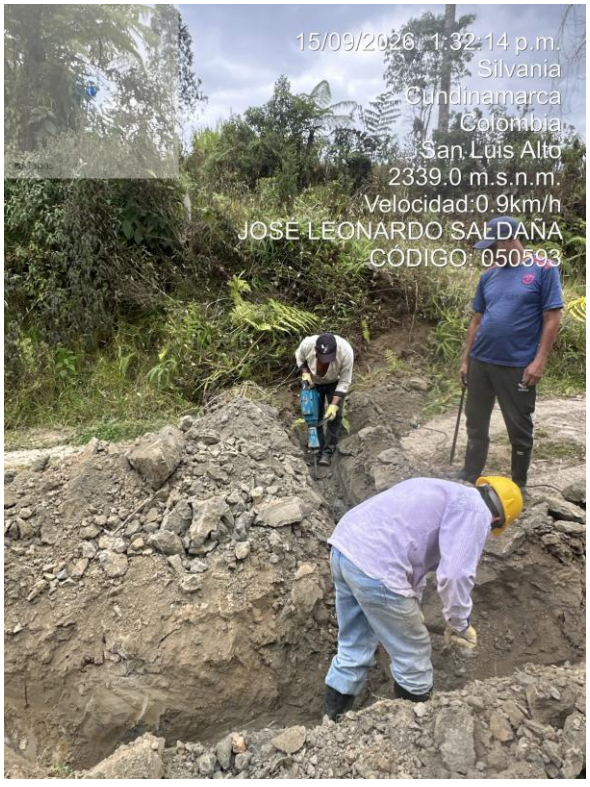

Red:14/09/2026, 1:51:51 p.m. COT
Local:14/09/2026, 1:51:51 p.m. COT
N 4.461073°, W 74.342058°
Silvania
Cundinamarca
Colombia
San Luis Alto


Red:14/09/2026, 4:00:57 p.m. COT
Local:14/09/2026, 4:00:57 p.m. COT
N 4.461691°, W 74.341832°
Silvania
Cundinamarca
Colombia
San Luis Alto


15/09/2026 2:35:55 p. m.
4.445098333333333N 74.33917166666667W
Unnamed Road
Silvania
Cundinamarca
Altitud:2156.7msnm
Velocidad:0.0km/h
Distriservicios EsP
Número de índice: 2281


15/09/2026 2:35:39 p. m.
4.445098333333333N 74.33917166666667W
Unnamed Road
Silvania
Cundinamarca
Altitud:2156.7msnm
Velocidad:0.0km/h
Distriservicios EsP.
Número de índice: 2280
Granja el portal
IERD Agua Bonita
Google


15/09/2026, 1:32:16 p.m.
Silvania
Cundinamarca
Colombia
San Luis Alto
2339.0 m.s.n.m.
Velocidad:0.9km/h
JOSÉ LEONARDO SALDAÑA
CÓDIGO: 050593

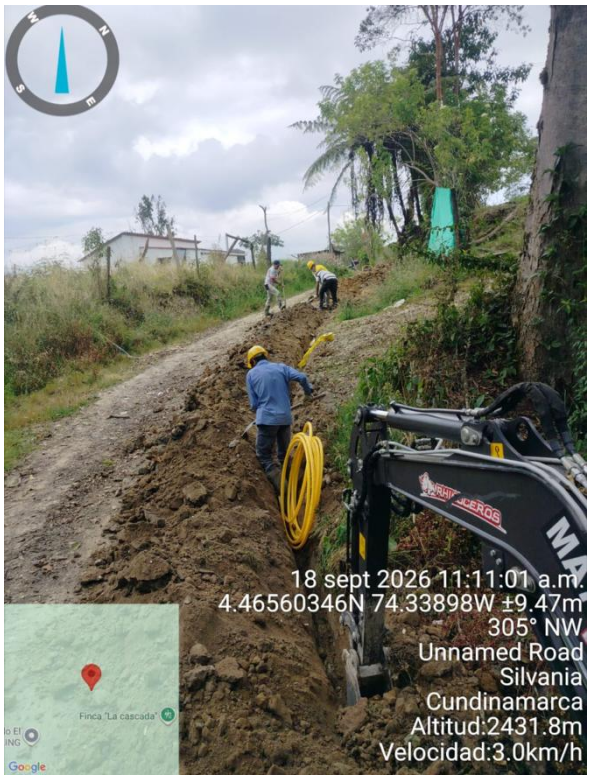

15/09/2026, 1:32:14 p.m.
Silvania
Cundinamarca
Colombia
San Luis Alto
2339.0 m.s.n.m.
Velocidad:0.9km/h
JOSÉ LEONARDO SALDAÑA
CÓDIGO: 050593


15/09/2026, 1:42:55 p.m.
Silvania
Cundinamarca
Colombia
San Luis Alto
2396.9 m.s.n.m.
Velocidad:3.7km/h
JOSÉ LEONARDO SALDAÑA
CÓDIGO: 050593
MA756066

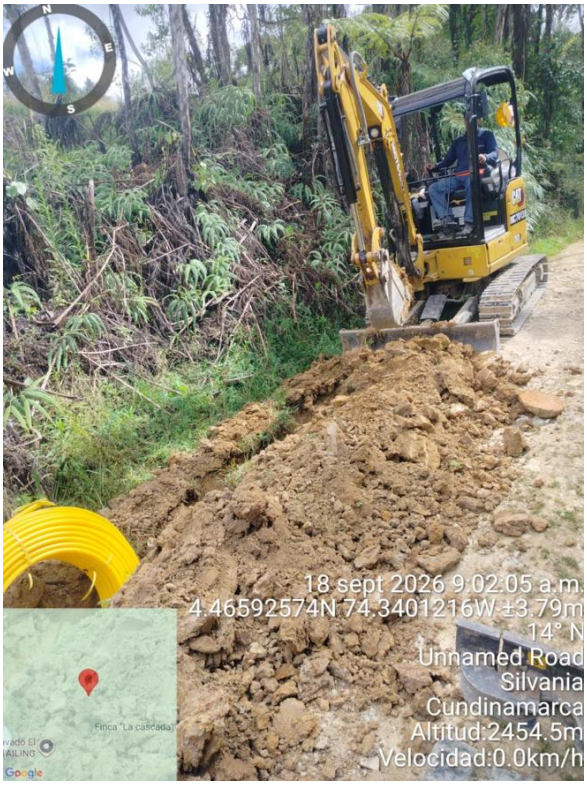

18/09/2026 2:58:35 p. m.


18/09/2026 9:46:25 a. m.


18/09/2026 3:09:04 p. m.


18 sept 2026 11:11:01 a.m.
4.46560346N 74.33898W ±9.47m
305° NW
Unnamed Road
Silvania
Cundinamarca
Altitud:2431.8m
Velocidad:3.0km/h
Finca "La cascada"
Google


18 sept 2026 10:44:42 a.m.
4.46575836N 74.33917923W ±4.91m
333° NW
Unnamed Road
Silvania
Cundinamarca
Altitud:2468.7m
Velocidad:0.0km/h


18 sept 2026 9:02:05 a.m.
4.46592574N 74.3401216W ±3.79m
14° N
Unnamed Road
Silvania
Cundinamarca
Altitud:2454.5m
Velocidad:0.0km/h


18 sept 2026 9:01:44 a.m.
4.46589006N 74.3401853W ±3.79m
12° N
Unnamed Road
Silvania
Cundinamarca
Altitud:2455.0m
Velocidad:0.0km/h


18 sept 2026 1:59:26 p.m.
4.46540142N 74.33848694W ±3.79m
68° E
Unnamed Road
Silvania
Cundinamarca
Altitud:2466.3m
Velocidad:0.0km/h

2.REGISTRO FOTOGRAFICO DE PASOS ESPECIALES










21/08/2026 11:42:46 a. m.
4.438163333333334N 74.352531666666666W
Fusagasuga - Sibate
Silvania
Cundinamarca
Altitud:1998.1msnm
Velocidad:0.8km/h
Distriservicios EsP.
Número de índice: 1765


21/08/2026 10:22:26 a. m.
4.437956666666666N 74.35244833333333W
Fusagasuga - Sibate
Silvania
Cundinamarca
Altitud:1944.1msnm
Velocidad:0.6km/h
Distriservicios EsP.
Número de índice: 1748


17/09/2026 11:10:57 a. m.
4.4312211N 74.3266702W
Fusagasuga - Sibate
Silvania
Cundinamarca
Distriservicios EsP.
Número de índice: 2325


17/09/2026 4:08:04 p. m.
4.448049999999999N 74.33915333333333W
Unnamed Road
Silvania
Cundinamarca
Altitud:2126.8msnm
Velocidad:0.0km/h
Distriservicios EsP.
Número de índice: 2334


17/09/2026 3:35:05 p. m.
4.4312211N 74.3266702W
Fusagasuga - Sibate
Silvania
Cundinamarca
Distriservicios EsP
Número de índice: 2330


17/09/2026 4:06:39 p. m.
4.448116666666666N 74.38921666666667W
Fusagasuga - Sibate
Silvania
Cundinamarca
Altitud:2141.3msnm
Velocidad:1.2km/h
Distriservicios EsP
Número de índice: 2332


18/09/2026 10:37:38 a. m.


18/09/2026 10:37:31 a. m.
