BOGOTA-D.C., 13 de Octubre de 2026

Al contestar cite el numero de radicado de este documento

ANI Numero de Radicado 20264091337612

Fecha: 13/10/2026

SENORES:

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Asunto: IPAB-0869-2026 ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORíA 008 – SEPTIEMBRE 2026

Cordial saludo,

entrega de informe mensual de interventoría 008 – septiembre 2026

Atentamente,

CONSORCIO IPAB IPAB
Documento de Identidad No. 902030942

Direccion: CRA 49 A 94 76 OF 601
Telefono: 6017446234
Municipio: BOGOTA
Departamento: D.C.
Correo electronico: consorcioipab@consorcioipab.com
Correo electronico de Notificacion: consorcioipab@consorcioipab.com

Anexos:
OFICIO REMISORIO
ANEXOS.
ANEXOS.
ANEXOS.
ANEXOS.
ANEXOS.
ANEXOS.
ANEXOS.
ANEXOS.
ANEXOS.
ANEXOS.
ANEXOS.
ANEXOS.
ANEXOS.
ANEXOS.
ANEXOS.
ANEXOS.

IPAB-0869-2026

Bogotá D.C., 10 de octubre de 2026

Señores
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – ANI
Ing. CECILIA MUÑOZ SALAMANCA
Gerente de Proyectos - Vicepresidencia Ejecutiva VEJ
Calle 24A No. 59 – 42
Bogotá D.C

ASUNTO: Entrega de Informe Mensual de Interventoría 008 – Septiembre 2026

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA **No. VEJ-523 DE 2026**

OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, MEDIOAMBIENTAL, SOCIO–PREDIAL, ADMINISTRATIVA, DE SEGUROS, RIESGOS, OPERATIVA, MANTENIMIENTO, ADMINISTRATIVA DE AFORO Y RECAUDO Y DE GESTIÓN DE CALIDAD AL CONTRATO DE CONCESIÓN No.016 DE 2015 DEL PROYECTO IP CONEXIÓN ANTIOQUÍA - BOLÍVAR

Cordial saludo,

En virtud de las obligaciones contractuales asumidas por esta Interventoría en el marco del Contrato referenciado y en cumplimiento de nuestras funciones, realizamos la entrega del **Informe de Interventoría 008** que comprende el periodo entre el **01 y el 30 de septiembre de 2026**. El documento y sus anexos se adjuntan a esta comunicación, y además se pueden consultar en el siguiente enlace:

01.ANI.IPAB.IMI.008.SEP

Quedamos atentos a su revisión y comentarios pertinentes.

Cordialmente,

_____

ELSA TORRES ARENALES
Representante Legal
*Anexo: Dos (2) Archivos en PDFA (Informe Mensual y Ejecutivo) /**Anexos del informe en 13 carpetas comprimidas***
C.Co: Ing. John Alexander Rey Cañón – Líder de apoyo a la Supervisión - ANI - jrey@ani.gov.co
Elaboró: ACZH
Revisó: WCTP, AABB, JEDC
Aprobó: RAAC

ANI

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N.º VEJ-523-2026

INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, MEDIOAMBIENTAL, SOCIO-PREDIAL, ADMINISTRATIVA, DE SEGUROS, RIESGOS, OPERATIVA, MANTENIMIENTO, ADMINISTRATIVA DE AFORO Y RECAUDO Y DE GESTIÓN DE CALIDAD AL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 016 DE 2015 DEL PROYECTO IP CONEXIÓN ANTIOQUÍA - BOLÍVAR".

Consorcio IPAB

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA 008
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
ORIGINAL ANI

Bogotá D.C., 10 de octubre de 2026

PRODUCTO DOCUMENTAL IPAB-IMI-008-V01

Versión	Fecha	Descripción Modificación	Folios
01	10/Octubre/2026	Emisión Inicial.	**940**

INTRODUCCIÓN 25
1. OBJETO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 27
1.1. ETAPA PREOPERATIVA 28
1.2. ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 28
1.3. ETAPA DE REVERSIÓN 29
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 30
2.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 30
2.2. ALCANCE DEL PROYECTO 32
2.2.1. Unidad Funcional Integral (UFI) 1: Caucasia - Planeta Rica. 36
2.2.2. Unidad Funcional Integral (UFI) 2: Cereté – Lorica 38
2.2.3. Unidad Funcional Integral (UFI) 3: Variante Planeta Rica; El Quince – San Carlos – Cereté y Variante Cereté 40
2.2.4. Unidad Funcional Integral (UFI) 4: Planeta Rica – Montería 45
2.2.5. Unidad Funcional Integral (UFI) 5: Puerto Rey – Montería; Santa Lucia – San Pelayo. 48
2.2.6. Unidad Funcional Integral (UFI) 6: Cereté – Lorica; Lorica – Coveñas; Coveñas – Tolú 51
2.2.7. Unidad Funcional Integral (UFI) 7: Variante Lorica; Variante Coveñas; Tolú – Pueblito 53
2.2.8. Unidad Funcional Integral (UFI) 8: Tolú – Tolú Viejo; Pueblito – Cruz del Viso 56
3. CONTRATO DE CONCESIÓN 59
3.1. GENERALIDADES 59
3.2. ESTADO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 60
3.2.1. Modificaciones al Contrato de Concesión 60
3.2.2. Plazos Actuales del Contrato de Concesión 65
3.2.3. Hitos Presentados en el Desarrollo del Proyecto 66
3.2.4. Pólizas Vigentes 70
3.2.5. Estado Actual Etapa de Reversión. 77

3.3. GESTIÓN JURÍDICA.....108
3.3.1. PLAZOS DE CURA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS CONTRACTUALES. 108
3.3.2. Plazos de Cura.....108
3.3.3. Procedimientos Administrativos Sancionatorios Contractuales.....108
3.3.4. EVENTOS EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD EER. 109
3.3.5. RECLAMACIONES EN CONTRA DE LA ANI 111
4. ÁREA TÉCNICA OPERATIVA..... 113
4.1. GENERALIDADES..... 113
4.2. ÁREA TÉCNICA..... 115
4.2.1. Etapa de Estudios, Diseños y Construcción.....115
4.2.2. Seguimiento Fase de Construcción 117
4.2.3. OBRAS MENORES 176
4.2.4. Pruebas y ensayos realizados a los Materiales 179
4.3. ÁREA OPERATIVA Y DE MANTENIMIENTO.....182
4.3.1. Mantenimiento Rutinario y Actividades Particulares en la Operación de Vías 183
4.3.2. Principios de Operación y Parámetros de Control de Servicios....187
4.3.3. Seguridad Vial.....202
4.3.4. Seguimiento a Convenio DITRA 223
4.3.5. Información Permanente.....256
4.3.6. Programa de mantenimiento y operación 259
4.3.7. Obligaciones Particulares de Operación 260
4.3.8. Niveles de Servicio para Unidades Funcionales abiertas al tránsito, sin acta de terminación.....261
4.3.9. Indicadores de Operación y Mantenimiento durante la Etapa de Reversión 269
4.3.10. Resumen Indicadores de Operación y Mantenimiento en etapa de Reversión 311
4.3.11. Indicadores de la Etapa de Reversión 341

4.4. OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO AL TRÁNSITO Y RECAUDO 382
4.4.1. Objetivos de la supervisión a la operación en las estaciones de peaje y pesaje 387
4.4.2. Tarifas de Peaje 391
4.4.1. Tránsito de las estaciones de peaje 392
4.4.2. Análisis de tráfico y recaudo vehículos especiales TED 413
4.4.3. Recaudo de las estaciones de peaje 417
4.4.4. Sobrantes estaciones de peaje 432
4.4.5. Arqueos en estaciones de peaje. 434
4.4.6. Estaciones de Pesaje 437
4.4.7. Transportes Especiales 454
4.4.8. Auditoría de Equipos y Sistemas 454
4.5. CONDICIONES METEOROLÓGICAS 496
5. GESTIÓN AMBIENTAL 498
5.1. OBJETIVO GENERAL 500
5.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONCESIONARIO 500
5.3. ESTUDIOS AMBIENTALES Y PERMISOS REQUERIDOS 501
5.4. TRÁMITES DE LICENCIAS AMBIENTALES Y PERMISOS DE RECURSOS NATURALES 502
5.5. SEGUIMIENTO GENERAL POR PARTE DE INTERVENTORÍA 519
5.5.1. Relación de Correspondencia 519
5.5.2. Reuniones, Comités Y Visitas De Seguimiento 524
5.6. SEGUIMIENTO COMPENSACIONES AMBIENTALES 524
5.6.1. Ejecución Subcuenta Compensaciones Ambientales 533
5.7. SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS Y MEDIDAS DEL PAGA DURANTE LA REVERSIÓN 559
5.7.1. Conformación del Grupo de Gestión Ambiental 560
5.7.2. Capacitación y concientización para el personal de obra 560
5.7.3. Cumplimiento de Requerimientos Legales 561

5.7.4. Manejo Integral de Materiales de Construcción 562
5.7.5. Señalización en frentes de obra y sitios temporales 564
5.7.6. Manejo Y Disposición Final De Escombros.....567
5.7.7. Manejo y Disposición Final de Residuos Sólidos Convencionales y Especiales 568
5.7.8. Manejo de Aguas Superficiales 570
5.7.9. Manejo de Residuos Líquidos, Domésticos e Industriales 571
5.7.10. Manejo de descapote y cobertura vegetal 572
5.7.11. Protección de Fauna 573
5.7.12. Recuperación de Áreas Afectadas. 574
5.7.13. Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio. 575
5.7.14. Indicadores de Seguimiento ambiental UFI 4 y UFI 5 575
5.7.15. Indicadores de Seguimiento Ambiental UFI 1 578
5.7.16. Indicadores de seguimiento UFI 2 y 6.1 580
5.7.17. Indicadores de Seguimiento Ambiental UFI 8 583
5.7.18. Indicadores de Seguimiento Ambiental UFI 6 586
5.7.19. Indicadores de Seguimiento ambiental UFI 3.....588
5.7.20. Indicadores de Seguimiento ambiental UFI 7.3.....591
5.8. SEGUIMIENTO A LAS LICENCIAS AMBIENTALES 594
5.8.1. UFI 7.2 Variante Coveñas 594
5.8.2. Licencias Ambientales en cierre 594
6. GESTIÓN SOCIAL 595
6.1. OBJETIVOS 595
6.1.1. Objetivos Generales.....595
6.1.2. Objetivos Específicos 595
6.2. CONFORMACIÓN GRUPO GESTIÓN SOCIAL 596
6.3. CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS CONTRACTUALES.....597
6.4. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL CONTRACTUAL 599

6.4.1. Programa de atención al usuario 599
6.4.2. Programa de vinculación de mano de obra.....603
6.4.3. Recepción de hojas de vida 605
6.4.4. Programa de Educación y Capacitación al Personal Vinculado al Proyecto 605
6.4.5. Programa de Información y Participación Comunitaria 606
6.4.6. Programa de capacitación, educación y concientización de la comunidad aledaña al proyecto. 610
6.4.7. Programa de Apoyo a la Capacidad de Gestión Institucional..... 611
6.4.8. Programa de Arqueología Preventiva. 612
6.4.9. Programa de Cultura Vial 614
6.4.10. Programa de Acompañamiento a la Gestión Socio- Predial 615
6.5. PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL 618
6.6. DESARROLLO DE CONSULTAS PREVIAS EN LAS UF DEL PROYECTO632
6.6.1. Consulta Previa UF 7.1 Variante Lorica. 634
6.6.2. Consulta Previa UF 7.3 Perimetral Aeropuerto. 663
6.7. SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL DE LAS LICENCIAS AMBIENTALES EN FASE DE CONSTRUCCIÓN. 671
6.8. MATRIZ DE PUNTOS CRÍTICOS 675
6.9. PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA GESTIÓN SOCIAL EN LA ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 727
7. GESTIÓN PREDIAL..... 733
7.1 GENERALIDADES.....733
7.2 OBJETIVOS GENERALES 733
7.3 PREDIOS REQUERIDOS 734
7.4 SEGUIMIENTO DE PREDIOS QUE FUERON REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.....735
7.5 RESUMEN DEL ESTADO DE LA GESTIÓN PREDIAL.....736
7.6 ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN PREDIAL 740
7.6.1 Predios con Tiempos de Avalúo Mayores a 30 días:.....740

6.9.1. Predios con Promesa de Compraventa sin Avance 741
7.6.2 Predios para procesos de expropiación devueltos por la Interventoría 743
7.6.3 Estado De Predios Liberados Para La Ejecución De La Obra 744
7.7 TRAZABILIDAD PREDIAL 755
7.8 INDICADORES DE LA GESTIÓN PREDIAL 760
7.8.1 FORMULA INDICADOR 760
7.9 EXPEDIENTES EN PROCESO DE EXPROPIACIÓN 764
7.10 COMITÉ PREDIAL 765
7.11 SEGUIMIENTO A PREDIOS ESPECIALES (BALDÍOS) 770
7.12 SEGUIMIENTO SUBCUENTA PREDIAL 782
7.12.1 Seguimiento a recursos de subcuenta predial 782
7.12.2 Comités de previa aprobación 784
7.13 ESTADO DE ÁREAS REMANENTES DE LOS PREDIOS ADQUIRIDOS .787
7.14 HALLAZGOS 790
7.15 COMUNICADOS 790
7.16 SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PLANTEADAS POR EL CONCESIONARIO. 793
7.17 AVANCE EN EL SISTEMA IMPLEMENTADO POR LA ANI 794
8. INFORME FINANCIERO MENSUAL DE INTERVENTORÍA 795
8.1. ANTECEDENTES 797
8.2. INFORMACIÓN GENERAL 797
8.3. SITUACIÓN DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO A CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2026. 798
8.3.1. Giros Equity 799
8.4. CUENTA RECAUDO DE PEAJES 800
8.4.1. Subcuenta Recaudo de Peajes 803
8.4.2. Subcuenta Recaudo Peaje Retenciones Otrosí N. 17 806
8.4.3. Subcuenta Interventoría y Supervisión 811

8.4.4. Subcuenta Viáticos Contratos ANI 812
8.4.5. Subcuenta Soporte Contractual 813
8.4.6. Subcuenta Autónoma De Soporte 814
8.4.7. Subcuenta autónoma de soporte manguitos, caimanera y uf 6.3.2 Y UF 6.3.3 816
8.4.8. Subcuenta UF 6.3.2 y UF 6.3.3. 816
8.4.9. Subcuenta Perimetrales 820
8.4.10. Subcuenta MASC (Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias) 821
8.4.11. Subcuenta Excedentes ANI 823
8.4.12. Subcuenta Ingresos Por Explotación Comercial 825
8.4.13. Subcuenta Obras Menores 827
8.4.14. Subcuenta Predios 828
8.4.15. Subcuenta Compensaciones Ambientales 829
8.4.16. Subcuenta Redes 832
8.4.17. Subcuentas de la Financiación 834
8.5. FOSEVI 838
8.6. FONSECON 839
8.7. FONTUR 841
8.8. ESTADOS FINANCIEROS 842
8.8.1. Balance General 842
8.8.2. ACTIVO 845
8.8.3. PASIVO 849
8.8.4. PATRIMONIO 853
8.9. ESTADO DE RESULTADOS 859
8.9.1. Panorama general 860
8.9.2. INGRESOS TOTALES 861
8.9.3. GASTOS DE OPERACIÓN 863
8.9.4. COSTOS 864

8.10. INDICADORES FINANCIEROS 866
8.10.1. Fuentes y Usos 870
8.11. INFORME DE TRÁFICO Y RECAUDO 873
8.12. INGRESOS SUBCUENTA AUTÓNOMA DE SOPORTE 881
8.13. VPIP ACUMULADO 882
8.14. COMPARATIVA ESTRUCTURACIÓN VS EJECUCIÓN REAL 885
8.15. ACTAS CÁLCULO COMPENSACIÓN ESPECIAL, RETRIBUCIÓN Y COMPENSACIÓN POR RIESGO 885
8.16. ACTUALIZACIÓN SARLAFT 892
8.17. SALDO CUENTAS PROYECTO 893
8.18. PÓLIZAS DEL PROYECTO 893
8.18.1. Antecedentes 893
8.18.2. Oficio radicado 20260914013012 del 14 de septiembre de 2026 894
8.18.3. Estado de las pólizas de la Fase de Construcción 896
8.19. RESULTADO DE LA AUDITORÍA AL P.A. FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. 896
8.19.1. Objetivo de la Auditoría 896
8.19.2. Alcance de la Auditoría 897
8.19.3. Objetivo Específico 897
8.19.4. Criterios de la Auditoría 898
8.19.5. Fecha Auditada 898
8.19.6. Conclusiones 898
9. GESTIÓN DE LA INTERVENTORÍA 899
9.1. INFORMACIÓN GENERAL 899
9.2. MODIFICACIONES AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 899
9.3. PÓLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 899
9.4. PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA 900
9.5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA 905
9.5.1. Auditorías de Gestión ANI 905
9.5.2. Actividades Gestión Administrativa y Legal: 906

9.5.3. Actividades Gestión de Riesgos....906
9.5.4. Actividades Gestión Financiera....907
9.5.5. Actividades Gestión Técnica....908
9.5.6. Actividades Gestión Operativa....909
9.5.7. Actividades Gestión Social....911
9.5.8. Actividades Gestión Ambiental....915
9.5.9. Seguridad y Salud en el Trabajo SST:....916
10. CONCLUSIONES....919
10.1. GESTIÓN JURÍDICA....919
10.2. GESTIÓN DE RIESGOS....920
10.3. GESTIÓN FINANCIERA....921
10.4. TÉCNICA....931
10.5. GESTIÓN OPERATIVA....934
10.6. GESTIÓN SOCIAL....936
10.7. GESTIÓN AMBIENTAL....938

LISTA DE TABLAS

Tabla 2-1 Vías Concesionadas en el Proyecto Conexión Antioquia – Bolívar 32
Tabla 2-2 Distribución de Unidades Funcionales 34
Tabla 2-3 Descripción de la Unidad Funcional Integral 1 36
Tabla 2-4 Características geométricas y técnicas UFI 1 37
Tabla 2-5 Otros requerimientos Técnicos UFI 1 37
Tabla 2-6 Descripción de la Unidad Funcional 2 38
Tabla 2-7 Características geométricas y técnicas UFI 2 39
Tabla 2-8 Otros requerimientos Técnicos Unidad Funcional 2 39
Tabla 2-9 Descripción de la Unidad Funcional 3 43
Tabla 2-10 Características geométricas y técnicas Unidad Funcional 3 43
Tabla 2-11 Otros requerimientos Técnicos Unidad Funcional 3 44
Tabla 2-12 Descripción de la Unidad Funcional 4 46
Tabla 2-13 Características geométricas y técnicas UFI 4 46
Tabla 2-14 Otros requerimientos Técnicos Unidad Funcional 4 47
Tabla 2-15 Descripción de la Unidad Funcional 5 49
Tabla 2-16 Otros requerimientos Técnicos Unidad Funcional 5 49
Tabla 2-17 Descripción de la Unidad Funcional 6 51
Tabla 2-18 Características geométricas y técnicas Unidad Funcional 6 52
Tabla 2-19 Otros requerimientos Técnicos Unidad Funcional 6 53
Tabla 2-20 Descripción de la Unidad Funcional 7 54
Tabla 2-21 Características geométricas y técnicas Unidad Funcional 7 55
Tabla 2-22 Otros requerimientos Técnicos Unidad Funcional 7 55
Tabla 2-23 Descripción de la Unidad Funcional 8 57
Tabla 2-24 Características geométricas y técnicas UFI 8 57
Tabla 2-25 Otros requerimientos Técnicos Unidad Funcional 8 58
Tabla 3-1 Información General del Contrato de Concesión. 59
Tabla 3-2 Otrosí al Contrato de Concesión N° 016 / 2015. 60
Tabla 3-3 Plazos Actuales Contrato Concesión. 65
Tabla 3-5 Reclamaciones. 111
Tabla 4-1. Avances Estudios Y Diseños. 116
Tabla 4-2. Plan de Obras. 118
Tabla 4-3. Estado Pasos Peatonales. 120
Tabla 4-4 Estado UF2. 122
Tabla 4-5 Estado de la Unidad Funcional 2. 123
Tabla 4-6. Intersección 7. 132
Tabla 4-7. Pasos Peatonales. 133
Tabla 4-8. Pasos Peatonales. 133
Tabla 4-9 Pasos Peatonales. 135
Tabla 4-10 Estado de UF6. 144
Tabla 4-11. Pasos Peatonales. 145
Tabla 4-12 Pasos Peatonales. 149
Tabla 4-13 Pasos Peatonales. 154
Tabla 4-14. Pasos Peatonales. 160

Tabla 4-15 Pasos Peatonales. 160
Tabla 4-16 Pasos Peatonales. 162
Tabla 4-17 Pasos Peatonales. 163
Tabla 4-18 Pasos Peatonales. 165
Tabla 4-19 Pasos Peatonales. 168
Tabla 4-20 Intersecciones. 169
Tabla 4-21 Estado de Puentes. 170
Tabla 4-22 Estado de Redes. 172
Tabla 4-23 Presupuesto de Manejo de Redes no Objetado - 13 ENERO 2017 174
Tabla 4-24 Presupuesto de Manejo de Redes no Objetado. 174
Tabla 4-25 Diferencias Totales en Porcentajes. 175
Tabla 4-26 Traslado de Redes a la Subcuenta de Redes. 175
Tabla 4-27. Acta de Obras Menores Suscritas. 178
Tabla 4-28 Listado de Equipos de Medición Interventoría. ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 4-29. Actividades de mantenimiento ejecutadas – 01 al 30 de septiembre de 2026 184
Tabla 4-30. Bloqueos presentados durante el mes de septiembre de 2026 187
Tabla 4-31. Servicios prestados a los usuarios de la vía – septiembre de 2026 190
Tabla 4-32. Servicios Acumulados Mensuales – Año anterior y presente año 192
Tabla 4-33. Bases Operativas y Satelitales para Atención al Usuario 193
Tabla 4-34. Servicios atención al usuario por UFI – septiembre 2026 199
Tabla 4-35. Accidentalidad por Unidad Funcional 204
Tabla 4-36. Niveles de Accidentalidad Acumulada 207
Tabla 4-37. Relación de accidentes en el presente periodo 208
Tabla 4-38. Causas de accidentes en el presente periodo 210
Tabla 4-39. Distribución acumulada de víctimas por gravedad de los accidentes 214
Tabla 4-40. **Sectores críticos de accidentalidad segundo trimestre 2026** 217
Tabla 4-13. **Soporte reporte sectores críticos de siniestralidad** 219
Tabla 4-42. **Soporte reporte PECSO a la Supertransporte** 221
Tabla 4-43. **Relación de comunicaciones para mejorar la seguridad vial** 222
Tabla 4-44. Seguimiento a Convenio DITRA 224
Tabla 4-45. Estado Convenio DITRA 240
Tabla 4-46. Equipo mínimo a ser puesto a disposición de la policía de Carreteras 244
Tabla 4-47. Equipo mínimo a ser puesto a disposición de la policía de Carreteras 246
Tabla 4-48. Equipo mínimo a ser puesto a disposición de la policía de Carreteras 246
Tabla 4-49. Equipo mínimo a ser puesto a disposición de la policía de Carreteras 247
Tabla 4-50 Seguimiento reposición de elementos a la DITRA por vida útil de 1 año 249
Tabla 4-51. Seguimiento reposición de elementos a la DITRA por vida útil de 3 años 252
Tabla 4-52. Seguimiento reposición de elementos a la DITRA por vida útil de 4 años 253
Tabla 4-53. Seguimiento reposición de elementos a la DITRA por vida útil de 5 años 253
Tabla 4-54. Seguimiento reposición de elementos a la DITRA por vida útil de 7 años 255
Tabla 4-55. Vallas Informativas 258
Tabla 4-56. Obligaciones Contractuales UFI en Etapa Preoperativa (Niveles de Servicio) – Unidades Funcionales 2, 6 y 8 261
Tabla 4-57. Cumplimiento N.S. E6 262
Tabla 4-58. Cumplimiento Nivel de Servicio E8 264

Tabla 4-59. Cumplimiento N.S. E10 265
Tabla 4-60. Cumplimiento N.S. E11 267
Tabla 4-61. Cumplimiento Niveles de Servicio 268
Tabla 4-62. Obligaciones Contractuales para Indicadores en cada UFI en Etapa de Operación y Mantenimiento. 270
Tabla 4-35. Registro fotográfico de Cumplimiento Indicador E8 289
Tabla 4-64. Registro fotográfico de Cumplimiento Indicador E10 292
Tabla 4-65. Registro fotográfico de Cumplimiento Indicador E13 299
Tabla 4-66. Registro fotográfico de verificación Indicador E14 302
Tabla 4-67. Resumen Indicadores 311
Tabla 4-68. Resumen Indicadores de reversión 342
Tabla 4-69. Estaciones de Peaje y Pesaje Operativas 382
Tabla 4-70. Registro fotográfico estaciones de peaje 385
Tabla 4-71. Tarifa de Peajes 391
Tabla 4-72 Tránsito Vehicular Estación La Apartada 393
Tabla 4-73 Tránsito Vehicular Estación Manguitos 394
Tabla 4-74 Tránsito Vehicular Estación Mata de Caña 395
Tabla 4-75 Tránsito Vehicular Estación Caimanera 397
Tabla 4-76 Tránsito Vehicular Estación San Onofre 398
Tabla 4-77 Tránsito Vehicular Estación Purgatorio 400
Tabla 4-78 Tránsito Vehicular Estación Los Cedros 401
Tabla 4-79 Tránsito Vehicular Estación Los San Carlos 402
Tabla 4-80 tráfico según categoría vehicular 404
Tabla 4-81 Seguimiento del TPD mensual en las estaciones de peaje 406
Tabla 4-82 Especiales Estación de Peaje Manguitos 413
Tabla 4-83 Especiales Estación de Peaje Cedros 414
Tabla 4-84 Especiales Estación de Peaje Purgatorio 415
Tabla 4-85 Estación de Mata de Caña 416
Tabla 4-86 Estado Actual vehículos Especiales 417
Tabla 4-87 Recaudo Estación La Apartada 418
Tabla 4-88 Recaudo Estación Manguitos 419
Tabla 4-89 Recaudo Estación Mata de Caña 420
Tabla 4-90 Recaudo en Estación de Peaje Caimanera 421
Tabla 4-91 Recaudo Estación San Onofre 422
Tabla 4-92 Recaudo Estación Cedros 423
Tabla 4-93 Recaudo Estación Purgatorio 425
Tabla 4-94 Recaudo Estación San Carlos 426
Tabla 4-95 Recaudo Total por estación de peaje 427
Tabla 4-96 Recaudo Total por categoría vehicular 428
Tabla 4-97 Total Recaudo Acumulado por estación de peaje 429
Tabla 4-98 Sobrantes estaciones de Peajes 432
Tabla 4-99 Seguimiento a Instalación de TIE en estaciones de peaje 433
Tabla 4-100 Arqueo en caseta en la estación La Apartada 434
Tabla 4-101 Arqueo en caseta en la estación Manguitos 435
Tabla 4-102 Arqueo de caseta en la estación Mata de Caña 435

Tabla 4-103 Arqueo de caseta en la estación San Carlos 435
Tabla 4-104 Arqueo en caseta en la estación Purgatorio 436
Tabla 4-105 Arqueo en caseta en la estación Cedros 436
Tabla 4-106 Arqueo en caseta en la estación Caimanera 436
Tabla 4-107 Arqueo en caseta en la estación San Onofre 437
Tabla 4-108 Vehículos pesados en estaciones Manguitos I 437
Tabla 4-109 clasificación de vehículos con sobrepeso manguitos I 438
Tabla 4-110 Vehículos pesados en estaciones Manguitos 2 439
Tabla 4-111 clasificación de vehículos con sobrepeso manguitos II 440
Tabla 4-112 Vehículos pesados en estaciones San Onofre I 443
Tabla 4-113 clasificación de vehículos con sobrepeso San Onofre I 445
Tabla 4-114 Vehículos pesados en estaciones San Onofre II 446
Tabla 4-115 clasificación de vehículos con sobrepeso San Onofre II 447
Tabla 4-116 Vehículos pesados en estaciones Mata de Caña I 448
Tabla 4-117 clasificación de vehículos con sobrepeso Mata de Caña I 450
Tabla 4-118 Vehículos pesados en estaciones Mata de Caña II 451
Tabla 4-119 clasificación de vehículos con sobrepeso Mata de Caña II 453
Tabla 4-120. Fechas de la Auditoría realizada 456
Tabla 4-121. Confiabilidad 458
Tabla 4-122. Errores de detección por estaciones 459
Tabla 4-123. Registro fotográfico Novedades Peaje Apartada 461
Tabla 4-124. Registro fotográfico Novedades Peaje San Onofre 464
Tabla 4-125. Registro fotográfico Novedades Peaje Los Cedros 466
Tabla 4-126. Registro fotográfico Novedades Peaje Los Cedros 468
Tabla 4-127. Registro fotográfico Novedades Peaje Manguitos 472
Tabla 4-128. Registro fotográfico Novedades estación de pesaje Los Manguitos 475
Tabla 4-129. Registro fotográfico Novedades estación de pesaje Mata de Caña 478
Tabla 4-130. Estado hallazgos de la auditoria de sistemas en las estaciones de peajes y pesajes 481
Tabla 4-131. Estado Estaciones Meteorológicas 496
Tabla 5-1 Entrega de unidades funcionales – componente ambiental- 24 de agosto de 2026 499
Tabla 5-2 Entrega de unidades funcionales – componente ambiental- 25 de septiembre de 2026. 499
Tabla 5-3 Obligaciones Contractuales de documentos 500
Tabla 5-4 Requerimiento Contractual de estudios 501
Tabla 5-5 Avance trámites ambiental 503
Tabla 5-6 Relación de correspondencia recibida 520
Tabla 5-7 Relación de correspondencia de salida 523
Tabla 5-8 Avance de las compensaciones a agosto de 2026 526
Tabla 5-9 Compensaciones pendientes por cerrar a septiembre de 2026 529
Tabla 5-10 Pagos realizados a la orden de servicio 1222206. UFI 3.3 534
Tabla 5-11 Pagos realizados a la orden de servicio 1222206. UFI 3.5 534
Tabla 5-12. Reporte de valores ejecutados durante los cuatro (4) comités previa aprobación ambiental – agosto 2026 534
Tabla 5-13. Reporte de la fiducia a agosto de 2026 535

Tabla 5-14 Proyección presupuesto Comité 1 (junio-diciembre 2024)..... 536
Tabla 5-15 Pagos programados vs pagos realizados Comité 1 (junio-diciembre 2024) .. 536
Tabla 5-16 Proyección presupuesto Comité 2 (marzo – junio 2025) 537
Tabla 5-17 Resumen de valores conciliados presentados en el comité No. 2 538
Tabla 5-18 Pagos programados vs pagos realizados Comité 2 (enero 2025 a octubre 2025) 538
Tabla 5-19 Proyección presupuesto Comité 3..... 539
Tabla 5-20 Pagos programados vs pagos realizados Comité 3..... 539
Tabla 5-21. Actividades a ejecutar en el marco del 4to comité..... 540
Tabla 5-22 Actividades proyectadas para el 5to comité..... 543
Tabla 5-23 Actividades proyectadas para el 5to comité..... 545
Tabla 5-24 Costos asociados al quinto comité previa aprobación ambiental 546
Tabla 5-25 Oficios Generado en el marco de las compensaciones ambientales 547
Tabla 5-26 Consolidado Residuos generados 570
Tabla 5-27 Indicadores de seguimiento PAGA UFI 4 y 5. 576
Tabla 5-28 Indicadores de seguimiento PAGA UFI 1. 578
Tabla 5-29 Indicadores Paga UFI 2 y 6.1..... 581
Tabla 5-30 Indicadores de seguimiento PAGA UFI 8. 584
Tabla 5-31 Indicadores de seguimiento PAGA UFI 6 586
Tabla 5-32 Indicadores de seguimiento UFI 3..... 589
Tabla 5-33 Indicadores de seguimiento PAGA UFI 7.3. 592
Tabla 6-1 Personal Área Social del Concesionario Ruta Al Mar..... 597
Tabla 6-2 PGSC del Concesionario Ruta Al Mar..... 598
Tabla 6-3 Oficinas de Atención al Usuario Concesionario Ruta Al Mar 600
Tabla 6-4 PQRS Etapa de Reversión 602
Tabla 6-5 Discriminado de la contratación de la mano de obra..... 603
Tabla 6-6 Empleos Generados por Departamentos 604
Tabla 6-7 Monitoreo de medios 608
Tabla 6-8 Capacitaciones Autoridades Municipales y Organizaciones Sociales 611
Tabla 6-9 Recuperaciones de la zona del derecho de vía..... 611
Tabla 6-10 Capacitación para autoridades locales..... 611
Tabla 6-11 Indicadores de cumplimento del programa..... 613
Tabla 6-12 Hallazgos corredor concesionado mes de septiembre de 2026 613
Tabla 6-13 Solicitudes de Intervención arqueológica ante el ICANH..... 613
Tabla 6-14 Estado de Licencias IP Antioquia-Bolívar ICANH..... 614
Tabla 6-15 Comparativo Valores 615
Tabla 6-16 Consolidación general de la aplicación del catálogo de compensaciones socioeconómicas 617
Tabla 6-17 Seguimiento a la Gestión de los Trámites ante el Ministerio del Interior..... 620
Tabla 6-18 Desarrollo Consultas Previas Proyecto Antioquia-Bolívar 632
Tabla 6-19 Cronograma Consultas Previa Tutela 606 2019 UF 7.1 Construcción Variante Lorica 635
Tabla 6-20 Cronograma Consultas Previa Sentencia T – 63 de 2019 Consejo Comunitario Humberto Hernández..... 639
Tabla 6-21 Cronograma Consultas Previa resolución ST- 1260 de 09 diciembre 2020..... 640

Tabla 6-22 Comunidad CCN Humberto Hernández 642
Tabla 6-23 Comunidad CCN Barule..... 644
Tabla 6-24 Comunidad Indígena Bellavista..... 645
Tabla 6-25 Comunidad Indígena El Porvenir 648
Tabla 6-26 Cronograma Consultas Previa sentencia 2021.00081 Comunidad Zenú Guayabal649
Tabla 6-27 Comunidad Indígena Zenú Guayabal..... 650
Tabla 6-28 Cronograma Consultas Previa resolución ST- 1261 de 09 diciembre 2020..... 663
Tabla 6-29 Comunidad Indígena Isla Gallinazo..... 665
Tabla 6-30 Comunidad Indígena El Palmar 666
Tabla 6-31 Seguimiento Licencias fase construcción UF 7.2 Variante Coveñas y 7.3 Perimetral Aeropuerto de Tolú 672
Tabla 6-32 Matriz Puntos Críticos..... 676
Tabla 6-33 Matriz Puntos Críticos..... 677
Tabla 6-34 Seguimiento y Monitoreo de la Gestión Social en la Etapa de Operación y Mantenimiento 727
Tabla 6-35 Actividades en etapa de operación y mantenimiento 729
Tabla 6-36 Actividades en etapa de Reversión..... 731
Tabla 7-1 Comparación de Predios Requeridos año 2026. 734
Tabla 7-2 Estado Gestión Predial 737
Tabla 7-3 Entrega UF1 738
Tabla 7-4 Entrega UF3.1..... 738
Tabla 7-5 Entrega UF3.2..... 739
Tabla 7-6 Predios con novedad 740
Tabla 7-7 Predios con promesa de compraventa sin avance..... 742
Tabla 7-8 Predios No Disponibles UF-3-5..... 744
Tabla 7-9 Predios No Disponibles UF-2-1 Y UF-8-3..... 744
Tabla 7-10 Predio de Eventos Eximentes de Responsabilidad Solicitados 746
Tabla 7-11 trazabilidad cronológica de las comunicaciones..... 749
Tabla 7-12 Catálogo de los EER identificados en la matriz anexa IPAB-0524-2026.D (corte 31 de mayo de 2026)..... 751
Tabla 7-13 Trazabilidad Predial 756
Tabla 7-14 Indicadores De La Gestión Predial..... 760
Tabla 7-15 Indicadores De La Gestión Predial..... 761
Tabla 7-16 Indicadores De La Gestión Predial..... 761
Tabla 7-17 Indicadores De La Gestión Predial..... 762
Tabla 7-18 Indicadores De La Gestión Predial..... 762
Tabla 7-19 Indicadores De La Gestión Predial..... 763
Tabla 7-20 Indicadores De La Gestión Predial..... 763
Tabla 7-21 Estado Actual de los Expedientes De Expropiación 764
Tabla 7-22 Predios NO Disponible..... 764
Tabla 7-23 Comité Predial 766
Tabla 7-24 Seguimiento A Predios Especiales (Baldíos) 770
Tabla 7-25 Estado Actual de los Predios Baldíos..... 781
Tabla 7-26 Seguimiento a recursos de subcuenta predial..... 782
Tabla 7-27 Fondeo..... 783

Tabla 7-28 Comités de previa aprobación 784
Tabla 7-29 Comités de previa aprobación 786
Tabla 7-30 Comunicados 791
Tabla 7-31 ANISCOPIO 794
Tabla 8-1. Laudo Final. Caso CIRD No. 01-23-0002-8303 795
Tabla 8-2. Capital social 797
Tabla 8-3. Composición Accionaria Concesión Ruta al Mar 797
Tabla 8-4. Balance Equity 799
Tabla 8-5. Ingreso Neto por estación de peaje sin FOSEVI 800
Tabla 8-6. Recaudo por estación de peaje 802
Tabla 8-7. Ingresos y egresos de la Subcuenta de Recaudo de Peajes 803
Tabla 8-8. Ingresos y egresos de las Subcuentas de Peaje desagregados 803
Tabla 8-9. Resumen de ingresos por Unidad Funcional con FOSEVI 804
Tabla 8-10. Subcuenta Recaudo Peaje Retenciones Otrosí N. 17 807
Tabla 8-11. Reintegro por desistimiento tácito CAB-3-1-001 807
Tabla 8-12. Aplicación de Deducciones UF3 – Otrosí 17 808
Tabla 8-13. Retenciones Índice de Cumplimiento Predial UF3 y UF 8 809
Tabla 8-14. Subcuenta Interventoría y Supervisión 812
Tabla 8-15. Subcuenta de Interventoría y Supervisión. Ingresos y egresos 812
Tabla 8-16. Subcuenta Viáticos Contratos ANI 812
Tabla 8-17. Subcuenta Soporte Contractual 813
Tabla 8-18. Subcuenta Soporte Contractual ingresos y egresos 813
Tabla 8-19. Subcuenta Autónoma De Soporte 814
Tabla 8-20. Subcuenta Autónoma de Soporte 6.3.2 y 6.3.3 816
Tabla 8-21. Reconocimiento Otrosí 16 816
Tabla 8-22. Pagos actas del Otrosí No. 16 817
Tabla 8-23. Pagos Actas de Compensación 817
Tabla 8-24. Actas de compensación pendientes de pago 818
Tabla 8-25. Pagos Sub. Excedentes ANI - Sub. y Autónoma de soporte 819
Tabla 8-26. Subcuenta Perimetrales. Ingresos y Egresos 820
Tabla 8-27. Subcuenta MASC. Ingresos y Egresos 821
Tabla 8-28. Subcuenta MASC. Fondeos 821
Tabla 8-29. Subcuenta MASC. Fondeos anuales y semestrales 822
Tabla 8-30. Subcuenta Excedentes ANI. Ingresos y Egresos 824
Tabla 8-31. Pago actas de Compensación 824
Tabla 8-32. Subcuenta de Excedentes ANI desembolsos a 2025 825
Tabla 8-33. Histórico de ingresos Subcuenta Ingresos Por Explotación Comercial 826
Tabla 8-34. Subcuenta Ingresos Por Explotación Comercial. Ingresos y egresos 826
Tabla 8-35. Subcuenta Ingresos Por Explotación Comercial por UF 827
Tabla 8-36. Subcuenta Obras Menores. Ingresos y egresos 827
Tabla 8-37. Subcuenta Obras Menores. Actas pagadas 828
Tabla 8-38. Subcuenta de Predios. Ingresos y egresos 828
Tabla 8-39. Subcuenta de Predios. Fondeos 828
Tabla 8-40. Subcuenta de Predios. Histórico pago de actas 829
Tabla 8-41. Subcuenta Compensaciones Ambientales. Fondeos 830

Tabla 8-42. Subcuenta Compensaciones Ambientales. Ingresos y egresos 831
Tabla 8-43. Subcuenta Redes. Ingresos y egresos 832
Tabla 8-44. Subcuenta Redes. Valores ejecutados 833
Tabla 8-45. Subcuenta Redes. Actas aprobadas 833
Tabla 8-46. Subcuenta Redes. Fondeo 834
Tabla 8-47. Subcuentas Financiación 835
Tabla 8-48. Obligaciones leasing financieros y operativos 836
Tabla 8-49. Fuentes de financiación 836
Tabla 8-50. Emisión de bonos en el exterior 837
Tabla 8-51. Desembolsos 838
Tabla 8-52. Intereses causados y pagados 838
Tabla 8-53. Fondo de Seguridad Vial (FOSEVI) 839
Tabla 8-54. Pago FONSECON 839
Tabla 8-55. FONTUR 841
Tabla 8-56. Estado de situación Financiera. Agosto 2026 843
Tabla 8-57. Estado de resultados agosto 2026 859
Tabla 8-58. Indicadores Financieros agosto 2026 866
Tabla 8-59. Fuentes y Usos 870
Tabla 8-60. Estructura Tarifaria del 1 al 15 de enero 2026 con FOSEVI 874
Tabla 8-61. Estructura Tarifaria del 16 de enero de 2026 al 15 de enero de 2027 con FOSEVI 874
Tabla 8-62. Desglose de tarifas peaje La Apartada 875
Tabla 8-63. Desglose de tarifas peaje Los Manguitos 876
Tabla 8-64. Desglose de tarifas peaje Mata de Caña 876
Tabla 8-65. Desglose de tarifas peaje San Onofre 877
Tabla 8-66. Desglose de tarifas peaje Los Cedros 877
Tabla 8-67. Desglose de tarifas peaje San Carlos 878
Tabla 8-68. Desglose de tarifas peaje Purgatorio 878
Tabla 8-69. Informe de Tráfico agosto 2026 879
Tabla 8-70. Informe de Tráfico acumulado a agosto de 2026 880
Tabla 8-71. Histórico de Ingresos por peaje. Subcuenta Autónoma de Soporte 881
Tabla 8-72. Laudo Arbitral. Caso CIRD No. 01-23-0002-8303 883
Tabla 8-73. VPIP Acumulado a abril 2026 884
Tabla 8-74. VPIP Estructuración vs ejecución a abril 2026 885
Tabla 8-75. Actas de Retribución y Compensación Especial 886
Tabla 8-76. Actas de Compensación Especial. Saldos retenidos. 887
Tabla 8-77. Actas de Compensación de Riesgo pagadas 888
Tabla 8-78. Actas de Compensación Tarifaria 888
Tabla 8-79. Actas de Compensación Caimanera 889
Tabla 8-80. Actas de Compensación decreto 050 890
Tabla 8-81. Actas de Retribución, Compensación Especial y Compensación de riesgo 891
Tabla 8-82. Saldo cuentas proyecto 893
Tabla 8-83. Valores asegurados etapa de reversión 895
Tabla 9-1 Información General del Contrato de Interventoría 899
Tabla 9-2 Pólizas vigentes del Contrato de Interventoría No. VEJ-523-2026 900

Tabla 9-3 Personal Interventoría 900
Tabla 9-4 Recursos Interventoría Etapa Preoperativa Fase Construcción 904

LISTA DE FIGURAS

Figura 2-1 Localización General del Proyecto 31
Figura 2-2 Unidad Funcional UFI 1 36
Figura 2-3. Unidad Funcional UFI 2 38
Figura 2-4 Unidad Funcional UFI 3 40
Figura 2-5. Unidad Funcional UFI 3.1 41
Figura 2-6 Unidad Funcional UFI 3.2 41
Figura 2-7. Unidad Funcional UFI 3.3 41
Figura 2-8. Unidad Funcional UFI 3.4 42
Figura 2-9 Unidad Funcional UFI 3.5 42
Figura 2-10 Unidad Funcional UFI 4 45
Figura 2-11 Unidad Funcional UFI 4.1 45
Figura 2-12. Unidad Funcional UFI 4.2 46
Figura 2-13. Unidad Funcional UFI 5 48
Figura 2-14 Unidad Funcional UFI 5.1 48
Figura 2-15. Unidad Funcional UFI 5.1 49
Figura 2-16 Unidad Funcional UFI 6 51
Figura 2-17. Unidad Funcional UFI 7 54
Figura 2-18 Unidad Funcional UFI 8 56
Figura **4-1.** Sección Transversal de la Vía. 119
Figura 4-2. Especificación de la Vía. 122
Figura 4-3. Avance Acumulado Unidad Funcional 2. 125
Figura 4-4. Excavación y Demolición de Puente Trementino II 137
Figura 4-5. Actividades ejecutadas en el puente Trementino II 139

Figura 4-6. Fallas en el talud PR 7 +380 140
Figura 4-7 diseño de estabilización de talud 142
Figura 4-8. Reparaciones en el talud PR 7 +380 143
Figura 4-9 Sección Trasversal de la Vía 144
Figura 4-10. Avance Acumulado por Intervención. 147
Figura 4-11. Sección Transversal de la Vía. 149
Figura 4-12. Sección Transversal de la Vía. 151
Figura 4-13. Avance Acumulado Unidad Funcional 6.3.1. 156
Figura 4-14. Monitoreo a Puente la Ciénaga. PR36+850 PUENTE LA CAIMANERA 157
Figura 4-15. Avance Acumulado Unidad Funcional 6. 158
Figura 4-16. Sección Típica Construida. 159
Figura 4-17. Avance Acumulado Unidad Funcional 7. 161
Figura 4-18. Pavimento Construido. 164
Figura 4-19. Avance Acumulado Unidad Funcional 8.3. 167
Figura 4-20. Avance Acumulado Unidad Funcional 8. 168
Figura 4-21 Avance General. 171
Figura 5-1. Notificación de aplicación de pagos-Bancolombia. Jorge Bertel 533
Figura 5-2. Información incluida en la Carpeta 1 542

Figura 5-3. Información incluida en la carpeta 2 542
Figura 5-4. Información incluida en la Carpeta 3 542
Figura 5-5. Información incluida en la Carpeta 4 543

LISTA DE GRAFICAS

Grafica 1 Servicios de atención al usuario – 01 al 30 de septiembre 2026 189
Grafica 2 Servicios de atención al usuario por unidad funcional – 1 al 30 de septiembre 2026 200
Grafica 3 Accidentes por unidad funcional – 1 al 30 de septiembre 2026 206
Grafica 4 Clasificación de accidentes por causa 212
Grafica 5 Accidentes ocurridos años 2015 al 2021 213
Grafica 6 Accidentes ocurridos año 2022 a septiembre 2026 213
Grafica 7 Cantidad de fallecidos entre diciembre 2015 y septiembre 2026 214
Grafica 8 Gráfica de cumplimiento Indicador E1 274
Grafica 9 Gráficas de Cumplimiento Indicador E2 276
Grafica 10 Gráficas de Cumplimiento Indicador E3 278
Grafica 11 Gráficas de Cumplimiento Indicador E4 280
Grafica 12 Gráficas de Cumplimiento Indicador E5 282
Grafica 13 Gráficas de Cumplimiento Indicador E6 284
Grafica 14 Gráficas de Cumplimiento Indicador E7 286
Grafica 15 Gráficas de Cumplimiento Indicador E8 288
Grafica 16 Gráficas de Cumplimiento Indicador E10 291
Grafica 17 Gráficas de Cumplimiento Indicador E11 294
Grafica 18 Gráficas de Cumplimiento Indicador E12 296
Grafica 19 Gráfica de Cumplimiento Indicador E13 298
Grafica 20 Gráfica de Cumplimiento Indicador E14 301
Grafica 21 Gráfica de Cumplimiento Indicador E15 304
Grafica 22 Gráfica de Cumplimiento Indicador E16 306
Grafica 23 Gráfica Indicador de Mortalidad O1 308
Grafica 24 Gráfica Indicador de Disponibilidad del SICC - O6 310
Grafica 25 Trafico según categoría vehicular 405
Grafica 26 Seguimiento TPD Peaje La Apartada 408
Grafica 27 Seguimiento TPD Peaje Mata de Caña 409
Grafica 28 Seguimiento TPD Peaje San Onofre 409
Grafica 29 Seguimiento TPD Peaje Los Manguitos 410
Grafica 30 Seguimiento TPD Peaje Caimanera 410
Grafica 31 Seguimiento TPD Peaje Los Cedros 411
Grafica 32 Seguimiento TPD Peaje Purgatorio 411
Grafica 33 Seguimiento TPD Peaje San Carlos 412
Grafica 34 Sobrantes 433
Grafica 35 Empleos Generados en los Departamentos del Área Directa del Proyecto 604
Grafica 36 Areas Remanentes Adquiridos 787
Grafica 37 Areas Remanentes Adquiridos 788
Grafica 38 Areas Remanentes Adquiridos 789
Grafica 39 Areas Remanentes Adquiridos 789
Grafica 40. Activo corriente vs No corriente 845

Grafica 41. Pasivo corriente vs no corriente 849
Grafica 42. Pérdidas del ejercicio. Comparativo julio vs agosto 853
Grafica 43. Patrimonio total 855
Grafica 44. Pérdidas. Comparativo de julio vs agosto 2026 861

LISTADO DE ANEXOS

ANEXO N°1 Correspondencia.

ANEXO N°2 Obligaciones Contractuales.

ANEXO N°3 Gestión Jurídica.

ANEXO N°4 Gestión Financiera.

ANEXO N°5 Gestión Técnica.

ANEXO N°6 Gestión Operativa.

ANEXO N°7 Gestión Social.

ANEXO N°8 Gestión Ambiental.

ANEXO N°8 Gestión Predial.

INTRODUCCIÓN

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en el marco de la Ley 1508 de 2012 y el Decreto 1467 de 2012, adelantó la Licitación Pública No. VJ-VE-APP-IPV-006-2015, mediante la cual adjudicó, a través de la Resolución No. 1597 del 17 de septiembre de 2015, el Contrato de Concesión No. 016 de 2015 a Concesión Ruta al Mar S.A.S., cuya estructura accionaria está conformada por Construcciones El Cóndor S.A. (50 %), Infrared Infrastructure RAM S.L.U. (49,99985714 %) e Infrared Infrastructure RAM LP (0,000142857 %).

El Contrato, suscrito el 14 de octubre de 2015, tiene por objeto la financiación, construcción, mejoramiento, operación, mantenimiento y reversión del sistema vial para la conexión de los departamentos de Antioquia y Bolívar, con un plazo contractual de 34 años. No obstante, mediante laudo arbitral internacional proferido el 30 de abril de 2026 y notificado el 1 de mayo de 2026, en el marco del Caso CIRD No. 01-23-0002-8303, se declaró la terminación anticipada del Contrato, dando lugar al inicio de la Etapa de Reversión.

Por otro lado, la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI publicó en la plataforma transaccional de SECOP II el Aviso de Convocatoria, los estudios previos, el Proyecto de Pliego de Condiciones y los demás documentos que soportan el Proceso de Selección No. VJ-VEJ-CM-015-2025, bajo la modalidad de Concurso de Méritos Abierto de conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, cuyo objeto es “INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, MEDIOAMBIENTAL, SOCIO–PREDIAL, ADMINISTRATIVA, DE SEGUROS, RIESGOS, OPERATIVA, MANTENIMIENTO, ADMINISTRATIVA DE AFORO Y RECAUDO Y DE GESTIÓN DE CALIDAD AL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 016 DE 2015 DEL PROYECTO IP CONEXIÓN ANTIOQUÍA – BOLÍVAR.

Por medio de la Resolución número 20267030000925 del 2 de febrero de 2026, fue adjudicado el Contrato de Interventoría No VEJ-523-2026 a la firma CONSORCIO IPAB, conformada por conformado por ELSA TORRES ARENALES, identificada con cédula de ciudadanía: 63.323.375, con un porcentaje de participación del 60%, AEROVIAS INGENIERIA S.A.S identificado con NIT: 901143989-0, con un porcentaje de participación

del 20% y LA VIALIDAD LIMITADA, identificado con NIT: 860.003.342-8 con un porcentaje de participación del 20%.

Mediante la firma del Acta de Inicio, el 07 de febrero de 2026 suscrita con la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, se inició la ejecución del Contrato de Interventoría No VEJ-523-2026 de 03 de febrero de 2026.

Dando cumplimiento a lo previsto en el Contrato de Interventoría No. VEJ-523-2026 de 03 de febrero de 2026. Capítulo V, Cláusula 5.2 y Anexo Técnico 4, numeral 9.1.1, el presente documento incluye el informe de Interventoría que comprende el periodo entre el 1 y el 30 de septiembre de 2026 del Proyecto de Concesión Conexión Antioquia – Bolívar.

En el presente informe se refleja la situación actual del Contrato de Concesión de acuerdo con lo establecido en las obligaciones contractuales en cada una de las áreas de Gestión Técnica, Económica, Financiera, Contable, Jurídica, Medioambiental, Socio–Predial, Administrativa, de Seguros, Riesgos, Operativa, Mantenimiento, Administrativa de Aforo y Recaudo y de Gestión de Calidad.

El presente Informe Mensual de Interventoría toma como base la información y documentación contenidas en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP, información histórica suministrada por la ANI y la documentación que se ha venido consolidando por parte del Consorcio IPAB, instrumentos que han permitido el ejercicio de la interventoría durante lo corrido de su íter contractual.

1. OBJETO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN

El objeto del Contrato de Concesión N°016 de 2015, suscrito bajo un esquema de Asociación Público-Privada de Iniciativa Privada en los términos de la Ley 1508 de 2012, es el otorgamiento de una Concesión para la Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Sistema Vial para la Conexión de los departamentos Antioquia – Bolívar, en el cual el Concesionario por su cuenta y riesgo, debe ejecutar el Proyecto. El alcance físico del Proyecto se describe en la Parte Especial y en el Apéndice Técnico 1 conforme lo siguiente:

i) El mejoramiento de la calzada actual en los sectores Caucasia – Planeta Rica, los sectores Cereté – Lorica – Coveñas – Tolú – Tolú Viejo, y los sectores El Pueblito – San Onofre – Cruz del Viso.

ii) La construcción de un sector de la vía El 15 - San Carlos - Cereté y la vía Tolú – Pita Abajo – El Pueblito, así como las variantes que evitan los pasos urbanos para centros poblados como son las Variantes de Planeta Rica, de Cereté, de Lorica, y de Coveñas.

iii) La construcción de una segunda calzada en los sectores de la vía entre Cereté – Lorica

iv) La Operación vial y mantenimiento durante todo el plazo de la Concesión de los corredores que recibe del proyecto de Concesión Transversal de las Américas entre Montería – Arboletes – Puerto Rey, Santa Lucía – San Pelayo y Montería – El 15 – Planeta Rica.

v) Operación vial y mantenimiento durante todo el plazo de la Concesión de los corredores y sectores intervenidos y descritos en los numerales romanos i, ii, iii y iv anteriores.

El Contrato de Concesión está dividido en tres etapas así:

1.1. ETAPA PREOPERATIVA

El plazo previsto inicialmente para esta etapa era de 64 meses y su ejecución está prevista en dos fases:

Fase de Preconstrucción: Con una duración de 14 meses contempla el mantenimiento y operación de las vías entregadas al Concesionario y la elaboración de todos los Estudios y Diseños Definitivos Fase III, para construcción, así como la obtención de permisos y licencias ambientales requeridas para el inicio de la construcción.

Fase de Construcción: Con una duración estimada inicial de cincuenta (50) meses, contempló la intervención prevista para las ocho (8) Unidades Funcionales que componen el proyecto. Esta fase culminó como consecuencia de la Terminación Anticipada del Contrato de Concesión dispuesta mediante el Laudo Arbitral Internacional (Comercial), proferido el 30 de abril de 2026 y notificado a las partes el 1 de mayo de 2026.

Se resalta que, como consecuencia de la ocurrencia de diferentes eventos que afectaron los plazos previstos para la ejecución de las obras contractuales, y que fueron reconocidos y soportados mediante las correspondientes actas de Eventos Eximentes de Responsabilidad (EER), el plazo previsto para la Fase de Construcción fue objeto de las ampliaciones y ajustes establecidos en los respectivos documentos contractuales.

Desde el momento de la suscripción del Acta de Inicio y hasta la suscripción del Acta de Terminación de Unidad Funcional de cada una de las divisiones del proyecto, el Concesionario tendrá la obligación de operar las vías que le fueron entregadas de acuerdo con los principios establecidos en el Apéndice Técnico 2.

1.2. ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Contractualmente, se tiene contemplado el inicio de esta etapa con la suscripción de la última Acta de Terminación de la Unidad Funcional y se extenderá hasta la Fecha de Terminación de la Etapa de Operación y Mantenimiento, según se regula en la Sección 2.4(c) de la Parte General del Contrato de Concesión.

Las obligaciones del Concesionario relativas a la Operación y Mantenimiento de las Unidades Funcionales respecto de las cuales se hayan suscrito Acta de Terminación de

Unidad Funcional serán exigibles y estarán sujetas a todas las estipulaciones que en el Contrato se establecen para la Etapa de Operación y Mantenimiento en relación con dichas Unidades Funcionales. Por lo anterior, las garantías de cumplimiento en Etapa Preoperativa deberán amparar también las obligaciones de Operación y Mantenimiento de aquellas Unidades Funcionales respecto de las cuales se haya suscrito Acta de Terminación de Unidad Funcional.

1.3. ETAPA DE REVERSIÓN

La Etapa de Reversión inició el 2 de mayo de 2026, como consecuencia de la decisión adoptada por el Tribunal de Arbitramento mediante el Laudo Arbitral Internacional proferido dentro del Caso CIRD No. 01-23-0002-8303, mediante el cual se determinó la terminación anticipada del Contrato de Concesión.

Esta etapa se desarrollará hasta la suscripción del Acta de Reversión, mediante la cual se formalizará la entrega de los bienes, activos, información, documentación y demás elementos asociados al Proyecto, de conformidad con las obligaciones contractuales, los lineamientos establecidos y los requerimientos formulados por la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, el Instituto Nacional de Vías – INVÍAS y las demás entidades y organismos competentes que intervienen en el proceso de reversión.

En el marco de esta etapa, la Interventoría realiza el seguimiento y control de las actividades de Operación y Mantenimiento del corredor vial, verificando la continuidad y adecuada prestación de los servicios a cargo del Concesionario, así como el cumplimiento de las obligaciones contractuales que permanecen exigibles durante el periodo de transición y reversión. De igual manera, realiza el seguimiento al avance del cronograma de reversión, verificando el cumplimiento de los compromisos y requerimientos establecidos por las entidades competentes y reportando oportunamente los avances, situaciones identificadas y aspectos que requieran gestión o definición.

El estado y avance de las actividades correspondientes a esta etapa se presentan en el Estado General del Contrato de Concesión, numeral 3.2.5 – Estado Actual de la Etapa de Reversión, en el cual se consolida el seguimiento efectuado por la Interventoría a las principales actividades, compromisos, requerimientos y entregables asociados al proceso.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra localizado en los departamentos de Antioquia - Córdoba – Sucre y Bolívar, comprendiendo los sectores de Caucasia - Planeta Rica, Planeta Rica – Montería, Montería – Arboletes, Santa Lucia - San Pelayo, Montería – El 15, El 15 – Cerete, Cerete – Lorica – Coveñas – Tolú – Toluviejo, El Pueblito – San Onofre – Cruz del Viso, Variantes de Planeta Rica, Cereté, Coveñas, con una longitud aproximada de 498,49 Kilómetros. Atraviesa la jurisdicción de los municipios de Caucasia, La Apartada, Buenavista, Planeta Rica, Montería, Los Córdobas, Arboletes, San Carlos, Cereté, San Pelayo, Cotorra, Lorica, San Antero, Coveñas, Tolú, Toluviejo, San Onofre y Mahates.

A continuación, se presenta un esquema con la ubicación de los diferentes sectores que comprenden el Contrato de Concesión:



Figura 2-1 Localización General del Proyecto

En el Anexo 5.1 de la Gestión Técnica del presente informe, se incluye la Ficha del Proyecto, en la que se resume la descripción y los datos generales del mismo y se puede apreciar de mejor manera el esquema del proyecto.

2.2. ALCANCE DEL PROYECTO

Las vías en las cuales el Proyecto ha realizado algún tipo de intervención suman una longitud total estimada de 504,435 Kilómetros. En su recorrido el proyecto se desarrolla en los departamentos de Antioquia – Córdoba – Sucre y Bolívar. El propósito fundamental del corredor es desarrollar una vía primaria de altas especificaciones que garantice el fortalecimiento de la competitividad nacional uniendo los departamentos del centro y sur del país con el norte del país.

A la fecha se han revertido 5,945 Km al INVIAS, correspondientes a la Unidad Funcional 6 Subsector 3.3. Dicha reversión se dio mediante acta de reversión a partir del 01 de octubre de 2023, por lo cual, actualmente la longitud de vía a cargo del Concesionario es de **498,49** Kilómetros.

A continuación, se relacionan las vías existentes que fueron incorporadas al proyecto conforme los alcances pactados y las modificaciones que se han tenido en su desarrollo.

Tabla 2-1 Vías Concesionadas en el Proyecto Conexión Antioquia – Bolívar

Código de Vía (Nomenclatura)	Ente Competente	Origen	Destino	Longitud (Km)	Estado Actual	Soporte
2513	INVIAS	Caucasia PR 03+350	Planeta Rica PR 62+000	58,65	Vía Bidireccional Pavimentada	Resolución 06679 del 22/sep/2015
N/A	Municipio Montería	PR00+000	PR1+410	1,41	Vía Bidireccional en afirmado	Convenio 009 de 2017
N/A	Municipio San Carlos	PR01+410	PR10+000	8,59	Vía Bidireccional en afirmado	Convenio 024 de 2015
N/A	Gobernación de Córdoba	San Carlos PR22+500	Cereté PR32+000	9,5	Vía Bidireccional Pavimentada	Convenio 022 de 2015
2310	ANI (Transversal de las Americas)	Planeta Rica PR0+000	El 15 PR34+950	34,95	Vía Bidireccional Pavimentada	Acta de entrega del 23/ago/2017
2310	ANI (Transversal de las Americas)	El 15 PR34+950	Montería PR49+600	14,65	Calzada Izquierda Vía Unidireccional Pavimentada	Acta de entrega del 23/ago/2017 Acta de entrega 06/dic/2017

Tabla 2-1 Vías Concesionadas en el Proyecto Conexión Antioquia – Bolívar						
Código de Vía (Nomenclatura)	**Ente Competente**	**Origen**	**Destino**	**Longitud (Km)**	**Estado Actual**	**Soporte**
2310	ANI (Transversal de las Américas)	El 15 PR35+000	Montería PR49+600	14.60	Calzada derecha Vía Unidireccional Pavimentada	Acta entrega del 06/dic/2017 Acta de entrega del 30/may/2020
7401	ANI (Transversal de las Américas)	Puerto Rey PR0+000	Montería PR63+340	63,34	Vía Bidireccional Pavimentada	Acta de entrega del 23/ago./2017
21CR04	ANI (Transversal de las Américas)	Santa Lucia PR0+000	San Pelayo PR26+000	26	Vía Bidireccional Pavimentada	Acta de entrega del 23/ago./2017
2103	INVIAS	Cereté PR 10+764	Lorica PR 48+222	36	Vía Bidireccional Pavimentada	Resolución 06679 del 22/sep./2015
9004	INVIAS	Lorica PR 05+850	Porvenir (Coveñas) PR 23+300	17,5	Vía Bidireccional Pavimentada	Resolución 06679 del 22/sep/2015
9004	INVIAS	Coveñas PR 41+440	Tolú PR 43+355	1,9	Vía Bidireccional Pavimentada	Resolución 06679 del 22/sep/2015
9004	INVIAS	Coveñas PR 35+000	Tolú PR 41+440	6,44	Vía Bidireccional Pavimentada	Resolución 06679 del 22/sep./2015 Acta de entrega del 05/abr/2022
9004	INVIAS	Coveñas PR 43+355	Tolú PR 49+300	5,95	Vía Bidireccional Pavimentada	Resolución 06679 del 22/sep./2015 Acta de entrega del 05/abr/2022 **Revertida a INVIAS el 01 de octubre de 2023**
N/A	Gobernación de Sucre	Tolú A= PR05+650 C= PR21+800	El Pueblito B= PR17+700 D= PR24+650	24,35	Vía Bidireccional en afirmado	Convenio 023 de 2015 Otrosí 01 (1/03/2017) tramo A-B y C-D
9004	INVIAS	Tolú PR 49+453	Tolú Viejo PR 65+937	16,5	Vía Bidireccional Pavimentada	Resolución 06679 del 22/sep./2015
9004	INVIAS	El Pueblito PR 93+683	San Onofre PR 104+820	11,2	Vía Bidireccional Pavimentada	Resolución 06679 del 22/sep./2015
9005	INVIAS	San Onofre PR 00+000	Cruz del Viso PR 59+352	59,3	Vía Bidireccional Pavimentada	Resolución 06679 del 22/sep./2015

Fuente: Informe Final Interventoría CR Concesiones RAD.ANI 20264090245292 del 27 de febrero de 2026 - Actualizados conforme alcances pactados en el Otrosí 16 al Contrato de Concesión.

Para el proceso de diseño, construcción y operación, el corredor vial Concesionado, se ha dividido en ocho (8) unidades funcionales integrales que se describen a continuación:

Tabla 2-2 Distribución de Unidades Funcionales

Unidad Funcional Integral (UFI)	Subsector	Origen (nombre, abscisa, coordenadas)	Destino (nombre, abscisa, coordenadas)	Longitud aproximada origen destino (1)	Intervención prevista	Observación
UFI-1	1	Caucasia PR 03+350 X=872749.4848 Y=1376644.9338	Planeta Rica PR 62+000 X=835288.212 Y=1418729.525	58,6	Mejoramiento	No incluye Intervención en Puente del Rio San Jorge
UFI-2	1	Cereté PR 10+764 X=809954.897 Y=1477055.6749	Lorica PR 48+222 X=809162.8472 Y=1512218.1258	37	Construcción de Segunda Calzada	
UFI-3	1	Variante Planeta Rica PR 00+000 X=834443.9474 Y=1420245.3278	Variante Planeta Rica PR 04+53 X=834978.3088 Y=1423013.7133	4,5	Construcción	
	2	El 15 PR 00+000 X=813309.6020 Y=1447861.9930	Vía El 15 –San Carlos PR 10+000 X=819584.5183 Y=1455320.3397	10	Mejoramiento	
	3	Vía El 15 –Sn Carlos PR 10+000 X=819584.5183 Y=1455320.3397	San Carlos PR 22+500 X=820944.9797 Y=1467169.3538	12,5	Construcción	
	4	San Carlos PR 22+500 X=820944.9797 Y=1467169.3538	Cereté PR 31+990 X=816366.3359 Y=1474923.7743	9,5	Mejoramiento	
	5	Variante Cereté PR 00+000 X=814682.1199 Y=1475002.3657	Variante Cereté PR 05+600 X=809954.897 Y=1477055.6749	5,6	Construcción	
UFI-4	1	Montería PR 49+500 X=1130171.196 Y=1459766.468	Planeta Rica PR 0+000 X=834980.9672 Y=1423019.543	49,5	Operación y Mantenimiento	Calzada Derecha sector entre Montería y El 15
	2	Montería PR 49+731 X=1130171.196 Y=1459766.468	El 15 PR 34+950 X=1143183.515 Y=1448114.253	15	Operación y Mantenimiento	Calzada Izquierda
UFI-5	1	Puerto Rey (Arboletes) PR 00+000 X=1073036,020 Y=1474343,431	Montería PR 63+340 X=1130171.196 Y=1459766.468	63,5	Operación y Mantenimiento	
	2	Santa Lucía PR 00+000 X=1114600.696 Y=1470297.687	San Pelayo PR 26+000 X=1134376.253 Y=1482406.161	26	Operación y Mantenimiento	
UFI-6	1	Cereté PR 10+764 X=809954.897 Y=1477055.6749	Lorica PR 48+222 X=809162.8472 Y=1512218.1258	37	Mejoramiento	

Tabla 2-2 Distribución de Unidades Funcionales							
Unidad Funcional Integral (UFI)	Subsector		Origen (nombre, abscisa, coordenadas)	Destino (nombre, abscisa, coordenadas)	Longitud aproximada origen destino (1)	Intervención prevista	Observación
	2		Lorica PR 5+847 X=808953.6961 Y=1518449.6188	Coveñas PR 23+309 X=819426.4895 Y=1531439.9867	17	Mejoramiento	
	3	1	Coveñas PR 41+440 X=832183.7456 Y=1539208.5600	Tolú PR 43+355 X=833092.7925 Y=1540876.9826	1,9	Mejoramiento	
		2	Coveñas PR35+000	Coveñas PR41+440 X=832183.7456 Y=1539208.5600	6.44	Rehabilitación	Se adiciona al alcance del Contrato con alcance de rehabilitación y operación y mantenimiento por 10 años.
		3	Tolú PR 43+355 X=833092.7925 Y=1540876.9826	Tolú PR49+300	5.945	Intervención Prioritaria	Revertido a INVIAS el 1 de octubre del 2023
UFI-7	1		Variante Lorica PR 00+000 X=809162.8472 Y=1512218.1258	Variante Lorica PR 07+779 X=808953.6961 Y=1518449.6188	7,8	Construcción	
	2		Variante Coveñas PR 00+000 X=819426.4895 Y=1531439.9867	Variante Coveñas PR 21+550 X=832183.7456 Y=1539208.5600	21,6	Construcción	
	3		Tolú PR 00+000 X=833092.7925 Y=1540876.9826	Pueblito PR 27+950 X=847524.4634 Y=559720.0437	28	Construcción	
UFI-8	1		Tolú PR 49+453 X=835904.4824 Y=1544985.2296	Tolú Viejo PR 65+937 X=849784.6192 Y=1537371.0792	16,5	Mejoramiento	
	2		Pueblito PR 93+683 X=847524.4634 Y=1559720.0437	San Onofre PR 104+820 X=841646.0864 Y=1569449.4135	11,2	Mejoramiento	
	3		San Onofre PR 0+023 X=841646.0864 Y=1569449.4135	Cruz del Viso PR 59+352 X=872277.777 Y=1612725.206	59,3	Mejoramiento	

Fuente: Informe Final Interventoría CR Concesiones RAD.ANI 20264090245292 del 27 de febrero de 2026 – Alcance del Proyecto actualizado de acuerdo con el Otrosí N°9 para la UFI1 y UFI3.1, el Otrosí N°14 para la UF7.2 y UFI7.3 y Otrosí 16 para la UFI 6.3.

2.2.1. Unidad Funcional Integral (UFI) 1: Caucasia - Planeta Rica.



Figura 2-2 Unidad Funcional UFI 1

Fuente: Elaboración Propia – Vista de Google Earth desde enlace en página web Concesión Ruta al Mar https://www.rutaalmar.com/unidades-funcionales/ .

Tabla 2-3 Descripción de la Unidad Funcional Integral 1

Subsector	Origen (Nombre-Abscisa Coordenada))	Origen (Nombre - Abscisa - Coordenada))	Longitud aproximada	Intervención prevista	Observación
1	Caucasia PR 03+350 X=872801.0960 Y=1376611.8130	Planeta Rica PR 61+935 X=835343.6967 Y=1418662.46	58,65	Mejoramiento	No incluye Intervención en Puente sobre el Rio San Jorge

Fuente: Informe Final Interventoría CR Concesiones RAD.ANI 20264090245292 del 27 de febrero de 2026 y Apéndice 1- del Contrato de Concesión – Modificación Otrosí 14.

La Unidad Funcional tiene las siguientes características geométricas y requisitos técnicos:

Tabla 2-4 Características geométricas y técnicas UFI 1

Requisitos Técnicos	Subsector 1
Longitud Aproximada	58,65 km
Número de Calzadas mínimo (un)	1
Número de carriles por calzada mínimo (un)	2
Sentido de carriles (Uni o bidireccional)	Bidireccional
Ancho de Carril mínimo (m)	3,65
Ancho de Calzada mínimo (m)	7,30
Ancho de berma mínimo (m)	2,00
Tipo de berma (Berma- Berma)	Ext-int
Dimensiones de Ley 105 de 1993	si
Funcionalidad (Primaria-Secundaria)	Primaria
Acabado de la rodadura (Flexible -Rígido)	Flexible
Velocidad de diseño mínimo (km/h)	80,00
Radio mínimo (m)	230,00
Pendiente máxima (%)	6,00
Ancho mínimo del Corredor del Proyecto (m)	Existente

Fuente: Informe Final Interventoría CR Concesiones RAD.ANI 20264090245292 del 27 de febrero de 2026 y Apéndice 1 Alcance del proyecto.

Tabla 2-5 Otros requerimientos Técnicos UFI 1

REQUISITOS TÉCNICOS	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN
Intersecciones (Mínimas)	N.A.	
Estaciones de Peaje	La Apartada Los Manguitos (Nuevo)	Mejoramiento del existente (Apartada) Construcción de uno nuevo (Manguitos, asociado a la UFI 2)
Postes S.O. S	Cada 3 Km	Instalación alternada en ambos carriles de la vía con un sobre ancho de 1 mt y 10 mt de largo
Pasos Peatonales	Entrada a Nechí 1 La Apartada 2 Rusia 1 Buenavista 2 Plaza Bonita 1 Los Manguitos 1	Estos pasos peatonales deben permitir la circulación simultánea tanto de peatones, como de vehículos

Fuente: Interventoría CR Concesiones y Apéndice 1 Alcances del Proyecto.
Nota: A raíz de la suscripción del Otrosí N° 16 al Contrato de Concesión, se realizaron modificaciones en la tipología de los pasos peatonales proyectados.

2.2.2. Unidad Funcional Integral (UFI) 2: Cereté – Lorica



Figura 2-3. Unidad Funcional UFI 2
Fuente: Elaboración Propia – Vista de Google Earth desde enlace en página web Concesión Ruta al Mar https://www.rutaalmar.com/unidades-funcionales/ .

Tabla 2-6 Descripción de la Unidad Funcional 2

UNIDAD FUNCIONAL INTEGRAL 2 – UFI 2				
Subsector	**Origen** (Nombre - Abscisa - Coordenada)	**Origen** (Nombre - Abscisa - Coordenada)	**Longitud aproximada**	**Intervención prevista**
1	Cereté PR10+764 X=809954.897 Y=1477055.6749	Lorica PR 48+222 X=809162.8472 Y=1512218.1258	37	Construcción de Segunda Calzada

Fuente: Informe Final Interventoría CR Concesiones RAD.ANI 20264090245292 del 27 de febrero de 2026 y Apéndice 1 Alcance del proyecto.

La Unidad Funcional tiene las siguientes características geométricas y requisitos técnicos:

Tabla 2-7 Características geométricas y técnicas UFI 2	
UNIDAD FUNCIONAL INTEGRAL 2- UFI 2	
REQUISITOS TÉCNICOS	**SUBSECTOR 1**
Longitud Aproximada	37,00
Número de Calzadas mínimo (un)	1,00
Número de carriles por calzada mínimo (un)	2,00
Sentido de carriles (Uni o bidireccional)	Unidireccional
Ancho de Carril mínimo (m)	3,65
Ancho de Calzada mínimo (m)	7,30
Ancho de berma mínimo (m)	2,5 – 1,0
Tipo de berma (Berma- Berma)	Ext - Int
Dimensiones de Ley 105 de 1993	Si
Funcionalidad (Primaria-Secundaria)	Primaria
Acabado de la rodadura (Flexible -Rígido)	Flexible
Velocidad de diseño mínimo (km/h)	80,00
Radio mínimo (m)	230,00
Pendiente máxima (%)	6,00
Ancho mínimo de separador Central (m)	4,0
Ancho mínimo derecho de vía (m) (Modificado Mediante Otrosí No.15)	20 m contados a partir del eje de la calzada exterior, más lo requerido para la construcción del carril interior, la berma y el separador central que colinda con la UFI 6.1
Excepciones Ancho mínimo derecho de vía (m) (Incorporado Mediante Otrosí No.15)	5 metros a lado y lado de la vía en los pasos urbanos

Fuente: Informe Final Interventoría CR Concesiones RAD.ANI 20264090245292 del 27 de febrero de 2026 y Apéndice 1 Alcance del Proyecto – modificaciones otrosíes 10 y 15

Tabla 2-8 Otros requerimientos Técnicos Unidad Funcional 2		
REQUISITOS TÉCNICOS	**DESCRIPCIÓN**	**OBSERVACIÓN**
Intersecciones que como mínimo debe desarrollar el Concesionario	4 retornos	
Variantes	N. A	
Estaciones de Peaje	Peaje Existente Mata de Caña	Construcción de Infraestructura en Segunda Calzada
Postes S.O. S	Cada 3 Km	Instalación alternada en ambas calzadas sobre las bermas externas

Fuente: Informe Final Interventoría CR Concesiones RAD.ANI 20264090245292 del 27 de febrero de 2026 y Apéndice 1 Alcance del Proyecto

2.2.3. Unidad Funcional Integral (UFI) 3: Variante Planeta Rica; El Quince – San Carlos – Cereté y Variante Cereté



Figura 2-4 Unidad Funcional UFI 3
Fuente: Informe Final Interventoría CR Concesiones RAD.ANI 20264090245292 del 27 de febrero de 2026.



Figura 2-5. Unidad Funcional UFI 3.1
Fuente: Elaboración Propia – Vista de Google Earth desde enlace en página web Concesión Ruta al Mar https://www.rutaalmar.com/unidades-funcionales/ .



Figura 2-6 Unidad Funcional UFI 3.2
Fuente: Elaboración Propia – Vista de Google Earth desde enlace en página web Concesión Ruta al Mar https://www.rutaalmar.com/unidades-funcionales/ .

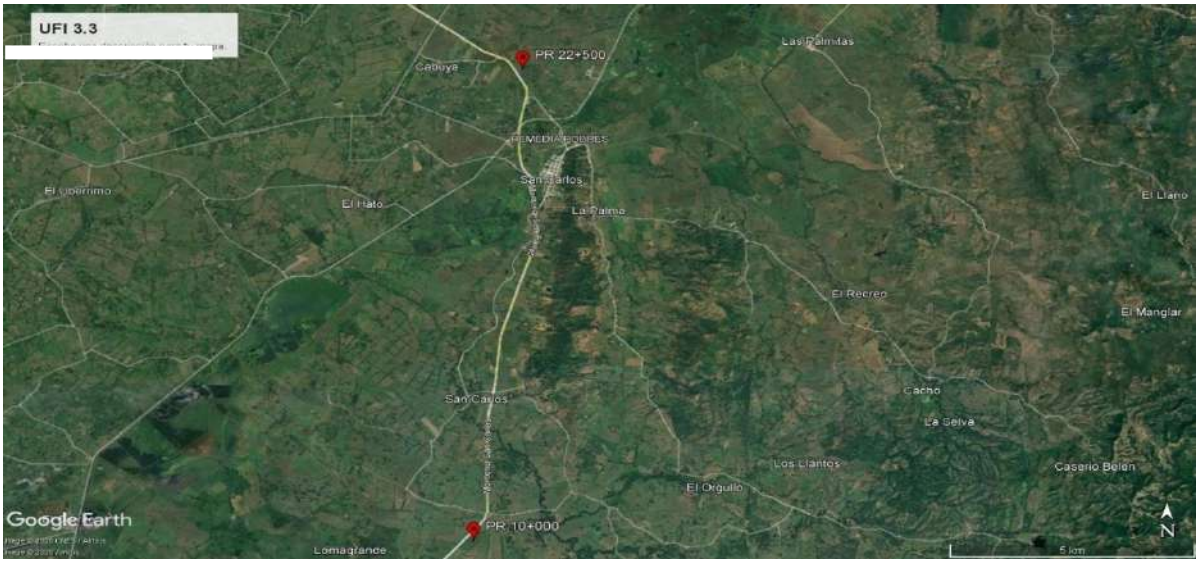


Figura 2-7. Unidad Funcional UFI 3.3
Fuente: Elaboración Propia – Vista de Google Earth desde enlace en página web Concesión Ruta al Mar https://www.rutaalmar.com/unidades-funcionales/ .

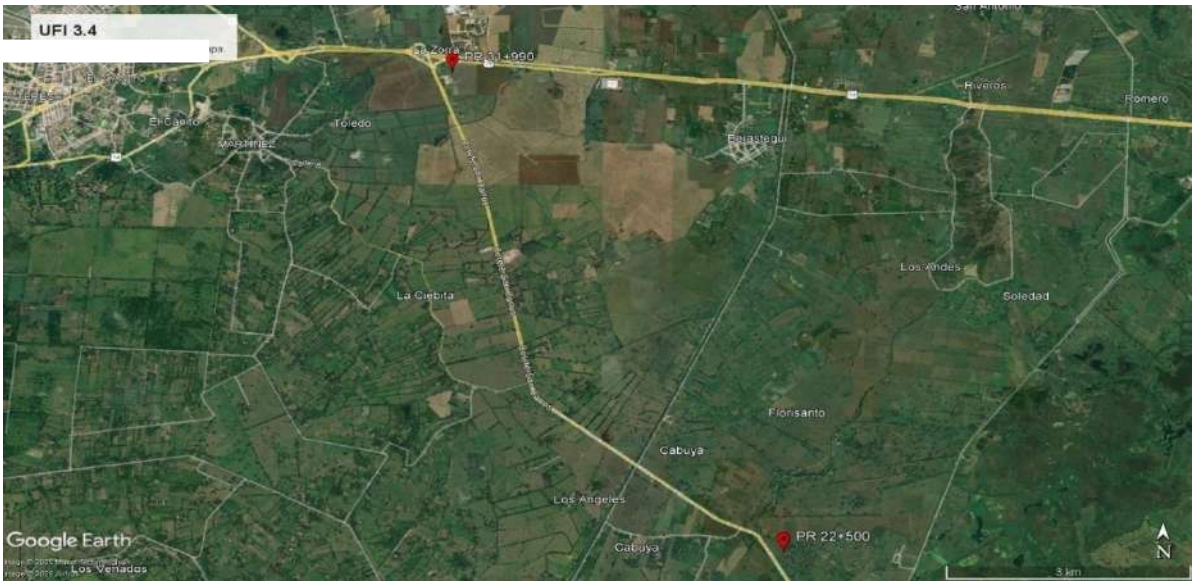


Figura 2-8. Unidad Funcional UFI 3.4

Fuente: Elaboración Propia – Vista de Google Earth desde enlace en página web Concesión Ruta al Mar https://www.rutaalmar.com/unidades-funcionales/ .



Figura 2-9 Unidad Funcional UFI 3.5

Fuente: Elaboración Propia – Vista de Google Earth desde enlace en página web Concesión Ruta al Mar https://www.rutaalmar.com/unidades-funcionales/ .

Tabla 2-9 Descripción de la Unidad Funcional 3

UNIDAD FUNCIONAL INTEGRAL – UFI 3				
Subsector	**Origen** (Nombre - Abscisa - Coordenada))	**Origen** (Nombre - Abscisa - Coordenada))	**Longitud aproximada**	**Intervención prevista**
1	Variante Planeta Rica PR 00+000 X=835343.8967 Y=1418662.46	Variante Planeta Rica PR 04+530 X=834978.3088 Y=1423013.7133	4,5	Construcción
2	El 15 PR 00+000 X=813309.6020 Y=1447861.9930	Vía El 15 –Sn Carlos PR 10+000 X=819584.5183 Y=1455320.3397	10	Mejoramiento
3	Vía El 15 – San Carlos PR 10+000 X=819584.5183 Y=1455320.3397	San Carlos PR 22+500 X=820944.9797 Y=1467169.3538	12,5	Construcción
4	San Carlos PR 22+500 X=820944.9797 Y=1467169.3538	Cereté PR 31+990 X=816366.3359 Y=1474923.7743	9,5	Mejoramiento
5	Variante Cereté PR 00+000 X=814682.1199 Y=1475002.3657	Variante Cereté PR 05+600 X=809954.897 Y=1477055.6749	5,6	Construcción

Fuente: Informe Final Interventoría CR Concesiones RAD.ANI 20264090245292 del 27 de febrero de 2026 y Apéndice 1- Pliegos Concesionario

La Unidad Funcional tiene las siguientes características geométricas y requisitos técnicos:

Tabla 2-10 Características geométricas y técnicas Unidad Funcional 3

UNIDAD FUNCIONAL INTEGRAL 3 - UFI 3					
	SUBSECTORES				
REQUISITOS TÉCNICOS	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
Longitud Aproximada	4,530	10,00	12,5	9,5	5,6
Número de Calzadas mínimo (un)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Número de carriles por calzada mínimo (un)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Sentido de carriles (Uni o bidireccional)	Bidirecc.	Bidirecc.	Bidirecc.	Bidirecc	Bidirecc.
Ancho de Carril mínimo (m)	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65
Ancho de Calzada mínimo (m)	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30
Ancho de berma mínimo (m)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Tipo de berma (Berma- Berma)	Ext - Int	Ext - Int	Ext - Int	Ext - Int	Ext - Int
Dimensiones de Ley 105 de 1993	Si	Si	Si	Si	Si
Acabado de la rodadura (Flexible -Rígido)	Flexible	Flexible	Flexible	Flexible	Flexible

UNIDAD FUNCIONAL INTEGRAL 3 - UFI 3					
	SUBSECTORES				
REQUISITOS TÉCNICOS	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
Velocidad de diseño mínimo (km/h)	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Radio mínimo (m)	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
Pendiente máxima (%)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Ancho mínimo del Corredor del Proyecto (m)	60	Existente*	60*	Existente	60

Fuente: Informe Final Interventoría CR Concesiones RAD.ANI 20264090245292 del 27 de febrero de 2026 y Apéndice 1 Alcance del Proyecto

* **Nota:** El ancho mínimo del corredor del proyecto para esta UF, fue corregido mediante el Otrosí No.6 del 22 de julio de 2016 ya que presentaba inconsistencias.

Tabla 2-11 Otros requerimientos Técnicos Unidad Funcional 3

REQUISITOS TÉCNICOS	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN
Intersecciones que como mínimo debe desarrollar el Concesionario	1. Variante Planeta Rica 2. Variante Planeta Rica (2) 3. Variante el 15 4. Variante el 15 (2) 5. Intersección Variante Cerete	1. Caucasia Planeta Rica Montería Sincelejo 2. Caucasia Planeta Rica Montería Sincelejo 3. Tierralta Montería Cereté 4. Tierralta Montería Cereté 5. Cereté La Y Lorica Montería
Variantes a Centros Poblados que como mínimo debe desarrollar el Concesionario	Variante Planeta Rica Variante Cereté	4,5 km 5,6 km
Estaciones de Peaje	San Carlos: Estación de Control al peaje Purgatorio	Construcción de Infraestructura nueva
Pasos Peatonales	1 en Variante Planeta Rica 1 en Entrada Carrizal 2 en Entrada a San Carlos 1 en Entrada a Cereté 1 en Entrada a Caracas	Los pasos peatonales deben permitir la circulación simultanea tanto de peatones como de vehículos

Fuente: Informe Final Interventoría CR Concesiones RAD.ANI 20264090245292 del 27 de febrero de 2026 y Apéndice 1 Alcances del Proyecto

Nota: A raíz de la suscripción del Otrosí N° 16 al Contrato de Concesión, se realizaron modificaciones en la tipología de los pasos peatonales proyectados.

2.2.4. Unidad Funcional Integral (UFI) 4: Planeta Rica – Montería

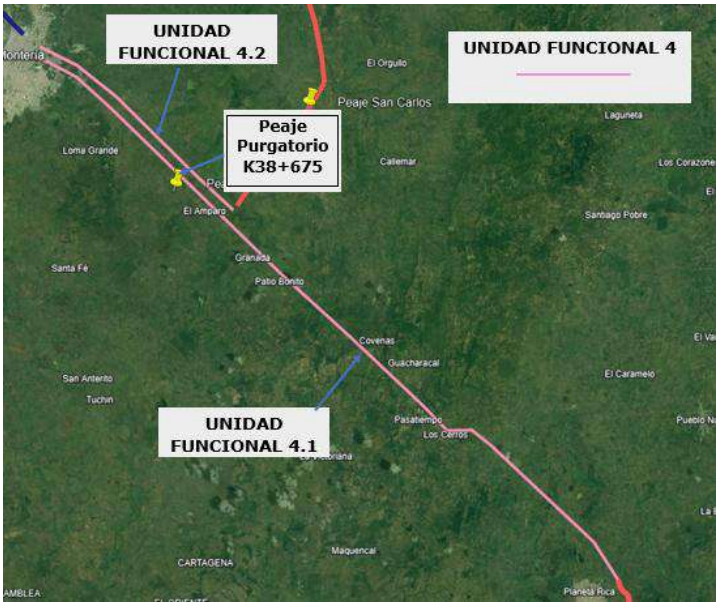


Figura 2-10 Unidad Funcional UFI 4

Fuente: Informe Final Interventoría CR Concesiones RAD.ANI 20264090245292 del 27 de febrero de 2026.

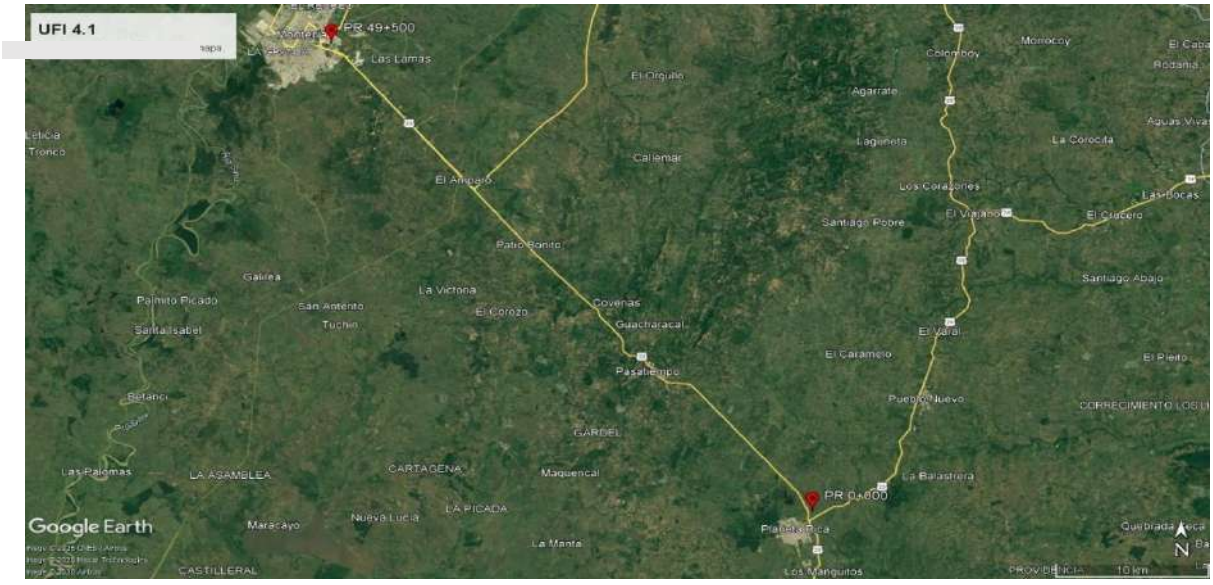


Figura 2-11 Unidad Funcional UFI 4.1

Fuente: Elaboración Propia – Vista de Google Earth desde enlace en página web Concesión Ruta al Mar https://www.rutaalmar.com/unidades-funcionales/

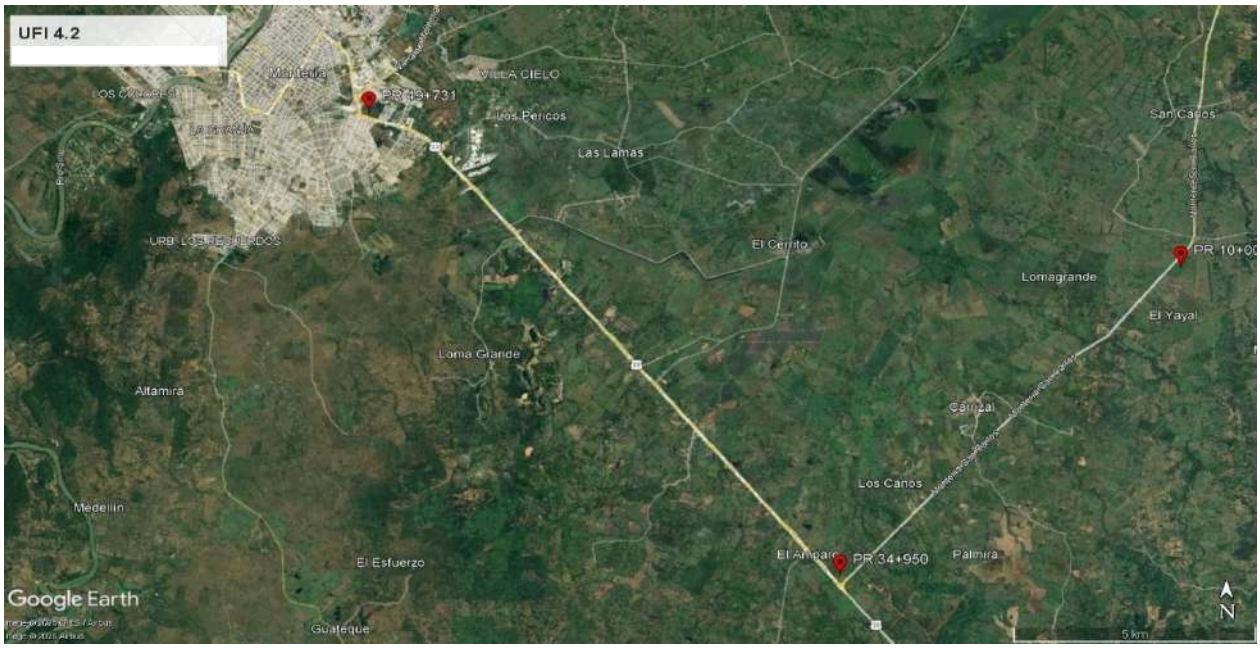


Figura 2-12. Unidad Funcional UFI 4.2

Fuente: Elaboración Propia – Vista de Google Earth desde enlace en página web Concesión Ruta al Mar https://www.rutaalmar.com/unidades-funcionales/

Tabla 2-12 Descripción de la Unidad Funcional 4

Unidad Funcional Integral – UFI 4					
Subsector	**Origen**(Nombre - Abscisa - Coordenada))	**Origen**(Nombre - Abscisa - Coordenada))	**Longitud aproximada**	**Intervención prevista**	**Observación**
1	Montería PR 49+500 X=1130171.196 Y=1459766.468	Planeta Rica PR 0+000 X=834980.9672 Y=1423019.543	49,5	Operación y Mantenimiento	Calzada Derecha sector entre Montería y El 15
2	Montería PR 49+731 X=1130171.196 Y=1459766.468	El 15 PR 34+950 X=1143183.515 Y=1448114.253	15	Operación y Mantenimiento	Calzada Izquierda

Fuente: Informe Final Interventoría CR Concesiones RAD.ANI 20264090245292 del 27 de febrero de 2026 y Apéndice 1 del Contrato de Concesión

La Unidad Funcional tiene las siguientes características geométricas y requisitos técnicos:

Tabla 2-13 Características geométricas y técnicas UFI 4

UNIDAD FUNCIONAL INTEGRAL 4 - UFI 4		
	SUBSECTORES	
REQUISITOS TÉCNICOS	**1**	**2**
Longitud Aproximada	49,50	15,00

UNIDAD FUNCIONAL INTEGRAL 4 - UFI 4		
	SUBSECTORES	
REQUISITOS TÉCNICOS	1	2
Número de Calzadas mínimo (un)	1,00	1,00
Número de carriles por calzada mínimo (un)	2,00	2,00
Sentido de carriles	Unidireccional, Bidireccional	Unidireccional
Ancho de Carril mínimo (m)	3,65	3,65
Ancho de Calzada mínimo (m)	7,30	7,30
Ancho de berma mínimo (m)	Existente	Existente
Tipo de berma (Berma – Berma) *	Ext – Int	Ext - Int
Dimensiones de Ley 105 de 1993	Si	Si
Funcionalidad (Primaria-Secundaria)	Primaria	Primaria
Acabado de la rodadura (Flexible -Rígido)	Flexible	Flexible
Velocidad de diseño mínimo (km/h)	80,00	80,00
Radio mínimo (m)	230,00	230,00
Pendiente máxima (%)	6,00	6,00
Ancho mínimo del Corredor del Proyecto (m)	Existente	Existente

Fuente: Apéndice 1 -*Ancho de berma modificado en Otrosí No. 10

Tabla 2-14 Otros requerimientos Técnicos Unidad Funcional 4

REQUISITOS TÉCNICOS	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN
Intersecciones	N.A.	N.A.
Variantes	N.A.	N.A.
Estaciones de Peaje	Peaje Purgatorio	Traslado de peaje al K38+700
Postes S.O. S	Recibidos de Transversal de las Américas	Instalación alternada en ambas calzadas sobre las bermas externas
Pasos Peatonales	- Entrada a la Carolina - Entrada de Patio Bonito - Entrada Tamarindo	

Fuente: Informe Final Interventoría CR Concesiones RAD.ANI 20264090245292 del 27 de febrero de 2026 y Apéndice 1- Alcance del Proyecto – Actualizado Otrosí 13 al Contrato de Concesión
Nota: A raíz de la suscripción del Otrosí N° 16 al Contrato de Concesión, se realizaron modificaciones en la tipología de los pasos peatonales proyectados.

2.2.5. Unidad Funcional Integral (UFI) 5: Puerto Rey – Montería; Santa Lucia – San Pelayo.



Figura 2-13. Unidad Funcional UFI 5
Fuente: Elaboración Propia – Vista de Google Earth desde enlace en página web Concesión Ruta al Mar
https://www.rutaalmar.com/unidades-funcionales/



Figura 2-14 Unidad Funcional UFI 5.1
Fuente: Elaboración Propia – Vista de Google Earth desde enlace en página web Concesión Ruta al Mar
https://www.rutaalmar.com/unidades-funcionales/

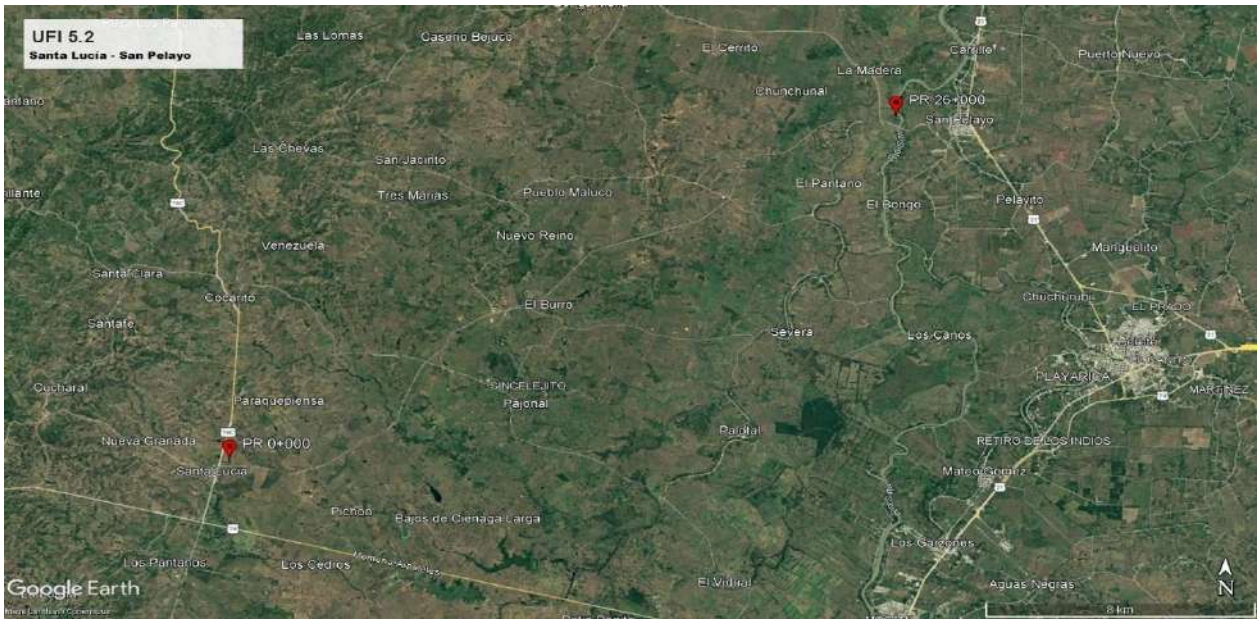


Figura 2-15. Unidad Funcional UFI 5.1

Fuente: Elaboración Propia – Vista de Google Earth desde enlace en página web Concesión Ruta al Mar https://www.rutaalmar.com/unidades-funcionales/

Tabla 2-15 Descripción de la Unidad Funcional 5

UNIDAD FUNCIONAL INTEGRAL 5 (UFI 5)				
Subsector	**Origen (Nom – Abs - Coor)**	**Destino(Nombre - Abscisa - Coordenada))**	**Longitud aproximada**	**Intervención prevista**
gtf1	Puerto Rey PR 00+000 X=1073036.020 Y=1474343.431	Montería PR63+340 X=1130171.196 Y=1459766.468	63,5	Operación y Mantenimiento
2	Santa Lucia PR00+000 X=1114600.696 Y=1470297.687	San Pelayo PR26+000 X=1134376.253 Y=1482406.161	26	Operación y Mantenimiento

Fuente: Informe Final Interventoría CR Concesiones RAD.ANI 20264090245292 del 27 de febrero de 2026 y Apéndice 1- Pliegos Concesionario

La Unidad Funcional tiene las siguientes características geométricas y requisitos técnicos:

Tabla 2-16 Otros requerimientos Técnicos Unidad Funcional 5

REQUISITOS TÉCNICOS	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN
Intersecciones (Mínimas)	N.A.	N.A.
Variantes a Centros Poblados (Mínimas)	N.A.	N.A.
Estaciones de Peaje	Los Cedros	Traslado de Peaje al K41+100

REQUISITOS TÉCNICOS	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN
Postes S.O. S	Recibidos de la Concesión Transversal de las Américas	Instalación alternada en ambas calzadas sobre las bermas externas
Pasos Peatonales	1 en María Santana 1 entrada los Córdobas 2 en el Ébano 1 en Holanda 1 entrada Santa Lucia 2 Santa Lucia 2 en San Pelayo	Los pasos peatonales deben permitir la circulación simultanea tanto de peatones como de vehículos

Fuente: Informe Final Interventoría CR Concesiones RAD.ANI 20264090245292 del 27 de febrero de 2026 y Apéndice 1- Alcance del Proyecto- Actualizado con Otrosí No. 13.
Nota: A raíz de la suscripción del Otrosí N° 16 al Contrato de Concesión, se realizaron modificaciones en la tipología de los pasos peatonales proyectados.

2.2.6. Unidad Funcional Integral (UFI) 6: Cereté – Lorica; Lorica – Coveñas; Coveñas – Tolú

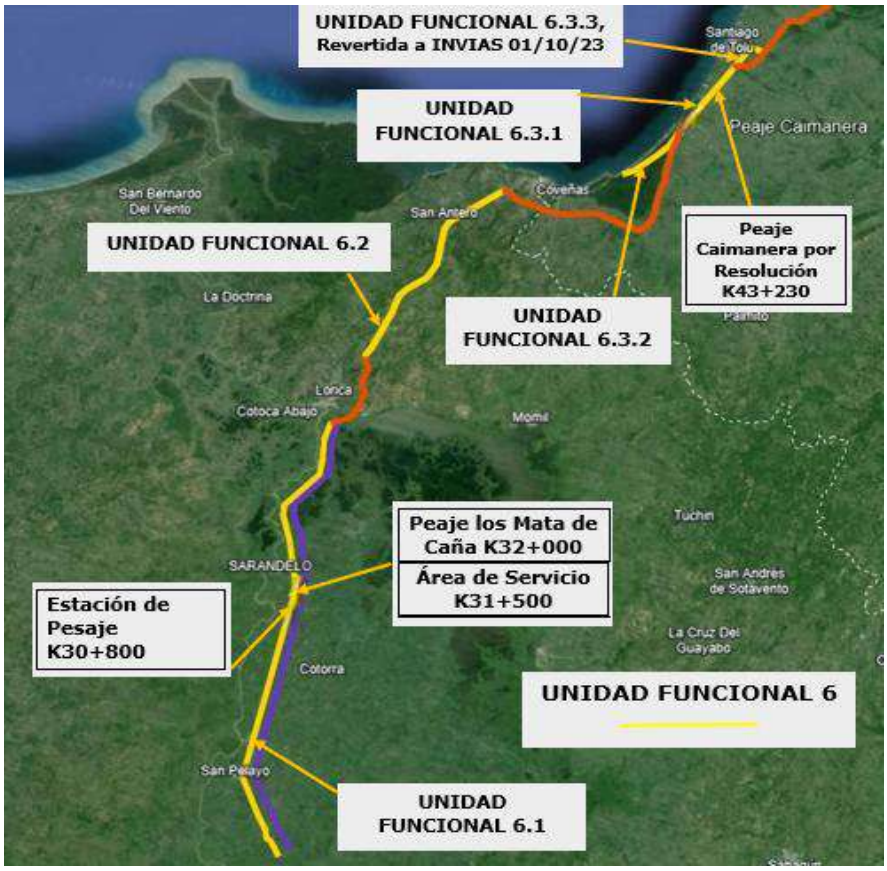


Figura 2-16 Unidad Funcional UFI 6

Fuente: Informe Final Interventoría CR Concesiones RAD.ANI 20264090245292 del 27 de febrero de 2026

Tabla 2-17 Descripción de la Unidad Funcional 6

UNIDAD FUNCIONAL INTEGRAL 6 (UFI 6)				
Subsector	**Origen (Nom – Abs - Coor)**	**Destino (Nom – Abs - Coor)**	**Longitud aproximada**	**Intervención prevista**
1	Cereté PR 10+764 X=809954.897 Y=1477055.6749	Lorica PR 48+222 X=809162.8472 Y=1512218.1258	37	Mejoramiento
2	Lorica PR 5+847 X=808953.6961 Y=1518449.6188	Coveñas PR 23+309 X=819426.4895 Y=1531439.9867	17	Mejoramiento
3	Coveñas PR 41+440 X=832183.7456 Y=1539208.5600	Tolú PR 43+355 X=833092.7925 Y=1540876.9826	1.9	Mejoramiento

UNIDAD FUNCIONAL INTEGRAL 6 (UFI 6)				
Subsector	**Origen (Nom – Abs - Coor)**	**Destino (Nom – Abs - Coor)**	**Longitud aproximada**	**Intervención prevista**
	Coveñas PR 35+000	Coveñas PR 41+440 X=832183.7456 Y=1539208.5600	6.44	Rehabilitación
	Tolú PR 43+355 X=833092.7925 Y=1540876.9826	Tolú PR 49+300	5.945	Puesta a punto

Fuente: Informe Final Interventoría CR Concesiones RAD.ANI 20264090245292 del 27 de febrero de 2026 y Apéndice 1- actualizado de acuerdo con el Otro sí N°14 y Otrosí 16.

La Unidad Funcional tiene las siguientes características geométricas y requisitos técnicos:

Tabla 2-18 Características geométricas y técnicas Unidad Funcional 6

UNIDAD FUNCIONAL INTEGRAL 6 - UFI 6					
	SUBSECTORES				
REQUISITOS TÉCNICOS	**1**	**2**	**3.1**	**3.2**	**3.3**
Longitud Aproximada	37,00	17,00	1,9	6.44	5.945
Número de Calzadas mínimo (un)	1	1	1	1	1
Número de carriles por calzada mínimo (un)	2	2	2	2	2
Sentido de carriles	Unidireccional	Bidireccional	Bidireccional	Bidireccional	Bidireccional
Ancho de Carril mínimo (m)	3,65	3,65	3,65	Existente	Existente
Ancho de Calzada mínimo (m)	7,30	7,30	7,30	Existente	Existente
Ancho de berma mínimo (m)	2.0 Ext - 1.0 Int	2,00	2,00	Existente	Existente
Tipo de berma (Berma-Berma)	Ext - Int	Ext - Int	Ext - Int	N/A	N/A
Dimensiones de Ley 105 de 1993	Si	Si	Si	NO	NO
Funcionalidad (Primaria-Secundaria)	Primaria	Primaria	Primaria	Primaria	Primaria
Acabado de la rodadura (Flexible -Rígido)	Flexible	Flexible	Flexible	Flexible	Flexible
Velocidad de diseño mínimo (km/h)	80,00	80,00	80,00	Existente	Existente
Radio mínimo (m)	230,00	230,00	230,00	Existente	Existente
Pendiente máxima (%)	6,00	6,00	6,00	Existente	Existente
Excepciones Ancho mínimo derecho de vía (m)	5 metros a lado y lado de la vía en los pasos urbanos	N/A	N/A	N/A	N/A
Ancho mínimo del Corredor del Proyecto (m) (Incorporado Mediante Otrosí No.15)	Existente	Existente	Existente	Existente	Existente

Fuente: Informe Final Interventoría CR Concesiones RAD.ANI 20264090245292 del 27 de febrero de 2026 y Apéndice 1- del Contrato de Concesión modificado por otrosí 16

Nota: Mediante el Otrosí No. 15 del 19 de diciembre de 2019, se incorporan las excepciones al ancho mínimo derecho de vía en los pasos urbanos en las UFI 2 y UFI 6.1. Así mismo en Otrosí No. 16 del 24 de noviembre de 2021, se incluyen los subsectores 6.3.2 y 6.3.3 de la Unidad Funcional 6.

Tabla 2-19 Otros requerimientos Técnicos Unidad Funcional 6

REQUISITOS TÉCNICOS	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN
Intersecciones (Mínimas)		N.A.
Variantes a Centros Poblados (Mínimas)	N.A.	N.A.
Estaciones de Peaje	Caimanera	Estación de peaje nueva
Postes S.O. S	Cada 3 Km	Instalación alternada en ambas calzadas sobre las bermas externas
Pasos Peatonales	2 Entrada Pelayito - 4 San Pelayo - 2 Entrada a Cotorra - 2 Entrada Mata de Caña - 1 entrada Sarandelo - 1 entrada a Cotorra 1 entrada a La Palma - 1 Entrada a Nuevo Agrado - 6 San Antero 1 El Porvenir - 3 Playas Coveñas 2 Tolú	Los pasos peatonales deben permitir la circulación simultanea tanto de peatones como de vehículos

Fuente: Informe Final Interventoría CR Concesiones RAD.ANI 20264090245292 del 27 de febrero de 2026 y Apéndice 1- Alcance del Proyecto

Nota 1: A raíz de la suscripción del Otrosí N° 16 al Contrato de Concesión, se realizaron modificaciones en la tipología de los pasos peatonales proyectados.

Nota 2: Teniendo en cuenta el modelo financiero entregado por el Concesionario en sus ejercicios conforme lo pactado en el Otrosí N°14, se encontró que el peaje Mata de Caña está asociado financieramente a la Unidad Funcional 6.

2.2.7. Unidad Funcional Integral (UFI) 7: Variante Lorica; Variante Coveñas; Tolú – Pueblito



Figura 2-17. Unidad Funcional UFI 7

Fuente: Informe Final Interventoría CR Concesiones RAD.ANI 20264090245292 del 27 de febrero de 2026 sobre Mapa de Google maps

Tabla 2-20 Descripción de la Unidad Funcional 7

UNIDAD FUNCIONAL INTEGRAL 7 (UFI 7)					
Subsector	**Origen (nombre, abscisa, coordenadas)**	**Destino (nombre, abscisa, coordenadas)**	**Longitud aproximada origen destino (1)**	**Intervención prevista**	**Observación**
1	Variante Lorica PR 00+000 X=809162.8472 Y=1512218.1258	Variante Lorica PR 07+779 X=808953.6961 Y=1518449.6188	7,8	Construcción	Incluye tres (3) intersecciones a nivel para accesos a Lorica y a Chinú
2	Variante Coveñas PR 00+000 X=819426.4895 Y=1531439.9867	Variante Coveñas PR 21+550 X=832183.7456 Y=1539208.5600	21,6	Construcción	Incluye tres (3) intersecciones a nivel para accesos a Coveñas
3	Tolú PR 00+000 X=833092.7925 Y=1540876.9826	Pueblito PR 27+950 X=847524.4634 Y=559720.0437	28	Construcción	Incluye tres (3) intersecciones a nivel para accesos a Tolú, Tolú Viejo y a Pita

Fuente: Informe Final Interventoría CR Concesiones RAD.ANI 20264090245292 del 27 de febrero de 2026 y Apéndice 1- actualizado de acuerdo con el Otrosí N°14

La Unidad Funcional tiene las siguientes características geométricas y requisitos técnicos:

Tabla 2-21 Características geométricas y técnicas Unidad Funcional 7

UNIDAD FUNCIONAL INTEGRAL 7 - UFI 7			
	SUBSECTORES		
REQUISITOS TÉCNICOS	1	2	3
Longitud Aproximada	7,80	21,6	28
Número de Calzadas mínimo (un)	1	1	1
Número de carriles por calzada mínimo (un)	2	2	2
Sentido de carriles	Bidireccional	Bidireccional	Bidireccional
Ancho de Carril mínimo (m)	3,65	3,65	3,65
Ancho de Calzada mínimo (m)	7,30	7,30	7,30
Ancho de berma mínimo (m)	2,00	2,00	2,00
Tipo de berma (Berma- Berma)	Ext - Int	Ext - Int	Ext - Int
Dimensiones de Ley 105 de 1993	Si	Si	Si
Funcionalidad (Primaria-Secundaria)	Primaria	Primaria	Primaria
Acabado de la rodadura (Flexible -Rígido)	Flexible	Flexible	Flexible
Velocidad de diseño mínimo (km/h)	80,00	80,00	80,00
Radio mínimo (m)	230,00	230,00	230,00
Pendiente máxima (%)	6,00	6,00	6,00
Ancho mínimo del Corredor del Proyecto (m)	60	60	60

Fuente: Informe Final Interventoría CR Concesiones RAD.ANI 20264090245292 del 27 de febrero de 2026 y Apéndice 1- Pliegos Concesionario y Otrosí N°14

Tabla 2-22 Otros requerimientos Técnicos Unidad Funcional 7

REQUISITOS TÉCNICOS	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN
Intersecciones (Mínimas)	Variante Lorica 1 Variante Lorica 2 Variante Lorica 3 Variante Coveñas 1 Variante Coveñas 2 Variante Coveñas 3 Tolú – Pueblito 1 Tolú – Pueblito 2 Tolú – Pueblito 3	Intersecciones a nivel.
Variantes a Centros Poblados (Mínimas)	Lorica Coveñas	
Estaciones de Peaje	N/A	

REQUISITOS TÉCNICOS	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN
Postes S.O. S	Cada 3 Km	Instalación alternada en ambas calzadas sobre las bermas externas
Pasos Peatonales	1 Entrada Purísima 1 Punta Seca 1 Entrada Torrente 2 Pita Abajo 1 Pita Arriba 1 Entrada a Toluviejo	Los pasos peatonales deben permitir la circulación simultanea tanto de peatones como de vehículos

Fuente: Informe Final Interventoría CR Concesiones RAD.ANI 20264090245292 del 27 de febrero de 2026 y Apéndice 1- Alcance del Proyecto

Nota: A raíz de la suscripción del Otrosí N° 16 al Contrato de Concesión, se realizaron modificaciones en la tipología de los pasos peatonales proyectados.

2.2.8. Unidad Funcional Integral (UFI) 8: Tolú – Tolú Viejo; Pueblito – Cruz del Viso

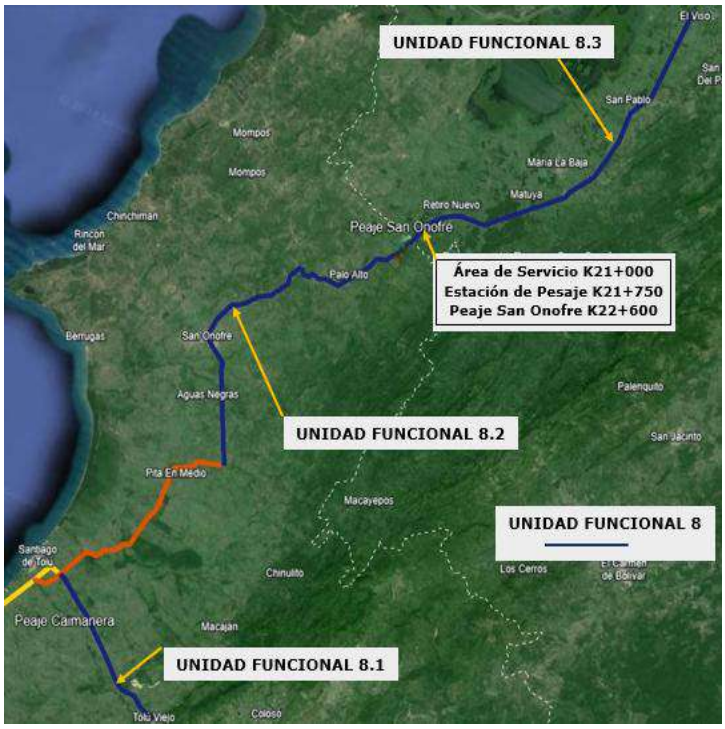


Figura 2-18 Unidad Funcional UFI 8

Fuente: Interventoría CR Concesiones.

Tabla 2-23 Descripción de la Unidad Funcional 8

UNIDAD FUNCIONAL INTEGRAL 8 (UFI 8)					
Subsector	**Origen (nombre, abscisa, coordenadas)**	**Destino (nombre, abscisa, coordenadas)**	**Longitud aproximada origen destino (1)**	**Intervención prevista**	**Observación**
1	Tolú PR 49+453 X=835904.4824 Y=1544985.2296	Tolú Viejo PR 65+937 X=849784.6192 Y=1537371.0792	16,5	Mejoramiento	
2	Pueblito PR 93+683 X=847524.4634 Y=1559720.0437	San Onofre PR 104+820 X=841646.0864 Y=1569449.4135	11,2	Mejoramiento	
3	San Onofre PR 0+023 X=841646.0864 Y=1569449.4135	Cruz del Viso PR 59+352 X=872277.777 Y=1612725.206	59,3	Mejoramiento	Incluye una intersección a nivel para accesos a la vía Carreto - Gambote

Fuente: Informe Final Interventoría CR Concesiones RAD.ANI 20264090245292 del 27 de febrero de 2026 y Apéndice 1- Contrato de Concesión

La Unidad Funcional tiene las siguientes características geométricas y requisitos técnicos:

Tabla 2-24 Características geométricas y técnicas UFI 8

UNIDAD FUNCIONAL INTEGRAL 8 - UFI 8			
	SUBSECTORES		
REQUISITOS TÉCNICOS	**1**	**2**	**3**
Longitud Aproximada	16,50	11,20	59,30
Numero de Calzadas mínimo (un)	1	1	1
Número de carriles por calzada mínimo (un)	2	2	2
Sentido de carriles	Bidireccional	Bidireccional	Bidireccional
Ancho de Carril mínimo (m)	3,65	3,65	3,65
Ancho de Calzada mínimo (m)	7,30	7,30	7,30
Ancho de berma mínimo (m)	2,00	2,00	2,00
Tipo de berma (Berma- Berma)	Ext - Int	Ext - Int	Ext - Int
Dimensiones de Ley 105 de 1993	Si	Si	Si
Funcionalidad (Primaria-Secundaria)	Primaria	Primaria	Primaria
Acabado de la rodadura (Flexible - Rígido)	Flexible	Flexible	Flexible
Velocidad de diseño mínimo (km/h)	80,00	80,00	80,00
Radio mínimo (m)	230,00	230,00	230,00
Pendiente máxima (%)	6,00	6,00	6,00
Ancho mínimo del Corredor del Proyecto (m)	Existente	Existente	Existente

Fuente: Apéndice 1- Pliegos Concesionario

Tabla 2-25 Otros requerimientos Técnicos Unidad Funcional 8

REQUISITOS TÉCNICOS	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN
Intersecciones (Mínimas)	San Onofre – Cruz del Viso	Intersección a nivel en Cruz del Viso.
Estaciones de Peaje	San Onofre	
Postes S.O. S	Cada 3 Km	Instalación alternada en ambas calzadas sobre las bermas externas
Pasos Peatonales	2 Tolú 2 Salida Tolú – Toluviejo 5 San Onofre 1 Pajonal 2 Palo Alto 1 Pueblo Nuevo 1 entrada Retiro Nuevo 1 entrada El Playón 1 Entrada Nueva esperanza 1 Planta Biodiesel Marial la Baja 2 entrada Bella Vista 1 entrada María la Baja 1 La Curva 1 Paso el Tiempo 2 San Pablo 1 Cruz del Viso	Los pasos peatonales deben permitir la circulación simultanea tanto de peatones como de vehículos

Fuente: Informe Final Interventoría CR Concesiones RAD.ANI 20264090245292 del 27 de febrero de 2026 Apéndice 1- Alcance del Proyecto

Nota: A raíz de la suscripción del Otrosí 16 al Contrato de Concesión, se realizaron modificaciones en la tipología de los pasos peatonales proyectados.

3. CONTRATO DE CONCESIÓN

3.1. GENERALIDADES

La siguiente tabla contiene el resumen de la información general del Contrato de Concesión.

Tabla 3-1 Información General del Contrato de Concesión.

CONTRATO DE CONCESIÓN	
Contrato No	016 del 14 de octubre de 2015
Concesionario:	CONCESIÓN RUTA AL MAR S.A.S. Estructura plural CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. con el 50%, INFRARED INFRAESTRUCTURE RAM S.L.U con el 49,99985714 % e INFRARED INFRAESTRUCTURE RAM LP con el 0,000142857 %
Objeto:	Financiación, construcción, mejoramiento, operación y mantenimiento y reversión del sistema vial para la conexión de los departamentos Antioquia – Bolívar
Valor:	$2.752.552.193.011
Plazo:	34 años.
Plazo Etapa Preoperativa	10,8 años. (según Plan de Obras versión 15)
Plazo Etapa de Operación y Mantenimiento	23,2 años.
Fecha Orden de Iniciación:	27 de noviembre de 2015
Declaratoria de terminación anticipada del contrato de Concesión:	30 de abril de 2026 (Mediante laudo arbitral internacional proferido para el Caso CIRD No. 01-23-0002-8303, notificado el 01 de mayo de 2026).

3.2. ESTADO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN

El 14 de octubre de 2015 se suscribió el Contrato de Concesión N° 016 de 2015, entre la Agencia Nacional de Infraestructura y la CONCESIÓN RUTA AL MAR S.A.S, el cual tiene por objeto: "CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y REVERSIÓN DEL SISTEMA VIAL PARA LA CONEXIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS ANTIOQUIA – BOLÍVAR - Contrato que fue resultado del proceso de Licitación Pública No VJ-VE-APP-IPV-006-2015.

Cabe señalar que el 02 de mayo de 2026 la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI y el Concesionario fueron notificados del laudo arbitral internacional proferido dentro del Caso CIRD No. 01-23-0002-8303, el cual dispuso –entre otros- declarar *"(...) la Terminación Anticipada del Contrato con ocasión de la configuración de las siguientes cuatro causales de Terminación Anticipada: (i) causal referente al retraso en la terminación de las UF 2, 6, 7 y 8 prevista en la Sección 14.1(e) del Contrato; (ii) causal referente a la no obtención de la Licencia Ambiental para la construcción de la Variante Lorica prevista en la Sección 8.1(h) del Contrato; (iii) causal referente a las medidas de afectación de la Estructura Tarifaria y el agotamiento de los MCR prevista en la Sección 17.2(b)(iii) en relación con la Sección 3.4(i).(ii)(5) del Contrato; y (iv) causal referente a la Estación de Peaje Carimagua prevista en la Sección 17.2(b)(iv)(1) del Contrato"*.

3.2.1. Modificaciones al Contrato de Concesión

En la siguiente tabla, se resumen las modificaciones efectuadas a través de otrosíes al Contrato de Concesión N°016 de 2015.

Tabla 3-2 Otrosí al Contrato de Concesión N° 016 / 2015.

N°	ESTADO	ÁREA	CONCEPTOS INTERVENTORÍA		CAPITULO DEL CONTRATO MODIFICADO	OBJETO
			RADICADO	FECHA		
1	Firmado el 13-ene-2016	Jurídica	CI-023/AB0010/16/5.3	12-ene-16	Capítulo XV del Contrato de Concesión 016-2015	Amplia la fecha para el nombramiento de los amigables componedores, se modifica el procedimiento para su nombramiento y se corrige la nomenclatura de las cláusulas correspondientes.

Tabla 3-2 Otrosí al Contrato de Concesión N° 016 / 2015.						
N°	**ESTADO**	**ÁREA**	**CONCEPTOS INTERVENTORÍA**		**CAPITULO DEL CONTRATO MODIFICADO**	**OBJETO**
			RADICADO	**FECHA**		
2	Firmado el 25-feb-2016	Operaciones	CI-023/AB0022 /16/5.3	11-feb-16	Sección 3.3.9.2 del Apéndice Técnico 2	**1.** Amplia a seis (6) meses el término para la entrega de los bienes que se detallan en la tabla No 1 – Equipo Mínimo a ser Puesto a Disposición de la Policía de Carreteras - **2.** Crea subcuenta DITRA
3	Firmado el 11-abr-2016	Financiera	CI.023/AB00 63/16/5.3	04-abr-16	Sección 4.2(c) y Sección 4.2(a) del Contrato Parte Especial	Cambia lo relacionado con el IPCt-1 y en relación con la actualización de la tarifa de las Estaciones de Peaje de San Carlos, La Caimanera, Los Manguitos, Cedros y Purgatorio.
			CI.023/AB00 66/16/5.3	06-abr-16		
4	Firmado el 23 de mayo de 2016	Operaciones	CI.023/AB00 88/16/5.3	27-abr-16	Sección 3.6(f)(i) del Contrato Parte Especial	Ampliación del Plazo para instalar y comenzar a operar las estaciones de Peajes nuevas Los Manguitos y Caimanera
			CI.023/AB01 10/16/5.3	20-may-16		
5	Firmado el 24-may-2016	Operaciones	CI.023/AB00 64/16/5.3	06-abr-16	Sección 3.3.9.2 del Apéndice Técnico 2	Modificar la Tabla de elementos que el Concesionario entregará a la DITRA para su operación en las vías Concesionadas
6	Firmado el 22-jul-2016	Jurídica, Financiera, Operaciones	CI.023/AB01 74/16/5.2	11-jul-16	Sección 3.6 (f)(i) de la Parte Especial; Literal (a) de la Sección 3.9 del CAPÍTULO II “TABLA DE REFERENCIAS DE LA PARTE GENERAL” de la Parte Especial; literales (a) y (b) de la Sección 3.8 de la Parte Especial; la Tabla 6 – UF 1 a 8 Apéndice técnico 1; Sección 17.2 Parte General	*Modificar el sentido de ampliar el plazo previsto para la instalación e inicio de operación de la estación de Peaje nueva: La Caimanera, a partir del 30 de julio de 2016; *Modificar el plazo para que el Concesionario presente la totalidad de la documentación para acreditar el Cierre Financiero es de trescientos noventa (390) Días contados desde la Fecha de Inicio; *Modificar, (a) Duración estimada de la Fase de Preconstrucción: Cuatrocientos veinticinco (425) Días contados desde la Fecha de Inicio. (b) Duración estimada de la Fase de Construcción: mil cuatrocientos sesenta (1460) Días contados desde la fecha del Acta de Inicio de la Fase de Construcción; *Modificar la Tabla 6 – UF 1 a 8: características geométricas y técnicas de entrega de cada subsector; *De conformidad con la Resolución 0002819 del 11 de julio de 2016, es necesario modificar el Capítulo XVII “TERMINACIÓN DEL CONTRATO”, Sección 17.2 “Causales de Terminación Anticipada del Contrato” de la Parte General del Contrato de Concesión No. 016 de 2015

Tabla 3-2 Otrosí al Contrato de Concesión N° 016 / 2015.						
N°	**ESTADO**	**ÁREA**	**CONCEPTOS INTERVENTORÍA**		**CAPITULO DEL CONTRATO MODIFICADO**	**OBJETO**
			RADICADO	**FECHA**		
7	Firmado el 16/01/2017	Jurídica, Financiera, Operaciones	CI.023/AB01 90/16/5.2	03-ago-16	Literal (b) de la Sección 17.2 (iv) Parte general. Sección 3.6 eliminar el literal (d) y modificar el literal (f)(i) Parte Especial, Sección 3.10 Parte Especial, literal (c) del numeral 2.1, numeral (xv) del literal (a) del numeral 4.3 del Apéndice Técnico 1, Sección 5.2 del Apéndice Técnico 1	*Modificar el numeral (iv) del literal (b) de la Sección 17.2 "Causales de Terminación Anticipada del Contrato", Capítulo XVII /TERMINACIÓN DEL CONTRATO". * Modificar la Sección 3.6 "Estaciones de Peaje", Capítulo 111 "ASPECTOS GENERALES" de la Parte Especial del Contrato de Concesión W 016 de 2015, en el sentido de eliminar el literal (d) de la misma y modificar el literal (f)(i). * Eliminar la Sección 3.10 "Obras correspondientes a la Estación de Peaje de Carimagua" del Capítulo 111 "ASPECTOS GENERALES" de la Parte Especial del Contrato de Concesión. * Eliminar el literal numeral (vi) del literal (c) del numeral 2.1 "Descripción" CAPITULO II "Descripción del Proyecto", Apéndice Técnico 1 del Contrato de Concesión. * Eliminar el numeral (xv) del literal (a) del numeral 4.3 "Alcance de las Obligaciones en la etapa Preoperativa", Capítulo IV "Obligaciones durante la Etapa Preoperativa" del Apéndice Técnico 1 del Contrato de Concesión. *Eliminar la Sección 5.2 "Obras correspondientes a la Estación de Peaje de Carimagua", del Capítulo V "Alcance de Obligaciones Técnicas Particulares y Específicas Adicionales del Concesionario en cada Etapa" del Apéndice Técnico 1 del Contrato de Concesión
8	Firmado el 31/01/2017	Jurídica, Financiera, Operaciones	CI.023/AB04 38/16/5.3	26-dic-16	Secciones 3.2 (a), 3.2 (g) (i), 3.2 (g) (ii), 3.4 (h) (ix) (1), 3.4 (h) (ix) (2), 3.5 (b) (i) (1), 3.15 (d) (i) y 3.15 (h) (v) (8) de la Parte General del Contrato. Numerales (1) y (2) de la Sección 3.15 (h) (ii) de la Parte General del Contrato. Numerales (13), (14), (15) y (16) a la Sección 3.15 (h) (ii) de la Parte General del Contrato. Numerales (1) y (4) de la Sección 3.15 (h) (v) de la de la Parte General del Contrato. literal (a) cálculo del VPIP de la parte general. literal d) de la cláusula 18.3 de la Parte General. Sección 3. 5(b) de la de la Parte General.	*Aclarar que el traslado de recursos de la Subcuenta Autónoma de Soporte o de la Subcuenta Excedentes ANI a la Cuenta Proyecto descrito en las Secciones 3.2 (a), 3.2 (g) (i), 3.2 (g) (ii), 3.4 (h) (ix) (1), 3.4 (h) (ix) (2), 3.5 (b) (i) (1) (componentes Traslados Exci y Traslados Auti,), 3.15 (d) (i) y 3.15 (h) (v) (8) de la Parte General del Contrato. *Modificar los numerales (1) y (2) de la Sección 3.15 (h) (ii) de la Parte General del Contrato. *Adicionar los numerales (13), (14), (15) y (16) a la Sección 3.15 (h) (ii) de la Parte General del Contrato. *Modificar los numerales (1) y (4) de la Sección 3.15 (h) (v) de la de la Parte General del Contrato. *Modificar el literal (a) cálculo del VPIP de la parte genera. *Modificar la descripción de la fórmula establecida en el literal d) Terminación Anticipada durante la Fase de Preconstrucción de la cláusula 18.3 de la Parte General "Formulas de Liquidación del Contrato", concerniente a ARh como VL(PC). *Modificar las fórmulas de Traslados Exci y Traslados Auti de la Sección 3. 5(b) de la de la Parte General del Contrato
9	Firmado el 12-jun-2017	Jurídica, Financiera, Operaciones	CI.023/AB07 47/17/5.3	02-jun-2017	Sección 3.3 Parte Especial, Tabla Sección 3.5(b) parte especial, Tabla 1, 3, 4 y 6 Apéndice Técnico 1	"3.3 División del proyecto: a) El proyecto corresponde al corredor denominado sistema vial para la conexión de los departamentos Antioquia y Bolívar, el cual se divide en o unidades funcionales "3.5 Entrega de la infraestructura. *Modifíquese las Tablas 1, 3, 4 y 6 Apéndice Técnico 1 en los aportes relacionados con los puntos de origen, destino y longitud de las UFI 1 del proyecto.

Tabla 3-2 Otrosí al Contrato de Concesión N° 016 / 2015.						
N°	**ESTADO**	**ÁREA**	**CONCEPTOS INTERVENTORÍA**		**CAPITULO DEL CONTRATO MODIFICADO**	**OBJETO**
			RADICADO	**FECHA**		
10	Firmado el 30-jun-2017	Jurídica, Financiera, Operaciones	CI.023/AB07 47/17/5.3	02-jun-2017	Apéndice Técnico 1.	*Modifíquese la Tabla N°4 del Apéndice Técnico 1 del Contrato de Concesión. *Modifíquese la Tabla N°6 del Apéndice Técnico 1 del Contrato de Concesión.
11	Firmado el 31-oct-2017	Jurídica, Financiera, Operaciones	CI.023/AB27 75/17/5.2	04-dic-2017	Parte General: Sección 3.13(a) Sección 3.13(d)(v) Sección 3.13(d) Sección 17.3 (b).	Inclusión de inhabilidad sobreviniente como causal de toma de posesión de contratista. Modificación de referencias cruzadas.
12	Firmado el 06-dic-2017	Financiera	CI.023/AB28 38/17/5.2	13-dic-2017	Apéndice financiero 2, Numeral 1 capítulo I; adiciona los numerales (viii) al numeral 4 del capítulo 1 y los numerales 5, 1, 6 y 7; Modifica los numerales 2.2., 2.3.1. ,2.3.2., 2.3.3., 2.4., 2.5., Modifica el anexo AF 2.2.	Modificar el apéndice financiero N° 2, a efecto de permitir la alternativa para la cesión del 100% de la retribución – y de la compensación Especial, cuando sea aplicable, de la Compensación por Riesgo cuando dicha compensación sea realizada con recursos en efectivo, así como la cesión de los pagos a cargo de la ANI como consecuencia de la aplicación de las fórmulas de liquidación previstas en el Contrato de Concesión.
13	Firmado el 01-feb-2018	Jurídica, Financiera, Operaciones	CI.023/AB11 98/17/5.3	31-oct-2017	Sección 3.6(b) de la Parte Especial y 2.3 del Apéndice Técnico 1	Con el fin de establecer el nuevo PR en el cual debe reubicarse las estaciones de Peaje Los Cedros y Purgatorio.
14	Firmado el 19-Jun-2019	Jurídica, Financiera, Técnico, Ambiental, Predial, Social Operaciones	CI.023/AB39 15/19/5.3 CI.023/AB39 71/19/5.3	29-may-2019 12–jun-2019	Sección 3.3 de la Parte Especial, Sección 3.5 literal d, Sección 5.2 Parte Especial, Sección 2.4 apéndice técnico 1, Sección 2.5(b) apéndice técnico 1, Sección 3.6 apéndice técnico 1	Modifica el trazado y diseño geométrico de las unidades funcionales 6.3, 7.2 y 7.3 del proyecto, debido a eventos eximentes de responsabilidad.
15	Firmado el 19-Dic-2019	Jurídica, Financiera, Técnico, Ambiental, Predial, Social Operaciones	CI.023/AB47 40/19/5.3 CI.023/AB48 47/19/5.3	17-oct-2019 29-oct-2019	Tabla No. 6 del Apéndice Técnico 1, Sección 7.2 (b) de la parte General del Contrato	Modificar el ancho mínimo de derecho de vía de la UFI-2 dispuesto en la Tabla No. 6 del Apéndice Técnico 1, e incorporar a esta Tabla la excepción para el ancho mínimo de derecho de vía en los pasos urbanos de las Unidades Funcionales 2 y 6.1 Modificar la Sección 7.2 (b) de la parte General del Contrato
16	Firmado el 24 – Nov-2021	Jurídica, Financiera, Técnico, Ambiental, Predial,	CI.023/7537 //21/5.3	30-abr-2021	Tablas 1, 3, 4, 6 y sección 3.5 del Apéndice Técnico 1 Secciones 3.3, 3.5 de la Parte Especial del Contrato.	Se incluyen los subsectores 3.2 y 3.3 en la Unidad Funcional 6.3 con alcances de rehabilitación y puesta a punto respectivamente. Se modifica la tipología de algunos pasos peatonales según lo contenido en el numeral 3.5 del apéndice técnico 1.

Tabla 3-2 Otrosí al Contrato de Concesión N° 016 / 2015.						
N°	**ESTADO**	**ÁREA**	**CONCEPTOS INTERVENTORÍA**		**CAPITULO DEL CONTRATO MODIFICADO**	**OBJETO**
			RADICADO	**FECHA**		
		Social Operaciones				
17	Firmado el 22 – Mar-2022	Financiero Predial Técnico Jurídico	CI.023/AB80 22/21/5.3	03-ago-2021	Parte General_ Capítulo I, sección 4.17, Sección 7.1. Parte especial: sección 4.3 (b). Apéndice 1: numeral 2.5	Se adicionan definiciones en el capítulo 1 de la parte general. Se modifica procedimiento de verificación de unidades funcionales. Se incluyen índices de cumplimiento de gestión predial y se modifica formula de retribución.
18	Firmado el 08 – ago-2025	Redes	CI.023/AB12 993/24/5.3	14-nov-2024	Sección 8.2 (d) de la Parte General del Contrato de Concesión	Distribución anticipada de los Remanentes de la subcuenta de Redes en los términos indicados en dicho Otrosí 18.

* OTROSÍ No. 19
REMUNERACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DURANTE LA ETAPA DE REVERSIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 016 DE 2015

Desde el mes de junio de 2026, la Interventoría ha participado activamente, junto con la ANI y el Concesionario, en las mesas de trabajo y gestiones orientadas a definir el mecanismo de remuneración de las actividades de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM) durante la Etapa de Reversión, ante la necesidad de establecer contractualmente las condiciones aplicables. En desarrollo de este proceso, revisó la propuesta inicial del Concesionario, solicitó los soportes técnicos y financieros correspondientes, participó en la construcción y ajuste del proyecto de Otrosí No. 19 y presentó a la ANI el concepto integral de viabilidad y sus respectivos alcances, atendiendo las observaciones formuladas por la Entidad.

Durante septiembre, la Interventoría continuó participando en las mesas de trabajo con la ANI y el Concesionario, revisando alternativas para la remuneración de AOM y desarrollando ejercicios y escenarios financieros relacionados con el cumplimiento del Laudo Arbitral. Asimismo, efectuó el análisis de las propuestas de pago presentadas por el Concesionario, revisó la información financiera y la disponibilidad de los recursos del Patrimonio Autónomo y remitió a la ANI sus observaciones y recomendaciones para la depuración de los conceptos económicos y la definición de

una alternativa de cumplimiento, en observancia del marco contractual y legal y de la protección de los recursos públicos.

Como resultado de las gestiones adelantadas, al cierre del presente Informe se continúa en revisión y ajuste el proyecto de Otrosí No. 19, mientras que las partes siguen analizando las alternativas para la remuneración de AOM durante la Etapa de Reversión y el cumplimiento del Laudo Arbitral.

Por lo anterior, la Interventoría continuará brindando acompañamiento técnico, financiero y contractual, participando activamente en las mesas de trabajo y promoviendo la definición de estos asuntos y la culminación de los trámites correspondientes.

3.2.2. Plazos Actuales del Contrato de Concesión

Tabla 3-3 Plazos Actuales Contrato Concesión.

CONCESIÓN 016 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2015				
ETAPA	**FASE**	**DURACIÓN (Meses)**	**INICIO**	**FIN**
PRE-OPERATIVA	PRECONSTRUCCIÓN	13,97	27/11/2015	25/01/2017
	CONSTRUCCIÓN	115,94 (según Plan de obras versión 15 y Eventos Eximentes de Responsabilidad)	26/01/2017	1/5/2026
REVERSIÓN	-	En caso de Terminación Anticipada del Contrato, el Plazo Máximo de la Etapa de Reversión podrá ampliarse por decisión autónoma y exclusiva de la ANI- en cualquier término adicional, hasta un máximo de quinientos cuarenta (540) Días contados a partir de la fecha en que se declare la ocurrencia de una causal de	02/05/2026	01/02/2027 (Estimada)

Tabla 3-3 Plazos Actuales Contrato Concesión.				
CONCESIÓN 016 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2015				
ETAPA	**FASE**	**DURACIÓN (Meses)**	**INICIO**	**FIN**
		Terminación Anticipada del Contrato		
	PLAZO TOTAL (Inicialmente previsto)	408 (34 años)		

* Considerando las causas que originaron la modificación de los plazos de terminación de las Unidades Funcionales 2, 6 y 8 a causas de los Eventos Eximentes de Responsabilidad reconocidos por interferencias de predios en la UFI 2, inconvenientes sociales en la UFI 2, obtención del DRMI en las UFI 2 y 6, Construcción del Peaje la Caimanera en la UFI 6, Construcción de la Variante Lorica UFI 7.1 e Intersección 17 en la UFI 8.3.

3.2.3. Hitos Presentados en el Desarrollo del Proyecto

En desarrollo del proyecto, se han presentado los siguientes hitos importantes:

I. El 27 de noviembre de 2015 se suscribe el Acta de Entrega por parte del Instituto Nacional de Vías INVIAS a la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI y de ésta a su vez a la CONCESIÓN RUTA AL MAR S.A.S. de las vías a cargo del INVIAS para que se incorporen al proyecto.

II. El 29 de marzo de 2016, se firmó el acta de entrega del tramo comprendido entre el PR01+410 y el PR10+000 de la vía El 15 – San Carlos, por parte del Municipio de San Carlos a la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI y ésta a su vez a la Concesión ruta al mar S.A.S. CORUMAR S.A.S. de las vías a cargo del Municipio de San Carlos para que se incorporen al proyecto.

III. El 31 de marzo de 2016, se firmó el acta de entrega del tramo perteneciente al departamento de Córdoba entre los PR22+500 en el Municipio de San Carlos y el PR31+990 en el Municipio de Cereté, contemplados en el convenio N°022 de 2015, por parte de la Gobernación de Córdoba a la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI y ésta a su vez a la Concesión ruta al mar S.A.S. de las vías a cargo de la Gobernación de Córdoba para que se incorporen al proyecto.

IV. El 25 de enero de 2017 se suscribió el Acta de Inicio de la etapa de construcción a partir del 26 de enero de 2017 del Contrato de Concesión No 016 de 2015.

V. El 5 de mayo de 2017, se firmó el acta de entrega del tramo comprendido entre el PR0+000 y el PR01+410 de la vía El 15 – San Carlos, por parte del Municipio de Montería a la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI y ésta a su vez a la Concesión ruta al mar S.A.S. CORUMAR S.A.S. de las vías a cargo del Municipio de Montería para que se incorporen al proyecto.

VI. El 23 de agosto de 2017, se firmó el acta de entrega de los tramos comprendidos entre el PR0+000 y el PR34+950 y del PR34+950 al PR49+000 calzada izquierda de la vía Planeta Rica- Montería, entre el PR0+000 al PR63+340 de la vía Arboletes – Montería, entre el PR0+000 al PR26+000 de la vía Santa Lucia- San Pelayo, por parte de Trasversal de las Américas a la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI y ésta a su vez a la Concesión ruta al mar S.A.S. CORUMAR S.A.S. para que se incorporen al proyecto.

VII. El 5 de diciembre de 2017, se firmó el acta de entrega de los tramos comprendidos entre el PR37+000 y el PR47+000 calzada derecha y del PR49+000 al PR49+600 calzada izquierda de la vía Planeta Rica- Montería, por parte de Trasversal de las Américas a la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI y ésta a su vez a la Concesión Ruta al Mar S.A.S. CORUMAR S.A.S. para que se incorporen al proyecto.

VIII. El 23 de noviembre de 2018, se firmó el acta de entrega de los ITS correspondiente a los tramos de las unidades funcionales 4 y 5 que se encuentran en operación dentro del Contrato 016 de 2015, por parte de Trasversal de las Américas a la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI y ésta a su vez a la Concesión ruta al mar S.A.S. CORUMAR S.A.S. para que se incorporen al proyecto.

IX. El 28 de junio de 2019, se firmó el acta de terminación parcial de la Unidad Funcional 3 subsectores 1, 2, 3 y 4, entrando en operación y mantenimiento.

X. El 24 de septiembre de 2019, se firmó el acta de terminación de la Unidad Funcional 1, entrando en operación y mantenimiento.

XI. El 1 de junio de 2020, se firmó el acta de entrega de los tramos comprendidos entre el PR35+000 - PR37+000 y PR47+000 – PR49+600 calzada derecha de la vía Planeta Rica- Montería, por parte de Trasversal de las Américas a la Agencia

Nacional de Infraestructura-ANI y ésta a su vez a la Concesión ruta al mar S.A.S. CORUMAR S.A.S. para que se incorporen al proyecto.

XII. El 25 de febrero de 2021, se firmó el acta de terminación de la Unidad Funcional 3 con la entrega del subsector 5, entrando en operación y mantenimiento.

XIII. El 8 de abril de 2021, se firmó el acta de terminación parcial de la Unidad Funcional 7 subsector 3, entrando en operación y mantenimiento.

XIV. El 30 de abril de 2021, se firmó el acta de terminación parcial de la Unidad Funcional 2, entrando en operación y mantenimiento.

XV. El 21 de junio de 2021, se firmó el acta de terminación parcial de la Unidad Funcional 8 subsector 2, entrando en operación y mantenimiento.

XVI. El 25 de junio de 2021, se firmó el acta de terminación parcial de la Unidad Funcional 6 subsector 1, entrando en operación y mantenimiento.

XVII. El 23 de agosto de 2021, se firmó el acta de terminación parcial de la Unidad Funcional 6 subsector 2, entrando en operación y mantenimiento.

XVIII. El 27 de septiembre de 2021, se firmó el acta de terminación parcial de la Unidad Funcional 8 subsector 1, entrando en operación y mantenimiento.

XIX. El 18 de abril de 2022, se firmó el acta de terminación parcial de la Unidad Funcional 8 subsector 3, entrando en operación y mantenimiento.

XX. El 09 de marzo de 2023, se firmó el acta de terminación parcial de la Unidad Funcional 7 subsector 3, entrando en operación y mantenimiento.

XXI. El 19 de septiembre de 2023, se firmó el acta de terminación parcial de la Unidad Funcional 6 subsectores 3.2 y 3.3, con lo cual el subsector 6.3.2 entró en operación y mantenimiento y el subsector 6.3.3, se revirtió al INVIAS el 01 de octubre de 2023.

XXII. El 30 de abril de 2024, se firmó el acta de terminación parcial de la Unidad Funcional 7 subsector 2, entrando en operación y mantenimiento desde esa fecha.

XXIII. El 17 de diciembre de 2024, se firmó el acta de terminación parcial de la Unidad Funcional 8 subsector 3 (sector Majagua), entrando en operación y mantenimiento desde esa fecha.

XXIV. El 04 de julio de 2025, se firmó la cuarta Acta de Terminación Parcial de la Unidad Funcional 6, correspondiente al subsector 1 (K15+300 al K15+500, K16+450 al K16+650, K28+940 al K29+430, y del K29+560 al K30+060) y subsector 3.1 (K41+440 al K433+355), entrando en operación y mantenimiento desde esa fecha.

XXV. El Laudo Arbitral Internacional (Comercial), proferido dentro del caso CIRD No. 01-23-0002-8303, fue emitido el 30 de abril de 2026 y notificado a las partes el 1 de mayo de 2026. Como consecuencia de las decisiones adoptadas en dicho laudo y de conformidad con las disposiciones contractuales aplicables, la Etapa de Reversión inició el 2 de mayo de 2026. En síntesis, las principales decisiones adoptadas en el referido laudo fueron las siguientes:

SOBRE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

Al respecto, es pertinente mencionar que, el TDA en su Laudo, fundamentó la declaratoria de terminación anticipada del Contrato de Concesión, en cuatro (4) causales, a saber: 1) Retraso en la terminación de las UF 2, 6, 7 y 8 (Sección 14.1(e)); 2) No obtención de la Licencia Ambiental para la Variante Lorica (Sección 8.1(h)); 3) Afectación de la Estructura Tarifaria y agotamiento de los MCR (Sección 17.2(b)(iii) y Sección 3.4(i) (ii) (5)); y, 4) Causal referente a la Estación de Peaje Carimagua (Sección 17.2(b)(iv) (1)).

OTRAS DECLARACIONES DEL TRIBUNAL:

Adicionalmente, el Tribunal profirió las siguientes declaraciones a cargo de la ANI:

- Obligación de compensar íntegramente a RAM por la materialización del riesgo derivado de la falta de aumento de las tarifas de la Estación de Peaje Carimagua.
- Obligación de compensar íntegramente a RAM por la materialización del riesgo derivado de la insuficiencia del Valor Estimado para Compensaciones Ambientales.
- Responsabilidad civil e indemnización integral de perjuicios por el no pago de los dos riesgos anteriores.
- Incumplimiento del Contrato por demoras en el reconocimiento y compensación de los efectos del Decreto 050.

- Incumplimiento de la obligación de atender los sitios inestables o activar las pólizas requeridas en las UF 4 y 5, con responsabilidad civil e indemnización integral de perjuicios.

CONDENAS DEL TRIBUNAL
Como consecuencia de las declaraciones mencionadas, el TDA aplicó la Fórmula de Liquidación prevista en la Sección 18.3(e) del Contrato por terminación anticipada en Etapa Preoperativa - Fase de Construcción y, por tanto, condenó a la ANI al pago de las siguientes sumas:

3.2.4. Pólizas Vigentes

En el marco de las obligaciones de seguimiento y control a cargo de la Interventoría, se efectuó la revisión de las garantías y pólizas constituidas por el Concesionario en desarrollo del Contrato de Concesión No. 016 de 2015, verificando su correspondencia con las exigencias contractuales aplicables y el cumplimiento de las obligaciones asociadas a su actualización y vigencia. Este seguimiento se desarrolló inicialmente respecto de las garantías correspondientes a la Etapa de Construcción y, posteriormente, frente a las obligaciones aplicables durante la Etapa de Reversión, considerando la terminación anticipada del Contrato y el inicio de dicha etapa de reversión a partir del 02 de mayo de 2026.

3.2.4.1. Pólizas Etapa Preoperativa – Fase de Construcción

La Interventoría verificó el cumplimiento de las condiciones de vigencia, cobertura, valores asegurados y demás requisitos establecidos contractualmente. Como resultado de esta revisión, se identificaron posibles incumplimientos asociados a las pólizas correspondientes a la Etapa de Construcción, al evidenciarse que estas no se encontraban ajustadas integralmente a los lineamientos y exigencias contractuales, situación que dio lugar a la solicitud de un Plazo de Cura para que el Concesionario efectuara las correcciones y subsanaciones correspondientes.

En atención a lo anterior, mediante oficio IPAB-0303-2026, con radicado ANI No. 20264090642512 del 21 de mayo de 2026, la Interventoría solicitó a la ANI la No Objeción para otorgar al Concesionario un Plazo de Cura de cinco (5) días hábiles, con el propósito de subsanar el posible incumplimiento identificado en materia de garantías.

Posteriormente, mediante radicado ANI No. 20263050226101 del 17 de junio de 2026, la ANI otorgó la No Objeción para el inicio del Plazo de Cura relacionado con el posible incumplimiento de la obligación establecida en la Sección 12.3(b) de la Parte General del Contrato de Concesión, correspondiente a la actualización anual de las pólizas.

En desarrollo de lo anterior, mediante comunicados ANI Nos. 20263050267311 y 20263050264761 del 14 de julio de 2026, la ANI solicitó a la Interventoría consolidar y unificar el concepto sobre las pólizas correspondientes a la vigencia 2026, considerando la documentación presentada por el Concesionario y los pronunciamientos previamente emitidos por la Interventoría.

En atención a dicho requerimiento, mediante oficio IPAB-0500-2026, con radicado ANI No. 20264090900822 del 15 de julio de 2026, la Interventoría notificó al Concesionario la No Objeción otorgada por la ANI y las falencias identificadas en las garantías presentadas, otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para su subsanación, con fecha límite del 24 de julio de 2026.

Entre las observaciones formuladas se identificó, entre otros aspectos, la permanencia de CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. como asegurado o asegurado adicional en los certificados CM103949, CM103950, CM103951 y CM103952, correspondientes a las pólizas de Obras Civiles Sección I y Sabotaje y Terrorismo; un error de transcripción en el Anexo 9, mediante el cual se trasladaron valores de la póliza de Sección I a la póliza de Sabotaje y Terrorismo; y la ausencia de referencias expresas al cumplimiento de la Sección 12.9(b) del Contrato.

Posteriormente, mediante comunicado 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260728012633 del 30 de julio de 2026, el Concesionario presentó respuesta a las observaciones formuladas, manifestando que estas habían sido atendidas o que, en su criterio, no requerían modificación. Asimismo, señaló que la póliza correspondiente a la Etapa de Construcción fue cancelada con ocasión del cambio a la Etapa de Reversión y manifestó que las pólizas cumplían con las condiciones de actualización exigidas contractualmente.

Una vez efectuada la revisión de la comunicación del Concesionario y de los soportes aportados, la Interventoría evidenció que las observaciones formuladas

mediante el oficio IPAB-0500-2026, con radicado ANI No. 20264090900822 del 15 de julio de 2026, no fueron atendidas integralmente, particularmente en lo relacionado con la permanencia de CÓNDOR S.A. en las pólizas de Obras Civiles Terminadas. Al respecto, el Concesionario sostuvo que dicha inclusión obedecía a un interés asegurable propio derivado de sus obligaciones como contratista EPC, sin que ello modificara el objeto del seguro, las coberturas o las sumas aseguradas.

Frente a lo anterior, la Interventoría considera que el argumento presentado por el Concesionario no resulta suficiente para atender la observación, toda vez que la concurrencia de dos intereses asegurables distintos —el de la ANI sobre la integridad del bien que revierte a la Nación y el interés contractual autónomo atribuido a CÓNDOR S.A.— sobre una suma asegurada fija podría generar un riesgo de fraccionamiento de la indemnización ante un eventual siniestro, aspecto que debe analizarse a la luz del principio indemnizatorio previsto en el artículo 1088 del Código de Comercio y de la finalidad de protección patrimonial asociada a las garantías contractuales.

En consecuencia, al no haberse acreditado la subsanación integral de las observaciones dentro del Plazo de Cura otorgado, la Interventoría mantendrá el seguimiento correspondiente y elaborará en el siguiente periodo el respectivo informe de incumplimiento, en el cual se dará cuenta a la ANI de las observaciones que permanecen sin subsanar y de las actuaciones que resulten procedentes conforme al Contrato de Concesión.

Amparo	Aseguradora	Póliza	Anexo / Certificado	Valor asegurado ($)	Vigencia desde	Vigencia hasta	Alerta	Observación
Cumplimiento	HDI Seguros	9201510	Anexo 56	$300.288.013.627,00	27/11/2015	30/09/2027	Vigente	
Salarios y Prestaciones Sociales	HDI Seguros	9201510	Anexo 56	$107.874.280.033,00	27/11/2015	30/09/2030	Vigente	
Responsabilidad Civil Extracontractual	Confianza	802087085	RE38648	$87.990.919.325,00	26/01/2026	26/01/2027	Próxima a vencer	Renovación anual (Sección 12.3(b)).

Amparo	Aseguradora	Póliza	Anexo / Certificado	Valor asegurado ($)	Vigencia desde	Vigencia hasta	Alerta	Observación
Todo Riesgo Obra Civil Sección I	Confianza	804000274	CM103949	$2.036.938.196.777,00	26/01/2026	26/01/2027	Próxima a vencer	Observación IPAB-0500-2026: Construcciones El Cóndor incluido indebidamente como asegurado.
Sabotaje y Terrorismo (Obra Civil Sec. I)	Confianza	804000275	CM103950	$60.000.000.000,00	26/01/2026	26/01/2027	Próxima a vencer	Observación IPAB-0500-2026: el clausulado reproduce el condicionado de Sección I (CM103949); falta firma de Everest en la cláusula de coaseguro.
Todo Riesgo Obra Civil Sección II	Confianza	CM001187	CM004164	$115.484.447.789,00	31/01/2026	31/01/2027	Vigente	Única cobertura de daños junto con Sección I mientras no se allegue la póliza 7.5(c) de Reversión.
Valor asegurado total Fase de Construcción ($)				**$2.708.575.857.551,00**				

3.2.4.2. Pólizas Etapa de Reversión

De manera complementaria al seguimiento efectuado sobre las garantías correspondientes a la Etapa de Construcción, la Interventoría verificó las obligaciones asociadas a las garantías propias de la Etapa de Reversión, de conformidad con las disposiciones establecidas en el Capítulo XII de la Parte General y el Capítulo VII de la Parte Especial del Contrato de Concesión No. 016 de 2015. Como resultado de dicha revisión, se identificaron posibles incumplimientos relacionados con las condiciones de las garantías exigidas para esta etapa, razón por la cual se adelantó el trámite correspondiente para el otorgamiento de un Plazo de Cura.

En este sentido, mediante comunicado IPAB-0368-2026, con radicado ANI No. 20264090709022, la Interventoría solicitó a la ANI la No Objeción para otorgar al Concesionario un Plazo de Cura, ante el posible incumplimiento de las obligaciones relacionadas con las garantías correspondientes a la Etapa de Reversión. Posteriormente, mediante radicado ANI No. 20263050249931 del 2 de julio de 2026, la ANI otorgó la No Objeción solicitada y, en atención a ello, mediante comunicado IPAB-0477-2026, con radicado ANI No. 20264090860372 del 7 de julio de 2026, la Interventoría notificó al Concesionario el otorgamiento de un Plazo de Cura de quince (15) días calendario.

En desarrollo del Plazo de Cura, mediante comunicado 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260708012476 del 8 de julio de 2026, el Concesionario remitió las pólizas y sus respectivos anexos y soportes, correspondientes a la Póliza de Cumplimiento Estatal No. 400075590, expedida por Nacional de Seguros, y a la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 802094170, Certificado RE38702, expedida por Confianza, solicitando tener por subsanado el presunto incumplimiento y proceder con el cierre del Plazo de Cura.

Una vez revisada la documentación presentada, la Interventoría efectuó la verificación técnica de las garantías en el marco del Concepto Consolidado y Unificado sobre las Pólizas Vigencia 2026, encontrando conformidad en los valores asegurados frente a los mínimos contractuales establecidos en las Secciones 7.1, 7.2 y 7.4. No obstante, se identificaron aspectos que impedían

considerar subsanadas integralmente las observaciones, relacionados principalmente con la insuficiencia de vigencia de los amparos de Cumplimiento del Contrato y Responsabilidad Civil Extracontractual, respecto de los cuales se otorgaron seis (6) meses frente a los doscientos setenta (270) días exigidos para la Etapa de Reversión; una posible insuficiencia en el amparo de Salarios; la inclusión de una leyenda residual contradictoria en la póliza de RCE; y la ausencia del Amparo de Todo Riesgo de Obra Civil exigido en la Sección 7.5(c) del Contrato.

En consecuencia, mediante comunicación IPAB-0574-2026, con radicado ANI No. 20264090978872 del 31 de julio de 2026, la Interventoría determinó que no procedía el cierre del Plazo de Cura, al evidenciar que persistían aspectos pendientes de subsanación en las pólizas y soportes presentados por el Concesionario. De manera complementaria, mediante comunicación IPAB-0575-2026, con radicado ANI No. 20264090979022 del 31 de julio de 2026, la Interventoría informó a la ANI sobre el presunto incumplimiento relacionado con la falta de subsanación de las observaciones formuladas respecto de las garantías correspondientes a la Etapa de Reversión.

Por lo anterior, mediante comunicación IPAB-575-2026, con radicado ANI No. 20264090979022 del 31 de julio de 2026, la Interventoría informó a la ANI el presunto incumplimiento relacionado con la falta de subsanación de las observaciones formuladas a las garantías de la Etapa de Reversión.

Posteriormente, mediante comunicado 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260914013012 del 21 de septiembre de 2026, el Concesionario dio respuesta al IPAB-0574-2026, con radicado ANI No. 20264090978872 del 31 de julio de 2026, informando la subsanación de las observaciones formuladas por la Interventoría. Una vez revisada la documentación aportada, se procedió a verificar el cumplimiento de las condiciones contractuales exigidas para las garantías de la Etapa de Reversión.

Como resultado de dicha revisión, mediante comunicado IPAB-0837-2026 con radicado ANI 20264091292042de fecha 1 de octubre del 2026, la Interventoría informó a la ANI que la Garantía de Cumplimiento No. 400075590, Referencia 223329 – Anexo 1, presentaba valores asegurados iguales o superiores a los exigidos contractualmente y, en consecuencia, cumplía con los requisitos jurídicos,

técnicos y financieros mínimos establecidos en el Contrato de Concesión, recomendando su aprobación por parte de la ANI.

De manera complementaria, mediante comunicado IPAB-0838-2026 con radicado ANI 20264091292062 de fecha 1 de octubre del 2026, la Interventoría informó al Concesionario el resultado de la revisión de las garantías. Frente a la Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 802094170, Certificado No. RE38726, se solicitó la remisión del certificado de pago de la prima, como requisito necesario para continuar con su verificación y emitir el concepto correspondiente. Asimismo, respecto de la Garantía Todo Riesgo de Obra Civil, se requirió al Concesionario su remisión para efectuar la revisión y emitir el concepto respectivo.

Posteriormente, mediante comunicación ANI No. 20263050366091 del 23 de septiembre de 2026, la Agencia Nacional de Infraestructura devolvió el informe IPAB-0575-2026 para su complementación y actualización, relacionado con la solicitud de inicio del procedimiento administrativo sancionatorio por los presuntos incumplimientos asociados a las garantías de la Etapa de Reversión.

En atención a lo requerido por la ANI, la Interventoría, mediante comunicado IPAB-0841-2026, con radicado ANI No. 20264091299592 del 2 de octubre de 2026, presentó respuesta integral y complementó la información relacionada con las garantías objeto de seguimiento. Como resultado, recomendó a la ANI continuar con el procedimiento administrativo sancionatorio por los presuntos incumplimientos relacionados con la Garantía Todo Riesgo de Obra Civil y la Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual.

Amparo (Parte Especial)	Aseguradora / Póliza / Anexo / Expedición	Valor asegurado ($)	Mínimo contractual ($)	Cumple valor	Vigencia desde	Vigencia hasta (anterior)	Vigencia hasta (14-sep-2026)	Vigencia mínima exigida hasta	Cumple vigencia	Concepto Interventoría
Cumplimiento del Contrato (7.1)	Compañía Nacional de Seguros Póliza 400075590 Anexo 1 Exp. 4/09/2026	$27.227.716.095,00	$13.762.760.965,00	Sí	1/05/2026	1/11/2026	27/02/2027	26/01/2027	Sí	Subsanado: el Anexo 1 amplía la vigencia de 6 meses a 27-feb-2027 y cubre los 270 días de la Etapa de Reversión.

Amparo (Parte Especial)	Aseguradora / Póliza / Anexo / Expedición	Valor asegurado ($)	Mínimo contractual ($)	Cumple valor	Vigencia desde	Vigencia hasta (anterior)	Vigencia hasta (14-sep-2026)	Vigencia mínima exigida hasta	Cumple vigencia	Concepto Interventoría
Salarios y Prestaciones Sociales (7.2)	Compañía Nacional de Seguros Póliza 400075590 Anexo 1 Exp. 4/09/2026	$13.613.858.049,00	$6.881.380.483,00	Sí	1/05/2026	1/11/2029	27/02/2030	26/01/2030	Sí	Subsanado: cubre la Etapa de Reversión más los 3 años adicionales.
Estabilidad de la Obra (7.3(b))	Compañía Nacional de Seguros Póliza 400075590 Anexo 1 Exp. 4/09/2026	$61.692.160.284,00	$13.762.760.965,00	Sí	1/05/2026	1/05/2028	1/05/2028	1/05/2028	Sí	Conforme. Sin cambios en el Anexo 1.
Responsabilidad Civil Extracontractual (7.4(d))	Confianza Póliza 802094170 RE38726 (reemplaza RE38702) Exp. 31/08/2026	$58.312.204.503,00	$29.475.000.000,00	Sí	1/05/2026	1/11/2026	1/02/2027	26/01/2027	Sí	Subsanado en vigencia. Verificar que RE38726 no repita la leyenda "180 días pendiente fecha inicio de vigencia" del RE38702.
Todo Riesgo Obra Civil (7.5(c))	No allegada			Pendiente					Pendiente	PENDIENTE: no se remitió con el oficio. Valor asegurable según estudio de pérdida máxima probable (Sección 12.8(a)(ii)). Impide recomendar el cierre total del Plazo de Cura (radicado ANI 20263050249931).

3.2.5. Estado Actual Etapa de Reversión.

3.2.5.1. Obligaciones Contractuales en Etapa de Reversión.

De conformidad con las obligaciones establecidas en el Contrato de Concesión bajo el esquema de APP No 016 de 2015 en su Parte General, Especial y Anexos, esta Interventoría realiza un seguimiento permanente durante la etapa de ejecución contractual que inició el pasado 07 de febrero de 2026 según fecha de suscripción de acta de inicio de Interventoría del Consorcio IPAB.

Con fundamento en la notificación del Laudo Final del 30 de abril de 2026, proferido por el Tribunal Arbitral en el marco del Arbitraje CIRD No. 01-230002-8303, mediante el cual se declaró la Terminación Anticipada del Contrato de Concesión No. 016 de 2015, notificado a las partes el 01 de mayo de 2026 e inició la Etapa de Reversión a 2 de mayo del 2026 y dada la terminación anticipada del Contrato se ha materializado el supuesto del hecho previsto en la Sección 1.60 de la Parte General del Contrato de Concesión, según el cual la "Etapa de Reversión" iniciará entre otros, "(…) (ii) cuando se declare la Terminación Anticipada del Contrato en cualquiera de sus Etapas (…)", por lo que correlativamente, para esta nueva etapa contractual, resulta aplicable el procedimiento previsto en la Sección 9.7 de la Parte General del Contrato de Concesión, haciéndose exigibles las obligaciones propias de esta nueva etapa contractual.

Por tanto, el rol de esta Interventoría a partir del mes de mayo de 2026 se ha circunscrito al seguimiento de las obligaciones a cargo del Concesionario tomando en cuenta el mencionado catálogo obligacional propio de la Etapa de Reversión, cuyo detalle se presenta en el **Anexo 2.1.**

3.2.5.2. Acciones y Gestiones en Etapa de Reversión.

En cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de esta Interventoría, se presenta a continuación la trazabilidad de las gestiones adelantadas en relación con las actividades asociadas a la Etapa de Reversión:

Mediante comunicación ANI No.20263050217301 del 05 de junio de 2026, la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI impartió lineamientos al Concesionario para el desarrollo de la Etapa de Reversión, indicando expresamente lo siguiente:

> *"(…) en el marco de la etapa de reversión, deben verificarse las obligaciones establecidas en el Contrato de Concesión, sin perjuicio de las que se resaltan a continuación:*
>
> - *Componente predial: Ello implica constatar la culminación integral de la gestión predial y la definición precisa de los asuntos aún pendientes, incluyendo la culminación de los trámites de enajenación voluntaria en aquellos casos en que resulte procedente, la revisión del estado de los predios inmersos en procesos de expropiación judicial, el cumplimiento de los pagos efectuados y las obligaciones económicas derivadas de los*

mismos de cara a los recursos de la subcuenta predial. De igual manera, deberá verificarse la situación de los predios adquiridos que no han sido objeto de intervención, así como los predios intervenidos que aún presentan pendientes por resolver. Estas actuaciones deberán desarrollarse bajo criterios de seguridad jurídica, transparencia y coordinación interinstitucional, de manera que al momento de la liquidación contractual los aspectos prediales se encuentren plenamente saneados, definidos los pendientes y con responsables claramente establecidos.

- *Componente ambiental: el concesionario deberá garantizar la entrega saneada de los aspectos ambientales asociados al contrato, procurando el cierre efectivo de obligaciones, permisos, trámites y actividades pendientes.*

Para tal efecto, durante la etapa de reversión se deberá cumplir con las disposiciones establecidas en el Manual de Reversión y entre otros aspectos diligenciar los formatos GCSP-F-240-Obligaciones Ambientales, GCSP-F-116-Permisos Ambientales y GCSP-F-242-Pendientes Ambientales, incorporando el detalle de los Instrumentos de Manejo y Control Ambiental con los que cuenta el proyecto, así como el estado de cumplimiento de cada uno de ellos. Igualmente, deberá incluirse la relación de los permisos ambientales vigentes y su estado actual, identificando cuáles se encuentran en proceso de cierre, cuáles deberán ser objeto de cesión en el marco de la futura operación de la vía y, en caso de existir permisos en trámite, informar su estado y analizar la procedencia del eventual desistimiento.

Así mismo, deberán anexarse los soportes emitidos por las respectivas autoridades ambientales que acrediten el cierre, archivo, terminación, cesión o estado actual de los permisos, obligaciones, requerimientos y demás actuaciones ambientales relacionadas con el proyecto. De igual manera, dentro de los formatos deberá incluirse la información correspondiente a los últimos seguimientos efectuados por las autoridades ambientales sobre cada uno de los expedientes a cargo del proyecto.

En caso de existir procesos sancionatorios ambientales en curso, estos deberán relacionarse indicando, como mínimo, la autoridad competente, el expediente correspondiente, el estado actual del trámite y las actuaciones adelantadas a la fecha.

En igual sentido, deberá presentarse el desglose actualizado del estado de las compensaciones ambientales, incluyendo las obligaciones ejecutadas, las actividades pendientes y los costos asociados a su cumplimiento. En caso de subsistir actividades de gestión ambiental que, de manera justificada, no puedan ser culminadas antes de la reversión del proyecto, el concesionario deberá dejar definida la proyección de costos correspondiente, así como los mecanismos, responsables y estrategias previstos para garantizar el cumplimiento integral de dichas obligaciones con posterioridad a la entrega.

- *Componente Técnico: Habilitar los tramos que se encuentran finalizados y que serán objeto de reversión, así como el inicio y la coordinación con la Interventoría del proyecto para las gestiones que se deben adelantar para la entrega de la infraestructura. (…)" (Énfasis añadido)*

Así mismo, mediante comunicación ANI No.20263050219641 del 09 de junio de 2026 trasladado al Concesionario mediante comunicado IPAB-0417-2026 radicado ANI 20264090784562 de fecha 19 de junio de 2026, la ANI solicitó a esta Interventoría coordinar con el Concesionario la consolidación, seguimiento y validación de la información requerida por el Instituto Nacional de Vías – INVIAS para el proceso de entrega y recibo de la infraestructura derivado de la Terminación Anticipada del Contrato de Concesión, mediante una matriz organizada que incluya la totalidad de los requerimientos efectuados por dicha Entidad.

De igual forma, mediante comunicación ANI No.20263050219731 del 09 de junio de 2026, la ANI remitió al Concesionario los lineamientos y formatos establecidos en el Manual de Reversiones GCSP-M-001, indicando la obligación de diligenciar y entregar la totalidad de los formatos técnicos, contables, prediales, ambientales, sociales, de permisos y demás documentos requeridos para el proceso de reversión, así como atender las demás disposiciones contenidas en dicho manual.

Adicionalmente, mediante comunicado ANI No.20263050231751 de fecha 18 de junio del 2026, la ANI solicita al Concesionario adelantar de manera inmediata y articulada las gestiones necesarias para coordinar con las Entidades Territoriales la entrega de la infraestructura recibida mediante los convenios administrativos listados a continuación:

- ✓ Convenio No.022 de 2015, suscrito con la Gobernación de Córdoba, relacionado con la vía El 15 – San Carlos – Cereté.
- ✓ Convenio No.023 de 2015, suscrito con la Gobernación de Sucre, relacionado con la vía Tolú – Las Pitas – El Pueblito.
- ✓ Convenio No.009 de 2017, suscrito con la Alcaldía Municipal de Montería, relacionado con el tramo vial El Quince – San Carlos.
- ✓ Convenio No.024 de 2015, suscrito con la Alcaldía Municipal de San Carlos, relacionado con la vía El 15 – San Carlos – Cereté.

Para tal efecto, la ANI requirió al Concesionario la presentación de un cronograma específico para la reversión de la infraestructura asociada a las Entidades Territoriales antes mencionadas, con copia a la Interventoría. No obstante, durante el desarrollo de las mesas de trabajo adelantadas sobre el particular, la ANI solicitó suspender dichas actividades hasta tanto se contara con la definición precisa de los PR de inicio y fin correspondientes a cada una de las Entidades Territoriales objeto de reversión.

Por otra parte, mediante correo electrónico del 11 de junio de 2026, la ANI remitió el cronograma propuesto por el INVIAS para el desarrollo de las actividades asociadas al proceso de reversión y solicitó al Concesionario la presentación de su programación de trabajo. En atención a dicho requerimiento, el Concesionario remitió mediante correo electrónico de fecha 16 de junio de 2026 el cronograma correspondiente, el cual contempla la consolidación y entrega de la información requerida por la ANI, los formatos establecidos en el Manual de Reversiones y la documentación solicitada por el INVIAS, con fecha prevista para el 01 de agosto de 2026.

Sobre el particular, y teniendo en cuenta lo tratado en la mesa de trabajo realizada el 18 de junio de 2026 entre la ANI, el Concesionario y esta Interventoría, se acordó efectuar seguimiento permanente al cumplimiento de las actividades y entregables definidos en el cronograma presentado. Para tal fin, el 23 de junio de 2026, el Concesionario inició el cargue de la información en el enlace dispuesto para tal fin.

Ahora bien, específicamente sobre la entrega y revisión de la información correspondiente a la Etapa de Reversión, se tiene:

Componente Ambiental

Mediante comunicación 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260622012377 del 22 de junio de 2026, el Concesionario atendió el Radicado ANI No. 20263050219731 del 9 de junio de 2026, relacionado con el Capítulo 7.4 Ambiental del Manual de Reversiones, señalando la necesidad de adelantar la cesión de los derechos y obligaciones de las licencias ambientales y permisos de vertimientos asociados al Proyecto. La Interventoría realizó el seguimiento a esta gestión y a las actuaciones requeridas para garantizar la continuidad de las obligaciones ambientales durante la Etapa de Reversión.

Con comunicado ANI No. 20266050268171 del 15 de julio de 2026. La Agencia Nacional de Infraestructura dio respuesta a la comunicación del Concesionario con radicado ANI No. 20264090811692 del 26 de junio de 2026, relacionada con la aplicación del Capítulo 7.4 Ambiental del Manual de Reversiones. En su respuesta informó que elevó consulta al Instituto Nacional de Vías – INVÍAS para que definiera cuáles permisos, autorizaciones, licencias e instrumentos de manejo y control ambiental vigentes debían ser objeto de cesión en el marco de la Etapa de Reversión, con el fin de garantizar la continuidad de la gestión ambiental de la infraestructura revertida.

Así mismo, la ANI precisó que los permisos e instrumentos ambientales que no fueran recibidos en cesión por el INVÍAS deberán continuar siendo administrados por el Concesionario hasta la liquidación del Contrato de Concesión, con el propósito de garantizar el cumplimiento de las obligaciones ambientales pendientes y la obtención de los respectivos actos administrativos de cierre. Finalmente, indicó que, en caso de existir obligaciones ambientales pendientes al momento de la liquidación del contrato, las partes definirán la asignación de responsabilidades y, de ser necesario, la constitución o conservación de recursos fiduciarios para asegurar el cumplimiento de dichas obligaciones.

Por otra parte, con comunicado ANI No. 20266050305111 del 11 de agosto de 2026, la ANI informó al Concesionario que, en el marco del proceso de reversión, remitió al INVIAS la información relacionada con los permisos y licencias ambientales bajo su titularidad, entidad que requirió información detallada sobre su estado, obligaciones pendientes, expedientes, actos administrativos, gestión ambiental, procesos sancionatorios, estudios de conectividad ecológica y fauna, y cumplimiento de consultas previas. Asimismo, la ANI reiteró que el Concesionario mantiene la responsabilidad de adelantar las actuaciones necesarias para el cumplimiento, cierre y archivo de los trámites, permisos, licencias y

demás obligaciones ambientales a su cargo, hasta la culminación del proceso de reversión y la suscripción del acta de liquidación del Contrato.

Posteriormente, con comunicación 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260820012804 del 21 de agosto de 2026, el Concesionario dio respuesta al oficio ANI No. 20266050268171 del 15 de julio de 2026, relacionado con el componente ambiental del proceso de reversión y el Capítulo 7.4 del Manual de Reversiones. En dicha comunicación, reiteró la solicitud de una respuesta de fondo respecto de los actos administrativos, permisos, autorizaciones e instrumentos ambientales que serán objeto de cesión a la ANI, al INVÍAS o a la entidad que corresponda, de conformidad con el artículo 2.2.2.3.8.4 del Decreto 1076 de 2015. Asimismo, solicitó claridad sobre el procedimiento administrativo para la constitución o conservación de recursos fiduciarios destinados a garantizar el cumplimiento de las obligaciones ambientales remanentes y la obtención del cierre definitivo de los instrumentos ambientales pendientes.

Componente Social

Con el comunicado IPAB-374-2026 con radicado ANI 20264090717122 de fecha 4 de junio de 2026 la Interventoría hace la solicitud de presentación del Plan de Trabajo de Gestión Social, Cronograma y formatos requeridos para la Etapa de Reversión a la Concesión

En respuesta de lo anterior, con comunicado 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260619012362 del 19 de junio de 2026 el Concesionario informó que se vienen ejecutando las actividades propias de la Etapa de Reversión relacionadas con la Gestión Social, y que se encuentran adelantando el diligenciamiento de los formatos GCSP-F-115, GCSP-F-305 y GCSP-F-306, para su posterior entrega a la Interventoría, de acuerdo con las fechas programadas en el cronograma establecido para la entrega de la información correspondiente a la Etapa de Reversión.

Componente Predial

Con comunicado IPAB-0376-2026 con radicado ANI 20264090719312 del 5 de junio de 2026, la Interventoría solicitó al Concesionario la actualización integral del estado de la gestión predial en el marco de la Etapa de Reversión, incluyendo: (i) estado y completitud de la información en ANISCOPIO; (ii) entrega de 250 expedientes prediales; (iii) estado detallado de los procesos de expropiación judicial; (iv) situación de predios baldíos; y (v)

estado de los predios en elaboración o ajuste de insumos y con oferta formal de compra inscrita, estableciendo un plazo de 15 días calendario para su entrega.

Por su parte, el Concesionario con comunicado 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260622012376 del 23 de junio de 2026, dio respuesta al comunicado IPAB-0376-2026 con radicado ANI 20264090719312 del 5 de junio de 2026, señalando que sus obligaciones durante la Etapa de Reversión se encuentran principalmente relacionadas con operación y mantenimiento y que la gestión predial debe desarrollarse conforme al Manual de Reversión. Frente a los 37 requerimientos formulados, manifestó que varios no se encuentran expresamente previstos en dicho Manual y remitió a la información contenida en las Sábanas Predial y de Expropiación, así como a otros instrumentos de seguimiento. Para algunos requerimientos indicó que la información se encontraba en proceso de consolidación o que debía adelantarse mediante actividades conjuntas con la Interventoría. Asimismo, se abstuvo de presentar conclusiones o recomendaciones sobre los procesos de expropiación, señalando que dicha competencia corresponde a la ANI.

Por lo anterior, con comunicado IPAB-0481-2026 radicado ANI 20264090878112 del 9 de julio de 2026 la Interventoría respondió al oficio del Concesionario 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260622012376 del 23 de junio de 2026 y reiteró la solicitud de información relacionada con el estado de la gestión predial, especialmente de los 250 predios pendientes de titularidad a favor de la ANI. Se requirió complementar y soportar la información sobre expedientes prediales, procesos de expropiación, actuaciones judiciales, depósitos y pagos, mejoras y construcciones, trámites ante la ANT, estado registral y demás actuaciones pendientes. La Interventoría señaló que parte de la información remitida resultaba insuficiente para validar el estado real de los procesos y que no cuenta con acceso a los expedientes prediales. Con fundamento en la Sección 4.5(k) del Contrato de Concesión y el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, reiteró los requerimientos.

Posteriormente, con comunicado IPAB-0505-2026 con radicado ANI 20264090902812 del 16 de julio de 2026 la Interventoría remitió al Concesionario el resultado de la revisión de la documentación correspondiente a 60 predios entregados el 3 de julio de 2026, en el marco de las actividades del Manual de Reversión. La revisión comprendió la titularidad de los predios, soportes de adquisición y pagos prediales, identificándose inconsistencias y faltantes relacionados principalmente con fichas prediales, escrituras y sus anexos, órdenes de pago, soportes de registro, certificaciones fiduciarias, mutaciones catastrales,

saneamiento automático, retenciones sobre lucro cesante y gastos notariales y registrales.

Asimismo, la Interventoría reiteró al Concesionario la obligación de completar y actualizar los expedientes prediales, conforme al Apéndice Técnico 7 y al Manual de Reversión, y solicitó aclaraciones y soportes adicionales para acreditar la correcta destinación de los recursos de la subcuenta predial. Se planteó además la necesidad de recibir directrices de la ANI sobre aspectos como la documentación de los expedientes, el tratamiento de gastos asociados al lucro cesante y la cancelación de anotaciones de intención de saneamiento automático.

Finalmente, se indicó que las observaciones de las entregas posteriores serían tratadas en las mesas de trabajo semanales, y se advirtió al Concesionario que la atención incompleta o extemporánea de las observaciones que afecte el cronograma de reversión será de su responsabilidad.

Por otra parte, mediante comunicado IPAB-0535-2026 del 23 de julio de 2026 con radicado ANI 20264090934952 del 23 de julio de 2026, la Interventoría elevó consulta formal a la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, con fundamento en el numeral 3.2 del Apéndice Técnico 7 – Gestión Predial, solicitando instrucciones para la aplicación de los criterios de revisión de los expedientes prediales durante la Etapa de Reversión.

La consulta se originó a partir de las inconsistencias identificadas durante la revisión de la documentación entregada por el Concesionario y comprendió, entre otros aspectos, la validación de las fichas prediales aprobadas por la anterior interventoría, la exigibilidad de la primera copia de las escrituras públicas con sus anexos, los soportes de pago y certificaciones fiduciarias, la procedencia de las facturas y recibos asociados a la adquisición predial, la inclusión del lucro cesante en la cuantía de las escrituras públicas y sus efectos sobre la liquidación de gastos notariales, registrales y tributarios, la eventual reliquidación y reintegro de valores pagados en exceso, el detalle de las órdenes de operación de la fiducia para la validación de reembolsos y el tratamiento de erogaciones no atribuibles al proyecto, como las comisiones bancarias.

Mediante la referida comunicación, la Interventoría solicitó a la ANI impartir las directrices correspondientes con el fin de unificar los criterios de revisión de los expedientes prediales durante la Etapa de Reversión y garantizar la correcta aplicación de las

disposiciones previstas en el Contrato de Concesión No. 016 de 2015, el Apéndice Técnico 7 – Gestión Predial, el Manual de Reversiones y la demás normativa aplicable.

Posteriormente, con comunicado IPAB-0538-2026 con radicado ANI No. 20264090938892 del 24 de julio de 2026, la Interventoría dio respuesta a las comunicaciones No. 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260713012501 y No. 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260713012502 del Concesionario, relacionadas con el cronograma de la Etapa de Reversión y la atención de las observaciones formuladas a la Entrega No. 1 del componente predial. En el comunicado la Interventoría presentó la trazabilidad de las actuaciones adelantadas entre la ANI, el Concesionario y la Interventoría, incluyendo las mesas de trabajo realizadas los días 07, 10, 15 y 17 de julio de 2026.

Como resultado de la revisión de la información correspondiente a las actividades de titularidad, pagos, inventario predial y visitas de campo, la Interventoría evidenció inconsistencias que impedían su validación integral, relacionadas con diferencias en la información financiera reportada, ausencia de soportes documentales, inconsistencias en las solicitudes de reembolso, liquidación de gastos notariales y registrales, inclusión del lucro cesante en conceptos que afectan los valores reconocidos por el proyecto, así como observaciones en los formatos e inventarios prediales y en las visitas de campo. En consecuencia, requirió al Concesionario subsanar integralmente las observaciones formuladas, remitir la documentación soporte pendiente, ajustar el cronograma para la atención de los requerimientos y complementar la información necesaria para continuar con el proceso de revisión y validación del componente predial en el marco de la Etapa de Reversión.

Posteriormente, mediante comunicación No. 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260726012600 del 28 de julio de 2026, el Concesionario dio respuesta al oficio IPAB-0481-2026 con radicado ANI 20264090878112 de fecha 9 de julio de 2026, relacionado con la solicitud de información y actualización del estado de la gestión predial en el marco de la Etapa de Reversión. En dicha comunicación, el Concesionario manifestó su posición frente a los requerimientos formulados por la Interventoría, indicando que parte de la información solicitada corresponde al seguimiento de la gestión predial ordinaria y no al procedimiento de reversión, así como que dicha información se encuentra contenida en los instrumentos contractuales de seguimiento predial. Igualmente, presentó consideraciones respecto del alcance de las obligaciones de suministro de información y de los términos para atender los requerimientos de la Interventoría.

Por otra parte, mediante comunicación No. 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260728012627 del 28 de julio de 2026 el Concesionario dio respuesta al comunicado IPAB-0505-2026 relacionada con la reversión para 60 predios entregados por el Concesionario el 3 de julio del 2026 – Revisión de titularidad, Revisión de soportes digitales de adquisición y pagos prediales-.

Ahora bien, mediante comunicación 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260727012618 del 27 de julio de 2026, el Concesionario reiteró a la ANI la solicitud de pronunciamiento frente a la liquidación de los gastos notariales y de registro asociados a los procesos de adquisición predial, particularmente respecto de la inclusión de los valores correspondientes a lucro cesante y daño emergente, asunto previamente consultado mediante los radicados 20234091050852 y 20244090895752 y en los comités de seguimiento predial realizados entre 2023 y 2026. La solicitud fue reiterada en el marco de la Etapa de Reversión, considerando que la definición de este criterio resulta necesaria para la revisión y recibo de los expedientes prediales.

Adicionalmente, con comunicado ANI No. 20266040286011 del 29 de julio de 2026, la ANI remitió al Concesionario y a la Interventoría la versión actualizada del Formato GCSP-F-052 v3.1 – Seguimiento y Control a la Gestión Predial del Concesionario, solicitando su implementación y diligenciamiento periódico para el reporte y seguimiento de la gestión predial. En atención a lo anterior, la Interventoría trasladó dicho requerimiento al Concesionario mediante comunicado IPAB-0650-2026, con radicado ANI No. 20264091079932 del 24 de agosto del 2026, para su correspondiente aplicación.

Mediante comunicado ANI No. 20266040289591 del 3 de agosto de 2026, la ANI dio respuesta a la consulta elevada por la Interventoría mediante comunicado IPAB-0535-2026 radicado 20264090934952 del 23 de julio de 2026, impartiendo lineamientos para la verificación del componente de Gestión Predial en la Etapa de Reversión y Liquidación. Entre otros aspectos, la ANI ratificó que el lucro cesante no debía incluirse en la cuantía de las escrituras públicas de compraventa y dispuso la reliquidación de los gastos notariales, impuesto de beneficencia y derechos de registro, así como el reintegro a la Subcuenta Predial de los valores pagados en exceso, incluidos los rendimientos financieros correspondientes.

Adicionalmente, a través de la comunicación IPAB-0602-2026 con radicado ANI 20264091002562 del 06 de agosto de 2026, dirigida a la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, la Interventoría presentó el alcance a la comunicación IPAB-0535-2026 con respuesta radicado ANI 20266040289591 del 3 de agosto de 2026, con el objetivo de recibir la complementación a la solicitud de la instrucción sobre la facturación

y soporte de registro en el componente predial, recibiendo la respuesta mediante comunicación Radicado ANI 20266060325931 del 26 de agosto de 2026.

Mediante comunicación 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260811012737 del 11 de agosto de 2026, el Concesionario dio respuesta al oficio IPAB-0537-2026 con radicado ANI 20264090938472 del 23 de julio del 2026, reiterando y actualizando la información relacionada con la Gestión Predial en el marco de la Etapa de Reversión. En la comunicación, precisó las respuestas previamente remitidas a los requerimientos IPAB-0481-2026 e IPAB-0438-2026 y señaló que, respecto de los 21 predios pendientes de intervención y adquisición a favor de la ANI, remitió a la Entidad, con copia a la Interventoría, el informe detallado mediante comunicación 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260727012615, con radicado ANI 20264090960752, dando continuidad a los compromisos establecidos en la mesa de trabajo del 22 de julio de 2026 y al seguimiento efectuado en el Comité de Control y Seguimiento a la Gestión Predial Antioquia–Bolívar del 31 de julio de 2026.

Adicionalmente, con comunicación 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260813012769 del 14 de agosto de 2026, el Concesionario dio respuesta a las observaciones formuladas por la Interventoría mediante comunicación IPAB-0538-2026, relacionadas con la revisión de la información predial entregada en el marco de la Etapa de Reversión. En dicha comunicación, manifestó su disposición para atender las observaciones asociadas a digitación, ajustes documentales, correcciones de abscisado y complementación de soportes, y señaló que, conforme a lo tratado en la mesa de trabajo del 10 de agosto de 2026 con participación de la ANI, la Interventoría y el Concesionario, las observaciones socializadas no impedían continuar con el proceso de reversión, dando respuesta a las observaciones correspondientes a las actividades de revisión de titularidad, visitas de campo y revisión de pagos.

Por lo anterior, mediante comunicación IPAB-0679-2026, con radicado ANI 20264091094802 del 26 de agosto de 2026, la Interventoría dio respuesta a la comunicación 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260813012769 del 14de agosto de 2026, relacionada con las observaciones efectuadas a la información predial correspondiente a la Entrega 1 de la Etapa de Reversión. En dicha comunicación, la Interventoría informó que, durante la segunda revisión de los 60 predios, se evidenciaron inconsistencias y observaciones que no habían sido subsanadas, asociadas principalmente al control de calidad de la información de titularidad y de los soportes de adquisición y pagos prediales. Asimismo, reiteró los requerimientos relacionados con los documentos protocolizados de las escrituras, el diligenciamiento del Formato GCSP-F-114, el seguimiento al saneamiento automático y la presentación de los recibos de radicación en registro, señalando que la atención extemporánea o incompleta de las

observaciones que afectara el cronograma de reversión sería responsabilidad del Concesionario.

Con comunicación 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260814012778 del 19 de agosto de 2026, el Concesionario dio respuesta al comunicado IPAB-0590-2026, relacionado con la instrucción impartida por la ANI respecto de la reliquidación de gastos notariales y registrales asociados a la inclusión del lucro cesante en las escrituras de adquisición predial. En dicha comunicación, el Concesionario manifestó que identificó los predios involucrados y adelantó gestiones ante las notarías competentes para solicitar la reliquidación correspondiente, precisando que estas actuaciones se realizan como mecanismo de colaboración y diligencia frente a la instrucción de la ANI, sin que impliquen aceptación del presunto sobrecosto, pago en exceso o de la posición jurídica planteada por la ANI y la Interventoría. Asimismo, reiteró su reserva de derechos frente a la interpretación jurídica sobre la base gravable y señaló que remitirá a la ANI y a la Interventoría las respuestas que sean emitidas por las entidades notariales.

Para atender lo anterior, y como respaldo a las instrucciones impartidas por la ANI, la Interventoría presentó los derechos de petición mediante el oficio IPAB-0668-2026 Radicado ANI 20264091081942 del 24 de agosto de 2026, dirigido a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales con Radicado DIAN 2026DP000273657 del 25 de agosto de 2026; y a su vez, el oficio IPAB-0617-2026 Radicado ANI 20264091033072 del 13 de agosto de 2026, dirigido al Instituto Geográfico Agustín Codazzi con Radicado IGAC 32005AF-2026-0061170-ER del 19 de agosto de 2026, solicitando al IGAC el Concepto Técnico respecto de la aplicación del artículo 17 de la Resolución IGAC 898 de 2014, frente a la liquidación y pago de los Gastos de Notariado y Registro, y a la DIAN EL Concepto Técnico y jurídico respecto de la aplicación del artículo 90 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 61 de la ley 2010 de 2019 en cuanto a la declaración del valor comercial del inmueble objeto de venta frente a la aplicación del numeral 1 del artículo 17 de la Resolución IGAC 898 de 2014, que determina la exclusión de la indemnización en el cálculo de los Gastos de Notariado y Registro.

Respecto al comunicado 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260728012627 del 28 de julio de 2026, por medio del cual el Concesionario dio respuesta a las observaciones a los 60 predios cargados a corte del 03 de julio de 2026, fue atendido por la Interventoría mediante comunicación IPAB-0649-2026 con radicado ANI 20264091079812 del 24 de agosto de 2026.

Finalmente, con ocasión al cruce de comunicaciones antes relacionado, se adelantó reunión conjunta sostenida el **25 de agosto de 2026**, entre la Interventoría y el Concesionario, por medio de la cual se socializó las observaciones encontradas en la revisión de la titularidad de los predios ANI, la situación que no ha permitido el avance

esperado por el Reproceso en las revisiones de la Interventoría sin encontrar los ajustes correspondientes, y la necesidad de cumplir con las entregas del componente de titularidad predial para el INVIAS, donde hay un avance significativo para el mes de julio en las siguientes actividades:

1. Los predios que cuentan con los datos corregidos en el archivo denominado “Revisión_Titularidad_Predios_ANI” de la Actividad 1 de cada Ruta.

2. El cumplimiento de las observaciones que correspondan a los archivos PDF de los documentos soporte de la adquisición predial cargados en la carpeta de la Actividad 5_Formato Inventario Predial, para cada predio.

Que las partes coincidieron en la preocupación en cuanto a que, a la fecha no se ha realizado la entrega de la información del componente predial del proyecto para el INVIAS, por encontrarse centrados en el cargue de información por parte del Concesionario y la Revisión de la Interventoría del archivo denominado “Revisión_Titularidad_Predios_ANI” de la Actividad 1 de cada Ruta, que en su momento se aceptó pero en el avance de la actividad se evidenció que no es práctico para mostrar resultados; más aún, al evidenciar que el archivo mencionado contiene alguna información jurídica que debe reposar en el Formato Inventario Predial (GCSP-F-114) de la carpeta de la actividad 5 de cada Ruta, y que corresponde al que se deberá entregar tanto a la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, como al INVIAS conforme lo descrito en el numeral 7.3 del Manual de Reversión.

Es así como, la Interventoría solicitó en la reunión al Concesionario migrar la información que reposa en el archivo denominado “Revisión_Titularidad_Predios_ANI”, de cada ruta entregada, al formato Inventario Predial (GCSP-F-114) de la carpeta de la Actividad 5 de cada Ruta, con el fin de no ser objeto de reprocesos, por contener la información idónea y ser el formato que se debe entregar como se mencionó; además, de solicitar al Concesionario que sea entregada la sábana predial en el formato GCSP-F-052 versión 3 remitido por la ANI mediante el oficio Radicado No. 20266040286011 del 29 de julio de 2026 "Remisión del Formato Predial Actualizado GCSP-F-052 Versión 3 – Seguimiento y Control a la Gestión Predial del Concesionario, para el Proyecto Vial IP Conexión Antioquia – Bolívar, en el marco del Contrato de Concesión No. 016 de 2015.", y así avanzar en su revisión para la entrega al INVIAS.

Que el Concesionario aceptó la estrategia de avance, con el compromiso de presentar la nueva metodología de entrega, y por su parte la Interventoría reconoce que el Concesionario cumplió con las fechas planteadas inicialmente en el cronograma a corte de agosto, respecto a la entrega de la información de la Actividad1_Revisióntitularidad mediante el archivo denominado “Revisión_Titularidad_Predios_ANI”; sin embargo, se

encontró un palpable reproceso para el mes de agosto ya que la dedicación correspondió a la segunda revisión de la atención a las observaciones de los predios relacionados en el oficio con Radicado 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260728012627 del 28 de julio de 2026 (60 predios) con respuesta IPAB-0649-2026 Radicado ANI 20264091079812 del 24 de agosto de 2026, y los predios relacionados en el oficio 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260813012769 del 13 de agosto de 2026 (189 predios) con respuesta IPAB-0679-2026 Radicado ANI 20264091094802 del 26 de agosto de 2026, teniendo en cuenta las instrucciones de la Agencia mediante la comunicación Radicado ANI N° 20266040289591 del 3 de agosto de 2026, y parando así la revisión de nuevos predios con un acumulado de 302 predios al mes de julio de 2026.

En consecuencia, el Concesionario mediante correo electrónico de fecha 28 de agosto de 2026 presentó a la Interventoría la modificación al cronograma predial “con el fin de adelantar la ejecución de la actividad 5 - Formato Inventario Predial (GCSP-F-114), se aclara que esta modificación No cambia los tiempos de terminación de cada actividad, además se actualiza el número de predios a Favor de la ANI que pasa de 1055 a 1056.”; es así como, por parte de la Interventoría para el mes de septiembre programa el inicio de la revisión del formato GCSP-F-114, que según lo informado por el Concesionario para la semana del 31 de agosto al 6 de septiembre se estará entregando el diligenciamiento de este formato de 150 Predios conforme al cronograma y corresponde a las UFI 1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 y 5.1; y que se espera el Concesionario tenga en cuenta las observaciones ya atendidas y las pendientes de atender.

Se aclaró al Concesionario que el archivo denominado “Revisión_Titularidad_Predios_ANI” de la actividad 1, No será objeto de revisión y presentación de observaciones, por cuanto No corresponde al formato idóneo a entregar según lo descrito en el numeral 7.3 del Manual de Reversión, con el fin de optimizar la gestión y su resultado.

Adicionalmente, la Interventoría implementará para el Formato Inventario Predial (GCSP-F-114), el método de revisión adelantado para el archivo denominado “Revisión_Titularidad_Predios_ANI”, por lo que remitió al Concesionario, el link de acceso al archivo de revisión para su acceso permanente, recomendándole que se informe a la Interventoría acerca de la atención a las observaciones que se lleguen a presentar.

Adicionalmente, mediante oficio IPAB-0650-2026 Radicado ANI 20264091079932 del 24 de agosto de 2026 la Interventoría solicitó migrar la información de la Sábana predial al Formato Predial Actualizado GCSP-F-052 Versión 3, obteniendo respuesta del Concesionario mediante oficio 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260928015068 del 28 de septiembre de 2026, informando que la Sabana Predial se encuentra actualizada

en el informe mensual de agosto radicado mediante la comunicación 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260904012945 del 04 de septiembre de 2026.

Es importante mencionar que, dada la respuesta del concesionario mediante comunicación 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260727012615 del 28 de julio de 2026 dirigida a la ANI en el cual remite el informe de los predios No Intervenidos, No adquiridos; la Interventoría expide el oficio IPAB-601-2026 Radicado ANI 20264091002482 del 06 de agosto de 2026 con el informe de los 21 predios No Adquiridos No Intervenidos.

De igual manera, mediante la comunicación 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260917013062 del 17 de septiembre de 2026 el Concesionario presentó la Actualización del estado de predios no intervenidos y no adquiridos – Reiteración de solicitud de directriz en el marco de la etapa de reversión adelantada con ocasión de la Terminación Anticipada del Contrato de Concesión IP No. 016 de 2015. Proyecto Vial Conexión Antioquia–Bolívar; y la Interventoría mediante oficio IPAB-0794-2026 Radicado ANI 20264091231242 del 21 de septiembre de 2026, se pronunció respecto al oficio RUTADCTOELECTRONICOS-20260727012615 y dio alcance al informe con oficio IPAB-601-2026.

Por otra parte, mediante comunicado IPAB-0718-2026, con radicado ANI No. 20264091141842 del 3 de septiembre de 2026, la Interventoría dio alcance a los comunicados IPAB-0649-2026 e IPAB-0679-2026, en atención a la información remitida por el Concesionario el 28 de agosto de 2026. En este sentido, precisó que la revisión de la información predial se efectuaría sobre el formato GCSP-F-114 Inventario Predial V3, conforme a lo establecido en el numeral 7.3 del Manual de Reversiones, y reiteró la necesidad de atender las observaciones consignadas en el archivo *“Revisión_Titularidad_Predios_ANI”*, con el propósito de evitar reprocesos.

En atención a lo anterior, mediante comunicado 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260921013078 del 21 de septiembre de 2026, el Concesionario informó sobre la migración y actualización de la información en el formato GCSP-F-114, indicando que, de los 60 predios inicialmente revisados mediante IPAB-0649-2026, 58 predios (96,7 %) se encontraban aprobados y que, en términos generales, se habían alineado los criterios frente a las principales observaciones formuladas. No obstante, manifestó que persistían diferencias relacionadas con anexos escriturales, saneamiento automático, recibos de radicación en registro y facturas o recibos no expedidos a nombre de la ANI. Finalmente, señaló que los predios pendientes de aprobación o revisión serían migrados y reportados directamente en el formato GCSP-F-114, entendido por el Concesionario como el instrumento único para la revisión, aprobación y cierre del inventario predial.

Adicional a lo anterior, mediante comunicado IPAB-0759-2026, con radicado ANI No. 20264091192232 del 14 de septiembre de 2026, la Interventoría dio respuesta a las comunicaciones No. 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260726012600 del 28 de julio de 2026 y 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260811012737 del 11 de agosto de 2026, incorporando la información validada durante la mesa de trabajo del 7 de septiembre de 2026. Como resultado de la revisión, se identificaron 203 predios intervenidos no adquiridos, correspondientes a 7 predios baldíos, 175 en proceso de expropiación judicial y 21 en proceso de enajenación voluntaria, así como 19 predios adquiridos a favor de la ANI que no han sido intervenidos.

En respuesta, mediante comunicado 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260918013070 del 21 de septiembre de 2026, el Concesionario manifestó que la situación de los 203 predios obedecía, en su mayoría, a actuaciones de autoridades judiciales y administrativas, e informó como estrategia la vigilancia permanente de los procesos, la presentación de memoriales de impulso y la reiteración de solicitudes ante los despachos judiciales, ORIP, IGAC, ANT y ANI. Frente a los predios adquiridos a favor de la ANI y no intervenidos, señaló que mantendría su custodia, cercado y vigilancia durante la Etapa de Reversión. Asimismo, solicitó a la Interventoría recomendar a la ANI la expedición de directrices respecto de las actuaciones requeridas en los procesos judiciales y manifestó su posición frente al término de cinco días señalado por la Interventoría para atender el requerimiento.

Adicionalmente, con comunicado IPAB-0761-2026, con radicado ANI No. 20264091193252 del 14 de septiembre de 2026, la Interventoría trasladó al Concesionario la respuesta emitida por el IGAC mediante radicado 2520SAV-2026-0001198-EE, caso 2028919, así como la respuesta de la ANI contenida en el radicado 20266060325931 del 26 de agosto de 2026, relacionada con la facturación y los soportes de registro correspondientes, para su conocimiento y las gestiones que resultaran pertinentes.

Finalmente, con comunicado 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260928015068 del 28 de septiembre de 2026, el Concesionario dio respuesta al oficio IPAB-0650-2026 del 24 de agosto de 2026, relacionado con el formato GCSP-F-052 V3 – Seguimiento y Control a la Gestión Predial del Concesionario, informando que dicho formato se encontraba actualizado y que había sido incorporado en el informe mensual correspondiente a agosto de 2026, remitido mediante radicado 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260904012945 del 4 de septiembre de 2026.

Gestiones respecto al cronograma y aclaraciones sobre la entrega de Información

La Interventoría, mediante comunicado IPAB-0468-2026 radicado ANI No. 20264090851052 del 03 de julio de 2026, presentó al Concesionario las observaciones derivadas de la revisión preliminar de la Entrega No. 1 del proceso de reversión correspondiente a las rutas 9004, 9004A, 90SCA y 9005, así como las observaciones al cronograma de reversión, producto de la revisión de la información cargada por el Concesionario en los formatos establecidos en el Manual de Reversión.

En atención a lo anterior, el Concesionario, mediante comunicación No. 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260713012502 del 14 de julio de 2026, presentó respuesta a las observaciones formuladas por la Interventoría, allegando aclaraciones y ajustes a la información previamente entregada.

Una vez analizada la respuesta del Concesionario y verificada la información documental y las inspecciones realizadas en campo, la Interventoría, mediante comunicado IPAB-0499-2026 con radicado ANI 20264090900782 del 15 de julio de 2026, concluyó que persistían inconsistencias técnicas, documentales y de inventarios que impedían validar la información presentada para la Entrega No. 1 del proceso de reversión.

Por otra parte, con comunicación No. 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260714012512 del 15 de julio de 2026, el Concesionario dio respuesta al comunicado ANI No. 20263050219731, relacionado con la remisión del Manual GCSP-M-001 – Manual de Reversiones ANI y los formatos técnicos para la Etapa de Reversión. En su respuesta manifestó que el proceso de reversión y el diligenciamiento de los formatos se vienen desarrollando conforme al Contrato de Concesión No. 016 de 2015 y al Manual de Reversiones, indicando que la información entregada ha sido preparada siguiendo la estructura y alcance definidos por dichos documentos.

Adicionalmente, el Concesionario señaló que continuará atendiendo los requerimientos formulados por la ANI y la Interventoría, siempre que correspondan a obligaciones previstas en el Contrato de Concesión, el Manual de Reversiones y la normativa aplicable, reiterando su disposición para desarrollar la Etapa de Reversión de manera coordinada con la ANI, la Interventoría y el INVÍAS, con el propósito de realizar una entrega ordenada, completa y técnicamente sustentada de la infraestructura objeto del contrato.

Posteriormente, mediante comunicado IPAB-0541-2026, con radicado ANI 20264090941562 del 24 de julio de 2026, la Interventoría dio respuesta a las

comunicaciones del Concesionario Nos. 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260713012501 y 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260713012502, mediante las cuales este remitió el cronograma actualizado para la Etapa de Reversión y presentó observaciones a los comunicados IPAB-0417-2026, con radicado ANI 20264090784562 del 19 de junio de 2026, e IPAB-0468-2026, con radicado ANI 20264090851052 del 3 de julio de 2026.

En dicho comunicado, la Interventoría consolidó la trazabilidad de las actuaciones adelantadas y reiteró las observaciones formuladas mediante el IPAB-0468-2026. Asimismo, se hizo referencia a la respuesta emitida mediante el IPAB-0499-2026, con radicado ANI 20264090900782 del 15 de julio de 2026, correspondiente a los componentes de Operación, Mantenimiento, Social y Ambiental, y al comunicado IPAB-0538-2026, con radicado ANI 20264090938892 del 24 de julio de 2026, correspondiente al componente Predial.

Así mismo, se informó el estado de revisión de la información entregada por el Concesionario y se establecieron los cronogramas de revisión de los componentes de Mantenimiento y Operación, Ambiental y Social, así como el cronograma para la entrega de los resultados de la medición de indicadores.

Adicionalmente, la Interventoría formuló nuevas observaciones derivadas de la revisión de la información suministrada por el Concesionario, relacionadas con los formatos ambientales, la programación de los entregables sociales, el estado de avance de la información jurídica y financiera y el cronograma general de la Etapa de Reversión.
Finalmente, requirió al Concesionario ajustar el cronograma incorporando las fechas para la atención de las observaciones formuladas, unificar la programación de las entregas para la ANI y el INVÍAS, garantizar que cada entrega contenga la totalidad de la información exigida por el Manual de Reversión y los requerimientos del INVÍAS, y reiteró que la continuidad de la revisión por parte de la Interventoría dependerá de la atención integral y oportuna de las observaciones comunicadas.

Por otra parte, la Interventoría tuvo conocimiento de la respuesta remitida por el INVIAS mediante radicado No. 2026S-VBOG-054557 del 4 de agosto de 2026, en atención a la solicitud del Concesionario relacionada con la corrección del abscisado y las coordenadas geográficas de los Postes de Referencia (PR) de la Ruta 21CR04 – Ramal Santa Lucía–San Pelayo. En dicha comunicación, el Instituto señaló que, conforme a la Resolución 339 de 1999, la referenciación propuesta requiere ser ajustada con el fin de garantizar la correcta jerarquización de la nomenclatura vial, indicando que el ramal

corresponde al código 21CR04. Posteriormente, el Concesionario, mediante comunicación 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260805012694 del 6 de agosto de 2026, manifestó su conocimiento de lo indicado por el INVIAS y su disposición para brindar el apoyo técnico e información requeridos para adelantar el ajuste.

Por lo anterior, mediante comunicación IPAB-0627-2026, con radicado ANI 20264091040482 del 14 de agosto de 2026, la Interventoría dio respuesta a la comunicación 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260805012694 del 6 de agosto de 2026, relacionada con la respuesta del INVÍAS frente a la corrección del abscisado y de las coordenadas geográficas de los Postes de Referencia (PR) de la Ruta 21CR04 – Ramal Santa Lucía–San Pelayo. En dicha comunicación, la Interventoría manifestó su conformidad con la referenciación definida por el INVÍAS, de acuerdo con la Resolución 339 de 1999, y señaló la necesidad de garantizar la correspondencia entre la nueva referenciación oficial y la utilizada históricamente durante la ejecución del contrato, con el fin de preservar la continuidad y trazabilidad de la información de accidentalidad, indicadores, inventarios, operación, mantenimiento e inspecciones. Asimismo, recomendó al Concesionario presentar una propuesta técnica para implementar dicha referenciación, la cual deberá ser socializada con la ANI y posteriormente con el INVÍAS para su definición y adopción.

Posteriormente, mediante comunicación 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260804012678 del 10 de agosto de 2026, el Concesionario dio respuesta a las comunicaciones IPAB-0499-2026 con radicado ANI 20264090900782 del 15 de julio de 2026 e IPAB-0541-2026 con radicado ANI 20264090941562 del 24 de julio de 2026, relacionadas con las observaciones formuladas por la Interventoría al cronograma de reversión y a la información correspondiente a la Entrega 1 (Rutas 9004, 9004A, 90SCA y 9005). En la comunicación, el Concesionario informó los ajustes realizados al cronograma, particularmente en los componentes de indicadores, operación y mantenimiento, ambiental, predial y social, y señaló que se encontraba atendiendo y cargando progresivamente las correcciones a los formatos observados.

Por lo anterior, mediante comunicación IPAB-0637-2026 con radicado ANI 20264091048462 del 14 de agosto de 2026, la Interventoría dio respuesta al Concesionario respecto de la comunicación 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260804012678, manifestando su **no objeción a las fechas del cronograma de reversión**, sujeto a su cumplimiento oportuno y a la actualización de las fechas reales de cargue. Asimismo, requirió completar y verificar la información pendiente del componente de Operación y Mantenimiento, reiteró los criterios de revisión para los componentes

Ambiental, Social y Predial, y solicitó atender integralmente las observaciones formuladas, con el fin de garantizar la revisión y consolidación de la información correspondiente a la Entrega 1 prevista para el 24 de agosto de 2026.

Por otra parte, mediante comunicado ANI No. 20263050308291 del 11 de agosto de 2026, la ANI solicitó al INVIAS definir la viabilidad de recibir por cesión el Convenio Marco de Cooperación suscrito entre URRÁ S.A. E.S.P. y el Concesionario, junto con la infraestructura asociada a las tres electrolineras instaladas en el corredor concesionado, en el marco del proceso de reversión. Para tal efecto, la ANI informó el estado de las estaciones de Mata de Caña, Los Manguitos y San Onofre y solicitó indicar las condiciones y documentos requeridos para formalizar la eventual cesión o, en caso de no resultar viable, comunicarlo oportunamente para gestionar el retiro de los equipos y la restitución de las áreas, con el fin de garantizar la continuidad y adecuada programación del proceso de entrega y recibo de la infraestructura.

Por otra parte, mediante comunicación 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260820012802 del 20 de agosto de 2026, el Concesionario realizó una entrega parcial de la información requerida por el INVÍAS para el recibo de los tramos objeto de reversión, en atención a los lineamientos y formatos remitidos por la ANI. La información fue consolidada y organizada conforme a los requerimientos establecidos, comprendiendo los componentes contractuales, técnico, social, ambiental, estaciones de peaje y pesaje, bienes, equipos e ITS, entre otros.

Posteriormente, la Interventoría efectuó la revisión, validación y complementación de la documentación, identificando la información completa, parcial y pendiente, y mediante comunicación IPAB-0669-2026, con radicado ANI 20264091084992 del 24 de agosto de 2026, presentó a la ANI la Entrega 1 de información para el proceso de recibo por parte del INVÍAS, manteniéndose el seguimiento a los aspectos pendientes y a las actualizaciones que realice el Concesionario, esta información fue revisada y trasladada por la ANI al INVIAS mediante comunicación 20263050335091 de fecha 1 de septiembre del 2026.

Por otra parte, con comunicación 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260818012793 del 21 de agosto de 2026, el Concesionario solicitó a la ANI definiciones necesarias para continuar con la preparación y ejecución de las actividades asociadas al proceso de reversión. En particular, requirió precisiones sobre la infraestructura, servicios, bienes, permisos ambientales, vehículos y actividades que serán objeto de entrega o transferencia, incluyendo las electrolineras y restaurantes de las áreas de servicio, el

Punto de Conectividad de Mata de Caña, los tramos que serán recibidos por el INVÍAS, el sistema de abscisado del tramo Santa Lucía–San Pelayo, la cesión de permisos de vertimientos, el cambio de suscriptor de los servicios públicos y el traspaso de vehículos.

El Concesionario señaló que estas definiciones son necesarias para establecer el alcance de las entregas, preparar la documentación requerida y programar oportunamente los trámites administrativos, técnicos y ambientales correspondientes, indicando que continuará adelantando las actividades que no dependan de dichas definiciones.

Mediante comunicado 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260830012889 del 1 de septiembre de 2026, el Concesionario dio respuesta al IPAB-0637-2026, remitiendo el cronograma de Reversión actualizado y reportando el estado de avance de las entregas de información de los componentes de Operación y Mantenimiento, Ambiental, Social y Predial. Asimismo, informó las actividades pendientes y las fechas previstas para su atención, manifestando que continuaría con la complementación y ajuste de la información requerida por la Interventoría.

Mediante comunicado 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260902012935 del 2 de septiembre de 2026, el Concesionario dio respuesta al IPAB-0627-2026 respecto de la referenciación de la Ruta 21CR04 – Ramal Santa Lucía–San Pelayo, manifestando la necesidad de armonizar la referenciación oficial definida por el INVÍAS con la utilizada históricamente durante la operación. Para tal efecto, propuso reubicar las señales PR conforme a las coordenadas oficiales, actualizar los inventarios del Manual de Reversión y conservar una referencia de los PR históricos que permita identificar la información de mantenimiento, inspecciones e indicadores generada durante la operación.

Posteriormente, mediante comunicado 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260909012983 del 9 de septiembre de 2026, el Concesionario dio alcance a la comunicación anterior y, atendiendo las aclaraciones solicitadas por la Interventoría, precisó la metodología propuesta para la transición entre la referenciación oficial y la histórica. Como alternativas para conservar físicamente la identificación histórica planteó mantener los postes existentes, debidamente señalizados, o retirarlos y construir placas o mojones a nivel del terreno con la identificación de los PR históricos, solicitando el concepto de la Interventoría y/o de la ANI.

Mediante comunicado IPAB-0777-2026, con radicado ANI 20264091214482 del 17 de septiembre de 2026, la Interventoría analizó la propuesta presentada por el Concesionario y reiteró que la información objeto de entrega en la Etapa de Reversión

debe ajustarse a la referenciación oficial establecida por el INVÍAS para la Ruta 21CR04. En relación con la conservación de la referenciación histórica, la Interventoría emitió concepto favorable a la Alternativa 2, consistente en retirar los postes de concreto existentes y disponer placas de concreto a nivel de piso, identificadas como referencia histórica, ubicadas fuera de la berma, georreferenciadas y vinculadas a una matriz de equivalencia entre la referenciación histórica y la oficial. Asimismo, señaló que la transición no debe alterar ni eliminar la información histórica y que el mecanismo de correspondencia deberá quedar formalmente documentado dentro del proceso de Reversión. Finalmente, con comunicado IPAB-775-2026 radicado ANI 20264091214392 de fecha 17 de septiembre del 2026 la Interventoría informó a la ANI sobre el concepto emitido, quedando a la espera de las directrices de la Entidad.

Por otra parte, mediante comunicado ANI No. 20263050346801 del 10 de septiembre de 2026, la ANI remitió al Concesionario y a la Interventoría el pronunciamiento del INVÍAS No. 2026S-VBOG-061578 del 28 de agosto de 2026, relacionado con la infraestructura objeto de recibo en la Etapa de Reversión. El INVÍAS presentó el análisis de los sectores viales del proyecto, identificando aquellos que hacen parte de la Red Vial Nacional, formulando observaciones sobre otros corredores cuya competencia o incorporación a dicha red requiere ser acreditada y solicitando a la ANI la documentación relacionada con su eventual nacionalización. Asimismo, indicó que la definición sobre el recibo de las estaciones de peaje continuaba en estudio y solicitó, de ser necesario, la realización de una mesa de trabajo para aclarar la competencia y condiciones de entrega y recibo. La ANI solicitó al Concesionario y a la Interventoría presentar sus observaciones, comentarios o solicitudes de aclaración dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación.

Posteriormente, mediante comunicado IPAB-792-2026, con radicado ANI 20264091224532 del 18 de septiembre de 2026, la Interventoría presentó a la ANI su análisis frente al pronunciamiento del INVÍAS, particularmente respecto de las UFI 3.1, 3.5, 5.2, 7.2 y 7.3, señalando que, si bien cuentan con antecedentes de categorización, nomenclatura o reconocimiento institucional, se requiere acreditar mediante el correspondiente acto administrativo o instrumento jurídico su nacionalización o incorporación a la infraestructura a cargo del INVÍAS. Igualmente, frente a las UFI 3.2, 3.3 y 3.4, indicó que la categorización como vías de segundo orden no acredita por sí sola su pertenencia al INVÍAS, por lo que se requiere definir formalmente la titularidad y competencia sobre dichos corredores. En relación con las estaciones de peaje Caimanera y San Carlos, precisó que Caimanera no cuenta con infraestructura construida

objeto de entrega, mientras que la situación de San Carlos debe ser evaluada integralmente dentro de la Reversión, considerando su incorporación a la red vial nacional y su función dentro del sistema de operación y recaudo del proyecto.

Por otra parte, mediante comunicación 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260915013036 del 16 de septiembre de 2026, el Concesionario presentó el avance de la segunda entrega de información requerida por el INVÍAS para el recibo de los tramos objeto de Reversión, con corte al 14 de septiembre de 2026. La documentación fue dispuesta en el enlace habilitado para su consulta y quedó sujeta al proceso de revisión y validación por parte de la Interventoría.

Una vez realizada la revisión y validación de la documentación que cumplía con los requerimientos aplicables, la Interventoría consolidó la información correspondiente a la Entrega 2 y la remitió a la ANI mediante comunicado IPAB-811-2026, con radicado ANI 20264091261832 del 25 de septiembre de 2026, como alcance al comunicado IPAB-0669-2026, radicado ANI 20264091084992 del 24 de agosto de 2026. La información fue organizada conforme a los capítulos y subnumerales establecidos por el INVÍAS para facilitar su identificación y gestión.

Posteriormente, la ANI trasladó dicha información al INVÍAS mediante comunicado No. 20263050380901 de fecha 6 de octubre del 2026, con asunto: *"Complemento radicado ANI No. 20263050335091 – Respuesta comunicado INVÍAS 2026S-VBOG-037396 con radicado ANI No. 20264090708272 del 03 de junio de 2026 – Solicitud Recopilación de Información para Gestión de Entrega de Infraestructura al INVÍAS por Terminación Anticipada del Contrato de Concesión IP No. 016 de 2015. Proyecto Vial Conexión Antioquia – Bolívar. Entrega 2",* formalizando así el traslado de la información consolidada para la gestión de entrega de la infraestructura al INVÍAS.

Finalmente, esta Interventoría reitera su disposición para acompañar y realizar el seguimiento a las actividades de reversión, con el propósito de garantizar la oportunidad, consistencia, trazabilidad y calidad de la información que deba ser entregada a la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, al Instituto Nacional de Vías – INVIAS y a las demás entidades territoriales, en el marco del proceso de reversión y entrega de la infraestructura correspondiente al Proyecto IP Conexión Antioquia – Bolívar.

Como soporte de lo anterior se presenta el **Anexo 2.2** correspondiente a las comunicaciones entre las partes.

3.2.5.3. Seguimiento Cronograma Reversión.

En el marco del proceso de Reversión, la Interventoría realiza el seguimiento a la preparación, revisión, consolidación y entrega de la información, infraestructura, bienes, activos y demás elementos requeridos para su recibo por parte de las entidades competentes. Para tal efecto, se verifica el cumplimiento de las actividades programadas, contrastando las fechas previstas con las efectivamente ejecutadas e identificando las actividades pendientes, con el fin de realizar el seguimiento correspondiente.

A continuación, se presenta el estado actualizado del Cronograma de Reversión, en el cual se detallan los avances alcanzados, las actividades en desarrollo y aquellas que se encuentran pendientes de ejecución.

Componente Técnico y Operación

Teniendo en cuenta las mesas de trabajo y conversaciones adelantadas entre la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, el Concesionario y esta Interventoría, se acordó realizar las verificaciones en campo de manera conjunta entre el Concesionario y la Interventoría, permitiendo que el Concesionario conozca las observaciones formuladas a cada formato en tiempo real y pueda programar su atención en el menor tiempo posible.

Bajo esta metodología de trabajo, esta Interventoría se permite informar el avance de la revisión correspondiente a cada una de las entregas de información relacionadas por el Concesionario en el cronograma.

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	FECHA DE ENTREGA DEL CONCESIONARIO	FECHA 1 y 2 DE OBSERVACIONES INTERVENTORÍA	FECHA 2 DE OBSERVACIONES INTERVENTORÍA	FECHA 3 DE OBSERVACIONES INTERVENTORÍA	FECHA APROBACIÓN Y ENTREGA A LA ANI
Técnico					
Entrega 1 (Rutas 9004, 9004A, 90SCA, 9005)	15/07/2026	14/08/2026 28/08/2026	14/08/2026 28/08/2026	4/9/2026	Entrega 2 *2/10/26*
Entrega 2 (7401, 21CR04, 2103)	15/07/2026	14/08/2026	14/08/2026 28/08/2026	4/9/2026	Entrega 2 *2/10/26*

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	FECHA DE ENTREGA DEL CONCESIONARIO	FECHA 1 y 2 DE OBSERVACIONES INTERVENTORÍA	FECHA 2 DE OBSERVACIONES INTERVENTORÍA	FECHA 3 DE OBSERVACIONES INTERVENTORÍA	FECHA APROBACIÓN Y ENTREGA A LA ANI
Entrega 3 (2513, 25CRA, 74CR01, 74CRA, 2310)	15/07/2026	14/08/2026 28/08/2026	14/08/2026 28/08/2026	4/9/2026	Entrega 2 *2/10/26*
Operación					
Entrega 1 (Rutas 9004, 9004A, 90SCA, 9005)	15/07/2026	14/08/2026	14/08/2026 28/08/2026	4/9/2026	Entrega 2 *2/10/26*
Entrega 2 (7401, 21CR04, 2103)	15/07/2026	14/08/2026	14/08/2026 28/08/2026	4/9/2026	Entrega 2 *2/10/26*
Entrega 3 (2513, 25CRA, 74CR01, 74CRA, 2310)	15/07/2026	14/08/2026 28/08/2026	14/08/2026 28/08/2026	4/9/2026	Entrega 2 *2/10/26*

En el **Anexo 2.3** se presenta el estado de la revisión de la información reportada por el Concesionario a la fecha de corte del presente informe. Se estima que la entrega de estos formatos a la ANI finalizará en la fecha prevista para la Entrega 3, al cierre del mes de octubre de 2026, teniendo en cuenta la extensión de la revisión requerida.

Componente Ambiental

Una vez revisado el cronograma establecido por el Concesionario para la entrega de la información, esta Interventoría presenta el resultado de la revisión correspondiente a cada Unidad Funcional, así como el estado actual del cargue de la información a la ANI en el enlace dispuesto para tal fin.

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	FECHA DE ENTREGA DEL CONCESIONARIO	FECHA 1 DE OBSERVACIONES INTERVENTORÍA	FECHA 2 DE OBSERVACIONES INTERVENTORÍA	FECHA 3 DE OBSERVACIONES INTERVENTORÍA	FECHA APROBACIÓN Y ENTREGA A LA ANI
Entrega 1 (UFI 4.1, 4.2)	14/07/2026	22/07/2026	5/08/2026	No aplicó	24/08/2026

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	FECHA DE ENTREGA DEL CONCESIONARIO	FECHA 1 DE OBSERVACIONES INTERVENTORÍA	FECHA 2 DE OBSERVACIONES INTERVENTORÍA	FECHA 3 DE OBSERVACIONES INTERVENTORÍA	FECHA APROBACIÓN Y ENTREGA A LA ANI
Entrega 1 (UFI 5.1)	14/07/2026	1/08/2026	28/08/2026	No aplicó	25/09/2026
Entrega 1 (UFI 8)	12/08/2026	28/08/2026	11/09/2026	21/09/2026	3ra entrega
Entrega 1 (UFI 8.3)	9/07/2026	5/08/2026	18/08/2026	21/08/2026	25/09/2026
Entrega 2 (UFI 2 y 6.1)	14/07/2026	24/07/2026	En revisión por IPAB		3ra entrega
Entrega 2 (UFI 6.2)	9/07/2026	24/07/2026	22/07/2026	12/08/2026	24/08/2026
Entrega 2 (UFI 6.3)	9/07/2026	27/07/2026	29/07/2026	12/08/2026	24/08/2026
Entrega 3 (UFI 1)	21/07/2026	25/08/2026	3/09/2026	No aplicó	25/09/2026
Entrega 3 (UFI 3.1)	26/08/2026	7/09/2026	23/09/2026	No aplicó	3ra entrega
Entrega 3 (UFI 3.2, 3.4)	23/07/2026	13/08/2026	19/08/2026	No aplicó	25/09/2026
Entrega 3 (UFI 3.3)	20/08/2026	1/09/2026	10/09/2026	No aplicó	25/09/2026
Entrega 3 (UFI 3.5)	2/09/2026	11/09/2026	En revisión por IPAB		3ra entrega
Entrega 3 (UFI 7.1)	No aplica entrega en el tema ambiental				
Entrega 3 (UFI 7.2)	21/07/2026	7/09/2026	18/08/2026	25/08/2026	25/09/2026
Entrega 3 (UFI 7.3)	4/09/2026	21/09/2026	En revisión por IPAB		3ra entrega

Componente Social

Una vez revisado el cronograma presentado por el Concesionario para la entrega de la información para la Etapa de Reversión, esta Interventoría presenta el estado de la revisión correspondiente a cada Unidad Funcional:

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	FECHA DE ENTREGA DEL CONCESIONARIO	FECHA 1 DE OBSERVACIONES INTERVENTORÍA	FECHA 2 DE OBSERVACIONES INTERVENTORÍA	FECHA APROBACIÓN Y ENTREGA A LA ANI
UFI 8	30/06/2026	27/07/2026	No aplicó	1ra entrega
UFI 6	15/07/2026	3/08/2026	No aplicó	1ra entrega
UFI 7	15/07/2026	3/08/2026		3ra entrega
UFI 4 y 5	22/07/2026	17/08/2026		2da entrega
UFI 1 y 3	31/07/2026	30/082026	En revisión por CORUMAR	3ra entrega
UFI 2	11/08/2026	30/08/2026	En revisión por CORUMAR	3ra entrega

Componente Predial

A corte del presente informe, el Concesionario ha realizado tres entregas del formato GCSP-F-114 – Inventario Predial V3, correspondientes a 464 predios, lo cual se detalla a continuación.

Entrega	Fecha	Predios	UFI / tramo
1	4/09/2026	**151**	2513-1, 25CRA-3.1, 74CRA01-3.2, 74CRA01-3.3, 74CRA01-3.4 y 7401-5.1
2	11/09/2026	**163**	74CRA-3.5, 2103-6.1 y 9004-6.2
3	25/09/2026	**150**	9005-8.3
Total		**464**	

Fuente: propia (2026)

En el **Anexo 2.4** se presenta al estado actual de la revisión realizada por esta Interventoría a la información del formato GCSP-F-114 cargada por el Concesionario a corte del 30 de septiembre de 2026, que para su validación se han tenido en cuenta los documentos PDF cargados en la carpeta denominada *soportes_AdquisicionExpedientes* de cada Ruta, estando el enlace de seguimiento a disposición del Concesionario para la atención de observaciones.

Con este fin, se llevaron a cabo (2) dos mesas de trabajo en fechas 16 y 23 de septiembre de 2026 para aprobación del formato *GCSP-F-114 inventario predial V3* y el formato *GCSP-052 Sabana predial*, de 68 predios de las UF 2513-1 (2), 25CRA-3.1(8), 74CRA01-3.2 (58), que hacen parte de la entrega dos (2) INVIAS realizada mediante el oficio IPAB-0811-2026 Radicado ANI 20264091261832 del 25 de septiembre de 2026.

A continuación, se presenta el Cuadro resumen con corte al 25 de septiembre de 2026 de la información cargada por el Concesionario e informada a la Interventoría, así:

Entrega 04-09-2026 Actividad 5 (151 predios)	**REVISIÓN TITULARIDAD GCSP-F-114**	**APROBADOS al 30-09-2026**	**VISITAS DE CAMPO GCSP-F-114**	**APROBADOS al 30-09-2026**
1.2513-1 (2)	2	2	2	2
2.25CRA-3.1(8)	8	8	8	8
3.74CRA01-3.2 (58)	58	58	58	58
3.74CRA01-3.3 (56)	56	55	56	0
3.74CRA01-3.4 (25)	25	25	25	0
6.7401-5.1 (2)	0	0	2	0
Entrega 11-09-2026 Actividad 5 (163 predios)	**REVISIÓN TITULARIDAD GCSP-F-114**	**APROBADOS al 30-09-2026**	**VISITAS DE CAMPO GCSP-F-114**	**APROBADOS al 30-09-2026**
4.74CRA-3.5 (54)	54	28	55	0
8. 2103-2_6.1 (69)	55	0	0	0
9.9004-6.2 (40)	0	0	34	0
Entrega 25-09-2026 Actividad 5 (150 predios)	**REVISIÓN TITULARIDAD GCSP-F-114**	**APROBADOS al 30-09-2026**	**VISITAS DE CAMPO GCSP-F-114**	**APROBADOS al 30-09-2026**
12.9005-8.3 (150)	0	0	171	0
TOTAL	**258**	**176**	**411**	**68**

Fuente: propia (2026)

Se estima que para la Entrega 3 programada finalizando el mes de octubre del 2026 el componente predial remita a la ANI lo siguiente:

COMPONENTE PREDIAL	FECHA DE ENTREGA DEL CONCESIONARIO	FECHA 1 DE OBSERVACIONES INTERVENTORÍA	FECHA APROBACIÓN Y ENTREGA A LA ANI
Identificación de los predios adquiridos para construcción de cada proyecto, señalando áreas adquiridas, trámites de legalización y titularización adelantados, problemas vigentes para cada predio, si los hubiere, uso de cada predio, suministrando el soporte documental correspondiente y como mínimo debe enviarse: Sabana Predial, Expedientes, soporte de valor para registro contable, información geografica, desenglobes y registro en folio, descripción de construcciones asociadas	04-09-2026 11-09-2026 25-09-2026	14-09-2026 28-09-2026 30-10-2026	23-10-2026
Planos de diseño definitivo de las vías construidas, superponiendo sobre ellos la tira predial (áreas de afectación predial), en forma tal que sea posible visualizar, además de la zona de carretera establecida en la Ley 1228 de 2008 para una vía de primer orden, las áreas de terreno determinadas como requeridas por la línea de chaflán en corte o relleno, para garantizar la estabilidad de la banca y de los taludes y la transitabilidad de los corredores viales.	En validación de entregas	A la espera de confirmación del Concesionario	

Componente Financiero

En relación con el componente Financiero, se realiza seguimiento a las actividades asociadas con la entrega, revisión, conciliación y consolidación de la información requerida para la Etapa de Reversión, así como a las gestiones relacionadas con la remuneración del Concesionario. A continuación, se presenta el estado de los principales asuntos, incluyendo los aspectos Financiero-Predial, Financiero-Operativo y el avance del Otrosí No. 19, identificando las actividades pendientes y aquellas cuya ejecución se

encuentra sujeta a la entrega de información, atención de observaciones y definiciones por parte del Concesionario, la ANI y terceros, a Continuación, se describen las actividades realizadas sobre el particular durante el presente periodo.

1. En el marco de la revisión del informe de peaje relacionado con el Costo Básico de Operación de Recaudo, esta Interventoría verificó la información reportada por el Concesionario Ruta al Mar frente a los Estados Financieros (EE.FF.) del primer semestre de 2026 remitidos por la Fiduciaria Bancolombia, e identificó diferencias entre las cifras del informe y dichos estados. En consecuencia, y con el fin de asegurar la idoneidad de la información, se solicitó al Concesionario adoptar los EE.FF. como soporte único y fidedigno del informe de costos, requerimiento que fue acogido. La información así soportada fue objeto de validación detallada y, como resultado, se ajustaron los valores de recaudo del semestre, así como los asociados al costo de personal.

2. En relación con la revisión de los informes de pesaje, una vez recibido el reporte semestral del Costo de Mantenimiento de Equipos, Software y Bases de Datos, esta Interventoría efectuó la conciliación de las cifras reportadas frente a los Estados Financieros (EE.FF.) del primer semestre de 2026 emitidos por la Fiduciaria Bancolombia, evidenciando diferencias entre ambas fuentes. En consecuencia, se requirió al Concesionario una revisión exhaustiva de la información, producto de la cual Ruta al Mar ajustó las cifras reportadas de conformidad con los registros contables del Patrimonio Autónomo. Se reitera que el reporte de costos debe sustentarse en los EE.FF. emitidos por la Fiduciaria, toda vez que el Patrimonio Autónomo constituye el único centro de imputación contable del Proyecto y, por ende, toda erogación debe contar con el respectivo soporte en dichos estados.

3. Adicionalmente, se adelantó una mesa de trabajo conjunta con el Concesionario para la revisión del formato *GCSP-F-301 PPYE Acuerdos de Concesión Infraestructura Carretero Nuevo Marco v3.3 (junio de 2026),* referente a Propiedad, Planta y Equipo (PP&E), en la cual se validaron las cifras allí consignadas frente a los reportes financieros. Como parte de esta revisión, se requirió el detalle de los bienes de cuantía inferior a un millón de pesos ($1.000.000), con el fin de verificar la integridad de la composición del saldo reportado.

4. Finalmente, el 16 de septiembre de 2026 la Fiduciaria Bancolombia remitió a esta Interventoría la certificación solicitada respecto de los predios CAB-2-1-051 y CAB-2-1-073. Dicho documento se encuentra en revisión, con el fin de determinar si constituye el

soporte idóneo para el seguimiento de las erogaciones y la realización del arqueo de la Subcuenta Predial.

Componente Jurídico

En cuanto al Componente Jurídico, se informa que, la Interventoría consolidó la información correspondiente a la Entrega 2 y la remitió a la ANI mediante comunicado IPAB-811-2026, con radicado ANI 20264091261832 del 25 de septiembre de 2026 remitiendo información relacionada con los procesos sancionatorios, procesos judiciales asociados a la infraestructura y relación de pólizas vigentes. Se identificaron entregas parciales respecto de la documentación de obras con pólizas de estabilidad y/o calidad, así como de los pronunciamientos de las autoridades ambientales sobre requerimientos y procesos sancionatorios, cuya información complementaria se prevé para la Entrega No. 3. Se precisa que las pólizas aportadas presentan observaciones por parte de la Interventoría.

3.3. GESTIÓN JURÍDICA

3.3.1. PLAZOS DE CURA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS CONTRACTUALES.

3.3.2. Plazos de Cura.

En el archivo de Excel adjunto **Anexo 3.1** se sintetizan los plazos de cura cuya no objeción ha sido solicitada por la interventoría junto con su respectivo estado.

3.3.3. Procedimientos Administrativos Sancionatorios Contractuales.

Actualmente, la Entidad viene impulsando los Procedimientos Administrativos Sancionatorios Contractuales (PAS) que se relacionan en **el Anexo 3.2**, los cuales no han tenido novedad procesal alguna. Cabe señalar que actualmente la ANI –con el acompañamiento de la interventoría- se encuentra analizando la procedencia de continuar o no adelante con dichos trámites, teniendo en cuenta el inicio de la etapa de reversión dada la terminación anticipada del contrato de concesión que se ha venido comentando.

3.3.4. EVENTOS EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD EER.

En el marco del seguimiento efectuado a los Eventos Eximentes de Responsabilidad – EER que mantienen incidencia sobre obligaciones exigibles durante la Etapa de Reversión, mediante radicado 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260624012392 del 25 de junio de 2026, el Concesionario manifestó que daría por cerrado el ciclo de remisión semanal de los informes de EER asociados a obligaciones constructivas de la Etapa Preoperativa, al considerar que estos reportes no resultaban contractual ni materialmente necesarios durante la Etapa de Reversión. No obstante, señaló que atendería los requerimientos puntuales de información formulados por la ANI o la Interventoría.

Sumado a lo anterior, mediante radicado ANI No. 20263050262721 del 09 de julio de 2026, la ANI trasladó a la Interventoría la comunicación del Concesionario y solicitó emitir la respectiva verificación y concepto frente a su posición. En desarrollo de dicho requerimiento, la Interventoría efectuó la revisión de los EER vigentes y determinó que algunos eventos mantenían incidencia sobre obligaciones exigibles durante la Etapa de Reversión.

En atención a lo anterior, la Interventoría realizó la revisión individual de los EER vigentes a la fecha de notificación del Laudo Arbitral, con el propósito de determinar cuáles de los eventos reportados continuaban teniendo incidencia sobre obligaciones que permanecen exigibles durante la Etapa de Reversión. Como resultado de este análisis, se identificaron, entre otros, los EER relacionados con la gestión predial y entrega de predios libres de ocupantes de la UF3.5, los trámites de expropiación y disponibilidad predial de la UF2 y UF6.1, y la interferencia de una tubería de conducción de agua que afecta la culminación del quinto carril de la estación de peaje Los Cedros, correspondiente a la UF5.1.

Posteriormente, mediante comunicación IPAB-0524-2026 del 22 de julio de 2026, radicada ante la ANI bajo el No. 20264090924872, la Interventoría requirió al Concesionario para que, dentro del término de cinco (5) días hábiles, se pusiera al día con la entrega de los Informes de EER pendientes y continuara con la remisión semanal de los informes correspondientes a aquellos eventos que, conforme a la matriz de seguimiento **Anexo 3.3**, mantienen incidencia sobre obligaciones durante la Etapa de Reversión. El requerimiento se efectuó con fundamento en las obligaciones contractuales relacionadas con el suministro de información durante el Período Especial y con el deber del Concesionario de presentar los informes y documentos exigidos por la ANI y la Interventoría.

Una vez vencido el término otorgado, la Interventoría efectuó la correspondiente verificación de sus registros de comunicaciones y documentación recibida, evidenciando que el Concesionario no había atendido integralmente el requerimiento efectuado mediante IPAB-0524-2026, ni acreditado la entrega de los informes pendientes o la continuidad de los reportes semanales de los EER identificados.

Esta situación fue objeto de seguimiento por parte de la Interventoría, teniendo en cuenta que la ausencia de dicha información limita la posibilidad de verificar oportunamente la evolución de los eventos, las medidas implementadas para mitigar sus efectos y las actuaciones adelantadas para superar las circunstancias que afectan obligaciones que continúan vigentes durante la Etapa de Reversión.

En desarrollo de dicho seguimiento y ante la persistencia de la situación advertida, la Interventoría analizó la procedencia de las medidas contractuales aplicables frente al posible incumplimiento, considerando lo establecido en las Secciones 14.2(d)(vi), 9.2(c) y 9.2(l) de la Parte General del Contrato de Concesión, relacionadas con el suministro semanal de información sobre los EER durante el Período Especial, la presentación de informes y documentos exigidos y el deber de suministrar la información requerida por la ANI y la Interventoría. Asimismo, se verificó la procedencia de la aplicación del mecanismo previsto en la Sección 10.2 de la Parte General, correspondiente al Plazo de Cura, como instrumento contractual destinado a permitir al Concesionario subsanar el incumplimiento identificado.

Como resultado de este análisis, la Interventoría mediante comunicado IPAB-628-2026 con radicado ANI 20264091040432 del 14 de agosto del 2026 remitió a la ANI la Solicitud de No Objeción para otorgar un Plazo de Cura al Concesionario por la no entrega semanal de los informes de seguimiento de los Eventos Eximentes de Responsabilidad (EER) que mantienen incidencia durante la Etapa de Reversión, con el fin de que este atienda el requerimiento efectuado mediante comunicación IPAB-0524-2026 del 22 de julio de 2026, radicada ante la ANI bajo el No. 20264090924872, complete la información pendiente y dé continuidad a la presentación semanal de los Informes de EER. Dada la necesidad de garantizar el adecuado seguimiento de los EER y el cumplimiento de las obligaciones de información previstas contractualmente, sin perjuicio de las consecuencias que pudieran derivarse de la persistencia del incumplimiento una vez vencido el Plazo de Cura.

Ahora bien, mediante comunicación ANI No. 20263050374161 del 28 de septiembre de 2026, la ANI devolvió la solicitud de no objeción al Plazo de Cura de quince (15) días calendario, presentada por la Interventoría mediante oficio IPAB-0628-2026 con radicado ANI 20264091040432 del 14 de agosto del 2026, y solicitó justificar la razonabilidad y proporcionalidad del término propuesto. En atención a lo anterior, la Interventoría,

mediante comunicación IPAB-0859-2026, con radicado ANI No. 20264091327892 de fecha 8 de octubre del 2026, precisó que el requerimiento se limita a cuatro EER relacionados con asuntos prediales y la interferencia de una tubería en el quinto carril del peaje Los Cedros, y aclaró que la obligación corresponde a la entrega de información documental, independientemente de que los eventos hayan sido superados. Asimismo, sustentó el plazo de quince (15) días calendario mediante un cronograma para identificar los informes pendientes, recopilar antecedentes, consolidar y verificar la información, y efectuar su revisión y radicación. En consecuencia, reiteró ante la ANI la solicitud de no objeción, considerando que el término propuesto es razonable y proporcional para acreditar el cumplimiento de la obligación.

3.3.5. RECLAMACIONES EN CONTRA DE LA ANI

Si bien es cierto, la Interventoría no es parte procesal dentro de los trámites que a continuación se identifican (los cuales se encuentran en trámite), se precisa que ésta ha conocido de la existencia de los mismos de acuerdo con lo informado por la interventoría anterior (Consorcio CR), tal como se estableció en la parte introductoria del presente informe, donde se informa que, correlativamente, apoyó a la ANI en la preparación de conceptos e insumos de cara a que la demandada y/o convocada (según el caso) para que la misma pudiera plantear su estrategia de defensa, a continuación el resumen ejecutivo de estas reclamaciones:

Tabla 3-4 Reclamaciones.

Naturaleza	Proceso	Estado	Síntesis de la decisión
Proceso Arbitral Internacional (Comercial)	Caso CIRD 01-23-0002-8303 (RAM Vs. ANI)	Laudo Arbitral (final) emitido el 30 de abril dentro del caso CIRD No. 01-23-0002-8303, el cual fue notificado a las partes el 02 de mayo de 2026	**SOBRE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO** Al respecto, es pertinente mencionar que, el TDA en su Laudo, fundamentó la declaratoria de terminación anticipada del Contrato de Concesión, en cuatro (4) causales, a saber: 1) Retraso en la terminación de las UF 2, 6, 7 y 8 (Sección 14.1(e)); 2) No obtención de la Licencia Ambiental para la Variante Lorica (Sección 8.1(h)); 3) Afectación de la Estructura Tarifaria y agotamiento de los MCR (Sección 17.2(b)(iii) y Sección 3.4(i) (ii) (5)); y, 4)

Tabla 3-4 Reclamaciones.			
Naturaleza	**Proceso**	**Estado**	**Síntesis de la decisión**
			Causal referente a la Estación de Peaje Carimagua (Sección 17.2(b)(iv) (1)). **OTRAS DECLARACIONES DEL TRIBUNAL** Adicionalmente, el Tribunal profirió las siguientes declaraciones a cargo de la ANI: Obligación de compensar íntegramente a RAM por la materialización del riesgo derivado de la falta de aumento de las tarifas de la Estación de Peaje Carimagua. Obligación de compensar íntegramente a RAM por la materialización del riesgo derivado de la insuficiencia del Valor Estimado para Compensaciones Ambientales. Responsabilidad civil e indemnización integral de perjuicios por el no pago de los dos riesgos anteriores. Incumplimiento del Contrato por demoras en el reconocimiento y compensación de los efectos del Decreto 050. Incumplimiento de la obligación de atender los sitios inestables o activar las pólizas requeridas en las UF 4 y 5, con responsabilidad civil e indemnización integral de perjuicios. **CONDENAS DEL TRIBUNAL** Como consecuencia de las declaraciones mencionadas, el TDA aplicó la Fórmula de Liquidación prevista en la Sección 18.3(e) del Contrato por terminación anticipada en Etapa Preoperativa - Fase de Construcción y, por tanto, condenó a la ANI al pago de las siguientes sumas

Tabla 3-4 Reclamaciones.

Naturaleza	Proceso	Estado	Síntesis de la decisión

Concepto	Valor
Fórmula de Liquidación	COP $3.306.292.000.000
Perjuicios riesgo Carimagua	COP $257.866.339.833
Perjuicios compensaciones ambientales	COP $933.062.815
Perjuicios Decreto 050	COP $1.240.438.812
Perjuicios sitios inestables UF 4 y 5	COP $5.437.747.505
Costas del arbitraje (honorarios y gastos RAM)	COP $9.439.635.342
TOTAL COP	**COP $3.581.209.224.307**
Honorarios y gastos del Tribunal	USD $575.871,37
Tarifa y gastos administrativos del CIRD	USD $21.825,00
TOTAL USD	**USD $597.696,37**

4. ÁREA TÉCNICA OPERATIVA

4.1. GENERALIDADES

El presente Informe Técnico de Interventoría detalla las actividades desarrolladas en el periodo del 1 al 30 de septiembre del 2026. Nuestro objetivo principal es asegurar la continuidad técnica, administrativa y contractual del proyecto, garantizando que el seguimiento sea ininterrumpido y eficiente.

Tras iniciar nuestras labores el pasado 7 de febrero, este periodo se ha centrado en consolidar la trazabilidad del contrato de concesión. Para ello, hemos integrado los antecedentes necesarios que permiten contextualizar el estado actual del proyecto, facilitando una transición fluida y documentada.

En cumplimiento de nuestras obligaciones, mantenemos una supervisión activa y constante sobre los compromisos del Concesionario, basándonos tanto en el histórico documental como en nuestras recientes labores de verificación en campo

El proyecto de Concesión “Conexión Antioquia – Bolívar” forma parte del segundo bloque de Contratos de Asociación Público-Privada (APP) de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), y tiene como objetivo la construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento del sistema vial.

Las vías contempladas en esta concesión tienen una longitud total inicial de 504,435 km y se extienden a lo largo de los departamentos de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar.

Es importante señalar que la Unidad Funcional 6.3.3 fue revertida al Instituto Nacional de Vías (INVIAS) el 01 de octubre de 2023, con una longitud de 5,945 km, por lo que actualmente la concesión tiene a su cargo un total de 498,49 km.

De igual manera, la Unidad Funcional 6.3.2, con una longitud de 6,44 km, se encontraba en etapa de operación y mantenimiento, de conformidad con lo establecido en el Otrosí N° 16 del Contrato de Concesión, cuyo plazo previsto correspondía a diez (10) años, contados a partir de la suscripción del Acta de Terminación, suscrita el 19 de septiembre de 2023. No obstante, debido a la terminación anticipada del Contrato de Concesión, actualmente se adelanta la etapa de reversión, en el marco de la cual se desarrollan las actividades correspondientes a la entrega de la infraestructura y demás obligaciones a cargo del Concesionario.

El proyecto tiene como propósito principal mejorar la conexión entre el centro y el norte del país mediante el desarrollo de una vía primaria con mejores condiciones y mayor capacidad. Este corredor inicia en Caucasia (Antioquia) y finaliza en el sector de Cruz del Viso (Bolívar), convirtiéndose en una ruta clave para la movilidad y el transporte.

La intervención se realiza sobre la Troncal de Occidente, una vía que durante mucho tiempo funcionó como carretera departamental y que no recibió el mantenimiento necesario. Aun así, sus condiciones permiten aprovecharla y transformarla en un corredor estratégico que se articula con otros proyectos viales cercanos.

Además, el proyecto se conecta con la concesión Córdoba – Sucre mediante la construcción de una segunda calzada entre Cereté y Lorica. Esto mejora notablemente la circulación, hace los viajes más seguros y cómodos, y reduce tiempos de desplazamiento.

En el tramo entre Lorica y Cruz del Viso, se plantearon soluciones como la construcción de variantes y el mejoramiento de vías existentes. La idea es sacar el tráfico pesado de los centros urbanos, lo que beneficia directamente a las comunidades, mejora la movilidad local y crea mejores condiciones para el turismo.

En conjunto, este proyecto no solo busca mejorar una carretera, sino también facilitar el transporte de mercancías hacia la Costa Caribe y sus puertos, fortaleciendo la conexión

con otros corredores importantes como Montes de María y Ruta Caribe. De esta manera, se aporta al desarrollo económico de la región y del país.

Adicionalmente, esta Interventoría tuvo conocimiento de la emisión del Laudo Arbitral de fecha 30 de abril de 2026, proferido por el International Centre for Dispute Resolution (ICDR) dentro del Caso CIRD No. 01-23-0002-8303, mediante el cual se declaró la Terminación Anticipada del Contrato de Concesión con ocasión de la configuración de las siguientes causales: (i) el retraso en la terminación de las Unidades Funcionales 2, 6, 7 y 8, prevista en la Sección 14.1(e) del Contrato; (ii) la no obtención de la Licencia Ambiental para la construcción de la Variante Lorica, prevista en la Sección 8.1(h); (iii) las medidas de afectación de la Estructura Tarifaria y el agotamiento de los Mecanismos de Compensación de Riesgos (MCR), previstas en la Sección 17.2(b)(iii) en relación con la Sección 3.4(i).(ii)(5); y (iv) la causal relacionada con la Estación de Peaje Carimagua, prevista en la Sección 17.2(b)(iv)(1) del Contrato.

Como consecuencia de esta decisión arbitral, se activó de manera inmediata la Etapa de Reversión del proyecto a partir del 2 de mayo del 2026, de conformidad con lo establecido en las Secciones 1.60 y 9.7 de la Parte General del Contrato de Concesión. En este contexto, y conforme a lo dispuesto en la Sección 9.7(f) contractual, el Concesionario deberá continuar ejecutando las actividades de Operación y Mantenimiento de la infraestructura concesionada durante el desarrollo de dicha etapa, garantizando la prestación adecuada del servicio y la conservación de los activos hasta la culminación del proceso de reversión.

4.2. ÁREA TÉCNICA

4.2.1. Etapa de Estudios, Diseños y Construcción

En relación con los Estudios y Diseños presentados por el Concesionario, es importante destacar que, al cierre del presente periodo, la totalidad de los documentos técnicos cuentan con su respectiva **No Objeción**. Este estado garantiza que la base técnica del proyecto se encuentra debidamente validada.

A continuación, se presenta la trazabilidad de este proceso, elaborada con base en la información suministrada por la Interventoría saliente. El detalle del estado de revisión se encuentra consignado en el **Anexo 5.3 del presente informe**.

Tabla 4-1. Avances Estudios Y Diseños.

UNIDAD FUNCIONAL	ESTADO DE LA ENTREGA	FECHA PROGRAMADA	RADICADO DE ENTREGA	FECHA DE ENTREGA	RADICADO DE APROBACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN
UF.1 CAUCASIA-PLANETA RICA (Mejoramiento)	APROBADO	24/06/2016	C147C-262-2016	24/06/2017	CI.023/AB0387/16/7.1.7	01/12/2016
UF.2 CERETE-LORICA (Construcción)	APROBADO	15/08/2018	48-147-20171017002450	17/10/2017	CI.023/AB2875/16/7.1.7	14/11/2018
UF.3.1 VARIANTE PLANETA RICA (Construcción)	APROBADO	17/11/2016	CE147-1846-2016	17/11/2016	CI.023/AB1593/18/7.1.7	12/02/2018
UF.3.2 EL 15 - SAN CARLOS (Mejoramiento).	APROBADO	17/11/2016	CE147-1846-2016	17/11/2016	CI.023/AB0620/17/7.1.7	31/03/2017
UF.3.3 EL 15 - VARIANTE SAN CARLOS (Construcción).	APROBADO	17/11/2016	CE147-1846-2016	17/11/2016	CI.023/AB0620/17/7.1.7	31/03/2017
UF.3.4 SAN CARLOS - CERETÉ (Mejoramiento).	APROBADO	17/11/2016	CE147-1846-2016	17/11/2016	CI.023/AB0620/17/7.1.7	31/03/2017
UF.3.5 VARIANTE CERETÉ (Construcción).	APROBADO	17/11/2016	CE147-1846-2016	17/11/2016	CI.023/AB0620/17/7.1.7	31/03/2017
UF.4.1 PLANETA RICA - MONTERÍA (O y M).	APROBADO	03/05/2017	48-147-2017-050500786	05/05/2017	CI.023/AB1337/17/7.1.7	12/12/2017
UF.4.2 EL 15 - MONTERÍA (O y M).	NO REQUIERE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
UF.5.1 PUERTO REY - MONTERÍA (O y M).	APROBADO	03/05/2017	48-147-2017-050500785	05/05/2017	CI.023/AB1338/17/7.1.7	12/12/2017
UF.5.2 SANTA LUCÍA - SAN PELAYO (O y M).	NO REQUIERE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
UF.6.1 CERETÉ-LORICA (Mejoramiento).	APROBADO	18/08/2018	48-147-20171017002451	17/10/2017	CI.023/AB2875/16/7.1.7	14/11/2018
UF.6.2 LORICA - COVEÑAS (Mejoramiento).	APROBADO	18/08/2018	48-147-20171017002451	17/10/2017	CI.023/AB2875/16/7.1.7	14/11/2018
UF.6.3 COVEÑAS-TOLÚ (Mejoramiento).	APROBADO	18/08/2018	48-147-20171017002451	17/10/2017	CI.023/AB2875/16/7.1.7	14/11/2018
UF.7.1 VARIANTE LORICA (Construcción).	APROBADO	15/05/2017	47-147-2017-0515000903	05/05/2017	CI.023/AB1357/17/7.1.7	12/12/2017

UNIDAD FUNCIONAL	ESTADO DE LA ENTREGA	FECHA PROGRAMADA	RADICADO DE ENTREGA	FECHA DE ENTREGA	RADICADO DE APROBACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN
UF.7.2 VARIANTE COVEÑAS (Construcción).	APROBADO	15/05/2017	47-147-2017-0515000903	05/05/2017	CI.023/AB1357/17/7.1.7	12/12/2017
UF.7.3 TOLÚ - PUEBLITO (Construcción).	APROBADO	15/05/2017	47-147-2017-0515000903	05/05/2017	CI.023/AB1357/17/7.1.7	12/12/2017
UF.8.1 TOLÚ - TOLÚ VIEJO (Mejoramiento).	APROBADO	15/082018	48-147-20170731001598	01/08/2017	CI.023/AB1244/17/7.1.7	15/11/2017
UF.8.2 EL PUEBLITO - SAN ONOFRE (Mejoramiento).	APROBADO	18/08/2018	48-147-20170731001598	01/08/2017	CI.023/AB1244/17/7.1.7	15/11/2017
UF.8.3 SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO (Mejoramiento).	APROBADO	18/08/2018	48-147-20170731001598	01/08/2017	CI.023/AB1244/17/7.1.7	15/11/2017

Fuente: informe final CR, febrero 2026.

No obstante, lo anterior, debe tenerse en cuenta que, en la fase de construcción del proyecto, el Concesionario presento algunos ajustes a los estudios y diseños no objetados a través de Notas técnicas, de las cuales se presentan las matrices de trazabilidad en el **anexo 5.3** del presente informe.

4.2.2. Seguimiento Fase de Construcción

4.2.2.1. Plan de obras

En el marco de las obligaciones contractuales y las disposiciones derivadas del laudo arbitral, la etapa de construcción finalizó el 30 de abril de 2026, actualmente el proyecto se encuentra en la etapa de reversión desde del 2 de mayo del 2026, orientando las actividades técnicas hacia la entrega y recibo de la infraestructura concesionada.

Para efectos de la trazabilidad del proyecto, se establece que la última actualización aprobada del Plan de Obras de la etapa de construcción correspondió a la Versión 15, documento que definió el cronograma base de las intervenciones en cada una de las Unidades Funcionales. En la fase actual, este histórico sirve como referencia técnica para verificar el estado de entrega de los activos, el cumplimiento de los indicadores de operación y mantenimiento, y las condiciones de la infraestructura que se revierte.

La información contenida en este apartado se soporta en los registros de seguimiento y control disponibles, consolidando los datos históricos del proyecto como insumo base

para garantizar la continuidad del control técnico y la transparencia en el proceso de liquidación y transferencia de la concesión.

Tabla 4-2. Plan de Obras.

PLAN DE OBRAS			% AVANCE – 30 septiembre 2026	
UNIDAD FUNCIONAL	COMIENZO	FIN	Ejecutado acumulado	Programado acumulado
UF.1 CAUCASIA-PLANETA RICA (Mejoramiento)	25-ene-17	25-mar-19	100,00%	100,00%
UF.2 CERETE-LORICA (Construcción)	15-nov-18	31-ene-26	89,50%	100,00%
UF3	1-abr-17	26-ago-19	99,94%	100,00%
UF.3.1 VARIANTE PLANETA RICA (Construcción)	15-feb-18	26-feb-19	100,00%	100,00%
UF.3.2 EL 15 - SAN CARLOS (Mejoramiento).	1-abr-17	26-feb-19	100,00%	100,00%
UF.3.3 EL 15 - VARIANTE SAN CARLOS (Construcción).	15-ago-17	26-feb-19	100,00%	100,00%
UF.3.4 SAN CARLOS - CERETÉ (Mejoramiento).	1-abr-17	26-feb-19	100,00%	100,00%
UF.3.5 VARIANTE CERETÉ (Construcción).	15-jun-17	26-ago-19	99,69%	100,00%
UF. 4.1 Montería-Planeta Rica	2-abr-18	15-ene-19	100,00%	100,00%
UF. 5.1 Arboletes-Montería	2-abr-18	15-ene-19	100,00%	100,00%
UF6	15-nov-18	31-ene-26	97,94%	100,00%
UF.6.1 CERETÉ- LORICA (Mejoramiento).	15-nov-18	31-ene-26	97,70%	100,00%
UF.6.2 LORICA - COVEÑAS (Mejoramiento).	15-nov-18	3-may-21	100,00%	100,00%
UF.6.3 COVEÑAS- TOLÚ (Mejoramiento).	5-ago-21	23-dic-25	84,41%	100,00%
UFI 6-3-2 COVEÑAS- TOLÚ - Rehabilitación con O&M por 10 años	3-dic-21	26-sep-22	100,00%	100,00%
UFI 6-3-3 COVEÑAS- TOLÚ -Puesta a punto	14-oct-21	15-jun-22	100,00%	100,00%
UF7	15-dic-17	23-sep-26	85,31%	94,70%
UF.7.1 VARIANTE LORICA (Construcción).	26-feb-26	23-sep-26	0,00%	64,20%
UF.7.2 VARIANTE COVEÑAS (Construcción).	27-jul-21	26-ene-24	100,00%	100,00%
UF.7.3 TOLÚ - PUEBLITO (Construcción).	15-dic-17	14-jul-22	100,00%	100,00%
UF8	15-nov-17	23-sep-26	99,81%	100,00%
UF.8.1 TOLÚ - TOLU VIEJO (Mejoramiento).	15-nov-18	3-may-21	100,00%	100,00%
UF.8.2 EL PUEBLITO - SAN ONOFRE (Mejoramiento).	15-ene-18	3-may-21	100,00%	100,00%
UF.8.3 SAN ONOFRE- CRUZ DEL VISO (Mejoramiento).	15-nov-17	23-sep-26	99,72%	99,96%
PROYECTO	25-ene-17	23-sep-26	94,39%	98,68%

Fuente: informe final CR, febrero 2026

A continuación, se presentan las actividades desarrolladas por el Concesionario en el presente mes, en las diferentes unidades funcionales que componen el proyecto de Concesión Ruta al Mar.


4.2.2.2. Unidad Funcional Integral (UFI) 1: Caucasia - Planeta Rica.

La Unidad Funcional Integral (UFI) 1 corresponde al tramo comprendido entre el municipio de Caucasia (PR 3+325) y el municipio de Planeta Rica (PR 61+935), con una longitud aproximada de 58,65 km.

De acuerdo con lo señalado en dichos informes anteriores, este tramo presentó una modificación en el sector objeto de intervención, conforme a lo establecido en el Otrosí N°9 del 12 de junio de 2017.

Así mismo, se indica que la intervención ejecutada en esta Unidad Funcional correspondió a actividades de mejoramiento, las cuales se desarrollaron conforme a las características geométricas y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato de Concesión.

Figura **4-1.** Sección Transversal de la Vía.

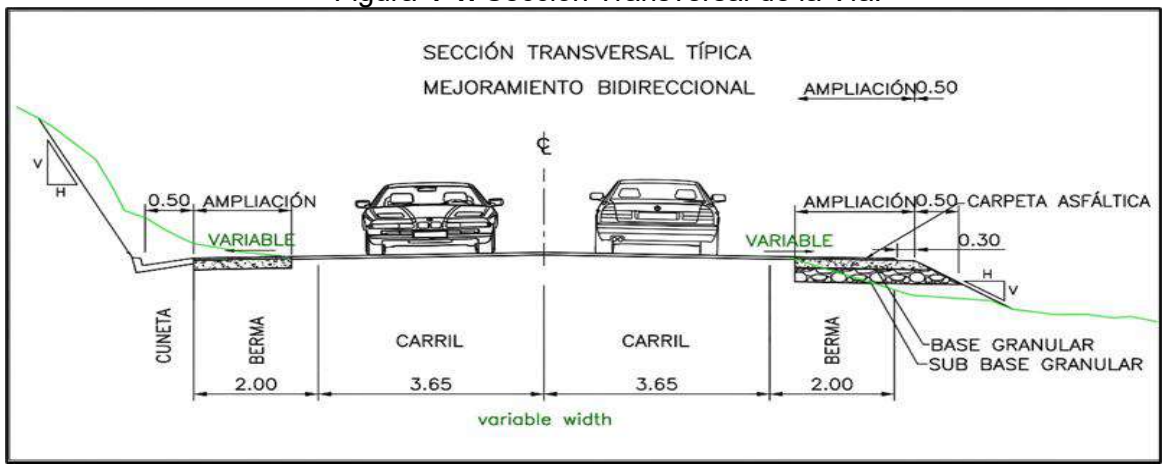

Fuente: Concesión Ruta al Mar, informe febrero 2026.

Actualmente esta Unidad Funcional se encuentra en etapa de operación y mantenimiento conforme acta de terminación suscrita el 24 de septiembre de 2019.

Peaje la Apartada y Peaje de Manguitos: En esta UFI, se encuentran el peaje de la Apartada PR12+000 y el nuevo peaje Los Manguitos PR52+450 (No obstante, éste se encuentra asociado a la Unidad Funcional 2).

Peatonales: Mediante el Otrosí N.°16 al Contrato de Concesión se efectuó la modificación de la tipología de algunos pasos peatonales, cambiando la solución inicialmente prevista de pasos peatonales subterráneos por pasos peatonales a nivel.

Esta modificación se implementó con el propósito de mejorar las condiciones de accesibilidad y funcionalidad para los usuarios, considerando que los pasos a nivel requieren longitudes de acceso significativamente menores en comparación con las estructuras tipo puente o paso subterráneo, lo cual facilita su utilización por parte de los peatones.

Con base en lo anterior, y de acuerdo con la información consignada en los informes de la interventoría anterior, a continuación, se presenta el estado de los pasos peatonales contemplados en el proyecto, indicando su localización, tipología y condición actual a la fecha de corte del presente informe.

Tabla 4-3. Estado Pasos Peatonales.

UF	Abs Contrato	Abs Construcción	Nombre del Paso	Municipio	Características Otrosí 16	Características Macro Construida	Cumplimiento características OTROSÍ 16	Avance Ejecutado Acumulado	Estado
1	K5+000	K5+000	Entrada Nechí	Caucasia	9 (Cruce Escolar Con Paradero)	9 (Cruce Escolar Con Paradero)	Si	100%	Recibido con acta del 04/09/2024
	K15+374	15+550	La Apartada 1	La Apartada	9 (Cruce Escolar Con Paradero)	9 (Cruce Escolar Con Paradero)	Si	100%	Recibido con acta del 04/09/2024
	K16+495	K16+495	La Apartada 2	La Apartada	2 (Cruce Con Paradero)	1 (Cruce Con Paradero)	Si	100%	Recibido con acta del 04/09/2024
	K24+070	24+120	Rusia	Buenavista	2 (Cruce Con Paradero)	2 (Cruce Con Paradero)	Si	100%	Recibido con acta del 04/09/2024
	K41+740	41+860	Buenavista 1	Buenavista	3 (Cruce Sin Paradero)	3 (Cruce Sin Paradero)	Si	100%	Recibido con acta del 04/09/2024
	K43+690	K43+690	Buenavista 2	Buenavista	9 (Cruce Escolar Con Paradero)	9 (Cruce Escolar Con Paradero)	Si	100%	Recibido con acta del 04/09/2024
	K50+888	50+970	Plaza Bonita	Planeta Rica	2 (Cruce Con Paradero)	2 (Cruce Con Paradero)	Si	100%	Recibido con acta del 22/08/2025
1	-		Los Manguitos	Planeta Rica	PPS			0%	Sin construir. *

Fuente: Consorcio IPAB.

* teniendo en cuenta que ya venció el plazo para su construcción, actualmente está en curso un proceso sancionatorio. Mediante comunicado con radicado ANI No. 20254091488982, la Interventoría Consorcio CR Concesiones presentó el informe de incumplimiento para el Paso Peatonal Los Manguitos y mediante memorando 20263050004103 se solicitó el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio contra el Concesionario Ruta Al Mar S.A.S, bajo el expediente 20267070320700003E De acuerdo con el radicado ANI No. 20263050070101 del 02/03/2026, se realizó la solicitud de actualización del proceso sancionatorio. Posteriormente, el Consorcio IPAB, mediante oficio IPAB-0081-2026, remitió aclaración respecto al presunto incumplimiento relacionado con la construcción de los pasos peatonales.
el 21/05/2026 mediante memorando ANI No. 20267070102233 “Solicitud de pronunciamiento respecto del presunto incumplimiento por parte de la sociedad Concesionario Ruta al Mar S.A.S., a las obligaciones relacionadas con la entrega del paso peatonal “los Manguitos” de la UF1. con radicado ANI No. 20263050189221 del 21/05/26 se solicitó a la Interventoría concepto frente a la procedencia de la continuidad del procedimiento administrativo sancionatorio

dado el fallo del tribunal y que la Interventoría con radicado ANI No. 20264090673702 del 27/05/26, la Interventoría emitió su respectivo concepto.
comunicado IPAB-0408-2026, radicado en la ANI bajo el No.20264090766602 del 17 de junio de 2026, mediante el cual esta Interventoría emitió concepto respecto del Procedimiento Administrativo Sancionatorio Contractual tramitado bajo el expediente No.20267070320700003E, comunicado ANI 20263050316101 del 18 de agosto Devolución para complementación del concepto remitido mediante el comunicado IPAB-0408-2026.
Consorcio IPAB, envió comunicado a ANI. El 26 de agosto-2026 de Solicitud de ampliación de plazo - Radicado ANI 20263050316101 con asunto: "Devolución para complementación del concepto remitido mediante el comunicado IPAB-0408-2026 — Radicado ANI No. 20264090766602 - Procedimiento Administrativa Sancionatoria Contractual tramitado bajo el Expediente No. 20267070320700003E, por el presunto incumplimiento respecto de las obligaciones relacionadas con la entrega del paso peatonal "Los Manguitos" de la UF1.
El 27 de agosto del 2026 el consorcio IPAB Radicó mediante comunicado IPAB-0689-2026, a la Agencian Nacional de Infraestructura (ANI), Cuyo asunto. Solicitud de ampliación de plazo – Radicado ANI 20263050316101 con asunto: “Devolución para complementación del concepto remitido mediante el comunicado IPAB-0408-2026 – Radicado ANI No. 20264090766602 - Procedimiento Administrativo Sancionatorio Contractual tramitado bajo el Expediente No. 20267070320700003E, por el presunto incumplimiento respecto de las obligaciones relacionadas con la entrega del paso peatonal “Los Manguitos” de la UF1.

Actividades ejecutadas en el periodo.

Pasos Peatonales: Durante el periodo objeto de seguimiento y de acuerdo con las verificaciones realizadas por la Interventoría, no se evidenció la ejecución de obras, actividades constructivas ni avances físicos relacionados con la construcción de los pasos peatonales contemplados dentro del alcance contractual del proyecto.


En particular, permanece pendiente la construcción del paso peatonal ubicado en el sector Los Manguitos, cuya ejecución no presenta avances durante el periodo evaluado. Así mismo, se deja constancia de que el plazo contractual establecido para la construcción de esta obra se encuentra vencido, sin que a la fecha se haya materializado su ejecución.

Esta situación constituye un incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del Concesionario, razón por la cual se encuentra activo un proceso sancionatorio relacionado con el incumplimiento en la ejecución y entrega de estas obras, las cuales revisten especial importancia para garantizar condiciones adecuadas de seguridad y movilidad peatonal para las comunidades aledañas.

Unidad Funcional Integral (UFI) 2: Cereté – Lorica

Este tramo se encuentra comprendido entre el municipio de Cereté (PR10+764) y el municipio de Lorica (PR48+222), con una longitud aproximada de 37 km.
El tipo de intervención contemplado corresponde a la construcción de una segunda calzada.
En este sentido, la intervención prevista considera la construcción de una segunda calzada con la siguiente sección:

Figura 4-2. Especificación de la Vía.

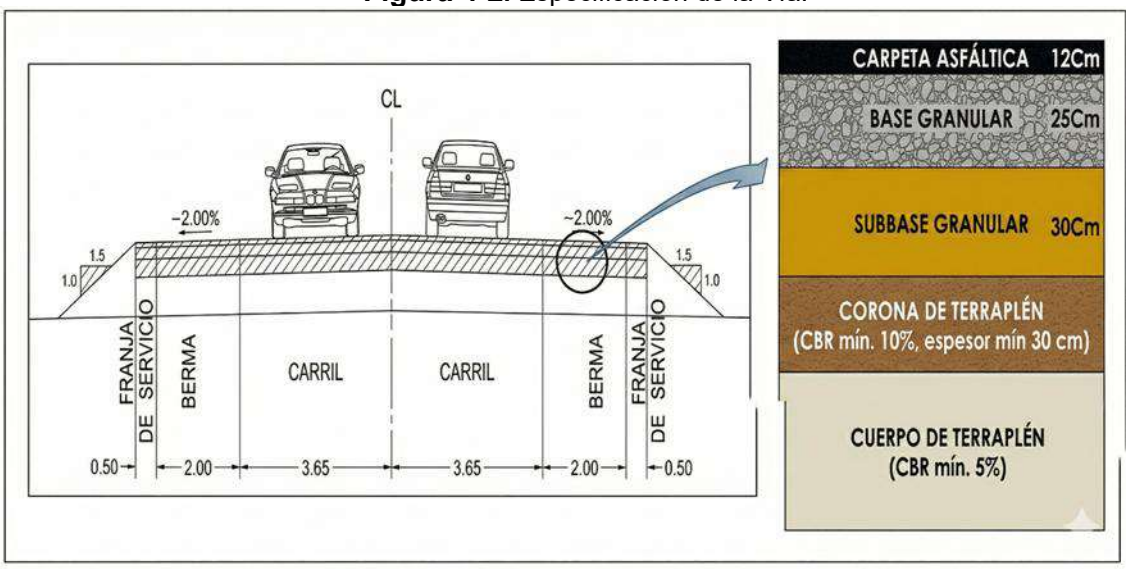

Fuente: Concesión Ruta al Mar, informe febrero 2026.

Actualmente la Unidad Funcional, se encuentra en el siguiente estado:

Tabla 4-4 Estado UF2.

Sector	Etapa/Fase	Observación:
K10+764 al K29+920	Construcción	Algunos sectores cubiertos con Evento Eximente de Responsabilidad
K29+920 al K32+320	Operación y Mantenimiento	Acta de terminación parcial suscrita el 31 de mayo de 2021)
K32+320 al K37+400	Construcción	Sector cubierto con Evento Eximente de Responsabilidad
K37+400 al K43+800	Operación y Mantenimiento	Acta de terminación parcial suscrita el 31 de mayo de 2021)
K43+800 al K44+400	Construcción	Sector cubierto con Evento Eximente de Responsabilidad

Sector	Etapa/Fase	Observación:
K44+400 al K47+570	Operación y Mantenimiento	Acta de terminación parcial suscrita el 31 de mayo de 2021)
K47+570 al K48+222	Construcción	Sector cubierto con Evento Eximente de responsabilidad

Fuente: consorcio IPAB.

- **Peaje de Manguitos:** Esta Infraestructura de operación se encuentra ubicada en el K52+450, de la vía Caucasia - Planeta Rica de la UF1, financieramente este peaje está asociado a las obras de la UF2.
- **Actividades ejecutadas en el periodo:** Durante el periodo objeto del presente informe no se adelantaron actividades de construcción por parte del Concesionario. En consecuencia, no se registraron avances de obra asociados a la Unidad Funcional 2 del proyecto.

Seguimiento al Plan de Obras

La información relacionada a continuación fue recopilada de los informes elaborados por la interventoría anterior, de conformidad con los reportes presentados durante el periodo objeto de seguimiento y en el marco de las funciones de vigilancia, seguimiento y control ejercidas sobre el contrato de concesión.

De acuerdo con la revisión de la información disponible y las verificaciones realizadas durante el periodo, a la fecha no se evidencia la ejecución de ninguna de las obras contempladas en el Plan de Obras del contrato de concesión. En consecuencia, las actividades y obras previstas permanecen pendientes de ejecución, de acuerdo con las obligaciones y compromisos establecidos contractualmente.

Tabla 4-5 Estado de la Unidad Funcional 2.

Calzada	ABS Inicial	ABS Final	Material
CD	PR 10 + 764,00	PR 10 + 770,31	SIN INTERVENCIÓN
CD	PR10+770,31	PR 10 + 837,00	SIN INTERVENCIÓN
CD	PR10+837,00	PR10+850,00	SIN INTERVENCIÓN
CD	PR10+850,00	PR11+020,00	BASE
CD	PR11+020,00	PR11+080,00	SUBBASE
CD	PR11+080,00	PR11+470,00	SIN INTERVENCIÓN

Calzada	ABS Inicial	ABS Final	Material
CD	PR11+470,00	PR11+530,00	BASE
CD	PR11+530,00	PR11+600,00	BASE
CD	PR11+600,00	PR11+790,00	TERMINADO
CD	PR11+790,00	PR12+190,00	TERMINADO
CD	PR12+190,00	PR13+930,00	TERMINADO
CD	PR13+930,00	PR13+970,00	TERMINADO
CD	PR13+970,00	PR14+060,00	BASE
CD	PR14+060,00	PR14+100,00	TERRAPLÉN
CD	PR14+100,00	PR14+115,00	TERRAPLÉN
CD	PR14+115,00	PR14+130,00	BASE
CD	PR14+130,00	PR14+160,00	TERMINADO
CD	PR14+160,00	PR14+640,00	TERMINADO
CD	PR14+640,00	PR14+970,00	TERMINADO
CD	PR14+970,00	PR15+150,00	TERMINADO
CD	PR15+150,00	PR15+200,00	TERMINADO
CD	PR15+200,00	PR15+550,00	TERMINADO
CI	PR14+970,00	PR15+090,00	TERMINADO
CI	PR15+090,00	PR15+310,00	TERMINADO
CI	PR15+310,00	PR15+460,00	BASE
CI	PR15+460,00	PR15+660,00	SIN INTERVENCIÓN
CI	PR15+660,00	PR15+740,00	SUBBASE
CI	PR15+740,00	PR15+760,00	BASE
CI	PR15+760,00	PR15+770,00	ASFALTO
CI	PR15+770,00	PR15+840,00	TERMINADO
CI	PR15+840,00	PR15+990,00	TERMINADO
CI	PR15+990,00	PR16+010,00	TERMINADO
CI	PR16+010,00	PR16+110,00	TERMINADO
CI	PR16+110,00	PR16+550,00	TERMINADO
CI	PR16+550,00	PR16+680,00	TERMINADO
CD	PR16+680,00	PR17+510,00	TERMINADO
CD	PR17+510,00	PR17+840,00	TERMINADO
CD	PR17+840,00	PR18+010,00	TERMINADO
CD	PR18+010,00	PR18+040,00	TERMINADO
CD	PR18+040,00	PR18+070,00	SIN INTERVENCIÓN
CD	PR18+070,00	PR18+317,00	SIN INTERVENCIÓN
	PR18+317,00	PR18+540,00	TERRAPLÉN
CD	PR18+540,00	PR18+740,00	SIN INTERVENCIÓN

Calzada	ABS Inicial	ABS Final	Material
CD	PR18+740,00	PR18+780,00	SIN INTERVENCIÓN
CD	PR18+780,00	PR18+820,00	TERMINADO
CD	PR18+820,00	PR19+230,00	ASFALTO
CD	PR19+230,00	PR19+250,00	ASFALTO
CD	PR19+250,00	PR19+280,00	ASFALTO
CD	PR19+280,00	PR19+290,00	ASFALTO
CD	PR19+290,00	PR19+540,00	ASFALTO
CD	PR19+540,00	PR19+590,00	TERRAPLÉN
CD	PR19+590,00	PR20+030,00	SIN INTERVENCIÓN
CD	PR20+030,00	PR20+140,00	BASE
	PR20+140,00	PR20+480,00	SIN INTERVENCIÓN
CD	PR20+840,00	PR20+920,00	TERRAPLÉN
CD	PR20+920,00	PR21+060,00	SUBBASE
CD	PR21+060,00	PR21+310,00	SIN INTERVENCIÓN
CD	PR21+310,00	PR21+315,00	ASFALTO
CD	PR21+315,00	PR21+350,00	TERMINADO
CD	PR21+350,00	PR21+900,00	TERMINADO
CD	PR21+900	PR47+614	TERMINADO
CD	PR47+614	PR47+901	Tramo Afectado DRMI

Fuente: Propia Consorcio IPAB

Figura 4-3. Avance Acumulado Unidad Funcional 2.

AVANCE MENSUAL ACUMULADO POR INTERVENCIÓN

UF 2
ABSCISADO PR10+764 - PR48 + 222

Actividad	K10+000	K12+000	K14+000	K16+000	K18+000	K20+000	K22+000	K24+000	K26+000	K28+000	K30+000
Ampliación de Berma	☐☐☑☑	☑☑☑☑	☐☑☑☑	☑☑☑☐	☐☑☑☐	☐☐☑☑	☑☑☑☑	☑☑☑☑	☑☑☑☑	☑☑☑☑	☑☑☑☐
Fresado 5cm	☐☐☑☑	☑☑☑☑	☐☑☑☑	☑☑☑☐	☐☑☑☐	☐☐☑☑	☑☑☑☑	☑☑☑☑	☑☑☑☑	☑☑☑☑	☑☑☑☑
Instalación 1ra Capa Asfáltica	☐☐☑☑	☑☑☑☑	☐☑☑☑	☑☑☑☐	☐☑☑☐	☐☐☑☑	☑☑☑☑	☑☑☑☑	☑☑☑☑	☑☑☑☑	☑☑☑☑
Instalación 2da Capa Asfáltica	☐☐☐☑	☑☑☑☑	☐☑☑☑	☑☑☑☐	☐☐☐☐	☐☐☑☑	☑☑☑☑	☑☑☑☑	☑☑☑☑	☑☑☑☑	☑☑☑☑
Obras de Drenaje Intervenidas	☐☐☐☑	☑☑☑☑	☐☐☐☐	☑☑☑☐	☐☐☐☐	☐☐☑☑	☑☑☑☑	☑☑☑☑	☑☑☑☑	☑☑☑☑	☑☑☑☑
Señalización Horizontal	☐☐☐☑	☑☑☑☑	☐☐☐☐	☑☑☑☐	☐☐☐☐	☐☐☑☐	☑☑☑☑	☑☑☑☑	☑☑☑☑	☑☑☑☑	☑☑☑☑
Señalización Vertical	☐☑☑☑	☑☑☑☑	☑☑☑☑	☑☑☑☐	☐☑☑☐	☐☐☑☑	☑☑☑☑	☑☑☑☑	☑☑☑☑	☑☑☑☑	☑☑☑☑

Actividad	K32+000	K34+000	K36+000	K38+000	K40+000	K42+000	K44+000	K46+000	K48+000	K50+000	K52+000
Ampliación de Berma	☑☑☑☑	☑☑☑☑	☑☑☑☑	☑☑☑☑	☑☑☑☑	☑☑☑☑	☑☑☑☑	☑☑☑☐	☐☐☐☐	☐☐☐☐	☐☐☐☐
Fresado 5cm	☑☑☑☑	☑☑☑☑	☑☑☑☑	☑☑☑☑	☑☑☑☑	☑☑☑☑	☑☑☑☑	☑☑☑☐	☐☐☐☐	☐☐☐☐	☐☐☐☐
Instalación 1ra Capa Asfáltica	☑☑☑☑	☑☑☑☑	☑☑☑☑	☑☑☑☑	☑☑☑☑	☑☑☑☑	☑☑☑☑	☑☑☑☐	☐☐☐☐	☐☐☐☐	☐☐☐☐
Instalación 2da Capa Asfáltica	☑☑☑☑	☑☑☑☑	☑☑☑☑	☑☑☑☑	☑☑☑☑	☑☑☑☑	☑☑☑☑	☑☑☑☐	☐☐☐☐	☐☐☐☐	☐☐☐☐
Obras de Drenaje Intervenidas	☑☑☑☑	☑☑☑☑	☑☑☑☑	☑☑☑☑	☑☑☑☑	☑☑☑☑	☑☑☑☑	☑☑☑☐	☐☐☐☐	☐☐☐☐	☐☐☐☐
Señalización Horizontal	☑☑☑☑	☑☑☑☑	☑☑☑☑	☑☑☑☑	☑☑☑☑	☑☑☑☑	☑☑☑☑	☑☑☑☐	☐☐☐☐	☐☐☐☐	☐☐☐☐
Señalización Vertical	☑☑☑☑	☑☑☑☑	☑☑☑☑	☑☑☑☑	☑☑☑☑	☑☑☑☑	☑☑☑☑	☑☑☑☐	☐☐☐☐	☐☐☐☐	☐☐☐☐

Fuente: Propia Consorcio IPAB.

Con base en la información consignada en los informes y comunicaciones emitidas por la Interventoría anterior, se presenta la trazabilidad de las actuaciones relacionadas con el proceso de presunto incumplimiento por la no terminación de las intervenciones previstas en la Unidad Funcional 2 (UF2).

La UF2 contemplaba como fecha de terminación de las intervenciones el 17 de marzo de 2022 para los sectores no cobijados por Eventos Eximentes de Responsabilidad (EER). En virtud de lo anterior, se otorgó al Concesionario un plazo de cura; no obstante, una vez vencido dicho plazo sin que se subsanara el incumplimiento, la Interventoría anterior, mediante comunicación CI.023/AB10913/23/5.3 con radicado ANI No. 20234090501622 del 8 de mayo de 2023, radicó ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) el Informe de Presunto Incumplimiento por la no terminación de la Unidad Funcional 2.

Posteriormente, el 19 de septiembre de 2023, debido a la oposición de las comunidades de San Pelayo, Pelayito y Cotorra, se reconoció al Concesionario un Evento Eximente de Responsabilidad (EER) en los siguientes sectores de la UF2: K11+510 – K12+600, K12+600 – K24+250, K26+480 – K26+790, K28+280 – K28+492, K28+492 – K29+920 y K32+320 – K36+460.

En atención a lo anterior, la Interventoría anterior presentó mediante comunicación CI.023/AB11811/23/5.3 con radicado ANI No. 20234091490322 del 27 de diciembre de 2023, un alcance al Informe de Presunto Incumplimiento, considerando que algunos de los sectores inicialmente involucrados habían quedado cobijados por el EER.

Posteriormente, mediante comunicación CI.023/AB11970/24/5.3 con radicado ANI No. 20244090181792 del 13 de febrero de 2024, y en atención a solicitud de la ANI, se remitió una actualización del informe de incumplimiento, excluyendo los sectores cobijados por el EER, quedando el proceso de incumplimiento circunscrito al tramo comprendido entre el K10+746 y el K11+500.

De acuerdo con lo reportado por la Interventoría anterior, el 30 de junio de 2024 se suscribió el Acta de Extensión del Periodo Especial de la UF2 para los sectores de San Pelayo, Pelayito y Cotorra, mediante la cual se extendió el período especial desde el 1 de julio de 2024 hasta el 30 de enero de 2025, en razón a la persistencia de las causas que dieron origen al EER reconocido el 19 de septiembre de 2023.

Posteriormente, en atención a la solicitud de la ANI mediante comunicado No. 20245010296831, la Interventoría anterior remitió una actualización del informe de incumplimiento mediante comunicación CI.023/AB12693/24/5.3, con radicado ANI No. 20244091075242 del 30 de agosto de 2024.

Así mismo, teniendo en cuenta la audiencia realizada el 21 de octubre de 2024, la ANI solicitó una nueva actualización del informe, la cual fue remitida mediante comunicación CI.023/AB12936/24/5.3 con radicado ANI No. 20244091358182 del 30 de octubre de 2024.

Posteriormente, mediante comunicación CI.023/AB12984/24/5.3 con radicado ANI No. 20244091403912 del 12 de noviembre de 2024, la Interventoría anterior dio respuesta al comunicado ANI No. 20243050399321 del 6 de noviembre de 2024, relacionado con la actualización del estado de cumplimiento de los hechos que dieron origen al procedimiento sancionatorio por la no terminación de las intervenciones previstas en la UF2. A la fecha del informe emitido por la Interventoría anterior, el proceso se encontraba en etapa sancionatoria.

Posteriormente, mediante comunicado ANI No. 20243050466801, la ANI remitió a la Interventoría la comunicación del Concesionario 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20241213007185 del 13 de diciembre de 2024, mediante la cual solicitó extender nuevamente los Periodos Especiales otorgados para los EER reconocidos en la UF2. Frente a esta solicitud, la Interventoría emitió concepto mediante comunicación CI.023/AB13151/24/5.3, remitida a la ANI el 3 de enero de 2025, en la cual se emitió concepto favorable para la continuidad del EER en los tramos PR11+510 – PR12+600 y PR12+600 – PR24+250, considerando que en los demás tramos se habían superado las circunstancias que dieron origen al evento.

En consecuencia, el 31 de enero de 2025 se suscribió el Acta de Extensión de los Periodos Especiales del EER para la UF2 – San Pelayo, en los sectores PR11+510 –

PR12+600 y PR12+600 – PR24+250, extendiendo su vigencia hasta el 30 de junio de 2025.

Posteriormente, mediante comunicado ANI No. 20253050305511, la ANI dio respuesta a la solicitud presentada por el Concesionario con radicado ANI No. 20254090801862, indicando que no procedía la extensión del Periodo Especial, considerando que las causas que originaron el EER habían sido superadas, toda vez que las comunidades manifestaron su disposición para permitir la continuidad de las obras contempladas en el Contrato de Concesión.

No obstante, el Concesionario mediante comunicación 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20250919009971 del 19 de septiembre de 2025, solicitó nuevamente la extensión del Periodo Especial, teniendo en cuenta lo manifestado por la comunidad de Pelayito en reunión realizada el 16 de septiembre de 2025, en la cual indicaron que no permitirían la continuidad de las obras hasta tanto no se definiera la fecha de inicio de la construcción de los retornos. Dicha solicitud fue remitida por la ANI a la Interventoría mediante comunicado No. 20253050351391.

Posteriormente, la ANI remitió a la Interventoría el Memorando No. 20257040000874 del 3 de octubre de 2025, mediante comunicado No. 20253050389111, el cual establece nuevos lineamientos para el análisis de solicitudes de declaratoria de EER en los Contratos de Concesión 4G y 5G, con el fin de que la Interventoría analizará nuevamente la solicitud presentada y ajustará el concepto emitido, en caso de considerarlo pertinente.

En atención a lo anterior, se precisa que mediante el comunicado ANI No. 20253050414161 del 11 de noviembre de 2025, la ANI remitió observaciones al concepto presentado por la Interventoría (radicado ANI No. 20254091388232 del 30 de octubre de 2025). Al respecto, la Interventoría dio respuesta y atendió los requerimientos mediante la comunicación CI.023/AB14294/25/5.3 del 21 de noviembre de 2025.

Mediante memorando Radicado ANI No. 20267070040913 del 11 de febrero de 2026, la Coordinación GIT de Procedimientos Administrativos Sancionatorios Contractuales, presentó a la Vicepresidencia Ejecutiva de la ANI y a la Gerencia de Proyectos Carretero 1 – Vicepresidencia Ejecutiva de la ANI, reiteración de la solicitud de información relacionada con el Procedimiento Administrativo Sancionatorio Contractual iniciado contra la sociedad Concesionaria Ruta al Mar S.A.S., concerniente al presunto incumplimiento de las obligaciones referidas a la no terminación de intervenciones previstas en la Unidad Funcional 2 - UF2 del Contrato de Concesión bajo esquema de APP No.016 de 2015, en el Proyecto Conexión Antioquia – Bolívar, Expediente No.20247070320700036E.

Mediante memorando Radicado ANI No.20263050061583 de fecha 11 de marzo de 2026, la Gerencia de Proyecto – Vicepresidencia Ejecutiva de la ANI, presentó a la Coordinación GIT de Procedimientos Administrativos Sancionatorios Contractuales, solicitud ampliación de plazo Memorando No.20267070040913 del 11 de febrero de 2026 e instrucciones para suspensión del Procedimiento Administrativo Sancionatorio Contractual contra el Concesionario Ruta al Mar S.A.S. por el presunto incumplimiento de las obligaciones referidas a la no terminación de intervenciones previstas en la Unidad Funcional 2 - UF2, del Contrato de Concesión bajo esquema de APP No.016 de 2015, en el Proyecto Conexión Antioquia – Bolívar, Expediente No.20247070320700036E.

Mediante memorando Radicado ANI No.20267070071623 de fecha 30 marzo de 2026, la Coordinación GIT de Procedimientos Administrativos Sancionatorios Contractuales, presentó a la Vicepresidencia Ejecutiva de la ANI y a la Gerencia de Proyectos Carretero 1 – VEJ de la ANI, respuesta a la solicitud relacionada con el Procedimiento Administrativo Sancionatorio Contractual iniciado contra la sociedad Concesionaria Ruta al Mar S.A.S., concerniente al presunto incumplimiento de las obligaciones referidas a la no terminación de intervenciones previstas en la Unidad Funcional 2 - UF2 del Contrato de Concesión bajo esquema de APP No.016 de 2015, en el Proyecto Conexión Antioquia – Bolívar, Expediente No.20247070320700036E.

Por memorando Radicado ANI No.20263050089583 del 30 de abril de 2026, la Vicepresidencia Ejecutiva de la ANI, remite a la Coordinación GIT de Procedimientos Administrativos Sancionatorios Contractuales, respuesta al Memorando ANI No.20267070071623, solicitud ampliación de plazo relacionada con el Procedimiento Administrativo Sancionatorio Contractual iniciado contra la sociedad CONCESIÓN RUTA AL MAR S.A.S., por el presunto incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la no terminación de intervenciones previstas en la Unidad Funcional 2 - UF2, Sector K10+746 al K11+500, dentro del plazo contractualmente previsto en el Contrato de Concesión bajo esquema de APP No.016 de 2015, en el Proyecto Conexión Antioquia – Bolívar, Expediente No.20247070320700036E.

Por comunicado radicado ANI No.20263050156891 del 30 de abril de 2026, la Gerencia de Proyecto – Vicepresidencia Ejecutiva de la ANI, solicitó al CONSORCIO IPAB, actual interventor, pronunciamiento respecto del presunto incumplimiento de las obligaciones referidas a la no terminación de intervenciones previstas en la Unidad Funcional 2 - UF2, bajo el Contrato de Concesión No.016 de 2015 Proyecto Vial IP Antioquia - Bolívar.

Que el 1.º de mayo de 2026 fue notificado a las Partes el Laudo Arbitral Final, proferido el 30 de abril de 2026, dentro del trámite del Tribunal de Arbitramento Internacional que se venía desarrollando, decisión mediante la cual, entre otros asuntos, se declaró la terminación anticipada del Contrato de Concesión. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en la Sección 1.60 de la Parte General del Contrato de Concesión, a partir del 2 de mayo de 2026 se dio inicio a la Etapa de Reversión, con las consecuencias y el tratamiento previstos en la Sección 9.7 de la Parte General del Contrato.

Que, en atención requerimiento contenido en el radicado ANI No.20263050156891 del 30 de abril de 2026, esta Interventoría se pronunció mediante comunicado IPAB-0337-2026 del 27 de mayo de 2026 (radicado ANI 20264090673712), en donde atendió la solicitud elevada por la entidad respecto de la procedencia de la eventual declaratoria de ocurrencia de un Evento Eximente de Responsabilidad en curso respecto de los predios CAB-2-1-002, CAB-2-1-007, CAB-2-1-007A, CAB-2-1068 y CAB-2-1-344, detallando el estado actualizado de los predios en mención, para que la entidad pudiese tomar decisiones al respecto.

Por comunicado radicado ANI No.20263050221661 del 10 de junio de 2026, la Gerencia de Proyecto – Vicepresidencia Ejecutiva de la ANI, solicitó al CONSORCIO IPAB, un análisis adicional respecto del presunto incumplimiento de las obligaciones referidas a la no terminación de intervenciones previstas en la Unidad Funcional 2 -UF2 del Contrato de Concesión No.016 de 2015, Proyecto Vial IP Antioquia - Bolívar.

Atendiendo dicho requerimiento, esta Interventoría se pronunció mediante comunicado IPAB-0406-2026 del 16 de junio de 2026 (radicado ANI 20264090766582), en donde se respondieron de manera específica, las consultas elevadas en la comunicación recibida y se fijó posición frente al presunto incumplimiento contractual, para que la entidad pudiese tomar decisiones al respecto.

Por comunicado radicado ANI No.20263050316041 del 18 de agosto de 2026, la Gerencia de Proyecto – Vicepresidencia Ejecutiva de la ANI, devolvió al CONSORCIO IPAB, el concepto emitido, solicitando su complementación de acuerdo con el memorando ANI No.20261010144083 del 22 de julio de 2026 emitido por la Vicepresidencia Jurídica, respecto del presunto incumplimiento de las obligaciones referidas a la no terminación de intervenciones previstas en la Unidad Funcional 2 -UF2 del Contrato de Concesión No.016 de 2015, Proyecto Vial IP Antioquia – Bolívar.

Consorcio IPAB mediante comunicado IPAB-0689-2026 radicado el 27 de agosto del 2026, da respuestas cuyo asunto, Solicitud de ampliación de plazo – Radicado ANI 20263050316041 con asunto: “Devolución para complementación del concepto remitido mediante el comunicado IPAB-0406-2026 – Radicado ANI No. 20264090766582 -

Procedimiento Administrativo Sancionatorio Contractual tramitado bajo el Expediente No. 20247070320700036E, por el presunto incumplimiento de las obligaciones a cargo del Concesionario relacionadas con la no terminación de intervenciones previstas en la unidad funcional 2-UF2.

4.2.2.4. Funcional Integral (UFI) 3: Variante Planeta Rica; El Quince – San Carlos – Cereté y Variante Cereté

4.2.2.4.1. UFI 3.1 Variante Planeta Rica:

Construcción de la variante al municipio de Planeta Rica, para garantizar un mejor flujo vehicular, evitando el paso por el casco urbano del municipio, disminuyendo el riesgo para los habitantes y usuarios de la vía dentro del municipio. Tiene una longitud aproximada de 4,53 km entre el K0+000 al K4+530, incluyó la construcción de una vía primaria de una calzada de dos carriles, bidireccional con carpeta de rodadura en pavimento flexible, con carriles de 3,65 m y bermas de 2,0 metros tanto externa como interna, la construcción de un puente en la intersección 2 y un paso peatonal deprimido.

4.2.2.4.2. UFI 3.2 Mejoramiento vía El Quince – San Carlos:

Correspondió al mejoramiento de la vía existente del K0+000 (El Quince) al K10+000, cumpliendo con los estándares requeridos contractualmente. Incluyó la construcción de una vía primaria de una calzada de dos carriles, bidireccional con carpeta de rodadura en pavimento flexible, con carriles de 3,65 m y bermas de 2,0 metros tanto externa como interna, la construcción de una intersección a nivel en el K0+000 del tramo, la construcción de la estación de Peaje San Carlos en el K9+650 y un Paso Peatonal Carrizal K4+090.

4.2.2.4.3. UFI 3.3 Construcción de la Vía Nueva del K10+000 al K22+500 (vía El Quince – San Carlos):

Correspondió a la construcción de vía nueva entre el K10+000 al K22+500, para una longitud de 12,5 kilómetros. Incluyó la construcción de una vía primaria de una calzada de dos carriles, bidireccional con carpeta de rodadura en pavimento flexible, con carriles de 3,65 m y bermas de 2,0 metros tanto externa como interna, la construcción de los Puentes Arroyo Grande PR12+900 y Puente Canal San Carlos PR20+160 y la construcción de dos pasos peatonales uno en San Carlos a la altura del K19+540 y otro en Remedia Pobre en el K21+860

4.2.2.4.4. UFI 3.4 Mejoramiento San Carlos – Cereté:

Correspondió al mejoramiento entre el K22+500 al K31+990, incluyó la construcción de una vía primaria de una calzada de dos carriles, bidireccional con carpeta de rodadura en pavimento flexible, con carriles de 3,65 m y bermas de 2,0 metros tanto externa como interna, la construcción de una intersección a nivel para el ingreso norte al municipio de San Carlos y una a desnivel empalmando con la vía Cereté -Ciénaga de Oro, la construcción de los puentes Aguas Prietas PR24+480 y la intersección 5.

4.2.2.4.5. UFI 3.5 Variante Cereté:

Correspondió a la construcción de vía nueva para comunicar la entrada al municipio de Cereté viajando desde Ciénaga de Oro, con la vía Cereté – Lorica, evitando el paso por el municipio la cual se encuentra entre el K0+000 al K05+600, para una longitud de 5,6 kilómetros, Incluyó la construcción de una vía primaria de una calzada de dos carriles, bidireccional con carpeta de rodadura en pavimento flexible, con carriles de 3,65 m y bermas de 2,0 metros tanto externa como interna, la construcción de dos pasos peatonales uno en las Marcelitas a la altura del K1+800 y otro en Caracas en el K2+320

En la UFI 3.5 Variante Cereté, se debe construir la Intersección 7, la cual a la fecha se encuentra construida parcialmente y operando, la construcción total de la misma no se ha podido realizar debido a la ocurrencia de un Evento Eximente de Responsabilidad que se describe a continuación:

El día 13 de noviembre/19 la ANI reconoce y acepta lo informado por la Concesión Ruta al Mar, mediante radicado ANI No.2019-409-081897-2 y No. 2019-409-093143-2 del 08 de agosto y 06 de septiembre de 2019, constituido un evento eximente de responsabilidad -EER para los predios CAB-3-5-061 y CAB-3-5-062 del subsector 5 de la Unidad Funcional 3, cuya gestión no pudo ser terminada en la fecha de terminación prevista de las intervenciones.

Respecto a los avances de esta Unidad Funcional, aún presenta algunos pendientes para terminar las actividades de construcción debido a la Declaratoria de Ocurrencia de Evento Eximente de Responsabilidad mencionada anteriormente, como son:
Falta la construcción de una alcantarilla que se encuentra en la intersección 7.

Tabla 4-6. Intersección 7.

INTERSECCIÓN 7	ABS INICIAL	ABS FINAL	ESTADO DEL AVANCE
enlace directo	210	301,192	SIN INTERVENIR
Glorieta	115	229,287	SIN INTERVENIR
enlace S-W	0	41,569	SIN INTERVENIR

INTERSECCIÓN 7	ABS INICIAL	ABS FINAL	ESTADO DEL AVANCE
enlace E-N	10	30	SIN INTERVENIR

Fuente: Consorcio IPAB.

Esta UFI cuenta con Acta de Terminación el 25 de febrero del 2021.

Pasos Peatonales: En esta Unidad Funcional se construyeron todos los pasos peatonales y se encuentran en operación y mantenimiento.

Tabla 4-7. Pasos Peatonales.

UF	Abscisa	Nombre del Paso	Municipio
3,1	K1+890	Variante Planeta	Planeta Rica
3,2	K4+050	Entrada Carrizal	San Carlos
3,3	K19+540	Entrada San Carlos 1	San Carlos
3,3	K21+900	Entrada San Carlos 2	San Carlos
3,5	K1+700	Entrada Cereté	Cereté
3,5	K2+350	Entrada Caracas	Cereté

Fuente: Consorcio IPAB.

4.2.2.5. Unidad Funcional Integral (UFI) 4: Planeta Rica – Montería

El alcance para esta Unidad Funcional, corresponde a la operación y mantenimiento de dos (2) subsectores recibidos de la Concesión Transversal de las Américas.

Si bien es cierto los alcances de esta UF son de operación y mantenimiento, el Concesionario adelantó algunas actividades constructivas como son:

Peaje Purgatorio PR38+700: Se terminaron las actividades de construcción del peaje, a la fecha se presta de forma continua y sin ningún contratiempo el servicio, funcionando en el K38+700, ubicación definitiva desde el 16 de abril del 2019 avalada por la resolución 1385 del 15 de abril de 2019, emitida por el Ministerio de Transporte.

Pasos Peatonales: Mediante Otrosí N°16 se modificó la tipología de los pasos peatonales cambiando algunos pasos de subterráneo a nivel con el fin de facilitar al peatón su utilización por presentar longitudes de acceso muy inferiores a las de los puentes peatonales, frente a lo anterior, a continuación, se presenta el detalle del estado de los pasos peatonales a la fecha:

Tabla 4-8. Pasos Peatonales.

UF	Abs Contrato	Abs Construcción	Nombre del Paso	Municipio	Características Macro Otrosí 16	Características Macro Construida	Cumplimiento características Macro OTRO SI 16	Avance Ejecutado Mensual	Avance Ejecutado Acumulado	Estado
4,1	K10+675	10+660	Entrada La Carolina	Planeta Rica	PPS	2 (Cruce Con Paradero)	No		95%	Puesto a disposición, el paso peatonal se encuentra construido, pero, no se ha recibido toda vez que contractualmente el paso se debía construir subterráneo y se construyó a nivel. Se encuentra pendiente que el Concesionario presente el rebalanceo de los pasos peatonales, de acuerdo con la solicitud se realiza a través de los comités mensuales y Gerencial, además de los comunicados: CI.023/AB13858/25/5.3 de rad. ANI No. 20254090946922 del 28 de julio del 2025 y CI.023/AB14043/25/5.3 de rad. ANI No. 20254091157942 del 9 de septiembre del 2025
4,1	K29+650	29+550	Entrada Patio Bonito	Montería	2 (Cruce Con Paradero)	5 (Cruce Sin Paradero)	Sí		100%	Recibido con acta del 18/09/2024
4,1	K29+715	29+200	Entrada Tamarindo	Montería	3 (Cruce Sin Paradero)	9 (Cruce Escolar Con Paradero)	Sí		100%	Recibido con acta del 22/08/2025, este paso peatonal se trasladó a Patio Bonito en el 29+200

Fuente: Consorcio IPAB.

Actividades Ejecutadas en el periodo

Durante el periodo objeto del presente informe no se adelantaron actividades de construcción por parte del Concesionario. En consecuencia, no se registraron avances de obra asociados a la Unidad Funcional del proyecto.

4.2.2.6. Unidad Funcional Integral (UFI) 5: Puerto Rey – Montería; Santa Lucia – San Pelayo.

El alcance de esta Unidad Funcional corresponde a la Operación y Mantenimiento de dos (2) subsectores recibidos de la Concesión Transversal de las Américas. El primer subsector UFI 5.1 incluye la vía Puerto Rey (Arboletes) – Montería, el cual cuenta con una longitud de 63.5 kilómetros aproximadamente y el segundo UFI 5.2 corresponde a la vía Santa Lucia – San Pelayo, con una longitud aproximada de 26 kilómetros.

Peaje Los Cedros PR41+100: Está operando en este sitio, desde el 16 de enero del 2019, teniendo en cuenta que fue trasladado del PR47+000 al PR41+100 de la misma Unidad Funcional. Cabe aclarar que, si bien el peaje se encuentra operando, actualmente hay vigente un Evento Eximente de Responsabilidad, suscrito el 28 de mayo de 2025, debido a la interferencia que se presenta en el carril No. 5 con una tubería de red de acueducto administrada por un tercero. Mediante dicho EER, se otorgó un periodo especial del 15 de enero de 2019 al 20 de noviembre de 2025.

Pasos Peatonales: Mediante Otrosí N°16 se modificó la tipología de los pasos peatonales cambiando algunos pasos de subterráneo a nivel con el fin de facilitar al peatón su utilización por presentar longitudes de acceso muy inferiores a las de los puentes peatonales, frente a lo anterior, a continuación, se presenta el detalle del estado de los pasos peatonales a la fecha.

Tabla 4-9 Pasos Peatonales.

UF	Abs Contrato	Abs Construcción	Nombre del Paso	Municipio	Características Macro Otrosí 16	Características Macro Construida	Cumplimiento características Macro OTROSI 16	Avance Ejecutado Mensual	Avance Ejecutado Acumulado	Estado
5,1	K6+110	6+110	María Santana	Los córdobas	2 (Cruce Con Paradero)	2 (Cruce Con Paradero)	Sí		100%	Recibido con acta del 22/08/2025
5,1	K7+540	7+550	Entrada Los Córdobas	Los córdobas	5 (Cruce Sin Paradero)	5 (Cruce Sin Paradero)	Sí		100%	Recibido con acta del 22/08/2025
5,1	K24+848	24+815	El Ébano 1	Los córdobas	2 (Cruce Con Paradero)	2 (Cruce Con Paradero)	Sí		100%	Recibido con acta del 14/11/2024
5,1	K13+520	13+460	El Ébano 2	Los córdobas	8 (Cruce Escolar Con Paradero)	8 (Cruce Escolar Con Paradero)	Sí		100%	Recibido con acta del 14/11/2024
5,1	K30+305	3+350	Holanda	Los córdobas	2 (Cruce Con Paradero)	2 (Cruce Con Paradero)	Sí		100%	Recibido con acta del 18/09/2024
5,1	K42+450	42+370	Entrada Santa Lucía	Montería	2 (Cruce Con Paradero)	2 (Cruce Con Paradero)	Sí		100%	Recibido con acta del 14/11/2024
5,2	Por fuera del proyecto	62+075 - 61+375	Santa Lucía 1	Montería	2 (Cruce Con Paradero)	2 (Cruce Con Paradero)	Sí		100%	Recibido con acta del 10/02/2026
5,2	Por fuera del proyecto	61+150	Santa Lucía 2	Montería	7 (Cruce Escolar Sin Paradero)	7 (Cruce Escolar Sin Paradero)	Sí		100%	Recibido con acta del 10/02/2026
5,2	K21+230	21+210	San Pelayo 1 - PP_Pantano pecho Pelú	San Pelayo	2 (Cruce Con Paradero)	2 (Cruce Con Paradero)	Sí		100%	Recibido con acta del 14/11/2024

UF	Abs Contrato	Abs Construcción	Nombre del Paso	Municipio	Características Macro Otrosí 16	Características Macro Construida	Cumplimiento características Macro OTROSI 16	Avance Ejecutado Mensual	Avance Ejecutado Acumulado	Estado
5,2	K25+010	24+990	San Pelayo 2 - PP_Caño Bohórquez	San Pelayo	2 (Cruce Con Paradero)	2 (Cruce Con Paradero)	Sí		100%	Recibido con acta del 14/11/2024

Fuente: Consorcio IPAB.

Actividades Ejecutadas en el periodo

Pasos Peatonales: mediante comunicado con radicado ANI No. 20254091488982, la Interventoría presentó el informe de incumplimiento para los Pasos Peatonales Santa Lucía 1 y Santa Lucía 2. Los cuales fueron verificados y recibidos a satisfacción.

Es importante precisar que dicho recibo fue realizado y avalado por la interventoría anterior (Consorcio CR Concesiones), quien ejercía la supervisión técnica directa de estas obras.

De acuerdo con el Acta de Recibo de Pasos Peatonales UF 5.1, de fecha 10 de febrero de 2026, suscrita por la interventoría anterior, se formalizó la entrega y recibo de las siguientes infraestructuras:

Paso Peatonal PR 62+075 – 61+375 (Montería)
Tipología PPN con paraderos, cuya verificación de cumplimiento fue calificada bajo el criterio "**Conforme".**

Paso Peatonal PR 61+150 (Montería)
Tipología PPN sin paraderos, con verificación de cumplimiento conforme a los lineamientos establecidos en el Otrosí No. 16.

La validación emitida por la interventoría anterior confirma que, al momento de la entrega, estas infraestructuras cumplían con los requisitos contractuales en materia de urbanismo, señalización e iluminación.
Quedando así el capítulo de pasos peatonales de esta unidad funcional superado pasa a etapa de operación y mantenimiento.

A corte de este periodo no se realizó ninguna actividad, para lo cual se deja cerrado el capítulo de pasos peatonales superado en esta unidad funcional.

Obras de emergencias:

Debido a las afectaciones registradas en el Puente Trementino II, ubicado en la RN 7401, en el PR 19+350 de la vía Puerto Rey – Montería, perteneciente a la Unidad Funcional 5.1, ocasionadas por las condiciones climatológicas (frente frío) que afectaron al departamento de Córdoba, a la fecha de corte del presente informe la vía alterna se encuentra operativa y habilitada para el servicio público, con el propósito de garantizar la continuidad de la operación y mantener la transitabilidad en el corredor vial.

Como parte de las acciones tomadas por el concesionario para atender las afectaciones generadas, enmarcadas como obras de emergencia, los días 22 y 23 de julio de 2026 el concesionario socializó con la comunidad del AID del sector El Ébano, la Gobernación de Córdoba y la Alcaldía de Los Córdobas el inicio de las obras correspondientes a la construcción del nuevo puente Trementino II. Esta invitación fue realizada mediante el comunicado 48-RUTADCTOELECTRONICOS20260715012534.


El 27 de julio de 2026 el concesionario dio inicio formal a las actividades preliminares y de demolición de la superestructura e infraestructura del puente existente. Estas labores se vienen ejecutando bajo la supervisión y el seguimiento permanente de la interventoría, velando en todo momento por el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y gestión ambiental, con el fin de avanzar de manera oportuna hacia la restitución definitiva de la conectividad del corredor vial.

Especificaciones Generales del Diseño.

El nuevo puente Trementino II fue diseñado bajo la norma colombiana CCP-14 (LRFD) y los lineamientos del INVÍAS. Las características principales de la estructura son:

- **Longitud y Tipología:** Puente de una sola luz con 22.50 metros de longitud.
- **Superestructura:** Tablero apoyado sobre 3 vigas postensadas en concreto (f'c = 35 MPa / 42 MPa en anclajes), losa de rodadura en concreto reforzado (f'c = 28 MPa), barreras de tráfico y losas de acceso de 9.50 metros de largo.
- **Subestructura y Cimentación:** Estribos de concreto apoyados sobre pilotes fundidos en sitio de 1.00 metro de diámetro (f'c = 28 MPa).
- **Capacidad:** Diseñado para dos carriles de tránsito con carga vehicular C-40-14.

Figura 4-4. Excavación y Demolición de Puente Trementino II

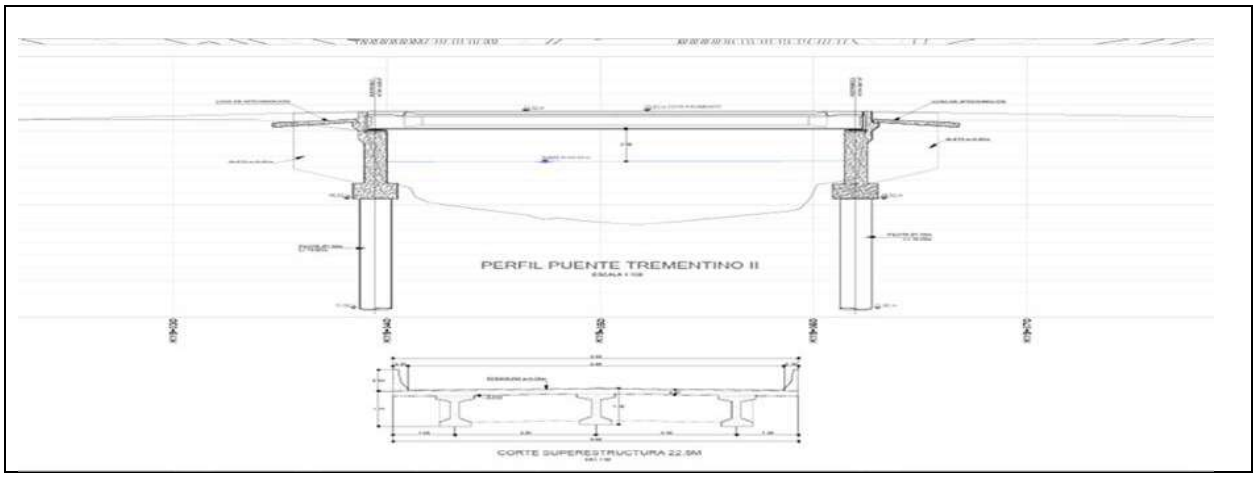

Fuente: Concesión Ruta al Mar, informe agosto 2026.

Avance de Construcción del puente Trementino II

En seguimiento al cronograma de obra establecido por el concesionario para la construcción del Puente Trementino II, durante el periodo correspondiente al mes de septiembre se verificaron las actividades ejecutadas y el avance de los diferentes frentes de trabajo a la fecha de corte del presente informe.

- **Demolición:** El 04 de agosto se dio inicio a las actividades de demolición del puente existente. Durante el periodo de seguimiento se verificó la culminación de las actividades de demolición, alcanzando un avance del 100 % a la fecha de corte.

- **Cimentación y Subestructura:** Durante el mes de septiembre se ejecutaron actividades correspondientes a la cimentación y subestructura de la nueva estructura, incluyendo las labores de excavación, armado del acero de refuerzo y fundida de los seis (6) pilotes de cimentación, distribuidos en tres (3) pilotes para cada uno de los apoyos de la estructura (Apoyo 1 y Apoyo 2).

Como parte del control de calidad del concreto utilizado en la fundida de los pilotes, se realizó la toma de muestras mediante cilindros para los respectivos ensayos de resistencia a la compresión, así como el ensayo de asentamiento (Slump), con el fin de verificar las condiciones y características del concreto colocado.

De igual manera, durante el periodo se adelantaron actividades de armado e instalación del acero de refuerzo de los estribos y pilotes, correspondientes a los elementos que conforman la cimentación y subestructura del nuevo puente.

A la fecha de corte, se evidencia un avance conforme a las actividades contempladas en el cronograma de obra, destacándose la culminación de la demolición del puente existente, la ejecución de los seis (6) pilotes de cimentación y el avance en el armado del acero de refuerzo de los estribos y pilotes.

Las actividades ejecutadas durante el periodo se encuentran acordes con la programación establecida por el concesionario, por lo cual, a la fecha de corte, no se evidencian atrasos frente al cronograma de obra vigente.

Figura 4-5. Actividades ejecutadas en el puente Trementino II



Fuente: Consorcio IPAB

Estabilización de talud en la unidad funcional UF 5 en el PR7+380.

En el sector ubicado aproximadamente en el PR 7+380 de la vía Puerto Rey – Montería, se identificó un proceso de inestabilidad del talud, asociado al deterioro y posterior falla funcional de una estructura de caída de agua existente, cuya función era conducir y disipar de manera controlada el flujo de escorrentía superficial proveniente de la cuenca aferente al talud.

De acuerdo con las condiciones evidenciadas en campo, la estructura de caída habría presentado una fractura y/o pérdida de continuidad hidráulica, posiblemente asociada a las condiciones excepcionales de precipitación registradas durante el periodo de lluvias. Esta condición habría permitido que parte del caudal dejara de circular de manera confinada por la estructura, generando infiltraciones hacia el terreno de soporte y el cuerpo del talud.

El proceso de inestabilidad se habría desarrollado con posterioridad a la ola invernal registrada en el departamento, durante la cual se presentaron precipitaciones de considerable intensidad, incremento de la escorrentía superficial y mayores aportes de agua hacia las obras de drenaje existentes. Bajo estas condiciones, la estructura de caída habría estado sometida a solicitaciones hidráulicas superiores a las habituales. La pérdida de continuidad y/o estanqueidad del sistema habría favorecido la infiltración de agua hacia el cuerpo del talud y la zona de apoyo de los elementos de contención conformados por gaviones.

Como consecuencia de este mecanismo de deterioro, se evidenció la pérdida de alineamiento y estabilidad de la estructura de caída, acompañada de procesos de rotación y desplazamiento de los gaviones laterales que cumplían funciones de contención, protección y confinamiento del sistema. Parte de estos elementos fueron desplazados conjuntamente con la masa inestable y terminaron depositándose sobre la berma de la vía, evidenciando un proceso de pérdida de confinamiento, desplazamiento del material y afectación parcial de las obras de drenaje y protección existentes.

Figura 4-6. Fallas en el talud PR 7 +380





Fuente: Consorcio IPAB

Especificaciones Generales del Diseño Estructural de canal en "u".

Normatividad y materiales.

El diseño se realiza bajo los lineamientos de la Norma colombiana de diseño de puentes LRFD - CCP-14, adoptando los siguientes parámetros de materiales:

- **Concreto Estructural (f'c**): 28 MPa (4000 psi)
- **Acero de Refuerzo (fy**): 420 MPa (60,000 psi), Grado 60.
- **Espesor de Losa y Muros**: 20 cm (0.20 m).
- **Recubrimiento libre geométrico**: 75 mm (7.5 cm), garantizando la durabilidad y protección ante la exposición ambiental e hidráulica.

Parámetros geotécnicos y cimentación.


De acuerdo con el informe de suelos (Anexo A), los parámetros adoptados para el análisis y verificación de los elementos de cimentación profunda son:

- **Tipo de cimentación:** Pilotes cortos de concreto.
- **Longitud del pilote (L):** 3.60 m (Medidos desde la base del canal).
- **Diámetro del pilote:** 0.30 m.
- **Capacidad Admisible Geotécnica (Padm):** 32 kN por pilote (según recomendaciones de diseño).
- **Modelación en Software:** Los pilotes se simularon mediante elementos tipo barra (Frame) empotrados en su base y vinculados monolíticamente a la losa del canal.

Se evalúa la sección circular propuesta para la cimentación profunda:

- **Diámetro del pilote (Ø):** 30 cm (300 mm).
- **Área bruta de la sección (Ag):** 70.686 mm².
- **Resistencia especificada a la compresión del concreto (f'c):** 28 MPa.

Figura 4-7 diseño de estabilización de talud

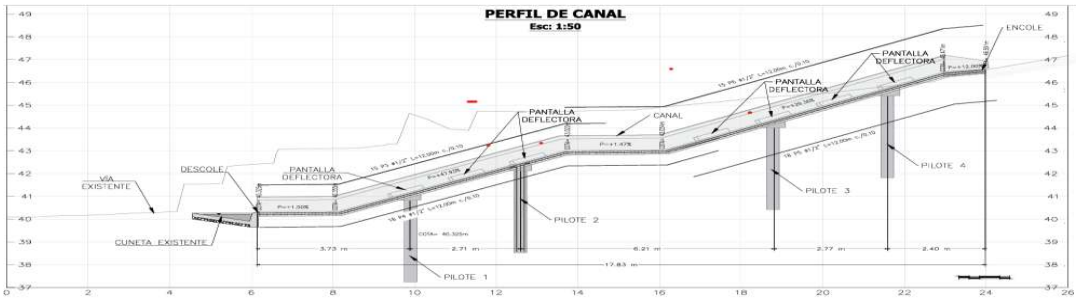

Fuente: Concesión Ruta al Mar, informe septiembre 2026.

Actividades ejecutadas durante el periodo

Como resultado del seguimiento realizado durante el periodo, esta Interventoría efectuó la verificación en campo de las actividades ejecutadas por el Concesionario en el sector objeto de intervención, relacionadas con la atención y recuperación de las afectaciones identificadas.

Durante el periodo se evidenció la ejecución de actividades de excavación y conformación del terreno, construcción y culminación de pilotes, ejecución de la estructura de conducción y disipación de aguas, así como la construcción de obras complementarias de protección mediante gaviones.

Las actividades ejecutadas estuvieron orientadas a estabilizar el talud, controlar y conducir adecuadamente las aguas superficiales y recuperar las condiciones de estabilidad y funcionalidad del sector intervenido.

Esta Interventoría realizó el seguimiento técnico correspondiente, verificando en campo el avance y las condiciones de las obras ejecutadas durante el periodo.

Figura 4-8. Reparaciones en el talud PR 7 +380





Fuente: Consorcio IPAB


4.2.2.7. Unidad Funcional Integral (UFI) 6: Cereté – Lorica; Lorica – Coveñas; Coveñas – Tolú

4.2.2.7.1. UF 6.1 Cereté - Lorica:

Tramo con una longitud aproximada de 37 kilómetros y con un ancho promedio de 9,0 metros a lo largo de todo el tramo; el alcance de las intervenciones es el mejoramiento con la adecuación de anchos en la calzada, recuperación de inestabilidades de la banca,

cambio y mejoramiento de las estructuras de drenaje que no cumplan hidráulicamente, corrección de curvas horizontales y verticales además de los bombeos y peraltes, reforzamiento de la estructura de pavimento, construcción de una nueva carpeta de rodadura e instalación de nueva señalización horizontal y vertical. La intervención en este subsector de la Unidad Funcional se realizó con la siguiente sección típica:

Figura 4-9 Sección Trasversal de la Vía.

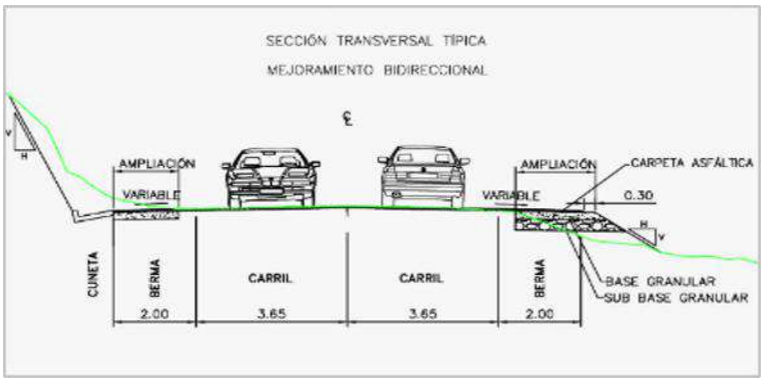

Fuente: Concesión Ruta al Mar, informe febrero 2026.

Actualmente la Unidad Funcional, se encuentra en el siguiente estado:

Tabla 4-10 Estado de UF6.

Sector	Etapa/Fase	Observación:
K10+764 al K14+960	En operación y mantenimiento	Acta de terminación parcial suscrita el 25 de junio de 2021
K14+960 al K15+300	En construcción	Sector cubierto con Evento Eximente de Responsabilidad
K15+300 al K15+500	En operación y mantenimiento	Acta de terminación parcial suscrita el 25 de junio de 2021
K15+500 al K16+170	En operación y mantenimiento	Acta de terminación parcial suscrita el 4 de julio de 2025
K16+170 al K16+450	En construcción	Sector cubierto con Evento Eximente de Responsabilidad
K16+450 al K16+650	En operación y mantenimiento	Acta de terminación parcial suscrita el 4 de julio de 2025
K16+650 al K28+940	En operación y mantenimiento	Acta de terminación parcial suscrita el 25 de junio de 2021
K28+940 al K29+430	En operación y mantenimiento	Acta de terminación parcial suscrita el 4 de julio de 2025
K29+430 al K29+560	En operación y mantenimiento	Acta de terminación parcial suscrita el 25 de junio de 2021
K29+560 al K30+060	En operación y mantenimiento	Acta de terminación parcial suscrita el 4 de julio de 2025
K30+060 al K47+640	En operación y mantenimiento	Acta de terminación parcial suscrita el 25 de junio de 2021

Sector	Etapa/Fase	Observación:
K47+640 al K48+222	En construcción	Sector cubierto con Evento Eximente de Responsabilidad

Fuente: Consorcio IPAB.

Construcción Peaje de Mata de Caña: Se encuentran finalizadas las actividades de construcción del Peaje Mata de Caña, en el PR 32+000.
Construcción Área de Servicio (K31+500) y CCO (K31+560): Se encuentra en operación, actualmente están en proceso de consecución de operadores para servicio de restaurante.
Construcción Básica (K30+700): Se encuentran finalizadas las actividades de construcción y se encuentra operando.

Pasos Peatonales: Mediante Otrosí N°16 se modificó la tipología de los pasos peatonales cambiando algunos pasos de subterráneo a nivel con el fin de facilitar al peatón su utilización por presentar longitudes de acceso muy inferiores a las de los puentes peatonales, frente a lo anterior, a continuación, se presenta el detalle del estado de los pasos peatonales a la fecha:

Tabla 4-11. Pasos Peatonales.

UF	Abs Contrato	Abs Construcción	Nombre del Paso	Municipio	Características Macro Otrosí 16	Características Macro Construida	Cumplimiento características Macro OTROSI 16	Avance Ejecutado Mensual	Avance Ejecutado Acumulado	Estado
6.1	14+000		Entrada Pelayito 1	San Pelayo	2 (Cruce Con Paradero)				0%	el plazo de cura solicitado por el Consorcio CR Concesiones, fue No Objetado por la ANI mediante radicado ANI No. 20263050034661 del 04/02/2026 y notificado al Concesionario con radicado ANI No. 20264090245982 del 27/02/2026. el Concesionario presente la respuesta al rebalanceo de los pasos peatonales enviada por la Interventoría CR mediante el comunicado CI.023/AB14501/26/5.3 del 31 de enero del 2026 con radicado ANI N°20264090116722 el concesionario mediante oficio CORRESPONDENCIA ENVIADA - RUTA AL MAR Radicado: 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260306011477 el 9/03/2026, dando respuesta a observaciones realizadas por la anterior interventoría anterior al balance de los pasos peatonales El consorcio CR notifico a la concesión mediante radicado ANI 20264090245982 el febrero 27 de 2026.el consorcio IPAB se pronunció mediante oficio IPAB-096-2026 con fecha del 26 de marzo del 2026. Quedando atenta
	14+650		Entrada Pelayito 2	San Pelayo	2 (Cruce Con Paradero)				0%	
	15+600		San Pelayo 1	San Pelayo	7 (Cruce Escolar Sin Paradero)				0%	
	16+650		San Pelayo 2	San Pelayo	2 (Cruce Con Paradero)				0%	
	17+850		San Pelayo 3	San Pelayo	2 (Cruce Con Paradero)				0%	
	18+750		San Pelayo 4	San Pelayo	2 (Cruce Con Paradero)				0%	
	24+400		Entrada a Cotorra 1	Cotorra	2 (Cruce Con Paradero)				0%	
	26+630		Entrada a Cotorra 2	Cotorra	2 (Cruce Con Paradero)				0%	
	29+750		Mata de Caña	Lorica	PPS				0%	

	31+200		Tierralta	Lorica	PPS				0%	a las instrucciones de la entidad. mediante radicado ANI No. 20263050148951 del 27 de abril de 2026, la ANI otorgó No Objeción al periodo de cura solicitado por la Interventoría Consorcio IPAB. Se notifico al concesionario el 8 de mayo 2026, Se notificación del otorgamiento de un plazo de cura por 30 días calendario al Concesionario por el Presunto incumplimiento plan de obras (pasos peatonales) la Agencia mediante comunicado ANI No. 20263050247561 del 30 de junio de 2026 solicitó a la Interventoría informar el estado de dicho plazo de cura otorgado y notificado al Concesionario, e informar las acciones adelantadas por la Interventoría para atender la solicitud de la Entidad. Consorcio IPAB da respuesta mediante comunicado IPAB-0584-2026, con radicado ANI 20264090987782 del 4 de agosto-2026. «solicitud estado de plazo de cura otorgado por la ANI mediante rad ANI no. 20263050148951.
	37+610		Cotocá Arriba	Lorica	PPS				0%	
	39+800		Palo de Agua	Lorica	PPS				0%	
	44+330		La Palma	Lorica	PPS				0%	

Fuente: Consorcio IPAB.

Con base en la información reportada en el informe mensual de la Interventoría anterior, se evidencia que, durante los Comités Mensuales y Gerenciales celebrados en el año 2025, se solicitó al Concesionario adelantar las gestiones necesarias para iniciar las actividades de construcción de los pasos peatonales.

Adicionalmente, se realizaron requerimientos formales mediante las comunicaciones CI.023/AB13858/25/5.3, con radicado ANI N°20254090946922 del 28 de julio de 2025, y CI.023/AB14043/25/5.3, con radicado ANI N°20254091157942 del 9 de septiembre de 2025, sin que a la fecha se haya recibido respuesta por parte del Concesionario.

Frente a esta situación, la Interventoría, mediante comunicado CI.023/AB14433/26/5.3, con radicado ANI N.°20264090027572 del 9 de enero de 2026, solicitó un plazo de cura al Concesionario por presunto incumplimiento del Plan de Obras.

La interventoría consorcio CR solicitó plazo de cura, el cual fue No Objetado por la ANI mediante radicado ANI No. 20263050034661 del 04/02/2026 y notificado al Concesionario con radicado ANI No. 20264090245982 del 27/02/2026. el consorcio IPAB se pronunció mediante oficio IPAB-096-2026 con fecha del 26 de marzo del 2026. Quedando atenta a las instrucciones de la entidad.

mediante radicado ANI No. 20263050148951 del 27 de abril de 2026, la ANI otorgó No Objeción al periodo de cura solicitado por la Interventoría Consorcio IPAB.

Se notificó del otorgamiento de un plazo de cura por 30 días calendario al Concesionario por el Presunto incumplimiento plan de obras (pasos peatonales) – el 08 de mayo del 2026.

El 2 de junio del 2026, con Radicado: 48 RUTADCTOELECTRONICOS-20260601012236, el concesionario responde "Notificación del otorgamiento de un plazo de cura al Concesionario por el Presunto incumplimiento plan de obras (pasos peatonales)".

la Agencia mediante comunicado ANI No. 20263050247561 del 30 de junio de 2026 solicitó a la Interventoría informar el estado de dicho plazo de cura otorgado y notificado al Concesionario, e informar las acciones adelantadas por la Interventoría para atender la solicitud de la Entidad.
Consorcio IPAB da respuesta mediante comunicado IPAB-0584-2026, con radicado ANI 20264090987782 del 4 de agosto-2026. «solicitud estado de plazo de cura otorgado por la ANI mediante rad ANI no. 20263050148951.

Actividades Ejecutadas en el periodo

Durante este periodo no se ejecutaron actividades en los sectores que cuenta con Evento Eximente de Responsabilidad y que afectan la terminación de los sectores en transición.

Pasos Peatonales: Durante el periodo objeto del presente informe no se registró ejecución de actividades de construcción asociadas a los pasos peatonales.

Seguimiento al Plan De Obras

Teniendo en cuenta el seguimiento a las actividades de construcción de esta Unidad Funcional con base al plan de obras vigente, se tiene el siguiente avance del periodo entre el 01 al 30 de septiembre del 2026.

Figura 4-10. Avance Acumulado por Intervención.

Actividad	K10+000	K12+000	K14+000	K16+000	K18+000	K20+000	K22+000	K24+000	K26+000	K28+000	K30+000
Ampliación de Berma	☐ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ☐ ☐ ✓	☐ ☐ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓
Fresado 5cm	☐ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ☐ ☐ ✓	☐ ☐ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓
Instalación 1ra Capa Asfáltica	☐ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ☐ ☐ ✓	☐ ☐ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓
Instalación 2da Capa Asfáltica	☐ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ☐ ☐ ✓	☐ ☐ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓
Obras de Drenaje Intervenidas	☐ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ☐ ☐ ✓	☐ ☐ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓
Señalización Horizontal	☐ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ☐ ☐ ✓	☐ ☐ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓
Señalización Vertical	☐ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ☐ ☐ ✓	☐ ☐ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓

Actividad	K32+000	K34+000	K36+000	K38+000	K40+000	K42+000	K44+000	K46+000	K48+000	K50+000	K52+000	Progreso
Ampliación de Berma	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	92.11%
Fresado 5cm	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	92.11%
Instalación 1ra Capa Asfáltica	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	92.11%
Instalación 2da Capa Asfáltica	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	92.11%
Obras de Drenaje Intervenidas	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	92.11%
Señalización Horizontal	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	92.11%
Señalización Vertical	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	92.11%

Fuente: Propia del Consorcio IPAB.


Con base en la información registrada en el informe de febrero del 2026, de la interventoría anterior, se identifica que las actividades reportadas con aún continúan con pendientes corresponden principalmente a:
Las actividades pendientes corresponden a algunos sectores que no se han podido intervenir y que son transiciones entre los alineamientos de la UFI 2 y 6.1 y la construcción de los pasos peatonales.

El 19 de septiembre del 2023, se firmó el Acta de Evento Eximente de Responsabilidad por la no disponibilidad predial del Predio CAB–2–1–067 y por algunos hechos sociales, que han impedido el cumplimiento de las obligaciones constructivas, específicamente el cabal cumplimiento del Plan de Obras en relación con la obligación constructiva de adelantar las intervenciones de Mejoramiento previstas en el Apéndice Técnico 1 y la sección 4.5 literal (b) de la Parte General del Contrato de Concesión, para el sector comprendido entre el K14+960 al K15+500 y K16+170 al K16+650.

4.2.2.7.2. UF 6.2 Lorica - Coveñas:

Ubicación: Inicia en el municipio de Lorica (PR05+847) y finaliza en el límite entre los departamentos de Córdoba y Sucre, en el municipio de Coveñas (PR23+309)
Longitud aproximada: 17 km.
Tipo de intervención: Mejoramiento de la vía existente.
Sección típica de la intervención: Según el informe de interventoría anterior, la intervención se realizó conforme a la sección típica definida para la Unidad Funcional, incluyendo elementos de plataforma, calzada, bermas y señalización, garantizando la seguridad y funcionalidad de la vía.

Figura 4-11. Sección Transversal de la Vía.

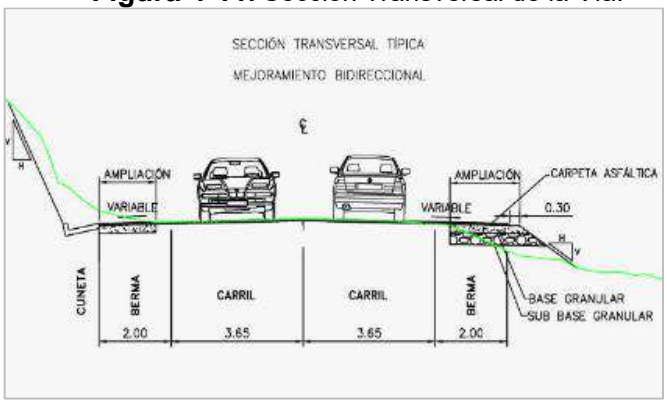

Fuente: Concesión Ruta al Mar, informe febrero 2026.

Tramo construido y recibido para Operación y Mantenimiento desde el 23 de agosto de 2021 entre el K05+847 al K23+309 de la ruta nacional 9004.

Pasos Peatonales: De acuerdo con la información contenida en el informe de interventoría anterior, mediante **Otrosí N°16** se modificó la tipología de los pasos peatonales, cambiando algunos de subterráneos a nivel. Esta modificación se realizó con el fin de facilitar la utilización por parte del peatón, dado que las longitudes de acceso de los subterráneos eran significativamente superiores a las de los puentes peatonales.

Con base en la información recopilada, se presenta a continuación el detalle del estado de los pasos peatonales a la fecha.

Tabla 4-12 Pasos Peatonales.

UF	Abs. Cont.	Abs Const.	Nombre del Paso	MNC.	Características Macro Otrosí 16	Característica s Macro Construida	Cumplimiento características Macro OTROSI 16	Avance Ejecutado Acumulado	Estado
6,2	9+250	9+240	Entrada Nuevo Agrado	San Antero	6 (Cruce Escolar Sin Paradero)	6 (Cruce Escolar Sin Paradero)	Sí	100%	Recibido con acta del 31/01/2025
6,2	17+850	17+830	San Antero 1 hospital	San Antero	5 (Cruce Sin Paradero)	5 (Cruce Sin Paradero)	Sí	100%	Recibido con acta del 31/01/2025
6,2	18+050	18+050	San Antero 2 lavadero	San Antero	4 (Cruce Sin Paradero)	4 (Cruce Sin Paradero)	Sí	100%	Recibido con acta del 31/01/2025
6,2	18+750	18+750	San Antero 3 brasilia	San Antero	4 (Cruce Sin Paradero)	2 (Cruce Con Paradero)	Sí	100%	Recibido con acta del 31/01/2025
6,2	19+280		San Antero 4 cangrejo	San Antero	2 (Cruce Con Paradero)	2 (Cruce Con Paradero)		100%	Recibido con acta del 6/02/2026

UF	Abs. Cont.	Abs Const.	Nombre del Paso	MNC.	Características Macro Otrosí 16	Características Macro Construida	Cumplimiento características Macro OTROSI 16	Avance Ejecutado Acumulado	Estado
									Este paso peatonal se construyó en la Unidad Funcional 7.2 a la altura del 4+100, de acuerdo con la solicitud de la comunidad del Palmar y teniendo en cuenta que, en la ubicación inicial, la Alcaldía de San Antero ejecutó una intervención que implica la construcción de un acceso, por lo tanto, se debió reubicar.
6,2	19+400	19+340	San Antero 5 cangrejo 2	San Antero	2 (Cruce Con Paradero)	2 (Cruce Con Paradero)	Sí	100%	Recibido con acta del 6/02/2026
6,2	19+740	19+650	San Antero 6 puente bijao	San Antero	4 (Cruce Sin Paradero)	4 (Cruce Sin Paradero)	Sí	100%	Recibido con acta del 6/02/2026
6,2	23+650	20+240	El Porvenir (mirian pardo)	San Antero	3 (Cruce Sin Paradero)	3 (Cruce Sin Paradero)	Sí	100%	Recibido con acta del 6/02/2026 Este paso peatonal se dividió en dos sectores Marian pardo 1(20+240) y Mirian Pardo 2 (20+580)


Fuente: Consorcio IPAB.

4.2.2.7.3. UF 6.3.1 Coveñas - Tolú:

Con base en la información recopilada, se tenía previsto inicialmente intervenir la Ruta 9004 entre el K41+000 y el K46+100, con una longitud aproximada de 5,1 km, realizando mejoramiento de la calzada sencilla existente.

No obstante, el Otrosí N°14 del mes de junio de 2019 modificó el alcance de la obra, dejando la intervención comprendida entre el K41+440 y el K43+355, con una longitud aproximada de 1,9 km, manteniendo el alcance de mejoramiento de la calzada sencilla. Esta modificación se presentó debido a: La negación de sustracción del DRMI de la Ciénaga de la Caimanera en la Unidad Funcional 7.2. La ampliación del aeropuerto de Tolú en la Unidad Funcional 7.3.

Figura 4-12. Sección Transversal de la Vía.

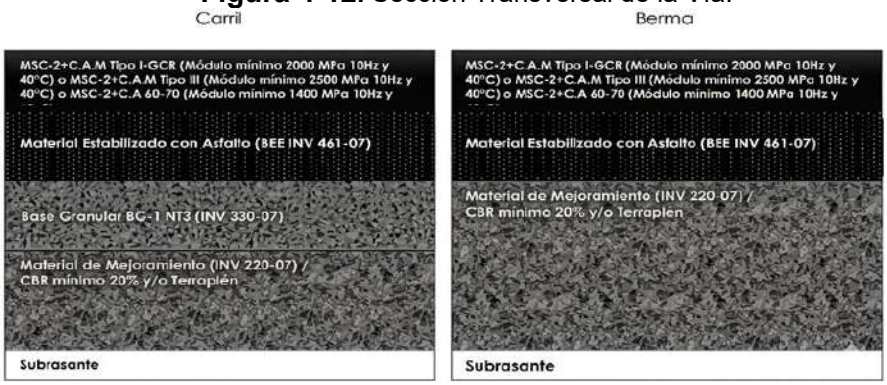

Fuente: Concesión Ruta al Mar, informe febrero 2026.

Tramo construido y recibido para Operación y Mantenimiento desde el 4 de julio de 2025 entre el K41+440 al K43+355 de la ruta nacional 9004.

EER – Establecimiento Definitivo Peaje Caimanera:

De conformidad con la información recopilada y analizada, a continuación, se presentan los eventos eximentes de responsabilidad (EER) asociados al desarrollo del proyecto, así como los antecedentes y gestiones adelantadas por las diferentes entidades involucradas.

1. Antecedentes y Bloqueos Iniciales

Desde septiembre de 2022, se presentó bloqueo en el sector Palo Blanco PR43+230 (UF 6.3.1), impidiendo la construcción de la estación de peaje La Caimanera y generando atrasos en el Plan de Obras.

El 11 de julio de 2023, mediante la Resolución 20233040029245, el Ministerio de Transporte definió la ubicación del peaje en el K1+500 de la UF 7 subsector 3, con plazo hasta 30 de noviembre de 2024.

El 19 de septiembre de 2023, la ANI aprobó un Evento Eximente de Responsabilidad (EER) para el PR43+230, estableciendo un período especial entre 15 de septiembre de 2022 y 30 de junio de 2024, y un tiempo adicional de 176 días para la ejecución de obras una vez superadas las causas del EER.

Al 30 de junio de 2024, no se habían superado las causas del EER, por lo que se extendió el período especial hasta 30 de enero de 2025, inclusive.

2. Extensiones del Período Especial

13 de diciembre de 2024: El concesionario solicitó nueva extensión de los períodos especiales de los EER de la UF 6.3.1.

La interventoría emitió concepto favorable mediante CI.023/AB13151/24/5.3, considerando que las causas del EER persistían.

31 de enero de 2025: Se suscribió acta de extensión del período especial hasta 30 de junio de 2025.

Posteriormente, la ANI recibió solicitud de tercera extensión del período especial, la cual fue remitida al Comité de Contratación para su estudio, dado que las causas del EER persistían.

3. Propuesta de Nueva Ubicación del Peaje

30 de mayo de 2025: La interventoría presentó concepto favorable a la ubicación del peaje en PR9+625 de la Variante Coveñas (UF 7.2). Se identificaron riesgos relacionados con la oposición de comunidades, trámites ambientales y vicisitudes que podrían impedir la ejecución.

27 de agosto de 2025: El Ministerio de Transporte publicó borrador de resolución para reubicación del peaje, con información sobre estructura tarifaria y espacio para comentarios de usuarios y comunidades.

4. Bloqueos y Mesas de Concertación

03 de septiembre de 2025: Bloqueos en UF 6.3 y PR 20+700 (Variante Coveñas) por oposición de comunidades de Coveñas y Tolú. ANI programó mesa de concertación para el 08 de septiembre de 2025.

11 de septiembre de 2025: Mesa de concertación con ANI, Ministerio de Transporte, líderes sociales y autoridades locales. Las comunidades reiteraron oposición por impactos en turismo y economía local. Se explicó la ubicación del peaje y beneficios de tarifas diferenciales especiales.

24 de noviembre de 2025: Bloqueos coordinados por comité "No al peaje", gremios y comunidad en múltiples puntos (UF 6.3, 7.2, 7.3 y 8.1), solicitando derogación de la Resolución 20253040046605 y presencia de altos funcionarios para diálogo.

ANI aclaró que la reubicación del peaje no sería inmediata y dependería de acuerdos con la comunidad.

5. Gestión del Concesionario y Autoridades

25 de noviembre de 2025: Concesionario solicitó intervención urgente ante amenazas de incendio al peaje.

26 de noviembre de 2025: Concesionario notificó a ANI sobre responsabilidades por daños derivados de la conflictividad.

26 de noviembre de 2025: Gobernadora de Sucre sostuvo reunión con ANI para buscar solución. Se levantaron los bloqueos tras el compromiso de realizar mesa de trabajo con la administración departamental y gremios.

05 de diciembre de 2025: Mesa de trabajo en Santiago de Tolú con comunidad, comité "No al peaje" y gobernación de Sucre. Se expusieron impactos sociales y económicos, y se evaluaron alternativas, incluyendo uso de recursos de la Ley Primera de Puertos y revisión de peajes existentes.

6. Conclusiones

La interventoría registró los antecedentes de bloqueos, EER y extensiones, así como la gestión de la ANI y el Ministerio de Transporte.

Las comunidades y autoridades de Sucre y Santiago de Tolú se oponen a la reubicación del peaje La Caimanera en el Golfo de Morrosquillo.

Se proponen medidas compensatorias, como utilización de recursos para mantenimiento de la vía y evaluación de otros peajes bajo la concesión Ruta al Mar.

Se requiere que la ANI fundamente jurídicamente, técnica, ambiental y socialmente la decisión de no ubicar el peaje en la zona.

Pasos Peatonales: De conformidad con la información recopilada y analizada, mediante el **Otrosí N°16** se realizó la modificación de la tipología de algunos pasos peatonales, cambiando la solución inicialmente prevista de pasos subterráneos por pasos a nivel. Esta modificación se efectuó con el propósito de facilitar su uso por parte de los peatones, teniendo en cuenta que estas soluciones presentan longitudes de acceso considerablemente menores en comparación con las requeridas para los puentes peatonales. En este sentido, a continuación, se presenta el detalle del estado de los pasos peatonales a la fecha.

Tabla 4-13 Pasos Peatonales.

UF	Abs Contrato	Abs Construcción	Nombre del Paso	Municipio	Características Macro Otrosí 16	Características Macro Construida	Cumplimiento características Macro OTROSI 16	Avance Ejecutado Mensual	Avance Ejecutado Acumulado	Estado
6, 3	42+420	42+540	Playa Coveñas	Coveñas	3 (Cruce Sin Paradero)	3 (Cruce Sin Paradero)	Sí		100%	Recibido con acta del 04/09/2024
6, 3	42+690	42+690	Playa Coveñas	Coveñas	4 (Cruce Sin Paradero)	4 (Cruce Sin Paradero)	Sí		100%	Recibido con acta del 04/09/2024
6, 3	44+370		Playa Coveñas	Coveñas	PPS				0%	*
6, 3	46+300		Tolú 1	Tolú	PPS				0%	
6, 3	46+300		Tolú 2	Tolú	PPS				0%	

Fuente: Consorcio IPAB.

* Sin construir, A través de los comités mensuales y Gerenciales celebrados en el año 2025, se le ha solicitado al Concesionario adelantar las gestiones necesarias para iniciar las actividades de construcción de los pasos peatonales. Además, se han realizado requerimiento por medio de las comunicaciones CI.023/AB13858/25/5.3 de rad. ANI No.

20254090946922 del 28 de julio del 2025 y CI.023/AB14043/25/5.3 de rad. ANI No. 20254091157942 del 9 de septiembre del 2025. Teniendo en cuenta que el Concesionario no ha dado respuesta a las solicitudes, Debido a lo anterior, la Interventoría mediante el comunicado CI.023/AB14433/26/5.3 ANI N° 20264090027572 del 9 de enero del 2026 solicitó un plazo de cura para el Concesionario por incumplimiento del plan de obras. La interventoría consorcio CR solicito plazo de cura, el cual fue No Objetado por la ANI mediante radicado ANI No. 20263050034661 del 04/02/2026 y notificado al Concesionario con radicado ANI No. 20264090245982 del 27/02/2026. el febrero 27 de 2026.el consorcio IPAB se pronunció mediante oficio IPAB-096-2026 con fecha del 26 de marzo del 2026. Quedando atenta a las instrucciones de la entidad. Sin construir, A través de los comités mensuales y Gerenciales celebrados en el año 2025, se le ha solicitado al Concesionario adelantar las gestiones necesarias para iniciar las actividades de construcción de los pasos peatonales. Además, se han realizado requerimiento por medio de las comunicaciones CI.023/AB13858/25/5.3 de rad. ANI No. 20254090946922 del 28 de julio del 2025 y CI.023/AB14043/25/5.3 de rad. ANI No. 20254091157942 del 9 de septiembre del 2025. Teniendo en cuenta que el Concesionario no ha dado respuesta a las solicitudes, Debido a lo anterior, la Interventoría mediante el comunicado CI.023/AB14433/26/5.3 ANI N° 20264090027572 del 9 de enero del 2026 solicitó un plazo de cura para el Concesionario por incumplimiento del plan de obras. La interventoría consorcio CR solicito plazo de cura, el cual fue No Objetado por la ANI mediante radicado ANI No. 20263050034661 del 04/02/2026 y notificado al Concesionario con radicado ANI No. 20264090245982 del 27/02/2026. el febrero 27 de 2026.el consorcio IPAB se pronunció mediante oficio IPAB-096-2026 con fecha del 26 de marzo del 2026. Quedando atenta a las instrucciones de la entidad. mediante radicado ANI No. 20263050148951 del 27 de abril de 2026, la ANI otorgó No Objeción al periodo de cura solicitado por la Interventoría Consorcio IPAB. El día 8 de mayo 2026, la notificación del otorgamiento de un plazo de cura por 30 días calendario al Concesionario por el Presunto incumplimiento plan de obras (pasos peatonales). El 2 de junio del 2026, con Radicado: 48 RUTADCTOELECTRONICOS-20260601012236, el concesionario responde "Notificación del otorgamiento de un plazo de cura al Concesionario por el Presunto incumplimiento plan de obras (pasos peatonales)". la Agencia mediante comunicado ANI No. 20263050247561 del 30 de junio de 2026 solicitó a la Interventoría informar el estado de dicho plazo de cura otorgado y notificado al Concesionario, e informar las acciones adelantadas por la Interventoría para atender la solicitud de la Entidad. Consorcio IPAB da respuesta mediante comunicado IPAB-0584-2026, con radicado ANI 20264090987782 del 4 de agosto-2026. «solicitud estado de plazo de cura otorgado por la ANI mediante rad ANI no. 20263050148951.


Actividades ejecutadas en el periodo

Pasos Peatonales: Durante el periodo objeto del presente informe no se adelantaron actividades de construcción relacionadas con los pasos peatonales del proyecto.

Seguimiento al Plan De Obras UFI 6.3.1

La información presentada en el presente apartado se fundamenta en lo consignado en los informes mensuales elaborados por la interventoría anterior y la información recopilada, los cuales fueron tomados como base para el seguimiento y consolidación del estado de avance de las actividades del proyecto. En este sentido, y de acuerdo con el plan de obras vigente, a continuación, se presenta el avance correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 30 de septiembre de 2026 para la presente Unidad Funcional.

Figura 4-13. Avance Acumulado Unidad Funcional 6.3.1.

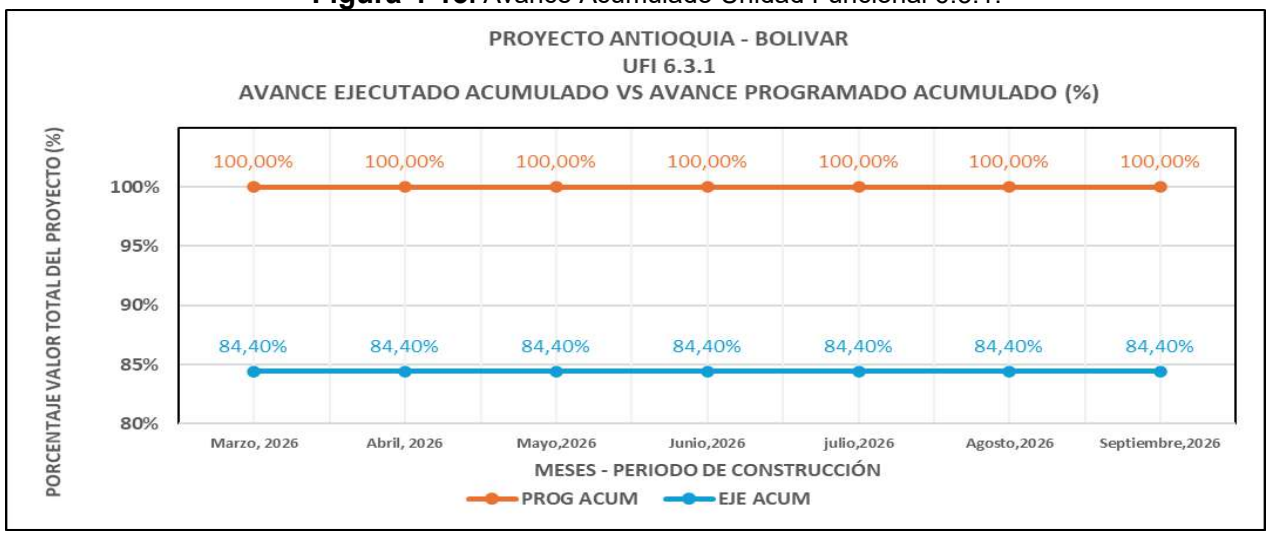

Fuente: Consorcio IPAB.

Los atrasos presentados en la Unidad Funcional 6.3.1, se deben a la problemática social presentada por la construcción de la Estación de Peaje Caimanera de este subsector, que quedó incluido en el EER firmado el 19 de septiembre de 2023.

4.2.2.7.4. UF 6.3.2 Rehabilitación PR35+000 – PR41+400:

Incluye el sector comprendido entre el K35+000 al K41+440 de la ruta nacional 9004 entre los municipios de Coveñas y Tolú con un alcance de rehabilitación con operación y mantenimiento por 10 años. El 19 de septiembre de 2023, se firmó acta el recibo parcial, iniciando la operación y mantenimiento del subsector.

- **Seguimiento Puente la Caimanera PR36+850:** Teniendo en cuenta el control topográfico que se realizaba en la interventoría anterior, se continúa realizando semanalmente en los puntos de control del puente Boca de la Ciénaga**.**

- **Monitoreo Puente Ciénaga**, se detallan las lecturas del monitoreo topográfico realizadas durante este mes sobre los puntos de control que se detallan a continuación que se encuentran sobre el puente.

- **Puntos de Control:** No obstante, durante las inspecciones realizadas se observa un incremento progresivo en la exposición del acero de refuerzo, asociado al deterioro de los elementos de concreto, situación que requiere seguimiento.

Figura 4-14. Monitoreo a Puente la Ciénaga. PR36+850 PUENTE LA CAIMANERA



Fuente: Consorcio IPAB.

UF 6.3.3 Puesto a Punto PR43+355 – PR49+580:


Comprendió el tramo entre el K43+355 al K49+580 de la ruta nacional 9004 con un alcance de Puesta a Punto.

El 19 de septiembre de 2023, se firmó acta de recibo. Así mismo para esta unidad funcional 6.3.3, se firmó el mismo 19 de septiembre de 2023, el acta de reversión de la ANI al Invias, a partir del 1 de octubre de 2023.

Seguimiento al Plan de Obras UFI 6:

Para toda la Unidad Funcional 6, teniendo en cuenta el seguimiento a las actividades de construcción con base al plan de obras vigente, se tiene el siguiente avance del periodo entre el 01 al 30 de septiembre del 2026.

Figura 4-15. Avance Acumulado Unidad Funcional 6.

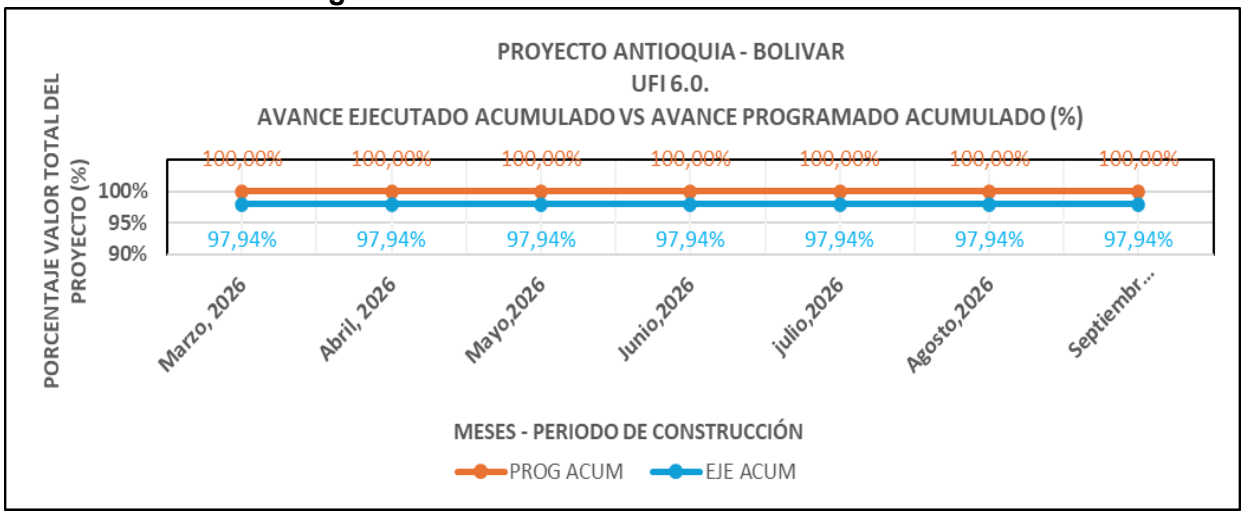

Fuente: Consorcio IPAB.

4.2.2.8. Unidad Funcional Integral (UFI) 7. Variante Lorica; Variante Coveñas; Tolú – Pueblito

4.2.2.8.1. UFI 7.1 Vía Nueva – Variante Lorica:

De acuerdo con la información recopilada, la Unidad Funcional correspondiente a la Variante Lorica contempla una longitud aproximada de 7,8 kilómetros, en la cual se proyecta la construcción de una vía nueva en calzada sencilla bidireccional, planteada por el costado derecho del municipio de Lorica, con el propósito de funcionar como variante vial, permitiendo desviar el tráfico pesado que actualmente transita por la vía principal del municipio.

Según el Plan de Obras vigente, el inicio de las actividades de construcción de esta Unidad Funcional estaba previsto para el 15 de febrero de 2018. No obstante, conforme a lo señalado por la interventoría anterior, debido a diversas dificultades relacionadas con consultas previas y aspectos asociados al diseño del proyecto, a la fecha de los informes consultados no se había dado inicio a las obras.

Adicionalmente, se indica que el diseño contractual correspondiente al trazado por el costado derecho no contó con la aprobación por parte de autoridades locales ni de la comunidad, quienes manifestaron la existencia de asentamientos de comunidades indígenas, afrodescendientes y de pescadores dentro del trazado aprobado, señalando posibles afectaciones a la Ciénaga Grande de Lorica.

En este sentido, y debido a la negación de la Licencia Ambiental, de acuerdo con lo reportado por la interventoría anterior, se encontraban en evaluación diferentes alternativas para el desarrollo del proyecto, entre las cuales se contemplaba la posible desafectación de la Variante Lorica.

4.2.2.8.2. UFI 7.2 Vía Nueva – Variante Coveñas:

De acuerdo con la información recopilada, y conforme a los alcances definitivos establecidos en el Otrosí N°14, se construyó un tramo vial con una longitud aproximada de 21,6 kilómetros, correspondiente a una vía en calzada sencilla bidireccional, desarrollada por la margen derecha del municipio de Coveñas.

La ejecución de esta infraestructura tuvo como propósito evitar posibles afectaciones a la Ciénaga La Caimanera y, a su vez, funcionar como variante al municipio de Coveñas, permitiendo desviar el tráfico pesado que anteriormente circulaba por la vía principal del municipio.

Figura 4-16. Sección Típica Construida.



Fuente: Concesión Ruta al Mar, informe febrero 2026.

Esta Unidad Funcional cuenta con acta de terminación parcial de Unidad Funcional, suscrita el 30 de abril de 2024, entrando a Operación y Mantenimiento desde esa fecha.

Pasos Peatonales: De acuerdo con la información recopilada, mediante el Otrosí N°16 se modificó la tipología de algunos pasos peatonales, cambiando su configuración de pasos subterráneos a pasos a nivel, con el fin de facilitar su utilización por parte de los peatones, considerando que estos presentan longitudes de acceso significativamente menores en comparación con los puentes peatonales.

En este sentido, a continuación, se presenta el detalle del estado de los pasos peatonales a la fecha, conforme a la información reportada por la interventoría anterior.

Tabla 4-14. Pasos Peatonales.

UF	Abs Contrato	Abs Construcción	Nombre del Paso	Municipio	Características Macro Otrosí 16	Características Macro Construida	Cumplimiento características Macro OTROSI 16	Avance Ejecutado Mensual	Avance Ejecutado Acumulado	Estado
7,2	4+620	4+620	Punta Seca	Coveñas	3 (Cruce Sin Paradero)	3 (Cruce Sin Paradero)	Sí		100%	Recibido con acta del 22/08/2025
7,2	5+105	5+105	Entrada Torrente	Coveñas	3 (Cruce Sin Paradero)	3 (Cruce Sin Paradero)	Sí		100%	Recibido con acta del 22/08/2025

Fuente: Consorcio IPAB.

4.2.2.8.3. UFI 7.3 Vía Nueva Entre Tolú y Pueblito:

De acuerdo con la información recopilada, este subsector cuenta con Acta de Terminación Parcial entre el K05+700 y el K27+060, incluyendo las intersecciones 15 y 16, suscrita el 8 de abril de 2021. Así mismo, se cuenta con Acta de Terminación Parcial entre el K00+000 y el K05+700, firmada el 9 de marzo de 2023.

En consecuencia, la totalidad de la Unidad Funcional 7.3 se encuentra actualmente en etapa de Operación y Mantenimiento.

Pasos Peatonales: De acuerdo con la información recopilada, mediante el Otrosí N°16 se modificó la tipología de algunos pasos peatonales, cambiando su configuración de pasos subterráneos a pasos a nivel, con el fin de facilitar su utilización por parte de los peatones, teniendo en cuenta que estos presentan longitudes de acceso considerablemente menores en comparación con los puentes peatonales.

En este sentido, a continuación, se presenta el detalle de los pasos peatonales construidos.

Tabla 4-15 Pasos Peatonales.


UF	Abs Contrato	Abs Construcción	Nombre del Paso	Municipio	Características Macro Otrosí 16	Características Macro Construida	Cumplimiento características Macro OTROSI 16	Avance Ejecutado Mensual	Avance Ejecutado Acumulado	Estado
7,3	5+860	5+860	Entrada Tolú viejo	Tolú	3 (Cruce Sin Paradero)	3 (Cruce Sin Paradero)	Sí		100%	Recibido con acta del 22/08/2025
7,3	20+570	20+600	Pita Abajo 1	Tolú	3 (Cruce Sin Paradero)	3 (Cruce Sin Paradero)	Sí		100%	Recibido con acta del 14/11/2024
7,3	21+760	21+760	Pita Abajo 2	Tolú	3 (Cruce Sin Paradero)	9 (Cruce Escolar Con Paradero)	Sí		100%	Recibido con acta del 04/09/2024
7,3	24+650	23+650	Pita Arriba	Tolú	2 (Cruce Con Paradero)	2 (Cruce Con Paradero)	Sí		100%	Recibido con acta del 14/11/2024

Fuente: Consorcio IPAB.

Seguimiento al Plan De Obras UFI 7

De acuerdo con la información recopilada y teniendo en cuenta el seguimiento realizado a las actividades de construcción de esta Unidad Funcional con base en el Plan de Obras vigente**,** a continuación, se presenta el avance correspondiente al periodo comprendido desde el 01 al 30 de septiembre de 2026.

Figura 4-17. Avance Acumulado Unidad Funcional 7.

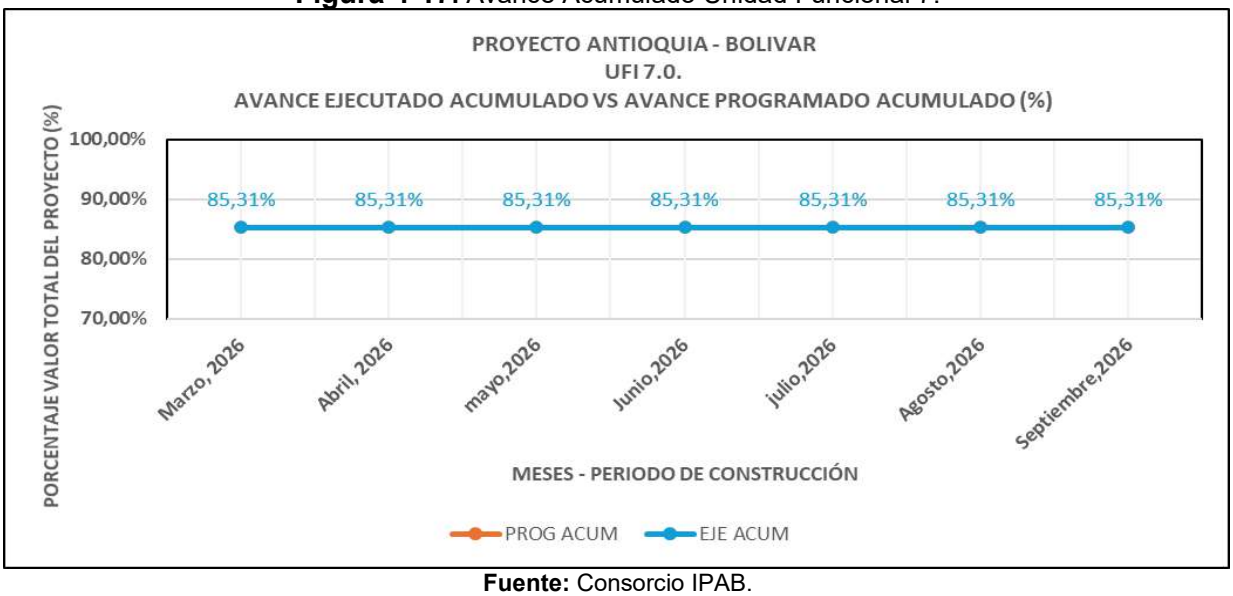

Fuente: Consorcio IPAB.

4.2.2.9. Unidad Funcional Integral (UFI) 8: Tolú – Tolú Viejo; Pueblito – Cruz del Viso

4.2.2.9.1. UFI 8.1 Vía Tolú - Toluviejo:

De acuerdo con la información recopilada, este subsector inicia en el municipio de Tolú en el PR49+453 y finaliza en el municipio de Toluviejo en el PR65+937, con una longitud aproximada de 16,5 km, y contempla una intervención de mejoramiento de la vía existente.

Así mismo, se indica que este subsector de la Unidad Funcional 8 se encuentra actualmente en operación, conforme al Acta de Terminación Parcial suscrita el 27 de septiembre de 2021.

Pasos Peatonales: De acuerdo con la información recopilada, mediante el Otrosí N°16 se modificó la tipología de algunos pasos peatonales, cambiando su configuración de pasos subterráneos a pasos a nivel, con el fin de facilitar su utilización por parte de los peatones, considerando que estos presentan longitudes de acceso considerablemente menores en comparación con los puentes peatonales.

En este sentido, a continuación, se presenta el detalle del estado de los pasos peatonales a la fecha.

Tabla 4-16 Pasos Peatonales.

UF	Abs Contrato	Abs Construcción	Nombre del Paso	Municipio	Características Macro Otrosí 16	Características Macro Construida	Cumplimiento características Macro OTROSI 16	Avance Ejecutado Mensual	Avance Ejecutado Acumulado	Estado
8,1	49+500	49+500	Tolú 1	Tolú	3 (Cruce Sin Paradero)	3 (Cruce Sin Paradero)	Sí		100%	Recibido con acta del 22/08/2025
8,1	49+700	50+000	Tolú 2	Tolú	8 (Cruce Escolar Con Paradero)	5 (Cruce Sin Paradero)	Sí		100%	Recibido con acta del 04/09/2024
8,1	56+750	56+650	Salida Tolú- Tolú Viejo 1	Tolú	5 (Cruce Sin Paradero)	5 (Cruce Sin Paradero)	Sí		100%	Recibido con acta del 18/09/2024
8,1	66+100	62+070	Salida Tolú- Tolú Viejo 2	Tolú Viejo	1 (Cruce Con Paradero)	1 (Cruce Con Paradero)	Sí		100%	Recibido con acta del 14/11/2024

Fuente: Consorcio IPAB.

4.2.2.9.2. UFI 8.2 Vía Pueblito – San Onofre:

De acuerdo con la información recopilada, este subsector inicia en el corregimiento de Pueblito en el PR93+683 y finaliza en el municipio de San Onofre en el PR104+820, con una longitud aproximada de 11,2 km, contemplando un alcance de mejoramiento de la vía existente.

Así mismo, se indica que este subsector de la Unidad Funcional 8 se encuentra actualmente en operación, conforme al Acta de Terminación Parcial suscrita el 21 de junio de 2021.

Pasos Peatonales: De acuerdo con la información recopilada, mediante el Otrosí N°16 se modificó la tipología de algunos pasos peatonales, cambiando su configuración de pasos subterráneos a pasos a nivel, con el fin de facilitar su utilización por parte de los peatones, considerando que estos presentan longitudes de acceso considerablemente menores en comparación con los puentes peatonales.

En este sentido, a continuación, se presenta el detalle del estado de los pasos peatonales a la fecha.

Tabla 4-17 Pasos Peatonales.

UF	Abs Contrato	Abs Construcción	Nombre del Paso	Municipio	Características Macro Otrosí 16	Características Macro Construida	Cumplimiento características Macro OTROSI 16	Avance Ejecutado Mensual	Avance Ejecutado Acumulado	Estado
8,2	96+180	96+240	San Onofre 1	San Onofre	3 (Cruce Sin Paradero)	3 (Cruce Sin Paradero)	Sí		100%	Recibido con acta del 14/11/2024
8,2	98+650	98+650	San Onofre 2	San Onofre	5 (Cruce Sin Paradero)	5 (Cruce Sin Paradero)	Sí		100%	Recibido con acta del 14/11/2024
8,2	104+580	104+500	San Onofre 3	San Onofre	5 (Cruce Sin Paradero)	5 (Cruce Sin Paradero)	Sí		100%	Recibido con acta del 18/09/2024
8,2	105+300	105+200	San Onofre 4	San Onofre	5 (Cruce Sin Paradero)	5 (Cruce Sin Paradero)	Sí		100%	Recibido con acta del 18/09/2024

Fuente: Consorcio IPAB.

4.2.2.9.3. UFI 8.3 San Onofre - Cruz Del Viso:

De acuerdo con la información recopilada, este tramo corresponde al sector comprendido entre el K00+023 y el K59+352 de la Ruta Nacional 9005, con una longitud aproximada de 59,34 km, en el cual se ejecutaron obras de mejoramiento vial.

Dentro de las actividades desarrolladas se incluyeron obras de ampliación de la calzada hasta un ancho de 11,3 m, recuperación de inestabilidades de la banca, cambio y/o mejoramiento de estructuras de drenaje que no cumplían con las condiciones hidráulicas requeridas, así como la corrección de curvas horizontales y verticales, junto con la adecuación de bombeos y peraltes.

Adicionalmente, se realizaron actividades de reforzamiento de la estructura de pavimento, construcción de una nueva carpeta de rodadura e instalación de señalización horizontal y vertical.

Figura 4-18. Pavimento Construido.



Fuente: Informe Concesión Ruta al Mar.

De acuerdo con la información recopilada, esta Unidad Funcional fue recibida parcialmente el 18 de abril de 2022, correspondiente a los sectores comprendidos entre el PR00+000 y el PR46+930, y entre el PR49+200 y el PR58+730.

Posteriormente, el 17 de diciembre de 2024, se suscribió Acta de Terminación Parcial para el tramo comprendido entre el PR46+930 y el PR49+200.

A la fecha, se encuentra pendiente únicamente el sector comprendido entre el PR58+730 y el PR59+180, correspondiente a la Intersección 17, el cual cuenta con Evento Eximente de Responsabilidad, confirmado mediante decisión del Amigable Componedor.

Pasos Peatonales:

De acuerdo con la información recopilada, mediante el Otrosí N°16 se modificó la tipología de algunos pasos peatonales, cambiando su configuración de pasos

subterráneos a pasos a nivel, con el fin de facilitar su utilización por parte de los peatones, considerando que estos presentan longitudes de acceso considerablemente menores en comparación con los puentes peatonales.

En este sentido, a continuación, se presenta el detalle del estado de los pasos peatonales a la fecha.

Tabla 4-18 Pasos Peatonales.

UF	Abs Contrato	Abs Construcción	Nombre del Paso	Municipio	Características Macro Otrosí 16	Características Macro Construida	Cumplimiento características Macro OTROSI 16	Avance Ejecutado Mensual	Avance Ejecutado Acumulado	Estado
8,3	0+341	0+180	San Onofre 5	San Onofre	4 (Cruce Sin Paradero)	5 (Cruce Sin Paradero)	Sí		100%	Recibido con acta del 18/09/2024
8,3	10+800	10+820	Entrada Pajonal	San Onofre	5 (Cruce Sin Paradero)	5 (Cruce Sin Paradero)	Sí		100%	Recibido con acta del 18/09/2024
8,3	14+990	15+000	Palo Alto 1	San Onofre	3 (Cruce Sin Paradero)	3 (Cruce Sin Paradero)	Sí		100%	Recibido con acta del 18/09/2024
8,3	16+000	16+000	Palo Alto 2	San Onofre	3 (Cruce Sin Paradero)	3 (Cruce Sin Paradero)	Sí		100%	Recibido con acta del 18/09/2024
8,3	23+500	23+650	Pueblo Nuevo	María La Baja	3 (Cruce Sin Paradero)	3 (Cruce Sin Paradero)	Sí		100%	Recibido con acta del 18/09/2024
8,3	27+350	27+350	Entrada Retiro Nuevo	María La Baja	5 (Cruce Sin Paradero)	5 (Cruce Sin Paradero)	Sí		100%	Recibido con acta del 18/09/2024
8,3	31+800	29+650	Entrada El Playón	María La Baja	3 (Cruce Sin Paradero)	8 (Cruce Escolar Con Paradero)	Sí		100%	Recibido con acta del 22/08/2025
8,3	32+000	29+600	Entrada Nueva Esperanza	María La Baja	1 (Cruce Con Paradero)	3 (Cruce Sin Paradero)	Sí		100%	Recibido con acta del 22/08/2025
8,3	32+500	31+800	Planta Biodiesel María la Baja	María La Baja	3 (Cruce Sin Paradero)	3 (Cruce Sin Paradero)	Sí		100%	Recibido con acta del 18/09/2024
8,3	35+550	35+550	Entrada Bellavista 1	María La Baja	3 (Cruce Sin Paradero)	3 (Cruce Sin Paradero)	Sí		100%	Recibido con acta del 18/09/2024
8,3	36+150	36+150	Entrada Bellavista 2	María La Baja	2 (Cruce Con Paradero)	2 (Cruce Con Paradero)	Sí		100%	Recibido con acta del 18/09/2024

UF	Abs Contrato	Abs Construcción	Nombre del Paso	Municipio	Características Macro Otrosí 16	Características Macro Construida	Cumplimiento características Macro OTROSI 16	Avance Ejecutado Mensual	Avance Ejecutado Acumulado	Estado
8,3	39+140	39+140	Entrada María La Baja	María La Baja	1 (Cruce Con Paradero)	5 (Cruce Sin Paradero)	Sí		100%	Recibido con acta del 18/09/2024
8,3	39+340	39+460	La Curva	María La Baja	2 (Cruce Con Paradero)	2 (Cruce Con Paradero)	Sí		100%	Recibido con acta del 18/09/2024
8,3	40+500	40+100	Caserío después de María La Baja	María La Baja	3 (Cruce Sin Paradero)	3 (Cruce Sin Paradero)	Sí		100%	Recibido con acta del 18/09/2024
8,3	48+450	48+450	San Pablo 1	María La Baja	5 (Cruce Sin Paradero)	5 (Cruce Sin Paradero)	Sí		100%	Recibido con acta del 22/08/2025
8,3	48+900	48+900	San Pablo 2	María La Baja	5 (Cruce Sin Paradero)	5 (Cruce Sin Paradero)		10%	100%	Recibido con acta del 6/02/2026 Se solicitar el desistimiento del periodo de cura a la ANI
8,3	59+000		Cruz del Viso	Mahates/Arjona	3 (Cruce Sin Paradero)	3 (Cruce Sin Paradero)			0%	*

Fuente: Consorcio IPAB.

*Sin construir. La interventoría consorcio CR solicitó plazo de cura, el cual fue No Objetado por la ANI mediante radicado ANI No. 20263050034661 del 04/02/2026 y notificado al Concesionario con radicado ANI No. 20264090245982 del 27/02/2026.el consorcio IPAB se pronunció mediante oficio IPAB-096-2026 con fecha del 26 de marzo del 2026. Quedando atenta a las instrucciones de la entidad. mediante radicado ANI No. 20263050148951 del 27 de abril de 2026, la ANI otorgó No Objeción al periodo de cura solicitado por la Interventoría Consorcio IPAB. Se notificó al concesionario el día 8 de mayo 2026, la notificación del otorgamiento de un plazo de cura por 30 días calendario al Concesionario por el Presunto incumplimiento plan de obras (pasos peatonales). El 2 de junio del 2026, con Radicado: 48 RUTADCTOELECTRONICOS-20260601012236, el concesionario responde "Notificación del otorgamiento de un plazo de cura al Concesionario por el Presunto incumplimiento plan de obras (pasos peatonales). la Agencia mediante comunicado ANI No. 20263050247561 del 30 de junio de 2026 solicitó a la Interventoría informar el estado de dicho plazo de cura otorgado y notificado al Concesionario, e informar las acciones adelantadas por la Interventoría para atender la solicitud de la Entidad. Consorcio IPAB da respuesta mediante comunicado IPAB-0584-2026, con radicado ANI 20264090987782 del 4 de agosto-2026. «solicitud estado de plazo de cura otorgado por la ANI mediante rad ANI no. 20263050148951.


Actividades ejecutadas en el periodo

Pasos Peatonales: Durante el periodo objeto del presente informe no se registraron avances en el desarrollo de las actividades previstas.

Seguimiento al Plan De Obras

De acuerdo con la información recopilada, y teniendo en cuenta el seguimiento realizado a las actividades de construcción de esta Unidad Funcional con base en el Plan de Obras vigente, a continuación, se presenta el avance correspondiente al periodo comprendido desde 01 al 30 de septiembre de 2026.

Figura 4-19. Avance Acumulado Unidad Funcional 8.3.

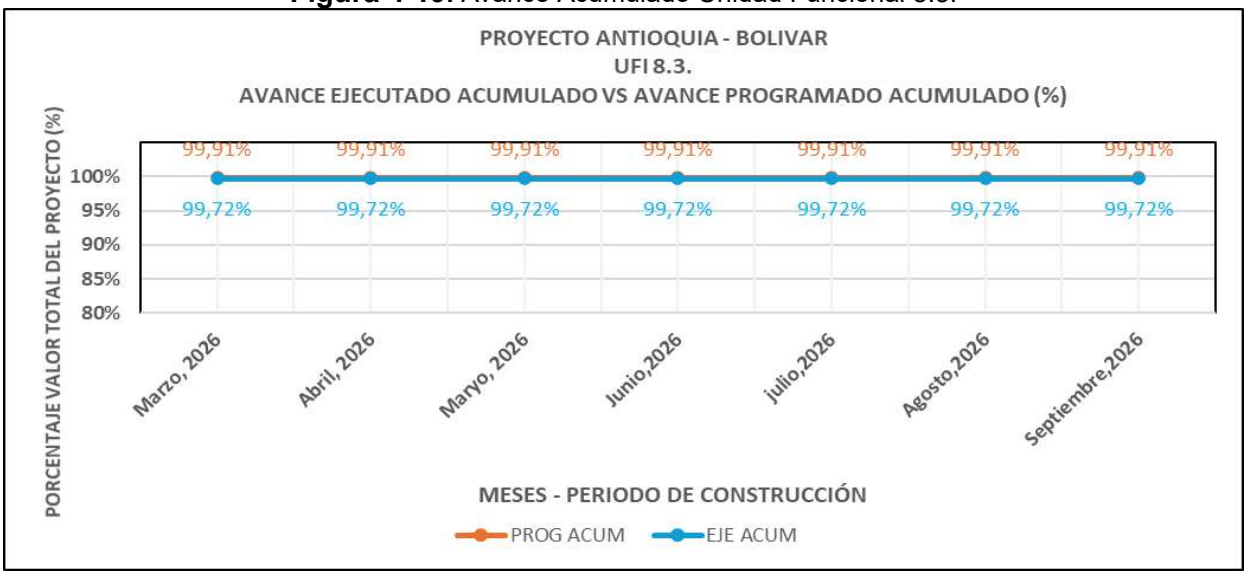

Fuente: Consorcio IPAB.


La situación presentada en el subsector 3 de la Unidad Funcional 8 se relaciona principalmente con que, a la fecha, no se han ejecutado las obras correspondientes a la Intersección 17, comprendida entre el PR58+730 y el PR59+318. Actualmente, el contrato se encuentra en etapa de Reversión, en virtud de la emisión del Laudo Arbitral, mediante el cual se declaró la terminación anticipada del Contrato de Concesión.

4.2.2.10. Seguimiento al Plan De Obras UFI 8

Para la Unidad Funcional 8, de acuerdo con la información recopilada, y teniendo en cuenta el seguimiento a las actividades de construcción con base en el Plan de Obras

vigente, a continuación, se presenta el avance correspondiente al periodo comprendido desde el 01 al 30 de septiembre de 2026.

Figura 4-20. Avance Acumulado Unidad Funcional 8.

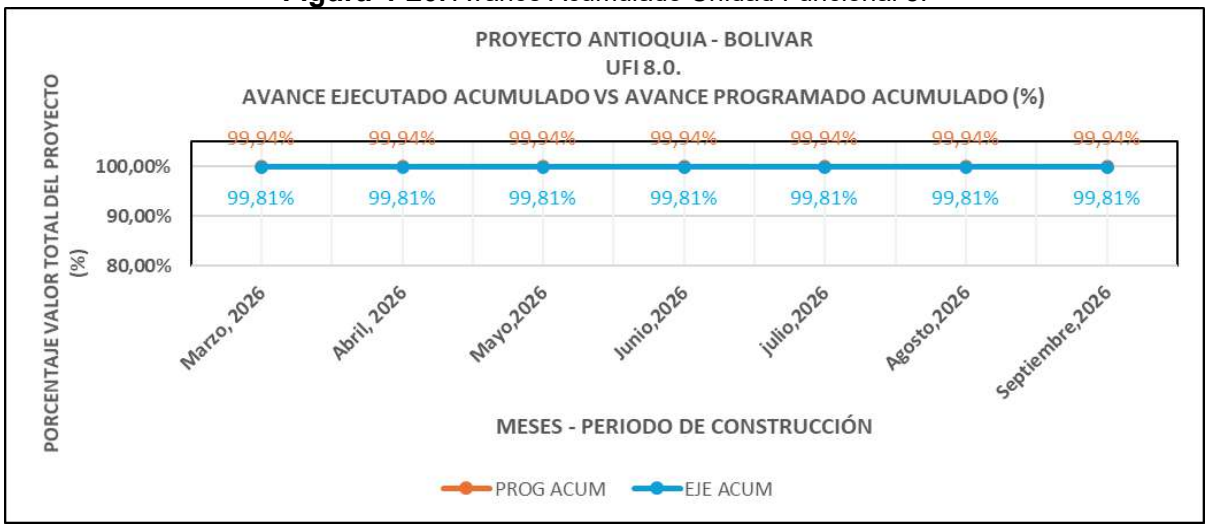

Fuente: Consorcio IPAB.

4.2.2.11. Balance Pasos Peatonales

De acuerdo con la información recopilada, y teniendo en cuenta que dentro del alcance contractual se contempla la construcción de 85 pasos peatonales, a continuación, se presenta el balance general de la totalidad de los pasos peatonales, así como el análisis de su estado actual y del cumplimiento de lo establecido en el Otrosí N°16.

Igualmente, se exponen las gestiones y acciones adelantadas, tendientes a dar cumplimiento a lo pactado en dicho Otrosí, conforme a lo reportado por la interventoría anterior.

Tabla 4-19 Pasos Peatonales.

UF	Cant.	Recibidos	Observaciones (Estado Actual)	Acciones adelantadas por la Interventoría
1	8	7	El paso de la UFI 1 (Los Manguitos) está sin iniciar a pesar de haber vencido el plazo de construcción.	Actualmente se encuentra en curso un proceso sancionatorio por el incumplimiento del plazo.
4	3	2	El paso de la UFI 4.1 se construyó a nivel,	Pendiente respuesta del Concesionario al rebalanceo enviado el 31/01/2026 (Rad. ANI 20264090116722).

			incumpliendo el Otrosí 16 que lo definía como subterráneo.	
6	26	10	16 pasos sin iniciar (13 en la UFI 6.1 y 3 en la UFI 6.3.1).	Consorcio IPAB da respuesta mediante comunicado IPAB-0584-2026, con radicado ANI 20264090987782 del 4 de agosto-2026. «solicitud estado de plazo de cura otorgado por la ANI mediante rad ANI no. 20263050148951.
7	7	6	El paso de la UFI 7.1 no se ha construido debido a la falta de Licencia Ambiental para este tramo.	Seguimiento al rebalanceo de pasos peatonales mediante el comunicado con radicado ANI 20264090116722.
8	25	24	El paso de la UFI 8.3 está sin iniciar porque aún no se ha ejecutado la intersección prevista en ese sitio.	mediante radicado ANI No. 20263050148951 del 27 de abril de 2026, la ANI otorgó No Objeción al periodo de cura solicitado por la Interventoría Consorcio IPAB. Se notificó al concesionario el día 8 de mayo 2026, la notificación del otorgamiento de un plazo de cura por 30 días calendario al Concesionario por el Presunto incumplimiento plan de obras (pasos peatonales)
TOTAL	85	63	74,12% de los pasos han sido recibidos exitosamente.	22,35% de los pasos se encuentran sin iniciar construcción.

Fuente: Consorcio IPAB.

4.2.2.12. Seguimiento de Avance de Intersecciones

De acuerdo con la información recopilada, y considerando que a lo largo del corredor vial se contempla la construcción de diferentes intersecciones, a continuación, se presenta el resumen del estado de avance de cada una de las estructuras proyectadas.

Tabla 4-20 Intersecciones.

Depto.	Municipio	Intersección	Tipo	UF	Avance (Prog / Ejec)	Observaciones / Estado
Córdoba	Planeta Rica	Int. 1	Nivel	3.1	100% / 100%	Finalizada.
	Planeta Rica	Int. 2	Desnivel	3.1	100% / 100%	Finalizada.
	San Carlos	Int. 3	Nivel	3.2	100% / 100%	Finalizada.
	San Carlos	Int. 4	Nivel	3.3	100% / 100%	Finalizada.
	San Carlos	Int. 5	Desnivel	3.4	100% / 100%	Finalizada.
	Cereté	Int. 6	Desnivel	3.5	100% / 100%	Finalizada.
	Cereté	Int. 7	Nivel	3.5	100% / 70%	Sin culminar por interferencia predial (cobijada con EER Predial).
	Lorica	Int. 8	Nivel	7.1	0% / 0%	Sin intervención: Falta de Licencia Ambiental para la UFI 7.1.
	Lorica	Int. 9	Nivel	7.1	0% / 0%	Sin intervención: Falta de Licencia Ambiental para la UFI 7.1.
	Lorica	Int. 10	Nivel	7.1	0% / 0%	Sin intervención: Falta de Licencia Ambiental para la UFI 7.1.
Sucre	Coveñas	Int. 11	Nivel	7.2	100% / 100%	Finalizada.
	Coveñas	Int. 12	Nivel	7.2	100% / 100%	Finalizada.
	Coveñas	Int. 13	Nivel	7.2	100% / 100%	Finalizada.
	Tolú	Int. 14	Nivel	7.3	100% / 100%	Finalizada.
	Tolú	Int. 15	Nivel	7.3	100% / 100%	Finalizada.
	Tolú	Int. 16	Nivel	7.3	100% / 100%	Finalizada.

Depto.	Municipio	Intersección	Tipo	UF	Avance (Prog / Ejec)	Observaciones / Estado
Bolívar	María La Baja	Int. 17	Nivel	8.3	0% / 0%	Sin intervención por EER (ampliado por Amigable Componedor).

Fuente: Consorcio IPAB.

4.2.2.13. Seguimiento de avance de puentes

De acuerdo con la información recopilada, y considerando que a lo largo del corredor vial se contempla la construcción de diferentes puentes vehiculares, a continuación, se presenta el resumen del estado de avance de cada una de las estructuras proyectadas

Tabla 4-21 Estado de Puentes.


Depto.	Nombre del Puente	UFI	Ubicación (PR)	Avance (Prog/Ejec)	Observaciones
Córdoba	Sin Nombre	1	K6+180	100% / 100%	Mej. finalizado.
	Q. San Mateo	1	K16+600	100% / 100%	Mej. finalizado.
	Q. Los Zambitos	1	K21+380	100% / 100%	Mej. finalizado.
	Q. Los Zambos	1	K34+200	100% / 100%	Mej. finalizado.
	Q. Carate	1	K49+350	100% / 100%	Límite Buenavista - Planeta Rica.
	Intersección 2	3.1	K4+530	100% / 100%	Const. finalizada.
	Arroyo Grande	3.3	K12+920	100% / 100%	Const. finalizada.
	Canal San Carlos	3.3	K20+160	100% / 100%	Const. finalizada.
	Intersección 5	3.4	K24+480	100% / 100%	Const. finalizada.
	Aguas Prietas	3.4	K31+440	100% / 100%	Mej. finalizado.
	Intersección 6	3.5	K0+000	100% / 100%	Const. finalizada.
	Caño Bugre	3.5	K2+780	100% / 100%	Const. finalizada.
	Aguas Prietas	7.1	K+200	0% / 0%	Sin intervención por Licencia Ambiental.
	Caño Mocho	7.1	K1+460	0% / 0%	Sin intervención por Licencia Ambiental.
Sucre	Petaca 1	7.2	K12+234	100% / 100%	Const. finalizada.
	Petaca 2	7.2	K12+538	100% / 100%	Const. finalizada.
	San Antonio	7.2	K14+085	100% / 100%	Const. finalizada.
	Arroyo Pechilin	7.3	K4+280	100% / 100%	Const. finalizada.
	Arroyo Grande	7.3	K13+800	100% / 100%	Const. finalizada.
	Palenquillo	7.3	K14+770	100% / 100%	Const. finalizada.
	Arroyo Cascajo	8.2	K100+560	100% / 100%	Const. finalizada.

Depto.	Nombre del Puente	UFI	Ubicación (PR)	Avance (Prog/Ejec)	Observaciones
Bolívar	Arroyo El Retiro	8.3	K27+755	100% / 100%	Const. finalizada.
	Arroyo Matuya	8.3	K36+580	100% / 100%	Mej. finalizado.
	Arroyo Corral	8.3	K38+450	100% / 100%	Mej. finalizado.

Fuente: Consorcio IPAB.

AVANCE FÍSICO Y PORCENTAJES DE AVANCE

Figura 4-21 Avance General.

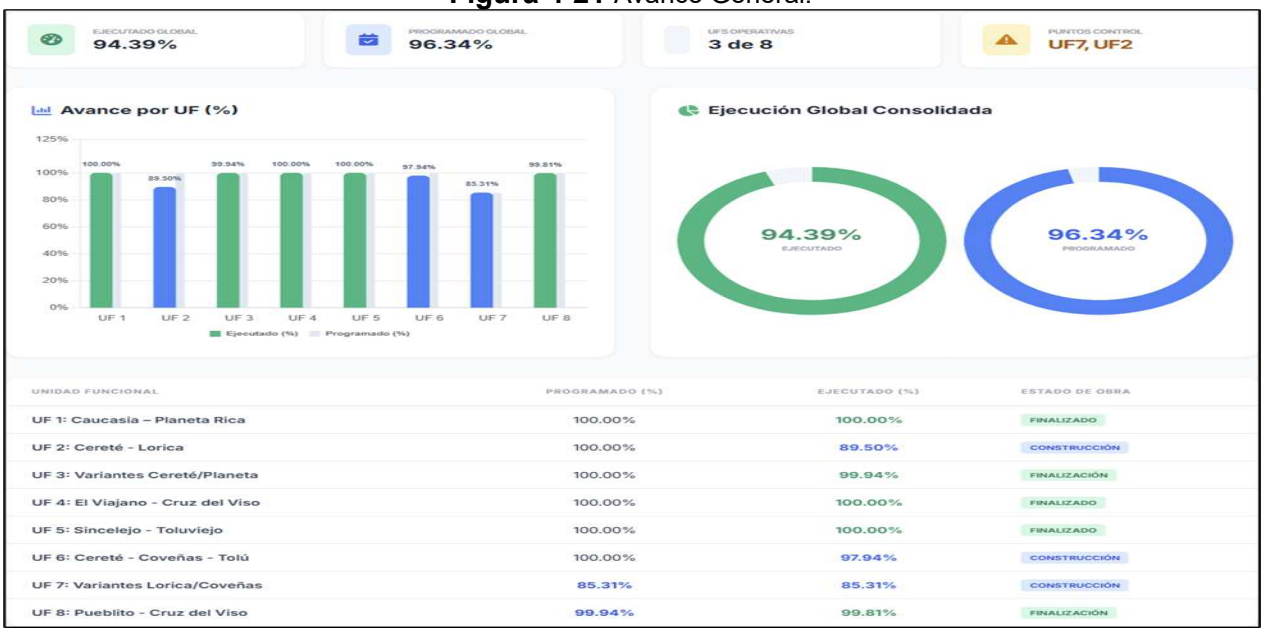

Fuente: Propia del Consorcio IPAB.

4.2.2.14. Seguimiento de redes

Durante el periodo objeto del presente informe no se registró avance en las actividades correspondientes.

4.2.2.14.1. Consolidado traslado de redes

De acuerdo con la información recopilada, a continuación, se presenta el consolidado del traslado de redes ejecutado a lo largo de las diferentes Unidades Funcionales del proyecto durante su vigencia.

Tabla 4-22 Estado de Redes.

UF	Tipo de Red	Operador(es)	Long. Presupuesto (km)	Long. Ejecutada (km)
1	Eléctrica	Electricaribe y EPM	30,135	3,67
	Telecom.	Claro, Movistar, Media Commerce, Global TV, Ufinet	29,43	0,41
	Hidrocarburos	Ocensa y Cenit	0,083	0
	Gas	Surtigas y Promigas	0,22	0
	Acueducto	E.P. Buenavista, OPSA SA ESP	1,446	0
2	Eléctrica	Electricaribe	36,22	43,67
	Telecom.	Media Commerce, Global TV, Claro, Tv Azteca, Ufinet	13,45	6,6
	Acueducto	Uniaguas, Aguas del Sinú, EPM-San Pelayo	3,286	1,886
	Gas	Promigas, Surtigas	3,327	0
3.1	Eléctrica	Electricaribe	0,33	0,721
	Telecom.	Media Commerce, Claro, Ufinet, Tv Azteca, Global TV	0,32	0
	Gas	Promigas	0,041	0,074
3.2	Eléctrica	Electricaribe	2,58	12,118
	Telecom.	Colombia Telecomunicaciones	0,74	1
3.3	Eléctrica	Electricaribe	1,45	2,33
3.4	Eléctrica	Electricaribe	15,169	19,541
	Telecom.	Ufinet, Claro, Edatel	3,8	0
	Acueducto	Uniaguas S.A E.S.P	0,132	8,38
	Gas	Surtigas y Promigas	1,998	0
3.5	Eléctrica	Electricaribe	1,88	3,344
	Telecom.	Ufinet, Claro, Edatel	1,98	0
	Acueducto	Uniaguas S.A E.S.P	0,563	0,47
	Gas	Surtigas	0,5	0,17
6.1	Acueducto	EPM-San Pelayo, Aguas del Sinú, Uniaguas	0,637	1,5
	Gas	Surtigas y Promigas	3,314	0,4
6.2	Eléctrica	Electricaribe	4,095	3,63
	Telecom.	Claro, Ufinet, Tv Azteca, Media Commerce	5,912	1,3
	Acueducto	Sercov s.a e.s.p., Aguas del Sinú	3,829	2,7
	Gas	Surtigas y Promigas	1,485	0,36
6.3	Eléctrica	Electricaribe	1,965	1,45
	Gas	Promigas	0	1
	Telecom.	Media Commerce, Claro, Tv Azteca, Ufinet	2,838	0

UF	Tipo de Red	Operador(es)	Long. Presupuesto (km)	Long. Ejecutada (km)
7.1	Eléctrica	Electricaribe	0,46	0
	Telecom.	Claro, Tv Azteca, Ufinet, Media Commerce	0,328	0
	Acueducto	Aguas del Sinú APC	0,155	0
7.2	Eléctrica	Electricaribe	1,793	2,86
	Telecom.	Edatel, Tv Azteca, Ufinet, Media Commerce	1,281	0,9
	Acueducto	Aguas del Golfo	5,105	0,32
	Gas	Surtigas	2,325	0
	Hidrocarburos	Ocensa y Cenit	0,237	0,165
7.3	Eléctrica	Electricaribe	2,298	1,9
	Telecom.	Tv Azteca, Media Commerce, Ufinet	1,641	4,29
	Acueducto	Aguas del Morrosquillo S.A. E.S.P.	0,11	0
8.1	Eléctrica	Electricaribe	0,836	4,93
	Telecom.	Colombia Telecomunicaciones, Claro	1,904	7,2
	Hidrocarburos	Cenit	0,03	0,06
	Acueducto	Aguas del Morrosquillo S.A. E.S.P.	1,386	0,7
	Gas	Surtigas, Promigas	5,115	0
8.2	Eléctrica	Electricaribe	0,4	8,92
	Telecom.	Claro, Tv Azteca	0,911	0
	Acueducto	A. Morrosquillo, Insegurt, Acu. Nva. Esperanza	1,539	0,85
8.3	Eléctrica	Electricaribe	1,75	18,67
	Telecom.	Claro, Tv Azteca, Ufinet	3,985	0,9
	Acueducto	A. Pava, Acuamaria, Acu. Cruz del Viso	5,38	0,4
	Hidrocarburos	Cenit	0,053	0

Fuente: Consorcio IPAB.

4.2.2.14.2. Seguimiento a presupuesto de gestión de redes

De acuerdo con la información consignada en el Informe Mensual No. 122 del Consorcio CR – Concesión, ajustado por el Consorcio IPAB, el presupuesto para el traslado de redes fue aprobado inicialmente por la Interventoría mediante el comunicado CI.023/AB0463/17/7.1.15, con radicado ANI No. 2017-409-005418-2 del 19 de enero de 2017. Posteriormente, dicho presupuesto fue actualizado por el Concesionario y

aprobado nuevamente por la Interventoría mediante el oficio CI.023/AB4379/19/7.1.3, con radicado ANI No. 2019-4090-88352-2 del 26 de agosto de 2019.

Posteriormente, el 22 de mayo de 2024, mediante comunicación No. 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20240522004942, el Concesionario presentó una nueva actualización al presupuesto de traslado de redes, la cual fue revisada y no objetada por la Interventoría mediante comunicación CI.023/AB12364/24/7.1.15, con radicado ANI No. 20244090633152 del 27 de mayo de 2024. Cabe señalar que esta actualización no modificó el valor total inicialmente aprobado para el traslado de redes, realizándose principalmente un balance de recursos entre las diferentes Unidades Funcionales.

Así mismo, mediante el comunicado 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20241022006684 del 22 de octubre de 2024, y teniendo en cuenta la mesa de trabajo realizada el 3 de octubre de 2024 entre la Interventoría y la Concesión, el Concesionario presentó el presupuesto actualizado del traslado de redes, incluyendo la justificación del monto correspondiente a contingencias. Posteriormente, mediante el comunicado CI.023/AB12926/24/7.1.15, con radicado ANI del 24 de octubre de 2024, la Interventoría, una vez revisada la información, otorgó la aprobación a dicho presupuesto.

A continuación, se presenta la tabla resumen correspondiente, esta información se encuentra consignada en el Informe Mensual No. 122 del Consorcio CR.

Tabla 4-23 Presupuesto de Manejo de Redes no Objetado - 13 ENERO 2017.

RED DE SERVICIO	REDES HÚMEDAS	REDES SECAS	REDES HIDROCARBURO	TOTAL X UF	% Costo Total
UF 1	$ 981,943,146	$ 4,598,111,276	$ 762,176,074	**$ 6,342,230,495**	**24.59%**
UF 2	$ 1,075,116,710	$ 5,076,160,812	$ -	**$ 6,151,277,522**	**23.85%**
UF 3	$ 1,156,903,975	$ 1,776,941,926	$ -	**$ 2,933,845,902**	**11.38%**
UF 6	$ 1,708,939,774	$ 877,677,688	$ -	**$ 2,586,617,461**	**10.03%**
UF 7	$ 1,724,856,142	$ 639,893,115	$ 1,827,653,667	**$ 4,192,402,924**	**16.26%**
UF 8	$ 1,529,905,403	$ 1,289,905,053	$ 762,176,074	**$ 3,581,986,530**	**13.89%**
TOTAL X RED	**$ 8,177,665,150**	**$ 14,258,689,870**	**$ 3,352,005,815**	**$ 25,788,360,835**	**100.00%**

Fuente: Consorcio IPAB.

Tabla 4-24 Presupuesto de Manejo de Redes no Objetado.

Red de Servicio	Redes Húmedas	Redes Secas	Redes Hidrocarburo	Total x Uf	% Costo Total
UF 1	$ 981,943,146	$ 4,598,111,276	$ 762,176,074	**$ 6,342,230,495**	**24.59%**
UF 2	$ 1,075,116,710	$ 5,076,160,812	$ -	**$ 6,151,277,522**	**23.85%**

Red de Servicio	Redes Húmedas	Redes Secas	Redes Hidrocarburo	Total x Uf	% Costo Total
UF 3	$ 1,156,903,975	$ 1,776,941,926	$ -	$ 2,933,845,902	11.38%
UF 6	$ 1,708,939,774	$ 877,677,688	$ -	$ 2,586,617,461	10.03%
UF 7	$ 1,724,856,142	$ 639,893,115	$ 1,827,653,667	$ 4,192,402,924	16.26%
UF 8	$ 1,529,905,403	$ 1,289,905,053	$ 762,176,074	$ 3,581,986,530	13.89%
TOTAL X RED	$ 8,177,665,150	$ 14,258,689,870	$ 3,352,005,815	$ 25,788,360,835	100.00%

Fuente: Consorcio IPAB.

Las diferencias totales en porcentajes por Unidad Funcional se pueden observar en la siguiente tabla:

Tabla 4-25 Diferencias Totales en Porcentajes.

Red de Servicio	Redes Húmedas	Redes Secas	Redes Hidrocarburo	Total x UF	% Costo Total
UF 1	$ 487.875.918	$ -	$ -	$ 487.875.918	2,01%
UF 2	$ 810.394.393	$ 5.090.820.291	$ -	$ 5.901.214.684	24,34%
UF 3	$ 2.810.745.521	$ 2.103.494.056	$ -	$ 4.914.239.577	20,27%
UF 5	$ 626.429.100	$ 91.935.173	$ -	$ 718.364.273	2,96%
UF 6	$ 574.097.980	$ 1.102.204.441	$ -	$ 1.676.302.421	6,91%
UF 7	$ 1.931.442.560	$ 3.011.212.656	$ 2.460.805.694	$ 7.403.460.910	30,53%
UF 8	$ 530.879.182	$ 2.617.027.009	$ -	$ 3.147.906.191	12,98%
TOTAL X RED	$ 7.771.864.655	$ 14.016.693.625	$ 2.460.805.694	$ 24.249.363.974	100,00%

Fuente: Consorcio IPAB.

En conclusión, el costo total del presupuesto por traslado de Redes No Objetado a la fecha está por valor **$ 24.249.363.974 (***Veinticuatro mil doscientos cuarenta y nueve millones trescientos sesenta y tres mil novecientos setenta y cuatro pesos M/Constante enero de 2017*). Reportada en el informe de interventoría No. 122 del consorcio CR.

4.2.2.14.3. Actas de Pago

De acuerdo con la información recopilada, la trazabilidad de actas de pago por concepto de Traslado de Redes a la subcuenta de redes a la fecha es la siguiente:

Tabla 4-26 Traslado de Redes a la Subcuenta de Redes.

Acta	Presentación	Radicado Corumar	Aprobación (Fecha / Oficio)	Valor Original	Valor Aprobado (Indexado)
1	13-mar-18	48-147-20180314000933	06-abr-18 / AB1800	$2.014.413.824	$ 2.014.413.824
2	05-sep-18	48-147-20180906003675	10-dic-18 / AB3013	$1.165.603.365	$ 1.165.603.365

Acta	Presentación	Radicado Corumar	Aprobación (Fecha / Oficio)	Valor Original	Valor Aprobado (Indexado)
3	01-feb-19	48-147-20190201006154	05-abr-19 / AB3607	$1.334.707.897	$ 1.334.707.897
4	15-may-19	48-147-20190515009056	10-jul-20 / AB6089	$257.778.294	$ 257.778.294
5	18-feb-20	48-147-20200217012996	11-may-20 / AB5824	$3.012.857.965	$ 3.012.857.965
Ind.	23-jul-20	48-147-20200721014863	31-jul-20 / AB6196	N/A	$ 508.467.442
6	24-sep-20	48-147-20200923015651	18-nov-20 / AB6771	$1.177.470.357	$ 1.301.633.366
7	27-may-21	48-147-20210524019085	25-jun-21 / AB7825	$1.841.326.368	$ 2.058.161.836
8	03-sep-21	48-147-20210831020272	07-oct-21 / AB8409	$148.697.993	$ 169.891.759
9	26-ene-22	48-147-20220125022180	11-feb-22 / AB9029	$23.772.294	$ 27.949.566
10	08-jun-22	48-147-20220607024153	11-jul-22 / AB9724	$143.319.979	$ 167.681.481
11	14-dic-22	48-147-20221207026587	21-dic-22 / AB10372	$491.609.138	$ 599.557.226
12	27-mar-23	48-147-20230324000458	30-may-23 / AB10989	$142.422.027	$ 181.263.587
13	03-oct-23	48-20230929002572	12-oct-23 / AB11539	$692.399.881	$ 927.564.910
14	02-nov-23	48-20231102002890	20-nov-23 / AB11716	$1.697.803.889	$ 2.305.597.800
15	24-abr-24	48-20240423004667	25-abr-24 / AB12263	$311.188.679	$ 453.501.179
16	28-mar-25	48-20250327008216	02-abr-25 / AB13461	$433.413.778	$ 667.513.429
TOTAL				$ 14.888.785.728	$ 17.154.144.926

Fuente: Consorcio IPAB.

El valor total de actas aprobadas corresponde a **$17.154.144.926** (*Diecisiete mil ciento cincuenta y cuatro millones ciento cuarenta y cuatro mil novecientos veintiséis pesos M/CTE*).

Por lo tanto, la anterior cifra en pesos constantes representa un costo causado del **61.40%** del valor total del presupuesto de redes, que está por valor de **$ 24.249.363.974 (Veinticuatro mil doscientos cuarenta y nueve millones trescientos sesenta y tres mil novecientos setenta y cuatro pesos M/Constante enero de 2017).**

4.2.3. OBRAS MENORES

El Contrato de Concesión bajo el esquema de APP No. 016 de 2015 contempla en su clausulado la posibilidad de ejecutar las denominadas “Obras Menores”, definidas en la Sección 1.107 de la Parte General del Contrato, como:

"…obras no previstas ni en las Especificaciones Técnicas de este Contrato ni en la Licencia Ambiental y/u otros permisos o concesiones ambientales, solicitadas por las Autoridades Estatales del orden nacional, departamental o municipal o por comunidades ubicadas dentro del área de influencia directa del Proyecto, que son indispensables para la normal ejecución del Proyecto, de conformidad con lo previsto en la Sección 19.1 de esta Parte General.

Las Obras Menores no contemplan Obras de Construcción destinadas a ampliar de manera sustancial la capacidad de las vías que hacen parte del Proyecto ni otro tipo de inversiones que cambien sustancialmente el alcance del Proyecto".

A su vez, la Sección 19.1 de la Parte General del Contrato de Concesión establece las condiciones aplicables para la ejecución de este tipo de obras, señalando que durante la ejecución del contrato la ANI podrá decidir la realización de Obras Menores no previstas, siempre que estas sean indispensables para la normal ejecución del proyecto y que no impliquen ampliaciones sustanciales en la capacidad de las vías ni modificaciones significativas al alcance del proyecto.

Asimismo, se establece que la ejecución de estas obras será realizada por el Concesionario, previo acuerdo entre las partes sobre los precios unitarios correspondientes, contando con el concepto del Interventor.
En caso de no lograrse dicho acuerdo, las obras podrán ser ejecutadas por un tercero contratado por el Concesionario, bajo mecanismos que garanticen la libre concurrencia y con la no objeción previa de la ANI, conforme a los procedimientos establecidos en la mencionada sección contractual.

Igualmente, el contrato dispone que la ANI asumirá el pago de las Obras Menores, ya sea que estas sean ejecutadas por el Concesionario o por un tercero, de acuerdo con las condiciones y fuentes de financiación previstas en la Sección 13.3(o) de la Parte General del Contrato.

En este sentido, y en atención a los diversos requerimientos presentados, se relacionan a continuación las actas correspondientes a Obras Menores suscritas a la fecha.

Tabla 4-27. Acta de Obras Menores Suscritas.

Fecha Susc.	Descripción del Estudio / Diseño	Valor (Ene-14)	Entrega Concesionario	No Objeción Interventoría	Fecha de Pago
29/12/2023	Estudio de Patología - Puente La Caimanera	$71.200.220,98	Rad. 20240103003475 (27-nov-23)	Oficio AB11862 (15-ene-24)	17/07/2024
29/12/2023	Estudios y Diseños - Curva Puerto Rey	$166.050.249,33	Rad. 20250407008313 (08-abr-25)	Oficio AB13507 (16-abr-25)	29/05/2025
09/10/2024	Diseños Retornos Adicionales (UFI 2 y 6.1)	$25.604.941,37	Rad. 20241209007123 (09-dic-24)	Oficio AB13167 (09-ene-25)	29/01/2025
05/12/2024	Estudios y Diseños - Puente Boca Ciénaga	$208.224.936,00	Rad. 20250923010002 (25-sep-25)	Oficio AB14210 (22-oct-25)	05/12/2025

Fuente: Consorcio IPAB.

Así mismo, a la fecha se están tramitando o concertando las siguientes obras menores de acuerdo con informe de interventoría mensual No.122.

1. Construcción y Operación de dos retornos adicionales en la UFI 2 y 6.1: De acuerdo con la trazabilidad técnica y administrativa de los retornos ubicados en los PR 13+400 y PR 15+200, el Consorcio IPAB ratifica que los diseños y presupuestos cuentan con el aval técnico necesario para su implementación. Lo anterior se enmarca en lo dispuesto en el Laudo Arbitral de Reversión, mediante el cual se ordenó la reversión del Proyecto, por lo que dichas intervenciones hacen parte de las actividades requeridas para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de esa decisión.

2. Construcción de Pasos Seguros UFI 2 y 6.1: Como resultado de las situaciones de bloqueo presentadas por las comunidades a lo largo del corredor vial entre Cereté y Lorica, se solicitó al Concesionario la presentación de una propuesta para la construcción de pasos seguros en los accesos a estas poblaciones. En atención a lo anterior, el Concesionario presentó la propuesta económica para la elaboración de los estudios, diseños y la construcción de dichas obras, la cual fue objeto de revisión por parte de la Interventoría anterior y devuelta con observaciones para su ajuste. A la fecha, se encuentra pendiente que el Concesionario atienda las observaciones formuladas y presente la documentación ajustada. Lo anterior deberá desarrollarse en el marco de lo dispuesto en el Laudo Arbitral de Reversión, en virtud del cual las actuaciones asociadas al Proyecto deberán ejecutarse conforme a las obligaciones y alcances definidos en dicha decisión arbitral.

La información relacionada con los recursos asociados a estas obras puede ser verificada en el Capítulo Financiero, numeral 8.3.10 – Subcuenta Obras Menores, y ha sido obtenida con base en lo reportado en los informes mensuales de la interventoría anterior.

4.2.4. Pruebas y ensayos realizados a los Materiales

Las pruebas y ensayos se realizaron por el ejecutor de las obras en atención a las especificaciones generales de carreteras INVIAS durante la fase de construcción del contrato. Para el cumplimiento de estas, la concesionaria implementó los controles mediante el documento Plan de Inspección de Puntos PIP, el cual en cumplimiento de la obligación establecida en numeral 4.14 del contrato parte general permitiendo a la interventoría realizar un acompañamiento y seguimiento a las pruebas requeridas para examinar, medir, y ensayar las obras ejecutadas.

Una vez surtidas las etapas del Trámite Arbitral, y estando el Contrato surtiendo la Fase de Construcción de la Etapa Preoperativa, el Tribunal Arbitral profirió Laudo Arbitral; ello, ocurrió el 30 de abril de 2026, decisión notificada el primero (1) de mayo de 2026, mediante el cual adoptó decisiones relacionadas con el Contrato de Concesión bajo esquema de APP No. 016 de 2015, incluyendo la declaratoria de Terminación Anticipada de éste. Dado lo anteriormente expuesto, desde el 2 de mayo de 2026, el Contrato ha entrado en Etapa de Reversión

De acuerdo con lo anterior, los resultados correspondientes a las pruebas y ensayos se reportaron mensualmente en el documento memoria técnica, que obedece a requerimiento contractual establecidos en el numeral 4.16 del contrato de concesión parte general. La actualización de esta información se realizó mediante el vínculo disponible para la interventoría y la ANI, el acceso permitido es autorizado a los profesionales técnicos mediante usuario y contraseña a través de la plataforma SharePoint hasta finalizar la reversión del contrato.

En cuanto a la calidad de las obras, la documentación y los registros relacionados con los ensayos de laboratorio correspondientes al control de calidad de los materiales instalados fueron generados y revisados por la Interventoría anterior entre febrero de 2017 y enero de 2026, y por la interventoría presente entre febrero y abril de 2026, según lo establecido en el contrato de Concesión Parte General, Numeral 4.11 “Especificaciones Técnicas y Calidad de las Intervenciones”, literales c) y d), así como en el Apéndice Técnico 3, Numeral 2.2 “Intervenciones”,. En ese sentido, se precisa que la veracidad y confiabilidad de la información contenida en dichos ensayos es responsabilidad del Concesionario, la cual se encuentra respaldada mediante las firmas de los profesionales responsables que suscriben los respectivos registros y reportes de laboratorio. Así mismo, se aclara que la revisión realizada por la Interventoría en su momento tuvo un

carácter estrictamente documental y comparativo, orientado a verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas vigentes y aplicables al Contrato, particularmente las establecidas en el INV-2007, sin que dicha revisión implique la aprobación o validación de los datos consignados en los registros presentados por el Concesionario

"Numeral 4.11 Especificaciones Técnicas y Calidad de las Intervenciones literales c y d:

"(c) La aplicación de las previsiones contenidas en los Apéndices Técnicos genera a cargo del Concesionario obligaciones de resultado y no de medio. En todo caso, las Intervenciones deberán cumplir con las Especificaciones Técnicas contenidas en dichos Apéndices, especialmente en materia de calidad, resistencia y durabilidad".

"(d) El Concesionario, por su propia iniciativa o por solicitud del Interventor, deberá, por su cuenta y riesgo, rectificar a satisfacción de la ANI previa verificación del Interventor los errores técnicos que hubiera cometido en cumplimiento de las actividades previstas para la ejecución del Contrato".

*"**Apéndice Técnico 3 CAPÍTULO I Introducción**:*

"De conformidad con lo previsto en la Sección 1.52 la Parte General del Contrato, el presente Apéndice contiene las especificaciones generales que deberá atender el Concesionario para el desarrollo y presentación de los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico, los Estudios de Detalle, así como para el desarrollo de las Intervenciones. En consecuencia, el Concesionario deberá cumplir con las especificaciones y/o normas técnicas que se indican en el presente Apéndice al momento de desarrollar dichas actividades, sin perjuicio de lo previsto en la Sección 4.12 de la Parte General".

2.2 Intervenciones
Para el desarrollo de las Intervenciones del Proyecto relacionadas con la construcción, Mejoramiento y/o rehabilitación de carreteras, el Concesionario deberá cumplir con las especificaciones establecidas en el Apéndice Técnico 1 1 y los manuales y/o normas técnicas que de acuerdo con la Ley Aplicable vigente al momento de la presentación de la Oferta sean obligatorias para la ejecución de este tipo de Intervenciones, y, en particular, pero sin limitarse, con las identificadas en el siguiente listado.

(i) ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS adoptadas mediante Resolución No. 003288 del 15 de agosto de 2007 por el MINISTERIO DE TRANSPORTE, además de los

documentos posteriores que las actualicen, modifiquen, desarrollen o sustituyan.

(ii) *NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS, adoptadas mediante Resolución No. 003290 del 15 de agosto de 2007 por el MINISTERIO DE TRANSPORTE, además de los documentos posteriores que las actualicen, modifiquen, desarrollen o sustituyan.*

(iii) *REGLAMENTO PARA LA CERTIFICACIÓN SOBRE LA CALIDAD TÉCNICA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS PARA PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN adoptado mediante la Resolución No. 000070 del 21 de enero de 2004 por el MINISTERIO DE TRANSPORTE, además de los documentos posteriores que las actualicen, modifiquen, desarrollen o sustituyan.*

(iv) *GUÍA METODOLÓGICA PARA EL DISEÑO DE OBRAS DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS DE CARRETERAS. Adoptada por la Resolución 743 de 2009 del Ministerio de Transporte.*

(v) *EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO SUPERFICIAL Y ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO".*

En lo referente al Aseguramiento y Control de Calidad de materiales, la Memoria Técnica establece que los soportes documentales de pruebas y ensayos se estructuran en tres ejes principales: el Anexo 1 (Pruebas de materiales), el Anexo 2 (Ensayos de materiales) y el Anexo 3 (Pruebas de equipos).

En cumplimiento del numeral 4.16 del Contrato de Concesión, el acceso para la Interventoría y la ANI es mediante el siguiente enlace:

https://elcondor.sharepoint.com/sites/memoriatecnica/SitePages/Inicio.aspx

La Interventoría anterior aseguró copia de esta documentación en su nube de dominio interventoría CR concesiones y las mantuvo disponibles para la ANI de forma permanente para consulta, los documentos obedecen a fiel copia de la documentación entregada por la concesionaria desde el inicio de fase de construcción, teniéndose la primera memoria técnica desde febrero de 2017 hasta enero de 2026, información que se encuentra actualizada y se toma como fuente de información de respaldo de esta interventoría:

https://drive.google.com/drive/folders/1nTdwBav2I-ll0r_GNsEsE-z3bT64_i7x?usp=drive_link

Las memorias técnicas entre febrero y abril de 2026 reposan en la nube documental del Consorcio IPAB:

01.MTEC.CON

En cuanto a las actividades desarrolladas por esta interventoría, se presentan los equipos disponibles para las mismas:

Equipos Interventoría: A continuación, se relaciona la revisión a los equipos disponibles y/o utilizados por la Interventoría para la supervisión de las actividades de obra ejecutadas por la concesionaria para el presente periodo junio 2026, actualmente todos vigentes, los soportes respectivos se encuentran en anexo 12.2.2 Equipos Interventoría:

Tabla 4-28 Listado de equipos de Medición Interventoría

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	MARCA	MODELO	N° SERIE	FRECUENCIA CALIBRACIÓN	FECHA CALIBRACIÓN	ESTADO
Estación total	-	GOWIN	TKS – 202	8E4371	**ANUAL**	**10-feb-2026**	**VIGENTE**
Nivel Automático	-	SNDING	SL-C-32	X237213	**ANUAL**	**12-feb-2026**	**VIGENTE**
Retroreflectómetro Horizontal Portátil Equipo de respaldo Medición Conjunta CON	CON- SLH059	SAT-LUX	SAT-LUX-HORIZONTAL-15/30	SLH059	**ANUAL**	**18-mar-2025**	**VIGENTE**
Retroreflectómetro Vertical Equipo de respaldo Medición Conjunta CON	CON- SLV028	SAT-LUX	SAT-LUX-VERTICAL	SLV028	**ANUAL**	**21-jul-2025**	**VIGENTE**
Retroreflectómetro Vertical		TOPROAD	GT-SR-006		**ANUAL**	**20-ene-2026**	**VIGENTE**.

fuente: consorcio IPAB

4.3. ÁREA OPERATIVA Y DE MANTENIMIENTO

El 30 de abril de 2026, se profirió laudo dentro del arbitraje internacional tramitado por el Centro Internacional de Resolución de Disputas dentro del caso CIRD No. 01-23-0002-8303, en el cual el Concesionario Ruta al Mar S.A.S fungió como demandante y la Agencia Nacional de Infraestructura como demandada, dicho laudo (notificado el 01 de

mayo de 2026) declaró entre otros la Terminación Anticipada del contrato de Concesión 016 de 2015 y por lo tanto el 02 de mayo de 2026 inició la Etapa de Reversión.

Por lo tanto mediante comunicado 20263050217301 recibido el 9 de junio de 2026, la ANI le Informó al Concesionario entre otras cosas que conforme a lo dispuesto en la decisión arbitral y las actuaciones contractuales derivadas de la declaratoria de terminación anticipada, actualmente el Contrato de Concesión APP No. 016 de 2015, conforme a las normas imperativas de obligatorio cumplimiento, la operación aún no se ha cerrado, por cuanto se encuentra en desarrollo de la etapa de reversión, proceso que implica la ejecución de las actividades técnicas, operativas, administrativas, financieras y jurídicas necesarias para la entrega ordenada de la infraestructura, bienes, activos, información y demás elementos asociados al proyecto, garantizando la continuidad en la prestación del servicio público de transporte y el cumplimiento de las obligaciones contractuales aplicables.

Conforme a lo anterior, aun en etapa de reversión en la que se encuentra el contrato de concesión, en atención a los servicios obligatorios previstos en los numerales 3.2 (Obligaciones Generales) y 3.3 (Obligaciones Particulares de Operación) del Apéndice Técnico 2 del Contrato de Concesión, durante el periodo del **01 al 30 de septiembre de 2026** el Concesionario Ruta al Mar S.A.S. mantuvo la ejecución de actividades de mantenimiento cíclico, rutinario y periódico, así como las labores operativas inherentes a la Concesión.

Lo anterior, en concordancia con los principios de operación del proyecto continuidad, regularidad, calidad del servicio técnico y de la atención al usuario, cobertura y seguridad vial, con el propósito de asegurar el cumplimiento de los niveles de servicio y de los indicadores de estado y operación en las Unidades Funcionales Integrales que integran el Proyecto de Concesión Antioquia – Bolívar.

4.3.1. Mantenimiento Rutinario y Actividades Particulares en la Operación de Vías

Dentro de los servicios obligatorios básicos que regulan la operación de las vías se contemplan las actividades de mantenimiento rutinario y otras labores específicas, de conformidad con lo establecido en el numeral 2.1 y el Capítulo 6 (Mantenimiento) del Apéndice Técnico 2 del Contrato de Concesión.

A continuación, se detallan las actividades de mantenimiento desarrolladas en las Unidades Funcionales Integrales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.2, 7.3 y 8:

Tabla 4-29. Actividades de mantenimiento ejecutadas – 01 al 30 de septiembre de 2026

UFI	Actividad	PR Inicial	PR Final	Cantidad	Registro fotográfico	
1	Reparación de daños en el pavimento	4+030	61+665	142 parche		
3.1	Mantenimiento de señalización vertical, cumplimiento del indicador E11	1+580	INT2 eje4	8 señales		
3.2	Reparación de daños en el pavimento	2+380	7+430	3 parches		
3.3	Reparación de daños en el pavimento	12+920	19+580	3 parches		

UFI	Actividad	PR Inicial	PR Final	Cantidad	Registro fotográfico	
3.4	Reparación de daños en el pavimento	26+000	31+540	6 parches		
4.1	Reparación de daños en el pavimento.	3+400	30+975	14 parches		
5.1	Reparación de daños en el pavimento.	2+785	46+473	6 Parches		
5.2	Mantenimiento de pavimento, cumplimiento del indicador E1	6+000	16+200	28 parches		
6.1	Mantenimiento de señalización vertical, cumplimiento del indicador E11	20+070	36+830	6 señales		

UFI	Actividad	PR Inicial	PR Final	Cantidad	Registro fotográfico	
6.2	Mantenimiento de señalización vertical, cumplimiento del indicador E11	06+050	20+115	18 señales		
7.2	Mantenimiento de señalización vertical, cumplimiento del indicador E11	00+170	06+425	56 señales		
7.3	Mantenimiento de señalización vertical, cumplimiento del indicador E11	3+990	23+857	10 señales		
8.2	Mantenimiento de señalización vertical, cumplimiento del indicador E11	96+420	103+020	4 señales		
8.3	Mantenimiento de señalización vertical, cumplimiento del indicador E11	12+752	50+890	5 señales		

Fuente propia – Consorcio IPAB

Las cantidades y la descripción de las actividades ejecutadas en el marco del mantenimiento rutinario inciden directamente en el cumplimiento de los niveles de

servicio establecidos. La verificación de dichos niveles se registra en el formato de Verificación de Niveles de Servicio, el cual se adjunta en el Anexo 6 de “operación y mantenimiento” de cada uno de los informes mensuales correspondientes al periodo evaluado.

4.3.2. Principios de Operación y Parámetros de Control de Servicios

4.3.2.1. Continuidad

En el periodo del 01 al 30 de septiembre de 2026, se presentaron cuatro (4) eventos de tipo bloqueo o manifestación que afectaron la circulación del corredor y los peajes.

Durante el período objeto de análisis se registraron cuatro (4) bloqueos en diferentes sectores del área de influencia del proyecto, sin que ninguno de estos eventos estuviera relacionado con acciones, actuaciones o incumplimientos atribuibles al Concesionario. El bloqueo registrado en la comunidad de El Bongo, municipio de San Onofre, se originó por la inconformidad frente al incumplimiento en la entrega de los apoyos económicos prometidos por la Alcaldía Municipal para la realización de las fiestas patronales; el de Palo Alto, municipio de San Onofre, por la falta de suministro de energía eléctrica; el de Aguas Negras, municipio de San Onofre, por la falta de suministro de energía eléctrica y agua potable; y el de Patio Bonito, municipio de Montería, por la falta de suministro de energía eléctrica.

Los eventos presentados durante el mes en curso se describen a continuación:

Tabla 4-30. Bloqueos presentados durante el mes de septiembre de 2026

Fecha	UFI	Abscisa	Ruta	Tramo	Reporte	Llegada	Δt (min)	Finalización	Clase de Incidente
3/09/2026	8.2	97+800	9004	LORICA - SAN ONOFRE	16:08	16:09	1	17:07	SE PRESENTA BLOQUEO POR PARTE DE LA COMUNIDAD DE EL BONGO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE, QUIENES MANIFIESTAN DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LOS APOYOS ECONÓMICOS PROMETIDOS POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL PARA LA REALIZACIÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES.

Fecha	UFI	Abscisa	Ruta	Tramo	Reporte	Llegada	Δt (min)	Finalización	Clase de Incidente
5/09/2026	8.3	16+100	9005	SAN ONOFRE - CRUZ DEL VISO	11:24	11:24	0	16:00	BLOQUEO POR PARTE DE LA COMUNIDAD DE PALO ALTO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE, QUIENES MANIFIESTAN INCONFORMIDAD DEBIDO A LA FALTA DE FLUIDO ELÉCTRICO EN LA ZONA.
15/09/2026	8.2	98+300	9004	LORICA - SAN ONOFRE	15:56	15:57	1	16:43	BLOQUEO POR PARTE DE LA COMUNIDAD DE AGUAS NEGRAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE, QUIENES MANIFIESTAN DEBIDO A LA FALTA DE FLUIDO ELÉCTRICO Y AGUA POTABLE EN LA ZONA.
21/09/2026	4.1	32+300	2310	PLANETA RICA - MONTERÍA	17:38	17:38	0	18:26	BLOQUEO POR PARTE DE LA COMUNIDAD DE PATIO BONITO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MONTERIA, QUIENES MANIFIESTAN DEBIDO A LA FALTA DE FLUIDO ELÉCTRICO,

Fuente: Informe Gerencial # 130 – septiembre de 2026 ajustado por Interventoría Consorcio IPAB

Los accidentes ocurridos en el corredor vial han generado reducciones temporales en la velocidad de circulación del carril afectado, por un tiempo menor a dos (2) horas; por lo tanto, esta circunstancia no implica el incumplimiento del principio de continuidad del servicio.

A efectos de garantizar el principio de continuidad, el Concesionario cuenta con un esquema de atención al usuario integrado por el servicio de radio operación, inspectores viales, carro taller, ambulancias, grúas de plataforma y de gancho, además del acompañamiento de personal de la DITRA y, cuando la situación lo requiere del UNDMO.


Los registros de incidentes y accidentes ocurridos durante el presente periodo se incluyen en el anexo 6 de “operación y mantenimiento” del presente informe.

4.3.2.2. Regularidad

El Concesionario se obliga a tener la disponibilidad de los servicios de atención al usuario y de vehículos de atención de emergencias como son, el Carro Taller, Ambulancia, Grúas y Equipos de Rescate, los cuales, en función del cumplimiento de tiempo de respuesta, deben asegurar un servicio técnico de calidad que genere satisfacción en los usuarios en virtud de lo regulado en el numeral 3.1.2 del Apéndice Técnico 2 del Contrato de Concesión.

Durante el mes de septiembre de 2026 se prestaron **461** servicios de atención de emergencias, lo que representa una disminución de **97** servicios con respecto al mes anterior (agosto de 2026, con **558** servicios). Del total de servicios prestados, los correspondientes a Grúa de Plataforma representaron el **43 %**, seguidos por las ayudas mecánicas con el **28 %**. Lo anterior evidencia una mayor proporción de vehículos que requirieron ser remolcados frente a aquellos que presentaron varadas asociadas a fallas mecánicas. Por su parte, el servicio de Grúa de Gancho para el remolque de vehículos pesados representó el **20 %** de los servicios prestados, mientras que el servicio de Ambulancia correspondió al **9 %**.

Grafica 1 Servicios de atención al usuario – 01 al 30 de septiembre 2026

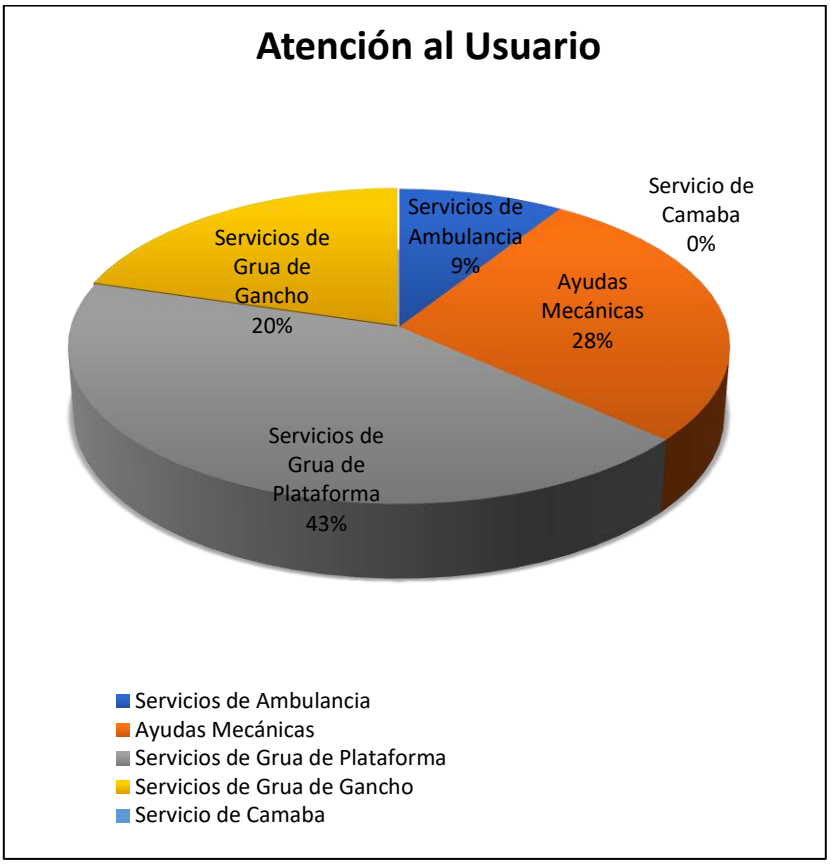

Fuente: Informe Gerencial # 130 – septiembre de 2026 ajustado por Interventoría Consorcio IPAB

A continuación, se consolidan los servicios atendidos por Categoría y tipo de Servicio durante los días del 1 al 30 de septiembre de 2026:

Tabla 4-31. Servicios prestados a los usuarios de la vía – septiembre de 2026

Categoría	Servicios de Ambulancia	Ayudas Mecánicas	Servicios de Grúa de Plataforma	Servicios de Grúa de Gancho	Servicio de Camabaja	TOTAL	
						CANTIDAD	%
CAT. 1	13	66	149	6	0	**234**	**50.76%**
CAT. 2	5	17	2	24	0	**48**	**10.41%**

Categoría	Servicios de Ambulancia	Ayudas Mecánicas	Servicios de Grúa de Plataforma	Servicios de Grúa de Gancho	Servicio de Camabaja	TOTAL	
						CANTIDAD	%
CAT. 3	2	12	0	19	0	**33**	**7.16%**
CAT. 4	0	10	0	7	0	**17**	**3.69%**
CAT. 5	2	1	0	1	0	**4**	**0.87%**
CAT. 6	0	2	0	6	0	**8**	**1.74%**
CAT. 7	0	2	0	2	0	**4**	**0.87%**
Motos	10	0	9	0	0	**19**	**4.12%**
Otros	0	0	0	0	0	**0**	**0.00%**
Bicicleta	0	0	0	0	0	**0**	**0.00%**
Comunidad	10	0	0	0	0	**10**	**2.17%**
Señalización	0	17	38	29	0	**84**	**18.22%**
Solucionado por usuario	0	0	0	0	0	**0**	**0.00%**
Totales	**42**	**127**	**198**	**94**	**0**	**461**	**100%**

Fuente: Informe Gerencial # 130 – septiembre de 2026 ajustado por Interventoría Consorcio IPAB

La atención de servicios de emergencia con los equipos de la Concesión continúa enfocada en los vehículos de categoría 1 y 2, representando el **61.17 %** del total de servicios prestados; mientras que para los vehículos de categoría 3 y/o superior, los servicios representaron el **14.32 %.** Por su parte, los servicios prestados a motos, bicicleta, comunidad, señalización y otros representaron el **24.51 %** del total de atenciones.

A continuación, se presentan los servicios prestados mes a mes del año anterior y del año en curso por categoría:

Tabla 4-32. Servicios Acumulados Mensuales – Año anterior y presente año

CATEGORIA	AÑO 2025												AÑO 2026								
	ene	feb	mar	abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	ene	7 - 28 feb	marzo	abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
Cat. 1	436	248	263	325	279	392	350	328	259	324	275	413	452	148	284	294	264	353	291	233	234
Cat. 2	81	61	72	100	60	104	105	87	79	87	72	91	69	49	64	57	48	63	49	67	48
Cat. 3	54	66	47	57	75	48	68	74	61	59	66	56	77	35	49	60	56	70	42	49	33
Cat. 4	20	11	11	16	22	22	15	15	17	12	24	21	15	14	18	23	14	18	14	20	17
Cat. 5	4	11	7	14	9	13	14	14	13	9	16	18	10	9	7	6	7	4	3	10	4
Cat.6	13	7	19	13	6	22	20	15	20	12	23	14	5	12	11	6	12	15	15	10	8
Cat.7	14	12	1	10	12	12	20	17	22	10	3	23	9	12	9	22	18	5	12	3	4
Motos	41	26	22	46	14	17	16	20	13	29	37	43	38	22	32	25	17	27	29	34	19
Otros	0	0	1	4	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	2	0	2	3	3	0	0
Bicicleta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0
Comunidad	23	27	30	34	25	41	30	50	26	38	28	30	41	21	35	49	31	42	20	21	10
Señalización	71	53	55	76	57	83	97	90	74	62	78	74	69	49	60	70	64	99	119	111	84
Solucionado por Usuario	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES	**761**	**522**	**529**	**695**	**559**	**755**	**735**	**710**	**585**	**643**	**623**	**784**	**786**	**371**	**571**	**612**	**535**	**699**	**597**	**558**	**461**

Fuente: Informe Gerencial # 130 – septiembre de 2026 ajustado por Interventoría Consorcio IPAB

4.3.2.3. Calidad del servicio y de atención al usuario

El Concesionario realiza la prestación apropiada de los servicios de atención a emergencias de incidentes y accidentes, para lo cual cuenta con tres (3) bases operativas distribuidas como aparece en el siguiente cuadro:

La Interventoría verificó la condición operativa y mecánica en términos de cobertura, vehículos y equipos según las obligaciones establecidas en el numeral 3.3.3.1.1 del Apéndice Técnico 2, tal como se observa a continuación:

Tabla 4-33. Bases Operativas y Satelitales para Atención al Usuario

Base de Operación 1: Manguitos		
	**Localización**	Área de servicio Manguitos – PR52+000 (Unidad Funcional 1)
	Cobertura	Caucasia - Planeta Rica – Montería, El 15 - San Carlos.
	Vehículos y Equipos	Ambulancia, Grúa de Pluma, Grúa de Plataforma, Moto de Inspección Vial, Equipo de Rescate de accidentes.
	Personal	Personal capacitado en atención de emergencias, manejo de equipos de rescate y primeros auxilios.

Base de Operación 1: CAU Purgatorio PR: 33+100.		
	Localización	PR33+100 (Unidad Funcional 4.1)
	Cobertura	Planeta Rica – Montería – El 15 – San Carlos – Cerete-Lorica
	Vehículos y Equipos	Carro Taller.
	Personal	Personal capacitado en atención de daños vehiculares.
Base de Operación 2: Peaje Mata de Caña		
	**Localización**	Área de Servicio Mata de Caña - PR31+500 (Unidad Funcional 6.1)
	Cobertura	Puerto Rey – Montería – Santa Lucia -San Pelayo - San Carlos
	Vehículos y Equipos	Grúa de Gancho - Grúa de Plataforma- Ambulancia, Equipo de Rescate
	Personal	Personal capacitado en atención de emergencias, manejo de equipos

		de rescate y primeros auxilios.
Base de Operación 2: Los Cedros PR: 41+100.		
	**Localización**	Peaje Los Cedros PR:41+100. (Unidad Funcional 5.1)
	Cobertura	Puerto Rey – Montería – Santa Lucia -San Pelayo.
	Vehículos y Equipos	Carro Taller- Moto de Inspección Vial.
	Personal	Personal capacitado en atención de daños vehiculares.
Base de Operación 3: San Onofre PR: 21+100.		
	**Localización**	Área de Servicio San Onofre PR: 21+100. (Unidad Funcional 8.3)
	Cobertura	Tolú – El Pueblito – Tolú Viejo - El Pueblito – San Onofre – María la Baja – Cruz del Viso
	Vehículos y Equipos	Grúa de Gancho - Grúa de Plataforma - Ambulancia - Moto

		de Inspección Vial, Equipo de Rescate
	Personal	Personal capacitado en atención de emergencias, manejo de equipos de rescate y primeros auxilios.
Base de Operación 3: Caimanera Ruta 9004, PR: 41+150.		
	Localización	Caimanera Ruta 9004, PR: 41+150.
	Cobertura	Coveñas – Tolú – El Pueblito – Tolú Viejo-El Pueblito – San Onofre – María la Baja – Cruz del Viso.
	Vehículos y Equipos	Carro Taller.
	Personal	Personal capacitado en atención de daños vehiculares.

Fuente Propia – Consorcio IPAB

Los equipos y personal del Concesionario están disponibles 24 horas para el cumplimiento de los indicadores de operación O4 (atención a incidentes) y O5 (atención a accidentes).

4.1.2.3.1 Resultados de la encuesta sobre la percepción de la satisfacción del servicio prestado

La Interventoría, de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico 4, correspondiente a la Hoja de Datos, Metodología y Plan de Cargas de Trabajo, específicamente en la sección 8.3.2 “Área Técnica”, tiene a su cargo la siguiente obligación:

“Adelantar semestralmente una encuesta con los usuarios de la vía sobre la percepción de la satisfacción del servicio prestado de acuerdo con los lineamientos del sistema de calidad de la ANI, los resultados de la misma harán parte del informe mensual que coincida con la fecha de realización de la mencionada encuesta.”

Conforme a lo anterior, los días 19, 20 y 21 de agosto de 2026 se realizó la mencionada encuesta a mil seiscientos siete (1.607) usuarios del corredor concesionado, de conformidad con lo establecido en el formato GCSP-F-204 “Consolidado Evaluación de Percepción Uso de la Vía”. En este sentido, se dio cumplimiento al criterio establecido, según el cual la Interventoría y/o el Concesionario deberá tomar una muestra que incluya, como mínimo, el cinco por ciento (5 %) de los vehículos que pagan peaje, o el porcentaje que se establezca de acuerdo con las condiciones particulares del respectivo contrato.

De acuerdo con los resultados de la evaluación de percepción del usuario de la vía, realizada durante los días 19, 20 y 21 de agosto de 2026 a una muestra de mil seiscientos siete (1.607) usuarios del corredor concesionado, se obtuvo un nivel de satisfacción total del 69 %.

Conforme con lo establecido en el formato GCSP-F-204 Consolidado Evaluación de Percepción Uso de la Vía, se establece que: *“Cuando el porcentaje sea inferior al 67%, para cada uno de los aspectos evaluados y/o para el total de los aspectos evaluados, el Concesionario deberá presentar un Plan de Mejoramiento.”*

En este sentido, del análisis individual de los quince (15) aspectos evaluados, se evidencia que seis (6) presentan resultados inferiores al 67 %, correspondientes, en el orden establecido en el formato, a: información recibida sobre cierres y teléfonos de contacto en caso de emergencia (56 %), satisfacción con el tiempo empleado en el

trayecto (66 %), estado de la vía (66 %), señalización nocturna de la vía (65 %), seguridad de la vía (66 %) y atención en el Centro/Oficina de Atención al Usuario (63 %).

En consecuencia, si bien el resultado consolidado de la evaluación alcanza un 69 %, superando el porcentaje mínimo establecido, se identifican seis (6) aspectos que individualmente no alcanzan el umbral del 67 %. Por lo anterior, Mediante comunicado IPAB-758-2026 con radicado ANI 20264091192102 de fecha 14 de septiembre de 2026, se requirió al Concesionario para que presentará el correspondiente Plan de Mejoramiento para los aspectos que no cumplen con el porcentaje mínimo establecido, de conformidad con lo señalado en el formato GCSP-F-204, asimismo mediante comunicado IPAB-769-2026 con radicado ANI 20264091196192 de fecha 14 de septiembre de 2026, se remitió a la ANI el resultado de la encuesta de percepción de satisfacción del servicio prestado a los usuarios de la vía, realizada en las UFI 1, 3, 4, 5, 6 y 8, correspondiente al primer semestre de 2026, aclarando que estos resultados se remitieron con el informe mensual del mes de agosto de 2026.

Por su parte, el Concesionario, mediante comunicado No. 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260907012963 del 8 de septiembre de 2026, remitió los resultados del Informe de medición de la calidad del servicio correspondiente al primer semestre de 2026. Asimismo, mediante comunicado No. 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260928015062 del 29 de septiembre de 2026, dio respuesta a la solicitud de presentación del Plan de Mejoramiento efectuada por la Interventoría. En dicha comunicación, el Concesionario informó que, de los quince (15) aspectos evaluados en su medición, únicamente uno presentó un nivel de satisfacción inferior al umbral del 67 %, con un resultado del 63 %, correspondiente a la información suministrada a los usuarios sobre cierres, teléfonos de contacto en caso de emergencia y demás novedades de la vía.

Frente a este aspecto, el Concesionario informó la implementación de estrategias de comunicación mediante emisoras radiales, canales digitales y alianzas con medios digitales regionales, con el propósito de fortalecer la divulgación de información relacionada con las condiciones y novedades del corredor vial. Asimismo, manifestó que continuará fortaleciendo estas estrategias para mejorar la percepción de los usuarios respecto de la disponibilidad y oportunidad de la información.

4.3.2.4. Cobertura

Mediante los recorridos del inspector vial del Concesionario 24 horas 365 días al año, en donde se identifican incidentes o accidentes y a través de llamadas de usuarios en estado de emergencia, el Concesionario mantuvo cobertura de todas las unidades funcionales que se encuentran en etapa Preoperativa y en Operación con la prestación de **461** servicios para las tres (3) bases operativas dispuesta en el proyecto.


Durante el periodo del 1 al 30 de septiembre de 2026, los servicios al usuario prestados por el Concesionario se dividieron por UFI de la siguiente manera:

Tabla 4-34. Servicios atención al usuario por UFI – septiembre 2026

Tipo de servicio	UFI 1	UFI 2	UFI 3					UFI 4		UFI 5		UFI 6			UFI 7		UFI 8			TOTALES
	1	1	1	2	3	4	5	1	2	1	2	1	2	3	2	3	1	2	3	
Carro taller	0	2	0	8	2	2	0	10	7	57	6	3	9	5	9	4	3	0	0	**127**
Grúa plataforma	41	5	2	3	0	3	1	38	8	27	3	21	4	2	6	7	2	2	23	**198**
Grúa gancho	17	1	1	3	3	1	0	9	3	9	2	12	2	1	3	5	0	1	21	**94**
Ambulancia	4	3	1	1	0	1	0	7	3	2	0	5	0	1	2	1	1	1	9	**42**
Camabaja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Totales	62	11	4	15	5	7	1	64	21	95	11	41	15	9	20	17	6	4	53	**461**
Incidencia (%) en el Proyecto	**13.4%**	**2.4%**	**0.9%**	**3.3%**	**1.1%**	**1.5%**	**0.2%**	**14%**	**4.6%**	**21%**	**2.4%**	**9%**	**3.3%**	**2.0%**	**4.3%**	**3.7%**	**1.3%**	**0.9%**	**11%**	**100%**
	13.4%	**2.4%**	**6.9%**					**18.4%**		**23.0%**		**14.1%**			**8.0%**		**13.7%**			**100%**

Fuente: Informe Gerencial #130 – septiembre de 2026 ajustado por Interventoría Consorcio IPAB

Grafica 2 Servicios de atención al usuario por unidad funcional – 1 al 30 de septiembre 2026

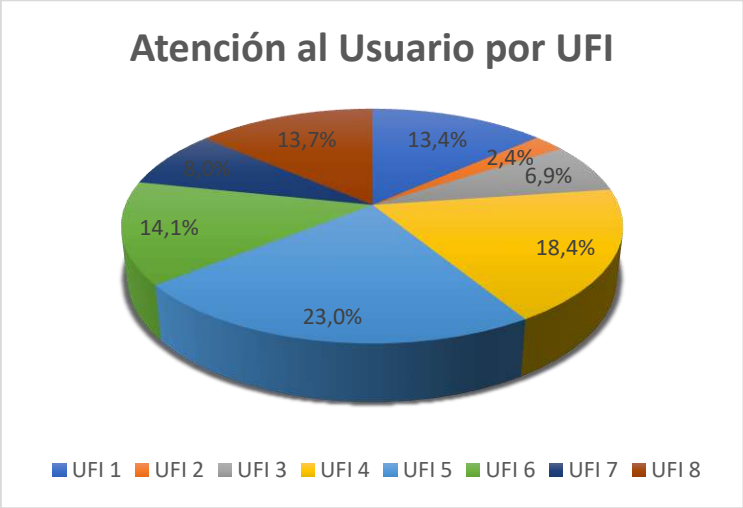

Fuente: Informe Gerencial #130 – septiembre de 2026 ajustado por Interventoría Consorcio IPAB

4.3.2.5. Integridad del Corredor del Proyecto

Conforme a lo establecido en el numeral 3.1.6 – Integridad del corredor del proyecto del Apéndice Técnico 2, el Concesionario, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, ha garantizado la conservación de la integridad de las vías en lo relacionado con la sección transversal y cada uno de sus componentes en las Unidades Funcionales que al iniciar la etapa de reversión, se encontraban en etapa de Operación y Mantenimiento, correspondientes a UF1, UFI 2 (parcial), UF3, UF4, UF5, UFI 6.1 (parcial), UFI 6.2, UFI 7.2, UFI 7.3, UFI 8.1, UFI 8.2 y UFI 8.3. Para algunos subsectores de la UF2, UFI 6.1 y UFI 8.3 no se había firmado acta de terminación, por lo tanto, no es procedente realizar la evaluación del indicador del apéndice técnico 4, si no que se miden con apéndice técnico 2.

No obstante, conforme a los reportes emitidos por medios locales y nacionales, así como en la verificación de campo posterior, se informa que la zona del proyecto entre el 01 y el 05 de febrero de 2026, se registraron intensas lluvias a raíz del paso de un frente frío proveniente del norte del continente, las cuales generaron inundaciones en el sector del Puente San Jorge, entre el PR17+500 y el PR21+500 de la Unidad Funcional 1 del tramo Caucasia – Planeta Rica, correspondiente a la Ruta 2513, al igual que en la Unidad Funcional 5.1 tramo Puerto Rey – Montería, correspondiente a la Ruta 7401, se

presentaron deslizamientos en taludes de corte e inundaciones en el corredor vial. En el tramo comprendido entre el PR20+100 y el PR18+650.

Durante el evento, el nivel del agua superó la rasante de la vía, generando flujo superficial sobre la calzada y ocasionando afectaciones en los taludes del corredor vial en dicho sector, con procesos de erosión y pérdida de material que comprometieron la estabilidad lateral de la infraestructura.

Adicionalmente, como consecuencia del fuerte creciente registrada el día 07 de febrero de 2026, se produjo la afectación de uno de los estribos del puente Trementino II ubicado en el PR19+350 de la unidad funcional 5.1 Ruta 7401, situación que generó la interrupción total del tránsito en el corredor Puerto Rey – Montería.

El Concesionario habilitó el tránsito vehicular mediante la vía alterna construida en el costado izquierdo del corredor, a la altura del PR 19+350 de la UFI 5.1, con el propósito de garantizar la continuidad de la transitabilidad en el corredor concesionado y actualmente se encuentra en construcción el nuevo puente trementino 2. Asimismo, presentó los estudios y diseños correspondientes para la reconstrucción de los taludes afectados, cuyas obras fueron posteriormente ejecutadas por el Concesionario. A la fecha, se verifica que los taludes se encuentran reparados.

Durante el periodo evaluado, se llevaron a cabo labores de mantenimiento rutinario en las unidades funcionales UF1, UFI 2 (parcial), UF3, UF4, UF5, UFI 6.1 (parcial), UFI 6.2, UFI 7.2, UFI 7.3, UFI 8.1, UFI 8.2 y UFI 8.3. De igual manera, se desarrollaron actividades orientadas a atender y corregir los incumplimientos identificados en la medición de los indicadores mensuales y de reversión, correspondientes a las UF1, UFI 2 (parcial), UF3, UF4, UF5, UFI 6.1 (parcial), UFI 6.2, UFI 6.3.1, UFI 6.3.2, UFI 7.2, UFI 7.3, UFI 8.1, UFI 8.2 y UFI 8.3.

4.3.3. Seguridad Vial

4.3.3.1. Auditoría de seguridad vial ANSV 2021

Con base en la información reportada por el Consorcio CR Concesiones, firma que se desempeñó como Interventoría del proyecto hasta el 06 de febrero de 2026, en su Informe Mensual No. 122 correspondiente al mes de enero de 2026, el cual fue remitido al Consorcio IPAB por la Agencia Nacional de Infraestructura mediante comunicado No. 20263050052951 del 17 de febrero de 2026, a continuación se presenta la trazabilidad de la auditoría de seguridad vial realizada por la ANSV en el año 2021, la cual realizó auditoría de seguridad vial en algunos sectores del corredor Antioquia – Bolívar y encontró una serie de hallazgos, el Concesionario mediante comunicado 48-147-20211129021528 de fecha 29 de noviembre de 2021, presentó un plan de acción para los hallazgos mencionados, la Interventoría mediante comunicado CI.023/AB10706/23/7.3 con radicado ANI 20234090271682 de fecha 09 de marzo de 2023, presentó a la ANI un informe de seguimiento a las acciones propuestas por el Concesionario, de igual forma a través del comunicado CI.023/AB10730/23/7.3.3 con radicado ANI 20234090291312 de fecha 14/03/2023 se requirió a la Concesión Ruta al Mar, la adopción de medidas pertinentes para cumplir con las acciones propuestas en el plan de mejoramiento ante la auditoría realizada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial en el año 2021, por medio del comunicado CI.023/AB11351/23/7.3 con radicado ANI 20234090963762 de fecha 28 de agosto 2023.

Los días 22 y 23 de julio de 2025, se realizó recorrido con la Agencia Nacional de Seguridad Vial en las unidades funcionales 4 y 5, quienes revisaron el estado de los hallazgos identificados en el año 2021, la ANSV remitió un acta con el estado de los hallazgos, de la cual la ANI solicitó concepto a la Interventoría mediante oficio 20253050375591 recibida el día 10 de octubre de 2025 y la Interventoría emitió concepto mediante oficio CI.023/AB14199/25/5.3 con radicado ANI 20254091360492 de fecha 24 de octubre de 2025.

Mediante comunicado 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20251210010743 de fecha 10 de diciembre de 2025, el Concesionario emitió respuesta a la Interventoría con copia a la

ANI, sobre el estado actual de los reportes presentados por la ANSV, en el anexo 6 “operación y mantenimiento” se incluye el estado presentado por el Concesionario.

4.3.3.2. Análisis de Accidentalidad

Durante el período analizado, la evaluación de los niveles de accidentalidad evidenció que la UFI 8 registró la mayor participación, con el 25,00 %, correspondiente a 8 siniestros viales. Le siguió la UFI 4, con una participación del 21,88 %, equivalente a 7 siniestros; posteriormente, las UFI 1 y 6 presentaron cada una participación del 12,50 %, correspondiente a 4 siniestros por unidad funcional; las UFI 3 y 7 registraron cada una el 9,38 %, equivalente a 3 siniestros; y las UFI 2 y 5 presentaron cada una una participación del 6,25 %, correspondiente a 2 siniestros viales. En total, durante el período se registraron 32 siniestros viales en las unidades funcionales concesionadas, destacándose una mayor incidencia en los vehículos de Categoría I, con 13 siniestros, seguidos de las motocicletas, con 10 siniestros**,** y los vehículos de Categoría II, con 5 siniestros**.**

Tabla 4-35. Accidentalidad por Unidad Funcional

Accidentalidad por Unidad Funcional y Subsector																				
Mes	UFI 1	UFI 2	UFI 3					UFI 4		UFI 5		UFI 6			UFI 7		UFI 8			Total
	1	2.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	4.1	4.2	5.1	5.2	6.1	6.2	6.3	7.2	7.3	8.1	8.2	8.3	
ene-25	8	3	1	1	3	4	0	4	1	9	2	4	2	0	1	0	1	0	3	47
feb-25	9	0	0	1	0	1	1	4	1	6	1	5	1	0	0	1	0	0	2	33
mar-25	3	1	0	1	1	0	2	4	0	5	0	4	0	0	1	2	0	0	7	31
abr-25	5	1	0	0	0	0	0	6	2	9	1	7	5	0	2	2	2	1	5	48
may-25	11	0	0	0	1	0	0	6	0	3	0	3	0	0	1	5	2	0	2	34
jun-25	10	1	0	0	0	0	1	6	1	3	1	1	1	0	2	4	0	0	1	32
jul-25	8	0	1	0	0	1	0	5	2	3	3	5	1	2	0	2	2	1	3	39
ago-25	3	2	0	0	0	3	0	7	1	5	1	2	2	0	3	2	1	1	3	36
sep-25	6	1	0	2	0	0	0	5	0	3	0	2	0	0	3	2	0	1	7	32
oct-25	1	2	1	0	2	1	1	7	0	7	2	6	2	0	2	4	0	1	2	41
nov-25	11	0	0	2	0	0	1	8	1	4	0	3	2	0	0	3	2	0	5	42
dic-25	11	0	3	0	1	2	0	10	2	3	0	5	2	1	1	1	0	3	4	49
ene-26	10	1	3	1	1	0	0	9	1	5	0	2	1	0	0	4	1	3	8	50
7-28 feb-2026	6	1	0	0	0	0	0	4	1	3	0	2	1	0	0	0	0	0	6	24
mar-26	3	1	0	0	3	0	0	3	3	5	2	8	3	0	2	2	0	1	3	39
abr-26	6	0	0	0	0	1	0	6	1	5	2	7	2	0	1	2	0	1	3	37
may-26	8	3	2	0	0	2	1	3	1	3	0	5	1	0	3	5	1	3	2	43
jun-26	4	2	1	2	0	1	1	2	1	4	1	11	2	0	0	4	2	1	4	43


jul-26	8	1	1	0	2	1	0	2	0	6	1	4	2	0	3	2	2	2	4	**41**
ago-26	15	0	1	1	0	0	0	11	1	2	0	6	3	0	1	2	0	0	2	**45**
sep-26	4	2	1	1	0	1	0	5	2	1	0	3	0	1	2	1	1	1	6	**32**
Totales año 2025	86	11	6	7	8	12	6	72	11	60	11	47	18	3	16	28	10	8	44	**464**
% año 2025	18.53%	2.37%	1.29%	1.51%	1.72%	2.59%	1.29%	15.52%	2.37%	12.93%	2.37%	10.13%	3.88%	0.65%	3.45%	6.03%	2.16%	1.72%	9.48%	**100%**
	18.53%	2.37%	8.41%					17.89%		15.30%		14.66%			9.48%		13.36%			**100%**
Totales año 2026	64	11	9	5	6	6	2	45	11	34	6	48	15	1	12	22	7	12	38	**354.0**
% año 2026	18.08%	3.11%	2.54%	1.41%	1.69%	1.69%	0.56%	12.71%	3.11%	9.60%	1.69%	13.56%	4.24%	0.28%	3.39%	6.21%	1.98%	3.39%	10.73%	**100%**
	18.08%	3.11%	7.91%					15.82%		11.30%		18.08%			9.60%		16.10%			**100%**

Fuente: Informe Gerencial #130 – septiembre de 2026 ajustado por Consorcio IPAB

Los registros mensuales y las investigaciones de los croquis de accidentes realizadas por la Dirección de Tránsito y Transporte (DITRA), con ocasión de la atención de los siniestros viales, evidencian que las principales causas de accidentalidad durante el período analizado corresponden a girar bruscamente, seguida de no conservar la distancia, presencia de animales en la vía (domésticos), falla mecánica, embriaguez del conductor y cansancio. En menor proporción se identificaron causas relacionadas con salir a la vía sin precaución, exceso de velocidad, transitar por cruce prohibido, adelantar por la derecha y cruzar la vía sin precaución.

En este sentido, se evidencia que la accidentalidad no depende exclusivamente de las condiciones o configuración de la vía, sino también de factores asociados al comportamiento de los usuarios, las condiciones mecánicas de los vehículos y factores externos. Por lo anterior, resulta fundamental que los usuarios observen las normas de tránsito, mantengan una conducción segura y respeten la señalización vial establecida, con el fin de contribuir a la prevención y reducción de la ocurrencia de siniestros viales.

Grafica 3 Accidentes por unidad funcional – 1 al 30 de septiembre 2026

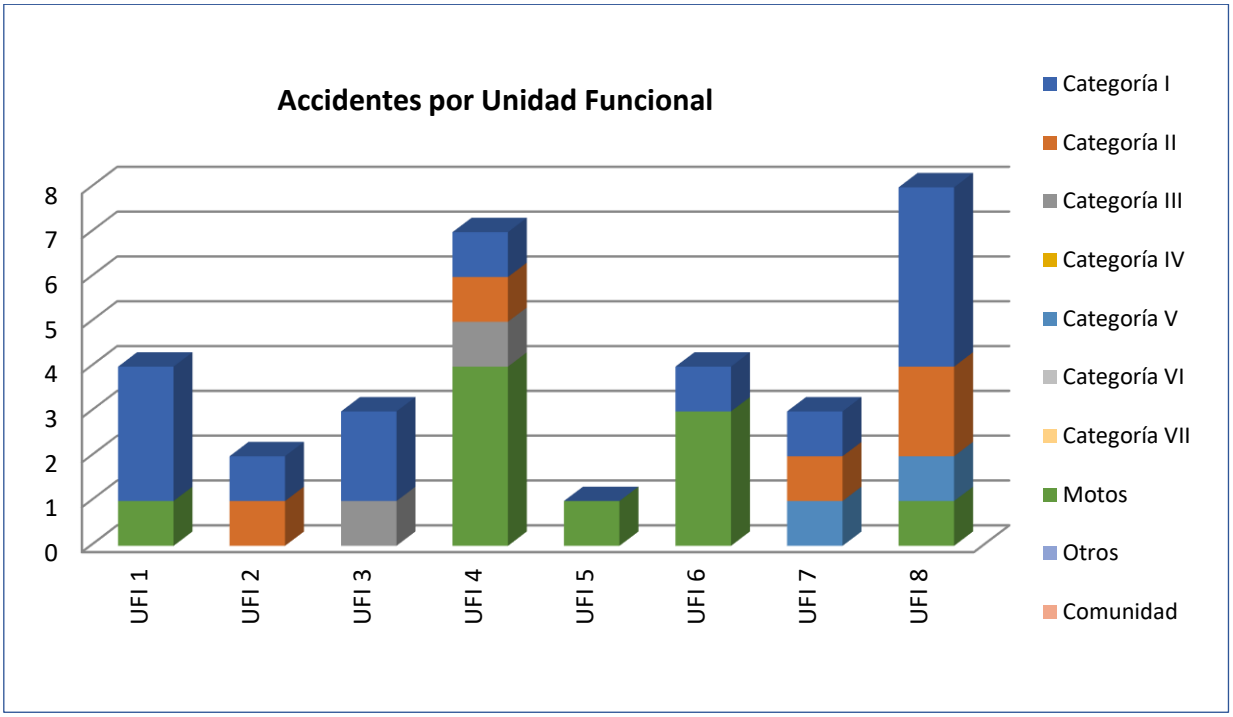

Fuente: Informe Gerencial #130 – septiembre de 2026

Durante el período comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre de 2026, se presentaron treinta y dos (32) accidentes de tránsito clasificados por categoría, de la siguiente manera: en vehículos de Categoría I se registraron trece (13) accidentes; en vehículos de Categoría II (buses y busetas doble llanta) se presentaron cinco (5) accidentes; en vehículos de Categoría III se registraron dos (2) accidentes; en vehículos de Categoría IV no se registraron accidentes; en vehículos de Categoría V se registraron dos (2) accidentes; y en vehículos de Categorías VI y VII no se registraron accidentes. Por su parte, las motocicletas registraron diez (10) accidentes, constituyéndose en el segundo

tipo de vehículo con mayor participación en la accidentalidad durante el período, después de los vehículos de Categoría I.

Tabla 4-36. Niveles de Accidentalidad Acumulada

Tipo Vehículo	Año 2026									Total 2015	Total 2016	Total 2017	Total 2018	Total 2019	Total 2020	Total 2021	Total 2022	Total 2023	Total 2024	Total 2025	Total, acumulada inicio operación		Total, acumulada 2026	
	Ene	7-28 feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep															
Categoría 1	21	9	10	12	24	19	18	11	13	11	123	166	165	153	125	197	237	278	202	184	1978	36.92%	137	38.70%
Categoría 2	4	3	7	2	4	4	2	5	5	6	66	81	80	70	37	61	46	40	37	42	602	11.24%	36	10.17%
Categoría 3	4	0	0	3	2	2	2	3	2	0	26	20	19	20	25	25	28	33	42	33	289	5.39%	18	5.08%
Categoría 4	0	1	1	1	1	0	1	4	0	2	3	10	9	3	11	13	12	10	16	4	102	1.90%	9	2.54%
Categoría 5	1	0	0	0	0	0	0	2	2	0	6	38	38	19	4	4	7	5	7	7	140	2.61%	5	1.41%
Categoría 6	0	0	0	1	0	2	2	2	0	0	0	0	5	4	11	7	16	11	7	8	76	1.42%	7	1.98%
Categoría 7	1	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11	14	13	12	8	66	1.23%	6	1.69%
Motos	19	11	19	14	8	16	15	18	10	8	137	151	151	217	168	236	260	231	181	170	2040	38.08%	130	36.72%
Otros	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	4	4	5	2	1	2	1	0	22	0.41%	2	0.56%
Bicicleta	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0	2	7	2	2	8	7	8	42	0.78%	4	1.13%
Comunidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
Totales	**50**	**24**	**39**	**37**	**43**	**43**	**41**	**45**	**32**	**27**	**362**	**468**	**471**	**492**	**395**	**558**	**623**	**631**	**512**	**464**	**5357**	**100%**	**354**	**100%**

Fuente: Informe Gerencial #130 – septiembre de 2026 ajustado por Consorcio IPAB

Tabla 4-37. Relación de accidentes en el presente periodo

RELACIÓN DE ACCIDENTES DE PRESENTE PERIODO																
INFORMACIÓN GENERAL							FALLECIDOS		HERIDOS				CAUSAS POSIBLES			
#	Fecha	UFI	Abscisa	Ruta	Tramo	Carril	No. De Fallecidos	EDAD	Graves	EDAD2	Leves	EDAD3	Clase de Accidente	Tipo	Categoría	Causa DITRA
1	2/09/2026	3.1	00+000	25CRA	VARIANTE PLANETA RICA	DERECHO	0	0	0	0	4	39/M 34/M 30/F 22/F	SALIDA DE VÍA	EMBRIAGUEZ DEL CONDUCTOR	I	114.EMBRIAGUEZ APARENTE
2	2/09/2026	1.1	49+400	2513	CAUCASIA - PLANETA RICA	IZQUIERDO	0	0	0	0	1	60/M	SALIDA DE VÍA	FALLA MECÁNICA	I	ASISTIÓ DITRA, NO REALIZÓ CROQUIS
3	4/09/2026	4.1	2+800	2310	PLANETA RICA - MONTERÍA	IZQUIERDO	0	0	0	0	0	0	VOLCAMIENTO	FALLA MECÁNICA	III	ASISTIÓ DITRA, NO REALIZÓ CROQUIS
4	4/09/2026	1.1	61+700	2513	CAUCASIA - PLANETA RICA	DERECHO	0	0	0	0	1	46/M	CHOQUE	GIRAR BRUSCAMENTE	I	122.GIRAR BRUSCAMENTE
5	5/09/2026	3.4	23+600	74CR01	SAN CARLOS - CERETÉ	IZQUIERDO	0	0	1	56/M	1	35/M	CHOQUE MULTIPLE	EMBRIAGUEZ DEL CONDUCTOR	I	114.EMBRIAGUEZ APARENTE
6	23/09/2026	8.3	14+900	9005	SAN ONOFRE - CRUZ DEL VISO	DERECHO	0	0	0	0	2	26/M 46/M	CHOQUE	NO CONSERVAR DISTANCIA	I	121.NO MANTENER DISTANCIA DE SEGURIDAD.
7	8/09/2026	2.1	37+700	2103	SEGUNDA CALZADA CERETÉ - LORICA	DERECHO	0	0	0	0	1	37/M	CHOQUE	GIRAR BRUSCAMENTE	I	ASISTIÓ DITRA, NO REALIZÓ CROQUIS
8	11/09/2026	1.1	6+300	2513	CAUCASIA - PLANETA RICA	IZQUIERDO	0	0	0	0	1	41/M	CHOQUE	NO CONSERVAR DISTANCIA	MOTO	ASISTIÓ DITRA, NO REALIZÓ CROQUIS
9	11/09/2026	4.2	40+700	2310	EL 15 - MONTERÍA	DERECHO	0	0	0	0	0	0	SALIDA DE VÍA	EMBRIAGUEZ DEL CONDUCTOR	I	ASISTIÓ DITRA, NO REALIZÓ CROQUIS
10	12/09/2026	1.1	56+200	2513	CAUCASIA - PLANETA RICA	IZQUIERDO	0	0	0	0	1	33/M	CHOQUE	ANIMAL EN LA VÍA(DOMESTICO)	I	126. FALTA DE PREVENCIÓN ANTE ANIMALES EN LA VÍA
11	12/09/2026	3.2	00+000	74CR01	EL 15 - SAN CARLOS	DERECHO	0	0	0	0	0	0	CAIDA DE CARGA	FALLA MECÁNICA	III	ASISTIÓ DITRA, NO REALIZÓ CROQUIS
12	13/09/2026	4.2	39+700	2310	EL 15 - MONTERÍA	DERECHO	1	37/M	0	0	0	0	CHOQUE	TRANSITAR POR CRUCE PROHIBIDO	MOTO	097. TRANSITAR POR VIAS PROHIBIDAS

RELACIÓN DE ACCIDENTES DE PRESENTE PERIODO																
INFORMACIÓN GENERAL							FALLECIDOS		HERIDOS				CAUSAS POSIBLES			
#	Fecha	UFI	Abscisa	Ruta	Tramo	Carril	No. De Fallecidos	EDAD	Graves	EDAD2	Leves	EDAD3	Clase de Accidente	Tipo	Categoría	Causa DITRA
13	14/09/2026	7.3	11+850	90SCA	TOLÚ - EL PUEBLITO	IZQUIERDO	0	0	0	0	1	23/M	CHOQUE	NO CONSERVAR DISTANCIA	V	NO ASISTIÓ DITRA, NO REALIZÓ CROQUIS
14	15/09/2026	8.1	61+100	9004	LORICA - SAN ONOFRE	IZQUIERDO	0	0	0	0	2	66/M 57/F	CHOQUE	GIRAR BRUSCAMENTE	I	122.GIRAR BRUSCAMENTE
15	16/09/2026	7.2	19+800	9004A	VARIANTE COVEÑAS	IZQUIERDO	0	0	0	0	0	0	SALIDA DE VÍA CON VOLCAMIENTO	CANSANCIO	II	ASISTIÓ DITRA, NO REALIZÓ CROQUIS
16	18/09/2026	6.1	24+850	2103	CERETÉ - LORICA	IZQUIERDO	0	0	0	0	0	0	CHOQUE	EXCESO DE VELOCIDAD	I	NO ASISTIÓ DITRA, NO REALIZÓ CROQUIS
17	18/09/2026	4.1	02+150	2310	PLANETA RICA - MONTERÍA	IZQUIERDO	0	0	0	0	2	60/M 50/M	CHOQUE	GIRAR BRUSCAMENTE	MOTO	122.GIRAR BRUSCAMENTE
18	18/09/2026	5.1	33+650	7401	PUERTO REY - MONTERÍA	IZQUIERDO	0	0	1	52/F	1	77/M	CHOQUE	SALIR A LA VÍA SIN PRECAUCIÓN	MOTO	NO ASISTIÓ DITRA, NO REALIZÓ CROQUIS
19	20/09/2026	6.1	29+700	2103	CERETÉ - LORICA	IZQUIERDO	1	50/M	0	0	0	0	CHOQUE	GIRAR BRUSCAMENTE	MOTO	122.GIRAR BRUSCAMENTE
20	20/09/2026	7.2	13+100	9004A	VARIANTE COVEÑAS	IZQUIERDO	0	0	0	0	0	0	CHOQUE	ANIMAL EN LA VÍA(DOMESTICO)	I	NO ASISTIÓ DITRA, NO REALIZÓ CROQUIS
21	21/09/2026	6.3	41+400	9004	LORICA - SAN ONOFRE	IZQUIERDO	0	0	0	0	0	0	CHOQUE	NO CONSERVAR DISTANCIA	MOTO	121.NO MANTENER DISTANCIA DE SEGURIDAD.
22	22/09/2026	8.2	94+300	9004	LORICA - SAN ONOFRE	IZQUIERDO	0	0	0	0	1	21/M	CHOQUE	NO CONSERVAR DISTANCIA	MOTO	ASISTIÓ DITRA, NO REALIZÓ CROQUIS
23	24/09/2026	8.3	25+700	9005	SAN ONOFRE - CRUZ DEL VISO	IZQUIERDO	0	0	0	0	0	0	CHOQUE	ANIMAL EN LA VÍA(DOMESTICO)	V	NO ASISTIÓ DITRA, NO REALIZÓ CROQUIS
24	29/09/2026	8.3	31+200	9005	SAN ONOFRE - CRUZ DEL VISO	IZQUIERDO	0	0	0	0	0	0	CHOQUE	ANIMAL EN LA VÍA(DOMESTICO)	II	NO ASISTIÓ DITRA, NO REALIZÓ CROQUIS

RELACIÓN DE ACCIDENTES DE PRESENTE PERIODO																
INFORMACIÓN GENERAL							FALLECIDOS		HERIDOS				CAUSAS POSIBLES			
#	Fecha	UFI	Abscisa	Ruta	Tramo	Carril	No. De Fallecidos	EDAD	Graves	EDAD2	Leves	EDAD3	Clase de Accidente	Tipo	Categoría	Causa DITRA
25	24/09/2026	4.1	0+550	2310	PLANETA RICA - MONTERÍA	IZQUIERDO	0	0	0	0	4	0/M 0/M 57/M 0/F	CHOQUE	GIRAR BRUSCAMENTE	MOTO	122.GIRAR BRUSCAMENTE
26	25/09/2026	4.1	15+170	2310	PLANETA RICA - MONTERÍA	DERECHO	0	0	0	0	1	32/M	CHOQUE	ADELANTAR POR LA DERECHA	II	102. ADELANTAR POR LA DERECHA
27	26/09/2026	8.3	44+200	9005	SAN ONOFRE - CRUZ DEL VISO	IZQUIERDO	0	0	0	0	0	0	SALIDA DE VÍA CON VOLCAMIENTO	FALLA MECÁNICA	I	NO ASISTIÓ DITRA, NO REALIZÓ CROQUIS
28	26/09/2026	6.1	11+300	2103	CERETÉ - LORICA	IZQUIERDO	0	0	0	0	1	36/F	CHOQUE	GIRAR BRUSCAMENTE	MOTO	ASISTIÓ DITRA, NO REALIZÓ CROQUIS
29	30/09/2026	8.3	53+200	9005	SAN ONOFRE - CRUZ DEL VISO	IZQUIERDO	0	0	0	0	1	63/M	SALIDA DE VÍA CON VOLCAMIENTO	CANSANCIO	II	NO ASISTIÓ DITRA, NO REALIZÓ CROQUIS
30	6/09/2026	8.3	6+600	9005	SAN ONOFRE - CRUZ DEL VISO	DERECHO	0	0	0	0	0	0	CHOQUE	ANIMAL EN LA VÍA(DOMESTICO)	I	NO ASISTIÓ DITRA, NO REALIZÓ CROQUIS
31	30/09/2026	4.1	29+370	2310	PLANETA RICA - MONTERÍA	DERECHO	0	0	0	0	2	29/M 14/F	CHOQUE	CRUZAR LA VÍA SIN PRECAUCIÓN	MOTO	411.OTRAS
32	30/09/2026	2.1	41+100	2103	SEGUNDA CALZADA CERETÉ - LORICA	DERECHO	0	0	0	0	0	0	CHOQUE	NO CONSERVAR DISTANCIA	II	NO ASISTIÓ DITRA, NO REALIZÓ CROQUIS

Fuente: Informe Gerencial # 130 – septiembre de 2026 ajustado por Interventoría Consorcio IPAB


Tabla 4-38. Causas de accidentes en el presente periodo

Causas de Accidentes	No. Accidentes	% Accidentes
Girar bruscamente	7	22%

Causas de Accidentes	No. Accidentes	% Accidentes
No conservar distancia	6	19%
Animal en la vía (Domésticos)	5	16%
Falla Mecánica	4	13%
Embriaguez del conductor	3	9%
Cansancio	2	6%
Salir a la vía sin precaución	1	3%
Exceso de velocidad	1	3%
Transitar por cruce prohibido	1	3%
Adelantar por la derecha	1	3%
Cruzar la vía sin precaución	1	3%
Total	**32**	**100%**

Fuente: Informe Gerencial # 130 – septiembre de 2026 ajustado por Interventoría Consorcio IPAB

Grafica 4 Clasificación de accidentes por causa

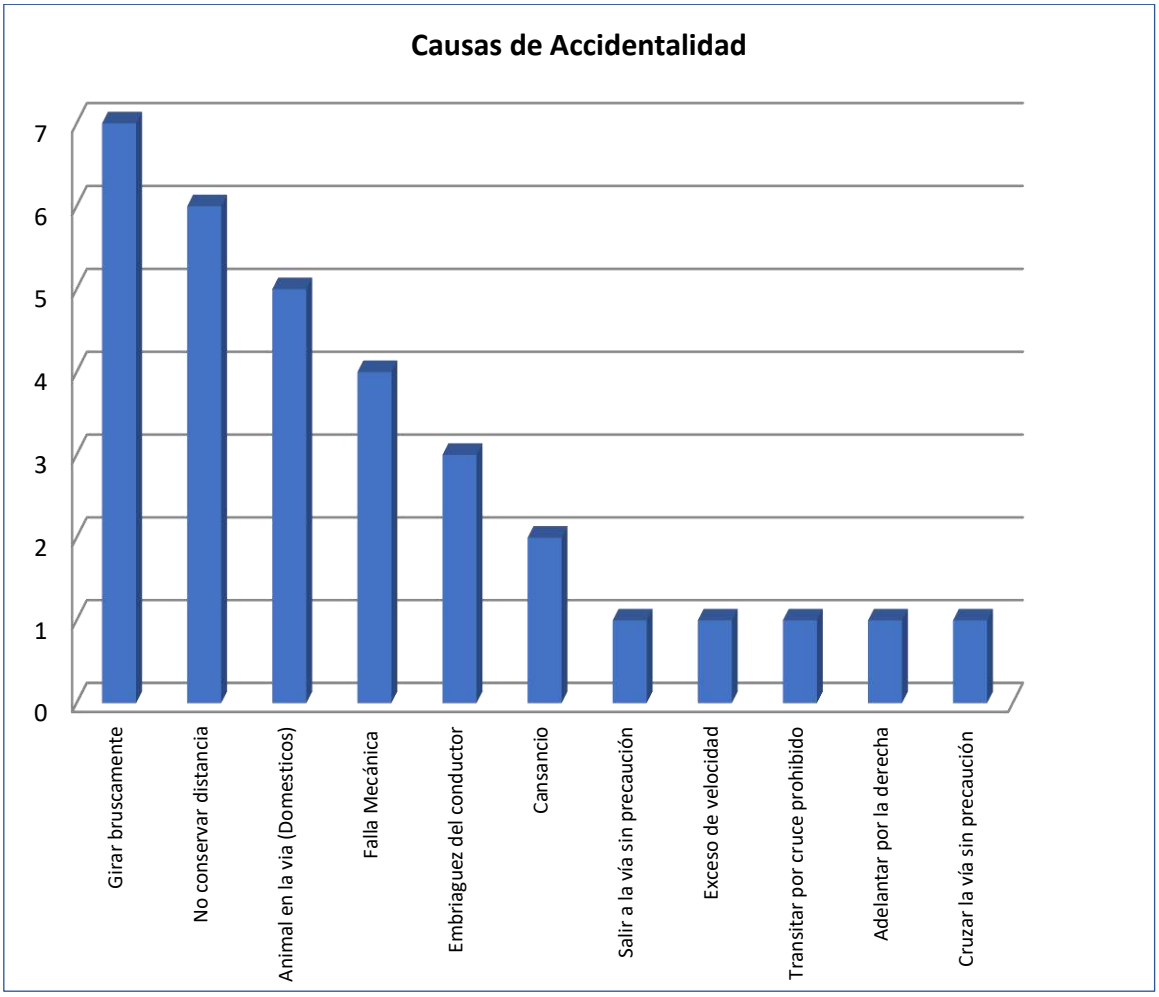


Fuente: Informe Gerencial # 130 – septiembre de 2026 ajustado por Interventoría Consorcio IPAB

Con base en la información entregada por la anterior Interventoría del Proyecto Antioquia – Bolívar, y analizando mes a mes los datos de accidentalidad, se observa que la línea de tendencia durante los últimos seis (6) años ha presentado seis picos relevantes. El primero ocurrió en octubre de 2017, con 62 accidentes, asociado a la incorporación de las UF4 y UF5 a los corredores de la Concesión; posteriormente se registraron


incrementos en diciembre de 2021, con 69 accidentes; enero de 2022, con 82 accidentes; abril de 2022, con 67 accidentes; enero de 2023, con 69 accidentes; y octubre de 2023, con 63 accidentes. Estos incrementos podrían estar relacionados con el aumento en los volúmenes de tráfico, la eliminación de restricciones derivadas de la pandemia, así como con temporadas vacacionales de fin de año y festividades regionales que generan mayor movilidad. En este contexto, la Interventoría recomienda mantener de forma permanente campañas de cultura, sensibilización y prevención vial, dirigidas especialmente a motociclistas, con el fin de promover el respeto por la normativa de tránsito vigente y fomentar conductas seguras que contribuyan al fortalecimiento de la seguridad vial en el corredor concesionado.

Grafica 5 Accidentes ocurridos años 2015 al 2021

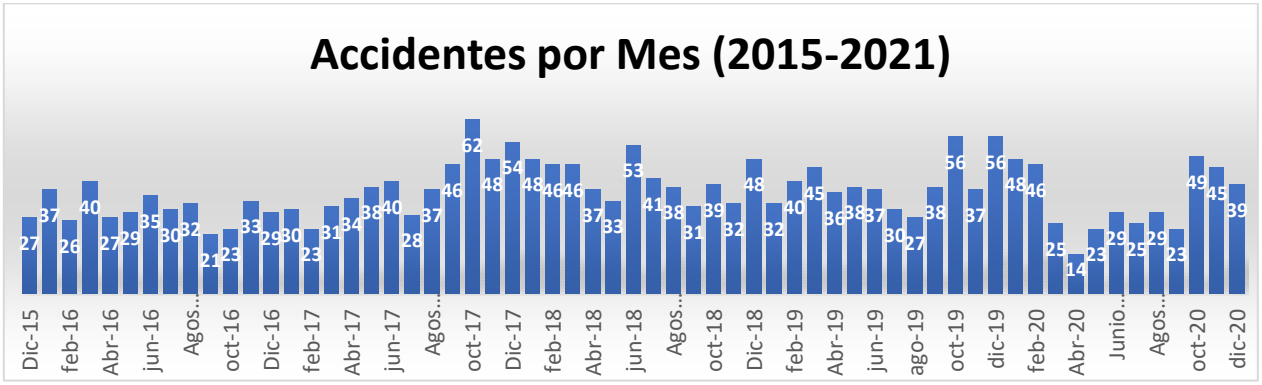

Fuente: Informe Gerencial #130 – septiembre de 2026 – Ajustado por Consorcio IPAB

Grafica 6 Accidentes ocurridos año 2022 a septiembre 2026

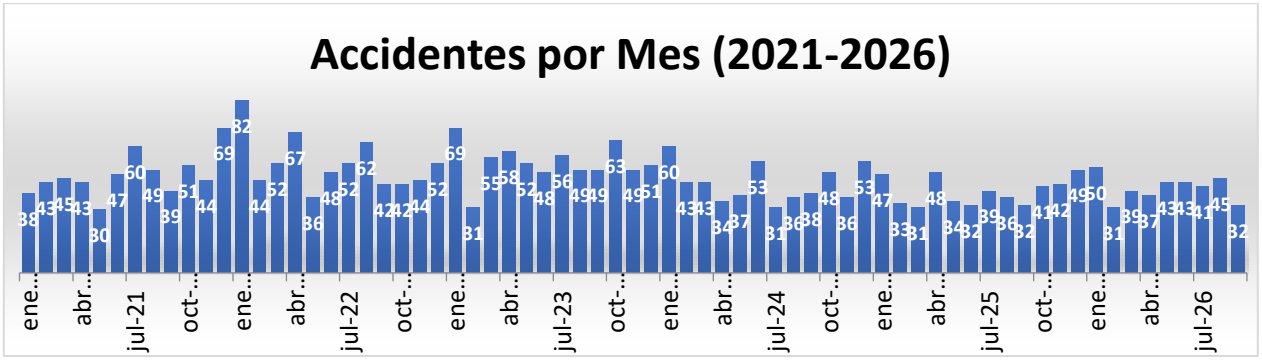

Fuente: Informe Gerencial #130 – septiembre de 2026 – Ajustado por Consorcio IPAB


Respecto a la gravedad de la accidentalidad, tal como se indica en la tabla a continuación, se registraron 32 víctimas, de las cuales el 87,50 % corresponde a heridos leves, el 6,25 % a heridos graves y el 6,25 % a víctimas mortales, correspondientes a 2 fallecidos.

Tabla 4-39. Distribución acumulada de víctimas por gravedad de los accidentes

N° de victimas	Año 2026									Total 2016	Total 2017	Total 2018	Total 2019	Total 2020	Total 2021	Total 2022	Total 2023	Total 2024	Total 2025	Total Acumulada		Total 2026	
	Ene	7 - 28 Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep														
Decesos (muertos)	9	6	11	3	10	7	15	6	2	41	43	58	46	57	72	86	86	63	80	701	12%	60	18%
Heridos graves	6	4	7	3	2	5	9	4	2	34	58	45	38	21	47	71	74	64	54	548	9%	36	11%
Heridos Leves	34	18	35	34	29	31	30	30	28	351	417	449	511	363	554	522	484	433	349	4702	79%	235	71%
TOTALES	**49**	**28**	**53**	**40**	**41**	**43**	**54**	**40**	**32**	**426**	**518**	**552**	**595**	**441**	**673**	**679**	**644**	**560**	**483**	**5951**	**100%**	**331**	**100%**

Fuente: Informe Gerencial #130 – septiembre de 2026 ajustado por Consorcio IPAB

Grafica 7 Cantidad de fallecidos entre diciembre 2015 y septiembre 2026

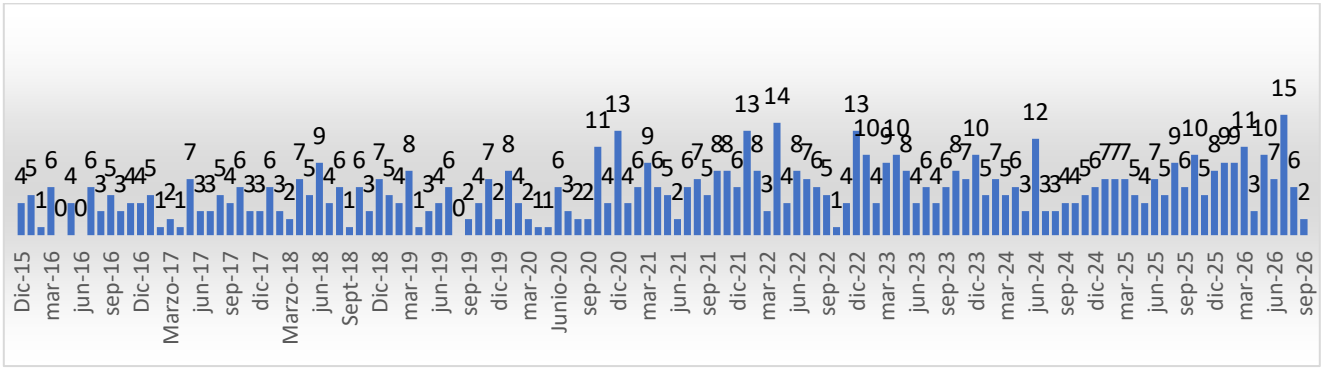

Fuente: Informe Gerencial #130 – septiembre de 2026 ajustado por Interventoría Consorcio IPAB

En la atención de los registros de emergencia vial presentados con las víctimas de accidentalidad, la Interventoría realiza periódicamente inspección y verificación de las condiciones técnicas y operativas en los equipos de las bases operativas en especial la ambulancia y carro taller, de conformidad al Apéndice Técnico 2. Numeral 3.3.3.11 del Contrato de Concesión 016 de 2015.

4.3.3.3. Atención ocurrencia de siniestros viales

De acuerdo con las obligaciones del Contrato y en atención a la solicitud realizada mediante comunicado radicado ANI N°20194090000504 de acuerdo al Plan Nacional de Seguridad Vial en el numeral 4.4.3.1. Atención prehospitalaria a víctimas por siniestros viales asociado a la evaluación de indicadores, se confirma que para las víctimas reportadas en la tabla anterior referente a distribución acumulada de víctimas por gravedad de los accidentes, una vez fue efectuado llamado de emergencia fueron inscritos sus datos de contacto y detalles del evento en los registros de las oficinas del CCO por la radio operadora, con la siguiente descripción que valida la Interventoría en informe gerencial mensual:

Registro y folio de bitácora con fecha.

Ubicación espacial de ocurrencia del siniestro (Ruta, UF, Abscisa)

Sitio exacto por carril.

Hora de llegada y salida de los equipos de la Concesión

Tipo de heridos (Leves y Graves).

Número de fallecidos (edades, sexo).

Clase y tipo de accidente con vehículos involucrados (categorías vehiculares asociadas al evento).

Acto seguido, el Concesionario en función del protocolo asociado al indicador O5, atención en accidentes indicado en el Plan de Operaciones actualizado año 2026, ha dispuesto de los equipos ubicados en las bases operativas (Ambulancia, Carro Taller, Grúa Gancho y Plancha, Cama baja), donde previamente se acordona con señalización de peligro la zona del evento por medio del inspector vial y se ofrece traslado urgente a las víctimas leves y víctimas graves al centro asistencial más cercano, además, los equipos remolcan los vehículos involucrados en el accidente para despeje y continuidad del tráfico circulante.

Adicional a estos equipos, la Concesión cuenta con postes satelitales SOS, cámaras ITS y el apoyo de la DITRA, que permiten alertar en tiempo real sobre estos eventos y realizar control de orden público para despeje, colaboración para la circulación de los vehículos por media calzada y mejorar rendimientos en los primeros auxilios de los afectados que están siendo atendidos por los profesionales de la ambulancia medicalizada.

La Interventoría de manera periódica, realiza la verificación del cumplimiento de los indicadores mensuales en todo el corredor tales como , E6 Baches, E7 Hundimientos, E11 Señalización Vertical, al igual el indicador semestral E12 señalización horizontal en las unidades funcionales en etapa de operación y mantenimiento, de la misma manera se verifica el indicador E14 Iluminación a zonas de aproximación a los peajes e intersecciones de la Concesión para disminuir el riesgo de accidentes con ocasión a los daños en vía o por deficiencias en señalización que inciden en aumentar la cantidad de víctimas por siniestros viales.

4.3.3.4. Análisis de Puntos Críticos

La Concesión Ruta al Mar, remite a la superintendencia de transporte un reporte trimestral de sectores críticos de accidentalidad en carreteras concesionadas, el día 14 de julio de 2026, el Concesionario remitió a la Supertransporte el reporte correspondiente al segundo trimestre del año 2026, dado que este es remitido a dentro de los primeros 15 días posteriores a la culminación de cada trimestre, a continuación, se muestra un resumen de la información enviada, correspondiente al segundo trimestre del año 2026.

Tabla 4-40. Sectores críticos de accidentalidad segundo trimestre 2026

5. Nro.	6. Tramo o trayecto	7.1. Municipio 1	7.2. Municipio 2	8. Abscisa	9. Denominación	10. Departamento	11. Motivo del evento
1	Caucasia - Planeta Rica	CAUCASIA	PLANETA RICA	33+100	Polonia	Córdoba	Accidente(s) con víctimas fatal(es)
2	Caucasia - Planeta Rica	CAUCASIA	PLANETA RICA	57+150	Los Manguitos	Córdoba	Accidente(s) con víctimas fatal(es)
3	Caucasia - Planeta Rica	CAUCASIA	PLANETA RICA	33+530	Arroyo Trementino	Córdoba	Accidente(s) con víctimas fatal(es)
4	Segunda Calzada Cerete - Lorica	CERETE	LORICA	46+600	Lorica	Córdoba	Accidente(s) con víctimas fatal(es)
5	Segunda Calzada Cerete - Lorica	CERETE	LORICA	42+300	La Palma	Córdoba	Accidente(s) con víctimas fatal(es)
6	Segunda Calzada Cerete - Lorica	CERETE	LORICA	32+000	Mata de Caña	Córdoba	Accidente(s) con víctimas fatal(es)
7	San Carlos - Cerete	SAN CARLOS	CERETE	31+200	Motel Manhattan	Córdoba	Accidente(s) con víctimas fatal(es)
8	Variante Cerete	CERETE	CERETE	00+000	Puente la Soberana	Córdoba	Accidente(s) con víctimas fatal(es)
9	Puerto Rey - Montería	LOS CÓRDOBAS	LOS CÓRDOBAS	11+000	Barranquillita	Córdoba	Accidente(s) con víctimas fatal(es)
10	Puerto Rey - Montería	MONTERIA	MONTERIA	59+550	El Vidrial	Córdoba	Accidente(s) con víctimas fatal(es)
11	Cerete - Lorica	CERETE	LORICA	17+950	Ideco	Córdoba	Accidente(s) con víctimas fatal(es)
12	Cerete - Lorica	CERETE	LORICA	20+100	Carrillo	Córdoba	Accidente(s) con víctimas fatal(es)
13	Cerete - Lorica	CERETE	LORICA	32+350	Mata de Caña	Córdoba	Accidente(s) con víctimas fatal(es)


5. Nro.	6. Tramo o trayecto	7.1. Municipio 1	7.2. Municipio 2	8. Abscisa	9. Denominación	10. Departamento	11. Motivo del evento
14	Cerete - Lorica	CERETE	LORICA	21+600	Carrillo	Córdoba	Accidente(s) con víctimas fatal(es)
15	Lorica - Coveñas	LORICA	COVEÑAS	11+500	El Tributo	Córdoba	Accidente(s) con víctimas fatal(es)
16	Tolú - Tolú Viejo	TOLÚ	TOLÚ VIEJO	54+280	Sector el 6	Sucre	Accidente(s) con víctimas fatal(es)
17	El Pueblito - San Onofre	SAN ONOFRE	SAN ONOFRE	99+290	Aguas Negras	Sucre	Accidente(s) con víctimas fatal(es)
18	San Onofre - Cruz del Viso	SAN ONOFRE	CRUZ DEL VISO	50+400	El Limon	Bolivar	Accidente(s) con víctimas fatal(es)

Fuente: Reporte trimestral de la Concesión Ruta al Mar a la Supertransporte

4.3.3.5. Trazabilidad de la información reportada por el Concesionario

La Concesión Ruta al Mar, presenta un reporte estadístico Programa Especial Sectores Críticos de Siniestralidad a través del aplicativo Survey123 (PESCRI Estadística), para la Dirección de Promoción y Prevención de Concesiones e Infraestructura de la superintendencia de Transporte y cuya información deberá ser reportada mensualmente dentro de los diez (10) primeros días calendario del mes siguiente al periodo objeto de reporte. Debido a que al cierre de este informe no se había realizado el reporte que corresponde al periodo del este informe, se anexa el soporte correspondiente al mes de agosto 2026, realizado por el Concesionario en el mes de septiembre de 2026, se remite la imagen donde se evidencia que el Concesionario realizó el reporte de los datos en el aplicativo.

Tabla 4-41. **Soporte reporte sectores críticos de siniestralidad**

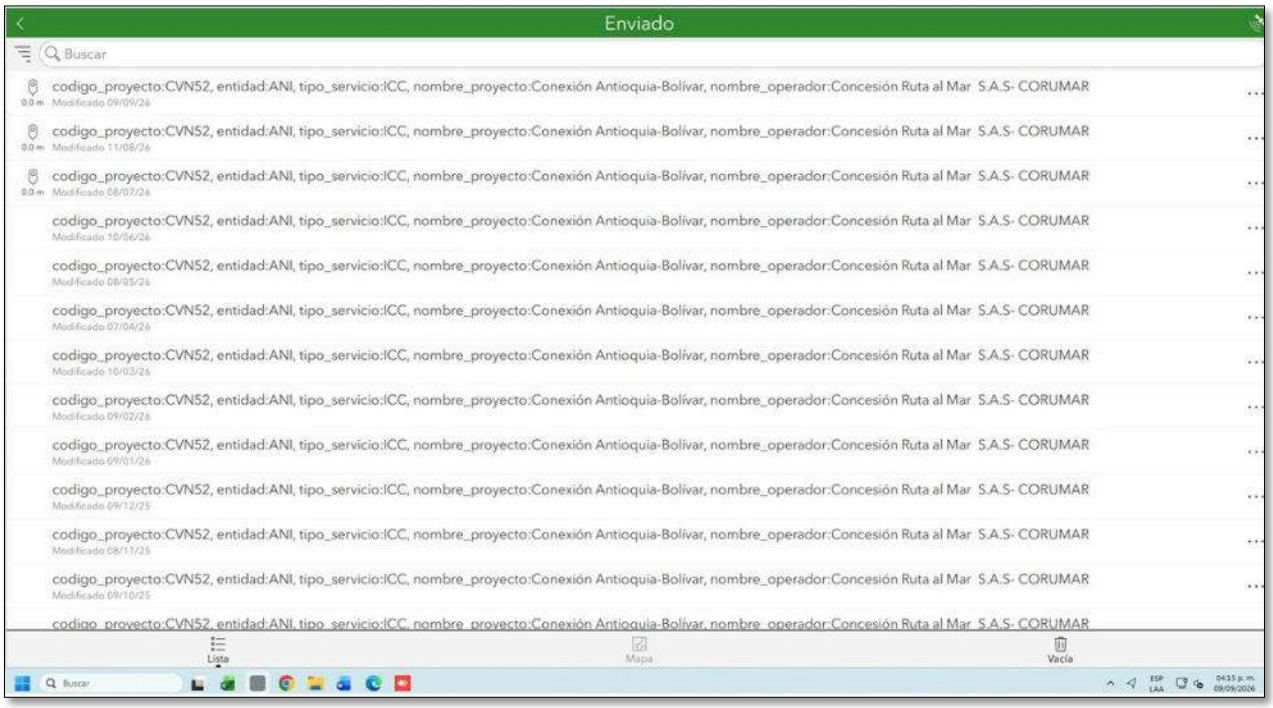

Fuente: Reporte mensual de la Concesión Ruta al Mar a la Supertransporte

4.3.3.6. Seguimiento Observaciones Visita Supertransporte

La Superintendencia de Transporte conforme lo informado mediante comunicado No. 20267300260421 del 12 de mayo de 2026, dirigido a la Concesión Ruta al Mar con copia a esta Interventoría, realizó recorrido de Inspección SETA (Supervisión Especial en Temporada Alta) al proyecto Antioquia Bolívar los días 19, 20, 21 y 22 de mayo de 2026, la Interventoría mediante comunicado IPAB-331-2026 con radicado ANI 20264090671762 de fecha 27 de mayo de 2026, solicitó al Concesionario presentar el plan de acción para los hallazgos identificados por la Superintendencia de Transporte, el cual se presenta en el anexo 6 “operación y mantenimiento”

Mediante comunicado 20267300342461 de fecha 17 de junio de 2026, la Supertransporte informó que realizaría visita de inspección técnica y operativa en el corredor Antioquia Bolívar, los días 22 al 26 de junio de 2026, la cual efectivamente realizó el Ing. Santiago Copete Lozano, con acompañamiento de la Interventoría y del Concesionario, en cuya visita se cerraron a las observaciones realizadas por la Supertransporte en visita al proyecto Antioquia – Bolívar, realizada en el mes de mayo de 2026 y se identificaron nuevas observaciones, mediante comunicado IPAB-493-2026 con radicado ANI 20264090893792 de fecha 14 de julio de 2026, se solicitó al Concesionario presentar el plan de acción para los hallazgos identificados por la Supertransporte, al cierre de este informe nos encontramos a la espera de la respuesta por parte del Concesionario, sin embargo, en el informe gerencial del mes de septiembre de 2026, el Concesionario remitió el anexo denominado *"Inspección General Supertransporte - Año 2026",* el cual se presenta en el anexo 6 "operación y mantenimiento"

Se aclara que mediante comunicado 20267300548841 recibida el 05 de agosto de 2026, la Supertransporte requirió al Concesionario presentar el plan de acción en el aplicativo de la supertransporte el cual estaría habilitado hasta el 03 de septiembre de 2026, cual fue cargado por el Concesionario en el aplicativo de la Superintendencia de transporte.

Por su parte, la ANI mediante comunicado 20263050309251 de fecha 12 de agosto de 2026, remitió la solicitud de la supertransporte para que fuera atendida por el Concesionario y se mantuviera informada a la Agencia, al cierre de este informe nos encontramos a la espera de la respuesta por parte del Concesionario.

Durante el mes de agosto de 2026, conforme a lo informado por la Superintendencia de Transporte mediante el comunicado No. 20267300616041 del 20 de agosto de 2026, dicha entidad realizó una visita de inspección al Proyecto Antioquia – Bolívar los días 24, 25, 26, 27 y 28 de agosto de 2026, en el marco del Programa Especial de Accesibilidad e Inclusión – PEACCI. Como resultado de la inspección, se identificaron diferentes aspectos relacionados con las condiciones de accesibilidad e inclusión de los componentes de la infraestructura, los cuales fueron calificados como "NO CUMPLE", "NO EXISTE" y "PARCIALMENTE". En consecuencia, la interventoría solicitara al Concesionario presentar el correspondiente plan de acción.

4.3.3.7. Seguimiento reporte de la información del Programa Especial de Supervisión al Control del Sobrepeso en carreteras (PECSO)

El Concesionario realiza el reporte los primeros días del mes siguiente al periodo a reportar, mediante correo electrónico de fecha 04 de septiembre de 2026, el Concesionario remitió el soporte de cargue de la información en el aplicativo de la Supertransporte, correspondiente al mes de agosto de 2026, en lo relacionado con el Programa Especial de Supervisión de Control al Sobrepeso en Carreteras – PECSO, según se muestra en los mencionados correos, la Supertransporte responde que los archivos cargados han sido aprobados y cumplen con todos los requisitos, anexamos imagen de lo enunciado:

Tabla 4-42. **Soporte reporte PECSO a la Supertransporte**



De: aplicacionesotic@supertransporte.gov.co <aplicacionesotic@supertransporte.gov.co>
Enviado: jueves, 3 de septiembre de 2026 14:37
Para: Bascula San Onofre1 <basculasanonofre1@rutaalmar.com>; danielaocampo@supertransporte.gov.co <danielaocampo@supertransporte.gov.co>
Asunto: Survey. Aprobación del archivo: ['PECSOEstadistico_M1_Agosto_2026-a2f40113c6dc408e8a3d842317fdf276.csv', 'PECSOEstadistico_M2_Agosto_2026-840c7db96f2f4f3786fc0c247c142e98.csv', 'PECSOEstadistico_SO1_Agosto_2026-ae00c4cc78624435955cc02a33e3130e.csv', 'P...

PRECAUCIÓN CORREO EXTERNO: No haga clic en los enlaces, ni abra archivos adjuntos a menos que reconozca al remitente y tenga conocimiento que el contenido es seguro.

Estimado/a GUSTAVO SALCEDO,

Gracias por diligenciar el formulario Survey.

Nos complace informarle que los siguientes archivos han sido aprobados y cumplen con todos los requisitos:

PECSOEstadistico_M1_Agosto_2026-a2f40113c6dc408e8a3d842317fdf276.csv
PECSOEstadistico_M2_Agosto_2026-840c7db96f2f4f3786fc0c247c142e98.csv
PECSOEstadistico_SO1_Agosto_2026-ae00c4cc78624435955cc02a33e3130e.csv
PECSOEstadistico_SO2_Agosto_2026-c3db96afc28d45a0988b75775233181c.csv
PECSOEstadistico_MC1_Agosto_2026-0895ff5855e1430f8d8107f8d2723072.csv
PECSOEstadistico_MC2_Agosto_2026-53f9ee68864a48f8917ec206550109a8.csv

Agradecemos su trabajo y esfuerzo en el proceso de validación.

Fuente: Reporte de la Concesión Ruta al Mar a la Supertransporte

4.3.3.8. Seguimiento a las acciones, estrategias y gestiones adelantadas por el Concesionario.

Las acciones adelantadas por el Concesionario corresponden, en su mayoría, a campañas de prevención vial, jornadas de sensibilización en seguridad vial y talleres de cultura vial dirigidos a los diferentes actores viales, las cuales se describen en el acápite 4.3.4 – Seguimiento al Convenio DITRA del presente informe.

Adicionalmente, durante el presente periodo, la Interventoría remitió al Concesionario las siguientes comunicaciones, mediante las cuales se solicitó la implementación de medidas correctivas orientadas a la reducción de riesgos de accidentalidad y al fortalecimiento de las condiciones de seguridad vial:

Tabla 4-43. **Relación de comunicaciones para mejorar la seguridad vial**

IDENTIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN	FECHA	PROCEDENCIA	DESTINATARIO	RADICADO ANI	ASUNTO
IPAB-713-2026	3/09/2026	CONSORCIO IPAB	CONCESIÓN RUTA AL MAR S.A.S	20264091141162	Respuesta a comunicación con radicado 48-RUTADCTOELECTRONICOS20260724012589 - Seguimiento a cronograma de reparaciones de pavimento UF 4.1,4.2 y 5.1, Contrato de Concesión IP No. 016 de 2015
IPAB-716-2026	3/09/2026	CONSORCIO IPAB	CONCESIÓN RUTA AL MAR S.A.S	20264091141282	Novedades evidenciadas sobre el corredor vial, afectación al talud de la vía en el PR6+410 y PR11+825 de la UFI 5.1
IPAB-729-2026	4/09/2026	CONSORCIO IPAB	CONCESIÓN RUTA AL MAR S.A.S	20264091151802	Respuesta a sus comunicaciones con radicado 48-RUTADCTOELECTRÓNICOS20260811012735 del 12 de agosto de 2026 con asunto: "Respuesta a la comunicación IPAB-0551-2026 (radicado ANI 20264090960842) - Requerimiento de información y cierre del Plazo de Cura – Estación de Pesaje Manguitos"
IPAB-731-2026	4/09/2026	CONSORCIO IPAB	CONCESIÓN RUTA AL MAR S.A.S	20264091151822	Solicitud de restitución de bandas alertadoras afectadas por actividades de mantenimiento de pavimento en el PR 18+380 de la UFI 3.3 – Tramo Vía El 15 – San Carlos – San Carlos
IPAB-734-2026	7/09/2026	CONSORCIO IPAB	CONCESIÓN RUTA AL MAR S.A.S	20264091152372	Respuesta a la comunicación No.48-RUTADCELECTRONICOS20260723012573 - Auditoría de Seguridad Vial 2025, Aplicación de la Resolución No.20243040022485 de 2024, Sistemas de Contención Vehicular (SCV) y Sección 4.11(f) de la Parte General del Contrato de Concesión No.016 de 2015
IPAB-758-2026	14/09/2026	CONSORCIO IPAB	CONCESIÓN RUTA AL MAR S.A.S	20264091192102	Solicitud Plan de Mejoramiento – Resultados de la encuesta de percepción de satisfacción del servicio prestado – Primer semestre de 2026
IPAB-762-2026	15/09/2026	CONSORCIO IPAB	CONCESIÓN RUTA AL MAR S.A.S	20264091197432	Informe preliminar No.1 de la Auditoría - Inspección de Seguridad Vial de febrero a julio 2026
IPAB-771-2026	17/09/2026	CONSORCIO IPAB	CONCESIÓN RUTA AL MAR S.A.S	20264091213502	Solicitud de ejecución de reparaciones de daños tipo bache en el pavimento, entre el PR 58+730 y el PR 59+180 de la UFI 8.3.
IPAB-773-2026	17/09/2026	CONSORCIO IPAB	CONCESIÓN RUTA AL MAR S.A.S	20264091213652	Solicitud de ejecución de actividades de mantenimiento en paso peatonal del PR1+800 de la UFI 3.1

IDENTIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN	FECHA	PROCEDENCIA	DESTINATARIO	RADICADO ANI	ASUNTO
IPAB-783-2026	17/09/2026	CONSORCIO IPAB	CONCESIÓN RUTA AL MAR S.A.S	20264091214712	Reporte de novedades en el corredor vial – Indicador E13, defensas metálicas en mal estado en la Unidad Funcional 8
IPAB-784-2026	17/09/2026	CONSORCIO IPAB	CONCESIÓN RUTA AL MAR S.A.S	20264091214732	Novedades evidenciadas sobre el corredor vial, afectación al talud de la vía en el PR 56+094 de la UFI 1
IPAB-800-2026	23/09/2026	CONSORCIO IPAB	CONCESIÓN RUTA AL MAR S.A.S	20264091240632	Respuesta a su comunicado 48-147-20260831028436 de fecha 31 de agosto de 2026 con asunto “Respuesta al oficio IPAB-0652-2026 – Novedades evidenciadas en auditorías de sistemas en las estaciones de peaje durante el mes de julio de 2026” y Hallazgos identificados en Auditoría de Sistemas en las Estaciones de Peaje y Pesaje en el mes de agosto de 2026
IPAB-801-2026	23/09/2026	CONSORCIO IPAB	CONCESIÓN RUTA AL MAR S.A.S	20264091240852	Observaciones evidenciadas en inspección a vehículos y equipos DITRA en el mes de septiembre de 2026
IPAB-807-2026	23/09/2026	CONSORCIO IPAB	CONCESIÓN RUTA AL MAR S.A.S	20264091245632	Respuesta a su comunicado No.48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260714012516 de fecha 15 de julio de 2026 cuyo asunto es "Respuesta a comunicación IPAB-0470-2026 con radicado ANI No. 20264090851342 Requerimiento de información y soportes - Evento caída de árbol en la vía Montería – Arbolete”
IPAB-809-2026	24/09/2026	CONSORCIO IPAB	CONCESIÓN RUTA AL MAR S.A.S	20264091251902	Respuesta a su comunicado No.48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260907012963 de fecha 08 de septiembre de 2026 cuyo asunto es: "Resultados del Informe Medición de la Calidad del Servicio primer Semestre 2026”
IPAB-813-2026	28/09/2026	CONSORCIO IPAB	CONCESIÓN RUTA AL MAR S.A.S	20264091263142	Solicitud de ejecución de reparaciones de daños en pavimentos, losas de concreto y bordillos, identificados durante la verificación de la infraestructura a revertir de las áreas de servicio, CCO, estaciones de pesaje y peajes del corredor Antioquia – Bolívar
IPAB-821-2026	30/09/2026	CONSORCIO IPAB	CONCESIÓN RUTA AL MAR S.A.S	20264091278372	Solicitud de información sobre el cumplimiento de la obligación contractual relacionada con la implementación de WEB SERVICES para la consulta de información georreferenciada
IPAB-825-2026	30/09/2026	CONSORCIO IPAB	CONCESIÓN RUTA AL MAR S.A.S	20264091284452	Su comunicado 48-147-20260911028441 de fecha 16 de septiembre de 2026, con asunto “Respuesta comunicación IPAB-0101-2026 de fecha 7 de marzo de 2026 con radicado ANI No. 20264090386392 “Solicitud de ejecución de reparaciones en estructura de drenaje del PR1+998 de la UFI 5.1””

Fuente propia – Consorcio IPAB

4.3.4. Seguimiento a Convenio DITRA

Teniendo en cuenta que, al cierre del presente informe, no se había realizado la reunión con la Dirección de Tránsito y Transporte (DITRA) correspondiente al mes de septiembre, toda vez que esta se lleva a cabo durante el mes siguiente al periodo evaluado, se

presenta en el presente informe la información correspondiente a las reuniones de seguimiento al Convenio de Cooperación con la DITRA correspondiente al mes de agosto de 2026, la cual fue realizada el 21 de septiembre de 2026. En dicha reunión se socializaron diversos temas que se describen a continuación:

Tabla 4-44. Seguimiento a Convenio DITRA

Actividad	Responsable	Frecuencia	Observaciones
Campañas de Seguridad Vial	Concesión - DITRA	Programada	Durante el mes de agosto se realizaron un total de 2 actividades encaminadas a la prevención de siniestros viales, en el cual se beneficiaron 300 actores viales entre ellos motociclistas, conductores y peatones. A continuación, se describen las actividades ejecutadas:  Campañas de cultura vial 

<table>
<tr><th>Actividad</th><th>Responsable</th><th>Frecuencia</th><th>Observaciones</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>A continuación, se describen las actividades ejecutadas:

<table>
<tr><th colspan="7">CAMPAÑAS DE CULTURA VIAL</th></tr>
<tr><th>N°</th><th>FECHA</th><th>TEMA</th><th>MUNICIPIO /LUGAR</th><th>GRUPO DE INTERÉS</th><th>UFI</th><th>N° DE ASISTENTES</th></tr>
<tr><td>1</td><td>06/08/ 2026</td><td>Prevención de la fatiga durante la conducción / Gestión de la velocidad segura</td><td>San Onofre, PR 96+00</td><td>Actores viales</td><td>8.2</td><td>200</td></tr>
<tr><td>2</td><td>15/08/ 2026</td><td>Tipos de señales de tránsito/ Uso adecuado de los EPP</td><td>San Antero</td><td>Actores viales</td><td>7.2</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="2">TOTAL, DE ACTIVIDADES Y PARTICIPANTES</td><td colspan="3">2</td><td>300</td></tr>
</table>

Para el mes de agosto se continúan con las actividades en las unidades funcionales enfatizando en aquellas con mayores índices de accidentalidad, fortaleciendo los temas de seguridad para los diferentes usuarios de la vía y comunidad del AID.</td></tr>
<tr><td>Gestión ante los vendedores ambulantes en el</td><td>Concesión – Interventoría - DITRA</td><td>Programada</td><td>Gestión ante presencia de vendedores ambulantes en el derecho de vía.</td></tr>
</table>

Actividad	Responsable	Frecuencia	Observaciones
derecho de vía.			Durante el mes de agosto -2026, se continuo con las actividades del programa de Apoyo a la Gestión Institucional. Debido a los recorridos realizados en el corredor vial, se logaron identificar algunas perturbaciones en el derecho de vía y de las cuales, **Se realizaron siete (7) notificaciones a entidades municipales**: • 04-agosto-2026: Oficio querella policiva al municipio de Cereté, solicitud de restitución del espacio público, UFI 3.4 PR 27+860- PR 27+720 (instalaciones de contadores de gas), Radicado: 20260804012677 • 02-agosto-2026: Querella policiva emitida al municipio de Coveñas, donde se solicita la recuperación y restitución del espacio público, UFI 7.2 PR 3+100 (taponamiento de cuentas) Radicado: 2026080500212700. • 10-agosto-2026: Oficio emitido al municipio de Tolú, solicitud de recuperación del espacio público, UFI 7.3 PR 4+655, (Box Colmatado); Radicado: 20260810012714. • 10-agosto-2026: Oficio emitido al municipio de San Antero, solicitud de recuperación del espacio público, UFI 6.2 PR 20+220, (chaza); Radicado: 20260810012718. • 19-agosto-2026: Oficio emitido al municipio de San Pelayo, donde se solicitó restitución del espacio público en la UFI 2.1 PR 14+186- PR 14+291 (vallas publicitarias); Radicado: 20260819012796. • 19-agosto-2026: Oficio emitido al municipio de María la Baja, donde se solicitó restitución del espacio público en la UFI 8.3 PR 23+700 (construcción acceso); Radicado: 20260819012798. • 31-agosto-2026: Oficio emitido al municipio de San Carlos, donde se solicitó restitución del espacio público en la UFI 3.2 PR 5+350 (chaza); Radicado: 20260831012908.

Actividad	Responsable	Frecuencia	Observaciones
			Se continua el trabajo articulado con el área de operaciones y el acompañamiento de la policía, para lograr recuperaciones de ocupaciones identificadas en el derecho de vía y programaciones con las autoridades municipales de diligencias policivas en el mes de junio de 2026.
Vehículos Inmovilizados báscula manguitos	DITRA	Diaria	Agradecemos continuar con las gestiones por parte de la Policía de Carreteras para el traslado de los vehículos que permanecían inmovilizados en la báscula de Manguitos, correspondientes a: 3 camionetas. 4 automóviles. 4 tractocamiones. Agradecemos su colaboración y apoyo en el desarrollo de esta gestión.  Bascula Manguitos.  Bascula Manguitos.
Presencia de DITRA en las Estaciones de Pesaje.	DITRA – Concesión	Diaria	Se solicita presencia de DITRA en las Estaciones de Pesaje de San Onofre y Mata de Caña. Durante el mes de agosto disminuyen los porcentajes de presencia comparado con el mes anterior.

Actividad	Responsable	Frecuencia	Observaciones
			Continúan los casos de vehículos con sobrepesos que quedan sin el respectivo comparendo; adicionalmente vemos la disminución de los vehículos que se encuentran eludiendo las Básculas. A continuación, se relacionan por Estación de Pesaje el total la problemática planteada:

EVASORES BASCULAS CORUMAR 2026				
MES	BASCULA SAN ONOFRE	BASCULA MATA DE CAÑA	BASCULA MANGUITOS	TOTAL
ENERO	223	727	110	1060
FEBRERO	222	553	102	877
MARZO	242	651	80	973
ABRIL	157	133	121	411
MAYO	137	272	100	509
JUNIO	159	184	128	471
JULIO	283	518	117	918
AGOSTO	131	428	79	638
			TOTAL EVASORES	5857

RESUMEN TOTAL VEHICULOS FUGADOS 2025								
MES	BASCULA SAN ONOFRE		BASCULA MATA DE CAÑA		BASCULA MANGUITOS		TOTAL FUGADOS	TOTAL DEVUELTOS
	FUGADOS	DEVUELTOS	FUGADOS	DEVUELTOS	FUGADOS	DEVUELTOS		
ENERO	199	0	83	10	6	0	288	10
FEBRERO	213	2	57	2	8	0	278	4
MARZO	178	0	56	1	4	0	238	1
ABRIL	201	0	58	1	12	0	271	1
MAYO	134	0	11	0	8	1	153	1
JUNIO	185	0	1	0	7	0	193	0
JULIO	330	0	109	0	4	0	443	0
AGOSTO	200	0	93	0	4	2	297	2
							TOTAL 2161	TOTAL 19

SOBREPESOS SIN COMPARENDOS AGOSTO 2026				
BASCULA	TOTAL SOBREPESOS	CON COMPARENDO	SIN COMPARENDO	%
MATA DE CAÑA	15	6	9	60.00
SAN ONOFRE	26	24	2	7.69
MANGUITOS	52	49	3	5.8

<table>
<tr><th>Actividad</th><th>Responsable</th><th>Frecuencia</th><th>Observaciones</th></tr>
<tr><td>Actividades desarrolladas por Ditra en el presente mes</td><td>DITRA</td><td>Diaria</td><td>

Actividades mes de agosto 2026

OBLIGACIÓN 1). Planear, coordinar y ejecutar las actividades y operativos de control y prevención necesarios para garantizar las condiciones de movilidad y seguridad en los tramos viales descritos en el objeto del presente convenio.

Durante el mes de agosto del presente año, se realizaron actividades de prevención y control en el tramo vial concesionado a cargo de la concesión Ruta al Mar, jurisdicción de los departamentos de Córdoba, Bolívar y Sucre, donde se impartieron recomendaciones de seguridad vial, de la siguiente manera:

- ✓ Instalación de áreas de prevención en puntos críticos de accidentalidad
- ✓ Utilización de los elementos de seguridad (cinturón y casco de seguridad)
- ✓ Conducción a la defensiva
- ✓ Respeto por las normas y señales de tránsito
- ✓ Mantener los documentos del vehículo y personal vigentes.
- ✓ Conducir a la defensiva
- ✓ Informar cualquier hecho a las líneas de atención de la Policía Nacional, numeral 767 y 123, para su oportuna atención.
- ✓ No realizar maniobras que pongan en peligro a sí mismo y a los demás actores viales.
- ✓ No conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes.
- ✓ No conducir con exceso de velocidad

<table>
<tr><th colspan="3">Control de exceso de velocidad, infracción C29</th></tr>
<tr><th>TRAMO</th><th>PR</th><th>COMPARENDOS</th></tr>
<tr><td>TR-Tolú-pita</td><td>KM-16+100-0-0</td><td>3</td></tr>
<tr><td>TR-Tolú-pita</td><td>KM-3+100-0-0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>V-Lorica - San Onofre</td><td>KM-65-0-0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>V-Monteria - Lorica</td><td>KM-30</td><td>3</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td></td><td>8</td></tr>
</table>

</td></tr>
</table>

Actividad	Responsable	Frecuencia	Observaciones
			   **OBLIGACIÓN 2). Desarrollar actividades de disuación, investigación e inteligencia para contrarrestar actos delictivos en el tramo vial objeto del convenio.**

Actividad	Responsable	Frecuencia	Observaciones
			Se realizó un despliegue del componente humano y logístico con el propósito de contrarrestar los delitos de impacto que afectan la cadena logística del transporte y la infraestructura vial, por medio de la instalación de áreas de prevención, cubrimiento de puntos críticos, plan de identificación y registros de personas y vehículos





OBLIGACIÓN 4). Capacitar al personal destinado para el cumplimiento del objeto del convenio.

El personal policial que pertenece a los tramos viales y/o unidades funcionales a cargo del concesionario para los departamentos

Actividad	Responsable	Frecuencia	Observaciones
			Córdoba, Bolívar y Sucre, se encuentra capacitado para cumplir con las funciones designadas en los tramos viales concesionados, de acuerdo a las tablas TOP de la Policía Nacional cargos y perfiles por competencias, así mismo dentro de los planes necesidades de cada seccional en materia de capacitación fue solicitado para la vigencia 2026, cursos para obtener y mantener la idoneidad en operación de equipos alcohosensores y radares de velocidad. **OBLIGACIÓN 6) dar uso adecuado a los bienes entregados por el CONCESIONARIO, respondiendo bajo su cuenta y riego por daño o deterioro derivado de su mal uso o manejo irresponsable. En estos casos la POLICÍA NACIONAL-DIRECCIÓN de TRÁNSITO y TRANSPORTE adelantará la investigación administrativa en los términos establecidos en la Ley 1476 de 2011 "por la cual se expide el régimen de responsabilidad administrativa por perdida o daño de bienes de propiedad o al servicio del Ministerio de Defensa Nacional, sus entidades administrativas o vinculadas o la fuerza pública".** Para el mes de agosto no se presentaron casos por daño o deterioro derivado de su mal uso o manejo irresponsable de los elementos entregados por el concesionario para la prestación del servicio. **OBLIGACIÓN 7) Garantizar que el personal POLICÍA que opere los vehículos, equipos y elementos entregados por el CONCESIONARIO, cuente con la idoneidad y/o la certificación de operación de los elementos entregados y asista a capacitación (es) que programe el CONCESIONARIO o las entidades especializadas sobre la correcta manipulación de los mismos, observando en su operación las recomendaciones realizadas.** El personal uniformado que labora en jurisdicción de los departamentos de Córdoba, Bolívar y Sucre que conducen los vehículos y motocicletas entregados por el concesionario, cuentan con licencia de conducción vigente de acuerdo a la categoría establecida, así mismo la idoneidad para la operación del equipo de medición Alcohosensor, los cuales están debidamente certificados. **OBLIGACIÓN 10) utilizar los bienes suministrados solo para los fines y objeto del presente contrato del presente convenio, almacenándolos cuando no estén siendo utilizados, bajo su cuenta y riesgo, en el espacio que el concesionario facilite a la Policía Nacional en el centro de control de operaciones (CCO) del**

Actividad	Responsable	Frecuencia	Observaciones
			CONCESIONARIO cuando este se encuentre activo, o en el sitio que este disponga, pero siempre manteniéndolos dentro del corredor vial CONCESIONADO, exceptuando los casos en que por motivos constitutivos de casos fortuitos o fuerza mayor no puedan allí mantenerse. Los elementos logísticos y tecnológicos entregados por el concesionario vial Ruta al Mar S.A.S, para la prestación del servicio de policía, son utilizados únicamente en los tramos viales concesionados de los departamentos de Córdoba, Bolívar y Sucre, en el momento que se requiera realizar alguna excepción esta supervisión informará al concesionario para su autorización. **OBLIGACIÓN 11) restituir los bienes entregados en desuso una vez se efectué su reposición; a su vez se deberá informar por escrito al CONCESIONARIO de cualquier hecho o novedad (daño o hurto) de los bienes. Este informe deberá ser remitido a más tardar dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al momento del suceso.** Para el mes de agosto no se presentó daño o hurto de los bienes entregados por el concesionario al servicio. **OBLIGACIÓN 13). Controlar y gestionar de acuerdo con la informacion suministrada por el CONCESIONARIO y de acuerdo a la normatividad vigente, la recuperacion de las invasiones o perturbaciones a derecho de via existentes y en general y no permitir la instalacion o invasion de nuevos espacios o terrenos de las zonas de reserva o derecho de via.**

Actividad	Responsable	Frecuencia	Observaciones
			Se realizó el acompañamiento por parte del personal policial a los funcionarios de la concesión cuando fue requerido, para el apoyo en los diferentes corredores viales y/o unidades funcionales a cargo del concesionario, orientado a garantizar el control al derecho de vía, así como, actividades de acercamiento a la comunidad con el fin de socializar la importancia de no instalar elementos que disminuyan la visibilidad o pongan en riesgo la integridad de los usuarios viales, por la ocupación de la malla vial para estacionarse y reducir la capacidad de la vía.  **OBLIGACIÓN 18). Entregar dentro de los dos (2) días calendario de cada mes al CONCESIONARIO, un informe que contenga la relación de los accidentes ocurridos y las infracciones a las cuales se les haya levantado comparendo en el proyecto durante el mes anterior.**  Outlook ENVÍO ESTADÍSTICA ACCIDENTALIDAD Y COMPARENDOS CONCESIÓN RUTA AL MAR - AGOSTO 2026 Desde DITRA DESUC-PLANE <ditra.setradesuc-plane@policia.gov.co> Fecha Jue 3/09/2026 3:01 PM Para Notificaciones Judiciales Ruta al Mar <notificacionesjudiciales@rutaalmar.com> 1 archivo adjunto (52 KB) ESTADÍSTICA ACCIDENTALIDAD Y COMPARENDOS CONCESION RUTA AL MAR MES AGOSTO 2026.xls;

Actividad	Responsable	Frecuencia	Observaciones
			El día 03/09/2026 fue enviada al concesionario en formato Excel, información discriminada de la accidentalidad y aplicación de la norma del mes de agosto 2026, se incluye las jurisdicciones de Córdoba, Bolívar y Sucre, a través del correo electrónico notificacionesjudiciales@rutaalmar.com. **OBLIGACIÓN 20). Apoyar al concesionario en las actividades relacionadas con los programas de capacitación, educación y concientización en seguridad y cultura vial a realizarse con los diferentes usuarios de la vía y la comunidad aledaña al proyecto.** Durante el mes de agosto del presente año se realizaron actividades de prevención con el concesionario en pro de la seguridad vial, donde se impartieron recomendaciones de seguridad vial a los actores viales, recalcando el no conducir bajo los efectos de embriaguez, exceso de velocidad, respeto por las normas y señales de tránsito. 
Solicitud de controles de velocidad.	DITRA – Concesión	Diaria	En atención al Convenio Interadministrativo de Cooperación suscrito el 09 de agosto de 2016 entre el Concesionario y la Policía Nacional, solicitamos de manera comedida la realización de actividades y operativos de control en el corredor concesionado. A continuación, se

Actividad	Responsable	Frecuencia	Observaciones
			detallan los sectores críticos del Proyecto en los que se requiere su intervención: • **Controles de velocidad, Campañas y Controles:** ✓ Planeta Rica – Montería UF1_PR29+000 – PR30+000 ✓ Planeta Rica – Montería UF1_PR41+000 – PR42+000 ✓ Planeta Rica – Montería UF1_PR51+000 – PR52+000 ✓ Planeta Rica – Montería UF1_PR52+000 – PR53+000 ✓ Planeta Rica – Montería UF1_PR61+000 – PR62+000 ✓ Segunda Calzada Cereté – Lorica UF2_PR30+000 – PR32+000 ✓ Segunda Calzada Cereté – Lorica UF2_PR37+000 – PR38+000 ✓ Segunda Calzada Cereté – Lorica UF2_PR41+000 – PR42+000 ✓ Tolú – San Onofre UF 7.3 PR 11+000 – PR 12+000. En atención a la solicitud presentada por la Concesión respecto a la implementación de controles de velocidad en el tramo 15 – Montería, específicamente entre los PR 42+000 y 43+000, con énfasis en el PR 42+750 correspondiente a la UFI 4.2 (sector Pueblito Cordobés), se informa que la Seccional de Tránsito y Transporte viene realizando de manera permanente actividades de control y prevención en el sector, orientadas a verificar el cumplimiento de los límites de velocidad y fortalecer las condiciones de seguridad vial. Estas acciones operativas buscan mitigar los riesgos asociados al exceso de velocidad y prevenir la ocurrencia de siniestros viales en este corredor.
Área de equipos	Concesión-DITRA	Programada	**1. Inspección de los equipos y vehículos de la Policía.** La revisión trimestral correspondiente al mes de septiembre de los elementos y vehículos entregados a DITRA se realizó en las fechas programadas, identificándose las siguientes novedades: ✓ Camioneta de placas KZR-385: baliza fuera de servicio. ✓ Camioneta de placas KZR-391: baliza fuera de servicio y fuga de aceite en el motor. ✓ Alcohosensores: se encuentran con el proveedor Diescon, en proceso de reparación y calibración.

Actividad	Responsable	Frecuencia	Observaciones
			2. Líneas corporativas entregados a Ditra. De las 7 líneas celulares corporativas entregadas en su momento a la DITRA, con el fin de garantizar la adecuada atención de incidentes, accidentes y demás novedades que se presentaran en el tramo concesionado, el día 18 de septiembre se realizó la devolución de 6 equipos, acompañados de únicamente de 2 cargadores. Durante la recepción, se evidenció que 2 celulares presentan las cámaras partidas y se encuentran descargados. Actualmente, los equipos están en revisión por parte del área de Sistemas de la concesión, con el fin de verificar su estado y funcionamiento. Queda pendiente la devolución de 1 equipo celular y la verificación del estado de los elementos recibidos.   Celulares corporativos Celulares corporativos **3. Estado del otrosí del convenio con DITRA**

Actividad	Responsable	Frecuencia	Observaciones
			Se informa que el otrosí al convenio suscrito con DITRA se encuentra elaborado y listo para su formalización. A la fecha, se encuentra pendiente únicamente la firma por parte de DITRA. **4. Acceso remoto al sistema de cámaras.** Se informó que, para habilitar el acceso remoto de DITRA al sistema de cámaras de la Concesión, se requiere disponer de un equipo al cual se pueda acceder de manera remota para realizar la instalación y configuración del agente VPN y del software de visualización. Una vez efectuada la instalación y validado el correcto funcionamiento del sistema, se suministrarán las credenciales correspondientes y se remitirá a DITRA un correo con las instrucciones para el acceso y consulta de las cámaras del proyecto.
Pago de auxilios al decreto vigente.	Concesión	Programada	El Concesionario se encuentra cumpliendo según decreto vigente, con el pago del 100% de los viáticos.

Fuente: Reunión de seguimiento a convenio DITRA

La reunión de seguimiento del mes de septiembre de 2026 será programada por el Concesionario para la segunda quincena del mes de octubre de 2026.

Con base en la información reportada por la anterior Interventoría, en su Informe Mensual No. 122 correspondiente al mes de enero de 2026, el cual fue remitido al Consorcio IPAB por la Agencia Nacional de Infraestructura mediante comunicado No. 20263050052951 del 17 de febrero de 2026, a continuación, se presenta el seguimiento a la ejecución del convenio DITRA.

El día 10 de junio de 2022, se firmó Otrosí del convenio de Cooperación suscrito el 9 de agosto de 2016, entre la Concesión y la Policía Nacional hasta el 24 de enero de 2024.

La concesión mediante comunicado 48-147-20230801027774 y alcance mediante oficio 20231006002637 F de fecha 06/10/2023, manifestó al Ministerio de Defensa Nacional, su interés de que sea prorrogado el Convenio de Cooperación hasta el día 31 de enero de 2025**,** mediante comunicado 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20240226004083 de fecha 26 de febrero de 2024, el Concesionario remitió a la Interventoría con copia a la ANI, el otro si al convenio DITRA con el nuevo plazo hasta el 31/01/2025.

Mediante comunicado 48-RUTADCTOELECTRONICOS- 20241028006736 de fecha 28 de octubre de 2024, la Concesión Ruta al Mar, solicitó al Ministerio de Defensa, la cuarta prórroga al convenio DITRA hasta el día el 2 de septiembre de 2025, cuya prórroga fue firmada el día 30 de enero de 2025.

El 11 de marzo de 2025, se realizó reposición por vida útil de 8 años y el Concesionario entregó 12 motocicletas a la DITRA.

Mediante comunicado 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20250703009192 de fecha 03/07/2025, el Concesionario solicitó a la Policía Nacional de Colombia, la 5ta prórroga al Convenio de Cooperación suscrito entre La Policía Nacional de Colombia y el Concesionario Ruta Al Mar S.A.S, dado que el 02 de septiembre de 2025 se vence el convenio actual, esta quinta prórroga se solicitó hasta el 26 de septiembre de 2026.

A través del oficio 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20250901009787 recibida el día 03 de septiembre de 2025, el Concesionario remitió a la ANI y a la anterior Interventoría, una copia de la quinta prórroga del convenio con la DITRA, la cual va hasta el día 22 de septiembre de 2026.

Mediante comunicado No. 48-RUTADCTOELECTRONICOS 20260820012811, de fecha 21 de agosto de 2026, el Concesionario solicitó al Ministerio de Defensa Nacional la sexta (6.ª) prórroga del Convenio de Cooperación suscrito entre la Policía Nacional de Colombia y el Concesionario Ruta al Mar S.A.S. A la fecha de cierre del presente informe, no se ha recibido respuesta por parte del Ministerio respecto de la solicitud presentada.

Por medio del comunicado No. 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260930015087, de fecha 1 de octubre de 2026, el Concesionario remitió la sexta prórroga al Convenio de Cooperación suscrito con la DITRA, cuya vigencia se extiende desde el 23 de septiembre de 2026 hasta el 1 de febrero de 2027**.**

En la siguiente tabla se relaciona el convenio inicial suscrito y las prórrogas realizadas al mencionado convenio con la DITRA:

Tabla 4-45. Estado Convenio DITRA

FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	DURACIÓN	ESTADO
lunes, 12 de diciembre de 2016	domingo, 12 de diciembre de 2021	Convenio Inicial	5 años	Cumplido
lunes, 13 de diciembre de 2021	domingo, 12 de junio de 2022	Prorroga No. 1	6 meses	Cumplido
lunes, 13 de junio de 2022	miércoles, 24 de enero de 2024	Prorroga No. 2	19,7 meses	Cumplido
jueves, 25 de enero de 2024	viernes, 31 de enero de 2025	Prorroga No. 3	12,4 meses	Cumplido
sábado, 1 de febrero de 2025	martes, 2 de septiembre de 2025	Prorroga No. 4	7,1 meses	Cumplido
miércoles, 3 de septiembre de 2025	martes, 22 de septiembre de 2026	Prorroga No. 5	12,8 meses	Cumplido
miércoles, 23 de septiembre de 2026	lunes, 1 de febrero de 2027	Prorroga No. 6	4,3 meses	Vigente

Fuente: Informe Mensual No. 122 del Consorcio CR Concesiones – Actualizado por Consorcio IPAB

En el Apéndice Técnico 2 del Contrato de Concesión No. 016 de 2015, en la sección 3.3.9.1 se establece el Protocolo de Coordinación con la Policía de Carreteras, así mismo en la sección 3.3.9.2 se relacionan los elementos que el Concesionario debe entregar a la policía de carreteras, en etapa preoperativa y en etapa operativa, como se cita a continuación:

"3.3.9.1 Protocolo de Coordinación con la Policía de Carreteras

El Concesionario establecerá un protocolo de coordinación con la Policía de Carreteras, con objeto de que ésta pueda desempeñar sus funciones conforme a la Ley Aplicable y a los convenios que tenga suscritos o suscriba en un futuro con la ANI.

El Protocolo a ser suscrito entre la Policía de Carreteras y el Concesionario deberá contemplar y desarrollar las siguientes actividades, para que se desarrollen de manera coordinada.

- *Realización eficiente de actividades y operativos de control para garantizar las condiciones de movilidad y seguridad vial, en toda la(s) vía(s) concesionada, efectuando reuniones de coordinación periódicas con la Policía de Carreteras para instrumentar los operativos de control del tránsito, velocidad y embriaguez y desarrollar los programas y campañas tendientes a la implementación y ejecución del programa de cultura vial.*

- *Coordinación en la atención de cualquier novedad o evento que ocurra en la vía, tales como accidentes, deslizamientos, desbordamientos de aguas, derrame de sustancias peligrosas, y en general cualquier hecho que pueda afectar el funcionamiento normal y adecuado de la vía. Se preparará un registro escrito de cada uno de estos eventos para efectos de antecedentes y/o consulta.*

- *Suministro a la Policía de Carreteras, o a quien ésta delegue, la información necesaria y oportuna para el desarrollo de los operativos de control y seguimiento del tránsito, control del peso de vehículos de carga, evasión de peaje, control de embriaguez y prevención de accidentalidad.*

- *Suministro del servicio de carro taller y ambulancia para atender los requerimientos del usuario y de los funcionarios de la Policía de Carreteras, en las condiciones previstas en este Contrato.*

- *Suministro del servicio de cama baja y grúa de alta capacidad para trasladar vehículos involucrados en accidentes, inmovilizados por infracciones de tránsito y transporte,*

por requerimiento judicial y/o por cualquier situación que considere la Policía de Carreteras, en las condiciones previstas en este Contrato.

- *Realización de las visitas necesarias para el seguimiento, la inspección y/o supervisión de los bienes entregados a la Policía de Carreteras.*

- *Garantizar a la Policía de Carreteras, en el momento en que lo requiera, el acceso a los sistemas de comunicación y plataformas informáticas instaladas por el Concesionario relacionadas con el control y seguimiento del tránsito y la seguridad vial.*

- *Coordinación con la Policía de Carreteras para el manejo de la información de los mensajes variables a ser transmitidos en los paneles que administrará el Concesionario, con objeto de dar prelación a la información relacionada con el control y seguimiento del tránsito y la seguridad vial de la(s) vía(s) concesionada.*

- *Asumir los costos de las pólizas de los equipos y bienes sujetos de cobertura, así como los costos de mantenimiento de los equipos y elementos que se entreguen a la Policía de Carreteras. Igualmente asumirá el costo del combustible necesario para el funcionamiento de dichos equipos, lo cual podrá ser supervisado por el Concesionario de acuerdo con la distribución de patrullas y motos en la(s) vía(s), para lo cual se requerirá coordinación con la Policía de Carreteras.*

El Concesionario deberá asegurar que los equipos y elementos para el control y seguimiento del tránsito que él instale y que sean adicionales a los entregados a la Policía de Carreteras sean compatibles con estos últimos, de tal manera que la Policía de Carreteras pueda hacer uso de ellos en caso necesario.

El protocolo definirá el apoyo logístico que la Policía de Carreteras brindará para la realización de operativos de control, principalmente de velocidad en concordancia con las señales de tránsito, de embriaguez y de la aplicación de las metodologías de prevención de accidentes. Estos operativos se deberán llevar a cabo como mínimo durante algunas horas del Día de semana y en los fines de semana y en especial los

festivos a lo largo del día. Los operativos de medición de niveles de alcohol deberán coordinarse con la Policía de Carreteras.

El Concesionario deberá contar con personal en el Centro de Control de Operación, de acuerdo con lo definido en el protocolo.

En el evento en que, pasados treinta días desde la suscripción del Acta de Inicio no hubiere sido factible la suscripción del Protocolo, ANI se incorporará en el proceso de diálogo para establecer las condiciones definitivas del Protocolo.

3.3.9.2 Entrega de Bienes a la Policía de Carreteras

El Concesionario estará obligado a entregar a la Policía de Carreteras los bienes, insumos y recursos que se especifican a continuación: La entrega de los bienes, equipos e insumos necesarios para que la Policía de Carreteras pueda desempeñar sus funciones en las vías que fueron entregadas al Concesionario deben ser a más tardar 3 meses después de la suscripción del Acta de Inicio. Para vías nuevas esta entrega se hará con el Acta de Terminación de la Unidad Funcional.

Tabla 4-46. Equipo mínimo a ser puesto a disposición de la policía de Carreteras

Tabla 1 - Equipo mínimo a ser puesto a disposición de la Policía de Carreteras

DESCRIPCION	UNIDAD	CANT ETAPA PROPERAT	CANT ETAPA OPERAT	VIDA UTIL
VEHICULOS Y MOTOS				
Patrulla tipo panel	UN	1	2	5
Patrulla 4x4	UN	2	4	5
Motos 650 Enduro	UN	12	24	4
ELEMENTOS VEHICULOS Y MOTOS				
Alistamiento Patrullas	UN	3	6	5
Alistamiento de Motos	UN	12	24	4
DOTACION LOGÍSTICA PERSONAL DITRA				
Cascos Abatibles	UN	24	48	1
Chalecos Reflectivos	UN	30	60	1
Impermeables	UN	30	60	1
Brazaletes	UN	30	60	1
Guantes de Regulación	UN	30	60	1
Guantes de conducción para motocicleta	UN	30	60	1
Chaquetas Reflectivas	UN	30	60	1
Gafas	UN	30	60	1
Elementos de protección personal según ficha técnica 1 (coderas, rodilleras, guantes, canilleras) por cada policía	UN	30	60	1
SISTEMAS DE CONTROL DE TRAFICO				
Tableros Luminosos Mensaje (Móviles)	UN	1	1	5
ITS-Tableros de Información	UN	1	1	5
Cámara de Seguridad y Accidentalidad	UN	1	1	3
Radar con Cámara lectora de velocidad e impresora	UN	1	1	3
Alcohosensores	UN	1	1	5

DESCRIPCION	UNIDAD	CANT ETAPA PROPERAT	CANT ETAPA OPERAT	VIDA UTIL
SEÑALIZACION VIAL				
Kit de puesto de control según ficha técnica	UN	1	1	1
Paletas	UN	15	30	1
Carpas	UN	1	1	1
Bastones luminosos - Linternas	UN	15	30	1
MEDIOS TECNOLÓGICOS				
Comparenderas electrónicas (CAT) con servicio de datos y voz según ficha técnica	UN	3	6	1
Computador portátil con internet	UN	2	4	5
Impresoras (MULTIFUNCIONAL)	UN	1	1	5
Radios de comunicación institucionales	UN	15	30	5
Sistema de perifoneo	UN	1	1	3
Planta eléctrica 3KVA	UN	1	1	5
Computadores de mesa	UN	1	1	5
OTROS EQUIPOS				
Televisores led de 47"	UN	1	1	5
Reproductor DVD (Blue-ray)	UN	1	1	5
Difusión, publicación e impresos	un	1	1	Anual
ELEMENTOS DE OFICINA				
Escritorio	UN	1	1	3
Silla ergonómica	UN	1	1	3
Sillas asistenciales	UN	2	2	3
Archivador	UN	1	1	3
Papelería y suministro, resmas de papel, cartucho para impresora y mantenimiento de las mismas, esferos, lápices, cosedoras y suministro, perforadoras, guillotina, mensualmente.	UN	1	1	Mensual
OTROS ELEMENTOS				
Mesas plásticas	UN	1	1	3
Sillas plásticas	UN	12	24	3

Fuente: Apéndice Técnico 2 Contrato de Concesión

Mediante oficio N° S-2016-004497/DITRA-PLANE-60 de fecha 09 de marzo de 2016, DITRA remitió al Concesionario la tabla de los elementos mínimos requeridos por esa Dirección para el control vial del tramo concesionado, al cual la Concesionaria manifestó su conformidad.

Mediante OTROSÍ No. 5 de fecha 24 de mayo de 2016, celebrado entre la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI – y la sociedad concesión Ruta al Mar S.A.S – CORUMAR SAS, se modificó la tabla 1 correspondiente a equipo mínimo a ser puesto a disposición de la policía de carreteras, quedando de la siguiente manera:

Tabla 4-47. Equipo mínimo a ser puesto a disposición de la policía de Carreteras

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT ETAPA PREOPERATIVA	CANT ETAPA OPERATIVA	VIDA ÚTIL
VEHICULOS Y MOTOS				
Patrulla Tipo Panel GPS + Alistamiento	UN	0	1	5
Camioneta Con Baliza Alto Parlante 4 x 4 + Alistamiento	UN	2	4	5
Motocicletas Entre 650 c.c. y 750 c.c.Tipo Enduro + Alistamiento	UN	12	24	4
TIC – TECNOLOGÍAS DEINFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
Radios de Comunicación Institucionales	UN	13	30	7
Camaras PersonalesTipo Monofono	UN	17	34	5
Sistemas de Perifoneo	UN	1	1	3
Computadores de Mesa	UN	1	2	5
Computadores Portátiles con Internet	UN	2	4	5
Impresoras Multifuncionales	UN	1	2	5
Planta Eléctrica de 3KVA	UN	1	1	5

Fuente: Otro si No. 5 del Contrato de Concesión 016 de 2015

Tabla 4-48. Equipo mínimo a ser puesto a disposición de la policía de Carreteras

Comporenderas Electrónicas (CAT) con Servicio de Datos y Voz Según Ficha Técnica - Servicio Mensual $110.000 * año	UN	7	10	1
COMPONENTE INVESTIGACIÓN CRIMINAL				
Kits de Criminalistica	UN	1	1	1
Elementos y Suministros de Criminalistica	UN	1	1	1
Kit de Iluminación Portátil	UN	1	1	3
SEÑALIZACIÓN VIAL				
Kit Puesto de Control según ficha técnica	UN	3	4	1
Paleta Pare-Siga	UN	8	24	1
Bastones Luminosos Linternas	UN	8	24	1
Carpas 4x4 mts.	UN	1	1	1

Fuente: Otro si No. 5 del Contrato de Concesión 016 de 2015

Tabla 4-49. Equipo mínimo a ser puesto a disposición de la policía de Carreteras

EQUIPOS Y ELEMENTOS DE OFICINA				
Escritorios	UN	1	1	3
Silla Ergonómicas	UN	1	1	3
Silla Asistenciales	UN	2	2	3
Archivador	UN	1	1	3
Papelería y Suministros Mensual $100.000 * cada año	UN	1	1	1
SISTEMAS DE CONTROL DE TRÁFICO				
Tableros Luminosos de Mensajes (móviles) 3.2 mt x 2mt	UN	1	1	5
Cámara Panorámica de Seguridad y Accidentalidad	UN	1	2	3
Alcoholsensores (de acuerdo a especificaciones DITRA)	UN	3	4	5
Radares con Cámara Lectora de Velocidad-Impresora	UN	3	3	3
DOTACIÓN LOGISTICA PERSONAL DITRA				
Chalecos Antibalas	UN	17	34	5
Cascos Blindados	UN	17	34	5
Gafas Antiesquirla	UN	17	34	1
Elementos de Protección Personal (coderas, rodilleras, guantes, canilleras)	UN	17	34	1
Impermeables	UN	17	34	1
Brazaletes	UN	17	34	1
Guantes de Regulación	UN	17	34	1
Cascos Abatibles	UN	17	34	1
ELEMENTOS DE CAPACITACIÓN Y PREVENCIÓN				
Televisores LED 47"	UN	1	1	5
Reproductor de DVD Blue Ray	UN	1	1	5
Difusión, Publicaciones e Impresos (anual)	UN	1	1	1
Mesas Plásticas	UN	1	1	3
Sillas Plásticas	UN	12	24	3

Fuente: Otro si No. 5 del Contrato de Concesión 016 de 2015

A continuación, se presenta el seguimiento a la entrega de elementos a la DITRA y reposición por vida útil de 1, 2, 3, 4, 5 y 7 años, con las fechas de entrega de cada elemento:

Tabla 4-50 Seguimiento reposición de elementos a la DITRA por vida útil de 1 año

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD ETAPA PREOPERATIVA OTROSÍ 5	CANTIDAD ENTREGADA	VIDA ÚTIL OTROSÍ 5 (AÑOS)	FECHA PRIMERA ENTREGA	REPOSICIÓN 1 (DIC 2017)	REPOSICIÓN 2 (DIC 2018)	REPOSICIÓN 3 (DIC 2019)	REPOSICIÓN 4 (DIC 2020)	REPOSICIÓN 5 (DIC 2021)	REPOSICIÓN 6 (DIC 2022)	REPOSICIÓN 7 (DIC 2023)	REPOSICIÓN 8 (DIC 2024)	REPOSICIÓN 9 (DIC 2025)
Comparenderas Electrónicas (CAT) con Servicio de Datos y Voz Según Ficha Técnica	7	7	1	16/12/2016	16/12/2017	31/05/2018	27/01/2020	10/12/2020	17/12/2021	23/12/2022	5/12/2024	23/09/2025	31/03/2026
Kits de Criminalística	1	1	1	16/12/2016	24/01/2018	23/07/2019	27/01/2020	10/12/2020	17/12/2021	23/12/2022	2/05/2024	15/01/2025	31/03/2026
Elementos y suministros de Criminalística	1	1	1	16/12/2016	24/01/2018	23/07/2019	27/01/2020	10/12/2020	17/12/2021	23/12/2022	2/05/2024	15/01/2025	31/03/2026
Kit Puesto de Control según ficha técnica	3	3	1	16/12/2016	16/12/2017	15/01/2018	27/01/2020	10/12/2020	17/12/2021	23/12/2022	2/05/2024	15/01/2025	31/03/2026
Paleta Pare-Siga	8	8	1	16/12/2016	16/12/2017	15/01/2018	27/01/2020	10/12/2020	17/12/2021	23/12/2022	2/05/2024	15/01/2025	31/03/2026

Tabla 4-50 Seguimiento reposición de elementos a la DITRA por vida útil de 1 año

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD ETAPA PREOPERATIVA OTROSÍ 5	CANTIDAD ENTREGADA	VIDA ÚTIL OTROSÍ 5 (AÑOS)	FECHA PRIMERA ENTREGA	REPOSICIÓN 1 (DIC 2017)	REPOSICIÓN 2 (DIC 2018)	REPOSICIÓN 3 (DIC 2019)	REPOSICIÓN 4 (DIC 2020)	REPOSICIÓN 5 (DIC 2021)	REPOSICIÓN 6 (DIC 2022)	REPOSICIÓN 7 (DIC 2023)	REPOSICIÓN 8 (DIC 2024)	REPOSICIÓN 9 (DIC 2025)
Bastones Luminosos Linternas	8	8	1	16/12/2016	16/12/2017	15/01/2018	27/01/2020	10/12/2020	17/12/2021	23/12/2022	2/05/2024	15/01/2025	31/03/2026
Carpas 4x4 m	1	1	1	16/12/2016	15/01/2018	23/07/2019	27/01/2020	10/12/2020	17/12/2021	23/12/2022	2/05/2024	15/01/2025	31/03/2026
Papelería y Suministros	1	1	1	16/12/2016	15/01/2018	23/07/2019	27/01/2020	10/12/2020	17/12/2021	23/12/2022	2/05/2024	23/01/2026	23/01/2026
Gafas Antiesquirlas	17	17	1	16/12/2016	16/12/2017	15/01/2018	27/01/2020	10/12/2020	17/12/2021	23/12/2022	5/12/2024	15/01/2025	31/03/2026
Elementos de Protección Personal (coderas, rodilleras, guantes, canilleras)	17	17	1	16/12/2016	16/12/2017	15/01/2018	27/01/2020	10/12/2020	17/12/2021	23/12/2022	2/05/2024	15/01/2025	31/03/2026

Tabla 4-50 Seguimiento reposición de elementos a la DITRA por vida útil de 1 año													
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD ETAPA PREOPERATIVA OTROSÍ 5	CANTIDAD ENTREGADA	VIDA ÚTIL OTROSÍ 5 (AÑOS)	FECHA PRIMERA ENTREGA	REPOSICIÓN 1 (DIC 2017)	REPOSICIÓN 2 (DIC 2018)	REPOSICIÓN 3 (DIC 2019)	REPOSICIÓN 4 (DIC 2020)	REPOSICIÓN 5 (DIC 2021)	REPOSICIÓN 6 (DIC 2022)	REPOSICIÓN 7 (DIC 2023)	REPOSICIÓN 8 (DIC 2024)	REPOSICIÓN 9 (DIC 2025)
Impermeables	17	17	1	16/12/2016	16/12/2017	15/01/2018	27/01/2020	10/12/2020	17/12/2021	23/12/2022	2/05/2024	15/01/2025	31/03/2026
Brazaletes	17	17	1	16/12/2016	16/12/2017	15/01/2018	27/01/2020	10/12/2020	17/12/2021	23/12/2022	2/05/2024	15/01/2025	31/03/2026
Guantes de Regulación	17	17	1	16/12/2016	16/12/2017	15/01/2018	27/01/2020	10/12/2020	17/12/2021	23/12/2022	2/05/2024	15/01/2025	31/03/2026
Cascos Abatibles	17	17	1	16/12/2016	16/12/2017	15/01/2018	27/01/2020	10/12/2020	17/12/2021	23/12/2022	2/05/2024	15/01/2025	31/03/2026
Difusión, Publicaciones e Impresos	1	1	1	16/12/2016	15/01/2018	23/07/2019	27/01/2020	10/12/2020	17/12/2021	23/12/2022	2/05/2024	23/01/2026	23/01/2026

Fuente: Informe Mensual No. 122 del Consorcio CR Concesiones ajustado por Consorcio IPAB

Tabla 4-51. Seguimiento reposición de elementos a la DITRA por vida útil de 3 años

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD ETAPA PREOPERATIVA OTROSÍ 5	CANTIDAD ENTREGADA	VIDA ÚTIL OTROSÍ 5 (AÑOS)	FECHA PRIMERA ENTREGA	REPOSICIÓN 1 (Dic 2019)	REPOSICIÓN 2 (Dic 2022)	REPOSICIÓN 2 (Dic 2025)
Sistemas de Perifoneo	1	1	3	16/12/2016	27/01/2020	23/12/2022	31/03/2026
Kit de iluminación Portátil	1	1	3	16/12/2016	27/01/2020	23/12/2022	31/03/2026
Escritorios	1	1	3	16/12/2016	27/01/2020	23/12/2022	31/03/2026
Sillas Ergonómicas	1	1	3	16/12/2016	27/01/2020	23/12/2022	31/03/2026
Sillas Asistenciales	2	2	3	16/12/2016	27/01/2020	23/12/2022	31/03/2026
Archivador	1	1	3	16/12/2016	27/01/2020	23/12/2022	31/03/2026
Cámara Panorámica de Seguridad y Accidentalidad	1	1	3	16/12/2016	27/01/2020	23/12/2022	31/03/2026
Radares con Cámara Lectora de Velocidad - Impresora	3	3	3	16/12/2016	27/01/2020	23/12/2022	31/03/2026
Mesas Plásticas	1	1	3	16/12/2016	27/01/2020	23/12/2022	31/03/2026
Sillas Plásticas	12	12	3	16/12/2016	27/01/2020	23/12/2022	31/03/2026

Fuente: Informe Mensual No. 122 del Consorcio CR Concesiones ajustado por Consorcio IPAB

Tabla 4-52. Seguimiento reposición de elementos a la DITRA por vida útil de 4 años

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD ETAPA PREOPERATIVA OTROSÍ 5	CANTIDAD ENTREGADA	VIDA ÚTIL OTROSÍ 5 (AÑOS)	FECHA PRIMERA ENTREGA	REPOSICIÓN 1 (Dic 2020)	REPOSICIÓN 2 (Dic 2024)	REPOSICIÓN 3 (Dic 2028)
Motocicletas Entre 650 c.c. y 750 c.c Tipo Enduro	12	12	4	16/12/2016	24/02/2021	11/03/2025	Dentro del plazo que es diciembre 2028

Fuente: Informe Mensual No. 122 del Consorcio CR Concesiones

Tabla 4-53. Seguimiento reposición de elementos a la DITRA por vida útil de 5 años

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD ETAPA PREOPERATIVA OTROSÍ 5	CANTIDAD ENTREGADA	VIDA ÚTIL OTROSÍ 5 (AÑOS)	FECHA PRIMERA ENTREGA	REPOSICIÓN 1 (Dic 2021)	REPOSICIÓN 2 (Dic 2026)
Patrulla Tipo Panel GPS	0	0	5	N/A	N/A	N/A
Camioneta Con Baliza Altoparlante 4 x 4	2	2	5	16/12/2016	17/12/2021	Dentro del plazo que es diciembre 2026
Cámaras Personales Tipo Monofono	17	17	5	16/12/2016	17/12/2021	Dentro del plazo que es diciembre 2026
Computadores de Mesa	1	1	5	16/12/2016	17/12/2021	Dentro del plazo que es diciembre 2026

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD ETAPA PREOPERATIVA OTROSÍ 5	CANTIDAD ENTREGADA	VIDA ÚTIL OTROSÍ 5 (AÑOS)	FECHA PRIMERA ENTREGA	REPOSICIÓN 1 (Dic 2021)	REPOSICIÓN 2 (Dic 2026)
Computadores Portátiles con Internet	2	2	5	16/12/2016	17/12/2021	Dentro del plazo que es diciembre 2026
Impresoras Multifuncionales	1	1	5	16/12/2016	17/12/2021	Dentro del plazo que es diciembre 2026
Planta Eléctrica de 3KVA	1	1	5	16/12/2016	17/12/2021	Dentro del plazo que es diciembre 2026
Tableros Luminosos de Mensajes (móviles) 3.2 m x 2 m	1	1	5	16/12/2016	17/12/2021	Dentro del plazo que es diciembre 2026
Alcosensores (de acuerdo a especificaciones DITRA)	3	3	5	16/12/2016	17/12/2021	Dentro del plazo que es diciembre 2026
Chalecos Antibalas	17	17	5	16/12/2016	17/12/2021	Dentro del plazo que es diciembre 2026
Cascos Blindados	17	17	5	16/12/2016	17/12/2021	Dentro del plazo que es diciembre 2026
Televisores LED 47”	1	1	5	16/12/2016	17/12/2021	Dentro del plazo que es diciembre 2026
Reproductor de DVD Blu Ray	1	1	5	16/12/2016	17/12/2021	Dentro del plazo que es diciembre 2026

Fuente: Informe Mensual No. 122 del Consorcio CR Concesiones

Tabla 4-54. Seguimiento reposición de elementos a la DITRA por vida útil de 7 años

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD ETAPA PREOPERATIVA OTROSÍ 5	CANTIDAD ENTREGADA	VIDA ÚTIL OTROSÍ 5 (AÑOS)	FECHA PRIMERA ENTREGA	REPOSICIÓN 1 (Dic 2023)	REPOSICIÓN 1 (Dic 2030)
Radios de Comunicación Institucionales	13	13	7	16/12/2016	8/06/2024	Dentro del plazo que es diciembre 2030

Fuente: Informe Mensual No. 122 del Consorcio CR Concesiones

Mediante acta de entrega de fecha 23 de enero de 2026, remitida por el Concesionario a través de correo electrónico el 26 de enero de 2026, la Concesión realizó la entrega a la DITRA de los elementos de papelería, suministros, material de difusión, publicaciones e impresos correspondientes a los años 2024 y 2025.

Posteriormente, mediante comunicado 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260126011051 de fecha 26 de enero de 2026, el Concesionario informó a la Seccional de Tránsito y Transporte de Sucre que la entrega de los elementos con vida útil de uno (1) y tres (3) años se efectuaría el 31 de enero de 2026 en dicha seccional. No obstante, a la fecha no se ha recibido el acta de entrega correspondiente a los elementos relacionados.

El Concesionario con comunicación 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260216011266 de fecha 16/02/2026 radicado ANI 20264090189712 ha cambiado el compromiso de entrega a la DITRA de la reposición de vida útil de los equipos para el 31 de marzo de 2026 y enuncia el listado de elementos a entregar.

El Consorcio IPAB, mediante comunicado IPAB-025-2026 de fecha 03 de marzo de 2026, solicitó al Concesionario que en un plazo que no supere los cinco (05) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación presente los soportes que justifican el cambio de fecha prevista para la entrega de los mencionados elementos, esto es, de finales del mes de enero de 2026 a la nueva fecha definida en la comunicación 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260216011266 10 cuya copia fue recibida por esta interventoría.

El Consorcio IPAB actualizó las fechas de entrega de los elementos correspondientes a la reposición por vida útil de 1 y 3 años, teniendo en cuenta que, mediante acta de entrega con fecha 31 de marzo de 2026, el Concesionario efectuó la reposición de dichos elementos a la Seccional de Tránsito y Transporte de Sucre, en cabeza de la mayor Alejandra Gallo Chacón y el intendente jefe Edwin Álvarez Díaz.

Mediante comunicado IPAB-543-2026 con radicado ANI 20264090941892 de fecha 24 de julio de 2026, el consorcio IPAB emitió respuesta al comunicado 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260616012328 recibida el 30 junio de 2026 con asunto "Respuesta a GS-2026/DESUC-SETRA-20.1. Solicitud gestión para la entrega elementos Convenio de Cooperación Ruta al Mar S.A.S.", el Consorcio IPAB analizó la posición del Concesionario y manifestó que la misma no resultaba acorde con el alcance de las obligaciones contractuales a su cargo.

La Interventoría señaló que las obligaciones relacionadas con la coordinación y apoyo a la Policía de Carreteras, así como con la entrega, disponibilidad, mantenimiento y reposición de los elementos previstos en el Contrato y en el Convenio de Cooperación, guardan relación directa con las obligaciones de operación y, particularmente, con la seguridad vial, las cuales continúan durante la Etapa de Reversión.

En consecuencia, mediante dicha comunicación se requirió al Concesionario, entre otros aspectos, gestionar la continuidad del Convenio de Cooperación con la Policía Nacional y adelantar las acciones necesarias para la reposición de los elementos cuya vida útil se encontrará próxima a vencerse, informando las actuaciones adelantadas y las fechas previstas para su entrega.

4.3.5. Información Permanente

El Concesionario ha venido realizando la difusión de los datos de los teléfonos y puntos de atención con los cuales puede comunicarse la comunidad para solicitar algún servicio relacionado con la operación de la carretera.

El Consorcio IPAB, verificó la existencia de las vallas informativas del proyecto, las cuales se encuentran localizadas en PR3+350 y PR43+000 de la UFI1, PR00+000 de la UFI 3.2, PR10+850 de la UFI 6.1, PR23+650 de la UFI 6.2, PR0+830 de la UFI 7.3, intersección 16 (el pueblito) PR 93+800 inicio de la UF 8.2 y PR58+750 de la UFI 8.3.

A continuación, mediante registro fotográfico actualizado al periodo del informe, la Interventoría confirma las condiciones estructurales de las vallas del proyecto, sin embargo, se observa perdida de color, por lo que se realizó requerimiento al Concesionario mediante comunicado IPAB-237-2026 con radicado ANI 20264090550142 de fecha 4 de mayo de 2026, el Concesionario mediante comunicado 48.20260511012063 de fecha 12 de mayo de 2026 respondió que el pasado 1 de mayo de 2026, el laudo Arbitral ordenó, entre otras cosas, la Terminación Anticipada del Contrato de concesión y que la actualización o mejoramiento de elementos informativos del proyecto que no correspondan a las actividades propias de la Etapa de Reversión no hacen parte de las responsabilidades actualmente a cargo de la Concesión.

La Interventoría por medio del comunicado IPAB-344-2026 con radicado ANI 20264090681252 de fecha 28 de mayo de 2026, se reiteró la solicitud de adelantar las actividades necesarias para la restitución de las vallas deterioradas, con el fin de garantizar adecuadas condiciones de conservación e integridad del corredor vial hasta la culminación de la Etapa de Reversión del Contrato de Concesión y el Concesionario mediante comunicado 48.20260619012367 de fecha 24 de junio de 2026, indicó que la reposición de las vallas informativas solicitadas constituye una actividad de renovación o mejoramiento que excede las obligaciones actualmente a cargo de la Concesión dentro de la Etapa de Reversión, sin embargo se observa deterioro en las vallas informativas, por lo tanto, nuevamente la Interventoría realizó el requerimiento mediante comunicado IPAB-636-2026 con radicado ANI 20264091048442 de fecha 14/08/2026, al cierre del presente informe, esta Interventoría se encuentra a la espera de la respuesta por parte del Concesionario. De igual manera, es preciso aclarar que, para efectuar el cambio de las vallas, se requiere contar previamente con los lineamientos establecidos en el Manual de Marca aplicable, teniendo en cuenta el cambio de Gobierno de Colombia.

El Concesionario, mediante comunicado RUTADCTOELECTRONICOS-20260910012994 del 11 de septiembre de 2026, emitió respuesta a la comunicación IPAB-0636-2026, en la cual se ratificó en su decisión de no adelantar actividades de mantenimiento, reposición ni renovación de las vallas informativas objeto de la solicitud, al considerar que dichas actividades exceden el alcance de las obligaciones a su cargo durante la Etapa de Reversión.

Por lo tanto, la Interventoría procederá con la aplicación de los mecanismos de apremio previstos en el Contrato de Concesión, conforme a las obligaciones y procedimientos contractualmente establecidos.

Tabla 4-55. Vallas Informativas

	
UFI 1. Valla informativa Caucasia. PR 03+350	UFI 1. Valla informativa Buenavista. PR 43+000
	
UFI 3,2. Valla informativa El Quince PR 0+000	UFI 6,1. Valla informativa Cereté PR10+850

	
UFI 6,2. Valla informativa Lorica.PR 23+650	UFI 7,3. Valla informativa Tolú.PR 5+950

	
UFI 7,3. Valla informativa Intersección 16 (No existe)	UFI 8,3. Valla informativa PR 58+680

Fuente propia: Consorcio IPAB

4.3.6. Programa de mantenimiento y operación

Con base en la información reportada por la anterior Interventoría, firma que ejerció dicha función en el proyecto hasta el 6 de febrero de 2026, contenida en el Informe Mensual No. 122, correspondiente al mes de enero de 2026, el cual fue remitido al Consorcio IPAB

por la Agencia Nacional de Infraestructura mediante comunicado No. 20263050052951 del 17 de febrero de 2026. A continuación, se presenta la trazabilidad de los informes anuales y planes y programas de operación y mantenimiento. El Informe Anual de Mantenimiento 2025 y Programa mensualizado de actividades de mantenimiento año 2026, fue entregado por el Concesionario mediante comunicado de radicado 48-RUTADCTOELECTRONICOS - 20260129011094 de fecha 29 de enero de 2026 y mediante comunicado CI.023/AB14545/26/7.5 de fecha 06 de febrero de 2026, se informó al Concesionario que la información contenida en los citados documentos, cumple con los requisitos mínimos establecidos en el numeral 4.2.3.2 Informe Anual de Mantenimiento del apéndice técnico 2. La actualización del Manual de Operación y Programa de Actividades de Operación 2026 e Informe Anual de Operación 2025, fue entregado por el Concesionario mediante comunicado 48-RUTADCTOELECTRONICOS - 20260130011107 del 30 de enero de 2026, la Interventoría mediante comunicado CI.023/AB14544/26/7.5 de fecha 06 de febrero de 2026, informó que los documentos presentados cumplen con los requisitos mínimos establecidos en el numeral 4.2.3.1 Informe Anual de Operación y 4.2.3.3 Otros Informes Anuales incisos a y b del apéndice técnico 2, no obstante, el Concesionario deberá actualizar los documentos “Manual Operaciones V13” y “ANEXO_5_PlanGestionIntegral V15” y todos los que aplique, en lo referente al nombre de la Interventoría del Proyecto, teniendo en cuenta que el contrato de interventoría del Consorcio CR Concesiones finalizó el 06 de febrero de 2026, y que con posterioridad a dicha fecha inicia una nueva Interventoría, cuyo requerimiento fue realizado por el Consorcio IPAB mediante comunicado IPAB-0369-2026 con radicado ANI 20264090709142 de fecha 3 de junio de 2026 y el Concesionario remitió la actualización de los documentos requeridos mediante comunicado 48-RUTADCTOELECTRONICOS20260604012279 de fecha 06 de junio de 2026, la ANI mediante comunicado 20263050224981 de fecha 16 de junio de 2026, solicitó concepto de la Interventoría, el cual fue emitido mediante comunicación IPAB-420-2026 con radicado ANI 20264090784782 de fecha 19 de junio de 2026, indicando que la actualización se encontraba acorde a lo solicitado.

4.3.7. Obligaciones Particulares de Operación

En el seguimiento efectuado a las obligaciones del Concesionario para operar y mantener las vías del corredor Concesionado aun en etapa de reversión, dentro de las actividades de verificación, se encuentra la valoración del estado de cumplimiento de los Niveles de Servicio e Indicadores según los parámetros establecidos en el Apéndice Técnico 2 y 4

del Contrato. a continuación, se indican los parámetros y requisitos para su comprobación periodo a periodo según frecuencia de medición.

4.3.8. Niveles de Servicio para Unidades Funcionales abiertas al tránsito, sin acta de terminación.

Se continúa avanzando con actividades de mantenimiento rutinario y preventivo en las vías (recolección de basuras en márgenes, limpieza de señales, limpieza de defensas, rocería y limpieza de alcantarillas), además, actividades de operación para atención emergencias al usuario (incidentes y accidentes) para mantener los Niveles de Servicio en Etapa Preoperativa de acuerdo con los requisitos del Apéndice Técnico 2 del Contrato.

Tabla 4-56. Obligaciones Contractuales UFI en Etapa Preoperativa (Niveles de Servicio) – Unidades Funcionales 2, 6 y 8

N	Concepto	Frecuenci	Medidas	Valor Aceptación	Tiempo Corrección	Observación Verificación
E6	Baches	Diaria	B > 0,05 m2 y Prof. > 2,5 cm.	Área Afectada < 4% Área Calzada	1 semana	Atendidos durante el periodo
E8	Altura Vegetación	Mensual	C / km, escoger 2 Sectores Continuos (50 m).	Altura de Vegetación < 40 cm	1 semana	Atendido durante la medición.
E1	Capacidad Hidráulica y Estado de Obras	Mensual	pección Visual lividual	Obstrucción < 25% De La Sección	2 semanas	Sin afectación NS. En fase de construcción.
E1	Posición, Legibilidad de la Señalización Vertical y % Retroreflectividad	Mensual	Retroreflectividad >5 Señales X Km. Inspección Visual/Daños-Pintura-Obstáculos	Estado general, Visibilidad; Legibilidad y Retroreflectividad > 80% Valor Inicial	1 semana Retroreflectividad / 48 horas Señales Conformes.	En mantenimiento toda señalización PMT. Conserva buen nivel Retroreflectividad. En fase de construcción.
E1	Señalización Horizontal	Semestral	C/250 m en C/Línea de Borde I - D Y cada línea central.	Blancas> 160 Amarillas >140,	1 semana	Algo borrosa en marcas viales y líneas longitudinales. .

Fuente: Apéndice Técnico 2 Contrato de Concesión 016 de 2015

4.3.8.1. Nivel de Servicio E6 – Baches

En algunos tramos de las Unidades Funcionales 2 y 6.1, así como en un sector de la UFI 8.3 que, al inicio de la etapa de reversión, no contaban con acta de terminación, el Concesionario ejecuta las acciones requeridas para asegurar el cumplimiento de los principios básicos de seguridad vial, conforme los indicadores de apéndice técnico 2, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de confort para los usuarios y reducir el riesgo de accidentes en la vía.

Con base en los criterios establecidos en la Tabla 1 del numeral 3.2.2 del Apéndice Técnico 2, la Interventoría realiza la verificación del estado de cumplimiento del Nivel de Servicio E6 – Baches para las Unidades Funcionales Integrales UF2, UF6.1 y UF8.3, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre de 2026. Mediante comunicado IPAB-771-2026 con radicado ANI 20264091213502 de fecha 17 de septiembre de 2026, se solicitó al Concesionario la ejecución de reparaciones de daños tipo bache en el pavimento, entre el PR 58+730 y el PR 59+180 de la UFI 8.3, a la fecha los daños del pavimento se encuentran reparados. Los resultados obtenidos se presentan en el cuadro que se muestra a continuación.

Tabla 4-57. Cumplimiento N.S. E6

UFI	Subsector	PR INI	PR FIN	Cumplimiento (< = 4%)	
				SI	NO
2	1	11+600 15+840 22+130 32+320 43+800 47+570	13+530 17+510 29+920 37+400 44+400 47+614	X	

UFI	Subsector	PR INI	PR FIN	Cumplimiento (< = 4%)	
				SI	NO
6	1	14+960 16+170 47+620	15+300 16+450 48+222	X	
8	3	58+730	59+180	X	

Fuente propia – Consorcio IPAB

Las verificaciones de niveles de servicio se adjuntan en el Anexo 6. “operación y mantenimiento” del presente informe.

4.3.8.2. Nivel de Servicio E8 – Altura de Vegetación, estado de Calzada, Márgenes, Bermas, Separador central y Áreas de Servicio.

El Concesionario continúa realizando el control de la altura de la vegetación y del estado de limpieza en las márgenes de la vía mediante las actividades ejecutadas por las cuadrillas de mantenimiento, entre las que se incluyen la limpieza de bermas, rocería y recolección de residuos, con el propósito de conservar el Nivel de Servicio en condiciones adecuadas, de acuerdo con la metodología establecida en el Capítulo 6. Mantenimiento del Apéndice Técnico 2.

En el marco de los recorridos de verificación adelantados por la Interventoría para evaluar el Nivel de Servicio E8, relacionados con el estado de este indicador, al cierre del mes y conforme a los criterios de medición definidos en el Apéndice Técnico 2 para la etapa preoperativa, los resultados obtenidos se presentan en la tabla que se muestra a continuación.

Tabla 4-58. Cumplimiento Nivel de Servicio E8

UFI	Subsector	PR INI	PR FIN	Cumplimiento (H máx.40cm)	
				SI	NO
2	1	11+600 15+840 22+130 32+320 43+800 47+570	13+530 17+510 29+920 37+400 44+400 47+614	X	
6	1	14+960 16+170 47+620	15+300 16+450 48+222	X	
8	3	58+730	59+180	X	

Fuente propia – Consorcio IPAB

4.3.8.3. Nivel de Servicio – Capacidad Hidráulica de Obras de Drenaje longitudinales y transversales

El Concesionario continúa adelantando las actividades necesarias para asegurar el adecuado funcionamiento del drenaje superficial, tanto longitudinal como transversal, con el propósito de mantener las obras en condiciones normales de escorrentía en los sectores que aún no se encuentran en etapa de operación. En este sentido, las cooperativas realizan labores de limpieza en las secciones tubulares con el fin de conservar el Nivel de Servicio E10 – Obras de drenaje en condiciones adecuadas para aquellas Unidades Funcionales cuyos tramos no han entrado en fase de operación y mantenimiento.

De igual manera, los sectores que se encuentran en proceso de mejoramiento, en los cuales se ejecutan actividades como la ampliación de bermas, continúan siendo

atendidos conforme lo permiten las dinámicas propias de la construcción, particularmente por el tránsito de maquinaria asociado a las labores de explanación. Por tal razón, considerando la frecuencia de las labores de limpieza y las condiciones del tramo en intervención, no resulta procedente realizar una evaluación exhaustiva del indicador, excepto en los casos donde se evidencie acumulación de material orgánico proveniente de las laderas, arrastrado por las aguas lluvias, que genere obstrucciones superiores al 25% de la sección hidráulica; dichas situaciones son tratadas como incidentes dentro de los Servicios de Carácter Obligatorio establecidos en el Apéndice Técnico 2.

Por lo tanto, la Interventoría manifiesta el estado de cumplimiento del Nivel de Servicio E10 – Capacidad hidráulica de las obras de drenaje, considerando un grado de colmatación menor o igual al 25%, sin incluir las obstrucciones ocasionadas por derrumbes, de acuerdo con lo dispuesto en el Apéndice Técnico 2.

Tabla 4-59. Cumplimiento N.S. E10

Medición de nivel de servicio E10 – Capacidad Hidráulica Obras de Drenaje					
UFI	Subsector	PR INI	PR FIN	Cumplimiento (obstrucción sección hidráulica < 25%)	
				SI	NO
2	1	11+600 15+840 22+130 32+320 43+800 47+570	13+530 17+510 29+920 37+400 44+400 47+614	X	
6	1	14+960	15+300	X	

Medición de nivel de servicio E10 – Capacidad Hidráulica Obras de Drenaje					
UFI	Subsector	PR INI	PR FIN	Cumplimiento (obstrucción sección hidráulica < 25%)	
				SI	NO
		16+170 47+620	16+450 48+222		
8	3	58+730	59+180	X	

Fuente propia – Consorcio IPAB

4.3.8.4. Nivel de Servicio E11 – Señalización Vertical

Las señales verticales que se ubican en tramos abiertos al tránsito, por fuera de los frentes activos de construcción, se conservan con bajo nivel de limpieza, pero con posicionamiento y buen nivel de retroreflectividad nocturna conforme la verificación realizada a cinco (5) señales escogidas por segmento en las Unidades Funcionales UF 2, 6 y 8.

Con corte a la fecha, se conservan los niveles de retroreflectividad para la Señalización Vertical indicados en la norma NTC 4739. Señales con láminas tipo IX y el Manual de Señalización 2004 estipulado en el Apéndice Técnico 2 del Contrato.

Al cierre del presente periodo, la Interventoría verificó que la señalización vertical cumple con los criterios mínimos de legibilidad, limpieza y correcta posición establecidos en el Apéndice Técnico 2 para las Unidades Funcionales en abiertas al tránsito, sin acta de terminación.

Tabla 4-60. Cumplimiento N.S. E11

UFI	Subsector	PR INICIAL	PR FINAL	Cumplimiento (Posición)	
				SI	NO
2	1	11+600 15+840 22+130 32+320 43+800 47+570	13+530 17+510 29+920 37+400 44+400 47+614	X	
6	1	14+960 16+170 47+620	15+300 16+450 48+222	X	
8	3	58+730	59+180	X	

Fuente propia – Consorcio IPAB

4.3.8.5. Nivel de Servicio E12 – Señalización Horizontal

La medición del nivel de servicio E12 en la UFI 6.1 se realizó en mayo de 2026, en los tramos comprendidos entre el PR14+960 y el PR15+300, entre el PR16+170 y el PR16+450, y entre el PR47+620 y el PR48+222. En esta misma fecha, se efectuó la medición en el tramo comprendido entre el PR58+730 y el PR59+352 de la UFI 8.3.

Posteriormente, en julio de 2026, se realizó la medición del nivel de servicio E12 en los sectores de la UFI 2 que se encontraban abiertos al tránsito y que no contaban con Acta

de Terminación. Los hallazgos identificados en dichas mediciones fueron atendidos y reparados por el Concesionario.

De conformidad con lo establecido en el Apéndice Técnico 2 del Contrato de Concesión, la medición de este indicador se realiza con una frecuencia semestral. Como resultado de la verificación efectuada por la Interventoría, no se evidenciaron incumplimientos asociados al indicador E12.

4.3.8.6. Nivel de Servicio O4 – Tiempos de Atención de Incidentes

Durante el presente periodo, en la medición del indicador ***O4 - Tiempos de Atención de incidentes***, el Concesionario continua realizando la prestación de los servicios de emergencia dentro de los tiempos máximos, tal como, se evidencia en los reportes de medición para los tiempos de despeje de material, instalaciones señalización temporal < 1 h, llegada de personal y equipos por cada punto de referencia dentro de las unidades funcionales del proyecto según las exigencias descritas e*n el numeral 3.1.3 Calidad del Servicio Técnico y de la Atención al Usuario y 3.2.2 Obligaciones Generales de Operación del Apéndice Técnico 2 del Contrato.*

4.3.8.7. Nivel de Servicio O5 – Tiempos de Atención de Accidentes

Durante el presente periodo, en la medición del indicador ***O5 - Tiempos de Atención de Accidentes*** según reportes del Concesionario, el Concesionario hasta la fecha ha cumplido con el tiempo de respuesta de mínimo 30 min para cada evento presentado ofreciendo atención con ambulancia medicalizada para los eventos graves, más aún, en primera instancia produce su arribo el inspector vial para acordonar sitio con señalización conforme a la obligación contractual del Apéndice Técnico 2.

Los registros de verificación y medición todos los niveles de servicios (E6_Baches), (E8_altura de vegetación), (E10_obras de drenaje), (E11_señalizacion vertical) y (E12_señalizacion horizontal) establecidos en la tabla 1. Numeral 3.3.1 del Apéndice Técnico 2 son indicados en el Anexo 6. “operación y mantenimiento” del presente informe.

Tabla 4-61. Cumplimiento Niveles de Servicio

Indicador	Descripción	Requisitos – Apéndice técnico 2	2	6.1	8.3
E6	Baches	área Afectada< 4% Área Calzada	SI	SI	SI

Indicador	Descripción	Requisitos – Apéndice técnico 2	2	6.1	8.3
E8	Altura Vegetación	H máxima vegetación < 40 Cm	SI	SI	SI
E10	Capacidad Hidráulica Y Estado De Obras Arte	obstrucción < 25% De La sección	SI	SI	SI
E11	Posición, Legibilidad De La señalización Vertical Y % Reflectividad	Señal En posición Y Cumple Dimensiones-Colores Y Rotulado.Retroref> 80% Valor Inicial	SI	SI	SI
E12	Señalización Horizontal	BLANCAS> 160 Mc. Lux/Cm2, AMARILLAS >140 Mc. Lux/Cm2	SI	SI	SI
O4	Tiempo De atención Incidentes	Valor: Cero, Si #Inc No Atendido>3	SI	SI	SI
O5	Tiempo De atención Accidentes	Tiempo Max. Sitio Llegada. Valor: Cero, Si #Acc. No Atendido>3	SI	SI	SI

Fuente propia – Consorcio IPAB

4.3.9. Indicadores de Operación y Mantenimiento durante la Etapa de Reversión

Durante el período en análisis se realizó el cálculo del Índice de Cumplimiento (IC) mediante el SICC (Sistema Informático de Contabilización y Control) para las UFIs 1, 2, 3, 4 y 5, con base en los indicadores semestrales previamente cargados en dicho sistema y publicados en julio de 2026, los cuales corresponden a información registrada por la interventoría anterior. Para las UFIs 6.1, 6.2 y 6.3.1 se tomaron como referencia las mediciones realizadas en julio de 2026. Asimismo, para las UFIs 7.2, 7.3, 8.1, 8.2 y 8.3 se consideraron los indicadores semestrales publicados en julio de 2026, junto con los indicadores mensuales reportados durante el periodo del presente informe, teniendo en cuenta los parámetros mínimos de aceptación establecidos en el Apéndice Técnico 4 del Contrato de Concesión.

Para los indicadores con frecuencia de medición semestral, anual y bienal, al igual que la trazabilidad de cumplimiento de los indicadores que se presentan en las gráficas, se toma como base la información reportada por la anterior Interventoría, en su Informe Mensual No. 122 correspondiente al mes de enero de 2026, el cual fue remitido al Consorcio IPAB por la Agencia Nacional de Infraestructura mediante comunicado No. 20263050052951 del 17 de febrero de 2026.

Tabla 4-62. Obligaciones Contractuales para Indicadores en cada UFI en Etapa de Operación y Mantenimiento.

IE	Concepto	Frecuencia	Medidas	Valor aceptación	Tiempo corrección
E1	IRI	Semestral	Se debe calcular el IRI cada 100 m en ambas huellas de la llanta en m/km aproximado a un decimal.	Valor puntual ≤ 3.5 mm/m o Valor medio ≤ 3.0 mm/m	3 meses
E2	Ahuellamiento	Semestral	Medidas C/20 m, X C/km. se obtendrá como media de todas las medidas de ese km	Valor puntual ≤ 20 mm Valor medio ≤ 15 mm	3 meses
E3	Fisuras	Mensual	se cuentan las fisuras > a 3mm (multiplicar por un ancho de 0,6cm)	área afectada menor o igual < 1% área calzada	1 mes
E4	Coeficiente Fricción Transversal (CRT)	Semestral	Medidas en el carril de mayor tráfico Pesado cada 20 m	Valor puntual ≥ 40 Valor medio≥ 45	3 meses
E5	Textura	Semestral	Medidas en el carril de mayor tráfico Pesado cada 20 m	Valor puntual ≥ 0.5 mm	3 meses
E6	Baches	Mensual	Area > 0,05 m2 y profundidad > 2,5 cms	ningún bache	24 horas
E7	Hundimientos	Mensual	Hundimientos> 2 cm (severidad media alta)	área afectada< 0,1% área calzada	2 semanas
E8	Estado de Márgenes Separador Central, Áreas de Servicio y	Mensual	c / km, escoger 2 sectores no continuos (50 m).	altura de vegetación < 30 cm	1 semana

IE	Concepto	Frecuencia	Medidas	Valor aceptación	Tiempo corrección
	Corredor del Servicio				
E10	Drenajes superficiales, longitudinal y transversal	Mensual	inspección visual individual	obstrucción < 25% de la sección	2 semanas
E11	Posición, legibilidad de la señalización vertical y % retroreflectividad	Mensual	retroreflexividad:>5 señales x km. inspección visual/daños-pintura-obstáculos	estado general, visibilidad; legibilidad y retroreflectividad > 80% valor inicial	1 semana para las señales que incumplan la retroreflectividad y 48 horas para las señales ilegibles y/o dañadas
E12	Señalización horizontal	Semestral	c/20 m en c/línea de borde i - d y cada línea central.	blancas> 160 amarillas >140	1 semana
E13	Barreras y elementos de contención	Mensual	no debe existir tramos > 20 metros con problemas estructurales o productos no conformes.	barreras de concreto alineadas y metálicas sin oxidaciones ni defectos.	1 mes
E14	Iluminación	Mensual	c/250 metros	luminarias defectuosas < igual a 5% del total instalado	1 semana
E15	Puentes y Estructuras	Anual	Inspección Visual Según SIPUCOL	Criterios varios AT 4 de acuerdo al tipo de estructura	1 mes
E16	Capacidad Estructural	Cada 2 años	Cada 20 m. El valor correspondiente a cada Km se obtendrá como media de todas las medidas de ese km.	De acuerdo al Tránsito NT1 <1000 NT2 <800 NT3 o mayor <600	3 meses
E17	Disponibilidad de la vía	Diaria	c/kilómetro	El Kilómetro está disponible cuando resulta posible la circulación de vehículos de todas las categorías a lo largo	3 meses

IE	Concepto	Frecuencia	Medidas	Valor aceptación	Tiempo corrección
				de la totalidad del kilómetro. No se consideran interrupciones de la disponibilidad de la vía aquellas generadas por interrupciones en la circulación de vehículos derivadas de la indisponibilidad de túneles, y puentes.	
O1	Mortalidad	Mensual	conteo mensual número de víctimas	conteo mensual	n/a
O2	Ocupación de carriles	Evento	longitud se mide desde estrechamiento de la calzada	longitud. retención>300 m	1 hr
O3	Tiempo de atención en Caseta de Peaje	Mínimo 5 al mes	Acumulación de vehículos en carriles en estaciones de pago manuales y semiautomáticas. Tiempo de medición deberá ser como mínimo de cuatro (4) horas de mayor tráfico, en cada sentido.	No podrá acumularse un número igual o mayor a 10 vehículos por carril en la mitad de las estaciones de pago manual o semiautomático que se encuentran en servicio, por un periodo igual o mayor a sesenta (60) minutos.	NA
O4	Tiempo de atención incidentes	Diario	2 personas y vehículos deben señalizar área evento.	valor: cero, si #inc. no atendido > 3	NA
O5	Tiempo de atención accidentes	Diario	3 personas, vehículo, y ambulancia. Se debe señalizar área evento.	tiempo Max. sitio llegado. Valor: cero, si #acc. no atendido>3	NA

Fuente Apéndice Técnico 4

4.3.9.1. Indicador E1 – Rugosidad (IRI)

Para las UFIs 1, 2, 3, 4 y 5, los resultados de la última medición semestral fueron publicados en el SICC durante el mes de julio de 2026. Los hallazgos identificados se encuentran dentro del plazo de reparación por parte del Concesionario.


Los sectores en los cuales se identificaron incumplimientos y sobre los cuales el Concesionario ejecutó las respectivas reparaciones son los siguientes:

- UFI 1, UFI 2, UFI 3 y UFI 4: No se identificaron incumplimientos.
- UFI 5: Se reportaron diecinueve (19) hallazgos, distribuidos de la siguiente manera: seis (6) hallazgos en la UFI 5.1, correspondientes a los PR37, PR42, PR44, PR51, PR60 y PR63, y trece (13) hallazgos en la UFI 5.2, correspondientes a los PR2, PR3, PR4, PR7, PR10, PR12, PR13, PR14, PR15, PR16, PR17, PR18 y PR19.

Para las UFI 6.1, 6.2 y 6.3.1, los resultados de la última medición realizada en etapa de reversión fueron publicados en la plataforma SICC (Sistema Informático de Contabilidad y Control) por el Consorcio IPAB en el mes de julio de 2026; no obstante, no se identificaron incumplimientos.

Para las UFI 7 y 8, los resultados de la última medición realizada durante la Etapa de Reversión fueron publicados en julio de 2026. Para la UFI 7 no se identificaron hallazgos, mientras que los hallazgos identificados en la UFI 8.3, correspondientes a los PR 32, 33 y 53, se encuentran dentro del plazo contractual establecido para su reparación, de tres (3) meses.

Grafica 8 Gráfica de cumplimiento Indicador E1

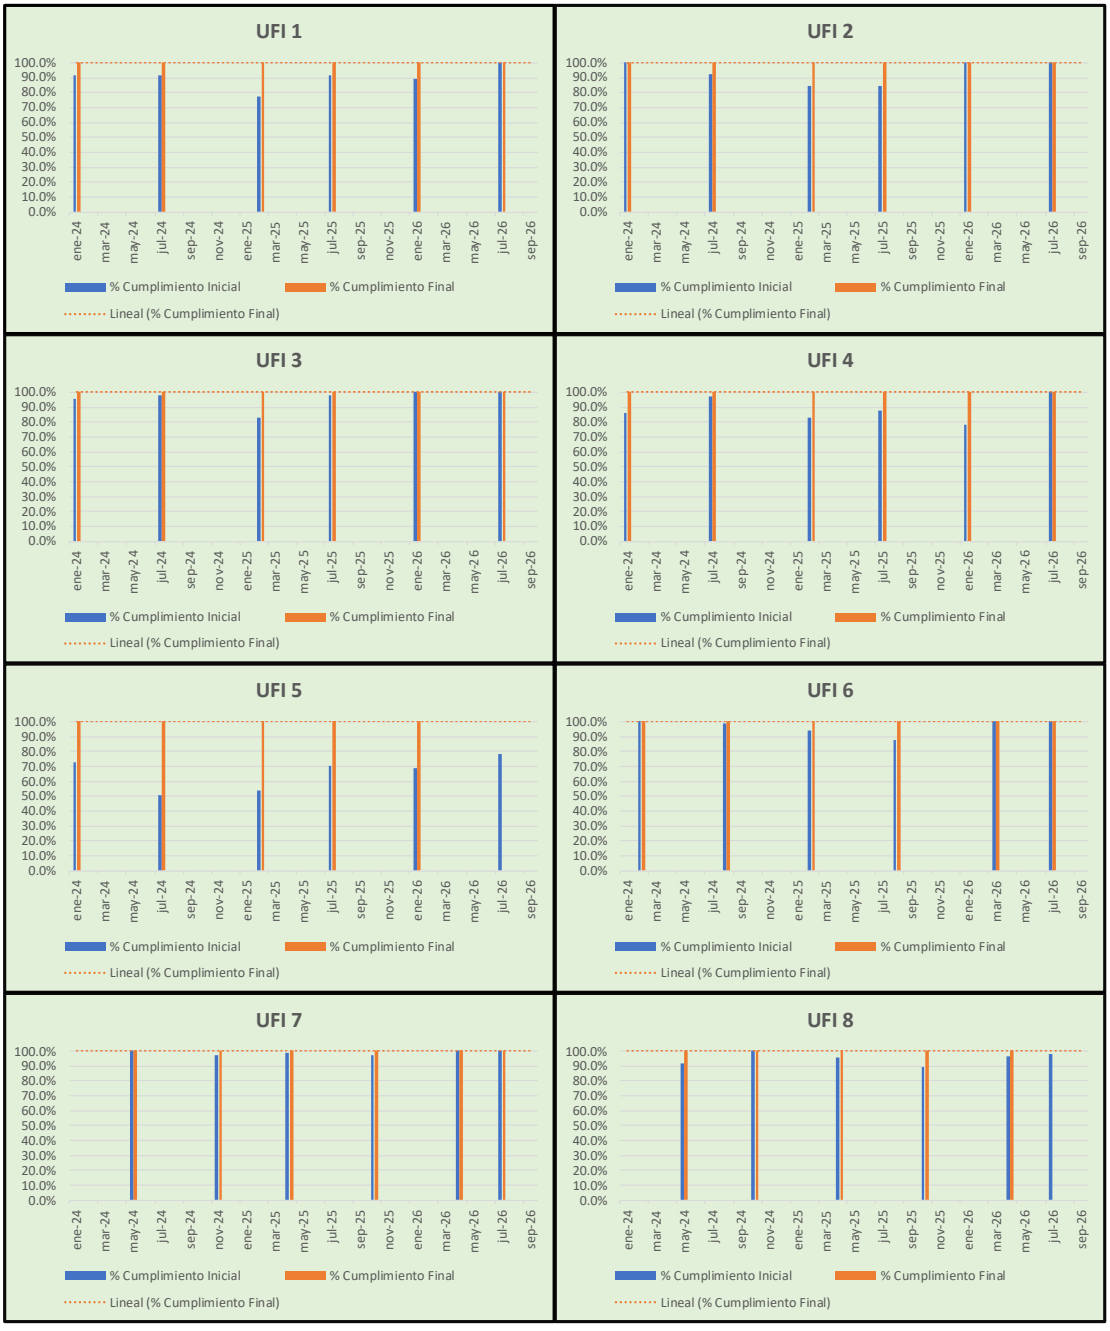

Fuente: Informe Mensual No. 122 del Consorcio CR Concesiones – Actualizado por Consorcio IPAB


4.3.9.2. Indicador E2 – Ahuellamiento

Para las UFIs 1, 2, 3, 4 y 5 los resultados de la última medición semestral fueron publicados en el SICC durante el mes de julio de 2026, sin embargo, no se identificaron incumplimientos.

Para las UFI 6.1, 6.2 y 6.3.1, los resultados de la última medición realizada en etapa de reversión fueron publicados en la plataforma SICC (Sistema Informático de Contabilidad y Control) por el Consorcio IPAB en el mes de julio de 2026; no obstante, no se identificaron incumplimientos.

Para las UFI 7 y 8, los resultados de la última medición realizada durante la Etapa de Reversión fueron publicados en julio de 2026, sin embargo, no se encontraron incumplimientos.

Grafica 9 Gráficas de Cumplimiento Indicador E2

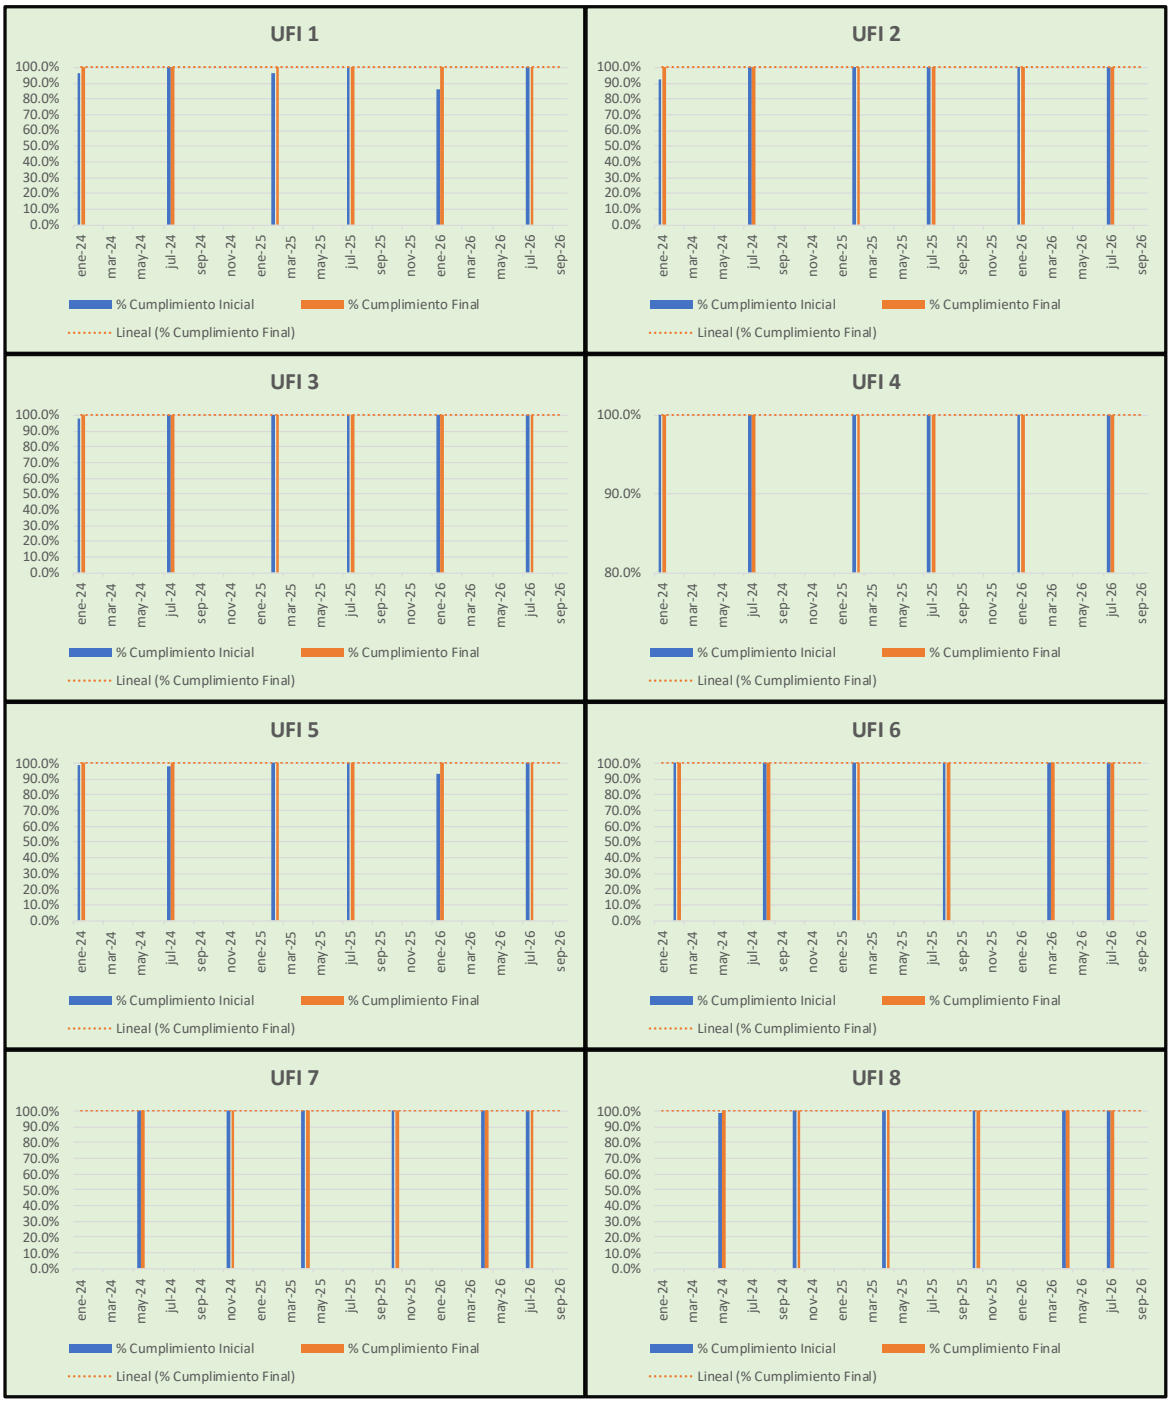

Fuente: Informe Mensual No. 122 del Consorcio CR Concesiones – Actualizado por Consorcio IPAB

4.3.9.3. Indicador E3 – Fisuras

Durante el período comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre de 2026, se reportaron hallazgos asociados al indicador E3 (Fisuras), evidenciándose diecinueve (19) incumplimientos en la UFI 1, correspondientes a los PR 5, 6, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 29, 30, 44, 45, 53, 54, 57, 58, 59 y 60; no se reportaron incumplimientos en la UFI 2**;** cinco (5) incumplimientos en la UFI 3, correspondientes a los PR 10, 14, 15 y 21 de la UFI 3.3, y el PR 0 de la UFI 3.5; dos (2) incumplimientos en la UFI 4.1, correspondientes a los PR 16 y 20; y diecisiete (17) incumplimientos en la UFI 5, distribuidos así: doce (12) en la UFI 5.1, correspondientes a los PR 5, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 22, 30, 31 y 38, y cinco (5) en la UFI 5.2, correspondientes a los PR 6, 9, 13, 14 y 23. No se reportaron incumplimientos en las UFI 6, UFI 7 y UFI 8. Los hallazgos identificados se encuentran dentro del plazo contractual establecido para su reparación por parte del Concesionario, correspondiente a un (1) mes contado a partir de la notificación o publicación en el SICC.

En las gráficas mostradas a continuación, se presenta el estado de cumplimiento por unidad funcional y por mes desde enero de 2024 hasta el presente periodo, del indicador E3 - Fisuras:

Grafica 10 Gráficas de Cumplimiento Indicador E3



Fuente: Informe Mensual No. 122 del Consorcio CR Concesiones – Actualizado por Consorcio IPAB

4.3.9.4. Indicador E4 – Fricción (TRRL)


Para las UFIs 1, 2, 3, 4 y 5 los resultados de la última medición semestral fueron publicados en el SICC durante el mes de julio de 2026. no obstante, no se identificaron incumplimientos.

Para las UFI 6.1, 6.2 y 6.3.1, los resultados de la última medición realizada en etapa de reversión fueron publicados en la plataforma SICC (Sistema Informático de Contabilidad y Control) por el Consorcio IPAB en el mes de julio de 2026; no obstante, no se identificaron incumplimientos.

Para las UFI 7 y 8, los resultados de la última medición realizada durante la Etapa de Reversión fueron publicados en julio de 2026, sin embargo, no se encontraron incumplimientos.

En las gráficas mostradas a continuación, se presenta el estado de cumplimiento, desde el mes de enero de 2024 hasta el presente periodo:

Grafica 11 Gráficas de Cumplimiento Indicador E4

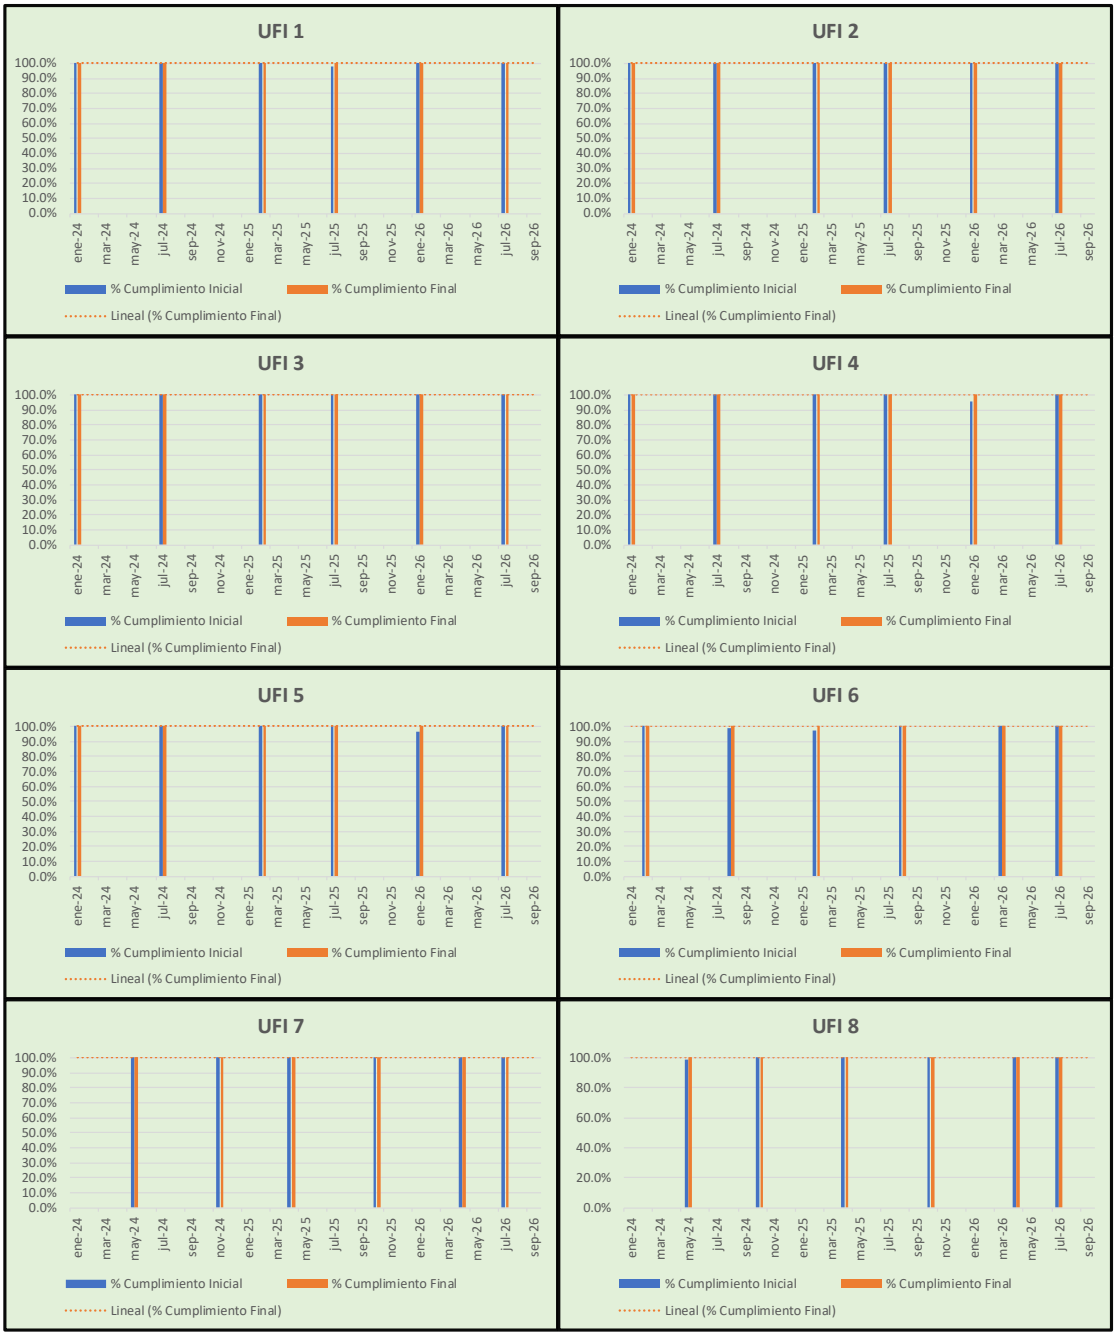

Fuente: Informe Mensual No. 122 del Consorcio CR Concesiones – Actualizado por Consorcio IPAB

4.3.9.5. Indicador E5– Textura


Para las UFIs 1, 2, 3, 4 y 5 se publicaron los resultados de la última medición semestral en el SICC en el mes de julio de 2026, sin embargo, no se encontraron Incumplimientos.

Para las UFI 6.1, 6.2 y 6.3.1, los resultados de la última medición realizada en etapa de reversión fueron publicados en la plataforma SICC (Sistema Informático de Contabilidad y Control) por el Consorcio IPAB en el mes de julio de 2026; no obstante, no se identificaron incumplimientos.

Para las UFI 7 y 8, los resultados de la última medición realizada durante la Etapa de Reversión fueron publicados en julio de 2026, sin embargo, no se encontraron incumplimientos.

En las gráficas mostradas a continuación, se presenta el estado de cumplimiento, desde el mes de enero de 2024 hasta el presente periodo:

Grafica 12 Gráficas de Cumplimiento Indicador E5

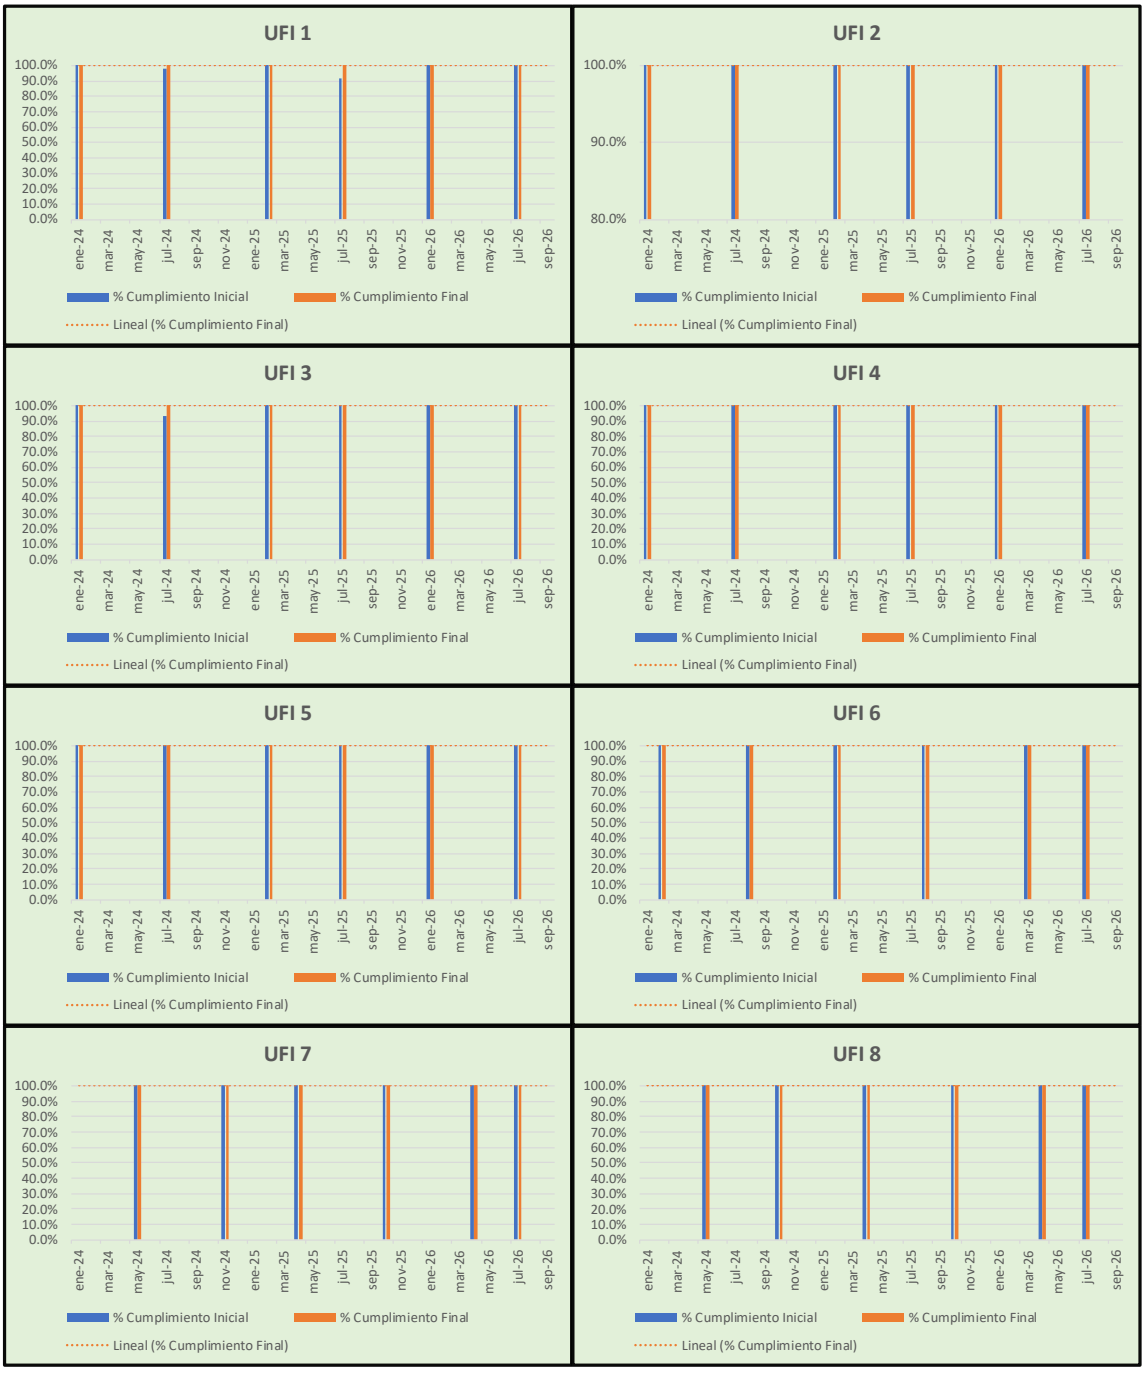

Fuente: Informe Mensual No. 122 del Consorcio CR Concesiones – Actualizado por Consorcio IPAB


4.3.9.6. Indicador E6 – Baches

Durante el período correspondiente al mes de septiembre de 2026 se reportaron hallazgos asociados al indicador de baches, evidenciándose catorce (14) incumplimientos en la UFI 1, correspondientes a los PR 5, 18, 19, 21, 24, 28, 30, 35, 36, 40, 41, 42, 49 y 60; no se reportaron incumplimientos en las UFI 2 y 3; cuatro (4) incumplimientos en la UFI 4.1, correspondientes a los PR 12, 13, 22 y 30; tres (3) incumplimientos en la UFI 5.1, correspondientes a los PR 2, 6 y 13; tres (3) incumplimientos en la UFI 6.1, correspondientes a los PR 11, 14 y 17; un (1) incumplimiento en la UFI 7.3, correspondiente al PR 2; y dos (2) incumplimientos en la UFI 8.3, correspondientes a los PR 11 y 33. En total, durante el período se reportaron veintisiete (27) incumplimientos asociados al indicador de baches.

Todos los hallazgos fueron reparados dentro del plazo contractual establecido en el apéndice técnico 4, correspondiente a 24 horas contadas a partir de la notificación o publicación en el SICC.

En las gráficas mostradas a continuación, se presenta el estado de cumplimiento por unidad funcional y por mes desde enero de 2024 hasta el presente periodo, del indicador E6 - baches:

Grafica 13 Gráficas de Cumplimiento Indicador E6

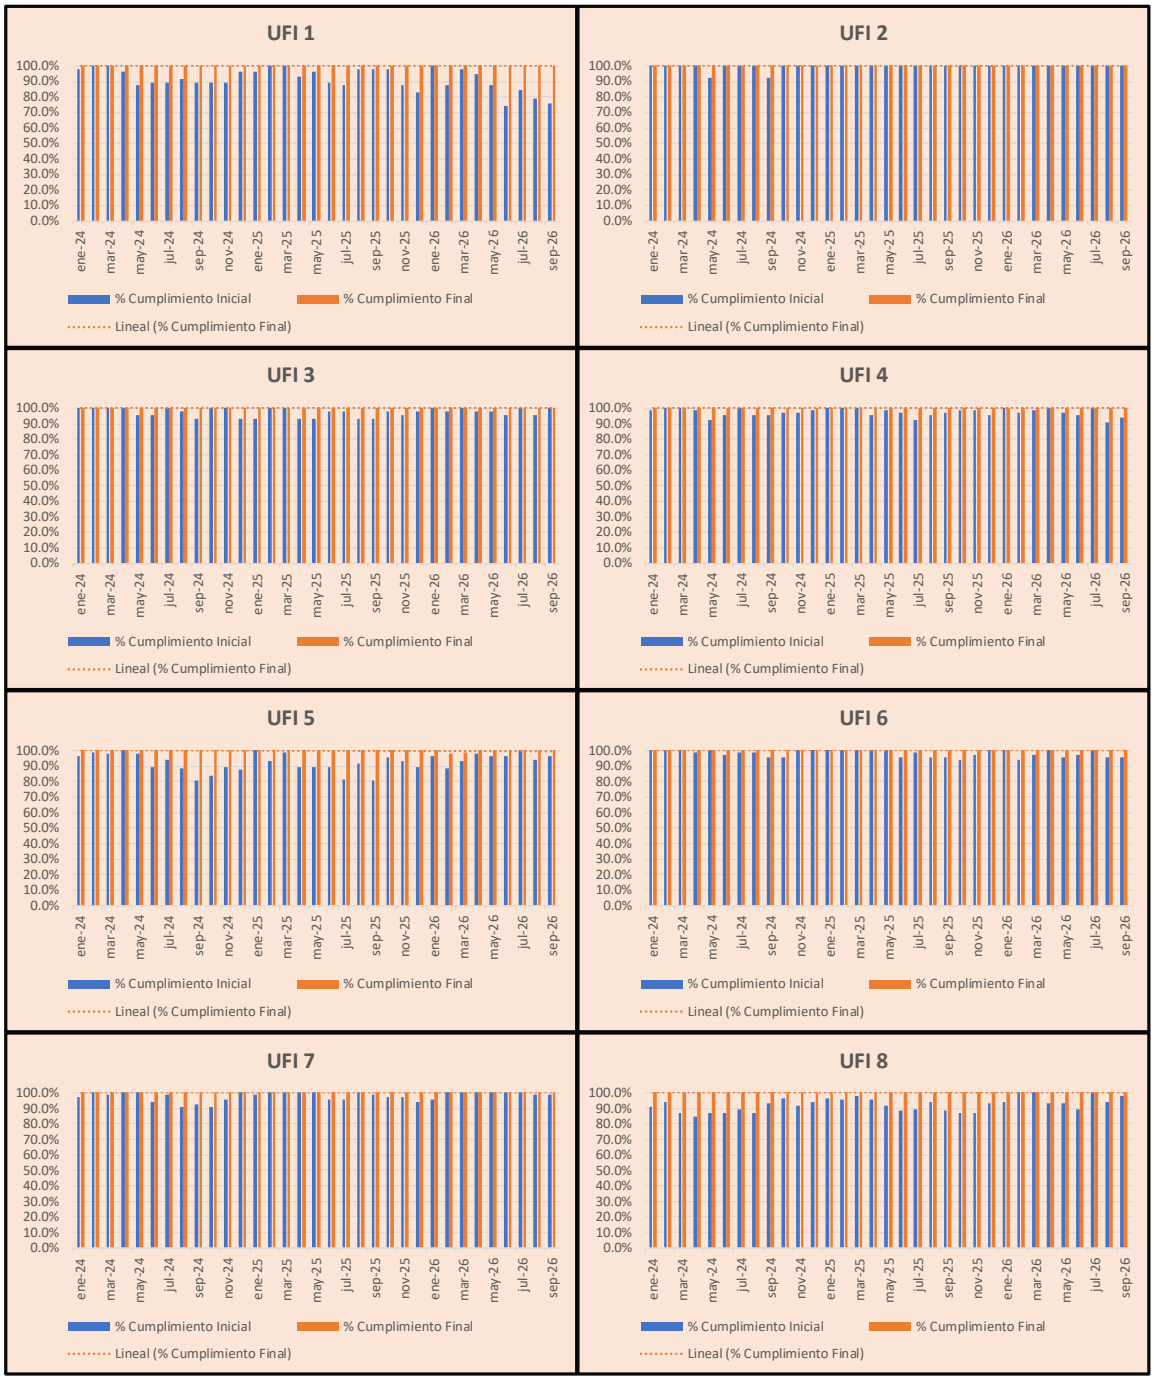


Fuente: Informe Mensual No. 122 del Consorcio CR Concesiones – Actualizado por Consorcio IPAB

4.3.9.7. Indicador E7 – Hundimientos

Durante el período correspondiente al mes de septiembre de 2026, no se identificaron hallazgos asociados al indicador de hundimientos.

En las gráficas mostradas a continuación, se presenta el estado de cumplimiento por unidad funcional y por mes desde enero de 2024 hasta el presente periodo, del indicador E7 - hundimientos:

Grafica 14 Gráficas de Cumplimiento Indicador E7

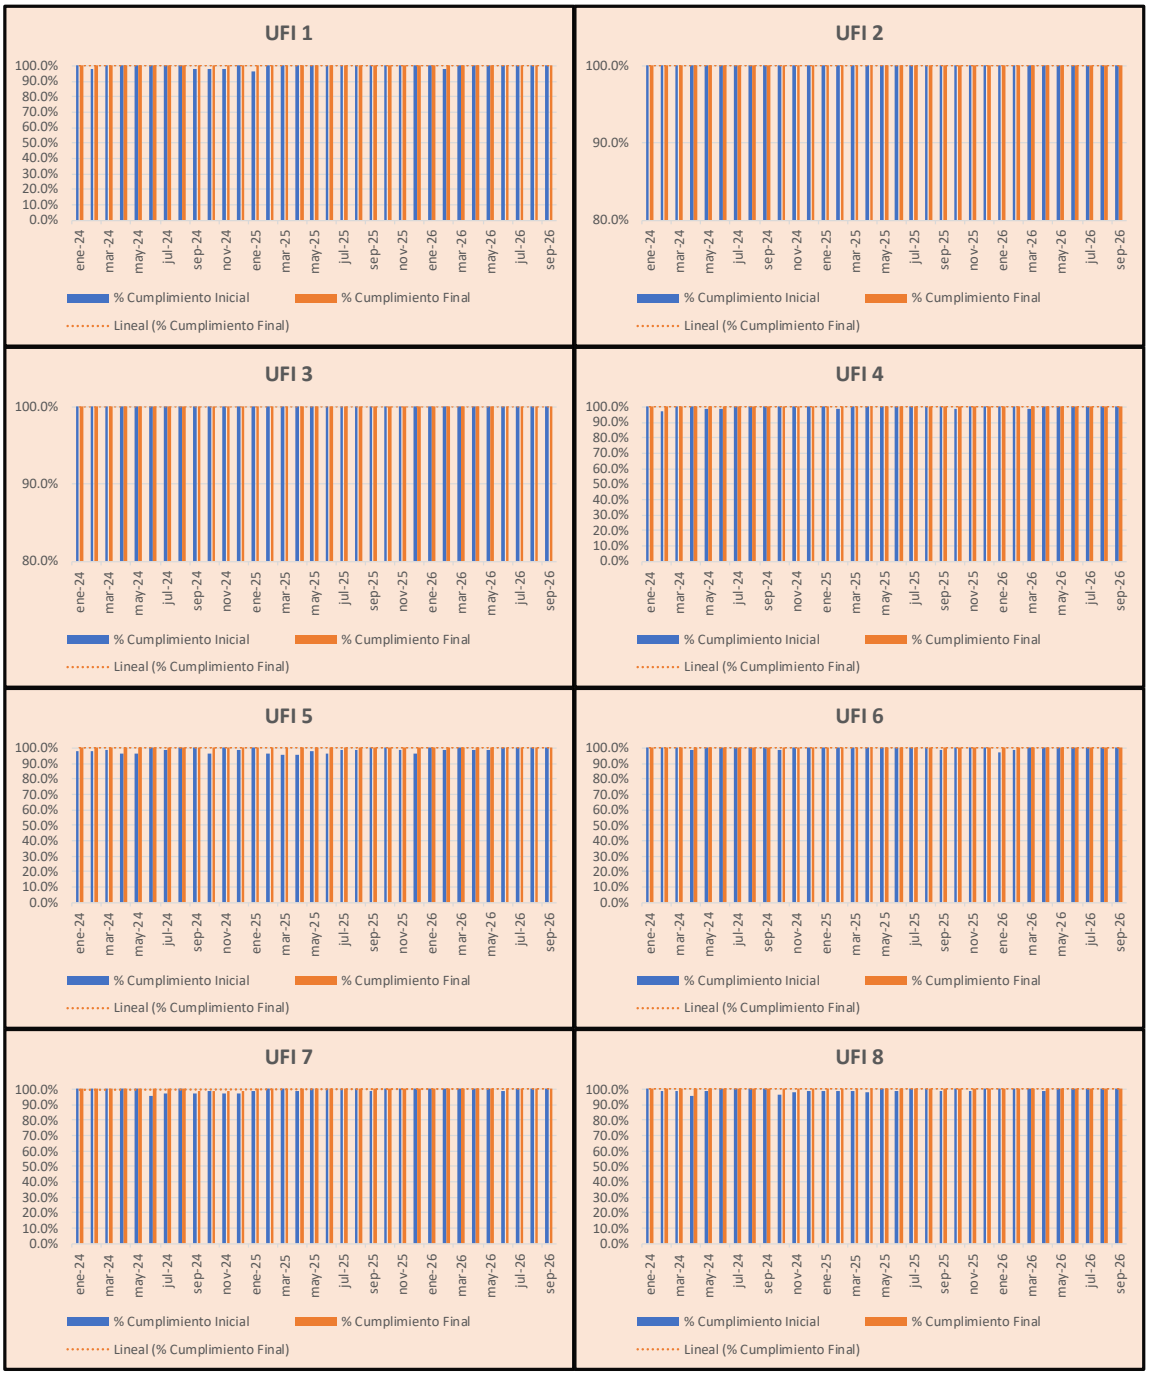


Fuente: Informe Mensual No. 122 del Consorcio CR Concesiones – Actualizado por Consorcio IPAB

4.3.9.8. Indicador E8 – Estado de Calzada, Márgenes, Bermas, Separador central y Áreas de Servicio.

Durante el período correspondiente al mes de septiembre de 2026 se identificaron hallazgos asociados al indicador E8, evidenciándose siete (7) incumplimientos en la UFI 1, correspondientes a los PR 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40; no se reportaron incumplimientos en las UFI 2, 3, 5 y 6; cinco (5) incumplimientos en la UFI 4.1, correspondientes a los PR 12, 28, 29, 30 y 31; un (1) incumplimiento en la UFI 7.2, correspondiente al PR 6; y cinco (5) incumplimientos en la UFI 8, de los cuales uno (1) corresponde al PR 50 de la UFI 8.1 y cuatro (4) a los PR 28, 29, 44 y 45 de la UFI 8.3. En total, durante el período se registraron dieciocho (18) incumplimientos asociados al indicador E8. Los hallazgos identificados fueron reparados por el Concesionario dentro del plazo contractual de reparación establecido en el Apéndice Técnico 4, correspondiente a una (1) semana contada a partir de la notificación o publicación en el SICC.

En las gráficas mostradas a continuación, se presenta el estado de cumplimiento por unidad funcional y por mes desde enero de 2024 hasta el presente periodo, del indicador E8 - Altura de vegetación:

Grafica 15 Gráficas de Cumplimiento Indicador E8

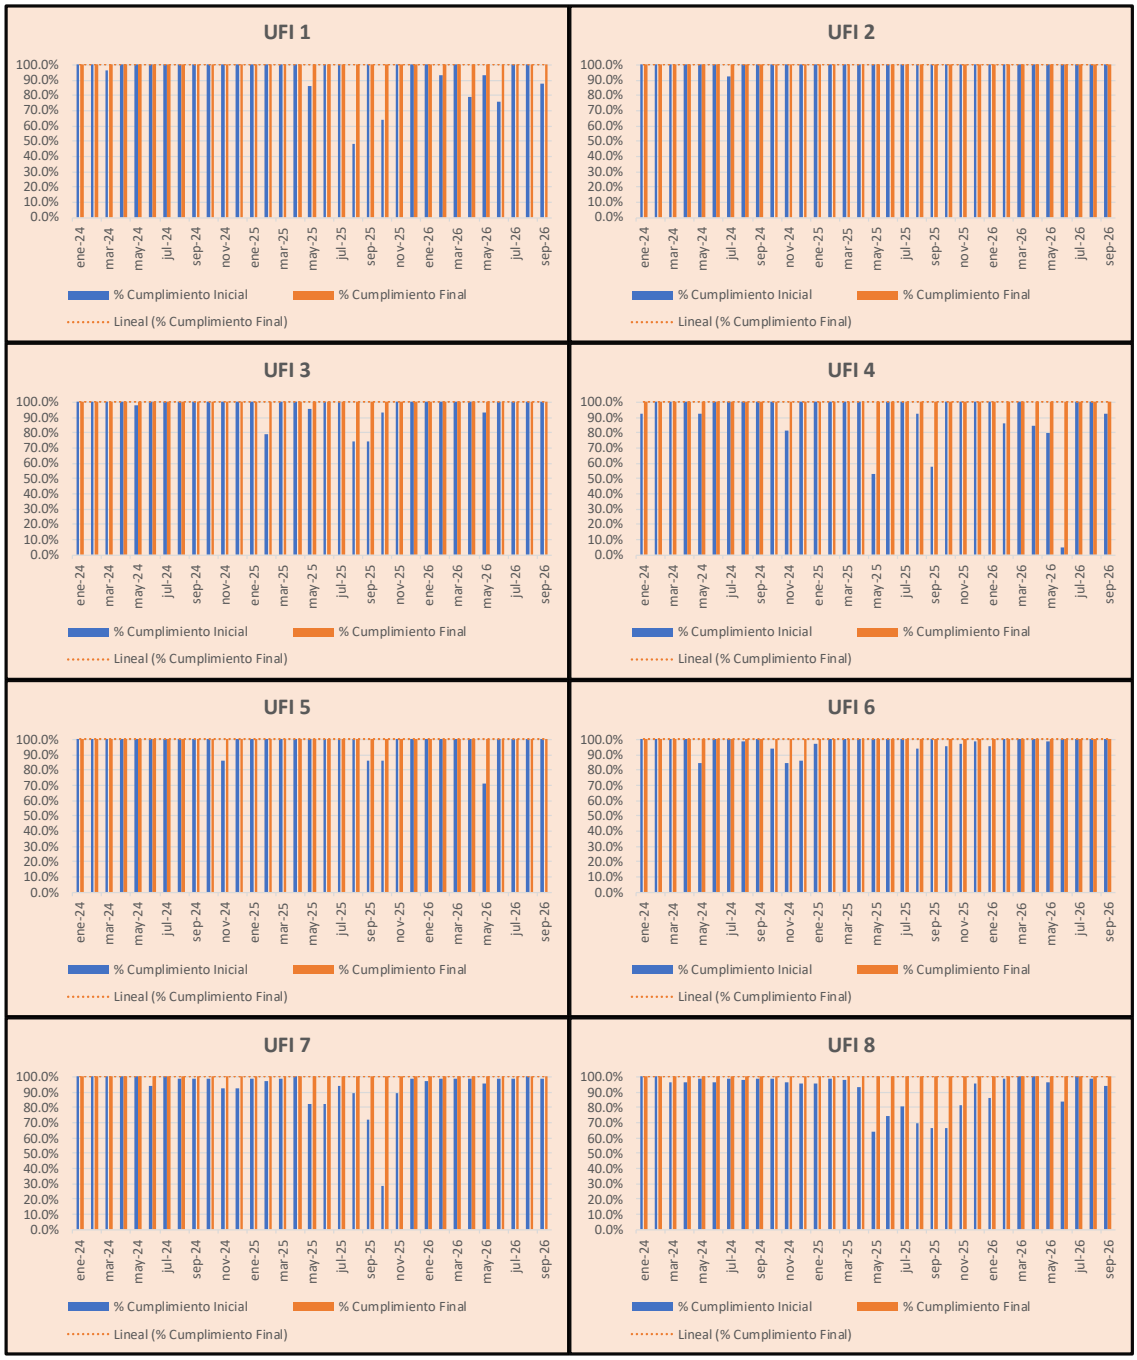

Fuente: Informe Mensual No. 122 del Consorcio CR Concesiones – Actualizado por Consorcio IPAB

Tabla 4-63. Registro fotográfico de Cumplimiento Indicador E8



to 1. Limpieza de Rocería E8, UFI 8.3

Fuente propia – Consorcio IPAB

4.3.9.9. Indicador E10 – Capacidad Hidráulica de Obras de Drenaje


Durante el período correspondiente al mes de septiembre de 2026 se identificaron hallazgos asociados al indicador E10, evidenciándose un (1) incumplimiento en la UFI 1, correspondiente al PR 7; cuatro (4) incumplimientos en la UFI 2, correspondientes a los PR 42, 43, 44 y 45; no se reportaron incumplimientos en la UFI 3; doce (12) incumplimientos en la UFI 4, correspondientes a los PR 2, 7, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 24, 28, 29 y 38; once (11) incumplimientos en la UFI 5, distribuidos así: diez (10) en la UFI 5.1, correspondientes a los PR 2, 5, 6, 7, 10, 14, 26, 31, 35 y 37, y un (1) incumplimiento en la UFI 5.2, correspondiente al PR 20; siete (7) incumplimientos en la UFI 6.1, correspondientes a los PR 30, 35, 37, 42, 43, 44 y 45. Para las UFI 7 y UFI 8 no se reportaron incumplimientos asociados a este indicador.

Todos los hallazgos fueron reparados dentro del plazo contractual establecido, correspondiente a una (1) semana contada a partir de la notificación o publicación en el SICC, con excepción de las obras de la 2 y 6.1 que se encuentran tapadas por la comunidad, al inicio de la etapa de reversión estaba vigente un evento eximente de responsabilidad, para UFI2 y 6.1- Cumplimiento Indicador E10 (Obras Hidráulicas) debido al taponamiento de las Obras Hidráulicas por parte de la comunidad. Evento Eximente

de Responsabilidad otorgado por el Amigable Componedor en decisión del 10 de abril de 2024 (trámite 146289), para solucionar esta problemática se requiere la construcción de compuertas conforme lo autorizado por la CVS, no obstante, en la etapa de reversión no siguen vigentes las obligaciones de construcción.

En las gráficas mostradas a continuación, se presenta el estado de cumplimiento por unidad funcional y por mes desde enero de 2024 hasta el presente periodo, del indicador E10 - Drenajes Superficiales, longitudinal y transversal:

Grafica 16 Gráficas de Cumplimiento Indicador E10

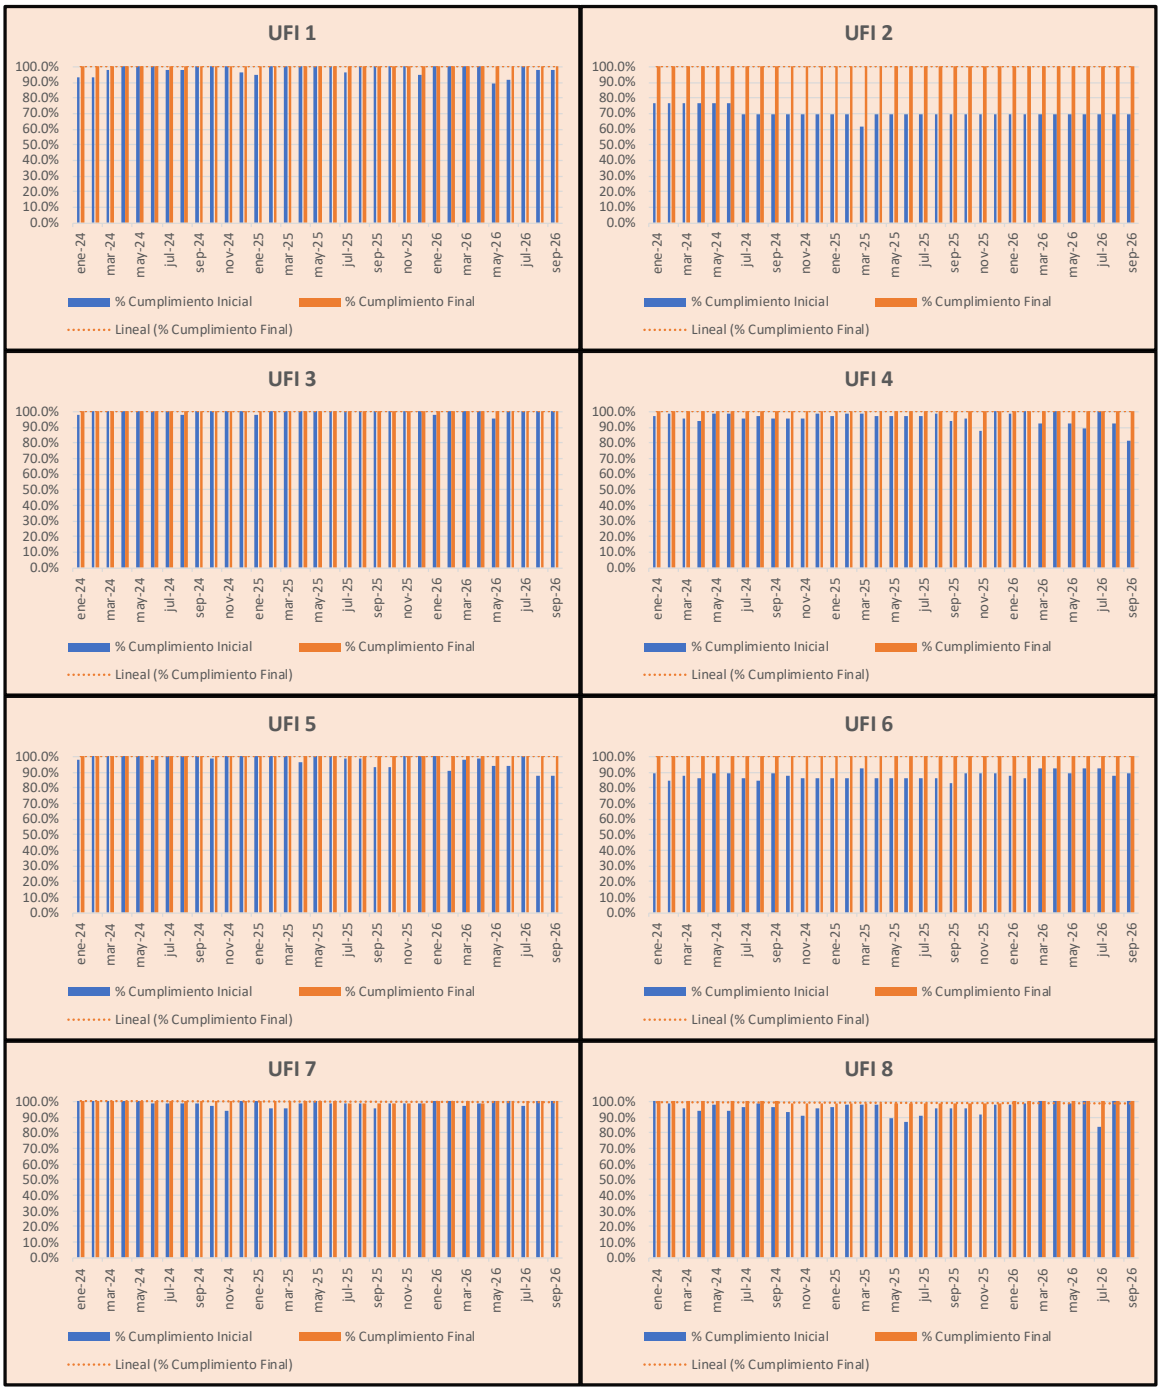

Fuente: Informe Mensual No. 122 del Consorcio CR Concesiones – Actualizado por Consorcio IPAB

Por tanto, la Interventoría manifiesta el estado de cumplimiento para el indicador ***E10 - capacidad hidráulica*** de las obras de drenaje en cuanto a grado de colmatación menor al 25% según los requisitos del Apéndice Técnico 4 del Contrato, con excepción de las obras tapadas por la comunidad en las unidades funcionales 2 y 6, por las razones expuestas en los párrafos anteriores.

Tabla 4-64. Registro fotográfico de Cumplimiento Indicador E10

	
to 2. Limpieza Obra de drenaje Longitudinal PR10+700 de la UFI 5.1	to 3. Limpieza Obra de drenaje Transversal PR5+200 de la UFI 5.1

Fuente propia – Consorcio IPAB

4.3.9.10. Indicador E11 – Señalización Vertical

Durante el período correspondiente al mes de septiembre de 2026 se identificaron hallazgos asociados al indicador evaluado, evidenciándose dieciséis (16) incumplimientos en la UFI 1, correspondientes a los PR 16, 17, 18, 19, 20, 40, 41, 43, 44, 51, 52, 57, 58, 59, 60 y 61; cuatro (4) incumplimientos en la UFI 2, correspondientes a los PR 42, 43, 44 y 45; ocho (8) incumplimientos en la UFI 3, distribuidos así: dos (2) en la UFI 3.1, correspondientes a los PR 1 y 2 de las Intersecciones No. 1 y No. 2; uno (1) en la UFI 3.2, correspondiente a la Intersección No. 3; dos (2) en la UFI 3.3, correspondientes a los PR 18 y 19; y los restantes en la UFI 3.5, correspondientes a la Intersección No. 6; siete (7) incumplimientos en la UFI 4, distribuidos así: cinco (5) en la UFI 4.1, correspondientes a los PR 44, 45, 46, 48 y 49, y dos (2) en la UFI 4.2, correspondientes a los PR 48 y 49; nueve (9) incumplimientos en la UFI 5, distribuidos así: ocho (8) en la UFI 5.1, correspondientes a los PR 8, 11, 35, 42, 48, 56, 58 y 62, y uno (1) en la UFI 5.2, correspondiente al PR 7; no se reportaron incumplimientos en la UFI 6; ocho (8)

incumplimientos en la UFI 7, correspondientes a los PR 1, 2, 8, 14, 18, 19 y 23, y a la Intersección No. 16 de la UFI 7.3; y ocho (8) incumplimientos en la UFI 8, distribuidos así: tres (3) en la UFI 8.2, correspondientes a los PR 97, 102 y 103, y cinco (5) en la UFI 8.3, correspondientes a los PR 0, 40, 45, 49 y 50.

Al cierre de este informe, dichos incumplimientos fueron reparados dentro del plazo de reparación establecido en el Apéndice Técnico 4, correspondiente a una (1) semana para las señales que incumplen la retroreflectividad y cuarenta y ocho (48) horas para las señales ilegibles y/o dañadas.

Los resultados para el indicador E11, son diligenciados en los formatos de medición que se incluyen en el Anexo 6. “operación y mantenimiento” del presente informe.

Grafica 17 Gráficas de Cumplimiento Indicador E11



Fuente: Informe Mensual No. 122 del Consorcio CR Concesiones – Actualizado por Consorcio IPAB

4.3.9.11. Indicador E12 – Señalización Horizontal

Para las UFI 1, 2, 3, 4 y 5, los resultados de la medición semestral fueron publicados en el SICC durante el mes de julio de 2026. En la mayoría de los segmentos se identificaron hallazgos asociados a la retrorreflectividad de las líneas y a la falta de tachas. Frente a estos hallazgos, el Concesionario realizó las respectivas actividades de reparación; no obstante, durante la verificación efectuada por la Interventoría en el mes de agosto de 2026, se evidenciaron cuarenta y ocho (48) incumplimientos en la UFI 1; no se identificaron incumplimientos en la UFI 2; treinta y tres (33) incumplimientos en la UFI 3; treinta (30) incumplimientos en la UFI 4; y cuarenta y dos (42) incumplimientos en la UFI 5, asociados principalmente a la falta de tachas. En consecuencia, estos segmentos fueron calificados como no conformes en el SICC, afectando las respectivas actas del índice de cumplimiento correspondientes al mes de agosto de 2026. Posteriormente, durante el mes de septiembre de 2026, el Concesionario realizó la instalación de la totalidad de las tachas faltantes, con lo cual los segmentos verificados quedaron conformes para este indicador.

Para las UFI 6.1, 6.2 y 6.3.1, los resultados de la última medición realizada en etapa de reversión fueron publicados en la plataforma SICC (Sistema Informático de Contabilidad y Control) por el Consorcio IPAB en el mes de julio de 2026, en la mayoría de los segmentos se presentaron hallazgos por la retrorreflectividad de las líneas o por falta de tachas, estos hallazgos fueron reparados por el Concesionario y verificados por la Interventoría.

Para las UFIs 7 y 8, los resultados de la última medición realizada en etapa de reversión fueron publicados en la plataforma SICC (Sistema Informático de Contabilidad y Control) por el Consorcio IPAB en el mes de julio de 2026, los hallazgos identificados fueron reparados por parte del Concesionario.

En las gráficas mostradas a continuación, se presenta el estado de cumplimiento, desde el mes de enero de 2024 hasta el presente periodo:

Grafica 18 Gráficas de Cumplimiento Indicador E12




Fuente: Informe Mensual No. 122 del Consorcio CR Concesiones – Actualizado por Consorcio IPAB

4.3.9.12. Indicador E13 - Defensas Metálicas

Durante el período correspondiente al mes de septiembre de 2026 se identificaron hallazgos asociados al indicador E13, evidenciándose tres (3) incumplimientos en la UFI 3, distribuidos así: un (1) incumplimiento en la UFI 3.2, correspondiente al PR 7; un (1) incumplimiento en la UFI 3.4, correspondiente a la Intersección No. 5; y un (1) incumplimiento en la UFI 3.5, correspondiente a la Intersección No. 6; y un (1) incumplimiento en la UFI 5.1, correspondiente al PR 48. Para las UFI 1, 2, 4, 6, 7 y 8 no se reportaron incumplimientos asociados a este indicador.

En las gráficas mostradas a continuación, se presenta el estado de cumplimiento por unidad funcional y por mes desde enero de 2024 hasta el presente periodo, del indicador E13– defensas metálicas:

Grafica 19 Gráfica de Cumplimiento Indicador E13

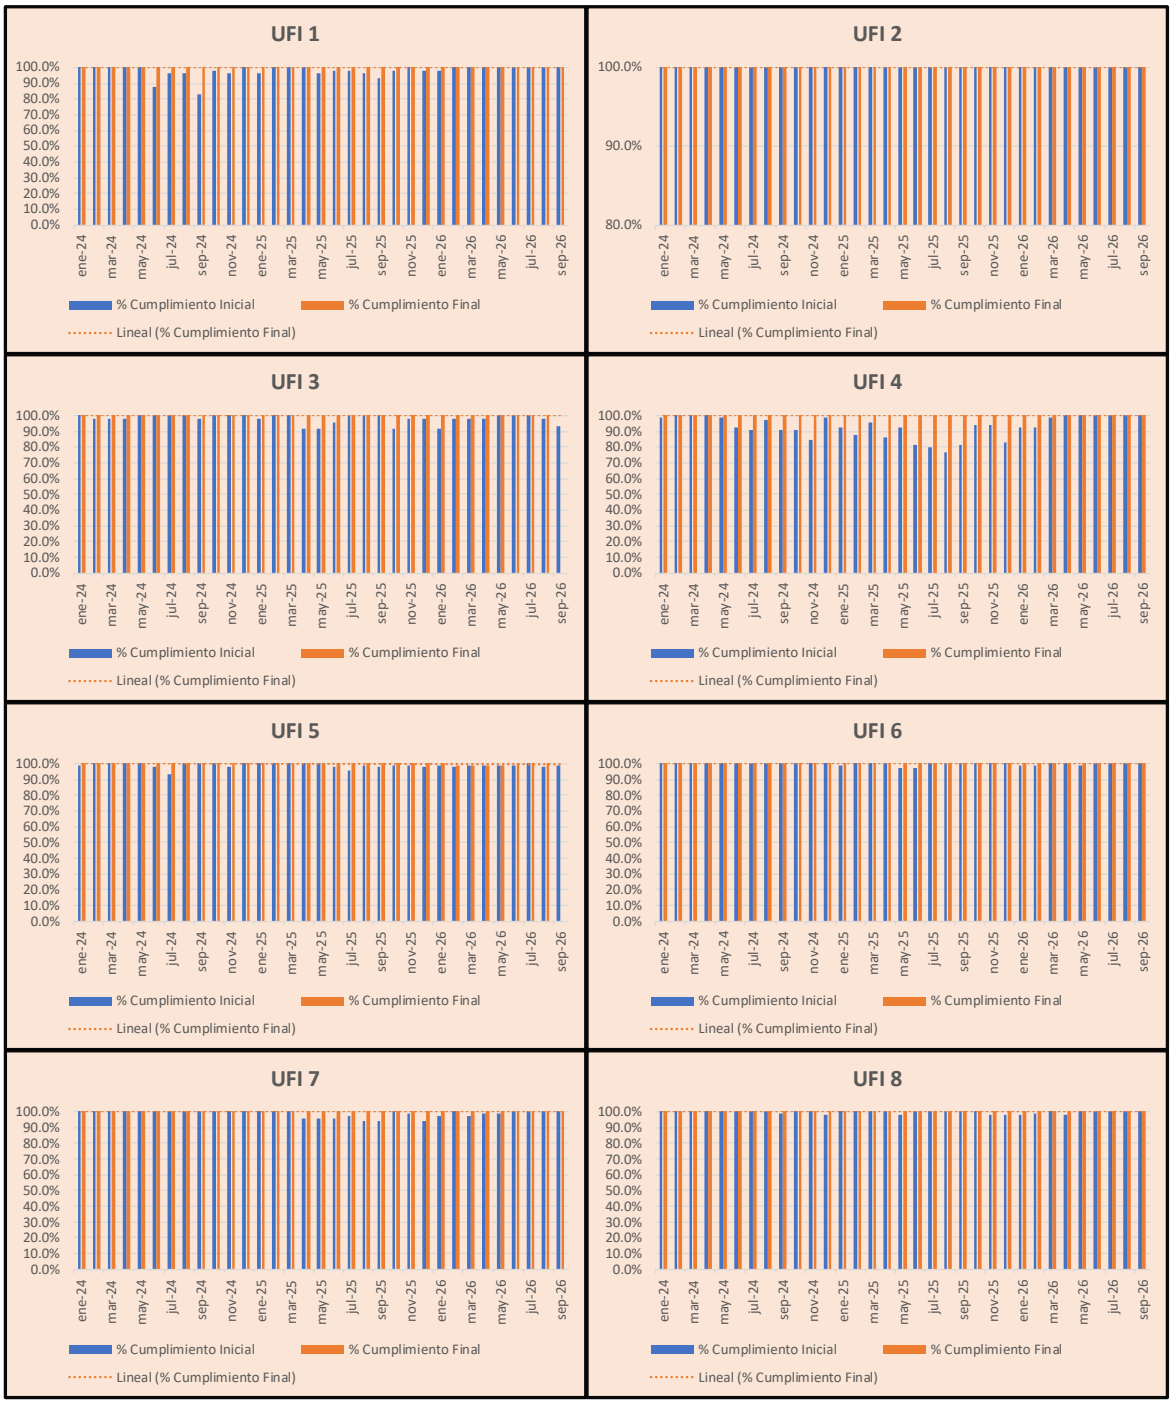

Fuente: Informe Mensual No. 122 del Consorcio CR Concesiones – Actualizado por Consorcio IPAB

Tabla 4-65. Registro fotográfico de Cumplimiento Indicador E13



to 4. Mantenimiento Defensas UFI 5.1

Fuente Propia – Consorcio IPAB

4.3.9.13. Indicador E14 – Iluminación

Durante el período correspondiente al mes de septiembre de 2026 se identificaron los siguientes hallazgos: seis (6) incumplimientos en la UFI 1, correspondientes a los PR 11, 16, 24, 13, 51 y 52; no se reportaron incumplimientos en la UFI 2; siete (7) incumplimientos en la UFI 3, distribuidos así: dos (2) en las Intersecciones No. 1 y No. 2 de la UFI 3.1, uno (1) en el PR 9 y la Intersección No. 3 de la UFI 3.2, uno (1) en la Intersección No. 4 de la UFI 3.3, uno (1) en el PR 1 de la UFI 3.3 y uno (1) en el PR 1 de la UFI 3.5; tres (3) incumplimientos en la UFI 4.1, correspondientes a los PR 10, 29 y 38; seis (6) incumplimientos en la UFI 5, distribuidos así: cuatro (4) en la UFI 5.1, correspondientes a los PR 24, 33, 41 y 42, y dos (2) en la UFI 5.2, correspondientes a los PR 21 y 25; un (1) incumplimiento en la UFI 6.1, correspondiente al PR 32; un (1) incumplimiento en la UFI 7.2, correspondiente a la Intersección No. 11; y un (1) incumplimiento en la UFI 8.3, correspondiente al PR 23. Para las demás Unidades Funcionales de Intervención no se presentaron hallazgos asociados al indicador evaluado.

Los hallazgos fueron reparadas dentro del plazo contractual de reparación de una (1) semana, conforme a lo establecido en el Apéndice Técnico 4.

En las gráficas mostradas a continuación, se presenta el estado de cumplimiento por unidad funcional y por mes desde enero de 2024 hasta el presente periodo, del indicador E14 – iluminación:

Grafica 20 Gráfica de Cumplimiento Indicador E14



Fuente: Informe Mensual No. 122 del Consorcio CR Concesiones – Actualizado por Consorcio IPAB

Tabla 4-66. Registro fotográfico de verificación Indicador E14

	
oto 5. Verificación de luminarias, UFI 1	oto 6. Verificación de luminarias UFI 7.3

Fuente Propia – Consorcio IPAB

4.3.9.14. Indicador E15 - Puentes y Estructuras

Con base en la información reportada por la anterior Interventoría en la plataforma SICC y las mediciones realizadas por el Consorcio IPAB, a continuación, se relacionan las fechas en las que se realizó la medición y publicación del indicador E15 para los puentes de cada unidad funcional del proyecto Antioquia – Bolívar.

En relación con el indicador E15, En septiembre de 2025 se publicaron en el SICC los resultados correspondientes a la UFI 8.2; en octubre de 2025 se realizó la medición en las UFI 4 y 5; y en diciembre de 2025 se efectuó la medición en las UFI 1 y 3, cuyos resultados se encontraban vigentes durante el período objeto de seguimiento.

En la UFI 5.1, específicamente en el PR 19+350, se presentó el 07 de febrero de 2026 la afectación del puente Trementino II, como consecuencia de las fuertes lluvias y las crecientes súbitas de los cauces. Ante esta situación, el Concesionario construyó una vía alterna para garantizar la transitabilidad mientras se adelanta la construcción del nuevo puente. Actualmente, el puente Trementino II se encuentra en proceso de construcción.

Posteriormente, en abril de 2026 se realizó la medición y publicación del indicador E15 en la UFI 7.2, correspondiente a la Variante Coveñas, cuyos hallazgos fueron reparados por el Concesionario dentro del plazo establecido de un (1) mes. En junio de 2026 se

realizó la medición y publicación del indicador en la UFI 8.3, cuyos hallazgos igualmente fueron atendidos dentro del plazo de reparación establecido en el Apéndice Técnico 4, correspondiente a un (1) mes. En agosto de 2026 se publicaron en el SICC los resultados correspondientes a las UFI 2, 6.1 y 6.2, los incumplimientos identificados en la UFI 6.2 los cuales fueron reparados por el Concesionario.

Finalmente, en el marco de la etapa de reversión, se realizó la medición del indicador E15 en la totalidad de los puentes de las diferentes Unidades Funcionales, cuyos resultados fueron cargados en la plataforma SICC durante el mes de julio de 2026. Los incumplimientos identificados fueron atendidos por el Concesionario mediante las respectivas actividades de reparación, dentro del plazo establecido de un (1) mes. En consecuencia, para efectos del seguimiento del indicador, se tomará como fecha de referencia el mes de julio de 2026 para el inicio del período de un (1) año correspondiente a la siguiente medición, en caso de que esta llegue a requerirse.

Los inventarios de verificación de acuerdo con medición anual realizada sobre el indicador E15 Puentes, confirman el estado funcional y estructural de los puentes según los requisitos del Apéndice Técnico 4, en cuanto a conectores metálicos, juntas de expansión, superficie de pintura, barreras de seguridad, roturas, estado de conexiones en cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas en el Apéndice Técnico 4 y de acuerdo con los requerimientos de verificación del procedimiento de verificación de SIPUCOL.

En las gráficas mostradas a continuación, se presenta el estado de cumplimiento, del indicador E15 de puentes, de las últimas mediciones realizadas:

Grafica 21 Gráfica de Cumplimiento Indicador E15



Fuente: Informe Mensual No. 122 del Consorcio CR Concesiones

4.3.9.15. Indicador E16 – Capacidad Estructural

Con base en la información reportada por la anterior Interventoría en la plataforma SICC y las mediciones realizadas por el Consorcio IPAB, a continuación, se relacionan las fechas en las que se realizó la medición y publicación del indicador E16 para los puentes de cada unidad funcional del proyecto Antioquia – Bolívar.

UF1, UF3 en el mes de septiembre 2025, se publicaron los resultados de las mediciones, los incumplimientos presentados en la UFI 1, dado que la medición es con frecuencia bienal, se encuentra vigente la medición.

UFI 2, Publicado el día 24 de septiembre de 2025, dado que la medición es con frecuencia bienal, se encuentra vigente la medición.

UF 4, UF 5, en el mes de abril 2026 se publicaron los resultados en el SICC de la medición bienal, realizada conforme la programación remitida por el Consorcio IPAB mediante comunicado IPAB-026-2026 de fecha 04 de marzo de 2026, dirigido al Concesionario, sin embargo, no se encontraron incumplimientos en estas unidades funcionales.

UF6, UF7.3 Revisión realizada en el SICC a finales de septiembre de 2025, los incumplimientos presentados en la UFI 6, dado que la medición es con frecuencia bienal, se encuentra vigente la medición.

UF8.1, UF8.2. En el mes de septiembre de 2025 se le colocó en estado revisión realizada en el SICC, dado que la medición es con frecuencia bienal, se encuentra vigente la medición.

UFI 7.2, UF8.3 se realizó la publicación en el mes de abril de 2026, conforme lo programado por el consorcio IPAB mediante comunicado IPAB-026-2026 de fecha 04 de marzo de 2026, remitió al Concesionario, los hallazgos identificados en la UFI 7.2, fueron reparados por el Concesionario dentro del plazo de reparación de 3 meses.

En las gráficas mostradas a continuación, se presenta el estado de cumplimiento, del indicador E16 de puentes, de las últimas mediciones realizadas:

Grafica 22 Gráfica de Cumplimiento Indicador E16



Fuente: Informe Mensual No. 122 del Consorcio CR Concesiones

4.3.9.16. Indicador E17 – Disponibilidad de la vía

Indicador cumplido. No obstante, durante el mes de febrero de 2026, se presentó un evento por inundaciones generando flujo laminar de agua sobre la vía en algunos sectores de la UFI 1 tramo Caucasia – Planeta Rica y en la Unidad Funcional 5.1 tramo puerto Rey - Montería, siendo de mayor afectación en esta última, debido a que el 07 de febrero de 2026 a raíz de las fuertes lluvias se generaron crecientes súbitas en los cauces, ocasionando la afectación de uno de los estribos del puente Trementino II, ubicado en el PR 19+350 de la UFI 5.1, en el tramo Puerto Rey – Montería. Como consecuencia de esta situación, el INVÍAS expidió la Resolución 0281 del 09 de febrero de 2026, mediante la cual se autorizó el cierre total de la vía Montería – Puerto Rey – Montería en la ruta nacional 7401, entre los PR 18+000 y PR 21+000, así como entre los PR 53+000 y PR 63+340. No obstante, esta condición no genera la calificación de incumplimiento del indicador, teniendo en cuenta que el Apéndice Técnico 4 del Contrato de Concesión 016 de 2015, en el método de medición del indicador E17, establece que:

“No se consideran interrupciones de la disponibilidad de la vía aquellas generadas por interrupciones en la circulación de vehículos derivadas de la indisponibilidad de túneles y puentes.”

En este sentido, considerando que la indisponibilidad de la Unidad Funcional 5.1 en el tramo Puerto Rey – Montería obedece a la afectación del puente Trementino II, y que el tramo comprendido entre el PR 53+000 y el PR 63+340 presentó restricciones temporales por inundaciones que ya cesaron, permitiendo actualmente el tránsito vehicular, no se califica el indicador como incumplido.


Se aclara que el Concesionario construyó una vía alterna en el PR 19+350 de la UFI 5.1, la cual entró en operación el 26 de marzo de 2026, permitiendo el tránsito vehicular y garantizando la continuidad de la movilidad en el corredor Puerto Rey – Montería. Asimismo, presentó los diseños para la construcción del nuevo puente Trementino II,

cuya ejecución se encuentra actualmente en curso. De igual manera, el Concesionario ejecutó las obras de reconstrucción de los taludes afectados en las UFI 1 y 5.1.

4.3.9.17. Indicador O1– Mortalidad

Cumplido. Durante el periodo evaluado, el Concesionario continuó desarrollando estrategias de carácter social mediante campañas de información y sensibilización dirigidas a los usuarios del corredor y a la comunidad en general, con el propósito de promover la cultura vial. De igual manera, se evidenció la presencia de la DITRA realizando operativos de control de velocidad y pruebas de alcoholemia, orientados a la prevención de siniestros viales en el corredor. Si bien se registraron víctimas mortales asociadas al comportamiento inadecuado de algunos actores viales, estas situaciones no generan afectación al indicador O1 en ninguna de las unidades funcionales, conforme a lo establecido en el Apéndice Técnico 4.

Grafica 23 Gráfica Indicador de Mortalidad O1

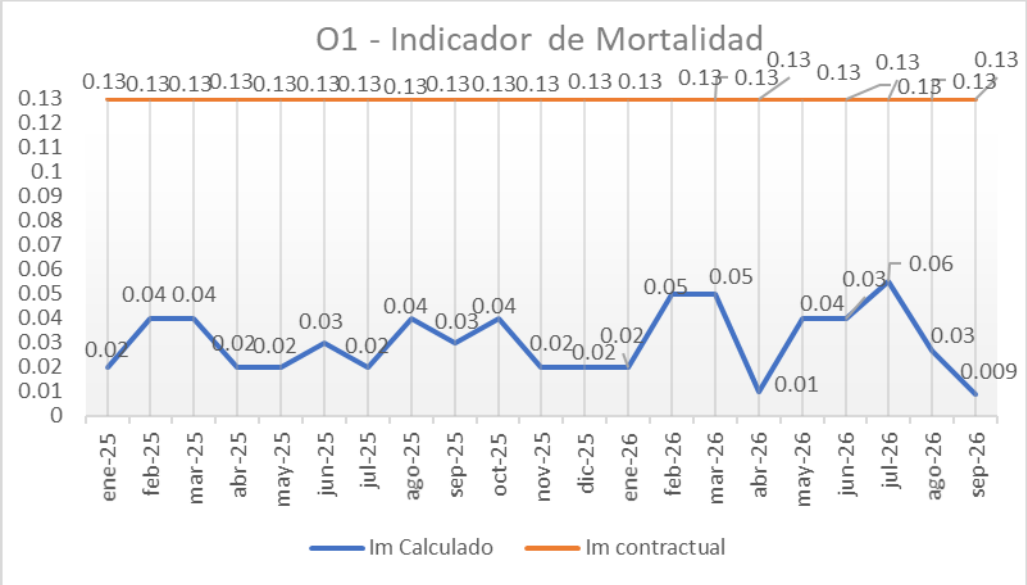

Fuente: Informe Mensual No. 122 de la anterior Interventoría – Actualizado por Consorcio IPAB

4.3.9.18. Indicador O2 – Disponibilidad y ocupaciones de carriles

Cumplido. Durante el periodo, no se presentaron eventos que afectaran la disponibilidad de los carriles según los requisitos y términos establecidos en el Apéndice Técnico 4 del

contrato. El Concesionario no realizó actividad vinculada al mantenimiento correctivo o preventivo que propiciara la retención de vehículos con longitudes mayores a 300 metros.

4.3.9.19. Indicador O3 – Cola de Peaje

Cumplido. Durante el periodo, en las visitas de inspección y verificación para realizar auditorías operativas en las estaciones de peaje La Apartada, Cedros, San Carlos, San Onofre y Purgatorio, *no se* evidenció acumulación mayor a diez (10) vehículos por carril por un periodo mayor a 60 minutos que afectará el indicador O3 - Cola de peajes según los requisitos establecidos en el Apéndice Técnico 4 del Contrato.

4.3.9.20. Indicador O4 – Tiempos de Atención de Incidentes

Evaluado en el SICC Cumplido. Durante el presente periodo, en la medición del nivel de servicio O4 - Tiempos de Atención de incidentes, en la medida de sus posibilidades en la disponibilidad del equipo durante el momento del evento, el Concesionario continúa asistiendo a los usuarios varados sobre la vía cumpliendo con los tiempos de atención de Incidentes en la asistencia con carro taller y protocolo de señalización en todas las unidades del proyecto según la cobertura de la base operativa instalada.


4.3.9.21. Indicador O5 – Tiempos de Atención de Accidentes

Evaluado en el SICC Cumplido. Durante el presente periodo, en la medición del indicador O5 - Tiempos de Atención de Accidentes según reportes, el Concesionario cumplió con el tiempo de respuesta de mínimo 30 min para cada evento presentado según la obligación contractual del Apéndice Técnico 2.

4.3.9.22. Indicador O6 – Disponibilidad del SICC

Evaluado en el SICC Cumplido. Durante el presente periodo, en la medición del indicador O6 – Disponibilidad del SICC, el Concesionario cumplió con la disponibilidad mínima del 99% según la obligación contractual del Apéndice Técnico 4.

Grafica 24 Gráfica Indicador de Disponibilidad del SICC - O6

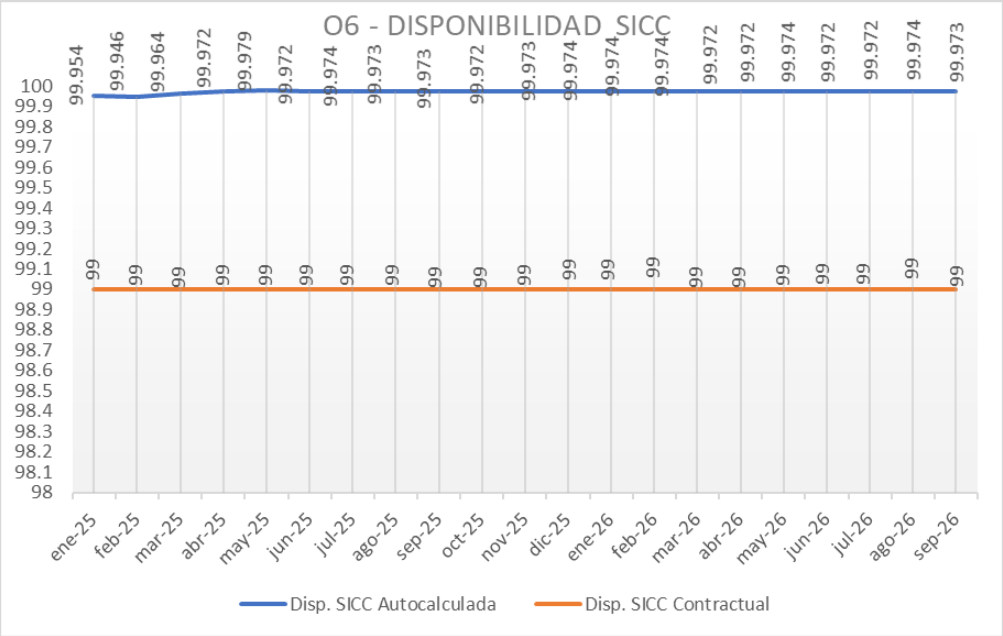

Fuente: Informe Mensual No. 122 de la anterior Interventoría – Actualizado por Consorcio IPAB

En general, los registros de medición de indicadores (E3-fisuras), (E6-bermas y cunetas), (E7-Hundimientos), (E8-altura de vegetación), (E10-obras de drenaje), (E11-señalización vertical), (E12-señalización horizontal), (E13-barreras y elementos de contención), (E14-Iluminación) establecidos en la tabla 1. Numeral 3. del Apéndice Técnico 4 se incluyen en el Anexo 6. “operación y mantenimiento” del presente informe.

4.3.10. Resumen Indicadores de Operación y Mantenimiento en etapa de Reversión

Tabla 4-67. Resumen Indicadores

Estado de cumplimiento Indicadores - UF1-UF2-UF3-UF4-UF5-UF6, UF7 y UF8 - septiembre de 2026											
UFI	**Indicador**	**sep-26**									
		CUMPLE		**Registro**		**Plazo**	**Fecha Revisión Realizada en el SICC**	**Fecha Máxima de Corrección**	**Próxima publicación en el SICC**	**Hallazgos identificados**	**Estado de cumplimiento**
		SI	**NO**	**Comunicado**	**REV SICC**						
UNIDAD FUNCIONAL 1	E1		X	IPAB-482-2026	1893	3 MESES	lunes, 27 de julio de 2026	martes, 27 de octubre de 2026	miércoles, 27 de enero de 2027	No se reporta Incumplimientos, UF1	No se genera descuento, porque no se identificaron hallazgos.
	E2		X	IPAB-482-2026	1898	3 MESES	lunes, 27 de julio de 2026	martes, 27 de octubre de 2026	miércoles, 27 de enero de 2027	No se reporta Incumplimientos,UF1	No se genera descuento, porque no se identificaron hallazgos.
	E3		X		2101	1 MES	lunes, 21 de septiembre de 2026	miércoles, 21 de octubre de 2026	miércoles, 21 de octubre de 2026	Mensual - 19 Incumplimientos PR (5,6,16,17,18,19,20,21,22,29,30,44,45,53,54,57,58,59,60) UF1	No se genera descuento, porque se encuentra dentro del plazo de corrección contractual.
	E4	X		IPAB-482-2026	1911	3 MESES	lunes, 27 de julio de 2026	martes, 27 de octubre de 2026	miércoles, 27 de enero de 2027	No se reporta Incumplimientos, UF1	No se genera descuento, porque no se identificaron hallazgos.

Estado de cumplimiento Indicadores - UF1-UF2-UF3-UF4-UF5-UF6, UF7 y UF8 - septiembre de 2026											
UFI	Indicador	sep-26									
		CUMPLE		Registro		Plazo	Fecha Revisión Realizada en el SICC	Fecha Máxima de Corrección	Próxima publicación en el SICC	Hallazgos identificados	Estado de cumplimiento
		SI	NO	Comunicado	REV SICC						
	E5	X		IPAB-482-2026	1916	3 MESES	lunes, 27 de julio de 2026	martes, 27 de octubre de 2026	miércoles, 27 de enero de 2027	No se reporta Incumplimientos, UF1	No se genera descuento, porque no se identificaron hallazgos.
	E6		X		2102	24 HORAS	lunes, 21 de septiembre de 2026	martes, 22 de septiembre de 2026	miércoles, 21 de octubre de 2026	Mensual - 14 Incumplimientos PR (5,18,19,21,24,28,30,35,36, 40,41,42,49,60,)UF1	No se genera descuento, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual.
	E7	X			2106	2 SEMANAS	lunes, 21 de septiembre de 2026	lunes, 5 de octubre de 2026	miércoles, 21 de octubre de 2026	Mensual - No se reporta IncumplimientosUF1	No se genera descuento, porque no se identificaron hallazgos.
	E8		X		2152	1 SEMANA	martes, 29 de septiembre de 2026	martes, 6 de octubre de 2026	jueves, 29 de octubre de 2026	Mensual - se reporta 7 IncumplimientosUF1 PR (34,35,36,37,38,39,40)	No se genera descuento, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual.
	E10		X		2153	1 SEMANA	martes, 29 de septiembre de 2026	martes, 6 de octubre de 2026	jueves, 29 de octubre de 2026	Mensual - se reporta 1 Incumplimiento; PR (7) UFI1	No se genera descuento, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual.

Estado de cumplimiento Indicadores - UF1-UF2-UF3-UF4-UF5-UF6, UF7 y UF8 - septiembre de 2026											
UFI	Indicador	sep-26									
		CUMPLE		Registro		Plazo	Fecha Revisión Realizada en el SICC	Fecha Máxima de Corrección	Próxima publicación en el SICC	Hallazgos identificados	Estado de cumplimiento
		SI	NO	Comunicado	REV SICC						
	E11		X		2154	1 SEMANA/ 48 HORAS	martes, 29 de septiembre de 2026	martes, 6 de octubre de 2026	jueves, 29 de octubre de 2026	Mensual- 15 incumplimientos PR(16,17,18,19,20,40,41,43,44,51,52,57,58,59,60,61) UFI1	No se genera descuento, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual.
	E12		X	IPAB-0600-2026	2012	1 SEMANA	martes, 4 de agosto de 2026	martes, 11 de agosto de 2026	jueves, 4 de febrero de 2027	58 incumplimientos PR(3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61),UF1	No se genera descuento, porque fue reparado en el mes de septiembre.
	E13	X			2113	1 MES	lunes, 21 de septiembre de 2026	miércoles, 21 de octubre de 2026	miércoles, 21 de octubre de 2026	Mensual - No se reporta IncumplimientosUF1	No se genera descuento, porque no se identificaron hallazgos.

Estado de cumplimiento Indicadores - UF1-UF2-UF3-UF4-UF5-UF6, UF7 y UF8 - septiembre de 2026											
UFI	Indicador	sep-26									
		CUMPLE		Registro		Plazo	Fecha Revisión Realizada en el SICC	Fecha Máxima de Corrección	Próxima publicación en el SICC	Hallazgos identificados	Estado de cumplimiento
		SI	NO	Comunicado	REV SICC						
	E14		X		2144	1 SEMANA	martes, 29 de septiembre de 2026	martes, 6 de octubre de 2026	jueves, 29 de octubre de 2026	se reporta 6 Incumplimientos,PR (11,16,24,43,51,52,)UF1	No se genera descuento, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual.
	E15		X		1165	1 MES	lunes, 24 de noviembre de 2025	miércoles, 24 de diciembre de 2025	martes, 24 de noviembre de 2026	Se reportan 6 Incumplimientos PR(6,16,19,21,34,49,) UF1	No se genera descuento, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual.
	E16		X	IPAB-674-2026	1019	3 MESES	viernes, 26 de septiembre de 2025	viernes, 26 de diciembre de 2025	domingo, 26 de septiembre de 2027	Bienal - 3 incumplimiento (PR 19,34,61)UF1	No se genera descuento, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual.
	E17	X			2165	3 MESES	miércoles, 30 de septiembre de 2026	miércoles, 30 de diciembre de 2026	viernes, 30 de octubre de 2026	Mensual - No se reporta IncumplimientosUF1	No se genera descuento, porque no se identificaron hallazgos.

Estado de cumplimiento Indicadores - UF1-UF2-UF3-UF4-UF5-UF6, UF7 y UF8 - septiembre de 2026												
UFI	Indicador	sep-26										
		CUMPLE		Registro		Plazo	Fecha Revisión Realizada en el SICC	Fecha Máxima de Corrección	Próxima publicación en el SICC	Hallazgos identificados	Estado de cumplimiento
		SI	NO	Comunicado	REV SICC						
UNIDAD FUNCIONAL 2	E1	X		IPAB-482-2026	1894	3 MESES	lunes, 27 de julio de 2026	martes, 27 de octubre de 2026	miércoles, 27 de enero de 2027	Semestral - 0 Incumplimientos	No se genera descuento, porque no se identificaron hallazgos.
	E2	X		IPAB-482-2026	1899	3 MESES	lunes, 27 de julio de 2026	martes, 27 de octubre de 2026	miércoles, 27 de enero de 2027	Semestral - 0 Incumplimientos	No se genera descuento, porque no se identificaron hallazgos.
	E3		X		2123	1 MES	lunes, 21 de septiembre de 2026	miércoles, 21 de octubre de 2026	miércoles, 21 de octubre de 2026	Mensual - no se reporta incumplimiento	No se genera descuento, porque no se identificaron hallazgos.
	E4	X		IPAB-482-2026	1912	3 MESES	lunes, 27 de julio de 2026	martes, 27 de octubre de 2026	miércoles, 27 de enero de 2027	Semestral - 0 Incumplimientos	No se genera descuento, porque no se identificaron hallazgos.
	E5	X		IPAB-482-2026	1917	3 MESES	lunes, 27 de julio de 2026	martes, 27 de octubre de 2026	miércoles, 27 de enero de 2027	Semestral - 0 Incumplimientos	No se genera descuento, porque no se identificaron hallazgos.
	E6	X			2124	24 HORAS	lunes, 21 de septiembre de 2026	martes, 22 de septiembre de 2026	miércoles, 21 de octubre de 2026	Mensual - no se reporta incumplimiento	No se genera descuento, porque no se identificaron hallazgos.

Estado de cumplimiento Indicadores - UF1-UF2-UF3-UF4-UF5-UF6, UF7 y UF8 - septiembre de 2026											
UFI	Indicador	sep-26									
		CUMPLE		Registro		Plazo	Fecha Revisión Realizada en el SICC	Fecha Máxima de Corrección	Próxima publicación en el SICC	Hallazgos identificados	Estado de cumplimiento
		SI	NO	Comunicado	REV SICC						
	E7	X			2126	2 SEMANAS	lunes, 21 de septiembre de 2026	lunes, 5 de octubre de 2026	miércoles, 21 de octubre de 2026	Mensual - no se reporta incumplimiento	No se genera descuento, porque no se identificaron hallazgos.
	E8	X			2095	1 SEMANA	lunes, 21 de septiembre de 2026	lunes, 28 de septiembre de 2026	miércoles, 21 de octubre de 2026	Mensual - no se reporta incumplimiento	No se genera descuento, porque no se identificaron hallazgos.
	E10		X		2127	1 SEMANA	lunes, 21 de septiembre de 2026	lunes, 28 de septiembre de 2026	miércoles, 21 de octubre de 2026	Se reporta 4 incumplimiento PR(42,43,44,45) UF 2	No se genera descuento, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual.
	E11	X			2128	1 SEMANA/ 48 HORAS	lunes, 21 de septiembre de 2026	lunes, 28 de septiembre de 2026	miércoles, 21 de octubre de 2026	Mensual - no se reporta incumplimiento	No se genera descuento, porque no se identificaron hallazgos.
	E12		X	IPAB-0600-2026	2014	1 SEMANA	martes, 4 de agosto de 2026	martes, 11 de agosto de 2026	jueves, 4 de febrero de 2027	Se reportan 15 incumplimientos PR (29,30,31,32,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47)	No se genera descuento, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual.

Estado de cumplimiento Indicadores - UF1-UF2-UF3-UF4-UF5-UF6, UF7 y UF8 - septiembre de 2026											
UFI	Indicador	sep-26									
		CUMPLE		Registro		Plazo	Fecha Revisión Realizada en el SICC	Fecha Máxima de Corrección	Próxima publicación en el SICC	Hallazgos identificados	Estado de cumplimiento
		SI	NO	Comunicado	REV SICC						
	E13	X			2114	1 MES	lunes, 21 de septiembre de 2026	miércoles, 21 de octubre de 2026	miércoles, 21 de octubre de 2026	Mensual - no se reporta incumplimiento	No se genera descuento, porque no se identificaron hallazgos.
	E14		X		2129	1 SEMANA	lunes, 21 de septiembre de 2026	lunes, 28 de septiembre de 2026	miércoles, 21 de octubre de 2026	Mensual - no se reporta incumplimiento	No se genera descuento, porque no se identificaron hallazgos.
	E15	X			2021	1 MES	miércoles, 26 de agosto de 2026	sábado, 26 de septiembre de 2026	jueves, 26 de agosto de 2027	Anual - 0 Incumplimientos	No se genera descuento, porque no se identificaron hallazgos.
	E16		X	IPAB-674-2026	1015	3 MESES	jueves, 25 de septiembre de 2025	jueves, 25 de diciembre de 2025	sábado, 25 de septiembre de 2027	Bienal presentan 2 incumplimientos (38,39)	No se genera descuento, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual.
	E17	X			2166	3 MESES	miércoles, 30 de septiembre de 2026	miércoles, 30 de diciembre de 2026	viernes, 30 de octubre de 2026	Mensual - no se reporta incumplimiento	No se genera descuento, porque no se identificaron hallazgos.

Estado de cumplimiento Indicadores - UF1-UF2-UF3-UF4-UF5-UF6, UF7 y UF8 - septiembre de 2026												
UFI	Indicador	sep-26										
		CUMPLE		Registro		Plazo	Fecha Revisión Realizada en el SICC	Fecha Máxima de Corrección	Próxima publicación en el SICC	Hallazgos identificados	Estado de cumplimiento
		SI	NO	Comunicado	REV SICC						
UNIDAD FUNCIONAL 3	E1	X		IPAB-482-2026	1895	3 MESES	lunes, 27 de julio de 2026	martes, 27 de octubre de 2026	miércoles, 27 de enero de 2027	Semestral - No se reporta incumplimientos	No se genera descuento, porque no se identificaron hallazgos.
	E2	X		IPAB-482-2026	1900	3 MESES	lunes, 27 de julio de 2026	martes, 27 de octubre de 2026	miércoles, 27 de enero de 2027	Semestral - No se reporta incumplimientos	No se genera descuento, porque no se identificaron hallazgos.
	E3		X		2155	1 MES	martes, 29 de septiembre de 2026	jueves, 29 de octubre de 2026	jueves, 29 de octubre de 2026	Mensual se reportan 5 incumplimientos en el;PR (10,14,15,21) UFI 3,3; PR (0)UFI 3,5	No se genera descuento, porque se encuentra dentro del plazo de corrección contractual.
	E4	X		IPAB-482-2026	1913	3 MESES	lunes, 27 de julio de 2026	martes, 27 de octubre de 2026	miércoles, 27 de enero de 2027	Semestral - No se reporta incumplimientos	No se genera descuento, porque no se identificaron hallazgos.
	E5	X		IPAB-482-2026	1918	3 MESES	lunes, 27 de julio de 2026	martes, 27 de octubre de 2026	miércoles, 27 de enero de 2027	Semestral - No se reporta incumplimientos	No se genera descuento, porque no se identificaron hallazgos.

Estado de cumplimiento Indicadores - UF1-UF2-UF3-UF4-UF5-UF6, UF7 y UF8 - septiembre de 2026											
UFI	Indicador	sep-26									
		CUMPLE		Registro		Plazo	Fecha Revisión Realizada en el SICC	Fecha Máxima de Corrección	Próxima publicación en el SICC	Hallazgos identificados	Estado de cumplimiento
		SI	NO	Comunicado	REV SICC						
	E6		X		2156	24 HORAS	martes, 29 de septiembre de 2026	miércoles, 30 de septiembre de 2026	jueves, 29 de octubre de 2026	Mensual no se reportan incumplimientos	No se genera descuento, porque no se identificaron hallazgos.
	E7	X			2157	2 SEMANAS	martes, 29 de septiembre de 2026	martes, 13 de octubre de 2026	jueves, 29 de octubre de 2026	Mensual no se reportan incumplimientos	No se genera descuento, porque no se identificaron hallazgos.
	E8		X		2141	1 SEMANA	martes, 29 de septiembre de 2026	martes, 6 de octubre de 2026	jueves, 29 de octubre de 2026	Mensual no se reportan incumplimientos	No se genera descuento, porque no se identificaron hallazgos.
	E10		X		2142	1 SEMANA	martes, 29 de septiembre de 2026	martes, 6 de octubre de 2026	jueves, 29 de octubre de 2026	Mensual no se reportan incumplimientos	No se genera descuento, porque no se identificaron hallazgos.
	E11		X		2158	1 SEMANA/ 48 HORAS	martes, 29 de septiembre de 2026	martes, 6 de octubre de 2026	jueves, 29 de octubre de 2026	Mensual se reportan 8 incumplimientos;PR (1,2)INT#1,INT#2 UFI3,1;INT#3 UFI3,2; PR	No se genera descuento, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual.

Estado de cumplimiento Indicadores - UF1-UF2-UF3-UF4-UF5-UF6, UF7 y UF8 - septiembre de 2026											
UFI	Indicador	sep-26									
		CUMPLE		Registro		Plazo	Fecha Revisión Realizada en el SICC	Fecha Máxima de Corrección	Próxima publicación en el SICC	Hallazgos identificados	Estado de cumplimiento
		SI	NO	Comunicado	REV SICC						
										(18,19) UFI 3,3; INT# 6 UFI3.5	
	E12		X	IPAB-0600-2026	2016	1 SEMANA	martes, 4 de agosto de 2026	martes, 11 de agosto de 2026	jueves, 4 de febrero de 2027	se presentaron 37 incumplimientos en los PR(0,1,3,4) UFI3,1 PR(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)UFI3,2 PR(10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21)UFI3,3 PR(23,25,26,27,28,29,30,31)UFI3,4 PR(0,2,3,)UFI3,5	No se genera descuento, porque fue reparado en el mes de septiembre.
	E13	X			2143	1 MES	martes, 29 de septiembre de 2026	jueves, 29 de octubre de 2026	jueves, 29 de octubre de 2026	Mensual - se reporta 3 incumplimiento; PR (7) UFI3,2; INT #5 UFI3,4;INT#6 UFI 3,5	No se genera descuento, porque se encuentra dentro del plazo de corrección contractual.

Estado de cumplimiento Indicadores - UF1-UF2-UF3-UF4-UF5-UF6, UF7 y UF8 - septiembre de 2026											
UFI	Indicador	sep-26									
		CUMPLE		Registro		Plazo	Fecha Revisión Realizada en el SICC	Fecha Máxima de Corrección	Próxima publicación en el SICC	Hallazgos identificados	Estado de cumplimiento
		SI	NO	Comunicado	REV SICC						
	E14		X		2145	1 SEMANA	martes, 29 de septiembre de 2026	martes, 6 de octubre de 2026	jueves, 29 de octubre de 2026	Mensual se reportan 7 incumplimientos en el;INT1 INT2 UFI3.1, PR(9) INT#3 UFI3,2; INT 4 UFI 3,3; PR (1)INT# 7 UFI3,5	No se genera descuento, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual.
	E15		X		1167	1 MES	martes, 25 de noviembre de 2025	jueves, 25 de diciembre de 2025	miércoles, 25 de noviembre de 2026	Anual, se reportan 7 incumplimientos PR(4)UF3.1 PR(12,20)UF3.3 PR(24,31)UF3.4 PR(0,2)UF3.5	No se genera descuento, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual.
	E16	X		IPAB-674-2026	1016	3 MESES	jueves, 25 de septiembre de 2025	jueves, 25 de diciembre de 2025	sábado, 25 de septiembre de 2027	Bienal - No se reporta Incumplimientos	No se genera descuento, porque no se identificaron hallazgos.
	E17	X			2167	3 MESES	miércoles, 30 de septiembre de 2026	miércoles, 30 de diciembre de 2026	viernes, 30 de octubre de 2026	Mensual - No se reporta incumplimiento	No se genera descuento, porque no se identificaron hallazgos.

Estado de cumplimiento Indicadores - UF1-UF2-UF3-UF4-UF5-UF6, UF7 y UF8 - septiembre de 2026												
UFI	Indicador	sep-26										
		CUMPLE		Registro		Plazo	Fecha Revisión Realizada en el SICC	Fecha Máxima de Corrección	Próxima publicación en el SICC	Hallazgos identificados	Estado de cumplimiento
		SI	NO	Comunicado	REV SICC						
UNIDAD FUNCIONAL 4	E1		X	IPAB-482-2026	1896	3 MESES	lunes, 27 de julio de 2026	martes, 27 de octubre de 2026	miércoles, 27 de enero de 2027	Semestral 0 incumplimientos	No se genera descuento, porque no se identificaron hallazgos.
	E2	X		IPAB-482-2026	1901	3 MESES	lunes, 27 de julio de 2026	martes, 27 de octubre de 2026	miércoles, 27 de enero de 2027	Semestral 0 incumplimientos	No se genera descuento, porque no se identificaron hallazgos.
	E3		X		2159	1 MES	martes, 29 de septiembre de 2026	jueves, 29 de octubre de 2026	jueves, 29 de octubre de 2026	Mensual 2 incumplimiento PR (16,20) UFI4.1	No se genera descuento, porque se encuentra dentro del plazo de corrección contractual.
	E4		X	IPAB-482-2026	1914	3 MESES	lunes, 27 de julio de 2026	martes, 27 de octubre de 2026	miércoles, 27 de enero de 2027	Semestral 0 incumplimientos	No se genera descuento, porque no se identificaron hallazgos.
	E5	X		IPAB-482-2026	1919	3 MESES	lunes, 27 de julio de 2026	martes, 27 de octubre de 2026	miércoles, 27 de enero de 2027	Semestral 0 incumplimientos	No se genera descuento, porque no se identificaron hallazgos.

Estado de cumplimiento Indicadores - UF1-UF2-UF3-UF4-UF5-UF6, UF7 y UF8 - septiembre de 2026											
UFI	Indicador	sep-26									
		CUMPLE		Registro		Plazo	Fecha Revisión Realizada en el SICC	Fecha Máxima de Corrección	Próxima publicación en el SICC	Hallazgos identificados	Estado de cumplimiento
		SI	NO	Comunicado	REV SICC						
	E6		X		2160	24 HORAS	miércoles, 30 de septiembre de 2026	jueves, 1 de octubre de 2026	viernes, 30 de octubre de 2026	Mensual 4 incumplimiento PR(12,13,22,30) UFI4.1	No se genera descuento, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual.
	E7	X			2161	2 SEMANAS	miércoles, 30 de septiembre de 2026	miércoles, 14 de octubre de 2026	viernes, 30 de octubre de 2026	Mensual 0 incumplimientos	No se genera descuento, porque no se identificaron hallazgos.
	E8		X		2162	1 SEMANA	martes, 29 de septiembre de 2026	martes, 6 de octubre de 2026	jueves, 29 de octubre de 2026	Mensual 5 incumplimientos PR(12,28,29,30,31) UFI4,1	No se genera descuento, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual.
	E10		X		2163	1 SEMANA	martes, 29 de septiembre de 2026	martes, 6 de octubre de 2026	jueves, 29 de octubre de 2026	Mensual 12 incumplimiento PR (2,7,13,14,17,18,19,22,24,28,29,38) UFI4.1;	No se genera descuento, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual.
	E11		X		2164	1 SEMANA/ 48 HORAS	martes, 29 de septiembre de 2026	martes, 6 de octubre de 2026	jueves, 29 de octubre de 2026	Mensual 7 incumplimientos;PR	No se genera descuento, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual.

Estado de cumplimiento Indicadores - UF1-UF2-UF3-UF4-UF5-UF6, UF7 y UF8 - septiembre de 2026												
UFI	**Indicador**	**sep-26**										
		CUMPLE		**Registro**		**Plazo**	**Fecha Revisión Realizada en el SICC**	**Fecha Máxima de Corrección**	**Próxima publicación en el SICC**	**Hallazgos identificados**	**Estado de cumplimiento**	
		SI	**NO**	**Comunicado**	**REV SICC**							
										(44,45,46,48,49) UFI4,1; PR(48,49)UFI 4,2		
	E12		X	IPAB-0600-2026	1966	1 SEMANA	martes, 4 de agosto de 2026	martes, 11 de agosto de 2026	jueves, 4 de febrero de 2027	Semestral se presentaron 65 incumplimientos en los PR(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49) 4,1 PR(35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,) 4,2	No se genera descuento, porque fue reparado en el mes de septiembre.
	E13	X			2151	1 MES	martes, 29 de septiembre de 2026	jueves, 29 de octubre de 2026	jueves, 29 de octubre de 2026	Mensual 0 incumplimientos	No se genera descuento, porque no se identificaron hallazgos.	

Estado de cumplimiento Indicadores - UF1-UF2-UF3-UF4-UF5-UF6, UF7 y UF8 - septiembre de 2026											
UFI	Indicador	sep-26									
		CUMPLE		Registro		Plazo	Fecha Revisión Realizada en el SICC	Fecha Máxima de Corrección	Próxima publicación en el SICC	Hallazgos identificados	Estado de cumplimiento
		SI	NO	Comunicado	REV SICC						
	E14		X		2146	1 SEMANA	martes, 29 de septiembre de 2026	martes, 6 de octubre de 2026	jueves, 29 de octubre de 2026	Mensual 3 incumplimientos en los PR (10,29,38)UFI4.1	No se genera descuento, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual.
	E15		X		1084	1 MES	jueves, 23 de octubre de 2025	domingo, 23 de noviembre de 2025	viernes, 23 de octubre de 2026	Anual - Se reportan (17) Incumplimientos PR: UF 4.1 (7,26,27,30,31,35,36,38,40, 41,45) 4,2 (36,39,43,45,47,49)	No se genera descuento, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual.
	E16	X		IPAB-674-2026	1544	3 MESES	jueves, 30 de abril de 2026	jueves, 30 de julio de 2026	domingo, 30 de abril de 2028	Bienal - No se reporta incumplimiento	No se genera descuento, porque no se identificaron hallazgos.
	E17	X			2168	3 MESES	miércoles, 30 de septiembre de 2026	miércoles, 30 de diciembre de 2026	viernes, 30 de octubre de 2026	Mensual 0 incumplimientos	No se genera descuento, porque no se identificaron hallazgos.

Estado de cumplimiento Indicadores - UF1-UF2-UF3-UF4-UF5-UF6, UF7 y UF8 - septiembre de 2026												
UFI	**Indicador**	**sep-26**										
		CUMPLE		**Registro**		**Plazo**	**Fecha Revisión Realizada en el SICC**	**Fecha Máxima de Corrección**	**Próxima publicación en el SICC**	**Hallazgos identificados**	**Estado de cumplimiento**
		SI	**NO**	**Comunicado**	**REV SICC**						
UNIDAD FUNCIONAL 5	E1		X	IPAB-482-2026	1897	3 MESES	lunes, 27 de julio de 2026	martes, 27 de octubre de 2026	miércoles, 27 de enero de 2027	Semestral - se reporta 19 incumplimientos en los PR (37,42,44,51,60,63) 5.1; PR (2,3,4,7,10,12,13,14,15,16, 17,18,19) UFI 5.2	No se genera descuento, porque se encuentra dentro del plazo de corrección contractual.
	E2		X	IPAB-482-2026	1902	3 MESES	lunes, 27 de julio de 2026	martes, 27 de octubre de 2026	miércoles, 27 de enero de 2027	Semestral - no se reportan Incumplimientos	No se genera descuento, porque no se identificaron hallazgos.
	E3		X		2148	1 MES	martes, 29 de septiembre de 2026	jueves, 29 de octubre de 2026	jueves, 29 de octubre de 2026	Mensual- se reportan 17 incumplimientos en los PR (5,6,8,9,10,18,19,20,22,30, 31,38) UFI 5,1; PR (6,9,13,14,23) UFI 5,2	No se genera descuento, porque se encuentra dentro del plazo de corrección contractual.
	E4		X	IPAB-482-2026	1915	3 MESES	lunes, 27 de julio de 2026	martes, 27 de octubre de 2026	miércoles, 27 de enero de 2027	Semestral - no se reportan Incumplimientos	No se genera descuento, porque no se identificaron hallazgos.
	E5	X		IPAB-482-2026	1920	3 MESES	lunes, 27 de julio de 2026	martes, 27 de octubre de 2026	miércoles, 27 de enero de 2027	Semestral - no se reportan Incumplimientos	No se genera descuento, porque no se identificaron hallazgos.

Estado de cumplimiento Indicadores - UF1-UF2-UF3-UF4-UF5-UF6, UF7 y UF8 - septiembre de 2026											
UFI	Indicador	sep-26									
		CUMPLE		Registro		Plazo	Fecha Revisión Realizada en el SICC	Fecha Máxima de Corrección	Próxima publicación en el SICC	Hallazgos identificados	Estado de cumplimiento
		SI	NO	Comunicado	REV SICC						
	E6		X		2149	24 HORAS	martes, 29 de septiembre de 2026	miércoles, 30 de septiembre de 2026	jueves, 29 de octubre de 2026	Mensual- se reportan 3 incumplimientos en los PR (2,6,13) UFI 5,1	No se genera descuento, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual.
	E7		X		2150	2 SEMANAS	martes, 29 de septiembre de 2026	martes, 13 de octubre de 2026	jueves, 29 de octubre de 2026	Mensual - No se reporta incumplimiento	No se genera descuento, porque no se identificaron hallazgos.
	E8		X		2115	1 SEMANA	lunes, 21 de septiembre de 2026	lunes, 28 de septiembre de 2026	miércoles, 21 de octubre de 2026	Mensual - No se reporta incumplimiento	No se genera descuento, porque no se identificaron hallazgos.
	E10		X		2135	1 SEMANA	lunes, 21 de septiembre de 2026	lunes, 28 de septiembre de 2026	miércoles, 21 de octubre de 2026	Mensual - se reportan 11 incumplimientos;PR(2,5,6,7,10,14,26,31,35,37)UFI5,1; PR(20)UFI5,2	No se genera descuento, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual.
	E11		X		2140	1 SEMANA/ 48 HORAS	martes, 29 de septiembre de 2026	martes, 6 de octubre de 2026	jueves, 29 de octubre de 2026	Mensual - 9 Incumplimientos	No se genera descuento, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual.

Estado de cumplimiento Indicadores - UF1-UF2-UF3-UF4-UF5-UF6, UF7 y UF8 - septiembre de 2026											
UFI	Indicador	sep-26									
		CUMPLE		Registro		Plazo	Fecha Revisión Realizada en el SICC	Fecha Máxima de Corrección	Próxima publicación en el SICC	Hallazgos identificados	Estado de cumplimiento
		SI	NO	Comunicado	REV SICC						
										(8,11,35,42,48,56,58,62) UFI5,1; PR (7,) UFI5,2	
	E12		X	IPAB-0600-2026	1967	1 SEMANA	martes, 4 de agosto de 2026	martes, 11 de agosto de 2026	jueves, 4 de febrero de 2027	Semestral se reportan 84 incumplimientos en los PR 5,1 (0,1,2,3,4,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63) (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25) 5,2	No se genera descuento, porque fue reparado en el mes de septiembre.
	E13		X		2117	1 MES	lunes, 21 de septiembre de 2026	miércoles, 21 de octubre de 2026	miércoles, 21 de octubre de 2026	Mensual - Se reportan 1 incumplimientos PR(48) UFI 5,1	No se genera descuento, porque se encuentra dentro del plazo de corrección contractual.

Estado de cumplimiento Indicadores - UF1-UF2-UF3-UF4-UF5-UF6, UF7 y UF8 - septiembre de 2026												
UFI	Indicador	sep-26										
		CUMPLE		Registro		Plazo	Fecha Revisión Realizada en el SICC	Fecha Máxima de Corrección	Próxima publicación en el SICC	Hallazgos identificados	Estado de cumplimiento
		SI	NO	Comunicado	REV SICC						
	E14		X		2147	1 SEMANA	martes, 29 de septiembre de 2026	martes, 6 de octubre de 2026	jueves, 29 de octubre de 2026	Mensual - se reporta 6 incumplimiento PR (24,33,41,42) UFI5,1;PR(21,25)	No se genera descuento, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual.
	E15		X		1086	1 MES	jueves, 23 de octubre de 2025	domingo, 23 de noviembre de 2025	viernes, 23 de octubre de 2026	Anual - 4 Incumplimientos en los PR: 5.1 (7,19,31) 5,2 (24)	No se genera descuento, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual.
	E16	X		IPAB-674-2026	1545	3 MESES	jueves, 30 de abril de 2026	jueves, 30 de julio de 2026	domingo, 30 de abril de 2028	Bienal - No se reporta Incumplimientos	No se genera descuento, porque no se identificaron hallazgos.
	E17	X			2169	3 MESES	miércoles, 30 de septiembre de 2026	miércoles, 30 de diciembre de 2026	viernes, 30 de octubre de 2026	Mensual - No se reporta incumplimiento	No se genera descuento, porque no se identificaron hallazgos.

Estado de cumplimiento Indicadores - UF1-UF2-UF3-UF4-UF5-UF6, UF7 y UF8 - septiembre de 2026											
UFI	**Indicador**	**sep-26**									
		CUMPLE		**Registro**		**Plazo**	**Fecha Revisión Realizada en el SICC**	**Fecha Máxima de Corrección**	**Próxima publicación en el SICC**	**Hallazgos identificados**	**Estado de cumplimiento**
		SI	**NO**	**Comunicado**	**REV SICC**						
UNIDAD FUNCIONAL 6.1 y 6.2	E1	X		IPAB-103-2026	1763	3 MESES	lunes, 6 de julio de 2026	martes, 6 de octubre de 2026	miércoles, 6 de enero de 2027	Semestral - No se reporta incumplimiento	No se genera descuento, porque no se identificaron hallazgos.
	E2	X		IPAB-103-2026	1771	3 MESES	lunes, 6 de julio de 2026	martes, 6 de octubre de 2026	miércoles, 6 de enero de 2027	Semestral - No se reporta incumplimiento	No se genera descuento, porque no se identificaron hallazgos.
	E3		X		2103	1 MES	lunes, 21 de septiembre de 2026	miércoles, 21 de octubre de 2026	miércoles, 21 de octubre de 2026	Mensual - No se reporta incumplimiento	No se genera descuento, porque no se identificaron hallazgos.
	E4	X		IPAB-103-2026	1779	3 MESES	lunes, 6 de julio de 2026	martes, 6 de octubre de 2026	miércoles, 6 de enero de 2027	Semestral - No se reporta incumplimiento	No se genera descuento, porque no se identificaron hallazgos.
	E5	X		IPAB-103-2026	1787	3 MESES	lunes, 6 de julio de 2026	martes, 6 de octubre de 2026	miércoles, 6 de enero de 2027	Semestral - No se reporta incumplimiento	No se genera descuento, porque no se identificaron hallazgos.
	E6		X		2107	24 HORAS	lunes, 21 de septiembre de 2026	martes, 22 de septiembre de 2026	miércoles, 21 de octubre de 2026	Mensual - Se reportan 3 incumplimiento; PR (11,14,17) UFI 6.1	No se genera descuento, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual.

Estado de cumplimiento Indicadores - UF1-UF2-UF3-UF4-UF5-UF6, UF7 y UF8 - septiembre de 2026											
UFI	Indicador	sep-26									
		CUMPLE		Registro		Plazo	Fecha Revisión Realizada en el SICC	Fecha Máxima de Corrección	Próxima publicación en el SICC	Hallazgos identificados	Estado de cumplimiento
		SI	NO	Comunicado	REV SICC						
	E7	X			2108	2 SEMANAS	lunes, 21 de septiembre de 2026	lunes, 5 de octubre de 2026	miércoles, 21 de octubre de 2026	Mensual - No se reporta incumplimiento	No se genera descuento, porque no se identificaron hallazgos.
	E8		X		2098	1 SEMANA	lunes, 21 de septiembre de 2026	lunes, 28 de septiembre de 2026	miércoles, 21 de octubre de 2026	Mensual - No se reporta incumplimiento	No se genera descuento, porque no se identificaron hallazgos.
	E10		X		2130	1 SEMANA	lunes, 21 de septiembre de 2026	lunes, 28 de septiembre de 2026	miércoles, 21 de octubre de 2026	Mensual - Se reportan 7 incumplimiento; PR (30,35,37,42,43,44,45) UFI 6.1	No se genera descuento, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual.
	E11		X		2131	1 SEMANA/ 48 HORAS	lunes, 21 de septiembre de 2026	lunes, 28 de septiembre de 2026	miércoles, 21 de octubre de 2026	Mensual - No se reporta incumplimiento	No se genera descuento, porque no se identificaron hallazgos.
	E12		X	IPAB-103-2026	1795	1 SEMANA	martes, 4 de agosto de 2026	martes, 11 de agosto de 2026	jueves, 4 de febrero de 2027	Semestral - 66 incumplimiento, PR (10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36	No se genera descuento, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual.

Estado de cumplimiento Indicadores - UF1-UF2-UF3-UF4-UF5-UF6, UF7 y UF8 - septiembre de 2026												
UFI	Indicador	sep-26										
		CUMPLE		Registro		Plazo	Fecha Revisión Realizada en el SICC	Fecha Máxima de Corrección	Próxima publicación en el SICC	Hallazgos identificados	Estado de cumplimiento
		SI	NO	Comunicado	REV SICC						
										,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47) UFI 6,1; PR (5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23) UFI 6,2; PR(41,42,43) UFI 6,3,1; PR(35,36,37,38,39,40,41)	
	E13		X		2118	1 MES	lunes, 21 de septiembre de 2026	miércoles, 21 de octubre de 2026	miércoles, 21 de octubre de 2026	Mensual - No se reporta incumplimiento	No se genera descuento, porque no se identificaron hallazgos.
	E14		X		2132	1 SEMANA	lunes, 21 de septiembre de 2026	lunes, 28 de septiembre de 2026	miércoles, 21 de octubre de 2026	Mensual - se 1 reporta incumplimiento PR (32) UFI6,1	No se genera descuento, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual.
	E15		X		2022	1 MES	miércoles, 26 de agosto de 2026	sábado, 26 de septiembre de 2026	jueves, 26 de agosto de 2027	Anual - se reportan Incumplimientos PR (19) UFI6,2	No se genera descuento, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual.

Estado de cumplimiento Indicadores - UF1-UF2-UF3-UF4-UF5-UF6, UF7 y UF8 - septiembre de 2026												
UFI	**Indicador**	**sep-26**										
		CUMPLE		**Registro**		**Plazo**	**Fecha Revisión Realizada en el SICC**	**Fecha Máxima de Corrección**	**Próxima publicación en el SICC**	**Hallazgos identificados**	**Estado de cumplimiento**
		SI	**NO**	**Comunicado**	**REV SICC**						
	E16		X	IPAB-674-2026	1030	3 MESES	martes, 7 de octubre de 2025	miércoles, 7 de enero de 2026	jueves, 7 de octubre de 2027	Bienal - No se reportan 4 incumplimientos PR(32,39,41,44) UFI6,1	No se genera descuento, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual.
	E17	X			2170	3 MESES	miércoles, 30 de septiembre de 2026	miércoles, 30 de diciembre de 2026	viernes, 30 de octubre de 2026	Mensual - No se reporta incumplimiento	No se genera descuento, porque no se identificaron hallazgos.
UNIDAD FUNCIONAL 7	E1	X		IPAB-482-2026	1764	3 MESES	lunes, 6 de julio de 2026	martes, 6 de octubre de 2026	miércoles, 6 de enero de 2027	Semestral - No se reporta Incumplimientos	No se genera descuento, porque no se identificaron hallazgos.
	E2	X		IPAB-482-2026	1772	3 MESES	lunes, 6 de julio de 2026	martes, 6 de octubre de 2026	miércoles, 6 de enero de 2027	Semestral - No se reporta Incumplimientos	No se genera descuento, porque no se identificaron hallazgos.
	E3		X		2104	1 MES	lunes, 21 de septiembre de 2026	miércoles, 21 de octubre de 2026	miércoles, 21 de octubre de 2026	Mensual - no se reporta Incumplimientos	No se genera descuento, porque no se identificaron hallazgos.

Estado de cumplimiento Indicadores - UF1-UF2-UF3-UF4-UF5-UF6, UF7 y UF8 - septiembre de 2026											
UFI	Indicador	sep-26									
		CUMPLE		Registro		Plazo	Fecha Revisión Realizada en el SICC	Fecha Máxima de Corrección	Próxima publicación en el SICC	Hallazgos identificados	Estado de cumplimiento
		SI	NO	Comunicado	REV SICC						
	E4	X		IPAB-482-2026	1780	3 MESES	lunes, 6 de julio de 2026	martes, 6 de octubre de 2026	miércoles, 6 de enero de 2027	Semestral - No se reporta Incumplimientos	No se genera descuento, porque no se identificaron hallazgos.
	E5	X		IPAB-482-2026	1788	3 MESES	lunes, 6 de julio de 2026	martes, 6 de octubre de 2026	miércoles, 6 de enero de 2027	Semestral - No se reporta Incumplimientos	No se genera descuento, porque no se identificaron hallazgos.
	E6	X			2109	24 HORAS	lunes, 21 de septiembre de 2026	martes, 22 de septiembre de 2026	miércoles, 21 de octubre de 2026	Mensual - se reporta 1 Incumplimiento PR(2) UFI7,3	No se genera descuento, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual.
	E7	X			2110	2 SEMANAS	lunes, 21 de septiembre de 2026	lunes, 5 de octubre de 2026	miércoles, 21 de octubre de 2026	Mensual - no se reporta Incumplimientos	No se genera descuento, porque no se identificaron hallazgos.
	E8		X		2099	1 SEMANA	lunes, 21 de septiembre de 2026	lunes, 28 de septiembre de 2026	miércoles, 21 de octubre de 2026	Mensual-se reporta 1 incumplimiento PR (6) UFI7,2	No se genera descuento, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual.

Estado de cumplimiento Indicadores - UF1-UF2-UF3-UF4-UF5-UF6, UF7 y UF8 - septiembre de 2026											
UFI	Indicador	sep-26									
		CUMPLE		Registro		Plazo	Fecha Revisión Realizada en el SICC	Fecha Máxima de Corrección	Próxima publicación en el SICC	Hallazgos identificados	Estado de cumplimiento
		SI	NO	Comunicado	REV SICC						
	E10	X			2133	1 SEMANA	lunes, 21 de septiembre de 2026	lunes, 28 de septiembre de 2026	miércoles, 21 de octubre de 2026	Mensual - no se reporta Incumplimientos	No se genera descuento, porque no se identificaron hallazgos.
	E11		X		2134	1 SEMANA/ 48 HORAS	lunes, 21 de septiembre de 2026	lunes, 28 de septiembre de 2026	miércoles, 21 de octubre de 2026	Mensual - Se reporta 8 Incumplimiento PR (1,2,8,14,18,19,23)INT 16 UFI 7,3	No se genera descuento, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual.
	E12		X	IPAB-0600-2026	1796	1 SEMANA	martes, 4 de agosto de 2026	martes, 11 de agosto de 2026	jueves, 4 de febrero de 2027	Semestral - Se reportan 50 incumplimientos UF 7.2-PR (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21); UFI7.3-PR(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27)	No se genera descuento, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual.
	E13		X		2119	1 MES	lunes, 21 de septiembre de 2026	miércoles, 21 de octubre de 2026	miércoles, 21 de octubre de 2026	Mensual - no reporta Incumplimiento	No se genera descuento, porque no se identificaron hallazgos.

Estado de cumplimiento Indicadores - UF1-UF2-UF3-UF4-UF5-UF6, UF7 y UF8 - septiembre de 2026											
UFI	Indicador	sep-26									
		CUMPLE		Registro		Plazo	Fecha Revisión Realizada en el SICC	Fecha Máxima de Corrección	Próxima publicación en el SICC	Hallazgos identificados	Estado de cumplimiento
		SI	NO	Comunicado	REV SICC						
	E14		X		2136	1 SEMANA	lunes, 21 de septiembre de 2026	lunes, 28 de septiembre de 2026	miércoles, 21 de octubre de 2026	Mensual - se reporta 1 Incumplimientos ; ; (INT#11) UFI7,2	No se genera descuento, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual.
	E15		X		2121	1 MES	lunes, 21 de septiembre de 2026	miércoles, 21 de octubre de 2026	martes, 21 de septiembre de 2027	Anual - se reportan 3 incumplimientos en los PR(4,13,14) UFI 7.3	No se genera descuento, porque se encuentra dentro del plazo de corrección contractual.
	E16		X	IPAB-674-2026	1546	3 MESES	jueves, 30 de abril de 2026	jueves, 30 de julio de 2026	domingo, 30 de abril de 2028	Bienal - Se 1 reporta Incumplimientos PR (10) UFI 7.2	No se genera descuento, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual.
	E17	X			2171		miércoles, 30 de septiembre de 2026	miércoles, 30 de diciembre de 2026	viernes, 30 de octubre de 2026	Mensual - No se reporta Incumplimientos	No se genera descuento, porque no se identificaron hallazgos.

Estado de cumplimiento Indicadores - UF1-UF2-UF3-UF4-UF5-UF6, UF7 y UF8 - septiembre de 2026											
UFI	**Indicador**	**sep-26**									
		CUMPLE		**Registro**		**Plazo**	**Fecha Revisión Realizada en el SICC**	**Fecha Máxima de Corrección**	**Próxima publicación en el SICC**	**Hallazgos identificados**	**Estado de cumplimiento**
		SI	**NO**	**Comunicado**	**REV SICC**						
UNIDAD FUNCIONAL 8.1, 8.2 y 8.3	E1		X	IPAB-482-2026	1765	3 MESES	lunes, 6 de julio de 2026	martes, 6 de octubre de 2026	miércoles, 6 de enero de 2027	Semestral - se reporta 2 Incumplimientos PR(32,53) UFI8,3	No se genera descuento, porque se encuentra dentro del plazo de corrección contractual.
	E2	X		IPAB-482-2026	1773	3 MESES	lunes, 6 de julio de 2026	martes, 6 de octubre de 2026	miércoles, 6 de enero de 2027	Semestral - No se reporta Incumplimientos	No se genera descuento, porque no se identificaron hallazgos.
	E3	X			2105	1 MES	lunes, 21 de septiembre de 2026	miércoles, 21 de octubre de 2026	miércoles, 21 de octubre de 2026	Mensual - No se reporta Incumplimientos	No se genera descuento, porque no se identificaron hallazgos.
	E4	X		IPAB-482-2026	1781	3 MESES	lunes, 6 de julio de 2026	martes, 6 de octubre de 2026	miércoles, 6 de enero de 2027	Semestral - No se reporta Incumplimientos	No se genera descuento, porque no se identificaron hallazgos.
	E5	X		IPAB-482-2026	1789	3 MESES	lunes, 6 de julio de 2026	martes, 6 de octubre de 2026	miércoles, 6 de enero de 2027	Semestral - No se reporta Incumplimientos	No se genera descuento, porque no se identificaron hallazgos.

Estado de cumplimiento Indicadores - UF1-UF2-UF3-UF4-UF5-UF6, UF7 y UF8 - septiembre de 2026											
UFI	Indicador	sep-26									
		CUMPLE		Registro		Plazo	Fecha Revisión Realizada en el SICC	Fecha Máxima de Corrección	Próxima publicación en el SICC	Hallazgos identificados	Estado de cumplimiento
		SI	NO	Comunicado	REV SICC						
	E6		X		2111	24 HORAS	lunes, 21 de septiembre de 2026	martes, 22 de septiembre de 2026	miércoles, 21 de octubre de 2026	Mensual - se reporta 2 Incumplimientos; PR(11,33) UFI8,3	No se genera descuento, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual.
	E7	X			2112	2 SEMANAS	lunes, 21 de septiembre de 2026	lunes, 5 de octubre de 2026	miércoles, 21 de octubre de 2026	Mensual - No se reporta Incumplimientos	No se genera descuento, porque no se identificaron hallazgos.
	E8		X		2100	1 SEMANA	lunes, 21 de septiembre de 2026	lunes, 28 de septiembre de 2026	miércoles, 21 de octubre de 2026	Mensual - se reporta 5 Incumplimientos; PR (50)UFI8,1; PR(28,29,44,45) 8,3	No se genera descuento, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual.
	E10		X		2137	1 SEMANA	lunes, 21 de septiembre de 2026	lunes, 28 de septiembre de 2026	miércoles, 21 de octubre de 2026	Mensual - No se reporta Incumplimientos	No se genera descuento, porque no se identificaron hallazgos.
	E11		X		2138	1 SEMANA/ 48 HORAS	lunes, 21 de septiembre de 2026	lunes, 28 de septiembre de 2026	miércoles, 21 de octubre de 2026	Mensual - se reporta 8 Incumplimientos;	No se genera descuento, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual.

Estado de cumplimiento Indicadores - UF1-UF2-UF3-UF4-UF5-UF6, UF7 y UF8 - septiembre de 2026											
UFI	Indicador	sep-26									
		CUMPLE		Registro		Plazo	Fecha Revisión Realizada en el SICC	Fecha Máxima de Corrección	Próxima publicación en el SICC	Hallazgos identificados	Estado de cumplimiento
		SI	NO	Comunicado	REV SICC						
										PR(97,102,103,) UFI 8,2 ;PR (0,40,45,49,50)UFI8,3	
	E12		X	IPAB-0600-2026	1797	1 SEMANA	martes, 4 de agosto de 2026	martes, 11 de agosto de 2026	jueves, 4 de febrero de 2027	Semestral - Se reportan 84 Incumplimientos UFI 8.1 (49,50,51,53,54,55,56,57,58 ,59,60,62,64,65,); PR(93,94,95,96,97,98,99,1 00,101,102,103,104) UFI 8.2 ; PR(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1 1,12,13,14,15,16,17,18,19, 20,21,22,23,24,26,27,28,29 ,30,31,32,33,34,35,36,37,3 8,39,40,41,42,43,44,45,46, 47,48,49,50,51,52,53,55,56 ,57,58) UFI 8.3	No se genera descuento, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual.
	E13	X			2120	1 MES	lunes, 21 de septiembre de 2026	miércoles, 21 de octubre de 2026	miércoles, 21 de octubre de 2026	Mensual - No se reporta Incumplimientos	No se genera descuento, porque no se identificaron hallazgos.

Estado de cumplimiento Indicadores - UF1-UF2-UF3-UF4-UF5-UF6, UF7 y UF8 - septiembre de 2026											
UFI	Indicador	sep-26									
		CUMPLE		Registro		Plazo	Fecha Revisión Realizada en el SICC	Fecha Máxima de Corrección	Próxima publicación en el SICC	Hallazgos identificados	Estado de cumplimiento
		SI	NO	Comunicado	REV SICC						
	E14		X		2139	1 SEMANA	lunes, 21 de septiembre de 2026	lunes, 28 de septiembre de 2026	miércoles, 21 de octubre de 2026	Mensual - se reporta 1 Incumplimientos;PR (23) UFI 8,3	No se genera descuento, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual.
	E15		X		2122	1 MES	lunes, 21 de septiembre de 2026	miércoles, 21 de octubre de 2026	martes, 21 de septiembre de 2027	Anual - Se reporta 1 incumplimiento en el PR (100) UFI 8.2	No se genera descuento, porque se encuentra dentro del plazo de corrección contractual.
	E16	X		IPAB-674-2026	1547	3 MESES	jueves, 30 de abril de 2026	jueves, 30 de julio de 2026	domingo, 30 de abril de 2028	Bienal - No se reporta Incumplimientos	No se genera descuento, porque no se identificaron hallazgos.
	E17	X			2172	1 MES	miércoles, 30 de septiembre de 2026	miércoles, 30 de diciembre de 2026	viernes, 30 de octubre de 2026	Mensual - No se reporta Incumplimientos	No se genera descuento, porque no se identificaron hallazgos.

Fuente propia: Consorcio IPAB

Se resalta que para aquellas UFIs donde se presentó algún incumplimiento, los indicadores que tenían tiempo de corrección de 24 horas, una semana o inferior a un mes, fueron reparados dentro del plazo, excepto el E10 de las UFIs 2 y 6.1, donde se encuentran obras de drenajes obstruidas por la comunidad y al inicio de la etapa de reversión se encontraba cubierto por un evento eximente de responsabilidad, otorgado al Concesionario mediante la figura de amigable componedor.

Los respectivos incumplimientos de las UFIs 1, 2, 3, 4, 5, 6.1, 6.2, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2 y 8.3 del mes de septiembre de 2026, están siendo atendidos por el Concesionario con base a los tiempos máximos de corrección establecidos en el Apéndice Técnico 4, con las excepciones descritas en cada caso.

4.3.11. Indicadores de la Etapa de Reversión

Mediante los comunicados IPAB-320-2026, con radicado ANI No. 20264090654502 del 25 de mayo de 2026, e IPAB-353-2026, con radicado ANI No. 20264090690652 del 1 de junio de 2026, remitidos al Concesionario, la Interventoría comunicó el cronograma establecido para la medición de los indicadores de reversión. En cumplimiento de dicha programación, las actividades de medición se desarrollaron durante los meses de junio y julio de 2026. Como resultado de lo anterior, los indicadores de reversión fueron publicados en el SICC durante el mes de julio de 2026, con excepción del indicador de Capacidad Estructural E16, cuya publicación se efectuó en el mes de agosto de 2026, debido al tiempo requerido para la ejecución, procesamiento y análisis de las mediciones asociadas a este indicador.

En la siguiente tabla se presenta el resumen de los indicadores de reversión, con sus fechas de cargue en la plataforma SICC y fechas máximas de corrección conforme lo establecido en el apéndice técnico 4 del contrato de Concesión.

Tabla 4-68. Resumen Indicadores de reversión

Estado de cumplimiento Indicadores - UF1-UF2-UF3-UF4-UF5-UF6, UF7 y UF8 - Reversión de 2026										
UFI	**Indicador**	**sep-26**								
		CUMPLE		**Registro**		**Plazo**	**Fecha Revisión Realizada en el SICC**	**Fecha Máxima de Corrección**	**Hallazgos identificados**	**Estado de cumplimiento**
		SI	**NO**	**Comunicado**	**REV SICC**					
UNIDAD FUNCIONAL 1	E1		X	IPAB-482-2026	1758	3 MESES	lunes, 6 de julio de 2026	martes, 6 de octubre de 2026	No se reporta Incumplimientos, UF1	No se procede a la aplicación de multas, porque no se identificaron hallazgos.
	E2		X	IPAB-482-2026	1766	3 MESES	lunes, 6 de julio de 2026	martes, 6 de octubre de 2026	No se reporta Incumplimientos, UF1	No se procede a la aplicación de multas, porque no se identificaron hallazgos.
	E3		X		1829	1 MES	viernes, 17 de julio de 2026	lunes, 17 de agosto de 2026	Mensual - 21 Incumplimientos PR (11,12,16,17,19,20,29,30,43,44,45,46 ,48,49,52,53,56,57,58,59,60) UF1	No se procede a la aplicación de multas, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual
	E4	X		IPAB-482-2026	1774	3 MESES	lunes, 6 de julio de 2026	martes, 6 de octubre de 2026	No se reporta Incumplimientos, UF1	No se procede a la aplicación de multas, porque no se identificaron hallazgos.

Estado de cumplimiento Indicadores - UF1-UF2-UF3-UF4-UF5-UF6, UF7 y UF8 - Reversión de 2026										
UFI	Indicador	sep-26								
		CUMPLE		Registro		Plazo	Fecha Revisión Realizada en el SICC	Fecha Máxima de Corrección	Hallazgos identificados	Estado de cumplimiento
		SI	NO	Comunicado	REV SICC					
	E5	X		IPAB-482-2026	1782	3 MESES	lunes, 6 de julio de 2026	martes, 6 de octubre de 2026	No se reporta Incumplimientos, UF1	No se procede a la aplicación de multas, porque no se identificaron hallazgos.
	E6		X		1837	24 HORAS	jueves, 30 de julio de 2026	viernes, 31 de julio de 2026	Mensual - 9 Incumplimientos PR (18,19,37,40,41,45,51,56,58) UF1	No se procede a la aplicación de multas, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual
	E7	X			1845	2 SEMANAS	viernes, 17 de julio de 2026	viernes, 31 de julio de 2026	Mensual - No se reporta IncumplimientosUF1	No se procede a la aplicación de multas, porque no se identificaron hallazgos.
	E8		X		1853	1 SEMANA	viernes, 17 de julio de 2026	viernes, 24 de julio de 2026	Mensual - 14 Incumplimientos PR (9,11,12,13,14,17,20,22,23,25,26,27, 28,29) UF1	No se procede a la aplicación de multas, porque fue reparado

Estado de cumplimiento Indicadores - UF1-UF2-UF3-UF4-UF5-UF6, UF7 y UF8 - Reversión de 2026										
UFI	Indicador	sep-26								
		CUMPLE		Registro		Plazo	Fecha Revisión Realizada en el SICC	Fecha Máxima de Corrección	Hallazgos identificados	Estado de cumplimiento
		SI	NO	Comunicado	REV SICC					
										dentro del plazo de corrección contractual
	E10		X		1861	1 SEMANA	lunes, 27 de julio de 2026	lunes, 3 de agosto de 2026	Mensual - Se reporta 5 IncumplimientosUF1 PR (4,31,44,52,53)	No se procede a la aplicación de multas, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual
	E11		X		1869	1 SEMANA/ 48 HORAS	lunes, 27 de julio de 2026	lunes, 3 de agosto de 2026	Mensual- 53 incumplimientos PR (3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,57,58,59,60,61) UFI1	No se procede a la aplicación de multas, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual
	E12		X	IPAB-0600-2026	2011	1 SEMANA	martes, 4 de agosto de 2026	martes, 11 de agosto de 2026	58 incumplimientos PR (3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61), UF1	Se afectó el acta de índice de cumplimiento de agosto de 2026, en septiembre no se afecta porque fueron

Estado de cumplimiento Indicadores - UF1-UF2-UF3-UF4-UF5-UF6, UF7 y UF8 - Reversión de 2026										
UFI	Indicador	sep-26								
		CUMPLE		Registro		Plazo	Fecha Revisión Realizada en el SICC	Fecha Máxima de Corrección	Hallazgos identificados	Estado de cumplimiento
		SI	NO	Comunicado	REV SICC					
										reparados los incumplimientos.
	E13	X			1877	1 MES	lunes, 27 de julio de 2026	jueves, 27 de agosto de 2026	Mensual - No se reporta IncumplimientosUF1	No se procede a la aplicación de multas, porque no se identificaron hallazgos.
	E14		X		1885	1 SEMANA	lunes, 27 de julio de 2026	lunes, 3 de agosto de 2026	se reporta 4 Incumplimientos,PR (11,12,52,59)UF1	No se procede a la aplicación de multas, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual
	E15		X		1994	1 MES	lunes, 27 de julio de 2026	jueves, 27 de agosto de 2026	Se reportan 6 Incumplimientos PR(6,16,19,21,34,49,) UF1	No se procede a la aplicación de multas, porque fue reparado

Estado de cumplimiento Indicadores - UF1-UF2-UF3-UF4-UF5-UF6, UF7 y UF8 - Reversión de 2026										
UFI	Indicador	sep-26								
		CUMPLE		Registro		Plazo	Fecha Revisión Realizada en el SICC	Fecha Máxima de Corrección	Hallazgos identificados	Estado de cumplimiento
		SI	NO	Comunicado	REV SICC					
										dentro del plazo de corrección contractual
	E16		X	IPAB-674-2026	1798	3 MESES	lunes, 10 de agosto de 2026	martes, 10 de noviembre de 2026	Bienal - No se reporta IncumplimientosUF1	No se procede a la aplicación de multas, porque no se identificaron hallazgos.
	E17	X			1995		lunes, 3 de agosto de 2026	martes, 3 de noviembre de 2026	Mensual - No se reporta IncumplimientosUF1	No se procede a la aplicación de multas, porque no se identificaron hallazgos.
	E1	X		IPAB-482-2026	1759	3 MESES	lunes, 6 de julio de 2026	martes, 6 de octubre de 2026	Semestral - 0 Incumplimientos	No se procede a la aplicación de multas, porque no se

Estado de cumplimiento Indicadores - UF1-UF2-UF3-UF4-UF5-UF6, UF7 y UF8 - Reversión de 2026										
UFI	Indicador	sep-26								
		CUMPLE		Registro		Plazo	Fecha Revisión Realizada en el SICC	Fecha Máxima de Corrección	Hallazgos identificados	Estado de cumplimiento
		SI	NO	Comunicado	REV SICC					
UNIDAD FUNCIONAL 2										identificaron hallazgos.
	E2	X		IPAB-482-2026	1767	3 MESES	lunes, 6 de julio de 2026	martes, 6 de octubre de 2026	Semestral - 0 Incumplimientos	No se procede a la aplicación de multas, porque no se identificaron hallazgos.
	E3		X		1830	1 MES	viernes, 17 de julio de 2026	lunes, 17 de agosto de 2026	Mensual - se reportan 3 incumplimiento PR (38,40,47)	No se procede a la aplicación de multas, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual
	E4	X		IPAB-482-2026	1775	3 MESES	lunes, 6 de julio de 2026	martes, 6 de octubre de 2026	Semestral - 0 Incumplimientos	No se procede a la aplicación de multas, porque no se identificaron hallazgos.

Estado de cumplimiento Indicadores - UF1-UF2-UF3-UF4-UF5-UF6, UF7 y UF8 - Reversión de 2026										
UFI	Indicador	sep-26								
		CUMPLE		Registro		Plazo	Fecha Revisión Realizada en el SICC	Fecha Máxima de Corrección	Hallazgos identificados	Estado de cumplimiento
		SI	NO	Comunicado	REV SICC					
	E5	X		IPAB-482-2026	1783	3 MESES	lunes, 6 de julio de 2026	martes, 6 de octubre de 2026	Semestral - 0 Incumplimientos	No se procede a la aplicación de multas, porque no se identificaron hallazgos.
	E6	X			1838	24 HORAS	jueves, 30 de julio de 2026	viernes, 31 de julio de 2026	Mensual - no se reporta incumplimiento	No se procede a la aplicación de multas, porque no se identificaron hallazgos.
	E7	X			1846	2 SEMANAS	viernes, 17 de julio de 2026	viernes, 31 de julio de 2026	Mensual - no se reporta incumplimiento	No se procede a la aplicación de multas, porque no se identificaron hallazgos.
	E8	X			1854	1 SEMANA	viernes, 17 de julio de 2026	viernes, 24 de julio de 2026	Mensual - no se reporta incumplimiento	No se procede a la aplicación de multas, porque no se

Estado de cumplimiento Indicadores - UF1-UF2-UF3-UF4-UF5-UF6, UF7 y UF8 - Reversión de 2026										
UFI	Indicador	sep-26								
		CUMPLE		Registro		Plazo	Fecha Revisión Realizada en el SICC	Fecha Máxima de Corrección	Hallazgos identificados	Estado de cumplimiento
		SI	NO	Comunicado	REV SICC					
										identificaron hallazgos.
	E10		X		1862	1 SEMANA	lunes, 27 de julio de 2026	lunes, 3 de agosto de 2026	Se reporta 4 incumplimiento PR(42,43,44,45) UF 2	No se procede a la aplicación de multas, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual
	E11	X			1870	1 SEMANA/ 48 HORAS	lunes, 27 de julio de 2026	lunes, 3 de agosto de 2026	Mensual -se reporta incumplimiento PR (46) UFI 2	No se procede a la aplicación de multas, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual
	E12		X	IPAB-0600-2026	2013	1 SEMANA	martes, 4 de agosto de 2026	martes, 11 de agosto de 2026	Se reportan 15 incumplimientos PR (29,30,31,32,37,38,39,40,41,42,43,44 ,45,46,47)	No se procede a la aplicación de multas, porque fueron reparados dentro del plazo de corrección contractual.

Estado de cumplimiento Indicadores - UF1-UF2-UF3-UF4-UF5-UF6, UF7 y UF8 - Reversión de 2026										
UFI	Indicador	sep-26								
		CUMPLE		Registro		Plazo	Fecha Revisión Realizada en el SICC	Fecha Máxima de Corrección	Hallazgos identificados	Estado de cumplimiento
		SI	NO	Comunicado	REV SICC					
	E13	X			1878	1 MES	lunes, 27 de julio de 2026	jueves, 27 de agosto de 2026	Mensual - no se reporta incumplimiento	No se procede a la aplicación de multas, porque no se identificaron hallazgos.
	E14		X		1977	1 SEMANA	lunes, 27 de julio de 2026	lunes, 3 de agosto de 2026	Mensual - se reporta 3 incumplimiento PR (30,31,32)	No se genera descuento, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual.
	E15	X			1985	1 MES	lunes, 27 de julio de 2026	jueves, 27 de agosto de 2026	Anual - 0 Incumplimientos	No se procede a la aplicación de multas, porque no se identificaron hallazgos.
	E16		X	IPAB-674-2026	1799	3 MESES	lunes, 10 de agosto de 2026	martes, 10 de noviembre de 2026	Bienal - se reporta 1 Incumplimiento PR(40) UFI 2	No se procede a la aplicación de multas, porque se encuentra dentro del plazo de

Estado de cumplimiento Indicadores - UF1-UF2-UF3-UF4-UF5-UF6, UF7 y UF8 - Reversión de 2026										
UFI	Indicador	sep-26								
		CUMPLE		Registro		Plazo	Fecha Revisión Realizada en el SICC	Fecha Máxima de Corrección	Hallazgos identificados	Estado de cumplimiento
		SI	NO	Comunicado	REV SICC					
										corrección contractual.
	E17	X			1996		viernes, 3 de julio de 2026	sábado, 3 de octubre de 2026	Mensual - no se reporta incumplimiento	No se procede a la aplicación de multas, porque no se identificaron hallazgos.
UNIDAD FUNCIONAL 3	E1	X		IPAB-482-2026	1760	3 MESES	lunes, 6 de julio de 2026	martes, 6 de octubre de 2026	Semestral - No se reporta incumplimientos	No se procede a la aplicación de multas, porque no se identificaron hallazgos.
	E2	X		IPAB-482-2026	1768	3 MESES	lunes, 6 de julio de 2026	martes, 6 de octubre de 2026	Semestral - No se reporta incumplimientos	No se procede a la aplicación de multas, porque no se

Estado de cumplimiento Indicadores - UF1-UF2-UF3-UF4-UF5-UF6, UF7 y UF8 - Reversión de 2026										
UFI	Indicador	sep-26								
		CUMPLE		Registro		Plazo	Fecha Revisión Realizada en el SICC	Fecha Máxima de Corrección	Hallazgos identificados	Estado de cumplimiento
		SI	NO	Comunicado	REV SICC					
										identificaron hallazgos.
	E3		X		1831	1 MES	viernes, 17 de julio de 2026	lunes, 17 de agosto de 2026	Mensual se reportan 17 incumplimientos en el; PR (0,1,2,3,6) UFI3,2; PR (10,11,12,14,15,21) UFI 3,3; PR (25,26) UFI 3,4; PR (0,2,3,4) UFI 3,5	No se procede a la aplicación de multas, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual
	E4	X		IPAB-482-2026	1776	3 MESES	lunes, 6 de julio de 2026	martes, 6 de octubre de 2026	Semestral - No se reporta incumplimientos	No se procede a la aplicación de multas, porque no se identificaron hallazgos.
	E5	X		IPAB-482-2026	1784	3 MESES	lunes, 6 de julio de 2026	martes, 6 de octubre de 2026	Semestral - No se reporta incumplimientos	No se procede a la aplicación de multas, porque no se identificaron hallazgos.

Estado de cumplimiento Indicadores - UF1-UF2-UF3-UF4-UF5-UF6, UF7 y UF8 - Reversión de 2026										
UFI	Indicador	sep-26								
		CUMPLE		Registro		Plazo	Fecha Revisión Realizada en el SICC	Fecha Máxima de Corrección	Hallazgos identificados	Estado de cumplimiento
		SI	NO	Comunicado	REV SICC					
	E6		X		1839	24 HORAS	jueves, 30 de julio de 2026	viernes, 31 de julio de 2026	Mensual se reporta 2 incumplimientos en el; PR (0,1) UFI3,1	No se procede a la aplicación de multas, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual
	E7	X			1847	2 SEMANAS	viernes, 17 de julio de 2026	viernes, 31 de julio de 2026	Mensual no se reportan incumplimientos	No se procede a la aplicación de multas, porque no se identificaron hallazgos.
	E8		X		1855	1 SEMANA	viernes, 17 de julio de 2026	viernes, 24 de julio de 2026	Mensual no se reportan incumplimientos	No se procede a la aplicación de multas, porque no se identificaron hallazgos.
	E10		X		1863	1 SEMANA	lunes, 27 de julio de 2026	lunes, 3 de agosto de 2026	Mensual no se reportan incumplimientos	No se procede a la aplicación de multas, porque no se

Estado de cumplimiento Indicadores - UF1-UF2-UF3-UF4-UF5-UF6, UF7 y UF8 - Reversión de 2026										
UFI	Indicador	sep-26								
		CUMPLE		Registro		Plazo	Fecha Revisión Realizada en el SICC	Fecha Máxima de Corrección	Hallazgos identificados	Estado de cumplimiento
		SI	NO	Comunicado	REV SICC					
										identificaron hallazgos.
	E11		X		1871	1 SEMANA/ 48 HORAS	lunes, 27 de julio de 2026	lunes, 3 de agosto de 2026	Mensual se reportan 37 incumplimientos;PR (0,1,2,3)INT#1 UFI3,1;PR (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) INT#3 UFI3,2; PR (10,11,12,13,14,15,16,17,18,19) UFI 3,3;PR(24,25,26,28,29,30)UFI3,4;PR(0,1,2,3,4) UFI3.5	No se procede a la aplicación de multas, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual
	E12		X	IPAB-0600-2026	2015	1 SEMANA	martes, 4 de agosto de 2026	martes, 11 de agosto de 2026	se presentaron 37 incumplimientos en los PR (0,1,3,4) UFI3,1 PR (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) UFI3,2 PR (10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21) UFI3,3 PR (23,25,26,27,28,29,30,31) UFI3,4 PR(0,2,3,)UFI3,5	Se afectó el acta de índice de cumplimiento de agosto de 2026, en septiembre no se afecta porque fueron reparados los incumplimientos.

Estado de cumplimiento Indicadores - UF1-UF2-UF3-UF4-UF5-UF6, UF7 y UF8 - Reversión de 2026										
UFI	Indicador	sep-26								
		CUMPLE		Registro		Plazo	Fecha Revisión Realizada en el SICC	Fecha Máxima de Corrección	Hallazgos identificados	Estado de cumplimiento
		SI	NO	Comunicado	REV SICC					
	E13	X			1879	1 MES	lunes, 27 de julio de 2026	jueves, 27 de agosto de 2026	Mensual - No se reporta incumplimiento	No se procede a la aplicación de multas, porque no se identificaron hallazgos.
	E14		X		1887	1 SEMANA	lunes, 27 de julio de 2026	lunes, 3 de agosto de 2026	Mensual se reportan 8 incumplimientos en el; INT1 INT2 UFI3.1, PR (9) INT#3 UFI3,2; INT#4 UFI3,3; INT 5 UFI 3,4; INT#6 INT# 7 UFI3,5	No se procede a la aplicación de multas, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual
	E15		X		1986	1 MES	lunes, 27 de julio de 2026	jueves, 27 de agosto de 2026	Anual, se reportan 7 incumplimientos PR (4) UF3.1 PR(12,20)UF3.3 PR(24,31)UF3.4 PR(0,2)UF3.5	No se procede a la aplicación de multas, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual
	E16	X		IPAB-674-2026	1800	3 MESES	lunes, 10 de agosto de 2026	martes, 10 de noviembre de 2026	Bienal - No se reporta Incumplimientos	No se procede a la aplicación de multas, porque no se

Estado de cumplimiento Indicadores - UF1-UF2-UF3-UF4-UF5-UF6, UF7 y UF8 - Reversión de 2026										
UFI	Indicador	sep-26								
		CUMPLE		Registro		Plazo	Fecha Revisión Realizada en el SICC	Fecha Máxima de Corrección	Hallazgos identificados	Estado de cumplimiento
		SI	NO	Comunicado	REV SICC					
										identificaron hallazgos.
	E17	X			1997		lunes, 3 de agosto de 2026	martes, 3 de noviembre de 2026	Mensual - No se reporta incumplimiento	No se procede a la aplicación de multas, porque no se identificaron hallazgos.
UNIDAD FUNCIONAL 4	E1		X	IPAB-482-2026	1761	3 MESES	lunes, 6 de julio de 2026	martes, 6 de octubre de 2026	Semestral 0 incumplimientos	No se procede a la aplicación de multas, porque no se identificaron hallazgos.
	E2	X		IPAB-482-2026	1769	3 MESES	lunes, 6 de julio de 2026	martes, 6 de octubre de 2026	Semestral 0 incumplimientos	No se procede a la aplicación de multas, porque no se

Estado de cumplimiento Indicadores - UF1-UF2-UF3-UF4-UF5-UF6, UF7 y UF8 - Reversión de 2026										
UFI	Indicador	sep-26								
		CUMPLE		Registro		Plazo	Fecha Revisión Realizada en el SICC	Fecha Máxima de Corrección	Hallazgos identificados	Estado de cumplimiento
		SI	NO	Comunicado	REV SICC					
										identificaron hallazgos.
	E3		X		1832	1 MES	viernes, 17 de julio de 2026	lunes, 17 de agosto de 2026	Mensual 7 incumplimiento PR (5,16,19,20,28,36,37) UFI4.1	No se procede a la aplicación de multas, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual
	E4		X	IPAB-482-2026	1777	3 MESES	lunes, 6 de julio de 2026	martes, 6 de octubre de 2026	Semestral 0 incumplimientos	No se procede a la aplicación de multas, porque no se identificaron hallazgos.
	E5	X		IPAB-482-2026	1785	3 MESES	lunes, 6 de julio de 2026	martes, 6 de octubre de 2026	Semestral 0 incumplimientos	No se procede a la aplicación de multas, porque no se identificaron hallazgos.

Estado de cumplimiento Indicadores - UF1-UF2-UF3-UF4-UF5-UF6, UF7 y UF8 - Reversión de 2026										
UFI	Indicador	sep-26								
		CUMPLE		Registro		Plazo	Fecha Revisión Realizada en el SICC	Fecha Máxima de Corrección	Hallazgos identificados	Estado de cumplimiento
		SI	NO	Comunicado	REV SICC					
	E6		X		1840	24 HORAS	jueves, 30 de julio de 2026	viernes, 31 de julio de 2026	Mensual 3 incumplimientos PR(10,22,38) UFI 4,1	No se procede a la aplicación de multas, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual
	E7	X			1848	2 SEMANAS	viernes, 17 de julio de 2026	viernes, 31 de julio de 2026	Mensual 0 incumplimientos	No se procede a la aplicación de multas, porque no se identificaron hallazgos.
	E8		X		1856	1 SEMANA	viernes, 17 de julio de 2026	viernes, 24 de julio de 2026	Mensual 61 incumplimiento PR (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 ,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28 ,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 ,41,42,43,44,45,46,47) UFI4.1; PR(35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 ,46,47,48)	No se procede a la aplicación de multas, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual
	E10		X		1864	1 SEMANA	lunes, 27 de julio de 2026	lunes, 3 de agosto de 2026	Mensual 7 incumplimientos PR (17,18,21,22,28,29,39) UFI 4,1	No se procede a la aplicación de multas, porque fue reparado

Estado de cumplimiento Indicadores - UF1-UF2-UF3-UF4-UF5-UF6, UF7 y UF8 - Reversión de 2026										
UFI	Indicador	sep-26								
		CUMPLE		Registro		Plazo	Fecha Revisión Realizada en el SICC	Fecha Máxima de Corrección	Hallazgos identificados	Estado de cumplimiento
		SI	NO	Comunicado	REV SICC					
										dentro del plazo de corrección contractual
	E11		X		1872	1 SEMANA/ 48 HORAS	lunes, 27 de julio de 2026	lunes, 3 de agosto de 2026	Mensual 26 incumplimientos; PR (7,8,12,13,17,18,19,20,21,22,23,24,25,29,31,32,38,49) UFI4,1; PR (35,36,39,40,45,46,47,49) UFI 4,2	No se procede a la aplicación de multas, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual
	E12		X	IPAB-0600-2026	1793	1 SEMANA	martes, 4 de agosto de 2026	martes, 11 de agosto de 2026	Semestral se presentaron 65 incumplimientos en los PR (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49) 4,1 PR (35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,) 4,2	Se afectó el acta de índice de cumplimiento de agosto de 2026, en septiembre no se afecta porque fueron reparados los incumplimientos.
	E13	X			1880	1 MES	lunes, 27 de julio de 2026	jueves, 27 de agosto de 2026	Mensual 0 incumplimientos	No se procede a la aplicación de multas, porque no se

Estado de cumplimiento Indicadores - UF1-UF2-UF3-UF4-UF5-UF6, UF7 y UF8 - Reversión de 2026										
UFI	Indicador	sep-26								
		CUMPLE		Registro		Plazo	Fecha Revisión Realizada en el SICC	Fecha Máxima de Corrección	Hallazgos identificados	Estado de cumplimiento
		SI	NO	Comunicado	REV SICC					
										identificaron hallazgos.
	E14		X		1888	1 SEMANA	lunes, 27 de julio de 2026	lunes, 3 de agosto de 2026	Mensual 2 incumplimientos en los PR (38) UFI4.1; PR (38) UFI4,2	No se procede a la aplicación de multas, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual
	E15		X		1987	1 MES	lunes, 27 de julio de 2026	jueves, 27 de agosto de 2026	Anual - Se reportan (17) Incumplimientos PR: UF 4.1 (7,26,27,30,31,35,36,38,40,41,45) 4,2 (36,39,43,45,47,49)	No se procede a la aplicación de multas, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual
	E16	X		IPAB-674-2026	1801	3 MESES	lunes, 10 de agosto de 2026	martes, 10 de noviembre de 2026	Bienal - se reporta 1 incumplimiento PR (13) UFI4,1	No se procede a la aplicación de multas, porque se encuentra dentro del plazo de corrección contractual.

Estado de cumplimiento Indicadores - UF1-UF2-UF3-UF4-UF5-UF6, UF7 y UF8 - Reversión de 2026										
UFI	**Indicador**	**sep-26**								
		CUMPLE		**Registro**		**Plazo**	**Fecha Revisión Realizada en el SICC**	**Fecha Máxima de Corrección**	**Hallazgos identificados**	**Estado de cumplimiento**
		SI	**NO**	**Comunicado**	**REV SICC**					
	E17	X			1998		lunes, 3 de agosto de 2026	martes, 3 de noviembre de 2026	Mensual 0 incumplimientos	No se procede a la aplicación de multas, porque no se identificaron hallazgos.
UNIDAD FUNCIONAL 5	E1		X	IPAB-482-2026	1762	3 MESES	lunes, 6 de julio de 2026	martes, 6 de octubre de 2026	Semestral - se reporta 19 incumplimientos en los PR (37,42,44,51,60,63) 5.1; PR (2,3,4,7,10,12,13,14,15,16,17,18,19) UFI 5.2	No se procede a la aplicación de multas, porque se encuentra dentro del plazo de corrección contractual.
	E2		X	IPAB-482-2026	1770	3 MESES	lunes, 6 de julio de 2026	martes, 6 de octubre de 2026	Semestral - no se reportan Incumplimientos	No se procede a la aplicación de multas, porque no se identificaron hallazgos.

Estado de cumplimiento Indicadores - UF1-UF2-UF3-UF4-UF5-UF6, UF7 y UF8 - Reversión de 2026										
UFI	Indicador	sep-26								
		CUMPLE		Registro		Plazo	Fecha Revisión Realizada en el SICC	Fecha Máxima de Corrección	Hallazgos identificados	Estado de cumplimiento
		SI	NO	Comunicado	REV SICC					
	E3		X		1833	1 MES	viernes, 17 de julio de 2026	lunes, 17 de agosto de 2026	Mensual- se reportan 23 incumplimientos en los PR (1,2,7,8,9,11,17,22,36,38,41,44,46,49 ,50) UFI 5,1; PR (7,8,10,12,14,23,24,25) UFI 5,2	No se procede a la aplicación de multas, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual
	E4		X	IPAB-482-2026	1778	3 MESES	lunes, 6 de julio de 2026	martes, 6 de octubre de 2026	Semestral - no se reportan Incumplimientos	No se procede a la aplicación de multas, porque no se identificaron hallazgos.
	E5	X		IPAB-482-2026	1786	3 MESES	lunes, 6 de julio de 2026	martes, 6 de octubre de 2026	Semestral - no se reportan Incumplimientos	No se procede a la aplicación de multas, porque no se identificaron hallazgos.
	E6		X		1841	24 HORAS	jueves, 30 de julio de 2026	viernes, 31 de julio de 2026	Mensual- se reporta 3 incumplimiento en el; PR (7,16,36) UFI 5,1	No se procede a la aplicación de multas, porque fue reparado

Estado de cumplimiento Indicadores - UF1-UF2-UF3-UF4-UF5-UF6, UF7 y UF8 - Reversión de 2026										
UFI	Indicador	sep-26								
		CUMPLE		Registro		Plazo	Fecha Revisión Realizada en el SICC	Fecha Máxima de Corrección	Hallazgos identificados	Estado de cumplimiento
		SI	NO	Comunicado	REV SICC					
										dentro del plazo de corrección contractual
	E7		X		1849	2 SEMANAS	viernes, 17 de julio de 2026	viernes, 31 de julio de 2026	Mensual - No se reporta incumplimiento	No se procede a la aplicación de multas, porque no se identificaron hallazgos.
	E8		X		1857	1 SEMANA	viernes, 17 de julio de 2026	viernes, 24 de julio de 2026	Mensual - No se reporta incumplimiento	No se procede a la aplicación de multas, porque no se identificaron hallazgos.
	E10		X		1865	1 SEMANA	lunes, 27 de julio de 2026	lunes, 3 de agosto de 2026	Mensual - 5 Incumplimiento (14,27,31,34,38) UFI5,1;	No se procede a la aplicación de multas, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual

Estado de cumplimiento Indicadores - UF1-UF2-UF3-UF4-UF5-UF6, UF7 y UF8 - Reversión de 2026										
UFI	Indicador	sep-26								
		CUMPLE		Registro		Plazo	Fecha Revisión Realizada en el SICC	Fecha Máxima de Corrección	Hallazgos identificados	Estado de cumplimiento
		SI	NO	Comunicado	REV SICC					
	E11		X		1873	1 SEMANA/ 48 HORAS	lunes, 27 de julio de 2026	lunes, 3 de agosto de 2026	Mensual - 63 Incumplimientos (0,1,2,3,4,5,6,7,8,13,14,15,18,19,20,22,23,24,25,26,27,29,30,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,47,48,50,51,52,53,54,56,58,60,61,62) UFI5,1; PR (0,1,2,3,5,6,7,8,9,12,14,17,19,20,21,23,24,25) UFI5,2	No se procede a la aplicación de multas, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual
	E12		X	IPAB-0600-2026	1794	1 SEMANA	martes, 4 de agosto de 2026	martes, 11 de agosto de 2026	Semestral se reportan 84 incumplimientos en los PR 5,1 (0,1,2,3,4,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63) (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25) 5,2	Se afectó el acta de índice de cumplimiento de agosto de 2026, en septiembre no se afecta porque fueron reparados los incumplimientos.
	E13		X		1881	1 MES	lunes, 27 de julio de 2026	jueves, 27 de agosto de 2026	Mensual - No se reporta incumplimiento	No se procede a la aplicación de multas, porque no se identificaron hallazgos.

Estado de cumplimiento Indicadores - UF1-UF2-UF3-UF4-UF5-UF6, UF7 y UF8 - Reversión de 2026										
UFI	Indicador	sep-26								
		CUMPLE		Registro		Plazo	Fecha Revisión Realizada en el SICC	Fecha Máxima de Corrección	Hallazgos identificados	Estado de cumplimiento
		SI	NO	Comunicado	REV SICC					
	E14		X		1889	1 SEMANA	lunes, 27 de julio de 2026	lunes, 3 de agosto de 2026	Mensual - se reporta 4 incumplimiento PR (40,41,42) UFI5,1; PR(11) UFI5,2	No se procede a la aplicación de multas, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual
	E15		X		1988	1 MES	lunes, 27 de julio de 2026	jueves, 27 de agosto de 2026	Anual - 4 Incumplimientos en los PR: 5.1 (7,19,31) 5,2 (24)	No se procede a la aplicación de multas, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual
	E16	X		IPAB-674-2026	1802	3 MESES	lunes, 10 de agosto de 2026	martes, 10 de noviembre de 2026	Bienal - se reportan 4 Incumplimientos PR(13,15,16,17) UFI 5,2	No se procede a la aplicación de multas, porque se encuentra dentro del plazo de corrección contractual.
	E17	X			1999		lunes, 3 de agosto de 2026	martes, 3 de noviembre de 2026	Mensual - No se reporta incumplimiento	No se procede a la aplicación de multas, porque no se

Estado de cumplimiento Indicadores - UF1-UF2-UF3-UF4-UF5-UF6, UF7 y UF8 - Reversión de 2026										
UFI	**Indicador**	**sep-26**								
		CUMPLE		**Registro**		**Plazo**	**Fecha Revisión Realizada en el SICC**	**Fecha Máxima de Corrección**	**Hallazgos identificados**	**Estado de cumplimiento**
		SI	**NO**	**Comunicado**	**REV SICC**					
										identificaron hallazgos.
UNIDAD FUNCIONAL 6.1, 6.2, 6.3.1, 6.3.2	E1	X		IPAB-482-2026	1763	3 MESES	lunes, 6 de julio de 2026	martes, 6 de octubre de 2026	Semestral - No se reporta incumplimiento	No se procede a la aplicación de multas, porque no se identificaron hallazgos.
	E2	X		IPAB-482-2026	1771	3 MESES	lunes, 6 de julio de 2026	martes, 6 de octubre de 2026	Semestral - No se reporta incumplimiento	No se procede a la aplicación de multas, porque no se identificaron hallazgos.
	E3		X		1834	1 MES	viernes, 17 de julio de 2026	lunes, 17 de agosto de 2026	Mensual - Se reporta 7 incumplimiento; PR (32,33,34) UFI6,1 ;PR (9,10,14) UFI 6,2; PR(36)6,3,2	No se procede a la aplicación de multas, porque fue reparado

Estado de cumplimiento Indicadores - UF1-UF2-UF3-UF4-UF5-UF6, UF7 y UF8 - Reversión de 2026										
UFI	**Indicador**	**sep-26**								
		CUMPLE		**Registro**		**Plazo**	**Fecha Revisión Realizada en el SICC**	**Fecha Máxima de Corrección**	**Hallazgos identificados**	**Estado de cumplimiento**
		SI	**NO**	**Comunicado**	**REV SICC**					
										dentro del plazo de corrección contractual
	E4	X		IPAB-482-2026	1779	3 MESES	lunes, 6 de julio de 2026	martes, 6 de octubre de 2026	Semestral - No se reporta incumplimiento	No se procede a la aplicación de multas, porque no se identificaron hallazgos.
	E5	X		IPAB-482-2026	1787	3 MESES	lunes, 6 de julio de 2026	martes, 6 de octubre de 2026	Semestral - No se reporta incumplimiento	No se procede a la aplicación de multas, porque no se identificaron hallazgos.
	E6		X		1842	24 HORAS	jueves, 30 de julio de 2026	viernes, 31 de julio de 2026	Mensual -Se reportan 2 incumplimiento PR (13) UFI 6,1; PR (20) UFI 6,2	No se procede a la aplicación de multas, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual

Estado de cumplimiento Indicadores - UF1-UF2-UF3-UF4-UF5-UF6, UF7 y UF8 - Reversión de 2026										
UFI	Indicador	sep-26								
		CUMPLE		Registro		Plazo	Fecha Revisión Realizada en el SICC	Fecha Máxima de Corrección	Hallazgos identificados	Estado de cumplimiento
		SI	NO	Comunicado	REV SICC					
	E7	X			1850	2 SEMANAS	viernes, 17 de julio de 2026	viernes, 31 de julio de 2026	Mensual - No se reporta incumplimiento	No se procede a la aplicación de multas, porque no se identificaron hallazgos.
	E8		X		1858	1 SEMANA	viernes, 17 de julio de 2026	viernes, 24 de julio de 2026	Mensual - No se reporta incumplimiento	No se procede a la aplicación de multas, porque no se identificaron hallazgos.
	E10		X		1866	1 SEMANA	lunes, 27 de julio de 2026	lunes, 3 de agosto de 2026	Mensual - Se reportan 5 incumplimiento; PR (37,42,43,44,45) UFI 6.1	No se procede a la aplicación de multas, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual

Estado de cumplimiento Indicadores - UF1-UF2-UF3-UF4-UF5-UF6, UF7 y UF8 - Reversión de 2026										
UFI	Indicador	sep-26								
		CUMPLE		Registro		Plazo	Fecha Revisión Realizada en el SICC	Fecha Máxima de Corrección	Hallazgos identificados	Estado de cumplimiento
		SI	NO	Comunicado	REV SICC					
	E11		X		1874	1 SEMANA/ 48 HORAS	lunes, 27 de julio de 2026	lunes, 3 de agosto de 2026	Mensual - se reporta 38 incumplimiento PR (13,14,16,17,18,19,20,30,31,) UFI6,1; PR (5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 ,19,20,21,22,23) UFI 6,2; PR (41,42,43) UFI 6,3,1; PR(35,36,37,38,39,40,41) UFI 6,3,2	No se procede a la aplicación de multas, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual
	E12		X	IPAB-0600-2026	1795	1 SEMANA	martes, 4 de agosto de 2026	martes, 11 de agosto de 2026	Semestral - 66 incumplimiento, PR (10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 ,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 ,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 ,47) UFI 6,1; PR (5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 ,19,20,21,22,23) UFI 6,2; PR(41,42,43) UFI 6,3,1; PR(35,36,37,38,39,40,41)	No se procede a la aplicación de multas, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual.
	E13		X		1882	1 MES	lunes, 27 de julio de 2026	jueves, 27 de agosto de 2026	Mensual - No se reporta incumplimiento	No se procede a la aplicación de multas, porque no se

Estado de cumplimiento Indicadores - UF1-UF2-UF3-UF4-UF5-UF6, UF7 y UF8 - Reversión de 2026										
UFI	Indicador	sep-26								
		CUMPLE		Registro		Plazo	Fecha Revisión Realizada en el SICC	Fecha Máxima de Corrección	Hallazgos identificados	Estado de cumplimiento
		SI	NO	Comunicado	REV SICC					
										identificaron hallazgos.
	E14		X		1890	1 SEMANA	lunes, 27 de julio de 2026	lunes, 3 de agosto de 2026	Mensual - se 4 reporta incumplimiento PR (30,31,32) UFI6,1; PR(18) UFI 6,2	No se procede a la aplicación de multas, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual
	E15		X		1989	1 MES	lunes, 27 de julio de 2026	jueves, 27 de agosto de 2026	Anual - se reportan Incumplimientos PR (19) UFI6,2	No se procede a la aplicación de multas, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual
	E16		X	IPAB-674-2026	1803	3 MESES	lunes, 10 de agosto de 2026	martes, 10 de noviembre de 2026	Bienal - se reportan 2 Incumplimientos PR (11) UFI 6,1; PR (16) UFI6,2	No se procede a la aplicación de multas, porque se encuentra dentro del plazo de corrección contractual.

Estado de cumplimiento Indicadores - UF1-UF2-UF3-UF4-UF5-UF6, UF7 y UF8 - Reversión de 2026										
UFI	Indicador	sep-26								
		CUMPLE		Registro		Plazo	Fecha Revisión Realizada en el SICC	Fecha Máxima de Corrección	Hallazgos identificados	Estado de cumplimiento
		SI	NO	Comunicado	REV SICC					
	E17	X			2000	1 MES	lunes, 3 de agosto de 2026	martes, 3 de noviembre de 2026	Mensual - No se reporta incumplimiento	No se procede a la aplicación de multas, porque no se identificaron hallazgos.
UNIDAD FUNCIONAL 7	E1	X		IPAB-482-2026	1764	3 MESES	lunes, 6 de julio de 2026	martes, 6 de octubre de 2026	Semestral - No se reporta Incumplimientos	No se procede a la aplicación de multas, porque no se identificaron hallazgos.
	E2	X		IPAB-482-2026	1772	3 MESES	lunes, 6 de julio de 2026	martes, 6 de octubre de 2026	Semestral - No se reporta Incumplimientos	No se procede a la aplicación de multas, porque no se identificaron hallazgos.

Estado de cumplimiento Indicadores - UF1-UF2-UF3-UF4-UF5-UF6, UF7 y UF8 - Reversión de 2026										
UFI	Indicador	sep-26								
		CUMPLE		Registro		Plazo	Fecha Revisión Realizada en el SICC	Fecha Máxima de Corrección	Hallazgos identificados	Estado de cumplimiento
		SI	NO	Comunicado	REV SICC					
	E3		X		1835	1 MES	viernes, 17 de julio de 2026	lunes, 17 de agosto de 2026	Mensual - se 2 reporta Incumplimientos PR (1,2) UFI 7,2	No se procede a la aplicación de multas, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual
	E4	X		IPAB-482-2026	1780	3 MESES	lunes, 6 de julio de 2026	martes, 6 de octubre de 2026	Semestral - No se reporta Incumplimientos	No se procede a la aplicación de multas, porque no se identificaron hallazgos.
	E5	X		IPAB-482-2026	1788	3 MESES	lunes, 6 de julio de 2026	martes, 6 de octubre de 2026	Semestral - No se reporta Incumplimientos	No se procede a la aplicación de multas, porque no se identificaron hallazgos.
	E6	X			1843	24 HORAS	jueves, 30 de julio de 2026	viernes, 31 de julio de 2026	Mensual - no se reporta Incumplimientos	No se procede a la aplicación de multas, porque no se

Estado de cumplimiento Indicadores - UF1-UF2-UF3-UF4-UF5-UF6, UF7 y UF8 - Reversión de 2026										
UFI	Indicador	sep-26								
		CUMPLE		Registro		Plazo	Fecha Revisión Realizada en el SICC	Fecha Máxima de Corrección	Hallazgos identificados	Estado de cumplimiento
		SI	NO	Comunicado	REV SICC					
										identificaron hallazgos.
	E7	X			1851	2 SEMANAS	viernes, 17 de julio de 2026	viernes, 31 de julio de 2026	Mensual - no se reporta Incumplimientos	No se procede a la aplicación de multas, porque no se identificaron hallazgos.
	E8		X		1859	1 SEMANA	viernes, 17 de julio de 2026	viernes, 24 de julio de 2026	Mensual-se reporta 1 incumplimiento PR (6) UFI7,2	No se procede a la aplicación de multas, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual
	E10	X			1867	1 SEMANA	lunes, 27 de julio de 2026	lunes, 3 de agosto de 2026	Mensual - Se 2 reporta Incumplimiento PR (0) UFI7,2; PR (4) UFI 7,3	No se procede a la aplicación de multas, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual

Estado de cumplimiento Indicadores - UF1-UF2-UF3-UF4-UF5-UF6, UF7 y UF8 - Reversión de 2026										
UFI	Indicador	sep-26								
		CUMPLE		Registro		Plazo	Fecha Revisión Realizada en el SICC	Fecha Máxima de Corrección	Hallazgos identificados	Estado de cumplimiento
		SI	NO	Comunicado	REV SICC					
	E11		X		1875	1 SEMANA/ 48 HORAS	lunes, 27 de julio de 2026	lunes, 3 de agosto de 2026	Mensual - Se reporta 52 Incumplimiento PR (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 ,16,17,18,19,20) INT#11, INT#12,INT#13; PR (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 ,16,17,18,19,20,21,23,24,25) INT#14,INT#15,INT#16	No se procede a la aplicación de multas, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual
	E12		X	IPAB-0600-2026	1796	1 SEMANA	martes, 4 de agosto de 2026	martes, 11 de agosto de 2026	Semestral - Se reportan 50 incumplimientos UF 7.2-PR (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 ,16,17,18,19,20,21); UFI7.3-PR(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 ,27)	No se procede a la aplicación de multas, porque los incumplimientos fueron reparados en el mes de septiembre de 2026.
	E13		X		1883	1 MES	lunes, 27 de julio de 2026	jueves, 27 de agosto de 2026	Mensual - no reporta Incumplimiento	No se procede a la aplicación de multas, porque no se identificaron hallazgos.

Estado de cumplimiento Indicadores - UF1-UF2-UF3-UF4-UF5-UF6, UF7 y UF8 - Reversión de 2026										
UFI	Indicador	sep-26								
		CUMPLE		Registro		Plazo	Fecha Revisión Realizada en el SICC	Fecha Máxima de Corrección	Hallazgos identificados	Estado de cumplimiento
		SI	NO	Comunicado	REV SICC					
	E14		X		1891	1 SEMANA	lunes, 27 de julio de 2026	lunes, 3 de agosto de 2026	Mensual - se reporta 2 Incumplimientos ; INT#11 UFI 7,2; (INT#14) UFI7,3	No se procede a la aplicación de multas, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual
	E15		X		1990	1 MES	lunes, 27 de julio de 2026	jueves, 27 de agosto de 2026	Anual - se reportan 2 incumplimientos en los PR(12,14) UFI 7.2; PR(4,13,14) UFI7,3	No se procede a la aplicación de multas, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual
	E16		X	IPAB-674-2026	1804	3 MESES	lunes, 10 de agosto de 2026	martes, 10 de noviembre de 2026	Bienal - se reportan 16 Incumplimientos; INT#11 (0,1,2,3,4,5,10,11,12,13,14,17,18,20) UFI7,2; PR(0,7) UFI7,3	No se procede a la aplicación de multas, porque se encuentra dentro del plazo de corrección contractual.
	E17	X			2001		lunes, 3 de agosto de 2026	martes, 3 de noviembre de 2026	Mensual - No se reporta Incumplimientos	No se procede a la aplicación de multas, porque no se

Estado de cumplimiento Indicadores - UF1-UF2-UF3-UF4-UF5-UF6, UF7 y UF8 - Reversión de 2026										
UFI	**Indicador**	**sep-26**								
		CUMPLE		**Registro**		**Plazo**	**Fecha Revisión Realizada en el SICC**	**Fecha Máxima de Corrección**	**Hallazgos identificados**	**Estado de cumplimiento**
		SI	**NO**	**Comunicado**	**REV SICC**					
										identificaron hallazgos.
UNIDAD FUNCIONAL 8.1, 8.2 y 8.3	E1		X	IPAB-482-2026	1765	3 MESES	lunes, 6 de julio de 2026	martes, 6 de octubre de 2026	Semestral - se reporta 2 Incumplimientos PR(32,53) UFI8,3	No se procede a la aplicación de multas, porque se encuentra dentro del plazo de corrección contractual.
	E2	X		IPAB-482-2026	1773	3 MESES	lunes, 6 de julio de 2026	martes, 6 de octubre de 2026	Semestral - No se reporta Incumplimientos	No se procede a la aplicación de multas, porque no se identificaron hallazgos.

Estado de cumplimiento Indicadores - UF1-UF2-UF3-UF4-UF5-UF6, UF7 y UF8 - Reversión de 2026										
UFI	Indicador	sep-26								
		CUMPLE		Registro		Plazo	Fecha Revisión Realizada en el SICC	Fecha Máxima de Corrección	Hallazgos identificados	Estado de cumplimiento
		SI	NO	Comunicado	REV SICC					
	E3	X			1836	1 MES	viernes, 17 de julio de 2026	lunes, 17 de agosto de 2026	Mensual - Se reporta 1 Incumplimientos PR(22)UFI 8,3	No se procede a la aplicación de multas, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual
	E4	X		IPAB-482-2026	1781	3 MESES	lunes, 6 de julio de 2026	martes, 6 de octubre de 2026	Semestral - No se reporta Incumplimientos	No se procede a la aplicación de multas, porque no se identificaron hallazgos.
	E5	X		IPAB-482-2026	1789	3 MESES	lunes, 6 de julio de 2026	martes, 6 de octubre de 2026	Semestral - No se reporta Incumplimientos	No se procede a la aplicación de multas, porque no se identificaron hallazgos.
	E6		X		1844	24 HORAS	jueves, 30 de julio de 2026	viernes, 31 de julio de 2026	Mensual - Se reporta 9 Incumplimientos PR(53) UFI 8,1; PR(13,14,20,21,23,29,32,33)UFI 8,3	No se procede a la aplicación de multas, porque fue reparado

Estado de cumplimiento Indicadores - UF1-UF2-UF3-UF4-UF5-UF6, UF7 y UF8 - Reversión de 2026										
UFI	Indicador	sep-26								
		CUMPLE		Registro		Plazo	Fecha Revisión Realizada en el SICC	Fecha Máxima de Corrección	Hallazgos identificados	Estado de cumplimiento
		SI	NO	Comunicado	REV SICC					
										dentro del plazo de corrección contractual
	E7	X			1852	2 SEMANAS	viernes, 17 de julio de 2026	viernes, 31 de julio de 2026	Mensual - No se reporta Incumplimientos	No se procede a la aplicación de multas, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual
	E8		X		1860	1 SEMANA	viernes, 17 de julio de 2026	viernes, 24 de julio de 2026	Mensual - se reportan 14 Incumplimientos PR (50) UFI8,1; PR(39,40,41,42,44,45,46,48,53,54,55 ,56,57) UFI8,3	No se procede a la aplicación de multas, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual
	E10		X		1868	1 SEMANA	jueves, 30 de julio de 2026	jueves, 6 de agosto de 2026	Mensual - Se reportan 14 Incumplimientos; PR (103,104,105) UFI8,2; PR(5,6,15,16,17,22,23,25,26,31,34) UFI8,3	No se procede a la aplicación de multas, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual

Estado de cumplimiento Indicadores - UF1-UF2-UF3-UF4-UF5-UF6, UF7 y UF8 - Reversión de 2026										
UFI	Indicador	sep-26								
		CUMPLE		Registro		Plazo	Fecha Revisión Realizada en el SICC	Fecha Máxima de Corrección	Hallazgos identificados	Estado de cumplimiento
		SI	NO	Comunicado	REV SICC					
	E11		X		1876	1 SEMANA/ 48 HORAS	lunes, 27 de julio de 2026	lunes, 3 de agosto de 2026	Mensual - se reportan 65 Incumplimientos (50,51,53,54,55,56,57,58,59,62,63) UFI 8,1; PR(94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105) UFI8,2; PR(0,1,2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,39,40,45,47,49,50,52,53)	No se procede a la aplicación de multas, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual
	E12		X	IPAB-0600-2026	1797	1 SEMANA	martes, 4 de agosto de 2026	martes, 11 de agosto de 2026	Semestral - Se reportan 84 Incumplimientos UFI 8.1 (49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,62,64,65,); PR(93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104) UFI 8.2 ; PR(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58) UFI 8.3	No se procede a la aplicación de multas, porque los incumplimientos fueron reparados en el mes de septiembre de 2026.

Estado de cumplimiento Indicadores - UF1-UF2-UF3-UF4-UF5-UF6, UF7 y UF8 - Reversión de 2026										
UFI	Indicador	sep-26								
		CUMPLE		Registro		Plazo	Fecha Revisión Realizada en el SICC	Fecha Máxima de Corrección	Hallazgos identificados	Estado de cumplimiento
		SI	NO	Comunicado	REV SICC					
	E13	X			1884	1 MES	lunes, 27 de julio de 2026	jueves, 27 de agosto de 2026	Mensual - No se reporta Incumplimientos	No se procede a la aplicación de multas, porque no se identificaron hallazgos.
	E14		X		1892	1 SEMANA	lunes, 27 de julio de 2026	lunes, 3 de agosto de 2026	Mensual - se reporta 4 Incumplimientos; PR (56) UFI 8,1; PR (21,22,36)	No se procede a la aplicación de multas, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual
	E15		X		1991	1 MES	lunes, 27 de julio de 2026	jueves, 27 de agosto de 2026	Anual - Se reporta 4 incumplimientos en el PR (100) UFI8,2; PR (27,36,38) UFI 8.3	No se procede a la aplicación de multas, porque fue reparado dentro del plazo de corrección contractual
	E16	X		IPAB-674-2026	1804	3 MESES	lunes, 10 de agosto de 2026	martes, 10 de noviembre de 2026	Bienal - No se reportan 2 Incumplimientos; PR (54) UFI 8,1; PR (25) UFI 8,3	No se procede a la aplicación de multas, porque se encuentra dentro del plazo de

Estado de cumplimiento Indicadores - UF1-UF2-UF3-UF4-UF5-UF6, UF7 y UF8 - Reversión de 2026										
UFI	Indicador	sep-26								
		CUMPLE		Registro		Plazo	Fecha Revisión Realizada en el SICC	Fecha Máxima de Corrección	Hallazgos identificados	Estado de cumplimiento
		SI	NO	Comunicado	REV SICC					
										corrección contractual.
	E17	X			2002	1 MES	lunes, 3 de agosto de 2026	martes, 3 de noviembre de 2026	Mensual - No se reporta Incumplimientos	No se procede a la aplicación de multas, porque no se identificaron hallazgos.

Fuente propia: Consorcio IPAB

4.4. OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO AL TRÁNSITO Y RECAUDO

Durante el proceso de auditoría a las estaciones de peaje y pesaje, se tiene en cuenta la verificación del tráfico y el recaudo según corresponde, realizando comparaciones entre los reportes de equipo (DAC) de la Concesión y los reflejados en la elaboración de los diferentes informes diarios de operación del peaje producto de las visitas de auditoría técnica y operativa.

La Interventoría realiza aforos vehiculares por medio de equipo remoto para obtener grabaciones de tráfico por siete (7) días consecutivos en cada peaje, como lo exige el Contrato en el plan de cargas, los cuales serán confrontados y conciliados con los informes de gestión de tráfico y recaudo mensual del Concesionario.

Debido al tiempo requerido para efectuar el conteo y procesamiento de los vehículos registrados en los videos, la información remitida como anexo al presente informe corresponde al mes inmediatamente anterior, esto es agosto de 2026.

A continuación, se presenta la relación de estaciones de peajes y pesajes del proyecto Antioquia Bolívar.

Tabla 4-69. Estaciones de Peaje y Pesaje Operativas

Nombre	UFI	Tramo	PR INICIAL	PR ACTUAL	Coordenadas		Carriles X Sentido				UFI Asociada al Recaudo	Resolución Ubicación
					Norte	Este	1	2	Bid	Total		
EXISTENTES – RECIBIDOS PARA OPERACIÓN												
La Apartada	1.1	Caucasia - Planeta Rica	PR 11+840	PR 12+000	8,031606	-75,302773	3	3	No	6	1	Acta de entrega peaje nuevo, del 07 de marzo de 2019

Nombre	UFI	Tramo	PR INICIAL	PR ACTUAL	Coordenadas		Carriles X Sentido				UFI Asociada al Recaudo	Resolución Ubicación
					Norte	Este	1	2	Bid	Total		
EXISTENTES – RECIBIDOS PARA OPERACIÓN												
Mata de Caña	6.1	Cereté - Lorica	PR 32+500	PR 32+000	9.090647	-75.819782	3	3	No	6	6	Acta de recibo peaje Antiguo del 30 de mayo de 2016
San Onofre	8.3	San Onofre - Cruz del Viso	PR 21+500	PR 22+600	9,872531	-75,393358	3	3	No	6	8	Acta de entrega bajo radicado ANI 2016-300-032310-1
Purgatorio	4.1	Montería - Planeta Rica	PR 32+800	PR38+700	8,671853	-75,798325	4	4	0	8	4	Resolución 111 del 15 de enero de 2018
Los Cedros	5.1	Montería - Puerto Rey	PR 47+000	PR 41+100	8,832191	-76,051231	3	3	0	6	5	Resolución 111 del 15 de enero de 2018
CONSTRUIDAS NUEVAS												
Los Manguitos	1.1	Caucasia - Planeta Rica	PR 52+200	PR52+450	8,303527	-75,531559	3	3	No	6	2	Resolución 288 del 14 feb de 2020
San Carlos	3.2	El 15 - San Carlos	N.A	PR 09+660	8,709977	-75,716649	2	2	No	4	3	Resolución 1884 del 17 de junio de 2015

Nombre	UFI	Tramo	PR INICIAL	PR ACTUAL	Coordenadas		Carriles X Sentido				UFI Asociada al Recaudo	Resolución Ubicación
					Norte	Este	1	2	Bid	Total		
EXISTENTES – RECIBIDOS PARA OPERACIÓN												
Caimanera	7.2	Variante Coveñas	N. A	PR9+625	-75.636413	9.386101						Nueva Resolución No. 20253040046605 del 12-11-2025 Nota: Actualmente esta estación no está operando, se contempló reubicación en el PR9+625 de la UFI 7.2, pero aún no está construido porque la comunidad se opone.
ESTACIONES DE PESAJE												
Manguitos 1	1.1	Caucasia - Planeta Rica	N.A	PR59+800	8°21'41.89"	75°33'41.677"	1	1	No			En operación en nuevas instalaciones desde el día 17 de diciembre de 2018
Manguitos 2	1.1	Caucasia - Planeta Rica	N.A	PR59+800	8°21'41.89"	75°33'41.677"	1	1	No			En operación en nuevas instalaciones desde el día 20 de enero de 2019
San Onofre 1	8.3	San Onofre –	N.A	PR21+750	9°51'56''N	75°23'51"W	1	1	No			"En Operación el 9 de abril de 2021

Nombre	UFI	Tramo	PR INICIAL	PR ACTUAL	Coordenadas		Carriles X Sentido				UFI Asociada al Recaudo	Resolución Ubicación
					Norte	Este	1	2	Bid	Total		
EXISTENTES – RECIBIDOS PARA OPERACIÓN												
		Cruz del Viso										
San Onofre 2	8.3	San Onofre – Cruz del Viso	N.A	PR21+750	9°51'56''N	75°23'51"W	1	1	No			En Operación el 9 de abril de 2021
Mata de Caña 1	2	Lorica-cereté	N.A	PR30+700	9°04'46.48" N	75°49'19"W	1	1	No			inició operación el día 10/02/2022
Mata de Caña 2	6.1	Cerete–Lorica	N.A	PR30+700	9°04'47.32" N	75°49'17"W	1	1	No			inició operación el día 10/02/2022

Fuente: Elaboración propia Consorcio IPAB

Tabla 4-70. Registro fotográfico estaciones de peaje



Foto 7. UFI 1. Peaje La Apartada PR 12+000.



Foto 8. UFI 1. Peaje Los Manguitos PR 52+450.

	
Foto 9. UFI 6.1. Peaje Mata de Caña PR 32+000.	Foto 10. UFI 6.3. Sitio de conteo del Peaje Caimanera PR 41+550

	
Foto 11. UFI 4.1. Peaje El Purgatorio. PR 38+700	Foto 12. UFI 5.1. Peaje Los Cedros. PR 41+100



Foto 13. UFI 8.3. Peaje San Onofre. PR 22+600



Foto 14. UFI 3.2. Peaje San Carlos. PR 09+660

Fuente Propia – Consorcio IPAB

4.4.1. Objetivos de la supervisión a la operación en las estaciones de peaje y pesaje

Realizar las actividades relacionadas con la revisión y control del aforo y recaudo según las obligaciones establecidas en el Anexo 4. Sección 7.5 del Plan de Cargas del Contrato de Interventoría.

Realizar conteos de vehículos independientes en cada una de las Estaciones de Peaje del corredor del proyecto, durante un mínimo de siete (7) Días consecutivos al mes durante 24 horas para establecer un parámetro de control al TPD reportado por el Concesionario. Esta información se deberá reportar y analizar en informes mensuales y semestrales de aforo y en general se deberán suministrar los datos de aforo tomados con los equipos de la Interventoría.

En caso de materializarse el riesgo de no instalación de peajes, el Interventor deberá realizar los conteos descritos anteriormente, en la ubicación prevista para la instalación del peaje. En caso de no ser posible realizar el conteo en esta ubicación, se deberá seleccionar otra, previa aprobación de la ANI, donde se pueda contabilizar el tráfico que circulará por la estación de peaje propuesta.

Certificar los tráficos vehiculares en cada Estación de Peaje y para cada una de las categorías de vehículo para comprobar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario y los demás efectos previstos en este Contrato.

Verificar el conteo de vehículos de tarifas especiales de las Resoluciones que expida el Ministerio de Transporte para otorgar tarifas especiales en los peajes del proyecto.

Verificar el cumplimiento del reglamento de operación, la operación de la estación, en particular lo previsto para el manejo de carriles exteriores, colas, atención al usuario, etc. En todo caso el Interventor deberá disponer de recursos para el cumplimiento de esta obligación.

Presentar una guía de auditoría que permita conocer las pruebas y verificaciones que se van a realizar sobre el sistema de información que utiliza el Concesionario para tránsito y Recaudo de Peaje.

Realizar la medición, conteo, caracterización de los tráficos y evaluación del nivel de servicio del Contrato de Concesión durante la vigencia del Contrato de Interventoría, así como la elaboración de los informes mensuales y semestrales de aforo y el suministro de los datos de aforo en general.

Verificar los conteos de vehículos que realice el Concesionario con el fin de comprobar que la información suministrada sea correcta y requerir al Concesionario para que cumpla esta obligación.

Verificación del correcto funcionamiento de los equipos de conteo, clasificación de vehículos y de registro de Recaudo de Peaje.

Verificar mediante auditoría de sistemas el correcto funcionamiento de los equipos de control de tráfico en las Estaciones de Peaje de la concesión e informar a la ANI sobre el particular en el Informe de Interventoría. Para tal efecto, el Interventor tendrá la posibilidad de requerir la información producida por tales equipos en forma directa cuando lo considere conveniente, sin que el Concesionario pueda rehusarse a ello.

Realizar el levantamiento de la información requerida para identificar las características generales y específicas de los aplicativos y sistemas de información de tráfico, recaudo que se encuentra en funcionamiento.

Verificar y evaluar la información producida por las aplicaciones, software y sistemas de información, para comprobar que éstas sean confiables, completas y oportunas.

Verificar y evaluar las rutinas de cálculo ejecutadas por las aplicaciones y sistemas de información, y que las cantidades calculadas se aplican correctamente en los archivos de computador y en los registros oficiales que se reportan a la ANI.

Evaluar los riesgos asociados en el sistema de información existente en los peajes y verificar si el software y los procedimientos asociados con el manejo del sistema satisfacen los requerimientos de seguridad, efectividad y eficiencia.

Recomendar acciones de mejoramiento para corregir las debilidades de control que se detecten y para incrementar las condiciones de calidad, confiabilidad y seguridad del sistema de información de peajes.

Verificar y evaluar el proceso de diseño, desarrollo y prueba de los cambios de software aplicativo.

Verificar y evaluar los planes de contingencia para garantizar la continuidad en las operaciones.

Efectuar auditoría a los sistemas de tráfico y recaudo. El Interventor incluirá en el Informe Mensual un capítulo sobre verificación y auditoría a los sistemas de tráfico y recaudo.

Verificar los informes del Concesionario, los registros de Recaudo de Peaje y todas las demás estadísticas que éste presente, así como revisar que su calidad, contenido y periodicidad se ajusten a las disposiciones del Contrato de Concesión, sus Apéndices Técnicos y anexos.

Efectuar revisión a la metodología de verificación empleada por el Concesionario, para el control de tráficos vehiculares en las estaciones de peaje y para cada una de las categorías de vehículos, para los efectos previstos en el Contrato de Interventoría y en el Contrato de Concesión.

Revisar los reportes, estadísticas diarias y la información de tránsito, recaudo y evasión enviada por el Concesionario, con el fin de constatar que el dinero transferido por recaudo corresponda al Recaudo de Peaje obtenido en cada caseta de peaje.

Montar y ejecutar operativos de control mediante visita a las casetas de peaje, que incluyan: revisión de libros de asistencia, conteos secretos de comparación, arqueo en las casetas de recolección, revisión de la boletería existente en casetas y oficina, arqueos administrativos, de caja menor y del dinero de recambio, revisión de planillas y registros.

Verificar que en las casetas de peaje se cobren las tarifas contempladas en la estructura tarifaria del Contrato de Concesión y/o en las resoluciones emitidas por las autoridades correspondientes.

Advertir por escrito cualquier incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del Concesionario con respecto al control de aforo, comunicarle esta circunstancia a la ANI y adoptar los procedimientos previstos en este Contrato, según el caso.

Realizar una proyección estadística del tráfico anualmente para cada estación de peaje, teniendo en cuenta como mínimo los datos históricos de tráfico, a partir de esta proyección, hacer seguimiento mensual al Ingreso Real a partir de una comparación entre el tráfico real, el proyectado en la estructuración del proyecto y el proyectado anualmente por la Interventoría.

Revisar y emitir conceptos sobre las Nuevas Vías Públicas y eventos de Elusión si estos llegan a presentarse y son justificados por el Concesionario, y revisar los cálculos si hay lugar al reconocimiento del menor recaudo de conformidad con lo establecido en el Contrato de Concesión.

Revisar y emitir conceptos sobre eventos de Restricción de Movilidad si estos llegan a presentarse y son justificados por el Concesionario, y revisar los cálculos del Recaudo de Peaje que se hubiese producido de no haberse materializado un evento por Restricción de Movilidad.

Vigilar la implementación de nuevas tecnologías para recaudo electrónico de Peajes.

Revisar informes de discrepancias y funcionamiento de los equipos de conteo y de clasificación de vehículos de las estaciones de peaje.

Auditar, supervisar, controlar, registrar y conceptuar sobre los aspectos Técnicos en la operación, implementación y mantenimiento de los equipos de control de tránsito, contemplados en el Contrato de Concesión de recaudo y operación de las estaciones de peaje que se encuentran a cargo del Concesionario.

A partir de 60 días después de firmado el acta de inicio, realizar comparación de los conteos de vehículos por video en cada una de las estaciones de peaje, durante períodos de siete (7) días consecutivos al mes durante 24 horas para establecer un parámetro de control al TPD reportado por el Concesionario.

Estimar y verificar sin previo aviso la confiabilidad de los equipos de control de tránsito. Si la confiabilidad resulta ser inferior al 99%, el Interventor deberá efectuar un análisis más pormenorizado de los hechos, con el fin de determinar el grado de confiabilidad en la operación y administración del Recaudo de Peaje y presentará un informe a la Vicepresidencia Ejecutiva de la ANI.

En general, vigilar y controlar que el Concesionario cumpla con sus obligaciones para el normal desarrollo y ejecución de la concesión.

4.4.2. Tarifas de Peaje

El Concesionario mediante comunicado con radicado 48-48-RUTADCTOELECTRONICOS 20260114010957 del 14/01/2026, envió la actualización del esquema tarifario para las estaciones de Peaje del proyecto incluyendo FOSEVI (fondo de seguridad vial), la cual empezó a regir a partir de las 06 horas del 16 de enero de 2026.

A continuación, se presenta el esquema tarifario vigente en las estaciones de peaje del corredor vial

Tabla 4-71. Tarifa de Peajes

PEAJE	TIPO	CAT 1	CAT 2	CAT 3	CAT 4	CAT 5	CAT 6	CAT 7
La Apartada	Plena	$19.700	$29.100	$29.100	$29.100	$52.500	$83.400	$96.000
Los Manguitos	Plena	$19.700	$29.100	$29.100	$29.100	$52.500	$83.400	$96.000
	(Res288)	$ 6.700	$19.100	$19.100	$19.100			
	(Res410)	$11.900	$17.300					
San Carlos	Plena	$19.400	$28.500	$28.500	$28.500	$30.300	$44.300	$44.400
Purgatorio	Plena	$19.700	$29.100	$29.100	$29.100	$52.500	$83.400	$96.000
	(Res410-A1-2)	$11.900	$17.300					
	(Res410-A3)	$10.000	$14.500	$14.500	$14.500			
	(Res410-A4)	$1.200						

PEAJE	TIPO	CAT 1	CAT 2	CAT 3	CAT 4	CAT 5	CAT 6	CAT 7
	(Res410-A2)	$3.700	$1.200					
Cedros	Plena	$19.700	$29.100	$29.100	$29.100	$52.500	$83.400	$96.000
	(Res410)	$11.900	$17.300					
Mata De Caña	Plena	$19.400	$28.500	$28.500	$28.500	$30.300	$44.300	$44.400
	(Res410)	$11.900	$17.300					
Caimanera	Plena	$19.400	$28.500	$28.500	$28.500	$30.300	$44.300	$44.400
San Onofre	Plena	$19.700	$29.100	$29.100	$29.100	$52.500	$83.400	$96.000

Fuente: Comunicado con radicado 48-RUTADCTOELECTRONICOS 20260114010957 del 14/01/2026

4.4.1. Tránsito de las estaciones de peaje

4.4.1.1. Tránsito Vehicular en Estación de Peaje La Apartada

Durante el mes se registró el paso de 165.511 vehículos que cancelaron la tarifa plena establecida por categoría, adicionalmente, pasaron 1.368 vehículos exentos según la Ley 787 de 2002 y 4 maquinarias agrícolas, para un total de 166.879 pasos de vehículos por la estación de peaje La Apartada sin contar la maquinaria agrícola.

Tabla 4-72 Tránsito Vehicular Estación La Apartada

Tránsito Estación De Peaje La Apartada							
Categoría	**Tto-Tp**	**Tto-Ted**	**Exentos 787**	**Evasores**	**Maquina Agrícola**	**Total**	**%**
I	73.002	0	1.184	0	4	74.186	44%
II	8.755	0	27	0	0	8.782	5%
III	21.722	0	119	0	0	21.841	13%
IV	15.912	0	37	0	0	15.949	10%
V	10.598	0	1	0	0	10.599	6%
VI	11.845	0	0	0	0	11.845	7%
VII	23.677	0	0	0	0	23.677	14%
sep-26	165.511	0	1.368	0	4	166.879	100%
ago-26	174.761	0	1.238	0	4	175.999	
diferencia	-9.250	0	130	0	0	-9.120	
porcentaje	-5,29%		10,50%			-5,18%	

Fuente: Informe Gerencial No.130 – septiembre 2026. Concesionario Ruta al Mar

En comparación con el mes inmediatamente anterior (agosto de 2026), se evidenció un descenso en el tránsito vehicular de 9.120 vehículos, equivalente a una disminución del 5.18%, incluyendo los vehículos exentos registrados en la estación de peaje La Apartada.

4.4.1.2. Tránsito Vehicular en Estación de Peaje Manguitos

Durante el mes, se registró el paso de 178.887 vehículos que pagaron la tasa plena establecida por categoría, adicionalmente, pasaron 9.297 con tarifa especial diferencial y 2.078 vehículos exentos según la Ley 787 de 2002, para un total de 190.262 vehículos, sin incluir 8 máquinas agrícolas.

Tabla 4-73 Tránsito Vehicular Estación Manguitos

Tránsito Estación De Peaje Los Manguitos							
Categoría	**Tto-Tp**	**Tto-Ted**	**Exentos 787**	**Evasores**	**Maquina Agrícola**	**Total**	**%**
I	78.005	7.500	1.913	0	8	87.418	46%
II	9.127	1.737	25	0	0	10.889	6%
III	22.850	60	100	0	0	23.010	12%
IV	17.014	0	39	0	0	17.053	9%
V	10.461	0	1	0	0	10.462	5%
VI	13.968	0	0	0	0	13.968	7%
VII	27.462	0	0	0	0	27.462	14%
sep-26	178.887	9.297	2.078	0	8	190.262	100%
ago-26	186.045	9.149	2.011	0	3	197.205	
diferencia	-7.158	148	67	0	5	-6.943	

Tránsito Estación De Peaje Los Manguitos							
Categoría	**Tto-Tp**	**Tto-Ted**	**Exentos 787**	**Evasores**	**Maquina Agrícola**	**Total**	**%**
porcentaje	-3,85%	1,62%	3,33%			-3,52%	

Fuente: Informe Gerencial No.130 – septiembre 2026. Concesionario Ruta al Mar

En comparación con el mes inmediatamente anterior (agosto de 2026), se evidenció un descenso en el tránsito vehicular de 6.943 vehículos, equivalente a una disminución del 3.52%, incluyendo los vehículos exentos registrados en la estación de peaje Los Manguitos.

4.4.1.3. Tránsito Vehicular en Estación de Peaje Mata de Caña

Durante el mes se registró el paso total de 88.763 vehículos que pagaron la tarifa plena establecida por categoría, adicionalmente, pasaron 1.148 vehículos exentos según Ley 787 de 2002, se registró el paso de 66 maquinarias agrícolas y 4.418 pasos con tarifa especial diferencial, para un total de 94.329 vehículos sin incluir maquinas agrícolas.

Tabla 4-74 Tránsito Vehicular Estación Mata de Caña

Tránsito Estación De Peaje Mata de Caña							
Categoría	**Tto-Tp**	**Tto-Ted**	**Exentos 787**	**Evasores**	**Maquina Agrícola**	**Total**	**%**
I	58.037	2	1.085	0	66	59.124	63%
II	7.402	4.416	26	0	0	11.844	13%
III	7.035	0	34	0	0	7.069	7%

Tránsito Estación De Peaje Mata de Caña							
Categoría	**Tto-Tp**	**Tto-Ted**	**Exentos 787**	**Evasores**	**Maquina Agrícola**	**Total**	**%**
IV	5.876	0	3	0	0	5.879	6%
V	4.540	0	0	0	0	4.540	5%
VI	3.181	0	0	0	0	3.181	3%
VII	2.692	0	0	0	0	2.692	3%
sep-26	88.763	4.418	1.148	0	66	94.329	100%
ago-26	99.693	4.343	1.173	0	44	105.209	
diferencia	-10.930	75	-25	0	22	-10.880	
porcentaje	-10,96%	1,73%	-2,13%			-10,34%	

Fuente: Informe Gerencial No.130 – septiembre de 2026. Concesionario Ruta al Mar

En comparación con el mes inmediatamente anterior (agosto de 2026), se evidenció un descenso en el tránsito vehicular de 10.880 vehículos, equivalente a una disminución del 10.34%, considerando la totalidad de los vehículos, incluidos los exentos, registrados en la estación de peaje Mata de Caña.

4.4.1.4. Tránsito Vehicular en Estación de Peaje Caimanera

Durante el mes se registró el paso de 105.823 vehículos que no cancelaron la tarifa plena establecida por categoría, 0 vehículos que cancelaron tarifa diferencial y adicionalmente pasaron 913 vehículos exentos según la Ley 787, para un total de 106.736 vehículos.

Tabla 4-75 Tránsito Vehicular Estación Caimanera

Tránsito Estación De Peaje Caimanera							
Categoría	**Tto-Tp**	**Tto-Ted**	**Exentos 787**	**Evasores**	**Maquina Agrícola**	**Total**	**%**
I	69.112	0	540	0	0	69.652	65%
II	11.655	0	24	0	0	11.679	11%
III	8.210	0	253	0	0	8.463	8%
IV	6.422	0	20	0	0	6.442	6%
V	4.608	0	76	0	0	4.684	4%
VI	2.015	0	0	0	0	2.015	2%
VII	3.801	0	0	0	0	3.801	4%
sep-26	105.823	0	913	0	0	106.736	100%
ago-26	107.518	0	531	0	0	108.049	
diferencia	-1.695	0	382	0	0	-1.313	
porcentaje	-1,58%		71,94%			-1,22%	

Fuente: Informe Gerencial No.130 – septiembre de 2026. Concesionario Ruta al Mar

En comparación con el mes inmediatamente anterior (septiembre de 2026), se evidenció un descenso en el volumen de tráfico de 1.313 vehículos, equivalente a una disminución del 1.22%, incluyendo los vehículos exentos.

Debido a protestas realizadas el día 16 de septiembre de 2022 por motivos del traslado del peaje, el día 28 de septiembre de 2022 en audiencia pública quedan exceptuados de este cobro los carros de las categorías I y II, adicionalmente el día 29 de enero de 2023 desde las 00 horas se exceptúa el cobro de todas las categorías mientras se traslada de manera provisional en tanto se construye la nueva estación en su ubicación definitiva

4.4.1.5. Tránsito Vehicular en Estación de Peaje San Onofre

Durante el mes, se registró un paso total de 86.734 vehículos que cancelaron la tasa establecida por categoría y adicionalmente pasaron 343 vehículos exentos según la Ley 787 de 2002 y 11 máquinas agrícolas, para un total de 87.077 vehículos sin incluir la maquinaria agrícola.

Tabla 4-76 Tránsito Vehicular Estación San Onofre

Tránsito Estación De Peaje San Onofre							
Categoría	**Tto-Tp**	**Tto-Ted**	**Exentos 787**	**Evasores**	**Maquina Agrícola**	**Total**	**%**
I	38.471	0	244	0	11	38.715	44%
II	3.811	0	10	0	0	3.821	4%
III	9.092	0	46	0	0	9.138	10%
IV	8.240	0	7	0	0	8.247	9%
V	8.439	0	35	0	0	8.474	10%
VI	6.843	0	0	0	0	6.843	8%
VII	11.838	0	1	0	0	11.839	14%

Tránsito Estación De Peaje San Onofre							
Categoría	**Tto-Tp**	**Tto-Ted**	**Exentos 787**	**Evasores**	**Maquina Agrícola**	**Total**	**%**
sep-26	86.734	0	343	0	11	87.077	100%
ago-26	92.570	0	297	0	12	92.867	
diferencia	-5.836	0	46	0	-1	-5.790	
porcentaje	-6,30%		15,49%			-6,23%	

Fuente: Informe Gerencial No.130 – septiembre de 2026. Concesionario Ruta al Mar

En comparación con el mes inmediatamente anterior (agosto de 2026), se evidenció un descenso en el volumen de tráfico de 5.790 vehículos, equivalente a una disminución del 6.23%, incluyendo los vehículos exentos.

4.4.1.6. Tránsito Vehicular en Estación de Peaje Purgatorio

En la totalidad del periodo se obtuvo registros de pasos totales por 138.821 vehículos los cuales cancelaron tarifa plena, adicionalmente pasaron 4.356 vehículos exentos según la Ley 787 de 2002 y con respecto a los vehículos especiales pasaron 25.845 vehículos legalizados y transitando con TIE (tarjeta electrónica). Para un total de 169.022 vehículos. Sin incluir los 3.088 beneficios otorgados por el peaje de san Carlos.

Tabla 4-77 Tránsito Vehicular Estación Purgatorio

Tránsito Estación De Peaje Purgatorio							
Categoría	**Tto-Tp**	**Tto-Ted**	**Exentos 787**	**Beneficio**	**Maquina Agrícola**	**Total**	**%**
I	107.205	16.407	4.151	2.105	0	127.763	76%
II	5.966	9.438	21	106	0	15.425	9%
III	10.415	0	127	274	0	10.542	6%
IV	8.335	0	57	420	0	8.392	5%
V	4.437	0	0	100	0	4.437	3%
VI	1.035	0	0	31	0	1.035	1%
VII	1.428	0	0	52	0	1.428	1%
sep-26	138.821	25.845	4.356	3.088	0	169.022	100%
ago-26	144.664	25.779	4.308	3.287	0	174.751	
diferencia	-5.843	66	48	-199	0	-5.729	
porcentaje	-4,04%	0,26%	1,11%	-6,05%		-3,28%	

Fuente: Informe Gerencial No.130 – septiembre de 2026. Concesionario Ruta al Mar

En comparación con el mes inmediatamente anterior (agosto de 2026), se evidenció un descenso en el tránsito vehicular de 5.729 vehículos, equivalente a una disminución del 3.28%, considerando los vehículos exentos y excluyendo 3.088 vehículos correspondientes al beneficio tarifario aplicado en la estación de peaje San Carlos.

4.4.1.7. Tránsito Vehicular en Estación de Peaje Los Cedros

En la totalidad del periodo se obtuvo registros de pasos totales por 55.301 vehículos que cancelaron la tarifa plena según su categoría, adicionalmente pasaron 1.179 vehículos exentos según la Ley 787 de 2002, respecto a los vehículos especiales pasaron 6.402 vehículos legalizados y transitando con TIE (tarjeta electrónica), para un total de 62.882 vehículos.

Tabla 4-78 Tránsito Vehicular Estación Los Cedros

Tránsito Estación De Peaje Los Cedros							
Categoría	**Tto-Tp**	**Tto-Ted**	**Exentos 787**	**Evasores**	**Maquina Agrícola**	**Total**	**%**
I	39.978	4.610	1.159	0	10	45.747	73%
II	1.871	1.792	4	0	0	3.667	6%
III	5.853	0	4	0	0	5.857	9%
IV	5.397	0	12	0	0	5.409	9%
V	1.612	0	0	0	0	1.612	3%
VI	190	0	0	0	0	190	0%
VII	400	0	0	0	0	400	1%
sep-26	55.301	6.402	1.179	0	10	62.882	100%
ago-26	55.241	6.485	1.141	0	3	62.867	
diferencia	60	-83	38	0	7	15	

Tránsito Estación De Peaje Los Cedros							
Categoría	**Tto-Tp**	**Tto-Ted**	**Exentos 787**	**Evasores**	**Maquina Agrícola**	**Total**	**%**
porcentaje	0,11%	-1,28%	3,33%			0,02%	

Fuente: Informe Gerencial No.130 – septiembre de 2026. Concesionario Ruta al Mar

En comparación con el mes inmediatamente anterior (agosto de 2026), se evidenció un aumento en el tránsito vehicular de 15 vehículos, equivalente a un incremento del 0.02%, considerando la totalidad de los vehículos, incluidos los exentos, registrados en la estación de peaje Cedros.

4.4.1.8. Tránsito Vehicular en Estación de Peaje San Carlos

En la totalidad del periodo se obtuvo registros de 42.104 vehículos que cancelaron tarifa plena según su categoría. Adicionalmente pasaron 144 vehículos exentos según Ley 787 de 2002, para un total de 42.248 tránsitos sin incluir los 3.253 beneficios otorgados por el peaje purgatorio.

Tabla 4-79 Tránsito Vehicular Estación Los San Carlos

Tránsito Estación De Peaje San Carlos							
Categoría	**Tto-Tp**	**Tto-Ted**	**Exentos 787**	**Beneficios**	**Maquina Agrícola**	**Total**	**%**
I	17.677	0	137	2.142	41	17.814	42%
II	1.986	0	0	104	0	1.986	5%

Tránsito Estación De Peaje San Carlos							
Categoría	**Tto-Tp**	**Tto-Ted**	**Exentos 787**	**Beneficios**	**Maquina Agrícola**	**Total**	**%**
III	5.712	0	5	286	0	5.717	14%
IV	6.922	0	2	527	0	6.924	16%
V	3.900	0	0	109	0	3.900	9%
VI	2.577	0	0	38	0	2.577	6%
VII	3.330	0	0	47	0	3.330	8%
sep-26	42.104	0	144	3.253	41	42.248	100%
ago-26	48.273	0	176	3.388	33	48.449	
diferencia	-6.169	0	-32	-135	8	-6.201	
porcentaje	-12,78%		-18,18%	-3,98%		-12,80%	

Fuente: Informe Gerencial No.130 – septiembre de 2026. Concesionario Ruta al Mar

En comparación con el mes inmediatamente anterior (agosto de 2026), se evidenció un descenso en el tránsito vehicular de 6.201 vehículos, equivalente a una disminución del 12.80%, considerando los vehículos exentos y excluyendo 3.253 vehículos correspondientes al beneficio tarifario aplicado en la estación de peaje San Carlos.

4.4.1.9. Resumen total de tráfico por categoría vehicular


Unificando los resultados del total del tráfico que canceló la tarifa de peaje, se obtienen un total de 919.435 tránsitos, incluyendo vehículos exentos, tal como se presenta en la tabla a continuación.

Tabla 4-80 tráfico según categoría vehicular

Peajes	I	II	III	IV	V	VI	VII	TOTAL
La Apartada	74.186	8.782	21.841	15.949	10.599	11.845	23.677	**166.879**
Purgatorio	127.763	15.425	10.542	8.392	4.437	1.035	1.428	**169.022**
Los Cedros	45.747	3.667	5.857	5.409	1.612	190	400	**62.882**
Mata de Caña	59.124	11.844	7.069	5.879	4.540	3.181	2.692	**94.329**
San Onofre	38.715	3.821	9.138	8.247	8.474	6.843	11.839	**87.077**
Los Manguitos	87.418	10.889	23.010	17.053	10.462	13.968	27.462	**190.262**
San Carlos	17.814	1.986	5.717	6.924	3.900	2.577	3.330	**42.248**
Caimanera	69.652	11.679	8.463	6.442	4.684	2.015	3.801	**106.736**

Fuente: Interventoría Consorcio IPAB – Informe mensual No.8

Grafica 25 Trafico según categoría vehicular

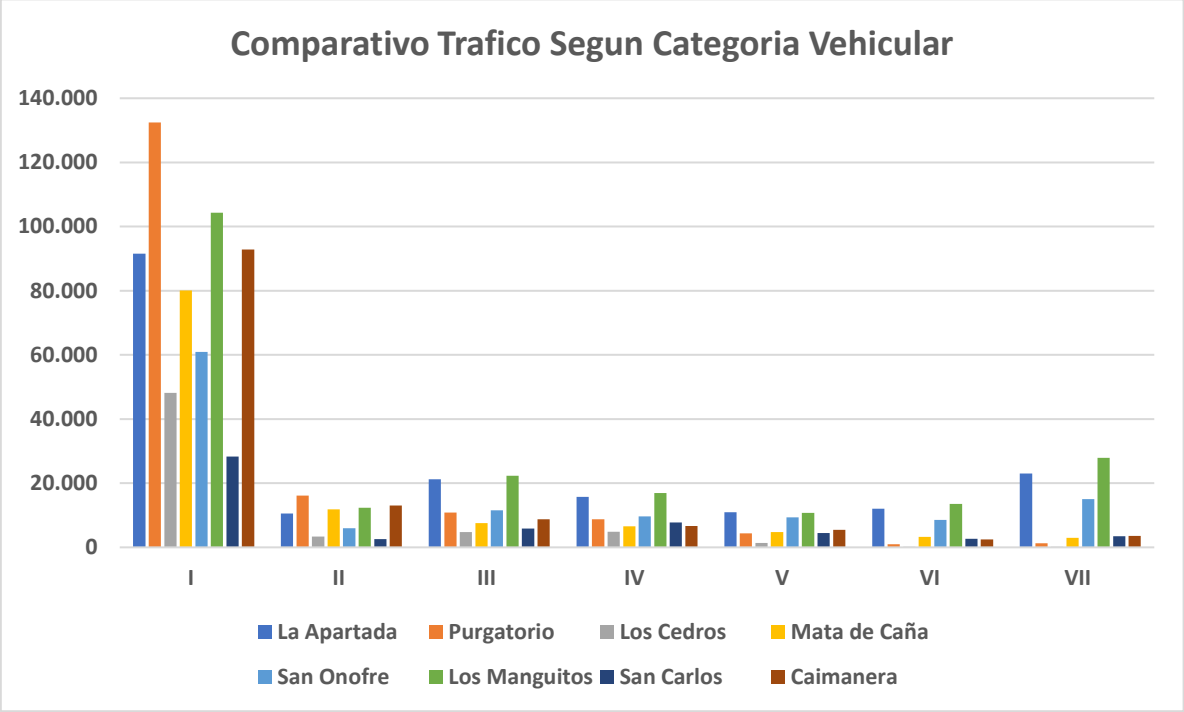

Fuente: Interventoría Consorcio IPAB – Informe mensual No.8

Desde los inicios del proyecto, la categoría I continua en primer lugar con el mayor tránsito de vehículos por las estaciones del proyecto, en orden de mayor tráfico para el periodo de evaluación, se posicionan el peaje, Manguitos, Purgatorio, Mata de caña y La Apartada, de menor incidencia en tránsito vehicular los peajes de Cedros, San Onofre y San Carlos. Las categorías IV y superior, tienen mayor presencia en los peajes de San Onofre, Manguitos y La Apartada como ruta escogida por los usuarios del gremio transportador para ingresar o sacar alimentos de Antioquia hacia Córdoba o viceversa.

Por las estaciones de peaje la Apartada, los Manguitos, Mata de Caña, Caimanera, Cedros, Purgatorio, San Onofre y San Carlos durante el mes, transitaron **861.944** vehículos que cancelaron la tasa de peaje establecida por categoría, **45.962** vehículos

que tuvieron beneficio de tarifa diferencial y **11.529** pasos de vehículos perteneciente a ley 787 del 2002, para un total de **919.435** vehículos que transitaron por las estaciones de peaje.

4.4.1.10. TPD ESTRUCTURADO – PROYECTADO – REAL

La Interventoría realiza el seguimiento periódico al comportamiento del tráfico del proyecto, mediante la revisión de la información reportada por el Concesionario y realiza el seguimiento mensual, comparando el tráfico real con el tráfico proyectado en la estructuración del proyecto y con la proyección anual elaborada por la anterior Interventoría. A partir de estas verificaciones se identifican desviaciones en el comportamiento del tráfico y sus posibles efectos sobre el recaudo, y en el presente informe se consigna el análisis y conclusiones correspondientes.

Tabla 4-81 Seguimiento del TPD mensual en las estaciones de peaje


ESTACIÓN	TPD	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26
Apartada	ESTRUCTURADO	6.194	6.194	6.194	6.194	6.194	6.194	6.194	6.194
	PROYECTADO POR ANTERIOR INTERVENTORIA	5.279	5.279	5.279	5.279	5.279	5.279	5.279	5.279
	REAL	5.202	4.027	5.891	5.248	5.736	6.127	5.637	5.517
Mata de Caña	ESTRUCTURADO	5.949	5.949	5.949	5.949	5.949	5.949	5.949	5.949
	PROYECTADO POR ANTERIOR INTERVENTORIA	3.712	3.712	3.712	3.712	3.712	3.712	3.712	3.712
	REAL	2.686	2.993	3.365	3.039	3.619	3.860	3.356	3.106

ESTACIÓN	TPD	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26
San Onofre	ESTRUCTURADO	4.028	4.028	4.028	4.028	4.028	4.028	4.028	4.028
	PROYECTADO POR ANTERIOR INTERVENTORIA	3.158	3.158	3.158	3.158	3.158	3.158	3.158	3.158
	REAL	2.615	2.577	3.166	2.603	3.246	4.021	2.986	2.891
Manguitos	ESTRUCTURADO	6.983	6.983	6.983	6.983	6.983	6.983	6.983	6.983
	PROYECTADO POR ANTERIOR INTERVENTORIA	6.329	6.329	6.329	6.329	6.329	6.329	6.329	6.329
	REAL	5.880	5.054	6.625	5.957	6.423	6.865	6.297	6.273
Caimanera	ESTRUCTURADO	3.293	3.293	3.293	3.293	3.293	3.293	3.293	3.293
	PROYECTADO POR ANTERIOR INTERVENTORIA	4.351	4.351	4.351	4.351	4.351	4.351	4.351	4.351
	REAL	3.125	3.543	4.187	3.527	4.094	4.396	3.468	3.527
Cedros	ESTRUCTURADO	2.374	2.374	2.374	2.374	2.374	2.374	2.374	2.374
	PROYECTADO POR ANTERIOR INTERVENTORIA	2.734	2.734	2.734	2.734	2.734	2.734	2.734	2.734
	REAL	1.278	1.660	1.909	1.865	1.998	2.056	1.991	2.057
Purgatorio	ESTRUCTURADO	3.608	3.608	3.608	3.608	3.608	3.608	3.608	3.608
	PROYECTADO POR ANTERIOR INTERVENTORIA	5.665	5.665	5.665	5.665	5.665	5.665	5.665	5.665

ESTACIÓN	TPD	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26
	REAL	5.212	5.530	5.545	5.312	5.375	5.690	5.498	5.489
San Carlos	ESTRUCTURADO	2.449	2.449	2.449	2.449	2.449	2.449	2.449	2.449
	PROYECTADO POR ANTERIOR INTERVENTORIA	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534
	REAL	1.273	1.392	1.683	1.388	1.712	1.834	1.557	1.403


Fuente: Interventoría Consorcio IPAB – Informe mensual No.8

Grafica 26 Seguimiento TPD Peaje La Apartada

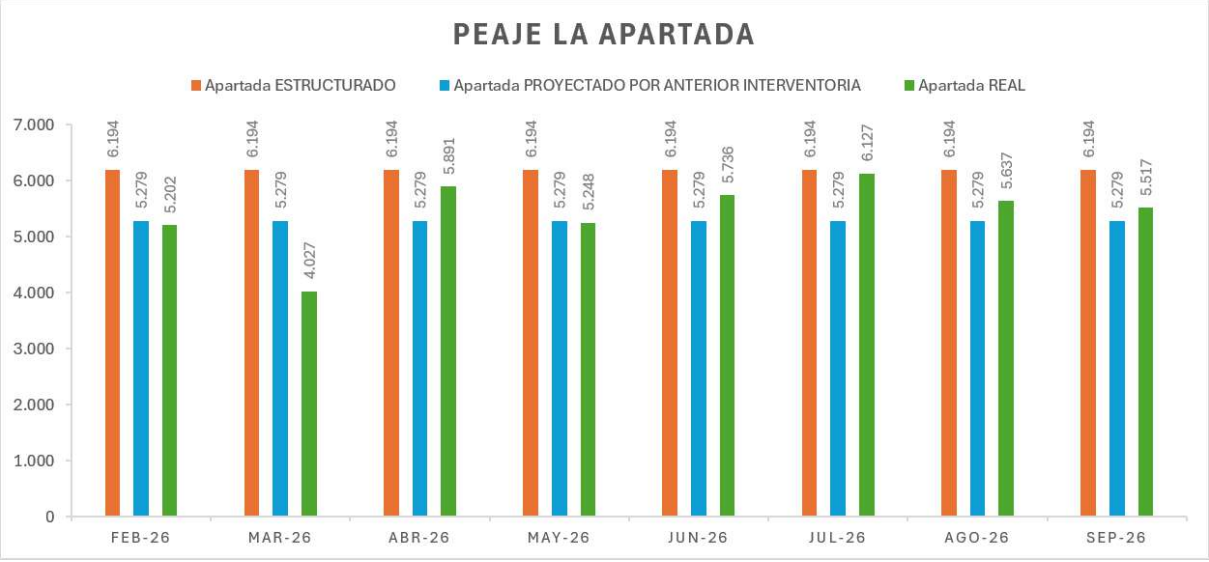


Fuente: Elaboración Propia – Consorcio IPAB

Grafica 27 Seguimiento TPD Peaje Mata de Caña

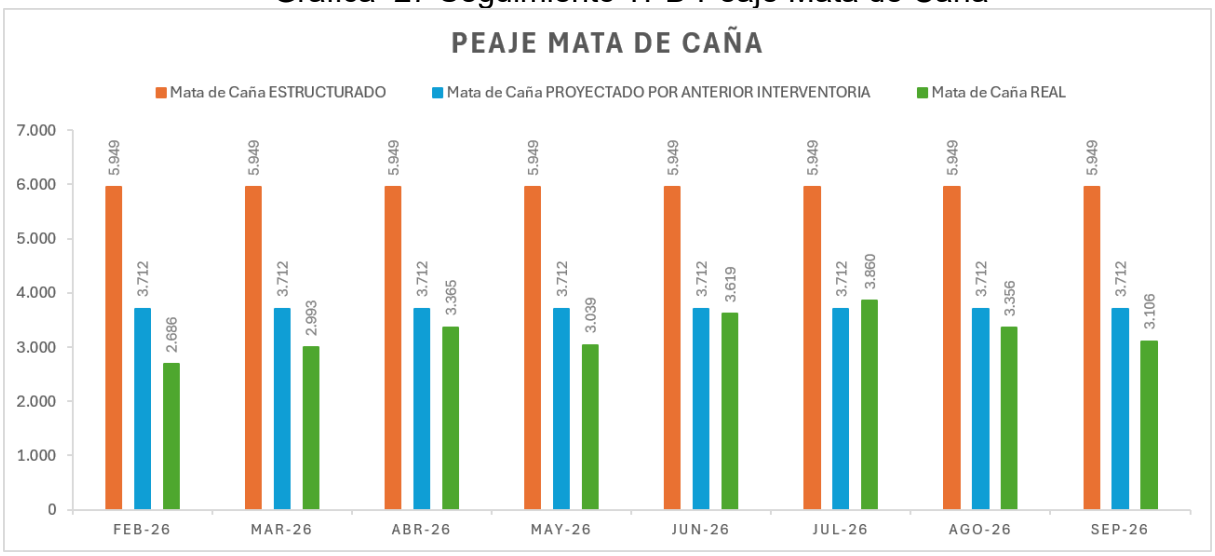


Fuente: Elaboración Propia – Consorcio IPAB

Grafica 28 Seguimiento TPD Peaje San Onofre

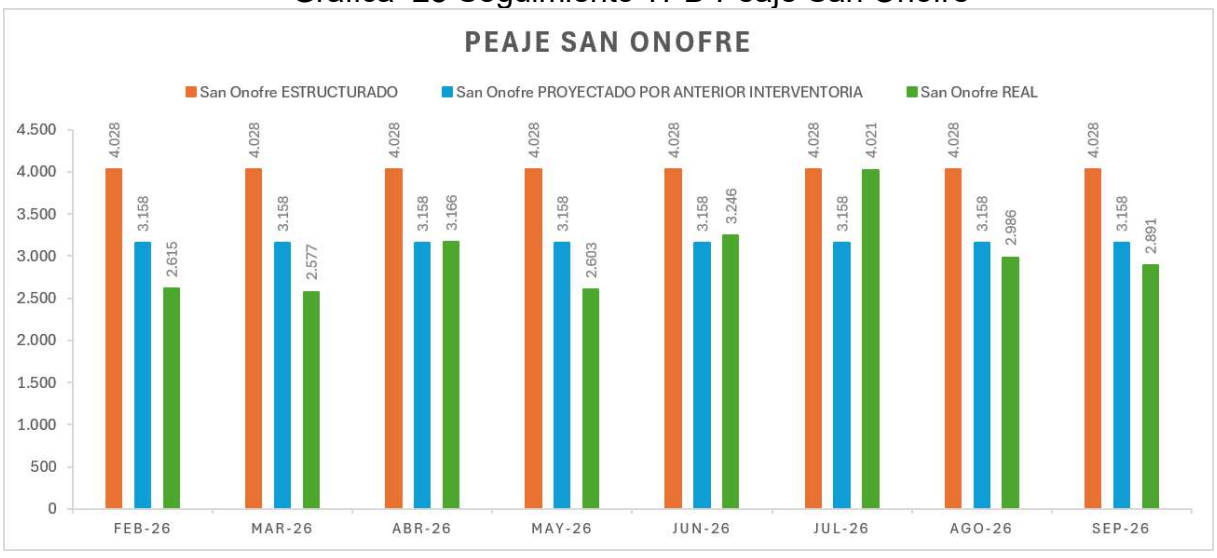


Fuente: Elaboración Propia – Consorcio IPAB

Grafica 29 Seguimiento TPD Peaje Los Manguitos

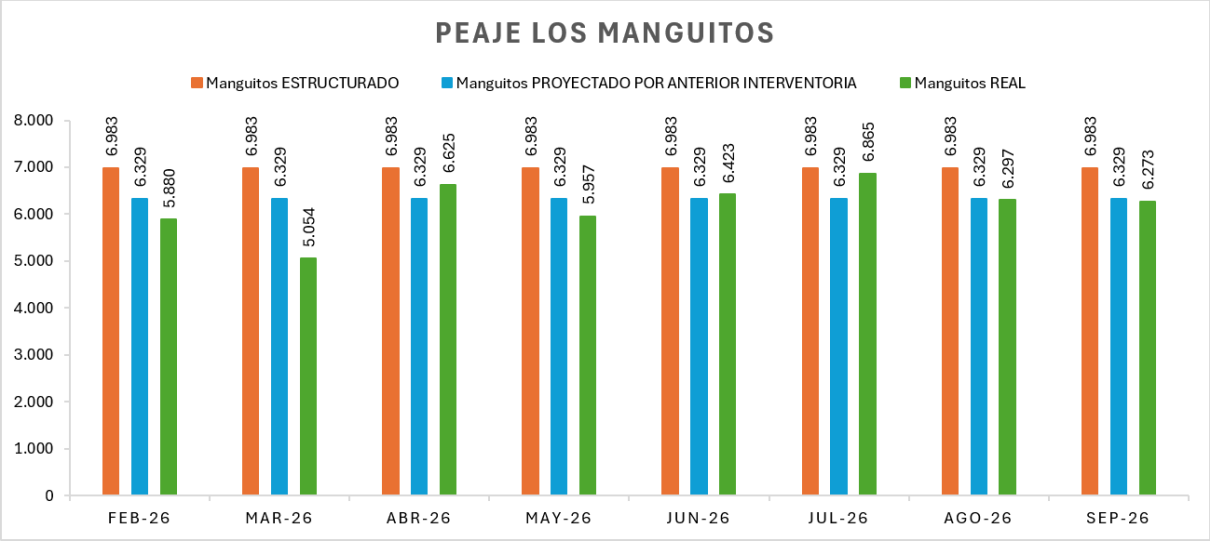


Fuente: Elaboración Propia – Consorcio IPAB

Grafica 30 Seguimiento TPD Peaje Caimanera

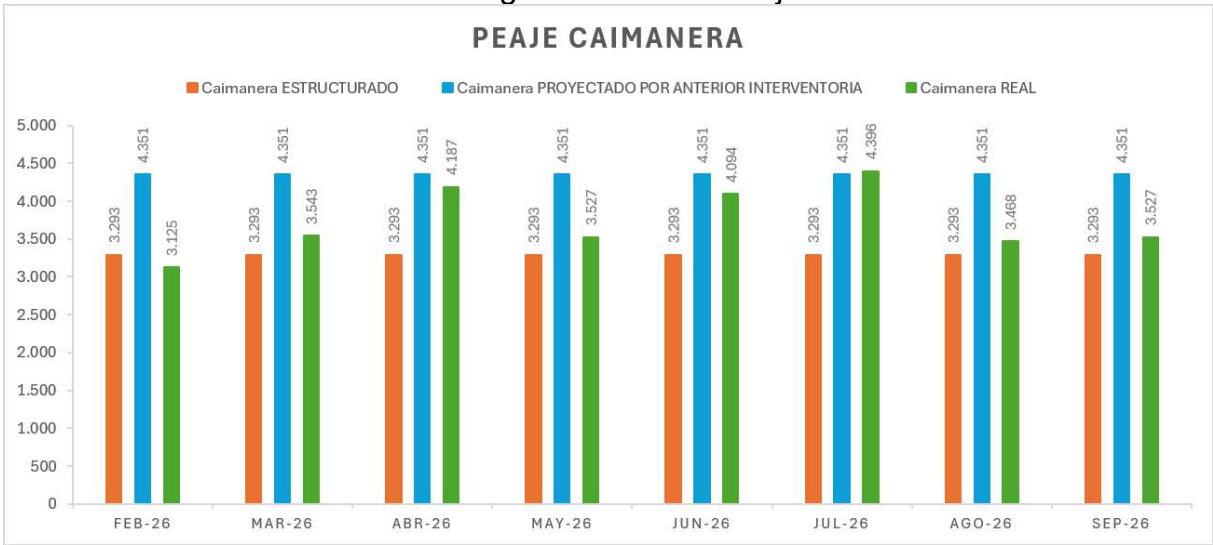


Fuente: Elaboración Propia – Consorcio IPAB

Grafica 31 Seguimiento TPD Peaje Los Cedros

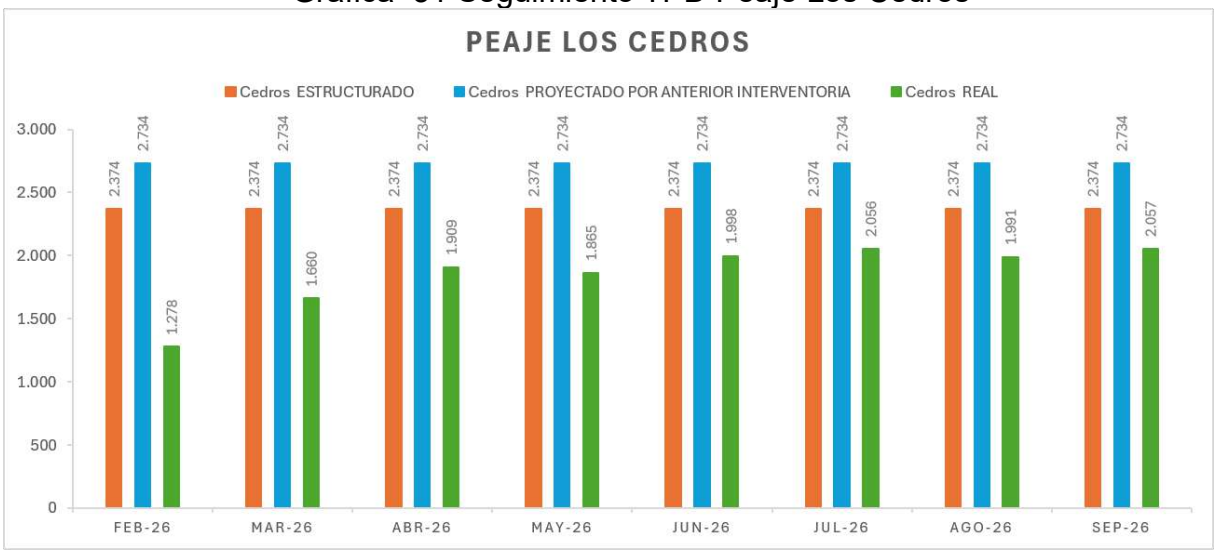


Fuente: Elaboración Propia – Consorcio IPAB

Grafica 32 Seguimiento TPD Peaje Purgatorio

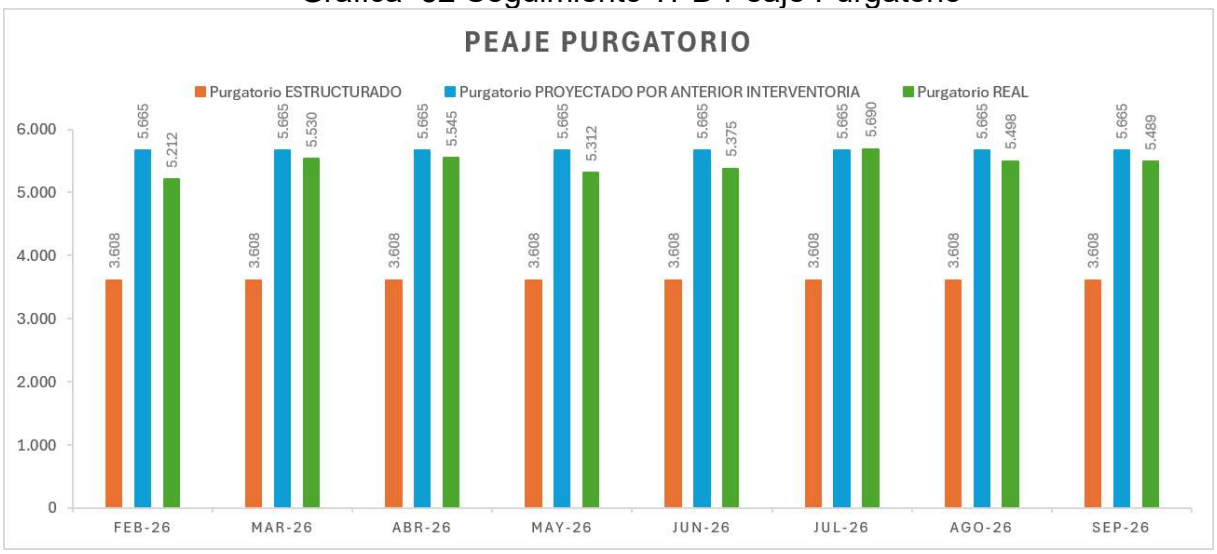

Fuente: Elaboración Propia – Consorcio IPAB

Grafica 33 Seguimiento TPD Peaje San Carlos

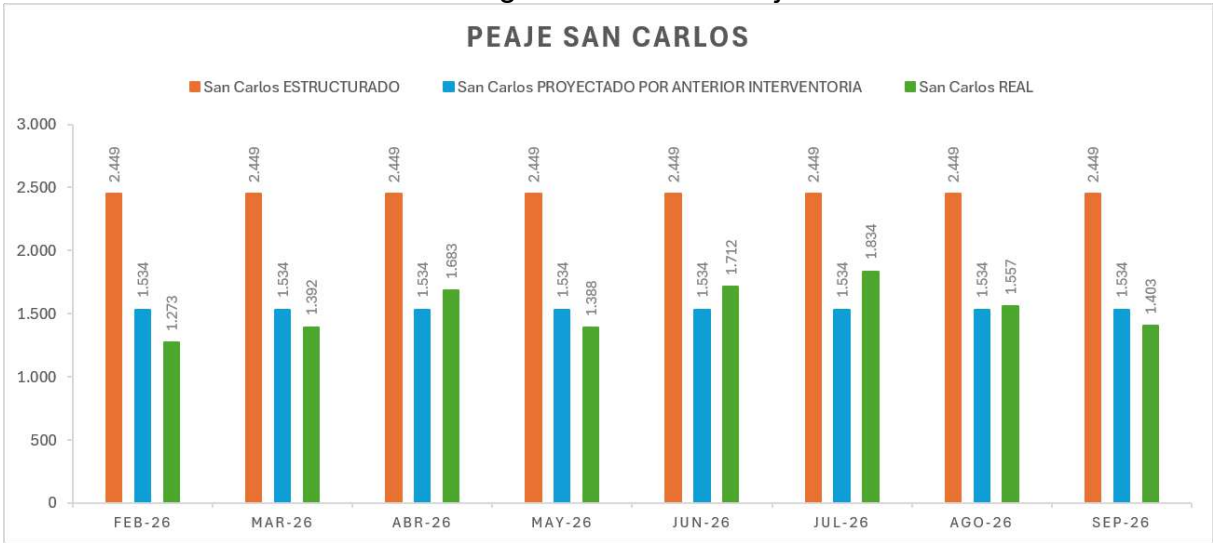

Fuente: Elaboración Propia – Consorcio IPAB

Al comparar el TPD real con el TPD estructurado y el TPD proyectado por la anterior Interventoría durante el período febrero–septiembre de 2026, se evidencia un comportamiento variable entre las estaciones de peaje. En general, el TPD real se mantiene por debajo del valor estructurado; no obstante, frente al TPD proyectado se presentan variaciones, registrándose en algunos meses valores reales superiores a la proyección, especialmente en Apartada, San Onofre y Manguitos. Para septiembre de 2026, los mayores volúmenes de tránsito se presentaron en Manguitos (6.273 vehículos), Apartada (5.517) y Purgatorio (5.489), mientras que San Carlos (1.403) y Cedros (2.057) registraron los menores valores. En particular, San Carlos y Cedros presentan en septiembre un TPD real inferior tanto al valor proyectado como al considerado en la estructuración, evidenciando una demanda vehicular menor a la prevista para estas estaciones.

4.4.2. Análisis de tráfico y recaudo vehículos especiales TED

4.4.2.1. Estación de Peaje Manguitos

Durante el mes de septiembre de 2026, transitaron un total de 7.500 de vehículos de primera categoría, 1.737 de segunda categoría especial y 60 de tercera categoría en la estación de Peaje Manguitos.

Tabla 4-82 Especiales Estación de Peaje Manguitos

Categoría	Resolución	Valor	Publico	Particular	Total, Pasos	Recaudo Real	Recaudo proyectado	Diferencia
IE Art. 5	288	$ 6.700	0	5.907	5.907	$ 39.576.900	$ 116.367.900	$ 76.791.000
IE Art. 1	410	$ 11.900	1.593	0	1.593	$ 18.956.700	$ 31.382.100	$ 12.425.400
IIE Art. 5	288	$ 19.100	0	0	0	$ -	$ -	$ -
IIE Art. 1	410	$ 17.300	1.737	0	1.737	$ 30.050.100	$ 50.546.700	$ 20.496.600
IIIE Art. 5	410	$ 19.100	60	0	60	$ 1.146.000	$ 1.746.000	$ 600.000
TOTAL			**3.390**	**5.907**	**9.297**	**$ 89.729.700**	**$ 200.042.700**	**$ 110.313.000**

Fuente: Informe Gerencial No.130 – septiembre de 2026. Concesionario Ruta al Mar

4.4.2.2. Estación de peaje Caimanera

Según la resolución 20233040029245 del 11 de julio de 2023 en su artículo 4 se Derogan las tarifas diferenciales establecidas en el artículo 2 de la resolución No.0000288 del 14 de febrero de 2020 y el artículo 1 de la resolución No.20213040030335 del 19 de Julio de 2021.

4.4.2.3. Estación de peaje Cedros

Durante el mes de septiembre de 2026, en la estación de peaje Los Cedros, transitó un total de 4.610 vehículos que pertenecen a la categoría I especial y 1.792 vehículos en la categoría II especial.

Tabla 4-83 Especiales Estación de Peaje Cedros

Categoría	Resolución	Valor	Publico	Particular	Total, Pasos	Recaudo Real	Recaudo proyectado	Diferencia
IE Art. 1	410	$ 11.900	4.610	0	4.610	$ 54.859.000	$ 90.817.000	$ 35.958.000
IIE Art. 1	410	$ 17.300	1.792	0	1.792	$ 31.001.600	$ 52.147.200	$ 21.145.600
TOTAL			**6.402**	**0**	6.402	**$ 85.860.600**	**$ 142.964.200**	**$ 57.103.600**

Fuente: Informe Gerencial No.130 – septiembre de 2026. Concesionario Ruta al Mar

4.4.2.4. Estación de peaje Purgatorio

Para el mes de septiembre de 2026, con tarifas especiales transitó un total de 16.407 vehículos perteneciente a categoría I especial, 9.438 pasos que pertenecen a la categoría II especial, 0 pasos que pertenecen a la categoría III especial y 0 pasos que pertenecen a la categoría de IV especial.

Tabla 4-84 Especiales Estación de Peaje Purgatorio

Categoría	Resolución	Valor	Publico	Particular	Total, Pasos	Recaudo Real	Recaudo proyectado	Diferencia
IE Art. 2	410	$ 11.900	6.069	0	6.069	$ 72.221.100	$ 119.559.300	$ 47.338.200
IE Art. 3	410	$ 10.000	0	542	542	$ 5.420.000	$ 10.677.400	$ 5.257.400
IE Art. 4	410	$ 1.200	0	8.951	8.951	$ 10.741.200	$ 176.334.700	$ 165.593.500
IEE Art.2	410	$ 3.700	845	0	845	$ 3.126.500	$ 16.646.500	$ 13.520.000
IIE Art. 2	410	$ 17.300	5.840	0	5.840	$ 101.032.000	$ 169.944.000	$ 68.912.000
IIE Art. 3	410	$ 14.500	0	0	0	$ -	$ -	$ -
IIEE Art. 2	410	$ 1.200	0	3.598	3.598	$ 4.317.600	$ 104.701.800	$ 100.384.200
IIIE Art. 3	410	$ 14.500	0	0	0	$ -	$ -	$ -
IVE Art. 3	410	$ 14.500	0	0	0	$ -	$ -	$ -
TOTAL			**12.754**	**13.091**	**25.845**	**$ 196.858.400**	**$ 597.863.700**	**$ 401.005.300**

Fuente: Informe Gerencial No.130 – septiembre de 2026. Concesionario Ruta al Mar

4.4.2.5. Estación de peaje Mata de Caña

Durante el mes de septiembre de 2026, en la estación de peaje Mata de Caña, transitó un total 2 vehículos de I categoría y 4.416 vehículos de II categoría con tarifa especial diferencial

Tabla 4-85 Estación de Mata de Caña

Categoría	Resolución	Valor	Publico	Particular	Total, Pasos	Recaudo Real	Recaudo proyectado	Diferencia
IE Art. 1	410	$ 11.900	2	0	2	$ 23.800	$ 38.800	$ 15.000
IIE Art. 1	410	$ 17.300	4.416	0	4.416	$ 76.396.800	$ 125.856.000	$ 49.459.200
TOTAL			**4.418**	**0**	4.418	**$ 76.420.600**	**$ 125.894.800**	**$ 49.474.200**

Fuente: Informe Gerencial No.130 – septiembre de 2026. Concesionario Ruta al Mar

4.4.2.6. Estado actual vehículos especiales (TED) por cada estación

El resumen del tránsito de vehículos especiales con tarifa diferencial (TED) aforado por las cuatro estaciones de peaje durante el mes, se indica a continuación**: Mata de caña** con 2 de vehículos de categoría 1E; 4.416 pasos de vehículos de categoría 2E, **Manguitos** con 7.500 pasos de vehículos de categoría 1E; 1.737 vehículos de categoría 2E, 60 Pasos de categoría 3E**; Purgatorio** 16.407 pasos, perteneciente a categoría 1E especial, 9.438 pasos que pertenecen a la categoría 2E, 0 pasos que pertenecen a la categoría 3E y 0 pasos que pertenecen a la categoría de 4E ; **Cedros** 4.610 vehículos categoría 1E y 1.792 pasos de vehículos categoría 2E, es decir, para un total de 45.962 vehículos con tarifa especial diferencial por los corredores de la Concesión.

Tabla 4-86 Estado Actual vehículos Especiales

Peaje	Total, vehículos especiales	Recaudo TED	Recaudo Tarifa plena	Diferencia
Los Manguitos	9.297	$ 89.729.700	$ 200.042.700	$ 110.313.000
Purgatorio	25.845	$ 196.858.400	$ 597.863.700	$ 401.005.300
Los Cedros	6.402	$ 85.860.600	$ 142.964.200	$ 57.103.600
Mata de Caña	4.418	$ 76.420.600	$ 84.079.600	$ 7.659.000
Total	**45.962**	**$ 448.869.300**	**$ 125.894.800**	**$ 576.080.900**

Fuente: Informe Gerencial No.130 – septiembre de 2026. Concesionario Ruta al Mar

4.4.3. Recaudo de las estaciones de peaje

El recaudo de las estaciones de peaje está directamente relacionado con el tráfico vehicular discriminado por su categoría y precio, condicionado solamente por las tarifas diferenciales y el tráfico de vehículos exentos (ley 787) en algunas de las estaciones.

Durante el mes de septiembre de 2026, se obtuvo recaudo en pesos colombianos por estación de peaje como se relaciona a continuación:

4.4.3.1. Recaudo en Estación de Peaje La Apartada

A continuación, se presenta el resumen del recaudo por categoría en la estación la Apartada:

Tabla 4-87 Recaudo Estación La Apartada

CAT	TTO-TP	TTO-TED	Total	Sobrantes	Fosevi	Total
I	$ 1.438.139.400,00	$ -	$ 1.438.139.400,00			
II	$ 254.770.500,00	$ -	$ 254.770.500,00			
III	$ 632.110.200,00	$ -	$ 632.110.200,00			
IV	$ 463.039.200,00	$ -	$ 463.039.200,00			
V	$ 556.395.000,00	$ -	$ 556.395.000,00	**$ 113.200,00**	**$ 91.527.583,00**	**$ 6.513.904.917,00**
VI	$ 987.873.000,00	$ -	$ 987.873.000,00			
VII	$ 2.272.992.000,00	$ -	$ 2.272.992.000,00			
sep-26	**$ 6.605.319.300,00**	**$ -**	**$ 6.605.319.300,00**			

Fuente: Informe Gerencial No.130 – septiembre de 2026. Concesionario Ruta al Mar

Por concepto de recaudo se obtuvo un valor de $ 6.605.319.300 adicionalmente se tiene $ 113.200 por concepto de sobrantes. El recaudo se discrimina así: $ 91.527.583 correspondiente a seguridad vial y $ 6.513.904.917 para la cuenta fiducia Ruta al Mar SAS del peaje la Apartada.

4.4.3.2. Recaudo en Estación de Peaje Manguitos

A continuación, se presenta el resumen del recaudo por categoría en la estación Manguitos:

Tabla 4-88 Recaudo Estación Manguitos

CAT	TTO-TP	TTO-TED	Total	Sobrantes	Fosevi	Total
I	$ 1.536.698.500,00	$ 58.533.600,00	$ 1.595.232.100,00			
II	$ 265.595.700,00	$ 30.050.100,00	$ 295.645.800,00			
III	$ 664.935.000,00	$ 1.146.000,00	$ 666.081.000,00			
IV	$ 495.107.400,00	$ -	$ 495.107.400,00			
V	$ 549.202.500,00	$ -	$ 549.202.500,00			
VI	$ 1.164.931.200,00	$ -	$ 1.164.931.200,00			
VII	$ 2.636.352.000,00	$ -	$ 2.636.352.000,00			
sep-26	**$ 7.312.822.300,00**	**$ 89.729.700,00**	**$ 7.402.552.000,00**	**$ 135.700,00**	**$ 104.065.752,00**	**$ 7.298.621.948,00**

Fuente: Informe Gerencial No.130 – septiembre de 2026. Concesionario Ruta al Mar

Por concepto de recaudo se obtuvo un valor de $ 7.402.552.000. Adicionalmente se tiene $135.700 por concepto de sobrantes. El recaudo se discrimina así: $104.065.452 correspondiente a seguridad vial y $7.298.621.948 para la cuenta fiducia Ruta al Mar SAS.

4.4.3.3. Recaudo en Estación de Peaje Mata de Caña

A continuación, se presenta el resumen del recaudo por categoría en la estación Mata de Caña:

Tabla 4-89 Recaudo Estación Mata de Caña

CAT	TTO-TP	TTO-TED	Total	Sobrantes	Fosevi	Total
I	$ 1.125.917.800,00	$ 23.800,00	$ 1.125.941.600,00			
II	$ 210.957.000,00	$ 76.396.800,00	$ 287.353.800,00			
III	$ 200.497.500,00	$ -	$ 200.497.500,00			
IV	$ 167.466.000,00	$ -	$ 167.466.000,00			
V	$ 137.562.000,00	$ -	$ 137.562.000,00	**$ 2.600,00**	**$ 51.529.093,00**	**$ 2.127.737.507,00**
VI	$ 140.918.300,00	$ -	$ 140.918.300,00			
VII	$ 119.524.800,00	$ -	$ 119.524.800,00			
sep-26	**$ 2.102.843.400,00**	**$ 76.420.600,00**	**$ 2.179.264.000,00**			

Fuente: Informe Gerencial No.130 – septiembre de 2026. Concesionario Ruta al Mar

Durante el mes de septiembre de 2026, por concepto de recaudo se tiene un valor de $ 2.179.264.000. Adicionalmente se tiene $ 2.600 por concepto de sobrantes. El recaudo se discrimina así: $ 51.529.093 correspondiente a seguridad vial y $ 2.127.737.507 para la cuenta fiducia Ruta al Mar SAS.

4.4.3.4. Recaudo en Estación de Peaje Caimanera

A continuación, se presenta el resumen del recaudo por categoría en la estación Caimanera:

Tabla 4-90 Recaudo en Estación de Peaje Caimanera

CAT	TTO-TP	TTO-TED	Total	Sobrantes	Fosevi	Total
I	$ -	$ -	$ -			
II	$ -	$ -	$ -			
III	$ -	$ -	$ -			
IV	$ -	$ -	$ -			
V	$ -	$ -	$ -			
VI	$ -	$ -	$ -			
VII	$ -	$ -	$ -			
jul-26	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**

Fuente: Informe Gerencial No.128 – julio de 2026. Concesionario Ruta al Mar

Por concepto de recaudo de la estación de peaje Caimanera se obtuvo un valor $0. Adicionalmente se tiene $ 0 por concepto de sobrantes. El recaudo se discrimina así: $0 correspondiente a seguridad vial y $ 0 para la cuenta fiducia Ruta al Mar SAS.

En comparación con el mes inmediatamente anterior, por concepto de recaudo de la tasa de peaje por esta estación, el recaudo sigue en $ 0 esto es debido a las protestas de la comunidad realizadas el día 16 al 28 de septiembre de 2022 en donde las categorías I y II no están cancelando la tarifa de peaje, y a partir del día 29 de enero de 2023 se suspende el recaudo de todas las categorías debido a reubicación de la estación de caimanera mientras se reubica la estación en la variante Coveñas – Tolú

4.4.3.5. Recaudo en Estación de San Onofre

A continuación, se presenta el resumen del recaudo por categoría en la estación San Onofre:

Tabla 4-91 Recaudo Estación San Onofre

CAT	TTO-TP	TTO-TED	Total	Sobrantes	Fosevi	Total
I	$ 757.878.700,00	$ -	$ 757.878.700,00			
II	$ 110.900.100,00	$ -	$ 110.900.100,00			
III	$ 264.577.200,00	$ -	$ 264.577.200,00	**$ 46.600,00**	**$ 47.963.902,00**	**$ 3.475.424.398,00**
IV	$ 239.784.000,00	$ -	$ 239.784.000,00			
V	$ 443.047.500,00	$ -	$ 443.047.500,00			

CAT	TTO-TP	TTO-TED	Total	Sobrantes	Fosevi	Total
VI	$ 570.706.200,00	$ -	$ 570.706.200,00			
VII	$ 1.136.448.000,00	$ -	$ 1.136.448.000,00			
sep-26	**$ 3.523.341.700,00**	**$ -**	**$ 3.523.341.700,00**			

Fuente: Informe Gerencial No.130 – septiembre de 2026. Concesionario Ruta al Mar

Durante el mes de septiembre de 2026, por concepto de recaudo se obtuvo un valor de $ 3.523.341.700 adicionalmente se tiene $ 46.600 por concepto de sobrantes. El recaudo se discrimina así: $ 47.963.902 correspondiente a seguridad vial y $ 3.475.424.398 para la cuenta fiducia Ruta al Mar SAS.

4.4.3.6. Recaudo en Estación de Cedros

A continuación, se presenta el resumen del recaudo por categoría en la estación de peaje Cedros:

Tabla 4-92 Recaudo Estación Cedros

CAT	TTO-TP	TTO-TED	Total	Sobrantes	Fosevi	Total
I	$ 787.566.600,00	$ 54.859.000,00	$ 842.425.600,00	**$ 31.100,00**	**$ 34.121.759,00**	**$ 1.360.033.641,00**
II	$ 54.446.100,00	$ 31.001.600,00	$ 85.447.700,00			

CAT	TTO-TP	TTO-TED	Total	Sobrantes	Fosevi	Total
III	$ 170.322.300,00	$ -	$ 170.322.300,00			
IV	$ 157.052.700,00	$ -	$ 157.052.700,00			
V	$ 84.630.000,00	$ -	$ 84.630.000,00			
VI	$ 15.846.000,00	$ -	$ 15.846.000,00			
VII	$ 38.400.000,00	$ -	$ 38.400.000,00			
sep-26	**$ 1.308.263.700,00**	**$ 85.860.600,00**	**$ 1.394.124.300,00**			

Fuente: Informe Gerencial No.130 – septiembre de 2026. Concesionario Ruta al Mar

Durante el mes de septiembre de 2026, por concepto de recaudo de la estación de peaje Cedros se obtuvo un valor de $ 1.394.124.300 Adicionalmente se tienen $ 31.100 por concepto de sobrantes. El recaudo se discrimina así: $ 34.121.759 correspondiente a seguridad vial y $ 1.360.033.641 para la cuenta fiducia Ruta al Mar SAS

4.4.3.7. Recaudo en Estación de Purgatorio

A continuación, se presenta el resumen del recaudo por categoría en la estación de peaje Purgatorio.

Tabla 4-93 Recaudo Estación Purgatorio

CAT	TTO-TP	TTO-TED	Total	Sobrantes	Fosevi	Total
I	$ 2.111.938.500,00	$ 91.508.800,00	$ 2.203.447.300,00			
II	$ 173.610.600,00	$ 105.349.600,00	$ 278.960.200,00			
III	$ 303.076.500,00	$ -	$ 303.076.500,00			
IV	$ 242.548.500,00	$ -	$ 242.548.500,00			
V	$ 232.942.500,00	$ -	$ 232.942.500,00	**$ 81.000,00**	**$ 91.060.298,00**	**$ 3.393.402.702,00**
VI	$ 86.319.000,00	$ -	$ 86.319.000,00			
VII	$ 137.088.000,00	$ -	$ 137.088.000,00			
sep-26	**$ 3.287.523.600,00**	**$ 196.858.400,00**	**$ 3.484.382.000,00**			

Fuente: Informe Gerencial No.130 – septiembre de 2026. Concesionario Ruta al Mar

Durante el mes de septiembre de 2026, por concepto de recaudo de la estación de peaje Purgatorio se obtuvo un valor de $ 3.484.382.000. Adicionalmente se tiene $ 81.000 por concepto de sobrantes. El recaudo se discrimina así: $ 91.060.298 correspondiente a seguridad vial y $ 3.393.402.702 para la cuenta fiducia Ruta al Mar SAS.

4.4.3.8. Recaudo en Estación de San Carlos

A continuación, se presenta el resumen del recaudo por categoría en la estación de peaje San Carlos:

Tabla 4-94 Recaudo Estación San Carlos

CAT	TTO-TP	TTO-TED	Total	Sobrantes	Fosevi	Total
I	$ 342.933.800,00	$ -	$ 342.933.800,00			
II	$ 56.601.000,00	$ -	$ 56.601.000,00			
III	$ 162.792.000,00	$ -	$ 162.792.000,00			
IV	$ 197.277.000,00	$ -	$ 197.277.000,00			
V	$ 118.170.000,00	$ -	$ 118.170.000,00	**$ 54.700,00**	**$ 23.283.512,00**	**$ 1.116.558.088,00**
VI	$ 114.161.100,00	$ -	$ 114.161.100,00			
VII	$ 147.852.000,00	$ -	$ 147.852.000,00			
sep-26	**$ 1.139.786.900,00**	**$ -**	**$ 1.139.786.900,00**			

Fuente: Informe Gerencial No.130 – septiembre de 2026. Concesionario Ruta al Mar

Durante el mes de septiembre de 2026, por concepto de recaudo de la estación de peaje San Carlos se obtuvo un valor de $ 1.139.786.900; Adicionalmente se tiene $ 54.700 por concepto de sobrantes. El recaudo se discrimina así: $ 23.283.512 correspondiente a seguridad vial y $ 1.116.558.088 para la cuenta fiducia Ruta al Mar SAS.

4.4.3.9. Resumen del Recaudo Total por estación de peaje

Unificando los resultados del recaudo en cada estación de peaje, se presenta la tabla a continuación:

Tabla 4-95 Recaudo Total por estación de peaje

Peaje	Recaudo Total	
La Apartada	$	6.605.319.300,00
Purgatorio	$	3.484.382.000,00
Los Cedros	$	1.394.124.300,00
Mata de Caña	$	2.179.264.000,00
San Onofre	$	3.523.341.700,00
Los Manguitos	$	7.402.552.000,00
San Carlos	$	1.139.786.900,00
Caimanera	$	-
TOTAL	**$**	**25.728.770.200,00**

Fuente: Informe Gerencial No.130 – septiembre de 2026. Concesionario Ruta al Mar

En términos de recaudo, el peaje con mayor ingreso fue el peaje manguitos con $ 7.402.552.000 y el de menor ingreso fue el peaje el San Carlos con $ 1.139.786.900 exceptuando caimanera el cual tuvo un recaudo de $ 0.

4.4.3.10. Resumen del Recaudo por categoría vehicular

Tabla 4-96 Recaudo Total por categoría vehicular

TOTAL 8 ESTACIÓN						
CAT	**TTO-TP**	**TTO-TED**	**Total**	**Sobrantes**	**Fosevi**	**Total**
I	$ 8.101.073.300	$ 204.925.200	$ 8.305.998.500	$ 464.900	$ 443.551.899	$ 25.285.683.201
II	$ 1.126.881.000	$ 242.798.100	$ 1.369.679.100			
III	$ 2.398.310.700	$ 1.146.000	$ 2.399.456.700			
IV	$ 1.962.274.800	$ -	$ 1.962.274.800			
V	$ 2.121.949.500	$ -	$ 2.121.949.500			
VI	$ 3.080.754.800	$ -	$ 3.080.754.800			
VII	$ 6.488.656.800	$ -	$ 6.488.656.800			
TOTAL	**$ 25.279.900.900**	**$ 448.869.300**	**$ 25.728.770.200**			

Fuente: Informe Gerencial No.130 – septiembre de 2026. Concesionario Ruta al Mar

En resumen, se tiene que durante el mes de septiembre de 2026 en las estaciones La Apartada, Manguitos, Mata de caña, Caimanera, Purgatorio, Cedros y San Onofre se tiene un total de 919.435 vehículos que hicieron tránsito por las estaciones de peaje, generando un recaudo de $ 25.728.770.200 y $ 464.900 por concepto de sobrantes en las estaciones de peaje. El recaudo se distribuyó en $ 443.551.899 correspondiente a seguridad vial y $ 25.285.683.201 para la cuenta fiducia Ruta al Mar SAS.

Tabla 4-97 Total Recaudo Acumulado por estación de peaje

Peaje	Inicio de la Operación	Total, acumulado año 2026	Total, acumulado año 2025	Total, acumulado año 2024	Total, acumulado año 2023	Total, acumulado año 2022	Total, acumulado año 2021	Total, acumulado año 2020	Total, acumulado año 2019	Total, acumulado año 2018	Total, acumulado año 2017	Total, acumulado año 2016	total, RECAUDO acumulado por estación de peaje desde inicio Operación
La Apartada	30/05/2016	$ 56.772.371.200,00	$ 62.838.040.800,00	$ 48.337.677.500,00	$ 37.641.672.900,00	$ 40.539.759.700,00	$ 33.824.383.200,00	$ 23.854.543.300,00	$ 28.938.214.100,00	$ 28.364.524.100,00	$ 28.902.038.600,00	$ 24.331.703.500,00	$ 414.344.928.900,00
Mata de Caña	30/05/2016	$ 20.411.352.400,00	$ 26.865.977.700,00	$ 25.390.942.100,00	$ 24.284.896.200,00	$ 18.899.738.100,00	$ 14.097.692.000,00	$ 8.755.925.900,00	$ 12.041.849.000,00	$ 12.046.607.100,00	$ 11.287.161.650,00	$ 11.108.332.450,00	$ 185.190.474.600,00
San Onofre	30/07/2016	$ 31.372.838.800,00	$ 37.652.588.100,00	$ 31.507.094.900,00	$ 26.413.244.600,00	$ 24.974.494.200,00	$ 19.919.660.400,00	$ 16.346.075.500,00	$ 17.951.052.700,00	$ 12.956.059.000,00	$ 12.057.438.200,00	$ 10.134.414.000,00	$ 241.284.960.400,00
Manguitos	24/06/2016	$ 62.077.896.200,00	$ 74.705.849.500,00	$ 62.475.581.200,00	$ 50.457.133.800,00	$ 51.804.169.300,00	$ 39.790.027.600,00	$ 27.277.984.000,00	$ 32.195.485.100,00	$ 29.229.091.500,00	$ 28.089.922.950,00	$ 12.492.257.750,00	$ 470.595.398.900,00
Caimanera	30/07/2016	$ -	$ -	$ -	$ 447.429.400,00	$ 7.878.638.300,00	$ 7.963.151.400,00	$ 5.233.032.900,00	$ 6.179.113.500,00	$ 6.724.874.350,00	$ 6.545.596.500,00	$ 2.379.032.000,00	$ 43.350.868.350,00
Los Cedros	23/08/2017	$ 11.411.963.400,00	$ 23.213.820.600,00	$ 20.466.026.100,00	$ 20.219.729.300,00	$ 17.843.544.400,00	$ 14.418.103.000,00	$ 11.424.019.300,00	$ 11.561.700.100,00	$ 9.874.620.800,00	$ 3.300.924.400,00		$ 143.734.451.400,00

Peaje	Inicio de la Operación	Total, acumulado año 2026	Total, acumulado año 2025	Total, acumulado año 2024	Total, acumulado año 2023	Total, acumulado año 2022	Total, acumulado año 2021	Total, acumulado año 2020	Total, acumulado año 2019	Total, acumulado año 2018	Total, acumulado año 2017	Total, acumulado año 2016	total, RECAUDO acumulado por estación de peaje desde inicio Operación
Purgatorio	23/08/2017	$ 30.756.009.400,00	$ 37.310.964.200,00	$ 31.860.597.200,00	$ 28.162.803.400,00	$ 28.047.878.100,00	$ 22.424.721.800,00	$ 16.086.779.900,00	$ 17.836.475.200,00	$ 16.383.052.800,00	$ 5.917.955.900,00		$ 234.787.237.900,00
San Carlos	16/02/2019	$ 11.419.442.700,00	$ 12.409.964.000,00	$ 11.460.464.000,00	$ 10.078.441.000,00	$ 7.868.031.500,00	$ 5.211.584.700,00	$ 2.826.482.100,00	$ 2.229.333.800,00	$ -	$ -	$ -	$ 63.503.743.800,00
Totales		$ 224.221.874.100,00	$ 274.997.204.900,00	$ 231.498.383.000,00	$ 197.705.350.600,00	$ 197.856.253.600,00	$ 157.649.324.100,00	$ 111.804.842.900,00	$ 128.933.223.500,00	$ 115.578.829.650,00	$ 96.101.038.200,00	$ 60.445.739.700,00	$ 1.796.792.064.250,00

Fuente: Interventoría Consorcio IPAB – Informe mensual No.8

De la tabla anterior, se puede observar la variación del tráfico a partir del inicio de operación tráfico y recaudo por peaje en el proyecto con corte al periodo del informe, el cual se obtuvo una variación anual entre año 2018 - 2017 del 16.85% en mayor cantidad de recaudo percibido a causa de la incorporación de los peajes Purgatorio y Cedros durante el año 2017 y la actualización de tarifas por cambio de año; adicionalmente, entre los años 2016 – 2017 se superó la incidencia porcentual, esto se debe a que el aumento de tarifas fue más notable cuando pasaron los peajes de INVIAS a la Concesión y la valoración del año 2016 se dio a partir del inicio de operación por peaje. A corte diciembre 31 del año 2019, se tuvo que el valor total recaudado fue de $128.933.223.500, por lo que se evidencia que fue favorable el nuevo punto de traslado del peaje Cedros (PR41+000) y peaje Purgatorio (PR38+700), dado que al propiciar mayor tráfico atraído al corredor se proporciona mayor recaudo de peajes. Adicionalmente se contó en su momento con un nuevo peaje ubicado en el PR9+650 de la Unidad Funcional 3.2.

En el año 2020 se tiene que el valor total recaudado fue de $71.704.241.500 con una diferencia de $ -57.228.982.000 en comparación con el año anterior, esto debido a que el tránsito de todas las estaciones de peaje se vio afectado directamente por la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, declarada por el ministerio de salud y protección social mediante resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el cual ordenó adoptar las medidas de prevención y control sanitario para evitar la propagación del COVID-19.

En el año 2022 se tiene que el valor total recaudado fue de $ 197.856.253.600 con una diferencia de $ 25.358.068.600 en comparación con el año 2021, que registró un recaudo total de $ 172.498.185.000, Viéndose afectado el recaudo debido a protestas realizadas el día 16 de septiembre por motivos del traslado del peaje la caimanera, el día 28 de septiembre y en audiencia pública quedan exceptuados de este cobro los carros de las categorías I y II

En el año 2023 se tiene que el valor total recaudado fue de $ 197.705.350.600 con una diferencia de $ 150.903.000 en comparación con el año 2022, que registró un recaudo total de $ 197.856.253.600, Viéndose afectado el recaudo debido a protestas realizadas el día 16 de septiembre por motivos del traslado del peaje la caimanera y a partir del día **29 de enero de 2023** se suspende el recaudo de todas las categorías debido a reubicación de la estación de caimanera mientras se reubica la estación en la variante Coveñas – Tolú

En el año 2024 se tiene que el valor total recaudado fue de $ 231.498.383.000 con una diferencia de $ 33.792.931.400 en comparación con el año 2023, que registró un recaudo total de $ 197.705.350.600, Viéndose afectado el recaudo debido a protestas realizadas el día 16 de septiembre por motivos del traslado del peaje la caimanera y a partir del día **29 de enero de 2023** se suspende el recaudo de todas las categorías debido a reubicación de la estación de caimanera mientras se reubica la estación en la variante Coveñas – Tolú

En el año 2025 se tiene que el valor total recaudado fue de $ 274.997.204.900 con una diferencia de $ 43.498.821.900 en comparación con el año 2024, que registró un recaudo total de $ 231.498.383.000, Viéndose afectado el recaudo debido a protestas realizadas el día 16 de septiembre por motivos del traslado del peaje la caimanera y a partir del día **29 de enero de 2023** se suspende el recaudo de todas las categorías debido a reubicación de la estación de caimanera mientras se reubica la estación en la variante Coveñas - Tolú

4.4.4. Sobrantes estaciones de peaje


En la totalidad del periodo, se obtuvo un registro de sobrantes por un valor de $ 536.700. Se observa una disminución de $ 89.800 pesos en comparación con el mes anterior, lo que equivale un 14% menos sobrantes y teniendo en cuenta que la estación de caimanera no está recaudando las diferentes categorías establecidas.

Tabla 4-98 Sobrantes estaciones de Peajes

	LA APARTADA	PURGATORIO	LOS CEDROS	MATA DE CAÑA	SAN ONOFRE	LOS MANGUITOS	SAN CARLOS	CAIMANERA	TOTAL
SEPTIEMBRE	$ 113.200	$ 81.000	$ 31.100	$ 2.600	$ 46.600	$ 135.700	$ 54.700	$ -	$ 464.900
AGOSTO	$ 132.100	$ 49.200	$ 111.800	$ 11.700	$ 107.700	$ 157.800	$ 13.200	$ -	$ 583.500
DIFERENCIA	-$ 18.900	$ 31.800	-$ 80.700	-$ 9.100	-$ 61.100	-$ 22.100	$ 41.500	$ -	-$ 118.600
PORCENTAJE	-14%	65%	-72%	-78%	-57%	-14%	314%	0%	-20%

Fuente: Informe Gerencial No.130 – septiembre de 2026. Concesionario Ruta al Mar

Grafica 34 Sobrantes

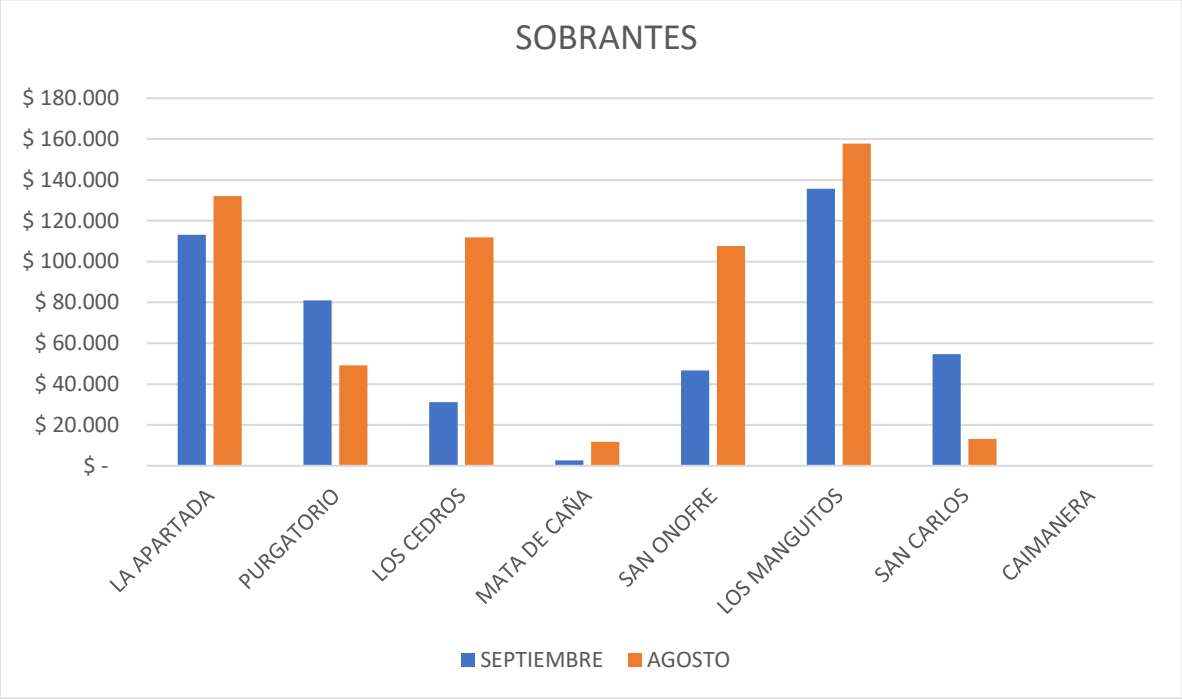

Fuente: Interventoría Consorcio IPAB – Informe mensual No.8

Tabla 4-99 Seguimiento a Instalación de TIE en estaciones de peaje

Estación	Inicio Tarifa Diferencial	TIE Instalada Activas		TIE Retiradas Por Pasos	
	Fecha	Público	Particulares	Público	Particulares
Manguitos	**26/12/2016**	238	97	364	191
Cedros	**15/01/2018**	166	0	79	0
Mata de Caña	**30/07/2016**	126	0	96	0
Purgatorio	**16/04/2019**	289	315	234	665

Estación	Inicio Tarifa Diferencial	TIE Instalada Activas		TIE Retiradas Por Pasos	
	Fecha	Público	Particulares	Público	Particulares
Total		819	412	773	837

Fuente: Informe Gerencial No.130 – septiembre de 2026. Concesionario Ruta al Mar

4.4.5. Arqueos en estaciones de peaje.

Mediante las actividades de auditoría en las estaciones de peaje, se realizaron arqueos, tanto en las casetas de recaudo como en los fondos de operación (caja menor y recambio) que tienen a cargo para la operación de recaudo para la verificación, control y supervisión de los dineros que son consignados a las cuentas de patrimonio antes de la etapa de reversión.

Estas visitas son efectuadas periódicamente a cada estación de peaje para la auditoría técnica y operativa. A continuación, se indican los resultados obtenidos de los registros de operación mensual elaborados por Interventoría en las visitas periódicas FR-CI.023-EDS09-V00 (arqueos en caseta) y CI.023-ED010-V00 (fondo caja menor y fondo de recambio) para cada estación de peaje en el proyecto. Estos se incluyen en el ***Anexo 10 Gestión Operativa*** del presente informe:

Se pueden evidenciar que las causas más comunes de sobrantes y faltantes, son las malas vueltas entregadas a los usuarios.

4.4.5.1. Estación La Apartada:

Tabla 4-100 Arqueo en caseta en la estación La Apartada

Fecha	Cabina	Turno	Efectivo	Electrónico	Consignación	Equipos	Sobrante	Faltante
19/09/2026	4	DIA	$902.300	$0	$0	$902.300	$0	$0
19/09/2026	5	DIA	$788.000	$0	$0	$788.000	$0	$ 400

Fuente: Interventoría Consorcio IPAB – Informe mensual No.8

4.4.5.2. Estación Manguitos:

Tabla 4-101 Arqueo en caseta en la estación Manguitos

Fecha	Cabina	Turno	Efectivo	Electrónico	Consignaciones	Equipos	Sobrante	Faltante
19/09/2026	4	DIA	$232.400	$0	$0	$232.400	$0	$0
19/09/2026	5	DIA	$944.600	$0	$0	$944.600	$0	$ 400

Fuente: Interventoría Consorcio IPAB – Informe mensual No.8

4.4.5.3. Estación Mata de Caña:

Tabla 4-102 Arqueo de caseta en la estación Mata de Caña

Fecha	Cabina	Turno	Efectivo	Electrónico	Consignaciones	Equipos	Sobrante	Faltante
26/09/2026	2	DIA	$757.300	$0	$0	$757.300	$ 0	$ 0
26/09/2026	4	DIA	$683.300	$0	$0	$683.300	$ 0	$ 0

Fuente: Interventoría Consorcio IPAB – Informe mensual No.8

4.4.5.4. Estación San Carlos:

Tabla 4-103 Arqueo de caseta en la estación San Carlos

Fecha	Cabina	Turno	Efectivo	Electrónico	Consignaciones	Equipos	Sobrante	Faltante
24/09/2026	2	DIA	$323.600	$0	$0	$323.600	$ 0	$ 0
24/09/2026	3	DIA	$363.800	$0	$0	$363.800}+	$ 0	$ 0

Fuente: Interventoría Consorcio IPAB – Informe mensual No.8

4.4.5.5. Estación Purgatorio:

Tabla 4-104 Arqueo en caseta en la estación Purgatorio

Fecha	Cabina	Turno	Efectivo	Electrónico	Consignaciones	Equipos	Sobrante	Faltante
24/09/2026	2	DIA	$702.200	$0	$0	$700.200	$ 2.000	$ 0
24/0692026	6	DIA	$319.400	$0	$0	$319.400	$ 0	$ 0

Fuente: Interventoría Consorcio IPAB – Informe mensual No.8

4.4.5.6. Estación Cedros

Tabla 4-105 Arqueo en caseta en la estación Cedros

Fecha	Cabina	Turno	Efectivo	Electrónico	Consignaciones	Equipos	Sobrante	Faltante
24/09/2026	2	DIA	$155.900	$0	$0	$155.800	$ 100	$ 0
24/09/2026	4	DIA	$601.100	$0	$0	$601.100	$ 0	$ 0

Fuente: Interventoría Consorcio IPAB – Informe mensual No.8

4.4.5.7. Estación Caimanera

A partir del día 28/01/2023 a las 23:59:59 horas se suspende el cobro de la tasa de peaje.

Tabla 4-106 Arqueo en caseta en la estación Caimanera

Fecha	Cabina	Turno	Efectivo	Prepago	Consignaciones	Equipos	Sobrante	Faltante
-	1	DIA	0	0	0	0	0	0
-	2	DIA	0	0	0	0	0	0

Fuente: Interventoría Consorcio IPAB – Informe mensual No.8

4.4.5.8. Estación San Onofre

Tabla 4-107 Arqueo en caseta en la estación San Onofre

Fecha	Cabina	Turno	Efectivo	Electrónico	Consignaciones	Equipos	Sobrante	Faltante
26/09/2026	2	DIA	$167.100	$0	$0	$167.100	$0	$ 0
26/09/2026	4	DIA	$743.000	$0	$0	$743.000	$ 0	$0

Fuente: Interventoría Consorcio IPAB – Informe mensual No.8

4.4.6. Estaciones de Pesaje

4.4.6.1. Estación de pesaje Manguitos 1

Durante el mes de septiembre de 2026 por la estación de pesaje manguitos 1 se pesaron 5.123 vehículos de los cuales 31 tuvieron sobrepeso, tal como se refleja en la tabla a continuación:

Tabla 4-108 Vehículos pesados en estaciones Manguitos I

Pesaje De Basculas Manguitos 1				
Categoría	**Sin Sobrepeso**	**Con Sobre Peso**	**Total, Pesados**	**%**
2	3994	28	4022	78,5%
3	61	1	62	1,2%
4	10	0	10	0,2%
2S1	0	0	0	0,0%
2S2	100	0	100	2,0%
2S3	46	0	46	0,9%
3S1	9	0	9	0,2%
3S2	130	0	130	2,5%
3S3	737	2	739	14,4%
2R2	4	0	4	0,1%
2R3	0	0	0	0,0%
3R2	0	0	0	0,0%
3R3	0	0	0	0,0%
3R4	0	0	0	0,0%
2B1	0	0	0	0,0%

Pesaje De Basculas Manguitos 1				
Categoría	**Sin Sobrepeso**	**Con Sobre Peso**	**Total, Pesados**	**%**
2B2	1	0	1	0,0%
2B3	0	0	0	0,0%
TOTAL, CAT	**5092**	**31**	**5123**	**100,0%**
ago-26	4534	23	4557	
Diferencia	558	8	566	
Porcentaje	**12,31%**	**34,78%**	**12,42%**	

Fuente: Informe Gerencial No.130 – septiembre de 2026. Concesionario Ruta al Mar

A continuación, se discriminan los vehículos a los que se les debería realizar comparendo en el mes de septiembre de 2026, expedido por la DITRA que permanece como apoyo en las instalaciones de las básculas.

Tabla 4-109 clasificación de vehículos con sobrepeso manguitos I

NUMERO TIQUETE	FECHA	PLACA	TIPO VEHÍCULO	SOBREPESO (Kg)	COMPARENDO
011026-00242	1/10/2026	QPO987	2	155	6705805
011026-00221	1/10/2026	NHQ985	2	1625	6705808
020926-00003	2/09/2026	QSV573	2	765	6675239
020926-00201	2/09/2026	NXR251	3S3	130	6675240
030926-00001	3/09/2026	FSU118	2	120	6630221
030926-00136	3/09/2026	TOR823	2	2355	6691270
090926-00079	9/09/2026	NNM178	2	175	6691450
110926-00255	11/09/2026	TMW546	3	170	6691408
120926-00007	12/09/2026	TTX165	2	3500	6691446
160926-00179	16/09/2026	SNT401	2	140	6691619
180926-00032	18/09/2026	GTX992	2	350	6691642
180926-00138	18/09/2026	ESZ790	2	105	6691634
180926-00320	18/09/2026	JYX736	3S3	150	6705649
190926-00011	19/09/2026	PSY881	2	1645	6691645

NUMERO TIQUETE	FECHA	PLACA	TIPO VEHÍCULO	SOBREPESO (Kg)	COMPARENDO
200926-00045	20/09/2026	QOP566	2	807	6691156
230926-00166	23/09/2026	ZDA784	2	4455	6705684
240926-00016	24/09/2026	PUP147	2	695	6705678
240926-00154	24/09/2026	LGU819	2	2315	6705744
240926-00222	24/09/2026	JRR726	2	200	6705741
250926-00181	25/09/2026	ESX832	2	985	6705799
250926-00154	25/09/2026	TMU733	2	1850	6705792
250926-00166	25/09/2026	TFQ950	2	2810	6705781
250926-00170	25/09/2026	PXK208	2	935	6705782
260926-00132	26/09/2026	TPU962	2	7790	6705802
270926-00087	27/09/2026	JOV938	2	4770	N/A
270926-00074	27/09/2026	QJX905	2	2870	6705701
280926-00086	28/09/2026	SQG237	2	1145	6705704
290926-00117	29/09/2026	SNU013	2	1360	6705843
300926-00197	30/09/2026	JYX581	2	1385	6705844
300926-00069	30/09/2026	GIL701	2	560	6705826
300926-00187	30/09/2026	GND240	2	110	6705846

Fuente: Informe Gerencial No.130 – septiembre de 2026. Concesionario Ruta al Mar

4.4.6.2. Estación de pesaje Manguitos 2

Durante el mes de septiembre de 2026 por la estación de pesaje manguitos 2 se pesaron 2464 vehículos de los cuales 42 tuvieron sobrepeso, tal como se refleja en la tabla a continuación:

Tabla 4-110 Vehículos pesados en estaciones Manguitos 2

Pesaje De Basculas Manguitos 2				
Categoría	**Sin Sobrepeso**	**Con Sobre Peso**	**Total, Pesados**	**%**
2	1848	41	1889	76,7%
3	43	0	43	1,7%
4	16	0	16	0,6%
2S1	0	0	0	0,0%
2S2	78	0	78	3,2%
2S3	21	0	21	0,9%

Pesaje De Basculas Manguitos 2				
Categoría	**Sin Sobrepeso**	**Con Sobre Peso**	**Total, Pesados**	**%**
3S1	20	0	20	0,8%
3S2	121	0	121	4,9%
3S3	268	1	269	10,9%
2R2	5	0	5	0,2%
2R3	0	0	0	0,0%
3R2	2	0	2	0,1%
3R3	0	0	0	0,0%
3R4	0	0	0	0,0%
2B1	0	0	0	0,0%
2B2	0	0	0	0,0%
2B3	0	0	0	0,0%
TOTAL, CAT	**2422**	**42**	**2464**	**100,0%**
ago-26	4142	29	4171	
Diferencia	-1720	13	-1707	
Porcentaje	**-41,53%**	**44,83%**	**-40,93%**	

Fuente: Informe Gerencial No.130 – septiembre de 2026. Concesionario Ruta al Mar

A continuación, se discriminan los vehículos a los que se les debería realizar comparendo en el mes de septiembre de 2026, expedido por la DITRA que permanece como apoyo en las instalaciones de las básculas.

Tabla 4-111 clasificación de vehículos con sobrepeso manguitos II

NUMERO TIQUETE	FECHA	PLACA	TIPO VEHÍCULO	SOBREPESO (Kg)	COMPARENDO
011026-00198	1/10/2026	GTZ105	2	5830	6715647
011026-00200	1/10/2026	SOZ776	2	1480	6705842
011026-00188	1/10/2026	ETL036	2	4955	6715637

NUMERO TIQUETE	FECHA	PLACA	TIPO VEHÍCULO	SOBREPESO (Kg)	COMPARENDO
030926-00028	3/09/2026	QAB974	2	320	6691258
040926-00009	4/09/2026	WTO589	2	2150	6691271
040926-00015	4/09/2026	LZL001	2	9825	6691304
040926-00019	4/09/2026	STE559	2	2715	6691332
040926-00047	4/09/2026	NSQ815	2	3015	6691333
050926-00015	5/09/2026	LUL192	2	755	6691354
060926-00002	6/09/2026	NUY795	2	1427	6691384
060926-00129	6/09/2026	SRR843	2	120	6691374
060926-00082	6/09/2026	WPK823	2	3355	6691387
060926-00065	6/09/2026	WNM950	2	200	6691397
060926-00004	6/09/2026	WNX849	2	1130	6691386
060926-00051	6/09/2026	WHV718	2	170	6691396
070926-00046	7/09/2026	SLJ110	2	540	6691320
070926-00053	7/09/2026	TBA121	2	120	6691321
070926-00075	7/09/2026	WRD461	2	720	6691325
080926-00040	8/09/2026	TJZ821	2	310	6691433
090926-00013	9/09/2026	JYX061	2	2745	6691449
170926-00006	17/09/2026	UZK426	2	960	6691599

NUMERO TIQUETE	FECHA	PLACA	TIPO VEHÍCULO	SOBREPESO (Kg)	COMPARENDO
180926-00074	18/09/2026	LJS138	2	495	6675250
180926-00100	18/09/2026	XIE488	2	670	6691617
180926-00020	18/09/2026	PWZ588	2	565	6691633
190926-00031	19/09/2026	SYK551	3S3	600	6691646
190926-00106	19/09/2026	SSM814	2	4845	6705662
210926-00061	21/09/2026	QOP313	2	1735	6705710
220926-00033	22/09/2026	WOY915	2	240	6705673
220926-00041	22/09/2026	WNX844	2	1610	6705674
220926-00088	22/09/2026	PUN578	2	180	6705721
250926-00003	25/09/2026	SMD254	2	1880	6705776
250926-00011	25/09/2026	KSQ702	2	235	6705742
250926-00130	25/09/2026	LJS256	2	115	6705791
260926-00002	26/09/2026	PWY529	2	4195	6705800
260926-00003	26/09/2026	STJ118	2	3030	6005794
260926-00044	26/09/2026	TTU256	2	130	6705807
270926-00002	27/09/2026	NOS567	2	1025	6705806
270926-00003	27/09/2026	WMP046	2	1280	6705823
270926-00006	27/09/2026	QOQ003	2	225	6705824

NUMERO TIQUETE	FECHA	PLACA	TIPO VEHÍCULO	SOBREPESO (Kg)	COMPARENDO
270926-00010	27/09/2026	NNM774	2	6825	6705809
300926-00160	30/09/2026	LFL422	2	345	6705737
300926-00002	30/09/2026	QKL248	2	1005	N/A

Fuente: Informe Gerencial No. 130– septiembre de 2026. Concesionario Ruta al Mar

4.4.6.3. Estación de pesaje San Onofre 1

Durante el mes de septiembre de 2026 por la estación de pesaje San Onofre se pesaron 2702 vehículos de los cuales 10 tuvieron sobrepeso.

Tabla 4-112 Vehículos pesados en estaciones San Onofre I

Pesaje De Basculas San Onofre 1				
Categoría	**Sin Sobrepeso**	**Con Sobre Peso**	**Total, Pesados**	**%**
2	1880	5	1885	69,8%
3	120	3	123	4,6%
4	78	0	78	2,9%
2S1	0	0	0	0,0%
2S2	196	0	196	7,3%
2S3	79	0	79	2,9%
3S1	0	0	0	0,0%
3S2	87	0	87	3,2%

Pesaje De Basculas San Onofre 1				
Categoría	**Sin Sobrepeso**	**Con Sobre Peso**	**Total, Pesados**	**%**
3S3	250	2	252	9,3%
2R2	0	0	0	0,0%
2R3	0	0	0	0,0%
3R2	2	0	2	0,1%
3R3	0	0	0	0,0%
3R4	0	0	0	0,0%
2B1	0	0	0	0,0%
2B2	0	0	0	0,0%
2B3	0	0	0	0,0%
TOTAL, CAT	**2692**	**10**	**2702**	**100,0%**
ago-26	2574	12	2586	
Diferencia	118	-2	116	
Porcentaje	**4,58%**	**-16,67%**	**4,49%**	

Fuente: Informe Gerencial No. 130 – septiembre de 2026. Concesionario Ruta al Mar

A continuación, se discriminan los vehículos a los que se les debería realizar comparendo en el mes de septiembre de 2026, expedido por la DITRA que permanece como apoyo en las instalaciones de las básculas.

Tabla 4-113 clasificación de vehículos con sobrepeso San Onofre I

NUMERO TIQUETE	FECHA	PLACA	TIPO VEHÍCULO	SOBREPESO (Kg)	COMPARENDO
260907-00036	7/09/2026	NLV992	2	175	6692288
260908-00032	8/09/2026	KPO687	2	405	6692357
260909-00036	9/09/2026	VZS371	3	4,77	6692427
260911-00124	11/09/2026	SNO855	2	160	N/A
260916-00005	16/09/2026	NUY080	2	1,165	6692522
260916-00122	16/09/2026	TKD528	2	170	6562285
260917-00032	17/09/2026	TGM749	3	680	6702317
260922-00005	22/09/2026	SBN566	3	180	N/A
260924-00019	24/09/2026	STA113	3S3	150	6706026
260930-00018	30/09/2026	PWZ769	3S3	30	6705994

Fuente: Informe Gerencial No. 130 – septiembre de 2026. Concesionario Ruta al Mar

4.4.6.4. Estación de pesaje San Onofre 2

Durante el mes de septiembre de 2026 por la estación de pesaje San Onofre 2 se pesaron 5299 vehículos, de los cuales 9 presentaban sobrepesos, tal como se refleja en la tabla a continuación:

Tabla 4-114 Vehículos pesados en estaciones San Onofre II

Pesaje De Basculas San Onofre 2				
Categoría	**Sin Sobrepeso**	**Con Sobre Peso**	**Total, Pesados**	**%**
2	2339	9	2348	44,3%
3	250	0	250	4,7%
4	4	0	4	0,1%
2S1	0	0	0	0,0%
2S2	482	0	482	9,1%
2S3	154	0	154	2,9%
3S1	2	0	2	0,0%
3S2	561	0	561	10,6%
3S3	1487	0	1487	28,1%
2R2	4	0	4	0,1%
2R3	0	0	0	0,0%
3R2	0	0	0	0,0%
3R3	0	0	0	0,0%
3R4	0	0	0	0,0%
2B1	3	0	3	0,1%

Pesaje De Basculas San Onofre 2				
Categoría	**Sin Sobrepeso**	**Con Sobre Peso**	**Total, Pesados**	**%**
2B2	4	0	4	0,1%
2B3	0	0	0	0,0%
TOTAL, CAT	**5290**	**9**	**5299**	**100,0%**
ago-26	4351	14	4365	
Diferencia	939	-5	934	
Porcentaje	**21,58%**	**-35,71%**	**21,40%**	

Fuente: Informe Gerencial No. 130 – septiembre de 2026. Concesionario Ruta al Mar

A continuación, se discriminan los vehículos a los que se les debería realizar comparendo en el mes de septiembre de 2026, expedido por la DITRA que permanece como apoyo en las instalaciones de las básculas.

Tabla 4-115 clasificación de vehículos con sobrepeso San Onofre II

NUMERO TIQUETE	FECHA	PLACA	TIPO VEHÍCULO	SOBREPESO (Kg)	COMPARENDO
260901-00183	1/09/2026	NLX749	2	740	6679218
260901-00214	1/09/2026	TDL754	2	1,27	6679219
260902-00201	2/09/2026	WLY706	2	60	6679080

NUMERO TIQUETE	FECHA	PLACA	TIPO VEHÍCULO	SOBREPESO (Kg)	COMPARENDO
260907-00141	7/09/2026	YHL503	2	140	6692355
260914-00132	14/09/2026	LPK642	2	3,255	6692544
260916-00006	16/09/2026	LPK642	2	2,415	6692521
260916-00071	16/09/2026	LWY563	2	335	6702316
260926-00135	26/09/2026	LZS020	2	205	6714592
260929-00012	29/09/2026	TGK031	2	10	N/A

Fuente: Informe Gerencial No. 130 – septiembre de 2026. Concesionario Ruta al Mar

4.4.6.5. Estación de pesaje Mata de Caña 1

Por la estación de pesaje Mata de Caña 1 se pesaron 2.169 vehículos de los cuales 11 presentaron con sobrepeso:

Tabla 4-116 Vehículos pesados en estaciones Mata de Caña I

Pesaje De Basculas Mata de Caña 1				
Categoría	**Sin Sobrepeso**	**Con Sobre Peso**	**Total, Pesados**	**%**
2	1459	10	1469	67,7%
3	314	1	315	14,5%
4	7	0	7	0,3%
2S1	0	0	0	0,0%
2S2	46	0	46	2,1%

Pesaje De Basculas Mata de Caña 1				
Categoría	**Sin Sobrepeso**	**Con Sobre Peso**	**Total, Pesados**	**%**
2S3	32	0	32	1,5%
3S1	54	0	54	2,5%
3S2	59	0	59	2,7%
3S3	161	0	161	7,4%
2R2	1	0	1	0,0%
2R3	1	0	1	0,0%
3R2	18	0	18	0,8%
3R3	0	0	0	0,0%
3R4	0	0	0	0,0%
2B1	2	0	2	0,1%
2B2	4	0	4	0,2%
2B3	0	0	0	0,0%
TOTAL, CAT	**2158**	**11**	**2169**	**100,0%**
ago-26	1910	5	1915	
Diferencia	248	6	254	
Porcentaje	**12,98%**	**120,00%**	**13,26%**	

Fuente: Informe Gerencial No. 130 – septiembre de 2026. Concesionario Ruta al Mar

A continuación, se discriminan los vehículos a los que se les debería realizar comparendo en el mes de septiembre de 2026, expedido por la DITRA que permanece como apoyo en las instalaciones de las básculas.

Tabla 4-117 clasificación de vehículos con sobrepeso Mata de Caña I

NUMERO TIQUETE	FECHA	PLACA	TIPO VEHÍCULO	SOBREPESO (Kg)	COMPARENDO
260905-00044	5/09/2026	OTJ036	2	880	6691361
260910-00023	10/09/2026	KPP709	2	1,235	6691426
260910-00058	10/09/2026	EYX704	2	230	6691432
260921-00033	21/09/2026	STR824	3	940	6705688
260921-00063	21/09/2026	VJK297	2	1,6	6705652
260925-00034	25/09/2026	SZL191	2	160	5705718
260926-00002	26/09/2026	TUL776	2	440	N/A
260928-00067	28/09/2026	VJK297	2	2,35	6705719
260929-00069	29/09/2026	PXK834	2	445	N/A
260930-00027	30/09/2026	QKL336	2	150	6691584
260930-00064	30/09/2026	QSK143	2	385	6691585

Fuente: Informe Gerencial No. 130 – septiembre de 2026. Concesionario Ruta al Mar

4.4.6.6. Estación de pesaje Mata de Caña 2

Por la estación de pesaje Mata de Caña 2 se pesaron 2.341 vehículos de los cuales se presentan 18 vehículos con sobrepesos.

Tabla 4-118 Vehículos pesados en estaciones Mata de Caña II

Pesaje De Basculas Mata de Caña 2				
Categoría	**Sin Sobrepeso**	**Con Sobre Peso**	**Total, Pesados**	**%**
2	1572	14	1586	67,7%
3	163	1	164	7,0%
4	15	1	16	0,7%
2S1	0	0	0	0,0%
2S2	34	0	34	1,5%
2S3	12	0	12	0,5%
3S1	2	0	2	0,1%
3S2	142	0	142	6,1%
3S3	362	2	364	15,5%
2R2	17	0	17	0,7%
2R3	0	0	0	0,0%
3R2	3	0	3	0,1%

Pesaje De Basculas Mata de Caña 2				
Categoría	**Sin Sobrepeso**	**Con Sobre Peso**	**Total, Pesados**	**%**
3R3	0	0	0	0,0%
3R4	0	0	0	0,0%
2B1	1	0	1	0,0%
2B2	0	0	0	0,0%
2B3	0	0	0	0,0%
TOTAL, CAT	**2323**	**18**	**2341**	**100,0%**
ago-26	2295	10	2305	
Diferencia	28	8	36	
Porcentaje	**1,22%**	**80,00%**	**1,56%**	

Fuente: Informe Gerencial No. 130 – septiembre de 2026. Concesionario Ruta al Mar

A continuación, se discriminan los vehículos a los que se les debería realizar comparendo en el mes de septiembre de 2026, expedido por la DITRA que permanece como apoyo en las instalaciones de las básculas.

Tabla 4-119 clasificación de vehículos con sobrepeso Mata de Caña II

NUMERO TIQUETE	FECHA	PLACA	TIPO VEHÍCULO	SOBREPESO (Kg)	COMPARENDO
260904-00065	4/09/2026	PRZ334	2	555	6691252
260904-00066	4/09/2026	LWL567	2	795	6691253
260905-00057	5/09/2026	NNL728	3S3	920	6691249
260907-00008	7/09/2026	UYX750	2	800	N/A
260908-00009	8/09/2026	YHL665	2	180	6691262
260908-00010	8/09/2026	TKF942	2	1,48	6691263
260908-00035	8/09/2026	GDY905	3	1,17	6691424
260909-00057	9/09/2026	NLV975	4	5,09	6691456
260910-00019	10/09/2026	YHL621	2	625	6691425
260913-00035	13/09/2026	WHW883	2	220	6691498
260914-00047	14/09/2026	YHK911	2	270	6691552
260915-00059	15/09/2026	PRZ334	2	305	6691597
260917-00056	17/09/2026	SQM120	3S3	190	N/A
260920-00008	20/09/2026	STX911	2	960	6691631
260921-00021	21/09/2026	KSK437	2	235	6705699
260925-00106	25/09/2026	TFV110	2	1,08	6705804
260926-00018	26/09/2026	UNB085	2	4,68	6705813

NUMERO TIQUETE	FECHA	PLACA	TIPO VEHÍCULO	SOBREPESO (Kg)	COMPARENDO
260927-00029	27/09/2026	EQY175	2	210	6691582

Fuente: Informe Gerencial No. 130 – septiembre de 2026. Concesionario Ruta al Mar

4.4.7. Transportes Especiales

De acuerdo con lo informado por el Concesionario en el informe gerencial del presente periodo, durante el mes de septiembre no se recibieron solicitudes de concepto para el transporte de cargas extra dimensionadas y extrapesadas.

Con base al decreto 1079 de 2015 operación, tránsito y transporte de sustancias peligrosas y de acuerdo a las definiciones y clasificaciones establecidas en la NTC1692 para el transporte de mercancías peligrosas, clasificado, etiquetado y rotulado; durante el periodo, no se presentó movilización de productos peligrosos que implicarán imprevistos como derrames de sustancias peligrosas y así implementar acción estratégica y de contingencia; por tanto, estas fueron transportadas en condiciones normales con tránsito por los sitios de peajes en cumplimiento al protocolo de seguimiento a los parámetros legales citados en el Plan de Manejo de Transportes Especiales 2026.

4.4.8. Auditoría de Equipos y Sistemas

La auditoría de los sistemas de información se define como una evaluación de procesos y riesgos de los sistemas de información y comunicación que operan en los peajes en el proceso global de recaudo.

El objetivo de la auditoría de sistemas a peajes es supervisar, controlar, registrar y conceptuar sobre los aspectos Técnicos en la operación, implementación y mantenimiento de los equipos de control de tránsito, contemplados en el Contrato de Concesión N ° 016 de 2015 de las estaciones de peaje que se encuentran a cargo del Concesionario, así como informar a la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, las novedades de sistemas que se deriven de la aplicación del Plan de Auditoría de sistemas durante el periodo evaluado. Durante las visitas a las estaciones de peaje, se ejecutaron las listas de chequeo que comprende el plan de auditoría de sistemas propuesto por esta

Interventoría, con el fin de obtener evidencia mediante pruebas y verificación directa del funcionamiento de los equipos que operan en las estaciones de peajes.

Actividades realizadas

Durante las visitas de auditoría a las estaciones de peaje, se realizan las listas de chequeo y verificación de la operación en general, con el fin de obtener evidencia mediante pruebas seguimientos y verificación directa del funcionamiento de los equipos que operan en las estaciones de peaje. Durante cada visita se aplica el plan de Auditoría de Sistemas y revisiones adicionales complementarias de tipo Administrativo, operativo y financiero. Para ubicar o encontrar los posibles escenarios de riesgos, se aplica el Plan de Auditoría de Sistemas que se estableció previamente por esta Interventoría, con el cual se evalúan varios riesgos inherentes a la operación de recaudo en función del control de la cantidad de vehículos y las categorías cobradas y reportadas.

Equipos y estaciones auditadas.

Por parte de la auditoría en sistemas, se continúa realizando el chequeo y la verificación de que los sistemas de detección automática (DAC), han operado con normalidad todas las gestiones de tráfico y recaudo en el ambiente de la tecnología en sistemas ROAD PASS con detección automática. Adicionalmente, estas estaciones cuentan con toda la infraestructura básica y las edificaciones que permiten ofrecer condiciones adecuadas de confort y seguridad de los usuarios, incluyendo señalización horizontal y vertical indicativa de aproximación e iluminación de aproximación al sitio.

Escenarios de riesgo

De acuerdo con los procesos de operación en las estaciones de peaje y de las cuales se origina el Plan de Auditoría de Sistemas propuesto por esta Interventoría, se evalúan varios riesgos, como se relacionan a continuación:

Monitoreo del sistema.

Confiabilidad del sistema.

Arqueos en cabinas de recaudo.

Funcionamiento interfaz de usuarios para los sistemas ROAD PASS para todos los peajes de la Concesión verificados mediante formato EDS-016.

Sistema de respaldo: planta eléctrica y UPS.

Funcionamiento sistema de detección de tráfico.

Informes de tráfico y recaudo / reportes de discrepancias.

Inventario y estado de elementos en carriles y estación.

Seguridad física: carriles, sala de sistemas y estación.

Verificación de recibos de pago: consecutivos por categoría, valor de tarifas.

Versiones del sistema y tamaños de programas instalados para la operación de tráfico y recaudo.

Verificación normativa aplicable NTC2031:2014 para operación de basculas (revisión resultados de pruebas).

VISITAS REALIZADAS

La dedicación del Auditor de Sistemas para este contrato es del 25%.

En el mes de septiembre de 2026 se realizaron visitas a los peajes así:

A continuación, se relaciona las fechas en las cuales se llevó a cabo los trabajos de Auditoría del periodo, presente informe:

Tabla 4-120. Fechas de la Auditoría realizada

Estación	Ingeniero Encargado	Fecha Auditoría	Periodo
Peaje Apartada	Enver Barrios	19/09/2026	Septiembre 2026
Peaje Manguitos	Enver Barrios	19/09/2026	Septiembre 2026

Estación	Ingeniero Encargado	Fecha Auditoría	Periodo
Básculas Manguitos 1 y 2	Enver Barrios	19/09/2026	Septiembre 2026
Peaje San Carlos	Enver Barrios	24/09/2026	Septiembre 2026
Peaje Cedros	Enver Barrios	24/09/2026	Septiembre 2026
Peaje Purgatorio	Enver Barrios	24/09/2026	Septiembre 2026
Peaje San Onofre	Enver Barrios	26/09/2026	Septiembre 2026
Básculas San Onofre 1 y 2	Enver Barrios	26/09/2026	Septiembre 2026
Peaje Mata de Caña	Enver Barrios	26/09/2026	Septiembre 2026
Básculas Mata de caña 1 y 2	Enver Barrios	26/09/2026	Septiembre 2026

Fuente propia: Consorcio IPAB

INDICADORES

En el mes de septiembre de 2026, los equipos de control de tráfico vehicular presentaron 559 fallas en el sistema de categorización automática de vehículos, correspondientes a errores en la detección de las categorías vehiculares, se produjo una disminución de 173 errores respecto a los 732 errores reportados en agosto 2026. Cabe señalar que en este análisis no se incluye la operación del peaje de Caimanera.

Se realizó una verificación exhaustiva del sistema de detección vehicular, identificándose errores de clasificación que el Concesionario clasifica como fallas de operación, asociados principalmente a vehículos pinchados, vehículos con llantas anchas y casos particulares de errores de usuario durante las conciliaciones efectuadas en las estaciones de peaje del proyecto. Asimismo, el incremento en determinados registros se atribuye principalmente a fallas en los sistemas de conteo de ejes y detección de doble rueda.

La siguiente tabla ilustra la confiabilidad de los equipos por peaje.

Tabla 4-121. Confiabilidad

PEAJE	TOTAL TRAFICO	ERRORES EQUIPO	% DE ERROR	CONFIABILIDAD
LA APARTADA	165,511	73	0.0441%	99.96%
MATA DE CAÑA	93,181	20	0.0215%	99.98%
SAN ONOFRE	86,734	78	0.0899%	99.91%
LOS CEDROS	61,703	12	0.0194%	99.98%
PURGATORIO	164,666	82	0.0498%	99.95%
MANGUITOS	188,184	235	0.1249%	99.88%
CAIMANERA	0	0	0.0000%	0.00%
SAN CARLOS	42,104	59	0.1401%	99.86%

Fuente propia: Consorcio IPAB

Para el cálculo de confiabilidad, se toman los errores presentados en cada carril y se realiza la sumatoria de estos en cada estación, por lo tanto se aclara que la operación en la estación de Purgatorio, se implementó detección en carriles 1,2,3,6,7,8, los carriles 4 y 5, no tienen implementado la detección automática de vehículos y se encuentran cerrados, por esta razón no se incluyen errores en los carriles 4 y 5, de igual forma ocurre en la estación de peaje los cedros, dado que el carril N°5 se encuentra cerrado, por esta razón se muestra con cero error.

Para el período objeto del presente informe, se observó una disminución en el número de vehículos que transitaron por las estaciones de peaje del proyecto, comportamiento que podría estar asociado, entre otros factores, a la finalización de la temporada de vacaciones de mitad de año.

Por último, la estación de caimanera se muestra con cero errores, debido a que fue desmontada del sitio donde venía operando y aún no se ha reubicado.

En la siguiente tabla se muestran los errores de equipo discriminados por cada peaje durante el periodo del presente informe:

Tabla 4-122. Errores de detección por estaciones

PEAJE	CARRIL 1	CARRIL 2	CARRIL 3	CARRIL 4	CARRIL 5	CARRIL 6	CARRIL 7	CARRIL 8	TOTAL
LA APARTADA	16	6	7	5	6	33	No existe	No existe	**73**
MATA DE CAÑA	3	8	4	0	2	3	No existe	No existe	**20**
SAN ONOFRE	9	5	5	11	10	38	No existe	No existe	**78**
LOS CEDROS	2	4	0	0	No existe	6	No existe	No existe	**12**
PURGATORIO	24	5	32	Sin detección	Sin detección	2	7	12	**82**
MANGUITOS	30	36	35	29	32	73	No existe	No existe	**235**
CAIMANERA	0	0	0	0	No existe	No existe	No existe	No existe	**0**
SAN CARLOS	21	6	15	17	No existe	No existe	No existe	No existe	**59**
TOTAL									**559**

Fuente propia: Consorcio IPAB

Las fallas más frecuentes en la detección automática de categorización se presentan cuando el sistema no identifica correctamente los vehículos de mayor categoría que transitan por las estaciones de peaje, registrándose como pertenecientes a categorías inferiores. En este sentido, pueden presentarse casos en los que vehículos de categorías II, III o IV son clasificados como categoría I, o incluso situaciones inversas. No obstante, esta condición no genera afectación en el recaudo, ya que este se determina con base en el tráfico real verificado mediante las cámaras instaladas en los peajes.

HALLAZGOS

Como resultado de las visitas de interventoría y de la aplicación del plan de auditoría.

HALLAZGOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026

A continuación, se presentan los hallazgos identificados durante el mes el Mes de septiembre de 2026 en las estaciones de peaje y pesaje que forman parte del proyecto.

ESTACIONES DE PEAJES

Peaje La Apartada:

Se evidenció que el mantenimiento a puesta a tierra de la estación se encuentra vencido de acuerdo a la norma RETIE (Resolución 90708 de 2013 y posteriores modificaciones), la cual Obliga a que toda instalación eléctrica cuente con un sistema de puesta a tierra verificable, Instalaciones industriales y comerciales, medición anual o semestral según criticidad y cumplimiento, por lo tanto, se solicitó al Concesionario implementar las acciones correctivas.

En respuesta comunicado IPAB-800-2026 con radicado ANI 20264091240632 de fecha 23 de septiembre de 2026, el Concesionario a través del comunicado 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260928015063 de fecha 29 de septiembre de 2026, manifestó lo siguiente:

“Se le informa a la interventoría que el mantenimiento al sistema de puesta a tierra se realizó el día 21 de septiembre del 2026.

De acuerdo con la verificación realizada, se evidenció que el Concesionario ejecutó las actividades de mantenimiento correspondientes, subsanando la observación formulada por esta Interventoría, por lo cual se da por cerrada.

Afectación en la carcasa protectora del sensor óptico emisor de salida del carril N°6, En consecuencia, se solicitó al concesionario realizar las reparaciones pertinentes en el menor tiempo posible.

En respuesta comunicado IPAB-800-2026 con radicado ANI 20264091240632 de fecha 23 de septiembre de 2026, el Concesionario a través del comunicado 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260928015063 de fecha 29 de septiembre de 2026, manifestó lo siguiente:

"Se le informa a la interventoría que la carcasa protectora del sensor óptico emisor de salida del carril N°6, se encuentra en reparación y será instalado el 10 de octubre."

Por lo tanto, la observación continúa vigente y se realizará el seguimiento correspondiente, con el fin de verificar su atención y ejecución dentro del plazo propuesto por el Concesionario.

Tabla 4-123. Registro fotográfico Novedades Peaje Apartada



Carcasa sensor óptico emisor de salida del carril N°6

Fuente Propia – Consorcio IPAB

Peaje Mata de caña:

Se evidenció que el mantenimiento a puesta a tierra de la estación se encuentra vencido de acuerdo a la norma RETIE (Resolución 90708 de 2013 y posteriores modificaciones), la cual Obliga a que toda instalación eléctrica cuente con un sistema de puesta a tierra verificable, Instalaciones industriales y comerciales, medición anual o semestral según criticidad y cumplimiento, por lo tanto, se solicitó al Concesionario implementar las acciones correctivas.

En respuesta comunicado IPAB-800-2026 con radicado ANI 20264091240632 de fecha 23 de septiembre de 2026, el Concesionario a través del comunicado 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260928015063 de fecha 29 de septiembre de 2026, manifestó lo siguiente:

"Se le informa a la interventoría que el mantenimiento al sistema de puesta a tierra se realizó el día 24 de septiembre del 2026."

De acuerdo con la verificación realizada, se evidenció que el Concesionario ejecutó las actividades de mantenimiento correspondientes, subsanando la observación formulada por esta Interventoría, por lo cual se da por cerrada.

El aire acondicionado del carril N°2 presenta fallas en su funcionamiento, al no regular adecuadamente la temperatura al interior de la cabina. Por lo tanto, se solicitó al concesionario realizar las reparaciones pertinentes en el menor tiempo posible.

En respuesta comunicado IPAB-800-2026 con radicado ANI 20264091240632 de fecha 23 de septiembre de 2026, el Concesionario a través del comunicado 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260928015063 de fecha 29 de septiembre de 2026, manifestó lo siguiente:

"Se le informa a la interventoría que el día 21 de septiembre del 2026. Se realizo el respectivo mantenimiento al aire acondicionado del carril N°2."

De acuerdo con la verificación realizada, se evidenció que el Concesionario ejecutó las actividades de mantenimiento correspondientes, subsanando la observación formulada por esta Interventoría, por lo cual se da por cerrada.

Peaje San Onofre:

Se evidenció que el mantenimiento a puesta a tierra de la estación, se encuentra vencido de acuerdo a la norma RETIE (Resolución 90708 de 2013 y posteriores modificaciones), la cual Obliga a que toda instalación eléctrica cuente con un sistema de puesta a tierra verificable, Instalaciones industriales y comerciales, medición anual o semestral según criticidad y cumplimiento, por lo tanto, se solicitó al Concesionario implementar las acciones correctivas.

En respuesta comunicado IPAB-800-2026 con radicado ANI 20264091240632 de fecha 23 de septiembre de 2026, el Concesionario a través del comunicado 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260928015063 de fecha 29 de septiembre de 2026, manifestó lo siguiente:

"Se le informa a la interventoría que el mantenimiento al sistema de puesta a tierra se realizó el día 21 de septiembre del 2026."

De acuerdo con la verificación realizada, se evidenció que el Concesionario ejecutó las actividades de mantenimiento correspondientes, subsanando la observación formulada por esta Interventoría, por lo cual se da por cerrada.

Se evidenció afectación en la parte superior del techo de la caseta auxiliar de recaudo del carril N°5, se solicitó al Concesionario realizar las reparaciones pertinentes en el menor tiempo posible.

En respuesta comunicado IPAB-800-2026 con radicado ANI 20264091240632 de fecha 23 de septiembre de 2026, el Concesionario a través del comunicado 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260928015063 de fecha 29 de septiembre de 2026, manifestó lo siguiente:

"Se le informa a la interventoría que el mantenimiento a la afectación en la parte superior de la caseta auxiliar se realizará el 30 de septiembre del 2026."

Por lo tanto, la observación continúa vigente y se verificará en la próxima visita, se anexa imagen de referencia:

Tabla 4-124. Registro fotográfico Novedades Peaje San Onofre



Caseta Auxiliar de recaudo del carril N°5

Fuente Propia – Consorcio IPAB

El aire acondicionado del carril N°2 presenta fallas en su funcionamiento, al no regular adecuadamente la temperatura al interior de la cabina. Por lo tanto, se solicitó al concesionario realizar las reparaciones pertinentes en el menor tiempo posible.

En respuesta comunicado IPAB-800-2026 con radicado ANI 20264091240632 de fecha 23 de septiembre de 2026, el Concesionario a través del comunicado 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260928015063 de fecha 29 de septiembre de 2026, manifestó lo siguiente:

“Se le informa a la interventoría que el mantenimiento al aire acondicionado se realizara lo antes posible.”

Por lo tanto, la observación continúa vigente y se verificará en la próxima visita.

Peaje Purgatorio

Se evidenció que el mantenimiento a puesta a tierra de la estación, se encuentra vencido de acuerdo a la norma RETIE (Resolución 90708 de 2013 y posteriores modificaciones), la cual Obliga a que toda instalación eléctrica cuente con un sistema de puesta a tierra verificable, Instalaciones industriales y comerciales, medición anual o semestral según criticidad y cumplimiento, por lo tanto, se solicitó al Concesionario implementar las acciones correctivas.

En respuesta comunicado IPAB-800-2026 con radicado ANI 20264091240632 de fecha 23 de septiembre de 2026, el Concesionario a través del comunicado 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260928015063 de fecha 29 de septiembre de 2026, manifestó lo siguiente:

"Se le informa a la interventoría que el mantenimiento al sistema de puesta a tierra se realizó el día 22 de septiembre del 2026."

De acuerdo con la verificación realizada, se evidenció que el Concesionario ejecutó las actividades de mantenimiento correspondientes, subsanando la observación formulada por esta Interventoría, por lo cual se da por cerrada.

El aire acondicionado del carril N°2 presenta fallas en su funcionamiento, al no regular adecuadamente la temperatura al interior de la cabina. Por lo tanto, se solicitó al concesionario realizar las reparaciones pertinentes en el menor tiempo posible.

En respuesta comunicado IPAB-800-2026 con radicado ANI 20264091240632 de fecha 23 de septiembre de 2026, el Concesionario a través del comunicado 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260928015063 de fecha 29 de septiembre de 2026, manifestó lo siguiente:

"Se le informa a la interventoría que el mantenimiento al aire acondicionado del carril 2 se realizó el día 24 de septiembre del 2026."

De acuerdo con la verificación realizada, se evidenció que el Concesionario ejecutó las actividades de mantenimiento correspondientes, subsanando la observación formulada por esta Interventoría, por lo cual se da por cerrada.

Peaje Los Cedros

Se observa que el Carril N°5, no está en operación y que el carril N°6 que debe ser exclusivo para IP/REV se está usando de forma mixta, sin embargo, al inicio de la etapa de reversión existía un evento eximente de responsabilidad para estas dos condiciones y para el cual está en proceso la extensión del periodo especial, se anexan imágenes de referencia:

Tabla 4-125. Registro fotográfico Novedades Peaje Los Cedros

	
Carril N°5 (entrada)	Carril N°5 (salida)

Fuente Propia – Consorcio IPAB

En respuesta comunicado IPAB-800-2026 con radicado ANI 20264091240632 de fecha 23 de septiembre de 2026, el Concesionario a través del comunicado 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260928015063 de fecha 29 de septiembre de 2026, manifestó lo siguiente:

"Frente al uso del carril N°6 IP/REV, es preciso informarle a la interventoría que, el Concesionario continuará utilizando el carril N°6 para el tránsito de vehículos de categorías III a la VII; toda vez que, el uso del carril N°4 para estas categorías, generaría un riesgo de ruptura de la tubería que se encuentra a escasos 50 cm de la superficie. El carril N°4 permanece abierto las 24 horas, lo cual puede ser evidenciado a través del sistema, orientando a los usuarios a realizar el tránsito por este, dando prioridad a la exclusividad del carril N°6."

La observación continúa vigente y se realizará el seguimiento correspondiente, con el fin de verificar su atención, una vez se realice el traslado de la tubería.

Deterioro de la señal de COLPASS en la entrada del carril N°6, por lo cual se solicitó al Concesionario implementar las acciones correctivas.

En respuesta comunicado IPAB-800-2026 con radicado ANI 20264091240632 de fecha 23 de septiembre de 2026, el Concesionario a través del comunicado 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260928015063 de fecha 29 de septiembre de 2026, manifestó lo siguiente:

"Se le informa a la interventoría que el mantenimiento a la señal de COLPASS se encuentra programado para el mes de octubre del 2026. Inicialmente se había informado que era para el mes de agosto, pero toca de reprogramarla por inconvenientes con el proveedor."

Por lo tanto, la observación continúa vigente y se realizará el seguimiento correspondiente, con el fin de verificar su atención y ejecución dentro del plazo propuesto por el Concesionario.

Tabla 4-126. Registro fotográfico Novedades Peaje Los Cedros



Señal COLPASS Carril 6

Fuente Propia – Consorcio IPAB

Se evidenció que el mantenimiento a puesta a tierra de la estación, se encuentra vencido de acuerdo a la norma RETIE (Resolución 90708 de 2013 y posteriores modificaciones), la cual Obliga a que toda instalación eléctrica cuente con un sistema de puesta a tierra verificable, Instalaciones industriales y comerciales, medición anual o semestral según criticidad y cumplimiento, por lo tanto, se solicitó al Concesionario implementar las acciones correctivas.

En respuesta comunicado IPAB-800-2026 con radicado ANI 20264091240632 de fecha 23 de septiembre de 2026, el Concesionario a través del comunicado 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260928015063 de fecha 29 de septiembre de 2026, manifestó lo siguiente:

“Se le informa a la interventoría que el mantenimiento al sistema de puesta a tierra se realizó el día 24 de septiembre del 2026.”

De acuerdo con la verificación realizada, se evidenció que el Concesionario ejecutó las actividades de mantenimiento correspondientes, subsanando la observación formulada por esta Interventoría, por lo cual se da por cerrada.

Se observa que la estructura metálica del techo cubre Islas, presenta corrosión y falta de mantenimiento entre los carriles 5 y 6, por lo tanto, se requiere al Concesionario aplicar los correctivos necesarios en el menor tiempo posible.

En respuesta comunicado IPAB-800-2026 con radicado ANI 20264091240632 de fecha 23 de septiembre de 2026, el Concesionario a través del comunicado 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260928015063 de fecha 29 de septiembre de 2026, manifestó lo siguiente:

“Se le informa a la interventoría que antes del 30 de septiembre se estará realizando el respectivo mantenimiento a la estructura metálica del techo cubre isla en el carril 5 y 6.”

Dado que la visita se realizó el 24 de septiembre de 2026, se verificará en la próxima visita.

Se evidenció daño en el mecanismo interno que controla la función (subir/bajar) de la barrera automática de salida correspondiente al carril N.º 3. En consecuencia, se solicitará al Concesionario realizar su instalación en el menor tiempo posible, con el fin de garantizar el adecuado control de la salida del carril y evitar que los usuarios puedan omitir el pago de la tasa de peaje, se anexa imagen de referencia:

En respuesta comunicado IPAB-800-2026 con radicado ANI 20264091240632 de fecha 23 de septiembre de 2026, el Concesionario a través del comunicado 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260928015063 de fecha 29 de septiembre de 2026, manifestó lo siguiente:

“Se le informa a la interventoría que el día 24 de septiembre del 2026. Se realizo el respectivo mantenimiento al servomotor de la barrera, quedando está operativa.”

De acuerdo con la verificación realizada, se evidenció que el Concesionario ejecutó las actividades de mantenimiento correspondientes, subsanando la observación formulada por esta Interventoría, por lo cual se da por cerrada.

Peaje San Carlos

Se evidenció que el mantenimiento a puesta a tierra de la estación, se encuentra vencido de acuerdo a la norma RETIE (Resolución 90708 de 2013 y posteriores modificaciones), la cual Obliga a que toda instalación eléctrica cuente con un sistema de puesta a tierra verificable, Instalaciones industriales y comerciales, medición anual o semestral según criticidad y cumplimiento, por lo tanto, se solicitó al Concesionario implementar las acciones correctivas.

En respuesta comunicado IPAB-800-2026 con radicado ANI 20264091240632 de fecha 23 de septiembre de 2026, el Concesionario a través del comunicado 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260928015063 de fecha 29 de septiembre de 2026, manifestó lo siguiente:

"Se le informa a la interventoría que el mantenimiento al sistema de puesta a tierra se realizó el día 22 de septiembre del 2026."

De acuerdo con la verificación realizada, se evidenció que el Concesionario ejecutó las actividades de mantenimiento correspondientes, subsanando la observación formulada por esta Interventoría, por lo cual se da por cerrada.

Peaje los Manguitos

Se evidenció que el mantenimiento a puesta a tierra de la estación, se encuentra vencido de acuerdo a la norma RETIE (Resolución 90708 de 2013 y posteriores modificaciones), la cual Obliga a que toda instalación eléctrica cuente con un sistema de puesta a tierra verificable, Instalaciones industriales y comerciales, medición anual o semestral según criticidad y cumplimiento, por lo tanto, se solicitó al Concesionario implementar las acciones correctivas.

En respuesta comunicado IPAB-800-2026 con radicado ANI 20264091240632 de fecha 23 de septiembre de 2026, el Concesionario a través del comunicado 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260928015063 de fecha 29 de septiembre de 2026, manifestó lo siguiente:

"Se le informa a la interventoría que el mantenimiento al sistema de puesta a tierra se realizó el día 21 de septiembre del 2026."

De acuerdo con la verificación realizada, se evidenció que el Concesionario ejecutó las actividades de mantenimiento correspondientes, subsanando la observación formulada por esta Interventoría, por lo cual se da por cerrada.

Se evidenció una imagen opaca en la cámara PTZ ubicada en el sentido La Apartada – Planeta Rica. En consecuencia, se solicitó al Concesionario realizar los correctivos pertinentes, con el fin de garantizar la adecuada visualización y funcionamiento de las cámaras.

En respuesta comunicado IPAB-800-2026 con radicado ANI 20264091240632 de fecha 23 de septiembre de 2026, el Concesionario a través del comunicado 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260928015063 de fecha 29 de septiembre de 2026, manifestó lo siguiente:

"Se le informa a la interventoría que antes del 30 de septiembre se estará realizando el respectivo mantenimiento de limpieza a la a la carcasa de la cámara PTZ."

Dado que la visita se realizó el 19 de septiembre de 2026, aún no se había realizado el correctivo, por lo tanto, la observación continúa vigente y se realizará el seguimiento correspondiente, con el fin de verificar su atención y ejecución dentro del plazo propuesto por el Concesionario, se anexa imagen de referencia:

Tabla 4-127. Registro fotográfico Novedades Peaje Manguitos



Cámara PTZ sentido (La Apartada – Planeta Rica)

Fuente Propia – Consorcio IPAB

Todas las Estaciones de peajes

Se evidenció que el procedimiento de recaudo mediante datáfono genera retrasos en la atención de los usuarios de la vía, particularmente cuando se presentan pagos simultáneos con tarjeta débito y/o crédito en diferentes carriles, debido a que el Concesionario dispone actualmente de un solo datáfono por estación de peaje, limitando la operación de cobro semiautomático, por lo tanto se solicitó al Concesionario implementar las acciones correctivas para dar cumplimiento a la obligación contenida en la Sección 3.3.4.3 de Apéndice Técnico 2 del Contrato de Concesión No.016 de 2015.

En respuesta comunicado IPAB-800-2026 con radicado ANI 20264091240632 de fecha 23 de septiembre de 2026, el Concesionario a través del comunicado 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260928015063 de fecha 29 de septiembre de 2026, manifestó lo siguiente:

"El Concesionario ha venido realizando análisis del uso con el pago del datafono, el cual no llega ni al 1 % del tráfico diario cobrado en las estaciones de peajes, por lo tanto, no se observa la necesidad de ampliar por el momento la adquisición de otro equipo. Adicional a lo anteriormente expuesto, el sector financiero solo entrega un elemento por estación. El concesionario viene cumplimiento con la obligación contenida en la Sección 3.3.4.3 del Apéndice Técnico 2 del Contrato de Concesión No.016 de 2015.

"(…) Los sistemas que permitan la Operación de ***al menos un (1) carril por sentido de cobro semiautomático*** *deberán estar en servicio al momento de la suscripción del Acta de Terminación de Unidad Funcional en la que se encuentra la correspondiente Estación de Peaje (…)"*

Toda vez que tiene más de un carril con la tecnología de cobro semiautomático en todas sus estaciones de peajes."

La Interventoría indica que independiente del porcentaje que se utilicen los datafonos, el Concesionario tiene la obligación de disponer de al menos un (1) carril por sentido de cobro semiautomático, asimismo, si bien el Concesionario tiene habilitado más de un carril por sentido, estos no pueden ser utilizados de manera simultánea para el pago mediante tarjeta débito o crédito, debido a que en cada estación se cuenta con un único datáfono disponible para atender las transacciones. En consecuencia, cuando en ambos carriles se requiere efectuar el pago mediante este medio, uno de los usuarios debe esperar a que finalice la transacción del otro, generando tiempos adicionales de atención y afectando la fluidez en la operación del peaje. Lo anterior no resulta acorde con la finalidad de los carriles de cobro semiautomático, orientada a agilizar el proceso de cobro y reducir los tiempos de atención a los usuarios. Por lo tanto, se aplicarán los mecanismos de apremio contractuales.

Mediante comunicado IPAB-0754-2026 con radicado ANI 20264091173872 de fecha 10 de septiembre de 2026, se solicitó a la ANI no objeción para otorgar un plazo de cura al concesionario por no cumplir la obligación contractual de tener, al menos, un (1) carril por sentido de cobro semiautomático (at2 numeral 3.3.4.3 - tecnología de cobro y control del tráfico) en las estaciones de peaje del proyecto ruta al mar Antioquia – Bolívar.

A través del comunicado 20263050365641 de fecha 23 de septiembre de 2026, La ANI solicitó complementar la información asociada a la solicitud de no objeción al Plazo de

Cura para los carriles de cobro semiautomático en las estaciones de peaje del proyecto Antioquia – Bolívar.

Al cierre del presente informe, la Interventoría se encontraba elaborando el complemento solicitado.

ESTACIONES DE PESAJES

En las estaciones de pesaje (básculas), se monitorea permanentemente por parte de la Interventoría el funcionamiento de estas y se reglamentan pruebas periódicas para garantizar la mayor precisión posible al momento de pesar los vehículos de carga, pruebas que se encuentran reglamentadas en el Artículo 1 de la Resolución 1782 de 2009 del Ministerio de Transporte.

Básculas Manguitos 1 y 2.

No se realizaron pruebas de excentricidad y repetibilidad en la estación de pesaje Maguitos 1 y 2. Debido a que la grúa que se utiliza para la prueba se encontraba prestando un servicio.

Se evidenció daño en el mecanismo interno que controla la función (subir/bajar) de la barrera automática de salida de la plataforma de pesaje de la báscula estática en Manguitos 1. Por lo tanto, se solicitó al concesionario realizar los correctivos pertinentes en el menor tiempo posible, se anexa imagen de referencia:

Tabla 4-128. Registro fotográfico Novedades estación de pesaje Los Manguitos



Barrera automática de salida plataforma de pesaje Manguitos 1

Fuente Propia – Consorcio IPAB

En respuesta comunicado IPAB-800-2026 con radicado ANI 20264091240632 de fecha 23 de septiembre de 2026, el Concesionario a través del comunicado 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260928015063 de fecha 29 de septiembre de 2026, manifestó lo siguiente:

"Se le informa a la interventoría que el Concesionario está a la espera que el proveedor le envié la tarjeta controladora de la barrera, la cual deberá quedar instalada antes del 30 de octubre de 2026."

Por lo tanto, la observación continúa vigente y se realizará el seguimiento correspondiente, con el fin de verificar su atención y ejecución dentro del plazo propuesto por el Concesionario.

Se evidenció que el mantenimiento a puesta a tierra de la estación, se encuentra vencido de acuerdo a la norma RETIE (Resolución 90708 de 2013 y posteriores modificaciones), la cual Obliga a que toda instalación eléctrica cuente con un sistema de puesta a tierra verificable, Instalaciones industriales y comerciales, medición anual o semestral según

criticidad y cumplimiento, por lo tanto, se solicitará al Concesionario implementar las acciones correctivas.

En respuesta comunicado IPAB-800-2026 con radicado ANI 20264091240632 de fecha 23 de septiembre de 2026, el Concesionario a través del comunicado 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260928015063 de fecha 29 de septiembre de 2026, manifestó lo siguiente:

"Se le informa a la interventoría que el mantenimiento al sistema de puesta a tierra se realizó el día 21 de septiembre del 2026."

De acuerdo con la verificación realizada, se evidenció que el Concesionario ejecutó las actividades de mantenimiento correspondientes, subsanando la observación formulada por esta Interventoría, por lo cual se da por cerrada.

Se encuentran en mal estado las plumillas de las barreras automáticas de entrada y de salida de la plataforma de pesaje de la báscula estática de la báscula Manguitos 2. En consecuencia, se solicitó al concesionario reemplazar o reponer dichos elementos en el menor tiempo posible

En respuesta comunicado IPAB-800-2026 con radicado ANI 20264091240632 de fecha 23 de septiembre de 2026, el Concesionario a través del comunicado 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260928015063 de fecha 29 de septiembre de 2026, manifestó lo siguiente:

"El día 02 de septiembre se realizó el respectivo cambio de las plumillas."

De acuerdo con la verificación realizada, se evidenció que el Concesionario ejecutó las actividades de mantenimiento correspondientes, subsanando la observación formulada por esta Interventoría, por lo cual se da por cerrada.

Básculas Mata de Caña 1 y 2.

No se realizaron pruebas de excentricidad y repetibilidad en la estación de pesaje Maguitos 1 y 2. Debido a que el sábado 26 de septiembre de 2026, no estaba el técnico para realizarla.

Se evidenció que el mantenimiento a puesta a tierra de la estación, se encuentra vencido de acuerdo a la norma RETIE (Resolución 90708 de 2013 y posteriores modificaciones), la cual Obliga a que toda instalación eléctrica cuente con un sistema de puesta a tierra verificable, Instalaciones industriales y comerciales, medición anual o semestral según criticidad y cumplimiento, por lo tanto, se solicitó al Concesionario implementar las acciones correctivas.

En respuesta comunicado IPAB-800-2026 con radicado ANI 20264091240632 de fecha 23 de septiembre de 2026, el Concesionario a través del comunicado 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260928015063 de fecha 29 de septiembre de 2026, manifestó lo siguiente:

“Se le informa a la interventoría que el mantenimiento al sistema de puesta a tierra se realizó el día 21 de septiembre del 2026.”

De acuerdo con la verificación realizada, se evidenció que el Concesionario ejecutó las actividades de mantenimiento correspondientes, subsanando la observación formulada por esta Interventoría, por lo cual se da por cerrada.



Se identificó mal estado en los tableros de peso bruto de Mata de Caña 1 y 2. Se solicitó al Concesionario realizar el reemplazo o reposición de las partes afectadas de los tableros en el menor tiempo posible, con el fin de garantizar la adecuada visualización de la información correspondiente al peso bruto de los vehículos.

En respuesta comunicado IPAB-800-2026 con radicado ANI 20264091240632 de fecha 23 de septiembre de 2026, el Concesionario a través del comunicado 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260928015063 de fecha 29 de septiembre de 2026, manifestó lo siguiente:

“Se le informa a la interventoría que el mantenimiento a los tableros de pesaje se realizara a finales del mes de septiembre del 2026.”

Por lo tanto, la observación continúa vigente y se realizará el seguimiento correspondiente, con el fin de verificar su atención y ejecución dentro del plazo propuesto por el Concesionario, se anexan imágenes de referencia:

Tabla 4-129. Registro fotográfico Novedades estación de pesaje Mata de Caña

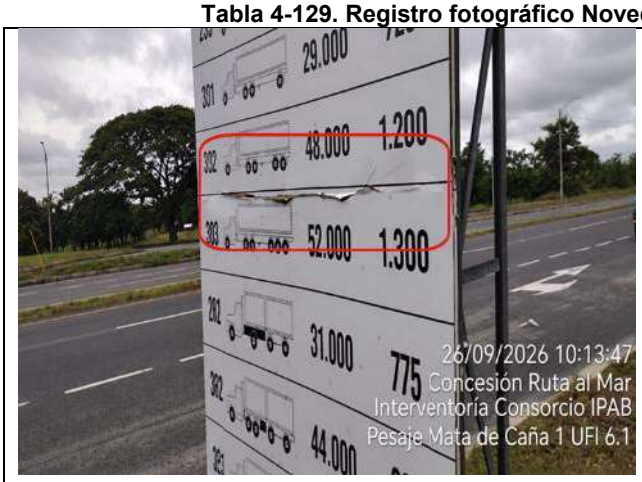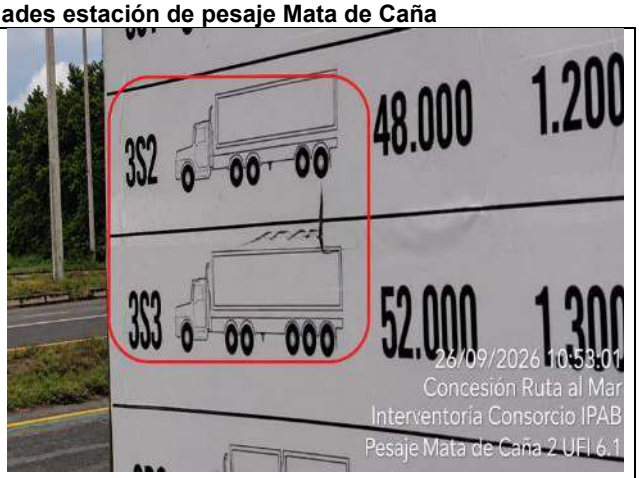	
Tablero Peso Bruto Mata de Caña 1	Tablero Peso Bruto Mata de Caña 2

Fuente Propia – Consorcio IPAB

Básculas San Onofre 1 y 2.

No se realizaron pruebas de excentricidad y repetibilidad en la estación de pesaje Maguitos 1 y 2. Debido a que el sábado 26 de septiembre de 2026, no estaba el técnico para realizarla.

Se evidenció que el mantenimiento a puesta a tierra de la estación, se encuentra vencido de acuerdo a la norma RETIE (Resolución 90708 de 2013 y posteriores modificaciones), la cual Obliga a que toda instalación eléctrica cuente con un sistema de puesta a tierra verificable, Instalaciones industriales y comerciales, medición anual o semestral según criticidad y cumplimiento, por lo tanto, se solicitará al Concesionario implementar las acciones correctivas.

En respuesta comunicado IPAB-800-2026 con radicado ANI 20264091240632 de fecha 23 de septiembre de 2026, el Concesionario a través del comunicado 48-

RUTADCTOELECTRONICOS-20260928015063 de fecha 29 de septiembre de 2026, manifestó lo siguiente:

"Se le informa a la interventoría que el mantenimiento al sistema de puesta a tierra se realizó el día 21 de septiembre del 2026."

De acuerdo con la verificación realizada, se evidenció que el Concesionario ejecutó las actividades de mantenimiento correspondientes, subsanando la observación formulada por esta Interventoría, por lo cual se da por cerrada.

Mal estado de las plumillas de las barreras automáticas ubicadas en la entrada y salida de la plataforma de pesaje de la báscula estática de la estación San Onofre 2. En consecuencia, se solicitó al Concesionario realizar el reemplazo o reposición de dichos elementos en el menor tiempo posible. Se anexan imágenes de referencia:

En respuesta comunicado IPAB-800-2026 con radicado ANI 20264091240632 de fecha 23 de septiembre de 2026, el Concesionario a través del comunicado 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260928015063 de fecha 29 de septiembre de 2026, manifestó lo siguiente:

"El día 24 de septiembre se realizó el respectivo cambio de la plumilla de bascula 1."

De acuerdo con la verificación realizada, se evidenció que el Concesionario ejecutó las actividades de mantenimiento correspondientes, subsanando la observación formulada por esta Interventoría, por lo cual se da por cerrada.

Mal estado de la plumilla de la barrera automática de entrada a la plataforma de pesaje de la báscula estática de la estación San Onofre 1. En consecuencia, se solicitó al Concesionario realizar el reemplazo o reposición de dicho elemento en el menor tiempo posible. Se anexa imagen de referencia:

En respuesta comunicado IPAB-800-2026 con radicado ANI 20264091240632 de fecha 23 de septiembre de 2026, el Concesionario a través del comunicado 48-

RUTADCTOELECTRONICOS-20260928015063 de fecha 29 de septiembre de 2026, manifestó lo siguiente:

"El día 24 de septiembre se realizó el respectivo cambio de la plumilla de bascula 1."

De acuerdo con la verificación realizada, se evidenció que el Concesionario ejecutó las actividades de mantenimiento correspondientes, subsanando la observación formulada por esta Interventoría, por lo cual se da por cerrada.

A continuación, se relaciona el estado de cumplimiento por parte del Concesionario frente a los hallazgos identificados, de igual forma en el anexo 6.4.1 Auditorias.INT.Hallazgos.Peajes, se adjunta el archivo en Excel con la relación de hallazgos, se aclara que para las observaciones identificadas en las auditorías de sistemas de peajes, el requerimiento al Concesionario se realiza en el mes siguiente al periodo de la revisión.

Tabla 4-130. Estado hallazgos de la auditoria de sistemas en las estaciones de peajes y pesajes

ESTADO DE CUMPLIMINETO DE HALLAZGOS DE LA AUDITORIA DE SISTEMAS EN LAS ESTACIONES DE PEAJES Y PESAJES										
ESTACIÓN DE PEAJE Ó PESAJE	HALLAZGO	IPAB				CRM			ESTADO	OBSERVACIONES
		FECHA DE VISITA	N° DE FOLDER DE ARCHIVO	RADICADO ANI	FECHA	OFICIO RESPUESTA Concesionario	FECHA	ULTIMA RESPUESTA		
La Apartada	Se evidenció que el mantenimiento a puesta a tierra de la estación, se encuentra vencido de acuerdo a la norma RETIE (Resolución 90708 de 2013 y posteriores modificaciones), la cual Obliga a que toda instalación eléctrica cuente con un sistema de puesta a tierra verificable, Instalaciones industriales y comerciales, medición anual o semestral según criticidad y cumplimiento, por lo tanto, se solicitó al Concesionario implementar las acciones correctivas.	19/06/2026	IPAB-514-2026 IPAB-652-2026 IPAB-800-2026	20264090911142 20264091080232 20264091240632	17/07/2026 24/08/2026 23/09/2026	48-20260729012645 48-147-20260831028436 48-20260928015063	29/07/2026 31/08/2026 29/09/2026	Se le informa a la interventoría que el mantenimiento al sistema de puesta a tierra se realizó el día 21 de septiembre del 2026.	CERRADO	
	Afectación en la carcasa protectora del sensor óptico emisor de salida del carril N°6, En consecuencia, se solicitó al concesionario realizar las reparaciones pertinentes en el menor tiempo posible	19/08/2026	IPAB-800-2026	20264091240632	23/09/2026	48-20260928015063	29/09/2026	Se le informa a la interventoría que la carcasa protectora del sensor óptico emisor de salida del carril N°6, se encuentra en reparación y será instalado el 10 de octubre.	PENDIENTE	Dentro del plazo propuesto por el Concesionario

ESTADO DE CUMPLIMINETO DE HALLAZGOS DE LA AUDITORIA DE SISTEMAS EN LAS ESTACIONES DE PEAJES Y PESAJES

ESTACIÓN DE PEAJE Ó PESAJE	HALLAZGO	IPAB				CRM			ESTADO	OBSERVACIONES
		FECHA DE VISITA	N° DE FOLDER DE ARCHIVO	RADICADO ANI	FECHA	OFICIO RESPUESTA Concesionario	FECHA	ULTIMA RESPUESTA		
	Se evidencia fractura del concreto en la losa No.7 del carril No.2, observándose movimiento de la losa con el paso de los vehículos, condición que podría estar asociada a una falla por bombeo y pérdida de soporte de la capa subyacente; por lo anterior, se solicitó al Concesionario realizar la reposición de la losa, previa verificación de las condiciones de soporte.	19/08/2026	IPAB-800-2026	20264091240632	23/09/2026	48-20260928015063	29/09/2026	Con respecto a la fractura del concreto en la losa No.7 del carril No.2 se le informa que esta siendo analizada por el área técnica para determinar la causa y tratamiento a seguir.	PENDIENTE	
Mata de Caña	Se evidenció que el mantenimiento a puesta a tierra de la estación, se encuentra vencido de acuerdo a la norma RETIE (Resolución 90708 de 2013 y posteriores modificaciones), la cual Obliga a que toda instalación eléctrica cuente con un sistema de puesta a tierra verificable, Instalaciones industriales y comerciales, medición anual o semestral según criticidad y cumplimiento, por lo tanto se solicitó al Concesionario implementar las acciones correctivas.	30/06/2026	IPAB-514-2026 IPAB-652-2026 IPAB-800-2026	20264090911142 20264091080232 20264091240632	17/07/2026 24/08/2026 23/09/2026	48-20260729012645 48-147-20260831028436 48-20260928015063	29/07/2026 31/08/2026 29/09/2026	Se le informa a la interventoría que el mantenimiento al sistema de puesta a tierra se fue realizado el día 24 de septiembre del 2026.	CERRADO	

ESTADO DE CUMPLIMINETO DE HALLAZGOS DE LA AUDITORIA DE SISTEMAS EN LAS ESTACIONES DE PEAJES Y PESAJES

ESTACIÓN DE PEAJE Ó PESAJE	HALLAZGO	IPAB				CRM			ESTADO	OBSERVACIONES
		FECHA DE VISITA	N° DE FOLDER DE ARCHIVO	RADICADO ANI	FECHA	OFICIO RESPUESTA Concesionario	FECHA	ULTIMA RESPUESTA		
	El aire acondicionado del carril N°2 presenta fallas en su funcionamiento, al no regular adecuadamente la temperatura al interior de la cabina. Por lo tanto, se solicitó al concesionario realizar las reparaciones pertinentes en el menor tiempo posible	31/08/2026	IPAB-800-2026	20264091240632	23/09/2026	48-20260928015063	29/09/2026	Se le informa a la interventoría que el día 21 de septiembre del 2026. Se realizo el respectivo mantenimiento al aire acondicionado del carril N°2.	CERRADO	
Peaje San Onofre	Se evidenció que el mantenimiento a puesta a tierra de la estación, se encuentra vencido de acuerdo a la norma RETIE (Resolución 90708 de 2013 y posteriores modificaciones), la cual Obliga a que toda instalación eléctrica cuente con un sistema de puesta a tierra verificable, Instalaciones industriales y comerciales, medición anual o semestral según criticidad y cumplimiento, por lo tanto se solicitó al Concesionario implementar las acciones correctivas.	26/06/2026	IPAB-514-2026 IPAB-652-2026 IPAB-800-2026	20264090911142 20264091080232 20264091240632	17/07/2026 24/08/2026 23/09/2026	48-20260729012645 48-147-20260831028436 48-20260928015063	29/07/2026 31/08/2026 29/09/2026	Se le informa a la interventoría que el mantenimiento al sistema de puesta a tierra se realizó el día 21 de septiembre del 2026.	CERRADO	
	Se evidenció afectación en la parte superior del techo de la caseta auxiliar de recaudo del carril N°5, se solicitó al Concesionario realizar las	31/07/2026	IPAB-652-2026 IPAB-800-2026	20264091080232 20264091240632	24/08/2026 23/09/2026	48-147-20260831028436 48-20260928015063	31/08/2026 29/09/2026	Se le informa a la interventoría que el mantenimiento a la afectación en la parte superior de la caseta auxiliar se realizará el	PENDIENTE	Dado que la visita se realizó el 26 de septiembre de 2026, se verificará

ESTADO DE CUMPLIMINETO DE HALLAZGOS DE LA AUDITORIA DE SISTEMAS EN LAS ESTACIONES DE PEAJES Y PESAJES

ESTACIÓN DE PEAJE Ó PESAJE	HALLAZGO	IPAB				CRM			ESTADO	OBSERVACIONES
		FECHA DE VISITA	N° DE FOLDER DE ARCHIVO	RADICADO ANI	FECHA	OFICIO RESPUESTA Concesionario	FECHA	ULTIMA RESPUESTA		
	reparaciones pertinentes en el menor tiempo posible							30 de septiembre del 2026.		en la proxima visita.
	El aire acondicionado del carril N°2 presenta fallas en su funcionamiento, al no regular adecuadamente la temperatura al interior de la cabina. Por lo tanto, se solicitó al concesionario realizar las reparaciones pertinentes en el menor tiempo posible	26/08/2026	IPAB-800-2026	20264091240632	23/09/2026	48-20260928015063	29/09/2026	Se le informa a la interventoría que el mantenimiento al aire acondicionado se realizara lo antes posible.	PENDIENTE	se verificará en la próxima visita.
Peaje Purgatorio	Se evidenció que el mantenimiento a puesta a tierra de la estación, se encuentra vencido de acuerdo a la norma RETIE (Resolución 90708 de 2013 y posteriores modificaciones), la cual Obliga a que toda instalación eléctrica cuente con un sistema de puesta a tierra verificable, Instalaciones industriales y comerciales, medición anual o semestral según criticidad y cumplimiento, por lo tanto se solicitó al Concesionario implementar las acciones correctivas.	30/06/2026	IPAB-514-2026 IPAB-652-2026 IPAB-800-2026	20264090911142 20264091080232 20264091240632	17/07/2026 24/08/2026 23/09/2026	48-20260729012645 48-147-20260831028436 48-20260928015063	29/07/2026 31/08/2026 29/09/2026	Se le informa a la interventoría que el mantenimiento al sistema de puesta a tierra se realizó el día 22 de septiembre del 2026.	CERRADO	

ESTADO DE CUMPLIMINETO DE HALLAZGOS DE LA AUDITORIA DE SISTEMAS EN LAS ESTACIONES DE PEAJES Y PESAJES

ESTACIÓN DE PEAJE Ó PESAJE	HALLAZGO	IPAB				CRM			ESTADO	OBSERVACIONES
		FECHA DE VISITA	N° DE FOLDER DE ARCHIVO	RADICADO ANI	FECHA	OFICIO RESPUESTA Concesionario	FECHA	ULTIMA RESPUESTA		
	El aire acondicionado del carril N°2 presenta fallas en su funcionamiento, al no regular adecuadamente la temperatura al interior de la cabina. Por lo tanto, se solicitó al concesionario realizar las reparaciones pertinentes en el menor tiempo posible	31/08/2026	IPAB-800-2026	20264091240632	23/09/2026	48-20260928015063	29/09/2026	Se le informa a la interventoría que el mantenimiento al aire acondicionado del carril 2 se realizó el día 24 de septiembre del 2026.	CERRADO	
Peaje Los Cedros	La obligación relacionada con los carriles de cobro automático o telepeaje que serán de uso exclusivo para los vehículos portadores de esa tecnología. Se encuentra en el Capítulo 3 del Apéndice Técnico 2 del Contrato de Concesión, en cuyo apartado se definen las obligaciones del Concesionario en relación con la Operación del Proyecto, desde el momento de la suscripción del Acta de Entrega de Infraestructura y hasta la reversión total del Proyecto, por lo tanto, una vez se realice el traslado de la tubería mencionada, se solicita al Concesionario dar cumplimiento a esta obligación	25/02/2026	IPAB-053-2026 IPAB-138-2026 PAB-292-2026 IPAB-0393-2026 IPAB-514-2026 IPAB-652-2026 IPAB-800-2026	20264090329952 20264090449812 20264090631082 20264090749412 20264090911142 20264091080232 20264091240632	16/03/2026 13/04/2026 20/05/2026 12/06/2026 17/07/2026 24/08/2026 23/09/2026	48-20260320011629 48-20260414011834 48-20260526012200 48-20260617012351 48-20260729012645 48-147-20260831028436 48-20260928015063	20/03/2026 15/04/2026 27/05/2026 18/06/2026 29/07/2026 31/08/2026 29/09/2026	Frente al uso del carril N°6 IP/REV, es preciso informarle a la interventoría que, el Concesionario continuará utilizando el carril N°6 para el tránsito de vehículos de categorías III a la VII; toda vez que, el uso del carril N°4 para estas categorías, generaría un riesgo de ruptura de la tubería que se encuentra a escasos 50 cm de la superficie. El carril N°4 permanece abierto las 24 horas, lo cual puede ser evidenciado a través del sistema, orientando a los usuarios a realizar el	PENDIENTE	

ESTADO DE CUMPLIMINETO DE HALLAZGOS DE LA AUDITORIA DE SISTEMAS EN LAS ESTACIONES DE PEAJES Y PESAJES										
ESTACIÓN DE PEAJE Ó PESAJE	HALLAZGO	IPAB				CRM			ESTADO	OBSERVACIONES
		FECHA DE VISITA	N° DE FOLDER DE ARCHIVO	RADICADO ANI	FECHA	OFICIO RESPUESTA Concesionario	FECHA	ULTIMA RESPUESTA		
								tránsito por este, dando prioridad a la exclusividad del carril N°6.		
	Deterioro de la señal de COLPASS en la entrada del carril N°6, por lo cual se solicitó al concesionario implementar las acciones correctivas.	30/06/2026	IPAB-514-2026 IPAB-652-2026 IPAB-800-2026	20264090911142 20264091080232 20264091240632	17/07/2026 24/08/2026 23/09/2026	48-20260729012645 48-147-20260831028436 48-20260928015063	29/07/2026 31/08/2026 29/09/2026	Se le informa a la interventoría que el mantenimiento a la señal de COLPASS se encuentra programado para el mes de octubre del 2026. Inicialmente se había informado que era para el mes de agosto, pero toca de reprogramarla por inconvenientes con el proveedor.	PENDIENTE	Dentro del plazo propuesto por el Concesionario

ESTADO DE CUMPLIMINETO DE HALLAZGOS DE LA AUDITORIA DE SISTEMAS EN LAS ESTACIONES DE PEAJES Y PESAJES

ESTACIÓN DE PEAJE Ó PESAJE	HALLAZGO	IPAB				CRM			ESTADO	OBSERVACIONES
		FECHA DE VISITA	N° DE FOLDER DE ARCHIVO	RADICADO ANI	FECHA	OFICIO RESPUESTA Concesionario	FECHA	ULTIMA RESPUESTA		
	Se evidenció que el mantenimiento a puesta a tierra de la estación, se encuentra vencido de acuerdo a la norma RETIE (Resolución 90708 de 2013 y posteriores modificaciones), la cual Obliga a que toda instalación eléctrica cuente con un sistema de puesta a tierra verificable, Instalaciones industriales y comerciales, medición anual o semestral según criticidad y cumplimiento, por lo tanto se solicitó al Concesionario implementar las acciones correctivas.	30/06/2026	IPAB-514-2026 IPAB-652-2026 IPAB-800-2026	20264090911142 20264091080232 20264091240632	17/07/2026 24/08/2026 23/09/2026	48-20260729012645 48-147-20260831028436 48-20260928015063	29/07/2026 31/08/2026 29/09/2026	Se le informa a la interventoría que el mantenimiento al sistema de puesta a tierra se realizó el día 24 de septiembre del 2026.	CERRADO	
	Se evidenció daño en el mecanismo interno que controla la función (subir/bajar) de la barrera automática de salida correspondiente al carril N.° 3. En consecuencia, se solicitó al Concesionario realizar su instalación en el menor tiempo posible, con el fin de garantizar el adecuado control de la salida del carril y evitar que los usuarios puedan omitir el pago de la tasa de peaje.	31/08/2026	IPAB-800-2026	20264091240632	23/09/2026	48-20260928015063	29/09/2026	Se le informa a la interventoría que el día 24 de septiembre del 2026. Se realizo el respectivo mantenimiento al servomotor de la barrera, quedando está operativa.	CERRADO	

ESTADO DE CUMPLIMINETO DE HALLAZGOS DE LA AUDITORIA DE SISTEMAS EN LAS ESTACIONES DE PEAJES Y PESAJES

ESTACIÓN DE PEAJE Ó PESAJE	HALLAZGO	IPAB				CRM			ESTADO	OBSERVACIONES
		FECHA DE VISITA	N° DE FOLDER DE ARCHIVO	RADICADO ANI	FECHA	OFICIO RESPUESTA Concesionario	FECHA	ULTIMA RESPUESTA		
	Se observa que la estructura metálica del techo cubre Islas, presenta corrosión y falta de mantenimiento entre los carriles 5 y 6, por lo tanto, se requiere al Concesionario aplicar los correctivos necesarios en el menor tiempo posible.	30/07/2026	IPAB-652-2026 IPAB-800-2026	20264091080232 20264091240632	24/08/2026 23/09/2026	48-147-20260831028436 48-20260928015063	31/08/2026 29/09/2026	Se informa a la interventoría que antes del 30 de septiembre se estará realizando el respectivo mantenimiento a la estructura metálica del techo cubre isla en el carril 5 y 6.	PENDIENTE	se verificará en la próxima visita.
Peaje San Carlos	Se evidenció que el mantenimiento a puesta a tierra de la estación, se encuentra vencido de acuerdo a la norma RETIE (Resolución 90708 de 2013 y posteriores modificaciones), la cual Obliga a que toda instalación eléctrica cuente con un sistema de puesta a tierra verificable, Instalaciones industriales y comerciales, medición anual o semestral según criticidad y cumplimiento, por lo tanto se solicitó al Concesionario implementar las acciones correctivas.	19/06/2026	IPAB-514-2026 IPAB-652-2026 IPAB-800-2026	20264090911142 20264091080232 20264091240632	17/07/2026 24/08/2026 23/09/2026	48-20260729012645 48-147-20260831028436 48-20260928015063	29/07/2026 31/08/2026 29/09/2026	Se le informa a la interventoría que el mantenimiento al sistema de puesta a tierra se realizó el día 22 de septiembre del 2026.	CERRADO	

ESTADO DE CUMPLIMINETO DE HALLAZGOS DE LA AUDITORIA DE SISTEMAS EN LAS ESTACIONES DE PEAJES Y PESAJES

ESTACIÓN DE PEAJE Ó PESAJE	HALLAZGO	IPAB				CRM			ESTADO	OBSERVACIONES
		FECHA DE VISITA	N° DE FOLDER DE ARCHIVO	RADICADO ANI	FECHA	OFICIO RESPUESTA Concesionario	FECHA	ULTIMA RESPUESTA		
Peaje Manguitos	Se evidenció que el mantenimiento a puesta a tierra de la estación, se encuentra vencido de acuerdo a la norma RETIE (Resolución 90708 de 2013 y posteriores modificaciones), la cual Obliga a que toda instalación eléctrica cuente con un sistema de puesta a tierra verificable, Instalaciones industriales y comerciales, medición anual o semestral según criticidad y cumplimiento, por lo tanto se solicitó al Concesionario implementar las acciones correctivas.	19/06/2026	IPAB-514-2026 IPAB-652-2026 IPAB-800-2026	20264090911142 20264091080232 20264091240632	17/07/2026 24/08/2026 23/09/2026	48-20260729012645 48-147-20260831028436 48-20260928015063	29/07/2026 31/08/2026 29/09/2026	Se le informa a la interventoría que el mantenimiento al sistema de puesta a tierra se realizó el día 21 de septiembre del 2026.	CERRADO	
	Se evidenció una imagen opaca en la cámara PTZ ubicada en el sentido La Apartada – Planeta Rica. En consecuencia, se solicitó al Concesionario realizar los correctivos pertinentes, con el fin de garantizar la adecuada visualización y funcionamiento de las cámaras.	15/07/2026	IPAB-652-2026 IPAB-800-2026	20264091080232 20264091240632	24/08/2026 23/09/2026	48-147-20260831028436 48-20260928015063	31/08/2026 29/09/2026	Se le informa a la interventoría que antes del 30 de septiembre se estará realizando el respectivo mantenimiento de limpieza a la a la carcasa de la cámara PTZ.	PENDIENTE	se verificará en la próxima visita.
Todas las estaciones de peajes	Se evidenció que el procedimiento de recaudo mediante datáfono genera retrasos en la atención de los usuarios de la vía, particularmente cuando se presentan pagos simultáneos con tarjeta débito y/o	30/05/2026	IPAB-0393-2026 IPAB-514-2026	20264090749412 20264090911142 20264091080232 20264091240632	12/06/2026 17/07/2026 24/08/2026 23/09/2026	48-20260617012351 48-20260729012645 48-147-20260831028436 48-20260928015063	18/06/2026 29/07/2026 31/08/2026 29/09/2026	El Concesionario ha venido realizando análisis del uso con el pago del datafono, el cual no llega ni al 1 % del tráfico diario	PENDIENTE	Esta observación se tramitará mediante la solicitud de no objeción al plazo de cura, por lo

ESTADO DE CUMPLIMINETO DE HALLAZGOS DE LA AUDITORIA DE SISTEMAS EN LAS ESTACIONES DE PEAJES Y PESAJES										
ESTACIÓN DE PEAJE Ó PESAJE	HALLAZGO	IPAB				CRM			ESTADO	OBSERVACIONES
		FECHA DE VISITA	N° DE FOLDER DE ARCHIVO	RADICADO ANI	FECHA	OFICIO RESPUESTA Concesionario	FECHA	ULTIMA RESPUESTA		
	crédito en diferentes carriles, debido a que el Concesionario dispone actualmente de un solo datáfono por estación de peaje, limitando la operación de cobro semiautomático, por lo tanto se solicitó al Concesionario implementar las acciones correctivas para dar cumplimiento a la obligación contenida en la Sección 3.3.4.3 de Apéndice Técnico 2 del Contrato de Concesión No.016 de 2015		IPAB-652-2026 IPAB-800-2026					cobrado en las estaciones de peajes, por lo tanto, no se observa la necesidad de ampliar por el momento la adquisición de otro equipo. Adicional a lo anteriormente expuesto, el sector financiero solo entrega un elemento por estación. El concesionario viene cumplimiento con la obligación contenida en la Sección 3.3.4.3 del Apéndice Técnico 2 del Contrato de Concesión No.016 de 2015. "(…) Los sistemas que permitan la Operación de al menos un (1) carril por sentido de cobro semiautomático deberán estar en servicio al momento de la suscripción del Acta de Terminación de Unidad Funcional en la que se encuentra la correspondiente			tanto se retirará de la matriz en le proximo informe.

ESTADO DE CUMPLIMINETO DE HALLAZGOS DE LA AUDITORIA DE SISTEMAS EN LAS ESTACIONES DE PEAJES Y PESAJES

ESTACIÓN DE PEAJE Ó PESAJE	HALLAZGO	IPAB				CRM			ESTADO	OBSERVACIONES
		FECHA DE VISITA	N° DE FOLDER DE ARCHIVO	RADICADO ANI	FECHA	OFICIO RESPUESTA Concesionario	FECHA	ULTIMA RESPUESTA		
								Estación de Peaje (…)" Toda vez que tiene más de un carril con la tecnología de cobro semiautomático en todas sus estaciones de peajes.		
Básculas Manguitos 1 y 2	Se evidenció que el mantenimiento a puesta a tierra de la estación, se encuentra vencido de acuerdo a la norma RETIE (Resolución 90708 de 2013 y posteriores modificaciones), la cual Obliga a que toda instalación eléctrica cuente con un sistema de puesta a tierra verificable, Instalaciones industriales y comerciales, medición anual o semestral según criticidad y cumplimiento, por lo tanto se solicitó al Concesionario implementar las acciones correctivas.	19/06/2026	IPAB-514-2026 IPAB-652-2026 IPAB-800-2026	20264090911142 20264091080232 20264091240632	17/07/2026 24/08/2026 23/09/2026	48-20260729012645 48-147-20260831028436 48-20260928015063	29/07/2026 31/08/2026 29/09/2026	Se le informa a la interventoría que el mantenimiento al sistema de puesta a tierra se realizó el día 21 de septiembre del 2026.	CERRADO	
	Se evidenció daño en el mecanismo interno que controla la función (subir/bajar) de la barrera automática de salida de la plataforma de pesaje de la báscula estática en Manguitos 1. Por lo tanto, se solicitó al concesionario realizar los correctivos	19/08/2026	IPAB-800-2026	20264091240632	23/09/2026	48-20260928015063	29/09/2026	Se le informa a la interventoría que el Concesionario está a la espera que el proveedor le envié la tarjeta controladora de la barrera, la cual deberá quedar	PENDIENTE	Dentro del plazo propuesto por el Concesionario

ESTADO DE CUMPLIMINETO DE HALLAZGOS DE LA AUDITORIA DE SISTEMAS EN LAS ESTACIONES DE PEAJES Y PESAJES

ESTACIÓN DE PEAJE Ó PESAJE	HALLAZGO	IPAB				CRM			ESTADO	OBSERVACIONES
		FECHA DE VISITA	N° DE FOLDER DE ARCHIVO	RADICADO ANI	FECHA	OFICIO RESPUESTA Concesionario	FECHA	ULTIMA RESPUESTA		
	pertinentes en el menor tiempo posible							instalada antes del 30 de octubre de 2026.		
	Se encuentran en mal estado las plumillas de las barreras automáticas de entrada y de salida de la plataforma de pesaje de la báscula estática de la báscula Manguitos 2. En consecuencia, se solicitó al concesionario reemplazar o reponer dichos elementos en el menor tiempo posible	19/08/2026	IPAB-800-2026	20264091240632	23/09/2026	48-20260928015063	29/09/2026	El día 02 de septiembre se realizo el respectivo cambio de las plumillas.	CERRADO	
Básculas Mata de caña 1 y 2	Se evidenció que el mantenimiento a puesta a tierra de la estación, se encuentra vencido de acuerdo a la norma RETIE (Resolución 90708 de 2013 y posteriores modificaciones), la cual Obliga a que toda instalación eléctrica cuente con un sistema de puesta a tierra verificable, Instalaciones industriales y comerciales, medición anual o semestral según criticidad y cumplimiento, por lo tanto se solicitó	30/06/2026	IPAB-514-2026 IPAB-652-2026 IPAB-800-2026	20264090911142 20264091080232 20264091240632	17/07/2026 24/08/2026 23/09/2026	48-20260729012645 48-147-20260831028436 48-20260928015063	29/07/2026 31/08/2026 29/09/2026	Se le informa a la interventoría que el mantenimiento al sistema de puesta a tierra se fue realizado el día 24 de septiembre del 2026.	CERRADO	

ESTADO DE CUMPLIMINETO DE HALLAZGOS DE LA AUDITORIA DE SISTEMAS EN LAS ESTACIONES DE PEAJES Y PESAJES										
ESTACIÓN DE PEAJE Ó PESAJE	HALLAZGO	IPAB				CRM			ESTADO	OBSERVACIONES
		FECHA DE VISITA	N° DE FOLDER DE ARCHIVO	RADICADO ANI	FECHA	OFICIO RESPUESTA Concesionario	FECHA	ULTIMA RESPUESTA		
	al Concesionario implementar las acciones correctivas.									
	Se identificó mal estado en los tableros de peso bruto de Mata de Caña 1 y 2. Se solicitó al Concesionario realizar el reemplazo o reposición de las partes afectadas de los tableros en el menor tiempo posible, con el fin de garantizar la adecuada visualización de la información correspondiente al peso bruto de los vehículos.	30/07/2026	IPAB-652-2026 IPAB-800-2026	20264091080232 20264091240632	24/08/2026 23/09/2026	48-147-20260831028436 48-20260928015063	31/08/2026 29/09/2026	Se le informa a la interventoría que el mantenimiento a los tableros de pesaje se realizara a finales del mes de septiembre del 2026.	PENDIENTE	se verificará en la próxima visita.

ESTADO DE CUMPLIMINETO DE HALLAZGOS DE LA AUDITORIA DE SISTEMAS EN LAS ESTACIONES DE PEAJES Y PESAJES

ESTACIÓN DE PEAJE Ó PESAJE	HALLAZGO	IPAB				CRM			ESTADO	OBSERVACIONES
		FECHA DE VISITA	N° DE FOLDER DE ARCHIVO	RADICADO ANI	FECHA	OFICIO RESPUESTA Concesionario	FECHA	ULTIMA RESPUESTA		
Básculas San Onofre 1 y 2	Se evidenció que el mantenimiento a puesta a tierra de la estación, se encuentra vencido de acuerdo a la norma RETIE (Resolución 90708 de 2013 y posteriores modificaciones), la cual Obliga a que toda instalación eléctrica cuente con un sistema de puesta a tierra verificable, Instalaciones industriales y comerciales, medición anual o semestral según criticidad y cumplimiento, por lo tanto se solicitó al Concesionario implementar las acciones correctivas.	31/07/2026	IPAB-652-2026 IPAB-800-2026	20264091080232 20264091240632	24/08/2026 23/09/2026	48-147-20260831028436 48-20260928015063	31/08/2026 29/09/2026	Se le informa a la interventoría que el mantenimiento al sistema de puesta a tierra se realizó el día 23 de septiembre del 2026.	CERRADO	
	Mal estado de las plumillas de las barreras automáticas ubicadas en la entrada y salida de la plataforma de pesaje de la báscula estática de la estación San Onofre 2. En consecuencia, se solicitó al Concesionario realizar el reemplazo o reposición de dichos elementos en el menor tiempo posible.	26/08/2026	IPAB-800-2026	20264091240632	23/09/2026	48-20260928015063	29/09/2026	El día 24 de septiembre se realizó el respectivo cambio de la plumilla de bascula 2.	CERRADO	

ESTADO DE CUMPLIMINETO DE HALLAZGOS DE LA AUDITORIA DE SISTEMAS EN LAS ESTACIONES DE PEAJES Y PESAJES										
ESTACIÓN DE PEAJE Ó PESAJE	HALLAZGO	IPAB				CRM			ESTADO	OBSERVACIONES
		FECHA DE VISITA	N° DE FOLDER DE ARCHIVO	RADICADO ANI	FECHA	OFICIO RESPUESTA Concesionario	FECHA	ULTIMA RESPUESTA		
	Se evidencia mal estado de la plumilla de la barrera automática de entrada a la plataforma de pesaje de la báscula estática de la estación San Onofre 1. En consecuencia, se solicitó al Concesionario realizar el reemplazo o reposición de dicho elemento en el menor tiempo posible.	26/08/2026	IPAB-800-2026	20264091240632	23/09/2026	48-20260928015063	29/09/2026	El día 24 de septiembre se realizó el respectivo cambio de la plumilla de bascula 1	CERRADO	

Fuente Propia – Consorcio IPAB

4.5. CONDICIONES METEOROLÓGICAS

En el mes de septiembre se prevén suelos muy secos en sectores específicos de la alta y media Guajira. Se esperan suelos secos en la mayor parte del departamento de La Guajira y en algunos sectores particulares del nororiente y suroriente del departamento de Cesar y el norte del Magdalena.

Se prevén suelos semisecos en la mayor parte del departamento de Magdalena y Atlántico, en el occidente de Cesar, norte de Bolívar, Sucre y Córdoba.

Se esperan suelos semihúmedos en el archipiélago de San Andrés y Providencia, en el nororiente de Cesar, en la Serranía del Perijá, en el nororiente del Magdalena, en la Sierra Nevada de Santa Marta, también en el sur de Bolívar, Sucre y occidente y centro de Córdoba, además de sectores dispersos del norte de los mismos departamentos.

Finalmente, se prevén suelos húmedos en el sur del departamento de Córdoba, Sucre y Bolívar. En la siguiente tabla se relaciona el estado de las estaciones meteorológicas del proyecto Antioquia Bolívar y en el anexo 6.3.3.Cond.MET. se presentan los reportes de datos generados por dichas estaciones.

Tabla 4-131. Estado Estaciones Meteorológicas

Nombre Estación	UF/sector	Observaciones (Indicar Otra)	Cláusula Contractual obligación	CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN - VALIDACIÓN INTERVENTORÍA
EMT010	UF01/FITS001	Están activas encendidas y capturando datos	Apéndice Técnico 2, numeral 3.3.5.1 Sistema de Control de Tráfico. En cada Estación de Peaje, el Sistema de Control de Tráfico deberá contar al menos con los siguientes equipos: equipos de detección y sensores de pista (o carril), paneles de	Operativa
EMT030	UF01/FITS003			Operativa
EMT150	UF03/FITS015			Operativa
EMT-080	UF04/GAL-08	Están activas encendidas y capturando datos		Operativa

Nombre Estación	UF/sector	Observaciones (Indicar Otra)	Cláusula Contractual obligación	CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN - VALIDACIÓN INTERVENTORÍA
			mensajes variables (al menos dos por cada área de peaje), equipos de monitoreo meteorológico, vehículos de inspección de tráfico, circuito cerrado de TV (CCTV), cámara panorámica, detectores de altura, y sistemas de control de velocidad.	
EMT-050	UF05/GAL-05	Están activas encendidas y capturando datos		Operativa
EMT220	UF02/FITS220	Están activas encendidas y capturando datos		Operativa
EMT260	UF7.3/FITS260	Están activas encendidas y capturando datos		Operativa
EMT410	UF8.3/FITS410	Están activas encendidas y capturando datos.		Operativa

Fuente: Informe Gerencial #130 – septiembre de 2026 ajustado por Interventoría Consorcio IPAB

5. GESTIÓN AMBIENTAL

Durante mayo de 2026, se dio a conocer el Laudo Arbitral emitido por el Centro Internacional de Resolución de Disputas, correspondiente al Caso CIRD No. 01-23-0002-8303 y que fue remitido por la ANI mediante radicado No**. 20263050158691** de 04 de mayo de 2026, solicitando un concepto frente al Laudo Arbitral del 30 de abril de 2026. Este Laudo, entre otras cosas, da por terminado de **forma anticipada** el contrato de Concesión entre la Agencia Nacional de Infraestructura y CORUMAR, lo que ocasiona, que a partir del 2 mayo de 2026 el proyecto entra en etapa de reversión, lo que implica que la Interventoría realizará el seguimiento para que CORUMAR proceda con los cierres, cesiones o desistimientos de expedientes, licencias ambientales y permisos de aprovechamientos de recursos naturales, con el fin de sanear el proyecto desde la normatividad ambiental.

El 10 de agosto de 2026, mediante oficio 48-RUTADCTOELECTRONICOS20260804012678, CORUMAR presentó la respuesta a los oficios IPAB-0499-2026 e IPAB-541-2026, dando claridad sobre la entrega de la información y formatos en el marco de la reversión, indicando lo siguiente:

> "(…) *Se incluyó una entrega intermedia, ya ejecutada el 23 de julio de 2026, correspondiente a las UFI 1, 3.2, 3.4 y 7.2. Con esta entrega van tres de las cuatro previstas para este componente; la entrega pendiente se corre del 31 de julio al 15 de agosto de 2026.*
>
> *Sobre la solicitud de aclaración de la actividad "Informe del estado actual del cumplimiento de cada una de las obligaciones ambientales de carácter contractual", esta corresponde al numeral 7.4.1 del Manual de Reversiones (pág. 72), que asigna dicho informe al profesional ambiental de la Interventoría cuando el proyecto cuenta con interventoría, como es el caso (…)".*

Ante esto, la interventoría respondió mediante oficio IPAB-0637-2026 del 14 de agosto de 2026, que no existía observaciones al respecto, y se seguía usando el cronograma inicial presentado mediante oficio IPAB-0541-2026 del 24 de julio de 2026.

El diligenciamiento de los formatos que se deben realizar para la entrega de la información ambiental del proyecto, corresponde a los siguientes:

- gcsp-f-116-permisos-ambientales-v5

- gcsp-f-240-cumplimiento-obligaciones-ambientales-v5_vv
- gcsp-f-242_pendientes_ambientales_v5_0_vv

En este sentido, cada formato se debe diligenciar por permiso ambiental, o por licencia ambiental según corresponda.

Al 30 de septiembre de 2026 las unidades funcionales revisadas y subidas al drive de la ANI corresponden a las siguientes:

Tabla 5-1 Entrega de unidades funcionales – componente ambiental- 24 de agosto de 2026

ENTREGA	UFI	%
1	4.1, 4.2	100%
1	6.2	100%
1	6.3	100,00%

Fuente: Consorcio IPAB, 2026

Mediante oficio IPAB-0811-2026 del 25 de septiembre de 2026 (Rad ANI 20264091261832), se realizó la entrega formal de la segunda parte de la reversión. A continuación, se relaciona dicho entregable:

Tabla 5-2 Entrega de unidades funcionales – componente ambiental- 25 de septiembre de 2026.

ENTREGA	UFI	%
2	1	100%
2	3.2-3.4	100%
2	5.1	100%
2	7.2	100%
2	8.3	100%

Fuente: Consorcio IPAB, 2026

5.1. OBJETIVO GENERAL

Realizar los procesos enfocados en la coordinación de las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental, planes de manejo ambiental, programas de adaptación de las guías de manejo ambiental y requerimientos ambientales, entre otros, sean implementadas para minimizar los impactos negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales.

5.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONCESIONARIO

A continuación, se relacionan los documentos contractuales en los cuales se encuentran establecidas las obligaciones generales del Concesionario en materia de gestión ambiental.

Es importante precisar que, considerando que el presente corresponde al Informe Mensual de la Interventoría a cargo del Consorcio IPAB, la información presentada en la siguiente tabla corresponde a antecedentes documentales del proyecto y a actuaciones adelantadas por la Interventoría anterior, según consta en los comunicados y soportes contractuales referenciados. En ese sentido, la información se presenta con fines de trazabilidad y referencia contractual, sin que ello implique que dichas aprobaciones hayan sido emitidas por la presente Interventoría

Tabla 5-3 Obligaciones Contractuales de documentos

OBLIGACIÓN DOCUMENTO	ESTADO	AVANCE/ VERIFICACIÓN
Plan de Responsabilidad Social y Ambiental	No objeción por parte de la Interventoría.	La Interventoría aprobó mediante comunicado CI.023/AB3683/19/7.1.9 del 17 de abril de 2019 el Plan.
Informe de forma, mecanismos y Cronograma EIA – PAGA	No objeción por parte de la Interventoría.	La Interventoría da la no objeción al informe mediante comunicado No CI.23/AB0246/16/7.1.8 con radicado del 06-sept-2016. Se entregan ajustes al informe mediante comunicado No CE147-1878 del 25 de nov-2016. Se entrega comunicado No CE147-1904 del 30 de nov-2016 donde se presentan las fechas de las mesas de trabajo. La Interventoría da respuesta mediante

OBLIGACIÓN DOCUMENTO	ESTADO	AVANCE/ VERIFICACIÓN
		comunicado No CI.023/AB0442/16/7.1.8. El Concesionario envía ajustes mediante oficio No CE147-0030 del 27/01/2017.La Interventoría aprueba mediante oficio No CI.023/AB0495/17/7.1.8, Mediante comunicado No CI.23/AB0609/16/7.1.8 radicado del 31/03/2017 Interventoría solicita ajustar y modificar el cronograma dado que como esta pueda afectar el cumplimiento del plan de obras del Contrato. El Concesionario envía ajustes Mediante oficio No 48-147-20170412000632 del 12 de abril del 2017. Se realiza nuevamente observaciones Mediante comunicado CI.023/AB0659/16/7.1.8. del 21 de abril y el Concesionario presenta el cronograma modificado con comunicado 48-147-20170426000715. El cronograma presentado es aceptado por la Interventoría Mediante comunicado CL.023/AB0680/17/7.1.8 del 27/04/17. Interventoría solicita ajustar y modificar el cronograma dado que como se encuentra no cumple con los tiempos establecidos para la obtención de los permisos de acuerdo con el plan de obra aprobado Mediante comunicado CL.023/AB1061/17/7.1.8 del 20/09/2017. El Concesionario envía ajustes Mediante comunicado 48-147-20171005002327 del 05/10/2017. El cronograma presentado es aceptado por la Interventoría Mediante comunicado CL.023/AB1167/17/7.1.8 del 24/10/2017; El Concesionario envía ajustes Mediante comunicado 48-147-20171227003280 del 27/12/2017; El cronograma presentado es aceptado por la Interventoría Mediante comunicado CL.023/AB1481/17/7.1.8 del 15/01/2018.

Fuente: Interventoría anterior – CR Concesiones

5.3. ESTUDIOS AMBIENTALES Y PERMISOS REQUERIDOS

Los estudios ambientales y documentos requeridos para la ejecución de la etapa preoperativa se detallan en la siguiente tabla:

Tabla 5-4 Requerimiento Contractual de estudios

			PAGA	EIA	
UFI 1	1. Caucasia – Planeta Rica	25-ene-2017	x		OPERACIÓN

			PAGA	EIA	
UFI 2	1. Cereté – Lorica	15-nov-2018	x		CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN (PARCIAL)
UFI 3	1. Variante Planeta Rica	15-ene-2018		x	OPERACIÓN
	2. El 15 – Vía El 15 San Carlos	01-abril-2017	x		OPERACIÓN
	3. Vía El 15 San Carlos - San Carlos	15-ago-2017		x	OPERACIÓN
	4. San Carlos – Cereté	01-abril-2017	x		OPERACIÓN
	5. Variante Cereté	15-jun-2017		x	OPERACIÓN
UFI 4	1. Montería – Planeta Rica		x		OPERACIÓN
	2. Montería – El 15		x		OPERACIÓN
UFI 5	1. Puerto Rey – Montería		x		OPERACIÓN
	2. Santa Lucía – San Pelayo		x		OPERACIÓN
UFI 6	1. Cereté – Lorica	15-nov-2018	x		OPERACIÓN
	2. Lorica – Coveñas	15-nov-2018	x		OPERACIÓN
	3. Coveñas – Tolú	15-nov-2018	x		OPERACIÓN
UFI 7	1. Variante Lorica	15-feb-2018		x	SIN INTERVENCIÓN
	2. Variante Coveñas	30-ago-21		x	OPERACIÓN
	3. Tolú – Pueblito	15-dic-2017		x	OPERACIÓN
UFI 8	1. Tolú – Toluviejo	15-nov-2018	x		OPERACIÓN
	2. Pueblito – San Onofre	15-ene-2018	x		OPERACIÓN
	3. San Onofre – Cruz del Viso	15-nov-2017	x		OPERACIÓN

Fuente: Interventoría anterior – CR Concesiones

5.4. TRÁMITES DE LICENCIAS AMBIENTALES Y PERMISOS DE RECURSOS NATURALES

A la fecha se cuenta con todas las licencias ambientales solicitadas ante la ANLA:

UFI 3.1= Resolución No 00114 del 30 de enero de 2018

UFI 3.3= Resolución No 00898 del 01 de agosto de 2017

UFI 3.5= Resolución No 00057 del 12 de enero de 2017

UFI 7.2= Resolución No 01317 del 27 de julio de 2021

UFI 7.3= Resolución No 01243 del 15 de julio de 2021

A continuación, se presenta el avance de las solicitudes de permisos, cierre y/o renovación que se encuentran en trámite ante las autoridades ambientales.

La información corresponde a antecedentes reportados en informes de interventoría anteriores y documentación suministrada por el Concesionario, los cuales se toman como base para el presente informe:

Tabla 5-5 Avance trámites ambiental

UFI	SUBSECTOR	TRÁMITE/ PERMISO	AUTORIDAD AMBIENTAL	ESTADO	ACTOS ADMINISTRATIVOS RTA	
					FECHA	COMUNICADO
UFI 1	Caucasia – Planeta Rica	Cierre de expediente	CVS	**EN TRAMITE**	**25-jun-20**	Solicitud de cierre y archivo del Expediente ATV 0421. Cumplimiento al artículo 8 y 9 de la Resolución 1778 del 2016
					07-Abr-25	Reiteración oficio 20201103819 del 25 de junio del 2020 Rad N° 20251103926
					09-Sep-25	CVS solicita informe final con dos capítulos uno para las medidas de flora vascular y otro para las medidas de no vasculares Rad No 20252113972
					13-ago-26	Concesión solicita pronunciarse respecto del cierre y archivo del expediente correspondiente, de conformidad con las actuaciones adelantadas dentro del trámite Rad N°20261109526

UFI	SUBSECTOR	TRÁMITE/ PERMISO	AUTORIDAD AMBIENTAL	ESTADO	ACTOS ADMINISTRATIVOS RTA	
					FECHA	COMUNICADO
UFI 2 y 6.1	1. Cerete-Lorica	Cierre de expediente	CVS	**EN TRAMITE**	**24-ago-26**	Acuerdo de Consejo Directivo No. 363 del 30 de mayo de 2018 y modificada mediante el Acuerdo de Consejo Directivo No. 539 del 17 de diciembre de 2024, se solicita que se pronuncie en el término de Ley frente a la expedición del cumplimiento de los pasivos ambientales y archive el expediente Rad N°20261109974
		Cierre de expediente	CVS	**EN TRAMITE**	**13-sep-24**	Solicitud archivo del expediente de la resolución 011 del 2020 Rad No 20241109166
					02-oct-24	NO procede el cierre de expediente hasta tanto no se verifique la ejecución total de las obligaciones impuestas originalmente. RAD N°20242112962
					17-dic-24	Mediante Rad N°20241113288 Concesión remite respuesta al RAD N°20242112962.
					14-Oct-25	La CVS informa que se hace necesario realizar una visita de inspección en campo, con el fin de constatar en sitio el cumplimiento de las obligaciones impuestas. Rad No 20252116243
					24-Oct-25	La concesión propone a la CVS como fecha para la realización de la visita técnica el 18 de noviembre de 2025. Rad No 20251112405
					18-nov-25	CVS informa que se debe reprogramar la visita técnica dado que por cuestiones de logística y contratación no se cuenta con el personal para esta

UFI	SUBSECTOR	TRÁMITE/ PERMISO	AUTORIDAD AMBIENTAL	ESTADO	ACTOS ADMINISTRATIVOS RTA	
					FECHA	COMUNICADO
						actividad, por lo cual requiere programar para se primera semana de diciembre. Rad N° 20252118135
					14-jul-26	Se solicita el pronunciamiento respecto al cierre del expediente y el cumplimiento de pasivos ambientales. Rad N°20261108142
		Cierre de expediente	CVS	**EN TRAMITE**	**20-Ene-26**	Cumplimiento de pasivos ambientales y solicitud archivo del expediente de la Resolución 026 del 11 de abril del 2019 Aprovechamiento forestal UFI 2 y UFI 6.1 Rad No 20261100587
					09-abr-26	Mediante radicado N°20262106131 la CVS informa que La plantación establecida como medida de compensación deberá ser registrada como plantación protectora ante la Corporación
					16-abr-26	Mediante radicado No 20261104388 la concesión emitió respuesta a la informado por la CVS mediante radicado N°20262106131
		Cierre de expediente	CVS	**EN TRAMITE**	**12-Jun-26**	Nos permitimos solicitar a esta Autoridad que se pronuncie en el término de Ley, frente a la expedición del cumplimiento de los pasivos ambientales y se permita cerrar el expediente 2-5360 del 15/11/2018 rad N°20261106916
		Cierre de expediente	CVS	**EN TRAMITE**	**25-May-26**	Aprovechamiento forestal resolución 012 del 07 de marzo del 2019 - Cumplimiento de pasivos ambientales y solicitud archivo del

UFI	SUBSECTOR	TRÁMITE/ PERMISO	AUTORIDAD AMBIENTAL	ESTADO	ACTOS ADMINISTRATIVOS RTA	
					FECHA	COMUNICADO
						expediente Rad N°20261106192
		Cierre de expediente	CVS	**EN TRAMITE**	**25-May-26**	Aprovechamiento forestal resolución 005 del 06 de febrero del 2019 - Cumplimiento de pasivos ambientales y solicitud archivo del expediente Rad N°20261106189
UFI 3	1. Variante Planeta Rica	Cierre de expediente	ANLA	**EN TRAMITE**	**24-feb-25**	Resolución 1596 del 04 de octubre del 2016, nos permitimos reiterar el pronunciamiento en el término de Ley, frente a la expedición del cierre del expediente
					12-feb-26	Reiteración oficio 20256200208772 del 26/02/2025, Expediente LAV0053-00-2017. Expediente ATV 0443. Cumplimiento Resolución 1596 del 04 de octubre del 2016. Levantamiento de Especies Epifitas en Veda, construcción de la unidad funcional integral 3.1, denominada Variante Planeta Rica – Córdoba. Alcance a oficio 2021253927-1-000 del 23-11-2021. Rad N°20260210011213
					06-Mar-26	La ANLA mediante radicado N°20262300234341 informa que se encuentra en revisión por parte del equipo jurídico de la Entidad, para ser posteriormente notificado de conformidad con lo establecido en el artículo 66 del Código de Procedimiento

UFI	SUBSECTOR	TRÁMITE/ PERMISO	AUTORIDAD AMBIENTAL	ESTADO	ACTOS ADMINISTRATIVOS RTA	
					FECHA	COMUNICADO
						Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
		Cambio Menor	ANLA	**EN TRAMITE**	**28-ago-26**	Cambio menor numeral 17 - Cambio de sitios para compensaciones forestales, dentro de lo dispuesto en el manual de compensación o el que haga sus veces. Artículo 2.2.2.6.1.3 del Decreto 1076 del 2015. Variante de Planeta Rica UFI 3.1. Resolución 00705 del 29 de abril de 2019 y oficio 2021093786-2-000 del 2021-05-12.Rad N° 20266201239032
		Cesión Licencia Ambiental	ANLA	**NEGADA**	**05-May-26**	Solicitud trámite administrativo de Cesión Total de derechos y obligaciones de la Licencia Ambiental expedida mediante Resolución 00114 del 30 de enero del 2018. Rad No 20266200541422
					18-jun-26	Pago por el servicio de evaluación. Expediente: LAV0053-00-2017. "Solicitud trámite administrativo de Cesión Total de derechos y obligaciones de la Licencia Ambiental expedida mediante Resolución 00114 del 30 de enero del 2018." Rad 20264800560361
		OTRO	ANLA	**EN TRAMITE**	**09-feb-21**	Solicitud expedición Auto de seguimiento y control ambiental. Declaratoria de cumplimiento de obligaciones. Acta de terminación de la UFI 3.1 Rad N°2021020973-1-000

UFI	SUBSECTOR	TRÁMITE/ PERMISO	AUTORIDAD AMBIENTAL	ESTADO	ACTOS ADMINISTRATIVOS RTA	
					FECHA	COMUNICADO
					02-mar-21	Solicitar a esta Autoridad que expida un Auto de seguimiento y control ambiental, que declare el cumplimiento de las obligaciones asociadas al expediente LAV0053-00-2017, conforme a la información de soporte radicada en el expediente. Rad N° 2021036646-1-000
					14-jul-21	Solicitar a esta Autoridad que expida un Auto de seguimiento y control ambiental, que declare el cumplimiento de las obligaciones asociadas a las resoluciones N°00114 30/01/2018 y 1596 04/10/2016, conforme a la información de soporte radicada en el expediente. Rad N° 2021143539-1-000
					23-ago-21	Expedición de Auto de seguimiento ambiental completo con todas las obligaciones vinculantes para este Concesionario. Rad N°2021177693-1-000
					21-feb-22	Expedición de Auto de seguimiento ambiental completo con todas las obligaciones vinculantes para este Concesionario, así como la respuesta del Auto 10295 del 2021. Rad No 2022029236-1-000
					08-abr-24	Solicitud de expedir el acto administrativo con la declaratoria de cumplimiento y conclusión de la totalidad de las obligaciones contenidas en la

UFI	SUBSECTOR	TRÁMITE/ PERMISO	AUTORIDAD AMBIENTAL	ESTADO	ACTOS ADMINISTRATIVOS RTA	
					FECHA	COMUNICADO
						licencia ambiental a excepción de la medida compensatoria por pérdida de biodiversidad, que aún se encuentra en seguimiento. Rad N°20246200382572
					15-abr-26	Mediante Rad No 20266200488302 la concesión solicita a la autoridad un pronunciamiento en el término de Ley, frente a la expedición del cumplimiento de los pasivos ambientales y archivo del expediente
UFI 3.2 y 3.4	El 15 – Cerete	Cierre de expediente	CVS	**EN TRAMITE**	**06-mar-25**	Solicitud cierre y archivo de expediente Res N°2181 Rad 20251102473
					09-Sep-25	CVS solicita informe final con dos capítulos uno para las medidas de flora vascular y otro para las medidas de no vasculares Rad No 20252113977
					24-Sep-25	Concesión remite Respuesta al oficio 20252113977 del 09 de septiembre de 2025 Rad 20251111152
					12-feb-26	Reiteración oficio 20251111152 del 24/09/2025 en respuesta a su oficio 20252113977 del 09 de septiembre de 2025 con asunto Respuesta al radicado 20251102473: 20250305008011 Alcance a radicado 20201103820 del 25/06/2020. Expediente ATV 0420. Cierre expediente ATV 0420. Rad No 20261101705
					14-jun-26	Remisión del informe final Rad No 20261107407

UFI	SUBSECTOR	TRÁMITE/ PERMISO	AUTORIDAD AMBIENTAL	ESTADO	ACTOS ADMINISTRATIVOS RTA	
					FECHA	COMUNICADO
UFI 3.5	Variante Cerete	OTRO	ANLA	**EN TRAMITE**	**29-mar-21**	Solicitud expedición Auto de seguimiento y control ambiental. Declaratoria de cumplimiento de obligaciones. De la resolución 00057 12/01/2017 Rad N°2021056569-1-000
					14-jul-21	Solicitud expedición Auto de seguimiento y control ambiental. Declaratoria de cumplimiento de obligaciones. De la resolución 00057 12/01/2017 y 1978 del 29/11/2016 Rad N°2021143536-1-000
					19-mar-24	Solicitud de expedir el acto administrativo con la declaratoria de cumplimiento y conclusión de la totalidad de las obligaciones contenidas en la licencia ambiental a excepción de la medida compensatoria por pérdida de biodiversidad, que aún se encuentra en seguimiento. Rad N° 20246200305762
					05-jun-26	Mediante Rad N° 20264800584771 la ANLA informa que dentro de la programación para el presente año (2026), tiene previsto realizar el control y seguimiento ambiental al proyecto en donde se verificará el cumplimiento de las obligaciones ambientales pendientes y vigentes
					09-jul-26	Concesión solicita a la ANLA que expida el acto administrativo que Declare el cumplimiento de todas las obligaciones

UFI	SUBSECTOR	TRÁMITE/ PERMISO	AUTORIDAD AMBIENTAL	ESTADO	ACTOS ADMINISTRATIVOS RTA	
					FECHA	COMUNICADO
						contenidas en la Licencia Ambiental y con ello el archivo del expediente Rad No 20266200910282
UFI 6	2 lorica-Coveñas	Cierre de expediente	CVS	**EN TRAMITE**	**26-feb-25**	Alcance a oficio 20251101173 del 06/02/2025. Solicitud cierre expediente. Resolución 121 del 10 de junio del 2022, "por la cual se autoriza una reducción a la compensación impuesta en la Resolución 244 del 22 de noviembre del 2018. Rad 20251102157
					27-Oct-25	La CVS informa que debe revisar el estado actual de la medida de compensación, en el marco del seguimiento ambiental correspondiente Rad No 20252116955
					31-oct-25	Concesión emite Respuesta al oficio 20252116954 del 27/10/2025 y 20252116955 del 27/10/2025 Mediante Rad N° 20251112774
					04-may-26	Respuesta comunicado 20262106525; concesión informa que se encuentra pendiente el registro de la plantación compensatoria Rad N° 20261105237
UFI 6	3 Coveñas – Tolú	Cierre de expediente	CARSUCRE	**EN TRAMITE**	**05-mar-25**	Solicitud cierre de expediente Res N°1976 Rad Correo electrónico
					29-may-26	Cierre Expediente Vedas, se solicita el pronunciamiento respeto al cierre del expediente y el cumplimiento de pasivos ambientales. Rad No 5176

UFI	SUBSECTOR	TRÁMITE/ PERMISO	AUTORIDAD AMBIENTAL	ESTADO	ACTOS ADMINISTRATIVOS RTA	
					FECHA	COMUNICADO
UFI 7	**3variante tolú**	OTRO	ANLA	**EN TRAMITE**	**25-mar-25**	Notificación evento fuerza mayor o caso fortuito predio San Antonio, ubicado en la vereda El Silencio del Municipio de Puerto Escondido del Departamento de Córdoba. Rad N° 20256200327212 del 25/03/2025
					03-jun-25	Derecho de Petición. Alcance Rad 20256200327212 del 25/03/2025 Rad N°20256200638502
					17-jun25	Solicitud de Prórroga por parte de la ALNA a la comunicación 20250603008839 con radicado ANLA 20256200638502 del 3 de junio de 2025. Rad N°20252300433181
					01-jul-26	Derecho de petición – solicitud de pronunciamiento de fondo, aclaración del alcance de la Resolución 2226 del 29 de septiembre de 2023 respecto del predio San Antonio y reconocimiento de los efectos jurídicos del evento de fuerza mayor o caso fortuito previamente informado Rad N°20266200865132
UFI 8	1 tolú – Tolú Viejo	Cierre de expediente	CARSUCRE	**EN TRAMITE**	**05-mar-25**	Solicitud cierre de expediente Res N°1547 Rad Correo electrónico
					29-may-26	Cierre Expediente Vedas, se solicita el pronunciamiento respecto al cierre del expediente y el cumplimiento de pasivos ambientales. Rad No 5172
UFI 8	2 pueblito – San Onofre	Cierre de expediente	CARSUCRE	**EN TRAMITE**	**05-mar-25**	Solicitud cierre de expediente Res N°1458 Rad Correo electrónico

UFI	SUBSECTOR	TRÁMITE/ PERMISO	AUTORIDAD AMBIENTAL	ESTADO	ACTOS ADMINISTRATIVOS RTA	
					FECHA	COMUNICADO
					29-may-26	Cierre Expediente Vedas, se solicita el pronunciamiento respecto al cierre del expediente y el cumplimiento de pasivos ambientales. Rad No 5173
		OTRO	CARDIQUE	**EN TRAMITE**	**26-feb-25**	Desistimiento expreso de la Resolución 1266 del 05 de septiembre del 2016.
					11-feb-26	Reiteración radicada 2025-01606 del 27/02/2025 del desistimiento expreso de la Resolución 1266 del 05 de septiembre del 2016. Artículo 18 de la Ley 1755 del 2015. Rad N°2026-01096
					07-sep-26	Reiteración Oficio 2026-01096 del 11-02-2026. Desistimiento expreso de la Resolución 1266 del 05 de septiembre del 2016. Artículo 18 de la Ley 1755 del 2015.
		OTRO	CARDIQUE	**EN TRAMITE**	**26-feb-25**	Desistimiento expreso de la Resolución 0281 del 15 de abril del 2021. Expediente vital PAF-00003-21.
					11-feb-26	Reiteración de radicado 2025-01605 del 27/02/2025 del desistimiento expreso de la Resolución 0281 del 15 de abril del 2021. Expediente vital PAF-00003-21. Artículo 18 de la Ley 1755 del 2015. Rad No 2026-01098
					07-sep-26	Reiteración Oficio 2026-01098 del 11-02-2026. Desistimiento expreso de la Resolución 0281 del 15 de abril del 2021. Expediente vital PAF00003-21. Artículo

UFI	SUBSECTOR	TRÁMITE/ PERMISO	AUTORIDAD AMBIENTAL	ESTADO	ACTOS ADMINISTRATIVOS RTA	
					FECHA	COMUNICADO
						18 de la Ley 1755 del 2015
		Cierre de expediente	CARSUCRE	**EN TRAMITE**	**08-jul-26**	Concesión solicita el pronunciamiento respecto al cierre del expediente y el cumplimiento de pasivos ambientales de la Concesión Ruta al Mar. resolución No 862 del 30 de junio del 2017. Rad N°6525
		Cierre de expediente	CARSUCRE	**EN TRAMITE**	**08-jul-26**	Concesión solicita el pronunciamiento respecto al cierre del expediente y el cumplimiento de pasivos ambientales de la Concesión Ruta al Mar. resolución No 840 del 03 de junio del 2022. Rad N°6526
		Cierre de expediente	CARSUCRE	**EN TRAMITE**	**05-mar-25**	Solicitud cierre de expediente Res N°1473 Rad Correo electrónico
					29-may-26	Cierre Expediente Vedas, se solicita el pronunciamiento respecto al cierre del expediente y el cumplimiento de pasivos ambientales. Rad No 5174
		Ocupación de Cauce	CARDIQUE	**EN TRAMITE**	**16-jun-25**	Solicitud permiso de ocupación de cauces permanente Intersección 17 UFI 8, subsector 3 denominado San Onofre (PR0+23) – Cruz del Viso (PR59+352). (correo electrónico radicado)
					16-jul-25	Cardique informa que la solicitud debe ser por la plataforma VITAL
					14-May-26	Desistimiento expreso de la solicitud con radicado No 2025-05588 del 13 de junio del 2025 Rad No 2026-04074

UFI	SUBSECTOR	TRÁMITE/ PERMISO	AUTORIDAD AMBIENTAL	ESTADO	ACTOS ADMINISTRATIVOS RTA	
					FECHA	COMUNICADO
		OTRO	CARDIQUE	**EN TRAMITE**	**11-mar-25**	Solicitud de paz y salvo y cumplimiento de las obligaciones de compensación por aprovechamiento forestal. Resolución 1363 y resolución 0601 Rad No Correo electrónico
					11-feb-26	Reiteración a radicado 2025-02112 del 12/03/2025 y alcance a oficio 0000005931 del 16- 08-2019 y oficio E-2021-0379 Rad N°2026-01097
					07-sep-26	Reiteración solicitud de paz y salvo y cumplimiento de las obligaciones de la Resolución 1363 del 10 de agosto del 2017 y Resolución 0601 del 11 de mayo del 2018.
		OTRO	CARSUCRE	**EN TRAMITE**	**26-feb-24**	Solicitud renovación permiso de vertimiento Peaje San Onofre Rad N°0974 del 26/02/2024
					19-mar-24	Respuesta a las solicitudes formuladas por CARSUCRE en el oficio 300.01375 del 14 de marzo de 2024.
					11-abr-24	Se solicita a CARSUCRE se pronuncie en el menor tiempo posible expidiendo la factura por concepto de evaluación de la renovación del permiso de vertimiento de aguas residuales domésticas del Peaje San Onofre, otorgado a través de la Resolución 0494 del 2019.
					25-jun-25	Respuesta oficio No 300.03471 del 20 de junio del 2025- Reiteración requerimiento para

UFI	SUBSECTOR	TRÁMITE/ PERMISO	AUTORIDAD AMBIENTAL	ESTADO	ACTOS ADMINISTRATIVOS RTA	
					FECHA	COMUNICADO
						aportar costos del proyecto. Rad 5019
					15-ago-25	RAD. INTERNO 5019 DE 25 DE JUNIO DE 2025 PERMISO DE VERTIMIENTO CONCEPTO: EVALUACIÓN. Factura FES2 5631. Rad 6424
					12-Dic-25	Concesión solicita información en relación a la renovación del permiso Rad 10622
					29-May-26	Reiteración oficio No 10622 de 2025-12-09. Pronunciamiento de la Renovación permiso de vertimiento Peaje San Onofre. Expediente 0522 del 8 noviembre 2018 Rad 5175
					18-jun-26	CARSUCRE mediante Rad 04104 informa que el expediente fue remitido a la subdirección para su evaluación.
UFI	2 y 6.1	Prorroga permiso	CVS	**EN TRAMITE**	**27-abr-26**	Solicitud renovación Resolución 2-9151 del 11/04/2022. Permiso de Vertimiento Peaje Mata de Caña Rad N°20261104929
UFI	5	Prorroga permiso	CVS	**EN TRAMITE**	**27-abr-26**	Solicitud renovación Resolución 2-9151 del 11/04/2022. Permiso de Vertimiento Peaje cedro Rad N°20261104933
UFI	3	Prorroga permiso	CVS	**EN TRAMITE**	**27-abr-26**	Solicitud renovación Resolución 2-9151 del 11/04/2022. Permiso de Vertimiento Peaje san Carlos Rad N°20261104930
UFI	1	Prorroga permiso	CVS	**EN TRAMITE**	**27-abr-26**	Solicitud renovación Resolución 2-8831 del 21/01/2022. Permiso de Vertimiento Peaje Manguitos Rad N°20261104932
UFI	4	Prorroga permiso	CVS	**EN TRAMITE**	**27-abr-26**	Solicitud renovación Resolución 2-9173 del 20/04/2022. Permiso de Vertimiento Peaje

UFI	SUBSECTOR	TRÁMITE/ PERMISO	AUTORIDAD AMBIENTAL	ESTADO	ACTOS ADMINISTRATIVOS RTA	
					FECHA	COMUNICADO
						Purgatorio Rad N°20261104931
TODAS LAS UF	1,2,3,4,5,6,7,8	Otro	CARDIQUE	**EN TRAMITE**	**17-oct-20**	Aprobación plan de cierre y abandono cantera Mucacal Rad N°E-2379
					28-feb-22	Alcance a radicado E-2379 del 17 de octubre del 2020. Resolución 0244 del 28 de febrero de 2018 –Plan de Cierre y Abandono cantera Mucacal SDS-10151 y solicitud cierre del expediente No. 1.291 Rad N°E-2022-0926
					07-Dic-22	Solicitud a esta Autoridad que se pronuncie en el término de Ley, frente a la expedición del cierre el expediente. Rad El 2022-12-07
					08-jul-24	Insistencia pronunciamiento plan de cierre y abandono cantera Mucacal SDS-10151 - Resolución 0244 del 2018 y solicitud cierre expediente 1.291 - Radicados E-2022-7388 del 2022, E-2022-0926 del 2022 y E-2379 del 2020 Rad: 2024-05485
					26-feb-25	Alcance a radicado E-2379 del 19 de octubre del 2020. Resolución 0244 del 28 de febrero de 2018 expedición del del cierre el expediente.
					11-feb-26	Reiteración radicado 2025-01613 del 27 febrero 2025 y E-2379 del 19 de octubre del 2020. Resolución 0244 del 28 de febrero de 2018 –Plan de Cierre y Abandono cantera Mucacal SDS-10151 y solicitud cierre del

UFI	SUBSECTOR	TRÁMITE/ PERMISO	AUTORIDAD AMBIENTAL	ESTADO	ACTOS ADMINISTRATIVOS RTA	
					FECHA	COMUNICADO
						expediente No. 1.291 Rad N°2026-01095
					25-Sep-26	Respuesta Petición Cierre de Expediente. Rad N°2026-08608

Fuente: Elaboración propia con base en CR Concesiones, actualizada por la Interventoría IPAB.

Se hace claridad que la presente tabla se encuentra actualizada con base en los comunicados y soportes documentales remitidos por el Concesionario a la Interventoría, con corte a la fecha del presente informe. En aquellos trámites en los que no se registra el número de radicado de la autoridad ambiental, esto obedece a que algunas entidades, en determinados casos, únicamente incorporan en el documento recibido el sello de recibido con la respectiva fecha, sin asignar un número de radicado visible, como ocurre, entre otras, con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Corantioquia.

En relación con los trámites ambientales que continúan pendientes de pronunciamiento por parte de las autoridades ambientales competentes, la Interventoría deja constancia de que, mediante comunicado IPAB-0421-2026, emitido en junio de 2026, formuló la siguiente observación a la Concesión, en el marco de la revisión del Informe Trimestral:

“Teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra en Etapa de Reversión desde el 02 de mayo de 2026, se solicita complementar la información relacionada con las gestiones adelantadas ante las autoridades ambientales respecto de los trámites que se encuentran pendientes de pronunciamiento. Lo anterior, considerando que varios de ellos registran tiempos superiores a seis (6) meses sin respuesta por parte de las autoridades competentes, por lo que resulta pertinente informar las actuaciones de seguimiento realizadas durante el período reportado.”

En atención a dicho requerimiento, la Concesión informó que, teniendo en cuenta la condición actual del proyecto en Etapa de Reversión, ha intensificado las gestiones de seguimiento y los acercamientos con las autoridades ambientales competentes, mediante reuniones de trabajo, comunicaciones y demás actuaciones orientadas a impulsar la revisión, definición y cierre de los expedientes que permanecían pendientes. Así mismo, manifestó ser el principal interesado en lograr la culminación y cierre de dichos trámites.

De acuerdo con la información y los soportes reportados por la Concesión, las gestiones adelantadas durante el período de reversión han empezado a reflejarse en resultados concretos, particularmente en el cierre de varios expedientes administrativos ambientales. Lo anterior evidencia avances en las actuaciones de seguimiento y gestión desarrolladas ante las respectivas autoridades ambientales.

Respecto de los trámites que aún figuran como abiertos en la presente tabla, se precisa que su estado corresponde, según la información reportada y los soportes disponibles, a expedientes que se encuentran dentro de los términos establecidos para el respectivo pronunciamiento de la autoridad ambiental, a trámites que continúan a la espera de respuesta por parte de la entidad competente, o a procesos asociados a solicitudes de renuncia, desistimiento o cierre de trámites y/o permisos que finalmente no fueron utilizados o requeridos para el desarrollo de las obras del proyecto. En estos últimos casos, se adelantan las actuaciones correspondientes ante las autoridades competentes con el propósito de formalizar su terminación y/o cierre administrativo.

En consecuencia, la Interventoría continuará realizando la verificación y seguimiento de las actuaciones adelantadas por la Concesión ante las autoridades ambientales, así como de los pronunciamientos que sean emitidos por estas, con el fin de mantener actualizada la trazabilidad de cada expediente y verificar su efectiva culminación y cierre. Los avances y resultados obtenidos serán reportados en los respectivos informes de seguimiento hasta la culminación de los trámites ambientales que permanezcan pendientes.

5.5. SEGUIMIENTO GENERAL POR PARTE DE INTERVENTORÍA

A continuación, se presenta el seguimiento efectuado por la Interventoría a la revisión de los informes ambientales, comunicados enviados y recibidos, reuniones y comités realizados durante el periodo en análisis.

5.5.1. Relación de Correspondencia

Durante el presente periodo se recibieron y se dio trámite a la siguiente correspondencia relacionada con el área Ambiental conforme se presenta a continuación:

Tabla 5-6 Relación de correspondencia recibida

Radicado de salida	Enviado Por	Fecha De Llegada	Asunto
IPAB-1704-2026	CONCESIÓN RUTA AL MAR S.A.S .	**1/09/2026**	Expediente LAV0007-00-2020. Numeral 2.9 del Artículo Quinto y Ficha CVCO-2.6 conservación de especies vegetales o en veda del PMA de la Licencia Ambiental de la Resolución 1317 del 27/07/2021 de la UFI 7.2
IPAB-1744-2026	CONCESIÓN RUTA AL MAR S.A.S .	**11/09/2026**	Expediente No. 015 de 05 de abril del 2016. Permiso de Vertimiento Peaje Caimanera. Concepto: Seguimiento. Factura FES2 7082.
IPAB-1750-2026	CONCESIÓN RUTA AL MAR S.A.S .	**9/09/2026**	Reiteración oficio No 2025-11097 del 21 noviembre 2025. Desistimiento expreso de la Resolución 0735 del 19 de junio del 2018. Artículo 18 de la Ley 1755 del 2015.
IPAB-1751-2026	CONCESIÓN RUTA AL MAR S.A.S .	**9/09/2026**	Reiteración Oficio 2026-01098 del 11-02-2026. Desistimiento expreso de la Resolución 0281 del 15 de abril del 2021. Expediente vital PAF00003-21. Artículo 18 de la Ley 1755 del 2015
IPAB-1752-2026	CONCESIÓN RUTA AL MAR S.A.S .	**9/09/2026**	Reiteración Oficio 2026-01096 del 11-02-2026. Desistimiento expreso de la Resolución 1266 del 05 de septiembre del 2016. Artículo 18 de la Ley 1755 del 2015.
IPAB-1753-2026	CONCESIÓN RUTA AL MAR S.A.S .	**9/09/2026**	Reiteración Oficio 2026-01097 del 11-02-2026, oficio 2025-02112 del 12/03/2025 y alcance a oficio 0000005931 del 16-08-2019 y oficio E2021-0379 del 04 de febrero del 2021. Solicitud de paz y salvo y

			cumplimiento de las obligaciones de la Resolución 1363 del 10 de agosto del 2017 y Resolución 0601 del 11 de mayo del 2018.
IPAB-1754-2026	CONCESIÓN RUTA AL MAR S.A.S .	**9/09/2026**	Respuesta comunicada 20262300989551 del 28 de agosto del 2026
IPAB-1762-2026	CONCESIÓN RUTA AL MAR S.A.S .	**10/09/2026**	Reiteración Oficio 2026-01094 del 12-02-2026, oficio 2025-01532 del 26 de febrero 2025 y oficio 0000002805 del 25 de abril del 2019. Insistencia pronunciamiento a solicitud de renuncia Resolución 0369 del 14 marzo 2019.
IPAB-1763-2026	CONCESIÓN RUTA AL MAR S.A.S .	**10/09/2026**	Reiteración radicada 2026-01095 del 11 febrero 2026, oficio 2025-01613 del 27 febrero 2025 y E-2379 del 19 de octubre del 2020. Resolución 0244 del 28 de febrero de 2018 –Plan de Cierre y Abandono cantera Mucacal SDS-10151 y solicitud cierre del expediente No. 1.291
IPAB-1775-2026	CONCESIÓN RUTA AL MAR S.A.S .	**11/09/2026**	Cuadragésimo tercer Informe de Gestión Ambiental, para el periodo del 01 de junio al 31 de agosto del 2026. Apéndice técnico 6, Gestión Ambiental, numeral 2.4 del Contrato de Concesión 016 de 2015
IPAB-1809-2026	CONCESIÓN RUTA AL MAR S.A.S .	**16/09/2026**	Respuesta oficio IPAB-0744-2026: Observaciones al “Informe de gestión del riesgo frente a los posibles efectos del fenómeno climático el niño y otros fenómenos climáticos sobrepuestos”, radicado mediante el oficio 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260828012885 del 01 de septiembre de 2026. RADICADO 47-RUTADCTOELECTRONICOS-20260908015793.

IPAB-1819-2026	CONCESIÓN RUTA AL MAR S.A.S .	**17/09/2026**	Su oficio No IPAB-0757-2026 del 14 de septiembre de 2026. Observaciones al documento Informe julio de 2026, seguimiento inversión 1er, 2°, 3r y 4to Comité Previa Aprobación Ambiental"
IPAB-1862-2026	CONCESIÓN RUTA AL MAR S.A.S .	**23/09/2026**	Cumplimiento numeral 9 del Instructivo GCSP-I-024. Informe agosto de 2026, Seguimiento inversión 1er, 2do, 3er y 4to Comité Previa Aprobación Ambiental.
IPAB-1883-2026	CONCESIÓN RUTA AL MAR S.A.S .	**25/09/2026**	Respuesta oficio No. 4744 el 10 de septiembre del 2026. Respuesta Petición Cierre de Expediente.
IPAB-1884-2026	CONCESIÓN RUTA AL MAR S.A.S .	**25/09/2026**	Informe de Cumplimiento Ambiental N° 09 - Proyecto "Construcción de la Variante Coveñas. Licencia Ambiental expedida mediante Resolución 01317 del 27 de julio del 2021. Expediente LAV0007-00-2020.
IPAB-1885-2026	CONCESIÓN RUTA AL MAR S.A.S .	**28/09/2026**	Expediente LAV0053-00-2017. Cambio menor numeral 17 - Cambio de sitios para compensaciones forestales, dentro de lo dispuesto en el manual de compensación o el que haga sus veces. Artículo 2.2.2.6.1.3 del Decreto 1076 del 2015. Variante de Planeta Rica UFI 3.1. Resolución 00705 del 29 de abril de 2019 y oficio 2021093786-2-000 del 2021-05-12.
IPAB-1901-2026	CONCESIÓN RUTA AL MAR S.A.S .	**29/09/2026**	Respuesta oficio IPAB-0799-2026 del 23 de septiembre del 2026. Observaciones informe trimestral número 43.

Fuente: Elaboración propia con base en CR Concesiones, actualizada por la Interventoría IPAB.

De igual manera, durante el presente periodo se generaron los siguientes comunicados desde el área Ambiental de la Interventoría.

Tabla 5-7 Relación de correspondencia de salida

Consecutivo	Enviado Por	Dirigida A	Fecha De Llegada	Asunto
IPAB-714-2026	CONSORCIO IPAB	CONCESIÓN RUTA AL MAR S.A.S	**3/09/2026**	Observaciones al oficio 48-RUTADCTOELECTRONICOS20260821012819 del 25 de agosto de 2026 cuyo asunto es: "Cumplimiento numeral 9 del Instructivo GCSP-I-024. Informe julio de 2026, Seguimiento inversión 1er, 2°, 3r y 4to Comité Previa Aprobación Ambiental"
IPAB-744-2026	CONSORCIO IPAB	CONCESIÓN RUTA AL MAR S.A.S	**8/09/2026**	Observaciones al "Informe de gestión del riesgo frente a los posibles efectos del fenómeno climático el niño y otros fenómenos climáticos sobrepuestos", radicado mediante el oficio 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260828012885 del 01 de septiembre de 2026 cuyo asunto es: "Respuesta oficio IPAB-0594-2026: Traslado Circular No.20266050000484 de la ANI, cuyo asunto es: "Traslado de la Circular No. 10002026E4000030 del 28 de mayo de 2026 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y fortalecimiento de acciones de gestión del riesgo frente a los posibles efectos del Fenómeno Climático El Niño y otros fenómenos climáticos sobrepuestos". RADICADO 47-RUTADCTOELECTRONICOS20260806015544""
IPAB-757-2026	CONSORCIO IPAB	CONCESIÓN RUTA AL MAR S.A.S	**14/09/2026**	Observaciones al oficio 48-RUTADCTOELECTRONICOS20260904012951 del 08 de septiembre de 2026 cuyo asunto es: "Su oficio No IPAB-0714-2026 con radicado del 02 de septiembre del 2026. Observaciones al documento Informe julio de 2026, seguimiento inversión 1er, 2°, 3r y 4to Comité Previa Aprobación Ambiental"
IPAB-788-2026	CONSORCIO IPAB	ANI	**18/09/2026**	Respuesta a Circular ANI 20266050000484 de fecha 31 de julio del 2026 con asunto: "Traslado de la Circular No. 10002026E4000030 del 28 de mayo de 2026 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y fortalecimiento de acciones de gestión del riesgo frente a los posibles efectos del Fenómeno Climático El Niño y otros fenómenos climáticos sobrepuestos" (Comunicado del Concesionario 48-RUTADCTOELECTRONICOS 20260915013035 del 16 de septiembre de 2026)
IPAB-799-2026	CONSORCIO IPAB	CONCESIÓN RUTA AL MAR S.A.S	**23/09/2026**	Respuesta a su comunicado No.48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260910012989 de fecha 11 de septiembre de 2026 con asunto: "Informe Trimestral No. 43" - Componente Ambiental

5.5.2. Reuniones, Comités Y Visitas De Seguimiento

FECHA DE REUNIÓN	TEMÁTICA	ASISTENTES	OBSERVACIONES
24 de septiembre	Formatos reversión	Concesión E Interventoría	Se hizo socialización de los formatos de revisión con las observaciones remitidas por interventoría.

Fuente: Elaboración propia con base en CR Concesiones, actualizada por la Interventoría IPAB.

5.6. SEGUIMIENTO COMPENSACIONES AMBIENTALES

Para el mes de julio de 2026, el concesionario remitió el informe de compensaciones mediante radicado 48-RUTADCTOELECTRONICOS20260821012819 del 25 de agosto de 2026, el cual fue observado por el consorcio IPAB mediante oficio **IPAB-0714-2026** del 02 de septiembre de 2026 solicitando aclaración de lo siguiente:

> *(…) 1. La compensación de la Cantera Arroyo Grande se contrató con la empresa SOUTH POLE CARBON ASSET MANAGMENT S.A.S bajo número de Contrato 148-262 del 03 de junio de 2021, sin embargo, el pago de $117.007.773, reportado en el Excel "Ejecución - CPA Ambiental", se realizó a la empresa Valorando el Agro de acuerdo con los anexos incluidos en el oficio 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260821012819 del 25 de agosto de 2026. Aclarar la razón por la cual, el pago se realizó a una empresa diferente a la contratada inicialmente.*
>
> *2. En el Informe indican que pagaron los mantenimientos 3 y 4, de la compensación de la Cantera Arroyo Grande, sin embargo, el Acta de visita adjunta en el Informe corresponde solo al mantenimiento 5. Por lo tanto, se solicita aclarar el concepto del pago de $117.007.773,0.*
>
> *3. De acuerdo con el resumen de pagos realizados, se evidencia que las erogaciones reportadas con cargo al 2do y 4to Comités Previa Aprobación Ambiental superan el valor total aprobado, por lo que se requiere validar y soportar los movimientos realizados.*

4. El saldo total pendiente de ejecutar de los cuatro Comités Previa Aprobación Ambiental no resulta consistente con el saldo actualmente disponible en la Subcuenta Ambiental, por lo que se requiere validar y soportar las diferencias. (…)"

Mediante oficio 48-RUTADCTOELECTRONICOS20260904012951 del 8 de septiembre de 2026, CORUMAR emitió la respuesta al oficio **IPAB-0714-2026**, sin embargo, revisada dicha respuesta, el consorcio IPAB remitió el oficio **IPAB-0757-2026** del 14 de septiembre de 2026, solicitando las siguientes aclaraciones:

1. Remitir las evidencias y aclarar a esta Interventoría los aspectos contractuales pendientes con South Pole.

2. Corregir en el documento el valor aprobado del Comité 2 (impreso como $2.43.531.413,36), cuyo valor correcto es $2.243.531.413,36.

Mediante oficio 48-RUTADCTOELECTRONICOS20260915013024 del 16 de septiembre de 2026, CORUMAR emitió la respuesta al oficio **IPAB-0757-2026**, donde se evidenció que CORUMAR emitió las respuestas a lo solicitado, por lo tanto, el consorcio IPAB mediante oficio **IPAB-0814-2026**, no emitió más objeciones al informe de compensaciones de julio de 2026.

Por otro lado, mediante oficio **48-RUTADCTOELECTRONICOS20260921013080** del 23 de septiembre de 2026, CORUMAR remitió el informe de compensaciones de agosto de 2026, donde se evidenció la entrega de los muestreos de suelos de las áreas de compensaciones de las UF 3.3 y 3.5, realizados en mayo y agosto de 2026. Frente a este oficio, el consorcio IPAB emitirá Objeción, solicitando entre otras cosas, la inclusión de las actividades de los muestreos de suelos en el Excel de seguimiento a las compensaciones realizadas.

Aunado a lo anterior, el avance de las compensaciones reportada a agosto de 2026, fueron las siguientes:

Tabla 5-8 Avance de las compensaciones a agosto de 2026

UFI	Autoridad ambiental	Permiso asociado	Acto administrativo	Aprobación medida compensatoria	N° Total de hectáreas requeridas por la AA	N° Total de hectáreas compensadas	Avance de aislamiento	Avance de establecimiento	Avance de mantenimiento	Avance muestreo suelos
1	CVS	Aprovechamiento forestal (Peaje)	340 del 2019	Si	1,02	1,02	100%	100%	100%	NA
1	CVS	Aprovechamiento forestal	303 del 31 de agosto del 2016	Si	35,83	35,83	100%	100%	100%	NA
1	CORANTIOQUIA	Aprovechamiento forestal	160PZ-1608-3779 del 08 de agosto del 2016	Si	1	1	100%	100%	100%	NA
2 y 6.1	CVS	DRMI	Acuerdo 363 del 30 de mayo de 2018	Si	124,21	124,21	100%	100%	100%	NA
2 y 6.1	CVS	DRMI	Acuerdo 363 del 30 de mayo de 2018	Si	37,74	37,74	100%	100%	100%	NA
2 y 6.1	CVS	DRMI	Acuerdo 363 del 30 de mayo de 2018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2 y 6.1	CVS	Aprovechamiento forestal	005 del 06-02-2019	Si	40,78	40,78	100%	100%	100%	NA
2 y 6.1	CVS	Aprovechamiento forestal	012 del 07-03-2019	Si	27,39	27,39	100%	100%	100%	NA
2 y 6.1	CVS	Aprovechamiento forestal	026 del 11-04-2019	Si	101,44	101,44	100%	100%	100%	NA
2 y 6.1	CVS	Aprovechamiento forestal	011 del 07-02-2020	Si	40,73	40,73	100%	100%	100%	NA
3.1	ANLA	Licencia Ambiental	00114 del 30 de enero del 2018	Plan radicado ante ANLA, en espera del pronunciamiento.	3,57		No se han iniciado actividades			
3.1	ANLA	Licencia Ambiental	00114 del 30 de enero del 2018	Si	31,64	31,64	100%	100%		

Consorcio IPAB

NIT. 902030942-3
PERIODO: 01-30 de septiembre del 2026
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 8

UFI	Autoridad ambiental	Permiso asociado	Acto administrativo	Aprobación medida compensatoria	N° Total de hectáreas requeridas por la AA	N° Total de hectáreas compensadas	Avance de aislamiento	Avance de establecimiento	Avance de mantenimiento	Avance muestreo suelos
3.1	ANLA	Licencia Ambiental	00114 del 30 de enero del 2018	Si	NA	NA	No se han iniciado actividades			
3.2 y 3.4	CVS	Aprovechamiento forestal	346 del 18 de octubre de 2016	Si	50,4	50,4	100%	100%	100%	NA
3.2 y 3.4	CVS	Aprovechamiento forestal	346 del 18 de octubre de 2016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3.3	ANLA	Licencia Ambiental	00898 del 1 de agosto de 2017	Si	3,24	3,24	100%	100%	100%	NA
3.3	ANLA	Licencia Ambiental	00898 del 1 de agosto de 2017	Si	NA	NA	NA	NA	NA	100%
3.3	ANLA	Licencia Ambiental	00898 del 1 de agosto de 2017	Si	NA	NA	NA	NA	NA	100%
3.3	ANLA	Licencia Ambiental	00898 del 1 de agosto de 2017	Si	NA	NA	NA	NA	NA	100%
3.5	ANLA	Licencia Ambiental	0057 del 12 de enero de 2017	Si	24,77	24,77	100%	100%	100%	NA
3.5	ANLA	Licencia Ambiental	0057 del 12 de enero de 2017	Si	NA	NA	NA	NA	NA	100%
3.5	ANLA	Licencia Ambiental	0057 del 12 de enero de 2017	Si	NA	NA	NA	NA	NA	100%
3.5	ANLA	Muestreos de suelo Licencia Ambiental	0057 del 12 de enero de 2017	Si	NA	NA	NA	NA	NA	100%
5	CVS	Aprovechamiento forestal (Peaje)	586 del 24 de octubre del 2017	Si	1	1	100%	100%	100%	NA
6.2	CVS	Aprovechamiento forestal	244 del 22 de noviembre del 2018	Si	7,94	7,94	100%	100%	100%	NA
6.2	CVS	Aprovechamiento forestal	244 del 22 de noviembre del 2018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6.3	CARSUCRE	Aprovechamiento forestal	862 del 30 de junio de 2017	Si	8,2	8,2	100%	100%	45%	NA

UFI	Autoridad ambiental	Permiso asociado	Acto administrativo	Aprobación medida compensatoria	N° Total de hectáreas requeridas por la AA	N° Total de hectáreas compensadas	Avance de aislamiento	Avance de establecimiento	Avance de mantenimiento	Avance muestreo suelos
6.3	CARSUCRE	Aprovechamiento forestal (peaje Caimanera)	0840 del 03 de junio del 2022	Si	2	2	100%	100%	45%	NA
7.2	ANLA	Licencia Ambiental	Licencia Ambiental 01317 del 2021	Si	188,74	188,74	100%	100%	60%	NA
7.2	ANLA	Licencia Ambiental	1545 del 26 de julio del 2017	Si, en espera de época de lluvia para iniciar actividades	9,65	0	0	0	0	NA
7.2	ANLA	Licencia Ambiental	Licencia Ambiental 01317 del 2021	En evaluación por Carsucre	1,1	0	0	0	0	NA
7.3	ANLA	Licencia Ambiental	1575 del 7 de diciembre del 2017	Si	87,25	65,91	100%	80%	30%	NA
7.3	ANLA	Licencia Ambiental	1243 del 15 de julio del 2021	Si	29,6	29,6	100%	100%	25%	NA
7.3	CARSUCRE	Aprovechamiento forestal	2143 del 22 de noviembre 2017	Si	7,1	7,1	100%	100%	100%	NA
8.1 y 8.2	CARSUCRE	Aprovechamiento forestal	2142 del 22 de noviembre de 2017	Si	15	15	100%	100%	100%	NA
8.3	CARDIQUE	Aprovechamiento forestal ajuste diseño	601 del 11 de mayo del 2018	Si	12,83	12,83	100%	100%	100%	NA
8.3	CARSUCRE	Aprovechamiento forestal (Peaje)	1629 del 09 de noviembre del 2018	Si	2,7	2,7	100%	100%	100%	NA
8.3	CARDIQUE	Aprovechamiento forestal	1363 del 10 de agosto de 2017	Si	33,62	33,62	100%	100%	100%	NA

UFI	Autoridad ambiental	Permiso asociado	Acto administrativo	Aprobación medida compensatoria	N° Total de hectáreas requeridas por la AA	N° Total de hectáreas compensadas	Avance de aislamiento	Avance de establecimiento	Avance de mantenimiento	Avance muestreo suelos
8.3	CARSUCRE	Aprovechamiento forestal	1294 del 18 de agosto de 2017	Si	11	11	100%	100%	100%	NA
NA	CVS	Cantera Carrizal	2-3462 del 22 de junio de 2017	Si	0,264	0,264	100%	100%	40%	NA
NA	CVS	Cantera Malagana	2-4151 del 15 de diciembre de 2017	Si	1,64	1,64	100%	100%	40%	NA
NA	CVS	Cantera Planeta Rica	2-3915 del 03 de noviembre de 2017	Si	2,36	2,36	100%	100%	40%	NA
NA	ANLA	Cantera Arroyo Grande	617 del 15 de abril de 2019.	Si	51,62	51,62	100%	100%	50%	NA
NA	CARSUCRE	Cantera El Mono	0951 del 25 de julio de 2019	Si	25,56	25,56	100%	100%	100%	NA
NA	CARDIQUE	Cantera Mucacal	0244 del 28 de febrero de 2018	Si	1,86	1,86	100%	100%	100%	NA
NA	CVS	Cantera Lorica 2	2-7499 de 2020	Si	49,9	49,9	100%	100%	40%	NA
				TOTAL	**1074,694**	**1039,034**				

Fuente: CORUMAR, 2026

Por otro lado, a continuación, se relaciona las compensaciones que aún se encuentran **PENDIENTES** por cerrar, ya sea porque se continúan desarrollando mantenimientos, por temas de orden público, o por afectaciones a las plantaciones debido al clima.

Tabla 5-9 Compensaciones pendientes por cerrar a septiembre de 2026

Consorcio IPAB

NIT. 902030942-3
PERIODO: 01-30 de septiembre del 2026
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 8

UFI	Autoridad ambiental	Permiso asociado	Acto administrativo	Aprobación medida compensatoria	N° Total de hectáreas requeridas por la AA	N° Total de hectáreas compensadas	Actividades que se deben cumplir de la medida de compensación	% avance de compensaciones pendientes	Pendiente	Mantenimientos
3.1	ANLA	Licencia Ambiental	00114 del 30 de enero del 2018	Plan radicado ante ANLA, en espera del pronunciamiento.	3,57	0	Aislamiento, siembra y mantenimiento de la plantación y cumplimiento de indicadores	0%	La plantación sembrada se dañó por las precipitaciones presentadas en el segundo trimestre de 2023. Mediante Radicado: 48-147-20260827028435 del 28 de agosto de 2026 (Rad ANLA 20266201239032), CORUMAR remitió a la autoridad un nuevo plan de compensación con el fin de iniciar las actividades correspondientes a la compensación de esta UF. La Autoridad no se ha pronunciado al respecto	No se han ejecutado. La compensación estaría proyectada hectareas el año 2032
3.1	ANLA	Licencia Ambiental	00114 del 30 de enero del 2018	Si	31,64	31,64	Aislamiento, siembra y mantenimiento de la plantación y cumplimiento de indicadores	50%	En proceso de actividades para realizar los mantenimientos. Como plateo, fertilizaciones, limpias de cercos, y de plantaciones en general, entre otros	Se encuentra en proceso de mantenimientos
6.3	CARS UCRE	Aprovechamiento forestal	862 del 30 de junio de 2017	Si	8,2	8,2	Aislamiento, siembra y mantenimiento de la plantación y cumplimiento de indicadores Cedido a Fundación Mi Sinú	82%	Obligacion cedida mediante Resolución 0628 del 21 de julio de 2023 a la fundación Mi Sinú	No corresponde a CORUMAR, realizar los mantenimientos.
6.3	CARS UCRE	Aprovechamiento forestal (peaje Caimanera)	0840 del 03 de junio del 2022	Si	2	2	Aislamiento, siembra y mantenimiento de la plantación y cumplimiento de indicadores Cedido a Fundación Mi Sinú	82%	Obligacion cedida mediante Resolución 0640 del 21 de julio de 2023 a la fundación Mi Sinú	No corresponde a CORUMAR, realizar los mantenimientos.

Consorcio IPAB

NIT. 902030942-3
PERIODO: 01-30 de septiembre del 2026
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 8

UFI	Autoridad ambiental	Permiso asociado	Acto administrativo	Aprobación medida compensatoria	N° Total de hectáreas requeridas por la AA	N° Total de hectáreas compensadas	Actividades que se deben cumplir de la medida de compensación	% avance de compensaciones pendientes	Pendiente	Mantenimientos
7.2	ANLA	Licencia Ambiental	Licencia Ambiental 01317 del 2021	Si	188,74	188,74	Aislamiento, siembra y mantenimiento de la plantación y cumplimiento de indicadores	87%	Se han ejecutado 12 mantenimientos a corte de septiembre de 2026	Faltan 8 mantenimientos En proceso de ejecución. Finalizaría en 2028.
7.2	ANLA	Licencia Ambiental	1545 del 26 de julio del 2017	Si, en espera de época de lluvia para iniciar actividades	9,65	0	Aislamiento, siembra y mantenimiento de la plantación y cumplimiento de indicadores	0%	Veda Nacional	No se han iniciado por temas climaticos
7.2	ANLA	Licencia Ambiental	Licencia Ambiental 01317 del 2021	En evaluación por Carsucre	1,1	0	Aislamiento, siembra y mantenimiento de la plantación y cumplimiento de indicadores	0%	Veda Forestal	No se han iniciado por temas climáticos
7.3	ANLA	Licencia Ambiental	1575 del 7 de diciembre del 2017	Si	87,25	65,91	Aislamiento, siembra y mantenimiento de la plantación y cumplimiento de indicadores	70%	Mediante radicado ANLA 20256200901412 del 31 de julio de 2025 se solicitó el desistimiento expreso numerales 3 y 4 de la Resolución 2226 del 2023 por problemas de orden público para el ingreso a las plantaciones.	No se han realizado mantenimientos por problemas de orden público
7.3	ANLA	Licencia Ambiental	1243 del 15 de julio del 2021	Si	29,6	29,6	Aislamiento, siembra y mantenimiento de la plantación y cumplimiento de indicadores	75%	Mediante radicado ANLA 20256200901412 del 31 de julio de 2025 se solicitó el desistimiento expreso numerales 3 y 4 de la Resolución 2226 del 2023 por problemas de orden público para el ingreso a las plantaciones	No se han realizado mantenimientos por problemas de orden público
NA	CVS	Cantera Carrizal	2-3462 del 22 de junio de 2017	Si	0,264	0,264	Aislamiento, siembra y mantenimiento de la plantación y cumplimiento de indicadores Cedido a	80%	Cesion autorizada mediante Resolución 3-3425 del 30 de diciembre de 2024. Cedida a Organicos de la Costa	

UFI	Autoridad ambiental	Permiso asociado	Acto administrativo	Aprobación medida compensatoria	N° Total de hectáreas requeridas por la AA	N° Total de hectáreas compensadas	Actividades que se deben cumplir de la medida de compensación	% avance de compensaciones pendientes	Pendiente	Mantenimientos
							ORGANICOS DE LA COSTA			
NA	CVS	Cantera Malagana	2-4151 del 15 de diciembre de 2017	Si	1,64	1,64	Aislamiento, siembra y mantenimiento de la plantación y cumplimiento de indicadores Cedido a ORGANICOS DE LA COSTA	80%	Cesion autorizada mediante Resolución No 0020 del 14 de enero de 2025. Cedida a Organicos de la Costa	
NA	CVS	Cantera Planeta Rica	2-3915 del 03 de noviembre de 2017	Si	2,36	2,36	Aislamiento, siembra y mantenimiento de la plantación y cumplimiento de indicadores Cedido a ORGANICOS DE LA COSTA	80%	Cedida mediante mediante Resolución 0019 del 14 de enero de 2025. Cedida a Organicos de la Costa	
NA	ANLA	Cantera Arroyo Grande	617 del 15 de abril de 2019.	Si	51,62	51,62	Aislamiento, siembra y mantenimiento de la plantación y cumplimiento de indicadores	83%	Se han realizado 6 mantenimientos a septiembre de 2026	faltan 4 mantenimientos
NA	CVS	Cantera Lorica 2	2-7499 de 2020	Si	49,9	49,9	Aislamiento, siembra y mantenimiento de la plantación y cumplimiento de indicadores. Cedido a INSADE S.A.S	80%	Cesion autorizada mediante Resolución 017 del 10 de enero 2025. cedida a INSADE	

Fuente: IPAB, 2026

5.6.1. Ejecución Subcuenta Compensaciones Ambientales

Cabe aclarar que los movimientos de la fiducia correspondientes a septiembre 2026, se entregan a los 10 días del cierre del mes, por lo tanto, para el cierre del presente informe, no se cuenta aún con los detalles del movimiento de la Fiducia. En ese sentido, los valores de la fiducia y actividades de compensación se encuentran al cierre de agosto de 2026, y los detalles del 5to CPAA, se detallan a septiembre de 2026.

Durante agosto de 2026, el concesionario realizó los siguientes movimientos en el marco de las compensaciones.

✓ **Orden de servicio 1222206: Proveedor Jorge Bertel**

El documento OP 08096, corresponde al pago por $59.228.000 a la empresa **BERTEL PATERNINA JORGE FABIAN** el 26 de agosto de 2026.

Figura 5-1. Notificación de aplicación de pagos-Bancolombia. Jorge Bertel

Bancolombia

Notificación de Aplicación de Pagos

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO Y PAGADOR

NOMBRE DEL CLIENTE	BERTEL PATERNINA JORGE FABIAN	MONEDA	COP
TIPO IDENTIFICACIÓN	CC	VALOR TOTAL	$59.228.000,00
IDENTIFICACIÓN	1102855045	PAGADOR	10134 - P.A CONCESION RUTA AL MAR

DETALLE DEL PAGO

Fecha de aplicación del pago	Orden	Cuenta a debitar	Tipo de cuenta a debitar	Entidad de origen	Numero de Cuenta acreditar	Tipo de cuenta acreditar	Entidad destino	Valor total	Estado pago	N° Factura
26/08/2026	8096	*******2323	AHO	BANCOLOMBIA	08256760224	AHO	BANCOLOMBIA	$59.228.000,00	Transacción Exitosa**	4507262206

DETALLE DE FACTURA

N° Factura	4507262206	Valor Base
Retención Honorarios 11%	$7.370.000,00	$67.000.000,00
Retención Reteica 0.7% San Carlos - Cordoba	$234.500,00	$33.500.000,00
Retención Rete Ica Cerete-cordoba 0.5%	$167.500,00	$33.500.000,00
Total Retenciones	$7.772.000,00	

Transacción Exitosa**

Pago abonado a la cuenta del beneficiario/ Traslados entre cuentas Bancolombia/ Pago Obligaciones Financieras/ Pagos Facturas PSE.

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. Sociedad Fiduciaria.

Fuente: CORUMAR, 2026. OP 08096. Radicado 48-RUTADCTOELECTRONICOS20260921013080 del 23/09/2026

Los pagos realizados al proveedor Jorge Bertel en el marco de la orden de servicio No. 1222206 se le han realizado de la siguiente forma:

Tabla 5-10 Pagos realizados a la orden de servicio 1222206. UFI 3.3

OS 1222206 **JORGE BERTEL**
UFI: 3.3 **LICENCIA AMBIENTAL RES. 00898 DEL 2017**
Valor contratado: $33.662.000 **Valor pagado: $33.299.000** **Valor Pend. Pago: $363.000**

Mes	Comité 1	Comité 2	Comité 3	Comité 4	Total
Ago-26	---	---	$33.299.000	---	$33.299.000
Total	**---**	**---**	**$33.299.000**	**---**	**$33.299.000**

Fuente: IPAB, 2026. Datos tomados del archivo Ejecución - CPA Ambiental. Radicado 48-RUTADCTOELECTRONICOS20260921013080 del 23/09/2026

Tabla 5-11 Pagos realizados a la orden de servicio 1222206. UFI 3.5

OS 1222206 **JORGE BERTEL**
UFI: 3.5 **LICENCIA AMBIENTAL RES. 0057 DEL 2017**
Valor contratado: $33.662.000 **Valor pagado: $33.299.000** **Valor Pend. Pago: $363.000**

Mes	Comité 1	Comité 2	Comité 3	Comité 4	Total
Ago-26	---	---	$33.299.000	---	$33.299.000
Total	**---**	**---**	**$33.299.000**	**---**	**$33.299.000**

Fuente: IPAB, 2026. Datos tomados del archivo Ejecución - CPA Ambiental. Radicado 48-RUTADCTOELECTRONICOS20260921013080 del 23/09/2026

Teniendo en cuenta lo anterior, los valores que se han movido hasta agosto de 2026, en el marco de los cuatro comités que se han llevado a cabo, se relacionan en la siguiente tabla:

Tabla 5-12. Reporte de valores ejecutados durante los cuatro (4) comités previa aprobación ambiental – agosto 2026

Fechas	Comité 1	Comité 2	Comité 3	Comité 4	total
Aprobado	**$ 2.785.826.664,0**	**$ 1.686.136.877,0**	**$ 556.024.692,0**	**$ 599.940.205,0**	**$ 5.627.928.438,0**
jul-24	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0
ago-24	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0
sep-24	$ 382.217.372,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 382.217.372,0
oct-24	$ 102.906.523,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 102.906.523,0
nov-24	$ 375.534.516,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 375.534.516,0
dic-24	$ 180.217.067,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 180.217.067,0
ene-25	$ 79.656.660,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 79.656.660,0

Fechas	Comité 1	Comité 2	Comité 3	Comité 4	total
feb-25	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0
mar-25	$ 104.595.920,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 104.595.920,0
abr-25	$ 121.698.948,0	$ 1.384.607.005,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 1.506.305.953,0
may-25	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0
jun-25	$ 0,0	$ 483.595.407,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 483.595.407,0
jul-25	$ 233.753.310,0	$ 110.736.273,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 344.489.583,0
ago-25	$ 0,0	$ 4.733.187,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 4.733.187,0
sep-25	$ 73.394.815,0	$ 11.340.875,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 84.735.690,0
oct-25	$ 92.457.990,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 92.457.990,0
nov-25	$ 5.714.545,0	$ 17.426.505,0	$ 142.045.478,0	$ 0,0	$ 165.186.528,0
dic-25	$ 0,0	$ 82.848.318,0	$ 27.887.955,0	$ 0,0	$ 110.736.273,0
ene-26	$ 0,0	$ 0,0	$ 6.772.642,0	$ 0,0	$ 6.772.642,0
feb-26	$ 0,0	$ 0,0	$ 4.779.182,0	$ 0,0	$ 4.779.182,0
mar-26	$ 0,0	$ 0,0	$ 50.751.822,0	$ 94.841.188,0	$ 145.593.010,0
abr-26	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0
may-26	$ 259.937.186,0	$ 2.221.125,0	$ 1.128.875,0	$ 0,0	$ 263.287.186,0
jun-26	$ 13.704.927,0	$ 0,0	$ 8.408.174,0	$ 280.877.676,0	$ 302.990.777,0
jul-26	$ 45.290.652,0	$ 66.636.095,0	$ 0,0	$ 224.221.341,0	$ 336.148.088,0
ago-26	$ 0,0	$ 0,0	$ 66.598.000,0	$ 0,0	$ 66.598.000,0
Total	**$ 2.071.080.431,0**	**$ 2.164.144.790,0**	**$ 308.372.128,0**	**$ 599.940.205,0**	**$ 5.143.537.554,0**

Fuente: IPAB, 2026. Datos tomados del archivo Ejecución - CPA Ambiental. Radicado 48-RUTADCTOELECTRONICOS20260921013080 del 23/09/2026

Ahora bien, respecto con lo reportado por la Fiducia al corte del mes de agosto de 2026 se tiene un saldo en la subcuenta de **$146.224.017,62.**

Tabla 5-13. Reporte de la fiducia a agosto de 2026

RESUMEN INGRESOS Y EGRESOS		
CATEGORIA	RUBRO	8.AGOSTO 2026
0. SALDO INICIAL		
	SALDO INICIAL	$ 210.046.928,98
		$ 210.046.928,98
1. INGRESOS		
	RENDIMIENTOS	$ 1.696.889,94
	TRASLADO DESDE SUBCUENTA PAGOS O&M POR RECONOCIMIENTO GMF	$ 1.344.590,70
		$ 3.041.480,64
2. EGRESOS		
	GRAVAMEN MVTO FINANCIERO (GMF)	$ 266.392,00
	PAGO IMPUESTOS	$ 7.370.000,00
	PAGOS A TERCEROS	$ 59.228.000,00
		$ 66.864.392,00
3. SALDO FINAL		
	SALDO FINAL	$ 146.224.017,62
Total 3. SALDO FINAL		**$ 146.224.017,62**

Fuente: Fiduciaria Bancolombia, agosto 2026.

5.6.1. SOLICITUD CONCESIONARIO COMITÉ PREVIA APROBACIÓN AMBIENTAL

A la fecha, el concesionario ha solicitado cinco (5) comités previa aprobación ambiental los cuales se detallan a continuación:

5.6.1.1. Primer comité previa aprobación: Acta del 17 de julio de 2024

AREA RESPONSABLE:	*CONEXIÓN ANTIOQUIA BOLIVAR*				
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:	***Comité Ambiental de previa aprobación No 1***				
FECHA Y HORA DE LA REUNIÓN:	**Fecha: 17 de julio 2024**	**Hora Inicio:**	10:00	**Hora Fin:**	12:00

*En este comité se aprobó el valor de **$2.785.826.664** en pesos corrientes, que sería equivalente a un valor de $1.553.402.440 en pesos constantes los cuales fueron aprobados de la siguiente forma (junio a diciembre de 2024):*

Tabla 5-14 Proyección presupuesto Comité 1 (junio-diciembre 2024)

VIGENCIA	*VALOR*	*ANI (70%)*	*CONCESIONARIO (30%)*
jul-24	*$ 199.529.579*	*$ 139.670.705*	*$ 59.858.874*
ago-24	*$ 726.289.334*	*$ 508.402.534*	*$ 217.886.800*
sep-24	*$ 318.039.388*	*$ 222.627.572*	*$ 95.411.816*
oct-24	*$ 910.125.377*	*$ 637.087.764*	*$ 273.037.613*
nov-24	*$ 66.602.551*	*$ 46.621.786*	*$ 19.980.765*
dic-24	*$ 565.240.436*	*$ 395.668.305*	*$ 169.572.131*
TOTALES	***$ 2.785.826.665***	***$ 1.950.078.666***	***$ 835.747.999***

Fuente: Informe mensual IPAB febrero 2026.

En ese sentido, a diciembre de 2024, se evidenció la siguiente ejecución:

Tabla 5-15 Pagos programados vs pagos realizados Comité 1 (junio-diciembre 2024)

MES	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
jul-24	$ 199.529.579	$ 0	$ 199.529.579
ago-24	$ 726.289.334	$ 7.607.308	$ 718.682.026
sep-24	$ 318.039.388	$ 375.130.816,15	$ 57.091.429
oct-24	$ 910.125.377	$ 103.318.150,09	$ 806.807.227
nov-24	$ 66.602.551	$ 377.036.674,13	$ 310.434.123

MES	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
dic-24	$ 565.240.436	$ 185.030.882,25	$ 380.209.554
TOTAL	**$ 2.785.826.665**	**$ 1.048.123.831**	**$ 1.737.702.834**

Fuente: Informe mensual IPAB febrero 2026

*De lo anterior, encontramos que con corte a dic-2024 se tiene que el programado por ejecutar era $2.785.826.664,47, se habían ejecutado $1.048.123.830,62, dejándose por ejecutar un valor acumulado de $**1.737.702.833,85**. Cabe aclarar, que estos valores pueden diferir de los valores que el área financiera informe, dado que no se tienen en cuenta impuestos, retenciones y/o pagos de retenciones y reconocimientos GMF.*

5.6.1.2. Segundo comité previa aprobación: Acta del 24 de abril de 2025

ACTA DE REUNIÓN					
SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN					
CÓDIGO	SEPG-F-027	VERSIÓN	006	FECHA	04/07/2024

Acta No: 02 **Tipo de Reunión:** Interna ☐ Externa ■

AREA RESPONSABLE:	*CONEXIÓN ANTIOQUIA BOLIVAR*				
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:	***Comité Ambiental de previa aprobación No2***				
FECHA Y HORA DE LA REUNIÓN:	**Fecha: 24 de abril 2025**	**Hora Inicio:**	15:30	**Hora Fin:**	16:50

*En este comité se aprobó el valor de **$ 1.686.136.877** pesos los cuales fueron aprobados de la siguiente forma (junio a diciembre de 2024):*

Tabla 5-16 Proyección presupuesto Comité 2 (marzo – junio 2025)

VIGENCIA	VALOR	ANI (70%)	CONCESIONARIO (30%)
mar-25	$ 1.168.744.883	$ 818.121.418	$ 350.623.465
abr-25	$ 33.662.000	$ 23.563.400	$ 10.098.600
may-25	$ 18.343.689	$ 12.840.582	$ 5.503.107
jun-25	$ 465.386.306	$ 325.770.414	$ 139.615.892
TOTALES	**$ 1.686.136.878**	**$ 1.180.295.815**	**$ 505.841.063**

Fuente: Datos tomados del acta No. 2. Cuadro ajustado por IPAB,2026.

A la fecha del segundo comité se tiene lo siguiente:

Tabla 5-17 Resumen de valores conciliados presentados en el comité No. 2

CONCEPTO		VALOR ($COP)
(A)	Contratos solicitados en Comité N° 1	1.062.236.090,35
(B)	Valor a solicitar del Comité N° 2	2.372.807.541,75
(A+B)	**Valor total a ejecutar en Comité N° 2**	**3.435.043.632,10**
(C)	Valor liberado del Comité N° 1	603.058.436,00
(D)	Rendimientos generados	83.612.229,00
(B-C-D)	**Valor a solicitar en Comité N° 2**	**1.686.136.876,75**

Fuente: Informe mensual IPAB febrero 2026

*Así las cosas, a corte de noviembre de 2025, el Concesionario ejecutó un **94,84%** del valor que se tenía programado al mes de julio de 2025 y que corresponde a lo aprobado en el 2° CPAA, de acuerdo con lo siguiente:*

Tabla 5-18 Pagos programados vs pagos realizados Comité 2 (enero 2025 a octubre 2025)

MES	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
ene-25	$ 0	$ 0	$ 0
feb-25	$ 104.595.920	$ 0	$ 104.595.920
mar-25	$ 1.535.348.044	$ 104.595.920	$ 1.430.752.124
abr-25	$ 33.662.000	$ 1.513.619.089	-$ 1.479.957.089
may-25	$ 18.343.689	$ 0,00	$ 18.343.689
jun-25	$ 1.056.423.314,53	$ 464.624.431,97	$ 591.798.883
jul-25		$ 342.193.759,00	-$ 342.193.759
ago-25			
sep-25		$ 70.304.507,00	-$ 70.304.507
oct-25		$ 111.187.261,00	-$ 111.187.261
TOTAL	**$ 2.748.372.967,83**	**$ 2.606.524.968,07**	**$ 141.847.999,76**
PORCENTAJE			**94,84%**

Fuente: Informe mensual IPAB febrero 2026

5.6.1.3. Tercer comité previa aprobación: Acta del 12 de noviembre del 2025

ACTA DE REUNIÓN					
SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN					
CÓDIGO	SEPG-F-027	VERSIÓN	006	FECHA	04/07/2024

Acta No: 03 **Tipo de Reunión:** Interna ☐ Externa ■

AREA RESPONSABLE:	*CONEXIÓN ANTIOQUIA BOLIVAR*				
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:	***Comité Ambiental de previa aprobación No2***				
FECHA Y HORA DE LA REUNIÓN:	**Fecha: 12 de noviembre de 2025**	**Hora Inicio:**	14:30	**Hora Fin:**	15:00

En este comité, finalmente se dieron por aprobados los valores solicitados por el Concesionario, anotando que no fue necesario el aporte de nuevos valores dado que el concesionario lo que propuso fue la reprogramación de los valores pendientes por ejecutar de los dos comités anteriores adicional a los valores devueltos por el tema de vedas.

Tabla 5-19 Proyección presupuesto Comité 3

VALOR A SOLICITAR CPA N° 3 (A)	$ 556.024.692
SALDO EN SUBCUENTA PREVISTO PARA COMPROMETER EN COMITES (B)	$ 83.027.938
REINTEGRO VEDAS AGOSTO 2025 (C)	$ 472.996.754
NECESIDAD CPA N° 3 (A-B-C) = D	$ 0
A cargo ANI 70%	$ 0
A cargo Concesionario 30%	$ 0

Fuente: CORUMAR, Informe Ejecución De Actividades De Compensación Realizadas en el mes de diciembre 2025

Así las cosas, con corte al 31 de enero de 2026, la ejecución de los valores se presenta a continuación:

Tabla 5-20 Pagos programados vs pagos realizados Comité 3

Mes	Programado	Ejecutado	Diferencia
feb-25	$ 104.595.920	$ -	$ 104.595.920
mar-25	$ 2.222.018.709	$ 104.595.920	$ 2.117.422.789

Mes	Programado	Ejecutado	Diferencia
abr-25	$ 33.662.000	$ 1.506.305.953	-$ 1.472.643.953
may-25	$ 18.343.689	$ -	$ 18.343.689
jun-25	$ 1.056.423.315	$ 483.595.407	$ 572.827.908
jul-25		$ 344.489.583	-$ 344.489.583
ago-25	$ 115.767.419	$ -	$ 115.767.419
sep-25	$ 126.455.800	$ 70.304.507	$ 56.151.293
oct-25	$ 2.579.949	$ 111.187.261	-$ 108.607.312
nov-25	$ -	$ 159.882.237	-$ 159.882.237
dic-25	$ 1.267.614.293	$ 117.436.273	$ 1.150.178.020
ene-26		$ 6.330.442	-$ 6.330.442
Total	$ 4.947.461.094	$ 2.904.127.583	$ 2.043.333.511
Saldo por ejecutar			**$ 2.043.333.511**

Fuente: CORUMAR, Informe Ejecución De Actividades De Compensación Realizadas en el mes de diciembre 2025

De acuerdo a este cuadro, la Interventoría Consorcio CR indica lo siguiente:

- *Al corte del periodo de ejecución aprobado por la ANI para el 3er CPAA, se encuentra un atraso en la ejecución del **41,72%.***
- *Lo anterior, implica que se dejaron ejecutar recursos por valor de **$2.063.987.573,90**.*

5.6.1.4. Cuarto comité de previa aprobación ambiental - CPAA.

El cuarto (4°) comité previa aprobación ambiental se desarrolló el 4 de junio de 2026.



ACTA DE REUNIÓN

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO	SEPG-F-027	VERSIÓN	006	FECHA	04/07/2024

Acta No: 04 Tipo de Reunión: Interna ☐ Externa ■

AREA RESPONSABLE:	CONEXIÓN ANTIOQUIA BOLIVAR				
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:	Comité Ambiental de previa aprobación No4				
FECHA Y HORA DE LA REUNIÓN:	Fecha: 4 de junio de 2026	Hora Inicio:	14:30	Hora Fin:	15:20

A continuación, se relacionan los valores aprobados en el cuarto comité, correspondiente a **$599.940.205.**

Tabla 5-21. Actividades a ejecutar en el marco del 4to comité

Actividades a ejecutar en el marco del 4to comité

UFI	Autoridad ambiental	Tipo de permiso	Acto administrativo	Valor solicitado	Actividades a ejecutar en el marco del 4 comité
1	CVS	Aprovechamiento forestal	303 del 31 de agosto del 2016	$ 28.507.960,35	Los valores hacen referencia a la rete garantía del contrato
1	CORANTIOQUIA	Aprovechamiento forestal	160PZ-1608-3779 del 08 de agosto del 2016	$ 795.645,00	
2 y 6.1	CVS	DRMI	Acuerdo 372 del 29-08-2018	$ 154.708.512,90	Los valores hacen referencia a la rete garantía del contrato
2 y 6.1	CVS	DRMI (Otrosí 1 impulsores)	Acuerdo 372 del 29-08-2018	$ 313.939,85	
3.3	ANLA	Licencia Ambiental	00898 del 1 de agosto de 2017	$ 2.449.634,80	Los valores hacen referencia a la rete garantía del contrato
3.3	ANLA	Muestreos de suelo época seca y húmeda	00898 del 1 de agosto de 2017	$ 33.662.000,00	Muestreos de suelos (abril y junio de 2026)
3.5	ANLA	Licencia Ambiental	0057 del 12 de enero de 2017	$ 9.072.720,00	Los valores hacen referencia a la rete garantía del contrato
3.5	ANLA	Muestreos de suelo época seca y húmeda	0057 del 12 de enero de 2017	$ 33.662.000,00	Muestreos de suelos (abril y junio de 2026)
6.2	CVS	Aprovechamiento forestal (Impulsor eléctrico)	244 del 22 de noviembre del 2018	$ 123.065,00	Los valores hacen referencia a la rete garantía del contrato
6.2	CVS	Aprovechamiento forestal	244 del 22 de noviembre del 2018	$ 5.995.555,85	
7.2	ANLA	Licencia Ambiental	1317 del 27 de julio de 2021	$ 227.619.778,25	Dos mantenimientos (9 y 10)
7.3 FM Arroyo Grande	ANLA	Cantera Arroyo Grande	617 del 15 de abril de 2019.	$ 103.029.393,00	Costo de mantenimientos año 2026 (I semestre).
Total				**$ 599.940.205,00**	

Fuente: IPAB, 2026. Acta de reunión cuarto comité

Se hizo claridad en el acta de comité No. 4 de lo siguiente: "*(…) Se aclara que el presente Comité responde a una redistribución de los recursos que no fueron ejecutados en el marco de los Comités 2 y 3, tal como se señala en los numerales 3 y 4 de la presente acta.*


En este sentido, las actividades expuestas en el Comité 4 y relacionadas en la tabla del numeral 8 no corresponden a nuevas actividades; por el contrario, se tratan de actividades previamente aprobadas que no fueron ejecutadas durante la implementación

de los Comités 2 y 3, por lo que los recursos asociados a estas se redistribuyen para su ejecución en el marco del presente Comité. (…)"

5.6.1.5. Quinto comité de previa aprobación ambiental – CPAA


El concesionario solicitó mediante oficio 48-RUTADCTOELECTRONICOS20260612012325 del 12 de junio de 2026, la activación del Quinto comité previa aprobación ambiental. en este oficio, el concesionario remitió los siguientes anexos:

Figura 5-2. Información incluida en la Carpeta 1




Fuente: CORUMAR 2026, oficio 48-RUTADCTOELECTRONICOS20260612012325

Figura 5-3. Información incluida en la carpeta 2




Fuente: CORUMAR 2026, oficio 48-RUTADCTOELECTRONICOS20260612012325

Figura 5-4. Información incluida en la Carpeta 3



Fuente: CORUMAR 2026, oficio 48-RUTADCTOELECTRONICOS20260612012325

Figura 5-5. Información incluida en la Carpeta 4

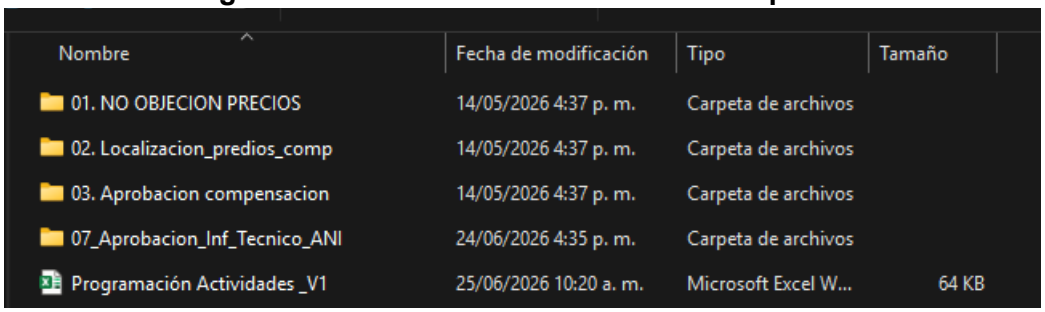

Fuente: CORUMAR 2026, oficio 48-RUTADCTOELECTRONICOS20260612012325

Los valores solicitados por CORUMAR para la activación del quinto (5°) comité previa aprobación ambiental, son los siguientes: **$3.120.491.666,45**

Tabla 5-22 Actividades proyectadas para el 5to comité

UFI	Autoridad ambiental	Tipo de permiso	Acto administrativo	Valores a solicitar en el comité 5	Actividades
NA	ANLA	Cantera Arroyo Grande	617 del 15 de abril de 2019.	$ 180.016.029,40	Mantenimiento de junio y diciembre de 2026
7.2	ANLA	Licencia Ambiental	1317 del 27 de julio de 2021	$ 2.018.007.594,10	Mantenimiento en marzo, julio y septiembre de 2026
7.3	ANLA	Licencia Ambiental - Perimetral aeropuerto	1243 del 15 de julio de 2021	$ 344.701.292,90	Mantenimiento en marzo, julio y septiembre de 2026
6.3	CARSUCRE	Aprovechamiento forestal	862 del 30 de junio de 2017	$ 11.853.100,00	Mantenimientos de febrero, junio y octubre de 2026
6.3	CARSUCRE	Aprovechamiento forestal (peaje Caimanera otrosí 14)	0805 del 18 de junio del 2020	$ 2.891.000,00	Mantenimientos de febrero, junio y octubre de 2026
8.3	CARDIQUE	Aprovechamiento forestal (ramal intersección 17)	0281 del 15 de abril del 2021	$ 12.431.300,00	En el programa de actividades no se evidencian actividades para esta UFI
3.1	ANLA	Licencia Ambiental	00114 del 30 de enero del 2018, CUS	$ 419.724.029,45	Siembras realizadas en mayo de 2026 y mantenimientos en agosto y diciembre de 2026
7.3	ANLA	Licencia Ambiental	1575 del 7 de diciembre del 2017	$ 87.177.595,60	Mantenimiento en marzo, julio y septiembre de 2026

UFI	Autoridad ambiental	Tipo de permiso	Acto administrativo	Valores a solicitar en el comité 5	Actividades
8.3	CARDIQUE	Aprovechamiento forestal	1363 del 10 de agosto de 2017	$ 30.224.380,00	En el programa de actividades no se evidencian actividades para esta UFI.
8.3	CARDIQUE	Aprovechamiento forestal ajuste diseño	601 del 11 de mayo del 2018	$ 11.534.170,00	En el programa de actividades no se evidencian actividades para esta UFI.
8.3	CARSUCRE	Aprovechamiento forestal (Peaje)	1629 del 09 de noviembre del 2018	$ 1.931.175,00	En el programa de actividades no se evidencian actividades para esta UFI.
TOTAL				**$3.120.491.666,45**	

Fuente: IPAB, 2026

Ante esta solicitud de activación del quinto comité, la Interventoría presentó la objeción a la información presentada, toda vez que existieron datos numéricos que no coinciden entre formatos, no se tuvo en cuenta la información allegada a la interventoría relacionada con los informes mensuales de compensaciones, entre otros. Este oficio se radicó ante CORUMAR el 01 de julio de 2026 mediante radicado **IPAB-0450-2026.**

Mediante oficio Radicado **48-RUTADCTOELECTRONICOS20260707012447** del 09 de julio de 2026, CORUMAR, entregó la respuesta a las observaciones remitidas en el oficio **IPAB-0450-2026** del 01 de julio de 2026. Estas respuestas fueron objetadas por la interventoría mediante oficio **IPAB-0534-2026** del 23 de julio de 2026, solicitando lo siguiente:

1. Aclarar el avance de compensación que se lleva hasta el 30 de junio de 2026, ya que el Excel “Avance_compensaciones_junio26”, en la columna “No. Total, de áreas compensadas” cuenta con datos que no corresponden de acuerdo con lo evidenciado por la Interventoría y que se relacionaron en el presente oficio.
2. Aclaración de los valores correspondientes a los movimientos de marzo de 2026, ya que difieren de los presentados en el Informe Mensual de Compensaciones Ambientales de marzo de 2026 (Radicado 48-RUTADCTOELECTRONICOS20260406011745 del 07 de abril de 2026).
3. Se solicita que la información financiera remitida en el archivo de Excel denominado "Seguimiento_Comp_Ambiental-CPA5_VFm" sea actualizada con corte al mes de junio de 2026, teniendo en cuenta que la información remitida actualmente corresponde al 30 de abril de 2026.

Frente a este último oficio, CORUMAR remitió la respuesta mediante oficio Radicado: **48-RUTADCTOELECTRONICOS20260812012739** del 13 de agosto de 2026, y solicitando la cantidad de **$627.687.017,40** para cubrir los compromisos en el marco de las compensaciones ambientales de los meses de agosto y septiembre de 2026.

Las actividades que se llevarán a cabo en el marco del 5º Comité Ambiental Previa Aprobación se relacionan en la siguiente tabla:

Tabla 5-23 Actividades proyectadas para el 5to comité

UFI	Autoridad ambiental	Tipo de permiso	Acto administrativo	Valores a solicitar en el comité 5	Actividades
NA	ANLA	Cantera Arroyo Grande	617 del 15 de abril de 2019.	$ 180.016.029,40	Mantenimientos
7.2	ANLA	Licencia Ambiental	1317 del 27 de julio de 2021	$ 447.670.988,00	Mantenimientos
				$ 627.687.017,40	

Fuente: Oficio 48-RUTADCTOELECTRONICOS20260812012739 del 13/08/2026Carpeta Anexo 02\Informe Instructivo\Programación Actividades _V1

Los costos asociados para el desarrollo de las actividades en el marco del 5º comité se relacionan en la siguiente tabla:

Tabla 5-24 Costos asociados al quinto comité previa aprobación ambiental

UFI	Autoridad	Acto	Valor total del contrato	Valor facturado	Valor pagado	Valor pendiente de pago	Contratista	N° Contrato	ago-26	sep-26	Valores a solicitar en el comité 5
CANTERA ARROYO GRANDE	ANLA	617 del 15 de abril de 2019.	$1.038.491.160,00	$ 790.792.928,00	$ 751.253.281,60	$ 287.237.878,40	South Pole Carbon Asset Management S.A.S.	148-262		$180.016.029,40	$180.016.029,40
7.2	ANLA	1317 del 27 de	$ 7.093.530.000,00	$ 5.201.948.866,00	$ 5.068.599.038,90	$ 2.024.930.961,10	Fundación para el Desarrollo Integral de Colombia - Biopaz	148-308	$123.256.988,00	$324.414.000,00	$447.670.988,00

Fuente: Oficio 48-RUTADCTOELECTRONICOS20260812012739 del 13/08/2026. Carpeta: Anexo 01\08_Reporte_financiero-Seg_subcuenta

Al cierre del presente informe, la Interventoría se encuentra a la espera de una directriz por parte de la ANI ya que se requiere conocer como en esta etapa de Reversión, se va a pagar por parte de la ANI esa compensación (sólo el 70%) ya que en reuniones el Concesionario ha manifestado que dentro de la remuneración del 50% que se está previendo a través del otrosí, no podría fondear al 100% y esperar pago de la compensación de la ANI como se venía haciendo.

Por lo tanto, se hace necesario tener claridad para este comité si se va a manejar el mismo procedimiento pre laudo o si se permite contractualmente y es beneficioso proponerle a la ANI que pague directamente desde la Subcuenta Autónoma de Soporte, la cual tendría actualmente los recursos para pagar el 70% que le correspondería para este comité.

Por otro lado, a continuación, se relacionan los oficios que se han generado por las partes para el desarrollo de los CPAA:

Tabla 5-25 Oficios Generado en el marco de las compensaciones ambientales

COMUNICACIÓN	FECHA	ASUNTO
CI.023/AB11303/23/7.1.8	15/08/2023	Instructivo Código: GCSP-I- 024 Versión: 001 del 26/05/2020 - previa aprobación de la ANI de los aportes de los Concesionarios a la subcuenta ambiental, los cuales serán reembolsados por la ANI. Estado de ejecución valor estimado para Compensaciones Ambientales - Sección 8.1(d) de la Parte General del Contrato en referencia.
48-RUTADCTOELECTRONICOS-20230911002367	11/09/2023	Reiteración de respuesta a oficio 20230822002105 del 22 de agosto del 2023. Su oficio CI.023/AB11303/23/7.1.8 del 15 de agosto del 2023. Instructivo Código: GCSP-I- 024 Versión: 001 del 26/05/2020 - previa aprobación de la ANI de los aportes de los Concesionarios a la subcuenta ambiental, los cuales serán reembolsados por la ANI. Estado de ejecución valor estimado para Compensaciones ambientales - Sección 8.1(d) de la Parte General del Contrato en referencia.

COMUNICACIÓN	FECHA	ASUNTO
48-RUTADCTOELECTRONICOS-20230918002413	18/09/2023	Alcance a oficio Corumar 20230808001962 del 8-8-2023 y radicado ANI 20234090882772 del 8-8- 2023, oficio Corumar 20230822002105 del 22-8-2023 y radicado ANI 20234090960792 del 25-8-2023. Instructivo Código: GCSP-I-024 Versión: 001 del 26/05/2020 - previa aprobación de la ANI de los aportes de los Concesionarios a la subcuenta ambiental, los cuales serán reembolsados por la ANI. Estado de ejecución valor estimado para Compensaciones Ambientales - Sección 8.1(d) de la Parte General del Contrato en referencia.
48-RUTADCTOELECTRONICOS-20230920002444	20/09/2023	Instructivo GCSP-I-024. Previa Aprobación de la ANI de los aportes de los Concesionarios a la Subcuenta Ambiental, los cuales serán reembolsados por la ANI. Numeral 6.1 - Literal e) – Informe Técnico.
CI.023/AB11495/23/7.1.8	1/10/2023	Estado de ejecución valor estimado para Compensaciones Ambientales - Sección 8.1(d) de la Parte General del Contrato en referencia.
CI.023/AB11496/23/5.3	1/10/2023	Comunicación del Concesionario 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20230918002413 – Solicitud inicio de Comités Previa Aprobación Ambiental
RUTADCTOELECTRONICOS- 20231010002669	10/10/2023	Respuesta a oficios de radicado CI.023/AB11495/23/7.1.8, CI.023/AB11510/7.1.8 y CI.023/AB11517/23/7.1.8 - Instructivo GCSP-I-024. Previa Aprobación de la ANI de los aportes de los Concesionarios a la Subcuenta Ambiental, los cuales serán reembolsados por la ANI. Numeral 6.1 - Literal e) – Informe Técnico
CI.023/AB11559/23/7.1.8	17/10/2023	Previa aprobación de la ANI de los aportes de los Concesionarios a la subcuenta ambiental, los cuales serán reembolsados por la ANI. Numeral 6.1 - Literal e) – Informe Técnico
48-RUTADCTOELECTRONICOS-20231019002760	19/10/2023	Respuesta oficio de interventoría CI.023/AB11559/23/7.1.8 del 17 de octubre de 2023 con radicado Corumar 47-RUTADCTOELECTRONICOS-20231017006899. Instructivo GCSP-I-024. Previa Aprobación de la ANI de los aportes de los Concesionarios a la Subcuenta Ambiental, los cuales serán reembolsados por la ANI. Numeral 6.1 - Literal e) – Informe Técnico. Alcance a oficio con radicado Corumar 20231019002760 del 20 de noviembre del 2023. Su oficio CI.023/AB11559/23/7.1.8 del 17 de octubre de 2023 con radicado Corumar 47-RUTADCTOELECTRONICOS-20231017006899. Instructivo GCSP-I-024. Previa
48-RUTADCTOELECTRONICOS-20231101002878	1/11/2023	Aprobación de la ANI de los aportes de los Concesionarios a la Subcuenta Ambiental, los cuales serán reembolsados por la ANI. Numeral 6.1 - Literal e) – Informe Técnico

COMUNICACIÓN	FECHA	ASUNTO
48-RUTADCTOELECTRONICOS-20231110002954	10/11/2023	Alcance a oficio con radicado Corumar 20231101002878 del 01 de noviembre del 2023. Su oficio CI.023/AB11559/23/7.1.8 del 17 de octubre de 2023 con radicado Corumar 47- RUTADCTOELECTRONICOS-20231017006899. Instructivo GCSP-I-024. Previa Aprobación de la ANI de los aportes de los Concesionarios a la Subcuenta Ambiental, los cuales serán reembolsados por la ANI. Numeral 6.1 - Literal e) – Informe Técnico.
CI.023/AB11685/23/7.1.8	20/11/2023	Previa aprobación de la ANI de los aportes de los Concesionarios a la subcuenta ambiental, los cuales serán reembolsados por la ANI. Numeral 6.1 - Literal e) – Informe Técnico.
CI.02/AB11781/23/7.1.8	14/12/2023	Reiteración al Concesionario proceder con la devolución de los recursos que se hayan utilizado de los actos administrativos listados en la precitada comunicación de la ANI, los cuales ascienden a la suma de $437.430.595
48-RUTADCTOELECTRONICOS- 20231124003105	24/11/2023	Numeral 6.2 Instructivo GCSP- I-024. Previa Aprobación de la ANI de los aportes de los Concesionarios a la Subcuenta Ambiental, los cuales serán reembolsados por la ANI. Numeral 6.1 - Literal e) – Informe Técnico.
48-RUTADCTOELECTRONICOS-20240222004061	23/02/2024	Respuesta oficio ANI 20236050467811 del 26-12-2023. Numeral 6.2 Instructivo GCSP-I-024. Previa Aprobación de la ANI de los aportes de los Concesionarios a la Subcuenta Ambiental, los cuales serán reembolsados por la ANI. Numeral 6.1 - Literal e) – Informe Técnico.
CI.023/AB12039/24/7.1.8	29/03/2024	Previa aprobación de la ANI de los aportes de los Concesionarios a la subcuenta ambiental, los cuales serán reembolsados por la ANI. Numeral 6.1 - Literal e) – Informe Técnico.
48-RUTADCTOELECTRONICOS-20240308027989	8/03/2024	Atención comunicación CI.023/AB12039/24/7.1.8 del 29 de febrero de 2024 Instructivo GCSP-I-024. Previa aprobación de la ANI de los aportes de los Concesionarios a la subcuenta ambiental, los cuales serán reembolsados por la ANI. Numeral 6.1 - Literal e) – Informe Técnico.
Radicado ANI No.: 20246050088371	8/03/2024	Respuesta radicado 20244090235582 de 23 de febrero de 2023 convocatoria Primer Comité de Previa Aprobación Ambiental
CI.023/AB12081/24/7.1.8	13/03/2024	Su oficio 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20240308027989 - Atención comunicación CI.023/AB12039/24/7.1.8 del 29 de febrero de 2024 Instructivo GCSP-I-024. Previa aprobación de la ANI de los aportes de los Concesionarios a la subcuenta ambiental, los cuales serán reembolsados por la ANI. Numeral 6.1 - Literal e) – Informe Técnico.
48-RUTADCTOELECTRONICOS-20240315004282	15/03/2024	Atención comunicación CI.023/AB12081/24/7.1.8 del 15 de marzo de 2024 Instructivo GCSP-I-024. Previa aprobación de la ANI de los aportes de los Concesionarios a la subcuenta ambiental, los cuales serán reembolsados por la ANI. Numeral 6.1 - Literal e) – Informe Técnico.

COMUNICACIÓN	FECHA	ASUNTO
CI.023/AB12135/24/7.1.8	1/04/2024	Concepto de Interventoría de aprobación tanto del informe técnico como del presupuesto
CI.023/AB12152/24/7.1.8	4/04/2024	Concepto Interventoría numeral 6.3 Instructivo GCSP- I-024. Previa aprobación de la ANI de los aportes de los Concesionarios a la subcuenta ambiental, los cuales serán reembolsados por la ANI. Numeral 6.1 - Literal e) – Informe Técnico
CI.023/AB12220/24/5.3	20/04/2024	Remisión aclaración valores requeridos para la vigencia 2024 del comité de previa aprobación
CI.023/AB12377/24/7.1.8	30/05/2024	Requerimiento al Concesionario para su aclaración por la cesión de derechos económicos de unos de los contratistas que ejecutan las compensaciones – BIOPAZ – a otro contratista denominado REFORESTANDO TIERRA DE ESPERANZA SAS.
CI.023/AB12463/24/5.3.	24/06/2024	Informe de no objeción de la solicitud del comité previa aprobación ambiental
48-RUTADCTOELECTRONICOS-20240624005258	26/06/2024	el Concesionario dio respuesta aclarando el tema de la firma Reforestando, explicación que fue de recibo de la Interventoría
CI.023/AB12463/24/5.3.	27/06/2024	Alcance comunicación Interventoría CI.023/AB12463 /24/5.3. Concepto Interventoría numeral 6.3 Instructivo GCSP- I-024. Previa aprobación de la ANI de los aportes de los Concesionarios a la subcuenta ambiental, los cuales serán reembolsados por la ANI. Numeral 6.1 - Literal e) – Informe Técnico
	17/07/2024	Ejecución reunión 1er CPAA; aprobación montos por parte de la ANI, de los montos solicitados por el Concesionario
48-RUTADCTOELECTRONICOS-20230808001962	8/08/2024	Instructivo Código: GCSP-I- 024 Versión: 001 del 26/05/2020 - previa aprobación de la ANI de los aportes de los Concesionarios a la subcuenta ambiental, los cuales serán reembolsados por la ANI. Estado de ejecución valor estimado para Compensaciones Ambientales - Sección 8.1(d) de la Parte General del Contrato en referencia.
Rad. ANI No. 20240906006163	6/09/2024	el Concesionario instruyó a la Fiduciaria Bancolombia para que procediera con el fondeo
C303700200-10134-01914	12/09/2024	La fiducia informa a la ANI acerca del fondeo de la subcuenta con los valores aprobados, por valor de $2.785.826.664.
Radicado ANI No.: 20246050340951	23/09/2024	La ANI autorizó al Concesionario para que efectuara el fondeo en la Subcuenta Compensaciones Ambientales correspondiente a la suma de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES SETENTA Y OCHO MIL PESOS SEISCIENTOS SESENTA CINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 1.950.078.665 M/CTE) y así dar continuidad a la ejecución de Compensaciones Ambientales del Proyecto
48-RUTADCTOELECTRONICOS-20250204007653 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20250205007685	5/02/2025	El concesionario remite solicitud de citación para el 2° Comité de Previa Aprobación Ambiental – CPAA

COMUNICACIÓN	FECHA	ASUNTO
CI.023/AB13305/25/7.1.8	17/02/2025	Interventoría solicita que previo a iniciar el trámite de convocatoria, considera que el Concesionario debe actualizar el Informe técnico de que trata el literal e) del Numeral 6. CONSIDERACIONES PREVIAS A LA REALIZACIÓN DEL COMITÉ DE PREVIA APROBACIÓN, del citado Instructivo GCSP-I-024
48-RUTADCTOELECTRONICOS-20250226007939	27/02/2025	Concesionario remite el Informe Técnico actualizado para la no objeción de la Interventoría
48-RUTADCTOELECTRONICOS-20250317008127	17/03/2025	El Concesionario remite la actualización del informe técnico del que trata el Instructivo GCSP-I-024 solicitado por la Interventoría, para la activación del 2° Comité Previa Aprobación de la ANI de los aportes de los Concesionarios a la Subcuenta Ambiental los cuales serán reembolsados por la ANI, a la vez que remiten el presupuesto ajustado de fecha 17/03/2025
CI.023/AB13436/25/7.1.8	17/03/2025	La Interventoría informa que el presupuesto fue No Objetado por valor de $28139584126,47
CI.023/AB13444/25/7.1.8	31/03/2025	Interventoría da respuesta a la comunicación del concesionario, y procedió con la No Objeción del informe técnico, con el fin de que se continúe con la aplicación del Instructivo GCSP-I-024 Previa aprobación de la ANI de los aportes de los Concesionarios a la subcuenta ambiental. Dado lo anterior, se solicitó la Concesionario dar aplicación al numeral 6.2 SOLICITUD DEL CONCESIONARIO ANTE LA ANI, PARA LA PREVIA APROBACIÓN DE LOS APORTES A REALIZAR.
CI.023/AB13470/25/7.1.8	7/04/2025	La Interventoría presentó el concepto de No Objeción a la ANI requerido en el numeral 6.3. PARTICIPACIÓN DE LA INTERVENTORÍA DEL PROYECTO EN EL COMITÉ DE PREVIA APROBACIÓN DE APORTES del citado Instructivo GCSP-I-024, como soporte para la toma de decisión por parte de la ANI, para la citación y ejecución del 2° CPAA.
Radicado ANI No.: 20256050134231	21/04/2025	la ANI Mediante comunicación citó tanto al Concesionario como a la interventoría para realizar el 2° CPAA
	24/04/2025	Ejecución reunión 2° CPAA; y ejecución del 2° CPAA. Así las cosas, los valores proyectados y aprobados para la vigencia del primer semestre del año 2025 por la ANI en el 2° CPAA, son de $ 1.686.136.876,75 COP, de acuerdo con lo que solicitó el Concesionario
C303700200-10134-00663	4/06/2025	La Fiducia Bancolombia informó a la ANI acerca de la autorización remitida por el Concesionario para que procediera con el traslado de recursos por concepto de fondeo de la Subcuenta Ambiental.
Radicado ANI No. 20256050199111	10/06/2025	La ANI mediante comunicación remitió la autorización de fondeo de los valores autorizados en el 2° CPPA
-RUTADCTOELECTRONICOS- 20250902009798	2/09/2025	CORUMAR remite el Informe Técnico a la vez que solicita la activación del tercer CPAA

COMUNICACIÓN	FECHA	ASUNTO
CI.023/AB14045/25/7.1.8	12/09/2025	La Interventoría realizó observaciones y solicitó ajustes al informe
8-RUTADCTOELECTRONICOS-20250922009989	30/09/2025	CORUMAR remite nuevamente el informe técnico para revisión
CI.023/AB14132/25/7.1.8	1/10/2025	Interventoría solicita nuevamente ajustar el informe técnico en orden a cumplir lo requerido en el literal e) del Numeral 6.1. ASPECTOS PREVIOS QUE DEBE TENER EN CUENTA EL CONCESIONARIO Y LA INTERVENTORÍA, PARA ENVIAR A LA ANI LA SOLICITUD DE PREVIA APROBACIÓN DE LOS APORTES A REALIZAR del Instructivo PREVIA APROBACIÓN DE LA ANI DE LOS APORTES DE LOS CONCESIONARIOS A LA SUBCUENTA AMBIENTAL, LOS CUALES SERÁN REEMBOLSADOS POR LA ANI, Código GCSO-I-024.
48-RUTADCTOELECTRONICOS-20251007010164	9/10/2025	El Concesionario El 9 de octubre de 2025 por medio de la comunicación 48- RUTADCTOELECTRONICOS-20251007010164 así como la información recibida mediante correo electrónico del 15 de octubre de 2025 con información de alcance requerida, el Concesionario ajustó el informe técnico de acuerdo con las observaciones realizadas por la interventoría
48-RUTADCTOELECTRONICOS-20251021010276	21/10/2025	CORUMAR solicitó a la ANI citar el 3er comité a la vez que propuso tres fechas para su realización
CI.023/AB14194/25/7.1.8	17/10/2025	la Interventoría dio la no objeción al citado informe a la vez que solicitó al Concesionario dar aplicación al numeral 6.2 SOLICITUD DEL CONCESIONARIO ANTE LA ANI, PARA LA PREVIA APROBACIÓN DE LOS APORTES A REALIZAR.
CI.023/AB14239/25/5.3	30/10/2025	Interventoría en cuanto a la aplicación del numeral 6.3. PARTICIPACIÓN DE LA INTERVENTORÍA DEL PROYECTO EN EL COMITÉ DE PREVIA APROBACIÓN DE APORTES del instructivo GCSP-I-024, con la comunicación procedió con el concepto antes enunciado, con el respectivo pronunciamiento en cada uno de los puntos del numeral del Instructivo GCSP- I-024.
Correo electrónico	5/11/2025	la ANI por medio de correo electrónico de fecha 05/11/2025 citó al comité para el día 12 de noviembre de 2025
	12/11/2025	Realización ejecución 3er CPAA. La ANI aprobó la ejecución y/o reprogramación de recursos no ejecutados en los anteriores CPAA, por valor de **$556.024.692.**
48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260126011049	26/01/2026	Programación de ejecución para la activación del cuarto comité de previa aprobación ambiental
CI.023/AB14528/26/7.1.8	6/02/2026	La interventoría objeta el informe y lo devuelve para ajustes

COMUNICACIÓN	FECHA	ASUNTO
IPAB-039-2026 (radicado ANI 20264090302382 del 11/03/2026)	11/03/2026	Programación de ejecución para la activación del cuarto comité de previa aprobación ambiental
Radicado No. ANI 20266050101291	20/03/2026	Respuesta comunicación radicado ANI No. 20264090302382 de 11 de marzo de 2026. Asunto Respuesta Radicado Concesionario 48RUTADCTOELECTRONICOS20260211011229. Programación de ejecución para la activación del cuarto comité de previa aprobación ambiental. - Contrato de Concesión No.016 de 2015. Proyecto Vial Conexión IP Antioquia – Bolívar
IPAB-0120-2026 (Radicado ANI Radicado 20264090414422)	6/04/2026	No Objeción a la programación del 4to Comité Ambiental Previa Aprobación
48-RUTADCTOELECTRONICOS 20260406011745	06/04/2026	Informe ejecución de actividades de compensación realizadas en el mes de marzo 2026
Radicado ANI 20266050138441	21/04/2026	Solicitud alcance concepto de Interventoría, en atención a Alcance comunicado 20264090328502 del 16 de marzo 2026. Solicitud de programación del cuarto comité de previa aprobación de la ANI de los aportes del concesionario a la subcuenta ambiental. Contrato de Concesión APP N° 016 de 2025–“Antioquia – Bolívar”
Radicado ANI No. 20264090566662 del 07 de mayo de 2026 (Radicado IPAB No. IPAB-0247-2026),	7/05/2026	El Consorcio IPAB, remitió la no objeción a la ejecución del cuarto (4) comité ambiental.
Radicado: 48-RUTADCTOELECTRONICOS20260521012140 del 21/05/2026	21/05/2026	La Concesión informó a la ANLA mediante oficio Radicado: 48-RUTADCTOELECTRONICOS20260521012140 del 21/05/2026, el inicio de las labores de aislamiento y establecimiento el 19/05/2026
Radicado: 48-RUTADCTOELECTRONICOS2026052901222	01/06/2026	Cumplimiento numeral 9 del Instructivo GCSP-I-024. Informe mayo de 2026, Seguimiento inversión 1er, 2° y 3r Comité Previa Aprobación Ambiental.

COMUNICACIÓN	FECHA	ASUNTO
	04/06/2026	Ejecución del cuarto 4° comité previa aprobación ambiental
IPAB-0431-2026	23/06/2026	Se objeta el informe de compensaciones de mayo 2026, radicado bajo el numero 48-RUTADCTOELECTRONICOS2026052901222
48-RUTADCTOELECTRONICOS20260612012325	12/06/2026	Se solicitó la activación del Quinto comité previa aprobación ambienta
IPAB-0450-2026.	01/07/2026	Se objeta la información allegada para la activación del quinto comité previa aprobación ambiental
48-RUTADCTOELECTRONICOS20260707012446	8/07/2026	Cumplimiento numeral 9 del Instructivo GCSP-I-024. Informe junio de2026, Seguimiento inversión 1er, 2do, 3er y 4to Comité previa Aprobación Ambiental.
RUTADCTOELECTRONICOS20260707012447	09/07/2026	Su oficio No. IPAB-0450-2026 del 01 de julio de 2026. Objeción a la programación del quinto comité ambiental previa aprobación
IPAB-0526-2026	22/07/2026	Respuesta al comunicado 48-RUTADCTOELECTRONICOS20260626012404 del 30 de junio de 2026 con asunto: “Su oficio No IPAB-0431-2026 del 23 de junio del 2026. Observaciones al documento INFORME EJECUCION DE ACTIVIDADES DE COMPENSACION REALIZADAS EN EL MES DE MAYO 2026”

COMUNICACIÓN	FECHA	ASUNTO
IPAB-0527-2026	22/07/2026	Respuesta al oficio 48-RUTADCTOELECTRONICOS20260707012446 del 08 de julio de 2026 con asunto: “Cumplimiento numeral 9 del Instructivo GCSP-I024. Informe junio de 2026, Seguimiento inversión 1er, 2do, 3er y 4to Comité Previa Aprobación Ambiental”
IPAB-0534-2026	23/07/20026	Respuesta comunicada No.48-RUTADCTOELECTRONICOS20260707012447 del 09 de julio de 2026 con asunto: “Su oficio No IPAB-0450-2026 del 01 de julio del 2026. Objeción a la programación del quinto Comité Ambiental Previa Aprobación”
48-RUTADCTOELECTRONICOS20260724012591	28/07/2026	Su oficio No IPAB-0527-2026 del 22 de julio del 2026. “Cumplimiento numeral 9 del Instructivo GCSP-I- 024. Informe junio de 2026, Seguimiento inversión 1er, 2do, 3er y 4to Comité Previa Aprobación Ambiental”
Radicado: 48-RUTADCTOELECTRONICOS20260723012588	28/07/2026	Su oficio No IPAB-0526-2026 del 22 de julio del 2026. Observaciones al documento INFORME EJECUCION DE ACTIVIDADES DE COMPENSACION REALIZADAS EN EL MES DE MAYO 2026”
CIRCULAR No. 20266050000484 (ANI)	30/07/2026	Traslado de la Circular No. 10002026E4000030 del 28 de mayo de 2026 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y fortalecimiento de acciones de gestión del riesgo frente a los posibles efectos del Fenómeno Climático El Niño y otros fenómenos climáticos sobrepuestos
IPAB-0587-2026	03/08/2026	Respuesta a comunicado 48-RUTADCTOELECTRONICOS20260707012446 del 08 de julio de 2026de 2026 con asunto: “Cumplimiento numeral 9 del Instructivo GCSP-I-024. Informe junio de 2026, Seguimiento inversión 1er, 2do, 3er y 4to Comité Previa Aprobación Ambiental” Respuesta a comunicado 48-RUTADCTOELECTRONICOS20260724012591 del 28 de julio de 2026 cuyo asunto es: “Su oficio No IPAB-0527-2026 del 22 de julio del 2026. “Cumplimiento numeral 9 del Instructivo GCSP-I- 024. Informe junio de 2026, Seguimiento inversión 1er, 2do, 3er y 4to Comité Previa Aprobación Ambiental””

COMUNICACIÓN	FECHA	ASUNTO
IPAB-0588-2026	03/08/2026	Respuesta a comunicado 48-RUTADCTOELECTRONICOS20260529012227 del 01 de junio de 2026 con asunto: "Cumplimiento numeral 9 del Instructivo GCSP-I-024. Informe mayo de 2026, Seguimiento inversión 1er, 2° y 3 Comité Previa Aprobación Ambiental" Respuesta a comunicado 48-RUTADCTOELECTRONICOS20260626012404 del 30 de junio de 2026 con asunto: "Su oficio No IPAB-0431-2026 del 23 de junio del 2026. Observaciones al documento INFORME EJECUCION DE ACTIVIDADES DE COMPENSACION REALIZADAS EN EL MES DE MAYO 2026" Respuesta a comunicado 48-RUTADCTOELECTRONICOS20260723012588 del 28 de julio de 2026 cuyo asunto es: "Su oficio No IPAB-0526-2026 del 22 de julio del 2026. Observaciones al documento INFORME EJECUCION DE ACTIVIDADES DE COMPENSACION REALIZADAS EN EL MES DE MAYO 2026"
IPAB-0592-2026	5/08/2026	Solicitud de información sobre el estado actual del procedimiento administrativo adelantado mediante los Autos Nos.205 de 2023, 17927 de 2024 y 0832 de 2025, por el presunto incumplimiento de la Resolución No.026 de 2019, relacionada con el permiso de aprovechamiento forestal, en el que fueron vinculadas la Concesión Ruta al Mar S.A.S. y la Fundación para el Desarrollo Integral de Colombia – BIOPAZ
IPAB-0594-2026	5/08/2026	Traslado Circular No.20266050000484 de la ANI, cuyo asunto es: "Traslado de la Circular No. 10002026E4000030 del 28 de mayo de 2026 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y fortalecimiento de acciones de gestión del riesgo frente a los posibles efectos del Fenómeno Climático El Niño y otros fenómenos climáticos sobrepuestos"
IPAB-0608-2026	11/08/2026	Respuesta a su solicitud remitida mediante correo electrónico del 14 de julio de 2026 y 17 de julio de 2026, bajo el asunto "Requerimiento información URGENTE Solicitud de conciliación extrajudicial - temas de compensación"
48-RUTADCTOELECTRONICOS20260821012819	25/08/2026	Cumplimiento numeral 9 del Instructivo GCSP-I-024. Informe julio de 2026, Seguimiento inversión 1er, 2°, 3r y 4to Comité Previa Aprobación Ambiental

COMUNICACIÓN	FECHA	ASUNTO
48-147-20260827028435	28/08/2026	Expediente LAV0053-00-2017. Cambio menor numeral 17 - Cambio de sitios para compensaciones forestales, dentro de lo dispuesto en el manual de compensación o el que haga sus veces. Artículo 2.2.2.6.1.3 del Decreto 1076 del 2015. Variante de Planeta Rica UFI 3.1. Resolución 00705 del 29 de abril de 2019 y oficio 2021093786-2-000 del 2021-05-12.
48-RUTADCTOELECTRONICOS2026082801288	1/09/2026	Respuesta oficio IPAB-0594-2026: Traslado Circular No.20266050000484 de la ANI, cuyo asunto es: "Traslado de la Circular No. 10002026E4000030 del 28 de mayo de 2026 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y fortalecimiento de acciones de gestión del riesgo frente a los posibles efectos del Fenómeno Climático El Niño y otros fenómenos climáticos sobrepuestos". RADICADO 47-RUTADCTOELECTRONICOS20260806015544
IPAB-0714-2026	2/09/2026	Observaciones al oficio 48-RUTADCTOELECTRONICOS20260821012819 del 25 de agosto de 2026 cuyo asunto es: "Cumplimiento numeral 9 del Instructivo GCSP-I-024. Informe julio de 2026, Seguimiento inversión 1er, 2°, 3r y 4to Comité Previa Aprobación Ambiental"
48-RUTADCTOELECTRONICOS20260901012920	3/09/2026	Reiteración oficio 20264091065032 del 20/08/2026. Su oficio No IPAB-0534-2026 del 23 de julio del 2026. Objeción a la programación del quinto Comité Ambiental Previa Aprobación.
IPAB-0744-2026	7/09/2026	Observaciones al "Informe de gestión del riesgo frente a los posibles efectos del fenómeno climático el niño y otros fenómenos climáticos sobrepuestos", radicado mediante el oficio 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260828012885 del 01 de septiembre de 2026 cuyo asunto es: "Respuesta oficio IPAB-05942026: Traslado Circular No.20266050000484 de la ANI, cuyo asunto es: "Traslado de la Circular No. 10002026E4000030 del 28 de mayo de 2026 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y fortalecimiento de acciones de gestión del riesgo frente a los posibles efectos del Fenómeno Climático El Niño y otros fenómenos climáticos sobrepuestos". RADICADO 47RUTADCTOELECTRONICOS20260806015544"

COMUNICACIÓN	FECHA	ASUNTO
48-RUTADCTOELECTRONICOS20260904012951	8/09/2026	Su oficio No IPAB-0714-2026 del 02 de septiembre del 2026. Observaciones al documento Informe julio de 2026, Seguimiento inversión 1er, 2°, 3r y 4to Comité Previa Aprobación Ambiental”
IPAB-0757-2026	14/09/2026	Observaciones al oficio 48-RUTADCTOELECTRONICOS20260904012951 del 08 de septiembre de 2026 cuyo asunto es: “Su oficio No IPAB-0714-2026 con radicado del 02 de septiembre del 2026. Observaciones al documento Informe julio de 2026, seguimiento inversión 1er, 2°, 3r y 4to Comité Previa Aprobación Ambiental”
48-RUTADCTOELECTRONICOS20260915013024	16/09/2026	Su oficio No IPAB-0757-2026 del 14 de septiembre de 2026. Observaciones al documento Informe julio de 2026, seguimiento inversión 1er, 2°, 3r y 4to Comité Previa Aprobación Ambiental”
48-RUTADCTOELECTRONICOS20260915013035	16/09/2026	Respuesta oficio IPAB-0744-2026: Observaciones al “Informe de gestión del riesgo frente a los posibles efectos del fenómeno climático el niño y otros fenómenos climáticos sobrepuestos”, radicado mediante el oficio 48RUTADCTOELECTRONICOS-20260828012885 del 01 de septiembre de 2026. RADICADO 47-RUTADCTOELECTRONICOS-20260908015793
IPAB-0788-2026	18/09/2026	Respuesta a Circular ANI 20266050000484 de fecha 31 de julio del 2026 con asunto: “Traslado de la Circular No. 10002026E4000030 del 28 de mayo de 2026 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y fortalecimiento de acciones de gestión del riesgo frente a los posibles efectos del Fenómeno Climático El Niño y otros fenómenos climáticos sobrepuestos” (Comunicado del Concesionario 48-RUTADCTOELECTRONICOS 20260915013035 del 16 de septiembre de 2026)
48-RUTADCTOELECTRONICOS20260921013080	23/09/2026	Cumplimiento numeral 9 del Instructivo GCSP-I-024. Informe agosto de 2026, Seguimiento inversión 1er, 2do, 3er y 4to Comité Previa Aprobación Ambiental.

COMUNICACIÓN	FECHA	ASUNTO
IPAB-0814-2026	28/09/2026	Observaciones al oficio 48-RUTADCTOELECTRONICOS20260915013024 del 16 de septiembre de 2026 cuyo asunto es: "Su oficio No IPAB-0757-2026 del 14 de septiembre de 2026. Observaciones al documento Informe julio de 2026, seguimiento inversión 1er, 2°, 3r y 4to Comité Previa Aprobación Ambiental"

Fuente: Consorcio IPAB, 2026

5.7. SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS Y MEDIDAS DEL PAGA DURANTE LA REVERSIÓN

A partir del 02 de mayo del 2026, fecha en la cual inició la etapa de reversión del Contrato de Concesión, la Interventoría ha realizado el seguimiento ambiental a las actividades asociadas al proceso de reversión, con fundamento en la normatividad ambiental vigente, los instrumentos de manejo ambiental aplicables, los permisos y autorizaciones ambientales otorgados para el proyecto, así como en las obligaciones contractuales y ambientales pendientes de cierre.

En este contexto, la Interventoría verifica el estado de cumplimiento de las obligaciones ambientales derivadas de la fase de construcción ejecutada en las diferentes Unidades Funcionales, incluyendo el seguimiento a los Planes de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), permisos, autorizaciones, requerimientos de las autoridades ambientales y demás compromisos asociados al proyecto.

Es importante precisar que las aprobaciones de los PAGA y los actos de no objeción asociados corresponden a actuaciones adelantadas durante la ejecución contractual y, en su momento, gestionadas por la interventoría anterior, conforme a los registros documentales y comunicaciones oficiales del proyecto. Dicha información se incorpora en el presente informe como antecedente para efectos de trazabilidad, verificación y seguimiento de las obligaciones ambientales objeto del proceso de reversión.

Durante el período evaluado; en la UFI 1, en la UFI 2 y 6.1 instalación de tachas, en la UFI 3 No registra actividades, en la UFI 4 y 5 se ejecutaron actividades de intervención del puente Trementino, bacheo y manejo de taludes, en la UFI 6 se registra actividades de estabilización de taludes y rocería; y en la UFI 8 no registra actividades.

5.7.1. Conformación del Grupo de Gestión Ambiental

El Concesionario dentro de su grupo de trabajo y para atender las unidades funcionales Concesionadas, cuenta con un grupo de gestión Ambiental, el cual está conformado por un Coordinador Ambiental, un ingeniero Ambiental y/o tecnólogo, 1 Biólogo.

La empresa el Cóndor, contratista EPC del Concesionario, realiza las labores de tala rescate de veda y ahuyentamiento de la fauna presente en el corredor vial, y de igual manera cuenta con 1 ingeniero ambiental.

NOMBRE	CARGO
Johana Ghysais	Profesional Ambiental
Oswaldo Gambin	Coordinador Ambiental
Lina Oviedo	Bióloga

5.7.2. Capacitación y concientización para el personal de obra

Durante el período evaluado, el Concesionario realizó inducciones al personal de nuevo ingreso, en cumplimiento de la política integral de la empresa, la cual establece que todo trabajador que se vincule al proyecto debe recibir una inducción inicial. En estas jornadas se socializan de manera detallada los Planes de Manejo Ambiental (PMA) y se resalta la importancia de su correcta implementación durante el desarrollo de las actividades de obra.

Adicionalmente, se llevan a cabo charlas diarias de “cinco minutos” dirigidas a todo el personal, previas al inicio de las labores, con el fin de reforzar aspectos ambientales, de seguridad y buenas prácticas operativas. Entre las charlas impartidas al personal durante el período se destacan las siguientes:

UF	Inducción	Capacitaciones	Tema
1,2,3,4,5,6,7 y 8	0	9	- Seguridad vial. - Riesgo mecánico. - Riesgo ergonómico. - Riesgo biológico. - Riesgo psicosocial - Pausas Activas. - Aspectos e impactos Ambientales

UF	Inducción	Capacitaciones	Tema
			- Ecosistemas estratégicos: Protección flora y fauna - Uso y ahorro eficiente del agua y energía.

Las capacitaciones por lo general son a primera hora del día antes de comenzar las actividades constructivas, con la finalidad de no interrumpir la programación de obra o en cualquier espacio que la obra se encuentre suspendida por una u otra circunstancia.

5.7.3. Cumplimiento de Requerimientos Legales

Durante el período evaluado, la Concesión obtuvo los permisos ambientales requeridos para la construcción de los peajes correspondientes a las Unidades Funcionales de Intervención (UFI) 1, 4 y 5. En el presente informe se relacionan únicamente los permisos asociados al aprovechamiento forestal y a los vertimientos, teniendo en cuenta que, para la etapa constructiva se tramitaron y obtuvieron la totalidad de los permisos necesarios, los cuales a la fecha se encuentran cerrados o en proceso de cierre ante la autoridad ambiental competente.

Adicionalmente, para las UFI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.3 y 8, la Concesión cuenta con proveedores externos debidamente autorizados, quienes disponen de los permisos y/o autorizaciones ambientales vigentes para la prestación de los servicios contratados. A continuación, se relacionan los principales gestores y operadores ambientales:

- Los residuos hospitalarios generados por los servicios de ambulancia son gestionados por la empresa Bioresiduos, la cual realiza el tratamiento mediante incineración y da cumplimiento a los requisitos técnicos y normativos asociados a la gestión de residuos peligrosos, de acuerdo con sus características de peligrosidad y la normatividad ambiental vigente.

- La disposición final de los residuos sólidos ordinarios se realiza a través de la empresa Servigenerales S.A. E.S.P., la cual cuenta con Licencia Ambiental vigente para su operación, otorgada mediante Resolución No. 08861 de 2005 expedida por la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS). El material reciclable generado es entregado a la Fundación IMAT para su aprovechamiento.

- Los residuos sólidos peligrosos son gestionados por la empresa Ascrudos LTDA, la cual cuenta con licencia ambiental otorgada por el Área Metropolitana

del Valle de Aburrá, para el manejo, transporte y disposición de este tipo de residuos.

- Las aguas residuales domésticas generadas por la limpieza y mantenimiento de las unidades sanitarias portátiles son recolectadas por la empresa Septicleam y transportadas para su tratamiento y disposición final a la empresa Veolia S.A. E.S.P., la cual cuenta con Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) aprobado por la CVS, cuya última modificación corresponde a la Resolución No. 2-0661 del 31 de diciembre de 2014.

5.7.4. Manejo Integral de Materiales de Construcción

Para la ejecución de las obras de mantenimiento de las unidades funcionales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.3 y 8 los materiales son provenientes de la Planta de construcciones El Cóndor Sede Lorica, materiales de mezcla asfáltica y prefabricados, esta planta cuenta con los respectivos permisos ambientales según la Resolución 2-6521 del 23-09-2019 expedida por CVS, quienes adquieren los materiales pétreos de:

- **Cantera Lorica II** ATEI UAH-10471, Licencia ambiental Resolución CVS N° 2-7499 del 23/09/2020 y Resolución ANM N°000097 del 18/02/2019.

Durante el período evaluado, se generaron sobrantes producto del fresado de la carpeta asfáltica. Dicho material fue retirado y aprovechado por los subcontratistas como materia prima para la elaboración de nueva mezcla asfáltica, en el marco de prácticas de reutilización y aprovechamiento de materiales. En consecuencia, estos sobrantes no requirieron disposición final como residuos de construcción y demolición (RCD), de conformidad con la normatividad ambiental vigente.

Durante el periodo adicionalmente se utilizó material de concreto el cual fue adquirido con la empresa CONCRETOS DEL SINÚ la cual se encuentra ubicada en el kilómetro 2, sobre la vía que conduce de la ciudad de Montería al corregimiento de Las Palomas, la cual le compra materiales de construcción de la **CANTERA EL CABRERO** a la empresa **COMERCIALIZADORA AGRECONS SAS** CON **NIT 900.710.539-9** que cuenta con licencia ambiental **Resolución Ambiental No 2-9554** y **Contrato de concesión Minero No RHB – 15221 y CRM No 202603171049.**

A continuación, se detallan las actividades realizadas por la Concesión en cada una de las UFI antes mencionadas.

5.7.4.1. UFI 1 Caucasia – Planeta Rica.

Para el desarrollo de las actividades ejecutadas durante el período evaluado, se utilizó mezcla asfáltica proveniente de la Planta de Construcciones El Cóndor, sede Lorica, la cual cuenta con permiso ambiental vigente otorgado mediante la Resolución No. 2-6521 del 23 de septiembre de 2019, expedida por la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS).

El material fue transportado en las cantidades requeridas para cada jornada laboral, de acuerdo con la programación de obra, razón por la cual no fue necesario habilitar ni utilizar áreas de acopio temporal para el almacenamiento de los materiales durante el período reportado.

5.7.4.2. UFI 2 y 6.1 Cereté – Lorica

No se registra novedad con relación a la ficha.

5.7.4.3. UFI 5 Arboletes – Montería y UFI 4 Montería – Planeta Rica.

Para el desarrollo de las actividades ejecutadas durante el período evaluado, se utilizó mezcla asfáltica proveniente de la Planta de Construcciones El Cóndor, sede Lorica, la cual cuenta con permiso ambiental vigente otorgado mediante la Resolución No. 2-6521 del 23 de septiembre de 2019, expedida por la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS).

Durante el periodo adicionalmente se utilizó material de concreto el cual fue adquirido con la empresa CONCRETOS DEL SINÚ la cual se encuentra ubicada en el kilómetro 2, sobre la vía que conduce de la ciudad de Montería al corregimiento de Las Palomas, la cual le compra materiales de construcción de la **CANTERA EL CABRERO** a la empresa **COMERCIALIZADORA AGRECONS SAS** CON **NIT 900.710.539-9** que cuenta con licencia ambiental **Resolución Ambiental No 2-9554** y **Contrato de concesión Minero No RHB – 15221 y CRM No 202603171049**

El material fue transportado en las cantidades requeridas para cada jornada laboral, de acuerdo con la programación de obra, razón por la cual no fue necesario habilitar ni utilizar áreas de acopio temporal para el almacenamiento de los materiales durante el período reportado.

5.7.4.4. UFI 3 Variante Planeta Rica – Cereté.

No se registra novedad con relación a la ficha.

5.7.4.5. UFI 6 Lorica – Tolú.

No se registra novedad con relación a la ficha.

5.7.4.6. UFI 7.3 Tolú – Pueblito

No se registra novedad con relación a la ficha.

5.7.4.7. UFI 8 Tolú – Cruz del Viso.

No se registra novedad con relación a la ficha.

5.7.5. Señalización en frentes de obra y sitios temporales

UFI 1

Dentro de los recorridos realizados por el área SST a este frente de trabajo se evidencian actividades de bacheo.

	
Foto 01. PR 52+030 UFI 1	Foto 02. PR 52+210 UFI 1

UFI 2 y 6.1

Se realiza inspección de las zonas de transición de estas unidades funcionales, se realiza actividades de instalación de tachas.

	
Foto 01. PR 16+300 UFI 6.1	Foto 02. PR 16+690 UFI 6.1

UFI 4.1

Dentro de los recorridos realizados por el área SST a este frente de trabajo se evidencian actividades de instalación de bacheo e instalación de tachas.

	
Foto 03. PR 29+000 UFI 4.1	Foto 04. PR 29+550 UFI 4.1

UFI 4.2

Dentro de los recorridos realizados por el área SST a este frente de trabajo se evidencian actividades de sello de fisura.

	
Foto 03. PR 38+900 UFI 4.2	Foto 04. PR 38+900 UFI 4.2

UFI 5.1

Dentro de los recorridos realizados por el área SST a este frente de trabajo se evidencian actividades de armado de hierro y fundida de pilotes del puente Trementino II y estabilización de taludes. se observan hallazgo para comunicar al concesionario.

	
Foto 05. PR 18+980 UFI 5.1	Foto 06. PR 07+370 UFI 5.1

UFI 5.2

Dentro de los recorridos realizados por el área SST a este frente de trabajo se evidencian actividades de bacheo y tachas.

	
Foto 07. PR 02+350 UFI 5.2	Foto 08. PR 03+200 UFI 5.2

UFI 6.2

Dentro del recorridos realizados por el área SST a este frente de trabajo se evidencian actividades de estabilización de taludes para pasos peatonales. No se observan hallazgos para comunicar al concesionario.

	
Foto 09. PR 18+335 UFI 6.2	Foto 10. PR 18+000 UFI 6.2

5.7.6. Manejo Y Disposición Final De Escombros

5.7.6.1. UFI 1 Caucasia – Planeta Rica.

No se registra novedad con relación a la ficha

5.7.6.2. UFI 2 y 6.1 Cereté – Lorica

No se registra novedad con relación a la ficha

5.7.6.3. UFI 3 Variante Planeta – Cereté.

Durante el período evaluado, se generaron sobrantes producto del fresado de la carpeta asfáltica. Dicho material fue retirado y aprovechado por los subcontratistas como materia prima para la elaboración de nueva mezcla asfáltica, en el marco de prácticas de reutilización y aprovechamiento de materiales. En consecuencia, estos sobrantes no requirieron disposición final como residuos de construcción y demolición (RCD), de conformidad con la normatividad ambiental vigente

5.7.6.4. UFI 5 Arboletes – Montería y UFI 4 Montería – Planeta Rica.

Durante el período evaluado, se generaron materiales sobrantes producto de las actividades de fresado de la carpeta asfáltica y de la demolición del puente Trementino. En el marco de las actividades de seguimiento y control, se realizó una observación relacionada con el manejo inadecuado de los residuos provenientes de la demolición del puente, debido a que estos se encontraban dispuestos dentro del cauce. Al cierre del presente informe, la Concesión no ha emitido respuesta formal frente a la observación realizada; no obstante, durante las verificaciones efectuadas en campo, la Interventoría evidenció que los residuos de demolición fueron retirados del cauce.

5.7.6.5. UFI 6 Lorica – Tolú.

No se registra novedad con relación a la ficha.

5.7.6.6. UFI 7.3 Tolú – Pueblito

No se registra novedad con relación a la ficha.

5.7.6.7. UFI 8 Tolú – Cruz del Viso.

No se registra novedad con relación a la ficha

5.7.7. Manejo y Disposición Final de Residuos Sólidos Convencionales y Especiales

A continuación, se presenta la gestión adelantada por la Concesión en relación con las medidas de manejo implementadas para los residuos sólidos, abarcando desde su generación en la fuente hasta su disposición final, de acuerdo con sus características y en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

En las Unidades Funcionales de Intervención (UFI) 1, 3, 4, 5, 6, 7.3 y 8, los residuos ordinarios y/o especiales generados son segregados y depositados en puntos

ecológicos debidamente señalizados. Posteriormente, estos residuos son recolectados por el mismo Concesionario y entregados a la empresa Servigenerales S.A. E.S.P., para su transporte y disposición final en el relleno sanitario Loma Grande, ubicado en la ciudad de Montería.

La empresa Servigenerales S.A. E.S.P. cuenta con Licencia Ambiental para el desarrollo de sus actividades, otorgada mediante la Resolución No. 08861 de 2005, expedida por la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), garantizando el cumplimiento de la legislación ambiental vigente.

Por otra parte, los residuos sólidos especiales generados durante la ejecución de las actividades, principalmente material contaminado con hidrocarburos (trapos y estopas), son manejados de manera diferenciada. Estos residuos son transportados a la planta Los Pocitos, donde se realiza su almacenamiento temporal, para posteriormente ser recolectados, tratados y dispuestos por la empresa Asocrudos Ltda., la cual cuenta con las licencias y permisos ambientales correspondientes para el manejo de este tipo de residuos.

Para la UFI 1 Se contó con puntos ecológicos en los peajes de La Apartada y manguitos, donde se realizaba el bacheo contaban con bolsas plásticas, registrando cumplimiento a lo establecido en las fichas aprobadas

Para la UFI 2 y 6.1 Se contó con puntos ecológicos en el peaje de matá de Caña, registrando cumplimiento a lo establecido en las fichas aprobadas

En la UFI 3. Se contó con puntos ecológicos en el peaje de San Carlos.

En la UFI 5 y 4: Durante este periodo la Concesión contó con 3 puntos ecológicos ubicados en los peajes de Cedros y Purgatorio y en los frentes de obra, donde se realizaba el bacheo contaban con bolsas plásticas, registrando cumplimiento a lo establecido en las fichas aprobadas.

UFI 6. No se registra novedad en relación a la ficha

UFI 7.3. No se registra novedad en relación a la ficha.

UFI 8. No se registra novedad en relación a la ficha.

Tabla 5-26 Consolidado Residuos generados

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	UFI 1	UFI 2 y 6.1	UFI 3	UFI 4 y 5	6	7.3	8
RESIDUOS RECICLABLES	KG	0	0	0	0	0	0	0
RESIDUOS ORDINARIOS	KG	1	1	0	1	0	0	0
RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS	KG	0	1	0	0	0	0	0
RESIDUOS LÍQUIDOS PELIGROSOS	GL	0	0	0	0	0	0	0

5.7.8. Manejo de Aguas Superficiales

5.7.8.1. UFI 5 Arboletes – Montería y UFI 4 Montería – Planeta Rica.

Con este programa se propende por la prevención, minimización y control de los impactos que se producen sobre el recurso hídrico, así como garantizar el cumplimiento de las normas legales vigentes en la materia.

Se cuenta con la resolución 235 del 13 de febrero del 2026 donde la corporación CVS otorga un permiso de concesión de aguas para construcción del puente Trementino y la resolución 632 del 24 de abril del 2026 para la captación de agua.

Las medidas ambientales tenidas en cuenta durante actividades constructivas fueron las siguientes:

1. Se capacitó al personal en el manejo integral de materiales de construcción, resaltando el orden y aseo con el objetivo de evitar el aporte de materiales.

2. Se prohibió el lavado de la maquinaria y equipo en los cursos de agua, para evitar el derrame de lubricantes o hidrocarburos que contribuyan a la contaminación de estos.

3. En ninguna circunstancia se permitió la disposición de residuos sólidos en las corrientes hídricas.

4. En caso de contingencia o accidente, se deben adelantar labores de limpieza inmediatamente y tomar las medidas correctivas apropiadas.

5. Se utilizan barreras en las obras cercanas a cuerpos de agua para evitar el

aporte de materiales.

6. La disposición de los residuos provenientes de las actividades de excavación, demolición, desmonte, nunca estuvieron en contacto con las fuentes hídricas.

7. Solo se realizó captación de aguas de las fuentes hídricas autorizadas.

8. Las obras civiles sobre los cauces naturales, cuentan con los respectivos permisos de ocupación de cauce.

5.7.8.2. UFI 2 y 6.1 Cereté – Lorica

En la etapa de reversión no se tiene previsto intervenir cuerpos de agua.

5.7.8.3. UFI 1 Caucasia – Planeta Rica

En la etapa de reversión no se tiene previsto intervenir cuerpos de agua.

5.7.8.4. UFI 3 Variante Planeta – Cereté

En la etapa de reversión no se tiene previsto intervenir cuerpos de agua.

5.7.8.5. UFI 6 Lorica– Tolú

En la etapa de reversión no se tiene previsto intervenir cuerpos de agua.

5.7.8.6. UFI 7.3 Tolú – Pueblito

En la etapa de reversión no se tiene previsto intervenir cuerpos de agua

5.7.8.7. UFI 8 Tolú – Cruz del Viso

En la etapa de reversión no se tiene previsto intervenir cuerpos de agua.

5.7.9. Manejo de Residuos Líquidos, Domésticos e Industriales

5.7.9.1. UFI 1 Caucasia – Planeta Rica

Para el periodo contó con 6 baños en los peajes de la Apartada y Manguitos; estos peajes cuentan con permiso de vertimiento mediante resoluciones N°2-5410 del 27/11/2018 y N°2-3789 del 05/07/2017 respectivamente.

5.7.9.2. UFI 2 y 6.1 Cereté – Lorica

Para el periodo la Concesión contó con baño en el peaje de San Carlos; este peaje cuenta con permiso de vertimiento mediante resolución N°2-3353 del 15/05/2017

5.7.9.3. UFI 3 Variante Planeta – Cereté

Para el periodo la Concesión contó con 3 baños en el peaje de San Carlos; este peaje cuenta con permiso de vertimiento mediante resolución N°2-3352 del 15/05/2017.

5.7.9.4. UFI 5 Arboletes – Montería y UFI 4 Montería – Planeta Rica

Durante el periodo, la Concesión contó con los baños necesarios en la UFI 4 y 5, dando cumplimiento al indicador establecido que es 1 baño por cada 15 trabajadores.

De esta manera registraron cumplimiento a lo establecido en el PAGA.

Adicional a lo anterior se tiene prohibido el lavado de maquinaria y de volquetas en la obra; se cuenta con kit antiderrames en cada frente de obra

5.7.9.5. UFI 6 Lorica - Tolú

No se registra novedad en relación a la ficha

5.7.9.6. UFI 7.3 Tolú – Pueblito

No se registra novedad en relación a la ficha.

5.7.9.7. UFI 8 Tolú – Cruz del Viso

No se registra novedad en relación a la ficha

5.7.10. Manejo de descapote y cobertura vegetal

5.7.10.1. UFI 1 Caucasia – Planeta Rica

No registra actividad

5.7.10.2. UFI 2 y 6.1 Cereté – Lorica

No registra actividad

5.7.10.3. UFI 3 Variante Planeta – Cereté

No registra actividad

5.7.10.4. UFI 5 Arboletes – Montería y UFI 4 Montería – Planeta Rica

No registran actividad.

5.7.10.5. UFI 6.2 Lorica - Coveñas

No registra actividad.

5.7.10.6. UFI 7.3 Tolú – Pueblito

No registra actividad

5.7.10.7. UFI 8 Tolú – Cruz del Viso.

No registra Actividad.

5.7.11. Protección de Fauna

5.7.11.1. UFI 1 Caucasia – Planeta Rica

Durante el periodo con el informe de atropellamiento que se viene dando en todas las unidades funcionales se presentaron (3) muertes por atropellamiento de los animales que se encuentran en la guía; se deja la claridad de que, aunque se evidencia más muertes de animales por atropellamiento estos no están dentro de la guía.

5.7.11.2. UFI 2 y 6.1 Cereté – Lorica

Durante el periodo con el informe de atropellamiento que se viene dando en todas las unidades funcionales se presentaron (4) muertes por atropellamiento de los animales que se encuentran en la guía; se deja la claridad de que, aunque se evidencia más muertes de animales por atropellamiento estos no están dentro de la guía

5.7.11.3. UFI 3 Variante Planeta – Cereté

Durante el periodo con el informe de atropellamiento que se viene dando en todas las unidades funcionales no se presentaron muertes por atropellamiento de los animales que se encuentran en la guía; se deja la claridad de que, aunque se evidencia más muertes de animales por atropellamiento estos no están dentro de la guía.

5.7.11.4. UFI 5 Arboletes – Montería y UFI4 Montería – Planeta Rica

Durante el periodo con el informe de atropellamiento que se viene dando en todas las unidades funcionales se presentaron (2) muertes por atropellamiento de los animales que se encuentran en la guía; se deja la claridad de que, aunque se evidencia más muertes de animales por atropellamiento estos no están dentro de la guía.

5.7.11.5. UFI 6 Lorica – Tolú

Durante el periodo con el informe de atropellamiento que se viene dando en todas las unidades funcionales no se presentaron muertes por atropellamiento de los animales que se encuentran en la guía; se deja la claridad de que, aunque se evidencia más muertes de animales por atropellamiento estos no están dentro de la guía.

5.7.11.6. UFI 7.3 Tolú – Pueblito

Durante el periodo con el informe de atropellamiento que se viene dando en todas las unidades funcionales no se presentaron muertes por atropellamiento de los animales que se encuentran en la guía; se deja la claridad de que, aunque se evidencia más muertes de animales por atropellamiento estos no están dentro de la guía.

5.7.11.7. UFI 8 Tolú – Cruz del Viso.

Durante el periodo con el informe de atropellamiento que se viene dando en todas las unidades funcionales se presentaron (3) muertes por atropellamiento de los animales que se encuentran en la guía; se deja la claridad de que, aunque se evidencia más muertes de animales por atropellamiento estos no están dentro de la guía.

5.7.12. Recuperación de Áreas Afectadas.

Se verificó en recorrido de la mano con la Concesión, que todas las áreas del corredor vial estaban revegetalizadas dándole cierre a las observaciones registradas en los informes de cierre, de esta manera se registra cumplimiento al documento aprobado.

5.7.13. Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio.

UF 4 No se tiene instalado campamento temporal.

UF 5 No se tiene instalado campamento temporal.

UF 3 No se tiene instalado campamento temporal.

UF 2 y 6.1 No se tiene instalado campamento temporal.

UF 1 No se tiene instalado campamento temporal

UF 7.3 No se tiene instalado campamento temporal

UF 8 No se tiene instalado campamento temporal

5.7.14. Indicadores de Seguimiento ambiental UFI 4 y UFI 5

En el marco de la Etapa de Reversión y de los programas aplicables establecidos en la Guía Ambiental para Proyectos de Infraestructura del Subsector Vial, la Interventoría realizó la verificación del estado de cumplimiento de los indicadores ambientales, con fundamento en la documentación y soportes aportados por la Concesión, los informes de gestión correspondientes al mes de septiembre de 2026, así como en las actividades de seguimiento y verificación efectuadas durante el período evaluado. Con base en esta información, se realizó la evaluación de los indicadores de seguimiento correspondientes a las UFI 4 y 5.

De acuerdo con los resultados obtenidos, el Concesionario presenta a la fecha un cumplimiento del 100 % respecto de los programas del PAGA aprobados por la Interventoría, evidenciando la atención de los requerimientos y obligaciones establecidos en las respectivas fichas de manejo ambiental.

Es importante precisar que la tabla presentada a continuación consolida los indicadores de seguimiento ambiental asociados a cada programa del PAGA. No obstante, el análisis detallado del estado de cumplimiento, las gestiones adelantadas

y la verificación de las obligaciones ambientales correspondientes a cada programa se desarrollan en las secciones precedentes del presente capítulo.

Tabla 5-27 Indicadores de seguimiento PAGA UFI 4 y 5.

PROGRAMA Y/O PROYECTO	INDICADOR	FORMA DE EVALUACIÓN	VALOR (%)	Observaciones
Conformación Del Grupo De Gestión Socio-Ambiental	No. de profesionales contratados. / No. de profesionales propuestos.	3/3	100%	Conformado por un Coordinador Ambiental, un ingeniero Ambiental y un biólogo
Conformación Del Grupo De Gestión Socio-Ambiental	No de requerimientos emitidos/ Requerimientos superados	0	100%	N/A
Capacitación y concienciación para el personal de obra	Capacitaciones programadas / Capacitaciones ejecutadas	10/10	100%	Capacitaciones acordes al cronograma.
Cumplimiento de requerimientos legales	No. de permisos obtenidos/ No. de permisos requeridos por el proyecto	3/3	100%	Todos los permisos necesarios para el funcionamiento están según lo exigido.
Manejo Integral de Materiales de Construcción	No de quejas y reclamos por manejo de construcción propuestas / No de quejas y reclamos por manejo de construcción resueltas	0	100%	N/A
Manejo Integral de Materiales de Construcción	No. de charlas ofrecidas/No de charlas programadas	0	100%	No Se realizó capacitación en el tema de manejo de materiales de construcción.
Explotación de fuentes de materiales	Verificar las licencias ambientales	2/2	100%	Cantera con los permisos ambientales necesarios
Señalización en frentes de obras y sitios temporales	No de frentes de trabajo / No de frentes de trabajo señalizados	2/2	100%	Señalización acorde a lo requerido.
Señalización en frentes de obras y sitios temporales	No. De charlas ofrecidas al personal/No. De charlas programadas	7/7	100%	Capacitaciones acordes al cronograma.
Manejo y disposición final de escombros y lodos	Requerimientos emitidos por autoridades ambientales / Requerimientos resueltos por autoridades ambientales.	0/0	100%	A la fecha no se han emitido requerimientos por parte de las autoridades ambientales por Manejo y disposición final de escombros y lodos.

PROGRAMA Y/O PROYECTO	INDICADOR	FORMA DE EVALUACIÓN	VALOR (%)	Observaciones
Manejo de residuos Sólidos convencionales y especiales	Volúmenes RSD entregados / Volúmenes RSD Generados	1/1	100%	Se dispuso en el relleno sanitario los residuos originados.
Manejo de residuos Peligrosos	Volumen de residuos sólidos peligrosos entregados / Volumen de residuos sólidos peligrosos generados	N/A	N/A	N/A
Manejo de aguas superficiales	Cumplir con el 100% de las medidas propuestas en el programa	N/A	N/A	N/A
Manejo de aguas superficiales	Responder el 100% de los requerimientos solicitados por las CAR	N/A	N/A	N/A
Manejo de Residuos líquidos, Domésticos e Industriales	No. De seguimientos realizados / No. De seguimientos programados	8/8	100%	Seguimientos según lo requerido. Contaban con baños portátiles en el frente de obra.
Manejo de descapote y cobertura vegetal	No de individuos talados / No de individuos autorizados	12/59	20%	No hubo tala
Manejo de descapote y cobertura vegetal	M3 de madera donados a la comunidad / m**3** de madera generada	N/A	N/A	N/A
Manejo de descapote y cobertura vegetal	M3 de madera aprovechado en obra / m**3** de madera generada	N/A	N/A	N/A
Recuperación de áreas afectadas	M2 de áreas recuperada	N/A	N/A	N/A
Protección de fauna	Promedio de reportes de accidentes de animales en último trimestre	Registro de atropellamiento	100%	Registro de los atropellamientos evidenciados en vía.
Instalación y mantenimiento de campamento y sitios de acopio temporal	No de medidas ambientales ejecutadas/ No de medidas ambientales programadas	N/A	N/A	N/A
Manejo de maquinaria, equipos y vehículos	No de accidentes ocurridos por manejo de maquinaria y vehículos = 0	N/A	N/A	N/A
Manejo de maquinaria,	No. Vehículos con revisión técnico	15/15	100%	Vehículos con los papeles acorde a lo exigido.

PROGRAMA Y/O PROYECTO	INDICADOR	FORMA DE EVALUACIÓN	VALOR (%)	Observaciones
equipos y vehículos	Mecánica / No. Vehículos utilizados en el proyecto			

5.7.15. Indicadores de Seguimiento Ambiental UFI 1

En el marco de la etapa de reversión y de los programas aplicables establecidos en la Guía Ambiental para Proyectos de Infraestructura del Subsector Vial, la Interventoría realizó la verificación del estado de cumplimiento de los indicadores ambientales, con fundamento en la documentación aportada por la Concesión, los informes de gestión presentados durante el mes de septiembre de 2026 y las actividades de seguimiento y verificación efectuadas en dicho periodo. Con base en esta información, se efectuó la evaluación de los indicadores de seguimiento correspondientes a las UFI 1.

De acuerdo con los resultados obtenidos, el Concesionario presenta a la fecha un cumplimiento del 100 % respecto de los programas del PAGA aprobados por la Interventoría, evidenciando la atención de los requerimientos y obligaciones establecidos en las respectivas fichas de manejo ambiental.

Es importante precisar que la tabla presentada a continuación consolida los indicadores de seguimiento ambiental asociados a cada programa del PAGA. No obstante, el análisis detallado del estado de cumplimiento, las gestiones adelantadas y la verificación de las obligaciones ambientales correspondientes a cada programa se desarrollan en las secciones precedentes del presente capítulo.

Tabla 5-28 Indicadores de seguimiento PAGA UFI 1.

PROGRAMA Y/O PROYECTO	INDICADOR	FORMA DE EVALUACIÓN	VALOR (%)	Observaciones
Conformación Del Grupo De Gestión Socio-Ambiental	No. de profesionales contratados. / No. de profesionales propuestos.	3/3	100%	Conformado por un Coordinador Ambiental, un ingeniero Ambiental y/o tecnólogo, 1 forestal
Conformación Del Grupo De Gestión Socio-Ambiental	No de requerimientos emitidos/ Requerimientos superados	N/A	N/A	N/A
Capacitación y concienciación	Capacitaciones programadas /	10/10	100%	Capacitaciones acordes al cronograma.

PROGRAMA Y/O PROYECTO	INDICADOR	FORMA DE EVALUACIÓN	VALOR (%)	Observaciones
para el personal de obra	Capacitaciones ejecutadas			
Cumplimiento de requerimientos legales	No. de permisos obtenidos/ No. de permisos requeridos por el proyecto	1/1	100%	Todos los permisos necesarios para el funcionamiento están según lo exigido.
Manejo Integral de Materiales de Construcción	No de quejas y reclamos por manejo de construcción propuestas / No de quejas y reclamos por manejo de construcción resueltas	N/A	N/A	N/A
Manejo Integral de Materiales de Construcción	No. de charlas ofrecidas/No de charlas programadas	N/A	N/A	N/A
Explotación de fuentes de materiales	Verificar las licencias ambientales	1/1	100%	Cantera con los permisos ambientales necesarios
Señalización en frentes de obras y sitios temporales	No de frentes de trabajo / No de frentes de trabajo señalizados	1/1	100%	Señalización acorde a lo requerido.
Señalización en frentes de obras y sitios temporales	No. de charlas ofrecidas al personal/No. De charlas programadas	7/7	100%	Capacitaciones acordes al cronograma.
Manejo y disposición final de escombros y lodos	Requerimientos emitidos por autoridades ambientales / Requerimientos resueltos por autoridades ambientales.	N/A	N/A	N/A
Manejo de residuos Sólidos convencionales y especiales	Volúmenes RSD entregados / Volúmenes RSD Generados	1/1	100%	Se dispuso en el relleno sanitario los residuos originados.
Manejo de residuos Peligrosos	Volumen de residuos sólidos peligrosos entregados / Volumen de residuos sólidos peligrosos generados	N/A	N/A	N/A
Manejo de aguas superficiales	Cumplir con el 100% de las medidas propuestas en el programa	N/A	N/A	N/A
Manejo de aguas superficiales	Responder el 100% de los requerimientos solicitados por las CAR	N/A	N/A	N/A

PROGRAMA Y/O PROYECTO	INDICADOR	FORMA DE EVALUACIÓN	VALOR (%)	Observaciones
Manejo de Residuos líquidos, Domésticos e Industriales	No. De seguimientos realizados / No. De seguimientos programados	8/8	100%	Se evidencia baños en los peajes.
Manejo de descapote y cobertura vegetal	No de individuos talados / No de individuos autorizados	39/178	21,9%	No hubo tala durante el periodo.
Manejo de descapote y cobertura vegetal	M3 de madera donados a la comunidad / m**3** de madera generada	N/A	N/A	N/A
Manejo de descapote y cobertura vegetal	M3 de madera aprovechado en obra / m**3** de madera generada	N/A	N/A	N/A
Recuperación de áreas afectadas	M2 de áreas recuperada	N/A	N/A	N/A
Protección de fauna	Promedio de reportes de accidentes de animales en último trimestre	Registro de atropellamiento	100%	Registro de los atropellamientos evidenciados en vía.
Instalación y mantenimiento de campamento y sitios de acopio temporal	No de medidas ambientales ejecutadas/ No de medidas ambientales programadas	N/A	N/A	N/A
Manejo de maquinaria, equipos y vehículos	No de accidentes ocurridos por manejo de maquinaria y vehículos = 0	0	100%	En el periodo no se presentó accidente de trabajo en esta UF.
Manejo de maquinaria, equipos y vehículos	No. vehículos con revisión técnico Mecánica / No. vehículos utilizados en el proyecto	12/12	100%	Vehículos con los papeles acorde a lo exigido.

5.7.16. Indicadores de seguimiento UFI 2 y 6.1

En el marco de la etapa de reversión y de los programas aplicables establecidos en la Guía Ambiental para Proyectos de Infraestructura del Subsector Vial, la Interventoría realizó la verificación del estado de cumplimiento de los indicadores ambientales, con fundamento en la documentación aportada por la Concesión, los informes de gestión presentados durante el mes de septiembre de 2026 y las actividades de seguimiento y verificación efectuadas en dicho periodo. Con base en

esta información, se efectuó la evaluación de los indicadores de seguimiento correspondientes a las UFI 2 y 6.1.

De acuerdo con los resultados obtenidos, el Concesionario presenta a la fecha un cumplimiento del 100 % respecto de los programas del PAGA aprobados por la Interventoría, evidenciando la atención de los requerimientos y obligaciones establecidos en las respectivas fichas de manejo ambiental.

Es importante precisar que la tabla presentada a continuación consolida los indicadores de seguimiento ambiental asociados a cada programa del PAGA. No obstante, el análisis detallado del estado de cumplimiento, las gestiones adelantadas y la verificación de las obligaciones ambientales correspondientes a cada programa se desarrollan en las secciones precedentes del presente capítulo.

Tabla 5-29 Indicadores Paga UFI 2 y 6.1

PROGRAMA Y/O PROYECTO	INDICADOR	FORMA DE EVALUACIÓN	VALOR (%)	Observaciones
Conformación Del Grupo De Gestión Socio-Ambiental	No. de profesionales contratados. / No. de profesionales propuestos.	3/3	100%	Conformado por un ingeniero Ambiental y/o tecnólogo, y un forestal
Conformación Del Grupo De Gestión Socio-Ambiental	No de requerimientos emitidos/ Requerimientos superados	0/0	100%	N/A
Capacitación y concienciación para el personal de obra	Capacitaciones programadas / Capacitaciones ejecutadas	10/10	100%	Capacitaciones acordes al cronograma
Cumplimiento de requerimientos legales	No. De Permisos obtenidos = al No. De permisos requeridos por el proyecto.	7/7	100%	Se cuenta con todos los permisos.
Manejo Integral de Materiales de Construcción	No de quejas y reclamos por manejo de construcción propuestas / No de quejas y reclamos por manejo de construcción resueltas	N/A	N/A	N/A
Manejo Integral de Materiales de Construcción	N° de charlas ofrecidas personal /N° de charlas programadas	N/A	N/A	N/A
Explotación de fuentes de materiales	Verificar las licencias ambientales	1/1	100%	Cantera con todos los permisos ambientales aprobados.

PROGRAMA Y/O PROYECTO	INDICADOR	FORMA DE EVALUACIÓN	VALOR (%)	Observaciones
Señalización en frentes de obras y sitios temporales	No de frentes de trabajo señalizados /No de frentes de trabajo	1/1	100%	Señalización según lo establecido
Señalización en frentes de obras y sitios temporales	No. de charlas ofrecidas al personal/No. De charlas programadas	7/7	100%	Charlas acordes a la programación.
Manejo y disposición final de escombros y lodos	Requerimientos emitidos por autoridades ambientales / Requerimientos resueltos por autoridades ambientales.	N/A	N/A	N/A
Manejo y disposición final de escombros y lodos	No. De Quejas y reclamos por manejo de materiales de construcción propuestas/ No. De Quejas y reclamos por manejo de materiales de construcción resueltas	N/A	N/A	N/A
Manejo de residuos Sólidos convencionales y especiales	Vol. RSD entregados/Vol. RSD generados	1/1	100%	Residuos dispuestos en el relleno.
Manejo de residuos Peligrosos	Vol. RSP entregados/Vol. RSP generados	1/1	100%	Entregado a la empresa bioresiduos.
Manejo de aguas superficiales	Cumplir con el 100% de las medidas propuestas en el programa	N/A	N/A	N/A
Manejo de aguas superficiales	Responder el 100% de los requerimientos solicitados por las CAR	N/A	N/A	N/A
Manejo de Residuos líquidos, Domésticos e Industriales	No. De seguimientos realizados / No. De seguimientos programados	N/A	N/A	N/A
Manejo de descapote y cobertura vegetal	# de individuos arbóreos talados / # de individuos arbóreos autorizados	8664/26416	32.8%	Durante el mes no hubo tala.
Manejo de descapote y cobertura vegetal	m3 de madera donados a la comunidad / m3 de madera generada	N/A	N/A	N/A
Manejo de descapote y cobertura vegetal	m3 de madera aprovechada en obra / m3 de madera generada	N/A	N/A	N/A
Recuperación de áreas afectadas	M2 de área recuperada	N/A	N/A	N/A

PROGRAMA Y/O PROYECTO	INDICADOR	FORMA DE EVALUACIÓN	VALOR (%)	Observaciones
Protección de fauna	# de actividades ejecutadas / # de actividades programadas	8/8	100%	Sin observaciones
Instalación y mantenimiento de campamento y sitios de acopio temporal	No de medidas ambientales ejecutadas/ No de medidas ambientales programadas	N/A	N/A	N/A
Manejo de maquinaria, equipos y vehículos	No de accidentes ocurridos por manejo de maquinaria y vehículos = 0	0	100%	En el periodo no se presentó accidente de trabajo en esta UF a causa de maquinaria.
Manejo de maquinaria, equipos y vehículos	No. vehículos con revisión técnico Mecánica / No. vehículos utilizados en el proyecto	2/2	100%	Maquinaria con toda su documentación al día.

5.7.17. Indicadores de Seguimiento Ambiental UFI 8

En el marco de la etapa de reversión y de los programas aplicables establecidos en la Guía Ambiental para Proyectos de Infraestructura del Subsector Vial, la Interventoría realizó la verificación del estado de cumplimiento de los indicadores ambientales, con fundamento en la documentación aportada por la Concesión, los informes de gestión presentados durante el mes de septiembre de 2026 y las actividades de seguimiento y verificación efectuadas en dicho periodo. Con base en esta información, se efectuó la evaluación de los indicadores de seguimiento correspondientes a las UFI 8.

De acuerdo con los resultados obtenidos, el Concesionario presenta a la fecha un cumplimiento del 100 % respecto de los programas del PAGA aprobados por la Interventoría, evidenciando la atención de los requerimientos y obligaciones establecidos en las respectivas fichas de manejo ambiental.

Es importante precisar que la tabla presentada a continuación consolida los indicadores de seguimiento ambiental asociados a cada programa del PAGA. No obstante, el análisis detallado del estado de cumplimiento, las gestiones adelantadas y la verificación de las obligaciones ambientales correspondientes a cada programa se desarrollan en las secciones precedentes del presente capítulo.

.

Tabla 5-30 Indicadores de seguimiento PAGA UFI 8.

PROGRAMA Y/O PROYECTO	INDICADOR	FORMA DE EVALUACIÓN	VALOR (%)	Observaciones
Conformación Del Grupo De Gestión Socio-Ambiental	No. de profesionales contratados. / No. de profesionales propuestos.	3/3	100%	Conformado por un Coordinador Ambiental, un ingeniero Ambiental y un biólogo
Conformación Del Grupo De Gestión Socio-Ambiental	No de requerimientos emitidos/ Requerimientos superados	N/A	N/A	N/A
Capacitación y concienciación para el personal de obra	Capacitaciones programadas / Capacitaciones ejecutadas	4/4	100%	Capacitaciones acordes al cronograma.
Cumplimiento de requerimientos legales	No. de permisos obtenidos/ No. de permisos requeridos por el proyecto	1/1	100%	Todos los permisos necesarios para el funcionamiento están según lo exigido.
Manejo Integral de Materiales de Construcción	No de quejas y reclamos por manejo de construcción propuestas / No de quejas y reclamos por manejo de construcción resueltas	N/A	N/A	N/A
Manejo Integral de Materiales de Construcción	No. de charlas ofrecidas/No de charlas programadas	N/A	N/A	N/A
Explotación de fuentes de materiales	Verificar las licencias ambientales	1/1	100%	Cantera con los permisos ambientales necesarios
Señalización en frentes de obras y sitios temporales	No de frentes de trabajo / No de frentes de trabajo señalizados	N/A	N/A	N/A
Señalización en frentes de obras y sitios temporales	No. De charlas ofrecidas al personal/No. De charlas programadas	3/3	100%	Acorde al cronograma
Manejo y disposición final de escombros y lodos	Requerimientos emitidos por autoridades ambientales / Requerimientos resueltos por autoridades ambientales.	N/A	N/A	N/A

PROGRAMA Y/O PROYECTO	INDICADOR	FORMA DE EVALUACIÓN	VALOR (%)	Observaciones
Manejo de residuos Sólidos convencionales y especiales	Volúmenes RSD entregados / Volúmenes RSD Generados	N/A	N/A	N/A
Manejo de residuos Peligrosos	Volumen de residuos sólidos peligrosos entregados / Volumen de residuos sólidos peligrosos generados	N/A	N/A	N/A
Manejo de aguas superficiales	Cumplir con el 100% de las medidas propuestas en el programa	N/A	N/A	N/A
Manejo de aguas superficiales	Responder el 100% de los requerimientos solicitados por las CAR	N/A	N/A	N/A
Manejo de Residuos líquidos, Domésticos e Industriales	No. De seguimientos realizados / No. De seguimientos programados	8/8	100%	Seguimiento acorde a lo exigido.
Manejo de descapote y cobertura vegetal	No de individuos talados / No de individuos autorizados	N/A	N/A	N/A
Manejo de descapote y cobertura vegetal	M3 de madera donados a la comunidad / m**3** de madera generada	N/A	N/A	N/A
Manejo de descapote y cobertura vegetal	M3 de madera aprovechado en obra / m**3** de madera generada	N/A	N/A	N/A
Recuperación de áreas afectadas	M2 de áreas recuperada	N/A	N/A	N/A
Protección de fauna	Promedio de reportes de accidentes de animales en último trimestre	Registro de atropellamiento	100%	Registro de los atropellamientos evidenciados en vía.
Instalación y mantenimiento de campamento y sitios de acopio temporal	No de medidas ambientales ejecutadas/ No de medidas ambientales programadas	N/A	N/A	N/A
Manejo de maquinaria, equipos y vehículos	No de accidentes ocurridos por manejo de maquinaria y vehículos = 0	0	100%	En el periodo no se presentó accidente de trabajo en esta UF.
Manejo de maquinaria,	No. Vehículos con revisión técnico	N/A	N/A	N/A

PROGRAMA Y/O PROYECTO	INDICADOR	FORMA DE EVALUACIÓN	VALOR (%)	Observaciones
equipos y vehículos	Mecánica / No. Vehículos utilizados en el proyecto			

5.7.18. Indicadores de Seguimiento Ambiental UFI 6

En el marco de la etapa de reversión y de los programas aplicables establecidos en la Guía Ambiental para Proyectos de Infraestructura del Subsector Vial, la Interventoría realizó la verificación del estado de cumplimiento de los indicadores ambientales, con fundamento en la documentación aportada por la Concesión, los informes de gestión presentados durante el mes de septiembre de 2026 y las actividades de seguimiento y verificación efectuadas en dicho periodo. Con base en esta información, se efectuó la evaluación de los indicadores de seguimiento correspondientes a las UFI 6.

De acuerdo con los resultados obtenidos, el Concesionario presenta a la fecha un cumplimiento del 100 % respecto de los programas del PAGA aprobados por la Interventoría, evidenciando la atención de los requerimientos y obligaciones establecidos en las respectivas fichas de manejo ambiental.

Es importante precisar que la tabla presentada a continuación consolida los indicadores de seguimiento ambiental asociados a cada programa del PAGA. No obstante, el análisis detallado del estado de cumplimiento, las gestiones adelantadas y la verificación de las obligaciones ambientales correspondientes a cada programa se desarrollan en las secciones precedentes del presente capítulo.

Tabla 5-31 Indicadores de seguimiento PAGA UFI 6

PROGRAMA Y/O PROYECTO	INDICADOR	FORMA DE EVALUACIÓN	VALOR (%)	Observaciones
Conformación Del Grupo De Gestión Socio-Ambiental	No. de profesionales contratados. / No. de profesionales propuestos.	3/3	100%	Conformado por un Coordinador Ambiental, un ingeniero Ambiental y un biólogo
Conformación Del Grupo De Gestión Socio-Ambiental	No de requerimientos emitidos/ Requerimientos superados	N/A	N/A	N/A
Capacitación y concienciación	Capacitaciones programadas /	4/4	100%	Capacitaciones acordes al cronograma

PROGRAMA Y/O PROYECTO	INDICADOR	FORMA DE EVALUACIÓN	VALOR (%)	Observaciones
para el personal de obra	Capacitaciones ejecutadas			
Cumplimiento de requerimientos legales	No. de permisos obtenidos/ No. de permisos requeridos por el proyecto	0	100%	N/A
Manejo Integral de Materiales de Construcción	No de quejas y reclamos por manejo de construcción propuestas / No de quejas y reclamos por manejo de construcción resueltas	0	100%	No se presentó queja durante este periodo
Manejo Integral de Materiales de Construcción	No. de charlas ofrecidas/No de charlas programadas	0	100%	No Se realizó capacitación en el tema de manejo de materiales de construcción.
Explotación de fuentes de materiales	Verificar las licencias ambientales	1/1	100%	Cantera con los permisos ambientales necesarios
Señalización en frentes de obras y sitios temporales	No de frentes de trabajo / No de frentes de trabajo señalizados	1/1	100%	Señalización según lo establecido
Señalización en frentes de obras y sitios temporales	No. De charlas ofrecidas al personal/No. De charlas programadas	3/3	100%	Charlas acordes a la programación.
Manejo y disposición final de escombros y lodos	Requerimientos emitidos por autoridades ambientales / Requerimientos resueltos por autoridades ambientales.	N/A	N/A	N/A
Manejo de residuos Sólidos convencionales y especiales	Volúmenes RSD entregados / Volúmenes RSD Generados	N/A	N/A	N/A
Manejo de residuos Peligrosos	Volumen de residuos sólidos peligrosos entregados / Volumen de residuos sólidos peligrosos generados	N/A	N/A	N/A
Manejo de aguas superficiales	Cumplir con el 100% de las medidas propuestas en el programa	N/A	N/A	N/A

PROGRAMA Y/O PROYECTO	INDICADOR	FORMA DE EVALUACIÓN	VALOR (%)	Observaciones
Manejo de aguas superficiales	Responder el 100% de los requerimientos solicitados por las CAR	N/A	N/A	N/A
Manejo de Residuos líquidos, Domésticos e Industriales	No. De seguimientos realizados / No. De seguimientos programados	8/8	100%	Seguimientos según lo requerido
Manejo de descapote y cobertura vegetal	No de individuos talados / No de individuos autorizados	N/A	N/A	N/A
Manejo de descapote y cobertura vegetal	M3 de madera donados a la comunidad / m**3** de madera generada	N/A	N/A	N/A
Manejo de descapote y cobertura vegetal	M3 de madera aprovechado en obra / m**3** de madera generada	N/A	N/A	N/A
Recuperación de áreas afectadas	M2 de áreas recuperada	N/A	N/A	N/A
Protección de fauna	Promedio de reportes de accidentes de animales en último trimestre	Registro de atropellamiento	100%	Registro de los atropellamientos evidenciados en vía
Instalación y mantenimiento de campamento y sitios de acopio temporal	No de medidas ambientales ejecutadas/ No de medidas ambientales programadas	N/A	N/A	N/A
Manejo de maquinaria, equipos y vehículos	No de accidentes ocurridos por manejo de maquinaria y vehículos = 0	0	100%	No registra accidentes
Manejo de maquinaria, equipos y vehículos	No. Vehículos con revisión técnico Mecánica / No. Vehículos utilizados en el proyecto	N/A	N/A	N/A

5.7.19. Indicadores de Seguimiento ambiental UFI 3

En el marco de la etapa de reversión y de los programas aplicables establecidos en la Guía Ambiental para Proyectos de Infraestructura del Subsector Vial, la Interventoría realizó la verificación del estado de cumplimiento de los indicadores ambientales, con fundamento en la documentación aportada por la Concesión, los

informes de gestión presentados durante el mes de septiembre de 2026 y las actividades de seguimiento y verificación efectuadas en dicho periodo. Con base en esta información, se efectuó la evaluación de los indicadores de seguimiento correspondientes a las UFI 3.

De acuerdo con los resultados obtenidos, el Concesionario presenta a la fecha un cumplimiento del 100 % respecto de los programas del PAGA aprobados por la Interventoría, evidenciando la atención de los requerimientos y obligaciones establecidos en las respectivas fichas de manejo ambiental.

Es importante precisar que la tabla presentada a continuación consolida los indicadores de seguimiento ambiental asociados a cada programa del PAGA. No obstante, el análisis detallado del estado de cumplimiento, las gestiones adelantadas y la verificación de las obligaciones ambientales correspondientes a cada programa se desarrollan en las secciones precedentes del presente capítulo.

Tabla 5-32 Indicadores de seguimiento UFI 3

PROGRAMA Y/O PROYECTO	INDICADOR	FORMA DE EVALUACIÓN	VALOR (%)	Observaciones
Conformación Del Grupo De Gestión Socio-Ambiental	No. de profesionales contratados. / No. de profesionales propuestos.	3/3	100%	Conformado por un Coordinador Ambiental, un ingeniero Ambiental y/o tecnólogo, un forestal
Conformación Del Grupo De Gestión Socio-Ambiental	No de requerimientos emitidos/ Requerimientos superados	N/A	N/A	No hubo requerimientos durante el periodo.
Capacitación y concienciación para el personal de obra	Capacitaciones programadas / Capacitaciones ejecutadas	4/4	100%	Capacitaciones acordes al cronograma
Cumplimiento de requerimientos legales	No. de permisos obtenidos/ No. de permisos requeridos por el proyecto	1/1	100%	Todos los permisos necesarios para el funcionamiento están según lo exigido.
Manejo Integral de Materiales de Construcción	No de quejas y reclamos por manejo de construcción propuestas / No de quejas y reclamos por manejo de construcción resueltas	0	100%	No se presentó queja durante este periodo
Manejo Integral de Materiales de Construcción	No. de charlas ofrecidas/No de charlas programadas	0	100%	No Se realizó capacitación en el tema de manejo de materiales de construcción.

PROGRAMA Y/O PROYECTO	INDICADOR	FORMA DE EVALUACIÓN	VALOR (%)	Observaciones
Explotación de fuentes de materiales	Verificar las licencias ambientales	1/1	100%	Cantera con los permisos ambientales necesarios
Señalización en frentes de obras y sitios temporales	No de frentes de trabajo / No de frentes de trabajo señalizados	1/1	100%	Señalización acorde a lo requerido.
Señalización en frentes de obras y sitios temporales	No. de charlas ofrecidas al personal/No. De charlas programadas	3/3	100%	Capacitaciones acordes al cronograma.
Manejo y disposición final de escombros y lodos	Requerimientos emitidos por autoridades ambientales / Requerimientos resueltos por autoridades ambientales.	N/A	N/A	N/A
Manejo de residuos Sólidos convencionales y especiales	Volúmenes RSD entregados / Volúmenes RSD Generados	N/A	N/A	N/A
Manejo de residuos Peligrosos	Volumen de residuos sólidos peligrosos entregados / Volumen de residuos sólidos peligrosos generados	N/A	N/A	N/A
Manejo de aguas superficiales	Cumplir con el 100% de las medidas propuestas en el programa	N/A	N/A	N/A
Manejo de aguas superficiales	Responder el 100% de los requerimientos solicitados por las CAR	N/A	N/A	N/A
Manejo de Residuos líquidos, Domésticos e Industriales	No. De seguimientos realizados / No. De seguimientos programados	8/8	100%	Seguimientos según lo requerido
Manejo de descapote y cobertura vegetal	No de individuos talados / No de individuos autorizados	N/A	N/A	N/A
Manejo de descapote y cobertura vegetal	M3 de madera donados a la comunidad / m**3** de madera generada	N/A	N/A	N/A
Manejo de descapote y cobertura vegetal	M3 de madera aprovechado en obra / m**3** de madera generada	N/A	N/A	N/A

PROGRAMA Y/O PROYECTO	INDICADOR	FORMA DE EVALUACIÓN	VALOR (%)	Observaciones
Recuperación de áreas afectadas	M2 de áreas recuperada	N/A	N/A	N/A
Protección de fauna	Promedio de reportes de accidentes de animales en último trimestre	Registro de atropellamiento	100%	Registro de los atropellamientos evidenciados en vía
Instalación y mantenimiento de campamento y sitios de acopio temporal	No de medidas ambientales ejecutadas/ No de medidas ambientales programadas	0	100%	N/A
Manejo de maquinaria, equipos y vehículos	No de accidentes ocurridos por manejo de maquinaria y vehículos = 0	0/0	100%	N/A
Manejo de maquinaria, equipos y vehículos	No. vehículos con revisión técnico Mecánica / No. vehículos utilizados en el proyecto	N/A	N/A	N/A

5.7.20. Indicadores de Seguimiento ambiental UFI 7.3

En el marco de la etapa de reversión y de los programas aplicables establecidos en la Guía Ambiental para Proyectos de Infraestructura del Subsector Vial, la Interventoría realizó la verificación del estado de cumplimiento de los indicadores ambientales, con fundamento en la documentación aportada por la Concesión, los informes de gestión presentados durante el mes de septiembre de 2026 y las actividades de seguimiento y verificación efectuadas en dicho periodo. Con base en esta información, se efectuó la evaluación de los indicadores de seguimiento correspondientes a las UFI 7.3.

De acuerdo con los resultados obtenidos, el Concesionario presenta a la fecha un cumplimiento del 100 % respecto de los programas del PAGA aprobados por la Interventoría, evidenciando la atención de los requerimientos y obligaciones establecidos en las respectivas fichas de manejo ambiental.

Es importante precisar que la tabla presentada a continuación consolida los indicadores de seguimiento ambiental asociados a cada programa del PAGA. No obstante, el análisis detallado del estado de cumplimiento, las gestiones adelantadas y la verificación de las obligaciones ambientales correspondientes a cada programa se desarrollan en las secciones precedentes del presente capítulo.

Tabla 5-33 Indicadores de seguimiento PAGA UFI 7.3.

PROGRAMA Y/O PROYECTO	INDICADOR	FORMA DE EVALUACIÓN	VALOR (%)	Observaciones
Conformación Del Grupo De Gestión Socio-Ambiental	No. de profesionales contratados. / No. de profesionales propuestos.	3/3	100%	Conformado por un Coordinador Ambiental, un ingeniero Ambiental y/o tecnólogo, un forestal
Conformación Del Grupo De Gestión Socio-Ambiental	No de requerimientos emitidos/ Requerimientos superados	N/A	N/A	No hubo requerimientos durante el periodo.
Capacitación y concienciación para el personal de obra	Capacitaciones programadas / Capacitaciones ejecutadas	4/4	100%	Capacitaciones acordes al cronograma.
Cumplimiento de requerimientos legales	No. de permisos obtenidos/ No. de permisos requeridos por el proyecto	N/A	N/A	N/A
Manejo Integral de Materiales de Construcción	No de quejas y reclamos por manejo de construcción propuestas / No de quejas y reclamos por manejo de construcción resueltas	0	100%	No se presentó queja durante este periodo
Manejo Integral de Materiales de Construcción	No. de charlas ofrecidas/No de charlas programadas	0	100%	No se realizó capacitación en el tema de manejo de materiales de construcción.
Explotación de fuentes de materiales	Verificar las licencias ambientales	1/1	100%	Cantera con los permisos ambientales necesarios
Señalización en frentes de obras y sitios temporales	No de frentes de trabajo / No de frentes de trabajo señalizados	0	100%	No se presentó queja durante este periodo
Señalización en frentes de obras y sitios temporales	No. de charlas ofrecidas al personal/No. De charlas programadas	8/8	100%	Capacitaciones acordes al cronograma.
Manejo y disposición final de escombros y lodos	Requerimientos emitidos por autoridades ambientales / Requerimientos resueltos por autoridades ambientales.	0/0	100%	A la fecha no se han emitido requerimientos por parte de las autoridades ambientales por Manejo y disposición final de escombros y lodos.
Manejo de residuos Sólidos convencionales y especiales	Volúmenes RSD entregados / Volúmenes RSD Generados	0	100%	N/A

PROGRAMA Y/O PROYECTO	INDICADOR	FORMA DE EVALUACIÓN	VALOR (%)	Observaciones
Manejo de residuos Peligrosos	Volumen de residuos sólidos peligrosos entregados / Volumen de residuos sólidos peligrosos generados	0	100%	N/A
Manejo de aguas superficiales	Cumplir con el 100% de las medidas propuestas en el programa	N/A	N/A	N/A
Manejo de aguas superficiales	Responder el 100% de los requerimientos solicitados por las CAR	N/A	N/A	N/A
Manejo de Residuos líquidos, Domésticos e Industriales	No. De seguimientos realizados / No. De seguimientos programados	8/8	100%	Se evidencia baños en los peajes.
Manejo de descapote y cobertura vegetal	No de individuos talados / No de individuos autorizados	N/A	N/A	N/A
Manejo de descapote y cobertura vegetal	M3 de madera donados a la comunidad / m**3** de madera generada	N/A	N/A	N/A
Manejo de descapote y cobertura vegetal	M3 de madera aprovechado en obra / m**3** de madera generada	N/A	N/A	N/A
Recuperación de áreas afectadas	M2 de áreas recuperada	N/A	N/A	N/A
Protección de fauna	Promedio de reportes de accidentes de animales en último trimestre	Registro de atropellamiento	100%	Registro de los atropellamientos evidenciados en vía.
Instalación y mantenimiento de campamento y sitios de acopio temporal	No de medidas ambientales ejecutadas/ No de medidas ambientales programadas	N/A	N/A	N/A
Manejo de maquinaria, equipos y vehículos	No de accidentes ocurridos por manejo de maquinaria y vehículos = 0	0	100%	En el periodo no se presentó accidente de trabajo en esta UF.
Manejo de maquinaria, equipos y vehículos	No. vehículos con revisión técnico Mecánica / No. vehículos utilizados en el proyecto	N/A	N/A	N/A

5.8. SEGUIMIENTO A LAS LICENCIAS AMBIENTALES

5.8.1. UFI 7.2 Variante Coveñas

La Variante Coveñas se encuentra en etapa de operación, con actividades pendientes únicamente en lo relacionado con el mantenimiento de las medidas de compensación ambiental.

El registro fotográfico de las actividades adelantadas se encuentra consolidado en el Anexo 8. De acuerdo con los lineamientos establecidos, las evidencias no se incluyen en el cuerpo del informe, sino que se presentan de manera organizada en dicho anexo.

Así mismo, en el Anexo 8 reposan los soportes documentales y demás evidencias del componente ambiental que respaldan las actividades reportadas para el período.

5.8.2. Licencias Ambientales en cierre

Las Licencia Ambiental correspondiente a la UF 3.3 fue cerrada por la ANLA mediante resolución Número 002251 del 24 de agosto de 2026

La licencia ambiental de la UFI 3.5 se encuentran actualmente en trámite de cierre y archivo de expediente ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Se encuentra pendiente la respuesta de la cesión UFI 3.1 por parte de la ANLA.

De igual forma, el estado actual de cada licencia ambiental, incluyendo las actuaciones administrativas adelantadas, tales como solicitudes de cierre de expediente, cesión de licencias y demás trámites asociados, se presenta en la Tabla 5-3 “Avance de trámites ambientales.

6. GESTIÓN SOCIAL

El documento que nos ocupa describe las actividades de Gestión Social ejecutadas por el Concesionario del 01 al 30 de septiembre de 2026 en la cual señala las obligaciones de manera general y particular, de acuerdo con los requerimientos contractuales establecidos en el Apéndice Técnico 8 – Social y en concordancia con lo establecido en la Parte General y en la Parte Especial del Contrato de Concesión, a las cuales la Interventoría realizó el respectivo seguimiento como se reporta en el capítulo No. 10 del presente informe.

6.1. OBJETIVOS

6.1.1. Objetivos Generales

- Ejecutar actividades destinadas a verificar que los procesos se desarrollen dentro del Plan de Gestión Social Contractual (PGSC), elaborado por el Concesionario, en el cual se incorporan los programas establecidos en el Plan Básico y en el Plan de Gestión Social establecidos en el Apéndice 8-Social, adicionalmente el PGSC deberá incorporar los programas del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA).
- Verificar el cumplimiento de los requerimientos contenidos en el Plan de Compensaciones Económicas (Resolución 545 del 2008), Plan de Reasentamientos y el Plan de Responsabilidad Social y Ambiental establecidos en el Apéndice 8-Social.

6.1.2. Objetivos Específicos

- Facilitar y potencializar la integración del proyecto en el ordenamiento y realidad social, geográfica, administrativa, jurídica y económica de la región influenciada con su ejecución.
- Promover en las comunidades la apropiación, respeto y sentido de pertenencia de las obras que se adelantan, así como el establecimiento de canales de participación de las comunidades en torno al proyecto.

- Resaltar la importancia del usuario para el desarrollo eficiente del proyecto de Concesión concretando sus derechos y responsabilidades como ciudadanos, para el ejercicio democrático de la participación ciudadana.
- Supervisar que el Concesionario disponga de la infraestructura y el personal que cumpla con los requerimientos definidos en el PGSC sobre el cual se efectuará la Interventoría.
- Realizar el control y seguimiento a todas las actividades que deba adelantar el Concesionario para cumplir con las obligaciones de Gestión Social exigidas en el contrato de Concesión.

6.2. CONFORMACIÓN GRUPO GESTIÓN SOCIAL

Teniendo en cuanta el comunicado con radicado No. 48-RUTADCTOELECTRONICOS 20260508012034, mediante el cual Concesionario indica a la Interventoría que, el 1 de mayo de 2026, se notificó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al Concesionario la declaratoria de terminación anticipada del Contrato de Concesión No. 016 de 2015, como consecuencia del laudo proferido dentro del arbitraje internacional tramitado por el Centro Internacional de Resolución de Disputas (CIRD), correspondiente al caso No. 01-23-0002-8303, en el cual el Concesionario Ruta al Mar S.A.S. fungió como demandante y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) como demandada, como consecuencia de dicha decisión, el 2 de mayo de 2026 se dio inicio a la Etapa de Reversión del Contrato de Concesión, durante la cual el Concesionario continúa desarrollando las actividades y obligaciones que le corresponden, entre ellas, las relacionadas con la Gestión Social.

Conviene señalar que, a la fecha, el equipo de Gestión Social de la Concesión Ruta al Mar se encuentra conformado por seis (6) profesionales.

A continuación, se presenta el equipo de profesionales del Concesionario responsable de adelantar las actividades de Gestión Social, así como la descripción de sus respectivos perfiles y funciones.

Tabla 6-1 Personal Área Social del Concesionario Ruta Al Mar

N°	Programa	Nombre	Profesión	Cargo	Funciones
1	PGSC	Diana Fernández	Psicóloga	Coordinadora Social	Coordinadora social- A cargo de la Gestión social del Concesionario
2	Programa de Atención al Usuario	Elcys Correa Galván	Trabajadora Social	Auxiliar Social	Oficina Principal Atención al Usuario
3	Programa de apoyo a la capacidad de gestión Institucional Programa de acompañamiento a la gestión socio predial	Jarinka Arango	Comunicadora Social	Residente Social	Profesional a cargo del Programa de Apoyo a la Capacidad de Gestión Institucional.
4	Programa de capacitación, educación y concientización de la comunidad aledaña al proyecto	Heidy Flórez Causil	Trabajadora social	Residente Social	Residente social - A cargo del Programa de e capacitación, educación y concientización de la comunidad aledaña al proyecto. Además, lleva el Programa de Responsabilidad Social y Ambiental PRAS
5	Programa de arqueología preventiva	Lina Restrepo	Arqueóloga	Profesional Arqueología	A cargo del Programa de Arqueología
6	Programa de cultura vial	Laura Quintana	Trabajadora Social	Residente social	Analista Social- A cargo del Programa de Cultura Vial

Fuente: Tomado de los reportes mensuales presentados por Concesionario Ruta al Mar.

6.3. CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS CONTRACTUALES

Con el objetivo de garantizar que se cumplan los diferentes aspectos que encierran el PGSC, la Interventoría verificó el cumplimiento contractual de los documentos establecidos en el Apéndice 8 - Social de las actividades programadas.

Cumplimiento de compromisos contractuales:

Tabla 6-2 PGSC del Concesionario Ruta Al Mar

Cumplimientos contractuales	Fecha de Entrega Contractual /Cumplimiento	Seguimiento Interventoría
Oficina de Atención al Usuario y 2 Oficinas Móviles de atención	30/03/17 cumplido con radicado 48-147-20170330000548	De acuerdo con el reporte del Concesionario y teniendo en cuenta que 1 de mayo de 2026, se notificó a la Agencia Nacional de Infraestructura ANI y al Concesionario, la declaratoria de terminación anticipada del contrato de Concesión No. 016 de 2015, y como consecuencia de dicha decisión, el 02 de mayo de 2026 inició la Etapa de Reversión. Laudo proferido dentro del arbitraje internacional tramitado por el Centro Internacional de Resolución de Disputas dentro del caso CIRD No. 01-23-0002-8303, en el cual el Concesionario Ruta al Mar S.A.S fungió como demandante y la Agencia Nacional de Infraestructura como demandada, conviene señalar que, a la fecha de este informe la Concesión cuenta con una (1) oficina Fija de atención al usuario ubicada Centro de Control de Operaciones de Mata de Caña ubicado en el Km 31+500 vía Cereté – Lorica, sin embargo, no se han realizado reportes a la Interventoría.
Página Web	27 de enero de 2016	Se verificó y se hizo monitoreo a los medios a cada uno de los contenidos de las publicaciones informativas y avances del proyecto, es muy importante señalar, que de acuerdo al día 1 de mayo de 2026, se notificó a la Agencia Nacional de Infraestructura ANI y al Concesionario, la declaratoria la terminación anticipada del contrato de Concesión No. 016 de 2015, y como consecuencia de dicha decisión, el 02 de mayo de 2026 inició la Etapa de Reversión. “Laudo emitido el dentro del arbitraje internacional CIRD No. 01-23-0002-8303 (el “Laudo”), adelantado entre la Concesión Ruta al Mar S.A.S. (“RAM” o el “Concesionario”) y la Agencia Nacional de Infraestructura (“ANI”)”. No hay publicaciones en el periodo de este informe.
Publicación Boletín Informativo	01/03/22 cumplido con radicado 48-147-20210224017911	A la fecha el Concesionario hizo entrega hasta el boletín #41 en físico en las oficinas de atención al usuario, en los espacios de capacitaciones y socializaciones. Radicado mediante comunicado a la Interventoría 48-RUTADCTOELECTRONICOS20260424011908
(PGSC)	27 de marzo de 2016 Cumplido 26-02-16.	Actualmente al año 2026, se encuentra vigente el PGSC Versión 12. Aprobado mediante comunicado IPAB-0340-2026, radicado ANI 20264090680432
Informe trimestral del Plan de Responsabilidad Ambiental y Social	21/09/18 cumplido	La Concesión hizo entrega del Informe Trimestral número treinta y ocho (38) del Plan de Responsabilidad Ambiental y Social (PRAS), Sin embargo, mediante la comunicación IPAB-0158-2026 (Radicado ANI 20264090469822) la Interventoría realizó observaciones al documento presentado.
Informe trimestral N° 42	05/09/18 cumplido	La Concesión Ruta al mar S.A.S mediante comunicado No. No. 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260605012290, presentó los ajustes solicitados al informe trimestral N°42, correspondiente a los meses de marzo y abril de 2026, la Interventoría IPAB mediante el Radicado IPAB-0443-2026 realizo observaciones al documento.
Campaña vial	18/02/2022 cumplido	Se hizo seguimientos al programa y se evidenció que el Concesionario no realizó reporte ni informo sobre actividades llevadas a cabo en este periodo, es importante mencionar que el día 1 de mayo de 2026, se

Cumplimientos contractuales	Fecha de Entrega Contractual /Cumplimiento	Seguimiento Interventoría
		notificó a la Agencia Nacional de Infraestructura ANI y al Concesionario, la declaratoria de terminación anticipada del contrato de Concesión No. 016 de 2015, y como consecuencia de dicha decisión, el 02 de mayo de 2026 inició la Etapa de Reversión. “Laudo emitido el dentro del arbitraje internacional CIRD No. 01-23-0002-8303 (el “Laudo”), adelantado entre la Concesión Ruta al Mar S.A.S. (“RAM” o el “Concesionario”) y la Agencia Nacional de Infraestructura (“ANI”)”
Plan de Compensaciones Sociales	05/09/17 cumplido	En este periodo del mes de septiembre de 2026, mediante 48-RUTADCTOELECTRONICOS 20260902012923, la Concesión entregó mediante LINK el seguimiento al Plan de Compensaciones Sociales, correspondiente al mes de agosto del 2026. Se sugiere al Concesionario que antes de suscribir el acuerdo con las unidades sociales, se tenga en cuenta el trámite del comité de previa aprobación.
Realización de reuniones de socialización	19/04/17 cumplido	En el periodo del mes de septiembre 2026, el Concesionario asistió a dos reuniones, es importante mencionar que el que de acuerdo al día 1 de mayo de 2026, se notificó a la Agencia Nacional de Infraestructura ANI y al Concesionario, la declaratoria de terminación anticipada del contrato de Concesión No. 016 de 2015, y como consecuencia de dicha decisión, el 02 de mayo de 2026 inició la Etapa de Reversión. “Laudo emitido dentro del arbitraje internacional CIRD No. 01-23-0002-8303 (el “Laudo”), adelantado entre la Concesión Ruta al Mar S.A.S. (“RAM” o el “Concesionario”) y la Agencia Nacional de Infraestructura (“ANI”)” sin embargo, las reuniones se llevaron a cabo en las Unidades Funcionales 1 y 7-3.

Fuente: Adaptado por la Interventoría de los reportes mensuales que presenta el Concesionario Ruta al Mar

A continuación, se especifican las actividades sociales desarrolladas entre el 01 al 30 de septiembre 2026, en cumplimiento de los programas de Gestión Social ejecutados por el Concesionario teniendo en cuenta las especificaciones del apéndice 8 del Plan de Gestión Social Contractual.

6.4. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL CONTRACTUAL

6.4.1. Programa de atención al usuario

En cumplimiento de las obligaciones contractuales, para la etapa de reversión, se encuentra asociada a la gestión desarrollada durante la etapa operativa, la Concesión continúa brindando atención y seguimiento a las peticiones, quejas e inquietudes presentadas por las comunidades del área de influencia.

Actividades programadas:

- Atención e información a los usuarios referente al proyecto.
- Recepción de hojas de vida
- Recepción de PQRS.

6.4.1.1. La Concesión cuenta con una (1) oficina fija de atención al usuario

Tabla 6-3 Oficinas de Atención al Usuario Concesionario Ruta Al Mar

UBICACIÓN	Atención Oficina fija de atención al usuario Centro de Control de Operaciones de Mata de Caña ubicado en el Km 31+500 vía Cereté – Lorica.
LÍNEA DE ATENCIÓN	Fijo; 791 83 61 Línea gratuita 8000 910 442 # 442
CORREO ELECTRÓNICO	contacto@rutaalmar.com Sitio Web **www.rutaalmar.com**
HORARIO DE ATENCIÓN	Lunes a viernes de 8;00 am a 6 pm Sábados de 8;00 am a 2;00 pm.
PROFESIONAL A CARGO	Trabajadora Social Diana Fernández

Fuente: Tomado por la Interventoría de los informes mensuales

6.4.1.2. Oficinas móviles de atención al usuario

En el marco de la Etapa de Reversión iniciada el 2 de mayo de 2026, y de acuerdo con las condiciones actuales de ejecución del Contrato de Concesión No. 016 de 2015, no se registró el desarrollo de actividades relacionadas con el Programa.

Análisis de la Interventoría:

Meta

Instalación en un 100% de las oficinas de atención al usuario móviles y fija de acuerdo con la programación establecida.

El indicador del programa equivale al 100 % según la fórmula que se expone a continuación.

Número de oficinas móviles instaladas 0 / número de OMAU programadas 0 X 100%

6.4.1.3. Recepción y trámite de PQRS

A la fecha de inicio de la Etapa de Reversión, el Concesionario había recibido un total de 4.065 PQRS, evidenciándose, como resultado de la verificación realizada, un índice de productividad del 100%, correspondiente a 4.065 PQRS cerradas. A la fecha de corte del presente informe, no se ha recibido por parte del Concesionario información respecto de la gestión y continuidad de las PQRS en el marco de la Etapa de Reversión.

Es muy importante resaltar que, desde la Interventoría IPAB, se indicó que, durante la Etapa de Reversión, el Concesionario deberá garantizar una atención oportuna, adecuada y permanente a los usuarios y a las comunidades ubicadas en el Área de Influencia del Proyecto. Esta atención deberá estar orientada a mantener una comunicación clara y efectiva, atender las inquietudes y requerimientos que puedan surgir durante esta etapa, y facilitar los procesos asociados a la reversión, procurando en todo momento minimizar posibles afectaciones y garantizar una adecuada gestión de las relaciones con los grupos de interés.

A continuación, se presenta las PQRS recibidas por la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI

Seguimiento a PQRS Etapa de Reversión – ANI

Tabla 6-4 PQRS Etapa de Reversión

UFI	Radicado IPAB	Radicado ANI	Fecha			Nombre Del Solicitante	Municipio	Tipo de Solicitud	Asunto	Área	Estado		Fecha de Cierre			Se Cumple Tiempos Respuesta	
			DIA	MES	AÑO						Trámite	Cerrado	dd	mm	aa	Si	No
1	IPAB-1882-2026	20263050371091.	25	9	26	Jaidith Codero	Buenavista	Solicitud	Radicado ANI Radicado ANI No. 20264091232812 del 22 de septiembre 2026 - Traslado PQRS Jaidith Codero - Hotel Barajas – Solicitud inspección y verificación reductor de velocidad en el Municipio de Buenavista (Córdoba) RN 2513 - Contrato de Concesión No 016 de 2015. Proyecto de Concesión IP Conexión Antioquia Bolívar.	Jurídico		x				x	

Fuente: Elaboración Propia Social IPAB

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre de 2026, la Interventoría continuó realizando seguimiento al estado de los trámites, solicitudes y peticiones de los usuarios. Este seguimiento se desarrolló en el marco de la Etapa de Reversión iniciada el 2 de mayo de 2026, manteniéndose la atención y gestión de las solicitudes presentadas por los usuarios, conforme a las obligaciones a cargo del Concesionario y a los términos establecidos para su trámite y respuesta.

Análisis de la Interventoría:

Meta

- *Atención del 100% de las solicitudes de usuario en oficina fija.*
- *Atención del 100% de las solicitudes de usuario en oficina móvil.*

- *Dar trámite y/o respuesta oportuna a las PQRS, inferior a 15 días hábiles.*
- *Cubrir el 100% del corredor vial con las actividades de atención al usuario mediante la oficina fija y móvil.*

Indicador

Con base en lo anterior, esta Interventoría realizó el seguimiento y verificación de la PQRS recibida con el fin de verificar el cumplimiento de los tiempos de las respuestas y su estado actual, evidenciándose que para el periodo en mención.

6.4.2. Programa de vinculación de mano de obra

Durante el periodo objeto de seguimiento, correspondiente a la Etapa de Reversión iniciada el 2 de mayo de 2026, el Concesionario no reportó a esta Interventoría personal contratado en el periodo, sin embargo, se tiene que el último reporte fue en el mes de abril de 2026, se encontraban vinculados al proyecto 757 personas reportadas en el mes de abril del 2026 en el Registro consolidado de mano de obra vinculada al proyecto PGSP-F-140, de las cuales 615 están en la categoría de mano de obra calificada y 142 en mano de obra no calificada, 173 son mujeres y 584 son hombres. Ahora bien, de los setecientos cincuenta y siete (757) colaboradores vinculados al proyecto, quinientos noventa y nueve (599) son del área de influencia directa y ciento cincuenta y ocho (158) son del área de influencia indirecta del proyecto.

En el siguiente cuadro se especifican las cifras de contratación de manera general, teniendo en cuenta el tipo de contratación, el tipo de mano de obra, el género y origen en el último periodo 2026 reportado por el Concesionario.


Tabla 6-5 Discriminado de la contratación de la mano de obra

Tipo de contratación	Cant.	Tipo de Mano de Obra		Genero		Origen	
		MOC	MONC	F	M	AID	AII
DIRECTO	307	270	37	140	167	263	44
INDIRECTO	450	345	105	33	417	336	114
TOTAL	**757**	**615**	**142**	**173**	**584**	**599**	**158**

Fuente: Tomado del último reporte mensual presentado por el Concesionario Ruta al Mar (periodo abril)

En el siguiente grafico se detallan las cifras del consolidado de todo el personal contratado del área de influencia en el último periodo reportado por el Concesionario mes de abril de 2026, con relación a los cuatro departamentos que hacen parte del proyecto Antioquia – Bolívar.

Grafica 35 Empleos Generados en los Departamentos del Área Directa del Proyecto

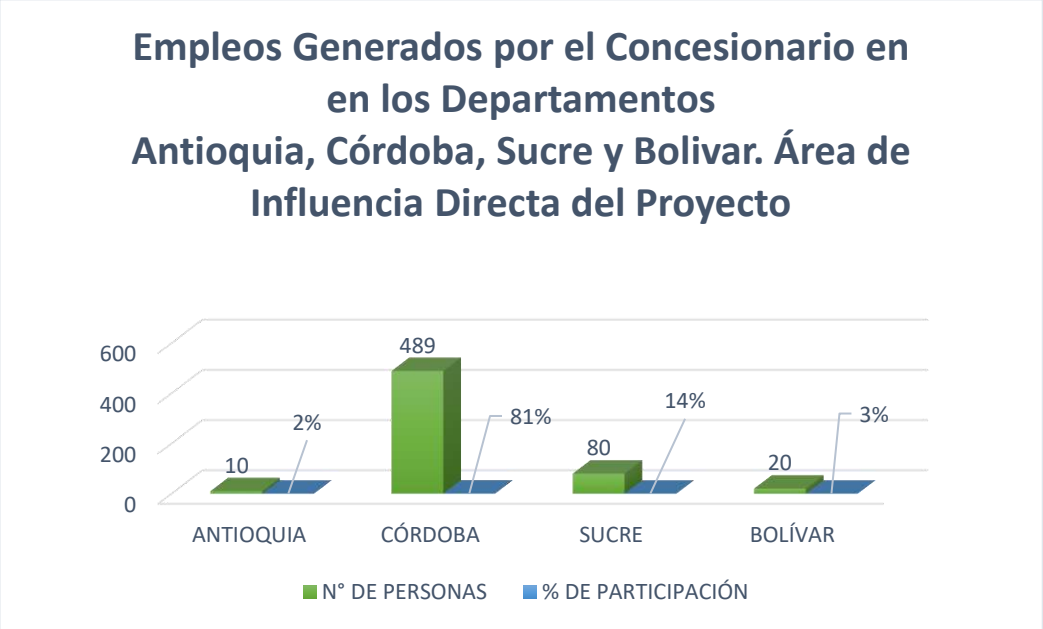

Fuente: Tomado del último reporte mensual presentado por el Concesionario Ruta al Mar.

Tabla 6-6 Empleos Generados por Departamentos

DEPARTAMENTO	N° DE PERSONAS	% DE PARTICIPACIÓN
ANTIOQUIA	10	2%
CÓRDOBA	489	81%
SUCRE	80	14%
BOLÍVAR	20	3%
TOTAL	**599**	**100%**

Fuente: Tomado del último reporte mensual presentado por el Concesionario Ruta al Mar

6.4.3. Recepción de hojas de vida

No hubo recepción de hojas de vidas teniendo en cuenta que, de acuerdo al 1 de mayo de 2026, se notificó a la Agencia Nacional de Infraestructura ANI y al Concesionario, la declaratoria la terminación anticipada del contrato de Concesión No. 016 de 2015, y como consecuencia de dicha decisión, el 02 de mayo de 2026 inició la Etapa de Reversión. “Laudo emitido el dentro del arbitraje internacional CIRD No. 01-23-0002-8303 (el “Laudo”), adelantado entre la Concesión Ruta al Mar S.A.S. (“RAM” o el “Concesionario”) y la Agencia Nacional de Infraestructura (“ANI”)”, las obligaciones contractuales a cargo del Concesionario deben entenderse en el marco de dicha etapa.

Análisis de la Interventoría:

Meta

Fomentar y promover la vinculación laboral del personal del área de influencia del proyecto.

Indicador

N° de trabajadores contratado del AID 0/ Total de trabajadores contratados 0=0%

6.4.4. Programa de Educación y Capacitación al Personal Vinculado al Proyecto

En el periodo objeto de seguimiento, correspondiente a la Etapa de Reversión del Contrato de Concesión No. 016 de 2015, no se registró el desarrollo de actividades relacionadas con el Programa de Educación y Capacitación al Personal Vinculado al Proyecto, de acuerdo con las actividades adelantadas durante la etapa contractual vigente.

Análisis de la Interventoría:

Meta

Capacitar el 100% de los colaboradores directos y personal subcontratado para el proyecto.

Indicador

N°0 de trabajadores directos e indirectos con inducción en el periodo / N°0 de trabajadores directos e indirectos contratados en el periodo x 100%=0%

6.4.5. Programa de Información y Participación Comunitaria

Durante el periodo objeto de seguimiento, correspondiente a la Etapa de Reversión iniciada el 2 de mayo de 2026, no se evidenció la programación.

6.4.5.1. Reuniones de CPC

Durante el periodo el Concesionario no hizo reportes de reuniones con el comité de participación comunitaria de la UFI 2, teniendo en cuenta que las obligaciones contractuales a cargo del Concesionario deben entenderse en el marco de la etapa de reversión.

6.4.5.2. Reuniones Informativas de Inicio, Avance y Finalización:

Durante el periodo de seguimiento correspondiente a septiembre de 2026, y en consideración a la Etapa de Reversión iniciada el 2 de mayo de 2026, no se evidenció la programación de actividades asociadas a estas obligaciones contractuales, cuyo desarrollo deberá considerarse en el marco de la etapa contractual actualmente vigente.

6.4.5.3. Otras reuniones:

6.4.5.3.1 Reuniones Extraordinarias:

Durante el periodo el Concesionario no hizo reportes de reuniones extraordinarias teniendo en cuenta que las obligaciones contractuales a cargo del Concesionario deben entenderse en el marco de la etapa de reversión.

Sin embargo, en el periodo del mes de septiembre 2026, el Concesionario asistió a dos (2) reuniones llevadas a cabo en las Unidades Funcionales 1 cita por la IE Loma Azul sede los Cerros y UFI 7-3 citadas por la alcaldía de Santiago de Tolú

- El 11 de septiembre de 2026 se realizó acompañamiento y seguimiento al Concesionario durante una reunión en la Institución Educativa Loma Azul, sede Los Cerros, en el municipio de Planeta Rica, Córdoba. Participaron el rector Leider Herrera, el coordinador académico Amilkar Mercado, docentes y representantes de las áreas técnica y social del Concesionario Ruta al Mar y de la Interventoría IPAB, el encuentro tuvo como propósito abordar las condiciones de seguridad vial en el entorno de la institución, teniendo en cuenta que niños, niñas y adolescentes deben cruzar la vía para desplazarse. El rector expresó su preocupación y señaló que los padres de familia también han manifestado inquietudes al respecto. Asimismo, presentó solicitudes para reducir la velocidad de los vehículos y mejorar la seguridad de la comunidad educativa. Estas solicitudes fueron atendidas en el marco de la PQRS 4139. El Concesionario indicó que algunas solicitudes corresponden a competencias de otras entidades. Sin embargo, manifestó su disposición para colaborar dentro del alcance de sus funciones y orientó a los participantes sobre los actores institucionales que podrían atenderlas, como resultado, se propuso realizar una segunda mesa de trabajo con las entidades competentes, para revisar las solicitudes, definir los compromisos correspondientes y fortalecer la articulación institucional frente a la problemática identificada.
- El 18 de septiembre de 2026, la ANI, Concesión Ruta al Mar y la Interventoría IPAB participaron en una mesa convocada por la Alcaldía de Santiago de Tolú para tratar la accidentalidad en la vía Tolú–San Onofre, especialmente en los sectores Pueblito, Pasacorriendo y Pita. El Concesionario presentó los factores de riesgo identificados y las medidas preventivas en curso, los asistentes expresaron su preocupación y solicitaron reforzar las acciones mientras se realiza el estudio de seguridad vial, como seguimiento, se acordó fortalecer las medidas preventivas, realizar el estudio en octubre y socializar sus resultados en noviembre. También se programará una visita a Pita en Medio para revisar una solicitud comunitaria de rocería. La ANI y la Interventoría harán seguimiento a estos compromisos y a las gestiones de las entidades competentes.

6.4.5.3.2 Reuniones Paso Peatonal a Nivel:

En este periodo no reportaron reuniones relaciones con pasos peatonales.

Monitoreo de Medios:

En el periodo del 01 al 30 de septiembre de 2026, se monitorearon los medios como: La Razón, El Meridiano, Chica noticias, GS Noticias, La Lengua Caribe, el Universal, Facebook y Twitter de usuarios que nos citan en sus publicaciones. La temática más reiterativa fue el tema de la erosión costera reductores de velocidad e instalación de foto multa en la vía.

6.4.5.4. Enlaces:

Tabla 6-7 Monitoreo de medios

DÍA	MEDIO	ENLACE	TITULO
08/09/2026	Chica noticias	https://www.instagram.com/p/DdC8FhDCXil/?img_index=4&stkn=aDNqOHE1MWJvZjFp	¡Alerta en las vías! Siniestros dejan 45 ~~muertos~~ y 94 lesionados en el departamento
19/09/2026	Chica noticias	https://www.instagram.com/p/DdeeErSjmfy/?stkn=bXNrMGdhZjBkMzN2	¡CERRADA LA VÍA MONTERÍA–PLANETA RICA! árboles caídos bloquean el paso a la altura de Patio Bonito
25/09/2026	El meridiano	https://www.instagram.com/p/DdwCB2kHOH6/?stkn=Z2JtdTI2azczeDhz	Min Ambiente y Gobernación Córdoba coordinan acciones por erosión costera
25/09/2026	Caracol Radio	https://share.google/uSiGW7gXBhpNcGN1e	"Puedo asegurar que la situación es grave": delegado de Min Ambiente sobre erosión costera en Córdoba

Análisis de prensa:

De acuerdo con el seguimiento del 01 al 30 de septiembre 2026, se monitorearon los medios como: La Razón, El Meridiano, Chica noticias, GS Noticias, La Lengua Caribe, Radio Tolú Online, el Universal, Facebook y Twitter de usuarios que nos citan en sus publicaciones. La temática más reiterativa Solicitud de la variante Lorica y peaje Caimanera; entre otras noticias de interés para el corredor vial.

Bloqueos y manifestaciones:

Durante el mes de septiembre se presentó cuatro (4) bloqueos en la vía concesionada, los cuales fueron reportados oportunamente en la red social X (Twitter) y a través de cuñas radiales emitidas por las emisoras: 1.050 AM LA FM, 97.5 FM La Mega, 91.7 FM Radio Uno, 91.3 FM Radio uno Caucasia, en las siguientes fechas:

- **3 de septiembre de 2026:** Se presentó bloqueo por parte de la comunidad de El Bongo, perteneciente al municipio de San Onofre, quienes manifestaron inconformidad debido al incumplimiento en la entrega de los apoyos económicos prometidos por la Alcaldía Municipal para la realización de las fiestas patronales.
- **5 de septiembre de 2026:** Se presentó bloqueo por parte de la comunidad de Palo Alto, perteneciente al municipio de San Onofre, quienes manifiestan inconformidad debido a la falta de fluido eléctrico en la zona.
- **15 de septiembre de 2026:** Bloqueo por parte de la comunidad de Aguas Negras, perteneciente al municipio de San Onofre, quienes manifestaron inconformidad por falta de Fluido Eléctrico y agua potable en la zona.
- **21 de septiembre de 2026:** Bloqueo por parte de la comunidad de Patio Bonito, perteneciente al municipio de Montería, quienes manifestaron inconformidad por la falta de Fluido Eléctrico.

METAS:

- *Realizar el 100% de las reuniones informativas programadas.*
- *Publicar y distribuir el 100% de los boletines trimestrales programados.*
- *Realizar el 100% la divulgación en televisión, radio y prensa con la información del proyecto y sus avances.*

INDICADORES

- *Nº de encuestas realizadas 0*
- *Nº de reuniones de avance de obra (programadas 0) ejecutada (0)*
- *Nº de reuniones de finalización de obra (0)*
- *Nº de reuniones CPC ejecutadas 0 / Nº 0 de reuniones CPC programadas x 0% =*
- *N.º 0 de actividades de divulgación ejecutadas /0Nº de actividades de divulgación programadas x 0% =*

Análisis de la Interventoría:

En el periodo del mes de septiembre 2026, la Interventoría IPAB, realizó el monitoreo de medios y verificación sobre la información y divulgación que efectuó el Concesionario a las autoridades municipales y comunidad sobre las ofertas laborales disponibles en proyecto.

Por otra parte, se realizó la verificación de las actualizaciones de los contenidos de las redes sociales: Facebook, Pag web y Twitter, en las cuales se informa de manera permanente a los usuarios de vías y la comunidad en general, sobre aspectos generales del Proyecto y demás de interés social.

6.4.5.5. Actividades adicionales:

N/A. en este periodo

6.4.6. Programa de capacitación, educación y concientización de la comunidad aledaña al proyecto.

Para el periodo objeto de seguimiento, no se registraron actividades relacionadas con el Programa de Capacitación, Educación y Concientización dirigido a la comunidad aledaña al proyecto, conforme a las actuaciones adelantadas por el Concesionario en el marco de la etapa de reversión.

Análisis de la Interventoría:

METAS

Cumplir con el 100% del cronograma de capacitaciones

INDICADORES

- *N° de reuniones propuestas 0/N° de reuniones efectuadas x0%=0%*
- *N° de capacitaciones ejecutada 0/N° de capacitaciones programadas 0x 0%=0 %*

6.4.7. Programa de Apoyo a la Capacidad de Gestión Institucional

A la fecha del presente informe correspondiente al mes de septiembre de 2026, se encuentran identificados en total 1.515 ocupaciones ilegales en el derecho de vía del corredor Concesionado, ante lo cual, desde la Concesión, continúan enviando notificaciones a las alcaldías e inspecciones de policía, con el objetivo de que se inicien los respectivos procedimientos para la restitución del derecho de vía.

En cuanto a la relación de las capacitaciones, en septiembre de 2026 el Concesionario en este periodo no realizó capacitaciones ha Autoridades Municipales y Organizaciones Sociales.

Tabla 6-8 Capacitaciones Autoridades Municipales y Organizaciones Sociales

FECHA	ACTIVIDAD	OBJETIVO	MUNICIPIO
N/A	N/A	N/A	N/A

Fuente: Tomado del reporte mensual presentado por el Concesionario Ruta al Mar

Para el reporte del periodo de septiembre 2026, el Concesionario informó sobre el retiro de la ocupación identificada en el espacio público en el corredor vial.

Tabla 6-9 Recuperaciones de la zona del derecho de vía

Tipo de Ocupación	Unidad Funcional	Fecha de Identificación	Fecha de la Recuperación	Notificación
Venta	UFI 3-2 PR 5+350	20/08/2026	15/09/2026	20250311008062

Fuente: El Concesionario Ruta al Mar

Tabla 6-10 Capacitación para autoridades locales

OBJETIVO: Gestionar espacios de interlocución con la institucionalidad en pro a la recuperación del derecho de vía -Espacio Público.				
FECHA	**LUGAR**	**TEMÁTICA**	**POBLACIÓN**	**SOPORTE**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Fuente: El Concesionario Ruta al Mar durante el mes de septiembre de 2026

6.4.7.1. Otras actividades:

Análisis de la Interventoría:

La Interventoría durante el periodo del del mes de septiembre de 2026, efectuó verificación y seguimiento a las actividades del Concesionario concernientes al

programa de Apoyo a la Capacidad de Gestión Institucional, en la cual se evidenció, la actualización del registro de las áreas ocupadas ilegalmente, así mismo, se formalizaron acciones tendientes a la recuperación del espacio público tales como las querellas policivas a cada uno de los municipios que hacen parte de la influencia directa del proyecto.

METAS

- *Efectuar el 100% de las reuniones informativas y capacitaciones programadas en el marco del programa.*
- *Acompañamiento de las mesas de trabajo programadas por las autoridades locales.*

INDICADORES

- *N° de capacitaciones realizadas 0 / N° de capacitación programadas 0 x 100%=0%*
- *N° de mesas de trabajo ejecutadas x0 /N° de mesas de trabajo programadas 0x 100% =0%*

En el marco de la etapa de reversión, y de acuerdo con el alcance y las actividades previstas para esta fase, las capacitaciones y mesas de trabajo asociadas al Programa de Apoyo a la Capacidad de Gestión Institucional no se evidencian como actividades requeridas o directamente aplicables a las necesidades propias de dicha etapa de reversión.

6.4.8. Programa de Arqueología Preventiva.

En el periodo del 01 al 30 de septiembre 2026, la Interventoría continuó con el seguimiento al estado de trámites, sin embargo, es importante mencionar que el 1 de mayo de 2026, se notificó a la Agencia Nacional de Infraestructura ANI y al Concesionario, la declaratoria de terminación anticipada del contrato de Concesión No. 016 de 2015, y como consecuencia de dicha decisión, el 02 de mayo de 2026 inició la Etapa de Reversión. Laudo proferido dentro del arbitraje internacional tramitado por el Centro Internacional de Resolución de Disputas dentro del caso CIRD No. 01-23-0002-8303, en el cual el Concesionario Ruta al Mar S.A.S fungió como demandante y la Agencia Nacional de Infraestructura como demandada, ahora bien,

las obligaciones contractuales a cargo del Concesionario deben entenderse en el marco de dicha etapa.

Tabla 6-11 Indicadores de cumplimento del programa

Objetivo del programa	Indicadores	Resultados del 01 al 30 de septiembre 2026	Porcentaje de cumplimiento de indicador	Porcentaje de cumplimiento del Programa
Proteger el Patrimonio Arqueológico de la nación que pueda encontrarse en el área a intervenir, Mediante actividades. En este sentido, el Concesionario ejecuta actividades bajo las directrices del ICANH.	Realizar inducción al 100% del personal vinculado al proyecto en temas de preservación del patrimonio arqueológico	Inicio de Etapa de reversión	0%	0%
	Reportar el 100% de hallazgos en el corredor Concesionado.	Inicio de Etapa de reversión	N/A	
	Realizar las solicitudes de intervención arqueológica necesarias ante el ICANH.	Del 01 al 30 de septiembre 2026 el Concesionario no realizó solicitud de intervención arqueológica ante el ICANH	N/A	

Fuente: El Concesionario Ruta al Mar

A continuación, se describe cada uno de los indicadores del Programa de Arqueología Preventiva:

Tabla 6-12 Hallazgos corredor concesionado mes de septiembre de 2026

Tema	Fecha	Lugar	Unidad Funcional	Comentario
Reportar el 100% de hallazgos en el corredor Concesionado.		Todo el proyecto	Todo el proyecto	Del 1 al 30 de septiembre de 2026 las obligaciones contractuales a cargo del Concesionario deben entenderse en el marco de dicha etapa de reversión

Fuente: El Concesionario Ruta al Mar

Tabla 6-13 Solicitudes de Intervención arqueológica ante el ICANH.

Del 01 al 30 de septiembre de 2026				
Asunto	**UF**	**Radicado de la Concesión ante el ICANH**	**Respuesta del ICANH**	**Estado**
Del 01 al 30 de septiembre de 2026 se realizó solicitudes de intervención arqueológica ante el ICANH (incluye todas las solicitudes necesarias ante el ICANH para el cumplimiento del programa de arqueología Preventiva del Proyecto).	UFI 2 Y UFI 6-1	02618420007 3772	Seguimiento	Atención a oficio ICANH - 2026162000075451 respecto al informe de prospección para aprobación de PMA del proyecto “Programa de arqueología preventiva para ZODME (km 13+600) asociado a la unidad funcional 6, subsector 2. Municipio de San Antero (Córdoba)” Resolución 274 del 22 de mayo de 2020. Recibido con radicado: 47-20260619015145

A continuación, se presenta el consolidado actualizado del 01 al 30 de septiembre 2026 de los tramites que han sido aprobados por el ICANH en materia de licencias

para las UFI que integran el proyecto IP Antioquia Bolívar, en total 35, de los cuales 2 PMA arqueológicos se encuentran activos, 1 cedido, 4 en proceso de cierre, 2 abiertas sin ejecución, 1 ZODME, 1 cerrada por cierre atípico y 24 licencias cerradas.

Tabla 6-14 Estado de Licencias IP Antioquia-Bolívar ICANH

UF	LICENCIAS	FASE	ESTADO
2 y 6 (1, 2, 3)	Res. N° 1247 del 15/11/2021	PMA monitoreo y rescate	Abierta
7.1	Res. 257 del 15/05/2020	PMA – monitoreo y rescate	Abierta no se ha ejecutado en campo
7.2	Res 720 del 15/09/2020	PMA – monitoreo y rescate	Abierta en proceso de Informe para cierre
7.3	Licencia N° 7284 de 2019	PMA – monitoreo y rescate	Abierta en proceso de Informe para cierre
Cantera Lorica	Licencia 280 de 2020	PMA – monitoreo y rescate	Abierta
2 y 6.1	Licencia N° 7572	PMA – monitoreo	Cedida
3.1, 3.2 Y 3.3	Licencia N° 6534	PMA Monitoreo	Abierta en proceso de Informe para cierre
8.2 Y 8.3	Licencia N° 6976	PMA Monitoreo	En proceso de cierre
ZODME 6,2	Res. 274 del 22/05/2020	Prospección	Abierta
Cantera Lorica 1	Res. 260 del 15/05/2020	PMA (monitoreo y rescate)	Cerrada Por Cierre Atípico
Curva Puerto Rey	Res. 1574 del 15/09/2022	Prospección	Abierta

Fuente: El Concesionario Ruta al Mar Informe Consolidado seguimiento tramites socio ambiéntales programa Arqueología Preventiva

Seguimiento de la Interventoría:

-Revisión y actualización de la matriz de tramites ICANH, del 01 al 30 de septiembre de 2026

6.4.9. Programa de Cultura Vial

Es importante mencionar que, de acuerdo con el inicio de la etapa de reversión, con fundamento en el Laudo emitido el 2 de mayo de 2026 dentro del arbitraje internacional CIRD No. 01-23-0002-8303 (el “Laudo”), adelantado entre la Concesión Ruta al Mar S.A.S. (“RAM” o el “Concesionario”) y la Agencia Nacional de Infraestructura (“ANI”)”, las obligaciones contractuales a cargo del Concesionario deben entenderse en el marco de dicha etapa reversión

Análisis de la Interventoría:

METAS

- *Desarrollar 100% de las actividades pedagógicas programadas.*
- *Distribución del 100% del material alusivo a la seguridad vial elaborado.*
- *Realizar el 100% de las campañas pedagógicas sobre el corredor vial.*

INDICADORES

- *Nº de campañas ejecutadas 0/ Nº de campañas programadas 0x 100% =0%*
- *N° de atividades pedagógicas ejecutadas 0 / N° de atividades pedagógicas programadas 0x 100% = 0%*
- *Cantidad de material informativo entregado =0*

6.4.10. Programa de Acompañamiento a la Gestión Socio- Predial

De acuerdo con el informe de la anterior Interventoría, el Concesionario en el periodo del mes de septiembre de 2026, presentó mediante radicado 48-RUTADCTOELECTRONICOS 20260902012923, la actualización de la matriz de Compensaciones Socioeconómicas del mes de julio de 2026. Ahora bien, teniendo en cuenta los predios en los cuales se ha realizado el levantamiento de insumos técnicos y jurídicos a lo largo del corredor vial y con el fin de mantener la información de la base de datos actualizada a la fecha del presente informe y poder contar con un estimado del valor por compensaciones sociales, en cumplimiento con lo estipulado en la sección 5.1.2 del Apéndice Técnico 8.

A continuación, se presenta la consolidación de la información reportada por el Concesionario:

Tabla 6-15 Comparativo Valores

UFI	Sub/ Sector	No. de Predios PPCSE	Valor Inicial PPCSE	No. de predios 07-26	Valor PCSE 07/2026	No. de predios 08-26	Valor PCSE 08/2026
1	1	73	$ 9.652.356	3	$ 6.000.000,00	3	$ 6.000.000,00
2	1	357	$ 6.672.687.570	426	$ 9.749.136.311,55	426	$ 9.749.136.311,55
	1	10	$ 94.097.382	9	$-	9	$-
	2	53	$ 355.758.264	60	$ 108.701.955,19	60	$ 108.701.955,19
	3	58	$ 63.429.768	59	$ 297.556.560,00	59	$ 297.556.560,00

UFI	Sub/ Sector	No. de Predios PPCSE	Valor Inicial PPCSE	No. de predios 07-26	Valor PCSE 07/2026	No. de predios 08-26	Valor PCSE 08/2026
3	4	33	$ 109.939.566	28	$ 6.144.621,00	28	$ 6.144.621,00
	5	67	$ 1.259.029.990	64	$ 394.364.162,00	64	$ 394.364.162,00
5	1	0	$ 0	2	$-	2	$-
6	1	75	$ 152.190.426	86	$ 21.589.563,00	86	$ 21.589.563,00
	2	82	$ 1.567.977.334	47	$ 79.880.073,00	47	$ 79.880.073,00
	3	49	$ 741.237.246	48	$ 22.713.150,00	48	$ 22.713.150,00
7	1	13	$ 96.523.560	11	$-	11	$-
	2	105	$ 1.211.265.966	100	$ 1.842.767.895,74	100	$ 1.842.767.895,74
	3	120	$ 336.527.748	107	$ 127.005.783,00	107	$ 127.005.783,00
8	1	70	$ 177.189.678	34	$ 2.633.409,00	34	$ 2.633.409,00
	2	65	$ 48.261.780	13	$-	13	$-
	3	462	$ 3.778.897.374	189	$ 2.051.691.951,00	189	$ 2.051.691.951,00
TOTAL		**1692**	**$ 16.674.666.008**	**1286**	**$ 14.710.185.434,48**	**1286**	**$ 14.710.185.434,48**

Fuente: Tomado del reporte mensual de la Matriz del Plan de Compensaciones presentado por el Concesionario Ruta al Mar en el mes de septiembre de 2026

Radicación de Fichas Sociales en Interventoría

En el transcurso del mes de septiembre de 2026, no se remitieron Fichas Sociales a la Interventoría IPAB, para revisión y aprobación.

6.4.10.1. Acuerdos de compensación firmados

En el transcurso del mes de septiembre de 2026, no se realizaron trámites para pago por compensaciones socioeconómicas.

6.4.10.2. Compensaciones pagadas en el Periodo

En el mes de septiembre, no hubo modificación y se continua con el consolidado de compensaciones sociales aprobadas por la Interventoría, siendo la suma **DE CATORCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SESENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($14.737.367.064,48)** de los cuales se han cancelado la suma **TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISICENTOS SESENTA Y**

CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($ 13.899.664.994,52), quedando pendiente por pagar, la suma de **OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTO DOS MIL SESENTA Y NUEVO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($837.702.069,96).** A continuación, se relaciona el consolidado de pagos por Unidad Funcional en los que procede el pago de compensaciones sociales, aprobadas por la Interventoría:

Tabla 6-16 Consolidación general de la aplicación del catálogo de compensaciones socioeconómicas

UNIDAD FUNCIONAL		TOTAL, COMPENSACIONES APROBADAS	TOTAL, COMPENSACIONES PAGADAS	TOTAL, COMPENSACIONES PENDIENTES POR PAGAR
UFI	SUBSECTOR			
1	1	$ 6.000.000,00	$ 6.000.000,00	$ 0,00
2	1	$ 9.776.317.941,55	$ 9.072.686.017,59	$ 703.631.923,96
3	1	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	2	$ 108.701.955,19	$ 108.701.955,19	$ 0,00
	3	$ 297.556.560,00	$ 297.556.560,00	$ 0,00
	4	$ 6.144.621,00	$ 6.144.621,00	$ 0,00
	5	$ 394.364.162,00	$ 393.428.624,00	$ 935.538,00
5	1	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
6	1	$ 21.589.563,00	$ 21.589.563,00	$ 0,00
	2	$ 79.880.073,00	$ 79.880.073,00	$ 0,00
	3	$ 22.713.150,00	$ 22.713.150,00	$ 0,00
7	1	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	2	$ 1.842.767.895,74	$ 1.842.767.895,74	$ 0,00
	3	$ 127.005.783,00	$ 127.005.783,00	$ 0,00
8	1	$ 2.633.409,00	$ 2.633.409,00	$ 0,00
	2	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	3	$ 2.051.691.951,00	$ 1.918.557.343,00	$ 133.134.608,00
TOTAL		**$ 14.737.367.064,48**	**$ 13.899.664.994,52**	**$ 837.702.069,96**

Fuente: Tomado del reporte mensual de la Matriz del Plan de Compensaciones presentado por el Concesionario Ruta al Mar en el mes de septiembre de 2026

Análisis de la Interventoría:

La Interventoría continúa con la verificación del seguimiento al cumplimiento del avance del Plan de Compensaciones Sociales los cuales mensualmente el Concesionario entrega para su revisión, asimismo, se analiza los cambios que se presentaron en el respectivo mes.

METAS

- *Seguimiento y acompañamiento social, técnico y jurídico al 100% de las unidades sociales objeto de traslado.*
- *Seguimiento y acompañamiento al proceso de adaptación en el nuevo sitio del 100% de las unidades sociales trasladadas por un periodo de un año posterior al traslado.*

INDICADORES

- *N°0 de unidades sociales con acompañamiento por parte de la Concesión / 0N° de unidades sociales objeto de traslado x100% =%*
- *N° de unidades sociales compensadas 0/ N°6de unidades sociales trasladadas x 0%=%*

6.4.10.3. Seguimiento Actas de Vecindad

N/A.

6.5. PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL

A continuación, se detallan los programas, de acuerdo con las actividades ejecutadas por la Concesión del 01 al 30 de septiembre de 2026:

1.Formación Comunitaria: No se realizaron actividades en este periodo septiembre de 2026

2.Formación vial: Durante el mes de septiembre de 2026, el día 2, se desarrolló la actividad Institución Educativa Patio Bonito (Montería) fortalecimiento de

conocimientos en educación vial, promoviendo la comprensión de la movilidad segura y el respeto por las normas de tránsito a estudiantes (UF 1).

La jornada estuvo orientada al fortalecimiento de conocimientos en educación vial, promoviendo la comprensión de la movilidad segura, el respeto por las normas de tránsito y la importancia de adoptar comportamientos responsables como actores viales. Asimismo, se abordaron temas relacionados con la percepción del riesgo en la vía, el reconocimiento e interpretación de las señales de tránsito y el uso adecuado de los espacios públicos.

Como parte de la actividad, se desarrollaron ejercicios pedagógicos y participativos que permitieron a los estudiantes identificar situaciones de riesgo en su entorno cotidiano, fortalecer comportamientos seguros y reflexionar sobre la importancia de prevenir los siniestros viales mediante la adopción de conductas responsables

3.Formación Para el Empleo: No se realizaron actividades en este periodo septiembre de 2026.

4.Infraestructura Educativa: No se realizaron actividades en este periodo septiembre de 2026.

5.Campañas ambientales: No se realizaron actividades en este periodo septiembre de 2026.

Resulta pertinente mencionar, que el Concesionario mantuvo la apertura del punto de conectividad a la comunidad aledaña del Peaje de Mata de Caña y a los usuarios de la vía, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. hasta el 14 de septiembre de 2026.

Asimismo, conviene señalar que el día 14 de septiembre 2026, el Concesionario realizó la donación de mobiliario (Lorica) computadores, mesas y sillas que se encontraban en el punto de conectividad ubicado en el CCO de Mata de Caña, a las comunidades vecinas al Peaje, entre las cuales se encuentran: Institución Educativa de Mata de Caña, Institución Educativa Eugenio Sánchez Cárdenas de Tierraltica y de Sarandelo, así como también se hizo donación de sillas y mesas al Hogar de Bienestar Genios Infantiles del barrio Las Acacias de Tierraltic.

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LOS TRÁMITES ANTE EL MINISTERIO DEL INTERIOR.

Se hace la claridad que la información reportada a continuación corresponde a antecedentes procedente de la Interventoría pasada, igualmente, a los reportes emitidos por el Concesionario, en este sentido la información se deja con fines de la trazabilidad

Además, es importante mencionar que el Concesionario de acuerdo con el inicio de la etapa de reversión, que de acuerdo al día 1 de mayo de 2026, se notificó a la Agencia Nacional de Infraestructura ANI y al Concesionario, la declaratoria la terminación anticipada del contrato de Concesión No. 016 de 2015, y como consecuencia de dicha decisión, el 02 de mayo de 2026 inició la Etapa de Reversión. “Laudo emitido el dentro del arbitraje internacional CIRD No. 01-23-0002-8303 (el “Laudo”), adelantado entre la Concesión Ruta al Mar S.A.S. (“RAM” o el “Concesionario”) y la Agencia Nacional de Infraestructura (“ANI”)”. las obligaciones contractuales a cargo del Concesionario deben entenderse en el marco de dicha etapa.

A continuación, se relacionan los trámites efectuados ante el Ministerio del Interior:

Tabla 6-17 Seguimiento a la Gestión de los Trámites ante el Ministerio del Interior

UF	Tipo de Intervención	N° de Certificación	SI/NO	Observación
1	Mejoramiento	392 de 30 de abril de 2014	NO	El cabildo indígena zenú Nueva Estación manifestó ser objeto de Consulta Previa ya que el sitio de reubicación del peaje Los Manguitos se encuentra en territorio étnico.
2	Construcción calzada adosada a la UFI 6.1	1716 de 07 de noviembre de 2013	NO	La DCP a través del OFI 18-8763-2500 del 13 de marzo de 2018 estableció no adelantar proceso de certificación debido que el tipo de intervención es un mejoramiento vial, por lo tanto, no se requiere Consulta Previa.
3.1	Construcción	482 del 14 de marzo de 2014 / 0020 de 20 de enero de 2017	NO	Licencia ambiental Res. N° 114 del 30 de enero de 2018
3.2	Mejoramiento	487 del 14 de mayo de 2014	NO	
3.3	Construcción	0019 del 20 de enero de 2017	NO	Licencia ambiental Res. N° 898 del 01 de agosto de 2017
3.4	Mejoramiento	486 del 14 de marzo de 2014	NO	
3.5	Construcción	488 del 14 de marzo de 2014	NO	En el trámite de licenciamiento La DCP emitió Certificación N°01452 del 22 de diciembre de 2017. NO presencia Licencia ambiental Res. N° 0057 del 12 de enero de 2017, modificado por la resolución 360 del 12 de marzo de 2018.
6.1	Mejoramiento	1716 del 07 de noviembre de 2013	NO	La DCP a través del OFI 18-8763-2500 del 13 de marzo de 2018 estableció no adelantar proceso

UF	Tipo de Intervención	N° de Certificación	SI/NO	Observación
				de certificación debido que el tipo de intervención es un mejoramiento vial, por lo tanto, no se requiere Consulta Previa.
6.2		391 de 05 de marzo de 2014	NO	
6.3		1560 de 31 de octubre de 2013	SI	Presencia de la comunidad negra Benkos Biojó, jurisdicción del municipio de Coveñas. La Concesión expresa se acogerá a lo circular 2016-409-000028-4.
7.1	Construcción	760 del 30 de abril del 2014	NO	Certificación fase de estructuración.
		1602 del 19 de diciembre del 2016	NO	Actualización Certificación.
		021 del 20 de enero de 2017	NO	Certificación vigente.
		0064 del 30 de enero de 2019	NO	Actualización certificación incluyó áreas adicionales y ZODMES.
		EXTMI 19 – 10641 del 18 de marzo de 2019.	En proceso	Solicitud de certificación de presencia o no de comunidades étnicas del proyecto denominado área adicional para la construcción de la variante Lorica UFI7.1 y zona de disposición de materiales sobrantes certificación 0021 de 20 de enero de 2017 y certificación 0064 de 30 de enero de 2019.
7.1	Construcción	0181 del 29 de marzo de 2019	NO	La nueva zona de disposición de materiales que solicitó la Concesión en adyacente a la certificada con la resolución 021 de 20 de enero de 2017 y 0064 del 30 de enero de 2019.
7.1	Construcción	Tutela 606 de 2019	SI	En respuesta al citado pronunciamiento de primera instancia, la Concesión impugnó el fallo proferido, solicitando específicamente al juzgado de segunda instancia, "reevaluar la decisión de la instancia, misma que consideramos incurre en VÍA DE HECHO, sin olvidar que en estos momentos existe CARENCIA DE OBJETO como consecuencia de la imposibilidad de hacer intervenciones en la UFI.7.1". En este orden, desde la Interventoría se realizó seguimiento al vencimiento de los tiempos (30 días, los cuales se cumplieron el 12 de noviembre de 2019) en los que se esperaba el fallo en segunda instancia, para lo cual se consultó a la Concesión el 14 de noviembre de 2019, quienes informaron lo siguiente: A través del telegrama N° 6953 del 13 de noviembre de 2019, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá notificó a la Concesión Ruta al Mar el fallo de segunda instancia tutela N° 015-2019-606-00 declarando la NULIDAD de todo lo actuado por el juzgado 15 laboral, en el auto fechado 16 de septiembre de 2019. En la providencia el tribunal ordenó iniciar nuevamente el proceso, pidiendo se vincule a la ANLA, ICANH, MADS, CVS, procuraduría agraria y ambiental, procuraduría general y a los municipios de Cereté, Cotorra, San Carlos, San Pelayo, San Antero y Coveñas. Lo anterior en aras de garantizar el derecho a la defensa.

UF	Tipo de Intervención	N° de Certificación	SI/NO	Observación
				El 10 de febrero 2020 El Concesionario fue notificado de la providencia del Tribunal que confirma el fallo, en el que se ordenó consultar seis (6) comunidades: El 13 de febrero 2020 El ministerio del Interior convocó reunión preparatoria para el cumplimiento del fallo, y se acordó llevara cabo la siguiente reunión el 4 de marzo de 2020 con el objetivo de establecer rutas claras en tiempos y modos para el abordaje de la consulta previa. El 25 de septiembre 2020 se realizó reunión preparatoria entre el Ministerio del Interior DANCP, Concesión e Interventoría con el objetivo de avanzar en el cumplimiento de la sentencia N° 606 de 2019 Consulta Previa. El 18 de noviembre de 2020 mediante comunicado AB 6773 la Interventoría aprobó la ruta metodológica en tiempos y costos. Lo anterior, atendiendo la solicitud de la Concesión en su radicado N° 48-147-20201110016410 del 11 de noviembre de 2020 El 20 de enero de 2021 re realizó reunión de consulta, con el objetivo de dar continuidad a la etapa de identificación de impactos y medidas de manejo, esta reunión se llevó a cabo en el cabildo la Palma, Lorica. El 21 de enero de 2021 se realizó recorrido en campo por solicitud de equipo asesor de las comunidades, con el objetivo de revisar en época seca la zona donde se construirá el puente caño chimalito y de este modo evaluar medidas de manejo a los impactos socioeconómicos. El 22 de enero de 2021 se dio cumplimiento a la capacitación en materia de consulta previa a cargo de la DANCP. El 26 de marzo de 2021 La Concesión mediante radicado N° 20211102301 allegó ante CVS los acuerdos protocolizados de las Consultas Previas realizadas con las comunidades indígenas. En el numeral 6.7.1 del presente capítulo se encuentra el detalle del proceso consultivo. El 20 de abril de 2021, la Concesión mediante derecho de petición con radicado N° 20211102937 solicitó al consejo directivo CVS fecha para el pronunciamiento de fondo del trámite de sustracción. El 10 de mayo de 2021 La CVS mediante oficio N° 20212103820 le indicó a la Agencia que en la sesión de consejo directivo del 18 de mayo del

UF	Tipo de Intervención	N° de Certificación	SI/NO	Observación
				2021 se incluiría el acuerdo de sustracción (la sesión sí se realizó, pero se pospuso la decisión) El 18 de mayo de 2021 El Concesionario mediante radicado N° 48-147-20210518019006 presentó Derecho de Petición ante el Consejo Directivo CVS ya que este órgano no ha notificado la decisión del trámite de sustracción. En el mes de febrero 2023 mediante Radicado: 47-RUTADCTOELECTRONICOS-20230208004508, la concesión Ruta al Mar fue notificada por parte del Consejo de Estado, sobre fallo de acción popular interpuesta por Manuel Salvador Nule Rhenals, hasta la fecha del presente informe el Concesionario no se ha manifestado. En el mes de mayo 2024, se conoció que la CVS notificó al Concesionario el Acuerdo del Concejo Directivo No. 522 de fecha 11 de marzo de 2024, por medio del cual niega la solicitud de revocatoria del Acuerdo No. 509 del 26/09/2023 y por el cual se resolvió una solicitud de Sustracción del Distrito de Manejo Integrado del Complejo Cenagoso del Bajo Sinú – CCBS que había presentado el Concesionario; así las cosas, la CVS deja en firme la negación de sustracción del DRMI del CCBS a la vez que informa que se podrá presentar una nueva solicitud de sustracción que se ajuste a los requerimientos de la Corporación. Del 01 al 30 de septiembre 2026, no se tienen novedades.
7.2	Construcción	508 del 17 de marzo de 2014	NO	Certificación diseño contractual
		EXTMI17–- 50622 de 08 de noviembre de 2017	SI	Los días 15-19 de noviembre el Ministerio de Interior hizo visita de verificación, diseño Gran Variante
		092 del 23 de febrero de 2018 Posterior a la presente tabla se presenta la trazabilidad del proceso de consulta previa En cuanto a la solicitud de nueva certificación en el trámite de licenciamiento ambiental, el Concesionario mediante radicado EXTMI2020-10912 del 13 de marzo de 2020 solicitó una nueva certificación, la cual se basó en el área	SI	Presencia de dos comunidades étnicas: Parcialidad indígena El Porvenir – Municipio de San Antero y consejo comunitario de Barulé – Municipio de Coveñas. El 12 de marzo de 2018 la Concesión presentó recurso de reposición contra el acto administrativo 092 del 23 de febrero de 2018–- EXTMI 18-9604. Con la resolución 011 del 10 de abril de 2018 el Min Interior ratificó la integridad del acto administrativo 092 del 23 de febrero de 2018 La Concesión solicita a la ANI EER por la certificación 0092 del 23 de febrero de 2018, radicado 48-147-20180312000887 La ANI con el radicado 2018-300-012178-1 del 23 de abril de 2018 NO ACEPTA la ocurrencia del EER invocado por el Concesionario en su

UF	Tipo de Intervención	N° de Certificación	SI/NO	Observación
		de influencia de impactos significativos.		comunicado con radicado ANI N° 2018-409-025125-2. OTROSÍ N° 14 de 19 de junio de 2019. Consulta previa con 2 comunidades étnicas, más 1 que entró vía fallo judicial del tribunal administrativo de Sucre (Humberto Hernández) Del 22 al 27 de septiembre de 2020 se realizó las reuniones de socialización de resultados del EIA Variante de Coveñas, en total 12 comunidades socializadas, de acuerdo con el requerimiento ANLA en la solicitud de información adicional, sólo está pendiente el pronunciamiento de la DANCP sobre la presencia o no de comunidades étnicas en el marco del requerimiento ampliación de nuevas áreas de influencia, una vez se pronuncie el Ministerio del Interior, se establecerá el estado del proceso. La Concesión mediante radicado: 48-147-20200820015155 del 20 de agosto de 2020 interpuso DP al ministerio del Interior con ocasión de las metodologías y criterios dentro de la certificación número 0092 del 23 de febrero del 2018. En el mes de septiembre 2023, se realizó visita se seguimiento a los acuerdos de consultas previas por parte de la DANCP con las comunidades de El Porvenir y Barulé los días 19 y 20 de septiembre respectivamente. En el mes de mayo 2024, con las comunidades de Humberto Hernández, Barule y Porvenir se realizó seguimiento con la DANCP a los acuerdos de Consulta Previa. El 22 y 24 de abril 2025, se realizó seguimiento por parte de la DANCP a las comunidades de Barulé y El Porvenir, en este último seguimiento interno con el Ministerio del Interior se hizo cierre de los acuerdos de consulta previa con la comunidad del Porvenir, después de haber cumplido a cabalidad el 100% de estos. Del 01 al 30 de junio 2026, no se tienen novedades, se continúan los seguimientos internos con la comunidad de Barulé. *“cuál fue la metodología y criterios legales, técnicos y étnicos empleados en la determinación del contenido de la Certificación número 0092 del 23 de febrero del 2018 y explicar las razones por la cuales la citada certificación cumple con la normatividad vigente en relación con la identificación de presencia o no de comunidades étnicas en el área de influencia definitiva del proyecto”*

UF	Tipo de Intervención	N° de Certificación	SI/NO	Observación
				En el numeral 6.7.2 del capítulo 6.7 *Desarrollo de consultas previas en las UF del proyecto*, se encuentra el detalle del proceso consultivo.
7.2	Construcción Variante otrosí 14 de 2019	**Resolución ST- 1260 de 09 dic 2020**	SI	Presencia de la comunidad indígena **Bella Vista**, ubicada en el municipio de Coveñas. El reconocimiento se dio de acuerdo con el análisis de nuevas áreas de influencia hecho por la ANLA en el marco del trámite de licenciamiento ambiental para esta Unidad Funcional. La Concesión mediante comunicado radicado 48-147-20210120017424 del 20 de enero de 2021 solicitó a la DANCP el inicio de la Consulta Previa. El 17 de febrero de 2021 se realizó reunión de coordinación entre Concesión, Interventoría y la DANCP. Se propuso iniciar la consulta Previa el 17 de marzo de 2021. La Concesión presentó ante la Interventoría solicitud para la validación de los costos asociados a Ruta Metodológica de la comunidad étnica Bellavista, a través del radicado N° 48-147-20210330018383 del 30 de marzo de 2021. El 5 de abril de 2021, la Interventoría mediante comunicado CI.023/AB7405/21/7.1.8 dio no objeción a la ruta metodológica presentada por la Concesionaria, con un costo de “ciento cuarenta seis millones ciento sesenta y dos mil quinientos pesos” ($146.162.500) y un tiempo de 2 meses contados a partir del 16 de marzo hasta el 19 de mayo de 2021. El 14 de abril de 2021, se desarrolló la etapa de identificación de impactos y concertación de medidas de manejo, la cual fue convocada por la DANCP mediante OFI2021-8506-DCP-2500 del 30 de marzo de 2021. El 27 de abril de 2021, se desarrolló la etapa de concertación de medidas de manejo convocada mediante OFI2021-10493-DCP-2500 del 20 de abril de 2021. En este sentido, al estar las partes de acuerdo con las medidas de manejo, se le solicitó a la DANCP protocolizar los acuerdos formulados, solicitud que fue aprobada por el garante de la Consulta Previa – Ministerio del Interior, con un valor en compensaciones equivalente a $275.000.000 para el desarrollo de proyectos en beneficio de las comunidades.

UF	Tipo de Intervención	N° de Certificación	SI/NO	Observación
		Sentencia 2021.00081		El 3 de mayo de 2021 la Concesión mediante comunicado No 48-147-20210503018811 radicó el complemento del EIA UF 7.2 Variante de Coveñas, referido al capítulo de caracterización social con la incorporación de los acuerdos protocolizados con la comunidad indígena Bellavista. Posteriormente, mediante radicado N° 48-147-20210920020509 del 20 de septiembre de 2021 el Concesionario remitió ante la DANCP la Licencia Ambiental No 1317 del 27 de julio de 2021–- Licencia Ambiental para la UF 7.2 Variante Coveñas, en el marco del proceso consultivo de la ST-1260 de 2020, 092 de 2018 y T63 de 2019 En el mes de diciembre 2021, se realizó reunión de seguimiento de la implementación de acuerdos protocolizados de consulta previa con la Comunidad Indígena Bellavista. En el mes de marzo 2022 se realizó reunión de seguimiento a los Acuerdos con la Comunidad Indígena Bellavista. En el mes de julio 2022, se realizó reunión interna de seguimiento de la implementación de acuerdos protocolizados de consulta previa con esta comunidad. En el mes de octubre 2022 se realizó reunión de seguimiento de la implementación de acuerdos protocolizados de consulta previa, con la presencia de la DANCP cuya finalidad es poner en conocimiento del Mininterior los avances del proceso de cumplimiento de los acuerdos En el mes de abril 2023, se realizó reunión interna de seguimiento de la implementación de acuerdos protocolizados de consulta previa con esta comunidad. En el mes de junio 2023, se realizó reunión de seguimiento de la implementación de acuerdos protocolizados de consulta previa, con la presencia de la DANCP. En atención a lo ordenado por el TRIBUNAL SUPERIOR DE SINCELEJO en ordinal de la sentencia 2021.00081, para ello, el día 19 de octubre de 2021, el Ministerio del Interior, desde la DANCP inició los trámites para la preparación de la consulta previa de la Comunidad Indígena Zenú Guayabal, en la etapa de coordinación y preparación, en donde surgió la convocatoria para la reunión de consulta previa en la etapa PRECONSULTA Y APERTURA con la comunidad indígena Zenú Guayabal.

UF	Tipo de Intervención	N° de Certificación	SI/NO	Observación
				El 4 de noviembre 2021 se llevó a cabo consulta previa con la Comunidad Indígena Zenú Guayabal en la etapa PRECONSULTA Y APERTURA, convocada por la DANCP mediante OFI2021-29996-DCP-2700 de 20 de octubre de 2021. El día 30 de noviembre de 2021 se surte la etapa de Taller de análisis e identificación de impactos y formulación de medidas de manejo con la comunidad indígena Zenú Guayabal. Mediante oficio OFI2021-34769-DCP-2700 del 05 de diciembre de 2021 la DANCP convoco a Reunión de Consulta Previa en la etapa de Formulación de acuerdos y protocolización con la Comunidad Indígena Zenú Guayabal. El día 16 de diciembre se dio por surtida la etapa de Formulación de acuerdos y protocolización, en cumplimiento a lo ordenado por EL TRIBUNAL SUPERIOR DE SINCELEJO en el Ordinal 2 de la Sentencia 2021.00081", con el Cabildo Indígena de Guayabal El 22 de diciembre 2021, mediante comunicado CI.023/AB8803/21/7.1.8, esta Interventoría dio respuesta al oficio 48-147-20211206021602, Solicitud de aprobación de costos asociados a Ruta Metodológica de la comunidad Indígena Guayabal UF 7.2. En el mes de febrero 2022 se realizó reunión de Inicio de implementación de Acuerdos con la Comunidad Indígena Zenú Guayabal. En el mes de marzo 2022 se realizó reunión de seguimiento a los Acuerdos con la Comunidad Indígena Zenú Guayabal. En el mes de septiembre 2022, no se realizó reunión de seguimiento de la implementación de acuerdos protocolizados de consulta previa. En el mes de octubre 2022 se realizó reunión de seguimiento de la implementación de acuerdos protocolizados de consulta previa, con la presencia de la DANCP cuya finalidad es poner en conocimiento del Mininterior los avances del proceso de cumplimiento de los acuerdos. En el mes de abril 2023, se realizó seguimiento a los acuerdos de consulta previa por parte del Ministerio del Interior, en esta reunión de seguimiento se realizaron algunas modificaciones de los acuerdos protocolizados requeridos por la comunidad, sin afectar lo planteado Inicialmente. En el mes de abril 2024, se realizó seguimiento a los acuerdos con la comunidad de Bellavista en la

UF	Tipo de Intervención	N° de Certificación	SI/NO	Observación
				cual la DANCP en su seguimiento pudo evidenciar el 100% de los acuerdos suscritos en el acta de protocolización del 27 de abril 2021, fueron cumplidos a cabalidad, por los que las partes en consenso aceptan la terminación del procedimiento consultivo. En el mes de mayo 2024, se realizó seguimiento a los acuerdos con la comunidad Zenú Guayabal en la cual la DANCP en su seguimiento pudo evidenciar el 100% de los acuerdos suscritos en el acta de protocolización del 16 de diciembre 2021, fueron cumplidos a cabalidad, por los que las partes en consenso aceptan la terminación del procedimiento consultivo. En el numeral 6.7.2 del capítulo 6.7 Desarrollo de consultas previas en las UF del proyecto, se encuentra el detalle del proceso consultivo.
	Construcción Gran Variante	093 de febrero de 2018	Si	Mediante la certificación 0093 de 23 de febrero de 2010 La Dirección de Consulta Previa certificó presencia de tres comunidades étnicas: Parcialidad indígena El Porvenir – Municipio de San Antero, Parcialidad indígena Puerto Viejo – Municipio de Tolú y consejo comunitario de Barulé – Municipio de Coveñas. Proyecto Gran Variante. La Concesión a través del comunicado 48-147-20180312000897 del 12 de marzo apeló ante la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior lo dispuesto en la certificación 0093 del 23 de febrero de 2018. El diseño geométrico Gran variante finalmente no se incluyó dentro del alcance del Contrato, por lo tanto, no se llevó a cabo proceso de Consulta Previa en cumplimiento a la certificación 093 de 2018.
7.3	Construcción Perimetrales	509 del 17 de marzo de 2014 1090 del 31 de octubre de 2018	NO NO	La Concesión mediante radicado externo EXTMI 18-40279 del 28 de septiembre de 2018 solicitó certificación de presencia de comunidades para el proyecto construcción variante Tolú, ZODME, accesos, retornos y zonas directas de intervención El ministerio de interior emitió la Certificación N° 1090 del 31 de octubre de 2018. No presencia (perimetral aeropuerto) La Concesión mediante radicado 48-147-20200224013127 del 24 de febrero de 2020 presentó nueva solicitud de certificación en el marco del proceso de modificación a la licencia ambiental.

UF	Tipo de Intervención	N° de Certificación	SI/NO	Observación
				El 14 de septiembre de 2020 se realizó las reuniones de socialización de resultados del EIA Variante de Coveñas, en total 2 comunidades socializadas; sin embargo, de acuerdo con el requerimiento ANLA en la solicitud de información adicional, siguió pendiente el pronunciamiento de la DANCP sobre la presencia o no de comunidades étnicas en el marco del requerimiento ampliación de nuevas áreas de influencia. El 23 de septiembre de 2020 La ANLA mediante comunicado 2020163148-2-000 notificó a la Concesión que hasta tanto no se tenga el pronunciamiento del Ministerio del Interior sobre la presencia o no de comunidades étnicas para la UF 7.3 Variante de Tolú, la autoridad ambiental no continuará con el trámite hasta tanto se cuente con el acto administrativo por parte de la DNCP Para el caso puntual de la modificación de licencia en la UF 7.3 perimetral aeropuerto de Tolú, se describe en el siguiente cuadro el proceso.
7.3	Construcción de la variante Tolú PR 0+000 al 4+440	**Resolución ST- 1261 de 09 dic 2020**	SI	Presencia de las comunidades indígenas Isla Gallinazos y El Palmar, ubicada en el municipio de Tolú. El reconocimiento se dio de acuerdo al análisis de nuevas áreas de influencia hecho por la ANLA en el marco del trámite de licenciamiento ambiental para esta Unidad Funcional. La Concesión mediante comunicado radicado 8-147-20210120017423 del 20 de enero de 2021 solicitó a la DANCP el inicio de la consulta previa. El 17 de febrero de 2021 se realizó reunión de coordinación entre Concesión, Interventoría y la DANCP. Se estimó iniciar la consulta previa el 18 de marzo de 2021 El 15 de marzo de 2021 se realizó reunión de preconsulta con el **Cabildo Isla Gallinazo**, en este espacio no se logró hacer la apertura de la consulta. El 28 de abril de 2021 se desarrolló la etapa de talleres de impactos y medidas de manejo, la cual fue convocada por la DANCP mediante OFI2021-10395-DCP-2500 del 20 de abril de 2021. El 12 de mayo de 2021 se llevó a cabo la etapa de formulación de acuerdos y protocolización, la cual fue convocada OFI2021-11920-DCP-2500 del 4 de mayo de 2021. En este sentido, las partes unificaron criterios en cuanto a la concertación de las medidas de manejo, por lo cual le solicitaron a la DANCP protocolizar los acuerdos formulados, solicitud que fue aprobada por el garante de la Consulta Previa – Ministerio del Interior. con un valor global en compensaciones equivalente a

UF	Tipo de Intervención	N° de Certificación	SI/NO	Observación
				$250.000.000 para el desarrollo de proyectos en beneficio de las comunidades. La Concesión mediante radicado N° 48-147-20210913020424 del 13 de septiembre de 2021, convocó al cabildo Isla Gallinazos, con el objetivo de evaluar los avances en la gestión para la consecución del predio a comprar en atención a los acuerdos protocolizados y solicitud de cotizaciones para la ejecución de los demás proyectos estipulados. Fecha 29 de septiembre de 2021. El 17 de marzo de 2021, se desarrolló la Preconsulta y apertura, etapa convocada por la DANCP mediante OFI2021-4763-DCP-2500 del 1 de marzo de 2021. El 16 de abril de 2021 se llevó a cabo la etapa de concertación de medidas de manejo convocada mediante OFI2021-8504-DCP-2500 del 30 de marzo de 2021. En este sentido, al estar las partes de acuerdo con las medidas de manejo, se le solicitó a la DANCP protocolizar los acuerdos formulados, solicitud que fue aprobada por el garante de la Consulta Previa – Ministerio del Interior, con un valor global en compensaciones equivalente a $235.000.000 para el desarrollo de proyectos en beneficio de las comunidades, el desembolso quedó sujeto a la expedición de la modificación de la Licencia Ambiental por parte de la ANLA, excepto un rubro de $10.000.000 que serán entregados anticipadamente al cabildo para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria en esta comunidad. Una vez surtida la etapa se acordó realizar la etapa de formulación de acuerdos para el viernes 7 de mayo de 2021. El 25 de mayo de 2021 la Concesión mediante comunicado No 48-147-20210521019056 radicó ante la ANLA el complemento del EIA UF 7.3 Perimetral Aeropuerto, referido al capítulo de caracterización Social con la incorporación de los acuerdos protocolizados con las comunidades indígenas El Palmar e Isla Gallinazo. En este orden, al cumplirse con establecido en el Artículo 2.2.2.3.6.3 del Decreto No 1076 del 2015. El 15 de julio de 2021, la ANLA mediante radicado No 2021144790-2-000 notificó a la Concesión la resolución No 1243 del 15 de julio de 2021 – Aprobación a la modificación de Licencia Ambiental para la UF 7.3 Perimetral Aeropuerto de Tolú.

UF	Tipo de Intervención	N° de Certificación	SI/NO	Observación
				El 13 de septiembre de 2021, La Concesión convocó al Cabildo el Palmar a través del comunicado 48-147-20210913020423 con el objetivo de evaluar los avances en la gestión para la consecución del predio a comprar en atención a los acuerdos protocolizados y solicitud de cotizaciones para la ejecución de los demás proyectos estipulados. En el mes de diciembre de 2021 se realizaron las reuniones programadas de seguimiento de la implementación de acuerdos protocolizados de consulta previa con las comunidades Cabildo Indígena El Palmar, Isla Gallinazo. En el mes de septiembre 2022, no se realizó reunión de seguimiento de la implementación de acuerdos protocolizados de consulta previa. En el mes de octubre 2022 se realizó reunión de seguimiento de la implementación de acuerdos protocolizados de consulta previa, con la presencia de la DANCP cuya finalidad es poner en conocimiento del Min interior los avances del proceso de cumplimiento del acuerdo. En el mes de abril 2024, en seguimiento por parte del Ministerio del Interior, se pudo evidenciar que el 100% de los acuerdos establecidos con la Comunidad Indígena el palmar, se cumplieron a cabalidad por lo cual se realiza el cierre de este proceso de consultas previas. El día 24 de abril 2025 en seguimiento por parte del Ministerio del Interior, se pudo evidenciar que el 100% de los acuerdos establecidos con la Comunidad Indígena Isla Gallinazo, quienes cumplieron con todos los acuerdos pactados, por tal motivo se realiza el cierre de las consultas previas con esta comunidad. En el numeral 6.7.3 del capítulo 6.7 *Desarrollo de consultas previas en las UF del proyecto*, se encuentra el detalle del proceso consultivo.
8.1	Mejoramiento	N° 1650 de 31 de octubre de 2013	SI	Presencia comunidad negra Benkos Bioho. La Concesión expresa se acogerá a lo circular 2016-409-000028-4
8.2	Mejoramiento	484 del 14 de marzo de 2014	NO	
8.3	Mejoramiento	009 de 31 enero de 2014	NO	Revoca el numeral tercero de la certificación N° 1649 de 31 de octubre de 2013. No se debe agotar consulta previa para el tramo Tolú Viejo – Retiro Nuevo.

Fuente: Tomado del último reporte mensual presentado por el Concesionario Ruta al Mar (mes de abril 2026)

6.6. DESARROLLO DE CONSULTAS PREVIAS EN LAS UF DEL PROYECTO

Cabe aclarar que, la información reportada a continuación corresponde a antecedentes de la Interventoría pasada, igualmente, a los reportes emitidos por el Concesionario, en este sentido la información se deja con fines de la trazabilidad.

En el presente capítulo, se presenta el detalle del proceso consultivo con cada una de las comunidades étnicas certificadas por la Dirección del Consulta Previa del Ministerio de Interior, hoy DANCP en el siguiente orden:

Tabla 6-18 Desarrollo Consultas Previas Proyecto Antioquia-Bolívar

ESTADO CONSULTAS PREVIAS							
UF	**Comunidad étnica**	**Acto Administrativo**	**Fecha Protocolización**	**Costo Ruta Metodológica**	**Costos Acuerdos**	**Destino de los Fondos**	**Estado Actual**
7.1	El Volao Las Estancias	Tutela 606 de 2019	19 de marzo de 2020	$ 100.001.000	$ 240.000.000	Compra de terreno	Hasta la etapa de protocolización de acuerdos. No se implementaron dado que, no se inició con la construcción de la variante-Lorica
	La Palma	Tutela 606 de 2019	19 de marzo de 2020	$ 100.001.000	$ 240.000.000	Compra de terreno Proyecto Piscícola Vivero Fortalecimiento Cultural Plan de vida	
	Nueva Esperanza	Tutela 606 de 2019	19 de marzo de 2020	$ 100.001.000	$ 240.000.000	Compra de terreno Proyecto Piscícola Vivero Fortalecimiento Cultural Plan de vida	
	EL Carito	Tutela 606 de 2019	19 de marzo de 2020	$ 100.001.000	$ 240.000.000	Compra de terreno Proyecto Piscícola Vivero Fortalecimiento Cultural Plan de vida	
	La Rusia	Tutela 606 de 2019	19 de marzo de 2020	$ 100.001.000	$ 240.000.000	Compra de terreno	

ESTADO CONSULTAS PREVIAS							
UF	**Comunidad étnica**	**Acto Administrativo**	**Fecha Protocolización**	**Costo Ruta Metodológica**	**Costos Acuerdos**	**Destino de los Fondos**	**Estado Actual**
						Proyecto Piscícola Vivero Fortalecimiento Cultural Plan de vida	
	Chuchurubí	Tutela 606 de 2019	19 de marzo de 2020	$ 100.001.000	$ 240.000.000	Compra de terreno	
7.2	El Porvenir	Resolución 092 de 2018	26 de noviembre 2019	$ 95.810.000	$ 220.000.000 Según ajuste de acuerdos del acta de seguimiento del 22 de marzo de 2022	Inversión en proyectos comunitarios	Consulta Previa Cerrada. Acuerdos Implementados al 100%
	Barulé	Resolución 092 de 2018	28 de noviembre 2019	$ 159.912.276	$ 320.300.000	Inversión en proyectos comunitarios	Consulta previa en etapa de implementación de acuerdos, presenta avance del 60%.
							De un total de 14 Proyectos comunitario se han ejecutado 8 al 100%. Y seis (6) proyectos se encuentran en curso para su implementación los cuales son: • Taller de pedagogía cultural (Dirigida al sector estudiantil) • Compra de predio • Construcción casa Afro • Étnovivero y sensibilización de uso tradicional de plantas • Fortalecimiento Organizativo del Consejo • Compensación forestal Pendiente por pagar:

ESTADO CONSULTAS PREVIAS							
UF	**Comunidad étnica**	**Acto Administrativo**	**Fecha Protocolización**	**Costo Ruta Metodológica**	**Costos Acuerdos**	**Destino de los Fondos**	**Estado Actual**
							$ 237.500.000
	Humberto Hernández	T-163 de 2019	27 de noviembre 2019	$ 160.958.000	$270.000.000	Inversión en proyectos comunitarios	Consulta Previa Cerrada. Acuerdos Implementados al 100%
	Bellavista	ST-1260 de 2020	27 de abril 2021	$ 146.162.500	$275.000.000	Inversión en proyectos productivos en beneficio de la comunidad	Consulta Previa Cerrada. Acuerdos Implementados al 100%
	Zenú Guayabal	ST-2021.00081 de 2021	16 de diciembre 2021	$200.000.000	$400.000.000	Compra de terreno y proyecto de capacitación en beneficio de la comunidad	Consulta Previa Cerrada. Acuerdos Implementados al 100%
7.3	Isla Gallinazo	ST-1261 de 2020	12 de mayo 2021	$ 149.360.000	$250.000.000	Compra de terreno y proyectos productivos en beneficio de las comunidades	Consulta Previa Cerrada. Acuerdos Implementados al 100%
	El Palmar	ST-1261 de 2020	16 de abril 2021	$ 111.867.500	$235.000.000	Compra de terreno y proyectos productivos en beneficio de las comunidades	Consulta Previa Cerrada. Acuerdos Implementados al 100%
TOTAL				**$ 1.424.076.276**	**$ 3.410.300.000**		

Fuente: Tomado del reporte mensual presentado por el Concesionario Ruta al Mar (mes de abril de 2026)

6.6.1. Consulta Previa UF 7.1 Variante Lorica.

Desarrollo de la consulta Previa en cumplimiento a la tutela 606 de 2019.

Entre el 29 de octubre de 2020 y el 19 de marzo de 2021, se realizó la consulta previa en la UF 7.1, en cumplimiento a la tutela sentencia 606 de 2019, en un tiempo de 5 meses. A continuación, se presenta tabla programática con el desarrollo del proceso consultivo.

Tabla 6-19 Cronograma Consultas Previa Tutela 606 2019 UF 7.1 Construcción Variante Lorica

N°	Cabildo Indígena	Radicado	Fecha Convocada	Etapa	Estado
1	Bolao la Estancia	OFI2020-35237-DCP-2500	29/10/2020	Preconsulta y Apertura	Surtida
		2	La Palma	Preconsulta y Apertura	Surtida
3	La Esperanza	OFI2020-35423-DCP-2500	31/10/2020	Preconsulta y Apertura	Surtida
4	El Carito	OFI2020-35641-DCP-2500	1/11/2020	Preconsulta y Apertura	Surtida
5	Chuchurubí	OFI2020-35643-DCP-2500	2/11/2020	Preconsulta y Apertura	Surtida
6	La Rusia	OFI2020-35651-DCP-2500	3/11/2020	Preconsulta y Apertura	Surtida
7	Nueva Esperanza y El Carito	OFI2020-41653-DCP-2500	10/12/2020	Impactos y medidas de manejo	No concluida
8	La Rusia y Chuchurubí	OFI2020-41654-DCP-2500	11/12/2020	Impactos y medidas de manejo	No concluida
9	Bolao La Estancia y La Palma	OFI2020-41649-DCP-2500	12/12/2020	Impactos y medidas de manejo	No concluida
10	Bolao La Estancia y La Palma	OFI2021-516-DCP-2500	20/01/2021	Impactos y medidas de manejo	No concluida
11	Nueva Esperanza y El Carito	OFI2021-520-DCP-2500	21/01/2021	Impactos y medidas de manejo	No concluida
12	Chuchurubí	OFI2021-517-DCP-2500	22/01/2021	Impactos y medidas de manejo	No concluida
13	La Rusia y Chuchurubí	OFI2021-1727-DCP-2500	15/02/2021	Impactos y medidas de manejo	Surtida
14	Nueva Esperanza y El Carito	OFI2021-1725-DCP-2500	16/02/2021	Impactos y medidas de manejo	Surtida
15	Bolao La Estancia y La Palma	OFI2021-1723-DCP-2500	17/02/2021	Impactos y medidas de manejo	Surtida
16	La Rusia y Chuchurubí	OFI2021-4761-DCP-2500	18/03/2021	Formulación de acuerdos/protocolización	Surtida
17	Bolao La Estancia y La Palma	OFI2021-4634-DCP-2500	19/03/2021	Formulación de acuerdos/protocolización	Surtida
18	Nueva Esperanza y El Carito	OFI2021-4762-DCP-2500	19/03/2021	Formulación de acuerdos/protocolización	Surtida

Fuente: Tomado del reporte mensual presentado por el Concesionario Ruta al Mar (mes de abril de 2026)

El Concesionario mediante radicado N° 20211102301 del 26 de marzo de 2021, allegó los acuerdos protocolizados de las Consultas Previas realizadas con las comunidades indígenas, como el último requisito para dar respuesta a la solicitud de sustracción del DRMI del CCBS producto de las obras a realizar en la Variante de Lorica – UFI 7.1. dándole cumplimiento a lo establecido en los numerales 3 y 4 del artículo 5° - acuerdo 312 del 2016 expedido por la CVS. Teniendo en cuenta lo anterior, la Corporación CVS deberá emitir concepto técnico y trasladar el mismo a la secretaria del Consejo Directo para que se incluya en el orden del día. (en líneas siguientes se explica los motivos que condicionaron la decisión).

Mediante derecho de petición con radicado N° 20211102937 del 20 de abril de 2021, la Concesión solicitó a la CVS indicará la fecha en la cual será notificado el Acuerdo del Consejo Directivo que resuelve la solicitud de sustracción definitiva del DRMI del CCBS de la Unidad Funcional Integral 7 – subsector 1, denominado Construcción de la Variante del Municipio de Lorica (PR0+000 al PR7+779)

La CVS mediante oficio N° 20212103820 del 10 de mayo de 2021, indicó a la Agencia que, en la sesión de consejo directivo del 18 de mayo del 2021, se decidiría sobre la solicitud de sustracción del DRMI del CCBS UFI 7.1. (En esta sesión, el Consejo Directivo pospuso la decisión hasta tanto se resuelva la medida cautelar – trámite judicial). Teniendo en cuenta lo anterior y pese de haber agotado la agenda propuesta, no se obtuvo resultado decisorio en la sesión.

El Concesionario mediante radicado N° 48-147-20210518019006 del 18 de mayo de 2021, presentó Derecho de Petición ante el Consejo Directivo CVS en donde se requirió que en el término máximo de diez (10) días hábiles, de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 1755 de 2015, indique la fecha en qué será notificado el Acuerdo del Consejo Directivo que resuelve la solicitud de sustracción definitiva del Distrito Regional de Manejo Integrado del Complejo Cenagoso del Bajo Sinú – DMI.

Sin embargo, finalizado el mes de febrero 2023 no se ha obtenido respuesta, por lo que se tiene lo siguiente, el plazo originalmente previsto para la terminación de la Unidad Funcional 7.1, se cumplió en el mes de enero de 2023, por lo que las partes de acuerdo con lo previsto en la Sección 14.1 (e) deberán de buena fe revisar el alcance del Contrato de concesión para determinar si resulta viable modificar el alcance de las Intervenciones, incluyendo la posibilidad de modificar o desafectar la Unidad Funcional 7.1 variante lorica.

Además, mediante Radicado: 47-RUTADCTOELECTRONICOS-20230208004508, la concesión Ruta al Mar fue notificada por parte del Consejo de Estado, sobre fallo de acción popular interpuesta por Manuel Salvador Nule Rhenals, hasta la fecha del presente informe el Concesionario no se ha manifestado.

Como novedad, se tiene que, el alcalde del Municipio de Lorica Carlos Manzur, posesionado en enero 2024, se ha mostrado interesado en lo concerniente a la Variante de Lorica, por lo cual ha mantenido reuniones a puerta cerrada a lo largo de este periodo, con la Gobernación de Córdoba, el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura y la Concesión Ruta al Mar, de estos encuentros ha salido

a la luz pública la molestia de la administración municipal y departamental por la falta de construcción de la Variante, por esta razón la comunidad de Lorica ha manifestado que los recursos de la Variante UFI 7.1, cuya ejecución se estancó por querellas jurídicas y ambientales, sean destinados para las obras viales, mantenimiento y reparación de la Avenida Bicentenario de este municipio.

El 30 del de abril 2024, realizaron reunión con la Agencia Nacional de Infraestructura con la administración municipal y la comunidad de lorica, esta última conformó un Comité llamado. “Trabajemos por Lorica” quienes son los que están en frente de las mesas de trabajo realizadas con otras entidades como la CVS, Personería, INVIAS y ANI, con el objetivo de encontrar una solución para la movilidad del paso urbano del municipio de Lorica.

En el mes de mayo 2024, se conoció que la CVS notificó al Concesionario el Acuerdo del Concejo Directivo No. 522 de fecha 11 de marzo de 2024, por medio del cual niega la solicitud de revocatoria del Acuerdo No. 509 del 26/09/2023 y por el cual se resolvió una solicitud de Sustracción del Distrito de Manejo Integrado del Complejo Cenagoso del Bajo Sinú – CCBS que había presentado el Concesionario; así las cosas, la CVS deja en firme la negación de sustracción del DRMI del CCBS a la vez que informa que se podrá presentar una nueva solicitud de sustracción que se ajuste a los requerimientos de la Corporación.

En el mes de junio 2024, se continuaron las mesas de trabajo con la administración municipal y la comunidad de lorica, Comité llamado: “Trabajemos por Lorica” con el fin de buscar soluciones para que se realice la variante lorica, sin embargo la ANI y La Concesión Ruta al Mar, han dejado claro que se está analizando el contrato para desafectar ese tramo que corresponde a la UFI 7.1 Variante Lorica del proyecto, ya que esta no se podrá realizar por las condiciones expuestas en el pronunciamiento del consejo de estado, sin embargo la comunidad de lorica exige la variante y se muestran en desacuerdo con mejorar el paso urbano de este municipio en compensación por la no realización de la misma, por lo que han manifestado que bloquearan el peaje mata de caña si pronto no se resuelve la situación, en este sentido anuncian que realizaran una mesa de trabajo donde esperan que participen las entidades competentes con poder de decisión para tomar decisiones sobre la situación de movilidad del municipio de Lorica.

En el mes de agosto 2024, La Agencia Nacional de Infraestructura y El Concesionario manifestaron en audiencia del consejo de Estado que se presentara la desafectación de la variante Lorica del proyecto Antioquia-Bolívar, por lo cual el comité ciudadano

pro- variante lorica, expreso su molestia, convocando a la comunidad a bloquear el paso por lorica y alzar las talanqueras del peaje mata de caña, sin embargo después de 3 días de bloqueo, en el municipio de Lorica, el Gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, se reunió con la comunidad y se comprometió a solucionar el paso urbano de este municipio y a realizar las gestiones necesarias para continuar con la construcción de una variante el Lorica.

El 20 de enero 2025, en la reunión efectuada con la ANI para atender el bloqueo de los transportadores de córdoba, realizada en montería, se retomó por parte del alcalde de lorica y el gobernador de córdoba, el paso urbano del municipio de lorica, ya que no se va a realizar la variante lorica, por tal motivo piden a la ANI y al Ministerio de transporte un espacio para debatir la posible solución al paso urbano de lorica, en días posteriores se concretara una reunión en la alcaldía de lorica para tratar dicha problemática.

El día 6 de febrero 2025, se llevó a cabo reunión con la ANI y con la alcaldía de Lorica para debatir la posible solución al paso urbano de este municipio, en dicha reunión la Agencia se comprometió a estudiar la posibilidad con el Concesionario de realizar los estudios y diseños para la construcción de la variante lorica, con las especificaciones que entregó el fallo del consejo de estado, esto en ocasión de los recursos para la variante Lorica en contrato de concesión, sin olvidar que, por parte de esta se está realizando todo el proceso para desafectar la variante lorica de dicho contrato, así que, en caso de realizar estos estudios serán entregados a la alcaldía de Lorica y a La Gobernación de Córdoba, quienes están prestos a gestionar los recursos con el gobierno nacional para su ejecución.

El día 23 de abril 2025, se realizó reunión en la Alcaldía de lorica con la Gobernación de Córdoba, la Agencia Nacional de Infraestructura, Invias y La Concesión Ruta al Mar, con fin de continuar con el compromiso de mejorar el paso urbano de lorica, por lo cual, los representantes de la Gobernación de Córdoba realizaron una presentación exponiendo los avances del diseño del paso urbano de lorica.

Del 01 al 30 de septiembre 2026, no se tienen novedades.

Consulta Previa UF 7.2 Variante Coveñas.

Con la resolución N° 092 del 26 de noviembre de 2018, la Dirección de Consulta del Ministerio del Interior Certificó la presencia del cabildo indígena El Porvenir (San Antero) y El Consejo Comunitario Barulé (Coveñas); posteriormente, el Tribunal

Superior de Distrito Judicial de Sincelejo, Sala Civil Familia Laboral, dentro del proceso de radicado N°70-001-31-05-003-2019-00086-01 ordenó mediante sentencia T-63-2019 incluir al Consejo Comunitario Humberto Hernández dentro de la Consulta Previa para la UF 7.2 Variante Coveñas.

Los acuerdos protocolizados se presentaron ante la ANLA el 14 de enero de 2020 a través del radicado N°2020004303-1-000. Posterior a esto, la Autoridad convocó el 4 de marzo de 2020 a reunión de información adicional, solicitando en este espacio se allegara una nueva certificación de presencia de comunidades étnicas que abarque un área de influencia equivalente a las áreas establecidas para los componentes biótico, físico o socioeconómico, considerando la ANLA qué los impactos a generarse en estos componentes son susceptibles de afectar comunidades étnicas con presencia en el territorio circunvecino al trazado de la Variante Coveñas.

A continuación, se presenta la trazabilidad del proceso, el cual se desarrolló en un tiempo de 3.5 meses.

Tabla 6-20 Cronograma Consultas Previa Sentencia T – 63 de 2019 Consejo Comunitario Humberto Hernández

N°	Comunidad étnica	Convocatoria	Fecha Convocada	Etapa	Estado
1	Humberto Hernández	OFI 19-27452-DCP-2500 del 24 de julio de 2019.	6/08/2019	Preconsulta y Apertura	Surtida
2		OFI 19-39142-dcp-2500 del 17 de septiembre de 2019	3/10/2019	Talleres de impactos y medidas de manejo	Surtida
3		OFI 19-45283-DCP-2500 del 18 de octubre de 2019	6/11/2019	Talleres de impactos y medidas de manejo	
4		OFI19-50108-DCP-2500 del 12 de noviembre de 2019	27/11/2019	Formulación de acuerdos y protocolización	Surtida
Cronograma Consultas Previa certificación 092 de 2019 Consejo Comunitario Barulé					
1	Barulé	OFI 19-27399–DCP-2500 del 24 de julio de 2019.	7/08/2019	Preconsulta	Surtida
2		OFI19–33904–DCP- 2500 del 28 de agosto de 2019.	5/09/2019	Apertura	Surtida
3		OFI 19- 38687-DCP-2500 del 16 de septiembre de 2019	23 y 24 /09/2019	Talleres de impactos y medidas de manejo	Surtida
4		OFI 19-45284-DCP-2500 del 18 de octubre de 2019	7 y 8 /11/2019	Talleres de impactos y medidas de manejo	Surtida
5		OFI19-50108-DCP-2500 del 12 de noviembre de 2019	28/11/2019	Formulación de acuerdos y protocolización	Surtida
Cronograma Consultas Previa Certificación 092 de 2019 Cabildo El Porvenir					
1	Porvenir	OFI 19-27388–DCP-2500 del 24 de julio de 2019.	8/08/2019	Preconsulta y Apertura	Surtida
2		OFI 19-33385-DCP-2500 del 26 de agosto de 2019.	19 y 20 /09/2019	Talleres de impactos y medidas de manejo	Surtida
3		OFI 19-43108-DCP-2500 del 7 de octubre de 2019.	15 y 19 /10/2019	Talleres de impactos y medidas de manejo	Surtida
4		OFI 19-45290-DCP-2500 del 18 de octubre de 2019	12 y 13 /11/2019	Talleres de impactos y medidas de manejo	Surtida

N°	Comunidad étnica	Convocatoria	Fecha Convocada	Etapa	Estado
5		OFI19-50101 -DCP-2500 del 12 de noviembre de 2019	26/11/2019	Formulación de acuerdos y protocolización	Surtida

Fuente: Tomado del reporte mensual presentado por el Concesionario Ruta al Mar (mes de abril de 2026)

El Concesionario mediante radicado EXTMI2020-10912 del 13 de marzo de 2020, solicitó una nueva certificación de presencia de comunidades étnicas ante el Ministerio del Interior. En atención a la solicitud, la Dirección Autoridad de Consulta Previa DANCP, mediante resolución ST-1260 de 09 diciembre 2020 certificó la presencia del cabildo Bellavista.

Teniendo en cuenta lo expuesto, el Concesionario, mediante radicado N° 48-147-20210120017424 del 20 de enero de 2021, solicitó a la DANCP el inicio de la Consulta, realizándose el 17 de febrero de 2021 la reunión de coordinación entre Concesionario y DANCP. A continuación, se presenta la trazabilidad de dicho proceso:

Tabla 6-21 Cronograma Consultas Previa resolución ST- 1260 de 09 diciembre 2020

N°	Cabildo Indígena	Convocatoria	Fecha Convocada	Etapa	Estado
1	Bellavista	OFI2021-5915-DCP-2500	16/03/2021	Preconsulta y Apertura	Surtida
2		OFI2021-8506-DCP-2500 del 30 de marzo de 2021	14/04/2021	Talleres de impactos y medidas de manejo	Surtida
3		OFI2021-10493-DCP-2500 del 20 de abril de 2021	27/04/2021	Concertación de medidas de manejo y formulación de acuerdos	Surtida
4		OFI2024-2-002423-011550 del 26 de marzo 2024	26/03/2024	Etapa de Seguimiento a los acuerdos	Cerrada

Fuente: Tomado del último reporte mensual presentado por el Concesionario Ruta al Mar (mes de abril de 2026)

El 14 de abril de 2021, se desarrolló la etapa de identificación de impactos y concertación de medidas de manejo, la cual fue convocada por la DANCP mediante OFI2021-8506-DCP-2500 del 30 de marzo de 2021. La etapa se surtió a cabalidad.

El 3 de mayo de 2021 la Concesión mediante comunicado No 48-147-20210503018811 radicó el complemento del EIA UF 7.2 Variante de Coveñas, referido al capítulo de caracterización social con la incorporación de los acuerdos protocolizados con la comunidad indígena Bellavista.

El 28 de julio de 2021, finalmente la ANLA mediante radicado No 2021155831-2-000 notificó a la Concesión la resolución **No 1317 del 27 de julio de 2021–- Licencia Ambiental para la UF 7.2 Variante Coveñas**.

HUMBERTO HERNÁNDEZ

El día 19 de abril se presentó un bloqueo en la UFI 7.2 en el sector de Guayabal en la Intersección 13, por parte de la Comunidad Consejo Comunitario Humberto Hernández, quienes argumentan que el Concesionario no ha permitido la compra del predio que ellos necesitan adquirir y que hace parte de los acuerdos de la consulta previa, sin embargo cabe aclarar que el Concesionario ha hecho la gestión para que se lleve a cabo el proceso de compra y venta del predio de la mencionada comunidad, no obstante este proceso se ha visto afectado por la falta de documentación para realizar este trámite.

El día 20 de abril, se realizó reunión en la que fue atendida la comunidad por el Concesionario y en la cual se acordó que la comunidad solicitará reunión del seguimiento a los acuerdos de consulta previa a la DANCP, con el fin de modificar el acuerdo de la compra y venta del predio.

El 23 de mayo 2023, se realizó visita de seguimiento a los acuerdos de consulta previa del Consejo Comunitario Humberto Hernández por parte de la DANCP, en esta reunión se modificó el acuerdo en cuanto a los recursos y porcentaje de distribución para el pago de la compra del terreno a nombre del Consejo Comunitario Humberto Hernández, los recursos serán entregados directamente al Consejo Comunitario Humberto Hernández quien será el responsable del manejo y administración de los mismos, de conformidad con los acuerdos de consulta previa respetando su autonomía.

En el mes marzo 2024, se realizó seguimiento interno de la empresa con el consejo Comunitario Humberto Hernández, con el fin de finalizar la asistencia técnica para el proyecto de Granja Integral concluyendo con este acuerdo, además se realizó reunión de finalización de actividades de obra de la UF 7.2, como medida de tipo social que estaba pendiente de realizar, en el marco de las Consultas Previas.

En el mes de abril 2024, se realizó reunión de seguimiento en la etapa de seguimiento a los acuerdos de consulta previa, convocada por la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa mediante oficio Rad.2024-2-002423-011552 del 26 de

marzo de 2024, en la cual se revisó y verificó el estado del cumplimiento de los acuerdos protocolizados entre las partes.

En el mes de mayo 2024, se realizó reunión de seguimiento en la etapa de seguimiento a los acuerdos de consulta previa por parte de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa DANCP, con la finalidad de realizar el respectivo seguimiento a los acuerdos de consulta previa con esta comunidad.

En el mes de abril 2025, se realizó reunión de seguimiento de acuerdos convocada por la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa - DANCP, en esta reunión se pudo evidenciar que el 100% de los acuerdos suscritos en acta de protocolización de fecha 27 de noviembre 2019 , fueron cumplidos a cabalidad, lo cual es reforzado con la manifestación de aprobación por parte de la Comunidad del CCNC Humberto Hernández, respecto a todos y cada uno de los diferentes acuerdos suscritos en dicha fecha y acta en el marco del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE COVEÑAS UFI 7.2”

Estado actual de los acuerdos Humberto Hernández

Tabla 6-22 Comunidad CCN Humberto Hernández

Humberto Hernández Sánchez (51)	Cantidad acuerdos	% ejecución
En ejecución	0	0%
Ejecutado	51	100%

Fuente: Tomado del último reporte mensual presentado por el Concesionario Ruta al Mar (mes de abril de 2026)

BARULÉ

El 20 de septiembre de 2023 se llevó a cabo una reunión de seguimiento al cumplimiento de los acuerdos establecidos en el marco del proceso de consulta previa, con la participación de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP) del Ministerio del Interior. En el marco de la reunión, se evidenció un retraso del 20 % en el cumplimiento de los acuerdos a cargo de la comunidad,

asociado a la demora en la ejecución de las gestiones requeridas para su cumplimiento.

El 26 de octubre 2023, se realizó reunión para acordar el cumplimiento de los acuerdos de consulta previa con la comunidad de Barulé, en lo concerniente al proyecto de capacitación en de Artesanía, comidas típicas y muestras culturales con esta comunidad, actividades que se llevaran a cabo en el mes de noviembre.

Los días 14, 22 y 30 de noviembre de 2023, se llevó a cabo con esta comunidad varias actividades involucradas en los siguientes proyectos: Artesanías, Muestras Culturales y Gastronomía, Historia y Memoria Cultural de Coveñas y Recorridos a la Naturaleza con los guías turísticos de la comunidad, quienes dieron una muestra de la implementación de la bici rutas incluidas en el proyecto.

En el mes de marzo 2024, se realizó reunión de finalización de actividades de obra de la UF 7.2, como medida de tipo social que estaba pendiente de realizar, en el marco de las Consultas Previas.

En el mes de abril 2024, se realizó reunión de seguimiento en la etapa de seguimiento a los acuerdos de consulta previa, convocada por la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa mediante oficio Rad.2024-2-002423-011553 del 26 de marzo de 2024, en la cual se revisó y verificó el estado del cumplimiento de los acuerdos protocolizados entre las partes.

En el mes de mayo 2024, se realizó reunión de seguimiento en la etapa de seguimiento a los acuerdos de consulta previa, convocada por la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa mediante oficio Rad. 2024-2-002423-020801 Id: 331571 del 14 de mayo de 2024, en la cual se revisó y verificó el estado del cumplimiento de los acuerdos protocolizados entre las partes.

El 22 de abril 2025, se realizó reunión de seguimiento a los acuerdos de consultas previas por la DANCP, a la fecha la comunidad y la empresa cuentan con el siguiente avance:

Del 01 al 30 de septiembre 2026, no se tienen novedades.

Estado actual de los acuerdos Barulé

Tabla 6-23 Comunidad CCN Barule

Barule (69)	Cantidad acuerdos	% ejecución
En ejecución	08	12%
Ejecutado	61	88%

Fuente: Tomado del último reporte mensual presentado por el Concesionario Ruta al Mar (mes de abril de 2026)

BELLAVISTA

En el mes de abril 2023, se realizó seguimiento a los acuerdos de consulta previa por parte del Ministerio del Interior, en esta reunión de seguimiento se realizaron algunas modificaciones de los acuerdos protocolizados requeridos por la comunidad, sin afectar lo planteado Inicialmente.

El 17 de mayo 2023, se realizó reunión interna de seguimiento a los acuerdos de consulta previa entre el Cabildo Indígena Bellavista y El Concesionario con el fin de avanzar en las gestiones de documentación para la adquisición del predio que se encuentra en proceso de compra por la comunidad.

El 13 de junio 2023, se llevó a cabo reunión de seguimiento interno entre la concesión y la comunidad Indígena Bellavista a petición de dicha comunidad con el fin de plantear una propuesta para la modificación del acuerdo que corresponde a la forma de pago del terreno que está en proceso de adquisición y compra por parte de la comunidad.

El 29 de junio 2023, se realizó reunión de seguimiento a los acuerdos de consulta previa por parte de la DANCP, en esta reunión se modificó el acuerdo en cuanto a la forma de pago de las 7.5 hectáreas que hace falta por adquirir ya que estas no tienen escrituración por lo que se desembolsara el 50% del dinero con la promesa de compraventa notariada y el otro 50% con la entrega de la copia del acta de entrega material del predio, este proceso quedara a cuenta y riesgo de la comunidad.

En el mes de marzo 2024, se realizó reunión de finalización de actividades de obra de la UF 7.2, como medida de tipo social que estaba pendiente de realizar, en el marco de las Consultas Previas.

En el mes de abril 2024, se realizó reunión de seguimiento de acuerdos convocada por la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa - DANCP, mediante Rad. 2024-2-002423-011550 del 26 de marzo 2024, en la cual se pudo evidenciar que el 100% de los acuerdos suscritos en acta de protocolización de fecha 27 de abril de 2021, fueron cumplidos a cabalidad, lo cual es reforzado con la manifestación de aprobación por parte de la Comunidad Cabildo Indígena Bellavista, respecto a todos y cada uno de los diferentes acuerdos suscritos en dicha fecha y acta en el marco del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE COVEÑAS UFI 7.2”

Estado actual de los acuerdos Bellavista

Tabla 6-24 Comunidad Indígena Bellavista

Bellavista (43)	% ejecución	Cantidad acuerdos
En ejecución	0%	0
Ejecutado	100%	43

Fuente: Tomado del último reporte mensual presentado por el Concesionario Ruta al Mar (mes de abril de 2026)

PORVENIR

De otra parte, la Concesión mediante los radicados 48-147-20210913020421 del 13 de septiembre de 2021 convocó a la comunidad indígena El Porvenir, con el objetivo de realizar el seguimiento a los acuerdos protocolizados, fecha 29 de septiembre de 2021, sin embargo, no se realizó la reunión debido a que la comunidad Indígena, no estaba satisfecha con los acuerdos protocolizados el 26 de noviembre del 2019. El Ministerio del Interior reprogramo un nuevo encuentro con esta comunidad convocada mediante OFI2021-32213 del 12 de noviembre de 2021, la cual no tuvo asistencia de la comunidad quien avisó previamente que no asistiría. La citada comunidad decide hacer parte de la Minga que tuvo inicio el 04 de febrero del 2022 con otras comunidades de la UFI 7.2 Variante Coveñas. En las reuniones con la minga se estableció el compromiso de adelantar una reunión entre Cabildo El Porvenir, sus delegados, y la Concesión Ruta al Mar, el día 17 de febrero a las 10:00 am, con la finalidad de iniciar la materialización e implementación de los acuerdos protocolizados en la Consulta Previa por el proyecto Ruta al Mar Variante Coveñas UFI 7.2, quedando igualmente como compromiso que, una vez desarrollada esta, la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior,

procedería a convocar a la reunión de seguimiento de acuerdos, una vez la comunidad y el ejecutor le informen la fecha y lugar para establecer en el marco del proceso de Consulta Previa los ajustes a los acuerdos.

El 24 de febrero de 2022 se realizó una reunión de atención a inquietudes por vinculación de mano de obra con la comunidad El Porvenir, en cumplimiento a los compromisos de la reunión del 17 de febrero 2022, ya que dicha comunidad manifestó inconformidad en el proceso de vinculación laboral.

El 29 de abril de 2022 se realizó reunión de seguimiento a la implementación del acuerdo N° 41- Adecuación del museo arqueológico, con la Comunidad del Cabildo Indígena El Porvenir en cumplimiento de los acuerdos protocolizados en el marco del proceso consultivo, sobre la programación de actividades requeridas para la materialización de este acuerdo, toda vez que el Concesionario solicito al ICANH la autorización de custodia del material arqueológico existente, el 18 de abril del 2022 el ICANH mediante Rad. 2022144200025272, estableció los criterios y procedimientos para contar con la autorización de tenencia de material arqueológico procedente de un PAP, en consecuencia, una vez se verifique que el lugar que ofrece la comunidad indígena del cabildo El Porvenir cumple con las condiciones, el titular del PAP debe continuar con el trámite correspondiente a la entrega, registro y tenencia de la totalidad de los materiales obtenidos durante el desarrollo del Programa, hasta la fecha se logró consolidar el listado de actividades y tiempos de ejecución, se determina que para la implementación del acuerdo se estima un total de 6 meses.

En el mes de mayo 2022, se realizó reunión de seguimiento en cuanto a la implementación de los acuerdos de la consulta previa en el cabildo indígena El Porvenir jurisdicción del Municipio de San Antero, Córdoba, el cual se socializó acerca del “protocolo del manejo de bienes arqueológicos” para la instalación y gestión del museo arqueológico de dicho cabildo.

El 10 de octubre 2022, se realizó reunión interna de seguimiento a la implementación del acuerdo #41, corresponde a la adecuación del museo de arqueología, con el fin de programar de manera preliminar cada una de las actividades que se realizaran con el acompañamiento del contratista de la concesión.

Los días 20 y 21 de octubre de 2022, se inició capacitación con la contratista de la concesión sobre la adecuación del museo de arqueología que corresponde al acuerdo #41 de los acuerdos de consulta previa.

El día 20 de septiembre 2023, se realizó reunión de seguimiento a los acuerdos de consulta previa por parte de la DANCP del Ministerio de Interior, esta comunidad presenta un avance en el cumplimiento de los acuerdos de un 84%, pendientes de culminar y los cuales se encuentran en ejecución siete (7) acuerdos.

En el mes de marzo 2024, se realizó reunión de finalización de actividades de obra de la UF 7.2, como medida de tipo social que estaba pendiente de realizar, en el marco de las Consultas Previas.

En el mes de abril 2024, se realizó reunión de seguimiento en la etapa de seguimiento a los acuerdos de consulta previa, convocada por la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa mediante oficio Rad.2024-2-002423-011548 del 26 de marzo de 2024, en la cual se revisó y verificó el estado del cumplimiento de los acuerdos protocolizados entre las partes.

En el mes de mayo 2024, se realizó reunión de seguimiento en la etapa de seguimiento a los acuerdos de consulta previa, convocada por la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa mediante oficio Rad. 2024-2-002423-020812 Id: 331596 del 14 de mayo de 2024, en la cual se revisó y verificó el estado del cumplimiento de los acuerdos protocolizados entre las partes.

El 18 de febrero 2025, en cumplimientos de los acuerdos de consulta previa con el cabildo indígena el porvenir se realizó seguimiento al acuerdo adecuación del museo arqueológica, además se hizo entrega al cabildo de los elementos recuperados por el grupo de arqueología de la concesión material que se entregó teniendo en cuenta las exigencias del ICANH, se entregaron los materiales arqueológicos recuperados durante el monitoreo realizado en la UF 3.3, UF 7.3, UF 7.2, UF 8.2, UF 8.1, UF 8.3 cantera el mono y Arroyo grande, en cuanto a las resoluciones de tenencia del material arqueológico tenemos avanzadas las de la UF 8.2 UF 8.3 y la cantera los monos, las de la UF 7.3 se encuentran en evaluación, y la UF 3.3 y UF 7.2 se encuentran en elaboración de ficha de tenencia.

El 23 de abril 2025, se realizó reunión de seguimiento de acuerdos convocada por la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa – DANCP, en la cual se revisaron los acuerdos pactados uno a uno con las partes y las respectivas acciones a dar cumplimiento a los mismos, se evidencio que se ha cumplido en un 100% la consulta previa para el proyecto Antioquia-Bolívar “CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE COVEÑAS UFI 7.2” por tal motivo se da por cerrado el proceso de consultas previas con esta comunidad.

Estado actual de los acuerdos Porvenir

Tabla 6-25 Comunidad Indígena El Porvenir

Porvenir (43)	% ejecución	Cantidad acuerdos
En ejecución	0%	0
Ejecutado	100%	43

Fuente: Tomado del último reporte mensual presentado por el Concesionario Ruta al Mar (mes de abril de 2026)

GUAYABAL

En el mes de Octubre de 2021, se dio inicio al desarrollo de la consulta Previa en cumplimiento a la tutela de acuerdo a lo ordenado por el TRIBUNAL SUPERIOR DE SINCELEJO en ordinal de la sentencia **2021.00081,** para ello, el día 19 de octubre de 2021, el Ministerio del Interior, desde la DANCP inició los trámites para la preparación de la consulta previa de la Comunidad Indígena Zenú Guayabal, en la etapa de coordinación y preparación, en donde surgió la convocatoria para la reunión de consulta previa en la etapa PRECONSULTA Y APERTURA con la comunidad indígena Zenú Guayabal (Fecha 4 de noviembre de 2021).

Para el día 4 de noviembre se llevó a cabo consulta previa con la Comunidad Indígena Zenú Guayabal en la etapa PRECONSULTA Y APERTURA, convocada por la DANCP mediante **OFI2021-29996-DCP-2700** de 20 de octubre de 2021.

El día 16 de diciembre del 2021 se dio por surtida la etapa de FORMULACIÓN DE ACUERDOS Y PROTOCOLIZACIÓN en el marco del proceso consultivo del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE COVEÑAS-UF 7.2" en cumplimiento a lo ordenado por EL TRIBUNAL SUPERIOR DE SINCELEJO en el Ordinal 2 de la Sentencia 2021.00081", con el Cabildo Indígena de Guayabal, donde se pudo evidenciar que las partes por medio de un dialogo intercultural identificaron los impactos correspondientes a cada una de las actividades del proyecto, asimismo, se formularon las medidas de manejo para los impactos identificados, logrando concertación entre las partes.

Finalmente, mediante radicado **48-147-20211220021786** del 21 de diciembre de 2021, el Concesionario presentó ante la ANLA, el acta de protocolización de Consulta

Previa con la comunidad Indígena Zenú Guayabal, en Cumplimiento Sentencia Tribunal Superior de Sincelejo en el Ordinal 2 de la Sentencia 2021.00081":

Tabla 6-26 Cronograma Consultas Previa sentencia 2021.00081 Comunidad Zenú Guayabal

N°	Comunidad étnica	Convocatoria	Fecha Convocada	Etapa	Estado
1	Zenú Guayabal	OFI2021-29996-DCP-2700 de 20 de octubre de 2021	4/11/2021	Preconsulta y Apertura	Surtida
2		OFI2021-31943-DCP-2700 de 10 de noviembre de 2021	30/11/2021	Análisis e identificación de impactos y medidas de manejo	Surtida
3		OFI2021-34769-DCP-2700 de 05 de diciembre de 2021	16/12/2021	Formulación de acuerdos y protocolización	Surtida

Fuente: Tomado del último reporte mensual presentado por el Concesionario Ruta al Mar (mes de abril de 2026)

En el mes de octubre 2022, se realizó reunión de seguimiento de la implementación de acuerdos protocolizados de consulta previa, a continuación, estado del avance de los acuerdos.

En el mes de febrero 2023, no se realizó actividades de seguimiento con esta comunidad, sin embargo, el día 20 de febrero se efectuó una reunión extraordinaria para atender una solicitud por parte del Capitán del Cabildo Indígena Guayabal de cambio de acuerdos protocolizados en la consulta previa con esta comunidad, se orientó a la comunidad en mención sobre el debido proceso para llevar a cabo este cambio en los acuerdos protocolizados.

En el mes de abril 2023, se realizó seguimiento a los acuerdos de consulta previa por parte del Ministerio del Interior, en esta reunión de seguimiento se realizaron algunas modificaciones de los acuerdos protocolizados requeridos por la comunidad, sin afectar lo planteado Inicialmente.

En el mes de marzo 2024, se realizó reunión de finalización de actividades de obra de la UF 7.2, como medida de tipo social que estaba pendiente de realizar, en el marco de las Consultas Previas.

En el mes de abril 2024, se realizó reunión de seguimiento en la etapa de seguimiento a los acuerdos de consulta previa, convocada por la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa mediante oficio Rad.2024-2-002423-011545 del 26 de

marzo de 2024, en la cual se revisó y verificó el estado del cumplimiento de los acuerdos protocolizados entre las partes, quedando un acuerdo pendiente por ejecutar.

En el mes de mayo 2024, se realizó reunión de seguimiento de acuerdos convocada por la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa - DANCP, mediante Rad. 2024-2-002423-020811 Id: 331595 del 14 de mayo 2024, en la cual se pudo evidenciar que el 100% de los acuerdos suscritos en acta de protocolización de fecha 16 de diciembre 2021, fueron cumplidos a cabalidad, lo cual es reforzado con la manifestación de aprobación por parte de la Comunidad Cabildo Indígena Guayabal, respecto a todos y cada uno de los diferentes acuerdos suscritos en dicha fecha y acta en el marco del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE COVEÑAS UFI 7.2”

Comunidad Indígena Zenú Guayabal

Tabla 6-27 Comunidad Indígena Zenú Guayabal

Guayabal (9)	% ejecución	Cantidad acuerdos
En ejecución	0%	0
Ejecutado	100%	9

Fuente: Tomado del último reporte mensual presentado por el Concesionario Ruta al Mar (mes de abril de 2026)

Minga por el territorio, La Soberanía y su conservación ancestral, representada en las comunidades Cabildo Isla Gallinazo, Cabildo Torrente, Cabildo Porvenir y Asociación AFROBANTU, por las afectaciones del Proyecto Ruta al Mar Variante Coveñas UFI 7.2.

El día 04 de febrero del 2022 se inició la minga por el territorio, La Soberanía y su conservación ancestral, representada en las comunidades Cabildo Isla Gallinazo, Cabildo Torrente, Cabildo Porvenir, Asociación AFROBANTU, Justicia Propia Córdoba y Sucre, a través de vías de hecho las comunidades antes mencionadas retuvieron la maquinaria, materiales y equipos, y bloqueando las obras de la Unidad Funcional 7, subsector 2, a la altura del Kilómetro 5 (Sector Guayabal), aludiendo afectaciones del Proyecto Ruta al Mar Variante Coveñas UFI 7.2, y exigiendo el derecho fundamental y colectivo a la consulta previa.

El Concesionario en atención a esta protesta de las comunidades, atendió la solicitud de una reunión que se programó el día 09 de febrero del 2022 convocando a las entidades pertinentes, Autoridades Locales de los Municipios de Coveñas, Tolú y San Antero, ANI y Ministerio del Interior DANCP.

El día 09 de febrero de 2022 se realizó mesa de diálogo con las comunidades que hacen parte de la minga, en presencia del Concesionario Ruta al Mar, Ministerio del Interior DANCP, Construcciones El Condor, ANI y Personería Municipal de Coveñas, sin embargo la reunión prevista para este día no se llevó a cabo, debido a que la minga consideró inviable realizarla con la inasistencia de las entidades públicas garantes, desde la gestión del Concesionario Ruta al Mar y por solicitud de la minga y sus asesores jurídicos se convoca las siguientes entidades: Gobernación de Sucre delegados de asuntos étnicos, Alcaldías de los Municipios de Coveñas, Tolú y San Antero, Procuraduría Ambiental y Agraria de Sucre, Procuraduría Nacional para asuntos Estincos, Personería de los Municipios de Coveñas, Tolú y San Antero, Defensorías del Pueblo de Sucre y Córdoba, CARSUCRE, CVS y ANLA, se programó la reunión solicitada por la minga el día 15 de febrero 2022.

El día 15 de Febrero se realizó la reunión programada con las instituciones convocadas, Las comunidades Isla Gallinazo y Torrente acordó con el Ministerio del Interior realizar un estudio cartográfico y geográfico basado en la sentencia SU 123 de 2018, en conjunto con el Concesionario quien facilitará los medios logísticos y profesionales para realizarlo, asimismo, este estudio se allegara a la Dirección Nacional de Consultas Previas para su evaluación y así definir si dicha comunidad es afectada geográficamente y si será objeto de consulta Previa, en el caso del Cabildo El Porvenir acordó con la Concesión Ruta al Mar realizar mesa de trabajo el día 17 de febrero de 2022 y estudiar los acuerdos que están solicitando, tomar decisiones, y ajustar los acuerdos ya establecidos en el marco de la consulta previa protocolizada si es necesario, de esta manera poder continuar con el proceso de consulta previa en la etapa de seguimiento a los acuerdos con el Cabildo el Porvenir.

El Concesionario le solicitó a la Minga la entrega de la totalidad de las maquinarias retenidas a través de vías de hecho, sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo al respecto, por tal motivo se da por terminada la reunión, así mismo por medio de comunicación telefónica, los representantes de la Minga entablaron diálogo con el Concesionario Ruta al Mar y la DANCP para continuar con la reunión el día 16 de febrero 2022.

El día 16 de febrero de 2022 se realizó reunión con la Dirección de las Consultas Previas con el acompañamiento de la ANI, Concesión Ruta al Mar, la Interventoría CR CONCESIONES y la personería del Municipio de Coveñas, haciendo énfasis en la certificación de las comunidades que hacen parte de la minga específicamente Cabildo Isla Gallinazo y Cabildo Torrente, para ejercer su derecho a las consultas previas, en la que se estableció lo siguiente:

- La Subdirección Técnica de Consulta Previa del Ministerio del Interior evaluara la información que se recopilará en el recorrido que se realizara entre la comunidad, sus asesores y los profesionales de la Concesión Ruta al Mar, teniendo en cuenta la Res. 0023 de 2016 y en su sentido geográfico y amplio bajo la sentencia SU 123 de 2018, para determinar si el área del proyecto que se va a realizar se encuentra dentro del territorio de la comunidad Cabildo Torrente.

- La Subdirección Técnica de Consulta Previa del Ministerio del Interior evaluara la información que se recopilará en el recorrido que se realizara entre la comunidad, sus asesores y los profesionales de la Concesión Ruta al Mar, teniendo en cuenta la Res. 0023 de 2016 y en su sentido geográfico y amplio bajo la sentencia SU 123 de 2018, para determinar si el área del proyecto que se va a realizar se encuentra dentro del territorio de la comunidad Cabildo Isla Gallinazo.

- Basado en los resultados de los recorridos se realizará una mesa Interinstitucional que estará integrada por la DANCP, ANI, Concesión Ruta al Mar y comunidades.

- En el caso de Cabildo Porvenir se realizará reunión entre esta comunidad y la Concesión Ruta al Mar el jueves 17 de febrero del presente año en el territorio de dicho cabildo, para iniciar la materialización e implementación de los acuerdos en el marco de la consulta previa protocolizada con esta comunidad.

- En referencia a la Asociación Afro bantú La DANCP realizara el enlace con la Dirección de Autoridades Negras, Afrocolombiana, Raizales y Palenqueras, para realizar una reunión con la representante de dicha Asociación.

En consecuencia, a los acuerdos estipulados, las comunidades que integran la minga y la Concesión Ruta al Mar acuerdan la entrega de la totalidad de los equipos y la maquinaria retenida, sin embargo, dichos acuerdos se condicionaron al cumplimiento de los siguientes compromisos:

- Las comunidades de la minga levantan las vías de hecho con la entrega de la totalidad de la maquinaria retenida.

- Ni el tramo donde estaba la minga entre tolú y San Antero KM 5+800 sector Torrente, ni el tramo casa roja serán intervenidos hasta en cuanto se cumplan todos los acuerdos concertados y firmados por las partes en el marco de las reuniones del 16 y 17 de febrero del 2022.

- Los acuerdos para los casos de las comunidades Indígenas de Isla Gallinazo y Torrente se entenderán cumplidos una vez se emita la resolución de la Subdirección Técnica de la DANCP, en el que se determine si es o no es procedente el derecho a la Consulta Previa, en un término de 45 días, contados desde el día después de la radicación del alcance del Concesionario.

- La Dirección de Asuntos Indígenas ROM y Minorías del Ministerio de Interior se compromete a convocar y a asistir el día 24 de febrero del 2022 en el Municipio de Coveñas, así como las demás entidades competentes para analizar el pliego de peticiones de la minga.

El día 17 de febrero de 2022 se desarrolló la reunión acordada con el Cabildo Indígena El Porvenir, con referencia a los acuerdos logrados con las comunidades presentes en la UF7.2 Variante Coveñas, en el marco de la Minga, dando inicio a la materialización e implementación de los acuerdos protocolizados con esta comunidad, quedó como compromiso que, una vez desarrollada esta reunión, la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, procedería a convocar a la reunión de seguimiento de acuerdos, una vez la comunidad y el ejecutor le informen la fecha y lugar para establecer en el marco del proceso de Consulta Previa los ajustes a los acuerdos, en consecuencia el Concesionario por medio del Radicado 48-147-20220218022541 del 18 de febrero de 2022, solicita a la DANCP del Ministerio del Interior reunión de seguimiento acuerdo Minga Indígena Cabildo Indígena El Porvenir – UF 7.2 Variante Coveñas.

El 17 de febrero mediante Rad 48-147-20220217022515 el Concesionario envió el alcance a la DANCP del Ministerio del Interior sobre la verificación de posibles afectaciones directas a comunidades étnicas en el proyecto Variante Coveñas. Certificación 0092 del 23 de febrero del 2018 y certificación ST-1260 de 2020 y oficio OFI2020-10117-DCP-2500.

El día 22 de febrero de 2022 se realizó recorrido con la comunidad Isla Gallinazo, en dicho recorrido se tuvo como referencia visitar 7 puntos estratégicos identificados por la comunidad en los cuales bajo su criterio étnico reconocen diferentes afectaciones a esta.

-Puente amansa Guapo sobre la vía, cobertura manglar, puente amansa Guapo en la zona de construcción de la variante, predio del Cabildo Isla Gallinazo, finca casa roja, Pr 13+900 al Pr 14+100, Pr 14+100 arroyo San Antonio.

El día 23 de febrero con la comunidad Torrente, en este recorrido se referenciaron 4 puntos a tener en cuenta y son los siguientes: Mayoría de Torrente, caminos del territorio aproximados al PR 8+700, camino de tránsito de la comunidad aproximados al PR 11+000 y Pr 11 vía Petalaca.

El día 24 de febrero del 2022 se realizó reunión convocada por la DANCP del Ministerio del Interior atendiendo los acuerdos y el condicionamiento de los mismos, firmados entre las partes en el marco de la Minga por el territorio, la soberanía y la conservación ancestral del Pueblo Zenú en la reunión llevada a cabo entre los días 16 y 17 de febrero de 2022, en la cual se revisó los puntos número 4 y 5 del pliego de peticiones presentado, el punto número 4 corresponde a las Alcaldías Municipales de San Antero, Coveñas y Tolú, el punto numero 5 a la Unidad Nacional de Protección del Ministerio del Interior, cabe aclarar quedaron los puntos faltantes por abordar de 12 que hacen parte del pliego de peticiones y que se retomaran en el próximo encuentro que está programado para el día 19 de marzo de 2022 en el municipio de Coveñas.

El viernes 25 de febrero fue enviado al correo de la comunidad indígena Cabildo Isla Gallinazo y sus asesores, el informe que se levantó posterior al recorrido, para revisión y observaciones del cabildo.

En lo que respecta al informe del recorrido con el Cabildo Torrente Indígena, aún la Concesión está a la espera de la remisión de las coordenadas de INCODER por parte del capitán, para la consolidación de la cartografía; una vez se cuente con ello se procederá a procesar la información geográfica y cartográfica del recorrido y de la ubicación dada por INCODER.

El día 07 de marzo de 2022 mediante Rad 48-147-20220304022731 el Concesionario solicito al Capitán Alexander Martínez del Cabildo Torrente Indígena, la información cartográfica INCODER, en atención a los compromisos firmados entre las partes el

pasado 17 de febrero de 2022, asociados con el comienzo del estudio cartográfico y geográfico, y una vez cumplido el compromiso de realización de recorrido y georreferenciación, actividad ejecutada entre las partes el pasado miércoles 23 de febrero de 2022. El Concesionario hasta el día 07 de marzo del 2022 no recibió las coordenadas de INCODER sobre la delimitación del territorio del Cabildo Torrente Indígena, esta información es necesaria para la construcción de la cartografía del informe que debe ser remitido, con el objetivo de determinar la procedencia y oportunidad del proceso de consulta previa. Se informa que en caso de no recibir la información cartográfica de INCODER el miércoles 9 de marzo de 2022, correspondiente a 15 días posteriores al recorrido, el mencionado informe se articularía con la información registrada al tenor de la Resolución 0023 del 2016.

El día 09 de marzo mediante Rad 48-147-20220308022796 el Concesionario realizo la solicitud del informe de recorrido por el territorio del Cabildo Indígena de Isla Gallinazo UF 7.2 Variante Coveñas, en atención a los compromisos contraídos entre las partes el pasado 16 de febrero de 2022, asociados con el comienzo del estudio cartográfico y geográfico, y una vez ejecutado el compromiso de realización de recorrido y georreferenciación, actividad que se desarrolló entre las partes el 22 de febrero de 2022, del cual la Concesión remitió el informe de campo en los tiempos pactados dado que el documento fue entregado a la comunidad y su grupo asesor vía correo electrónico el viernes 25 de febrero. Después de haber pasado 10 días, aun el informe no ha sido devuelto y dicho informe se debe remitir a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, toda vez que corresponde a los insumos que tendrá la autoridad para el análisis particular del caso y para el análisis a través de la mesa interinstitucional que fue pactada en los acuerdos firmados el 16 de febrero.

El día martes 15 de marzo 2022, se presentaron nuevas vías de hecho por parte de los representantes de la Minga con la retención de la maquinaria del contratista EPC-Construcciones El Condor, en el predio privado ubicado en el sector Petalaca PR8+300.

El día miércoles 16 de Marzo de 2022, la Capitana del Cabildo Indígena Isla Gallinazo quien hace parte de la Minga permanente por el territorio, La Soberanía y su conservación ancestral, por las afectaciones del Proyecto Ruta al Mar Variante Coveñas UFI 7.2, realizando un pronunciamiento a través de un video que difundieron por medio de las redes sociales, expresó que continúan en Minga permanente, aludiendo la falta de compromiso de la Concesión Ruta al Mar en los acuerdos pactados en las reuniones del 16 y 17 de febrero de 2022, asimismo, hacen

responsables a la ANI, Concesión Ruta al Mar y a la Constructora El Condor y a las entidades municipales del Municipio de Coveñas, exponiendo que están amenazados.

El día 17 de marzo, el Concesionario Ruta al Mar por medio de comunicado de prensa informa a la opinión pública, que luego de 41 días de establecida la minga permanente en el sector variante Coveñas UFI 7.2, k 5+800, por parte de los representantes de las comunidades Indígenas Isla Gallinazo, Torrente Indígena y la Asociación Afrobantu, del municipio de Coveñas, Sucre, y una vez establecidos los acuerdos y Condicionamientos para la liberación de la maquinaria requerida, formalizados en el acta suscrita el 17 de febrero de 2022 con representantes de las comunidades, el Ministerio del Interior, La Personería de Coveñas y la ANI, el Concesionario dio Inicio a la Implementación de los acuerdos.

Ni el tramo donde estaba la minga entre tolú y San Antero KM 5+800 sector Torrente, ni el tramo casa roja serán intervenidos hasta en cuanto se cumplan todos los acuerdos concertados y firmados por las partes en el marco de las reuniones del 16 y 17 de febrero del 2022.", acuerdo que la Concesión Ruta al Mar y Construcciones El Condor S.A, han venido cumpliendo a cabalidad.

El día 17 de marzo, El Concesionario Ruta Al Mar se pronuncia por medio de un segundo comunicado de prensa a la opinión pública, para informar que acudieron en compañía del contratista Construcciones El Condor el Jueves 17 de marzo a las 10:00 am a la casa de la cultura de Coveñas a la citación realizada por la personería de este Municipio, para dialogar con los representantes de la Minga Indígena, con el motivo de conocer las razones de la retención de la maquinaria que desde el 15 de marzo de 2022 se encuentra inmovilizada en el predio privado sector de casa Roja y la cual es fundamental para la ejecución de las obras de la Variante Coveñas que actualmente se encuentran suspendidas. A esta reunión a los que asistieron la Secretaría de Gobierno de Coveñas y la PONAL de Sucre, no asistieron los representantes de la minga, toda vez que los representantes de la minga manifestaron que solo dialogaran en presencia del Ministerio del Interior en la Reunión del 19 de marzo.

El Concesionario Ruta al Mar se pronuncia por medio de un Tercer comunicado de prensa a la opinión pública, Informando que en horas de la madrugada del 18 de marzo de 2022, y gracias a las acciones de la Policía Nacional, seccional Sucre, se logró la liberación de la maquinaria del Contratista Construcciones el Condor, que se encontraban retenidas de manera ilegal por la minga Indígena en el predio privado

en el sector de Petalaca, K8+300 Municipio de Coveñas, desde el pasado 15 de marzo del presente año.

El día 19 de marzo se realizó reunión en el marco de la minga por el Territorio, la Soberanía y su Conservación Ancestral del Pueblo Zenú, en dicha reunión se plantearon 5 acuerdos los cuales quedaron ajustados a unos condicionamientos conforme lo siguiente:

1. La Concesión Ruta al Mar solicitara visita de verificación al Ministerio del interior, para que se lleve a cabo el día 31 de marzo y primero de abril para torrente indígena e Isla gallinazo.

2. El 23 de marzo la DANCP emitirá un acto administrativo que ordena la visita de verificación para las comunidades Torrente e Isla Gallinazo por el proyecto ruta al mar variante 7.2 Coveñas, programadas para el día 31 de marzo para Isla gallinazo y 1 de abril para torrente indígena.

3. Los informes construidos según acuerdos del 16 y 17 de febrero del 2022 serán entregados por la comunidad y la Concesión a la DANCP del Ministerio del interior máximo el 25 de marzo como a la fecha en la que se suscribe en estos acuerdos la dirección de autoridad Nacional de consulta previa no ha recibido los informes por parte de la comunidad y la concepción se deja la salvedad que si los informes nos aportan máximo el 25 de marzo se podrá prescindir de estos para realizar las visitas de verificación y demás trámites dentro del proceso en aras de garantizar el cumplimiento de los acuerdos.

4. El 9 de mayo del 2022 es la fecha en la cual la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior Se compromete a expedir la resolución de procedencia o no de la consulta previa, para las comunidades indígenas Isla gallinazo y Torrente, con base a la visita de verificación y los informes construidos con la comunidad y la Concesión ruta al mar, con la salvedad del punto tercero.

5. La próxima reunión se acuerda se llevará a cabo el jueves 7 de abril del 2022, con el objetivo de concertar los demás puntos pendientes acordados el 24 de febrero de 2022, Y dónde se tratarán los temas respecto a la documentación aportada por la alcaldía de Coveñas, con las mismas garantías que se han especificado para la realización de esta.

Entre los condicionamientos se encuentran los siguientes: Según Los acuerdos el tiempo para la expedición de la resolución sobre el acto administrativo, en dónde se determinará la procedencia o no de la consulta previa de las comunidades, son 52 días calendario, contados desde el 20 de marzo del 2022 hasta el 9 de mayo del 2022 por lo tanto durante los 52 días, la Concesión podrá adelantar únicamente, obras disposición del material para la conformación del terraplén producto de los cortes que debe realizar entre el kilómetro 0 y km 4 esta actividad se realizará únicamente en el kilómetro 5 y el 10 + 400.

El 22 de marzo mediante Rad. 48-147-20220322022983 la Concesión Ruta al Mar realizo solicitud de informe del recorrido por el territorio al Cabildo Isla Gallinazo, Conforme lo acordado en la reunión del pasado 19 de marzo de 2022 en presencia de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa -DANCP, se acordó la remisión del informe resultante del recorrido por el territorio - Variante Coveñas, realizado el martes 22 de febrero de 2022, con el objetivo de ser radico a más tardar el viernes 25 de marzo del presente año, ante el Ministerio del Interior.

El 22 de marzo mediante Rad. 48-147-20220322022984 la Concesión Ruta al Mar realizo solicitud de informe del recorrido por el territorio al Cabildo Torrente Indígena Conforme con lo acordado en la reunión del pasado 19 de marzo de 2022 en presencia de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa -DANCP, en la cual se acordó la remisión del informe resultante del recorrido por el territorio - Variante Coveñas, realizado el miércoles 23 de febrero de 2022, con el objetivo de ser radicado a más tardar el viernes 25 de marzo del presente año, ante el Ministerio del Interior, dado que a la fecha no se cuenta con el informe complementado con los insumos por parte de la comunidad.

El 24 de marzo mediante Rad. 48-147-20220324023059, se realizó entrega del informe consolidado entre el Cabildo Indígena Isla Gallinazo y la Concesión Ruta al Mar, con el apoyo de representantes de Gobierno Mayor, que contiene la información geográfica, cartográfica y de análisis sobre el recorrido efectuado el 22 de febrero de 2022 por el territorio de interés determinado por la comunidad de Isla Gallinazo, con respecto a la Variante Coveñas – Unidad Funcional 7, subsector 2 (UF 7.2) del proyecto Conexión Antioquia – Bolívar.

El día 30 de marzo mediante correo la Concesión ruta al mar, reitero la solicitud el envío del informe en su versión final para radicación, al cabildo Indígena torrente, para dar cumplimiento al compromiso que correspondía a la radicación ante la DANCP para el 25 de marzo de 2022.

El 31 de marzo 2022, a pesar de la convocatoria realizada por medio de la solicitud de visita de verificación construcción de la Variante Coveñas – Unidad Funcional 7.2, por parte del Concesionario Ruta al Mar al Ministerio del interior, como quedo estipulado en el punto número 1 de los acuerdos firmados en la reunión del 19 de marzo, en el marco de La minga, no se realizó el recorrido en mención dada la inasistencia de los representantes del ministerio.

El 04 de abril del 2022 en Concesionario mediante Rad. 48-147-20220404023168 envió Respuesta Información aclaratoria, informe recorrido comunidad Indígena Isla Gallinazo – Variante Coveñas Unidad Funcional 7.2, del proyecto Conexión Antioquia – Bolívar. En este caso la respuesta aclaratoria consiste en al informe elaborado en el marco de los acuerdos suscritos el día 17 de febrero, con la comunidad Indígena Isla Gallinazo, que contiene la información geográfica, cartográfica y de análisis sobre el recorrido efectuado el 22 de febrero de 2022 por el territorio de interés determinado por la comunidad de Isla Gallinazo, con respecto a la Variante Coveñas – UF 7.2 remitido mediante comunicación con radicado 48-147-202203240230591 del 25 de marzo de 2022.

El 04 de abril del 2022 en Concesionario mediante Rad. 48-147-20220404023169 en respuesta a las comunicaciones OFI2022-6232-DCP-2500 fechada el 28 de marzo de 2022 y OFI2022-6502-DCP-2500 fechada el 29 de marzo de 2022, a través de las cuales se reitera la solicitud de dar claridad frente a los aspectos referidos en la comunicación OFI2022-5994-DCP-2700 fechada el 23 de marzo de 2022.

La reunión que estaba programada para el día 7 de abril del 2022 con el objetivo de concertar los puntos pendientes acordados el 24 de febrero de 2022 en los acuerdos de la minga no se llevó a cabo, ya que la DANCP no convoco a dicha reunión de seguimiento, a la fecha se está a la espera de la nueva fecha dispuesta por el Ministerio del Interior.

El día 09 de mayo 2022, mediante Rad. 48-147-20220509023719 el Concesionario Ruta al Mar envío al Ministerio del Interior DANCP, alcance aclaratorio a informes de recorrido de la minga Indígena, con el propósito de precisar algunos aspectos contenidos en los informes derivados de los recorridos realizados con las comunidades indígenas Isla Gallinazo y Torrente Indígena, dando cumplimiento a los acuerdos pactados con la Minga Indígena instalada por dichas comunidades.

El 11 de mayo, mediante OFI2022-9719-DCP-2700, La Subdirección Técnica de Consulta Previa de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del

Ministerio del Interior, se pronunció mediante asunto, cumplimiento de los acuerdos pactados en el desarrollo de la Minga Indígena del Pueblo Zenú, Proyecto Variante Coveñas UFI 7.2, en el cual se considera improcedente una revisión por parte de la Subdirección Técnica de lo actuado y los pronunciamientos emitidos en la Certificación N°508 de 2014, Certificación N° 0092 de 2018 y Resolución N° ST 1260 de 2020, ya que no se identificó una modificación de los elementos constitutivos, fácticos o técnicos del proyecto a ejecutar que llevarán a inferir nuevas posibles afectaciones directas o impactos que afectarán a la comunidad étnica Isla Gallinazo.

El día 31 de mayo 2022, mediante OFI2022-11305-DCP-2700, La Subdirección Técnica de Consulta Previa de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, se pronunció mediante asunto, cumplimiento de los acuerdos pactados en el desarrollo de la Minga Indígena del Pueblo Zenú, Proyecto Variante Coveñas UFI 7.2, en el cual se considera improcedente una revisión por parte de la Subdirección Técnica de lo actuado y los pronunciamientos emitidos en la Certificación N°508 de 2014, Certificación N° 0092 de 2018 y Resolución N° ST 1260 de 2020, ya que no se identificó una modificación de los elementos constitutivos, fácticos o técnicos del proyecto a ejecutar que llevarán a inferir nuevas posibles afectaciones directas o impactos que afectarán a la comunidad étnica Torrente.

El día 1 de junio del 2022, a raíz de la comunicación que emitió la Subdirección Técnica de Consulta Previa de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior en la cual considera, específicamente, de acuerdo a las competencias del decreto 2353 de 2019 se hace improcedente en este estado o instancia administrativa, una revisión por parte de la Subdirección Técnica de lo actuado y los pronunciamientos emitidos en la Certificación N°508 de 2014, Certificación N° 0092 de 2018 y Resolución N° ST 1260 de 2020, ya que no se identificó una modificación de los elementos constitutivos, fácticos o técnicos del proyecto a ejecutar que llevarán a inferir nuevas posibles afectaciones directas o impactos que afectarán a la comunidad étnica Torrente, haciendo improcedente la realización de Consulta Previa con esta comunidad, de acuerdo a lo expresado en esta comunicación, La Comunidad de Torrente Indígena volvió a tomar las vías de hecho, al considerar el desacuerdo con el pronunciamiento del Ministerio del Interior.

Cabe resaltar, que a partir de este suceso el Concesionario busco un acercamiento con la comunidad, el cual no fue posible, sin embargo la Agencia Nacional de Infraestructura envió un equipo especial para trabajar con comunidades, integrado por 2 profesionales los cuales lograron realizar una mesa de diálogo y una mesa de trabajo los días 24, 25, 26, 27 y 28 de junio de 2022 con las comunidades de la Minga

Indígena, Isla Gallinazo, Torrente Indígena e incluyeron a la comunidad de El Reparo quienes estaban solicitando por fuera de la Minga Consulta Previa para su comunidad, a raíz de este acercamiento se definieron 3 ejes temáticos relacionados al fortalecimiento Institucional y Organizacional, Comunitario y Proyectos Productivos, con un valor aproximado de doscientos cincuenta millones de pesos ($ 250.000.0000), para cada una de las comunidades, finalmente, el día 28 de junio de 2022 se cerraron los acuerdos planteados y se espera que con el cumplimiento de los mismos se pueda finalizar esta situación.

En el mes de julio se tiene lo siguiente: El Concesionario Ruta al Mar informó a esta Interventoría de manera informal mediante los comités Internos mensuales #75 y #76, que en el mes de junio 2022 desde el 24 al 26, se realizó el acercamiento de la ANI, el Concesionario Ruta al Mar y las Comunidades Isla Gallinazo, Torrente Indígena y El Reparo, en donde realizaron unos acuerdos en los que se pactaron apoyos económicos a las Comunidades para el desarrollo de dos (2) ejes de fortalecimiento organizacional y productivo, de igual forma también se concertó la vinculación laboral de sus cabildantes y el apoyo con maquinaria para la realización de unas obras menores, finalmente, el día 28 de junio de 2022 se cerraron los acuerdos planteados y se espera que con el cumplimiento de los mismos se pueda finalizar esta situación.

Asimismo, en el mes de agosto de 2022, no se recibió por parte de la Concesión Ruta al Mar el oficio en el cual de manera oficial informe a esta Interventoría los acuerdos pactados con las Comunidades Isla Gallinazo, Torrente Indígena y El Reparo.

Sin embargo, mediante comunicado rad. CI.023/AB9902/22/7.1.9 del 19 de agosto 2022 esta Interventoría solicita a la Concesión Ruta al Mar, una copia de los acuerdos firmados con las comunidades representantes de la Minga Indígena de la UF 7.2, a fin de contar con información actualizada del proceso y realizar el respectivo seguimiento.

En el mes de septiembre de 2022 mediante Radicado: 48-147-20220823025236, dio respuesta al oficio CI.023/AB9902/22/7.1.9 Solicitud de copia de los Acuerdos Adquiridos con las Comunidades representadas en la Minga Indígena de la U.F. 7.2.

Sin embargo, en el comité mensual N°78 del mes de septiembre 2022, se solicitó al Concesionario allegar a esta Interventoría el estado actual de avance de los proyectos que hacen parte de los acuerdos pactados con las comunidades de Torrente Indígena e Isla Gallinazo, las cuales hicieron parte de la Minga de la UFI 7.2.

El día 6 de octubre de 2022 mediante Rad. Radicado: 48-147-20220929025755 El Concesionario remitió a esta Interventoría los proyectos presentados por las comunidades indígenas de Isla Gallinazo, Torrente y Reparo relacionados con los acuerdos privados con estas comunidades, dichos proyectos ya fueron revisados y aprobados y se encuentran en ejecución actualmente.

En el comité mensual con el Concesionario N°82 del mes de enero de 2023 se informó por parte del Concesionario sobre el avance de los proyectos acordados entre el Concesionario y las comunidades indígenas de Isla Gallinazo, El Reparo y Torrente Indígena que hicieron parte de la Minga UF 7.2, Con la comunidad del Reparo ya se ejecutaron todos los procesos, para la comunidad Isla Gallinazo se encuentra en proceso de adquisición del predio para la construcción de casa comunitaria indígena se realiza reunión final con acompañamiento de Interventoría, y con respecto a Torrente indígena se espera que solucionen diferencias internas para avance del proceso.

En el mes de febrero 2023, se realizó reunión convocada por el Cabildo Indígena de Torrente para informar al Concesionario el cambio de capitán de este cabildo en aras de continuar con los acuerdos pactados en el marco de la Minga Indígena.

En el mes de mayo 2023, en el Comité mensual #86 el Concesionario dio a conocer a la Interventoría el estado de los acuerdos con las comunidades que hacen parte de la minga de la UFI 7.2, con relación a la comunidad Indígena de Torrente, esta comunidad solicitará una reunión con el Concesionario para informar el proceso interno de cambio de capitán que lleva a cabo este cabildo, la comunidad Indígena Isla Gallinazo se encuentra en el proceso de construcción de la casa indígena la cual cuando se culminen las obras constructivas se realizara el respectivo seguimiento y finalmente con la comunidad el reparo ya se culminaron los acuerdos pactados, por tal motivo la Interventoría sugiere realizar un acta de finalización de dichos acuerdos.

El día 29 de mayo 2023, se realizó reunión virtual con la comunidad de Torrente Indígena en la cual informaron al Concesionario sobre el nuevo Capitán y representante legal del Cabildo para continuar con el cumplimiento de los acuerdos que se vieron retrasados por el trámite interno del cabildo en mención.

El día 10 de julio 2023, se llevó a cabo reunión interna entre el Concesionario y el Cabildo Torrente Indígena en su territorio, con el fin de realizar el debido seguimiento a los acuerdos establecidos entre empresa y comunidad, permitiendo de esta manera

la participación activa de está, se pudo verificar el avance en los proyectos planteados.

En el mes de septiembre 2023, se realizó visita de seguimiento entre la empresa y la comunidad de Torrente Indígena, con el fin de revisar los avances de los acuerdos privados realizados con dicha comunidad, en esta visita se pudo evidenciar el avance de estos.

En el mes de noviembre 2023, el Cabildo Indígena Torrente envió informe de avance de los acuerdos pactados con el Concesionario, se encuentra pendiente reunión de seguimiento.

El día 27 de diciembre de 2023 se realizó visita de seguimiento al cabildo Indígena de Torrente, con el fin de evaluar el avance en los acuerdos internos con esta comunidad, en la visita se pudo evidenciar que tienen un avance del 90% en los acuerdos pendientes.

El Concesionario informa que, se cerraron los acuerdos con esta comunidad y que estaba pendiente un informe final por parte de la comunidad de Torrente, el cual no entregaron, por lo tanto, no quedan acuerdos pendientes del Concesionario y las comunidades de la Minga indígena de la UFI 7.2.

6.6.2. Consulta Previa UF 7.3 Perimetral Aeropuerto.

La Dirección de la Autoridad de Consulta Previa DANCP, mediante resolución **ST-1261 de 09 diciembre 2020** certificó la presencia de las comunidades Isla Gallinazo y El Palmar, de acuerdo con la solicitud de ampliación de áreas de influencia requerida por la ANLA en el marco de la evaluación al EIA para la Perimetral Aeropuerto de Tolú. Teniendo en cuenta lo anterior, el Concesionario mediante radicado 48-147-20210120017423 del 20 de enero de 2021, solicitó a la DANCP el inicio de la consulta, realizándose el 17 de febrero de 2021 la reunión de coordinación entre Concesionario y DANCP.

Tabla 6-28 Cronograma Consultas Previa resolución ST- 1261 de 09 diciembre 2020

N°	Cabildo Indígena	Radicado	Fecha Convocada	Etapa	Estado
1	Isla Gallinazo	OFI2021-5914-DCP-2500 del 9 de marzo de 2021	15/03/2021	Preconsulta y Apertura	Surtida
2		OFI2021-8492-DCP-2500 del 30 de marzo de 2021	15/04/2021	Apertura	Surtida

N°	Cabildo Indígena	Radicado	Fecha Convocada	Etapa	Estado
3		OFI2021-10395-DCP-2500 del 20 de abril de 2021	28/04/2021	Talleres de impactos y medidas de manejo	Surtida
4		OFI2021-11920-DCP-2500 del 4 de mayo de 2021	12/05/2021	Formulación de acuerdos y protocolización	Protocolizada
5	El Palmar	OFI2021-4763-DCP-2500 del 1 de marzo de 2021	17/03/2021	Preconsulta y Apertura	Surtida
6		OFI2021-8504-DCP-2500 del 30 de marzo de 2021	16/04/2021	Talleres de impactos y medidas de manejo	Protocolizada
7		OFI2024-2-002423-011543 Id:304432 del 26 de marzo 2024	09/04/2024	Reunión de consultas previas en etapa de seguimiento de acuerdos	Cerrada

Fuente: Tomado del último reporte mensual presentado por el Concesionario Ruta al Mar (mes de abril de 2026)

Luego de realizado el proceso consultivo, mediante radicado N° 48-147-20210920020509 del 20 de septiembre de 2021, el Concesionario remitió ante la DANCP, la Licencia Ambiental resolución N°1243 del 15 de julio de 2021. Modificación de Licencia Ambiental UF 7.3, en el marco del proceso consultivo de la ST-1261 de 2020.

En cuanto a los avances de las Consultas Previas para los citados Cabildos Indígenas, se avanzó en el siguiente orden:

Cabildo Indígena Isla Gallinazo.

El 15 de marzo de 2021, se desarrolló la Preconsulta y apertura, etapa convocada por la DANCP mediante OFI2021-5914-DCP-2500 del 9 de marzo de 2021. La presente convocatoria surgió como un alcance a la Convocatoria con numero consecutivo OFI2021-4960-DCP-2500 del 2 de marzo de 2021, lo anterior, por solicitud de los representantes del cabildo indígena quienes solicitaron aplazamiento y cambio de fecha, por tal motivo, la apertura se concertó para el 15 de marzo de 2021, surtiéndose de este modo la etapa.

El 12 de mayo de 2021 se llevó a cabo la etapa de formulación de acuerdos y protocolización, la cual fue convocada OFI2021-11920-DCP-2500 del 4 de mayo de 2021. En este sentido, las partes unificaron criterios en cuanto a la concertación de

las medidas de manejo, por lo cual le solicitaron a la DANCP protocolizar los acuerdos formulados, solicitud que fue aprobada por el garante de la Consulta Previa – Ministerio del Interior. con un valor global en compensaciones equivalente a $250.000.000 para el desarrollo de proyectos en beneficio de las comunidades.

La Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, mediante radicado 2022-2-002423-020549 realizó convocatoria para la Reunión de Consulta Previa en la etapa de Seguimiento de Acuerdos con el Cabildo Indígena Isla Gallinazo, en el marco del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE TOLÚ – UFI 7.3 Y ZONA DE DISPOSICIÓN DE MATERIALES SOBRANTES”, en jurisdicción del departamento de Sucre.

En el mes de agosto 2024, se realizó actividades de seguimiento interno con esta comunidad y la concesión ruta al mar, con el fin de revisar los avances que se han tenido de los proyectos a desarrollar, se solicitara al Ministerio del Interior realizar la visita de seguimiento a los acuerdos a esta comunidad.

El 24 de abril 2025 se realizó reunión de seguimiento de acuerdos convocada por la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa – DANCP, en la cual se revisaron los acuerdos pactados uno a uno con las partes y las respectivas acciones a dar cumplimiento a los mismos, se evidencio que se ha cumplido en un 100% la consulta previa para el proyecto AREA ADICIONAL PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE TOLU- UFI 7.3 Y ZONA DE DISPOSICIÓN DE MATERIALES SOBRANTES. Con el Concesionario y la comunidad.

Isla Gallinazo

Tabla 6-29 Comunidad Indígena Isla Gallinazo

Isla Gallinazo asentamiento El Palmar (31)	% ejecución	Cantidad acuerdos
En ejecución	0%	0
Ejecutado	100%	31

Fuente: Tomado del último reporte mensual presentado por el Concesionario Ruta al Mar (mes de abril de 2026)

Cabildo Indígena El Palmar:

El 17 de marzo de 2021, se desarrolló la Preconsulta y apertura, etapa convocada por la DANCP mediante OFI2021-4763-DCP-2500 del 1 de marzo de 2021. La etapa

se dio por surtida, instalándose de esta manera el proceso consultivo ante el garante, Ministerio del Interior.

El 25 de mayo de 2021 la Concesión mediante comunicado No 48-147-20210521019056 radicó ante la ANLA el complemento del EIA UF 7.3 Perimetral Aeropuerto, referido al capítulo de caracterización Social con la incorporación de los acuerdos protocolizados con las comunidades indígenas El Palmar e Isla Gallinazo. En este orden, al cumplirse con establecido en el Artículo 2.2.2.3.6.3 del Decreto No 1076 del 2015.
El 15 de julio de 2021, la ANLA mediante radicado No 2021144790-2-000 notificó a la Concesión la resolución No 1243 del 15 de julio de 2021 – Aprobación a la modificación de Licencia Ambiental para la UF 7.3 Perimetral Aeropuerto de Tolú.

En el mes de septiembre 2022, no se realizó reunión de seguimiento de la implementación de acuerdos protocolizados de consulta previa.

En el mes de noviembre 2022, se realizó reunión de seguimiento de la implementación de acuerdos protocolizados de consulta previa, a continuación, estado del avance de los acuerdos.

La Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, mediante radicado 2022-2-002423-020118 del 13 de octubre 2022, realizó convocatoria para la reunión de Consulta Previa en la etapa de Seguimiento de Acuerdos con el Cabildo Indígena el Palmar, en el marco del proyecto “ÁREA ADICIONAL PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE TOLÚ – UF1 7.3 Y ZONA DE DISPOSICIÓN DE MATERIALES SOBRANTES" (PROY-01933), en jurisdicción del Municipio de Tolú, departamento de Sucre.

Palmar

Tabla 6-30 Comunidad Indígena El Palmar

El Palmar	% ejecución	Cantidad acuerdos
En ejecución	0%	0
Ejecutado	100%	33

Fuente: Tomado del último reporte mensual presentado por el Concesionario Ruta al Mar (mes de abril de 2026)

En el mes de abril 2024, se realizó reunión de seguimiento de acuerdos convocada por la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa - DANCP, en la cual se pudo evidenciar que el 100% de los acuerdos suscritos en acta de protocolización de fecha 16 de abril de 2021 , fueron cumplidos a cabalidad, lo cual es reforzado con la manifestación de aprobación por parte de la Comunidad Indígena el palmar, respecto a todos y cada uno de los diferentes acuerdos suscritos en dicha fecha y acta, en el marco del proyecto "ÁREA ADICIONAL PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE TOLÚ – UFI 7.3 Y ZONA DE DISPOSICIÓN DE MATERIALES SOBRANTES", dándose así, por cerrado este proceso de consultas previas.

TUTELAS UFI 7.2

A continuación, se detallan las acciones de tutelas interpuestas por diferentes comunidades aduciendo el amparo de los derechos fundamentales a la consulta previa.

Cabildo Menor Zenú de Puerto Viejo

El 29 de octubre de 2021 se notifica que el Cabildo Menor Zenú de Puerto Viejo, instauraron una acción de Tutela con el fin de que en orden a lo establecido en el artículo 86 de la constitución política, que se les sean protegidos sus derechos fundamentales a la consulta previa, en razón a la construcción de la vía nueva variante Coveñas de la UFI 7-2.

En el mes de noviembre de 2021, surge como novedad la DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA del Juzgado Tercero Penal de Sincelejo:

"PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo de los derechos fundamentales a la consulta previa invocado por el Cabildo Menor Indígena Zenú de Puerto Viejo – Municipio de Santiago de Tolú, Sucre, por intermedio de su representante legal, señor Juan Carlos García de León, contra la Agencia Nacional de Infraestructura ANI - Ministerio del Interior - Concesionario "RUTA AL MAR" - Agencia Nacional de Licencias Ambientales, y Corporación Autónoma Regional de Sucre "CARSUCRE",, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la providencia.

Finalmente, en el mes de enero 2022, el Concesionario informa que el día 26 de abril se recibió notificación del tribunal de Sincelejo (fallo en segunda instancia) en el cual

se ratifica el fallo en primera instancia negando el derecho a la consulta previa para dicha comunidad.

Comunidad afro BENKOS BIOHO.

El 10 de marzo 2022, el JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO, Sincelejo (Sucre), notificó que el señor MARCELINO CONEO SEVILLA, quien actúa en calidad de Presidente del CONSEJO COMUNITARIO AFROCOLOMBIANO BENKOS BIOHO, instauraron acción de tutela en contra del PROYECTO DE LA VARIANTE COVEÑAS PLANIFICADO Y EJECUTADO POR LA CONCESIÓN VÍA AL MAR S.A.S, CONSTRUCCIONES EL CONDOR, MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE, MUNICIPIO DE PALMITOS, SUCRE, MUNICIPIO DE TOLÚ, SUCRE, DEPARTAMENTO DE SUCRE, MINISTERIO DEL INTERIOR, CARSUCRE y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, por la presunta violación de sus derechos fundamentales a la consulta previa, al consentimiento previo libre e informado, a la participación, a la igualdad y al debido proceso.

El día 11 de marzo de 2022 mediante oficio UFI 8.3.CI.023/AB9164/22/5.3, se dio respuesta a la Solicitud de la ANI, de pronunciamiento hechos y pretensiones de la acción de tutela interpuesta por la comunidad BENKOS BIOHO.

El 27 de marzo de 2022 se notificó fallo en primera instancia negando por improcedencia el requerimiento de realizar la consulta previa para dicha comunidad.

En el mes de abril de 2022 el Concesionario informa mediante el comité N° 73, que el fallo en primera instancia fue impugnado y se está a la espera del fallo en segunda instancia.

En el mes de mayo de 2022 el Concesionario informa mediante el comité N° 74 se notificó fallo en segunda instancia negando por improcedencia el requerimiento de realizar la consulta previa para dicha comunidad.

Consejo Comunidades Negras del Porvenir CONCONEPOR.

El 24 de marzo 2022, El Juzgado Penal del Circuito de Lorica, Córdoba, notificó, acción de tutela promovido por el señor ABEL OLIVA LOBO, mayor de edad, domiciliado en el corregimiento del Porvenir- San Antero e identificado con cédula de ciudadanía número 92.551.727 de Corozal-Sucre, actuando en calidad de

representante legal del consejo comunitario de la comunidad negra del corregimiento el Porvenir “CONCONEPOR”, contra la Concesión Ruta AL Mar SAS-, ministerio del Interior Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa “DANCP”, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales “ANLA”, Agencia Nacional de Infraestructura “ANI”, Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y de San Jorge “CVS” y Construcciones el CONDOR S.A, en virtud de la ejecución del Proyecto: “Construcción de la Variante de Coveñas”, localizado en jurisdicción de los Municipios San Antero en el Departamento de Córdoba, y Coveñas, Palmito y Santiago de Tolú en el Departamento de Sucre y del Proyecto “Construcción, Rehabilitación, Operación y Mantenimiento del Sistema Vial para la Conexión de los Departamentos de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar, representados por quienes hagan sus veces, con el objeto de que se protejan derechos Constitucionales fundamentales y de tipo colectivos amenazados y vulnerados: a la Consulta Previa, de igualdad, de Participación, a la autonomía, a la autodeterminación de los pueblos, y a la diversidad étnica y cultural: por la existencia, autonomía, integridad e identidad cultural y social, usos; y subsidiariamente como mecanismos adecuado y eficaz por estrecha relación con el derecho o interés de tipo colectivo al Goce al Medio Ambiente, a la protección territorial.

El día 25 de marzo 2022 mediante oficio CI.023/AB9229/22/5.3 se dio respuesta a la Solicitud de la ANI, de pronunciamiento hechos y pretensiones acción de tutela CONCONEPOR.

En el mes de abril de 2022 el Concesionario informa mediante el comité N° 73 se notificó fallo en primera instancia negando por improcedencia el requerimiento de realizar la consulta previa para dicha comunidad, sin embargo, este fallo fue impugnado y se está a la espera del fallo en segunda instancia.

En el mes de mayo de 2022 el Concesionario informa mediante el comité N° 74 se notificó fallo en segunda instancia negando por improcedencia el requerimiento de realizar la consulta previa para dicha comunidad.

TUTELAS UFI 8.3

COMUNIDAD AFROPAL.

El 29 de marzo 2022, el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes de Sincelejo notifica, Acción de tutela de primera instancia, interpuesta por NELSON JULIO SANMARTIN, identificado con la cédula de ciudadanía número 73.120.767,

como representante legal de la COMUNIDAD DEL CONSEJO COMUNITARIO DE NEGRITUDES DE PALO ALTO GUAYABAL - AFROPAL DEL CORREGIMIENTO DE PALO ALTO DEL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE, SUCRE, contra el MINISTERIO DEL INTERIOR - Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA, AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – ANI, CONCESIÓN RUTA AL MAR S.A.S (Nit.900894996 -0), CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA. (Nit. 890922447-4), MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE y CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SUCRE – CARSUCRE, por la violación de las garantías fundamentales a la consulta previa, la diversidad étnica y cultural, la igualdad, la participación y el debido proceso.

El día 31 de marzo de 2022 mediante oficio CI.023/AB9261/22/5.3, se dio respuesta a la Solicitud de la ANI, de pronunciamiento hechos y pretensiones de la acción de tutela interpuesta por la comunidad AFROPAL. UFI 8.3.

En el mes de abril de 2022 el Concesionario informa mediante el comité N° 73 se notificó fallo en primera instancia negando por improcedencia el requerimiento de realizar la consulta previa para dicha comunidad, sin embargo, este fallo fue impugnado y se está a la espera del fallo en segunda instancia.

En el mes de mayo de 2022 el Concesionario informa mediante el comité N° 74 se notificó fallo en segunda instancia negando por improcedencia el requerimiento de realizar la consulta previa para dicha comunidad.

El día 26 de octubre de 2022 surge como novedad, el JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO (SUCRE) admitió la acción de tutela interpuesta por la COMUNIDAD DEL CONSEJO COMUNITARIO DE NEGRITUDES DE PALO ALTO GUAYABAL - AFROPAL DEL CORREGIMIENTO DE PALO ALTO DEL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE (SUCRE) en contra de la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, el Ministerio del Interior - Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y otros, por la posible vulneración de los derechos fundamentales a la consulta previa, debido proceso, participación, igualdad y reconocimiento y protección a la diversidad étnica.

En el mes de diciembre de 2022 se conoció pronunciamiento del juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo, sobre acción de tutela interpuesta por la Comunidad del Consejo Comunitario de negritudes de Palo Alto Guayabal - AFROPAL del

Corregimiento de Palo Alto del Municipio de San Onofre (Sucre) el 26 de octubre 2022:

"PRIMERO: NEGAR la tutela invocada por la COMUNIDAD DEL CONSEJO COMUNITARIO DE NEGRITUDES DE PALO ALTO GUAYABAL - AFROPAL DEL CORREGIMIENTO DE PALO ALTO DEL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE, SUCRE, contra del MINISTERIO DE INTERIOR Y JUSTICIA - AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, ANI - CONCESIÓN RUTA AL MAR S.A.S - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SUCRE, CARSUCRE, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia."

La sentencia de primera instancia fue impugnada, aún no se resuelve la segunda instancia.

COMUNIDAD CONCEJO COMUNITARIO MA-MAJARI DEL NISPERO DE ANGOLA

El 02 de diciembre de 2022 surge como novedad la acción de tutela interpuesta por DANIEL EDUARDO FLOREZ MUÑOZ como apoderado judicial del CONSEJO COMUNITARIO MA-MAJARI DEL NISPERO DE ANGOLA, en contra de la MINISTERIO DEL INTERIOR, DIRECCION DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE CONSULTA PREVIA, AGENCIA NACIONAL DE MINERIA-ANM-, CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A, CONCESION VIAL RUTA AL MAR S.A.S, CANTERA MUCACAL., por la presunta vulneración al DERECHO FUNDAMENTAL DE CONSULTA PREVIA, AMBIENTE SANO Y VIDA DIGNA.

6.7. SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL DE LAS LICENCIAS AMBIENTALES EN FASE DE CONSTRUCCIÓN.

Cabe aclarar que, la información reportada a continuación corresponde a antecedentes de la Interventoría pasada, igualmente, a los reportes emitidos por el Concesionario, en este sentido la información se deja con fines de la trazabilidad.

En esta sección, se presentan los avances reportados por la Concesión en cumplimiento a la gestión socioambiental, para la fase constructiva de la UFI 7, subsector 2 Variante Coveñas y subsector 3 Perimetral Aeropuerto de Tolú. Lo

anterior, teniendo en cuenta lo establecido en los anexos técnico ambiental N° 6 y social N° 8.

En lo concerniente al subsector 1 de la UFI 7 Variante Lorica, la información se detalla en el siguiente numeral del informe mensual de Interventoría - Matriz de Puntos Críticos, debido a que el trámite actualmente cursa una medida judicial, que incide en los trámites ambientales que se adelantan ante la Corporación CVS, imposibilitando de este modo la obtención de Licencia Ambiental y por ende su construcción.

A continuación, se presenta la trazabilidad en la gestión social y ambiental en las UF 7.2 y 7.3:

Tabla 6-31 Seguimiento Licencias fase construcción UF 7.2 Variante Coveñas y 7.3 Perimetral Aeropuerto de Tolú

Resolución N° 1317 del 27 de julio de 2021. Expedición de Licencia Ambiental UF 7.2	Radicado de referencia	Estado	Resolución N° 1243 del 15 de julio de 2021. Modificación de Licencia Ambiental UF 7.3	Radicado de referencia	Estado
Socialización Licencia Ambiental e Inicio de Obras					
Convocatoria para la reunión socialización de Inicio de obras **con administraciones municipales**	48-147-20210804019954 del 4 de agosto 2021	**Cumplido** 19 y 20 de agosto 2021	Convocatoria para la reunión socialización de Inicio de obras administraciones locales, JAC El Palmar e Isla Gallinazo	48-147-20210727019763 del 27 de julio de 2021	**Cumplido** 5 y 6 de agosto 2021
Convocatoria para la reunión socialización de Inicio de obras **con comunidades**	48-147-20210809020013 del 9 de agosto de 2021	**Cumplido** 23 - 27 de agosto 2021	La Concesión presentó ante la ANLA los soportes de las socializaciones de inicio.	48-147-20210817020113 del 17 de agosto de 2021	**Cumplido** 19 – 27 de agosto 2021
Remisión de actas de socialización licencia ambiental					
La Concesión presentó ante la ANLA las actas y registro de las socializaciones con las diferentes comunidad e instituciones	48-147-20210917020499 del 17 de septiembre de 2021	**Cumplido**			
Remisión Licencia Ambiental Entes Territoriales y Comunidades					
Remisión Licencia Ambiental Consejo comunitario Barulé	48-147-20210729019825 del 29 de julio de 2021	**Cumplido**	Remisión Licencia Ambiental Aeronáutica Civil	48-147-20210719019674 del 19 de julio de 2021	**Cumplido**
Remisión Licencia Ambiental Consejo comunitario Humberto Hernández	48-147-20210729019826 del 29 de julio de 2021	**Cumplido**	Remisión Licencia Ambiental Gobernación de Sucre	48-147-20210719019667 del 19 de julio de 2021	**Cumplido**

Resolución N° 1317 del 27 de julio de 2021. Expedición de Licencia Ambiental UF 7.2	Radicado de referencia	Estado	Resolución N° 1243 del 15 de julio de 2021. Modificación de Licencia Ambiental UF 7.3	Radicado de referencia	Estado
Remisión Licencia Ambiental Cabildo indígena El Porvenir	48-147-48-147-20210729019827 del 29 de julio de 2021	**Cumplido**	Remisión Licencia Ambiental Alcaldía Santiago de Tolú	48-147-20210719019663 del 19 de julio de 2021	**Cumplido**
Remisión Licencia Ambiental Cabildo indígena Bellavista	48-147-20210729019828 del 29 de julio de 2021	**Cumplido**	Remisión Licencia Ambiental Alcaldía San Onofre	48-147-20210719019664 del 19 de julio de 2021	**Cumplido**
Remisión Licencia Ambiental Gobernación de Sucre	48-147-20210802019872 de 2 de agosto de 2021	**Cumplido**	Remisión Licencia Ambiental Cabildo El Palmar	48-147-20210721019692 del 21 de julio de 2021	**Cumplido**
Remisión Licencia Ambiental Alcaldía Coveñas	48-147-20210728019815 del 28 de julio de 2021	**Cumplido**	Remisión Licencia Ambiental cabildo Isla Gallinazo Remisión Licencia Ambiental	48-147-20210721019690 del 21 de julio de 2021	**Cumplido**
Remisión Licencia Ambiental Alcaldía de Tolú	48-147-20210802019868 del 2 de agosto de 2021	**Cumplido**	Procuraduría Agraria y de Asuntos Ambientales Sucre	48-147-20210719019665 del 19 de julio de 2021 **Alcance:** 48-147-20210817020102 del 17 de agosto de 2021	**Cumplido**
Remisión Licencia Ambiental Alcaldía Palmito – Sucre	48-147-20210728019816 del 28 de julio de 2021	**Cumplido**	----------	N/A	
Remisión Licencia Ambiental Gobernación de Córdoba	48-147-20210802019871 del 2 de agosto de 2021	**Cumplido**	----------	N/A	
Remisión Licencia Ambiental Corporación CVS	48-147-20210802019870 del 2 de agosto de 2021	**Cumplido**	---------- -	N/A	
Remisión Licencia Ambiental Corporación CARSUCRE	48-147-20210802019869 del 2 de agosto de 2021	**Cumplido**	---------- -	N/A	
Procuraduría Agraria y de Asuntos Ambientales Córdoba	48-147-20210817020103 del 17 de agosto de 2021	**Cumplido**	---------- -	N/A	

Resolución N° 1317 del 27 de julio de 2021. Expedición de Licencia Ambiental UF 7.2	Radicado de referencia	Estado	Resolución N° 1243 del 15 de julio de 2021. Modificación de Licencia Ambiental UF 7.3	Radicado de referencia	Estado
Uso de vías de Apoyo para la construcción de las Unidades Funcionales Licenciadas					
Trámite de cambio menor, según Decreto 1076 del 2015. uso de vías existentes para acceso al proyecto.	48-147-20210907020362 07 de septiembre de 2021	**Cumplido**	N/A	N/A	N/A
			Diseños, localización y planos de las cunetas a implementar		
			La Concesión informó a la ANLA que, de acuerdo con el Diseño Geométrico y la topografía del terreno existente, la conformación y construcción de la vía de la Variante Aeropuerto de Tolú se hará en terraplén, con lo cual en el Diseño Hidráulico **no se determinó la necesidad de implementar cunetas**	48-147-20210810020024 del 10 de agosto de 2021	**Cumplido Artículo 2, Numeral 1.2.2**
			Entrega plan de compensaciones epifitas.		
			La Concesión presentó ante la ANLA el documento plan de rehabilitación ecológica en 1 ha, ubicado en el predio Santa Ángela, corregimiento Nueva Era, municipio Santiago de Tolú	48-147-20210810020029 del 10 de agosto de 2021	**Cumplido Articulo 17**
			Traslado unidades sociales		
			La Concesión informó a la ANLA que la modificación de la licencia NO implica el traslado de unidades sociales	48-147-20210810020028 del 10 de agosto de 2021	**Cumplido Artículo 9, numeral 3**
			Perfiles de flujo aguas arriba y aguas abajo de las estructuras hidráulicas aprobadas		
			La Concesión presentó ante la ANLA los planes con los perfiles de flujo hidráulicos	48-147-20210810020025 del 10 de agosto de 2021	**Cumplido Articulo 7**
			Análisis de aguas subterráneas en el sector del brazo del arroyo Pechilín PR 3+950		
N/A	**N/A**	**N/A**	La Concesión presentó ante la ANLA una Nota técnica en la que explica que hubo un error al utilizar el término NACEDERO	48-147-20210817020099 del 17 de agosto de 2021	**Cumplido Articulo 19 Numeral 2**
			Aforos de movilidad y propuesta de pasos peatonales para las comunidades étnicas Isla Gallinazo y el Palmar		
			La Concesión ajustó y presentó ante la ANLA la ficha de manejo CVT-3.9 manejo de la infraestructura social del medio socioeconómico: infraestructura de servicios	48-147-20210824020175 del 24 de agosto de 2021	**Articulo 19 Numeral 4**

Resolución N° 1317 del 27 de julio de 2021. Expedición de Licencia Ambiental UF 7.2	Radicado de referencia	Estado	Resolución N° 1243 del 15 de julio de 2021. Modificación de Licencia Ambiental UF 7.3	Radicado de referencia	Estado
			públicos y accesos a predios privados		
			La Concesión presentó ante la ANLA una nota técnica cuyos resultados indican que la solución a la movilidad peatonal es un paso a nivel con su respectiva señalización. Incluir la fecha y resultado de los aforos realizados por la Concesión, con participación de la comunidad	48-147-2021082402 0179 del 24 de agosto de 2021	**Articulo 9 Numeral 5**
			Análisis fitosanitario de los dos (2) individuos de Campano ubicados en los PR3+120 y PR3+240		
N/A	**N/A**	**N/A**	La Concesión presentó ante la ANLA los resultados de la evaluación en los dos individuos de Campano, concluyendo que, por su edad y condición física, la probabilidad de supervivencia en los casos que se trasladen sería baja. En este sentido, se hizo un ajuste de alineamiento geométrico en el diseño, dentro del área del derecho de vía.	48-147-2021082502 0192 del 25 de agosto de 2021	**Articulo 6 Numeral 23 y 24**
			Ajustes a los PMA y PMS de la Licencia Ambiental		
			La Concesión presentó ante la ANLA los ajustes a los programas del Plan de Manejo Ambiental - PMA y Plan de Seguimiento y Monitoreo - PSM	48-147-2021090202 0304 del 2 de septiembre de 2021	**Articulo 8 y 10**

6.8. MATRIZ DE PUNTOS CRÍTICOS

La matriz tiene por objeto el tener conocimiento sobre las situaciones críticas que se presentan y las que se pueden presentar en el desarrollo del proyecto para preveer con anticipación la manera de mitigar los impactos que se generan en el proyecto.

Tabla 6-32 Matriz Puntos Críticos

UF	Punto critico	Trazabilidad
5.1	Emergencia invernal presentada en el Departamento de Córdoba	Entre el 1 y el 6 de febrero de 2026, se presentó en la región caribe colombiana un evento hidrometeorológico atípico, asociado a un frente frio, ocasionando inundaciones en el Departamento de Córdoba por el desbordamiento de los ríos y ciénaga.
	Afectación a la Estructura del Puente Trementino II (ubicado en el PR 19+340 de la Ruta 7401, vía Montería - Puerto Rey, UF 5.1).	El día 7 de febrero de 2026, se realizó visita de obra para verificar la estructura vial de acuerdo con la emergencia que se generó en el Puente Trementino II (ubicado en el PR 19+340 de la Ruta 7401, vía Montería - Puerto Rey, UF 5.1) con el objetivo prevenir cualquier evento que comprometa la seguridad en el corredor vial.
		El día 2 de marzo de 2026, se presentó un bloqueo en el Peaje Los Cedros, por parte del gremio de transportadores, comerciantes, comunidad de los córdobas y arboletes. * Solicitaban el No cobro del peaje de los cedros o implementación de mecanismos de solución. *Se llego a acuerdos con los lideres, reunión de seguimiento al avance de obra los martes a las 9 de a.m. *El Concesionario está realizando un paso provisional peatonal *A la vez están ejecutando obras para un paso provisional vehicular. *Además, se están realizando estudios para evaluar la afectación de la infraestructura del puente Trementino II
		*El día 26 de marzo de 2026 se dio la apertura al paso vehicular provisional

Fuente: Elaboración Propia Social IPAB

Aunque, el Concesionario ha restablecido el paso vehicular provisional desde el día 26 de marzo de 2026, se tiene que hay una afectación a la Estructura del Puente Trementino II (ubicado en el PR 19+340 de la Ruta 7401, vía Montería - Puerto Rey, UF 5.1), el cual se contempla la ejecución de una obra nueva, teniendo en cuenta los estudios realizados por el Concesionario

Los días 22 y 23 de julio 2026, se llevaron a cabo las socializaciones del inicio de obras del puente Trementino.

En el periodo del mes de septiembre de 2026 no se tienen novedades, conviene señalar que para este mes continuaron las actividades de obras en el puente Trementino de la Unidad Funcional 5.1, programadas por el Concesionario.

Cabe aclarar que, la información reportada a continuación corresponde a informes de la Interventoría pasada, igualmente, a los reportes emitidos por el Concesionario, en este sentido la información se deja con fines de la trazabilidad.

En la siguiente tabla se detalla el Perfil Básico de Conflictos Sociales – Resolución de conflictos enviado por la Agencia Nacional de Infraestructura para su diligenciamiento. Finalmente, se presenta el reporte de bloqueos del mes, por razones asociadas al desarrollo del proyecto.

Tabla 6-33 Matriz Puntos Críticos

UF	Punto critico	Trazabilidad
1	Inconformidad con la operación del Peaje Manguitos en el PR 52+200 (Plaza Bonita) debido a que se afectan las comunidades usuarias de la vía, (canasta familiar, salud, educación, comercio y transporte entre otros).	En 2016 Se socializó inicialmente la construcción y operación del peaje Manguitos en el PR 60+700, luego se planteó en el PR 55+400 y finalmente se decidió después de realizar los estudios técnicos que se ubicaría en el PR52+200 El ministerio de transporte expidió la resolución 2820 del 11 de julio de 2016 a través de la cual se definió el PR de operación de la estación de peaje 52+200 y se estableció TED para las categorías 1E, 6E y 7E, con lo cual se superó el punto crítico identificado. El 26 de junio de 2019 la ANI, Concesión e Interventoría realizó reunión en el Municipio de Planeta Rica con el objetivo de atender nuevas inquietudes de la comunidad y gremios de transportes usuarios del Peaje Manguitos; en donde los participantes plantearon lo siguiente: Tarifa diferencial $200 para públicos y particulares de Planeta Rica Tarifa diferencial por el tiempo del proyecto Disminuir de 20 a 5 el número de pasos Incluir la categoría 2 e ingresar nuevos vehículos No pago de peaje purgatorio a los vehículos que pasen por Manguitos Modificar resolución 2820 de 2016 el requisito de la licencia de conducción en la solicitud de tarifa El 22 de agosto de 2019 se realizó de trabajo y se le propuso a los gremios y comunidad un esquema tarifario, sin embargo, este no fue aprobado, los gremios propusieron lo siguiente: Unificar las tarifas diferenciales al 60% para los peajes de Cedros, Purgatorio, Manguitos y Mata de caña. En Respuesta la ANI accede a su requerimiento y acuerda que la resolución será modificada, pero debe generarse un compromiso pacifico frente el desarrollo de las obras de construcción del peaje, al tiempo que se entienda que no es posible otorgar tarifa simbólica de $200 Dentro de los puntos por revisar quedó: El Concesionario y la ANI revisaran el traslado del peaje de Plaza Bonita a Nueva Estación, así mismo, se estudiaría las TD de particulares Categoría 1 para Planeta Rica, Buena Vista y Nueva Estación, para disminuir el valor de la propuesta. El 27 de noviembre de 2019 se fijó en la página de la ANI la resolución “Por la cual se establecen unas tarifas diferenciales en las estaciones de peaje Los Manguitos, Purgatorio, Cedros y Mata de Caña del proyecto de asociación público-privada de iniciativa privada para la conexión de los departamentos de Antioquía, Córdoba, Sucre y Bolívar, se modifican las Resoluciones No. 000111 de 2018 y No. 1385 de 2019” la cual estará por 5 días hábiles disponible para que los interesados realicen sus observaciones (hasta el 5 de diciembre de 2019) El 14 de febrero de 2020 el ministerio de transporte emitió la resolución 0288 a través de la cual se mantiene la ubicación de la estación de peajes Manguitos (52+200) y se definen tarifas para las categorías 1E, 2E,3E y 4E, así como el número de cupos El 26 de febrero de 2020 el ministerio de transporte emitió la resolución 0410 de 2020 a través de la cual se establecen tarifas diferenciales, cupos y pasos para vehículos del servicio de transporte público en las estaciones de peaje Manguitos, Purgatorio, Cedros y Mata de Caña. La medida fue bien recibida por parte del gremio de transportadores. El 26 de abril de 2020 se inició la construcción del peaje, el cual avanzó de acuerdo al plan de obras. El 10 de junio 2021 se realizó reunión extraordinaria para resolver las inquietudes de la comunidad indígena–- Plaza Bonita, quienes manifiestan se les debió realizar Consulta Previa para el desarrollo de las obras constructivas, especialmente la del Peaje Manguitos, ya que el mismo le genera

UF	Punto critico	Trazabilidad
		afectaciones socioeconómicas; de otra parte, solicitaron alumbrado público. Frente esto, la Concesión generó las respectivas aclaraciones en cuanto a la improcedencia de la solicitud de Consulta Previa para el mejoramiento vial, y, por parte del secretario de gobierno del Municipio de Planeta Rica, se generó el compromiso de realizar las gestiones ante el acalde del citado municipio, con el objetivo de resolver la problemática del espacio público; del mismo modo, la Concesión expresó disponibilidad para realizar acciones conjuntas. En enero de 2022, el Concesionario informa sobre los acuerdos que se han venido realizando con la comunidad el Rosario de Plaza Bonita para continuar proceso de energización de peaje Manguitos. El 27 de enero se realizó reunión con dicha comunidad y la alcaldía de Planeta Rica con el fin de lograr acuerdos que permitan continuar con actividades en el peaje. En el mes de febrero de 2022 el Concesionario en el Comité mensual N° 71 el Concesionario informa que ya se lograron acuerdos con la comunidad de Plaza Bonita y ya se tiene contratado al personal que realizara el proceso de energización. En el mes de marzo, Concesionario informa en el comité N° 72, que ya se lograron acuerdos con la comunidad y se tiene contratado al personal que realizara el proceso de energización, además, conforme a los acuerdos con la comunidad, contratista del Concesionario inicia actividades de iluminación el día martes 5 de abril y posteriormente se desarrollaran actividades de energización del peaje los manguitos. En el mes de mayo 2022, se adelantaron actividades de energización previstas en el peaje y se dio cumplimiento a acuerdos con la comunidad, con dichos acuerdos se superó el punto crítico.

UF	Punto critico	Trazabilidad
2	El 29 de abril de 2020 el juzgado veintiséis de familia Bogotá D.C emitió el fallo de tutela en primera instancia N° 026-2020-00163-01, interpuesto a la Concesión, al Ministerio Del Interior, a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS). Los accionante de la tutela (Miguel Negrete e Iván Negrete), solicitan se les ampare el derecho a la Consulta Previa y	El 13 de mayo de 2020, el mismo juzgado, decide en primera instancia amparar el derecho de consulta previa, al tiempo que solicita a la Concesión suspender las obras de la UF 2. El 14 de mayo de 2020 el Ministerio del Interior a través del EXTMI2020-16862 impugnó el fallo en primera instancia de la Tutela 2020-00163 del 29 de abril de 2020, solicitando se revoque la primera instancia. Con la anterior impugnación, se dio traslado a la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá. El 19 de mayo de 2020 La ANI solicitó al juez negar la peticiones del accionante, mientras que la Concesión solicitó REVOCAR el fallo de primera instancia proferido por el Juzgado Veintiséis de Bogotá D.C., y en su lugar declarar IMPROCEDENTE el trámite de tutela iniciado y, o, en su defecto, se sirva negar las pretensiones de la Acción de Tutela incoada y absolver de todo cargo a la CONCESIÓN RUTA AL MAR S.A.S., teniendo en cuenta que la presunta vulneración a los derechos reclamados no es cierta ni exigible, debido a que el proyecto objeto de discusión, no es de aquellos por los cuales sea viable la realización de Consulta Previa El 1 de junio de 2020 el tribunal superior del distrito judicial de Bogotá revocó el fallo en el cual los 15 cabildos indígenas que solicitaban Consulta Previa, lo cual fue notificado y de conocimiento, en este sentido, desde la citada fecha, la UF 2 está liberada por hechos atribuibles a la tutela 026 - 2020-00163-01 La Concesión mediante comunicado N° 48-147-20200604014346 del 4 de junio de 2020 notificó el impedimento para el cumplimiento del Plan de Obras conforme la Sección 4.8 (a) de la Parte General, en relación con la UF 2, Segunda Calzada Cereté - Lorica., por fallo de acción de tutela radicado 2020 – 00163, proferido por el Juzgado Veintiséis de Familia de Bogotá D.C La ANI mediante Radicado No 20203110166031 del 11 de junio de 2020 solicitó a la Interventoría concepto sobre la Ampliación del plazo al Plan de Obras debido al Fallo de Acción de Tutela en la UF2 con radicado ANI No. 20204090487362 del 04 de junio de 2020. La Interventoría mediante comunicación CI.023/AB5994/20/5.3 del 18 de junio de 2020 (radicado ANI No. 2020-409053979-2 del 18 de junio de 2020) emitió concepto en donde considera que no

UF	Punto critico	Trazabilidad
	como medida cautelar suspender las obras de la UF 2 y 6.1	sería procedente una ampliación del plazo al plan de obras, ni el reconocimiento de un evento eximente de responsabilidad ya que carecen de sustento fáctico para otorgarlas. El 7 de julio de 2020, Iván Negrete Yánez, interpuso ante la Corte Suprema de Justicia, una acción de tutela contra providencia judicial - fallo de tutela 026-2020-00163-01, proferido por la sala de familia del tribunal superior de Bogotá. En este sentido, solicita a la CSJ la revisión del citado fallo. El 23 de agosto de 2021 La Corte Suprema de Justicia – CSJ – mediante radicado 11001020300020210302100 admitió en primera instancia la revisión de la acción de Tutela contra Providencia Judicial - Fallo de Tutela 026-2020-00163-01, proferido por La Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá. El 3 de septiembre de 2021, los accionantes - Autoridades Indígenas Zenúes, solicitaron mediante correo electrónico la impugnación en contra de la sentencia STC11289- 2021 del 1º de septiembre. El 6 de septiembre de 2021, La CSJ mediante radicado N°. 11001-02-03-000-2021-03021-00 concedió la impugnación solicitada por los accionantes - Autoridades Indígenas Zenúes, por lo tanto, se está a la espera de la decisión del superior jerárquico sobre el particular.

UF	Punto critico	Trazabilidad
2	Minga Indígena Km 20+900 Corregimiento Carrillo, en jurisdicción de San Pelayo, correspondiente a la Unidad Funcional Integral 2, Segunda Calzada Cereté-Lorica.	**15 de junio de 2023**, se presentó un bloqueo con retención de maquinaria, el cual inició a las 7:55 a.m. en el Km 20+900 Corregimiento Carrillo, en jurisdicción de San Pelayo, correspondiente a la Unidad Funcional Integral 2, Segunda Calzada Cereté-Lorica, por parte de integrantes de la Minga de comunidades indígenas, quienes, a través de carteles que instalaron en la maquinaria retenida, exigen el derecho a la Consulta Previa, reteniendo la maquinaria que se encontraba en la obra y aludiendo afectaciones en sus territorios y solicitando una mesa de trabajo y la presencia del Mininterior, La Concesión Ruta al Mar y la ANI. Este mismo día en Concesionario mediante los radicados: **48 RUTADCTOELECTRONICOS-20230615001445** **48-RUTADCTOELECTRONICOS-20230615001443** **48-RUTADCTOELECTRONICOS-20230615001444** Puso en conocimiento de la situación presentada a la Alcaldía Municipal de San Pelayo, a la Policía Nacional y a la Gobernación de Córdoba respectivamente. **16 de junio de 2023**, la concesión Ruta al Mar mediante boletín de prensa informó a la opinión pública frente al bloqueo con retención de maquinaria realizado por la minga Indígena en el Km 20+900 Corregimiento Carrillo y que la concesión rechaza las vías de hecho tomadas por la minga reteniendo los equipos de propiedad privada. Este mismo día, en horas de la tarde se llevó a cabo por parte de la minga la retención de un trabajador Operario de maquinaria de Construcciones el Condor, el cual fue sometido al Cepo por parte de los manifestantes. **17 de junio de 2023**, se llevó a cabo una reunión con el alcalde de San Pelayo Harving Espitia, secretario de Gobierno, secretario de Planeación, Policía Nacional y representante de Construcciones El Condor, con el fin de liberar la maquinaria, el alcalde se reunió con 2 de los representantes de la minga para llegar a un acuerdo y poder liberar la maquinaria de forma voluntaria, sin embargo, estos fueron a llevar el mensaje a sitio donde se encontraba el bloqueo y no se concertó la entrega voluntaria de dicha maquinaria, por lo que fue necesario utilizar el ESMAD, la maquinaria fue recuperada en horas de la noche el sábado 17 de junio de 2023. Asimismo, en este mismo espacio, se concertó vía telefónica, una reunión en atención a la minga Indígena con el supervisor social ANI José Calume para el día viernes 23 de junio de 2023.

UF	Punto critico	Trazabilidad
		El día 21 de junio de 2023, esta Interventoría acompañó una mesa de diálogo con las comunidades indígenas que se han declarado en Minga Permanente conviene señalar que la Interventoría CR no estaba convocada por el Ministerio, asistimos por solicitud de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI. **Demas asistentes:** Delegado de la alcaldía del municipio de san Pelayo Personería Fiscalía Defensoría del Pueblo Concesionario Ruta Al Mar EPC área predial Representantes de las comunidades indígenas, representantes de la minga y su asesora jurídico. El doctor Alexander Izasa del ministerio del interior, aclaró que se llevarán dos espacios en la mesa de diálogo el **primer espacio** para tratar las denuncias públicas efectuadas a la minga y un **segundo espacio** para tratar el tema de la procedencia de la consulta previas para las comunidades que están en minga, asimismo, hacer la indagación sobre el predio del señor Édison Pérez Argumedo quien alude que en dicho predio es territorio ancestral indígena. Con relación al **primer espacio** La asesora Meylin, manifestó que existía una denuncia pública contra los participantes de la Minga, además, en los diarios había noticias que afectaban la integridad de los cabildantes y su exigencia era que el Concesionario se retractara y aclarara los hechos sobre la Minga ante la información dada a los medios, asimismo, la asesora Meylin solicito, que se diera a conocer el nombre de quien realizo la denuncia en contra de los cabildante, en el transcurso de la mesa de diálogo el ministerio del interior pudo averiguar que si existe una demanda interpuesta por construcciones el Condor, por lo que la asesora de la Minga Meilyn Agamez, exigió a la representante de la Fiscalía recibir en ese espacio la denuncia de injuria y calumnia en contra de la Alcaldía, concesión Ruta el Mar, Construcciones el Condor y periódico la Razón a lo cual la funcionaria de la fiscalía anuncio cual eran los canales para interponer la denuncia. Ahora bien, teniendo en cuenta que, en la mesa de diálogo no se estaban brindando las garantías a los actores de las instituciones y el Concesionario, los representantes del Concesionario, contratista del Condor e Interventoría se levantar de la mesa, por lo tanto, se desconoce si se adelantó el segundo espacio. La Agencia Nacional de Infraestructura convoca a una mesa de trabajo el día 29 de junio 2023, sin embargo, la reunión fue aplazada para el día 06 de julio 2023, con el fin de atender a las comunidades de la Minga Indígena; ahora bien, dicha reunión convocada por la Agencia no se realizó debido a que el Ministerio del Interior mediante rad. 2023-2-002000-028924 Id.159194. desde el despacho viceministro para el Dialogo Social La Igualdad y Los Derechos Humanos, realizó convocatoria en atención a las comunidades de la Minga pluriétnica y social, en el marco de las acciones de hecho acontecidas en el corregimiento de Carrillo Municipio de San Pelayo-Córdoba, para el día 25 de Julio 2023. El día 25 de julio 2023, se llevó a cabo mesa de diálogo social convocada por el despacho para el Dialogo Social La Igualdad y Los Derechos Humanos del Ministerio del Interior, a la cual asistieron las siguientes Entidades: ● Delegados Oficina de asuntos étnicos ● Delegados de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI. ● Defensoría de Pueblo regional. ● Delegados Contraloría regional. ● Delegados de la Procuraduría. ● Delegados Fiscalía regional. ● Delegados de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA. ● Delegados de la Agencia Nacional de Tierras ANT. ● Delegados de la Gobernación de Córdoba. Además de los representantes de la Minga pluriétnica y social. ● Autoridades tradicionales indígenas de Colombia gobierno Mayor

UF	Punto critico	Trazabilidad
		● Organización Regional indígena del caribe ORICA ● Asociación de usuarios campesinos ANUC ● Sector Étnico AFRO En este espacio de dialogo las comunidades participantes de la minga dieron a conocer las inquietudes e inconformidades que tienen frente al proyecto APP 016 del 14 de octubre del 2015, que tiene como objeto la Construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento del sistema vial para la conexión de los departamentos Antioquia – Bolívar y el cual cuenta con una Unidad Funcional descrita como UF 2 en el tramo cerete-lorica, de la cual hace parte el corregimiento de Carrillo del Municipio de San Pelayo, en donde se encuentra ubicada la minga, aludiendo que la comunidad Indígena Cabildo Carrillo y otras 15 comunidades étnicas a lo largo del tramo Cerete-Lorica tienen el derecho a la Consulta previa, así mismo el gremio Campesino y las comunidades Afros del sector insinúan que han sido afectados por el paso de proyecto, así mismo se concluye que se convocara a una próxima mesa de trabajo, a la cual asistan funcionarios con poder de decisión que permitan avanzar en el dialogo, hasta la fecha de este informe no se ha establecido la fecha para esta. El 16 de agosto de 2023, se estaría realizando la entrega anticipada del predio CAB-2-1-067, la cual no se pudo realizar debido a que la Minga Pluri étnica Social se posesiono de este predio impidiendo que se llevara a cabo la diligencia judicial, aludiendo que existe un acta firmada en la mesa sostenida el 25 de julio 2023 en atención a la Minga, entre miembros de comunidades indígenas, campesinas y afro pertenecientes a la minga pluriétnica y social de San Pelayo, Ministerio del Interior, Agencia Nacional de Infraestructura, Gobernación de Córdoba, Agencia Nacional de Tierras, Fiscalía General de La Nación, ANLA, Defensoría del Pueblo y Contraloría General, adicionalmente afirman que en la mencionada reunión se solicitó entre otros, suspender todo lo concerniente a los procesos de expropiación. El día 31 de agosto 2023, se realizó un bloqueo a la altura del corregimiento de Carrillo por la Minga pluri étnica social, exigiendo que se establezca una mesa de diálogo en cabeza de la Vice ministra del dialogo social y el director de la Agencia Nacional, para dirimir la problemática presentada en el sector aludiendo “avalúos falsos que realizó la concesión Ruta al mar” en el lugar hizo presencia la autoridad local del Municipio de San Pelayo, sin embargo en horas de tarde con intervención de la policía fue desbloqueada la vía, aunque esta no está bloqueada la minga permanece en el sector. En el mes de septiembre de 2023, la concesión Ruta al mar dio a conocer mediante oficio Rad: 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20230925002485 del 27 de septiembre 2023, cuyo asunto es: Remisión de comunicación enviada por la Minga pluriétnica Social MIPES a los juzgados donde cursan los procesos de expropiación CAB-2-1-065, CAB-2-1-067, CAB-2-1-068, CAB-2-1-071, CAB-2-1-138, CAB-2-1-139, CAB-2-1-140, CAB-2-1-141, CAB-2-1-142, CAB- 2-1-143, CAB-2-1-145, CAB-2-1-188, CAB-2-1-224, CAB-2-1-233, en el cual la Minga informa a los despachos, que los procesos judiciales que se adelantan en contra de los propietarios de los predios que anteriormente se mencionan: “Se encuentran en una ruta especial de derechos humanos atendidas por el Ministerio del Interior, en dirección del Asuntos Indígenas Rom y Minorías, Viceministerio de Diálogo Social. Para constancia de la ruta de diálogo accionada sobre las violaciones de los derechos humanos de sujetos en especial estado de protección”. El día 31 del presente mes de mayo 2024, se conoció que la minga pluriétnica social, se reunió el PR 21+000 de la UFI 2, colocando vayas y pancartas alusivas a la inconformidad con el proyecto Antioquia Bolívar y la Concesión Ruta al Mar, con la pretensión de bloquear la vía en una manifestación pacífica, sin embargo, esta intención no se materializó, ya que en horas de la tarde se retiraron de la zona. El día 12 de junio 2024, mediante radicado 47-RUTADCTOELECTRONICOS 20240611008956, El Ministerio del Interior mediante La Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, Coordinación de Políticas, Dialogo Social y Participación, realizó Convocatoria en atención a las comunidades de la Minga pluriétnica y social, en la cual por solicitud de dicha minga, convoca los días 14 y 15 de junio 2024, a desarrollar un espacio dialéctico, participativo, articulador interinstitucional de instalación de rutas con atención y concertación de acuerdos, de nivel regional, local y nacional, adicionalmente adjunta una matriz realizada por la minga, la cual contiene los requerimientos que abarca la competencia de cada una de las entidades convocadas.

UF	Punto critico	Trazabilidad
		El día 14 de junio 2024, se establece el primer espacio convocado por Min interior en el Municipio de San Pelayo, dirigida por el delegado de la oficina de Políticas, Dialogo Social y Participación, en esta jornada se presentó las siguientes entidades convocadas, cabe resaltar que las pretensiones de la Minga MIPES estaban plasmados en una matriz que anexó el organizador de esta mesa de trabajo en las respectivas invitaciones a las diferentes entidades, a continuación las participantes del día 14 de junio de 2024: -Dirección Nacional de Diálogo social y -Registro -DANCP -Fiscalía -Ministerio de Agricultura -Ruta al mar -ICBF -PONAL San Pelayo -Gobierno Mayor -Personería San Pelayo **El día 15 de junio 2024**, los asistentes a la jornada se redujo, ya que, en la primera jornada del día anterior, se trataron los puntos correspondientes a cada entidad presente, a continuación, se relacionan los puntos correspondientes a la Concesión y a la ANI que estuvieron presentes en los temas tratados en dichas jornadas: 1. **Actuación de la debida diligencia por encontrar una comunidad indígena "cabildo de carrillo" en la ejecución del proyecto por parte de la empresa ANI en garantía del derecho fundamental a la consulta previa**. R/Concesión: La Concesión Ruta al Mar S.A.S, manifiesta que no realizará una nueva solicitud de procedencia de consulta previa a comunidades debido a que: - Previo al inicio del desarrollo del proyecto, solicitó al Ministerio de Interior la certificación de presencia de comunidades en el AID del proyecto para el caso de la vía Cereté - Lorica, y esta autoridad a través de diversos actos administrativos, informó que no se registraba presencia de comunidades en esta. - El Ministerio de Interior, a través del oficio 2023-2-002410-023566, en respuesta a una solicitud de las comunidades, concluyó: "Por lo tanto, este despacho se permite manifestar que no es procedente acceder a su petición puesto que se desprende que en las actuaciones desplegadas por esta autoridad no se identificaron posibles afectaciones directas, en el marco de ejecución de los proyectos mencionados anteriormente, sobre las comunidades objeto de la presente solicitud. De esta manera damos respuesta a su petición." - Que el CPACA en su artículo 93, prevé que las autoridades, con el cumplimiento de los requisitos en el establecidos, tienen la posibilidad de realizar la revocatoria directa de los actos administrativos por ellas emitidas. En ese orden, el Ministerio de Interior, en caso de considerar necesario revocar los actos administrativos previamente proferidos (certificaciones de presencia de comunidades) puede realizar la revocatoria directa de estas. R/ DANCP: Por parte de la DANCP manifiesta que tienen la voluntad de actuar en el marco de sus funciones para determinar o no la procedencia y oportunidad de la consulta previa en el marco del proyecto APP No 016 con la comunidad indígena de carrillo, para esto solicita a la empresa que allegue la debida diligencia por medio de un documento donde plasme las actividades del proyecto, situación específica de la comunidad, posibles impactos y sus apreciaciones sobre los mismos, de igual manera se le informa a la comunidad que pueden allegar las preguntas orientadoras para de esta manera poder convocar a visita de verificación. **2. 1. Se solicita la presencia de la ANI, RUTA AL MAR Y CONSTRCIONES EL CONDOR con el fin de revisar las condiciones actuales del tramo 7.3 Santiago de tolú y la rotonda. 2. El box culvert no es funcional debido a que no cumple eficientemente con el drenaje. 3. el estancamiento de aguas residuales favorece la aparición de vectores de enfermedades poniendo en riesgo la salud de los habitantes de la vereda. 4. instalación de las defensas metálicas, reductores de velocidad con sus respectivos reflectores y avisos de seguridad. 5. Instalación de alumbrado público desde la rotonda en el tramo Santiago de tolú, vereda el Palmar.**

UF	Punto critico	Trazabilidad
		R/Concesionario: visita al sitio con los especialistas para corregir las dificultades reportadas, para la fecha: 18 de junio del 2024 hora: 09:00am profesionales: 2 ingeniero civil con un especialista en obras hidráulicas, ingeniero de sistema. 3. **Realizar los avalúos comerciales de los terrenos y viviendas de los campesinos afectados por la construcción de la doble calzada, ejecutada por la concesión Ruta al Mar y ANI, de acuerdo con los lineamientos y bloque constitucional vigente.** R/ Concesionario: Ruta al Mar propone el desarrollo de una reunión el día 20 de junio de 2024, la cual estamos prestos a desarrollar de forma virtual o presencial. En esta reunión Ruta al Mar informará: 1. Quien hizo el mercado inmobiliario? 2. Nombre la Lonja que desarrolló el avalúo 3. La forma en la que se garantizó la publicidad, el debido proceso y el derecho de defensa en el marco del proceso judicial 4. Si existen posibilidades de promover terminaciones anormales de los procesos a través de los mecanismos contemplados en el código general del proceso? 5. Si existen posibles actuaciones para superar la resistencia de los propietarios de los predios con el proyecto? Esto será sobre los 12 predios informados por la representante de la comunidad. 4. **Realizar pago total de las construcciones y viviendas de los campesinos (ANUC 15 predios radicados con su respectiva nomenclatura) por las afectaciones a consecuencia de la construcción del proyecto APP 016-2015, ejecutado por la concesión Ruta al Mar y ANI, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la normatividad y bloque constitucional vigente.** R/ Concesionario: Este punto se tratará en la reunión del día 20 de junio del 2024. 5. **se concertó una visita de los 15 predios ANUC en compañía de los equipos predial y social de Ruta al mar - ANI. Fecha por concertar antes del 20 de junio del 2024:** R/ Concesionario: fecha por concertar antes del 20 de junio del 2024. 6. **Garantizar la compensación mínima de la vivienda de interés prioritarias para los campesinos (ANUC 15 predios radicados con su respectiva nomenclatura) de acuerdo con los lineamientos establecidos por la normatividad y bloque constitucional vigente.** R/ Concesionario: se realizará un recorrido con la comunidad para revisar predios 7. **Reconocer las indemnizaciones y/o compensaciones dejadas de reconocer a los campesinos afectad (ANUC 15 predios radicados con su respectiva nomenclatura) los por el proyecto de infraestructura de transporte desarrollado por la concesión ruta al mar y la ANI, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la normatividad y bloque constitucional vigente.** R/ Concesionario: fecha por concertar antes del 20 de junio del 2024. 8. **Al estado colombiano reconocer de acuerdo al artículo 90 de la constitución política en cabeza de ANI por afectaciones correspondientes al daño emergente y lucro cesante ocasionadas por la no disposición de los bienes de los campesinos durante el tiempo que han permanecido fuera del comercio, como consecuencia del registro en los folios de matrículas inmobiliarias de las ofertas de compra y demandas de expropiación nota.** R/ Concesionario: La concesión Ruta Al Mar requiere que los propietarios de los predios de manera formal soliciten la certificación con el alcance que ellos crean pertinente. 9. **Reconocer, compensar, indemnizar por los daños ocasionados a las viviendas de los campesinos del barrio las flores Calle 9A CRA 3 al frente de la funeraria, en el corregimiento de carrillo municipio de san Pelayo con ubicación (8°58'53"N75°49'58"W) 511m, con ocasión de la construcción de los Box Culvert o puentes pequeños que vierten sus aguas lluvias en los inmuebles de los campesinos, causando su deterioro y propagación de enfermedades. Entidades responsables el estado colombiano en cabeza de la alcaldía de San Pelayo y ANI.** R/ Concesionario: se realizará recorrido día de la visita el 18 de junio del 2024 - hora por confirmar por ANI. 10. **De mutuo acuerdo entre la parte demandante y los demandados, solicitar a los despachos judiciales que llevan los procesos expropiatorios suspender estos**

UF	Punto critico	Trazabilidad
		procesos en contra de los campesinos afectados entre el municipio de cerete y san Pelayo. R/ Concesionario: los procesos de expropiación solo se pueden terminar por mutuo acuerdo es decir por medio de enajenación voluntaria o sentencia judicial. **Cumplimiento de los Compromisos adquiridos por el Concesionario:** **El día 18 de junio 2024**, se llevó a cabo visita e inspección en la Vereda El Palmar como compromiso de las mesas de trabajo de los días 14 y 15 de junio 2024 en el marco de la minga MIPES, donde se acordó la revisión de los siguientes puntos: **1.Revisar las condiciones actuales del tramo 7.3 Santiago de tolú y la rotonda.** R/ SE PROCEDE POR PARTE DE LA Concesión Ruta al Mar, EPC El Condor, en compañía de la Interventoría a revisar las inquietudes de la comunidad. **2. El box Culvert no es funcional debido a que no cumple eficientemente con el drenaje y el estancamiento de aguas residuales favorece la aparición de vectores de enfermedades poniendo en riesgo la salud de los habitantes de la vereda.** R/ El EPC Condor informa que el Box del PR 2+360, se construyó para el manejo del agua del sector obedece a unos diseños hidráulicos aprobados, sin embargo, teniendo en cuenta la inconformidad se estará realizando una topografía en compañía de la comunidad El Palmar en el sitio, detallando el comportamiento de las aguas. **3. instalación de las defensas metálicas, reductores de velocidad con sus respectivos reflectores y avisos de seguridad.** R/ la concesión revisará lo siguiente: -Aviso Informativo de la vereda El Palmar en ambos lados - se realizará un estudio y análisis de seguridad vial en cuanto a los reductores de velocidad (pendiente fecha de estudio) - Se instalarán barandas metálicas en ambos costados de la vía - se revisará la condición del Box y alcantarilla existente sobre el acceso de la Vereda El Palmar, para determinar la instalación de una defensa metálica **5. Instalación de alumbrado público desde la rotonda en el tramo Santiago de tolú, vereda el Palmar.** R/ Concesionario: contractualmente existe un alcance con el alumbrado público, ya que este se instala en las glorietas y en los pasos peatonales construidos. Además, el Concesionario se comprometió con la comunidad a adecuar los accesos de la entrada de la Vereda El Palmar con material fresado para que pueda compactar y a donar un hilo oscuro de la fibra óptica que ellos manejan en la UFI 7.3, con el fin de que un contratista municipal pueda mejorar la calidad del internet en esta vereda. **El día 19 de junio de 2024,** se realizó recorrido con el fin de identificar las viviendas que manifiestan inconformidad y afectaciones por las inundaciones **en** el barrio las flores del corregimiento de Carrillo, Municipio de San Pelayo, de acuerdo a los compromisos adquiridos en las mesas de trabajo realizadas los días 14 y 15 de junio 2024, en el marco de la minga MIPES. Se inicia recorrido en el PR 19+800, a continuación, se identifican las siguientes viviendas: 1. Mary Luz Hernández 2. Nelly Isabel Hernández Pérez 3. Fina María Luna 4. Saudith Luna Hernández 5. Edith Arias Zapata 6. Gregoria Lara 7. Ana Virginia Hernández 8. Maia Correa Martínez 9. Porfiria Durango Suarez 10. Petrona Correa Martínez 11. Mixiade Romero Negrete 12. Luz Elena Ayala 13. Aníbal Ramírez 14. Mirella Palomino Hernández Además, en el PR 18+060 UFI 2, se realizó la visita a los predios de Lidis Esther Padilla y Domingo Gaviria, los cuales cuentan con un proceso predial inconcluso.

UF	Punto critico	Trazabilidad
		Después de realizar dicho recorrido, la Concesión Informa que analizará los casos y dará su respectiva respuesta y posibles soluciones el día 18 de julio 2024, en la mesa de trabajo que está programada por el Min interior en el marco de la minga MIPES. El día 20 de junio 2024, se llevó a cabo reunión virtual La ANI, Concesión Ruta al mar, Interventoría, ANUC, asesores jurídicos y representantes de la minga MIPES, con el fin de tratar los temas de los procesos prediales de acuerdo a los predio presentados por la comunidad, de esta reunión se determinó que el Concesionario analizó y revisó cada caso y encontró que ha actuado de manera acorde a los debidos procesos prediales, además se concretó que se realizara una mesa de trabajo interna concesión, Interventoría con la ANI, para estudiar cada caso y establecer respuestas para la próxima mesa de trabajo que se realizara en el marco de la minga MIPES el próximo 18 de julio 2024. El día 31 de julio 2024, la Minga MIPES realizó bloqueo en horas de la mañana en el sector de Carrillo Corregimiento del Municipio de San Pelayo, por supuesto complot de ruta al mar y la administración municipal de San Pelayo por incumplimiento del contrato 003 de 2020 para actualización del PBOT, este bloqueo fue atendido por el SMAT quien restableció el orden en horas de la tarde, por lo que el tráfico continuo con normalidad. Cabe aclarar que, a la fecha no se ha realizado la convocatoria por parte del Ministerio del Interior para continuar con las mesas de trabajo con la minga MIPES, ya que en el último encuentro la fecha estaba dispuesta para el 18 y 19 de julio 2024, sin embargo, no se tiene conocimiento del motivo por el cual no se ha realizado dicha convocatoria. En el mes de agosto 2024, El Ministerio de Interior mediante la oficina de Dialogo Social y los Derechos Humanos, realizó convocatoria en atención comunidades de la Minga pluriétnica y social, para atender articuladamente los requerimientos y necesidades de las comunidades pertenecientes a la Minga pluriétnica y social, con el fin de generar solución a las problemáticas presentadas, los días 26 y 27 de agosto 2024. Los días 26 y 27 de agosto 2024, se realizó mesa de trabajo con la minga MIPES, entre los puntos a tratar a cargo de la ANI, se continuo con los temas prediales que la comunidad estaba solicitando que se revisara nuevamente la condición de los predios que están por adquisición predial por parte de la ANI y repetir los avalúos, ya que ellos manifiestan que no están correctos, sin embargo la ANI socializo la mesa de trabajo que realizo con el Concesionario y la lonja y la cual había quedado como comprom8iso en la mesa de trabajo del 18 y 19 de julio de 2024, en la cual se revisó la situación de los predios campesinos incluidos en la minga y concluyeron que los avalúos están realizados bajo la normatividad y legislación vigente y correspondiente a estos procesos, además se dejó claro que todos los procesos se realizaron CONFORME AL PBOT vigente del municipio de San Pelayo por lo cual todos los procesos están acordes con la norma. El 30 de octubre 2024, la Procuraduría Regional de Instrucción de Córdoba convocó a ANUC, ANI, CORUMAR y Defensoría del Pueblo a una mesa de trabajo el día 07 de noviembre 2024, con el fin de buscar soluciones definitivas a la problemática presentada con las comunidades Campesinas agremiadas ANUC, las comunidades Indígenas y Afros del sector de Carrillo San Pelayo, Córdoba. El día 25 de noviembre 2024, se llevó a cabo la mesa de trabajo convocada por la Procuraduría Regional de Instrucción de Córdoba, para continuar con el seguimiento preventivo que no se pudo realizar el 07 de noviembre 2024, a la problemática con las comunidades campesinas de San Pelayo agremiadas ANUC, a la cual asistieron las entidades Convocadas, La Agencia Nacional de Infraestructura, La Concesión Ruta al Mar, La Gobernación de Córdoba, La Alcaldía y Personería de San Pelayo, La Defensoría del Pueblo de Córdoba y La Procuraduría Agraria, cabe mencionar que no asistió a la mesa de trabajo La Agencia Nacional de tierras quien se encontraba Convocada. En este espacio de dialogo fueron escuchadas las pretensiones de los campesinos de ANUC y del mismo modo la ANI y Concesionario ratifico que la gestión predial se ha realizado conforme lo prevé la ley y el contrato de concesión, así mismo se planteó realizar diferentes reuniones para revisar de manera individual los casos, esta reuniones las coordinará la gobernación de Córdoba, dado su compromiso en mesas de trabajo anteriores llevadas a cabo con la ANI de manera interna, la

UF	Punto critico	Trazabilidad
		programación tentativa será los días 4,5,6 de diciembre de 2024, también asistió a la mesa de trabajo la comunidad indígena de carrillo, con ellos la gestión social de la ANI solicitara al Ministerio del Interior una mesa de participación con dicha comunidad. En el mes de diciembre 2024 se tiene que, se realizaron las mesas de trabajo coordinadas por la gobernación de Córdoba con participación de la Procuraduría Regional de Córdoba los días 13,17 y 20 de diciembre 2024, en las cuales se revisaron los 16 predios que hacen parte de la agremiación ANUC pertenecientes a la UFI 6.1 y 2, informando de manera explícita el proceso predial de cada caso en particular, llevado a cabo por el Concesionario y la ANI, ahora bien, el representante de la agremiación ANUC le corresponde allegar a la Gobernación de Córdoba y a la Procuraduría Regional de Córdoba la información que ellos consideren pertinente para contrapesar los argumentos suministrados por la Agencia y el Concesionario, asimismo, se está a la espera de los requerimientos o consultas que puedan presentar tanto la Gobernación, como la procuraduría de Córdoba a raíz de estas mesas de trabajo realizadas. En el mes de enero 2025, se tiene los siguiente, se conoce que la minga Pluri étnica y Social desaparece, debido a que los campesinos del gremio ANUC, han venido realizando un proceso de revisión predial con la Gobernación de Córdoba y con la Procuraduría Regional de Córdoba, de ahora en adelante nos referimos a la Minga Indígena Fin Zenú, representada por la comunidad Indígena de Carrillo, esta última tiene como líder al señor Édison Pérez, quien participo en una mesa de diálogo con la Agencia Nacional de Infraestructura el día 12 de noviembre de 2024 y de la cual quedo como compromiso traer una respuesta de la ANI a unas solicitudes de la comunidad, para lo cual se programó un encuentro en el mes de diciembre 2024, sin embargo no se pudo realizar en el mes en mención, a si las cosas la ANI reprogramó el encuentro el día 24 de enero 2025, ahora bien la re unión se realizó en el municipio de San Pelayo en el consejo municipal, contó con la presencia de la Gerente Social de la ANI, la Supervisora social, La Gerente de Proyecto y el supervisor del proyecto, la Concesión Ruta al Mar y la Interventoría del proyecto, la Defensoría Regional de Córdoba realizó el acompañamiento, ahora bien, hicieron presencia los representantes de la comunidad indígena de Carrillo e hizo acompañamiento la comunidad Indígena Marcial Alegría de San Sebastián quienes pertenecen a Lorica, en esta reunión se deja la claridad por parte de la ANI que se viene a continuar con los temas que convocaron la mesa de diálogo de Bogotá los cuales son: - La consulta previa. (se ratifica que no es procedente por resoluciones de Mininterior) - La gestión predial. (los predios ya surtieron el proceso y se encuentran a favor de la ANI) - Solicitud de unidades productivas. (la Concesión dentro del contrato no contempla proyectos productivos) Para tratar los temas de consultas previas no se encuentran las entidades competentes, por lo que la comunidad solicitó a la ANI que convoque una mesa Inter Institucional, sin embargo, la ANI no es la indicada para realizar dichas convocatorias, por lo tanto, se le informa a la comunidad que ellos deben solicitar dicha mesa ante el Min interior. Como compromiso de esta reunión la comunidad realizara una solicitud al ministerio del interior para realizar una mesa interinstitucional con los actores y las entidades que ellos consideren, y la defensoría del pueblo coadyuvara a impulsar la solicitud de la comunidad. El día 03 de febrero 2025, la minga fin Zenú realizó bloqueo en la UFI 2 en el PR 31+170 sentido cerete-lorica por los resultados de la reunión con la ANI. Además, se conoció por parte del Concesionario mediante comité mensual #107, que el Concesionario sostuvo, reunión con representantes de la Minga y se analizó la posibilidad de destrabar la zona del predio, conocido como el predio del ají, ya que esta comunidad solicitó apoyo de un proyecto productivo, el cual está en trámite de presentación por parte de ellos para análisis del Concesionario, autoridades municipales y departamentales, cabe aclarar que, el Concesionario está brindando apoyo y asesoría en la estructuración del proyecto y se dará apoyo logístico para el desarrollo de este. En el mes de marzo 2025, el Concesionario nos informa mediante el comité mensual #108 que, se encuentra coordinando con los representantes indígenas, para diseñar o buscar proyectos productivos que les ayuden a las comunidades, con el fin de coordinar el apoyo de estructuración, están a la espera de concretar reunión con el Gobernador para ponerlo en contexto y que delegue

UF	Punto critico	Trazabilidad
		a alguien que pueda ayudarnos con las comunidades, coordinando con las entidades correspondiente como el SENA, Autoridad Nacional de Acuicultura y pesca AUNAP, entre otras. En el mes de abril 2025, el Concesionario nos informa mediante el comité mensual #109 que se encuentran a la espera de las reuniones con la Gobernación, para dar inicio al proceso de apoyo y acompañamiento con esta comunidad. En el mes de mayo 2025, el Concesionario se reunió con la Autoridad Nacional de Acuicultura y pesca AUNAP, con el fin de gestionar un acercamiento con la comunidad Indígena de Carrillo, para darles a conocer las convocatorias y proyectos que esta entidad aplica en los territorios. En el mes de septiembre 2025, se convocó a la ANI y a la Concesión Ruta al Mar entre otras entidades a una mesa de Dialogo Interinstitucional, por parte del Ministerio del Interior en lo referente a construcción de rutas de trabajo y reconocimiento de comunidades. Aquí nos concentraremos en lo que concierne específicamente al tema, donde se menciona al proyecto Antioquia – Bolívar. Esta mesa de trabajo se llevó a cabo en dos espacios el primero el día 22 de septiembre y el segundo el 23 de septiembre del 2025, cuyo objetivo era atender la solicitud de la autoridad Mayor de la Minga Indígena Finzenú señor Nelson Argumedo López, Cabe resaltar que la concesión no asistió a estas jornadas, sin embargo, esta Interventoría realizó acompañamiento. El 22 de septiembre, el asesor técnico de la comunidad indígena Finzenú Marcial Alegría de san Sebastián señor Édison Pérez, solicita dar lectura al acta de la reunión sostenida con el Ministerio del Interior donde quedaron unos compromisos, conviene mencionar, que se desconoce la fecha y quienes estuvieron en la reunión con la minga Indígena Finzenú marcial alegría de San Sebastián y el Ministerio del Interior y los compromisos o acuerdos adquiridos en la misma, en este espacio la MINGA solicitó al Ministerio para que coadyuve al Concesionario en citar a la Gobernación de Córdoba teniendo en cuenta que ha sido imposible que asista a las reuniones las cuales ha sido convocas por el Concesionario para trabajar iniciativas productivas en el predio que fue entregado con acuerdos. El día 23 de septiembre, se presentó el delegado de la gobernación de Córdoba quien expresó que convocara a la Concesión Ruta al Mar para una reunión el día 20 de octubre 2025, con el fin de tratar el tema de iniciativas productivas para la comunidad, a la fecha de entrega de este informe no se tienen novedades. Del 01 al 30 de septiembre 2026, no se tienen novedades.

UF	Punto critico	Trazabilidad
3.3 y 3.5	El ICANH a través del radicado 4170 del 21 de agosto de 2018 comunicó a la Concesión la actuación administrativa resolución N° 165 del 16 de agosto de 2018 por el cual se ordenó indagación preliminar en contra de CORUMAR S.A.S con el fin de determinar la existencia o no de méritos para sancionar las actividades desarrolladas sin autorización del PMA arqueológico de la licencia **6533 Y 6534**	La Concesión Mediante radicado ICANH 0479 del 5 de febrero de 2018 presentó informe final a la autorización de Intervención en fase de re- prospección licencia N° 6744 del 31 de julio de 2017. El ICANH Mediante radicado 0927 del 05 de marzo de 2018 NO aprobó y solicitó ajustes al informe final para la implementación del PMA para la re- prospección de un ZODME y tres tramos de la UFI3.5. La Concesión Mediante radicado N° 1875 del 17 de abril de 2018 presentó los ajustes al informe final a la licencia N°6744 La Concesión Mediante radicado ICANH N° 1966 del 23 de abril de 2018 presentó los ajustes al informe final de la licencia de rescate N° 6533 del 26 de abril de 2017 El ICANH Mediante radicado 2529 del 30 de mayo de 2018 confirmó el recibido del informe final, sin embargo, se estableció la necesidad de hacer visita en campo ya que se requiere monitorear los predios en los que no fue posible su ingreso (tramo 2 Km 1 + 720 a Km 1 + 980). El ICANH Mediante radicado 2530 del 30 de mayo de 2018 confirmó que recibió por parte de la Concesión la solicitud para la ejecución de la licencia rescate arqueológico, comunicando que realizará visita en campo para verificar realización de monitoreos en los sitios 1 y 12 La Interventoría a través del comunicado CI.023/AB2459/18/7.1.9 solicitó a la Concesión informe sobre el estado de la gestión de las visitas de seguimiento por parte del Instituto de Antropología e Historia – ICANH de acuerdo a los comunicado N° 2530 y 2528 del 30 de mayo de 2018, para las UF 3.3 y 3.5 ICANH realizó visita en campo los días 29 y 30 de agosto de 2018 en el marco del proceso resolución 165 de 2018 El ICANH mediante radicado 4919 del 03 de octubre de 2018 aprobó el informe final y PMA en fase de recate de la licencia 6533 para los yacimientos 3 y 4 de la UFI3.2 y los sitios 1, 2, 3, 8, 11 y 12 de la UFI3.3. UFI3.5 El ICANH Mediante radicado N° 5008 del 5 de octubre de 2018 presentó la respuesta al comunicado 4286 presentando las consideraciones de la visita en campo realizada los días 29-31 de agosto de 2018 para las UFI3.3 y 3.5 La Concesión Mediante radicado ICANH 6153 del 9 de noviembre de 2018 presentó respuesta al oficio ICANH 130-5674 y solicitó adenda a la AIA 6534 El ICANH mediante radicado N° 6254 del 13 de diciembre de 2018 aprobó el informe final Implementación del plan de manejo arqueológico: re- prospección de un ZODME y tres tramos entre los PR 0+000 A 0+810, 1+720 A 1+980 y 2+960 a 4+800, en total 2.9 KM de los 4.9 km correspondientes a la licencia 5728. En el siguiente orden: tramo 1 sigue en curso la indagación preliminar: tramo 2 se debe presentar informa final de prospección y tramo 3 se debe solicitar adenda por parte de la Concesión El ICANH mediante radicado 2955 del 7 de junio de 2019 aprobó el informe final de prospección del tramo 2 UFI3.5. Le corresponde a la Concesión solicitar adenda en fase monitoreo ante el ICANH. La Concesión mediante radicado 3254 del 12 de junio de 2019 solicitó adenda modificatoria a la AIA N° 7572: implementación PMA arqueológico en fase de monitoreo. El objetivo es que se incluya la

UF	Punto critico	Trazabilidad
		las AIA 6340, 6744 y 6774, de tal forma que el tramo 2 de la UFI3.5 quede libre para monitoreo y de este modo se pueda intervenir los 260 m de esta Unidad Funcional. En este punto crítico ya se encuentra cerrada la AIA N° 6533, desde la Interventoría se continuo seguimiento a la AIA N° 6534, la cual continua en proceso de cierre. Del 01 al 30 de septiembre 2026, no se tienen novedades.
4.2	**Traslado peaje el Purgatorio:** Los líderes comunitarios de los KM 15, 12, Orlando Benítez y los alcaldes de Tierralta, Valencia y Montería manifiestan su negativa frente la reubicación del peaje del PR 32+100 al PR 38+700, de acuerdo a lo establecido en la resolución N° 111 del 15 de enero de 2018. La ANI, la Concesión y la Interventoría atendieron las inquietudes y solicitudes de los actores locales. La ANI solicita a la Concesión mejorar la gestión social de tal forma que sea posible superar las situaciones conflictivas con ocasión del traslado del peaje	El 24 de agosto de 2017 Mediante comunicado 2017-409-090270-2 la Concesión solicitó se definiera el nuevo PR para la reubicación del peaje del acuerdo a lo establecido en la sección 3.6 (b) parte especial del Contrato y 2.3 del apéndice técnico 1. El 15 de enero de 2018 el ministerio de transporte a través de la resolución N°111 del 15 de enero de 2018 resuelve definir el PR 38+700 como el punto en el cual La Concesión deberá reubicar el Peaje. El 6 de febrero de 2018 la ANI, Concesión e Interventoría sostuvo reunión con gremios de transportadores y líderes de los km 15 y 12 con el objetivo de escuchar las inquietudes y analizar estrategias de solución. El 8 de febrero 2018 Marcos Daniel Pineda García publicó en su cuenta que la decisión de trasladar el peaje de El Purgatorio del Kilómetro 18 al Kilómetro 14, se postergará hasta el año 2019, indicando que la ANI adelantaría un estudio socioeconómico El 10 de marzo de 2018 comunidades de varios sectores de Montería, Valencia y Tierralta adelantan un plantón como protesta del traslado del peaje el Purgatorio El 16 de marzo de 2018 La ANI, Concesión; Interventoría y actores locales del km 15 y km 12 realizaron mesa técnica para identificar los impactos susceptibles de presentarse con el traslado el Peaje El 18 de abril de 2018 el tribunal contencioso administrativo de córdoba admitió acción popular interpuesta por los alcaldes de Tierralta (Fabio Leonardo Otero Avilez) y Valencia (José Ignacio Gómez Ramos), expediente 23-0001-23-33-000-2018-00-185-00, en contra de La ANI, en atención al NO traslado del peaje Purgatorio. El de 11 de mayo de 2018 personas de los Km 15, 12, Tierralta, Valencia y zonas rurales de estos municipios realizaron un plantón en negativa a la reubicación del Peaje El 22 de mayo de 2018 habitantes del km 12 y km 15 marcharon e hicieron plantón en inmediaciones de PR 38+700 manifestando no al traslado. El 30 de mayo de 2018 los líderes del km 12, 15, carrizal y verederas circunvecinas llevaron a cabo plantón en inmediaciones del PR 38+700. El 26 de junio el concejo de Montería citó a la ANI al debate que tuvo por objetivo solicitar el No traslado del Peaje, lo cual fue respaldado por senadores y representantes electos. Al final de la sesión se acordó suspender las obras de construcción hasta el 04 de julio de 2018. El 11 de julio de 2018 El senador electo David Barguil, en apoyo al doctor José Javier de la Hoz de la firma de abogados de Abelardo de la Espriella, presentaron en conjunto ante el ministro de Transporte, Germán Cardona, una solicitud de revocatoria directa de la Resolución 1884 del 17 de junio de 2015, la cual ordenó la reubicación de las estaciones de los peajes Purgatorio y Los Cedros en el departamento de Córdoba. Esta revocatoria busca suspender el traslado de los peajes

		mencionados, dándole una oportunidad al Mintransporte que corrija su error y evitar la afectación de la comunidad El 12 de julio de 2018 se realizó mesa de trabajo entre la ANI, Concesión, Interventoría y gremio de trasportadores en donde se les presento el paquete de medidas que permiten mitigar los impactos socioeconómicos con ocasión al traslado del peaje el Purgatorio; también se convocó a líderes comunitarios del KM 13 y veredas circunvecinas, pero estos no asistieron El 24 de julio de 2018 se realizó reunión en el despacho del alcalde de Montería Marcos Daniel Pineda, con participación de funcionarios de la ANI, Concesión e Interventoría, luego de exponer el paquete de medidas para mitigar los impactos del traslado peaje el Purgatorio, el alcalde expresó estar de acuerdo ya que las medidas son socialmente correctas, sin embargo, su administración mantiene su oposición al traslado, agregando que no firmará acuerdos con el gobierno saliente El 1° de agosto de 2018 la ANI Mediante comunicado N° 2018-300-024131-1 solicitó respuesta a la Concesión frente la insuficiente gestión social de la Concesión, so pena incumplimiento en las obligaciones sociales. El 10 de agosto de 2018 la Concesión Mediante comunicado 47-147-20180810003244 presentó respuesta al comunicado de la ANI ° 2018-300-024131-1 indicando que no ha incumplido en la GSC y que es la ANI quien debe cumplir con el estudio socioeconómico de acuerdo a los compromisos adquiridos con los alcaldes de Tierralta, Valencia, Montería y comunidad. El 11 de agosto de 2018, habitantes del Km 15 marcharon en inmediaciones de la UFI4.2 en oposición al traslado del peaje Purgatorio. El 13 de agosto de 2018 a través de la comunicación 48-147-20180813003253 la Concesión presentó “derecho de petición de información – solicitud de pronunciamiento por parte de la ANI, frente las comunicaciones con radicado N° 2018-409-062743-2 y 2018-409-0688899-2” en el sentido de que se le defina a la Concesión la fecha a partir de la cual puedan reiniciar obras sin que se cause perjuicios por la imposibilidad de trasladar el peaje. El 10 de septiembre de 2018 los alcaldes de Montería y Valencia se reunieron en Bogotá con el nuevo presidente de la ANI Dr. Louis Kleyn y expusieron las razones socioeconómicas por las que no están de acuerdo con el traslado del Peaje. El 20 de septiembre de 2018 el presidente de la ANI Dr. Louis Kleyn sostuvo en Montería reunión interinstitucional en donde se expuso los mecanismos para mitigar los impactos con ocasión del traslado del peaje y sostuvo que la obra avanzará en los términos contractuales El 21 de septiembre de 2018 la ANI expuso el esquema de tarifas diferenciales para loe vehículos públicos y particulares usuarios del Peaje el Purgatorio, las cuales aplicarán una vez sea trasladado. El 24 de septiembre de 2018 en reunión liderada por la ministra de transporte ordenó suspender las obras del peaje hasta obtener conceso. El 26 de septiembre de 2018 Javier De la Hoz, del bufete de Abelardo De La Espriella, quien junto con los senadores David Barguil, Fabio Amín, los representantes a la Cámara, Erasmo Zuleta Bechara, Jorge Burgos Lugo, Sara Piedrahita y el personero de Montería, Jorge Galofre, presentaron una acción popular en contra de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, en la que se plantean se prohíba el traslado del peaje. El 17 de octubre de 2018 la Concesión ruta al mar emitió comunicado a la opinión pública en el que se informó a la comunidad que no se ha reanudado las obras de reubicación de la caseta de peaje, solo se efectuaron labores de limpieza y mantenimiento del sector entre las 8 y 9 am. correspondientes a las labores de mantenimiento rutinario de la Unidad Funcional 4 Montería – Planeta Rica. El 27 de octubre de 2018 se desarrolló el taller N° 13 Construyendo País en el municipio de Chinú Córdoba en el cual el presidente anunció que desde el Ministerio de Transporte y ANI se está

		trabajando en buscar solución al traslado Peaje el Purgatorio e indicó que cualquier decisión de debe tomar bajo criterios de racionabilidad, el mandatario expresó que en la última semana de octubre habrá nueva reunión con participación de la Concesión y así avanzar. El 9 de noviembre de 2018 el tribunal administrativo de córdoba ordenó traslado de la demanda en contra del ministerio del transporte, ANI, Concesión ruta al mar y construcciones el cóndor con ocasión de impacto que ocasionaría el traslado del Peaje a las poblaciones circunvecinas, principalmente a los municipios de Tierralta y valencia. El 11 de diciembre de 2018 se realizó en Montería reunión mesa de trabajo liderada por la ANI y el Ministerio de transporte en la que participó los alcaldes Montería, Valencia, Tierralta, líderes de los corregimientos Km 12 y km 15, gremios de transporte, Concesión e Interventoría. En este espacio se ratificó el traslado del Peaje el Purgatorio y se dio a conocer las medidas concertadas y definidas para mitigar los impactos identificado en las diferentes mesas de trabajos y reuniones realizadas: Mantenimiento de la vía Kilometro 15- Tierralta -Valencia desde que inicie el cobro del Peaje hasta el año 2046, responsable: Gobierno Nacional Exención del pago del peaje para el transporte público intermunicipal y urbano incluidos taxis, que cubra rutas rurales en montería, por toda la vida del Contrato, lo cual permitirá que el usuario final no pague recargo. Tarifa Diferencial del 50% para: *Habitantes de la Zona Rural de Montería que residan en el corredor vial. *Todos los habitantes de Tierralta *Todos los habitantes de Valencia Exención total del cobro de peaje a los habitantes del K12 y todas sus veredas, sólo, pagará lo correspondiente al FOSEVI Mejoramiento periódico y progresivo de la vía Hoyos oscuro – Guateque – Montería, responsable: Gobierno Nacional Los habitantes de Valencia empezaran a pagar el peaje en el mes de septiembre de 2019 y/o una vez esté en servicio el puente de Valencia. Si al final de la fase de construcción de la construcción Ruta al mar existen excedentes en la subcuenta autónoma de soportes se priorizarán estos recursos para la construcción de ciclo rutas en el tramo Montería - Km15 El Concesionario ratifica el compromiso de inversión social en la región, apoyo laboral al emprendimiento y proyectos productivos El 9 de enero de 2019 se retomas las obras de construcción del peaje el Purgatorio en el PR 38+700 El 15 de enero de 2019 se reunión el alcalde de Montería Marcos Daniel Pineda García con líderes del KM 15 para analizar implicaciones del traslado del Peaje el Purgatorio El 21 de enero de 2019 se llevó a cabo la marcha convocada por algunos líderes políticos y comunitarios la cual inicio en el centro comercial Nuestro hasta inmediaciones al km 13 Mediante C.I. 023. /AB3203/19/5.3 del 23 de enero de 2019 la Interventoría emitió concepto de viabilidad relativo a la solicitud de la Concesión en el reconocimiento de un EER de acuerdo al requerimiento de la ANI en su comunicado N° 2018-409-130359-2 El 30 de enero de 2019 se llevó reunión entre Concesión, ANI y comunidad para avanzar en mesas de trabajo que permitan atender las situaciones problemas con ocasión del traslado el purgatorio El 8 de febrero de 2019, el tribunal administrativo de Córdoba denegó la acción popular/medida cautelar interpuesta por José Ignacio Ramos, estableciendo que no hay elementos suficientes que evidencien la inminencia de un daño, por cuanto no están soportados en pruebas que le permitieran a la colegiatura establecer la cautela deprecada. El 15 de febrero de 2019, la ANI desarrolló reunión con representantes de los sectores KM 12, 15, comerciantes, líderes políticos y delegados de la alcaldía de Montería en donde se dio respuesta al derecho de petición interpuesto Liliana Alarcón y Juan Velázquez en la reunión del 30 de enero de 2019, la cual fue presidida por el Dr. Lois Kleyn. Durante la reunión se hizo entrega de los siguientes documentos: Estudio socioeconómico, Estudios ambientales, Estudio de movilidad, Plano de localización y actas de socialización con las comunidades del Km 15

		El 20 de marzo de 2019 el concejal Amaury Contreras Duarte, lideró en calidad de ponente sesión a la que asistió la ANI, Interventoría y fuerzas vivas locales con ocasión de continuar lo que él denominó la defensa de los intereses de las problemáticas de la población del municipio de Montería, instalado a los congresistas ya que el marco jurídico existente debe ser revisado a la luz de las ambigüedades de la ley 105 de 1993, y las implicaciones de la misma en concordancia a las decisión de reubicación del Peaje Purgatorio al KM 13; de otra parte, exigió a los representantes del departamento de Córdoba para que convoque al ministerio del transporte, ANI e INVIAS y se reestructure el esquema de peajes en el país, puesto que de los 137 peajes existentes en Colombia, 8 se encuentran en córdoba, cuando en cada departamento no hay más de 4 peajes, todos estos operados por privados. **El 16 de abril de 2019 la Concesión inició el cobro del peaje en su sitio de traslado, desde las 5 am.** El 16 de abril de 2019 La ANI emitió comunicado a la opinión pública con ocasión del inicio del cobro del peaje en su nuevo PR, en donde puntualizó los acuerdos suscritos con las comunidades, gremios e instituciones; así como la resolución 1385 del 15 de abril de 2019. https://www.ani.gov.co/comunicado-la-opinion-publica-20 El 16 de abril de 2019 el secretario de gobierno de montería Arturo José Mercado Pérez interpuso ante el juez segundo de ejecución de penas la acción de tutela en la que solicitó como medida cautelar la suspensión del cobro del peaje. El 17 de abril de 2019 el transporte público suspendió la ruta Montería – KM 15 por cobro del peaje El 18 de abril de 2019 se activó las tarifas diferenciales al servicio público ruta Montería – KM 15, lo que permitió el reinicio de operaciones. El 23 de abril de 2019 el juez segundo de ejecución de penas admitió tutela interpuesta por la alcaldía de Montería y negó medidas cautelares hasta tanto se presente el fallo definitivo El 24 de abril de 2019 el viceministro de Transporte, Manuel Gutiérrez, dio rueda de prensa atendiendo a los diferentes hechos y medidas presentadas con el traslado del peaje purgatorio. El 25 de abril de 2019 La comunidad realizó protesta pacífica, inició a las 8:30 y finalizó a las 11:00 a.m. participaron concejales, Personería Municipal, en rechazo a la reubicación del Peaje Purgatorio. El 25 de abril de 2019 Tribunal administrativo de Córdoba negó las medias cautelares interpuestas por la firma De la Espriella Lawyers que intentaba reversar el traslado del peaje El Purgatorio. La firma apelará el fallo. El 10 de septiembre de 2019 la sala del tribunal superior del distrito judicial del Montería – córdoba resolvió la impugnación instaurada por el Dr. Javier de la Hoz, quien actuó en representación del cabildo indígena Jaraguay, contra el fallo de tutela del 15 de mayo de 2019. En este sentido ordenó a las partes del proyecto socializar y buscar espacios de dialogo que permitan superar los impactos del traslado peaje el Purgatorio (ver ponencia del magistrado Víctor Diz Castro, acta 292, radicado 23 001 31 04 002 2019 00037 91). El 24 de octubre de 2019 se realizó reunión Inter partes, la cual fue convocada por el Ministerio del Interior, en donde se concertó que los representantes del cabildo Jaraguay deberán presentar una propuesta en la que definan el impacto que les ocasionó el traslado del peaje y sobre esto se seguirán abriendo espacios. El 11de noviembre de 2019 el representante de la comunidad Jaraguay solicitó mediante correo electrónico a la Concesión precisiones sobre el contenido del acta del 24 de octubre de 2019 y solicitó acompañamiento de asesores propios para la identificación de impactos. El 22 de noviembre de 2019 la Concesión envío respuesta integral al comunicado emitido por el cabildo Jaraguay con fecha 11 de noviembre de 2019. Entre estas, la imposibilidad de pagar asesores, argumentando los dispuesto por la dirección de asuntos indígenas en cuanto a que el ministerio cuenta con profesionales encargados de realizar esa función

		El 27 de noviembre de 2019 se fijó en la página de la ANI la resolución "Por la cual se establecen unas tarifas diferenciales en las estaciones de peaje Los Manguitos, Purgatorio, Cedros y Mata de Caña del proyecto de asociación público-privada de iniciativa privada para la conexión de los departamentos de Antioquía, Córdoba, Sucre y Bolívar, se modifican las Resoluciones No. 000111 de 2018 y No. 1385 de 2019" la cual estará por 5 días hábiles disponible para que los interesados realicen sus observaciones (hasta el 5 de diciembre de 2019) El 30 de enero de 2020 la ANI presentó ante la Concesión el proyecto de resolución para tarifas plenas y diferenciales peajes Purgatorio y los Manguitos. Se está a la espera de la publicación y cumplimiento, para lo cual se instaló oficinas móviles de atención al usuario en ambos peajes como medida preventiva de contingencia El 26 de febrero de 2020 el ministerio de transporte emitió la resolución 0410 de 2020 a través de la cual se establecen tarifas diferenciales, cupos y pasos para vehículos del servicio de transporte público en las estaciones de peaje Manguitos, Purgatorio, Cedros y Mata de Caña. La medida fue bien recibida por parte del gremio de transportadores. El 23 de junio de 2020 la personería solicitó cumplimiento de los acuerdos para el traslado peaje Purgatorio comunidad km 15. El 24 de junio de 2020 ingresó la PQRS N° 1430 en la que la comunidad realizó nuevos requerimientos (9 puntos). La Concesión tramitó la PQRS El 25 de junio 2020 se realizó reunión virtual transversal las américas, ruta al mar, CONDOR, ANI e Interventoría y se generó el compromiso de cerramiento escuela, demolición aulas viejas, acceso a la escuela KM 15 por el paso peatonal e instalación de barandas en puntos críticos. Lo anterior lo asumió construcciones el Cóndor. El 26 de junio de 2020 se atendió reunión en el KM 15 con líderes, Concesión, vía las américas, alcaldía, Interventoría y personería, en donde se generó los siguientes compromisos: demolición aula (vías las américas), accesos y enceramiento (ruta al mar); instalación de barandas y separadores (ruta al mar); señalización en la entrada vías Tierralta y Valencia (Ruta al mar) y señalización horizontal y vertical para reducir velocidad en el centro poblado KM (ruta al mar) El 30 de octubre de 2020 se verificó avance en el cumplimiento de los compromisos, Sin embargo, la comunidad solicitó adicionalmente lo siguiente: arreglar cunetas e instalar filtros para que el agua lluvia de las cunetas no llegue a la institución educativa; adicionalmente realizó una nueva solicitud: asfaltar la entrada al colegio. El 27 de enero de 2021 se presentó una serie de comunicaciones a través de redes sociales en la cual algunos miembros de la comunidad informaron sobre la reactivación del movimiento NO peaje Purgatorio, sin embargo, no se presentó vías de hecho, por lo tanto, se reporta normalidad en la operación. El 26 de febrero de 2021 se realizó reunión convocada por la ANI con el objetivo de revisar los avances en el cumplimiento de los acuerdos: I. proponer formula de acuerdo por parte del Ministerio de Transporte y la ANI. La metodología planteada para este escenario se centraría en los esquemas de acceso a tarifas diferenciales, de este modo se generaría un tiempo de espera avanzar para avanzar en los acuerdos pendientes. II. Demostrarles a los demandantes el cumplimiento de los acuerdos. El 2 de marzo de 2021, se presentó por parte de la ANI el estado de cumplimiento a los acuerdos y formula de arreglo, sin embargo, por tratarse de un procedimiento judicial, no se participó en el espacio. En el mes de noviembre 2021 El Ministerio de Transporte mediante Radicado MT No.: 20212231207801, solicita a la ANI información para representación judicial, copia de los estudios técnicos y socio económicos realizados con anticipación a la expedición de la Resolución No. 001884 del 17 de junio de 2015, por la cual se emite concepto vinculante previo a la reubicación del

UF	Punto critico	Trazabilidad
		peaje El Purgatorio del PR 32+800 al Km 38+300, esta información es requerida como medio probatorio en el medio de control por el Honorable Tribunal Administrativo de Córdoba. El 21 de enero de 2022 se reporta como novedad la convocatoria de Jornada de protestas por el peaje el purgatorio, por parte de distintas comunidades, desde el km 12 hasta Tierra Alta incluyendo a Valencia, esta jornada se realizó sin ninguna alteración de orden público que afectara las instalaciones del peaje El Purgatorio y tampoco la vía nacional, ya que la concentración estuvo en el punto de la Apartada de Tierralta. El 14 de octubre de 2022, se presenta como novedad, derecho de petición a la ANI, por Rafael Enrique Gómez Herrera, gobernador del Cabildo Indígena Zenú Jaraguay, solicitando que se remita copia de la primera instancia de diálogo y participación, realizada en el mes de octubre del año 2019, en la ciudad de Bogotá, en cumplimiento a lo ordenado por el tribunal superior; de igual manera indicar cual fue la ruta o cronograma a seguir por parte de los accionados, en aras de dar cumplimiento a este mismo. Del 01 al 30 de septiembre 2026, no se reportan novedades.

UF	Punto critico	Trazabilidad
6.3	Traslado peaje La Caimanera: Mediante Otrosí No. 14 de fecha 19 de junio de 2019, se modificó el trazado de la Variante de Coveñas (UF 7.2), ampliando la circunvalación de la misma por el sector exterior al área del DRMI de la Caimanera, evitando así la interferencia con el mismo, en atención a la negativa que sobre el trazado inicial de la UF7.2 emitió CARSUCRE en el	El ministerio de transporte emitió la resolución 3119 de julio de 2016 a través de la cual se define el sitio de operación del peaje la Caimanera PR 41+150 y establece TED para todas las categorías. El 02 de octubre de 2018 Los abogados Shalem Cure Baiz y el Gerente de la firma Amorocho y Daza se reunieron con gremios y comunidad para respaldar con firmas la iniciativa jurídica ante el contencioso administrativo y de este modo quitar el Peaje La Caimanera. El 23 de agosto de 2019 La ANI y Concesión convocó reunión a los actores locales de los municipios de Tolú y Coveñas con el objetivo de presentar el nuevo PR del Peaje y el esquema tarifario que aplicaría, incluyendo la tarifa especial (15 de diciembre a puente de reyes) acordada por el presidente Duque en el taller Construyendo País realizado en Coveñas, en febrero de 2018. El 4 de septiembre de 2019 se activó la Minga por parte de las comunidades Indígenas Isla Gallinazo, Puerto Viejo, sector Torrente, quienes manifestaron desacuerdo con la operación del

	trámite de sustracción.	peaje la Caimanera. Las manifestaciones estuvieron respaldadas por el gremio hotelero de Coveñas y Tolú. El 13 de septiembre de 2019 se realizó reunión de atención a comunidades en las instalaciones de la ANI, en donde asistieron representantes de las comunidades con el objetivo de atender y buscar solución a la Minga indígena El 27 de septiembre de 2019 se realizó recorrido con presencia del ministerio del interior (Dirección de Consulta Previa), CARSUCRE, ANI, CORUMAR, CCR y comunidades étnicas en donde se revisó la distribución de los integrantes de los cabildantes en territorio de Coveñas y Tolú
	El otrosí 14, propone modificar la ubicación de la Estación de Peaje La Caimanera en el PR **42 +900** al norte del punto denominado "Manglar de las Garzas", para evitar su elusión. Posteriormente, con la resolución 0288 del 14 de febrero de 2020, el ministerio de transporte estableció que el peaje conservaría su ubicación **PR 41+150.** El 5 de agosto mediante la resolución 20213040034315 se realizan ajustes a los horarios, categorías y tarifas fijados en la resolución 20213040030335 del 19 de julio de 2021, al tiempo que define el sitio de traslado del peaje La Caimanera al **PR 43+230.**	El 8 de octubre de 2019 la ANI atendió a las comunidades activas de la Minga y al alcalde del municipio de Tolú, en donde se concluyó que se presentará una propuesta que permita superar los hechos que motivan la Minga por parte de las comunidades. El 14 de febrero de 2020 el ministerio de transporte emitió la resolución 0288 a través de la cual se mantiene la ubicación de la estación de peaje La Caimanera (PR 41+150) y se definen tarifas para las categorías 1E, 2E,3E y 4E, así como el número de cupos. Categoría 1E 500 Categoría 2E 500 Categoría 3E 500 Categoría 4E 500 En la temporada del 15 de diciembre 2020 al 6 de enero 2021, se mantendrá tarifa por temporada de turistas 1ET $6.100, hasta completar el cupo de los 12.000 vehículos El 10 de marzo de 2021 el alcalde de Santiago de Tolú, José Chadid, se pronunció a través de redes publica informando que celebraba la decisión del gobierno nacional en trasladar el Peaje Caimanera por fuera del corredor Coveñas Tolú, al tiempo que el alcalde de Coveñas Rafael Ospina informó en redes que el mismo sería trasladado entre el corredor turístico San Anterito – Coveñas, sector el Porvenir. Lo anterior generó una serie de rechazo por parte de diferentes sectores políticos y comunitarios del departamento de Córdoba. El 29 de marzo de 2021 La ANI emitió comunicado a la opinión pública en donde informó que en ninguno de los casos el traslado del peaje se realzará en el departamento de Córdoba. Lo anterior, ha disminuido la tensión en redes. El 26 de abril de 2021 se firmó el acta N° 11 declaratoria de la ocurrencia de un EER y consecuente ampliación del plazo para la ejecución de las obras y actividades asociadas las **UF 6.3**, 7.2 y 7.3. En este sentido se reconocerá el tiempo incurrido desde la fecha de suscripción del otrosí 14 – junio de 2018 y hasta que el ministerio de transporte ordene la ubicación definitiva del Peaje Caimanera. El 19 de julio de 2021, el ministerio de Transporte expidió la resolución N° 20213040030335 a través de la cual se estableció tarifas diferenciales en la estación de peaje la Caimanera, para las categorías 1E y 2E, con un valor de $900 durante los fines de semanas viernes 12 pm a domingo 00, y festivos. La citada resolución comenzó a regir a partir del 23 de julio de 2021; sin embargo, el acto administrativo no incluyó la ubicación definitiva para el traslado del peaje. El 23 de julio de 2021, se presentaron movilizaciones en oposición a la operación del peaje Caimanera, liderado por agremiaciones del sector turístico y hotelero, así mismo participaron activamente indígenas y negritudes; durante la movilización hubo cierres temporales en inmediaciones al peaje y hacia el sector del manglar de las Garzas, en el municipio de Santiago de Tolú. https://www.elheraldo.co/sucre/sigue-la-lucha-por-el-desmonte-del-peaje-la-caimanera-836044 El 5 de agosto de 2021 mediante la resolución 20213040034315 se realizan ajustes a los horarios y tarifas fijado en la resolución 20213040030335 del 19 de julio de 2021, al tiempo que define el sitio de traslado del peaje La Caimanera al PR 43+230

		El 19 de agosto de 2021, por solicitud de miembros del consejo del municipio de Tolú y comunidad, se atendió mesa de trabajo a través de la cual se dio respuestas a los contenidos de las resoluciones 20213040030335 del 19 de julio de 2021 y 20213040034315 del 5 de agosto de 2021, al tiempo que se recibió propuesta presentadas por la comunidad, con ocasión de la operación del Peaje La Caimanera. El 28 de septiembre de 2021, por solicitud de miembros de la comunidad del municipio de Tolú, se atendió reunión a través de la cual la Agencia Nacional de Infraestructura dio respuestas a los contenidos de las solicitudes efectuadas en el 19 de agosto de 2021. En octubre de 2021, como novedad se conoció la convocatoria de una marcha organizada por el comité movimiento resistencia peaje el día 23 de octubre de 2021, la cual fue aplazada por los juegos IV versión de Mar y Playa llevados a cabo en los municipios costaneros; se encuentra en monitoreo y seguimiento. En el mes de febrero de 2022 se realizó reunión convocada por el Concejo Municipal de Coveñas Sucre para tratar temas sobre permisos ambientales de las UF 6.3 y 7.3 y localización del Peaje la Caimanera la cual fue atendida por la Interventoría lo anterior conforme solicitud de la ANI. Al cierre del mes de marzo 2022 se presenta como novedad, la negación del aprovechamiento forestal Mediante resolución 0526 del 14 de marzo de 2022 CARSUCRE declaro que no era viable autorizar el aprovechamiento forestal para la construcción del peaje la caimanera; de igual manera el 09 de marzo de 2022 la Concesión volvió a realizar la solicitud del permiso de vertimientos para el peaje. El día 13 de septiembre de 2022, se reporta como novedad la convocatoria de una Jornada de protestas por el peaje La Caimanera, liderada por el comité cívico de resistencia al peaje, a través de un Facebook Live emitido en las redes sociales, en el cual convocan a la comunidad de Santiago de Tolú a bloquear la glorieta de la Intersección 15 cerrando las entradas del Municipio de Tolú, ya que la comunidad estuvo tratando de persuadir al Alcalde Municipal de hacer un acto administrativo para suspender las obras de construcción del peaje la caimanera, lo cual no ocurrió, esta protesta estaría programada para el día 15 de septiembre 2022. El día 15 de septiembre de 2022, desde las 5.00 AM, Inicio el bloqueo de manera pacífica por parte del comité cívico de resistencia al peaje, la comunidad y los diferentes gremios del municipio de Tolú, en la Intersección 15 de las Unidades Funcionales 7.2,7.3 y 8.1, exigiendo la no reubicación del peaje la Caimanera, cabe señalar que, la Concesión Ruta al Mar acudió en atención de la comunidad al lugar donde se encontraba el bloqueo, con el fin de generar un dialogo y buscar soluciones, sin embargo, los representantes del Comité cívico de resistencia al peaje no accedieron, solicitando exclusivamente la presencia de la Presidencia de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI. El día 16 de septiembre 2022, en horas de la mañana se presentó una comisión de la Concesión Ruta al Mar y de la ANI, con el fin de atender la protesta de la reubicación del peaje la caimanera, sin embargo en esta ocasión no se llegó a ningún acuerdo, debido a que la comunidad del municipio de Tolú no acepta el peaje en el corredor turístico entre Tolú y Coveñas, aludiendo que, “los han perjudicado en sus actividades económicas, que están basadas en el turismo, el cual se ha visto afectado por el bajo flujo de turistas que no se dirigen a Tolú por el peaje” ocasionando malestar en la comunidad, quienes se dirigieron al PR 41+150 donde se encuentra ubicado el peaje la caimanera en donde levantaron las talanqueras a la 01:00 pm, manteniéndolas de esta manera, impidiendo el cobro de dicho peaje a todo tipo de vehículos, hasta tanto la ANI defina el futuro del peaje la caimanera. El día 22 de septiembre 2022, se realizó reunión en la gobernación de Sucre para tratar la problemática presentada por el peaje la caimanera, ya que desde el 16 de septiembre a la 1:00 pm las talanqueras se encuentran levantadas impidiendo el cobro del peaje, hacen presencia en la reunión la Senadora Karina Espinosa, Delegados de la gobernación de Sucre, Alcaldes de Tolú y Coveñas, Presidente encargado de la Agencia Nacional de infraestructura, y demás funcionarios

		de la ANI, Interventoría y Concesionario, en este espacio funcionarios de la ANI, exponen las posibles soluciones y sus consecuencias en todos los panoramas. El día 23 de septiembre 2022, se realizó diálogos con la comunidad, en el parque central del Municipio de Tolú, con el fin de escuchar directamente las peticiones, solicitudes y necesidades de esta población y además presentar alternativas de solución a la ubicación del peaje la caimanera, se determinó en dicho dialogo que para la audiencia pública del 28 de septiembre 2022 se establecerán las posibles propuestas y escenarios que permitan superar la crisis de la ubicación del peaje la caimanera. El día 28 de septiembre 2022, se realizó audiencia pública del peaje la caimanera citada por el Municipio de Tolú de fecha 16 de septiembre del 2022 Resolución #471, en el parque principal del municipio en mención, en dicha audiencia se establecieron los siguientes acuerdos: ● No se instalará el peaje en el sector de Palo Blanco. ● No se instalará el peaje en el corredor turístico de Tolú-Coveñas. ● El peaje actual permanecerá en el sitio donde está ubicado actualmente, por un tiempo máximo de 4 meses, y en él no se cobrará tarifa para los vehículos de categorías 1 y 2 (livianos y buses), se cobrará la tarifa a partir de la fecha, únicamente a las categorías 3 en adelante. ● En un mes se realizará nueva reunión en tolú, para informar sitio de reubicación del peaje, en el proyecto por fuera del corredor turístico Tolú-Coveñas. ● Mientras dure el peaje actual (4 meses), se instalar avisos que indiquen el paso libre para las categorías 1 y 2. (el tiempo de 4 meses corresponde a los meses de octubre, noviembre, diciembre del 2022 y enero de 2023). ● La ANI se compromete a realizar con el Concesionario los aspectos de responsabilidad social. ● Se precisa que el paso libre para las categorías 1 y 2, no requiere ningún tipo de registro en plataforma o en físico. Para el día 28 de octubre 2022, estaba prevista reunión, para informar el sitio de reubicación del peaje la caimanera en el proyecto por fuera del corredor turístico Tolú-Coveñas, la cual fue aplazada por el director encargado de la ANI Diego Morales, quien se comunicó con los lideres representantes del comité cívico de resistencia al peaje, fundamentado en falta de tiempo para analizar las alternativas de ubicación de este, se está a la espera de la nueva fecha. El 21 de diciembre 2022 se llevó a cabo reunión con varios lideres del comité de “No al Peaje” de Tolú, delegados de la ANI, Concesión Ruta al Mar e Interventoría, con el fin de lograr concertar más tiempo para analizar las alternativas de ubicación de este argumentando que por la época de vacaciones y la caída del puente bicentenario de lorica hubo atraso para la recolección de datos necesarios para el análisis que arrojara el resultado de la ubicación del peaje La Caimanera, asimismo se concreta fecha para la nueva fecha de reunión antes del 28 de enero de 2023, en la que está previsto el levantamiento del peaje en los acuerdos pactados el 28 de enero 2022, quedando así la reunión para el día 10 de enero de 2023. En el mes de enero del 2023, la reunión estipulada para el 10 de enero 2023, se reprogramo para el día 25 del mismo mes, en esta reunión estaba dispuesto socializar con el comité de No al peaje, un cronograma que permitiera establecer los tiempos para lograr analizar los datos que arrojaría un estudio de tráfico para determinar la reubicación del peaje la caimanera fuera del corredor turístico de Tolú- Coveñas, sin embargo esta reunión no cumplido su objetivo principal ya que los representantes del comité en mención no permitieron el desarrollo de esta, aludiendo que no iban a esperar tanto tiempo sin que se liberara el peaje del corredor turístico, por tal motivo exigieron la presencia de del gobierno nacional para ser escuchados. El día 27 de enero 2023, la Agencia Nacional de Infraestructura convocó al Ministerio de Transporte en cabeza de Guillermo Reyes, además de autoridades locales, regionales y representantes de la concesión Ruta al Mar, para atender a la comunidad de Tolú y dar solución a la problemática de la reubicación del peaje la Caimanera, en este encuentro con la comunidad quedo el siguiente compromiso:

		• Se acordó el traslado provisional del peaje 'La Caimanera' en la variante de Tolú, mientras se construye su ubicación definitiva en la variante de Coveñas durante los próximos meses. • El Gobierno nacional en cumplimiento con los compromisos adquiridos con las comunidades, no cobrará el paso por la estación de peaje La Caimanera (actual) a partir del 29 de enero a las 00:00 horas. Una vez este peaje sea reubicado durante el segundo semestre de 2023, se cobrará en todas las categorías. • Traslado provisional del peaje ubicado en La Caimanera en la variante de Tolú mientras se construye su ubicación definitiva en la variante de Coveñas durante los próximos meses. En el mes de febrero de 2023, se tiene lo siguiente: El día 2 de febrero de 2023, atendiendo los compromisos adquiridos el 27 de enero de 2023, con el ministro de Transporte se realizó un recorrido por la UFI 7.3 perimetral Tolú, por parte de la ANI, La Concesión Ruta al Mar y La Interventoría del Proyecto, con el fin de identificar el punto exacto donde se ubicará de forma provisional el peaje La Caimanera, se estableció teniendo en cuenta los estudios técnicos y topográficos el PR 1+500 de la UFI 7.3. El día 8 de febrero de 2023, la Agencia Nacional de Infraestructura dio inicio a las socializaciones de la ubicación definitiva del peaje La Caimanera con las diferentes comunidades y entes gubernamentales, sin embargo, estas reuniones no se llevaron a cabo en su totalidad, debido a que el comité de NO al peaje se opuso aludiendo que no los tuvieron en cuenta para establecer la ubicación del peaje provisional. El día 16 de febrero de 2023, la ANI realizó una reunión generalizada convocando a toda la comunidad en general, lideres del Comité No al peaje, gremio hotelero y demás entes con el fin de cumplir con las socializaciones del peaje provisional y temporal en la UFI 7.3. El día 24 de julio 2023, mediante rad. 2023603025807, la Agencia Nacional de Infraestructura realizó convocatoria reunión de socialización número 20233040029245 de 11-07-2023, ubicación temporal del peaje la caimanera, Proyecto IP 016 de 2015. El día 03 de agosto de 2023, se realizó la socialización de la resolución número 20233040029245 de 11-07-2023, del 2023 ubicación temporal del peaje la caimanera, Proyecto IP 016 de 2015, por parte de la ANI y a la cual asistieron los miembros del "comité No al peaje" y comunidad en general, cabe aclarar que, a pesar de socializar la mencionada resolución, los presentes no estuvieron de acuerdo con estas condiciones socializadas y se mantienen en la no ubicación del peaje provisional en la perimetral Tolú. El día 20 de diciembre de 2023, se realizó una reunión de socialización con el comité No al peaje del municipio de tolú con el fin de ponerlos en conocimiento sobre la construcción de la caseta de control dispuesta en el PR 43+350 de la UFI 6.3.1 la cual será utilizada para la contabilización de los vehículos mientras se construye el peaje la Caimanera en la UFI 7.2, sin embargo, esta comunidad se mantiene en la posición de no permitir la construcción en este sector. En el mes de abril 2024, se tiene lo siguiente, la Agencia Nacional de Infraestructura ANI ha venido analizando con el Concesionario y la Interventoría, el punto de referencia conveniente para instalar de manera permanente el peaje la caimanera, toda vez que, no se pudo dar cumplimiento a la resolución número 20233040029245 de 11-07-2023, ubicación temporal del peaje la caimanera, Proyecto IP 016 de 2015, la cual mencionaba la UFI 7.3 como lugar temporal para este, sin embargo por oposición del Comité No al Peaje no se pudo concretar dicha instalación, ahora bien, en los análisis realizados se propone colocar el peaje la caimanera de manera permanente en la UFI 7.2 PR16+600 variante Coveñas y caseta de control PR 27+200 vía INVIAS ruta 9004, teniendo esta ubicación se programaron las respectivas socializaciones con las administraciones locales, entidades y comunidades del área de Influencia directa a dicha ubicación, para lo cual se realizó las convocatorias de la siguiente manera: **22/04/2024:** Gobernación de Sucre y Alcaldía _ Concejo Municipal del municipio de Coveñas. **23/04/2024:** JAC, Comunidad Puerto viejo y Comunidad indígena Puerto Viejo (Tolú, Sucre)

		24/04/2024: Comunidad, Gremios de Transportadores, Gremio de Hoteleros, Líder Comunitario del Barrio San José, Ecopetrol, Infantería de Marina y Comunidad del Corregimiento El Porvenir (Córdoba) El día 23 de abril 2024, la ANI, El Concesionario y la Interventoría realizó visita en campo con el fin de verificar y determinar el punto de referencia para el peaje la caimanera ya que el PR16+600 variante Coveñas, sigue estando en el área de Influencia del Municipio de Santiago de Tolú, por lo tanto realizada dicha inspección y teniendo en cuenta los requerimiento técnicos, ambientales, sociales y operativos para la instalación del peaje se estableció que el lugar adecuado corresponde al sector entre el PR 9 y PR 10 en la Variante Coveñas, y una caseta de control en el PR 27+200 Vía INVIAS Ruta 9004. De acuerdo a las socializaciones llevadas a cabo por la Agencian Nacional de Infraestructura ANI, del 22 al 24 de abril del 2024, en el Departamento de sucre, Municipio de Coveñas con el objetivo de informar la Reubicación definitiva del Peaje la Caimanera entre el PR 9 y PR 10 en la Variante Coveñas, se pudo evidenciar que los asistentes no tienen observaciones con relación a esta ubicación , sin embargo, no están de acuerdo con la caseta de control que se tiene prevista en el PR 27+200 Vía INVIAS Ruta 9004, aludiendo, que esta quedaría ubicada en el corredor turístico Golfo de Morrosquillo que conecta a los municipios de San antero Córdoba, Coveñas, Santiago de Tolú y san Onofre, Sucre, además se pudo observar que el comité de No al Peaje perteneciente al municipio de Santiago de Tolú, hizo presencia en las socializaciones realizadas en el municipio de Coveñas, este comité se opone a la instalación del Peaje la Caimanera en los municipios de Coveñas y Santiago de Tolú y también llego a persuadir a los asistentes del municipio de Coveñas a unirse a este comité con el fin de impedir que se ubique el Peaje en el corredor Turístico Golfo de Morrosquillo. En el presente mes de septiembre 2024, la Agencia Nacional de Infraestructura realizó una convocatoria con el fin de socializar la instalación del peaje en el municipio de Coveñas, Departamento de Sucre- Contrato de Concesión bajo el esquema IP N° 016 de 2015- Proyecto Vial Conexión Antioquia-Bolívar, para lo cual las reuniones se programaron los días 25, 26 y 27 del mes de septiembre 2024, de la siguiente manera: **23/09/2024:** Gobernación de Sucre, Alcaldía de Santiago de Tolú, Personería Municipal de Santiago de Tolú, Comité No al peaje. En estas reuniones se pudo evidenciar el inconformismo del departamento de Sucre con la reubicación del peaje La Caimanera, principalmente del Comité No al peaje y el Municipio de Santiago de Tolú, donde el alcalde de este Municipio fue tajante al referirse a la reubicación del peaje la caimanera en el Golfo de Morrosquillo, por su parte la gobernación de Sucre, solicito realizar el ejercicio de socializaciones con los diferentes convocados, para así después hacer una nueva reunión de retroalimentación de estas, con el fin de evaluar lo manifestado por los participantes y así tomar una posición como gobierno departamental. **24/09/2024:** Alcaldía Municipal San Antonio de Palmito, Personería Municipal San Antonio de Palmito, presidenta de las JAC San Antonio de Palmito, presidenta de la JAC Corregimiento Puerto Viejo de Santiago de Tolú, Cabildo Indígena Corregimiento Puerto Viejo de Santiago de Tolú. En estas reuniones, se realizó la socialización de la instalación del peaje la caimanera entre el PR 9+400 y el PR 10+330, de la variante Coveñas, correspondiente a la UFI 7.2 ubicado en el municipio de Coveñas, Sucre, en el caso del municipio de San Antonio de Palmito, la propuesta tuvo buena acogida por parte del alcalde y el personero municipal , así mismo, por lideres de la comunidad, sin embargo en el Corregimiento Puerto Viejo de Santiago de Tolú, no se pudo realizar las socializaciones, toda vez que, los miembros del comité no al peaje persuadieron a los lideres de esta comunidad para que no se llevara a cabo la socialización, por tal motivo aunque asistieron a la convocatoria, no se llevó a cabo la socialización, argumentando que se encuentran en posición de no al peaje en la variante de Coveñas y en el golfo de Morrosquillo. **25/09/2024:** Alcaldía de Coveñas, Personería de Coveñas, Representantes del Gremio Comerciantes Hoteleros, Representante del Gremio de Transportadores, CENIT, Infantería de

UF	Punto critico	Trazabilidad
		Marina, JAC Corregimiento El Porvenir de San Antero Córdoba, Representante del Barrio Torrente Coveñas, Cabildo Indígena Guayabal, Coveñas. Para este día, no se pudo llevar a cabo la reunión de la alcaldía de Coveñas debido a que la alcaldesa se encontraba por fuera de la ciudad, sin embargo, aunque los demás representes de la comunidad y de los gremios citados, asistieron a la convocatoria, esta socialización no se llevó a cabo, ya que nuevamente el comité No al peaje estuvo en el sitio dela reunión y no permitió el ingreso de los participantes a esta, aludiendo que no permitirán un peaje en la variante de Coveñas y en el golfo de Morrosquillo. Ahora bien, el día 25 de septiembre de 2024, en horas de la tarde, la gobernación de Sucre solicitó a la ANI la retroalimentación del trabajo en campo con los actores convocados en los diferentes territorios, esta reunión tuvo representantes de la cámara del departamento de sucre, además delegados del comité no al peaje, desde la Agencia se realizó la retroalimentación de las reuniones llevadas a cabo los días programados 23, 24 y 25 de septiembre 2024, y se explicó a los presentes la negativa de la reubicación del peaje la caimanera encontrada en el sector, así mismo, la ANI se encargó de socializar las consecuencias de la no instalación del este peaje en el departamento de Sucre, con esta Información La Gobernación de Sucre reitera que no se opone a la Instalación del Peaje la Caimanera, pero prefieren que no sea en Sucre, sin embargo proponen realizar unas mesas de trabajo para evaluar alternativas conjuntamente ya que no desconocen la necesidad de la instalación del peaje la caimanera. El 08 de octubre 2024 se realizó la Asamblea General del Departamento de Sucre, convocó a la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, a una sesión ampliada para socializar la propuesta de instalación del peaje La Caimanera en el municipio de Coveñas, ubicado en el departamento de Sucre, con la finalidad de buscar generar un espacio de diálogo entre las autoridades locales, la comunidad y los sectores involucrados, con el objetivo de evaluar los impactos económicos y sociales de la medida, así como escuchar las inquietudes y sugerencias de los habitantes de la región. El día 27 del mes de agosto 2025, el Ministerio de Transporte publico el borrador de la Resolución *RAD_S* de *F_RAD_S* **RAD_S** de la reubicación del **Peaje la Caimanera** en el PR9+625 de la Ruta Nacional 9004A, denominada Variante Coveñas, con el objetivo de dar a conocer a los usuarios de la comunidades y usuarios de la vía, el Punto de referencia donde se proyecta reubicar la caseta del peaje y asimismo dar a conocer la estructura tarifaria, además, conocer sugerencias y comentarios sobre la misma. El día 03 de septiembre 2025, se presentó bloqueo en la UFI 6.3 Puerto Viejo del municipio de Tolú PR 41+400 y el PR 20+700 de la Variante Coveñas, por parte de las comunidades de Coveñas y Tolú quienes manifestaron estar en contra de la instalación de la caseta del peaje La caimanera en la variante Coveñas, el bloqueo fue atendido por la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, dejando como compromiso realizar una mesa de concertación con estas comunidades el día 08 de septiembre 2025, con el fin de revisar la permanencia del peaje la caimanera. El día 11 de septiembre 2025, se realizó la mesa de concertación que estaba prevista para el día 08 de septiembre, con el fin de revisar la permanencia del Peaje la Caimanera “propuesta en la Unidad Funcional 7-2 Variante Coveñas PR 9+625 de la Ruta Nacional 9004A” en el Departamento de Sucre, en la cual asistieron los funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, Ministerio de Transporte, lideres sociales convocados, autoridades Municipales y Gubernamentales, por parte de la ANI se expone el alcance, las características y las acciones previstas llevadas a cabo en el marco del proyecto, exponiendo la trazabilidad de la Resoluciones

UF	Punto critico	Trazabilidad
		emitidas por el Ministerio de Transporte, en las cuales se evidencia beneficios de Tarifas Diferenciales Especiales, para las comunidades y usuarios de la vía en el tramo de los municipios de Coveñas y Santiago de Tolú pertenecientes al Departamento de Sucre, además, informa la importancia de la participación de las comunidades en el crecimiento y desarrollo integral del País, se aclaró que la vía existente conocida como corredor turístico de Coveñas y Santiago de Tolú, quedaría libre de Peaje, puesto que en el borrador de la Resolución publicada en el Ministerio de Transporte informa que el peaje estaría en la Unidad Funcional 7-2 Variante Coveñas PR 9+625 de la Ruta Nacional 9004A. También se les dio la palabra a los asistentes quienes en sus intervenciones expusieron las razones por las cuales se oponen a la instalación del peaje alegando "crisis del sector del turismo, perjuicios en la economía de los tuludeños, no han recibido beneficios de los peajes, entre otros". Desde el Ministerio de Transporte manifestando que "es muy importante el turismo y como Estado donde la infraestructura ha mejorado, ha mejorado el turismo con la conectividad. Es una mesa de escucha y concertación donde se toman las notas y se llevan las inquietudes, también se debe analizar que donde el Gobierno lleva los proyectos estructurados, es poderlos ejecutar, estas mesas de concertación y diálogos buscan llegar a acuerdos y propuestas, con garantías para las comunidades, no es el espacio físico, si no mirar el impacto para el proyecto, donde se busquen alternativas respetando los acuerdos". Conclusiones: • Se sugiere al comité No al Peaje crear un correo con el fin de mejorar la comunicación con todos los miembros. • **Primera Propuesta:** Ruta a seguir nueva sesión de trabajo, con previas mesa técnica de concertación las cuales se fijarán un cronograma de fechas. • **Segundo:** Presentar los estudios y diseños del Puente Boca de la ciénaga de la Caimanera. • **Tercero:** El Ministerio de Transporte quien es la entidad de competencia y tiene la responsabilidad de ampliar o prorrogar el plazo de publicación de la Resolución, lo consideramos pertinentes hay que estudiarlo hasta donde se puede ampliar el plazo de la publicación. • **Cuarto:** Desde la ANI y de la mano con el Ministerio desde ya hay un compromiso de revisar las propuestas o solicitudes que se han hecho de los sectores y gremios relacionados con el Peaje de Tolú Viejo. • **Quinto:** Dentro de las notas técnicas * Estudio de Impacto socioeconómico *Todo lo relacionado con la Planeación el desarrollo del territorio, que incluya no solo a la comunidad si no a las autoridades territoriales, Gobernación de Sucre y alcaldías municipales para revisar todo lo referente al Plan de Ordenamiento Territorial. En el mes de octubre 2025, se programó reunión convocada por la Agencia Nacional de Infraestructura, mediante Rad.No.20253050384941, con asunto: Complemento Invitación a mesa de socialización – Estudios y Diseños puente ubicado en el PR 36+0850 de la Ruta Nacional 9004 Puente Boca de la Ciénaga municipio de Coveñas (Sucre) y Reubicación Peaje La Caimanera- Contrato de Concesión No 016 de 2015. Proyecto de Concesión IP Conexión Antioquia Bolívar. Que se llevaría a cabo el día 22 de octubre 2025, en la IE La Martha sede Boca de la Ciénaga, ahora bien, la reunión se realizó el día 22 de octubre 2025, con la comunidad de Boca de la Ciénaga, sin embargo, el comité NO al peaje y los demás convocados al tema de Reubicación Peaje La Caimanera, no asistieron. En esta reunión se trató el tema referente a Estudios y Diseños puente ubicado en el PR 36+0850 de la Ruta Nacional 9004 Puente Boca de la Ciénaga municipio de Coveñas (Sucre), para ello se contó con la asistencia representantes de la comunidad de Boca de la Ciénaga, la personería y secretaría de infraestructura del municipio de Coveñas y la defensoría del pueblo. El 12 de noviembre de 2025, se expidió la RESOLUCIÓN NÚMERO 20253040046605, *"Por la cual se modifica la Resolución No.20213040034315 del 05 de agosto de 2021, la Resolución No. 20233040029245 del 11 de julio de 2023, y se emite concepto vinculante previo a la reubicación del Peaje denominada La Caimanera del proyecto de Asociación*

UF	Punto critico	Trazabilidad
		Público-Privada para la conexión de los departamentos de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar, y se dictan otras disposiciones" El día 24 de noviembre 2025, se presentó bloqueo por parte del comité NO al peaje, la comunidad, el gremio hotelero y comercial del municipio de Santiago de Tolú, en consecuencia a la publicación de la RESOLUCIÓN NÚMERO 20253040046605, exigiendo que dicha resolución sea derogada y sea reversada la autorización de ubicar el peaje la caimanera entre los municipios de Coveñas y Santiago de Tolú, en la variante Coveñas UFI 7.2 PR 9+625, los bloqueos se concentraron en tres puntos específicos Glorieta Palo Blanco PR 43+355 UFI 6.3, en la variante de Coveñas, sector Puerto Viejo PR 20+700 UFI 7.2 y en el puente la caimanera PR 36+800 UFI 6.3, adicionalmente hubo cierre de 2 sectores más en el PR 5+900 de la UFI 7.3 y el PR 49+700 de la UFI 8.1. En el trascurso del día se activó el PMU del municipio de Santiago de Tolú liderado por la secretaria de gobierno municipal a través de la plataforma TEAMS, en el cual informan que tras reunirse con los lideres del bloqueo plantearon las siguientes solicitudes: • Presencia de la ministra de Transporte y presidente de la ANI o en su defecto funcionario con poder de decisión • Derogación de la resolución N° 20253040046605 • Se mantiene el bloqueo hasta que no sean atendidas las peticiones de los lideres y hasta que haya dialogo con Ministerio de Transporte y ANI. Cabe destacar que, por parte de la ANI se dejó claro que, no son necesarias las vías de hecho, puesto que independientemente a la Resolución del Ministerio de Transporte No.20253040046605 del 12 de noviembre de 2025, la reubicación de la estación de peaje no sería inmediata, y que esta, solo se dará, una vez se logre alcanzar con la comunidad los acuerdos a los que haya lugar para que esta permita su instalación. El 25 de noviembre 2025, la concesión ruta al mar envió comunicados a los diferentes entes territoriales del sector, de asunto: SOLICITUD DE INTERVENCIÓN URGENTE ANTE AMENAZAS DE INCENDIOS A LA CASETA DE CONTEO CAIMANERA (CONTAINER) PR 41+150, a la gobernación de Sucre y a las Alcaldías de Tolú y Coveñas. El 26 de noviembre 2025, el Concesionario mediante comunicado Radicado: 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20251126010643, envió a la Agencia un oficio de asunto: Bloqueos de la vía concesionada por expedición de la Resolución Mini Transporte No. 20253040046605 del 12 de noviembre de 2025 –reubicación estación de peaje La Caimanera en el cual, advierte que la ANI será responsable por los daños materiales, operacionales, económicos y de seguridad que la conflictividad generada por la Resolución 2025304004660 produzca sobre el Proyecto, sus colaboradores, los usuarios y la infraestructura a cargo de la Concesión Ruta al Mar. El 26 de noviembre 2025, mediante los diferentes medios de comunicación se conoció que, la Gobernadora del departamento de Sucre la Sra. Luz García Montes, sostuvo una reunión privada con la ANI en la ciudad de Bogotá, para buscar solución a la oposición departamental en contra de la reubicación del peaje la caimanera entre los municipios de Coveñas y Santiago de Tolú, en dicha reunión quedo como compromiso que los directivos de la ANI asistirán a una mesa de trabajo con la administración departamental y los representantes de los diferentes gremios, para escuchar los argumentos de estos en contra a la instalación del peaje la caimanera en el golfo de Morrosquillo.

UF	Punto critico	Trazabilidad
		Seguidamente de esta noticia, se hizo levantamiento del bloqueo en los diferentes sectores de las UF 6.3, UF 7.2, UF 7.3 Y UF 8.1. En el mes de diciembre 2025, se tiene que, el día 05 de diciembre se realizó mesa de trabajo concertada por la gobernación de Sucre y la oposición a la reubicación del peaje la caimanera, en el Municipio de Santiago de Tolú con el objetivo de cumplir con el compromiso adquirido por la ANI a raíz de las manifestaciones del 24 de noviembre 2025 en negativa a la reubicación del peaje la caimanera en la UFI 7.2 Variante Coveñas, en esta reunión los representantes de la comunidad, el comité No al peaje y la Gobernación de sucre, manifestaron las razones sobre el impacto social y económico al cual se enfrentarían con la ubicación del peaje en el golfo de Morrosquillo, después de escuchadas las intervenciones, el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI Oscar Torres dio a conocer toda la parte jurídica y financiera del proyecto, además las alternativas evaluadas incluidas las gestiones adelantadas para la infraestructura del puente boca de la ciénaga, entre las opiniones de la comunidad se propone que se evalué el cobro de $200 pesos en todos los peajes del país con el fin de no reubicar el peaje la caimanera, a esto se explica que el proyecto es de Iniciativa Privada por lo cual no se puede hacer este tipo de recaudo, por otro lado el alcalde de Santiago de Tolú solicitó que se consulte sobre un recaudo al que se refiere la resolución portuaria, por otra parte con respecto al sitio donde se va a reubicar el peaje PR 9 es un área de expansión urbana de los municipios de Tolú y Coveñas y zonas de reserva y protección, esta zona fue analizada de acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial existente el cual determina que el uso del suelo es del área de la ganadería, la comunidad invita a que se busquen otras alternativas para no ubicar el peaje en el golfo de Morrosquillo, además la gobernadora de Sucre propone analizar el corredor turístico y ambiental del golfo para no ubicar el peaje la caimanera en esta zona. En esta reunión se determina la siguiente ruta metodológica en aprobación de las comunidades, gobernación de Sucre, el municipio e Tolú y la ANI: Conclusiones: • La ANI escucho propuestas para definir el futuro del peaje la caimanera. • Las comunidades y los entes gubernamentales de sucre y Santiago de Tolú se oponen con un rotundo No a la reubicación del peaje la caimanera en el golfo de Morrosquillo. • Como compensación por la no instalación del peaje la caimanera, proponen tomar los recursos que dispone la ley primera de puertos para el mantenimiento de la vía. • Evaluar la alternativa de que el peaje la esperanza y/o las flores, sea recaudado por la concesión ruta al mar. • La ANI debe fundamentar con argumentos jurídicos, técnicos, ambientales y sociales para no ubicar el peaje la caimanera en el golfo de Morrosquillo. Del 01 al 30 de septiembre 2026, no se tienen novedades.

UF	Punto critico	Trazabilidad
7.1	El diseño contractual (Costado derecho), no es aprobada por parte de las autoridades locales, y comunidad. Según la comunidad existen asentamientos indígenas, afro y pescadores con el trazado aprobado, y consideran afectará gravemente la Ciénaga Grande de Lorica. El trámite de sustracción del DRMI ciénaga de Lorica, costado oriental optimizado, no ha sido aprobado por el concejo directivo CVS. Existe una Acción Popular interpuesta por el señor Manuel Salvador Nule Rhenals, en desacuerdo con el trazado y diseño de la UF 7.1 Variante Lorica. Actualmente sigue vigente. El juzgado quince laboral del circuito de Bogotá, admitió la tutela 606 de 2019, interpuesta por el señor Miguel Antonio Negrete Carrascal, en su calidad de	**SUSTRACCIÓN DRMI** El 24 de noviembre de 2016, La Concesión mediante radicado N° 6670, presentó ante la CVS solicitud de sustracción del DRMI del Complejo del Bajo Sinú para la construcción de la variante Lorica – DRMI Ciénaga de Lorica. EL 12 de diciembre de 2016, La CVS mediante Auto No 822 dio inicio al trámite de solicitud de sustracción. **AQUÍ INICIA LA TRAZABILIDAD DE LA MEDIDA CAUTELAR** El 15 de febrero de 2017, Manuel Salvador Nule interpuso una acción popular ante la Sala Tercera de decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba, radicado 23-001-23-33-000-2017-00008-00, en el que se vincula a la CVS, ANI y Concesión. El accionante solicitó suspender las obras de construcción de la UF 7.1 variante Lorica, argumentado derecho a un ambiente sano y previniendo afectaciones al DRMI. El 22 de febrero de 2017, la Concesión radicó memorial contra la solicitud de medida cautelar, en el mismo sentido la ANI y la CVS realizaron los respectivos alegatos ante el tribunal administrativo de Córdoba. El 17 de diciembre de 2017, el tribunal administrativo de Córdoba ordenó la suspensión de obras hasta tanto se profiera sentencia dentro del proceso. El 14 de febrero de 2018, la Concesión mediante radicado N° 2018-409-015458-2 solicita ante la ANI el reconocimiento de un EER por la imposibilidad de iniciar y cumplir el plan de obras, debido a la decisión del tribunal administrativo de Córdoba. **El 27 de marzo de 2018, las partes del Contrato de Concesión, suscribieron el acta N° 1 de reconocimiento de un evento eximente de responsabilidad EER**, con ocasión al decreto de medida cautelar por parte del Tribunal Administrativo de Córdoba, dentro de la Acción Popular interpuesta por Manuel Salvador Nule Rhenals. El 4 de mayo de 2018, el Consejo de estado, resolvió confirmar el auto a través del cual decretó la medida cautelar de suspensión de las obras, y ordenó vincular al proceso al a la ANLA y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El 25 de septiembre de 2018, se le notificó a la Concesión audiencia pacto de cumplimiento, el cual se desarrolló el 26 de octubre de 2018 a las 10:00 am, dicha audiencia no se llevó a cabo dado que los tribunales se encontraban cerrados para la fecha; finalmente, el 14 de noviembre de 2018 se desarrolló la audiencia, pero está se declaró fallida por la no asistencia del representante del ministerio de ambiente. El 6 de mayo de 2019, se radicó escrito de alegatos de conclusión, solicitando que se levantara la medida cautelar de suspensión de las obras, considerando que, a nuestro juicio, con la construcción de la Variante Lorica no se vulneran los derechos colectivos invocados. El 12 de noviembre de 2020, se profirió fallo de primera instancia, exhortando a la ANI y al Concesionario emplear tecnologías y técnicas de construcción que garanticen que el impacto ambiental a generar sea el mínimo posible, garantizando la preservación de los componentes

	apoderado de las comunidades indígenas La Palma, El Carito, El Bolao las Estancias, La Esperanza en el municipio de Lorica y La Rusia y Chuchcuribí en el municipio de Cereté	señalados en la parte motiva, evitando de ser posible el uso de terraplenes y que se implementen las medidas de manejo, de mitigación y de control requeridas por los impactos ambientales. El 22 de noviembre de 2020 dentro del término legal para hacerlo, la ANLA y el Ministerio de Ambiente interpusieron el recurso de apelación en contra de la decisión proferida. El 8 de abril de 2021, la Sección Primera del Consejo de Estado, admitió el recurso presentado por la ANLA y el Ministerio del Medio Ambiente. En el mes de febrero 2023, mediante Radicado: 47-RUTADCTOELECTRONICOS-20230208004508, la concesión Ruta al Mar fue notificada por parte del Consejo de Estado, sobre fallo de acción popular interpuesta por Manuel Salvador Nule Rhenals, hasta la fecha del presente informe el Concesionario no se ha manifestado. **SE RETOMA LA TRAZABILIDAD DEL TRÁMITE DE SUSTRACCIÓN CVS.** El 4 de mayo de 2017, La Concesión mediante oficio N°2477, presentó la información adicional solicitada para la continuidad del trámite. El 26 de mayo de 2017, La CVS mediante oficio N° 090.2249, convocó reunión con el fin de socializar los ajustes requeridos en el oficio 090.824, los que a su vez fueron atendidos por la Concesión en su comunicado N° 2477 del 4 de mayo de 2017. El 18 de agosto de 2017 se emitió comunicado a través de la WEB de la corporación en donde se da a conocer los argumentos de esta entidad para la NO sustracción del DRMI. El 18 de septiembre de 2017 la corporación CVS envió comunicado al presidente de la República informado los motivos para la NO sustracción del DRMI. En octubre de 2017 se realizaron mesas de trabajo con la CVS y se acordó que la Concesión presentaría el diseño mejorado a la opción contractual, lo cual se cumplió por parte de la Concesión el 23 de septiembre de 2017. El 15 de noviembre de 2017, la Concesión presentó ante la CVS, con radicado N° 6798 los ajustes requeridos durante las mesas técnicas de trabajo realizadas entre las partes. El 18 de abril de 2018, el equipo técnico de la CVS mediante concepto técnico ALP-2018-178 en el cual considera que los ajustes presentados por la Concesión son acordes a las condiciones hidráulicas, hidrológicas, hidrodinámicas y ecosistémicas del complejo cenagoso del bajo Sinú, dando traslado a la honorable secretaría del Consejo Directivo CVS. Lo anterior, fue notificado a la Concesión mediante radicado N° 3850 del 18 de junio de 2018. A través del comunicado N° 060 2602 del 23 de abril de 2018 la corporación CVS invitó al presidente de la ANI a sesión del consejo directivo, con ocasión de escuchar los argumentos de la solicitud del trámite se sustracción. El 26 de abril de 2018 se llevó a cabo consejo directivo de la corporación CVS, con representantes de la ANI, Concesión e Interventoría en donde se expuso el estado del trámite, sin embargo, no se tomó decisión de aprobación o negación, en lo que respecta al trámite. La ANI a través del radicado N° 2018 605 012885 – 1 del 27 de abril del 2018 presentó derecho de petición en atención a la solicitud de sustracción definitiva del distrito de manejo integrado – DRMI. **El 30 de mayo de 2018** el consejo directivo de **la CVS negó** mediante Acuerdo N° 362, confirmado a través de Acuerdo N° 371 del 23 de agosto de 2018 la solicitud de sustracción del DRMI con **3 votos a favor** y **10 en contra**. A continuación, el nombre de los consejeros del NO: Jorge Doria Corrales y Álvaro Pineda Naranjo – Sector Privado, León Jaime Zapata y David Salcedo – ONGs, Franklin Córdoba – Afrodescendientes, José Manuel Peñate – Indígenas, Nancy Jattin – Alcaldesa Lorica, Juan Custode Vivanco – alcalde Chimá, Teresa Salamanca – alcalde Chinú y Ovidio Hoyos – alcalde de Pueblo Nuevo; Los consejeros que votaron A FAVOR FUERON: Natalia López –

		Delegada de Presidencia, Ana Carolina Mercado – Delegada Gobernación y Omar Guevara – Delegado de Min Ambiente. El 12 de junio de 2018 la Concesión interpuso derecho de petición de documentos (Copia del concepto técnico ALP-2018-178) Rad N°3522. El cual fue respondido por la CVS el 18 de junio de 2018 a través del comunicado N°3850 - concepto técnico referente a la negativa de sustracción del DRMI. La Concesión Mediante radicado N°3749 del 26 de junio de 2018 interpuso recurso de reposición al concepto de la CVS El 7 de septiembre de 2018, el Concesionario mediante oficio con radicado ANI No 20184090923492 informó a la Agencia, la negativa de sustracción por parte del Consejo Directivo y solicitó EER derivado de la decisión de la autoridad ambiental. **El 18 de diciembre de 2018, se suscribió el acta No 4. A través de la cual las partes reconocen la ocurrencia de un EER derivado de la negativa de sustracción del DRMI**, sin embargo y dado que la CVS le solicitó a la Concesión una permeabilidad del 80% lo cual implicaría iniciar un nuevo trámite de licencia ante la ANLA y trámite de sustracción ante la CVS, es obligación de la Concesión agotar la gestión ambiental que permita obtener o no la autorización por parte de las autoridades ambientales pertinentes. Por lo anterior, se acepta que no es posible cumplir con los tiempos aprobados en el plan de obras, no obstante, lo anterior no implica el reconocimiento de costos económicos ya que las obras no se han realizado, por suspensión judicial y negativa de sustracción. **El 14 de marzo de 2019 la ANLA negó licencia ambiental** con fundamento a la negación de sustracción del DMI Ciénaga de Lorica por parte del concejo directivo de la CVS. La Concesión surtirá un nuevo proceso de licenciamiento ambiental. El 6 de mayo de 2019 la Concesión presentó nueva solicitud de sustracción ante CVS mediante radicado 48-147-20190502008621, al cual la CVS abrió auto de inicio el 30 de mayo de 2019. Este trámite aún continúa abierto, hasta tanto la corporación CVS a través de su concejo directivo aprueben o nieguen la sustracción, sin embargo, en líneas siguientes se describen los avances. **AQUÍ INICIA LA CONSULTA PREVIA VÍA JUDICIAL – TUTELA 606 2019** El 25 de septiembre de 2019 el juzgado quince laboral del circuito de Bogotá, notificó la tutela 606 de 2019, interpuesta por Miguel Antonio Negrete Carrascal, en su calidad de apoderado de las comunidades indígenas La Palma, Bellavista, Guayabal Punta Seca, Bajo Grande, El Carito, Lorica Zenú, Bolao las Estancias y Naranjo N° 2, ordenando la inclusión de estas comunidades en los procesos de consulta previa de la UF 7.1 Variante Lorica. El 26 de septiembre de 2019 la Concesión presentó dentro del término otorgado por el despacho, el informe de contestación a la acción de tutela Numero 2019-606. El 17 de octubre de 2019 la Concesión mediante radicado N° 2019-409-109713-2 solicito reconocimiento de EER derivado por el fallo de tutela 606. El 31 de octubre de 2019 La ANI mediante radicado N° 20193110373681 (recibido en esta Interventoría el 8 de noviembre de 2019) solicitó concepto sobre el reconocimiento del EER tutela 606. El 13 de noviembre de 2019 a través del telegrama N° 6953 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá notificó a la Concesión Ruta al Mar el fallo de segunda instancia tutela N° 0152019-606-00 declarando la NULIDAD de todo lo actuado por el juzgado 15 laboral, en el auto fechado 16 de septiembre de 2019. El 25 de noviembre de 2019 el juzgado 15 laboral del circuito de Bogotá resolvió tutelar nuevamente los derechos de las comunidades indígenas y ordena al Ministerio del Interior y a la Concesión adelantar la Consulta Previa dentro de los siguientes 3 meses.

		El 25 de noviembre de 2019 la Interventoría mediante comunicado CI.023/AB4955/19/5.3 emite concepto, concluyendo que **no considera pertinente el reconocimiento del EER**, respondiendo de este modo el requerimiento ANI - comunicado N° 20193110373681 El 26 de noviembre de 2019 el Ministerio del Interior da respuesta al juzgado quince, mediante OFI19-52518-DCP-2500 en donde solicitó revocara el fallo en primera instancia. Por su parte, el 29 de noviembre de 2019 la Concesión impugnó el fallo del juzgado 15 laboral (Lo expresó verbalmente la Concesión en comité mensual de Interventoría). El 10 de febrero de 2020 el tribunal superior del distrito judicial de Bogotá notificó a través del telegrama 8802 la providencia – Tutela de segunda instancia – N° 015-2019-606-02 en segunda instancia y se ordena iniciar la consulta previa con seis (6) comunidades étnicas: La Palma; El Bolao la Estancia; Nueva Esperanza; El Carito; Esperanza de Chuchurubí y La Rusia. **El 12 de febrero de 2020 La ANI mediante radicado N° 2020-31-004207-1 niega el reconocimiento del EER** con ocasión del fallo de tutela N° 606 de 2019. Posteriormente, el Concesionarios mediante radicado ANI N° 20204090922562 manifestó desacuerdo con las conclusiones las que se fundamentó la ANI para negar el EER. El 13 de febrero de 2020 se desarrolló reunión de coordinación entre el ministerio del Interior, La Concesión, ANI e Interventoría con el objetivo de definir la ruta de cumplimiento del fallo El 4 de marzo de 2020 se realizó una segunda reunión de coordinación en el Min Interior, sin embargo, no se estableció fecha para el inicio de la Consulta. En julio de 2020 el consejo directivo de la corporación emitió comunicado en el que sujeta el pronunciamiento de sustracción al cumplimiento de la Consulta Previa, de acuerdo a lo establecido en el fallo de tutela. El 22 de septiembre de 2020, La Concesión mediante radicado No. 48-147-20200922015613 reafirma la necesidad de que se le reconozca un EER con ocasión del desarrollo de las Consultas Previas ordenadas en fallo de tutela de segunda instancia N° 015-2019-606-02 del 30 de enero de 2020 El 25 de septiembre de 2020, se realizó reunión de coordinación entre la DANCP, CORUMAR, ANI e Interventoría, en donde se pospuso abordar la CP en 4 meses, contados a partir del 14 de octubre de 2020. Le corresponde al Ministerio del Interior confirmar. El 21 de octubre de 2020, la Interventoría mediante comunicado CI.023/AB6656/20/5.3 presentó concepto considerando procedente el reconocimiento del EER solicitado por la Concesión con radicado No. 48-147-20200922015613 del 22 de septiembre de 2020, sobre el que a su vez la agencia mediante comunicado ANI No. 2020-3110291411, requiere concepto a la Interventoría. El 29 de octubre de 2020 se realizó la apertura del proceso de Consulta Previa, en cumplimiento a la tutela sentencia 606 de 2020. El 11 de noviembre de 2020, la Concesión mediante radicado N° 48-147-20201110016410 presentó la ruta metodológica para el desarrollo de la Consulta Previa, fallo de tutela en segunda instancia del 30 de enero de 2020. Las partes acordaron un tiempo de 4 meses a partir de la apertura del proceso consultivo. (se propuso protocolizar entes de finalizar el mes de marzo de 2021) El 18 de noviembre de 2020, la Interventoría mediante comunicado AB 6773 aprobó la ruta metodológica propuesta por la Concesión, en tiempos y recursos. El 25 de noviembre de 2020, La Concesión mediante radicado 48-147-20201125016690 informó el contenido de la sentencia 12 del 18 de noviembre de 2020 del tribunal administrativo de Córdoba, a través de la cual se presentó una serie de consideraciones relacionadas con la medida

		cautelar Manuel Salvador Nule Rhenals y los modos procedentes en los escenarios que se avance con el licenciamiento ambiental y sustracción DRMI Lorica. El 9 y 11 se diciembre de 2020 se realizó la etapa de identificación de impactos con los cabildos tutelantes El 20 de enero de 2021 se surtió reunión en la etapa de identificación de impactos y medias de manejo, cabildo la Palma con miembros del equipo asesor y comunidad, en este espacio, sea propuesto por parte de los tutelantes realizar un recorrido el día 21 de enero de 2021 con el objetivo de revisar las obras del puente chimailito en época de verano, lo cual se hizo en la fecha y lugar solicitado; posteriormente, el 22 de enero de 2021 se realizó taller de capacitación en Consulta Previa, en el corregimiento del Carito, actividad liderada por la DANCP. El 22 de febrero de 2021, la Interventoría mediante comunicado CI.023/AB7220/21/5.3 **presentó un alcance** al comunicado CI.023/AB6656/20/5.3 del 21 de octubre de 2020, en este comunicado, la Interventoría consideró que los tiempos aprobados mediante el comunicado AB 6773 del 18 de noviembre de 2020, permitían superar lo ordenado en el fallo de segunda instancia, por lo tanto, al encontrarse dentro de los tiempos previsibles para resolver el cumplimiento a la tutela 606 de 2019, no se consideraba procedente el reconocimiento del EER. El 19 de marzo de 2021 se protocolizó el proceso de Consulta Previa con los seis cabildos accionantes. El 26 de marzo de 2021 la Concesión radicó ante CVS las actas de protocolización en cumplimiento a lo ordenado en el fallo de tutela de segunda instancia N° 015-2019-606-02 del 30 de enero de 2020, en los términos establecidos en el artículo 5° del acuerdo N° 312 de 2016. El 20 de abril de 2021 la Concesión radicó derecho de petición ante la CVS mediante comunicado N° 20211102937 del 20 de abril de 2021, en donde se requiere conocer la fecha en la cual será notificado el Acuerdo del Consejo Directivo que resuelve la solicitud de sustracción definitiva del DRMI del CCBS El 10 de mayo de 2021 La CVS mediante oficio N° 20212103820 le indicó a la Agencia que, en la sesión de consejo directivo del 18 de mayo del 2021, se decidiría sobre la solicitud de sustracción (En esta cesión, el Consejo Directivo pospuso la decisión hasta tanto se resuelva la medida cautelar) El 18 de mayo de 2021 el Concesionario mediante radicado N° 48-147-20210518019006 del presentó nuevamente Derecho de Petición ante el Consejo Directivo CVS requiriendo que en el término máximo de diez (10) días hábiles, de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 1755 de 2015, indique la fecha en la será notificado el Acuerdo del Consejo Directivo que resuelve la solicitud de sustracción definitiva del DRMI Lorica. El 30 de julio de 2021, la Agencia mediante comunicado ANI 20213110231631 negó el reconocimiento del EER invocado por el Concesionario con ocasión del fallo de tutela en segunda instancia sentencia N°015-2019-606-02 del 30 de enero de 2020, ya que el proceso consultivo se desarrolló dentro de los tiempos acordados entre las partes, con lo que se dio cumplimiento a lo ordenado por el tribunal; de otra parte, se concluyó que el inicio del plan de obras actualmente se encuentra suspendido hasta tanto se resuelva la medida cautelar y la sustracción del DRMI, condiciones que fueron reconocidas por la agencia en sus actas 1 y 4, respectivamente. Al cierre del presente mes – abril de 2023 – no se ha notificado respuesta por parte de la corporación CVS, en cuanto al trámite de sustracción. sin embargo, se debe hacer seguimiento al avance del trámite, toda vez que, está en proceso un nuevo Otrosí con el cual y de conformidad con los análisis realizados a través de las mesas de trabajo desarrolladas, y en las cuales fueron evaluadas las alternativas propuestas por las Partes, se concluyó que lo más conveniente de cara a la ejecución del proyecto dentro de la mejor alternativa es la modificación del alcance previsto inicialmente para el Subsector 1 de la Unidad Funcional 7.

		Así las cosas, el Concesionario contrató con una firma especializada la elaboración de un estudio de prefactibilidad para explorar posibles soluciones viales alternas a la no construcción de la variante de Lorica, teniendo en cuenta la condición que presenta la misma derivada de la dificultad con los trámites ambientales que viabilicen su construcción, presentando a consideración dos alternativas en etapa de prefactibilidad; de lo anterior, la Interventoría inició su estudio para pronunciamiento el cual se estará presentando a más tardar a mediados del mes de abril de 2023. El día 30 de abril 2024, se llevó a cabo reunión con la Agencia Nacional de Infraestructura con la administración municipal y la comunidad de lorica, esta última conformó un Comité llamado. "Trabajemos por Lorica" quienes son los que están en frente de las mesas de trabajo realizadas con otras entidades como la CVS, Personería, INVIAS y ANI, con el objetivo de encontrar una solución para la movilidad del paso urbano del municipio de Lorica. En el mes de mayo 2024, se conoció que la CVS notificó al Concesionario el Acuerdo del Concejo Directivo No. 522 de fecha 11 de marzo de 2024, por medio del cual niega la solicitud de revocatoria del Acuerdo No. 509 del 26/09/2023 y por el cual se resolvió una solicitud de Sustracción del Distrito de Manejo Integrado del Complejo Cenagoso del Bajo Sinú – CCBS que había presentado el Concesionario; así las cosas, la CVS deja en firme la negación de sustracción del DRMI del CCBS a la vez que informa que se podrá presentar una nueva solicitud de sustracción que se ajuste a los requerimientos de la Corporación. En el mes de junio 2024, se continuaron las mesas de trabajo con la administración municipal y la comunidad de lorica, Comité llamado: "Trabajemos por Lorica" con el fin de buscar soluciones para que se realice la variante lorica, sin embargo la ANI y La Concesión Ruta al Mar, han dejado claro que se está analizando el contrato para desafectar ese tramo que corresponde a la UFI 7.1 Variante Lorica del proyecto, ya que esta no se podrá realizar por las condiciones expuestas en el pronunciamiento del consejo de estado, sin embargo la comunidad de lorica exige la variante y se muestran en desacuerdo con mejorar el paso urbano de este municipio en compensación por la no realización de la misma, por lo que han manifestado que bloquearan el peaje mata de caña si pronto no se resuelve la situación, en este sentido anuncian que realizaran una mesa de trabajo donde esperan que participen las entidades competentes con poder de decisión para tomar decisiones sobre la situación de movilidad del municipio de Lorica. En el mes de agosto 2024, La Agencia Nacional de Infraestructura y El Concesionario manifestaron en audiencia del consejo de Estado que se presentara la desafectación de la variante Lorica del proyecto Antioquia-Bolívar, por lo cual el comité ciudadano pro- variante lorica, expreso su molestia, convocando a la comunidad a bloquear el paso por lorica y alzar las talanqueras del peaje mata de caña, sin embargo después de 3 días de bloqueo, en el municipio de Lorica, el Gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, se reunió con la comunidad y se comprometió a solucionar el paso urbano de este municipio y a realizar las gestiones necesarias para continuar con la construcción de una variante el Lorica. El 20 de enero 2025, en la reunión efectuada con la ANI para atender el bloqueo de los transportadores de córdoba, realizada en montería, se retomó por parte del alcalde de lorica y el gobernador de córdoba, el paso urbano del municipio de lorica, ya que no se va a realizar la variante lorica, por tal motivo piden a la ANI y al Ministerio de transporte un espacio para debatir la posible solución al paso urbano de lorica, en días posteriores se concretara una reunión en la alcaldía de lorica para tratar dicha problemática. El día 6 de febrero 2025, se llevó a cabo reunión con la ANI y con la alcaldía de Lorica para debatir la posible solución al paso urbano de este municipio, en dicha reunión la Agencia se comprometió a estudiar la posibilidad con el Concesionario de realizar los estudios y diseños para la construcción de la variante lorica, con las especificaciones que entregó el fallo del consejo de estado, esto en ocasión de los recursos para la variante Lorica en contrato de concesión, sin olvidar que, por parte de esta se está realizando todo el proceso para desafectar la variante lorica de dicho contrato, así que, en caso de realizar estos estudios serán entregados a la alcaldía de Lorica y a La Gobernación de Córdoba, quienes están prestos a gestionar los recursos con el gobierno nacional para su ejecución.

UF	Punto critico	Trazabilidad
		El día 23 de abril 2025, se realizó reunión en la Alcaldía de lorica con la Gobernación de Córdoba, la Agencia Nacional de Infraestructura, Invias y La Concesión Ruta al Mar, con fin de continuar con el compromiso de mejorar el paso urbano de lorica, por lo cual, los representantes de la Gobernación de Córdoba realizaron una presentación exponiendo los avances del diseño del paso urbano de lorica. Del 01 al 30 de septiembre 2026, no se tienen novedades. .

UF	Punto critico	Trazabilidad
7.2	La comunidad de pescadores manifestó inconformidad con la Variante Coveñas socializada, consideran que afecta la Ciénaga de la Caimanera. Adicionalmente, CARSUCRE negó la sustracción del DRMI Mediante acuerdo N°008 del 15/11/2017 Rad de salida N°18687 del 15/11/2017 De otra parte en la visita de verificación realizada por área de certificaciones, Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, durante los días 18 y 19 de Mayo de 2017 los funcionarios manifestaron la presencia de grupos étnicos, de acuerdo a la resoluciones 023 y 026 de 2016, en las cuales la dirección de asuntos indígenas del ministerio del interior registra las comunidades	El Ministerio del Interior a través de la resolución 011 del 10 de abril de 2018 ratifico la integridad del acto administrativo 092 del 23 de febrero de 2018 La ANI a través del radicado de 2018-300-012178-1 del 23 de abril de 2018 NO ACEPTA la ocurrencia del EER invocado por el Concesionario en su comunicado con radicado ANI N° 2018-409-025125-2. El tribunal superior judicial de Sincelejo emitió sentencia T – 2019-063 de 29 de mayo de 2019 a través de la cual se impugnó sentencia del 23 de abril de 2019 proferida por el juzgado tercero laboral de Sincelejo, dentro de la acción de tutela promovida por el consejo comunitario afrocolombiano Humberto Hernández en contra del Ministerio del Interior y ordena al ministerio del interior que se adelante las diligencias necesarias para incluir al concejo comunitario afrocolombiano Humberto Hernández en el proceso de consulta previa del proyecto construcción Variante Coveñas. El 24 de octubre de 2019 la procuradora Ambiental y Agraria de Sucre convocó reunión en el municipio de Coveñas con el objetivo que se la Concesión aclarar inquietudes de las comunidades consultada, el municipio de Coveñas, comunidades en general y gremio de hoteleros. Se está pendiente del acta por parte de la procuraduría. El 26, 27 y 28 de septiembre de 2019 se protocolizó con acuerdos en las 3 comunidades certificadas con el acto administrativos 092 del 23 de febrero de 2018. El cumplimiento de los acuerdos con cada una de las comunidades consultadas quedó sujeto al otorgamiento de Licencia Ambiental y aprobación del Plan de Obras. El EIA fue radicado en la ANLA el 20 de enero de 2020 mediante Auto No. 0000281 de 23 de enero de 2020. Este documento contiene los acuerdos protocolizados. La Interventoría emitió observaciones a los documentos EIA mediante el CI.023/AB5173/19/7.1.8. La ANLA en el marco del proceso de Evaluación realizó visita de campo los días 10 al 13 de febrero de 2020. El 4 de marzo de 2020 la ANLA realizó reunión de información adicional – acta 15, dentro de los requerimientos al componente socioeconómico del EIA está el de aportar una nueva certificación de presencia de comunidades étnicas a partir de un área de influencia mayor al derecho de vía y equivalente al área de influencia biótica y física. El 11 de marzo de 2020 el Concesionario mediante comunicación No. 48-14720200306013337, solicitó prórroga de un mes para dar cumplimiento a lo establecido en el Acta No. 15. La ANLA

	(parcialidades) bellavista, el reparo, el Mamey y Torrente; consejo comunitario Barule en jurisdicción del municipio de Coveñas y, para el municipio de Tolú el cabildo indígena Puerto Viejo. El Ministerio del Interior a través de la Certificación 092 de 2018 certificó la presencia de las comunidades étnicas Porvenir y Barulé; posterior, el tribunal superior judicial de Sincelejo emitió sentencia T – 2019-063 de 29 de mayo de 2019 ordenó incluir en la Consulta el consejo comunitario Humberto Hernández; finalmente, la DANCP mediante ST 1260 de 2020 certificó al cabildo Bellavista	con el Radicado N° 2020044893-2-000 24 del 20 de marzo de 2020 concedió 1 mes adicional al plazo inicialmente establecido El 13 de marzo de 2020 el Concesionario solicitó al Ministerio del Interior a través del EXTMI2020-10912 nueva certificación, con un área de influencia que incluye el polígono equivalente al área física, biótica y social. La Concesión mediante radicado N°2020043667-1-000 del 20 de marzo de 2020 solicitó se condicione la licencia ambiental dando cumplimiento a lo estipulado en el acta 015 de 2020 o que se suspenda el término perentorio de la radicación de la información adicional hasta que se supere la emergencia del COVID-19 La Concesión mediante radicado: 48-147-20200820015155 del 20 de agosto de 2020 interpuso DP al ministerio del Interior con ocasión de las metodologías y criterios dentro de la Certificación número 0092 del 23 de febrero del 2018 En donde pidió pronunciarse sobre cuál fue la metodología y criterios legales, técnicos y étnicos empleados en la determinación del contenido de la Certificación número 0092 del 23 de febrero del 2018 y explicar las razones por la cuales la citada certificación cumple con la normatividad vigente en relación con la identificación de presencia o no de comunidades étnicas en el área de influencia definitiva del proyecto Del 22 al 27 de septiembre de 2020 se realizó las reuniones de socialización de resultados del EIA Variante de Coveñas, en total 12 comunidades socializadas, de acuerdo al requerimiento ANLA en la solicitud de información adicional, sólo está pendiente el pronunciamiento de la DANCP sobre la presencia o no de comunidades étnicas en el marco del requerimiento ampliación de nuevas áreas de influencia, una vez se pronuncie el Ministerio del Interior, se establecerá el estado del proceso. La Concesión mediante radicado 48-147-2020121016915 del 11 de diciembre de 2020 radicó ante la ANLA solicitud de SUSPENSIÓN del trámite de licenciamiento con ocasión de resolución de la DANCP ST 1260 del 9 de diciembre de 2020 en la cual se certificó la presencia de la comunidad indígena, en este sentido la Concesión expone que requiere 18 meses para aportar la información complementaria y así avanzar en la evaluación de la L.A. Teniendo en cuenta lo anterior, el trámite estaría suspendido desde el 14 de diciembre de 2020 hasta el 14 de junio de 2022. La Concesión mediante comunicado radicado 8-147-20210120017424 del 20 de enero de 2021 solicitó a la DANCP el inicio de la consulta previa. El 17 de febrero de 2021 se realizó reunión de coordinación entre Concesión, Interventoría y la DANCP. Se estimó iniciar la consulta previa el 17 de marzo de 2021 El 17de marzo de 2021 se realizó preconsulta apertura a la Consulta Previa con el cabildo Bellavista – Coveñas. El 26 de abril de 2021 se firmó el acta declaratoria de la ocurrencia de un EER y consecuente ampliación del plazo para la ejecución de las obras y actividades asociadas las UF 6.3, **7.2** y 7.3. En este sentido se reconocerá el tiempo incurrido desde la fecha de solicitud de información adicional por parte de la ANLA – 25 de febrero de 2020 hasta la obtención de licencia ambiental; sin embargo, con la expedición de la resolución N° 1317 del 27 de julio de 2021, se resolvió la condición. El 27 de abril de 2021 se protocolizó la Consulta Previa con el Cabildo Bellavista. El 3 de mayo de 2021 la Concesión mediante comunicado N° 48-147-20210503018811 radicó ante la ANLA el complemento del EIA UF 7.2 Variante de Coveñas (radicado ANLA radicado 2021086127-1-000 del 04 de mayo del 2021). El 9 de mayo de 2021, La ANI mediante radicado N° 20216050173731 le informó a la Concesión que desde que se conoció el número del radicado con el cual, la ANLA dio inicio a la solicitud del trámite de Licencia Ambiental para la Variante Coveñas – UFI 7.2, esto es, el radicado 2019200790-1-000 del 19 diciembre 2019 y el radicado 2020004303-1-000 del 14 de enero del

UF	Punto critico	Trazabilidad
		2020, el trámite fue incluido en la agenda de las mesas PINES que se han realizado desde entonces y hasta la fecha, incluido el radicado 2021086127-1-000 del 04 de mayo del 2021. Sin embargo, le recordó a la Concesión que tanto los tramites como los resultados de la gestión ambiental, son responsabilidad de la Concesión. El 28 de julio de 2021, la ANLA mediante radicado N° 2021155831-2-000 notificó a la Concesión la resolución N° 1317 del 27 de julio de 2021–- Licencia Ambiental para la UF 7.2 Variante Coveñas. Los días 19-23 de agosto de 2021 la Concesión realizó la socialización de licencia ambiental resolución N° 1317 del 27 de julio de 2021, al tiempo que informó el inicio de obras programado – 30 de agosto de 2021. Con la expedición de la resolución N° 1317 del 27 de julio de 2021–- Licencia Ambiental para la UF 7.2 Variante Coveñas, se superó el punto crítico, por lo tanto, se reportan por fuera de esta matriz los avances en el cumplimiento de las obligaciones derivadas del citado acto administrativo. El 29 de octubre de 2021 se notifica que el Cabildo Menor Zenú de Puerto Viejo, instauró una acción de Tutela con el fin de que en orden a lo establecido en el artículo 86 de la constitución política, sean protegidos sus derechos fundamentales a la consulta previa, en razón a la construcción de la vía nueva variante Coveñas de la UFI 7-2. En el mes de noviembre de 2021, surge como novedad la DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA del Juzgado Tercero Penal de Sincelejo: “PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo de los derechos fundamentales a la consulta previa invocado por el Cabildo Menor Indígena Zenú de Puerto Viejo – Municipio de Santiago de Tolú, Sucre, por intermedio de su representante legal, señor Juan Carlos García de León, contra la Agencia Nacional de Infraestructura ANI - Ministerio del Interior - Concesionario “RUTA AL MAR” - Agencia Nacional de Licencias Ambientales, y Corporación Autónoma Regional de Sucre “CARSUCRE”,, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la providencia. El día 26 de enero de 2022 el Concesionario recibió notificación del tribunal de Sincelejo en la cual se ratifica el fallo en primera instancia negando el derecho a la consulta previa para dicha comunidad.
7.2	Suspensión de Obras por parte de la Armada Nacional en el sector PR K 2+200 AL K 4+140 con respecto a los predios CAB-7-2-011, CAB-7-2-012, CAB-7-2-013, CAB-7-2-013 A, CAB-7-2-014, CAB-7-2-01, CAB-7-2-016, CAB-7-2-017, CAB-7-2-018, CAB-7-2-019, CAB-7-2-020 de la UFI 7.2	El día Jueves 14 de octubre de 2021 se presentó la suspensión de las obras en el sector PR K 2+200 AL K 4+140 de la UF 7-2 “Variante Coveñas”, debido a presencia de la Armada Nacional de la Base de Entrenamiento de Infantería de Marina- Coveñas, manifestando ser titulares de los predios sobre los cuales el Concesionario se encontraba adelantando las obras correspondientes, para lo cual facilitaron copia del folio de matrícula inmobiliaria N° 340-35061 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Sincelejo, y la Escritura Pública No. 3393 del 24 de septiembre de 1981 otorgada por la Notaría Tercera de Bogotá. El día 19 de octubre se realizó reunión con el objetivo de aclarar la situación que se presentó en los predios, con funcionarios de Construcciones el Cóndor , El Concesionario y el Comandante Garzón y el Teniente de Fragata Campuzano del Rio Jaime, Asesor Jurídico por parte de la Armada Nacional, además se expusieron los resultados del estudio jurídico que realizó el equipo predial de la Concesión sobre el folio de matrícula inmobiliaria N° 340-35061 que aporta la Armada Nacional a fin de refrendar su titularidad, en esta reunión dicha entidad manifestó su responsabilidad como garante de la preservación y cuidado de los predios que afirma son de propiedad del Ministerio de Defensa Nacional – ARC, por tanto, en el acta de esta reunión la Armada indicó que: “no tiene competencia para permitir continuar con las obras, que la competencia es del Ministerio de Defensa y que se debe elevar dicha solicitud a esta entidad”. El día 11 de noviembre de 2021 se llevó a cabo reunión en las instalaciones del Ministerio de Defensa entre el Comando Central de la Armada Nacional, la Agencia Nacional de Infraestructura, la Interventoría CR Consorcio CONCESIONES y la Concesión Ruta al Mar S.A.S., en la cual, las

UF	Punto critico	Trazabilidad
		partes expusieron cada uno su punto de vista respecto del proceso de adquisición predial y en general sobre el desarrollo del proyecto Conexión Antioquia- Bolívar. El día 16 de noviembre de 2021 el director de asuntos legales del Ministerio de Defensa Nacional radicó la comunicación No. RS20211111040276 de fecha 11 de noviembre de 2021. Consecutivo interno No. 016-ELECT-20211116000004 de fecha 16 de noviembre de 2021 dirigida al Director de proyectos de Construcciones el Condor S.A mediante la cual el Ministerio de defensa considera que deben ser tenidos en cuenta para cualquier negociación que involucre las once (11) franjas de terreno que hacen parte del globo de mayor extensión de su propiedad, las cuales afecta parte del trazado del proyecto, asimismo consideran importante que la constructora en el desarrollo de sus actividades puede ocasionar las afectaciones que a continuación se detallan: "1. Interferencia con línea de servidumbre de acueducto (…); 2. Traslape del predio de mayor extensión (…); 3. Servidumbres por líneas de oleoducto (…); 4. Interferencia de la línea de acueducto que actualmente capta la represa de villeros (…); 5. Afectación de las nuevas líneas de acueducto (…), 6. Segregación del predio de mayor extensión (…), 7. Posibles afectaciones ambientales a la represa de villeros (…)" A raíz de lo anterior las partes pactaron suscribir acuerdo de voluntades mediante el cual la Concesión Ruta al Mar y el Ministerio de Defensa Nacional- Armada Nacional realizan gestiones conjuntas para la ejecución del proyecto de utilidad pública denominado: CONEXIÓN ANTIOQUIA- BOLÍVAR. UNIDAD FUNCIONAL 7-2 "VARIANTE COVEÑAS" Con el fin de impulsar la continuación de las obras, debido a la suspensión arbitraria por parte de la Armada con respecto a la suspensión de obras en los predios CAB-7-2-011, CAB-7-2-012, CAB-7-2-013, CAB-7-2-013 A, CAB-7-2-014, CAB-7-2-01, CAB-7-2-016, CAB-7-2-017, CAB-7-2-018, CAB-7-2-019, CAB-7-2-020, el Concesionario interpuso querella policiva a fin de solicitar la continuidad de las obras constructivas teniendo en cuenta los permiso de intervención suscritos por parte de los titulares de cada predio y la obstrucción arbitraria e injustificada por parte de la Brigada de Infantería de Marina de Coveñas con los siguientes comunicados: ● Predio CAB-7-2-011 Oficio 48-147S-20211108007443 ● Predio CAB-7-2-016 Oficio 48-147S-20211112007465 ● Predio CAB-7-2-018 Oficio 48-147S-20211116007470 El día 20 de diciembre se realizó reunión a través de la plataforma electrónica TEAMS, contó con la participación del Ministerio de Defensa Nacional, la Interventoría, El Concesionario, la ANI y de representantes del Contratista EPC, en estas reuniones se ha manifestado al Ministerio de Defensa que sí bien la Armada cuenta con el folio de matrícula inmobiliaria 340-35061 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Sincelejo, luego de la confrontación de la información de este y la información de la base catastral del IGAC, se observó que el predio propiedad de la Armada no se encuentra en la zona de influencia del proyecto, por lo que actualmente, el predio que se identifica con el citado folio no es requerido para la ejecución del proyecto de la referencia. En el mes de enero de 2022 se encuentra en trámite de suscripción, el acta de Acuerdo de voluntades mediante el cual la Concesión Ruta al Mar S.A.S. y el Ministerio de Defensa nacional- Armada Nacional realizan gestiones conjuntas para la ejecución del proyecto de utilidad pública denominado: Conexión Antioquia- Bolívar. Unidad Funcional 7- 2 "variante Coveñas" El día 18 de febrero 2022 se firmó por parte de la Armada Nacional y La Concesión Ruta al Mar, el acta de acuerdo y autorización, a la Concesión Ruta al Mar S.A.S para continuar y terminar la ejecución del proyecto de utilidad pública denominado: conexión Antioquia-Bolívar, Unidad Funcional 7.2 variante Coveñas, a ejecutarse entre el PR 2+200 al 4+140 de la UFI 7.2, con la firma de estos acuerdos se da por superado este punto crítico.

UF	Punto critico	Trazabilidad
7.2	**Minga por el territorio, La Soberanía y su conservación ancestral,**	El día 04 de febrero del 2022 se inició la minga por el territorio, La Soberanía y su conservación ancestral, representada en las comunidades Cabildo Isla Gallinazo, Cabildo Torrente, Cabildo Porvenir, Asociación AFROBANTU, Justicia Propia Córdoba y Sucre, a través de vías de hecho las comunidades antes mencionadas retuvieron la maquinaria, materiales y equipos, bloqueando las obras de la Unidad Funcional 7, subsector 2, a la altura del Kilómetro 5 (Sector Guayabal),

	representada en las comunidades Cabildo Isla Gallinazo, Cabildo Torrente, Cabildo Porvenir y Asociación AFROBANTU, por las afectaciones del Proyecto Ruta al Mar Variante Coveñas UFI 7.2.	aludiendo afectaciones del Proyecto Ruta al Mar Variante Coveñas UFI 7.2, y exigiendo el derecho fundamental y colectivo a la consulta previa. El Concesionario en atención a esta protesta de las comunidades, atendió la solicitud de una reunión que se programó el día 09 de febrero del 2022 convocando a las entidades pertinentes, Autoridades Locales de los Municipios de Coveñas, Tolú y San Antero, ANI y Ministerio del Interior DANCP. El día 09 de febrero de 2022 se realizó mesa de diálogo con las comunidades que hacen parte de la minga, en presencia del Concesionario Ruta al Mar, Ministerio del Interior DANCP, Construcciones El Condor, ANI y Personería Municipal de Coveñas, sin embargo, la reunión prevista para este día no se llevó a cabo, debido a que la minga consideró inviable realizarla con la inasistencia de las entidades públicas garantes. Desde la gestión del Concesionario Ruta al Mar y por solicitud de la minga y sus asesores jurídicos, se convoca las siguientes entidades: Gobernación de Sucre delegados de asuntos étnicos, Alcaldías de los Municipios de Coveñas, Tolú y San Antero, Procuraduría Ambiental y Agraria de Sucre, Procuraduría Nacional para asuntos Étnicos, Personería de los Municipios de Coveñas, Tolú y San Antero, Defensorías del Pueblo de Sucre y Córdoba, CARSUCRE, CVS y ANLA, se programó la reunión solicitada por la minga el día 15 de febrero 2022. El día 15 de Febrero se realizó la reunión programada con las instituciones convocadas, Las comunidades Isla Gallinazo y Torrente acordaron con el Ministerio del Interior, realizar un estudio cartográfico y geográfico basado en la sentencia SU 123 de 2018, en conjunto con el Concesionario quien facilitó los medios logísticos y profesionales para realizarlo, asimismo, este estudio se allegara a la Dirección Nacional de Consultas Previas para su evaluación y así definir si dicha comunidad es afectada geográficamente y si será objeto de consulta Previa. En el caso del Cabildo El Porvenir se acordó con la Concesión Ruta al Mar, realizar mesa de trabajo el día 17 de febrero de 2022 y estudiar los acuerdos que están solicitando, tomar decisiones, y ajustar los acuerdos ya establecidos en el marco de la consulta previa protocolizada si es necesario, de esta manera poder continuar con el proceso de consulta previa en la etapa de seguimiento a los acuerdos con el Cabildo el Porvenir. El Concesionario le solicitó a la Minga la entrega de la totalidad de las maquinarias retenidas a través de vías de hecho, sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo al respecto, por tal motivo se da por terminada la reunión sin acuerdos. No obstante, por medio de comunicación telefónica en horas de la noche del 15 de febrero, los representantes de la Minga entablaron diálogo con el Concesionario Ruta al Mar y la DANCP para continuar con la reunión el día 16 de febrero 2022. El día 16 de febrero de 2022 se realizó reunión con la Dirección de las Consultas Previas con el acompañamiento de la ANI, Concesión Ruta al Mar, la Interventoría CR CONCESIONES y la personería del Municipio de Coveñas, haciendo énfasis en la certificación de las comunidades que hacen parte de la minga específicamente Cabildo Isla Gallinazo y Cabildo Torrente, para ejercer su derecho a las consultas previas, en la que se estableció lo siguiente: ● La Subdirección Técnica de Consulta Previa del Ministerio del Interior evaluara la información que se recopilará en el recorrido que se realizara entre la comunidad, sus asesores y los profesionales de la Concesión Ruta al Mar, teniendo en cuenta la Res. 0023 de 2016 y en su sentido geográfico y amplio bajo la sentencia SU 123 de 2018, para determinar si el área del proyecto que se va a realizar se encuentra dentro del territorio de la comunidad Cabildo Torrente. ● La Subdirección Técnica de Consulta Previa del Ministerio del Interior evaluara la información que se recopilará en el recorrido que se realizara entre la comunidad, sus asesores y los profesionales de la Concesión Ruta al Mar, teniendo en cuenta la Res. 0023 de 2016 y en su sentido geográfico y amplio bajo la sentencia SU 123 de 2018, para determinar si el área del proyecto que se va a realizar se encuentra dentro del territorio de la comunidad Cabildo Isla Gallinazo. ● Basado en los resultados de los recorridos se realizará una mesa Interinstitucional que estará integrada por la DANCP, ANI, Concesión Ruta al Mar y comunidades. ● En el caso de Cabildo Porvenir se realizará reunión entre esta comunidad y la Concesión Ruta al Mar el jueves 17 de febrero del presente año en el territorio de dicho cabildo, para iniciar la materialización e implementación de los acuerdos en el marco de la consulta previa protocolizada con esta comunidad.

		● En referencia a la Asociación Afrobantú La DANCP realizara el enlace con la Dirección de Autoridades Negras, Afrocolombiana, Raizales y Palenqueras, para realizar una reunión con la representante de dicha Asociación. En consecuencia y conforme los acuerdos estipulados, las comunidades que integran la minga y la Concesión Ruta al Mar, acuerdan la entrega de la totalidad de los equipos y la maquinaria retenida, sin embargo, dichos acuerdos se condicionaron al cumplimiento de los siguientes compromisos: ● Las comunidades de la minga levantan las vías de hecho con la entrega de la totalidad de la maquinaria retenida. ● Ni el tramo donde estaba la minga entre tolú y San Antero KM 5+800 sector Torrente, ni el tramo casa roja serán intervenidos hasta en cuanto se cumplan todos los acuerdos concertados y firmados por las partes en el marco de las reuniones del 16 y 17 de febrero del 2022. ● Los acuerdos para los casos de las comunidades Indígenas de Isla Gallinazo y Torrente se entenderán cumplidos una vez se emita la resolución de la Subdirección Técnica de la DANCP, en el que se determine si es o no es procedente el derecho a la Consulta Previa, en un término de 45 días, contados desde el día después de la radicación del alcance del Concesionario. ● La Dirección de Asuntos Indígenas ROM y Minorías del Ministerio de Interior se compromete a convocar y a asistir el día 24 de febrero del 2022 en el Municipio de Coveñas, así como las demás entidades competentes para analizar el pliego de peticiones de la minga. El día 17 de febrero de 2022 se desarrolló la reunión acordada con el Cabildo Indígena El Porvenir, con referencia a los acuerdos logrados con las comunidades presentes en la UF7.2 Variante Coveñas, en el marco de la Minga, dando inicio a la materialización e implementación de los acuerdos protocolizados con esta comunidad, quedó como compromiso que, una vez desarrollada esta reunión, la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, procedería a convocar a la reunión de seguimiento de acuerdos. Una vez la comunidad y el ejecutor le informen la fecha y lugar para establecer en el marco del proceso de Consulta Previa los ajustes a los acuerdos, en consecuencia, el Concesionario por medio del Radicado 48-147-20220218022541 del 18 de febrero de 2022, solicita a la DANCP del Ministerio del Interior reunión de seguimiento acuerdo Minga Indígena Cabildo Indígena El Porvenir – UF 7.2 Variante Coveñas. El 17 de febrero mediante Rad 48-147-20220217022515 el Concesionario envió el alcance a la DANCP del Ministerio del Interior sobre la verificación de posibles afectaciones directas a comunidades étnicas en el proyecto Variante Coveñas. Certificación 0092 del 23 de febrero del 2018 y certificación ST-1260 de 2020 y oficio OFI2020-10117-DCP-2500. El día 22 de febrero de 2022 se realizó recorrido con la comunidad Isla Gallinazo, en dicho recorrido se tuvo como referencia visitar 7 puntos estratégicos identificados por la comunidad en los cuales bajo su criterio étnico reconocen diferentes afectaciones a esta. -Puente amansa Guapo sobre la vía, cobertura manglar, puente amansa Guapo en la zona de construcción de la variante, predio del Cabildo Isla Gallinazo, finca casa roja, Pr 13+900 al Pr 14+100, Pr 14+100 arroyo San Antonio. El día 23 de febrero con la comunidad Torrente, en este recorrido se referenciaron 4 puntos a tener en cuenta y son los siguientes: Mayoría de Torrente, caminos del territorio aproximados al PR 8+700, camino de tránsito de la comunidad aproximados al PR 11+000 y Pr 11 vía Petalaca. El día 24 de febrero del 2022 se realizó reunión convocada por la DANCP del Ministerio del Interior atendiendo los acuerdos y el condicionamiento de estos, firmados entre las partes en el marco de la Minga por el territorio, la soberanía y la conservación ancestral del Pueblo Zenú en la reunión llevada a cabo entre los días 16 y 17 de febrero de 2022, en la cual se revisó los puntos número 4 y 5 del pliego de peticiones presentado. El punto numero 4 corresponde a las Alcaldías Municipales de San Antero, Coveñas y Tolú, el punto numero 5 a la Unidad Nacional de Protección del Ministerio del Interior, cabe aclarar quedaron los puntos faltantes por abordar de 12 que hacen

		parte del pliego de peticiones y que se retomaran en el próximo encuentro que está programado para el día 19 de marzo de 2022 en el municipio de Coveñas. El viernes 25 de febrero fue enviado al correo de la comunidad indígena Cabildo Isla Gallinazo y sus asesores, el informe que se levantó posterior al recorrido, para revisión y observaciones del cabildo. En lo que respecta al informe del recorrido con el Cabildo Torrente Indígena, aún la Concesión está a la espera de la remisión de las coordenadas de INCODER por parte del capitán, para la consolidación de la cartografía; una vez se cuente con ello se procederá a procesar la información geográfica y cartográfica del recorrido y de la ubicación dada por INCODER. El día 07 de marzo mediante Rad 48-147-20220304022731 el Concesionario solicito al Capitán Alexander Martínez del Cabildo Torrente Indígena, Solicitud de información cartográfica INCODER, en atención a los compromisos firmados entre las partes el pasado 17 de febrero de 2022, asociados con el comienzo del estudio cartográfico y geográfico, y una vez cumplido el compromiso de realización de recorrido y georreferenciación, actividad ejecutada entre las partes el pasado miércoles 23 de febrero de 2022, el Concesionario hasta el día 07 de marzo del 2022 no recibió las coordenadas de INCODER sobre la delimitación del territorio del Cabildo Torrente Indígena, esta información es necesaria para la construcción de la cartografía del informe que debe ser remitido, con el objetivo de determinar la procedencia y oportunidad del proceso de consulta previa, por esta razón el Concesionario en caso de no recibir la información cartográfica de INCODER el miércoles 9 de marzo de 2022, correspondiente a 15 días posteriores al recorrido, el mencionado informe se articularía con la información registrada al tenor de la Resolución 0023 del 2016. El día 09 de marzo mediante Rad 48-147-20220308022796 el Concesionario realizo solicitud informe de recorrido por el territorio del Cabildo Indígena de Isla Gallinazo UF 7.2 Variante Coveñas, en atención a los compromisos contraídos entre las partes el pasado 16 de febrero de 2022, asociados con el comienzo del estudio cartográfico y geográfico, y una vez ejecutado el compromiso de realización de recorrido y georreferenciación, actividad que se desarrolló entre las partes el 22 de febrero de 2022, del cual la Concesión remitió el informe de campo en los tiempos pactados dado que el documento fue entregado a la comunidad y su grupo asesor vía correo electrónico el viernes 25 de febrero del presente año, y después de haber pasado 10 días, aun el informe no ha sido devuelto y dicho informe se debe remitir a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa en el menor tiempo posible, toda vez que corresponde a los insumos que tendrá esta autoridad para el análisis particular del caso y para el análisis a través de la mesa interinstitucional que fue pactada en los acuerdos firmados el 16 de febrero. El día martes 15 de marzo 2022, se presentaron nuevas vías de hecho por parte de los representantes de la Minga con la retención de la maquinaria del contratista EPC- Construcciones El Condor, en el predio privado ubicado en el sector Petalaca PR 8+300. El día miércoles 16 de Marzo la Capitana del Cabildo Indígena Isla Gallinazo quien hace parte de la Minga permanente por el territorio, La Soberanía y su conservación ancestral, por las afectaciones del Proyecto Ruta al Mar Variante Coveñas UFI 7.2, realizando un pronunciamiento a través de un video que difundieron por medio de las redes sociales, expresando que continúan en Minga permanente, aludiendo la falta de compromiso de la Concesión Ruta al Mar en los acuerdos pactados en las reuniones del 16 y 17 de febrero de 2022, asimismo, hacen responsables a la ANI, Concesión Ruta al Mar y a la Constructora El Condor y a las entidades municipales del Municipio de Coveñas, exponiendo que están amenazados. El día 17 de marzo, el Concesionario Ruta al Mar por medio de comunicado de prensa informa a la opinión pública, que luego de 41 días de establecida la minga permanente en el sector variante Coveñas UFI 7.2, k 5+800, por parte de los representantes de las comunidades Indígenas Isla Gallinazo, Torrente Indígena y la Asociación Afrobantu, del municipio de Coveñas, Sucre, y una vez establecidos los acuerdos y Condicionamientos para la liberación de la maquinaria requerida, formalizados en el acta suscrita el 17 de febrero de 2022 con representantes de las comunidades, el Ministerio del Interior, La Personería de Coveñas y la ANI, el Concesionario dio Inicio a la Implementación de los acuerdos.

		Ni el tramo donde estaba la minga entre tolú y San Antero KM 5+800 sector Torrente, ni el tramo casa roja serán intervenidos hasta en cuanto se cumplan todos los acuerdos concertados y firmados por las partes en el marco de las reuniones del 16 y 17 de febrero del 2022.", acuerdo que la Concesión Ruta al Mar y Construcciones El Condor S.A, han venido cumpliendo a cabalidad. El día 17 de marzo, El Concesionario Ruta Al Mar se pronuncia por medio de un segundo comunicado de prensa a la opinión pública, para informar que acudieron en compañía del contratista Construcciones El Condor el Jueves 17 de marzo a las 10:00 am a la casa de la cultura de Coveñas a la citación realizada por la personería de este Municipio, para dialogar con los representantes de la Minga Indígena, con el motivo de conocer las razones de la retención de la maquinaria que desde el 15 de marzo de 2022 se encuentra inmovilizada en el predio privado sector de casa Roja y la cual es fundamental para la ejecución de las obras de la Variante Coveñas que actualmente se encuentran suspendidas, a esta reunión a los que asistieron la Secretaria de Gobierno de Coveñas y la PONAL de Sucre, no asistieron los representantes de la minga, toda vez que los representante de la minga manifestaron que solo dialogaran en presencia del Ministerio del Interior en la Reunión del 19 de marzo. El Concesionario Ruta al Mar se pronuncia por medio de un Tercer comunicado de prensa a la opinión pública, Informando que en horas de la madrugada del 18 de marzo de 2022, y gracias a las acciones de la Policía Nacional, seccional Sucre, se logró la liberación de la maquinaria del Contratista Construcciones el Condor, que se encontraban retenidas de manera ilegal por la minga Indígena en el predio privado en el sector de Petalaca, k 8+300 Municipio de Coveñas, desde el pasado 15 de marzo del presente año. El día 19 de marzo se realizó reunión en el marco de la minga por el Territorio, la Soberanía y su Conservación Ancestral del Pueblo Zenú, en dicha reunión se plantearon 5 acuerdos los cuales quedaron ajustados a unos condicionamientos. 1. La Concesión Ruta al Mar solicitara visita de verificación al Ministerio del interior, para que se lleve a cabo el día 31 de marzo y primero de abril para torrente indígena e Isla gallinazo. 2. El 23 de marzo la DANCP emitirá un acto administrativo que ordena la visita de verificación para las comunidades Torrente e Isla Gallinazo por el proyecto ruta al mar variante 7.2 Coveñas, programadas para el día 31 de marzo para Isla gallinazo y 1 de abril para torrente indígena. 3. Los informes construidos según acuerdos del 16 y 17 de febrero del 2022 serán entregados por la comunidad y la Concesión a la DANCP del Ministerio del interior máximo el 25 de marzo como a la fecha en la que se suscribe en estos acuerdos la dirección de autoridad Nacional de consulta previa no ha recibido los informes por parte de la comunidad y la concepción se deja la salvedad que si los informes nos aportan máximo el 25 de marzo se podrá prescindir de estos para realizar las visitas de verificación y demás trámites dentro del proceso en aras de garantizar el cumplimiento de los acuerdos. 4. El 9 de mayo del 2022 es la fecha en la cual la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior Se compromete a expedir la resolución de procedencia o no de la consulta previa, para las comunidades indígenas Isla gallinazo y Torrente, con base a la visita de verificación y los informes construidos con la comunidad y la Concesión ruta al mar, con la salvedad del punto tercero. 5. La próxima reunión se acuerda se llevará a cabo el jueves 7 de abril del 2022, con el objetivo de concertar los demás puntos pendientes acordados el 24 de febrero de 2022, Y dónde se tratarán los temas respecto a la documentación aportada por la alcaldía de Coveñas, con las mismas garantías que se han especificado para la realización de la misma. Entre los condicionamientos encontramos los siguiente: Según Los acuerdos el tiempo para la expedición de la resolución sobre el acto administrativo, en dónde se determinará la procedencia o no de la consulta previa de las comunidades, son 52 días calendario, contados desde el 20 de marzo del 2022 hasta el 9 de mayo del 2022 por lo tanto Durante los 52 días, la Concesión podrá adelantar únicamente, obras disposición del material para la conformación del terraplén producto de los cortes que debe realizar entre el kilómetro 0 y km 4 esta actividad se realizará únicamente en el kilómetro 5 y el 10 + 400. El 22 de marzo mediante Rad. 48-147-20220322022983 la Concesión Ruta al Mar realizo solicitud de informe del recorrido por el territorio al Cabildo Isla Gallinazo, Conforme lo acordado en la

		reunión del pasado 19 de marzo de 2022 en presencia de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa -DANCP, se acordó la remisión del informe resultante del recorrido por el territorio - Variante Coveñas, realizado el martes 22 de febrero de 2022, con el objetivo de ser radico a más tardar el viernes 25 de marzo del presente año, ante el Ministerio del Interior. El 22 de marzo mediante Rad. 48-147-20220322022984 la Concesión Ruta al Mar realizo solicitud de informe del recorrido por el territorio al Cabildo Torrente Indígena Conforme con lo acordado en la reunión del pasado 19 de marzo de 2022 en presencia de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa -DANCP, en la cual se acordó la remisión del informe resultante del recorrido por el territorio - Variante Coveñas, realizado el miércoles 23 de febrero de 2022, con el objetivo de ser radicado a más tardar el viernes 25 de marzo del presente año, ante el Ministerio del Interior, dado que a la fecha no se cuenta con el informe complementado con los insumos por parte de la comunidad. El 24 de marzo mediante Rad. 48-147-20220324023059, se realizó entrega del informe consolidado entre el Cabildo Indígena Isla Gallinazo y la Concesión Ruta al Mar, con el apoyo de representantes de Gobierno Mayor, que contiene la información geográfica, cartográfica y de análisis sobre el recorrido efectuado el 22 de febrero de 2022 por el territorio de interés determinado por la comunidad de Isla Gallinazo, con respecto a la Variante Coveñas – Unidad Funcional 7, subsector 2 (UF 7.2) del proyecto Conexión Antioquia – Bolívar. El día 30 de marzo mediante correo la Concesión ruta al mar, reitero la solicitud el envío del informe en su versión final para radicación, al cabildo Indígena torrente, para dar cumplimiento al compromiso que correspondía a la radicación ante la DANCP para el 25 de marzo de 2022. El 31 de marzo 2022, a pesar de la convocatoria realizada por medio de la solicitud de visita de verificación construcción de la Variante Coveñas – Unidad Funcional 7.2, por parte del Concesionario Ruta al Mar al Ministerio del interior, como quedo estipulado en el punto número 1 de los acuerdos firmados en la reunión del 19 de marzo, en el marco de La minga, no se realizó el recorrido en mención por la inasistencia de representantes del ministerio. El 04 de abril del 2022 en Concesionario mediante Rad. 48-147-20220404023168 envió Respuesta Información aclaratoria, informe recorrido comunidad Indígena Isla Gallinazo – Variante Coveñas Unidad Funcional 7.2, del proyecto Conexión Antioquia – Bolívar. En este caso la respuesta aclaratoria consiste en al informe elaborado en el marco de los acuerdos suscritos el día 17 de febrero, con la comunidad Indígena Isla Gallinazo, que contiene la información geográfica, cartográfica y de análisis sobre el recorrido efectuado el 22 de febrero de 2022 por el territorio de interés determinado por la comunidad de Isla Gallinazo, con respecto a la Variante Coveñas – UF 7.2 remitido mediante comunicación con radicado 48-147-202203240230591 del 25 de marzo de 2022. El 04 de abril del 2022 en Concesionario mediante Rad. 48-147-20220404023169 en respuesta a las comunicaciones OFI2022-6232-DCP-2500 fechada el 28 de marzo de 2022 y OFI2022-6502-DCP-2500 fechada el 29 de marzo de 2022, a través de las cuales se reitera la solicitud de dar claridad frente a los aspectos referidos en la comunicación OFI2022-5994-DCP-2700 fechada el 23 de marzo de 2022. La reunión que estaba programada para el día 7 de abril del 2022 con el objetivo de concertar los puntos pendientes acordados el 24 de febrero de 2022 en los acuerdos de la minga no se llevó a cabo, ya que la DANCP no convoco a dicha reunión de seguimiento, a la fecha se está a la espera de la nueva fecha dispuesta por el Ministerio del Interior. El día 09 de mayo 2022, mediante Rad. 48-147-20220509023719 el Concesionario Ruta al Mar envío al Ministerio del Interior DANCP, alcance aclaratorio a informes de recorrido de la minga Indígena, con el propósito de precisar algunos aspectos contenidos en los informes derivados de los recorridos realizados con las comunidades indígenas Isla Gallinazo y Torrente Indígena, dando cumplimiento a los acuerdos pactados con la Minga Indígena instalada por dichas comunidades. El 11 de mayo, mediante OFI2022-9719-DCP-2700, La Subdirección Técnica de Consulta Previa de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, se pronunció mediante asunto, cumplimiento de los acuerdos pactados en el desarrollo de la Minga Indígena

		del Pueblo Zenú, Proyecto Variante Coveñas UFI 7.2, en el cual se considera improcedente una revisión por parte de la Subdirección Técnica de lo actuado y los pronunciamientos emitidos en la Certificación N°508 de 2014, Certificación N° 0092 de 2018 y Resolución N° ST 1260 de 2020, ya que no se identificó una modificación de los elementos constitutivos, fácticos o técnicos del proyecto a ejecutar que llevarán a inferir nuevas posibles afectaciones directas o impactos que afectarán a la comunidad étnica Isla Gallinazo. El día 31 de mayo 2022, mediante OFI2022-11305-DCP-2700, La Subdirección Técnica de Consulta Previa de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, se pronunció mediante asunto, cumplimiento de los acuerdos pactados en el desarrollo de la Minga Indígena del Pueblo Zenú, Proyecto Variante Coveñas UFI 7.2, en el cual se considera improcedente una revisión por parte de la Subdirección Técnica de lo actuado y los pronunciamientos emitidos en la Certificación N°508 de 2014, Certificación N° 0092 de 2018 y Resolución N° ST 1260 de 2020, ya que no se identificó una modificación de los elementos constitutivos, fácticos o técnicos del proyecto a ejecutar que llevarán a inferir nuevas posibles afectaciones directas o impactos que afectarán a la comunidad étnica Torrente. El día 1 de junio del 2022, a raíz de la comunicación que emitió la Subdirección Técnica de Consulta Previa de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior en la cual considera, específicamente, de acuerdo a las competencias del decreto 2353 de 2019 se hace improcedente en este estado o instancia administrativa, una revisión por parte de la Subdirección Técnica de lo actuado y los pronunciamientos emitidos en la Certificación N°508 de 2014, Certificación N° 0092 de 2018 y Resolución N° ST 1260 de 2020, ya que no se identificó una modificación de los elementos constitutivos, fácticos o técnicos del proyecto a ejecutar que llevarán a inferir nuevas posibles afectaciones directas o impactos que afectarán a la comunidad étnica Torrente, haciendo improcedente la realización de Consulta Previa con esta comunidad, de acuerdo a lo expresado en esta comunicación, La Comunidad de Torrente Indígena volvió a tomar las vías de hecho, al considerar el desacuerdo con el pronunciamiento del Ministerio del Interior. Cabe resaltar, que a partir de este suceso el Concesionario busco un acercamiento con la comunidad, el cual no fue posible, sin embargo la Agencia Nacional de Infraestructura envió un equipo especial para trabajar con comunidades, integrado por 2 profesionales los cuales lograron realizar una mesa de diálogo y una mesa de trabajo los días 24, 25, 26, 27 y 28 de junio con las comunidades de la Minga Indígena, Isla Gallinazo, Torrente Indígena e incluyeron a la comunidad de El Reparo quienes estaban solicitando por fuera de la Minga Consulta Previa para su comunidad, a raíz de este acercamiento se definieron 3 ejes temáticos relacionados al fortalecimiento Institucional y Organizacional, Comunitario y Proyectos Productivos, con un valor aproximado de doscientos cincuenta millones de pesos ($ 250.000.0000), para cada una de las comunidades. Finalmente, el día 28 de junio de 2022 se cerraron los acuerdos planteados y se espera que con el cumplimiento de los mismos se pueda finalizar esta situación. En el mes de julio de 2022 no se recibió por parte de la Concesión Ruta al Mar el oficio en el cual de manera oficial informe a esta Interventoría los acuerdos pactados con las Comunidades Isla Gallinazo, Torrente Indígena y El Reparo. Asimismo, en el mes de agosto de 2022, no se recibió por parte de la Concesión Ruta al Mar el oficio en el cual de manera oficial informe a esta Interventoría los acuerdos pactados con las Comunidades Isla Gallinazo, Torrente Indígena y El Reparo. Sin embargo, mediante comunicado rad. CI.023/AB9902/22/7.1.9 del 19 de agosto 2022 esta Interventoría solicita a la Concesión Ruta al Mar, una copia de los acuerdos firmados con las comunidades representantes de la Minga Indígena de la UF 7.2, a fin de contar con información actualizada del proceso y realizar el respectivo seguimiento. En el mes de septiembre mediante Radicado: 48-147-20220823025236, dio respuesta al oficio CI.023/AB9902/22/7.1.9 Solicitud de copia de los Acuerdos Adquiridos con las Comunidades representadas en la Minga Indígena de la U.F. 7.2.

		Sin embargo, en el comité mensual N°78 del mes de septiembre 2022, se solicitó al Concesionario allegar a esta Interventoría el estado actual de avance de los proyectos que hacen parte de los acuerdos pactados con las comunidades de Torrente Indígena e Isla Gallinazo, las cuales hicieron parte de la Minga de la UFI 7.2. El día 6 de octubre mediante Rad. Radicado: 48-147-20220929025755 El Concesionario remitió a esta Interventoría los proyectos presentados por las comunidades indígenas de Isla Gallinazo, Torrente y Reparo relacionados con los acuerdos privados con estas comunidades, dichos proyectos ya fueron revisados y aprobados y se encuentran en ejecución actualmente. En el mes de enero 2023, en el comité mensual con el Concesionario N°82 del mes de enero de 2023 se informó por parte del Concesionario sobre el avance de los proyectos acordados entre el Concesionario y las comunidades indígenas de Isla Gallinazo, El Reparo y Torrente Indígena que hicieron parte de la Minga UF 7.2, Con la comunidad del Reparo ya se ejecutaron todos los procesos, para la comunidad Isla Gallinazo se encuentra en proceso de adquisición del predio para la construcción de casa comunitaria indígena se realiza reunión final con acompañamiento de Interventoría, y con respecto a Torrente indígena se espera que solucionen diferencias internas para avance del proceso. En el mes de febrero 2023, se realizó reunión convocada por el Cabildo Indígena de Torrente para informar al Concesionario el cambio de capitán de este cabildo en aras de continuar con los acuerdos pactados en el marco de la Minga Indígena. En el mes de mayo 2023, en el Comité mensual #86 el Concesionario dio a conocer a la Interventoría el estado de los acuerdos con las comunidades que hacen parte de la minga de la UFI 7.2, con relación a la comunidad Indígena de Torrente, esta comunidad solicitará una reunión con el Concesionario para informar el proceso interno de cambio de capitán que lleva a cabo este cabildo, la comunidad Indígena Isla Gallinazo se encuentra en el proceso de construcción de la casa indígena la cual cuando se culminen las obras constructivas se realizara el respectivo seguimiento y finalmente con la comunidad el reparo ya se culminaron los acuerdos pactados, por tal motivo la Interventoría sugiere realizar un acta de finalización de dichos acuerdos. El día 29 de mayo 2023, se realizó reunión virtual con la comunidad de Torrente Indígena en la cual informaron al Concesionario sobre el nuevo Capitán y representante legal del Cabildo para continuar con el cumplimiento de los acuerdos que se vieron retrasados por el trámite interno del cabildo en mención. El día 10 de julio 2023, se llevó a cabo reunión interna entre el Concesionario y el Cabildo Torrente Indígena en su territorio, con el fin de realizar el debido seguimiento a los acuerdos establecidos entre empresa y comunidad, permitiendo de esta manera la participación activa de está, se pudo verificar el avance en los proyectos planteados. En el mes de septiembre 2023, se realizó visita de seguimiento entre la empresa y la comunidad de Torrente Indígena, con el fin de revisar los avances de los acuerdos privados realizados con dicha comunidad, en esta visita se pudo evidenciar el avance de estos. En el mes de octubre 2023, se realizó inauguración de la casa Indígena de la comunidad Isla Gallinazo, construida en cumplimiento de los acuerdos pactados de la minga. En el mes de noviembre 2023, el Cabildo Indígena Torrente envió al Concesionario un informe sobre el avance de los acuerdos pactados con la empresa en el marco de la Minga Indígena de la UFI 7.2. El día 27 de diciembre se realizó visita de seguimiento al cabildo Indígena de Torrente, con el fin de evaluar el avance en los acuerdos internos con esta comunidad, en la visita se pudo evidenciar que tienen un avance del 90% en los acuerdos pendientes. Luego el Concesionario informa que, se cerraron los acuerdos con esta comunidad y que estaba pendiente un informe final por parte de la comunidad de Torrente, el cual no entregaron, así pues, si acuerdos pendientes del Concesionario con las comunidades de la Minga indígena de la UFI 7.2, se supera este punto crítico.

UF	Punto critico	Trazabilidad
7.3	Modificación licencia ambiental variante Tolú: El 12 de agosto de 2017 la ANLA convocó a reunión para solicitar información adicional al EIA siendo uno de los componentes fuertes el traslape de la UF con la ampliación del aeropuerto de Santiago de Tolú, lo cual se convierte en factor de riesgo a la hora de toma de decisiones en el concepto de otorgamiento o no de licencia ambiental	Mediante comunicado 2017072809-1-000 del 8 de septiembre de 2017 la dirección general de la AEREOCIVIL informó que el proyecto cuenta con firma protocolaria del Convenio interadministrativo de colaboración, no obstante, este debe ser firmado por parte para que se pueda garantizar la gestión contractual para el inicio de obras. El 7 de diciembre de 2017 se expidió la resolución N° 1575, a través de la cual La ANLA otorgó licencia ambiental, condicionando armonizar la ampliación de la pista del aeropuerto de Tolú con el diseño y trazado de la UFI7.3 El 10 de mayo de 2018, la Concesión solicita ante la ANI la materialización de un Evento Eximente de Responsabilidad a favor de la Concesión Ruta al Mar S.A.S., ante la imposibilidad de iniciar las obras previstas para la Unidad Funcional 7.3 por el pronunciamiento realizado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- en la Licencia Ambiental otorgada. La Interventoría, Mediante comunicado CI.023/AB2025/18/5.3 del 21 de mayo de 2018 presento ante la ANI concepto de viabilidad del EER. La Concesión a través del radicado CRM 48-147-20180606001948 del 06 de junio de 2018 comunicó a la ANI sobre la respuesta emitida por la AEREOCIVIL en atención al derecho de petición hecho por CORUMAR Mediante radicado CRM 48-147-20180507001484, en la citada respuesta es posible confirmar que durante las etapas de pre factibilidad y factibilidad de la IP Antioquia – Bolívar no existía documento que estableciera la expansión futura del aeropuerto del golfo, por lo que la Concesión Ruta al Mar reitera se les reconozca un EER. La ANLA mediante radicado Radicación: 2020011590-2-000 del 28 de enero de 2020 notificó a la Concesión la Visita de evaluación para la modificación de la Licencia Ambiental al proyecto: “Unidad Funcional 7, Tramo 7.3 Tolú-Pita Abajo - El Pueblito” - Perimetral del Aeropuerto de Tolú (K0+000 al K4+192). Expediente ANLA LAV0032-00-2017, la cual se realizó los días 4 y 5 de enero de 2020. La visita de evaluación se llevó a cabo el 3 y 4 de febrero de 2020, posterior a esto se citó el 19 de febrero de 2020 a reunión de solicitud de información adicional, dentro de los 13 requerimientos que la autoridad ambiental realizó a la Concesión mediante acta 9, están los siguientes: Requerimiento 2. Ajustar el área de influencia definitiva del proyecto, de manera que se involucren aquellas en las que se van a manifestar los impactos ambientales significativos ocasionados por el desarrollo del mismo. Requerimiento 3. Presentar la certificación del Ministerio del Interior que incluya la totalidad del área de influencia definitiva del proyecto “área adicional para el proyecto construcción de la variante Tolú UF 7.3 y zona de disposición de materiales sobrantes”. La ANLA notificó a la Concesión a través del comunicado No. 020062009-2-000 del 23 de abril de 2020 la suspensión de los términos con ocasión de los decretos de emergencia nacional –COVID 19. Sin embargo, queda abierta la posibilidad que, al ampliarse el polígono a certificar, se resuelva por parte de la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, certificar presencia de una o más comunidades étnicas. La Concesión mediante el radicado N° 48-147-20200227013196 del 27 de mayo de 2020 presentó ante la ANI el análisis de impactos ambientales UFI 7.3 – Perimetral del Aeropuerto de Tolú. Alcance a oficio 2019-409-120234-2 del 18-11-2019. Circular de Lineamientos institucionales para la solicitud de certificaciones de presencia de comunidades étnicas de proyectos viales de la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, oficio 2016-409-000028-4 del 21-09-2016. Área de Influencia EIA VS Área de influencia MININTERIOR. En donde se da cumplimiento al requerimiento N° 3 del acta 9. El 14 de septiembre de 2020 se realizó las reuniones de socialización de resultados del EIA Variante de Coveñas, en total 2 comunidades socializadas, de acuerdo con el requerimiento ANLA en la solicitud de información adicional, sólo está pendiente el pronunciamiento de la DANCP

		sobre la presencia o no de comunidades étnicas en el marco del requerimiento ampliación de nuevas áreas de influencia, una vez se pronuncie el Ministerio del Interior, se establecerá el estado del proceso. El 23 de septiembre de 2020 La ANLA mediante comunicado 2020163148-2-000 notificó a la Concesión que hasta tanto no se tenga el pronunciamiento del Ministerio del Interior sobre la presencia o no de comunidades étnicas para la UF 7.3 Variante de Tolú, la autoridad ambiental no continuará con el trámite hasta tanto se cuente con el acto administrativo por parte de la DNCAP El 10 de octubre de 2020, la Concesión juntamente con la unidad de riesgos departamental, la alcaldía de Tolú, CARSUCRE, la procuraduría agraria y de asuntos ambientales de Sucre y la Comunidad desarrollaron reunión de acuerdo a lo comprometido en la socialización de resultados del EIA, específicamente para revisar a mayor profundidad la hidrología y obras de hidráulicas propuestas en el diseño en área de influencia de la vereda el Palmar El 27 de noviembre se realizó recorrido con la participación de la alcaldía de Tolú, unidad de gestión de riesgo, CARSUCRE y comunidades de la vereda y cabildo el Palmar con ocasión de recorrer el trazado Pr 0+000 al 4+400 UF 7.3 Perimetral aeropuerto de Tolú, en donde se generaron las observaciones puntuales al componen hidráulico, de acuerdo con los diseños socializados por la Concesión. La Concesión mediante radicado 48-147-2020121116915 del 11 de diciembre de 2020 radicó ante la ANLA solicitud de SUSPENSIÓN del trámite de licenciamiento con ocasión de resolución de la DANCP ST 1260 del 9 de diciembre de 2020 en la cual se certificó la presencia de la comunidad indígena, en este sentido la Concesión expone que requiere 18 meses para aportar la información complementaria y así avanzar en la evaluación de la L.A. Teniendo en cuenta lo anterior, el trámite estaría suspendido desde el 14 de diciembre de 2020 hasta el 14 de junio de 2022. La Concesión mediante comunicado radicado 8-147-20210120017423 del 20 de enero de 2021 solicitó a la DANCP el inicio de la Consulta Previa. El 17 de febrero de 2021 se realizó reunión de coordinación entre Concesión, Interventoría y la DANCP. Se estimó iniciar la consulta previa el 18 de marzo de 2021 El 15 de marzo de 2021 se desarrolló la etapa de Pre-Consulta con el cabildo Isla Gallinazo, la apertura de la consulta se dio en abril de 2021. El 17 de 2021 de marzo se realizó apertura de la Consulta Previa con el cabildo el Palmar. El 26 de abril de 2021 se firmó el acta declaratoria de la ocurrencia de un EER y consecuente ampliación del plazo para la ejecución de las obras y actividades asociadas las UF 6.3, 7.2 y **7.3.** En este sentido se reconocerá el tiempo incurrido desde la fecha de solicitud de información adicional por parte de la ANLA – 25 de febrero de 2020 hasta la modificación de licencia ambiental, sin embargo, con la expedición de la resolución N° 1243 del 15 de julio de 2021, se entiende superada la condición. El 28 de abril se protocolizó la Consulta previa con la comunidad el Palmar El 12 de mayo se protocolizó la Consulta Previa con el cabildo Isla Gallinazo El 25 de mayo de 2021 la Concesión mediante comunicado N° 48-147-20210521019056 radicó ante la ANLA el complemento del EIA y las actas de protocolización. El 15 de julio de 2021, la ANLA mediante radicado N° 2021144790-2-000 notificó a la Concesión la resolución N° 1243 del 15 de julio de 2021 – **Aprobación** a la modificación de Licencia Ambiental para la UF 7.3 Perimetral Aeropuerto de Tolú. Los días 5 y 6 de agosto de 2021 la Concesión realizó la socialización de licencia ambiental resolución N° 1243 del 15 de julio de 2021, al tiempo que informó el inicio de obras programado – 15 de agosto de 2021.

UF	Punto critico	Trazabilidad
		Con la expedición de la resolución N° 1243 del 15 de julio de 2021–- Licencia Ambiental para la UF 7.3 Perimetral Aeropuerto de Tolú, se superó el punto crítico, por lo tanto, se reportan por fuera de esta matriz los avances en el cumplimiento de las obligaciones derivadas del citado acto administrativo.

UF	Punto critico	Trazabilidad
8.3	**Oposición de las comunidades de María La Baja para dar continuidad a la ejecución de las obras de la UFI 8.3, lo cual se convierte en factor de riesgo ya que impide la continuidad de las Obras.**	En el mes de noviembre de 2020 en la UFI 8.3 en el sector San pablo y Majagua, la comunidad impidió la terminación de las obras constructivas en razón a PQRS relacionadas con supuestas afectaciones a sus viviendas, solicitudes que fueron atendidas por la Concesión demostrando que las supuestas afectaciones no eran responsabilidad de las obras, debido a esta situación se adelantó reunión en la Alcaldía de María la Baja, el viernes 13 de noviembre de 2020 con acompañamiento de la Interventoría y administración Municipal en la cual se plantearon opciones para el cierre de dichas PQRS. 20 enero- 2021 Se programa una nueva visita en cada una de las viviendas que presentaron PQRS con el acompañamiento de Personería y administración Municipal con el objeto de revisar y explicar el concepto previamente emitido por la Concesión a cada una de las PQRS. De acuerdo con la situación presentada por la comunidad, el Concesionario informa la posibilidad de solicitar Evento Eximente de Responsabilidad debido a las circunstancias relacionadas con la negativa de la comunidad para permitir la terminación de las obras. El 13 de febrero de 2021 finalizaron las visitas con acompañamiento de la personería y va a socializar las conclusiones del EPC con personería y alcaldía. En el mes de marzo esta Interventoría sugiere al Concesionario ubicar una oficina móvil en la Unidad Funcional 8 subsector 3, con el fin de realizar relacionamientos con las comunidades, con el objetivo de mitigar la problemática social presentada en el municipio de María La Baja, sectores San Pablo, Majagua y Primero de Julio. En el mes de mayo 2021, se realiza ruta de cierre a las PQRS - viviendas sector San Pablo en la UF 8.3 - teniendo en cuenta los diferentes disensos entre peticionarios y alcance del proyecto: de 14 viviendas que reportaron afectaciones se llegó a un consenso con propietarios de 7 viviendas, 6 manifestaron su intención de tener otras expectativas y una está pendiente de definición. El Concesionario informa que ya ha dado respuesta a cada una de las PQRS atendiendo las inquietudes de los peticionarios, sin embargo, se tienen otras expectativas por parte de las comunidades. El director del EPC manifestó que de las 73 PQRS se evidenció una posible afectación ocasionada por la ejecución de las obras en 14 viviendas, se revisaron las propuestas de los peticionarios y se tendrá el acompañamiento de un especialista con el fin de validar soluciones de fondo a implementarse respecto de lo cual se mantendrá informada a la Interventoría. Frente a las 59 viviendas restantes se tiene pronunciamiento de la personería y alcaldía donde se indica que no se tuvo afectaciones por la ejecución de las obras en la UF 8.3 y se requerirá por

		parte de la Concesión acompañamiento para realizar el cierre de las actas de vecindad de estas viviendas. En el mes de junio de 2021, Estado de avance en la gestión PQRS viviendas UF 8.3. Sector Majagua San Pablo, Total de viviendas 14, todas fueron revisadas por el especialista, 8 se acogieron a acuerdo y 5 pretensión judicial, cotizaciones 4, disenso una Vivienda. En agosto de 2021 se generaron compromisos entre la concesión y los propietarios de las viviendas que aceptaron la reparación de sus casas, en los términos propuestos por la Concesión, se realizaron los avalúos del posible reconocimiento a realizarse a cada propietario “afectado”. En el mes de octubre el Concesionario informa que llegó a acuerdo con 8 propietarios y están en proceso de suscripción de Contratos. Seis propietarios indicaron que iniciarán acciones legales al no estar de acuerdo con las reparaciones que se pretenden realizar. Para el mes de noviembre, de 14 viviendas que reportaron afectaciones se llegó a un consenso con propietarios de 8 viviendas, conviene señalar que los otros 6 propietarios manifestaron su intención de tener otras expectativas y una está pendiente de definición. El Concesionario informa que ya ha dado respuesta a cada una de las PQRS atendiendo las inquietudes de los peticionarios, sin embargo, se tienen otras expectativas por parte de la comunidad. En el mes de diciembre 2021 continúan los diálogos de concertación con los peticionarios de estas viviendas y se logró con 8 propietarios la suscripción de 8 Contratos, además se adelanta la entrega de recursos y materiales según los acuerdos ya pactados. En el mes de enero 2022, se adelanta la entrega de recursos y materiales según los acuerdos ya pactados, una vez se entreguen los recursos a los propietarios que aceptaron el acuerdo de viviendas afectadas se concertara reunión con alcaldía de María la Baja para buscar estrategias y dar continuidad a obras en la UFI 8.3 En febrero del 2022 se suscribieron 8 Contratos con propietarios que aceptaron el acuerdo. El 31 de marzo 2022, se llevó a cabo reunión para solucionar las dificultades con las comunidades del sector Majagua, San Pablo y Primero de Julio y continuar con las obras de la Unidad Funcional 8.3, convocada por la Concesión Ruta al Mar, en la que estuvieron presentes, Construcciones El cóndor la ANI la Interventoría CR CONCESIONES la gobernación de Bolívar, la Policía de tránsito, la personería, secretaría de planeación y alcaldía de María la baja, representantes de las comunidades Majagua, San Pablo y Primero de Julio, en dicha reunión se establecieron acuerdos para dar inicio a las obras el día 25 de abril en este sector de la UFI 8.3. En el mes de abril se inició al cumplimiento de los compromisos que hacen parte de los acuerdos planteados en la reunión realizada el 31 de marzo en la alcaldía de María la Baja para solucionar las dificultades con las comunidades del sector Majagua, San Pablo y Primero de Julio y continuar con las obras de la Unidad Funcional 8.3: ● 04 abril 2022: socialización de los acuerdos planteados en la reunión del 31 de marzo en la alcaldía de María la Baja con la comunidad de Majagua, en esta reunión la comunidad expresó no estar satisfecha con los acuerdos, por lo tanto, no utilizaran las instancias legales para reclamar la adecuación de todas las viviendas de la comunidad. ● 04 abril 2022: socialización de los acuerdos planteados en la reunión del 31 de marzo en la alcaldía de María la Baja con la comunidad de la Comunidad de la Vereda San Pablo- Primero de julio, esta comunidad aprueba los acuerdos planteados y determinan iniciar las visitas de verificación a las viviendas afectadas el 06 de abril del 2022. ● 04 abril 2022: se realizó visita para determinar el cronograma de las visitas a realizar en el sector de San Pablo y Primero de Julio según lo acordado con la comunidad, en esta reunión participó el Concesionario, Construcciones El Condor y secretaria de Planeación Municipal quienes serán los encargados de realizar dichas visitas de verificación, los días 06,07,25,26 y 27 de abril. ● 05 abril 2022: de acuerdo a los compromisos de la reunión realizada el 31 de marzo en la alcaldía de María la Baja, se realizó recorrido de verificación de las obras hidráulicas

		en la UFI 8.3, para determinar las obras que están afectando a las comunidades del sector. En el mes de abril solo se realizaron 7 visitas de verificación a las viviendas en el sector de la comunidad San Pablo y Primero de Julio debido a la disponibilidad de acompañamiento que tuvo la secretaria de planeación municipal de María La Baja. El 25 de mayo 2022, la Concesión Ruta al Mar realizó reunión con la Alcaldía de María la Baja, el EPC, personal de las comunidades primero de Julio y San Pablo e Interventoría, para continuar con el cumplimiento de los compromisos que hacen parte de los acuerdos planteados en la reunión realizada el 31 de marzo, para proseguir con las obras de la Unidad Funcional 8.3. El 31 de mayo 2022, se realizó reunión con la Alcaldía de María la Baja con el fin de continuar con las visitas de verificación a las viviendas, se logra coordinar y organizar el plan de trabajo de la siguiente manera: - Cronograma de las visitas en compañía de la personería, secretaria de planeación de María la baja ● 01 de junio ● 02 de junio ● 07 de junio ● 08 de junio ● 09 de junio Se llega acuerdo de iniciar las actividades de obra en este sector el día 15 de junio 2022. El 13 de junio se llevó a cabo reunión de seguimiento a los compromisos pactados entre el EPC, la Concesión Ruta al Mar, La Alcaldía Municipal de María la Baja y las Comunidades de Primero de Julio y San Pablo, en esta se pudo evidenciar que no se logró realizar las visitas de verificación a las 40 viviendas pendientes según el cronograma que se había realizado el 31 de mayo, toda vez que las viviendas del primero de julio no aceptaron dicha visita por que no estaban de acuerdo con la profesional de la secretaria de planeación delegada por la Alcaldía de María La Baja para realizar el acompañamiento, además otras visitas no se han logrado concertar por falta de acompañamiento de la Alcaldía Municipal debido a múltiples obligaciones de sus profesionales, por tal motivo no se ha podido avanzar de acuerdo a lo establecido en compromisos anteriores de realizar las visitas de verificación a las viviendas de manera conjunta, el Concesionario reitera a la Alcaldía Municipal de María la Baja la importancia de su acompañamiento para continuar con las actividades acordadas. El día 08 de agosto se programó continuar con las visitas técnicas de verificación en el sector de María la Baja, a las que asistió la concesión, el EPC y la Interventoría, nuevamente no hubo presencia de la autoridad local y la Personería lo que imposibilita continuar con las visitas ya que la comunidad exige la presencia de estas entidades. El día 30 de agosto se realizó reunión para establecer nuevos compromisos con la alcaldía de maría la baja y la personería, en la cual se iniciarán las visitas nuevamente el 05 de septiembre, además por parte de la alcaldía contratarán un funcionario para su respaldo. En el mes de septiembre se dio inicio a las visitas en el sector de San Pablo, en compañía del EPC, Interventoría y el profesional Ingeniero Civil contratado por la alcaldía y Personería Municipal de María la Baja. El día 19 de octubre se realizó mesa de trabajo para revisión de conceptos técnicos, de las visitas ya realizadas, se revisaron 19 informes técnicos, esto por solicitud del ing. de Planeación debido a que las otras 12 visitas se habían realizado con otros funcionarios de planeación y no estuvieron presentes en dicho encuentro, en ese orden de ideas quedaron pendientes por revisar 12 informes técnicos, de esos 19 informes técnicos, el funcionario de planeación presentó objeciones, no estuvo de acuerdo con 9. debido a esto, se le solicitó al ing. de planeación que entregara un informe técnico del porque consideraba que, si se debían hacer arreglos o reparaciones a las viviendas.

		Se programo para el martes 25 de octubre, hacer 4 visitas adicionales a unas construcciones de la zona, las cuales no se realizaron y se está a la espera de la nueva programación, asimismo, se programará la segunda mesa de trabajo con la Alcaldía para revisar las viviendas faltantes de este sector. En el mes de noviembre 2022, se tiene que no se realizó la segunda mesa de trabajo con la alcaldía de María La Baja, ya que esta no cuenta con el profesional de arquitectura para continuar con los acompañamientos a los profesionales de la concesión ruta al mar, sin embargo se realizó una reunión extraordinaria el día 29 de noviembre, con la comunidad del sector de San Pablo y primero de Julio, con el fin de socializar la propuesta de la concesión para continuar con las obras de construcción en esta zona, la cual consiste en: de las 49 viviendas a las que se le hizo visitas de verificación, entregar materiales de construcción y una ayuda económica para arreglar los daños de estas, ahora bien se concluyó después de la mesa técnica de estas visitas de verificación que solo 9 viviendas fueron afectadas por el proyecto, sin embargo la ayuda se entregara a las 40 viviendas restantes de forma lineal es decir la misma cantidad a todos, 4 bolsas de cemento, lo equivalente en arena y $150.000 para mano de obra, así mismo, las 9 casas afectadas por el proyecto, recibirán 5 bolsas de cemento, lo equivalente en arena y $200.000, el líder de San Pablo y primero de Julio socializara dicha propuesta con los demás integrantes de la comunidad y estarán emitiendo una respuesta por escrito aceptando o no lo que propone el Concesionario. El día 29 de diciembre del 2022, en el comité mensual N°81, el Concesionario indicó que, a pesar de lo acordado Con las comunidades de Primero de Julio solo algunas firmaron los acuerdos y con la comunidad de Majagua no aceptaron los acuerdos propuestos por el Concesionario, por ello continuaran las gestiones para acercarse a la comunidad y lograr la terminación de las obras. En el mes de enero 2023, se tiene lo siguiente, se logró concertar con 15 propietarios y se iniciaran las reparaciones por el sector primero de julio. Adicionalmente en el sector Majagua no se pudo concretar acercamiento para las aproximadamente 45 viviendas. En el mes de febrero se realizó los últimos acuerdos con la comunidad de San Pablo y Primero de Julio quienes están recibiendo la donación del Concesionario para el mejoramiento de sus viviendas. En el mes de marzo se finalizaron las actividades de obra en el sector de San Pablo y Primero de Julio, así mismo se continúa realizando visitas para concertar los acuerdos con la comunidad de Majagua, para continuar con las actividades de obra en este sector. En el mes de abril 2023, se logró los acuerdos con la comunidad de Majagua, en el Municipio de María La Baja, quienes recibirán las donaciones por parte del Concesionario, para el mejoramiento de sus viviendas, en la primera semana del mes de mayo. En el mes de mayo se culminó la entrega de las donaciones por parte del Concesionario, para el mejoramiento de las viviendas del sector Majagua y se continuo con las actividades de obra paralelamente. El día 12 de mayo 2023, se realizó reunión en la comunidad de Majagua, con presencia de la Concesión, EPC, Interventoría, lideres y miembros de la comunidad, con el fin de tratar temas tales como: - Adecuación de barrancos - Bajada de arroyo - Pasos peatonales, bermas y barandas - Adecuación de accesos a viviendas - Entrega de material a 6 personas que hicieron falta - Adecuación de canales de desagüe - Compensación comunitaria Además, se atendieron otras solicitudes de la comunidad como adecuación de accesos y reductores de velocidad que se han ido realizando en el último semestre del 2023.

UF	Punto critico	Trazabilidad
		En el último semestre del año 2023, se terminó de realizar los compromisos pactados con estas comunidades, por lo tanto, a la fecha se encuentra superado este punto crítico. El 27 de julio, se presentó un bloqueo en el sector primero de julio de la UFI 8.3, donde la comunidad alude que, a pesar de los acuerdos allegados con el Concesionario, este no ha cumplido con la adecuación de varios accesos a las viviendas del sector, este bloqueo fue atendido por el Cocesionario, quien se comprometió a realizar una nueva revisión de las obras en este sector. Del 01 al 30 de septiembre 2026, no se tienen novedades.

6.9. PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA GESTIÓN SOCIAL EN LA ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

A continuación, se describen las acciones a ejecutar por el Concesionario Ruta al Mar SAS, en la etapa de operación y mantenimiento en cada una de las unidades funcionales de acuerdo con lo establecido en el apéndice técnico social 8, así mismo, lo establecido en el programa de adaptación de la guía Ambiental – PAGA y la Licencia Ambiental.

Tabla 6-34 Seguimiento y Monitoreo de la Gestión Social en la Etapa de Operación y Mantenimiento

UF	SUB-SECTOR	UNIDAD FUNCIONAL	INSTRUMENTO DE CONTROL	ESTADO ACTUAL DE LA UFI PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES EN LA ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
UF 1	1	CAUCASIA - PLANETA RICA	PAGA	Operación
UF 2	1	CERETE – LORICA	PAGA	Operación/ Construcción
UF 3	1	VARIANTE DE PLANETA RICA	EIA Con Licencia Ambiental N°00114 del 30 de enero de 2018	Operación
	2	EL QUINCE - SAN CARLOS (PR0+00 AL PR10+00)	PAGA	Operación
	3	EL QUINCE - SAN CARLOS (PR10+00 AL PR22+500)	EIA Con Licencia Ambiental N°00898 del 01 de agosto de 2017	Operación
	4	SAN CARLOS - CERETE (PR22+500 AL PR31+990)	PAGA	Operación
	5	VARIANTE DE CERETE	EIA Con Licencia Ambiental 057 del 12 de enero de 2017	Operación

UF	SUB-SECTOR	UNIDAD FUNCIONAL	INSTRUMENTO DE CONTROL	ESTADO ACTUAL DE LA UFI PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES EN LA ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
UF 6	1	CERETE - LORICA	PAGA	Operación Entre el K22+040 al K22+200 y K27+820 al K28+190de la Unidad Funcional 6, subsector 1
	2	LORICA – COVEÑAS	PAGA	Operación
	3	COVEÑAS – TOLÚ	PAGA	Mejoramiento
UF 7	1	VARIANTE DE LORICA	EIA Pendiente X Aprobar ANLA	Pendiente
	2	VARIANTE DE COVEÑAS	EIA Con Licencia Ambiental Resolución 01317 del del 27 de julio del 2021	Operación
	3	TOLÚ – PUEBLITO	EIA Con Licencia Ambiental 01575 del 07 de diciembre de 2017	Operación
UF 8	1	TOLÚ – TOLUVIEJO	PAGA	Operación
	2	PUEBLITO - SAN ONOFRE	PAGA	Operación
	3	SAN ONOFRE - CRUZ DE VISO	PAGA	Mejoramiento

Fuente: Tomado por la Interventoría de los informes mensuales

Tabla 6-35 Actividades en etapa de operación y mantenimiento

	PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		UFI
Actividades en etapa de operación y mantenimiento **PLAN DE GESTIÓN SOCIAL EN ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**	**Programa de atención al usuario**	* Una Oficina fija y una oficina móvil *Recepción de PQRS *Medios electrónicos de Atención *Recepción de hojas de vida	Todas
	Programa de vinculación de mano de obra	*Publicación de las ofertas de empleo acorde con los niveles de formación requeridos por la empresa.	Todas
	Programa de Educación y Capacitación al Personal Vinculado al Proyecto	*Capacitar a los colaboradores dentro de los tres meses de su vinculación al proyecto.	Todas
	Programa de Información y Participación Comunitaria	*Apropiación, Inserción y adopción del Proyecto *Socialización sensibilización e información * Herramientas y Canales de comunicación *Generación de opinión pública *Organización para la participación y el desarrollo comunitario	Todas
	Programa de Apoyo a la Capacidad de Gestión Institucional	*Actualización del registro de las áreas ocupadas ilegalmente. *Promover en coordinación con las entidades competentes iniciativas relacionadas para la recuperación del espacio público *Recuperación del espacio público.	Todas
	Programa de capacitación, educación y concientización de la comunidad aledaña al proyecto.	*Crear espacios de educación y concientización a las comunidades en temas que contribuyan a la conservación del entorno *Realizar jornadas Cívico ambientales	Todas
	Programa Cultura Vial	*Ejecutar campañas de prevención vial trimestrales *Realizar mensualmente actividades pedagógicas de formación de sensibilización orientadas a los diferentes grupos de interés *Diseñar, elaborar y distribuir material informativo (afiches, volantes, merchandising publicitario como bolsas, calendarios o cualquier elemento útil al usuario que pueda tener función pedagógica.	Todas
	Programa de Acompañamiento a la Gestión socio- Predial	*Hacer seguimiento a las unidades sociales hasta un año más luego haber concluido el proceso de traslado.	Todas
	Programa de Reasentamiento	*Hacer seguimiento a las unidades sociales hasta un año más luego haber concluido el proceso de traslado.	UFI 3-5

Fuente: Tomado por la Interventoría de los informes mensuales

PROCESO DE REVERSIÓN ÁREA SOCIAL

De conformidad con lo ordenado por un tribunal arbitral internacional, se produjo la terminación anticipada del contrato de concesión de la Concesión Ruta al Mar, en consecuencia, el proyecto vial, que comprende los departamentos de Córdoba, Sucre, Antioquia y Bolívar, inició el proceso de reversión y devolución de la infraestructura al Estado.

En el marco del proceso de reversión, el componente social tiene como propósito verificar y documentar el cumplimiento de las obligaciones sociales a cargo del Concesionario durante la ejecución del proyecto. Esta verificación comprende las obligaciones establecidas en los instrumentos de Gestión Social previstos en el contrato de concesión, así como aquellas derivadas de los instrumentos de control y seguimiento ambiental, los acuerdos suscritos con comunidades étnicas en el marco de los procesos de consulta previa, los compromisos adquiridos con terceros con participación de la Agencia y las obligaciones establecidas mediante decisiones o mandatos judiciales.

Lo anterior, con el objeto de establecer que, durante las diferentes etapas de ejecución del proyecto y hasta su finalización, la gestión social se haya desarrollado de manera integral y bajo criterios de sostenibilidad, participación y cumplimiento de los compromisos adquiridos con los diferentes grupos de interés.

Desde la Interventoría, se realizó la notificación del proceso de reversión, para ello el Concesionario deberá diligenciar y presentar los siguientes formatos establecidos por la ANI:

• **Formato de Cumplimiento de Obligaciones Sociales (GCSP-F-115):** *Formato en el que se consignan cada uno de los ítems relacionados con el cumplimiento de las obligaciones sociales derivadas de los instrumentos de Gestión Social establecidos en el Contrato de Concesión, los instrumentos de control y seguimiento ambiental, los acuerdos suscritos con comunidades étnicas en el marco de los procesos de consulta previa, los acuerdos con terceros con participación de la Agencia y las obligaciones derivadas de mandatos judiciales*.

• **Formato de Pendientes Sociales (GCSP-F-305)**: *Formato en el que se registran las obligaciones pendientes de cumplimiento derivadas de los instrumentos de Gestión Social establecidos en el Contrato de Concesión, los instrumentos de control y seguimiento ambiental, los acuerdos suscritos con comunidades étnicas en el*

marco de los procesos de consulta previa, los acuerdos con terceros con participación de la Agencia y las obligaciones derivadas de mandatos judiciales. En este formato se deberá indicar: i) el tipo de pendiente social; ii) el origen del pendiente; y iii) su ubicación dentro del proyecto.

• **Formato de Inventario de Pagos de Compensaciones Socioeconómicas (GCSP-F-306):** *Formato en el que se registran los pagos realizados en los procesos de adquisición predial mediante enajenación voluntaria o expropiación judicial, según corresponda, debidamente cotejados con los informes de fiducia que evidencien el soporte idóneo de la relación directa entre las obligaciones contractuales por concepto de compensaciones socioeconómicas y su destinación específica para cada predio.*

En este sentido, resulta importante señalar que, durante la transición del proyecto de infraestructura Antioquia–Bolívar, la Gestión Social deberá garantizar la adecuada atención a los usuarios y, adicionalmente, verificar y evaluar la existencia de compromisos pendientes a cargo del Concesionario o de la Entidad, con el propósito de evitar la generación de expectativas indebidas y mantener relaciones adecuadas con las comunidades y los usuarios de la vía.

Es muy importante señalar, que el Concesionario presento un cronograma para la entrega de la información, para su verificación y recibo a conformidad, con el fin de hacer la entrega al Instituto Nacional de Vías INVIAS.

Tabla 6-36 Actividades en etapa de Reversión

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE FORMATOS POR RUTA NACIONAL			
ÁREA	**DESCRIPCIÓN DE LA TAREA**	**INICIO**	**FIN**
SOCIAL	**Entrega 1** (UFI 8)	30/06/2026	27/07/2026
	Entrega 2 (UFI 6 y 7)	15/07/2026	3/08/2026
	Entrega 3 (UFI 4 y 5)	22/07/2026	17/08/2026
	Entrega 4 (UFI 1 y 3)	31/07/2026	30/082026
	Entrega 5 (UFI 2)	11/08/2026	30/08/2026

Fuente: Propia de la Interventoría IPAB

Esta revisión debe considerar la naturaleza y alcance de la etapa de reversión, diferenciándola de las obligaciones previstas para las etapas de construcción, operación y mantenimiento. En este sentido, la terminación anticipada del contrato y el consecuente inicio de la reversión implican un cambio en el marco de ejecución de las obligaciones contractuales, por lo que aquellas actividades, programas o compromisos vinculados exclusivamente a las etapas de construcción, operación y mantenimiento deberán analizarse de acuerdo con su finalidad, vigencia y estado de cumplimiento, sin que su continuidad pueda presumirse como una obligación propia de la etapa de reversión.

De esta manera, la gestión social asociada al proceso de reversión busca dejar evidencia del cumplimiento de los compromisos sociales exigibles al Concesionario hasta la terminación de su gestión, así como del estado de aquellos asuntos que, por su naturaleza, deban ser objeto de entrega, seguimiento o cierre, garantizando la adecuada transición y trazabilidad de la gestión social desarrollada durante la ejecución del proyecto.

En este periodo del mes de septiembre de 2016, se realizó el análisis y revisión de los Formatos:

• **Formato de Cumplimiento de Obligaciones Sociales (GCSP-F-115)**

• **Formato de Pendientes Sociales (GCSP-F-305)**

• **Formato de Inventario de Pagos de Compensaciones Socioeconómicas (GCSP-F-306)**

Correspondientes a las **UFI 1 RUTA 2513, UFI 3-1 RUTA 25CRA, UFI 3-2, UFI 3-3 y UFI 3-4 RUTA 74CR01, UFI 3-5 RUTA 74CRA, UFI 4 subsectores 1 y 2 RUTA 2310 y UFI 5-1 RUTA 7401, UFI 5-2, RUTA 21CR04**, cumpliendo con el cronograma de entrega.

Asimismo, se hizo el cargue de la información de la Gestión Social para la entrega al Instituto Nacional de Vías (INVIAS), las Unidades Funcionales reportadas en la Segunda entrega:

- RUTA 2513: (UFI1)
- RUTA 25CRA :(UFI 3-1)
- RUTA 74CR01:(UFI 3-2, UFI 3-3 y UFI 3-4)
- RUTA 74CRA: (UFI 3-5)
- RUTA 2310: (UFI 4 subsectores 1 y 2)
- RUTA 7401: (UFI 5-1)
- RUTA 21CR04 (UFI 5-2)

7. GESTIÓN PREDIAL

De conformidad con el cumplimiento del objeto pactado en el Contrato de Interventoría, este capítulo contiene el análisis de la gestión adelantada por el Concesionario en el mes de septiembre de 2026 y su relación con el cumplimiento de las obligaciones contractuales estipuladas en el Apéndice Técnico 7 – Gestión Predial en concordancia con lo establecido en la Parte General y en la Parte Especial del Contrato de Concesión 016 de 2015. Que conforme a la terminación anticipada del mismo con ocasión al Laudo Arbitral del 30 de abril de 2026, Se incluye el seguimiento a las actividades prediales en el proceso de Reversión dirigidas a consolidar el inventario de los predios, la recopilación de la información que se entregará a la entidad que recibe la infraestructura INVIAS, y el seguimiento al Concesionario de la culminación de la gestión predial hasta que se consiga la titularidad a favor de la ANI en el trascurso de la mencionada etapa.

7.1 GENERALIDADES

Contrato de Interventoría:

Contrato 523 de 2026, se adjudicó el Contrato de Interventoría al **CONSORCIO IPAB**

El periodo evaluado corresponde al periodo comprendido entre el 01 al 30 de septiembre de 2026.

7.2 OBJETIVOS GENERALES

El objetivo general del presente informe es realizar el seguimiento al desarrollo de la gestión Predial adelantada por el Concesionario, a partir de la NO OBJECIÓN al Plan de Adquisición Predial presentado para el proyecto Antioquia – Bolívar.

7.3 PREDIOS REQUERIDOS

A continuación, se presenta una tabla comparativa de los últimos tres (3) informes radicados por el Concesionario, en dónde se discrimina la totalidad de los predios requeridos por Unidad Funcional.

Tabla 7-1 Comparación de Predios Requeridos año 2026.

UFI	No PREDIOS SEPTIEMBRE 2026	No PREDIOS AGOSTO 2026	No PREDIOS JULIO 2026
UF 1	3	3	3
UF 2	426	427	427
UF 3.1	9	9	9
UF 3.2	60	60	60
UF 3.3	59	59	59
UF 3.4	28	28	28
UF 3.5	64	64	64
UF 5.1	2	2	2
UF 6.1	86	86	86
UF 6.2	47	47	47
UF 6.3	48	48	48
UF 7.1	11	11	11
UF 7.2	99	100	100
UF 7.3	107	107	107
UF 8.1	34	34	34
UF 8.2	13	13	13
UF 8.3	192	192	192
TOTAL, PREDIOS	**1288**	**1290**	**1290**

Fuente: Consorcio IPAB.

A continuación, se detallan las variaciones prediales con respecto a periodos anteriores:

- **Agosto 2026:** Respecto al mes de julio de 2026 la cantidad de predios requeridos no presentó variación.
- **Septiembre 2026:** Respecto al mes de agosto de 2026 la cantidad de predios requeridos presentó variación.

El predio CAB-2-1-180A la ANI desiste ante la ANT, del trámite de adjudicación, tal como consta en oficio 20266040271361.

Para el predio CAB-7-2-060 la ANI desiste ante la ANT, del trámite de adjudicación, tal como consta en oficio No. 20266060211111 del 3 de junio de 2026.

7.4 SEGUIMIENTO DE PREDIOS QUE FUERON REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

La información registrada a continuación, corresponde a los predios que se han identificado como interferencia predial a pesar de la gestión realizada por el Concesionario, no ha sido posible obtener el permiso de intervención para la ejecución de actividades, por lo tanto, no se cuenta con la disponibilidad predial para el desarrollo de obras:

Para la Unidad Funcional integral 3 se tienen identificadas las siguientes interferencias prediales:

CAB-3-5-061 y CAB-3-5-062: Predios requeridos para culminar obras en la Intersección 7 de la UFI 3.5. Los predios en mención se encuentran adquiridos por la Agencia mediante la aplicación de saneamiento automático. No obstante, a la fecha no se ha logrado la realización del procedimiento policivo requerido para obtener la disponibilidad predial debido a que la ocupante se niega a la intervención voluntaria.

El Concesionario ha realizado acercamientos con la Alcaldía de Cereté, sin embargo, se ha dificultado la aplicación del procedimiento policivo con el Municipio de Cereté y

paralelamente presento a demanda reivindicatorias correspondiéndole el radicado 11001418900720240123000. las cuales están en curso en la ciudad de Bogotá, donde para el periodo de este informe presentó avance con respecto al mes de septiembre de 2026, ya que el Juzgado 07 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá D.C., profirió Auto de trámite el 30 de septiembre de 2026, por lo que se solicitará al Concesionario ampliar la información al respecto.

Como antecedente, el Juzgado Séptimo de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá mediante Auto del 25/06/2025 admite demanda declarativa reivindicatoria en contra de Lila Padilla Petro y Martin Negrete Padilla, el Concesionario notificó a los demandados acerca de la admisión de la demanda reivindicatoria el 01 de agosto de 2025 y el 27 de agosto de 2025 se radica memorial con las constancias de las notificaciones del auto admisorio de la demanda.

7.5 RESUMEN DEL ESTADO DE LA GESTIÓN PREDIAL

A continuación, se presenta el análisis de la gestión predial desarrollada mediante un cuadro resumen que permite identificar datos relevantes en las etapas de la gestión predial.

Tabla 7-2 Estado Gestión Predial

CONSOLIDADO GESTIÓN PREDIAL SEPTIEMBRE DE 2026																	
RESUMEN ESTADISTICO POR UNIDAD FUNCIONAL																	
UNIDAD FUNCIONAL	ORIGEN / DESTINO	LONGITUD EFECTIVA PREDIAL TOTAL (Km)	PREDIOS REQUERIDOS	PREDIOS DISPONIBLES	% DISPONIBILIDAD	LONGITUD EFECTIVA PREDIAL DISPONIBLE (Km)	% LONGITUD PREDIAL DISPONIBLE	ADQUIRIDOS POR SENTENCIA-EXPROPIACION	ADQUIRIDOS POR ENAJENACION VOLUNTARIA	PREDIOS EN PROCESO DE EXPROPIACIÓN	PREDIOS EN ENAJENACION VOLUNTARIA Y ADJUDICIACION	PREDIO FOLIO A FAVOR DE LA ANI	TOTAL PREDIOS ADQUIRIDO SEGÚN NRAL 1.13A OTRO SI 17	% DE ADQUISICION	PREDIOS FALTANTES POR ADQUIRIR	PREDIOS PENDIENTES POR OFERTAR	% FALTANTES
UF 1	Caucacia – Planeta Rica	58,6	3	3	100,00%	58,60	100,00%	0	2	1	0	0	2	66,67%	1	0	33%
UF 2	Cereté – Lorica	37	426	412	96,71%	36,58	98,86%	16	312	85	12	1	329	77,23%	97	0	23%
UF 3.1	Variante Planeta Rica	4,5	9	9	100,00%	4,50	100,00%	1	7	1	0	0	8	88,89%	1	0	11%
UF 3.2	El 15 – San Carlos	10	60	60	100,00%	10,00	100,00%	1	57	2	0	0	58	96,67%	2	0	3%
UF 3.3	El 15 – Variante San Carlos	12,5	59	59	100,00%	12,50	100,00%	0	56	3	0	0	56	94,92%	3	0	5%
UF 3.4	San Carlos – Cereté	9,5	28	28	100,00%	9,50	100,00%	1	24	3	0	0	25	89,29%	3	0	11%
UF 3.5	Variante Cereté	5,6	64	62	96,88%	5,58	99,64%	2	53	9	0	0	55	85,94%	9	0	14%
UF 5.1	Puerto Rey Arbolete –	-	2	2	100,00%	0,00	-	1	1	0	0	0	2	100,00%	0	0	0%
UF 6.1	Cereté – Lorica	37	86	86	100,00%	37,00	100,00%	5	65	13	3	0	70	81,40%	16	0	19%
UF 6.2	Lorica - Coveñas	17	47	47	100,00%	17,00	100,00%	12	29	6	0	0	41	87,23%	6	0	13%
UF 6.3	Coveñas - Tolú	1,92	48	48	100,00%	1,92	100,00%	1	38	8	1	0	39	81,25%	9	0	19%
UF 7.1	Variante Lorica	7,8	11	9	81,82%	6,37	81,67%	0	0	0	11	0	0	0,00%	11	0	100%
UF 7.2	Variante Coveña	21,6	99	99	100,00%	21,60	100,00%	11	66	16	5	1	78	78,79%	21	0	21%
UF 7.3	Tolú - Pueblito	28	107	107	100,00%	28,00	100,00%	7	84	15	1	0	91	85,05%	16	0	15%
UF 8.1	Tolú - Toluviejo	16,5	34	34	100,00%	16,50	100,00%	2	21	10	1	0	23	67,65%	11	0	32%
UF 8.2	Pueblito - San Onofre	11,2	13	13	100,00%	11,20	100,00%	1	11	0	1	0	12	92,31%	1	0	8%
UF 8.3	San Onofre – Cruz del Viso	59,3	192	186	96,88%	58,85	99,24%	6	161	17	8	4	171	89,06%	21	0	11%
SUBTOTAL		338,02	1288	1264		335,70		67	987	189	43	6	1060	82,30%	228	0	

Fuente: Consorcio IPAB.

Para este periodo de septiembre se evidenció siete nuevos predios a favor de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) de los cuales fueron: CAB-2-1-126, CAB-2-1-240, CAB-2-1-294, CAB-3-5-027G, CAB-6-1-059, CAB-6-2-011, CAB-7-2-085.

Así mismo, se tiene que actualmente el Contrato de Concesión se encuentra en etapa de reversión, por lo cual, se llevaron a cabo (2) dos mesas de trabajo en fechas 16 y 23 de septiembre de 2026 para aprobación del formato GCSP-F-114 inventario predial V3 y el formato GCSP-052 Sabana predial, de 68 predios de las UF 2513-1 (2), 25CRA-3.1(8), 74CRA01-3.2 (58), que hacen parte de la entrega dos (2) INVIAS

realizada mediante el oficio IPAB-0811-2026 Radicado ANI 20264091261832 del 25 de septiembre de 2026, a continuación de describe cada una de las unidades funcionales que fueron UF 1, 3.1, 3.2:

Tabla 7-3 Entrega UF1

ENTREGA No 2		
TRAMO	**REVISADOS**	**ENTREGADOS**
Caucasia - Planeta Rica 2513	2	2
UF 1	**PREDIOS**	
	CAB-1-1-009 - CAB-1-1-023	
CONTENIDO DE LA ENTREGA		
Construcciones asociadas	Formato gcsp-f-114_inventario_predial_v3_Informe_anexo_visita_UF1	
Documentos Físicos de la Adquisición Predial	Expedientes Prediales: 1. Estudio de títulos 2. Ficha predial 3. Avalúo Comercial 4. Oferta de Compra 5. Ficha Social 6. Enajenación 7. Permiso de Intervención.	
Identificación de Predios Adquiridos	Soporte-Actividad5_ANI_Formato(gcsp-f-114) gcsp-f-114_Invetario_Predial_v3 Sabana Predial-gcsp-f-052_seguimiento_y_Control_a_la_Gestión_Predial_del_Concesionario_v3	
Información Geográfica y Planos	Shape_File_Origen_Bogota Shape_File_Origen_Nacional Empalme Tira predial - Planos Records UF 1_Ruta 2513 Tira Predial UF 1 Caucasia-Planeta Rica_Ruta 2513	
Soporte de Valor	20260703_Verificación de Pagos UF1	

Fuente: Consorcio IPAB.

Tabla 7-4 Entrega UF3.1

ENTREGA No 2		
TRAMO	**REVISADOS**	**ENTREGADOS**
Variante Planeta Rica 25CRA	8	8
UF 3.1	**PREDIOS**	
	CAB-3-1-001 - CAB-3-1-002 - CAB-3-1-003 - CAB-3-1-004 - CAB-3-1-005 - CAB-3-1-006 - CAB-3-1-007 - CAB-3-1-009	
CONTENIDO DE LA ENTREGA		
Construcciones asociadas	Formato gcsp-f-114_inventario_predial_v3_Informe_anexo_visita_UF1	

ENTREGA No 2	
Documentos Físicos de la Adquisición Predial	Expedientes Prediales: 1. Estudio de títulos 2. Ficha predial 3. Avalúo Comercial 4. Oferta de Compra 5. Ficha Social 6. Enajenación 7. Permiso de Intervención.
Identificación de Predios Adquiridos	Soporte-Actividad5_ANI_Formato(gcsp-f-114) gcsp-f-114_Invetario_Predial_v3 Sabana Predial-gcsp-f-052_seguimiento_y_Control_a_la_Gestión_Predial_del_Concesionario_v3
Información Geográfica y Planos	Shape_File_Origen_Bogota Shape_File_Origen_Nacional Empalme Tira predial - Planos Records UF 1_Ruta 2513 Tira Predial UF 1 Caucasia-Planeta Rica_Ruta 2513
Soporte de Valor	20260703_Verificación de Pagos UF1

Fuente: Consorcio IPAB.

Tabla 7-5 Entrega UF3.2

ENTREGA No 2		
TRAMO	**REVISADOS**	**ENTREGADOS**
El 15 - San Carlos 74CRA01	58	58
UF 3.2	**PREDIOS**	
	CAB-3-2-001 - CAB-3-2-002 - CAB-3-2-003 - CAB-3-2-004 - CAB-3-2-005 - CAB-3-2-007 - CAB-3-2-008 - CAB-3-2-009 - CAB-3-2-010 - CAB-3-2-011 - CAB-3-2-012 - CAB-3-2-013 - CAB-3-2-014 - CAB-3-2-015 - CAB-3-2-016 - CAB-3-2-017 - CAB-3-2-017A - CAB-3-2-020 - CAB-3-2-021 - CAB-3-2-022 - CAB-3-2-023 - CAB-3-2-024 - CAB-3-2-025 - CAB-3-2-025A - CAB-3-2-026 - CAB-3-2-027 - CAB-3-2-027A - CAB-3-2-028 - CAB-3-2-029 - CAB-3-2-030 - CAB-3-2-031 - CAB-3-2-032 - CAB-3-2-034 - CAB-3-2-034A - CAB-3-2-034B - CAB-3-2-034C - CAB-3-2-034D - CAB-3-2-035 - CAB-3-2-036 - CAB-3-2-037 - CAB-3-2-038 - CAB-3-2-039 - CAB-3-2-039A - CAB-3-2-040 - CAB-3-2-041 - CAB-3-2-042 - CAB-3-2-043 - CAB-3-2-044 - CAB-3-2-045 - CAB-3-2-046 - CAB-3-2-046A - CAB-3-2-046B - CAB-3-2-046C - CAB-3-2-047 - CAB-3-2-048 - CAB-3-2-048A - CAB-3-2-048C - CAB-3-2-049.	
CONTENIDO DE LA ENTREGA		
Construcciones asociadas	Formato gcsp-f-114_inventario_predial_v3_Informe_anexo_visita_UF1	
Documentos Físicos de la Adquisición Predial	Expedientes Prediales: 1. Estudio de títulos 2. Ficha predial 3. Avalúo Comercial 4. Oferta de Compra 5. Ficha Social 6. Enajenación 7. Permiso de Intervención.	
Identificación de Predios Adquiridos	Soporte-Actividad5_ANI_Formato(gcsp-f-114) gcsp-f-114_Invetario_Predial_v3 Sabana Predial-gcsp-f-052_seguimiento_y_Control_a_la_Gestión_Predial_del_Concesionario_v3	
Información Geográfica y Planos	Shape_File_Origen_Bogota Shape_File_Origen_Nacional	

ENTREGA No 2	
	Empalme Tira predial - Planos Records UF 1_Ruta 2513 Tira Predial UF 1 Caucasia-Planeta Rica_Ruta 2513
Soporte de Valor	20260703_Verificación de Pagos UF1

Fuente: Consorcio IPAB.

7.6 ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN PREDIAL

Este subcapítulo hace referencia al análisis del avance de la gestión predial y al seguimiento de los instrumentos de gestión predial (Sabana predial, Tira topográfica, Plano predial) en la cual se debe tener en cuenta su concordancia y/o verificar los siguientes parámetros:

7.6.1 Predios con Tiempos de Avalúo Mayores a 30 días:

Aquí se efectúa la identificación de predios verificando el cumplimiento de lo señalado en el parágrafo 2 del Artículo 13 del Decreto 1420 de 1998, el cual indica que el plazo para la realización de los avalúos objeto del mencionado decreto es máximo de treinta (30) días hábiles, salvo las excepciones legales, los cuales se contarán a partir del día siguiente al recibo de la solicitud con toda la información y documentos establecidos en el citado artículo.

Tabla 7-6 Predios con novedad

CANTIDAD	PREDIO	FECHA DE REMISIÓN DE INSUMOS PREDIALES PARA AVALÚO	No DE DÍAS CON CORTE A FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
1	CAB-2-1-128**	2-mayo-2024	881

**Predio relacionado en solicitud de EER predial de la UFI 2 presentada por el Concesionario en el mes de marzo de 2025.

Se remitió comunicación con radicado Interventoría CI.023/AB12629/24/7.4.1 de fecha 9 de agosto de 2024, al concesionario solicitando celeridad del trámite correspondiente a la entrega de avalúo, y el Concesionario respondió que se encuentra a la espera de actualización catastral para continuar la adquisición predial.

Este mismo predio está relacionado en el comunicado 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20250331008247 con radicado ANI 20254090400372 de fecha 31 de marzo de 2025 y su respectivo alcance mediante comunicado 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20250415008391 del 15 de abril de 2025, mediante el cual el Concesionario notifica ocurrencia de un Evento Eximente de Responsabilidad (EER), debido a la imposibilidad de adquirir y disponer de la totalidad de los predios necesarios para el desarrollo del proyecto de conexión Antioquia – Bolívar, específicamente en la Unidad Funcional 2 – subsector 1 Cereté-Lorica.

La Interventoría respondió y la ANI trasladó al Concesionario la negación de la solicitud de EER en la que se incluye el predio en mención.

Además, el Concesionario presentó a Interventoría comunicado 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20250909009879, el 11 de septiembre de 2025, con asunto, Informe Estado Jurídico y Técnico del Predio CAB-2-1-128.

Con respecto a los predios con estado de avalúos solicitados en la sabana predial de la UFI 7-1, CAB-7-1-003, CAB-7-1-004, CAB-7-1-005, CAB-7-1-006, CAB-7-1-007, CAB-7- 1-008, CAB-7-1-009, CAB-7-1-010, CAB-7-1-011 y CAB-7-1-012, no se reportan toda vez que las gestiones de este sector se encuentran suspendidas por tramites ambientales.

6.9.1. Predios con Promesa de Compraventa sin Avance

En este subcapítulo se identifican los términos de compromisos pactados en las promesas de compraventa para dar continuidad a la terminación del proceso de enajenación voluntaria. A continuación, se presentan los predios que refieren alguna novedad:

Tabla 7-7 Predios con promesa de compraventa sin avance

30 DE SEPTIEMBRE DE 2026						
UFI	Trayecto	Predios	ALCANCE DE LA OFERTA		Fecha de Radicación y Promesa de Compraventa	No de Días con corte a Fecha.
			Fecha del Oficio de la Oferta	Fecha de Notificación de la Oferta		
UF 8.3	San Onofre - Cruz del Viso	CAB-8-3-235	26-oct.-21	28-oct.-21	17-nov.-21	**1778**
UF 8.3	San Onofre - Cruz del Viso	CAB-8-3-245	18-ene.-19	17-ene.-19	15-may.-19	**2695**

Fuente: Consorcio IPAB.

Conforme al proceso de gestión en trámite para los predios CAB-8-3-235 y CAB-8-3-245: Predio ubicados en sector de intersección N°17, donde actualmente se cuenta con diseño no objetado con las obras previstas en la intersección 17 del proyecto, sin embargo, en el sector se tuvo fallo de amigable componedor y conforme la aprobación del diseño definitivo se determinarán las áreas de adquisición predial, a la fecha está pendiente la entrega del ajuste del cronograma predial para este subsector, de conformidad con el plan de obras V.14 aprobado recientemente por la ANI. Asimismo, es preciso indicar que mediante comunicado CI.023/AB13657/25/7.4.1 con radicado ANI 20254090665272 del 27 de mayo de 2025 se dio no objeción al cronograma predial de la UFI 2 versión 14, reiterando observaciones sobre este subsector.

Además, mediante comunicado CI.023/AB13916/25/7.4.1 la interventoría observaciones para el desarrollo de la gestión predial en dicho subsector.

El Concesionario por comunicado Radicado: 48-RUTADCTOELECTRONICOS20260727012615 del 28 de julio de 2026, presentó informe de predios No Adquiridos No Intervenidos IP Antioquia - Bolívar, e indica que el predio CAB-8-3-235 no fue intervenido por la modificación de diseño de la Intersección Nro 17, y presenta factor social de restablecimiento de medios económicos, así mismo, esta Interventoría ha constatado que a pesar de no haber

sido intervenido ni adquirido el predio tiene promesa de compraventa suscrita por las partes, con un primer pago del 80% del valor total ofertado es decir la suma de $134.053.268 pagados a los propietarios el 26 de noviembre de 2021, presentando un saldo por pagar de $33.513.317.

Ahora bien, respecto del predio CAB-8-3-245, se indica en el citado oficio que el mismo no fue intervenido por la modificación de diseño de la Intersección Nro 17, pero esta Interventoría ha constatado que a pesar de no haber sido intervenido ni adquirido el predio tiene promesa de compraventa suscrita por las partes, con un primer pago del 50% del valor total ofertado es decir la suma de $3.660.688 pagados a los propietarios el 29 de mayo de 2019, presentando un saldo por pagar de $3.660.688.

Por lo anterior, y en atención a los pagos que se han realizado a los predios CAB-8-3-235 y CAB-8-3-245 dentro del proceso de gestión y adquisición predial, presentan un alto riesgo el no continuar con la adquisición de los mismos, por la posibilidad de no obtener el retorno de los recursos pagados a los propietarios. Por lo cual, se requeriría el acercamiento del Concesionario con los propietarios para determinar si están en disposición de suscribir un acuerdo de mutuo disenso, para retornar los dineros entregados a la firma de la promesa de compraventa

7.6.2 Predios para procesos de expropiación devueltos por la Interventoría

Aquí se registran aquellos predios que no han finalizado su gestión predial ni ha empezado su trámite de expropiación y/o no han culminado su proceso de adquisición, bien sea por enajenación voluntaria o la continuidad del proceso de expropiación.

Que mediante oficio 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260831012902 del 31 de agosto de 2026 EL Concesionario respondió el oficio con Radicado ANI 20266060296671 informando si se realizó Intervención sobre los predios CAB-7-2-049, CAB-7-3-038, CAB-7-3-026, CAB-7-3-064, y por su parte no fueron objeto de intervención los predios CAB-2-1-122, CAB-2-1-154, y CAB-2-1-163.

7.6.3 Estado De Predios Liberados Para La Ejecución De La Obra

7.6.3.1 Predios Disponibles

Este subcapítulo hace referencia al seguimiento de los predios disponibles y a su utilización en la ejecución de la obra. Para este periodo no se tienen nuevos predios disponibles.

7.6.3.2 Predios No Disponibles

A continuación, se presenta la relación de los predios no intervenidos indicando la justificación de su no intervención.

Tabla 7-8 Predios No Disponibles UF-3-5

UFI	TRAYECTO	PREDIO	ESTADO ACTUAL POR SU NO DISPONIBILIDAD
UF 3.5	VARIANTE CERETÉ	CAB-3-5-061	No se puede intervenir debido a que no se cuenta con disponibilidad por parte del ocupante- Proceso policivo- Demanda reivindicatoria
UF 3.5	VARIANTE CERETÉ	CAB-3-5-062	

Fuente: Consorcio IPAB.

Tabla 7-9 Predios No Disponibles UF-2-1 Y UF-8-3

NO DISPONIBLE			
UFI	TRAYECTO	PREDIO	ESTADO ACTUAL PREDIAL
UF 2.1	CERETÉ - LORICA	CAB-2-1-003	48. Demanda Rechazada
UF 2.1	CERETÉ - LORICA	CAB-2-1-007	47. Demanda Admitida
UF 2.1	CERETÉ - LORICA	CAB-2-1-007A	49. Sentencia Proferida a Favor de la ANI
UF 2.1	CERETÉ - LORICA	CAB-2-1-067	49.1 Sentencia en Impugnación
UF 2.1	CERETÉ - LORICA	CAB-2-1-122	42. En trámite de Notificación de Resolución de Expropiación

NO DISPONIBLE			
UFI	**TRAYECTO**	**PREDIO**	**ESTADO ACTUAL PREDIAL**
UF 2.1	CERETÉ - LORICA	CAB-2-1-128	12. Alcance a Insumos Técnicos y jurídicos
UF 2.1	CERETÉ - LORICA	CAB-2-1-128A	7. En elaboración de Insumos Técnicos y jurídicos
UF 2.1	CERETÉ - LORICA	CAB-2-1-133	47. Demanda Admitida
UF 2.1	CERETÉ - LORICA	CAB-2-1-134	47. Demanda Admitida
UF 2.1	CERETÉ - LORICA	CAB-2-1-154	42. En trámite de Notificación de Resolución de Expropiación.
UF 2.1	CERETÉ - LORICA	CAB-2-1-163	42. En trámite de Notificación de Resolución de Expropiación
UF 2.1	CERETÉ - LORICA	CAB-2-1-180A	La ANI desiste ante la ANT, del trámite de adjudicación, tal como consta en oficio 20266040271361
UF 2.1	CERETÉ - LORICA	CAB-2-1-188	47. Demanda Admitida
UF 2.1	CERETÉ - LORICA	CAB-2-1-207	3. Predios sin antecedente enviados a la ANI
UF 2.1	CERETÉ - LORICA	CAB-2-1-224	47. Demanda Admitida
UF 8.3	SAN ONOFRE - CRUZ DEL VISO	CAB-8-3-236	32. Predio con Folio a favor de la ANI
UF 8.3	SAN ONOFRE - CRUZ DEL VISO	CAB-8-3-239	32. Predio con Folio a favor de la ANI
UF 8.3	SAN ONOFRE - CRUZ DEL VISO	CAB-8-3-241	32. Predio con Folio a favor de la ANI
UF 8.3	SAN ONOFRE - CRUZ DEL VISO	CAB-8-3-243	32. Predio con Folio a favor de la ANI
UF 8.3	SAN ONOFRE - CRUZ DEL VISO	CAB-8-3-245	26.1 Contrato de Promesa de Venta Firmado
UF 8.3	SAN ONOFRE - CRUZ DEL VISO	CAB-8-3-247	18. Avalúos con observaciones

Fuente: Consorcio IPAB.

Conforme lo indicado el capítulo 7.5, la información registrada aquí, corresponde a los predios que se han identificado como interferencia predial de la UFI 3.5 debido a que a pesar de la gestión realizada por el Concesionario y los predios se encuentran adquiridos mediante la aplicación de la figura de saneamiento automático, no ha sido

posible obtener el permiso de intervención para la ejecución de actividades, porque se ha acudido al procedimiento de restitución policivo, pero aún no se cuenta con la disponibilidad predial para el desarrollo de obras. De conformidad con la consulta realizada al proceso se evidencia que, el Juzgado Séptimo de Pequeñas Causas y competencia de Bogotá presenta avance con respecto al mes de septiembre de 2026, ya que profirió Auto de trámite el 30 de septiembre de 2026, por lo que se solicitará al Concesionario ampliar la información al respecto.

Por otra parte, la Interventoría mediante oficio Radicado ANI 20264091040432 la Interventoría solicito a la ANI la No Objeción para otorgar un Plazo de Cura al Concesionario por la no entrega semanal de los informes de seguimiento de los Eventos Eximentes de Responsabilidad – EER que mantienen incidencia durante la etapa de Reversión; con respuesta mediante oficio Radicado ANI N° 20263050374161 del 28 de septiembre de 2026, por medio del cual devolvió el oficio IPAB-0628-2026 para su complementación y a la fecha del presente informe se encuentra en trámite de respuesta por parte de la Interventoría.

Que mediante oficio 48-RUTADCTOELECTRONICO-20260831012906 del 31 de agosto de 2026 el Concesionario da respuesta al oficio con Radicado ANI 20263050314841 informando a la ANI la imposibilidad física y jurídica de ejecutar las obras conforme al plan de obras vigente en su momento, por el Laudo arbitral que dio por terminado el Contrato de Concesión de manera anticipada, que al haber desaparecido el objeto y la finalidad que motivaron la petición de Evento Eximente de Responsabilidad, el Concesionario considera que no es necesario continuar con el trámite de la mencionada solicitud respecto de los predios CAB-2-1-122, CAB-2-1-128, CAB-2-1-154, CAB-2-1-163, CAB-2-1-180A, CAB-2-1-184.

Tabla 7-10 Predio de Eventos Eximentes de Responsabilidad Solicitados

UFI	TRAYECTO	PREDIO	CONDICIONES PARA UN SUPUESTO EER	FECHA DE INICIO DEL PERIODO ESPECIAL	FECHA FINAL DEL PERIODO ESPECIAL	OBSERVACIÓN	ESTADO ACTUAL
UF 2.1	Cereté - Lorica	**CAB-2-1-002**	Fuerza mayor predial	21-jun-24	Al obtener la disponibilidad predial	Motel séptimo cielo -	Demanda Admitida
UF 2.1	Cereté - Lorica	**CAB-2-1-007**	Retraso por ajuste de insumos prediales	29-sep-22	13-nov-23	Vivienda - Estación de Servicio Alejandría	Demanda Admitida

UFI	TRAYECTO	PREDIO	CONDICIONES PARA UN SUPUESTO EER	FECHA DE INICIO DEL PERIODO ESPECIAL	FECHA FINAL DEL PERIODO ESPECIAL	OBSERVACIÓN	ESTADO ACTUAL
UF 2.1	Cereté - Lorica	**CAB-2-1-007A**	Fuerza mayor predial	19-ene-24	Al obtener la disponibilidad predial	Lote de terreno con mejoras	Sentencia Proferida a Favor de la ANI
UF 2.1	Cereté - Lorica	**CAB-2-1-068**	Fuerza mayor predial	27-sep-22	Al obtener la disponibilidad predial	Lote de terreno con mejoras	Demanda Admitida
UF 2.1	Cereté - Lorica	**CAB-2-1-344**	Retraso en trámite administrativo ambiental de desmantelamiento de EDS	13-jul-23	Al obtener la disponibilidad predial	Estación de Servicio Tierraltica, predio ya intervenido con vía terminada.	PREDIO ADQUIRIDO A FAVOR DE LA ANI

Fuente: Fuente: Consorcio IPAB.

Así las cosas, de esta solicitud los predios no disponibles son: CAB-2-1-007 y CAB-2-1-007A.

En materia predial, esta información de EER permite establecer el avance de los trámites de adquisición, expropiación y entrega material de los predios, que, a corte del 30 de septiembre de 2026, Una vez revisado el estado actual de cada uno de los procesos y/o trámites adelantados por el Concesionario, se tiene lo siguiente:

Predio: CAB-2-1-067

Tipo de procesos: Expropiación
Juzgado de conocimiento: 039 Circuito - Civil
Radicado: 11001310303920210038300
Demandante: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI
Demandada: LINELLY DEL SOCORRO HERNANDEZ DORIA
Última actuación: 17/09/2026 se realiza diligencia de entrega

Predio: CAB-2-1-133
Tipo de procesos: Expropiación
Juzgado de conocimiento: 014 Circuito - Civil
Radicado: 11001310301420210033600

Demandante: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI
Demandado: AMADIS ANTONIO GONZALEZ GALVAN
Última actuación: *15/07/2026 Se cancela audiencia debido a que el despacho deberá revisar el informe allegado por el juzgado 2 de Cereté sobre la diligencia de entrega que está suspendida desde el 2023. Al Despacho desde el 28-08-2026 17/09/2026 mediante oficio 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260917013062 se reitera solicitud de directriz*

Predio: CAB-2-1-188
Tipo de procesos: Expropiación
Juzgado de conocimiento: 002 Circuito - Civil
Radicado: 11001310300220220013300
Demandante: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI
Demandados: EMIRO CARLOS OSORIO MARTINEZ / ENA LUZ OSORIO MARTINEZ / LILII DEL ROSARIO OSORIO MARTINEZ / OLGA SOFIA OSORIO MARTINEZ / SULMA LEBRIET OSORIO MARTINEZ / WALTER NADITH OSORIO MARTINEZ
Última actuación: 01-10-2026 Auto Admite Reforma de la Demanda.

Predio: CAB-2-1-207
Tipo de trámite: Baldío rural con vivienda
Pronunciamiento de la Interventoría: En atención a la última actuación registrada, hacer seguimiento al trámite del *Predio No disponible No intervenido ya que La ANI desiste ante la ANT, del trámite de adjudicación, tal como consta en oficio 20266040271361 del 27/08/2026, el Concesionario revisará los valores consignados desde la subcuenta a la ANI para la desafectación del predio dentro del inventario de predios requeridos para la ejecución del Proyecto IP Antioquia – Bolívar*

Predio: CAB-2-1-224
Tipo de procesos: Expropiación
Juzgado de conocimiento: 019 Circuito - Civil
Radicado: 11001310301920220016400
Demandante: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI
Demandados: ELVIRA DE JESUS OSORIO NEGRETE / MARGARITA MARIA NEGRETE DE OSORIO
Última actuación: *Memorial de solicitud de terminación del proceso de fecha 24 de agosto de 2026, Radicado ANI No.: 20266060347381 de fecha 10 de septiembre de 2026 solicitud de terminación del proceso, El Juzgado mediante Auto pone en conocimiento los escritos de terminación del proceso notificado en estado de fecha 11 de septiembre de 2026.*

Para Predios de Eventos Eximentes de Responsabilidad Solicitados, para el mes de septiembre de 2026 se tiene la siguiente trazabilidad.

Tabla 7-11 trazabilidad cronológica de las comunicaciones

Archivo	Fecha del documento	Identificación	Contenido
20260722.IPAB05242026.B .pdf	22 de julio de 2026	Oficio IPAB-0524-2026	Interventoría responde al Concesionario sobre cierre de remisión semanal de informes EER
20260722.IPAB05242026.D .xlsx	22 de julio de 2026 (anexo)	Matriz de seguimiento EER	Análisis individual de los EER vigentes, cortes abril 30 y mayo 31 de 2026
20260813.IPAB06282026.A .docx / .B.pdf	13 de agosto de 2026	Oficio IPAB-0628-2026	Interventoría solicita a la ANI No Objeción para Plazo de Cura al Concesionario
20260909.IPAB07482026.C .pdf	9 de septiembre de 2026	Oficio IPAB-0748-2026	Interventoría remite a la ANI respuesta/insumos sobre PQRS de seguridad vial (Personería de Santiago de Tolú)

Fecha	Documento / Radicado	Remitente → Destinatario	Tema	Contenido relevante
1 de mayo de 2026	Notificación del Laudo Arbitral	Tribunal Arbitral → Partes del Contrato	Terminación Anticipada del Contrato de Concesión	Hito que da origen a la Etapa de Reversión y detona la controversia sobre la vigencia de la obligación de reportar semanalmente los EER.
25 de junio de 2026	Rad. 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260624012392	Concesión Ruta al Mar S.A.S. → Consorcio IPAB (Interventoría)	Cierre de la remisión semanal de informes EER en la Etapa de Reversión	El Concesionario comunica que da por cerrado el ciclo de remisión semanal de informes EER asociados a obligaciones constructivas de la Etapa Preoperativa, por no considerarlos necesarios en la Etapa de Reversión; deja a salvo los efectos jurídicos, económicos y técnicos de los EER reconocidos o en trámite.
22 de julio de 2026	Oficio IPAB-0524-2026 / Rad. ANI 20264090924872	Consorcio IPAB → Concesión Ruta al Mar S.A.S. (c.c. ANI)	Respuesta al oficio del 25 de junio — requerimiento de continuidad de informes EER	La Interventoría revisó individualmente los EER vigentes a la fecha del Laudo (matriz anexa **D**) y concluye que algunos mantienen incidencia sobre obligaciones de la Etapa de Reversión

Fecha	Documento / Radicado	Remitente → Destinatario	Tema	Contenido relevante
				(prediales, operativas y de mantenimiento). Requiere al Concesionario ponerse al día con los informes pendientes y continuar la remisión semanal, dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo.
22 de julio de 2026 (anexo)	20260722.IPAB05242026.D	Consorcio IPAB (anexo al oficio anterior)	Matriz de seguimiento y análisis de los 10 EER vigentes	Contiene, para cada EER, la descripción del evento, su estado, la gestión reportada por el Concesionario y el análisis/conclusión de la Interventoría sobre la necesidad de continuar el reporte semanal (ver numeral 3).
13 de agosto de 2026	Oficio IPAB-0628-2026	Consorcio IPAB → ANI (Ing. Lilian Mercedes Laza Pinedo)	Solicitud de No Objeción para Plazo de Cura al Concesionario	Vencido el término de 5 días hábiles otorgado el 22 de julio sin que el Concesionario entregara los informes EER pendientes ni respuesta alguna, la Interventoría identifica un posible incumplimiento de las Secciones 14.2(d)(vi), 9.2(c) y 9.2(l) del Contrato de Concesión y solicita No Objeción para otorgar un Plazo de Cura de quince (15) días calendario (Sección 10.2), advirtiendo el riesgo de multa diaria de 7 SMMLV (Capítulo 6, num. 6.1, literal h).
7 de septiembre de 2026	Correo electrónico (remitente no incluido en los soportes aportados)	(Presumiblemente ANI) → Consorcio IPAB	Solicitud de insumos de respuesta — PQRS Personería de Santiago de Tolú — medidas de seguridad vial	Solicitud de insumos técnicos para atender un requerimiento de la Procuraduría, originado en una PQRS de la Personería de Santiago de Tolú sobre medidas de seguridad vial en el Proyecto Vial Antioquia — Bolívar.

Fecha	Documento / Radicado	Remitente → Destinatario	Tema	Contenido relevante
9 de septiembre de 2026	Oficio IPAB-0748-2026 / Rad. ANI 20264091167492	Consorcio IPAB → ANI	Respuesta al correo del 7 de septiembre de 2026	La Interventoría remite oficio remisorio con los insumos solicitados por la ANI para atender la PQRS de la Personería de Santiago de Tolú sobre medidas de seguridad vial.

Tabla 7-12 Catálogo de los EER identificados en la matriz anexa IPAB-0524-2026.D (corte 31 de mayo de 2026)

N.°	UFI	Fecha acta de reconocimiento	Tema / evento	¿Continúa el reporte semanal en Reversión?	Fundamento de la Interventoría
1	7.1	27-mar-2018	Medida cautelar en Acción Popular (Tribunal Administrativo de Córdoba) y negativa de la CVS a sustraer área del DRMI — Variante Lorica	NO	Obligación propia de la fase de construcción, terminada con la declaratoria de Terminación Anticipada (Laudo Arbitral).
2	3.5	13-nov-2019	Falta de disponibilidad predial (predios CAB-3-5-061 y CAB-3-5-062) — demanda reivindicatoria en curso	SÍ	Conforme al numeral 7.3 del Manual de Reversión, el Concesionario continúa a cargo de la gestión predial hasta obtener la titularidad a favor de la ANI.
3	2	8-mar-2022	Retraso en la gestión predial de la UF 2 por demoras de entidades (ANT, municipios, Rama Judicial) — varios procesos de expropiación judicial	SÍ	Igual fundamento: el Concesionario, como apoderado de la ANI, debe continuar la gestión de la expropiación judicial y reportar avances.
4	8.3	8-mar-2022	Imposibilidad de ejecutar intervenciones en la Intersección 17 — pendiente definición de diseños y modificación contractual por la ANI	NO	Obligación propia de la fase de construcción, terminada con el Laudo Arbitral.
5	2 y 6.1	28-dic-2022	Imposibilidad de intervenir el sector PR47+614–48+222 por negativa de la CVS a sustraer el DRMI del CCBS	NO	Obligación propia de la fase de construcción, terminada con el Laudo Arbitral.
6	6.3.1	19-sep-2023	Imposibilidad de instalar la estación de peaje Caimanera por oposición comunitaria y decisión del Ministerio de Transporte (reubicación)	NO	Obligación propia de la fase de construcción, terminada con el Laudo Arbitral (persiste, no

N.°	UFI	Fecha acta de reconocimiento	Tema / evento	¿Continúa el reporte semanal en Reversión?	Fundamento de la Interventoría
					obstante, la solicitud pendiente de ampliación del período especial).
7	2 y 6.1	19-sep-2023	Imposibilidad de intervenir la UF 2.1 (Cereté–Lorica) por oposición de comunidades de San Pelayo y Cotorra	NO	Obligación propia de la fase de construcción, terminada con el Laudo Arbitral.
8	2 y 6.1	19-sep-2023	Falta de disponibilidad predial en sectores de transición (predio CAB-2-1-067 en expropiación judicial)	SÍ	Igual fundamento del numeral 7.3 del Manual de Reversión: continúa la gestión de expropiación judicial.
9	2	10-abr-2024	Afectación del Indicador E10 por bloqueo de obras hidráulicas (compuertas) en la UF 2 y 6.1	NO	El panel de amigable componedor determinó que el Concesionario cumplió lo que le correspondía; la construcción de las compuertas no es exigible en esta etapa.
10	5.1	28-may-2025	Imposibilidad de construir el quinto carril de la estación de peaje Los Cedros por interferencia de tubería de Aguas de Córdoba	SÍ	Persiste el seguimiento activo: se requiere verificar el cumplimiento del compromiso de Aguas de Córdoba para habilitar la nueva línea de conducción y permitir la culminación de la obra.

Nota metodológica: las fechas de "*acta de reconocimiento*" corresponden a la conversión de los valores de fecha serial de Excel registrados en la matriz. Los EER N.° 2, 3, 8 y 10 (marcados "SÍ") coinciden exactamente con los identificados como necesarios para seguimiento en el cuerpo del oficio IPAB-0524-2026 del 22 de julio de 2026 (UFI 3.5; UF 2 y UF 2/6.1 —predial—; UF 5.1).

Que mediante el oficio IPAB-0748-2026 observa una coincidencia de contexto geográfico y temático que podría ser relevante para un análisis más amplio del expediente: el EER N.° 6 (UFI 6.3.1) se refiere precisamente a la oposición comunitaria y a las gestiones adelantadas ante autoridades del departamento de Sucre (municipios cercanos a Coveñas y Santiago de Tolú) en relación con la estación de peaje Caimanera y medidas de seguridad vial asociadas a su reubicación. Se recomienda verificar, con el correo electrónico del 7 de septiembre de 2026 y sus anexos (no aportados), si la PQRS de la Personería de Santiago de Tolú guarda relación con dicho EER.

Es importante mencionar que, el Concesionario mediante comunicación 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260727012615 del 28 de julio de 2026 dirigió a la ANI el informe de los predios No Intervenidos, No adquiridos; y la Interventoría expide el oficio IPAB-0601-2026 Radicado ANI 20264091002482 del 06 de agosto de 2026 con el informe de los 21 predios No Adquiridos No Intervenidos.

De igual manera, mediante la comunicación 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260917013062 del 17 de septiembre de 2026 el Concesionario presentó la Actualización del estado de predios no intervenidos y no adquiridos – Reiteración de solicitud de directriz en el marco de la etapa de reversión adelantada con ocasión de la Terminación Anticipada del Contrato de Concesión IP No. 016 de 2015. Proyecto Vial Conexión Antioquia–Bolívar; y la Interventoría mediante oficio IPAB-0794-2026 Radicado ANI 20264091231242 del 21 de septiembre de 2026, se pronunció respecto al oficio 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260727012615 y dio alcance al informe con oficio IPAB-0601-2026, respecto de los siguientes predios:

1. **CAB-2-1-003**
2. **CAB-2-1-007A**
3. **CAB-2-1-007**
4. **CAB-2-1-067**
5. **CAB-2-1-122**
6. **CAB-2-1-128**
7. **CAB-2-1-128A**
8. **CAB-2-1-133**
9. **CAB-2-1-134**
10. **CAB-2-1-135**
11. **CAB-2-1-154**
12. **CAB-2-1-163**
13. **CAB-2-1-180**
14. **CAB-2-1-180A**
15. **CAB-2-1-200**
16. **CAB-2-1-207**
17. **CAB-2-1-224**
18. **CAB-8-3-235**
19. **CAB-8-3-245**
20. **CAB-8-3-247**
21. **CAB-8-3-253**

Y reportó el estado actual de cada uno de los trámites adelantados a la fecha en gestión y adquisición predial, así como, que pagos se han realizado en los mismos,

con el fin de que se defina si se continua con el proceso de adquisición o si por el contrario se dan por terminadas las actuaciones adelantadas.

7.6.3.3 Síntesis

El cruce de comunicaciones analizado refleja una controversia contractual secuencial y consistente:

(i) el Concesionario intenta cerrar unilateralmente el reporte semanal de EER al iniciar la Etapa de Reversión (25-jun-2026);
(ii) La Interventoría, tras un análisis EER por EER, acota la obligación a los eventos con incidencia real en la Reversión y reitera el requerimiento de información (22-jul-2026);
(iii) Ante el silencio del Concesionario, la Interventoría eleva el asunto a la ANI solicitando la activación del mecanismo contractual de Plazo de Cura, con la consecuente advertencia de multa (13-ago-2026); y
(iv) Un mes después, surge una comunicación de naturaleza distinta —aparentemente— relacionada con una PQRS de seguridad vial en una de las zonas donde se originó uno de los EER en discusión (9-sep-2026).

7.6.3.4 Para los predios baldíos o ejidos se identifican las siguientes categorías:

• Predios sin antecedente registral y/o en investigación jurídica: corresponde a los predios que se encuentran en trámite de elaboración de insumos.

• Predios enviados a la ANI para adjudicación de la ANT: corresponde a los predios enviados a la ANI para tramitar la solicitud de adjudicación.

• Baldíos con resolución de adjudicación: corresponde a los predios baldíos que cuentan con resolución de adjudicación emitida.

7.6.3.5 Para los predios con titularidad se tienen las siguientes categorías:

• En trámite de radicación y aprobación de insumos Técnicos y Jurídicos: corresponde a los predios que se encuentran con insumos elaborados.

• Avalúos: Predios que cuentan con avalúo elaborado dado que la ficha predial y estudio de títulos ya están aprobados.

• Citados: Corresponde al inicio del proceso de enajenación voluntaria, donde los predios cuentan avalúo aprobado y oferta de compra expedida.

• Notificados: Corresponde a los predios con oferta de compra notificada, aquí el propietario conoce el valor total del avalúo, que incluye área requerida y las mejoras afectadas.

• Escrituras Públicas firmadas por las partes: Corresponde a los predios que cuentan con Escritura pública firmada por el propietario y la Concesión.

• Radicados en Registro: Corresponde a la radicación de la Escritura pública ante la oficina de registro de instrumentos públicos del círculo en el cual se encuentra ubicado el predio y con este trámite se incluye la actualización del proceso de enajenación voluntaria en el folio de matrícula inmobiliaria.

• Predios Adquiridos: corresponde a los predios con folio de matrícula inmobiliaria a favor de la ANI, cuyo trámite de gestión predial se encuentra de acuerdo con lo establecido en el otrosí 17, por ello desde abril de 2024 se unifica el criterio.

• Trámite de expropiación: Corresponde a los predios que se encuentran que su adquisición no se pudo realizar por enajenación voluntaria y se continua el trámite de adquisición mediante expropiación, incluyendo desde la proyección de la resolución de expropiación por parte del Concesionario.

7.6.3.6 En cuanto a la disponibilidad predial para ejecutar obras se identifican las siguientes categorías:

• Permisos de Intervención: corresponde al documento o acuerdo verbal donde el propietario u ocupante permite el ingreso al área requerida para la ejecución de actividades de obra.

• % Disponible: corresponde al porcentaje de predios disponibles con respecto a la cantidad de predios requeridos.

7.7 TRAZABILIDAD PREDIAL

Este subcapítulo hace referencia al seguimiento mes a mes del avance predial en todas sus etapas de manera histórica.

Tabla 7-13 Trazabilidad Predial

	Predios sin antecedente registral y/o en investigación jurídica	Predios enviados a la ANI para adjudicación de la ANT	Baldíos con resolución de adjudicación	En trámite de radicación y aprobación de insumos Baldíos Técnicos y Jurídicos	Avalúos	Citados	Notificados	Escrituras Públicas firmadas por las partes	Radicados en Registro	Predios Adquiridos	Trámite de expropiación	Permisos de Intervención por predio (predios disponibles)	% Disponible	% Long. Efec Disponible
AÑO 2020- Dic	2	131	103	103	112	17	119	19	45	439	204	1060	81,66	93,01%
AÑO 2021- Ene	2	131	103	81	113	18	111	17	36	463	223	1060	81,66	93,01%
AÑO 2021- Feb	2	131	103	81	113	18	111	17	38	487	223	1094	84,02	93,20%
AÑO 2021-Mar	2	130	103	66	127	1	88	18	29	499	242	1094	84,02	93,20%
AÑO 2021-Abr	2	129	103	51	143	1	73	15	27	513	249	1114	85,23	93,43%
AÑO 2021-May	2	129	103	51	144	0	56	14	28	530	250	1114	85,23	93,43%
AÑO 2021-Jun	2	132	112	51	167	0	43	13	29	548	222	1117	85,46%	93,43%
AÑO 2021-Jul	0	124	112	31	112	29	60	8	27	560	244	1123	85,92%	93,78%
AÑO 2021- Ago	2	122	112	33	101	15	59	15	23	568	256	1136	87,32%	94,29%
AÑO 2021- Sep	2	116	114	54	75	1	30	13	20	610	266	1136	87,32%	94,43%
AÑO 2021-Oct	2	129	114	30	81	4	19	12	21	624	265	1147	88,16%	94,53%
AÑO 2021-Nov	3	97	108	46	47	7	61	8	20	634	270	1153	88,62	94,86%
AÑO 2021-Dic	10	93	108	38	36	6	76	11	22	636	265	1158	89,01%	94.97%
AÑO 2022-Ene	15	85	108	15	54	1	77	14	21	642	269	1158	89,01%	94,97%
AÑO 2022-Feb	13	82	108	38	32	0	69	4	24	648	281	1159	89,22%	95,56%
AÑO 2022- Mar	8	90	108	33	38	0	72	7	14	657	272	1174	90.04	95.97%
AÑO 2022- Abr	8	90	108	25	26	6	81	3	23	661	266	1176	90.67%	96,04%
AÑO 2022- May	8	95	103	24	30	0	75	11	18	668	265	1195	92,14%	96,97%

	Predios sin antecedente registral y/o en investigación jurídica	Predios enviados a la ANI para adjudicación de la ANT	Baldíos con resolución de adjudicación	En trámite de radicación y aprobación de insumos Baldíos Técnicos y Jurídicos	Avalúos	Citados	Notificados	Escrituras Públicas firmadas por las partes	Radicados en Registro	Predios Adquiridos	Trámite de expropiación	Permisos de Intervención por predio (predios disponibles)	% Disponible	% Long. Efec Disponible
AÑO 2022-Jun	8	93	32	21	21	11	68	11	21	749	262	1202	92.68%	97.72%
AÑO 2022-Jul	8	67	57	18	24		80	6	21	760	258	1215	93.53%	98.04%
AÑO 2022-Ago	7	66	57	22	25	0	74	12	20	778	250	1228	94.53%	98.39%
AÑO 2022-Sep	1	73	30	14	32	1	61	4	28	811	244	1235*	95.23%	98.39%
AÑO 2022-Oct	1	73	29	12	32	0	49	11	22	822	244	1235	95.37%	98.38%
Año 2022- Nov	1	65	29	13	30	0	50	10	19	834	239	1235	95.74	98.45%
Año 2022- Dic	1	65	29	12	20	10	56	8	23	838	238	1235	95.74	98.45%
Año 2023- Ene	1	65	29	12	12	2	49	10	13	849	248	1235	95.74	98.45%
Año 2023 -Feb	1	65	29	14	10	0	50	6	15	853	247	1244	96.43%	98,75%
Año 2023 -Mar	1	65	29	15	4	0	48	6	14	858	227	1246	96,59	98,88%
Año 2023- Abr	1	58	29	25	6	0	28	8	13	868	253	1252	97,05%	99,00%
Año 2023- May	1	36	48	16	3	0	39	6	14	874	253	1252	97,20%	99,00%
Año 2023- Jun	1	35	27	15	5	0	36	5	13	899	252	1255	97,44%	99,01%
Año 2023- Jul	1	30	33	14	6	0	26	11	9	901	258	1255	97,44%	99,01%
Año 2023- Ago	1	29	33	12	8	0	49	5	12	908	231	1255	97,44%	99,01%
Año 2023- Sep	1	29	33	12	8	0	21	4	8	918	253	1255	97,44%	99,01%
Año 2023- Oct	1	28	33	14	6	0	22	4	6	921	253	1255	97,44%	99,01%
Año 2023- Nov	1	28	33	14	6	0	22	4	6	921	253	1255	97,44%	99,01%

	Predios sin antecedente registral y/o en investigación jurídica	Predios enviados a la ANI para adjudicación de la ANT	Baldíos con resolución de adjudicación	En trámite de radicación y aprobación de insumos Baldíos Técnicos y Jurídicos	Avalúos	Citados	Notificados	Escrituras Públicas firmadas por las partes	Radicados en Registro	Predios Adquiridos	Trámite de expropiación	Permisos de Intervención por predio (predios disponibles)	% Disponible	% Long. Efec Disponible
Año 2023- Dic	1	28	33	14	6	0	22	4	0	927	253	1257	97,66%	99,01%
Año 2024- Ene	2	27	33	6	13	0	16	5	4	931	249	1258	97.75%	99,04%
Año 2024- Feb	2	26	34	13	5	0	9	6	6	933	252	1259	97.80%	99.08%
Año 2024- Mar	2	25	36	11	8	0	8	6	3	921*	251	1259	97,90%	99,08%
Año 2024- Abr	1	25	36	13	8	0	8	5	25	921	245	1259	97,90%	99.08%
Año 2024- May	1	25	36	13	7	0	5	3	25	925	246	1259	97,90%	99.08%
Año 2024- Jun	1	25	36	13	7	0	5	3	25	925	246	1259	97,90%	99.08%
Año 2024- Jul	1	25	36	13	7	0	3	0	0	933	244	1259	97,90%	99.08%
Año 2024- Ago	1	25	38	12	5	0	4	18	6	941	233	1259	97,90%	99.08%
Año 2024- Sep	1	25	10	12	6	0	4	19	7	964*	232	1259	97,90%	99.08%
Año 2024- Oct	1	25	10	12	6	0	4	19	7	964	231	1259	97,90%	99.08%
Año 2024- Nov	1	25	10	12	6	0	4	19	7	964	231	1259	97,90%	99.08%
Año 2024- Dic	1	25	10	12	6	0	4	19	7	964	231	1259	97,90%	99.08%
Año 2025 -Ene	1	26	10	13	2	0	5	1	28	976	224	1260	97,98%	99.08%
Año 2025 -Feb	1	25	12	13	1	0	6	1	25	981	221	1260	97,98%	99.08%
Año 2025 -Mar	1	25	9	13	1	0	5	1	25	985	221	1261	98.06%	99.09%
Año 2025 -Abr	1	25	9	13	1	0	5	1	22	988	221	1261	98.06%	99.09%
Año 2025-May	1	19	12	8	7	0	4	3	15	999	221	1261	98.06%	99.09%
Año 2025-Jun	1	19	12	8	7	0	5	3	12	1006	213	1261	98.06%	99.09%

	Predios sin antecedente registral y/o en investigación jurídica	Predios enviados a la ANI para adjudicación de la ANT	Baldíos con resolución de adjudicación	En trámite de radicación y aprobación de insumos Baldíos Técnicos y Jurídicos	Avalúos	Citados	Notificados	Escrituras Públicas firmadas por las partes	Radicados en Registro	Predios Adquiridos	Trámite de expropiación	Permisos de Intervención por predio (predios disponibles)	% Disponible	% Long. Efec Disponible
Año 2025-Jul	1	19	12	8	7	0	5	3	12	1006	213	1261	98.06%	99.09%
Año 2025-Ago	1	19	12	8	7	0	5	0	14	1008	212	1261	98.06%	99.09%
Año 2025-Sep	1	19	12	7	5	0	6	1	15	1012	208	1261	98.06%	99.09%
Año 2025-Oct	1	19	12	7	5	0	4	2	11	1019	206	1261	98.06%	99.09%
Año 2025- Nov	1	19	12	7	5	0	7	0	29	1025	181	1264	98.28%	99.09%
Año 2025- Dic	1	19	12	7	5	0	7	0	29	1025	181	1264	98.28%	99.16%
Año 2026- Ene	1	17	12	12	2	0	4	1	8	1026	203	1267	98,52%	99,91%
Año 2026- Feb	1	17	12	12	2	0	4	1	8	1027	202	1267	98,52%	99,91%
Año 2026- Mar	1	13	5	16	5	0	1	0	4	1030	199	1267	98,52%	99,91%
Año 2026- Abr	1	13	5	18	8	0	1	0	4	1034	199	1267	98,52%	99,91%
Año 2026- May	1	13	5	17	8	0	1	0	4	1036	195	1265	98,50%	99,90%
Año 2026- Jun	1	13	5	17	8	0	1	0	4	1036	195	1265	98,50%	99,90%
Año 2026- Jul	1	13	5	17	8	0	1	0	2	1037	193	1265	98,50%	99,90%
Año 2026- Ago	1	12	5	7	8	0	1	0	12	1040	192	1265	98,50%	99,90%
Año 2026- Sep.	1	11	5	6	6	0	3	0	2	1060	193	1264	98,50%	99,90%

Fuente: Consorcio IPAB

7.8 INDICADORES DE LA GESTIÓN PREDIAL

Estos indicadores reflejan porcentualmente el estado de gestión, avance y permite comparar los resultados para analizar, mejorar y tomar las acciones necesarias.

7.8.1 FORMULA INDICADOR

Longitud Predial Disponible (km) = (km de longitud disponible) / (km longitud efectiva)
Disponibilidad Predial (No) = número de predios disponible / número de predios requeridos.
Adquisición Predial = número de predios adquiridos / número de predios requeridos.
Predios Faltante = número de predios por adquirir / número de predios requeridos.
Proceso de Expropiación = número de predios en expropiación / número de predios requeridos.
Desenglobe Catastral = número de solicitudes de desenglobe catastral radicados / número de predios adquiridos.

Tabla 7-14 Indicadores De La Gestión Predial

INDICADOR	UFI 1		
	VALOR 1	VALOR 2	%
Longitud Predial Disponible (km)	58,6	58,6	100%
Disponibilidad predial (und)	3	3	100%
Adquisición predial	2	3	67%
Predios Faltantes	1	3	33%
Procesos de Expropiación	1	3	33%
Desenglobe Catastral	2	2	100%

Fuente: Consorcio IPAB.

Tabla 7-15 Indicadores De La Gestión Predial

INDICADOR	UFI 2		
	VALOR 1	VALOR 2	%
Longitud Predial Disponible (km)	36,58	37	99%
Disponibilidad predial (und)	412	426	97%
Adquisición predial	329	426	77%
Predios Faltantes	97	426	23%
Procesos de Expropiación	85	426	20%
Desenglobe Catastral	179	329	54%

Fuente: Consorcio IPAB.

Tabla 7-16 Indicadores De La Gestión Predial

INDICADOR	UFI 3		
	VALOR 1	VALOR 2	%
Longitud Predial Disponible (km)	42,08	42,1	99,95%
Disponibilidad predial (und)	218	220	99%
Adquisición predial	202	220	92%
Predios Faltantes	18	220	8%
Procesos de Expropiación	18	220	8%
Desenglobe Catastral	180	202	89%

Fuente: Consorcio IPAB.

Tabla 7-17 Indicadores De La Gestión Predial

INDICADOR	UFI 5		
	VALOR 1	VALOR 2	%
Longitud Predial Disponible (km)	0	0	0,00%
Disponibilidad predial (und)	2	2	100%
Adquisición predial	2	2	100%
Predios Faltantes	0	2	0%
Procesos de Expropiación	0	2	0%
Desenglobe Catastral	2	2	100%

Fuente: Consorcio IPAB.

Tabla 7-18 Indicadores De La Gestión Predial

INDICADOR	UFI 6		
	VALOR 1	VALOR 2	%
Longitud Predial Disponible (km)	55,92	55,92	100,00%
Disponibilidad predial (und)	181	181	100%
Adquisición predial	150	181	83%
Predios Faltantes	31	181	17%
Procesos de Expropiación	27	181	15%
Desenglobe Catastral	71	150	47%

Fuente: Consorcio IPAB.

Tabla 7-19 Indicadores De La Gestión Predial

INDICADOR	UFI 7		
	VALOR 1	VALOR 2	%
Longitud Predial Disponible (km)	55,97	57,4	97,5%
Disponibilidad predial (und)	215	217	99,1%
Adquisición predial	169	217	78%
Predios Faltantes	48	217	22%
Procesos de Expropiación	31	217	14%
Desenglobe Catastral	112	169	66%

Fuente: Consorcio IPAB.

Tabla 7-20 Indicadores De La Gestión Predial

INDICADOR	UFI 8		
	VALOR 1	VALOR 2	%
Longitud Predial Disponible (km)	86,55	87	99,5%
Disponibilidad predial (und)	233	239	97,5%
Adquisición predial	206	239	86%
Predios Faltantes	37	239	15%
Procesos de Expropiación	27	239	11%
Desenglobe Catastral	145	206	70%

Fuente: Consorcio IPAB.

A la fecha de este informe, para todo el proyecto se tiene lo siguiente:

- La disponibilidad predial total corresponde a 338,02 km, dada por 1264 predios disponibles.
- Para la adquisición predial, se tienen 1060 predios con folio ANI que representan el 82.30% del total de los predios requeridos.
- En este análisis indica que a mayor porcentaje de predios adquiridos de cada uno de las unidades funcionales (UF), son menores los porcentajes en la necesidad de recurrir a procesos de expropiación, lo que refleja los avance en la formalización de los predios y resolución de la adquisición predial a favor de la ANI. Mirando de otra forma que, a menores porcentajes de adquisición predial, lo que se puede decir que

hay porcentajes de expropiaciones que se encuentran pendientes, demostrando que la expropiación es un recurso utilizado para avanzar en la adquisición cuando no se logra de manera directa o voluntaria.

• Por otra parte, se discrepa con la adquisición predial de las unidades funcionales (UF) sus porcentajes son menores en la adquisición.

• Se vienen presentando debilidades en materia jurídicas en la gestión predial, especialmente en la formalización de la adquisición de los predios con la finalidad y a favor de la Agencia Nacional de Infraestructura.

7.9 EXPEDIENTES EN PROCESO DE EXPROPIACIÓN

Este capítulo hace referencia a aquellos predios que dieron inicio al trámite de Expropiación en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 10 de la Ley 1882 de 2018 y demás normativa concordante.

Tabla 7-21 Estado Actual de los Expedientes De Expropiación

UFI	RESOLUCIÓN RADICADA A LA ANI	RESOLUCION EXPROPIACION APROBADA	NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN EXPEROPIACIÓN	DEMANDA PRESENTADA	DEMANDA ADMITIDA	PREDIOS CON SENTENCIA	PREDIOS FOLIO ANI
UF 1	-	-	-	-	1	-	-
UF 2	2	-	3	-	50	21	-
UF 3	-	-	-	-	8	9	-
UF 5	-	-	-	-	-	-	-
UF 6	1	-	-	-	22	3	-
UF 7	6	1	-	1	20	1	1
UF 8	-	-	-	-	16	9	4
TOTAL	9	1	3	1	117	43	5

Fuente: Consorcio IPAB.

Es importante identificar los predios en trámite de expropiación, incluyendo aquellos desde el envío de la resolución de expropiación, que a la fecha no han sido entregados, relacionados a continuación:

Tabla 7-22 Predios NO Disponible

PREDIO NO DISPONIBLES CON TIPO DE ENAJENACIÓN DE EXPROPACIÓN	
PREDIO	**ESTADO GENERAL**
CAB-2-1-003	48. Demanda Rechazada

PREDIO NO DISPONIBLES CON TIPO DE ENAJENACIÓN DE EXPROPACIÓN	
CAB-2-1-007	47. Demanda Admitida
CAB-2-1-007A	49. Sentencia Proferida a Favor de la ANI
CAB-2-1-067	49.1 Sentencia en Impugnación
CAB-2-1-133	47. Demanda Admitida
CAB-2-1-134	47. Demanda Admitida
CAB-2-1-188	47. Demanda Admitida
CAB-2-1-224	47. Demanda Admitida

Fuente: Consorcio IPAB.

7.10 COMITÉ PREDIAL

Con el fin mejorar el desarrollo de la gestión predial, a continuación, se presenta seguimiento a los compromisos adquiridos en los comités periódicos de seguimiento año 2026:

El día 30 de septiembre de 2026, se realizó el comité predial del mes de septiembre de 2026, con el objetivo es hacer seguimiento y control a la gestión predial Antioquia – Bolívar.

Tabla 7-23 Comité Predial

COMITÉ PREDIAL ANTIOQUIA - BOLIVAR MES DE SEPTIEMBRE				
FECHA	**TEMA**	**COMPROMISO**	**RESPONSABLE**	**OBSERVACIONES**
30-09-2026	Seguimiento A Los Predios En Trámite De Adjudicación De Baldíos Ante La Ant Y Municipios. CAB-2-1-017A, CAB-2-1-180A, CAB-2-1-207, CAB-2-1-229A, CAB-2-1-230, CAB-2-1-266, CAB-2-1-302, CAB-2-1-428, CAB-6-1-054, CAB-6-1-075, CAB-6-1-111, CAB-7-2-022, CAB-7-2-024, CAB-7-2-046, CAB-7-2-047, CAB-7-3-069, CAB-8-1-038, CAB-8-2-011.	ANI	CORUMAR	El concesionario reitera consulta a la ANI sobre el avance en la solicitud de los predios baldíos, lo cual estos predios se encuentran en proceso de trámite:
	Estado De La Gestión De Predios No Adquiridos No Intervenidos (21 Predios) CAB-2-1-003, CAB-2-1-007, CAB-2-1-007A, CAB-2-1-067, CAB-2-1-122, CAB-2-1-128, CAB-2-1-128A, CAB-2-1-133, CAB-2-1-134, CAB-2-1-135, CAB-2-1-154, CAB-2-1-163, CAB-2-1-180	NO HAY		En atención a la solicitud elevada por la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA el 22 de julio de 2026 en mesa de trabajo celebrada con el fin de verificar el estado de los predios no intervenidos que a la fecha no cuentan con titularidad a favor de la entidad, el concesionario remitió a la entidad con copia a la interventoría oficio 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260727012615, donde adjunta archivo pdf con el informe detallado del estado de los predios presentados en la mesa de trabajo adelantada el 22 de julio de 2026, esto debido a que la premura de la información solicitada por la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTRA es la relativa a los 21 predios que no serán intervenidos. A la espera de pronunciamiento formal por parte de la ANI

COMITÉ PREDIAL ANTIOQUIA - BOLIVAR MES DE SEPTIEMBRE				
FECHA	**TEMA**	**COMPROMISO**	**RESPONSABLE**	**OBSERVACIONES**
	- Estado De La Gestión De Predios Intervenidos No Adquiridos (203 Predios). - Proceso De Adjudicación De Baldíos (7 Predios) - Proceso De Expropiación Judicial (172 Predios) - Proceso De Enajenación Voluntaria (21predios) - Estado De La Gestión De Predios Adquiridos A Favor De La Ani No Intervenidos			Los predios en proceso de adjudicación de baldíos han sido reportados en el numeral 2. Para los procesos de expropiación judicial se tienen diferentes estados de estos predios tales como: Demanda Admitida, Sentencia en trámite de Corrección o Aclaración, Registro Sentencia ante ORIP, Sentencia Proferida a Favor de la ANI, Sentencia en Impugnación, Resolución de Expropiación radicada y en revisión ANI, Alcance Avalúo, Demanda Rechazada. El estado en que se encuentran los predios de enajenación voluntaria sería: Escritura Publica Radicada en Registro, Predios sin antecedente enviados a la ANI, En solicitud de cesión ante el municipio, Resolución de Expropiación radicada en interventoría, Resolución de Expropiación radicada y en revisión ANI, En solicitud de cesión ante el ANT, Resolución de Expropiación en atención de observaciones, Predios sin antecedente con inspección ocular, los predios adquiridos y no intervenidos por las obras
	Estado Y Seguimiento De Cronograma Predial En El Proceso De Reversión.	INTERVENTORIA Y CORUMAR	CORUMAR	El concesionario se permite informar el estado de las entregas realizadas a la interventoría en el marco de la etapa de reversión.
	Reporte Predios NIIF.	INTERVENTORIA Y CORUMAR	CORUMAR	A la fecha se han hecho entrega de **1.015 predios**, revisados y aprobados por Interventoría y notificados a la ANI. -Dentro de los próximos días se estará radicando a Interventoría, mediante radicado No 48-147S-20260826009330 del 26/08/2026, el concesionario hace reporte de 11 predios para revisión y aprobación. Mediante oficio 20264091214632 del 17-09-2026 se remitió aprobación por parte de la interventoría y no objeción por parte de la ANI

COMITÉ PREDIAL ANTIOQUIA - BOLIVAR MES DE SEPTIEMBRE				
FECHA	**TEMA**	**COMPROMISO**	**RESPONSABLE**	**OBSERVACIONES**
				-32 predios en revisión de soportes por parte del concesionario para entregar a Interventoría.
	Informes Finales Predios Adquiridos	INTERVENTORIA Y CORUMAR	CORUMAR	Para la entrega del expediente final a la ANI, se debe contar con el Informe Final de Adquisición Predial, revisado y aprobado por la Interventoría; A la fecha se han radicado a Interventoría 219 predios. -106 predios con informe final aprobado por Interventoría; expediente físico radicado en la ANI. -99 predios con informe final aprobado por interventoría; estos predios se encontraban organizados de acuerdo a la Lista de Chequeo formato GCSP-F-046, ahora deberán organizarse de acuerdo a los nuevos lineamientos para entrega final de expediente predial, CIRCULAR ANI No. 20266040000544. -14 predios con documentos pendientes (resolución IGAC de Mutación; correcciones en trámite ante la ORIP, IGAC; y observaciones en subcuenta de predios).
	Expedientes Finales	NO HAY	CORUMAR	Para la entrega del expediente final a la ANI, se debe contar con el Informe Final de Adquisición Predial, revisado y aprobado por la Interventoría; La Interventoría a revisado y aprobado 205 predios. -106 predios ya se encuentran radicados a la Agencia Nacional de Infraestructura; Radicado ANI 20244090467392 (7predios) / 20254090563002 (99 predios). -99 predios con informe final aprobado, organizados de acuerdo a la Lista de Chequeo formato GCSP-F-046, los cuales deberán reorganizarse de acuerdo a los nuevos lineamientos para entrega

COMITÉ PREDIAL ANTIOQUIA - BOLIVAR MES DE SEPTIEMBRE				
FECHA	**TEMA**	**COMPROMISO**	**RESPONSABLE**	**OBSERVACIONES**
				final de expediente predial, Circular ANI No. 20266040000544. Una vez sean reorganizados, se estarán remitiendo a Interventoría para su validación.
	ANISCOPIO	NO HAY	CORUMAR	El concesionario resalta que ha venido realizando la actualización dentro del software predial designado por la Agencia (ANI), conforme avanza la gestión predial del proyecto. Sin embargo, se han podido identificar inconsistencias y/o diferencias que surgieron tras el proceso de migración de datos desde la plataforma "OLYMPUS" a la plataforma "ANISCOPIO". En conjunto con la interventoría (CR Concesiones) se realizaron mesas de trabajo, que permitieron el avance de actualización de la plataforma. A la fecha se ha logrado actualizar y aprobar **205 predios.**
	Cesión De Los Predios CAB-6-3-017, CAB-7-2-021A: Predios Intervenidos	NO HAY		En solicitud de cesión ante el municipio de Coveñas y Tolú, se ha reiterado al municipio la solicitud de cesión sin obtener respuesta alguna, El concesionario solicita a la ANI revisar la condición jurídica de estos predios y estudiar la posibilidad de realizar la misma estrategia planteadas con los predios del Municipio de San Pelayo (expropiación). 10/12/2025 La ANI manifiesta que revisara la condición jurídica de los inmuebles con el Coordinador GIT Asesoría Jurídica Predial e informara sobre la procedencia de lo solicitado por el concesionario. 19/05/2026 Concesionario remite a la ANI respuesta a la petición radicada por la alcaldía de Coveñas donde solicita información acerca del proceso de expropiación del predio CAB-7-2-021A.

Fuente: Consorcio IPAB.

7.11 SEGUIMIENTO A PREDIOS ESPECIALES (BALDÍOS)

En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 78 de la Ley 160 de 1994, se efectúa el seguimiento a los predios declarados como baldíos con el objetivo de coadyuvar al Concesionario en el trámite de adquisición de estos.

Tabla 7-24 Seguimiento A Predios Especiales (Baldíos)

FICHA PREDIAL	Estado Visita Inspección Ocular ANT o Visita del Municipio.	Resolución Adjudicación	Fecha de Resolución.	Folio Matrícula Inmobiliaria - FMI	ESTADO ACTUAL
CAB-2-1-016	Realizada	20224300124566.	8/06/2022	143-62973	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-2-1-017	Realizada	20224300084776.	25/04/2022	143-60956	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-2-1-017A	Pendiente				Predios sin antecedente enviado a la ANI
CAB-2-1-046	Realizada	20224300084846.	25/04/2022	143-60958	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-2-1-104		99 notaria única de San Pelayo	8-may.-25	143-67507	Predio Adquirido
CAB-2-1-167		577 Notaria única de Cerete		143-66407	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-2-1-199		Resolución de Saneamiento Automático 20226060000525	19-ene-22	143-62253	Predio Adquirido
CAB-2-1-205		Resolución de Saneamiento Automático 20226060000555	19-ene-22	143-62255	Predio Adquirido
CAB-2-1-207	Realizada				Predios sin antecedente enviados a la ANI
CAB-2-1-209	Realizada	20224300084856	25/04/2022	143-60959	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-2-1-211	Pendiente	214 notaria única San Pelayo	11-jul.-23	143-63149	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.

FICHA PREDIAL	Estado Visita Inspección Ocular ANT o Visita del Municipio.	Resolución Adjudicación	Fecha de Resolución.	Folio Matrícula Inmobiliaria - FMI	ESTADO ACTUAL
CAB-2-1-229	Realizada	20224300084786	25/04/2022	143-60957	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-2-1-229A	Realizada	20224300092146	29/04/2022		Resolución de Adjudicación.
CAB-2-1-230	Realizada	20224300092146	16/06/2022		Resolución de Adjudicación.
CAB-2-1-245	Realizada	20224300143896	7/06/2022	146-56711	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-2-1-248	Realizada	20224300124316	16/06/2022	146-57723	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-2-1-255	Realizada	20224300143566	10/06/2022	146-56958	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-2-1-256	Realizada	20224300128856	17/06/2022	146-57725	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-2-1-257	Realizada	20224300143886	10-jun.-22	146-56718	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-2-1-259	Realizada	20224300143576	16/06/2022	146-59035	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-2-1-266	Realizada	20224300143906			Predios sin antecedente enviados a la ANI
CAB-2-1-273	Realizada	20224300143906	16/06/2022	146-57722	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-2-1-302	Realizada	1044	17/02/2020	146-53500	Predios sin antecedente enviados a la ANI
CAB-2-1-306	Realizada	20224300091586	29/04/2022	146-56577	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-2-1-331	Realizada	11154	3/08/2021	146-56731	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-2-1-358	Realizada	332	28/01/2020	340-138510	Predio Adquirido
CAB-2-1-367	Realizada	1630	4/03/2020	340-138556	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-2-1-368	Realizada	22585	6/11/2020	340-140918	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-2-1-369	EN TRÁMITE				Auto de Aceptación - Inspección Ocular.
CAB-2-1-391	Realizada	5461	6/07/2020	146-56713	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-2-1-410	Realizada	20224300124326	7/06/2022	146-56724	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-2-1-411	Realizada	20224300091576	29/04/2022	146-56543	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-2-1-412	Realizada	1635	4/03/2020	146-56716	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.

FICHA PREDIAL	Estado Visita Inspección Ocular ANT o Visita del Municipio.	Resolución Adjudicación	Fecha de Resolución.	Folio Matrícula Inmobiliaria - FMI	ESTADO ACTUAL
CAB-2-1-413	Realizada	1624	4/03/2020	146-56716	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-2-1-414	Realizada	1633	4/03/2020	146-56709	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-2-1-418	Realizada	1632	4/03/2020	146-56726	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-2-1-428	Realizada	1050	17/02/2020		Resolución de Adjudicación.
CAB-2-1-429	Realizada	10128	8/10/2020	060-347511	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-3-2-028	Realizada	20224300126816	9/06/2022	143-61946	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-3-3-036A	Realizada	7292	21/08/2020	143-60941	Predio Adquirido
CAB-3-3-046	Realizada	5181	2/07/2020	143-60906	Predio Adquirido
CAB-3-3-050	Realizada	5186	2/07/2020	143-60916	Predio Adquirido
CAB-3-3-052	Realizada, en espera de resolución de adjudicación o entrega anticipada	20224300281686	24-oct.-22	143-62974 143-62975	Predio Adquirido
CAB-3-5-020	Pendiente	20226060020665	20-dic.-21	143-62254	Predio Adquirido
CAB-6-1-033	Realizada	20224300124296	7/06/2022	146-56712	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-6-1-035	Realizada	202243000124306	7/06/2022	146-56732	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-6-1-036	Realizada	202243000124586	8/06/2022	146-56706	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-6-1-037	Realizada	202243000124616	8/06/2022	146-56722	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-6-1-049	Realizada	20224300124626	8/06/2022	146-56703	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-6-1-050	Realizada	202243000124636	8/06/2022	146-56727	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-6-1-051	Realizada	202243000124286	7/06/2022	146-56725	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-6-1-054	Realizada	20224300124606	8/06/2022		Resolución de Adjudicación.
CAB-6-1-068	Realizada	20224300124556	8/06/2022	146-56707	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-6-1-075	Realizada	20224300128796	10/06/2022		Resolución de Adjudicación.
CAB-6-1-076	Realizada	20224300126716	9/06/2022	146-56702	Predios Adquiridos
CAB-6-1-078	Realizada	20224300128806	10/06/2022	146-56704	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-6-1-082	Realizada	20224300128816	10/06/2022	146-56699	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.

FICHA PREDIAL	Estado Visita Inspección Ocular ANT o Visita del Municipio.	Resolución Adjudicación	Fecha de Resolución.	Folio Matrícula Inmobiliaria - FMI	ESTADO ACTUAL
CAB-6-1-088	Realizada	202243000126726	9/06/2022		Resolución de Adjudicación.
CAB-6-1-090	Realizada	202243000126746	9/06/2022	146-56723	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-6-1-093	Realizada	202243000126776	9/06/2022		Resolución de Adjudicación.
CAB-6-1-101	Realizada	202243000124546	8/06/2022	146-56728	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-6-1-104	Realizada	202243000128826	10/06/2022	146-56719	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-6-1-109	Realizada	202243000126786	9/06/2022	146-56720	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-6-1-110	Realizada	202243000126796	9/06/2022	146-56721	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-6-1-111	Pendiente				RADICADO ANTE ANT
CAB-6-2-021A	Realizada	1041	17/02/2020	146-53499	Predio Adquirido
CAB-6-2-022	Realizada	1256	21/02/2020	146-53501	Predio Adquirido
CAB-6-2-023	Realizada	1044	17/02/2020	146-53500	Predio Adquirido
CAB-6-2-028	Realizada	1045	17/02/2020	146-53502	Predio Adquirido
CAB-6-2-032	Realizada	10138	8/10/2020	146-56534	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-6-2-034	Realizada	20216060021025	12/22/2021	146-58085	Predio Adquirido
CAB-6-2-035	Realizada	20216060021025	12/22/2021	146-57983	Predio Adquirido
CAB-6-2-036	Realizada	20216060021085	12/22/2021	146-57984	Predio Adquirido
CAB-6-2-037	Realizada	20216060021035	12/22/2021	146-57985	Predio Adquirido
CAB-6-2-038	Realizada	20216060021065	12/22/2021	146-57978	Predio Adquirido
CAB-6-2-040	Realizada	10120	8/10/2020	146-56536	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-6-2-044	Realizada	20216060021065	12/22/2021	146-57977	Predio Adquirido
CAB-6-3-005A	Pendiente				6. Predios sin antecedente con proceso terminado - DIMAR
CAB-6-3-023B	En Trámite				6. Predios sin antecedente con proceso terminado - DIMAR
CAB-6-3-024	Pendiente				6. Predios sin antecedente con proceso terminado - DIMAR

FICHA PREDIAL	Estado Visita Inspección Ocular ANT o Visita del Municipio.	Resolución Adjudicación	Fecha de Resolución.	Folio Matrícula Inmobiliaria - FMI	ESTADO ACTUAL
CAB-6-3-025	Pendiente				6. Predios sin antecedente con proceso terminado - DIMAR
CAB-6-3-026A	Pendiente				6. Predios sin antecedente con proceso terminado - DIMAR
CAB-6-3-026B	Pendiente				6. Predios sin antecedente con proceso terminado - DIMAR
CAB-6-3-026C	Pendiente				6. Predios sin antecedente con proceso terminado - DIMAR
CAB-6-3-026D	Pendiente				Radicado Ante Municipio.
CAB-6-3-026E	Pendiente				6. Predios sin antecedente con proceso terminado - DIMAR
CAB-6-3-026G	Pendiente				6. Predios sin antecedente con proceso terminado - DIMAR
CAB-6-3-026H	EN TRÁMITE				6. Predios sin antecedente con proceso terminado - DIMAR
CAB-6-3-026I	Pendiente				47. Demanda Admitida
CAB-6-3-027	Pendiente				6. Predios sin antecedente con proceso terminado - DIMAR
CAB-6-3-028	Pendiente				6. Predios sin antecedente con proceso terminado - DIMAR
CAB-6-3-029	Pendiente				6. Predios sin antecedente con proceso terminado - DIMAR
CAB-6-3-030	Pendiente				Radicado Ante Municipio.
CAB-7-2-016	Realizada	23205	13/11/2020	340-139926	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.

FICHA PREDIAL	Estado Visita Inspección Ocular ANT o Visita del Municipio.	Resolución Adjudicación	Fecha de Resolución.	Folio Matrícula Inmobiliaria - FMI	ESTADO ACTUAL
CAB-7-2-022	Realizada, en espera de resolución de adjudicación o entrega anticipada				RADICADO ANTE ANT
CAB-7-2-024	Pendiente				Predios sin antecedente enviados a la ANI
CAB-7-2-046	Pendiente				Predios sin antecedente enviados a la ANI
CAB-7-2-047	Pendiente				Predios sin antecedente enviados a la ANI
CAB-7-2-048A	Realizada	23207	13/11/2020	340-139932	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-7-2-048B	Realizada	23213	13/11/2020	340-139927	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-7-2-049	Realizada, en espera de resolución de adjudicación o entrega anticipada				RADICADO ANTE ANT
CAB-7-2-050	Realizada	23212	13/11/2020	340-139928	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-7-2-051	Realizada	23211	13/11/2020	340-139929	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-7-2-052	Realizada	23214	13/11/2020	340-140022	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-7-2-052A	Realizada	23208	13/11/2020	340-139931	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-7-2-054	Realizada	23210	13/11/2020	340-140027	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-7-2-055	Realizada	232009	13/11/2020	340-139930	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-7-2-057	Realizada	23206	13/11/2020	340-140023	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-7-2-065	Realizada	23204	13/11/2020	340-140024	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-7-3-063	Realizada	11156	3/08/2021	340-141341	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-7-3-065	Realizada	11157	3/08/2021	340-141333	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-7-3-066	Realizada	11151	3/08/2021	CAB-7-3-066	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-7-3-069	Realizada, en espera de resolución de adjudicación o entrega anticipada				Predios sin antecedente enviados a la ANI

FICHA PREDIAL	Estado Visita Inspección Ocular ANT o Visita del Municipio.	Resolución Adjudicación	Fecha de Resolución.	Folio Matrícula Inmobiliaria - FMI	ESTADO ACTUAL
CAB-7-3-070	Realizada	11155	3/08/2021	340-141340	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-7-3-075	Realizada	11154	3/08/2021	340-141339	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-7-3-079	Realizada	11159	3/08/2021	340-143265	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-7-3-081	Realizada	11158	3/08/2021	340-141342	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-7-3-096	Realizada	11153	3/08/2021	340-141335	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-7-3-104	Realizada	1641	4/03/2020	340-138531	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-7-3-105	Realizada	1614	4/03/2020	340-138536	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-7-3-106	Realizada	1613	4/03/2020	340-138572	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-8-1-038	Realizada				RADICADO ANTE ANT
CAB-8-2-001	Realizada	23203	13/11/2020	340-140905	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-8-2-002	Realizada	1640	4/03/2020	340-138522	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-8-2-003	Realizada	1639	4/03/2020	340-138521	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-8-2-004	Realizada	1638	4/03/2020	340-138558	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-8-2-005	Realizada	1637	4/03/2020	340-138559	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-8-2-006	Realizada	23202	13/11/2020	340-140908	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-8-2-016	Realizada	'202343001515656	8-ago.-23	340-148900	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-8-3-001	Realizada	344	28/01/2020	340-138523	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-8-3-003	Realizada	1647	4/03/2020	340-138578	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-8-3-006	Realizada	1611	4/03/2020	340-138554	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-8-3-009	Realizada	1612	4/03/2020	340-138561	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-8-3-015	Realizada	5364	6/07/2020	340-139883	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-8-3-017	Realizada	22586	6/11/2020	340-139884	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-8-3-018	Realizada	22587	6/11/2020	340-140907	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.

FICHA PREDIAL	Estado Visita Inspección Ocular ANT o Visita del Municipio.	Resolución Adjudicación	Fecha de Resolución.	Folio Matrícula Inmobiliaria - FMI	ESTADO ACTUAL
CAB-8-3-019	Realizada	340	28/01/2020	340-138543	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-8-3-023	Realizada	342	28/01/2020	340-138557	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-8-3-025	Realizada	1636	4/03/2020	340-138570	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-8-3-028	Realizada	1645	4/03/2020	340-140997	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-8-3-029	Realizada	1642	4/03/2020	340-138566	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-8-3-031	Realizada	1610	4/03/2020	340-138527	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-8-3-034	Realizada	332	28/01/2020	340-138510	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-8-3-041	Realizada	333	28/01/2020	340-138555	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-8-3-048	Realizada	329	28/01/2020	340-138515	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-8-3-049	Realizada	330	28/01/2020	340-138516	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-8-3-050	Realizada	1644	4/03/2020	340-138575	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-8-3-051	Realizada	1608	4/03/2020	340-138565	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-8-3-052	Realizada	1609	4/03/2020	340-138573	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-8-3-053	Realizada	1643	4/03/2020	340-138529	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-8-3-057	Realizada	1607	4/03/2020	340-140917	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-8-3-065	Realizada	1630	4/03/2020	340-138556	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-8-3-068	Realizada	22585	6/11/2020	340-140918	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-8-3-068A	Realizada				Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-8-3-072	Realizada	1628	4/03/2020	340-138530	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-8-3-073	Realizada	1629	4/03/2020	340-138571	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-8-3-073A	Realizada				Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-8-3-075	Realizada	1617	4/03/2020	340-138579	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-8-3-077	Realizada	1618	4/03/2020	340-138553	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.

FICHA PREDIAL	Estado Visita Inspección Ocular ANT o Visita del Municipio.	Resolución Adjudicación	Fecha de Resolución.	Folio Matrícula Inmobiliaria - FMI	ESTADO ACTUAL
CAB-8-3-082	Realizada	1631	4/03/2020	340-138526	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-8-3-088	Realizada	331	28/01/2020	340-138514	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-8-3-089	Realizada	341	28/01/2020	340-138525	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-8-3-090	Realizada	338	28/01/2020	340-138551	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-8-3-091	Realizada	339	28/01/2020	340-138552	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-8-3-092	Realizada	5456	6/07/2020	060-351686	Predio Adquirido
CAB-8-3-093	Realizada	5457	6/07/2020	060-351717	Predio Adquirido
CAB-8-3-094	Realizada	1237	21/02/2020	060-350991	Predio Adquirido
CAB-8-3-095	Realizada	5458	6/07/2020	060-351742	Predio Adquirido
CAB-8-3-096	Realizada	1240	21/02/2020	060-350992	Predio Adquirido
CAB-8-3-100	Realizada	5153	1/07/2020	060-351712	Predio Adquirido
CAB-8-3-100A	Realizada	1258	21/02/2020	060-343251	Predio Adquirido
CAB-8-3-101	Realizada	1235	21/02/2020	060-350997	Predio Adquirido
CAB-8-3-102	Realizada	5459	6/07/2020	060-351697	Predio Adquirido
CAB-8-3-103	Realizada	5460	6/07/2020	060-351739	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-8-3-104	Realizada	347	28/01/2020	060-343014	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-8-3-105	Realizada	5461	6/07/2020	060-351743	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-8-3-107	Realizada	1054	17/02/2020	060-343254	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-8-3-107A	Realizada	202343001515666	8/08/2023	060-386901	Predio Adquirido
CAB-8-3-108A	Realizada	1051	17/02/2020	060-351358	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-8-3-108B	Realizada	10130	8/10/2020	060-347516	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-8-3-109	Realizada	5154	1/07/2020	060-351747	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-8-3-109A	Realizada	28248	11/12/2020	060-351710	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-8-3-109B	Realizada	5155	1/07/2020	060-351713	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-8-3-109C	Realizada	343	28/01/2020	060-350990	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-8-3-109D	Realizada	23217	13/11/2020	060-351745	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-8-3-109E	Realizada	19536	5/12/2019	060-343178	Predio Adquirido

FICHA PREDIAL	Estado Visita Inspección Ocular ANT o Visita del Municipio.	Resolución Adjudicación	Fecha de Resolución.	Folio Matrícula Inmobiliaria - FMI	ESTADO ACTUAL
CAB-8-3-110	Realizada	5156	1/07/2020	060-359815	Predio Adquirido Con Mutación Catastral.
CAB-8-3-112	Realizada	10133	8/10/2020	060-348234	Predio Adquirido
CAB-8-3-113	Realizada	19543	5/12/2019	060-343179	Predio Adquirido
CAB-8-3-114	Realizada	19537	5/12/2019	060-343181	Predio Adquirido
CAB-8-3-115	Realizada	19542	5/12/2019	060-345585	Predio Adquirido
CAB-8-3-115A	Realizada	5462	6/07/2020	060-351684	Predio Adquirido
CAB-8-3-115B	Realizada	1236	21/02/2020	060-350988	Predio Adquirido
CAB-8-3-117	Realizada	19540	5/12/2019	060-343180	Predio Adquirido
CAB-8-3-122	Realizada	23216	13/11/2020	060-351687	Predio Adquirido
CAB-8-3-123	Realizada	5463	1/07/2020	060-359814	Predio Adquirido
CAB-8-3-124	Realizada	1635	4/03/2020	060-351311	Predio Adquirido
CAB-8-3-125	Realizada	1624	4/03/2020	060-351310	Predio Adquirido
CAB-8-3-126	Realizada	1633	1/07/2020	060-353676	Predio Adquirido
CAB-8-3-127	Realizada	1616	4/03/2020	060-351313	Predio Adquirido
CAB-8-3-129	Realizada	1239	21/02/2020	060-343252	Predio Adquirido
CAB-8-3-130	Realizada	5464	1/07/2020	060-359816	Predio Adquirido
CAB-8-3-134	Realizada	1632	4/03/2020	060-351318	Predio Adquirido
CAB-8-3-145	Realizada	23246	13/11/2020	060-351673	Predio Adquirido
CAB-8-3-146	Realizada	5157	1/07/2020	060-350987	Predio Adquirido
CAB-8-3-147	Realizada	5465	6/07/2020	060-351688	Predio Adquirido
CAB-8-3-148	Realizada	1615	4/03/2020	060-343015	Predio Adquirido
CAB-8-3-149	Realizada	1646	4/03/2020	060-343253	Predio Adquirido
CAB-8-3-150	Realizada	1049	17/02/2020	060-343026	Predio Adquirido
CAB-8-3-151	Realizada	1259	21/02/2020	060-343255	Predio Adquirido
CAB-8-3-152	Realizada	10132	8/10/2020	060-348230	Predio Adquirido
CAB-8-3-153	Realizada	1260	21/02/2020	060-351002	Predio Adquirido
CAB-8-3-154	Realizada	1050	17/02/2020	060-343256	Predio Adquirido
CAB-8-3-155	Realizada	10128	8/10/2020	060-347511	Predio Adquirido
CAB-8-3-156	Realizada	1261	21/02/2020	060-343024	Predio Adquirido
CAB-8-3-157	Realizada	1262	21/02/2020	060-351342	Predio Adquirido
CAB-8-3-158	Realizada	10131	8/10/2020	060-348229	Predio Adquirido
CAB-8-3-159	Realizada	10129	8/10/2020	060-347515	Predio Adquirido
CAB-8-3-160	Realizada	346	28/01/2020	060-351370	Predio Adquirido
CAB-8-3-165	Realizada	5466	6/07/2020	060-351741	Predio Adquirido
CAB-8-3-166	Realizada	5467	6/07/2020	060-351672	Predio Adquirido

FICHA PREDIAL	Estado Visita Inspección Ocular ANT o Visita del Municipio.	Resolución Adjudicación	Fecha de Resolución.	Folio Matrícula Inmobiliaria - FMI	ESTADO ACTUAL
CAB-8-3-167	Realizada	5468	6/07/2020	060-351371	Predio Adquirido
CAB-8-3-167A	Realizada	1625	4/03/2020	060-351319	Predio Adquirido
CAB-8-3-168	Realizada	5158	1/07/2020	060-359819	Predio Adquirido
CAB-8-3-169	Realizada	5469	6/07/2020	060-351727	Predio Adquirido
CAB-8-3-170	Realizada	5470	6/07/2020	060-351711	Predio Adquirido
CAB-8-3-185	Realizada	202343001904086	8/31/2023	060-387651	Predio Adquirido
CAB-8-3-188	Realizada	1626	4/03/2020	060-351320	Predio Adquirido
CAB-8-3-190	Realizada			060-411363	Predio Adquirido
CAB-8-3-191	Realizada	5471	6/07/2020	060-351718	Predio Adquirido
CAB-8-3-192	Realizada	1238	21/02/2020	060-351369	Predio Adquirido
CAB-8-3-193	Realizada	5159	1/07/2020	060-351685	Predio Adquirido
CAB-8-3-194	Realizada	5473	6/07/2020	060-351683	Predio Adquirido
CAB-8-3-196	Realizada	5160	1/07/2020	060-351682	Predio Adquirido
CAB-8-3-197	Realizada	5472	6/07/2020	060-351716	Predio Adquirido
CAB-8-3-198	Realizada	28249	11/12/2020	060-351681	Predio Adquirido
CAB-8-3-199	Realizada	23245	13/11/2020	060-351740	Predio Adquirido
CAB-8-3-200	Realizada	23244	13/11/2020	060-351696	Predio Adquirido
CAB-8-3-200A	Realizada	1052	17/02/2020	060-351003	Predio Adquirido
CAB-8-3-200B	Realizada	10127	8/10/2020	060-351736	Predio Adquirido
CAB-8-3-207	Realizada	1031	17/02/2020	060-351181	Predio Adquirido
CAB-8-3-212A	Realizada	23215	13/11/2020	060-351690	Predio Adquirido
CAB-8-3-215	Realizada	28227	10/12/2020	NEGADO	NEGADO
CAB-8-3-216	Realizada	345	28/01/2020	060-351000	Predio Adquirido
CAB-8-3-231	Realizada	28247	11/12/2020	060-356857	Predio Adquirido
CAB-8-3-236	Realizada	23219	13/11/2020	060-348233	REGISTRADO - FMI
CAB-8-3-239	Realizada	23218	13/11/2020	060-14274	REGISTRADO - FMI
CAB-8-3-243	Realizada	23220	13/11/2020	060-347512	REGISTRADO - FMI

Fuente: Consorcio IPAB.

Tabla 7-25 Estado Actual de los Predios Baldíos

ESTADO Actual	CANTIDAD
PREDIOS SIN ANTECEDENTE CON PROCESO TERMINADO - DIMAR	7
AUTO DE ACEPTACIÓN - INSPECCIÓN OCULAR	3
DESISTIDO	1
NEGADO	1
RADICADO ANTE ANT	4
RADICADO ANTE MUNICIPIO	5
REGISTRADO - FMI	3
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	8
PREDIO ADQUIRIDO	88
PREDIO ADQUIRIDO CON MUTACIÓN CATASTRAL	120

Fuente: Consorcio IPAB

Que mediante correo electrónico de fecha 10 de septiembre de 2026 la ANI presenta el estado de avance de los trámites de adjudicación de bienes baldíos que cursan ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT), con el propósito de solicitar la coadyuvancia e intervención institucional activa para obtener el impulso procesal de los siguientes expedientes:

1. **Expedición de Resoluciones de Adjudicación (Inspecciones Oculares realizadas):**

Durante los días 30 y 31 de julio de 2026 se llevaron a cabo de manera satisfactoria las diligencias de Inspección Ocular Programada para los predios CAB-2-1-266, CAB-2-1-302, CAB-6-1-111 y CAB-7-2-022, los cuales se encuentran actualmente intervenidos por el proyecto. solicitando a la ANT para la pronta expedición y notificación de los actos administrativos de adjudicación correspondientes.

2. **Apertura y remisión de Folios de Matrícula Inmobiliaria:**

Los predios CAB-2-1-229A, CAB-2-1-230, CAB-2-1-428, CAB-6-1-054 y CAB-6-1-075 cuentan con resolución de adjudicación en firme proferidas en el año 2022; no obstante, a la fecha no se ha obtenido la información registral correspondiente (apertura de matrícula

inmobiliaria). De igual forma, en los predios CAB-7-3-069 y CAB-8-1-038 se encuentra pendientes la notificación formal del acto administrativo y la consecuente matrícula. Por lo que se solicitó la intermediación de la ANT ante la ORIP competente para consolidar el saneamiento registral de estas áreas.

3. **Predio sin información de trámite**:

Respecto al predio CAB-8-2-011, radicados formalmente ante la entidad mediante radicado 20254091289742, pendientes de conocer el estado procesal actual y número de expediente asignado.

7.12 SEGUIMIENTO SUBCUENTA PREDIAL

Este capítulo corresponde al seguimiento realizado al manejo de los recursos prediales desde la subcuenta predial, la cual se revisa continuamente y es comparado contra los reportes de fiducia.

7.12.1 Seguimiento a recursos de subcuenta predial

A continuación, se incluye el seguimiento de recursos de subcuenta predial de la franja del 0 al 100%

Tabla 7-26 Seguimiento a recursos de subcuenta predial

Aporte	Fecha Giro	Valor Girado en Corrientes	Valor Acumulado en precios corrientes	Valor Girado en Constantes	Valor Acumulado en precios Constantes
1	17/11/2015	$ 7.402.740.884	$ 7.402.740.884	$ 6.803.963.576	$ 6.803.963.576
2	26/05/2016	$ 7.798.361.605	$ 15.201.102.489	$ 6.803.963.576	$ 13.607.927.152
3	22/11/2016	$ 10.510.284.228	$ 25.711.386.717	$ 9.071.951.435	$ 22.679.878.587
4	21/05/2017	$ 13.603.174.952	$ 39.314.561.669	$ 11.339.939.294	$ 34.019.817.881
5	16/11/2017	$ 13.669.507.756	$ 52.984.069.424	$ 11.339.939.294	$ 45.359.757.175
6	16/05/2018	$ 14.414.805.685	$ 67.398.875.110	$ 11.651.883.156	$ 57.011.640.331
7	9/10/2018	$ 14.496.187.792	$ 81.895.062.902	$ 11.651.883.156	$ 68.663.523.487
8	11/05/2019	$ 9.893.785.560	$ 91.788.848.462	$ 7.783.981.062	$ 76.447.504.549
9	7/11/2019	$ 10.070.008.271	**$ 101.858.856.733**	$ 7.783.981.062	**$ 84.231.485.611**

Aporte	Fecha Giro	Valor Girado en Corrientes	Valor Acumulado en precios corrientes	Valor Girado en Constantes	Valor Acumulado en precios Constantes
FRANJA DEL 0% AL 100%					

Fuente: Consorcio IPAB.

de conformidad con el cuadro anterior, se puede identificar que el Concesionario realizó los fondeos correspondientes a la franja de riesgo del 0% al 100%, dando cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas en la sección 7.2 Recursos para la Adquisición de Predios y Compensaciones Socioeconómicas de la parte general del Contrato de Concesión 016 de 2015.

Para la franja del 120% al 200%, el ultimo fondeo realizado corresponde a el comité previa aprobación N°19 con el fondeo correspondiente a $ 183.736.893,18 según el resumen de comité registrado de la siguiente manera:

Tabla 7-27 Fondeo

RESUMEN	
Concepto	**Valor total a cancelar**
Saldo Disponible para comprometer en el comité CPA 19	$ 770.998.752,00
Rendimiento Acumulados Menos Rendimiento Utilizados	$ 565.096.752,00
Traslado Predio CAB-7-2-081comprometido Comité CPA 14	$ (22.118.366,00)
Acumulado Predios Desafectados	$ 228.017.366
Valor Solicitado Comité 19	$ 183.736.893,18
Sobrantes Despues del CPA19	$ 587.258.858,36

Fuente: Consorcio IPAB.

Para el comité previa aprobación N°15, 16,17,18 y 19 se usaron los rendimientos de la subcuenta predial.

7.12.2 Comités de previa aprobación

Este capítulo corresponde a aquellos comités requeridos, cuando el riesgo predial sobrepasa el 120% del valor establecido en el Contrato, A continuación, se indica un resumen de los comités desarrollados y las aprobaciones dadas en desarrollo de estos:

Tabla 7-28 Comités de previa aprobación

Comité previa aprobación	Oficio ANI Aprobación	Fecha fondeo	Valor total aprobado en corriente	Valor a cargo de la ANI 70%	Valor a cargo del Concesionario 30%
Acta de comité previa aprobación #1	20216040158781 del 26 de mayo de 2021	15 de junio de 2021	$ 1.168.747.665,14	$ 818.123.365,60	$ 350.624.299,54
Acta de comité previa aprobación #2	20216040187341 del 22 de junio de 2021	15 de junio de 2021	$ 4.222.905.662,00	$ 2.956.033.963,40	$ 1.266.871.698,60
Acta de comité previa aprobación #3	20216040222111 del 23 de julio de 2021	21 de julio de 2021	$ 7.390.425.679,21	$ 5.173.297.975,45	$ 2.217.127.703,76
Acta de comité previa aprobación #4	20216040243331 del 10 de agosto de 2021	19 de agosto de 2021	$ 566.895.094	$ 396.826.566	$ 170.068.528
Acta de comité previa aprobación #5	20216040328501 del 21 de octubre de 2021	21 de octubre de 2021	$ 8.297.275.090,00	$ 5.808.092.563	$ 2.489.182.527
Acta de comité previa aprobación #6	20216040373991 del 26 de noviembre de 2021	6 de diciembre de 2021	$ 7.579.214.906,01	$ 5.305.450.434,21	$ 2.273.764.471,80
Acta de comité previa aprobación #7	20216040409021 del 27 de diciembre de 2021	5 de enero de 2022	$ 2.712.125.191,27	$ 1,898,487,633.89	$ 813,637,557.38

Comité previa aprobación	Oficio ANI Aprobación	Fecha fondeo	Valor total aprobado en corriente	Valor a cargo de la ANI 70%	Valor a cargo del Concesionario 30%
Acta de comité previa aprobación #8	20226040184371 recibido el 24 de junio de 2022,	Junio de 2022	$ 5.799.822.802,87	$ 4.059.875.962,01	$ 1.739.946.840,86
Acta de comité previa aprobación #9	20226040218871 del 27 de julio de 2022	Julio de 2022	$ 2.794.971.717,22	$ 1.956.480.202,05	$ 838.491.515,17
Acta de comité previa aprobación #10	20226060388541 del 30 de noviembre de 2022	No requiere, uso de rendimientos	$ 712.702.383,11	$ 498.891.668,17	213810714,9
Acta de comité previa aprobación #11	20226060389771 del 1 de diciembre de 2022	Diciembre de 2022	$ 6.376.133.100,33	$ 4.463.293.170,25	$ 1.912.839.930,08
Acta de comité previa aprobación #12	20236040132091 del 21 de abril de 2023	Abril de 2023	$ 3.023.397.989,98	2.116.378.592,99	$ 907.019.396,99
Acta de comité previa aprobación #13	20246060049851 del 12 de febrero de 2024	Febrero de 2024	$ 2.218.602.343.52	911.092.808.06	390.468.346.31
Acta de comité previa aprobación #14	N.A	Agosto 2024	1.859.097.538,35	$ 1.285.885.420,65	$ 573.212.117,70
Acta de comité previa aprobación #15 y 16	N.A	N.A	$517.392.793,22	Recurso de rendimientos de la Subcuenta predial	

Comité previa aprobación	Oficio ANI Aprobación	Fecha fondeo	Valor total aprobado en corriente	Valor a cargo de la ANI 70%	Valor a cargo del Concesionario 30%
Acta de comité previa aprobación #17	N.A	N.A	$357.630.457,34	Recurso de rendimientos de la Subcuenta predial	
Acta de comité previa aprobación #18	N.A	N.A	$449.017.220,12	Recurso de rendimientos de la Subcuenta predial	
Acta de comité previa aprobación #19	N.A	Junio de 2026	$ 183.736.893,18	Recurso de rendimientos de la Subcuenta predial	

Fuente: Consorcio IPAB.

Tabla 7-29 Comités de previa aprobación

ACTA COMITÉ PREVIA APROBACIÓN		ACTA EN CORRIENTES	VALOR ACUMULADO EN PRECIOS CORRIENTES
# 1	7/5/2021	$1.168.747.665,00	$125.224.627.859
# 2	26/05/2021	$4.222.905.662,00	$129.447.533.521
# 3	14/07/2021	$7.390.425.679,00	$136.837.959.200
#4	28/07/2021	$ 566.895.094,00	$137.404.854.294
#5	16/09/2021	$8.297.275.090,00	$145.702.129.385
#6	26/10/2021	$7.579.214.906,01	$153.281.344.291,01
#7	7/12/2021	$2.712.125.191,27	$155.993.469.482,28
#8	10/3/2022	$5.799.822.802,87	$161.793.292.285,15
#9	17/05/2022	$2.794.971.717,22	$164.588.264.002,37
#10	21/07/2022	$ 712.702.383,11	$165.300.966.385,48


ACTA COMITÉ PREVIA APROBACIÓN		ACTA EN CORRIENTES	VALOR ACUMULADO EN PRECIOS CORRIENTES
#11	18/10/2022	$6.376.133.100,33	$171.677.099.485,81
#12	28/03/2022	$3.023.397.989,98	$174.700.497.385,63
#13	4/10/2023	$1.323.629.595,78	$176.024.126.981,41
#14	24/05/2024	$1.859.097.538,35	$177.883.224.519,76
#15 y #16	22/11/2024	$ 517.392.793,22	$178.400.617.312,98
#17	10/06/2025	$357,630,457.34	$178.758.247.770.32
#18	3/12/2025	$449.017.220,12	$179.207.264.990,44
#19	26/06/2026	$ 183.736.893,18	$ 179.187.395.291

Fuente: Consorcio IPAB.

7.13 ESTADO DE ÁREAS REMANENTES DE LOS PREDIOS ADQUIRIDOS


Con el fin de dar aplicación a lo estipulado en el Instructivo de la ANI GCSP-I-022, Identificación de las áreas remanentes y predios sobrantes en los proyectos de Concesión vial a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura, a continuación, se presenta gráficamente el número de predios con áreas remanentes adquiridas por Unidad Funcional en el proyecto Antioquia – Bolívar.

Grafica 36 Areas Remanentes Adquiridos

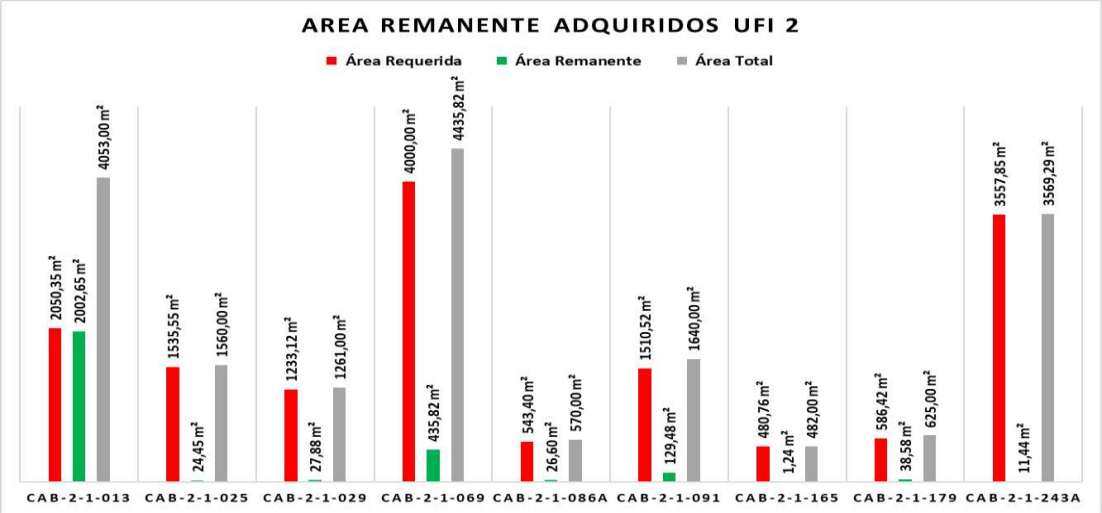


Fuente: Consorcio IPAB.

Grafica 37 Areas Remanentes Adquiridos

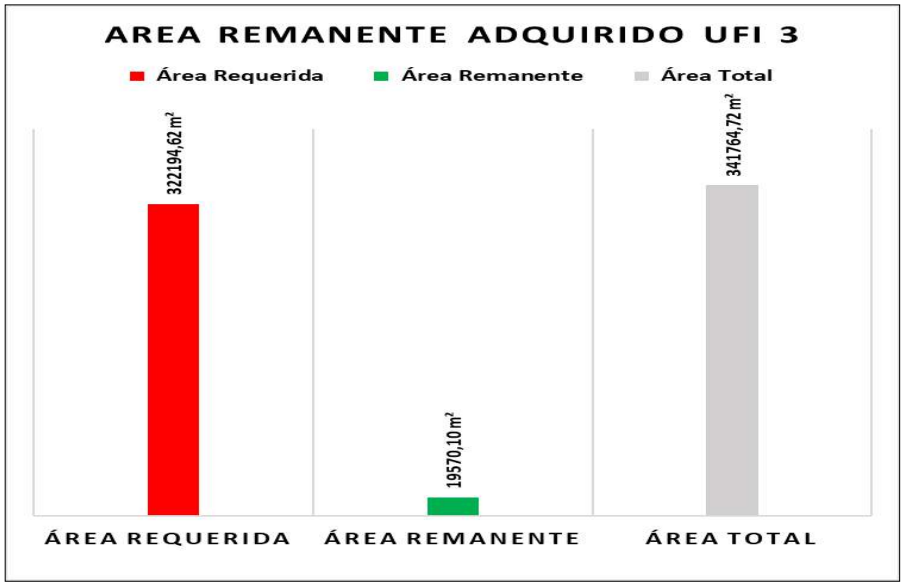


Fuente: Consorcio IPAB.

Grafica 38 Areas Remanentes Adquiridos

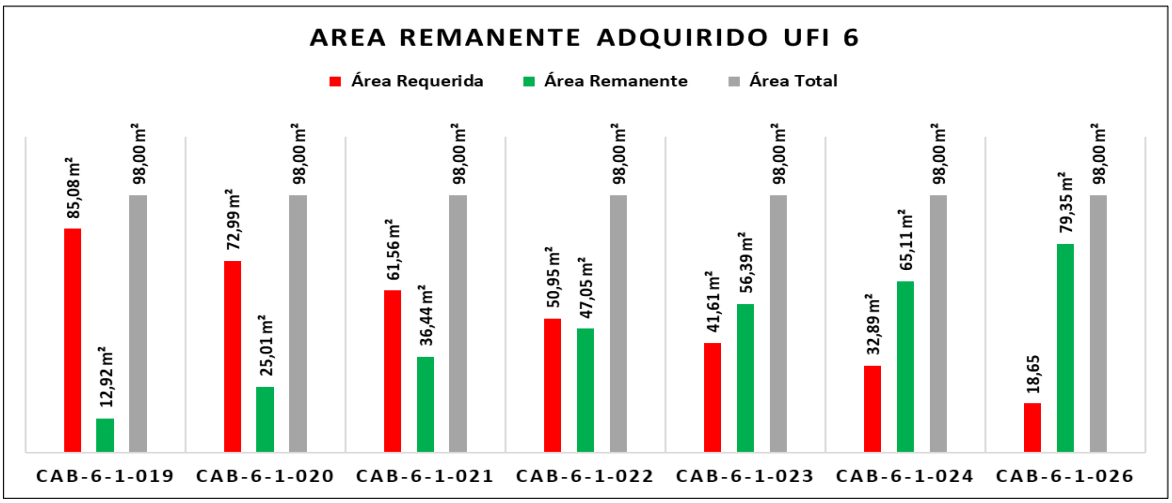

Fuente: Consorcio IPAB.

Grafica 39 Areas Remanentes Adquiridos

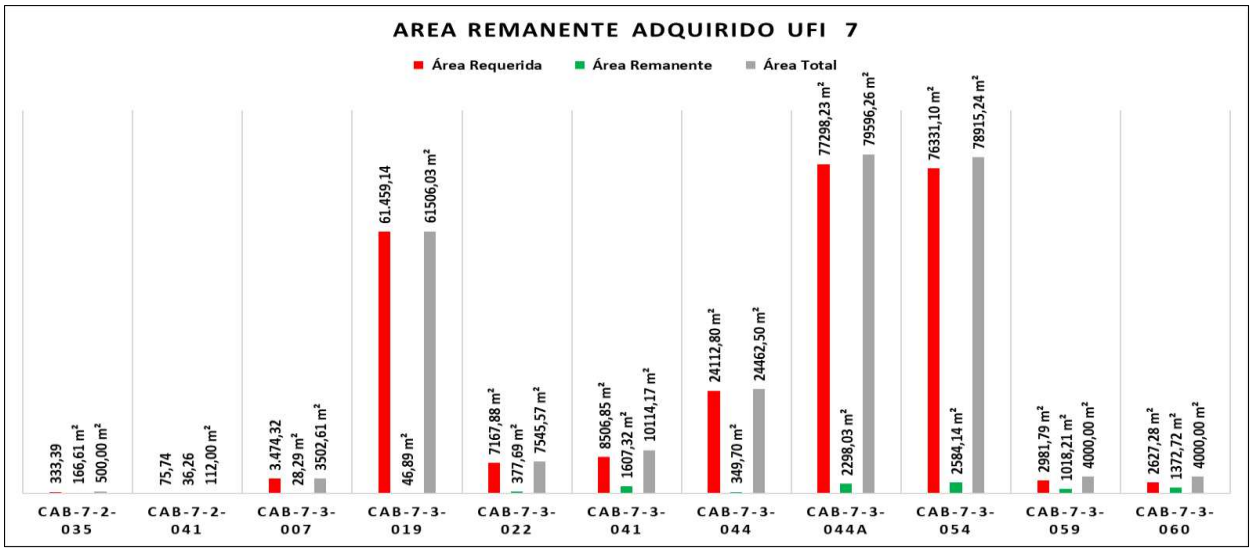

Fuente: Consorcio IPAB.

La variedad de las áreas remanentes es considerable para los tamaños de cada una de las unidades funcionales donde la UFI 3 presenta la mayor área remanente con

19,570.10 m², mientras que la UFI 6 tiene la menor área remanente con 322.27 m², lo que se diferencia la disponibilidad de una futura expansión.

La finalidad y el uso de una forma estratégica para que estas áreas contribuyen a una planificación sostenible en la vía concesionada de Antioquia – Bolivar.

7.14 HALLAZGOS

En cumplimiento de las acciones planteadas para cerrar los diferentes tipos de hallazgos encontrados internamente o por Entes externos, en este capítulo se relacionan hallazgos del Proyecto.

Se resalta que a la fecha en gestión del proyecto Concesión Antioquia – Bolívar, no se cuenta con ningún hallazgo de los entes de control relacionados con el área o gestión predial.

7.15 COMUNICADOS

A continuación, se presenta un listado de las comunicaciones de seguimiento y control a las actividades inherentes a la gestión predial que fueron emitidos durante el mes de septiembre de 2026.

Tabla 7-30 Comunicados

CONCECUTIVO RECIBIDO IPAB	FECHA DE RECIBO	PROCEDENCIA	DESTINATARIO	IDENTIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓ	CONTENIDO O TEMA TRATADO	CUMPLIDO
IPAB-1677-2026	1/09/2026	RUTA AL MAR	CONSORCIO IPAB	48.20260828012887	Solicitud previa aprobación por sobrecostos prediales asociados a decisión judicial dentro del proceso de expropiación judicial adelantado sobre el predio CAB-7-2-014	SI
IPAB-1698-2026	1/09/2026	RUTA AL MAR	ANI	48.20260831012905	Respuesta al Radicado ANI No. 20263050313081, recibido bajo el radicado CORUMAR 47-RUTADCTOELECTRONICOS-20260818015601, en el cual solicitan la Revisión sobre procedencia actual de la solicitud de extensión del Periodo Especial del Evento Eximente de Responsabilidad de la Unidad Funcional 2 - Contrato de Concesión No 016 de 2015. Proyecto de Concesión IP Conexión Antioquia Bolívar.	SI
IPAB-1749-2026	9/09/2026	RUTA AL MAR	ANI	48.20260831012902	Respuesta a la comunicación con radicado ANI No. 20266060296671 recibido CORUMAR 47-RUTADCTOELECTRONICOS20260805015540. Frente a la Devolución expedientes en trámite de expropiación CAB-7-2-049, CAB-7-3-038, CAB-2-1-122, CAB-2-1-154, CAB-7-3-026, CAB-7-3-064 y CAB-2-1-163. PROYECTO DE CONCESION – ANTIOQUIA BOLIVAR. CONTRATO DE CONCESIÓN IP 016 DE 2015.	SI
IPAB-1777-2026	11/09/2026	RUTA AL MAR	CONSORCIO IPAB	48.20260828012887	Solicitud previa aprobación por sobrecostos prediales asociados a decisión judicial dentro del proceso de expropiación judicial adelantado sobre el predio CAB-7-2-014	SI
IPAB-1778-2026	11/09/2026	RUTA AL MAR	CONSORCIO IPAB	48.20260828012888	Solicitud previa aprobación por sobrecostos prediales asociados a decisión judicial dentro del proceso de expropiación judicial adelantado sobre el predio CAB-7-2-026	SI
IPAB-1806-2026	15/09/2026	RUTA AL MAR	CONSORCIO IPAB	48.20260911013005	Respuesta comunicación IPAB-0667-2026 recibida mediante radicado 47-RUTADCTOELECTRONICOS-20260824015660 - Solicitud previa aprobación por sobrecostos prediales asociados a decisión judicial dentro del proceso de expropiación judicial adelantado sobre el predio CAB-8-1-024	SI
IPAB-1826-2026	18/09/2026	RUTA AL MAR	ANI	48.20260914013015	Respuesta oficio N° 20266040327021 recibido mediante radicado 47-RUTADCTOELECTRONICOS-20260827015708 - Respuesta a la comunicación con radicado Concesión No. RUTADCTOELECTRONICOS4820260727012618 (Radicado ANI No. No. de radicado al que responde: 20264090960892 20264090960892) Reiteración radicados N°	SI

CONCECUTIVO RECIBIDO IPAB	FECHA DE RECIBO	PROCEDENCIA	DESTINATARIO	IDENTIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓ	CONTENIDO O TEMA TRATADO	CUMPLIDO
					20234091050852 y 20244090895752, consulta elevada por el Concesionario en comités de seguimiento predial (años 2023 a 2026) respecto a la liquidación de gastos notariales y de registro incluyendo los valores de los conceptos indemnizatorios (Lucro cesante y Daño Emergente). Proyecto - "Conexión Antioquía - Bolívar"	
IPAB-1834-2026	18/09/2026	RUTA AL MAR	ANI	48.20260917013062	Actualización estado de predios no intervenidos y no adquiridos – Reiteración de solicitud de directriz en el marco de la etapa de reversión adelantada con ocasión a la Terminación Anticipada del Contrato de Concesión IP No.016 de 2015. Proyecto Vial Conexión Antioquia – Bolívar	SI
IPAB-1842-2026	21/09/2026	RUTA AL MAR	CONSORCIO IPAB	48.20260918013070	Respuesta oficio N° IPAB-0759-2026 recibido mediante radicado 47-RUTADCTOELECTRONICOS-20260914015844 - Solicitud de información y actualización del estado de la gestión predial en el marco de la Etapa de Reversión del Contrato de Concesión No.016 de 2015"	SI
IPAB-1846-2026	22/09/2026	RUTA AL MAR	CONSORCIO IPAB	48.20260921013078	Respuesta oficio N° IPAB-0649-2026 recibido mediante radicado 47-RUTADCTOELECTRONICOS-20260824015644 – IPAB-0718-2026 recibido mediante radicado 47-RUTADCTOELECTRONICOS-20260903015756 - IPAB-0679-2026 recibido mediante radicado 47-RUTADCTOELECTRONICOS-20260826015680 - Migración del archivo "Revisión Titularidad Predios ANI" al formato GCSP-F-114 Inventario Predial V3 y cierre de observaciones coincidentes.	SI
IPAB-1878-2026	25/09/2026	RUTA AL MAR	ANI	48.20260924013169	Remisión de documentos para proceder a transferencia de dinero predio identificado ficha predial CAB-2-1-331.	SI
IPAB-1888-2026	28/09/2026	RUTA AL MAR	CONSORCIO IPAB	48.20260928015057	Solicitud previa aprobación por sobrecostos prediales asociados al seguimiento ambiental EDS – CARRILLO Predio CAB-2-1-195.	SI
IPAB-1889-2026	28/09/2026	RUTA AL MAR	ANI	48.20260928015067	Solicitud Remisión Acta Firmada Comité Previa Aprobación No. 19	SI
IPAB-1890-2026	28/09/2026	RUTA AL MAR	CONSORCIO IPAB	48.20260928015068	Respuesta Oficio N° IPAB-0650-2026 del 21/08/2026 - Formato Predial Actualizado GCSP-F-052 V3 "Proyecto vial IP Conexión Antioquia Bolívar"	SI
IPAB-1897-2026	29/09/2026	ANI	CONSORCIO IPAB	48.20263050374161	Devolución comunicado IPAB-0628-2026 de radicado ANI No. 20264091040432 para complementación de la solicitud de no objeción al Plazo de Cura – No Entrega Informe de EER - Contrato de Concesión IP No.016 de 2015. Proyecto Conexión Antioquia - Bolívar.	SI

CONCECUTIVO RECIBIDO IPAB	FECHA DE RECIBO	PROCEDENCIA	DESTINATARIO	IDENTIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓ	CONTENIDO O TEMA TRATADO	CUMPLIDO
IPAB-1903-2026	29/09/2026	RUTA AL MAR	CONSORCIO IPAB	48.20260928015061	Respuesta Oficio N° IPAB-0727-2026 del 03/09/2026 - Respuesta oficio Radicado 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260703012440 del 03 de julio de 2026 y al oficio Radicado 48-RUTAELECTRONICOS 20260804012686 del 04 de agosto de 2026, cuyo asunto es "Informe de Avance a la Gestión Predial correspondiente al periodo del mes de junio y julio de 2026.	SI
IPAB-1908-2026	29/09/2026	RUTA AL MAR	CARLOS ANDRES SAIBIS ELJACH	48.20260928015060	Respuesta a la comunicación remitida por la ANI el 18 de septiembre de 2026, relacionada con la solicitud de levantamiento de las medidas cautelares que recaen sobre el inmueble identificado con el código predial CAB-2-1-007.	En curso
IPAB-1911-2026	29/09/2026	RUTA AL MAR	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS (ANT)	48.20260928015064	Retiración a la comunicación 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260218011304 Procedimiento agrario de deslinde o delimitación de tierras de la Nación (Decreto Único Reglamentario 1071 de 2015). Predio: CIÉNAGA GRANDE DEL BAJO SINÚ - CGBS, ubicada en jurisdicción de los municipios de Chima, Ciénaga de Oro, Cotorra, Lorica, Momil, Purísima Concepción y San Pelayo en el Departamento de Córdoba. Exp. 201832007711300035E. Solicitud de Requerir a la ORIP de Lorica _ Córdoba, para que proceda con la Inscripción de Sentencias proferidas en el marco de los Procesos Declarativos Especiales De Expropiación adelantados para el proyecto de Utilidad Pública denominado conexión Vial de los Departamentos Antioquia – Bolívar. Unidad Funcional 2 Subsector 1 y Unidad Funcional 6 Subsector 1, Tramo Cereté – Lorica.	En curso

Fuente: Consorcio IPAB.

7.16 SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PLANTEADAS POR EL CONCESIONARIO.

Se han identificado dificultades en el proceso de adjudicación de los predios baldíos en diferentes municipios, donde las acciones de los entes municipales y la Agencia

Nacional de Tierras (ANT), no favorecen el avance que requiere el proyecto. Pese a que el Concesionario y la Agencia han impulsado de diferentes maneras los tramites de adjudicación, aun no se logra obtener la titularidad de todos los predios solicitados a favor de la ANI.

Adicionalmente por parte de los entes municipales no se tiene avance con respecto a la adquisición predial de los predios solicitado en cesión.

7.17 AVANCE EN EL SISTEMA IMPLEMENTADO POR LA ANI

ANISCOPIO es una herramienta sistematizada de la Agencia Nacional de Infraestructura que permitía conocer el avance de la gestión predial.

En fecha 02 de septiembre de 2026 se realizó mesa de trabajo en conjunto con el Concesionario con el fin de definir los lineamientos para el proceso de actualización de la plataforma de ANISCOPIO, a la fecha del presente informe tenemos que:

Tabla 7-31 ANISCOPIO

DESCRIPCION	CANTIDAD
Predios Cargados por el Concesionario	1287
Predios migrados de OLYMPUS a ANISCOPIO	1065
Predios Aprobados Interventoría CR	188
Predios Aprobados Interventoría IPAB	17
Predios pendientes de Radicación de expedientes en físico para revisión en la plataforma ANISCOPIO	860

Fuente: Consorcio IPAB.

8. INFORME FINANCIERO MENSUAL DE INTERVENTORÍA

El presente informe presenta la situación financiera del Contrato de Concesión No. 016 de 2015, con base en la información reportada en el Informe Fiduciario correspondiente a agosto de 2026. En él se detallan los ingresos del proyecto reconocidos por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Concesionario, así como el estado de las subcuentas, los estados financieros del período y los recursos aportados por el Concesionario para el desarrollo del contrato.

Sea lo primero informar que el Contrato de Concesión APP No. 016 del 14 de octubre de 2015, suscrito entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Concesionaria Ruta al Mar S.A.S. (CORUMAR S.A.S.) para la financiación, construcción, mejoramiento, operación y mantenimiento del corredor vial que conecta los departamentos de Antioquia y Bolívar, entró formalmente en su Etapa de Reversión a partir del 2 de mayo de 2026, la cual fue notificado a las partes el 1 de mayo mediante Laudo Arbitral CIRD No. 01-23-0002-8303, proferido el 30 de abril de 2026 por el Tribunal de Arbitramento constituido ante el Centro Internacional de Resolución de Disputas (CIRD). En dicha decisión, el Tribunal declaró la Terminación Anticipada del Contrato con fundamento en las cuatro causales invocadas por la parte convocante, todas ellas atribuibles a incumplimientos contractuales imputables a la ANI, y ordenó la aplicación de la Fórmula de Terminación Anticipada prevista en la Sección 18.4 del Contrato, condenando a la Entidad al pago de las sumas que a continuación se presentan:

Tabla 8-1. Laudo Final. Caso CIRD No. 01-23-0002-8303
Centro Internacional de Resolución de Disputas

Concepto	Monto	Dispositivo
Liquidación del Contrato (Fórmula Sección 18.3(e))	**$ 3.306.292.000.000,00**	Dispositivos TERCERO y CUARTO
Perjuicios — Falta aumento tarifas Peaje Carimagua	**$ 257.866.339.833,00**	Dispositivo NOVENO
Perjuicios — Insuficiencia Compensaciones Ambientales	**$ 933.062.815,00**	Dispositivo DÉCIMO
Perjuicios — Demoras reconocimiento Decreto 050	**$ 1.240.438.812,00**	Dispositivo DÉCIMO CUARTO
Perjuicios — Sitios inestables UF 4 y 5	**$ 5.437.747.505,00**	Dispositivo DÉCIMO QUINTO
Costas (honorarios Tribunal y CIRD)	**USD $ 597.696,37**	Dispositivo DÉCIMO OCTAVO

Costas (honorarios peritos y legales de RAM)	**$ 9.439.635.342,80**	Dispositivo DÉCIMO NOVENO
Ajustes de actualización sobre montos condenados	**Por liquidar al cumplimiento**	Dispositivos DÉCIMO SEXTO y DÉCIMO SÉPTIMO

Fuente: Laudo Final. Caso CIRD No. 01-23-0002-8303, 30 abril 2026.

En virtud de lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en la Sección 9.7 de la Parte General del Contrato, el Concesionario y esta Interventoría dieron inicio a las actividades propias de la Etapa de Reversión, en cuyo marco el Concesionario continúa ejecutando las labores de operación y mantenimiento de la infraestructura, dentro del Plazo Máximo de la Etapa de Reversión, el cual, tratándose de una Terminación Anticipada, podrá extenderse hasta por quinientos cuarenta (540) Días contados desde la declaratoria de la causal correspondiente.

Adicionalmente, debe precisarse que el Contrato de Concesión no contempla de manera expresa el porcentaje de remuneración aplicable en escenarios de Terminación Anticipada. En consecuencia, la ANI, el Concesionario y esta Interventoría adelantan la estructuración de un Otrosí que defina el porcentaje de remuneración al cual tiene derecho el Concesionario durante la ejecución de las labores de operación y mantenimiento del corredor vial en la etapa de reversión. Dicho instrumento contractual tendrá como objeto regular las particularidades que el contrato inicial no previó y aquellas que, por su naturaleza, puedan ser homologadas, estableciendo un marco normativo complementario que busca garantizar la seguridad jurídica, técnica y financiera de las partes, así como la adecuada administración de los riesgos y obligaciones en esta fase del contrato.

Nota. La Interventoría IPAB inició su gestión el 7 de febrero de 2026. En consecuencia, los valores acumulados y la información histórica incorporados en este informe tienen como fuente los registros previamente validados por la Interventoría Consorcio CR Concesiones y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), los cuales fueron recibidos por IPAB como insumo de referencia para el seguimiento financiero del período. La Interventoría IPAB toma esta información como base de trabajo, sin que ello conlleve responsabilidad sobre la verificación de cifras correspondientes a períodos anteriores al inicio de su gestión.

8.1. ANTECEDENTES

El Contrato de Concesión No. 016 de 2015 fue suscrito el 14 de Octubre de 2015 entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la sociedad concesionaria Concesión Ruta al Mar S.A.S. De acuerdo con la certificación emitida por la firma Crowe Horwath, entidad encargada de certificar el libro oficial de accionistas, se presenta a continuación la composición accionaria de la sociedad Concesión Ruta al Mar S.A.S.

Tabla 8-2. Capital social

Capital autorizado	$2.000.000.000	**Acciones autorizadas**	700.000
Capital suscrito	$700.000.000	**Acciones suscritas y pagadas**	700.000
Capital Pagado	$700.000.000	**Valor Nominal**	1.000

Fuente: Fiduciaria Bancolombia S.A.

Tabla 8-3. Composición Accionaria Concesión Ruta al Mar

Accionista	Participación	Cantidad de Acciones
Construcciones el Cóndor S.A.	50%	350.000
Infrared Infraestructura RAM S.L.U	49.99985714%	349.999
Infrared Infraestructura RAM L.P	0.0001428571%	1
Total	**100%**	**700.000**

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Ficha General de Concesiones 4G.Ferero 2023.

8.2. INFORMACIÓN GENERAL

Fiduciaria: Fiduciaria Bancolombia S.A.
NIT: 800.150.280-0
Nombre Fideicomiso: Patrimonio Autónomo Concesión Ruta al Mar
Dirección: Cra 48 N°26-85 Torre Sur Piso 10-Medellín
Teléfono: (574) 4042354 ext 42354
Persona Contacto P.A: Jairo Alonso Ruiz Ospina
Teléfono: (574) 4042354 ext 42354
Correo: jairruiz@bancolombia.com.co

Fecha de Creación:	17/11/2015
Fideicomitente:	Concesión Ruta al Mar SAS
Nit:	900.894.996-0
Dirección:	Calle B etapa 1 kilómetro 3 vía Montería – Planeta Rica. Centro logístico industrial San Jerónimo - bodega N. 4.
Persona de Contacto:	Manuel Raigozo Rubio

8.3. SITUACIÓN DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO A CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2026.

A continuación, se expone la estructura de cuentas y subcuentas que componen el patrimonio autónomo del proyecto.

Cuentas ANI
Subcuenta Aportes ANI
Subcuenta Autónoma de Soporte Caimanera
Subcuenta Autónoma de Soporte Manguitos
Subcuenta Autónoma de Soporte
Subcuenta Perimetrales
Subcuenta Compensación por Riesgo
Subcuenta Excedentes ANI
Subcuenta Ingresos por Explotación Comercial
Subcuenta Interventoría y Supervisión
Subcuenta MASC
Subcuenta Obras Menores.
Subcuenta Recaudo Peaje
Subcuenta de Soporte Contractual
Subcuenta Supervisión Viáticos Contratos ANI

Cuentas Proyecto
Subcuenta Compensaciones Ambientales
Subcuenta Cuenta Proyecto
Subcuenta Fondo Proyecto
Subcuenta Predios
Subcuenta Redes
Subcuenta Reserva de deuda
Subcuenta Reserva O&M
Subcuenta Reserva de IDC
Subcuenta de Balance

Subcuenta Pagos O&M
Subcuenta Capex
Desembolso de Equity

8.3.1. Giros Equity

Corresponde a los aportes que el Concesionario debe transferir, como mínimo, a la Cuenta Proyecto, conforme a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato de Concesión. En este sentido, se fijó como fecha máxima para la realización del giro No. 11 el día 1.800 contado a partir de la fecha de inicio del contrato. Bajo este marco, el Concesionario dio cumplimiento al fondeo contractual en el mes de noviembre de 2020, superando los montos mínimos exigidos. No obstante, podrán efectuarse aportes adicionales a la Subcuenta Equity en la medida en que se continúe con la suscripción de contratos de crédito por parte del Concesionario.

A la fecha, por aportes Equity en dinero, se tiene un saldo de $546.721.890.699 equivalente a $434.174.966.307 pesos de enero de 2014, con un porcentaje de ejecución del 140.01% incluyendo el giro Equity N. 11 correspondiente a $310.104.308.431 pesos de enero de 2014, valor que actualmente se encuentra conciliado y certificado con extractos por la fiduciaria Bancolombia.

En relación con el mes de agosto de 2026, no se presentaron aportes.

A continuación, se relaciona el último giro de Equity efectuado durante los meses de enero y febrero de 2023, junto con el valor acumulado registrado por este concepto, evidenciándose que la subcuenta mantiene un adecuado balance.

Tabla 8-4. Balance Equity

BALANCE EQUITY				
Giro Equity No	**VR GIRO CONTRACTUAL**	**FECHA GIRO**	**VR ULT. GIRO CTE**	**VR CONSTANTES**
		31-ene-23	$ 7.300.000.000	$ 4.550.050.674
		1-feb-23	$ 7.300.000.000	$ 4.550.050.674
TOTAL ACUMULADO	**$ 310.104.308.431**		**$ 546.721.890.699**	**$ 434.174.966.307**

Anexo: 4.1 Balance Equity

Es pertinente señalar que los recursos provenientes de los giros de Equity se encuentran registrados en los estados financieros del fideicomiso como deuda subordinada dentro del pasivo. Por su parte, los aportes en especie y los aportes en dinero se reconocen en el patrimonio.

8.4. CUENTA RECAUDO DE PEAJES

La Subcuenta de Recaudo de Peajes de la ANI está destinada a recibir los recursos provenientes del cobro de peajes durante la ejecución del contrato. En esta cuenta no solo se consignan los ingresos generados por el recaudo, sino también los valores asociados a la contribución al Fondo de Seguridad Vial, así como cualquier otra sobretasa o contribución de naturaleza similar cuya destinación no corresponda directamente al proyecto.

Acorde con la información allegada a la Interventoría IPAB, el 31 de mayo de 2021 se suscribió el acta de terminación parcial de la Unidad Funcional No. 2, lo cual habilitó el inicio del derecho de recaudo para el peaje Los Manguitos a partir del 1 de junio de 2021. De igual forma, el 25 de junio de 2021 se firmó el acta de terminación de la Unidad Funcional No. 6, permitiendo que el recaudo del peaje La Caimanera fuera efectivo desde el 26 de junio de 2021.

En este contexto, durante el mes de agosto de 2026 se registró un ingreso neto por recaudo de peajes por valor de $ 25.709.955.815,95, correspondiente a las estaciones La Apartada, Mata de Caña, San Onofre, Los Cedros, El Purgatorio, San Carlos y Los Manguitos.

A continuación, se presenta el detalle del ingreso neto por estación de peaje, excluyendo los valores asociados a FOSEVI y a sobrantes de recaudo.

Tabla 8-5. Ingreso Neto por estación de peaje sin FOSEVI

Peajes	jun-26	jul-26	ago-26	Acumulado	Variación
La Apartada	$ 6.305.398.006,44	$ 6.789.455.399,60	$ 6.585.543.506,64	$ 404.505.922.629,57	-3,00%
Mata de Caña	$ 2.427.215.520,50	$ 2.550.935.255,83	$ 2.295.588.650,23	$ 180.228.256.200,23	-10,01%
San Onofre	$ 3.650.495.431,10	$ 4.522.524.274,91	$ 3.529.336.391,23	$ 235.574.904.893,30	-21,96%
Los Cedros	$ 1.295.587.393,21	$ 1.303.915.305,25	$ 1.304.007.735,11	$ 141.670.757.523,86	0,01%
Purgatorio	$ 3.371.711.431,14	$ 3.454.790.680,08	$ 3.468.577.636,43	$ 229.299.651.543,03	0,40%
San Carlos	$ 1.294.527.429,94	$ 1.374.301.019,50	$ 1.227.319.812,73	$ 60.707.124.870,64	-10,69%
Caimanera	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.033.566.629,30	0,00%

Manguitos	$ 7.047.716.842,81	$ 7.590.703.564,65	$ 7.299.582.083,58	$ 317.783.533.887,37	-3,84%
Total	**$ 25.392.652.055,14**	**$ 27.586.625.499,83**	**$ 25.709.955.815,95**	**$ 1.581.803.718.177,30**	-6,80%

Fuente: Elaboración propia

Durante el mes de agosto de 2026, el ingreso neto por recaudo de peajes del corredor Antioquia – Bolívar registró un valor de $ 25.709.955.815,95, presentando una variación de -6,80% frente al mes de julio ($ 27.586.625.499,83). Esta contracción debe interpretarse en el contexto del comportamiento estacional propio de la culminación de las vacaciones escolares, período en el que se genera un incremento atípico en el flujo vehicular que en el presente periodo se disipa progresivamente. En este sentido, la variación registrada en agosto refleja la dinámica regular del corredor, evidenciada en el ajuste general del -6.8% del ingreso mensual; a continuación, se presentan las estaciones y su correspondiente desempeño: San Onofre (-21,96%), Mata de Caña (-10,01%), San Carlos (-6,16%), Manguitos (-3,84%), Purgatorio (0,40%), Los cedros (0,01%) y La Apartada (-3%).

La estación La Caimanera continúa sin registrar recaudo, en cumplimiento de la instrucción de suspensión vigente desde el 29 de enero de 2023, impartida por el Ministerio de Transporte, como consecuencia de los bloqueos ocurridos en septiembre de 2022, los cuales derivaron en la suspensión definitiva del cobro de peajes para todas las categorías. Esta decisión fue anunciada por el entonces ministro de transporte, Guillermo Francisco Reyes, el 27 de enero de 2023, en reunión llevada a cabo en el municipio de Tolú.

En términos acumulados, el proyecto registra a corte de agosto de 2026 un ingreso neto de $ 1.581.803.718.177,30.

Nota. Es preciso indicar que, en el saldo correspondiente a corte de agosto de 2026, en la cuenta de recaudo se está incluyendo el excedente del 2% como mecanismo de compensación por riesgo, aprobado con el incremento de tarifas realizado en enero de 2016, cuya destinación es la atención de los riesgos materializados. Lo anterior, en virtud de la Resolución No. 20253040018105 del 14 de mayo de 2025, emitida por el Ministerio de Transporte.

A continuación, se muestra el recaudo desagregado por estación de peaje:

Tabla 8-6. Recaudo por estación de peaje

RECAUDO AGOSTO 2026				
Concepto	**La Apartada**	**Mata de Caña**	**San Onofre**	**Los Cedros**
Recaudado Bruto	$ 6.740.810.300,00	$ 2.373.569.300,00	$ 3.611.945.500,00	$ 1.349.765.000,00
Fondo de Seguridad Vial	$ 96.642.833,00	$ 57.531.908,00	$ 51.191.210,00	$ 34.134.478,00
Sobrante	$ 132.100,00	$ 11.700,00	$ 107.700,00	$ 111.800,00
Incremento tarifas	$ 130.394.094,00	$ 43.954.973,00	$ 69.876.649,00	$ 24.209.756,00
Ingreso Neto	$ 6.644.299.567,00	$ 2.316.049.092,00	$ 3.560.861.990,00	$ 1.315.742.322,00
Ingreso menos sobrante	$ 6.644.167.467,00	$ 2.316.037.392,00	$ 3.560.754.290,00	$ 1.315.630.522,00
Total a Consignar	$ 6.740.942.400,00	$ 2.373.581.000,00	$ 3.612.053.200,00	$ 1.349.876.800,00
Total a Consignar sin sobrantes	$ 6.740.678.200,00	$ 2.373.557.600,00	$ 3.611.837.800,00	$ 1.349.653.200,00
0,9% Cuenta Autónoma Soporte	$ 58.623.960,36	$ 20.448.741,77	$ 31.417.898,77	$ 11.622.786,89
Ingreso Formato Recaudo Peaje ANI	$ 6.585.543.506,64	$ 2.295.588.650,23	$ 3.529.336.391,23	$ 1.304.007.735,11

RECAUDO AGOSTO 2026				
Concepto	**Purgatorio**	**San Carlos**	**Manguitos**	**Caimanera**
Recaudado Bruto	$ 3.593.741.900,00	$ 1.264.940.600,00	$ 7.472.519.700,00	$ 0,00
Fondo de Seguridad Vial	$ 94.254.979,00	$ 26.694.969,00	$ 107.942.282,00	$ 0,00
Sobrante	$ 49.200,00	$ 13.200,00	$ 157.800,00	$ 0,00
Incremento tarifas	$ 65.121.969,00	$ 24.265.823,00	$ 142.873.594,00	$ 0,00
Ingreso Neto	$ 3.499.536.121,00	$ 1.238.258.831,00	$ 7.364.735.218,00	$ 0,00
Ingreso menos sobrante	$ 3.499.486.921,00	$ 1.238.245.631,00	$ 7.364.577.418,00	$ 0,00
Total a Consignar	$ 3.593.791.100,00	$ 1.264.953.800,00	$ 7.472.677.500,00	$ 0,00
Total a Consignar sin sobrantes	$ 3.593.692.700,00	$ 1.264.927.400,00	$ 7.472.361.900,00	$ 0,00
0,9% Cuenta Autónoma Soporte	$ 30.909.284,57	$ 10.925.818,27	$ 64.995.334,42	$ 0,00
Ingreso Formato Recaudo Peaje ANI	$ 3.468.577.636,43	$ 1.227.319.812,73	$ 7.299.582.083,58	$ 0,00

De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución No. 20253040018105 del 14 de mayo de 2025, a partir del 16 de enero de 2026 las tarifas aplicables en las estaciones de peaje del contrato sin incluir las tarifas especiales, se incrementaron en un 2% adicional al IPC.

No obstante, este porcentaje adicional tiene carácter de mecanismo de compensación por riesgo, por lo cual no es reconocido como ingreso del Concesionario ni considerado dentro del cálculo del VPIP. En consecuencia, los recursos generados por dicho incremento serán transferidos a la Subcuenta Autónoma de Soporte.

En virtud de lo anterior, el valor acumulado recaudado por este concepto para los primeros 8 meses de 2026 asciende a $3.603.469.288, de los cuales:

$500.696.858 pertenecen a agosto, $537.811.547 corresponden a julio, $494.391.931 son el resultado de junio; $467.274.865 pertenecen a mayo, $496.310.367 son producto de abril; $400.648.917 corresponden a marzo de 2026; $421.199.618 a febrero; y $285.135.185 al período comprendido entre el 16 y el 31 de enero de 2026. No se incluyen tarifas especiales.

8.4.1. Subcuenta Recaudo de Peajes

A continuación, se detalla el comportamiento de los ingresos y egresos de la Subcuenta de Recaudo de Peajes.

Tabla 8-7. Ingresos y egresos de la Subcuenta de Recaudo de Peajes

SUBCUENTA	SALDO A 31 JULIO	INGRESO	EGRESO	SALDO A 31 AGOSTO
Recaudo de Peaje	$ 24.795.031.257,54	$ 26.275.255.243,68	$ 27.684.403.394,93	$ 23.385.883.106,29

ANEXO: 4.2 Recaudo de Peajes

Asimismo, los cuadros de ingresos y egresos de las Subcuentas de Peajes de: La Apartada, Mata de Caña, San Onofre, El Purgatorio, Los Cedros, San Carlos, Los Manguitos y La Caimanera.

Tabla 8-8. Ingresos y egresos de las Subcuentas de Peaje desagregados

SUBCUENTA	SALDO FINAL A 31 JULIO	INGRESO	EGRESO	SALDO FINAL A 31 AGOSTO
La Apartada	$ 2.460.778.850,61	$ 2.816.383.485,34	$ 2.686.075.844,43	$ 2.591.086.491,52
San Onofre	$ 1.848.800.338,66	$ 1.684.650.886,27	$ 1.971.827.024,91	$ 1.561.624.200,02
Mata de Caña	$ 1.359.888.744,55	$ 1.336.663.678,81	$ 1.418.470.040,80	$ 1.278.082.382,56
Purgatorio	$ 1.910.725.743,63	$ 2.108.257.562,71	$ 2.033.211.999,84	$ 1.985.771.306,50
Cedros	$ 878.997.216,68	$ 957.683.976,45	$ 931.346.521,30	$ 905.334.671,83
San Carlos	$ 651.783.290,28	$ 633.226.369,34	$ 681.217.323,22	$ 603.792.336,40
Manguitos	$ 2.624.125.588,57	$ 2.958.813.281,72	$ 2.863.878.255,86	$ 2.719.060.614,43
Caimanera	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Total	**$ 11.735.099.773**	**$ 12.495.679.241**	**$ 12.586.027.010**	**$ 11.644.752.003**

ANEXOS: 4.2 La Apartada, San Onofre, Mata De Caña, Purgatorio, Cedros, San Carlos, Manguitos Y Caimanera.

En las subcuentas asociadas a las estaciones de peaje no se registran partidas conciliatorias correspondientes a sobrantes derivados de la modalidad de recaudo. Dichos valores, cuando se presentan corresponden a recursos que deben ser reintegrados a los usuarios, en los casos en que se haya presentado doble cobro en la transacción.

Mediante comunicación CI.023/AB14377/25/7.5.9 del 16 de diciembre de 2025, la Interventoría Consorcio CR Concesiones indicó que dichas partidas conciliatorias deberían ser reintegradas en un plazo máximo de tres (3) meses, contados a partir de la fecha de su ingreso.

En este sentido, se solicitó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) impartir la instrucción pertinente para trasladar a la Subcuenta de Excedentes ANI aquellos recursos que, transcurrido el plazo de tres (3) meses, no hayan sido reclamados ni reintegrados a los usuarios.

A continuación, se presenta el resumen de ingresos por Unidad Funcional con corte a agosto de 2026, el cual incorpora el recaudo con FOSEVI, los rendimientos financieros generados y el porcentaje de compensación por riesgos (0,9%).

Tabla 8-9. Resumen de ingresos por Unidad Funcional con FOSEVI

RESUMEN SUBCUENTA PEAJE POR UNIDAD FUNCIONAL					
CTA 24580302463		CTA 24580302617		CTA 24580302552	
UF 1		UF 2		UF 3	
Año 2016	$ 5.712.583.624,65	Año 2016	$ 3.793.483.450,75	Año 2016	$ 3.935.086.959,49
Año 2017	$ 20.202.426.096,19	Año 2017	$ 13.415.529.578,15	Año 2017	$ 13.916.305.721,45
Año 2018	$ 12.881.787.677,02	Año 2018	$ 8.505.931.142,25	Año 2018	$ 8.823.441.481,09
Año 2019	$ 15.369.918.020,36	Año 2019	$ 10.462.994.003,22	Año 2019	$ 10.475.580.648,04
Año 2020	$ 12.068.976.756,05	Año 2020	$ 9.108.468.704,94	Año 2020	$ 8.464.244.453,64
Año 2021	$ 21.783.868.729,84	Año 2021	$ 15.111.635.761,15	Año 2021	$ 15.033.181.205,64
Año 2022	$ 29.954.045.821,85	Año 2022	$ 21.870.213.667,20	Año 2022	$ 20.633.706.709,92
Año 2023	$ 30.312.245.351,03	Año 2023	$ 23.464.907.346,44	Año 2023	$ 20.880.450.808,75
Año 2024	$ 34.591.644.201,14	Año 2024	$ 25.252.578.730,48	Año 2024	$ 23.828.126.004,75
Año 2025	$ 40.749.607.811,48	Año 2025	$ 29.316.338.426,79	Año 2025	$ 28.739.587.871,59
ene-26	$ 4.138.512.209,72	ene-26	$ 2.955.848.754,38	ene-26	$ 2.850.792.371,58
feb-26	$ 4.587.695.373,15	feb-26	$ 3.252.478.440,48	feb-26	$ 3.160.212.812,55
mar-26	$ 3.301.029.020,58	mar-26	$ 2.431.810.575,83	mar-26	$ 2.273.898.651,37
abr-26	$ 3.145.168.795,06	abr-26	$ 2.343.994.721,85	abr-26	$ 2.170.284.760,82
may-26	$ 3.880.684.424,76	may-26	$ 2.850.089.541,68	may-26	$ 2.673.223.552,37
jun-26	$ 3.670.500.847,11	jun-26	$ 2.705.532.492,64	jun-26	$ 2.528.423.372,71
jul-26	$ 3.897.041.638,69	**jul-26**	$ 2.868.484.747,50	**jul-26**	$ 2.684.459.616,94
ago-26	$ 4.260.805.023,84	**ago-26**	$ 3.114.424.617,95	**ago-26**	$ 2.935.036.358,29
Total	**$ 254.508.541.422,52**	**Total**	**$ 182.824.744.703,68**	**Total**	**$ 176.006.043.360,99**

RESUMEN SUBCUENTA PEAJE POR UNIDAD FUNCIONAL					
CTA 24580302668		CTA 24580302714		CTA 24580303036	
UF 4		UF 5		UF 6	
Año 2016	$ 2.858.155.016,36	Año 2016	$ 3.264.333.499,58	Año 2016	$ 5.783.385.377,89
Año 2017	$ 10.107.771.350,73	Año 2017	$ 11.544.208.192,26	Año 2017	$ 20.452.814.934,98
Año 2018	$ 6.186.283.842,94	Año 2018	$ 6.981.760.324,17	Año 2018	$ 12.967.785.208,03
Año 2019	$ 7.223.356.192,76	Año 2019	$ 8.219.839.810,77	Año 2019	$ 15.951.440.760,48
Año 2020	$ 6.040.190.055,45	Año 2020	$ 6.897.202.402,64	Año 2020	$ 13.886.388.440,08
Año 2021	$ 10.899.039.344,29	Año 2021	$ 12.447.924.987,79	Año 2021	$ 22.988.222.546,38
Año 2022	$ 14.986.792.656,55	Año 2022	$ 17.116.597.611,75	Año 2022	$ 31.485.839.912,75
Año 2023	$ 15.166.009.251,61	Año 2023	$ 17.321.283.056,87	Año 2023	$ 32.723.267.070,07
Año 2024	$ 17.306.981.671,55	Año 2024	$ 19.766.513.617,25	Año 2024	$ 36.944.902.592,69
Año 2025	$ 20.388.033.979,46	Año 2025	$ 23.285.420.816,41	Año 2025	$ 43.240.257.791,38
ene-26	$ 2.070.605.913,05	ene-26	$ 2.364.864.119,77	ene-26	$ 4.376.245.150,27
feb-26	$ 2.295.343.999,40	feb-26	$ 2.621.540.213,14	feb-26	$ 4.829.522.818,39
mar-26	$ 1.651.591.166,79	mar-26	$ 1.886.302.297,43	mar-26	$ 3.557.247.296,18
abr-26	$ 1.573.610.218,97	abr-26	$ 1.797.239.311,38	abr-26	$ 3.414.683.317,16
may-26	$ 1.941.607.928,08	may-26	$ 2.217.533.956,95	may-26	$ 4.174.034.915,38
jun-26	$ 1.836.447.586,20	jun-26	$ 2.097.429.055,44	jun-26	$ 3.956.752.514,72
jul-26	$ 1.949.791.870,04	jul-26	$ 2.226.880.936,32	jul-26	$ 4.197.328.287,64
ago-26	$ 2.131.792.206,84	ago-26	$ 2.434.745.727,83	ago-26	$ 4.569.533.254,45
Total	**$ 126.613.404.251,07**	**Total**	**$ 144.491.619.937,75**	**Total**	**$ 269.499.652.188,92**

RESUMEN SUBCUENTA PEAJE POR UNIDAD FUNCIONAL				
CTA 24580302889		CTA 24580309310		
UF 7		UF 8		TOTAL
Año 2016	$ 5.377.206.894,70	Año 2016	$ 6.539.846.223,82	Año 2016	$ 37.264.081.047,24
Año 2017	$ 19.016.562.998,42	Año 2017	$ 23.128.252.207,14	Año 2017	$ 131.783.871.079,32
Año 2018	$ 12.057.036.432,20	Año 2018	$ 14.663.963.229,00	Año 2018	$ 83.067.989.336,70
Año 2019	$ 14.831.144.035,94	Año 2019	$ 18.037.877.881,63	Año 2019	$ 100.572.151.353,20
Año 2020	$ 12.911.123.780,04	Año 2020	$ 15.702.718.111,47	Año 2020	$ 85.079.312.704,31
Año 2021	$ 21.527.379.076,48	Año 2021	$ 25.863.343.689,70	Año 2021	$ 145.654.595.341,27
Año 2022	$ 32.179.424.560,64	Año 2022	$ 35.219.754.131,66	Año 2022	$ 203.446.375.072,32

RESUMEN SUBCUENTA PEAJE POR UNIDAD FUNCIONAL					
CTA 24580302889		CTA 24580309310			
UF 7		UF 8		TOTAL	
Año 2023	$ 34.515.139.225,68	Año 2023	$ 36.688.463.300,15	Año 2023	$ 211.071.765.410,60
Año 2024	$ 36.244.374.302,76	Año 2024	$ 41.460.234.857,61	Año 2024	$ 235.395.355.978,23
Año 2025	$ 42.161.796.988,70	Año 2025	$ 48.568.045.736,37	Año 2025	$ 276.449.089.422,18
ene-26	$ 4.252.665.531,94	ene-26	$ 4.917.697.704,97	ene-26	$ 27.927.231.755,68
feb-26	$ 4.672.628.244,36	feb-26	$ 5.430.503.768,63	feb-26	$ 30.849.925.670,10
mar-26	$ 3.519.531.735,27	mar-26	$ 3.986.777.240,43	mar-26	$ 22.608.187.983,88
abr-26	$ 3.399.248.264,49	abr-26	$ 3.823.490.957,91	abr-26	$ 21.667.720.347,64
may-26	$ 4.122.548.096,00	may-26	$ 4.679.254.396,25	may-26	$ 26.538.976.811,47
jun-26	$ 3.916.154.844,08	jun-26	$ 4.434.289.090,36	jun-26	$ 25.145.529.803,26
jul-26	$ 4.150.936.903,20	jul-26	$ 4.704.459.837,46	jul-26	$ 26.679.383.837,79
ago-26	$ 4.500.878.227,05	ago-26	$ 5.124.695.235,58	ago-26	$ 29.071.910.651,83
Total	**$ 263.355.780.141,95**	**Total**	**$ 302.973.667.600,14**	**Total**	**$ 1.720.273.453.607,02**

Fuente. Fiduciaria Bancolombia S.A.

8.4.2. Subcuenta Recaudo Peaje Retenciones Otrosí N. 17

Durante el mes de junio de 2025, la ANI solicitó la apertura de una nueva subcuenta de ahorros denominada “Recaudo de Peajes – Retenciones Otrosí 17”, con el fin de trasladar a esta los recursos correspondientes a retenciones asociadas a la Unidad Funcional 3 y 8.

Dichas retenciones se efectúan en cumplimiento de lo establecido en el Otrosí 17 del Contrato de Concesión, y se originan en incumplimientos prediales, en la medida en que algunos predios correspondientes a las Unidades Funcionales 3 y 8 aún se encuentran en proceso de gestión predial.

En este contexto, los predios involucrados se encuentran en diferentes etapas del proceso de adquisición, incluyendo casos en proceso de expropiación, predios con demandas admitidas y otros con sentencias judiciales ya proferidas, las cuales se encuentran pendientes de ejecución para que dichos predios puedan ser considerados formalmente adquiridos.

Tabla 8-10. Subcuenta Recaudo Peaje Retenciones Otrosí N. 17

SUBCUENTA	SALDO A 31 JULIO	INGRESO	EGRESO	SALDO A 31 AGOSTO
Retenciones Otrosí 17	$ 2.960.125.183,40	$ 25.192.434,32	$ 25.002.490,22	$ 2.960.315.127,50

ANEXOS: 4.2 Subcuenta Recaudo Peaje Retenciones OtroSí N. 17.

Para el mes de agosto de 2026, se registró un ingreso total por valor de $ 25.192.434,32, compuesto por rendimientos financieros.

Por otra parte, durante el mismo periodo se registró un egreso por valor de $ 25.002.490,22, correspondiente al traslado de rendimientos a la Subcuenta Excedentes ANI.

Es importante indicar que, el 10 de marzo del año 2026 se realizó el reintegro de $1.082.063.105 pesos, monto retenido en cumplimiento de las directrices asociadas el Otrosí 17, correspondientes al predio CAB- 3-1-001 por razón de incumplimiento del Índice predial asociado al desistimiento tácito, una vez el Concesionario presentó los soportes que sustentaron el predio como adquirido, se procedió a solicitar a la Agencia el retorno de los recursos anteriormente mencionados.

A continuación, se presenta tabla con las retenciones que le fueron aplicadas al predio anteriormente mencionado; es preciso señalar que, en estricta aplicación del otrosí, los rendimientos producto de las retenciones serán dirigidos a la Subcuenta de Excedentes ANI.

Tabla 8-11. Reintegro por desistimiento tácito CAB-3-1-001

UNIDAD FUNCIONAL	ACTA#	MES - AÑO	PREDIOS CON DESISTIMIENTO TÁCITO	VALOR RETRIBUCIÓN POR CADA PERIODO	% de Retención de la Retribución UF por el Año 2	RETENCIÓN	RENDIMIENTOS	RETENCIÓN + RENDIMIENTOS
UF3	53	feb-25	1	$ 2.101.794.294,22	5%	$ 105.089.714,71	$ 2.014.479,00	$ 107.104.193,71
UF3	53	mar-25	1	$ 2.251.748.006,37	5%	$ 112.587.400,32	$ 1.412.027,00	$ 113.999.427,32
UF3	53	abr-25	1	$ 2.364.719.613,61	5%	$ 118.235.980,68	$ 564.006,00	$ 118.799.986,68
UF3	53	may-25	1	$ 2.201.131.844,24	5%	$ 110.056.592,21	$ 0,00	$ 110.056.592,21
UF3	53	jun-25	1	$ 2.351.817.503,83	5%	$ 117.590.875,19	$ 0,00	$ 117.590.875,19
Subtotal	**53**	**jun-25**				**$ 563.560.563,11**	**$ 3.990.512,00**	**$ 567.551.075,11**

UF3	54	jul-25	1	$ 2.381.319.679,17	5%	$ 119.065.983,96	$ 0,00	$ 119.065.983,96
UF3	55	ago-25	1	$ 2.382.031.336,88	5%	$ 119.101.566,84	$ 0,00	$ 119.101.566,84
UF3	56	sep-25	1	$ 2.196.091.701,92	6%	$ 131.765.502,12	$ 0,00	$ 131.765.502,12
UF3	57	oct-25	1	$ 2.476.158.151,31	6%	$ 148.569.489,08	$ 0,00	$ 148.569.489,08
		TOTAL				**$ 1.082.063.105,11**	**$ 3.990.512,00**	**$ 1.086.053.617,11**

Posteriormente, se detallan las actas correspondientes a las Unidades Funcionales 3 y 8 a las cuales se les ha efectuado deducciones y retenciones:

Tabla 8-12. Aplicación de Deducciones UF3 – Otrosí 17

DEDUCCIONES UF3 APLICADAS SEGUN OTROSÍ 17								
UNIDAD FUNCIONAL	ACTA #	# PERIODO	MES - AÑO	PREDIOS NO ADQUIRIDOS	VALOR DEDUCCIÓN POR CADA PREDIO	DEDUCCIONES INDICE DE CUMPLIMIENTO PREDIAL	RENDIMIENTOS	DICP + RENDIMIENTOS
UF3	52	1	sep-23	18	$ 2.320.000,00	$ 41.760.000,00	$ 6.873.086,92	$ 48.633.086,92
UF3	52	2	oct-23	18	$ 2.320.000,00	$ 41.760.000,00	$ 6.403.047,04	$ 48.163.047,04
UF3	52	3	nov-23	18	$ 2.320.000,00	$ 41.760.000,00	$ 5.866.148,23	$ 47.626.148,23
UF3	52	4	dic-23	18	$ 2.320.000,00	$ 41.760.000,00	$ 5.513.203,15	$ 47.273.203,15
UF3	52	5	ene-24	18	$ 2.600.000,00	$ 46.800.000,00	$ 5.594.078,12	$ 52.394.078,12
UF3	52	6	feb-24	16	$ 2.600.000,00	$ 41.600.000,00	$ 4.529.109,88	$ 46.129.109,88
UF3	52	7	mar-24	12	$ 2.600.000,00	$ 31.200.000,00	$ 3.157.827,80	$ 34.357.827,80
UF3	52	8	abr-24	12	$ 2.600.000,00	$ 31.200.000,00	$ 2.769.348,46	$ 33.969.348,46
UF3	52	9	may-24	12	$ 2.600.000,00	$ 31.200.000,00	$ 2.500.193,84	$ 33.700.193,84
UF3	52	10	jun-24	13	$ 2.600.000,00	$ 33.800.000,00	$ 2.474.561,10	$ 36.274.561,10
UF3	52	11	jul-24	13	$ 2.600.000,00	$ 33.800.000,00	$ 2.147.935,05	$ 35.947.935,05
UF3	52	12	ago-24	13	$ 2.600.000,00	$ 33.800.000,00	$ 1.877.098,94	$ 35.677.098,94
TOTAL						**$ 450.440.000,00**	**$ 49.705.638,53**	**$ 500.145.638,53**

Tabla 8-13. Retenciones Índice de Cumplimiento Predial UF3 y UF 8

RETENCIONES UF3 y UF8 OTROSÍ17 - 7.1(g)(iii)										
UNIDAD FUNCIONAL	ACTA#	# PERIODO	MES - AÑO	PREDIOS NO ADQUIRIDOS	VALOR RETRIBUCIÓN PERIODO	% DE RETENCIÓN DE LA RETRIBUCIÓN IF3	RETENCIONES POR INDICE DE CUMPLIMIENTO PREDIAL	RENDIMIENTOS	RICP + RENDIMIENTOS	FECHA DE PAGO
UF3	52	1	sep-24	11	$ 1.970.487.937,72	3%	$ 59.114.638,13	$ 2.855.081,77	$ 61.969.719,90	
UF3	52	2	oct-24	13	$ 2.065.363.388,56	3%	$ 61.960.901,66	$ 2.467.930,73	$ 64.428.832,39	
UF3	52	3	nov-24	13	$ 2.026.412.124,33	3%	$ 60.792.363,73	$ 1.991.113,12	$ 62.783.476,85	
UF3	52	4	dic-24	13	$ 2.333.109.588,08	3%	$ 69.993.287,64	$ 1.805.671,11	$ 71.798.958,75	
UF3	52	5	ene-25	13	$ 2.685.656.675,48	3%	$ 80.569.700,26	$ 1.521.937,69	$ 82.091.637,95	
UF3	52	6	feb-25	13	$ 2.101.794.294,22	3%	$ 63.053.828,83	$ 773.291,26	$ 63.827.120,08	
UF3	52	7	mar-25	12	$ 2.251.748.006,37	3%	$ 67.552.440,19	$ 383.789,39	$ 67.936.229,58	
UF3	52	8	abr-25	12	$ 2.364.719.613,61	3%	$ 70.941.588,41	$ -	$ 70.941.588,41	
UF3	52	9	may-25	12	$ 2.201.131.844,24	3%	$ 66.033.955,33	$ -	$ 66.033.955,33	
Subtotal	**52**						**$ 600.012.704,18**	**$ 11.798.815,07**	**$ 611.811.519,24**	22-jul-25
UF3	53	10	jun-25	10	$ 2.351.817.503,83	3%	$ 70.554.525,11	$ -	$ 70.554.525,11	20-ago-25
UF3	54	11	jul-25	10	$ 2.381.319.679,17	3%	$ 71.439.590,38	$ -	$ 71.439.590,38	11-sep-25
UF3	55	12	ago-25	10	$ 2.382.031.336,88	3%	$ 71.460.940,11	$ -	$ 71.460.940,11	9-oct-25
UF3	56	13	sep-25	10	$ 2.196.091.701,92	5%	$ 109.804.585,10	$ -	$ 109.804.585,10	14-nov-25
UF3	57	14	oct-25	10	$ 2.476.158.151,31	5%	$ 123.807.907,57	$ -	$ 123.807.907,57	12-dic-25
UF3	58	15	nov-25	10	$ 2.356.953.933,71	5%	$ 117.847.696,69	$ -	$ 117.847.696,69	9-ene-26
UF3	59	16	dic-25	1	$ 2.851.865.529,91	5%	$ 142.593.276,50	$ -	$ 142.593.276,50	13-feb-26
UF3	60	17	ene-26	1	$ 3.156.361.555,29	5%	$ 157.818.077,76	$ -	$ 157.818.077,76	13-mar-26
UF3	61	18	feb-26	3	$ 2.273.636.990,41	5%	$ 113.681.849,52	$ -	$ 113.681.849,52	16-abr-26
UF3	62	19	mar-26	3	$ 2.172.712.298,90	5%	$ 108.635.614,95	$ -	$ 108.635.614,95	Pendiente
UF3	63	20	abr-26	3	$ 2.673.733.233,83	5%	$ 133.686.661,69	$ -	$ 133.686.661,69	Pendiente

RETENCIONES UF3 y UF8 OTROSÍ17 - 7.1(g)(iii)										
UNIDAD FUNCIONAL	ACTA#	# PERIODO	MES - AÑO	PREDIOS NO ADQUIRIDOS	VALOR RETRIBUCIÓN PERIODO	% DE RETENCIÓN DE LA RETRIBUCIÓN IF3	RETENCIONES POR INDICE DE CUMPLIMIENTO PREDIAL	RENDIMIENTOS	RICP + RENDIMIENTOS	FECHA DE PAGO
						TOTAL	**$1.821.343.429,54**	**$11.798.815,07**	**$1.833.142.244,60**	

RETENCIONES UF3 y UF8 OTROSÍ17 - 7.1(g)(iii)										
UF8	52	1	jul-25	1	$ 3.716.589.254,42	6%	$ 222.995.355,00	$ 1.012.958,08	$ 224.008.313,08	
UF8	52	2	ago-25	1	$ 3.839.824.320,75	6%	$ 230.389.459,00	$ 0,00	$ 230.389.459,00	
UF8	52	3	sep-25	1	$ 3.444.278.635,56	6%	$ 206.656.718,00	$ 0,00	$ 206.656.718,00	
Subtotal	**52**						**$ 660.041.532,00**	**$ 1.012.958,08**	**$ 661.054.490,08**	14-nov-25
UF8	53	4	oct-25	1	$ 3.870.138.703,09	6%	$ 232.208.322,00	$ 0,00	$ 232.208.322,00	12-dic-25
UF8	54	5	nov-25	1	$ 3.692.156.820,57	6%	$ 221.529.409,00	$ 0,00	$ 221.529.409,00	9-ene-26
						TOTAL	**$ 1.113.779.263,00**	**$ 1.012.958,08**	**$1.114.792.221,08**	

Fuente. Elaboración propia

* En la UF8 no se realizaron más retenciones por este concepto, actualmente se está a la espera de los soportes del Concesionario, que acrediten que el predio se encuentra adjudicado o cubierto por una de las exclusiones

En virtud del Laudo Arbitral CIRD No. 01-23-0002-8303, proferido el 30 de abril de 2026 por el Tribunal de Arbitramento constituido ante el Centro Internacional de Resolución de Disputas (CIRD) y cuya aplicación se dio a partir del 2 de mayo del mismo año, se declaró la Terminación Anticipada del Contrato de Concesión con fundamento en las cuatro causales invocadas por la parte convocante, todas ellas atribuibles a incumplimientos contractuales imputables a la ANI. En consecuencia, el contrato entró en la etapa de reversión y, por tanto, las actas de Retribución y de Compensación Especial dejan de ser aplicables, al igual que el Otrosí No. 17 relativo al Índice de Cumplimiento Predial, dado que estas figuras corresponden únicamente a la ejecución ordinaria del contrato. Por lo anterior, la información remitida tiene como fecha de corte abril de 2026, en concordancia con la terminación anticipada y el inicio del proceso de reversión, conforme a la aplicación de la Fórmula de Terminación Anticipada prevista en la Sección 18.4 del Contrato.

Por otra parte, mediante Decisión del 10 de septiembre de 2026, adoptada por unanimidad dentro del trámite 166172, el Panel de Amigables Componedores Permanente, convocado ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, resolvió la controversia planteada por la Concesión Ruta al Mar S.A.S. frente a la ANI respecto de las deducciones y retenciones aplicadas a la Retribución de la UF3 en virtud del Otrosí No. 17 (Índice de Cumplimiento Predial).

El Panel declaró que conserva competencia hasta la suscripción del Acta de Liquidación y que fueron improcedentes las deducciones practicadas sobre diecinueve (19) predios reconocidos como adquiridos, así como las retenciones aplicadas a los predios CAB-3-1-009, CAB-3-4-002, CAB-3-4-010, CAB-3-5-031 y CAB-3-5-043A, ordenando su cese y devolución debidamente actualizada. Respecto del predio CAB-3-5-045, declaró improcedentes las deducciones efectuadas entre el 22 de septiembre de 2023 y el 22 de septiembre de 2024 y la retención posterior al periodo de prórroga; para el predio CAB-3-5-046 determinó que, a partir de mayo de 2025, sí procede la retención, sin lugar a devolución. En consecuencia, ordenó a la ANI reliquidar la Retribución de la UF3 excluyendo de la base del Índice de Cumplimiento Predial los predios y periodos reconocidos, y devolver las sumas correspondientes con los intereses remuneratorios de la Sección 3.7 de la Parte General y su actualización, las cuales deberán contabilizarse como cuentas pendientes a favor del Concesionario y reflejarse en el Acta de Liquidación del Contrato. Finalmente, aceptó el desistimiento sobre los predios CAB-3-2-025A y CAB-3-2-027A y negó la totalidad de las solicitudes de la ANI.

8.4.3. Subcuenta Interventoría y Supervisión

Los recursos disponibles en la Subcuenta Interventoría y Supervisión se destinan a la atención de los pagos correspondientes al Interventor y a la supervisión del Contrato.

Los rendimientos financieros generados por las operaciones de tesorería realizadas con cargo a los recursos de esta subcuenta serán transferidos mensualmente a la Subcuenta Obras Menores. Así mismo, los recursos remanentes que no sean requeridos para el pago del Interventor o del Supervisor del Contrato podrán ser transferidos a la Subcuenta Excedentes ANI al finalizar el contrato, siempre que medie instrucción expresa y por escrito de la ANI.

A la fecha, y en cumplimiento de las obligaciones a su cargo, el Concesionario ha realizado aportes por un valor total de $72.077.180.517 M/CTE.

Tabla 8-14. Subcuenta Interventoría y Supervisión

SUBCUENTA INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN				
Subcuenta	Aporte total en precios constantes	Fondeo total en precios ctes	Fecha de último fondeo	Fondeo a precios corrientes
Subcuenta interventoría y supervisión	$53.361.384.052	$ 72.077.180.517	25-Sep-25	$ 5.357.561.116

ANEXO: 4.18 Fondeos

A continuación, se presentan los ingresos y egresos realizados en el mes de agosto de 2026.

Tabla 8-15. Subcuenta de Interventoría y Supervisión. Ingresos y egresos

SUBCUENTA	SALDO A 31 JULIO	INGRESO	EGRESO	SALDO A 31 AGOSTO
Interventoría y supervisión	$ 2.839.386.617,76	$ 23.566.698,85	$ 1.145.085.674,38	$ 1.717.867.642,23

ANEXO: 4.3 Interventoría y Supervisión.

8.4.4. Subcuenta Viáticos Contratos ANI

De conformidad con las instrucciones impartidas por la ANI respecto de la Subcuenta Viáticos Contratos ANI, se procede a realizar el registro correspondiente de las operaciones asociadas a dicha subcuenta.

Los rendimientos financieros generados por las operaciones de tesorería realizadas con cargo a los recursos de esta subcuenta serán transferidos mensualmente a la Subcuenta Obras Menores.

A continuación, se presentan los ingresos y egresos registrados con corte al mes de agosto de 2026.

Tabla 8-16. Subcuenta Viáticos Contratos ANI

SUBCUENTA	SALDO A 31 JULIO	INGRESO	EGRESO	SALDO A 31 AGOSTO
Viáticos Contratos ANI	$ 557.768.756,33	$ 4.752.790,39	$ 3.956.823,04	$ 558.564.723,68

ANEXO: 4.4 Supervisión y Viat.

8.4.5. Subcuenta Soporte Contractual

Los recursos depositados en la Subcuenta de Soporte Contractual se destinan a atender los costos y gastos requeridos para el desarrollo de actividades de carácter técnico y de auditoría, orientadas al seguimiento técnico a cargo de la ANI, así como al trámite y apoyo en la gestión, control y/o supervisión de los procesos relacionados con la obtención de licencias ambientales, consultas previas y demás permisos necesarios para la adecuada ejecución del proyecto.

Los rendimientos financieros generados por las operaciones de tesorería realizadas con cargo a los recursos de esta subcuenta serán transferidos mensualmente a la Subcuenta Obras Menores.

A la fecha, el Concesionario ha realizado aportes a la Subcuenta de Soporte Contractual por un valor total de $5.448.000.642 M/CTE. De acuerdo con el cronograma establecido, el próximo fondeo se encontraba programado para el 17 de diciembre de 2026. No obstante, en virtud del Laudo Arbitral CIRD No. 01 23 0002 8303, proferido el 30 de abril de 2026 por el Tribunal de Arbitramento constituido ante el Centro Internacional de Resolución de Disputas (CIRD) y cuya aplicación se dio a partir del 2 de mayo del mismo año, se declaró la Terminación Anticipada del Contrato de Concesión En consecuencia, el contrato entró en la etapa de reversión los fondeos a las subcuentas dejan de ser aplicables, dado que estas figuras corresponden únicamente a la etapa de ejecución ordinaria del contrato.

Tabla 8-17. Subcuenta Soporte Contractual

Subcuenta Soporte Contractual				
Subcuenta	**Aporte total en precios constantes**	**Fondeo total en precios Ctes**	**Fecha de último fondeo**	**Fondeo a precios corrientes**
Subcuenta Soporte contractual	$ 3.868.915.600	$5.448.000.642	27-Nov-25	$ 667.629.350

ANEXO: 4.18 Fondeos

A continuación, se presentan los ingresos y egresos de la subcuenta con corte al mes de agosto de 2026.

Tabla 8-18. Subcuenta Soporte Contractual ingresos y egresos

SUBCUENTA	SALDO A 31 JULIO	INGRESO	EGRESO	SALDO A 31 AGOSTO
Soporte Contractual	$ 4.976.544.347,59	$ 42.353.364,61	$ 42.034.287,64	$ 4.976.863.424,56

ANEXO: 4.5 Soporte Contractual.

8.4.6. Subcuenta Autónoma De Soporte

La Subcuenta Autónoma de Soporte fue creada con ocasión de la suscripción del Contrato de Fiducia Mercantil y se fondea con recursos provenientes de las siguientes fuentes: (i) el Porcentaje de Compensación por Riesgos, correspondiente al cero punto nueve por ciento (0,9%), el cual se recauda hasta la terminación del Contrato, y (ii) el recaudo de peajes de las nuevas estaciones, desde su instalación y hasta la fecha de suscripción del Acta de Terminación de Unidad Funcional o del Acta Parcial de Terminación de Unidad Funcional a la que se encuentre asociada la respectiva estación de peaje, según corresponda.

Los recursos disponibles en la Subcuenta Autónoma de Soporte se destinan, conforme a lo establecido en la Sección 3.2 del Contrato de Concesión, a atender los riesgos compartidos en la porción a cargo de la ANI o aquellos asignados en su totalidad a dicha entidad, en los términos definidos en el Contrato.

Tabla 8-19. Subcuenta Autónoma De Soporte

SUBCUENTA	SALDO A 31 JULIO	INGRESO	EGRESO	SALDO A 31 AGOSTO
Autónoma de Soporte	$ 2,00	0	$ 0	$ 2

ANEXO: 4.6 Autónoma de Soporte.

En el marco del seguimiento al mecanismo de compensación por riesgo previsto en el Contrato de Concesión IP No. 016 de 2015, se evidenció que la Subcuenta SAS, identificada como la principal fuente de compensación, presentó un saldo de $0 desde el mes de julio de 2024, condición que se mantuvo durante lo corrido de 2025 y hasta el mes de junio de 2026, confirmando así su agotamiento total. En mes de junio se realizó un aporte con el objeto de evitar la desactivación de la cuenta por valor de $1 peso, saldo que se conservó en julio y agosto de 2026.

En consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en la Sección 3.2 del Contrato de Concesión, se activaron los mecanismos sucesivos de compensación, haciendo uso de la Subcuenta Excedentes ANI, la cual a la fecha también se encuentra agotada.

Ante esta situación, se dio inicio a la implementación del siguiente mecanismo contractual previsto, correspondiente al incremento en las tarifas de peaje, proceso que requirió la elaboración y remisión de los respectivos soportes técnicos, financieros y jurídicos al Ministerio de Transporte, entidad competente para la expedición del acto administrativo que formalizó dicha medida.

Así mismo, en relación con la aplicación de estos mecanismos y acorde con la información proporcionada por la Interventoría CR Concesiones, se recibieron diversas comunicaciones por parte de la ANI, entre las cuales se destaca el oficio con Radicado ANI No. 20253050151001 del 5 de mayo de 2025. En dicha comunicación, la Agencia señala que los mecanismos contractuales previstos han sido aplicados conforme a lo establecido en el Contrato, rechazando cualquier señalamiento de incumplimiento y destacando que las actuaciones adelantadas se han desarrollado con transparencia, dentro del marco legal y en los tiempos previstos. Adicionalmente, la ANI solicitó al Concesionario la presentación de una propuesta técnica y económica para la desafectación de la Unidad Funcional 7 – Subsector 1 (Variante Lorica), como parte de los mecanismos subsiguientes contemplados en la Sección 3.2 – Compensación por Riesgo.

Es importante indicar, que, desde las Subcuentas Autónomas de Soporte, se han realizado pagos relacionados con:

- Las Actas de Compensación por riesgo tarifario
- Actas del Decreto 050
- Actas por la imposibilidad del recaudo del peaje de Caimanera
- Actas por afectación de COVID
- Pago de Actas por Otrosí 14 y Otrosí 16

Es preciso anotar que en virtud del Laudo Arbitral CIRD No. 01 23 0002 8303, proferido el 30 de abril de 2026 por el Tribunal de Arbitramento constituido ante el Centro Internacional de Resolución de Disputas (CIRD) y cuya aplicación se dio a partir del 2 de mayo del mismo año, se declaró la Terminación Anticipada del Contrato de Concesión; en consecuencia, el contrato entró en la etapa de reversión; no obstante, la Subcuenta Autónoma de Soporte seguirá recibiendo recursos por concepto de compensación de riesgos producto del recaudo que recibe el proyecto en la etapa de reversión por la operación y mantenimiento que actualmente se está llevando a cabo.

8.4.7. Subcuenta autónoma de soporte manguitos, caimanera y uf 6.3.2 Y UF 6.3.3

Tabla 8-20. Subcuenta Autónoma de Soporte 6.3.2 y 6.3.3

SUBCUENTA AUTÓNOMA DE SOPORTE MANGUITOS Y UF 6.3.2 Y 6.3.3				
SUBCUENTA	SALDO A 31 JULIO	INGRESO	EGRESO	SALDO A 31 AGOSTO
UF 6.3.2 Y 6.3.3	$ 2.302.940.326,89	$ 19.750.123,08	$ 0	$ 2.322.690.449,97
Manguitos Montería	$ 3.122.774.669,88	$ 253.139.025,23	$ 0	$ 3.375.913.695,11

ANEXO: 4.6 SAS Manguitos; Uf 6.3.2 Y 6.3.3

8.4.8. Subcuenta UF 6.3.2 y UF 6.3.3.

De acuerdo con lo establecido en el Otrosí 16, se acordó que se realizará el reconocimiento de las labores de Operación y Mantenimiento de forma anual, el cual debe realizarse cumplido el año a partir de la fecha en que las obras fueron recibidas por la ANI. En este sentido, el reconocimiento al concesionario debe efectuarse en el mes de septiembre de cada año.

No obstante, la evidencia de cumplimiento de los indicadores corresponde al acta de índice de cumplimiento, el cual se expide a más tardar el día 10 de mes siguiente al periodo evaluado; por tal motivo esto se formaliza en el mes de octubre de cada año.

Tabla 8-21. Reconocimiento Otrosí 16

CONCEPTO	RECONOCIMIENTO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE (FORMALIZADO EN OCTUBRE)
Operación y Mantenimiento vigencia 2023-2024	19 de septiembre de 2024*
Operación y Mantenimiento vigencia 2024-2025	19 de septiembre de 2025*
Operación y Mantenimiento vigencia 2025-2026	19 de septiembre de 2026*
Operación y Mantenimiento vigencia 2026-2027	19 de septiembre de 2027*
Operación y Mantenimiento vigencia 2027-2028	19 de septiembre de 2028*
Operación y Mantenimiento vigencia 2028-2029	19 de septiembre de 2029*
Operación y Mantenimiento vigencia 2029-2030	19 de septiembre de 2030*
Operación y Mantenimiento vigencia 2030-2031	19 de septiembre de 2031*
Operación y Mantenimiento vigencia 2031-2032	19 de septiembre de 2032*
Operación y Mantenimiento vigencia 2032-2033	19 de septiembre de 2033*

Con corte a agosto de 2026 se presentó un ingreso por rendimientos por valor de $ 19.750.123,08.

De esta forma se han efectuado pagos relacionados con las actas del Otrosí No. 16 por un valor total de $5.922.053.272, como se muestra a continuación:

Tabla 8-22. Pagos actas del Otrosí No. 16

Fecha	Actas de Compensación	VALOR
Valor Total Pago Otrosi No 16 N.1	29-jul-24	$ 5.371.903.906
Valor Total Pago Otrosi No 16 N.2	30-ene-25	$ 268.241.224
Valor Total Pago Otrosi No 16 N.3	24-dic-25	$ 281.908.140
Total		$ 5.922.053.272

Fuente. Elaboración propia.

Es importante indicar que, con cargo a las Subcuenta Autónoma de Soporte, se han realizado pagos asociados a los siguientes conceptos: actas de compensación por riesgo tarifario, actas relacionadas con la aplicación del Decreto 050, actas derivadas de la imposibilidad de recaudo del peaje de Caimanera, actas por afectaciones derivadas del COVID-19, actas correspondientes a los Otrosí No. 14 y No. 16, así como actas de compensación predial, tal como se presenta a continuación.

Tabla 8-23. Pagos Actas de Compensación

Acta de compensación	Cuenta Origen	Valor traslado total
Acta Tarifaria (1-37)	Subcuenta SAS Manguitos / Caimanera	$ 53.335.610.585
Acta Decreto 050 (1-7)	Subcuenta SAS Manguitos	$ 43.754.400.583
Acta Caimanera (1-9)	Subcuenta SAS Manguitos	$ 48.807.122.950
Acta Afectación COVID (A-B)	Subcuenta SAS Manguitos / Caimanera	$ 31.016.679.995
Acta predial (1-13)	Subcuenta SAS Manguitos / Caimanera	$ 34.877.628.568
TOTAL		**$ 211.791.442.681**
Acta Otrosí 14	Subcuenta SAS Perimetrales	$ 24.916.562.869,35
Acta Otrosí 16	Subcuenta SAS 6.3.2 y 6.3.3 (3 actas)	$ 5.922.053.272,18
TOTAL		**$ 30.838.616.141,53**

Fuente: Elaboración Propia

Adicionalmente, a la fecha se han suscrito Actas de Compensación correspondientes al IV trimestre de 2024, a los trimestres I, II, III y IV de 2025 y al I trimestre de 2026. No obstante, dichas actas se encuentran pendientes

de pago, debido al agotamiento de los recursos líquidos disponibles en la Subcuenta SAS y en la Subcuenta de Excedentes ANI.

En este contexto, y conforme a los mecanismos previstos contractualmente, a partir del mes de enero de 2026 se implementó un incremento adicional del 2% en la estructura tarifaria, el cual constituía un mecanismo de liquidez destinado a compensar al concesionario. No obstante, en virtud del Laudo Arbitral CIRD No. 01 23 0002 8303, proferido el 30 de abril de 2026 por el Tribunal de Arbitramento constituido ante el Centro Internacional de Resolución de Disputas (CIRD) y cuya aplicación se dio a partir del 2 de mayo del mismo año, se declaró la Terminación Anticipada del Contrato de Concesión. En consecuencia, el contrato entró en la etapa de reversión razón por la cual se está a la espera de las directrices impartidas por la Entidad para el manejo de este incremento.

Por otra parte, en virtud del mismo Laudo Arbitral CIRD No. 01-23-0002-8303, las actas de compensación por riesgo pendientes de pago se entienden incluidas dentro del monto global reconocido en la condena impuesta a la ANI al declararse la Terminación Anticipada del Contrato y ordenarse la aplicación de la Fórmula de Terminación Anticipada prevista en la Sección 18.4 del Contrato, dichas obligaciones se consolidan en el valor determinado por el Tribunal, razón por la cual no corresponde su seguimiento individual en la etapa de reversión. A continuación, y de manera informativa, se presenta el histórico de las actas con corte a abril de 2026, ultimo mes de operación antes de la entrada en etapa de reversión.

Tabla 8-24. Actas de compensación pendientes de pago

	N. Acta	Periodo	Valor Acta M/CTE	VPN
Actas tarifarias	ACTA 38	(01 ene 31 mar 2025)	$ 1.348.783.520	$ 335.807.529
	ACTA 39	(01 abr a 30 de jun 2025)	$ 1.432.093.297	$ 346.677.853
	ACTA 40	(01 jul a 30 de sep 2025)	$ 1.601.110.874	$ 378.000.969
	Acta 41	(01 oct a 31 de dic 2025)	$ 1.689.551.328	$ 390.028.982
	Acta 42	(01 ene a 31 de mar2026)	$ 1.685.675.778	**$ 371.101.980**
	Tarifaria		**$ 7.757.214.797**	**$ 1.821.617.313**
Actas Caimanera	Acta 10	(01 oct 31 dic 2024)	$ 7.235.039.698	$ 1.880.702.821
	Acta 11	(01 ene 31 mar 2025)	$ 8.180.071.023	$ 2.036.597.717
	Acta 12	(01 abr 30 jun 2025)	$ 7.494.348.018	$ 1.814.214.537
	Acta 13	(01 jul a 30 de sep 2025)	$ 7.173.475.899	$ 1.693.562.190
	Acta 14	(01 oct 31 de dic 2025)	$ 8.087.697.178	$ 1.867.026.026
	Acta 15	**(01 ene 31 de mar 2026)**	**$ 8.787.955.549**	**$ 1.934.670.799**

	N. Acta	Periodo	Valor Acta M/CTE	VPN
	Caimanera		**$ 46.958.587.365**	**$ 11.226.774.090**
Decreto 050	Acta 8	(01 Oct 31 Dic 2024)	$ 3.025.201.001	$ 786.381.871
Decreto 050			**$ 3.025.201.001**	**$ 786.381.871**
Sub Total			**$ 57.741.003.163**	**$ 13.834.773.274**
Acta Ambiental	Comité 1		$ 1.986.197.742	$ 520.068.678
Acta Ambiental	Comité 2		$ 1.181.553.622	$ 286.027.784
Total			**$ 60.908.754.527**	**$ 14.640.869.736**

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con la información remitida por CR Concesiones y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) a la Interventoría IPAB, y en atención a lo dispuesto en el Otrosí No. 18, se aprobó el traslado de recursos desde la Subcuenta de Redes hacia la Subcuenta de Excedentes ANI, con el fin de atender las obligaciones derivadas de las Actas de Compensación por Riesgo. Dicho traslado fue acordado mediante comunicación emitida por la Interventoría Consorcio CR Concesiones con número CL.023/AB14218/25/7.5.9 del 24 de octubre de 2025, a través de la cual se solicitó autorización para el uso de los recursos disponibles en la Subcuenta de Excedentes ANI y en la Subcuenta Autónoma de Soporte Manguitos, con el propósito de efectuar el pago de las actas relacionadas a continuación.

Tabla 8-25. Pagos Sub. Excedentes ANI - Sub. y Autónoma de soporte

Fuentes	
Saldo sub excedentes ANI	$ 14.754.215.165,83
Saldo SAS Manguitos	$ 619.594.233,85
Total	**$ 15.373.809.399,68**

Usos	
Actas	**Valor Corriente**
Decreto 050 Abono 4 Acta 6	$ 308.568.512,18
Tarifaria 36	$ 1.269.106.755,00
Caimanera N. 9	$ 6.807.661.563,00
Decreto 050 7	$ 3.860.655.012,00
Ambiental n. 1	$ 1.986.197.742,00
Tarifaria 37 (Abono N. 1)	$ 1.141.619.815.50
Total	**$ 15.373.809.399,68**

Con base en lo anterior, durante el mes de diciembre de 2025 se efectuaron

los traslados de recursos asociados a las actas previamente mencionadas, tomando como fuente los saldos disponibles en la Subcuenta de Excedentes ANI y en la Subcuenta Autónoma de Soporte Manguitos, en el marco de los mecanismos de compensación establecidos contractualmente. No obstante, quedó pendiente de pago el acta Ambiental N.1 por valor de $1.986.197.742,00, ya que se dio prioridad al pago del Acta Tarifaria No. 37, la cual fue cancelada parcialmente por valor de $1.141.619.815.50.

Se hace hincapié en la decisión proferida por el Laudo Arbitral CIRD No. 01-23-0002-8303, en la cual las actas de compensación por riesgo pendientes de pago se entienden incluidas dentro del monto global reconocido en la condena impuesta a la ANI al declararse la Terminación Anticipada del Contrato y ordenarse la aplicación de la Fórmula de Terminación Anticipada prevista en la Sección 18.4 del Contrato de Concesión, dichas obligaciones se consolidan en el valor determinado por el Tribunal.

8.4.9. Subcuenta Perimetrales

La Subcuenta Perimetrales fue creada mediante instrucción impartida por la ANI a la fiduciaria Bancolombia, con ocasión de la suscripción del Otrosí No. 14 al Contrato de Concesión No. 016 de 2015, y se encuentra vinculada a la Subcuenta Autónoma de Soporte. En esta subcuenta se depositan los recursos estimados para cubrir los sobrecostos reconocidos en el marco del referido otrosí; así mismo, los rendimientos financieros que se generen se incorporarán al saldo de la misma.

Los recursos disponibles en la Subcuenta Perimetrales se destinan conforme a lo dispuesto en la cláusula cuarta (parágrafo tercero) del Otrosí No. 14, con el propósito de atender las compensaciones derivadas de los riesgos reconocidos en dicho acuerdo contractual.

Tabla 8-26. Subcuenta Perimetrales. Ingresos y Egresos

SUBCUENTA	SALDO A 31 JULIO	INGRESO	EGRESO	SALDO A 31 AGOSTO
Perimetrales	$ 841.217.912,59	$ 7.214.323,76	$ 0	$ 848.432.236,35

ANEXO: 4.7 Cta Perimetrales

8.4.10. Subcuenta MASC (Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias)

Los recursos de la Subcuenta MASC se destinan prioritariamente a financiar las actuaciones asociadas a los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Contrato, en particular aquellas relacionadas con el proceso de Amigable Composición. Así mismo, dichos recursos podrán utilizarse para cubrir los honorarios de los árbitros y demás gastos comunes que se generen con ocasión de la convocatoria y desarrollo de un Tribunal de Arbitramento.

Tabla 8-27. Subcuenta MASC. Ingresos y Egresos

SUBCUENTA	SALDO A 31 JULIO	INGRESO	EGRESO	SALDO A 31 AGOSTO
MASC	$ 1.997.843,26	$ 17.002,67	$ 16.874,58	$ 1.997.971,35

ANEXO: 4.8 MASC

En el marco de las obligaciones establecidas durante la vigencia del contrato, el Concesionario debe realizar los aportes correspondientes al fondeo contractual.

En este sentido, durante el mes de diciembre de 2025 se efectuó el fondeo contractual No. 35, correspondiente al fondeo anticipado semestral y anual previsto para el año 2028, por un valor de $495.484.800 M/CTE.

Con este aporte, el monto acumulado de los fondeos realizados asciende a $8.098.312.628 M/CTE.

Tabla 8-28. Subcuenta MASC. Fondeos

SUBCUENTA MASC				
Subcuenta	Aporte acumulado en precios constantes	Fondeo acumulado en precios ctes	Fecha de último fondeo	Fondeo a precios corrientes
Subcuenta MASC	$ 5.325.340.508	$ 8.098.312.628	02-Dic-25	$ 495.484.800

ANEXO: 4.18 FONDEOS

Ahora bien, considerando los fondeos anticipados efectuados, se han realizado los siguientes aportes: en mayo de 2024 se registró un aporte por $918.787.078 M/CTE; en junio de 2024, $633.109.750 M/CTE; en octubre de 2024, $549.185.000 M/CTE; y en diciembre de 2024, $551.413.757 M/CTE.

Posteriormente, durante 2025 se efectuaron aportes en marzo por $1.716.529 M/CTE; en mayo por $59.288.775 M/CTE; en julio por $59.288.775 M/CTE; en noviembre por $495.247.644 M/CTE; y en diciembre por $495.484.800 M/CTE.

Con base en lo anterior, los aportes y su correspondiente distribución se realiza de la siguiente manera:

Tabla 8-29. Subcuenta MASC. Fondeos anuales y semestrales

Subcuenta MASC				
Concepto	Fecha Limite	Valor Constante	Valor Corriente	Fecha de Fondeo
Aporte Anual				
Aporte Anticipado 1	17-dic-24	$ 253.238.112	$ 450.792.346	3-may-24
Aporte Anticipado 1	**17-dic-25**	$ 82.017.395	$ 146.000.196	3-may-24
Aporte Anticipado 2		$ 171.220.717	$ 306.077.109	5-jun-24
Aporte Anticipado 2	**17-dic-26**	$ 62.353.745	$ 111.464.630	5-jun-24
Aporte Anticipado 3		$ 190.884.367	$ 343.854.491	2-oct-24
Aporte Anticipado 4	**17-dic-27**	$ 253.238.112	$ 456.810.513	4-dic-24
Aporte Anticipado 8	**17-dic-28**	$ 250.295.027	$ 475.106.609	6-nov-25
Aporte Anticipado 9		$ 2.943.085	$ 5.590.572	2-dic-25
Aporte Anticipado 9	**17-dic-29**	$ 137.308.911	$ 260.826.821	2-dic-25
Aporte Semestral				
Aporte Anticipado 1	5-jul-24	$ 60.294.789	$ 107.331.512	3-may-24
Aporte Anticipado 1	5-ene-25	$ 60.294.789	$ 107.331.512	3-may-24
Aporte Anticipado 1	5-jul-25	$ 60.294.789	$ 107.331.512	3-may-24
Aporte Anticipado 2	5-ene-26	$ 60.294.789	$ 107.784.006	5-jun-24
Aporte Anticipado 2	5-jul-26	$ 60.294.789	$ 107.784.006	5-jun-24
Aporte Anticipado 3	5-ene-27	$ 60.294.789	$ 108.613.577	2-oct-24
Aporte Anticipado 3	5-jul-27	$ 53.690.590	$ 96.716.932	2-oct-24
Aporte Anticipado 4	5-jul-27	$ 6.604.199	$ 11.913.166	4-dic-24
Aporte Anticipado 4	5-ene-28	$ 45.840.187	$ 82.690.078	4-dic-24
Aporte Anticipado 5	5-ene-28	$ 927.901	$ 1.716.529	18-mar-25
Aporte Anticipado 6	5-ene-28	$ 13.526.701	$ 25.320.902	14-may-25
Aporte Anticipado 6	5-jul-28	$ 18.146.274	$ 33.968.373	14-may-25
Aporte Anticipado 7	5-jul-28	$ 31.537.841	$ 59.288.775	09-jul-25
Aporte Anticipado 8	5-jul-28	$ 10.610.673	$ 20.141.035	6-nov-25
Aporte Anticipado 9	5-ene-29	$ 60.297.789	$ 114.533.704	2-dic-25

Subcuenta MASC				
Concepto	Fecha Limite	Valor Constante	Valor Corriente	Fecha de Fondeo
Aporte Anticipado 9	05-jul-29	$ 60.297.789	$ 114.533.704	2-dic-25

Se precisa que esta subcuenta, en razón de su obligación de atender los pagos asociados, presentó un descalce en la programación de fuentes y usos. Por tal motivo, resulta necesario realizar seguimiento a los posibles trámites de amigable composición, con el fin de garantizar la disponibilidad de recursos para su atención, así como para cubrir las erogaciones que pudieran derivarse de la demanda arbitral internacional.

En virtud del Laudo Arbitral CIRD No. 01 23 0002 8303, proferido el 30 de abril de 2026 por el Tribunal de Arbitramento constituido ante el Centro Internacional de Resolución de Disputas (CIRD) y cuya aplicación se dio a partir del 2 de mayo del mismo año, se declaró la Terminación Anticipada del Contrato de Concesión En consecuencia, el contrato entró en la etapa de reversión los fondeos a la subcuenta MAS se realizarán según las necesidades que la etapa exija, dado que estas figuras corresponde a la ocurrencia de controversias que requieran el acompañamiento del Amigable Componedor.

8.4.11. Subcuenta Excedentes ANI

Los recursos de la Subcuenta Excedentes se destinan conforme a las instrucciones impartidas por la ANI mediante notificación a la Fiduciaria, con el propósito de atender la compensación de los riesgos que se encuentren a cargo de la Agencia, en los términos establecidos en el Contrato de Concesión.

Así mismo, los rendimientos generados por las operaciones de tesorería realizadas con cargo a los recursos de esta subcuenta serán transferidos mensualmente a la Subcuenta de Obras Menores, de acuerdo con lo previsto contractualmente.

De conformidad con la información reportada por la Fiduciaria Bancolombia S.A., con corte al mes de agosto de 2026, se presentan los ingresos y egresos registrados en esta subcuenta.

Tabla 8-30. Subcuenta Excedentes ANI. Ingresos y Egresos

SUBCUENTA	SALDO A 31 JULIO	INGRESO	EGRESO	SALDO A 31 AGOSTO
Excedentes ANI	$ 3.502.346.964,87	$ 55.585.639,88	$ 24.113.596,81	$ 3.533.819.007,94

ANEXO: 4.9 Excede ANI

Durante el mes de agosto de 2026 se registró un ingreso total de $ 55.585.639,88, compuesto por los siguientes conceptos: rendimientos financieros por $30.046.449,66, traslado de sobrantes provenientes de los peajes por $536.700,00 y transferencia de rendimientos desde la Subcuenta Recaudo Otrosí No. 17 por $25.002.490,22.

Así mismo, es pertinente señalar que, conforme a lo establecido en el Otrosí No. 18, suscrito el 8 de agosto de 2025, se definió una metodología para la distribución anticipada de los remanentes de la Subcuenta Redes. Dicha metodología establece que el 40% de los recursos corresponde a la ANI y el 60% al Concesionario, con el objetivo de fortalecer la disponibilidad de los mecanismos de compensación, particularmente la Subcuenta de Excedentes ANI, destinada al pago de las actas de compensación pendientes desde el año 2024.

En virtud de lo anterior, durante el mes de diciembre de 2025 se efectuó el pago de las actas de compensación por riesgo, utilizando los remanentes disponibles de la Subcuenta Redes, de la siguiente manera:

Tabla 8-31. Pago actas de Compensación

	N. Acta	Periodo	Valor Acta M/CTE	Fecha de pago
Actas tarifarias	ACTA 36	01 jul a 30 sep. 2024	$ 1.269.106.755	15-dic-25
	ACTA 37	01 oct a 31 de dic. 2024	$ 1.301.283.915	23-dic-25
Actas Caimanera	Acta 9	1 jul a 30 de sep. 2024	$ 6.807.661.563	23-dic-25
Decreto 050	Acta 6 abono	abr -jun 2024	$ 308.568.692	12-dic-25
	Acta 7	Julio - sep. 2024	$ 3.860.655.012	15-dic-25
	Total		$ 13.547.275.937	

A la fecha, desde la Subcuenta de Excedentes ANI se ha realizado un desembolso total de $17.541.977.764 por concepto de Actas de Compensación por Riesgo tarifaria, peaje La Caimanera y al Decreto 050.

Tabla 8-32. Subcuenta de Excedentes ANI desembolsos a 2025

Acta Peaje Caimanera	8. abr -Jun 2024	21-ago-24	$	1.017.366.152
Acta de Decreto 050	6. Abr -Jun 2024	11-oct-24	$	2.874.912.943
Acta de Decreto 050	Abono N. 2 Acta 6 Abr -Jun 2024	06-Jun-25	$	102.422.914
Acta Tarifaria	36. jul - sep 2024	15-dic-25	$	1.269.106.755
Acta Tarifaria	37. oct - dic 2024	23-dic-25	$	1.301.283.915
Acta Peaje Caimanera	9. jul -sep 2024	23-dic-25	$	6.807.661.563
Acta de Decreto 050	Abono N. 4 Acta 6 Abr -Jun 2024	12-dic-25	$	308.568.512
Acta de Decreto 050	7. Jul - Sep 2024	15-dic-25	$	3.860.655.010
Actas de compensación por riesgo			**$**	**17.541.977.764**

Es necesario puntualizar en esta cuenta residen los recursos provenientes de las deducciones producto de la aplicación del Otrosí 17.

Por otra parte, en virtud del mismo Laudo Arbitral CIRD No. 01-23-0002-8303, las actas de compensación por riesgo pendientes de pago se entienden incluidas dentro del monto global reconocido en la condena impuesta a la ANI. Al declararse la Terminación Anticipada del Contrato y ordenarse la aplicación de la Fórmula de Terminación Anticipada prevista en la Sección 18.4 del Contrato, dichas obligaciones se consolidan en el valor determinado por el Tribunal, razón por la cual no corresponde su pago en la etapa de reversión. El saldo actual presente en la cuenta será distribuido con base en el direccionamiento otorgado por el Otrosí 18.

8.4.12. Subcuenta Ingresos Por Explotación Comercial

La Subcuenta de Ingresos por Explotación Comercial se encuentra estructurada en subcuentas asociadas a cada unidad funcional del proyecto. En cada una de ellas se registra el valor resultante de multiplicar los ingresos derivados de la explotación comercial, una vez descontado el porcentaje correspondiente al 2,2%.

De acuerdo con lo establecido en la Sección 1.83 de la Parte General del Contrato, dicho 2,2% es transferido a la Subcuenta de Excedentes ANI.

Con base en la información reportada por Fiduciaria Bancolombia S.A., con corte a agosto de 2026, no se presenta movimiento alguno en esta subcuenta, respecto de canon de arrendamiento de la zona de cocina o la plazoleta de comidas ubicadas en las áreas de servicio de los peajes.

No obstante, es importante indicar que a partir de septiembre de 2025 se aplicó un ajuste del 5,20% correspondiente al IPC.

Tabla 8-33. Histórico de ingresos Subcuenta Ingresos Por Explotación Comercial

Explotación comercial			
Concepto	**Fecha**	**Valor**	**Valor Acumulado**
Total 2023	(ago.-dic)	$ 4.000.000	$ 4.000.000
Total 2024	(ene-dic)	$ 14.342.399	$ 18.342.399
Canon de restaurante Peaje de Manguitos	ene-25	$ 1.748.480	$ 20.090.879
	feb-25	$ 1.748.480	$ 21.839.359
	mar-25	$ 1.748.480	$ 23.587.839
	abr-25	$ 1.748.480	$ 25.336.318
	may-25	$ 1.748.480	$ 27.084.798
	jun-25	$ 1.748.480	$ 28.833.278
	jul-25	$ 1.748.480	$ 30.581.758
	ago-25	$ 1.839.401	$ 32.421.159
	sep-25	$ 3.522.602	$ 35.943.761
	oct-25	$ 2.681.001	$ 38.624.761
	nov-25	$ 2.681.001	$ 41.305.762
	dic-25	$ 2.681.001	$ 43.986.763
	ene-26	$ 2.681.001	$ 46.677.764
	Feb-26	$ 2.681.001	$ 49. 348.765
	mar-26	$ 2.681.001	$ 52.029.766
	abr-26	$ 2.681.001	$ 54.710.767
	may-26	$ 2.681.001	$ 57.391.767
	Jun-26	$ 2.681.001	$ 60.072.768
	Jul-26	$ 2.681.001	$ 62.753.769
	Ago-26	$0	$ 62.753.769

Tabla 8-34. Subcuenta Ingresos Por Explotación Comercial. Ingresos y egresos

SUBCUENTA	SALDO A 31 JULIO	INGRESO	EGRESO	SALDO A 31 AGOSTO
Explotación Comercial	$ 511.641,02	$ 8.441,95	$ 6.884,39	$ 513.198,58

Tabla 8-35. Subcuenta Ingresos Por Explotación Comercial por UF

SUBCUENTA	SALDO A 31 JULIO	INGRESO	EGRESO	SALDO A 31 AGOSTO
Explotación Comercial UF 1	$ 1.225.674,73	$ 11.574,85	$ -	$ 1.237.249,58
Explotación Comercial UF 2	$ 1.931.901,21	$ 17.274,18	$ -	$ 1.949.175,39
Explotación Comercial UF 3	$ 844.306,50	$ 7.973,28	$ -	$ 852.279,78
Explotación Comercial UF 4	$ 613.237,36	$ 5.791,12	$ -	$ 619.028,48
Explotación Comercial UF 5	$ 700.385,80	$ 6.614,15	$ -	$ 706.999,95
Explotación Comercial UF 6	$ 2.273.366,19	$ 20.573,09	$ -	$ 2.293.939,28
Explotación Comercial UF 7	$ 3.050.585,88	$ 27.162,92	$ -	$ 3.077.748,80
Explotación Comercial UF 8	$ 2.403.675,01	$ 21.831,44	$ -	$ 2.425.506,45

8.4.13. Subcuenta Obras Menores

Los recursos de la Subcuenta Obras Menores provienen principalmente de los rendimientos financieros generados por las subcuentas que integran la Cuenta ANI. No obstante, se exceptúan los rendimientos correspondientes a la Subcuenta de Recaudo de Peaje, la Subcuenta de Ingresos por Explotación Comercial y la Subcuenta Autónoma de Soporte, los cuales se acumulan en cada una de estas subcuentas.

Adicionalmente, esta subcuenta puede recibir otros recursos que, conforme a lo previsto en el contrato, deban ser trasladados para atender las obligaciones asociadas a Obras Menores.

Seguidamente, se presentan los movimientos de ingresos y egresos registrados con corte a agosto de 2026.

Tabla 8-36. Subcuenta Obras Menores. Ingresos y egresos

SUBCUENTA	SALDO A 31 JULIO	INGRESO	EGRESO	SALDO A 31 AGOSTO
Obras Menores	$ 12.663.808.653,93	$ 205.938.959,57	$ 0	$ 12.869.747.613,50

ANEXO: 4.11 Obras Menores

A la fecha, se han pagado cuatro actas asociadas a estudios y diseños por un valor total de $828.548.978, como se detalla a continuación:

Tabla 8-37. Subcuenta Obras Menores. Actas pagadas

Acta	Fecha De pago	Valor CTE
Acta Obras Menores Estudio Patología - Puente La Caimanera	17/07/2024	$ 122.086.782
EYD retornos San Pelayo Uf 2 y 6,1	29/01/2025	$ 46.124.123
Acta Obras Menores fenómeno de erosión costera Puerto Rey	29/05/2025	$ 284.725.812
EYD Fase III Puente Boca De la Ciénaga Sub 3.2 y uF 6	05/12/2025	$ 375.612.261

Fuente: Elaboración propia.

8.4.14. Subcuenta Predios

Los recursos disponibles en la Subcuenta de Predios se utilizarán exclusivamente para atender los pagos previstos en la Sección 7.2(a) de la Parte General del Contrato. Una vez cubiertas dichas obligaciones, los remanentes que correspondan a la ANI deberán ser trasladados a la Subcuenta de Excedentes, previa instrucción expresa y por escrito de la Agencia.

Tabla 8-38. Subcuenta de Predios. Ingresos y egresos

CUENTAS PROYECTO				
SUBCUENTA	SALDO A 31 JULIO	INGRESO	EGRESO	SALDO A 31 AGOSTO
Predios	$ 5.806.136.884,09	$ 49.793.699,55	$ 0	$ 5.855.930.583,64

ANEXO: 4.12 Predios

8.4.14.1. Fondeos

El monto estimado correspondiente a la adquisición de predios y al pago de compensaciones, que debe ser aportado por el Concesionario a la Subcuenta de Predios, asciende a OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS ($84.231.485.612) a precios constantes del mes de referencia. Dichos recursos deberán encontrarse disponibles en la Subcuenta Predios, conforme a la programación establecida. A continuación, fondeos realizados a la cuenta con corte a agosto de 2026.

Tabla 8-39. Subcuenta de Predios. Fondeos

CUENTA PROYECTO				
Subcuenta	Aporte total en precios Constantes	Fondeo total en precios Ctes	Fecha de último fondeo	Fondeo a precios corrientes
Predios	**$ 134.765.484.666**	**$ 171.898.391.041**	**15-Feb-24**	**$ 406.588.416**

ANEXO: 4.18 Fondeos

A medida que el Concesionario presenta las ofertas formales, debe continuar realizando los fondeos correspondientes a la Subcuenta, garantizando la disponibilidad de los recursos requeridos. Estos aportes se efectúan con base en las actas de aprobación emitidas por el comité correspondiente.

En el mes de junio de 2024 se tramitó el Acta de Compensación por Riesgo Predial No. 13, por un valor de $293.080.608, cuyo origen de recursos corresponde a la Subcuenta Autónoma de Soporte Los Manguitos. Asimismo, el 26 de junio de 2026 tuvo lugar el Comité Previa Aprobación No. 19 por un valor de $ 183.736.893,18 cuya fuente de recursos son los rendimientos de la Subcuenta predial.

A continuación, se presenta el histórico de pagos asociados a las Actas de Compensación Predial:

Tabla 8-40. Subcuenta de Predios. Histórico pago de actas

PREDIAL			
N. Acta	**Fecha pago**	**Cuenta Destino**	**Valor**
1	31/08/2021	Cuenta Ahorros Bancolombia 245-864882-41	$ 829.861.319,31
2	30/09/2021	Cuenta Ahorros Bancolombia 245-864882-41	$ 3.028.988.667,47
3	30/11/2021	Cuenta Ahorros Bancolombia 245-864882-41	$ 5.324.219.913,82
4	9/11/2021	Cuenta Ahorros Bancolombia 245-864882-41	$ 404.723.740,95
5	31/01/2022	Cuenta Ahorros Bancolombia 245-864882-41	$ 5.982.656.744,08
6	31/03/2022	Cuenta Ahorros Bancolombia 245-864882-41	$ 5.650.186.816,91
7	31/03/2022	Cuenta Ahorros Bancolombia 245-864882-41	$ 1.995.646.508,45
8	31/08/2022	Cuenta Ahorros Bancolombia 245-864882-41	$ 4.161.124.084,99
9	3/11/2022	Cuenta Ahorros Bancolombia 245-864882-41	$ 2.045.890.116,86
11	18/04/2023	Cuenta Ahorros Bancolombia 245-864882-41	$ 4.785.042.815,21
12	27/07/2023	Cuenta Ahorros Bancolombia 245-864882-41	$ 376.207.231,36
13	28/06/2024	Cuenta Ahorros Bancolombia 245-864882-41	$ 293.080.608
Total			**$ 34.877.628.567**

8.4.15. Subcuenta Compensaciones Ambientales

Los recursos disponibles en esta subcuenta se emplearán para cubrir las compensaciones ambientales, de conformidad con lo establecido en la Sección 8.1 (e) de la Parte General del Contrato.

8.4.15.1. Fondeos

El monto estimado que el Concesionario deberá aportar a la Subcuenta de Compensaciones Ambientales asciende a ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS ($11.951.582.312), expresados en pesos del mes de referencia.

Tabla 8-41. Subcuenta Compensaciones Ambientales. Fondeos

CUENTA PROYECTO				
Subcuenta	**Aporte total en precios constantes**	**Fondeo total en precios ctes**	**Fecha de último fondeo**	**Fondeo a precios corrientes**
Compensación Ambiental	$ 16.790.038.589	$ 22.458.537.217	03-jun-25	$ 1.686.136.877

ANEXO: 4.18 Fondeos

Como se evidencia, el Concesionario realizó el fondeo total de los valores contractuales, alcanzando un monto de $16.790.038.589 en precios constantes.

En este contexto, durante septiembre de 2024 el Concesionario efectuó un aporte por $2.785.826.664 M/CTE, correspondiente al Comité de Aprobación No. 1. Así mismo, se registró un fondeo por $1.686.136.877 M/CTE asociado al Comité de Previa Aprobación No. 2. De igual forma, se aprobó el Comité No. 3 por un valor de $556.024.692, monto definido con base en el saldo disponible de la subcuenta y los rendimientos generados a la fecha. Asimismo, el 4 de junio se llevó a cabo el comité No. 4 por valor de $599.940.505 cuya fuente de recursos son los saldos y rendimientos.

A continuación, se presentan los ingresos y egresos registrados con corte al mes de agosto de 2026.

En virtud del Laudo Arbitral CIRD No. 01 23 0002 8303, proferido el 30 de abril de 2026 por el Tribunal de Arbitramento constituido ante el Centro Internacional de Resolución de Disputas (CIRD) y cuya aplicación se dio a partir del 2 de mayo del mismo año, se declaró la Terminación Anticipada del Contrato de Concesión. En consecuencia, el contrato entró en la etapa de reversión y los fondeos a las subcuentas se encuentran en verificación.

Tabla 8-42. Subcuenta Compensaciones Ambientales. Ingresos y egresos

CUENTAS PROYECTO				
SUBCUENTA	SALDO A 31 JULIO	INGRESO	EGRESO	SALDO A 31 AGOSTO
Compensación Ambiental	$ 210.046.928,98	$ 3.041.480,64	$ 66.864.392,00	$ 146.224.017,62

ANEXO: 4.13 Compensaciones

A la fecha, acorde con la información histórica recibida por parte de la Interventoría CR Concesiones, el presupuesto aprobado alcanza un valor de $28.354.314.667,47 conforme a lo informado por el Concesionario mediante la comunicación No. 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20250804009524 del 4 de agosto de 2025.

El 17 de julio de 2024 se llevó a cabo la aprobación del Comité CPA No. 1, mediante el cual el Concesionario solicitó recursos por $2.785.826.664 M/CTE, los cuales corresponden a $1.550.266.874 en valores en precios constantes, proyectados para el período comprendido entre junio y diciembre de 2024. Con este fondeo, la franja de riesgo proyectada alcanzaría el 149,23%. No obstante, al cierre de dicho período se evidenció que $1.665.294.526 de los recursos inicialmente solicitados no fueron ejecutados.

Adicionalmente, en el marco del Acta del Comité No. 1, el Concesionario presentó el Acta de Compensación Ambiental No. 1 por un valor de $1.986.197.742 M/CTE, equivalente a $520.068.677 en VPN. Este documento fue radicado ante la ANI el 23 de diciembre de 2024 y, a la fecha, permanece pendiente de pago.

Posteriormente, el Concesionario presentó el Comité CPA No. 2, mediante el cual se solicitó un monto total de $3.435.043.632. De este valor, $2.372.807.541 corresponden a nuevas solicitudes de pago asociadas a contratos contemplados dentro del presupuesto, mientras que $1.062.478.418 corresponden a recursos aprobados en el Comité CPA No. 1 que no fueron ejecutados dentro del plazo previsto. La ejecución de estos recursos fue proyectada para el período comprendido entre enero y junio de 2025.

Asimismo, tras la revisión correspondiente, el valor aprobado para fondeo en el marco del Comité CPA No. 2 fue de $1.686.136.877, el cual se efectuó el 3 de junio de 2025.

Finalmente, se aprobó el Comité CPA No. 3 por un valor de $556.024.692, el cual fue autorizado considerando el saldo disponible en la subcuenta, utilizando para ello recursos provenientes de rendimientos financieros y del

reintegro por concepto de vedas. Asimismo, el 4 de junio se llevó a cabo el comité No. 4 por valor de $599.940.505 con cargo a liberación de recursos comité No 2 y No 3, rendimientos y saldos disponible de vedas, por lo cual no se requiere fondeo adicional.

8.4.16. Subcuenta Redes

Los recursos disponibles en la Subcuenta Redes se utilizarán exclusivamente para atender los pagos previstos en la Sección 8.2 de la Parte General del Contrato. En caso de generarse saldos remanentes, estos serán distribuidos conforme a lo establecido en dicha sección.

Los remanentes que correspondan a la Agencia Nacional de Infraestructura serán trasladados a la subcuenta excedentes ANI.

Tabla 8-43. Subcuenta Redes. Ingresos y egresos

CUENTAS PROYECTO				
SUBCUENTA	SALDO A 31 JULIO	INGRESO	EGRESO	SALDO A 31 AGOSTO
Redes	$ 16.640.433.932,58	$ 142.709.134,48	$ 0	$ 16.783.143.067,06

ANEXO: 4.14 Redes

Es importante destacar que, mediante la comunicación CL.023/AB13993/25/7.2 del 29 de agosto de 2025 emitida por la Interventoría Consorcio CR Concesiones, se formuló pronunciamiento respecto a los remanentes de la Subcuenta Redes, tomando como referencia el saldo registrado con corte al 11 de agosto de 2025.

En dicha comunicación se detallan los valores asociados a la subcuenta que ya han sido ejecutados, así como el saldo existente, los presupuestos correspondientes y el monto disponible para la distribución de los remanentes.

Tabla 8-44. Subcuenta Redes. Valores ejecutados

	Concepto	Valor	Explicacion
A	Redes ejecutadas/pagadas	$ 17.154.144.922,00	Valor pagado a la Subcuenta
B	Saldo en Subcuenta redes al 11/08/2025	$ 50.440.347.198,10	Saldo en la Subcuenta
C	Redes en proceso o pendientes por ejecutar	$ 6.657.358.115,00	Valor estimado conforme al plan de traslado Redes
D	Redes Con posible necesidad de traslado	$ 8.275.300.601,00	Valor estimado conforme al plan de traslado Redes
E	Presupuesto Plan de traslado Redes (A+C+D)	$ 32.086.803.638,00	Valor estimado conforme al plan de traslado Redes
F	Saldo disponible al 12/08/2025 (B-C-D)	$ 35.507.688.482,10	Valor estimado conforme al plan de traslado Redes
G	ANI 40% (F*40%)	$ 14.203.075.392,84	Porcentaje correspondiente a la ANI de remanente (sección 8.2 (d) P.G)
H	CONCESIONARIO 60% (F*60%)	$ 21.304.613.089,26	Porcentaje correspondiente al Concesionario de remanente estimado (sección 8.2 (d) P.G)

De igual manera, es pertinente señalar que la anterior distribución de recursos se efectuó en cumplimiento de lo dispuesto en el Otrosí No. 18, suscrito el 8 de agosto de 2025, mediante el cual se estableció la metodología para la distribución anticipada de los remanentes de la Subcuenta Redes. Conforme a esta metodología, el 40% de los recursos corresponde a la ANI y el 60% al concesionario, con el objetivo de fortalecer la disponibilidad de los mecanismos de compensación, entre ellos la Subcuenta de Excedentes ANI, destinada a atender las actas de compensación pendientes desde el año 2024.

Adicionalmente, en el marco de la Subcuenta Redes se aprobaron un total de 16 actas, por un valor acumulado de $17.154.144.924 M/CTE.

Tabla 8-45. Subcuenta Redes. Actas aprobadas

N. Acta	Costo total Ene 2017	Valor en M/CTE
Acta 1	$ 2.014.413.824	$ 2.064.767.892
Acta 2	$ 1.165.603.365	$ 1.229.655.800
Acta 3	$ 1.334.707.897	$ 1.411.084.565
Acta 4	$ 257.778.294	$ 275.672.333
Acta 5	$ 3.012.857.965	$ 3.312.648.197
Acta 6	$ 1.177.470.357	$ 1.301.633.366
Acta 7	$ 1.841.326.368	$ 2.058.161.836
Acta 8	$ 148.697.993	$ 169.891.759
Acta 9	$ 23.772.294	$ 27.949.566
Acta 10	$ 143.319.979	$ 167.681.481
Acta 11	$ 491.609.138	$ 599.557.226
Acta 12	$ 142.422.027	$ 181.263.587
Acta 13	$ 692.399.881	$ 927.564.910
Acta 14	$ 1.697.803.889	$ 2.305.597.800
Acta 15	$ 311.188.679	$ 453.501.179

N. Acta	Costo total Ene 2017	Valor en M/CTE
Acta 16	$ 433.413.779	$ 667.513.429
Total	$ 14.888.785.728	$ 17.154.144.926

Fuente: Concesionario CR Concesiones – Informe Final de Interventoría parte 4 de 4. Sección 10.0.13/ Archivo Calculo Indexación Acta de redes.

8.4.16.1. Fondeos

El valor estimado de redes que el Concesionario deberá aportar a la Subcuenta Redes corresponde a la suma de TREINTA y SIETE MIL OCHENTA y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS **($37.083.891.973)** del mes de referencia.

Tabla 8-46. Subcuenta Redes. Fondeo

CUENTA PROYECTO				
Subcuenta	**Aporte total en precios constantes**	**Fondeo total en precios ctes**	**Fecha de último fondeo**	**Fondeo a precios corrientes**
Redes	$ 37.083.891.973	$ 44.831.406.635	6-nov-19	$ 5.683.829.682

ANEXO: 4.18 FONDEOS

El Concesionario fondeó en su totalidad a la Subcuenta Redes, los valores contractuales equivalentes a $44.831.406.635 M/CTE.

En virtud del Laudo Arbitral CIRD No. 01 23 0002 8303, proferido el 30 de abril de 2026 por el Tribunal de Arbitramento constituido ante el Centro Internacional de Resolución de Disputas (CIRD) y cuya aplicación se dio a partir del 2 de mayo del mismo año, se declaró la Terminación Anticipada del Contrato de Concesión En consecuencia, el contrato entró en la etapa de reversión los fondeos a las subcuentas dejan de ser aplicables, dado que estas figuras corresponden únicamente a la etapa previa de ejecución ordinaria del contrato.

8.4.17. Subcuentas de la Financiación

Estas subcuentas fueron constituidas por instrucción expresa del fideicomitente, en concordancia con los acuerdos establecidos con el inversionista externo, con el propósito de dar cumplimiento a la estructura de financiación del proyecto. En este marco, se incluyen las siguientes subcuentas: Subcuenta de Balance, Subcuenta de Desembolsos de Créditos,

Subcuenta de Desembolsos de Equity, Subcuenta de Reserva de Deuda, Subcuenta IDC, Subcuenta Capex, Subcuenta de Pagos O&M y Subcuenta de Reserva O&M.

Tabla 8-47. Subcuentas Financiación

SUBCUENTA DE FINANCIACION				
SUBCUENTA	SALDO A 31 JULIO	INGRESO	EGRESO	SALDO A 31 AGOSTO
Reserva de Deuda	$ 72.899.835.275,26	$ 238.177.805,30	$ 73.138.013.080,56	0
Reserva de O&M	$ 27.177.599.014,87	$ 118.388.198,75	$ 15.401.462.449,20	$ 11.894.524.764,42
Subcuenta Balance	$ 75.899.712,11	$ 863.406.220,73	$ 921.248.325,53	$ 18.057.607,31
Subcuenta Capex	$ 8.466.545,38	$ 72.587,86	$ 9.538,00	$ 8.529.595,24
Pagos O&M	$ 1.902.013.374,03	$ 14.747.762.571,17	$ 14.374.547.443,42	$ 2.275.228.501,78

ANEXO: 4.15 Reserva deuda; Reserva de O&M; Subcuenta Balance; Subcuenta Capex; Pagos O&M

8.4.17.1. Créditos

Acorde con la información histórica proporcionada a la Interventoría IPAB, la estructura financiera estimada del proyecto contempla una distribución del 70% financiado con recursos de deuda y el 30% mediante aportes de equity. La deuda se encuentra estructurada en cuatro tramos, los cuales corresponden a una combinación entre créditos financieros y una emisión de bonos.

En este sentido, el Tramo A corresponde a un crédito otorgado por la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) por $400 mil millones, con un plazo de 9,7 años. Por su parte, el Tramo B está representado por un crédito de Bancolombia por $280 mil millones, con un plazo de 14,2 años. Adicionalmente, se cuenta con un crédito denominado en UVR del fondo de deuda CAF-AM por $270 mil millones, cuyo plazo es de 20,2 años.

Complementariamente, el 21 de diciembre de 2017 se realizó la emisión de bonos, bajo la regla 144A/Reg S de la SEC en Nueva York, por un valor de $522 mil millones, con un plazo de 26,2 años. Los desembolsos correspondientes a los tramos A y B, así como al crédito en UVR, se efectúan de manera progresiva conforme a las necesidades del proyecto, una vez se hayan agotado los recursos provenientes de la emisión de bonos.

En cuanto a los aportes de equity, los socios de la concesión asumieron el compromiso de realizar aportes por un valor total de $620 mil millones.

Finalmente, con corte al 31 de agosto de 2026, las obligaciones financieras y el nivel de endeudamiento registrados a nombre del fideicomiso son los siguientes:

Tabla 8-48. Obligaciones leasing financieros y operativos

OBLIGACIONES LEASING FINANCIEROS Y OPERATIVOS				
Obligación		Saldo Capital mes Anterior	Capital	Saldo Capital Actual
Leasing Bancolombia	335114	$ 197.051.863,00	-$1.252.073,00	$195.799.790,00
Leasing Bancolombia	336391	$ 325.326.321,00	-$2.067.219,00	$323.259.102,00
Leasing Bancolombia	334620	$ 1.523.713.190,00	-$23.532.250,00	$1.500.180.940,00
Leasing Bancolombia	334628	$ 1.149.904.169,00	-$22.488.144,00	$1.127.416.025,00
Leasing Bancolombia	338869	$ 883.923.806,00	-$12.219.992,00	$871.703.814,00
TOTAL		**$ 4.079.919.349,00**	**-$ 61.559.678,00**	**$ 4.018.359.671,00**

La financiación del proyecto de la Concesión Ruta al Mar S.A.S. fue estructurada a través de la Fiduciaria Bancolombia, en su calidad de agente fiduciario del Fideicomiso PA APP Ruta al Mar, mediante una combinación de recursos provenientes del mercado financiero internacional y del sistema financiero nacional. En particular, se contempló una emisión internacional de bonos bajo la regla 144A/Reg S de la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC), complementada con créditos otorgados por entidades financieras en Colombia. En esta estructura, el emisor de la financiación corresponde al Fideicomiso PA APP Ruta al Mar S.A.S.

Por su parte, la Concesionaria actúa como garante solidario de las obligaciones financieras derivadas de dicha financiación.

Los desembolsos de los recursos se realizan de manera gradual, conforme a las necesidades del proyecto, una vez se hayan utilizado los fondos provenientes de la emisión de Bonos.

A continuación, se establece una síntesis de las fuentes de financiación:

Tabla 8-49. Fuentes de financiación

	COPmm	US$mm
Cop Loan A	$ 400	$ 132,90
Cop Loan B	$ 280	$ 93,10

	COPmm	US$mm
UVR Loan	$ 270	$ 89,70
UVR Notes	$ 522	$ 173,50
Base Equity	$ 620	$ 206,00
Total	**$2.092 Billones**	**USD $695,2**

En la tabla contigua, se presentan las características de la emisión de bonos en el exterior:

Tabla 8-50. Emisión de bonos en el exterior

EMISOR	Fideicomiso P.A Concesión Ruta Al Mar			
CALIFICACIÓN	"BBB-"(en una escala global) por Fitch y "Baa3" por Moody´s			
MONEDA	Series A: Indexadas UVR			
VALOR DEL ENDEUDAMIENTO	Series A: COP 522,000,000,000			
CUPÓN	Series A: 6.750% por año, pagadero semestralmente, en cada Fecha de pago que comienza el 15 de agosto de 2018			
VENCIMIENTOS	Series A: febrero 15 de 2044			
TASA DE COMPRA	Series A:96.607% más intereses devengados, de haberlos, desde el 21 de diciembre de 2017.			
FECHA PAGO DE INTERESES	Febrero 15 y agosto 15 de cada año, exceptuando febrero de 2018.			
CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN	**SERIES**			
	FECHA DE PAGO PRINCIPAL	**%**	**FECHA DE PAGO PRINCIPAL**	**%**
	15-feb-32	1,000%	15-ago-38	8,500%
	15-ago-32	0,787%	15-feb-39	8,000%
	15-feb-33	0,787%	15-ago-39	3,000%
	15-ago-33	0,197%	15-feb-40	9,000%
	15-feb-34	0,197%	15-ago-40	3,750%
	15-ago-34	2,752%	15-feb-41	11,000%
	15-feb-35	2,752%	15-ago-41	3,000%
	15-ago-35	2,752%	15-feb-42	10,000%
	15-feb-36	2,097%	15-ago-42	9,000%
	15-ago-36	3,670%	15-feb-43	3,000%
	15-feb-37	2,621%	15-ago-43	3,000%
	15-ago-37	3,408%	15-feb-44	2,230%
				100,000
	15-feb-38	3,500%	**TOTAL**	**%**

Fuente: Elaboración propia

Con corte a la fecha del presente informe, se registran los siguientes desembolsos:

Tabla 8-51. Desembolsos

ENTIDAD	SALDO DESEMBOLSOS A 31 DE JULIO 2026	DESEMBOLSOS REALIZADOS EN AGOSTO 2026	REEXPRESIÓN DESEMBOLSOS	CAPITAL PAGADO AGOSTO 2026	SALDO DESEMBOLSOS A 31 DE AGOSTO 2026
Bancolombia	$ 248.220.000.013,51	$ -	$ -	$ 279.999.988,00	$ 247.940.000.025,51
Financiera Desarrollo Nacional	$ 206.660.987.884,42	$ -	$ -	$ -	$ 206.660.987.884,42
Ashmore CAF	$ 425.787.279.043,86	$ -	$ 1.176.849.223,10	$ -	$ 426.964.128.266,96
TOTALES	$ 880.668.266.941,79	$ -	$ 1.176.849.223,10	$ 279.999.988,00	$ 881.565.116.176,89

Fuente: Fiduciaria Bancolombia, Comité Fiduciario septiembre 2026 (corte a 31 de agosto de 2026).

Tabla 8-52. Intereses causados y pagados

ENTIDAD	SALDO INTERESES A 31 JULIO 2026	INTERESES CAUSADOS EN AGOSTO 2026	INTERESES PAGADOS A AGOSTO 2026	REEXPRESIÓN INTERESES	SALDO INTERESES A 31 AGOSTO 2026
Bancolombia	$ 16.422.337.050,90	$ 2.724.275.427,44	$ 15.466.074.856,00	$ -	$ 3.680.537.622,34
Financiera Desarrollo Nacional	$ 12.825.449.014,77	$ 2.073.913.575,06	$ 11.859.958.708,00	$ -	$ 3.039.403.881,83
Ashmore CAF	$ 20.471.661.040,75	$ 2.689.107.381,23	$ 15.471.841.450,87	$ 457.082.850,84	$ 8.146.009.821,95
TOTALES	**$ 49.719.447.106,42**	**$ 7.487.296.383,73**	**$ 42.797.875.014,87**	$ 457.082.850,84	**$ 14.865.951.326,12**

Fuente: Fiduciaria Bancolombia, Comité Fiduciario septiembre 2026 (corte a 31 de agosto de 2026).

8.5. FOSEVI

Mediante el comunicado 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260911012999 allegado a la Interventoría el 11 de septiembre de 2026, el Concesionario efectuó la Conciliación mensual por recaudo de FOSEVI con corte a agosto 2026 por un valor de $ 468.392.659,00, correspondiente a un total de 847.003 vehículos registrados durante el mes.

A continuación, se presenta el detalle de los valores transferidos asociados a los peajes de La Apartada, El Purgatorio, Los Cedros, Mata de Caña, San Onofre, Los Manguitos, San Carlos y La Caimanera.

Tabla 8-53. Fondo de Seguridad Vial (FOSEVI)

Mes	La Apartada	El Purgatorio	Los Cedros	Mata de Caña	San Onofre	Los Manguitos	San Carlos	Caimanera
Total	$ 96.642.833	$ 94.254.979	$ 34.134.478	$ 57.531.908	$ 51.191.210	$ 107.942.282	$ 26.694.969	$ -

8.6. FONSECON

Mediante correo electrónico, el Concesionario Ruta al Mar informó que, debido a la ausencia de retribución durante la etapa de reversión en la que se encuentra el proyecto, no cuenta con recursos para efectuar el pago de la contribución. En consecuencia, se mantiene como referencia el último pago realizado: según el comunicado con radicado ANI 48-RUTADCTOELECTRONICOS-20260710012497 del 10 de julio de 2026, allegado en copia a esta Interventoría, en el cual el Concesionario pagó al Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON) la contribución correspondiente al ingreso generado en el mes de abril de 2026 cuyo pago al Concesionario se realizó en junio, por un valor de $56.834.023 (CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL VEINTITRÉS PESOS M/CTE), calculada sobre el recaudo de las Unidades Funcionales 1 a 8.

Tabla 8-54. Pago FONSECON

Fecha De Pago	Periodo De Pago	Valor Base	Valor Pagado
10/07/2026	junio-26	$ 22,733,609,120	$ 56,834,023

En relación con el cálculo del FONSECON, la Interventoría Consorcio CR Concesiones y el Concesionario adelantaron diversas reuniones con el propósito de verificar la correcta determinación de este impuesto, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006. De acuerdo con esta disposición, la base de liquidación debe establecerse sobre el recaudo bruto generado por el Concesionario.

En este sentido, se identificó que los valores calculados inicialmente requerían ser ajustados, debido a que en la determinación preliminar se

incluyeron conceptos que no hacían parte de la fórmula establecida en la norma, tales como los rendimientos financieros.

En este sentido y con fundamento en lo siguiente:

"(…) El artículo 120 de la Ley 418 de 1997 modificado por el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006 establece que la Contribución Especial en contratos de concesión se calcula sobre el 2,5 por mil del valor total del recaudo bruto que genere la respectiva concesión, Este concepto abarca todos los ingresos generados en virtud del contrato, independientemente de su fuente o modalidad de remuneración,
El término "recaudo bruto" implica que los ingresos percibidos por el concesionario no están sujetos a deducción alguna antes de calcular la base gravable, Según el Oficio DIAN No, 080095 de 2013, este concepto ***"debe entenderse como el ingreso sin retención o descuento alguno recibido por la concesión,*** *Adicionalmente, los contratos de concesión, regulados por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, establecen que el concesionario tiene derecho a percibir ingresos provenientes de diferentes fuentes incluidos, por ejemplo, peajes, aportes públicos entre otros, para garantizar el retorno de su inversión, Así, todos estos ingresos constituyen la base gravable sobre la cual se debe liquidar la contribución,*

En consecuencia, la interpretación del término "recaudo bruto" incluye todos los ingresos percibidos por el concesionario en virtud del contrato de concesión, sin retención o descuento alguno" (…)",

Es menester plantear con claridad absoluta que en los descuentos por concepto de contraprestación y transferencias correspondientes a la ley 1106 de 2006 no se realizó la expresa excepción jurídica para estos conceptos y se vislumbró en su mandato legal que debía ser liquidada sobre el total del ingreso facturado de la base gravable para el pago de la contribución especial del 2,5x 1000 en el caso de las concesiones.

8.7. FONTUR

Atendiendo la solicitud del Consorcio IPAB, el Concesionario Ruta al Mar presentó el certificado de pago de la contribución correspondiente al Fondo Nacional de Turismo (FONTUR) para el II trimestre de 2026 el día 31 de julio de 2026 mediante correo electrónico, el pago, calculado conforme a los parámetros establecidos para este concepto fue sujeto a validación por parte de esta interventoría.

Es pertinente precisar que el valor total correspondiente al aporte FONTUR efectivamente pagado asciende a $64.312.000 con fecha de 29 de julio de 2026; el monto trasladado se determinó con base en los porcentajes de avance de obra del proyecto. En consecuencia, se encuentran pendientes por pagar $6.326.056, asociados a las Unidades Funcionales 2, 6, 7 y 8, los cuales serán cancelados de manera progresiva en la medida en que se registren los respectivos avances de obra. Cobra especial relevancia precisar que el proyecto se encuentra en Etapa de Reversión, iniciada el 2 de mayo de 2026 con la notificación del Laudo Arbitral CIRD No. 01-23-0002-8303 (proferido el 30 de abril de 2026), que declaró la Terminación Anticipada del Contrato de Concesión APP No. 016 de 2015, bajo este marco será la Agencia Nacional de Infraestructura la que determine el destino de los recursos pendientes.

Tabla 8-55. FONTUR

FIRMAS ACTAS	II-2026	% de Avance de Construcción
UF 1	$4.331.544.949	100%
UF 2	$2.876.394.493	80.550%
UF 3	$2.983.764.818	100%
UF 4	$2.167.185.242	100%
UF 5	$2.475.168.542	100%
UF 6	$4.385.230.112	88,146%
UF 7	$4.077.246.811	76,779%
UF 8	$4.958.813.690	89,829%
BASE	**$28.255.348.659**	
FONTUR %	**0,00250**	
FONTUR VALOR	**$70.638.372**	

Pago FONTUR por % de Avance de Construcción (A)	$64.312.316
Faltante (B)	$6.326.056

8.8. ESTADOS FINANCIEROS

8.8.1. Balance General

A continuación, se expone la información financiera del Balance General con corte al 31 de agosto de 2026, con fundamento en el reporte fiduciario presentado por la fiduciaria Bancolombia S.A.

Tabla 8-56. Estado de situación Financiera. Agosto 2026


CONCESIÓN RUTA AL MAR S.A.S • ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						
Contrato de Concesión No. 016 de 2015 | Análisis Financiero Mensual | Cifras en millones de COP						
IPAB – Interventoría Integral | Período: julio 2026 – agosto 2026						
DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	**JULIO-26**	**AGOSTO-26**	**VAR. ABSOLUTA (Actual – Ant.)**	**VAR. % (Actual / Ant.)**	**A. VERT. Mes Ant. (%)**	**A. VERT. Mes Act. (%)**
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE						
Efectivo	**$ 400.165,0**	**$ 339.639,8**	**($ 60.525,2)**	**(15,1%)**	**17,72%**	**15,39%**
Bancos y Otras Entidades Financieras	$ 400.165,0	$ 339.639,8	($ 60.525,2)	(15,1%)	17,72%	15,39%
Cuentas Por Cobrar	**$ 48.180,3**	**$ 61.200,9**	**$ 13.020,6**	**27,0%**	**2,13%**	**2,77%**
Impuestos	$ 0,4	$ 0,3	($ 0,0)	(5,0%)	0,00%	0,00%
Diversas C.P	$ 48.180,0	$ 61.200,6	$ 13.020,6	27,0%	2,13%	2,77%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**$ 448.345,3**	**$ 400.840,7**	**($ 47.504,6)**	**(10,6%)**	**19,85%**	**18,17%**
ACTIVO NO CORRIENTE						
Activos Materiales	**$ 10.094,6**	**$ 10.356,4**	**$ 261,7**	**2,6%**	**0,45%**	**0,47%**
Propiedad, Planta Y Equipo	$ 4.617,8	$ 4.928,0	$ 310,2	6,7%	0,20%	0,22%
Ppe Por Derechos De Uso	$ 5.476,8	$ 5.428,4	($ 48,4)	(0,9%)	0,24%	0,25%
Otros Activos	**$ 1.800.384,6**	**$ 1.795.093,0**	**($ 5.291,6)**	**(0,3%)**	**79,70%**	**81,36%**
Activos Intangibles	$ 1.798.500,0	$ 1.792.091,6	($ 6.408,3)	(0,4%)	79,62%	81,23%
Gastos Pagados Por Anticipado	$ 1.619,8	$ 1.314,8	($ 305,0)	(18,8%)	0,07%	0,06%
Diversos	$ 264,8	$ 1.686,6	$ 1.421,8	536,9%	0,01%	0,08%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**$ 1.810.479,3**	**$ 1.805.449,4**	**($ 5.029,8)**	**(0,3%)**	**80,15%**	**81,83%**
TOTAL ACTIVO	**$ 2.258.824,6**	**$ 2.206.290,1**	**($ 52.534,4)**	**(2,3%)**	**100,00%**	**100,00%**
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
Cuentas Por Pagar C.P	**$ 32.605,2**	**$ 29.499,4**	**($ 3.105,7)**	**(9,5%)**	**1,14%**	**1,05%**
Comisiones Y Honorarios	$ 10,6	$ 10,6	-	-	0,00%	0,00%
Costos Y Gastos Por Pagar	$ 22.232,4	$ 22.438,8	$ 206,4	0,9%	0,78%	0,80%
Impuestos	$ 338,4	$ 1.844,3	$ 1.505,9	445,0%	0,01%	0,07%
Proveedores Y Servicios	$ 10.023,7	$ 5.205,7	($ 4.818,0)	(48,1%)	0,35%	0,18%
Diversas C.P	**$ 128.642,8**	**$ 132.845,3**	**$ 4.202,6**	**3,3%**	**4,52%**	**4,71%**
Retenciones a Terceros	**$ 4.107,4**	**$ 4.187,9**	**$ 80,5**	**2,0%**	**0,14%**	**0,15%**
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**$ 165.355,3**	**$ 166.532,7**	**$ 1.177,4**	**0,7%**	**5,81%**	**5,90%**

CONCESIÓN RUTA AL MAR S.A.S • ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						
Contrato de Concesión No. 016 de 2015 | Análisis Financiero Mensual | Cifras en millones de COP						
IPAB – Interventoría Integral | Período: julio 2026 – agosto 2026						
DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	**JULIO-26**	**AGOSTO-26**	**VAR. ABSOLUTA (Actual – Ant.)**	**VAR. % (Actual / Ant.)**	**A. VERT. Mes Ant. (%)**	**A. VERT. Mes Act. (%)**
PASIVO NO CORRIENTE						
Instrumentos Financieros	**$ 584.857,5**	**$ 563.364,7**	**($ 21.492,8)**	**(3,7%)**	**20,54%**	**19,96%**
Títulos De Inversión en circulación	$ 579.804,9	$ 558.306,4	($ 21.498,5)	(3,7%)	20,36%	19,78%
Pasivos Por Arrendamientos	$ 5.052,6	$ 5.058,3	$ 5,8	0,1%	0,18%	0,18%
Créditos de Bancos y Otras Obligaciones Financieras	**$ 918.617,8**	**$ 884.647,6**	**($ 33.970,2)**	**(3,7%)**	**32,25%**	**31,34%**
Otros Bancos Y Entidades	$ 918.617,8	$ 884.647,6	($ 33.970,2)	(3,7%)	32,25%	31,34%
Cuentas Por Pagar L.P	**$ 869.943,5**	**$ 869.943,5**	**-**	**-**	**30,55%**	**30,82%**
Deuda Subordinada Especie	$ 28.778,1	$ 28.778,1	-	-	1,01%	1,02%
Deuda Subordinada Socio	$ 546.021,9	$ 546.021,9	-	-	19,17%	19,35%
Intereses Deuda Subordinada	$ 295.143,2	$ 295.143,2	-	-	10,36%	10,46%
Retención por pagar proveedor	$ 0,3	$ 0,3	-	-	0,00%	0,00%
Provisiones	**$ 16.812,2**	**$ 16.812,2**	**-**	**-**	**0,59%**	**0,60%**
Mantenimiento Y Reparaciones	$ 16.683,2	$ 16.683,2	-	-	0,59%	0,59%
Multas Y Sanciones, Litigios	$ 129,0	$ 129,0	-	-	0,00%	0,00%
Diversos L.P	**$ 292.466,6**	**$ 321.092,6**	**$ 28.626,0**	**9,8%**	**10,27%**	**11,38%**
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**$ 2.682.697,7**	**$ 2.655.860,7**	**($ 26.837,0)**	**(1,0%)**	**94,19%**	**94,10%**
TOTAL PASIVO	**$ 2.848.053,0**	**$ 2.822.393,4**	**($ 25.659,6)**	**(0,9%)**	**100,00%**	**100,00%**
PATRIMONIO						
Patrimonio Especiales	**$ 925,4**	**$ 925,4**	**-**	**-**	**0,16%**	**0,15%**
Acreedores Fiduciarios	$ 925,4	$ 925,4	-	-	0,16%	0,15%
Aportes En Dinero	*$ 700,0*	*$ 700,0*	-	-	*0,12%*	*0,11%*
Aportes Otros Ingresos	*$ 225,4*	*$ 225,4*	-	-	*0,04%*	*0,04%*
Ganancias O Pérdidas	**($ 590.153,9)**	**($ 617.028,7)**	**($ 26.874,9)**	**(4,6%)**	**(100,16%)**	**(100,15%)**
Perdidas Acum.Ejerc.Ant	($ 495.161,7)	($ 495.161,7)	-	-	(84,04%)	(80,37%)
Pérdida Del Ejercicio	($ 94.992,2)	($ 121.867,0)	($ 26.874,9)	(28,3%)	(16,12%)	(19,78%)
TOTAL PATRIMONIO	**($ 589.228,4)**	**($ 616.103,3)**	**($ 26.874,9)**	**(4,6%)**	**(100,00%)**	**(100,00%)**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**$ 2.258.824,6**	**$ 2.206.290,1**	**($ 52.534,4)**	**(2,3%)**	**100,00%**	**100,00%**

Fuente. Fiduciaria Bancolombia S,A, (Expresado en millones de pesos)

8.8.2. ACTIVO

Grafica 40. Activo corriente vs No corriente

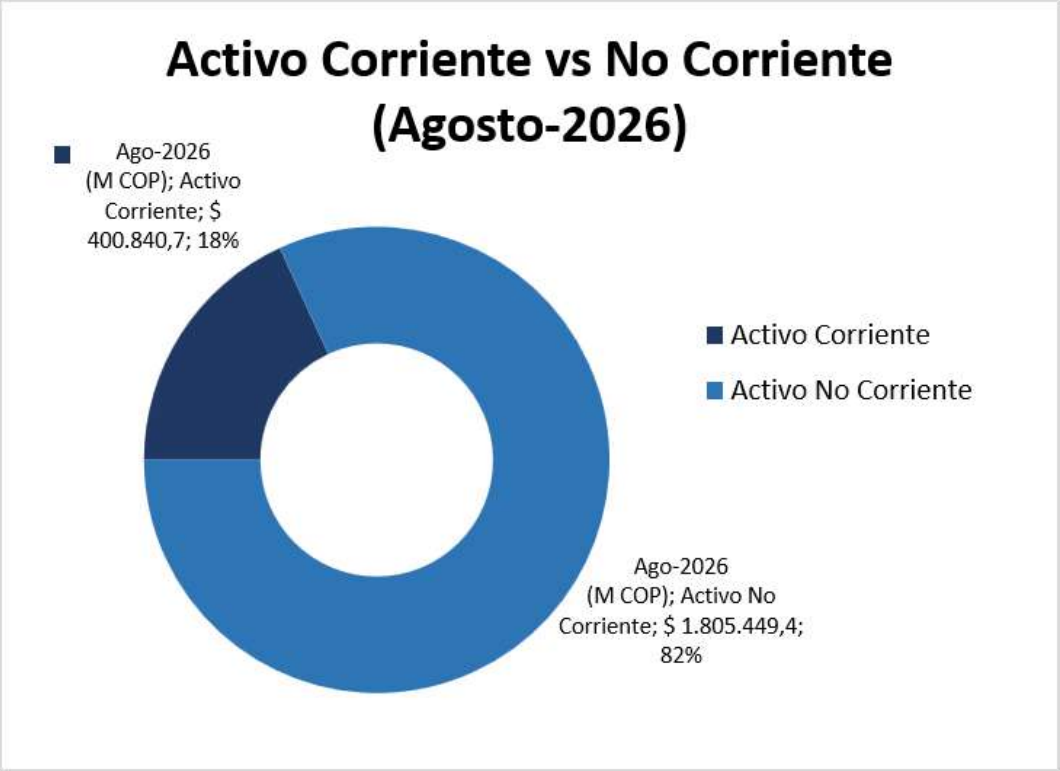

Fuente. Fiduciaria Bancolombia S.A (Cifras en Millones de pesos)

8.8.2.1. Análisis global del activo

Al cierre de agosto de 2026, el activo total del P.A. Concesión Ruta al Mar asciende a $2.206.290 millones, con una disminución de $52.534 millones (−2,33%) frente a julio ($2.258.825 millones). Es la primera reducción del activo desde febrero de 2026 y obedece casi por completo al activo corriente, que cae $47.505 millones (−10,60%) hasta $400.841 millones, mientras el activo no corriente se reduce $5.030 millones (−0,28%) hasta $1.805.449 millones.

La estructura conserva su concentración en el largo plazo: el activo no corriente representa el 81,83% del total (80,15% en julio) y, dentro de él, el derecho de concesión equivale al 99,26% (Activo Intangible). La caída del activo corriente responde a la salida de efectivo por el servicio de la deuda —pago de intereses causados de créditos bancarios y de bonos—, compensada

parcialmente por el crecimiento de las cuentas por cobrar diversas (+$13.021 millones), cuyo origen es nuevamente el reconocimiento de la Remuneración Principal frente a la ANI sin recaudo, es importante anotar que este rubro no tiene respaldo alguno ya que actualmente se encuentra en proceso de negociación el Otrosí19. El activo no corriente refleja la amortización del intangible (−$6.408,3 millones) y del seguro pagado por anticipado (−$305,0 millones), parcialmente compensada por nuevos anticipos a contratos (+$1.421,8 millones) y compras de vehículos (+$387,1 millones). En síntesis, el activo se contrae por la atención de obligaciones financieras con recursos de la fiducia, y la porción que crece —las cuentas por cobrar a la ANI— es precisamente la de menor calidad y liquidez.

8.8.2.1.1 Bancos y otras entidades financieras: $400.165 → $339.640 millones | −$60.525 millones (−15,13%)

Se presenta Constituye la variación de mayor materialidad del activo en el período y explica el -115,2% de su disminución neta. El Balance de Prueba registra débitos por $72.352,8 millones y créditos por $132.878,0 millones.

La salida se concentró en las cuentas de ahorro del grupo 111505504: la cuenta AHO 24586437875 se agotó por completo (de $72.899,8 millones a cero) y la AHO 24586438073 se redujo $15.283,1 millones. Esas salidas coinciden con la cancelación de intereses causados de la deuda: la subcuenta de intereses bancarios (243505004) registra débitos por $42.797,9 millones y la de intereses de bonos (213007010) débitos por $29.074,0 millones, estos últimos girados a través de proveedores del exterior.

En sentido contrario, las cuentas de ahorro de recaudo (111505503) aumentaron $28.586,1 millones, en línea con los recaudos de peaje acumulados a favor de la ANI. La participación del efectivo en el activo total desciende de 17,72% en julio a 15,39% en agosto.

8.8.2.1.2 Cuentas por Cobrar Diversas: $48.180 → $61.201 millones | +$13.021

Constituye la segunda variación en magnitud del activo y la única partida del activo corriente que registra incremento en el período. El saldo de las Cuentas por Cobrar Diversas pasa de $48.180,0 a $61.200,6 millones, con un aumento de $13.020,6 millones (+27,03%), y acumula tres meses consecutivos de crecimiento. El 96,8% del incremento se explica por la subcuenta 169095002030 REMUNERACIÓN PRINCIPAL, a cargo de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, cuyo saldo pasa de $37.749,7 a $50.354,4 millones (+$12.604,6 millones), con contrapartida en la cuenta de ingreso 410185 Participaciones en Concesiones.

El aumento restante obedece principalmente a las cuentas por cobrar por concepto de peajes, que pasan de $3.146,6 a $3.438,4 millones (+$291,8 millones). Por su parte, la subcuenta CXC PA TRANSACCIÓN registra débitos y créditos por $85.033,7 millones y cierra sin saldo, movimiento que corresponde a un traslado interno entre encargos fiduciarios sin efecto neto en el balance. Al cierre de agosto, la cuenta representa el 15,27% del activo corriente y el 2,77% del activo total.

8.8.2.1.3 Activos Intangibles – derecho de concesión: $1.798.500 → $1.792.092 millones | −$6.408 millones (−0,36%)

Corresponde al derecho de concesión reconocido conforme a la CINIIF 12 y Corresponde al derecho de concesión reconocido como activo intangible conforme a la CINIIF 12 y constituye la tercera variación en magnitud del activo, así como la principal partida que explica la disminución del activo no corriente.

El saldo pasa de $1.798.500,0 a $1.792.091,6 millones, con una disminución de $6.408,3 millones (−0,36%), originada exclusivamente en créditos por amortización, sin débitos en el período. El valor amortizado coincide exactamente con el gasto registrado en la cuenta 5180 Amortización de Activos Intangibles del Estado de Resultados. La participación de la cuenta en el activo total aumenta de 79,62% a 81,23%, efecto que no obedece a un crecimiento propio de la partida sino a la contracción del activo corriente, principalmente del efectivo.

8.8.2.1.4 Diversos – anticipos a contratos (1960): $265 → $1.687 millones | +$1.422 millones (+536,9%)

Constituye la cuarta variación en magnitud del activo. La cuenta recoge los anticipos entregados a contratistas pendientes de legalización y, tras tres meses consecutivos de contracción, su saldo pasa de $264,8 a $1.686,6 millones, con un aumento de $1.421,8 millones (+536,9%), equivalente a 6,4 veces el saldo de julio. La variación se concentra en la subcuenta 196095001007 ANTICIPOS A CONTRATOS, que registra débitos por $1.481,9 millones —de los cuales $1.185,6 millones (80,0%) corresponden a CONSORCIO TREMENTINO II y $146,8 millones a JV CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.— y créditos por legalizaciones de $60,1 millones. Por su parte, la subcuenta FONDO ROTATORIO registra débitos y créditos por $7.973,0 millones y cierra sin saldo, por lo que no tiene efecto neto en el balance.

8.8.2.1.5 Propiedad, Planta y Equipo (1801): $4.618 → $4.928 millones | +$310 millones (+6,72%)


Constituye la quinta variación en magnitud del activo. El saldo de la Propiedad, Planta y Equipo pasa de $4.617,8 a $4.928,0 millones, con un aumento de $310,2 millones (+6,72%), resultado de débitos por $426,3 millones y créditos por $116,2 millones en el período. El incremento se explica principalmente por la subcuenta 180112001003 VEHÍCULOS (TERC) REVERSIBLES, cuyo saldo pasa de $753,3 a $1.140,4 millones (+$387,1 millones) por la adquisición de vehículos al proveedor INVERSIONES GEZPOMOTOR S.A.S. Los créditos corresponden al cargo por depreciación del mes y a bajas de menor cuantía. Por su parte, los activos por derecho de uso (1802) disminuyen $48,4 millones (−0,88%) como efecto de la depreciación ordinaria, sin que se registren nuevas bajas en el período.

Cobra especial relevancia precisar que el proyecto se encuentra en Etapa de Reversión, iniciada el 2 de mayo de 2026 con la notificación del Laudo Arbitral CIRD No. 01-23-0002-8303 (proferido el 30 de abril de 2026), que declaró la Terminación Anticipada del Contrato de Concesión APP No. 016 de 2015. Agosto es, por tanto, el cuarto mes completo bajo esta etapa. Actualmente se trabaja conjuntamente en la construcción de un Otrosí al Contrato de

Concesión en el cual se determinará el valor o porcentaje de la remuneración a la que tiene derecho el Concesionario conforme a la cláusula 9.7 (Etapa de Reversión), ya que durante dicha etapa el Concesionario deberá continuar con las labores de Operación y Mantenimiento del corredor vial y tendrá derecho a recibir la citada remuneración.

8.8.3. PASIVO

Grafica 41. Pasivo corriente vs no corriente

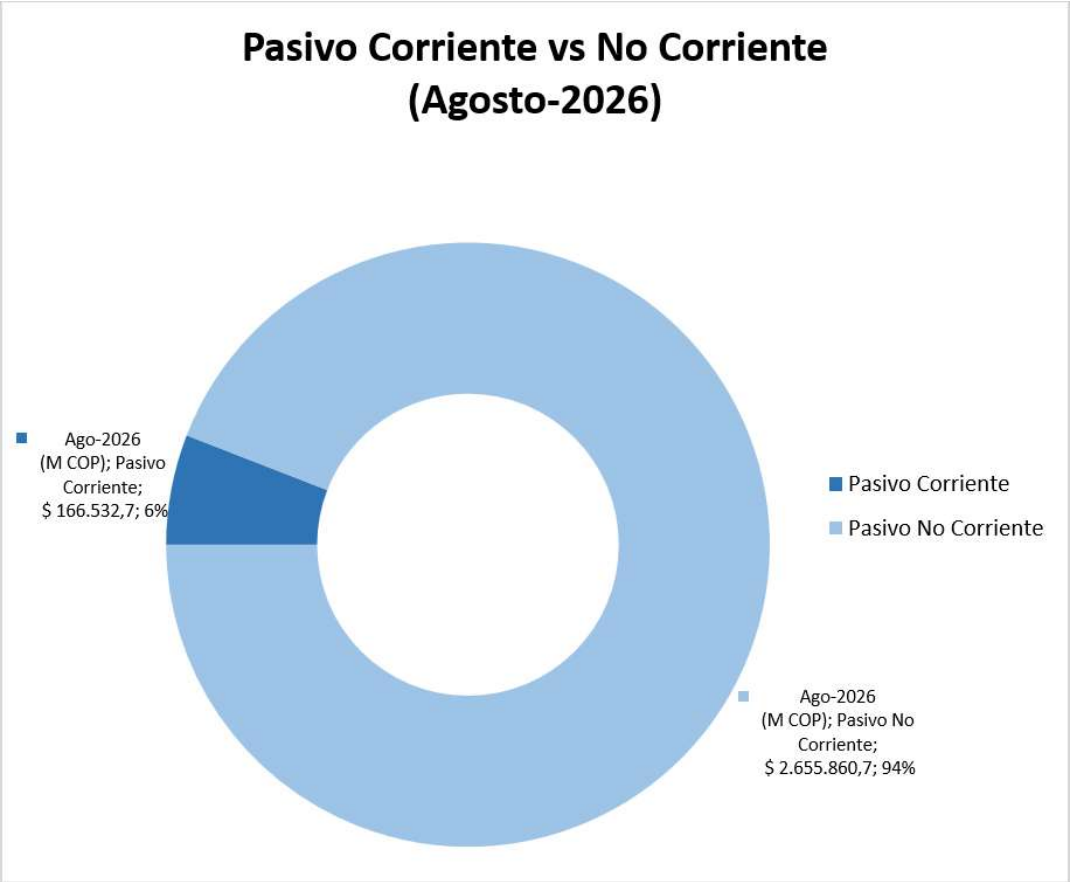

Fuente. Fiduciaria Bancolombia S.A (Cifras en cientos de pesos)

8.8.3.1. Análisis global del pasivo

Al cierre de agosto de 2026 el pasivo total del Patrimonio Autónomo Concesión Ruta al Mar asciende a $2.822.393 millones, con una disminución de $25.660

millones (−0,90%) frente a julio ($2.848.053 millones). Es la primera reducción del pasivo desde febrero de 2026 y obedece al pago de intereses causados de la deuda financiera, no a amortización de capital. El pasivo no corriente disminuye $26.837 millones (−1,00%) hasta $2.655.861 millones y concentra el 94,10% del total; el pasivo corriente aumenta $1.177 millones (+0,71%) hasta $166.533 millones (5,90%). Dentro del no corriente, los créditos bancarios (2435) bajan $33.970 millones por la cancelación de intereses bancarios (débitos por $42.797,9 millones en la subcuenta 243505004, frente a una causación de $7.944,4 millones) y los títulos de inversión (2130) bajan $21.499 millones por el pago de intereses de bonos ($29.074,0 millones en la subcuenta 213007010). El capital de ambas obligaciones no se reduce: el principal de los bonos aumenta $1.375,6 millones y el de los créditos $883,3 millones.

En sentido contrario, los Diversos de largo plazo (2990) crecen $28.626 millones, casi en su totalidad por recaudos de peaje retenidos a favor de la ANI. La deuda subordinada ($869.944 millones) y las provisiones ($16.812 millones) no registran variación. El pasivo continúa superando al activo en $616.103 millones, brecha que se amplía en $26.875 millones en el mes.

8.8.3.1.1 Créditos de Bancos y Otras Entidades Financieras : $918.618 → $884.648 millones | −$33.970 millones (−3,70%)

Constituye la variación de mayor magnitud absoluta del pasivo en el período. La subcuenta 243505004 INTERESES BANCOS pasa de $49.719,5 a $14.866,0 millones: registra débitos por $42.797,9 millones (pago de intereses causados) y créditos por $7.944,4 millones (causación del mes). El capital (243505002 Bancos y Entidades Financieras de Largo Plazo) aumenta de $868.898,4 a $869.781,7 millones (+$883,3 millones). El Estado de Resultados registra en el mes $7.487,3 millones de intereses de créditos bancarios (510310). El pago se atendió con recursos del fideicomiso, lo que explica la caída del efectivo.

8.8.3.1.2 Diversos de Largo Plazo – recaudos y rendimientos a favor de terceros: $292.467 → $321.093 millones | +$28.626 millones (+9,79%)

Segunda variación en magnitud del período y la principal que aumenta el pasivo. La subcuenta 299095020 OTROS PASIVOS aumenta $25.939,5

millones, explicada por los recaudos de peaje acumulados a favor de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA en siete estaciones: Manguitos (+$7.299,6 millones), La Apartada (+$6.585,5 millones), San Onofre (+$3.529,3 millones), Purgatorio (+$3.468,6 millones), Mata de Caña (+$2.295,6 millones), Los Cedros (+$1.304,0 millones) y San Carlos (+$1.227,3 millones), que suman $25.710 millones, más la compensación de riesgo del 0,9% (+$228,9 millones). La subcuenta 299040 Ingresos Recibidos para Terceros aumenta $2.683,9 millones.

8.8.3.1.3 Instrumentos Financieros – Títulos de Inversión en circulación: $579.805 → $558.306 millones | −$21.499 millones (−3,71%)

Constituye la tercera variación en magnitud del pasivo y corresponde a los Bonos de Garantía General. La disminución de $21.498,5 millones obedece a dos efectos de signo contrario. Por un lado, los intereses por pagar (213007010) se reducen $22.874,1 millones, de $82.125,3 a $59.251,2 millones, toda vez que en el mes se pagaron intereses por $29.074,0 millones, cifra superior a la causación del período ($6.199,9 millones). Dicho pago se canalizó a través de la cuenta de proveedores del exterior (251105004), con CITIBANK NEW YORK como agente de pago. Por otro lado, el capital (213007001) aumenta $1.375,6 millones, de $497.679,7 a $499.055,2 millones.

8.8.3.1.4 Proveedores y Servicios por Pagar (2511): $10.024 → $5.206 millones | −$4.818 millones (−48,07%)

Cuarta variación en magnitud del período. La subcuenta 251105003 PROVEEDORES baja de $10.023,7 a $4.255,1 millones (−$5.768,6 millones) por pagos superiores a las causaciones del mes (débitos $52.988,6 millones; créditos $47.220,1 millones). La subcuenta 251105004 PROVEEDORES DEL EXTERIOR, que inicia en cero, registra créditos por $30.024,6 millones y débitos por $29.074,0 millones, y cierra en $950,6 millones: es el vehículo de pago de los intereses de bonos.


8.8.3.1.5 Diversas CxP Corto Plazo: $128.643 → $132.845 millones (+$4.203)

Las Diversas Cuentas por Pagar de corto plazo aumentan $4.202,6 millones (+3,27%), por los intereses de deuda subordinada no facturados (259095003076), que pasan de $116.117,1 a $122.200,5 millones (+$6.083,4 millones), y el neto de la reducción de la cuenta de Fideicomitentes ($12.520,9 → $10.640,0 millones) de -$1.880.868.668,12

8.8.4. PATRIMONIO

8.8.4.1. Análisis global del patrimonio

Grafica 42. Pérdidas del ejercicio. Comparativo julio vs agosto

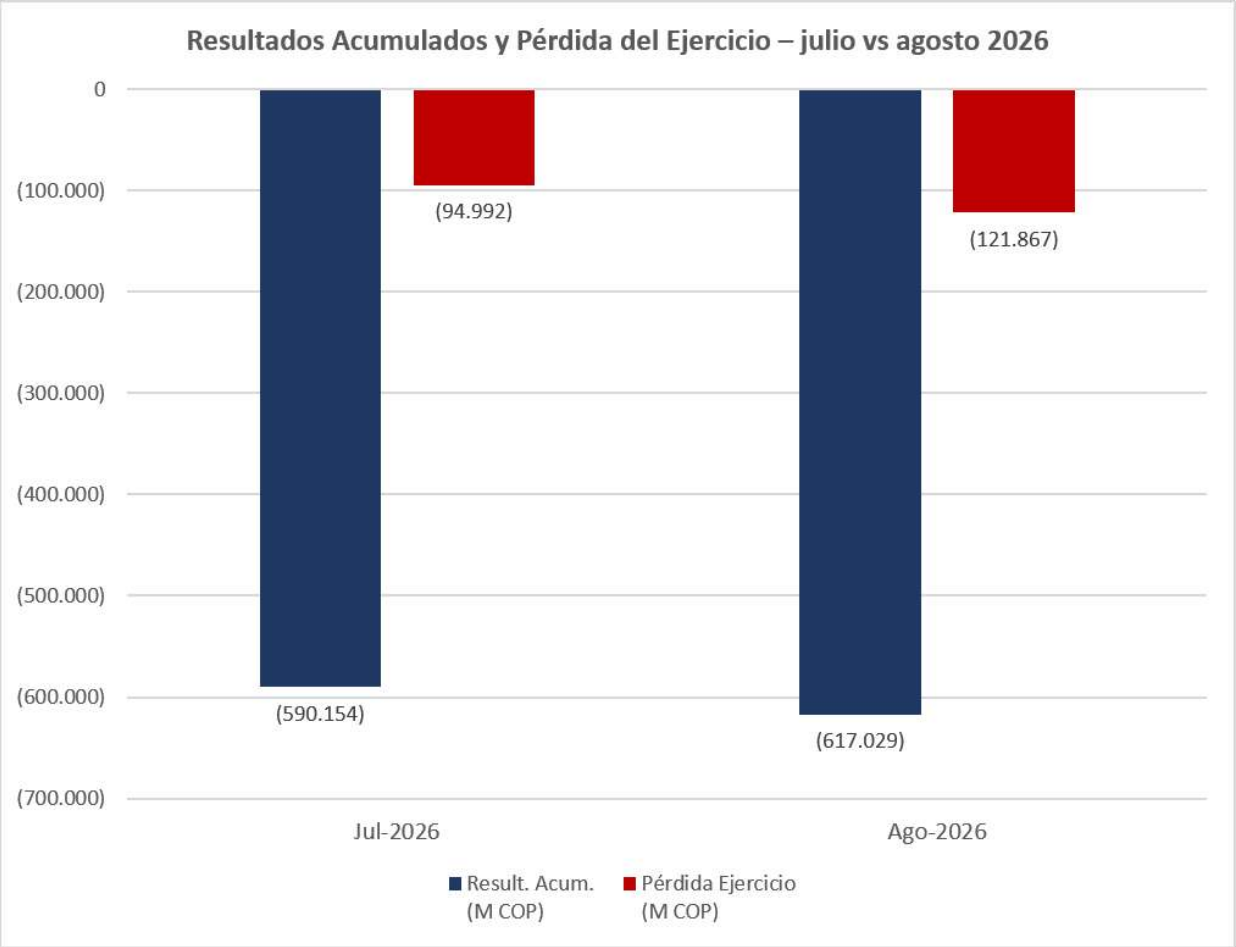

Fuente: Fiduciaria Bancolombia S,A (Cifras en Millones de pesos)

Al cierre de agosto de 2026 el patrimonio del Patrimonio Autónomo Concesión Ruta al Mar registra un saldo negativo de −$616.103 millones, con un deterioro de $26.875 millones (−4,56%) frente a julio (−$589.228 millones). La totalidad del movimiento obedece a la pérdida del mes de agosto, que eleva la pérdida acumulada del ejercicio de −$94.992 millones a −$121.867 millones. Las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores (−$495.162 millones) y los aportes fiduciarios ($925,4 millones) no registran variación. El déficit patrimonial equivale al 27,92% del activo total (26,09% en julio) y la relación

pasivo/activo sube a 1,28. La pérdida del mes (−$26.875 millones) es inferior en $3.957 millones a la de julio (−$30.832 millones), pero se mantiene muy por encima del promedio mensual del ejercicio ($15.233 millones). Su origen es estructural: los ingresos del mes ($13.335 millones, de los cuales $12.605 millones son Remuneración Principal no recaudada) cubren apenas un tercio de los costos y gastos del período ($40.210 millones), dominados por la carga financiera ($22.769 millones) y la amortización del intangible ($6.408 millones).

8.8.4.1.1 Pérdida del Ejercicio (3920): −$94.992 → −$121.867 millones | −$26.875 millones (−28,29% de mayor pérdida)

Constituye el único movimiento patrimonial del período y explica la totalidad del deterioro del patrimonio. La subcuenta 392000 Pérdida del Ejercicio registra débitos por $26.874,9 millones, en correspondencia exacta con el resultado del mes en el Estado de Resultados: ingresos por $13.334,8 millones frente a gastos de operación por $30.698,7 millones y costos por $9.511,0 millones. Por componentes, la pérdida del mes se explica por los intereses de créditos y deuda subordinada ($13.570,7 millones), la amortización del intangible ($6.408,3 millones), los intereses de bonos ($5.833,8 millones), la reexpresión de pasivos ($3.364,8 millones) y los costos de operación y mantenimiento ($9.511,0 millones).


8.8.4.1.2 Pérdidas Acumuladas de Ejercicios Anteriores (3910): −$495.162 → −$495.162 millones | sin variación

La cuenta no registró movimiento en el período y conserva un saldo negativo de $495.161,7 millones, correspondiente al resultado acumulado de ejercicios anteriores trasladado en el cierre de 2025. Su participación en el déficit patrimonial baja de 84,04% a 80,37% por el crecimiento de la pérdida del ejercicio.

8.8.4.1.3 Patrimonios Especiales – Acreedores Fiduciarios (35 / 3505): $925,4 → $925,4 millones | sin variación

La cuenta no registró movimiento en el período y conserva un saldo de $925,4 millones, integrado por aportes en dinero ($700,0 millones) y otros aportes ($225,4 millones). Constituye el único componente positivo del patrimonio.

Grafica 43. Patrimonio total

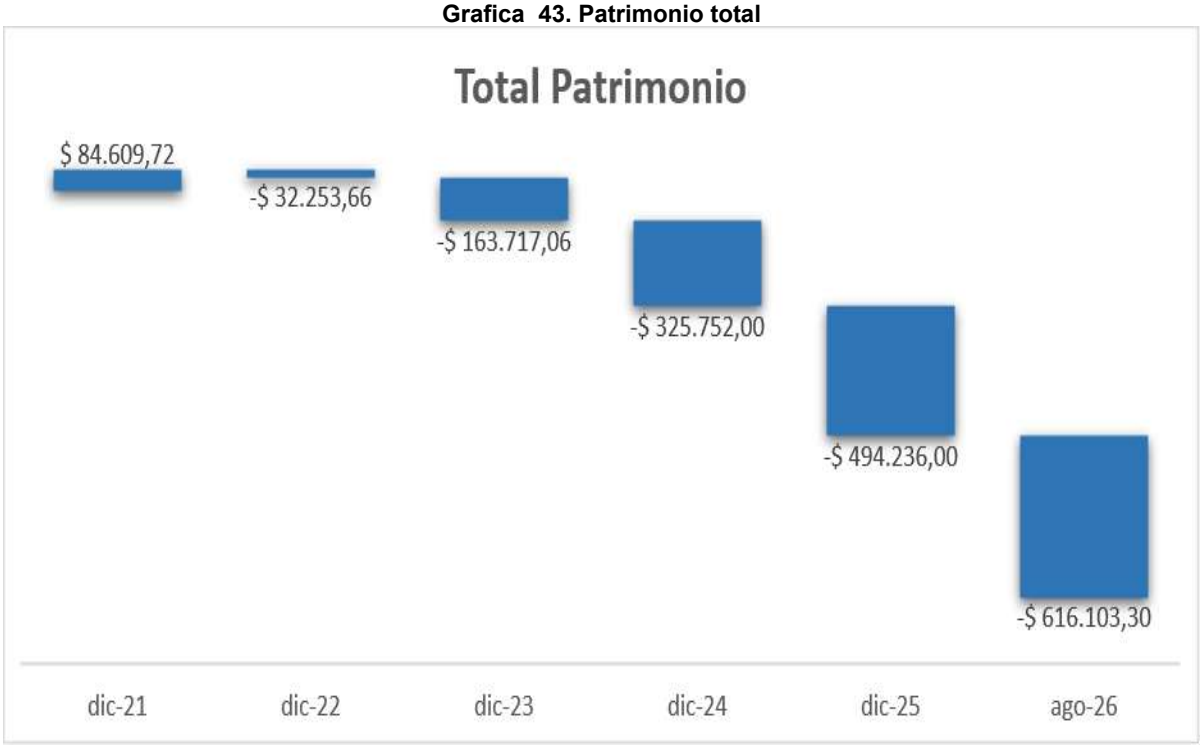

Fuente: Fiduciaria Bancolombia S,A (Cifras en Millones de pesos)

El Concesionario Ruta al Mar S.A.S., en los estados financieros auditados con corte al 30 de junio de 2025, incorporó un análisis bajo la hipótesis de negocio en marcha, en el cual se pronunció en los siguientes términos:

> *"Concesión Ruta al Mar SAS A 30 de junio de 2025, presenta un patrimonio negativo, lo cual podría interpretarse como un indicio de incumplimiento con la hipótesis de negocio en marcha; ante esta situación Concesión Ruta al Mar SAS confirma que la empresa, a pesar de tener un patrimonio negativo, cumple con la hipótesis de negocio en marcha, y revela los puntos de vista sobre los que se basa la confirmación.*
>
> *Las pérdidas que presenta la Concesión Ruta al Mar SAS, se deben principalmente a los costos financieros, los cuales son muy elevados en toda la etapa de construcción (etapa que se encuentra la Concesión*

Ruta al Mar SAS actualmente) y al inicio de la etapa de Operación y Mantenimiento, debido a la estructura financiera definida en el cierre financiero. Así las cosas, como la UF1 y la UF3 fueron entregadas totalmente, no es posible continuar capitalizando los costos por préstamos (según NIC 23 Costos por Préstamos) al activo intangible por encontrarse dichas UF en etapa de operación y mantenimiento, lo cual significa que dichos costos por préstamos asociados a éstas dos unidades funcionales, deben ir directamente a resultados, así como también se realizó una entrega parcial de las UF2, UF6 UF7 y UF8 , en donde la parte que corresponde a los costos por préstamos de esa entrega parcial, tampoco es posible capitalizarla en el activo intangible (según NIC 23 Costos por Préstamos) , ya que una parte de las UF está en construcción (capitalizable) y la otra parte en operación y mantenimiento (la parte entregada parcialmente, que no es capitalizable); y este movimiento es el que genera las pérdidas.

Esta estructura financiera está planteada de esta forma desde el inicio de la Concesión, teniendo en cuenta que así es el funcionamiento de este tipo de negocio. Inicialmente los recursos para poder ejecutar la obra y cumplir con la etapa de construcción, son bastante elevados y se debe recurrir al endeudamiento, que para el caso de Concesión Ruta al Mar SAS tiene la emisión de bonos, los tres tramos de crédito (Ver nota 18 y 19) y la deuda subordinada con los socios (Ver nota 22), los costos financieros de este endeudamiento son muy elevados y es lo que produce las pérdidas contables. Dentro del modelo financiero, en el año 2030 se empiezan a generar utilidades, pero en el año 2037 es donde revierte los resultados acumulados negativos y empieza a generar resultados acumulados positivos, lo cual es prueba de que este tipo de negocio funciona inicialmente con pérdidas contables y posteriormente, una vez se empiece a amortizar el endeudamiento en la etapa de operación y mantenimiento, se empieza a revertir.

Como se explica anteriormente, este tipo de negocio está estructurado de esta forma desde su inicio y prueba de ello es su modelo financiero, por lo tanto, el patrimonio negativo, no significa que la empresa este poniendo en duda su continuidad o la hipótesis de negocio en marcha, sino, por el contrario, que es resultado del tipo de negocio de las Concesiones 4G en Colombia, y por este motivo confirmamos que Concesión Ruta al Mar SAS a pesar de tener un patrimonio negativo

para JUNIO 2025, reflejado principalmente por sus costos financieros, se encuentra cumpliendo actualmente con la hipótesis de negocio en marcha..”

A partir de este pronunciamiento, el Concesionario sustentó que la continuidad operacional de la empresa se encuentra respaldada por los ingresos futuros derivados del contrato de concesión, así como por las fuentes de financiación de corto y mediano plazo estructuradas desde el cierre financiero del proyecto, dentro de las cuales se contemplan la emisión de bonos, los tres tramos de crédito y la deuda subordinada con los socios. En este marco, el modelo financiero del proyecto proyecta la generación de utilidades a partir del año 2030 y la reversión de los resultados acumulados negativos en el año 2037, lo cual es coherente con la naturaleza y el ciclo financiero propio de las concesiones de infraestructura de cuarta generación en Colombia.

No obstante lo anterior, el Consorcio IPAB, en su calidad de Interventoría Integral del Contrato de Concesión No. 016 de 2015, toma nota del seguimiento iniciado por la Interventoría predecesora CR Concesiones mediante la comunicación CI.023/AB13027/24/7.2 del 20 de noviembre de 2024, en la cual se advirtió sobre la acumulación consecutiva de pérdidas desde el año 2022 y se requirió pronunciamiento formal de la Revisoría Fiscal y la Dirección Financiera del proyecto y en cumplimiento de sus obligaciones contractuales de seguimiento financiero, el Consorcio IPAB continuará realizando el monitoreo periódico de los resultados financieros de la concesión, verificando que el comportamiento de las pérdidas se mantenga dentro de los parámetros previstos en el modelo financiero del proyecto y que el Concesionario dé cumplimiento oportuno a sus obligaciones de reporte, transparencia y revelación de información financiera ante la Interventoría y la Agencia Nacional de Infraestructura.

Es importante precisar que el Contrato de Concesión APP No. 016 del 14 de octubre de 2015, suscrito entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Concesionaria Ruta al Mar S.A.S. (CORUMAR S.A.S.) para la financiación, construcción, mejoramiento, operación y mantenimiento del corredor vial que conecta los departamentos de Antioquia y Bolívar, entró formalmente en su Etapa de Reversión a partir del 2 de mayo de 2026, fecha en la cual fue notificado a las partes el Laudo Arbitral CIRD No. 01-23-0002-8303, proferido el 30 de abril de 2026 por el Tribunal de Arbitramento constituido ante el Centro Internacional de Resolución de Disputas (CIRD). En dicha decisión, el Tribunal

declaró la Terminación Anticipada del Contrato con fundamento en las cuatro causales invocadas por la parte convocante, todas ellas atribuibles a incumplimientos contractuales imputables a la ANI, y ordenó la aplicación de la Fórmula de Terminación Anticipada prevista en la Sección 18.4 del Contrato.

8.9. ESTADO DE RESULTADOS

Tabla 8-57. Estado de resultados agosto 2026

CONCESIÓN RUTA AL MAR S.A.S • ESTADO DE RESULTADOS						
Contrato de Concesión No. 016 de 2015 | Análisis Financiero Mensual | Cifras en millones de COP						
IPAB – Interventoría Integral | Período: julio 26 – Agosto 2026						
DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	**JULIO-26**	**AGOSTO-26**	**VAR. ABSOLUTA (Actual – Ant.)**	**VAR. % (Actual / Ant.)**	**A. VERT. Mes Ant. (%)**	**A. VERT. Mes Act. (%)**
INGRESOS						
Ingresos De Operaciones	**$ 193.108,8**	**$ 206.443,6**	**$ 13.334,8**	**6,9%**	**100,00%**	**100,00%**
Industrial Y De Servicio	$ 73.580,9	$ 86.185,5	$ 12.604,6	17,1%	38,10%	41,75%
Deposito A La Vista- Cuentas De Ahorro	$ 6.339,9	$ 6.951,0	$ 611,2	9,6%	3,28%	3,37%
Cambios	$ 146,9	$ 251,8	$ 104,9	71,4%	0,08%	0,12%
Por venta de propiedades y equipo	$ 16,8	$ 30,9	$ 14,1	84,4%	0,01%	0,01%
Diversos	$ 113.024,4	$ 113.024,4	$ 0,0	0,0%	58,53%	54,75%
TOTAL INGRESOS	**$ 193.108,8**	**$ 206.443,6**	**$ 13.334,8**	**6,9%**	**100,00%**	**100,00%**
GASTOS DE OPERACIÓN						
Gastos De Operaciones	**$ 217.776,2**	**$ 248.474,9**	**$ 30.698,7**	**14,1%**	**112,77%**	**120,36%**
Intereses Créditos De Bcos Moratorios	$ 87.482,8	$ 101.053,5	$ 13.570,7	15,5%	45,30%	48,95%
Finan Oper.M/Cado Monet Y Otro	$ 37.802,6	$ 43.636,4	$ 5.833,8	15,4%	19,58%	21,14%
Comisiones	$ 18,5	$ 21,8	$ 3,3	18,0%	0,01%	0,01%
Cambios Por Reexpresion De Otros Pasivos	$ 45.436,1	$ 48.801,0	$ 3.364,8	7,4%	23,53%	23,64%
Impuestos Y Tasas	$ 385,3	$ 447,1	$ 61,8	16,1%	0,20%	0,22%
Multas Y Sanciones Otras Autoridades	$ 3,9	$ 3,9	-	-	0,00%	0,00%
Act. Intang. Sobre Der. De Operca	$ 44.733,7	$ 51.142,1	$ 6.408,3	14,3%	23,17%	24,77%
Diversos - Otros Gastos	$ 1.913,3	$ 3.369,1	$ 1.455,8	76,1%	0,99%	1,63%
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	**$ 217.776,2**	**$ 248.474,9**	**$ 30.698,7**	**14,1%**	**112,77%**	**120,36%**
COSTOS						
COSTOS	**$ 70.324,8**	**$ 79.835,7**	**$ 9.511,0**	**13,5%**	**36,42%**	**38,67%**
Inversion Infraestructura	$ 1.123,9	$ 1.123,9	-	-	0,58%	0,54%
Gastos Financieros	$ 921,0	$ 1.052,4	$ 131,4	14,3%	0,48%	0,51%
Social Ambiental	$ 1.478,6	$ 2.071,6	$ 593,0	40,1%	0,77%	1,00%
Amortizaciones	$ 2.687,5	$ 2.992,5	$ 305,0	11,3%	1,39%	1,45%
Depreciación PPYE	$ 866,9	$ 988,3	$ 121,5	14,0%	0,45%	0,48%
Otros Costos	$ 63.246,9	$ 71.607,0	$ 8.360,1	13,2%	32,75%	34,69%
TOTAL COSTOS	**$ 70.324,8**	**$ 79.835,7**	**$ 9.511,0**	**13,5%**	**36,42%**	**38,67%**
TOTAL COSTOS Y GASTOS	**$ 288.101,0**	**$ 328.310,6**	**$ 40.209,6**	**14,0%**	**149,19%**	**159,03%**
TOTAL GANANCIAS (EXCEDENTES)	**($ 94.992,2)**	**($ 121.867,0)**	**($ 26.874,9)**	**(28,3%)**	**(49,19%)**	**(59,03%)**
GANANCIAS Y PÉRDIDAS	**($ 94.992,2)**	**($ 121.867,0)**	**($ 26.874,9)**	**(28,3%)**	**(49,19%)**	**(59,03%)**

Fuente: Fiduciaria Bancolombia S,A. (Expresado en millones de pesos)

8.9.1. Panorama general

En agosto de 2026 el Patrimonio Autónomo registró una pérdida de $26.874,9 millones, resultado de ingresos por $13.334,8 millones frente a gastos de operación por $30.698,7 millones y costos por $9.511,0 millones; con ello, la pérdida acumulada del ejercicio asciende a $121.867,0 millones, producto de ingresos acumulados por $206.443,6 millones y costos y gastos acumulados por $328.310,6 millones, y el margen neto del mes es negativo (−201,5%), lo que significa que por cada peso de ingreso reconocido el proyecto incurrió en aproximadamente tres pesos de costos y gastos.

El ingreso del mes se concentra casi en su totalidad en la Remuneración Activo Financiero (410185001152), por $12.604,6 millones (94,5%), reconocida frente a la ANI como cuenta por cobrar (Remuneración Principal, 169095002030) sin recaudo y sin Otrosí suscrito que la respalde; el único ingreso efectivamente recaudado corresponde a los rendimientos de las cuentas de ahorro del fideicomiso ($611,2 millones, 4,6%), y el resto proviene de diferencia en cambio ($104,9 millones) y venta de vehículos ($14,1 millones). Desde el inicio de la Etapa de Reversión el recaudo de peajes dejó de reconocerse como ingreso. Los Ingresos Diversos (4195), que concentran el 54,75% del acumulado ($113.024,4 millones), no registran movimiento, y el recaudo se acumula como pasivo a favor de la ANI.


Por el lado de las erogaciones, los gastos de operación representan el 76,3% del total de costos y gastos del mes y están dominados por la carga financiera —intereses moratorios de créditos bancarios ($13.570,7 millones), gastos financieros de bonos y deuda subordinada ($5.833,8 millones) y reexpresión de pasivos en moneda extranjera ($3.364,8 millones)—, que suma $22.769,3 millones y equivale a 1,7 veces los ingresos del mes; le sigue la amortización del intangible de concesión ($6.408,3 millones), que se mantiene pese a que el Concesionario ya no percibe el recaudo de peajes.

Los costos, por $9.511,0 millones (23,7% del total), corresponden principalmente a Otros Costos de operación y mantenimiento del corredor ($8.360,1 millones, 87,9%), seguidos de la gestión social y ambiental ($593,0 millones), amortizaciones ($305,0 millones), gastos financieros ($131,4 millones) y depreciación ($121,5 millones), sin movimiento en Inversión en Infraestructura, en coherencia con la etapa de reversión.

En conjunto, la pérdida del mes es estructural y no obedece a hechos extraordinarios: el proyecto se encuentra sin ingreso de peajes, con una carga financiera que supera ampliamente el ingreso reconocido y con un ingreso que, en su mayor parte, no se

ha recaudado ni cuenta con soporte contractual. Excluidas las partidas que no implican salida de caja (amortizaciones y depreciación por $6.834,8 millones), la pérdida del mes sería de $20.040,1 millones, lo que confirma que el déficit no es solo contable; además, la cifra reportada constituye un límite inferior, pues si la Remuneración Activo Financiero no llegara a formalizarse exactamente como lo tiene registrado el Concesionario, su reversión aumentaría la pérdida acumulada en $50.354,4 millones.

Grafica 44. Pérdidas. Comparativo de julio vs agosto 2026

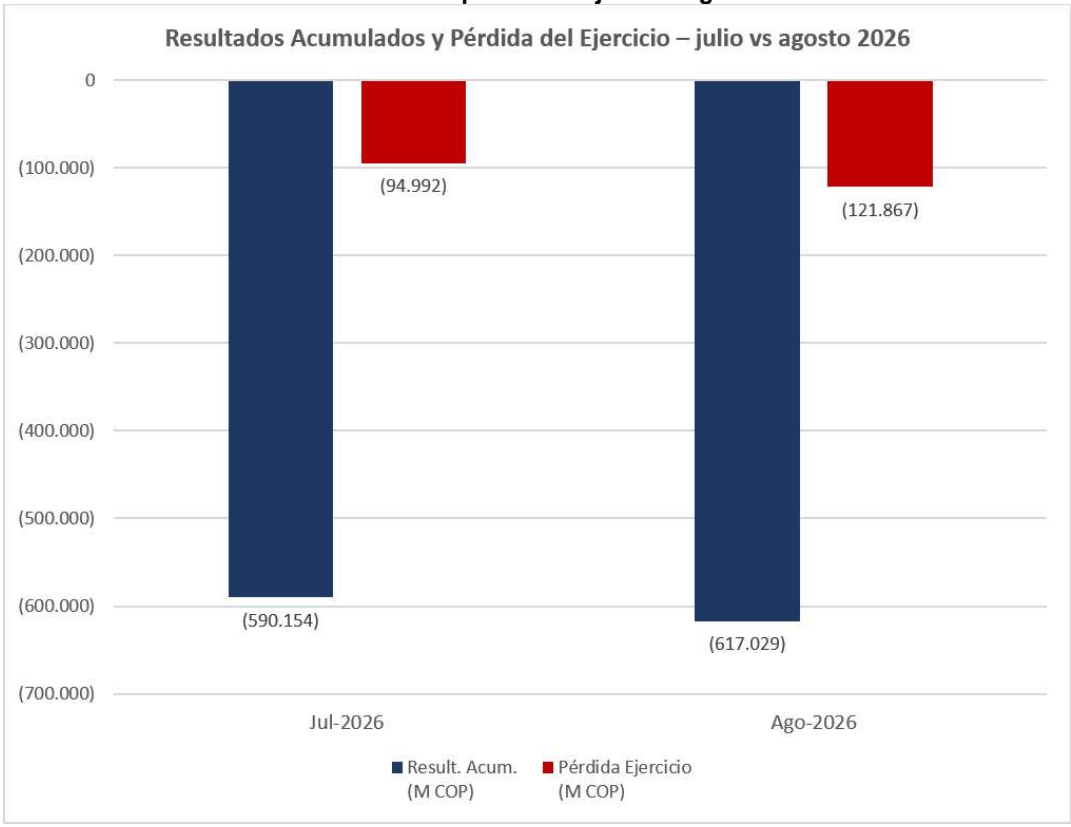

Fuente: Fiduciaria Bancolombia S,A (Cifras en Millones de pesos)

8.9.2. INGRESOS TOTALES

Los ingresos acumulados del ejercicio al 31 de agosto de 2026 ascienden a $206.444 millones, frente a $193.109 millones al cierre de julio, con un ingreso

operacionel del mes de $13.335 millones (+6,91% sobre el acumulado). El ingreso de agosto es 8,8% inferior al de julio ($14.626 millones) y se concentra casi por completo en una sola partida: la Remuneración Principal reconocida frente a la ANI en la subcuenta 410185 Participaciones en Concesiones ($12.604,6 millones, 94,5% del mes), que no se recaudó y se registró como cuenta por cobrar. El resto corresponde a rendimientos financieros de las cuentas de ahorro ($611,2 millones), diferencia en cambio por liquidación de pasivos ($104,9 millones) y utilidad en venta de vehículos ($14,1 millones).

Los Ingresos Diversos (4195), que concentran el 54,75% del acumulado, no registraron movimiento en agosto (en julio, apenas $1,7 millones netos), y el componente de Construcciones (410105) permanece en $35.831,2 millones sin variación. En términos de cobertura, el ingreso del mes equivale al 43,4% de los gastos de operación del período ($30.699 millones) y al 33,2% del total de costos y gastos ($40.210 millones).

8.9.2.1. Ingresos Industrial y de Servicio : acumulado $73.581 → $86.186 millones | agosto aislado $12.605 millones (+17,13% del acumulado)

Constituye la variación de mayor cuantía del estado de resultados por el lado de los ingresos y explica el 94,5% del ingreso del mes. La totalidad del movimiento corresponde a la subcuenta 410185 PARTICIPACIONES EN CONCESIONES, que pasa de $37.749,7 a $50.354,4 millones (créditos por $12.604,6 millones), con contrapartida exacta en la cuenta por cobrar 169095002030 REMUNERACIÓN PRINCIPAL a cargo de la ANI. La subcuenta 410105 CONSTRUCCIONES no registra movimiento ($35.831,2 millones).

8.9.2.2. Ingresos Diversos: acumulado $113.024 → $113.024 millones | agosto aislado $0,0 millones

Continúa siendo la cuenta de mayor peso de los ingresos, con $113.024 millones y el 54,75% del acumulado, pero no registró movimiento en agosto (en julio el movimiento neto fue de apenas $1,7 millones). La totalidad del saldo se reconoció en el primer semestre, principalmente por la retribución de peajes antes de la etapa de reversión.

8.9.2.3. Depósito a la Vista – Cuentas de Ahorro: acumulado $6.340 → $6.951 millones | agosto aislado $611 millones

Corresponde a los rendimientos financieros generados por los recursos depositados en las cuentas de ahorro del fideicomiso. El ingreso del mes ($611,2 millones) es 44,4% inferior al de julio ($1.098,6 millones), en línea con la caída del saldo del efectivo por el pago de intereses de la deuda.

8.9.3. GASTOS DE OPERACIÓN

Los gastos de operación acumulados del ejercicio al 31 de agosto de 2026 ascienden a $248.475 millones, frente a $217.776 millones al cierre de julio, con un gasto del mes de $30.699 millones (+14,10% sobre el acumulado), prácticamente igual al de julio ($30.226 millones). Equivalen al 120,36% de los ingresos acumulados (112,77% en julio).

El gasto del mes se compone de: intereses de créditos de bancos y deuda subordinada (5103) $13.570,7 millones (44,2%), amortización del intangible $6.408,3 millones (20,9%), financiación de operaciones de mercado monetario —intereses de bonos— (5104) $5.833,8 millones (19,0%), reexpresión de pasivos (5135) $3.364,8 millones (11,0%), diversos (5190) $1.455,8 millones (4,7%), impuestos y tasas $61,8 millones y comisiones $3,3 millones.

El 95,1% del gasto del mes es de naturaleza financiera o contable sin erogación de caja en el período (intereses causados, reexpresión y amortización); los gastos con erogación efectiva suman $1.520,9 millones. La carga financiera del mes (intereses, bonos y reexpresión: $22.769,3 millones) equivale a 1,7 veces los ingresos del período ($13.335 millones). Se destaca que en agosto se pagaron intereses causados de créditos y bonos por cerca de $71.872 millones, que no afectan el gasto del mes por corresponder a causaciones de periodos anteriores.

8.9.3.1. Intereses de Créditos de Bancos Moratorios: acumulado $87.483 → $101.054 millones | agosto aislado $13.571 millones (+15,51% del acumulado)

Constituye la variación de mayor cuantía de los gastos de operación y el rubro de mayor peso del bloque (40,67% del acumulado). Supera por primera vez los $100.000 millones acumulados. El gasto del mes se integra por intereses

de créditos bancarios (510310) $7.487,3 millones y otros créditos —deuda subordinada— (510395) $6.083,4 millones; este último coincide exactamente con el aumento de los intereses de deuda subordinada no facturados registrados en el pasivo corriente (259095003076).

8.9.3.2. Amortización del Activo Intangible sobre Derechos de Operación: acumulado $44.734 → $51.142 millones | agosto aislado $6.408 millones

Segundo rubro del mes, con el 20,58% del total. El cargo del mes ($6.408,3 millones) es idéntico al peso al de junio y julio, con contrapartida exacta en el crédito a la cuenta 1911 del activo.

8.9.3.3. Financiación de Operaciones de Mercado Monetario y Otros (5104): acumulado $37.803 → $43.636 millones | agosto aislado $5.834 millones

Cuarto rubro en cuantía del bloque acumulado, con el 17,56% del total, y tercera variación del mes. Corresponde a los intereses y la amortización del descuento de los Bonos de Garantía General (510420). En el mes se causaron intereses de bonos por $6.199,9 millones en el pasivo y se pagó el cupón por $29.074,0 millones con cargo a intereses causados en periodos anteriores.

8.9.4. COSTOS

Los costos acumulados del ejercicio al 31 de agosto de 2026 ascienden a $79.836 millones, frente a $70.325 millones al cierre de julio, con un costo del mes de $9.511 millones (+13,52% sobre el acumulado), 37,6% inferior al de julio ($15.231 millones). Todo el bloque corresponde al grupo 551505 Costos de Operación de contratos de concesión. El costo del mes se concentra en el renglón «Otros Costos» ($8.360,1 millones, 87,9%), que agrupa doce subgrupos del Balance de Prueba, entre los que destacan: Mantenimiento Vial ($2.547,3 millones), Administración de Estación de Peaje ($1.707,9 millones), Costos de Operación ($1.500,8 millones), Gastos de Operación y Administración ($1.277,8 millones) y Asesores ($1.127,8 millones).

Asimismo los rubros: Social y Ambiental registra un importe de $593,0 millones, Amortizaciones $305,0 millones, Gastos Financieros $131,4 millones y Depreciación $121,5 millones; Inversión en Infraestructura no registra

movimiento por tercer mes consecutivo. La provisión de mantenimiento del pasivo no se utilizó ni se reconstituyó en el mes, de modo que la totalidad del mantenimiento ejecutado se llevó directamente al costo.

8.9.4.1. Otros Costos: acumulado $63.247 → $71.607 millones | agosto aislado $8.360 millones (+13,22% del acumulado)

Constituye la variación de mayor cuantía del bloque y el rubro dominante de los costos (89,69% del acumulado). Los débitos del mes en los doce subgrupos suman $8.932,3 millones y los créditos $572,2 millones (principalmente $539,1 millones en Administración de Estación de Peaje). Por subgrupo, el movimiento neto del mes fue: Mantenimiento Vial $2.547,3 millones; Administración de Estación de Peaje $1.707,9 millones; Costos de Operación $1.500,8 millones; Gastos de Operación y Administración $1.277,8 millones; Asesores $1.127,8 millones; Impuestos $121,2 millones; Adquisición de Predios $36,2 millones; Seguridad Vial $15,0 millones; Proyectos $13,1 millones y Obras Complementarias $13,0 millones. Gestión de Redes y Construcciones en Curso no registran movimiento.

8.9.4.2. Mantenimiento Vial y provisión: acumulado $29.032 → $31.579 millones | agosto aislado $2.547 millones

Aunque no figura con línea propia en la tabla, este subgrupo constituye el principal costo del proyecto (39,56% del acumulado). El costo del mes ($2.547,6 millones en débitos) es 73,7% inferior al de julio (débitos $9.688,9 millones). Por concepto: Rutinario $866,7 millones (Construcciones El Cóndor $502,7 millones, Mantenimiento Vial de la Costa $158,2 millones, Multiservicios en Mantenimiento $97,0 millones, Mantenimiento y Conservación de Vías $61,5 millones y Trabajadores Viales de María la Baja $47,4 millones); Personal – nómina $561,8 millones; Materiales $461,2 millones (Global de Pinturas $281,9 millones); Mantenimiento en Infraestructura $435,1 millones (JV Consultoría y Construcciones $228,8 millones); Combustibles $120,0 millones; Señalización $72,5 millones (Smart Traffic Devices); Aseo y Vigilancia $17,4 millones y otros menores $12,8 millones.

8.9.4.3. Social y Ambiental (551505013): acumulado $1.479 → $2.072 millones | agosto aislado $593 millones

Corresponde a los costos de gestión social y ambiental del corredor. El costo del mes ($593,0 millones) es el mayor del ejercicio y supera 3,7 veces el de julio ($161,0 millones); el rubro crece 40,1% en el mes y representa el 2,60% del acumulado.

8.10. INDICADORES FINANCIEROS

Tabla 8-58. Indicadores Financieros agosto 2026

CONCESIÓN RUTA AL MAR S.A.S • INDICADORES FINANCIEROS CLAVE – PANEL DE CONTROL							
IPAB – Interventoría Integral | Diagnóstico Mensual | Comparativo Julio vs Agosto 2026							
INDICADOR	**FÓRMULA**	**JULIO-26**	**AGOSTO-26**	**VAR.**	**SEMÁFORO JUL**	**SEMÁFORO AGO**	**INTERPRETACIÓN FINANCIERA**
LIQUIDEZ							
Razón Corriente	*Act.Cte / Pas.Cte*	**2,7114**	**2,4070**	**(0,3044)**	🟢	🟢	En agosto la razón corriente desciende a 2,41, frente a 2,71 en julio: una reducción de 0,30 puntos. El activo corriente cae de $448.345 M a $400.841 M (−$47.505 M, −10,6%), por la salida de caja asociada al servicio de la deuda: el efectivo baja de $400.165 M a $339.640 M (−$60.525 M), compensada solo en parte por el aumento de las cuentas por cobrar diversas ($48.180 M a $61.201 M). El pasivo corriente aumenta levemente, de $165.355 M a $166.533 M (+$1.177 M, +0,7%), por los intereses de deuda subordinada no facturados (+$6.083 M). El indicador sigue muy por encima de 1,0, pero su calidad continúa deteriorándose: el 12,6% del activo corriente ($50.354 M) es un derecho de cobro frente a la ANI por Remuneración Principal sin instrumento contractual.
ENDEUDAMIENTO							
Endeudamiento Total	*Pas.Total / Act.Total*	**1,2609**	**1,2792**	**0,0184**	🔴	🔴	En agosto el endeudamiento sube a 1,28 (pasivo $2.822.393 M / activo $2.206.290 M), frente a 1,26 en julio. El pasivo total sigue superando al activo y la brecha se amplía de $589.228 M a $616.103 M. Aunque el pasivo disminuyó (−0,90%) por el pago de intereses de bonos y créditos, el activo cayó en mayor proporción (−2,33%), porque ese pago se atendió con caja. Este nivel de apalancamiento es estructural en proyectos APP 4G; no obstante, en Etapa de Reversión el pasivo se sostiene por causación de intereses, reexpresión de bonos y retención de recaudos de peaje a favor de la ANI (+$25.710 M en el mes), no por nueva financiación aplicada al proyecto.

CONCESIÓN RUTA AL MAR S.A.S • INDICADORES FINANCIEROS CLAVE – PANEL DE CONTROL							
IPAB – Interventoría Integral | Diagnóstico Mensual | Comparativo Julio vs Agosto 2026							
INDICADOR	**FÓRMULA**	**JULIO-26**	**AGOSTO-26**	**VAR.**	**SEMÁFORO JUL**	**SEMÁFORO AGO**	**INTERPRETACIÓN FINANCIERA**
COBERTURA							
Cobertura Financiera	*Ing.Oper / Gas.Financ*	**0,8867**	**0,8308**	**(0,0559)**	🔴	🔴	La cobertura financiera retrocede de 0,89 en julio a 0,83 en agosto. Los ingresos acumulados crecieron 6,9% (de $193.109 M a $206.444 M), mientras los gastos de operación crecieron 14,1% (de $217.776 M a $248.475 M). En el mes aislado la situación es más severa: los ingresos de agosto ($13.335 M) cubren solo el 43,4% de los gastos de operación del período ($30.699 M) y el 58,6% de la carga financiera ($22.773 M: intereses de créditos y deuda subordinada $13.571 M, intereses de bonos $5.834 M y reexpresión $3.365 M). Los ingresos propios del corredor no alcanzan a cubrir el servicio de la deuda.
RENTABILIDAD							
Margen de Pérdida	*Pérdida / Ingresos*	**(0,4919)**	**(0,5903)**	**(0,0984)**	🔴	🔴	INDICADOR CRÍTICO, CON DETERIORO SOSTENIDO: el margen de pérdida pasa de −49,2% en julio a −59,0% en agosto, un retroceso de 9,8 puntos porcentuales. Los ingresos acumulados crecieron +6,9% (a $206.444 M) frente a un +14,0% de los costos y gastos totales (a $328.311 M). AGOSTO AISLADO ARROJÓ PÉRDIDA DE −$26.875 M —ingresos del mes $13.335 M contra costos y gastos del mes $40.210 M—, con lo cual la pérdida acumulada del ejercicio aumenta de −$94.992 M a −$121.867 M. La pérdida mensual es 12,8% menor que la de julio (−$30.832 M), pero sigue siendo estructural: el 94,5% del ingreso del mes ($12.605 M) es Remuneración Principal reconocida como cuenta por cobrar a la ANI, no recaudo efectivo.
ESTRUCTURA							

Consorcio IPAB

NIT. 902030942-3
PERIODO: 01-30 de septiembre de 2026
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 8

CONCESIÓN RUTA AL MAR S.A.S • INDICADORES FINANCIEROS CLAVE – PANEL DE CONTROL

IPAB – Interventoría Integral | Diagnóstico Mensual | Comparativo Julio vs Agosto 2026

INDICADOR	FÓRMULA	JULIO-26	AGOSTO-26	VAR.	SEMÁFORO JUL	SEMÁFORO AGO	INTERPRETACIÓN FINANCIERA
Activo Intangible / Total Activo	*Int.Concesión / Act.Total*	**0,7962**	**0,8123**	**0,0161**	🟢	🟢	El activo intangible de concesión ($1.792.092 M en agosto) representa el 81,2% del activo total, frente al 79,6% de julio ($1.798.500 M). El aumento de la participación no obedece a crecimiento del intangible —que se reduce por la amortización mensual bajo CINIIF 12 (−$6.408,3 M)— sino a la caída del activo corriente por el pago de intereses. SE ADVIERTE que el cargo de amortización permanece INVARIABLE en $6.408,3 millones mensuales por tercer mes consecutivo (junio, julio y agosto), sin ajuste desde el inicio de la Etapa de Reversión el 1 de mayo de 2026. Ello implica una vida útil remanente implícita de 23,3 años, en dirección opuesta al escenario de terminación anticipada declarado mediante Laudo Arbitral (véase el numeral 2.3 de la hoja Análisis Activo).
LIQUIDEZ							
Efectivo / Total Activo	*Efectivo / Act.Total*	**0,1772**	**0,1539**	**(0,0232)**	🟢	🟡	El efectivo (saldo en bancos) disminuye de $400.165 M en julio a $339.640 M en agosto, una caída de $60.525 M (−15,1%); su participación en el activo total baja de 17,72% a 15,39%. La salida corresponde principalmente al servicio de la deuda: pago de intereses de créditos bancarios (débitos por $42.798 M) e intereses de bonos ($29.074 M, girados vía proveedores del exterior). La caída se amortiguó por la retención de recaudos de peaje a favor de la ANI (+$25.710 M), que permanecen en la fiducia pero NO son de libre disposición. El ingreso operacional del mes ($12.605 M) tampoco ingresó a caja: se reconoció como derecho de cobro frente a la ANI. Se pasa el semáforo a amarillo.
TENDENCIA DE PÉRDIDA							
Var. Pérdida del Ejercicio	*(Perd.Ago – Perd.Jul) / |Perd.Jul|*	**-$ 94.992,17**	**-$ 121.867,03**	**-28,3%**	🔴	🔴	DETERIORO SOSTENIDO: la pérdida acumulada del ejercicio aumenta de −$94.992 M en julio a −$121.867 M en agosto, un incremento del 28,3%. Agosto aislado arroja una pérdida de −$26.875 M, menor en $3.957 M a la de julio (−$30.832 M), pero equivalente a 1,8 veces la pérdida mensual promedio del ejercicio ($15.233 M) y al 201,5% de los ingresos del período. Se confirma que la utilidad aislada de junio fue no recurrente. Debe advertirse que la cifra reportada constituye un límite inferior: la amortización del intangible invariable y la ausencia de causación de provisión de mantenimiento operan ambas subestimando el resultado negativo.
PROVISIONES							

Consorcio IPAB

NIT. 902030942-3
PERIODO: 01-30 de septiembre de 2026
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 8

CONCESIÓN RUTA AL MAR S.A.S • INDICADORES FINANCIEROS CLAVE – PANEL DE CONTROL

IPAB – Interventoría Integral | Diagnóstico Mensual | Comparativo Julio vs Agosto 2026

INDICADOR	FÓRMULA	JULIO-26	AGOSTO-26	VAR.	SEMÁFORO JUL	SEMÁFORO AGO	INTERPRETACIÓN FINANCIERA
Provisión Mant. / Total Pasivo	*Prov.Mant. / Pas.Total*	**0,0059**	**0,0059**	**0,0001**	🔴	🔴	La provisión de mantenimiento se mantiene en $16.683 M, sin variación frente a julio; su participación en el pasivo total sube marginalmente de 0,586% a 0,591% solo por la disminución del pasivo. ATENCIÓN: el Balance de Prueba al 31 de agosto de 2026 muestra débitos y créditos idénticos por $113,6 M (movimiento neto cero), es decir, NO se causó provisión en el mes, mientras el costo de mantenimiento vial del período ascendió a $2.547,3 M (débitos $2.547,6 M). El saldo acumula una caída de 57,8% desde abril ($39.543 M).
SOLVENCIA							
Ratio de Solvencia	*Act.Total / Pas.Total*	**0,7931**	**0,7817**	**(0,0114)**	🟡	🟡	El ratio de solvencia retrocede de 0,7931 en julio a 0,7817 en agosto (−0,0114). El activo total ($2.206.290 M) sigue siendo inferior al pasivo total ($2.822.393 M). El retroceso refleja que el activo cayó más (−2,33%) que el pasivo (−0,90%), porque el pago de intereses se atendió con caja. El indicador se mantiene por encima del umbral de 0,75, pero acumula tres meses consecutivos de deterioro y se aproxima al umbral; debe monitorearse de manera permanente.
LIQUIDEZ AMPLIADA							
Capital Neto de Trabajo	*Act.Cte – Pas.Cte (M COP)*	**282.990**	**234.308**	**(48.682)**	🟢	🟢	El Capital Neto de Trabajo disminuye de $282.990 M en julio a $234.308 M en agosto (−$48.682 M, −17,2%). El activo corriente cayó $47.505 M por el pago de intereses y el pasivo corriente aumentó $1.177 M. Los valores positivos (>$230.000 M) mantienen holgura nominal para atender compromisos de corto plazo. No obstante, $61.201 M del activo corriente son cuentas por cobrar diversas —de los cuales $50.354 M corresponden a la Remuneración Principal frente a la ANI sin instrumento contractual— y una porción del efectivo corresponde a recaudos de peaje a favor de la ANI pendientes de giro, por lo que la holgura efectiva es inferior a la que refleja el indicador.

● VERDE: favorable — dentro de parámetros óptimos (no requiere acción) ● AMARILLO: alerta moderada — requiere seguimiento preventivo ● ROJO: crítico — fuera de rango, requiere análisis o acción ● GRIS: sin datos — indicador no calculable en el período | Los indicadores se interpretan en contexto de proyectos APP / Contrato 016-2015.

● VERDE: favorable — dentro de parámetros óptimos. ***● AMARILLO: alerta moderada — seguimiento preventivo.*** ***● ROJO: crítico — requiere análisis o acción correctiva.*** ***● GRIS: sin datos — no calculable en el período.***

Fuente: Fiduciaria Bancolombia S.A.

8.10.1. Fuentes y Usos

Con base en la información del Balance General y a partir del análisis de la métrica de fuentes y usos, a continuación, se presenta el comportamiento de estas cuentas para el período comprendido entre julio y agosto de 2026:

Tabla 8-59. Fuentes y Usos

CONCESIÓN RUTA AL MAR S.A.S • ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS

Contrato de Concesión No. 016 de 2015 | Cifras en millones de COP

IPAB – Interventoría Integral | Variación: Julio 2026 → Agosto 2026

■ CUADRO 1 — FUENTES DE FONDOS (disminuciones de activo y aumentos de pasivo o patrimonio, de mayor a menor)

CONCEPTO	jul-26	ago-26	VARIACIÓN	FUENTE	% DEL TOTAL
Efectivo y Bancos (11)	$ 400.165,0	$ 339.639,8	($ 60.525,2)	**$ 60.525,2**	59,4%
Diversos LP – incluye recaudos a favor de la ANI (2990)	$ 292.466,6	$ 321.092,6	$ 28.626,0	**$ 28.626,0**	28,1%
Intangibles – Derechos de Concesión (1911)	$ 1.798.500,0	$ 1.792.091,6	($ 6.408,3)	**$ 6.408,3**	6,3%
Diversas Cuentas por Pagar CP (2590)	$ 128.642,8	$ 132.845,3	$ 4.202,6	**$ 4.202,6**	4,1%
Impuestos por Pagar (2503)	$ 338,4	$ 1.844,3	$ 1.505,9	**$ 1.505,9**	1,5%
Gastos Pagados por Anticipado (1925)	$ 1.619,8	$ 1.314,8	($ 305,0)	**$ 305,0**	0,3%
Costos y Gastos por Pagar (2502)	$ 22.232,4	$ 22.438,8	$ 206,4	**$ 206,4**	0,2%
Retenciones a Terceros (2920)	$ 4.107,4	$ 4.187,9	$ 80,5	**$ 80,5**	0,1%
TOTAL FUENTES DE FONDOS				**$ 101.860,0**	**100,0%**

■ CUADRO 2 — USOS DE FONDOS (aumentos de activo y disminuciones de pasivo o patrimonio, de mayor a menor)

CONCEPTO	jul-26	ago-26	VARIACIÓN	USO	% DEL TOTAL
Créditos de Bancos y Otras Entidades (24)	$ 918.617,8	$ 884.647,6	($ 33.970,2)	**$ 33.970,2**	33,3%
Resultado del Ejercicio (3920)	($ 94.992,2)	($ 121.867,0)	($ 26.874,9)	**$ 26.874,9**	26,4%
Instrumentos Financieros – Bonos (21)	$ 584.857,5	$ 563.364,7	($ 21.492,8)	**$ 21.492,8**	21,1%
Cuentas por Cobrar (16)	$ 48.180,3	$ 61.200,9	$ 13.020,6	**$ 13.020,6**	12,8%
Proveedores y Servicios (2511)	$ 10.023,7	$ 5.205,7	($ 4.818,0)	**$ 4.818,0**	4,7%
Diversos Activo No Corriente (1960)	$ 264,8	$ 1.686,6	$ 1.421,8	**$ 1.421,8**	1,4%
Propiedades, Planta y Equipo (18)	$ 10.094,6	$ 10.356,4	$ 261,7	**$ 261,7**	0,3%

CONCESIÓN RUTA AL MAR S.A.S • ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS

Contrato de Concesión No. 016 de 2015 | Cifras en millones de COP

IPAB – Interventoría Integral | Variación: Julio 2026 → Agosto 2026

TOTAL USOS DE FONDOS	$ 101.860,0	100,0%

■ CUADRO 3 — VARIACIONES DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (base de cálculo de los cuadros 1 y 2)

CONCEPTO	jul-26	ago-26	VARIACIÓN	MOVIMIENTO	FUENTE	USO
ACTIVO CORRIENTE	**$ 448.345,3**	**$ 400.840,7**	**($ 47.504,6)**			
Efectivo y Bancos (11)	$ 400.165,0	$ 339.639,8	($ 60.525,2)	↓ Activo	$ 60.525,2	-
Cuentas por Cobrar (16)	$ 48.180,3	$ 61.200,9	$ 13.020,6	↑ Activo	-	$ 13.020,6
ACTIVO NO CORRIENTE	**$ 1.810.479,3**	**$ 1.805.449,4**	**($ 5.029,8)**			
Propiedades, Planta y Equipo (18)	$ 10.094,6	$ 10.356,4	$ 261,7	↑ Activo	-	$ 261,7
Intangibles – Derechos de Concesión (1911)	$ 1.798.500,0	$ 1.792.091,6	($ 6.408,3)	↓ Activo	$ 6.408,3	-
Gastos Pagados por Anticipado (1925)	$ 1.619,8	$ 1.314,8	($ 305,0)	↓ Activo	$ 305,0	-
Diversos Activo No Corriente (1960)	$ 264,8	$ 1.686,6	$ 1.421,8	↑ Activo	-	$ 1.421,8
PASIVO CORRIENTE	**$ 165.355,3**	**$ 166.532,7**	**$ 1.177,4**			
Comisiones y Honorarios (2501)	$ 10,6	$ 10,6	-	Sin variación	-	-
Costos y Gastos por Pagar (2502)	$ 22.232,4	$ 22.438,8	$ 206,4	↑ Pasivo	$ 206,4	-
Impuestos por Pagar (2503)	$ 338,4	$ 1.844,3	$ 1.505,9	↑ Pasivo	$ 1.505,9	-
Proveedores y Servicios (2511)	$ 10.023,7	$ 5.205,7	($ 4.818,0)	↓ Pasivo	-	$ 4.818,0
Diversas Cuentas por Pagar CP (2590)	$ 128.642,8	$ 132.845,3	$ 4.202,6	↑ Pasivo	$ 4.202,6	-
Retenciones a Terceros (2920)	$ 4.107,4	$ 4.187,9	$ 80,5	↑ Pasivo	$ 80,5	-
PASIVO NO CORRIENTE	**$ 2.682.697,7**	**$ 2.655.860,7**	**($ 26.837,0)**			
Instrumentos Financieros – Bonos (21)	$ 584.857,5	$ 563.364,7	($ 21.492,8)	↓ Pasivo	-	$ 21.492,8
Créditos de Bancos y Otras Entidades (24)	$ 918.617,8	$ 884.647,6	($ 33.970,2)	↓ Pasivo	-	$ 33.970,2
Cuentas por Pagar LP (2590 no corriente)	$ 869.943,5	$ 869.943,5	-	Sin variación	-	-
Provisión Mantenimiento y Reparaciones (2812)	$ 16.683,2	$ 16.683,2	-	Sin variación	-	-
Provisión Multas, Sanciones y Litigios	$ 129,0	$ 129,0	-	Sin variación	-	-
Diversos LP – incluye recaudos a favor de la ANI (2990)	$ 292.466,6	$ 321.092,6	$ 28.626,0	↑ Pasivo	$ 28.626,0	-
PATRIMONIO	**($ 589.228,4)**	**($ 616.103,3)**	**($ 26.874,9)**			
Aportes Fiduciarios (Acreedores Fiduciarios)	$ 925,4	$ 925,4	-	Sin variación	-	-
Pérdidas Acumuladas Ejercicios Anteriores (3910)	($ 495.161,7)	($ 495.161,7)	-	Sin variación	-	-
Resultado del Ejercicio (3920)	($ 94.992,2)	($ 121.867,0)	($ 26.874,9)	↓ Patrimonio	-	$ 26.874,9

■ CUADRO 3 — VARIACIONES DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (base de cálculo de los cuadros 1 y 2)

CONCEPTO	jul-26	ago-26	VARIACIÓN	MOVIMIENTO	FUENTE	USO
TOTAL					$ 101.860,0	$ 101.860,0

Fuente. Fiduciaria Bancolombia

Durante agosto de 2026 el patrimonio autónomo movilizó recursos brutos por $101.860 millones, monto en el que las fuentes igualan exactamente a los usos. Las FUENTES provinieron principalmente de: (i) la reducción del efectivo en bancos por $60.525 millones (59,4%), que constituye la principal fuente del mes; (ii) el aumento de los Diversos de largo plazo por $28.626 millones (28,1%), correspondiente principalmente a recaudos de peaje retenidos a favor de la ANI, es decir, recursos de terceros y no propios; (iii) la amortización del intangible de concesión por $6.408 millones (6,3%), partida que no implica salida de caja; y (iv) el aumento de las Diversas Cuentas por Pagar de corto plazo por $4.203 millones (4,1%), por intereses de deuda subordinada causados y no pagados. El resto ($1.506 millones de impuestos por pagar y $592 millones de otros rubros) es de menor cuantía.

Los USOS se concentraron en: (i) el pago de créditos bancarios por $33.970 millones (33,4%) y de intereses de bonos por $21.493 millones (21,1%), que en conjunto absorben el 54,5% de los recursos; (ii) la pérdida del mes por $26.875 millones (26,4%); (iii) el aumento de las cuentas por cobrar por $13.021 millones (12,8%), de los cuales $12.605 millones corresponden a la Remuneración Principal reconocida frente a la ANI y no recaudada; y (iv) el pago neto a proveedores por $4.818 millones (4,7%).

En conclusión, el servicio de la deuda del mes se financió con la caja acumulada del patrimonio autónomo y con la retención de recaudos de terceros; la operación no generó fuentes propias, pues el ingreso del período se reconoció como derecho de cobro y no como recaudo.

8.11. INFORME DE TRÁFICO Y RECAUDO

A continuación, se presenta el comportamiento del tráfico registrado durante el transcurso del mes de agosto de 2026, así como las tarifas aplicadas que incluyen el valor correspondiente a FOSEVI para cada una de las estaciones de peaje.

Adicionalmente, acorde con la información reportada por la Interventoría Consorcio CR Concesiones, es importante tener en cuenta que durante el año 2025 se realizaron las siguientes actualizaciones:

- Resolución N, 20253040018105. Con fundamento en la insuficiencia de recursos en la Subcuenta Autónoma de Soporte y en la Subcuenta de Excedentes de la ANI para cubrir el valor de los riesgos materializados, esta resolución, expedida el 14 de mayo de 2025, establece un incremento tarifario adicional del 2 % sobre el IPC definido por el DANE.

Este ajuste se aplicará en las estaciones de peaje desde el año 2026 hasta el año 2034, y será actualizado anualmente cada 16 de enero. Asimismo, la resolución deroga los parágrafos primero y segundo del artículo 1, así como los parágrafos primero, tercero y cuarto del artículo 2, y modifica integralmente el artículo 8 de la Resolución 410 de 2020.

Por otra parte, también se amplía la vigencia de las tarifas diferenciales aplicables al servicio público, las cuales inicialmente tenían plazo hasta el 31 de diciembre de 2022, conforme a lo establecido en la Resolución 410 de 2020, expedida el 26 de febrero de 2020.

Por medio de la circular -Decreto No, 50 de 2023 en la que se indica que:

"Con el fin de contribuir con el conjunto de medidas antiinflacionarias que viene implementando el Gobierno Nacional, el Presidente de la República en uso de sus facultades constitucionales y legales, expidió el 15 de enero de 2023, el Decreto No 50 de 2023, por medio del cual se ordena no incrementar las tarifas de peaje a vehículos que transiten por el territorio nacional por las estaciones de peaje a cargo del Instituto Nacional de Vías – INVIAS y de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI"

Teniendo en cuenta lo anterior, la estructura tarifaria vigente es la siguiente:

Tabla 8-60. Estructura Tarifaria del 1 al 15 de enero 2026 con FOSEVI

TARIFAS DE PEAJES DEL 1 AL 15 ENERO DE 2026 CON FOSEVI								
CAT	La Apartada	Purgatorio	Cedros	Mata De Caña	San Onofre	Manguitos	San Carlos	Caimanera
I	$18.400	$18.400	$18.400	$18.100	$18.400	$18.400	$18.100	$ 0
I – E	-	$11.300	$11.300	$11.300	-	$6.400	-	$ 0
I – EE	-	$9.500	-	-	-	$11.300	-	-
I – EEE	-	$1.100	-	-	-	-	-	-
I – ET	-	$3.500	-	-	-	-	-	-
I-EFS	-	-	-	-	-	-	-	$ 0
II	$27.200	$27.200	$27.200	$26.600	$27.200	$27.200	$26.600	$ 0
II - E	-	$16.500	$16.500	$16.500	-	$18.200	-	$ 0
II - EE	-	$13.800	-	-	-	$16.500	-	-
II – EEE	-	$1.100	-	-	-	-	-	-
II-EFS	-	-	-	-	-	-	-	$ 0
III	$27.200	$27.200	$27.200	$26.600	$27.200	$27.200	$26.600	$ 0
III – E	-	$13.800		-	-	$18.200	-	$ 0
IV	$27.200	$27.200	$27.200	$26.600	$27.200	$27.200	$26.600	$ 0
IV – E	-	$13.800		-	-	$18.200	-	$ 0
V	$49.000	$49.000	$49.000	$28.300	$49.000	$49.000	$28.300	$ 0
VB	$49.000	$49.000	$49.000	$28.300	$49.000	$49.000	$28.300	$ 0
VI	$77.800	$77.800	$77.800	$41.300	$77.800	$77.800	$41.300	$ 0
VI – E	-			-	-	-	-	$ 0
VII	$89.600	$89.600	$89.600	$41.400	$89.600	$89.600	$41.400	$ 0
VII – E	-	-		-	-	-	-	-

Fuente: Construcción propia

Tabla 8-61. Estructura Tarifaria del 16 de enero de 2026 al 15 de enero de 2027 con FOSEVI

TARIFAS DE PEAJES DEL 16 DE ENERO 2026 AL 15 ENERO DE 2027 CON FOSEVI								
CAT	La Apartada	Purgatorio	Cedros	Mata De Caña	San Onofre	Manguitos	San Carlos	Caimanera
I	$19.700	$19.700	$19.700	$19.400	$19.700	$19.700	$19.400	$ 0
I – E	-	$11.900	$11.900	$11.900	-	$6.700	-	$ 0
I – EE	-	$10.000	-	-	-	$11.900	-	-
I – EEE	-	$1.200	-	-	-	-	-	-
I - ET	-	$3.700	-	-	-	-	-	-
I-EFS	-	-	-	-	-	-	-	$ 0
II	$29.100	$29.100	$29.100	$28.500	$29.100	$29.100	$28.500	$ 0
II - E	-	$17.300	$17.300	$17.300	-	$19.100	-	$ 0
II - EE	-	$14.500	-	-	-	$17.300	-	-
II – EEE	-	$1.200	-	-	-	-	-	-
II-EFS	-	-	-	-	-	-	-	$ 0
III	$29.100	$29.100	$29.100	$28.500	$29.100	$29.100	$28.500	$ 0
III – E	-	$14.500		-	-	$19.100	-	$ 0
IV	$29.100	$29.100	$29.100	$28.500	$29.100	$29.100	$28.500	$ 0

TARIFAS DE PEAJES DEL 16 DE ENERO 2026 AL 15 ENERO DE 2027 CON FOSEVI								
CAT	La Apartada	Purgatorio	Cedros	Mata De Caña	San Onofre	Manguitos	San Carlos	Caimanera
IV – E	-	$14.500		-	-	$19.100	-	$ 0
V	$52.500	$52.500	$52.500	$30.300	$52.500	$52.500	$30.300	$ 0
VB	$52.500	$52.500	$52.500	$30.300	$52.500	$52.500	$30.300	$ 0
VI	$83.400	$83.400	$83.400	$44.300	$83.400	$83.400	$44.300	$ 0
VI – E	-			-	-	-	-	$ 0
VII	$96.000	$96.000	$96.000	$44.400	$96.000	$96.000	$44.400	$ 0
VII - E	-	-		-	-	-	-	-

Fuente: Construcción propia

Al respecto, es pertinente señalar, que el 27 de enero de 2023, mediante el radicado de salida RAM No. 48-147-20230127027253, se notificó la suspensión del recaudo en la estación de peaje La Caimanera, por instrucción del ministro de transporte, con el propósito de prevenir posibles alteraciones del orden público y mitigar riesgos para el personal y la infraestructura de la caseta de peaje. En consecuencia, la medida entró en vigor a partir del 29 de enero de 2023.

Posteriormente, de conformidad con la Resolución 20253040018105, expedida el 14 de mayo de 2025, se establece que a partir del 16 de enero de 2026 las tarifas de las estaciones de peaje del contrato se incrementarán en un 2 % adicional al IPC.

Es oportuno enfatizar que, este porcentaje adicional se aplicará como un mecanismo de compensación por riesgo, por lo que no será reconocido como ingreso del concesionario ni tendrá efecto en el cálculo del VPIP. En consecuencia, los recursos generados por este incremento serán transferidos a la Subcuenta Autónoma de Soporte, de acuerdo con lo acordado en las mesas de trabajo realizadas entre las partes.

Bajo este contexto, la destinación de los valores correspondientes a las tarifas de peaje se presenta a continuación:

Tabla 8-62. Desglose de tarifas peaje La Apartada

LA APARTADA: VALORES A DISTRIBUIR EN EL 2026			
FSV	INCREMENTO 2%	CONCESIÓN	TOTAL
$ 553	$ 376	$ 18.771	$ 19.700
$ 553	$ 561	$ 27.986	$ 29.100

$ 553	$ 561	$ 27.986	$ 29.100
$ 553	$ 561	$ 27.986	$ 29.100
$ 553	$ 1.019	$ 50.928	$ 52.500
$ 553	$ 1.019	$ 50.928	$ 52.500
$ 553	$ 1.624	$ 81.223	$ 83.400
$ 553	$ 1.872	$ 93.575	$ 96.000

Fuente: Construcción propia

Tabla 8-63. Desglose de tarifas peaje Los Manguitos

LOS MANGUITOS. VALORES A DISTRIBUIR EN EL 2026			
FSV	INCREMENTO 2%	CONCESIÓN	TOTAL
$ 553	$ 376	$ 18.771	$ 19.700
$ 553	$ -	$ 6.147	$ 6.700
$ 553	$ -	$ 11.347	$ 11.900
$ 553	$ 561	$ 27.986	$ 29.100
$ 553	$ -	$ 18.547	$ 19.100
$ 553	$ -	$ 16.747	$ 17.300
$ 553	$ 561	$ 27.986	$ 29.100
$ 553	$ -	$ 18.547	$ 19.100
$ 553	$ 561	$ 27.986	$ 29.100
$ 553	$ -	$ 18.547	$ 19.100
$ 553	$ 1.019	$ 50.928	$ 52.500
$ 553	$ 1.624	$ 81.223	$ 83.400
$ 553	$ 1.872	$ 93.575	$ 96.000

Fuente: Construcción propia

Tabla 8-64. Desglose de tarifas peaje Mata de Caña

MATA DE CAÑA. VALORES A DISTRIBUIR EN EL 2026			
FSV	INCREMENTO 2%	CONCESION	TOTAL

$ 553	$ 369	$ 18.478	$ 19.400
$ 553	$ -	$ 11.347	$ 11.900
$ 553	$ 548	$ 27.399	$ 28.500
$ 553	$ -	$ 16.747	$ 17.300
$ 553	$ 548	$ 27.399	$ 28.500
$ 553	$ 548	$ 27.399	$ 28.500
$ 553	$ 584	$ 29.163	$ 30.300
$ 553	$ 584	$ 29.163	$ 30.300
$ 553	$ 857	$ 42.890	$ 44.300
$ 553	$ 859	$ 42.988	$ 44.400

Fuente: Construcción propia

Tabla 8-65. Desglose de tarifas peaje San Onofre

SAN ONOFRE. VALORES A DISTRIBUIR EN EL 2026			
FSV	INCREMENTO 2%	CONCESION	TOTAL
$ 553	$ 376	$ 18.771	$ 19.700
$ 553	$ 561	$ 27.986	$ 29.100
$ 553	$ 561	$ 27.986	$ 29.100
$ 553	$ 561	$ 27.986	$ 29.100
$ 553	$ 1.019	$ 50.928	$ 52.500
$ 553	$ 1.019	$ 50.928	$ 52.500
$ 553	$ 1.624	$ 81.223	$ 83.400
$ 553	$ 1.872	$ 93.575	$ 96.000

Fuente: Construcción propia

Tabla 8-66. Desglose de tarifas peaje Los Cedros

CEDROS. VALORES A DISTRIBUIR EN EL 2026			
FSV	INCREMENTO 2%	CONCESION	TOTAL
$ 553	$ 376	$ 18.771	$ 19.700
$ 553	$ -	$ -	$ -
$ 553	$ -	$ 11.347	$ 11.900
$ 553	$ 561	$ 27.986	$ 29.100
$ 553	$ -	$ -	$ -
$ 553	$ -	$ 16.747	$ 17.300
$ 553	$ 561	$ 27.986	$ 29.100
$ 553	$ 561	$ 27.986	$ 29.100

$ 553	$ 1.019	$ 50.928	$ 52.500
$ 553	$ 1.019	$ 50.928	$ 52.500
$ 553	$ 1.624	$ 81.223	$ 83.400
$ 553	$ 1.872	$ 93.575	$ 96.000

Fuente: Construcción propia

Tabla 8-67. Desglose de tarifas peaje San Carlos

SAN CARLOS: VALORES A DISTRIBUIR EN EL 2026			
FSV	INCREMENTO 2%	CONCESIÓN	TOTAL
$ 553	$ 369	$ 18.478	$ 19.400
$ 553	$ 548	$ 27.399	$ 28.500
$ 553	$ 548	$ 27.399	$ 28.500
$ 553	$ 548	$ 27.399	$ 28.500
$ 553	$ 584	$ 29.163	$ 30.300
$ 553	$ 584	$ 29.163	$ 30.300
$ 553	$ 857	$ 42.890	$ 44.300
$ 553	$ 859	$ 42.988	$ 44.400

Tabla 8-68. Desglose de tarifas peaje Purgatorio

PURGATORIO. VALORES A DISTRIBUIR EN EL 2026			
FSV	INCREMENTO 2%	CONCESIÓN	TOTAL
$ 553	**$ 376**	**$ 18.771**	**$ 19.700**
$ 553	$ -	$ 9.447	$ 10.000
$ 553	$ -	$ 647	$ 1.200
$ 553	$ -	$ 11.347	$ 11.900
$ 553	$ -	$ 3.147	$ 3.700
$ 553	**$ 561**	**$ 27.986**	**$ 29.100**
$ 553	$ -	$ 16.747	$ 17.300
$ 553	$ -	$ 13.947	$ 14.500
$ 553	$ -	$ 647	$ 1.200
$ 553	**$ 561**	**$ 27.986**	**$ 29.100**
$ 553	$ -	$ 13.947	$ 14.500
$ 553	$ 561	$ 27.986	$ 29.100
$ 553	$ -	$ 13.947	$ 14.500

$ 553	$ 1.019	$ 50.928	$ 52.500
$ 553	$ 1.019	$ 50.928	$ 52.500
$ 553	$ 1.624	$ 81.223	$ 83.400
$ 553	$ 1.872	$ 93.575	$ 96.000

Fuente: Construcción propia

Es importante precisar que el incremento del 2% adicional establecido en la Resolución aplica únicamente sobre las tarifas plenas, y no sobre las categorías especiales.

A continuación, se presenta el tráfico del mes de agosto de 2026, precisando que tuvo una contracción del -8.70% pasando de 1.045.458 vehículos que transitaron en el corredor en julio a 954.521 en agosto.

Tabla 8-69. Informe de Tráfico agosto 2026

Categorías	ago-26								
	ESTACIONES DE PEAJES								
	La Apartada	Purgatorio	Cedros	Mata de caña	San Onofre	Manguitos	San Carlos	Caimanera	Total
I	82.597	112.578	42.065	69.644	44.882	86.536	22.795	75.820	536.917
I - E	0	5.844	4.756	70	0	5.703	0	0	16.373
I - EE	0	448	0	0	0	1.598	0	0	2.046
I-EEP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I - EEE	0	8.953	0	0	0	0	0	0	8.953
I-EEEP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I - ET	0	732	0	0	0	0	0	0	732
I - EFS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	10.296	6.066	1.875	8.209	4.333	10.315	2.813	12.696	56.603
II - E	0	6.104	1.729	4.273	0	0	0	0	12.106
II - EE	0	0	0	0	0	1.786	0	0	1.786
II-EEP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II - EEE	0	3.698	0	0	0	0	0	0	3.698
II-EEEP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II- EFS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	20.667	10.241	4.914	6.467	8.595	21.636	5.386	6.487	84.393
III - E	0	0	0	0	0	62	0	0	62
IV	15.695	8.861	4.747	5.869	8.065	16.598	7.537	4.834	72.206
IV - E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	3.501	4.185	1.237	2.156	3.007	3.291	2.129	1.815	21.321
V - E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VB	7.231	562	71	2.065	5.233	7.284	1.989	1.824	26.259
VI	11.574	919	132	2.742	6.937	13.212	2.394	1.394	39.304
VI - E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	23.200	1.252	200	2.541	11.518	27.173	3.230	2.648	71.762

Categorías	ago-26								
	ESTACIONES DE PEAJES								
	La Apartada	Purgatorio	Cedros	Mata de caña	San Onofre	Manguitos	San Carlos	Caimanera	Total
VII - E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	174.761	170.443	61.726	104.036	92.570	195.194	48.273	107.518	954.521

Fuente: Concesionario Ruta al Mar. Informe de tráfico y recaudo, agosto 2026.

Posteriormente, se informa el tráfico consolidado por cada categoría desde el inicio 28 de noviembre de 2015 hasta el 31 de agosto de 2026.

Tabla 8-70. Informe de Tráfico acumulado a agosto de 2026

Categorías	ACUMULADO A AGOSTO 2026								
	ESTACIONES DE PEAJES								
	La Apartada	Purgatorio	Cedros	Mata De Caña	San Onofre	Manguitos	San Carlos	Caimanera	Total
I	7.609.220	9.849.375	4.832.176	8.213.209	4.570.332	8.368.065	1.545.557	5.752.849	50.740.783
I-E	886	430.771	315.184	4.243	0	524.582	0	362.761	1.638.427
I - EE	0	104.174	0	0	0	53.374	0	0	157.548
I-EEP	0	1.710	0	0	0	0	0	0	1.710
I - EEE	0	605.977	0	0	0	0	0	0	605.977
I-EEEP	0	39.831	0	0	0	0	0	0	39.831
IET	0	21.889	0	0	0	0	0	12.000	33.889
I-EFS	0	0	0	0	0	0	0	364.790	364.790
II	1.118.200	687.439	314.262	1.106.567	574.134	1.047.408	135.643	846.993	5.830.646
II - E	0	308.035	120.671	264.945	0	0	0	307.710	1.001.361
II - EE	0	4.464	0	0	0	51.977	0	0	56.441
II-EEP	0	3.648	0	0	0	0	0	0	3.648
II - EEE	0	257.066	0	0	0	0	0	0	257.066
II-EEEP	0	54.358	0	0	0	0	0	0	54.358
II-EFS	0	0	0	0	0	0	0	38.942	38.942
III	1.839.003	925.763	694.083	556.248	836.896	1.898.710	311.719	526.506	7.588.928
III-E	0	1.297	0	0	0	1.484	0	15.381	18.162
IV	1.396.025	761.503	705.221	496.295	915.145	1.462.459	392.342	498.982	6.627.972
IV E	0	1.080	0	0	0	0	0	545	1.625
V	464.026	291.783	186.389	206.777	397.559	417.655	141.691	225.218	2.331.098
VE	0	0	0	0	0	0	0	58	58
vb	408.156	36.733	35.355	75.783	339.759	394.333	51.660	77.945	1.419.724
VI	806.096	82.949	113.995	197.262	552.133	1.053.453	151.161	179.888	3.136.937
VIE	0	0	0	0	0	2.757	0	1.056	3.813
VII	1.889.980	137.923	237.873	373.621	1.109.497	2.359.752	293.464	398.307	6.800.417
VIIE	0	0	0	0	0	7.200	0	51	7.251
TOTAL	**15.531.592**	**14.607.768**	**7.555.209**	**11.494.950**	**9.295.455**	**17.643.209**	**3.023.237**	**9.609.982**	**88.761.402**

Fuente: Concesionario Ruta al Mar. Informe de tráfico y recaudo, agosto 2026.

8.12. INGRESOS SUBCUENTA AUTÓNOMA DE SOPORTE

Se presenta el balance de la Subcuenta Autónoma de Soporte (SAS) con corte a agosto de 2026. A la fecha, esta subcuenta ha recibido recursos por un total de $193.013 millones, provenientes del 0,9 % del recaudo de las estaciones de peaje: Mata de Caña, La Apartada, San Onofre, Los Cedros, Purgatorio, San Carlos, Los Manguitos y La Caimanera.

Es importante precisar los periodos en los cuales se comenzaron a realizar los aportes de las siguientes estaciones: San Carlos se realizan desde el 15 de julio de 2019, los de Los Manguitos desde el 1 de junio de 2021, y los de La Caimanera desde el 26 de junio de 2021.

Corresponde advertir que, al cierre del presente informe el recaudo en la estación de peaje La Caimanera permanece suspendido, en cumplimiento de la instrucción impartida por el Ministro de Transporte, conforme a lo acordado en la reunión realizada el 28 de enero de 2023.

A continuación, se presenta el comportamiento histórico de los ingresos de la Subcuenta Autónoma de Soporte. Cabe señalar que los recursos que conforman esta subcuenta corresponden al 0,9 % del recaudo de peajes, y su destinación principal es servir como primer mecanismo de compensación frente a la materialización de riesgos asociados al proyecto.

Tabla 8-71. Histórico de Ingresos por peaje. Subcuenta Autónoma de Soporte

MES	La Apartada	Mata De Caña	San Onofre	Cedros	Purgatorio	San Carlos	Manguitos	Caimanera	Manguitos S.A.S	Caimanera S.A.S	Total
Acumulado a Dic 2016	$ 203	$ 90	$ 81						$ 12.444	$ 2.325	$ 15.143
Acumulado a Dic 2017	$ 258	$ 100	$ 107	$ 29	$ 53	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.770	$ 6.414	$ 34.730
Acumulado a Dic 2018	$ 253	$ 107	$ 115	$ 88	$ 145	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.937	$ 6.602	$ 36.247
Acumulado a Dic 2019	$ 279	$ 112	$ 172	$ 112	$ 175	$ 817	$ 0	$ 0	$ 34.525	$ 6.108	$ 42.300
Acumulado a Dic 2020	$ 213	$ 78	$ 146	$ 102	$ 143	$ 25	$ 0	$ 0	$ 27.052	$ 5.152	$ 32.911
Acumulado a Dic 2021	$ 331	$ 137	$ 195	$ 140	$ 218	$ 51	$ 246	$ 36	$ 16.144	$ 4.401	$ 21.897
Acumulado a Dic 2022	$ 362	$ 168	$ 223	$ 159	$ 249	$ 70	$ 463	$ 70	$ 0	$ 0	$ 1.763

MES	La Apartada	Mata De Caña	San Onofre	Cedros	Purgatorio	San Carlos	Manguitos	Caimanera	Manguitos S.A.S	Caimanera S.A.S	Total
Acumulado a Dic 2023	$ 336	$ 216	$ 236	$ 180	$ 250	$ 90	$ 451	$ 4	$ 0	$ 0	$ 1.763
Acumulado a Dic 2024	$ 428	$ 223	$ 279	$ 180	$ 279	$ 101	$ 554	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.044
Acumulado 2025	$ 557	$ 236	$ 334	$ 205	$ 327	$ 109	$ 662	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.429
ene-26	$ 65	$ 32	$ 35	$ 18	$ 31	$ 17	$ 71	$ 0			$ 269
feb-26	$ 52	$ 15	$ 26	$ 7	$ 27	$ 8	$ 58	$ 0			$ 192
mar-26	$ 41	$ 18	$ 25	$ 10	$ 31	$ 10	$ 49	$ 0			$ 184
abr-26	$ 58	$ 20	$ 31	$ 11	$ 30	$ 11	$ 66	$ 0			$ 227
may-26	$ 55	$ 19	$ 27	$ 11	$ 30	$ 10	$ 62	$ 0			$ 214
jun-26	$ 56	$ 22	$ 32	$ 12	$ 30	$ 12	$ 63	$ 0			$ 226
jul-26	$ 60	$ 23	$ 40	$ 12	$ 31	$ 12	$ 68	$ 0			$ 246
ago-26	$ 59	$ 20	$ 31	$ 12	$ 31	$ 11	$ 65	$ 0			$ 229
Total	$ 3.666	$ 1.634	$ 2.135	$ 1.285	$ 2.078	$ 1.353	$ 2.877	$ 109	$ 146.872	$ 31.002	$ 193.013

Fuente. Informe de tráfico y recaudo. Cifras en millones de pesos corrientes

Por otra parte, el recaudo acumulado a agosto de 2026 a precios corrientes proveniente de las estaciones de peaje La Apartada, Mata de Caña, San Onofre, Los Cedros, Purgatorio, San Carlos, Los Manguitos y La Caimanera asciende a $ 1.581.803.718.177,30

En cuanto a la Subcuenta Autónoma de Soporte (SAS), el recaudo total acumulado corresponde a $ 193.012,83082147, valor que incluye los aportes provenientes de los peajes de San Carlos, La Caimanera y Los Manguitos, así como el 0,9 % correspondiente al recaudo total de las estaciones de peaje destinado a dicha subcuenta.

8.13. VPIP ACUMULADO

Para el presente informe, se precisa que, a partir del 2 de mayo de 2026 el proyecto entró formalmente en su Etapa de Reversión, y fue notificada a las partes el Laudo Arbitral CIRD No. 01-23-0002-8303, proferido el 30 de abril de 2026 por el Tribunal de Arbitramento constituido ante el Centro Internacional de Resolución de Disputas (CIRD). En dicha decisión, el Tribunal declaró la Terminación Anticipada del Contrato con fundamento en las cuatro causales invocadas por la parte convocante, y ordenó la aplicación de la Fórmula de

Terminación Anticipada prevista en la Sección 18.4 del Contrato, condenando a la Entidad al pago de las sumas que a continuación se presentan:

Tabla 8-72. Laudo Arbitral. Caso CIRD No. 01-23-0002-8303

Concepto	Monto	Dispositivo
Liquidación del Contrato (Fórmula Sección 18.3(e))	$ 3.306.292.000.000,00	Dispositivos TERCERO y CUARTO
Perjuicios — Falta aumento tarifas Peaje Carimagua	$ 257.866.339.833,00	Dispositivo NOVENO
Perjuicios — Insuficiencia Compensaciones Ambientales	$ 933.062.815,00	Dispositivo DÉCIMO
Perjuicios — Demoras reconocimiento Decreto 050	$ 1.240.438.812,00	Dispositivo DÉCIMO CUARTO
Perjuicios — Sitios inestables UF 4 y 5	$ 5.437.747.505,00	Dispositivo DÉCIMO QUINTO
Costas (honorarios Tribunal y CIRD)	USD $ 597.696,37	Dispositivo DÉCIMO OCTAVO
Costas (honorarios peritos y legales de RAM)	$ 9.439.635.342,80	Dispositivo DÉCIMO NOVENO
Ajustes de actualización sobre montos condenados	Por liquidar al cumplimiento	Dispositivos DÉCIMO SEXTO y DÉCIMO SÉPTIMO

Fuente: Laudo Final. Caso CIRD No. 01-23-0002-8303, 30 abril 2026.

En virtud de lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en la Sección 9.7 de la Parte General del Contrato, el Concesionario y esta Interventoría dieron inicio a las actividades propias de la Etapa de Reversión, en cuyo marco el Concesionario continúa ejecutando las labores de operación y mantenimiento de la infraestructura, dentro del Plazo Máximo de la Etapa de Reversión, el cual, tratándose de una Terminación Anticipada, podrá extenderse hasta por quinientos cuarenta (540) Días contados desde la declaratoria de la causal correspondiente.

Con base en Laudo Arbitral y la consecuente terminación anticipada del contrato de concesión, no se efectuará seguimiento ni aplicación del VPIP, dado que esta variable corresponde exclusivamente al escenario de terminación por vencimiento de plazo, o por consecución del mismo, conforme a lo previsto en las Secciones 1.171 y 1.173 de la Parte Especial y 3.5 de la Parte General del contrato. En los eventos de terminación anticipada, la liquidación se realiza conforme a la fórmula establecida en la Sección 18.3 de la Parte General, que contempla parámetros financieros específicos y no el VPIP como componente de cálculo. Por tanto, en la etapa de operación y mantenimiento, el VPIP no constituye una variable de seguimiento ni de aplicación contractual.

Bajo ese marco contractual se detalla la última medición realizada al valor presente de los ingresos por peaje (VPIP) que tuvo lugar en abril de 2026, como a continuación se enseña:

Tabla 8-73. VPIP Acumulado a abril 2026

TOTAL A ABRIL 2026	
PEAJE	**INGRESOS**
La Apartada	$378.219.371.150,63
Mata De Caña	$170.731.563.121,64
San Onofre	$220.573.009.484,82
Los Cedros	$136.454.784.357,30
Purgatorio	$215.466.264.704,80
San Carlos	$55.625.222.420,14
Manguitos	$288.395.595.272,59
Caimanera	$12.033.566.629,30
Total Peajes ($Corrientes)	$1.477.499.377.141,22
Peajes acumulado ($Mes De Referencia)	$954.087.407.324,47
Vpip Acumulado	$616.448.688.578,02
Vpip	$ 2.020.456.205.788
Porcentaje	**30,51%**

Fuente: Concesionario Ruta al Mar

El VPIP del proyecto ascendió a $2.020.456.205.788, expresado en precios constantes de enero de 2014. Con corte a abril de 2026, el VPIP acumulado ejecutado corresponde a $616.448.688.578,02, en los mismos precios constantes, lo que representa un avance del 30,51 % frente al valor total.

En consecuencia, el saldo pendiente por ejecutar alcanzó los $ 1.404.007.517.210, equivalente al 69,49 % del VPIP total.

De acuerdo con la validación de la información de estructuración, el valor acumulado proyectado para abril de 2026 ascendía a $ 831.707.280.445,00 cifra que corresponde a la suma de los valores acumulados previstos desde el año 2015 hasta abril de 2026. Este monto proyectado representa un nivel de cumplimiento del 41,16 % respecto al VPIP total, lo que evidencia una diferencia significativa frente al nivel de ejecución real registrado a la fecha.

8.14. COMPARATIVA ESTRUCTURACIÓN VS EJECUCIÓN REAL

Tabla 8-74. VPIP Estructuración vs ejecución a abril 2026

Concepto	Valor (S)	% frente al VPIP total
VPIP total	$ 2.020.456.205.788	100,00%
Acumulado previsto a abril -2026 (estructuración)	$ 831.707.280.445	41,16%
VPIP ejecutado a abril-2026	$ 616.448.688.578	30,51%
Diferencia estructuración vs ejecución	$ 215.258.591.867	10.65%

Fuente: Concesionario Ruta al Mar.

Del análisis comparativo entre la estructuración financiera y la ejecución real del VPIP, se observa que el valor acumulado efectivo a abril de 2026 (30,51%) se encuentra por debajo del nivel previsto en la estructuración (41,16%), lo que genera una brecha aproximada de 10,65 puntos porcentuales.

Esta diferencia podría estar asociada a una sobreestimación en las proyecciones de tráfico, especialmente en las categorías IV, V, VI y VII, que representan una participación relevante dentro de los ingresos del proyecto. La menor materialización del tráfico real en estas categorías podría haber incidido directamente en los niveles de recaudo y, en consecuencia, en la acumulación efectiva del VPIP.

8.15. ACTAS CÁLCULO COMPENSACIÓN ESPECIAL, RETRIBUCIÓN Y COMPENSACIÓN POR RIESGO

Acorde con del Laudo Arbitral y la consecuente terminación anticipada del contrato de concesión, tampoco procede la suscripción de las actas de compensación por riesgo a partir del dos de mayo de 2026. Conforme a lo previsto en la Sección 17.2 de la Parte General y su desarrollo en las Secciones 18.3(c) a 18.3(f) de la Parte Especial, la liquidación en escenarios de terminación anticipada se realiza mediante la fórmula financiera allí establecida; bajo este escenario, las precitadas actas solo tienen aplicación durante la ejecución ordinaria del contrato.

No obstante. Como parte del seguimiento anterior a la decisión del Laudo Arbitral cuya notificación tuvo lugar el 2 de mayo de 2026, y atendiendo el

reporte de los pagos realizados por parte de la Fiduciaria Bancolombia como consecuencia de las actas ya suscritas por las partes, se detalla a continuación la información de pago con corte al mes de junio de 2026, periodo en el que se canceló al concesionario la última acta suscrita antes de decretar la terminación anticipada del contrato, dichas actas corresponden al mes de abril de 2026. Cabe recordar que las Actas de Compensación Especial y las de Retribución se pagan bimensualmente.

Por otra parte, es importante señalar que, la Interventoría IPAB recibió el archivo histórico de las Actas de Retribución, Compensación Especial y Compensación por riesgo firmadas por la Interventoría Consorcio CR Concesiones. Acorde con la información proporcionada, se suscribieron las Actas de Retribución correspondientes a las Unidades Funcionales 1, 3, 4 y 5; asimismo, las Actas de Compensación Especial asociadas a las Unidades Funcionales UF2, UF6, UF7 y UF8.

A continuación, se presentan las Actas firmadas entre el Concesionario y la Interventoría Consorcio CR Concesiones, asimismo, las correspondientes al periodo de entrada en vigencia del contrato de la Interventoría IPAB junto con los valores correspondientes a las transferencias realizadas con corte al mes de junio por parte de Fiduciaria Bancolombia.

Tabla 8-75. Actas de Retribución y Compensación Especial

Actas por Unidad funcional	N. acta pagada corte abril 2026 (últimas actas suscritas)	Valor Pagado en junio 2026 (último pago)	Acumulado a junio 2026
Und. Funcional 1	81 (abril 2026)	$3.876.026.560	$236.300.332.186
Und. Funcional 2	60 (abril 2026)	$ 2.687.085.932	$150.215.921.950
Und. Funcional 3	63 (abril 2026)	$ 2.540.046.572	$ 159.665.399.683
UF 3 (Excedentes / Otrosí 17)		$ 133.686.662	$ 3.309.494.760
Und. Funcional 4	89 (abril 2026)	$1.939.277.467	$116.513.917.618
Und. Funcional 5	96 (abril 2026)	$2.214.872.320	$133.377.770.312
Und. Funcional 6	59 (abril 2026)	$2.687.085.932	$241.328.168.700
Und. Funcional 7	61 (abril 2026)	$3.179.652.911	$205.733.062.904
Und. Funcional 8	56 (abril 2026)	$4.210.762.663	$ 275.703.527.052
UF 8 (Excedentes / Otrosí 17/ Comp. Riesgo)		$ 0	$ 1.113.779.263
Total		**$ 23.468.497.019**	**$ 1.523.261.374.428**

ANEXO: 4.16 Detalle de Actas de Retribución y Actas de Compensación especial.

Por otra parte, es importante señalar que, a partir del mes de junio de 2025, se habilitó la Subcuenta del Otrosí 17 con el propósito de trasladar a esta los recursos retenidos asociados a las Unidades Funcionales 3 y 8.

A la fecha de corte del presente informe – agosto 2026-, el valor total trasladado a dicha subcuenta ascendió a $ 4.017.185.798,18.

En relación con las Actas de Compensación Especial de las Unidades Funcionales 2, 6, 7 y 8, es necesario precisar que la retribución al Concesionario se determinaba por dos variables: el avance de obra registrado en cada periodo y el porcentaje de inversión efectivamente ejecutada. Este último, conforme a lo establecido en la Sección 14.1(b) de la Parte General del Contrato, que define la fracción aplicable para el cálculo de la Compensación Especial. Los recursos correspondientes a la diferencia resultante se encuentran retenidos. Aclarado lo anterior, en la tabla posterior se registran dichas sumas, los cuales se detallan con corte a junio de 2026, mes en el cual se realizó el pago de las actas correspondientes al mes de abril.

Es importante precisar que debido al Laudo Arbitral notificado el 2 de mayo de 2026, no se realizaron actas para mayo, junio, julio y agosto, solo se ejecutaron los pagos de aquellas ya suscritas entre el Concesionario, la Interventoría IPAB y la ANI, así las cosas, se presenta la siguiente información:

Tabla 8-76. Actas de Compensación Especial. Saldos retenidos.

SALDOS PENDIENTES POR RESTRIBUIR A ABRIL 2026 (ÚLTIMAS ACTAS SUSCRITAS)				
UNIDAD FUNCIONAL	UF 2	UF 6	UF 7	UF 8
Peajes	$32.410.909.955,62	$29.103.235.579,63	$55.747.820.313,39	$ 28.073.567.609,04
Riesgo	$ 3.888.822.923,31	$3.492.469.623,64	$6.686.358.283,53	$ 3.369.356.093,74
Explotacion Comercial	$ 1.090.865,65	$ 1.007.451,56	$ 1.850.863,99	$ 976.231,15
SUBTOTAL POR UF	**$ 36.300.823.744,58**	**$ 32.596.712.654,83**	**$ 62.436.029.460,91**	**$ 31.443.899.933,93**
CONSOLIDADO TOTAL	**$ 162.777.465.794,25**			

Fuente: Actas de Compensación Especial abril de 2026 (pagadas en junio de 2026). Elaboración propia

A continuación, se presentan las Actas de Compensación por riesgo pagadas a la fecha y el detalle de cada rubro:

Tabla 8-77. Actas de Compensación de Riesgo pagadas

Acta de compensación	Cuenta Origen	Valor traslado total
Acta Tarifaria (1-37)	Subcuenta SAS Manguitos / Caimanera	$ 53.335.610.585
Acta Decreto 050 (1-7)	Subcuenta SAS Manguitos	$ 43.754.400.583
Acta Caimanera (1-9)	Subcuenta SAS Manguitos	$ 48.807.122.950
Acta Afectación COVID (A-B)	Subcuenta SAS Manguitos / Caimanera	$ 31.016.679.995
Acta predial (1-13)	Subcuenta SAS Manguitos / Caimanera	$ 34.877.628.568
		$ 211.791.442.681
Acta Otrosí 14	Subcuenta SAS Perimetrales	$ 24.916.562.869,35
Acta Otrosí 16	Subcuenta SAS 6.3.2 y 6.3.3 (3 actas)	$ 5.922.053.272,18
		$ 30.838.616.141,53

ANEXO: 4.16 Actas de Retribución; Acta de Compensación por Riesgo.

Tabla 8-78. Actas de Compensación Tarifaria

N. Acta	ACTA DE COMPENSACIÓN TARIFARIA	FECHA DE PAGO	VALOR
ACTA 1	1 (28 de noviembre 2015 a 29 de febrero 2016)		$ 6.838.843.698
ACTA 2	2 (1 de marzo 2016 a 31 de mayo 2016)		$ 5.878.794.228
ACTA 3	3 (1 de junio 2016 a 29 de julio 2016)		$ 989.255.029
ACTA 4	4 (30 de julio a 30 septiembre 2016)		$ 847.393.756
ACTA 5	5 (1 octubre a 31 diciembre 2016)	1-mar-17	$ 1.014.904.540
ACTA 6	6 (1 enero a 31 marzo 2017)	28-abr-17	$ 1.025.643.904
ACTA 7	7 (1 abril a 30 junio 2017)	1-jul-17	$ 1.203.887.952
ACTA 8	8 (1 julio a 30 septiembre 2017)	1-oct-17	$ 1.177.678.660
ACTA 9	9 (1 octubre a 31 diciembre 2017)	1-feb-18	$ 1.195.798.110
ACTA 10	10 (1 enero a 31 marzo 2018)	3-may-18	$ 1.252.071.338
ACTA 11	11 (1 abril a 30 junio 2018)	1-jul-18	$ 1.376.553.900
ACTA 12	12 (1 julio a 30 septiembre 2018)	1-nov-18	$ 1.444.886.256
ACTA 13	13(1 octubre a 31 diciembre 2018)	31-ene-19	$ 1.490.106.255
ACTA 14	14(1 enero a 31 marzo 2019)	6-may-19	$ 279.803.193
ACTA 15	15(1 abril a 30 junio 2019)	31-jul-19	$ 677.726.625
ACTA 16	16 (1 julio a 30 septiembre 2019)	1-nov-19	$ 872.408.260
ACTA 17	17 (1 octubre a 31 diciembre 2019)	4-feb-20	$ 847.127.115
ACTA 18	18 (1 enero a 25 marzo 2020)	30-abr-20	$ 734.141.104
ACTA 19	19 (1 abril a 30 junio 2020)	29-jul-20	$ 89.891.981
ACTA 20	20 (1 Julio a 30 septiembre 2020)	27-oct-20	$ 296.124.419
ACTA 21	21 (1 octubre a 31 diciembre 2020)	29-ene-21	$ 544.537.395
ACTA 22	22 (1 enero a 31 marzo 2021)	26-abr-21	$ 565.967.741

N. Acta	ACTA DE COMPENSACIÓN TARIFARIA	FECHA DE PAGO	VALOR
ACTA 23	23 (1 abril a 30 junio 2021)	30-jul-21	$ 625.130.099
ACTA 24	24 (1 julio a 30 septiembre 2021)	9-nov-21	$ 1.948.915.952
ACTA 25	25 (1 octubre a 31 diciembre 2021)	4-feb-22	$ 2.370.264.496
ACTA 26	26 (1 enero a 31 marzo 2022)	13-may-22	$ 2.608.031.240
ACTA 27	27 (1Abril a 30 junio 2022)	29-jul-22	$ 2.448.944.022
ACTA 28	28 (1Julio a 30 septiembre 2022)	31-oct-22	$ 2.537.264.653
ACTA 29	29 (1 octubre a 31 diciembre 2022)	31-ene-23	$ 937.624.236
ACTA 30	30 (1 enero a 31 marzo 2023)	15-jun-23	$ 970.702.494
ACTA 31	31 (1 abril a 30 junio 2023)	15-sep-23	$ 1.041.636.835
ACTA 32	32 (1 julio - 30 septiembre 2023)	13-dic-23	$ 1.081.298.561
ACTA 33	33 (01 oct a 31 dic 2023)	21-feb-24	$ 1.118.602.662
ACTA 34	34 (01 ene a 31 mar 2024)	21-jun-24	$ 1.198.146.986
ACTA 35	35 (01 abr a 30 jun 2024)	14-ago-24	$ 1.216.258.782
ACTA 36	36 (1 julio - 30 septiembre 2024)	15-dic-25	$ 1.269.106.755
ACTA 37	37 (01 oct – 31 dic 2024)	23-dic-25	$ 1.301.283.915
ACTA 38	38 (01 ene- 31 mar 2025)	Pendiente	$ 1.348.783.520
ACTA 39	39 (01 abr- 30 jun 2025)	Pendiente	$ 1.432.093.297
ACTA 40	40 (01 jul -30 sep 2025)	Pendiente	$ 1.601.110.874
ACTA 41	41 (01 oct – 31 dic 2025)	Pendiente	$ 1.689.551.328
CTA 42	42 (01 enero – 31 mar 2026)	Pendiente	$ 1.685.675.778
	Subtotal de Actas pagadas al mes de abril 2026		**$ 53.335.610.584**
	Subtotal de Actas pendientes de pago a abril 2026		**$ 7.757.214.797**
	TOTAL DE ACTAS SUSCRITAS		**$ 61.092.825.382**

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 8-79. Actas de Compensación Caimanera

N. ACTA	ACTA DE COMPENSACIÓN CAIMANERA	FECHA DE PAGO	FUENTE DE PAGO	VALOR
Acta 1	01 (16 sep a 30 sep 2022)	10-mar-23	Sub Autónoma de Soporte	$ 785.749.193
Acta 2	02 (01 oct a 31 dic 2022)	10-mar-23	Sub Autónoma de Soporte	$ 3.918.050.772
Acta 3	03 (1 ene a 31 mar 2023)	13-jun-23	Sub Autónoma de Soporte	$ 6.208.919.965
Acta 4	04 (1 abr a 30 jun 2023)	15-sep-23	Sub Autónoma de Soporte	$ 5.950.728.574
Acta 5	05 (1 de jul al 30 de sept de 2023)	7-dic-23	Sub Autónoma de Soporte	$ 5.607.293.647

N. ACTA	ACTA DE COMPENSACIÓN CAIMANERA	FECHA DE PAGO	FUENTE DE PAGO	VALOR
Acta 6	06 (01 oct al 31 de dic 2023)	21-feb-24	Sub Autónoma de Soporte	$ 5.687.257.069
Acta 7	07 (01 ene a 31 de mar de 2024)	21-jun-24	Sub Autónoma de Soporte	$ 7.590.893.260
Acta 8	08 (01 abr a 30 de jun de 2024)	21-ago-2024	Sub Autónoma de Soporte	$ 5.233.202.755
			Sub Excedentes ANI	$ 1.017.366.152
Acta 9	09 (1 de jul al 30 de sep. de2024)	23-dic-25	Sub Excedentes ANI	$ 6.807.661.563
Acta 10	10 (01 oct al 31 de dic de 2024)	**Pendiente**		$ 7.235.039.698
Acta 11	11 (01 ene al 31 de mar de 2025)	**Pendiente**		$ 8.180.071.023
Acta 12	12 (01 abr al 30 de jun de 2025)	**Pendiente**		$ 7.494.348.018
Acta 13	13 (01 jul a 30 sep. 2025)	**Pendiente**		$ 7.173.475.899
Acta 14	14 (01 oct a 31 dic 2025)	**Pendiente**		$ 8.087.697.178
Acta 15	15 (01 enero a 31 marzo 2026)	**Pendiente**		$ 8.787.955.549
Subtotal de actas pagadas a abril 2026				**$ 48.807.122.950**
Subtotal de actas pendiente de pago a abril 2025				**$ 46.958.587.365**
TOTAL ACTAS SUSCRITAS				**$ 95.765.710.315**

Fuente: elaboración propia

Tabla 8-80. Actas de Compensación decreto 050

N. Del Acta	ACTA DE COMPENSACIÓN DECRETO 050	FECHA DE PAGO	VALOR
Acta 1	1. (1 Enero - Mar 2023)	27-dic-23	$ 5.404.128.391
Acta 2	2. (Abril - Jun 2023)	27-dic-23	$ 7.221.972.944
Acta 3	3. (Julio - Sep 2023)	27-dic-23	$ 7.317.237.821
Acta 4	4. (Oct - Dic 2023)	21-feb-24	$ 7.764.688.717
Acta 5	5. /Ene - Mar 2024)	21-jun-24	$ 6.595.179.703
Acta 6	6. /Abr -Jun 2024/	11-oct-24	$ **2.874.912.943**
		6-jun-25	$ 1.607.386.899
		20-ago-25	$ 799.669.640
		12-dic-25	$ 308.568.692
Acta 7	7. (Julio - Sep 2024)	15-dic-25	$ 3.860.655.012
Acta 8	8. (Oct -Dic 2024)	Pendiente	$ 3.025.201.001

N. Del Acta	ACTA DE COMPENSACIÓN DECRETO 050	FECHA DE PAGO	VALOR
	Subtotal de actas pagadas a abril 2026		$ 43.754.400.581
	Subtotal de actas pendientes de pago a abril 2026		$ 3.025.201.001
	TOTAL DE ACTAS SUSCRITAS		$ 46.779.601.584

Fuente: elaboración propia

En junio de 2026 se realizaron los últimos pagos de actas suscritas por las partes, por un total de $ 23.468.497.019, correspondientes a las Unidades Funcionales (UF) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, asociados a las actas del mes de abril de 2026. En este valor se incluyen $133.686.662 producto de la retención realizada a UF3 por la aplicación del Otrosí 17- Índice de Cumplimiento Predial.

Adicionalmente, es importante señalar que a la fecha las Actas de Compensación Especial y las Actas de Retribución de las UFs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 se pagan a través de la Subcuenta de Ingresos.

No obstante, en el caso de las Actas de Compensación por Riesgo Tarifario, la compensación por riesgo asociada al peaje La Caimanera, la compensación derivada del Decreto 050 y las Actas de Reconocimiento por Afectación a los Ingresos del Concesionario (literales A y B), el destino de los recursos se determinó según la Unidad Funcional. En este sentido, los valores correspondientes a las UFs 1, 3, 4 y 5 se transfirieron a la Subcuenta de Ingresos, mientras que los valores asociados a las UFs 2, 6, 7 y 8 se destinaron a la Subcuenta de Compensación por Riesgo.

Tabla 8-81. Actas de Retribución, Compensación Especial y Compensación de riesgo

Unidades funcionales	VALOR ACUMULADO ACTAS RETRIBUCION	ACTA DIF TARIFARIO	ACTAS DECRETO 50	ACTAS CAIMANERA	ACTAS COVID 19	TOTAL ACUMULADO
Und, Funcional 1	$ 236.300.332.186	$ 4.084.258.940	$ 6.707.549.609	$ 7.482.131.948	$ 4.754.857.043	$ 259.329.129.726
Und, Funcional 2	$ 150.215.921.950					$ 150.215.921.950
Und, Funcional 3	$ 162.974.894.443	$ 2.456.048.271	$ 4.620.464.701	$ 5.154.032.184	$ 3.275.361.407	$ 173.326.768.822
Und, Funcional 4	$ 116.513.917.618	$ 2.543.633.601	$ 3.355.962.525	$ 3.743.506.330	$ 2.378.979.356	$ 124.792.493.100
Und, Funcional 5	$ 133.377.770.312	$ 2.905.114.779	$ 3.832.885.491	$ 4.275.503.970	$ 2.717.061.168	$ 147.108.335.720
Und, Funcional 6	$ 241.328.168.700					$ 241.328.168.700
Und, Funcional 7	$ 205.733.062.904					$ 205.733.062.904

Unidades funcionales	VALOR ACUMULADO ACTAS RETRIBUCION	ACTA DIF TARIFARIO	ACTAS DECRETO 50	ACTAS CAIMANERA	ACTAS COVID 19	TOTAL ACUMULADO
Und, Funcional 8	$ 276.817.306.315					$ 276.817.306.315
Total	$ 1.523.261.374.428	$ 11.989.055.591	$ 18.516.862.326	$ 11.757.635.918	$ 13.126.258.974	$ 1.578.651.187.237

*Para el cálculo de las actas de retribución n, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 19 de la UF 4 se les realizo un descuento por el índice de cumplimiento por valor total de $136,363,590 el cual se destinó a la Sub de saldo en discusión UF 4 y posteriormente se traslada a la Sub de excedentes ANI,

Con base en la información presentada en el cuadro anterior, se concluye que con corte a junio de 2026 (último pago realizado) el concesionario recibió ingresos por concepto de Actas de Retribución, Compensación Especial y Compensación por Riesgos por un total de $ 1.578.651.187.237, los recursos producto de la retención del Índice de Cumplimiento Predial -Otrosí 17- se trasladan a la cuenta que lleva el mismo nombre.

Asimismo, es importante señalar que, con la entrada en vigor de la Resolución 20253040018105 del 14 de mayo de 2025, se estableció un incremento del 2 % en las tarifas de peaje a partir del año 2026, además de la eliminación del límite mínimo de pasos exigido para los vehículos con tarifas diferenciales en las estaciones de peaje Los Manguitos, Los Cedros, Purgatorio y Mata de Caña.

Como consecuencia de esta modificación en las condiciones tarifarias, se prevé un incremento en los valores de compensación asociados a este tipo de vehículos, lo que podría generar un impacto directo en los costos de compensación que deben ser asumidos por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

8.16. ACTUALIZACIÓN SARLAFT

Teniendo en cuenta el Informe de Rendición Mensual enviado por la Fiduciaria Bancolombia con corte a 31 de agosto 2026, el fideicomitente actualizó la información relacionada con el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo- SARLAFT el 05 de marzo de 2025, encontrándose vigente dicha información como lo indica la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia.

8.17. SALDO CUENTAS PROYECTO

A continuación, se presentan los saldos de las cuentas del proyecto, así como las cuentas administradas por la ANI destinadas al manejo y control de los recursos. Los valores reportados corresponden al corte del 31 de agosto de 2026.

Tabla 8-82. Saldo cuentas proyecto

CUENTAS PROYECTO		
CUENTA	SALDO FINAL JULIO-26	SALDO CONTABLE AGOSTO-26
Cuentas Proyecto	$ 124.720.431.670,30	$ 36.981.638.140,07
Cuentas ANI	$ 275.444.574.118,90	$ 302.658.124.062,40
Total disponible cuentas del Fideicomiso	$ 400.165.005.789,20	$ 339.639.762.202,47

ANEXO: 4,17 SALDOS

Nota: No se reportan partidas conciliatorias al cierre del periodo informadas por la Fiduciaria Bancolombia.

8.18. PÓLIZAS DEL PROYECTO

8.18.1. Antecedentes

Durante la vigencia 2026, la Interventoría ha adelantado la verificación de las garantías exigidas en el Contrato en dos frentes:

(i) las pólizas provenientes de la Fase de Construcción y su actualización anual, conforme a lo exigido en la Sección 12.3(b) de la Parte General; y

(ii) las garantías propias de la Etapa de Reversión, activada como consecuencia de la Terminación Anticipada declarada mediante el Laudo Arbitral del 30 de abril de 2026.

Respecto del primer frente, el Concesionario remitió la actualización de los valores asegurados y de las vigencias mediante los radicados 20260205011180 (05-feb-2026), 20260217011288 (17-feb-2026) y 20260417011856/20260417011857 (17-abr-2026), estos últimos acompañados de los paz y salvos y de las pólizas de maquinaria.

Posteriormente, mediante radicado 20260601012239 (02-jun-2026), el Concesionario dio respuesta al oficio IPAB-0172-2026. Mediante oficio IPAB-

0500-2026 (15-jul-2026), la Interventoría formuló observaciones a dicha respuesta, entre las que se destacan la inclusión indebida de Construcciones El Cóndor como asegurado en los certificados CM103949 a CM103952 y el error de transcripción del certificado CM103950 (Sabotaje y Terrorismo). Dentro del Plazo de Cura, que contó con la No Objeción de la ANI (radicado 20264090642512), el Concesionario se pronunció mediante radicado 20260728012633 (30-jul-2026). En dicha comunicación controvirtió las observaciones formuladas, sin subsanarlas. En consecuencia, continúa en curso el trámite por presunto incumplimiento, para lo cual la Interventoría elaboró el informe correspondiente.

En cuanto al segundo frente, la ANI otorgó un Plazo de Cura mediante radicado 20263050249931, el cual fue notificado al Concesionario por la Interventoría a través del oficio IPAB-0477-2026. Mediante radicado 20260708012476 (08-jul-2026), el Concesionario remitió la Póliza de Cumplimiento Estatal No. 400075590, Anexo 0 (Compañía Nacional de Seguros), y la Póliza RCE No. 802094170, certificado RE38702 (Confianza). En ambos instrumentos, los amparos de Cumplimiento y de RCE se expidieron con vigencia únicamente entre el 01-may-2026 y el 01-nov-2026 (seis meses), término inferior a los 270 días de la Etapa de Reversión que exigen las Secciones 7.1(a)(iii) y 7.4(d)(i) de la Parte Especial. Adicionalmente, el Amparo de Salarios no cubría el término previsto en la Sección 7.2(a)(iii), y no se allegó el Seguro de Todo Riesgo de Obra Civil exigido en la Sección 7.5(c).

En consecuencia, la Interventoría no recomendó el cierre del Plazo de Cura y, el 29-jul-2026, requirió al Concesionario para que subsanara las deficiencias señaladas.

8.18.2. Oficio radicado 20260914013012 del 14 de septiembre de 2026

Mediante el oficio de la referencia, CORUMAR remitió los ajustes a las garantías de la Etapa de Reversión y solicitó nuevamente el cierre del Plazo de Cura. Para el efecto, allegó los siguientes documentos:

- **el Anexo 1 de la Póliza de Cumplimiento Estatal No. 400075590**, expedido el 04-sep-2026, que prorroga las vigencias de los amparos de Cumplimiento y de Salarios y Prestaciones Sociales;
- **el certificado RE38726 de la Póliza RCE No. 802094170**, expedido el 31-ago-2026, que reemplaza el RE38702 y amplía la vigencia hasta el 01-feb-2027.

Los valores asegurados se mantienen sin modificación respecto de los documentos remitidos, tal como se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 8-83. Valores asegurados etapa de reversión

Amparo (Parte Especial)	Aseguradora / Póliza / Anexo	Valor asegurado ($)	Mínimo contractual ($)	Cumple valor	Vigencia desde	Vigencia hasta (anterior)	Vigencia hasta (14-sep-2026)	Vigencia mínima exigida	Cumple vigencia	Concepto Interventoría
Cumplimiento del Contrato (7.1)	Compañía Nacional de Seguros Póliza 400075590 Anexo 1 (exp. 04/09/2026)	$27.227.716.095	$13.762.760.965	Sí	01/05/2026	01/11/2026	27/02/2027	26/01/2027	Sí	Subsanado: el Anexo 1 amplía la vigencia de 6 meses a 27-feb-2027 y cubre los 270 días de la Etapa de Reversión.
Salarios y Prestaciones Sociales (7.2)	Compañía Nacional de Seguros Póliza 400075590 Anexo 1 (exp. 04/09/2026)	$13.613.858.049	$6.881.380.483	Sí	01/05/2026	01/11/2029	27/02/2030	26/01/2030	Sí	Subsanado: cubre la Etapa de Reversión más los 3 años adicionales.
Estabilidad de la Obra (7.3(b))	Compañía Nacional de Seguros Póliza 400075590 Anexo 1 (exp. 04/09/2026)	$61.692.160.284	$13.762.760.965	Sí	01/05/2026	01/05/2028	01/05/2028	01/05/2028	Sí	Conforme. Sin cambios en el Anexo 1.
Responsabilidad Civil Extracontractual (7.4(d))	Confianza Póliza 802094170 RE38726, reemplaza RE38702 (exp. 31/08/2026)	$58.312.204.503	$29.475.000.000	Sí	01/05/2026	01/11/2026	01/02/2027	26/01/2027	Sí	Subsanado en vigencia. Verificar que RE38726 no repita la leyenda «180 días pendiente fecha inicio de vigencia» del RE38702.
Todo Riesgo Obra Civil (7.5(c))	No allegada	—	—	Pendiente	—	—	—	—	Pendiente	PENDIENTE: no se remitió con el oficio. Valor asegurable según estudio de pérdida máxima probable (Sección 12.8(a)(ii)). Impide recomendar el cierre total del Plazo de Cura (radicado ANI 20263050249931).

Fuente: elaboración propia

Contados los 270 días de la Etapa de Reversión a partir del 1 de mayo de 2026, su vencimiento se produce el 26 de enero de 2027. En consecuencia, las nuevas vigencias de los amparos de Cumplimiento (27-feb-2027) y de RCE (01-feb-2027) cubren la totalidad de la Etapa. Por su parte, la vigencia del amparo de Salarios y Prestaciones Sociales (27-feb-2030) cubre la Etapa y los tres (3) años adicionales exigidos por la Sección 7.2(a)(iii). De esta manera, se entienden subsanadas, en cuanto a vigencia, las observaciones formuladas respecto de estos tres amparos, cuyos valores asegurados ya superaban los mínimos establecidos en la Parte Especial.

No obstante, el oficio no incluye el Seguro de Daños contra Todo Riesgo de Obra Civil para la Etapa de Reversión exigido en la Sección 7.5(c), cuyo valor asegurable debe determinarse con base en el estudio de pérdida máxima

probable previsto en la Sección 12.8(a)(ii). Por tanto, esta garantía continúa pendiente, hasta tanto dicho seguro no sea allegado, la Interventoría no podrá recomendar a la ANI el cierre total del Plazo de Cura otorgado mediante radicado 20263050249931. Adicionalmente, la Interventoría verificará que el certificado RE38726 no reproduzca la leyenda residual "180 días pendiente fecha inicio de vigencia" contenida en el certificado RE38702, y que los documentos se encuentren debidamente firmados y acompañados de sus clausulados y de los paz y salvos de pago de la prima.

8.18.3. Estado de las pólizas de la Fase de Construcción

A la fecha siguen vigentes estas pólizas:

- Cumplimiento y Salarios HDI Seguros No. 9201510, Anexo 56 ($300.288.013.627 hasta el 30-sep-2027 y $107.874.280.033 hasta el 30-sep-2030);
- RCE Confianza No. 802087085, certificado RE38648 ($87.990.919.325 hasta el 26-ene-2027);
- Todo Riesgo Obra Civil Sección I, CM103949 ($2.036.938.196.777 hasta el 26-ene-2027);
- Sabotaje y Terrorismo, CM103950 ($60.000.000.000 hasta el 26-ene-2027);
- Obra Civil Sección II, CM004164 / CM001187 ($115.484.447.789 hasta el 31-ene-2027).

Respecto de las observaciones de IPAB-0500-2026 sigue en curso el trámite de incumplimiento.

8.19. RESULTADO DE LA AUDITORÍA AL P.A. FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.

8.19.1. Objetivo de la Auditoría

La presente auditoría se realiza con el propósito de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en la Circular de la Gerencia Financiera VGC del 4 de junio de 2017, identificada con Radicado de Salida No. 2017-308-010384-1, cuyo asunto corresponde a

"Auditorías a Patrimonios Autónomos – Proyectos de Cuarta Generación de Concesiones".

En dicho documento se establece que la Interventoría debe incluir dentro de su informe mensual los resultados de la auditoría efectuada al Patrimonio Autónomo, garantizando que esta actividad se desarrolle en cumplimiento de las disposiciones contractuales y del marco normativo aplicable al proyecto.

8.19.2. Alcance de la Auditoría

Las actividades analizadas en la auditoría son:

- Envío de las certificaciones tanto mensual como el Informe de Gestión del mes respectivo.
- El Informe de Costos y Gastos del mes respectivo.
- El informe de los flujos de caja, reportes de pagos, información de gestión, balance por centros de costos tanto general como por Unidad Funcional.
- Envío de extractos bancarios de las subcuentas.
- Soporte del pago del Fosevi.
- Soporte de los Traslados de las Compensaciones.
- Informes trimestrales no auditados.
- Informes semestrales auditados.
- Pagos Fontur.

8.19.3. Objetivo Específico

La presente auditoría tiene como objetivos específicos los siguientes:

Verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el contrato de fiducia mercantil suscrito con Fiduciaria Bancolombia, en relación con las obligaciones asumidas, los plazos para la entrega de información, los compromisos adquiridos y demás condiciones pactadas para la administración del patrimonio autónomo.

Evaluar la confiabilidad y veracidad de la información suministrada, con el fin de determinar si esta refleja adecuadamente la situación financiera del

proyecto, así como su conformidad con las normas y principios contables aplicables. Lo anterior permitirá emitir conclusiones y facilitar la toma de decisiones en beneficio del proyecto.

Comprobar que la información presentada sea consistente con los planes, metas y políticas definidas para el desarrollo del proyecto.

8.19.4. Criterios de la Auditoría

En el marco de la presente auditoría, se evidenció que el Patrimonio Autónomo (PA) cumple con la normativa legal vigente, aplicando los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, así como las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y la normatividad correspondiente a COLGAAP.

Asimismo, se verificó que los procesos y reportes elaborados y presentados por el Patrimonio Autónomo son objeto de revisión y auditoría, garantizando la confiabilidad y consistencia de la información financiera reportada.

8.19.5. Fecha Auditada

La fecha auditada junto con los informes presentados por el Patrimonio Autónomo corresponde al mes de agosto de 2026.

8.19.6. Conclusiones

se concluye que durante el mes objeto de reporte el Patrimonio Autónomo (PA) atendió de manera oportuna las solicitudes de información y realizó el envío de la documentación requerida por parte de la fiduciaria, en cumplimiento de los procedimientos establecidos.

De igual forma, la información suministrada por el PA permite identificar con claridad la situación financiera del proyecto, así como su posición económica, el estado de avance, los compromisos asumidos y demás aspectos relevantes desde el punto de vista financiero.

9. GESTIÓN DE LA INTERVENTORÍA

9.1. INFORMACIÓN GENERAL

En la tabla siguiente, se presenta la información general del Contrato de Interventoría No VEJ-523-2026:

Tabla 9-1 Información General del Contrato de Interventoría

Contrato No	VEJ-523-2026
Contratista:	Consorcio IPAB.
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, MEDIOAMBIENTAL, SOCIO–PREDIAL, ADMINISTRATIVA, DE SEGUROS, RIESGOS, OPERATIVA, MANTENIMIENTO, ADMINISTRATIVA DE AFORO Y RECAUDO Y DE GESTIÓN DE CALIDAD AL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 016 DE 2015 DEL PROYECTO IP CONEXIÓN ANTIOQUÍA - BOLÍVAR".
Valor Inicial:	$ 30.013.436.514 COP
Plazo Total:	60 meses
Acta de Inicio:	07 de febrero de 2026.
Fecha de Terminación:	07 de febrero de 2031.

Fuente: Elaboración Propia Consorcio IPAB

Nota: Al Contrato de Interventoría Consorcio IPAB lo antecede la Interventoría Consorcio CR Concesiones para el periodo comprendido entre el 27 de noviembre de 2015 y 06 de febrero de 2026.

9.2. MODIFICACIONES AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El Contrato de Interventoría Consorcio IPAB no tiene modificaciones a la fecha.

9.3. PÓLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A continuación, se relacionan las pólizas vigentes que cubren las garantías del Contrato de Interventoría del Consorcio IPAB, las mismas se encuentran aprobadas por la Agencia de conformidad con lo establecido en el Capítulo VI - Garantías y Pólizas del Contrato, mediante radicado ANI 20263050152501 del 28 de abril de 2026:

Tabla 9-2 Pólizas vigentes del Contrato de Interventoría No. VEJ-523-2026

GARANTÍAS		NOMBRE DE ASEGURADORA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	Cumplimiento del Contrato	Seguros del Estado Póliza No 14-44-101256924	07-02-2026	07-08-2031	$12.500.399.796.283,33
	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones laborales.		07-02-2026	07-02-2034	$1.562.549.910,42
	Calidad del servicio.		07-02-2026	07-08-2031	$3.125.099.820,83
RCE	Predios, Labores y operaciones.	Seguros del Estado Póliza No 14-40-101079816	07-02-2026	07-02-2027	$1.562.549.910,42

Fuente: Elaboración Propia Consorcio IPAB

9.4. PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

De acuerdo con lo previsto en Anexo Técnico hoja de datos, metodología y plan de cargas de trabajo, y según los ajustes producto del inicio de la etapa de reversión se tiene el siguiente personal vigente para el contrato de interventoría, ratificado mediante comunicado ANI 0263050218651 de 09 de junio de 2026:

Tabla 9-3 Personal Interventoría

CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	DEDIC ACIÓN	FECHA APR	RAD APROBACIÓN
9.656.400	Ricardo Alonso Avella Chaparro	Director de Interventoría	100%	7/02/2026	20263050040121
78.751.323	William Cicerón Tordecilla Payares	Subdirector Técnico - Operativo	100%	7/02/2026	20263050040131
79.723.520	Andrés Alberto Beltran Bonilla	Subdirector Financiero	50%	2/03/2026	20263050069971
79.626.166	Javier Enrique Delgado Campuzano	Subdirector Jurídico	50%	20/02/2026	20263050058021

79.723.520	Javier Enrique Pérez Argumedo	Ingeniero Residente Operativo	100%	16/02/2026	20263050049811
30.685.373	María Esthela Julio González	Ingeniero Residente Técnico	100%	16/02/2026	20263050049821
9.778.218	Ángel Alberto Cohecha Pabon	Ingeniero Residente Puentes	25%	17/03/2026	20263050096441
1.136.882.668	Natalia García López	Ingeniero Residente de Redes	25%	2/03/2026	20263050069981
7.572.041	Pedro Manuel Ortega Diaz	Ingeniero Residente SISO	25%	16/02/2026	20263050049831
52.847.813	Martha Rocio Castillo Fernández	Experto en Sistemas Inteligentes de Transporte	25%	2/03/2026	20263050069941
79.406.449	Juan Ricardo Torres Salazar	Especialista en Estructuras	20%	2/03/2026	20263050070071
52.786.438	Tannia Yohana Sanjuan Galindo	Especialista en Pavimentos	20%	6/03/2026	20263050079491
80.168.122	Miyer Orlando Ramírez Vargas	Especialista en Geotecnia y Suelos	20%	17/02/2026	20263050053251
93.401.974	Juan Carlos Bonilla Cabeza	Especialista en Hidráulica e Hidrología	20%	17/03/2026	20263050096821
	Elsa Torres Arenales	Especialista en Vías	20%	23/03/2026	20263050102681
25.171.322	Beatriz Eugenia Monsalve Guarin	Especialista en seguridad industrial y salud ocupacional	20%	1/06/2026	20263050206381
52.970.997	Liz Jennifer Salazar Ruiz	Especialista Ambiental	25%	12/03/2026	20263050089291

79.958.562	Félix Eduardo Arias Sáenz	Especialista en Tránsito y Transporte	20%	18/02/2026	20263050054011
35.426.956	Johana Carolina Gonzales	Abogado Especialista en Derecho Administrativo	100%	2/09/2026	20263050336441
1.049.607.667	Néstor Acuña Daza	Abogado Gestión Predial	50%	17/03/2026	20263050096451
39.812.648	Jeimmy Bibiana López Tinoco	Abogado Gestión Predial	50%	4/06/2026	20263050212161
92.559.002	German Bladimir Garrido Peralta	Auditor de Sistemas de peajes y/o pesaje y/o tarifas	25%	6/03/2026	20263050079501
53.063.593	Andrea Carolina Zarate Hidalgo	Profesional Aseguramiento y Gestión de la Calidad	25%	4/03/2026	20263050075481
51.783.493	Melba Ines Albañil Fagua	Profesional Auditor Interno de Calidad	25%	17/03/2026	20263050096501
52.847.813	Martha Rocio Castillo Fernández	Profesional Auditor Seguridad Vial	25%	2/03/2026	20263050069951
3.838.321	Leonardo Javier González Salgado	Profesional Predial	100%	24/03/2026	20263050104671
52.352.948	Diana Patricia Ortiz Poveda	Profesional Financiero	100%	18/02/2026	20263050054241
34.566.697	Sonia Socorro Hernández Giraldo	Profesional Contable	100%	25/03/2026	20263050105761
80.757.264	Oscar Adolfo Aristizabal Celis	Profesional Ambiental	100%	17/02/2026	20263050051811
52.087.016	María Isabel Aya Suarez	Profesional riesgos	25%	5/05/2026	20263050162071

50.910.283	Jislaine Cecilia Olascoaga Zuluaga	Profesional Social	100%	16/02/2026	20263050051441
1.136.889.986	Juan Sebastián García Ramírez	Ingeniero Auxiliar ANI	100%	6/02/2026	20263050038621
1.003.049.720	Mauricio Carrascal Bula	Auxiliar de Ingeniería	100%	16/02/2026	20263050049731
92.641.374	Jair Alfonso Pérez Daza	Auxiliar Predial	100%	2/03/2026	20263050070051
1.063.647.276	Mayra Lucía Pérez Mares	Auxiliar Social	100%	3/06/2026	20263050209451
51.783.493	Duván Andrés Sánchez Canabal	Auxiliar de Ingeniería Peajes y Operativo	100%	17/03/2026	20263050096831
1.016.095.903	Edson David Espitia Montes	Topógrafo	25%	6/03/2026	20263050079471
1.024.574.838	Angie Viviana Castro Muñoz	Cadenero I	25%	2/03/2026	20263050072251
52.149.741	Sandra Fabiola Gómez Flórez	Cadenero II	25%	2/03/2026	20263050069991
15.034.341	Beder Antonio Burgos Negrete	Inspector de Obra 1	100%	16/02/2026	20263050049781
18.882.260	Julio Manuel Bohorquez Petro	Inspector de Obra 2	100%	16/02/2026	20263050049771
1.007.765.631	Andrea Susana Campo Martínez	Inspector de Obra 3	100%	09/06/2026	20263050219741
1.022.353.833	Rousbellh Estibenson Contreras Herrera	Profesional en Archivística	25%	6/03/2026	20263050079481
1.000.242.115	Valentina Ávila López	Asistente Administrativa.	100%	19/02/2026	20263050057301
1.065.002.512	Andrés Felipe Fontalvo Rubio	Conductor 1	100%	6/03/2026	20263050079511
1.065.008.064	Daniel José Enamorado Paternina	Conductor 2	100%	17/03/2026	20263050096431
7.385.895	Néstor Javier Llorente Portillo	Conductor 3	100%	23/03/2026	20263050102671

Fuente: Elaboración Propia Consorcio IPAB

Adicionalmente, la Interventoría tiene a disposición los recursos que se relacionan en la siguiente tabla:

Tabla 9-4 Recursos Interventoría Etapa Preoperativa Fase Construcción

RECURSO	UND	CANTIDAD	MESES DE USO
Computador portátil - (incluye ANI)	UND	8	Global
Computadores de escritorio	UND	2	Global
Escáner	UND	1	Global
Dron	UND	1	Global
Adquisición de equipos celulares	UND	8	Global
Equipos de video peajes	UND	8	Global
Adquisición plan telefonía celular	UND	8	12
Alquiler de Vehículo	Mes	3	12
Alquiler Equipo de Topografía	Mes	1	12
Alquiler de Oficina en el lugar del proyecto (Incluye Servicios Públicos y Dotación)	Mes	1	12
Papelería, fotocopias, heliografías, informes y otros	Mes	1	12
Comunicaciones (telefonía, fax. email, etc.)	Mes	1	12
Medición deflectometría	Km	1	482
Medición Indicadores, y demás ensayos requeridos.	Km	2	482
Ensayos de laboratorio y mediciones de campo	Mes	1	12

Fuente: Elaboración Propia Consorcio IPAB

9.5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

A continuación, se describen las actividades desarrolladas por la Interventoría en el presente mes:

9.5.1. Auditorías de Gestión ANI

De acuerdo con la fecha de suscripción del contrato de Interventoría del Consorcio IPAB a la fecha no se han realizado auditorías de gestión por parte de la ANI, se tiene como fuente de información el último informe de auditoría publicado en la página de la Agencia, este será tomado como insumo para las labores de supervisión, seguimiento y control de esta interventoría, y corresponde al Informe de auditoría a la función pública realizado a la Interventoría anterior Consorcio CR Concesiones y a la Supervisión del proyecto carretero Antioquia – Bolívar año 2025:

https://www.ani.gov.co/sites/default/files/auditoria_al_proyecto_antioquia_bolivar.pdf

El 17 de abril de 2026 se informó por parte de la Agencia mediante correo electrónico que,
"*La Oficina de Control Interno ha emitido el memorando ANI No. 20261020004953, el cual se encuentra adjunto, mediante el cual detalla el plan de auditorías para la presente vigencia e incluye a nuestro proyecto IP Conexión Antioquia – Bolívar entre los contratos a ser auditados*.

La auditoría está programada para realizarse en el mes de octubre de 2026. Por lo que, me permito recordar los procedimientos y trámites susceptibles de control, incluyendo, pero no limitándose a:

Otrosíes.
Informes de interventoría.
Actualización y aprobación de pólizas.
Actualización del ANIscopio en cada área.
Plazos de cura y procesos sancionatorios.
Trámites de Amigable Componedor.
Laudos Arbitrales.
Respuesta a solicitudes de Evento Eximente de responsabilidad.
Actualización de la matriz o informe de riesgos del proyecto.
Comités de previa aprobación.
Actas de compensación por riesgo.
Avance y gestión en cada área: técnica, predial, ambiental, financiera, entre otras".

"En consecuencia, desde la Interventoría hemos iniciado una revisión integral de todos los preparativos y requerimientos necesarios para la auditoría de gestión

9.5.2. Actividades Gestión Administrativa y Legal:

- Participación en la elaboración del Proyecto de Otrosí No. 19 relacionado con la remuneración de las Actividades de Operación y Mantenimiento en la Etapa de Reversión
- De manera continua y transversal, en ejercicio de sus funciones de seguimiento, control y verificación, la Interventoría:

  - ✓ Emite los conceptos jurídicos e integrales requeridos por la Agencia Nacional de Infraestructura
  - ✓ Tramita las comunicaciones y solicitudes al Concesionario que resulten necesarias para el correcto desarrollo de las actividades del proyecto.
- Realiza el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del Concesionario
- Participación de reuniones presenciales en la ANI los días 04, 08, 15 y 22 de septiembre con el fin de escuchar propuestas por parte de concesionario y alternativas por parte de la interventoría sobre las condenas que ordena el laudo, así como la construcción del otrosí 19.

9.5.3. Actividades Gestión de Riesgos

Análisis y seguimiento periódico a los riesgos asociados al Contrato de Concesión, ceñidos a la normatividad vigente que orienta el componente de riesgos.

- Inclusión de conceptos a comunicaciones generadas por la Interventoría acorde con las solicitudes de la ANI.
- Elaboración y coordinación de los informes contractuales requeridos en el Contrato de Interventoría.
- Se asistió a reuniones presenciales y virtuales con la entidad con ocasión de avanzar en la posible suscripción del otrosí que regule la contraprestación económica del Concesionario en la etapa de reversión.
- Atención y respuesta a observaciones relacionadas al proyecto de otrosí 19.

9.5.4. Actividades Gestión Financiera

En el marco del Contrato de Concesión bajo el esquema de Asociación Público-Privada N° 016 de 2015 —Proyecto IP Concesión Antioquia Bolívar—, el área financiera de la Interventoría desarrolla de manera recurrente las siguientes actividades de seguimiento, control y reporte con periodicidad mensual:

- Elaboración y remisión del Informe Mensual Financiera, del Informe Ejecutivo de Interventoría y del documento de Conclusiones y Recomendaciones, como instrumentos de seguimiento integral al desempeño financiero del proyecto.
- Validación del Informe Diagnóstico Financiero remitido por el Concesionario, verificando la consistencia, integridad y razonabilidad de la información reportada.
- Diligenciamiento del ANISCOPIO en la plataforma dispuesta por la Agencia Nacional de Infraestructura para el registro y seguimiento de las obligaciones contractuales.
- Conciliación del FOSEVI (Fondo de Seguridad Vial), con la previa solicitud del informe de tráfico al Concesionario como insumo técnico indispensable para su elaboración.
- Elaboración y entrega del Informe de CAPEX Y OPEX, con el análisis de la ejecución de inversiones y gastos de operación frente a los valores contractualmente establecidos.
- Recepción, validación y remisión formal de las actas relacionadas con la etapa de reversión verificando el cumplimiento de los requisitos y soportes establecidos en el contrato
- Presentación del Informe de la Subcuenta Autónoma de Soporte (SAS), con el análisis de los saldos, movimientos y consistencia de los recursos administrados por la Fiduciaria.
- Presentación de los Formatos ANI correspondientes a:

    - ✓ Reporte de rendimientos financieros elaborado por el Consorcio IPAB.
    - ✓ Recaudo en estaciones de peaje.
    - ✓ Explotación comercial del proyecto.
    - ✓ Mantenimiento rutinario.

- Informes FOSEVI, conforme a las obligaciones contractuales y los reglamentos de cada fondo.

- Apoyo a las áreas técnica-operativa, predial, ambiental frente al reporte financiero de las actividades relacionadas con cada departamento.

- Con periodicidad trimestral, se elaboran y radican los siguientes documentos:

  - ✓ Informes de FOSECON y FONTUR, conforme a las obligaciones contractuales y los reglamentos de cada fondo.

- De manera continua y transversal, en ejercicio de sus funciones de seguimiento, control y verificación, la Interventoría:

  - ✓ Emite los conceptos técnicos e integrales requeridos por la Agencia Nacional de Infraestructura en materia financiera.
  - ✓ Tramita las comunicaciones y solicitudes al Concesionario que resulten necesarias para el correcto desarrollo de las actividades del proyecto.
  - ✓ Realiza el seguimiento a la constitución, vigencia y suficiencia de las garantías contractuales, incluyendo las pólizas de seguro exigidas en el Contrato de Concesión, verificando que estas se encuentren debidamente constituidas, actualizadas y aprobadas por la Agencia Nacional de Infraestructura conforme a los requisitos y amparos establecidos contractualmente.
  - ✓ Vigila y audita la correcta aplicación del Índice de Cumplimiento Predial (ICP) en el marco de lo dispuesto en el Otrosí N° 17, verificando que su cálculo, reporte y aplicación se ajusten a las condiciones y parámetros contractualmente establecidos.

9.5.5. Actividades Gestión Técnica

- Se realizaron recorridos de campo con el fin de verificar las actividades de infraestructura ejecutadas por el Concesionario, evaluando su estricta concordancia con las obligaciones contractuales y los estándares técnicos exigidos para el proceso de reversión.
- Se mantuvo un seguimiento permanente y prioritario a las actividades ejecutadas por el Concesionario para garantizar la movilidad en el PR 19+350 de la UF 5.1, en atención a la emergencia ocasionada por las condiciones meteorológicas asociadas al frente frío, las cuales afectaron la estabilidad de la estructura del puente Trementino II.

- Se realizó el control y seguimiento técnico a la construcción y puesta en marcha de la vía alterna que actualmente se encuentra en operación; esta infraestructura es fundamental para asegurar la continuidad del servicio, la seguridad de los usuarios y las condiciones óptimas de transitabilidad en el corredor vial.
- Se continúa con las actividades de construcción del puente Trementino II. A la fecha de corte, se culminaron las actividades de demolición de la estructura existente y se avanzó en la ejecución de las obras de cimentación del nuevo puente, incluyendo la instalación del acero de refuerzo y la fundición de seis (6) pilotes, tres (3) correspondientes al Apoyo 1 y tres (3) al Apoyo 2. Asimismo, se realizó el armado y posterior fundición de la viga de apoyo del estribo 2. Durante las actividades de fundición se efectuaron los respectivos ensayos de asentamiento (slump) y la toma de muestras de concreto mediante cilindros para el correspondiente control de calidad.
- Se realizo seguimiento a las actividades de reparación y estabilización del talud ubicadas en el PR 7+400 de la UF5.1, verificando durante el periodo el avance de las obras ejecutadas y las condiciones actuales del sector intervenido.
- Se realizo seguimiento de reparación ejecutadas en el sector PR 41+450 de la Unidades Funcionales 1, esta Interventoría realizó la correspondiente verificación de las obras y actividades ejecutadas en campo.
- Se continúa con la revisión, análisis técnico de los formatos para la reversión y se verifica en campo.
- Se continuó con el monitoreo y seguimiento técnico semanal en los puntos de control estructural y topográfico establecidos para el puente Boca de la Ciénaga, garantizando la trazabilidad de su comportamiento.

9.5.6. Actividades Gestión Operativa

9.5.6.1. Gestión operativa en Vías

- Seguimiento, control y medición de indicadores mensuales en las UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7.2, UF7.3, UF8.1, UF8.2 y UF8.3

- Seguimiento, control y medición de los niveles de servicio para los tramos que al inicio de la etapa de reversión, no se encontraban con acta de terminación, en los cuales se realizan (actividades de mantenimiento rutinario y cíclico) en la unidad funcional UF2, UF6 y UF8 conforme a lo estipulado en el numeral 3.3. Obligaciones Particulares de Operación del Apéndice Técnico 2.

- Elaboración del acta de índice de cumplimiento por medio del SICC para las unidades funcionales UF1, UFI2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7 y UF8 correspondiente al mes de septiembre de 2026.

- Seguimiento a los controles operativos ejercidos por la policía de carreteras (DITRA) en diferentes sectores para garantizar la Seguridad Vial del corredor en cumplimiento a las obligaciones del convenio interadministrativo

9.5.6.2. Gestión operativa en peajes

- Se realizó auditoria a las estaciones de peajes y pesajes, cuya relación de hallazgos se presenta en el informe mensual de Interventoría.

- Verificación de informes de vehículos especiales efectuando chequeo aleatorio de placas que transitan en un (1) día de peaje, confirmando con imágenes captadas por equipos de la Concesión para validar placa y categoría vehicular. Este proceso queda consignado en registro de visita y en el informe mensual con el seguimiento y análisis al consolidado de vehículos especiales para peaje Manguitos, Mata de Caña, Cedros y Purgatorio según cada resolución correspondiente.

- Se continúa con la ejecución de procesos para Auditoria operativa (tráfico y recaudo) y de sistemas a los peajes La Apartada, Mata de Caña, Los Manguitos, Purgatorio, Cedros, Caimanera y San Onofre.

- Revisión de documentación para otorgamiento o negación de las tarifas diferenciales por parte de la ANI, según las resoluciones 410/20, 288/20, Resolución 20223040079455/2022 y reglamento de tarifas diferenciales con radicado 20225000046981 de fecha 22/02/2022.

- Revisión y verificación de los formatos de sistema eléctrico correspondientes al proceso de reversión, con el fin de validar la información consignada y el cumplimiento de los requisitos establecidos para su entrega.

- Medición del indicador O3, cola de peajes en las estaciones del corredor Antioquia - Bolívar.

.

9.5.6.3. Gestión operativa en estaciones de pesaje

- Se realizó la visita y se verificó la operación de las estaciones de pesaje Manguitos 1 y 2, Mata de Caña 1 y 2, y San Onofre 1 y 2. Sin embargo no se realizaron las pruebas, debido a que el vehículo que se utiliza estaba prestando un servicio y al estado del clima.

- Auditoría de sistemas en conjunto con el Concesionario para verificar el correcto funcionamiento de los sistemas y aplicaciones (software) en los equipos de cómputo para registro de pasos y clasificación vehicular. La Interventoría identificó nuevos registros de gestión tráfico y recaudo, los cuales fueron auditados durante el periodo del informe.

- Revisión de informe de sobre pesados y comprobación de comparendos emitidos por la DITRA para vehículos infractores.

- Revisión periódica de libro de novedades y supervisión de mantenimientos a la infraestructura física de la estación según cronograma establecido en el Plan de Operaciones vigente al año 2026.

- Revisión del Plan de Operaciones vigente al año 2026.

- En el Anexo N°6. Operación y mantenimiento, se incluye el registro fotográfico del seguimiento a algunas de las actividades, trabajos y labores ejecutadas durante el período.

9.5.7. Actividades Gestión Social

- Actividades Gestión Social el 11 de septiembre de 2026 se realizó acompañamiento y seguimiento al Concesionario durante una reunión en la Institución Educativa Loma Azul, sede Los Cerros, en el municipio de Planeta Rica, Córdoba. Participaron el rector Leider Herrera, el coordinador académico Amilkar Mercado, docentes y representantes de las áreas técnica y social del Concesionario Ruta al Mar y de la Interventoría IPAB. El encuentro tuvo como propósito abordar las condiciones de seguridad vial en el entorno de la

institución, teniendo en cuenta que niños, niñas y adolescentes deben cruzar la vía para desplazarse. El rector expresó su preocupación y señaló que los padres de familia también han manifestado inquietudes al respecto. Asimismo, presentó una solicitud para reducir la velocidad de los vehículos y mejorar la seguridad de la comunidad educativa. Esta solicitud fue atendida en el marco de la PQRS 4139. El Concesionario indicó que algunas solicitudes corresponden a competencias de otras entidades. Sin embargo, manifestó su disposición para colaborar dentro del alcance de sus funciones y orientó a los participantes sobre los actores institucionales que podrían atenderlas, como resultado, se propuso realizar una segunda mesa de trabajo con las entidades competentes, el Concesionario informara la fecha, con el fin de revisar la solicitud, definir los compromisos correspondientes y fortalecer la articulación institucional frente a la problemática identificada.

- El 17 de septiembre de 2026, profesionales de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Concesionario Ruta al Mar y la Interventoría IPAB realizaron un recorrido de inspección en la UFI 5, sector 2, para verificar y concertar la demarcación de los puntos de referencia (PR), de acuerdo con la normativa aplicable y la resolución vigente del Instituto Nacional de Vías (INVIAS). Durante la visita se evidenció la ejecución de actividades de bacheo, la Interventoría hizo énfasis al Concesionario en la necesidad de mantener la señalización preventiva e informativa de las obras, con el fin de brindar condiciones de seguridad a los usuarios de la vía y a los trabajadores. Asimismo, se solicitó reforzar la información dirigida a los usuarios mediante los tableros informativos ubicados en el área de influencia, comunicando oportunamente las intervenciones en curso y las posibles afectaciones a la movilidad, finalmente, se pidió al Concesionario demarcar en sitio los cambios efectuados en los PR y mantener el registro de las observaciones y demás aspectos relevantes de la intervención, para facilitar la identificación, el seguimiento y la trazabilidad de las modificaciones.

- Como parte de la jornada de seguimiento del 17 de septiembre de 2026, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Concesionario Ruta al Mar y la Interventoría IPAB visitaron el frente de obra del puente Trementino II para verificar el avance de las actividades constructivas y revisar aspectos de Gestión Social, atención a los usuarios de la vía y comunicación con las comunidades del área de influencia, de acuerdo con la información

suministrada por el Concesionario y la verificación en campo, la obra presenta un avance físico acumulado del 22 %. Al contrastar este porcentaje con el cronograma vigente, se evidenció que el avance está acorde con la programación prevista para el periodo, a la fecha de la visita, no se identificaron atrasos que comprometieran el cumplimiento de los plazos establecidos, la Interventoría efectuó seguimiento a las actividades en ejecución y realizó las observaciones pertinentes en campo. También señaló la importancia de mantener el control de los frentes de trabajo para favorecer la continuidad de las actividades y el cumplimiento de los hitos del cronograma, en materia social, la coordinadora social de la ANI consultó al Concesionario sobre la recepción de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) relacionadas con las obras del puente. El Concesionario informó que, a la fecha de la visita, no había recibido PQRS asociadas al proyecto, se resaltó la importancia de mantener activos y divulgar adecuadamente los mecanismos de atención a la comunidad, así como de continuar informando sobre los avances de la obra, las actividades previstas y las posibles afectaciones a la movilidad. La Interventoría continuará verificando que las solicitudes que eventualmente se reciban sean registradas, atendidas y gestionadas dentro de los tiempos establecidos, y que cuenten con la debida trazabilidad.

- En el recorrido realizado el 17 de septiembre de 2026, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Interventoría IPAB inspeccionaron el punto afectado por erosión costera en Puerto Rey, con el propósito de verificar las condiciones actuales del sector y observar su posible incidencia sobre la infraestructura vial y las áreas aledañas, durante la inspección visual no se evidenciaron novedades ni cambios significativos frente a las condiciones identificadas previamente. Tampoco se observaron afectaciones adicionales que permitieran establecer un incremento del proceso erosivo durante el periodo de seguimiento, debido a la posible incidencia de la erosión costera sobre la estabilidad de las áreas próximas a la infraestructura vial, se considera necesario mantener el seguimiento periódico del punto, especialmente durante periodos de oleaje fuerte, lluvias intensas u otros eventos climáticos que puedan favorecer la evolución del proceso.

- En la mesa del 17 de septiembre de 2026, en conjunto con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Concesionario Ruta al Mar y la Interventoría IPAB se revisó el avance de la segunda entrega de información para el proceso de

reversión al INVIAS. Se abordaron el cargue y la revisión de expedientes prediales, las rutas incluidas y la atención de observaciones de la Interventoría. También se trataron asuntos de seguridad vial en Santiago de Tolú: el Concesionario presentaría el estudio de velocidad y sus resultados en una mesa prevista para el día siguiente. La ANI solicitó que se expusieran las estadísticas, las posibles causas de accidentalidad y las recomendaciones técnicas para el sector.

- El 18 de septiembre de 2026, la ANI, Concesión Ruta al Mar y la Interventoría IPAB participaron en una mesa convocada por la Alcaldía de Santiago de Tolú para tratar la accidentalidad en la vía Tolú–San Onofre, especialmente en los sectores Pueblito, Pasacorriendo y Pita. El Concesionario presentó los factores de riesgo identificados y las medidas preventivas en curso, los asistentes expresaron su preocupación y solicitaron reforzar las acciones mientras se realiza el estudio de seguridad vial, como seguimiento, se acordó fortalecer las medidas preventivas, realizar el estudio en octubre y socializar sus resultados en noviembre. También se programará una visita a Pita en Medio para revisar una solicitud comunitaria de rocería. La ANI y la Interventoría harán seguimiento a estos compromisos y a las gestiones de las entidades competentes.

- Del 21 al 25 de septiembre de 2026, se realizó el cargue y organización de información correspondiente a la segunda entrega documental de Gestión Social, asociada a las siguientes rutas y Unidades Funcionales:
  -Ruta 2513 – UFI 1.
  -Ruta 25CRA – UFI 3-1.
  -Ruta 74CR01 – UFI 3-2, UFI 3-3 y UFI 3-4.
  -Ruta 74CRA – UFI 3-5.
  -Ruta 2310 – UFI 4, subsectores 1 y 2.
  -Ruta 7401 – UFI 5-1.
  -Ruta 21CR04 – UFI 5-2.

- La información cargada correspondió al Formato de cumplimiento de Obligaciones Sociales (GCSP-115), Formato de Pendientes Sociales (GCSP-F-305) y Formato de Inventario de Pagos de Compensaciones Socioeconómicas (GCSP-F-306). Asimismo, se realizó el cargue de los Informes Trimestrales correspondientes al periodo 2016-2019 y de las PQRS,

organizadas por año y mes. Durante esta entrega se verificó la documentación asociada a las rutas relacionadas, teniendo en cuenta que para estas no aplica las consultas previas.

9.5.8. Actividades Gestión Ambiental

- Se atendieron de manera oportuna y dentro de los plazos establecidos las solicitudes, requerimientos y consultas formuladas por la profesional ambiental de la ANI, relacionadas con el componente ambiental del proyecto.
- Se participó en los comités internos de la Interventoría, realizados semanalmente los días martes, en horario de 8:00 a.m. a 11:00 a.m., en los cuales se efectuó seguimiento al estado general del contrato y a las actividades asociadas a los componentes técnico, ambiental, predial, social y administrativo del proyecto.
- Se elaboró y actualizó la matriz de seguimiento ambiental, teniendo en cuenta la condición actual del proyecto en Etapa de Reversión, con el propósito de identificar y mantener actualizada la trazabilidad del estado de las obligaciones, trámites, permisos y compromisos ambientales vigentes.
- En desarrollo de las actividades de seguimiento y verificación de las obligaciones ambientales asociadas al proceso de reversión, se efectuó la revisión de los formatos establecidos por la ANI para la consolidación y entrega de la información ambiental. Como resultado de esta revisión, se identificaron observaciones relacionadas con la información y los soportes consignados en dichos formatos, las cuales fueron socializadas con la Concesión mediante mesa de trabajo realizada el 24 de septiembre de 2026. En dicha reunión se efectuaron las aclaraciones correspondientes y se revisaron los ajustes y/o complementaciones requeridas para continuar con el proceso de reversión.
- Se efectuó la revisión y seguimiento al cumplimiento de los requerimientos legales y obligaciones ambientales a cargo del Concesionario, así como a las gestiones adelantadas ante las diferentes autoridades ambientales competentes, verificando los avances y soportes asociados a cada trámite.
- Se realizó seguimiento a los trámites ambientales pendientes de pronunciamiento, así como a las actuaciones adelantadas por el Concesionario ante las autoridades ambientales, verificando los avances relacionados con el cierre, cesión, desistimiento o terminación de aquellos expedientes y permisos que correspondan, de acuerdo con la condición actual del proyecto.

9.5.9. Seguridad y Salud en el Trabajo SST:

En cuanto a la Seguridad y Salud en el trabajo se realizan actividades por parte de la Interventoría en cuento a cumplimiento interno de la misma en materia SST y del Concesionario así:

9.5.9.1. Gestiones SST Internas de la Interventoría:

Respecto a las actividades relacionadas en Seguridad y Salud en el Trabajo internas de la Interventoría, se presenta lo siguiente:

- Se continúan realizando las inspecciones pre-operacionales a las camionetas adscritas a la Interventoría, mensualmente se realiza la inspección de vehículos. Cada camioneta cuenta con su kit de derrames completo y sus elementos de primeros auxilios (extintor y botiquín) dichos elementos tienen una periodicidad de revisión según cronograma estipulado en el SG-SST.
- Todo el personal de la Interventoría cuenta con afiliación al sistema general de seguridad social; el personal cuenta con su esquema de vacunas completas reforzadas (si es el caso) en los exámenes médicos periódicos.
- Las capacitaciones son dictadas en su mayoría por la ARL SEGURO BOLIVAR siguiendo el cronograma anual de capacitaciones de la organización. Las capacitaciones se vienen dictando de manera virtual y presencial.
- En la oficina se cuenta con kit de emergencias completo, tal como son: Camilla rígida, botiquín de primeros auxilios con sus elementos esenciales y tres extintores contraincendios (uno multipropósito y uno Co2). El cual se le realiza inspecciones con una periodicidad bimestral.
- Se cuenta con los elementos de protección personal para cada actividad a desarrollar en las tareas diarias de esta interventoría determinados en la matriz de EPP.

9.5.9.2. Gestiones SST CORUMAR

- Para este periodo se genera comunicado IPAB-0743-2026 del 09 de septiembre de 2026.Solicitud de información, observaciones de las actividades en la UFI 5.1 PR19+850 - Puente Trementino II
- Para este periodo se genera comunicado IPAB-0782-2026 del 17 de septiembre de 2026. Solicitud de información, Pago de Seguridad Social y Aporte de Parafiscales Personal de Rocería.
- Para este periodo se genera comunicado IPAB-0817-2026 del 29 de septiembre de 2026. Respuesta a comunicado 48-

RUTADCTOELECTRONICOS-20260722012570 de fecha 23 de julio de 2026 con asunto “Respuesta comunicación IPAB-0377-2026 con radicado ANI No. 20264090721372 de fecha 5 de junio de 2026, radicado 47-RUTADCTOELECTRONICOS-20260605015041 con asunto: Solicitud de documentación SG-SST en el marco de la terminación anticipada y reversión del Contrato de Concesión”.

- Para este periodo se genera comunicado IPAB-0823-2026 del 30 de septiembre de 2026. Solicitud de información y acciones correctivas para actividades de izaje y cumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo (SST) para actividades de trabajo en alturas - Puente Trementino II, PR 19+850, UF 5.1.
- Durante el periodo reportado, se verificó la ejecución del plan de capacitaciones en cumplimiento del **Decreto 1072 de 2015 (Art. 2.2.4.6.11)** y la **Resolución 0312 de 2019**. Se validaron actividades en los siguientes temas: seguridad vial, identificación de peligros y riesgos, riesgos locativos, psicosociales, biomecánicos, cardiovasculares, biológicos, pausas activas e inducción/reinducción al SG-SST.
- Para el periodo se realizó verificación de afiliaciones y pago de seguridad a ARL, EPS y AFP al personal que se encuentra vinculado al proyecto incluyendo contratistas y EPC.

En las inspecciones realizadas en campo al personal activo, se revisan las afiliaciones de seguridad social al siguiente personal:

- ALVAREZ MORELO SIBIA CECILIA c.c: 50914783.
- ANAYA CONTRERAS YAIDITH DEL CARMEN c.c: 1067862138.
- ARTEAGA DIAZ YULI JOHANA c.c 30668842.
- BERTEL GONZALEZ LIZETH CECILIA c.c 23175791.
- CALDERIN FLOREZ CELMIRA DE JESUS c.c: 30668244.
- CAMARGO MADRIGAL LEIDDY JULIETH c.c: 1090454521.
- CANO MONTALVO CARMEN CECILIA c.c 33358663.
- CORREA GALVAN ELCIS MAXIELES c.c: 50910559
- DIAZ VASQUEZ KAREN NINI c.c 1066569473.
- GALVAN RIVERO ROQUELINA c.c: 25799998.
- LOPEZ MORALES NELDY JUDITHC.C 30665408.
- LOPEZ ORTEGA KAREN MARGARITA c.c 1133819123.
- MEZA MEZA IRNELDA c.c: 33056245.
- MORALES SANCHEZ RUBYS MARIA c.c: 1007461371.
- PADRON REGINO GREY XIOMARA c.c: 1067896171.
- SOTOMAYOR RICO CLARA EUGENIA c.c: 50910000.
- MARTINEZ HOYOS KAROL LINA c.c: 1128415860.

- TORDECILLA MIRANDA NUBIA CRISTINA c.c: 50923793.
- AGUILAR LOPEZ LAURA BIBIANA c.c: 11000334.
- QUINTANA MEZA LAURA BANESSA c.c: 1047492746.
- ANAYA ANICHIARICO ANA ANGELICA c.c: 1067902864.
- PAEZ CASTRO VIVIANA c.c: 64526049.
- ORTIZ CUADRADO LUISA MARIA c.c: 1067911481.
- PEREZ ANAYA VERONICA DEL CARMEN c.c: 1067094571.

10. CONCLUSIONES

10.1. GESTIÓN JURÍDICA

- Dado que dentro del proceso de arbitraje internacional se emitió el respectivo laudo, mediante el cual se dispuso la terminación anticipada del Contrato de Concesión, la Interventoría continuará realizando el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales que resulten aplicables durante la Etapa de Reversión, así como al cronograma establecido para su desarrollo y culminación.
- Se deberá culminar la estructuración, revisión y depuración técnica, financiera y jurídica del proyecto de Otrosí No. 19, atendiendo los requerimientos y observaciones formulados por la ANI y procurando la consolidación de un mecanismo de remuneración coherente con el marco contractual y con las obligaciones que permanecen vigentes durante la Etapa de Reversión, al cierre de este informe entre las partes intervinientes en dicha modificación se encuentra en discusión y revisión una propuesta para el reconocimiento de la etapa de reversión que quedará consignada en el documento así como el pago de las condenas establecidas en el Laudo Arbitral.
- Frente a los Eventos Eximentes de Responsabilidad (EER), se continuará con el seguimiento de aquellos eventos que mantienen incidencia sobre obligaciones exigibles durante la Etapa de Reversión. En atención a la no atención integral de los requerimientos efectuados al Concesionario respecto de la entrega de los informes semanales de seguimiento, para el siguiente periodo se proyecta solicitar a la ANI la No Objeción para el otorgamiento de un Plazo de Cura, de conformidad con las disposiciones contractuales aplicables.
- Respecto de los Plazos de Cura, se continuará con el seguimiento y las actuaciones jurídicas derivadas de los procedimientos adelantados, particularmente frente a aquellos en los que no se acreditó la subsanación integral de los presuntos incumplimientos dentro de los términos otorgados, y se dará traslado a la ANI de los resultados correspondientes para que se adelanten, cuando proceda, las actuaciones previstas contractualmente y en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.
- Finalmente, se continuará con el acompañamiento jurídico al trámite de Reversión, orientado a la preparación y suscripción del Acta de Reversión prevista para febrero de 2027, así como al seguimiento de las obligaciones,

actuaciones y decisiones que deban surtirse hasta la culminación de dicho proceso.

10.2. GESTIÓN DE RIESGOS

- El recaudo del tráfico del mes de septiembre de 2026 representó para la SAS un aporte de $223.176.235 (Doscientos Veintitrés Millones Ciento Setenta y Seis Mil Doscientos Treinta y Cinco Pesos Mcte) correspondiente al 0,9%.

- El incremento del 2% adicional a las tarifas estipulado mediante la resolución 20253040018105 del 14 de mayo de 2025, se creó con objeto se servir como mecanismo de compensación de riesgos, sin embargo, con la declaración anticipada del contrato, estos recursos quedan a disposición de la Entidad. Para el mes de septiembre de 2026 se generó en las estaciones de peaje un valor de (Cuatrocientos Ochenta y Siete Millones Ochocientos Cincuenta y Ocho Mil Ochocientos Siete Pesos Mcte) $487.858.807.

- La franja de riesgo por compensaciones ambientales, hasta el comité previo de aprobación No 4. se encuentra en 143,08% (Cálculo del cual no hace parte los rendimientos generados por la misma subcuenta)

- La franja de riesgos de Predios se encuentra en 160,01%. (Cálculo del cual no hace parte los rendimientos generados por la misma subcuenta).

- Se ha identificado un riesgo de insuficiencia de recursos en la Subcuenta de Interventoría y Supervisión, ya que el saldo actual, es insuficiente para cubrir las deudas acumuladas y los honorarios futuros de la etapa de reversión. Por lo tanto, se estima necesario que la ANI realice un aporte adicional para evitar un déficit a corto plazo, sugiriendo la utilización de fondos líquidos de otras subcuentas. Esta alerta se notificó a la entidad mediante comunicación IPAB-0458-2026 del 23 de julio de 2026.

- El Concesionario está solicitando la No Objeción para llevar a cabo el 5to comité de previa aprobación ambiental. De acuerdo con el análisis del área ambiental, las actividades y recursos contemplados en dicho comité son pertinentes y necesarios para esta Etapa de Reversión. Sin embargo, su ejecución requiere aportes o recursos adicionales por un valor total de $597.159.385. Por tal motivo, esta Interventoría requiere coordinar con la entidad el manejo que se le dará a esta solicitud, teniendo en cuenta la etapa de reversión en la que se encuentra el

proyecto y el fondeo del 70% que le correspondería a la ANI. La Interventoría en el próximo periodo solicitará la definición de este manejo.

10.3. GESTIÓN FINANCIERA

En materia financiera respecto del contrato de concesión 016 de 2015, se puede concluir que:

- El Contrato de Concesión APP No. 016 del 14 de octubre de 2015, suscrito entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Concesionaria Ruta al Mar S.A.S. (CORUMAR S.A.S.) para la financiación, construcción, mejoramiento, operación y mantenimiento del corredor vial que conecta los departamentos de Antioquia y Bolívar, entró formalmente en su Etapa de Reversión a partir del 2 de mayo de 2026, como consecuencia del Laudo Arbitral CIRD No. 01-23-0002-8303, proferido el 30 de abril de 2026 por el Tribunal de Arbitramento constituido ante el Centro Internacional de Resolución de Disputas (CIRD). En dicha decisión, el Tribunal declaró la Terminación Anticipada del Contrato con fundamento en las cuatro causales invocadas por la parte convocante, y ordenó la aplicación de la Fórmula de Terminación Anticipada prevista en la Sección 18.3 del Contrato, condenando a la Entidad al pago de las sumas que a continuación se presentan:

Tabla 10.3.1 Laudo Final. Caso CIRD No. 01-23-0002-8303

Centro Internacional de Resolución de Disputas

Concepto	Monto	Dispositivo
Liquidación del Contrato (Fórmula Sección 18.3(e))	$ 3.306.292.000.000,00	Dispositivos TERCERO y CUARTO
Perjuicios — Falta aumento tarifas Peaje Carimagua	$ 257.866.339.833,00	Dispositivo NOVENO
Perjuicios — Insuficiencia Compensaciones Ambientales	$ 933.062.815,00	Dispositivo DÉCIMO
Perjuicios — Demoras reconocimiento Decreto 050	$ 1.240.438.812,00	Dispositivo DÉCIMO CUARTO
Perjuicios — Sitios inestables UF 4 y 5	$ 5.437.747.505,00	Dispositivo DÉCIMO QUINTO
Costas (honorarios Tribunal y CIRD)	USD $ 597.696,37	Dispositivo DÉCIMO OCTAVO
Costas (honorarios peritos y legales de RAM)	$ 9.439.635.342,80	Dispositivo DÉCIMO NOVENO
Ajustes de actualización sobre montos condenados	Por liquidar al cumplimiento	Dispositivos DÉCIMO SEXTO y DÉCIMO SÉPTIMO

Fuente: Laudo Final. Caso CIRD No. 01-23-0002-8303, 30 abril 2026.

En virtud de lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en la Sección 9.7 de la Parte General del Contrato, el Concesionario y esta Interventoría dieron inicio a las actividades propias de la Etapa de Reversión, en cuyo marco el Concesionario continúa ejecutando las labores de operación y mantenimiento de la infraestructura, dentro del Plazo Máximo de la Etapa de Reversión, el cual, tratándose de una Terminación Anticipada, podrá extenderse hasta por quinientos cuarenta (540) Días contados desde la declaratoria de la causal correspondiente.

Adicionalmente, debe precisarse que el Contrato de Concesión no contempla expresamente el porcentaje de remuneración aplicable en caso de Terminación Anticipada. En consecuencia, la ANI, el Concesionario y esta Interventoría adelantan la estructuración de un Otrosí que defina el porcentaje de remuneración al cual tiene derecho el Concesionario durante la ejecución de las labores de operación y mantenimiento del corredor vial en la etapa de reversión. Dicho instrumento contractual tendrá como objeto regular las particularidades que el contrato inicial no previó y aquellas que, por su naturaleza, puedan ser homologadas, estableciendo un marco normativo complementario que busca garantizar la seguridad jurídica, técnica y financiera de las partes, así como la adecuada administración de los riesgos y obligaciones en esta fase del contrato.

- En el marco de las disposiciones contractuales y legales vigentes, se ha dado cumplimiento a los fondeos requeridos a la fecha de corte del presente informe, evidenciándose el cumplimiento total de los aportes correspondientes a la Subcuenta de Compensación Ambiental, la Subcuenta de Redes y la Subcuenta de Predios.
- En relación con la Subcuenta Ambiental, se ha cumplido con los fondeos establecidos contractualmente por un valor total de $11.951.582.312 en pesos constantes. Adicionalmente, en mayo de 2022 se realizó un fondeo por $2.390.316.462 en pesos constantes, en atención a que la ejecución de las compensaciones ambientales alcanzó el 90 % del valor estimado. Con este aporte adicional, se dio cumplimiento a la franja de riesgo del 120 %, conforme a lo previsto en el contrato.

  Con corte de mayo de 2026, acorde con la información histórica recibida por parte de la Interventoría CR Concesiones, el presupuesto aprobado asciende a $28.354.314.668.447, acorde con la comunicación emitida por parte del Concesionario No. 20250804009524 del 4 de agosto de 2025, en la cual se ha realizado fondeos equivalentes al 120 % del valor proyectado, así como los

montos aprobados en los diferentes comités: Comité N.º 1 por $1.550.266.873 en moneda constante, Comité N.º 2 por $897.872.940 en moneda constante y Comité N.º 3 por $293.465.633 en moneda constante. Actualmente está en proceso de aprobación el Comité N.º 4.

A continuación, se presentan los valores solicitados por el concesionario:

1. Comité N.º 1: El concesionario radicó el Acta de Compensación Ambiental N.º 1 por un valor de $2.785.826.664 en moneda corriente, equivalente a $1.550.266.873,99 en constantes. Dicho documento fue presentado ante la Agencia Nacional de Infraestructura el 23 de diciembre de 2024 acorde con información histórica recibida por esta Interventoría y, hasta la fecha, permanece pendiente de pago.
2. Comité CPA N.º 2: El concesionario solicitó un valor total de $3.435.043.632. No obstante, únicamente se fondearon $1.686.136.877 en moneda corriente, debido a que no se ejecutó la totalidad del monto aprobado en el Comité CPA N.º 1, quedando un saldo de $1.062.478.418 M/CTE, el cual se destinó para atender la solicitud de este comité. Adicionalmente, se utilizaron los rendimientos generados en la subcuenta para completar el valor requerido del Comité N.º 2.
3. Comité N.º 3: Finalmente, se solicitó el Comité N.º 3 por un valor de $556.024.692 en moneda corriente. Para esta solicitud se tuvo en cuenta el saldo reportado a agosto de 2025 por $1.630.344.419, de acuerdo con el certificado C303700200-10134-00866 del 3 de septiembre de 2025, el cual incluye el reintegro por concepto de vedas por $584.129.008, así como los rendimientos generados por este concepto.
4. Comité N.º 4: por valor de $599.940.2025 con cargo a liberación de recursos comité No 2 y No 3, rendimientos y saldos disponible de vedas, por lo cual no se requiere fondeo adicional.

- En relación con la Subcuenta de Predios se han realizado 19 comités con aprobación predial, por un valor total de $55.293.133.622 y una franja de riesgo del 165,15%. De este monto, la Agencia Nacional de Infraestructura ha reconocido el 70% con cargo a la SAS, equivalente a $33.489.757.587, correspondiente hasta el comité No. 13, en virtud de la franja de riesgo aplicable.

  Para el mes de febrero de 2024, se reportó que el concesionario efectuó un fondeo por valor de $406.588.416, alcanzando un acumulado total de $171.898.391.041

en precios corrientes. Con ello se garantiza el cumplimiento de la franja de riesgo establecida entre el 120% y el 200%, considerando el riesgo predial hasta el acta No. 13.

- Es importante precisar, mediante Decisión del 10 de septiembre de 2026, adoptada por unanimidad dentro del trámite 166172, el Panel de Amigables Componedores Permanente, convocado ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, resolvió la controversia planteada por la Concesión Ruta al Mar S.A.S. frente a la ANI respecto de las deducciones y retenciones aplicadas a la Retribución de la UF3 en virtud del Otrosí No. 17 (Índice de Cumplimiento Predial).

  El Panel declaró que conserva competencia hasta la suscripción del Acta de Liquidación y que fueron improcedentes las deducciones practicadas sobre diecinueve (19) predios reconocidos como adquiridos, así como las retenciones aplicadas a los predios CAB-3-1-009, CAB-3-4-002, CAB-3-4-010, CAB-3-5-031 y CAB-3-5-043A, ordenando su cese y devolución debidamente actualizada. Respecto del predio CAB-3-5-045, declaró improcedentes las deducciones efectuadas entre el 22 de septiembre de 2023 y el 22 de septiembre de 2024 y la retención posterior al periodo de prórroga; para el predio CAB-3-5-046 determinó que, a partir de mayo de 2025, sí procede la retención, sin lugar a devolución.

  En consecuencia, ordenó a la ANI reliquidar la Retribución de la UF3 excluyendo de la base del Índice de Cumplimiento Predial los predios y periodos reconocidos, y devolver las sumas correspondientes con los intereses remuneratorios de la Sección 3.7 de la Parte General y su actualización, las cuales deberán contabilizarse como cuentas pendientes a favor del Concesionario y reflejarse en el Acta de Liquidación del Contrato. Finalmente, aceptó el desistimiento sobre los predios CAB-3-2-025A y CAB-3-2-027A y negó la totalidad de las solicitudes de la ANI.

- La Subcuenta Redes ha cumplido con la totalidad de los fondeos contractuales establecidos, alcanzando un valor total de $44.831.406.635 M/CTE, siendo el último desembolso efectuado el 6 de noviembre de 2019 por un valor de $ 5.683.829.682 en precios constantes.

  Esta información corresponde a registros históricos consolidados a partir de los informes emitidos por la fiduciaria y de los reportes elaborados por la anterior interventoría. Aunque la subcuenta se encuentra completamente fondeada, no ha

sido necesario ejecutar la totalidad de los recursos disponibles, dado que los requerimientos operativos y contractuales no lo han exigido hasta la fecha.

Sin embargo, ante la insuficiencia de los mecanismos de compensación y con el propósito de garantizar su sostenibilidad, se suscribió el Otrosí No. 18 el 8 de agosto de 2025, mediante el cual se definió la metodología para la distribución anticipada de los remanentes de la Subcuenta Redes. Conforme a lo establecido, el 40% de dichos recursos corresponde a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el 60% al concesionario, con el fin de fortalecer la disponibilidad de los mecanismos de compensación, entre ellos la Subcuenta de Excedentes ANI, destinada al pago de actas de compensación pendientes desde el año 2024.

Es importante resaltar que, mediante la comunicación CL.023/AB13993/25/7.2 del 29 de agosto de 2025, la interventoría Consorcio CR Concesiones, emitió su pronunciamiento respecto a los remanentes de la Subcuenta Redes, tomando como base el saldo con corte al 11 de agosto de 2025. En dicha comunicación se presentan los valores correspondientes a la subcuenta, los recursos ejecutados, el saldo disponible y los montos presupuestados, información que sirvió de soporte para la distribución de los remanentes conforme a lo dispuesto en el Otrosí No. 18.

Imagen 10.3.1. Movimiento Subcuenta redes

	Concepto	Valor	Explicacion
A	Redes ejecutadas/pagadas	$ 17.154.144.922,00	Valor pagado a la Subcuenta
B	Saldo en Subcuenta redes al 11/08/2025	$ 50.440.347.198,10	Saldo en la Subcuenta
C	Redes en proceso o pendientes por ejecutar	$ 6.657.358.115,00	Valor estimado conforme al plan de traslado Redes
D	Redes Con posible necesidad de traslado	$ 8.275.300.601,00	Valor estimado conforme al plan de traslado Redes
E	Presupuesto Plan de traslado Redes (A+C+D)	$ 32.086.803.638,00	Valor estimado conforme al plan de traslado Redes
F	Saldo disponible al 12/08/2025 (B-C-D)	$ 35.507.688.482,10	Valor estimado conforme al plan de traslado Redes
G	ANI 40% (F*40%)	$ 14.203.075.392,84	Porcentaje correspondiente a la ANI de remanente (sección 8.2 (d) P.G)
H	CONCESIONARIO 60% (F*60%)	$ 21.304.613.089,26	Porcentaje correspondiente al Concesionario de remanente estimado (sección 8.2 (d) P.G)

- Durante el periodo objeto del presente informe, el Fideicomiso generó rendimientos financieros derivados de la inversión de los recursos en cuentas de ahorro de Bancolombia, con una tasa de remuneración del 1,50% E.A. y de 10,80% E.A. a partir del 21 de agosto de 2026. Para dicho periodo, los rendimientos obtenidos en las cuentas proyecto ascendieron a $611.155.816,38, mientras que en las cuentas correspondientes a la ANI se registraron rendimientos

por $2.470.037.215,04, para un total de $3.081.193.031,42. En consecuencia, el valor acumulado de rendimientos para el periodo alcanza la suma de $255.326.121.156,65.

- Durante el mes de agosto de 2026, el recaudo por concepto de peajes de la Concesión ascendió a $ 25.709.955.815,95, correspondiente a las estaciones de peaje La Apartada, Mata de Caña, Los Manguitos, San Onofre, Los Cedros, Purgatorio y San Carlos.
- Para el mes de agosto de 2026 se realizaron los respectivos traslados de rendimientos a la subcuenta de obras menores por $ 109.353.819,92.
- En el Estado de Situación Financiera, el pasivo total de la concesión al cierre de agosto de 2026 ascendió a $ 2.822.393,4 M/COP, registrando un descenso de $25.659,6 M/COP frente al mes de julio, equivalente a una variación del -0,9%.
- Al mes de agosto de 2026 se registró Pérdida acumulada del Ejercicio de -$121.867,0 M/COP, frente a -$94.900,2 millones en julio (un aumento de la pérdida del 28,3% en el mes).
- El patrimonio ha transitado de un valor positivo de $84.610 M/COP al cierre de 2021 hacia un saldo negativo creciente que alcanza a ($ 616.103,3) millones en agosto de 2026, con un desempeño negativo de ($ 26.874,9) millones, equivalente a (-4,6%) frente a julio ($ 589.228,4) millones.
- Al cierre de agosto de 2026 el Patrimonio Autónomo registró ingresos acumulados por $206.443,6 frente a costos y gastos por $ 328.310,6, con una pérdida del ejercicio de $121.867,0 y un margen de pérdida del −28,3%, que evidencia un detrimento respecto del observado en julio.
- El ingreso del mes se concentra casi en su totalidad en la Remuneración Activo Financiero, por $12.604,6 millones (94,5%), reconocida frente a la ANI como cuenta por cobrar (Remuneración Principal) sin recaudo y sin Otrosí suscrito que la respalde; el único ingreso efectivamente recaudado corresponde a los rendimientos de las cuentas de ahorro del fideicomiso ($611,2 millones, 4,6%), y el resto proviene de diferencia en cambio ($104,9 millones) y venta de vehículos ($14,1 millones). Desde el inicio de la Etapa de Reversión el recaudo de peajes dejó de reconocerse como ingreso. Los Ingresos Diversos (4195), que concentran el 54,75% del acumulado ($113.024,4 millones), no registran movimiento, y el recaudo se acumula como pasivo a favor de la ANI.

- Por otra parte, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) solicitó la creación de una nueva subcuenta de ahorros denominada “Recaudo de peajes – Retenciones Otrosí 17”, con el propósito de trasladar a esta los recursos retenidos correspondientes a la Unidad Funcional 3 y 8. Estas retenciones, establecidas en el marco de lo dispuesto en el Otrosí 17, obedecen a incumplimientos prediales y generan deducciones y rendimientos aplicados a las actas de retribución de las Unidades Funcionales 3 y 8, a partir del Acta No. 52 de mayo de 2025. A agosto, el valor trasladado a dicha subcuenta por Unidad Funcional es: $ 2.903.406.535,18 correspondientes a la UF3 y $1.113.779.263,00 pertenecientes a la UF8.

  Es importante indicar que, el 10 de marzo del año en curso se realizó el reintegro de $1.082.063.105 pesos, monto retenido en cumplimiento de las directrices asociadas al Otrosí 17, correspondientes al predio CAB-3-1-001 por razón de incumplimiento del Índice predial asociado al desistimiento tácito, una vez el Concesionario presentó los soportes que sustentaron el predio como adquirido, se procedió a solicitar a la Agencia el retorno de los recursos anteriormente mencionados.

  Por otra parte, mediante Decisión del 10 de septiembre de 2026, adoptada por unanimidad dentro del trámite 166172, el Panel de Amigables Componedores Permanente, convocado ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, resolvió la controversia planteada por la Concesión Ruta al Mar S.A.S. frente a la ANI respecto de las deducciones y retenciones aplicadas a la Retribución de la UF3 en virtud del Otrosí No. 17 (Índice de Cumplimiento Predial).

  El Panel declaró que conserva competencia hasta la suscripción del Acta de Liquidación y que fueron improcedentes las deducciones practicadas sobre diecinueve (19) predios reconocidos como adquiridos, así como las retenciones aplicadas a los predios CAB-3-1-009, CAB-3-4-002, CAB-3-4-010, CAB-3-5-031 y CAB-3-5-043A, ordenando su cese y devolución debidamente actualizada. Respecto del predio CAB-3-5-045, declaró improcedentes las deducciones efectuadas entre el 22 de septiembre de 2023 y el 22 de septiembre de 2024 y la retención posterior al periodo de prórroga; para el predio CAB-3-5-046 determinó que, a partir de mayo de 2025, sí procede la retención, sin lugar a devolución. En consecuencia, ordenó a la ANI reliquidar la Retribución de la UF3 excluyendo de la base del Índice de Cumplimiento Predial los predios y periodos reconocidos, y devolver las sumas correspondientes con los intereses remuneratorios de la


Sección 3.7 de la Parte General y su actualización, las cuales deberán contabilizarse como cuentas pendientes a favor del Concesionario y reflejarse en el Acta de Liquidación del Contrato. Finalmente, aceptó el desistimiento sobre los predios CAB-3-2-025A y CAB-3-2-027A y negó la totalidad de las solicitudes de la ANI.

- Acorde con la información recibida por esta interventoría, el proyecto presenta un avance físico general del 94,39% que actualmente en virtud del Laudo Arbitral CIRD No. 01-23-0002-8303, proferido el 30 de abril de 2026 por el Tribunal de Arbitramento constituido ante el Centro Internacional de Resolución de Disputas (CIRD), se entró formalmente en Etapa de Reversión y de conformidad con lo dispuesto en la Sección 9.7 de la Parte General del Contrato, el Concesionario y esta Interventoría dieron inicio a las actividades propias de la Etapa de Reversión, en cuyo marco el Concesionario continúa ejecutando las labores de operación y mantenimiento de la infraestructura, bajo el direccionamiento del Apéndice No 4. en cuanto a índice de cumplimiento correspondiente.

  Debe precisarse que el Contrato de Concesión no contempla de manera expresa el porcentaje de remuneración aplicable en escenarios de Terminación Anticipada. En consecuencia, la ANI, el Concesionario y esta Interventoría adelantan la estructuración de un Otrosí que defina el porcentaje de remuneración al cual tiene derecho el Concesionario durante la ejecución de las labores de operación y mantenimiento del corredor vial en la etapa de reversión. Dicho instrumento contractual tendrá como objeto regular las particularidades que el contrato inicial no previó y aquellas que, por su naturaleza, puedan ser homologadas, estableciendo un marco normativo complementario que busca garantizar la seguridad jurídica, técnica y financiera de las partes, así como la adecuada administración de los riesgos y obligaciones en esta fase del contrato.

- Es importante señalar que para el año 2025 acorde con la información histórica reportada por la fiduciaria, el patrimonio registró un saldo negativo que ascendió a -$494.236 millones. Esta situación evidencia que las pérdidas acumuladas superan los aportes realizados tanto en dinero como en especie. De igual manera, la pérdida acumulada alcanza un valor de -$616.103 millones a agosto de 2026. En consecuencia, se observa que la inversión en activos del proyecto está siendo financiada principalmente con recursos de terceros y no con recursos propios.

Gráfica 10.3.1. Evolución del Patrimonio diciembre 2021 – agosto 2026

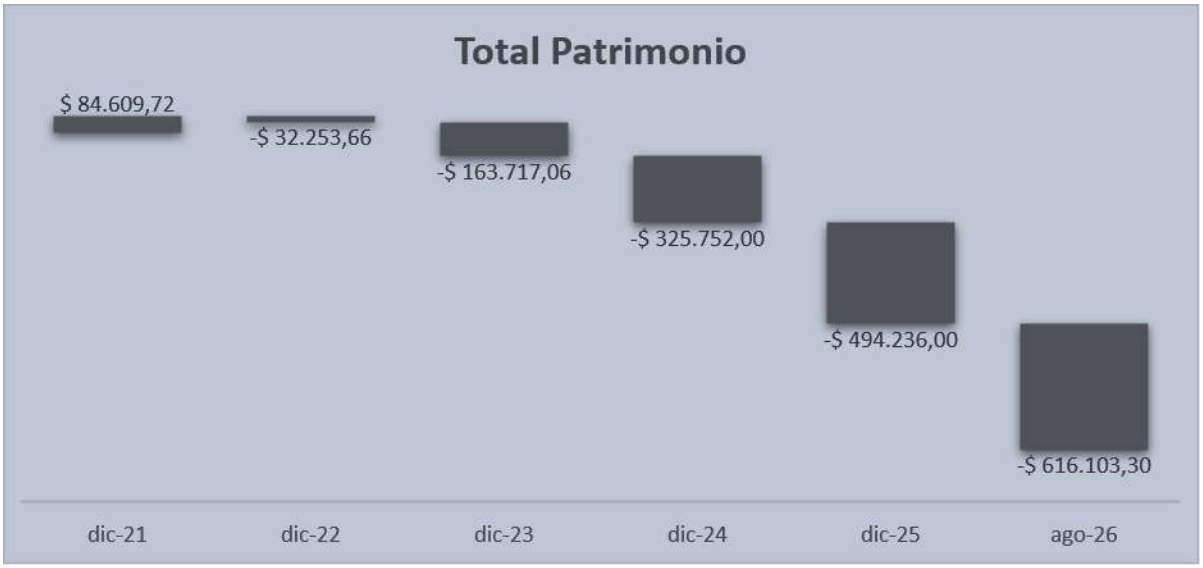

Expresado en millones

Tabla 10.3.2. Estado de Situación Financiera 2021 – 2025

Estado financiero	Diciembre 2025	Diciembre 2024	Diciembre 2023	Diciembre 2022	Diciembre 2021
Total Activo	$2.213.928	$2.253.648	$2.377.714	$2.336.112	$2.304.125
Total Pasivo	$2.708.164	$2.579.399	$2.541.431	$2.368.365	$2.219.515
Total Patrimonio	-$494.236	-$325.752	-$163.717	-$32.253	$84.609

Expresado en millones

- Debido a la insuficiencia de recursos entre la Subcuenta Autónoma de Soporte y la Subcuenta de Excedentes de la ANI para cubrir el valor del riesgo materializado, mediante la Resolución No. 18105 del 14 de mayo de 2025 se dispuso la implementación de un incremento tarifario equivalente al 2% adicional al IPC definido por el DANE. Este ajuste será aplicado en las estaciones de peaje a partir del año 2026 y hasta el año 2034, y su actualización se realizará anualmente cada 16 de enero.

  El citado incremento adicional del 2% en la estructura tarifaria, el cual constituía un mecanismo de liquidez destinado a compensar al concesionario, en virtud del Laudo Arbitral CIRD No. 01-23-0002-8303, proferido el 30 de abril de 2026 por el Tribunal de Arbitramento cuya aplicación se dio a partir del 2 de mayo del mismo año, declaró la Terminación Anticipada del Contrato de Concesión. En consecuencia, el contrato entró en la etapa de reversión, razón por la cual se

están realizando mesas de trabajo que permitan dilucidar mediante documento oficial, las directrices impartidas por la Entidad para el manejo de este incremento.

De igual forma, es importante indicar que, con la entrada en vigor de la Resolución No. 18105 del 14 de mayo de 2025, se elimina el límite mínimo de pasos para los vehículos con tarifas especiales en los peajes de Los Manguitos, Los Cedros, El Purgatorio y Mata de Caña.

- La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) gestionó la suscripción del Otrosí No. 18, el 8 de agosto de 2025, mediante el cual se definió la metodología para la distribución anticipada de los remanentes de la Subcuenta Redes, estableciendo que el 40% corresponde a la ANI y el 60% al Concesionario. De acuerdo con las condiciones previstas en la declaratoria de remanentes, dichos recursos serán trasladados a la Subcuenta de Excedentes ANI y a la Subcuenta Proyecto. Con esta medida se busca fortalecer la Subcuenta de Excedentes ANI, la cual constituye uno de los mecanismos de compensación establecidos en el marco del contrato de concesión.

- Por otra parte, mediante la comunicación CL.023/AB13027/24/7.2 del 20 de noviembre de 2024 enviada por la Interventoría Consorcio CR Concesiones, se indicó que, desde el año 2022, el patrimonio autónomo registró de manera consecutiva pérdidas en su estado de resultados. Con corte al mes de septiembre de 2024, el resultado negativo ascendió a -$256.807 millones, lo que representó un incremento en las pérdidas superior al 50% respecto al año 2023.

  En atención a esta situación, se solicitó un pronunciamiento formal por parte de la Revisoría Fiscal y de la Dirección Financiera, con el propósito de identificar las causas que originaron estos resultados y presentar una explicación detallada de los valores negativos reflejados en los estados financieros.

  La presente Interventoría procede a detallar la información histórica de las pérdidas registradas desde enero de 2022, que han impactado de manera consecutiva el patrimonio desde octubre de 2022 hasta agosto de 2026.

Tabla 10.3.3. Evolución mensual del Patrimonio 2022 – 2026

Patrimonio	2022	2023	2024	2025	2026
enero	$79.875	-$ 39.541	-$ 176.882	-$342.982	-$503.598
febrero	$77.392	-$ 56.230	-$ 176.563	-$364.410	-$511.719
marzo	$70.514	-$ 81.244	-$ 195.377	-$385.452	-$530.782
abril	$52.078	-$ 99.855	-$ 210.933	-$410.524	-$553.238


Patrimonio	2022	2023	2024	2025	2026
mayo	$41.784	-$ 115.564	-$ 232.870	-$430.685	-$562.781
junio	$29.829	-$ 109.993	-$ 243.675	-$449.701	-$558.397
julio	$18.388	-$ 122.109	-$229.828	-$469.867	-$589.228
agosto	$18.042	-$ 116.356	-$234.870	-$479.379	-$616.103
septiembre	$4.175	-$ 125.778	-$256.801	-$489.991	
octubre	-$ 6.434	-$ 143.875	-$274.428	-$466.937	
noviembre	-$ 13.367	-$ 155.318	-$300.141	-$482.828	
diciembre	-$ 32.254	-$ 163.717	-$325.752	-$494.236	

Con base en la evaluación realizada en cada una de las áreas objeto de seguimiento durante el período analizado, el presente informe reúne las principales conclusiones técnicas del proyecto. Estas se presentan en el contexto de la terminación anticipada del Contrato de Concesión y de lo dispuesto en el Laudo Arbitral de Reversión, con el fin de dejar registro del estado de la infraestructura y de las actividades desarrolladas, contribuyendo a mantener la continuidad del seguimiento, la trazabilidad de la información y el adecuado control del proyecto.

10.4. **TÉCNICA**

De acuerdo con la información reportada en el Plan de Obras vigente en su versión 15, para el periodo analizado el proyecto presenta un avance ejecutado acumulado del **94,39%,** frente a un avance programado del **98,68 %,** lo que refleja una diferencia del **4,29%** respecto a lo programado.

Figura 6. Progreso global del proyecto y el estado de avance de cada Unidad Funcional.

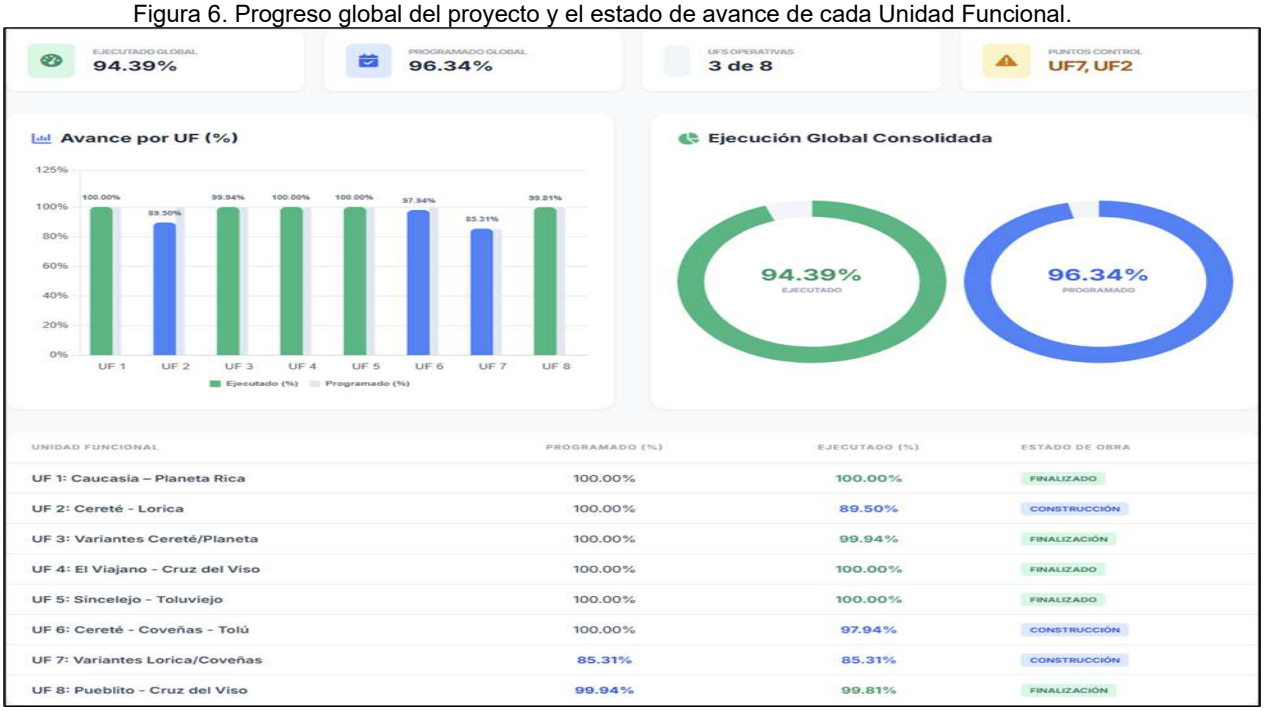

UNIDAD FUNCIONAL	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	ESTADO DE OBRA
UF 1: Caucasia – Planeta Rica	100.00%	100.00%	FINALIZADO
UF 2: Cereté - Lorica	100.00%	89.50%	CONSTRUCCIÓN
UF 3: Variantes Cereté/Planeta	100.00%	99.94%	FINALIZACIÓN
UF 4: El Viajano - Cruz del Viso	100.00%	100.00%	FINALIZADO
UF 5: Sincelejo - Toluviejo	100.00%	100.00%	FINALIZADO
UF 6: Cereté - Coveñas - Tolú	100.00%	97.94%	CONSTRUCCIÓN
UF 7: Variantes Lorica/Coveñas	85.31%	85.31%	CONSTRUCCIÓN
UF 8: Pueblito - Cruz del Viso	99.94%	99.81%	FINALIZACIÓN

Fuente: Elaboración Propia.

• **En la Unidad Funcional 2** (Cereté – Lorica) se reporta un avance físico en excavaciones del **93,39%,** terraplenes **92,93%,** subbase y base **90,30%,** pavimentos **87,40%,** obras de drenaje **89,65%** y Peaje Manguitos **100%,** para un avance ejecutado acumulado promedio del **89,50%.** El avance programado corresponde al **99,64%,** lo que representa un atraso del **10,15%.** De acuerdo con lo informado por la anterior Interventoría, este atraso se asocia a la imposibilidad de adelantar actividades en algunos sectores que presentan Eventos Eximentes de Responsabilidad, entre ellos situaciones derivadas de oposiciones por parte de comunidades que solicitan la ejecución de obras adicionales a las contempladas en el Contrato de Concesión.

• **Para la Unidad Funcional 6**, que comprende los tramos Cereté – Lorica, Lorica – Coveñas y Coveñas – Tolú, se registra un avance ejecutado acumulado promedio del **97,94%,** frente a un avance programado del **99,60%,** evidenciando un atraso del **1,66%,** según lo reportado en el informe de la anterior Interventoría.

• **En la Unidad Funcional 6-1** (Cereté – Lorica) se reportan los siguientes avances: excavaciones **98,64%,** terraplenes **98,64%,** subbase y base **98,64%,** pavimentos **95,72%,** obras de drenaje **100%,** Peaje Mata de Caña **100%,** Estación de Pesaje Mata de Caña **100%,** Pasos Peatonales **0%** y Centro de Control de Operaciones (CCO) **100%,** para un avance ejecutado acumulado promedio del **97,70%.** El avance programado corresponde al **99,36%,** presentando un atraso del **1,66%.** De acuerdo con lo reportado por la anterior Interventoría, algunas transiciones entre los alineamientos de las UF 2 y 6.1 no han podido ser intervenidas debido a la presencia de Eventos Eximentes de Responsabilidad.


• **La Unidad Funcional 6-3-1** (Coveñas – Tolú) presenta un avance ejecutado acumulado promedio del **84,41%,** frente a un avance programado del **100%.** El porcentaje pendiente corresponde principalmente a la construcción del Peaje Caimanera, según lo indicado en el informe de la anterior Interventoría.

• **En la Unidad Funcional 7** se reporta un avance ejecutado acumulado promedio del **85,31%,** equivalente al avance programado del mismo porcentaje. El porcentaje restante se encuentra asociado a la construcción de la Unidad Funcional 7.1 – con un avance del 70 % según el reporte de la interventoría anterior, cuya ejecución se encuentra suspendida debido a la presencia de un Evento Eximente de Responsabilidad.

• **En la Unidad Funcional 8** se presenta un avance ejecutado del **99,81%,** frente a un **99,94%** programado, evidenciando un atraso del **0,13%,** conforme a lo reportado en el informe de la anterior Interventoría.

• **Finalmente, en la Unidad Funcional 8-3** (San Onofre – Cruz del Viso) se registra un avance ejecutado acumulado del **99,72%,** frente a un avance programado del **99,91%,** lo que refleja un atraso del **0,19%.** El porcentaje pendiente corresponde a la construcción de la Intersección 17, de acuerdo con la información consignada en el informe de la anterior Interventoría.

Figura 2. Estado de unidades funcionales

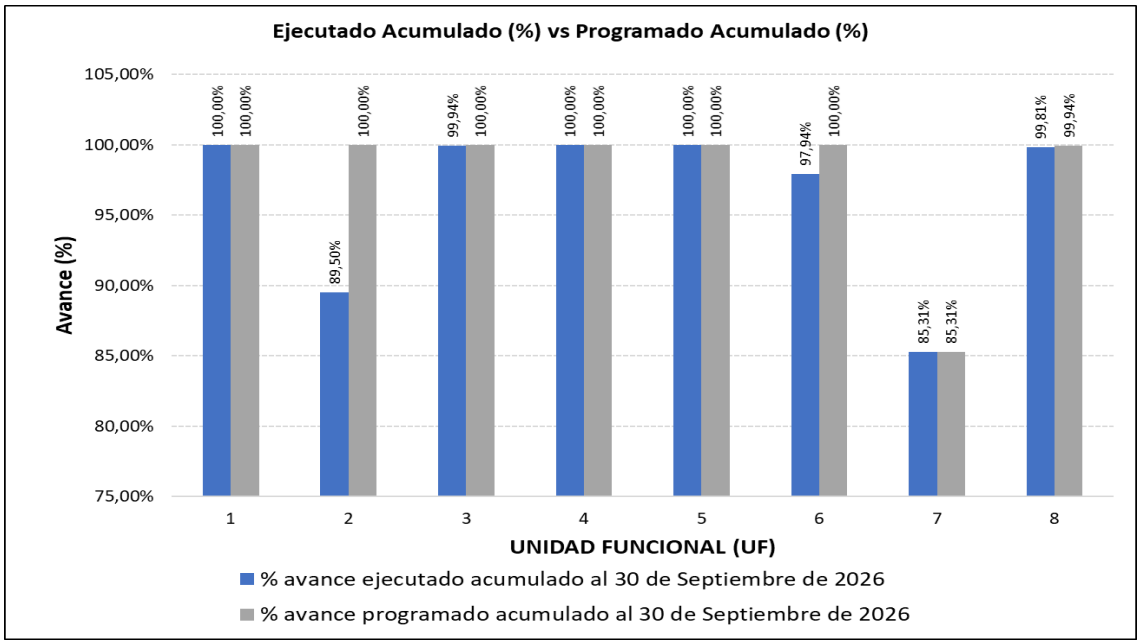

Fuente: consorció IPAB.

10.5. GESTIÓN OPERATIVA

- Durante el período evaluado, se identificó que, en términos generales, se presentan incumplimientos asociados a los indicadores mensuales de las Unidades Funcionales que se encuentran en operación. No obstante, la mayoría de estos hallazgos son atendidos oportunamente por el Concesionario, dentro de los plazos máximos de corrección establecidos contractualmente, lo que permite obtener Índices de Cumplimiento (IC) satisfactorios para las actas de índice de cumplimiento. Asimismo, se verificó la corrección de los hallazgos asociados al indicador semestral E12, correspondientes a los 231 segmentos que habían sido calificados como no conformes en el SICC durante el período anterior. En consecuencia, durante el período correspondiente a septiembre de 2026, se verificó que los incumplimientos anteriormente identificados fueron subsanados por el Concesionario.
- Durante los meses de junio y julio de 2026, el Consorcio IPAB realizó la medición de los indicadores de reversión. Los resultados de dichas mediciones fueron publicados en la plataforma SICC, la mayoría durante el mes de julio, con excepción del indicador E16 – Capacidad Estructural, cuya publicación se efectuó en agosto de 2026.
- Los incumplimientos reportados en el mes de julio 2026 por el Consorcio IPAB para las UFIs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 en los indicadores semestrales del estado de

pavimentos (IRI, Ahuellamiento, Fricción Transversal y textura, se encuentran dentro del plazo de reparación de 3 meses, establecido en el apéndice técnico 4.

- Se concluye que las publicaciones de los indicadores correspondientes a la etapa de reversión de las Unidades Funcionales del proyecto constituyen la base para el seguimiento y cuantificación de los próximos períodos de medición, de acuerdo con las frecuencias contractualmente establecidas. Para los indicadores de frecuencia semestral, el período de medición se contabiliza a partir de julio de 2026, conforme a lo establecido para la etapa de reversión.
- Durante el mes de septiembre de 2026 se prestaron **461** servicios de atención al usuario, evidenciándose una disminución de **97** servicios con respecto al mes inmediatamente anterior, en el cual se registraron **558** atenciones. Los servicios más demandados por los usuarios correspondieron al carro taller y la grúa plataforma, con un total de **325** atenciones, equivalentes al **70.5 %** del total de servicios prestados durante el período evaluado.
- Durante el mes de septiembre de 2026 se registraron treinta y dos (32) accidentes de tránsito, presentándose una disminución de trece (13) accidentes con respecto a los eventos reportados durante el mes inmediatamente anterior, en el cual se registraron cuarenta y cinco (45) accidentes. Asimismo, se observó una disminución en el número de fallecidos, pasando de quince (15) víctimas mortales registradas en agosto a dos (2) en septiembre. Para la vigencia 2026, la distribución acumulada de estos siniestros es la siguiente:

Accidentalidad por Unidad Funcional y Subsector																				
Mes	UFI 1	UFI 2	UFI 3					UFI 4		UFI 5		UFI 6			UFI 7		UFI 8			Total
	1	2.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	4.1	4.2	5.1	5.2	6.1	6.2	6.3	7.2	7.3	8.1	8.2	8.3	
sep-26	4	2	1	1	0	1	0	5	2	1	0	3	0	1	2	1	1	1	6	32
Totales año 2026	64	11	9	5	6	6	2	45	11	34	6	48	15	1	12	22	7	12	38	354
% año 2026	18.08%	3.11%	2.54%	1.41%	1.69%	1.69%	0.56%	12.71%	3.11%	9.60%	1.69%	13.56%	4.24%	0.28%	3.39%	6.21%	1.98%	3.39%	10.73%	100.00%
	18.08%	3.11%	7.91%					15.82%		11.30%		18.08%			9.60%		16.10%			100.00%

- Se evidencia por parte de esta Interventoría que el Concesionario puso en funcionamiento el sistema IP/REV en las 8 estaciones de peajes, el Concesionario mantiene como exclusivo el carril de cobro automático, con algunas excepciones como en el peaje de cedros que debido a la interferencia de redes de acueducto que impiden construir el carril 5, el Concesionario opera de manera mixta el carril 6 de telepeaje, y el peaje de Caimanera que, debido a protestas de la comunidad, el Ministerio de Transporte ordenó el desmonte y traslado del peaje caimanera, el cual no se encuentra recaudando desde el 29 de enero de 2023 a las 00:00 horas.

- Durante el mes de septiembre de 2026, se registró el paso **861,944** vehículos que cancelaron la tarifa plena establecida por categoría, adicionalmente, pasaron **11,529** vehículos exentos según la Ley 787 de 2002; **140** maquinarias agrícolas, y con respecto a los vehículos especiales pasaron **45,962** vehículos legalizados y transitando con TIE (tarjeta electrónica), se registraron **6,341** pasos con beneficios otorgados entre las estación de purgatorio y San Carlos, para un total de **925,916** pasos de vehículos por el corredor vial.

- En el mes de septiembre de 2026, por concepto de recaudo se obtuvo un valor de **$ 25,728,770,200.00** adicionalmente se tiene **$ 464,900.00** por concepto de sobrantes. El recaudo se discrimina así: **$ 443,551,899.00** correspondiente a seguridad vial y **$ 25,285,683,201.00** para la cuenta fiducia Ruta al Mar SAS.

10.6. GESTIÓN SOCIAL

- La Interventoría solicitó al Concesionario fortalecer e implementar mecanismos efectivos de planificación, programación, seguimiento y control de las actividades asociadas a la Gestión Social Contractual durante la etapa de reversión. De igual manera, se recomendó asegurar una adecuada organización, administración, trazabilidad, disponibilidad y conservación de la información y documentación generada en el desarrollo de dichas actividades, con el propósito de facilitar su verificación, seguimiento y consulta. Lo anterior permitirá contar con los soportes necesarios para evidenciar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y contribuir a un proceso de reversión ordenado, verificable y adecuado cierre contractual.

- En el marco de la revisión conjunta de los formatos ANI realizada con el Concesionario, la Interventoría evidenció una mejora general en la calidad, consistencia y diligenciamiento de la información registrada. No obstante, persisten aspectos susceptibles de mejora, principalmente relacionados con la calidad, precisión y suficiencia de las observaciones consignadas, así como con la integridad y consistencia de la información reportada.

- La Interventoría requiere al Concesionario continuar fortaleciendo los procesos de diligenciamiento, revisión y validación de los formatos ANI, garantizando que las observaciones registradas sean objetivas, claras, concisas, precisas y específicas, y que permitan identificar de manera inequívoca la situación reportada y su correspondiente soporte. En consecuencia, deberá evitarse la

inclusión de información confusa, general o que no aporte a la trazabilidad y seguimiento del registro, con el fin de asegurar la integridad, consistencia y confiabilidad de la información consignada y facilitar su posterior verificación.

- La Interventoría reitera al Concesionario el requerimiento de establecer e implementar una estrategia de comunicación integral durante la etapa de reversión, orientada a garantizar que las comunidades y demás grupos de interés dispongan de información clara, precisa, actualizada y oportuna respecto del estado del proyecto, los cambios asociados y las actividades previstas.

- La Interventoría reitera al Concesionario la necesidad de elaborar y presentar un informe final de cierre que consolide de manera integral las actividades ejecutadas durante la vigencia contractual y las desarrolladas en el marco de la reversión. Este informe deberá presentar de forma clara y organizada los principales resultados alcanzados y encontrarse acompañado de los soportes, registros y evidencias documentales que permitan sustentar y verificar las actuaciones reportadas, de manera que constituya un soporte para la verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales y para la culminación ordenada del proceso de reversión.

- Como conclusión durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre de 2026, la Interventoría IPAB realizó el seguimiento, inspección y verificación de las actividades asociadas al componente social en el marco de la etapa de reversión del proyecto, de conformidad con los requerimientos contractuales establecidos en el Apéndice Técnico 8 – Social, así como con lo dispuesto en la Parte General y la Parte Especial del Contrato de Concesión.

Como resultado de las actividades de seguimiento y verificación realizadas, se evidenció el desarrollo de las acciones correspondientes al componente social requeridas para la etapa de reversión, orientadas a garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la adecuada gestión de los aspectos sociales asociados a la terminación y entrega del proyecto.

La Interventoría realizó el respectivo acompañamiento y seguimiento a la gestión adelantada por el Concesionario, verificando la atención de los compromisos y obligaciones sociales establecidos contractualmente y efectuando las observaciones y recomendaciones pertinentes, cuando fueron necesarias.

En términos generales, durante el periodo objeto de seguimiento se mantuvo el control sobre los aspectos sociales relacionados con la etapa de reversión, procurando que las actividades desarrolladas se ajustaran a las obligaciones contractuales, a los lineamientos establecidos y a los procedimientos aplicables.

Finalmente, la Interventoría continuará realizando el seguimiento y verificación de las obligaciones pendientes que correspondan a la etapa de reversión, con el propósito de contribuir a que el proceso de entrega y cierre del componente social se efectúe de manera adecuada, documentada y conforme a las disposiciones contractuales aplicables.

10.7. GESTIÓN AMBIENTAL

- Durante el período evaluado se evidencia, en términos generales, cumplimiento de las medidas de manejo ambiental aplicables a las UFI objeto de seguimiento, particularmente en aspectos como conformación del grupo ambiental, capacitación, permisos, manejo de residuos, señalización y manejo de residuos líquidos.
- Debido a que el proyecto se encuentra en etapa de reversión, el seguimiento ambiental debe orientarse no solamente a verificar el cumplimiento operativo de las fichas PAGA, sino a garantizar el cierre documental, administrativo y físico de las obligaciones ambientales pendientes, incluyendo permisos, compensaciones, licencias y eventuales pasivos ambientales.
- Se evidencia avance en el cierre de obligaciones ambientales: la licencia de la UF 3.3 ya fue cerrada por ANLA, mientras que la UFI 3.5 se encuentra en trámite de cierre y archivo y permanece pendiente la respuesta relacionada con la cesión de la UFI 3.1.
- El seguimiento de las medidas asociadas al manejo de aguas, residuos líquidos, residuos sólidos, fauna y otros componentes presenta resultados favorables. Por ejemplo, se reporta cumplimiento en el manejo de residuos líquidos y disponibilidad de baños con los respectivos permisos de vertimiento.
- La Interventoría efectuó la revisión de la información ambiental entregada por el Concesionario para el proceso de reversión, formulando las observaciones correspondientes a los formatos remitidos y realizando seguimiento al cronograma establecido para la entrega de la totalidad de la información ambiental.
- Respecto de los trámites, permisos y expedientes ambientales, la gestión adelantada por la Concesión durante la etapa de reversión ha mostrado avances, los cuales se han visto reflejados en el cierre de algunos

expedientes administrativos. Para los trámites que permanecen abiertos, se deberá mantener la diferenciación entre aquellos que se encuentran dentro de los términos establecidos para pronunciamiento, aquellos pendientes de respuesta por parte de las autoridades ambientales y aquellos relacionados con solicitudes de renuncia, desistimiento o cierre de permisos y trámites que no fueron utilizados o requeridos para el desarrollo de las obras.

- En relación con las compensaciones ambientales, se evidencia la continuidad de las actividades y obligaciones asociadas a las medidas compensatorias, registrándose avances en las áreas compensadas y en las actividades de aislamiento, establecimiento y mantenimiento. El consolidado reportado registra 1.039,034 ha compensadas frente a 1.074,694 ha requeridas, equivalente al 96,7 %, aunque persisten actividades de mantenimiento y otros compromisos que deberán ser objeto de seguimiento hasta su culminación.
- La Interventoría continuará realizando el seguimiento mensual a las obligaciones ambientales pendientes, verificando que las actuaciones adelantadas por la Concesión cuenten con los respectivos soportes documentales y, cuando corresponda, con los pronunciamientos de las autoridades ambientales competentes, de manera que al cierre de la Etapa de Reversión se cuente con la debida trazabilidad y saneamiento de los compromisos ambientales del proyecto.
- Con corte al 30 de junio de 2026, se evidencia un avance significativo en la ejecución de las medidas de compensación ambiental reportadas por el concesionario, registrándose un total de 1.074,694 ha requeridas por las autoridades ambientales y 1.039,034 ha compensadas, equivalente aproximadamente al 96,68 % del área requerida. No obstante, persisten obligaciones pendientes de ejecución, principalmente asociadas a actividades de establecimiento, mantenimiento y muestreos de suelo, las cuales deberán continuar siendo objeto de seguimiento hasta su culminación y acreditación.
- La Interventoría IPAB ha garantizado la continuidad del seguimiento ambiental durante la etapa de reversión, incorporando y validando la información proveniente de la interventoría anterior, con el fin de mantener la trazabilidad de las obligaciones ambientales, el estado de los expedientes y las gestiones adelantadas por el Concesionario.
- Se deja constancia de que la información contenida en el presente informe corresponde a la documentación radicada y recibida por la Interventoría durante el mes de agosto de 2026. En caso de que algún comunicado no se encuentre relacionado en el presente informe, ello obedece a que su

recepción se produjo con posterioridad al corte de información considerado para este período.

- Exigir al Concesionario la conciliación de la información técnica y financiera de las compensaciones ambientales, de manera que exista correspondencia entre actividades ejecutadas, áreas compensadas, valores aprobados, pagos realizados y saldo disponible.

- Realizar seguimiento específico al cierre de las licencias ambientales, especialmente a las UFI que aún presentan trámites ante ANLA y las corporaciones ambientales, hasta obtener los actos administrativos de cierre, archivo, cesión o pronunciamiento correspondiente.

- Priorizar el cierre de las obligaciones que puedan generar actuaciones posteriores de las autoridades ambientales, de manera que la entrega de la infraestructura no implique trasladar obligaciones ambientales pendientes sin una adecuada identificación y soporte.
