INFORME DE SUPERVISIÓN DE INTERVENTORÍA

INFORME DE SUPERVISIÓN No:	4			FECHA:	5	de	OCTUBRE	de	2026		
PERIODO: DEL	1	de	SEPTIEMBRE	de	2026	AL	30	de	SEPTIEMBRE	de	2026
CONTRATO No:	IPVO-021	DE	2026	REGISTRO BP Y P No							

OBJETO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA LA AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE ZETAQUIRA, FIRAVITOBA Y SANTA ROSA DE VITERBO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

LOCALIZACIÓN:

MUNICIPIOS DE ZETAQUIRA, FIRAVITOBA Y SANTA ROSA DE VITERBO

PROGRAMA DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO:

Plan de Desarrollo Departamental "Nuestro Gran Plan es Boyacá 2024-2027"

NOMBRE DEL CONTRATISTA INTERVENTORÍA:	REPRESENTANTE LEGAL:
NJS INGENIERÍA Y SOLUCIONES S.A.S.	**JANETH VIVIANA CHÍA JEREZ**
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA Y/O CONSULTORÍA:	NOMBRE DEL SUPERVISOR:
NJS INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S	**JULIÁN EDGARDO GUERRERO RINCÓN**

ADICIONALES Y PRÓRROGAS


No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0.00	

VALOR INICIAL:	**$ 315,183,828.76**	VALOR ADICIONALES:	$ 0.00	VALOR TOTAL:	**$ 315,183,828.76**

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	15	de	ENERO	de	2027
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	15	de	ENERO	de	2027

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE AVANCE CTO INTERV.	**48.80%**	% DE AVANCE CTO DE OBRA Y/O CONSULTORIA	**63.54%**	% PROGRAMADO CTO DE OBRA Y/O CONSULTORIA	**54.47%**



PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA

No PÓLIZA	11-46-101111192		ANEXO No.	2	ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16	6	2026	26	7	2027	$ 31,518,381.88
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	16	6	2026	26	1	2030	$ 31,518,382.88
CALIDAD DEL SERVICIO	26	1	2027	26	1	2032	$ 63,036,765.75
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	16	6	2026	26	1	2027	$ 350,181,000.00

INFORME DE SUPERVISIÓN DE INTERVENTORÍA	TIERRASUA ¡Conectamos región!

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)			
DESCRIPCIÓN	FECHA		
	dd	mm	aaaa
ACTA DE INICIO	16	6	2026

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA	
SE EFECTUD EL SEGUIMIENTO A LA CUADRILLA ACTIVA	ZETAQUIRA TRAMO 1 PUNTO DE INICIO Cementerio local, barrio progreso (5.284422355511417, 73.17035583377951) TRAMO PUNTO FINAL TRAMO 4 termales arco iris (5.304369969555111, 73.16440875892792)
LA INTERVENTORIA REALIZA SOLICITUD DE INFORMES SEMANALES QUE SE REQUIREN LLEVAR ACABO	ZETAQUIRA TRAMO 1 PUNTO DE INICIO Cementerio local, barrio progreso (5.284422355511417, 73.17035583377951) TRAMO PUNTO FINAL TRAMO 4 termales arco iris (5.304369969555111, 73.16440875892792)
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, SALUD OCUPACIONAL, NORMATIVIDAD APLICABLE DE ACUERDO CON LA NATURALEZA DEL CONTRATO.	ZETAQUIRA TRAMO 1 PUNTO DE INICIO Cementerio local, barrio progreso (5.284422355511417, 73.17035583377951) TRAMO PUNTO FINAL TRAMO 4 termales arco iris (5.304369969555111, 73.16440875892792)
SE ELABORA EL INFORME TÉCNICO DE SEGUIMIENTO, EL CUAL ESTÁ CONFORMADO POR TRES SECCIONES , SE ENTREGA EN CUERPO DEL INFORME Y SUS ANEXOS EN FORMA DIGITAL.	ZETAQUIRA TRAMO 1 PUNTO DE INICIO Cementerio local, barrio progreso (5.284422355511417, 73.17035583377951) TRAMO PUNTO FINAL TRAMO 4 termales arco iris (5.304369969555111, 73.16440875892792)

EQUIPO UTILIZADO POR CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA			
DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTLIZACIÓN	OBSERVACIONES
COMPUTADOR	INFORMES	100%	NINGUNA
IMPRESORA	IMPRESIONES	30%	NINGUNA
CELULAR	COMUNICACIONES	100%	NINGUNA
DECAMETRO	MEDICIONES	10%	NINGUNA
CAMIONETA	TRANSPORTE	100%	NINGUNA

SEGUIMIENTO FINANCIERO

INFORME DE SUPERVISIÓN DE INTERVENTORÍA	TIERRASUA ¡Conectamos región!

DESCRIPCIÓN	FECHA ACTA			VALOR
Anticipo				NO APLICA
ACTA PARCIAL No. 1	27	8	2026	$ 67,539,391.88
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS				**$ 67,539,391.88**

SOLICITUDES PRESENTADAS

FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE

VERIFICACIÓN DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL DE LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA

NOBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	PERIODO					
					DESDE			HASTA		
					dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
NICOLAS COBOS PORRAS	915140910	X	X	X	1	9	2026	30	9	2026
MONICA LISETH NAVAS ROJAS	10958299262	X	X	X	1	9	2026	30	9	2026
OLGA LUCIA PEREZ CARDENAS	1057594312	X	X	X	1	9	2026	30	9	2026
JOSE FABIAN VALVUENA MACHUCA	1098682511	X	X	X	1	9	2026	30	9	2026
JESUS MARIA RANGEL CASTEÑADA	1095791138	X	X	X	1	9	2026	30	9	2026
MAYRA ALEJANDRA SALCEDO GOMEZ	1098628681	X	X	X	1	9	2026	30	9	2026
SANTIAGO ANDRES PITA LAVERDE	1052414220	X	X	X	1	9	2026	30	9	2026
LUIS CARLOS PLAZAS PASTRANA	12105817	X	X	X	1	9	2026	30	9	2026
ROBY ANTONY GONZALEZ CASTRO	86073331	X	X	X	1	9	2026	30	9	2026

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO A LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA*

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN
DIRECTOR DE OBRA	NICOLAS COBOS PORRAS	915140910
AUXILIAR ADMINISTRATIVA	MONICA LISETH NAVAS ROJAS	10958299262
CADENERO	OLGA LUCIA PEREZ CARDENAS	1057594312
TOPOGRAFO	JOSE FABIAN VALVUENA MACHUCA	1098682511
RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1	JESUS MARIA RANGEL CASTEÑADA	1095791138
RESIDENTE DE INTERVENTORIA 2	MAYRA ALEJANDRA SALCEDO GOMEZ	1098628681
RESIDENTE DE INTERVENTORIA 3	SANTIAGO ANDRES PITA LAVERDE	1052414220
INGENIERO ELECTRICO 1	LUIS CARLOS PLAZAS PASTRANA	12105817
INGENIERO ELECTRICO 2	ROBY ANTONY GONZALEZ CASTRO	86073331

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida y la aprobación de interventoría

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA PARA EL CONTROL, MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
ENTREGA DE DOTACIÓN Y E.P.P.	ZETAQUIRA TRAMO 1 PUNTO DE INICIO Cementerio local, barrio progreso (5.284422355511417, 73.17035583377951) TRAMO PUNTO FINAL TRAMO 4 termales arco iris (5.304369969555111, 73.16440875892792)

DOCUMENTACIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ZETAQUIRA TRAMO 1 PUNTO DE INICIO Cementerio local, barrio progreso (5.284422355511417, 73.17035583377951) TRAMO PUNTO FINAL TRAMO 4 termales arco iris (5.304369969555111, 73.16440875892792)
DOCUMENTACIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ZETAQUIRA TRAMO 1 PUNTO DE INICIO Cementerio local, barrio progreso (5.284422355511417, 73.17035583377951) TRAMO PUNTO FINAL TRAMO 4 termales arco iris (5.304369969555111, 73.16440875892792)
PRESENTACIÓN INDICADORES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ZETAQUIRA TRAMO 1 PUNTO DE INICIO Cementerio local, barrio progreso (5.284422355511417, 73.17035583377951) TRAMO PUNTO FINAL TRAMO 4 termales arco iris (5.304369969555111, 73.16440875892792)

RELACIÓN DE LABORATORIOS PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
TOMA DE MUESTRAS(CILINDROS) MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO	2	9	2026	NINGUNA

RELACIÓN DE COMITÉS DE OBRA REALIZADOS

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
ACTA DE REUNION	31	8	2026	• SOLICITAR LA ACTUALIZACIÓN DE SOLICITUDES DE DISPONIBILIDAD PARA PROYECTO SANTA ROSA • DEFINIR LA UBICACIÓN DE LOS TRANSFORMADORES PARA LA RESPECTIVA CONEXIÓN . •SE VE LA VIABILIDAD DE LA SOLICITUD DE LA COMUNIDAD Y SE AUTORIZA . SE DA AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE COLLARIN CON OREJA EN POSTE 510KGF

RELACIÓN DE INFORMES DE SUPERVISIÓN

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	

INFORME DE SUPERVISIÓN DE INTERVENTORÍA	TIERRASUA ¡Conectamos región!

Informe de Supervisión No. 0	16	6	2026	17	6	2026	NINGUNA
Informe de Supervisión No. 1	16	6	2026	30	6	2026	NINGUNA
Informe de Supervisión No. 2	1	7	2026	31	7	2026	NINGUNA
Informe de Supervisión No. 3	1	8	2026	31	8	2026	NINGUNA
Informe de Supervisión No. 4	1	9	2026	30	9	2026	NINGUNA

OBSERVACIONES: El contrato de interventoría continúan en ejecución, conforme al Acta de Inicio suscrita el 16 de junio de 2026, con fecha de terminación prevista para el 15 de enero de 2027. A la fecha del presente informe, el proyecto registra un avance físico acumulado del **63.54%**, evidenciando la continuidad de las actividades programadas dentro del cronograma de ejecución.Se continua con el seguimiento técnico permanente al desarrollo de las actividades constructivas, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, los procedimientos constructivos y las condiciones de seguridad durante la ejecución de la obra.

LISTA DE CHEQUEO INFORME DE INTERVENTORÍA

	VERIFICACIÓN	FOLIOS No
INFORME DE INTERVENTORÍA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría	SI	6-8
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación) contrato de Interventoría	SI	9-20
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría	SI	21-22
El personal de Interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	YA SE RADICO	
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Amortización del anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	SI	23
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	SI	24
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	YA SE RADICO	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	SI	25-26
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	SI	27
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	SI	28-56
Generales		
Certificación de ejecución de actividades	SI	57
Registro fotográfico	SI	58-70
Soportes de Correspondencia enviada y recibida	NO	

OBSERVACIONES:

FIRMA:

Supervisor

NOMBRE: JULIAN EDGARDO GUERRERO

Brayan Arvey López Pinzón
Apoyo a supervisión

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901513118	0	NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAJASAN	CALLE 13N # 2-83	PIEDECUESTA-SANTANDER	6546342	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-09	614303639	9510579113	E	2026/09/04	2026/09/01	BANCOLOMBIA	0	$9,837,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: RIEGO 5 (10 Afiliados)						$30,015,639	$4,802,900			$33,642,778	$1,346,200			$33,642,778	$1,346,200			$33,642,778	$2,342,000		$0	$0
Centro de Trabajo: RIEGO 5 (10 Afiliados)						$30,015,639	$4,802,900			$33,642,778	$1,346,200			$33,642,778	$1,346,200			$33,642,778	$2,342,000		$0	$0
Ciudad: PIEDECUESTA Depto: SANTANDER (10 Afiliados)						$30,015,639	$4,802,900			$33,642,778	$1,346,200			$33,642,778	$1,346,200			$33,642,778	$2,342,000		$0	$0
1	CC	63546649	CHIA JANETH	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
2	CC	91540910	COBOS NICOLAS	25-14	30	$6,276,037	$1,004,200	EPS005	30	$6,276,037	$251,100	CCF39	30	$6,276,037	$251,100	14-4	30	$6,276,037	$436,900	30	$0	$0
3	CC	86073331	GONZALEZ ROBY	25-14	30	$3,627,139	$580,400	EPS037	30	$3,627,139	$145,100	CCF39	30	$3,627,139	$145,100	14-4	30	$3,627,139	$252,500	30	$0	$0
4	CC	1095829262	NAVAS MONICA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
5	CC	1057594312	PEREZ OLGA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
6	CC	1052414220	PITA SANTIAGO	25-14	30	$4,510,105	$721,700	EPS002	30	$4,510,105	$180,500	CCF39	30	$4,510,105	$180,500	14-4	30	$4,510,105	$314,000	30	$0	$0
7	CC	12105817	PLAZA LUIS		0	$0	$0	EPS037	30	$3,627,139	$145,100	CCF39	30	$3,627,139	$145,100	14-4	30	$3,627,139	$252,500	30	$0	$0
8	CC	1095791138	RANGEL JESUS	230201	30	$4,006,736	$641,100	EPS002	30	$4,006,736	$160,300	CCF39	30	$4,006,736	$160,300	14-4	30	$4,006,736	$278,900	30	$0	$0
9	CC	1098628681	SALCEDO MAYRA	230301	30	$4,006,736	$641,100	EPS002	30	$4,006,736	$160,300	CCF39	30	$4,006,736	$160,300	14-4	30	$4,006,736	$278,900	30	$0	$0
10	CC	1098682511	VALBUENA JOSE	231001	30	$2,336,171	$373,800	EPS005	30	$2,336,171	$93,500	CCF39	30	$2,336,171	$93,500	14-4	30	$2,336,171	$162,600	30	$0	$0
Total			**Afiliados(10)**			$30,015,639	$4,802,900			$33,642,778	$1,346,200			$33,642,778	$1,346,200			$33,642,778	$2,342,000		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901513118	0	NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAJASAN	CALLE 13N # 2-83	PIEDECUESTA-SANTANDER	6546342	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-09	614303639	9510579113	E	2026/09/04	2026/09/01	BANCOLOMBIA	0	$9,837,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VAL
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$4,802,900	$0					$0	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$373,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$2,306,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$1,201,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$921,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$2,342,000	$0					$0	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	10	$2,342,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$1,346,200	$0					$0	
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	10	$1,346,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				10	$1,346,200	$0					$0	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$70,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$70,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$290,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$501,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$414,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				**10**	**$9,837,300**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	

Resumen General de Pago

LOR A PAGAR
$4,802,900
$373,800
$2,306,300
$1,201,500
$921,300
$2,342,000
$2,342,000
$1,346,200
$1,346,200
$1,346,200
$70,100
$70,100
$290,200
$501,100
$414,700
$9,837,300

ACTA DE APROBACIÓN PÓLIZA

CONTRATO No. IPVO	**No. 021-2026**	
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE ZETAQUIRA, FIRAVITOBA Y SANTA ROSA DE VITERBO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	
CONTRATISTA / TOMADOR	NJS INGENIERÍA Y SOLUCIONES S.A.S.	
NIT	901.513.118-0	
REPRESENTANTE LEGAL	JANETH VIVIANA CHÍA JEREZ CC. No. 63.546.649 de Bucaramanga.	
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NÚMERO	11-46-101111192	**ANEXO:** 2
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA	19/06/2026	
AMPARO	**VIGENCIA**	**VALOR ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/06/2026 A 26/07/2027	$ 31.518.382,88
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.	16/06/2026 A 26/01/2030	$ 31.518.382,88
CALIDAD DEL SERVICIO	26/01/2027 A 26/01/2032	$ 63.036.765,75

COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	11-54-101011944	**ANEXO:** 2	
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA	19/06/2026		
AMPARO	**VIGENCIA**	**VALOR ASEGURADO**	
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	16/06/2026 A 26/01/2027	$ 350.181.000	

Por lo anterior se aprueba la póliza allegada por el contratista, contra fecha de suscripción acta de inicio de fecha 16 de junio de 2026; teniendo en cuenta que reúne las condiciones establecidas en este.

La presente se firma en Tunja a los veinticinco (25) días del mes de junio de 2026.

JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL
Representante Legal

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Revisó	Laura Catherine Rivera Echenique	Directora Jurídica y de Contratación	
Elaboró	Adriana Menjura Rodríguez	Profesional Contratista	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.			

Datos de la póliza

Estado:
Vigente

Número de póliza:
11-54-101011944

Fecha de expedición:
viernes, 19 de junio de 2026

Asegurado:
NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS

Inicio de vigencia:
martes, 16 de junio de 2026

Valor total asegurado:
$ 350.181.000,00

Número de anexo:
2

Ramo:
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPL

Tomador:
NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS

Fin vigencia:
martes, 26 de enero de 2027

Consultar de nuevo

Datos de la póliza

Estado:
Vigente

Número de póliza:
11-46-101111192

Fecha de expedición:
viernes, 19 de junio de 2026

Asegurado:
TIERRASUA S.A.S.

Inicio de vigencia:
martes, 16 de junio de 2026

Valor total asegurado:
$ 126.073.531,51

Número de anexo:
2

Ramo:
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL ONLINE

Tomador:
NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS

Fin vigencia:
lunes, 26 de enero de 2032

Consultar de nuevo

TIERRASUA	TIERRASUA S.A.S NIT 265.377-2	Código: GJC-FO-08
	FORMATO APROBACIÓN DE GARANTÍA	Versión: 00
	GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN	Fecha: 02-12-2024
		Página 3 de 3

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-46-101111192	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	06	2026	16	06	2026	00:00	26	01	2032	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS	NIT: 901.513.118-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 13 N 2 80	PIEDECUESTA, SANTANDER	3012711243

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
TIERRASUA S.A.S.	NIT: 901.285.377-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 19 NRO. 9 - 35 PISO 10	TUNJA, BOYACA	3108808902

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NO. IPVO 021-2026 DE INTERVENTORIA CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE, Y JURIDICA PARA LA AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE LOS MUNICIPIOS DE ZETAQUIRA, FIRAVITOBA Y SANTA ROSA DE VITERBO, DEPARTAMENTO DE BOYACA.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CALIDAD DEL SERVICIO	26/01/2027	26/01/2032	$63,036,765.75	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/06/2026	26/07/2027	$31,518,382.88	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	16/06/2026	26/01/2030	$31,518,382.88	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS DEL CONTRATO NO. IPVO 021-2026 EN CONFORMIDAD CON EL ACTA DE INICIO DE FECHA 16 DE JUNIO DEL 2026 LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****835,763.00	$ *******8,000.00	$ *****160,315.00	$ *********1,004,079.00	$ *******126,073,531.51	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
B&M SEGUROS Y NEGOCIOS COLOMBIA LTD	153934	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-46-101111192

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Janeth Viviana Chía

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-46-101111192	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	06	2026	16	06	2026	00:00	26	01	2032	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS	NIT: 901.513.118-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 13 N 2 80	PIEDECUESTA, SANTANDER	3012711243

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN
TIERRASUA S.A.S.	NIT: 901.285.377-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 19 NRO. 9 - 35 PISO 10	TUNJA, BOYACA	3108808902

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL
$ *****835,763.00	$ *******8,000.00	$ *****160,315.00	$ *********1,004,079.00	$ ******126,073,531.51

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
B&M SEGUROS Y NEGOCIOS COLOMBIA LTD	153934	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

PLAN DE PAGO CONTADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO RACIÓN

DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415) 7709998021167 (8020) 1100063231702 0 (3900) 000001004079 (96) 20270616

REFERENCIA PAGO: 1100063231702-0

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO RAPIESTADO

RCE CONTRATO ESTATAL

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-54-101011944	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	06	2026	16	06	2026	00:00	26	01	2027	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS		NIT: 901.513.118-0
DIRECCIÓN: CALLE 13 N 2 80	**CIUDAD:** PIEDECUESTA, SANTANDER	**TELÉFONO:** 3012711243

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS		NIT: 901.513.118-0
DIRECCIÓN: CALLE 13 N 2 80	**CIUDAD:** PIEDECUESTA, SANTANDER	**TELÉFONO:** 3012711243

BENEFICIARIO: 901285377 - TIERRASUA S.A.S. Y/O TERCEROS AFECTADOS

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-54-101011944

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Janeth Viviana Chía

FIRMA TOMADOR

DLF153934A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO RAPIESTADO

RCE CONTRATO ESTATAL

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-54-101011944	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	06	2026	16	06	2026	00:00	26	01	2027	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS	NIT: 901.513.118-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 13 N 2 80	PIEDECUESTA, SANTANDER	3012711243

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS	NIT: 901.513.118-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 13 N 2 80	PIEDECUESTA, SANTANDER	3012711243

BENEFICIARIO: 901285377 - TIERRASUA S.A.S. Y/O TERCEROS AFECTADOS

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL TOMADOR/ASEGURADO DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, POR HECHOS OCURRIDOS COMO RESULTADO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. IPVO 021-2026 DE INTERVENTORIA CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE, Y JURIDICA PARA LA AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE LOS MUNICIPIOS DE ZETAQUIRA, FIRAVITOBA Y SANTA ROSA DE VITERBO, DEPARTAMENTO DE BOYACA.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	16/06/2026	26/01/2027	$350,181,000.00	

DEDUCIBLE : 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS DEL CONTRATO NO. IPVO 021-2026 EN CONFORMIDAD CON EL ACTA DE INICIO DE FECHA 16 DE JUNIO DEL 2026 LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****537,264.00	$ *******3,000.00	$ *****102,650.00	$ **********642,914.00	$ ******350,181,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
B&M SEGUROS Y NEGOCIOS COLOMBIA LTD	153934	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-54-101011944

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Janeth Viviana Chía

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO RAPIESTADO

RCE CONTRATO ESTATAL

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-54-101011944	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	06	2026	16	06	2026	00:00	26	01	2027	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS	NIT: 901.513.118-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 13 N 2 80	PIEDECUESTA, SANTANDER	3012711243

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS	NIT: 901.513.118-0

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CALLE 13 N 2 80	PIEDECUESTA, SANTANDER	3012711243

BENEFICIARI 901285377 - TIERRASUA S.A.S. Y/O TERCEROS AFECTADOS

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB

pse | American Express | MasterCard | VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla | SuperINTER | éxito | MOVIIRED | Gana Ganas | SURTIMAX | Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL			
$ *****537,264.00	$ *******3,000.00	$ *****102,650.00	$ **********642,914.00	$ ******350,181,000.00	19	06	2026

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
B&M SEGUROS Y NEGOCIOS COLOMBIA LTD	153934	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

PLAN DE PAGO CONTADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO RACIÓN

DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415) 7709998021167 (8020) 11000632317045 (3900) 000000642914 (96) 20270616

REFERENCIA PAGO: 1100063231704-5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-46-101111192	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	06	2026	16	06	2026	00:00	26	01	2032	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS		NIT: 901.513.118-0
DIRECCIÓN: CALLE 13 N 2 80	**CIUDAD:** PIEDECUESTA, SANTANDER	**TELÉFONO:** 3012711243	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	TIERRASUA S.A.S.		NIT: 901.285.377-2
DIRECCIÓN: CL 19 NRO. 9 - 35 PISO 10	**CIUDAD:** TUNJA, BOYACA	**TELÉFONO:** 3108808902	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-46-101111192

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Janeth Viviana Chía

FIRMA TOMADOR

DLF153934A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

TIERRASUA ¡Conectamos región!	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CODIGO: M-GE-CV-F-001
	ACTA DE REUNIÓN	

LUGAR DE REUNIÓN	SANTA ROSA DE VITERBO - VEREDA EL SALITRE				
FECHA	31-ago-26	HORA DE INICIO	11:15 a. m.	HORA FIN	2:00 p. m.

Siendo 11:15 AM se reune la supervisión,interventoría y obra del contrato IPO-009-2026 con la EBSA empresa de energía de boyacá

OBJETO: Identificar los nuevos puntos de los transformadores para la conexión de los circuitos, atender la solicitud de la comunidad, socializar novedades de obra en relación con el proyecto EBSA, que se está instalando en la vereda salitre, ademas la adecuación del punto 84 mediante la instalación de collarín con oreja para la fijación de la grapa de suspensión y comunicar la actualización de la disponibilidad de servicio de los transformadores

1 - Verificación y revisión de nuevos puntos de transformación:
Se realiza la verificación técnica de los nuevos puntos asociados a los transformadores contemplados para el proyecto. La información y condiciones identificadas quedan sujetas a revisión y validación por parte del equipo de obra y la interventoría, con el fin de determinar su viabilidad técnica y definir las acciones correspondientes.

2 - Revisión de solicitudes y requerimientos de la comunidad:
Se revisan los requerimientos y solicitudes presentados por la comunidad en relación con el desarrollo del proyecto. De acuerdo con lo expuesto, se realiza la respectiva socialización entre las partes involucradas y se establece que, una vez efectuado el análisis técnico y operativo, se adoptarán las decisiones y acciones pertinentes para atender los requerimientos de manera adecuada.

3 -Articulación de actividades entre proyectos y definición de acciones:
La supervisión realiza la revisión y articulación de las actividades programadas conjuntamente con el equipo de obra y la interventoría, con el propósito de establecer las decisiones y medidas necesarias para garantizar la correcta y óptima ejecución del proyecto. Lo anterior, teniendo en cuenta la posible interferencia y/o cruce de actividades entre las obras programadas por EBSA y las correspondientes al proyecto de Alumbrado Público IPO-009-2026, buscando evitar interferencias en la ejecución, optimizar la programación de actividades y garantizar la adecuada coordinación técnica y operativa entre los proyectos.

COMPROMISOS		
FECHA	**ACTIVIDAD**	**RESPONSABLE**
4-sep-26	Comunicarse con la EBSA para solicitar nuevas disponibilidades de los transformadores que ya se tenian	DIRECTOR DE OBRA
4-sep-26	Atender solicitud de la comunidad	RESIDENTE DE OBRA
3-sep-26	Verificar la nueva posición de los tranformadores	RESIDENTE DE OBRA
15-sep-26	Se realizará la adecuación del punto 84 mediante la instalación de collarín con oreja para la fijación de la grapa de suspensión, garantizando su correcta sujeción y disposición mecánica	DIRECTOR DE OBRA

DECISIONES / APROBACIONES
SOLICITAR LA ACTUALIZACIÓN DE SOLICITUDES DE DISPONIBILIDAD PARA PROYECTO SANTA ROSA
DEFINIR LA UBICACIÓN DE LOS TRANSFORMADORES PARA LA RESPECTIVA CONEXIÓN
SE VE LA VIABILIDAD DE LA SOLICITUD DE LA COMUNIDAD Y SE AUTORIZA
SE DA AUTORIZACIÓN PARA LA INTALACIÓN DE COLLARIN CON OREJA EN POSTE 510
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta y se anexa lista de asistencia que en ella intervinieron.

ASISTENTES			
NOMBRE COMPLETO	**CARGO**	**ENTIDAD**	**FIRMA**
JESUS MARIA RANGEL CASTAÑEDA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	NJS INGENIERÍA Y SOLUCIONES S.A.S	
BRAYAN LOPEZ PINZÓN	APOYO A SUPERVISIÓN	TIERRA SUA S.A.S	
OSCAR DANIEL PRECIADO ROJAS	SISOMA IGS	IGS INGENIERIA EU	
MAYRA ALEJANDRA SALCEDO GOMEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	NJS INGENIERÍA Y SOLUCIONES S.A.S	
DIEGO FONSECA	INTERVENTORÍA EBSA	DISAL INGENIERIA	

TIERRASUA S.A.S.

NIT 901285377

CL 19 9 35 BRR CENTRO P 10 OF 1001 C.P. 150010

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

Fecha : 27/08/2026

Comprobante de Egreso No. 2026080012

C.C./NIT. : 901513118 **Beneficiario** : NJS INGENIERÍA Y SOLUCIONES S.A.S.

Cta. Cte. No. : SGPR

Banco : NO APLICA - Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías SSF

Referencias : CDP : 826, CRP : 202506006, OP : 2026080014

Concepto : IPVO-021-2026 AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE ZETAQUIRA FIRAVITOBA Y SANTA ROSA DE VITERBO DEPARTAMENTO BOYACÁ. PAGO PARICAL ACTA N1

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
240101	BIENES Y SERVICIOS	56.557.492,88	
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		56.557.492,88
Total Documento:		56.557.492,88	56.557.492,88

TOTAL: CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (56.557.492,88)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
GIRO0000075	Sistema de Presupuesto y Giro de	NJS INGENIERÍA Y SOLUCIONES S.A.S.	56.557.492,88

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
ESTAMPILLA POR ELECTRIFICACION RURAL	56.755.791,50	567.558,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	56.755.791,50	1.418.895,00
ESTAMPILLA POR ADULTO MAYOR	56.755.791,50	1.135.116,00
RETENCION EN LA FUENTE SERVICIOS 6%	56.755.791,50	3.405.000,00
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	10.783.600,38	1.617.540,00
ADMINISTRACION TIERRASUA SPGR	56.755.791,50	2.837.790,00
Total Descuentos		10.981.899,00

* Nota: Los descuentos corresponden al total en la orden de pago más no al valor proporcional del egreso

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
2689	3010500AR2102190005-00AR		67.539.391,88
		Ampliación y construcción de la infraestructura eléctrica rural y del sistema de iluminación de los municipios de	
Total Rubros			67.539.391,88

Natalia del pilar Coy Cubides
Tesorero

Documento elaborado por 1049616509

Cra. 11 # 24-15 Apto 205B – Edificio Pinares del Bosque
Celular 3043783477
Email: int.apfirasanzet@gmail.com

Sogamoso, 30 de septiembre del 2026 INT-OF-2026-09

CERTIFICACIÓN

REFERENCIA: CONTRATO No. IPO-009-2026 "AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE ZETAQUIRA, FIRAVITOBA Y SANTA ROSA DE VITERBO, DEPARTAMENTO BOYACÁ".

En calidad de Interventoría del Contrato **No. IPO 009-2026**, cuyo objeto es la **"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE ZETAQUIRA, FIRAVITOBA Y SANTA ROSA DE VITERBO, DEPARTAMENTO BOYACÁ"**, se certifica que la empresa I.G.S INGENIERIA E.U, identificada con NIT 900.308.302-8 ha dado cumplimiento a las especificaciones técnicas de los materiales empleados y a los procesos constructivos establecidos para la ejecución de las obras, de conformidad con lo consignado en los documentos técnicos, planos, memorias y demás soportes anexos.

Así mismo, se deja constancia de que las actividades ejecutadas se desarrollaron conforme a las normas técnicas vigentes, a las condiciones contractuales pactadas y a los lineamientos de calidad exigidos para el proyecto, verificándose su adecuada implementación durante el desarrollo de la obra.

La presente certificación se expide a solicitud de TIERRASUA S.A.S, para los fines pertinentes, a los treinta (30) días del mes de septiembre de dos mil veintiséis (2026).

Atentamente,

Revisó
Residente de Interventoría
Jesús María Rangel.

Aprobó
Director de Interventoría
Nicolas Cobos Porras.

INGETEST IE Ingeniería, Proyectos y Ensayos	**ROTURA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO.**	**Código:** EL - NTC673 - F01
	FORMATO	**Versión:** 4 **Fecha:** 20/04/2020

Fecha Informe: 25/09/2026 Cliente: NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS NIT: 901.513.118-0

Direccion: Santa Rosa De Viterbo, Vereda El Salitre Telefono: 3043783477 Correo Electronico: vivianachia@hotmail.com


Proyecto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA LA AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE ZETAQUIRA, FIRAVITOBA Y SANTA ROSA DE VITERBO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁMUNICIPIO DE CORRALES BOYACÁ

Maquina de Compresión: Maquina doble rango Pinzuar PC 42 D, capacidad 1000KN rango alto, 200KN rango bajo

RESULTADOS ENSAYOS CILINDROS DE CONCRETO

CILINDRO N°	Localización de toma	Fecha de fundida (DD/MM/AA)	Fecha de Rotura (DD/MM/AA)	Tiempo de fragüe (DD)	Peso (g)	Diametro (mm)	Longitud(mm)	Densidad(kg/m3)	Carga (KN)	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN								f'c requisito	% cumplimiento f'c requisito	¿Presenta Defectos el cilindro?	¿El cilindro se encuentra fuera del rango 1,8D a 2,2D?	Tipo de Falla
										7 Dias		>=14 Dias		>=28 Dias		Proyección 28 dias						
										MPa	PSI	MPa	PSI	MPa	PSI	MPa	PSI	Resistencia esperada (PSI)				
#1	Vereda Salitre - Mina de Argos San Antonio	19/08/2026	26/08/2026	7	12160	150	300	2293,7	118,62	16,90	2451							3000	82%	NO	NO	5
#2	Vereda Salitre - Mina de Argos San Antonio	19/08/2026	2/09/2026	14	12300	150	300	2320,1	124,71			22,25	3227					3000	108%	NO	NO	5
#3	Vereda Salitre - Mina de Argos San Antonio	19/08/2026	16/09/2026	28	12550	150	300	2367,3	165,11					23,10	3244			3000	108%	NO	NO	5
#4																						
#5																						
#6																						
#7																						
#8																						
#9																						
#10																						
#11																						
#12																						
#13																						
#14																						
#15																						
#16																						
#17																						
#18																						
#19																						
#20																						
#21																						
#22																						
#23																						
#24																						
#25																						
#26																						
#27																						
#28																						
#29																						
#30																						

TIPOS DE FALLA DE LOS CILINDROS DE CONCRETO



ESTADISTICA DESCRIPTIVA DATOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN CILINDROS EN CONCRETO (PSI)

7d	**Media (Promedio)**	**2451**	**Desviación Estandar**		**Rango**		**Maximo**		**Minimo**	
14d	**Media (Promedio)**	**3227**	**Desviación Estandar**		**Rango**		**Maximo**		**Minimo**	
28d	**Media (Promedio)**	**3244**	**Desviación Estandar**		**Rango**		**Maximo**		**Minimo**	
>=56d	**Media (Promedio)**		**Desviación Estandar**		**Rango**		**Maximo**		**Minimo**	
% cumplimiento 28d	**Media (Promedio)**	99,13%	**Desviación Estandar**	447,78	**Rango**		**Maximo**		**Minimo**	


OBSERVACIONES: Cilindro traidos en buen estado a la empresa, Fecha de Ingreso: 25/08/2026. Cilindros bien elaborados en obra.


Aprobo:


Camilo Andrés Serrano Talero
Gerente
MP N° 15228-255384 BYC Copnia
Esp. Gerencia Proyectos de Construcción

Ingetest IE SAS, Direccion: Calle 11 # 9-26 Diagonal al Bambi,
Celular: 3214387932, 3155253663, Email: ingetest.ie@gmail.com.

GRAFICOS

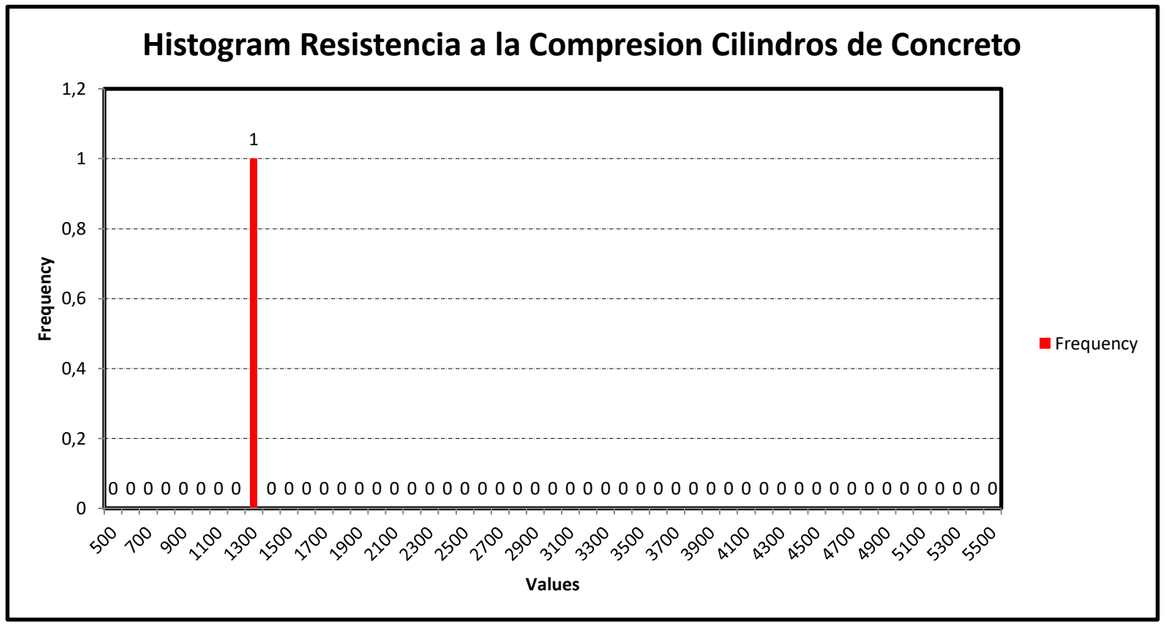
Histogram Resistencia a la Compresion Cilindros de Concreto
Frequency
Values
Frequency

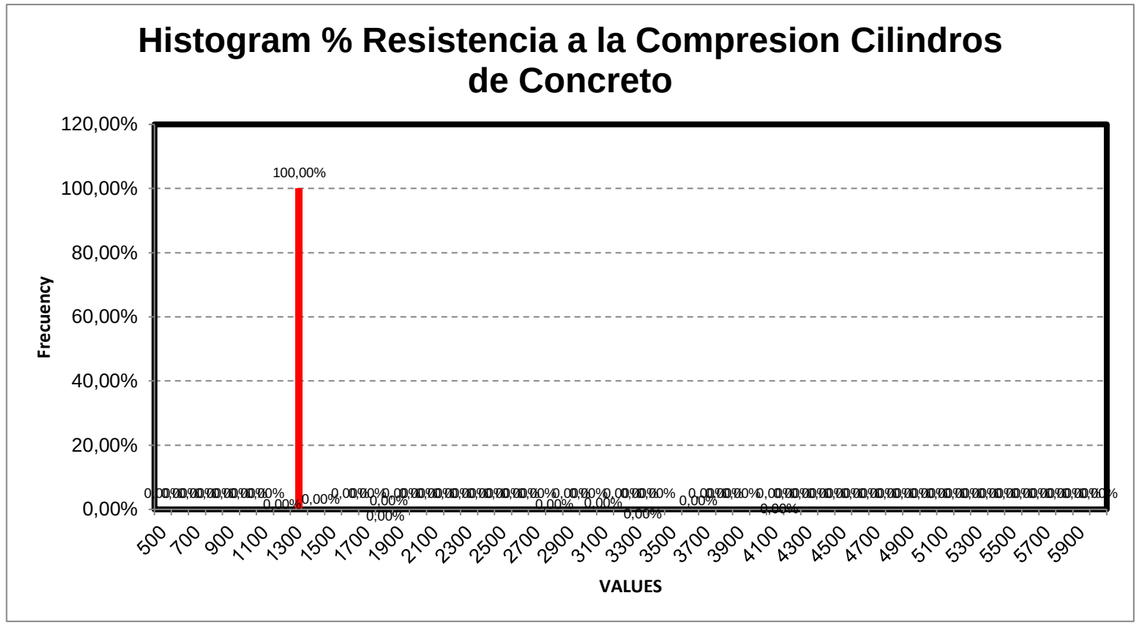
Histogram % Resistencia a la Compresion Cilindros de Concreto
Frecuency
VALUES

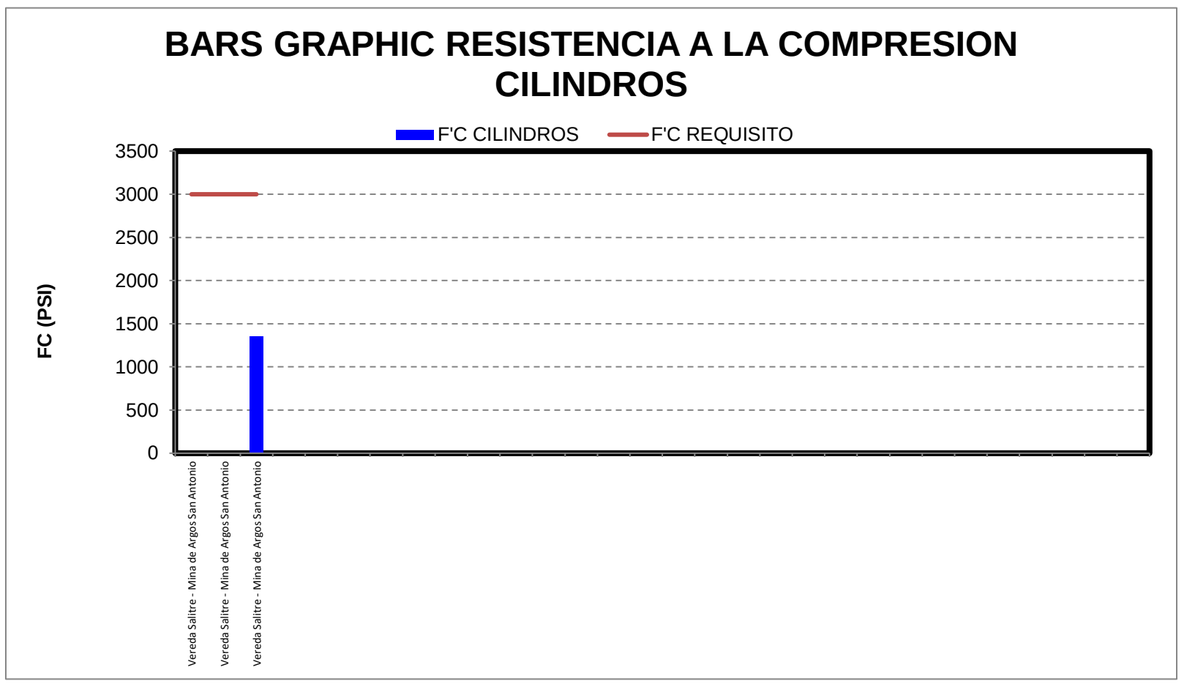
BARS GRAPHIC RESISTENCIA A LA COMPRESION CILINDROS
F'C CILINDROS
F'C REQUISITO
FC (PSI)
Vereda Salitre - Mina de Argos San Antonio
Vereda Salitre - Mina de Argos San Antonio
Vereda Salitre - Mina de Argos San Antonio

Cra. 11 # 24-15 Apto 205B – Edificio Pinares del Bosque
Celular 3043783477
Email: int.apfirasanzet@gmail.com

Sogamoso, 30 de septiembre del 2026 INT-OF-2026-09

CERTIFICACIÓN

REFERENCIA: CONTRATO No. IPO-009-2026 "AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE ZETAQUIRA, FIRAVITOBA Y SANTA ROSA DE VITERBO, DEPARTAMENTO BOYACÁ".

En calidad de Interventoría del Contrato No. **IPO-009-2026**, cuyo objeto es la "**AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE ZETAQUIRA, FIRAVITOBA Y SANTA ROSA DE VITERBO, DEPARTAMENTO BOYACÁ**", se certifica que la empresa **I.G.S INGENIERIA E.U**, se encuentra **a paz y salvo** y ha dado **cumplimiento oportuno e integral** a las obligaciones relacionadas con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, correspondientes a **salud, pensiones, riesgos laborales**, así como a los aportes a la **Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)** y al **Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción.**

Lo anterior se certifica en cumplimiento de lo dispuesto en el **artículo 50 de la Ley 789 de 2002**, previa verificación de la documentación soporte presentada por el contratista.


La presente certificación se expide a solicitud de TIERRASUA S.A.S, para los fines pertinentes, a los Treinta (30) días del mes de septiembre de dos mil veintiséis (2026).

Atentamente,



Revisó

Residente de Interventoría
Jesús María Rangel.



Aprobó

Director de Interventoría
Nicolas Cobos Porras.

NJS INGENIERÍA Y SOLUCIONES S.A.S		
	Tipo de documento: INSPECCION PREOPERACIONAL EQUIPOS CONTRA CAIDAS	CÓDIGO: F-G.SST-2022-024
	Proceso Responsable: SISTEMA DE GESTIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
	Fecha Elaboración: 18 DE ENERO DEL 2022	VERSION: 1


LUGAR: Zetaquira FECHA 10-09-2026

INSPECCIONADO POR: Jesus Maria Rangel Castareda -> Felix Alvarez


INFORMACIÓN DEL ARNÉS

TIPO Dielectrico TALLA Unica REFERENCIA Cuerpo C. SERIE No _____

	ITEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
ARNES	Argolla en "D" dorsal (Detección de caidas)							X							
	Argolla en "D" pectoral (Ascenso y descenso controlado)							X							
	Argollas en "D" lateral (posicionamiento)							X							
	Eslabón pelvico de ajuste rápido							X							
	Eslabón pectoral de ajuste rápido							X							
	La reata esta libre de deshilachaduras, fibras rotas, cortadas, abrasiones, quemaduras o decoloración							X							
	La reata esta libre hebras sueltas o costuras rotas							X							
	El rótulo del arnés es completamente legible							X							
	El soporte dorsal se encuentra en buen estado sin roturas							X							
LINEA DE VIDA TIPO MANILA	SERIE No_____														
	El cuerpo de la eslinga es uniforme, no presenta deshilachaduras o quemaduras							X							
	Los guarda cabos protegen la eslinga perfectamente							X							
	La lengüeta de seguridad de los mosquetones ejercen su función perfectamente							X							
	El rótulo es completamente legible							X							
LINEA DE VIDA TIPO REATA	SERIE No_____														
	La eslinga se encuentra quemada, derretida, cortada o rota								X						
	El hilo de las costuras se aprecia en buen estado							X							
	La lengüeta de seguridad de los mosquetones ejercen su función perfectamente							X							
	El rótulo es completamente legible							X							
	El sistema de absorción de energía está cubierto							X							
TIE OFF / ANCLAJE PORTATIL	SERIE No_____														
	La riata se encuentra quemada, derretida, cortada o rota								X						
	El hilo de las costuras se aprecia en buen estado							X							
	Las argollas se encuentran sin corrosion, golpes o fisuras							X							
	El rótulo es completamente legible							X							
	V°B° SUPERVISOR														

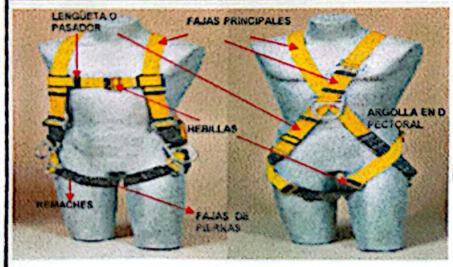











Scanned with CamScanner

NJS INGENIERÍA & SOLUCIONES S.A.S		
	Tipo de documento: INSPECCION PREOPERACIONAL EQUIPOS CONTRA CAIDAS	CÓDIGO: F-G.SST-2022-024
	Proceso Responsable: SISTEMA DE GESTIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
	Fecha Elaboración: 18 DE ENERO DEL 2022	VERSION: 1


LUGAR: Zetaquira FECHA 10-09-2026

INSPECCIONADO POR: Jesus Maria Rangel → Manuel Aguilar.

INFORMACIÓN DEL ARNÉS

TIPO Dielectrico TALLA Unica REFERENCIA Aerpac SERIE No _____

	ITEM	LUNES SI	LUNES NO	MARTES SI	MARTES NO	MIERCOLES SI	MIERCOLES NO	JUEVES SI	JUEVES NO	VIERNES SI	VIERNES NO	SABADO SI	SABADO NO	DOMINGO SI	DOMINGO NO
ARNES	Argolla en "D" dorsal (Detección de caidas)							X							
	Argolla en "D" pectoral (Ascenso y descenso controlado)							X							
	Argollas en "D" lateral (posicionamiento)							X							
	Estabón pelvico de ajuste rápido							X							
	Eslabón pectoral de ajuste rápido							X							
	La reata esta libre de deshilachaduras, fibras rotas, cortadas, abrasiones, quemaduras o decoloración							X							
	La reata esta libre hebras sueltas o costuras rotas							X							
	El rótulo del arnés es completamente legible							X							
	El soporte dorsal se encuentra en buen estado sin roturas							X							
LINEA DE VIDA TIPO MANILA	SERIE No_____														
	El cuerpo de la eslinga es uniforme, no presenta deshilachaduras o quemaduras							X							
	Los guarda cabos protegen la eslinga perfectamente							X							
	La lengüeta de seguridad de los mosquetones ejercen su función perfectamente							X							
	El rótulo es completamente legible							X							
LINEA DE VIDA TIPO REATA	SERIE No_____														
	La eslinga se encuentra quemada, derretida, cortada o rota								X						
	El hilo de las costuras se aprecia en buen estado							X							
	La lengüeta de seguridad de los mosquetones ejercen su función perfectamente							X							
	El rótulo es completamente legible							X							
	El sistema de absorción de energía está cubierto							X							
TIE OFF / ANCLAJE PORTATIL	SERIE No_____														
	La riata se encuentra quemada, derretida, cortada o rota								X						
	El hilo de las costuras se aprecia en buen estado							X							
	Las argollas se encuentran sin corrosion, golpes o fisuras							X							
	El rótulo es completamente legible							X							
	V°B° SUPERVISOR														

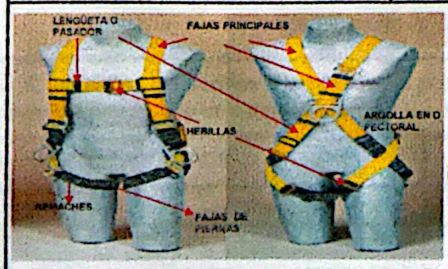

ARNES



LÍNEAS DE VIDA



TIPO MANILA TIPO REATA



TIE OFF





NJS INGENIERÍA & SOLUCIONES S.A.S	NJS INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S								
	Tipo de documento: INSPECCION DE ESCALERAS						CÓDIGO: F-G.SST-2024-023		
	Proceso Responsable: SISTEMA DE GESTIÓN						PÁGINA: 1 DE 1		
	Fecha Elaboración: 18 DE ENERO DEL 2024						VERSIÓN: 1		
REALIZADA POR:	Jesus Maria Rangel Castaneda → Manuel Aguilar								
PROYECTO Y/O CUADRILLA :	Zetaquira								
FECHA DE INSPECCIÓN :	10-09-2026								
MARQUE ASÍ PARA INDICAR LA CASILLA EN QUE SE ENCUENTRA: (√)									
DESCRIPCION DE LA ESCALERA :	MARCA			DIELECTRICA	X	EXTENSIÓN	X	No DE PASOS	
	CERTIFICADA		X	ALUMINIO		TIJERA		No DE PASOS	

ITEM	DESCRIPCCIÓN	ESTADO			OBSERVACIONES
		BUENO	MALO	N/A	
1	BINCHA O APOYA POSTE	✓			
2	BISAGRAS	✓			
3	CUERDA DE LA POLEA	✓			
4	ELE GUIAS EN ALUMINIO	✓			
5	GANCHO EN ALUMNIO O TRABAPELDAÑO	✓			
6	GANCHOS O BASTONES	✓			
7	MEDIAS EN ALUMINIO	✓			
8	PELDAÑOS ANTIDESLIZANTE	✓			
9	PERFILES O LARGUEROS EN ALUMINIO	✓			
10	PERFILES O LARGUEROS EN FIBRA DE VIDRIO	✓			
11	PIES DE AMIGOS EN ACERO GALVANIZADO	✓			
12	PLATAFORMAS	✓			
13	REMACHES	✓			
14	SISTEMA DE POLEAS	✓			
15	TAPONES DOBLE ESPESOR ALTO IMPACTO	✓			
16	ZAPATAS ANTIDESLIZANTE EN ACERO	✓			





NOTA:Si encuentra los perfiles o largueros y/o peldaños partidos y/o fracturados NO USAR y enviar a mantenimiento o remplazar.
Si encuentra defectuoso otro item diferente a los anteriores mencionados reportarlo al personal encargado para su respectivo mantenimiento.

ACCIONES/COMPROMISOS	FECHA	RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO
	10-09-2026	Manuel Aguilar	10-09-2026

FIRMA QUIEN REALIZA INSPECCIÓN

Scanned with CamScanner

NJS INGENIERÍA & SOLUCIONES S.A.S	NJS INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S	
	Tipo de documento: INSPECCION DE ESCALERAS	CÓDIGO: F-G.SST-2024-023
	Proceso Responsable: SISTEMA DE GESTIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
	Fecha Elaboración: 18 DE ENERO DEL 2024	VERSIÓN: 1

REALIZADA POR:	Jesus Maria Rangel Castaneda - FELIX DANIEL.
PROYECTO Y/O CUADRILLA :	Setaquira.
FECHA DE INSPECCIÓN :	10-09-2026

MARQUE ASÍ PARA INDICAR LA CASILLA EN QUE SE ENCUENTRA: (√)

DESCRIPCION DE LA ESCALERA :	MARCA		DIELECTRICA	X	EXTENSIÓN	X	No DE PASOS	
	CERTIFICADA	X	ALUMINIO		TIJERA		No DE PASOS	

ITEM	DESCRIPCCIÓN	ESTADO			OBSERVACIONES
		BUENO	MALO	N/A	
1	BINCHA O APOYA POSTE	✓			
2	BISAGRAS	✓			
3	CUERDA DE LA POLEA	✓			
4	ELE GUIAS EN ALUMINIO	✓			
5	GANCHO EN ALUMNIO O TRABAPELDAÑO	✓			
6	GANCHOS O BASTONES	✓			
7	MEDIAS EN ALUMINIO	✓			
8	PELDAÑOS ANTIDESLIZANTE	✓			
9	PERFILES O LARGUEROS EN ALUMINIO	✓			
10	PERFILES O LARGUEROS EN FIBRA DE VIDRIO	✓			
11	PIES DE AMIGOS EN ACERO GALVANIZADO	✓			
12	PLATAFORMAS	✓			
13	REMACHES	✓			
14	SISTEMA DE POLEAS	✓			
15	TAPONES DOBLE ESPESOR ALTO IMPACTO	✓			
16	ZAPATAS ANTIDESLIZANTE EN ACERO	✓			





NOTA:Si encuentra los perfiles o largueros y/o peldaños partidos y/o fracturados NO USAR y enviar a mantenimiento o remplazar.
Si encuentra defectuoso otro item diferente a los anteriores mencionados reportarlo al personal encargado para su respectivo mantenimiento.

ACCIONES/COMPROMISOS	FECHA	RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO
	10-09-2026	FELIX D. ALVAREZ	10-09-2026

FIRMA QUIEN REALIZA INSPECCIÓN

Scanned with CamScanner

	Tipo de documento: INSPECCION DE EXTINTORES	CÓDIGO: F-G.SST-2024-013
	Proceso Responsable: SISTEMA DE GESTIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
	Fecha Elaboración: 21 DE ENERO DEL 2024	VERSIÓN: 1

Fecha de inspección:	01 -09 - 26	Area o Lugar:	Zetaquira	Proyecto:	Zetaquira

UBICACIÓN	CLASE DE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA DE RECARGA	SEÑALIZACIÓN SI/NO	ALTURA DE UBICACIÓN ≤ 1.50 mts (SI / NO)	ESTADO GENERAL (B / M)						
						MANIJA	SEGURO	MANÓMETRO	MANGUERA	BOQUILLA	CILINDRO	ETIQUETA DE USO Y RECARGA
Obra	Co2	20lb	Junio 2026	Si	Si	B	B		B	B	B	B
Obra	A,B,C	10lb	Junio 2026	Si	Si	B	B	B	B	B	B	B
Carro renault	A,B,C	5lb	Nov 2026	Si	Si	B	B	B	B	B	B	B
grua	A,B,C	30lb	Oct 2026	Si	Si	B	B	B	B	B	B	B

OBSERVACIONES

Estado General	
B	Bueno
M	Malo

ELABORÓ	
NOMBRE:	nicolas Cobos, mayra Salcedo
CARGO:	R. intern

Powered by CamScanner

	Tipo de documento: INSPECCIÓN DE BOTIQUIN		CÓDIGO: F-G.SST-2024-010
	Proceso Responsable: SISTEMA DE GESTIÓN		PÁGINA: 1 DE 1
	Fecha Elaboración: 21 DE ENERO DEL 2024		VERSION: 1
CONTRATO	Aravitoba, Santa Rosa, Zetaquira		
UBICACIÓN	Zetaquira	FECHA DE INSPECCIÓN	01-09-26

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO				OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO
			B	R	M	NT		
1	Esparadrapo	1	B					
2	Gasas	100	B					
3	Guantes desechables	9	B					
4	Microporo	1	B					
5	Solución antiséptica	1	B					
6	Suero oral	1	B					
7	Vendaje elástico	6	B					
8	Curitas	CAJA	B					
9	Tapabocas	5	B					
10	Mascarilla RCP	2	B					
11	Listado de teléfonos de emergencia	1	B					
12	Manual de primeros auxilios	1	B					
13	Inmovilizador cervical	2	B					
16	férulas moldeables	5 PIEZAS	B					
17	Termometro	1	B					
18	Linterna	1	B					
19	Bajalenguas	40	B					
20	Gasa Esteril	12	B					
21	Tijeras	1	B					
22	Alcohol Antisepetico	1	B					
23	Jabon Uso Topico	5	B					
24	Venda de Algodón Laminado	4	B					
25	Apositos	CAJA	B					
26	Pulsoximetro	1	B					
27	Manta Termica	1	B					

ELABORÓ	
NOMBRE:	Rojas Cobos, Maura Soledad
CARGO:	NTS

NT	No Tiene
B	Bueno
R	Regular
M	Malo

Powered by CamScanner

NJS INGENIERÍA & SOLUCIONES S.A.S	Tipo de documento: INSPECCION PREOPERACIONAL DE VEHICULOS	CÓDIGO: F-G.SST-2024-14
	Proceso Responsable: SISTEMA DE GESTIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
	Fecha Elaboración: 21 DE ENERO DEL 2024	VERSIÓN: 1

INSPECCIONADO POR (CARGO) Mayra salcedo

TIPO DE VEHICULO Y PLACA : JAC camioneta COD 424.

DOCUMENTOS (TARJETA DE PROPIEDAD, SEGURO , TECNICO MECANICO Y OTROS)

SI X NO ____

VENC. POLIZA			VENC LICENCIA DE CONDUCTOR		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO

VENC.TEC MECANICO			VENC. SOAT		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
15	10	2027	11	15	2016

ITEM / DESCRIPCIÓN		SEMANA DESDE : 01-09-2026									SEMANA HASTA : 04-09-2026								
		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		E	SB	NA	E	SB	NA	E	SB	NA	E	SB	NA	E	SB	NA	E	SB	NA
CABINA	Espejo central convexo (retrovisor) y laterales				X			X			X			X					
	Vidrio frontal				X			X			X			X					
	Cinturón de seguridad (en cada asiento)				X			X			X			X					
	Puertas de acceso al vehiculo				X			X			X			X					
	Capo (Gancho y cierre adecuado)				X			X			X			X					
EQUIPOS DE EMERGENCIA	Extintor de incendio (10 - 20 lbs)				X			X			X			X					
	Botiquin primeros auxilios (Contenido)				X			X			X			X					
	Paleta(pare - siga)				X			X			X			X					
	Conos (45cm Banda Reflectiva)				X			X			X			X					
	Herramienta Basica(Alicate, Llaves fijas, Llaves de expansión, Destornillador,)				X			X			X			X					
	Gato (Capacidad para levantar vehiculo)				X			X			X			X					
	Cruceta				X			X			X			X					
	Linterna				X			X			X			X					
LLANTAS	Llanta de Repuesto y equipo para cambio				X			X			X			X					
	Todas la ruedas tienen sus esparrágos completos				X			X			V			X					
	Llantas (sin cortaduras profundas y sin abultamientos y 5mm de huella mínima).				X			X			X			X					
ESTADO MECANICO Y HIDRAULICO	Control de fugas hidráulicas en el brazo				X			X			X			X					
	Nivel de fluidos (hidraulico, refrigerante ,direccion, frenos y agua de bateria.				X			X			X			X					
	Estado de pedales (acelerador,freno clutch)				X			X			X			X					
	Estado de latas (golpes y rayaduras)				X			X			X			X					
	Prueba de frenado de Servicio y freno de mano emergencia.				X			X			X			X					
	Batería y cables				X			X			X			X					
	Caja de cambios en buen estado				X			X			X			X					
SISTEMA ELECTRICO	Alarma de retroceso				X			X			X			X					
	Pito				X			X			X			X					
	Instrumentos de control (temperatura, aceite, Velocidad Combustible)				X			X			X			X					
	Luces delanteras, traseras y reversa				X			X			X			X					
	Direccionales				X			X			X			X					
RECORRIDO	KILOMETRAJE DIARIO INICIAL																		
	KILOMETRAJE DIARIO FINAL																		
CUSTODIA TEMPORAL DEL VEHICULO	NOMBRE	FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA		
	Cristian Barrera				Tom			Tom			Tom			Tom					

E= ESTANDAR SB=SUBESTANDAR NA = NO APLICA

SI ENCONTRO UN ITEM SUBESTANDAR EN EL VEHICULO , REPORTELÓ.

OBSERVACIONES

LUNES:

MARTES:

MIERCOLES:

JUEVES:

VIERNES:

SABADO:

Scanned with CamScanner

	NJS INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S	
NJS INGENIERÍA & SOLUCIONES S.A.S	Tipo de documento: INSPECCION PREOPERACIONAL DE VEHICULOS	CÓDIGO: F-G.SST-2024-14
	Proceso Responsable: SISTEMA DE GESTIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
	Fecha Elaboración: 21 DE ENERO DEL 2024	VERSIÓN: 1

INSPECCIONADO POR (CARGO)	Santiago Pita	VENC. POLIZA			VENC LICENCIA DE CONDUCTOR		
		DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
TIPO DE VEHICULO Y PLACA :	JAC COD 429.						

DOCUMENTOS (TARJETA DE PROPIEDAD, SEGURO , TECNICO MECANICO Y OTROS)	VENC. TEC MECANICO			VENC. SOAT		
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
SI X NO ____						

	ITEM / DESCRIPCIÓN	SEMANA DESDE : 05-Sep-2026									SEMANA HASTA : 09-Sep-2026								
		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		E	SB	NA	E	SB	NA	E	SB	NA	E	SB	NA	E	SB	NA	E	SB	NA
CABINA	Espejo central convexo (retrovisor) y laterales	X			X			X			X			X					
	Vidrio frontal	X			X			X			X			X					
	Cinturón de seguridad (en cada asiento)	X			X			X			X			X					
	Puertas de acceso al vehiculo	X			X			X			X			X					
	Capo (Gancho y cierre adecuado)	X			X			X			X			X					
EQUIPOS DE EMERGENCIA	Extintor de incendio (10 - 20 lbs)	X			X			X			X			X					
	Botiquin primeros auxilios (Contenido)	X			X			X			X			X					
	Paleta(pare - siga)	X			X			X			X			X					
	Conos (45cm Banda Reflectiva)	X			X			X			X			X					
	Herramienta Basica(Alicate, Llaves fijas, Llaves de expansión, Destornillador,)	X			X			X			X			X					
	Gato (Capacidad para levantar vehiculo)	X			X			X			X			X					
	Cruceta	X			X			X			X			X					
	Linterna	X			X			X			X			X					
LLANTAS	Llanta de Repuesto y equipo para cambio	X			X			X			X			X					
	Todas la ruedas tienen sus esparrágos completos	X			X			X			X			X					
	Llantas (sin cortaduras profundas y sin abultamientos y 5mm de huella mínima).	X			X			X			X			X					
ESTADO MECANICO Y HIDRAULICO	Control de fugas hidráulicas en el brazo	X			X			X			X			X					
	Nivel de fluidos (hidraulico, refrigerante ,direccion, frenos y agua de bateria.	X			X			X			X			X					
	Estado de pedales (acelerador,freno clutch)	X			X			X			X			X					
	Estado de latas (golpes y rayaduras)	X			X			X			X			X					
	Prueba de frenado de Servicio y freno de mano emergencia.	X			X			X			X			X					
	Batería y cables	X			X			X			X			X					
	Caja de cambios en buen estado	X			X			X			X			X					
SISTEMA ELECTRICO	Alarma de retroceso	X			X			X			X			X					
	Pito	X			X			X			X			X					
	Instrumentos de control (temperatura, aceite, Velocidad Combustible)	X			X			X			X			X					
	Luces delanteras, traseras y reversa	X			X			X			X			X					
	Direccionales	X			X			X			X			X					
RECORRIDO	KILOMETRAJE DIARIO INICIAL																		
	KILOMETRAJE DIARIO FINAL																		
CUSTODIA TEMPORAL DEL VEHICULO	NOMBRE	FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA		
	Cristian Barrera.	Tom			Tom			Tom			Tom			Tom					

E= ESTANDAR SB=SUBESTANDAR NA = NO APLICA

SI ENCONTRO UN ITEM SUBESTANDAR EN EL VEHICULO , REPORTELÓ.

OBSERVACIONES

LUNES:

MARTES:

MIERCOLES:

JUEVES:

VIERNES:

Scanned with CamScanner
