Consorcio Puente Gacheta	**INFORME QUINCENAL CONSORCIO PUENTE GACHETA**							U Versión: 1 Fecha: 04/02/2026	
FECHA	26 jun 26	**PERIODO NRo.**	20	**DEL**	10 jun 26		**AL**	23-jun-26	

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO Nro.	LP-098-2026								
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR QUEBRADA GRANDE MUNICIPIO DE GACHETA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONVENIO No. ICCU-391-2025.								
LOCALIZACIÓN:	MUNICIPIO DE GACHETÁ-QUEBRADA GRANDE								
CONTRATISTA:	CONSORCIO PUENTE GACHETA								
INTERVENTORIA:	SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL DESARROLLO ECOLOGICO Y AMBIENTAL S.A.S								
CONTRATO DE OBRA									
PLAZO INICIAL:	180 días calendario								
FECHA DE INICIACIÓN:	04/02/26								
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	NA								
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	NA								
FECHA DE TERMINACIÓN:	04/08/2026								
PLAZO ACTUALIZADO:	NA								
PLAZO TRANSCURRIDO:	140 días calendario	**EQUIVALE AL**	77.78%	**AVANCE DEL CONTRATO**					
VALOR INICIAL:	$1,616,188,364.87								
VALOR ADICION(ES):	NA			**AVANCE**			**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	
VALOR FINAL:	$1,616,188,364.87			**TIEMPO %**			77.78%	77.78%	
VALOR PAGADO:	-			**OBRA FÍSICA %**			88.52%	81.27%	
VALOR POR PAGAR:	$1,616,188,364.87			**FINANCIERO %**					

2. CONTROL DE ACTIVIDADES


Nro.	Descripción de actividades (Alcance viabilizado del proyecto)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
2	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACION, ENSANBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-516/A572	04 feb 26	12 jun 26	128	04 feb 26		139		11

3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA REPORTADA

Nro.	Descripción de actividades (Alcance viabilizado del proyecto)	Descripción	Programado a la fecha (%)	Ejecutado acumulado anterior (%)	Ejecutado Actual (%)	Ejecucion total actual (%)
1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	Se ejecuto esxcavación para el dado de cimentación de los caisson	100.00%	50.00%	50.00%	100.00%
2	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	se dio inicio a la ejecución de los aceros para el dado y estribo donde roposan las vigas metalicas prefabricadas del puente vehicular	100.00%	37.31%	26.11%	63.42%
3	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	se realizo la ejecución de solados de limpieza para los dados de cimentación o de los estribos	100.00%	53.13%	46.87%	100.00%
4	SUMINISTRO,TRASPORTE,FABRICACION ENSANBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-516/A572	se adelanta la ejecución de empalmes y aplicación de anticorrosivo y esmalte de las vigas metalicas para el puente en obra.	70.80%	77.85%	12.15%	90.00%
5	CONCRETOS f´c =3500 psi (bases)	se ejecuto la fundidad de los dados de cimentación del puente vehicular	100.00%		100.00%	100.00%

4. SEGUIMIENTO FINANCIERO SEMANAL

Semana Nro.	Desde	Hasta	PROGRAMADO				EJECUTADO				ESTADO	
			SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO			
			$ -		$ -							
1	04 feb 26	10 feb 26	$ 5,748,415.03	0.36%	$ 5,748,415.03	0.36%	$ 41,763,276.80	2.58%	$ 41,763,276.80	2.58%	2.23%	Avance
2	11 feb 26	17 feb 26	$ 9,001,119.20	0.56%	$ 14,749,534.23	0.91%	$ 128,581,403.07	7.96%	$ 170,344,679.87	10.54%	9.63%	Avance
3	18 feb 26	24 feb 26	$ 8,459,908.38	0.52%	$ 23,209,442.61	1.44%	$ 69,021,458.33	4.27%	$ 239,366,138.20	14.81%	13.37%	Avance
4	25 feb 26	03 mar 26	$ 3,395,736.87	0.21%	$ 26,605,179.48	1.65%	$ 72,215,675.00	4.47%	$ 311,581,813.20	19.28%	17.63%	Avance
5	04 mar 26	10 mar 26	$ 21,820,599.45	1.35%	$ 48,425,778.93	3.00%	$ 94,718,289.95	5.86%	$ 406,300,103.15	25.14%	22.14%	Avance
6	11 mar 26	17 mar 26	$ 113,093,827.21	7.00%	$ 161,519,606.14	9.99%	$ 94,718,289.95	5.86%	$ 501,018,393.11	31.00%	21.01%	Avance
7	18 mar 26	24 mar 26	$ 113,093,827.21	7.00%	$ 274,613,433.35	16.99%	$ 64,647,534.59	4.00%	$ 565,665,927.70	35.00%	18.01%	Avance
8	25 mar 26	31 mar 26	$ 113,093,827.21	7.00%	$ 387,707,260.57	23.99%	$ 64,647,534.59	4.00%	$ 630,313,462.30	39.00%	15.01%	Avance
9	01 abr 26	07 abr 26	$ 72,389,361.85	4.48%	$ 460,096,622.41	28.47%	$ 68,223,680.00	4.22%	$ 698,537,142.30	43.22%	14.75%	Avance
10	08 abr 26	14 abr 26	$ 113,093,827.21	7.00%	$ 573,190,449.63	35.47%	$ 68,223,680.00	4.22%	$ 766,760,822.30	47.44%	11.98%	Avance
11	15 abr 26	21 abr 26	$ 113,093,827.21	7.00%	$ 686,284,276.84	42.46%	$ 101,476,098.31	6.28%	$ 868,236,920.61	53.72%	11.26%	Avance
12	22 abr 26	28 abr 26	$ 113,093,827.21	7.00%	$ 799,378,104.05	49.46%	$ 101,476,098.31	6.28%	$ 969,713,018.92	60.00%	10.54%	Avance
13	29 abr 26	05 may 26	$ 82,828,503.71	5.12%	$ 882,206,607.76	54.59%	$ 46,061,369.00	2.85%	$ 1,015,774,387.92	62.85%	8.26%	Avance
14	06 may 26	12 may 26	$ 90,783,220.54	5.62%	$ 972,989,828.30	60.20%	$ 46,061,369.00	2.85%	$ 1,061,835,756.92	65.70%	5.50%	Avance
15	13 may 26	19 may 26	$ 159,887,085.82	9.89%	$ 1,132,876,914.12	70.10%	$ 16,150,000.00	1.00%	$ 1,077,985,756.92	66.70%	-3.40%	Atraso
16	20 may 26	26 may 26	$ 58,746,784.39	3.63%	$ 1,191,623,698.51	73.73%	$ 16,150,000.00	1.00%	$ 1,094,135,756.92	67.70%	-6.03%	Atraso
17	27 may 26	02 jun 26	$ 106,283,843.25	6.58%	$ 1,297,907,541.75	80.31%	$ 34,277,067.00	2.12%	$ 1,128,412,823.92	69.82%	-10.49%	Atraso
18	03 jun 26	09 jun 26	$ 53,778,428.30	3.33%	$ 1,351,685,970.06	83.63%	$ 27,816,984.64	1.72%	$ 1,156,229,808.56	71.54%	-12.09%	Atraso
19	10 jun 26	16 jun 26	$ 39,520,368.13	2.45%	$ 1,391,206,338.18	86.08%	$ 32,501,777.40	2.01%	$ 1,188,731,585.96	73.55%	-12.53%	Atraso
20	17 jun 26	23 jun 26	$ 39,520,368.13	2.45%	$ 1,430,726,706.31	88.52%	$ 124,760,131.20	7.72%	$ 1,313,491,717.16	81.27%	-7.25%	Atraso
21	24 jun 26	30 jun 26	$ 39,520,368.13	2.45%	$ 1,470,247,074.44	90.97%						
22	01 jul 26	07 jul 26	$ 39,520,368.13	2.45%	$ 1,509,767,442.57	93.42%						
23	08 jul 26	14 jul 26	$ 41,802,406.53	2.59%	$ 1,551,569,849.10	96.00%						
24	15 jul 26	21 jul 26	$ 17,787,188.40	1.10%	$ 1,569,357,037.50	97.10%						
25	22 jul 26	28 jul 26	$ 36,041,856.67	2.23%	$ 1,605,398,894.17	99.33%						
26	29 jul 26	04 ago 26	$ 10,789,470.72	0.67%	$ 1,616,188,364.89	100.00%						

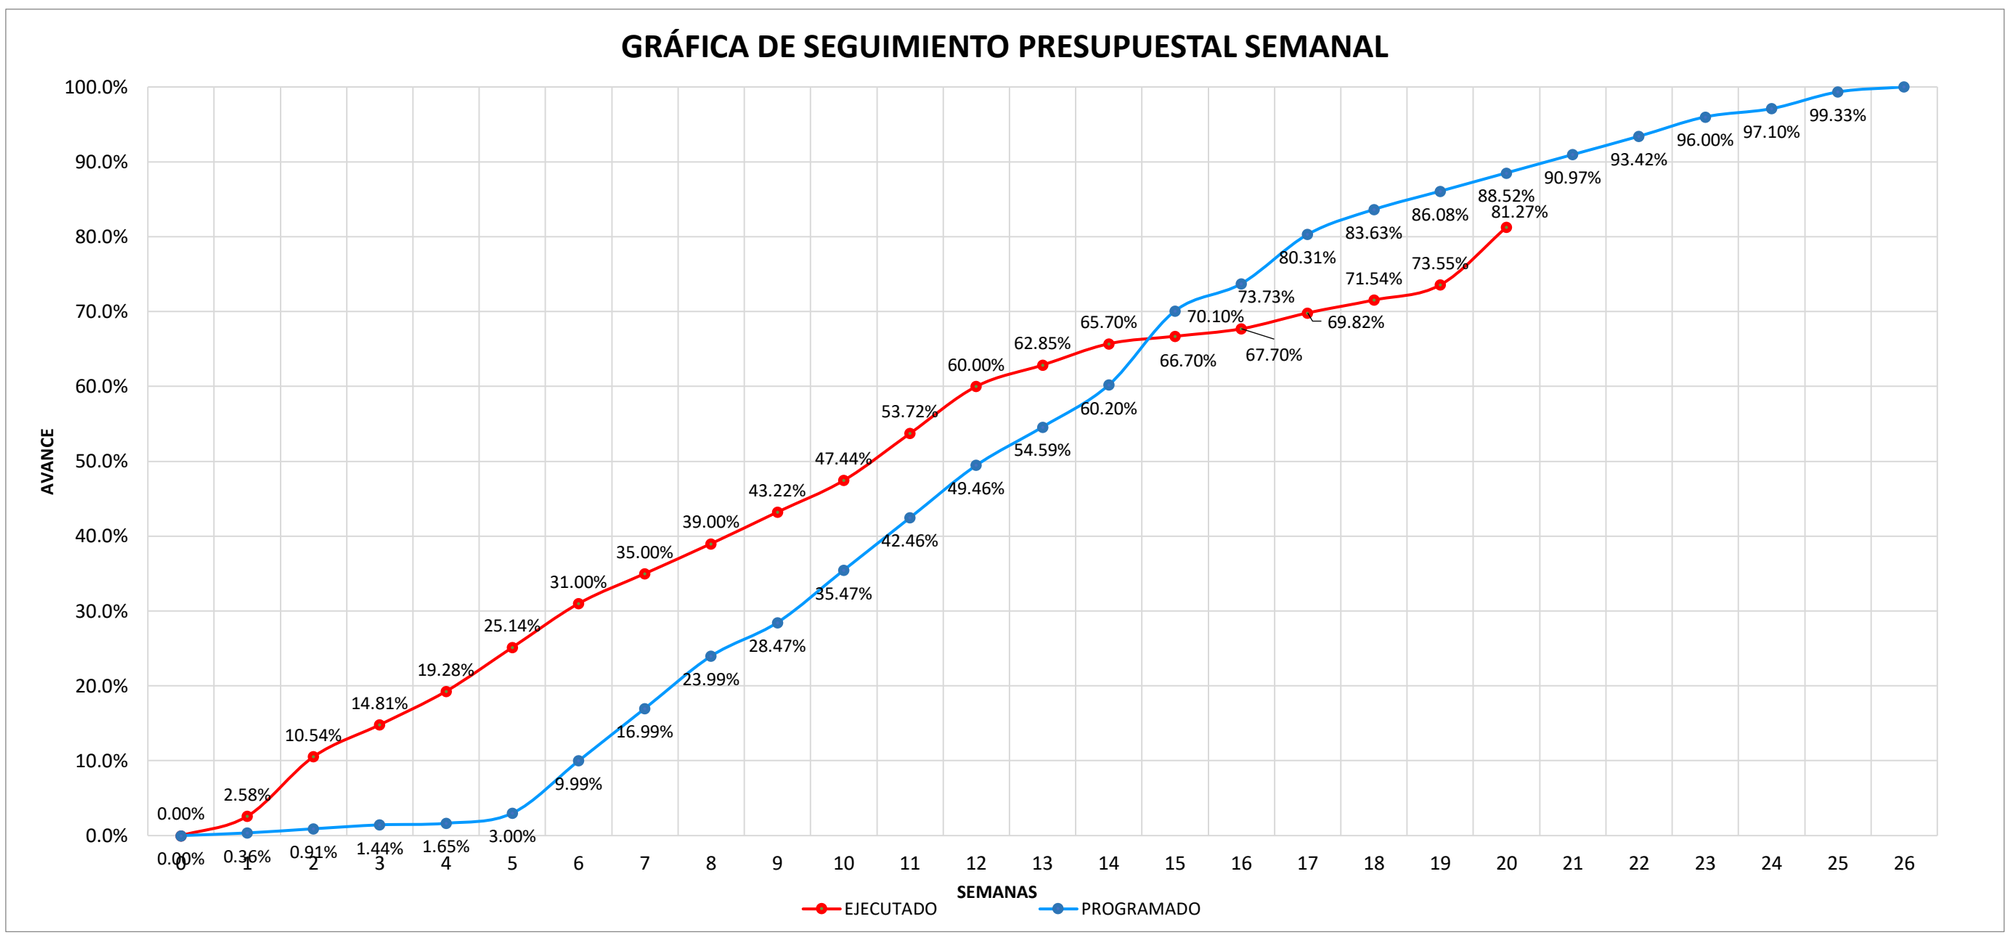


Nro.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO	
1	Valor acumulado de las actividades conforme a la programación vigente.	$ 1,430,726,706.31	88.52%	$ 117,234,989.15	ATRASO
2	Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.	$ 1,313,491,717.16	81.27%	-7.25%	

5. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

* Respecto a la excavaciones varias en material comun , se reporta la ejecución del 100.00 % de avance en excavación para los dados de cimentación.
* Se adelanto el 100% de la actividad de solados de limpieza para los dados de cimentación y el profundiad de los ciasson.
* Respecto al suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60.000 psi, se reporta la ejecución del 26.11 % de avance de acero para los dados y estribos conforme a los requerimientos técnicos del proyecto. teniendo un total acumulado de 63.42%.
* En el componente de superestructura metálica, se deja constancia que se ha realizado la fabricación y disposición en sitio del 12.15% de estructura metálica, quedando estos elementos disponibles para las etapas subsiguientes de montaje según el plan de obra. teniendo un total acumulado del 90.00 % en obra.
* Se ejecuto el 100 % de instalación de concreto de 3500 psi para bases en los dados de cimentación.

Elaboro:	Reviso:	Aprobo:
Ing. Daniel Mauricio Ulier Restrepo	Ing. Nelson Odens Mora Franco	ERIKA JOHANA SUAREZ SANTANA
RESIDENTE DE OBRA	**DIRECTOR DE OBRA**	**REPRESENTANTE LEGAL**

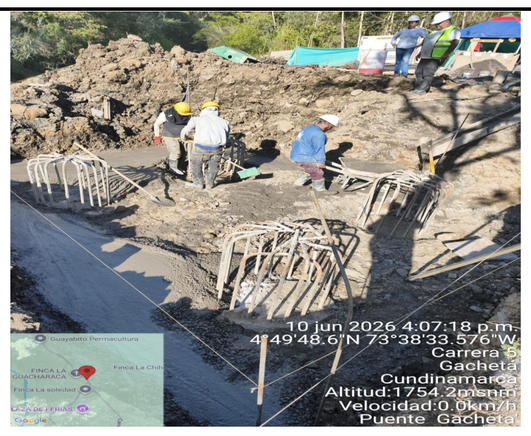INFORME QUINCENAL		
		
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
		
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI
		
CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES
		
SUMINISTRO,TRASPORTE,FABRICACION ENSANBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-516/A572	SUMINISTRO,TRASPORTE,FABRICACION ENSANBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-516/A572	SUMINISTRO,TRASPORTE,FABRICACION ENSANBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-516/A572
		
CONCRETOS f´c =3500 psi (bases)	CONCRETOS f´c =3500 psi (bases)	CONCRETOS f´c =3500 psi (bases)
