MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS			**FORMATO**	INFORME SEMANAL DEL ESTADO DE LA OBRA				
PROCESO	AUDITORIA DE OBRA		**CÓDIGO**					
FECHA DE EMISIÓN			**VERSIÓN**	1	**HOJA**	1	**DE**	2

SEMANA N°	2 **DEL**	5/10/2026	**AL**	11/10/2026	
FECHA INICIO :	**30/09/2026**	**FECHA TERMINO :**	**30/11/2026**		

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	**EL MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA Y EL CERRAMIENTO DE BATALLÓN DE OPERACIONES ESPECIALES DE AVIACIÓN (BAOEA) UBICADO EN EL FUERTE MILITAR DE TOLEMAIDA, MUNICIPIO DE NILO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**				
INTERVENTOR	**N/A**	**NIT O C.C.**	**N/A**	**CONTRATO N°**	**N/A**
CONTRATISTA	**INGENIERIA Y CONSULTORIA SDC SAS**	**NIT O C.C.**	**902010225-5**	**CONTRATO N°**	**N°265**

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS			ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO	
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	**PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO**	**PORCENTAJE DE EJECUCION EJECUTADO**	**ACTIVIDADES**	**MOTIVOS**
P-1. PRELIMINARES	21,00%	32,00%	Se ejecutaron actividades de corte de placa de concreto sobre zonas de parqueaderos, demolicion de placa y excavacion según diseños de 5 zapatas	Se proyecta para la proxima semana terminar actividades de corte demolicion y excavacion para zapatas.
C-2 CIMIENTOS	0,00%	0,00%	N P	
S-3 DESAGUES E INSTALACIONES	0,00%	0,00%	N P	
PB-4 PISOS-BASES-RELLENOS	50,00%	35,00%	Se ejecutan actividades de relleno de base granular en 2 zapatas de la subestacion	se continuan actividades de excavacion para ejecutar relleno con base granular
EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO	0,00%	0,00%	N P	
IE-8 INSTALACIONES ELECTRICAS	0,00%	0,00%	N P	
CB-10 CUBIERTAS	0,00%	0,00%	N P	
CR-11 CIELORASOS	0,00%	0,00%	N P	
PI-19 PINTURA	0,00%	0,00%	N P	
OE-21 OBRAS EXTERIORES	0,00%	0,00%	N P	
AG-22 ASEO GENERAL	0,00%	0,00%	N P	
TOTALES	6,45%	6,09%		

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLU	**VR.TOTAL CONTRATO**	**VR. TOTAL EJECUTADO**	**VR. POR EJECUTAR**	**AVANCE DE INVERSION**	**SEMANA**	**ACUMULADO**
	$ 288.171.073,57	$ 17.552.238,12	**270.618.835,45**		6,09%	$ 17.552.238,12

IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA


PERSONAL	**CANTIDAD**	**PERSONAL**	**CANTIDAD**
ARQUITECTOS	**1**	**INSPECTOR**	
INGENIEROS	**1**	**OBREROS**	**1,00**
TOPÓGRAFO		**AYUDANTES**	**3,00**
PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO			

V.ESTADO DEL TIEMPO

	FECHA	**MAÑANA**	**TARDE**	**LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS**
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	N/A	N/A	N/A	
	N/A	N/A	N/A	SI [ ] NO [X]
	N/A	N/A	N/A	

SI [X] NO [ ]

IV. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)





VI. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES


Se continuan actividades de corte, demolicion y excavacion para zapatas de zona de cerramiento y subestacion

VII. REGISTRO FOTOGRÁFICO













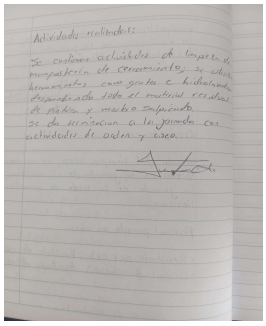

VIII. REGISTRO BITACORA DE OBRA


Actividades realizadas:

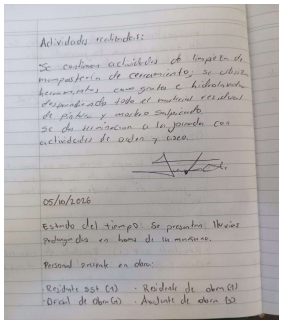Se continua actividades de limpieza de mampostería de cerramiento, se utiliza herramientas como guata e hidrolavadora desprendiendo todo el material residual de pega y mocho salpicado.
Se da terminacion a la jornada con actividades de orden y aseo.


Actividades realizadas:


Se continua actividades de limpieza de mampostería de cerramiento; se utiliza herramientas como guata e hidrolavadora desprendiendo todo el material residual de pega y mocho salpicado.
se da terminacion a la jornada con actividades de orden y aseo.

05/10/2026

Estado del tiempo: Se presentan lluvias prolongadas en horas de la mañana.

Personal presente en obra:

· Residente SST (x) · Residente de obra (x)
· Oficial de obra (x) · Ayudante de obra (x)

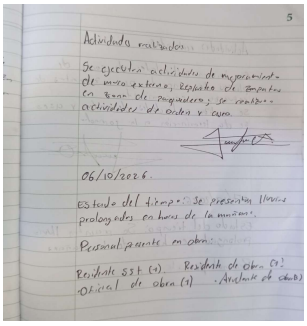
5

Actividades realizadas:


Se ejecutan actividades de mejoramiento de muro externo, Reparto de empates en zona de parqueadero; se realizan actividades de orden y aseo.

06/10/2026

Estado del tiempo: Se presentan lluvias prolongadas en horas de la mañana.

Personal presente en obra:

Residente SST (x) Residente de obra (x)
Oficial de obra (x) · Ayudante de obra (x)

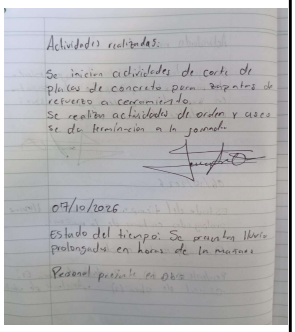
Actividades realizadas:

Se inician actividades de corte de placas de concreto para empates de retorno a cerramiento.
Se realiza actividades de orden y aseo se da terminación a la jornada.

07/10/2026

Estado del tiempo: Se presentan lluvias prolongadas en horas de la mañana.

Personal presente en obra:

FIRMA RESIDENTE DE OBRA

Original : Central Administrativa y Contable Especializada de Ingenieros
1 era copia: Interventor
2 da copia : Contratista
