
ID	Task Mode	Nombre de tarea	Cost	Duration	Start	Finish	Predecessors	Successors
1		MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO CALAHORRA	$ 186,262,351.00	44 days	Sun 1/11/26	Thu 31/12/26		
2		FECHA DE INICIO	$ 0.00	0 days	Sun 1/11/26	Sun 1/11/26		455
3		PRELIMINARES	$ 11,000,815.31	26 days	Mon 2/11/26	Mon 7/12/26		
4		CERCA EN TELA VERDE H 2.10 M	$ 1,346,545.20	2 days	Mon 2/11/26	Tue 3/11/26	2SS	5
5		DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO) INC RETIRO	$ 5,398,106.00	8 days	Wed 4/11/26	Fri 13/11/26	4	6
6		DESMONTE DE ESTRUCTURA DE MADERA DE CUBIERTA, INCLUYE DESMONTAJE MANUAL Y/O MECÁNICO, CORTE DE ELEMENTOS, DESCENSO, CARGUE, RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS EN SITIO AUTORIZADO.	$ 10,292,450.70	15 days	Mon 16/11/26	Fri 4/12/26	5	7FF,11
7		DESMONTE CERCHAS METALICAS	$ 1,862,000.00	5 days	Mon 30/11/26	Fri 4/12/26	6FF	8
8		DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.15 M. INC RETIRO	$ 100,914.01	1 day	Mon 7/12/26	Mon 7/12/26	7	
9		CUBIERTAS	$ 145,376,456....	19 days	Mon 7/12/26	Thu 31/12/26		
10		ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA EN FIBROCEMENTO	$ 5,065,873.20	10 days	Mon 14/12/26	Fri 25/12/26	12	13SS,15
11		DADOS EN CONCRETO 3500 PSI	$ 3,538,855.19	5 days	Mon 7/12/26	Fri 11/12/26	6	12FF
12		ACERO FIGURADO 60000 PSI	$ 3,119,967.20	5 days	Mon 7/12/26	Fri 11/12/26	11FF	10
13		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA A DOS AGUAS EN GUADUA ANGUSTIFOLIA KUNTH TIPO MACANA Ø120 MM. INMUNIZADA E IMPERMEABILIZADA, INCLUYE ESTRUCTURA PORTANTE, CORREAS, ESTERILLA, MACHIHEMBRE, APOYOS, CONEXIONES,	$ 98,744,090.68	12 days	Mon 14/12/26	Tue 29/12/26	10SS	15FF
14		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ECOROOF ESPAÑOLA 40 ASA-UPVC 2.3 mm TERRACOTA MATE L.04 x 4.92 m. SOBRE ESTRUCTURA	$ 28,196,340.00	7 days	Mon 21/12/26	Tue 29/12/26	10SS+5 days	16FF
15		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE TEJA ECOROOF ESPAÑOLA 40 ASA-UPVC 2.3 MM, TERRACOTA MATT, INCLUYE TRASLAPES, FIJACIONES Y SELLADO.	$ 2,778,987.65	2 days	Mon 28/12/26	Tue 29/12/26	10,14FF,13FF	16,19:23
16		CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22 DS 60	$ 4,453,787.60	2 days	Wed 30/12/26	Thu 31/12/26	15	17FF
17		BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4" INC ACCESORIOS	$ 1,456,644.73	2 days	Wed 30/12/26	Thu 31/12/26	16FF	
18		ACABADOS Y ASEO	$ 17,076,109.49	2 days	Wed 30/12/26	Thu 31/12/26		
19		PINTURA GENERAL Y REMATES	$ 4,249,569.40	2 days	Wed 30/12/26	Thu 31/12/26	15	20FF
20		PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIOR	$ 10,814,695.00	2 days	Wed 30/12/26	Thu 31/12/26	19FF	21FF
21		ASEO FINAL DE OBRA	$ 2,011,625.00	1 day	Thu 31/12/26	Thu 31/12/26	24FF,20FF	25
22		INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 4,809,769.44	2 days	Wed 30/12/26	Thu 31/12/26		
23		SALIDA LAMPARA TOMA EMT COMPLETA INC. PITERRUPTOR	$ 2,681,769.44	1 day	Wed 30/12/26	Wed 30/12/26	15	24
24		SUMINISTRO LAMPARA LUZ INDIRECTA	$ 2,128,000.00	1 day	Thu 31/12/26	Thu 31/12/26	23	21FF
25		FIN	$ 0.00	0 days	Thu 31/12/26	Thu 31/12/2621		

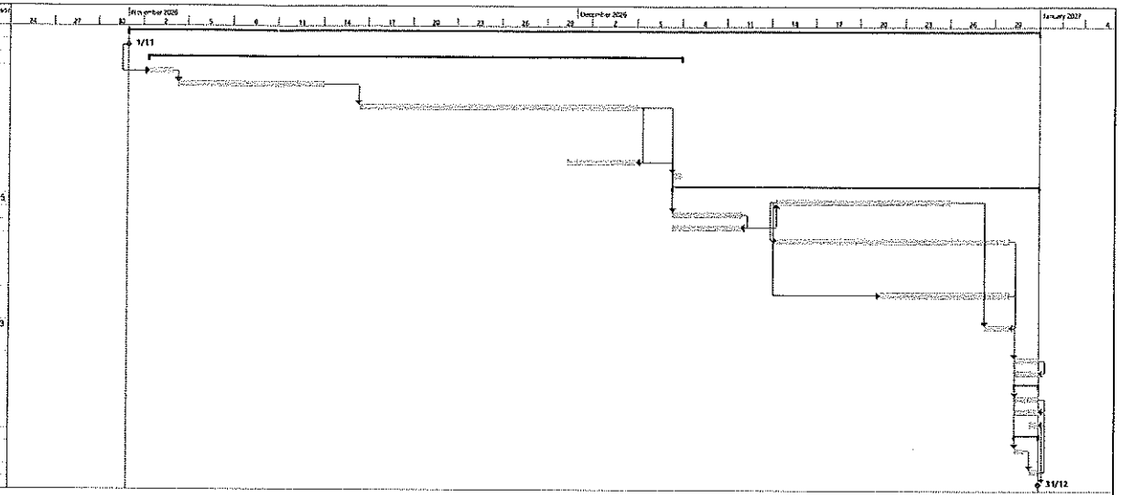

Proyecto: PROGRAMACIÓN DE
Fecha: Thu 24/09/26

Página 1


February 2027
March 2027
April 2027
Proyecto: PROGRAMACIÓN DE
Fecha: Thu 24/09/26
Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual
