CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CIN-20260504-002

CONTRATISTA: QUINAC SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

“INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA PARA LA ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA BOYACÁ.”

“ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA – BOYACÁ”

INFORME N 3 DE INTERVENTORIA


TABLA DE CONTENIDO

1. GENERALIDADES 5
1.1. Descripción general 5
1.2. LOCALIZACIÓN 6
1.3. ALCANCE 6
2. CONTRATO DE OBRA 7
3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA 7
4. METAS FÍSICAS CONTRATADAS 8
4.1. OBRAS ACTUALIZADAS 11
5. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 14
5.1. MODIFICACIONES EN EL TIEMPO – PRÓRROGAS Y/O SUSPENSIONES 14
5.2. RELACIÓN DE PAGOS 14
5.3. MODIFICATORIOS EN VALOR REALIZADOS AL CONTRATO 14
5.4. GARANTÍAS Y VIGENCIAS 14
5.5. SUPERVISORES E INTERVENTORES DELEGADOS AL CONTRATO 16
5.6. VERIFICACIÓN DE PERSONAL, EQUIPOS Y MATERIALES EN OBRA. 16
5.7. REPORTE DE VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA OBJETO DE LA INTERVENTORÍA 17
5.8. BALANCE GENERAL FINANCIERO DEL CONTRATO PROGRAMADO VS EJECUTADO 17
6 INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO, ASPECTOS SISO, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MANEJO AMBIENTAL 24
7 INFORMES TÉCNICOS DESARROLLADOS Y/O APROBADOS EN EL PERIODO. 25
7.2 INFORME FOTOGRÁFICO DE OBRA-MES 3 EJECUCIÓN 26
8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 41

LISTA DE TABLAS

Figura 1-1. Mapa ubicación del proyecto 6
Tabla 1. Contrato de Obra 7
Tabla 2. Cuadro de Información del Personal del contratista 7
Tabla 3. Contrato de Interventoría 7
Tabla 4. Cuadro de Información del Personal de Interventoría 8
Tabla 5. Cuadro metas físicas contratadas 8
Tabla 6. Cuadro de Información Modificaciones– Mes 3 de ejecución 14
Tabla 7. Cuadro de relación de pagos– Mes 3 de ejecución. 14
Tabla 8. Cuadro de Información modificatorios – Mes 3 de ejecución. 14
Tabla 9. Cuadro de información de Garantías del Contrato de Interventoría 14
Tabla 10. Cuadro de información de Garantías del Contrato de Obra 15
Tabla 11. Cuadro de Información dependencias de control del contrato– Mes 3 De Construcción 16
Tabla 12. Reporte de personal en obra. 16
Tabla 13. Reporte de personal de interventoría. 16
Tabla 14. Reporte de equipos y materiales en obra. 17
Tabla 15. Cuadro de avance general del proyecto – Mes 3 de ejecución. 17
Tabla 16. Cuadro de Avance General del Proyecto – Mes 3 de ejecución 22
Tabla 17. Cuadro de Avance General del Proyecto con Atraso/Adelanto– Mes3 de ejecución. 22
1-2 Grafica Seguimiento financiero – Mes 3 ejecución. 23

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

ELABORÓ	Nombre	NANCY YASMIN QUIROGA CASTRO
	Firma	
	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	

1. GENERALIDADES

1.1. Descripción general

La E.S.E Centro de Salud Santa Isabel de Buenavista Boyacá presenta un deterioro significativo en su infraestructura física, con deficiencias en enlucidos, cielos falsos, cubiertas, redes eléctricas, hidBPráulicas y sanitarias, lo cual afecta la seguridad, comodidad y calidad en la prestación de los servicios de salud. Para solucionar esta problemática, Que La E.S.E Centro de Salud Santa Isabel de Buenavista Boyacá, radicó ante el Ministerio de Salud y Protección Social el proyecto denominado "**ADECUACIONES MENORES A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SANTA ISABEL BUENAVISTA BOYACA**" el cual tuvo concepto técnico de viabilidad por parte de la Subdirección de Infraestructura en Salud del Ministerio de Salud y Protección Social, Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Resolución No 1487 del 21 de julio de 2025 "Por la cual se efectúa una asignación de recursos del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Salud y Protección Social, del rubro "Apoyo a Programas de Desarrollo de la Salud Ley 100 de 1993" para la financiación proyectos de infraestructura en salud" resolvió asignarle a La E.S.E Centro de Salud Santa Isabel de Bunavista Boyacá la suma de **QUINIENTOS DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS. ($516.462.620,00) M/CTE**, para el proyecto denominado "**ADECUACIÓNES MENORES A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SANTA ISABEL BUENAVISTA BOYACA,** Por lo que la entidad celebro el contrato de obra **N COP-20260504-001** cuyo objeto es**: ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA – BOYACÁ**

con el fin de garantizar que la ejecución del proyecto cumpla con los estándares de calidad, normativa vigente y optimización de los recursos públicos asignados. La interventoría asegurará que las obras se desarrollen conforme a los diseños, especificaciones técnicas, plazos establecidos y principios de transparencia, eficiencia y legalidad, tal como lo exige el marco normativo aplicable, incluyendo la Resolución No 1487 del 21 de julio de 2025, que regula los procesos contractuales financiados con recursos de la Nación. se celebro el Contrato de Interventoría No. **CIN-20260504-002,** cuyo objeto es "**INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL,AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA PARA LA ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA BOYACÁ"**

1.2. LOCALIZACIÓN

El proyecto está localizado en el casco urbano del Municipio de BUENAVISTA en el Departamento de Boyacá.

A continuación, se presenta una imagen de la localización del proyecto.

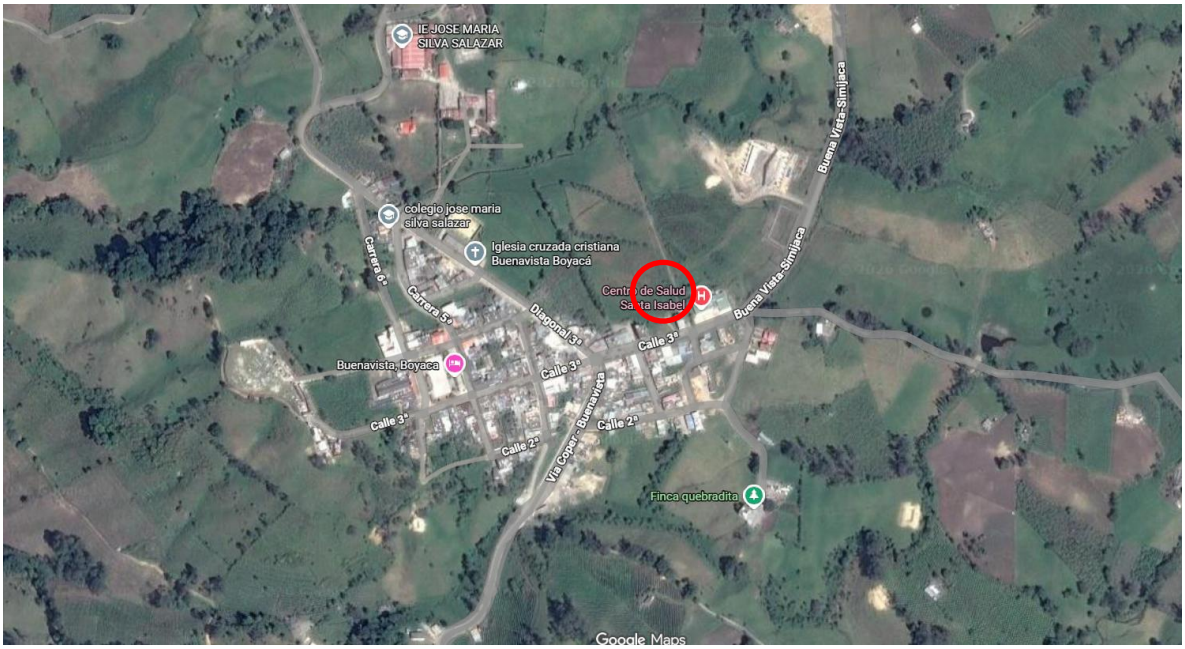


Figura 1-1. Mapa ubicación del proyecto

1.3. ALCANCE

En cumplimiento del Contrato de interventoría **No. CIN-20260504-002,** a cargo de la empresa QUINAC SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.Scon NIT: 901.565.963-0 Representado legalmente por el Señora, NANCY YASMIN QUIROGA CASTRO quien a su vez y a través del presente documento hace entrega a la E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA ISABEL DE BUENAVISTA - BOYACÁ, el Informe No.3 , de Interventoría, cuyo objeto contractual corresponde a **INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA PARA LA ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA-BOYACA.** Teniendo en cuenta las actividades contempladas inicialmente**.** El presente informe comprende las actividades desarrolladas en la fase de construcción, comprendido en el periodo del presente informe.

2. *CONTRATO DE OBRA*

Se muestra la información pertinente al contrato objeto del proyecto, fechas correspondientes, acta de inicio, suscripción y terminación del contrato:

Tabla 1. Contrato de Obra

Contrato de Obra Pública No	**COP-20260504-001**
Objeto del Contrato:	ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA – BOYACÁ
Contratista:	OSCAR RAÚL SARMIENTO DAZA
Plazo de Ejecución:	TRES (3) MESES
Fecha de Iniciación:	4 DE MAYO DE 2026
Fecha de Terminación:	4 DE Agosto DE 2026
Valor del Contrato:	$ 483.325.508,90
Valor de Adición:	$0
Valor total del contrato	$ 483.325.508,90

El siguiente Cuadro muestra la información del personal de Contratista:

Tabla 2. Cuadro de Información del Personal del contratista

Nombre	Cargo	Email
KAREN DAYHIANA ESPITIA SUAREZ	DIRECTOR DE OBRA	quinacingenieria05@gmail.com
OSCAR RAUL SARMIENTO DAZA	RESIDENTE DE OBRA	diferotri@hotmail.com
JHONAL DEAVIES MORENO SUAREZ	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	N/A
MAESTRO DE OBRA	MAESTRO DE OBRA	N/A

3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se muestra la información pertinente al contrato objeto del proyecto, fechas de acta de inicio, suscripción y terminación del contrato:

Tabla 3. Contrato de Interventoría

Contrato de Interventoría Pública No	**082-2025**
Objeto del Contrato:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA PARA LA ADECUACIÓN MENOR DE

	LA INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA -BOYACÁ
Contratista:	QUINAC SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
Plazo de Ejecución:	TRES (3) MESES
Fecha de Iniciación:	MAYO 4 DE 2026
Fecha de Terminación:	4 DE AGOSTO DE 2026
Valor del Contrato:	$26.185.950.00
Valor total del contrato	$26.185.950.00

El siguiente Cuadro muestra la información del personal de Interventoría:

Tabla 4. Cuadro de Información del Personal de Interventoría

Nombre	Cargo	Email
NANCY YASMIN QUIROGA CASTRO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	quinacingenieria05@gmail.com
CARMEN YANEHT ALCANTAR	ASESOR EN CONDICONES DEE HABILTACION	quinacingenieria05@gmail.com

4. METAS FÍSICAS CONTRATADAS

Las metas físicas de este proyecto se basan en las actividades generadas por la **"ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA – BOYACÁ"** específicamente las actividades se encuentran descritas en el presupuesto oficial.

Metas Físicas Contractuales:

Tabla 5. Cuadro metas físicas contratadas

CONDICIONES ORIGINALES

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL
1		**PRELIMINARES**					
1.01	1.01.24	DEMOLICIÓN ENCHAPE CERAMICO	Metro Cuadrado	49,38		$ 9.547,65	$ 471.463,00
1.02	1.01.63	DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS	Metro Cuadrado	72,24		$ 13.628,20	$ 984.501,00
1.03	1.01.47	DESMONTE ADOQUIN PREFABRICADO	Metro Cuadrado	195,20		$ 4.741,43	$ 925.527,00
						COSTO DIRECTO GRUPO	**$ 2.381.491,00**
2		**PISOS Y ENCHAPES**					
2.01	1.11.44	PISO CERÁMICA 51*51 CM	Metro Cuadrado	49,38	4%	$ 94.652,06	$ 4.860.875,00
2.02	1.11.04	ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5	Metro Cuadrado	247,38	4%	$ 30.027,15	$ 7.725.241,00
						COSTO DIRECTO GRUPO	**$ 12.586.116,00**
3		**PINTURA**					
3.01	1.09.04	ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS	Metro lineal	2076,70	4%	$ 7.336,35	$ 15.844.807,00
3.02	1.09.01	IMPRIMACION CON SIKADUR 32 O SIMILAR	Metro Cuadrado	159,82	4%	$ 82.245,15	$ 13.670.197,00
						COSTO DIRECTO GRUPO	**$ 29.515.004,00**
4		**INSTALACIONES ELÉCTRCIAS Y DE ILUMINACIÓN**					
4.01	7.01.172	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 24 W	Unidad	61,00	4%	$ 32.787,60	$ 2.080.045,00
4.02	7.01.181	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TIPO TORTUGA	Unidad	20,00	4%	$ 42.190,04	$ 877.553,00
4.03	7.01.178	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL CUADRADO DE INCRUSTAR DE 60X60 CM, 40-60W	Unidad	40,00	4%	$ 171.103,48	$ 7.117.905,00
						COSTO DIRECTO GRUPO	**$ 10.075.503,00**
5		**CARPINTERIA METALICA**					
5.01	1.15.18	BARRA DE SEGURIDAD PARA MOVILIDAD REDUCIDA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 D = 1 1/2" (distancia mayor a 1 ml)	Metro Lineal	48,00	4%	$ 215.795,22	$ 10.772.497,00
						COSTO DIRECTO GRUPO	**$ 10.772.497,00**
6		**VIDRIOS Y CERRADURAS**					
6.01	1.17.01	CERRADURA ALCOBA	Unidad	33,00	4%	$ 56.833,14	$ 1.950.513,00
						COSTO DIRECTO GRUPO	**$ 1.950.513,00**
7		**PUENTES**					
7.01	3.10.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS EN TUBERÍA METÁLICA AGUA NEGRA D=2", C. 0.80, SOLDADO, SEGUN DISEÑO, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.	Metro Lineal	3,30	4%	$ 458.134,72	$ 1.572.318,00
						COSTO DIRECTO GRUPO	**$ 1.572.318,00**
8		**OBRAS EXTERIORES**					
8.01	1.18.03	ASEO GENERAL ENTREGA	Metro Cuadrado	700,00		$ 7.137,60	$ 4.996.320,00
						COSTO DIRECTO GRUPO	**$ 4.996.320,00**
9		**CUBIERTAS**					
9.01	1.12.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA THERMOACUSTICA ONDULADA EN POLIPROPILENO No. 10	Metro Cuadrado	374,00	4%	$ 77.878,55	$ 30.291.642,00
9.02	1.12.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	Kilogramo	2496,80	4%	$ 17.135,03	$ 44.494.041,00
9.03	1.12.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LAMINA	Metro Lineal	70,00	4%	$ 48.067,38	$ 3.499.305,00
9.04	1.12.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA LAMINA POLICARBONATO Cal. 6 mm	Metro Cuadrado	337,10	4%	$ 139.373,49	$ 48.862.116,00
						COSTO DIRECTO GRUPO	**$ 127.147.104,00**

10		**OTROS**					
10.01		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA CUBIERTA THERMOACUSTICA ONDULADA EN POLIPROPILENO	Metro Lineal	18,00		$ 61.232,00	$ 1.102.176,00
10.02		MANTENIMIENTO DE CANALES Y BAJANTES INCLUYE ANDAMIOS	Metro Lineal	64,90		$ 11.331,68	$ 735.426,00
10.03		PISO PORCELANATO TRAFICO PESADO ANTIDESLIZANTE 50x50	Metro Cuadrado	198,00		$ 124.636,89	$ 24.678.104,00
10.04		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA Y RINCONERA PVC MEDIACAÑA	Metro Lineal	471,15		$ 31.934,61	$ 15.045.992,00
10.05		CIELO RASO EN LAMINA PVC DE 9mm O SUPERIOR	Metro Cuadrado	435,47		$ 80.559,45	$ 35.080.821,00
10.06		PINTURA EPOXICA MUROS	Metro Cuadrado	1354,16		$ 33.645,23	$ 45.561.025,00
10.07		SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA Y MARCO EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 INCLUYE PINTURA COLOR BLANCO	Metro Cuadrado	74,34		$ 653.597,57	$ 48.588.443,00
						COSTO DIRECTO GRUPO	**$ 170.791.987,00**
11		**NO PREVISTOS**					
11.01	REF: 2.08.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO UPVC	Metro Cuadrado	0,00	4%	$ 99.381,28	$ 0,00
11.02	2.01.51	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00		$ 10.410,68	$ 0,00
11.03	2.01.46	DESMONTE DE CIELO FALSO (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.	Metro Cuadrado	0,00		$ 9.430,39	$ 0,00
11.04	2.15.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO (TABLERO LLENO)	Metro Cuadrado	0,00	4%	$ 512.285,73	$ 0,00
11.05	2.15.13	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO. (INCLUYE VIDRIO DE 5 MM. Y HERRAJES).	Metro Cuadrado	0,00	4%	$ 389.100,82	$ 0,00
11.06	2.07.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS	Metro Cuadrado	0,00	4%	$ 19.824,16	$ 0,00
11.07	2.05.25	PLACA BASE EN CONCRETO E = 8.0 CM. 17.5 MPa (2500 PSI)	Metro Cuadrado	0,00	4%	$ 74.483,78	$ 0,00
11.08	2.07.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA BAJO PLACA A DOS MANOS	Metro Cuadrado	0,00	4%	$ 23.511,33	$ 0,00
11.09	COMB: 2.18.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZANTE PARA CANALES TIPO CORONA O SIMILAR TRES MANOS	Metro Cuadrado	0,00	4%	$ 55.402,94	$ 0,00
11.10	2.17.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10.00 MM. (INCLUYE HERRAJES Y CERRADURA).	Metro Cuadrado	0,00	4%	$ 574.147,32	$ 0,00
11.11	COMB: 2.08.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE UPVC	Metro Lineal	0,00	4%	$ 84.071,47	$ 0,00
11.12	3.13.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	Kilogramo	0,00	4%	$ 7.423,82	$ 0,00
11.13	2.05.28	PULIDO Y DESTRONCADO DE PISOS EN BALDOSÍN DE GRANITO	Metro Cuadrado	0,00		$ 62.012,59	$ 0,00
11.14	2.01.14	DEMOLICIÓN DE ANDÉN O PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E < = A 12CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00		$ 34.674,09	$ 0,00
11.15	3.03.15	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	Metro Cubico	0,00	4%	$ 119.997,54	$ 0,00
11.16	1.03.01	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	ML	0,00	4%	$ 12.797,41	$ 0,00
11.17	REF: 2.04.09 - 2.19.02	MESON EN CONCRETO CON ACABADO EN GRANITO PULIDO	Metro Cuadrado	0,00	4%	$ 510.156,27	$ 0,00
						COSTO DIRECTO GRUPO	**$ 0,00**
							$ 371.788.853,00
				25%			**$ 92.947.213,25**
				2%			**$ 7.435.777,06**
				3%			**$ 11.153.665,59**
				19%			**0**
							$ 483.325.508,90

4.1. OBRAS ACTUALIZADAS

Durante el periodo no se presentaron modificaciones al contrato, se continua la ejecución sobre el modificatorio n 1 realizado el día 5 de Mayo, cabe resaltar que este modificatorio no constituye adiciones al contrato ya que se realizo un balance manteniendo el valor inicial del contrato. Sin embargo se están estudiando algunos cambios solicitados por la gerencia de la ese y viabilizados por la interventoría con el fin de mejorar el alcance del proyecto y poder realizar las actividades plasmadas dentro del proyecto siempre manteniendo el cierre financiero del proyecto.

CONDICIONES ORIGINALES				MAYORES Y MENORES CANTIDAES			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	**ITEM GOBER**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**"+/-**	**CANT**	**VR TOTAL**	**CANT**	**VR TOTAL**
1		**PRELIMINARES**						
1.01	1.01.24	DEMOLICIÓN ENCHAPE CERAMICO	Metro Cuadrado	+	82,16	$ 784.435,00	131,54	$ 1.255.898,00
1.02	1.01.63	DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS	Metro Cuadrado	-	-4,76	-$ 64.870,00	67,48	$ 919.631,00
1.03	1.01.47	DESMONTE ADOQUIN PREFABRICADO	Metro Cuadrado	-	-0,39	-$ 1.849,00	194,81	$ 923.678,00
		COSTO DIRECTO GRUPO				**$ 717.716,00**		**$ 3.099.207,00**
2		**PISOS Y ENCHAPES**						
2.01	1.11.44	PISO CERÁMICA 51*51 CM	Metro Cuadrado	+	145,43	$ 14.315.860,00	194,81	$ 19.176.735,00
2.02	1.11.04	ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5	Metro Cuadrado	-	-46,67	-$ 1.457.343,00	200,71	$ 6.267.898,00
		COSTO DIRECTO GRUPO				**$ 12.858.517,00**		**$ 25.444.633,00**
3		**PINTURA**						
3.01	1.09.04	ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS	Metro lineal	+	474,98	$ 3.624.011,00	2551,68	$ 19.468.818,00
3.02	1.09.01	IMPRIMACION CON SIKADUR 32 O SIMILAR	Metro Cuadrado	-	-159,82	-$ 13.670.197,00	0,00	$ 0,00
		COSTO DIRECTO GRUPO				**-$ 10.046.186,00**		**$ 19.468.818,00**
4		**INSTALACIONES ELÉCTRCIAS Y DE ILUMINACIÓN**						
4.01	7.01.172	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 24 W	Unidad	-	-6,00	-$ 204.594,00	55,00	$ 1.875.451,00
4.02	7.01.181	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TIPO TORTUGA	Unidad	-	-4,00	-$ 175.511,00	16,00	$ 702.042,00
4.03	7.01.178	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL CUADRADO DE INCRUSTAR DE 60X60 CM, 40-60W	Unidad	=	0,00	$ 0,00	40,00	$ 7.117.905,00
		COSTO DIRECTO GRUPO				**-$ 380.105,00**		**$ 9.695.398,00**
5		**CARPINTERIA METALICA**						
5.01	1.15.18	BARRA DE SEGURIDAD PARA MOVILIDAD REDUCIDA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 D = 1 1/2" (distancia mayor a 1 ml)	Metro Lineal	=	0,00	$ 0,00	48,00	$ 10.772.497,00
		COSTO DIRECTO GRUPO				**$ 0,00**		**$ 10.772.497,00**
6		**VIDRIOS Y CERRADURAS**						
6.01	1.17.01	CERRADURA ALCOBA	Unidad	+	1,00	$ 59.107,00	34,00	$ 2.009.620,00
		COSTO DIRECTO GRUPO				**$ 59.107,00**		**$ 2.009.620,00**
7		**PUENTES**						
7.01	3.10.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS EN TUBERÍA METÁLICA AGUA NEGRA D=2", C. 0.80, SOLDADO, SEGUN DISEÑO, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.	Metro Lineal	=	0,00	$ 0,00	3,30	$ 1.572.318,00
		COSTO DIRECTO GRUPO				**$ 0,00**		**$ 1.572.318,00**
8		**OBRAS EXTERIORES**						
8.01	1.18.03	ASEO GENERAL ENTREGA	Metro Cuadrado	+	358,93	$ 2.561.899,00	1058,93	$ 7.558.219,00
		COSTO DIRECTO GRUPO			0,00	$ 2.561.899,00		**$ 7.558.219,00**
9		**CUBIERTAS**						
9.01	1.12.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA THERMOACUSTICA ONDULADA EN POLIPROPILENO No. 10	Metro Cuadrado	-	-374,00	-$ 30.291.642,00	0,00	$ 0,00
9.02	1.12.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	Kilogramo	-	-1379,02	-$ 24.574.719,00	1117,78	$ 19.919.322,00
9.03	1.12.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LAMINA	Metro Lineal	=	0,00	$ 0,00	70,00	$ 3.499.305,00
9.04	1.12.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA LAMINA POLICARBONATO Cal. 6 mm	Metro Cuadrado	-	-120,71	-$ 17.496.725,00	216,39	$ 31.365.391,00
		COSTO DIRECTO GRUPO				**-$ 72.363.086,00**		**$ 54.784.018,00**

10		**OTROS**						
10.01		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA CUBIERTA THERMOACUSTICA ONDULADA EN POLIPROPILENO	Metro Lineal	-	-18,00	-$ 1.102.176,00	0,00	$ 0,00
10.02		MANTENIMIENTO DE CANALES Y BAJANTES INCLUYE ANDAMIOS	Metro Lineal	-	-1,34	-$ 15.184,00	63,56	$ 720.242,00
10.03		PISO PORCELANATO TRAFICO PESADO ANTIDESLIZANTE 50x50	Metro Cuadrado	-	-129,54	-$ 16.145.463,00	68,46	$ 8.532.641,00
10.04		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA Y RINCONERA PVC MEDIACAÑA	Metro Lineal	-	-471,15	-$ 15.045.992,00	0,00	$ 0,00
10.05		CIELO RASO EN LAMINA PVC DE 9mm O SUPERIOR	Metro Cuadrado	-	0,00	$ 0,00	435,47	$ 35.080.821,00
10.06		PINTURA EPOXICA MUROS	Metro Cuadrado	+	42,22	$ 1.420.501,00	1396,38	$ 46.981.526,00
10.07		SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA Y MARCO EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 INCLUYE PINTURA COLOR BLANCO	Metro Cuadrado	-	-68,64	-$ 44.862.937,00	5,70	$ 3.725.506,00
		COSTO DIRECTO GRUPO				**-$ 75.751.251,00**		**$ 95.040.736,00**
11		**NO PREVISTOS**						
11.01	REF: 2.08.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO UPVC	Metro Cuadrado	+	463,28	$ 47.883.014,00	463,28	$ 47.883.014,00
11.02	2.01.51	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	+	623,27	$ 6.488.665,00	623,27	$ 6.488.665,00
11.03	2.01.46	DESMONTE DE CIELO FALSO (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.	Metro Cuadrado	+	435,47	$ 4.106.605,00	435,47	$ 4.106.605,00
11.04	2.15.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO (TABLERO LLENO)	Metro Cuadrado	+	53,04	$ 28.258.501,00	53,04	$ 28.258.501,00
11.05	2.15.13	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO. (INCLUYE VIDRIO DE 5 MM. Y HERRAJES).	Metro Cuadrado	+	4,02	$ 1.626.753,00	4,02	$ 1.626.753,00
11.06	2.07.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS	Metro Cuadrado	+	703,94	$ 14.513.220,00	703,94	$ 14.513.220,00
11.07	2.05.25	PLACA BASE EN CONCRETO E = 8.0 CM. 17.5 MPa (2500 PSI)	Metro Cuadrado	+	103,41	$ 8.010.462,00	103,41	$ 8.010.462,00
11.08	2.07.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA BAJO PLACA A DOS MANOS	Metro Cuadrado	+	365,35	$ 8.933.459,00	365,35	$ 8.933.459,00
11.09	COMB: 2.18.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZANTE PARA CANALES TIPO CORONA O SIMILAR TRES MANOS	Metro Cuadrado	+	63,56	$ 3.662.267,00	63,56	$ 3.662.267,00
11.10	2.17.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10.00 MM. (INCLUYE HERRAJES Y CERRADURA).	Metro Cuadrado	+	3,76	$ 2.245.146,00	3,76	$ 2.245.146,00
11.11	COMB: 2.08.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE UPVC	Metro Lineal	+	18,00	$ 1.573.818,00	18,00	$ 1.573.818,00
11.12	3.13.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	Kilogramo	+	132,06	$ 1.019.584,00	132,06	$ 1.019.584,00
11.13	2.05.28	PULIDO Y DESTRONCADO DE PISOS EN BALDOSÍN DE GRANITO	Metro Cuadrado	+	87,83	$ 5.446.287,00	87,83	$ 5.446.287,00
11.14	2.01.14	DEMOLICIÓN DE ANDÉN O PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E < = A 12CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	+	103,41	$ 3.585.648,00	103,41	$ 3.585.648,00
11.15	3.03.15	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	Metro Cubico	+	7,24	$ 903.533,00	7,24	$ 903.533,00
11.16	1.03.01	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	ML	+	176,68	$ 2.351.488,00	176,68	$ 2.351.488,00
11.17	REF: 2.04.09 - 2.19.02	MESON EN CONCRETO CON ACABADO EN GRANITO PULIDO	Metro Cuadrado	+	3,27	$ 1.734.939,00	3,27	$ 1.734.939,00
		COSTO DIRECTO GRUPO				**$ 142.343.389,00**		**$ 142.343.389,00**
								$ 371.788.853,00
								$ 92.947.213,25
								$ 7.435.777,06
								$ 11.153.665,59
								$ 483.325.508,90

5. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

5.1. MODIFICACIONES EN EL TIEMPO – PRÓRROGAS Y/O SUSPENSIONES

Tabla 6. Cuadro de Información Modificaciones– Mes 3 de ejecución.

SUSPENSIÓN/ PRÓRROGA	MOTIVO	FECHA DE SUSPENSIÓN / PRÓRROGA	PERIODO DE SUSPENSIÓN / PRÓRROGA	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
NA	NA	NA	NA	

NOTA : No ha presentado

5.2. RELACIÓN DE PAGOS

Tabla 7. Cuadro de relación de pagos– Mes 3 de ejecución.

ACTAS PRESENTADAS Y PAGADAS	VALOR
ACTA PARCIAL N 1	**$ 241.662.754, 45**

5.3. MODIFICATORIOS EN VALOR REALIZADOS AL CONTRATO

Tabla 8. Cuadro de Información modificatorios – Mes 3 de ejecución.

CONTRATO ADICIONAL	CLÁUSULA ACLARADA Y/O MODIFICADA
NA	NA

NOTA : No ha presentado

5.4. GARANTÍAS Y VIGENCIAS

5.4.1. Contrato de obra e interventoría.

Tabla 9. Cuadro de información de Garantías del Contrato de Interventoría

Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal expedida por COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A No. **CB-100002887** ANEXO – 0

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	SUMA ASEGURADA ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/05/2026	4/02/2027	$5.384.600,00	$5.237.190,00
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	04/05/2026	4/08/2029	$5.384.600,00	$5.237.190,00
CALIDAD DEL SERVICIO	04/05/2026	4/08/2031		$5.237.190,00

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 10. Cuadro de información de Garantías del Contrato de Obra

Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal de Aseguradora Solidaria de Colombia No. 980 47 994000032433 ANEXO – 0

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/05/2026	04/02/2027	$ 96,665,101.60
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	04/05/2026	04/08/2029	$ 96,665,101.60
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	04/05/2026	DOS (2) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTEDE LA ENTIDAD CONTRATANTE	$ 96,665,101.60
CALIDAD DEL SERVICIO	04/05/2026	04/05/2028	$ 96,665,101.60

Fuente: Elaboración Propia

Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual Aseguradora Solidaria de Colombia Expedida el 7/05/2026. No. 980-74 99400001230 8

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	04/05/2026	04/08/2026	$350,181,000

Fuente: Elaboración Propia

5.5. SUPERVISORES E INTERVENTORES DELEGADOS AL CONTRATO

Tabla 11. Cuadro de Información dependencias de control del contrato– Mes 3 De Construcción.

INTERVENTOR/SUPERVISOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
QUINAC SOLUCIONEES DE INGENIERIA SAS / Interventoría	04 de Mayo de 2026	04 de Agosto de 2026
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA / DIANA JULIETH PEÑA PULIDO Supervisión	04 de Mayo de 2026	04 de Agosto de 2026

5.6. VERIFICACIÓN DE PERSONAL, EQUIPOS Y MATERIALES EN OBRA.

Se realiza un seguimiento del personal, equipos, materiales en obra, a la fecha del presente informe.

Tabla 12. Reporte de personal en obra.

NOMBRE	CARGO	SEGURIDAD SOCIAL	EPP	REVISIÓN INTERVENTORIA
KAREN DAYHIANA ESPITIA SUAREZ	DIRECTOR DE OBRA	AFILIADO	CASCO, BOTAS,	CUMPLE
OSCAR RAUL SARMIENTO DAZA	RESIDENTE DE OBRA	AFILIADO	CASCO, BOTAS,	CUMPLE
JHONAL DEAVIES MORENO SUAREZ	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	AFILIADO	CASCO, BOTAS,	CUMPLE
JOSE ESPINEL QUINTANA	MAESTRO DE OBRA	AFILIADO	CASCO, BOTAS,	CUMPLE
HILDEBRANDO PERAZA ORTIZ	MAESTRO DE OBRA	AFILIADO	CASCO, BOTAS,	CUMPLE
KEVIN SEBASTIAN PERAZA SALINAS	AYUDANTE	AFILIADO	CASCO, BOTAS,	CUMPLE
MAIKOL STIVEN PERAZA SALINAS	AYUDANTE	AFILIADO	CASCO, BOTAS,	CUMPLE

Tabla 13. Reporte de personal de interventoría.

NOMBRE	CARGO	EPP	REVISIÓN INTERVENTORIA
NANCY YASMIN QUIROGA CASTRO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CASCO, BOTAS	CUMPLE
CARMEN YANET ALCANTAR	ASESOR CONDICIONES DE HABILITACION	VISITA DE OBRA	CUMPLE

Tabla 14. Reporte de equipos y materiales en obra.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ALMACENAMIENTO/ USO	OBSERVACIONES	REVISIÓN INTERVENTOR
ANDAMIOS TUBULARES	4	BODEGA EN OBRA	ESTRUCTURA TEMPORAL MÓVIL, QUE SIRVE DE APOYO EN LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES TRABAJOS, ESPECIALMENTE EN TRABAJOS DE ALTURAS	SI
TEJA	30	EN EXTERIOR	EN OBRA D EACUERDO A AVAANCE DE EJECUCION	SI
CEMENTO HOLCIM TIPO UG (50,0Kg)	50	BODEGA EN OBRA	PROCURAR ALMACENAR, EN SITIOS LIBRES DE HUMEDAD.	SI
RECEBO	7	EN OBRA	PROCURAR APILAR Y PROTEGER CON PLÁSTICO, SEÑALIZAR ÁREA DE ACOPIO.	SI
AGREGADOS (ARENA, GRAVA)	SEGÚN PEDIDO	EN OBRA	PROCURAR APILAR Y PROTEGER CON PLÁSTICO, SEÑALIZAR ÁREA DE ACOPIO.	SI
PINTURA EPOXICA (GALON)	10	BODEGA EN OBRA	SE DEBE TENER TODA LAS PRECAUCIONES DE ALMACENAMIENTO Y MANIPULACION POR SU GRADO DE TOXICIDAD QUE PUEDE PRENTAR	SI
PINTURA CORAZA CUNETE)	10	BODEGA EN OBRA	ALMACENAMIENTO EN LUGAR FRESCO Y AISLADO DE CUALQUIER TROPIEZO POR POSIBLES DERRAMES	SI
PERFILERIA METALICA	50	BODEGA Y OBRA	ALMACENAR CUBIERTOS PARA EVITAR CORROSION	SI
POLICABORNATO	20	EN OBRA	SE ESCUENTRA EN INSTALACION LA CUBIERTA EN POLICARBONATO	SI
DRYWALL	5	EN OBRA	SE ENCUENTRA EN REMPLAZO LAS LAMINAS DETERIORADAS	SI

5.7. REPORTE DE VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA OBJETO DE LA INTERVENTORÍA

El contratista de obra cumple con la afiliación a seguridad social (EPS, Pensión y ARL) del personal de obra que laboró el mes de julio de 2026

5.8. BALANCE GENERAL FINANCIERO DEL CONTRATO PROGRAMADO VS EJECUTADO

El contrato se encuentra en etapa inicial de cada una de las actividades.

Sin embargo, toda vez que la interventoría realiza seguimiento a los avances programados vs. Ejecutados, para el TERCER (3) mes de desarrollo de la etapa de construcción del Contrato de Obra Pública No. COP-20260504-001podemos tener el siguiente balance general teórico teniendo en cuenta los avances ejecutados y programados en el periodo del presente informe QUE ES EL MISMO EL ACTA PARCIAL 1.

Tabla 15. Cuadro de avance general del proyecto – Mes 3 de ejecución.

CONDICIONES ORIGINALES						EJECUTADO ACTA PARCIAL 1	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANT**	**DIST.**	**VR UNITARIO**	**CANT**	**VR TOTAL**
1	**PRELIMINARES**						
1.01	DEMOLICIÓN ENCHAPE CERAMICO	Metro Cuadrado	49,38		$ 9.547,65	131,54	$ 1.255.898,00
1.02	DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS	Metro Cuadrado	72,24		$ 13.628,20	67,48	$ 919.631,00
1.03	DESMONTE ADOQUIN PREFABRICADO	Metro Cuadrado	195,20		$ 4.741,43	194,81	$ 923.678,00
					COSTO DIRECTO GRUPO		**$ 3.099.207,00**
2	**PISOS Y ENCHAPES**						
2.01	PISO CERÁMICA 51*51 CM	Metro Cuadrado	49,38	4%	$ 94.652,06	156,47	$ 15.402.616,00
2.02	ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5	Metro Cuadrado	247,38	4%	$ 30.027,15	109,95	$ 3.433.545,00
					COSTO DIRECTO GRUPO		**$ 18.836.161,00**
3	**PINTURA**						
3.01	ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS	Metro lineal	2076,70	4%	$ 7.336,35	2073,15	$ 15.817.728,00
3.02	IMPRIMACION CON SIKADUR 32 O SIMILAR	Metro Cuadrado	159,82	4%	$ 82.245,15	0,00	$ 0,00
					COSTO DIRECTO GRUPO		**$ 15.817.728,00**
4	**INSTALACIONES ELÉCTRCIAS Y DE ILUMINACIÓN**						
4.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 24 W	Unidad	61,00	4%	$ 32.787,60	42,00	$ 1.432.162,00
4.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TIPO TORTUGA	Unidad	20,00	4%	$ 42.190,04	0,00	$ 0,00
4.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL CUADRADO DE INCRUSTAR DE 60X60 CM, 40-60W	Unidad	40,00	4%	$ 171.103,48	34,00	$ 6.050.219,00
					COSTO DIRECTO GRUPO		**$ 7.482.381,00**
5	**CARPINTERIA METALICA**						
5.01	BARRA DE SEGURIDAD PARA MOVILIDAD REDUCIDA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 D = 1 1/2" (distancia mayor a 1 ml)	Metro Lineal	48,00	4%	$ 215.795,22	0,00	$ 0,00
					COSTO DIRECTO GRUPO		**$ 0,00**
6	**VIDRIOS Y CERRADURAS**						
6.01	CERRADURA ALCOBA	Unidad	33,00	4%	$ 56.833,14	0,00	$ 0,00

					COSTO DIRECTO GRUPO		**$ 0,00**
7	**PUENTES**						
7.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS EN TUBERÍA METÁLICA AGUA NEGRA D=2", C. 0.80, SOLDADO, SEGUN DISEÑO, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.	Metro Lineal	3,30	4%	$ 458.134,72	0,00	$ 0,00
					COSTO DIRECTO GRUPO		**$ 0,00**
8	**OBRAS EXTERIORES**						
8.01	ASEO GENERAL ENTREGA	Metro Cuadrado	700,00		$ 7.137,60	0,00	$ 0,00
					COSTO DIRECTO GRUPO		**$ 0,00**
9	**CUBIERTAS**						
9.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA THERMOACUSTICA ONDULADA EN POLIPROPILENO No. 10	Metro Cuadrado	374,00	4%	$ 77.878,55	0,00	$ 0,00
9.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	Kilogramo	2496,80	4%	$ 17.135,03	1029,85	$ 18.352.371,00
9.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LAMINA	Metro Lineal	70,00	4%	$ 48.067,38	70,00	$ 3.499.305,00
9.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA LAMINA POLICARBONATO Cal. 6 mm	Metro Cuadrado	337,10	4%	$ 139.373,49	178,91	$ 25.932.144,00
					COSTO DIRECTO GRUPO		**$ 47.783.820,00**
10	**OTROS**						
10.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA CUBIERTA THERMOACUSTICA ONDULADA EN POLIPROPILENO	Metro Lineal	18,00		$ 61.232,00	0,00	$ 0,00
10.02	MANTENIMIENTO DE CANALES Y BAJANTES INCLUYE ANDAMIOS	Metro Lineal	64,90		$ 11.331,68	63,56	$ 720.242,00
10.03	PISO PORCELANATO TRAFICO PESADO ANTIDESLIZANTE 50x50	Metro Cuadrado	198,00		$ 124.636,89	21,26	$ 2.649.780,00
10.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA Y RINCONERA PVC MEDIACAÑA	Metro Lineal	471,15		$ 31.934,61	0,00	$ 0,00
10.05	CIELO RASO EN LAMINA PVC DE 9mm O SUPERIOR	Metro Cuadrado	435,47		$ 80.559,45	0,00	$ 0,00
10.06	PINTURA EPOXICA MUROS	Metro Cuadrado	1354,16		$ 33.645,23	252,19	$ 8.484.991,00
10.07	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA Y MARCO EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 INCLUYE PINTURA COLOR BLANCO	Metro Cuadrado	74,34		$ 653.597,57	0,00	$ 0,00
					COSTO DIRECTO GRUPO		**$ 11.855.013,00**
11	**NO PREVISTOS**						

11.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO UPVC	Metro Cuadrado	0,00	4%	$ 99.381,28	450,51	$ 46.563.151,00
11.02	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00		$ 10.410,68	619,39	$ 6.448.271,00
11.03	DESMONTE DE CIELO FALSO (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.	Metro Cuadrado	0,00		$ 9.430,39	10,88	$ 102.603,00
11.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO (TABLERO LLENO)	Metro Cuadrado	0,00	4%	$ 512.285,73	0,00	$ 0,00
11.05	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO. (INCLUYE VIDRIO DE 5 MM. Y HERRAJES).	Metro Cuadrado	0,00	4%	$ 389.100,82	0,00	$ 0,00
11.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS	Metro Cuadrado	0,00	4%	$ 19.824,16	616,46	$ 12.709.634,00
11.07	PLACA BASE EN CONCRETO E = 8.0 CM. 17.5 MPa (2500 PSI)	Metro Cuadrado	0,00	4%	$ 74.483,78	66,73	$ 5.169.115,00
11.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA BAJO PLACA A DOS MANOS	Metro Cuadrado	0,00	4%	$ 23.511,33	98,71	$ 2.413.636,00
11.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZANTE PARA CANALES TIPO CORONA O SIMILAR TRES MANOS	Metro Cuadrado	0,00	4%	$ 55.402,94	63,56	$ 3.662.267,00
11.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10.00 MM. (INCLUYE HERRAJES Y CERRADURA).	Metro Cuadrado	0,00	4%	$ 574.147,32	0,00	$ 0,00
11.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	Kilogramo	0,00	4%	$ 7.423,82	66,73	$ 515.211,00
11.13	PULIDO Y DESTRONCADO DE PISOS EN BALDOSÍN DE GRANITO	Metro Cuadrado	0,00		$ 62.012,59	0,00	$ 0,00
11.14	DEMOLICIÓN DE ANDÉN O PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E < = A 12CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00		$ 34.674,09	78,41	$ 2.718.795,00
11.15	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	Metro Cubico	0,00	4%	$ 119.997,54	7,24	$ 903.533,00
11.16	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	ML	0,00	4%	$ 12.797,41	157,18	$ 2.091.957,00
11.17	MESON EN CONCRETO CON ACABADO EN GRANITO PULIDO	Metro Cuadrado	0,00	4%	$ 510.156,27	0,00	$ 0,00
11,18	DEMOLICIÓN DE SARDINEL EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	4%	$ 7.613,13	0,00	$ 0,00

11,19	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO DE 20 X 35 CM. FUNDIDO EN CONCRETO DE 17.5 Mpa. (NO INCLUYE REFUERZO).	Metro lineal	0,00	4%	$ 84.448,93	0,00	$ 0,00
11,20	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	Kilogramo	0,00	4%	$ 7.675,05	0,00	$ 0,00
11,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL GUÍA (LÍNEAS) 40*40 CM	Metro Cuadrado	0,00	4%	$ 117.263,88	0,00	$ 0,00
11,22	CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa (3000 PSI)	Metro Cubico	0,00	4%	$ 556.652,91	0,00	$ 0,00
11,23	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO EN PARED	Metro Cuadrado	0,00	4%	$ 92.859,89	0,00	$ 0,00
11,24	DEMOLICIÓN DE MUROS EN DRYWALL E = 0.12 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00		$ 9.669,84	0,00	$ 0,00
11,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA	UND	0,00	4%	$ 20.703,02	0,00	$ 0,00
11,26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO TIPO GFCI	UND	0,00	4%	$ 65.492,02	0,00	$ 0,00
11,27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	UND	0,00	4%	$ 16.687,55	0,00	$ 0,00
11,28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE	UND	0,00	4%	$ 22.029,44	0,00	$ 0,00
11,29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIPLE	UND	0,00	4%	$ 23.255,04	0,00	$ 0,00
11,30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) FREETOX LHFR - LS Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	UND	0,00	4%	$ 119.298,57	0,00	$ 0,00
11,31	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR	Metro Cubico	0,00	4%	$ 887.643,35	0,00	$ 0,00
11,32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELÍCULA TIPO FROSTED PARA VENTANAS	Metro Cuadrado	0,00	4%	$ 18.076,47	0,00	$ 0,00
11,33	SELLADO DE JUNTAS Y ORIFICIOS EN VENTANAS	Metro lineal	0,00	4%	$ 12.882,47	0,00	$ 0,00
11,34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA DE DRYWALL DE 1/2"	Metro Cuadrado	0,00	4%	$ 75.892,92	0,00	$ 0,00
11,35	CONSTRUCCION DE JARDINES	Metro Cuadrado	0,00	4%	$ 71.787,55	0,00	$ 0,00
11,36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE ACCESO EN ACERO INOXIDABLE ABATIBLE HASTA 180*, INCLUYE VISORES EN VIDRIO LAMINADO Y BISAGRAS TIPO SPEEDY	Unidad	0,00		$ 6.572.000,00	0,00	$ 0,00

11,37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN GRANITO. H = 7.0 - 8.0 CM.	Metro lineal	0,00	4%	$ 63.148,36	0,00	$ 0,00

5.8.1. BALANCE GENERAL FINANCIERO DEL ACUMULADO DEL MES

Se muestra un resumen del porcentaje ejecutado para cada semana, a lo largo de los periodos de ejecución y valor correspondiente acumulado por semana.

Tabla 16. Cuadro de Avance General del Proyecto – Mes 3 de ejecución.

	AVANCE GENERAL DEL PROYECTO			
	Ejecutado	Programado	Valor Ejecutado	Valor Programado
Semana 1	2,13%	4,14%	$ 10.302.257	$ 19.994.786
Semana 2	6,36%	8,27%	$ 30.742.835	$ 39.989.573
Semana 3	10,98%	12,41%	$ 53.063.255	$ 59.984.359
Semana 4	16,31%	16,55%	$ 78.808.041	$ 79.979.146
Semana 5	21,55%	22,85%	$ 104.168.284	$ 110.460.918
Semana 6	25,52%	29,16%	$ 123.356.348	$ 140.942.690
Semana 7	29,56%	35,47%	$ 142.889.182	$ 171.424.462
Semana 8	33,44%	41,77%	$ 161.630.698	$ 201.906.234
Semana 9	37,13%	55,98%	$ 179.473.225	$ 270.586.512
Semana 10	42,70%	70,19%	$ 206.401.522	$ 339.266.790
Semana 11	47,28%	84,40%	$ 228.518.861	$ 407.947.067
Semana 12	50,82%	98,61%	$ 245.606.246	$ 476.627.345

5.8.2. ADELANTO Y/0 ATRASO DE LA OBRA

En los siguientes Cuadros se muestra en porcentaje el avance del proyecto con respecto al cronograma establecido con su respectivo porcentaje de atraso o adelanto para el presente periodo:


Tabla 17. Cuadro de Avance General del Proyecto con Atraso/Adelanto– Mes3 de ejecución.


	AVANCE GENERAL DEL PROYECTO		
	Ejecutado	Programado	(-) Atraso (+) Adelanto
MES 1	16,31%	16,55%	-0,24%
MES 2	33,44%	41,77%	-8,33%
MES 3	50,82%	98,61%	-47,80%

5.8.3. SEGUIMIENTO GENERAL FINANCIERO

Se realiza un análisis financiero, según el cronograma de obra, de los valores programados para las cantidades de cada actividad previamente presupuestadas, para cada semana a lo largo del plazo de ejecución de obra, en relación con el valor ejecutado de las actividades hasta la fecha del presente informe:

1-2 Grafica Seguimiento financiero – Mes 3 ejecución.

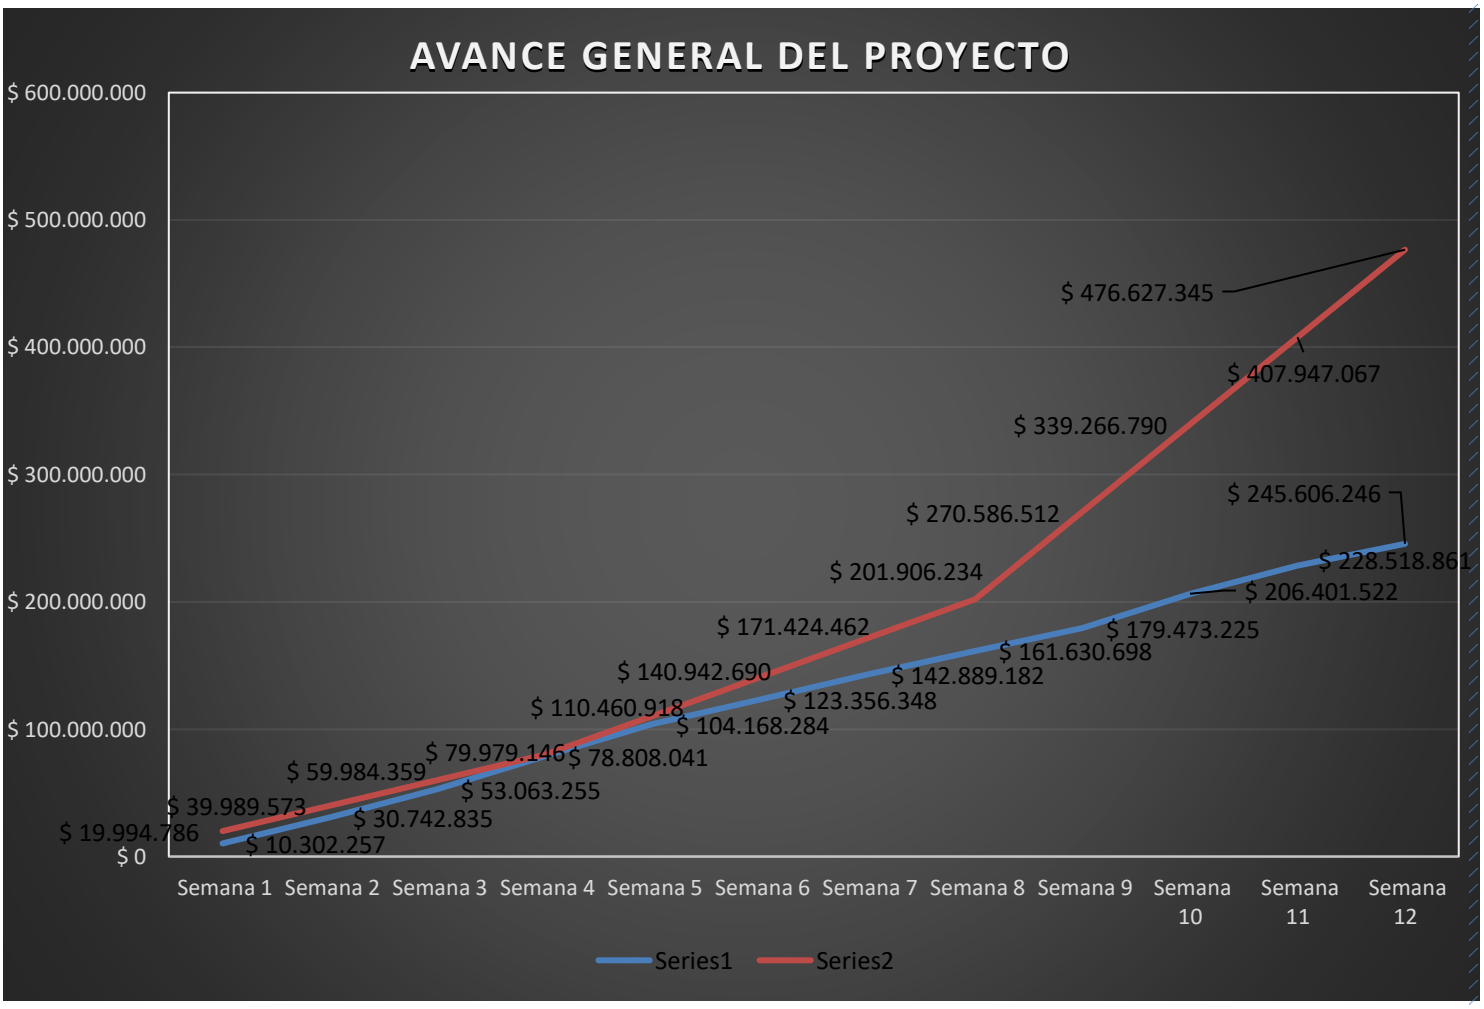

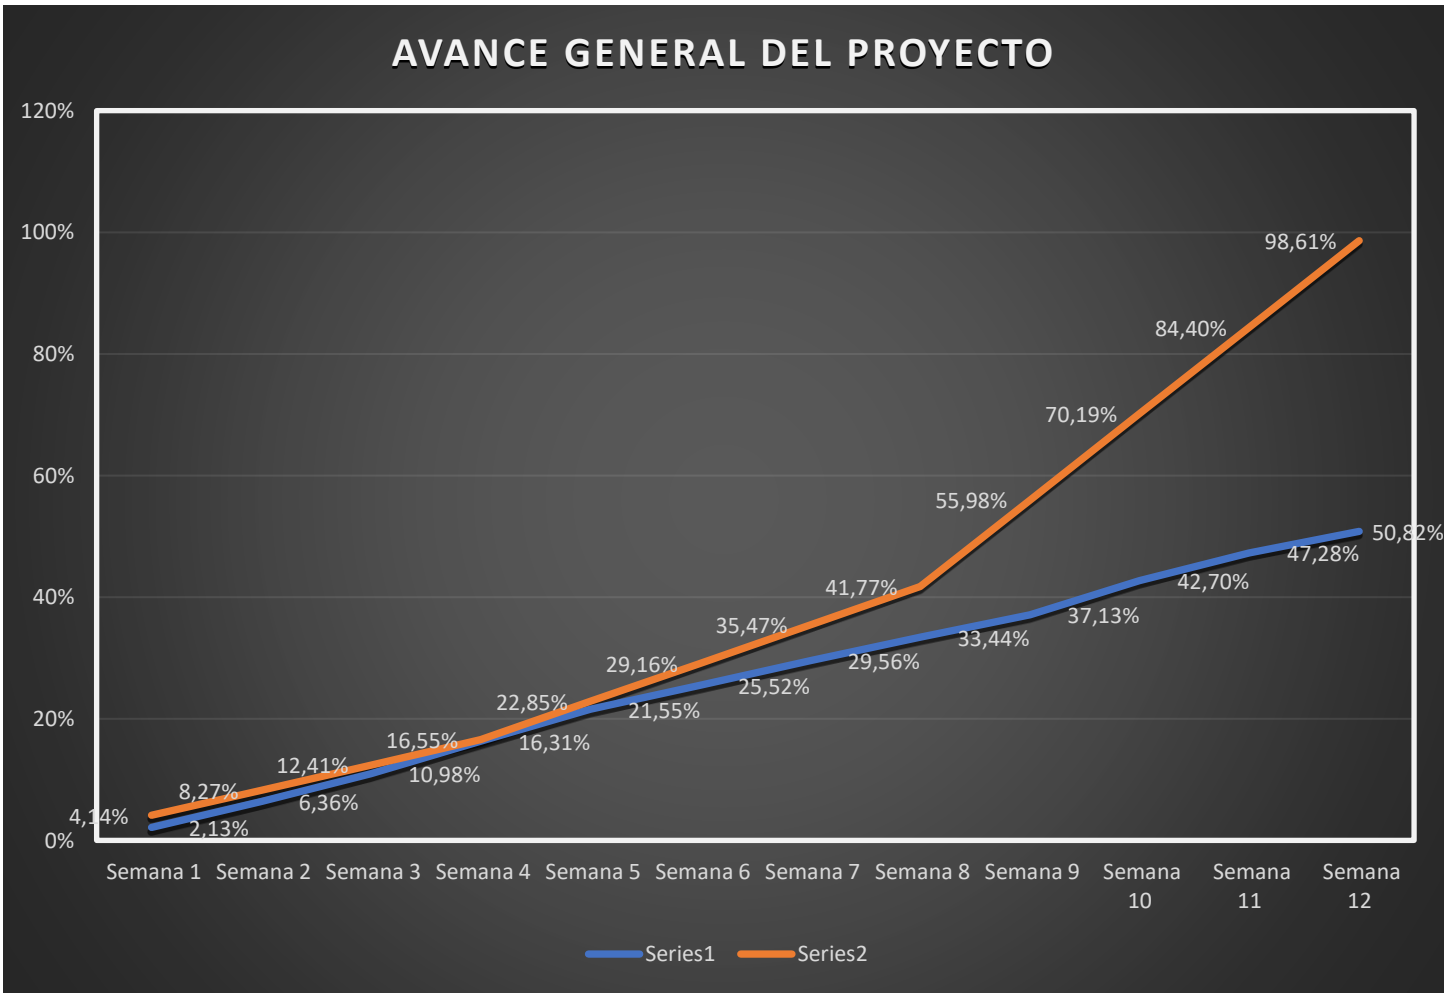

6 INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO, ASPECTOS SISO, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MANEJO AMBIENTAL

6.1.1 Actividades componente ambiental

Actividades ejecutadas por el contratista durante el periodo del presente informe, junto con la supervisión, verificación y acompañamiento por parte de interventoría.

Por tanto, el contratista realizó las siguientes actividades, para dar manejo ambiental en la obra:

- Solicitud de formatos vigentes de los materiales ingresados a obra, control de especificaciones técnicas.
- Capacitación de los tipos de EPP y su uso correcto.
- Manejo adecuado del almacenamiento de materiales y equipos en la obra.
- Se desarrollaron Capacitaciones a los trabajadores.

6.1.2 Actividades de componente SG-SST (Anexo)

A continuación, se lista las actividades del contratista con supervisión por parte de la interventoría y actividades propias de la interventoría en el periodo del presente informe:

- Se realizo verificación de afiliaciones y pago al sistema de seguridad social del personal.
- Revisión de pagos de salarios y honorarios de los subcontratistas.
- En el presente mes se presenta por parte del contratista personas en obra.
- No se presentaron accidentes de trabajo por parte de interventoría ni del contratista.

7 INFORMES TÉCNICOS DESARROLLADOS Y/O APROBADOS EN EL PERIODO.

7.1.1 BITÁCORA DE OBRA

Las copias correspondientes a los registros de actividades durante el periodo del presente informe del libro de obra se adjuntan en el (anexo).

7.1.2 RELACIÓN DE CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES

En el periodo del presente informe, bajo la supervisión, control y seguimiento de la Interventoría se observan muestras de los materiales utilizados en obra con el fin de verificar y comparar con los informes de calidad de materiales.

7.1.3 CONTROL TÉCNICO DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN

Durante este periodo, se realiza la recopilación de datos en obra, de las distintas actividades constructivas contempladas contractualmente, para el desarrollo y correcta ejecución del proyecto, **"ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA – BOYACÁ."** donde se verifica por parte de esta interventoría, su estado, procedimiento constructivo y el cumplimiento de las especificaciones técnicas en cuanto a calidad, dimensión y técnicas de construcción, teniendo en cuenta la referencia establecida. Se observa las principales características que se tienen en cuenta para realizar la inspección y verificación de las obras ejecutadas durante el presente periodo.

Relación de los componentes para la implementación del control técnico de actividades de construcción ejecutadas durante el mes.

Puntos de control

- Horizontalidad y pendiente (nivel).
- Calidad (tipo de material, marca, calibre).
- Seguridad industrial (señalización, elementos de protección).
- Retiro de materiales (señalización preventiva, cargue de material)

7.2 INFORME FOTOGRÁFICO DE OBRA-MES 3 EJECUCIÓN

A continuación, un resumen de las actividades realizadas durante el mes con soporte fotográfico del estado de las áreas de trabajo de la obra.

Mes 3 EJECUCIÓN

1.01 DEMOLICIÓN ENCHAPE CERÁMICO

Se ejecutaron actividades de demolición y retiro del enchape cerámico existente en las vigas canales, realizando el levantamiento controlado del material, retiro de residuos y limpieza del área intervenida. Los trabajos se desarrollaron garantizando la adecuada disposición del material resultante y dejando la superficie preparada para la ejecución de las actividades posteriores.







1.02 DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS

Se ejecutaron actividades de desmonte y retiro de marcos, puertas y ventanas existentes, realizando el desmontaje controlado de los elementos y sus accesorios de fijación. Los trabajos se desarrollaron evitando afectaciones a los elementos constructivos adyacentes,

con posterior retiro de residuos y limpieza del área intervenida, dejándola preparada para la ejecución de las actividades posteriores..



2.01. PISO CERÁMICA 51*51 CM

Se ejecutaron actividades de instalación de piso cerámico de 51 × 51 cm, previa verificación y preparación de la superficie de soporte, garantizando condiciones adecuadas de limpieza, nivelación y adherencia. Se realizó la colocación de las piezas mediante la aplicación de material adhesivo, controlando la alineación, modulación, nivelación y uniformidad de las juntas, así como la continuidad del acabado en las áreas intervenidas. La interventoría verificó la correcta instalación del material, la planeidad de la superficie, la distribución de las piezas, la uniformidad de las juntas y la calidad de los acabados, con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y las condiciones requeridas para su adecuado funcionamiento.





2.02. ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5.

Se ejecutó la construcción de alistado de piso con mortero en proporción 1:5 y espesor de cuatro (4) centímetros, previa verificación y limpieza de la superficie de soporte, garantizando condiciones adecuadas de humedad, limpieza y adherencia. La colocación del mortero se realizó de manera uniforme, controlando los niveles, las pendientes, el espesor y la planeidad de la superficie, y se efectuó el esparcido, la regleada y el acabado de la capa en las áreas intervenidas.
La interventoría verificó la correcta ejecución de la actividad, la dosificación del mortero, el espesor especificado, la nivelación y la planeidad de la superficie, así como la calidad del acabado, con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y las condiciones requeridas para recibir el acabado final.



4.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 24 W.

Se ejecutó el suministro e instalación de panel LED redondo de incrustar de 24 W, previa verificación de los puntos de instalación y de las condiciones de la conexión eléctrica. Se realizó la apertura del orificio en el cielo raso, la fijación del panel, la conexión de los conductores y la verificación del funcionamiento, controlando el correcto ajuste, la alineación y el acabado de la luminaria en las áreas intervenidas.
La interventoría verificó que los paneles suministrados correspondieran a las características y a la potencia especificadas, la correcta instalación y conexión de las luminarias, el adecuado funcionamiento y la calidad de los acabados, con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y las condiciones requeridas para su adecuado funcionamiento





4.03. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL CUADRADO DE INCRUSTAR DE 60X60 CM, 40-60W

Se ejecutó el suministro e instalación de panel LED cuadrado de incrustar de 60x60 cm, de 40 a 60 W, previa verificación de los puntos de instalación y de las condiciones de la conexión eléctrica. Se realizó la instalación del panel en el sistema de cielo raso, la fijación y el ajuste de la luminaria, la conexión de los conductores y la verificación del

funcionamiento, controlando la nivelación, la alineación y el acabado en las áreas intervenidas.

La interventoría verificó que los paneles suministrados correspondieran a las dimensiones y a la potencia especificadas, la correcta instalación y conexión de las luminarias, el adecuado funcionamiento y la calidad de los acabados, con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y las condiciones requeridas para su adecuado funcionamiento.



9.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO

Se ejecutó el suministro e instalación de perfilería metálica para la estructura de cubierta, con las dimensiones y calibres establecidos en el diseño, destinada a servir de soporte

para el policarbonato. Previamente se verificaron los ejes, los niveles, los puntos de apoyo y las condiciones de la superficie de soporte. Se realizó el corte, el armado, el montaje y la fijación de los perfiles, controlando la alineación, la nivelación, las pendientes, la separación entre elementos y la correcta ejecución de las uniones y de los apoyos en las áreas intervenidas.

La interventoría verificó que los perfiles suministrados correspondieran a las dimensiones y calibres especificados en el diseño, la correcta instalación y fijación de la estructura, la alineación, la nivelación y la estabilidad del conjunto, así como la idoneidad de la estructura para recibir el policarbonato, con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y su adecuado funcionamiento.



9.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA LAMINA POLICARBONATO Cal. 6 mm

Se ejecutó el suministro e instalación de cubierta en lámina de policarbonato de 6 mm de espesor, previa verificación del estado, la nivelación y la alineación de la estructura de soporte. Se realizó el corte, la colocación y la fijación de las láminas, controlando los traslapes, la alineación, la correcta fijación y la continuidad de la cubierta en las áreas intervenidas.

La interventoría verificó que las láminas suministradas correspondieran al espesor y a las características especificadas, la correcta instalación y fijación del material, los traslapes, la uniformidad del acabado y la hermeticidad de la cubierta, con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y su adecuado funcionamiento.

Tu mensaje no traía número de ítem, así que no lo puse. No sé si el policarbonato es alveolar o compacto, ni su color, ni qué accesorios de fijación y sellado lleva, y no los incluí. Si me los das, los agrego.

.



10.06 PINTURA EPOXICA MUROS

Se ejecutó la aplicación de pintura epóxica sobre muros, previa verificación y preparación de la superficie de soporte, garantizando condiciones adecuadas de limpieza, sequedad, nivelación y adherencia. La aplicación se realizó de manera uniforme, respetando los tiempos de secado y las recomendaciones del fabricante, y controlando el cubrimiento, la continuidad y la uniformidad del acabado en las áreas intervenidas.

La interventoría verificó la correcta ejecución de la actividad, la preparación de la superficie, el cubrimiento de la pintura aplicada, la uniformidad del color y la calidad de los acabados, con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y las condiciones requeridas para la protección y el adecuado funcionamiento de los muros intervenidos.

No sé cuántas manos se aplicaron, ni el color, la marca o la altura de aplicación, y no los incluí. Si me los das, los agrego.









11.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO UPVC

Se continua con el suministro e instalación de la cubierta tipo UPVC sobre la estructura metálica previamente conformada, verificando la correcta ubicación, alineación y ajuste de las láminas conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. La actividad incluyó la instalación de los elementos de fijación requeridos, garantizando la estabilidad del sistema, adecuada unión entre piezas y condiciones óptimas de funcionamiento frente a las condiciones ambientales.



11.03 DESMONTE DE CIELO FALSO (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.

Se ejecutó el desmonte de cielo falso en las áreas afectadas, previa verificación de las zonas a intervenir y de las condiciones de seguridad para la ejecución de la actividad. Se realizó el retiro de las láminas, la estructura de soporte y los elementos de fijación,

controlando el adecuado manejo del material para evitar daños en los elementos y las áreas adyacentes. Los materiales y escombros resultantes se retiraron y se transportaron hasta una distancia de 5 km, dejando las áreas intervenidas limpias y libres de residuos.

La interventoría verificó la correcta ejecución del desmonte en las áreas afectadas, el retiro completo de los elementos, el cargue y el acarreo del material hasta la distancia especificada, y la limpieza de las áreas intervenidas, con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y las condiciones requeridas para continuar con las siguientes actividades



11.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS.

Se realizó el suministro y aplicación de pintura tipo **Koraza o similar** para fachadas exteriores, mediante la aplicación de **tres (3) manos**, de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto y las recomendaciones del fabricante. La actividad comprendió la preparación de la superficie, incluyendo la limpieza y corrección de pequeñas imperfecciones, seguida de la aplicación uniforme de cada mano de pintura, respetando los tiempos de secado entre capas. Como resultado, se obtuvo un acabado homogéneo, con adecuada adherencia, protección frente a los agentes ambientales y un mejoramiento de la apariencia estética de la fachada.









11.07 PLACA BASE EN CONCRETO E = 8.0 CM. 17.5 MPa (2500 PSI)

Se ejecutó la construcción de placa base en concreto de 17.5 MPa (2500 PSI) y espesor de ocho (8) centímetros, para la conformación de andenes, previa verificación y preparación de la superficie de soporte, garantizando condiciones adecuadas de limpieza, nivelación y compactación. Se realizó el vaciado del concreto de manera continua, controlando los niveles, el espesor, las pendientes y la planeidad de la superficie, y se efectuó el vibrado, la regleada y el acabado de la placa, así como el curado del concreto en las áreas intervenidas.
La interventoría verificó la correcta ejecución de la actividad, la resistencia del concreto especificada, el espesor, la nivelación y la planeidad de la placa, así como la calidad del acabado y del curado, con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y las condiciones requeridas para el adecuado funcionamiento de los andenes.








11.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA BAJO PLACA A DOS MANOS

Se ejecutó el suministro e instalación de pintura epóxica bajo placa, aplicada a dos (2) manos, previa verificación y preparación de la superficie de soporte, garantizando condiciones adecuadas de limpieza, sequedad y adherencia. La aplicación se realizó de manera uniforme, respetando los tiempos de secado entre manos y las recomendaciones del fabricante, y controlando el cubrimiento y la continuidad de la película en las áreas intervenidas, antes de la fundición de la placa.

La interventoría verificó la correcta ejecución de la actividad, la preparación de la superficie, el cubrimiento de cada mano aplicada y la continuidad de la capa, con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y las condiciones requeridas para recibir la placa.



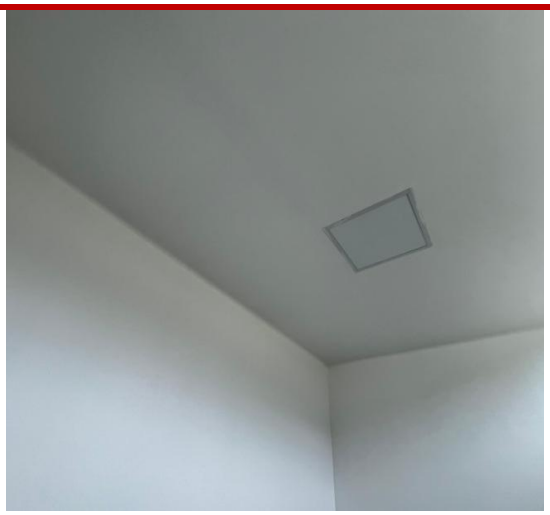

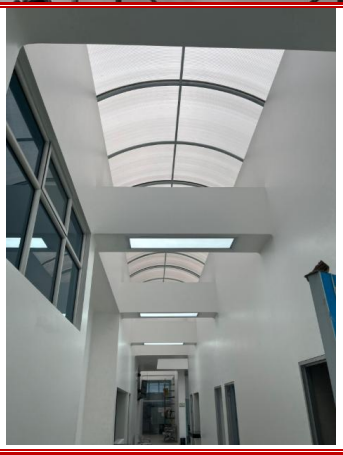





11.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA

Se ejecutó el suministro e instalación de malla electrosoldada de 4 mm de diámetro, con separación de 15 cm, para el refuerzo de los andenes, previa verificación de las condiciones de la superficie de soporte y de los niveles de instalación. Se realizó el corte, la colocación y la fijación de la malla, controlando los traslapes, la separación de los elementos y el recubrimiento requerido, garantizando su correcta posición dentro del espesor de la placa en las áreas intervenidas.
La interventoría verificó que la malla suministrada correspondiera al diámetro y a la separación especificados, la correcta instalación, los traslapes, la posición y el recubrimiento del refuerzo, con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y las condiciones requeridas para el adecuado funcionamiento de los andenes.



11.16 FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES

Se ejecutó la construcción de filos y dilataciones en pañetes, previa verificación de las superficies pañetadas y del trazado de los elementos a ejecutar. Se realizó la conformación de los filos y de las juntas de dilatación de manera continua, controlando la alineación, la verticalidad o nivelación, el ancho y la profundidad de las juntas, y la uniformidad del acabado en las áreas intervenidas, dejando las superficies limpias y libres de residuos.

La interventoría verificó la correcta ejecución de la actividad, la alineación y la continuidad de los filos y de las dilataciones, la uniformidad de las dimensiones y la calidad de los acabados, con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y las condiciones requeridas para recibir los acabados posteriores.
No sé en qué elementos se ejecutaron (muros, columnas, vigas), qué dimensiones tienen las dilataciones ni si se sellaron con algún material, y no lo incluí. Si me lo confirmas, lo agrego



7.3 INFORME DEL ESTADO DEL TIEMPO

A continuación, se ilustra el estado del tiempo durante el periodo correspondiente al presente informe:

CONVENCIONES	
Soleado	S
Nublado	N
Llovizna	II
Frio	F
Lluvia	LL
Lluvias fuertes	LF


MES		JULIO																													
HORA	DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
7:00	9:00	LL	N	N	N	D	N	N	N	N	F	F	D	F	N	N	N	N	N	D	F	N	N	N	N	N	D	N	N	N	N
9:00	11:00	N	N	S	S	O	N	S	S	F	N	S	O	E	S	S	N	N	S	O	E	S	S	S	S	S	O	S	N	S	S
11:00	13:00	S	N	S	S	M	S	S	S	S	S	S	M	S	S	S	S	S	S	M	S	S	S	S	S	S	M	S	S	S	S
13:00	15:00	S	N	S	S	I	S	S	S	S	S	S	I	T	S	S	S	S	S	I	T	S	S	S	S	S	I	S	S	S	S
15:00	17:00	S	N	S	S	N	S	S	S	S	S	N	N	V	S	S	S	S	S	N	V	II	S	II	II	S	N	S	S	S	S
17:00	18:00	N	F	LL	LL	G	F	LL	F	FF	F	F	G	O	LL	F	F	F	N	G	O	N	F	F	N	F	G	F	F	N	F
0:00	7:00	F	F	F	F	O	LL	F	LL	F	F	F	O		F	LL	LL	LL	F	O		LL	F	F	LL	F	O	F	LL	F	F

8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Durante el tercer mes de ejecución se continuó con el desarrollo de las actividades contempladas en el contrato, destacándose las actividades de demolición y desmonte, con el desmonte de marcos, puertas y ventanas y de cielo falso en las áreas afectadas. También se adelantaron actividades de estructura y cubierta, con el suministro e instalación de perfilería metálica y de lámina de policarbonato de 6 mm. En acabados se ejecutaron el enchape de pisos, el alistado de piso, la pintura epóxica en muros y la aplicación de esmalte, además de la instalación de luminarias tipo panel y la construcción de andenes con placa base en concreto, malla electrosoldada y filos y dilataciones en pañetes.
- Con corte al 31 de julio, el proyecto registra un avance físico ejecutado del 50,82%, frente a un avance programado del 98,61%, evidenciando un atraso acumulado del 47,80%. Si bien las actividades ejecutadas cumplen con el alcance técnico previsto y presentan una adecuada

calidad constructiva, el rendimiento alcanzado no ha permitido cumplir con la programación establecida, y la brecha respecto al mes anterior se ha incrementado de manera significativa.

- Se informa que el contratista radicó una solicitud de prórroga de veintiséis (26) días, la cual fue revisada y aprobada en comité. A la fecha de corte del presente informe, las prórrogas de los dos contratos se encuentran pendientes de formalización, por lo que aún no tienen efecto legal. En consecuencia, el avance programado del 98,61% se reporta conforme al plazo contractual inicial de tres (3) meses, el cual vence el 4 de agosto, es decir, a cuatro (4) días calendario de la fecha de corte.
- No obstante, las actividades desarrolladas durante el período han permitido avanzar en frentes importantes para la continuidad de la obra, dejando las áreas intervenidas en condiciones adecuadas para la ejecución de las actividades pendientes.
- Se recomienda adelantar oportunamente los trámites de formalización de las prórrogas de los dos contratos, de manera que queden perfeccionadas antes del vencimiento del plazo inicial, el 4 de agosto.
- Se recomienda al contratista presentar y ejecutar un plan de contingencia para la recuperación del atraso acumulado del 47,80%, que incluya el incremento de personal, equipos y materiales, la priorización de las actividades pendientes y un cronograma de recuperación con metas verificables por la interventoría.
- Así mismo, se recomienda mantener una adecuada coordinación entre los diferentes frentes de trabajo para minimizar interferencias durante la ejecución de las actividades, especialmente en las áreas donde la prestación del servicio de salud debe continuar de manera simultánea con la obra.
- Finalmente, se recomienda realizar un seguimiento permanente y más estricto al cronograma de ejecución, implementando las acciones correctivas que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de los plazos contractuales, sin afectar la calidad de las obras ejecutadas ni las condiciones de seguridad del personal y de los usuarios de la institución.



NANCY YASMIN QUIRGA CASTRO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
QUINAC SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS

ANEXOS

ANEXO No 1 INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA
ANEXO No 2 PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL DE OBRA
ANEXO No 3 PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL DE INTERVENTORIA
ANEXO No 4 INFORME DE GESTION SST

ANEXO No 1
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA

La salud es de todos · Minsalud	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA - BOYACÁ** **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA N° 9** **QUINAC SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS**	Dirección de Infraestructura

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	OSCAR RAUL SARMIENTO DAZA
Contrato No.	COP-20260504-001
Valor Inicial:	$ 483.325.508,90
Valor adicional:	$ -
Valor Actualizado:	$ 483.325.508,90
Plazo Inicial:	TRES MESES
Suspension 1	N/A
Reincio	N/A
Plazo Actualizado:	N/A
Fecha de Iniciación:	04 DE MAYO DE 2026
Fecha de Vencimiento:	04 DE AGOSTO DE 2026

Objeto

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA PARA LA ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA - BOYACÁ

Semana Número: 9 Del: 29/06/2026 Al: 05/07/2026 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 65 días


Nombre del Supervisor JULIE IVONNE ORTIZ CASAS

AVANCE DE LA OBRA

	OBRA PROGRAMADA SEMANAL	OBRA PROGRAMADA ACUMULADO	OBRA EJECUTADA SEMANAL	OBRA EJECUTADA ACUMULADO
Obra programada (%) / Obra Física Ejecutada (%)	14,21%	55,98%	3,69%	37,13%
Valor de la Obra programada: / Valor de la Obra Ejecutada:	$ 68.680.277,57	$ 270.586.512,05	$ 17.842.526,87	$ 179.473.224,67

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	41,77%	33,44%	-18,85%
Durante el periodo	14,21%	3,69%	
Acumulado actual	55,98%	37,13%	

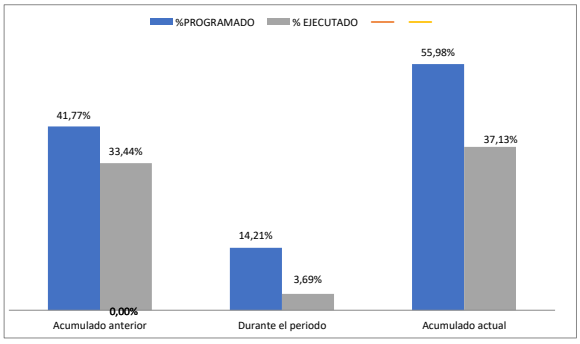

REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL



OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

Se verificó el desmonte de puertas y ventanas existentes, junto con la limpieza y retiro de escombros de las áreas intervenidas. Se realizó seguimiento al alistado de los andenes perimetrales y a la demolición del enchape existente, previo a la instalación del nuevo acabado. Se verificó el inicio de la instalación de enchape cerámico en los andenes laterales y frontales, revisando su alineación y nivelación. Se realizó seguimiento al inicio de la instalación de la cubierta en policarbonato en las zonas de ingreso y parqueadero, previa preparación de la estructura metálica. Se evidencia un avance acumulado ejecutado del 37,13% frente al 55,98% programado, presentándose un atraso de 18,85 puntos porcentuales, considerado significativo para el estado actual del proyecto. La interventoría requiere al contratista incrementar de manera inmediata el ritmo de ejecución, fortalecer los frentes de trabajo y garantizar la disponibilidad de personal, materiales y equipos, con el fin de implementar acciones efectivas de recuperación y evitar que la diferencia frente a la programación continúe aumentando.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

Se realiza el desmonte de puertas y ventanas existentes, incluyendo marcos y contramarcos, seguido de la limpieza general de las áreas intervenidas y el retiro de los escombros y residuos provenientes

Se realiza el alistado y preparación de la superficie de piso en los andenes perimetrales, garantizando condiciones adecuadas de nivelación y adherencia para la posterior instalación del enchape cerámico.

Se continua actividades de demolicion de enchape cermico

Se inician actividades de suministro e instalación de enchape cerámico en andenes perimetrales, específicamente en el costado lateral derecho y en los andenes frontales, verificando la correcta disposición y alineación

Se inicia el suministro e instalación de cubierta en lámina de policarbonato en las áreas de ingreso y parqueadero, realizando previamente la limpieza y preparación de la estructura metálica de soporte.

FIRMAS

RESIDENTE DE INTERVENTOR

Nombre **NANCY YASMIN QUIROGA CASTRO**

RESIDENTE DE OBRA

Nombre **OSCAR RAUL SARMIENTO DAZA**

La salud es de todos · Minsalud	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA - BOYACÁ**	Dirección de Infraestructura
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA N° 10 QUINAC SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS	

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	OSCAR RAUL SARMIENTO DAZA
Contrato No.	COP-20260504-001
Valor Inicial:	$ 483.325.508,90
Valor adicional:	$ -
Valor Actualizado:	$ 483.325.508,90
Plazo Inicial:	TRES MESES
Suspension 1	N/A
Reincio	N/A
Plazo Actualizado:	N/A
Fecha de Iniciación:	04 DE MAYO DE 2026
Fecha de Vencimiento:	04 DE AGOSTO DE 2026

Objeto

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA PARA LA ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA - BOYACÁ

Semana Número: 10 Del: 06/07/2026 Al: 12/07/2026 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 72 días


Nombre del Supervisor JULIE IVONNE ORTIZ CASAS

AVANCE DE LA OBRA

	OBRA PROGRAMADA SEMANAL	OBRA PROGRAMADA ACUMULADO	OBRA EJECUTADA SEMANAL	OBRA EJECUTADA ACUMULADO
Obra programada (%) / Obra Física Ejecutada (%)	14,21%	70,19%	5,57%	42,70%
Valor de la Obra programada / Ejecutada:	$ 68.680.277,57	$ 339.266.789,61	$ 26.928.297,07	$ 206.401.521,73

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	55,98%	37,13%	-27,49%
Durante el periodo	14,21%	5,57%	
Acumulado actual	70,19%	42,70%	

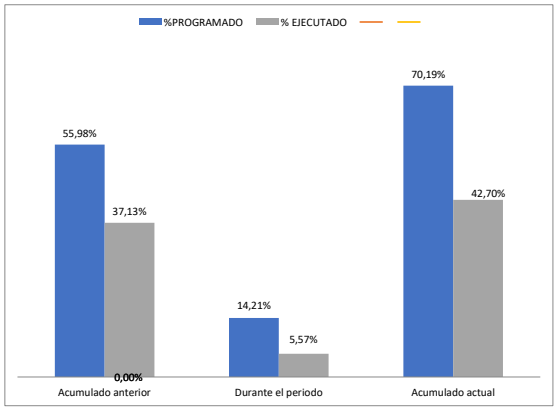

REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL



OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

Se verificó la continuidad del alistado de andenes y la instalación de enchape cerámico en los costados lateral, frontal y posterior. Se realizó seguimiento al montaje de la estructura metálica y a la instalación de las cubiertas en policarbonato y teja UPVC, verificando alineación, fijación y condiciones de instalación. Se verificó la ejecución de la placa base de concreto de 8 cm, incluyendo la preparación, compactación del afirmado y colocación de malla electrosoldada. Se verificó el inicio de las actividades de resane y pañete de filos en los vanos de puertas intervenidos.
La interventoría evidencia un avance acumulado ejecutado del 42,70% frente al 70,19% programado, generándose un atraso de 27,49 puntos porcentuales. Esta diferencia es significativa y evidencia un bajo rendimiento de ejecución, por lo cual se requiere al contratista implementar de manera inmediata medidas de recuperación, incrementar los frentes de trabajo y garantizar los recursos necesarios para mejorar el ritmo de ejecución y evitar un mayor incumplimiento de la programación contractual.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

Se continúan las actividades de alistado y preparación de la superficie de piso en los andenes perimetrales, realizando labores de nivelación y acondicionamiento de las áreas para garantizar condiciones adecuadas para la posterior instalación del enchape cerámico.

Se continúan las actividades de suministro e instalación de enchape cerámico en andenes perimetrales, específicamente en los andenes ubicados en el costado lateral derecho, frontal y partes posteriores, verificando la correcta disposición, alineación y nivelación de las piezas durante su instalación.

Se realiza el suministro e instalación de perfilería metálica para estructura de cubierta en el área de laboratorio, ejecutando el montaje, alineación y fijación de los perfiles que conforman la estructura de soporte de la cubierta.

Se realiza la fundida de placa base en concreto de 8,0 cm de espesor, previa adecuación y nivelación del área con material afirmado y compactado.

Se realiza el suministro e instalación de malla electrosoldada como refuerzo de la placa, verificando su correcta disposición y nivelación.

Se continúan las actividades de suministro e instalación de cubierta en lámina de policarbonato en las áreas de ingreso y parqueadero de ambulancias, realizando la colocación y fijación de las láminas sobre la estructura previamente instalada, verificando su correcta alineación, traslapo y sujeción.

Se realiza el suministro e instalación de cubierta en teja UPVC en el área de laboratorio, efectuando la colocación y fijación de las tejas sobre la estructura metálica previamente instalada, verificando su correcta alineación y disposición para garantizar la funcionalidad y adecuado desempeño de la cubierta.

Se inician actividades de resane y pañete de filos en los vanos de las puertas previamente desmontadas, realizando la recuperación y regularización de las superficies intervenidas

FIRMAS

RESIDENTE DE INTERVENTOR
Nombre **NANCY YASMIN QUIROGA CASTRO**

RESIDENTE DE OBRA
Nombre **OSCAR RAUL SARMIENTO DAZA**

La salud es de todos · Minsalud	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA - BOYACÁ** **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA N° 11** **QUINAC SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS**	Dirección de Infraestructura

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	OSCAR RAUL SARMIENTO DAZA
Contrato No.	COP-20260504-001
Valor Inicial:	$ 483.325.508,90
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	QUINAC SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS
Valor Actualizado:	$ 483.325.508,90
Plazo Inicial:	TRES MESES
Suspension 1	N/A
Reincio	N/A
Plazo Actualizado:	N/A
Fecha de Iniciación:	04 DE MAYO DE 2026
Fecha de Vencimiento:	04 DE AGOSTO DE 2026

Objeto

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA PARA LA ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA - BOYACÁ


Semana Número: 11 Del: 13/07/2026 Al: 19/07/2026 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 79 días

AVANCE DE LA OBRA

	OBRA PROGRAMADA SEMANAL	OBRA PROGRAMADA ACUMULADO	OBRA EJECUTADA SEMANAL	OBRA EJECUTADA ACUMULADO
Obra programada (%)	14,21%	84,40%		
Obra Física Ejecutada (%)			4,58%	47,28%
Valor de la Obra programada:	$ 68.680.277,57	$ 407.947.067,18		
Valor de la Obra Ejecutada:			$ 22.117.339,18	$ 228.518.860,92

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	70,19%	42,70%	-37,12%
Durante el periodo	14,21%	4,58%	
Acumulado actual	84,40%	47,28%	

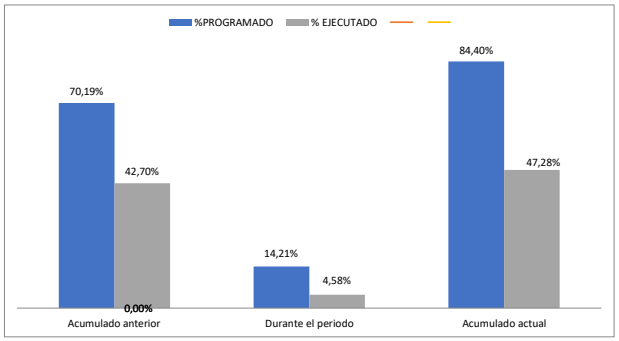

REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL



OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

Durante el periodo se evidenció continuidad en la ejecución del enchape de los andenes y en la recuperación de los filos de los vanos de puertas mediante actividades de resane y pañete. En las áreas eléctricas se verificó el avance en la instalación de paneles LED redondos y cuadrados, revisando su ubicación, fijación y conexión. Se efectuó el seguimiento al desmonte del cielo falso del área de terapia respiratoria, dejando el espacio dispuesto para las actividades posteriores. Se constató el inicio de los trabajos de pintura epóxica en las áreas de Psicología y Consultorio 1 Prioritaria, así como la aplicación de pintura Koraza en la fachada posterior. Desde la interventoría se observa que, pese a las actividades desarrolladas durante el periodo, el avance físico continúa significativamente por debajo de la programación: se registra un 47,28% ejecutado frente a un 84,40% programado, con una diferencia de 37,12 puntos porcentuales.

La magnitud de la desviación requiere que el contratista refuerce de forma inmediata los frentes de trabajo y establezca acciones concretas de recuperación, dado que el comportamiento actual de la ejecución no permite evidenciar una tendencia suficiente para alcanzar las metas establecidas en la programación contractual.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

Continuan con la instalacion de enchape ceramico en andenes

Se realiza el suministro e instalación de paneles LED redondos, efectuando su correcta ubicación, fijación y conexión, verificando su adecuada disposición y funcionamiento.

Se continúa con la instalación de paneles LED cuadrados en las áreas contempladas dentro del proyecto, verificando la correcta alineación, fijación y conexión de los elementos de iluminación.

Se realiza el desmonte de cielo falso existente en el área de terapia respiratoria, efectuando el retiro de los elementos que lo conforman y dejando las áreas despejadas

Se continúan las actividades de resane y pañete de filos en vanos de puertas, realizando la regularización y acabado de las superficies intervenidas.

Se inician actividades de aplicación de pintura epóxica en muros en las áreas de Psicología, baño de Psicología, Consultorio 1 Prioritaria y baño del consultorio, realizando previamente la preparación y acondicionamiento de las superficies para garantizar una adecuada adherencia y acabado del recubrimiento.

Se continuan actividades de aplicación de pintura koraza para fachada, en fachada posterior a tres manos

FIRMAS

RESIDENTE DE INTERVENTOR

Nombre: **NANCY YASMIN QUIROGA CASTRO**

RESIDENTE DE OBRA

Nombre: **OSCAR RAUL SARMIENTO DAZA**

La salud es de todos · Minsalud	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA - BOYACÁ** **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA N° 12** **QUINAC SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS**	Dirección de Infraestructura

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	OSCAR RAUL SARMIENTO DAZA
Contrato No.	COP-20260504-001
Valor Inicial:	$ 483.325.508,90
CONTRATISTA DE INTERVENT	QUINAC SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS
Valor Actualizado:	$ 483.325.508,90
Plazo Inicial:	TRES MESES
Suspension 1	N/A
Reincio	N/A
Plazo Actualizado:	N/A
Fecha de Iniciación:	04/05/2026
Fecha de Vencimiento:	04 DE AGOSTO DE 2026

Objeto

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA PARA LA ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA - BOYACÁ


Semana Número: 12 Del: 20/07/2026 Al: 26/07/2026 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 81,00 días

AVANCE DE LA OBRA


	OBRA PROGRAMADA SEMANAL	OBRA PROGRAMADA ACUMULADO	OBRA EJECUTADA SEMANAL	OBRA EJECUTADA ACUMULADO
Obra programada (%) / Obra Física Ejecutada (%)	14,21%	98,61%	3,54%	50,82%
Valor de la Obra programada: / Valor de la Obra Ejecutada:	$ 68.680.277,57	$ 476.627.344,74	$ 17.087.384,60	$ 245.606.245,52

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	84,40%	47,28%	-47,80%
Durante el periodo	14,21%	3,54%	
Acumulado actual	98,61%	50,82%	

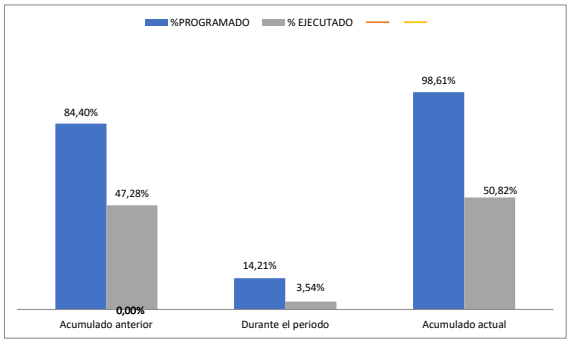

REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL

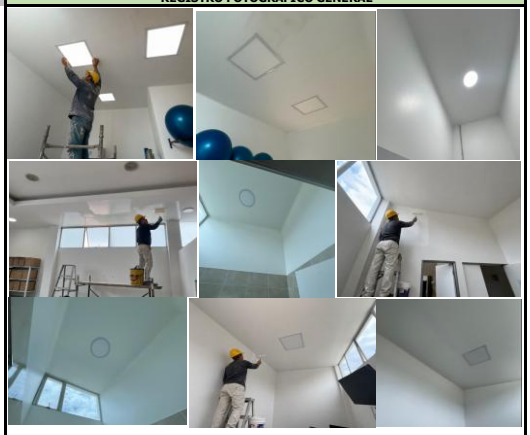

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

Durante el periodo se verificó la continuidad de las actividades de instalación de paneles LED, aplicación de pintura epóxica en muros y bajo placa, y pintura tipo Koraza en fachadas, evidenciándose avance en los diferentes frentes de acabados contemplados en el proyecto.
No obstante, al corte del periodo se registra un avance acumulado del 50,82% frente al 98,61% programado, presentándose una diferencia de 47,8 puntos porcentuales. Si bien se evidencia ejecución de actividades, el avance continúa por debajo de las metas establecidas inicialmente.
En atención a las condiciones que han afectado el desarrollo del proyecto, el contratista presentó solicitud de prórroga por veintiséis (26) días calendario, hasta el 30 de agosto, la cual fue revisada y avalada por la interventoría. Entre las situaciones consideradas se encuentran la cantidad de días festivos durante los meses de junio y julio, las festividades del municipio y la consecuente dificultad para disponer de mano de obra; igualmente, la necesidad de mantener la prestación continua de los servicios de salud de la E.S.E., lo que ha limitado la ejecución simultánea de varios frentes de trabajo.
Adicionalmente, durante la etapa inicial se presentaron fuertes lluvias, afectando principalmente las actividades de desmonte e instalación de cubierta, debido a la imposibilidad de intervenir dichas áreas bajo condiciones climáticas que pudieran comprometer las zonas existentes.
En este contexto, la prórroga busca permitir la culminación de las actividades pendientes; sin embargo, la interventoría continuará realizando seguimiento estricto al avance durante el plazo prorrogado, requiriendo al contratista fortalecer los frentes de trabajo y adoptar las medidas necesarias para mejorar el rendimiento y cumplir con la terminación prevista para el 30 de agosto.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

Se continúa con el suministro e instalación de paneles LED redondos en las áreas contempladas dentro del proyecto, verificando su correcta ubicación, fijación, conexión y funcionamiento.

Se continúa con el suministro e instalación de paneles LED cuadrados, realizando la correcta disposición, fijación y conexión de los elementos de iluminación, de acuerdo con la distribución establecida para las áreas intervenidas.

continuan actividades de aplicación de pintura epóxica en muros en las áreas de auditorio, consultorio de vacunacion y consultorio de enfermeria, realizando previamente la preparación y acondicionamiento de las superficies para garantizar una adecuada adherencia y acabado del recubrimiento.

Se continua la aplicación de pintura epóxica bajo placa en las áreas de consultorio de vacunacion, consultorio de enfermeria y auditorio, con previa preparación de las superficies, con el fin de garantizar la correcta adherencia, uniformidad y acabado final del recubrimiento

se continua apliacion de pintura sobre muros fachadas con pintura tipo coraza, previa preparación de las superficies, con el fin de garantizar la correcta adherencia, uniformidad y acabado final del recubrimiento.

FIRMAS

RESIDENTE DE INTERVENTOR _____
Nombre **NANCY YASMIN QUIROGA CASTRO**

RESIDENTE DE OBRA _____
Nombre **OSCAR RAUL SARMIENTO DAZA**

ANEXO No 2
PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DE OBRA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1057410871		OSCAR RAUL SARMIENTO DAZA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	MZ C CS 27 BRR VILLA ISABEL	MIRAFLORES-BOYACA	3114373101	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	544165978	9509218255	E	2026/08/20	2026/08/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$2,169,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: TUNJA (4 Afiliados)						$7,003,620	$1,120,800			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$487,600		$0	$0
Centro de Trabajo: TUNJA (4 Afiliados)						$7,003,620	$1,120,800			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$487,600		$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (4 Afiliados)						$7,003,620	$1,120,800			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$487,600		$0	$0
1	CC	7175530	ESPINEL JOSE	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
2	CC	80024382	PERAZA HILDEBRANDO	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
3	CC	1051184316	PERAZA KEVIN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
4	CC	1002402952	PERAZA MAIKOL	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
Total			**Afiliados(4)**			$7,003,620	$1,120,800			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$487,600		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$1,120,800	$0	$0	$1,120,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$840,600	$0	$0	$840,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$487,600	$0	$0	$487,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$487,600	$0	$0	$487,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$280,400	$0	$0	$280,400
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	4	$280,400	$0	$0	$280,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$280,400	$0	$0	$280,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$280,400	$0	$0	$280,400
TOTAL				**4**	**$2,169,200**	**$0**	**$0**	**$2,169,200**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1057410871
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			OSCAR RAUL SARMIENTO DAZA SARMIENTO DAZA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MIRAFLORES	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	MANZANA C CASA 27 VILLA ISABEL	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**6024696243**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/08/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		559357208

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 1.016.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.016.000	$ 0	$ 1.016.000
SUBTOTALES:										**$ 1.016.000**	**$ 0**	**$ 1.016.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 793.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 793.800	$ 0	$ 0	$ 793.800
SUBTOTALES:													**$ 793.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 793.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 66.300	$ 66.300	$ 0	$ 0	$ 66.300
SUBTOTALES:									**$ 66.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 66.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD					ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1057410871	SARMIENTO DAZA OSCAR RAUL	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 6.350.000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 6.350.000	$ 1.016.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.016.000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 6.350.000	$ 793.800	$ 0	$ 793.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 6.350.000	105741087	$ 66.300		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.876.100

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1057410871		OSCAR RAUL SARMIENTO DAZA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	MZ C CS 27 BRR VILLA ISABEL	MIRAFLORES-BOYACA	3114373101	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	544165978	9509218255	E	2026/08/20	2026/08/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$2,169,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: TUNJA (4 Afiliados)						$7,003,620	$1,120,800			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$487,600		$0	$0
Centro de Trabajo: TUNJA (4 Afiliados)						$7,003,620	$1,120,800			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$487,600		$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (4 Afiliados)						$7,003,620	$1,120,800			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$487,600		$0	$0
1	CC	7175530	ESPINEL JOSE	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
2	CC	80024382	PERAZA HILDEBRANDO	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
3	CC	1051184316	PERAZA KEVIN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
4	CC	1002402952	PERAZA MAIKOL	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
Total			**Afiliados(4)**			$7,003,620	$1,120,800			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$487,600		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$1,120,800	$0	$0	$1,120,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$840,600	$0	$0	$840,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$487,600	$0	$0	$487,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$487,600	$0	$0	$487,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$280,400	$0	$0	$280,400
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	4	$280,400	$0	$0	$280,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$280,400	$0	$0	$280,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$280,400	$0	$0	$280,400
TOTAL				**4**	**$2,169,200**	**$0**	**$0**	**$2,169,200**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1057410871		OSCAR RAUL SARMIENTO DAZA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	MZ C CS 27 BRR VILLA ISABEL	MIRAFLORES-BOYACA	3114373101	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	559374628	9509386357	E	2026/08/20	2026/08/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$108,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BUENAVISTA (1 Afiliados)					$350,181	$56,100			$350,181	$14,100			$350,181	$14,100			$350,181	$24,400		$0	$0
Centro de Trabajo: BUENAVISTA (1 Afiliados)					$350,181	$56,100			$350,181	$14,100			$350,181	$14,100			$350,181	$24,400		$0	$0
Ciudad: BUENAVISTA Depto: BOYACA (1 Afiliados)					$350,181	$56,100			$350,181	$14,100			$350,181	$14,100			$350,181	$24,400		$0	$0
1	CC 74348221	MORENO JHONAL	230301	6	$350,181	$56,100	EPS037	6	$350,181	$14,100	CCF10	6	$350,181	$14,100	14-23	6	$350,181	$24,400	6	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$350,181	$56,100			$350,181	$14,100			$350,181	$14,100			$350,181	$24,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$56,100	$0	$0	$56,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$56,100	$0	$0	$56,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$24,400	$0	$0	$24,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$24,400	$0	$0	$24,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,100	$0	$0	$14,100
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$14,100	$0	$0	$14,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,100	$0	$0	$14,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$14,100	$0	$0	$14,100
TOTAL				**1**	**$108,700**	**$0**	**$0**	**$108,700**

ANEXO No 3
PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL DE INTERVENTORIA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	33377448
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARMEN JANETH ALCANTAR
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 23B NO 2B-21	TELÉFONO:	7440791
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**1114361073**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	11		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/08/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	2411123900

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.400	$ 0	$ 280.200	$ 2.400	$ 282.600
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 2.400**	**$ 282.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 1.900	$ 0	$ 218.900	$ 1.900	$ 0	$ 220.800
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 1.900**	**$ 0**	**$ 220.800**

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																			PARAFISCALES							
																											PENSIÓN									SALUD							ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 33377448	ALCANTAR CARMEN JANETH	INDEPEND		$ 1.750.905				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 503.400

Planilla Pagada

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901565963	0	QUINAC SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 4 7 37	CHIQUINQUIRA-BOYACA	7211054	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	515884609	9507064005	E	2026/07/15	2026/07/28	BANCOLOMBIA	13	$433,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$70,100**			**$1,750,905**	**$70,100**			**$1,750,905**	**$9,200**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)					**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$70,100**			**$1,750,905**	**$70,100**			**$1,750,905**	**$9,200**		**$0**	**$0**
Ciudad: CHIQUINQUIRA Depto: BOYACA (1 Afiliados)					**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$70,100**			**$1,750,905**	**$70,100**			**$1,750,905**	**$9,200**		**$0**	**$0**
1	CC 23731286	QUIROGA CASTRO NANCY YASMIN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$70,100**			**$1,750,905**	**$70,100**			**$1,750,905**	**$9,200**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$2,700	$0	$282,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$2,700	$0	$282,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$100	$0	$9,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,200	$100	$0	$9,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$700	$0	$70,800
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$70,100	$700	$0	$70,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$700	$0	$70,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$70,100	$700	$0	$70,800
TOTAL				**1**	**$429,600**	**$4,200**	**$0**	**$433,800**

ANEXO No 4
INFORME DE GESTION SST

CONTRATO COP-20260504-001

"ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA – BOYACÁ"



ORIGINAL ENTREGADO A	**RT PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S**
	Interventoría
ENTREGADO POR	**ING. JHONAL DEAVIES MORENO SUAREZ**
	Residente SST

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION 3
1. OBJETIVOS 3
2.1 Objetivo General 3
2.2 Objetivos Específicos 3
2. AVANCE DE OBRA 4
3. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 5
4.1. INDUCCION Y REINDUCCION 6
4.2. PROGRAMA CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 6
4.3. PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 9
4.4. PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 9
4.5 REPORTES DE ACCIDENTES LABORALES 11

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Relación de ingreso e inducción del personal .....
Tabla 2. Relación de personal retirado..... 6
Tabla 3. Identificación de Riesgos.....
Tabla 4. Divulgación de Charlas de Seguridad 8

1. INTRODUCCION

Con la puesta en marcha del CONTRATO COP-20260504-001cuyo objeto es, "ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA – BOYACÁ, El presente documento corresponde al informe No. 3 de cumplimiento de las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo para contrato en mención, en el que se describen las, las medidas y actividades orientadas a prevenir y/o mitigar accidentes de trabajo y enfermedades laborales que se pueden generar en la población trabajadora durante el desarrollo de las actividades constructivas propias del contrato durante el periodo del mes de JULIO de 2026.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Dar a conocer la gestión en seguridad y salud en el trabajo para el contrato COP-20260504-001 "ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA – BOYACÁ", a través de las actividades desarrolladas, entre el periodo del mes de JULIO de 2026

2.2 Objetivos Específicos



- Mostrar el acompañamiento SST a las actividades constructivas durante el periodo del mes de JULIO
- Evidenciar el cumplimiento de actividades de gestión en seguridad y salud en el trabajo SST

- Divulgar las normas en seguridad y salud en el trabajo, para facilitar el control de los factores de riesgos y prevenir la aparición de accidentes y enfermedades de origen laboral

3. AVANCE DE OBRA

Durante el presente periodo se ejecutaron las siguientes actividades constructivas:

1.02	DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS
2.01	PISO CERÁMICA 51*51 CM
2.02	ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5
4.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 24 W
4.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL CUADRADO DE INCRUSTAR DE 60X60 CM, 40-60W
9.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO
9.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA LAMINA POLICARBONATO Cal. 6 mm
10.06	PINTURA EPOXICA MUROS
11.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO UPVC
11.03	DESMONTE DE CIELO FALSO (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.
11.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA BAJO PLACA A DOS MANOS
11.16	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES

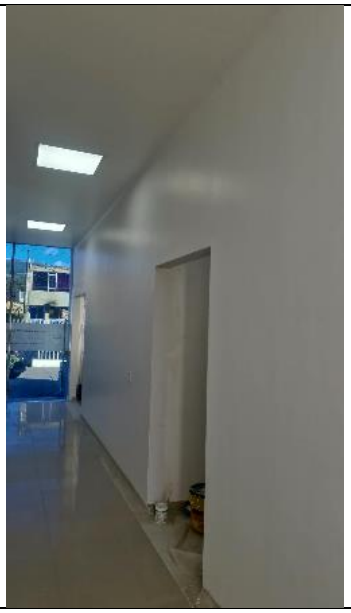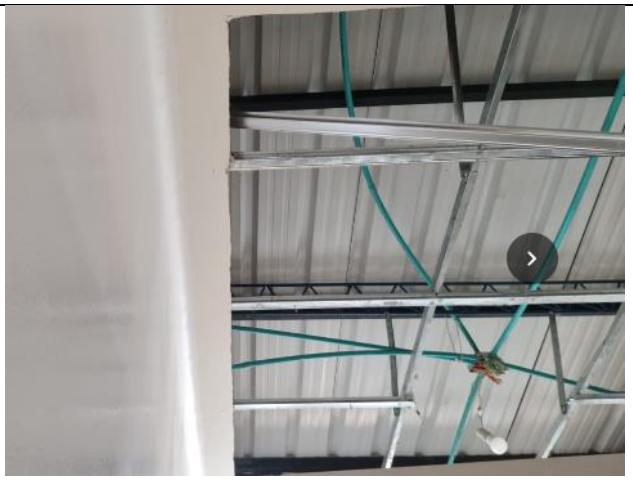AVANCE DE OBRA	
	
FOTOGRAFIA 1. Instalación luminarias led redonda	**FOTOGRAFIA 2. Instalación panel cuadrado**
	

FOTOGRAFIA 3. Instalación pintura epoxica	FOTOGRAFIA 4. Desmonte cielo raso
	
FOTOGRAFIA 5. Filos y dilataciones	**FOTOGRAFIA 6 Alistado de piso**
	
FOTOGRAFIA 7. Desmonte de marcos y puertas	**FOTOGRAFIA 8. Desmonte de marcos y puertas**

4. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La seguridad y la salud en el trabajo (SST) es una disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo y de

la protección y promoción de la salud de los trabajadores. A su vez, es una actividad multidisciplinaria que tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo. La salud en el trabajo conlleva la promoción y el mantenimiento del más alto grado de salud física, mental y de bienestar de los trabajadores en todas las ocupaciones.

4.1. INDUCCION Y REINDUCCION

Siguiendo en la búsqueda de desarrollar conocimientos y destrezas necesarias para que todo el personal contratado desempeñe sus funciones de manera segura y saludable, en el periodo del mes de julio de 2026, se llevó a cabo inducción, teniendo en cuenta el ingreso de nuevo personal a la empresa.

Tabla 1. Relación de personal ingresado

FECHA DE INGRESO	NOMBRE	CARGO	FECHA DE RETIRO
-	-	-	-


Fuente: Residente SST

Nota 1: *No se reportan ingresos para el periodo de julio de 2026*
Nota 2: *No se reportan retiros para el periodo de julio de 2026*

4.2. PROGRAMA CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

OSCAR RAUL SARMIENTO DAZA con el ánimo de garantizar la ejecución de un trabajo seguro en todas las actividades que se desarrollen dentro del proyecto, realiza capacitaciones e imparte charlas de seguridad a los trabajadores con el fin de enriquecer y fortalecer conocimientos en prevención identificación de riesgos y prevención de accidentes laborales, el periodo del JULIO de 2026 al personal.

Imagen 1. Soporte de asistencia capacitaciones

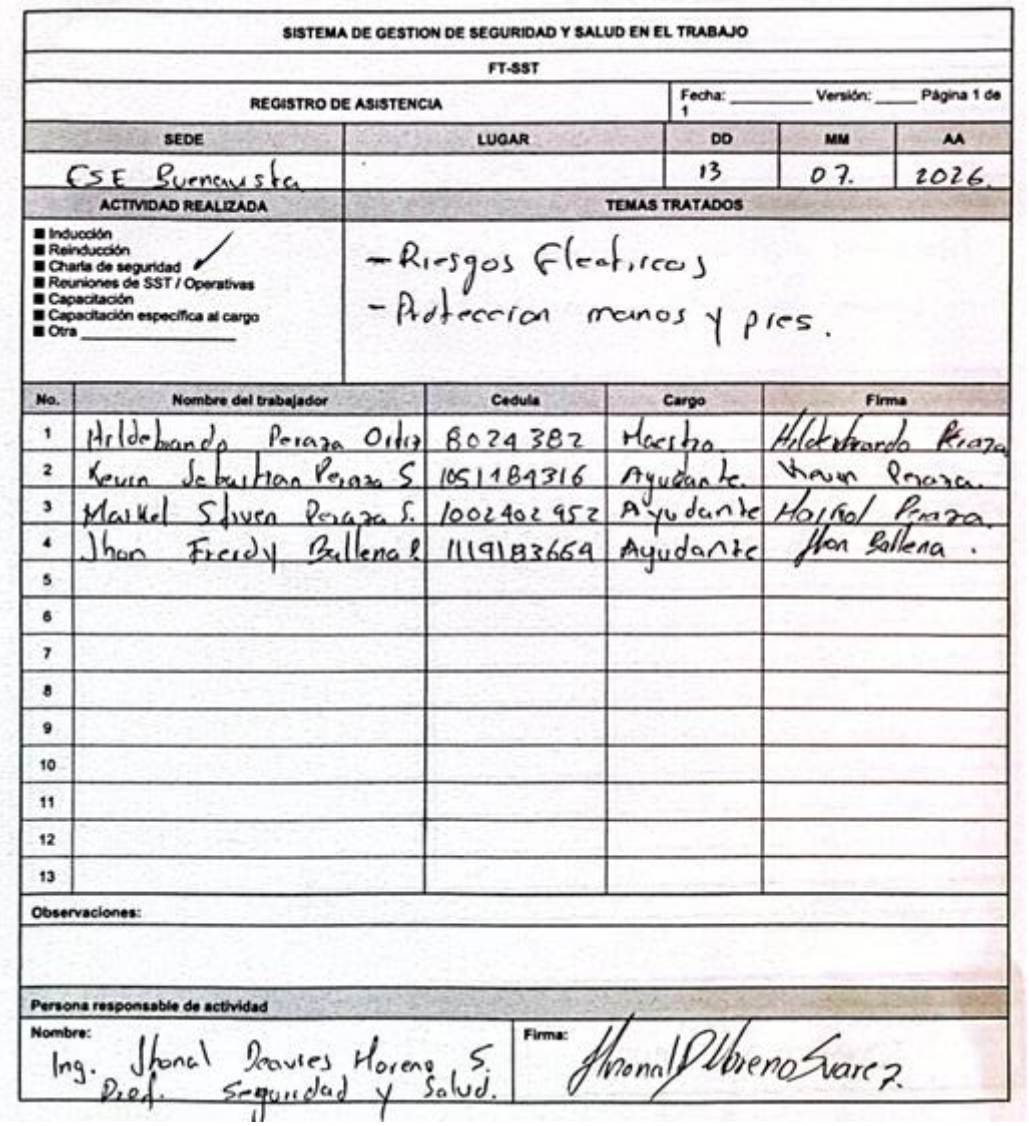

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FT-SST

REGISTRO DE ASISTENCIA — Fecha: _____ Versión: ____ Página 1 de 1

SEDE	LUGAR	DD	MM	AA
CSE Bucaramanga		13	07.	2026.

ACTIVIDAD REALIZADA

- Inducción
- Reinducción
- Charla de seguridad ✓
- Reuniones de SST / Operativas
- Capacitación
- Capacitación específica al cargo
- Otra _____

TEMAS TRATADOS

- Riesgos Electricos
- Proteccion manos y pies.

No.	Nombre del trabajador	Cedula	Cargo	Firma
1	Hildebrando Peraza Ortiz	8024382	Maestro	Hildebrando Peraza
2	Kevin Sebastian Peraza S	1051184316	Ayudante	Kevin Peraza.
3	Maikel Steven Peraza S.	1002402952	Ayudante	Maikel Peraza.
4	Jhon Freidy Ballena L	1119183669	Ayudante	Jhon Ballena.
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

Observaciones:

Persona responsable de actividad

Nombre:	Firma:
Ing. Jhonal Reaves Moreno S. Prof. Seguridad y Salud.	Jhonal Reaves Moreno Suarez.

FECHA	TEMAS	N° Asistentes
13-07-2026	RIESGOS ELECTRICOS	04
13-07-2026	PROTECCION MANOS Y PIES	04

4.3. PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

El Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo es un conjunto de actividades dirigidas a la promoción, prevención y control de la salud de los trabajadores. En este programa se integran las acciones de medicina preventiva y medicina del trabajo, teniendo en cuenta que las dos tienden a mantener y promover la salud de los trabajadores frente a los riesgos ocupacionales.

Para dar cumplimiento al Programa de Medicina Preventiva, se hace seguimiento y control del personal que ingresa. Todo trabajador que ingrese a laborar con la empresa debe realizar los exámenes de ingreso de acuerdo al cargo a desempeñar, estos exámenes se analizan para saber en qué condiciones se encuentra el trabajador y si está apto para desempeñar el cargo para el cual fue contratado. Adicionalmente se realiza la afiliación respectiva al sistema de seguridad social.

4.4. PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

El Programa de Seguridad Industrial es el componente encargado, mediante el conjunto de técnicas y actividades destinadas a la identificación y valoración del control, de las causas de los accidentes de trabajo.

El objetivo de este programa es mantener un ambiente laboral seguro, mediante el control de las causas básicas que potencialmente pueden causar daño a la integridad física del trabajador o a los recursos de la organización.
Durante el periodo del mes de Julio de 2026, se desarrollaron las siguientes actividades:

- Inspecciones periódicas de seguridad en las áreas de trabajo
- Verificación del suministro, uso y estado de los Elementos de Protección Personal (EPP)
- Señalización y demarcación de las diferentes frentes de trabajo dentro de la obra
- Inspección de herramientas, equipos y maquinaria
- Charlas de seguridad y capacitaciones al personal en pro del mejoramiento de la seguridad y salud en el trabajo.
- Diligenciamiento y socialización de permisos de trabajo y ATS
- Verificación de las condiciones de higiene y bienestar laboral

Las actividades realizadas en este periodo están orientadas a preservar la salud y bienestar del trabajador en el desarrollo de cada una de sus tareas asignadas en el trabajo. El gran objetivo con el desarrollo de estas actividades es concientizar al personal sobre el autocuidado y la prevención como reglas básicas para evitar accidentes e incidentes de trabajo, estas actividades son:

Fomentar el orden y aseo en cada frente de trabajo, El objetivo principal es la adecuada disposición de estos y que el área permanezca en condiciones óptimas de orden y aseo.

Socialización de charlas de seguridad, donde se identifican los riesgos a los cuales se encuentran expuestos en las actividades que realizan durante su jornada laboral, concientizándolos en el uso correcto y permanente de los Elementos de Protección Personal (EPP), con el fin de cuidar su salud y evitar que se presenten accidentes de trabajo o enfermedades laborales.

Entrega de EPP a los trabajadores, se hace acompañamiento y verificación de la entrega de estos, donde se facilita el elemento requerido dependiendo de la actividad y el riesgo al cual se encuentra expuesto el trabajador. Se verifica que el personal porte correctamente los elementos de protección personal y les den un uso adecuado. Como constancia a la entrega el trabajador firma formato de la respectiva entrega.



FOTOGRAFIA 1. Charla de seguridad

4.5 REPORTES DE ACCIDENTES LABORALES

En el periodo del mes de JULIO de 2026 no se presentan accidentes

ELABORÓ:

Ing. JHONAL DEAVIES MORENO SUAREZ
Residente SST – OSCAR RAUL SARMIENTO DAZA

ANEXOS

PANILLAS DE SEGURIDAD PROFESIONALES Y TRABAJADORES

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1057410871		OSCAR RAUL SARMIENTO DAZA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	MZ C CS 27 BRR VILLA ISABEL	MIRAFLORES-BOYACA	3114373101	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	544165978	9509218255	E	2026/08/20	2026/08/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$2,169,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: TUNJA (4 Afiliados)						$7,003,620	$1,120,800			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$487,600		$0	$0
Centro de Trabajo: TUNJA (4 Afiliados)						$7,003,620	$1,120,800			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$487,600		$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (4 Afiliados)						$7,003,620	$1,120,800			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$487,600		$0	$0
1	CC	7175530	ESPINEL JOSE	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
2	CC	80024382	PERAZA HILDEBRANDO	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
3	CC	1051184316	PERAZA KEVIN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
4	CC	1002402952	PERAZA MAIKOL	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
Total			**Afiliados(4)**			$7,003,620	$1,120,800			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$487,600		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$1,120,800	$0	$0	$1,120,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$840,600	$0	$0	$840,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$487,600	$0	$0	$487,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$487,600	$0	$0	$487,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$280,400	$0	$0	$280,400
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	4	$280,400	$0	$0	$280,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$280,400	$0	$0	$280,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$280,400	$0	$0	$280,400
TOTAL				**4**	**$2,169,200**	**$0**	**$0**	**$2,169,200**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1057410871
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			OSCAR RAUL SARMIENTO DAZA SARMIENTO DAZA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MIRAFLORES	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	MANZANA C CASA 27 VILLA ISABEL	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**6024696243**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/08/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		559357208

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 1.016.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.016.000	$ 0	$ 1.016.000
SUBTOTALES:										**$ 1.016.000**	**$ 0**	**$ 1.016.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 793.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 793.800	$ 0	$ 0	$ 793.800
SUBTOTALES:													**$ 793.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 793.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 66.300	$ 66.300	$ 0	$ 0	$ 66.300
SUBTOTALES:									**$ 66.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 66.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD					ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1057410871	SARMIENTO DAZA OSCAR RAUL	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 6.350.000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 6.350.000	$ 1.016.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.016.000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 6.350.000	$ 793.800	$ 0	$ 793.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 6.350.000	105741087	$ 66.300		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.876.100

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1057410871		OSCAR RAUL SARMIENTO DAZA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	MZ C CS 27 BRR VILLA ISABEL	MIRAFLORES-BOYACA	3114373101	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	544165978	9509218255	E	2026/08/20	2026/08/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$2,169,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: TUNJA (4 Afiliados)						$7,003,620	$1,120,800			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$487,600		$0	$0
Centro de Trabajo: TUNJA (4 Afiliados)						$7,003,620	$1,120,800			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$487,600		$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (4 Afiliados)						$7,003,620	$1,120,800			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$487,600		$0	$0
1	CC	7175530	ESPINEL JOSE	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
2	CC	80024382	PERAZA HILDEBRANDO	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
3	CC	1051184316	PERAZA KEVIN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
4	CC	1002402952	PERAZA MAIKOL	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
Total			**Afiliados(4)**			$7,003,620	$1,120,800			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$487,600		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$1,120,800	$0	$0	$1,120,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$840,600	$0	$0	$840,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$487,600	$0	$0	$487,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$487,600	$0	$0	$487,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$280,400	$0	$0	$280,400
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	4	$280,400	$0	$0	$280,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$280,400	$0	$0	$280,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$280,400	$0	$0	$280,400
TOTAL				**4**	**$2,169,200**	**$0**	**$0**	**$2,169,200**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1057410871		OSCAR RAUL SARMIENTO DAZA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	MZ C CS 27 BRR VILLA ISABEL	MIRAFLORES-BOYACA	3114373101	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	559374628	9509386357	E	2026/08/20	2026/08/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$108,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BUENAVISTA (1 Afiliados)					$350,181	$56,100			$350,181	$14,100			$350,181	$14,100			$350,181	$24,400		$0	$0
Centro de Trabajo: BUENAVISTA (1 Afiliados)					$350,181	$56,100			$350,181	$14,100			$350,181	$14,100			$350,181	$24,400		$0	$0
Ciudad: BUENAVISTA Depto: BOYACA (1 Afiliados)					$350,181	$56,100			$350,181	$14,100			$350,181	$14,100			$350,181	$24,400		$0	$0
1	CC 74348221	MORENO JHONAL	230301	6	$350,181	$56,100	EPS037	6	$350,181	$14,100	CCF10	6	$350,181	$14,100	14-23	6	$350,181	$24,400	6	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$350,181	$56,100			$350,181	$14,100			$350,181	$14,100			$350,181	$24,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$56,100	$0	$0	$56,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$56,100	$0	$0	$56,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$24,400	$0	$0	$24,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$24,400	$0	$0	$24,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,100	$0	$0	$14,100
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$14,100	$0	$0	$14,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,100	$0	$0	$14,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$14,100	$0	$0	$14,100
TOTAL				**1**	**$108,700**	**$0**	**$0**	**$108,700**
