GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA DE PROYECTOS

CONTRATO DE OBRA No. 2543 DE 2025 SUSCRITO ENTRE GOBERNACION DE BOLIVAR Y CONSORCIO ESTADIOS DE SOFTBALL CI.

OBJETO DEL CONTRATO:
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESTADIOS DE SOFTBALL PARA EL FOMENTO DE LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

INFORME MENSUAL DE OBRA No 7.

PERIODO DEL: 1 AL 31 MAYO DE 2026.

INFORME MENSUAL N° 7
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESTADIOS DE SOFTBALL PARA EL FOMENTO DE LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

1. INTRODUCCIÓN.

En el marco de las estrategias de fortalecimiento del sector deportivo, el Departamento de Bolívar celebró el Contrato de Obra No. 2543 de 2025, cuyo propósito es la adecuación e intervención de cinco (5) escenarios destinados a la práctica del softball. Estas actuaciones se ejecutarán en el Distrito de Cartagena de Indias y en el municipio de Arjona, consolidando una apuesta institucional por el mejoramiento de la infraestructura deportiva en el territorio.

La materialización de este proyecto representa una inversión estratégica en el desarrollo social y deportivo del departamento. La optimización de estos escenarios no solo facilita la realización de actividades recreativas y competitivas, sino que fortalece la cohesión social, el sentido de pertenencia y la identidad regional a través del deporte.

Asimismo, contar con infraestructura en condiciones técnicas adecuadas permite proyectar a Bolívar como un referente regional para la organización de eventos deportivos de mayor alcance, dinamizando sectores como el turismo y el comercio, y generando nuevas oportunidades para la identificación y formación de talentos locales.

En consecuencia, las intervenciones contempladas en el contrato contribuyen de manera integral al crecimiento deportivo, económico y social del departamento, impactando positivamente a las comunidades beneficiadas.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El diagnóstico actual evidencia que los espacios destinados a la recreación y al deporte en el territorio presentan limitaciones significativas en términos de capacidad, funcionalidad y estado físico. La infraestructura existente no responde adecuadamente a las necesidades de la población, lo que restringe el acceso a escenarios apropiados para la práctica deportiva y el aprovechamiento saludable del tiempo libre.

El deterioro progresivo de estos espacios ha generado una disminución en la participación comunitaria en actividades físicas, afectando el desarrollo de competencias deportivas y reduciendo las oportunidades de integración social. Esta situación incide directamente en el incremento del sedentarismo y en la adopción de hábitos poco saludables dentro de la comunidad.

La insuficiencia de infraestructura adecuada limita el fortalecimiento de habilidades

en niños, jóvenes y adultos, impidiendo la consolidación de procesos formativos y competitivos. En consecuencia, se desaprovecha el potencial deportivo del departamento y se incrementan problemáticas asociadas a la falta de actividad física, tales como enfermedades relacionadas con el sobrepeso y otras afecciones derivadas del sedentarismo.

Adicionalmente, la carencia de escenarios en condiciones óptimas impacta negativamente la convivencia ciudadana y la integración familiar, al reducir los espacios seguros de encuentro comunitario. Esta circunstancia puede propiciar el aumento de fenómenos sociales adversos y debilitar los entornos de desarrollo integral de la población.

Por otra parte, la falta de infraestructura adecuada obliga a deportistas con proyección a buscar alternativas fuera de su lugar de origen, lo que limita la consolidación de procesos deportivos locales y afecta la competitividad del Departamento de Bolívar en el ámbito del softball a nivel departamental, regional y nacional.

En este contexto, el proyecto surge como una respuesta estructural a las necesidades identificadas, orientada a mejorar las condiciones físicas de los escenarios deportivos, fortalecer el tejido social y promover el desarrollo económico y deportivo del territorio.

2.1. **LOCALIZACIÓN.**

CAMPO DE SOFTBALL DE "EL SOCORRO".

La locación del escenario deportivo a intervenir se encuentra en la ciudad de Cartagena D.T, Bolívar, en el barrio El Socorro. Con base a la información otorgada por el MIDAS la dirección del campo de softbol El Socorro es la K 73 19b 06, con un número de referencia predial 010502400001000. De igual forma, las coordenadas del predio bajo el marco geocéntrico Nacional de Referencia (MAGNA-SIRGAS) son 846176.1260267297 (ESTE), 1640166.6727991228 (NORTE).



CAMPO DE SOFTBALL DE "LAS GAVIOTAS"

La locación del escenario deportivo a intervenir se encuentra en la ciudad de Cartagena D.T, Bolívar. Ubicado en el barrio Las Gaviotas, a unos metros de su entrada principal, colindante con la institución educativa Las Gaviotas. Con base a la información otorgada por el MIDAS la dirección del campo de softbol Las Gaviotas es la K 61 33b 89, con un número de referencia predial 010406160001000.

De igual forma, las coordenadas del predio bajo el marco geocéntrico Nacional de Referencia (MAGNA-SIRGAS) son 845114.8355923647 (ESTE) ,1642152.4536689136 (NORTE).



CAMPO DE SOFTBALL SANTA RITA

La localización del escenario deportivo a intervenir se encuentra en la ciudad de Cartagena D.T, Bolívar. Con nombre oficial "Estadio José Miguel Corpas", este estadio está ubicado en el barrio Santa Rita, en inmediación con el CAI de Santa Rita y colinda con el mercado que lleva el mismo nombre. Con base a la información otorgada por el MIDAS la dirección del campo de softbol de Santa Rita es la K 17 54 52, con un número de referencia predial 010203330001000. De igual forma, las coordenadas del predio bajo el marco geocéntrico Nacional de Referencia (MAGNA-SIRGAS) son 841271.13 (ESTE), 1646185.60 (NORTE).






CAMPO DE SOFTBALL DE "LOS CERROS"

La localización del escenario deportivo a intervenir se encuentra en la ciudad de Cartagena D.T, Bolívar. Ubicado en el barrio Paraguay, a unas cuadras del centro de capacitación y habilitación "ALUNA". Colinda con los barrios República de Chile, Altos de San Isidro y las Brisas. Con base a la información otorgada por el MIDAS la dirección del campo de softbol de Los Cerros es la D 26 47 185, con un número de referencia predial 010301470052000. De igual forma, las coordenadas del predio bajo el marco geocéntrico Nacional de Referencia (MAGNA-SIRGAS) son 842938.2511843444(ESTE), 1641747.5720782212 (NORTE).



CAMPO DE SOFTBALL ARJONA

La localización del escenario deportivo a intervenir se encuentra en el municipio de Arjona, Bolívar. Con nombre oficial "Estadio 3 de mayo", este estadio está ubicado en el barrio La Cruz, en inmediación con el Iglesia cristina Orabes Paraklero y colinda con la Troncal del Caribe sobre la Ruta Nacional 90. Con base a la información obtenida del levantamiento topográfico, las coordenadas del predio bajo el marco geocéntrico Nacional de Referencia (MAGNA-SIRGAS) son 861404.87 (ESTE), 1624784.43 (NORTE).

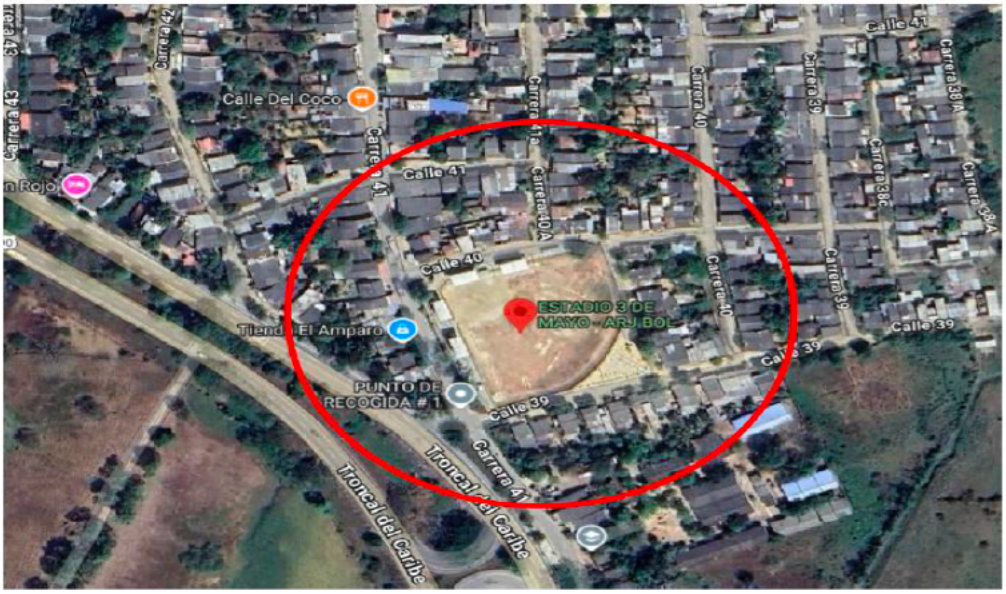

2.2. **Inventario y estado inicial de los escenarios deportivos**.

Estadio de Softball del barrio el Socorro.

De este escenario deportivo con un área aproximada de 14.120 m2, teniendo en cuenta la lista de chequeo del cuadro N° 1, se concluye que, la infraestructura actual y renovada a finales del año 2023, no satisface las necesidades, tanto de los espectadores como de los practicantes del softball. En primer lugar, la infraestructura intervenida nueva (gradas, dogouts, cuarto eléctrico y cerramiento del campo de juego) no es suficiente para la demanda de la comunidad deportiva que asiste a este escenario; actualmente tiene un aforo aproximado de 300 personas cuando en la práctica asisten entre 400 y 500 personas cuando hay torneos. Por otra parte, el perímetro del escenario debido a la antigüedad de la infraestructura, a la falta de mantenimiento correctivo y preventivo, además de la exposición al ambiente agresivo de Cartagena, presenta un alto grado de deterioro en su apariencia física. Lo cual se evidencia en el mal estado de la cancha múltiple, la superficie del área del campo de juego, el mal estado de las zonas verdes, la ausencia de baterías sanitarias, la existencia de locales comerciales y parqueos privados presuntamente ilegales ante la administración municipal (IDER), además de la deficiencia en la iluminación con que cuenta el escenario deportivo, el cual no reúne las condiciones mínimas solicitadas en la normatividad vigente para estos escenarios.



Estadio de Softball del barrio las Gaviotas.

El Campo de softball de Las Gaviotas tiene un área aproximada de 8.750 m2. Actualmente la infraestructura del escenario no brinda las condiciones ideales deportivas para desarrollar el deporte del softball de manera adecuada, poniendo en riesgo la integridad física de los practicantes, así como la de los espectadores, no sin antes mencionar la seguridad del escenario en sí mismo como tal ya que el cerramiento existente no es el adecuado y no se encuentra en buen estado. Por lo antes mencionado y registrado en el cuadro N° 2, se hace necesario realizar una reconstrucción total del escenario deportivo.




Estadio de Softball del barrio los Cerros.

Con un área aproximada de 6.500 m2, el campo de softball de Los Cerros, según la lista de chequeo del cuadro N° 3, se concluye que es necesaria una intervención total, donde

se aumente el aforo de 140 personas a 244 personas, incrementando en un 175%. Por el estado de su infraestructura y debido a que el este escenario ha sido vandalizado en reiteradas ocasiones, la intervención de este debe ser completa.



Estadio de Softball del barrio Santa Rita.
En un área aproximada de 5494,19 m2 se tiene un campo de softball con características de diseño que no cumplen con las solicitudes del Ministerio del Deporte y su infraestructura se encuentra en alto grado de deterioro, como se registra en el cuadro N° 4, es necesaria la reconstrucción total de este escenario deportivo.

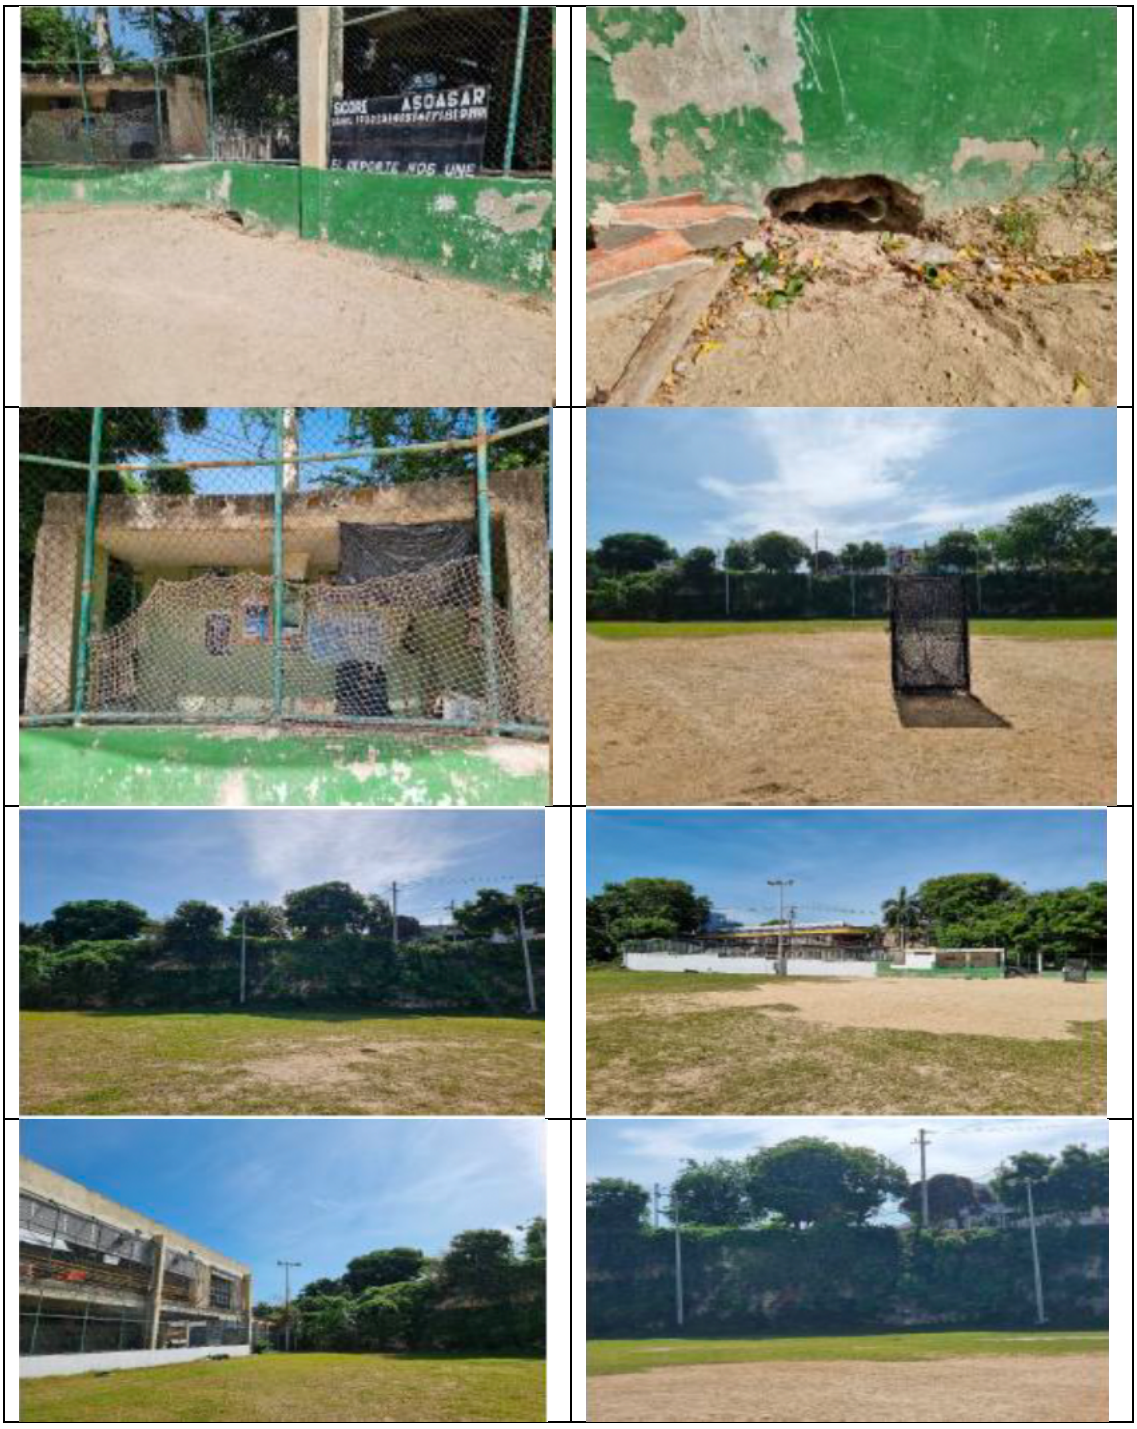
ASOASAR

Estadio de Softball del Municipio de Arjona.
En un área de aproximadamente 8,025.37 m², se encuentra un campo de softball cuya infraestructura presenta características de diseño que no cumplen con los requisitos establecidos por el Ministerio del Deporte, además de estar deteriorada por el paso del tiempo. No obstante, la intervención será parcial, con el objetivo de mejorar las condiciones actuales del escenario deportivo. En este sentido, se llevarán a cabo actividades de reparación, mantenimiento y embellecimiento de las estructuras existentes.







2.3. **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO**.

A continuación se detalla la intervención a realizar en cada escenario, así:

ESTADIO DE SOFTBALL DEL BARRIO EL SOCORRO.

Para optimizar el servicio que presta el Campo de Softball del barrio El Socorro a la comunidad en general, se propone lo siguiente:

- Incremento del aforo de 300 a 620 personas con 2 graderías en segundo nivel (Base 1° y Base 3°).
- Locales comerciales en primer nivel para sostenimiento del escenario deportivo.
- Batería de baños de damas, caballeros y PMR.
- Un Sistema de drenaje dentro del campo de juego construido a partir de una primera capa canto rodado fracturado (3/4"-1") y una serie de tuberías livianas perforadas, de excelente desempeño estructural y útil en drenajes por exfiltración e infiltración en cumplimiento de la norma NTC 4764.
- Adecuación del campo de juego con mezcla de polvo de arcilla en el infield y grama sintética en el outfield.
- Ampliar el sistema de redes hidráulicas, sanitarias y eléctricas.
- Cambio del sistema de iluminación del campo de juego
- Instalar acometidas para el paso de tubería del servicio de gas natural
- Construcción de tanque de almacenamiento de agua potable
- Intervención de las zonas verdes.
- Construcción de senderos peatonales y andenes.
- Remodelación de altar a la virgen
- Reconstrucción total de la cancha múltiple existente por una sola de fútbol.
- Construcción de cancha de básquetbol
- Construcción de área para maquinas biosaludables.
- Construcción de zona de juegos infantiles.
- Construcción del cerramiento Interno de cancha.

- Construcción de SCORE
- Construcción del cerramiento perimetral.

ESTADIO DE SOFTBALL DEL BARRIO LAS GAVIOTAS.

El Campo de Softball del barrio Las Gaviotas requiere una intervención con el siguiente alcance:

- Incremento del aforo de 250 a 696 personas (Equivalente al 278%) con 2 graderías en segundo nivel (Base 1° y Base 3°).
- Locales comerciales en primer nivel para sostenimiento del escenario deportivo.
- Batería de baños de damas, caballeros y PMR.
- Un Sistema de drenaje dentro del campo de juego construido a partir de una primera capa canto rodado fracturado (3/4"-1") y una serie de tuberías livianas perforadas, de excelente desempeño estructural y útil en drenajes por exfiltración e infiltración en cumplimiento de la norma NTC 4764.
- Adecuación del campo de juego con mezcla de polvo de arcilla en el infield y grama sintética en el outfield.
- Ampliar el sistema de redes hidráulicas, sanitarias y eléctricas.
- Cambio del sistema de iluminación del campo de juego
- Instalar acometidas para el paso de tubería del servicio de gas natural
- Construcción de tanque de almacenamiento de agua potable
- Intervención de las zonas verdes.
- Construcción del cerramiento Interno de cancha.
- Construcción de senderos peatonales y andenes.
- Construcción SCORE
- Construcción del cerramiento perimetral.

ESTADIO DE SOFTBALL DEL BARRIO LOS CERROS.

Para optimizar el servicio que presta el Campo de Softball del barrio Los Cerros a la comunidad en general, se propone lo siguiente. V Incremento del aforo de 140 a 244 personas con 2 graderías en primer nivel (Base 1° y Base 3°).

- Batería de baños de damas, caballeros y PMR.
- Un Sistema de drenaje dentro del campo de juego construido a partir de una primera capa canto rodado fracturado (3/4"-1") y una serie de tuberías livianas perforadas, de excelente desempeño estructural y útil en drenajes por exfiltración e infiltración en cumplimiento de la norma NTC 4764.
- Adecuación del campo de juego con mezcla de polvo de arcilla en el infield y grama sintética en el outfield.
- Ampliar el sistema de redes hidráulicas, sanitarias y eléctricas.
- Cambio del sistema de iluminación del campo de juego

- Construcción de tanque de almacenamiento de agua potable
- Intervención de las zonas verdes.
- Construcción de andenes.
- Construcción SCORE
- Construcción del cerramiento Interno de cancha.
- Construcción del cerramiento perimetral.

ESTADIO DE SOFTBALL DEL BARRIO SANTA RITA

Para la reconstrucción del Campo de Softball del barrio Santa Rita, se propone lo siguiente.

- Graderías en primer nivel (Base 1° y Base 3°) aforo aproximado de 475 personas.
- Batería de baños de damas, caballeros y PMR.
- Un Sistema de drenaje dentro del campo de juego construido a partir de una primera capa canto rodado fracturado (3/4"-1") y una serie de tuberías livianas perforadas, de excelente desempeño estructural y útil en drenajes por exfiltración e infiltración en cumplimiento de la norma NTC 4764.
- Adecuación del campo de juego con mezcla de polvo de arcilla en el infield y grama sintética en el outfield.
- Rediseñar el sistema de redes hidráulicas, sanitarias y eléctricas.
- Cambio del sistema de iluminación del campo de juego
- Construcción de tanque de almacenamiento de agua potable.
- Intervención de las zonas verdes.
- Construcción de andenes.
- Construcción SCORE
- Construcción del cerramiento Interno de cancha.
- Construcción del cerramiento perimetral.

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA.

3.1. IDENTIFICACION DEL CONTRATO.

Concepto	Descripción
Entidad Contratante	Gobernación de Bolívar – Secretaría de Infraestructura
Contratista	CONSORCIO ESTADIOS DE SOFTBALL CI
Integrantes	AFA Consultores y Constructores S.A. (30%) Constructora del Cambio S.A.S. (70%)
NIT	901.983.585-2
Contrato de Obra No.	2543 DE 2025
Objeto	Construcción y mejoramiento de estadios de softball para el fomento de la recreación y el deporte en el Departamento de Bolívar.
Valor Inicial	$ 44.538.617.761
Plazo de Ejecución	18 Meses
Fecha de Inicio	31 de octubre de 2025
Fecha de Terminación	30 de abril de 2027
Periodo del Informe	1 al 31 de ENERO de 2025 (Mes 3)
Interventoría	Consorcio Interventoría Estadios 2025 (Contrato No. 25-0106)

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES.

Durante el mes de mayo, se mantuvo la ejecución simultánea de actividades en los diferentes frentes de obra correspondientes a los escenarios deportivos objeto del contrato, desarrollando labores de cimentación, estructuras, cerramientos, urbanismo, drenajes, instalaciones eléctricas y adecuación de campos de juego, de conformidad con las especificaciones técnicas, diseños aprobados y programación vigente del proyecto.

3.2.1 ESTADIO LAS GAVIOTAS

Durante el periodo reportado se registraron avances en los componentes de cerramiento interno, graderías, sistema SCORE y adecuación del campo deportivo.

Cerramiento Interno de Campo

Las actividades se concentraron principalmente en la ejecución de pañete liso sobre muros exteriores con mortero en relación 1:3, permitiendo la preparación de superficies para la construcción de la viga cinta y la instalación de su correspondiente refuerzo estructural. Estos trabajos contribuyen a la consolidación y terminación progresiva de este componente.

Graderías Campo de Softball

Se culminó la instalación del acero de refuerzo correspondiente a las columnas estructurales de graderías, permitiendo avanzar en las actividades de formaleteado y posterior vaciado de concreto con resistencia de diseño f'c = 4.000 psi.

La fundición de los elementos estructurales se ejecutó en dos etapas, garantizando el cumplimiento de los procedimientos de control de calidad relacionados con alineación, verticalidad, dosificación, vibrado, acabado y curado del concreto. Paralelamente, se continuó con la conformación de rellenos mediante suministro y compactación de material tipo zahorra en capas sucesivas, alcanzando densidades acordes con las especificaciones técnicas del proyecto.

Sistema SCORE

Se continuó con la construcción de la estructura arquitectónica mediante el levantamiento de mampostería, ejecución de pañetes interiores y exteriores e instalación de elementos calados en bloque, avanzando en la configuración definitiva de la edificación.

Cancha de Softball

Durante el periodo se finalizaron las actividades de movimiento de tierras requeridas para la conformación del campo de juego, incluyendo excavaciones, cortes, nivelaciones y retiro de material sobrante.

Adicionalmente, se recibió e instaló material filtrante compuesto por piedra china fracturada con granulometría entre ½" y 1", complementando la construcción del sistema de drenaje. Se continuó con la instalación de capas de zahorra compactadas al 95% Proctor Modificado, extendido de geotextil NT-1600, colocación del material granular para el lecho filtrante e instalación de registros y tuberías de drenaje.

3.2.2 ESTADIO EL SOCORRO

Durante el mes de mayo se desarrollaron actividades en los frentes correspondientes a cerramiento interno, graderías, cuarto eléctrico, módulos sanitarios, senderos peatonales, movimiento de tierras e instalaciones eléctricas.

Se ejecutaron excavaciones mecánicas en áreas de campo y excavaciones para cimentaciones de graderías, así como el retiro, transporte y disposición final del material producto de excavaciones y demoliciones.

En el componente estructural se adelantaron actividades de localización y replanteo, construcción de concretos de limpieza, instalación de material granular seleccionado, armado de formaletas, figuración e instalación de acero de refuerzo y preparación de elementos para fundición de cimentaciones.

Respecto al cerramiento interno del campo, se avanzó en la construcción de muros en mampostería de bloque liso, ejecución de pañetes, fundición de machones en concreto reforzado y disposición de pasantes para futuras instalaciones.

En el componente urbanístico se desarrolló la construcción de senderos peatonales y bordillos perimetrales, mientras que en el frente eléctrico se avanzó en la figuración del acero de refuerzo y preparación de cimentaciones para los mástiles de iluminación, garantizando la continuidad de las actividades programadas.

3.2.3 ESTADIO SANTA RITA

Cerramiento Interno de Campo

Durante el mes de mayo se continuó con la ejecución de las actividades correspondientes a la cimentación y elevación del cerramiento interno del campo.

Se realizaron excavaciones manuales, colocación de concretos de limpieza, construcción de zapatas y pedestales en concreto reforzado e instalación de acero fy = 60.000 psi, verificando el cumplimiento de los parámetros establecidos en planos y especificaciones técnicas.

Igualmente, se avanzó en la construcción de vigas de cimentación, instalación de dovelas de anclaje y colocación de material granular seleccionado para mejoramiento de la capacidad portante del terreno.

En la etapa de superestructura se ejecutó la construcción de machones en concreto reforzado, levantamiento de muros en bloque No. 15 e instalación del acero correspondiente a la viga cinta, garantizando la integración estructural del sistema de cerramiento.

Sistema SCORE

Las actividades estuvieron orientadas a la conformación de la cimentación que soportará la estructura del marcador.

Se ejecutaron excavaciones manuales y perfilación mecánica, instalación de material granular seleccionado, construcción de concretos de limpieza y fundición de zapatas en concreto de 4.000 psi.

De manera complementaria, se instaló el acero de refuerzo estructural conforme a los diseños aprobados, verificando alineamientos, recubrimientos y condiciones constructivas requeridas para la correcta ejecución de la cimentación.

3.2.4 ESTADIO LOS CERROS

Durante el periodo se concentraron esfuerzos en la construcción de graderías, módulos sanitarios, senderos peatonales y obras de contención, registrando avances significativos en la infraestructura principal del escenario deportivo.

Gradería Primera Base

Se ejecutaron excavaciones para cimentaciones, retiro y disposición final del material sobrante, construcción de concretos de limpieza y fundición de elementos estructurales asociados a zapatas, vigas de cimentación y columnas.

Asimismo, se realizó el suministro, figuración e instalación del acero de refuerzo requerido para los diferentes elementos estructurales y se avanzó en la construcción de vigas y graderías en concreto reforzado, consolidando la estructura principal de este sector.

Gradería Tercera Base

Las actividades comprendieron excavaciones para fundaciones, conformación de cimentaciones, instalación de acero de refuerzo y fundición de columnas, vigas y graderías en concreto reforzado, permitiendo el avance sostenido de la estructura proyectada.

Baños PMR y Damas

Se inició la construcción de las cimentaciones correspondientes a los módulos sanitarios mediante excavaciones manuales, retiro de material, instalación de acero de refuerzo y fundición de vigas de cimentación que servirán de soporte para la futura estructura arquitectónica.

Sendero Peatonal

Se ejecutaron actividades de excavación, conformación de estructura granular mediante suministro y compactación de material tipo zahorra, instalación de lámina de polietileno como barrera de separación y posterior construcción de rampas de acceso en concreto reforzado con malla electrosoldada, garantizando condiciones adecuadas de accesibilidad.

Muro de Contención

Se avanzó en la excavación y conformación de la cimentación del muro, incluyendo la colocación de concreto de limpieza y posterior fundición de elementos estructurales en concreto reforzado de 4.000 psi.

De igual manera, se ejecutó la instalación de material granular seleccionado para relleno estructural y drenaje posterior, contribuyendo a la estabilidad del sistema de contención proyectado.

En términos generales, las actividades desarrolladas durante el periodo permitieron consolidar importantes avances en estructuras principales, urbanismo y obras complementarias requeridas para el funcionamiento integral del escenario deportivo.

3.2.5 MUNICIPIO DE ARJONA (ESTADIO 3 DE MAYO)

Durante el periodo reportado se desarrollaron actividades en los componentes de cerramiento interno, graderías, campo de juego e instalaciones eléctricas, manteniendo la secuencia constructiva definida para el proyecto.

Cerramiento Interno de Campo

Se avanzó en la ejecución de cimentaciones mediante fundición de zapatas y machones, instalación de acero de refuerzo, construcción de vigas de cimentación y suministro de material granular para mejoramiento de apoyo.

Asimismo, se continuó con el levantamiento de mampostería en bloque No. 15 y la aplicación de pañete impermeabilizado relación 1:3, cumpliendo con las especificaciones técnicas y los controles topográficos establecidos para el proyecto.

Graderías y Dugouts

Se ejecutaron excavaciones, mejoramiento de suelos, armado de acero y fundición de zapatas para las graderías de primera y tercera base. De igual manera, se realizaron fundiciones de vigas de cimentación, columnas y elementos estructurales asociados a los dugouts, permitiendo avanzar en la conformación de la estructura portante de estos sectores.

Campo de Juego

Se continuó con las actividades de corte, relleno y conformación geométrica del terreno, garantizando los niveles y pendientes establecidos en diseño.

Posteriormente, se ejecutó la instalación del sistema de drenaje mediante la colocación de geotextil NT-1600 y piedra china fracturada, complementando la estructura filtrante requerida para el adecuado manejo de aguas dentro del campo deportivo.

Instalaciones Eléctricas

Se adelantaron actividades relacionadas con el suministro y preparación para instalación de mástiles metálicos galvanizados de 18 metros de altura, diseñados para soportar velocidades de viento de hasta 130 km/h.

Asimismo, se gestionó el suministro de proyectores deportivos de alta eficiencia luminosa, destinados al sistema de iluminación del estadio, garantizando el cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos para la operación del escenario deportivo.

4.AVANCE FISICO Y FINANCIERO

A la fecha de corte del 31 de MAYO de 2026, se presenta el siguiente balance de ejecución conforme a la programación aprobada:

4.1. RESUMEN DE AVANCE.

Concepto	Programado (Mes)	Ejecutado (Mes)	Programado (Acumulado)	Ejecutado (Acumulado)
Avance Físico (%)	4,24%	15,43%	54,99%	50,00%
Avance Financiero ($)	$ 1.886.967.023,18	$ 6.872.308.720,52	$ 24.490.315.536,88	$ 22.269.308.880,50

4.2. INVERSIÓN EJECUTADA EN EL PERIODO (MAYO 2026)

No	SUBCAPÍTULOS	% PROGRAMADO ACUMULADO	%EJECUTADO ACUMULADO
1	PRELIMINARES	100,64%	94,60%
2	CANCHAS DEPORTIVAS	39,42%	43,44%
3	ZONA DE JUEGOS INFANTILES	11,29%	11,29%
4	CERRAMIENTO DE FACHADA DE CAMPO DE JUEGO	1,37%	17,97%
5	CERRAMIENTO INTERNO CAMPO	41,70%	50,58%
6	CUARTO ELECTRICO Y BOMBAS Y TANQUE	33,06%	35,00%
7	GRADERÍA TERCERA BASE CAMPO DE SOFTBOL	28,85%	51,37%
8	GRADERÍA PRIMERA BASE CAMPO DE SOFTBOL	17,92%	42,16%
9	BAÑOS PMR Y DAMAS PRIMERA BASE	2,13%	10,12%
10	BAÑOS DAMAS TERCERA BASE (ESCALERA DE EMERGENCIA)	0,76%	0,00%
11	BAÑOS GENERAL TERCERA BASE	0,55%	5,81%
12	SCORE	20,35%	20,96%
13	SENDERO PEATONAL	12,93%	31,66%
14	OBRAS EXTERIORES	54,36%	30,34%
15	CANCHA DE SOFTBALL	48,84%	73,34%
16	PORTICO DE ACCESO	4,17%	0,00%
17	MURO DE CONTENCIÓN	40,18%	83,14%
18	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	0,00%	4,92%
19	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	26,41%	29,54%
20	GAS NATURAL Y/O PROPANO	0,00%	0,00%
21	MANTENIEMIENTO Y RECTIFICACION DE CANALES DE DRENAJE	0,00%	50,00%
22	ASEO FINAL	9,66%	9,66%
23	Certificación Retie	0,00%	0,00%
24	Certificación Retilap	0,00%	0,00%
25	Trámites de Conexión Servicios Públicos	0,00%	30,00%
26	Presupuesto PGIO	33,33%	66,67%
27	Presupuesto PMT	33,33%	66,67%
28	Presupuesto PMA	33,33%	66,67%
29	Apoyo a supervision	0,00%	0,00%
	TOTAL PROYECTOS	**54,99%**	**50,00%**

4.3. CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA.

Para la ejecucion de las actividades registradas en periodo de este informe se ha tenido la siguiente maquinaria y/o equipos en los diferentes frentes:

Maquinaria y Equipos
Estadio de Softball barrio Las Gaviotas
Mini Cargador
Camión Tipo Turbo
Volqueta
Retroexcavadora de Llantas
Vibro Compactador

Benitin
Estacion topografica + Tripode
Nivel optico + Tripode
Mezcladora de concreto 1
Mezcladora de concreto 2
Canguro
Herramientas menores
Estadio de Softball Municipio de Arjona
Retroexcavadora de Llantas
MINI CARGADOR
ESTACIÓN TOPOGRAFICA
NIVEL OPTICO
VOLQUETA
HERRAMIENTA MENOR
MEZCLADORA DE CONCRETO
TRONZADORA
CANGURO
VIBROCOMPACTADOR
RANA
Estadio de Softball Barrio el Socorro
Minicargador
Retroxexcavadora de llanta
Vibrocompactador (canguro)
Rana
Vibrocompactador de rodillo
Mezcladora de concreto
Vibrador de concreto
Tronzadora
Estación topografica + tripode
Nivel optico + tripode
Herramientas menores
Estadio de Softball Barrio Los Cerros
Mini Cargador
Retroexcavadora de Llanta
Tronzadora
Estación topograaáfica + tripode

Nivel optico + tripode
Herramientas menores
Mezcladora de concreto
Taladro Percutor
Estadio de Softball barrio Santa Rita
Mini Cargador
Vibrocompactador
Tronzadora
Estación topograáfica + tripode
Nivel optico + tripode
Herramientas menores
Mezcladora de concreto
Retroexcavadora de Llantas

4.4. CONTROL DE PERSONAL DE OBRA.

Para la ejecucion y desarrollo del proyecto, se registra el siguiente personal de obra:

Nombre	Cargo
Estadio de Softball barrio Las Gaviotas	
ILICH RAMOS	**RESIDENTE DE OBRA**
JESUS MARRUGO	**RESIDENTE JUNIOR**
JULIETH ESPINOSA	**AUXILIAR ADMINISTRATIVA**
SERGIO GARAVITO	**TOPOGRAFO**
NICOLAS CONTRERAS	**ALMACENISTA**
MANUEL MARTINEZ	**OFICIAL**
JONNANCY PAREJA	**AYUDANTE 1**
RICARDO ROZO	**AYUDANTE 2**
LEONARDO ALTAMAR	**OPERADOR MINI CARGADOR**
ALFREDO PATRON	**OPERADOR RETROEXCAVADORA**
INDIRA MUÑOZ	**SST**
WILFRIDO CANABAL	**MAESTRO**
ALEJANDRO PEREZ	**OFICIAL**
LUIS CARLOS CORDOBA	**OFICIAL**
CARLOS GONZALEZ	**OFICIAL HERRERIA**
CARLOS ALBERTO DAVILA	**OFICIAL DE HERRERIA**

JEYSON ROMERO	OFICIAL MAMPOSTERIA
CIRO PIZA	OFICIAL MAMPOSTERIA
DAMAR SAYAS	AYUDANTE
ORLANDO VILORIA	AYUDANTE ADELANTADO
EDWIN MEDRANO	AYUDANTE
ALVARO VILLAR BELLO	AYUDANTE
MARTIN PACHECO JIRALDO	AYUDANTE
YESID ESTREMOR BLANCO	AYUDANTE
ARNOL BARRIOS CORTES	LATERO
DEIBIS ARROYO	AYUDANTE
ESTIVENSON ROJAS ALVAREZ	AYUDANTE
GIBRAN FANATE	AYUDANTE
JESUS VASQUEZ BARRAGAN	AYUDANTE
ORLANDO CABEZAS	OFICIAL
BLADIMIR PUERTAS	OFICIAL
ISMAEL JULIO	AYUDANTE
ENRIQUE POLO	AYUDANTE
LEIDER SAYAS	AYUDANTE
WILL OSORIO	OFICIAL
HUMBERTO HEREDIA	AYUDANTE
Estadio de Softball Municipio de Arjona	
ALBERTO GUZMAN	INGENIERO RESIDENTE
GERMAN GUERRERO	INSPECTOR
ISAAC GARCIA	ALMACENISTA
DAVID RAMOS	OFICIAL
LUIS GONZALES	AYUDANTE 1
JESUS CASTAÑO	AYUDANTE 2
ARGELIO JULIO	OPERADOR PAJARITA
JUAN CAMILO BURGOS	RESIDENTE INTERVENTORIA
ARTURO	TOPÓGRAFO 3
YOISER VILLADIEGO	OPERADOR MINI CARGADOR
YOVANI MARTINEZ	AYUDANTE
ALEXANDER ANGULO	OFICIAL
FABIO ARCE	AYUDANTE
ANDRÉS GUILLERMO	OFICIAL
RAFAEL COGOLLO	ENCARGADO
Claudio Díaz Castro	AYUDANTE
Miguel Simancas Fernandez	AYUDANTE

Luis Felipe simancas	**AYUDANTE**
Leonardo Romero	**AYUDANTE**
WLFRIDO CANAVAL	**ENCARGADO**
DANIEL ENRIQUE CARO	**AYUDANTE**
WILTON COGOLLO	**AYUDANTE**
ÓSCAR HERNANDEZ	**AYUDANTE**
ÓSCAR MENDOZA	**AYUDANTE**
JULIO MORALES	**AYUDANTE**
ERICK JINETE	**AYUDANTE**
César Castro Puello	**AYUDANTE**
FREDYS CANAVAL	**OFICIAL**
EVELIO MENDEZ	**OFICIAL**
Estadio de Softball Barrio el Socorro	
Stefany Torrente	**Residente de obra**
Sebastian Canchila	**Residente junior**
Miguel Nuñez	**Auxiliar administrativo**
Enrique Periñan	**HSE**
Claudia Martínez	**Topografa**
Juan Manuel Arias	**Alamacenista**
Jhonatan Beltran	**Operador de Minicargador**
Marcos Deboz	**Operador de Retroexcavadora**
Cristian Barrios	**Operador de Vibrocompactador**
Harrison Paz	**Oficial**
Robinson Flores	**Ayudante de obra**
David Barrios	**Ayudante de obra**
SUBCONTRATISTA BETHEL	
Kiara Torrente Arrieta	**Auxiliar administrativo Bethel**
Edwin Puello Villalba	**Encargado**
Amaury Martínez	**Ayudante de obra**
Ariel Castilla	**Oficial Herreria**
Bernardo Gonzalez	**Oficial**
Brayan Segrera Villa	
Bonair Barrios	**Ayudante de obra**
Carlos Suarez Castellar	**Ayudante de obra**
Cleide Barón	
Daniel Romero	
Daniel de la Osa	**Ayudante de obra**
Dilan Julio	**Ayudante de obra**

Eder Iregui	**Oficial**
Heider Puello Corpas	**Oficial**
Heder Elles Gongora	**Oficial**
Hermes Julio	**Ayudante de obra**
Humberto Gamarra	**Ayudante de obra**
Humberto Rivero	**Oficial**
Jesus Hernandez	**Ayudante de obra**
Jesus Vásquez	**Ayudante de obra**
Jhonatan Cabarcas Agamez	**Ayudante de obra**
Jorge Zabala	**Oficial Herreria**
José Cabeza	
José Castellón	
José Luis Valeta Linares	
Josias Mendivil	**Ayudante de obra**
Juan I Herrera Alvarez	**Ayudante de obra**
Leonardo Palomino	**Oficial Herreria**
Levid Porto Villanueva	
Luis Alberto Hernández	
Luis Carlos Cordoba	
Luis Casiani	
Luis Gómez	
Luis Perez Estrada	**Oficial**
Manuel Vergara	
Oscar Meléndez	
Oscar Vega	**Oficial**
Tomas Arnedo	**Oficial**
Yeison Salinas Cassiani	**Oficial**
Estadio de Softball Barrio Los Cerros	
Julian David Mesa	**Ingeniero Residente de Obra**
Isabella Taborda	**Residente Junior de Obra**
Dayana Ariza	**Inspector de SST**
Fabián Novoa	**Almacenista**
Cristian Berrio	**Operador Retroexcavadora de Llanta**
Luis Carlos Garcia	**Minicargador**
Alex Barrios	**Topografo**
Yosser Montes	**Encargado**
Jimmy Cortez	**Oficial de Herrería**
Elio Chacon Fortich	**Ayudante de Obra**

Alejandro Perez	**Oficial de Obra**
Adolfo Carey Perez	**Ayudante de Obra**
Anuar Serpa	**Oficial de Obra**
Luis Córdoba	**Oficial de Obra**
Oscar Castillo	**Ayudante de Obra**
Aldemar Valiente	**Oficial de Obra**
Eliecer Castillo	**Oficial de Herrería**
Yorman Muñoz	**Ayudante de Obra**
Ulises Salcedo	**Ayudante de Obra**
Fran Zarante	**Ayudante de Obra**
Richar Mata	**Ayudante de Obra**
Luis Velez	**Ayudante de Obra**
Humberto Ortiz	**Ayudante de Obra**
Luis Gamarra	**Ayudante de Obra**
Luis Zarante	**Oficial Latero**
Miller de Jesús Valencia	**Oficial de Albañileria**
William Muñoz	**Ayudante de Obra**
Alfredis Julio	**Ayudante de Obra**
Estadio de Softball barrio Santa Rita	
Jossie Pineda Atencia	**Residente de Obra**
Santiago Andrés Miranda Periñán	**Auxiliar residente**
Angel Castellanos	**Topografo**
Edwar Ortega	**Almacenista**
Luis Salcedo	**Maestro**
Wilfredo Márquez	**Ayudante**
Wilmer López	**Ayudante**
Víctor Peña Ayudante	**Ayudante**
Abel Barrios	**Ayudante**
Julián Hernández	**Ayudante**
Olando Rodrigues	**Oficial**
Nel Alfredo serna	**Oficial**
Abel Barrio	**Ayudante**
Jorge salgado	**Ayudante**
Rafael salas	**Ayudante**
Yerlis ZabaletaAY	**Ayudante**

4.5. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA.

A la fecha de cierre del presente informe se ha alcanzado el 50% de avance de obra, por lo que se dara inicio a los tramites requeridos para el cobro del Acta parcial 2, conforme a lo indicado en el contrato de obra. Por lo anterior, el estado financiero del proyecto se presenta a continuacion:

- Acta No.1: $ 13.361.585.328 – PAGADO.
- Acta No. 2: $ 8.907.723.552 – SE DARA INICIO AL PROCESO DE COBRO.

4.6. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.

Se reportaron condiciones de lluvia en diferentes frentes de Cartagena y el municipio de Arjona, lo cual ha generado contratiempos o retrasos en las actividades desarrolladas. A continuacion se presenta el registro diario del estado del tiempo durante el periodo:

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																														
Clase de Tiempo	Dias del Mes de mayo																													Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V			
Estadio de Softball barrio Santa Rita																																
Seco	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	8	8	8	8	8	8	8	8	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	245
Lluvias Moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Lluvias Intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	248
Estadio de Softball barrio Las Gaviotas																																
Seco	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	8	8	8	8	8	8	8	8	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	245
Lluvias Moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Lluvias Intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	248
Estadio de Softball barrio Los Cerros																																
Seco	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	8	8	8	8	8	8	8	8	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	245
Lluvias Moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Lluvias Intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	248
Estadio de Softball barrio El Socorro																																
Seco	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	8	8	8	8	8	8	8	8	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	245
Lluvias Moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Lluvias Intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	248
Estadio de Softball Arjona																																
Seco	8	8	8	8	8	8	8	8			8	8	6	8	8				8	8	8	8			8	8	8	6	8			148
Lluvias Moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	2	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0			2
Lluvias Intensas	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0			0	0	0	2	0			2
TOTAL	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**			**8**	**8**	**8**	**8**	**8**				**8**	**8**	**8**	**8**			**8**	**8**	**8**	**8**	**8**			152

4.7. ENSAYOS DE LABORATORIO.

Durante el mes de MAYO de 2026 se realizaron los siguientes ensayos de laboratorio:

- **Estadio de softball El Socorro**

FECHA DEL ENSAYO	DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO	NORMA	PROCEDENCIA (Sitio donde se tomó la muestra)	ELEMENTO	N° DE MUESTRAS	N° DE MUESTRAS LLEVADAS AL LABORATORIO	Rango del Ensyo (PSI)	EDAD DEL CONCRETO (Dias)	RESULTADO ENSAYO	Cumple SI / NO	OBSERVACIONES
lunes, 9 de febrero de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Zapata Cerramiento Interno T1	6	4	3500	17	2918	NO	El ensayo de resistencia no cumple con el valor mínimo requerido según las especificaciones técnicas del proyecto, por lo que se registra como resultado no conforme.
lunes, 9 de febrero de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Zapata Cerramiento Interno T1	6	4	3500	17	3004	NO	El ensayo de resistencia no cumple con el valor mínimo requerido según las especificaciones técnicas del proyecto, por lo que se registra como resultado no conforme.
lunes, 9 de febrero de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Zapata Cerramiento Interno T1	6	4	3500	17	3047	NO	El ensayo de resistencia no cumple con el valor mínimo requerido según las especificaciones técnicas del proyecto, por lo que se registra como resultado no conforme.
lunes, 9 de febrero de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Zapata Cerramiento Interno T1	6	4	3500	28	3580	SI	La prueba de resistencia realizada cumple con los valores de diseño y las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.
lunes, 9 de febrero de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Zapata Cerramiento Interno T1	6	4	3500	28	3532	SI	La prueba de resistencia realizada cumple con los valores de diseño y las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.
lunes, 9 de febrero de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Zapata Cerramiento Interno T1	6	4	3500	28	3570	SI	La prueba de resistencia realizada cumple con los valores de diseño y las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.
martes, 10 de febrero de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Zapata Cerramiento Interno T 12	6	4	3500	16	3459	NO	El ensayo de resistencia no cumple con el valor mínimo requerido según las especificaciones técnicas del proyecto, por lo que se registra como resultado no conforme.
martes, 10 de febrero de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Zapata Cerramiento Interno T 12	6	4	3500	16	3395	NO	El ensayo de resistencia no cumple con el valor mínimo requerido según las especificaciones técnicas del proyecto, por lo que se registra como resultado no conforme.
martes, 10 de febrero de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Zapata Cerramiento Interno T 12	6	4	3500	16	3426	NO	El ensayo de resistencia no cumple con el valor mínimo requerido según las especificaciones técnicas del proyecto, por lo que se registra como resultado no conforme.
martes, 10 de febrero de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Zapata Cerramiento Interno T 12	6	4	3500	28	3904	SI	La prueba de resistencia realizada cumple con los valores de diseño y las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.
martes, 10 de febrero de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Zapata Cerramiento Interno T 12	6	4	3500	28	3941	SI	La prueba de resistencia realizada cumple con los valores de diseño y las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.
martes, 10 de febrero de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Zapata Cerramiento Interno T 12	6	4	3500	28	3882	SI	La prueba de resistencia realizada cumple con los valores de diseño y las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.
miércoles, 11 de febrero de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Zapata Cerramiento Interno T1 Cemento Plástico 3500 PSI	6	4	3500	15	3472	NO	El ensayo de resistencia no cumple con el valor mínimo requerido según las especificaciones técnicas del proyecto, por lo que se registra como resultado no conforme.
miércoles, 11 de febrero de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Zapata Cerramiento Interno T1 Cemento Plástico 3500 PSI	6	4	3500	15	3504	SI	La prueba de resistencia realizada cumple con los valores de diseño y las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.
miércoles, 11 de febrero de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Zapata Cerramiento Interno T1 Cemento Plástico 3500 PSI	6	4	3500	15	3501	SI	La prueba de resistencia realizada cumple con los valores de diseño y las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.
miércoles, 11 de febrero de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Zapata Cerramiento Interno T1 Cemento Plástico 3500 PSI	6	4	3500	28	3881	SI	La prueba de resistencia realizada cumple con los valores de diseño y las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.
miércoles, 11 de febrero de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Zapata Cerramiento Interno T1 Cemento Plástico 3500 PSI	6	4	3500	28	3909	SI	La prueba de resistencia realizada cumple con los valores de diseño y las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.
miércoles, 11 de febrero de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Zapata Cerramiento Interno T1 Cemento Plástico 3500 PSI	6	4	3500	28	3978	SI	La prueba de resistencia realizada cumple con los valores de diseño y las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.
martes, 24 de febrero de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Cancha de Fútbol C Platico 4000 PSI triturado 3/8	6	4	4000	7	3940	SI	La prueba de resistencia realizada cumple con los valores de diseño y las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.
martes, 24 de febrero de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Cancha de Fútbol C Platico 4000 PSI triturado 3/8	6	4	4000	7	3982	SI	La prueba de resistencia realizada cumple con los valores de diseño y las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.
martes, 24 de febrero de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Cancha de Fútbol C Platico 4000 PSI triturado 3/8	6	4	4000	14	3919	SI	La prueba de resistencia realizada cumple con los valores de diseño y las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.
martes, 24 de febrero de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Cancha de Fútbol C Platico 4000 PSI triturado 3/8	6	4	4000	14	3985	SI	La prueba de resistencia realizada cumple con los valores de diseño y las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.
martes, 24 de febrero de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Cancha de Fútbol C Platico 4000 PSI triturado 3/8	6	4	4000	-	-	-	-
martes, 24 de febrero de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Cancha de Fútbol C Platico 4000 PSI triturado 3/8	6	4	4000	-	-	-	-
jueves, 26 de febrero de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Cancha de Fútbol Concreto en obra 4000 PSI triturado 1/2	6	4	4000	14	3769	NO	El ensayo de resistencia no cumple con el valor mínimo requerido según las especificaciones técnicas del proyecto, por lo que se registra como resultado no conforme.

FECHA DEL ENSAYO	DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO	NORMA	PROCEDENCIA (Sitio donde se tomó la muestra)	ELEMENTO	N° DE MUESTRAS	N° DE MUESTRAS LLEVADAS AL LABORATORIO	Rango del Ensyo (PSI)	EDAD DEL CONCRETO (Dias)	RESULTADO ENSAYO	Cumple SI / NO	OBSERVACIONES
jueves, 26 de febrero de 2026	Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Cancha de Fútbol Concreto en obra 4000 PSI triturado 1/2	6	4	4000	14	3867	NO	El ensayo de resistencia no cumple con el valor mínimo requerido según las especificaciones técnicas del proyecto, por lo que se registra como resultado no conforme.
jueves, 26 de febrero de 2026	Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Cancha de Fútbol Concreto en obra 4000 PSI triturado 1/2	6	4	4000	14	3847	NO	El ensayo de resistencia no cumple con el valor mínimo requerido según las especificaciones técnicas del proyecto, por lo que se registra como resultado no conforme.
jueves, 26 de febrero de 2026	Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Cancha de Fútbol Concreto en obra 4000 PSI triturado 1/2	6	4	4000	-	-	-	-
jueves, 26 de febrero de 2026	Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Cancha de Fútbol Concreto en obra 4000 PSI triturado 1/2	6	4	4000	-	-	-	-
jueves, 26 de febrero de 2026	Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Cancha de Fútbol Concreto en obra 4000 PSI triturado 1/2	6	4	4000	-	-	-	-
viernes, 27 de febrero de 2026	Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Cancha de Fútbol Concreto en obra 4000 PSI triturado 1/2	6	4	4000	-	-	-	-
viernes, 27 de febrero de 2026	Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Cancha de Fútbol Concreto en obra 4000 PSI triturado 1/2	6	4	4000	-	-	-	-
viernes, 27 de febrero de 2026	Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Cancha de Fútbol Concreto en obra 4000 PSI triturado 1/2	6	4	4000	-	-	-	-
viernes, 27 de febrero de 2026	Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Cancha de Fútbol Concreto en obra 4000 PSI triturado 1/2	6	4	4000	-	-	-	-
viernes, 27 de febrero de 2026	Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Cancha de Fútbol Concreto en obra 4000 PSI triturado 1/2	6	4	4000	-	-	-	-
sábado, 28 de febrero de 2026	Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Cancha de Fútbol Concreto en obra 4000 PSI triturado 1/2	6	4	4000	-	-	-	-
sábado, 28 de febrero de 2026	Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Cancha de Fútbol Concreto en obra 4000 PSI triturado 1/2	6	4	4000	-	-	-	-
sábado, 28 de febrero de 2026	Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Cancha de Fútbol Concreto en obra 4000 PSI triturado 1/2	6	4	4000	-	-	-	-
sábado, 28 de febrero de 2026	Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Cancha de Fútbol Concreto en obra 4000 PSI triturado 1/2	6	4	4000	-	-	-	-
sábado, 28 de febrero de 2026	Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Cancha de Fútbol Concreto en obra 4000 PSI triturado 1/2	6	4	4000	-	-	-	-
sábado, 28 de febrero de 2026	Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Cancha de Fútbol Concreto en obra 4000 PSI triturado 1/2	6	4	4000	-	-	-	-
lunes, 2 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Viga Cerramiento Interno T1 Concreto en Obra 3500 PSI	6	4	3500	-	-	-	-
lunes, 2 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Viga Cerramiento Interno T1 Concreto en Obra 3500 PSI	6	4	3500	-	-	-	-
lunes, 2 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Viga Cerramiento Interno T1 Concreto en Obra 3500 PSI	6	4	3500	-	-	-	-
lunes, 2 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Viga Cerramiento Interno T1 Concreto en Obra 3500 PSI	6	4	3500	-	-	-	-
lunes, 2 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Viga Cerramiento Interno T1 Concreto en Obra 3500 PSI	6	4	3500	-	-	-	-
lunes, 2 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Viga Cerramiento Interno T1 Concreto en Obra 3500 PSI	6	4	3500	-	-	-	-
martes, 3 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Cancha de Fútbol Concreto en Obra 4000 PSI	6	4	4000	-	-	-	-
martes, 3 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Cancha de Fútbol Concreto en Obra 4000 PSI	6	4	4000	-	-	-	-
martes, 3 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Cancha de Fútbol Concreto en Obra 4000 PSI	6	4	4000	-	-	-	-
martes, 3 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Cancha de Fútbol Concreto en Obra 4000 PSI	6	4	4000	-	-	-	-
martes, 3 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Cancha de Fútbol Concreto en Obra 4000 PSI	6	4	4000	-	-	-	-
martes, 3 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Cancha de Fútbol Concreto en Obra 4000 PSI	6	4	4000	-	-	-	-
miércoles, 4 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Cancha de Fútbol Concreto en Obra 4000 PSI Triturado 3/8	6	4	4000	-	-	-	-
miércoles, 4 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Cancha de Fútbol Concreto en Obra 4000 PSI Triturado 3/8	6	4	4000	-	-	-	-
miércoles, 4 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Cancha de Fútbol Concreto en Obra 4000 PSI Triturado 3/8	6	4	4000	-	-	-	-
miércoles, 4 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Cancha de Fútbol Concreto en Obra 4000 PSI Triturado 3/8	6	4	4000	-	-	-	-
miércoles, 4 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Cancha de Fútbol Concreto en Obra 4000 PSI Triturado 3/8	6	4	4000	-	-	-	-

FECHA DEL ENSAYO	DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO	NORMA	PROCEDENCIA (Sitio donde se tomó la muestra)	ELEMENTO	N° DE MUESTRAS	N° DE MUESTRAS LLEVADAS AL LABORATORIO	Rango del Ensyo (PSI)	EDAD DEL CONCRETO (Dias)	RESULTADO ENSAYO	Cumple SI / NO	OBSERVACIONES
miércoles, 4 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Cancha de Fútbol Concreto en Obra 4000 PSI Triturado 3/8	6	4	4000	-	-	-	-
jueves, 5 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Cancha de Fútbol Concreto en Obra 4000 PSI Triturado 3/8	6	4	4000	-	-	-	-
jueves, 5 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Cancha de Fútbol Concreto en Obra 4000 PSI Triturado 3/8	6	4	4000	-	-	-	-
jueves, 5 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Cancha de Fútbol Concreto en Obra 4000 PSI Triturado 3/8	6	4	4000	-	-	-	-
jueves, 5 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Cancha de Fútbol Concreto en Obra 4000 PSI Triturado 3/8	6	4	4000	-	-	-	-
jueves, 5 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Cancha de Fútbol Concreto en Obra 4000 PSI Triturado 3/8	6	4	4000	-	-	-	-
jueves, 5 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Cancha de Fútbol Concreto en Obra 4000 PSI Triturado 3/8	6	4	4000	-	-	-	-
lunes, 9 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Viga Cerramiento Interno Concreto en Obra 3500 PSI	6	4	3500	-	-	-	-
lunes, 9 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Viga Cerramiento Interno Concreto en Obra 3500 PSI	6	4	3500	-	-	-	-
lunes, 9 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Viga Cerramiento Interno Concreto en Obra 3500 PSI	6	4	3500	-	-	-	-
lunes, 9 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Viga Cerramiento Interno Concreto en Obra 3500 PSI	6	4	3500	-	-	-	-
lunes, 9 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Viga Cerramiento Interno Concreto en Obra 3500 PSI	6	4	3500	-	-	-	-
lunes, 9 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Cancha de Fútbol Concreto en obra 4000 PSI	6	4	4000	-	-	-	-
lunes, 9 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Cancha de Fútbol Concreto en obra 4000 PSI	6	4	4000	-	-	-	-
lunes, 9 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Cancha de Fútbol Concreto en obra 4000 PSI	6	4	4000	-	-	-	-
lunes, 9 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Cancha de Fútbol Concreto en obra 4000 PSI	6	4	4000	-	-	-	-
lunes, 9 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Cancha de Fútbol Concreto en obra 4000 PSI	6	4	4000	-	-	-	-
lunes, 9 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Cancha de Fútbol Concreto en obra 4000 PSI	6	4	4000	-	-	-	-
martes, 10 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Viga Cerramiento Interno Concreto en Obra 3500 PSI	6	4	3500	-	-	-	-
martes, 10 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Viga Cerramiento Interno Concreto en Obra 3500 PSI	6	4	3500	-	-	-	-
martes, 10 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Viga Cerramiento Interno Concreto en Obra 3500 PSI	6	4	3500	-	-	-	-
martes, 10 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Viga Cerramiento Interno Concreto en Obra 3500 PSI	6	4	3500	-	-	-	-
martes, 10 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Viga Cerramiento Interno Concreto en Obra 3500 PSI	6	4	3500	-	-	-	-
martes, 10 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Viga Cerramiento Interno Concreto en Obra 3500 PSI	6	4	3500	-	-	-	-
jueves, 12 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Viga de Confinamiento Perimetral Concreto en Obra 4000 PSI cancha de Fútbol	6	4	4000	-	-	-	-
jueves, 12 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Viga de Confinamiento Perimetral Concreto en Obra 4000 PSI cancha de Fútbol	6	4	4000	-	-	-	-
jueves, 12 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Viga de Confinamiento Perimetral Concreto en Obra 4000 PSI cancha de Fútbol	6	4	4000	-	-	-	-
jueves, 12 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Viga de Confinamiento Perimetral Concreto en Obra 4000 PSI cancha de Fútbol	6	4	4000	-	-	-	-
jueves, 12 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Viga de Confinamiento Perimetral Concreto en Obra 4000 PSI cancha de Fútbol	6	4	4000	-	-	-	-
jueves, 12 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Viga de Confinamiento Perimetral Concreto en Obra 4000 PSI cancha de Fútbol	6	4	4000	-	-	-	-
martes, 17 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Tanque Losa de Fondo Concreto Platico 4000 PSI	6	4	4000	28	4436	SI	La prueba de resistencia realizada cumple con los valores de diseño y las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.
martes, 17 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Tanque Losa de Fondo Concreto Platico 4000 PSI	6	4	4000	28	4575	SI	La prueba de resistencia realizada cumple con los valores de diseño y las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.
martes, 17 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Tanque Losa de Fondo Concreto Platico 4000 PSI	6	4	4000	-	-	-	-

FECHA DEL ENSAYO	DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO	NORMA	PROCEDENCIA (Sitio donde se tomó la muestra)	ELEMENTO	N° DE MUESTRAS	N° DE MUESTRAS LLEVADAS AL LABORATORIO	Rango del Ensyo (PSI)	EDAD DEL CONCRETO (Dias)	RESULTADO ENSAYO	Cumple SI / NO	OBSERVACIONES
martes, 17 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Tanque Losa de Fondo Concreto Platico 4000 PSI	6	4	4000	-	-	-	-
martes, 17 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Tanque Losa de Fondo Concreto Platico 4000 PSI	6	4	4000	-	-	-	-
martes, 17 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Tanque Losa de Fondo Concreto Platico 4000 PSI	6	4	4000	-	-	-	-
miércoles, 18 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Viga de Cimentación de Cuarto Electrico Concreto en Obra 4000 PSI	6	4	4000	28	4007	SI	La prueba de resistencia realizada cumple con los valores de diseño y las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.
miércoles, 18 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Viga de Cimentación de Cuarto Electrico Concreto en Obra 4000 PSI	6	4	4000	28	4032	SI	La prueba de resistencia realizada cumple con los valores de diseño y las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.
miércoles, 18 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Viga de Cimentación de Cuarto Electrico Concreto en Obra 4000 PSI	6	4	4000	-	-	-	-
miércoles, 18 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Viga de Cimentación de Cuarto Electrico Concreto en Obra 4000 PSI	6	4	4000	-	-	-	-
miércoles, 18 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Viga de Cimentación de Cuarto Electrico Concreto en Obra 4000 PSI	6	4	4000	-	-	-	-
miércoles, 18 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Viga de Cimentación de Cuarto Electrico Concreto en Obra 4000 PSI	6	4	4000	-	-	-	-
jueves, 19 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Columna Cuarto Electrico 4000 PSI	6	4	4000	28	4000	SI	La prueba de resistencia realizada cumple con los valores de diseño y las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.
jueves, 19 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Columna Cuarto Electrico 4000 PSI	6	4	4000	28	3999	NO	El ensayo de resistencia no cumple con el valor mínimo requerido según las especificaciones técnicas del proyecto, por lo que se registra como resultado no conforme.
jueves, 19 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Columna Cuarto Electrico 4000 PSI	6	4	4000	-	-	-	-
jueves, 19 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Columna Cuarto Electrico 4000 PSI	6	4	4000	-	-	-	-
jueves, 19 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Columna Cuarto Electrico 4000 PSI	6	4	4000	-	-	-	-
jueves, 19 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Columna Cuarto Electrico 4000 PSI	6	4	4000	-	-	-	-
viernes, 20 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Columna Cuarto Electrico 4000 PSI	6	4	4000	28	4098	SI	La prueba de resistencia realizada cumple con los valores de diseño y las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.
viernes, 20 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Columna Cuarto Electrico 4000 PSI	6	4	4000	28	4103	SI	La prueba de resistencia realizada cumple con los valores de diseño y las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.
viernes, 20 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Columna Cuarto Electrico 4000 PSI	6	4	4000	28	3501	NO	El ensayo de resistencia no cumple con el valor mínimo requerido según las especificaciones técnicas del proyecto, por lo que se registra como resultado no conforme.
viernes, 20 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Columna Cuarto Electrico 4000 PSI	6	4	4000	28	3587	NO	El ensayo de resistencia no cumple con el valor mínimo requerido según las especificaciones técnicas del proyecto, por lo que se registra como resultado no conforme.
viernes, 20 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Columna Cuarto Electrico 4000 PSI	6	4	4000	-	-	-	-
viernes, 20 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Columna Cuarto Electrico 4000 PSI	6	4	4000	-	-	-	-
viernes, 20 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Viga de Cerramiento Interno Concreto en Obra 3500 PSI	6	4	3500	-	-	-	-
viernes, 20 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Viga de Cerramiento Interno Concreto en Obra 3500 PSI	6	4	3500	-	-	-	-
viernes, 20 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Viga de Cerramiento Interno Concreto en Obra 3500 PSI	6	4	3500	-	-	-	-
viernes, 20 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Viga de Cerramiento Interno Concreto en Obra 3500 PSI	6	4	3500	-	-	-	-
viernes, 20 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Viga de Cerramiento Interno Concreto en Obra 3500 PSI	6	4	3500	-	-	-	-
viernes, 20 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Viga de Cerramiento Interno Concreto en Obra 3500 PSI	6	4	3500	-	-	-	-
martes, 24 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Viga de Cerramiento Interno Concreto en Obra 3500 PSI	6	4	3500	28	4006	SI	La prueba de resistencia realizada cumple con los valores de diseño y las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.
martes, 24 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Viga de Cerramiento Interno Concreto en Obra 3500 PSI	6	4	3500	28	3993	SI	La prueba de resistencia realizada cumple con los valores de diseño y las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.
martes, 24 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Viga de Cerramiento Interno Concreto en Obra 3500 PSI	6	4	3500	-	-	-	-
martes, 24 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Viga de Cerramiento Interno Concreto en Obra 3500 PSI	6	4	3500	-	-	-	-
martes, 24 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Viga de Cerramiento Interno Concreto en Obra 3500 PSI	6	4	3500	-	-	-	-
martes, 24 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Viga de Cerramiento Interno Concreto en Obra 3500 PSI	6	4	3500	-	-	-	-
martes, 24 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Columna de Cuarto Electrico 4000 PSI	6	4	4000	-	-	-	-
martes, 24 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Columna de Cuarto Electrico 4000 PSI	6	4	4000	-	-	-	-

FECHA DEL ENSAYO	DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO	NORMA	PROCEDENCIA (Sitio donde se tomó la muestra)	ELEMENTO	N° DE MUESTRAS	N° DE MUESTRAS LLEVADAS AL LABORATORIO	Rango del Ensyo (PSI)	EDAD DEL CONCRETO (Dias)	RESULTADO ENSAYO	Cumple SI / NO	OBSERVACIONES
martes, 24 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Columna de Cuarto Electrico 4000 PSI	6	4	4000	-	-	-	-
martes, 24 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Columna de Cuarto Electrico 4000 PSI	6	4	4000	-	-	-	-
martes, 24 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Columna de Cuarto Electrico 4000 PSI	6	4	4000	-	-	-	-
martes, 24 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Columna de Cuarto Electrico 4000 PSI	6	4	4000	-	-	-	-
miércoles, 25 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Viga Cerramiento Interno Concreto en Obra 3500 PSI	6	4	3500	14	3165	NO	El ensayo de resistencia no cumple con el valor mínimo requerido según las especificaciones técnicas del proyecto, por lo que se registra como resultado no conforme.
miércoles, 25 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Viga Cerramiento Interno Concreto en Obra 3500 PSI	6	4	3500	14	3285	NO	El ensayo de resistencia no cumple con el valor mínimo requerido según las especificaciones técnicas del proyecto, por lo que se registra como resultado no conforme.
miércoles, 25 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Viga Cerramiento Interno Concreto en Obra 3500 PSI	6	4	3500	28	3630	SI	La prueba de resistencia realizada cumple con los valores de diseño y las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.
miércoles, 25 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Viga Cerramiento Interno Concreto en Obra 3500 PSI	6	4	3500	28	3540	SI	La prueba de resistencia realizada cumple con los valores de diseño y las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.
miércoles, 25 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Viga Cerramiento Interno Concreto en Obra 3500 PSI	6	4	3500	-	-	-	-
miércoles, 25 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Viga Cerramiento Interno Concreto en Obra 3500 PSI	6	4	3500	-	-	-	-
viernes, 27 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Tapas de Registro 0,90 MX0,90MX0,08M CONCRETO EN OBRA 3500 PSI	6	4	3500	28	3589	SI	La prueba de resistencia realizada cumple con los valores de diseño y las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.
viernes, 27 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Tapas de Registro 0,90 MX0,90MX0,08M CONCRETO EN OBRA 3500 PSI	6	4	3500	28	3558	SI	La prueba de resistencia realizada cumple con los valores de diseño y las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.
viernes, 27 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Tapas de Registro 0,90 MX0,90MX0,08M CONCRETO EN OBRA 3500 PSI	6	4	3500	-	-	-	-
viernes, 27 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Tapas de Registro 0,90 MX0,90MX0,08M CONCRETO EN OBRA 3500 PSI	6	4	3500	-	-	-	-
viernes, 27 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Tapas de Registro 0,90 MX0,90MX0,08M CONCRETO EN OBRA 3500 PSI	6	4	3500	-	-	-	-
viernes, 27 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Tapas de Registro 0,90 MX0,90MX0,08M CONCRETO EN OBRA 3500 PSI	6	4	3500	-	-	-	-
martes, 31 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Zapatas Cerramiento Interno Viga de Cimentación	6	4	3500	14	3119	NO	El ensayo de resistencia no cumple con el valor mínimo requerido según las especificaciones técnicas del proyecto, por lo que se registra como resultado no conforme.
martes, 31 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Zapatas Cerramiento Interno Viga de Cimentación	6	4	3500	14	3160	NO	El ensayo de resistencia no cumple con el valor mínimo requerido según las especificaciones técnicas del proyecto, por lo que se registra como resultado no conforme.
martes, 31 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Zapatas Cerramiento Interno Viga de Cimentación	6	4	3500	28	3532	SI	La prueba de resistencia realizada cumple con los valores de diseño y las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.
martes, 31 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Zapatas Cerramiento Interno Viga de Cimentación	6	4	3500	28	3502	SI	La prueba de resistencia realizada cumple con los valores de diseño y las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.
lunes, 6 de abril de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Registros drenaje de Campo	6	4	3500	14	2861	NO	El ensayo de resistencia no cumple con el valor mínimo requerido según las especificaciones técnicas del proyecto, por lo que se registra como resultado no conforme.
lunes, 6 de abril de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Registros drenaje de Campo	6	4	3500	14	2905	NO	El ensayo de resistencia no cumple con el valor mínimo requerido según las especificaciones técnicas del proyecto, por lo que se registra como resultado no conforme.
lunes, 6 de abril de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Registros drenaje de Campo	6	4	3500	-	-	-	-
lunes, 6 de abril de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Registros drenaje de Campo	6	4	3500	-	-	-	-
lunes, 6 de abril de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Registros drenaje de Campo	6	4	3500	-	-	-	-
lunes, 6 de abril de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Registros drenaje de Campo	6	4	3500	-	-	-	-
martes, 7 de abril de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Registros drenaje de Campo	6	4	3500	28	3567	SI	La prueba de resistencia realizada cumple con los valores de diseño y las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.
martes, 7 de abril de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Registros drenaje de Campo	6	4	3500	28	3601	SI	La prueba de resistencia realizada cumple con los valores de diseño y las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.
martes, 7 de abril de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Registros drenaje de Campo	6	4	3500	-	-	-	-
martes, 7 de abril de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Registros drenaje de Campo	6	4	3500	-	-	-	-
martes, 7 de abril de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Registros drenaje de Campo	6	4	3500	-	-	-	-
martes, 7 de abril de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Registros drenaje de Campo	6	4	3500	-	-	-	-

FECHA DEL ENSAYO	DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO	NORMA	PROCEDENCIA (Sitio donde se tomó la muestra)	ELEMENTO	N° DE MUESTRAS	N° DE MUESTRAS LLEVADAS AL LABORATORIO	Rango del Ensyo (PSI)	EDAD DEL CONCRETO (Dias)	RESULTADO ENSAYO	Cumple SI / NO	OBSERVACIONES
miércoles, 8 de abril de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Registros drenaje de Campo	6	4	3500	14	2910	NO	El ensayo de resistencia no cumple con el valor mínimo requerido según las especificaciones técnicas del proyecto, por lo que se registra como resultado no conforme.
miércoles, 8 de abril de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Registros drenaje de Campo	6	4	3500	14	2875	NO	El ensayo de resistencia no cumple con el valor mínimo requerido según las especificaciones técnicas del proyecto, por lo que se registra como resultado no conforme.
miércoles, 8 de abril de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Registros drenaje de Campo	6	4	3500	-	-	-	-
miércoles, 8 de abril de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Registros drenaje de Campo	6	4	3500	-	-	-	-
miércoles, 8 de abril de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Registros drenaje de Campo	6	4	3500	-	-	-	-
miércoles, 8 de abril de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Registros drenaje de Campo	6	4	3500	-	-	-	-
jueves, 9 de abril de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Tanque	6	4	4000	14	3312	NO	El ensayo de resistencia no cumple con el valor mínimo requerido según las especificaciones técnicas del proyecto, por lo que se registra como resultado no conforme.
jueves, 9 de abril de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Tanque	6	4	4000	14	3230	NO	El ensayo de resistencia no cumple con el valor mínimo requerido según las especificaciones técnicas del proyecto, por lo que se registra como resultado no conforme.
jueves, 9 de abril de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Tanque	6	4	4000	-	-	-	-
jueves, 9 de abril de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Tanque	6	4	4000	-	-	-	-
jueves, 9 de abril de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Tanque	6	4	4000	-	-	-	-
jueves, 9 de abril de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Tanque	6	4	4000	-	-	-	-
viernes, 10 de abril de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Registros drenaje de Campo	6	4	3500	14	2897	NO	El ensayo de resistencia no cumple con el valor mínimo requerido según las especificaciones técnicas del proyecto, por lo que se registra como resultado no conforme.
viernes, 10 de abril de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Registros drenaje de Campo	6	4	3500	14	2908	NO	El ensayo de resistencia no cumple con el valor mínimo requerido según las especificaciones técnicas del proyecto, por lo que se registra como resultado no conforme.
viernes, 10 de abril de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Registros drenaje de Campo	6	4	3500	-	-	-	-
viernes, 10 de abril de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Registros drenaje de Campo	6	4	3500	-	-	-	-
viernes, 10 de abril de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Registros drenaje de Campo	6	4	3500	-	-	-	-
viernes, 10 de abril de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Registros drenaje de Campo	6	4	3500	-	-	-	-
martes, 21 de abril de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Tanque	6	4	4000	-	-	-	-
martes, 21 de abril de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Tanque	6	4	4000	-	-	-	-
martes, 21 de abril de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Tanque	6	4	4000	-	-	-	-
martes, 21 de abril de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Tanque	6	4	4000	-	-	-	-
martes, 21 de abril de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Tanque	6	4	4000	-	-	-	-
martes, 21 de abril de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Cerramiento Interno Concreto en Obra	6	4	3500	-	-	-	-
martes, 21 de abril de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Cerramiento Interno Concreto en Obra	6	4	3500	-	-	-	-
martes, 21 de abril de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Cerramiento Interno Concreto en Obra	6	4	3500	-	-	-	-
martes, 21 de abril de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Cerramiento Interno Concreto en Obra	6	4	3500	-	-	-	-
martes, 21 de abril de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Cerramiento Interno Concreto en Obra	6	4	3500	-	-	-	-
martes, 21 de abril de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Cerramiento Interno Concreto en Obra	6	4	3500	-	-	-	-
miércoles, 29 de abril de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Sendero Cancha	6	4	3500	-	-	-	-
miércoles, 29 de abril de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Sendero Cancha	6	4	3500	-	-	-	-
miércoles, 29 de abril de 2026	Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Sendero Cancha	6	4	3500	-	-	-	-

FECHA DEL ENSAYO	DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO	NORMA	PROCEDENCIA (Sitio donde se tomó la muestra)	ELEMENTO	N° DE MUESTRAS	N° DE MUESTRAS LLEVADAS AL LABORATORIO	Rango del Ensyo (PSI)	EDAD DEL CONCRETO (Dias)	RESULTADO ENSAYO	Cumple SI / NO	OBSERVACIONES
miércoles, 29 de abril de 2026	Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Sendero Cancha	6	4	3500	-	-	-	-
miércoles, 29 de abril de 2026	Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Sendero Cancha	6	4	3500	-	-	-	-
miércoles, 29 de abril de 2026	Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Sendero Cancha	6	4	3500	-	-	-	-
jueves, 30 de abril de 2026	Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Gradas	6	4	4000	-	-	-	-
jueves, 30 de abril de 2026	Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Gradas	6	4	4000	-	-	-	-
jueves, 30 de abril de 2026	Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Gradas	6	4	4000	-	-	-	-
jueves, 30 de abril de 2026	Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Gradas	6	4	4000	-	-	-	-
jueves, 30 de abril de 2026	Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Gradas	6	4	4000	-	-	-	-
jueves, 30 de abril de 2026	Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra	NTC 550	Socorro	Gradas	6	4	4000	-	-	-	-

- **Estadio de Softball Los Cerros**

FECHA DEL ENSAYO	DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO	NORMA	PROCEDENCIA (Sitio donde se tomó la muestra)	ELEMENTO	N° DE MUESTRAS	N° DE MUESTRAS LLEVADAS AL LABORATORIO	Rango del Ensyo (PSI)	EDAD DEL CONCRETO (Dias)	RESULTADO ENSAYO	Cumple SI / NO	OBSERVACIONES
miércoles, 21 de enero de 2026	Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra	NTC 550	Estadio de Softball Los Cerros	Zapata Tipo I - Cerramiento Interno	6	4	3500	29	4059	SI	La prueba de resistencia realizada cumple con los valores de diseño y las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.
miércoles, 21 de enero de 2026	Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra	NTC 550	Estadio de Softball Los Cerros	Zapata Tipo I - Cerramiento Interno	6	4	3500	29	4034	SI	La prueba de resistencia realizada cumple con los valores de diseño y las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.
miércoles, 21 de enero de 2026	Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra	NTC 550	Estadio de Softball Los Cerros	Zapata Tipo I - Cerramiento Interno	6	4	3500	29	4142	SI	La prueba de resistencia realizada cumple con los valores de diseño y las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.
miércoles, 21 de enero de 2026	Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra	NTC 550	Estadio de Softball Los Cerros	Zapata Tipo I - Cerramiento Interno	6	4	3500	29	3992	SI	La prueba de resistencia realizada cumple con los valores de diseño y las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.
jueves, 22 de enero de 2026	Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra	NTC 550	Estadio de Softball Los Cerros	Zapata Tipo I - Cerramiento Interno	6	4	3500	28	3964	SI	La prueba de resistencia realizada cumple con los valores de diseño y las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.
jueves, 22 de enero de 2026	Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra	NTC 550	Estadio de Softball Los Cerros	Zapata Tipo I - Cerramiento Interno	6	4	3500	28	4027	SI	La prueba de resistencia realizada cumple con los valores de diseño y las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.
jueves, 22 de enero de 2026	Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra	NTC 550	Estadio de Softball Los Cerros	Zapata Tipo I - Cerramiento Interno	6	4	3500	28	3939	SI	La prueba de resistencia realizada cumple con los valores de diseño y las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.
jueves, 22 de enero de 2026	Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra	NTC 550	Estadio de Softball Los Cerros	Zapata Tipo I - Cerramiento Interno	6	4	3500	28	3997	SI	La prueba de resistencia realizada cumple con los valores de diseño y las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.
viernes, 23 de enero de 2026	Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra	NTC 550	Estadio de Softball Los Cerros	Zapata Tipo I - Cerramiento Interno	6	4	3500	28	4019	SI	La prueba de resistencia realizada cumple con los valores de diseño y las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.
viernes, 23 de enero de 2026	Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra	NTC 550	Estadio de Softball Los Cerros	Zapata Tipo I - Cerramiento Interno	6	4	3500	28	3941	SI	La prueba de resistencia realizada cumple con los valores de diseño y las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.
viernes, 23 de enero de 2026	Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra	NTC 550	Estadio de Softball Los Cerros	Zapata Tipo I - Cerramiento Interno	6	4	3500	28	3975	SI	La prueba de resistencia realizada cumple con los valores de diseño y las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.
viernes, 23 de enero de 2026	Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra	NTC 550	Estadio de Softball Los Cerros	Zapata Tipo I - Cerramiento Interno	6	4	3500	28	3997	SI	La prueba de resistencia realizada cumple con los valores de diseño y las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.
sábado, 24 de enero de 2026	Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra	NTC 550	Estadio de Softball Los Cerros	Zapata Tipo I - Cerramiento Interno	6	4	3500	29	3976	SI	La prueba de resistencia realizada cumple con los valores de diseño y las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.
sábado, 24 de enero de 2026	Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra	NTC 550	Estadio de Softball Los Cerros	Zapata Tipo I - Cerramiento Interno	6	4	3500	29	3923	SI	La prueba de resistencia realizada cumple con los valores de diseño y las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.
sábado, 24 de enero de 2026	Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra	NTC 550	Estadio de Softball Los Cerros	Zapata Tipo I - Cerramiento Interno	6	4	3500	29	4052	SI	La prueba de resistencia realizada cumple con los valores de diseño y las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.
sábado, 24 de enero de 2026	Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra	NTC 550	Estadio de Softball Los Cerros	Zapata Tipo I - Cerramiento Interno	6	4	3500	29	4095	SI	La prueba de resistencia realizada cumple con los valores de diseño y las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.
lunes, 26 de enero de 2026	Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra	NTC 550	Estadio de Softball Los Cerros	Zapata Tipo I - Cerramiento Interno	6	4	3500	28	3992	SI	La prueba de resistencia realizada cumple con los valores de diseño y las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.
lunes, 26 de enero de 2026	Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra	NTC 550	Estadio de Softball Los Cerros	Zapata Tipo I - Cerramiento Interno	6	4	3500	28	4146	SI	La prueba de resistencia realizada cumple con los valores de diseño y las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.
lunes, 26 de enero de 2026	Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra	NTC 550	Estadio de Softball Los Cerros	Zapata Tipo I - Cerramiento Interno	6	4	3500	28	4026	SI	La prueba de resistencia realizada cumple con los valores de diseño y las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.
lunes, 26 de enero de 2026	Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra	NTC 550	Estadio de Softball Los Cerros	Zapata Tipo I - Cerramiento Interno	6	4	3500	28	4036	SI	La prueba de resistencia realizada cumple con los valores de diseño y las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.
martes, 27 de enero de 2026	Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra	NTC 550	Estadio de Softball Los Cerros	Zapata Tipo I - Cerramiento Interno	6	4	3500	28	4018	SI	La prueba de resistencia realizada cumple con los valores de diseño y las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.
martes, 27 de enero de 2026	Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra	NTC 550	Estadio de Softball Los Cerros	Zapata Tipo I - Cerramiento Interno	6	4	3500	28	3996	SI	La prueba de resistencia realizada cumple con los valores de diseño y las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.
martes, 27 de enero de 2026	Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra	NTC 550	Estadio de Softball Los Cerros	Zapata Tipo I - Cerramiento Interno	6	4	3500	28	4076	SI	La prueba de resistencia realizada cumple con los valores de diseño y las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.
martes, 27 de enero de 2026	Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra	NTC 550	Estadio de Softball Los Cerros	Zapata Tipo I - Cerramiento Interno	6	4	3500	28	3668	SI	La prueba de resistencia realizada cumple con los valores de diseño y las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.
miércoles, 18 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra	NTC 550	Estadio de Softball Los Cerros	Cimentación muro de Contención Perimetral - Gradería Tercera Base	6	4	4000		-	-	La prueba de resistencia realizada cumple con los valores de diseño y las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.
jueves, 26 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra	NTC 550	Estadio de Softball Los Cerros	Cimentación muro de Contención Seguido a Gradas - Gradería Primera Base	6	4	4000	14	4007	SI	La prueba de resistencia realizada cumple con los valores de diseño y las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.
jueves, 26 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra	NTC 550	Estadio de Softball Los Cerros	Cimentación muro de Contención Seguido a Gradas - Gradería Primera Base	6	4	4000	14	3996	NO	El ensayo de resistencia no cumple con el valor mínimo requerido según las especificaciones técnicas del proyecto, por lo que se registra como resultado no conforme.
jueves, 26 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra	NTC 550	Estadio de Softball Los Cerros	Cimentación muro de Contención Seguido a Gradas - Gradería Primera Base	6	4	4000	28	5300	SI	La prueba de resistencia realizada cumple con los valores de diseño y las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.
jueves, 26 de marzo de 2026	Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra	NTC 550	Estadio de Softball Los Cerros	Cimentación muro de Contención Seguido a Gradas - Gradería Primera Base	6	4	4000	28	5370	SI	La prueba de resistencia realizada cumple con los valores de diseño y las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.
miércoles, 8 de abril de 2026	Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra	NTC 550	Estadio de Softball Los Cerros	Cimentación Muro Perimetras detrás de Dogout Tercera Base	6	4	4000	19	4612	SI	La prueba de resistencia realizada cumple con los valores de diseño y las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.

DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO	NORMA	PROCEDENCIA (Sitio donde se tomó la muestra)	ELEMENTO	N° DE MUESTRAS	N° DE MUESTRAS LLEVADAS AL LABORATORIO	Rango del Ensyo (PSI)	EDAD DEL CONCRETO (Dias)	RESULTADO ENSAYO	Cumple SI / NO	OBSERVACIONES
Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Estadio de Softball Los Cerros	Cimentación Muro Perimetras detrás de Dogout Tercera Base	6	4	4000	19	4492	SI	La prueba de resistencia realizada cumple con los valores de diseño y las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.
Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Estadio de Softball Los Cerros	Muro de Contencion Gradería Tercera Base	6	4	4000	17	4167	SI	La prueba de resistencia realizada cumple con los valores de diseño y las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.
Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Estadio de Softball Los Cerros	Muro de Contencion Gradería Tercera Base	6	4	4000	17	4231	SI	La prueba de resistencia realizada cumple con los valores de diseño y las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.
Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Estadio de Softball Los Cerros	Muro de Contencion Gradería Primera Base	6	4	4000	10	5407	SI	La prueba de resistencia realizada cumple con los valores de diseño y las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.
Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Estadio de Softball Los Cerros	Muro de Contencion Gradería Primera Base	6	4	4000	10	5440	SI	La prueba de resistencia realizada cumple con los valores de diseño y las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.
Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Estadio de Softball Los Cerros	Muro de Contencion Gradería Primera Base	6	4	4000	10	5529	SI	La prueba de resistencia realizada cumple con los valores de diseño y las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.
Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Estadio de Softball Los Cerros	Muro de Contencion Gradería Primera Base	6	4	4000	10	5480	SI	La prueba de resistencia realizada cumple con los valores de diseño y las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.
Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Estadio de Softball Los Cerros	Muro de Contención Periemtral Detrás de Dogout Gradería Tercera Base y Zapatas de Gradería Primera Base	6	4	4000	-	-	-	-
Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Estadio de Softball Los Cerros	Pedestal de Gradería - Tercera Base	6	4	4000	-	-	-	-
Elaboración y curado de especimenes de concreto en obra	NTC 550	Estadio de Softball Los Cerros	Viga de Cimentación - Gradería Primera Base	6	4	4000	-	-	-	-

- **Estadio de softball Las Gaviotas**

FECHA DEL ENSAYO	DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO	NORMA	PROCEDENCIA (Sitio donde se tomó la muestra)	ELEMENTO	N° DE MUESTRAS	N° DE MUESTRAS LLEVADAS AL LABORATORIO	Rango del Ensyo (PSI)	RESULTADO ENSAYO	Cumple SI / NO	OBSERVACIONES
22/01/2026	PRUEBA DE RESISTENCIA DEL CONCRETO	NTC550	LAS GAVIOTAS	ZAPATA DE CERRAMIENTO INTERNO MURO COLEGIO	**6**	**6**	3500	**3577**	**SI**	NINGUNA
26/01/2026	PRUEBA DE RESISTENCIA DEL CONCRETO	NTC550	LAS GAVIOTAS	VIGA DE CIMENTACION DE CERRAMIENTO INTERNO MURO COLEGIO	**6**	**6**	3500			NINGUNA
30/01/2026	PRUEBA DE RESISTENCIA DEL CONCRETO	NTC550	LAS GAVIOTAS	COLUMNETA MURO COLEGIO	**6**	**6**	3500			NINGUNA
4/02/2026	PRUEBA DE RESISTENCIA DEL CONCRETO	NTC550	Gaviotas	COLUMNETA MURO COLEGIO Y ZAPATA DE CIMENTACION CERRAMIENTO INTERNO	6	4	3500	3550	SI	NINGUNA
5/02/2026	PRUEBA DE RESISTENCIA DEL CONCRETO	NTC550	Gaviotas	ZAPATA DE CIMENTACION CERRAMIENTO INTERNO Y VIGA DE AMARRE MURO DEL COLEGIO PREMEZCLADO	6	4	3500	3726	SI	NINGUNA
5/02/2026	PRUEBA DE RESISTENCIA DEL CONCRETO	NTC550	Gaviotas	ZAPATA DE CIMENTACION CERRAMIENTO INTERNO Y VIGA DE AMARRE MURO DEL COLEGIO	6	4	3500	3587	SI	NINGUNA
6/02/2026	PRUEBA DE RESISTENCIA DEL CONCRETO	NTC550	Gaviotas	ZAPATA DE CIMENTACION CERRAMIENTO INTERNO Y VIGA DE AMARRE MURO DEL COLEGIO	6	4	3500	3587	SI	NINGUNA
7/02/2026	PRUEBA DE RESISTENCIA DEL CONCRETO	NTC550	Gaviotas	ZAPATA DE CIMENTACION Y COLUMNETAS MURO DEL COLEGIO	6	4	3500	3616	SI	NINGUNA
12/02/2026	PRUEBA DE RESISTENCIA DEL CONCRETO	NTC550	Gaviotas	ZAPATA DE CIMENTACION SCORE Y VIGA CINTA MURO DEL COLEGIO	4	4	3500	3610	SI	NINGUNA
16/02/2026	PRUEBA DE RESISTENCIA DEL CONCRETO	NTC550	Gaviotas	PALNTILLA SCORE	4	4	3500	3595	SI	NINGUNA
18/02/2026	PRUEBA DE RESISTENCIA DEL CONCRETO	NTC550	Gaviotas	VIGA DE CIMENTACION CERRAMIENTO INTERNO	5	4	3500	4233	SI	NINGUNA
jueves, 5 de marzo de 2026	Prueba de Resistencia del Concreto	NTC550	Gaviotas	Viga de Cimentación Cerramiento Interno	6	4	3500	168 PSI DE CURADO A LOS 14 DIA	SI	NINGUNA
jueves, 5 de marzo de 2026	Prueba de Resistencia del Concreto	NTC550	Gaviotas	Viga de Cimentación Cerramiento Interno	6	4	3500	175 PSI DE CURADO A LOS 14 DIA	SI	NINGUNA
jueves, 5 de marzo de 2026	Prueba de Resistencia del Concreto	NTC550	Gaviotas	Viga de Cimentación Cerramiento Interno	6	4	3500	3177 PSI DE CURADO A LOS 14 DIAS	SI	NINGUNA
jueves, 5 de marzo de 2026	Prueba de Resistencia del Concreto	NTC550	Gaviotas	Viga de Cimentación Cerramiento Interno	6	4	3500	3540	SI	NINGUNA
jueves, 5 de marzo de 2026	Prueba de Resistencia del Concreto	NTC550	Gaviotas	Viga de Cimentación Cerramiento Interno	6	4	3500	3570	SI	NINGUNA
jueves, 5 de marzo de 2026	Prueba de Resistencia del Concreto	NTC550	Gaviotas	Viga de Cimentación Cerramiento Interno	6	4	3500	3559	SI	NINGUNA
lunes, 16 de marzo de 2026	Prueba de Resistencia del Concreto	NTC550	Gaviotas	Zapata Gradería E 1-5	6	4	4000	4181	SI	NINGUNA
lunes, 16 de marzo de 2026	Prueba de Resistencia del Concreto	NTC550	Gaviotas	Zapata Gradería E 1-5	6	4	4000	2845	SI	NINGUNA
lunes, 16 de marzo de 2026	Prueba de Resistencia del Concreto	NTC550	Gaviotas	Zapata Gradería E 1-5	6	4	4000	3626	SI	NINGUNA
lunes, 16 de marzo de 2026	Prueba de Resistencia del Concreto	NTC550	Gaviotas	Zapata Gradería E 1-5	6	4	4000	3662 A LOS 14 DIAS DE CURADO	SI	NINGUNA
lunes, 16 de marzo de 2026	Prueba de Resistencia del Concreto	NTC550	Gaviotas	Zapata Gradería E 1-5	6	4	4000	4233	SI	NINGUNA
lunes, 16 de marzo de 2026	Prueba de Resistencia del Concreto	NTC550	Gaviotas	Zapata Gradería E 1-5	6	4	4000	4181	SI	NINGUNA
miércoles, 18 de marzo de 2026	Prueba de Resistencia del Concreto	NTC550	Gaviotas	Zapata Gradería E 6-14	6	4	4000	2807 PSI A LOS 7 DIAS DE CURADO	SI	NINGUNA
miércoles, 18 de marzo de 2026	Prueba de Resistencia del Concreto	NTC550	Gaviotas	Zapata Gradería E 6-15	6	4	4000	2862 PSI A LOS 7 DIAS DE CURADO	SI	NINGUNA
miércoles, 18 de marzo de 2026	Prueba de Resistencia del Concreto	NTC550	Gaviotas	Zapata Gradería E 6-16	6	4	4000	3723 PSI A LOS 14 DIAS DE CURADO	SI	NINGUNA

FECHA DEL ENSAYO	DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO	NORMA	PROCEDENCIA (Sitio donde se tomó la muestra)	ELEMENTO	N° DE MUESTRAS	N° DE MUESTRAS LLEVADAS AL LABORATORIO	Rango del Ensyo (PSI)	RESULTADO ENSAYO	Cumple SI / NO	OBSERVACIONES
miércoles, 18 de marzo de 2026	Prueba de Resistencia del Concreto	NTC550	Gaviotas	Zapata Gradería E 6-16	6	4	4000	3723 PSI A LOS 14 DIAS DE CURADO	SI	NINGUNA
miércoles, 18 de marzo de 2026	Prueba de Resistencia del Concreto	NTC550	Gaviotas	Zapata Gradería E 6-17	6	4	4000	4192	SI	NINGUNA
miércoles, 18 de marzo de 2026	Prueba de Resistencia del Concreto	NTC550	Gaviotas	Zapata Gradería E 6-18	6	4	4000	4140	SI	NINGUNA
miércoles, 18 de marzo de 2026	Prueba de Resistencia del Concreto	NTC550	Gaviotas	Zapata Gradería E 6-19	6	4	4000	4192	SI	NINGUNA
miércoles, 25 de marzo de 2026	Prueba de Resistencia del Concreto	NTC550	Gaviotas	Zapata Gradería , Vigas y Loza de entrepiso Score y Viga Cinta Cerramiento Interno	6	4	4000	SE HAN REGISTRADO RESULTAD	-	NINGUNA
lunes, 20 de abril de 2026	Prueba de Resistencia del Concreto	NTC550	Gaviotas	Vigas de Cimentación de Graderías	12	8	4000	SE HAN REGISTRADO RESULTAD	-	NINGUNA
lunes, 20 de abril de 2026	VIGAS DE CIMENTACION GRADERIAS 4000 PSI	NTC550	GAVIOTAS	VIGAS DE CIMENTACION GRADERIAS	12	10	4000	NO SE HAN REPORTADO RESULTADOS		NINGUNA
martes, 12 de mayo de 2026	COLUMNAS DE GRADERIAS 4000 PSI	NTC550	GAVIOTAS	COLUMNAS DE GRADERIAS 4000 PSI	6	4	4000	NO SE HAN REPORTADO RESULTADOS		NINGUNA
jueves, 21 de mayo de 2026	COLUMNAS DE GRADERIAS 4000 PSI	NTC550	GAVIOTAS	COLUMNAS DE GRADERIAS 4000 PSI	6	4	4000	NO SE HAN REPORTADO RESULTADOS		NINGUNA
lunes, 25 de mayo de 2026	ENSAYO DE DENSIDADES Y PROCTOR MODIFICADO	ASTM D1557	GAVIOTAS	GRADERIAS	1	1	95% COMPACTACION	96,3	SI	SE DEBE HUMECTAR MAS EL TERRENO
lunes, 25 de mayo de 2026	ENSAYO DE DENSIDADES Y PROCTOR MODIFICADO	ASTM D1557	GAVIOTAS	GRADERIAS	1	1	95% COMPACTACION	98	SI	SE DEBE HUMECTAR MAS EL TERRENO
lunes, 25 de mayo de 2026	ENSAYO DE DENSIDADES Y PROCTOR MODIFICADO	ASTM D1557	GAVIOTAS	GRADERIAS	1	1	95% COMPACTACION	97,8	SI	SE DEBE HUMECTAR MAS EL TERRENO
lunes, 25 de mayo de 2026	ENSAYO DE DENSIDADES Y PROCTOR MODIFICADO	ASTM D1557	GAVIOTAS	GRADERIAS	1	1	95% COMPACTACION	99,7	SI	SE DEBE HUMECTAR MAS EL TERRENO
lunes, 25 de mayo de 2026	ENSAYO DE DENSIDADES Y PROCTOR MODIFICADO	ASTM D1557	GAVIOTAS	GRADERIAS	1	1	95% COMPACTACION	98,8	SI	SE DEBE HUMECTAR MAS EL TERRENO
lunes, 25 de mayo de 2026	ENSAYO DE DENSIDADES Y PROCTOR MODIFICADO	ASTM D1557	GAVIOTAS	GRADERIAS	1	1	95% COMPACTACION	100,7	SI	SE DEBE HUMECTAR MAS EL TERRENO
lunes, 25 de mayo de 2026	ENSAYO DE DENSIDADES Y PROCTOR MODIFICADO	ASTM D1557	GAVIOTAS	CAMPO DE SOFTBAL	1	1	95% COMPACTACION	97,9	SI	SE DEBE HUMECTAR MAS EL TERRENO
lunes, 25 de mayo de 2026	ENSAYO DE DENSIDADES Y PROCTOR MODIFICADO	ASTM D1557	GAVIOTAS	CAMPO DE SOFTBAL	1	1	95% COMPACTACION	97,5	SI	SE DEBE HUMECTAR MAS EL TERRENO
lunes, 25 de mayo de 2026	ENSAYO DE DENSIDADES Y PROCTOR MODIFICADO	ASTM D1557	GAVIOTAS	CAMPO DE SOFTBAL	1	1	95% COMPACTACION	89,6	NO	SE DEBE HUMECTAR MAS EL TERRENO Y REALIZAR UN REFUERZO A LA COMPACTACION PARA LLEGARL AL PORCENTAJE CONTRACTUAL
lunes, 25 de mayo de 2026	ENSAYO DE DENSIDADES Y PROCTOR MODIFICADO	ASTM D1557	GAVIOTAS	CAMPO DE SOFTBAL	1	1	95% COMPACTACION	99,7	SI	SE DEBE HUMECTAR MAS EL TERRENO
lunes, 25 de mayo de 2026	ENSAYO DE DENSIDADES Y PROCTOR MODIFICADO	ASTM D1557	GAVIOTAS	CAMPO DE SOFTBAL	1	1	95% COMPACTACION	102,4	SI	SE DEBE HUMECTAR MAS EL TERRENO

- **Estadio de softball Arjona**

FECHA DEL ENSAYO	DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO	NORMA	PROCEDENCIA (Sitio donde se tomó la muestra)	ELEMENTO	N° DE MUESTRAS	N° DE MUESTRAS LLEVADAS AL LABORATORIO	Rango del Ensyo (PSI)	RESULTADO ENSAYO	Cumple SI / NO	OBSERVACIONES
lunes, 26 de enero de 2026	Cancha de softball concreto en obra 4000 PSI	NTC 550	Arjona	Zapatas prefabricada tipo 1 (1,3x0,8m)	6	4	4000	3988	SI	NINGUNA
miércoles, 28 de enero de 2026	Cancha de softball concreto en obra 4000 PSI	NTC 550	Arjona	Zapatas prefabricada tipo 1 (1,3x0,8m)	6	4	4000	4060	SI	NINGUNA
viernes, 30 de enero de 2026	Cancha de softball concreto en obra 4000 PSI	NTC 550	Arjona	Zapatas prefabricada tipo 1 (1,3x0,8m)	6	4	4000	4068	SI	NINGUNA
lunes, 9 de febrero de 2026	Cancha de softball concreto en obra 4000 PSI	NTC 550	Arjona	Zapatas prefabricada tipo 2 (1,3x1,3m)	6	4	4000	4235	SI	NINGUNA
viernes, 27 de febrero de 2026	Cancha de softball concreto en obra 4000 PSI	NTC 550	Arjona	Viga cimentación Z43-Z47 (0,25x0,30m)	6	4	3500	3925	SI	NINGUNA
martes, 3 de marzo de 2026	Cancha de softball concreto en obra 4000 PSI	NTC 550	Arjona	Viga cimentación Z52-Z56 (0,25x0,30m)	6	4	3500	3712	SI	NINGUNA
miércoles, 4 de marzo de 2026	Cancha de softball concreto en obra 4000 PSI	NTC 550	Arjona	Viga cimentación Z43-Z 40(0,25x0,30m)	6	4	3500	3625	SI	NINGUNA
jueves, 5 de marzo de 2026	Cancha de softball concreto en obra 4000 PSI	NTC 550	Arjona	Viga cimentación Z40-Z 35(0,25x0,30m)	6	4	3500	3654	SI	NINGUNA
lunes, 9 de marzo de 2026	Cancha de softball concreto en obra 4000 PSI	NTC 550	Arjona	Viga cimentación Z56-Z 62(0,25x0,30m)	6	4	3500	3678	SI	NINGUNA
viernes, 13 de marzo de 2026	Cancha de softball concreto en obra 4000 PSI	NTC 550	Arjona	Viga cimentación Z68-Z 78(0,25x0,30m)	6	4	3500	3726	SI	NINGUNA
lunes, 16 de marzo de 2026	Cancha de softball concreto en obra 4000 PSI	NTC 550	Arjona	Viga cimentación Z78-Z 82(0,25x0,30m)	6	4	3500	2831	NO	Esta muestra no adquirio la resitencia esperada ya que fue un concreto preparado en obra y se realizo un cambio de docificación.
martes, 31 de marzo de 2026	Cancha de softball concreto en obra 4000 PSI	NTC 550	Arjona	Viga cimentación Z05-Z 10(0,25x0,30m)	6	4	3500	4168	SI	NINGUNA
miércoles, 1 de abril de 2026	Cancha de softball concreto en obra 4000 PSI	NTC 550	Arjona	Zapata dogaut 3ra base	6	4	4000	4268	SI	NINGUNA
lunes, 6 de abril de 2026	Cancha de softball concreto en obra 4000 PSI	NTC 550	Arjona	Viga cimentación Z92-Z 97(0,25x0,30m)	6	4	3500			
martes, 7 de abril de 2026	Cancha de softball concreto en obra 4000 PSI	NTC 550	Arjona	Zapata dogaut 3ra base	6	4	4000			
jueves, 23 de abril de 2026	Cancha de softball concreto en obra 4000 PSI	NTC 550	Arjona	Zapatas graderia 3ra base	6	4	4000			
jueves, 30 de abril de 2026	Cancha de softball concreto en obra 4000 PSI	NTC 550	Arjona	Zapatas graderia 1ra base	6	4	4000			
miércoles, 13 de mayo de 2026	Cancha de softball concreto en obra 4000 PSI	NTC 550	Arjona	Columnas graderia 3ra base y columnas dogaut 1ra base	6	4	4000			
martes, 19 de mayo de 2026	Cancha de softball concreto en obra 4000 PSI	NTC 550	Arjona	Grada 1ra base / Dogout 3ra base	6	4	4000			
jueves, 28 de mayo de 2026	Cancha de softball concreto en obra 4000 PSI	NTC 550	Arjona	Viga cimentacion de graderia 3ra base	6	4	4000			

- **Estadio de softball Santa Rita**


FECHA DEL ENSAYO	DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO	NORMA	PROCEDENCIA (Sitio donde se toma la muestra)	ELEMENTO	N° DE MUESTRAS	N° DE MUESTRAS LLEVADAS AL LABORATORIO	Rango del Ensayo (PSI)	RESULTADO ENSAYO (PSI)	Cumple SI / NO	OBSERVACIONES	EDAD ENSAYO (días)	LABORATORIO
sábado, 28 de marzo de 2026	Cerramiento Interno Campo Zapata de la 7 a la 12 Concreto en Obra 3500 PSI	NTC 673 / NTC 550	Hecho en obra	Zapata de la 7 a la 12	6	4	3.500				21	ANTONIO MARIMÓN
sábado, 4 de abril de 2026	Cerramiento Interno Campo Zapata de la 7 a la 12 Concreto en Obra 3500 PSI	NTC 673 / NTC 550	Hecho en obra	Zapata de la 7 a la 12	6	4	3.500				28	ANTONIO MARIMÓN
sábado, 4 de abril de 2026	Cerramiento Interno Campo Zapata de la 7 a la 12 Concreto en Obra 3500 PSI	NTC 673 / NTC 550	Hecho en obra	Zapata de la 7 a la 12	6	4	3.500				28	ANTONIO MARIMÓN
miércoles, 1 de abril de 2026	Cerramiento Interno Campo Zapata de la 18 a la 24 Concreto en Obra 3500 PSI	NTC 673 / NTC 550	Hecho en obra	Zapata de la 18 a la 24	6	4	3.500				21	ANTONIO MARIMÓN
miércoles, 8 de abril de 2026	Cerramiento Interno Campo Zapata de la 18 a la 24 Concreto en Obra 3500 PSI	NTC 673 / NTC 550	Hecho en obra	Zapata de la 18 a la 24	6	4	3.500				28	ANTONIO MARIMÓN
miércoles, 8 de abril de 2026	Cerramiento Interno Campo Zapata de la 18 a la 24 Concreto en Obra 3500 PSI	NTC 673 / NTC 550	Hecho en obra	Zapata de la 18 a la 24	6	4	3.500				28	ANTONIO MARIMÓN
martes, 31 de marzo de 2026	Cerramiento Interno Campo Viga desde zapata 1 a la 12 Concreto en Obra 3500 PSI	NTC 673 / NTC 550	Hecho en obra	Viga desde zapata 1 a la 12	6	4	3.500				14	ANTONIO MARIMÓN
martes, 14 de abril de 2026	Cerramiento Interno Campo Viga desde zapata 1 a la 12 Concreto en Obra 3500 PSI	NTC 673 / NTC 550	Hecho en obra	Viga desde zapata 1 a la 12	6	4	3.500				28	ANTONIO MARIMÓN
martes, 14 de abril de 2026	Cerramiento Interno Campo Viga desde zapata 1 a la 12 Concreto en Obra 3500 PSI	NTC 673 / NTC 550	Hecho en obra	Viga desde zapata 1 a la 12	6	4	3.500				28	ANTONIO MARIMÓN
jueves, 2 de abril de 2026	Cerramiento Interno Campo Viga desde zapata 12 a la 23 Concreto en Obra 3500 PSI	NTC 673 / NTC 550	Hecho en obra	Viga desde zapata 12 a la 23	6	4	3.500				14	ANTONIO MARIMÓN
jueves, 2 de abril de 2026	Cerramiento Interno Campo Viga desde zapata 12 a la 23 Concreto en Obra 3500 PSI	NTC 673 / NTC 550	Hecho en obra	Viga desde zapata 12 a la 23	6	4	3.500				14	ANTONIO MARIMÓN
jueves, 16 de abril de 2026	Cerramiento Interno Campo Viga desde zapata 12 a la 23 Concreto en Obra 3500 PSI	NTC 673 / NTC 550	Hecho en obra	Viga desde zapata 12 a la 23	6	4	3.500				28	ANTONIO MARIMÓN
jueves, 16 de abril de 2026	Cerramiento Interno Campo Viga desde zapata 12 a la 23 Concreto en Obra 3500 PSI	NTC 673 / NTC 550	Hecho en obra	Viga desde zapata 12 a la 23	6	4	3.500				28	ANTONIO MARIMÓN

4.8. PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y DE SEGURIDAD SOCIAL.

En los anexos del presente informe se incluyen las respectivas planillas de aportes legales pagadas.

4.9 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA:

A continuación, se adjunta el programa de obra con el corte de avance correspondiente a la fecha de corte del informe mensual:

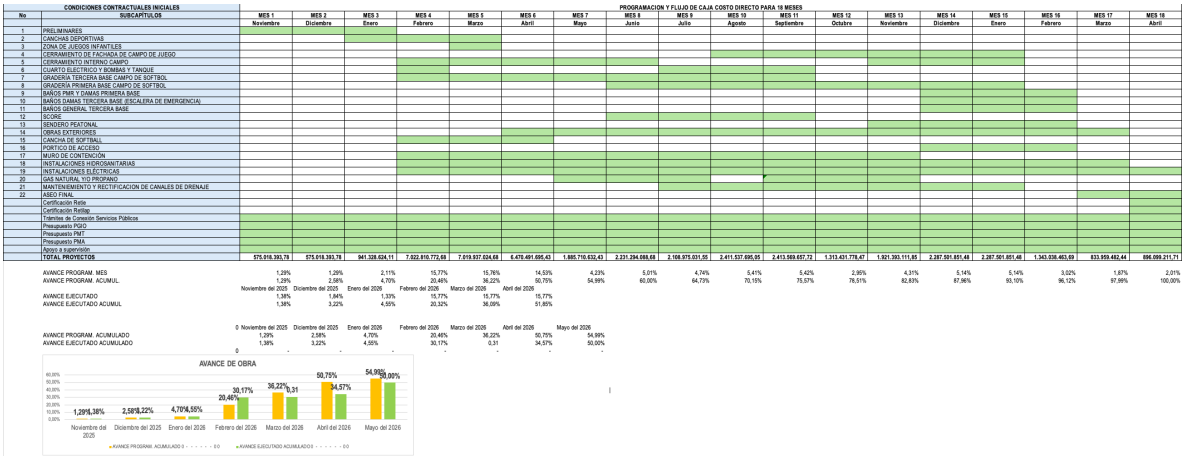

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES		PROGRAMACION Y FLUJO DE CAJA COSTO DIRECTO PARA 18 MESES																	
No	SUBCAPTULOS	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18
		Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril
1	PRELIMINARES																		
2	CANCHAS DEPORTIVAS																		
3	ZONA DE JUEGOS INFANTILES																		
4	CERRAMIENTO DE FACHADA DE CAMPO DE JUEGO																		
5	CERRAMIENTO INTERNO CAMPO																		
6	CUARTO ELECTRICO Y BOMBAS Y TANQUE																		
7	GRADERIA TERCERA BASE CAMPO DE SOFTBOL																		
8	GRADERIA PRIMERA BASE CAMPO DE SOFTBOL																		
9	BAÑOS PMR Y DAMAS PRIMERA BASE																		
10	BAÑOS DAMAS TERCERA BASE (ESCALERA DE EMERGENCIA)																		
11	BAÑOS GENERAL TERCERA BASE																		
12	SCORE																		
13	SENDERO PEATONAL																		
14	OBRAS EXTERIORES																		
15	CANCHA DE SOFTBALL																		
16	PORTICO DE ACCESO																		
17	MURO DE CONTENCIÓN																		
18	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS																		
19	INSTALACIONES ELÉCTRICAS																		
20	GAS NATURAL Y/O PROPANO																		
21	MANTENIMIENTO Y RECTIFICACION DE CANALES DE DRENAJE																		
22	ASEO FINAL																		
	Certificación Retie																		
	Certificación Retilap																		
	Tramites de Conexión Servicios Públicos																		
	Presupuesto PGIO																		
	Presupuesto PMT																		
	Presupuesto PMA																		
	Apoyo a supervisión																		
	TOTAL PROYECTOS	575.016.393,78	575.016.393,78	941.328.624,11	7.022.810.772,68	7.019.937.024,68	6.478.491.695,43	1.695.710.632,43	2.231.294.088,68	2.108.975.031,55	2.411.537.695,95	2.413.569.657,72	1.313.431.779,47	1.921.393.111,85	2.287.501.851,48	2.287.501.851,48	1.343.038.463,69	833.959.482,44	896.099.211,71
	AVANCE PROGRAM. MES	1,29%	1,29%	2,11%	15,77%	15,76%	14,53%	4,23%	5,01%	4,74%	5,41%	5,42%	2,95%	4,31%	5,14%	5,14%	3,02%	1,87%	2,01%
	AVANCE PROGRAM. ACUMUL	1,29%	2,58%	4,70%	20,46%	36,22%	50,75%	54,99%	60,00%	64,73%	70,15%	75,57%	78,51%	82,83%	87,96%	93,10%	96,12%	97,99%	100,00%
		Noviembre del 2025	Diciembre del 2025	Enero del 2026	Febrero del 2026	Marzo del 2026	Abril del 2026												
	AVANCE EJECUTADO	1,38%	1,84%	1,33%	15,77%	15,77%	15,77%												
	AVANCE EJECUTADO ACUMUL	1,38%	3,22%	4,55%	20,32%	36,09%	51,85%												

	0	Noviembre del 2025	Diciembre del 2025	Enero del 2026	Febrero del 2026	Marzo del 2026	Abril del 2026	Mayo del 2026
AVANCE PROGRAM. ACUMULADO		1,29%	2,58%	4,70%	20,46%	36,22%	50,75%	54,99%
AVANCE EJECUTADO ACUMULADO		1,38%	3,22%	4,55%	20,17%	0,31	34,57%	50,00%

INFORME MENSUAL N° 7
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESTADIOS DE SOFTBALL PARA EL FOMENTO DE LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

5. GESTION AMBIENTAL

Desde el punto de vista ambiental las actividades de obra se han desarrollado enmarcados en los siguientes lineamientos:

5.1 REVISIÓN NORMATIVA:

El tipo de proyecto a ejecutar en cada uno de los estadios es del tipo remodelación, rehabilitación y reconstrucción de escenarios deportivos, que corresponde a Proyectos, Obras o Actividades POA que no están sujetos a licenciamiento ambiental.

Los ejecutores de los proyectos realizaron un análisis para revisar si la ejecución de las obras se requiere el aprovechamiento de recursos naturales.

Estadio	ıprovechamiento forestal	oncesión de aguas	cupación de cauce	Emisiones atmosféricas
Las gaviotas	No requiere	ɔ requiere	ɔ requiere	No requiere
Socorro	No requiere	ɔ requiere	ɔ requiere	No requiere
Cerros	No requiere	ɔ requiere	ɔ requiere	No requiere
anta Rita	No requiere	ɔ requiere	ɔ requiere	No requiere

5.2 MANEJO DE RCD

Los escenarios cuentan con PIN como generadores de RCD, emitidos por EPA Cartagena, autoridad ambiental con jurisdicción en el distrito de Cartagena.

Estadio	PIN GENERADOR	/IGENCIA DESDE	IGENCIA HASTA	AUTORIDAD AMBIENTAL
Las gaviotas	1-1538-003	-enero-2026	3-nov-2027	PA CARTAGENA
Socorro	1-1538-001	-enero-2026	3-nov-2027	PA CARTAGENA
Cerros	1-1538-004	-enero-2026	7-nov-2027	PA CARTAGENA
anta Rita	1-1538-002	-enero-2026	-nov-2027	PA CARTAGENA

Se anexan los Programas de manejo ambiental de RCD asociados a los PINES otorgados por el EPA Cartagena.

5.3 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS COMUNES

Los sitios donde se ubican los escenarios cuentan con rutas de recolección de residuos urbanos, a los operadores se les entregarán los residuos comunes generados en obra. Para su acopio temporal se emplearán kits de reciclaje en la fuente usando el código de colores establecido en la Resolución 2184 de

2019.

5.4 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Durante el periodo se utilizaron los siguientes materiales de construcción provenientes de canteras autorizadas para la explotación de recursos naturales:

Estadio		ZAHORRA	RITURADO	ARENA
Las gaviotas	Volumen	m3	m3	m3
	Cantera			
	Licencia ambiental			
Socorro	Volumen	m3	m3	m3
	Cantera			
	Licencia ambiental			
Cerros	Volumen	m3	m3	m3
	Cantera			
	Licencia ambiental			
anta Rita	Volumen	m3	m3	m3
	Cantera			
	Licencia ambiental			

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ESTADIO LAS GAVIOTAS	
	
Material de cantera	Material de cantera
	
Acopio de materiales	

ESTADIO LOS CERROS	
	
Kits de aseo	Acopio de materiales

ESTADIO LOS CERROS	
	
Equipos en obra	Baños portátiles

ESTADIO SANTA RITA	
	
Equipos en obra	Baños portátiles
	
Protección al suelo	Cerramiento

ESTADIO SOCORRO	
	
Baños portátiles	Acopio de materiales
	
Equipos en obra	Acopio de materiales

6. GESTION SOCIAL

La gestión social desarrollada durante el periodo evaluado comprendió las siguientes líneas de acción:

- Reuniones informativas de socialización de inicio de obras
- Relacionamiento comunitario con Juntas de Acción Comunal (JAC)
- Atención y gestión de PQRS.
- Promoción de mecanismos de participación y control social (Veeduría ciudadana).
- Gestión de conflictos sociales
- Apoyo a la vinculación de mano de obra local

Lo anterior, en cumplimiento de las obligaciones contractuales del Contratista en materia de gestión social, comunicación comunitaria y promoción de empleo local.

6.1 ESTRATEGIA DE INTERVENCION SOCIAL

6.1.1 Enfoque metodológico

La gestión social se estructuró bajo un enfoque participativo, orientado a garantizar el acceso a la información, la transparencia y la articulación con actores comunitarios e institucionales, mediante:

- Espacios de socialización directa con las comunidades del área de influencia directa (AID)
- Articulación con Juntas de Acción Comunal como instancia de representación comunitaria
- Implementación de mecanismos de atención y trazabilidad de PQRS
- Coordinación permanente con la Interventoría y la Gobernación de Bolívar

6.1.2 Mecanismos implementados

- Reuniones Informativas de socialización de Inicio de Obras
- Levantamiento de actas de reuniones, Listados de asistencia y registro fotográfico.
- Presentaciones técnicas del proyecto en territorio (AID).
- Espacios de diálogo y resolución de inquietudes.
- Promoción de la conformación de veedurías ciudadanas en las comunidades del área de influencia directa (AID).
- Implementación de canales de atención al ciudadano.

6.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS

6.2.1 Reuniones informativas de socialización de inicio de obras:

Durante el periodo evaluado se realizaron jornadas de socialización en las comunidades beneficiarias, con el propósito de presentar el alcance de los proyectos, establecer canales de comunicación y promover la participación ciudadana.

Fecha	Lugar	Participantes	Actividad	Evidencia
09 de octubre 2025	Casa de Cultural de Arjona	59	Socialización del proyecto en el corregimiento de Arjona (sector 3 de mayo), con participación de comunidad, administración municipal, JAC, interventoría y contratista.	Actas de reunión, Registro de asistencia y Registro fotográfico
16 de octubre de 2025	Terraza y Restaurante Lily / Socorro	48	Socialización del estadio de softball del barrio El Socorro, con participación de líderes comunitarios, clubes deportivos y comunidad en general.	Actas de reunión, Registro de asistencia y Registro fotográfico
20 de octubre 2025	Parque Recreacional El Edén / Gaviotas	36	Socialización del campo de softball de Los Cerros, con participación de representantes comunitarios e institucionales.	Actas de reunión, Registro de asistencia y Registro fotográfico
20 de octubre 2025	Casa Comunal de los Cerros	32	Socialización del estadio de softball de Gaviotas, con presencia de líderes de JAC y delegados institucionales.	Actas de reunión, Registro de asistencia y Registro fotográfico
21 de octubre 2025	Carrera 17 calle 55c Pedro Salazar - Salón Principal de FUNSAEP/ Santa Rita.	24	Socialización del campo de softball de Santa Rita, con participación de comunidad y autoridades locales.	Actas de reunión, Registro de asistencia y Registro fotográfico
18 de diciembre 2025	Terraza Arepa Empila / Socorro	32	Segunda Socialización del estadio de softball del barrio El Socorro, con participación de líderes comunitarios, clubes deportivos y comunidad en general.	Actas de reunión, Registro de asistencia y Registro fotográfico.

Fuente: Elaboración propia

Contenido desarrollado en las jornadas:

- Presentación del proyecto (alcance, cronograma y características técnicas)
- Identificación de actores y canales de comunicación
- Espacio de preguntas y respuestas
- Promoción de la conformación de veedurías ciudadanas en las comunidades del área de influencia directa (AID).



Fotos 1 y 2 – Reuniones informativa de Inicio de Obras ejecutadas en Arjona, El Socorro, Los Cerros, Santa Rita y Gaviotas).

Consorcio Estadios de Softball CI.

6.2.2. Jornada adicional por Derecho de Petición

El 18 de diciembre de 2025 se desarrolló una segunda jornada de socialización en el barrio El Socorro, en atención a un Derecho de Petición presentado por algunos residentes de la comunidad.

Esta actividad se ejecutó en cumplimiento de la Ley 1755 de 2015, como mecanismo orientado a garantizar el acceso a la información, la participación ciudadana y la transparencia del proyecto.

Se deja constancia de que:

- La socialización inicial fue realizada el 16 de octubre de 2025.
- La segunda jornada se desarrolló como medida adicional de garantía de derechos.

6.3 MECANISMOS DE PARTICIPACION

Durante el periodo evaluado se implementaron los siguientes mecanismos:

- Articulación permanente con líderes comunitarios
- Canalización de PQRS a través de las JAC

- Espacios abiertos de diálogo en reuniones comunitarias

Estas acciones contribuyen al fortalecimiento de la transparencia, la participación y el control social del proyecto.

6.4 GESTION DE EMPLEO LOCAL

En cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas, se implementaron acciones orientadas a la promoción de empleo local, mediante:

- Recepción de hojas de vida a través de canales comunitarios.
- Articulación con JAC para identificación de mano de obra disponible
- Priorización de población local en procesos de vinculación

6.4.1 Cumplimiento de mano de obra no calificada

Obligación contractual: mínimo 10% de mano de obra no calificada de la región.
Resultado: marzo 2026: 100% de cumplimiento del requisito mínimo exigido.

6.4.2 Participación de mujeres en la vinculación laboral.

Obligación contractual: mínimo 5% de participación femenina.
Resultado: marzo 2026: 16,12% de participación femenina, superando el mínimo contractual exigido.

6.4.3 Cumplimiento de vinculación de personal colombiano.

Obligación contractual: mínimo 80% de personal colombiano.
Resultado: (marzo 2026): Se evidencia cumplimiento del 100% en la vinculación de personal colombiano, superando el mínimo contractual exigido (80%).

PERIODO	TRABAJADORES DIRECTOS	TRABAJADORES INDIRECTOS	AI	AII	HOMBRES VINCULADOS	MUJERES VINCULADOS	MOC	MONC	TOTAL, DE EMPLEOS GENERADOS MES 100% colombiano
Marzo 2026	*59*	*0*	*10*	*49*	*54*	*5*	*31*	*28*	*59*

Fuente: Elaboración propia

Convenciones: AID: Área de Influencia Directa. AII: Área de Influencia Indirecta. MOC: Mano de Obra Calificada. MONC: Mano de Obra No Calificada.

7. CONCLUSIONES

7.1 Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de mayo de 2026, el Contratista mantuvo la ejecución simultánea de actividades constructivas en los cinco (5) escenarios deportivos objeto del Contrato de Obra No. 2543 de 2025, garantizando la continuidad operativa de los diferentes frentes de trabajo y el desarrollo de actividades asociadas a cimentaciones, estructuras, cerramientos, urbanismo, drenajes, instalaciones eléctricas y adecuación de campos de juego, conforme a los diseños aprobados y especificaciones técnicas del proyecto.

7.2 Se evidenció una adecuada disposición de recursos humanos, técnicos, maquinaria y equipos en cada uno de los escenarios intervenidos, permitiendo atender de manera eficiente las necesidades constructivas de cada frente de obra y garantizando la ejecución de las actividades programadas bajo condiciones de productividad y control.

7.3 El proyecto continúa desarrollándose bajo los lineamientos establecidos en el plan de Gestión de Calidad, implementando controles constructivos permanentes, inspecciones de obra y seguimiento técnico a los procesos ejecutados. Asimismo, se realizaron los ensayos de laboratorio requeridos para la verificación de materiales y elementos estructurales, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y normativas aplicables.

7.4 En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, se mantuvieron las actividades de seguimiento y control en los diferentes frentes de obra, promoviendo condiciones seguras para el personal vinculado al proyecto y dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y a las obligaciones contractuales vigentes.

7.5 Desde el componente ambiental, las actividades constructivas fueron ejecutadas aplicando las medidas de manejo ambiental definidas para el proyecto, incluyendo la adecuada disposición de residuos de construcción y demolición, el control de material sobrante, el manejo de escombros y la implementación de buenas prácticas orientadas a minimizar los impactos generados por la ejecución de las obras.

7.6 En el componente social, se mantuvo la articulación con las comunidades y actores involucrados en las áreas de influencia de los escenarios deportivos intervenidos, garantizando canales de comunicación permanentes y contribuyendo al adecuado desarrollo de las actividades constructivas dentro de un marco de convivencia y participación comunitaria.

7.7 El proyecto registra avances significativos en componentes estructurales, urbanísticos, arquitectónicos y de infraestructura deportiva en los escenarios de Las Gaviotas, El Socorro, Santa Rita, Los Cerros y Arjona, consolidando progresivamente las condiciones requeridas para el cumplimiento del objeto contractual y la futura puesta en servicio de los escenarios deportivos. Cumpliendo hasta este periodo con el 50% de avance del contrato.

7.8 El seguimiento técnico, administrativo y financiero efectuado durante el periodo permite concluir que el proyecto mantiene una gestión integral acorde con las obligaciones establecidas en el contrato, asegurando la trazabilidad de las actividades ejecutadas, el control de los recursos y el cumplimiento de los procedimientos establecidos por la entidad contratante y la interventoría.

7.9 Como resultado de la evaluación y actualización de las condiciones de ejecución del proyecto, el cambio de diseños en algunos frentes, entre otras., el Contratista presentará a la Interventoría y a la Entidad Contratante un **cronograma de reprogramación de actividades**, mediante el cual se optimizará la secuencia constructiva y la distribución de recursos en los diferentes frentes de obra, **manteniendo inalterado el plazo contractual vigente (18 meses) y la fecha de terminación establecida en el contrato**.

7.10 En términos generales, durante el mes de mayo de 2026 el proyecto continuó su desarrollo bajo criterios de calidad, seguridad, sostenibilidad, control técnico y responsabilidad social, evidenciando el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por el Contratista y el compromiso permanente con la correcta ejecución de las obras destinadas al fortalecimiento de la infraestructura deportiva del Departamento de Bolívar.

Informe presentado por:



CONSORCIO ESTADIOS DE SOFTBALL CI
MAYRON ADALBERTO VERGEL ARMENTA
REPRESENTANTE LEGAL
