Bogotá D.C., 12 de septiembre de 2026

Oficio No. 089 KASAF-CULTURAL-2025

SEÑORES
PROYECTO SANABRIA S.A.S.
Att: Gabriela Salgado Pinilla

Referencia: Contrato de Obra No. 2039-2025. "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL, PRIORIZADAS POR EL GOBIERNO NACIONAL (LOTE 4)". CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE INÍRIDA, GUAINÍA - ADECUACIÓN DE LA CASA DE CULTURA DE INÍRIDA GUAINÍA.

Asunto: SOLICITUD DE PRORROGA.

Yo, MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA, identificado con C.C. 1.082.774.968 de San Agustín (Huila), en mi calidad de Representante Legal de CONSORCIO KASAF CULTURAL 2025, identificado con NIT No. 902.015.784-3, por medio del presente documento me permito presentar a su consideración la aprobación a la solicitud de prorroga en tiempo adicional al plazo establecido del contrato de la referencia en **Cuarenta y Seis (46) Días** calendario o sea hasta el **30 de noviembre de 2026** teniendo en cuenta que contractualmente la fecha de finalización es el 15 de octubre de 2026. La presente solicitud se basa en los argumentos que se exponen a continuación.

1. **Antecedentes**

Desde el inicio de la ejecución del contrato, el **CONSORCIO KASAF CULTURAL 2025** ha dispuesto los recursos humanos, técnicos, administrativos y financieros necesarios para el cumplimiento de las obligaciones contractuales, ejecutando las actividades programadas conforme al cronograma aprobado y manteniendo una coordinación permanente con la interventoría y la Supervisión del contrato.

No obstante, durante la ejecución de las obras se han presentado circunstancias ajenas al control del **CONSORCIO KASAF CULTURAL 2025** que han afectado el normal desarrollo de varias actividades del proyecto, generando impactos sobre la ruta crítica del cronograma sin que ello obedezca a incumplimientos atribuibles al contratista.

2. **Justificación técnica de la solicitud**

La presente solicitud se fundamenta en las siguientes circunstancias:

2.1 **Condiciones climáticas excepcionales.**

El municipio de Puerto Inírida presenta un régimen climático caracterizado por altas precipitaciones, elevada humedad relativa y frecuentes tormentas durante gran parte del año.

Durante el periodo de ejecución contractual se registraron múltiples jornadas de lluvia intensa que ocasionaron:

- Suspensión de actividades de excavación.
- Saturación de los suelos.
- Suspensión de actividades de lleno de nivelación.

Dificultades para realizar procesos de compactación conforme a las especificaciones técnicas.

- Retrasos en actividades de llenos de nivelación.
- Retrasos en actividades de cimentación.
- Restricciones para el vaciado de concreto estructural.
- Afectación en el transporte interno de materiales y equipos.

La ejecución de actividades bajo estas condiciones hubiera comprometido la calidad de la obra y el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas por el contrato.

Como soporte de lo anteriormente expuesto se presentan los registros de lluvias dese la fecha de inicio del contrato de la referencia que fue el 16 de marzo de 2026 hasta el 10 de septiembre de 2026 (5,97 meses)

MES 1. En la siguiente tabla No. 1 se evidencian los tiempos de lluvias desde el 16 de marzo de 2026 hasta el 15 de abril de 2026.

FECHA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN	TOTAL HORAS	TIEMPO ADICONAL SECADO DE ZONAS A INTERVENIR	TOTAL REAL HORAS	OBSERAVACIONES
lunes, 16 de marzo de 2026						
martes, 17 de marzo de 2026						
miércoles, 18 de marzo de 2026						
jueves, 19 de marzo de 2026						
viernes, 20 de marzo de 2026						
sábado, 21 de marzo de 2026						
domingo, 22 de marzo de 2026						
lunes, 23 de marzo de 2026						
martes, 24 de marzo de 2026						
miércoles, 25 de marzo de 2026						
jueves, 26 de marzo de 2026						
viernes, 27 de marzo de 2026						
sábado, 28 de marzo de 2026						
domingo, 29 de marzo de 2026						
lunes, 30 de marzo de 2026	8:00 a. m.	5:00 p. m.	9.00	8.00	17.00	FUERTES TORMENTAS DURANTE EL DIA AFECTA LAS ACTIVIDADES DE LLENO DEL DIA MARTES 31 MARZO DE 2026 POR HUMEDAD DEL MATERIAL DE LENO QUE NO PERMITE CONTINUAR ACTRIVIDADES
martes, 31 de marzo de 2026				8.00	8.00	DIA NUBLADO, AFECTA LAS ACTIVIDADES DE LLENO DE ESTE DIAS Y DEL 1 DE ABRIL ENTRE TANTO EL AMBIENTE PERMITA EL SECADO DE LOS MATERIALES DE LLENO Y NIVELACIÓN.
miércoles, 1 de abril de 2026						
jueves, 2 de abril de 2026						
viernes, 3 de abril de 2026						
sábado, 4 de abril de 2026						
domingo, 5 de abril de 2026						
lunes, 6 de abril de 2026						
martes, 7 de abril de 2026	1:00 p. m.	5:00 p. m.	4.00	4.00	8.00	TARDE LLUVIOSA QUE AFECTA LAS ACTIVIDADES DE LLENO Y NIVELACIÓN DEL DIA SIGUENTE 8 DE ABRIL DE 2026 MEDIO
miércoles, 8 de abril de 2026				5.00	5.00	SE AFECTA LAS ACTIVIDADES DE LLENO DE ESTE DIA DEBIDO A LLUVIAS DEL DIA ANTERIOR.
jueves, 9 de abril de 2026						
viernes, 10 de abril de 2026						
sábado, 11 de abril de 2026						
domingo, 12 de abril de 2026						
lunes, 13 de abril de 2026						
martes, 14 de abril de 2026	12:00 p. m.	5:00 p. m.	5.00	8.00	13.00	TARDE LLUVIOSA. AFECTAN ACTIVIDADES DE LLENO POR LLUVIAS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2026
miércoles, 15 de abril de 2026				4.00	4.00	DIA NUBLADO. SE AFECTAN ACTIVIDADES DE LLENO POR LLUVIAS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2026
		TOTAL HORAS	18.00		55.00	
		HORAS DIA	8.00		8.00	
		DIAS	2.25		6.88	

Tabla 1.

MES 2. En la siguiente tabla No. 2 se evidencian los tiempos de lluvias desde el 16 de abril de 2026 hasta el 15 de mayo de 2026.

FECHA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN	TOTAL HORAS	TIEMPO ADICONAL SECADO DE ZONAS A	TOTAL REAL HORAS	OBSERAVACIONES
jueves, 16 de abril de 2026	7:00 a. m.	5:00 p. m.	9.00		9.00	LLUVIAS DURANTE TODA LA JORNADA LABORAL SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES POR SEGURIDAD DEL PERSONAL
viernes, 17 de abril de 2026	2:30 p. m.	3:30 p. m.	1.00	1.50	2.50	SE SUSPENDEN LAS ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA DURANTE EL DIA POR SATURACION DE AGUA EN EL CAMPO DE OBRA DEBIDO ALAS FUERTES LLUVIAS QUE ADICONALMENTE POR 1,5 HORAS PARA TERMINAR LA JORNADA LABORALSOLO SE LABORA EN LA LUDOTECA
sábado, 18 de abril de 2026				5.00	5.00	SE AFECTAN ACTIVIDADES DE LLENO POR LLUVIAS DEL DIA ANTERIOR 17 DE ABRIL DE 2026
domingo, 19 de abril de 2026						
lunes, 20 de abril de 2026						DIA NUBLADO
martes, 21 de abril de 2026	7:00 a. m.	4:00 p. m.	9.00	1.00	10.00	LLUVIAS DURANTE TODO EL DIA. NO SE PUDO REALIZAR ACTIVIDADES LUEGO DE LA LLUVIA POR SEGURIDAD DEL PERSONAL OPERATIVO
miércoles, 22 de abril de 2026				8.00	8.00	DIA NUBLADO. SE AFECTAN LAS ACTIIVDADES DE LLENO Y NIVELACIÓN POR LLUVIAS DEL DIA ANTERIOR 21 DE ABRIL DE 2026.
jueves, 23 de abril de 2026					-	
viernes, 24 de abril de 2026						DIA NUBLADO
sábado, 25 de abril de 2026						DIA NUBLADO
domingo, 26 de abril de 2026						
lunes, 27 de abril de 2026						DIA NUBLADO
martes, 28 de abril de 2026						DIA NUBLADO
miércoles, 29 de abril de 2026	9:00 a. m.	12:08 p. m.	3.00	8.00	11.00	LLUVIAS INTERMITENTES SE AFECTO EL MATERIA LDE LLENO EN LA JORNADA DEL JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 POR LLUVIAS LO QUE IMPLICA TIEMPO DE SECADO DEL MATERIAL Y ESCARIFICACIÓN.
jueves, 30 de abril de 2026	9:00 a. m.	11:00 a. m.	2.00	5.00	7.00	LLUVIAS EN LA MAÑANA QUE AFECTA EL PROCESO DE LLENO Y NIVELACIPON DE TERRENO POR HUMEDAD DURANTE TODA LATARDE
viernes, 1 de mayo de 2026						DIA DEL TRABAJO - FESTIVO - DIA LLUVIOSO NO LABORABLE
sábado, 2 de mayo de 2026	9:03 a. m.	10:32 a. m.	1.50	6.50	8.00	LLUVIAS EN LA MAÑANA. SE AFECTO EL MATERIA LDE LLENO EN ESTA JORNADA POR LLUVIAS LO QUE IMPLICA TIEMPO DE SECADO DEL MATERIAL Y ESCARIFICACIÓN.
domingo, 3 de mayo de 2026						
lunes, 4 de mayo de 2026	10:00 a. m.	1:00 p. m.	3.00	4.00	7.00	SE AFECTO EL MATERIA LDE LLENO EN ESTA JORNADA POR LLUVIAS LO QUE IMPLICA TIEMPO DE SECADO DEL MATERIAL Y ESCARIFICACIÓN. INICIO ACTIVIDADES DE FUNDICION SOBRE ZAPATAS BIBLIOTECA NUEVA
	4:00 p. m.	5:00 p. m.	1.00		1.00	INICIO ACTIVIDADES DE FUNDICION SOBRE ZAPATAS BIBLIOTECA NUEVA EN LA MAÑANA
martes, 5 de mayo de 2026	8:02 a. m.	10:04 a. m.	2.00	7.00	9.00	SE AFECTO EL MATERIA LDE LLENO EN ESTA JORNADA POR LLUVIAS LO QUE IMPLICA TIEMPO DE SECADO DEL MATERIAL Y ESCARIFICACIÓN.
miércoles, 6 de mayo de 2026	7:02 a. m.	9:35 a. m.	1.50	1.50	3.00	SE AFECTO EL MATERIA LDE LLENO EN ESTA JORNADA POR LLUVIAS LO QUE IMPLICA TIEMPO DE SECADO DEL MATERIAL Y ESCARIFICACIÓN.
	11:00 a. m.	12:03 p. m.	1.00	5.00	6.00	SE AFECTO EL MATERIA LDE LLENO EN ESTA JORNADA POR LLUVIAS LO QUE IMPLICA TIEMPO DE SECADO DEL MATERIAL Y ESCARIFICACIÓN.
jueves, 7 de mayo de 2026						
viernes, 8 de mayo de 2026						
sábado, 9 de mayo de 2026						
domingo, 10 de mayo de 2026						
lunes, 11 de mayo de 2026	7:00 a. m.	11:07 p. m.	4.00	4.00	8.00	SE AFECTO EL MATERIA LDE LLENO EN ESTA JORNADA POR LLUVIAS LO QUE IMPLICA TIEMPO DE SECADO DEL MATERIAL Y ESCARIFICACIÓN.
martes, 12 de mayo de 2026	7:00 a. m.	8:00 a. m.	1.00	7.00	8.00	SE AFECTO EL MATERIA LDE LLENO EN ESTA JORNADA POR LLUVIAS LO QUE IMPLICA TIEMPO DE SECADO DEL MATERIAL Y ESCARIFICACIÓN DUENATE EL DIA
miércoles, 13 de mayo de 2026	9:40 a. m.	10:44 a. m.	1.00	6.00	7.00	SE AFECTO EL MATERIA LDE LLENO EN ESTA JORNADA POR LLUVIAS LO QUE IMPLICA TIEMPO DE SECADO DEL MATERIAL Y ESCARIFICACIÓN DUENATE EL DIA
jueves, 14 de mayo de 2026						
viernes, 15 de mayo de 2026	10:41 a. m.	11:38 a. m.	1.00	4.00	5.00	SE AFECTO EL MATERIA LDE LLENO EN ESTA JORNADA POR LLUVIAS LO QUE IMPLICA TIEMPO DE SECADO DEL MATERIAL Y ESCARIFICACIÓN PARA CONTINUAR CON LOS LLENOS DE NIVELACIÓN
		TOTAL HORAS	41.00		114.50	
		HORAS DIA	8.00		8.00	
		DIAS	5.13		14.31	

Tabla 2.

MES 3. En la siguiente tabla No. 3 se evidencian los tiempos de lluvias desde el 16 de mayo de 2026 hasta el 15 de junio de 2026

FECHA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN	TOTAL HORAS	TIEMPO ADICONAL SECADO DE ZONAS A INTERVENIR	TOTAL REAL HORAS	OBSERAVACIONES
sábado, 16 de mayo de 2026	8:00:00 a. m.	9:30:00 a. m.	1.50	4.00	5.50	SE AFECTO EL MATERIA DE LLENO EN ESTA JORNADA POR LLUVIAS LO QUE IMPLICA TIEMPO DE SECADO DEL MATERIAL Y ESCARIFICACIÓN. DIA NUBADO
domingo, 17 de mayo de 2026						
lunes, 18 de mayo de 2026						
martes, 19 de mayo de 2026	10:30 a. m.	5:30 p. m.	7.00	1.00	8.00	SE AFECTO EL MATERIA DE LLENO EN ESTA JORNADA POR LLUVIAS LO QUE IMPLICA TIEMPO DE SECADO DEL MATERIAL Y ESCARIFICACIÓN.
miércoles, 20 de mayo de 2026						DIA NUBLADO
jueves, 21 de mayo de 2026	1:00 p. m.	4:00 p. m.	3.00	1.00	4.00	SE AFECTO EL MATERIA LDE LLENO EN LA JORNADA DEL DIA VIERNES 22 MAYO 2026 EN 2 HORAS
viernes, 22 de mayo de 2026	9:00 a. m.	10:30 a. m.	1.50	5.50	7.00	SE AFECTO EL MATERIA DE LLENO EN ESTA JORNADA POR LLUVIAS LO QUE IMPLICA TIEMPO DE SECADO DEL MATERIAL Y ESCARIFICACIÓN.
sábado, 23 de mayo de 2026	8:00 a. m.	12:00 a. m.	4.00		4.00	DIA LLUVIOS
domingo, 24 de mayo de 2026						DIA LLUVIOS, AFECTA LAS LABORES DEL 25 DE MAYO POR AFECTACIÓN DEL MATERIAL DE LLENO Y NIVELACIÓN
lunes, 25 de mayo de 2026				4.00	4.00	DIA NUBLADO. EN HORAS DE LA MANALA AFECTACIÓN DEL MATERIAL DE LLENO POR LLUVIAS DEL FESTIVOS 24 DE MAYO DE 2026
martes, 26 de mayo de 2026	7:00 a. m.	11:00 a. m.	4.00	5.00	9.00	SE AFECTO EL MATERIA DE LLENO EN ESTA JORNADA POR LLUVIAS LO QUE IMPLICA TIEMPO DE SECADO DEL MATERIAL Y ESCARIFICACIÓN.
miércoles, 27 de mayo de 2026	8:00 a. m.	12:00 a. m.	4.00	4.00	8.00	DIA NUBLADO - LLUVIASD EN HORAS DE LA MAÑANA
jueves, 28 de mayo de 2026						DIA NUBLADO
viernes, 29 de mayo de 2026						DIA NUBLADO
sábado, 30 de mayo de 2026						DIA NUBLADO
domingo, 31 de mayo de 2026						
lunes, 1 de junio de 2026						
martes, 2 de junio de 2026	8:15 a. m.	10:13 a. m.	2.00	5.50	7.50	SE AFECTO EL MATERIA DE LLENO EN ESTA JORNADA POR LLUVIAS LO QUE IMPLICA TIEMPO DE SECADO DEL MATERIAL Y ESCARIFICACIÓN.
miércoles, 3 de junio de 2026	7:00 a. m.	9:00 a. m.	2.00	3.00	5.00	SE AFECTO EL MATERIA DE LLENO EN ESTA JORNADA POR LLUVIAS LO QUE IMPLICA TIEMPO DE SECADO DEL MATERIAL Y ESCARIFICACIÓN.
jueves, 4 de junio de 2026	8:00 a. m.	5:00 p. m.	8.00		8.00	DIA LLUVIOSO, AFECTA ACTIVIDADES DE LLENOS Y NIVELACIÓN DEL 5 DE JUNIO DE
viernes, 5 de junio de 2026				7.00	7.00	SE AFECTAN ACTIVIDADES DE LLENOS Y NIVELACIÓN POR LLUIVAS DEL 4 DE JUNIO DE 2026
sábado, 6 de junio de 2026						DIA NUBLADO
domingo, 7 de junio de 2026						
lunes, 8 de junio de 2026		FESTIVO				
martes, 9 de junio de 2026						
miércoles, 10 de junio de 2026	9:00 a. m.	10:30 a. m.	1.50	5.50	7.00	SE AFECTO EL MATERIA DE LLENO EN ESTA JORNADA POR LLUVIAS LO QUE IMPLICA TIEMPO DE SECADO DEL MATERIAL Y ESCARIFICACIÓN.
jueves, 11 de junio de 2026						DIA NUBLADO
viernes, 12 de junio de 2026						
sábado, 13 de junio de 2026						
domingo, 14 de junio de 2026						
lunes, 15 de junio de 2026						DIA NUBLADO
		TOTAL HORAS	38.50		84.00	
		HORAS DIA	8.00		8.00	
		DIAS	4.81		10.50	

Tabla 3.

MES 4. En la siguiente tabla No. 4 se evidencian los tiempos de lluvias desde el 16 de junio de 2026 hasta el 15 de julio de 2026

FECHA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN	TOTAL HORAS	TIEMPO ADICONAL SECADO DE ZONAS A INTERVENIR	TOTAL REAL HORAS	OBSERAVACIONES
martes, 16 de junio de 2026	7:20 a. m.	10:20 a. m.	3.00	5.50	8.50	SE AFECTO EL MATERIA DE LLENO EN ESTA JORNADA POR LLUVIAS LO QUE IMPLICA TIEMPO DE SECADO DEL MATERIAL Y ESCARIFICACIÓN.
miércoles, 17 de junio de 2026						
jueves, 18 de junio de 2026	7:00 a. m.	11:00 a. m.	4.00		4.00	SE AFECTO EL MATERIA DE LLENO EN ESTA JORNADA POR LLUVIAS LO QUE IMPLICA TIEMPO DE SECADO DEL MATERIAL Y ESCARIFICACIÓN.
viernes, 19 de junio de 2026				6.00	6.00	SE AFECTAN ACTIVIDADES DE LLENOS Y NIVELACIÓN POR LLUIVAS DEL 18 DE JUNIO DE 2026
sábado, 20 de junio de 2026						
domingo, 21 de junio de 2026						
lunes, 22 de junio de 2026						DIA NUBLADO
martes, 23 de junio de 2026	9:30 a. m.	10:30 a. m.	1.00	3.00	4.00	SE AFECTAN ACTIVIDADES POR SECADO DE ZONAS A LABORAR POR SEGURIDAD DEL PERSONAL DE OBRA
miércoles, 24 de junio de 2026	7:00 a. m.	8:00 a. m.	1.00	5.00	6.00	SE AFECTAN ACTIVIDADES POR SECADO DE ZONAS A LABORAR POR SEGURIDAD DEL PERSONAL DE OBRA
jueves, 25 de junio de 2026	7:00 a. m.	8:00 a. m.	1.00	7.00	8.00	SE AFECTO EL MATERIA DE LLENO EN ESTA JORNADA POR LLUVIAS LO QUE IMPLICA TIEMPO DE SECADO DEL MATERIAL Y ESCARIFICACIÓN.
viernes, 26 de junio de 2026						
sábado, 27 de junio de 2026						
domingo, 28 de junio de 2026						
lunes, 29 de junio de 2026						DIA NUBLADO
martes, 30 de junio de 2026	7:00 a. m.	8:30 a. m.	1.50	3.00	4.50	SE AFECTAN ACTIVIDADES POR SECADO DE ZONAS A LABORAR POR SEGURIDAD DEL PERSONAL DE OBRA EN ARMADO DE FORMALETAS DE MADERA
miércoles, 1 de julio de 2026						DIA NUBLADO
jueves, 2 de julio de 2026						
viernes, 3 de julio de 2026						DIA NUBLADO
sábado, 4 de julio de 2026	7:00 a. m.	11:30 a. m.	4.50	3.00	7.50	SE AFECTAN ACTIVIDADES POR SECADO DE ZONAS A LABORAR POR SEGURIDAD DEL PERSONAL DE OBRA EN ARMADO DE FORMALETAS DE MADERA
domingo, 5 de julio de 2026						
lunes, 6 de julio de 2026						
martes, 7 de julio de 2026						DIA NUBLADO
miércoles, 8 de julio de 2026						
jueves, 9 de julio de 2026						
viernes, 10 de julio de 2026						DIA NUBLADO
sábado, 11 de julio de 2026	7:06 a. m.	12:00 a. m.	5.00		5.00	SE AFECTAN ACTIVIDADES POR SECADO DE ZONAS A LABORAR POR SEGURIDAD DEL PERSONAL DE OBRA EN ARMADO DE FORMALETAS DE MADERA
domingo, 12 de julio de 2026						
lunes, 13 de julio de 2026		FESTIVO				
martes, 14 de julio de 2026						DIA NUBLADO
miércoles, 15 de julio de 2026						DIA NUBLADO
		TOTAL HORAS	21.00		53.50	
		HORAS DIA	8.00		8.00	
		DIAS	2.63		6.69	

Tabla 4.

MES 5. En la siguiente tabla No. 5 se evidencian los tiempos de lluvias desde el 16 de julio de 2026 hasta el 15 de agosto 2026

FECHA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN	TOTAL HORAS	TIEMPO ADICONAL SECADO DE ZONAS A INTERVENIR	TOTAL REAL HORAS	OBSERAVACIONES
jueves, 16 de julio de 2026						
viernes, 17 de julio de 2026						
sábado, 18 de julio de 2026						DIA NUBLADO
domingo, 19 de julio de 2026						
lunes, 20 de julio de 2026						DIA NUBLADO
martes, 21 de julio de 2026	1:00 p. m.	2:00 p. m.	1.00	3.00	4.00	SE AFECTAN ACTIVIDADES POR SECADO DE ZONAS DE EXCAVACION PARA INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES
miércoles, 22 de julio de 2026	7:01 a. m.	8:37 a. m.	1.30	4.00	5.30	SE AFECTAN ACTIVIDADES POR SATURACION DEL TERERENO EN EXCAVACIONES PARA INSTALACIÒN DE TUBERIAS ELECTRICAS, AGUAS
jueves, 23 de julio de 2026	7:10 a. m.	8:10 a. m.	1.00	4.00	5.00	SE AFECTAN ACTIVIDADES DE FUNDIDA DE PLACA DE CONTRAPISOPOR SATURACIÒN DE HUMEDAD DEL SUELO DE NIVELACIÓN
viernes, 24 de julio de 2026						
sábado, 25 de julio de 2026						DIA NUBLADO
domingo, 26 de julio de 2026						
lunes, 27 de julio de 2026						
martes, 28 de julio de 2026						DIA NUBLADO
miércoles, 29 de julio de 2026						
jueves, 30 de julio de 2026						
viernes, 31 de julio de 2026						
sábado, 1 de agosto de 2026						
domingo, 2 de agosto de 2026						
lunes, 3 de agosto de 2026						
martes, 4 de agosto de 2026						
miércoles, 5 de agosto de 2026						
jueves, 6 de agosto de 2026						
viernes, 7 de agosto de 2026						
sábado, 8 de agosto de 2026						
domingo, 9 de agosto de 2026						
lunes, 10 de agosto de 2026						
martes, 11 de agosto de 2026						
miércoles, 12 de agosto de 2026	7:11 a. m.	11:49 a. m.	4.00	4.00	8.00	LLUVIAS EN LA MAÑANA. SE AFECTAN ACTIVIDADES DE VIGAS AEREAS POR SEGURIDAD DEL PERSONAL DE OBRA POR TRABAJO EN ALTURA
jueves, 13 de agosto de 2026	2:07 p. m.	5:11 p. m.	3.00		3.00	LLUVIAS EN LA TARDE. SE AFECTAN ACTIVIDADES DE VIGAS AEREAS POR SEGURIDAD DEL PERSONAL DE OBRA POR TRABAJO EN ALTURA
viernes, 14 de agosto de 2026						
sábado, 15 de agosto de 2026						
		TOTAL HORAS	10.30		25.30	
		HORAS DIA	8.00		8.00	
		DIAS	1.29		3.16	

Tabla 5.


MES 6. En la siguiente tabla No. 6 se evidencian los tiempos de lluvias desde el 16 de agosto de 2026 hasta el 05 de septiembre 2026

FECHA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN	TOTAL HORAS	TIEMPO ADICONAL SECADO DE ZONAS A INTERVENIR	TOTAL REAL HORAS	OBSERAVACIONES
domingo, 16 de agosto de 2026						
lunes, 17 de agosto de 2026						DIA FESTIVO
martes, 18 de agosto de 2026						
miércoles, 19 de agosto de 2026						
jueves, 20 de agosto de 2026						
viernes, 21 de agosto de 2026	10:39 a. m.	1:40 p. m.	3.00	3.00	6.00	SE AFECTAN ACTIVIDADES DE PROTECCION DE PLACA CON ATISOL POR SECADA PARA SU APLICACIÓN
sábado, 22 de agosto de 2026	7:00 a. m.	7:30 a. m.	0.50	6.00	6.50	SE AFECTAN ACTIVIDADES DE FUNDIDA DE ANDENES EXTERIORES POR SATURACION DE TERRENO.
domingo, 23 de agosto de 2026						
lunes, 24 de agosto de 2026						
martes, 25 de agosto de 2026						
miércoles, 26 de agosto de 2026	6:00 a. m.	7:00 a. m.		8.00	8.00	SE AFECTAN ACTIVIDADES DE MAMPOSTERIA POR REPLANTEOS Y SEGURIDAD DEL PERSONAL OPERATIVO
jueves, 27 de agosto de 2026						
viernes, 28 de agosto de 2026						
sábado, 29 de agosto de 2026						
domingo, 30 de agosto de 2026						
lunes, 31 de agosto de 2026						
martes, 1 de septiembre de 2026						
miércoles, 2 de septiembre de 2026						
jueves, 3 de septiembre de 2026						
viernes, 4 de septiembre de 2026						
sábado, 5 de septiembre de 2026						
domingo, 6 de septiembre de 2026						
lunes, 7 de septiembre de 2026						
martes, 8 de septiembre de 2026	12:45 p. m.	2:10 p. m.	1.50	3.00	4.50	SE AFECTAN ACTIVIDADES DE PAÑETE, PEDETALES AEREOS Y VIGAS AEREAS PARA PLACA DE TANQUE DE AGUA. TRABAJOS EN ALTURA QUE REQUEIREN DE AREAS SECAS POR SEGURIDAD DEL PERSONAL
miércoles, 9 de septiembre de 2026	1:00 p. m.	2:00 p. m.	1.00	3.00	4.00	SE AFECTAN ACTIVIDADES DE PAÑETE, PEDETALES AEREOS Y VIGAS AEREAS PARA PLACA DE TANQUE DE AGUA. TRABAJOS EN ALTURA QUE REQUEIREN DE AREAS SECAS POR SEGURIDAD DEL PERSONAL OPERATIVO
jueves, 10 de septiembre de 2026	8:00 a. m.	8:30 a. m.	0.50	6.00	6.50	SE AFECTAN ACTIVIDADES DE PAÑETE, VIGAS AEREAS PARA PLACA DE TANQUE DE AGUA. TRABAJOS EN ALTURA QUE REQUEIREN DE AREAS SECAS POR SEGURIDAD DEL PERSONAL OPERATIVO
viernes, 11 de septiembre de 2026						
sábado, 12 de septiembre de 2026						
domingo, 13 de septiembre de 2026						
lunes, 14 de septiembre de 2026						
martes, 15 de septiembre de 2026						
		TOTAL HORAS	6.50		35.50	
		HORAS DIA	8.00		8.00	
		DIAS	0.81		4.44	

Tabla 6.

de acuerdo a los registros presentados y seguimiento de la Bitácora de obra, se resumen los tiempos de lluvia de los seis (6) meses aproximados transcurridos hasta el 10 de septiembre de 2026 como se presenta en la siguiente tabla No. 7.

DIAS DE LLUVIA DEL 16 DE MARZO DE 2026 AL 10 SEPTIEMBRE DE 2026		
MES	**DIAS DE LLUVIA**	**PERIODO**
1	6.88	16 de mazo de 2026 hasta 15 abril de 2026
2	14.31	16 de abril de 2026 hasta 15 mayo de 2026
3	10.50	16 de mayo de 2026 hasta 15 junio de 2026
4	6.69	16 de junio de 2026 hasta 15 julio de 2026
5	3.16	16 de julio de 2026 hasta 15 agosto de 2026
6	4.44	16 de agosto de 2026 hasta 08 septiembre de 2026
TOTAL	**45.98**	**TOTAL DIAS DE LLUVIA**

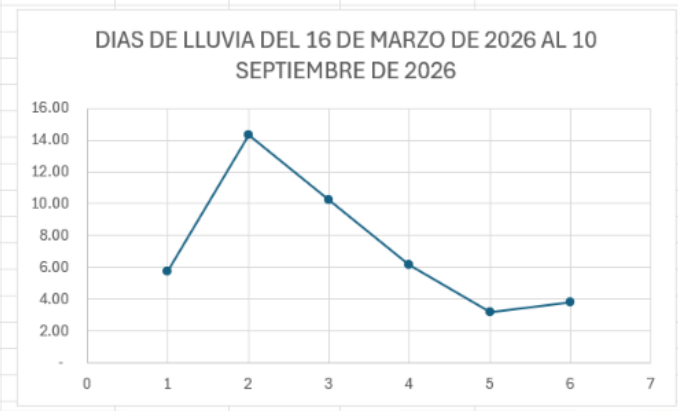


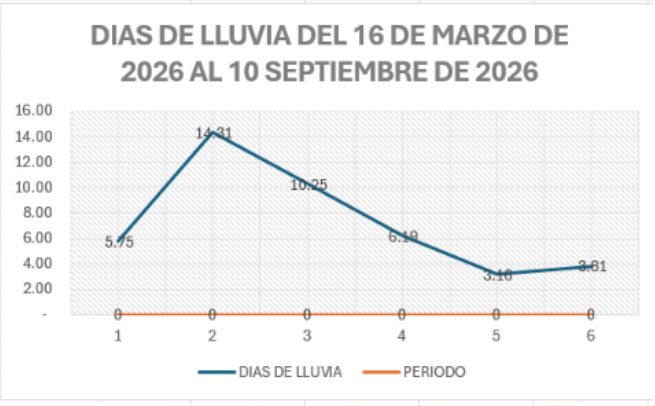


Tabla 7.

Como conclusión de la información presentada se evidencia que el contrato de la referencia se ha visto afectado en aproximadamente **45,98** días calendario a causa de las constantes lluvias durante el periodo evaluado.

El IDEAM no publica en sus boletines climáticos generales de libre consulta, de cuadros estadísticos mensuales consolidados que presenten de manera detallada los milímetros de precipitación acumulados para cada municipio. Este tipo de información histórica puede requerir una consulta o descarga específica de las bases de datos del Instituto. No obstante, a partir de los informes de predicción climática emitidos por el IDEAM durante 2026 y de las métricas históricas de precipitación disponibles en la plataforma **Weather Spark para Inirida Guainía**, para el municipio de Inírida, Guainía, es posible establecer un balance del comportamiento de las lluvias durante el periodo comprendido entre marzo y septiembre de 2026.

Ilustración 1. Promedio mensual de lluvia en Inírida – General

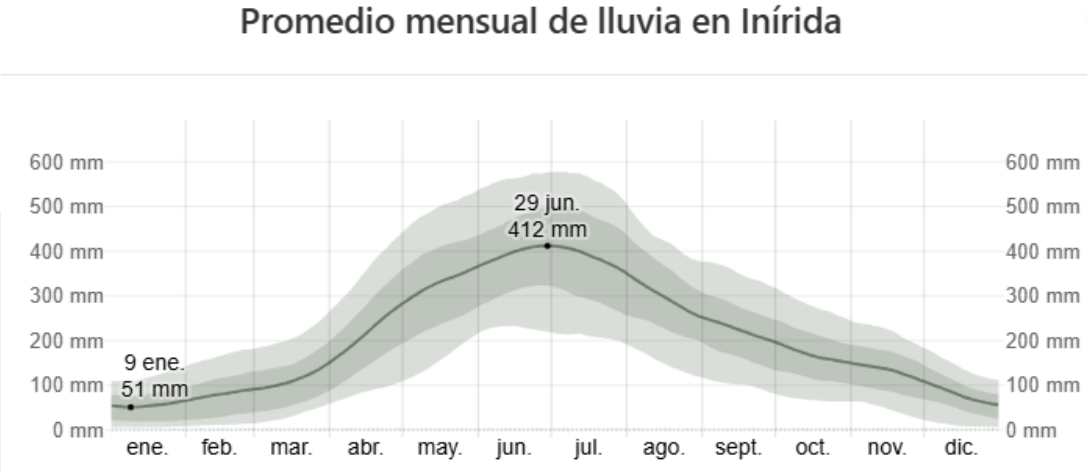

	ene.	feb.	mar.	abr.	may.	jun.	jul.	ago.	sept.	oct.	nov.	dic.
Lluvia	54,0mm	79,5mm	108,8mm	213,4mm	332,0mm	398,5mm	391,0mm	297,5mm	225,4mm	165,8mm	136,6mm	76,1mm

Fuente: Weather Spark

Balance de precipitación de Puerto Inírida Guainía (marzo - septiembre de 2026)


Mes	Comportamiento del periodo (2026)	Promedio histórico de lluvia (referencia)
Marzo	En Inírida, la probabilidad de un día mojado durante marzo *aumenta muy rápido*, y comienza el mes en *35 %* y termina en *47 %*.	~108,8 mm

Mes	Comportamiento del periodo (2026)	Promedio histórico de lluvia (referencia)
Abril	Consolidación progresiva de la temporada lluviosa; sin embargo, para Inírida se estimaron lluvias deficitarias, con reducción del número de días con precipitación respecto al promedio.	~213,4 mm
Mayo	Incremento de las precipitaciones y consolidación de la temporada lluviosa. Se presentaron condiciones de lluvia frecuentes en Guainía, aunque la predicción climática señalaba un comportamiento cercano a los valores normales en sectores del departamento.	~332,0 mm
Junio	Periodo de alta incidencia de lluvias, coincidente con el máximo climatológico histórico de Inírida. Se mantuvieron condiciones húmedas y presencia de lluvias en Guainía.	~398,5 mm
Julio	Persistencia de condiciones lluviosas, aunque con señales de variabilidad asociadas al fortalecimiento de las condiciones de El Niño. Se registraron pronósticos de lluvias en sectores de Guainía y la región Orinoquía-Amazonía.	~391,0 mm
Agosto	Se mantuvo un régimen lluvioso, aunque con tendencia a presentar déficits localizados en Guainía. IDEAM proyectó condiciones cercanas a lo normal en buena parte de la Amazonía, con posibles reducciones en sectores de Guainía.	~297,5 mm
Septiembre	Tendencia hacia una disminución progresiva de las precipitaciones frente a los meses de junio-julio. Se mantuvieron eventos de lluvia, aunque con mayor variabilidad y tendencia a condiciones más secas asociadas al fortalecimiento de El Niño.	~225,4 mm

Fuente: Weather Spark

Ilustración 2. Balance de precipitación de Puerto Inírida (marzo - septiembre)

Balance de precipitación de Puerto Inírida Guainía (marzo - septiembre de 2026)

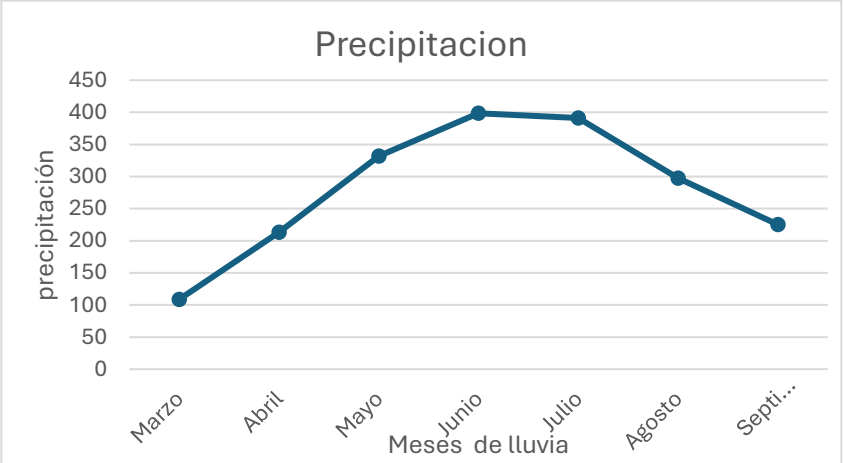

Se demostró la variación durante un mes y no solamente los totales mensuales, sino la precipitación de lluvia acumulada durante un período de 31 días en una escala móvil centrado alrededor de cada día del año. Inírida tiene una variación extremada de lluvia mensual por estación.

Con base en la descripción anterior, se establece el comportamiento promedio mensual de las precipitaciones en el municipio de Puerto Inírida, Guainía, y su incidencia en el desarrollo de las actividades del proyecto. Esta información permite identificar los periodos de mayor ocurrencia de lluvias y su relación con la ejecución de las actividades en obra. El comportamiento registrado se encuentra soportado mediante las Tablas 1 a 6, correspondientes a las evidencias y registros de precipitación recopilados durante el periodo evaluado.

3. Necesidad de la prórroga

La ampliación del plazo permitirá culminar la totalidad de las actividades en su totalidad bajo las condiciones de calidad, seguridad y estabilidad exigidas por las especificaciones técnicas del contrato, garantizando el adecuado cumplimiento del objeto contractual y evitando riesgos constructivos derivados de una ejecución acelerada.

La solicitud de prórroga no implica modificaciones al objeto contractual ni altera las condiciones técnicas ni económicas inicialmente pactadas, constituyéndose únicamente en una ampliación del término de ejecución necesaria para culminar satisfactoriamente el proyecto.

4. **Solicitud**

Con fundamento en los principios de planeación, economía, responsabilidad, eficiencia, equilibrio contractual y buena fe que rigen la contratación estatal, respetuosamente solicitamos a la Interventoría **PROYECTO SANABRIA S.A.S.** y al **Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes** autorizar una prórroga del plazo de ejecución por un término de **Cuarenta y Seis (46) días** calendario (hasta el 30 de noviembre de 2026), contados a partir del vencimiento del plazo contractual vigente que es el 15 de octubre de 2026, tiempo considerado técnicamente necesario para culminar las actividades restantes y entregar la obra completamente terminada, conforme a las especificaciones técnicas, normas de calidad y obligaciones establecidas en el Contrato de Obra No. 2039 de 2025.

Finalmente, manifestamos la total disposición del **CONSORCIO KASAF CULTURAL 2025** para continuar ejecutando las obras con el mayor compromiso técnico y administrativo, garantizando la entrega de una infraestructura que satisfaga plenamente los requerimientos del **Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes** y de la comunidad beneficiaria.

Agradecemos su atención.

Cordialmente,



CONSORCIO KASAF CULTURAL 2025
NIT 902.015.784-3
MIGUEL ALEXANDER CERÓN MOLINA
Representante Legal
C.C. No. 1.082.774.968 de San Agustín (Huila)

Documentos Adjuntos:

- Programación de intención (Excel, PDF)
