

CRONOGRAMA DE PRÓRROGAC.I 1348-2024 – 12 MESES

ACTIVIDAD	DESCRIPCION	RESPONSABLE	PLAZO
1	**ACTIVIDADES GENERALES**		
1.1	Suscripción de otrosí de prórroga y levantamiento de la suspensión del Contrato Interadministrativo No. MSPS-1348-2024.	MINISTERIO DE SALUD Y FINDETER	2 SEMANAS
1.2	Definición formal por parte del Ministerio de Salud de la capacidad instalada y áreas finales de construcción de los CAPS de los Grupos 1 y 2, previa concertación técnica con FINDETER.	MINISTERIO DE SALUD	2 SEMANAS
1.3	Presentacion de propuesta formal de FINDETER para modificación de los contratos derivados para ejecución de ajustes a diseños	FINDETER	2 SEMANAS
1.4	Aprobación de propuesta de modificacion de contratos para realizar ajustes a diseños	MINISTERIO DE SALUD	2 SEMANAS
1.5	Modificación de contratos deriviados para ajustes a diseños	FINDETER	
1.6	Ajuste de estudios y diseños, Grupos 1 y 2	Contratistas e Interventorías Derivados	8 SEMANAS
1.7	Emisión de conceptos de pertinencia técnica y financiera para los CAPS de los Grupos 1 y 2.	MINISTERIO DE SALUD Y FINDETER	4 SEMANAS
1.8	Radicación, trámite y obtención de modificaciones a las licencias urbanísticas derivadas de los ajustes solicitados por el MSPS.	Contratistas Derivados y Curaduría	8 SEMANAS
1.9	Definición de la estrategia de cierre financiero o priorización de proyectos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social.	MINISTERIO DE SALUD	8 SEMANAS
1.10	Modificación de contratos derivados para inclur cierre financiero de CAPS San Cipriano, Comunas 6, 9 y 11	FINDETER y Contratistas	2 SEMANAS
2	**Ejecución Obra Civil CAPS - San Cipriano**		
2.1	Cimentación (Terminación) y Estructuras	Contratistas e Interventorías Derivados	5 SEMANAS
2.2	Mampostería		4 SEMANAS
2.3	Instalaciones Técnicas (Redes)		9 SEMANAS
2.4	Obra gris, blanca y acabados		9 SEMANAS
2.5	Carpintería, accesorios sanitarios, eléctricos, sistemas A.A., grifería, etc.		5 SEMANAS
2.6	Obras Exteriores		5 SEMANAS
2.7	Pruebas, Cierre y Entrega		3 SEMANAS
3	**Ejecución Obra Civil CAPS - Comuna 6**		
3.1	Cimentación	Contratistas e Interventorías Derivados	4 SEMANAS
3.2	Redes Hidrosanitarias y plantilla de piso		5 SEMANAS
3.3	Estructuras complementarias		8 SEMANAS
3.4	Mampostería		5 SEMANAS
3.5	Instalaciones Técnicas (Redes)		9 SEMANAS
3.6	Obra gris, blanca y acabados		8 SEMANAS
3.7	Carpintería, accesorios sanitarios, eléctricos, sistemas A.A., grifería, etc.		4 SEMANAS
3.8	Obras Exteriores		4 SEMANAS
3.9	Pruebas, Cierre y Entrega		3 SEMANAS
4	**Ejecución Obra Civil CAPS - Comuna 9**		
4.1	Cimentación	Contratistas e Interventorías Derivados	4 SEMANAS
4.2	Redes Hidrosanitarias y plantilla de piso		5 SEMANAS
4.3	Estructuras complementarias		8 SEMANAS
4.4	Mampostería		5 SEMANAS
4.5	Instalaciones Técnicas (Redes)		9 SEMANAS
4.6	Obra gris, blanca y acabados		8 SEMANAS
4.7	Carpintería, accesorios sanitarios, eléctricos, sistemas A.A., grifería, etc.		4 SEMANAS
4.8	Obras Exteriores		4 SEMANAS
4.9	Pruebas, Cierre y Entrega		3 SEMANAS
5	**Ejecución Obra Civil CAPS - Comuna 11**		
5.1	Cimentación	Contratistas e Interventorías Derivados	4 SEMANAS
5.2	Redes Hidrosanitarias y plantilla de piso		5 SEMANAS
5.3	Estructuras complementarias		8 SEMANAS
5.4	Mampostería		5 SEMANAS
5.5	Instalaciones Técnicas (Redes)		9 SEMANAS
5.6	Obra gris, blanca y acabados		8 SEMANAS
5.7	Carpintería, accesorios sanitarios, eléctricos, sistemas A.A., grifería, etc.		4 SEMANAS
5.8	Obras Exteriores		4 SEMANAS
5.9	Pruebas, Cierre y Entrega		3 SEMANAS
6	**Ejecución Obra Civil CAPS - Citronela**		
6.1	Cimentación (Terminación) y Estructuras	Contratistas e Interventorías Derivados	5 SEMANAS
6.2	Mampostería		5 SEMANAS
6.3	Instalaciones Técnicas (Redes)		9 SEMANAS
6.4	Obra gris, blanca y acabados		9 SEMANAS
6.5	Carpintería, accesorios sanitarios, eléctricos, sistemas A.A., grifería, etc.		5 SEMANAS
6.6	Obras Exteriores		5 SEMANAS
6.7	Pruebas, Cierre y Entrega		3 SEMANAS

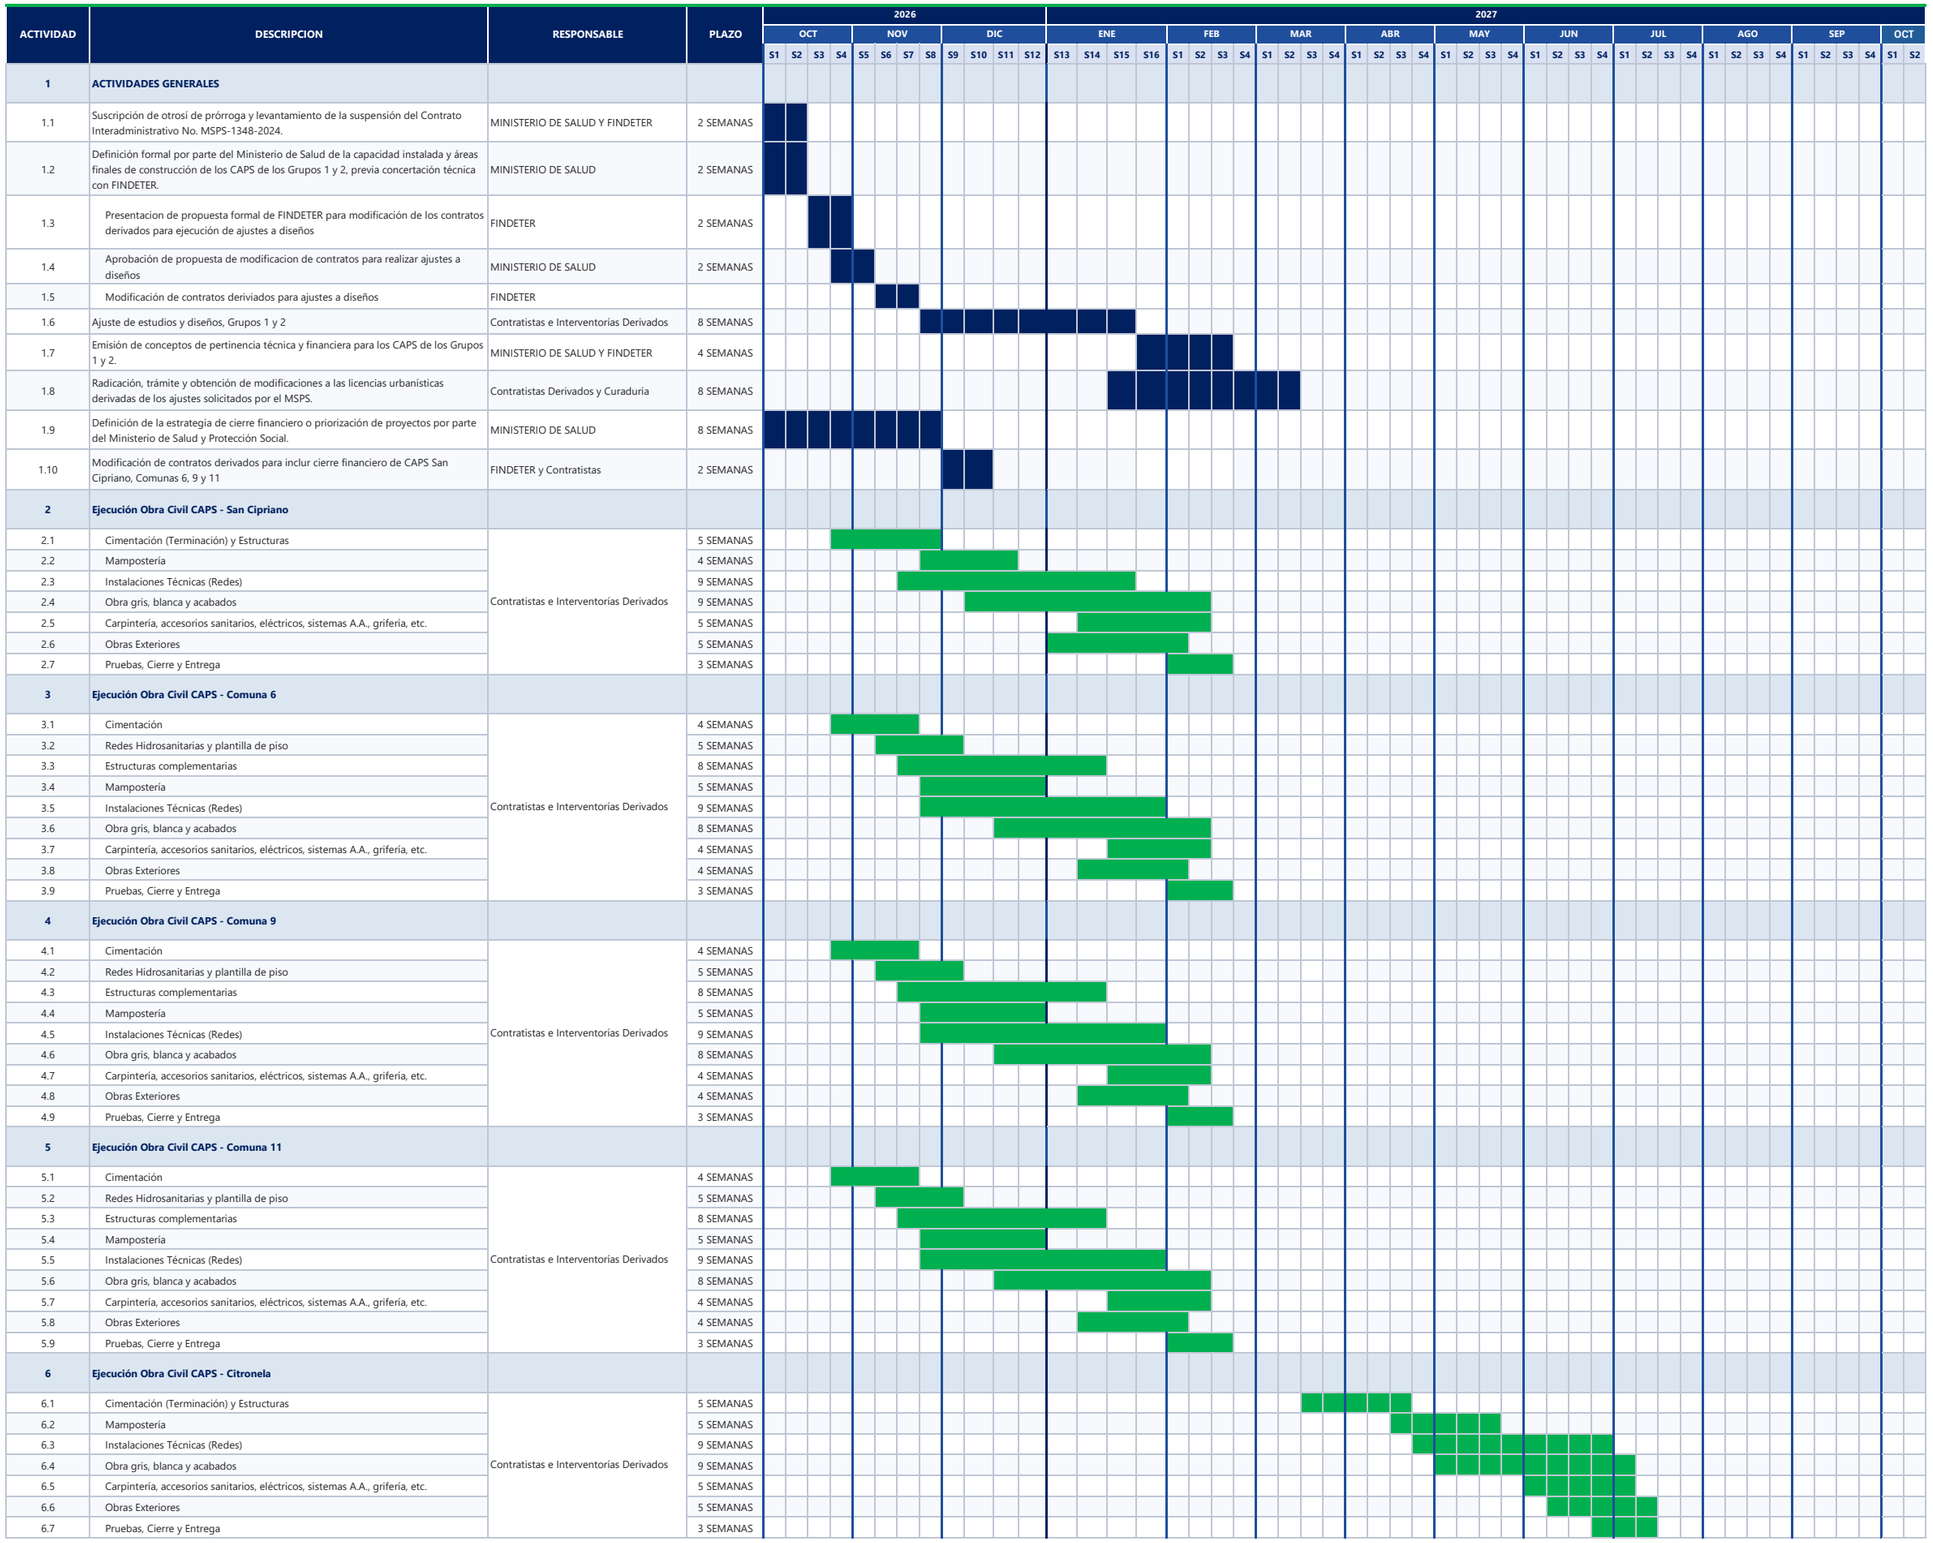

CRONOGRAMA DE PRÓRROGAC.I 1348-2024 – 12 MESES

ACTIVIDAD	DESCRIPCION	RESPONSABLE	PLAZO
7	**Ejecución Obra Civil CAPS - Llano Bajo**		
7.1	Cimentación (Terminación) y Estructuras	Contratistas e Interventorías Derivados	7 SEMANAS
7.2	Mampostería		7 SEMANAS
7.3	Instalaciones Técnicas (Redes)		9 SEMANAS
7.4	Obra gris, blanca y acabados		9 SEMANAS
7.5	Carpintería, accesorios sanitarios, eléctricos, sistemas A.A., grifería, etc.		6 SEMANAS
7.6	Obras Exteriores		5 SEMANAS
7.7	Pruebas, Cierre y Entrega		3 SEMANAS
8	**Ejecución Obra Civil CAPS - Punta Bonita**		
8.1	Cimentación (Terminación) y Estructuras	Contratistas e Interventorías Derivados	7 SEMANAS
8.2	Mampostería		7 SEMANAS
8.3	Instalaciones Técnicas (Redes)		9 SEMANAS
8.4	Obra gris, blanca y acabados		9 SEMANAS
8.5	Carpintería, accesorios sanitarios, eléctricos, sistemas A.A., grifería, etc.		6 SEMANAS
8.6	Obras Exteriores		5 SEMANAS
8.7	Pruebas, Cierre y Entrega		3 SEMANAS
9	**Ejecución Obra Civil CAPS - Barranco**		
9.1	Cimentación (Terminación) y Estructuras	Contratistas e Interventorías Derivados	7 SEMANAS
9.2	Mampostería		7 SEMANAS
9.3	Instalaciones Técnicas (Redes)		9 SEMANAS
9.4	Obra gris, blanca y acabados		9 SEMANAS
9.5	Carpintería, accesorios sanitarios, eléctricos, sistemas A.A., grifería, etc.		6 SEMANAS
9.6	Obras Exteriores		5 SEMANAS
9.7	Pruebas, Cierre y Entrega		3 SEMANAS
10	**Ejecución Obra Civil CAPS - Zaragoza**		
10.1	Cimentación (Terminación) y Estructuras	Contratistas e Interventorías Derivados	7 SEMANAS
10.2	Mampostería		7 SEMANAS
10.3	Instalaciones Técnicas (Redes)		9 SEMANAS
10.4	Obra gris, blanca y acabados		9 SEMANAS
10.5	Carpintería, accesorios sanitarios, eléctricos, sistemas A.A., grifería, etc.		6 SEMANAS
10.6	Obras Exteriores		5 SEMANAS
10.7	Pruebas, Cierre y Entrega		3 SEMANAS
11	**Ejecución Obra Civil CAPS - San Francisco**		
11.1	Cimentación (Terminación) y Estructuras	Contratistas e Interventorías Derivados	7 SEMANAS
11.2	Mampostería		7 SEMANAS
11.3	Instalaciones Técnicas (Redes)		9 SEMANAS
11.4	Obra gris, blanca y acabados		9 SEMANAS
11.5	Carpintería, accesorios sanitarios, eléctricos, sistemas A.A., grifería, etc.		6 SEMANAS
11.6	Obras Exteriores		5 SEMANAS
11.7	Pruebas, Cierre y Entrega		3 SEMANAS
12	**Ejecución Obra Civil CAPS - Guadual**		
12.1	Cimentación (Terminación) y Estructuras	Contratistas e Interventorías Derivados	7 SEMANAS
12.2	Mampostería		7 SEMANAS
12.3	Instalaciones Técnicas (Redes)		9 SEMANAS
12.4	Obra gris, blanca y acabados		9 SEMANAS
12.5	Carpintería, accesorios sanitarios, eléctricos, sistemas A.A., grifería, etc.		6 SEMANAS
12.6	Obras Exteriores		5 SEMANAS
12.7	Pruebas, Cierre y Entrega		3 SEMANAS
13	**Ejecución Obra Civil CAPS - Comuna 5**		
13.1	Revisión ministerial y emisión del concepto de pertinencia técnica y financiera de estudios y diseños del CAPS Comuna 5.	MINISTERIO DE SALUD	8 SEMANAS
13.2	Obtención de licencia de construcción y permisos requeridos para inicio de obra.	Contratistas Derivados y Curaduría	8 SEMANAS
13.3	Alistamiento y Logistica para inicio de obra civil	Contratistas Derivados y Curaduría	3 SEMANAS
13.4	Cimentación	Contratistas e Interventorías Derivados	4 SEMANAS
13.5	Redes Hidrosanitarias y plantilla de piso		5 SEMANAS
13.6	Estructuras complementarias		8 SEMANAS
13.7	Mampostería		5 SEMANAS
13.8	Instalaciones Técnicas (Redes)		9 SEMANAS
13.9	Obra gris, blanca y acabados		8 SEMANAS
13.10	Carpintería, accesorios sanitarios, eléctricos, sistemas A.A., grifería, etc.		4 SEMANAS
13.11	Obras Exteriores		4 SEMANAS
13.12	Pruebas, Cierre y Entrega		3 SEMANAS

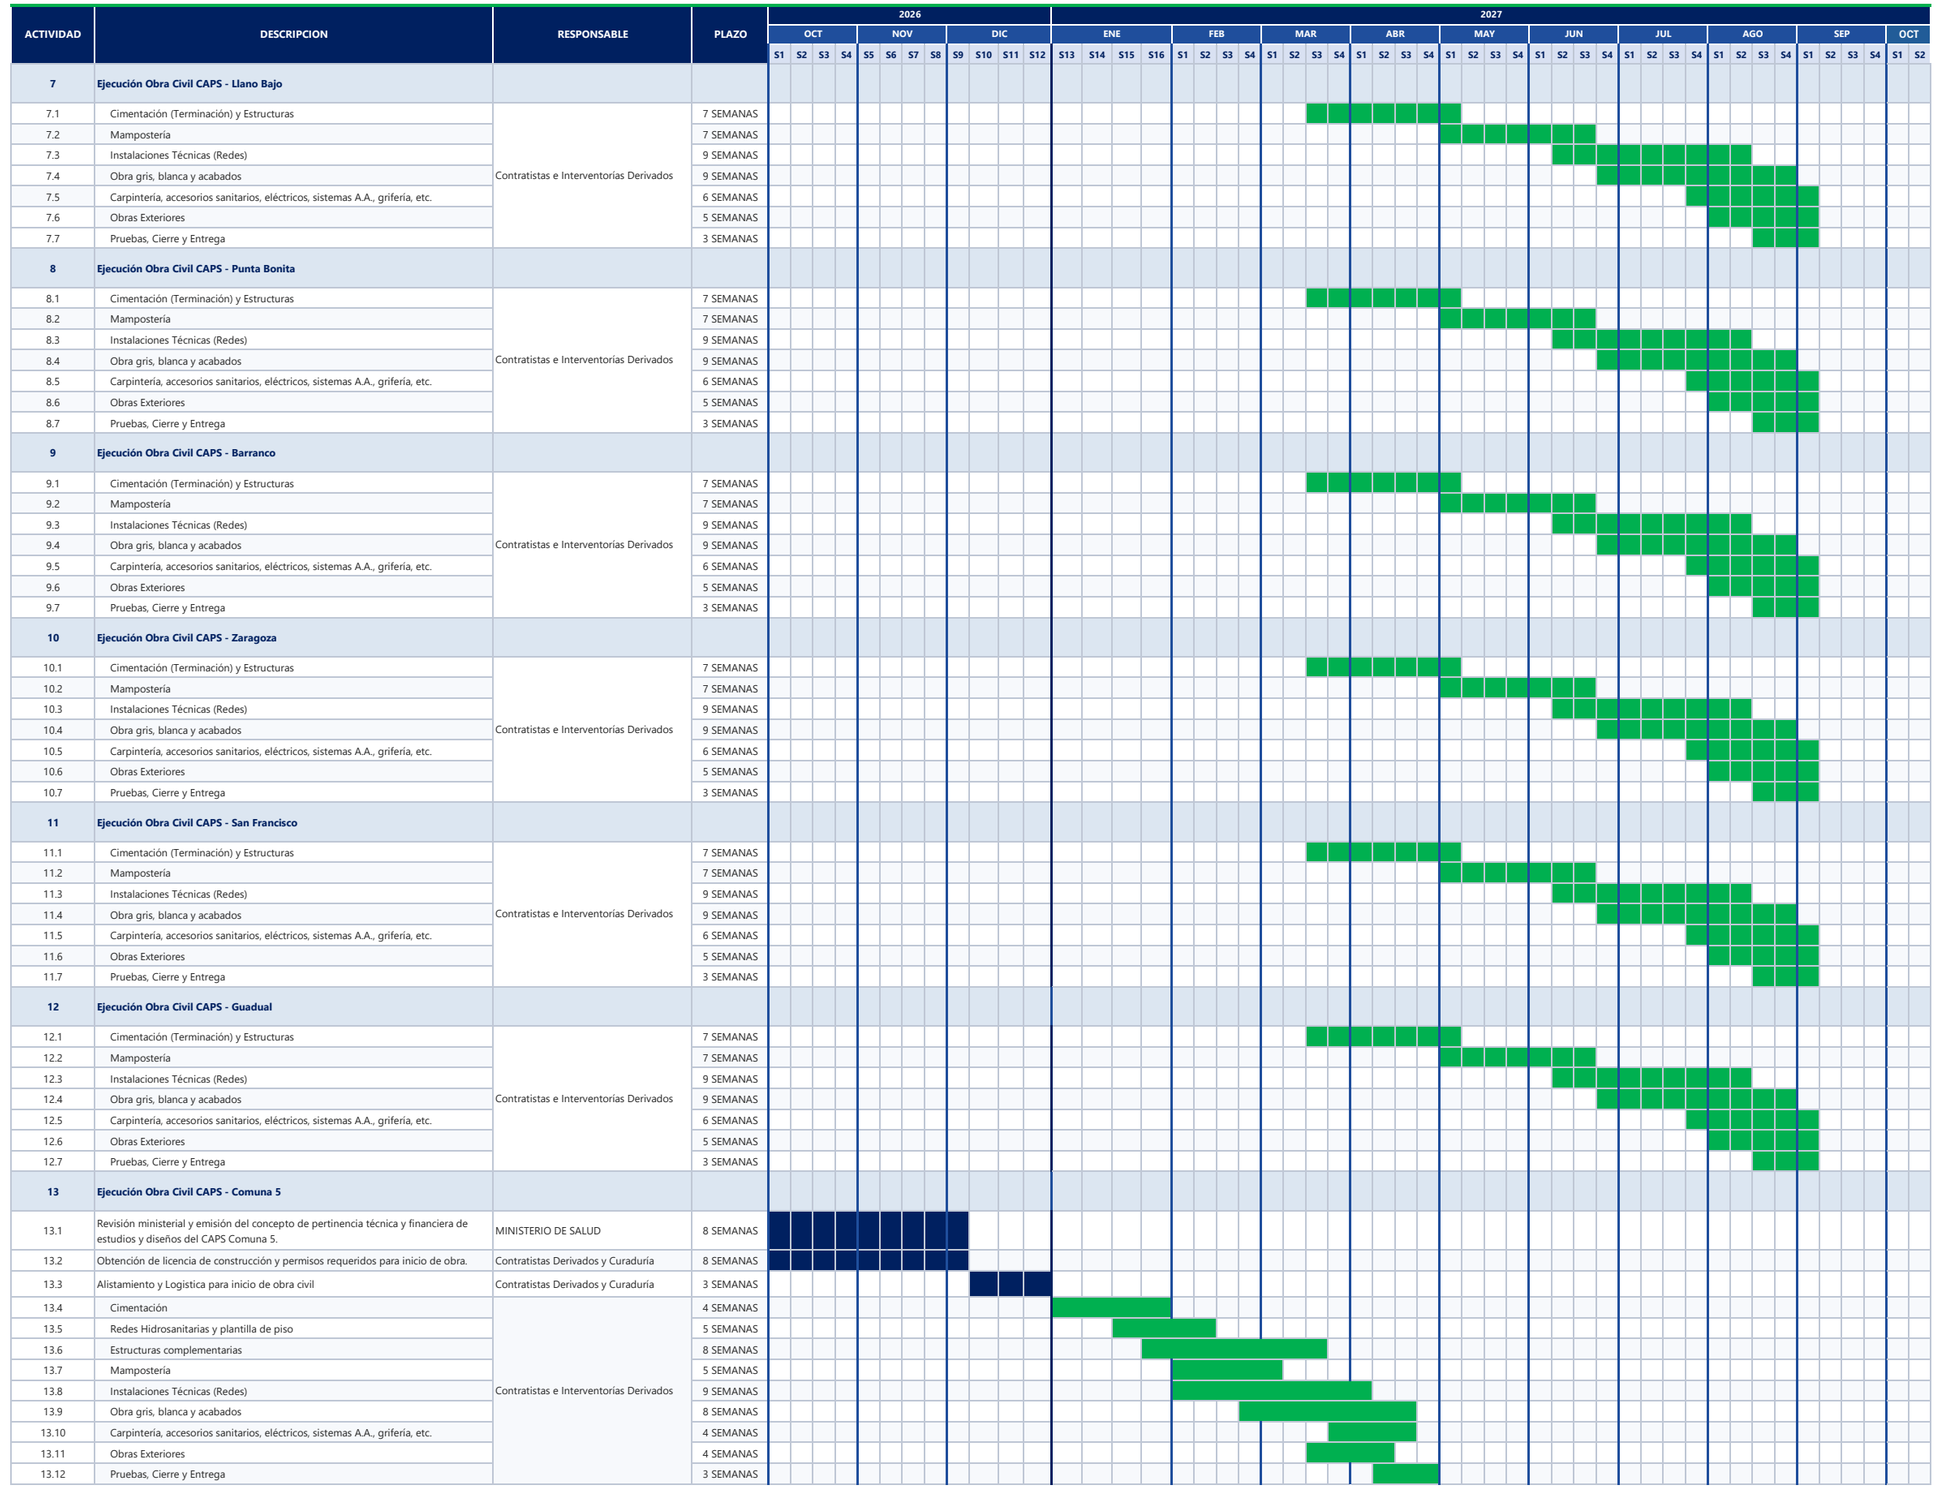

CRONOGRAMA DE PRÓRROGAC.I 1348-2024 – 12 MESES

| ACTIVIDAD | DESCRIPCION | RESPONSABLE | PLAZO | 2026 | | | | | | | | | | | | 2027 | | | | | | | | | | | |
