11845

Puerto Gaitán, 24 de julio del 2026

1090-1335

SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN
Recibido por: karen p
Fecha 28 JUL 2026
Hora: 9:12 a.m.

Doctora:
ALEJANDRA CASTILLO BLANDON
Secretaría de contratación
Alcaldía Municipal de Puerto Gaitán - Meta

Referencia: **CONTRATO DE OBRA No 0821 DE 2025**, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META."

Asunto: Remisión de informe mensual N° 9 del contrato de la referencia

Cordial saludo,

De manera atenta, me permito remitir a su despacho la documentación entregada por el contratista de obra del contrato No. 0821 de 2025, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META.", la cual fue aprobada por la interventoría y verificada por la secretaría de infraestructura, respecto al Informe mensual N° 9 en el periodo del 01/05/2026 al 31/05/2026.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN
Recibido por: karen p
Fecha 06 OCT 2026
Hora: 3:55 pm

Sin otro particular,

CHRISTIAN JULIÁN FERNÁNDEZ REYES
Secretario de Infraestructura

Elaboró: Hanlly Lorena Vergara Camargo – Profesional de Apoyo CPS 1106 de 2026
Revisó: Christian Julián Fernández Reyes - Secretario de Infraestructura

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

CONSORCIO INTERVENTORÍA AC INDÍGENAS 2025

1846

CONS-10-26
Villavicencio (Meta), 17 junio de 2026

Ingeniero:
Ing CRISTIAN JULIAN FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Calle 10No. 10-90 Barrio Centro – Palacio Municipal
e-mail: infraestructura@puertogaitan-meta.gov.co
Puerto Gaitán – Meta.

0117
11:10 AM
17 JUN 2026

Ref.: Contrato de Interventoría No. 1004 de 2025 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEIMPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN META.

Asunto: Entrega de informe mensual No.9 Contrato de obra 0821 de 2025

Cordial Saludo:

A continuación, hacemos entrega del informe de actividades de obra del contrato No 0821 de 2025, informe que fue revisado y ajustado a requerimientos contractuales.

- ✓ Original informe mensual No.09 correspondiente al contrato de obra 0821 de 2025, junto con sus anexos. Periodo del (01 de mayo de 2026 al 31 de mayo de 2026). # de carpetas:2.

Cordialmente,

JORGE ADELMO DIAZ SARMIENTO
R.L. CONSORCIO INTERVENTORÍA AC INDIGENAS 2025

Anexo. lo enunciado en 2 carpeta

1184

CE-023-2026

Villavicencio, 05 de junio de 2026

Ingeniero:
JORGE ADELMO DIAZ SARMIENTO
CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025
Calle 41B #30 – 11
e-mail: interventoria.acindigenas@gmail.com
Ciudad

Ref.: Contrato de Obra No. 0821 de 2025 "CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META"

Asunto: Entrega informe mensual No. 9

Cordial saludo:

Por medio de la presente me permito entregar el informe mensual No.9 del periodo comprendido entre el 01 al 31 de mayo de 2026, para su respectiva revisión, aprobación y tramite.

Agradeciendo la atención prestada y a la espera de sus indicaciones.

Atentamente,

LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA
R.L. CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
Contratista

Anexo: lo enunciado en 2 carpetas y un CD

ALCALDÍA DE PUERTO GAITAN, META	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE INFORME MENSUAL DE OBRA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:ING-FR-72	Version:05	Vigencia:10-01-2025	

Ciudad y Fecha: PUERTO GAITAN 05/06/2026

Contrato de obra No.: 821 DE 2025

Objeto: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META

Radicado No: Fecha:

Periodo del informe: Desde: 01/05/2026 Hasta: 31/05/2026

No.	DOCUMENTO / TRAMITE	ENTREGADO	CUMPLE			RESPONSABLE
			SI	NO	N/A	
1	INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO					
1,01	Generalidades del contrato, localización especifica, región, zona urbana o rural, georreferenciación, descripción del proyecto, expectativas, alcance del contrato, población beneficiada, entre otros (imágenes áreas y/o en detalle de la zona a intervenir).	X	X			
2	INFORMACION DEL CONTRATO					
2,01	**Cuadro de trazabilidad:** 1) Numero del proceso (Etapa pre-contractual), 2) Numero y fecha de suscripción de minuta inicial,3) Objeto del contrato , 4) Numero de identificación Tributaria (NIT), 5) Representante legal (para personas juridicas y plurales), 6) Identificación personal del representante legal (para personas juridicas y plurales), 7) Correo electrónico del contratista (acorde a minuta y RUT), 8) Nombre del contratista (natural, juridica, plural), 9) Valor del contrato , 10) Plazo de ejecución inicial, 11) Nombre del Supervisor y cargo, 12) Acta de inicio y fecha, 13) Fecha de terminación inicial prevista, 14) Actas de suspensión y/o ampliación de suspensiones, fecha y tiempo (si aplica en orden cronológico), 15) Actas de Reinicio y fecha, indicando el plazo ya ejecutado y el plazo restante de ejecución, 16) Nueva fecha de terminación del contrato (ajustada por las suspensiones y/o ampliaciones de suspensión), 17) Otros si modificatorios, 18) Contrato(s) adicional(es), fecha y valor, 19) Valor total del contrato, 20) Prorroga(s), 21) Nueva fecha de terminación	X	X			
3	INFORMACION LEGAL DEL CONTRATO					
3,01	Control de pólizas aprobadas del contrato de obra según vigencias, valor y coberturas exigidas en (minuta, modificatorios, prorrogas, reinicios y todos los actos administrativos que aplique)	X	X			
4	INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO					
4,01	Plan de inversión de anticipo	X	X			
4,02	Información de avance financiero de la obra	X	X			
4,03	Balance financiero indicando anticipos, parciales y amortizaciones de anticipo de obra.	X	X			
4,04	Acta de desembolso del anticipo de obra (si aplica).				X	
4,05	Relación de certificados de Disponibilidad Presupuestal de cada contrato de obra .	X	X			
4,06	Relación de registros presupuestales de cada contrato con N° de rubro, fuente de financiación	X	X			
4,07	Ordenes de pago efectuadas (Desembolso de anticipo y pagos parciales)	X	X			
5	INFORMACION TECNICA DEL CONTRATO					
5,01	Grafico avance de programado vs ejecutado de las actividades contratadas. (financiera, por porcentajes)	X	X			
5,02	Cuadro de avance con acumulado mes a mes	X	X			
5,03	Control del estado del tiempo resumen (dia a dia mes reportado en el informe)	X	X			
6	INFORMACION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO					
6,01	Cuadro de relación de personal de obra (profesional - operativo) propuesto vs personal modificado (aval del supervisor cambio de personal) y organigrama de personal	X	X			
6,02	Certificado del representante legal y contador publico y/o revisor fiscal del pago de seguridad social y parafiscales mensuales avalando el cumplimiento de estas obligaciones (adjuntar matricula y antecedentes de la junta central de contadores vigente) relacionar (nombre, numero de identidad, cargo, N° de planilla, EPS, AFP y ARL).	X	X			
6,03	Paz y salvo de los trabajadores (retirados al corte)	X	X			
7	CUADRO DE LABORATORIOS TOMADOS EN EL PERIODO	X	X			
8	CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS (CERTIFICADO DE INTERVENTORIA AVALANDO EQUIPOS PROPUESTOS EN EL CONTRATO DE OBRA)	X	X			
9	INFORMACION AMBIENTAL DEL CONTRATO					
9,01	Certificación del cumplimiento de los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para la ejecución del proyecto (prediales, ambientales, de construcción en otros).	X	X			
9,02	Seguimiento a la disposición de materiales	X	X			
9,03	Registro fotográfico de actividades ambientales	X	X			
10	ANEXOS					
10,01	Actas de socialización (informes inicial)	X	X			
10,02	Actas de vecindad (de apertura y cierre - si aplica)				X	
10,03	Relación de comités de obra. (según orden cronológico y debidamente numeradas)				X	
10,04	Registro fotográfico del acta de avance con acumulado mes a mes	X	X			
10,05	Cartera topográfica de obra (si en el periodo se ejecutaron labores que requiera esta labor)				X	
10,06	Calidad de los materiales, ensayos de laboratorio y certificados de calidad, (anexar de acuerdo al tipo de obra y obligaciones legales , anexando certificados de los materiales y de calibración de equipos utilizados en los ensayos o levantamientos topográficos)	X	X			

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE INFORME MENSUAL DE OBRA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:ING-FR-72	Version:05	Vigencia:10-01-2025	

Ciudad y Fecha: PUERTO GAITAN 05/06/2026

Contrato de obra No.: 821 DE 2025

Objeto: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META

Radicado No: Fecha:

Periodo del informe: Desde: 01/05/2026 Hasta: 31/05/2026

No.	DOCUMENTO / TRAMITE	ENTREGADO	CUMPLE			RESPONSABLE
			SI	NO	N/A	
10,07	Informe de los profesionales y/o especialistas debidamente firmados (topógrafos, estructurales, entre otros)				X	
10,08	Informe de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), en el cual se registre el seguimiento de las capacitaciones, entregas de EPP, protocolos de prevención y mitigación del COVID-19 y su seguimiento mediante registros (planillas, formatos, etc.) debidamente firmados por el profesional correspondiente	X	X			
10,09	Nominas mensuales debidamente firmadas copia por los trabajadores /profesionales /contador/revisor fiscales, según aplique (copia de las nominas pagadas) y desprendibles de pago a profesionales por prestación de servicios	X	X			
10,1	Pagos de seguridad social y aportes parafiscales (planillas) según la naturaleza del contratista y pagos de seguridad social para los profesionales contratados por prestación de servicios , mas pago de ARL en todos los casos por las empresas a nivel de riesgo V.	X	X			
10,11	Ordenes de operación de inversión y buen manejo del anticipo, y acumulado de obra (si aplica)	X	X			
10,12	Aprobación del contrato fiduciario (si aplica)	X	X			
10,13	Informe del contrato fiduciario del anticipo del contrato de obra (si aplica)	X	X			
10,14	Anexos (cada ficha de PMA o PAGA genera una evidencia la cual debe venir relacionada en el informe de interventoria, así como del cumplimiento de los deberes derivados de los actos administrativos, registro fotográfico). firmado por el profesional (si aplica).				X	
11	CD (CON TODA LA INFORMACIÓN EN FORMATO WORD, PDF, DWG, MPP, EN OTROS.)	X	X			

NOTA: Se aclara así alguna información de la aquí solicitada no se encuentre en los formatos de MECI - CALIDAD, se hace exigible por la Secretaria de Infraestructura, por tanto se debe adjuntar en el informe en el orden antes descrito. Los informes mensuales y sus soportes tanto de obra como de interventoría, deben allegarse por la interventoría conjuntamente dentro de un plazo máximo de los primeros ocho (8) días del corte del mes; y en caso de devolución deberá corregirse y entregar en un plazo máximo de cinco (5) días.

Revisó y aprobó:

R/L JORGE ADELMO DIAZ SARMIENTO
CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025

Nota: se debe paginar los informes

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.680 – 1

1645

INFORME DE OBRA

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 821 DE 2025

"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META"

INFORME MENSUAL No. 9

PERIODO DEL INFORME
DEL 01 AL 31 MAYO DE 2026

CONTRATISTA:
CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1
R.L. LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA

INTERVENTOR:
CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025
NIT. 901.972.868 – 4
R.L. JORGE ADELMO DÍAZ SARMIENTO

1650

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 5
2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 5
2.1.1 Localización comunidades Resguardo Indígena Wacoyo 5
2.1.2 Localización comunidades Resguardo Indígena Awaliba 6
2.1.3 Localización comunidades Resguardo Indígena Domoplanas 6
2.1.4 Localización comunidades Resguardo Indígena Aseinpome 7
2.1.5 Comunidad beneficiada 8
3. ALCANCE DEL PROYECTO 8
4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO 9
5. INFORMACIÓN LEGAL DEL CONTRATO 10
5.1 CONTROL DE PÓLIZAS APROBADAS 11
6 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO 12
6.1 PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO 12
6.2 ACTA DE DESEMBOLSO DEL ANTICIPO 13
6.3 INFORMACIÓN DE AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 15
6.4 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 16
6.5 RELACIÓN DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP. 17
6.6 RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP. 17
6.7 ORDENES DE PAGO EFECTUADAS 17
7 INFORMACIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO 18
7.1 CUADRO DE AVANCE % ACUMULADO MES A MES 18
7.1.1 GRAFICO DE AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO 19
7.2 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 19
7.3 CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES. 27
7.4 MANEJO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 24
7.5 CONTROL ESTADO DEL TIEMPO 27
8 INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 28

8.1 RELACION PERSONAL DE OBRA (PROFESIONAL, TÉCNICO, OPERATIVO) 28
8.2 PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 29
8.3 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 30
8.4 PAZ Y SALVO PERSONAL 29
9 CUADRO RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 30
10 CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 30
11 INFORMACIÓN AMBIENTAL DEL CONTRATO. 30
12 CONCLUSIONES 32
13 ANEXOS 33

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

1052

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de las leyes y normas, principalmente del artículo 366 de la Constitución Política de Colombia el cual establece que *"el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las actividades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento básico y de agua potable"*, el municipio de Puerto Gaitán en enmarcado en el cumplimiento de las metas de su Plan de Desarrollo **"JUNTOS LO HACEMOS POSIBLE 2024-2027"** PDM 0344- Construcción, ampliación, optimización, y adecuación de redes de acueducto y plantas de tratamiento de agua potable en el municipio de Puerto Gaitán, Meta. Atendiendo a la política pública de VIVIENDA, establece como uno de los fines principales de la actividad del Estado, la solución de las necesidades básicas insatisfechas, entre las que está el acceso al servicio de agua potable, que es fundamental para la vida humana. El abastecimiento adecuado de agua de calidad para el consumo humano es necesario para evitar casos de morbilidad por enfermedades como el cólera y la diarrea.

Algunas comunidades Indígenas del Municipio de Puerto Gaitán-Meta, presentan vulneración en el servicio de agua potable ya que no cuentan con sistemas de acueductos, se han visto afectadas por la carencia de agua potable, llevando a realizar malas prácticas de la captación del agua, tomando como forma de abastecimiento los pozos profundos rudimentarios en algunas de sus viviendas, que con el tiempo por el desconocimiento sobre las consecuencias que se podrían presentar, algunas familias construyeron pozos sépticos o letrinas a corta distancia de la fuente, lo cual ocasiona la contaminación inmediata de los mismos; evidenciándose condiciones incorrectas para el acceso al agua potable.

Surtidos los tramites de planeación del proyecto, mediante resolución No. 0014 del 10 de junio de 2025 *"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA PARA LA CONTRATACIÓN MEDIANTE LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA LP-SIP-005-2025"* se inició el proceso de contratación el cual culmino con la adjudicación y suscripción del Contrato de Obra Pública No. 821 del 17 de julio de 2025 cuyo objeto es la **"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META"**.

Así las cosas, con la presentación del presente informe damos cumplimiento a lo estipulado en el Contrato de Obra No. 821 – 2025 en su cláusula *OCTAVA. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:* numeral *6. Cumplir con la entrega de informes mensuales de ejecución, según el avance de la obra (secuencias de actividades, etc.) de acuerdo al plazo pactado.*

1653

Así mismo, el presente informe cumple con los requerimientos exigidos en el *FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE INFORME MENSUAL DE OBRA (INF-FR-72 V05 vigente desde el 10/01/2025)* establecido por la entidad para tal fin.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se localiza y beneficia a 58 comunidades de 4 resguardos indígenas de la zona rural del municipio de Puerto Gaitán – Meta, así:

2.1.1 Localización comunidades Resguardo Indígena Wacoyo

RESGUARDO WACOYO									
CÓDIGO	COMUNIDAD POZO	COMUNIDADES BENEFICIARIAS	TOTAL COMUNIDADES	ESTE	NORTE	COTA	LONGITUD	LATITUD	D. GAITAN
WAC01	POZO KALIWIRNAE	ACACIOS	2	888322.2694m	973031.6969m	204.700m	W71° 59' 36.52"	N4° 21' 06.35"	14,00 KM
WAC02	POZO ESMERALDA WALABO	LAS BRISAS, MANANTIAL Y WALABO	4	900418.0667m	972896.7131m	226.400m	W71° 58' 28.56"	N4° 21' 02.04"	16,00 KM
WAC03	POZO PALOGRANDE WALABO	PALOMEKO, PARAISO Y CAIMANA 2	4	900588.5666m	972854.4974m	226.400m	W71° 58' 23.03"	N4° 21' 00.67"	16,00 KM
WAC04	POZO LA UNION		1	902309.6873m	973188.3818m	218.100m	W71° 57' 27.23"	N4° 21' 11.61"	16,00 KM
WAC05	POZO PUNTO GRILLO	CARO CARO, LA BALSA, LLANO ALTO, ACEITICO	5	903640.5670m	974478.3613m	221.500m	W71° 56' 44.12"	N4° 21' 53.65"	18,00 KM
WAC06	POZO ALGARROBO	SANTA INES, VILLANUEVA	3	904014.1047m	975025.1358m	221.100m	W71° 56' 32.02"	N4° 22' 11.46"	19,00 KM
WAC07	POZO MATAPALITO	LAS PIEDRAS	2	906626.4761m	975804.6633m	209.800m	W71° 55' 07.48"	N4° 24' 47.14"	27,00 KM
WAC08	POZO LA PORFIA	LA HERMOSA	2	907524.2409m	981153.8279m	191.200m	W71° 54' 38.41"	N4° 25' 31.09"	29,00 KM
WAC09	POZO LA CAIMANA	VERGEL	2	900487.6918m	971329.8396m	202.200m	W71° 58' 26.24"	N4° 20' 11.04"	18,00 KM

Tabla 1. Coordenadas de localización comunidades del resguardo indígena Wacoyo

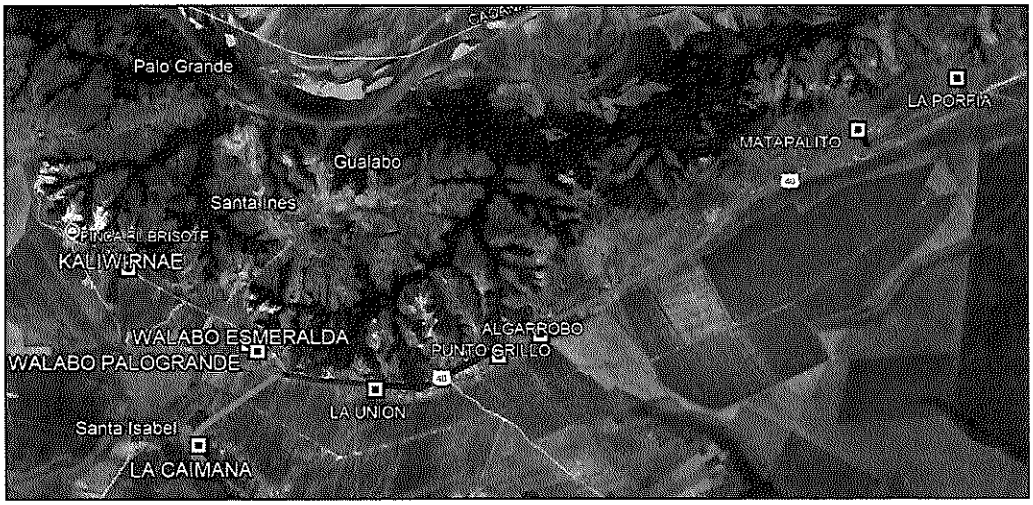


Figura 1. Localización comunidades del resguardo indígena Wacoyo

2.1.2 Localización comunidades Resguardo Indígena Awaliba

RESGUARDO AWALIBA									
CODIGO	COMUNIDAD			ESTE	NORTE	ALTURA	LONGITUD	LATITUD	DISTANCIA
AWA01	POZO MAKAPAY	LA VEREMOS	2	927966.5314m	948604.7669m	234.100m	W71° 43' 34.52"	N4° 07' 52.17"	81,00 KM
AWA02	POZO COMUNITARIO AWALIVA CENTRAL	CEREQUITO, LA BRISA, LA PISTA, CHAVALIVALI, LA ENVIDIA, DESEO	7	932219.8422m	949522.6407m	240.200m	W71° 41' 16.65"	N4° 08' 22.16"	85,00 KM
AWA03	POZO PUERTO LOPEZ		1	933332.3132m	944145.5908m	206.500m	W71° 40' 40.45"	N4° 05' 27.15"	90,00 KM
AWA04	POZO PUNTO GRILLO		1	932907.1761m	942400.7501m	187.200m	W71° 40' 54.19"	N4° 04' 30.33"	93,00 KM
AWA05	POZO SAN GIL	TAPIVA, BELLAVISTA	3	942563.2402m	947574.8922m	203.600m	W71° 35' 41.26"	N4° 07' 18.99"	96,00 KM
AWA06	POZO FACUNAE		1	935423.3607m	942265.4095m	194.400m	W71° 39' 32.61"	N4° 04' 25.99"	93,00 KM

Tabla 2. Coordenadas de localización comunidades del resguardo indígena Awaliba

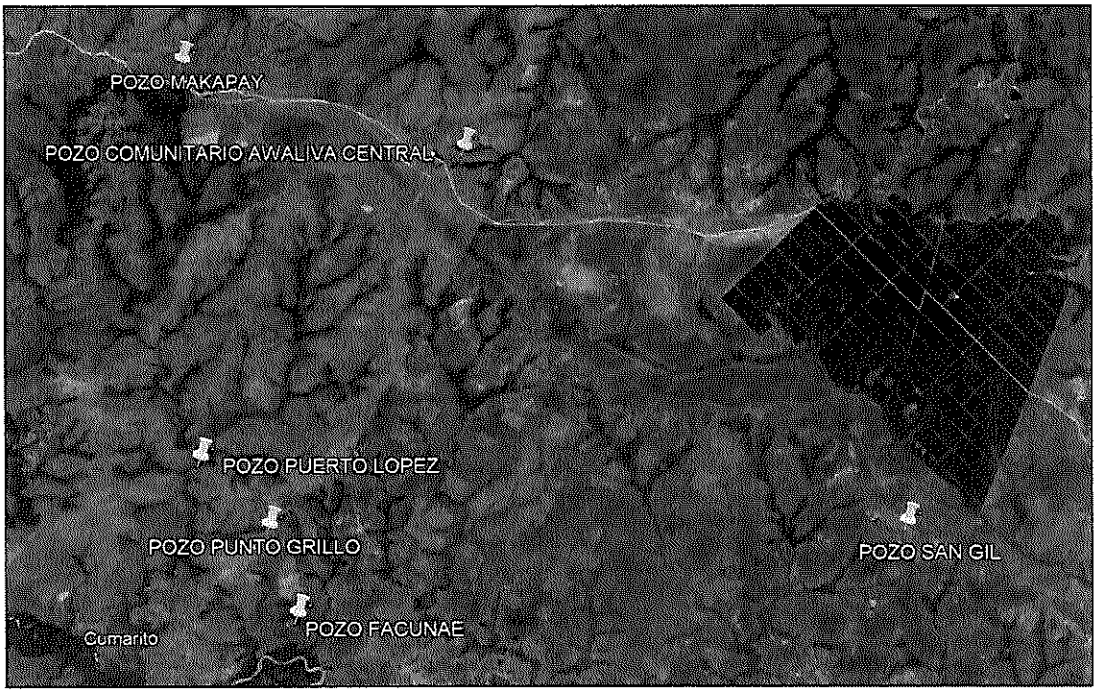


Figura 2. Localización comunidades del resguardo indígena Awaliba

2.1.3 Localización comunidades Resguardo Indígena Domoplanas

RESGUARDO DOMOPLANAS									
CODIGO	COMUNIDAD			ESTE	NORTE	ALTURA	LONGITUD	LATITUD	DISTANCIA
DOM01	POZO OLIVOS	WARROJO	2	979779.5881m	963044.8119m	185.800m	W71° 15' 34.74"	N4° 15' 43.15"	132,00 KM
DOM02	POZO PARAISO	VISTA HERMOSA	2	970139.3986m	962795.7268m	201.100m	W71° 20' 47.35"	N4° 15' 34.95"	125,00 KM
DOM03	POZO BUENAVISTA		1	968668.4144m	953173.8691m	232.350m	W71° 21' 34.94"	N4° 10' 21.70"	112,00 KM
DOM04	POZO VILLAMARCIA	DILUVIO	2	976124.0172m	945937.1103m	194.500m	W71° 17' 33.14"	N4° 06' 26.18"	124,00 KM
DOM05	POZO LAS BRISAS		1	977507.6932m	947082.3612m	200.550m	W71° 16' 48.28"	N4° 07' 03.47"	124,00 KM
DOM06	POZO CUMARALITO		1	977551.1217m	944929.9396m	197.550m	W71° 16' 46.86"	N4° 05' 53.40"	126,00 KM
DOM07	POZO YATORROBO		1	976876.8066m	943115.3330m	194.300m	W71° 17' 08.70"	N4° 04' 54.32"	129,00 KM
DOM08	POZO CERRITO		1	980241.7249m	947463.0325m	183.500m	W71° 15' 19.64"	N4° 07' 15.89"	126,00 KM
DOM09	POZO PUERTO GAVILAN	SOLEDAD	2	983468.1415m	944828.8256m	203.100m	W71° 13' 35.02"	N4° 05' 33.86"	132,00 KM
DOM10	POZO LAS DELICIAS		1	985468.1246m	941561.4449m	180.200m	W71° 12' 30.16"	N4° 04' 09.79"	137,00 KM
DOM11	POZO CACHAMITAS		1	979870.7300m	939807.9630m	186.933m	W71° 15' 31.62"	N4° 03' 06.67"	134,00 KM

Tabla 3. Coordenadas de localización comunidades del resguardo indígena Domoplanas

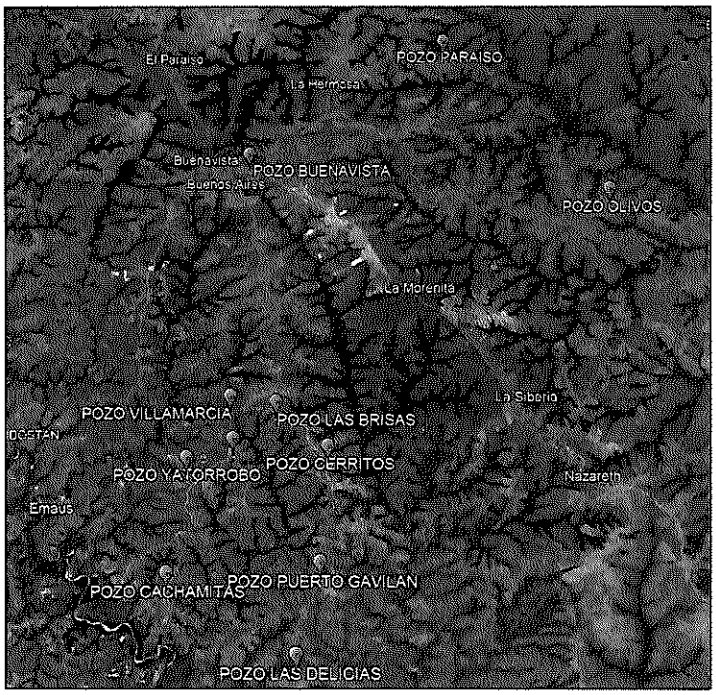


Figura 3. Localización comunidades del resguardo indígena Domoplanas

2.1.4 Localización comunidades Resguardo Indígena Aseinpome

RESGUARDO ASEINPOME									
UNU01	KEKO		1	960832.4770m	1009357.8925m	154.500m	W71° 25' 49.88"	N4° 40' 50.65"	92,00 KM
UNU01	SIETE RODRIGUEZ	SAN FERNANDO	2	960832.4770m	1009357.8925m	154.500m	W71° 25' 49.88"	N4° 40' 50.65"	92,00 KM

Tabla 4. Coordenadas de localización comunidades del resguardo indígena Aseinpome



Figura 4. Localización comunidades del resguardo indígena Aseinpome

2.1.5 COMUNIDAD BENEFICIADA


El número de beneficiarios directos e indirectos del proyecto es de 3.246 habitantes como se muestra a continuación:


GRUPOS ÉTNICOS:	Población Indígena		
ETARIA:	**Edad:**	0 a 14 años	1.087
		15 a 19 años	390
		20 a 59 años	1.617
		Mayor de 60 años	152
GÉNERO:	**Masculino:**	1.737	
	Femenino:	1.509	

3. ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto como se mencionó anteriormente beneficiara a 58 comunidades de 4 resguardos indígenas distribuidos en toda la zona rural del municipio de Puerto Gaitán, cada sistema está concebido que sea igual para todas las comunidades, que requieran de la menor operación y que brinde agua potable para el beneficio de las comunidades.

El sistema consta de manera general de los siguientes componentes:

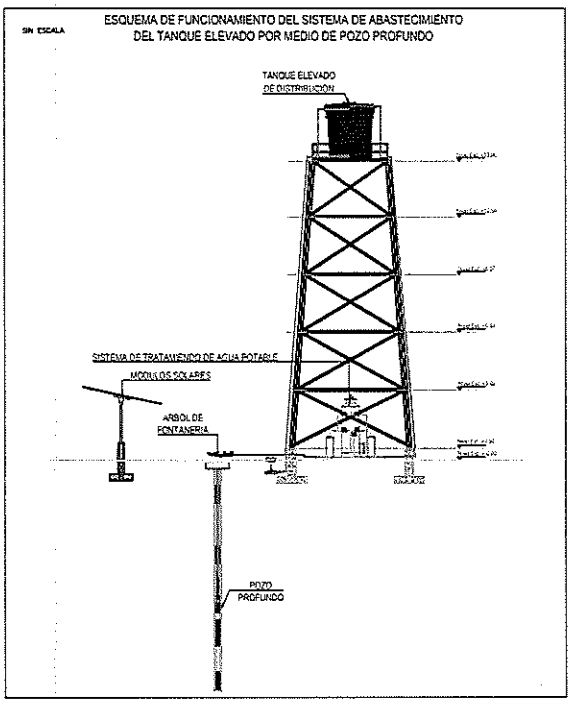

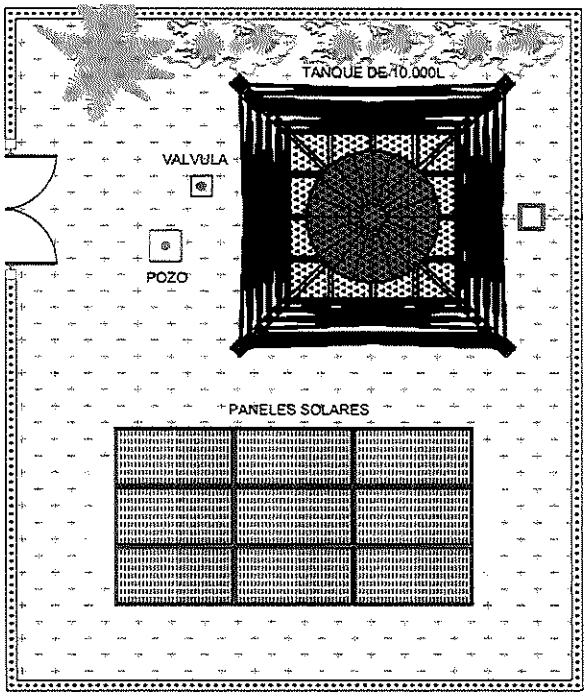

- **Pozo profundo:** Se contemplan profundidades de perforación desde 90 metros hasta los 153 metros, en tubería PVC de 6" al igual que los filtros.

- **Equipo de bombeo y sistema de energía solar:** bombas sumergibles solares de potencias entre 1.500, 3.000 y 16.000 wattios. Controladores de carga, sensores de nivel para tanque y pozo, y sistema de protección de malla a tierra.
  Paneles solares monocristalinos de 570 wattios, distribuidos en módulos de 5, 9 y 22 paneles según las características de cada sistema.

- **Sistema de tratamiento de agua:** compuestos por una unidad presurizada en acero inoxidable que filtra, clarifica y purifica; diseñados para tratar caudales de 0.5 lts/seg, 1 lts/seg y 2 lts/seg según el requerimiento de cada sistema.

- **Redes de acueducto:** 56.682.22 metros de tubería de pvc 2" RDE 21 – 941 acometidas domiciliarias y sus respectivos accesorios (válvulas, uniones, tapones, codos, tees).

- **Tanque elevado de distribución:** tanques plásticos de 6.000 lts, 10.000 lts, y 20.000 lts, soportados en estructuras de acero estructural ASTM de 13.7 metros de altura cimentados en zapatas y pedestales en concreto de 3.000 psi.

- **Cerramiento perimetral:** en tubo galvanizado de 2" soportados en viga de cimentación y concreto ciclópeo con portón de acceso.

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NÚMERO DEL PROCESO		LP-SIP-005-2025
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	**NÚMERO:**	821 DE 2025
	FECHA:	17 DE JULIO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO		"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META".
CONTRATISTA		CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 NIT. 901.965.630 – 1 R.L. LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA C.C. 86.051.533 DE VILLAVICENCIO consorcioaguasgaitan2025@gmail.com

VALOR DEL CONTRATO	**EN LETRAS**	CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE.
	EN NUMEROS	$42.408.897.278,00
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL		QUINCE (15) MESES
INTERVENTOR DEL CONTRATO:		CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025 NIT. 901.972.868 – 4 R.L. JORGE ADELMO DÍAZ SARMIENTO C.C. 79.134.525 DE FONTIBÓN interventoria.acindigenas@gmail.com
SUPERVISOR		CHRISTIAN JULIAN FERNANDEZ REYES SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
FECHA ACTA DE INICIO		29 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL		28 DE NOVIEMBRE DE 2026
PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO ACUMULADO AL PRESENTE CORTE		58,43%
COSTO EJECUTADO ACUMULADO AL PRESENTE CORTE		$ 24.779.519.044,00
PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO AL PRESENTE CORTE		48,08%
COSTO PROGRAMADO ACUMULADO AL PRESENTE CORTE		$ 20.387.173.611,00
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL ACTA DE INICIO		276 días
DIAS PENDIENTES DE EJECUCION		180 días
PORCENTAJE DE TIEMPO TRANSCURRIDO		60,53%

5. INFORMACIÓN LEGAL DEL CONTRATO

A continuación, se describen las pólizas expedidas por la compañía BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A. que amparan la ejecución del contrato desde su suscripción y las correspondientes modificaciones que se han realizado a la fecha del presente informe y que aplican para actualización de pólizas.

- Cumplimiento en favor de entidades estatales No. 93833.
- Responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento No. 27002.

5.1 CONTROL DE PÓLIZAS APROBADAS

PÓLIZAS INICIALES A LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 17 DE JULIO DE 2025.

Póliza No. 93833				Endoso 0			
RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA						VALOR ASEGURADO
	DESDE			HASTA			
	DÍA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17	07	2025	17	02	2027	$4.240.889.727,80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	17	07	2025	17	10	2029	$2.120.444.863,90
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	17	07	2025	17	02	2027	$21.204.448.639,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	17	10	2026	17	10	2031	$4.240.889.727,80
Póliza No. 27002				**Endoso 0**			
RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA						VALOR ASEGURADO
	DESDE			HASTA			
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	17	07	2025	17	10	2026	$2.120.444.864,00

PÓLIZAS INICIALES CORRECIÓN NIT. DEL CONTRATISTA.

Póliza No. 93833				Endoso 1			
RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA						VALOR ASEGURADO
	DESDE			HASTA			
	DÍA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17	07	2025	17	02	2027	$4.240.889.727,80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	17	07	2025	17	10	2029	$2.120.444.863,90
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	17	07	2025	17	02	2027	$21.204.448.639,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	17	10	2026	17	10	2031	$4.240.889.727,80
Póliza No. 27002				**Endoso 1**			
RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA						VALOR ASEGURADO
	DESDE			HASTA			
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	17	07	2025	17	10	2026	$2.120.444.864,00

PÓLIZAS ACTUALIZADAS PRORROGA DE VIGENCIA SEGÚN ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2025.

11800

Póliza No. 93833				Endoso 2			
RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA						VALOR ASEGURADO
	DESDE			HASTA			
	DÍA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29	08	2025	01	04	2027	$4.240.889.727,80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29	08	2025	01	12	2029	$2.120.444.863,90
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	29	08	2025	01	04	2027	$21.204.448.639,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	29	08	2025	28	11	2031	$4.240.889.727,80
Póliza No. 27002				**Endoso 2**			
RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA						VALOR ASEGURADO
	DESDE			HASTA			
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	29	08	2025	01	12	2026	$2.120.444.864,00

6 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

6.1 PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

El contrato de obra No. 821 de 2025 cuenta con un anticipo del 50% del valor del contrato correspondiente a la suma de $21.204.448.639,00; por concepto de FONSET la entidad retiene el 5% de este valor que son $1.060.222.431,95 es decir que el valor neto entregado del anticipo corresponde a $20.144.226.207,05.

En cumplimento de la CLÁUSULA CUARTA – VALOR DEL CONTRATO, ANTICIPO Y FORMA DE PAGO del contrato, el contratista suscribió con la FIDUCIARIA POPULAR S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS denominado **PATRIMONIO AUTONOMO ANTICIPO CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025**, con el fin de manejar y girar los recursos del anticipo del contrato.

De igual manera se registra la cuenta de ahorros No. 500807651648 del Banco Popular correspondiente al fideicomiso donde se deben abonar los recursos objeto del contrato fiduciario.

A continuación, se presenta el plan de inversión del anticipo aprobado inicialmente.

1166

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	%	% PORCENTAJE PROGRAMADO DE INVERSION EN EL TIEMPO EN MESES				
				1	2	3	4	5
1	MANO DE OBRA, PRESTACION DE SERVICIOS Y PAGOS DEL PERSONAL OFERTADO Y OPERATIVO (SALARIOS, SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES, DOTACIONES)	$2.417.307.144,85	12%	2%	3%	3%	3%	1%
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	$13.496.631.558,72	67%	15%	20%	20%	5%	7%
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	$4.230.287.503,48	21%	3%	5%	5%	5%	3%
TOTALES		**$20.144.226.207,05**	**100%**					

A continuación, se presenta la modificación del plan de inversión del anticipo aprobado y que se encuentra vigente a la fecha.

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	%	PLAZO DE EJECUCION (MESES)										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Mano de obra, prestación de servicios y pagos del personal ofertado y operativo (salarios, seguridad social, parafiscales, dotaciones, contribuciones y liquidaciones).	$ 2.917.307.144,85	14,48%	2,72%	0,32%	0,83%	0,38%	0,34%	0,89%	2,10%	1,73%	1,73%	1,73%	1,71%
2	Compra de materiales y accesorios.	$10.496.631.558,72	52,11%	20,50%	1,47%	4,13%	0,17%	1,90%	4,14%	8,11%	2,92%	2,92%	2,92%	2,93%
3	Transporte de materiales.	$ 6.730.287.503,48	33,41%	4,54%	0,30%	2,63%	0,05%	1,94%	1,65%	7,05%	3,81%	3,81%	3,81%	3,82%
TOTAL		$20.144.226.207,05	100,00%											

6.2 ACTA DE DESEMBOLSO DEL ANTICIPO

A continuación, se mencionan y describen cada uno de las ordenes de giro a la fiducia durante el periodo del informe:

11862

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

NIT. 901.965.630 – 1

CONSECUTIVO	ITEM	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	SALDO ANTICIPO
ORDEN GIRO No. 151	1	5/05/2026	ANCIZAR ARREDONDO	$ 10.096.319,00	$ 6.949.406.512,53
ORDEN GIRO No. 152	1	5/05/2026	ANGIE XIMENA CASTILLO	$ 885.000,00	$ 6.948.521.512,53
ORDEN GIRO No. 153	1	5/05/2026	SANOSOL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS	$ 149.032.016,58	$ 6.799.489.495,95
ORDEN GIRO No. 154	1	5/05/2026	CONSORCIO AGUAS GAITAN	$ 99.372.546,00	$ 6.700.116.949,95
ORDEN GIRO No. 155	1	6/05/2026	M&G INGENIERIA	$ 25.000.000,00	$ 6.675.116.949,95
ORDEN GIRO No. 156	1	6/05/2026	GEODELTA	$ 25.409.809,00	$ 6.649.707.140,95
ORDEN GIRO No. 157	1	13/05/2026	JULIAN HERNEY LOZANO GUTIERREZ	$ 34.968.584,00	$ 6.614.738.556,95
ORDEN GIRO No. 158	1	13/05/2026	CONSORCIO AGUAS GAITAN	$ 15.639.901,00	$ 6.599.098.655,95
ORDEN GIRO No. 159	1	13/05/2026	CONSORCIO AGUAS GAITAN	$ 25.064.458,00	$ 6.574.034.197,95
ORDEN GIRO No. 160	1	14/05/2026	GILBERTO PIÑEROS CASTRO	$ 52.800.000,00	$ 6.521.234.197,95
ORDEN GIRO No. 161	1	13/05/2026	FUENTE VIVA INVERSIONES	$ 10.000.000,00	$ 6.511.234.197,95
ORDEN GIRO No. 162	1	13/05/2026	BRAYAN MURCIA	$ 24.946.426,00	$ 6.486.287.771,95
ORDEN GIRO No. 163	1	14/05/2026	ELIZABETH ARIAS PARRA	$ 77.913.336,00	$ 6.408.374.435,95
ORDEN GIRO No. 164	1	19/05/2026	SANOSOL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS	$ 8.000.000,00	$ 6.400.374.435,95
ORDEN GIRO No. 165	1	19/05/2026	SANOSOL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS	$ 8.000.000,00	$ 6.392.374.435,95
ORDEN GIRO No. 166	1	19/05/2026	EDUAR BENJAMIN PEREZ	$ 48.650.000,00	$ 6.343.724.435,95
ORDEN GIRO No. 167	1	13/05/2026	TERRACQUA	$ 25.794.069,00	$ 6.317.930.366,95
ORDEN GIRO No. 168	1	14/05/2026	TERRACQUA	$ 55.334.291,00	$ 6.262.596.075,95
ORDEN GIRO No. 169	1	13/05/2026	TERRACQUA	$ 49.909.361,00	$ 6.212.686.714,95
ORDEN GIRO No. 170	1	19/05/2026	TERRACQUA	$ 19.249.306,00	$ 6.193.437.408,95

ORDEN GIRO No. 171	1	22/05/2026	ARCOE	$ 25.913.724,00	$ 6.167.523.684,95
ORDEN GIRO No. 172	1	22/05/2026	LUZ DARY CASTELLANOS	$ 2.092.117,00	$ 6.165.431.567,95
ORDEN GIRO No. 173	1	25/05/2026	REHOBOT	$ 914.800,00	$ 6.164.516.767,95
ORDEN GIRO No. 174	1	25/05/2026	PREVIS	$ 152.918,00	$ 6.164.363.849,95
ORDEN GIRO No. 175	1	26/05/2026	P&J CONSTRUCCIONES	$ 20.000.000,00	$ 6.144.363.849,95
ORDEN GIRO No. 176	1	26/05/2026	INTEGRALIA	$ 244.247.690,00	$ 5.900.116.159,95
ORDEN GIRO No. 177	1	26/05/2026	LA COMPUERTA	$ 442.681,00	$ 5.899.673.478,95
ORDEN GIRO No. 178	1	26/05/2026	CONSORCIO AGUAS GAITAN	$ 13.591.897,00	$ 5.886.081.581,95
ORDEN GIRO No. 179	1	28/05/2026	SANOSOL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS	$ 31.350.000,00	$ 5.854.731.581,95
ORDEN GIRO No. 180	1	28/05/2026	SANOSOL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS	$ 40.000.000,00	$ 5.814.731.581,95
ORDEN GIRO No. 181	1	28/05/2026	CONSORCIO AGUAS GAITAN	$ 96.088.700,00	$ 5.718.642.881,95
ORDEN GIRO No. 182	1	28/05/2026	ORLANDO BONILLA	$ 17.968.320,00	$ 5.700.674.561,95

6.3 INFORMACIÓN DE AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

MES		VALOR PROGRAMADO		VALOR EJECUTADO	
		MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
1	29-08-2025 a 30-09-25	$ 1.132.883.754,00	$ 1.132.883.754,00	$ 1.165.283.191,00	$ 1.165.283.191,00
2	01-10-25 a 31-10-25	$ 1.533.938.149,00	$ 2.666.821.903,00	$ 1.615.778.986,00	$ 2.781.062.177,00
3	01-11-25 a 30-11-25	$ 2.752.982.664,00	$ 5.419.804.567,00	$ 4.469.897.773,00	$ 7.250.959.950,00
4	01-12-25 a 31-12-25	$ 3.182.797.359,00	$ 8.602.601.926,00	$ 3.384.230.051,00	$ 10.635.190.489,00
5	01-01-26 a 31-01-26	$ 3.054.586.452,00	$ 11.657.188.378,00	$ 4.800.716.596,00	$ 15.435.907.083,00

6	01-02-26 a 28-02-26	$ 1.361.475.374,00	$ 13.018.663.752,00	$ 937.236.691,00	$ 16.373.143.774,00
7	01-03-26 a 31-03-06	$ 1.707.014.984,00	$ 14.725.678.736,00	$ 2.400.120.626,00	$ 18.773.264.400,00
8	01-04-26 a 30-04-26	$ 2.122.894.222,00	$ 16.848.572.958,00	$ 2.571.174.411,00	$ 21.344.438.811,00
9	01-05-26 a 31-05-26	$ 3.538.600.653,00	$ 20.387.173.611,00	$ 3.435.080.234,00	$ 24.779.519.044,00
10	01-06-26 a 30-06-26	$ 5.196.889.486,00	$ 25.584.063.097,00		
11	01-07-26 a 31-07-26	$ 6.886.687.533,00	$ 32.470.750.630,00		
12	01-08-26 a 31-08-26	$ 4.957.368.139,00	$ 37.428.118.769,00		
13	01-09-26 a 30-09-26	$ 3.283.638.775,00	$ 40.711.757.544,00		
14	01-10-26 a 31-10-26	$ 1.494.587.472,00	$ 42.206.345.016,00		
15	01-11-26 a 28-11-26	$ 202.576.537,00	$ 42.408.921.553,00		

6.4 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$42.408.897.278,00
VALOR ADICIONES	$0,00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO MAS ADICIONES	$42.408.897.278,00
VALOR ANTICIPO	$ 21.204.448.639,00
ACTAS PARCIALES	$ 15.000.043.212,21
VALOR ANTICIPO AMORTIZADO	$ 7.500.021.606,10
VALOR ANTICIPO POR AMORTIZAR	$ 13.704.427.032,90

6.5 RELACIÓN DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	
NÚMERO	DIS.2025000172
FECHA DE EXPEDICIÓN	16-05-2025
DEPENDENCIA	SGRP – SISTEMA GENERAL DE REGALIAS SPGR
CONCEPTO	SPGR CDP 13325 "CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META".
RECURSO	1121-00AD – ASIGNACIONES DIRECTAS (SGR) R.C.
VALOR INICIAL	$42.408.921.552,00
VALOR ACTUAL	$42.408.921.552,00

6.6 RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP.

REGISTRO PRESUPUESTAL	
NÚMERO	RS1.2025000156
FECHA DEL REGISTRO	23-07-2025
DEPENDENCIA	SGRP – SISTEMA GENERAL DE REGALIAS SPGR
DESCRIPCIÓN	CTO-821 "CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META".
FUENTE O RECURSO	1121-00AD – ASIGNACIONES DIRECTAS (SGR) R.C.
VALOR INICIAL	$42.408.897.278,00
VALOR ACTUAL	$42.408.897.278,00

6.7 ORDENES DE PAGO EFECTUADAS

CONCEPTO	ORDEN DE PAGO No.	VALOR NETO	FECHA
ANTICIPO 50,00%	2025090008	$ 21.204.448.639,00	17/09/2025
PARCIAL N° 1 35,37%	2026050018 2026050017 2026050019	$ 1.385.537.715,24 $ 2.106.881.696,13 $ 848.049.214,74	20/05/2026

1866

7 INFORMACIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO


7.1 CUADRO DE AVANCE % ACUMULADO MES A MES

MES		% PROGRAMADO		% EJECUTADO	
		MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
1	29-08-2025 a 30-09-25	2,67%	2,67%	2,75%	2,75%
2	01-10-25 a 31-10-25	3,62%	6,29%	3,81%	6,56%
3	01-11-25 a 30-11-25	6,49%	12,78%	10,54%	17,10%
4	01-12-25 a 31-12-25	7,51%	20,29%	7,98%	25,08%
5	01-01-26 a 31-01-26	7,20%	27,49%	11,32%	36,40%
6	01-02-26 a 28-02-26	3,21%	30,70%	2,21%	38,61%
7	01-03-26 a 31-03-06	4,03%	34,73%	5,66%	44,27%
8	01-04-26 a 30-04-26	5,01%	39,74%	6,06%	50,33%
9	01-05-26 a 31-05-26	8,34%	48,08%	8,10 %	58,43%
10	01-06-26 a 30-06-26	12,25%	60,33%		
11	01-07-26 a 31-07-26	16,24%	76,57%		
12	01-08-26 a 31-08-26	11,69%	88,26%		
13	01-09-26 a 30-09-26	7,74%	96,00%		
14	01-10-26 a 31-10-26	3,52%	99,52%		
15	01-11-26 a 28-11-26	0,48%	100,00%		

Ver anexo No. 1 Cuadro de avance actividades ejecutadas.

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

7.1.1 GRAFICO DE AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO

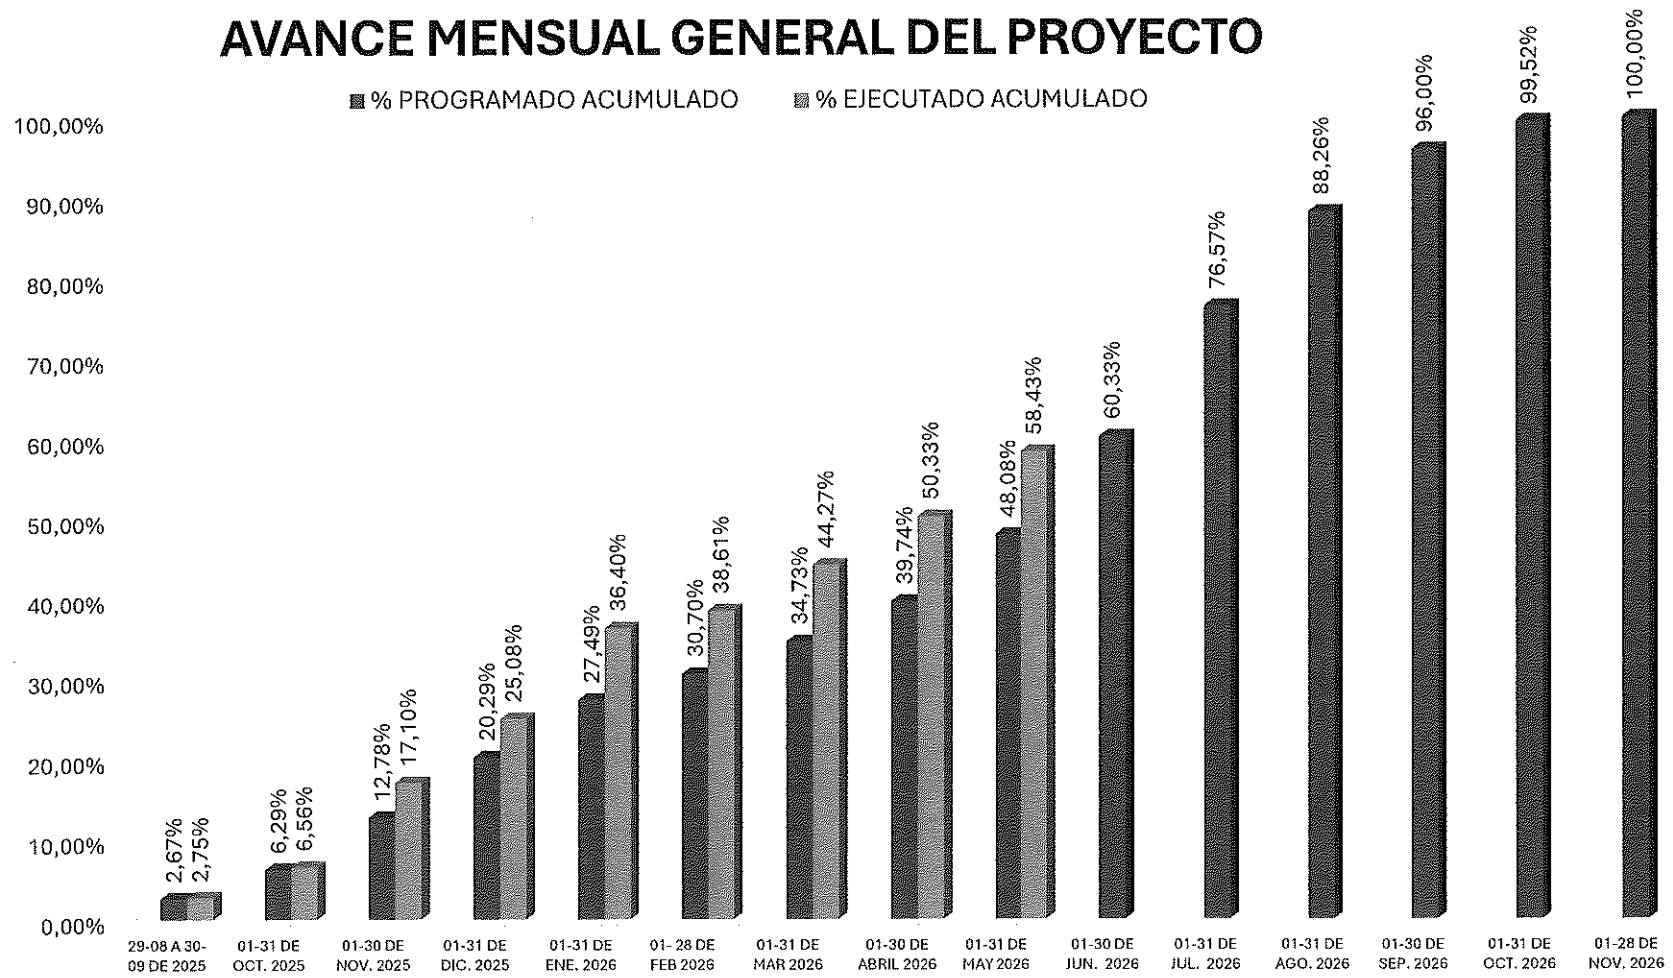

1865

7.2 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

A continuación, se relaciona las actividades de obra ejecutadas en el presente corte:

RESGUARDO AWALIBA.

COMUNIDAD MAKAPAY

- **EQUIPO DE BOMBEO Y SISTEMA DE ENERGÍA SOLAR**

Durante el periodo reportado en este informe, se inició con el suministro e instalación módulos solares monocristalinos, con caja de conexiones, montaje con ganchos. Incluyendo los accesorios de montaje y material de conexionado eléctrico.

COMUNIDAD AWALIBA CENTRAL

- **SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA**

Durante el periodo reportado en este informe, se realizó el suministro e instalación del acero refuerzo FY= 4200 MPA y la construcción de la placa de contrapiso en concreto 20,7 MPA (3000 psi) para el soporte de los filtros de la planta de tratamiento.

COMUNIDAD PUNTO GRILLO

- **SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA**

Durante el periodo reportado en este informe, se realizó el suministro e instalación del acero refuerzo FY= 4200 MPA y la construcción de la placa de contrapiso en concreto 20,7 MPA (3000 psi) para el soporte de los filtros de la planta de tratamiento.

RESGUARDO DOMOPLANAS.

COMUNIDAD LOS OLIVOS

- **REDES DE ACUEDUCTO.**

En el periodo comprendido en este informe se inició con las actividades de excavación mecánica, se realizó a su vez el retiro del material sobrante de las excavaciones, la

instalación de la base en arena de rio para la instalación de la tubería de 2", junto con el relleno de material seleccionado de la excavación, al tiempo de va se realizando la instalación del material de 3" para la parte superior de esta excavación, al realizar actividades como instalación de arena y relleno de material de 3" trae consigo la ejecución de sobre acarreo.

COMUNIDAD PARAISO

- **REDES DE ACUEDUCTO.**

En el periodo comprendido en este informe se terminó con las actividades de excavación mecánica, se realizó a su vez el retiro del material sobrante de las excavaciones, la instalación de la base en arena de rio para la instalación de la tubería de 2", junto con el relleno de material seleccionado de la excavación, finalmente se realiza la instalación del material de 3" para la parte superior de esta excavación, al realizar actividades como instalación de arena y relleno de material de 3" trae consigo la ejecución de sobre acarreo. Igualmente se realizó la excavación manual y se instalaron las acometidas domiciliarias.

- **TANQUE ELEVADO**

Durante el periodo reportado en este informe, se ejecutaron las actividades de excavación, relleno para la cimentación de la estructura de soporte para los tanques elevados, se realizó el vaciado de concreto para el solado, las zapatas de esta cimentación la que incluye la instalación de acero de refuerzo fy=4200 Mpa.

COMUNIDAD BUENAVISTA

- **TANQUE ELEVADO**

Durante el periodo reportado en este informe, se ejecutaron las actividades de excavación, relleno para la cimentación de la estructura de soporte para los tanques elevados, se realizó el vaciado de concreto para el solado, las zapatas de esta cimentación la que incluye la instalación de acero de refuerzo fy=4200 Mpa.

1830

COMUNIDAD BRISAS

- **POZO PROFUNDO**

Durante el periodo reportado en este informe, se realiza la ejecución de la piscina de lodos junto con los demás trabajos preparatorios para posteriormente iniciar la perforación de prueba en 8 ½" con equipo de rotación directa, para luego proceder con la ampliación de la perforación hasta su tamaño final de 12 ½", el suministro e instalación de la tubería de 6" RDE 21 con sus respectivos filtros, se suministra el material estabilizador de relleno.

COMUNIDAD CUMARALITO

- **POZO PROFUNDO**

Durante el periodo reportado en este informe, se realiza la ejecución de la piscina de lodos junto con los demás trabajos preparatorios para posteriormente iniciar la perforación de prueba en 8 ½" con equipo de rotación directa, para luego proceder con la ampliación de la perforación hasta su tamaño final de 12 ½", el suministro e instalación de la tubería de 6" RDE 21 con sus respectivos filtros, se suministra el material estabilizador de relleno, se realiza la prueba de bombeo, el lavado y desinfección del pozo, la construcción de cabeza y sello sanitario.

- **TANQUE ELEVADO**

Durante el periodo reportado en este informe, se ejecutaron las actividades de excavación, relleno para la cimentación de la estructura de soporte para los tanques elevados, se realizó el vaciado de concreto para el solado, las zapatas de esta cimentación la que incluye la instalación de acero de refuerzo fy=4200 Mpa.

COMUNIDAD YATARROBO

- **REDES DE ACUEDUCTO.**

En el periodo comprendido en este informe se realizó las actividades de excavación mecánica, se realizó a su vez el retiro del material sobrante de las excavaciones, la instalación de la base en arena de rio para la instalación de la tubería de 2", junto con el relleno de material seleccionado de la excavación, finalmente se realiza la instalación del material de 3" para la parte superior de esta excavación, al realizar actividades como instalación de arena y relleno de material de 3" trae consigo la ejecución de sobre acarreo. Igualmente se realizó la excavación manual y se instalaron las acometidas domiciliarias.

- **TANQUE ELEVADO**

Durante el periodo reportado en este informe, se ejecutaron las actividades de excavación, relleno para la cimentación de la estructura de soporte para los tanques elevados, se realizó el vaciado de concreto para el solado, las zapatas de esta cimentación la que incluye la instalación de acero de refuerzo fy=4200 Mpa.

COMUNIDAD CERRITO

- **POZO PROFUNDO**

Durante el periodo reportado en este informe, se realiza la ejecución de la piscina de lodos junto con los demás trabajos preparatorios para posteriormente iniciar la perforación de prueba en 8 ½" con equipo de rotación directa, para luego proceder con la ampliación de la perforación hasta su tamaño final de 12 ½", el suministro e instalación de la tubería de 6" RDE 21 con sus respectivos filtros, se suministra el material estabilizador de relleno, se realiza la prueba de bombeo, el lavado y desinfección del pozo, la construcción de cabeza y sello sanitario.

- **TANQUE ELEVADO**

Durante el periodo reportado en este informe, se ejecutaron las actividades de excavación, relleno para la cimentación de la estructura de soporte para los tanques elevados, se realizó el vaciado de concreto para el solado, las zapatas de esta cimentación la que incluye la instalación de acero de refuerzo fy=4200 Mpa.

COMUNIDAD PUERTO GAVILAN

- **TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN**

Durante el periodo reportado en este informe, se inició con el suministro e instalación del acero estructural A500 y A588 para la estructura del tanque elevado y el suministro e instalación de la plataforma en lamina alfajor donde reposa el tanque.

COMUNIDAD LAS DELICIAS

- **TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN**

Durante el periodo reportado en este informe, se inició con el suministro e instalación del acero estructural A500 y A588 para la estructura del tanque elevado y el suministro e instalación de la plataforma en lamina alfajor donde reposa el tanque.

COMUNIDAD CACHAMITAS

- **REDES DE ACUEDUCTO.**

En el periodo comprendido en este informe se realizó las actividades de excavación mecánica, se realizó a su vez el retiro del material sobrante de las excavaciones, la instalación de la base en arena de rio para la instalación de la tubería de 2", junto con el relleno de material seleccionado de la excavación, finalmente se realiza la instalación del material de 3" para la parte superior de esta excavación, al realizar actividades como instalación de arena y relleno de material de 3" trae consigo la ejecución de sobre acarreo. Igualmente se realizó la excavación manual y se instalaron las acometidas domiciliarias.

- **TANQUE ELEVADO**

Durante el periodo reportado en este informe, se ejecutaron las actividades de excavación, relleno para la cimentación de la estructura de soporte para los tanques elevados, se realizó el vaciado de concreto para el solado, las zapatas de esta cimentación la que incluye la instalación de acero de refuerzo fy=4200 Mpa.

RESGUARDO WACOYO.

COMUNIDAD KALIWIRNAE

- **POZO PROFUNDO**

Durante el periodo reportado en este informe, se realiza la ejecución de la piscina de lodos junto con los demás trabajos preparatorios para posteriormente iniciar la perforación de prueba en 8 ½" con equipo de rotación directa, para luego proceder con la ampliación de la perforación hasta su tamaño final de 12 ½", el suministro e instalación de la tubería de 6" RDE 21 con sus respectivos filtros, se suministra el material

1823

estabilizador de relleno, se realiza la prueba de bombeo, el lavado y desinfección del pozo, la construcción de cabeza y sello sanitario.

COMUNIDAD ESMERALDA WALABO

- **TANQUE ELEVADO**

Durante el periodo reportado en este informe, se ejecutaron las actividades de excavación, relleno para la cimentación de la estructura de soporte para los tanques elevados, se realizó el vaciado de concreto para el solado, las zapatas de esta cimentación la que incluye la instalación de acero de refuerzo fy=4200 Mpa.

COMUNIDAD PALOGRANDE WALABO

- **TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN**

Durante el periodo reportado en este informe, se inició con el suministro e instalación del acero estructural A500 y A588 para la estructura del tanque elevado y el suministro e instalación de la plataforma en lamina alfajor donde reposa el tanque.

COMUNIDAD LA UNIÓN

- **TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN**

Durante el periodo reportado en este informe, se inició con el suministro e instalación del acero estructural A500 y A588 para la estructura del tanque elevado y el suministro e instalación de la plataforma en lamina alfajor donde reposa el tanque.

COMUNIDAD ALGARROBO

- **POZO PROFUNDO**

Durante el periodo reportado en este informe, se terminó la perforación hasta su tamaño final de 12 ½", después se procedió a instalar la tubería de 6" RDE 21 con sus respectivos filtros, se suministra la gravilla y el material estabilizador de relleno, se realiza el lavado y desinfección del pozo, la construcción de cabeza y sello sanitario.

COMUNIDAD CAIMANA

- **TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN**

Durante el periodo reportado en este informe, se inició con el suministro e instalación del acero estructural A500 y A588 para la estructura del tanque elevado y el suministro e instalación de la plataforma en lamina alfajor donde reposa el tanque.

RESGUARDO ASEINPOME

COMUNIDAD KEKO A ASEINPOME

- **TANQUE ELEVADO**

Durante el periodo reportado en este informe, se ejecutaron las actividades de excavación, relleno para la cimentación de la estructura de soporte para los tanques elevados, se realizó el vaciado de concreto para el solado, las zapatas de esta cimentación la que incluye la instalación de acero de refuerzo fy=4200 Mpa. Igualmente se realizó el suministro e instalación del acero estructural A500 y A588 para la estructura del tanque elevado y el suministro e instalación de la plataforma en lamina alfajor donde reposa el tanque.

COMUNIDAD SIETE RODRIGUEZ

- **REDES DE ACUEDUCTO.**

En el periodo comprendido en este informe se realizó las actividades de excavación mecánica, se realizó a su vez el retiro del material sobrante de las excavaciones, la instalación de la base en arena de rio para la instalación de la tubería de 2", junto con el relleno de material seleccionado de la excavación, finalmente se realiza la instalación del material de 3" para la parte superior de esta excavación, al realizar actividades como instalación de arena y relleno de material de 3" trae consigo la ejecución de sobre acarreo. Igualmente se realizó la excavación manual y se instalaron las acometidas domiciliarias.

Las cantidades ejecutadas y mencionadas anteriormente para el periodo referenciado en este informe se pueden verificar en el **Anexo N°1.**

1835

7.3 CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES

En el **Anexo No. 2** se encontrarán los certificados de calidad de los materiales usados al corte del presente informe, junto con los certificados de calibración de los equipos usados si aplica.

7.4 MANEJO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se anexa el informe emitido por parte del profesional SISO, entrega de asistencia de charlas de seguridad, salud en el trabajo y las entregas de dotación.
Ver Anexo No. 3 Informe seguridad y salud en el trabajo (SISO)

7.5 CONTROL ESTADO DEL TIEMPO

RESGUARDO WACOYO MAYO 2026																															
DIA	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
CLASE DE TIEMPO Y FECHA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SECO AM						X		X				X		X				X			X				X	X			X		
LLUVIAS MODERADAS AM		X		X	X						X						X						X						X	X
LLUVIAS INTENSAS AM	X		X				X		X	X			X		X	X			X	X		X		X			X	X			
SECO PM	X		X				X					X		X				X			X	X				X			X		
LLUVIAS MODERADAS PM		X			X				X	X					X	X	X						X				X			X	
LLUVIAS INTENSAS PM				X		X		X			X		X						X	X				X	X			X				

RESGUARDO AWALIBA MAYO 2026																															
DIA	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
CLASE DE TIEMPO Y FECHA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SECO AM						X		X				X		X				X			X				X	X			X		
LLUVIAS MODERADAS AM		X		X	X						X						X						X						X	X
LLUVIAS INTENSAS AM	X		X				X		X	X			X		X	X			X	X		X		X			X	X			
SECO PM	X		X				X					X		X				X			X	X				X			X		
LLUVIAS MODERADAS PM		X			X				X	X					X	X	X						X				X			X	
LLUVIAS INTENSAS PM				X		X		X			X		X						X	X				X	X			X				

RESGUARDO ASEINPOME MAYO 2026																														
DIA	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
CLASE DE TIEMPO Y FECHA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SECO AM						X		X				X		X				X			X				X	X			X		
LLUVIAS MODERADAS AM		X		X	X						X						X						X						X	X
LLUVIAS INTENSAS AM	X		X				X		X	X			X		X	X			X	X		X		X			X	X			
SECO PM	X		X				X					X		X				X			X	X				X			X		
LLUVIAS MODERADAS PM		X			X				X	X					X	X	X						X				X			X	
LLUVIAS INTENSAS PM				X		X		X			X		X						X	X				X	X			X			

RESGUARDO ASEINPOME MAYO 2026																															
DIA	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
CLASE DE TIEMPO Y FECHA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SECO AM						X		X				X		X				X			X				X	X			X		
LLUVIAS MODERADAS AM		X		X	X						X						X						X						X	X
LLUVIAS INTENSAS AM	X		X				X		X	X			X		X	X			X	X		X		X			X	X			
SECO PM	X		X				X					X		X				X			X	X				X			X		
LLUVIAS MODERADAS PM		X			X				X	X					X	X	X						X				X			X	
LLUVIAS INTENSAS PM				X		X		X			X		X						X	X				X	X			X			

8 INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

8.1 RELACION PERSONAL DE OBRA (PROFESIONAL, TÉCNICO, OPERATIVO)

De acuerdo con las necesidades del proyecto, las actividades ejecutadas durante el presente periodo y el personal propuesto, se contó con la disposición del personal descrito en la siguiente tabla:

PERIODO: MAYO 2026

PERSONAL PROFESIONAL						
NOMBRE	CARGO	C.C.	AFP	EPS	ARL	PLANILLA No. / PAGO OPORTUNO
LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA	R/L Consorcio	86.051.533	PORVENIR	SANITAS	SURA	9506011959
FRANCY CAROLINA AREVALO GARZÓN	Director de Obra	40.326.478	COLPENSIONES	SANITAS	SURA	9506011959
WENDY VANESA GARZON GARCIA	Residente de Obra 1	1.121.902.403	PROTECCION	SANITAS	SURA	9506011959

GUILLERMO ALBERTO OSORIO VARGAS	Residente de Obra 2	1.121.834.340	COLPENSIONES	NUEVA EPS	SURA	9506011959
GUSTAVO ADOLFO MEDINA PARDO	Profesional en Salud Ocupacional	1.121.869.998	PORVENIR	SANITAS	SURA	9506011959
DIVA YANIRA MACHADO TEJEIRO	Contadora	40.395.435	COLPENSIONES	SANITAS	SURA	9506011257
LINA MARCELA GOMEZ LEAL	Auxiliar Contable	40.328.285	PORVENIR	SANITAS	SURA	9506011257

PERSONAL TECNICO						
NOMBRE	**CARGO**	**C.C.**	**AFP**	**EPS**	**ARL**	**PLANILLA No. / PAGO OPORTUNO**
GENESIS PAOLA PRADA MARTINEZ	Secretaria	1.092.394.700	PORVENIR	SANITAS	SURA	9506011257
JEIMMY ALEJANDRO MUÑOZ MURCIA	Conductor 1	80.013.513	PORVENIR	SANITAS	SURA	9506011257
ROSEMBERG MURCIA JOJOA	Conductor 2	1.003.359.252	PORVENIR	SANITAS	SURA	9506011959
OBER ASMED PEREZ PEREZ	Almacenista	96.193.788	COLPENSIONES	NUEVA EPS	SURA	9506011257
MIGUEL DIOSID CORREA	Oficial de obra	1.103.470.729	PORVENIR	CAJACOPI	SURA	9506011959
YEFERSON ENRIQUE GALVAN	Operador de maquinaria	78.646.546	COLFONDOS	NUEVA EPS	SURA	9506011959
EDWIN BARRIOS	Oficial de obra	1.120.864.265	PORVENIR	SALUDTOTAL	SURA	9506011959
DUVAN ARLEY ROMERO	Oficial de tubería	1.004.819.005	PORVENIR	NUEVA EPS	SURA	9506011959

8.2 PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se anexan las planillas de pago de seguridad social correspondientes al periodo del informe de cada uno de los empleados tanto profesionales, como operativos y técnicos junto con el certificado emitido por el contador público que avala dichos pagos.


Ver Anexo No. 4. Planillas de pago seguridad social y Certificación contador.

8.3 PAZ Y SALVO PERSONAL.

Se anexa paz y salvo de los trabajadores retirados durante el periodo comprendido a la fecha de corte del presente informe.

Ver Anexo No. 6. Paz y salvo personal retirado.

8.4 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

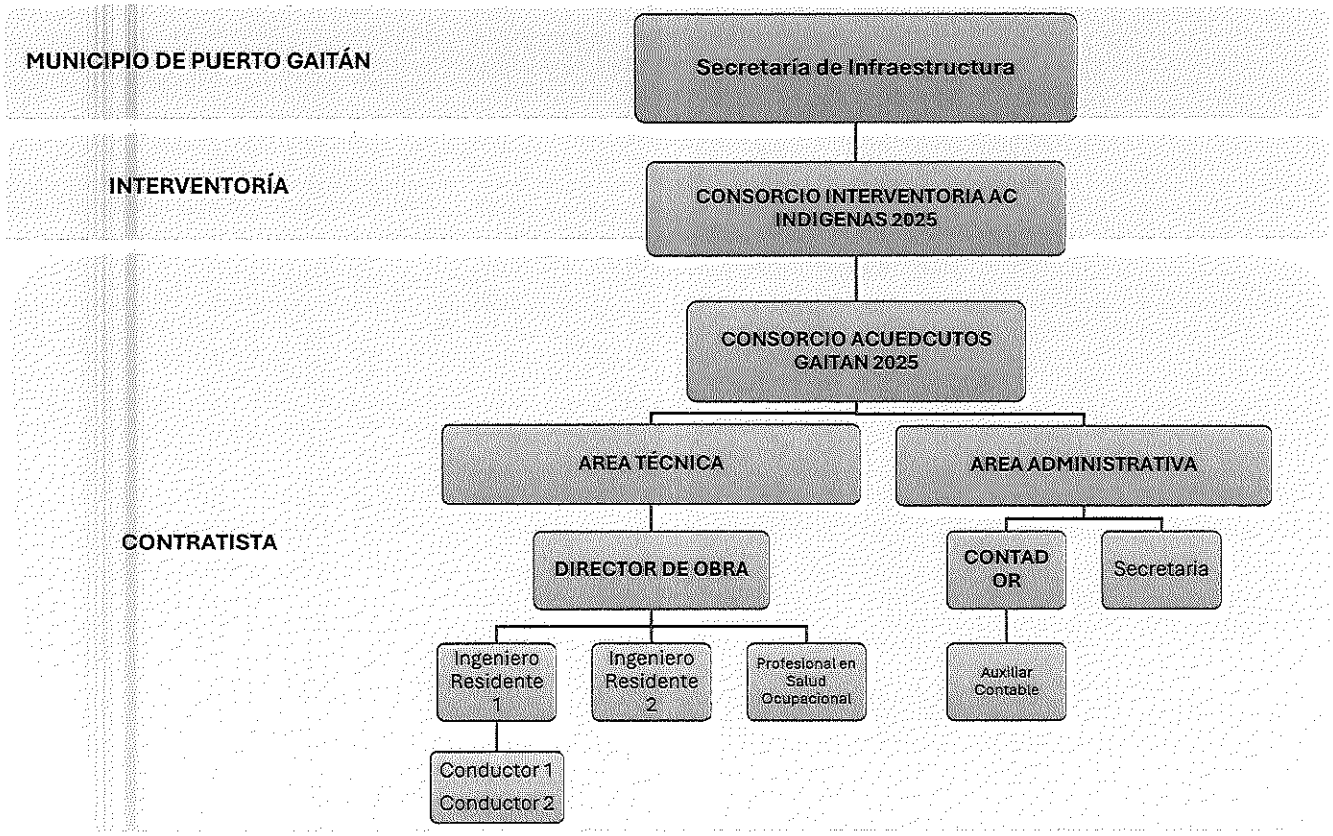

9 CUADRO RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO.

Se anexa resultados de los laboratorios que se realizaron de Granulometría, limites, terrones y Proctor.

Ver Anexo No. 7. Resultados de laboratorio.

10 CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS.

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD
NIVEL DE PRECISIÓN	NIVEL DE PRECISIÓN TOPCOM	1
ESTACIÓN TOTAL	ESTACIÓN TOPOGRÁFICA TOPCOM	1
CAMIONETA	TOYOTA HILUX	1
CAMION ESTACAS	CHEVROLET	1

EQUIPO DE PERFORACION	PORTADRILL 502, MOTOR DIESEL, BOMBA DE LODOS GARDNER DENVER 5 x 8	2
EQUIPO DE PERFORACION	DEUTZ, MOTOR DIESEL, BOMBA DE LODOS GARDNER DENVER 4 x 6	2
RETROEXCAVADORA	HITACHI	1
RETROEXCAVADORA	CARTERPILLA	1

11 INFORMACIÓN AMBIENTAL DEL CONTRATO.

En lo corrido del presente mes las actividades ejecutadas no causaron afectación ambiental en la zona de trabajo.

A la fecha el contrato cuenta con los permisos de prospección y exploración en de aguas subterráneas tramitados por el municipio de Puerto Gaitán ante la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena -CORMACARENA, los cuales a continuación se relacionan:

EXPEDIENTE	RESOLUCIÓN	FECHA	RESGUARDO INDÍGENA	POZO COMUNIDAD
3.37.2.6.025.001	PS-GJ. 1.2.6.25.0361	30/04/2025	WACOYO	KALIWIRNAE – ESMERALDA WALABO – PALOGRANDE WALABO – LA UNION – PUNTO GRILLO – ALGARROBO – MATAPALITO – LA PORIFA – LA CAIMANA
3.37.2.6.025.004	PS-GJ. 1.2.6.25.0359	30/04/2025	AWALIBA	MAKAPAY – AWALIBA CENTRAL – PUERTO LOPEZ – PUNTO GRILLO – SAN GIL – FACUNAE
3.37.2.6.025.002	PS-GJ. 1.2.6.25.0416	19/05/2025	DOMOPLANAS	OLIVOS – PARAISO – BUENA VISTA – VILLAMARCIA – LAS BRISAS – CUMARALITO – YATARROBO – CERRITO – PUERTO GAVILAN – LAS DELICIAS – CACHAMITAS
3.37.2.6.025.005	PS-GJ. 1.2.6.25.0369	06/05/2025	ASEINPOME	KEKO ASEINPOME – SIETE RODRIGUEZ

12 CONCLUSIONES

- Se presenta el siguiente informe con el fin de mantener informadas a las partes involucradas del estado y avance del contrato en el periodo correspondiente al informe mensual No. 9 con corte del (01-05-2026 al 31-05-2026), actividades que se desarrollaron con normalidad.

- En corte del presente periodo se tiene un acumulado del 86,82% de suministro de la tubería.

- Una vez recibidos los recursos de anticipo en la fiducia constituida para el manejo de este, se continua la inversión de tal forma que se logre el cumplimiento del cronograma, priorizando las actividades que más tiempo requieren en su ejecución.

- Al terminar la ejecución de la actividad de localización y replanteo de las redes de acueducto en las comunidades beneficiarias se evidencio la existencia de nuevos usuarios, así como el desplazamiento de algunos usuarios dentro de la misma comunidad, situación que genera mayor cantidad de actividades de obra por lo que se cuantificara junto con interventoría para realizar el balance del contrato.

- Para efectos de precisión, se deja claridad en que el porcentaje acumulado consignado en el cuadro de avance está redondeado a dos decimales.

11861

13 ANEXOS

- **ANEXO No. 1.** CUADRO DE AVANCE ACTIVIDADES EJECUTADAS.
- **ANEXO No. 2.** CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES.
- **ANEXO No. 3.** INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SISO).
- **ANEXO No. 4.** PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y CERTIFICACIÓN CONTADOR.
- **ANEXO No. 5.** NOMINAS DEL PERSONAL.
- **ANEXO No. 6.** PAZ Y SALVO TRABAJADORES RETIRADOS.
- **ANEXO No. 7.** LABORATORIOS
- **ANEXO No. 8.** REGISTRO FOTOGRAFICO.
- **ANEXO No. 9.** COPIA DE LA BITACORA.
- **ANEXO No. 10.** APROBACIÓN CONTRATO FIDUCIARIO Y SOPORTES PAGOS DE FIDUCIA.

Atentamente,

LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA
R.L. CONSORCIO ACUEDUCTOS AGUAS 2025
Contratista

1052

ANEXO 1. CUADRO DE CANTIDADES AVANCE DE OBRA.

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META

CONDICIONES INICIALES							ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PERIODO (01-05-2026 AL 31-05-2026)		AVANCE ACUMULADO		CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	
Nº ITEM	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
RESGUARDO AWALIBA														
COMUNIDAD MAKAPAY (6000 - 1L) (F.Z. 1,30)														
1	POZO PROFUNDO													
1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	$ 139.220,00	$ 139.220,00	1,00	$ 139.220,00		$ -	1,00	$ 139.220,00	-	$ -
1.2		INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS	UND	1,00	$ 2.882.980,00	$ 2.882.980,00	1,00	$ 2.882.980,00		$ -	1,00	$ 2.882.980,00	-	$ -
1.3		PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO	ML	90,00	$ 349.024,00	$ 31.412.160,00	90,00	$ 31.412.160,00		$ -	90,00	$ 31.412.160,00	-	$ -
1.4		ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÈTRICO DEL POZO	ML	90,00	$ 134.131,00	$ 12.071.790,00	90,00	$ 12.071.790,00		$ -	90,00	$ 12.071.790,00	-	$ -
1.5		EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA)	UND	1,00	$ 3.993.053,00	$ 3.993.053,00	1,00	$ 3.993.053,00		$ -	1,00	$ 3.993.053,00	-	$ -
1.6		AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"	ML	90,00	$ 502.845,00	$ 45.256.050,00	90,00	$ 45.256.050,00		$ -	90,00	$ 45.256.050,00	-	$ -
1.7		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN PARA PROFUNDIDADES DE 0 A 200 M	ML	60,00	$ 320.453,00	$ 19.227.180,00	60,00	$ 19.227.180,00		$ -	60,00	$ 19.227.180,00	-	$ -
1.8		AFORO DEL POZO (PRUEBA DE BOMBEO)	UND	1,00	$ 3.765.969,00	$ 3.765.969,00	1,00	$ 3.765.969,00		$ -	1,00	$ 3.765.969,00	-	$ -
1.9		CONSTRUCCIÓN DE CABEZA DE POZO Y SELLO SANITARIO E INSTALACIÓN DE GRAVILLADORES	UND	1,00	$ 1.668.279,00	$ 1.668.279,00	1,00	$ 1.668.279,00		$ -	1,00	$ 1.668.279,00	-	$ -
1.10		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESION	ML	30,00	$ 239.462,00	$ 7.183.860,00	30,00	$ 7.183.860,00		$ -	30,00	$ 7.183.860,00	-	$ -
1.11		SUMINISTRO DE GRAVILLA TAMIZADA, SELECCIONADA Y SIN CALCÁREOS	M3	5,22	$ 562.175,00	$ 2.934.554,00	4,00	$ 2.248.700,00	1,22	$ 685.854,00	5,22	$ 2.934.554,00	-	$ -
1.12		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ESTABILIZADOR Y DE RELLENO	BTO	18,00	$ 42.479,00	$ 764.622,00	18,00	$ 764.622,00		$ -	18,00	$ 764.622,00	-	$ -
1.13		LAVADO Y DESARROLLO DEL POZO POR MÉTODOS COMBINADOS (JETTING AIRE COMPRIMIDO)	UND	1,00	$ 4.282.909,00	$ 4.282.909,00	1,00	$ 4.282.909,00		$ -	1,00	$ 4.282.909,00	-	$ -
1.14		DESINFECCIÓN DEL POZO (DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO)	UND	1,00	$ 442.648,00	$ 442.648,00	1,00	$ 442.648,00		$ -	1,00	$ 442.648,00	-	$ -
1.15		ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DEL AGUA	UND	1,00	$ 405.516,00	$ 405.516,00		$ -	1,00	$ 405.516,00	1,00	$ 405.516,00	-	$ -
					TOTAL POZO PROFUNDO MAKAPAY	$ 136.430.790,00		$ 135.339.420,00		$ 1.091.370,00		$ 136.430.790,00		$ -
2	EQUIPO DE BOMBEO Y SISTEMA DE ENERGÍA SOLAR													
2.1.1		SUMINISTRO E INSTALACION DE CONJUNTO DE BOMBEO SOLAR FORMADO POR BOMBA SOLAR SUMERGIBLE POTENCIA DE 3000 WATIOS , VOLTAJE ENTRE (90-360) VCD, CORRIENTE 12 A , DE 16 ETAPAS Y CONTROLADOR DE CARGA 360 VCD, RANGO VOLTAJE 90-360 VCD CORRIENTE DIRECTA 18 A, PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.	UND	1,00	$ 60.695.848,00	$ 60.695.848,00	1,00	$ 60.695.848,00		$ -	1,00	$ 60.695.848,00	-	$ -
2.2		SENSOR DE NIVEL DE POZO CONEXION CONTROLADOR BOMBEO	UNO	1,00	$ 832.019,00	$ 832.019,00	1,00	$ 832.019,00		$ -	1,00	$ 832.019,00	-	$ -
2.3		SENSOR DE NIVEL DE TANQUES	UNO	1,00	$ 796.143,00	$ 796.143,00	1,00	$ 796.143,00		$ -	1,00	$ 796.143,00	-	$ -
2.4		CABLE ENCAUCHETADO PARA BOMBA	ML	103,00	$ 50.026,00	$ 5.152.678,00	65,00	$ 3.251.690,00		$ -	65,00	$ 3.251.690,00	38,00	$ 1.900.988,00
2.5		SUMINISTRO E INSTALACION MALLA TIERRA, CABLE 2/0, NO. 4, 3CW 33.10.13	UNO	1,00	$ 4.964.593,00	$ 4.964.593,00	1,00	$ 4.964.593,00		$ -	1,00	$ 4.964.593,00	-	$ -
2.6		SUMINISTRO E INSTALACION MODULOS SOLARES DE 570 WATTIOS MONOCRISTALINOS, TENSIÓN A MÁXIMA POTENCIA (VMP) 42.24 V, INTENSIDAD A MÁXIMA POTENCIA (IMP) 13.14 A, INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO (ISC) 14.04 A, TENSIÓN EN CIRCUITO ABIERTO (VOC) 49.90 V, CON CAJA DE CONEXIONES, MONTAJE CON GANCHOS INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE Y MATERIAL DE CONEXIONADO ELÉCTRICO.	UND	9,00	$ 3.094.227,00	$ 27.848.043,00	-	$ -	9,00	$ 27.848.043,00	9,00	$ 27.848.043,00	-	$ -
2.7.1		ESTRUCTURA PARA SOPORTE DE PANELES, PORTICOS EN PERFIL RECTANGULAR EN ACERO ASTM A.500, CONEXIONES ATORNILLADAS, BASE DE PANELES EN PERFIL DE ALUMINIO RANURADO, PARA MONTAJE DE 9 PANELES SOLARES EN ALTURA (INCLUYE EXCAVACION, ZAPATA, PEDESTAL EN CONCRETO, MONTAJE SOLDADURA APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE)	UND	1,00	$ 11.603.372,00	$ 11.603.372,00	1,00	$ 11.603.372,00		$ -	1,00	$ 11.603.372,00	-	$ -
2.8		TUBERÍA PVCP RDE 21 1 1/4" SUMINISTRO E INSTALACION	ML	18,00	$ 37.863,00	$ 681.534,00	-	$ -	6,00	$ 227.178,00	6,00	$ 227.178,00	12,00	$ 454.356,00
2.9		ARBOL DE FONTANERIA 1 1/4" INCLUYE SELLO, MEDIDOR, VALVULAS, REGISTROS, MANOMETRO Y ACCESORIOS	UND	1,00	$ 3.893.440,00	$ 3.893.440,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 3.893.440,00
2.10		GUAYA ENCAUCHETADA PARA BOMBA SUMERGIBLE	ML	93,00	$ 24.286,00	$ 2.258.598,00	93,00	$ 2.258.598,00		$ -	93,00	$ 2.258.598,00	-	$ -
2.11		TUBERÍA UPVC COLUMNA 1-1/4" PARA POZO PROFUNDO	ML	90,00	$ 105.680,00	$ 9.511.200,00	60,00	$ 6.340.800,00		$ -	60,00	$ 6.340.800,00	30,00	$ 3.170.400,00
					TOTAL EQUIPO DE BOMBEO MAKAPAY	$ 128.237.468,00		$ 90.743.063,00		$ 28.076.221,00		$ 118.819.284,00		$ 9.418.184,00
3	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA												-	
3.1.1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA UN CAUDAL DE 1 LPS, BASADO EN FILTROS A PRESIÓN (INCLUYE UNA UNIDAD DE FILTRACIÓN EN ACERO INOXIDABLE , DIAMETRO INTERNO 30 ", ALTURA 2.3 METROS, LECHOS FILTRANTES, ACCESORIOS EN PVC DIAMETRO 1.5 " Y MANOMETRO)	UND	1,00	$ 77.511.098,00	$ 77.511.098,00	1,00	$ 77.511.098,00		$ -	1,00	$ 77.511.098,00	-	$ -
3.2		DOSIFICADOR DE CLORO EN LÍNEA POR DIFERENCIAL DE PRESIÓN DE 5 LIBRAS (INCLUYE INSTALACIÓN Y VÁLVULA DE CONTROL QUE REGULA EL FLUJO).	UND	2,00	$ 640.372,00	$ 1.280.744,00	2,00	$ 1.280.744,00		$ -	2,00	$ 1.280.744,00	-	$ -
3.3		PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO (INCLUYE INSUMOS QUIMICOS Y PRUEBAS DE TRATABILIDAD)	UND	1,00	$ 4.564.040,00	$ 4.564.040,00	1,00	$ 4.564.040,00		$ -	1,00	$ 4.564.040,00	-	$ -
3.4		PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20,7 Mpa (3000 psi) MEZCLADO EN OBRA, SUMINISTRO Y CONTRUCCION PARA SOPORTE FILTROS	M3	1,08	$ 1.407.638,00	$ 1.520.465,00	0,90	$ 1.267.054,00		$ -	0,90	$ 1.267.054,00	0,18	$ 253.411,00
3.5		ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO ARMADO, COLOCACION Y AMARRE.	KG	95,04	$ 13.233,00	$ 1.257.664,00	92,44	$ 1.223.259,00		$ -	92,44	$ 1.223.259,00	2,60	$ 34.406,00
3.6		TUBERÍA PVCP RDE 21 1 1/4" SUMINISTRO E INSTALACION	ML	19,27	$ 37.863,00	$ 729.620,00	19,27	$ 729.620,00		$ -	19,27	$ 729.620,00	-	$ -
3.7		ESTRUCTURA DE CUBIERTA PARA PTAP (1 AGUA)	UND	1,00	$ 2.004.508,00	$ 2.004.508,00	1,00	$ 2.004.508,00		$ -	1,00	$ 2.004.508,00	-	$ -
					TOTAL SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUA MAKAPAY	$ 88.888.133,00		$ 88.580.323,00		$ -		$ 88.580.323,00		$ 287.817,00
4	REDES DE ACUEDUCTO												-	
4.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	4.140,25	$ 4.314,00	$ 17.861.039,00	3.917,61	$ 16.900.570,00		$ -	3.917,61	$ 16.900.570,00	222,64	$ 960.469,00
4.2		RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN	M3	1.035,06	$ 43.398,00	$ 44.919.534,00	932,50	$ 40.468.635,00		$ -	932,50	$ 40.468.635,00	102,56	$ 4.450.899,00
4.3		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE	M3	112,50	$ 98.753,00	$ 11.109.713,00	112,21	$ 11.081.074,00		$ -	112,21	$ 11.081.074,00	0,29	$ 28.638,00
4.4		CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	931,56	$ 189.095,00	$ 176.153.338,00	645,52	$ 122.064.604,00		$ -	645,52	$ 122.064.604,00	286,04	$ 54.088.734,00
4.5		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL	M3	1.204,58	$ 44.843,00	$ 54.016.981,00	1.203,57	$ 53.971.690,00		$ -	1.203,57	$ 53.971.690,00	1,01	$ 45.291,00
4.6		RELLENO CON MATERIAL DE ARRECIFE TAMAÑO MAX. 3"	M3	310,52	$ 78.793,00	$ 24.466.802,00	279,75	$ 22.042.342,00		$ -	279,75	$ 22.042.342,00	30,77	$ 2.424.461,00

		CONDICIONES INICIALES					ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PERIODO (01-05-2026 AL 31-05-2026)		AVANCE ACUMULADO		CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	
Nº ITEM	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
4.7		TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	327.182,73	$ 2.309,00	$ 755.464.921,00	221.081,82	$ 510.477.922,00		$ -	221.081,82	$ 510.477.922,00	106.100,91	$ 244.986.999,00
4.8		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN	ML	3.890,25	$ 23.403,00	$ 91.043.521,00	3.542,36	$ 82.901.851,00		$ -	3.542,36	$ 82.901.851,00	347,89	$ 8.141.670,00
4.9		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA EN H.D. 2" (INCLUYE CAJA VALV. Y ANCLAJE EN CONCRETO)	UN	1,00	$ 1.148.570,00	$ 1.148.570,00	1,00	$ 1.148.570,00		$ -	1,00	$ 1.148.570,00	-	$ -
4.10		CODO GRAN RADIO 90° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2")	UN	4,00	$ 128.043,00	$ 512.172,00	4,00	$ 512.172,00		$ -	4,00	$ 512.172,00	-	$ -
4.11		CODO GRAN RADIO 45° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2")	UN	10,00	$ 122.094,00	$ 1.220.940,00	6,00	$ 737.364,00		$ -	6,00	$ 737.364,00	4,00	$ 491.576,00
4.12		TEE PVC - PRESION TRABAJO 200 PSI- EXTREMOS UNION MECANICA X LISO (2X2X2)	UN	2,00	$ 140.168,00	$ 280.336,00	2,00	$ 280.336,00		$ -	2,00	$ 280.336,00	-	$ -
4.13		SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø2" UM UN	UN	5,00	$ 94.930,00	$ 474.650,00	5,00	$ 474.650,00		$ -	5,00	$ 474.650,00	-	$ -
4.14		TAPON EN PVC- PRESION TRABAJO 280 PSI (2")	UN	1,00	$ 4.065,00	$ 4.065,00	1,00	$ 4.065,00		$ -	1,00	$ 4.065,00	-	$ -
4.15		EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE	M3	2.334,15	$ 52.355,00	$ 122.204.423,00	2.125,41	$ 111.275.841,00		$ -	2.125,41	$ 111.275.841,00	208,74	$ 10.928.583,00
4.16		ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M, ACCESORIOS Y REGISTRO)	UND	25,00	$ 265.183,00	$ 6.629.575,00	25,00	$ 6.629.575,00		$ -	25,00	$ 6.629.575,00	-	$ -
		TOTAL REDES DE ACUEDUCTO MAKAPAY				$ 1.307.518.560,00		$ 980.971.261,00		$ -		$ 980.971.261,00		$ 326.547.320,00
5	TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN												-	
5.1		PLATAFORMA EN LÁMINA ALFAJOR ESPESOR 1/4" MM (INCLUYE TRANSPORTE, MONTAJE, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE)	M2	10,56	$ 665.020,00	$ 7.022.611,00	10,56	$ 7.022.611,00		$ -	10,56	$ 7.022.611,00	-	$ -
5.2		TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 6000 LITROS, ELEVADO A 13,5 METROS DE ALTURA, TIPO PLASTICO	UND	1,00	$ 15.554.528,00	$ 15.554.528,00	1,00	$ 15.554.528,00		$ -	1,00	$ 15.554.528,00	-	$ -
5.3		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0-2,00 M,INCLUYE CARGUE	M3	7,44	$ 98.753,00	$ 734.722,00	7,44	$ 734.722,00		$ -	7,44	$ 734.722,00	-	$ -
5.4		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN MANUAL	M3	4,90	$ 44.843,00	$ 219.731,00	4,28	$ 191.928,00		$ -	4,28	$ 191.928,00	0,62	$ 27.803,00
5.5		ZAPATA EN CONCRETO 20,7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,03	$ 1.591.805,00	$ 3.231.364,00	2,03	$ 3.231.364,00		$ -	2,03	$ 3.231.364,00	-	$ -
5.6		COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,77	$ 2.251.614,00	$ 1.733.743,00	0,77	$ 1.733.743,00		$ -	0,77	$ 1.733.743,00	-	$ -
5.7		ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO ARMADO, COLOCACION Y AMARRE.	M3	461,56	$ 13.233,00	$ 6.107.823,00	269,29	$ 3.563.515,00		$ -	269,29	$ 3.563.515,00	192,27	$ 2.544.309,00
5.8		SOLADO,LIMPIEZA CONCRETO 13,8 Mpa (2000 PSI)	M3	0,68	$ 1.099.773,00	$ 747.846,00	0,68	$ 747.846,00		$ -	0,68	$ 747.846,00	-	$ -
5.9		ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A500 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)	KG	2.480,08	$ 50.061,00	$ 124.155.285,00	2.200,00	$ 110.134.200,00		$ -	2.200,00	$ 110.134.200,00	280,08	$ 14.021.085,00
5.10		ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A588 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)	KG	133,00	$ 51.231,00	$ 6.813.723,00	110,00	$ 5.635.410,00		$ -	110,00	$ 5.635.410,00	23,00	$ 1.178.313,00
5.11		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	19,45	$ 104.995,00	$ 2.042.153,00	14,50	$ 1.522.428,00		$ -	14,50	$ 1.522.428,00	4,95	$ 519.725,00
		TOTAL TANQUE ELEVADO MAKAPAY				$ 168.363.529,00		$ 150.072.295,00		$ -		$ 150.072.295,00		$ 18.291.235,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL										-			
6.1		LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	48,20	$ 5.300,00	$ 255.460,00	45,50	$ 241.150,00		$ -	45,50	$ 241.150,00	2,70	$ 14.310,00
6.2		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE	M3	5,00	$ 98.753,00	$ 493.765,00	4,97	$ 490.802,00		$ -	4,97	$ 490.802,00	0,03	$ 2.963,00
6.3		CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	4,10	$ 1.126.628,00	$ 4.627.375,00	4,03	$ 4.548.371,00		$ -	4,03	$ 4.548.371,00	0,07	$ 79.004,00
6.4		VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,28	$ 1.705.560,00	$ 3.888.677,00	2,18	$ 3.718.121,00		$ -	2,18	$ 3.718.121,00	0,10	$ 170.556,00
6.5		COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,19	$ 2.251.614,00	$ 427.807,00	0,19	$ 427.807,00		$ -	0,19	$ 427.807,00	-	$ -
6.6		RELLENO CON GRAVILLA	M3	1,31	$ 169.936,00	$ 222.616,00	1,31	$ 222.616,00		$ -	1,31	$ 222.616,00	-	$ -
6.7		ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,38	$ 1.591.805,00	$ 604.886,00	0,38	$ 604.886,00		$ -	0,38	$ 604.886,00	-	$ -
6.8		ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO ARMADO, COLOCACION Y AMARRE.	KG	375,41	$ 13.233,00	$ 4.967.801,00	374,22	$ 4.952.053,00		$ -	374,22	$ 4.952.053,00	1,19	$ 15.747,00
6.9		CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.50 X 0.50 X 0.50 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UND	1,00	$ 815.572,00	$ 815.572,00	1,00	$ 815.572,00		$ -	1,00	$ 815.572,00	-	$ -
6.10		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN MANUAL	M3	0,44	$ 44.843,00	$ 19.731,00	0,44	$ 19.731,00		$ -	0,44	$ 19.731,00	-	$ -
6.11		SOLADO,LIMPIEZA CONCRETO 13,8 Mpa (2000 PSI)	M3	0,06	$ 1.099.773,00	$ 65.986,00	0,06	$ 65.986,00		$ -	0,06	$ 65.986,00	-	$ -
6.12		TUBO GALVANIZADO DE 2" (L= 2 M, E = 1,5 MM) PARA CERRAMIENTO, CON ANTICORROSIVO Y PINTURA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	UND	298,00	$ 122.681,00	$ 36.558.938,00	282,00	$ 34.596.042,00		$ -	282,00	$ 34.596.042,00	16,00	$ 1.962.896,00
6.13		SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTON TUBO REDONDO GALVANIZADO 1-1/4": (1,5 MM) MALLA ESLABONADA 2X2	M2	9,84	$ 334.950,00	$ 3.295.908,00	-	$ -		$ -	-	$ -	9,84	$ 3.295.908,00
		TOTAL CERRAMIENTO PERIMETRAL MAKAPAY				$ 56.244.522,00		$ 50.703.137,00		$ -		$ 50.703.137,00		$ 5.541.384,00
		TOTAL COMUNIDAD MAKAPAY				$ 1.885.683.028,00		$ 1.486.409.499,00		$ 29.166.591,00		$ 1.525.576.090,00		$ 360.086.940,00
COMUNIDAD AWALIBA CENTRAL (10.000 - 1L) (F.Z. 1,30)														
1	POZO PROFUNDO													
1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	$ 139.220,00	$ 139.220,00	1,00	$ 139.220,00		$ -	1,00	$ 139.220,00	-	$ -
1.2		INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS	UND	1,00	$ 2.882.980,00	$ 2.882.980,00	1,00	$ 2.882.980,00		$ -	1,00	$ 2.882.980,00	-	$ -
1.3		PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO	ML	102,00	$ 349.024,00	$ 35.600.448,00	102,00	$ 35.600.448,00		$ -	102,00	$ 35.600.448,00	-	$ -
1.4		ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO	ML	102,00	$ 134.131,00	$ 13.681.362,00	102,00	$ 13.681.362,00		$ -	102,00	$ 13.681.362,00	-	$ -
1.5		EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL ESPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA)	UND	1,00	$ 3.993.053,00	$ 3.993.053,00	1,00	$ 3.993.053,00		$ -	1,00	$ 3.993.053,00	-	$ -
1.6		AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"	ML	102,00	$ 502.845,00	$ 51.290.190,00	102,00	$ 51.290.190,00		$ -	102,00	$ 51.290.190,00	-	$ -
1.7		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN PARA PROFUNDIDADES DE 0 A 200 M	ML	66,00	$ 320.453,00	$ 21.149.898,00	66,00	$ 21.149.898,00		$ -	66,00	$ 21.149.898,00	-	$ -
1.8		AFORO DEL POZO (PRUEBA DE BOMBEO)	UNO	1,00	$ 3.765.969,00	$ 3.765.969,00	1,00	$ 3.765.969,00		$ -	1,00	$ 3.765.969,00	-	$ -
1.9		CONSTRUCCIÓN DE CABEZA DE POZO Y SELLO SANITARIO E INSTALACIÓN DE GRAVILLADORES	UNO	1,00	$ 1.668.279,00	$ 1.668.279,00	1,00	$ 1.668.279,00		$ -	1,00	$ 1.668.279,00	-	$ -
1.10		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESION	ML	36,00	$ 239.462,00	$ 8.620.632,00	36,00	$ 8.620.632,00		$ -	36,00	$ 8.620.632,00	-	$ -
1.11		SUMINISTRO DE GRAVILLA TAMIZADA, SELECCIONADA Y SIN CALCÁREOS.	M3	5,94	$ 562.175,00	$ 3.339.320,00	5,58	$ 3.136.937,00	0,36	$ 202.383,00	5,94	$ 3.339.320,00	-	$ -
1.12		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ESTABILIZADOR Y DE RELLENO	BTO	20,40	$ 42.479,00	$ 866.572,00	20,40	$ 866.572,00		$ -	20,40	$ 866.572,00	-	$ -
1.13		LAVADO Y DESARROLLO DEL POZO POR MÉTODOS COMBINADOS (JETTING AIRE COMPRIMIDO)	UNO	1,00	$ 4.282.909,00	$ 4.282.909,00	1,00	$ 4.282.909,00		$ -	1,00	$ 4.282.909,00	-	$ -
1.14		DESINFECCIÓN DEL POZO (DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO)	UND	1,00	$ 442.648,00	$ 442.648,00	1,00	$ 442.648,00		$ -	1,00	$ 442.648,00	-	$ -

11885

CONDICIONES INICIALES							ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PERIODO (01-05-2026 AL 31-05-2026)		AVANCE ACUMULADO		CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	
Nº ITEM	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.15		ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DEL AGUA	UND	1,00	$ 405.516,00	$ 405.516,00		$ -	1,00	$ 405.516,00	1,00	$ 405.516,00	-	$ -
		TOTAL POZO PROFUNDO AWALIBA CENTRAL				$ 152.128.996,00		$ 151.521.097,00		$ 607.899,00		$ 152.128.996,00		$ -
3	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA													
3.4		PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20,7 Mpa (3000 psi) MEZCLADO EN OBRA, SUMINISTRO Y CONTRUCCION PARA SOPORTE FILTROS	M3	1,08	$ 1.407.838,00	$ 1.520.465,00		$ -	1,08	$ 1.520.465,00	1,08	$ 1.520.465,00	-	$ -
3.5		ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO ARMADO, COLOCACION Y AMARRE.	KG	95,04	$ 13.233,00	$ 1.257.664,00		$ -	95,04	$ 1.257.664,00	95,04	$ 1.257.664,00	-	$ -
		TOTAL SISTEMA DE TRATAMIENTO AWALIBA CENTRAL				$ 88.897.672,00		$ -		$ 2.778.129,00		$ 2.778.129,00		$ 86.119.543,00
4	REDES DE ACUEDUCTO													
4.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	3.747,00	$ 4.314,00	$ 16.164.558,00	3.747,00	$ 16.164.558,00		$ -	3.747,00	$ 16.164.558,00	-	$ -
4.2		RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN	M3	936,75	43.398,00	$ 40.653.077,00	848,00	$ 36.801.504,00		$ -	848,00	$ 36.801.504,00	88,75	$ 3.851.573,00
4.3		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE	M3	319,50	$ 98.753,00	$ 31.551.584,00	231,30	$ 22.841.569,00		$ -	231,30	$ 22.841.569,00	88,20	$ 8.710.015,00
4.4		CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	843,08	$ 189.095,00	$ 159.422.213,00	587,48	$ 111.089.531,00		$ -	587,48	$ 111.089.531,00	255,60	$ 48.332.682,00
4.5		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL	M3	1.017,60	$ 44.843,00	$ 45.632.237,00	1.017,60	$ 45.632.237,00		$ -	1.017,60	$ 45.632.237,00	-	$ -
4.6		RELLENO CON MATERIAL DE ARRECIFE TAMAÑO MAX. 3"	M3	281,03	$ 78.793,00	$ 22.143.197,00	254,40	$ 20.044.939,00		$ -	254,40	$ 20.044.939,00	26,63	$ 2.098.258,00
4.7		TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	284.052,30	$ 2.309,00	$ 655.876.761,00	206.171,19	$ 476.049.278,00		$ -	206.171,19	$ 476.049.278,00	77.881,11	$ 179.827.483,00
4.8		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN	ML	3.037,00	$ 23.403,00	$ 71.074.911,00	3.037,00	$ 71.074.911,00		$ -	3.037,00	$ 71.074.911,00	-	$ -
4.9		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA EN H.D. 2" (INCLUYE CAJA VALV. Y ANCLAJE EN CONCRETO)	UN	1,00	$ 1.148.570,00	$ 1.148.570,00	1,00	$ 1.148.570,00		$ -	1,00	$ 1.148.570,00	-	$ -
4.10		CODO GRAN RADIO 90° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2")	UN	5,00	$ 128.043,00	$ 640.215,00	5,00	$ 640.215,00		$ -	5,00	$ 640.215,00	-	$ -
4.11		CODO GRAN RADIO 45° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2")	UN	10,00	$ 122.894,00	$ 1.228.940,00	7,00	$ 860.258,00		$ -	7,00	$ 860.258,00	3,00	$ 368.682,00
4.12		TEE PVC - PRESION TRABAJO 200 PSI- EXTREMOS UNION MECANICA X LISO (2X2X2)	UN	10,00	$ 140.168,00	$ 1.401.680,00	10,00	$ 1.401.680,00		$ -	10,00	$ 1.401.680,00	-	$ -
4.13		SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø2" U/M UN	UN	10,00	$ 94.930,00	$ 949.300,00	10,00	$ 949.300,00		$ -	10,00	$ 949.300,00	-	$ -
4.14		TAPON EN PVC- PRESION TRABAJO 200 PSI (2")	UN	5,00	$ 4.065,00	$ 20.325,00	2,00	$ 8.130,00		$ -	2,00	$ 8.130,00	3,00	$ 12.195,00
4.15		EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE	M3	1.822,20	$ 52.355,00	$ 95.401.281,00	1.822,20	$ 95.401.281,00		$ -	1.822,20	$ 95.401.281,00	-	$ -
4.16		ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M, ACCESORIOS Y REGISTRO)	UND	71,00	$ 265.183,00	$ 18.827.993,00	71,00	$ 18.827.993,00		$ -	71,00	$ 18.827.993,00	-	$ -
		TOTAL REDES DE ACUEDUCTO AWALIBA CENTRAL				$ 1.162.136.842,00		$ 918.935.954,00		$ -		$ 918.935.954,00		$ 243.200.888,00
5	TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN													
5.1		PLATAFORMA EN LÁMINA ALFAJOR ESPESOR 1/4" MM (INCLUYE TRANSPORTE, MONTAJE, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE)	M2	10,56	$ 665.020,00	$ 7.022.611,00	10,56	$ 7.022.611,00		$ -	10,56	$ 7.022.611,00	-	$ -
5.2.1		TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 10000 LITROS, ELEVADO A 13,5 METROS DE ALTURA, TIPO PLASTICO	UND	1,00	$ 36.413.704,00	$ 36.413.704,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 36.413.704,00
5.3		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0-2,00 M,INCLUYE CARGUE	M3	7,44	$ 98.753,00	$ 734.722,00	7,44	$ 734.722,00		$ -	7,44	$ 734.722,00	-	$ -
5.4		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN MANUAL.	M3	4,90	$ 44.843,00	$ 219.731,00	4,28	$ 191.928,00		$ -	4,28	$ 191.928,00	0,62	$ 27.803,00
5.5		ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,03	$ 1.591.805,00	$ 3.231.364,00	2,03	$ 3.231.364,00		$ -	2,03	$ 3.231.364,00	-	$ -
5.6		COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,77	$ 2.251.614,00	$ 1.733.743,00	0,77	$ 1.733.743,00		$ -	0,77	$ 1.733.743,00	-	$ -
5.7		ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO ARMADO, COLOCACION Y AMARRE.	M3	461,56	$ 13.233,00	$ 6.107.823,00	361,38	$ 4.782.142,00		$ -	361,38	$ 4.782.142,00	100,18	$ 1.325.682,00
5.8		SOLADO LIMPIEZA CONCRETO 13,8 Mpa (2000 PSI)	M3	0,68	$ 1.099.773,00	$ 747.846,00	0,68	$ 747.846,00		$ -	0,68	$ 747.846,00	-	$ -
5.9		ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A500 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)	KG	2.842,31	$ 50.061,00	$ 142.288.881,00	2.400,00	$ 120.146.400,00		$ -	2.400,00	$ 120.146.400,00	442,31	$ 22.142.481,00
5.10		ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A588 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)	KG	133,00	$ 51.231,00	$ 6.813.723,00	100,00	$ 5.123.100,00		$ -	100,00	$ 5.123.100,00	33,00	$ 1.690.623,00
5.11		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO E INSTALACION	ML	19,45	$ 104.995,00	$ 2.042.153,00		$ -		$ -	-	$ -	19,45	$ 2.042.153,00
		TOTAL TANQUE ELEVADO AWALIBA CENTRAL				$ 207.356.301,00		$ 143.713.856,00		$ -		$ 143.713.856,00		$ 63.642.446,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL													
6.1		LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	48,20	$ 5.300,00	$ 255.460,00	48,20	$ 255.460,00		$ -	48,20	$ 255.460,00	-	$ -
6.2		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE	M3	5,00	$ 98.753,00	$ 493.765,00	4,00	$ 395.012,00		$ -	4,00	$ 395.012,00	1,00	$ 98.753,00
6.3		CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	4,10	$ 1.128.628,00	$ 4.627.375,00	4,03	$ 4.548.371,00		$ -	4,03	$ 4.548.371,00	0,07	$ 79.004,00
6.7		ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,38	$ 1.591.805,00	$ 604.886,00	0,38	$ 604.886,00		$ -	0,38	$ 604.886,00	-	$ -
6.8		ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO ARMADO, COLOCACION Y AMARRE.	KG	375,41	$ 13.233,00	$ 4.967.801,00	200,00	$ 2.646.600,00		$ -	200,00	$ 2.646.600,00	175,41	$ 2.321.201,00
6.9		CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.50 X 0.50 X 0.50 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UND	1,00	$ 815.572,00	$ 815.572,00	1,00	$ 815.572,00		$ -	1,00	$ 815.572,00	-	$ -
6.10		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN MANUAL.	M3	0,44	$ 44.843,00	$ 19.731,00	0,40	$ 17.937,00		$ -	0,40	$ 17.937,00	0,04	$ 1.794,00
6.11		SOLADO,LIMPIEZA CONCRETO 13,8 Mpa (2000 PSI)	M3	0,06	$ 1.099.773,00	$ 65.986,00	0,06	$ 65.986,00		$ -	0,06	$ 65.986,00	-	$ -
		TOTAL CERRAMIENTO AWALIBA CENTRAL				$ 56.244.522,00		$ 9.349.824,00		$ -		$ 9.349.824,00		$ 46.894.698,00
		TOTAL COMUNIDAD AWALIBA CENTRAL				$ 1.795.001.801,00		$ 1.223.520.731,00		$ 3.386.028,00		$ 1.226.906.759,00		$ 568.095.043,00
COMUNIDAD PUERTO LOPEZ (6000 - 0.6L) (F.Z. 1,30)														
1	POZO PROFUNDO													
1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	$ 139.220,00	$ 139.220,00	1,00	$ 139.220,00		$ -	1,00	$ 139.220,00	-	$ -
1.2		INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS	UND	1,00	$ 2.882.980,00	$ 2.882.980,00	1,00	$ 2.882.980,00		$ -	1,00	$ 2.882.980,00	-	$ -
1.3		PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO	ML	96,00	$ 349.024,00	$ 33.506.304,00	96,00	$ 33.506.304,00		$ -	96,00	$ 33.506.304,00	-	$ -
1.4		ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO	ML	96,00	$ 134.131,00	$ 12.876.576,00	96,00	$ 12.876.576,00		$ -	96,00	$ 12.876.576,00	-	$ -
1.5		EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA)	UND	1,00	$ 3.993.053,00	$ 3.993.053,00	1,00	$ 3.993.053,00		$ -	1,00	$ 3.993.053,00	-	$ -
1.6		AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"	ML	96,00	$ 502.845,00	$ 48.273.120,00	96,00	$ 48.273.120,00		$ -	96,00	$ 48.273.120,00	-	$ -
1.7		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN PARA PROFUNDIDADES DE 0 A 200 M	ML	61,00	$ 320.453,00	$ 19.547.633,00	60,00	$ 19.227.180,00		$ -	60,00	$ 19.227.180,00	1,00	$ 320.453,00
1.8		AFORO DEL POZO (PRUEBA DE BOMBEO)	UND	1,00	$ 3.765.969,00	$ 3.765.969,00	1,00	$ 3.765.969,00		$ -	1,00	$ 3.765.969,00	-	$ -
1.9		CONSTRUCCIÓN DE CABEZA DE POZO Y SELLO SANITARIO E INSTALACIÓN DE GRAVILLADORES	UND	1,00	$ 1.668.279,00	$ 1.668.279,00	1,00	$ 1.668.279,00		$ -	1,00	$ 1.668.279,00	-	$ -

CONDICIONES INICIALES							ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PERIODO (01-05-2026 AL 31-05-2026)		AVANCE ACUMULADO		CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	
Nº ITEM	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.10		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESION	ML	35,00	$ 239.462,00	$ 8.381.170,00	35,00	$ 8.381.170,00		$ -	35,00	$ 8.381.170,00	-	$ -
1.11		SUMINISTRO DE GRAVILLA TAMIZADA, SELECCIONADA Y SIN CALCÁREOS	M3	5,58	$ 562.175,00	$ 3.136.937,00	5,00	$ 2.810.875,00	0,58	$ 326.062,00	5,58	$ 3.136.937,00	-	$ -
1.12		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ESTABILIZADOR Y DE RELLENO	BTO	19,20	$ 42.479,00	$ 815.597,00	19,20	$ 815.597,00		$ -	19,20	$ 815.597,00	-	$ -
1.13		LAVADO Y DESARROLLO DEL POZO POR MÉTODOS COMBINADOS (JETTING AIRE COMPRIMIDO)	UND	1,00	$ 4.282.909,00	$ 4.282.909,00	1,00	$ 4.282.909,00		$ -	1,00	$ 4.282.909,00	-	$ -
1.14		DESINFECCIÓN DEL POZO (DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO)	UND	1,00	$ 442.648,00	$ 442.648,00	1,00	$ 442.648,00		$ -	1,00	$ 442.648,00	-	$ -
1.15		ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DEL AGUA	UND	1,00	$ 405.516,00	$ 405.516,00		$ -	1,00	$ 405.516,00	1,00	$ 405.516,00	-	$ -
					TOTAL POZO PROFUNDO PTO LOPEZ	$ 144.117.911,00		$ 143.065.860,00		$ 731.678,00		$ 143.797.458,00		$ 320.453,00
4	REDES DE ACUEDUCTO												-	
4.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	669,00	$ 4.314,00	$ 2.886.066,00	669,00	$ 2.886.066,00		$ -	669,00	$ 2.886.066,00	-	$ -
4.2		RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN	M3	167,25	$ 43.398,00	$ 7.258.316,00	152,25	$ 6.607.129,00		$ -	152,25	$ 6.607.129,00	15,01	$ 651.187,00
4.3		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE	M3	54,00	$ 98.753,00	$ 5.332.662,00	39,30	$ 3.880.993,00		$ -	39,30	$ 3.880.993,00	14,70	$ 1.451.669,00
4.4		CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	150,53	$ 189.095,00	$ 28.464.470,00	105,45	$ 19.940.068,00		$ -	105,45	$ 19.940.068,00	45,08	$ 8.524.403,00
4.5		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL	M3	182,70	$ 44.843,00	$ 8.192.816,00	182,70	$ 8.192.592,00		$ -	182,70	$ 8.192.592,00	0,00	$ 224,00
4.6		RELLENO CON MATERIAL DE ARRECIFE TAMAÑO MAX. 3"	M3	50,18	$ 78.793,00	$ 3.953.633,00	45,68	$ 3.599.461,00		$ -	45,68	$ 3.599.461,00	4,50	$ 354.372,00
4.7		TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	57.770,11	$ 2.309,00	$ 133.391.184,00	43.915,29	$ 101.400.405,00		$ -	43.915,29	$ 101.400.405,00	13.854,82	$ 31.990.779,00
4.8		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN	ML	549,00	$ 23.403,00	$ 12.848.247,00	549,00	$ 12.848.247,00		$ -	549,00	$ 12.848.247,00	-	$ -
4.9		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA EN H.D. 2" (INCLUYE CAJA VALV. Y ANCLAJE EN CONCRETO)	UN	1,00	$ 1.148.570,00	$ 1.148.570,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 1.148.570,00
4.10		CODO GRAN RADIO 90° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2")	UN	4,00	$ 128.043,00	$ 512.172,00	3,00	$ 384.129,00		$ -	3,00	$ 384.129,00	1,00	$ 128.043,00
4.11		CODO GRAN RADIO 45° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2")	UN	1,00	$ 122.894,00	$ 122.894,00	1,00	$ 122.894,00		$ -	1,00	$ 122.894,00	-	$ -
4.12		TEE PVC - PRESION TRABAJO 200 PSI- EXTREMOS UNION MECANICA X LISO (2X2X2)	UN	1,00	$ 140.168,00	$ 140.168,00	1,00	$ 140.168,00		$ -	1,00	$ 140.168,00	-	$ -
4.13		SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø2" UM UN	UN	1,00	$ 94.930,00	$ 94.930,00	1,00	$ 94.930,00		$ -	1,00	$ 94.930,00	-	$ -
4.14		TAPON EN PVC- PRESION TRABAJO 280 PSI (2")	UN	2,00	$ 4.065,00	$ 8.130,00	2,00	$ 8.130,00		$ -	2,00	$ 8.130,00	-	$ -
4.15		EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE	M3	329,40	$ 52.355,00	$ 17.245.737,00	329,40	$ 17.245.737,00		$ -	329,40	$ 17.245.737,00	-	$ -
4.16		ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M. ACCESORIOS Y REGISTRO)	UND	12,00	$ 265.183,00	$ 3.182.196,00	9,00	$ 2.386.647,00		$ -	9,00	$ 2.386.647,00	3,00	$ 795.549,00
					TOTAL REDES DE ACUEDUCTO PTO LOPEZ	$ 224.782.391,00		$ 179.737.596,00		$ -		$ 179.737.596,00		$ 45.044.796,00
5	TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN												-	
5.1		PLATAFORMA EN LÁMINA ALFAJOR ESPESOR 1/4" MM (INCLUYE TRANSPORTE, MONTAJE, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE)	M2	10,56	$ 665.020,00	$ 7.022.611,00	10,56	$ 7.022.611,00		$ -	10,56	$ 7.022.611,00	-	$ -
5.2		TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 6000 LITROS, ELEVADO A 13,5 METROS DE ALTURA. TIPO PLASTICO	UND	1,00	$ 15.554.528,00	$ 15.554.528,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 15.554.528,00
5.3		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0-2,00 M,INCLUYE CARGUE	M3	7,44	$ 98.753,00	$ 734.722,00	7,44	$ 734.722,00		$ -	7,44	$ 734.722,00	-	$ -
5.4		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN MANUAL	M3	4,90	$ 44.843,00	$ 219.731,00	4,28	$ 191.928,00		$ -	4,28	$ 191.928,00	0,62	$ 27.803,00
5.5		ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,03	$ 1.591.805,00	$ 3.231.364,00	2,03	$ 3.231.364,00		$ -	2,03	$ 3.231.364,00	-	$ -
5.6		COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,77	$ 2.251.614,00	$ 1.733.743,00	0,77	$ 1.733.743,00		$ -	0,77	$ 1.733.743,00	-	$ -
5.7		ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO ARMADO, COLOCACION Y AMARRE.	M3	461,56	$ 13.233,00	$ 6.107.823,00	190,69	$ 2.523.401,00		$ -	190,69	$ 2.523.401,00	270,87	$ 3.584.423,00
5.8		SOLADO,LIMPIEZA CONCRETO 13,8 Mpa (2000 PSI)	M3	0,68	$ 1.099.773,00	$ 747.846,00	0,68	$ 747.846,00		$ -	0,68	$ 747.846,00	-	$ -
5.9		ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A500 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)	KG	2.480,08	$ 50.061,00	$ 124.155.285,00	2.200,00	$ 110.134.200,00		$ -	2.200,00	$ 110.134.200,00	280,08	$ 14.021.085,00
5.10		ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A588 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)	KG	133,00	$ 51.231,00	$ 6.813.723,00	110,00	$ 5.635.410,00		$ -	110,00	$ 5.635.410,00	23,00	$ 1.178.313,00
5.11		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO E INSTALACION	ML	19,45	$ 104.995,00	$ 2.042.153,00		$ -		$ -	-	$ -	19,45	$ 2.042.153,00
					TOTAL TANQUE ELEVADO PTO LOPEZ	$ 168.363.529,00		$ 131.955.225,00		$ -		$ 131.955.225,00		$ 36.408.305,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL												-	
6.1		LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	48,20	$ 5.300,00	$ 255.460,00	48,20	$ 255.460,00		$ -	48,20	$ 255.460,00	-	$ -
6.2		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE	M3	5,00	$ 98.753,00	$ 493.765,00	4,85	$ 478.952,00		$ -	4,85	$ 478.952,00	0,15	$ 14.813,00
6.3		CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	4,10	$ 1.128.628,00	$ 4.627.375,00	4,03	$ 4.548.371,00		$ -	4,03	$ 4.548.371,00	0,07	$ 79.004,00
6.4		VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,28	$ 1.705.560,00	$ 3.888.677,00	1,10	$ 1.876.116,00		$ -	1,10	$ 1.876.116,00	1,18	$ 2.012.561,00
6.7		ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,38	$ 1.591.805,00	$ 604.886,00	0,38	$ 604.886,00		$ -	0,38	$ 604.886,00	-	$ -
6.8		ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO ARMADO, COLOCACION Y AMARRE.	KG	375,41	$ 13.233,00	$ 4.967.801,00	200,00	$ 2.646.600,00		$ -	200,00	$ 2.646.600,00	175,41	$ 2.321.201,00
6.9		CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.50 X 0.50 X 0.50 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UND	1,00	$ 815.572,00	$ 815.572,00	1,00	$ 815.572,00		$ -	1,00	$ 815.572,00	-	$ -
6.10		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN MANUAL	M3	0,44	$ 44.843,00	$ 19.731,00	0,44	$ 19.731,00		$ -	0,44	$ 19.731,00	-	$ -
6.11		SOLADO,LIMPIEZA CONCRETO 13,8 Mpa (2000 PSI)	M3	0,06	$ 1.099.773,00	$ 65.986,00	0,06	$ 65.986,00		$ -	0,06	$ 65.986,00	-	$ -
6.12		TUBO GALVANIZADO DE 2" (L= 2 M, E = 1,5 MM) PARA CERRAMIENTO, CON ANTICORROSIVO Y PINTURA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	UND	298,00	$ 122.681,00	$ 36.558.938,00	100,00	$ 12.268.100,00		$ -	100,00	$ 12.268.100,00	198,00	$ 24.290.838,00
6.13		SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTON TUBO REDONDO GALVANIZADO 1-1/4": (1.5 MM) MALLA ESLABONADA 2X2	M2	9,84	$ 334.950,00	$ 3.295.908,00		$ -		$ -	-	$ -	9,84	$ 3.295.908,00
					TOTAL CERRAMIENTO PTO LOPEZ	$ 56.244.522,00		$ 23.579.774,00		$ -		$ 23.579.774,00		$ 32.664.748,00
		TOTAL COMUNIDAD PTO LOPEZ				$ 790.529.433,00		$ 478.338.475,00		$ 731.678,00		$ 479.070.053,00		$ 311.459.382,00
COMUNIDAD PUNTO GRILLO (6000 - 0.5L) (F.C. 1,30)													-	
1	POZO PROFUNDO												-	
1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	$ 139.220,00	$ 139.220,00	1,00	$ 139.220,00		$ -	1,00	$ 139.220,00	-	$ -
1.2		INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS	UND	1,00	$ 2.882.980,00	$ 2.882.980,00	1,00	$ 2.882.980,00		$ -	1,00	$ 2.882.980,00	-	$ -
1.3		PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 6 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO	ML	98,00	$ 349.024,00	$ 34.204.352,00	98,00	$ 34.204.352,00		$ -	98,00	$ 34.204.352,00	-	$ -
1.4		ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO	ML	98,00	$ 134.131,00	$ 13.144.838,00	98,00	$ 13.144.838,00		$ -	98,00	$ 13.144.838,00	-	$ -

11687

CONDICIONES INICIALES							ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PERIODO (01-05-2026 AL 31-05-2026)		AVANCE ACUMULADO		CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	
Nº ITEM	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.5		EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL ESPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA)	UND	1,00	$ 3.993.053,00	$ 3.993.053,00	1,00	$ 3.993.053,00		$ -	1,00	$ 3.993.053,00	-	$ -
1.6		AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"	ML	98,00	$ 502.645,00	$ 49.278.810,00	98,00	$ 49.278.810,00		$ -	98,00	$ 49.278.810,00	-	$ -
1.7		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN PARA PROFUNDIDADES DE 0 A 200 M	ML	62,00	$ 320.453,00	$ 19.868.086,00	62,00	$ 19.868.086,00		$ -	62,00	$ 19.868.086,00	-	$ -
1.8		AFORO DEL POZO (PRUEBA DE BOMBEO)	UND	1,00	$ 3.765.969,00	$ 3.765.969,00	1,00	$ 3.765.969,00		$ -	1,00	$ 3.765.969,00	-	$ -
1.9		CONSTRUCCIÓN DE CABEZA DE POZO Y SELLO SANITARIO E INSTALACIÓN DE GRAVILLADORES	UND	1,00	$ 1.668.279,00	$ 1.668.279,00	1,00	$ 1.668.279,00		$ -	1,00	$ 1.668.279,00	-	$ -
1.10		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESION	ML	36,00	$ 239.462,00	$ 8.620.632,00	35,00	$ 8.381.170,00		$ -	35,00	$ 8.381.170,00	1,00	$ 239.462,00
1.11		SUMINISTRO DE GRAVILA TAMIZADA, SELECCIONADA Y SIN CALCÁREOS.	M3	5,70	$ 562.175,00	$ 3.204.398,00	5,36	$ 3.013.258,00	0,34	$ 191.140,00	5,70	$ 3.204.398,00	-	$ -
1.12		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ESTABILIZADOR Y DE RELLENO	BTO	19,60	$ 42.479,00	$ 832.588,00	19,60	$ 832.588,00		$ -	19,60	$ 832.588,00	-	$ -
1.13		LAVADO Y DESARROLLO DEL POZO POR MÉTODOS COMBINADOS (JETTING AIRE COMPRIMIDO)	UND	1,00	$ 4.282.909,00	$ 4.282.909,00	1,00	$ 4.282.909,00		$ -	1,00	$ 4.282.909,00	-	$ -
1.14		DESINFECCIÓN DEL POZO (DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO)	UND	1,00	$ 442.648,00	$ 442.648,00	1,00	$ 442.648,00		$ -	1,00	$ 442.648,00	-	$ -
1.15		ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DEL AGUA	UND	1,00	$ 405.516,00	$ 405.516,00		$ -	1,00	$ 405.516,00	1,00	$ 405.516,00	-	$ -
					TOTAL POZO PROFUNDO PUNTO GRILLO	$ 146.734.278,00		$ 145.898.160,00		$ 596.658,00		$ 146.494.818,00		$ 239.462,00
2	EQUIPO DE BOMBEO Y SISTEMA DE ENERGÍA SOLAR													
2.7		ESTRUCTURA PARA SOPORTE DE PANELES, PORTICOS EN PERFIL RECTANGULAR EN ACERO ASTM A 500, CONEXIONES ATORNILLADAS, BASE DE PANELES EN PERFIL DE ALUMINIO RANURADO, PARA MONTAJE DE 5 PANELES SOLARES EN ALTURA (INCLUYE EXCAVACION, ZAPATA, PEDESTAL EN CONCRETO, MONTAJE SOLDADURA APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE)	UND	1,00	$ 10.422.331,00	$ 10.422.331,00	1,00	$ 10.422.331,00		$ -	1,00	$ 10.422.331,00	-	$ -
					TOTAL EQUIPO DE BOMBEO PUNTO GRILLO	$ 114.679.619,00		$ 10.422.331,00		$ -		$ 10.422.331,00		$ 104.257.188,00
3	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA													
3.4		PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20,7 Mpa (3000 psi) MEZCLADO EN OBRA, SUMINISTRO Y CONTRUCCION PARA SOPORTE FILTROS	M3	1,08	$ 1.407.838,00	$ 1.520.465,00	0,90	$ 1.267.054,00	0,18	$ 253.411,00	1,08	$ 1.520.465,00	-	$ -
3.5		ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO ARMADO, COLOCACION Y AMARRE.	KG	95,04	$ 13.233,00	$ 1.257.664,00		$ -	95,04	$ 1.257.664,00	95,04	$ 1.257.664,00	-	$ -
3.6		TUBERÍA PVCP RDE 21 1 1/4" SUMINISTRO E INSTALACION	ML	19,27	$ 37.863,00	$ 729.620,00		$ -		$ -	-	$ -	19,27	$ 729.620,00
3.7		ESTRUCTURA DE CUBIERTA PARA PTAP (1 AGUA)	UND	1,00	$ 2.004.508,00	$ 2.004.508,00	1,00	$ 2.004.508,00		$ -	1,00	$ 2.004.508,00	-	$ -
					TOTAL SISTEMA DE TRATAMIENTO PUNTO GRILLO	$ 82.341.681,00		$ 3.271.562,00		$ 1.511.076,00		$ 4.782.637,00		$ 77.558.924,00
4	REDES DE ACUEDUCTO													
4.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	782,00	$ 4.314,00	$ 3.373.548,00	782,00	$ 3.373.548,00		$ -	782,00	$ 3.373.548,00	-	$ -
4.2		RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN	M3	195,50	$ 43.398,00	$ 8.484.309,00	181,75	$ 7.887.587,00		$ -	181,75	$ 7.887.587,00	13,75	$ 596.723,00
4.3		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE	M3	49,50	$ 98.753,00	$ 4.888.274,00	33,00	$ 3.258.649,00		$ -	33,00	$ 3.258.649,00	16,50	$ 1.629.425,00
4.4		CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	175,95	$ 189.095,00	$ 33.271.265,00	127,23	$ 24.057.611,00		$ -	127,23	$ 24.057.611,00	48,73	$ 9.213.654,00
4.5		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL	M3	218,10	$ 44.843,00	$ 9.780.258,00	218,10	$ 9.780.258,00		$ -	218,10	$ 9.780.258,00	-	$ -
4.6		RELLENO CON MATERIAL DE ARRECIFE TAMAÑO MAX. 3"	M3	58,65	$ 78.793,00	$ 4.621.209,00	54,52	$ 4.295.794,00		$ -	54,52	$ 4.295.794,00	4,13	$ 325.415,00
4.7		TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	67.300,88	$ 2.309,00	$ 155.397.732,00	51.801,35	$ 119.609.317,00		$ -	51.801,35	$ 119.609.317,00	15.499,53	$ 35.788.415,00
4.8		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN	ML	672,00	$ 23.403,00	$ 15.726.816,00	672,00	$ 15.726.816,00		$ -	672,00	$ 15.726.816,00	-	$ -
4.9		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA EN H.D. 2" (INCLUYE CAJA VALV. Y ANCLAJE EN CONCRETO)	UN	1,00	$ 1.148.570,00	$ 1.148.570,00	1,00	$ 1.148.570,00		$ -	1,00	$ 1.148.570,00	-	$ -
4.10		CODO GRAN RADIO 90° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2")	UN	4,00	$ 128.043,00	$ 512.172,00	4,00	$ 512.172,00		$ -	4,00	$ 512.172,00	-	$ -
4.11		CODO GRAN RADIO 45° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2")	UN	0,00	$ 122.894,00	$ -		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
4.12		TEE PVC - PRESION TRABAJO 200 PSI- EXTREMOS UNION MECANICA X LISO (2X2X2)	UN	2,00	$ 140.168,00	$ 280.336,00	2,00	$ 280.336,00		$ -	2,00	$ 280.336,00	-	$ -
4.13		SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø2" UM UN	UN	2,00	$ 94.930,00	$ 189.860,00	2,00	$ 189.860,00		$ -	2,00	$ 189.860,00	-	$ -
4.14		TAPON EN PVC- PRESION TRABAJO 280 PSI (2")	UN	1,00	$ 4.065,00	$ 4.065,00	1,00	$ 4.065,00		$ -	1,00	$ 4.065,00	-	$ -
4.15		EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE	M3	403,20	$ 52.355,00	$ 21.109.536,00	403,20	$ 21.109.536,00		$ -	403,20	$ 21.109.536,00	-	$ -
4.16		ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M, ACCESORIOS Y REGISTRO)	UND	11,00	$ 265.183,00	$ 2.917.013,00	11,00	$ 2.917.013,00		$ -	11,00	$ 2.917.013,00	-	$ -
					TOTAL REDES DE ACUEDUCTO PUNTO GRILLO	$ 261.704.963,00		$ 214.151.332,00		$ -		$ 214.151.332,00		$ 47.553.632,00
5	TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN													
5.1		PLATAFORMA EN LÁMINA ALFAJOR ESPESOR 1/4" MM (INCLUYE TRANSPORTE, MONTAJE, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE)	M2	10,56	$ 665.020,00	$ 7.022.611,00	10,56	$ 7.022.611,00		$ -	10,56	$ 7.022.611,00	-	$ -
5.2		TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 6000 LITROS, ELEVADO A 13,5 METROS DE ALTURA, TIPO PLASTICO	UND	1,00	$ 15.554.528,00	$ 15.554.528,00	1,00	$ 15.554.528,00		$ -	1,00	$ 15.554.528,00	-	$ -
5.3		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0-2,00 M,INCLUYE CARGUE	M3	7,44	$ 98.753,00	$ 734.722,00	7,44	$ 734.722,00		$ -	7,44	$ 734.722,00	-	$ -
5.4		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN MANUAL	M3	4,90	$ 44.843,00	$ 219.731,00	4,28	$ 191.928,00		$ -	4,28	$ 191.928,00	0,62	$ 27.803,00
5.5		ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,03	$ 1.591.805,00	$ 3.231.364,00	2,03	$ 3.231.364,00		$ -	2,03	$ 3.231.364,00	-	$ -
5.6		COLUMNA EN CONCRETO 20,7 MPA (3000 PSI) MEZCLA OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,77	$ 2.251.614,00	$ 1.733.743,00	0,77	$ 1.733.743,00		$ -	0,77	$ 1.733.743,00	-	$ -
5.7		ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO ARMADO, COLOCACION Y AMARRE.	M3	461,56	$ 13.233,00	$ 6.107.823,00	190,69	$ 2.523.401,00		$ -	190,69	$ 2.523.401,00	270,87	$ 3.584.423,00
5.8		SOLADO,LIMPIEZA CONCRETO 13,8 Mpa (2000 PSI)	M3	0,68	$ 1.099.773,00	$ 747.846,00	0,68	$ 747.846,00		$ -	0,68	$ 747.846,00	-	$ -
5.9		ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A500 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)	KG	2.480,08	$ 50.061,00	$ 124.155.285,00	2.200,00	$ 110.134.200,00		$ -	2.200,00	$ 110.134.200,00	280,08	$ 14.021.085,00
5.10		ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A588 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)	KG	133,00	$ 51.231,00	$ 6.813.723,00	110,00	$ 5.635.410,00		$ -	110,00	$ 5.635.410,00	23,00	$ 1.178.313,00
5.11		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO E INSTALACION	ML	19,45	$ 104.995,00	$ 2.042.153,00		$ -	19,45	$ 2.042.153,00	19,45	$ 2.042.153,00	-	$ -
					TOTAL TANQUE ELEVADO PUNTO GRILLO	$ 168.363.529,00		$ 147.509.753,00		$ 2.042.153,00		$ 149.551.906,00		$ 18.811.624,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL													
6.1		LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	48,20	$ 5.300,00	$ 255.460,00	48,20	$ 255.460,00		$ -	48,20	$ 255.460,00	-	$ -
6.2		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE	M3	5,00	$ 98.753,00	$ 493.765,00	4,85	$ 478.952,00		$ -	4,85	$ 478.952,00	0,15	$ 14.813,00
6.3		CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	4,10	$ 1.128.628,00	$ 4.627.375,00	4,03	$ 4.548.371,00		$ -	4,03	$ 4.548.371,00	0,07	$ 79.004,00

CONDICIONES INICIALES							ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PERIODO (01-05-2026 AL 31-05-2026)		AVANCE ACUMULADO		CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	
Nº ITEM	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
6.4		VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,28	$ 1.705.560,00	$ 3.888.677,00	2,24	$ 3.820.454,00		$ -	2,24	$ 3.820.454,00	0,04	$ 68.222,00
6.5		COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,19	$ 2.251.614,00	$ 427.807,00	0,19	$ 427.807,00		$ -	0,19	$ 427.807,00	-	$ -
6.6		RELLENO CON GRAVILLA	M3	1,31	$ 169.936,00	$ 222.616,00	1,31	$ 222.616,00		$ -	1,31	$ 222.616,00	-	$ -
6.7		ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,38	$ 1.591.805,00	$ 604.886,00	0,38	$ 604.886,00		$ -	0,38	$ 604.886,00	-	$ -
6.8		ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO ARMADO, COLOCACION Y AMARRE.	KG	375,41	$ 13.233,00	$ 4.967.801,00	200,00	$ 2.646.600,00		$ -	200,00	$ 2.646.600,00	175,41	$ 2.321.201,00
6.9		CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.50 X 0.50 X 0.50 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UND	1,00	$ 815.572,00	$ 815.572,00	1,00	$ 815.572,00		$ -	1,00	$ 815.572,00	-	$ -
6.10		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL.	M3	0,44	$ 44.843,00	$ 19.731,00	0,44	$ 19.731,00		$ -	0,44	$ 19.731,00	-	$ -
6.11		SOLADO,LIMPIEZA CONCRETO 13,8 Mpa (2000 PSI)	M3	0,06	$ 1.099.773,00	$ 65.986,00	0,06	$ 65.986,00		$ -	0,06	$ 65.986,00	-	$ -
6.12		TUBO GALVANIZADO DE 2" (L= 2 M, E = 1,5 MM) PARA CERRAMIENTO, CON ANTICORROSIVO Y PINTURA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	UND	298,00	$ 122.681,00	$ 36.558.938,00	282,00	$ 34.596.042,00		$ -	282,00	$ 34.596.042,00	16,00	$ 1.962.896,00
6.13		SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTON TUBO REDONDO GALVANIZADO 1-1/4": (1.5 MM) MALLA ESLABONADA 2X2	M2	9,84	$ 334.950,00	$ 3.295.908,00		$ -		$ -	-	$ -	9,84	$ 3.295.908,00
					TOTAL CERRAMIENTO PUNTO GRILLO	$ 68.244.622,00		$ 48.502.477,00		$ -		$ 48.502.477,00		$ 7.742.044,00
		TOTAL COMUNIDAD PUNTO GRILLO				$ 830.068.372,00		$ 569.755.615,00		$ 4.149.884,00		$ 573.905.499,00		$ 256.162.874,00
COMUNIDAD SAN GIL (10.000 - 1L) (F.Z. 1,30)														
1	POZO PROFUNDO											-		
1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	$ 139.220,00	$ 139.220,00	1,00	$ 139.220,00		$ -	1,00	$ 139.220,00	-	$ -
1.2		INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS	UND	1,00	$ 2.882.980,00	$ 2.882.980,00	1,00	$ 2.882.980,00		$ -	1,00	$ 2.882.980,00	-	$ -
1.3		PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO	ML	92,00	$ 349.024,00	$ 32.110.208,00	92,00	$ 32.110.208,00		$ -	92,00	$ 32.110.208,00	-	$ -
1.4		ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO	ML	92,00	$ 134.131,00	$ 12.340.052,00	92,00	$ 12.340.052,00		$ -	92,00	$ 12.340.052,00	-	$ -
1.5		EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL ESPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA)	UND	1,00	$ 3.993.053,00	$ 3.993.053,00	1,00	$ 3.993.053,00		$ -	1,00	$ 3.993.053,00	-	$ -
1.6		AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"	ML	92,00	$ 502.845,00	$ 46.261.740,00	92,00	$ 46.261.740,00		$ -	92,00	$ 46.261.740,00	-	$ -
1.7		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN PARA PROFUNDIDADES DE 0 A 200 M	ML	56,00	$ 320.453,00	$ 17.945.368,00	56,00	$ 17.945.368,00		$ -	56,00	$ 17.945.368,00	-	$ -
1.8		AFORO DEL POZO (PRUEBA DE BOMBEO)	UND	1,00	$ 3.765.969,00	$ 3.765.969,00		$ -	1,00	$ 3.765.969,00	1,00	$ 3.765.969,00	-	$ -
1.9		CONSTRUCCIÓN DE CABEZA DE POZO Y SELLO SANITARIO E INSTALACIÓN DE GRAVILLADORES	UND	1,00	$ 1.668.279,00	$ 1.668.279,00	1,00	$ 1.668.279,00		$ -	1,00	$ 1.668.279,00	-	$ -
1.10		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESION	ML	36,00	$ 239.462,00	$ 8.620.632,00	36,00	$ 8.620.632,00		$ -	36,00	$ 8.620.632,00	-	$ -
1.11		SUMINISTRO DE GRAVILLA TAMIZADA, SELECCIONADA Y SIN CALCÁREOS.	M3	5,34	$ 562.175,00	$ 3.002.015,00	4,50	$ 2.529.788,00	0,84	$ 472.227,00	5,34	$ 3.002.015,00	-	$ -
1.12		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ESTABILIZADOR Y DE RELLENO	BTO	18,40	$ 42.479,00	$ 781.614,00	18,40	$ 781.614,00		$ -	18,40	$ 781.614,00	-	$ -
1.13		LAVADO Y DESARROLLO DEL POZO POR MÉTODOS COMBINADOS (JETTING AIRE COMPRIMIDO)	UND	1,00	$ 4.282.909,00	$ 4.282.909,00	1,00	$ 4.282.909,00		$ -	1,00	$ 4.282.909,00	-	$ -
1.14		DESINFECCION DEL POZO (DOSIFICACION DE HIPOCLORITO DE SODIO)	UND	1,00	$ 442.648,00	$ 442.648,00	1,00	$ 442.648,00		$ -	1,00	$ 442.648,00	-	$ -
1.15		ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DEL AGUA	UND	1,00	$ 405.516,00	$ 405.516,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 405.516,00
					TOTAL POZO PROFUNDO SAN GIL	$ 138.842.293,00		$ 133.998.491,00		$ 4.236.196,00		$ 138.236.687,00		$ 405.516,00
4	REDES DE ACUEDUCTO											-		
4.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	3.218,00	$ 4.314,00	$ 13.882.452,00	3.218,00	$ 13.882.452,00		$ -	3.218,00	$ 13.882.452,00	-	$ -
4.2		RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN	M3	804,50	$ 43.398,00	$ 34.913.691,00	765,75	$ 33.232.019,00		$ -	765,75	$ 33.232.019,00	38,75	$ 1.681.673,00
4.3		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE	M3	139,50	$ 98.753,00	$ 13.776.044,00	93,00	$ 9.184.029,00		$ -	93,00	$ 9.184.029,00	46,50	$ 4.592.015,00
4.4		CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	724,05	$ 189.095,00	$ 136.914.235,00	528,34	$ 99.906.452,00		$ -	528,34	$ 99.906.452,00	195,71	$ 37.007.782,00
4.5		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL	M3	918,90	$ 44.843,00	$ 41.206.233,00	918,90	$ 41.206.233,00		$ -	918,90	$ 41.206.233,00	-	$ -
4.6		RELLENO CON MATERIAL DE ARRECIFE TAMAÑO MAX. 3"	M3	241,35	$ 78.793,00	$ 19.016.691,00	229,72	$ 18.100.328,00		$ -	229,72	$ 18.100.328,00	11,63	$ 916.363,00
4.7		TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	257.990,88	$ 2.369,00	$ 595.700.942,00	197.205,37	$ 455.347.199,00		$ -	197.205,37	$ 455.347.199,00	60.785,51	$ 140.353.743,00
4.8		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN	ML	2.908,00	$ 23.403,00	$ 68.055.924,00	2.908,00	$ 68.055.924,00		$ -	2.908,00	$ 68.055.924,00	-	$ -
4.10		CODO GRAN RADIO 90° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2")	UN	3,00	$ 128.043,00	$ 384.129,00	3,00	$ 384.129,00		$ -	3,00	$ 384.129,00	-	$ -
4.11		CODO GRAN RADIO 45° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2")	UN	4,00	$ 122.894,00	$ 491.576,00	4,00	$ 491.576,00		$ -	4,00	$ 491.576,00	-	$ -
4.12		TEE PVC - PRESION TRABAJO 200 PSI- EXTREMOS UNION MECANICA X LISO (2X2X2)	UN	7,00	$ 140.168,00	$ 981.176,00	6,00	$ 841.008,00		$ -	6,00	$ 841.008,00	1,00	$ 140.168,00
4.13		SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø2" UM UN	UN	7,00	$ 94.930,00	$ 664.510,00	7,00	$ 664.510,00		$ -	7,00	$ 664.510,00	-	$ -
4.14		TAPON EN PVC- PRESION TRABAJO 280 PSI (2")	UN	6,00	$ 4.065,00	$ 24.390,00	5,00	$ 20.325,00		$ -	5,00	$ 20.325,00	1,00	$ 4.065,00
4.15		EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE	M3	1.744,80	$ 52.355,00	$ 91.349.004,00	1.744,80	$ 91.349.004,00		$ -	1.744,80	$ 91.349.004,00	-	$ -
4.16		ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M, ACCESORIOS Y REGISTRO)	UND	31,00	$ 265.183,00	$ 8.220.673,00	31,00	$ 8.220.673,00		$ -	31,00	$ 8.220.673,00	-	$ -
					TOTAL REDES DE ACUEDUCTO SAN GIL	$ 1.026.730.240,00		$ 840.885.661,00		$ -		$ 840.885.661,00		$ 185.844.379,00
5	TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN											-		
5.1		PLATAFORMA EN LÁMINA ALFAJOR ESPESOR 1/4" MM (INCLUYE TRANSPORTE, MONTAJE, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE)	M2	10,56	$ 665.020,00	$ 7.022.611,00	10,56	$ 7.022.611,00		$ -	10,56	$ 7.022.611,00	-	$ -
5.2.1		TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 10000 LITROS, ELEVADO A 13,5 METROS DE ALTURA, TIPO PLASTICO	UND	1,00	$ 38.413.704,00	$ 38.413.704,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 38.413.704,00
5.3		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0-2,00 M,INCLUYE CARGUE	M3	7,44	$ 98.753,00	$ 734.722,00	7,44	$ 734.722,00		$ -	7,44	$ 734.722,00	-	$ -
5.4		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL.	M3	4,90	$ 44.843,00	$ 219.731,00	4,90	$ 219.731,00		$ -	4,90	$ 219.731,00	-	$ -
5.5		ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,03	$ 1.591.805,00	$ 3.231.364,00	2,03	$ 3.231.364,00		$ -	2,03	$ 3.231.364,00	-	$ -
5.6		COLUMNA EN CONCRETO 20,7 MPA (3000 PSI) MEZCLA OBRA SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,77	$ 2.251.614,00	$ 1.733.743,00		$ -		$ -	-	$ -	0,77	$ 1.733.743,00
5.7		ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO ARMADO, COLOCACION Y AMARRE.	M3	461,56	$ 13.233,00	$ 6.107.823,00	200,00	$ 2.646.600,00		$ -	200,00	$ 2.646.600,00	261,56	$ 3.461.223,00
5.8		SOLADO,LIMPIEZA CONCRETO 13,8 Mpa (2000 PSI)	M3	0,68	$ 1.099.773,00	$ 747.846,00	0,68	$ 747.846,00		$ -	0,68	$ 747.846,00	-	$ -
5.9		ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A500 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)	KG	2.842,31	$ 50.061,00	$ 142.288.881,00	2.400,00	$ 120.146.400,00		$ -	2.400,00	$ 120.146.400,00	442,31	$ 22.142.481,00
5.10		ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A588 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)	KG	133,00	$ 51.231,00	$ 6.813.723,00	100,00	$ 5.123.100,00		$ -	100,00	$ 5.123.100,00	33,00	$ 1.690.623,00
5.11		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO E INSTALACION	ML	19,45	$ 104.995,00	$ 2.042.153,00		$ -		$ -	-	$ -	19,45	$ 2.042.153,00

CONDICIONES INICIALES							ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PERIODO (01-05-2026 AL 31-05-2026)		AVANCE ACUMULADO		CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	
Nº ITEM	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
					TOTAL TANQUE ELEVADO SAN GIL	$ 207.356.381,00		$ 139.872.374,00		$ -		$ 139.872.374,00		$ 67.483.927,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL											-		-
6.1		LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	48,20	$ 5.300,00	$ 255.460,00	48,20	$ 255.460,00		$ -	48,20	$ 255.460,00	-	$ -
					TOTAL CERRAMIENTO SAN GIL	$ 55.244.522,00		$ 255.460,00		$ -		$ 255.460,00		$ 55.989.062,00
		TOTAL COMUNIDAD SAN GIL				$ 1.648.095.154,00		$ 1.115.012.186,00		$ 4.238.196,00		$ 1.119.250.382,00		$ 528.844.772,00
COMUNIDAD FACUNAE (6000 - 1L) (F.Z. 1,30)														
1	POZO PROFUNDO											-		
1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	$ 139.220,00	$ 139.220,00	1,00	$ 139.220,00		$ -	1,00	$ 139.220,00	-	$ -
1.2		INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS	UND	1,00	$ 2.882.980,00	$ 2.882.980,00	1,00	$ 2.882.980,00		$ -	1,00	$ 2.882.980,00	-	$ -
1.3		PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO	ML	94,00	$ 349.024,00	$ 32.808.256,00	94,00	$ 32.808.256,00		$ -	94,00	$ 32.808.256,00	-	$ -
1.4		ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO	ML	94,00	$ 134.131,00	$ 12.608.314,00	94,00	$ 12.608.314,00		$ -	94,00	$ 12.608.314,00	-	$ -
1.5		EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA)	UND	1,00	$ 3.993.053,00	$ 3.993.053,00	1,00	$ 3.993.053,00		$ -	1,00	$ 3.993.053,00	-	$ -
1.6		AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"	ML	94,00	$ 502.845,00	$ 47.267.430,00	94,00	$ 47.267.430,00		$ -	94,00	$ 47.267.430,00	-	$ -
1.7		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN PARA PROFUNDIDADES DE 0 A 200 M	ML	58,00	$ 320.453,00	$ 18.586.274,00	58,00	$ 18.586.274,00		$ -	58,00	$ 18.586.274,00	-	$ -
1.8		AFORO DEL POZO (PRUEBA DE BOMBEO)	UND	1,00	$ 3.765.969,00	$ 3.765.969,00	1,00	$ 3.765.969,00		$ -	1,00	$ 3.765.969,00	-	$ -
1.9		CONSTRUCCIÓN DE CABEZA DE POZO Y SELLO SANITARIO E INSTALACIÓN DE GRAVILLADORES	UND	1,00	$ 1.668.279,00	$ 1.668.279,00	1,00	$ 1.668.279,00		$ -	1,00	$ 1.668.279,00	-	$ -
1.10		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESION	ML	36,00	$ 239.462,00	$ 8.620.632,00	21,50	$ 5.148.433,00		$ -	21,50	$ 5.148.433,00	14,50	$ 3.472.199,00
1.11		SUMINISTRO DE GRAVILLA TAMIZADA, SELECCIONADA Y SIN CALCÁREOS	M3	5,46	$ 562.175,00	$ 3.069.476,00	5,15	$ 2.895.201,00		$ -	5,15	$ 2.895.201,00	0,31	$ 174.274,00
1.12		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ESTABILIZADOR Y DE RELLENO	BTO	18,80	$ 42.479,00	$ 798.605,00	18,00	$ 764.622,00		$ -	18,00	$ 764.622,00	0,80	$ 33.983,00
1.13		LAVADO Y DESARROLLO DEL POZO POR MÉTODOS COMBINADOS (JETTING AIRE COMPRIMIDO)	UND	1,00	$ 4.282.909,00	$ 4.282.909,00	1,00	$ 4.282.909,00		$ -	1,00	$ 4.282.909,00	-	$ -
1.14		DESINFECCIÓN DEL POZO (DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO)	UND	1,00	$ 442.648,00	$ 442.648,00	1,00	$ 442.648,00		$ -	1,00	$ 442.648,00	-	$ -
1.15		ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DEL AGUA	UND	1,00	$ 405.516,00	$ 405.516,00	1,00	$ 405.516,00		$ -	1,00	$ 405.516,00	-	$ -
					TOTAL POZO PROFUNDO FACUNAE	$ 141.339.581,00		$ 137.659.104,00		$ -		$ 137.659.104,00		$ 3.680.466,00
4	REDES DE ACUEDUCTO											-		-
4.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	684,00	$ 4.314,00	$ 2.950.776,00	684,00	$ 2.950.776,00		$ -	684,00	$ 2.950.776,00	-	$ -
4.2		RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN	M3	171,00	$ 43.396,00	$ 7.421.058,00	142,25	$ 6.173.366,00		$ -	142,25	$ 6.173.366,00	28,75	$ 1.247.693,00
4.3		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE	M3	103,50	$ 98.753,00	$ 10.220.936,00	69,00	$ 6.813.957,00		$ -	69,00	$ 6.813.957,00	34,50	$ 3.406.979,00
4.4		CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	153,90	$ 189.095,00	$ 29.101.721,00	98,63	$ 18.649.494,00		$ -	98,63	$ 18.649.494,00	55,28	$ 10.452.226,00
4.5		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL	M3	170,70	$ 44.843,00	$ 7.654.700,00	170,70	$ 7.654.700,00		$ -	170,70	$ 7.654.700,00	-	$ -
4.6		RELLENO CON MATERIAL DE ARRECIFE TAMAÑO MAX. 3"	M3	51,30	$ 78.793,00	$ 4.042.081,00	42,67	$ 3.361.703,00		$ -	42,67	$ 3.361.703,00	8,64	$ 680.378,00
4.7		TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	59.781,83	$ 2.309,00	$ 138.036.245,00	42.168,51	$ 97.367.090,00		$ -	42.168,51	$ 97.367.090,00	17.613,32	$ 40.669.156,00
4.8		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN	ML	454,00	$ 23.403,00	$ 10.624.962,00	454,00	$ 10.624.962,00		$ -	454,00	$ 10.624.962,00	-	$ -
4.9		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA EN H.D. 2" (INCLUYE CAJA VALV. Y ANCLAJE EN CONCRETO)	UN	1,00	$ 1.148.570,00	$ 1.148.570,00	1,00	$ 1.148.570,00		$ -	1,00	$ 1.148.570,00	-	$ -
4.10		CODO GRAN RADIO 90° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2")	UN	3,00	$ 128.043,00	$ 384.129,00	3,00	$ 384.129,00		$ -	3,00	$ 384.129,00	-	$ -
4.11		CODO GRAN RADIO 45° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2")	UN	1,00	$ 122.894,00	$ 122.894,00	1,00	$ 122.894,00		$ -	1,00	$ 122.894,00	-	$ -
4.12		TEE PVC - PRESION TRABAJO 200 PSI- EXTREMOS UNION MECANICA X LISO (2X2X2)	UN	2,00	$ 140.168,00	$ 280.336,00	2,00	$ 280.336,00		$ -	2,00	$ 280.336,00	-	$ -
4.13		SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø2" UM UN	UN	2,00	$ 94.930,00	$ 189.860,00	2,00	$ 189.860,00		$ -	2,00	$ 189.860,00	-	$ -
4.14		TAPON EN PVC- PRESION TRABAJO 280 PSI (2")	UN	3,00	$ 4.065,00	$ 12.195,00	3,00	$ 12.195,00		$ -	3,00	$ 12.195,00	-	$ -
4.15		EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE	M3	272,40	$ 52.355,00	$ 14.261.502,00	272,40	$ 14.261.502,00		$ -	272,40	$ 14.261.502,00	-	$ -
4.16		ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M, ACCESORIOS Y REGISTRO)	UND	23,00	$ 265.183,00	$ 6.099.209,00	22,00	$ 5.834.026,00		$ -	22,00	$ 5.834.026,00	1,00	$ 265.183,00
					TOTAL REDES DE ACUEDUCTO FACUNAE	$ 232.551.174,00		$ 175.829.660,00		$ -		$ 175.829.660,00		$ 56.721.515,00
5	TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN											-		-
5.1		PLATAFORMA EN LÁMINA ALFAJOR ESPESOR 1/4" MM (INCLUYE TRANSPORTE, MONTAJE, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE)	M2	10,56	$ 665.020,00	$ 7.022.611,00	10,56	$ 7.022.611,00		$ -	10,56	$ 7.022.611,00	-	$ -
5.2		TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 6000 LITROS, ELEVADO A 13,5 METROS DE ALTURA, TIPO PLASTICO	UND	1,00	$ 15.554.528,00	$ 15.554.528,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 15.554.528,00
5.3		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0-2,00 M,INCLUYE CARGUE	M3	7,44	$ 98.753,00	$ 734.722,00	7,44	$ 734.722,00		$ -	7,44	$ 734.722,00	-	$ -
5.4		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL	M3	4,90	$ 44.843,00	$ 219.731,00	4,28	$ 191.928,00		$ -	4,28	$ 191.928,00	0,62	$ 27.803,00
5.5		ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,03	$ 1.591.805,00	$ 3.231.364,00	2,03	$ 3.231.364,00		$ -	2,03	$ 3.231.364,00	-	$ -
5.6		COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,77	$ 2.251.614,00	$ 1.733.743,00	0,77	$ 1.733.743,00		$ -	0,77	$ 1.733.743,00	-	$ -
5.7		ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO ARMADO, COLOCACION Y AMARRE.	M3	461,56	$ 13.233,00	$ 6.107.823,00	190,69	$ 2.523.401,00		$ -	190,69	$ 2.523.401,00	270,87	$ 3.584.422,00
5.8		SOLADO,LIMPIEZA CONCRETO 13,8 Mpa (2000 PSI)	M3	0,68	$ 1.099.773,00	$ 747.846,00	0,68	$ 747.846,00		$ -	0,68	$ 747.846,00	-	$ -
5.9		ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A500 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)	KG	2.480,08	$ 50.061,00	$ 124.155.285,00	2.200,00	$ 110.134.200,00		$ -	2.200,00	$ 110.134.200,00	280,08	$ 14.021.085,00
5.10		ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A588 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)	KG	133,00	$ 51.231,00	$ 6.813.723,00	110,00	$ 5.635.410,00		$ -	110,00	$ 5.635.410,00	23,00	$ 1.178.313,00
5.11		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO E INSTALACION	ML	19,45	$ 104.995,00	$ 2.042.153,00		$ -		$ -	-	$ -	19,45	$ 2.042.153,00
					TOTAL TANQUE ELEVADO FACUNAE	$ 168.363.529,00		$ 131.955.225,00		$ -		$ 131.955.225,00		$ 36.408.304,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL											-		-
6.1		LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	48,20	$ 5.300,00	$ 255.460,00	48,20	$ 255.460,00		$ -	48,20	$ 255.460,00	-	$ -
6.2		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE	M3	5,00	$ 98.753,00	$ 493.765,00	4,97	$ 490.802,00		$ -	4,97	$ 490.802,00	0,03	$ 2.963,00
6.3		CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20,7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	4,10	$ 1.128.628,00	$ 4.627.375,00	4,03	$ 4.548.371,00		$ -	4,03	$ 4.548.371,00	0,07	$ 79.004,00
6.4		VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,28	$ 1.705.560,00	$ 3.888.677,00	2,18	$ 3.718.121,00		$ -	2,18	$ 3.718.121,00	0,10	$ 170.556,00
6.7		ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,38	$ 1.591.805,00	$ 604.886,00	0,38	$ 604.886,00		$ -	0,38	$ 604.886,00	-	$ -

CONDICIONES INICIALES							ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PERIODO (01-05-2026 AL 31-05-2026)		AVANCE ACUMULADO		CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	
Nº ITEM	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
6.8		ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO FIGURADO ARMADO, COLOCACION Y AMARRE.	KG	375,41	$ 13.233,00	$ 4.967.801,00	200,00	$ 2.646.600,00		$ -	200,00	$ 2.646.600,00	175,41	$ 2.321.201,00
					TOTAL CERRAMIENTO FACUNAE	$ 56.244.622,00		$ 12.264.240,00		$ -		$ 12.264.240,00		$ 43.980.282,00
					TOTAL COMUNIDAD FACUNAE	$ 815.604.393,00		$ 457.708.129,00		$ -		$ 457.708.129,00		$ 357.896.264,00
		TOTAL RESGUARDO AWALIBA				$ 7.782.992.151,00		$ 5.340.744.935,00		$ 41.672.277,00		$ 5.382.418.912,00		$ 2.360.545.275,00
RESGUARDO DOMOPLANAS														
COMUNIDAD OLIVOS (10.000 - 1L) (F.Z. 1,34)														
1	POZO PROFUNDO												-	
1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	$ 140.909,00	$ 140.909,00	1,00	$ 140.909,00		$ -	1,00	$ 140.909,00	-	$ -
1.2		INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS	UND	1,00	$ 2.959.841,00	$ 2.959.841,00	1,00	$ 2.959.841,00		$ -	1,00	$ 2.959.841,00	-	$ -
1.3		PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO	ML	100,00	$ 357.987,00	$ 35.798.700,00	100,00	$ 35.798.700,00		$ -	100,00	$ 35.798.700,00	-	$ -
1.4		ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO	ML	100,00	$ 136.935,00	$ 13.693.500,00	100,00	$ 13.693.500,00		$ -	100,00	$ 13.693.500,00	-	$ -
1.5		EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL ESPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA)	UND	1,00	$ 4.064.604,00	$ 4.064.604,00	1,00	$ 4.064.604,00		$ -	1,00	$ 4.064.604,00	-	$ -
1.6		AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"	ML	100,00	$ 517.371,00	$ 51.737.100,00	100,00	$ 51.737.100,00		$ -	100,00	$ 51.737.100,00	-	$ -
1.7		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN PARA PROFUNDIDADES DE 0 A 200 M	ML	79,00	$ 327.083,00	$ 25.839.557,00	79,00	$ 25.839.557,00		$ -	79,00	$ 25.839.557,00	-	$ -
1.8		AFORO DEL POZO (PRUEBA DE BOMBEO)	UND	1,00	$ 3.853.671,00	$ 3.853.671,00	1,00	$ 3.853.671,00		$ -	1,00	$ 3.853.671,00	-	$ -
1.9		CONSTRUCCIÓN DE CABEZA DE POZO Y SELLO SANITARIO E INSTALACIÓN DE GRAVILLADORES	UND	1,00	$ 1.685.429,00	$ 1.685.429,00	1,00	$ 1.685.429,00		$ -	1,00	$ 1.685.429,00	-	$ -
1.10		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESION	ML	21,00	$ 243.661,00	$ 5.116.881,00	21,00	$ 5.116.881,00		$ -	21,00	$ 5.116.881,00	-	$ -
1.11		SUMINISTRO DE GRAVILLA TAMIZADA, SELECCIONADA Y SIN CALCÁREOS.	M3	5,82	$ 576.780,00	$ 3.356.860,00	5,00	$ 2.883.900,00	0,82	$ 472.960,00	5,82	$ 3.356.860,00	-	$ -
1.12		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ESTABILIZADOR Y DE RELLENO	BTO	20,00	$ 43.532,00	$ 870.640,00	20,00	$ 870.640,00		$ -	20,00	$ 870.640,00	-	$ -
1.13		LAVADO Y DESARROLLO DEL POZO POR MÉTODOS COMBINADOS (JETTING AIRE COMPRIMIDO)	UND	1,00	$ 4.410.001,00	$ 4.410.001,00	1,00	$ 4.410.001,00		$ -	1,00	$ 4.410.001,00	-	$ -
1.14		DESINFECCIÓN DEL POZO (DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO)	UND	1,00	$ 452.051,00	$ 452.051,00	1,00	$ 452.051,00		$ -	1,00	$ 452.051,00	-	$ -
1.15		ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DEL AGUA	UND	1,00	$ 417.994,00	$ 417.994,00		$ -	1,00	$ 417.994,00	1,00	$ 417.994,00	-	$ -
					TOTAL POZO PROFUNDO OLIVOS	$ 164.397.738,00		$ 153.506.784,00		$ 890.954,00		$ 164.397.738,00		$ -
4	REDES DE ACUEDUCTO												-	
4.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	3.250,85	$ 4.347,00	$ 14.131.445,00	3.250,85	$ 14.131.445,00		$ -	3.250,85	$ 14.131.445,00	-	$ -
4.2		RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN	M3	812,71	$ 44.733,00	$ 36.354.956,00		$ -	75,00	$ 3.354.975,00	75,00	$ 3.354.975,00	737,71	$ 32.999.981,00
4.3		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE	M3	184,50	$ 98.867,00	$ 18.240.962,00		$ -		$ -	-	$ -	184,50	$ 18.240.962,00
4.4		CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	731,44	$ 193.559,00	$ 141.576.795,00		$ -	51,89	$ 10.043.777,00	51,89	$ 10.043.777,00	679,55	$ 131.533.018,00
4.5		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL	M3	913,76	$ 45.262,00	$ 41.358.605,00		$ -	105,00	$ 4.752.510,00	105,00	$ 4.752.510,00	808,76	$ 36.606.095,00
4.6		RELLENO CON MATERIAL DE ARRECIFE TAMAÑO MAX. 3"	M3	243,81	$ 80.065,00	$ 19.520.648,00		$ -	22,50	$ 1.801.463,00	22,50	$ 1.801.463,00	221,31	$ 17.719.185,00
4.7		TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	306.455,02	$ 2.309,00	$ 707.604.641,00		$ -	27.377,00	$ 63.213.493,00	27.377,00	$ 63.213.493,00	279.078,02	$ 644.391.148,00
4.8		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN	ML	2.640,85	$ 23.569,00	$ 66.955.994,00		$ -	300,00	$ 7.070.700,00	300,00	$ 7.070.700,00	2.540,85	$ 59.885.294,00
4.15		EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE	M3	1.704,51	$ 53.911,00	$ 91.891.839,00		$ -	180,00	$ 9.703.980,00	180,00	$ 9.703.980,00	1.524,51	$ 82.187.859,00
					TOTAL REDES DE ACUEDUCTO OLIVOS	$ 1.165.083.429,00		$ 14.131.445,00		$ 99.940.898,00		$ 114.072.343,00		$ 1.041.011.086,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL												-	
6.1		LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA	M2	48,20	$ 5.357,00	$ 258.207,00	48,20	$ 258.207,00		$ -	48,20	$ 258.207,00	-	$ -
					TOTAL CERRAMIENTO OLIVOS	$ 57.569.364,00		$ 258.207,00		$ -		$ 258.207,00		$ 57.310.157,00
					TOTAL COMUNIDAD OLIVOS	$ 1.802.801.678,00		$ 167.896.436,00		$ 100.831.852,00		$ 268.728.288,00		$ 1.534.073.390,00
COMUNIDAD PARAISO (6000 - 1L) (F.Z. 1,34)														
1	POZO PROFUNDO												-	
1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	$ 140.909,00	$ 140.909,00	1,00	$ 140.909,00		$ -	1,00	$ 140.909,00	-	$ -
1.2		INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS	UND	1,00	$ 2.959.841,00	$ 2.959.841,00	1,00	$ 2.959.841,00		$ -	1,00	$ 2.959.841,00	-	$ -
1.3		PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO	ML	134,00	$ 357.987,00	$ 47.970.258,00	134,00	$ 47.970.258,00		$ -	134,00	$ 47.970.258,00	-	$ -
1.4		ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO	ML	134,00	$ 136.935,00	$ 18.349.290,00	134,00	$ 18.349.290,00		$ -	134,00	$ 18.349.290,00	-	$ -
1.5		EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL ESPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA)	UND	1,00	$ 4.064.604,00	$ 4.064.604,00	1,00	$ 4.064.604,00		$ -	1,00	$ 4.064.604,00	-	$ -
1.6		AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"	ML	134,00	$ 517.371,00	$ 69.327.714,00	134,00	$ 69.327.714,00		$ -	134,00	$ 69.327.714,00	-	$ -
1.7		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN PARA PROFUNDIDADES DE 0 A 200 M	ML	83,00	$ 327.083,00	$ 27.147.889,00	83,00	$ 27.147.889,00		$ -	83,00	$ 27.147.889,00	-	$ -
1.8		AFORO DEL POZO (PRUEBA DE BOMBEO)	UND	1,00	$ 3.853.671,00	$ 3.853.671,00		$ -	1,00	$ 3.853.671,00	1,00	$ 3.853.671,00	-	$ -
1.9		CONSTRUCCIÓN DE CABEZA DE POZO Y SELLO SANITARIO E INSTALACIÓN DE GRAVILLADORES	UND	1,00	$ 1.685.429,00	$ 1.685.429,00	1,00	$ 1.685.429,00		$ -	1,00	$ 1.685.429,00	-	$ -
1.10		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESION	ML	51,00	$ 243.661,00	$ 12.426.711,00	51,00	$ 12.426.711,00		$ -	51,00	$ 12.426.711,00	-	$ -
1.11		SUMINISTRO DE GRAVILLA TAMIZADA, SELECCIONADA Y SIN CALCÁREOS.	M3	7,86	$ 576.780,00	$ 4.533.491,00	6,86	$ 3.956.711,00	1,00	$ 576.780,00	7,86	$ 4.533.491,00	-	$ -
1.12		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ESTABILIZADOR Y DE RELLENO	BTO	26,80	$ 43.532,00	$ 1.166.658,00	26,80	$ 1.166.658,00		$ -	26,80	$ 1.166.658,00	-	$ -
1.13		LAVADO Y DESARROLLO DEL POZO POR MÉTODOS COMBINADOS (JETTING AIRE COMPRIMIDO)	UND	1,00	$ 4.410.001,00	$ 4.410.001,00		$ -	1,00	$ 4.410.001,00	1,00	$ 4.410.001,00	-	$ -
1.14		DESINFECCIÓN DEL POZO (DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO)	UND	1,00	$ 452.051,00	$ 452.051,00		$ -	1,00	$ 452.051,00	1,00	$ 452.051,00	-	$ -
1.15		ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DEL AGUA	UND	1,00	$ 417.994,00	$ 417.994,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 417.994,00
					TOTAL POZO PROFUNDO PARAISO	$ 198.906.511,00		$ 189.198.014,00		$ 9.292.503,00		$ 198.488.517,00		$ 417.994,00
4	REDES DE ACUEDUCTO												-	
4.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	2.606,01	$ 4.347,00	$ 11.328.325,00	2.606,01	$ 11.328.325,00		$ -	2.606,01	$ 11.328.325,00	-	$ -
4.2		RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN	M3	651,50	$ 44.733,00	$ 29.143.550,00	425,00	$ 19.011.525,00	163,75	$ 7.325.029,00	588,75	$ 26.336.554,00	62,75	$ 2.806.996,00
4.3		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE	M3	139,50	$ 98.867,00	$ 13.791.947,00		$ -	93,00	$ 9.194.631,00	93,00	$ 9.194.631,00	46,50	$ 4.597.316,00
4.4		CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	586,35	$ 193.559,00	$ 113.493.320,00	294,05	$ 56.916.024,00	113,57	$ 21.982.496,00	407,62	$ 78.898.520,00	178,73	$ 34.594.800,00
4.5		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL	M3	735,30	$ 45.262,00	$ 33.281.149,00	595,00	$ 26.930.890,00	140,30	$ 6.350.259,00	735,30	$ 33.281.149,00	-	$ -
4.6		RELLENO CON MATERIAL DE ARRECIFE TAMAÑO MAX. 3"	M3	195,45	$ 80.065,00	$ 15.646.704,00	127,50	$ 10.208.288,00	49,13	$ 3.933.593,00	176,63	$ 14.141.881,00	18,82	$ 1.506.822,00
4.7		TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	240.160,64	$ 2.309,00	$ 554.530.918,00	125.691,57	$ 290.221.835,00	52.047,65	$ 120.178.024,00	177.739,22	$ 410.399.859,00	62.421,42	$ 144.131.059,00
4.8		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN	ML	2.296,01	$ 23.569,00	$ 54.114.660,00	1.700,00	$ 40.067.300,00	500,00	$ 11.784.500,00	2.200,00	$ 51.851.800,00	96,01	$ 2.262.860,00
4.15		EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE	M3	1.377,61	$ 53.911,00	$ 74.268.333,00	1.020,00	$ 54.989.220,00	300,00	$ 16.173.300,00	1.320,00	$ 71.162.520,00	57,61	$ 3.105.813,00

				CONDICIONES INICIALES			ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PERIODO (01-05-2026 AL 31-05-2026)		AVANCE ACUMULADO		CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	
Nº ITEM	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
4.16		ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL MANGUERA 10M, ACCESORIOS Y REGISTRO)	UND	31,00	$ 273.342,00	$ 8.473.602,00		$ -	31,00	$ 8.473.602,00	31,00	$ 8.473.602,00	-	$ -
					TOTAL REDES DE ACUEDUCTO PARAISO	$ 912.843.267,00		$ 609.673.407,00		$ 205.395.434,00		$ 715.068.841,00		$ 197.774.425,00
5	TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN													
5.3		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0-2,00 M,INCLUYE CARGUE	M3	7,44	$ 98.867,00	$ 735.570,00		$ -	5,00	$ 494.335,00	5,00	$ 494.335,00	2,44	$ 241.235,00
5.4		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN MANUAL	M3	4,90	$ 45.262,00	$ 221.784,00		$ -	3,50	$ 158.417,00	3,50	$ 158.417,00	1,40	$ 63.367,00
5.5		ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,03	$ 1.634.474,00	$ 3.317.982,00		$ -	2,03	$ 3.317.982,00	2,03	$ 3.317.982,00	-	$ -
5.6		COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA OBRA SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,77	$ 2.304.372,00	$ 1.774.368,00		$ -	0,50	$ 1.152.186,00	0,50	$ 1.152.186,00	0,27	$ 622.180,00
5.7		ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO ARMADO, COLOCACION Y AMARRE.	M3	461,56	$ 13.557,00	$ 6.257.369,00		$ -	200,00	$ 2.711.400,00	200,00	$ 2.711.400,00	261,56	$ 3.545.969,00
5.8		SOLADO,LIMPIEZA CONCRETO 13,8 Mpa (2000 PSI)	M3	0,68	$ 1.129.386,00	$ 767.982,00		$ -	0,68	$ 767.982,00	0,68	$ 767.982,00	-	$ -
					TOTAL TANQUE ELEVADO PARAISO	$ 190.884.213,00		$ -		$ 8.602.302,00		$ 8.602.302,00		$ 182.281.911,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL													
6.1		LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	48,20	$ 5.357,00	$ 258.207,00	48,20	$ 258.207,00		$ -	48,20	$ 258.207,00	-	$ -
					TOTAL CERRAMIENTO PARAISO	$ 57.569.364,00		$ 258.207,00		$ -		$ 258.207,00		$ 57.310.157,00
					TOTAL COMUNIDAD PARAISO	$ 1.583.569.293,00		$ 699.127.628,00		$ 223.290.239,00		$ 922.417.867,00		$ 661.151.425,00
COMUNIDAD BUENAVISTA (6000 - 0,6L) (F.Z. 1,32)														
1	POZO PROFUNDO													
1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	$ 140.065,00	$ 140.065,00	1,00	$ 140.065,00		$ -	1,00	$ 140.065,00	-	$ -
1.2		INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS	UND	1,00	$ 2.921.411,00	$ 2.921.411,00	1,00	$ 2.921.411,00		$ -	1,00	$ 2.921.411,00	-	$ -
1.3		PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO	ML	102,00	$ 353.506,00	$ 36.057.612,00	102,00	$ 36.057.612,00		$ -	102,00	$ 36.057.612,00	-	$ -
1.4		ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO	ML	102,00	$ 135.532,00	$ 13.824.264,00	102,00	$ 13.824.264,00		$ -	102,00	$ 13.824.264,00	-	$ -
1.5		EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA)	UND	1,00	$ 4.028.829,00	$ 4.028.829,00	1,00	$ 4.028.829,00		$ -	1,00	$ 4.028.829,00	-	$ -
1.6		AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"	ML	102,00	$ 510.108,00	$ 52.031.016,00	102,00	$ 52.031.016,00		$ -	102,00	$ 52.031.016,00	-	$ -
1.7		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN PARA PROFUNDIDADES DE 0 A 200 M	ML	74,00	$ 323.768,00	$ 23.958.832,00	74,00	$ 23.958.832,00		$ -	74,00	$ 23.958.832,00	-	$ -
1.8		AFORO DEL POZO (PRUEBA DE BOMBEO)	UND	1,00	$ 3.809.819,00	$ 3.809.819,00	1,00	$ 3.809.819,00		$ -	1,00	$ 3.809.819,00	-	$ -
1.9		CONSTRUCCIÓN DE CABEZA DE POZO Y SELLO SANITARIO E INSTALACIÓN DE GRAVILLADORES	UND	1,00	$ 1.676.854,00	$ 1.676.854,00	1,00	$ 1.676.854,00		$ -	1,00	$ 1.676.854,00	-	$ -
1.10		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESION	ML	28,00	$ 241.561,00	$ 6.763.708,00	27,00	$ 6.522.147,00		$ -	27,00	$ 6.522.147,00	1,00	$ 241.561,00
1.11		SUMINISTRO DE GRAVILLA TAMIZADA, SELECCIONADA Y SIN CALCÁREOS	M3	5,94	$ 569.478,00	$ 3.382.699,00	4,94	$ 2.813.221,00	1,00	$ 569.478,00	5,94	$ 3.382.699,00	-	$ -
1.12		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ESTABILIZADOR Y DE RELLENO	BTO	20,40	$ 43.005,00	$ 877.302,00	20,40	$ 877.302,00		$ -	20,40	$ 877.302,00	-	$ -
1.13		LAVADO Y DESARROLLO DEL POZO POR MÉTODOS COMBINADOS (JETTING AIRE COMPRIMIDO)	UND	1,00	$ 4.346.454,00	$ 4.346.454,00	1,00	$ 4.346.454,00		$ -	1,00	$ 4.346.454,00	-	$ -
1.14		DESINFECCIÓN DEL POZO (DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO)	UND	1,00	$ 447.349,00	$ 447.349,00	1,00	$ 447.349,00		$ -	1,00	$ 447.349,00	-	$ -
1.15		ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DEL AGUA	UND	1,00	$ 411.755,00	$ 411.755,00		$ -	1,00	$ 411.755,00	1,00	$ 411.755,00	-	$ -
					TOTAL POZO PROFUNDO BUENAVISTA	$ 154.677.969,00		$ 153.455.175,00		$ 981.233,00		$ 154.436.408,00		$ 241.561,00
4	REDES DE ACUEDUCTO													
4.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	826,58	$ 4.347,00	$ 3.593.143,00	826,58	$ 3.593.143,00		$ -	826,58	$ 3.593.143,00	-	$ -
					TOTAL REDES DE ACUEDUCTO BUENAVISTA	$ 293.023.877,00		$ 3.593.143,00		$ -		$ 3.593.143,00		$ 289.430.734,00
5	TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN													
5.3		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0-2,00 M,INCLUYE CARGUE	M3	7,44	$ 98.810,00	$ 735.146,00		$ -	5,00	$ 494.050,00	5,00	$ 494.050,00	2,44	$ 241.096,00
5.4		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN MANUAL	M3	4,90	$ 45.052,00	$ 220.755,00		$ -	3,50	$ 157.682,00	3,50	$ 157.682,00	1,40	$ 63.073,00
5.5		ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,03	$ 1.613.140,00	$ 3.274.674,00		$ -	2,03	$ 3.274.674,00	2,03	$ 3.274.674,00	-	$ -
5.6		COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA OBRA SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,77	$ 2.277.993,00	$ 1.754.055,00		$ -	0,50	$ 1.138.997,00	0,50	$ 1.138.997,00	0,27	$ 615.058,00
5.7		ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO ARMADO, COLOCACION Y AMARRE.	M3	461,56	$ 13.395,00	$ 6.182.596,00		$ -	200,00	$ 2.679.000,00	200,00	$ 2.679.000,00	261,56	$ 3.503.596,00
5.8		SOLADO,LIMPIEZA CONCRETO 13,8 Mpa (2000 PSI)	M3	0,68	$ 1.114.580,00	$ 757.914,00		$ -	0,68	$ 757.914,00	0,68	$ 757.914,00	-	$ -
					TOTAL TANQUE ELEVADO BUENAVISTA	$ 170.343.812,00		$ -		$ 8.502.317,00		$ 8.502.317,00		$ 161.841.495,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL							$ -						
6.1		LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	48,20	$ 5.328,00	$ 256.810,00	48,20	$ 256.810,00		$ -	48,20	$ 256.810,00	-	$ -
					TOTAL CERRAMIENTO BUENAVISTA	$ 56.906.420,00		$ 256.810,00		$ -		$ 256.810,00		$ 56.649.610,00
					TOTAL COMUNIDAD BUENAVISTA	$ 674.933.725,00		$ 157.305.128,00		$ 9.483.550,00		$ 166.788.678,00		$ 708.145.047,00
COMUNIDAD VILLAMARCIA (6000 - 1L) (F.Z. 1,34)														
1	POZO PROFUNDO													
1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	$ 140.909,00	$ 140.909,00	1,00	$ 140.909,00		$ -	1,00	$ 140.909,00	-	$ -
1.2		INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS	UND	1,00	$ 2.959.841,00	$ 2.959.841,00	1,00	$ 2.959.841,00		$ -	1,00	$ 2.959.841,00	-	$ -
1.3		PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO	ML	141,00	$ 357.987,00	$ 50.476.167,00	141,00	$ 50.476.167,00		$ -	141,00	$ 50.476.167,00	-	$ -
1.4		ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO	ML	141,00	$ 136.935,00	$ 19.307.835,00	141,00	$ 19.307.835,00		$ -	141,00	$ 19.307.835,00	-	$ -
1.5		EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA)	UND	1,00	$ 4.064.604,00	$ 4.064.604,00	1,00	$ 4.064.604,00		$ -	1,00	$ 4.064.604,00	-	$ -
1.6		AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"	ML	141,00	$ 517.371,00	$ 72.949.311,00	141,00	$ 72.949.311,00		$ -	141,00	$ 72.949.311,00	-	$ -
1.7		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN PARA PROFUNDIDADES DE 0 A 200 M	ML	99,00	$ 327.083,00	$ 32.381.217,00	94,20	$ 30.811.219,00		$ -	94,20	$ 30.811.219,00	4,80	$ 1.569.998,00
1.8		AFORO DEL POZO (PRUEBA DE BOMBEO)	UND	1,00	$ 3.853.671,00	$ 3.853.671,00	-	$ -	1,00	$ 3.853.671,00	1,00	$ 3.853.671,00	-	$ -
1.9		CONSTRUCCIÓN DE CABEZA DE POZO Y SELLO SANITARIO E INSTALACIÓN DE GRAVILLADORES	UND	1,00	$ 1.685.429,00	$ 1.685.429,00	1,00	$ 1.685.429,00		$ -	1,00	$ 1.685.429,00	-	$ -
1.10		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESION	ML	42,00	$ 243.661,00	$ 10.233.762,00	42,00	$ 10.233.762,00		$ -	42,00	$ 10.233.762,00	-	$ -
1.11		SUMINISTRO DE GRAVILLA TAMIZADA, SELECCIONADA Y SIN CALCÁREOS	M3	8,28	$ 576.760,00	$ 4.775.738,00	6,00	$ 3.460.680,00	2,28	$ 1.315.058,00	8,28	$ 4.775.738,00	-	$ -
1.12		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ESTABILIZADOR Y DE RELLENO	BTO	28,20	$ 43.532,00	$ 1.227.602,00	28,20	$ 1.227.602,00		$ -	28,20	$ 1.227.602,00	-	$ -
1.13		LAVADO Y DESARROLLO DEL POZO POR MÉTODOS COMBINADOS (JETTING AIRE COMPRIMIDO)	UND	1,00	$ 4.410.001,00	$ 4.410.001,00	1,00	$ 4.410.001,00		$ -	1,00	$ 4.410.001,00	-	$ -
1.14		DESINFECCIÓN DEL POZO (DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO)	UND	1,00	$ 452.051,00	$ 452.051,00	1,00	$ 452.051,00		$ -	1,00	$ 452.051,00	-	$ -

CONDICIONES INICIALES							ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PERIODO (01-05-2026 AL 31-05-2026)		AVANCE ACUMULADO		CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	
Nº ITEM	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.15		ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DEL AGUA	UND	1,00	$ 417.994,00	$ 417.994,00	-	$ -	1,00	$ 417.994,00	1,00	$ 417.994,00	-	$ -
					TOTAL POZO PROFUNDO VILLAMARCIA	$ 209.336.132,00		$ 202.179.411,00		$ 5.586.723,00		$ 207.766.134,00		$ 1.569.998,00
4	REDES DE ACUEDUCTO						-				-		-	
4.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	2.225,57	$ 4.347,00	$ 9.674.553,00	2.225,57	$ 9.674.553,00		$ -	2.225,57	$ 9.674.553,00	-	$ -
4.2		RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN	M3	556,39	$ 44.733,00	$ 24.888.994,00	519,62	$ 23.244.161,00		$ -	519,62	$ 23.244.161,00	36,77	$ 1.644.832,00
4.3		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE	M3	121,50	$ 98.867,00	$ 12.012.341,00	91,50	$ 9.046.331,00		$ -	91,50	$ 9.046.331,00	30,00	$ 2.966.010,00
4.4		CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	500,75	$ 193.559,00	$ 96.924.669,00	359,00	$ 69.487.681,00		$ -	359,00	$ 69.487.681,00	141,75	$ 27.436.988,00
4.5		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL	M3	627,17	$ 45.262,00	$ 28.386.969,00	627,17	$ 28.386.969,00		$ -	627,17	$ 28.386.969,00	-	$ -
4.6		RELLENO CON MATERIAL DE ARRECIFE TAMAÑO MAX. 3"	M3	166,92	$ 80.065,00	$ 13.364.450,00	155,00	$ 12.410.075,00		$ -	155,00	$ 12.410.075,00	11,92	$ 954.375,00
4.7		TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	205.431,92	$ 2.309,00	$ 474.342.303,00	151.809,62	$ 350.528.413,00		$ -	151.809,62	$ 350.528.413,00	53.622,30	$ 123.813.891,00
4.8		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN	ML	1.955,57	$ 23.569,00	$ 46.090.829,00	1.926,00	$ 45.393.894,00		$ -	1.926,00	$ 45.393.894,00	29,57	$ 696.935,00
4.15		EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE	M3	1.173,34	$ 53.911,00	$ 63.255.933,00	1.155,60	$ 62.299.552,00		$ -	1.155,60	$ 62.299.552,00	17,74	$ 956.381,00
4.16		ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M, ACCESORIOS Y REGISTRO)	UND	27,00	$ 273.342,00	$ 7.380.234,00	24,00	$ 6.560.208,00		$ -	24,00	$ 6.560.208,00	3,00	$ 820.026,00
					TOTAL REDES DE ACUEDUCTO VILLAMARCIA	$ 781.383.859,00		$ 617.031.837,00		$ -		$ 617.031.837,00		$ 164.352.022,00
6	TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN													
5.3		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0-2,00 M,INCLUYE CARGUE	M3	7,44	$ 98.867,00	$ 735.570,00	7,44	$ 735.570,00		$ -	7,44	$ 735.570,00	-	$ -
5.4		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN MANUAL.	M3	4,90	$ 45.262,00	$ 221.784,00	4,28	$ 193.721,00		$ -	4,28	$ 193.721,00	0,62	$ 28.062,00
5.5		ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,03	$ 1.634.474,00	$ 3.317.982,00	2,03	$ 3.317.982,00		$ -	2,03	$ 3.317.982,00	-	$ -
5.6		COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,77	$ 2.304.372,00	$ 1.774.366,00	0,77	$ 1.774.366,00		$ -	0,77	$ 1.774.366,00	-	$ -
5.7		ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO ARMADO, COLOCACION Y AMARRE.	M3	461,56	$ 13.557,00	$ 6.257.369,00	269,29	$ 3.650.765,00		$ -	269,29	$ 3.650.765,00	192,27	$ 2.606.604,00
5.8		SOLADO LIMPIEZA CONCRETO 13,8 Mpa (2000 PSI)	M3	0,68	$ 1.129.388,00	$ 767.982,00	0,68	$ 767.982,00		$ -	0,68	$ 767.982,00	-	$ -
					TOTAL TANQUE ELEVADO VILLAMARCIA	$ 190.884.213,00		$ 10.440.386,00		$ -		$ 10.440.386,00		$ 180.443.826,00
8	CERRAMIENTO PERIMETRAL						-				-		-	
6.1		LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	48,20	$ 5.357,00	$ 258.207,00	48,20	$ 258.207,00		$ -	48,20	$ 258.207,00	-	$ -
					TOTAL CERRAMIENTO VILLAMARCIA	$ 57.568.364,00		$ 258.207,00		$ -		$ 258.207,00		$ 57.310.157,00
					TOTAL COMUNIDAD VILLAMARCIA	$ 1.462.639.508,00		$ 829.909.841,00		$ 5.586.723,00		$ 835.496.564,00		$ 627.042.941,00
COMUNIDAD LAS BRISAS (6000 - 0,5L) (F.Z. 1,34)														
1	POZO PROFUNDO												-	
1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	$ 140.909,00	$ 140.909,00	1,00	$ 140.909,00		$ -	1,00	$ 140.909,00	-	$ -
1.2		INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS	UND	1,00	$ 2.959.841,00	$ 2.959.841,00	-	$ -	1,00	$ 2.959.841,00	1,00	$ 2.959.841,00	-	$ -
1.3		PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO	ML	139,00	$ 357.987,00	$ 49.760.193,00	-	$ -	139,00	$ 49.760.193,00	139,00	$ 49.760.193,00	-	$ -
1.4		ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO	ML	139,00	$ 136.935,00	$ 19.033.965,00	-	$ -	139,00	$ 19.033.965,00	139,00	$ 19.033.965,00	-	$ -
1.5		EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA)	UND	1,00	$ 4.064.604,00	$ 4.064.604,00	-	$ -	1,00	$ 4.064.604,00	1,00	$ 4.064.604,00	-	$ -
1.6		AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"	ML	139,00	$ 517.371,00	$ 71.914.569,00	-	$ -	139,00	$ 71.914.569,00	139,00	$ 71.914.569,00	-	$ -
1.7		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN PARA PROFUNDIDADES DE 0 A 200 M	ML	91,00	$ 327.083,00	$ 29.764.553,00	-	$ -	82,00	$ 26.820.806,00	82,00	$ 26.820.806,00	9,00	$ 2.943.747,00
1.8		AFORO DEL POZO (PRUEBA DE BOMBEO)	UND	1,00	$ 3.853.671,00	$ 3.853.671,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 3.853.671,00
1.9		CONSTRUCCIÓN DE CABEZA DE POZO Y SELLO SANITARIO E INSTALACIÓN DE GRAVILLADORES	UND	1,00	$ 1.685.429,00	$ 1.685.429,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 1.685.429,00
1.10		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESION	ML	48,00	$ 243.661,00	$ 11.695.728,00	-	$ -	45,00	$ 10.964.745,00	45,00	$ 10.964.745,00	3,00	$ 730.983,00
1.11		SUMINISTRO DE GRAVILLA TAMIZADA, SELECCIONADA Y SIN CALCÁREOS.	M3	8,16	$ 576.780,00	$ 4.706.525,00	-	$ -	8,16	$ 4.706.525,00	8,16	$ 4.706.525,00	-	$ -
1.12		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ESTABILIZADOR Y DE RELLENO	BTO	27,80	$ 43.532,00	$ 1.210.190,00	-	$ -	27,80	$ 1.210.190,00	27,80	$ 1.210.190,00	-	$ -
1.13		LAVADO Y DESARROLLO DEL POZO POR MÉTODOS COMBINADOS (JETTING AIRE COMPRIMIDO)	UND	1,00	$ 4.410.001,00	$ 4.410.001,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 4.410.001,00
1.14		DESINFECCIÓN DEL POZO (DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO)	UND	1,00	$ 452.051,00	$ 452.051,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 452.051,00
1.15		ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DEL AGUA	UND	1,00	$ 417.994,00	$ 417.994,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 417.994,00
					TOTAL POZO PROFUNDO BRISAS	$ 206.070.223,00		$ 140.909,00		$ 191.435.438,00		$ 191.576.347,00		$ 14.493.876,00
4	REDES DE ACUEDUCTO						-				-		-	
4.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	715,07	$ 4.347,00	$ 3.108.409,00	692,00	$ 3.008.124,00		$ -	692,00	$ 3.008.124,00	23,07	$ 100.285,00
4.2		RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN	M3	178,77	$ 44.733,00	$ 7.996.918,00	163,75	$ 7.325.029,00		$ -	163,75	$ 7.325.029,00	15,02	$ 671.890,00
4.3		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE	M3	54,00	$ 98.867,00	$ 5.338.818,00	22,20	$ 2.194.847,00		$ -	22,20	$ 2.194.847,00	31,80	$ 3.143.971,00
4.4		CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	160,89	$ 193.559,00	$ 31.141.708,00	113,36	$ 21.941.848,00		$ -	113,36	$ 21.941.848,00	47,53	$ 9.199.859,00
4.5		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL	M3	196,52	$ 45.262,00	$ 8.894.888,00	196,52	$ 8.894.888,00		$ -	196,52	$ 8.894.888,00	-	$ -
4.6		RELLENO CON MATERIAL DE ARRECIFE TAMAÑO MAX. 3"	M3	53,63	$ 80.065,00	$ 4.293.886,00	49,12	$ 3.932.793,00		$ -	49,12	$ 3.932.793,00	4,51	$ 361.093,00
4.7		TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	71.323,23	$ 2.309,00	$ 164.685.338,00	51.042,54	$ 117.857.225,00		$ -	51.042,54	$ 117.857.225,00	20.280,69	$ 46.828.113,00
4.8		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN	ML	595,07	$ 23.569,00	$ 14.025.205,00	595,07	$ 14.025.205,00		$ -	595,07	$ 14.025.205,00	-	$ -
4.9		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA EN H.D. 2" (INCLUYE CAJA VALV. Y ANCLAJE EN CONCRETO)	UN	1,00	$ 1.183.911,00	$ 1.183.911,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 1.183.911,00
4.10		CODO GRAN RADIO 90° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2")	UN	5,00	$ 131.983,00	$ 659.915,00	4,00	$ 527.932,00		$ -	4,00	$ 527.932,00	1,00	$ 131.983,00
4.11		CODO GRAN RADIO 45° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2")	UN	0,00	$ 126.675,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
4.12		TEE PVC – PRESION TRABAJO 200 PSI- EXTREMOS UNION MECANICA X LISO (2X2X2)	UN	1,00	$ 144.481,00	$ 144.481,00	1,00	$ 144.481,00		$ -	1,00	$ 144.481,00	-	$ -
4.13		SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø2" UM UN	UN	2,00	$ 96.976,00	$ 193.952,00	2,00	$ 193.952,00		$ -	2,00	$ 193.952,00	-	$ -
4.14		TAPON EN PVC- PRESION TRABAJO 200 PSI (2")	UN	0,00	$ 4.191,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
4.15		EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE	M3	357,04	$ 53.911,00	$ 19.248.383,00	357,04	$ 19.248.383,00		$ -	357,04	$ 19.248.383,00	-	$ -
4.16		ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M, ACCESORIOS Y REGISTRO)	UND	12,00	$ 273.342,00	$ 3.280.104,00	7,00	$ 1.913.394,00		$ -	7,00	$ 1.913.394,00	5,00	$ 1.366.710,00
					TOTAL REDES DE ACUEDUCTO BRISAS	$ 264.195.916,00		$ 201.208.101,00		$ -		$ 201.208.101,00		$ 62.987.815,00
6	TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN						-				-		-	

CONDICIONES INICIALES							ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PERIODO (01-05-2026 AL 31-05-2026)		AVANCE ACUMULADO		CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	
Nº ITEM	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
5.1		PLATAFORMA EN LÁMINA ALFAJOR ESPESOR 1/4" MM (INCLUYE TRANSPORTE, MONTAJE, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE)	M2	10,56	$ 678.400,00	$ 7.163.904,00	-	$ -		$ -	-	$ -	10,56	$ 7.163.904,00
5.2		TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 6000 LITROS, ELEVADO A 13,5 METROS DE ALTURA, TIPO PLASTICO	UND	1,00	$ 15.959.556,00	$ 15.959.556,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 15.959.556,00
5.3		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0-2,00 M,INCLUYE CARGUE	M3	7,44	$ 98.867,00	$ 735.570,00	7,44	$ 735.570,00		$ -	7,44	$ 735.570,00	-	$ -
5.4		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN MANUAL	M3	4,90	$ 45.262,00	$ 221.784,00	4,28	$ 193.721,00		$ -	4,28	$ 193.721,00	0,62	$ 28.062,00
5.5		ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,03	$ 1.634.474,00	$ 3.317.982,00	2,03	$ 3.317.982,00		$ -	2,03	$ 3.317.982,00	-	$ -
5.6		COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA OBRA SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,77	$ 2.304.372,00	$ 1.774.366,00	0,77	$ 1.774.366,00		$ -	0,77	$ 1.774.366,00	-	$ -
5.7		ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO ARMADO, COLOCACION Y AMARRE.	M3	461,56	$ 13.557,00	$ 6.257.369,00	269,29	$ 3.650.765,00		$ -	269,29	$ 3.650.765,00	192,27	$ 2.606.604,00
5.8		SOLADO,LIMPIEZA CONCRETO 13,8 Mpa (2000 PSI)	M3	0,68	$ 1.129.386,00	$ 767.982,00	0,68	$ 767.982,00		$ -	0,68	$ 767.982,00	-	$ -
					TOTAL TANQUE ELEVADO BRISAS	$ 172.326.446,00		$ 10.440.386,00		$ -		$ 10.440.386,00		$ 161.886.059,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL						-				-		-	
6.1		LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	48,20	$ 5.357,00	$ 258.207,00	48,20	$ 258.207,00		$ -	48,20	$ 258.207,00	-	$ -
					TOTAL CERRAMIENTO BRISAS	$ 67.568.364,00		$ 258.207,00		$ -		$ 258.207,00		$ 67.310.157,00
					TOTAL COMUNIDAD BRISAS	$ 902.860.144,00		$ 212.047.603,00		$ 191.435.438,00		$ 403.483.041,00		$ 499.377.102,00
COMUNIDAD CUMARALITO (8000 - 1L) (F.Z. 1,34)														
1	POZO PROFUNDO												-	
1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	$ 140.909,00	$ 140.909,00	1,00	$ 140.909,00		$ -	1,00	$ 140.909,00	-	$ -
1.2		INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS	UND	1,00	$ 2.959.841,00	$ 2.959.841,00	-	$ -	1,00	$ 2.959.841,00	1,00	$ 2.959.841,00	-	$ -
1.3		PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO	ML	144,00	$ 357.987,00	$ 51.550.128,00	-	$ -	144,00	$ 51.550.128,00	144,00	$ 51.550.128,00	-	$ -
1.4		ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO	ML	144,00	$ 136.935,00	$ 19.718.640,00	-	$ -	144,00	$ 19.718.640,00	144,00	$ 19.718.640,00	-	$ -
1.5		EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA)	UND	1,00	$ 4.064.604,00	$ 4.064.604,00	-	$ -	1,00	$ 4.064.604,00	1,00	$ 4.064.604,00	-	$ -
1.6		AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"	ML	144,00	$ 517.371,00	$ 74.501.424,00	-	$ -	144,00	$ 74.501.424,00	144,00	$ 74.501.424,00	-	$ -
1.7		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN PARA PROFUNDIDADES DE 0 A 200 M	ML	102,00	$ 327.083,00	$ 33.362.466,00	-	$ -	95,40	$ 31.203.718,00	95,40	$ 31.203.718,00	6,60	$ 2.158.748,00
1.8		AFORO DEL POZO (PRUEBA DE BOMBEO)	UND	1,00	$ 3.853.671,00	$ 3.853.671,00	-	$ -	1,00	$ 3.853.671,00	1,00	$ 3.853.671,00	-	$ -
1.9		CONSTRUCCIÓN DE CABEZA DE POZO Y SELLO SANITARIO E INSTALACIÓN DE GRAVILLADORES	UND	1,00	$ 1.685.429,00	$ 1.685.429,00	-	$ -	1,00	$ 1.685.429,00	1,00	$ 1.685.429,00	-	$ -
1.10		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESION	ML	42,00	$ 243.661,00	$ 10.233.762,00	-	$ -	42,00	$ 10.233.762,00	42,00	$ 10.233.762,00	-	$ -
1.11		SUMINISTRO DE GRAVILLA TAMIZADA, SELECCIONADA Y SIN CALCÁREOS.	M3	8,46	$ 576.780,00	$ 4.879.559,00	-	$ -	8,46	$ 4.879.559,00	8,46	$ 4.879.559,00	-	$ -
1.12		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ESTABILIZADOR Y DE RELLENO	BTO	28,80	$ 43.532,00	$ 1.253.722,00	-	$ -	28,80	$ 1.253.722,00	28,80	$ 1.253.722,00	-	$ -
1.13		LAVADO Y DESARROLLO DEL POZO POR MÉTODOS COMBINADOS (JETTING AIRE COMPRIMIDO)	UND	1,00	$ 4.410.001,00	$ 4.410.001,00	-	$ -	1,00	$ 4.410.001,00	1,00	$ 4.410.001,00	-	$ -
1.14		DESINFECCIÓN DEL POZO (DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO)	UND	1,00	$ 452.051,00	$ 452.051,00	-	$ -	1,00	$ 452.051,00	1,00	$ 452.051,00	-	$ -
1.15		ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DEL AGUA	UND	1,00	$ 417.994,00	$ 417.994,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 417.994,00
					TOTAL POZO PROFUNDO CUMARALITO	$ 213.484.201,00		$ 140.909,00		$ 210.766.650,00		$ 210.907.459,00		$ 2.576.742,00
4	REDES DE ACUEDUCTO						-				-		-	
4.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	2.172,98	$ 4.347,00	$ 9.445.944,00	1.690,00	$ 7.346.430,00		$ -	1.690,00	$ 7.346.430,00	482,98	$ 2.099.514,00
4.2		RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN	M3	543,25	$ 44.733,00	$ 24.301.202,00	394,00	$ 17.624.802,00		$ -	394,00	$ 17.624.802,00	149,25	$ 6.676.400,00
4.3		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE	M3	126,00	$ 98.867,00	$ 12.457.242,00	67,80	$ 6.703.183,00		$ -	67,80	$ 6.703.183,00	58,20	$ 5.754.059,00
4.4		CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACIÓN DE TUBERIAS	M3	486,92	$ 193.559,00	$ 94.234.868,00	272,00	$ 52.648.048,00		$ -	272,00	$ 52.648.048,00	216,92	$ 41.986.818,00
4.5		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL	M3	609,89	$ 45.262,00	$ 27.604.641,00	551,00	$ 24.939.362,00		$ -	551,00	$ 24.939.362,00	58,89	$ 2.665.479,00
4.6		RELLENO CON MATERIAL DE ARRECIFE TAMAÑO MAX. 3"	M3	162,97	$ 80.065,00	$ 13.048.193,00	118,00	$ 9.447.670,00		$ -	118,00	$ 9.447.670,00	44,97	$ 3.600.523,00
4.7		TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	202.499,17	$ 2.309,00	$ 467.570.584,00	117.178,00	$ 270.564.002,00		$ -	117.178,00	$ 270.564.002,00	85.321,17	$ 197.006.582,00
4.8		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN	ML	1.892,98	$ 23.569,00	$ 44.615.646,00	1.464,00	$ 34.505.016,00		$ -	1.464,00	$ 34.505.016,00	428,98	$ 10.110.630,00
4.15		EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE	M3	1.135,79	$ 53.911,00	$ 61.231.575,00	878,00	$ 47.333.858,00		$ -	878,00	$ 47.333.858,00	257,79	$ 13.897.717,00
4.16		ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M, ACCESORIOS Y REGISTRO)	UND	28,00	$ 273.342,00	$ 7.653.576,00	14,00	$ 3.826.788,00		$ -	14,00	$ 3.826.788,00	14,00	$ 3.826.788,00
					TOTAL REDES DE ACUEDUCTO CUMARALITO	$ 768.047.280,00		$ 474.939.159,00		$ -		$ 474.939.159,00		$ 293.108.041,00
5	TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN						-				-		-	
5.3		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0-2,00 M,INCLUYE CARGUE	M3	7,44	$ 98.867,00	$ 735.570,00	-	$ -	7,44	$ 735.570,00	7,44	$ 735.570,00	-	$ -
5.4		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN MANUAL	M3	4,90	$ 45.262,00	$ 221.784,00	-	$ -	4,00	$ 181.048,00	4,00	$ 181.048,00	0,90	$ 40.736,00
5.5		ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,03	$ 1.634.474,00	$ 3.317.982,00	-	$ -	2,03	$ 3.317.982,00	2,03	$ 3.317.982,00	-	$ -
5.6		COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA OBRA SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,77	$ 2.304.372,00	$ 1.774.366,00	-	$ -	0,77	$ 1.774.366,00	0,77	$ 1.774.366,00	-	$ -
5.7		ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO ARMADO, COLOCACION Y AMARRE.	M3	461,56	$ 13.557,00	$ 6.257.369,00	-	$ -	200,00	$ 2.711.400,00	200,00	$ 2.711.400,00	261,56	$ 3.545.969,00
5.8		SOLADO,LIMPIEZA CONCRETO 13,8 Mpa (2000 PSI)	M3	0,68	$ 1.129.386,00	$ 767.982,00	-	$ -	0,68	$ 767.982,00	0,68	$ 767.982,00	-	$ -
					TOTAL TANQUE ELEVADO CUMARALITO	$ 190.884.213,00		$ -		$ 9.488.348,00		$ 9.488.348,00		$ 181.395.865,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL						-				-		-	
6.1		LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	48,20	$ 5.357,00	$ 258.207,00	48,20	$ 258.207,00		$ -	48,20	$ 258.207,00	-	$ -
					TOTAL CERRAMIENTO CUMARALITO	$ 67.568.364,00		$ 258.207,00		$ -		$ 258.207,00		$ 67.310.157,00
					TOTAL COMUNIDAD CUMARALITO	$ 1.453.350.916,00		$ 475.338.275,00		$ 220.254.898,00		$ 695.593.173,00		$ 757.757.743,00
COMUNIDAD YATORROBO (8000 - 0,5L) (F.Z. 1,34)														
1	POZO PROFUNDO												-	
1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	$ 140.909,00	$ 140.909,00	1,00	$ 140.909,00		$ -	1,00	$ 140.909,00	-	$ -
1.2		INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS	UND	1,00	$ 2.959.841,00	$ 2.959.841,00	1,00	$ 2.959.841,00		$ -	1,00	$ 2.959.841,00	-	$ -
1.3		PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO	ML	146,00	$ 357.987,00	$ 52.266.102,00	146,00	$ 52.266.102,00		$ -	146,00	$ 52.266.102,00	-	$ -
1.4		ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO	ML	146,00	$ 136.935,00	$ 19.992.510,00	146,00	$ 19.992.510,00		$ -	146,00	$ 19.992.510,00	-	$ -
1.5		EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA)	UND	1,00	$ 4.064.604,00	$ 4.064.604,00	1,00	$ 4.064.604,00		$ -	1,00	$ 4.064.604,00	-	$ -
1.6		AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"	ML	146,00	$ 517.371,00	$ 75.536.166,00	146,00	$ 75.536.166,00		$ -	146,00	$ 75.536.166,00	-	$ -

CONDICIONES INICIALES							ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PERIODO (01-05-2026 AL 31-05-2026)		AVANCE ACUMULADO		CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	
Nº ITEM	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.7		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN PARA PROFUNDIDADES DE 0 A 200 M	ML	104,00	$ 327.083,00	$ 34.016.632,00	104,00	$ 34.016.632,00		$ -	104,00	$ 34.016.632,00	-	$ -
1.8		AFORO DEL POZO (PRUEBA DE BOMBEO)	UND	1,00	$ 3.853.671,00	$ 3.853.671,00	1,00	$ 3.853.671,00		$ -	1,00	$ 3.853.671,00	-	$ -
1.9		CONSTRUCCIÓN DE CABEZA DE POZO Y SELLO SANITARIO E INSTALACIÓN DE GRAVILLADORES	UND	1,00	$ 1.685.429,00	$ 1.685.429,00	1,00	$ 1.685.429,00		$ -	1,00	$ 1.685.429,00	-	$ -
1.10		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESION	ML	42,00	$ 243.661,00	$ 10.233.762,00	40,30	$ 9.819.538,00		$ -	40,30	$ 9.819.538,00	1,70	$ 414.224,00
1.11		SUMINISTRO DE GRAVILLA TAMIZADA, SELECCIONADA Y SIN CALCÁREOS.	M3	8,58	$ 576.780,00	$ 4.948.772,00		$ -	8,00	$ 4.614.240,00	8,00	$ 4.614.240,00	0,58	$ 334.532,00
1.12		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ESTABILIZADOR Y DE RELLENO	BTO	29,20	$ 43.532,00	$ 1.271.134,00	29,20	$ 1.271.134,00		$ -	29,20	$ 1.271.134,00	-	$ -
1.13		LAVADO Y DESARROLLO DEL POZO POR MÉTODOS COMBINADOS (JETTING AIRE COMPRIMIDO)	UND	1,00	$ 4.410.001,00	$ 4.410.001,00	1,00	$ 4.410.001,00		$ -	1,00	$ 4.410.001,00	-	$ -
1.14		DESINFECCIÓN DEL POZO (DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO)	UND	1,00	$ 452.051,00	$ 452.051,00	1,00	$ 452.051,00		$ -	1,00	$ 452.051,00	-	$ -
1.15		ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DEL AGUA	UND	1,00	$ 417.994,00	$ 417.994,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 417.994,00
					TOTAL POZO PROFUNDO YATORROBO	$ 216.249.578,00		$ 210.468.588,00		$ 4.614.240,00		$ 215.082.828,00		$ 1.166.750,00
4	REDES DE ACUEDUCTO						-				-		-	
4.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	1.846,90	$ 4.347,00	$ 8.028.474,00	1.846,90	$ 8.028.474,00		$ -	1.846,90	$ 8.028.474,00	-	$ -
4.2		RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN	M3	461,73	$ 44.733,00	$ 20.654.568,00	-	$ -	461,73	$ 20.654.568,00	461,73	$ 20.654.568,00	-	$ -
4.3		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE	M3	72,00	$ 98.867,00	$ 7.118.424,00	-	$ -	48,00	$ 4.745.616,00	48,00	$ 4.745.616,00	24,00	$ 2.372.808,00
4.4		CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	415,55	$ 193.559,00	$ 80.433.442,00	-	$ -	325,34	$ 62.972.485,00	325,34	$ 62.972.485,00	90,21	$ 17.460.957,00
4.5		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL	M3	530,07	$ 45.262,00	$ 23.992.028,00	-	$ -	530,07	$ 23.992.028,00	530,07	$ 23.992.028,00	-	$ -
4.6		RELLENO CON MATERIAL DE ARRECIFE TAMAÑO MAX. 3"	M3	138,52	$ 80.065,00	$ 11.090.604,00	-	$ -	138,52	$ 11.090.604,00	138,52	$ 11.090.604,00	-	$ -
4.7		TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	174.841,43	$ 2.309,00	$ 403.708.862,00	-	$ -	141.007,43	$ 325.586.156,00	141.007,43	$ 325.586.156,00	33.834,00	$ 78.122.706,00
4.8		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN	ML	1.686,90	$ 23.569,00	$ 39.758.546,00	-	$ -	1.686,90	$ 39.758.546,00	1.686,90	$ 39.758.546,00	-	$ -
4.15		EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE	M3	1.012,14	$ 53.911,00	$ 54.565.480,00	-	$ -	1.012,14	$ 54.565.480,00	1.012,14	$ 54.565.480,00	-	$ -
4.16		ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M, ACCESORIOS Y REGISTRO)	UND	16,00	$ 273.342,00	$ 4.373.472,00	-	$ -	16,00	$ 4.373.472,00	16,00	$ 4.373.472,00	-	$ -
					TOTAL REDES DE ACUEDUCTO YATORROBO	$ 659.972.629,00		$ 8.028.474,00		$ 547.738.955,00		$ 555.767.429,00		$ 104.205.200,00
5	TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN						-				-		-	
5.3		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0-2,00 M,INCLUYE CARGUE	M3	7,44	$ 98.867,00	$ 735.570,00	-	$ -	7,44	$ 735.570,00	7,44	$ 735.570,00	-	$ -
5.4		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN MANUAL.	M3	4,90	$ 45.262,00	$ 221.784,00	-	$ -	4,28	$ 193.721,00	4,28	$ 193.721,00	0,62	$ 28.062,00
5.5		ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,03	$ 1.634.474,00	$ 3.317.982,00	-	$ -	2,03	$ 3.317.982,00	2,03	$ 3.317.982,00	-	$ -
5.6		COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,77	$ 2.304.372,00	$ 1.774.366,00	-	$ -	0,77	$ 1.774.366,00	0,77	$ 1.774.366,00	-	$ -
5.7		ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO ARMADO, COLOCACION Y AMARRE.	M3	461,56	$ 13.557,00	$ 6.257.369,00	-	$ -	269,29	$ 3.650.765,00	269,29	$ 3.650.765,00	192,27	$ 2.606.604,00
5.8		SOLADO,LIMPIEZA CONCRETO 13,8 Mpa (2000 PSI)	M3	0,68	$ 1.129.386,00	$ 767.982,00	-	$ -	0,68	$ 767.982,00	0,68	$ 767.982,00	-	$ -
					TOTAL TANQUE ELEVADO YATORROBO	$ 172.326.446,00		$ -		$ 10.440.386,00		$ 10.440.386,00		$ 181.886.059,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL						-				-		-	
6.1		LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA.	M2	48,20	$ 5.357,00	$ 258.207,00	48,20	$ 258.207,00		$ -	48,20	$ 258.207,00	-	$ -
					TOTAL CERRAMIENTO YATORROBO	$ 57.568.384,00		$ 258.207,00		$ -		$ 258.207,00		$ 57.310.157,00
					TOTAL COMUNIDAD YATORROBO	$ 1.308.816.212,00		$ 218.755.269,00		$ 562.793.581,00		$ 781.548.850,00		$ 527.267.361,00
COMUNIDAD CERRITO (6000 - 0,5L) (F.Z. 1,34)														
1	POZO PROFUNDO												-	
1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	$ 140.909,00	$ 140.909,00	1,00	$ 140.909,00		$ -	1,00	$ 140.909,00	-	$ -
1.2		INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS	UND	1,00	$ 2.959.841,00	$ 2.959.841,00	-	$ -	1,00	$ 2.959.841,00	1,00	$ 2.959.841,00	-	$ -
1.3		PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO	ML	143,00	$ 357.987,00	$ 51.192.141,00	-	$ -	143,00	$ 51.192.141,00	143,00	$ 51.192.141,00	-	$ -
1.4		ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO	ML	143,00	$ 136.935,00	$ 19.581.705,00	-	$ -	143,00	$ 19.581.705,00	143,00	$ 19.581.705,00	-	$ -
1.5		EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA)	UND	1,00	$ 4.064.604,00	$ 4.064.604,00	-	$ -	1,00	$ 4.064.604,00	1,00	$ 4.064.604,00	-	$ -
1.6		AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"	ML	143,00	$ 517.371,00	$ 73.984.053,00	-	$ -	143,00	$ 73.984.053,00	143,00	$ 73.984.053,00	-	$ -
1.7		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN PARA PROFUNDIDADES DE 0 A 200 M	ML	89,00	$ 327.083,00	$ 29.110.387,00	-	$ -	80,00	$ 26.166.640,00	80,00	$ 26.166.640,00	9,00	$ 2.943.747,00
1.8		AFORO DEL POZO (PRUEBA DE BOMBEO)	UND	1,00	$ 3.853.671,00	$ 3.853.671,00	-	$ -	1,00	$ 3.853.671,00	1,00	$ 3.853.671,00	-	$ -
1.9		CONSTRUCCIÓN DE CABEZA DE POZO Y SELLO SANITARIO E INSTALACIÓN DE GRAVILLADORES	UND	1,00	$ 1.685.429,00	$ 1.685.429,00	-	$ -	1,00	$ 1.685.429,00	1,00	$ 1.685.429,00	-	$ -
1.10		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESION	ML	54,00	$ 243.661,00	$ 13.157.694,00	-	$ -	50,00	$ 12.183.050,00	50,00	$ 12.183.050,00	4,00	$ 974.644,00
1.11		SUMINISTRO DE GRAVILLA TAMIZADA, SELECCIONADA Y SIN CALCÁREOS.	M3	8,40	$ 576.780,00	$ 4.844.952,00	-	$ -	8,00	$ 4.614.240,00	8,00	$ 4.614.240,00	0,40	$ 230.712,00
1.12		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ESTABILIZADOR Y DE RELLENO	BTO	28,60	$ 43.532,00	$ 1.245.015,00	-	$ -	28,60	$ 1.245.015,00	28,60	$ 1.245.015,00	-	$ -
1.13		LAVADO Y DESARROLLO DEL POZO POR MÉTODOS COMBINADOS (JETTING AIRE COMPRIMIDO)	UND	1,00	$ 4.410.001,00	$ 4.410.001,00	-	$ -	1,00	$ 4.410.001,00	1,00	$ 4.410.001,00	-	$ -
1.14		DESINFECCIÓN DEL POZO (DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO)	UND	1,00	$ 452.051,00	$ 452.051,00	-	$ -	1,00	$ 452.051,00	1,00	$ 452.051,00	-	$ -
1.15		ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DEL AGUA	UND	1,00	$ 417.994,00	$ 417.994,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 417.994,00
					TOTAL POZO PROFUNDO CERRITO	$ 211.100.447,00		$ 140.909,00		$ 206.392.441,00		$ 206.533.350,00		$ 4.567.097,00
4	REDES DE ACUEDUCTO						-				-		-	
4.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	522,06	$ 4.347,00	$ 2.269.395,00	522,06	$ 2.269.395,00		$ -	522,06	$ 2.269.395,00	-	$ -
4.2		RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN	M3	130,52	$ 44.733,00	$ 5.838.551,00	123,87	$ 5.541.077,00		$ -	123,87	$ 5.541.077,00	6,65	$ 297.474,00
4.3		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE	M3	67,50	$ 98.867,00	$ 6.673.523,00	30,90	$ 3.054.990,00		$ -	30,90	$ 3.054.990,00	36,60	$ 3.618.532,00
4.4		CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	117,46	$ 193.559,00	$ 22.735.440,00	85,81	$ 16.609.298,00		$ -	85,81	$ 16.609.298,00	31,65	$ 6.126.142,00
4.5		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL	M3	134,12	$ 45.262,00	$ 6.070.539,00	134,12	$ 6.070.539,00		$ -	134,12	$ 6.070.539,00	-	$ -
4.6		RELLENO CON MATERIAL DE ARRECIFE TAMAÑO MAX. 3"	M3	39,15	$ 80.065,00	$ 3.134.545,00	37,16	$ 2.975.215,00		$ -	37,16	$ 2.975.215,00	1,99	$ 159.329,00
4.7		TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	54.992,40	$ 2.309,00	$ 126.977.452,00	40.085,81	$ 92.558.135,00		$ -	40.085,81	$ 92.558.135,00	14.906,59	$ 34.419.316,00
4.8		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN	ML	372,06	$ 23.569,00	$ 8.769.082,00	372,06	$ 8.769.082,00		$ -	372,06	$ 8.769.082,00	-	$ -
4.9		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA EN H.D. 2" (INCLUYE CAJA VALV. Y ANCLAJE EN CONCRETO)	UN	2,00	$ 1.183.911,00	$ 2.367.822,00		$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 2.367.822,00
4.10		CODO GRAN RADIO 90° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2")	UN	2,00	$ 131.983,00	$ 263.966,00	2,00	$ 263.966,00		$ -	2,00	$ 263.966,00	-	$ -

CONDICIONES INICIALES							ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PERIODO (01-05-2026 AL 31-05-2026)		AVANCE ACUMULADO		CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	
Nº ITEM	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
4.11		CODO GRAN RADIO 45° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2")	UN	2,00	$ 126.675,00	$ 253.350,00	2,00	$ 253.350,00		$ -	2,00	$ 253.350,00	-	$ -
4.12		TEE PVC - PRESION TRABAJO 200 PSI- EXTREMOS UNION MECANICA X LISO (2X2X2)	UN	1,00	$ 144.481,00	$ 144.481,00	1,00	$ 144.481,00		$ -	1,00	$ 144.481,00	-	$ -
4.13		SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø2" UM UN	UN	2,00	$ 96.976,00	$ 193.952,00	2,00	$ 193.952,00		$ -	2,00	$ 193.952,00	-	$ -
4.14		TAPON EN PVC- PRESION TRABAJO 280 PSI (2")	UN	2,00	$ 4.191,00	$ 8.382,00		$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 8.382,00
4.15		EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE	M3	223,24	$ 53.911,00	$ 12.035.092,00	223,24	$ 12.035.092,00		$ -	223,24	$ 12.035.092,00	-	$ -
4.16		ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M, ACCESORIOS Y REGISTRO)	UND	15,00	$ 273.342,00	$ 4.100.130,00	10,00	$ 2.733.420,00		$ -	10,00	$ 2.733.420,00	5,00	$ 1.366.710,00
					TOTAL REDES DE ACUEDUCTO CERRITO	$ 201.835.702,00		$ 153.471.992,00		$ -		$ 153.471.992,00		$ 48.363.707,00
5	TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN						-				-		-	
5.3		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0-2,00 M,INCLUYE CARGUE	M3	7,44	$ 98.867,00	$ 735.570,00	-	$ -	7,44	$ 735.570,00	7,44	$ 735.570,00	-	$ -
5.4		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN MANUAL	M3	4,90	$ 45.262,00	$ 221.784,00	-	$ -	4,00	$ 181.048,00	4,00	$ 181.048,00	0,90	$ 40.736,00
5.5		ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,03	$ 1.634.474,00	$ 3.317.982,00	-	$ -	2,03	$ 3.317.982,00	2,03	$ 3.317.982,00	-	$ -
5.6		COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA OBRA SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,77	$ 2.304.372,00	$ 1.774.366,00	-	$ -	0,77	$ 1.774.366,00	0,77	$ 1.774.366,00	-	$ -
5.7		ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO ARMADO, COLOCACION Y AMARRE.	M3	461,56	$ 13.557,00	$ 6.257.369,00	-	$ -	200,00	$ 2.711.400,00	200,00	$ 2.711.400,00	261,56	$ 3.545.969,00
5.8		SOLADO,LIMPIEZA CONCRETO 13,8 Mpa (2000 PSI)	M3	0,68	$ 1.129.386,00	$ 767.982,00	-	$ -	0,68	$ 767.982,00	0,68	$ 767.982,00	-	$ -
					TOTAL TANQUE ELEVADO CERRITO	$ 172.326.446,00		$ -		$ 9.488.348,00		$ 9.488.348,00		$ 162.838.098,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL						-				-		-	
6.1		LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	48,20	$ 5.357,00	$ 258.207,00	48,20	$ 258.207,00		$ -	48,20	$ 258.207,00	-	$ -
					TOTAL CERRAMIENTO CERRITO	$ 57.568.364,00		$ 258.207,00		$ -		$ 258.207,00		$ 57.310.157,00
					TOTAL COMUNIDAD CERRITO	$ 845.530.154,00		$ 153.871.109,00		$ 215.880.789,00		$ 369.751.897,00		$ 475.778.254,00
COMUNIDAD PUERTO GAVILAN (10.000 - 1L) (F.Z. 1,34)														
1	POZO PROFUNDO						-				-		-	
1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	$ 140.909,00	$ 140.909,00	1,00	$ 140.909,00		$ -	1,00	$ 140.909,00	-	$ -
1.2		INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS	UND	1,00	$ 2.959.841,00	$ 2.959.841,00	1,00	$ 2.959.841,00		$ -	1,00	$ 2.959.841,00	-	$ -
1.3		PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO	ML	150,00	$ 357.987,00	$ 53.698.050,00	150,00	$ 53.698.050,00		$ -	150,00	$ 53.698.050,00	-	$ -
1.4		ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO	ML	150,00	$ 136.935,00	$ 20.540.250,00	150,00	$ 20.540.250,00		$ -	150,00	$ 20.540.250,00	-	$ -
1.5		EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA)	UND	1,00	$ 4.064.604,00	$ 4.064.604,00	1,00	$ 4.064.604,00		$ -	1,00	$ 4.064.604,00	-	$ -
1.6		AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"	ML	150,00	$ 517.371,00	$ 77.605.650,00	150,00	$ 77.605.650,00		$ -	150,00	$ 77.605.650,00	-	$ -
1.7		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN PARA PROFUNDIDADES DE 0 A 200 M	ML	96,00	$ 327.083,00	$ 31.399.968,00	93,00	$ 30.418.719,00		$ -	93,00	$ 30.418.719,00	3,00	$ 981.249,00
1.8		AFORO DEL POZO (PRUEBA DE BOMBEO)	UND	1,00	$ 3.853.671,00	$ 3.853.671,00	1,00	$ 3.853.671,00		$ -	1,00	$ 3.853.671,00	-	$ -
1.9		CONSTRUCCIÓN DE CABEZA DE POZO Y SELLO SANITARIO E INSTALACIÓN DE GRAVILLADORES	UND	1,00	$ 1.685.429,00	$ 1.685.429,00	1,00	$ 1.685.429,00		$ -	1,00	$ 1.685.429,00	-	$ -
1.10		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESION	ML	54,00	$ 243.661,00	$ 13.157.694,00	54,00	$ 13.157.694,00		$ -	54,00	$ 13.157.694,00	-	$ -
1.11		SUMINISTRO DE GRAVILLA TAMIZADA, SELECCIONADA Y SIN CALCÁREOS	M3	8,82	$ 576.780,00	$ 5.087.200,00	7,00	$ 4.037.460,00		$ -	7,00	$ 4.037.460,00	1,82	$ 1.049.740,00
1.12		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ESTABILIZADOR Y DE RELLENO	BTO	30,00	$ 43.532,00	$ 1.305.960,00	30,00	$ 1.305.960,00		$ -	30,00	$ 1.305.960,00	-	$ -
1.13		LAVADO Y DESARROLLO DEL POZO POR MÉTODOS COMBINADOS (JETTING AIRE COMPRIMIDO)	UND	1,00	$ 4.410.001,00	$ 4.410.001,00	1,00	$ 4.410.001,00		$ -	1,00	$ 4.410.001,00	-	$ -
1.14		DESINFECCIÓN DEL POZO (DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO)	UND	1,00	$ 452.051,00	$ 452.051,00	1,00	$ 452.051,00		$ -	1,00	$ 452.051,00	-	$ -
1.15		ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DEL AGUA	UND	1,00	$ 417.994,00	$ 417.994,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 417.994,00
					TOTAL POZO PUERTP GAVILAN	$ 220.779.272,00		$ 218.330.289,00		$ -		$ 218.330.289,00		$ 2.448.983,00
4	REDES DE ACUEDUCTO						-				-		-	
4.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	3.414,74	$ 4.347,00	$ 14.843.875,00	3.414,74	$ 14.843.875,00		$ -	3.414,74	$ 14.843.875,00	-	$ -
4.2		RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN	M3	853,69	$ 44.733,00	$ 38.188.115,00	781,18	$ 34.944.525,00		$ -	781,18	$ 34.944.525,00	72,51	$ 3.243.590,00
4.3		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE	M3	175,50	$ 98.867,00	$ 17.351.159,00	60,00	$ 5.932.020,00		$ -	60,00	$ 5.932.020,00	115,50	$ 11.419.139,00
4.4		CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	768,32	$ 193.559,00	$ 148.715.251,00	546,82	$ 105.841.932,00		$ -	546,82	$ 105.841.932,00	221,50	$ 42.873.319,00
4.5		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL	M3	965,92	$ 45.262,00	$ 43.719.471,00	965,92	$ 43.719.471,00		$ -	965,92	$ 43.719.471,00	-	$ -
4.6		RELLENO CON MATERIAL DE ARRECIFE TAMAÑO MAX. 3"	M3	256,11	$ 80.065,00	$ 20.505.447,00	234,35	$ 18.763.233,00		$ -	234,35	$ 18.763.233,00	21,76	$ 1.742.214,00
4.7		TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	320.139,50	$ 2.309,00	$ 739.202.106,00	236.418,06	$ 545.889.301,00		$ -	236.418,06	$ 545.889.301,00	83.721,44	$ 193.312.805,00
4.8		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN	ML	3.024,74	$ 23.569,00	$ 71.290.097,00	3.024,74	$ 71.290.097,00		$ -	3.024,74	$ 71.290.097,00	-	$ -
4.9		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA EN H.D. 2" (INCLUYE CAJA VALV. Y ANCLAJE EN CONCRETO)	UN	2,00	$ 1.183.911,00	$ 2.367.822,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 2.367.822,00
4.10		CODO GRAN RADIO 90° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2")	UN	3,00	$ 131.983,00	$ 395.949,00	3,00	$ 395.949,00		$ -	3,00	$ 395.949,00	-	$ -
4.11		CODO GRAN RADIO 45° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2")	UN	10,00	$ 126.675,00	$ 1.266.750,00	6,00	$ 760.050,00		$ -	6,00	$ 760.050,00	4,00	$ 506.700,00
4.12		TEE PVC - PRESION TRABAJO 200 PSI- EXTREMOS UNION MECANICA X LISO (2X2X2)	UN	3,00	$ 144.481,00	$ 433.443,00	3,00	$ 433.443,00		$ -	3,00	$ 433.443,00	-	$ -
4.13		SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø2" UM UN	UN	5,00	$ 96.976,00	$ 484.880,00	5,00	$ 484.880,00		$ -	5,00	$ 484.880,00	-	$ -
4.14		TAPON EN PVC- PRESION TRABAJO 280 PSI (2")	UN	2,00	$ 4.191,00	$ 8.382,00	2,00	$ 8.382,00		$ -	2,00	$ 8.382,00	-	$ -
4.15		EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE	M3	1.814,84	$ 53.911,00	$ 97.839.839,00	1.814,84	$ 97.839.839,00		$ -	1.814,84	$ 97.839.839,00	-	$ -
4.16		ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M, ACCESORIOS Y REGISTRO)	UND	39,00	$ 273.342,00	$ 10.660.338,00	20,00	$ 5.466.840,00		$ -	20,00	$ 5.466.840,00	19,00	$ 5.193.498,00
					TOTAL REDES DE ACUEDUCTO GAVILAN	$ 1.207.272.924,00		$ 946.613.837,00		$ -		$ 946.613.837,00		$ 260.659.087,00
5	TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN						-				-		-	
5.1		PLATAFORMA EN LÁMINA ALFAJOR ESPESOR 1/4" MM (INCLUYE TRANSPORTE, MONTAJE, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE)	M2	10,56	$ 678.400,00	$ 7.163.904,00	-	$ -	10,56	$ 7.163.904,00	10,56	$ 7.163.904,00	-	$ -
5.2.1		TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 10000 LITROS, ELEVADO A 13,5 METROS DE ALTURA, TIPO PLASTICO	UND	1,00	$ 37.460.552,00	$ 37.460.552,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 37.460.552,00
5.3		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0-2,00 M,INCLUYE CARGUE	M3	7,44	$ 98.867,00	$ 735.570,00	7,44	$ 735.570,00		$ -	7,44	$ 735.570,00	-	$ -
5.4		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN MANUAL	M3	4,90	$ 45.262,00	$ 221.784,00	4,90	$ 221.784,00		$ -	4,90	$ 221.784,00	-	$ -

CONDICIONES INICIALES							ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PERIODO (01-05-2026 AL 31-05-2026)		AVANCE ACUMULADO		CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	
Nº ITEM	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
5.5		ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,03	$ 1.634.474,00	$ 3.317.982,00	2,03	$ 3.317.982,00		$ -	2,03	$ 3.317.982,00	-	$ -
5.6		COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,77	$ 2.304.372,00	$ 1.774.366,00		$ -		$ -	-	$ -	0,77	$ 1.774.366,00
5.7		ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO ARMADO, COLOCACION Y AMARRE.	M3	461,56	$ 13.557,00	$ 6.257.369,00	200,00	$ 2.711.400,00		$ -	200,00	$ 2.711.400,00	261,56	$ 3.545.969,00
5.8		SOLADO LIMPIEZA CONCRETO 13,8 Mpa (2000 PSI)	M3	0,68	$ 1.129.386,00	$ 767.982,00	0,68	$ 767.982,00		$ -	0,68	$ 767.982,00	-	$ -
5.9		ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A500 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)	KG	2.842,31	$ 51.232,00	$ 145.617.228,00	-	$ -	2.200,00	$ 112.710.400,00	2.200,00	$ 112.710.400,00	642,31	$ 32.906.828,00
5.10		ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A588 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)	KG	133,00	$ 52.436,00	$ 6.974.254,00	-	$ -	100,00	$ 5.243.600,00	100,00	$ 5.243.600,00	33,00	$ 1.730.454,00
5.11		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO E INSTALACION	ML	19,45	$ 107.672,00	$ 2.094.220,00	-	$ -		$ -	-	$ -	19,45	$ 2.094.220,00
					TOTAL TANQUE ELEVADO GAVILAN	$ 212.385.209,00		$ 7.754.718,00		$ 125.118.104,00		$ 132.872.822,00		$ 79.512.387,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL						-				-		-	
6.1		LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	48,20	$ 5.357,00	$ 258.207,00	48,20	$ 258.207,00		$ -	48,20	$ 258.207,00	-	$ -
					TOTAL CERRAMIENTO GAVILAN	$ 57.568.364,00		$ 258.207,00		$ -		$ 258.207,00		$ 57.310.157,00
					TOTAL COMUNIDAD GAVILAN	$ 1.921.372.707,00		$ 1.172.957.051,00		$ 125.118.104,00		$ 1.298.075.155,00		$ 623.297.552,00
COMUNIDAD LAS DELICIAS (6000 - 0,5L) (F.Z. 1,34)														
1	POZO PROFUNDO												-	
1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	$ 140.909,00	$ 140.909,00	1,00	$ 140.909,00		$ -	1,00	$ 140.909,00	-	$ -
1.2		INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS	UND	1,00	$ 2.959.841,00	$ 2.959.841,00	1,00	$ 2.959.841,00		$ -	1,00	$ 2.959.841,00	-	$ -
1.3		PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO	ML	153,00	$ 357.987,00	$ 54.772.011,00	153,00	$ 54.772.011,00		$ -	153,00	$ 54.772.011,00	-	$ -
1.4		ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO	ML	153,00	$ 136.935,00	$ 20.951.055,00	153,00	$ 20.951.055,00		$ -	153,00	$ 20.951.055,00	-	$ -
1.5		EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA)	UND	1,00	$ 4.064.604,00	$ 4.064.604,00	1,00	$ 4.064.604,00		$ -	1,00	$ 4.064.604,00	-	$ -
1.6		AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"	ML	153,00	$ 517.371,00	$ 79.157.763,00	153,00	$ 79.157.763,00		$ -	153,00	$ 79.157.763,00	-	$ -
1.7		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN PARA PROFUNDIDADES DE 0 A 200 M	ML	99,00	$ 327.083,00	$ 32.381.217,00	98,00	$ 32.054.134,00		$ -	98,00	$ 32.054.134,00	1,00	$ 327.083,00
1.8		AFORO DEL POZO (PRUEBA DE BOMBEO)	UND	1,00	$ 3.853.671,00	$ 3.853.671,00	1,00	$ 3.853.671,00		$ -	1,00	$ 3.853.671,00	-	$ -
1.9		CONSTRUCCIÓN DE CABEZA DE POZO Y SELLO SANITARIO E INSTALACIÓN DE GRAVILLADORES	UND	1,00	$ 1.685.429,00	$ 1.685.429,00	1,00	$ 1.685.429,00		$ -	1,00	$ 1.685.429,00	-	$ -
1.10		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESION	ML	54,00	$ 243.661,00	$ 13.157.694,00	54,00	$ 13.157.694,00		$ -	54,00	$ 13.157.694,00	-	$ -
1.11		SUMINISTRO DE GRAVILA TAMIZADA, SELECCIONADA Y SIN CALCÁREOS.	M3	9,00	$ 576.780,00	$ 5.191.020,00	8,37	$ 4.827.649,00		$ -	8,37	$ 4.827.649,00	0,63	$ 363.371,00
1.12		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ESTABILIZADOR Y DE RELLENO	BTO	30,60	$ 43.532,00	$ 1.332.079,00	30,60	$ 1.332.079,00		$ -	30,60	$ 1.332.079,00	-	$ -
1.13		LAVADO Y DESARROLLO DEL POZO POR MÉTODOS COMBINADOS (JETTING AIRE COMPRIMIDO)	UND	1,00	$ 4.410.001,00	$ 4.410.001,00	1,00	$ 4.410.001,00		$ -	1,00	$ 4.410.001,00	-	$ -
1.14		DESINFECCIÓN DEL POZO (DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO)	UND	1,00	$ 452.051,00	$ 452.051,00	1,00	$ 452.051,00		$ -	1,00	$ 452.051,00	-	$ -
1.15		ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DEL AGUA	UND	1,00	$ 417.994,00	$ 417.994,00	1,00	$ 417.994,00		$ -	1,00	$ 417.994,00	-	$ -
					TOTAL POZO DELICIAS	$ 224.927.339,00		$ 224.236.885,00		$ -		$ 224.236.885,00		$ 690.454,00
4	REDES DE ACUEDUCTO						-				-		-	
4.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	1.493,19	$ 4.347,00	$ 6.490.897,00	1.493,19	$ 6.490.897,00		$ -	1.493,19	$ 6.490.897,00	-	$ -
4.2		RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN	M3	373,30	$ 44.733,00	$ 16.698.829,00	348,29	$ 15.580.057,00		$ -	348,29	$ 15.580.057,00	25,01	$ 1.118.772,00
4.3		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE	M3	90,00	$ 98.867,00	$ 8.898.030,00	60,00	$ 5.932.020,00		$ -	60,00	$ 5.932.020,00	30,00	$ 2.966.010,00
4.4		CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	335,97	$ 193.559,00	$ 65.030.017,00	242,00	$ 46.841.278,00		$ -	242,00	$ 46.841.278,00	93,97	$ 18.188.739,00
4.5		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL	M3	417,96	$ 45.262,00	$ 18.917.706,00	417,96	$ 18.917.706,00		$ -	417,96	$ 18.917.706,00	-	$ -
4.6		RELLENO CON MATERIAL DE ARRECIFE TAMAÑO MAX. 3"	M3	111,99	$ 80.065,00	$ 8.966.479,00	104,48	$ 8.365.191,00		$ -	104,48	$ 8.365.191,00	7,51	$ 601.288,00
4.7		TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	145.380,66	$ 2.309,00	$ 335.683.944,00	109.668,20	$ 253.223.874,00		$ -	109.668,20	$ 253.223.874,00	35.712,46	$ 82.460.070,00
4.8		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN	ML	1.293,19	$ 23.569,00	$ 30.479.195,00	1.293,19	$ 30.479.195,00		$ -	1.293,19	$ 30.479.195,00	-	$ -
4.10		CODO GRAN RADIO 90° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2")	UN	5,00	$ 131.983,00	$ 659.915,00	5,00	$ 659.915,00		$ -	5,00	$ 659.915,00	-	$ -
4.11		CODO GRAN RADIO 45° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2")	UN	6,00	$ 126.675,00	$ 760.050,00	6,00	$ 760.050,00		$ -	6,00	$ 760.050,00	-	$ -
4.12		TEE PVC - PRESION TRABAJO 200 PSI- EXTREMOS UNION MECANICA X LISO (2X2X2)	UN	2,00	$ 144.481,00	$ 288.962,00	2,00	$ 288.962,00		$ -	2,00	$ 288.962,00	-	$ -
4.13		SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø2" UM UN	UN	3,00	$ 96.976,00	$ 290.928,00	3,00	$ 290.928,00		$ -	3,00	$ 290.928,00	-	$ -
4.14		TAPON EN PVC- PRESION TRABAJO 280 PSI (2")	UN	1,00	$ 4.191,00	$ 4.191,00	1,00	$ 4.191,00		$ -	1,00	$ 4.191,00	-	$ -
4.15		EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE	M3	775,91	$ 53.911,00	$ 41.830.084,00	775,91	$ 41.830.084,00		$ -	775,91	$ 41.830.084,00	-	$ -
4.16		ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M, ACCESORIOS Y REGISTRO)	UND	20,00	$ 273.342,00	$ 5.466.840,00	20,00	$ 5.466.840,00		$ -	20,00	$ 5.466.840,00	-	$ -
					TOTAL REDES DE ACUEDUCTO DELICIAS	$ 541.649.978,00		$ 435.131.188,00		$ -		$ 435.131.188,00		$ 106.518.790,00
5	TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN						-				-		-	
5.1		PLATAFORMA EN LÁMINA ALFAJOR ESPESOR 1/4" MM (INCLUYE TRANSPORTE, MONTAJE, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE)	M2	10,56	$ 678.400,00	$ 7.163.904,00	-	$ -	10,56	$ 7.163.904,00	10,56	$ 7.163.904,00	-	$ -
5.3		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0-2,00 M,INCLUYE CARGUE	M3	7,44	$ 98.867,00	$ 735.570,00	7,44	$ 735.570,00		$ -	7,44	$ 735.570,00	-	$ -
5.4		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN MANUAL	M3	4,90	$ 45.262,00	$ 221.784,00	4,90	$ 221.784,00		$ -	4,90	$ 221.784,00	-	$ -
5.5		ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,03	$ 1.634.474,00	$ 3.317.982,00	2,03	$ 3.317.982,00		$ -	2,03	$ 3.317.982,00	-	$ -
5.7		ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO ARMADO, COLOCACION Y AMARRE.	M3	461,56	$ 13.557,00	$ 6.257.369,00	200,00	$ 2.711.400,00		$ -	200,00	$ 2.711.400,00	261,56	$ 3.545.969,00
5.8		SOLADO LIMPIEZA CONCRETO 13,8 Mpa (2000 PSI)	M3	0,68	$ 1.129.386,00	$ 767.982,00	0,68	$ 767.982,00		$ -	0,68	$ 767.982,00	-	$ -
5.9		ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A500 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)	KG	2.480,08	$ 51.232,00	$ 127.059.459,00	-	$ -	2.200,00	$ 112.710.400,00	2.200,00	$ 112.710.400,00	280,08	$ 14.349.059,00
5.10		ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A588 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)	KG	133,00	$ 52.436,00	$ 6.974.254,00	-	$ -	100,00	$ 5.243.600,00	100,00	$ 5.243.600,00	33,00	$ 1.730.454,00
5.11		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO E INSTALACION	ML	19,45	$ 107.672,00	$ 2.094.220,00	-	$ -		$ -	-	$ -	19,45	$ 2.094.220,00
					TOTAL TANQUE ELEVADO DELICIAS	$ 172.326.446,00		$ 7.754.718,00		$ 125.118.104,00		$ 132.872.822,00		$ 39.453.624,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL						-				-		-	
6.1		LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	48,20	$ 5.357,00	$ 258.207,00	48,20	$ 258.207,00		$ -	48,20	$ 258.207,00	-	$ -
					TOTAL CERRAMIENTO DELICIAS	$ 57.568.364,00		$ 258.207,00		$ -		$ 258.207,00		$ 57.310.157,00
					TOTAL COMUNIDAD DELICIAS	$ 1.199.171.322,00		$ 667.380.998,00		$ 125.118.104,00		$ 792.499.102,00		$ 406.672.220,00
COMUNIDAD CACHAMITAS (6000 - 0,5L) (F.Z. 1,34)														

CONDICIONES INICIALES							ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PERIODO (01-05-2026 AL 31-05-2026)		AVANCE ACUMULADO		CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	
Nº ITEM	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	POZO PROFUNDO												-	
1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	$ 140.909,00	$ 140.909,00	1,00	$ 140.909,00		$ -	1,00	$ 140.909,00	-	$ -
1.2		INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS	UND	1,00	$ 2.959.841,00	$ 2.959.841,00	1,00	$ 2.959.841,00		$ -	1,00	$ 2.959.841,00	-	$ -
1.3		PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO	ML	142,00	$ 357.987,00	$ 50.834.154,00	142,00	$ 50.834.154,00		$ -	142,00	$ 50.834.154,00	-	$ -
1.4		ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO	ML	142,00	$ 136.935,00	$ 19.444.770,00	142,00	$ 19.444.770,00		$ -	142,00	$ 19.444.770,00	-	$ -
1.5		EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA)	UND	1,00	$ 4.064.604,00	$ 4.064.604,00	1,00	$ 4.064.604,00		$ -	1,00	$ 4.064.604,00	-	$ -
1.6		AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"	ML	142,00	$ 517.371,00	$ 73.466.682,00	142,00	$ 73.466.682,00		$ -	142,00	$ 73.466.682,00	-	$ -
1.7		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN PARA PROFUNDIDADES DE 0 A 200 M	ML	103,00	$ 327.083,00	$ 33.689.549,00	93,00	$ 30.418.719,00		$ -	93,00	$ 30.418.719,00	10,00	$ 3.270.830,00
1.8		AFORO DEL POZO (PRUEBA DE BOMBEO)	UND	1,00	$ 3.853.671,00	$ 3.853.671,00	1,00	$ 3.853.671,00		$ -	1,00	$ 3.853.671,00	-	$ -
1.9		CONSTRUCCIÓN DE CABEZA DE POZO Y SELLO SANITARIO E INSTALACIÓN DE GRAVILLADORES	UND	1,00	$ 1.685.429,00	$ 1.685.429,00	1,00	$ 1.685.429,00		$ -	1,00	$ 1.685.429,00	-	$ -
1.10		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESION	ML	39,00	$ 243.661,00	$ 9.502.779,00	39,00	$ 9.502.779,00		$ -	39,00	$ 9.502.779,00	-	$ -
1.11		SUMINISTRO DE GRAVILLA TAMIZADA, SELECCIONADA Y SIN CALCÁREOS.	M3	8,34	$ 576.780,00	$ 4.810.345,00	7,77	$ 4.481.581,00		$ -	7,77	$ 4.481.581,00	0,57	$ 328.764,00
1.12		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ESTABILIZADOR Y DE RELLENO	BTO	28,40	$ 43.532,00	$ 1.236.309,00	28,40	$ 1.236.309,00		$ -	28,40	$ 1.236.309,00	-	$ -
1.13		LAVADO Y DESARROLLO DEL POZO POR MÉTODOS COMBINADOS (JETTING AIRE COMPRIMIDO)	UND	1,00	$ 4.410.001,00	$ 4.410.001,00	1,00	$ 4.410.001,00		$ -	1,00	$ 4.410.001,00	-	$ -
1.14		DESINFECCIÓN DEL POZO (DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO)	UND	1,00	$ 452.051,00	$ 452.051,00	1,00	$ 452.051,00		$ -	1,00	$ 452.051,00	-	$ -
1.15		ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DEL AGUA	UND	1,00	$ 417.994,00	$ 417.994,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 417.994,00
					TOTAL POZO PROFUNDO CACHAMITAS	$ 210.569.088,00		$ 209.951.500,00		$ -		$ 209.951.500,00		$ 4.017.688,00
4	REDES DE ACUEDUCTO						-						-	
4.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	1.169,03	$ 4.347,00	$ 5.081.773,00	1.169,03	$ 5.081.773,00		$ -	1.169,03	$ 5.081.773,00	-	$ -
4.2		RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN	M3	292,26	$ 44.733,00	$ 13.073.667,00	-	$ -	292,26	$ 13.073.667,00	292,26	$ 13.073.667,00	-	$ -
4.3		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE	M3	85,50	$ 98.867,00	$ 8.453.129,00	-	$ -	41,70	$ 4.122.754,00	41,70	$ 4.122.754,00	43,80	$ 4.330.375,00
4.4		CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	263,03	$ 193.559,00	$ 50.911.824,00	-	$ -	209,34	$ 40.519.641,00	209,34	$ 40.519.641,00	53,69	$ 10.392.183,00
4.5		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL	M3	322,21	$ 45.262,00	$ 14.583.869,00	-	$ -	322,21	$ 14.583.869,00	322,21	$ 14.583.869,00	-	$ -
4.6		RELLENO CON MATERIAL DE ARRECIFE TAMAÑO MAX. 3"	M3	87,68	$ 80.065,00	$ 7.020.099,00	-	$ -	87,68	$ 7.020.099,00	87,68	$ 7.020.099,00	-	$ -
4.7		TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	115.672,77	$ 2.309,00	$ 267.088.426,00	-	$ -	90.378,78	$ 208.684.603,00	90.378,78	$ 208.684.603,00	25.293,99	$ 58.403.823,00
4.8		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN	ML	979,03	$ 23.569,00	$ 23.074.758,00	-	$ -	979,03	$ 23.074.758,00	979,03	$ 23.074.758,00	-	$ -
4.10		CODO GRAN RADIO 90° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2")	UN	2,00	$ 131.983,00	$ 263.966,00	-	$ -	2,00	$ 263.966,00	2,00	$ 263.966,00	-	$ -
4.11		CODO GRAN RADIO 45° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2")	UN	5,00	$ 126.675,00	$ 633.375,00	-	$ -	3,00	$ 380.025,00	3,00	$ 380.025,00	2,00	$ 253.350,00
4.12		TEE PVC - PRESION TRABAJO 200 PSI- EXTREMOS UNION MECANICA X LISO (2X2X2)	UN	3,00	$ 144.481,00	$ 433.443,00	-	$ -	2,00	$ 288.962,00	2,00	$ 288.962,00	1,00	$ 144.481,00
4.13		SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø2" UM UN	UN	5,00	$ 96.976,00	$ 484.880,00	-	$ -	5,00	$ 484.880,00	5,00	$ 484.880,00	-	$ -
4.14		TAPON EN PVC- PRESION TRABAJO 280 PSI (2")	UN	2,00	$ 4.191,00	$ 8.382,00	-	$ -	2,00	$ 8.382,00	2,00	$ 8.382,00	-	$ -
4.15		EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE	M3	587,42	$ 53.911,00	$ 31.668.400,00	-	$ -	587,42	$ 31.668.400,00	587,42	$ 31.668.400,00	-	$ -
4.16		ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M, ACCESORIOS Y REGISTRO)	UND	19,00	$ 273.342,00	$ 5.193.498,00	-	$ -	14,00	$ 3.826.788,00	14,00	$ 3.826.788,00	5,00	$ 1.366.710,00
					TOTAL REDES DE ACUEDUCTO CACHAMITAS	$ 429.167.400,00		$ 5.081.773,00		$ 348.000.794,00		$ 353.082.567,00		$ 76.074.833,00
5	TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN						-						-	
5.3		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0-2,00 M,INCLUYE CARGUE	M3	7,44	$ 98.867,00	$ 735.570,00	-	$ -	7,44	$ 735.570,00	7,44	$ 735.570,00	-	$ -
5.4		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL	M3	4,90	$ 45.262,00	$ 221.784,00	-	$ -	4,28	$ 193.721,00	4,28	$ 193.721,00	0,62	$ 28.062,00
5.5		ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,03	$ 1.634.474,00	$ 3.317.982,00	-	$ -	2,03	$ 3.317.982,00	2,03	$ 3.317.982,00	-	$ -
5.6		COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,77	$ 2.304.372,00	$ 1.774.366,00	-	$ -	0,77	$ 1.774.366,00	0,77	$ 1.774.366,00	-	$ -
5.7		ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO ARMADO, COLOCACION Y AMARRE	M3	461,56	$ 13.557,00	$ 6.257.369,00	-	$ -	269,29	$ 3.650.765,00	269,29	$ 3.650.765,00	192,27	$ 2.606.604,00
5.8		SOLADO,LIMPIEZA CONCRETO 13,8 Mpa (2000 PSI)	M3	0,68	$ 1.129.386,00	$ 767.982,00	-	$ -	0,68	$ 767.982,00	0,68	$ 767.982,00	-	$ -
					TOTAL TANQUE ELEVADO CACHAMITAS	$ 172.326.446,00		$ -		$ 10.440.388,00		$ 10.440.388,00		$ 161.886.059,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL						-						-	
6.1		LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	48,20	$ 5.357,00	$ 258.207,00	48,20	$ 258.207,00		$ -	48,20	$ 258.207,00	-	$ -
					TOTAL CERRAMIENTO CACHAMITAS	$ 57.569.364,00		$ 258.207,00		$ -		$ 258.207,00		$ 57.310.157,00
					TOTAL COMUNIDAD CACHAMITAS	$ 1.072.720.493,00		$ 212.291.480,00		$ 358.441.180,00		$ 570.732.660,00		$ 501.987.832,00
		TOTAL RESGUARDO DOMOPLANAS				$ 14.427.666.150,00		$ 4.966.880.517,00		$ 2.138.234.458,00		$ 7.105.115.275,00		$ 7.322.550.867,00
RESGUARDO WACOYO														
COMUNIDAD KALIWIRNAE (10.000 - 1L) (F.Z. 1,22)														
1	POZO PROFUNDO												-	
1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	$ 135.845,00	$ 135.845,00	1,00	$ 135.845,00		$ -	1,00	$ 135.845,00	-	$ -
1.2		INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS	UND	1,00	$ 2.729.257,00	$ 2.729.257,00	-	$ -	1,00	$ 2.729.257,00	1,00	$ 2.729.257,00	-	$ -
1.3		PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO	ML	131,00	$ 331.099,00	$ 43.373.969,00	-	$ -	131,00	$ 43.373.969,00	131,00	$ 43.373.969,00	-	$ -
1.4		ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO	ML	131,00	$ 128.520,00	$ 16.836.120,00	-	$ -	131,00	$ 16.836.120,00	131,00	$ 16.836.120,00	-	$ -
1.5		EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA)	UND	1,00	$ 3.849.951,00	$ 3.849.951,00	-	$ -	1,00	$ 3.849.951,00	1,00	$ 3.849.951,00	-	$ -
1.6		AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"	ML	131,00	$ 473.791,00	$ 62.066.621,00	-	$ -	131,00	$ 62.066.621,00	131,00	$ 62.066.621,00	-	$ -
1.7		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN PARA PROFUNDIDADES DE 0 A 200 M	ML	101,00	$ 307.190,00	$ 31.026.190,00	-	$ -	95,00	$ 29.183.050,00	95,00	$ 29.183.050,00	6,00	$ 1.843.140,00
1.8		AFORO DEL POZO (PRUEBA DE BOMBEO)	UND	1,00	$ 3.590.564,00	$ 3.590.564,00	-	$ -	1,00	$ 3.590.564,00	1,00	$ 3.590.564,00	-	$ -
1.9		CONSTRUCCIÓN DE CABEZA DE POZO Y SELLO SANITARIO E INSTALACIÓN DE GRAVILLADORES	UND	1,00	$ 1.633.978,00	$ 1.633.978,00	-	$ -	1,00	$ 1.633.978,00	1,00	$ 1.633.978,00	-	$ -
1.10		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESION	ML	30,00	$ 231.060,00	$ 6.931.800,00	-	$ -	30,00	$ 6.931.800,00	30,00	$ 6.931.800,00	-	$ -
1.11		SUMINISTRO DE GRAVILLA TAMIZADA, SELECCIONADA Y SIN CALCÁREOS.	M3	7,68	$ 532.966,00	$ 4.093.179,00	-	$ -	7,68	$ 4.093.179,00	7,68	$ 4.093.179,00	-	$ -
1.12		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ESTABILIZADOR Y DE RELLENO	BTO	26,20	$ 40.372,00	$ 1.057.746,00	-	$ -	26,20	$ 1.057.746,00	26,20	$ 1.057.746,00	-	$ -
1.13		LAVADO Y DESARROLLO DEL POZO POR MÉTODOS COMBINADOS (JETTING AIRE COMPRIMIDO)	UND	1,00	$ 4.028.724,00	$ 4.028.724,00	-	$ -	1,00	$ 4.028.724,00	1,00	$ 4.028.724,00	-	$ -

CONDICIONES INICIALES							ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PERIODO (01-05-2026 AL 31-05-2026)		AVANCE ACUMULADO		CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	
Nº ITEM	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.14		DESINFECCIÓN DEL POZO (DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO)	UND	1,00	$ 423.843,00	$ 423.843,00	-	$ -	1,00	$ 423.843,00	1,00	$ 423.843,00	-	$ -
1.15		ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DEL AGUA	UND	1,00	$ 380.561,00	$ 380.561,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 380.561,00
					TOTAL POZO PROFUNDO KALIWIRNAE	$ 182.158.348,00		$ 135.845,00		$ 179.798.802,00		$ 179.934.647,00		$ 2.223.701,00
4	REDES DE ACUEDUCTO						-				-		-	
4.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	4.974,57	$ 4.250,00	$ 21.141.923,00	4.974,57	$ 21.141.923,00		$ -	4.974,57	$ 21.141.923,00	-	$ -
4.2		RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN	M3	1.243,64	$ 40.727,00	$ 50.649.726,00	1.189,43	$ 48.441.916,00		$ -	1.189,43	$ 48.441.916,00	54,21	$ 2.207.811,00
4.3		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE	M3	193,50	$ 98.525,00	$ 19.064.588,00	126,10	$ 12.621.053,00		$ -	126,10	$ 12.621.053,00	65,40	$ 6.443.535,00
4.4		CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	1.119,28	$ 180.167,00	$ 201.657.320,00	823,34	$ 148.338.698,00		$ -	823,34	$ 148.338.698,00	295,94	$ 53.318.622,00
4.5		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL	M3	1.427,87	$ 44.004,00	$ 62.831.991,00	1.425,59	$ 62.731.662,00		$ -	1.425,59	$ 62.731.662,00	2,28	$ 100.329,00
4.6		RELLENO CON MATERIAL DE ARRECIFE TAMAÑO MAX. 3"	M3	373,09	$ 76.250,00	$ 28.448.113,00	356,83	$ 27.208.288,00		$ -	356,83	$ 27.208.288,00	16,26	$ 1.239.825,00
4.7		TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3KM	236.148,94	$ 2.309,00	$ 545.267.902,00	177.548,38	$ 409.959.209,00		$ -	177.548,38	$ 409.959.209,00	58.600,56	$ 135.308.693,00
4.8		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN	ML	4.544,57	$ 23.070,00	$ 104.843.230,00	4.544,22	$ 104.835.155,00		$ -	4.544,22	$ 104.835.155,00	0,35	$ 8.074,00
4.9		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA EN H.D. 2" (INCLUYE CAJA VALV. Y ANCLAJE EN CONCRETO)	UN	2,00	$ 1.077.889,00	$ 2.155.778,00	2,00	$ 2.155.778,00		$ -	2,00	$ 2.155.778,00	-	$ -
4.10		CODO GRAN RADIO 90° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2")	UN	3,00	$ 120.164,00	$ 360.492,00	2,00	$ 240.328,00		$ -	2,00	$ 240.328,00	1,00	$ 120.164,00
4.11		CODO GRAN RADIO 45° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2")	UN	6,00	$ 115.332,00	$ 691.992,00	6,00	$ 691.992,00		$ -	6,00	$ 691.992,00	-	$ -
4.12		TEE PVC - PRESION TRABAJO 200 PSI- EXTREMOS UNION MECANICA X LISO (2X2X2)	UN	5,00	$ 131.542,00	$ 657.710,00	5,00	$ 657.710,00		$ -	5,00	$ 657.710,00	-	$ -
4.13		SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø2" UM UN	UN	5,00	$ 90.836,00	$ 454.180,00	5,00	$ 454.180,00		$ -	5,00	$ 454.180,00	-	$ -
4.14		TAPON EN PVC- PRESION TRABAJO 280 PSI (2")	UN	6,00	$ 3.814,00	$ 22.884,00	5,00	$ 19.070,00		$ -	5,00	$ 19.070,00	1,00	$ 3.814,00
4.15		EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE	M3	2.726,74	$ 58.518,00	$ 159.563.371,00	2.726,53	$ 159.551.083,00		$ -	2.726,53	$ 159.551.083,00	0,21	$ 12.289,00
4.16		ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M, ACCESORIOS Y REGISTRO)	UND	43,00	$ 248.863,00	$ 10.701.109,00	43,00	$ 10.701.109,00		$ -	43,00	$ 10.701.109,00	-	$ -
					TOTAL REDES DE ACUEDUCTO KALIWIRNAE	$ 1.208.512.309,00		$ 1.009.749.154,00		$ -		$ 1.009.749.154,00		$ 198.763.156,00
5	TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN						-				-		-	
5.3		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0-2,00 M,INCLUYE CARGUE	M3	7,44	$ 98.525,00	$ 733.026,00	7,44	$ 733.026,00		$ -	7,44	$ 733.026,00	-	$ -
5.4		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN MANUAL	M3	4,90	$ 44.004,00	$ 215.620,00	4,28	$ 188.337,00		$ -	4,28	$ 188.337,00	0,62	$ 27.282,00
5.5		ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,03	$ 1.506.465,00	$ 3.058.124,00	2,03	$ 3.058.124,00		$ -	2,03	$ 3.058.124,00	-	$ -
5.6		COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,77	$ 2.146.100,00	$ 1.652.497,00	0,77	$ 1.652.497,00		$ -	0,77	$ 1.652.497,00	-	$ -
5.7		ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO ARMADO, COLOCACION Y AMARRE.	M3	461,56	$ 12.584,00	$ 5.808.271,00	361,38	$ 4.547.606,00		$ -	361,38	$ 4.547.606,00	100,18	$ 1.260.665,00
5.8		SOLADO,LIMPIEZA CONCRETO 13,8 Mpa (2000 PSI)	M3	0,68	$ 1.040.548,00	$ 707.573,00	0,68	$ 707.573,00		$ -	0,68	$ 707.573,00	-	$ -
					TOTAL TANQUE ELEVADO KALIWIRNAE	$ 197.295.146,00		$ 10.887.163,00		$ -		$ 10.887.163,00		$ 186.407.982,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL						-				-		-	
6.1		LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	48,20	$ 5.186,00	$ 249.965,00	45,50	$ 235.963,00		$ -	45,50	$ 235.963,00	2,70	$ 14.002,00
6.2		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE	M3	5,00	$ 98.525,00	$ 492.625,00	4,97	$ 489.669,00		$ -	4,97	$ 489.669,00	0,03	$ 2.956,00
6.3		CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	4,10	$ 1.074.542,00	$ 4.405.622,00	3,92	$ 4.212.205,00		$ -	3,92	$ 4.212.205,00	0,18	$ 193.418,00
6.4		VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,28	$ 1.614.244,00	$ 3.680.476,00	2,18	$ 3.519.052,00		$ -	2,18	$ 3.519.052,00	0,10	$ 161.424,00
6.5		COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,19	$ 2.146.100,00	$ 407.759,00	0,19	$ 407.759,00		$ -	0,19	$ 407.759,00	-	$ -
6.6		RELLENO CON GRAVILLA	M3	1,31	$ 161.015,00	$ 210.930,00	1,31	$ 210.930,00		$ -	1,31	$ 210.930,00	-	$ -
6.7		ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,38	$ 1.506.465,00	$ 572.457,00	0,38	$ 572.457,00		$ -	0,38	$ 572.457,00	-	$ -
6.8		ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO ARMADO, COLOCACION Y AMARRE.	KG	375,41	$ 12.584,00	$ 4.724.159,00	374,22	$ 4.709.184,00		$ -	374,22	$ 4.709.184,00	1,19	$ 14.975,00
6.9		CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.50 X 0.50 X 0.50 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UND	1,00	$ 780.751,00	$ 780.751,00	1,00	$ 780.751,00		$ -	1,00	$ 780.751,00	-	$ -
6.10		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN MANUAL	M3	0,44	$ 44.004,00	$ 19.362,00	0,44	$ 19.362,00		$ -	0,44	$ 19.362,00	-	$ -
6.11		SOLADO,LIMPIEZA CONCRETO 13,8 Mpa (2000 PSI)	M3	0,06	$ 1.004.548,00	$ 60.273,00	0,06	$ 60.273,00		$ -	0,06	$ 60.273,00	-	$ -
6.12		TUBO GALVANIZADO DE 2" (L= 2 M, E = 1,5 MM) PARA CERRAMIENTO, CON ANTICORROSIVO Y PINTURA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	UND	298,00	$ 116.787,00	$ 34.796.566,00	298,00	$ 34.796.566,00		$ -	298,00	$ 34.796.566,00	-	$ -
6.13		SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTON TUBO REDONDO GALVANIZADO 1-1/4"; (1,5 MM) MALLA ESLABONADA 2X2	M2	9,84	$ 324.465,00	$ 3.192.736,00	-	$ -		$ -	-	$ -	9,84	$ 3.192.736,00
					TOTAL CERRAMIENTO KALIWIRNAE	$ 63.593.681,00		$ 60.914.171,00		$ -		$ 60.914.171,00		$ 3.679.511,00
					TOTAL COMUNIDAD KALIWIRNAE	$ 1.848.191.004,00		$ 1.070.786.333,00		$ 179.798.802,00		$ 1.250.585.135,00		$ 595.605.870,00
COMUNIDAD ESMERALDA WALABO (20.000 - 2L) (F.Z. 1,22)														
1	POZO PROFUNDO												-	
1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	$ 135.845,00	$ 135.845,00	1,00	$ 135.845,00		$ -	1,00	$ 135.845,00	-	$ -
1.2		INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS	UND	1,00	$ 2.729.257,00	$ 2.729.257,00	1,00	$ 2.729.257,00		$ -	1,00	$ 2.729.257,00	-	$ -
1.3		PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO	ML	120,00	$ 331.099,00	$ 39.731.880,00	120,00	$ 39.731.880,00		$ -	120,00	$ 39.731.880,00	-	$ -
1.4		ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO	ML	120,00	$ 126.520,00	$ 15.422.400,00	120,00	$ 15.422.400,00		$ -	120,00	$ 15.422.400,00	-	$ -
1.5		EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL ESPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA)	UND	1,00	$ 3.849.951,00	$ 3.849.951,00	1,00	$ 3.849.951,00		$ -	1,00	$ 3.849.951,00	-	$ -
1.6		AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"	ML	120,00	$ 473.791,00	$ 56.854.920,00	120,00	$ 56.854.920,00		$ -	120,00	$ 56.854.920,00	-	$ -
1.7		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN PARA PROFUNDIDADES DE 0 A 200 M	ML	94,00	$ 307.190,00	$ 28.875.860,00	86,00	$ 26.416.340,00	-1,00	-$ 307.190,00	85,00	$ 26.111.150,00	9,00	$ 2.764.710,00
1.8		AFORO DEL POZO (PRUEBA DE BOMBEO)	UND	1,00	$ 3.590.564,00	$ 3.590.564,00	1,00	$ 3.590.564,00		$ -	1,00	$ 3.590.564,00	-	$ -
1.9		CONSTRUCCIÓN DE CABEZA DE POZO Y SELLO SANITARIO E INSTALACIÓN DE GRAVILLADORES	UND	1,00	$ 1.633.978,00	$ 1.633.978,00	1,00	$ 1.633.978,00		$ -	1,00	$ 1.633.978,00	-	$ -
1.10		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESION	ML	26,00	$ 231.060,00	$ 6.007.560,00	26,00	$ 6.007.560,00		$ -	26,00	$ 6.007.560,00	-	$ -
1.11		SUMINISTRO DE GRAVILLA TAMIZADA, SELECCIONADA Y SIN CALCÁREOS.	M3	7,02	$ 532.966,00	$ 3.741.421,00	6,57	$ 3.501.587,00		$ -	6,57	$ 3.501.587,00	0,45	$ 239.835,00
1.12		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ESTABILIZADOR Y DE RELLENO	BTO	24,00	$ 40.372,00	$ 968.928,00	24,00	$ 968.928,00		$ -	24,00	$ 968.928,00	-	$ -

CONDICIONES INICIALES							ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PERIODO (01-05-2026 AL 31-05-2026)		AVANCE ACUMULADO		CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	
Nº ITEM	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.13		LAVADO Y DESARROLLO DEL POZO POR MÉTODOS COMBINADOS (JETTING AIRE COMPRIMIDO)	UND	1,00	$ 4.028.724,00	$ 4.028.724,00	1,00	$ 4.028.724,00		$ -	1,00	$ 4.028.724,00	-	$ -
1.14		DESINFECCIÓN DEL POZO (DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO)	UND	1,00	$ 423.843,00	$ 423.843,00	1,00	$ 423.843,00		$ -	1,00	$ 423.843,00	-	$ -
1.15		ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DEL AGUA	UND	1,00	$ 380.561,00	$ 380.561,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 380.561,00
					TOTAL POZO PROFUNDO ESMERALDA WALABO	$ 168.376.692,00		$ 165.297.777,00		$ (307.190,00)		$ 164.990.587,00		$ 3.385.106,00
4	REDES DE ACUEDUCTO						-				-		-	
4.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	3.888,98	$ 4.250,00	$ 16.526.165,00	3.888,98	$ 16.526.165,00		$ -	3.888,98	$ 16.526.165,00	-	$ -
4.2		RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN	M3	972,25	$ 40.727,00	$ 39.596.826,00	847,00	$ 34.495.769,00		$ -	847,00	$ 34.495.769,00	125,25	$ 5.101.057,00
4.3		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE	M3	400,50	$ 98.525,00	$ 39.459.263,00	234,00	$ 23.054.850,00		$ -	234,00	$ 23.054.850,00	166,50	$ 16.404.413,00
4.4		CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	875,02	$ 180.167,00	$ 157.649.728,00	593,07	$ 106.851.643,00		$ -	593,07	$ 106.851.643,00	281,95	$ 50.798.085,00
4.5		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL	M3	1.033,19	$ 44.004,00	$ 45.464.493,00	1.033,19	$ 45.464.493,00		$ -	1.033,19	$ 45.464.493,00	-	$ -
4.6		RELLENO CON MATERIAL DE ARRECIFE TAMAÑO MAX. 3"	M3	291,67	$ 76.250,00	$ 22.239.838,00	254,17	$ 19.380.463,00		$ -	254,17	$ 19.380.463,00	37,50	$ 2.859.375,00
4.7		TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	188.698,95	$ 2.309,00	$ 435.705.899,00	129.952,46	$ 300.060.230,00		$ -	129.952,46	$ 300.060.230,00	58.746,50	$ 135.645.669,00
4.8		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN	ML	2.998,98	$ 23.070,00	$ 69.186.469,00	2.998,98	$ 69.186.469,00		$ -	2.998,98	$ 69.186.469,00	-	$ -
4.9		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA EN H.D. 2" (INCLUYE CAJA VALV. Y ANCLAJE EN CONCRETO)	UN	6,00	$ 1.077.889,00	$ 6.467.334,00	-	$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 6.467.334,00
4.10		CODO GRAN RADIO 90° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2")	UN	3,00	$ 120.164,00	$ 360.492,00	3,00	$ 360.492,00		$ -	3,00	$ 360.492,00	-	$ -
4.11		CODO GRAN RADIO 45° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2")	UN	5,00	$ 115.332,00	$ 576.660,00	5,00	$ 576.660,00		$ -	5,00	$ 576.660,00	-	$ -
4.12		TEE PVC - PRESION TRABAJO 200 PSI- EXTREMOS UNION MECANICA X LISO (2X2X2)	UN	14,00	$ 131.542,00	$ 1.841.588,00	14,00	$ 1.841.588,00		$ -	14,00	$ 1.841.588,00	-	$ -
4.13		SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACIÓN EN PVC Ø2" UM UN	UN	15,00	$ 90.836,00	$ 1.362.540,00	15,00	$ 1.362.540,00		$ -	15,00	$ 1.362.540,00	-	$ -
4.14		TAPON EN PVC- PRESION TRABAJO 280 PSI (2")	UN	3,00	$ 3.814,00	$ 11.442,00	3,00	$ 11.442,00		$ -	3,00	$ 11.442,00	-	$ -
4.15		EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE	M3	1.799,39	$ 58.518,00	$ 105.296.704,00	1.799,39	$ 105.296.704,00		$ -	1.799,39	$ 105.296.704,00	-	$ -
4.16		ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M, ACCESORIOS Y REGISTRO)	UND	89,00	$ 248.863,00	$ 22.148.807,00	78,00	$ 19.411.314,00		$ -	78,00	$ 19.411.314,00	11,00	$ 2.737.493,00
					TOTAL REDES DE ACUEDUCTO ESMERALDA WALABO	$ 963.896.248,00		$ 743.882.822,00		$ -		$ 743.882.822,00		$ 220.013.426,00
5	TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN						-				-		-	
5.3		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0-2,00 M,INCLUYE CARGUE	M3	8,62	$ 98.525,00	$ 849.286,00	-	$ -	7,00	$ 689.675,00	7,00	$ 689.675,00	1,62	$ 159.611,00
5.4		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN MANUAL	M3	5,76	$ 44.004,00	$ 253.463,00	-	$ -	4,00	$ 176.016,00	4,00	$ 176.016,00	1,76	$ 77.447,00
5.5		ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,35	$ 1.506.465,00	$ 3.540.193,00	-	$ -	2,00	$ 3.012.930,00	2,00	$ 3.012.930,00	0,35	$ 527.263,00
5.6		COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA OBRA SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,97	$ 2.146.100,00	$ 2.081.717,00	-	$ -	0,50	$ 1.073.050,00	0,50	$ 1.073.050,00	0,47	$ 1.008.667,00
5.7		ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO ARMADO, COLOCACION Y AMARRE.	M3	645,24	$ 12.584,00	$ 8.119.700,00	-	$ -	200,00	$ 2.516.800,00	200,00	$ 2.516.800,00	445,24	$ 5.602.900,00
5.8		SOLADO,LIMPIEZA CONCRETO 13,8 Mpa (2000 PSI)	M3	0,78	$ 1.040.548,00	$ 811.627,00	-	$ -	0,50	$ 520.274,00	0,50	$ 520.274,00	0,28	$ 291.353,00
					TOTAL TANQUE ELEVADO ESMERALDA WALABO	$ 282.150.846,00		$ -		$ 7.988.745,00		$ 7.988.745,00		$ 274.162.101,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL													
6.1		LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	54,20	$ 5.186,00	$ 281.081,00	54,20	$ 281.081,00		$ -	54,20	$ 281.081,00	-	$ -
					TOTAL CERRAMIENTO ESMERALDA WALABO	$ 69.936.842,00		$ 281.081,00		$ -		$ 281.081,00		$ 69.657.761,00
					TOTAL COMUNIDAD ESMERALDA WALABO	$ 1.762.980.235,00		$ 909.461.680,00		$ 7.681.555,00		$ 917.143.235,00		$ 845.837.001,00
COMUNIDAD PALOGRANDE WALABO (10.000 - 1L) (F.Z. 1,22)														
1	POZO PROFUNDO						-				-		-	
1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	$ 135.845,00	$ 135.845,00	1,00	$ 135.845,00		$ -	1,00	$ 135.845,00	-	$ -
1.2		INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS	UND	1,00	$ 2.729.257,00	$ 2.729.257,00	1,00	$ 2.729.257,00		$ -	1,00	$ 2.729.257,00	-	$ -
1.3		PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO	ML	118,00	$ 331.999,00	$ 39.069.682,00	118,00	$ 39.069.682,00		$ -	118,00	$ 39.069.682,00	-	$ -
1.4		ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO	ML	118,00	$ 128.520,00	$ 15.165.360,00	118,00	$ 15.165.360,00		$ -	118,00	$ 15.165.360,00	-	$ -
1.5		EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA)	UND	1,00	$ 3.849.951,00	$ 3.849.951,00	1,00	$ 3.849.951,00		$ -	1,00	$ 3.849.951,00	-	$ -
1.6		AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"	ML	118,00	$ 473.791,00	$ 55.907.338,00	118,00	$ 55.907.338,00		$ -	118,00	$ 55.907.338,00	-	$ -
1.7		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN PARA PROFUNDIDADES DE 0 A 200 M	ML	92,00	$ 307.190,00	$ 28.261.480,00	84,00	$ 25.803.960,00		$ -	84,00	$ 25.803.960,00	8,00	$ 2.457.520,00
1.8		AFORO DEL POZO (PRUEBA DE BOMBEO)	UND	1,00	$ 3.590.564,00	$ 3.590.564,00	1,00	$ 3.590.564,00		$ -	1,00	$ 3.590.564,00	-	$ -
1.9		CONSTRUCCIÓN DE CABEZA DE POZO Y SELLO SANITARIO E INSTALACIÓN DE GRAVILLADORES	UND	1,00	$ 1.633.978,00	$ 1.633.978,00	1,00	$ 1.633.978,00		$ -	1,00	$ 1.633.978,00	-	$ -
1.10		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESION	ML	26,00	$ 231.060,00	$ 6.007.560,00	26,00	$ 6.007.560,00		$ -	26,00	$ 6.007.560,00	-	$ -
1.11		SUMINISTRO DE GRAVILLA TAMIZADA, SELECCIONADA Y SIN CALCÁREOS	M3	6,90	$ 532.966,00	$ 3.677.465,00	5,00	$ 2.664.830,00		$ -	5,00	$ 2.664.830,00	1,90	$ 1.012.635,00
1.12		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ESTABILIZADOR Y DE RELLENO	BTO	23,60	$ 40.372,00	$ 952.779,00	23,60	$ 952.779,00		$ -	23,60	$ 952.779,00	-	$ -
1.13		LAVADO Y DESARROLLO DEL POZO POR MÉTODOS COMBINADOS (JETTING AIRE COMPRIMIDO)	UND	1,00	$ 4.028.724,00	$ 4.028.724,00	1,00	$ 4.028.724,00		$ -	1,00	$ 4.028.724,00	-	$ -
1.14		DESINFECCIÓN DEL POZO (DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO)	UND	1,00	$ 423.843,00	$ 423.843,00	1,00	$ 423.843,00		$ -	1,00	$ 423.843,00	-	$ -
1.15		ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DEL AGUA	UND	1,00	$ 380.561,00	$ 380.561,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 380.561,00
					TOTAL POZO PROFUNDO PALOGRANDE WALABO	$ 165.814.387,00		$ 161.963.671,00		$ -		$ 161.963.671,00		$ 3.850.716,00
4	REDES DE ACUEDUCTO						-				-		-	
4.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	2.709,38	$ 4.250,00	$ 11.514.865,00	2.709,38	$ 11.514.865,00		$ -	2.709,38	$ 11.514.865,00	-	$ -
4.2		RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN	M3	677,35	$ 40.727,00	$ 27.586.433,00	571,10	$ 23.258.986,00		$ -	571,10	$ 23.258.986,00	106,26	$ 4.327.447,00
4.3		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE	M3	342,00	$ 98.525,00	$ 33.695.550,00	201,00	$ 19.803.525,00		$ -	201,00	$ 19.803.525,00	141,00	$ 13.892.025,00
4.4		CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	609,61	$ 180.167,00	$ 109.831.605,00	399,77	$ 72.024.461,00		$ -	399,77	$ 72.024.461,00	209,85	$ 37.807.144,00
4.5		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL	M3	698,81	$ 44.004,00	$ 30.750.435,00	698,81	$ 30.750.435,00		$ -	698,81	$ 30.750.435,00	-	$ -
4.6		RELLENO CON MATERIAL DE ARRECIFE TAMAÑO MAX. 3"	M3	203,20	$ 76.250,00	$ 15.494.000,00	171,33	$ 13.063.913,00		$ -	171,33	$ 13.063.913,00	31,87	$ 2.430.088,00
4.7		TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	132.936,32	$ 2.309,00	$ 306.949.963,00	89.701,05	$ 207.119.724,00		$ -	89.701,05	$ 207.119.724,00	43.235,27	$ 99.830.238,00
4.8		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN	ML	1.949,38	$ 23.070,00	$ 44.972.197,00	1.949,38	$ 44.972.197,00		$ -	1.949,38	$ 44.972.197,00	-	$ -
4.9		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA EN H.D. 2" (INCLUYE CAJA VALV. Y ANCLAJE EN CONCRETO)	UN	5,00	$ 1.077.889,00	$ 5.389.445,00	1,00	$ 1.077.889,00		$ -	1,00	$ 1.077.889,00	4,00	$ 4.311.556,00

CONDICIONES INICIALES							ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PERIODO (01-05-2026 AL 31-05-2026)		AVANCE ACUMULADO		CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	
Nº ITEM	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
4.10		CODO GRAN RADIO 90° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2")	UN	5,00	$ 120.164,00	$ 600.820,00	5,00	$ 600.820,00		$ -	5,00	$ 600.820,00	-	$ -
4.11		CODO GRAN RADIO 45° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2")	UN	8,00	$ 115.332,00	$ 922.656,00	8,00	$ 922.656,00		$ -	8,00	$ 922.656,00	-	$ -
4.12		TEE PVC - PRESION TRABAJO 200 PSI- EXTREMOS UNION MECANICA X LISO (2X2X2)	UN	6,00	$ 131.542,00	$ 789.252,00	6,00	$ 789.252,00		$ -	6,00	$ 789.252,00	-	$ -
4.13		SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø2" UM UN	UN	10,00	$ 90.836,00	$ 908.360,00	10,00	$ 908.360,00		$ -	10,00	$ 908.360,00	-	$ -
4.14		TAPON EN PVC- PRESION TRABAJO 280 PSI (2")	UN	3,00	$ 3.814,00	$ 11.442,00	3,00	$ 11.442,00		$ -	3,00	$ 11.442,00	-	$ -
4.15		EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE	M3	1.169,63	$ 58.518,00	$ 68.444.408,00	1.169,63	$ 68.444.408,00		$ -	1.169,63	$ 68.444.408,00	-	$ -
4.16		ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M, ACCESORIOS Y REGISTRO)	UND	76,00	$ 248.863,00	$ 18.913.588,00	67,00	$ 16.673.821,00		$ -	67,00	$ 16.673.821,00	9,00	$ 2.239.767,00
		TOTAL REDES DE ACUEDUCTO PALOGRANDE WALABO				$ 676.776.019,00		$ 511.936.764,00		$ -		$ 511.936.764,00		$ 164.839.255,00
5	TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN						-				-		-	
5.1		PLATAFORMA EN LÁMINA ALFAJOR ESPESOR 1/4" MM (INCLUYE TRANSPORTE, MONTAJE, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE)	M2	10,56	$ 638.258,00	$ 6.740.004,00	-	$ -	10,56	$ 6.740.004,00	10,56	$ 6.740.004,00	-	$ -
5.2.1		TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 10000 LITROS, ELEVADO A 13,5 METROS DE ALTURA, TIPO PLASTICO	UND	1,00	$ 34.320.004,00	$ 34.320.004,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 34.320.004,00
5.3		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0-2,00 M,INCLUYE CARGUE	M3	7,44	$ 98.525,00	$ 733.026,00	7,44	$ 733.026,00		$ -	7,44	$ 733.026,00	-	$ -
5.4		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN MANUAL.	M3	4,90	$ 44.004,00	$ 215.620,00	4,28	$ 188.337,00		$ -	4,28	$ 188.337,00	0,62	$ 27.282,00
5.5		ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,03	$ 1.506.465,00	$ 3.058.124,00	2,03	$ 3.058.124,00		$ -	2,03	$ 3.058.124,00	-	$ -
5.6		COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,77	$ 2.146.100,00	$ 1.652.497,00	0,77	$ 1.652.497,00		$ -	0,77	$ 1.652.497,00	-	$ -
5.7		ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO ARMADO, COLOCACION Y AMARRE.	M3	461,56	$ 12.584,00	$ 5.808.271,00	361,38	$ 4.547.606,00		$ -	361,38	$ 4.547.606,00	100,18	$ 1.260.665,00
5.8		SOLADO,LIMPIEZA CONCRETO 13,8 Mpa (2000 PSI)	M3	0,68	$ 1.040.548,00	$ 707.573,00	0,68	$ 707.573,00		$ -	0,68	$ 707.573,00	-	$ -
5.9		ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A500 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)	KG	2.842,31	$ 47.718,00	$ 135.629.349,00	-	$ -	1.000,00	$ 47.718.000,00	1.000,00	$ 47.718.000,00	1.842,31	$ 87.911.349,00
5.10		ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A588 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)	KG	133,00	$ 48.817,00	$ 6.492.661,00	-	$ -	50,00	$ 2.440.850,00	50,00	$ 2.440.850,00	83,00	$ 4.051.811,00
5.11		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO E INSTALACION	ML	19,45	$ 99.641,00	$ 1.938.017,00	-	$ -		$ -	-	$ -	19,45	$ 1.938.017,00
		TOTAL TANQUE ELEVADO PALOGRANDE WALABO				$ 197.285.146,00		$ 10.887.163,00		$ 56.898.854,00		$ 67.786.017,00		$ 129.509.128,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL						-				-		-	
6.1		LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	48,20	$ 5.186,00	$ 249.965,00	45,50	$ 235.963,00		$ -	45,50	$ 235.963,00	2,70	$ 14.002,00
6.2		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE	M3	5,00	$ 98.525,00	$ 492.625,00	4,97	$ 489.669,00		$ -	4,97	$ 489.669,00	0,03	$ 2.956,00
6.3		CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	4,10	$ 1.074.542,00	$ 4.405.622,00	3,92	$ 4.212.205,00		$ -	3,92	$ 4.212.205,00	0,18	$ 193.418,00
6.4		VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,28	$ 1.614.244,00	$ 3.680.476,00	2,18	$ 3.519.052,00		$ -	2,18	$ 3.519.052,00	0,10	$ 161.424,00
6.5		COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,19	$ 2.146.100,00	$ 407.759,00	0,19	$ 407.759,00		$ -	0,19	$ 407.759,00	-	$ -
6.6		RELLENO CON GRAVILLA	M3	1,31	$ 161.015,00	$ 210.930,00	1,31	$ 210.930,00		$ -	1,31	$ 210.930,00	-	$ -
6.7		ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,38	$ 1.506.465,00	$ 572.457,00	0,38	$ 572.457,00		$ -	0,38	$ 572.457,00	-	$ -
6.8		ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO ARMADO, COLOCACION Y AMARRE.	KG	375,41	$ 12.584,00	$ 4.724.159,00	200,00	$ 2.516.800,00		$ -	200,00	$ 2.516.800,00	175,41	$ 2.207.359,00
6.9		CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.50 X 0.50 X 0.50 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UND	1,00	$ 780.751,00	$ 780.751,00	1,00	$ 780.751,00		$ -	1,00	$ 780.751,00	-	$ -
6.10		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN MANUAL.	M3	0,44	$ 44.004,00	$ 19.362,00	0,44	$ 19.362,00		$ -	0,44	$ 19.362,00	-	$ -
6.11		SOLADO,LIMPIEZA CONCRETO 13,8 Mpa (2000 PSI)	M3	0,06	$ 1.004.548,00	$ 60.273,00	0,06	$ 60.273,00		$ -	0,06	$ 60.273,00	-	$ -
6.12		TUBO GALVANIZADO DE 2" (L= 2 M, E = 1,5 MM) PARA CERRAMIENTO, CON ANTICORROSIVO Y PINTURA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	UND	298,00	$ 116.767,00	$ 34.796.566,00	282,00	$ 32.928.294,00		$ -	282,00	$ 32.928.294,00	16,00	$ 1.868.272,00
6.13		SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTON TUBO REDONDO GALVANIZADO 1-1/4", (1,5 MM) MALLA ESLABONADA 2X2	M2	9,84	$ 324.465,00	$ 3.192.738,00	-	$ -		$ -	-	$ -	9,84	$ 3.192.736,00
		TOTAL CERRAMIENTO PALOGRANDE WALABO				$ 53.593.681,00		$ 45.953.515,00		$ -		$ 45.953.515,00		$ 7.640.167,00
		TOTAL COMUNIDAD PALOGRANDE WALABO				$ 1.298.122.486,00		$ 730.741.103,00		$ 56.898.854,00		$ 787.639.957,00		$ 510.482.529,00
COMUNIDAD LA UNIÓN (6000 - 1L) (F.Z. 1,22)														
1	POZO PROFUNDO												-	
1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	$ 135.845,00	$ 135.845,00	1,00	$ 135.845,00		$ -	1,00	$ 135.845,00	-	$ -
1.2		INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS	UND	1,00	$ 2.729.257,00	$ 2.729.257,00	1,00	$ 2.729.257,00		$ -	1,00	$ 2.729.257,00	-	$ -
1.3		PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO	ML	140,00	$ 331.099,00	$ 46.353.860,00	140,00	$ 46.353.860,00		$ -	140,00	$ 46.353.860,00	-	$ -
1.4		ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO	ML	140,00	$ 128.520,00	$ 17.992.800,00	140,00	$ 17.992.800,00		$ -	140,00	$ 17.992.800,00	-	$ -
1.5		EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA)	UND	1,00	$ 3.849.951,00	$ 3.849.951,00	1,00	$ 3.849.951,00		$ -	1,00	$ 3.849.951,00	-	$ -
1.6		AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"	ML	140,00	$ 473.791,00	$ 66.330.740,00	140,00	$ 66.330.740,00		$ -	140,00	$ 66.330.740,00	-	$ -
1.7		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN PARA PROFUNDIDADES DE 0 A 200 M.	ML	109,00	$ 307.190,00	$ 33.483.710,00	105,00	$ 32.254.950,00		$ -	105,00	$ 32.254.950,00	4,00	$ 1.228.760,00
1.8		AFORO DEL POZO (PRUEBA DE BOMBEO)	UND	1,00	$ 3.590.564,00	$ 3.590.564,00	1,00	$ 3.590.564,00		$ -	1,00	$ 3.590.564,00	-	$ -
1.9		CONSTRUCCIÓN DE CABEZA DE POZO Y SELLO SANITARIO E INSTALACIÓN DE GRAVILLADORES	UND	1,00	$ 1.633.978,00	$ 1.633.978,00	1,00	$ 1.633.978,00		$ -	1,00	$ 1.633.978,00	-	$ -
1.10		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESION	ML	31,00	$ 231.060,00	$ 7.162.860,00	31,00	$ 7.162.860,00		$ -	31,00	$ 7.162.860,00	-	$ -
1.11		SUMINISTRO DE GRAVILLA TAMIZADA, SELECCIONADA Y SIN CALCÁREOS.	M3	8,22	$ 532.966,00	$ 4.380.981,00	7,00	$ 3.730.762,00		$ -	7,00	$ 3.730.762,00	1,22	$ 650.219,00
1.12		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ESTABILIZADOR Y DE RELLENO	BTO	28,00	$ 40.372,00	$ 1.130.416,00	28,00	$ 1.130.416,00		$ -	28,00	$ 1.130.416,00	-	$ -
1.13		LAVADO Y DESARROLLO DEL POZO POR MÉTODOS COMBINADOS (JETTING AIRE COMPRIMIDO)	UND	1,00	$ 4.028.724,00	$ 4.028.724,00	1,00	$ 4.028.724,00		$ -	1,00	$ 4.028.724,00	-	$ -
1.14		DESINFECCIÓN DEL POZO (DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO)	UND	1,00	$ 423.843,00	$ 423.843,00	1,00	$ 423.843,00		$ -	1,00	$ 423.843,00	-	$ -
1.15		ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DEL AGUA	UND	1,00	$ 380.561,00	$ 380.561,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 380.561,00
		TOTALPOZO PROFUNDO LA UNIÓN				$ 193.609.090,00		$ 191.348.550,00		$ -		$ 191.348.550,00		$ 2.259.540,00
4	REDES DE ACUEDUCTO						-				-		-	
4.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	1.059,52	$ 4.250,00	$ 4.502.960,00	1.059,52	$ 4.502.960,00		$ -	1.059,52	$ 4.502.960,00	-	$ -

CONDICIONES INICIALES							ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PERIODO (01-05-2026 AL 31-05-2026)		AVANCE ACUMULADO		CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	
Nº ITEM	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
4.2		RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN	M3	264,88	$ 40.727,00	$ 10.787.768,00	229,88	$ 9.362.323,00		$ -	229,88	$ 9.362.323,00	35,00	$ 1.425.445,00
4.3		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE	M3	126,00	$ 98.525,00	$ 12.414.150,00	84,00	$ 8.276.100,00		$ -	84,00	$ 8.276.100,00	42,00	$ 4.138.050,00
4.4		CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	238,39	$ 180.167,00	$ 42.950.011,00	195,05	$ 35.140.673,00		$ -	195,05	$ 35.140.673,00	43,35	$ 7.809.338,00
4.5		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL	M3	275,86	$ 44.004,00	$ 12.138.943,00	275,86	$ 12.138.943,00		$ -	275,86	$ 12.138.943,00	-	$ -
4.6		RELLENO CON MATERIAL DE ARRECIFE TAMAÑO MAX. 3"	M3	79,46	$ 76.250,00	$ 6.059.825,00	68,96	$ 5.258.200,00		$ -	68,96	$ 5.258.200,00	10,50	$ 800.625,00
4.7		TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	54.943,00	$ 2.309,00	$ 126.863.387,00	38.852,27	$ 89.709.891,00		$ -	38.852,27	$ 89.709.891,00	16.090,73	$ 37.153.496,00
4.8		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN	ML	779,52	$ 23.070,00	$ 17.983.526,00	779,52	$ 17.983.526,00		$ -	779,52	$ 17.983.526,00	-	$ -
4.12		TEE PVC - PRESION TRABAJO 200 PSI- EXTREMOS UNION MECANICA X LISO (2X2X2)	UN	4,00	$ 131.542,00	$ 526.168,00	3,00	$ 394.626,00		$ -	3,00	$ 394.626,00	1,00	$ 131.542,00
4.13		SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø2" UM UN	UN	4,00	$ 90.836,00	$ 363.344,00	4,00	$ 363.344,00		$ -	4,00	$ 363.344,00	-	$ -
4.14		TAPON EN PVC- PRESION TRABAJO 280 PSI (2")	UN	5,00	$ 3.814,00	$ 19.070,00	5,00	$ 19.070,00		$ -	5,00	$ 19.070,00	-	$ -
4.15		EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE	M3	467,71	$ 58.516,00	$ 27.369.454,00	467,71	$ 27.369.454,00		$ -	467,71	$ 27.369.454,00	-	$ -
4.16		ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M, ACCESORIOS Y REGISTRO)	UND	28,00	$ 246.863,00	$ 6.968.164,00	28,00	$ 6.968.164,00		$ -	28,00	$ 6.968.164,00	-	$ -
					TOTAL REDES DE ACUEDUCTO LA UNIÓN	$ 271.221.712,00		$ 217.487.274,00		$ -		$ 217.487.274,00		$ 53.734.438,00
5	TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN						-				-		-	
5.1		PLATAFORMA EN LÁMINA ALFAJOR ESPESOR 1/4" MM (INCLUYE TRANSPORTE, MONTAJE, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE)	M2	10,56	$ 638.256,00	$ 6.740.004,00	-	$ -	10,56	$ 6.740.004,00	10,56	$ 6.740.004,00	-	$ -
5.2		TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 6000 LITROS, ELEVADO A 13,5 METROS DE ALTURA, TIPO PLASTICO	UND	1,00	$ 14.744.471,00	$ 14.744.471,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 14.744.471,00
5.3		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0-2,00 M,INCLUYE CARGUE	M3	7,44	$ 98.525,00	$ 733.026,00	7,44	$ 733.026,00		$ -	7,44	$ 733.026,00	-	$ -
5.4		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN MANUAL	M3	4,90	$ 44.004,00	$ 215.620,00	4,90	$ 215.620,00		$ -	4,90	$ 215.620,00	-	$ -
5.5		ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,03	$ 1.506.465,00	$ 3.058.124,00	2,03	$ 3.058.124,00		$ -	2,03	$ 3.058.124,00	-	$ -
5.7		ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO ARMADO, COLOCACION Y AMARRE.	M3	461,56	$ 12.584,00	$ 5.808.271,00	200,00	$ 2.516.800,00		$ -	200,00	$ 2.516.800,00	261,56	$ 3.291.471,00
5.8		SOLADO LIMPIEZA CONCRETO 13,8 Mpa (2000 PSI)	M3	0,68	$ 1.040.548,00	$ 707.573,00	0,68	$ 707.573,00		$ -	0,68	$ 707.573,00	-	$ -
5.9		ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A500 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)	KG	2.480,08	$ 47.716,00	$ 118.344.457,00	-	$ -	2.200,00	$ 104.979.600,00	2.200,00	$ 104.979.600,00	280,08	$ 13.364.857,00
5.10		ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A588 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)	KG	133,00	$ 48.817,00	$ 6.492.661,00	-	$ -	100,00	$ 4.881.700,00	100,00	$ 4.881.700,00	33,00	$ 1.610.961,00
5.11		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO E INSTALACION	ML	19,45	$ 99.641,00	$ 1.938.017,00	-	$ -		$ -	-	$ -	19,45	$ 1.938.017,00
					TOTAL TANQUE ELEVADO LA UNIÓN	$ 160.434.721,00		$ 7.231.143,00		$ 116.601.304,00		$ 123.832.447,00		$ 36.602.274,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL						-				-		-	
6.1		LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	48,20	$ 5.186,00	$ 249.965,00	48,20	$ 249.965,00		$ -	48,20	$ 249.965,00	-	$ -
					TOTAL CERRAMIENTO LA UNION	$ 53.593.681,00		$ 249.965,00		$ -		$ 249.965,00		$ 53.343.716,00
					TOTAL COMUNIDAD LA UNION	$ 883.474.081,00		$ 416.316.932,00		$ 116.601.304,00		$ 532.918.236,00		$ 350.555.845,00
COMUNIDAD PUNTO GRILLO (10.000 - 1L) (F.Z. 1,22)														
1	POZO PROFUNDO												-	
1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	$ 135.845,00	$ 135.845,00	1,00	$ 135.845,00		$ -	1,00	$ 135.845,00	-	$ -
1.2		INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS	UND	1,00	$ 2.729.257,00	$ 2.729.257,00	1,00	$ 2.729.257,00		$ -	1,00	$ 2.729.257,00	-	$ -
1.3		PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO	ML	143,00	$ 331.099,00	$ 47.347.157,00	143,00	$ 47.347.157,00		$ -	143,00	$ 47.347.157,00	-	$ -
1.4		ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO	ML	143,00	$ 128.520,00	$ 18.378.360,00	143,00	$ 18.378.360,00		$ -	143,00	$ 18.378.360,00	-	$ -
1.5		EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA)	UND	1,00	$ 3.849.951,00	$ 3.849.951,00	1,00	$ 3.849.951,00		$ -	1,00	$ 3.849.951,00	-	$ -
1.6		AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"	ML	143,00	$ 473.791,00	$ 67.752.113,00	143,00	$ 67.752.113,00		$ -	143,00	$ 67.752.113,00	-	$ -
1.7		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN PARA PROFUNDIDADES DE 0 A 200 M	ML	111,00	$ 307.190,00	$ 34.098.090,00	107,00	$ 32.869.330,00		$ -	107,00	$ 32.869.330,00	4,00	$ 1.228.760,00
1.8		AFORO DEL POZO (PRUEBA DE BOMBEO)	UNO	1,00	$ 3.590.564,00	$ 3.590.564,00	1,00	$ 3.590.564,00		$ -	1,00	$ 3.590.564,00	-	$ -
1.9		CONSTRUCCIÓN DE CABEZA DE POZO Y SELLO SANITARIO E INSTALACIÓN DE GRAVILLADORES	UND	1,00	$ 1.633.978,00	$ 1.633.978,00	1,00	$ 1.633.978,00		$ -	1,00	$ 1.633.978,00	-	$ -
1.10		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESION	ML	32,00	$ 231.060,00	$ 7.393.920,00	32,00	$ 7.393.920,00		$ -	32,00	$ 7.393.920,00	-	$ -
1.11		SUMINISTRO DE GRAVILLA TAMIZADA, SELECCIONADA Y SIN CALCÁREOS.	M3	8,40	$ 532.966,00	$ 4.476.914,00	7,00	$ 3.730.762,00	1,40	$ 746.152,00	8,40	$ 4.476.914,00	-	$ -
1.12		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ESTABILIZADOR Y DE RELLENO	BTO	28,60	$ 40.372,00	$ 1.154.639,00	28,60	$ 1.154.639,00		$ -	28,60	$ 1.154.639,00	-	$ -
1.13		LAVADO Y DESARROLLO DEL POZO POR MÉTODOS COMBINADOS (JETTING AIRE COMPRIMIDO)	UND	1,00	$ 4.028.724,00	$ 4.028.724,00	1,00	$ 4.028.724,00		$ -	1,00	$ 4.028.724,00	-	$ -
1.14		DESINFECCIÓN DEL POZO (DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO)	UND	1,00	$ 423.843,00	$ 423.843,00	1,00	$ 423.843,00		$ -	1,00	$ 423.843,00	-	$ -
1.15		ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DEL AGUA	UND	1,00	$ 380.561,00	$ 380.561,00	-	$ -	1,00	$ 380.561,00	1,00	$ 380.561,00	-	$ -
					TOTAL POZO PROFUNDO PUNTO GRILLO	$ 197.373.916,00		$ 195.018.443,00		$ 1.126.713,00		$ 196.145.156,00		$ 1.228.760,00
4	REDES DE ACUEDUCTO						-				-		-	
4.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	1.951,87	$ 4.250,00	$ 8.295.448,00	1.951,87	$ 8.295.448,00		$ -	1.951,87	$ 8.295.448,00	-	$ -
4.2		RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN	M3	487,97	$ 40.727,00	$ 19.873.554,00	386,72	$ 15.749.945,00		$ -	386,72	$ 15.749.945,00	101,25	$ 4.123.609,00
4.3		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE	M3	274,50	$ 98.525,00	$ 27.045.113,00	126,00	$ 12.414.150,00		$ -	126,00	$ 12.414.150,00	148,50	$ 14.630.963,00
4.4		CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	439,17	$ 180.167,00	$ 79.123.941,00	267,05	$ 48.113.597,00		$ -	267,05	$ 48.113.597,00	172,12	$ 31.010.344,00
4.5		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL	M3	494,06	$ 44.004,00	$ 21.740.616,00	494,06	$ 21.740.616,00		$ -	494,06	$ 21.740.616,00	-	$ -
4.6		RELLENO CON MATERIAL DE ARRECIFE TAMAÑO MAX. 3"	M3	146,39	$ 76.250,00	$ 11.162.238,00	116,39	$ 8.874.356,00		$ -	116,39	$ 8.874.356,00	30,01	$ 2.287.881,00
4.7		TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	96.663,66	$ 2.309,00	$ 227.860.571,00	62.922,29	$ 145.287.568,00		$ -	62.922,29	$ 145.287.568,00	35.761,37	$ 82.573.003,00
4.8		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN	ML	1.341,87	$ 23.070,00	$ 30.956.941,00	1.341,87	$ 30.956.941,00		$ -	1.341,87	$ 30.956.941,00	-	$ -
4.9		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA EN H.D. 2" (INCLUYE CAJA VALV. Y ANCLAJE EN CONCRETO)	UN	2,00	$ 1.077.889,00	$ 2.155.778,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 2.155.778,00
4.10		CODO GRAN RADIO 90° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2")	UN	4,00	$ 120.164,00	$ 480.656,00	3,00	$ 360.492,00		$ -	3,00	$ 360.492,00	1,00	$ 120.164,00
4.11		CODO GRAN RADIO 45° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2")	UN	1,00	$ 115.332,00	$ 115.332,00	1,00	$ 115.332,00		$ -	1,00	$ 115.332,00	-	$ -
4.12		TEE PVC - PRESION TRABAJO 200 PSI- EXTREMOS UNION MECANICA X LISO (2X2X2)	UN	5,00	$ 131.542,00	$ 657.710,00	5,00	$ 657.710,00		$ -	5,00	$ 657.710,00	-	$ -
4.13		SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø2" UM UN	UN	5,00	$ 90.836,00	$ 454.180,00	5,00	$ 454.180,00		$ -	5,00	$ 454.180,00	-	$ -
4.14		TAPON EN PVC- PRESION TRABAJO 280 PSI (2")	UN	2,00	$ 3.814,00	$ 7.628,00	2,00	$ 7.628,00		$ -	2,00	$ 7.628,00	-	$ -

CONDICIONES INICIALES							ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PERIODO (01-05-2026 AL 31-05-2026)		AVANCE ACUMULADO		CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	
Nº ITEM	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
4.15		EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE	M3	805,12	$ 58.518,00	$ 47.114.012,00	805,12	$ 47.114.012,00		$ -	805,12	$ 47.114.012,00	-	$ -
4.16		ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M, ACCESORIOS Y REGISTRO)	UND	61,00	$ 248.863,00	$ 15.180.643,00	42,00	$ 10.452.246,00		$ -	42,00	$ 10.452.246,00	19,00	$ 4.728.397,00
					TOTAL REDES DE ACUEDUCTO PUNTO GRILLO	$ 492.224.361,00		$ 350.594.221,00		$ -		$ 350.594.221,00		$ 141.630.139,00
5	TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN						-				-		-	
5.3		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0-2,00 M,INCLUYE CARGUE	M3	7,44	$ 98.525,00	$ 733.026,00	7,44	$ 733.026,00		$ -	7,44	$ 733.026,00	-	$ -
5.4		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN MANUAL	M3	4,90	$ 44.004,00	$ 215.620,00	4,90	$ 215.620,00		$ -	4,90	$ 215.620,00	-	$ -
5.5		ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,03	$ 1.506.465,00	$ 3.058.124,00	2,03	$ 3.058.124,00		$ -	2,03	$ 3.058.124,00	-	$ -
5.6		COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,77	$ 2.146.100,00	$ 1.652.497,00		$ -		$ -	-	$ -	0,77	$ 1.652.497,00
5.7		ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO ARMADO, COLOCACION Y AMARRE.	M3	461,56	$ 12.584,00	$ 5.808.271,00	200,00	$ 2.516.800,00		$ -	200,00	$ 2.516.800,00	261,56	$ 3.291.471,00
5.8		SOLADO,LIMPIEZA CONCRETO 13,8 Mpa (2000 PSI)	M3	0,68	$ 1.040.548,00	$ 707.573,00	0,68	$ 707.573,00		$ -	0,68	$ 707.573,00	-	$ -
					TOTAL TANQUE ELEVADO PUNTO GRILLO	$ 197.295.148,00		$ 7.231.143,00		$ -		$ 7.231.143,00		$ 190.064.003,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL												-	
6.1		LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	48,20	$ 5.186,00	$ 249.965,00	48,20	$ 249.965,00		$ -	48,20	$ 249.965,00	-	$ -
					TOTAL CERRAMIENTO PUNTO GRILLO	$ 53.693.681,00		$ 249.965,00		$ -		$ 249.965,00		$ 53.343.716,00
					TOTAL COMUNIDAD PUNTO GRILLO	$ 1.145.118.624,00		$ 553.093.772,00		$ 1.126.713,00		$ 554.220.485,00		$ 590.898.138,00
COMUNIDAD ALGARROBO (6000 - 1L) (F.Z. 1,22)														
1	POZO PROFUNDO						-				-		-	
1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	$ 135.845,00	$ 135.845,00	1,00	$ 135.845,00		$ -	1,00	$ 135.845,00	-	$ -
1.2		INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS	UND	1,00	$ 2.729.257,00	$ 2.729.257,00	1,00	$ 2.729.257,00		$ -	1,00	$ 2.729.257,00	-	$ -
1.3		PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO	ML	143,00	$ 331.099,00	$ 47.347.157,00	143,00	$ 47.347.157,00		$ -	143,00	$ 47.347.157,00	-	$ -
1.4		ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO	ML	143,00	$ 128.520,00	$ 18.378.360,00	143,00	$ 18.378.360,00		$ -	143,00	$ 18.378.360,00	-	$ -
1.5		EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA)	UND	1,00	$ 3.849.951,00	$ 3.849.951,00	1,00	$ 3.849.951,00		$ -	1,00	$ 3.849.951,00	-	$ -
1.6		AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"	ML	143,00	$ 473.791,00	$ 67.752.113,00	143,00	$ 67.752.113,00		$ -	143,00	$ 67.752.113,00	-	$ -
1.7		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN PARA PROFUNDIDADES DE 0 A 200 M	ML	111,00	$ 307.190,00	$ 34.098.090,00	-	$ -	108,00	$ 33.176.520,00	108,00	$ 33.176.520,00	3,00	$ 921.570,00
1.8		AFORO DEL POZO (PRUEBA DE BOMBEO)	UND	1,00	$ 3.590.564,00	$ 3.590.564,00	-	$ -	1,00	$ 3.590.564,00	1,00	$ 3.590.564,00	-	$ -
1.9		CONSTRUCCIÓN DE CABEZA DE POZO Y SELLO SANITARIO E INSTALACIÓN DE GRAVILLADORES	UND	1,00	$ 1.633.978,00	$ 1.633.978,00	-	$ -	1,00	$ 1.633.978,00	1,00	$ 1.633.978,00	-	$ -
1.10		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESION	ML	32,00	$ 231.060,00	$ 7.393.920,00	-	$ -	32,00	$ 7.393.920,00	32,00	$ 7.393.920,00	-	$ -
1.11		SUMINISTRO DE GRAVILLA TAMIZADA, SELECCIONADA Y SIN CALCÁREOS.	M3	8,40	$ 532.968,00	$ 4.476.914,00	-	$ -	7,00	$ 3.730.762,00	7,00	$ 3.730.762,00	1,40	$ 746.152,00
1.12		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ESTABILIZADOR Y DE RELLENO	BTO	28,60	$ 40.372,00	$ 1.154.639,00	-	$ -	28,60	$ 1.154.639,00	28,60	$ 1.154.639,00	-	$ -
1.13		LAVADO Y DESARROLLO DEL POZO POR MÉTODOS COMBINADOS (JETTING AIRE COMPRIMIDO)	UND	1,00	$ 4.028.724,00	$ 4.028.724,00	-	$ -	1,00	$ 4.028.724,00	1,00	$ 4.028.724,00	-	$ -
1.14		DESINFECCIÓN DEL POZO (DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO)	UND	1,00	$ 423.843,00	$ 423.843,00	-	$ -	1,00	$ 423.843,00	1,00	$ 423.843,00	-	$ -
1.15		ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DEL AGUA	UND	1,00	$ 380.561,00	$ 380.561,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 380.561,00
					TOTAL POZO PROFUNDO ALGARROBO	$ 197.373.916,00		$ 140.192.683,00		$ 55.132.950,00		$ 195.325.633,00		$ 2.048.283,00
4	REDES DE ACUEDUCTO						-				-		-	
4.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	2.362,75	$ 4.250,00	$ 10.041.688,00	2.362,75	$ 10.041.688,00		$ -	2.362,75	$ 10.041.688,00	-	$ -
4.2		RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN	M3	590,69	$ 40.727,00	$ 24.057.032,00	440,00	$ 17.919.880,00		$ -	440,00	$ 17.919.880,00	150,69	$ 6.137.152,00
4.3		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE	M3	112,50	$ 98.525,00	$ 11.084.063,00	-	$ -		$ -	-	$ -	112,50	$ 11.084.063,00
4.4		CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	531,62	$ 180.167,00	$ 95.780.381,00	304,43	$ 54.848.240,00		$ -	304,43	$ 54.848.240,00	227,19	$ 40.932.141,00
4.5		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL	M3	671,33	$ 44.004,00	$ 29.541.205,00	616,00	$ 27.106.464,00		$ -	616,00	$ 27.106.464,00	55,33	$ 2.434.741,00
4.6		RELLENO CON MATERIAL DE ARRECIFE TAMAÑO MAX. 3"	M3	177,21	$ 76.250,00	$ 13.512.263,00	132,00	$ 10.065.000,00		$ -	132,00	$ 10.065.000,00	45,21	$ 3.447.263,00
4.7		TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	119.357,36	$ 2.309,00	$ 275.596.144,00	71.602,48	$ 165.330.126,00		$ -	71.602,48	$ 165.330.126,00	47.754,88	$ 110.266.018,00
4.8		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN	ML	2.112,75	$ 23.070,00	$ 48.741.143,00	1.760,00	$ 40.603.200,00		$ -	1.760,00	$ 40.603.200,00	352,75	$ 8.137.943,00
4.15		EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE	M3	1.267,65	$ 58.518,00	$ 74.180.343,00	990,51	$ 57.962.664,00		$ -	990,51	$ 57.962.664,00	277,14	$ 16.217.679,00
					TOTAL REDES DE ACUEDUCTO ALGARROBO	$ 593.296.357,00		$ 383.877.262,00		$ -		$ 383.877.262,00		$ 209.419.095,00
5	TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN						-				-		-	
5.3		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0-2,00 M,INCLUYE CARGUE	M3	7,44	$ 98.525,00	$ 733.026,00	7,44	$ 733.026,00		$ -	7,44	$ 733.026,00	-	$ -
5.4		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN MANUAL	M3	4,90	$ 44.004,00	$ 215.620,00	4,90	$ 215.620,00		$ -	4,90	$ 215.620,00	-	$ -
5.5		ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,03	$ 1.506.465,00	$ 3.058.124,00	2,03	$ 3.058.124,00		$ -	2,03	$ 3.058.124,00	-	$ -
5.6		COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,77	$ 2.146.100,00	$ 1.652.497,00		$ -		$ -	-	$ -	0,77	$ 1.652.497,00
5.7		ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO ARMADO, COLOCACION Y AMARRE.	M3	461,56	$ 12.584,00	$ 5.808.271,00	200,00	$ 2.516.800,00		$ -	200,00	$ 2.516.800,00	261,56	$ 3.291.471,00
5.8		SOLADO,LIMPIEZA CONCRETO 13,8 Mpa (2000 PSI)	M3	0,68	$ 1.040.548,00	$ 707.573,00	0,68	$ 707.573,00		$ -	0,68	$ 707.573,00	-	$ -
					TOTAL TANQUE ELEVADO ALGARROBO	$ 177.719.813,00		$ 7.231.143,00		$ -		$ 7.231.143,00		$ 170.488.670,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL						-				-		-	
6.1		LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	48,20	$ 5.186,00	$ 249.965,00	48,20	$ 249.965,00		$ -	48,20	$ 249.965,00	-	$ -
					TOTAL CERRAMIENTO ALGARROBO	$ 53.693.681,00		$ 249.965,00		$ -		$ 249.965,00		$ 53.343.716,00
					TOTAL COMUNIDAD ALGARROBO	$ 1.226.615.087,00		$ 531.551.053,00		$ 55.132.950,00		$ 586.684.003,00		$ 639.931.084,00
COMUNIDAD MATAPALITO (6000 - 1L) (F.Z. 1,24)														
1	POZO PROFUNDO						-				-		-	
1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	$ 136.689,00	$ 136.689,00	1,00	$ 136.689,00		$ -	1,00	$ 136.689,00	-	$ -
1.2		INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS	UND	1,00	$ 2.767.688,00	$ 2.767.688,00	1,00	$ 2.767.688,00		$ -	1,00	$ 2.767.688,00	-	$ -
1.3		PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO	ML	132,00	$ 335.580,00	$ 44.296.560,00	132,00	$ 44.296.560,00		$ -	132,00	$ 44.296.560,00	-	$ -
1.4		ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO	ML	132,00	$ 129.923,00	$ 17.149.836,00	132,00	$ 17.149.836,00		$ -	132,00	$ 17.149.836,00	-	$ -
1.5		EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA)	UND	1,00	$ 3.885.726,00	$ 3.885.726,00	1,00	$ 3.885.726,00		$ -	1,00	$ 3.885.726,00	-	$ -
1.6		AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"	ML	132,00	$ 481.054,00	$ 63.499.128,00	132,00	$ 63.499.128,00		$ -	132,00	$ 63.499.128,00	-	$ -

		CONDICIONES INICIALES					ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PERIODO (01-05-2026 AL 31-05-2026)		AVANCE ACUMULADO		CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	
Nº ITEM	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.7		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN PARA PROFUNDIDADES DE 0 A 200 M	ML	101,00	$ 310.506,00	$ 31.361.106,00	100,00	$ 31.050.600,00		$ -	100,00	$ 31.050.600,00	1,00	$ 310.506,00
1.8		AFORO DEL POZO (PRUEBA DE BOMBEO)	UND	1,00	$ 3.634.415,00	$ 3.634.415,00	1,00	$ 3.634.415,00		$ -	1,00	$ 3.634.415,00	-	$ -
1.9		CONSTRUCCIÓN DE CABEZA DE POZO Y SELLO SANITARIO E INSTALACIÓN DE GRAVILLADORES	UND	1,00	$ 1.642.554,00	$ 1.642.554,00	1,00	$ 1.642.554,00		$ -	1,00	$ 1.642.554,00	-	$ -
1.10		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESION	ML	31,00	$ 233.161,00	$ 7.227.991,00	31,00	$ 7.227.991,00		$ -	31,00	$ 7.227.991,00	-	$ -
1.11		SUMINISTRO DE GRAVILLA TAMIZADA, SELECCIONADA Y SIN CALCÁREOS.	M3	7,74	$ 540.267,00	$ 4.181.667,00		$ -	7,00	$ 3.781.869,00	7,00	$ 3.781.869,00	0,74	$ 399.798,00
1.12		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ESTABILIZADOR Y DE RELLENO	BTO	26,40	$ 40.899,00	$ 1.079.734,00	26,40	$ 1.079.734,00		$ -	26,40	$ 1.079.734,00	-	$ -
1.13		LAVADO Y DESARROLLO DEL POZO POR MÉTODOS COMBINADOS (JETTING AIRE COMPRIMIDO)	UND	1,00	$ 4.092.271,00	$ 4.092.271,00	1,00	$ 4.092.271,00		$ -	1,00	$ 4.092.271,00	-	$ -
1.14		DESINFECCIÓN DEL POZO (DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO)	UND	1,00	$ 428.545,00	$ 428.545,00	1,00	$ 428.545,00		$ -	1,00	$ 428.545,00	-	$ -
1.15		ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DEL AGUA	UND	1,00	$ 386.800,00	$ 386.800,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 386.800,00
					TOTAL POZO PROFUNDO MATAPALITO	$ 185.770.710,00		$ 180.891.737,00		$ 3.781.869,00		$ 184.673.606,00		$ 1.097.104,00
4	REDES DE ACUEDUCTO						-				-		-	
4.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	2.976,40	$ 4.266,00	$ 12.697.322,00	2.976,40	$ 12.697.322,00		$ -	2.976,40	$ 12.697.322,00	-	$ -
4.2		RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN	M3	744,10	$ 41.395,00	$ 30.802.020,00	696,60	$ 28.835.757,00		$ -	696,60	$ 28.835.757,00	47,50	$ 1.966.263,00
4.3		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE	M3	144,00	$ 98.582,00	$ 14.195.808,00	78,00	$ 7.689.396,00		$ -	78,00	$ 7.689.396,00	66,00	$ 6.506.412,00
4.4		CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	669,69	$ 182.399,00	$ 122.150.786,00	466,75	$ 85.781.801,00		$ -	466,75	$ 85.781.801,00	182,95	$ 33.368.985,00
4.5		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL	M3	844,92	$ 44.214,00	$ 37.357.293,00	844,92	$ 37.357.293,00		$ -	844,92	$ 37.357.293,00	-	$ -
4.6		RELLENO CON MATERIAL DE ARRECIFE TAMAÑO MAX. 3"	M3	223,23	$ 76.885,00	$ 17.163.039,00	208,98	$ 16.067.427,00		$ -	208,98	$ 16.067.427,00	14,25	$ 1.095.611,00
4.7		TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	158.431,66	$ 2.309,00	$ 365.818.703,00	117.420,55	$ 271.124.050,00		$ -	117.420,55	$ 271.124.050,00	41.011,11	$ 94.694.653,00
4.8		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN	ML	2.656,40	$ 23.153,00	$ 61.503.629,00	2.656,40	$ 61.503.629,00		$ -	2.656,40	$ 61.503.629,00	-	$ -
4.9		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA EN H.D. 2" (INCLUYE CAJA VALV. Y ANCLAJE EN CONCRETO)	UN	2,00	$ 1.095.559,00	$ 2.191.118,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 2.191.118,00
4.10		CODO GRAN RADIO 90° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2")	UN	3,00	$ 122.134,00	$ 366.402,00	3,00	$ 366.402,00		$ -	3,00	$ 366.402,00	-	$ -
4.11		CODO GRAN RADIO 45° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2")	UN	8,00	$ 117.223,00	$ 937.784,00	8,00	$ 937.784,00		$ -	8,00	$ 937.784,00	-	$ -
4.12		TEE PVC - PRESION TRABAJO 200 PSI- EXTREMOS UNION MECANICA X LISO (2X2X2)	UN	4,00	$ 133.698,00	$ 534.792,00	4,00	$ 534.792,00		$ -	4,00	$ 534.792,00	-	$ -
4.13		SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø2" UM UN	UN	6,00	$ 91.859,00	$ 551.154,00	6,00	$ 551.154,00		$ -	6,00	$ 551.154,00	-	$ -
4.14		TAPON EN PVC- PRESION TRABAJO 280 PSI (2")	UN	3,00	$ 3.877,00	$ 11.631,00	3,00	$ 11.631,00		$ -	3,00	$ 11.631,00	-	$ -
4.15		EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE	M3	1.593,84	$ 50.020,00	$ 79.723.877,00	1.593,84	$ 79.723.877,00		$ -	1.593,84	$ 79.723.877,00	-	$ -
4.16		ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M, ACCESORIOS Y REGISTRO)	UND	32,00	$ 252.943,00	$ 8.094.176,00	26,00	$ 6.576.518,00		$ -	26,00	$ 6.576.518,00	6,00	$ 1.517.658,00
					TOTAL REDES DE ACUEDUCTO MATAPALITO	$ 764.099.534,00		$ 612.768.833,00		$ -		$ 612.768.833,00		$ 141.340.709,00
8	CERRAMIENTO PERIMETRAL						-				-		-	
8.1		LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	48,20	$ 5.214,00	$ 251.315,00	48,20	$ 251.315,00		$ -	48,20	$ 251.315,00	-	$ -
					TOTAL CERRAMIENTO MATAPALITO	$ 54.257.743,00		$ 251.315,00		$ -		$ 251.315,00		$ 54.006.428,00
					TOTAL COMUNIDAD MATAPALITO	$ 1.364.283.515,00		$ 793.901.885,00		$ 3.781.869,00		$ 797.683.754,00		$ 566.599.760,00
COMUNIDAD LA PORFIA (10,000 - 1L) (F.Z. 1,24)														
1	POZO PROFUNDO						-				-		-	
1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	$ 136.689,00	$ 136.689,00	1,00	$ 136.689,00		$ -	1,00	$ 136.689,00	-	$ -
1.2		INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS	UND	1,00	$ 2.767.688,00	$ 2.767.688,00	1,00	$ 2.767.688,00		$ -	1,00	$ 2.767.688,00	-	$ -
1.3		PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO	ML	100,00	$ 335.580,00	$ 33.558.000,00	100,00	$ 33.558.000,00		$ -	100,00	$ 33.558.000,00	-	$ -
1.4		ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO	ML	100,00	$ 129.923,00	$ 12.992.300,00	100,00	$ 12.992.300,00		$ -	100,00	$ 12.992.300,00	-	$ -
1.5		EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA)	UND	1,00	$ 3.885.726,00	$ 3.885.726,00	1,00	$ 3.885.726,00		$ -	1,00	$ 3.885.726,00	-	$ -
1.6		AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"	ML	100,00	$ 481.054,00	$ 48.105.400,00	100,00	$ 48.105.400,00		$ -	100,00	$ 48.105.400,00	-	$ -
1.7		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN PARA PROFUNDIDADES DE 0 A 200 M	ML	72,00	$ 310.506,00	$ 22.356.432,00	69,00	$ 21.424.914,00		$ -	69,00	$ 21.424.914,00	3,00	$ 931.518,00
1.8		AFORO DEL POZO (PRUEBA DE BOMBEO)	UND	1,00	$ 3.634.415,00	$ 3.634.415,00	1,00	$ 3.634.415,00		$ -	1,00	$ 3.634.415,00	-	$ -
1.9		CONSTRUCCIÓN DE CABEZA DE POZO Y SELLO SANITARIO E INSTALACIÓN DE GRAVILLADORES	UND	1,00	$ 1.642.554,00	$ 1.642.554,00	1,00	$ 1.642.554,00		$ -	1,00	$ 1.642.554,00	-	$ -
1.10		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESION	ML	28,00	$ 233.161,00	$ 6.528.508,00	28,00	$ 6.528.508,00		$ -	28,00	$ 6.528.508,00	-	$ -
1.11		SUMINISTRO DE GRAVILLA TAMIZADA, SELECCIONADA Y SIN CALCÁREOS.	M3	5,82	$ 540.267,00	$ 3.144.354,00	5,48	$ 2.960.663,00	0,34	$ 183.691,00	5,82	$ 3.144.354,00	-	$ -
1.12		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ESTABILIZADOR Y DE RELLENO	BTO	20,00	$ 40.899,00	$ 817.980,00	20,00	$ 817.980,00		$ -	20,00	$ 817.980,00	-	$ -
1.13		LAVADO Y DESARROLLO DEL POZO POR MÉTODOS COMBINADOS (JETTING AIRE COMPRIMIDO)	UND	1,00	$ 4.092.271,00	$ 4.092.271,00	1,00	$ 4.092.271,00		$ -	1,00	$ 4.092.271,00	-	$ -
1.14		DESINFECCIÓN DEL POZO (DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO)	UND	1,00	$ 428.545,00	$ 428.545,00	1,00	$ 428.545,00		$ -	1,00	$ 428.545,00	-	$ -
1.15		ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DEL AGUA	UND	1,00	$ 386.800,00	$ 386.800,00	1,00	$ 386.800,00		$ -	1,00	$ 386.800,00	-	$ -
					TOTAL POZO PROFUNDO LA PORFIA	$ 144.477.662,00		$ 143.362.453,00		$ 183.691,00		$ 143.546.144,00		$ 931.518,00
4	REDES DE ACUEDUCTO						-				-		-	
4.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	2.649,56	$ 4.266,00	$ 11.303.023,00	2.649,56	$ 11.303.023,00		$ -	2.649,56	$ 11.303.023,00	-	$ -
4.2		RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN	M3	662,39	$ 41.395,00	$ 27.419.634,00	594,89	$ 24.625.472,00		$ -	594,89	$ 24.625.472,00	67,50	$ 2.794.162,00
4.3		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE	M3	180,00	$ 98.582,00	$ 17.744.760,00	78,00	$ 7.689.396,00		$ -	78,00	$ 7.689.396,00	102,00	$ 10.055.364,00
4.4		CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	596,15	$ 182.399,00	$ 108.737.164,00	411,83	$ 75.117.380,00		$ -	411,83	$ 75.117.380,00	184,32	$ 33.619.784,00
4.5		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL	M3	734,87	$ 44.214,00	$ 32.491.542,00	734,87	$ 32.491.542,00		$ -	734,87	$ 32.491.542,00	-	$ -
4.6		RELLENO CON MATERIAL DE ARRECIFE TAMAÑO MAX. 3"	M3	198,72	$ 76.885,00	$ 15.278.587,00	178,47	$ 13.721.666,00		$ -	178,47	$ 13.721.666,00	20,25	$ 1.556.921,00
4.7		TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	143.696,28	$ 2.309,00	$ 331.794.711,00	102.923,97	$ 237.651.447,00		$ -	102.923,97	$ 237.651.447,00	40.772,31	$ 94.143.264,00
4.8		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN	ML	2.249,56	$ 23.153,00	$ 52.084.063,00	2.249,56	$ 52.084.063,00		$ -	2.249,56	$ 52.084.063,00	-	$ -
4.9		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA EN H.D. 2" (INCLUYE CAJA VALV. Y ANCLAJE EN CONCRETO)	UN	1,00	$ 1.095.559,00	$ 1.095.559,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 1.095.559,00
4.10		CODO GRAN RADIO 90° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2")	UN	5,00	$ 122.134,00	$ 610.670,00	4,00	$ 488.536,00		$ -	4,00	$ 488.536,00	1,00	$ 122.134,00
4.11		CODO GRAN RADIO 45° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2")	UN	4,00	$ 117.223,00	$ 468.892,00	2,00	$ 234.446,00		$ -	2,00	$ 234.446,00	2,00	$ 234.446,00

CONDICIONES INICIALES							ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PERIODO (01-05-2026 AL 31-05-2026)		AVANCE ACUMULADO		CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	
Nº ITEM	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
4.12		TEE PVC - PRESION TRABAJO 200 PSI- EXTREMOS UNION MECANICA X LISO (2X2X2)	UN	4,00	$ 133.698,00	$ 534.792,00	3,00	$ 401.094,00		$ -	3,00	$ 401.094,00	1,00	$ 133.698,00
4.13		SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø2" UM UN	UN	6,00	$ 91.859,00	$ 551.154,00	6,00	$ 551.154,00		$ -	6,00	$ 551.154,00	-	$ -
4.14		TAPON EN PVC- PRESION TRABAJO 280 PSI (2")	UN	3,00	$ 3.877,00	$ 11.631,00	3,00	$ 11.631,00		$ -	3,00	$ 11.631,00	-	$ -
4.15		EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE	M3	1.349,74	$ 50.020,00	$ 67.513.995,00	1.349,74	$ 67.513.995,00		$ -	1.349,74	$ 67.513.995,00	-	$ -
4.16		ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M, ACCESORIOS Y REGISTRO)	UND	40,00	$ 252.943,00	$ 10.117.720,00	26,00	$ 6.576.518,00		$ -	26,00	$ 6.576.518,00	14,00	$ 3.541.202,00
					TOTAL REDES DE ACUEDUCTO LA PORFIA	$ 677.757.697,00		$ 530.461.363,00		$ -		$ 530.461.363,00		$ 147.296.534,00
5	TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN						-				-		-	
5.3		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0-2,00 M,INCLUYE CARGUE	M3	7,44	$ 98.582,00	$ 733.450,00	7,44	$ 733.450,00		$ -	7,44	$ 733.450,00	-	$ -
5.4		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN MANUAL	M3	4,90	$ 44.214,00	$ 216.649,00	4,90	$ 216.649,00		$ -	4,90	$ 216.649,00	-	$ -
5.5		ZAPATA EN CONCRETO 20,7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,03	$ 1.527.600,00	$ 3.101.434,00	2,03	$ 3.101.434,00		$ -	2,03	$ 3.101.434,00	-	$ -
5.6		COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,77	$ 2.172.478,00	$ 1.672.808,00		$ -		$ -	-	$ -	0,77	$ 1.672.808,00
5.7		ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO ARMADO, COLOCACION Y AMARRE.	M3	461,56	$ 12.746,00	$ 5.883.044,00	200,00	$ 2.549.200,00		$ -	200,00	$ 2.549.200,00	261,56	$ 3.333.844,00
5.8		SOLADO,LIMPIEZA CONCRETO 13,8 Mpa (2000 PSI)	M3	0,68	$ 1.055.354,00	$ 717.641,00	0,68	$ 717.641,00		$ -	0,68	$ 717.641,00	-	$ -
					TOTAL TANQUE ELEVADO LA PORFIA	$ 199.810.970,00		$ 7.318.374,00		$ -		$ 7.318.374,00		$ 192.492.596,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL						-				-		-	
6.1		LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	48,20	$ 5.214,00	$ 251.315,00	48,20	$ 251.315,00		$ -	48,20	$ 251.315,00	-	$ -
					TOTAL CERRAMIENTO PORFIA	$ 54.257.743,00		$ 251.315,00		$ -		$ 251.315,00		$ 54.006.428,00
					TOTAL COMUNIDAD PORFIA	$ 1.284.058.238,00		$ 681.393.505,00		$ 183.691,00		$ 681.577.196,00		$ 602.481.040,00
COMUNIDAD LA CAIMANA (10.000 - 1L) (F.Z. 1,22)														
1	POZO PROFUNDO						-				-		-	
1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	$ 135.845,00	$ 135.845,00	1,00	$ 135.845,00		$ -	1,00	$ 135.845,00	-	$ -
1.2		INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS	UND	1,00	$ 2.729.257,00	$ 2.729.257,00	1,00	$ 2.729.257,00		$ -	1,00	$ 2.729.257,00	-	$ -
1.3		PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO	ML	137,00	$ 331.099,00	$ 45.360.563,00	137,00	$ 45.360.563,00		$ -	137,00	$ 45.360.563,00	-	$ -
1.4		ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO	ML	137,00	$ 128.520,00	$ 17.607.240,00	137,00	$ 17.607.240,00		$ -	137,00	$ 17.607.240,00	-	$ -
1.5		EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA)	UND	1,00	$ 3.849.951,00	$ 3.849.951,00	1,00	$ 3.849.951,00		$ -	1,00	$ 3.849.951,00	-	$ -
1.6		AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"	ML	137,00	$ 473.791,00	$ 64.909.367,00	137,00	$ 64.909.367,00		$ -	137,00	$ 64.909.367,00	-	$ -
1.7		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN PARA PROFUNDIDADES DE 0 A 200 M	ML	105,00	$ 307.190,00	$ 32.254.950,00	103,00	$ 31.640.570,00		$ -	103,00	$ 31.640.570,00	2,00	$ 614.380,00
1.8		AFORO DEL POZO (PRUEBA DE BOMBEO)	UND	1,00	$ 3.590.564,00	$ 3.590.564,00	1,00	$ 3.590.564,00		$ -	1,00	$ 3.590.564,00	-	$ -
1.9		CONSTRUCCIÓN DE CABEZA DE POZO Y SELLO SANITARIO E INSTALACIÓN DE GRAVILLADORES	UND	1,00	$ 1.633.978,00	$ 1.633.978,00	1,00	$ 1.633.978,00		$ -	1,00	$ 1.633.978,00	-	$ -
1.10		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESION	ML	32,00	$ 231.060,00	$ 7.393.920,00	32,00	$ 7.393.920,00		$ -	32,00	$ 7.393.920,00	-	$ -
1.11		SUMINISTRO DE GRAVILLA TAMIZADA, SELECCIONADA Y SIN CALCÁREOS.	M3	8,04	$ 532.966,00	$ 4.285.047,00	7,50	$ 3.997.245,00	0,54	$ 287.802,00	8,04	$ 4.285.047,00	-	$ -
1.12		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ESTABILIZADOR Y DE RELLENO	BTO	27,40	$ 40.372,00	$ 1.106.193,00	27,40	$ 1.106.193,00		$ -	27,40	$ 1.106.193,00	-	$ -
1.13		LAVADO Y DESARROLLO DEL POZO POR MÉTODOS COMBINADOS (JETTING AIRE COMPRIMIDO)	UND	1,00	$ 4.028.724,00	$ 4.028.724,00	1,00	$ 4.028.724,00		$ -	1,00	$ 4.028.724,00	-	$ -
1.14		DESINFECCIÓN DEL POZO (DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO)	UND	1,00	$ 423.843,00	$ 423.843,00	1,00	$ 423.843,00		$ -	1,00	$ 423.843,00	-	$ -
1.15		ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DEL AGUA	UND	1,00	$ 380.561,00	$ 380.561,00	1,00	$ 380.561,00		$ -	1,00	$ 380.561,00	-	$ -
					TOTAL POZO PROFUNDO LA CAIMANA	$ 169.690.003,00		$ 168.797.821,00		$ 287.802,00		$ 169.075.623,00		$ 614.380,00
4	REDES DE ACUEDUCTO						-				-		-	
4.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	3.393,74	$ 4.250,00	$ 14.423.395,00	3.393,74	$ 14.423.395,00		$ -	3.393,74	$ 14.423.395,00	-	$ -
4.2		RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN	M3	848,44	$ 40.727,00	$ 34.554.416,00	782,75	$ 31.879.059,00		$ -	782,75	$ 31.879.059,00	65,69	$ 2.675.357,00
4.3		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE	M3	163,00	$ 98.525,00	$ 16.074.325,00	93,00	$ 9.162.825,00		$ -	93,00	$ 9.162.825,00	60,00	$ 5.911.500,00
4.4		CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	763,59	$ 180.167,00	$ 137.573.720,00	542,94	$ 97.819.871,00		$ -	542,94	$ 97.819.871,00	220,65	$ 39.753.849,00
4.5		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL	M3	967,12	$ 44.004,00	$ 42.557.148,00	967,02	$ 42.552.748,00		$ -	967,02	$ 42.552.748,00	0,10	$ 4.400,00
4.6		RELLENO CON MATERIAL DE ARRECIFE TAMAÑO MAX. 3"	M3	254,53	$ 76.250,00	$ 19.407.913,00	234,83	$ 17.905.788,00		$ -	234,83	$ 17.905.788,00	19,70	$ 1.502.125,00
4.7		TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	167.947,33	$ 2.309,00	$ 387.790.385,00	122.776,81	$ 283.491.654,00		$ -	122.776,81	$ 283.491.654,00	45.170,52	$ 104.298.731,00
4.8		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN	ML	3.053,74	$ 23.070,00	$ 70.449.782,00	2.976,00	$ 68.656.320,00		$ -	2.976,00	$ 68.656.320,00	77,74	$ 1.793.462,00
4.9		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA EN H.D. 2" (INCLUYE CAJA VALV. Y ANCLAJE EN CONCRETO)	UN	2,00	$ 1.077.889,00	$ 2.155.778,00	1,00	$ 1.077.889,00		$ -	1,00	$ 1.077.889,00	1,00	$ 1.077.889,00
4.10		CODO GRAN RADIO 90° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2")	UN	5,00	$ 120.164,00	$ 600.820,00	5,00	$ 600.820,00		$ -	5,00	$ 600.820,00	-	$ -
4.11		CODO GRAN RADIO 45° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2")	UN	2,00	$ 115.332,00	$ 230.664,00	2,00	$ 230.664,00		$ -	2,00	$ 230.664,00	-	$ -
4.12		TEE PVC - PRESION TRABAJO 200 PSI- EXTREMOS UNION MECANICA X LISO (2X2X2)	UN	15,00	$ 131.542,00	$ 1.973.130,00	1,00	$ 131.542,00		$ -	1,00	$ 131.542,00	14,00	$ 1.841.588,00
4.13		SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø2" UM UN	UN	16,00	$ 90.836,00	$ 1.453.376,00	16,00	$ 1.453.376,00		$ -	16,00	$ 1.453.376,00	-	$ -
4.14		TAPON EN PVC- PRESION TRABAJO 280 PSI (2")	UN	16,00	$ 3.814,00	$ 61.024,00	2,00	$ 7.628,00		$ -	2,00	$ 7.628,00	14,00	$ 53.396,00
4.15		EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE	M3	1.832,24	$ 58.518,00	$ 107.219.020,00	1.785,60	$ 104.489.741,00		$ -	1.785,60	$ 104.489.741,00	46,64	$ 2.729.279,00
4.16		ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M, ACCESORIOS Y REGISTRO)	UND	34,00	$ 248.863,00	$ 8.461.342,00	31,00	$ 7.714.753,00		$ -	31,00	$ 7.714.753,00	3,00	$ 746.589,00
					TOTAL REDES DE ACUEDUCTO LA CAIMANA	$ 843.986.239,00		$ 681.598.073,00		$ -		$ 681.598.073,00		$ 162.388.165,00
5	TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN						-				-		-	
5.1		PLATAFORMA EN LÁMINA ALFAJOR ESPESOR 1/4" MM (INCLUYE TRANSPORTE, MONTAJE, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE)	M2	10,56	$ 638.258,00	$ 6.740.004,00	-	$ -	10,56	$ 6.740.004,00	10,56	$ 6.740.004,00	-	$ -
5.2.1		TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 10000 LITROS, ELEVADO A 13,5 METROS DE ALTURA, TIPO PLASTICO	UND	1,00	$ 34.320.004,00	$ 34.320.004,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 34.320.004,00
5.3		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0-2,00 M,INCLUYE CARGUE	M3	7,44	$ 98.525,00	$ 733.026,00	7,44	$ 733.026,00		$ -	7,44	$ 733.026,00	-	$ -
5.4		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN MANUAL	M3	4,90	$ 44.004,00	$ 215.620,00	4,90	$ 215.620,00		$ -	4,90	$ 215.620,00	-	$ -
5.5		ZAPATA EN CONCRETO 20,7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,03	$ 1.506.465,00	$ 3.058.124,00	2,03	$ 3.058.124,00		$ -	2,03	$ 3.058.124,00	-	$ -

CONDICIONES INICIALES							ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PERIODO (31-05-2026 AL 31-05-2026)		AVANCE ACUMULADO		CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	
Nº ITEM	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
5.6		COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA OBRA SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,77	$ 2.146.100,00	$ 1.652.497,00		$ -		$ -	-	$ -	0,77	$ 1.652.497,00
5.7		ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO ARMADO, COLOCACION Y AMARRE	M3	461,66	$ 12.584,00	$ 5.808.271,00	200,00	$ 2.516.800,00		$ -	200,00	$ 2.516.800,00	261,66	$ 3.291.471,00
5.8		SOLADO,LIMPIEZA CONCRETO 13,8 Mpa (2000 PSI)	M3	0,68	$ 1.040.548,00	$ 707.573,00	0,68	$ 707.573,00		$ -	0,68	$ 707.573,00	-	$ -
5.9		ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A500 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)	KG	2.842,31	$ 47.718,00	$ 135.629.349,00	-	$ -	2.200,00	$ 104.979.600,00	2.200,00	$ 104.979.600,00	642,31	$ 30.649.749,00
5.10		ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A588 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)	KG	133,00	$ 48.817,00	$ 6.492.661,00	-	$ -	100,00	$ 4.881.700,00	100,00	$ 4.881.700,00	33,00	$ 1.610.961,00
5.11		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO E INSTALACION	ML	19,45	$ 99.641,00	$ 1.938.017,00	-	$ -		$ -	-	$ -	19,45	$ 1.938.017,00
					TOTAL TANQUE ELEVADO LA CAIMANA	$ 197.295.146,00		$ 7.231.143,00		$ 116.601.304,00		$ 123.832.447,00		$ 73.462.699,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL						-				-		-	
6.1		LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	48,20	$ 5.186,00	$ 249.965,00	48,20	$ 249.965,00		$ -	48,20	$ 249.965,00	-	$ -
					TOTAL CERRAMIENTO LA CAIMANA	$ 53.693.681,00		$ 249.965,00		$ -		$ 249.965,00		$ 53.343.716,00
					TOTAL COMUNIDAD LA CAIMANA	$ 1.489.195.588,00		$ 877.867.602,00		$ 116.889.105,00		$ 994.756.108,00		$ 494.440.480,00
		TOTAL RESGUARDO WACOYO				$ 12.300.039.858,00		$ 6.555.113.265,00		$ 539.094.844,00		$ 7.103.208.109,00		$ 5.196.831.747,00
RESGUARDO ASEINPOME														
COMUNIDAD KEKO ASEINPOME (6.000 - 1L) (F.Z. 1,30)														
1	POZO PROFUNDO						-				-		-	
1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	$ 139.220,00	$ 139.220,00	1,00	$ 139.220,00		$ -	1,00	$ 139.220,00	-	$ -
1.2		INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS	UND	1,00	$ 2.882.980,00	$ 2.882.980,00	1,00	$ 2.882.980,00		$ -	1,00	$ 2.882.980,00	-	$ -
1.3		PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO	ML	114,00	$ 349.024,00	$ 39.788.736,00	114,00	$ 39.788.736,00		$ -	114,00	$ 39.788.736,00	-	$ -
1.4		ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO	ML	114,00	$ 134.131,00	$ 15.290.934,00	114,00	$ 15.290.934,00		$ -	114,00	$ 15.290.934,00	-	$ -
1.5		EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA)	UND	1,00	$ 3.993.053,00	$ 3.993.053,00	1,00	$ 3.993.053,00		$ -	1,00	$ 3.993.053,00	-	$ -
1.6		AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"	ML	114,00	$ 502.845,00	$ 57.324.330,00	114,00	$ 57.324.330,00		$ -	114,00	$ 57.324.330,00	-	$ -
1.7		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN PARA PROFUNDIDADES DE 0 A 200 M	ML	84,00	$ 320.453,00	$ 26.918.052,00	84,00	$ 26.918.052,00		$ -	84,00	$ 26.918.052,00	-	$ -
1.8		AFORO DEL POZO (PRUEBA DE BOMBEO)	UND	1,00	$ 3.765.969,00	$ 3.765.969,00	1,00	$ 3.765.969,00		$ -	1,00	$ 3.765.969,00	-	$ -
1.9		CONSTRUCCIÓN DE CABEZA DE POZO Y SELLO SANITARIO E INSTALACIÓN DE GRAVILLADORES	UND	1,00	$ 1.668.279,00	$ 1.668.279,00	1,00	$ 1.668.279,00		$ -	1,00	$ 1.668.279,00	-	$ -
1.10		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESION	ML	30,00	$ 239.462,00	$ 7.183.860,00	27,00	$ 6.465.474,00		$ -	27,00	$ 6.465.474,00	3,00	$ 718.386,00
1.11		SUMINISTRO DE GRAVILA TAMIZADA, SELECCIONADA Y SIN CALCÁREOS	M3	6,66	$ 562.175,00	$ 3.744.086,00	6,24	$ 3.507.972,00	0,42	$ 236.114,00	6,66	$ 3.744.086,00	-	$ -
1.12		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ESTABILIZADOR Y DE RELLENO	BTO	22,80	$ 42.479,00	$ 968.521,00	22,80	$ 968.521,00		$ -	22,80	$ 968.521,00	-	$ -
1.13		LAVADO Y DESARROLLO DEL POZO POR MÉTODOS COMBINADOS (JETTING AIRE COMPRIMIDO)	UND	1,00	$ 4.282.909,00	$ 4.282.909,00	1,00	$ 4.282.909,00		$ -	1,00	$ 4.282.909,00	-	$ -
1.14		DESINFECCIÓN DEL POZO (DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO)	UND	1,00	$ 442.648,00	$ 442.648,00	1,00	$ 442.648,00		$ -	1,00	$ 442.648,00	-	$ -
1.15		ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DEL AGUA	UND	1,00	$ 405.516,00	$ 405.516,00	1,00	$ 405.516,00		$ -	1,00	$ 405.516,00	-	$ -
					TOTAL POZO PROFUNDO KEKO A SEINPOME	$ 168.799.093,00		$ 167.844.593,00		$ 236.114,00		$ 168.080.707,00		$ 718.386,00
4	REDES DE ACUEDUCTO						-				-		-	
4.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	4.808,36	$ 4.314,00	$ 20.743.265,00	1.200,00	$ 5.176.800,00		$ -	1.200,00	$ 5.176.800,00	3.608,36	$ 15.566.465,00
4.2		RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN	M3	1.202,09	$ 43.398,00	$ 52.168.302,00	285,00	$ 12.368.430,00		$ -	285,00	$ 12.368.430,00	917,09	$ 39.799.872,00
4.3		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE	M3	126,00	$ 98.753,00	$ 12.442.878,00	-	$ -	36,00	$ 3.555.108,00	36,00	$ 3.555.108,00	90,00	$ 8.887.770,00
4.4		CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	1.081,88	$ 189.095,00	$ 204.578.099,00	197,30	$ 37.308.444,00		$ -	197,30	$ 37.308.444,00	884,58	$ 167.269.655,00
4.5		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL	M3	1.400,51	$ 44.843,00	$ 62.803.070,00	399,00	$ 17.892.357,00		$ -	399,00	$ 17.892.357,00	1.001,51	$ 44.910.713,00
4.6		RELLENO CON MATERIAL DE ARRECIFE TAMAÑO MAX. 3"	M3	360,63	$ 78.793,00	$ 28.415.120,00	85,50	$ 6.736.802,00		$ -	85,50	$ 6.736.802,00	275,13	$ 21.678.318,00
4.7		TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	436.232,48	$ 2.309,00	$ 1.007.260.796,00	73.408,25	$ 169.499.649,00		$ -	73.408,25	$ 169.499.649,00	362.824,23	$ 837.761.147,00
4.8		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN	ML	4.528,36	$ 23.403,00	$ 105.977.209,00	1.080,00	$ 25.275.240,00		$ -	1.080,00	$ 25.275.240,00	3.448,36	$ 80.701.969,00
4.15		EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE	M3	2.717,02	$ 52.355,00	$ 142.249.582,00	648,00	$ 33.926.040,00		$ -	648,00	$ 33.926.040,00	2.069,02	$ 108.323.542,00
4.16		ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M, ACCESORIOS Y REGISTRO)	UND	28,00	$ 265.183,00	$ 7.425.124,00	-	$ -	14,00	$ 3.712.562,00	14,00	$ 3.712.562,00	14,00	$ 3.712.562,00
					TOTAL REDES DE ACUEDUCTO KEKO A SEINPOME	$ 1.651.193.630,00		$ 308.183.762,00		$ 7.267.670,00		$ 315.451.432,00		$ 1.335.742.198,00
5	TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN						-				-		-	
5.1		PLATAFORMA EN LÁMINA ALFAJOR ESPESOR 1/4" MM (INCLUYE TRANSPORTE, MONTAJE, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE)	M2	10,56	$ 665.020,00	$ 7.022.611,00	-	$ -	10,56	$ 7.022.611,00	10,56	$ 7.022.611,00	-	$ -
5.3		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0-2,00 M,INCLUYE CARGUE	M3	7,44	$ 98.753,00	$ 734.722,00	-	$ -	7,44	$ 734.722,00	7,44	$ 734.722,00	-	$ -
5.4		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN MANUAL	M3	4,90	$ 44.843,00	$ 219.731,00	-	$ -	4,28	$ 191.928,00	4,28	$ 191.928,00	0,62	$ 27.803,00
5.5		ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,03	$ 1.591.805,00	$ 3.231.364,00	-	$ -	2,03	$ 3.231.364,00	2,03	$ 3.231.364,00	-	$ -
5.6		COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA OBRA SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,77	$ 2.251.614,00	$ 1.733.743,00	-	$ -	0,77	$ 1.733.743,00	0,77	$ 1.733.743,00	-	$ -
5.7		ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO ARMADO, COLOCACION Y AMARRE	M3	461,66	$ 13.233,00	$ 6.107.823,00	-	$ -	269,29	$ 3.563.515,00	269,29	$ 3.563.515,00	192,37	$ 2.544.309,00
5.8		SOLADO,LIMPIEZA CONCRETO 13,8 Mpa (2000 PSI)	M3	0,68	$ 1.099.773,00	$ 747.846,00	-	$ -	0,68	$ 747.846,00	0,68	$ 747.846,00	-	$ -
5.9		ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A500 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)	KG	2.842,31	$ 50.681,00	$ 142.288.881,00	-	$ -	2.200,00	$ 110.134.200,00	2.200,00	$ 110.134.200,00	642,31	$ 32.154.681,00
5.10		ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A588 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)	KG	133,00	$ 51.231,00	$ 6.813.723,00	-	$ -	100,00	$ 5.123.100,00	100,00	$ 5.123.100,00	33,00	$ 1.690.623,00
5.11		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO E INSTALACION	ML	19,45	$ 104.995,00	$ 2.042.153,00	-	$ -		$ -	-	$ -	19,45	$ 2.042.153,00
					TOTAL TANQUE ELEVADO KEKO A SEINPOME	$ 186.497.126,00		$ -		$ 132.483.029,00		$ 132.483.029,00		$ 54.014.097,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL						-				-		-	
6.1		LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	48,20	$ 5.300,00	$ 255.460,00	48,20	$ 255.460,00		$ -	48,20	$ 255.460,00	-	$ -
					TOTAL CERRAMIENTO KEKO A SEINPOME	$ 56.244.522,00		$ 255.460,00		$ -		$ 255.460,00		$ 55.989.062,00
					TOTAL COMUNIDADKEKO A SEINPOME	$ 2.279.965.059,00		$ 476.283.815,00		$ 139.986.813,00		$ 616.270.628,00		$ 1.663.694.432,00
COMUNIDAD SIETE RODRIGUEZ (10.000 - 1L) (F.Z. 1,30)														
1	POZO PROFUNDO						-				-		-	
1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	$ 139.220,00	$ 139.220,00	1,00	$ 139.220,00		$ -	1,00	$ 139.220,00	-	$ -
1.2		INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS	UND	1,00	$ 2.882.980,00	$ 2.882.980,00	1,00	$ 2.882.980,00		$ -	1,00	$ 2.882.980,00	-	$ -
1.3		PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO	ML	118,00	$ 349.024,00	$ 41.184.832,00	118,00	$ 41.184.832,00		$ -	118,00	$ 41.184.832,00	-	$ -
1.4		ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO	ML	118,00	$ 134.131,00	$ 15.827.458,00	118,00	$ 15.827.458,00		$ -	118,00	$ 15.827.458,00	-	$ -

CONDICIONES INICIALES							ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PERIODO (01-05-2026 AL 31-05-2026)		AVANCE ACUMULADO		CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	
Nº ITEM	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.5		EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA)	UND	1,00	$ 3.993.053,00	$ 3.993.053,00	1,00	$ 3.993.053,00		$ -	1,00	$ 3.993.053,00	-	$ -
1.6		AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"	ML	118,00	$ 502.845,00	$ 59.335.710,00	118,00	$ 59.335.710,00		$ -	118,00	$ 59.335.710,00	-	$ -
1.7		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN PARA PROFUNDIDADES DE 0 A 200 M	ML	83,00	$ 320.453,00	$ 26.597.599,00	83,00	$ 26.597.599,00		$ -	83,00	$ 26.597.599,00	-	$ -
1.8		AFORO DEL POZO (PRUEBA DE BOMBEO)	UND	1,00	$ 3.765.969,00	$ 3.765.969,00	1,00	$ 3.765.969,00		$ -	1,00	$ 3.765.969,00	-	$ -
1.9		CONSTRUCCIÓN DE CABEZA DE POZO Y SELLO SANITARIO E INSTALACIÓN DE GRAVILLADORES	UND	1,00	$ 1.668.279,00	$ 1.668.279,00	1,00	$ 1.668.279,00		$ -	1,00	$ 1.668.279,00	-	$ -
1.10		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESION	ML	35,00	$ 239.462,00	$ 8.381.170,00	31,00	$ 7.423.322,00	-1,00	-$ 239.462,00	30,00	$ 7.183.860,00	5,00	$ 1.197.310,00
1.11		SUMINISTRO DE GRAVILLA TAMIZADA, SELECCIONADA Y SIN CALCÁREOS.	M3	6,90	$ 562.175,00	$ 3.879.008,00	6,46	$ 3.631.651,00	0,44	$ 247.357,00	6,90	$ 3.879.008,00	-	$ -
1.12		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ESTABILIZADOR Y DE RELLENO	BTO	23,60	$ 42.479,00	$ 1.002.504,00	23,60	$ 1.002.504,00		$ -	23,60	$ 1.002.504,00	-	$ -
1.13		LAVADO Y DESARROLLO DEL POZO POR MÈTODOS COMBINADOS (JETTING AIRE COMPRIMIDO)	UND	1,00	$ 4.282.909,00	$ 4.282.909,00	1,00	$ 4.282.909,00		$ -	1,00	$ 4.282.909,00	-	$ -
1.14		DESINFECCIÓN DEL POZO (DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO)	UND	1,00	$ 442.648,00	$ 442.648,00	1,00	$ 442.648,00		$ -	1,00	$ 442.648,00	-	$ -
1.15		ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DEL AGUA	UND	1,00	$ 405.516,00	$ 405.516,00	1,00	$ 405.516,00		$ -	1,00	$ 405.516,00	-	$ -
					TOTAL POZO PROFUNDO SIETE RODRIGUEZ	$ 173.788.855,00		$ 172.583.660,00		$ 7.895,00		$ 172.591.545,00		$ 1.197.310,00
4	REDES DE ACUEDUCTO						-				-		-	
4.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	1.833,86	$ 4.314,00	$ 7.911.272,00	1.833,86	$ 7.911.272,00		$ -	1.833,86	$ 7.911.272,00	-	$ -
4.2		RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN	M3	458,47	$ 43.398,00	$ 19.896.681,00	-	$ -	458,47	$ 19.896.681,00	458,47	$ 19.896.681,00	-	$ -
4.3		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE	M3	220,50	$ 98.753,00	$ 21.775.037,00	-	$ -	195,00	$ 19.256.835,00	195,00	$ 19.256.835,00	25,50	$ 2.518.202,00
4.4		CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	412,62	$ 189.095,00	$ 78.024.379,00	-	$ -	412,62	$ 78.024.379,00	412,62	$ 78.024.379,00	-	$ -
4.5		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL	M3	476,66	$ 44.843,00	$ 21.374.864,00	-	$ -	476,66	$ 21.374.864,00	476,66	$ 21.374.864,00	-	$ -
4.6		RELLENO CON MATERIAL DE ARRECIFE TAMAÑO MAX. 3"	M3	137,54	$ 78.793,00	$ 10.837.189,00	-	$ -	137,54	$ 10.837.189,00	137,54	$ 10.837.189,00	-	$ -
4.7		TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	147.272,14	$ 2.309,00	$ 340.051.371,00	-	$ -	147.272,14	$ 340.051.371,00	147.272,14	$ 340.051.371,00	-	$ -
4.8		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN	ML	1.343,86	$ 23.403,00	$ 31.450.356,00	-	$ -	1.343,86	$ 31.450.356,00	1.343,86	$ 31.450.356,00	-	$ -
4.15		EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE	M3	806,32	$ 52.355,00	$ 42.214.884,00	-	$ -	806,32	$ 42.214.884,00	806,32	$ 42.214.884,00	-	$ -
4.16		ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M, ACCESORIOS Y REGISTRO)	UND	49,00	$ 265.183,00	$ 12.993.967,00	-	$ -	49,00	$ 12.993.967,00	49,00	$ 12.993.967,00	-	$ -
					TOTAL REDES DE ACUEDUCTO SIETE RODRIGUEZ	$ 588.516.602,00		$ 7.911.272,00		$ 576.109.526,00		$ 584.011.798,00		$ 4.506.804,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL						-				-		-	
6.1		LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	48,20	$ 5.300,00	$ 255.460,00	48,20	$ 255.460,00		$ -	48,20	$ 255.460,00	-	$ -
					TOTAL CERRAMIENTO SIETE RODRIGUEZ	$ 56.244.522,00		$ 255.460,00		$ -		$ 255.460,00		$ 55.989.062,00
					TOTAL COMUNIDAD SIETE RODRIGUEZ	$ 1.243.138.969,00		$ 180.750.382,00		$ 576.109.421,00		$ 756.859.803,00		$ 486.280.166,00
					TOTAL RESGUARDO ASEINPOME	$ 3.523.104.028,00		$ 857.034.197,00		$ 716.095.234,00		$ 1.573.129.431,00		$ 2.149.974.598,00
					SUB TOTAL DE OBRA (INCLUYE AIU)	$ 38.013.772.215,00		$ 17.529.772.913,00		$ 3.434.096.813,00		$ 20.963.869.726,00		$ 17.049.902.487,00
					COSTOS DIRECTOS OBRA (SIN AIU)	$ 28.368.486.727,61		$ 13.081.920.084,33		$ 2.562.758.815,67		$ 15.644.678.900,00		$ 12.723.807.828,12
SUMINISTROS														
RESGUARDO AWALIBA														
COMUNIDAD MAKAPAY (6000 - 1L) (F.Z. 1,30)														
4.17		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO	ML	3.890,25	$ 78.548,00	$ 305.571.357,00	3.542,36	$ 278.245.293,00		$ -	3.542,36	$ 278.245.293,00	347,89	$ 27.326.064,00
COMUNIDAD AWALIBA CENTRAL (10.000 - 1L) (F.Z. 1,30)														
4.17		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO	ML	3.037,00	$ 78.548,00	$ 238.550.276,00	3.037,00	$ 238.550.276,00		$ -	3.037,00	$ 238.550.276,00	-	$ -
COMUNIDAD PUERTO LOPEZ (6000 - 0.5L) (F.Z. 1,30)														
4.17		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO	ML	549,00	$ 78.548,00	$ 43.122.852,00	549,00	$ 43.122.852,00		$ -	549,00	$ 43.122.852,00	-	$ -
COMUNIDAD PUNTO GRILLO (6000 - 0.5L) (F.Z. 1,30)														
4.17		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO	ML	672,00	$ 78.548,00	$ 52.784.256,00	672,00	$ 52.784.256,00		$ -	672,00	$ 52.784.256,00	-	$ -
COMUNIDAD SAN GIL (10.000 - 1L) (F.Z. 1,30)														
4.17		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO	ML	2.908,00	$ 78.548,00	$ 228.417.584,00	2.908,00	$ 228.417.584,00		$ -	2.908,00	$ 228.417.584,00	-	$ -
COMUNIDAD FACUNAE (6000 - 1L) (F.Z. 1,30)														
4.17		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO	ML	454,00	$ 78.548,00	$ 35.660.792,00	454,00	$ 35.660.792,00		$ -	454,00	$ 35.660.792,00	-	$ -
					TOTAL SUMINISTRO AWALIBA	$ 904.107.117,00		$ 876.781.053,00		$ -		$ 876.781.053,00		$ 27.326.064,00
RESGUARDO DOMOPLANAS														
COMUNIDAD OLIVOS (10.000 - 1L) (F.Z. 1,34)														
4.17		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO	ML	2.840,85	$ 80.965,00	$ 230.069.420,00	1.983,00	$ 160.553.190,00		$ -	1.983,00	$ 160.553.190,00	857,86	$ 69.456.230,00
COMUNIDAD PARAISO (6000 - 1L) (F.Z. 1,34)														
4.17		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO	ML	2.296,01	$ 80.965,00	$ 185.896.450,00	1.577,14	$ 127.693.140,00		$ -	1.577,14	$ 127.693.140,00	718,87	$ 58.203.310,00
COMUNIDAD BUENAVISTA (6000 - 0,5L) (F.Z. 1,32)														
4.17		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO	ML	676,58	$ 79.756,00	$ 53.961.314,00	407,84	$ 32.527.687,00		$ -	407,84	$ 32.527.687,00	268,74	$ 21.433.627,00
COMUNIDAD VILLAMARCIA (6000 - 1L) (F.Z. 1,34)														
4.17		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO	ML	1.955,57	$ 80.965,00	$ 158.332.725,00	1.348,46	$ 109.178.064,00		$ -	1.348,46	$ 109.178.064,00	607,11	$ 49.154.661,00
COMUNIDAD LAS BRISAS (6000 - 0,5L) (F.Z. 1,34)														
4.17		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO	ML	595,07	$ 80.965,00	$ 48.179.843,00	595,07	$ 48.179.843,00		$ -	595,07	$ 48.179.843,00	-	$ 1,00
COMUNIDAD CUMARALITO (6000 - 1L) (F.Z. 1,34)														
4.17		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO	ML	1.892,98	$ 80.965,00	$ 153.265.126,00	1.374,21	$ 111.262.913,00		$ -	1.374,21	$ 111.262.913,00	518,77	$ 42.002.213,00
COMUNIDAD YATORROBO (6000 - 0,5L) (F.Z. 1,34)														
4.17		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO	ML	1.686,90	$ 80.965,00	$ 136.579.859,00	1.094,37	$ 88.605.667,00		$ -	1.094,37	$ 88.605.667,00	592,53	$ 47.974.191,00
COMUNIDAD CERRITO (6000 - 0,5L) (F.Z. 1,34)														
4.17		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO	ML	372,06	$ 80.965,00	$ 30.123.838,00	372,06	$ 30.123.838,00		$ -	372,06	$ 30.123.838,00	-	$ -
COMUNIDAD PUERTO GAVILAN (10.000 - 1L) (F.Z. 1,34)														
4.17		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO	ML	3.024,74	$ 80.965,00	$ 244.898.074,00	3.024,74	$ 244.898.074,00		$ -	3.024,74	$ 244.898.074,00	-	$ -
COMUNIDAD LAS DELICIAS (6000 - 0,5L) (F.Z. 1,34)														
4.17		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO	ML	1.293,19	$ 80.965,00	$ 104.703.128,00	1.293,19	$ 104.703.128,00		$ -	1.293,19	$ 104.703.128,00	-	$ -
COMUNIDAD CACHAMITAS (6000 - 0,5L) (F.Z. 1,34)														
4.17		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO	ML	979,03	$ 80.965,00	$ 79.267.164,00	652,87	$ 52.859.620,00		$ -	652,87	$ 52.859.620,00	326,16	$ 26.407.544,00
					TOTAL SUMINISTRO DOMOPLANAS	$ 1.425.216.941,00		$ 1.110.585.164,00		$ -		$ 1.110.585.164,00		$ 314.631.777,00
RESGUARDO WACOYO														
COMUNIDAD KALIWIRNAE (10.000 - 1L) (F.Z. 1,22)														
4.17		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO	ML	4.544,57	$ 73.714,00	$ 334.998.433,00	4.544,57	$ 334.998.433,00		$ -	4.544,57	$ 334.998.433,00	-	$ -
COMUNIDAD ESMERALDA WALABO (20.000 - 2L) (F.Z. 1,22)														
4.17		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO	ML	2.998,98	$ 73.714,00	$ 221.066.812,00	2.998,98	$ 221.066.812,00		$ -	2.998,98	$ 221.066.812,00	-	$ -
COMUNIDAD PALOGRANDE WALABO (10.000 - 1L) (F.Z. 1,22)														
4.17		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO	ML	1.949,38	$ 73.714,00	$ 143.696.597,00	1.949,38	$ 143.696.597,00		$ -	1.949,38	$ 143.696.597,00	-	$ -
COMUNIDAD LA UNIÓN (6000 - 1L) (F.Z. 1,22)														
4.17		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO	ML	779,52	$ 73.714,00	$ 57.461.537,00	779,52	$ 57.461.537,00		$ -	779,52	$ 57.461.537,00	-	$ -

CONDICIONES INICIALES							ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PERIODO (01-05-2026 AL 31-05-2026)		AVANCE ACUMULADO		CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	
Nº ITEM	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
COMUNIDAD PUNTO GRILLO (10.000 - 1L) (F.Z. 1,22)														
4.17		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO	ML	1.341,87	$ 73.714,00	$ 98.914.605,00	1.341,87	$ 98.914.605,00		$ -	1.341,87	$ 98.914.605,00	-	$ -
COMUNIDAD ALGARROBO (6000 - 1L) (F.Z. 1,22)														
4.17		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO	ML	2.112,75	$ 73.714,00	$ 155.739.254,00	1.760,00	$ 129.736.640,00		$ -	1.760,00	$ 129.736.640,00	352,75	$ 26.002.614,00
COMUNIDAD MATAPALITO (6000 - 1L) (F.Z. 1,24)														
4.17		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO	ML	2.656,40	$ 74.923,00	$ 199.025.457,00	2.656,40	$ 199.025.457,00		$ -	2.656,40	$ 199.025.457,00	-	$ -
COMUNIDAD LA PORFIA (10.000 - 1L) (F.Z. 1,24)														
4.17		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO	ML	2.249,56	$ 74.923,00	$ 168.543.784,00	2.249,56	$ 168.543.784,00		$ -	2.249,56	$ 168.543.784,00	-	$ -
COMUNIDAD LA CAIMANA (10.000 - 1L) (F.Z. 1,22)														
4.17		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO	ML	3.053,74	$ 73.714,00	$ 225.103.390,00	2.976,00	$ 219.372.864,00		$ -	2.976,00	$ 219.372.864,00	77,74	$ 5.730.526,00
TOTAL SUMINISTRO WACOYO						$ 1.604.549.669,00		$ 1.572.816.729,00		$ -		$ 1.572.816.729,00		$ 31.733.140,00
RESGUARDO ASEINPOME														
COMUNIDAD KEKO ASEINPOME (6.000 - 1L) (F.Z. 1,30)													-	
4.17		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO	ML	4.526,36	$ 78.548,00	$ 355.693.621,00	2.490,60	$ 195.631.649,00		$ -	2.490,60	$ 195.631.649,00	2.037,76	$ 160.061.972,00
COMUNIDAD SIETE RODRIGUEZ (10.000 - 1L) (F.Z. 1,30)							-				-		-	
4.17		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO	ML	1.343,86	$ 78.548,00	$ 105.557.515,00	749,24	$ 58.851.304,00	12,52	$ 983.421,00	761,76	$ 59.834.724,00	582,10	$ 45.722.791,00
TOTAL SUMINISTRO ASEINPOME						$ 461.251.136,00		$ 254.482.953,00		$ 983.421,00		$ 255.466.373,00		$ 205.784.763,00
SUB TOTAL DE SUMINISTROS (INCLUYE AIU)						$ 4.395.125.063,00		$ 3.814.665.898,00		$ 983.421,00		$ 3.815.649.318,00		$ 579.475.744,00
COSTOS DIRECTOS SUMINISTROS (SIN AIU)						$ 3.407.073.692,25		$ 2.957.105.347,29		$ 762.341,86		$ 2.957.867.688,37		$ 449.206.003,10
SUB TOTAL DE OBRA (INCLUYE AIU)						$ 38.013.772.216,00		$ 17.629.772.913,00		$ 3.434.096.813,00		$ 20.963.869.726,00		$ 17.049.902.487,00
SUB TOTAL DE SUMINISTROS (INCLUYE AIU)						$ 4.395.125.063,00	50,33%	$ 3.814.665.898,00	8,10%	$ 983.421,00	68,43%	$ 3.815.649.318,00	41,57%	$ 579.475.744,00
VALOR TOTAL						$ 42.408.897.278,00		$ 21.344.438.811,00		$ 3.435.080.234,00		$ 24.779.519.044,00		$ 17.629.378.231,00
VALOR TOTAL AJUSTADO ALPESO						$ 42.408.897.278,00		$ 21.344.438.811,00		$ 3.435.080.234,00		$ 24.779.519.044,00		$ 17.629.378.231,00

ING. LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA
R/L CONSORCIO AGUAS GAITAN 2026

JORGE ADEMIO RUIZ SARMIENTO
R/L CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025

11906

ANEXO 2. CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES.


Reporte de calidad

1/11/2025 | 30/11/2025 | Planta Sogamoso | Cemento Uso General

PARÁMETROS FÍSICOS

Blaine	Retenido 325	Fraguado inicial	Fraguado final
5260 cm2/g	5.1 %	162 min	265 min

Resistencia 1 día	Resistencia 3 días	Resistencia 7 días	Resistencia 28 días
6.7 MPa	14.7 MPa	18.5 MPa	(Blank) MPa

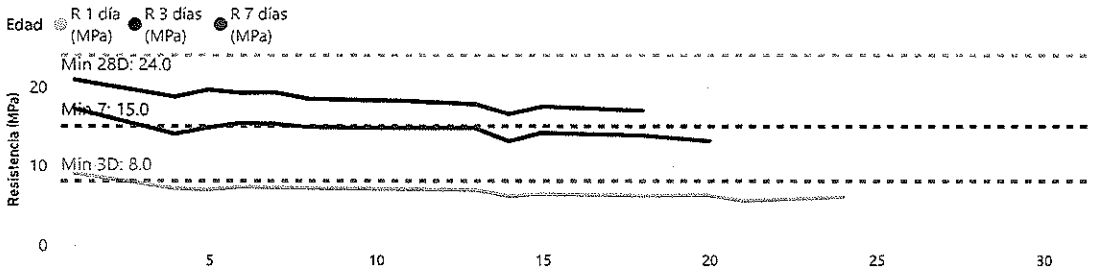


* Este cemento cumple con la Norma Técnica Colombiana 121 vigente para CEMENTO TIPO UG.

OTROS PARÁMETROS FÍSICO

Densidad NTC 221	Contenido de Aire NTC 224	Expansión en autoclave NTC 107	Expansión barras de mortero NTC 4927
NO HAY INFORMACIÓN	NO HAY INFORMACIÓN	NO HAY INFORMACIÓN	NO HAY INFORMACIÓN

PARÁMETROS QUÍMICOS

Óxidos



- Fe2O3(%)
- Al2O3(%)
- SiO2(%)
- CaO(%)

Perdidas por ignición	Equivalente alcalino	SO3
11.04 %	0.60 %	2.17 %

RESUMEN

Fecha	Blaine (cm2/g) NTC 33	Retenido 325 (%) NTC 294	FI (Min) NTC 118	FF (Min) NTC 118	R1 día (MPa) NTC 220	R3 días (MPa) NTC 220	R7 días (MPa) NTC 220	R28 días (MPa) NTC 220
1/11/2025	5238	5.0	161	285	9.0	17.3	20.9	
4/11/2025	5100	4.7	150	255	7.1	14.1	18.8	
5/11/2025	5295	4.9	151	255	7.0	14.8	19.6	
6/11/2025	5270	4.0	152	255	7.3	15.5	19.2	
7/11/2025	5160	6.0	154	255	7.2	15.3	19.3	
8/11/2025	4883	4.9	155	255	7.2	14.9	18.5	
11/11/2025	5305	4.1	169	270	7.0	14.8	18.2	
13/11/2025	5223	4.9	175	270	6.9	14.8	17.8	
14/11/2025	5535	5.9	172	270	6.1	13.1	16.6	
15/11/2025	5260	5.1	172	270	6.4	14.2	17.5	
18/11/2025	5740	5.9	165	270	6.2	13.9	17.0	
20/11/2025	5153	5.5	166	270	6.2	13.2		
21/11/2025	5180	5.7	166	270	5.6			
22/11/2025	4973	5.3	171	270	5.7			
24/11/2025	5580	4.6	153	255	6.1			

* Los resultados en este informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones de los materiales ensayados.

* Los resultados expresados han sido obtenidos aplicando los ensayos normalizados en la Norma Técnica Colombiana vigentes a la fecha de emision.

* Las especificaciones del cemento Tipo UG Argos cumplen la norma NTC 121:2021

1910

DERALAM	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	FT: 1 VERSION: 1 FECHA REVISION: 26/04/06
	FICHA TÉCNICA DE PLATINA LISA O ACANALADA NORMA ASTM A36	


FECHA	8 de mayo de 2025

RESULTADO DE ANÁLISIS

CLIENTE	ARCOE SAS

PLATINA	LISA
INFORME	Platina: 250426

MP	SIDOR		
DIAMETRO	9. mm	CALIDAD	1012

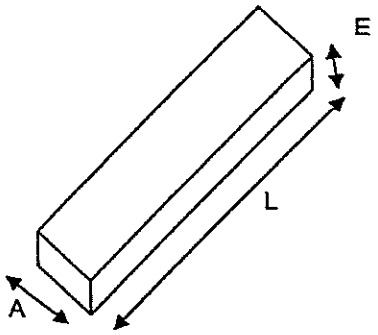

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	
REFERENCIA	18 x 3
PROBETA	25 cm.

DIMENSIONES: Largo x Ancho x Espesor

Dimensión No. L	Dimensión No. A	Dimensión No. E
Obtenido	Obtenido	Obtenido
604 cm.	18.03 mm.	3.03 mm.

PRESENTACIÓN : 600 cm. X 18 mm X 3 mm

Johnatan Saldaña Lopez
Analista de Calidad

Powered by CamScanner

1194

DESTINATARIO

NOMBRE	DIRECCIÓN	Nº ORDEN DE COMPRA
CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA	PV/1771182

AGOFER DITH Group

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

P-SGI-16-R01
Versión 5
30/08/2024

DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE:	Agofer S.A.S.	No. INTERNO	61,640	REPORTE DE PRODUCTO	RPT7113	FECHA DE PRODUCCIÓN	2024-10-24
N.I.T.	800.216.499-1	PLANTA	Yumbo	Nº ORDEN DE PRODUCCIÓN	PO4268	UNIDADES PRODUCIDAS	205.0
DIRECCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN			CR 39 12 A-15				

DATOS DEL PRODUCTO

PRODUCTO		Lámina HR A36 4.5mm x 1.00m x 2.00m													
Nº	NORMA DE FABRICACIÓN	Nº DE TRAZABILIDAD DE LA MATERIA PRIMA	PROPIEDADES QUÍMICAS (%)										RECUBRIMIENTO	PROPIEDADES MECÁNICAS		
			C	Si	Mn	P	S	Al	Cu	Ni	Cr	Mo		Fluencia (F/Y)	Tracción (F/T)	Elongación (%)
1	ASTM A36	ZV1626	0.1600	0.2000	0.4500	0.0140	0.0070	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	No aplica	310.0	455.0	32.0

NOTA: Certificamos que los datos descritos de la composición química y de las propiedades mecánicas son una fiel copia de los certificados de calidad emitidos por el fabricante de la materia prima utilizada, en caso que la propiedades mecánicas estén con valor 0 significa que el fabricante no lo certifica ya que la norma de fabricación no lo exige como aspecto obligatorio.

ENSAYOS REALIZADOS

PRUEBAS DESTRUCTIVAS			
Abocardado	NA	Doblado	NA
Aplastamiento	NA		

PRUEBAS DIMENSIONALES					
Diámetro	NA	Espesor	Conforme	Radios	NA
Dimensiones	Conforme	Longitud	Conforme	Rectitud	Conforme

Certificamos que el material aquí descrito fue producido, revisado y aprobado en la fecha escrita en nuestras instalaciones. Si requiere trazabilidad adicional puede solicitarla al personal de Agofer S.A.S. con el número interno.

Isabelly Angulo Suaréz
Directora del S.I.G.

Declaración generada en **Bogotá el 25/10/2024**

1912

CERTIFICADO DE CALIDAD

Laboratorio de Ensayos de PVC Gerfor S.A.S

		Consecutivo	7.261
Fecha:	03-sep-25	**Referencia:**	TUBO PRESION ACAMP RDE 21 2"
Norma:	NTC-382/2295	**Lote de Fabricación:**	30000077123

REQUISITO	UN. MEDIDA	METODO DE ENSAYO	ESPECIFICACION	RESULTADO
DIAMETRO EXTERIOR	mm	NTC-3358	60,17 - 60,47	60,40
OVALAMIENTO	mm	NTC-3358	<= 1,52	0,24
ESPESOR DE PARED MINIMO	mm	NTC-3358	2,87 - 3,38	3,14
LONGITUD DEL TUBO	mm	NTC-3358	6000 - 6012	6008,30
ESPESOR DE LA PESTAÑA	mm	NTC-3358	>= 2,87	3,31
ESPESOR DE LA CAMPANA	mm	NTC-3358	>= 3,15	3,34
DIAMETRO INT DE LA PESTAÑA	mm	NTC-3358	60,50 - 62,50	62,21
DIAMETRO INT DEL ANILLO	mm	NTC-3358	72,20 - 74,20	72,63
DIAMETRO INT DE LA CAMPANA	mm	NTC-3358	60,50 - 62,50	62,12
LONGITUD DE LA CAMPANA	mm	NTC-3358	>= 95,00	116,02
LONGITUD DE LA PESTAÑA	mm	NTC-3358	>= 15,00	25,03
REGRESIÓN ACELERADA (1 h)	psi	NTC-5494	0 - 2000	628,35
PRESION DE ROTURA	psi	NTC-3579	>= 630	648,50

Los resultados que aparecen en el presente certificado corresponden únicamente a la muestra evaluada.
Este certificado no podrá ser reproducido ni de forma parcial ni total sin la autorización de PVC Gerfor S.A.S
Muestreo realizado según la NTC 2859-1. Vigente

Revisó:

Juan Ramos

Juan Manuel Ramos Morales
Coordinador De Laboratorio PVC Gerfor

Aprobó:

Jenny Rodriguez

Jenny Andrea Rodriguez Gutierrez
Jefe de Laboratorio PVC Gerfor

NIT. 8605025091
AUT. MEDELLIN KM 2, 600 MTS ENTRADA
COTA - CUNDINAMARCA Colombia
PBX: 8776820 FAX: 8776849
www.gerfor.com

Colombia corre por nuestras venas

CERTIFICADO DE CALIDAD

Laboratorio de Ensayos de PVC Gerfor S.A.S

Fecha: 03-sep-25
Norma: NTC-382/2295
Consecutivo 7.261
Referencia: TUBO PRESION ACAMP RDE 21 2"
Lote de Fabricación: 30000077123

REQUISITO	UN. MEDIDA	METODO DE ENSAYO	ESPECIFICACION	RESULTADO
CALIDAD DE EXTRUSION	MINUTOS	NTC-2983	NO DEBE PRESENTAR DELAMINACION O DESMORONAMIENTO	CUMPLE
RESISTENCIA AL IMPACTO	JULIOS	NTC-1125	40,7	CUMPLE
APLASTAMIENTO TRANSVERSAL	%	NTC-3254	60% DEL DIAMETRO EXTERNO	CUMPLE
ATOXICIDAD	%	NTC-539	APTO PARA EL TRANSPORTE DE AGUA POTABLE	CUMPLE
HERMETICIDAD DE LA JUNTA	Psi	NTC-2295	100 PSI X 1 HORA / 500 PSI X 1 HORA / 630 PSI X 1 MINUTO	CUMPLE
HERMETICIDAD DE LA JUNTA	InHg	NTC-2295	22 InHg X 1 HORA	CUMPLE
ROTULADO	N/A	NTC-382	GERFOR IND. COL. PVC PRESION AGUA POTABLE 2" - 60mm RDE21 PT 1,38MPa - 200psi CALIDAD CERTIFICADA N ICONTEC NTC 382/2295 - REGLAMENTO TÉCNICO N Res. 0501 LOTE	CUMPLE

Los resultados que aparecen en el presente certificado corresponden únicamente a la muestra evaluada.
Este certificado no podrá ser reproducido ni de forma parcial ni total sin la autorización de PVC Gerfor S.A.S
Muestreo realizado según la NTC 2859-1. Vigente

Revisó:

Juan Ramos

Juan Manuel Ramos Morales
Coordinador De Laboratorio PVC Gerfor

Aprobó:

Jenny Rodriguez

Jenny Andrea Rodriguez Gutierrez
Jefe de Laboratorio PVC Gerfor

NIT. 8605025091
AUT. MEDELLIN KM 2, 600 MTS ENTRADA
COTA - CUNDINAMARCA Colombia
PBX: 8776820 FAX: 8776849
www.gerfor.com

Colombia corre por nuestras venas

1194

CERTIFICADO DE CALIDAD

Gerfor

Laboratorio de ensayos PVC Gerfor S.A.

Consecutivo: 1535
Fecha: 05-sept-25 **Referencia:** TUBO U.M. 2"
Norma: NTC-382 **Lote de fabricación:** 30000052516

REQUISITO	UN. MEDIDA	METODO DE ENSAYO	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO
DIAMETRO EXTERIOR	mm	NTC-3578	60 - 60	60
OVALAMIENTO	mm	NTC-3578	<- 1,60	0,75
ESPESOR DE PARED MINIMO	mm	NTC-3578	1,78 - 2,45	1,97
PORCENTAJE DE VARIACION DE PARED	%	NTC-3578	<- 12,00	8,62
LONGITUD DEL TUBO	mm	NTC-3578	6000 - 6012	6009,77

REQUISITO	UN. MEDIDA	METODO DE ENSAYO	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO
CALIDAD DE EXTRUSION	MINUTOS	NTC-3578	NO DEBE PRESENTAR DELAMINACION O DESMORONAMIENTO.	CUMPLE
RESISTENCIA AL IMPACTO	JULIOS	NTC-1125	68	CUMPLE
APLASTAMIENTO TRANSVERSAL	%	NTC-3254	70% DEL DIAMETRO EXTERNO	CUMPLE
ROTULADO		NTC-382	LOGO IND. COL. PVC PRESION AGUA POTABLE DIAMETRO PULG. - MM RDE PRESIÓN DE TRABAJO	CUMPLE

Los resultados que aparecen en el presente certificado corresponden únicamente a la muestra evaluada.
Este certificado no podrá ser reproducido ni de forma parcial ni total sin la autorización de PVC Gerfor S.A.
Muestreo realizado según la NTC 2859-1 Vigente.

Dra. Yeimi Milena Franco
Directora Conformidad

Nit: 860 502 509 - 1
Autopista Medellín Km 2
600 m. vía parcelas, Cota
Cundinamarca, Colombia.
pbx: (1) 877 68 00 /20
fax: (1) 877 68 49
www.gerfor.com

11915

DESTINATARIO

NOMBRE	DIRECCIÓN	N° ORDEN DE COMPRA
CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA	PV/1771182

AGOFER DITH Group

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

P-SGI-16-R01
Versión 5
30/08/2024

DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE:	Agofer S.A.S.	No. INTERNO	70,564	REPORTE DE PRODUCTO	RPT9962	FECHA DE PRODUCCIÓN	2025-08-21
N.I.T.	800.216.499-1	PLANTA	Yumbo	N° ORDEN DE PRODUCCIÓN	PO5989	UNIDADES PRODUCIDAS	159.0
DIRECCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN			CR 39 12 A-15				

DATOS DEL PRODUCTO

PRODUCTO	Lámina HR A36 12.0mm x 1.20m x 2.40m
PRODUCTO	Lámina HR A36 12.0mm x 1.20m x 6.00m

N°	NORMA DE FABRICACIÓN	N° DE TRAZABILIDAD DE LA MATERIA PRIMA	PROPIEDADES QUÍMICAS (%)										RECUBRIMIENTO	PROPIEDADES MECÁNICAS		
			C	Si	Mn	P	S	Al	Cu	Ni	Cr	Mo		Fluencia (F/Y)	Tracción (F/T)	Elongación (%)
1	ASTM A36	ZT2505251330	0.1700	0.1500	0.3700	0.0280	0.0100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	No aplica	381.0	498.0	29.0
2	ASTM A36	ZT2505251336	0.1700	0.1500	0.3700	0.0280	0.0120	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	No aplica	381.0	498.0	26.0
3	ASTM A36	ZT2505251338	0.1700	0.1500	0.3700	0.0280	0.0100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	No aplica	381.0	498.0	29.0
4	ASTM A36	ZT2505251321	0.1700	0.1600	0.3500	0.0240	0.0130	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	No aplica	315.0	474.0	26.0

NOTA: Certificamos que los datos descritos de la composición química y de las propiedades mecánicas son una fiel copia de los certificados de calidad emitidos por el fabricante de la materia prima utilizada, en caso que la propiedades mecánicas estén con valor 0 significa que el fabricante no lo certifica ya que la norma de fabricación no lo exige como aspecto obligatorio.

ENSAYOS REALIZADOS

PRUEBAS DESTRUCTIVAS			
Abocardado	NA	Doblado	NA
Aplastamiento	NA		

PRUEBAS DIMENSIONALES					
Diámetro	NA	Espesor	Conforme	Radios	NA
Dimensiones	Conforme	Longitud	Conforme	Rectitud	Conforme

Certificamos que el material aquí descrito fue producido, revisado y aprobado en la fecha escrita en nuestras instalaciones. Si requiere trazabilidad adicional puede solicitarla al personal de Agofer S.A.S. con el número interno.

Isabelly Angulo Suaréz
Directora del S.I.G.

Declaración generada en **Bogotá** el **21/08/2025**

11916

DESTINATARIO

NOMBRE	DIRECCIÓN	N° ORDEN DE COMPRA
CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA	PV/1765662

AGOFER
DITH Group

CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO

P-SGI-16-R01
Versión 5
30/08/2024

DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE:	Agofer S.A.S.	No. INTERNO	70,656	REPORTE DE PRODUCTO	RPT9889	FECHA DE PRODUCCIÓN	2025-08-14
N.I.T.	800.216.499-1	PLANTA	Malambo	N° ORDEN DE PRODUCCIÓN	PO5891	UNIDADES PRODUCIDAS	374.0
DIRECCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN			KM 3-100 Vía a Caracolí				

DATOS DEL PRODUCTO

PRODUCTO		Tubo Estructural Grado C Rectangular 100 x 40 x 6m (3.0mm)													
N°	NORMA DE FABRICACIÓN	N° DE TRAZABILIDAD DE LA MATERIA PRIMA	PROPIEDADES QUÍMICAS (%)										RECUBRIMIENTO	PROPIEDADES MECÁNICAS		
			C	Si	Mn	P	S	Al	Cu	Ni	Cr	Mo		Fluencia (F/Y)	Tracción (F/T)	Elongación (%)
1	NTC 4526	X25082624	0.1830	0.1630	0.3000	0.2270	0.0200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	No aplica	419.0	420.0	30.7
2	NTC 4526	X25082624	0.1830	0.1630	0.3000	0.2270	0.0200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	No aplica	419.0	420.0	30.7
3	NTC 4526	X25082624	0.1830	0.1630	0.3000	0.2270	0.0200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	No aplica	419.0	420.0	30.7

NOTA: Certificamos que los datos descritos de la composición química y de las propiedades mecánicas son una fiel copia de los certificados de calidad emitidos por el fabricante de la materia prima utilizada, en caso que la propiedades mecánicas estén con valor 0 significa que el fabricante no lo certifica ya que la norma de fabricación no lo exige como aspecto obligatorio.

ENSAYOS REALIZADOS

PRUEBAS DESTRUCTIVAS			
Abocardado	NA	Doblado	NA
Aplastamiento	NA		

PRUEBAS DIMENSIONALES					
Diámetro	NA	Espesor	Conforme	Radios	Conforme
Dimensiones	Conforme	Longitud	Conforme	Rectitud	Conforme

Certificamos que el material aquí descrito fue producido, revisado y aprobado en la fecha escrita en nuestras instalaciones. Si requiere trazabilidad adicional puede solicitarla al personal de Agofer S.A.S. con el número interno.

Isabelly Angulo Suaréz
Directora del S.I.G.

Declaración generada en **Bogotá** el **25/08/2025**

1917

ANEXO 3. INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	INFORME MENSUAL GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: SST-F-077 Versión: 01 Fecha: Agosto 2025

FECHA DE INFORME		
MM	DD	AAAA
Junio	9	2026

CONTRATO N°	CONTRATANTE	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA
821	ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN	CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025 (CAG)	CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025

MES AL QUE PERTENECE EL INFORME	OBJETO DEL CONTRATO	SEDE / PROYECTO
MAYO	CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS, ASEIPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META.	MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN

1. Registro Semanal de Charlas / Capacitaciones SST

Ítem	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN	No. HORAS	Fecha Programada	Indicador cobertura			Indicador eficacia			Responsable O Líder
				Total asistentes a la capacitación	Numero de trabajadores programados	% de Cumplimiento	Numero trabajadores evaluados	Numero de evaluaciones eficaces	% de Cumplimiento	
1	CONTROL DE RIESGOS - INSPECCIÓN VISUAL	0,15	4/05/2026	8	8	100%	8	8	100%	COORDINADOR SGSST
2	PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES ÉNDEMICAS	0,15	8/05/2026	8	8	100%	8	8	100%	COORDINADOR SGSST
3	RELACIONES INTERPERSONALES	1,00	12/05/2026	8	8	100%	8	8	100%	COORDINADOR SGSST
4	PAUSAS ACTIVAS: ESTIRAMIENTO MUSCULAR	0,15	15/05/2026	8	8	100%	8	8	100%	COORDINADOR SGSST
5	USO ADECUADO DE EPP	1,00	19/05/2026	8	8	100%	8	8	100%	COORDINADOR SGSST
6	GOLPES DE CALOR - HIDRATACIÓN	0,15	21/05/2026	8	8	100%	8	8	100%	COORDINADOR SGSST
7	RIESGO CARDIOVASCULAR	0,15	25/05/2026	8	8	100%	8	8	100%	COORDINADOR SGSST
8	SOCIALIZACION DE PRACTICA SEGURA DE FIGURADO	0,15	28/05/2026	8	8	100%	8	8	100%	COORDINADOR SGSST

2. Programa de Inspecciones (Relacione las inspecciones ejecutadas durante la semana)

Ítem	Inspección Realizada	Fecha	Periodicidad	Descripción del hallazgo	Plan de acción	Fecha del Cierre	% de Cumplimiento
1	LISTA DE CHEQUEO EQUIPO DE SOLDADURA ELÉCTRICA	4/05/2026	SEMANAL	NINGUNO	N/A	N/A	100%
2	BOTIQUÍN WACOYO	4/05/2026	MENSUAL	NINGUNO	N/A	N/A	100%
3	CAMILLA WACOYO	4/05/2026	MENSUAL	NINGUNO	N/A	N/A	100%
4	EXTINTOR WACOYO	4/05/2026	MENSUAL	NINGUNO	N/A	N/A	100%
5	LOCATIVA	4/05/2026	MENSUAL	NINGUNO	N/A	N/A	100%
6	HERRAMIENTAS MECÁNIZADAS	4/05/2026	QUINCENAL	NINGUNO	N/A	N/A	100%
8	INSPECCIÓN DE ANDAMIOS	4/05/2026	SEMANAL	NINGUNO	N/A	N/A	100%
9	INSPECCIÓN DE EQUIPOS	4/05/2026	SEMANAL	NINGUNO	N/A	N/A	100%
10	LISTA DE CHEQUEO EQUIPO DE SOLDADURA ELÉCTRICA	11/05/2026	SEMANAL	NINGUNO	N/A	N/A	100%
11	BOTIQUÍN DOMOPLANAS	11/05/2026	MENSUAL	NINGUNO	N/A	N/A	100%
12	CAMILLA DOMOPLANAS	11/05/2026	MENSUAL	NINGUNO	N/A	N/A	100%
13	EXTINTOR DOMOPLANAS	11/05/2026	MENSUAL	NINGUNO	N/A	N/A	100%
14	LOCATIVA	11/05/2026	MENSUAL	NINGUNO	N/A	N/A	100%
16	HERRAMIENTAS MENORES	11/05/2026	SEMANAL	NINGUNO	N/A	N/A	100%
17	INSPECCIÓN DE ANDAMIOS	11/05/2026	SEMANAL	NINGUNO	N/A	N/A	100%
18	INSPECCIÓN DE EQUIPOS	11/05/2026	SEMANAL	NINGUNO	N/A	N/A	100%
19	LISTA DE CHEQUEO EQUIPO DE SOLDADURA ELÉCTRICA	18/05/2026	SEMANAL	NINGUNO	N/A	N/A	100%
20	BOTIQUÍN ASEIPOME	18/05/2026	MENSUAL	NINGUNO	N/A	N/A	100%
21	CAMILLA ASEIPOME	18/05/2026	MENSUAL	NINGUNO	N/A	N/A	100%
22	EXTINTOR ASEIPOME	18/05/2026	MENSUAL	NINGUNO	N/A	N/A	100%
23	LOCATIVA	18/05/2026	MENSUAL	NINGUNO	N/A	N/A	100%
24	HERRAMIENTAS MECÁNIZADAS	18/05/2026	QUINCENAL	NINGUNO	N/A	N/A	100%
26	INSPECCIÓN DE ANDAMIOS	18/05/2026	SEMANAL	NINGUNO	N/A	N/A	100%
27	INSPECCIÓN DE EQUIPOS	18/05/2026	SEMANAL	NINGUNO	N/A	N/A	100%
28	LISTA DE CHEQUEO EQUIPO DE SOLDADURA ELÉCTRICA	25/05/2026	SEMANAL	NINGUNO	N/A	N/A	100%
30	HERRAMIENTAS MENORES	25/05/2026	QUINCENAL	NINGUNO	N/A	N/A	100%
31	INSPECCIÓN DE ANDAMIOS	25/05/2026	SEMANAL	NINGUNO	N/A	N/A	100%
32	INSPECCIÓN DE EQUIPOS	25/05/2026	SEMANAL	NINGUNO	N/A	N/A	100%
33	INSPECCIÓN DE DOTACIÓN Y EPP	25/05/2026	QUINCENAL	NINGUNO	N/A	N/A	100%
34	INSPECCION DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	30/05/2026	DIARIA	NINGUNO	N/A	N/A	100%

3. Seguimiento Semanal a Actividades adelantadas relacionadas a la Implementación y ejecución del SG-SST

Ítem	Descripción de Gestión SST y demás Actividades	Fecha	Observaciones
1	SE REALIZÓ INSPECCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, SE VALIDÓ DOCUMENTACIÓN DEL OPERADOR.	SEMANAL	NINGUNA
2	SE DA CUMPLIMIENTO A LAS INSPECCIONES PLANEADAS DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIAS.	MENSUAL	NINGUNA
3	SE REALIZAN CHARLAS PRE OPERACIONALES, SOCIALIZANDO LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EJECUTAR.	DIARIA	NINGUNA
4	SEGUIMIENTO AL USO DE EPP Y DOTACIÓN EN OBRA.	DIARIA	NINGUNA
5	INDUCCIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	OCASIONAL	NINGUNA
6	ANÁLISIS DE RIESGOS PARA ACTIVIDAD DE MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA	MENSUAL	NINGUNA
7	PERMISO DE TRABAJO SEGURO PARA ALTURAS	DIARIA	NINGUNA
8	INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	DIARIA	NINGUNA

1119

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	INFORME MENSUAL GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: SST-F-077 Versión: 01 Fecha: Agosto 2025

4. Inventario de Maquinaria y Equipos

Ítem	Nombre del Equipo	Referencia	Propio o Alquilado	Nombre del Operador	Observaciones
1	EXCAVADORA	97165	PROPIO	YEFERSON ENRIQUE GALVAN MONTES	NINGUNA


5. Seguimiento a hallazgos y Condiciones de Seguridad, Salud y Ambiente

Ítem	Descripción del hallazgo encontrado	Plan de Acción	Fecha	Se Notifico al Responsable		Fecha propuesta para el cierre	Estado
				Si	No		
1	NINGUNA	N/A	N/A			N/A	N/A


6. Seguimiento Ausentismo Laboral

Ítem	Fecha	Nombre del Trabajador	Cedula	Cargo	Periodo de ausentismo		Total Días de ausentismo	Descripción del ausentismo
					Fecha Inicial	Fecha final		
1	29/05/2026	YEFERSON ENRIQUE GALVÁN MONTES	78.646.546	OPERADOR DE MAQUINARÍA	29/05/2026	27/06/2026	30	ACCIDENTE DE TRABAJO.

7. Seguimiento a Indicadores de Accidentalidad

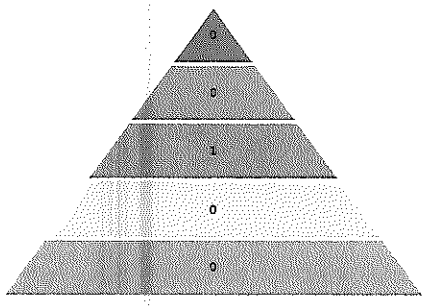

FATALIDAD
ACCIDENTE TRABAJO GRAVE
ACCIDENTE TRABAJO MODERADO
ACCIDENTE TRABAJO LEVE
INCIDENTES

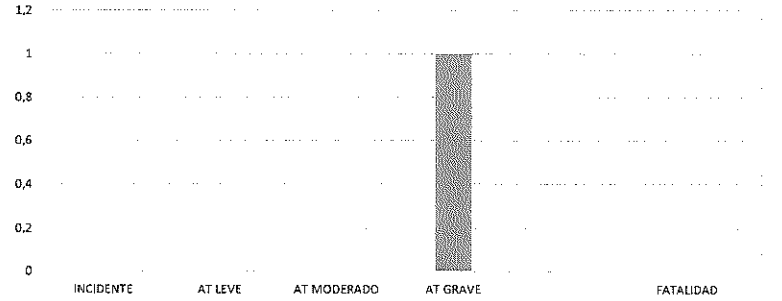


Ítem	Obra / Proyecto (Empresa contratista)	Promedio Trabajadores en el Mes	Total días trabajados en el Mes	HHT	INCIDENTE	AT LEVE	AT MODERADO	AT GRAVE	FATALIDAD	TOTAL AT	TOTAL DÍAS INCAPACIDAD	TOTAS DIAS CARGADOS	ÍNDICES					
													Mes	ÍNDICE DE FRECUENCIA	ÍNDICE DE SEVERIDAD	ÍNDICE DE LESIÓN INCAPACITANTE	TASA DE AUSENTISMO	TASA DE INCIDENCIA DE ACCIDENTES
1	CAG	16	21	1278	0	0	0	1	0	0	30	0	MAYO	0	192	0	0	0

8. Descripción de los Accidentes e Incidentes presentados durante la Semana


Fecha del AT	Nombre	# Cedula	Ubicación y tipo de lesión	Incapacidad	Avance Incapacidad	At investigado	Descripción del accidente
28/05/2026	YEFERSON ENRIQUE GALVÁN MONTES	78646546	DOMO PLANAS - FRACTURA EN BRAZO DERECHO	30 Días	SEGUIMIENTO MÉDICO	SI	ÉL COLABORADOR YEFERSON GALVAN ESTABA EN EL FRENTE DE OBRA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA VILLA MARCÍA RECOGIENDO UN ACEITE PARA LA MAQUINA, POR INSTRUCCIÓN DEL INGENIERO GUILLERMO SE TRASLABA EN MOTOCICLETA HACIA EL OTRO FRENTE EN LA COMUNIDAD INDÍGENA LOS OLIVOS DONDE ESTÁN REALIZANDO ACTIVIDADES DE LA OBRA, EN EL MOMENTO QUE VA ASCENDIENDO POR UN TRAMO DEL CAMINO VEREDAL QUE ESTABA HÚMEDA POR LLUVIAS, SE RESBALA LA MOTO PERDIENDO EL EQUILIBRIO Y CAE RECIBIENDO UN GOLPE EN EL BRAZO DERECHO.

9. Registro Fotográfico de Gestión SST

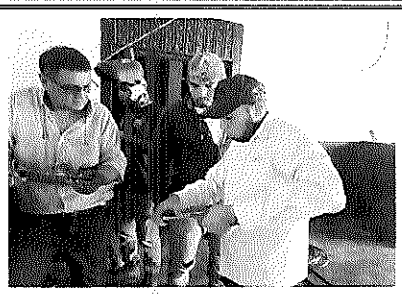



Ubicación:
Obra
Descripción:
Inducción de seguridad y salud en el trabajo


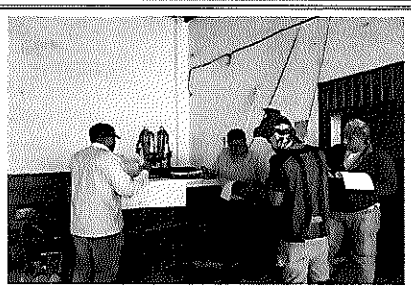


Ubicación:
Obra
Descripción:
Socialización de formatos del SG-SST

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	INFORME MENSUAL GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: SST-F-077 Versión: 01 Fecha: Agosto 2025





Ubicación:
Obra
Descripción:
Inspección de EPCC


Ubicación:
Obra
Descripción:
Uso correcto de EPP




Ubicación:
Obra
Descripción:
Socialización de uso adecuado de EPP

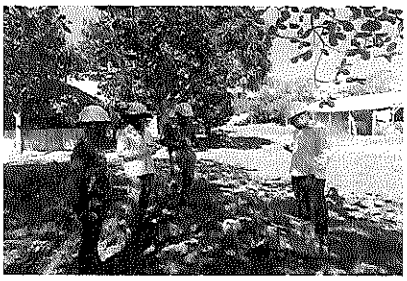

Ubicación:
Obra
Descripción:
Entrega de EPP


Ubicación:
Obra
Descripción:
Entrega de Dotación de invierno



Ubicación:
Obra
Descripción:
Inspección de camilla





Ubicación:
Obra
Descripción:
Inspección de botiquín y extintor

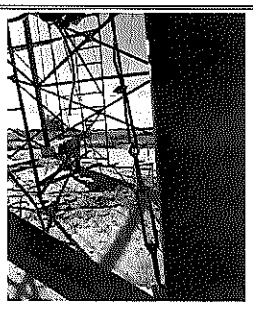



Ubicación:
Obra
Descripción:
Inspección de vientos

11921

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	INFORME MENSUAL GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**Código:** SST-F-077 **Versión:** 01 **Fecha:** Agosto 2025





Ubicación:
Obra
Descripción:
Supervisión SST en montaje de estructura.



Ubicación:
Obra
Descripción:
Inspección de maquinaria.

10. Comentarios generales SST	
1	Es importante destacar que se ejecutaron actividades de suministros de equipos, estructura y materiales para el desarrollo del proyecto, por lo tanto no se conto con personal operativo en el proyecto.
2	De acuerdo a lo anterior se realiza el presente Informe teniendo en cuenta el personal independiente, que debido al desarrollo de proyecto solo se realizaron actividades de inspección.

FIRMA	
NOMBRE	**GUSTAVO MEDINA**
CARGO	**RESPONSABLE SST**

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	**CONTROL DE ASISTENCIA**	**Código:** SST-F-0 **Versión:** 01 **Fecha:** agosto 202

1922

Tipo de actividad: Reunión__ Capacitación__ Charla X Visita__ Campaña__ Otra _____

Fecha de actividad: 4-6-2026	**Hora:** 7:00 AM	**Duración:** 15 minutos
Tema: Control de riesgos - inspección visual		**Lugar:** PUERTO GAITÁN

N.°	NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABADOR	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Yeferson Golver	7864654[illegible]	operador	Yeferson G
2	Duvan Gonzalo	1004819009	aguadante	Duvan R
3	Correa Miguel	1103470729	ofc	Correa
4	Guillermo osorio	1121834340	ING residente	
5	Genesis paola poveda Martinez	1.092.394.700	Secretaria	Genesis p poveda M
6	Dora Yamira Machado Tejero	40395435	Contadora	Dora Machado T.
7	VANESA GARZON	1121902403	ING. RESIDENTE	
8	Lina Marcela Gomez Leal	40.328.285	Aux. Contable	Lina Gomez
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES: _____

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:	GUSTAVO MEDINA
FIRMA:	

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	CONTROL DE ASISTENCIA	Código: SST-F-025
		Versión: 01
		Fecha: agosto 2025

1023

Tipo de actividad: Reunión__ Capacitación__ Charla X Visita__ Campaña__ Otra _____		
Fecha de actividad: 8-5-2026	Hora: 7:00 am	Duración: 35 minutos
Tema: PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES ENDEMICAS		Lugar: PUERTO GAITÁN

N.°	NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABADOR	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Yeferson Galvan	78646546	operador	Yeferson G
2	DAVAN ROMERO	1004818009	AUXILIAR	DAVAN R
3	Correa miguel.	1003470729	OFC	Correa
4	Guillermo osorio	1121934340	ING RESIDENTE	
5	Genesis paola parada Martinez	1.092394.700	Secretaria	Genesis parada M
6	Diva Yamra Machado Tejero	40395435	Contadora	Diva Machado
7	VANESA GARZON	1121902403	ING. RESIDENTE	
8	Lina Maricela Gomez Leal	40.328.285	AUX. Contable	Lina Gomez
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES: _____

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:	GUSTAVO MEDINA
FIRMA:	

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	**CONTROL DE ASISTENCIA**	**Código:** SST-F-025 **Versión:** 01 **Fecha:** agosto 2025

Tipo de actividad: Reunión__ Capacitación X Charla X Visita__ Campaña__ Otra _____

Fecha de actividad: 12-5-2026	**Hora:** 9:00	**Duración:** 1 HORA
Tema: RELACIONES INTERPERSONALES		**Lugar:** PUERTO GAITAN

N.°	NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABADOR	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Yeferson Galvis	7386165116	Operador	Yeferson G
2	Daron ROMERO	1004819005	ayudante	DURAN R
3	Edwin Alejandro B.	1.120.869.265	OFICIAL	Edwy B.
4	Guillermo osorio	1121834340	ING RESIDENTE	
5	Genesis paola parada Martinez	1.092.394.300	Secretaria	Genesis P parada M
6	Dora Yamira Machado Tejeiro	40395435	Contadora	Dora Machado T
7	VANESA GARZÓN	1121902403	Ing. RESIDENTE	
8	Tina Marcela Gomez Leal	40.328.285	AUX. Contable	Tina Gomez
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES: _____

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:	GUSTAVO MEDINA
FIRMA:	

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	**CONTROL DE ASISTENCIA**	**Código:** SST-F-025 **Versión:** 01 **Fecha:** agosto 2025

Tipo de actividad: Reunión__ Capacitación__ Charla X Visita__ Campaña__ Otra _____

Fecha de actividad: 15 - 6 - 2026	**Hora:** 7:00	**Duración:** 15 minutos
Tema: PAUSAS ACTIVAS: ESTIRAMIENTO MUSCULAR		**Lugar:** PUERTO GAITÁN

N.°	NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABADOR	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Yeferson Golua	78646546	Operador	Yeferson G
2	DAVAN ROMERO	1004819805	ayudante	Davan R
3	Edwin Alejandro B	1.170.864.765	Oficial	Edwin B.
4	Guillermo osorio	1121834340	ING RESIDENTE	
5	Genesis paola parada Martinez	1.092.394.700	Secretaria	Genesis Parada M
6	Diva Yanira Machado Tejeiro	40395435	Contadora	Diva Machado T
7	VANESA GARZON	1121902403	ING. RESIDENTE	
8	Dina Marcela Gomez Leal	40.328.785	AUX. Contable	Dina Gomez
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES: _____

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:	GUSTAVO MEDINA
FIRMA:	

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	CONTROL DE ASISTENCIA	Código: SST-F-025 Versión: 01 Fecha: agosto 2025

11926

Tipo de actividad: Reunión__ Capacitación X Charla__ Visita__ Campaña__ Otra _____		
Fecha de actividad: 19-8-2026	Hora: 7:00 AM	Duración: 1 HORA
Tema: USO ADECUADO DE EPP.		Lugar: PUESTO GAITÁN

N.°	NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABADOR	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Yeferson Colon	78646516	operador	Yeferson G
2	DUVAN ROMERO	1004819005	AUXILIAR	DUVAN R
3	Edwin Alejandro B.	1.120869765	Oficial	Edwin B.
4	Guillermo ayoro	1121E34340	ING RESIDENTE	
5	Genesis paola parada Martinez	1.092394700	Secretaria	Genesis parada M.
6	Dwayanna Madrid Mejia	40395435	Contadora	Dwayanna Madrid
7	VANESA GARZON	1121902403	ING. RESIDENTE	
8	Lina Marcela Gomez Leal	40.328.785	Aux. Contable	Lina Gomez
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES: IMPORTANCIA DE MINIMIZAR LAS LESIONES USANDO LA DOTACION Y EPP PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES.

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:	GUSTAVO MEDINA
FIRMA:	

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	CONTROL DE ASISTENCIA	Código: SST-F-025 Versión: 01 Fecha: agosto 2025

11927

Tipo de actividad: Reunión__ Capacitación__ Charla__ Visita__ Campaña__ Otra _____		
Fecha de actividad: 21-05-2026	Hora: 7:00 AM	Duración: 15 minutos
Tema: GOLPES DE CALOR. - HIDRATACIÓN		Lugar: PUERTO GAITÁN

N.°	NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABADOR	C.C.	CARGO	FIRMA
1	YEFERSON COLMA	7896465116	OPERADOR	YEFERSON
2	DAVAN ROMERO	1004819005	AUXILIAR	DAVAN R
3	EDWIN ALEJANDRO	1.120.864.265	OFICIAL	EDWIN B.
4	GUILLERMO OSORIO	1121834340	SISOMA RESIDENTE	
5	GENESIS PAOLA PARADA MARTINEZ	1.092.394.700	SECRETARIA	GENESIS P PARADA M
6	DIVA YANIRA MADRID	40395435	CONTADORA	DIVA MADRID
7	VANESA GARZON	1121902403	SISOMA RESIDENTE	
8	LINA MARCELA GOMEZ LEAL	40.328.285	AUX. CONTABLE	L.M. GOMEZ
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES: _____

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:	GUSTAVO MEDINA
FIRMA:	

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	CONTROL DE ASISTENCIA	Código: SST-F-025
		Versión: 01
		Fecha: agosto 2025

11 976

Tipo de actividad: Reunión__ Capacitación__ Charla X Visita__ Campaña__ Otra _____

Fecha de actividad: 25-05-2026	**Hora:** 7:00 am	**Duración:** 15 minutos
Tema: RIESGO CARDIOVASCULAR.		**Lugar:** PUERTO GAITÁN

N.°	NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABADOR	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Yeferson Colina	79644546	operador	Yeferson C
2	Duvan Romero	1004819005	ayudante	Duvan R
3	Edwin Alejandro	1.120.864765	Oficial	Edwin B.
4	Guillermo osorio	1121834340	ING RESIDENTE	
5	Genesis paola parada Martinez	1092394700	Secretaria	Genesis P parada M
6	Dora Yanira Machado S.	40395435	Contadora	Dora Machado
7	VANESA GAITÁN	1121924103	SST RESIDENTE	
8	Ana Maria Gomez Jal	40.328.285	AUX. Contable	Ana Gomez
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES: HABITOS SALUDABLES: ALIMENTACIÓN, EJERCICIO, LECTURA, CONTROL MEDICO.

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:	GUSTAVO MEDINA
FIRMA:	

11929

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	**CONTROL DE ASISTENCIA**	**Código:** SST-F-025 **Versión:** 01 **Fecha:** agosto 2025

Tipo de actividad: Reunión__ Capacitación__ Charla_X_ Visita__ Campaña__ Otra _____

Fecha de actividad: 28-05-2026	**Hora:** 700 am	**Duración:** 15 minutos
Tema: SOCIALIZACIÓN DE PRÁCTICA SEGURA DE TRABAJO.		**Lugar:** PUERTO GAITÁN.

N.°	NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABADOR	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Yeferson Cobos	7986665[illegible]	operador	Yeferson C
2	DUVAN ROMERO	1006481400[illegible]	Q&A Dentz	DUVAN R
3	Correa miguel.	1067470729	OFC	Correa
4	ING RESIDENTE	1121[illegible]	ING RESIDENTE	
5	Genesis paola paredaMartinez	1.092.394.700	Secretaria	Genesis P paredaM
6	Dina Yanira Machado Tejeiro	40395435	Contadora	Dina Machado T
7	VANESA GARZON	1121902403	ING RESIDENTE	
8	Dina Maria Gomez Del	40.328.285	AUX. Contable	Dina Gomez
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES: _____

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:	GUSTAVO MEDINA
FIRMA:	

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN SGSST	Código: SST-F-034 Versión: 01 Fecha: agosto 2025

11:30

INDUCCIÓN (X) RE-INDUCCIÓN ( )	Fecha	15	05	2026

INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

Nombres y Apellidos: John Alexander Diaz Sarmiento	Documento: 79.890490
Cargo: Soldador	N° de celular: 3125003163

TEMAS DIVULGADOS	SI	NO	TEMAS DIVULGADOS	SI	NO
Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	X		Enfermedad laboral - Procedimiento en caso de EL	X	
Objetivos del SG-SST	X		Reporte de Actos y Condiciones Inseguras.	X	
Política de SST	X		COPASST / Vigía de SST	X	
Política para la prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas.	X		Ley 1010 de 2006 Acoso laboral	X	
Política de Seguridad Vial	X		Comité de Convivencia laboral	X	
Definiciones de Riesgo y peligro	X		Dotación y EPP que requieren durante la ejecución de actividades.	X	
Identificación de peligros y controles	X		Plan de emergencias: Brigadistas, Procedimiento en caso de emergencia, códigos de alarma, punto de encuentro.	X	
Reporte e investigación de Accidentes e Incidentes de Trabajo.	X		Reglamento de Higiene y seguridad	X	

RESPONSABILIDADES RESPECTO A SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

a) Procurar el cuidado integral de mi salud; con el fin de prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
b) Suministrar información clara, veraz y completa sobre mi estado de salud,
c) Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del SG-SST de la Compañía,
d) Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en mi sitio de trabajo,
e) Participar en las actividades de prevención, mediante capacitaciones en SST, definidas en el cronograma de capacitación del SG-SST, que se realicen en la empresa.
f) Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.

NORMAS DE SEGURIDAD

1. El uso de la Dotación y EPP suministrados por la Empresa, es obligatorio durante toda la jornada laboral para el personal administrativo y Operativo.
2. Aplique las pautas de higiene postural y de manipulación de cargas. Realice diariamente pausas activas.
3. Prohibido obstaculizar, retirar, esconder u operar los equipos de emergencia como son extintores, gabinetes, camillas y botiquines, salvo en una emergencia.
4. Mantener el puesto de trabajo en perfecto orden y aseo y cuidar los equipos elementos asignados para ejecutar la labor.
5. Para la realización de tareas de alto riesgo (trabajos en altura, espacios confinados, excavaciones y energías peligrosas) es obligatorio tramitar el Permiso para tareas de alto riesgo, contar con los equipos, herramientas y protección adecuada para su realización.
6. En casos de emergencia siga los procedimientos de seguridad y reporte la situación a la persona encargada.
7. Evalúe y controle los riesgos antes de ejecutar cualquier tarea; evite improvisar.
8. No se permite usar joyas o prendas que puedan causar accidentes, tales como anillos, esclavas, cadenas, relojes, pulseras, ropa diferente a la entregada como dotación en obras.
9. Ponga en práctica los procedimientos seguros de trabajo y respete las instrucciones, señales y advertencias

PELIGROS A LOS QUE PUEDE ESTAR EXPUESTO

Peligro	Descripción	Aplica (Si - No)
Biológico	Virus, bacterias, hongos, ricketsias, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos o excrementos.	Si
Físico	**Ruido** (impacto intermitente y continuo) , **iluminación** (luz visible por exceso o deficiencia), **vibración** (cuerpo entero, segmentaria), **temperatura extrema** (calor y frío), **presión atmosférica** (normal y ajustada), **radiaciones ionizantes** (rayos x, gama, beta y alfa), **radiaciones no ionizantes** (láser, ultravioleta infrarroja).	Si
Químico	Polvos orgánicos e inorgánicos, fibras, **líquidos** (nieblas y rocíos), gases y vapores, humos metálicos, no metálicos, material pa	Si
Psicosocial	**Gestión organizacional** (estilo de mando, pago, contratación, participación, inducción y capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño, manejo de cambios). **Características de la organización del trabajo** (comunicación, tecnología, organización del trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas de la labor). **Características del grupo social del trabajo** (relaciones, cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo). **Condiciones de la tarea** (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonía, etc.). **Interfase persona/tarea** (conocimientos, habilidades con relación a la demanda de la tarea, iniciativa, autonomía y reconocimiento, identificación de la persona con la tarea y la organización). **Jornada de trabajo** (pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descansos).	Si
Biomecánicos	**Postura** (prolongada, mantenida, forzada, antigravitacionales), esfuerzo, movimiento repetitivo, manipulación manual de cargas.	Si
Condiciones de seguridad:	**Mecánica** (elementos de máquinas-herramientas, piezas por trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos). **Eléctrica** (alta y baja tensión, estática). **Locativa** (almacenamiento, superficies de trabajo irregularidades, deslizantes, con diferencia del nivel, condiciones de orden y aseo, caídas de objeto). **Tecnológica** (explosión, fuga, derrame, incendio). **Accidentes de tránsito.** **Públicas** (robos, atracos, asaltos, atentados, desorden público, etc.). **Trabajo en alturas, Espacios confinados.**	Si
Fenómenos naturales:	Sismo, terremoto, vendaval, inundación, derrumbe, precipitaciones (lluvias, granizadas, heladas).	Si

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN SGSST	Código: SST-F-034 Versión: 01 Fecha: agosto 2025

INDUCCIÓN (x) RE-INDUCCIÓN ( )	Fecha	25	08	26

VII. REGISTRO DE ASISTENCIA Y DECLARACION DE ENTERADO

Yo, John Alexander Diaz Sanmiguel, identificado con cédula de ciudadanía No. 79848490 desempeñando el cargo de Soldador. Certifico que recibí, la inducción o re inducción en aspectos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo, así mismo se han discutido conmigo los asuntos y temas arriba señalados, he manifestado todas mis dudas e inquietudes, las cuales me han sido aclaradas satisfactoriamente.

Me Comprometo a seguir y cumplir las instrucciones, normas y procedimientos establecidas por Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo.

En constancia de lo anterior firmo: _____

¡Gracias por su participación!

Responsable Inducción SST: Gustavo Medina	Firma:

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código: SST-F-035
		Versión: 01
		Fecha: agosto 2025

1934

Nombre del trabajador: John Alexander Diaz Samigal	
Fecha: 15 Mayo 2026	**Cedula:** 79.848490
Cargo: Soldador.	**Puntaje Obtenido:** 100 %

Con el fin de medir la eficacia de la capacitación, se solicita responder las siguientes preguntas relacionadas con la capacitación:

1. El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo

- [x] a. verdadero
- [ ] b. falso

2. Selecione 2 (dos) Políticas de la Empresa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo:

- [ ] a. Política de la empresa.
- [x] b. Política de alcohol y drogas.
- [x] c. Política SST.
- [ ] d. Política de de obra.

3. Peligro, es una combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.

- [x] a. Verdadero
- [ ] b. Falso

4. Riesgo, es toda fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones.

- [x] a. Verdadero
- [ ] b. Falso

5. De los siguientes anunciados, cual corresponde a la definición de ACCIDENTE DE TRABAJO:

- [ ] a. Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.
- [ ] b. El que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.
- [ ] c. El que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión
- [x] d. Todas las anteriores

6. Seleccione 2 (dos) responsabilidades que tengo como trabajador en Seguridad y Salud en el Trabajo:

- [x] a. Reportar una condición de salud desfavorable.
- [ ] b. Hacer buen uso de los elementos de protección personal.
- [ ] c. Cometer actos inseguros durante mis actividades.
- [x] d. Participar en las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo.

7. ¿Qué debo hacer en caso que tenga un accidente de trabajo?

- [x] a. Reportar al jefe inmediato y encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- [ ] b. Reportar directamente a la ARL.
- [ ] c. Dirigirse al centro asistencial más cercano sin informar.
- [ ] d. ninguna de las anteriores

1933

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	**Código:** SST-F-035
		Versión: 01
		Fecha: agosto 2025

8. Seleccione 2 (dos) actos inseguros:

a. Realizar trabajo en alturas sin uso de arnés. b. Usar los elementos de protección personal.

c. Verificar el área de trabajo. d. Trabajar sin uso de los guantes y la gafas de seguridad.

9. ¿El comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (Copasst) es?

a. Una entidad encargada de supervisar las labores de los trabajadores.

b. Un comité encargado de la promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de Seguridad y salud en el Trabajo dentro de la empresa

c. Un comité reglamentado para dar manejo a las conductas por acosos laboral

d. Ninguna de las anteriores

10. ¿En su sitio de trabajo Conoce el punto de encuentro en caso de evacuación?

a) SI **Ubicación:** ENTRADA

b) NO

Firma del trabajador

C.C.: 79.848490 Bta

Responsable de la Inducción
GUSTAVO MEDINA

Cargo: COORDINADOR SST

¡¡Gracias por su participación!!

CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN SGSST	Código: SST-F-034
		Versión: 01
		Fecha: agosto 2025

1194

INDUCCIÓN (X) RE-INDUCCIÓN ( )	Fecha	15	05	2026

INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

Nombres y Apellidos:	Jose Gregorio Aguilar	Documento:	25.645.394
Cargo:	Soldador	N° de celular:	3219171498

TEMAS DIVULGADOS	SI	NO	TEMAS DIVULGADOS	SI	NO
Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	Si		Enfermedad laboral - Procedimiento en caso de EL	Si	
Objetivos del SG-SST	Si		Reporte de Actos y Condiciones Inseguras.	Si	
Política de SST	Si		COPASST / Vigía de SST	Si	
Política para la prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas.	Si		Ley 1010 de 2006 Acoso laboral	Si	
Política de Seguridad Vial	Si		Comité de Convivencia laboral	Si	
Definiciones de Riesgo y peligro	Si		Dotación y EPP que requieren durante la ejecución de actividades.	Si	
Identificación de peligros y controles	Si		Plan de emergencias: Brigadistas, Procedimiento en caso de emergencia, códigos de alarma, punto de encuentro.	Si	
Reporte e investigación de Accidentes e Incidentes de Trabajo.	Si		Reglamento de Higiene y seguridad	Si	

RESPONSABILIDADES RESPECTO A SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

a) Procurar el cuidado integral de mi salud; con el fin de prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
b) Suministrar información clara, veraz y completa sobre mi estado de salud,
c) Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del SG-SST de la Compañía,
d) Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en mi sitio de trabajo,
e) Participar en las actividades de prevención, mediante capacitaciones en SST, definidas en el cronograma de capacitación del SG-SST, que se realicen en la empresa.
f) Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.

NORMAS DE SEGURIDAD

1. El uso de la Dotación y EPP suministrados por la Empresa, es obligatorio durante toda la jornada laboral para el personal administrativo y Operativo.
2. Aplique las pautas de higiene postural y de manipulación de cargas. Realice diariamente pausas activas.
3. Prohibido obstaculizar, retirar, esconder u operar los equipos de emergencia como son extintores, gabinetes, camillas y botiquines, salvo en una emergencia.
4. Mantener el puesto de trabajo en perfecto orden y aseo y cuidar los equipos elementos asignados para ejecutar la labor.
5. Para la realización de tareas de alto riesgo (trabajos en altura, espacios confinados, excavaciones y energías peligrosas) es obligatorio tramitar el Permiso para tareas de alto riesgo, contar con los equipos, herramientas y protección adecuada para su realización.
6. En casos de emergencia siga los procedimientos de seguridad y reporte la situación a la persona encargada.
7. Evalúe y controle los riesgos antes de ejecutar cualquier tarea; evite improvisar.
8. No se permite usar joyas o prendas que puedan causar accidentes, tales como anillos, esclavas, cadenas, relojes, pulseras, ropa diferente a la entregada como dotación en obras.
9. Ponga en práctica los procedimientos seguros de trabajo y respete las instrucciones, señales y advertencias

PELIGROS A LOS QUE PUEDE ESTAR EXPUESTO

Peligro	Descripción	Aplica (Si - No)
Biológico	Virus, bacterias, hongos, ricketsias, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos o excrementos.	Si
Físico	**Ruido** (impacto intermitente y continuo) , **iluminación** (luz visible por exceso o deficiencia), **vibración** (cuerpo entero, segmentaria), **temperatura extrema** (calor y frío), **presión atmosférica** (normal y ajustada), **radiaciones ionizantes** (rayos x, gama, beta y alfa), **radiaciones no ionizantes** (láser, ultravioleta infrarroja).	Si
Químico	Polvos orgánicos e inorgánicos, fibras, **líquidos** (nieblas y rocíos), gases y vapores, humos metálicos, no metálicos, material p	Si
Psicosocial	**Gestión organizacional** (estilo de mando, pago, contratación, participación, inducción y capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño, manejo de cambios). **Características de la organización del trabajo** (comunicación, tecnología, organización del trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas de la labor). **Características del grupo social del trabajo** (relaciones, cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo). **Condiciones de la tarea** (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonía, etc.). **Interfase persona/tarea** (conocimientos, habilidades con relación a la demanda de la tarea, iniciativa, autonomía y reconocimiento, identificación de la persona con la tarea y la organización). **Jornada de trabajo** (pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descansos).	Si
Biomecánicos	**Postura** (prolongada, mantenida, forzada, antigravitacionales), esfuerzo, movimiento repetitivo, manipulación manual de cargas.	Si
Condiciones de seguridad:	**Mecánica** (elementos de máquinas-herramientas, piezas por trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos). **Eléctrica** (alta y baja tensión, estática). **Locativa** (almacenamiento, superficies de trabajo irregularidades, deslizantes, con diferencia del nivel, condiciones de orden y aseo, caídas de objeto). **Tecnológica** (explosión, fuga, derrame, incendio). **Accidentes de tránsito. Públicas** (robos, atracos, asaltos, atentados, desorden público, etc.). **Trabajo en alturas, Espacios confinados.**	Si
Fenómenos naturales:	Sismo, terremoto, vendaval, inundación, derrumbe, precipitaciones (lluvias, granizadas, heladas).	Si

CONSORCIO AGUAS CAITÁN 2025	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN SGSST	**Código:** SST-F-034 **Versión:** 01 **Fecha:** agosto 2025

INDUCCIÓN (X) RE-INDUCCIÓN ( )	Fecha	15	5	26

VII. REGISTRO DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE ENTERADO

Yo, José Gregorio Aguilas, identificado con cédula de ciudadanía No. 25645394, desempeñando el cargo de Soldador Certifico que recibí, la inducción o re inducción en aspectos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo, así mismo se han discutido conmigo los asuntos y temas arriba señalados, he manifestado todas mis dudas e inquietudes, las cuales me han sido aclaradas satisfactoriamente.

Me Comprometo a seguir y cumplir las instrucciones, normas y procedimientos establecidas por Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo.

En constancia de lo anterior firmo: José

¡Gracias por su participación!

Responsable Inducción SST: Gustavo Medina	Firma:

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código: SST-F-035
		Versión: 01
		Fecha: agosto 2025

11936

Nombre del trabajador: Jose Gregorio Aguilar	
Fecha: 15-05-2026	**Cedula:** 25.695.394
Cargo: Soldador	**Puntaje Obtenido:** 100%

Con el fin de medir la eficacia de la capacitación, se solicita responder las siguientes preguntas relacionadas con la capacitación:

1. El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo

- [x] a. verdadero
- [ ] b. falso

2. Selecione 2 (dos) Políticas de la Empresa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo:

- [x] a. Política de la empresa.
- [ ] b. Política de alcohol y drogas.
- [x] c. Política SST.
- [ ] d. Política de de obra.

3. Peligro, es una combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.

- [x] a. Verdadero
- [ ] b. Falso

4. Riesgo, es toda fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones.

- [x] a. Verdadero
- [ ] b. Falso

5. De los siguientes anunciados, cual corresponde a la definición de ACCIDENTE DE TRABAJO:

- [ ] a. Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.
- [ ] b. El que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.
- [ ] c. El que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión
- [x] d. Todas las anteriores

6. Seleccione 2 (dos) responsabilidades que tengo como trabajador en Seguridad y Salud en el Trabajo:

- [x] a. Reportar una condición de salud desfavorable.
- [ ] b. Hacer buen uso de los elementos de protección personal.
- [ ] c. Cometer actos inseguros durante mis actividades.
- [x] d. Participar en las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo.

7. ¿Qué debo hacer en caso que tenga un accidente de trabajo?

- [x] a. Reportar al jefe inmediato y encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- [ ] b. Reportar directamente a la ARL.
- [ ] c. Dirigirse al centro asistencial más cercano sin informar.
- [ ] d. ninguna de las anteriores

CONSORCIO AGUAS CAITÁN 2025	EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	**Código:** SST-F-035 **Versión:** 01 **Fecha:** agosto 2025

8. Seleccione 2 (dos) actos inseguros:

a. Realizar trabajo en alturas sin uso de arnés. b. Usar los elementos de protección personal.

c. Verificar el área de trabajo. d. Trabajar sin uso de los guantes y la gafas de seguridad.

9. ¿El comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (Copasst) es?

a. Una entidad encargada de supervisar las labores de los trabajadores.

b. Un comité encargado de la promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de Seguridad y salud en el Trabajo dentro de la empresa

c. Un comité reglamentado para dar manejo a las conductas por acosos laboral

d. Ninguna de las anteriores

10. ¿En su sitio de trabajo Conoce el punto de encuentro en caso de evacuación?

a) SI **Ubicación:** ENTRADA

b) NO

Firma del trabajador JOSE

C.C.: 25.645-394

Responsable de la Inducción GUSTAVO MEDINA

Cargo: COORDINADOR SGSST

¡¡Gracias por su participación!!

CONSORCIO AGUAS CAPITÁN 2025	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN SGSST	Código: SST-F-034 Versión: 01 Fecha: agosto 2025

INDUCCIÓN (X) RE-INDUCCIÓN ( )	Fecha	15	05	2026

INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

Nombres y Apellidos: BRAIAN EDUARDO ARENAS MUÑOZ	Documento: 1121926476
Cargo: AYUDANTE	N° de celular: 3015532134

TEMAS DIVULGADOS	SI	NO	TEMAS DIVULGADOS	SI	NO
Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	X		Enfermedad laboral - Procedimiento en caso de EL	X	
Objetivos del SG-SST	X		Reporte de Actos y Condiciones Inseguras.	X	
Política de SST	X		COPASST / Vigía de SST	X	
Política para la prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas.	X		Ley 1010 de 2006 Acoso laboral	X	
Política de Seguridad Vial	X		Comité de Convivencia laboral	X	
Definiciones de Riesgo y peligro	X		Dotación y EPP que requieren durante la ejecución de actividades.	X	
Identificación de peligros y controles	X		Plan de emergencias: Brigadistas, Procedimiento en caso de emergencia, códigos de alarma, punto de encuentro.	X	
Reporte e investigación de Accidentes e Incidentes de Trabajo.	X		Reglamento de Higiene y seguridad	X	

RESPONSABILIDADES RESPECTO A SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

a) Procurar el cuidado integral de mi salud; con el fin de prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
b) Suministrar información clara, veraz y completa sobre mi estado de salud,
c) Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del SG-SST de la Compañía,
d) Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en mi sitio de trabajo,
e) Participar en las actividades de prevención, mediante capacitaciones en SST, definidas en el cronograma de capacitación del SG-SST, que se realicen en la empresa.
f) Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.

NORMAS DE SEGURIDAD

1. El uso de la Dotación y EPP suministrados por la Empresa, es obligatorio durante toda la jornada laboral para el personal administrativo y Operativo.
2. Aplique las pautas de higiene postural y de manipulación de cargas. Realice diariamente pausas activas.
3. Prohibido obstaculizar, retirar, esconder u operar los equipos de emergencia como son extintores, gabinetes, camillas y botiquines, salvo en una emergencia.
4. Mantener el puesto de trabajo en perfecto orden y aseo y cuidar los equipos elementos asignados para ejecutar la labor.
5. Para la realización de tareas de alto riesgo (trabajos en altura, espacios confinados, excavaciones y energías peligrosas) es obligatorio tramitar el Permiso para tareas de alto riesgo, contar con los equipos, herramientas y protección adecuada para su realización.
6. En casos de emergencia siga los procedimientos de seguridad y reporte la situación a la persona encargada.
7. Evalúe y controle los riesgos antes de ejecutar cualquier tarea; evite improvisar.
8. No se permite usar joyas o prendas que puedan causar accidentes, tales como anillos, esclavas, cadenas, relojes, pulseras, ropa diferente a la entregada como dotación en obras.
9. Ponga en práctica los procedimientos seguros de trabajo y respete las instrucciones, señales y advertencias

PELIGROS A LOS QUE PUEDE ESTAR EXPUESTO

Peligro	Descripción	Aplica (Si - No)
Biológico	Virus, bacterias, hongos, ricketsias, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos o excrementos.	Si
Físico	**Ruido** (impacto intermitente y continuo) , **iluminación** (luz visible por exceso o deficiencia), **vibración** (cuerpo entero, segmentaria), **temperatura extrema** (calor y frío), **presión atmosférica** (normal y ajustada), **radiaciones ionizantes** (rayos x, gama, beta y alfa), **radiaciones no ionizantes** (láser, ultravioleta infrarroja).	Si
Químico	Polvos orgánicos e inorgánicos, fibras, **líquidos** (nieblas y rocíos), gases y vapores, humos metálicos, no metálicos, material p	Si
Psicosocial	**Gestión organizacional** (estilo de mando, pago, contratación, participación, inducción y capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño, manejo de cambios). **Características de la organización del trabajo** (comunicación, tecnología, organización del trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas de la labor). **Características del grupo social del trabajo** (relaciones, cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo). **Condiciones de la tarea** (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonía, etc.). **Interfase persona/tarea** (conocimientos, habilidades con relación a la demanda de la tarea, iniciativa, autonomía y reconocimiento, identificación de la persona con la tarea y la organización). **Jornada de trabajo** (pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descansos).	Si
Biomecánicos	**Postura** (prolongada, mantenida, forzada, antigravitacionales), esfuerzo, movimiento repetitivo, manipulación manual de cargas.	Si
Condiciones de seguridad:	**Mecánica** (elementos de máquinas-herramientas, piezas por trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos). **Eléctrica** (alta y baja tensión, estática). **Locativa** (almacenamiento, superficies de trabajo irregularidades, deslizantes, con diferencia del nivel, condiciones de orden y aseo, caídas de objeto). **Tecnológica** (explosión, fuga, derrame, incendio). **Accidentes de tránsito**. **Públicas** (robos, atracos, asaltos, atentados, desorden público, etc.). **Trabajo en alturas, Espacios confinados.**	Si
Fenómenos naturales:	Sismo, terremoto, vendaval, inundación, derrumbe, precipitaciones (lluvias, granizadas, heladas).	Si

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN SGSST	**Código:** SST-F-034 **Versión:** 01 **Fecha:** agosto 2025

INDUCCIÓN (X) RE-INDUCCIÓN ( )	Fecha	15	05	2025

VII. REGISTRO DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE ENTERADO

Yo, BRAIAN EDUARDO ARCINIEGAS VELOZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1121926475 desempeñando el cargo de AYUDANTE Certifico que recibí, la inducción o re inducción en aspectos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo, así mismo se han discutido conmigo los asuntos y temas arriba señalados, he manifestado todas mis dudas e inquietudes, las cuales me han sido aclaradas satisfactoriamente.

Me Comprometo a seguir y cumplir las instrucciones, normas y procedimientos establecidas por Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo.

En constancia de lo anterior firmo: BRAIAN ARCINIEGAS

¡Gracias por su participación!

Responsable Inducción SST: GUSTAVO MESA	Firma:

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código: SST-F-035
		Versión: 01
		Fecha: agosto 2025

Nombre del trabajador: BRAILAN EDUARDO ARENAS MUÑOZ	
Fecha: 15/05/2026	Cedula: 1121926407
Cargo: AYUDANTE	Puntaje Obtenido: 90%

Con el fin de medir la eficacia de la capacitación, se solicita responder las siguientes preguntas relacionadas con la capacitación:

1. El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo

- [x] a. verdadero
- [ ] b. falso

2. Selecione 2 (dos) Políticas de la Empresa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo:

- [x] a. Política de la empresa.
- [ ] b. Política de alcohol y drogas.
- [ ] c. Política SST.
- [ ] d. Política de de obra.

3. Peligro, es una combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.

- [x] a. Verdadero
- [ ] b. Falso

4. Riesgo, es toda fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones.

- [x] a. Verdadero
- [ ] b. Falso

5. De los siguientes anunciados, cual corresponde a la definición de ACCIDENTE DE TRABAJO:

- [ ] a. Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.
- [ ] b. El que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.
- [ ] c. El que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión
- [x] d. Todas las anteriores

6. Seleccione 2 (dos) responsabilidades que tengo como trabajador en Seguridad y Salud en el Trabajo:

- [x] a. Reportar una condición de salud desfavorable.
- [ ] b. Hacer buen uso de los elementos de protección personal.
- [ ] c. Cometer actos inseguros durante mis actividades.
- [x] d. Participar en las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo.

7. ¿Qué debo hacer en caso que tenga un accidente de trabajo?

- [x] a. Reportar al jefe inmediato y encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- [ ] b. Reportar directamente a la ARL.
- [ ] c. Dirigirse al centro asistencial más cercano sin informar.
- [ ] d. ninguna de las anteriores

CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	**Código:** SST-F-035 **Versión:** 01 **Fecha:** agosto 2025

8. Seleccione 2 (dos) actos inseguros:

a. Realizar trabajo en alturas sin uso de arnés. b. Usar los elementos de protección personal.

c. Verificar el área de trabajo. d. Trabajar sin uso de los guantes y la gafas de seguridad.

9. ¿El comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (Copasst) es?

a. Una entidad encargada de supervisar las labores de los trabajadores.

b. Un comité encargado de la promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de Seguridad y salud en el Trabajo dentro de la empresa

c. Un comité reglamentado para dar manejo a las conductas por acosos laboral

d. Ninguna de las anteriores

10. ¿En su sitio de trabajo Conoce el punto de encuentro en caso de evacuación?

a. SI **Ubicación:** [illegible]

b) NO

Firma del trabajador

C.C.: BRAIAN ARENAS 1121426479

Responsable de la Inducción

Cargo: COORDINADOR SGSST

¡¡Gracias por su participación!!

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

LISTA DE CHEQUEO
EQUIPO DE SOLDADURA ELECTRICA

Código: SST-F-067
Versión: 01
Fecha: Agosto 2025

Frente de obra: AUSUBA - DOMO PLANOS

Fecha: 4-5-2026

Marque con una X el estado — BUENO: B — MALO: M — No aplica: NA

INSPECCION VISUAL	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
Carcaza del equipo	X			X			X			X			X			X			X			
Ventilador	X			X			X			X			X			X			X			
Ruedas	X			X			X			X			X			X			X			
Extensión Eléctrica, toma y clavija	X			X			X			X			X			X			X			
Fusible	X			X			X			X			X			X			X			
Porta electrodo	X			X			X			X			X			X			X			
Embobinado	X			X			X			X			X			X			X			
Pinza para masa	X			X			X			X			X			X			X			
Amperaje	X			X			X			X			X			X			X			
Suiche de encendido	X			X			X			X			X			X			X			
Cable de pinza para masa	X			X			X			X			X			X			X			
Cable de porta electrodo	X			X			X			X			X			X			X			
Polo a tierra	X			X			X			X			X			X			X			
Terminales para soldar	X			X			X			X			X			X			X			
Existe ventilacion durante la aplicación de soldadura electrica	X			X			X			X			X			X			X			
Estado de los Elementos de Protección Personal del soldador.	X			X			X			X			X			X			X			
Se cuenta con señalizacion de advertencia	X			X			X			X			X			X			X			
El permiso de Trabajo en Caliente está diligenciado.			X			X			X			X			X			X			X	
Estado de la mampara	X			X			X			X			X			X			X			
Estado del Extintor en el área de trabajo	X			X			X			X			X			X			X			
FIRMA DE QUIEN ELABORA	Jesus M			Jesus			Jesus			Jesus			Jesus			Jesus			Jesus			

Nombre: Jesus Villamizar

Firma: Jesus Villamizar

Elabora / Soldador

Nombre [illegible]

Firma:

Autorizó Responsable SST

1145

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN TIPO A	Código: SST-F-085 Versión: 01 Fecha: agosto 2025

Lugar:	PUERTO GAITAN	Fecha de inspección:	4	5	26
Ubicación del botiquín	WACCHO				

Marque con una X según las condiciones observadas:

El botiquín se encuentra instalado en la pared?	Si	X	No		Localizado en lugar visible?	Si	X	No	
El botiquín se encuentra libre de obstáculos?	Si	X	No		El botiquín se encuentra señalizado?	Si	X	No	

Ítem	Descripción del elemento del botiquín de primeros auxilios	Cantidad Requerida	Cantidad existente	Fecha de Vencimiento (Si aplica)	Observaciones
1	GASAS LIMPIAS PAQUETE	Paquete X 20	20 UN	4-28	
2	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO de 4"	1 unidad	1 UN	4-30	
3	BAJALENGUAS	Paquete X 20	20 UN	NA	
6	GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN	50 Pares	50 PAR	12-26	
7	VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS	1 unidad	1 UN	9-30	
8	VENDA ELÁSTICA 4 X 5 YARDAS	1 unidad	1 UN	9-30	
9	VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS	1 unidad	1 UN	9-30	
10	VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS	1 unidad	1 UN	9-30	
11	VENDA DE ALGODÓN 4 X 5 YARDAS	1 unidad	1 UN	9-30	
12	YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO) 120 ml	1 unidad	1 UN	9-27	
13	SOLUCIÓN SALINA 250 cc o 500 cc	2 unidades	2 UN	7-27	
14	TERMÓMETRO DE MERCURIO O DIGITAL	1 unidad	1 UN	NA	
15	ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 350 ml	1 unidad	1 UN	9-27	
16	INMOVILIZADOR DE CARTÓN PLÁSTICO	1 Juego	1 JUEGO	NA	
17	OTRO:				
18	OTRO:				
19	OTRO:				
20	OTRO:				
21	OTRO:				
22	OTRO:				
23	OTRO:				
24	OTRO:				

Observaciones Generales:

Participantes en la Inspección:	GUSTAVO MEDINA	Firmas:	

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	INSPECCIÓN CAMILLAS DE EMERGENCIA	Código: SST-F-021 Versión: 01 Fecha: agosto 2025

Codigo: NA	Fecha de Inspeccion: 04 DE MAYO DE 2026
Responsable de la Inspección: GUSTAVO MEDINA	Cargo: COORDINADOR SGSST
Lugar: PUERTO GAITAN	Ubicación de la camilla: VACCO40

DESCRIPCIÓN DE LA CAMILLA

	Elemento	VERIFICACIÓN / ESTADO			DESCRIPCIÓN DE LA CONDICIÓN OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	NA		
1	Instalación (Sitio de ubicación)	X				
2	Estado del soporte	X				
3	Sugetadores o Manijas de agarre	X				
4	Correas de amarre o seguridad	X				
5	Lugar visible y fácil acceso	X				
6	Rotulada / Señalización	X				
7	Juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior	X				

OBSERVACIONES:

GUSTAVO MEDINA

Firma

1145

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Código: SST-F-020 Versión: 01 Fecha: agosto 2025

FECHA INSPECCIÓN: 04 DE MAYO DE 2026 LUGAR: PUERTO GAITÁN

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: CRISTIAN MEDINA CARGO: COORDINADOR SGSST

Bueno: B Regular: R Malo: M No Tiene: N.T No aplica: N.A

N°.	Ubicación	Identificación	Capacidad	Clase	Agente	Fecha de ultima recarga	Acceso	Visibilidad	Señalización	Pintura	Cilindro	Etiqueta (instructivo)	Aro de seguridad	Manómetro	Presión	Pasador	Manguera	Boquilla	Envase	Manija de transporte	Manija de disparo	OBSERVACIONES
1	WACO40	NA	30 LBS	ABC	PQS	JUN 2026	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

OBSERVACIONES GENERALES:

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	FORMATO INSPECCIÓN LOCATIVA	Código: SST-F-023
		Versión: 01
		Fecha: agosto 2025

Fecha de inspección: 4-D-26	**Lugar:** PUERTO GAITÁN - CUADRO
Inspección realizada por: EDUARDO MEDINA	**Cargo:** COORDINADOR SGSST

No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE NA	OBSERVACIONES
	PELIGROS FISICOS				
1	Existe buena iluminación artificial y natural.	X			
2	Las luminarias están en buen estado.			X	
3	Hay buena ventilación en el área.	X			
4	El nivel de ruido es adecuado (Condiciones Normales inferiores	X			
5	Existen controles de ruido (control en la fuente, en el medio de	X			
6	La temperatura es confortable.	X			
	PELIGROS ELÉCTRICOS				
7	Instalaciones eléctricas bien aisladas, con conexiones a tierra,	X			
8	Instalaciones eléctricas señaladas	X			
9	Cables eléctricos debidamente entubados.	X			
10	Los empalmes o conexiones estan en buen estado.	X			
11	Tomas e interruptores en buen estado	X			
12	Se observa cajas o toma corriente sin sobrecarga.	X			
13	Cables en buen estado.	X			
14	Los tableros, cajas y circuitos estan identificados.	X			
15	Los tableros y cajas estan libres de obstáculos.	X			
16	Existe señalización de peligros.	X			
	PELIGROS DE SEGURIDAD				
17	Los extintores son los adecuados al tipo de peligros del área.	X			
18	Extintores de carga vigente.	X			
19	Extintores libre de obstaculos.	X			
20	Existe señalización de extintores.	X			
21	Existe señalización en todas las instalaciones y en las salidas de emergencia.	X			
22	Las áreas de salida de emergencia y punto de encuentro se encuentran despejadas	X			
23	El personal cuenta con los elementos de protección personal (EPP).	X			
24	Hay camilla en el área. (Solo si es necesaria).	X			
25	Cuentan con Inmovilizador cervical	X			
26	Hay botiquín y control de consumo.	X			
27	Se tiene la lista de teléfonos de emergencia a la mano?.	X			
28	Se tiene la lista de centros de salud u hospitales de referencia cercanos?	X			
	PELIGROS BIOLOGICOS				
29	Se realizan controles a los Factores que puedan generar Accidentes por contacto con Animales, y plantas.	X			
	PELIGROS BIOMECANICO				
30	Las sillas / puestos de las maquinas cumplen, teniendo en cuenta el tiempo de exposición y postura del operador.			X	
31	Las condiciones del puesto de trabajo, (escritorio) son las adecuadas a nivel Ergonomico. Teniendo en cuenta que se trabajaría 1/2 jornada en este sitio.			X	
32	Cuentan con las especificaciones del peso de las cargas que manejan en obra.	X			

CONSORCIO AGUAS CAITAS 2025	FORMATO INSPECCIÓN LOCATIVA	Código: SST-F-023 Versión: 01 Fecha: agosto 2025

	ORDEN Y ASEO					
33	El área se encuentra organizada.	X				
34	Se realiza la clasificación de residuos sólidos en forma correcta.	X				
35	Los residuos peligrosos se separan y disponen con empresas autorizadas.	X				
36	El sitio inspeccionado se encuentra en buen estado de aseo y mantenimiento.	X				
	SERVICIOS SANITARIOS Y LIMPIEZA GENERAL					
37	Baños con canecas			X		
38	Con jabón liquido, con toallas desechables			X		
39	Limpios			X		
40	Escaleras portátiles			X		
41	Sanitarios			X		
42	Lavamanos			X		
43	Orinales			X		
44	Duchas			X		
45	Espejo			X		
46	Acometida Hidrosanitaria			X		
47	Pintura			X		
	PELIGRO MECANICO (HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA)					
48	Se aplican los preoperacionales y listas de chequeo a la maquinaria en sitio	X				
49	Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo a las maquinas y herramientas.	X				
	PREGUNTAS Y OBSERVACION DE TAREAS (Hacer verificación a través de la observación de los trabajadores)					
50	Los funcionarios cumplen con las normas de seguridad de su actividad.	X				
51	Los funcionarios conocen los peligros a los que están expuestos.	X				
52	El personal tiene claro que hacer en caso de un incidente , Accidentes de trabajo y Enfermedad Laboral.	X				
53	Los funcionarios conocen la Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo.	X				
54	Los funcionarios saben como usar y cuidar sus EPP.	X				

	MEDIO AMBIENTE	B.E	RE	MAL	OBSERVACIONES
55	Impresora / fotocopiadora. (Si aplica)				
	Computador. (Si aplica)				
	Otro.				
56	El area cuenta con las tarjetas de emergencia.				
	El area cuenta con las Hojas de seguridad.				
	Otro.				

NOMBRE GUSTAVO MEDINA	NOMBRE
CARGO/ FIRMA COORDINADOR SGSST	CARGO/FIRMA

Plan de Accion Correctiva - Seguimiento**

Fecha	C/S	Descripcion	Responsable	Firma

* Escriba toda especificacion que requiera aclarar en el espacio **Observaciones**

* Para ser diligenciado por el competente mecanico o encargado de mantenimiento

No deje ningun espacio en blanco, diligencie el formato en su totalidad.

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MECÁNIZADAS

SST-F-073
VERSIÓN: 01
FECHA: AGOSTO 2025

FECHA DE INSPECCIÓN:	DÍA	MES	AÑO	HERRAMIENTAS PROPIAS	CONTRATISTA RESPONSABLE	PROYECTO:
	4	05	26	SI X NO	INMERFRAN	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LAS COMUNIDADES INDIGENAS WACOYO-ASEIPOME-AWALIBA-DOMO PLANA DE PUERTO GAITÁN.

ÍTEM	LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD - HERRAMIENTAS MECÁNIZADAS	INDIVIDUALIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA INSPECCIONADA (Nombre de la herramienta a inspeccionar)																										
		1 PULIDORA			2 TALADRO			3 PLANTA ELECTRICA			4 COMPRESOR			5			6			7			8			9		
	NOTA: Marque según corresponda:	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
1	Los equipos poseen aislamiento dieléctrico y su clavija se encuentra en buen estado.	X			X			X			X																
2	Antes de realizar el cambio de discos, brocas, puntas o cuchillas, se apaga el equipo.	X			X					X			X														
3	Se hace uso de las llaves adecuadas para realizar el cambio de discos, brocas y cuchillas.	X			X					X			X														
4	El almacenamiento de las herramientas eléctricas se hace en sitios adecuados, aislados de la humedad.	X			X			X					X														
5	Los discos, brocas, puntas, cuchillas y piezas clave se encuentran en buen estado	X			X					X			X														
6	Las rpm (revoluciones por minuto) de la pulidora, no son superiores a la capacidad del disco empleado.	X			X					X			X														
7	Los cables poseen aislamiento doble, polo a tierra y se encuentren libres de daño.	X			X			X			X																
8	Las conexiones de las mangueras neumáticas, cuentan con mecanismos de seguridad como pines "r" y/o sistema anti látigo.			X			X			X	X																
9	Las mangueras de los equipos neumáticos, se encuentran en buen estado y no presentan fugas de aire.			X			X			X	X																
10	Cuentan con todas sus piezas bien ajustadas (guardas de seguridad, manijas de sujeción, resguardos, carcasas, etc...)	X			X			X			X																
11	Las mangueras hidráulicas se encuentran en buen estado			X			X			X	X																
12	Los equipos hidráulicos tienen instalada la manguera de retorno			X			X			X			X														
13	El equipo inspeccionado no presenta fugas (aceite, gasolina, refrigerante...)	X			X			X			X																
14	El depósito de combustible, aceites y refrigerantes, están en buen estado y no permiten fugas ni derrames.	X		X			X	X			X																
15	El tubo de escape cuenta con guarda y silenciador	X			X			X			X																
16	Los equipos neumáticos tienen sistema de despresurización.			X			X			X	X																
17	Las mangueras de aire tienen las guayas antilatigos.			X			X			X	X																
18	Los acoples de las mangueras se encuentran en buen estado.			X			X			X	X																
19	El personal hace uso de los epp aplicables (casco, guantes, botas de seguridad, protección visual, facial, auditiva y respiratoria...).	X			X			X			X																
20	El personal conoce las normas de seguridad para el uso seguro de herramientas accionados por motor.	X			X			X			X																
21	Se inspecciona el área y se remueven los obstáculos antes de dar inicio a la actividad	X			X			X			X																

HERRAMIENTA RELACIONADA EN LA INSPECCIÓN	ÍTEM INCUMPLIDO	PLAN DE ACCIÓN: ACCIONES PROPUESTAS EN RELACIÓN A LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	CARGO	FIRMA	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE VERIFICACIÓN	ESTADO DEL HALLAZGO: ABIERTO	CERRADO

INSPECCIÓN REALIZADA POR:

NOMBRE: Carlos Lince
CARGO: Soldador
FIRMA:

PARTICIPACIÓN COPASST NOMBRE: FIRMA

11949

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	INSPECCIÓN DE ANDAMIOS	Código: SST-F-071 Versión: 01 Fecha: Agosto 2025

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LAS COMUNIDADES INDÍGENAS WACOYO-ASEIPOME-AWALIBA DOMO PLANA DE PUERTO GAITÁN.

FECHA			FRENTE DE TRABAJO	ANDAMIO PROPIO	NOMBRE DEL CONTRATISTA
4	5	26	COMO PLANAS	SI ☐ NO ☒	SANOSOL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS

	LISTA DE CHEQUEO	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	PLAN DE ACCIÓN (Las casillas del plan de acción, se deben diligenciar únicamente cuando al realizar la inspección, se identifique el no cumplimiento (NO CUMPLE) de alguno de los ítems.)				ESTADO DEL HALLAZGO		
					DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA ADOPTADA (Cambio de piezas, sustitución de equipo, mantenimiento...)	FECHA PROGRAMACIÓN	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN NOMBRE	FIRMA	FECHA DE VERIFICACIÓN	ABIERTO	CERRADO
CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD	El terreno es firme y estable y nivelado.	X									
	Las uniones de las bases regulables están en buen estado.	X									
	Las tuercas de las bases regulables están en buen estado.			X							
	La longitud mínima de solape de los tornillos es de 15cm o 25% del largo total del tornillo.			X							
	Los elementos tubulares están libres de daños o defectos estructurales.	X									
	Los horizontales y diagonales están asegurados.	X									
	El andamio se encuentra correctamente nivelado	X									
	Todos los elementos horizontales y diagonales están asegurados	X									
	La distancia vertical entre horizontales es máximo 2m.	X									
	Se instalan vientos una vez el andamio supera 3 veces la medida del lado más angosto (aplica para andamios de menos de 2.5 m de ancho).			X							
	Se instalan vientos una vez el andamio supera 4 veces la medida del lado más angosto (aplica para andamios de más de 2.5 m de ancho).		X								
PLATAFORMAS Y BARANDAS	Si se usan tablones como plataformas, estos están libres de grietas, nudos, defectos y no están pandos.	X									
	Los tablones empleados, tienen un espesor mínimo de 5 cm	X									
	El ancho de los tablones no es inferior a 25 cm.	X									
	Los tablones sobresalen de su soporte como mínimo 30 cm y no superan los 50 cm a menos que haya una barrera que prevenga el acceso.	X									

	LISTA DE CHEQUEO	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	PLAN DE ACCIÓN (Las casillas del plan de acción, se deben diligenciar únicamente cuando al realizar la inspección, se identifique el no cumplimiento (NO CUMPLE) de alguno de los ítems.)				ESTADO DEL HALLAZGO		
					DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA ADOPTADA (Cambio de piezas, sustitución de equipo, mantenimiento...)	FECHA PROGRAMACIÓN	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN NOMBRE	FIRMA	FECHA DE VERIFICACIÓN	ABIERTO	CERRADO
FORMAS Y BARANDAS	Las plataformas están libres de daños o defectos estructurales.	X									
	La plataforma destinada para la realización de la actividad, cuenta con un ancho mínimo de 50 cm	X									
	Los ganchos de soporte (garras) de las plataformas metálicas, están libres de deformación o daño.			X							
	Las plataformas de madera, están aseguradas.	X									
	Se cuenta con baranda que garantice una capacidad de carga de 200 libras			X							

11750

PLATA	Las barandas cuentan con un travesaño superior y uno intermedio con no más de 48 cm de separación			X								
	Las barandas cuentan con rodapies de mínimo 9 cm			X								
ACCESO	El ángulo de inclinación de las escaleras de acceso, es el adecuado			X								
	Hay acceso seguro y sin estorbos en todas las plataformas del andamio (como una escalera, pasillo o escalones)	X										
	Si una escalera es usada para acceso, está asegurada al andamio y se extiende por lo menos 1 metro por arriba del nivel de la plataforma.			X								
ANDAMIO RODANTE	El personal desciende del andamio rodante antes de realizar cualquier desplazamiento.			X								
	Las ruedas en andamios rodantes son aseguradas o bloqueadas antes de que alguien se suba.			X								
	Los tornillos ajustables no son extendidos en su totalidad			X								
	Después de que un andamio rodante es movido, es ajustado para estar seguro que está a plomo (a nivel vertical)			X								

- Si una o más respuestas son negativas (NO), la condición debe ser corregida antes de autorizar el uso del andamio.
- Esta lista de verificación debe realizarse cada vez que se modifique o se instale un nuevo andamio y permanecer en terreno.
- Todo andamio que no cuente con esta verificación y autorización no puede ser utilizado.

TARJETA

CUMPLE	INSTALACIÓN	NO CUMPLE

OBSERVACIONES:

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		PARTICIPACIÓN COPASST	
NOMBRE:	Carlos Cinco	NOMBRE:	
CARGO	Soldador	CARGO	
FIRMA		FIRMA	

	INSPECCIÓN DE EQUIPOS	SST-F-072 VERSIÓN: 01 FECHA: Agosto 2025

PROYECTO	CONSTRUCCION ADECUACIONES INDIGENAS

FECHA DE INSPECCIÓN	DÍA	MES	AÑO	VINCULACIÓN		NOMBRE DE LA EMPRESA	LUGAR DONDE SE DESARROLLA LA INSPECCIÓN
	4	MAYO	26	PROPIOS	CONTRATISTAS	CAC 2025	PUEBLO PLANO

ÍTEM		VEHÍCULO	MAQUINARIA	CÓDIGO / PLACA / REFERENCIA	EQUIPO 1	EQUIPO 2	EQUIPO 3	EQUIPO 4	EQUIPO 5
				TIPO DE VEHÍCULO / MAQUINARIA	CETCO EXCAVADORA				
				CONDUCTOR / OPERADOR	YEFERSON GALVIS				
				CÉDULA	1006956				
				FIRMA	Yeferson				
				ASPECTOS A VERIFICAR	C / NC / N/A	C / NC / N/A	C / NC / N/A	C / NC / N/A	C / NC / N/A
1	DOCUMENTOS DEL EQUIPO	X		LICENCIA DE TRANSITO	N/A				
2			X	TARJETA DE PROPIEDAD / MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN	C				
3		X		TARJETA DE OPERACIÓN (Aplica servicio público para transporte de pasajeros)	N/A				
4		X		SOAT VIGENTE	C				
5		X		REVISIÓN TECNO MECÁNICA VIGENTE (Aplica: Público. >2 años / Particular. >6 años)	N/A				
6		X	X	PÓLIZA TODO RIESGO VIGENTE (Aplica servicio público y maquinaria)	C				
8	DOCUMENTOS TRABAJADOR	X	X	LICENCIA DE CONDUCCIÓN VIGENTE (Según categoría del vehículo)	C				
9			X	CERTIFICADO DE OPERADOR (EXCAVADORA, RETROCARGADOR)	C				
10		X	X	SOPORTE DE PAGO DE SEG. SOCIAL (Vigencia, ARL: Clase de riesgo V)	C				
12		X	X	DOTACIÓN (Uso de camisa corporativa ó chaleco con reflectivo, pantalón, botas de seguridad)	C				
13	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVA	X	X	SISTEMA DE FRENOS	C				
14		X	X	SISTEMA DE DIRECCION	C				
15		X	X	SISTEMA DE SUSPENSIÓN (Muelles, amortiguadores)	C				
16		X	X	SISTEMA HIDRÁULICO	C				
17		X	X	SISTEMA ELECTRICO	C				
18		X	X	ESTADO TREN DE RODAJE (Llantas, orugas)	C				
19		X	X	SUJECIÓN DE ESPARRAGOS Y TUERCAS EN RINES	C				
20		X	X	ESTADO DE GUARDAFANGOS	N/A				
21		X	X	VIDRIOS (Panorámico, laterales, traseros)	C				
22		X	X	ESPEJOS RETROVISORES Y DE VISIÓN ANGULAR	C				
23		X	X	ESTADO GENERAL DE LIMPIAPARABRISAS	C				
24		X	X	LUCES EN BUEN ESTADO (Altas, medias, bajas, direccionales, estacionarias, stop)	C				
25		X	X	CLAXON / PITO	C				
26		X	X	ALARMA DE REVERSA	C				
27		X	X	CINTAS REFLECTIVAS (Maquinaria: Amarillo limón. - Vehículos: Blanco en la parte delantera / Rojo-Blanco en la parte lateral - Rojo en la parte trasera)	C				
28	SISTEMA DE SEGURIDAD	X	X	CINTURONES DE SEGURIDAD (Completos y abrochados)	C				
29		X	X	ESTADO DE LA(S) SILLA(S) DEL EQUIPO	C				
30		X		REPOSACABEZAS	C				
31	OTROS COMPONENTES	X		PLACAS: Frontal, posterior y laterales (este último, para servicio público)	N/A				
33		X		Volqueta — SISTEMA DE AUTOCARPADO	N/A				
34		X		Volqueta — ASEGURAMIENTO DE COMPUERTA DEL VOLCO	N/A				
37	KIT DE CARRETERA	X		CONOS y/o SEÑALES TRIANGULARES REFLECTIVAS * 2	N/A				
38		X		TACOS DE BLOQUEO * 2	N/A				
39		X		HERRAMIENTAS (Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas).	N/A				
40		X		GATO HIDRAULICO (con capacidad para elevar el vehículo)	N/A				
41		X		LLANTA DE REPUESTO	N/A				
42		X		CRUCETA	N/A				
43		X		LINTERNA	N/A				
44	BOTIQUÍN	X	X	SOLUCIÓN ANTISEPTICA	C				
45		X	X	ELEMENTO DE CORTE	C				
46		X	X	ALGODÓN	C				
47		X	X	GASA ESTERIL	C				
48		X	X	ESPARADRAPO ó VENDAS ADHESIVAS	C				
49		X	X	VENDA ELÁSTICA	C				
50		X	X	GUANTES DE LÁTEX	C				
51	EXTINTOR	X	X	CAPACIDAD DEL EXTINTOR 20 LBS	20				
52		X	X	RECARGA VIGENTE (Verificar color del anillo)	30 MAY 26	DD MM AAAA	DD MM AAAA	DD MM AAAA	DD MM AAAA
53		X	X	PRESURIZACIÓN (Verificar manómetro)	C				
54		X	X	ESTADO DEL CILINDRO	C				
55		X	X	INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN	C				
56		X	X	MANIJA DE TRANSPORTE	C				
57		X	X	PALANCA DE ACTIVACIÓN	C				
58		X	X	PASADOR DE SEGURIDAD	C				
59		X	X	BOQUILLA Y/O MANGUERA DE DESCARGA	C				
60		X	X	UBICACIÓN DE FACIL ACCESO	C				

EQUIPO RELACIONADO EN LA INSPECCIÓN	ÍTEM INCUMPLIDO	PLAN DE ACCION				
		MEDIDAS INMEDIATAS REALIZADAS EN EL FRENTE DE OBRA	ACCIONES PROPUESTAS EN RELACIÓN A LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS	CIERRE DE HALLAZGO SI	CIERRE DE HALLAZGO NO	FECHA DE CIERRE DE HALLAZGO

OBSERVACIONES GENERALES:

INSPECCION REALIZADA POR:			PARTICIPACIÓN COPASST:	
NOMBRE:	Yeferson Galvis	FIRMA		FIRMA
CARGO:	OP			

CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025

LISTA DE CHEQUEO
EQUIPO DE SOLDADURA ELECTRICA

Código: SST-F-067
Versión: 01
Fecha: Agosto 2025

ente de obra: BUENO PLANES

Fecha: 11-5-2026

arque con una X el estado — BUENO: B — MALO: M — No aplica: NA

INSPECCION VISUAL	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
arcaza del equipo	X			X			X			X			X			X			X			
entilador	X			X			X			X			X			X			X			
uedas			X			X			X			X			X			X			X	
xtensión Eléctrica, toma y clavija	X			X			X			X			X			X			X			
usible	X			X			X			X			X			X			X			
orta electrodo	X			X			X			X			X			X			X			
mbobinado	X			X			X			X			X			X			X			
inza para masa	X			X			X			X			X			X			X			
mperaje	X			X			X			X			X			X			X			
uiche de encendido	X			X			X			X			X			X			X			
able de pinza para masa	X			X			X			X			X			X			X			
able de porta electrodo	X			X			X			X			X			X			X			
olo a tierra	X			X			X			X			X			X			X			
erminales para soldar	X			X			X			X			X			X			X			
xiste ventilacion durante la aplicación de oldadura electrica	X			X			X			X			X			X			X			
stado de los Elementos de Protección ersonal del soldador.	X			X			X			X			X			X			X			
e cuenta con señalizacion de advertencia	X			X			X			X			X			X			X			
l permiso de Trabajo en Caliente está ligenciado.			X			X			X			X			X			X			X	
stado de la mampara	X			X			X			X			X			X			X			
stado del Extintor en el área de trabajo	X			X			X			X			X			X			X			
FIRMA DE QUIEN ELABORA	Carlos			Carlos			Carlos			Carlos			Carlos			Carlos			Carlos			

Nombre: Carlos Lucas

Firma:

Elabora / Soldador

Nombre: Gustavo Acosta

Firma:

Autorizó Responsable SST

1053

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN TIPO A	**Código:** SST-F-085 **Versión:** 01 **Fecha:** agosto 2025

Lugar:	PUERTO GAITÁN	Fecha de inspección:	15 / 6 / 26	
Ubicación del botiquín	CASA PLANAS			

Marque con una X según las condiciones observadas:

El botiquín se encuentra instalado en la pared?	Si		No	X	Localizado en lugar visible?	Si	X	No	
El botiquín se encuentra libre de obstáculos?	Si	X	No		El botiquín se encuentra señalizado?	Si	X	No	

Ítem	Descripción del elemento del botiquín de primeros auxilios	Cantidad Requerida	Cantidad existente	Fecha de Vencimiento (Si aplica)	Observaciones
1	GASAS LIMPIAS PAQUETE	Paquete X 20	20 UN.	9-28	
2	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO de 4"	1 unidad	1 UN	4-30	
3	BAJALENGUAS	Paquete X 20	20 UN	NA	
6	GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN	50 Pares	50 PARES	12-26	
7	VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS	1 unidad	1 UN	9-30	
8	VENDA ELÁSTICA 4 X 5 YARDAS	1 unidad	1 UN	9-30	
9	VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS	1 unidad	1 UN	9-30	
10	VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS	1 unidad	1 UN	9-30	
11	VENDA DE ALGODÓN 4 X 5 YARDAS	1 unidad	1 UN	9-30	
12	YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO) 120 ml	1 unidad	1 UN	9-27	
13	SOLUCIÓN SALINA 250 cc o 500 cc	2 unidades	2 UN	9-27	
14	TERMÓMETRO DE MERCURIO O DIGITAL	1 unidad	1 UN	NA	
15	ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 350 ml	1 unidad	1 UN	9-27	
16	INMOVILIZADOR DE CARTÓN PLÁSTICO	1 Juego	1 JUEGO	NA	
17	OTRO:				
18	OTRO:				
19	OTRO:				
20	OTRO:				
21	OTRO:				
22	OTRO:				
23	OTRO:				
24	OTRO:				

Observaciones Generales:

Participantes en la Inspección:	GUSTAVO MEDINA	Firmas:	

1154

CONSORCIO AGUAS GALTÁN 2025	INSPECCIÓN CAMILLAS DE EMERGENCIA	Código: SST-F-021 Versión: 01 Fecha: agosto 2025

Codigo: NA	**Fecha de Inspeccion:** 11 DE MAYO DE 2026
Responsable de la Inspección: GUSTAVO MEDINA	**Cargo:** COORDINADOR SGSST
Lugar: PUERTO GALTÁN	**Ubicación de la camilla:** CUARTO PLANAS

DESCRIPCIÓN DE LA CAMILLA

	Elemento	VERIFICACIÓN / ESTADO			DESCRIPCIÓN DE LA CONDICIÓN OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	NA		
1	Instalación (Sitio de ubicación)	X				
2	Estado del soporte	X				
3	Sugetadores o Manijas de agarre	X				
4	Correas de amarre o seguridad	X				
5	Lugar visible y fácil acceso	X				
6	Rotulada / Señalización	X				
7	Juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior	X				

OBSERVACIONES:

GUSTAVO MEDINA

Firma

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Código: SST-F-020 Versión: 01 Fecha: agosto 2025

FECHA INSPECCIÓN: 11 DE MAYO DE 2026 LUGAR: PUERTO GAITÁN

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: GUSTAVO MEDINA CARGO: COORDINADOR SGSST.

Bueno: B Regular: R Malo: M No Tiene: N.T No aplica: N.A

N°.	Ubicación	Identificación	Capacidad	Clase	Agente	Fecha de ultima recarga	Acceso	Visibilidad	Señalización	Pintura	Cilindro	Etiqueta (instructivo)	Aro de seguridad	Manómetro	Presión	Pasador	Manguera	Boquilla	Envase	Manija de transporte	Manija de disparo	OBSERVACIONES
1	DOMO PLANAS	NA	30 LBS	ABC	PQS	NOV - 26	B	B	B	B	B	B	B	B	O	B	B	B	B	B	B	
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

OBSERVACIONES GENERALES:

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	FORMATO INSPECCIÓN LOCATIVA	Código: SST-F-023
		Versión: 01
		Fecha: agosto 2025

1936

Fecha de inspección: 11-5-2026	Lugar: PUERTO GAITÁN - DOMO PLANAS
Inspección realizada por: GUSTAVO MEDINA	Cargo: COORDINADOR SGSST

No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	NA	
	PELIGROS FISICOS				
1	Existe buena iluminación artificial y natural.	X			
2	Las luminarias están en buen estado.			X	
3	Hay buena ventilación en el área.	X			
4	El nivel de ruido es adecuado (Condiciones Normales inferiores	X			
5	Existen controles de ruido (control en la fuente, en el medio de	X			
6	La temperatura es confortable.	X			
	PELIGROS ELÉCTRICOS				
7	Instalaciones eléctricas bien aisladas, con conexiones a tierra,	X			
8	Instalaciones eléctricas señaladas	X			
9	Cables eléctricos debidamente entubados.	X			
10	Los empalmes o conexiones estan en buen estado.	X			
11	Tomas e interruptores en buen estado	X			
12	Se observa cajas o toma corriente sin sobrecarga.	X			
13	Cables en buen estado.	X			
14	Los tableros, cajas y circuitos estan identificados.	X			
15	Los tableros y cajas estan libres de obstáculos.	X			
16	Existe señalización de peligros.	X			
	PELIGROS DE SEGURIDAD				
17	Los extintores son los adecuados al tipo de peligros del área.	X			
18	Extintores de carga vigente.	X			
19	Extintores libre de obstaculos.	X			
20	Existe señalización de extintores.	X			
21	Existe señalización en todas las instalaciones y en las salidas de emergencia.	X			
22	Las áreas de salida de emergencia y punto de encuentro se encuentran despejadas	X			
23	El personal cuenta con los elementos de protección personal (EPP).	X			
24	Hay camilla en el área. (Solo si es necesaria).	X			
25	Cuentan con Inmovilizador cervical	X			
26	Hay botiquín y control de consumo.	X			
27	Se tiene la lista de teléfonos de emergencia a la mano?.	X			
28	Se tiene la lista de centros de salud u hospitales de referencia cercanos?	X			
	PELIGROS BIOLOGICOS				
29	Se realizan controles a los Factores que puedan generar Accidentes por contacto con Animales, y plantas.	X			
	PELIGROS BIOMECANICO				
30	Las sillas / puestos de las maquinas cumplen, teniendo en cuenta el tiempo de exposición y postura del operador.			X	
31	Las condiciones del puesto de trabajo, (escritorio) son las adecuadas a nivel Ergonomico. Teniendo en cuenta que se trabajaría 1/2 jornada en este sitio.			X	
32	Cuentan con las especificaciones del peso de las cargas que manejan en obra.	X			

1959

CONSORCIO AGUAS CUYAS 2025	FORMATO INSPECCIÓN LOCATIVA	Código: SST-F-023 Versión: 01 Fecha: agosto 2025

ORDEN Y ASEO						
33	El área se encuentra organizada.	X				
34	Se realiza la clasificación de residuos sólidos en forma correcta.	X				
35	Los residuos peligrosos se separan y disponen con empresas autorizadas.	X				
36	El sitio inspeccionado se encuentra en buen estado de aseo y mantenimiento.	X				
SERVICIOS SANITARIOS Y LIMPIEZA GENERAL						
37	Baños con canecas			X		
38	Con jabón liquido, con toallas desechables			X		
39	Limpios			X		
40	Escaleras portátiles			X		
41	Sanitarios			X		
42	Lavamanos			X		
43	Orinales			X		
44	Duchas			X		
45	Espejo			X		
46	Acometida Hidrosanitaria			X		
47	Pintura			X		
PELIGRO MECANICO (HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA)						
48	Se aplican los preoperacionales y listas de chequeo a la maquinaria en sitio	X				
49	Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo a las maquinas y herramientas.	X				
PREGUNTAS Y OBSERVACION DE TAREAS (Hacer verificación a través de la observación de los trabajadores)						
50	Los funcionarios cumplen con las normas de seguridad de su actividad.	X				
51	Los funcionarios conocen los peligros a los que están expuestos.	X				
52	El personal tiene claro que hacer en caso de un incidente , Accidentes de trabajo y Enfermedad Laboral.	X				
53	Los funcionarios conocen la Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo.	X				
54	Los funcionarios saben como usar y cuidar sus EPP.	X				
	MEDIO AMBIENTE	**B.E**	**RE**	**MAL**	**OBSERVACIONES**	
55	Impresora / fotocopiadora. (Si aplica)					
	Computador. (Si aplica)					
	Otro.					
56	El area cuenta con las tarjetas de emergencia.					
	El area cuenta con las Hojas de seguridad.					
	Otro.					

NOMBRE GUSTAVO MEDINA	NOMBRE
CARGO/ FIRMA COORDINADOR SST	CARGO/FIRMA

Plan de Accion Correctiva - Seguimiento**

Fecha	C/S	Descripcion	Responsable	Firma

* Escriba toda especificacion que requiera aclarar en el espacio Observaciones

* Para ser diligenciado por el competente mecanico o encargado de mantenimiento

No deje ningun espacio en blanco, diligencie el formato en su totalidad.

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	INSPECCION DE HERRAMIENTAS MENORES	SST-F-066
		Versión: 01
		Fecha: Agosto 2025

CONTRATISTA: SANOSOL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LAS COMUNIDADES INDIGENAS WACOYO-ASEIPOME-AWALIBA-DOMO PLANA DE PUERTO GAITÁN.

FECHA: 11-05-2026

ITEM	ACTIVIDADES	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	**Herramientas**				
1,1	Se usa la herramienta y EPP's establecidos en el ATS	X			
1,2	Se encuentran en buen estado (limpias, sin desperfectos)	X			
1,3	Se guardan y portan adecuadamente (en cinturon o caja de herramientas)	X			
1,4	Se almacenan en sitios donde no puedan ser golpeados	X			
1,5	Se usan prensas de banco para sujetar	X			
1,6	Se tiene un programa de mantenimiento preventivo	X			
2	**Herramientas de corte**				
2,1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo			X	
2,2	Los cinceles se encuentran afiliados			X	
2,3	Las tarrajas macho o hembra no presentan rotura de sus dientes			X	
2,4	Las seguetas estan correctamente instaladas (fijas, asegurdas) y no presentan defectos	X			
2,5	Las limas disponen de sus mangos y no estan rotas o sucias	X			
2,6	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes estan completos	X			
2,7	Los cuchillos disponen de mangos y fundas	X			
3	**Herramientas manuales y de golpe**				
3,1	Se emplea el martillo adecuado según labor	X			
3,2	Sus caras y bordes estan en buen estado (no presentan fisuras, abolladuras, desperfectos)	X			
3,3	Su mango no esta quebrado, astillado, ni flojo	X			
3,4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y estan firmemente adheridos	X			
4	**Herramientas de torsion-llaves**				
4,1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimetricas	X			
4,2	Se observan en la llave huellas de palancas	X			
4,3	Se disponen de llaves para golpear	X			
4,4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas	X			
4,5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente	X			
4,6	La punta y cabo de los destornilladores no presentan fisuras, abolladuras, desperfectos	X			
4,7	Se disponen de herramientas que no produzcan chispas			X	
5	**Herramientas electricas**				
5,1	Estan limpias y lubricadas	X			
5,2	Tiene sus guardas	X			
5,3	Posee aislameinto doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	X			
5,4	El cable, enchufe y clavijas no presentan daños (cuentan con proteccion contra el riesgo mecanico)	X			
5,5	En los taladros se observa el mandril (broca) con golpes	X			
5,6	Brocas sin filo o se ha reducido su diametro para taladros pequeños	X		X	
5,7	Los esmeriles cuentan con guardas y con los soportes	X			
5,8	Los collarines coinciden en diametro y estan instalados según el relieve	X			
5,9	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas	X			
6	**Herramienta neumática**				
6,1	Las magueras y acoples se encuentran en buen estado (sin fugas, añadiduras, desperfectos)	X			
6,2	Se trabaja a las presiones indicadas	X			
6,3	La herramienta es descargada al terminar	X			
7	**Herramienta por detonación**				
7,1	El personal se encuentra autorizado	X			
7,2	Se descarga y es almacenada	X			
7,3	Su sistema de disparo es bajo presión	X			

ACCIONES DE MEJORA

Item	Accion	Responsable	Fecha de reinspeccion

Gustavo Arenas
RESPONSABLE SST

Carlos Luis
RESPONSABLE DE LA INSPECCION

11959

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	INSPECCIÓN DE ANDAMIOS	Código: SST-F-071 Versión: 01 Fecha: Agosto 2025

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LAS COMUNIDADES INDIGENAS WACOYO-ASEIPOME-AWALIBA-DOMO PLANA DE PUERTO GAITÁN.

FECHA			FRENTE DE TRABAJO	ANDAMIO PROPIO	NOMBRE DE CONTRATISTA
11	6	25	DOMO PLANAS	SI [ ] NO [X]	SANOSOL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS

	LISTA DE CHEQUEO	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	PLAN DE ACCIÓN (Las casillas del plan de acción, se deben diligenciar únicamente cuando al realizar la inspección, se identifique el no cumplimiento (NO CUMPLE) de alguno de los ítems.) DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA ADOPTADA (Cambio de piezas, sustitución de equipo, mantenimiento...)	FECHA PROGRAMACIÓN	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN NOMBRE	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN FIRMA	ESTADO DEL HALLAZGO FECHA DE VERIFICACIÓN	ESTADO DEL HALLAZGO ABIERTO	ESTADO DEL HALLAZGO CERRADO
CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD	El terreno es firme y estable y nivelado.	X									
	Las uniones de las bases regulables están en buen estado.	X									
	Las tuercas de las bases regulables están en buen estado.			X							
	La longitud mínima de solape de los tornillos es de 15cm o 25% del largo total del tornillo.			X							
	Los elementos tubulares están libres de daños o defectos estructurales.	X									
	Los horizontales y diagonales están asegurados.	X									
	El andamio se encuentra correctamente nivelado	X									
	Todos los elementos horizontales y diagonales están asegurados	X									
	La distancia vertical entre horizontales es máximo 2m.	X									
	Se instalan vientos una vez el andamio supera 3 veces la medida del lado más angosto (aplica para andamios de menos de 2.5 m de ancho).			X							
	Se instalan vientos una vez el andamio supera 4 veces la medida del lado más angosto (aplica para andamios de más de 2.5 m de ancho).		X								
PLATAFORMAS Y BARANDAS	Si se usan tablones como plataformas, estos están libres de grietas, nudos, defectos y no están pandos.	X									
	Los tablones empleados, tienen un espesor mínimo de 5 cm	X									
	El ancho de los tablones no es inferior a 25 cm.	X									
	Los tablones sobresalen de su soporte como mínimo 30 cm y no superan los 50 cm a menos que haya una barrera que prevenga el acceso.	X									

	LISTA DE CHEQUEO	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	PLAN DE ACCIÓN (Las casillas del plan de acción, se deben diligenciar únicamente cuando al realizar la inspección, se identifique el no cumplimiento (NO CUMPLE) de alguno de los ítems.) DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA ADOPTADA (Cambio de piezas, sustitución de equipo, mantenimiento...)	FECHA PROGRAMACIÓN	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN NOMBRE	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN FIRMA	ESTADO DEL HALLAZGO FECHA DE VERIFICACIÓN	ESTADO DEL HALLAZGO ABIERTO	ESTADO DEL HALLAZGO CERRADO
...FORMAS Y BARANDAS	Las plataformas están libres de daños o defectos estructurales.	X									
	La plataforma destinada para la realización de la actividad, cuenta con un ancho mínimo de 50 cm	X									
	Los ganchos de soporte (garras) de las plataformas metálicas, están libres de deformación o daño.			X							
	Las plataformas de madera, están aseguradas.	X									
	Se cuenta con baranda que garantice una capacidad de carga de 200 libras.			X							

1960

PLATA	Las barandas cuentan con un travesaño superior y uno intermedio con no más de 48 cm de separación			X							
	Las barandas cuentan con rodapies de mínimo 9 cm.			X							
ACCESO	El ángulo de inclinación de las escaleras de acceso, es el adecuado			X							
	Hay acceso seguro y sin estorbos en todas las plataformas del andamio (como una escalera, pasillo o escalones)	X									
	Si una escalera es usada para acceso, está asegurada al andamio y se extiende por lo menos 1 metro por arriba del nivel de la plataforma.			X							
ANDAMIO RODANTE	El personal desciende del andamio rodante antes de realizar cualquier desplazamiento.			X							
	Las ruedas en andamios rodantes son aseguradas o bloqueadas antes de que alguien se suba			X							
	Los tornillos ajustables no son extendidos en su totalidad.			X							
	Después de que un andamio rodante es movido, es ajustado para estar seguro que está a plomo (a nivel vertical).			X							

- Si una o más respuestas son negativas (NO), la condición debe ser corregida antes de autorizar el uso del andamio.
- Esta lista de verificación debe realizarse cada vez que se modifique o se instale un nuevo andamio y permanecer en terreno.
- Todo andamio que no cuente con esta verificación y autorización no puede ser utilizado.

TARJETA

CUMPLE	INSTALACIÓN	NO CUMPLE

OBSERVACIONES:

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	PARTICIPACIÓN COPASST
NOMBRE: Carlos Lincoln Soto Jara	NOMBRE:
CARGO	CARGO
FIRMA	FIRMA

	INSPECCIÓN DE EQUIPOS	SST-F-072 VERSIÓN: 01 FECHA: Agosto 2025

PROYECTO	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PARA LOS DESCANSOS UNIFAMILIARES

FECHA DE INSPECCIÓN	DÍA	MES	AÑO	VINCULACIÓN		NOMBRE DE LA EMPRESA	LUGAR DONDE SE DESARROLLA LA INSPECCIÓN
	11	MAYO	26	PROPIOS	CONTRATISTAS		CERRO PLANAS

ÍTEM		VEHÍCULO	MAQUINARIA	CÓDIGO / PLACA / REFERENCIA	EQUIPO 1	EQUIPO 2	EQUIPO 3	EQUIPO 4	EQUIPO 5
				TIPO DE VEHÍCULO / MAQUINARIA	EXCAVADORA				
				CONDUCTOR / OPERADOR					
				CEDULA					
				FIRMA					
				ASPECTOS A VERIFICAR	C / NC / N/A	C / NC / N/A	C / NC / N/A	C / NC / N/A	C / NC / N/A
1	DOCUMENTOS DEL EQUIPO	X		LICENCIA DE TRANSITO					
2			X	TARJETA DE PROPIEDAD / MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN					
3		X		TARJETA DE OPERACIÓN (Aplica servicio público para transporte de pasajeros)					
4		X		SOAT VIGENTE					
5		X		REVISIÓN TECNO MECÁNICA VIGENTE (Aplica: Público, >2 años / Particular, >6 años)					
6		X	X	PÓLIZA TODO RIESGO VIGENTE (Aplica servicio público y maquinaria)					
8	DOCUMENTOS TRABAJADOR	X	X	LICENCIA DE CONDUCCIÓN VIGENTE (Según categoría del vehículo)					
9			X	CERTIFICADO DE OPERADOR (EXCAVADORA, RETROCARGADOR)					
10		X	X	SOPORTE DE PAGO DE SEG. SOCIAL (Vigencia, ARL Clase de riesgo VI)					
12		X	X	DOTACIÓN (Uso de camisa corporativa ó chaleco con reflectivo, pantalón, botas de seguridad)					
13	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVA	X	X	SISTEMA DE FRENOS					
14		X	X	SISTEMA DE DIRECCIÓN					
15		X	X	SISTEMA DE SUSPENSIÓN (Muelles, amortiguadores)					
16		X	X	SISTEMA HIDRÁULICO					
17		X	X	SISTEMA ELECTRICO					
18		X	X	ESTADO TREN DE RODAJE (Llantas, orugas)					
19		X	X	SUJECIÓN DE ESPARRAGOS Y TUERCAS EN RINES					
20		X	X	ESTADO DE GUARDAFANGOS					
21		X	X	VIDRIOS (Panorámico, laterales, traseros)					
22		X	X	ESPEJOS RETROVISORES Y DE VISION ANGULAR					
23		X	X	ESTADO GENERAL DE LIMPIAPARABRISAS					
24		X	X	LUCES EN BUEN ESTADO (Altas, medias, bajas, direccionales, estacionarias, stop)					
25		X	X	CLAXON / PITO					
26		X	X	ALARMA DE REVERSA					
27		X	X	CINTAS REFLECTIVAS (Maquinaria: Amarillo limón. - Vehículos: Blanco en la parte delantera / Rojo-Blanco en la parte lateral - Rojo en la parte trasera)					
28	SISTEMA DE SEGURIDAD	X	X	CINTURONES DE SEGURIDAD (Completos y abrochados)					
29		X	X	ESTADO DE LA(S) SILLA(S) DEL EQUIPO					
30		X		REPOSACABEZAS					
31	OTROS COMPONENTES	X		PLACAS: Frontal, posterior y laterales (este último, para servicio público)					
33		X		Volqueta: SISTEMA DE AUTOCARPADO					
34		X		Volqueta: ASEGURAMIENTO DE COMPUERTA DEL VOLCO					
37	KIT DE CARRETERA	X		CONOS y/o SEÑALES TRIANGULARES REFLECTIVAS * 2					
38		X		TACOS DE BLOQUEO * 2					
39		X		HERRAMIENTAS (Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas).					
40		X		GATO HIDRÁULICO (con capacidad para elevar el vehículo)					
41		X		LLANTA DE REPUESTO					
42		X		CRUCETA					
43		X		LINTERNA					
44	BOTIQUÍN	X	X	SOLUCION ANTISEPTICA					
45		X	X	ELEMENTO DE CORTE					
46		X	X	ALGODON					
47		X	X	GASA ESTERIL					
48		X	X	ESPARADRAPO o VENDAS ADHESIVAS					
49		X	X	VENDA ELÁSTICA					
50		X	X	GUANTES DE LÁTEX					
51	EXTINTOR	X	X	CAPACIDAD DEL EXTINTOR 20 LBS					
52		X	X	RECARGA VIGENTE (Verificar color del anillo)					
53		X	X	PRESURIZACIÓN (Verificar manómetro)					
54		X	X	ESTADO DEL CILINDRO					
55		X	X	INSTRUCCIONES DE OPERACION					
56		X	X	MANIJA DE TRANSPORTE					
57		X	X	PALANCA DE ACTIVACIÓN					
58		X	X	PASADOR DE SEGURIDAD					
59		X	X	BOQUILLA Y/O MANGUERA DE DESCARGA					
60		X	X	UBICACIÓN DE FACIL ACCESO					

EQUIPO RELACIONADO EN LA INSPECCIÓN	ÍTEM INCUMPLIDO	PLAN DE ACCION: MEDIDAS INMEDIATAS REALIZADAS EN EL FRENTE DE OBRA	ACCIONES PROPUESTAS EN RELACIÓN A LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS	CIERRE DE HALLAZGO SI	CIERRE DE HALLAZGO NO	FECHA DE CIERRE DE HALLAZGO

OBSERVACIONES GENERALES:

INSPECCIÓN REALIZADA POR:			PARTICIPACIÓN COPASST:	
NOMBRE:	[illegible]	[illegible]		FIRMA
CARGO:	OP			

11961

CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025

LISTA DE CHEQUEO
EQUIPO DE SOLDADURA ELECTRICA

Código: SST-F-067
Versión: 01
Fecha: Agosto 2025

Frente de obra: DOMO PLANAS

Fecha: 18-5-2026

Marque con una X el estado — BUENO: B — MALO: M — No aplica: NA

INSPECCION VISUAL	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
Carcaza del equipo	X			X			X			X			X			X			X			
Ventilador	X			X			X			X			X			X			X			
Ruedas	X			X			X			X			X			X			X			
Extensión Eléctrica, toma y clavija	X			X			X			X			X			X			X			
Fusible	X			X			X			X			X			X			X			
Porta electrodo	X			X			X			X			X			X			X			
Embobinado	X			X			X			X			X			X			X			
Pinza para masa	X			X			X			X			X			X			X			
Amperaje	X			X			X			X			X			X			X			
Suiche de encendido	X			X			X			X			X			X			X			
Cable de pinza para masa	X			X			X			X			X			X			X			
Cable de porta electrodo	X			X			X			X			X			X			X			
Polo a tierra	X			X			X			X			X			X			X			
Terminales para soldar	X			X			X			X			X			X			X			
Existe ventilacion durante la aplicación de soldadura electrica	X			X			X			X			X			X			X			
Estado de los Elementos de Protección Personal del soldador.	X			X			X			X			X			X			X			
Se cuenta con señalizacion de advertencia	X			X			X			X			X			X			X			
El permiso de Trabajo en Caliente está diligenciado.			X			X			X			X			X			X			X	
Estado de la mampara	X			X			X			X			X			X			X			
Estado del Extintor en el área de trabajo	X			X			X			X			X			X			X			
FIRMA DE QUIEN ELABORA	carlos			carlos			carlos			carlos			carlos			carlos			carlos			

Nombre: Carlos Lince

Firma:

Elabora / Soldador

Nombre GUSTAVO MEDINA

Firma:

Autorizo Responsable SST

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN TIPO A	**Código:** SST-F-085 **Versión:** 01 **Fecha:** agosto 2025

Lugar:	PUERTO GAITAN	Fecha de inspección:	18	5	26
Ubicación del botiquín	ASEIPOME				

Marque con una X según las condiciones observadas:

El botiquín se encuentra instalado en la pared?	Si		No	X	Localizado en lugar visible?	Si	X	No	
El botiquín se encuentra libre de obstáculos?	Si	X	No		El botiquín se encuentra señalizado?	Si	X	No	

Ítem	Descripción del elemento del botiquín de primeros auxilios	Cantidad Requerida	Cantidad existente	Fecha de Vencimiento (Si aplica)	Observaciones
1	GASAS LIMPIAS PAQUETE	Paquete X 20	20 UN	4-28	
2	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO de 4"	1 unidad	1 UN	4-30	
3	BAJALENGUAS	Paquete X 20	20 UN	NA	
6	GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN	50 Pares	50 PARES	12-26	
7	VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS	1 unidad	1 UN	9-30	
8	VENDA ELÁSTICA 4 X 5 YARDAS	1 unidad	1 UN	9-30	
9	VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS	1 unidad	1 UN	9-30	
10	VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS	1 unidad	1 UN	9-30	
11	VENDA DE ALGODÓN 4 X 5 YARDAS	1 unidad	1 UN	9-30	
12	YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO) 120 ml	1 unidad	1 UN	9-30	
13	SOLUCIÓN SALINA 250 cc o 500 cc	2 unidades	2 UN	9-27	
14	TERMÓMETRO DE MERCURIO O DIGITAL	1 unidad	1 UN	7-29 ~~NA~~	
15	ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 350 ml	1 unidad	1 UN	NA 9-27	
16	INMOVILIZADOR DE CARTÓN PLÁSTICO	1 Juego	1 JUEGO	NA	
17	OTRO:				
18	OTRO:				
19	OTRO:				
20	OTRO:				
21	OTRO:				
22	OTRO:				
23	OTRO:				
24	OTRO:				

Observaciones Generales:

Participantes en la Inspección:	GUSTAVO MEDINA	Firmas:	

11964

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	INSPECCIÓN CAMILLAS DE EMERGENCIA	Código: SST-F-021 Versión: 01 Fecha: agosto 2025

Codigo: NA	Fecha de Inspeccion: 18 DE MAYO DE 2026
Responsable de la Inspección: GUSTAVO MEDINA	Cargo: COORD VIAL SGSST
Lugar: PUERTO GAITAN	Ubicación de la camilla: ASEIPOMG

DESCRIPCIÓN DE LA CAMILLA

	Elemento	VERIFICACIÓN / ESTADO			DESCRIPCIÓN DE LA CONDICIÓN OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	NA		
1	Instalación (Sitio de ubicación)	X				
2	Estado del soporte	X				
3	Sugetadores o Manijas de agarre	X				
4	Correas de amarre o seguridad	X				
5	Lugar visible y fácil acceso	X				
6	Rotulada / Señalización	X				
7	Juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior	X				

OBSERVACIONES:

GUSTAVO MEDINA

Firma

1965

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Código: SST-F-020 Versión: 01 Fecha: agosto 2025

FECHA INSPECCIÓN: 18 de mayo de 2026 LUGAR: PUERTO GAITÁN

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: GUSTAVO MEDINA CARGO: COORDINADOR SGSST.

Bueno: B Regular: R Malo: M No Tiene: N.T No aplica: N.A

N°.	Ubicación	Identificación	Capacidad	Clase	Agente	Fecha de ultima recarga	Acceso	Visibilidad	Señalización	Pintura	Cilindro	Etiqueta (instructivo)	Aro de seguridad	Manómetro	Presión	Pasador	Manguera	Boquilla	Envase	Manija de transporte	Manija de disparo	OBSERVACIONES
1	ABELPONE	N/A	30 Lbs	ABC	PQS	NOV-26	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

OBSERVACIONES GENERALES:

1966

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	FORMATO INSPECCIÓN LOCATIVA	Código: SST-F-023
		Versión: 01
		Fecha: agosto 2025

Fecha de inspección: 18 - 05 - 26	Lugar: PUERTO GAITÁN - ASEIFAME
Inspección realizada por: GUSTAVO MEDINA	Cargo: COORDINADOR SGSST

No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	NA	
	PELIGROS FISICOS				
1	Existe buena iluminación artificial y natural.	X			
2	Las luminarias están en buen estado.			X	
3	Hay buena ventilación en el área.	X			
4	El nivel de ruido es adecuado (Condiciones Normales inferiores	X			
5	Existen controles de ruido (control en la fuente, en el medio de	X			
6	La temperatura es confortable.	X			
	PELIGROS ELÉCTRICOS				
7	Instalaciones eléctricas bien aisladas, con conexiones a tierra,	X			
8	Instalaciones eléctricas señaladas	X			
9	Cables eléctricos debidamente entubados.	X			
10	Los empalmes o conexiones estan en buen estado.	X			
11	Tomas e interruptores en buen estado	X			
12	Se observa cajas o toma corriente sin sobrecarga.	X			
13	Cables en buen estado.	X			
14	Los tableros, cajas y circuitos estan identificados.	X			
15	Los tableros y cajas estan libres de obstáculos.	X			
16	Existe señalización de peligros.	X			
	PELIGROS DE SEGURIDAD				
17	Los extintores son los adecuados al tipo de peligros del área.	X			
18	Extintores de carga vigente.	X			
19	Extintores libre de obstaculos.	X			
20	Existe señalización de extintores.	X			
21	Existe señalización en todas las instalaciones y en las salidas de emergencia.	X			
22	Las áreas de salida de emergencia y punto de encuentro se encuentran despejadas	X			
23	El personal cuenta con los elementos de protección personal (EPP).	X			
24	Hay camilla en el área. (Solo si es necesaria).	X			
25	Cuentan con Inmovilizador cervical	X			
26	Hay botiquín y control de consumo.	X			
27	Se tiene la lista de teléfonos de emergencia a la mano?.	X			
28	Se tiene la lista de centros de salud u hospitales de referencia cercanos?	X			
	PELIGROS BIOLOGICOS				
29	Se realizan controles a los Factores que puedan generar Accidentes por contacto con Animales, y plantas.	X			
	PELIGROS BIOMECANICO				
30	Las sillas / puestos de las maquinas cumplen, teniendo en cuenta el tiempo de exposición y postura del operador.			X	
31	Las condiciones del puesto de trabajo, (escritorio) son las adecuadas a nivel Ergonomico. Teniendo en cuenta que se trabajaría 1/2 jornada en este sitio.			X	
32	Cuentan con las especificaciones del peso de las cargas que manejan en obra.	X			

CONSORCIO AGUAS CAITAN SAS	FORMATO INSPECCIÓN LOCATIVA	Código: SST-F-023 Versión: 01 Fecha: agosto 2025

ORDEN Y ASEO					
33	El área se encuentra organizada.	X			
34	Se realiza la clasificación de residuos sólidos en forma correcta.	X			
35	Los residuos peligrosos se separan y disponen con empresas autorizadas.	X			
36	El sitio inspeccionado se encuentra en buen estado de aseo y mantenimiento.	X			
SERVICIOS SANITARIOS Y LIMPIEZA GENERAL					
37	Baños con canecas			X	
38	Con jabón liquido, con toallas desechables			X	
39	Limpios			X	
40	Escaleras portátiles			X	
41	Sanitarios			X	
42	Lavamanos			X	
43	Orinales			X	
44	Duchas			X	
45	Espejo			X	
46	Acometida Hidrosanitaria			X	
47	Pintura			X	
PELIGRO MECANICO (HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA)					
48	Se aplican los preoperacionales y listas de chequeo a la maquinaria en sitio	X			
49	Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo a las maquinas y herramientas.	X			
PREGUNTAS Y OBSERVACION DE TAREAS (Hacer verificación a través de la observación de los trabajadores)					
50	Los funcionarios cumplen con las normas de seguridad de su actividad.	X			
51	Los funcionarios conocen los peligros a los que están expuestos.	X			
52	El personal tiene claro que hacer en caso de un incidente , Accidentes de trabajo y Enfermedad Laboral.	X			
53	Los funcionarios conocen la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.	X			
54	Los funcionarios saben como usar y cuidar sus EPP.	X			

	MEDIO AMBIENTE	B.E	RE	MAL	OBSERVACIONES
55	Impresora / fotocopiadora. (Si aplica)				
	Computador. (Si aplica)				
	Otro.				
56	El area cuenta con las tarjetas de emergencia.				
	El area cuenta con las Hojas de seguridad.				
	Otro.				

NOMBRE GUSTAVO MEDINA	NOMBRE
CARGO/ FIRMA COORDINADOR SGSST	CARGO/FIRMA

Plan de Accion Correctiva - Seguimiento**

Fecha	C/S	Descripcion	Responsable	Firma

* Escriba toda especificacion que requiera aclarar en el espacio Observaciones

* Para ser diligenciado por el competente mecanico o encargado de mantenimiento

No deje ningun espacio en blanco, diligencie el formato en su totalidad.

1/968

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MECÁNIZADAS

SST-F-073
VERSIÓN: 01
FECHA: AGOSTO 2025

FECHA DE INSPECCIÓN:	DÍA	MES	AÑO	HERRAMIENTAS PROPIAS	CONTRATISTA RESPONSABLE	PROYECTO:
	28	05	26	SI [X] NO [ ]	INMERFRAN	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LAS COMUNIDADES INDIGENAS WACOYO-ASEIPOME-AWALIBA-DOMO PLANA DE PUERTO GAITÁN.

ÍTEM	LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD - HERRAMIENTAS MECANIZADAS	INDIVIDUALIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA INSPECCIONADA (Nombre de la herramienta a inspeccionar)																										
		1 Pulidora			2 Taladro			3 Planta Electrica			4 Compresor			5			6			7			8			9		
	NOTA: Marque según corresponda:	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
1	Los equipos poseen aislamiento dieléctrico y su clavija se encuentra en buen estado.	X			X			X			X																
2	Antes de realizar el cambio de discos, brocas, puntas o cuchillas, se apaga el equipo.	X			X					X			X														
3	Se hace uso de las llaves adecuadas para realizar el cambio de discos, brocas y cuchillas.	X			X					X			X														
4	El almacenamiento de las herramientas eléctricas se hace en sitios adecuados, aislados de la humedad.	X			X			X					X														
5	Los discos, brocas, puntas, cuchillas y piezas clave se encuentran en buen estado	X			X					X			X														
6	Las rpm (revoluciones por minuto) de la pulidora, no son superiores a la capacidad del disco empleado.	X			X					X			X														
7	Los cables poseen aislamiento doble, polo a tierra y se encuentren libres de daño.	X			X			X			X																
8	Las conexiones de las mangueras neumáticas, cuentan con mecanismos de seguridad como pines "r" y/o sistema anti látigo.			X			X			X	X																
9	Las mangueras de los equipos neumáticos, se encuentran en buen estado y no presentan fugas de aire.			X			X			X	X																
10	Cuentan con todas sus piezas bien ajustadas (guardas de seguridad, manijas de sujeción, resguardos, carcasas, etc...)	X			X			X			X																
11	Las mangueras hidráulicas se encuentran en buen estado			X			X			X	X																
12	Los equipos hidráulicos tienen instalada la manquera de retorno			X			X			X			X														
13	El equipo inspeccionado no presenta fugas (aceite, gasolina, refrigerante...)	X			X			X			X																
14	El depósito de combustible, aceites y refrigerantes, están en buen estado y no permiten fugas ni derrames.			X			X	X			X																
15	El tubo de escape cuenta con guarda y silenciador	X			X			X			X																
16	Los equipos neumáticos tienen sistema de despresurización.			X			X			X	X																
17	Las mangueras de aire tienen las guayas antilatigos.			X			X			X	X																
18	Los acoples de las mangueras se encuentran en buen estado.			X			X			X	X																
19	El personal hace uso de los epp aplicables (casco, guantes, botas de seguridad, protección visual, facial, auditiva y respiratoria...).	X			X			X			X																
20	El personal conoce las normas de seguridad para el uso seguro de herramientas accionados por motor.	X			X			X			X																
21	Se inspecciona el área y se remueven los obstáculos antes de dar inicio a la actividad	X			X			X			X																

HERRAMIENTA RELACIONADA EN LA INSPECCIÓN	ÍTEM INCUMPLIDO	PLAN DE ACCIÓN: ACCIONES PROPUESTAS EN RELACIÓN A LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	CARGO	FIRMA	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE VERIFICACIÓN	ESTADO DEL HALLAZGO: ABIERTO	CERRADO

INSPECCIÓN REALIZADA POR:

NOMBRE: Carlos Lince
CARGO: Soldador
FIRMA:

PARTICIPACIÓN COPASST | NOMBRE: | FIRMA

11969

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2024	INSPECCIÓN DE ANDAMIOS	Código: SST-F-071 Versión: 01 Fecha: Agosto 2025

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LAS COMUNIDADES INDIGENAS WACOYO-ASEIPOME-AWALIBA-DOMO PLANA DE PUERTO GAITÁN.

FECHA			FRENTE DE TRABAJO	ANDAMIO PROPIO	NOMBRE DEL CONTRATISTA
28	5	26	DOMO PLANAS	SI [ ] NO [X]	SANOSOL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS

	LISTA DE CHEQUEO	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	PLAN DE ACCIÓN (Las casillas del plan de acción, se deben diligenciar únicamente cuando al realizar la inspección, se identifique el no cumplimiento (NO CUMPLE) de alguno de los ítems.) DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA ADOPTADA (Cambio de piezas, sustitución de equipo, mantenimiento...)	FECHA PROGRAMACIÓN	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN NOMBRE	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN FIRMA	ESTADO DEL HALLAZGO FECHA DE VERIFICACIÓN	ESTADO DEL HALLAZGO ABIERTO	ESTADO DEL HALLAZGO CERRADO
CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD	El terreno es firme y estable y nivelado.	X									
	Las uniones de las bases regulables están en buen estado.	X									
	Las tuercas de las bases regulables están en buen estado.			X							
	La longitud mínima de solape de los tornillos es de 15cm o 25% del largo total del tornillo.			X							
	Los elementos tubulares están libres de daños o defectos estructurales.	X									
	Los horizontales y diagonales están asegurados.	X									
	El andamio se encuentra correctamente nivelado	X									
	Todos los elementos horizontales y diagonales están aseguradas.	X									
	La distancia vertical entre horizontales es máximo 2m.	X									
	Se instalan vientos una vez el andamio supera 3 veces la medida del lado más angosto (aplica para andamios de menos de 2.5 m de ancho).			X							
	Se instalan vientos una vez el andamio supera 4 veces la medida del lado más angosto (aplica para andamios de más de 2.5 m de ancho).		X								
PLATAFORMAS Y BARANDAS	Si se usan tablones como plataformas, estos están libres de grietas, nudos, defectos y no están pandos.	X									
	Los tablones empleados, tienen un espesor mínimo de 5 cm	X									
	El ancho de los tablones no es inferior a 25 cm.	X									
	Los tablones sobresalen de su soporte como mínimo 30 cm y no superan los 50 cm a menos que haya una barrera que prevenga el acceso.	X									

	LISTA DE CHEQUEO	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	PLAN DE ACCIÓN (Las casillas del plan de acción, se deben diligenciar únicamente cuando al realizar la inspección, se identifique el no cumplimiento (NO CUMPLE) de alguno de los ítems.) DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA ADOPTADA (Cambio de piezas, sustitución de equipo, mantenimiento...)	FECHA PROGRAMACIÓN	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN NOMBRE	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN FIRMA	ESTADO DEL HALLAZGO FECHA DE VERIFICACIÓN	ESTADO DEL HALLAZGO ABIERTO	ESTADO DEL HALLAZGO CERRADO
ORMAS Y BARANDAS	Las plataformas están libres de daños o defectos estructurales.	X									
	La plataforma destinada para la realización de la actividad, cuenta con un ancho mínimo de 50 cm	X									
	Los ganchos de soporte (garras) de las plataformas metálicas, están libres de deformación o daño.			X							
	Las plataformas de madera, están aseguradas.	X									
	Se cuenta con baranda que garantice una capacidad de carga de 200 libras.			X							

1930

PLATA	Las barandas cuentan con un travesaño superior y uno intermedio con no más de 48 cm de separación		X								
	Las barandas cuentan con rodapiés de mínimo 9 cm.		X								
ACCESO	El ángulo de inclinación de las escaleras de acceso, es el adecuado		X								
	Hay acceso seguro y sin estorbos en todas las plataformas del andamio (como una escalera, pasillo o escalones)	X									
	Si una escalera es usada para acceso, está asegurada al andamio y se extiende por lo menos 1 metro por arriba del nivel de la plataforma.		X								
ANDAMIO RODANTE	El personal desciende del andamio rodante antes de realizar cualquier desplazamiento.		X								
	Las ruedas en andamios rodantes son aseguradas o bloqueadas antes de que alguien se suba		X								
	Los tornillos ajustables no son extendidos en su totalidad.		X								
	Después de que un andamio rodante es movido, es ajustado para estar seguro que está a plomo (a nivel vertical).		X								

- Si una o más respuestas son negativas (NO), la condición debe ser corregida antes de autorizar el uso del andamio.
- Esta lista de verificación debe realizarse cada vez que se modifique o se instale un nuevo andamio y permanecer en terreno.
- Todo andamio que no cuente con esta verificación y autorización no puede ser utilizado.

TARJETA

CUMPLE	INSTALACION	NO CUMPLE

OBSERVACIONES:

INSPECCION REALIZADA POR:	PARTICIPACION COPASST
NOMBRE: Sergio Cruz	NOMBRE:
CARGO Soldador	CARGO
FIRMA	FIRMA

	INSPECCIÓN DE EQUIPOS	SST-F-072 VERSIÓN: 01 FECHA: Agosto 2025

PROYECTO	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA COMUNIDADES INDIGENAS

FECHA DE INSPECCIÓN	DÍA	MES	AÑO	VINCULACIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA	LUGAR DONDE SE DESARROLLA LA INSPECCIÓN
	15	MAYO	26	PROPIOS / CONTRATISTAS		COMO PUNAS

ÍTEM	VEHÍCULO	MAQUINARIA		EQUIPO 1	EQUIPO 2	EQUIPO 3	EQUIPO 4	EQUIPO 5
			CÓDIGO / PLACA / REFERENCIA	MCO93353				
			TIPO DE VEHÍCULO / MAQUINARIA	RETRO EXCA				
			CONDUCTOR / OPERADOR	YEFERSON				
			CÉDULA	9106540				
			FIRMA					

ÍTEM		VEHÍCULO	MAQUINARIA	ASPECTOS A VERIFICAR	EQUIPO 1 C	EQUIPO 1 NC	EQUIPO 1 N/A	EQUIPO 2 C	EQUIPO 2 NC	EQUIPO 2 N/A	EQUIPO 3 C	EQUIPO 3 NC	EQUIPO 3 N/A	EQUIPO 4 C	EQUIPO 4 NC	EQUIPO 4 N/A	EQUIPO 5 C	EQUIPO 5 NC	EQUIPO 5 N/A
1	DOCUMENTOS DEL EQUIPO	X		LICENCIA DE TRANSITO			X													
2			X	TARJETA DE PROPIEDAD / MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN	X															
3		X		TARJETA DE OPERACIÓN (Aplica servicio público para transporte de pasajeros)			X													
4		X		SOAT VIGENTE			X													
5		X		REVISION TECNO MECÁNICA VIGENTE (Aplica: Público, >2 años / Particular, >6 años)			X													
6		X	X	PÓLIZA TODO RIESGO VIGENTE (Aplica servicio público y maquinaria)	X															
8	DOCUMENTOS TRABAJADOR	X	X	LICENCIA DE CONDUCCIÓN VIGENTE (Según categoría del vehículo)	X															
9			X	CERTIFICADO DE OPERADOR (EXCAVADORA, RETROCARGADOR)	X															
10		X	X	SOPORTE DE PAGO DE SEG. SOCIAL (Vigencia, ARL Clase de riesgo V)	X															
12		X	X	DOTACIÓN (Uso de camisa corporativa ó chaleco con reflectivo, pantalón, botas de seguridad)	X															
13	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVA	X	X	SISTEMA DE FRENOS	X															
14		X	X	SISTEMA DE DIRECCIÓN	X															
15		X	X	SISTEMA DE SUSPENSIÓN (Muelles, amortiguadores)	X															
16		X	X	SISTEMA HIDRÁULICO	X															
17		X	X	SISTEMA ELECTRICO	X															
18		X	X	ESTADO TREN DE RODAJE (Llantas, orugas)	X															
19		X	X	SUJECIÓN DE ESPARRAGOS Y TUERCAS EN RINES	X															
20		X	X	ESTADO DE GUARDAFANGOS			X													
21		X	X	VIDRIOS (Panorámico, laterales, traseros)	X															
22		X	X	ESPEJOS RETROVISORES Y DE VISIÓN ANGULAR	X															
23		X	X	ESTADO GENERAL DE LIMPIAPARABRISAS	X															
24		X	X	LUCES EN BUEN ESTADO (Altas, medias, bajas, direccionales, estacionarias, stop)	X															
25		X	X	CLAXON / PITO	X															
26		X	X	ALARMA DE REVERSA	X															
27		X	X	CINTAS REFLECTIVAS (Maquinaria: Amarillo limón. - Vehículos: Blanco en la parte delantera / Rojo-Blanco en la parte lateral - Rojo en la parte trasera)	X															
28	SISTEMA DE SEGURIDAD	X	X	CINTURONES DE SEGURIDAD (Completos y abrochados)	X															
29		X	X	ESTADO DE LA(S) SILLA(S) DEL EQUIPO	X															
30		X		REPOSACABEZAS	X															
31	OTROS COMPONENTES	X		PLACAS: Frontal, posterior y laterales (este último, para servicio público)			X													
33		X		Volqueta — SISTEMA DE AUTOCARPADO			X													
34		X		Volqueta — ASEGURAMIENTO DE COMPUERTA DEL VOLCO			X													
37	KIT DE CARRETERA	X		CONOS y/o SEÑALES TRIANGULARES REFLECTIVAS * 2			X													
38		X		TACOS DE BLOQUEO * 2			X													
39		X		HERRAMIENTAS (Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas).			X													
40		X		GATO HIDRAULICO (con capacidad para elevar el vehículo)			X													
41		X		LLANTA DE REPUESTO			X													
42		X		CRUCETA			X													
43		X		LINTERNA			X													
44	BOTIQUÍN	X	X	SOLUCION ANTISEPTICA	X															
45		X	X	ELEMENTO DE CORTE	X															
46		X	X	ALGODÓN	X															
47		X	X	GASA ESTÉRIL	X															
48		X	X	ESPARADRAPO ó VENDAS ADHESIVAS	X															
49		X	X	VENDA ELÁSTICA	X															
50		X	X	GUANTES DE LÁTEX	X															
51	EXTINTOR	X	X	CAPACIDAD DEL EXTINTOR 10 LBS	X															
52		X	X	RECARGA VIGENTE (Verificar color del anillo)	DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA
53		X	X	PRESURIZACIÓN (Verificar manómetro)	X															
54		X	X	ESTADO DEL CILINDRO	X															
55		X	X	INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN	X															
56		X	X	MANIJA DE TRANSPORTE	X															
57		X	X	PALANCA DE ACTIVACIÓN	X															
58		X	X	PASADOR DE SEGURIDAD	X															
59		X	X	BOQUILLA Y/O MANGUERA DE DESCARGA	X															
60		X	X	UBICACIÓN DE FACIL ACCESO	X															

EQUIPO RELACIONADO EN LA INSPECCIÓN	ÍTEM INCUMPLIDO	PLAN DE ACCION — MEDIDAS INMEDIATAS REALIZADAS EN EL FRENTE DE OBRA	ACCIONES PROPUESTAS EN RELACIÓN A LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS	CIERRE DE HALLAZGO SI	CIERRE DE HALLAZGO NO	FECHA DE CIERRE DE HALLAZGO

OBSERVACIONES GENERALES:

INSPECCION REALIZADA POR:			PARTICIPACION COPASST:	
NOMBRE:	[illegible]	YEFERSON		FIRMA
CARGO:	OP			

CONSORCIO AGUAS CARIBE 2022

LISTA DE CHEQUEO
EQUIPO DE SOLDADURA ELECTRICA

Código: SST-F-067
Versión: 01
Fecha: Agosto 2025

Frente de obra: COMO PLANAS

Fecha: 25-05-2026

Marque con una X el estado — BUENO: B — MALO: M — No aplica: NA

INSPECCION VISUAL	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
Carcaza del equipo	B			X			X			X			X			X			X			
Ventilador	B			X			X			X			X			X			X			
Ruedas	B			X			X			X			X			X			X			
Extensión Eléctrica, toma y clavija	B			X			X			X			X			X			X			
Fusible	B			X			X			X			X			X			X			
Porta electrodo	B			X			X			X			X			X			X			
Embobinado	B			X			X			X			X			X			X			
Pinza para masa	B			X			X			X			X			X			X			
Amperaje	B			X			X			X			X			X			X			
Suiche de encendido	B			X			X			X			X			X			X			
Cable de pinza para masa	B			X			X			X			X			X			X			
Cable de porta electrodo	B			X			X			X			X			X			X			
Polo a tierra	B			X			X			X			X			X			X			
Terminales para soldar	B			X			X			X			X			X			X			
Existe ventilacion durante la aplicación de soldadura electrica	B			X			X			X			X			X			X			
Estado de los Elementos de Protección Personal del soldador.	B			X			X			X			X			X			X			
Se cuenta con señalizacion de advertencia	B			X			X			X			X			X			X			
El permiso de Trabajo en Caliente está diligenciado.	B					X			X			X			X			X			X	
Estado de la mampara	B			X			X			X			X			X			X			
Estado del Extintor en el área de trabajo	B			X			X			X			X			X			X			
FIRMA DE QUIEN ELABORA	Jesus			Jesus			Jesus			Jesus			Jesus			Jesus			Jesus			

Nombre: Jesus Villamizar

Firma: Jesus Villamizar

Elabora / Soldador

Nombre: GUSTAVO MEDINA

Firma:

Autorizo Responsable SST

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	INSPECCION DE HERRAMIENTAS MENORES	SST-F-066
		Versión: 01
		Fecha: Agosto 2025

1123

CONTRATISTA: SANOSOL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LAS COMUNIDADES INDIGENAS WACOYO-ASEIPOME-AWALIBA-DOMO PLANA DE PUERTO GAITÁN.

FECHA: 25-5-2026

ITEM	ACTIVIDADES	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	**Herramientas**				
1,1	Se usa la herramienta y EPP's establecidos en el ATS	X			
1,2	Se encuentran en buen estado (limpias, sin desperfectos)	X			
1,3	Se guardan y portan adecuadamente (en cinturon o caja de herramientas)	X			
1,4	Se almacenan en sitios donde no puedan ser golpeados	X			
1,5	Se usan prensas de banco para sujetar	X			
1,6	Se tiene un programa de mantenimiento preventivo	-		X	
2	**Herramientas de corte**				
2,1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo			X	
2,2	Los cinceles se encuentran afiliados			X	
2,3	Las tarrajas macho o hembra no presentan rotura de sus dientes			X	
2,4	Las seguetas estan correctamente instaladas (fijas, asegurdas) y no presentan defectos			X	
2,5	Las limas disponen de sus mangos y no estan rotas o sucias	X			
2,6	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes estan completos			X	
2,7	Los cuchillos disponen de mangos y fundas	X			
3	**Herramientas manuales y de golpe**				
3,1	Se emplea el martillo adecuado según labor	X			
3,2	Sus caras y bordes estan en buen estado (no presentan fisuras, abolladuras, desperfectos)	X			
3,3	Su mango no esta quebrado, astillado, ni flojo	X			
3,4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y estan firmemente adheridos	X			
4	**Herramientas de torsion-llaves**				
4,1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimetricas	X			
4,2	Se observan en la llave huellas de palancas	X			
4,3	Se disponen de llaves para golpear	X			
4,4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas	X			
4,5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente	X			
4,6	La punta y cabo de los destornilladores no presentan fisuras, abolladuras, desperfectos	X			
4,7	Se disponen de herramientas que no produzcan chispas	X			
5	**Herramientas electricas**				
5,1	Estan limpias y lubricadas	X			
5,2	Tiene sus guardas	X			
5,3	Posee aislameinto doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	X			
5,4	El cable, enchufe y clavijas no presentan daños (cuentan con proteccion contra el riesgo mecanico)	X			
5,5	En los taladros se observa el mandril (broca) con golpes	X			
5,6	Brocas sin filo o se ha reducido su diametro para taladros pequeños	X			
5,7	Los esmeriles cuentan con guardas y con los soportes	X			
5,8	Los collarines coinciden en diametro y estan instalados según el relieve	X			
5,9	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas	X			
6	**Herramienta neumática**				
6,1	Las magueras y acoples se encuentran en buen estado (sin fugas, añadiduras, desperfectos)	X			
6,2	Se trabaja a las presiones indicadas	X			
6,3	La herramienta es descargada al terminar	X			
7	**Herramienta por detonación**				
7,1	El personal se encuentra autorizado	X			
7,2	Se descarga y es almacenada	X			
7,3	Su sistema de disparo es bajo presión	X			

ACCIONES DE MEJORA

Item	Accion	Responsable	Fecha de reinspeccion

GUSTAVO MEDINA
RESPONSABLE SST

JEAN LAMAMIZARB
RESPONSABLE DE LA INSPECCION

11994

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	INSPECCIÓN DE ANDAMIOS	Código: SST-F-071 Versión: 01 Fecha: Agosto 2025

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LAS COMUNIDADES INDIGENAS WACOYO-ASEIPOME-AWALIBA-DOMO PLANA DE PUERTO GAITÁN.

FECHA			FRENTE DE TRABAJO	ANDAMIO PROPIO	NOMBRE DEL CONTRATISTA
DÍA: 25	MES: 5	AÑO: 25	DOMO PLANAS	SI [ ] NO [X]	SANOSOL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS

	LISTA DE CHEQUEO	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	PLAN DE ACCIÓN (Las casillas del plan de acción, se deben diligenciar únicamente cuando al realizar la inspección, se identifique el no cumplimiento (NO CUMPLE) de alguno de los ítems)				ESTADO DEL HALLAZGO		
					DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA ADOPTADA (Cambio de piezas, sustitución de equipo, mantenimiento...)	FECHA PROGRAMACIÓN	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN NOMBRE	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN FIRMA	FECHA DE VERIFICACIÓN	ABIERTO	CERRADO
CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD	El terreno es firme y estable y nivelado.	X									
	Las uniones de las bases regulables están en buen estado.	X									
	Las tuercas de las bases regulables están en buen estado.			X							
	La longitud mínima de solape de los tornillos es de 15cm o 25% del largo total del tornillo.			X							
	Los elementos tubulares están libres de daños o defectos estructurales.	X									
	Los horizontales y diagonales están asegurados.	X									
	El andamio se encuentra correctamente nivelado	X									
	Todos los elementos horizontales y diagonales están asegurados	X									
	La distancia vertical entre horizontales es máximo 2m.	X									
	Se instalan vientos una vez el andamio supera 3 veces la medida del lado más angosto (aplica para andamios de menos de 2.5 m de ancho).			X							
	Se instalan vientos una vez el andamio supera 4 veces la medida del lado más angosto (aplica para andamios de más de 2.5 m de ancho).		X								
PLATAFORMAS Y BARANDAS	Si se usan tablones como plataformas, estos están libres de grietas, nudos, defectos y no están pandos.	X									
	Los tablones empleados, tienen un espesor mínimo de 5 cm	X									
	El ancho de los tablones no es inferior a 25 cm.	X									
	Los tablones sobresalen de su soporte como mínimo 30 cm y no superan los 50 cm a menos que haya una barrera que prevenga el acceso.	X									

	LISTA DE CHEQUEO	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	PLAN DE ACCIÓN (Las casillas del plan de acción, se deben diligenciar únicamente cuando al realizar la inspección, se identifique el no cumplimiento (NO CUMPLE) de alguno de los ítems)				ESTADO DEL HALLAZGO		
					DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA ADOPTADA (Cambio de piezas, sustitución de equipo, mantenimiento...)	FECHA PROGRAMACIÓN	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN NOMBRE	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN FIRMA	FECHA DE VERIFICACIÓN	ABIERTO	CERRADO
...FORMAS Y BARANDAS	Las plataformas están libres de daños o defectos estructurales.	X									
	La plataforma destinada para la realización de la actividad, cuenta con un ancho mínimo de 60 cm	X									
	Los ganchos de soporte (garras) de las plataformas metálicas, están libres de deformación o daño.			X							
	Las plataformas de madera, están aseguradas.	X									
	Se cuenta con baranda que garantice una capacidad de carga de 200 libras.			X							

1125

PLATA	Las barandas cuentan con un travesaño superior y uno intermedio con no más de 48 cm de separación		X								
	Las barandas cuentan con rodapiés de mínimo 9 cm.		X								
ACCESO	El ángulo de inclinación de las escaleras de acceso, es el adecuado		X								
	Hay acceso seguro y sin estorbos en todas las plataformas del andamio (como una escalera, pasillo o escalones)	X									
	Si una escalera es usada para acceso, está asegurada al andamio y se extiende por lo menos 1 metro por arriba del nivel de la plataforma.		X								
ANDAMIO RODANTE	El personal desciende del andamio rodante antes de realizar cualquier desplazamiento.		X								
	Las ruedas en andamios rodantes son aseguradas o bloqueadas antes de que alguien se suba.		X								
	Los tornillos ajustables no son extendidos en su totalidad.		X								
	Después de que un andamio rodante es movido, es ajustado para estar seguro que está a plomo (a nivel vertical).		X								

- Si una o más respuestas son negativas (NO), la condición debe ser corregida antes de autorizar el uso del andamio.
- Esta lista de verificación debe realizarse cada vez que se modifique o se instale un nuevo andamio y permanecer en terreno.
- Todo andamio que no cuente con esta verificación y autorización no puede ser utilizado.

TARJETA

CUMPLE	INSTALACIÓN	NO CUMPLE

OBSERVACIONES:

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		PARTICIPACION COPASST
NOMBRE:	Carlos Lines	NOMBRE:
CARGO	Soldador	CARGO
FIRMA		FIRMA

	INSPECCIÓN DE EQUIPOS	SST-F-072 VERSIÓN: 01 FECHA: Agosto 2025

PROYECTO: CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS VEREDALES

FECHA DE INSPECCIÓN	DÍA	MES	AÑO	VINCULACIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA	LUGAR DONDE SE DESARROLLA LA INSPECCIÓN
	25	MARZO	26	PROPIOS / CONTRATISTAS		BOMBA PUMAR

ÍTEM		VEHÍCULO	MAQUINARIA	ASPECTOS A VERIFICAR	EQUIPO 1 C	EQUIPO 1 NC	EQUIPO 1 N/A	EQUIPO 2 C	EQUIPO 2 NC	EQUIPO 2 N/A	EQUIPO 3 C	EQUIPO 3 NC	EQUIPO 3 N/A	EQUIPO 4 C	EQUIPO 4 NC	EQUIPO 4 N/A	EQUIPO 5 C	EQUIPO 5 NC	EQUIPO 5 N/A
				CÓDIGO / PLACA / REFERENCIA	MC095J5J															
				TIPO DE VEHÍCULO / MAQUINARIA	RETROEXCAVADORA															
				CONDUCTOR / OPERADOR	YOFERSON															
				CEDULA	76645596															
				FIRMA	YOFERSON															
1	DOCUMENTOS DEL EQUIPO	X		LICENCIA DE TRANSITO			X													
2			X	TARJETA DE PROPIEDAD / MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN	X															
3		X		TARJETA DE OPERACIÓN (Aplica servicio público para transporte de pasajeros)			X													
4		X		SOAT VIGENTE			X													
5		X		REVISIÓN TECNO MECÁNICA VIGENTE (Aplica: Público, >2 años / Particular, >6 años)			X													
6		X	X	PÓLIZA TODO RIESGO VIGENTE (Aplica servicio público y maquinaria)	X															
8	DOCUMENTOS TRABAJADOR	X	X	LICENCIA DE CONDUCCIÓN VIGENTE (Según categoría del vehículo)	X															
9			X	CERTIFICADO DE OPERADOR (EXCAVADORA, RETROCARGADOR)	X															
10		X	X	SOPORTE DE PAGO DE SEG. SOCIAL (Vigencia, ARL: Clase de riesgo VI)	X															
12		X	X	DOTACIÓN (Uso de camisa corporativa ó chaleco con reflectivo, pantalón, botas de seguridad)	X															
13	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVA	X	X	SISTEMA DE FRENOS	X															
14		X	X	SISTEMA DE DIRECCIÓN	X															
15		X	X	SISTEMA DE SUSPENSIÓN (Muelles, amortiguadores)	X															
16		X	X	SISTEMA HIDRÁULICO	X															
17		X	X	SISTEMA ELECTRICO	X															
18		X	X	ESTADO TREN DE RODAJE (Llantas, orugas)	X															
19		X	X	SUJECIÓN DE ESPARRAGOS Y TUERCAS EN RINES	X															
20		X	X	ESTADO DE GUARDAFANGOS		--	X													
21		X	X	VIDRIOS (Panorámico, laterales, traseros)	X															
22		X	X	ESPEJOS RETROVISORES Y DE VISIÓN ANGULAR	X															
23		X	X	ESTADO GENERAL DE LIMPIAPARABRISAS	X															
24		X	X	LUCES EN BUEN ESTADO (Altas, medias, bajas, direccionales, estacionarias, stop)	X															
25		X	X	CLAXON / PITO	X															
26		X	X	ALARMA DE REVERSA	X															
27		X	X	CINTAS REFLECTIVAS (Maquinaria: Amarillo limón. - Vehículos: Blanco en la parte delantera / Rojo-Blanco en la parte lateral - Rojo en la parte trasera)	X															
28	SISTEMA DE SEGURIDAD	X	X	CINTURONES DE SEGURIDAD (Completos y abrochados)	X															
29		X	X	ESTADO DE LA(S) SILLA(S) DEL EQUIPO	X															
30		X		REPOSACABEZAS	X															
31	OTROS COMPONENTES	X		PLACAS: Frontal, posterior y laterales (este último, para servicio público)			X													
33		X		Volqueta: SISTEMA DE AUTOCARPADO			X													
34		X		Volqueta: ASEGURAMIENTO DE COMPUERTA DEL VOLCO			X													
37	KIT DE CARRETERA	X		CONOS y/o SEÑALES TRIANGULARES REFLECTIVAS * 2			X													
38		X		TACOS DE BLOQUEO * 2			X													
39		X		HERRAMIENTAS (Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas).			X													
40		X		GATO HIDRÁULICO (con capacidad para elevar el vehículo)			X													
41		X		LLANTA DE REPUESTO			X													
42		X		CRUCETA			X													
43		X		LINTERNA			X													
44	BOTIQUÍN	X	X	SOLUCIÓN ANTISEPTICA	X															
45		X	X	ELEMENTO DE CORTE	X															
46		X	X	ALGODÓN	X															
47		X	X	GASA ESTERIL	X															
48		X	X	ESPARADRAPO ó VENDAS ADHESIVAS	X															
49		X	X	VENDA ELÁSTICA	X															
50		X	X	GUANTES DE LÁTEX	X															
51	EXTINTOR	X	X	CAPACIDAD DEL EXTINTOR 20 LBS	X															
52		X	X	RECARGA VIGENTE (Verificar color del anillo)	20	02	26	DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA
53		X	X	PRESURIZACIÓN (Verificar manómetro)	X															
54		X	X	ESTADO DEL CILINDRO	X															
55		X	X	INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN	X															
56		X	X	MANIJA DE TRANSPORTE	X															
57		X	X	PALANCA DE ACTIVACION	X															
58		X	X	PASADOR DE SEGURIDAD	X															
59		X	X	BOQUILLA Y/O MANGUERA DE DESCARGA	X															
60		X	X	UBICACIÓN DE FACIL ACCESO	X															

EQUIPO RELACIONADO EN LA INSPECCIÓN	ÍTEM INCUMPLIDO	PLAN DE ACCIÓN: MEDIDAS INMEDIATAS REALIZADAS EN EL FRENTE DE OBRA	ACCIONES PROPUESTAS EN RELACIÓN A LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS	CIERRE DE HALLAZGO SI	CIERRE DE HALLAZGO NO	FECHA DE CIERRE DE HALLAZGO

OBSERVACIONES GENERALES:

INSPECCION REALIZADA POR:			PARTICIPACION COPASST:	
NOMBRE:	YOFERSON ORTIZ	YOFERSON		FIRMA
CARGO:	OP			

11932

CONSORCIO AGUAS GALÁN 2025	INSPECCIÓN DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)	Código: SST-F-056 Versión: 01 Fecha: agosto 2025

Proyecto:	Construcción sistemas de acueductos para los resguardos indígenas del municipio de Puerto Gaitán (Wacoyo – Domoplanas – Awaliba – Aseinpome).	Fecha: 25 - 5 - 2026
Convenciones:	(E)ESTADO: (B) Bueno (M) Malo (NA) No Aplica - (U) USO: (A) Adecuado (I) Inadecuada	

Nombres y Apellidos:	Cédula	Cargo	Dotación					Elementos de Protección Personal															Observaciones	Firma
									Protector Auditivo		Protector Respiratorio		Guantes											
			Overol	Camisa	Pantalón	Bota de cuero	Bota de Caucho	Casco	Inserción	Copa	Vapores	Material Particulado	Carnaza	Vaqueta	Caucho	Kevlar	Nitrilo	Poliuretano	Gafas de seguridad	Impermeable	Otros		
Rosemberg Murcia Jojoa	17497322	Auxiliar operativo y conductor	NA	B	B	B	NA	B	B	NA	NA	B	NA	B	B	NA	B	B	B	NA	NA		
Edwin Alejandro Barrios	1120864265	Oficial de obra	NA	B	B	B	NA	B	B	NA	NA	B	NA	B	B	NA	B	B	B	NA	NA		
Miguel Diosid Correa	1103470729	Oficial de obra	NA	B	B	B	NA	B	B	NA	NA	B	NA	B	B	NA	B	B	B	NA	NA		
Yeferson Galvan Montes	78646546	Operador de maquinaria	NA	B	B	B	NA	B	B	B	NA	B	NA	B	B	NA	B	B	B	NA	NA		
Duvan Arley Ramirez	1004819005	Ayudante de obra	NA	B	B	B	NA	B	B	NA	NA	B	NA	B	B	NA	B	B	B	NA	NA		
Ober Asmed Perez Perez	96193788	Almacenista	NA	B	B	B	NA	B	B	B	NA	B	NA	B	B	NA	B	B	B	NA	NA		

Plan de acción:	

Responsable de la inspección: GUSTAVO MEDINA	Cargo: COORDINADOR SG-SST	Firma:

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

Inspección Preoperacional de Arnes y anclajes

SST-F-088
FV:15/08/2025

Marque según el estado: B Buen estado o cumple con el requisito. M Mal estado o No cumple con el requisito

Mes	MAYO	Año	2026

1. Datos del Equipo y la Inspección

Elemento	Referencia	Marca	Fecha de Vigencia	Precinto	Ubicación
Arnes	209026	UNITEC	10-29	N/A	DOMO PLANOS
Eslinga	281	SOFTEC	01-31	NA	DOMO PLANOS

1.1 Equipo asignado a:

Nombre: Carlos Linces Cargo: Soldador

Item a Inspeccionar	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Item a Inspeccionar	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
2. Documentacion del Equipo															
Certificado Inspeccion Tecnica del Equipo	B	B	B	B	B	B	B	Ficha Tecnica del Arnes	B	B	B	B	B	B	SD
3. Estado General del Equipo															
Elementos Blandos del Arnes y Linea de Vida (Correas - Ajustadores - Eslinga de Anclaje)															
Cintas sin Cortes	B	B	B	B	B	B	B	Cintas sin Quemaduras	B	B	B	B	B	B	B
Cintas Puntos Deshilachados	B	B	B	B	B	B	B	Cintas sin partes impregnadas de Quimicos	B	B	B	B	B	B	B
Cintas sin Abrasión	B	B	B	B	B	B	B	Etiquetas legibles	B	B	B	B	B	B	B
Cintas sin Partes Rotas	B	B	B	B	B	B	B								
Elementos Duros del Arnes y Linea de Vida (Anillos - Hebillas)															
Elementos duros sin Deformaciones	B	B	B	B	B	B	B	Elementos duros sin Bordes Cortantes	B	B	B	B	B	B	B
Elementos duros sin Grietas	B	B	B	B	B	B	B	Piezas Floja o Ausentes	B	B	B	B	B	B	B
Elementos duros sin Corrosión	B	B	B	B	B	B	B	Gancho de Seguridad	B	B	B	B	B	B	B

4. Observaciones


Contratsta: Sanosol ingeniería y construcciones SAS

5. Personal Responsable de la Inspeccion

Responsable de la Inspección

Dia		Usuario del equipo de alturas	Cedula	Firma
Lunes	4	Carlos Linces	17331371	
Martes	5	Carlos Linces	17331371	
Miércoles	6	Carlos Linces	17331371	
Jueves	7	Carlos Linces	17331371	
Viernes	8	Carlos Linces	17331371	
Sábado	9	Carlos Linces	17331371	
Domingo	10	Carlos Linces	17331371	

Requerimiento de claridad — N/A

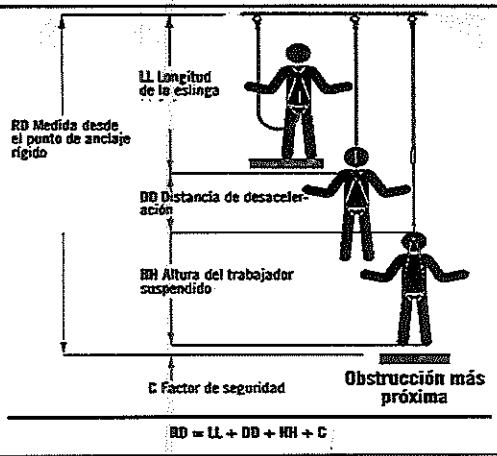

El requerimiento de claridad o espacio libre de caída: Es la distancia vertical requerida por un trabajador en caso de una caída, para evitar que impacte contra el suelo o contra un obstáculo y depende principalmente de la configuración del sistema de detención de caídas utilizado.

1. Longitud máxima de la eslinga (LL): 1.80 metros.
2. Distancia máxima de desaceleración (DD): 1.01 metros.
3. Altura del trabajador (HH): 3-65 metros.
4. Factor de seguridad (C): 1 metro.
5. Requerimiento de claridad: (RC = LL + DD + HH + C): 6-82 metros.
6. Medida desde el punto de anclaje rígido hasta la superficie: (RD = LL + DD + HH + C): 32-6 metros.

La distancia anclaje-obstáculo (Punto de choque) es mayor o igual a ladistancia libre de caída?	Si X No	Si la respuesta es NO, la configuración del sistema no es segura.

Si no existe suficiente distancia libre se pueden aplicar, entre otras, estás soluciones:

1- Elevar el punto de anclaje / 2- Disminuir la longitud del dispositivo / 3- Revisar la matriz de EPP y seleccionar un dispositivo que requiera poca distancia de frenado, no todos los absorvedores requieren la misma distancia.

4- Utilizar un retráctil, que requiera menor distancia de frenado. / 5- Consulta al coordinador de alturas del proyecto.

CONSORCIO AGUAS SANTAS 2025

Inspección Preoperacional de Arnes y anclajes

SST-F-088
FV:15/08/2025

Marque según el estado: B Buen estado o cumple con el requisito. M Mal estado o No cumple con el requisito

Mes	Mayo	Año	2026

1. Datos del Equipo y la Inspección

Elemento	Referencia	Marca	Fecha de Vigencia	Precinto	Ubicación
Arnes	707028	United	03-29	NA	Domo Planos
Eslinga	281	Sosecra	01-31	NA	Domo Planos

1.1 Equipo asignado a:

Nombre: Carlos Lince | Cargo: Soldador

Item a Inspeccionar	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Item a Inspeccionar	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
2. Documentación del Equipo															
Certificado Inspeccion Tecnica del Equipo	B	B	B	B	B	B	B	Ficha Tecnica del Arnes	B	B	B	B	B	B	B
3. Estado General del Equipo															
Elementos Blandos del Arnes y Linea de Vida (Correas - Ajustadores - Eslinga de Anclaje)															
Cintas sin Cortes	B	B	B	B	B	B	B	Cintas sin Quemaduras	B	B	B	B	B	B	B
Cintas Puntos Deshilachados	B	B	B	B	B	B	B	Cintas sin partes impregnadas de Quimicos	B	B	B	B	B	B	B
Cintas sin Abrasión	B	B	B	B	B	B	B	Etiquetas legibles	B	B	B	B	B	B	B
Cintas sin Partes Rotas	B	B	B	B	B	B	B								
Elementos Duros del Arnes y Linea de Vida (Anillos - Hebillas)															
Elementos duros sin Deformaciones	B	B	B	B	B	B	B	Elementos duros sin Bordes Cortantes	B	B	B	B	B	B	B
Elementos duros sin Grietas	B	B	B	B	B	B	B	Piezas Floja o Ausentes	B	B	B	B	B	B	B
Elementos duros sin Corrosión	B	B	B	B	B	B	B	Gancho de Seguridad	B	B	B	B	B	B	B

4. Observaciones:


Contratsta: Sanosol ingenieria y construcciones SAS

5. Personal Responsable de la Inspeccion

Responsable de la Inspección

Dia		Usuario del equipo de alturas	Cedula	Firma
Lunes	11	Carlos Lince	17321371	
Martes	12	Carlos Lince	17321371	
Miércoles	13	Carlos Lince	17321371	
Jueves	14	Carlos Lince	17321371	
Viernes	15	Carlos Lince	17321371	
Sábado	16	Carlos Lince	17321371	
Domingo	17	Carlos Lince	17321371	

Requerimiento de claridad

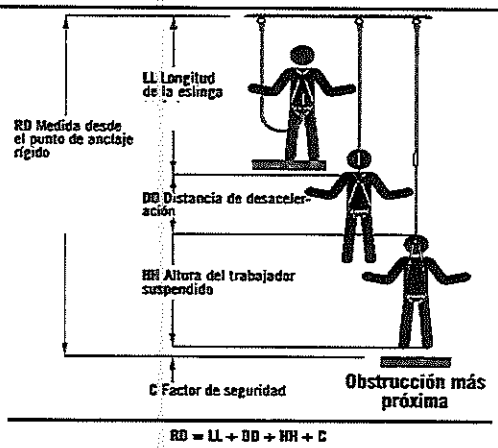

El requerimiento de claridad o espacio libre de caída: Es la distancia vertical requerida por un trabajador en caso de una caída, para evitar que impacte contra el suelo o contra un obstáculo y depende principalmente de la configuración del sistema de detención de caídas utilizado.

1. Longitud máxima de la eslinga (LL): 1.80 metros.
2. Distancia máxima de desaceleración (DD): 1.09 metros.
3. Altura del trabajador (HH): 1.65 metros.
4. Factor de seguridad (C): 1 metro.
5. Requerimiento de claridad: (RC = LL + DD + HH + C): 5.52 metros.
6. Medida desde el punto de anclaje rígido hasta la superficie: (RD = LL + DD + HH + C): 2.8 metros.

La distancia anclaje-obstáculo (Punto de choque) es mayor o igual a ladistancia libre de caída?	Si X No	Si la respuesta es NO, la configuración del sistema no es segura.

Si no existe suficiente distancia libre se pueden aplicar, entre otras, estás soluciones:

1- Elevar el punto de anclaje	2- Disminuir la longitud del dispositivo	3- Revisar la matriz de EPP y seleccionar un dispositivo que requiera poca distancia de frenado, no todos los absorvedores requieren la misma distancia.
4- Utilizar un retráctil, que requiera menor distancia de frenado.	5- Consulta al coordinador de alturas del proyecto.	

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

Inspección Preoperacional de Arnes y anclajes

SST-F-088
FV:15/08/2025

1980

Marque según el estado: B Buen estado o cumple con el requisito. M Mal estado o No cumple con el requisito

Mes	MARZO	Año	2026

1. Datos del Equipo y la Inspección

Elemento	Referencia	Marca	Fecha de Vigencia	Precinto	Ubicación
Arnes	107029	United	10-29	NA	DOMO PLANOS
Eslinga	284	Soreca	01-31	NA	DOMO PLANOS

1.1 Equipo asignado a:

Nombre: Carlos Lince | Cargo: Soldador

Item a Inspeccionar	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Item a Inspeccionar	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
2. Documentación del Equipo															
Certificado Inspeccion Tecnica del Equipo	B	B	B	B	B	B	B	Ficha Tecnica del Arnes	B	B	B	B	B	B	B
3. Estado General del Equipo															
Elementos Blandos del Arnes y Linea de Vida (Correas - Ajustadores - Eslinga de Anclaje)															
Cintas sin Cortes	B	B	B	B	B	B	B	Cintas sin Quemaduras	B	B	B	B	B	B	B
Cintas Puntos Deshilachados	B	B	B	B	B	B	B	Cintas sin partes impregnadas de Quimicos	B	B	B	B	B	B	B
Cintas sin Abrasión	B	B	B	B	B	B	B	Etiquetas legibles	B	B	B	B	B	B	B
Cintas sin Partes Rotas	B	B	B	B	B	B	B								
Elementos Duros del Arnes y Linea de Vida (Anillos - Hebillas)															
Elementos duros sin Deformaciones	B	B	B	B	B	B	B	Elementos duros sin Bordes Cortantes	B	B	B	B	B	B	B
Elementos duros sin Grietas	B	B	B	B	B	B	B	Piezas Floja o Ausentes	B	B	B	B	B	B	B
Elementos duros sin Corrosión	B	B	B	B	B	B	B	Gancho de Seguridad	B	B	B	B	B	B	B

4. Observaciones


Contratsta: Sanosol ingenieria y construcciones SAS

5. Personal Responsable de la Inspeccion

Responsable de la Inspección

Dia		Usuario del equipo de alturas	Cedula	Firma
Lunes	18	Carlos Lince	17 331 371	
Martes	19	Carlos Lince	17 331 371	
Miércoles	26	Carlos Lince	17 331 371	
Jueves	21	Carlos Lince	17 331 371	
Viernes	22	Carlos Lince	17 331 371	
Sábado	23	Carlos Lince	17 331 371	
Domingo	24	Carlos Lince	17 331 371	

Requerimiento de claridad | N/A

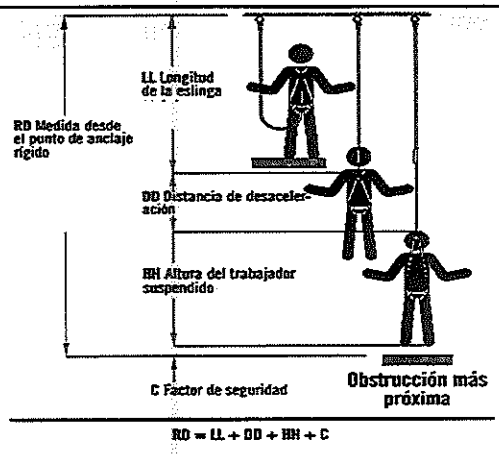

El requerimiento de claridad o espacio libre de caída: Es la distancia vertical requerida por un trabajador en caso de una caída, para evitar que impacte contra el suelo o contra un obstáculo y depende principalmente de la configuración del sistema de detención de caídas utilizado.

1. Longitud máxima de la eslinga (LL): 1.80 metros.
2. Distancia máxima de desaceleración (DD): 1.07 metros.
3. Altura del trabajador (HH): 1.68 metros.
4. Factor de seguridad (C): 1 metro.
5. Requerimiento de claridad: (RC = LL + DD + HH + C): 5.82 metros.
6. Medida desde el punto de anclaje rígido hasta la superficie: (RD = LL + DD + HH + C): 12-0 metros.

La distancia anclaje-obstáculo (Punto de choque) es mayor o igual a ladistancia libre de caída?	Si X No	Si la respuesta es NO, la configuración del sistema no es segura.

Si no existe suficiente distancia libre se pueden aplicar, entre otras, estás soluciones:

1- Elevar el punto de anclaje
2- Disminuir la longitud del dispositivo
3- Revisar la matriz de EPP y seleccionar un dispositivo que requiera poca distancia de frenado, no todos los absorvedores requieren la misma distancia.
4- Utilizar un retráctil, que requiera menor distancia de frenado.
5- Consulta al coordinador de alturas del proyecto.

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

Inspección Preoperacional de Arnes y anclajes

SST-F-088
FV:15/08/2025

1981

Marque según el estado: B Buen estado o cumple con el requisito. M Mal estado o No cumple con el requisito

Mes	MAYO	Año	2026

1. Datos del Equipo y la Inspeccion

Elemento	Referencia	Marca	Fecha de Vigencia	Precinto	Ubicación
Arnes	TC+ 026	Unitted	10-29	NA	CON PLANOS
Eslinga	281	Sojega	01-31	NA	CON PLANOS

1.1 Equipo asignado a:

Nombre: Carlos Lince | Cargo: Soldador

Item a Inspeccionar	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Item a Inspeccionar	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
2. Documentación del Equipo															
Certificado Inspeccion Tecnica del Equipo	B	B	B	B	B	B	B	Ficha Tecnica del Arnes	B	B	B	B	B	B	B
3. Estado General del Equipo															
Elementos Blandos del Arnes y Linea de Vida (Correas - Ajustadores - Eslinga de Anclaje)															
Cintas sin Cortes	B	B	B	B	B	B	B	Cintas sin Quemaduras	B	B	B	B	B	B	B
Cintas Puntos Deshilachados	B	B	B	B	B	B	B	Cintas sin partes impregnadas de Quimicos	B	B	B	B	B	B	B
Cintas sin Abrasión	B	B	B	B	B	B	B	Etiquetas legibles	B	B	B	B	B	B	B
Cintas sin Partes Rotas	B	B	B	B	B	B	B								
Elementos Duros del Arnes y Linea de Vida (Anillos - Hebillas)															
Elementos duros sin Deformaciones	B	B	B	B	B	B	B	Elementos duros sin Bordes Cortantes	B	B	B	B	B	B	B
Elementos duros sin Grietas	B	B	B	B	B	B	B	Piezas Floja o Ausentes	B	B	B	B	B	B	B
Elementos duros sin Corrosión	B	B	B	B	B	B	B	Gancho de Seguridad	B	B	B	B	B	B	B

4. Observaciones


Contratsta: Sanosol ingenieria y construcciones SAS

5. Personal Responsable de la Inspeccion

Responsable de la inspección

Dia		Usuario del equipo de alturas	Cedula	Firma
Lunes	25	Carlos Lince	17331371	
Martes	26	Carlos Lince	17331371	
Miércoles	27	Carlos Lince	17331371	
Jueves	28	Carlos Lince	17331371	
Viernes	29	Carlos Lince	17331371	
Sábado	30	Carlos Lince	17331371	
Domingo	31	Carlos Lince	17331371	

Requerimiento de claridad

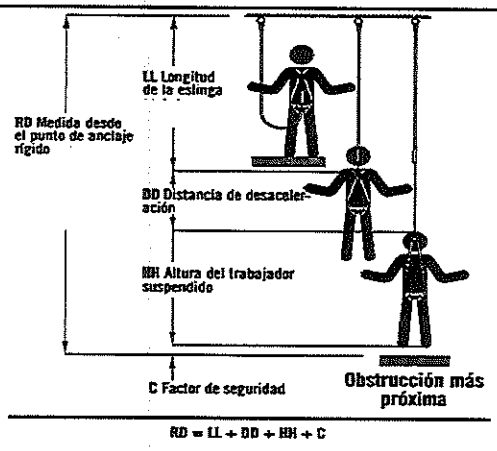

El requerimiento de claridad o espacio libre de caída: Es la distancia vertical requerida por un trabajador en caso de una caída, para evitar que impacte contra el suelo o contra un obstáculo y depende principalmente de la configuración del sistema de detención de caídas utilizado.

1. Longitud máxima de la eslinga (LL): 1.80 metros.
2. Distancia máxima de desaceleración (DD): 1.07 metros.
3. Altura del trabajador (HH): 1.65 metros.
4. Factor de seguridad (C): 1 metro.
5. Requerimiento de claridad: (RC = LL + DD + HH + C): 5.52 metros.
6. Medida desde el punto de anclaje rígido hasta la superficie: (RD = LL + DD + HH + C): 2.5 metros.

La distancia anclaje-obstáculo (Punto de choque) es mayor o igual a ladistancia libre de caída?	Si X No	Si la respuesta es NO, la configuración del sistema no es segura.

Si no existe suficiente distancia libre se pueden aplicar, entre otras, estás soluciones:

1- Elevar el punto de anclaje	2- Disminuir la longitud del dispositivo	3- Revisar la matriz de EPP y seleccionar un dispositivo que requiera poca distancia de frenado, no todos los absorvedores requieren la misma distancia.
4- Utilizar un retráctil, que requiera menor distancia de frenado.		5- Consulta al coordinador de alturas del proyecto.

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

Inspección Preoperacional de Arnes y anclajes

SST-F-088
FV:15/08/2025

1982

Marque según el estado: B Buen estado o cumple con el requisito. M Mal estado o No cumple con el requisito

Mes	MAYO	Año	2026

1. Datos del Equipo y la inspección

Elemento	Referencia	Marca	Fecha de Vigencia	Precinto	Ubicación
Arnes	106646	Miller	10-29	NA	TORRE PLANTA
Eslinga	262	Sala 594	01-31	NA	TORRE PLANTA

1.1 Equipo asignado a:

Nombre: AURÍS NEI SALGADO | Cargo: PINTOR

Item a Inspeccionar	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Item a Inspeccionar	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
2. Documentación del Equipo															
Certificado Inspeccion Tecnica del Equipo	B	B	B	B	B	B	B	Ficha Tecnica del Arnes	B	B	B	B	B	B	B
3. Estado General del Equipo															
Elementos Blandos del Arnes y Linea de Vida (Correas - Ajustadores - Eslinga de Anclaje)															
Cintas sin Cortes	B	B	B	B	B	B	B	Cintas sin Quemaduras	B	B	B	B	B	B	B
Cintas Puntos Deshilachados	B	B	B	B	B	B	B	Cintas sin partes impregnadas de Quimicos	B	B	B	B	B	B	B
Cintas sin Abrasión	B	B	B	B	B	B	B	Etiquetas legibles	B	B	B	B	B	B	B
Cintas sin Partes Rotas	B	B	B	B	B	B	B								
Elementos Duros del Arnes y Linea de Vida (Anillos - Hebillas)															
Elementos duros sin Deformaciones	B	B	B	B	B	B	B	Elementos duros sin Bordes Cortantes	B	B	B	B	B	B	B
Elementos duros sin Grietas	B	B	B	B	B	B	B	Piezas Floja o Ausentes	B	B	B	B	B	B	B
Elementos duros sin Corrosión	B	B	B	B	B	B	B	Gancho de Seguridad	B	B	B	B	B	B	B

4. Observaciones


Contratsta: Sanosol ingenieria y construcciones SAS

5. Personal Responsable de la Inspeccion

Responsable de la Inspección

Dia		Usuario del equipo de alturas	Cedula	Firma
Lunes	11	AURIS NEI SALGADO	1067867530	AURIS
Martes	12	AURIS NEI SALGADO	1067867530	AURIS
Miércoles	13	AURIS NEI SALGADO	1067867530	AURIS
Jueves	14	AURIS NEI SALGADO	1067867530	AURIS
Viernes	15	AURIS NEI SALGADO	1067867530	AURIS
Sábado	16	AURIS NEI SALGADO	1067867530	AURIS
Domingo	17	AURIS NEI SALGADO	1067867530	AURIS

Requerimiento de claridad N/A

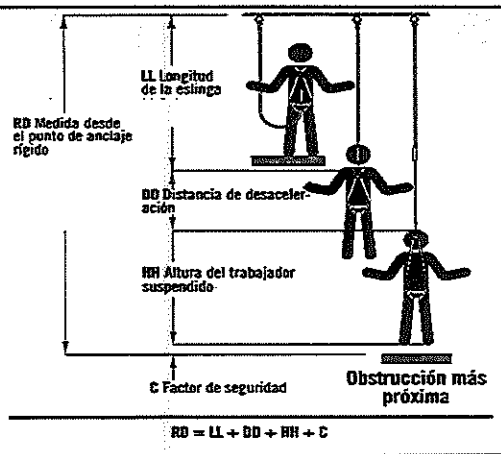

El requerimiento de claridad o espacio libre de caída: Es la distancia vertical requerida por un trabajador en caso de una caída, para evitar que impacte contra el suelo o contra un obstáculo y depende principalmente de la configuración del sistema de detención de caídas utilizado.

1. Longitud máxima de la eslinga (LL): 1.80 metros.
2. Distancia máxima de desaceleración (DD): 1.00 metros.
3. Altura del trabajador (HH): 1.62 metros.
4. Factor de seguridad (C): 1 metro.
5. Requerimiento de claridad:
   (RC = LL + DD + HH + C): 5.57 metros.
6. Medida desde el punto de anclaje rígido hasta la superficie:
   (RD = LL + DD + HH + C): 12.5 metros.

La distancia anclaje-obstáculo (Punto de choque) es mayor o igual a ladistancia libre de caída?	Si X No	Si la respuesta es NO, la configuración del sistema no es segura.

Si no existe suficiente distancia libre se pueden aplicar, entre otras, estás soluciones:

1- Elevar el punto de anclaje
2- Disminuir la longitud del dispositivo
3- Revisar la matriz de EPP y seleccionar un dispositivo que requiera poca distancia de frenado, no todos los absorvedores requieren la misma distancia.
4- Utilizar un retráctil, que requiera menor distancia de frenado.
5- Consulta al coordinador de alturas del proyecto.

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

Inspección Preoperacional de Arnes y anclajes

SST-F-088
FV:15/08/2025

1083

Marque según el estado: B Buen estado o cumple con el requisito. M Mal estado o No cumple con el requisito

Mes	Mayo	Año	2026

1. Datos del Equipo y la Inspeccion

Elemento	Referencia	Marca	Fecha de Vigencia	Precinto	Ubicación
Arnes	106646	Unitec	10-29	NA	Torre Planos
Eslinga	262	Doble Gancho	01-31	NA	Torre Planos

1.1 Equipo asignado a:

Nombre: Aun. Snei Salgado | Cargo: Pintor

Item a Inspeccionar	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Item a Inspeccionar	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
2. Documentación del Equipo															
Certificado Inspeccion Tecnica del Equipo	B	B	B	B	B	B	B	Ficha Tecnica del Arnes	B	B	B	B	B	B	B
3. Estado General del Equipo															
Elementos Blandos del Arnes y Linea de Vida (Correas - Ajustadores - Eslinga de Anclaje)															
Cintas sin Cortes	B	B	B	B	B	B	B	Cintas sin Quemaduras	B	B	B	B	B	B	B
Cintas Puntos Deshilachados	B	B	B	B	B	B	B	Cintas sin partes impregnadas de Químicos	B	B	B	B	B	B	B
Cintas sin Abrasión	B	B	B	B	B	B	B	Etiquetas legibles	B	B	B	B	B	B	B
Cintas sin Partes Rotas	B	B	B	B	B	B	B								
Elementos Duros del Arnes y Linea de Vida (Anillos - Hebillas)															
Elementos duros sin Deformaciones	B	B	B	B	B	B	B	Elementos duros sin Bordes Cortantes	B	B	B	B	B	B	B
Elementos duros sin Grietas	B	B	B	B	B	B	B	Piezas Floja o Ausentes	B	B	B	B	B	B	B
Elementos duros sin Corrosión	B	B	B	B	B	B	B	Gancho de Seguridad	B	B	B	B	B	B	B


4. Observaciones

Contratsta: Sanosol ingenieria y construcciones SAS

5. Personal Responsable de la Inspeccion

Dia		Responsable de la Inspección: Usuario del equipo de alturas	Cedula	Firma
Lunes	4	Aun. Snei Salgado	1067 867 530	Aun.
Martes	5	Aun. Snei Salgado	1067 867 530	Aun.
Miércoles	6	Aun. Snei Salgado	1067 867 530	Aun.
Jueves	7	Aun. Snei Salgado	1067 867 530	Aun.
Viernes	8	Aun. Snei Salgado	1067 867 530	Aun.
Sábado	9	Aun. Snei Salgado	1067 867 530	Aun.
Domingo	10	Aun. Snei Salgado	1067 867 530	Aun.

Requerimiento de claridad

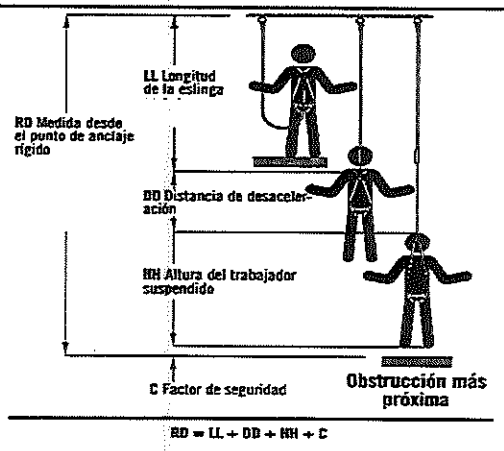

El requerimiento de claridad o espacio libre de caida: Es la distancia vertical requerida por un trabajador en caso de una caida, para evitar que impacte contra el suelo o contra un obstáculo y depende principalmente de la configuración del sistema de detención de caídas utilizado.

1. Longitud máxima de la eslinga (LL): 1.80 metros.
2. Distancia máxima de desaceleración (DD): 1.03 metros.
3. Altura del trabajador (HH): 1.65 metros.
4. Factor de seguridad (C): 1 metro.
5. Requerimiento de claridad:
   (RC = LL + DD + HH + C): 5.51 metros.
6. Medida desde el punto de anclaje rigido hasta la superficie:
   (RD = LL + DD + HH + C): 32.5 metros.

La distancia anclaje-obstáculo (Punto de choque) es mayor o igual a ladistancia libre de caída?	Si X No ___	Si la respuesta es NO, la configuración del sistema no es segura.

Si no existe suficiente distancia libre se pueden aplicar, entre otras, estás soluciones:

1- Elevar el punto de anclaje	2- Disminuir la longitud del dispositivo	3- Revisar la matriz de EPP y seleccionar un dispositivo que requiera poca distancia de frenado, no todos los absorvedores requieren la misma distancia.
4- Utilizar un retráctil, que requiera menor distancia de frenado.	5- Consulta al coordinador de alturas del proyecto.	

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

Inspección Preoperacional de Arnes y anclajes

SST-F-088
FV:15/08/2025

Marque según el estado: B Buen estado o cumple con el requisito. M Mal estado o No cumple con el requisito

Mes	MAYO	Año	2026

1. Datos del Equipo y la Inspección

Elemento	Referencia	Marca	Fecha de Vigencia	Precinto	Ubicación
Arnes	106646	United	10-29	NA	CORE PLANA
Eslinga	262	Soseqa	01-31	NA	CORE PLANA

1.1 Equipo asignado a:

Nombre: AUN.S NEI SAIGADO Cargo: PINTOR

Item a Inspeccionar	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Item a Inspeccionar	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
2. Documentación del Equipo															
Certificado Inspeccion Tecnica del Equipo	B	B	B	B	B	B	B	Ficha Tecnica del Arnes	B	B	B	B	B	B	B
3. Estado General del Equipo															
Elementos Blandos del Arnes y Linea de Vida (Correas - Ajustadores - Eslinga de Anclaje)															
Cintas sin Cortes	B	B	B	B	B	B	B	Cintas sin Quemaduras	B	B	B	B	B	B	B
Cintas Puntos Deshilachados	B	B	B	B	B	B	B	Cintas sin partes impregnadas de Quimicos	B	B	B	B	B	B	B
Cintas sin Abrasión	B	B	B	B	B	B	B	Etiquetas legibles	B	B	B	B	B	B	B
Cintas sin Partes Rotas	B	B	B	B	B	B	B								
Elementos Duros del Arnes y Linea de Vida (Anillos - Hebillas)															
Elementos duros sin Deformaciones	B	B	B	B	B	B	B	Elementos duros sin Bordes Cortantes	B	B	B	B	B	B	B
Elementos duros sin Grietas	B	B	B	B	B	B	B	Piezas Floja o Ausentes	B	B	B	B	B	B	B
Elementos duros sin Corrosión	B	B	B	B	B	B	B	Gancho de Seguridad	B	B	B	B	B	B	B

4. Observaciones


Contratsta: Sanosol ingenieria y construcciones SAS

5. Personal Responsable de la Inspeccion

Responsable de la Inspección

Dia		Usuario del equipo de alturas	Cedula	Firma
Lunes	25	AUN.S NEI SAIGADO	1067867530	AUN.S
Martes	26	AUN.S NEI SAIGADO	1067867530	AUN.S
Miércoles	27	AUN.S NEI SAIGADO	1067867530	AUN.S
Jueves	28	AUN.S NEI SAIGADO	1067867530	AUN.S
Viernes	29	AUN.S NEI SAIGADO	1067867530	AUN.S
Sábado	30	AUN.S NEI SAIGADO	1067867530	AUN.S
Domingo	31	AUN.S NEI SAIGADO	1067867530	AUN.S

Requerimiento de claridad N/A

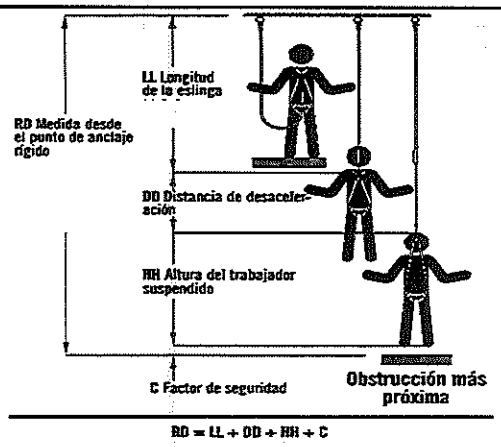

El requerimiento de claridad o espacio libre de caída: Es la distancia vertical requerida por un trabajador en caso de una caída, para evitar que impacte contra el suelo o contra un obstáculo y depende principalmente de la configuración del sistema de detención de caídas utilizado.

1. Longitud máxima de la eslinga (LL): 1.80 metros.
2. Distancia máxima de desaceleración (DD): 1.07 metros.
3. Altura del trabajador (HH): 1.65 metros.
4. Factor de seguridad (C): 1 metro.
5. Requerimiento de claridad: (RC = LL + DD + HH + C): 5.52 metros.
6. Medida desde el punto de anclaje rigido hasta la superficie: (RD = LL + DD + HH + C): 1.80 metros.

La distancia anclaje-obstáculo (Punto de choque) es mayor o igual a ladistancia libre de caída?	Si X No	Si la respuesta es NO, la configuración del sistema no es segura.

Si no existe suficiente distancia libre se pueden aplicar, entre otras, estás soluciones:

1- Elevar el punto de anclaje | 2- Disminuir la longitud del dispositivo | 3- Revisar la matriz de EPP y seleccionar un dispositivo que requiera poca distancia de frenado, no todos los absorvedores requieren la misma distancia.

4- Utilizar un retráctil, que requiera menor distancia de frenado. | 5- Consulta al coordinador de alturas del proyecto.

CONSORCIO AGUAS CAITAS 2025

Inspección Preoperacional de Arnes y anclajes

SST-F-088
FV:15/08/2025

1985

Marque según el estado: B Buen estado o cumple con el requisito. M Mal estado o No cumple con el requisito

Mes	Marzo	Año	2026

1. Datos del Equipo y la Inspección

Elemento	Referencia	Marca	Fecha de Vigencia	Precinto	Ubicación
Arnes	106696	United	10-26	NA	CORD PLAN
Eslinga	262	Sosega	01-31	NA	DOMO PLAN

1.1 Equipo asignado a:

Nombre: Aun.s nel salgado | Cargo: PINTOR

Item a Inspeccionar	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Item a Inspeccionar	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
2. Documentación del Equipo															
Certificado Inspeccion Tecnica del Equipo	B	B	B	B	B	B	B	Ficha Tecnica del Arnes	B	B	B	B	B	B	B
3. Estado General del Equipo															
Elementos Blandos del Arnes y Linea de Vida (Correas - Ajustadores - Eslinga de Anclaje)															
Cintas sin Cortes	B	B	B	B	B	B	B	Cintas sin Quemaduras	B	B	B	B	B	B	B
Cintas Puntos Deshilachados	B	B	B	B	B	B	B	Cintas sin partes impregnadas de Quimicos	B	B	B	B	B	B	B
Cintas sin Abrasión	B	B	B	B	B	B	B	Etiquetas legibles	B	B	B	B	B	B	B
Cintas sin Partes Rotas	B	B	B	B	B	B	B								
Elementos Duros del Arnes y Linea de Vida (Anillos - Hebillas)															
Elementos duros sin Deformaciones	B	B	B	B	B	B	B	Elementos duros sin Bordes Cortantes	B	B	B	B	B	B	B
Elementos duros sin Grietas	B	B	B	B	B	B	B	Piezas Floja o Ausentes	B	B	B	B	B	B	B
Elementos duros sin Corrosión	B	B	B	B	B	B	B	Gancho de Seguridad	B	B	B	B	B	B	B

4. Observaciones


Contratsta: Sanosol ingenieria y construcciones SAS

5. Personal Responsable de la Inspeccion

Responsable de la Inspección

Dia		Usuario del equipo de alturas	Cedula	Firma
Lunes	18	Aun.s nel salgado	1067 867 530	Aun.s
Martes	19	Aun.s nel salgado	1067 867 530	Aun.s
Miércoles	20	Aun.s nel salgado	1067 867 530	Aun.s
Jueves	21	Aun.s nel salgado	1067 867 530	Aun.s
Viernes	22	Aun.s nel salgado	1067 867 530	Aun.s
Sábado	23	Aun.s nel salgado	1067 867 530	Aun.s
Domingo	24	Aun.s nel salgado	1067 867 530	Aun.s

Requerimiento de claridad

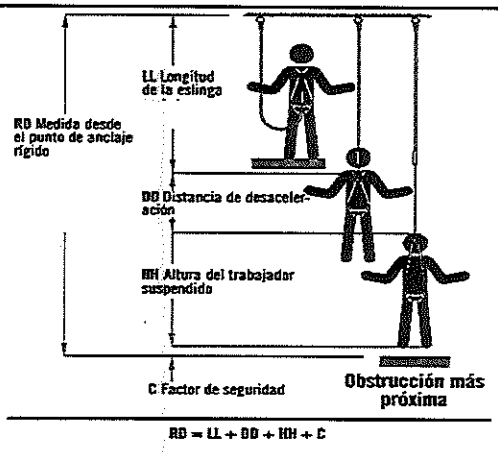

El requerimiento de claridad o espacio libre de caída: Es la distancia vertical requerida por un trabajador en caso de una caída, para evitar que impacte contra el suelo o contra un obstáculo y depende principalmente de la configuración del sistema de detención de caídas utilizado.

1. Longitud máxima de la eslinga (LL): 1.80 metros.
2. Distancia máxima de desaceleración (DD): 1.09 metros.
3. Altura del trabajador (HH): 1.65 metros.
4. Factor de seguridad (C): 1 metro.
5. Requerimiento de claridad:
   (RC = LL + DD + HH + C): 5.52 metros.
6. Medida desde el punto de anclaje rígido hasta la superficie:
   (RD = LL + DD + HH + C): 12-5 metros.

La distancia anclaje-obstáculo (Punto de choque) es mayor o igual a ladistancia libre de caída?	Si X No	Si la respuesta es NO, la configuración del sistema no es segura.

Si no existe suficiente distancia libre se pueden aplicar, entre otras, estás soluciones:

1- Elevar el punto de anclaje | 2- Disminuir la longitud del dispositivo | 3- Revisar la matriz de EPP y seleccionar un dispositivo que requiera poca distancia de frenado, no todos los absorvedores requieren la misma distancia.

4- Utilizar un retráctil, que requiera menor distancia de frenado. | 5- Consulta al coordinador de alturas del proyecto.

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS /LISTA DE CHEQUEO

CODIGO	SST-F-058		
VERSION	1		
FECHA	dic-25		
PAGINA	1 DE ____		

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS EN COMUNIDADES INDIGENAS DE PUERTO GAITÁN

FECHA DE INICIO DE LA TAREA: 4-5-26 — FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA TAREA: 30-5-26

PARTE No.1

TIEMPO ESTIMADO PARA REALIZAR EL TRABAJO	12 Horas	HORA INICIO	600 AM	HORA DE TERMINACION	600 PM
SUB-CONTRATISTA	SARSOL				
RESPONSABLE DEL FRENTE DE TRABAJO	GUILLERMO OSORIO	LOCALIZACION DEL TRABAJO A DESARROLLAR	DOMO PLANAS		
EL O LOS TRABAJADORES AUTORIZADOS SON APTOS MEDICAMENTE PARA TRABAJO EN ALTURAS	X	NO		SE HAN VERIFICADO LAS EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES DE APTITUD PARA TRABAJO EN ALTURAS	SI — NO
DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA A REALIZAR	MONTAJE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA TANQUE ELEVADO				
ALTURA APROXIMADA A LA CUAL SE VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD	15 METROS	REVISION DISTANCIA PARA REQUERIMIENTO DE CLARIDAD, SI APLICA	SI — NO		
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR	ANDAMIO- EQUIPO DE SOLDADURA- PULIDORA - PINTURA HTA MENOR				
AFILIACION Y PAGO VIGENTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	ARL X	EPS X	AFP X		
NUMERO DE PERSONAS A DESARROLLAR LA TAREA			ANEXO LISTADO ____	VER PAGINA No.	

PARTE No.2 — IDENTIFICACION DE PELIGROS Y RIESGOS ASOCIADOS.

FENOMENOS NATURALES	FISICO	CONDICIONES DE SEGURIDAD	QUIMICO	BIOMECANICO	PSICOSOCIAL	BIOLOGICO
SISMO X	RUIDO X	MECANICO X	POLVOS X	POSTURA X	ORGANIZACION DEL TRABAJO X	VIRUS X
TERREMOTO X	ILUMINACION X	ELECTRICO X	FIBRAS X	ESFUERZO X	GRUPO DE TRABAJO X	BACTERIAS X
VENDAVAL X	VIBRACIONES X	LOCATIVO X	MAT. PARTICULADO X	MOV REPETITIVOS X	CONDICIONES DE LA TAREA X	HONGOS X
DERRUMBE X	TEMPERATURAS X	TECNOLÓGICO X	GASES Y VAPORES X	M. MANUAL DE CARGAS X	INTERFACE PERSONA TAREA X	RIKETSIAS X
PRECIPITACIONES X	RAD. IONIZANTES X	ACCIDENTES DE TRANSITO X	LIQUIDOS X		JORNADA DE TRABAJO X	PARASITOS X
	RAD. NO IONIZANTES X	PÚBLICOS X	HUMUS MET. Y NO MET. X		GESTION OGANIZACIONAL X	PICADURAS X
	PRES. ATMOSFERICA	TRABAJO EN ALTURAS X				MORDEDURAS X
		ESPACIOS CONFINADOS				FLUIDOS O EXCREMENTOS

OTROS/ESPECIFIQUE

PARTE No.3 — MEDIDAS DE PREVENCION PARA TRABAJO EN ALTURAS

SEMANA DEL 4 AL 10 DE 26

ASPECTOS A VERIFICAR	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	OBS.
El trabajador (es) estan certificado (s) para el trabajo seguro en alturas de acuerdo al nivel de capacitación según la normatividad vigente.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Esta delimitada el area de acuerdo a la tarea a realizar, teniendo en cuenta la caída de objetos	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Se ha instalado la linea de advertencia de acuerdo a la tarea a realizar.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Se ha colocado la señalización de advertencia requerida como: Uso obligatorio de los equipos contra caídas, Precaución vacio o hueco, Izaje de cargas, Caida de objetos, Cinta de señalización (PELIGRO NO PASE", Excavación profunda, Riesgo eléctrico, Uso de los Elementos de Protección Personal, Salida, Ruta de evacuación y otros.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Se han instalado las barandas como medida colectiva de prevención en el area de trabajo de acuerdo al Programa de Protección Contra Caídas	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Se hace control de acceso al personal de obra mediante;	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Se han tapado todos los orificios, vacios, huecos, ductos y foso del ascensor con una resistencia de dos veces la carga prevista, o en su defecto se han señalizado o demarcado.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Se cuenta con el ayudante u oficial de seguridad para trabajo en alturas y ejecuta las tareas asignadas.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Los andamios y tablones que se utilizan para trabajo en alturas están en buen estado.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Los trabajadores recibieron inducción de Seguridad y Salud en el Trabajo, charlas de seguridad, capaitación haciendo enfasis en los procedimientos de trabajo seguro para trabajo en alturas.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Se mantiene la distancia minima de 5.0 metros a las lineas o redes electricas de media y alta tensión por parte de los trabajadores para trabajos en andamios, estructuras e izaje de cargas.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Se observa iluminación para trabajo en alturas en labores nocturnas, sotanos o caisson, lo cual permite la visualización de huecos, vacios, ductos, foso del ascensor, escaleras y salidas del area de trabajo.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Se observa sistema de ventilacion artificial para labores en espacios confinados, ductos, caisson, sotanos o fosos.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Se realizan mediciones de atmosferas peligrosas en espacios confinados, ductos, caisson, sotanos o fosos.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Se aplican los procedimientos de trabajo seguro para trabajo en alturas de acuerdo al manual, para armadura o cimbra, descimbrado en vigas-placas, columnas y muros.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	

PARTE No.4 — VERIFICACION DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION

EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS A UTILIZAR: X X X X X X X

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL A UTILIZAR: X X X X X X X

												OBSERVACIONES
MECANISMO DE ANCLAJE		ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR DE CHOQUE	SI	ARNES DE CUERPO COMPLETO	SI	CASCO CON BARBUQUEJO	SI	PROTECCION AUDITIVA	SI			
PUNTOS DE ANCLAJE		ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	SI	LINEA DE VIDA VERTICAL		ROPA DE TRABAJO - ROPA DE INVIERNO	SI	PROTECCION VISUAL	SI			
ESLINGA PARA DETENCION DE CAIDAS CORRIENTE		ESLINGA PARA RESTRICCION DE CAIDAS		LINEA DE VIDA HORIZONTAL		BOTAS DE SEGURIDAD	SI	PROTECCION RESPIRATORIA	SI			
MOSQUETONES		FRENOS		RED DE SEGURIDAD		GUANTES	SI	CHALECO REFLECTIVO				
PLAN DE RESCATE		EQUIPOS PARA RESCATE								BRIGADA DE EMERGENCIA		

	L	M	M	J	V	S	D
SE HA INSTALADO Y SE VERIFICAN LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LA MALLA ESCOMBRERA PARA CAIDA DE OBJETOS							
SE HA INSTALADO Y SE VERIFICAN LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LA RED DE SEGURIDAD PARA CAIDA DE PERSONAS							
Se revisan los Equipos de Protección Contra Caídas antes de cada uso por parte del trabajador.	X	X	X	X	X	X	X

PARTE No.5 — SISTEMA DE ACCESO

ESCALERAS		ESCALERAS DE GATO O MANUALES		ESCALERAS EN TABLON CON BARANDAS		REVISION VISUAL		BUEN ESTADO	SI — NO — N/A
ANDAMIO CON ESCALERA INTERNA		ELEVADOR		ANDAMIO DE CARGA O COLGANTE		REVISION VISUAL O INSPECCIÓN TECNICA		BUEN ESTADO	SI — NO — N/A
OTRO SISTEMA DE ACCESO: ANDAMIO						REVISION VISUAL O INSPECCIÓN TECNICA	SI	BUEN ESTADO	SI — NO — N/A
OTRO SISTEMA DE ACCESO:						REVISION VISUAL O INSPECCIÓN TECNICA		BUEN ESTADO	SI — NO — N/A

PARTE No.6

OBSERVACIONES GENERALES:

PARTE No.7

AUTORIZACION, REVISION Y VERIFICACION, PERMISO SUSPENDIDO.

PERMISO AUTORIZADO POR (DIRECTOR Y/O RESIDENTE DE OBRA/JEFE DE AREA)

NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CEDULA	CARGO	FIRMA
GUILLERMO ALBERTO OSORIO VARGAS	1121834340	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA 1	

RESPONSABLE DEL FRENTE OBRA (MAESTRO Y/O ENCARGADO)

NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CEDULA	CARGO	FIRMA
GUILLERMO ALBERTO OSORIO VARGAS	1121834340	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA 1	

PERMISO REVISADO Y VERIFICADO POR (RESIDENTE, INSPECTOR Y/O SUPERVISOR DE S&S-T) COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS

NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CEDULA	CARGO	FIRMA
JESÚS EVELIO VILLAMIZAR BOTIA	1090453178	COORDINADOR TRABAJO EN ALTURAS	

PERMISO SUSPENDIDO O TAREA DETENIDA	FECHA:	HORA:	SE REQUIERE RENOVACION DEL PERMISO PARA TERMINAR LA TAREA	SI	NO

NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CEDULA	CARGO	FIRMA

TRABAJADOR AUTORIZADO	No. DE CEDULA	CARGO	FIRMA

SE REPORTA POR PARTE DE ALGUN TRABAJADOR LA CONDICIÓN DE SALUD QUE LE IMPIDA EL TRABAJO EN ALTURAS	SI	NO	CUAL

NOTA LA (S) PERSONA (S) FIRMANTE (S) CONFIRMAN QUE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD HAN SIDO INSPECCIONADAS Y EL PORTADOR DEL PERMISO (EJECUTANTE) ES RESPONSABLE POR CONOCER Y APLICAR LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO Y LAS MEDIDAS DE PREVENCION Y PROTECCION PERTINENTES PARA EL DESARROLLO DE ESTE TIPO DE ACTIVIDAD O TAREA.

FIRMAS DEL PERSONAL AUTORIZADO PAGINA ___ DE ___

FECHA	No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ACTIVIDAD /TAREA	No. EPCC	Me encuentro en condiciones optimas de salud para realizar la labor		Inspeccioné el equipo contra caídas antes de iniciar la labor		FIRMA
LUNES	1	Carlos Linea	Soldador		X SI	NO	X SI	NO	
	2	JOHNS NELSON SALGADO	PINTOR		X SI	NO	X SI	NO	AUR.S.
	3	JESUS VILLAMIZAR	SOLDADOR		X SI	NO	X SI	NO	JESUS
	4				SI	NO	SI	NO	
	5				SI	NO	SI	NO	

FECHA	No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ACTIVIDAD /TAREA	No. EPCC	Me encuentro en condiciones optimas de salud para realizar la labor		Inspeccioné el equipo contra caídas antes de iniciar la labor		FIRMA
MARTES	1	JESUS VILLAMIZAR	SOLDADOR		X SI	NO	X SI	NO	JESU
	2	Carlos Linea	Soldador		X SI	NO	X SI	NO	
	3	AURI NELSAIGA	PINTOR		X SI	NO	X SI	NO	AUR.S
	4				SI	NO	SI	NO	
	5				SI	NO	SI	NO	

FECHA	No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ACTIVIDAD /TAREA	No. EPCC	Me encuentro en condiciones optimas de salud para realizar la labor		Inspeccioné el equipo contra caídas antes de iniciar la labor		FIRMA
MIERCOLES	1	JESUS VILLAMIZAR	JESUS VI		X SI	NO	X SI	NO	JESUS
	2				SI	NO	SI	NO	
	3	Carlos Linea	Soldador		X SI	NO	X SI	NO	
	4	AURI NELSAIGADO	PINTOR		X SI	NO	X SI	NO	AUR.S
	5				SI	NO	SI	NO	

FECHA	No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ACTIVIDAD /TAREA	No. EPCC	Me encuentro en condiciones optimas de salud para realizar la labor		Inspeccioné el equipo contra caídas antes de iniciar la labor		FIRMA
JUEVES	1	JESUS VILLAMIZAR	SOLDADOR		X SI	NO	X SI	NO	JESU
	2				SI	NO	SI	NO	
	3				SI	NO	SI	NO	
	4	AURI NELSAIGADO	PINTOR		X SI	NO	X SI	NO	AUR.S
	5	Carlos Linea	Soldador		X SI	NO	X SI	NO	

FECHA	No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ACTIVIDAD /TAREA	No. EPCC	Me encuentro en condiciones optimas de salud para realizar la labor		Inspeccioné el equipo contra caídas antes de iniciar la labor		FIRMA
VIERNES	1	JESU VILLAMIZA	SOLDADOR		X SI	NO	X SI	NO	JESU
	2				SI	NO	SI	NO	
	3				SI	NO	SI	NO	
	4	Carlos Linea	Soldador		X SI	NO	X SI	NO	
	5	AURI NELSAIGADO	PINTOR		X SI	NO	X SI	NO	AUR.

FECHA	No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ACTIVIDAD /TAREA	No. EPCC	Me encuentro en condiciones optimas de salud para realizar la labor		Inspeccioné el equipo contra caídas antes de iniciar la labor		FIRMA
SABADO	1	JESUS VILLAMIZAR	SOLDADOR		X SI	NO	X SI	NO	JESU
	2	Carlos Linea	Soldador		X SI	NO	X SI	NO	
	3	AURIS NELSAIGADO	PINTOR		X SI	NO	X SI	NO	AUR.
	4				SI	NO	SI	NO	
	5				SI	NO	SI	NO	

FECHA	No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ACTIVIDAD /TAREA	No. EPCC	Me encuentro en condiciones optimas de salud para realizar la labor		Inspeccioné el equipo contra caídas antes de iniciar la labor		FIRMA
DOMINGO	1	JESU VILLAMIZA	SOLDADO		X SI	NO	X SI	NO	JESU
	2				SI	NO	SI	NO	
	3	Carlos Linea	Soldador		X SI	NO	X SI	NO	
	4	ROBINSON SALGADO	PINTOR		X SI	NO	X SI	NO	AUR.S
	5				SI	NO	SI	NO	

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS /LISTA DE CHEQUEO

CODIGO	SST-F-026
VERSION	1
FECHA	dic-25
PAGINA	1 DE ____

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS EN COMUNIDADES INDIGENAS DE PUERTO GAITÁN

11988

PARTE No.1

FECHA DE INICIO DE LA TAREA	11-5-26	FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA TAREA	14-5-26		
TIEMPO ESTIMADO PARA REALIZAR EL TRABAJO	12 HORAS	HORA INICIO	7:00 Am	HORA DE TERMINACION	6:00 pm
SUB-CONTRATISTA	SANOSOL				
RESPONSABLE DEL FRENTE DE TRABAJO	GUILLERMO OSORIO	LOCALIZACION DEL TRABAJO A DESARROLLAR	PUERTO GAITAN		
EL O LOS TRABAJADORES AUTORIZADOS SON APTOS MEDICAMENTE PARA TRABAJO EN ALTURAS	SI	NO	SE HAN VERIFICADO LAS EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES DE APTITUD PARA TRABAJO EN ALTURAS	SI	NO
DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA A REALIZAR	MONTAJE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TANQUE ELEVADO.				
ALTURA APROXIMADA A LA CUAL SE VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD	17 METROS	REVISION DISTANCIA PARA REQUERIMIENTO DE CLARIDAD, SI APLICA		SI	NO
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR	Andamios Pulidora - Equipo soldadura, Planta, Herra				
AFILIACION Y PAGO VIGENTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	ARL X	EPS X	AFP X		
NUMERO DE PERSONAS A DESARROLLAR LA TAREA		ANEXO LISTADO	VER PAGINA No.		

PARTE No.2 — IDENTIFICACION DE PELIGROS Y RIESGOS ASOCIADOS.

FENOMENOS NATURALES	FISICO	CONDICIONES DE SEGURIDAD	QUIMICO	BIOMECANICO	PSICOSOCIAL	BIOLOGICO
SISMO X	RUIDO X	MECANICO X	POLVOS X	POSTURA X	ORGANIZACION DEL TRABAJO X	VIRUS X
TERREMOTO X	ILUMINACION X	ELECTRICO X	FIBRAS X	ESFUERZO X	GRUPO DE TRABAJO X	BACTERIAS X
VENDAVAL X	VIBRACIONES X	LOCATIVO X	MAT. PARTICULADO X	MOV REPETITIVOS X	CONDICIONES DE LA TAREA X	HONGOS X
DERRUMBE X	TEMPERATURAS X	TECNOLÓGICO X	GASES Y VAPORES X	M. MANUAL DE CARGAS X	INTERFACE PERSONA TAREA X	RIKETSIAS X
PRECIPITACIONES X	RAD. IONIZANTES X	ACCIDENTES DE TRANSITO X	LIQUIDOS X		JORNADA DE TRABAJO X	PARASITOS X
	RAD. NO IONIZANTES X	PÚBLICOS X	HUMUS MET. Y NO MET. X		GESTION OGANIZACIONAL X	PICADURAS X
	PRES. ATMOSFERICA	TRABAJO EN ALTURAS X				MORDEDURAS X
		ESPACIOS CONFINADOS				FLUIDOS O EXCREMENTOS

OTROS/ESPECIFIQUE

PARTE No.3 — MEDIDAS DE PREVENCION PARA TRABAJO EN ALTURAS

SEMANA DEL 8 AL 17 DE MAYO

ASPECTOS A VERIFICAR	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	OBS.
El trabajador (es) estan certificado (s) para el trabajo seguro en alturas de acuerdo al nivel de capacitación según la normatividad vigente.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Esta delimitada el area de acuerdo a la tarea a realizar, teniendo en cuenta la caida de objetos	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Se ha instalado la linea de advertencia de acuerdo a la tarea a realizar.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Se ha colocado la señalización de advertencia requerida como: Uso obligatorio de los equipos contra caídas, Precaución vacio o hueco, Izaje de cargas, Caida de objetos, Cinta de señalización (PELIGRO NO PASE", Excavación profunda, Riesgo eléctrico, Uso de los Elementos de Protección Personal, Salida, Ruta de evacuación y otros.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Se han instalado las barandas como medida colectiva de prevención en el area de trabajo de acuerdo al Programa de Protección Contra Caídas	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Se hace control de acceso al personal de obra mediante;	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Se han tapado todos los orificios, vacios, huecos, ductos y foso del ascensor con una resistencia de dos veces la carga prevista, o en su defecto se han señalizado o demarcado.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Se cuenta con el ayudante u oficial de seguridad para trabajo en alturas y ejecuta las tareas asignadas.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Los andamios y tablones que se utilizan para trabajo en alturas están en buen estado.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Los trabajadores recibieron inducción de Seguridad y Salud en el Trabajo, charlas de seguridad, capaitación haciendo enfasis en los procedimientos de trabajo seguro para trabajo en alturas.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Se mantiene la distancia minima de 5.0 metros a las lineas o redes electricas de media y alta tensión por parte de los trabajadores para trabajos en andamios, estructuras e izaje de cargas.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Se observa iluminación para trabajo en alturas en labores nocturnas, sotanos o caisson, lo cual permite la visualización de huecos, vacios, ductos, foso del ascensor, escaleras y salidas del area de trabajo.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Se observa sistema de ventilacion artificial para labores en espacios confinados, ductos, caisson, sotanos o fosos.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Se realizan mediciones de atmosferas peligrosas en espacios confinados, ductos, caisson, sotanos o fosos.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Se aplican los procedimientos de trabajo seguro para trabajo en alturas de acuerdo al manual, para armadura o cimbra, descimbrado en vigas-placas, columnas y muros.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	

PARTE No.4 — VERIFICACION DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION

EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS A UTILIZAR: L M M J V S D

						ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL A UTILIZAR			OBSERVACIONES
MECANISMO DE ANCLAJE		ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR DE CHOQUE	SI	ARNES DE CUERPO COMPLETO	SI	CASCO CON BARBUQUEJO	SI	PROTECCION AUDITIVA	SI	
PUNTOS DE ANCLAJE		ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	SI	LINEA DE VIDA VERTICAL		ROPA DE TRABAJO - ROPA DE INVIERNO	SI	PROTECCION VISUAL	SI	
ESLINGA PARA DETENCION DE CAIDAS CORRIENTE		ESLINGA PARA RESTRICCION DE CAIDAS		LINEA DE VIDA HORIZONTAL		BOTAS DE SEGURIDAD	SI	PROTECCION RESPIRATORIA	SI	
MOSQUETONES		FRENOS		RED DE SEGURIDAD		GUANTES	SI	CHALECO REFLECTIVO		
PLAN DE RESCATE		EQUIPOS PARA RESCATE						BRIGADA DE EMERGENCIA		

SE HA INSTALADO Y SE VERIFICAN LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LA MALLA ESCOMBRERA PARA CAIDA DE OBJETOS	L		M		M		J		V		S		D	
SE HA INSTALADO Y SE VERIFICAN LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LA RED DE SEGURIDAD PARA CAIDA DE PERSONAS	L		M		M		J		V		S		D	
Se revisan los Equipos de Protección Contra Caidas antes de cada uso por parte del trabajador.	L	X	M	X	M	X	J	X	V	X	S	X	D	X

PARTE No.5 — SISTEMA DE ACCESO

ESCALERAS		ESCALERAS DE GATO O MANUALES		ESCALERAS EN TABLON CON BARANDAS		REVISION VISUAL		BUEN ESTADO	SI	NO	N/A
ANDAMIO CON ESCALERA INTERNA		ELEVADOR		ANDAMIO DE CARGA O COLGANTE		REVISION VISUAL O INSPECCIÓN TECNICA		BUEN ESTADO	SI	NO	N/A
OTRO SISTEMA DE ACCESO: ANDAMIO						REVISION VISUAL O INSPECCIÓN TECNICA	X	BUEN ESTADO	X	NO	N/A
OTRO SISTEMA DE ACCESO:						REVISION VISUAL O INSPECCIÓN TECNICA		BUEN ESTADO	SI	NO	N/A

PARTE No.6

OBSERVACIONES GENERALES:

PARTE No.7 — AUTORIZACION, REVISION Y VERIFICACION, PERMISO SUSPENDIDO.

PERMISO AUTORIZADO POR (DIRECTOR Y/O RESIDENTE DE OBRA/JEFE DE AREA)

NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CEDULA	CARGO	FIRMA
GUILLERMO ALBERTO OSORIO VARGAS	1121834340	INGENEIRO RESIDENTE DE OBRA 1	

RESPONSABLE DEL FRENTE OBRA (MAESTRO Y/O ENCARGADO)

NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CEDULA	CARGO	FIRMA
GUILLERMO ALBERTO OSORIO VARGAS	1121834340	INGENEIRO RESIDENTE DE OBRA 1	

PERMISO REVISADO Y VERIFICADO POR (RESIDENTE, INSPECTOR Y/O SUPERVISOR DE S&S-T) COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS

NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CEDULA	CARGO	FIRMA
JESÚS EVELIO VILLAMIZAR BOTIA	1090453178	COORDINADOR TRABAJO EN ALTURAS	

PERMISO SUSPENDIDO O TAREA DETENIDA	FECHA:	HORA:	SE REQUIERE RENOVACION DEL PERMISO PARA TERMINAR LA TAREA	SI	NO

NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CEDULA	CARGO	FIRMA

TRABAJADOR AUTORIZADO	No. DE CEDULA	CARGO	FIRMA

SE REPORTA POR PARTE DE ALGUN TRABAJADOR LA CONDICIÓN DE SALUD QUE LE IMPIDA EL TRABAJO EN ALTURAS	SI	NO	CUAL

NOTA LA (S) PERSONA (S) FIRMANTE (S) CONFIRMAN QUE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD HAN SIDO INSPECCIONADAS Y EL PORTADOR DEL PERMISO (EJECUTANTE) ES RESPONSABLE POR CONOCER Y APLICAR LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO Y LAS MEDIDAS DE PREVENCION Y PROTECCION PERTINENTES PARA EL DESARROLLO DE ESTE TIPO DE ACTIVIDAD O TAREA.

FIRMAS DEL PERSONAL AUTORIZADO — PAGINA ___ DE ___

FECHA	No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ACTIVIDAD /TAREA	No. EPCC	Me encuentro en condiciones optimas de salud para realizar la labor		Inspeccioné el equipo contra caídas antes de iniciar la labor		FIRMA
LUNES	1				SI	NO	SI	NO	
	2	AURIS NELSALGADO	PINTOR		SI	NO	SI	NO	
	3	LUIS MIGUEL CONTRERAS	AYUDANTE		SI	NO	SI	NO	
	4	JOSE J C S	AYUDANTE		SI	NO	SI	NO	
	5	CARLOS LINEA	SOLDADOR		SI	NO	SI	NO	
FECHA	No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ACTIVIDAD /TAREA	No. EPCC	Me encuentro en condiciones optimas de salud para realizar la labor		Inspeccioné el equipo contra caídas antes de iniciar la labor		FIRMA
MARTES	1	AURIS NELSALGADO	PINTOR		SI	NO	SI	NO	
	2	CARLOS LINEA	SOLDADOR		SI	NO	SI	NO	
	3	JOSE J C S	AYUDANTE		SI	NO	SI	NO	
	4	LUIS MIGUEL CONTRERAS	AYUDANTE		SI	NO	SI	NO	
	5				SI	NO	SI	NO	
FECHA	No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ACTIVIDAD /TAREA	No. EPCC	Me encuentro en condiciones optimas de salud para realizar la labor		Inspeccioné el equipo contra caídas antes de iniciar la labor		FIRMA
MIERCOLES	1	CARLOS LINEA	SOLDADOR		SI	NO	SI	NO	
	2	JOSE J C S	AYUDANTE		SI	NO	SI	NO	
	3	LUIS MIGUEL CONTRERAS	AYUDANTE		SI	NO	SI	NO	
	4	AURIS NELSALGADO	PINTOR		SI	NO	SI	NO	
	5				SI	NO	SI	NO	
FECHA	No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ACTIVIDAD /TAREA	No. EPCC	Me encuentro en condiciones optimas de salud para realizar la labor		Inspeccioné el equipo contra caídas antes de iniciar la labor		FIRMA
JUEVES	1				SI	NO	SI	NO	
	2	LUIS MIGUEL CONTRERAS	AYUDANTE		SI	NO	SI	NO	
	3	CARLOS LINEA	SOLDADOR		SI	NO	SI	NO	
	4	JOSE J C S	AYUDANTE		SI	NO	SI	NO	
	5	AURIS NELSALGADO	PINTOR		SI	NO	SI	NO	
FECHA	No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ACTIVIDAD /TAREA	No. EPCC	Me encuentro en condiciones optimas de salud para realizar la labor		Inspeccioné el equipo contra caídas antes de iniciar la labor		FIRMA
VIERNES	1				SI	NO	SI	NO	
	2	JOSE J C S	AYUDANTE		SI	NO	SI	NO	
	3	CARLOS LINEA	SOLDADOR		SI	NO	SI	NO	
	4	LUIS MIGUEL CONTRERAS	AYUDANTE		SI	NO	SI	NO	
	5	AURIS NELSALGADO	PINTOR		SI	NO	SI	NO	
FECHA	No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ACTIVIDAD /TAREA	No. EPCC	Me encuentro en condiciones optimas de salud para realizar la labor		Inspeccioné el equipo contra caídas antes de iniciar la labor		FIRMA
SABADO	1	AURIS NELSALGADO	PINTOR		SI	NO	SI	NO	
	2	LUIS MIGUEL CONTRERAS	AYUDANTE		SI	NO	SI	NO	
	3	JOSE J C S	AYUDANTE		SI	NO	SI	NO	
	4	CARLOS LINEA	SOLDADOR		SI	NO	SI	NO	
	5				SI	NO	SI	NO	
FECHA	No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ACTIVIDAD /TAREA	No. EPCC	Me encuentro en condiciones optimas de salud para realizar la labor		Inspeccioné el equipo contra caídas antes de iniciar la labor		FIRMA
DOMINGO	1				SI	NO	SI	NO	
	2	CARLOS LINEA	SOLDADOR		SI	NO	SI	NO	
	3	JOSE J C S	AYUDANTE		SI	NO	SI	NO	
	4	LUIS MIGUEL CONTRERAS	AYUDANTE		SI	NO	SI	NO	
	5	AURIS NELSALGADO	PINTOR		SI	NO	SI	NO	

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS / LISTA DE CHEQUEO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS EN COMUNIDADES INDIGENAS DE PUERTO GAITÁN		VERSION	1
FECHA DE INICIO DE LA TAREA: 19-5-26	FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA TAREA: 29-5-26	FECHA	dic-25
		PAGINA	1 DE ___

PARTE No.1

TIEMPO ESTIMADO PARA REALIZAR EL TRABAJO	12 HORAS	HORA INICIO	6:00 AM	HORA DE TERMINACION	6:00 PM
SUB-CONTRATISTA	SANTOROI				
RESPONSABLE DEL FRENTE DE TRABAJO	GUILLERMO OSORIO	LOCALIZACION DEL TRABAJO A DESARROLLAR	SOMB PLANAS		
EL O LOS TRABAJADORES AUTORIZADOS SON APTOS MEDICAMENTE PARA TRABAJO EN ALTURAS	SI	NO		SE HAN VERIFICADO LAS EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES DE APTITUD PARA TRABAJO EN ALTURAS	SI / NO
DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA A REALIZAR	MONTAJE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA TANQUE ELEVADO				
ALTURA APROXIMADA A LA CUAL SE VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD	15 METROS	REVISION DISTANCIA PARA REQUERIMIENTO DE CLARIDAD, SI APLICA	SI / NO		
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR	ANDAMIO - ESCUADRA - SOLDADORA - POLIPASTO - PLANTA - HTA MANUAL				
AFILIACION Y PAGO VIGENTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	ARL [X]	EPS [X]	AFP [X]		
NUMERO DE PERSONAS A DESARROLLAR LA TAREA				ANEXO LISTADO [ ]	VER PAGINA No.

PARTE No.2 — IDENTIFICACION DE PELIGROS Y RIESGOS ASOCIADOS.

FENOMENOS NATURALES	FISICO	CONDICIONES DE SEGURIDAD	QUIMICO	BIOMECANICO	PSICOSOCIAL	BIOLOGICO
SISMO [X]	RUIDO [X]	MECANICO [X]	POLVOS [X]	POSTURA [X]	ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO [X]	VIRUS [X]
TERREMOTO [X]	ILUMINACION [X]	ELECTRICO [X]	FIBRAS [X]	ESFUERZO [X]	GRUPO DE TRABAJO [X]	BACTERIAS [X]
VENDAVAL [X]	VIBRACIONES [X]	LOCATIVO [X]	MAT. PARTICULADO [X]	MOV REPETITIVOS [X]	CONDICIONES DE LA TAREA [X]	HONGOS [X]
DERRUMBE [X]	TEMPERATURAS [X]	TECNOLOGICO [X]	GASES Y VAPORES [X]	M. MANUAL DE CARGAS [X]	INTERFACE PERSONA TAREA [X]	RIKETSIAS [X]
PRECIPITACIONES [X]	RAD. IONIZANTES [X]	ACCIDENTES DE TRANSITO [X]	LIQUIDOS [X]		JORNADA DE TRABAJO [X]	PARASITOS [X]
	RAD. NO IONIZANTES [X]	PÚBLICOS [X]	HUMUS MET. Y NO MET. [X]		GESTION OGANIZACIONAL [X]	PICADURAS [X]
	PRES. ATMOSFERICA [ ]	TRABAJO EN ALTURAS [X]				MORDEDURAS [X]
		ESPACIOS CONFINADOS [ ]				FLUIDOS O EXCREMENTOS [X]

OTROS/ESPECIFIQUE: ___

PARTE No.3 — MEDIDAS DE PREVENCION PARA TRABAJO EN ALTURAS

SEMANA DEL 19 AL 24 DE MAYO

ASPECTOS A VERIFICAR	SI/NO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	OBS.
El trabajador (es) estan certificado (s) para el trabajo seguro en alturas de acuerdo al nivel de capacitación según la normatividad vigente.		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Esta delimitada el area de acuerdo a la tarea a realizar, teniendo en cuenta la caida de objetos		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Se ha instalado la linea de advertencia de acuerdo a la tarea a realizar.		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Se ha colocado la señalización de advertencia requerida como: Uso obligatorio de los equipos contra caídas, Precaución vacio o hueco, Izaje de cargas, Caida de objetos, Cinta de señalización (PELIGRO NO PASE", Excavación profunda, Riesgo eléctrico, Uso de los Elementos de Protección Personal, Salida, Ruta de evacuación y otros.		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Se han instalado las barandas como medida colectiva de prevención en el area de trabajo de acuerdo al Programa de Protección Contra Caídas		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Se hace control de acceso al personal de obra mediante;		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Se han tapado todos los orificios, vacios, huecos, ductos y foso del ascensor con una resistencia de dos veces la carga prevista, o en su defecto se han señalizado o demarcado.		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Se cuenta con el ayudante u oficial de seguridad para trabajo en alturas y ejecuta las tareas asignadas.		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Los andamios y tablones que se utilizan para trabajo en alturas están en buen estado.		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Los trabajadores recibieron inducción de Seguridad y Salud en el Trabajo, charlas de seguridad, capaitación haciendo enfasis en los procedimientos de trabajo seguro para trabajo en alturas.		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Se mantiene la distancia minima de 5.0 metros a las lineas o redes electricas de media y alta tensión por parte de los trabajadores para trabajos en andamios, estructuras e izaje de cargas.		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Se observa iluminación para trabajo en alturas en labores nocturnas, sotanos o caisson, lo cual permite la visualización de huecos, vacios, ductos, foso del ascensor, escaleras y salidas del area de trabajo.		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Se observa sistema de ventilacion artificial para labores en espacios confinados, ductos, caisson, sotanos o fosos.		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Se realizan mediciones de atmosferas peligrosas en espacios confinados, ductos, caisson, sotanos o fosos.		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Se aplican los procedimientos de trabajo seguro para trabajo en alturas de acuerdo al manual, para armadura o cimbra, descimbrado en vigas-placas, columnas y muros.		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	

PARTE No.4 — VERIFICACION DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION

EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS A UTILIZAR [X] [X] [X] [X] [X] [X] [X]

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL A UTILIZAR [X] [X] [X] [X] [X] [X] [X]

MECANISMO DE ANCLAJE		ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR DE CHOQUE	SI	ARNES DE CUERPO COMPLETO	SI	CASCO CON BARBUQUEJO	SI	PROTECCION AUDITIVA	SI	OBSERVACIONES	
PUNTOS DE ANCLAJE		ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	SI	LINEA DE VIDA VERTICAL		ROPA DE TRABAJO - ROPA DE INVIERNO	SI	PROTECCION VISUAL	SI		
ESLINGA PARA DETENCION DE CAIDAS CORRIENTE		ESLINGA PARA RESTRICCION DE CAIDAS		LINEA DE VIDA HORIZONTAL		BOTAS DE SEGURIDAD	SI	PROTECCION RESPIRATORIA	SI		
MOSQUETONES		FRENOS		RED DE SEGURIDAD		GUANTES	SI	CHALECO REFLECTIVO			
PLAN DE RESCATE		EQUIPOS PARA RESCATE						BRIGADA DE EMERGENCIA			

	L	M	M	J	V	S	D
SE HA INSTALADO Y SE VERIFICAN LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LA MALLA ESCOMBRERA PARA CAIDA DE OBJETOS							
SE HA INSTALADO Y SE VERIFICAN LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LA RED DE SEGURIDAD PARA CAIDA DE PERSONAS							
Se revisan los Equipos de Protección Contra Caídas antes de cada uso por parte del trabajador.	X	X	X	X	X	X	X

PARTE No.5 — SISTEMA DE ACCESO

ESCALERAS		ESCALERAS DE GATO O MANUALES		ESCALERAS EN TABLON CON BARANDAS		REVISION VISUAL		BUEN ESTADO	SI / NO / N/A
ANDAMIO CON ESCALERA INTERNA		ELEVADOR		ANDAMIO DE CARGA O COLGANTE		REVISION VISUAL O INSPECCIÓN TECNICA		BUEN ESTADO	SI / NO / N/A
OTRO SISTEMA DE ACCESO: ANDAMIO						REVISION VISUAL O INSPECCIÓN TECNICA	SI	BUEN ESTADO	SI / NO / N/A
OTRO SISTEMA DE ACCESO:						REVISION VISUAL O INSPECCIÓN TECNICA		BUEN ESTADO	SI / NO / N/A

PARTE No.6

OBSERVACIONES GENERALES:

PARTE No.7

AUTORIZACION, REVISION Y VERIFICACION. PERMISO SUSPENDIDO.

PERMISO AUTORIZADO POR (DIRECTOR Y/O RESIDENTE DE OBRA/JEFE DE AREA)

NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CEDULA	CARGO	FIRMA
GUILLERMO ALBERTO OSORIO VARGAS	1121834340	INGENEIRO RESIDENTE DE OBRA 1	

RESPONSABLE DEL FRENTE OBRA (MAESTRO Y/O ENCARGADO)

NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CEDULA	CARGO	FIRMA
GUILLERMO ALBERTO OSORIO VARGAS	1121834340	INGENEIRO RESIDENTE DE OBRA 1	

PERMISO REVISADO Y VERIFICADO POR (RESIDENTE, INSPECTOR Y/O SUPERVISOR DE S&S-T) COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS

NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CEDULA	CARGO	FIRMA
JESÚS EVELIO VILLAMIZAR BOTIA	1090453178	COORDINADOR TRABAJO EN ALTURAS	Jesus Villamizar

PERMISO SUSPENDIDO O TAREA DETENIDA	FECHA:	HORA:	SE REQUIERE RENOVACION DEL PERMISO PARA TERMINAR LA TAREA	SI	NO

NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CEDULA	CARGO	FIRMA

TRABAJADOR AUTORIZADO	No. DE CEDULA	CARGO	FIRMA

SE REPORTA POR PARTE DE ALGUN TRABAJADOR LA CONDICIÓN DE SALUD QUE LE IMPIDA EL TRABAJO EN ALTURAS	SI	NO	CUAL

NOTA LA (S) PERSONA (S) FIRMANTE (S) CONFIRMAN QUE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD HAN SIDO INSPECCIONADAS Y EL PORTADOR DEL PERMISO (EJECUTANTE) ES RESPONSABLE POR CONOCER Y APLICAR LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO Y LAS MEDIDAS DE PREVENCION Y PROTECCION PERTINENTES PARA EL DESARROLLO DE ESTE TIPO DE ACTIVIDAD O TAREA.

FIRMAS DEL PERSONAL AUTORIZADO

PAGINA___ DE____

FECHA	No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ACTIVIDAD /TAREA	No. EPCC	Me encuentro en condiciones optimas de salud para realizar la labor		Inspeccioné el equipo contra caídas antes de iniciar la labor		FIRMA
LUNES	1	Carlos Lines	Soldador		SI	NO	SI	NO	
	2	Jesus Villamizar	Soldador		SI	NO	SI	NO	Jesus
	3	Aquiles Nel Salgado	PINTOR		SI	NO	SI	NO	Aquiles
	4				SI	NO	SI	NO	
	5				SI	NO	SI	NO	
FECHA	No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ACTIVIDAD /TAREA	No. EPCC	Me encuentro en condiciones optimas de salud para realizar la labor		Inspeccioné el equipo contra caídas antes de iniciar la labor		FIRMA
MARTES	1	Jesus Villamizar	Soldador		SI	NO	SI	NO	
	2				SI	NO	SI	NO	
	3	Carlos Lines	Soldador		SI	NO	SI	NO	
	4	Aquiles Nel Salgado	PINTOR		SI	NO	SI	NO	Aquiles
	5				SI	NO	SI	NO	
FECHA	No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ACTIVIDAD /TAREA	No. EPCC	Me encuentro en condiciones optimas de salud para realizar la labor		Inspeccioné el equipo contra caídas antes de iniciar la labor		FIRMA
MIERCOLES	1	Jesus Villamizar	Soldador		SI	NO	SI	NO	Jesus
	2	Carlos Lines	Soldador		SI	NO	SI	NO	
	3	Aquiles Nel Salgado	PINTOR		SI	NO	SI	NO	Aquiles
	4				SI	NO	SI	NO	
	5				SI	NO	SI	NO	
FECHA	No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ACTIVIDAD /TAREA	No. EPCC	Me encuentro en condiciones optimas de salud para realizar la labor		Inspeccioné el equipo contra caídas antes de iniciar la labor		FIRMA
JUEVES	1	Jesus Villamizar			SI	NO	SI	NO	
	2	Carlos Lines	Soldador		SI	NO	SI	NO	
	3	Aquiles Nel Salgado	PINTOR		SI	NO	SI	NO	Aquiles
	4				SI	NO	SI	NO	
	5				SI	NO	SI	NO	
FECHA	No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ACTIVIDAD /TAREA	No. EPCC	Me encuentro en condiciones optimas de salud para realizar la labor		Inspeccioné el equipo contra caídas antes de iniciar la labor		FIRMA
VIERNES	1	Jesus Villamizar	Soldador		SI	NO	SI	NO	Jesus
	2				SI	NO	SI	NO	
	3	Carlos Lines	Soldador		SI	NO	SI	NO	
	4	Aquiles Nel Salgado	PINTOR		SI	NO	SI	NO	Aquiles
	5				SI	NO	SI	NO	
FECHA	No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ACTIVIDAD /TAREA	No. EPCC	Me encuentro en condiciones optimas de salud para realizar la labor		Inspeccioné el equipo contra caídas antes de iniciar la labor		FIRMA
SABADO	1	Jesus Villamizar	Soldador		SI	NO	SI	NO	Jesus
	2				SI	NO	SI	NO	
	3	Carlos Lines	Soldador		SI	NO	SI	NO	
	4	Aquiles Nel Salgado	PINTOR		SI	NO	SI	NO	Aquiles
	5				SI	NO	SI	NO	
FECHA	No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ACTIVIDAD /TAREA	No. EPCC	Me encuentro en condiciones optimas de salud para realizar la labor		Inspeccioné el equipo contra caídas antes de iniciar la labor		FIRMA
DOMINGO	1	Jesus Villamizar	Soldador		SI	NO	SI	NO	Jesus
	2	Aquiles Nel Salgado	PINTOR		SI	NO	SI	NO	Aquiles
	3				SI	NO	SI	NO	
	4				SI	NO	SI	NO	
	5	Carlos Lines	Soldador		SI	NO	SI	NO	

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS / LISTA DE CHEQUEO

CODIGO			
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS EN COMUNIDADES INDIGENAS DE PUERTO GAITÁN	VERSION	1
FECHA DE INICIO DE LA TAREA: 25-5-26 — FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA TAREA: 31-5-26	FECHA	dic-25
	PAGINA	1 DE ____

PARTE No.1

TIEMPO ESTIMADO PARA REALIZAR EL TRABAJO	12 HORAS	HORA INICIO	6:00 AM	HORA DE TERMINACION	6:00 PM
SUB-CONTRATISTA	SANDOLI				
RESPONSABLE DEL FRENTE DE TRABAJO	GUILLERMO OSORIO	LOCALIZACION DEL TRABAJO A DESARROLLAR	DOMO PLANTA		
EL O LOS TRABAJADORES AUTORIZADOS SON APTOS MEDICAMENTE PARA TRABAJO EN ALTURAS	SI ✓	NO	SE HAN VERIFICADO LAS EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES DE APTITUD PARA TRABAJO EN ALTURAS	SI ✓	NO
DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA A REALIZAR	MONTAJE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA TANQUE ELEVADO				
ALTURA APROXIMADA A LA CUAL SE VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD	15 METROS	REVISION DISTANCIA PARA REQUERIMIENTO DE CLARIDAD, SI APLICA	SI ✓	NO	
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR	ANDAMIO - EQUIPO DE SOLDADURA - POLIDORA - PLANTA - HTA MANUALES				
AFILIACION Y PAGO VIGENTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	ARL ✓	EPS ✓	AFP ✓		
NUMERO DE PERSONAS A DESARROLLAR LA TAREA			ANEXO LISTADO ☐	VER PAGINA No.	

PARTE No.2 — IDENTIFICACION DE PELIGROS Y RIESGOS ASOCIADOS.

FENOMENOS NATURALES	FISICO	CONDICIONES DE SEGURIDAD	QUIMICO	BIOMECANICO	PSICOSOCIAL	BIOLOGICO
SISMO ☐	RUIDO ☒	MECANICO ☒	POLVOS ☒	POSTURA ☒	ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO ☒	VIRUS ☒
TERREMOTO ☒	ILUMINACION ☒	ELECTRICO ☒	FIBRAS ☒	ESFUERZO ☒	GRUPO DE TRABAJO ☒	BACTERIAS ☒
VENDAVAL ☒	VIBRACIONES ☒	LOCATIVO ☒	MAT. PARTICULADO ☒	MOV REPETITIVOS ☒	CONDICIONES DE LA TAREA ☒	HONGOS ☒
DERRUMBE ☒	TEMPERATURAS ☒	TECNOLÓGICO ☒	GASES Y VAPORES ☒	M. MANUAL DE CARGAS ☒	INTERFACE PERSONA TAREA ☒	RIKETSIAS ☒
PRECIPITACIONES ☒	RAD. IONIZANTES ☒	ACCIDENTES DE TRANSITO ☒	LIQUIDOS ☒		JORNADA DE TRABAJO ☒	PARASITOS ☒
	RAD. NO IONIZANTES ☒	PÚBLICOS ☒	HUMUS MET. Y NO MET. ☒		GESTION OGANIZACIONAL ☒	PICADURAS ☒
	PRES. ATMOSFERICA ☐	TRABAJO EN ALTURAS ☒				MORDEDURAS ☒
		ESPACIOS CONFINADOS ☐				FLUIDOS O EXCREMENTOS ☐

OTROS/ESPECIFIQUE: ____

MEDIDAS DE PREVENCION PARA TRABAJO EN ALTURAS

SEMANA DEL 25 AL 31 DE MAYO

ASPECTOS A VERIFICAR	SI/NO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	OBS.
El trabajador (es) estan certificado (s) para el trabajo seguro en alturas de acuerdo al nivel de capacitación según la normatividad vigente.		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Esta delimitada el area de acuerdo a la tarea a realizar, teniendo en cuenta la caída de objetos		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Se ha instalado la linea de advertencia de acuerdo a la tarea a realizar.		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Se ha colocado la señalización de advertencia requerida como: Uso obligatorio de los equipos contra caídas, Precaución vacio o hueco, Izaje de cargas, Caida de objetos, Cinta de señalización (PELIGRO NO PASE", Excavación profunda, Riesgo eléctrico, Uso de los Elementos de Protección Personal, Salida, Ruta de evacuación y otros.		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Se han instalado las barandas como medida colectiva de prevención en el area de trabajo de acuerdo al Programa de Protección Contra Caídas		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Se hace control de acceso al personal de obra mediante;		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Se han tapado todos los orificios, vacios, huecos, ductos y foso del ascensor con una resistencia de dos veces la carga prevista, o en su defecto se han señalizado o demarcado.		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Se cuenta con el ayudante u oficial de seguridad para trabajo en alturas y ejecuta las tareas asignadas.		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Los andamios y tablones que se utilizan para trabajo en alturas están en buen estado.		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Los trabajadores recibieron inducción de Seguridad y Salud en el Trabajo, charlas de seguridad, capaitación haciendo enfasis en los procedimientos de trabajo seguro para trabajo en alturas.		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Se mantiene la distancia minima de 5.0 metros a las lineas o redes electricas de media y alta tensión por parte de los trabajadores para trabajos en andamios, estructuras e izaje de cargas.		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Se observa iluminación para trabajo en alturas en labores nocturnas, sotanos o caisson, lo cual permite la visualización de huecos, vacios, ductos, foso del ascensor, escaleras y salidas del area de trabajo.		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Se observa sistema de ventilacion artificial para labores en espacios confinados, ductos, caisson, sotanos o fosos.		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Se realizan mediciones de atmosferas peligrosas en espacios confinados, ductos, caisson, sotanos o fosos.		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Se aplican los procedimientos de trabajo seguro para trabajo en alturas de acuerdo al manual, para armadura o cimbra, descimbrado en vigas-placas, columnas y muros.		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	

PARTE No.4 — VERIFICACION DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION

EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS A UTILIZAR ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ — ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL A UTILIZAR ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

										OBSERVACIONES
MECANISMO DE ANCLAJE		ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR DE CHOQUE	SI	ARNES DE CUERPO COMPLETO	SI	CASCO CON BARBUQUEJO	SI	PROTECCION AUDITIVA	SI	
PUNTOS DE ANCLAJE		ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	SI	LINEA DE VIDA VERTICAL		ROPA DE TRABAJO - ROPA DE INVIERNO	SI	PROTECCION VISUAL	SI	
ESLINGA PARA DETENCION DE CAIDAS CORRIENTE		ESLINGA PARA RESTRICCION DE CAIDAS		LINEA DE VIDA HORIZONTAL		BOTAS DE SEGURIDAD	SI	PROTECCION RESPIRATORIA	SI	
MOSQUETONES		FRENOS		RED DE SEGURIDAD		GUANTES	SI	CHALECO REFLECTIVO		
PLAN DE RESCATE		EQUIPOS PARA RESCATE						BRIGADA DE EMERGENCIA		

	L	M	M	J	V	S	D
SE HA INSTALADO Y SE VERIFICAN LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LA MALLA ESCOMBRERA PARA CAIDA DE OBJETOS							
SE HA INSTALADO Y SE VERIFICAN LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LA RED DE SEGURIDAD PARA CAIDA DE PERSONAS							
Se revisan los Equipos de Protección Contra Caídas antes de cada uso por parte del trabajador.	X	X	X	X	X	X	X

PARTE No.5 — SISTEMA DE ACCESO

ESCALERAS ☒		ESCALERAS DE GATO O MANUALES		ESCALERAS EN TABLON CON BARANDAS		REVISION VISUAL		BUEN ESTADO	SI	NO / N/A
ANDAMIO CON ESCALERA INTERNA ☒		ELEVADOR		ANDAMIO DE CARGA O COLGANTE		REVISION VISUAL O INSPECCIÓN TECNICA		BUEN ESTADO	SI	NO / N/A
OTRO SISTEMA DE ACCESO: ANDAMIO - ☒						REVISION VISUAL O INSPECCIÓN TECNICA	SI	BUEN ESTADO	X	NO / N/A
OTRO SISTEMA DE ACCESO: ☐						REVISION VISUAL O INSPECCIÓN TECNICA		BUEN ESTADO	SI	NO / N/A

PARTE No.6

OBSERVACIONES GENERALES:

PARTE No.7

AUTORIZACION, REVISION Y VERIFICACION, PERMISO SUSPENDIDO.

PERMISO AUTORIZADO POR (DIRECTOR Y/O RESIDENTE DE OBRA/JEFE DE AREA)

NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CEDULA	CARGO	FIRMA
GUILLERMO ALBERTO OSORIO VARGAS	1121834340	INGENEIRO RESIDENTE DE OBRA 1	

RESPONSABLE DEL FRENTE OBRA (MAESTRO Y/O ENCARGADO)

NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CEDULA	CARGO	FIRMA
GUILLERMO ALBERTO OSORIO VARGAS	1121834340	INGENEIRO RESIDENTE DE OBRA 1	

PERMISO REVISADO Y VERIFICADO POR (RESIDENTE, INSPECTOR Y/O SUPERVISOR DE S&S-T) COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS

NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CEDULA	CARGO	FIRMA
JESÚS EVELIO VILLAMIZAR BOTIA	1090453173	COORDINADOR TRABAJO EN ALTURAS	Jesus Villamizar

PERMISO SUSPENDIDO O TAREA DETENIDA	FECHA:	HORA:	SE REQUIERE RENOVACION DEL PERMISO PARA TERMINAR LA TAREA	SI	NO

NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CEDULA	CARGO	FIRMA

TRABAJADOR AUTORIZADO	No. DE CEDULA	CARGO	FIRMA

SE REPORTA POR PARTE DE ALGUN TRABAJADOR LA CONDICIÓN DE SALUD QUE LE IMPIDA EL TRABAJO EN ALTURAS	SI	NO	CUAL

NOTA LA (S) PERSONA (S) FIRMANTE (S) CONFIRMAN QUE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD HAN SIDO INSPECCIONADAS Y EL PORTADOR DEL PERMISO (EJECUTANTE) ES RESPONSABLE POR CONOCER Y APLICAR LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO Y LAS MEDIDAS DE PREVENCION Y PROTECCION PERTINENTES PARA EL DESARROLLO DE ESTE TIPO DE ACTIVIDAD O TAREA.

FIRMAS DEL PERSONAL AUTORIZADO — PAGINA ___ DE ___

FECHA	No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ACTIVIDAD /TAREA	No. EPCC	Me encuentro en condiciones optimas de salud para realizar la labor		Inspeccioné el equipo contra caídas antes de iniciar la labor		FIRMA
LUNES	1	Jesus Villamizar	Soldador		SI	NO	SI	NO	Jesus
	2	Carlos Lineg	Soldador		SI	NO	SI	NO	
	3	Aurelio Salgado	PINTO		SI	NO	SI	NO	Aur.
	4				SI	NO	SI	NO	
	5				SI	NO	SI	NO	
FECHA	No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ACTIVIDAD /TAREA	No. EPCC	Me encuentro en condiciones optimas de salud para realizar la labor		Inspeccioné el equipo contra caídas antes de iniciar la labor		FIRMA
MARTES	1	Jesus Villamizar	Soldador		SI	NO	SI	NO	Jesus
	2				SI	NO	SI	NO	
	3	Aurelio Salgado	PINTOR		SI	NO	SI	NO	Aur.
	4	Carlos Lineg	soldador		SI	NO	SI	NO	
	5				SI	NO	SI	NO	
FECHA	No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ACTIVIDAD /TAREA	No. EPCC	Me encuentro en condiciones optimas de salud para realizar la labor		Inspeccioné el equipo contra caídas antes de iniciar la labor		FIRMA
MIERCOLES	1	Jesus Villamizar	Soldador		SI	NO	SI	NO	Jesus
	2				SI	NO	SI	NO	
	3	Aurelio Salgado	PINTOR		SI	NO	SI	NO	Aur.
	4	Carlos Lineg	soldador		SI	NO	SI	NO	
	5				SI	NO	SI	NO	
FECHA	No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ACTIVIDAD /TAREA	No. EPCC	Me encuentro en condiciones optimas de salud para realizar la labor		Inspeccioné el equipo contra caídas antes de iniciar la labor		FIRMA
JUEVES	1	Jesus Villamizar	Soldador		SI	NO	SI	NO	Jesus
	2				SI	NO	SI	NO	
	3	Aurelio Salgado	PINTOR		SI	NO	SI	NO	Aur.
	4	Carlos Lineg	soldador		SI	NO	SI	NO	
	5				SI	NO	SI	NO	
FECHA	No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ACTIVIDAD /TAREA	No. EPCC	Me encuentro en condiciones optimas de salud para realizar la labor		Inspeccioné el equipo contra caídas antes de iniciar la labor		FIRMA
VIERNES	1	Jesus Villamizar	Soldador		SI	NO	SI	NO	Jesus
	2				SI	NO	SI	NO	
	3				SI	NO	SI	NO	
	4	Aurelio Salgado	PINTOR		SI	NO	SI	NO	Aur.
	5	Carlos Lineg	soldador		SI	NO	SI	NO	
FECHA	No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ACTIVIDAD /TAREA	No. EPCC	Me encuentro en condiciones optimas de salud para realizar la labor		Inspeccioné el equipo contra caídas antes de iniciar la labor		FIRMA
SABADO	1	Jesus Villamizar	Soldador		SI	NO	SI	NO	Jesus
	2				SI	NO	SI	NO	
	3	Aurelio Salgado	PINTOR		SI	NO	SI	NO	Aur.
	4	Carlos Lineg	soldador		SI	NO	SI	NO	
	5				SI	NO	SI	NO	
FECHA	No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ACTIVIDAD /TAREA	No. EPCC	Me encuentro en condiciones optimas de salud para realizar la labor		Inspeccioné el equipo contra caídas antes de iniciar la labor		FIRMA
DOMINGO	1	Jesus Villamizar	Soldador		SI	NO	SI	NO	Jesus
	2				SI	NO	SI	NO	
	3	Aurelio Salgado	PINTO		SI	NO	SI	NO	Aur.
	4	Carlos Lineg	soldador		SI	NO	SI	NO	
	5				SI	NO	SI	NO	

11994

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO	Código: SST-F-037
		VERSION	1
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	FECHA	Fecha: 15 Diciembre de 2026

PROYECTO	
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LAS COMUNIDADES INDÍGENAS WACOYO-ASEIPOME-AWALIBA-DOMO PLANA DE PUERTO GAITÁN	
OBJETO DEL TRABAJO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA TANQUES ELEVADOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA.
TRABAJO A REALIZAR	MONTAJE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TANQUE ELEVADO.
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	EQUIPO DE PROTECCION CONTRA CAIDAS, ANDAMIO, CUERDAS DE MANILA, EQUIPO DE SOLDADURA, HERRAMIENTAS MECÁNIZADAS, HERRAMIENTA MENOR, PLATA ELÉCTRICA.
FECHA DE INICIO: 1 DE MAYO DE 2026	FECHA DE CIERRE: 31 DE MAYO DE 2026

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (Procedimiento).	CLASIFICACION	PELIGROS (Situacion o Fuente).	CONTROLES	RESPONSABLE
ASEGURAMIENTO DEL AREA, ALISTAMIENTO DE MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPOS	DE SEGURIDAD	**Locativo:** sistemas y medios de almacenamiento (material mal almacenado). Area en desorden, Superficies lisas, húmedas o resbalosas, obstrucción en el área directa de trabajo, caida de objetos; **Electrico:** Baja tension; **Mecanico:** elementos o partes de máquinas, herramientas, equipos, piezas a trabajar, materiales proyectados sólidos; **Accidentes de tránsito:** atropellamiento entre equipos o de equipos con personas. (caidas a mismo nivel, tropesones, lesiones osteomusculares, electrocucion, quemaduras, Atropellos y colisiones)	Inspección pre uso de herramientas menores y equipos a utilizar, Realizar inspección de área, Utilizar senderos o áreas de transito seguras y garantizar la adecuada iluminación, Ubicar herramientas y equipos en lugares no transitados, demarcar zonas de almacenamiento de materiales, Coordinación de trabajos con personal y/o subcontratistas previamente al inicio de labores, Hacer uso adecuado de epps y dotacion, realizar jornadas de orden y aseo, Charlas de seguridad sobre riesgo mecánico, cuidado de manos.	Soldadores, ayudantes y ingeniero residente
	BIOMECÁNICO	**Manipulacion manual de cargas:** levantamiento de cargas, Adopción de **Posturas forzadas** (Fatiga muscular, Hernias, Lesiones osteomusculares)	Calistenia, Respetar pesos en levantamiento y manipulación de cargas, carga máxima para levantar 25 kg, Carga máxima para transportar 40 kg, Adoptar posiciones adecuadas de trabajo, Pausas Activas.	Soldadores, ayudantes y ingeniero residente
	BIOLOGICO	**Mordeduras de serpientes, Picaduras de abejas, avispas, pitos,** alacranes, arañas, insectos entre otros, **Bacterias** presentes en el entorno de trabajo (Alergias, Enrojecimiento de la piel, Brote, infecciones cutaneas, intoxicacion, envenenamiento, muerte)	Verificar el área de trabajo: en caso de encontrar un animal peligroso avisar inmediatamente al supervisor para que él se comunique con el area seguridad y medio ambiente. Realizar charlas de cinco minutos que permitan socializar al personal acerca del riesgo biológico y las medidas de prevención a tener en cuenta al desarrollar trabajos. Realizar limpieza de manos antes de alimentarse para prevenir contaminación-cruzada. Uso de dotación y de EPPS (mascarilla, casco, guantes, lentes de seguridad y botas de seguridad). Contar con vacunas (Tétano y fiebre amarilla)	Soldadores, ayudantes y ingeniero residente
	QUIMICO	**Polvos orgánicos e inorgánicos, Material particulado,** Manipulación de solventes y/o **sustancias químicas** (Afecciones respiratorias, Dermatitis, intoxicación, Irritación de ojos, hipósensibilidad, quemaduras de piel)	Uso de elementos de protección personal (protección respiratoria, guantes de vaqueta o nitrilo, lentes de seguridad) y uso de dotación. Uso de dique de contención en el momento de trasvase, Seguir indicaciones de la ficha de seguridad y/o técnica del producto, contar con kit antiderrames en el punto de acopio.	Soldadores, ayudantes y ingeniero residente
	FISICO	**Temperaturas extremas por calor,** Radiaciones no ionizantes por exposición a rayos solares, Ruido por utilización de herramienta de golpe y el aportado por el ambiente de trabajo (deshidratación, calambres, fatiga muscular, estrés termico, quemaduras de piel)	Hidratación, Uso de bloqueador solar, Hacer uso adecuado de epps y dotación (casco, camisa manga larga, guantes, gafas con filtro uv). Uso de protección auditiva de inserción para todo el personal en las zonas de alta operación de equipos. Sensibilizaciones de auto cuidado y percepción del riesgo.	Soldadores, ayudantes y ingeniero residente
	PSICOSOCIAL	**Gestión organizacional:** estilo de mando, inducción, capacitación, manejo de cambios, evaluación del desempeño; **Organización del trabajo:** comunicación; **Características del grupo social de trabajo:** trabajo en equipo; **Interfase persona tarea:** conocimientos y habilidades, identificación de la tarea; **Jornadas de trabajo:** horas extras (Stres, Sobrecarga laboral, Conflictos interpersonales, Consecuencias psicológicas (ansiedad, miedo, depresión e inseguridad))	Capacitación del personal en los estándares de seguridad asociados al desarrollo de la labor, Charlas de planeación de trabajos a realizar, asignación adecuada de funciones del personal en función de sus competencias y experiencia. Mantener siempre una comunicación asertiva en el equipo de trabajo, Pausas activas, Rotación del personal, Retomar prácticas de la buena comunicación, Campañas y capacitaciones de autocuidado.	Soldadores, ayudantes y ingeniero residente
	FENOMENOS NATURALES	**Sismos, Precipitaciones** de lluvias, **Terremotos, Inundación, Derrumbe.** (Fracturas, Lesiones en general, laceraciones, Caidas, Muerte)	Implementación del plan de emergencias y capacitación a los trabajadores en los procedimientos operativos normalizados (PON). Cuando se presenten tormentas eléctricas se deben detener las actividades, Contar con dotacion de invierno (carpas y botas de caucho), contar con parpas o campamento para el resguardo de los trabajadores.	Soldadores, ayudantes y ingeniero residente
ARMADO DE ANDAMIO	BIOMECÁNICO	**Manipulacion manual de cargas:** Levantamiento manual de elementos verticales y horizontales del andamio.	Calistenia, Respetar pesos en levantamiento y manipulación de cargas, carga máxima para levantar 25 kg (Hombres), 12.5 kg (Mujeres) Carga máxima para transportar 40 kg (Hombres), 20 kg (Mujeres), Adoptar posiciones adecuadas de trabajo, Pausas Activas, Rotacion del puesto de trabajo, Utilización de ayudas mecánicas (pluma o grua), Capacitación al personal sobre manipulación manual de cargas.	Soldadores, ayudantes, ingeniero residente.
	DE SEGURIDAD	**Trabajo en alturas:** Armado y aseguramiento de andamios por secciones., Caída de objetos. (Golpes, contusiones, fracturas, laceraciones, Aplastamiento, traumas, muerte)	Uso de equipos de alturas certificados, Inspeccion de equipos de Alturas, Uso de Porta herramientas, Uso de personal capacitado y certificado en Trabajo en Alturas (Verificación del certificado de aptitud médica de los trabajadores y del curso nivel avanzado de trabajo seguro en alturas), Verificación del diligenciamiento de los PTS, ATS y documentación requerida para el aseguramiento de la actividad en alturas, Uso de señalización de caída de objetos y trabajo en alturas, Uso de sistemas de acceso certificado, divulgacion del plan de	Soldadores, ayudantes, ingeniero residente y coordinador de alturas.
	FENOMENOS NATURALES	**Sismos, Precipitaciones** de lluvias, **Terremotos, Inundación, Derrumbe.** (Fracturas, Lesiones en general, laceraciones, Caidas, Muerte)	Implementación del plan de emergencias y capacitación a los trabajadores en los procedimientos operativos normalizados (PON). Cuando se presenten tormentas eléctricas se deben detener las actividades, Contar con dotacion de invierno (carpas y botas de caucho), contar con parpas o campamento para el resguardo de los trabajadores.	Soldadores, ayudantes y ingeniero residente
	FISICO	**Temperaturas extremas por calor,** Radiaciones no ionizantes por exposición a rayos solares, Ruido por utilización de herramienta de golpe y el aportado por el ambiente de trabajo (deshidratación, calambres, fatiga muscular, estrés termico, quemaduras de piel)	Hidratación, Uso de bloqueador solar, Hacer uso adecuado de epps y dotación (casco, camisa manga larga, guantes, gafas con filtro uv). Uso de protección auditiva de inserción para todo el personal en las zonas de alta operación de equipos. Sensibilizaciones de auto cuidado y percepción del riesgo.	Soldadores, ayudantes y ingeniero residente
	DE SEGURIDAD	**Locativo:** Area en desorden, Superficies lisas, húmedas, resbalosas o irregulares, obstrucción en el área directa de trabajo, caida de material (caidas a mismo y distinto nivel, tropesones, lesiones osteomusculares)	Realizar inspeccion de area, Aseguramiento y anclaje de la pluma para izaje de material, Utilizar senderos o áreas de transito seguras, La herramienta no debe ser ubicada al borde de la excavación, Se deberá asegurar el amarre de la herramienta y equipos a descender y el personal que labora dentro del caisson deberá ascender previo a la extracción del objeto, Hacer uso adecuado de epps y dotacion (casco, ropa de trabajo, botas de seguridad, gafas, tapabocas) y realizar jornadas de orden y aseo.	Soldadores, ayudantes, ingeniero residente y coordinador de alturas.

	DE SEGURIDAD	**Mecánico:** Manipulación herramientas manuales para aseguramiento de andamios (Lesiones osteomusculares, golpes, caída de objetos, cortes, machucones, laceraciones, esguinces, atrapamientos de miembros, fatiga muscular, material particulado)	Inspección de herramienta, equipos y/o maquinaria, Uso adecuado de equipos, No usar herramientas en mal estado, Contar con extintor en el área, Tener capacitación en uso de equipos (Verificar las competencias y/o experiencia del personal que empleará el equipo), Usar guardas de seguridad en los equipos, Contar con ayudante aparejador o bachero, No dejar la carga suspendida, No transitar por debajo de la carga, Usar manilas o vientos para guiar la carga, Usar equipo de comunicacion para el izaje de cargas con torregrua, Usar epps adecuados (guantes, casco).	Soldadores, ayudantes y Ingeniero residente
MONTAJE DE PIEZAS METÁLICAS PARA LA INSTLACIÓN DE LA ESTRUCTURA	BIOMECÁNICO	**Manipulacion manual de cargas:** Levantamiento manual de equipos y materiales; **Esfuerzo:** traslado de carretilla. **Postura prolongada, mantenida, forzada**	Calistenia, Respetar pesos en levantamiento y manipulación de cargas, carga máxima para levantar 25 kg (Hombres), 12.5 kg (Mujeres) Carga máxima para transportar 40 kg (Hombres), 20 kg (Mujeres), Adoptar posiciones adecuadas de trabajo, Pausas Activas, Rotacion del puesto de trabajo, Utilización de ayudas mecánicas (pluma o grua), Capacitación al personal sobre manipulación manual de cargas.	Soldadores, ayudantes, Ingeniero residente.
	DE SEGURIDAD	**Trabajo en alturas:** Soldadura a borde de placa en dovelas y andenes a mas de 1.50m de altura; trabajos en plataformas o canastas colgantes: Caidas a distinto nivel, Caída de objetos. (Golpes, contusiones, fracturas, laceraciones, Aplastamiento, traumas, muerte)	Uso de equipos de alturas certificados, Inspección de equipos de Alturas, Uso de Porta herramientas, Uso de personal capacitado y certificado en Trabajo en Alturas (Verificación del certificado de aptitud médica de los trabajadores y del curso nivel avanzado de trabajo seguro en alturas), Verificación del diligenciamiento de los PTS, ATS y documentación requerida para el aseguramiento de la actividad en alturas, Uso de señalización de caída de objetos y trabajo en alturas, Uso de sistemas de acceso certificado, divulgacion del plan de rescate, divulgacion del procedimiento contructivo, divulgacion de plan de emergencias, verificacion del estado de salud (lista de chequeo), hacer uso de acompañamiento o ayudante de seguridad, El personal que labora en la parte superior, deberá usar la eslinga de restriccion y estar anclado a un punto de anclaje, Hacer uso adecuado de los epps y los EPCC (casco, barbuquejo, ames, eslinga).	Soldadores, ayudantes, Ingeniero residente y coordinador de alturas.
	FENOMENOS NATURALES	**Sismos, Precipitaciones** de lluvias, **Terremotos, Inundación, Derrumbe.** (Fracturas, Lesiones en general, laceraciones, Caídas, Muerte)	Implementación del plan de emergencias y capacitación a los trabajadores en los procedimientos operativos normalizados (PON). Cuando se presenten tormentas eléctricas se deben detener las actividades, Contar con dotacion de invierno (carpas y botas de caucho), contar con parpas o campamento para el resguardo de los trabajadores.	Soldadores, ayudantes y ingeniero residente
	FISICO	**Temperaturas extremas por calor.** Radiaciones no ionizantes por exposición a rayos solares, Ruido por utilización de herramienta de golpe y el aportado por el ambiente de trabajo (deshidratación, calambres, fatiga muscular, estrés termico, quemaduras de piel)	Hidratación, Uso de bloqueador solar, Hacer uso adecuado de epps y dotación (casco, camisa manga larga, guantes, gafas con filtro uv), Uso de protección auditiva de inserción para todo el personal en las zonas de alta operación de equipos, Sensibilizaciones de auto cuidado y percepción del riesgo.	Soldadores, ayudantes y ingeniero residente
	DE SEGURIDAD	**Locativo:** Area en desorden, Superficies lisas, húmedas, resbalosas o irregulares, obstrucción en el área directa de trabajo, caída de material (caidas a mismo y distinto nivel, tropesones, lesiones osteomusculares)	Realizar inspección de área, Aseguramiento y anclaje de la pluma para izaje de material, Utilizar senderos o áreas de transito seguras, La herramienta no debe ser ubicada al borde de la excavación, Se deberá asegurar el amarre de la herramienta y equipos a descender y el personal que labora dentro del caisson deberá ascender previo a la extracción del objeto, Hacer uso adecuado de epps y dotacion (casco, ropa de trabajo, botas de seguridad, gafas, tapabocas) y realizar jornadas de orden y aseo.	Soldadores, ayudantes, Ingeniero residente y coordinador de alturas.
	DE SEGURIDAD	**Mecánico:** Manipulación de equipos y herramientas manuales y eléctricas (equipo de soldadura, pinza portaelectrodos y masa, martillo, alicate, llave, destornillador, hombresolo, maceta, etc), cortopunzantes, con piezas en movimiento, uso de equipos mecanicos para izaje de cargas como plumas, torregruas o gruas telescopicas (Lesiones osteomusculares, golpes, caida de objetos, cortes, machucones, laceraciones, esguinces, atrapamientos de miembros, fatiga muscular, material particulado, muerte)	Inspección de herramienta, equipos y/o maquinaria, Uso adecuado de equipos, No usar herramientas en mal estado, Contar con extintor en el área, Tener capacitación en uso de equipos (Verificar las competencias y/o experiencia del personal que empleará el equipo), Usar guardas de seguridad en los equipos, Contar con ayudante aparejador o bachero, No dejar la carga suspendida, No transitar por debajo de la carga, Usar manilas o vientos para guiar la carga, Usar equipo de comunicacion para el izaje de cargas con torregrua, Usar epps adecuados (guantes, casco).	Soldadores, ayudantes y ingeniero residente
SOLDADURA ELECTRICA	DE SEGURIDAD	**Trabajo en alturas:** Soldadura de estructura metálica; trabajos en andamios: Caidas a distinto nivel, Caída de objetos. (Golpes, contusiones, fracturas, laceraciones, Aplastamiento, traumas, muerte)	Uso de equipos de alturas certificados, Inspección de equipos de Alturas, Uso de Porta herramientas, Uso de personal capacitado y certificado en Trabajo en Alturas (Verificación del certificado de aptitud médica de los trabajadores y del curso nivel avanzado de trabajo seguro en alturas), Verificación del diligenciamiento de los PTS, ATS y documentación requerida para el aseguramiento de la actividad en alturas, Uso de señalización de caída de objetos y trabajo en alturas, Uso de sistemas de acceso certificado, divulgacion del plan de rescate, divulgacion del procedimiento contructivo, divulgacion de plan de emergencias, verificacion del estado de salud (lista de chequeo), hacer uso de acompañamiento o ayudante de seguridad, El personal que labora en la parte superior, deberá usar la eslinga de restriccion y estar anclado a un punto de anclaje, Hacer uso adecuado de los epps y los EPCC (casco, barbuquejo, ames, eslinga).	Soldadores, ayudantes, Ingeniero residente y coordinador de alturas.
		Locativo: Area en desorden, Superficies lisas, húmedas, resbalosas o irregulares, obstrucción en el área directa de trabajo, caída de material (caidas a mismo y distinto nivel, tropesones, lesiones osteomusculares)	Realizar inspección de área, Aseguramiento y anclaje de la pluma para izaje de material, Utilizar senderos o áreas de transito seguras, La herramienta no debe ser ubicada al borde de la excavación, Se deberá asegurar el amarre de la herramienta y equipos a descender y el personal que labora dentro del caisson deberá ascender previo a la extracción del objeto, Hacer uso adecuado de epps y dotacion (casco, ropa de trabajo, botas de seguridad, gafas, tapabocas) y realizar jornadas de orden y aseo.	Soldadores, ayudantes, Ingeniero residente y coordinador de alturas.
		Tecnologicos: Explosiones o incendios de origen electrico o por gases inflamables (Quemaduras de 1er, 2do o 3er grado, daños a los organos, daños a la propiedad y muerte)	Verificar el estado y mantenimiento del equipo, Realice inspeccion de equipos, Señalice y delimite el area de trabajo, Contar con extintor en el area.	Soldadores, ayudantes, Ingeniero residente y coordinador de alturas.
		Mecánico: Manipulación de equipos y herramientas manuales y eléctricas (equipo de soldadura, pinza portaelectrodos y masa, martillo, alicate, llave, destornillador, hombresolo, maceta, etc), cortopunzantes, con piezas en movimiento, uso de equipos mecanicos para izaje de cargas como plumas, torregruas o gruas telescopicas (Lesiones osteomusculares, golpes, caida de objetos, cortes, machucones, laceraciones, esguinces, atrapamientos de miembros, fatiga muscular, material particulado, muerte)	Inspección de herramienta, equipos y/o maquinaria, Uso adecuado de equipos, No usar herramientas en mal estado, Contar con extintor en el área, Tener capacitación en uso de equipos (Verificar las competencias y/o experiencia del personal que empleará el equipo), Usar guardas de seguridad en los equipos, Contar con ayudante aparejador o bachero, No dejar la carga suspendida, No transitar por debajo de la carga, Usar manilas o vientos para guiar la carga, Usar equipo de comunicacion para el izaje de cargas con torregrua, Usar epps adecuados (guantes, casco).	Soldadores, ayudantes, Ingeniero residente y coordinador de alturas.
		Electrico: Manipulación de equipos electricos, extensiones. (Quemaduras de 1er, 2do y 3er grado, choques eléctricos, muerte)	Inspección preoperacional de herramienta y equipos, Las extensiones de los equipos deben ser encauchetadas, Uso de equipos con aislamiento o dielectricos, Uso permanente de Epps dielectricos, No laborar bajo condiciones de lluvia, aterrizar equipos electricos con polo a tierra, No usar extenciones en mal estado, contar con extintor en el area.	Soldadores, ayudantes, Ingeniero residente y coordinador de alturas.
	FISICO	**Ruido:** Manipulación de herramientas de impacto (martillo, maceta) (Estrés, Dolor de oidos, Zumbidos, Cefalea, Perforación del timpano, Hipoacusia)	Reducir el tiempo de exposición a través de la rotación de las tareas, Realizar pausas activas, realizar inspección preoperacional de herramientas.	Soldadores, ayudantes, Ingeniero residente y coordinador de alturas.
		Iluminacion: Deficiencia de iluminacion (Sobreesfuerzo visual, Agotamiento visual, Encandilamiento, Golpes, Nistagmus, tropesones)	Proveer iluminacion artificial resistente al agua.	Soldadores, ayudantes, Ingeniero residente y coordinador de alturas.
		Vibración: Manipulación de equipos (taladro) (Dolor abdominal, Problemas de equilibrio, Cefalea, Artrosis, Problemas neurológicos, Mareo, Vomito).	Reducir el tiempo de exposición a través de la rotación de las tareas, Realizar pausas activas, Realizar los exámenes periódicos, Verificar el estado y mantenimiento de los equipos (preoperacional).	Soldadores, ayudantes, Ingeniero residente y coordinador de alturas.
		Temperaturas Extremas: Calor por luz Solar (Agotamiento físico, Deshidratación, Desmayos, Hipertermia).	Proveer ventilación adecuada para el lugar de trabajo, Realizar rotación de la tarea, Suministrar periódicamente agua potable, Suministrar la cantidad requerida de suero oral.	Soldadores, ayudantes, Ingeniero residente y coordinador de alturas.

OXICORTE	BIOMECÁNICO	**Manipulacion manual de cargas:** Levantamiento manual de equipos y materiales; **Esfuerzo:** traslado de carretilla. **Postura prolongada, mantenida, forzada**	Calistenia, Respetar pesos en levantamiento y manipulación de cargas, carga máxima para levantar 25 kg (Hombres), 12.5 kg (Mujeres) Carga máxima para transportar 40 kg (Hombres), 20 kg (Mujeres), Adoptar posiciones adecuadas de trabajo, Pausas Activas, Rotacion del puesto de trabajo, Utilización de ayudas mecánicas (pluma o grua), Capacitación al personal sobre manipulación manual de cargas.	Soldadores, ayudantes, ingeniero residente y coordinador de alturas.
	QUIMICO	**Material particulado:** por trabajos con pulidora; **Humus metalicos:** uso de soldadura electrica. (Afecciones respiratorias, Alergias, Carcinognesis, Dermatitis, intoxicación, Irritación nasal y ocular)	Uso de EPP adecuados para cada producto químico utilizado: como caretas, protectores respiratorios con filtro si se requiere, gafas de seguridad. Proveer ventilación artificial adecuada para el lugar de trabajo o si se presenta acumulación de particulas.	Soldadores, ayudantes, ingeniero residente y coordinador de alturas.
	BIOLOGICO	**Picaduras:** presencia de mosquitos y/o zancudos; **Mordeduras:** presencia de servientes (Alergias, Enrojecimiento de la piel, Brote, infecciones, transmision de enfermedades endemicas, intoxicacion, muerte)	Verificación del esquema de vacunación, Realizar inspeccion de areas de trabajo antes de iniciar la tarea, Capacitación relacionada al peligro, uso de dotación (camisa manga larga, pantalón, botas) y uso de EPP´S (guantes), Eliminar criaderos (orden y aseo en zonas de empozamiento de aguas).	Soldadores, ayudantes, ingeniero residente y coordinador de alturas.
	PSICOSOCIAL	**Gestión organizacional:** estilo de mando, inducción, capacitación, manejo de cambios, evaluación del desempeño; **Organización del trabajo:** comunicación; **Características del grupo social de trabajo:** trabajo en equipo; **Interfase persona tarea:** conocimientos y habilidades, identificación de la tarea; **Jornadas de trabajo:** horas extras (Stres, Sobrecarga laboral, Conflictos interpersonales, Consecuencias psicológicas (ansiedad, miedo, depresión e inseguridad))	Capacitación del personal en los estándares de seguridad asociados al desarrollo de la labor, Charlas de planeación de trabajos a realizar, asignación adecuada de funciones del personal en función de sus competencias y experiencia, Mantener siempre una comunicación asertiva en el equipo de trabajo, Pausas activas, Rotación del personal, Retomar prácticas de la buena comunicación, Campañas y capacitaciones de autocuidado.	Soldadores, ayudantes, ingeniero residente y coordinador de alturas.
	NATURALES	**Precipitaciones de lluvias y Sismos** (Atrapamiento por desprendimiento de material, lesiones leves y graves por desprendimiento de material, Hipotermia, Susceptibilidad a los virus (gripe, entre otras), Descargas Electricas)	Implementación del plan de emergencias y capacitación a los trabajadores en los procedimientos operativos normalizados (PON), Uso de carpas, uso de dotacion de invierno o lluvia, uso de botas de caucho, apuntalamientos, Identificar las rutas de evacuación y punto de encuentro, Inspeccionar las áreas susceptibles a sufrir derrumbes e intervenir con medidas preventivas y/o correctivas, Conformación, identificación y capacitación de las brigadas de emergencias, Contar con kit de rescate, suspender actividades en presencia de lluvia y tormenta electrica, Registro de MEDEVAC, Identificar y atender al sistema de ALARMA.	Soldadores, ayudantes, ingeniero residente y coordinador de alturas.
	DE SEGURIDAD	**Trabajo en alturas:** Soldadura en alturas mayor a 2 metros: Caídas a distinto nivel, Caída de objetos. (Golpes, contusiones, fracturas, laceraciones, Aplastamiento, traumas, muerte)	Uso de equipos de alturas certificados, Inspección de equipos de Alturas, Uso de Porta herramientas, Uso de personal capacitado y certificado en Trabajo en Alturas (Verificación del certificado de aptitud médica de los trabajadores y del curso nivel avanzado de trabajo seguro en alturas), Verificación del diligenciamiento de los PTS, ATS y documentación requerida para el aseguramiento de la actividad en alturas, Uso de señalización de caída de objetos y trabajo en alturas, Uso de sistemas de acceso certificado, divulgacion del plan de rescate, divulgacion del procedimiento contructivo, divulgacion de plan de emergencias, verificacion del estado de salud (lista de chequeo), hacer uso de acompañamiento o ayudante de seguridad, El personal que labora en la parte superior, deberá usar la eslinga de restriccion y estar anclado a un punto de anclaje, Hacer uso adecuado de los epps y los EPCC (casco, barbuquejo, ames, eslinga).	Soldadores, ayudantes, ingeniero residente y coordinador de alturas.
		Locativo: Area en desorden, Superficies lisas, húmedas, resbalosas o irregulares, obstrucción en el área directa de trabajo, caida de material (caidas a mismo y distinto nivel, tropesones, lesiones osteomusculares)	Realizar inspección de área, Aseguramiento y anclaje de la pluma para izaje de material, Utilizar senderos o áreas de transito seguras, La herramienta no debe ser ubicada al borde de la excavación, Se deberá asegurar el amarre de la herramienta y equipos a descender y el personal que labora dentro del caisson deberá ascender previo a la extracción del objeto, Hacer uso adecuado de epps y dotacion (casco, ropa de trabajo, botas de seguridad, gafas, tapabocas) y realizar jornadas de orden y aseo.	Soldadores, ayudantes, ingeniero residente y coordinador de alturas.
		Tecnologicos: Explosiones o incendios de origen electrico o por gases inflamables (Quemaduras de 1er, 2do o 3er grado, daños a los organos, daños a la propiedad y muerte)	Verificar el estado y mantenimiento del equipo, Realice inspeccion de equipos, Señallce y delimite el area de trabajo, Contar con extintor en el area.	Soldadores, ayudantes, ingeniero residente y coordinador de alturas.
		Mecánico: Manipulación de equipos y herramientas manuales y eléctricas (martillo, alicate, llave, destornillador, hombresolo, maceta, etc), cortopunzantes, con piezas en movimiento, uso de equipos mecanicos para izaje de cargas como plumas, torregruas o gruas telescopicas (Lesiones osteomusculares, golpes, caida de objetos, cortes, machucones, laceraciones, esguinces, atrapamientos de miembros, fatiga muscular, materal particulado, muerte)	Inspección de herramienta, equipos y/o maquinaria, Uso adecuado de equipos, No usar herramientas en mal estado, Contar con extintor en el área, Tener capacitación en uso de equipos (Verificar las competencias y/o experiencia del personal que empleará el equipo), Usar guardas de seguridad en los equipos, Contar con ayudante aparejador o bachero, No dejar la carga suspendia, No transitar por debajo de la carga, Usar manilas o vientos para guiar la carga, Usar equipo de comunicacion para el izaje de cargas con torregrua, Usar epps adecuados (guantes, casco),	Soldadores, ayudantes, ingeniero residente y coordinador de alturas.
		Electrico: Manipulación de equipos electricos, extensiones. (Quemaduras de 1er, 2do y 3er grado, choques eléctricos, muerte)	Inspección preoperacional de herramienta y equipos, Las extensiones de los equipos deben ser encauchetadas, Uso de equipos con aislamiento o dielectricos, Uso permanente de Epps dielectricos, No laborar bajo condiciones de lluvia, aterrizar equipos electricos con polo a tierra, No usar extenciones en mal estado, contar con extintor en el area.	Soldadores, ayudantes, ingeniero residente y coordinador de alturas.
	FISICO	**Ruido:** Manipulación de herramientas de impacto (martillo, maceta) (Estrés, Dolor de oídos, Zumbidos, Cefalea, Perforación del timpano, Hipoacusia)	Reducir el tiempo de exposición a través de la rotación de las tareas, Realizar pausas activas, realizar inspección preoperacional de herramientas.	Soldadores, ayudantes, ingeniero residente y coordinador de alturas.
		Iluminacion: Deficiencia de iluminacion (Sobreesfuerzo visual, Agotamiento visual, Encandilamiento, Golpes, Nistagmus, tropesones)	Proveer iluminacion artificial resistente al agua.	Soldadores, ayudantes, ingeniero residente y coordinador de alturas.
		Vibración: Manipulación de equipos (taladro) (Dolor abdominal, Problemas de equilibrio, Cefalea, Artrosis, Problemas neurológicos, Mareo, Vomito).	Reducir el tiempo de exposición a través de la rotación de las tareas, Realizar pausas activas, Realizar los exámenes periódicos, Verificar el estado y mantenimiento de los equipos (preoperacional).	Soldadores, ayudantes, ingeniero residente y coordinador de alturas.
		Temperaturas Extremas: Calor por luz Solar (Agotamiento físico, Deshidratación, Desmayos, Hipertermia).	Proveer ventilación adecuada para el lugar de trabajo, Realizar rotación de la tarea, Suministrar periódicamente agua potable, Suministrar la cantidad requerida de suero oral.	Soldadores, ayudantes, ingeniero residente y coordinador de alturas.
	BIOMECÁNICO	**Manipulacion manual de cargas:** Levantamiento manual de equipos y materiales; **Esfuerzo:** traslado de carretilla. **Postura prolongada, mantenida, forzada**	Calistenia, Respetar pesos en levantamiento y manipulación de cargas, carga máxima para levantar 25 kg (Hombres), 12.5 kg (Mujeres) Carga máxima para transportar 40 kg (Hombres), 20 kg (Mujeres), Adoptar posiciones adecuadas de trabajo, Pausas Activas, Rotacion del puesto de trabajo, Utilización de ayudas mecánicas (pluma o grua), Capacitación al personal sobre manipulación manual de cargas.	Soldadores, ayudantes, ingeniero residente y coordinador de alturas.
	QUIMICO	**Material particulado:** por trabajos con pulidora; **Gases y Vapores:** por manipulacion Gas Propano y oxigeno; **Humus metalicos:** uso de soldadura electrica: (Afecciones respiratorias, Alergias, Carcinognesis, Dermatitis, intoxicación, Irritación nasal y ocular)	Uso de EPP adecuados para cada producto químico utilizado: como caretas, protectores respiratorios con filtro si se requiere, gafas de seguridad. Proveer ventilación artificial adecuada para el lugar de trabajo o si se presenta acumulación de particulas.	Soldadores, ayudantes, ingeniero residente y coordinador de alturas.
	BIOLOGICO	**Picaduras:** presencia de mosquitos y/o zancudos; **Mordeduras:** presencia de servientes (Alergias, Enrojecimiento de la piel, Brote, infecciones, transmision de enfermedades endemicas, intoxicacion, muerte)	Verificación del esquema de vacunación, Realizar inspeccion de areas de trabajo antes de iniciar la tarea, Capacitación relacionada al peligro, uso de dotación (camisa manga larga, pantalón, botas) y uso de EPP´S (guantes), Eliminar criaderos (orden y aseo en zonas de empozamiento de aguas).	Soldadores, ayudantes, ingeniero residente y coordinador de alturas.

	PSICOSOCIAL	**Gestión organizacional:** estilo de mando, inducción, capacitación, manejo de cambios, evaluación del desempeño; **Organización del trabajo:** comunicación; **Caracteristicas del grupo social de trabajo:** trabajo en equipo; **Interfase persona tarea:** conocimientos y habilidades, identificación de la tarea; **Jornadas de trabajo:** horas extras (Stres, Sobrecarga laboral, Conflictos interpersonales, Consecuencias psicológicas (ansiedad, miedo, depresión e inseguridad))	Capacitación del personal en los estándares de seguridad asociados al desarrollo de la labor, Charlas de planeación de trabajos a realizar, asignación adecuada de funciones del personal en función de sus competencias y experiencia, Mantener siempre una comunicación asertiva en el equipo de trabajo, Pausas activas, Rotación del personal, Retomar prácticas de la buena comunicación, Campañas y capacitaciones de autocuidado.	Soldadores, ayudantes y coordinador de alturas.
	NATURALES	**Precipitaciones de lluvias y Sismos** (Atrapamiento por desprendimiento de material, lesiones leves y graves por desprendimiento de material, Hipotermia, Susceptibilidad a los virus (gripe, entre otras), Descargas Electricas)	Implementacion del plan de emergencias y capacitación a los trabajadores en los procedimientos operativos normalizados (PON), Uso de carpas, uso de dotacion de invierno o lluvia, uso de botas de caucho, apuntalamientos, identificar las rutas de evacuación y punto de encuentro, Inspeccionar las áreas susceptibles a sufrir derrumbes e intervenir con medidas preventivas y/o correctivas, Conformación, identificación y capacitación de las brigadas de emergencias, Contar con kit de rescate, suspender actividades en presencia de lluvia y tormenta electrica, Registro de MEDEVAC, Identificar y atender al sistema de ALARMA.	Soldadores, ayudantes y coordinador de alturas.

OBSERVACIONES: EMPRESA CONTRATISTA SANOSOL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS

EQUIPO QUE ELEBORA EL ATS

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
GUSTAVO MEDINA	COORDINADOR SGSST	
JESUS Villamizar	Soldador	
Guillermo Osorio	INGENIERO RESIDENTE	

SOCIALIZADO A:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
LUIS Miguel contreras	Ayudante	
Carlos Lines	soldador	
JOSE J CRESPO S	AYUDANTE	
AURIS NELSON SALGADO	PINTOR	
JESUS Villamizar	Soldador	

RESPONSABLE DEL TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
JESUS Villamizar	Soldador	
Guillermo Osorio	INGENIERO RESIDENTE	

SOCIALIZADO POR

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
GUSTAVO MEDINA	COORDINADOR SGSST	

ANEXO 4. PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y CERTIFICACIÓN CONTADOR.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901965630	1	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VILLAVICENCIO	CL 15 40 01	VILLAVICENCIO-META	3142334798	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	364132902	9506011959	E	2026/06/09	2026/06/04	BANCOLOMBIA	0	$8,685,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: VILLAVICENCIO (1 Afiliados)						$11,561,000	$1,965,600			$11,561,000	$462,500			$11,561,000	$462,500			$11,561,000	$60,400		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (1 Afiliados)						$11,561,000	$1,965,600			$11,561,000	$462,500			$11,561,000	$462,500			$11,561,000	$60,400		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)						$11,561,000	$1,965,600			$11,561,000	$462,500			$11,561,000	$462,500			$11,561,000	$60,400		$0	$0
1	CC	86051533	MUÑOZ LUIS	230301	30	$11,561,000	$1,965,600	EPS005	30	$11,561,000	$462,500	CCF34	30	$11,561,000	$462,500	14-11	30	$11,561,000	$60,400	30	$0	$0

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CAG RESGUARDOS INDIGENAS (9 Afiliados)						$18,531,238	$2,965,600			$18,531,238	$741,800			$18,882,995	$748,800			$18,531,238	$1,278,000		$0	$0
Centro de Trabajo: CAG RESGUARDOS INDIGENAS (9 Afiliados)						$18,531,238	$2,965,600			$18,531,238	$741,800			$18,882,995	$748,800			$18,531,238	$1,278,000		$0	$0
Ciudad: PUERTO GAITAN Depto: META (9 Afiliados)						$18,531,238	$2,965,600			$18,531,238	$741,800			$18,882,995	$748,800			$18,531,238	$1,278,000		$0	$0
2	CC	40326478	AREVALO FRANCY	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
3	CC	1120864265	BARRIOS EDWIN	230301	30	$1,850,905	$296,200	EPS002	30	$1,850,905	$74,100	CCF34	30	$2,202,662	$88,200	14-11	30	$1,850,905	$128,900	30	$0	$0
4	CC	1103470729	CORREA MIGUEL	230301	30	$1,850,905	$296,200	CCFC55	30	$1,850,905	$74,100	CCF34	30	$1,850,905	$74,100	14-11	30	$1,850,905	$128,900	30	$0	$0
5	CC	78646546	GALVAN YEFERSON	231001	27	$1,575,815	$252,200	EPS037	27	$1,575,815	$63,100	CCF34	27	$1,575,815	$63,100	14-11	27	$1,575,815	$109,700	27	$0	$0
6	CC	78646546	GALVAN YEFERSON	231001	3	$175,091	$28,100	EPS037	3	$175,091	$7,100	CCF34	3	$175,091	$0	14-11	3	$175,091	$0	3	$0	$0
7	CC	1121902403	GARZON WENDY	230301	30	$2,417,300	$386,800	EPS005	30	$2,417,300	$96,700	CCF34	30	$2,417,300	$96,700	14-11	30	$2,417,300	$168,300	30	$0	$0
8	CC	1121869998	MEDINA GUSTAVO	230301	30	$2,732,600	$437,300	EPS005	30	$2,732,600	$109,400	CCF34	30	$2,732,600	$109,400	14-11	30	$2,732,600	$190,200	30	$0	$0
9	CC	17497322	MURCIA ROSEMBERG	230301	30	$2,009,512	$321,600	EPS005	30	$2,009,512	$80,400	CCF34	30	$2,009,512	$80,400	14-11	30	$2,009,512	$139,900	30	$0	$0
10	CC	1121834340	OSORIO GUILLERMO	25-14	30	$2,417,300	$386,800	EPS037	30	$2,417,300	$96,700	CCF34	30	$2,417,300	$96,700	14-11	30	$2,417,300	$168,300	30	$0	$0
11	CC	1004819005	ROMERO DUVAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
Total			**Afiliados(10)**			$30,092,238	$4,931,200			$30,092,238	$1,204,300			$30,443,995	$1,211,300			$30,092,238	$1,338,400		$0	$0

2026/06/04 10:43 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901965630	1	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VILLAVICENCIO	CL 15 40 01	VILLAVICENCIO-META	3142334798	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	364132902	9506011959	E	2026/06/09	2026/06/04	BANCOLOMBIA	0	$8,685,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$4,931,200	$0	$0	$4,931,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,300	$0	$0	$280,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$667,000	$0	$0	$667,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$3,983,900	$0	$0	$3,983,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$1,338,400	$0	$0	$1,338,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$1,338,400	$0	$0	$1,338,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$1,211,300	$0	$0	$1,211,300
COFREM	CCF34	892,000,146	3	10	$1,211,300	$0	$0	$1,211,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				10	$1,204,300	$0	$0	$1,204,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$166,900	$0	$0	$166,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	1	$74,100	$0	$0	$74,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$74,100	$0	$0	$74,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$819,100	$0	$0	$819,100
TOTAL				10	$8,685,200	$0	$0	$8,685,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900751966	6	MUÑOZ AREVALO INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VILLAVO	primavera urbana ofc 826	VILLAVICENCIO-META	6849992	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	364107105	9506011257	E	2026/06/17	2026/06/04	BANCOLOMBIA	0	$3,723,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: VILLAVO (6 Afiliados)																						$14,090,093	$2,254,800			$14,090,093	$564,000			$14,498,547	$580,300			$14,090,093		$324,600		$0	$0		$3,723,700
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (4 Afiliados)																						$10,195,673	$1,631,600			$10,195,673	$408,100			$10,195,673	$408,100			$10,195,673		$53,500		$0	$0		$2,501,300
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (4 Afiliados)																						$10,195,673	$1,631,600			$10,195,673	$408,100			$10,195,673	$408,100			$10,195,673		$53,500		$0	$0		$2,501,300
1	CC	40326478	AREVALO GARZON FRANCY CAROLINA																	25-14	30	$3,553,851	$568,700	EPS005	30	$3,553,851	$142,200	CCF34	30	$3,553,851	$142,200	14-11	30	$3,553,851	0.522%	$18,600	30	$0	$0	SI	$871,700
2	CC	40328285	GOMEZ LEAL LINA MARCELA																	230301	30	$2,050,905	$328,200	EPS005	30	$2,050,905	$82,100	CCF34	30	$2,050,905	$82,100	14-11	30	$2,050,905	0.522%	$10,800	30	$0	$0	SI	$503,200
3	CC	40395435	MACHADO TEJEIRO DIVA YAMIRA																	25-14	30	$2,840,012	$454,500	EPS005	30	$2,840,012	$113,700	CCF34	30	$2,840,012	$113,700	14-11	30	$2,840,012	0.522%	$14,900	30	$0	$0	SI	$696,800
4	CC	1092394700	PARADA MARTINEZ GENESIS PAOLA																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
Centro de Trabajo: OBRA (2 Afiliados)																						$3,894,420	$623,200			$3,894,420	$155,900			$4,302,874	$172,200			$3,894,420		$271,100		$0	$0		$1,222,400
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)																						$3,894,420	$623,200			$3,894,420	$155,900			$4,302,874	$172,200			$3,894,420		$271,100		$0	$0		$1,222,400
5	CC	80013513	MUÑOZ MURCIA JEIMMY ALEJANDRO																	230301	30	$2,143,515	$343,000	EPS005	30	$2,143,515	$85,800	CCF34	30	$2,143,515	$85,800	14-11	30	$2,143,515	6.960%	$149,200	30	$0	$0	SI	$663,800
6	CC	96193788	PEREZ PEREZ OBER ASMED																X	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$2,159,359	$86,400	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$558,600
Total Afiliados(6)																						$14,090,093	$2,254,800			$14,090,093	$564,000			$14,498,547	$580,300			$14,090,093		$324,600		$0	$0		$3,723,700

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$2,254,800	$0	$0	$2,254,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,303,400	$0	$0	$1,303,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$951,400	$0	$0	$951,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$324,600	$0	$0	$324,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$324,600	$0	$0	$324,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$580,300	$0	$0	$580,300
COFREM	CCF34	892,000,146	3	6	$580,300	$0	$0	$580,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$564,000	$0	$0	$564,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$564,000	$0	$0	$564,000
TOTAL				6	$3,723,700	$0	$0	$3,723,700

1280

Villavicencio, 04 de junio de 2026

C E R T I F I C A C I Ó N:

Yo, **DIVA YANIRA MACHADO TEJEIRO**, identificada con Cédula de ciudadanía. No. 40.395.435 de Villavicencio y TP 227117 -T, designada como Contadora del **CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025**, identificado con **NIT. 901.965.630-1**, certifico que en la ejecución del CONTRATO DE OBRA No. 0821 de 2025, CON OBJETO "CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META" la entidad cumplió del 01 de mayo de 2026 al 31 de mayo de 2026 en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que corresponden respecto al Sistema de Seguridad Social, y en las ocasiones que se ha dado lugar a dichos pagos, en cuanto salud, pensiones y riesgos laborales, y en las circunstancias en las que ha sido necesario los aportes parafiscales al Servicios Nacional de Aprendizaje, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las Cajas de Compensación Familiar, por lo tanto la empresa se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

La presente certificación se expide a los cuatro (04) días del mes de junio del año 2026.

Cordialmente,

LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA
C.C. 86.051.533 DE VILLAVICENCIO
R.L. CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025

DIVA YANIRA MACHADO TEJEIRO
C.C. 40.395.435 DE VILLAVICENCIO
CONTADORA PUBLICA
TP 227117-T

12002

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 40.395.435
MACHADO TEJEIRO
APELLIDOS
DIVA YANIRA
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 05-ENE-1972
VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.55 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
24-SEP-1990 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-5200100-00126010-F-0040395435-20081106 0005570214A 1 6720006039

PARA CERTIFICAR DOCUMENTOS DE SEGURIDAD SOCIAL
COMO CONTADOR DEL CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

227117-T

DIVA YANIRA
MACHADO TEJEIRO
C.C. 40395435
RES. INSCRIPCION 297 DEL 31/03/2017
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS



OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

231370 244594

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

17003

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:
F4120C9C7A3AAB47

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DIVA YANIRA MACHADO TEJEIRO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 40395435 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 227117-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 30 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

ANEXO 5. NOMINAS DEL PERSONAL.

1/2025

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025

NIT. 901.965.630-1

Nomina del día 01 al 15 de Mayo de 2.026

				DEVENGADO								DEDUCCIONES						
Nombre del Empleado	No. Identificación	Cargo	RIESGO	Sueldo basico	Dias trabajados	Total basico	Aux de transporte	Licencia Remunerada	Incapacidad (EPS/ARL)	Pacto No Salarial	Total Devengado	Salud	Pension	Fondo Solidaridad Pensional	Anticipo a Nómina	Total Deducciones	Neto Pagado	OBSERVACIONES
AREVALO GARZON FRANCY CAROLINA	40.326.478	DIRECTOR DE OBRA	5	$ 1.750.905	15	$ 875.453	$ 124.548	$ -	$ -	$ -	$ 1.000.000	$ 35.018	$ 35.018	$ -	$ -	$ 70.036	$ 929.964	Se envia desprendible de nómina al correo: CAROLINA05_INGCIVIL@hotmail.com
GARZO GARCIA WENDY VANESA	1.121.902.403	INGENIERO RESIDENTE 2	5	$ 2.417.300	15	$ 1.208.650	$ 124.548	$ -	$ -	$ -	$ 1.333.198	$ 48.346	$ 48.346	$ -		$ 96.692	$ 1.236.506	Se envia desprendible de nómina al correo: ing.wvg2@gmail.com
MEDINA PARDO GUSTAVO ADOLFO	1.121.869.998	COORDINADOR SST	5	$ 2.732.600	15	$ 1.366.300	$ 124.548	$ -	$ -	$ -	$ 1.490.848	$ 54.652	$ 54.652	$ -	$ -	$ 109.304	$ 1.381.544	Se envia desprendible de nómina al correo: g.pardo09@gmail.com
MUÑOZMURCIA LUIS FERNANDO	86.051.533	REPRESENTANTE LEGAL	1	$ 11.561.000	15	$ 5.780.500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.780.500	$ 231.220	$ 231.220	$ 57.805	$ -	$ 520.245	$ 5.260.255	Se envia desprendible de nómina al correo: ingluisfernandom@gmail.com
MURCIA JOJOA ROSEMBERG	17.497.322	CONDUCTOR	5	$ 2.009.512	15	$ 1.004.756	$ 124.548	$ -	$ -	$ -	$ 1.129.304	$ 40.190	$ 40.190	$ -	$ -	$ 80.380	$ 1.048.923	Se envia desprendible de nómina al correo: asesoriasfym@outlook.com
OSORIO VARGAS GUILLERMO ALBERTO	1.121.834.340	INGENIERO RESIDENTE 1	5	$ 2.417.300	15	$ 1.208.650	$ 124.548	$ -	$ -	$ -	$ 1.333.198	$ 48.346	$ 48.346	$ -	$ -	$ 96.692	$ 1.236.506	Se envia desprendible de nómina al correo: eskp87@hotmail.com
TOTALES						$ 11.444.309	$ 622.738	$ -		$ -	$ 12.067.046	$ 457.772	$ 457.772	$ 57.805	$ -	$ 973.350	$ 11.093.696	

A cargo del empleador								
Seguridad Social			%	Valor	Provisiones Prest. Soc y Vac.	%		Valor
Salud			0,0%	$ 0	Cesantias	8,330%		$ 1.005.185
Fondo de Pensiones			12%	$ 1.373.317	Intereses sobre cesantias	1%		$ 120.670
ARL (riesgos laborales)	Seleccione la tarifa:	I	0,522%	$ 30.174	Prima	8,330%		$ 1.005.185
		IV	4,350%	$ 0	Vacaciones	4,170%		$ 477.226
		V	6,960%	$ 394.201				
Total Seguridad Social				$ 1.797.692	Total prestaciones sociales			$ 2.608.268

Parafiscales			%	Valor
Caja Compensación Familiar			4%	$ 457.772
ICBF			0%	$ 0
SENA			0%	$ 0
Total Parafiscales				$ 457.772

Total a cargo del empleador	$ 4.863.733

Dias de la nomina	30
Horas trabajadas en el dia	7,33

Salario Minimo Legal Vigente 2026	$ 1.750.905
Auxilio de transporte	$ 249.095

RIESGO ARL	
Tipo	Tarifa
I	0,52%
II	1,04%
III	2,44%
IV	4,35%
V	6,96%

IMPORTANTE!
Se encuentra exonerado de pago de aporte de Parafiscales y Salud Ley 1607 de 2012?
marque con una "X" si es asi.
SI X

FECHA ENVIO DESPRENDIBLES DE NOMINA
FECHA DE CONSIGNACIÓN DE LA NOMINA

NOVEDAD	
LICENCIA REMUNERADA	
ANTICIPO A NOMINA	

NOMBRE DEL EMPLEADO	No. Identificación	Basico	Valor hora ordinaria	Cant hora extra diurnas	Valor hora extra diurna	Cant hora extra nocturna	Valor hora extra nocturna	Cant hora extra dom festivo	Valor hora extra dom festivo	Cant hora extra recargo nocturno	Valor hora extra recargo nocturno	TOTAL HORAS EXTRAS
			MENSUAL	HORAS EXTRAS DIURNAS	EXTRA DIURNA							
AREVALO GARZON FRANCY CAROLINA	40.326.478	$ 1.750.905	7.982	0	-	0	-	0	-	0	-	-
GARZO GARCIA WENDY VANESA	1.121.902.403	$ 2.417.300	10.993	0	-	0	-	0	-	0	-	-
MEDINA PARDO GUSTAVO ADOLFO	1.121.869.998	$ 2.732.600	12.427	0	-	0	-	0	-	0	-	-
MUÑOZMURCIA LUIS FERNANDO	86.051.533	$ 11.561.000	52.574	0	-	0	-	0	-	0	-	-
MURCIA JOJOA ROSEMBERG	17.497.322	$ 2.009.512	9.138	0	-	0	-	0	-	0	-	-
OSORIO VARGAS GUILLERMO ALBERTO	1.121.834.340	$ 2.417.300	10.993	0	-	0	-	0	-	0	-	-
TOTALES				0	-	0	-	0	-	0	-	-

DIVA YANIRA MACHADO TEJEIRO
Ppal CONTADORA

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Consorcio Aguas Gait - Nit: 901965630

Martes, 19 de mayo de 2026, 8:45:02 a.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
15 May 2026

Nombre del destinatario
Francy Carolina Ar

Identificación destinatario
40326478

Producto destino
489 - 1904 - 05

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Banco Bbva

Valor
COP $ 929.964,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKB

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 190.159.137.73

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Consorcio Aguas Gait - Nit: 901965630
Viernes, 15 de mayo de 2026, 1:55:07 p.m.

1003

Número del registro
2

Fecha de aplicación
15 May 2026

Nombre del destinatario
Wendy Vanesa Garzo

Identificación destinatario
1121902403

Producto destino
844 - 889442 - 31

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.236.506,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.159.137.73

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Consorcio Aguas Gait - Nit: 901965630
Viernes, 15 de mayo de 2026, 1:56:06 p.m.

Número del registro
3

Nombre del destinatario
Gustavo Adolfo Med

Producto destino
312 - 53640 - 66

Banco
Nequi

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
15 May 2026

Identificación destinatario
1121869998

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 1.381.544,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Consorcio Aguas Gait - Nit: 901965630
Martes, 19 de mayo de 2026, 8:44:15 a.m.

1209

Número del registro
4

Fecha de aplicación
15 May 2026

Nombre del destinatario
Luis Fernando Mu O

Identificación destinatario
86051533

Producto destino
970 - 700522 - 34

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Banco Davivienda

Valor
COP $ 5.260.255,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKB

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.159.137.73

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Consorcio Aguas Gait - Nit: 901965630
Viernes, 15 de mayo de 2026, 1:56:23 p.m.

Número del registro
5

Fecha de aplicación
15 May 2026

Nombre del destinatario
Rosemberg Murcia

Identificación destinatario
17497322

Producto destino
844 - 000062 - 51

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.048.923,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 190.159.137.73

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Consorcio Aguas Gait - Nit: 901965630

Viernes, 15 de mayo de 2026, 1:56:41 p.m.

Número del registro
6

Fecha de aplicación
15 May 2026

Nombre del destinatario
Guillermo Alberto

Identificación destinatario
1121834340

Producto destino
849 - 684865 - 69

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.236.506,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.159.137.73

1202

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025

NIT. 901.955.630-1

Nomina del día 16 al 31 de Mayo de 2.026

				DEVENGADO								DEDUCCIONES							
Nombre del Empleado	No. Identificación	Cargo	Riesgo	Sueldo basico	Dias trabajados	Total basico	Aux de transporte	Licencia Remunerada	Incapacidad (EPS/ARL)	Pago No Salarial	Total Devengado	Salud	Pension	Fondo Solidaridad Pensional	Retencion en la Fuente	Anticipo a Nómina	Total Deducciones	Neto Pagado	OBSERVACIONES
AREVALO GARZON FRANCY CAROLINA	40.326.478	DIRECTOR DE OBRA	5	$ 1.750.905	15	$ 875.453	$ 124.548	$ -	$ -	$ -	$ 1.000.000	$ 35.018	$ 35.018	$ -	$ -		$ 70.036	$ 929.964	Se envia desprendible de nómina al correo: CAROLINA05_INGCIVIL@hotmail.com
GARZO GARCIA WENDY VANESA	1.121.902.403	INGENIERO RESIDENTE 2	5	$ 2.417.300	15	$ 1.208.650	$ 124.548	$ -	$ -	$ -	$ 1.333.198	$ 48.346	$ 48.346	$ -			$ 96.692	$ 1.236.506	Se envia desprendible de nómina al correo: ing.wvg2@gmail.com
MEDINA PARDO GUSTAVO ADOLFO	1.121.869.998	COORDINADOR SST	5	$ 2.732.600	15	$ 1.366.300	$ 124.548	$ -	$ -	$ -	$ 1.490.848	$ 54.652	$ 54.652	$ -	$ -		$ 109.304	$ 1.381.544	Se envia desprendible de nómina al correo: g.pardo09@gmail.com
MUÑOZMURCIA LUIS FERNANDO	86.051.533	REPRESENTANTE LEGAL	1	$ 11.561.000	15	$ 5.780.500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.780.500	$ 231.220	$ 231.220	$ 57.805	$ 254.000		$ 774.245	$ 5.006.255	Se envia desprendible de nómina al correo: lngluisfernandom@gmail.com
MURCIA JOJOA ROSEMBERG	17.497.322	CONDUCTOR	5	$ 2.009.512	15	$ 1.004.756	$ 124.548	$ -	$ -	$ -	$ 1.129.304	$ 40.190	$ 40.190	$ -	$ -		$ 80.380	$ 1.048.923	Se envia desprendible de nómina al correo: asesoriasfym@outlook.com
OSORIO VARGAS GUILLERMO ALBERTO	1.121.834.340	INGENIERO RESIDENTE 1	5	$ 2.417.300	15	$ 1.208.650	$ 124.548	$ -	$ -	$ -	$ 1.333.198	$ 48.346	$ 48.346	$ -	$ -		$ 96.692	$ 1.236.506	Se envia desprendible de nómina al correo: eskp87@hotmail.com
TOTALES						$ 11.444.309	$ 622.738	$ -		$ -	$ 12.057.046	$ 457.772	$ 457.772	$ 57.805	$ 254.000		$ 1.227.350	$ 10.839.696	

A cargo del empleador							
Seguridad Social		%	Valor	Provisiones Prest. Soc y Vac.	%		Valor
Salud		0,0%	$ 0	Cesantias	8,330%		$ 1.005.185
Fondo de Pensiones		12%	$ 1.373.317	Intereses sobre cesantias	1%		$ 120.670
ARL (riesgos laborales) Seleccione la tarifa:	I	0,522%	$ 30.174	Prima	8,330%		$ 1.005.185
	IV	4,350%	$ 0	Vacaciones	4,170%		$ 477.228
	V	6,960%	$ 394.201				
Total Seguridad Social			$ 1.797.692	Total prestaciones sociales			$ 2.608.268
Parafiscales			%	Valor			
Caja Compensación Familiar			4%	$ 457.772			
ICBF			0%	$ 0			
SENA			0%	$ 0			
Total Parafiscales				$ 457.772			

Salario Minimo Legal Vigente 2026	$ 1.750.905
Auxilio de transporte	$ 249.095

RIESGO ARL	
Tipo	Tarifa
I	0,52%
II	1,04%
III	2,44%
IV	4,35%
V	6,96%

FECHA ENVIO DESPRENDIBLES DE NOMINA
FECHA DE CONSIGNACIÓN DE LA NOMINA

IMPORTANTE!	
Se encuentra exonerado de pago de aporte de Parafiscales y Salud Ley 1607 de 20122	
marque con una "X" si es asi.	
SI	X

otal a cargo del empleador	$ 4.863.733

Días de la nomina	30
Horas trabajadas en el día	7,33

NOVEDAD	
LICENCIA REMUNERADA	
ANTICIPO A NOMINA	

NOMBRE DEL EMPLEADO	No. Identificación	Basico	Valor hora ordinaria	Cant horas extra ordinarias DIURNAS	Valor hora extra ordinaria DIURNA	Cant horas extra ordinarias	Valor hora extra ordinaria	Cant horas extra dom. o fest. Diurna	Valor hora extra dom. o fest. Diurna	Cant horas extra dom. o fest. Nocturna	Valor hora extra dom. o fest. Nocturna	TOTAL HORAS EXTRAS
AREVALO GARZON FRANCY CAROLINA	40.326.478	$ 1.750.905	7.962	0	-	0	-	0	-	0	-	-
GARZO GARCIA WENDY VANESA	1.121.902.403	$ 2.417.300	10.993	0	-	0	-	0	-	0	-	-
MEDINA PARDO GUSTAVO ADOLFO	1.121.869.998	$ 2.732.600	12.427	0	-	0	-	0	-	0	-	-
MUÑOZMURCIA LUIS FERNANDO	86.051.533	$ 11.561.000	52.574	0	-	0	-	0	-	0	-	-
MURCIA JOJOA ROSEMBERG	17.497.322	$ 2.009.512	9.138	0	-	0	-	0	-	0	-	-
OSORIO VARGAS GUILLERMO ALBERTO	1.121.834.340	$ 2.417.300	10.993	0	-	0	-	0	-	0	-	-
TOTALES				0	-	0	-	0	-	0	-	-

DIVA YANIRA MACHADO TEJEIRO
V°B° CONTADORA

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Consorcio Aguas Gait - Nit: 901965630
Martes, 02 de junio de 2026, 3:22:17 p.m.

1205

Número del registro
1

Fecha de aplicación
30 May 2026

Nombre del destinatario
Francy Carolina Ar

Identificación destinatario
40326478

Producto destino
489 - 1904 - 05

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Banco Bbva

Valor
COP $ 929.964,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKB

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 190.159.137.73

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Consorcio Aguas Gait - Nit: 901965630
Lunes, 01 de junio de 2026, 10:22:32 a.m.

1204

Número del registro
2

Fecha de aplicación
30 May 2026

Nombre del destinatario
Wendy Vanesa Garzo

Identificación destinatario
1121902403

Producto destino
844 - 889442 - 31

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.236.506,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 190.159.137.73

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Consorcio Aguas Gait - Nit: 901965630
Lunes, 01 de junio de 2026, 10:27:05 a.m.

Número del registro
3

Nombre del destinatario
Gustavo Adolfo Med

Producto destino
312 - 53640 - 66

Banco
Nequi

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
30 May 2026

Identificación destinatario
1121869998

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 1.381.544,00

Código
OKA

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia



Dirección IP: 190.159.137.73

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Consorcio Aguas Gait - Nit: 901965630

Martes, 02 de junio de 2026, 3:21:39 p.m.

Número del registro
4

Fecha de aplicación
30 May 2026

Nombre del destinatario
Luis Fernando Mu O

Identificación destinatario
86051533

Producto destino
970 - 700522 - 34

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Banco Davivienda

Valor
COP $ 5.006.255,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKB

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 190.159.137.73

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Consorcio Aguas Gait - Nit: 901965630
Lunes, 01 de junio de 2026, 10:27:24 a.m.

Número del registro
5

Fecha de aplicación
30 May 2026

Nombre del destinatario
Rosemberg Murcia

Identificación destinatario
17497322

Producto destino
844 - 000062 - 51

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.048.923,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 190.159.137.73

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Consorcio Aguas Gait - Nit: 901965630
Lunes, 01 de junio de 2026, 10:27:40 a.m.

Número del registro
6

Fecha de aplicación
30 May 2026

Nombre del destinatario
Guillermo Alberto

Identificación destinatario
1121834340

Producto destino
849 - 684865 - 69

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.236.506,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 190.159.137.73

CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025

NIT. 901.965.630-1

Nomina del día 01 al 31 de Mayo de 2.026

NOMINA MENSUAL

				DEVENGADO								DEDUCCIONES						
Nombre del Empleado	No. Identificación	Cargo	RIESGO	Sueldo basico	Dias trabajados	Total basico	Aux de transporte	Horas Extras / Recargos	Incapacidad (EPS/ARL)	Pacto No Salarial	Total Devengado	Salud	Pension	Fondo Solidaridad Pensional	Retefuente Laborales	Total Deducciones	Neto Pagado	OBSERVACIONES
BARRIOS POLOCHE EDWIN ALEJANDRO (R)	1.120.864.265	OFICIAL DE OBRA	5	$ 1.850.905	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	Se envia desprendible de nómina al correo: vanessazuarez1981@gmail.com
CORREA OJEDA MIGUEL DIOSIO	1.103.470.729	OFICIAL DE OBRA	5	$ 1.850.905	30	$ 1.850.905	$ 249.095	$ -	$ -	$ 200.000	$ 2.300.000	$ 74.036	$ 74.036	$ -	$ -	$ 148.072	$ 2.151.928	Se envia desprendible de nómina al correo: tanlaarianlscorreasuarez@gmail.com
GALVAN MONTES YEFERSON ENRIQUE (INC LB)	78.646.546	OPERADOR DE MAQUINARIA	5	$ 1.750.905	27	$ 1.575.815	$ 224.186	$ -	$ 175.091	$ 180.000	$ 2.155.091	$ 70.036	$ 70.036	$ -	$ -	$ 140.072	$ 2.015.018	Se envia desprendible de nómina al correo: jeffersong1984@gmail.com
ROMERO AREVALO DUVAN ARLEY	1.004.819.005	AYUDANTE DE OBRA	5	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ -	$ -	$ 100.000	$ 2.100.000	$ 70.036	$ 70.036	$ -	$ -	$ 140.072	$ 1.959.928	Se envia desprendible de nómina al correo: duvan260425@hotmail.com
						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
TOTALES						$ 5.177.625	$ 722.376	$ -		$ 480.000	$ 6.555.091	$ 214.109	$ 214.109	$ -	$ -	$ 428.217	$ 6.126.873	

Total a cargo del empleador		$ 2.512.866
Días de la nomina		30
Horas trabajadas en el día		7,33

	SI	NO
SE INDICA SI HUBO HORAS EXTRAS PARA UNO O VARIOS TRABAJADORS	X	

NOMBRE DEL EMPLEADO	No. Identificación	Sueldo	Valor Hora Ordinaria (SUELDO/240)	Cant. Horas extra diurnas (H.EXTRAS DIURNAS)	Valor hora extra diurna (EXTRA DIURNA)	Cant. horas extra nocturna	Valor hora extra nocturna	Cant. horas extra dia festivo	Valor hora extra dia festivo	Cant. hora extra nocturna festivo	Valor hora extra nocturna festivo	TOTAL HORAS EXTRAS
BARRIOS POLOCHE EDWIN ALEJANDRO (R)	1.120.864.265	$ 1.850.905	8.417	0	-	0	-	0	-	0	-	-
CORREA OJEDA MIGUEL DIOSIO	1.103.470.729	$ 1.850.905	8.417	0	-	0	-	0	-	0	-	-
GALVAN MONTES YEFERSON ENRIQUE (INC LB)	78.646.546	$ 1.750.905	7.962	0	-	0	-	0	-	0	-	-
ROMERO AREVALO DUVAN ARLEY	1.004.819.005	$ 1.750.905	7.962	0	-	0	-	0	-	0	-	-
0	-			0		0		0		0		
								-				
TOTALES				0		0		0		0		

NOVEDAD	
RETIRO 30.05.2026	
BARRIOS POLOCHE EDWIN ALEJANDRO (R)	Dias laborales en la Equidación de Prestaciones Sociales
INCAPACIDAD LABORAL	
GALVAN MONTES YEFERSON ENRIQUE (INC LB)	INICIO 28 DE MAYO

DIVA YANIRA MACHADO TEJEIRO
V°B° CONTADORA

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Consorcio Aguas Gait - Nit: 901965630

Lunes, 01 de junio de 2026, 10:28:17 a.m.

11020

Número del registro
1

Fecha de aplicación
30 May 2026

Nombre del destinatario
Miguel Diosid Corr

Identificación destinatario
1103470729

Producto destino
316 - 95229 - 44

Tipo de producto
Dep.electronico

Banco
Nequi

Valor
COP $ 2.151.928,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.159.137.73

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Consorcio Aguas Gait - Nit: 901965630

Lunes, 01 de junio de 2026, 10:29:01 a.m.

Número del registro
2

Fecha de aplicación
30 May 2026

Nombre del destinatario
Yeferson Enrique G

Identificación destinatario
78646546

Producto destino
849 - 595474 - 91

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 2.015.018,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 190.159.137.73

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Consorcio Aguas Gait - Nit: 901965630

Lunes, 01 de junio de 2026, 10:29:22 a.m.

Número del registro
3

Fecha de aplicación
30 May 2026

Nombre del destinatario
Duvan Arley Romero

Identificación destinatario
1004819005

Producto destino
311 - 49818 - 93

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Nequi

Valor
COP $ 1.959.928,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 190.159.137.73

CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025
NIT: 901.965.630-1
LIQUIDACIÓN DE CONTRATO
OBRA O LABOR

1203

NOMBRE:	**EDWIN ALEJANDRO BARRIOS POLOCHE**
C.C.:	1.120.864.265 de Puerto Gaitán (Meta)
CARGO:	OFICIAL DE OBRA
CAUSA DE LA LIQUIDACIÓN:	**RENUNCIA VOLUNTARIA**

Contrato No. CAG-COL-01.26

PERIODO DE LIQUIDACIÓN	
FECHA TERMINACIÓN DE CONTRATO	30-05-2026
FECHA DE INICIO CONTRATO	13-01-2026
TIEMPO TOTAL LABORADO	138
VALOR HORAS EXTRAS PENDIENTE DE PAGO	$ -
DÍAS SALARIO PENDIENTES POR CANCELAR	30

SALARIO BASE DE LIQUIDACIÓN:	
SUELDO BÁSICO:	$ 1.850.905
AUXILIO DE TRANSPORTE:	$ 249.095
PROMEDIO SALARIO VARIABLE	$ -
TOTAL BASE DE LIQUIDACIÓN:	**$ 2.100.000**
SANCIONES EN DÍAS	0,00

PRIMA	
FECHA DE LIQUIDACIÓN PRIMA	30-05-2026
FECHA DE CORTE PRIMA	13-01-2026
DÍAS PRIMA	**138,00**

CESANTÍAS	
FECHA DE LIQUIDACIÓN CESANTÍAS	30-05-2026
FECHA DE CORTE CESANTÍAS	13-01-2026
DÍAS CESANTÍAS	**138,00**

VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACIÓN VACACIONES	30-05-2026
FECHA DE CORTE VACACIONES	13-01-2026
TOTAL DÍAS DE VACACIONES	5,8
DÍAS TOMADOS DE VACACIONES	0,0
DÍAS PENDIENTES	**5,8**

INTERESES A LAS CESANTÍAS	
FECHA DE LIQUIDACIÓN INTERESES	30-05-2026
FECHA DE CORTE INTERESES	13-01-2026
DÍAS INTERESES	**138,00**

PERMISO NO REMUNERADO	**0 DIA**

RESUMEN LIQUIDACIÓN PAGOS

CONCEPTO	CALCULO	TOTAL
DÍAS DE VACACIONES PENDIENTES:		$ 354.757
CESANTÍAS :		$ 805.000
INTERESES DE CESANTÍAS		$ 37.030
PRIMA SERVICIOS		$ 805.000
DOMINICAL		$ -
SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:		$ 1.850.905
HORAS EXTRAS PENDIENTE POR CANCELAR:		$ -
PACTO NO SALARIAL (NO CONSTITUYEN SALARIO)		$ -
AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCELAR		$ 249.095
TOTAL DEVENGOS		**$ 4.101.787**

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACIÓN :

CONCEPTO	PORCENTAJE	BASE	TOTAL
SALUD:	4%		$ -74.036
PENSIÓN:	4%		$ -74.036
PRESTAMOS O ANTICIPOS:			$ -
DEVOLUCION NOMINA			$ -
TOTAL DEDUCCIONES			**$ -148.072**

VALOR LIQUIDACIÓN	**$ 3.953.714**
LA SUMA DE:	TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS M/C

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

Edwin Barrios.

EDWIN ALEJANDRO BARRIOS POLOCHE
C.C.: 1.120.864.265 de Puerto Gaitán (Meta)

Elaboró: D.M.
Fecha: 28/05/2026

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Consorcio Aguas Gait - Nit: 901965630

Lunes, 01 de junio de 2026, 10:36:45 a.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
30 May 2026

Nombre del destinatario
Edwin Alejandro Ba

Identificación destinatario
1120864265

Producto destino
289 - 964115 - 18

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 3.953.714,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

2025

MUÑOZARÉVALO INGENIERÍA SAS

MUÑOZ AREVALO INGENIERIA S.A.S.

NIT. 900.751.966-6

Nomina del dia 01 al 15 de Mayo de 2.026

NOMINA PERSONA CAG 2026

				DEVENGADO									DEDUCCIONES								
Nombre del Empleado	No. Identificación	Cargo	RIESGO	Sueldo basico	Dias trabajados	Total basico	Aux de transporte	INCAPACIDAD EGMRL	Licencia Remunerada / Calamidad Domestica	ANTICIPO A NOMINA	Vacaciones compensadas en dinero	Total Devengado	Salud	Pension	Fondo de Solidaridad Pensional	Retencion en la Fuente	Anticipo a nómina	Otras Deducciones	Total Deducciones	Neto Pagado	OBSERVACIÓN
GOMEZ LEAL LINA MARCELA	40.328.285	ASISTENTE CONTABLE	1	$ 2.050.905	15	$ 1.025.453	$ 124.548	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.150.000	$ 41.018	$ 41.018	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 82.036	$ 1.067.964	Se envia desprendible de nómina al correo: marce.g83@hotmail.com
MACHADO TEJEIRO DIVA YANIRA	40.395.435	CONTADOR	1	$ 2.840.012	15	$ 1.420.006	$ 124.548	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.544.554	$ 56.800	$ 56.800	$ -	$ -	$ 66.425	$ -	$ 180.025	$ 1.364.528	Se envia desprendible de nómina al correo: divaya_2005@hotmail.com
MUÑOZ MURCIA JEIMMY ALEJANDRO	80.013.513	CONDUCTOR	5	$ 2.143.515	15	$ 1.071.758	$ 124.548	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.196.305	$ 42.870	$ 42.870	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 85.741	$ 1.110.564	Se envia desprendible de nómina al correo: alejandromunoz0221@gmail.com
PARADA MARTINEZ GENESIS PAOLA	1.092.394.760	SECRETARIA	1	$ 1.750.905	15	$ 875.453	$ 124.548	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.000.000	$ 35.018	$ 35.018	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 70.036	$ 929.964	Se envia desprendible de nómina al correo: paradapaola181@gmail.com
PEREZ PEREZ OBER ASMED	96.193.788	ALMACENISTA	5	$ 1.750.905	15	$ 875.453	$ 124.548	$ -	$ -	$ -	$ 408.545	$ 1.408.545	$ 51.360	$ 51.360	$ -	$ -	$ 42.045	$ -	$ 144.765	$ 1.263.780	Se envia desprendible de nómina al correo: oberperez1979@gmail.com
TOTALES						$ 5.268.121	$ 622.738	$ -	$ -	$ -	$ 408.545	$ 6.299.404	$ 227.067	$ 227.067	$ -	$ -	$ 108.470	$ -	$ 562.603	$ 5.736.800	

A cargo del empleador

SEGURIDAD SOCIAL		%	VALOR
Salud		0,0%	$ 0
Fondo de Pensiones		12%	$ 681.200
ARL (riesgos laborales)	Seleccione la tarifa: I	0,52%	$ 17.335
	IV	4,35%	$ 0
	V	6,96%	$ 135.526
Total Seguridad Social			$ 834.061

Parafiscales	%	Valor
Caja Compensación Familiar	4%	$ 227.067
ICBF	0%	$ 0
SENA	0%	$ 0
Total Parafiscales		$ 227.067

Provisiones Prest. Soc y Vac.	%	VALOR
Cesantías	8,330%	$ 524.740
Intereses sobre cesantías	1%	$ 62.994
Prima	8,330%	$ 524.740
Vacaciones	4,170%	$ 236.717
Total prestaciones sociales		$ 1.349.192

Total a cargo del empleador	$ 2.410.319

Dias de la nomina	30
Horas trabajadas en el dia	7,33

	SI	NO
SE HACEN O HUBO HORAS EXTRAS PARA LOS O LAS TRABAJADORES		x

NOMBRE DEL EMPLEADO	No. Identificación	Basico		Valor Hora Ordinaria	Cant hora extra diurna	Valor hora extra d.	Cant hora extra nocturna	Valor hora extra n.	Cant hora extra dia festivo	Valor hora extra d.f.	Cant hora extra noche festivo	Valor hora extra n.f.	TOTAL HORAS EXTRAS
GOMEZ LEAL LINA MARCELA	40.328.285	$ 2.050.905		9.327	0	-	0	-	0	-	0	-	-
MACHADO TEJEIRO DIVA YANIRA	40.395.435	$ 2.840.012		12.915	0	-	0	-	0	-	0	-	-
MUÑOZ MURCIA JEIMMY ALEJANDRO	80.013.513	$ 2.143.515		9.748	0	-	0	-	0	-	0	-	-
PARADA MARTINEZ GENESIS PAOLA	1.092.394.760	$ 1.750.905		7.962	0	-	0	-	0	-	0	-	-
PEREZ PEREZ OBER ASMED	96.193.788	$ 1.750.905		7.962	0	-	0	-	0	-	0	-	-
					0		0		0		0		
TOTALES					0		0		0		0		-

Salario Minimo Legal Vigente 2026	$ 1.750.905
Auxilio de transporte	$ 249.095

RIESGO ARL	
Tipo	Tarifa
I	0,52%
II	1,04%
III	2,44%
IV	4,35%
V	6,96%

IMPORTANTE!
Se encuentra exonerado de pago de aporte de Parafiscales y Salud Ley 1607 de 2012?
marque con una "X" si es asi.
SI: X

FECHA ENVIO DESPRENDIBLES DE NOMINA
FECHA DE CONSIGNACIÓN DE LA NOMINA

NOVEDAD	
	ANTICIPO A NOMINA

DIVA YANIRA MACHADO TEJEIRO

VBº CONTADORA

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Munoz Arevalo - Nit: 900751966

Martes, 19 de mayo de 2026, 10:49:04 a.m.

Número del registro
2

Fecha de aplicación
15 May 2026

Nombre del destinatario
Lina Marcela Gomez

Identificación destinatario
40328285

Producto destino
841 - 000003 - 20

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.067.964,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 190.159.137.73

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Munoz Arevalo - Nit: 900751966

Martes, 19 de mayo de 2026, 10:49:21 a.m.

12027

Número del registro
3

Fecha de aplicación
15 May 2026

Nombre del destinatario
Diva Machado

Identificación destinatario
40395435

Producto destino
844 - 248126 - 83

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.430.953,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 190.159.137.73

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Munoz Arevalo - Nit: 900751966

Martes, 19 de mayo de 2026, 10:49:38 a.m.

12028

Número del registro
4

Fecha de aplicación
15 May 2026

Nombre del destinatario
Alejandro Mu Oz

Identificación destinatario
80013513

Producto destino
844 - 248402 - 96

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.110.564,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 190.159.137.73

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Munoz Arevalo - Nit: 900751966

Martes, 19 de mayo de 2026, 10:50:10 a.m.

17029

Número del registro
5

Fecha de aplicación
15 May 2026

Nombre del destinatario
Genesis Paola Para

Identificación destinatario
1092394700

Producto destino
586 - 000190 - 48

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 929.964,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 190.159.137.73

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Munoz Arevalo - Nit: 900751966

Miércoles, 13 de mayo de 2026, 3:31:54 p.m.

12030

Número del registro
1

Fecha de aplicación
12 May 2026

Nombre del destinatario
Ober Asmed Perez

Identificación destinatario
96193788

Producto destino
313 - 61841 - 67

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Nequi

Valor
COP $ 1.263.780,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 190.159.137.73

MUÑOZAREVALO INGENIERIA SAS

MUÑOZ AREVALO INGENIERIA S.A.S.

NIT. 900.751.956-6

Nomina del dia 16 al 31 de Mayo de 2.026

NOMINA PERSONA CAG 2025

				DEVENGADO									DEDUCCIONES								
Nombre del Empleado	No. Identificación	Cargo	RIESGO	Sueldo basico	Dias trabajados	Total basico	Aux de transporte	INCAPACIDAD EG/ARL	Licencia Remunerada / Calamidad Domestica	ANTICIPO A NOMINA 15 Jun	Vacaciones compensadas en dinero	Total Devengado	Salud	Pension	Fondo de Solidaridad Pensional	Retencion en la Fuente	Anticipo a nómina 31 mayo	Otras Deducciones	Total Deducciones	Neto Pagado	OBSERVACIÓN
GOMEZ LEAL LINA MARCELA	40.328.285	ASISTENTE CONTABLE	1	$ 2.050.905	15	$ 1.025.453	$ 124.548	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.150.000	$ 41.018	$ 41.018	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 82.036	$ 1.067.964	Se envia desprendible de nómina al correo: marce.g83@hotmail.com
MACHADO TEJEIRO DIVA YANIRA	40.395.435	CONTADOR	1	$ 2.840.012	15	$ 1.420.006	$ 124.548	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.544.554	$ 56.800	$ 56.800	$ -	$ -		$ -	$ 113.600	$ 1.430.953	Se envia desprendible de nómina al correo: divaya_2005@hotmail.com
MUÑOZ MURCIA JEIMMY ALEJANDRO	80.013.513	CONDUCTOR	5	$ 2.143.515	15	$ 1.071.758	$ 124.548	$ -	$ -	$ 370.188	$ -	$ 1.566.493	$ 57.678	$ 57.678	$ -	$ -	$ 103.235	$ -	$ 218.591	$ 1.347.902	Se envia desprendible de nómina al correo: alejandromunoz0221@gmail.com
PARADA MARTINEZ GENESIS PAOLA	1.092.394.700	SECRETARIA	1	$ 1.750.905	15	$ 875.453	$ 124.548	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.000.000	$ 35.018	$ 35.018	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 70.036	$ 929.964	Se envia desprendible de nómina al correo: paradapaola181@gmail.com
PEREZ PEREZ OBER ASMED	96.193.788	ALMACENISTA	5	$ 1.750.905	15	$ 875.453	$ 124.548	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.000.000	$ 35.018	$ 35.018	$ -	$ -		$ -	$ 70.036	$ 929.964	Se envia desprendible de nómina al correo: oberperez1979@gmail.com
TOTALES						$ 5.268.121	$ 622.738	$ -	$ -	$ 370.188	$ -	$ 6.261.047	$ 225.532	$ 225.532	$ -	$ -	$ 103.235	$ -	$ 554.300	$ 5.706.747	

A cargo del empleador

SEGURIDAD SOCIAL		%	VALOR
Salud		0,0%	$ 0
Fondo de Pensiones		12%	$ 632.175
ARL (riesgos laborales)	Seleccione la tarifa: I	0,52%	$ 17.335
	IV	4,35%	$ 0
	V	6,96%	$ 135.526
Total Seguridad Social			$ 785.035

Prestaciones Prest. Soc y Vac.	%	VALOR
Cesantias	8,330%	$ 490.709
Intereses sobre cesantias	1%	$ 58.909
Prima	8,330%	$ 490.709
Vacaciones	4,170%	$ 219.681
Total prestaciones sociales		$ 1.259.008

Parafiscales	%	Valor
Caja Compensación Familiar	4%	$ 210.725
ICBF	0%	$ 0
SENA	0%	$ 0
Total Parafiscales		$ 210.725

Total a cargo del empleador	$ 2.255.767

Dias de la nomina	30
Horas trabajadas en el dia	7,33

Salario Minimo Legal Vigente 2026	$ 1.750.905
Auxilio de transporte	$ 249.095

RIESGO ARL	
Tipo	Tarifa
I	0,52%
II	1,04%
III	2,44%
IV	4,35%
V	6,96%

FECHA ENVIO DESPRENDIBLES DE NOMINA
FECHA DE CONSIGNACIÓN DE LA NOMINA

(IMPORTANTE)	
Se encuentra exonerado de pago de aporte de Parafiscales y Salud Ley 1607 de 2012?	
marque con una "X" si es asi.	
SI	X

	SI	NO
REPORCA SI MUTO HORAS EXTRAS PARA UNO O VARIOS TRABAJADORES		X

NOMBRE DEL EMPLEADO	No. Identificación	Basico		Valor Hora Ordinario	Cant hora extra ordinaria	Valor hora extra o.	Cant hora extra nocturna	Vr hora extra nocturna	Cant hora extra dia festivo	Valor hora extra dia festivo	Cant hora extra noche festivo	Valor hora extra noche festivo	TOTAL HORAS EXTRAS
GOMEZ LEAL LINA MARCELA	40.328.285	$ 2.050.905		9.327	0	-	0	-	0	-	0	-	-
MACHADO TEJEIRO DIVA YANIRA	40.395.435	$ 2.840.012		12.915	0	-	0	-	0	-	0	-	-
MUÑOZ MURCIA JEIMMY ALEJANDRO	80.013.513	$ 2.143.515		9.748	0	-	0	-	0	-	0	-	-
PARADA MARTINEZ GENESIS PAOLA	1.092.394.700	$ 1.750.905		7.962	0	-	0	-	0	-	0	-	-
PEREZ PEREZ OBER ASMED	96.193.788	$ 1.750.905		7.962	0	-	0	-	0	-	0	-	-
					0		0		0		0		
TOTALES					0		0		0		0		-

NOVEDAD	
ANTICIPO A NOMINA	

DIVA YANIRA MACHADO TEJEIRO

VºBº CONTADORA

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Munoz Arevalo - Nit: 900751966
Lunes, 01 de junio de 2026, 11:17:31 a.m.

1037

Número del registro
2

Fecha de aplicación
30 May 2026

Nombre del destinatario
Lina Marcela Gomez

Identificación destinatario
40328285

Producto destino
841 - 000003 - 20

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.067.964,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.159.137.73

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Munoz Arevalo - Nit: 900751966

Lunes, 01 de junio de 2026, 11:17:52 a.m.

Número del registro
3

Fecha de aplicación
30 May 2026

Nombre del destinatario
Diva Machado

Identificación destinatario
40395435

Producto destino
844 - 248126 - 83

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.430.953,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 190.159.137.73

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Munoz Arevalo - Nit: 900751966

Jueves, 21 de mayo de 2026, 4:37:18 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
21 May 2026

Nombre del destinatario
Alejandro Mu Oz

Identificación destinatario
80013513

Producto destino
844 - 248402 - 96

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.347.902,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 190.159.137.73

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Munoz Arevalo - Nit: 900751966

Lunes, 01 de junio de 2026, 11:18:10 a.m.

1295

Número del registro
4

Fecha de aplicación
30 May 2026

Nombre del destinatario
Genesis Paola Para

Identificación destinatario
1092394700

Producto destino
586 - 000190 - 48

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 929.964,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.159.137.73

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Munoz Arevalo - Nit: 900751966

Lunes, 01 de junio de 2026, 11:18:24 a.m.

Número del registro
5

Fecha de aplicación
30 May 2026

Nombre del destinatario
Ober Asmed Perez

Identificación destinatario
96193788

Producto destino
313 - 61841 - 67

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Nequi

Valor
COP $ 929.964.00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.159.137.73

ANEXO 6. PAZ Y SALVO TRABAJADORES RETIRADOS

1048

CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025

PAZ Y SALVO

Yo **EDWIN ALEJANDRO BARRIOS POLOCHE,** identificado con cédula de ciudadanía **No. 1.120.864.265** expedida en Puerto Gaitán (Meta), hago constar que el **CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025,** identificada con **NIT 901.965.630-1**, y domicilio en la ciudad de Villavicencio, cumplió con todas las obligaciones que por Ley y acuerdos privados se establecieron, en el desarrollo de las actividades como **OFICIAL DE OBRA** desempeñadas desde el **13 de enero de 2026** al 30 **de** mayo **del 2026**; en la ejecución del Contrato Obra **No. 0821 de 2025** suscrito con el MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN con objeto **"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"**, y que en consecuencia manifiesta estar de acuerdo con todos los términos, conceptos, pagos, liquidaciones o cualquier otro concepto comercial y/o laboral creado entre las partes.

El presente documento se firma en Puerto Gaitán - Meta, el día 01 de Junio del año 2.026.

Edwin Barrios

FIRMA
NOMBRE: **EDWIN ALEJANDRO BARRIOS POLOCHE**
C.C. **No. 1.120.864.265 de Puerto Gaitán (Meta)**

ANEXO 7. LABORATORIOS

Villavicencio, Abril 10 del 2026

Señor(es):
CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

Referencia: "CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META"

Tema: ENTREGA RESULTADOS ENSAYO DE GRANULOMETRÍA, LIMITES, TERRONES Y PROCTOR.

A continuación se adjunta resultados de Cuatro (04) ensayos de: Granulometría, limites de atterberg, contenido de terrones y Proctor, referentes al material de **Arrecife.** El material está siendo utilizado en el Proyecto de referencia.

TABLA DE ENSAYOS Y RESULTADOS		
TIPO DE ENSAYO	**NORMA INVIAS**	**RESULTADOS**
Ensayo de granulometría	INV-E-123	VER CURVA
Ensayo de Limites de Atterberg	INV-E-125 INV-E-126	NO PRESENTA
Ensayo de Determinación de terrones de arcilla y partículas deleznables en los agregados	INV-E-211	0.87%
Ensayo de Proctor	INV-E-142	DENS MAX (gr/cm³) **2,027** W OPTIMA **7,3%**

Los ensayos están basados en la norma INV. E-211, E-123, E-125, E126, E-142 y corresponden exclusivamente a las muestras analizadas en Laboratorio.

En espera de sus comentarios, y dispuestos en aclarar cualquier duda que se suscribe de Uds.
Atentamente

ING. LINA GÓMEZ
DIRECTORA TÉCNICA
INCONTECH SAS
OT 1249-26

CERTIFICADO ISO 9001:2015
CO24.00584

INCONTECH SAS cuenta con un Sistema de Gestion de calidad certificado bajo la norma ISO 9001: 2015 por Bureau Veritas Certification.

INCONTECH SAS	INCONTECH SAS	CÓDIGO: SIG-OPS-F087
	LABORATORIO DE SUELOS CONCRETOS Y PAVIMENTOS	FECHA DE VIGENCIA: 05/01/2023
	CARACTERIZACION DE MATERIALES	VERSIÓN: 001
NIT 901376424-1	"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META"	

OT 1249-26 **INC 3213-26**


INCONTECH SAS	INCONTECH S.A.S	Codigo:	SIG-OPS-F030
	NIT 901376424-1	Version:	02
	ENSAYO DE GRADACION-CLASIFICACION	Fecha:	28/04/2025
	SISTEMA INTEGRAL DE GESTION	Pagina:	1 de 1

OBRA:	"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META"	NORMA:	INV-E-123
CLIENTE:	CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	OT:	1249-26
LOCALIZACION:	PUERTO GAITÁN - META		
DESCRIPCION:	MATERIAL DE ARRECIFE	N° INFORME:	INC 3213-26
FECHA RECIBO:	2026-04-04	Fecha Informe:	10-abr-26
OBSERVACIONES:			


LÍMITE LÍQUIDO			
N° Golpes			
N° Recip.			
P1			
P2			
P3			
W %			

LÍMITE PLÁSTICO			
			Wn
			S
			759.4
			680.4
			64.5
			12.8

VALORES		
LIMITE LÍQ	%	N.L
LIMITE PLÁS	%	N.P
INDICE PLAS	%	N.L-N.P
GRAVA	%	73.0
ARENA	%	13.0
FINOS	%	14.0

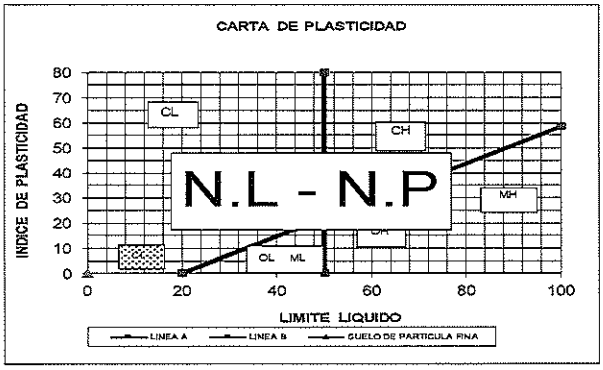

NORMA	TAMIZ	PESO RETENI.	% RETENIDO	% RET. ACUM.	% PASA
ARRECIFE	Pulg.				
	2"	0.0	-	-	100.0
	1 1/2"	48.1	7.8	7.8	92.2
	1"	42.8	6.9	14.8	85.2
	3/4"	110.5	17.9	32.7	67.3
	3/8"	150.0	24.4	57.1	42.9
	N° 4	98.3	16.0	73.0	27.0
	N° 10	36.9	6.0	79.0	21.0
	N° 40	10.4	1.7	80.7	19.3
	N° 200	32.8	5.3	86.0	14.0
	FONDO	86.1	14.0	100.0	-
	SUMAS	615.9	100.0		

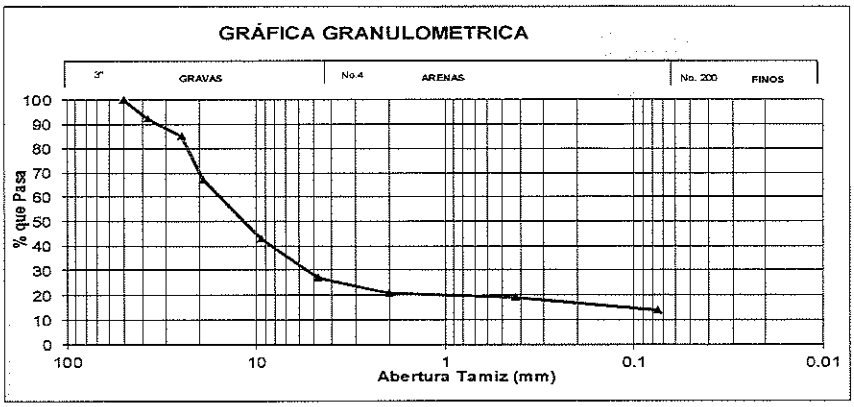

Muestra seca (gr)	615.9
Wr Des. Lav. (gr)	529.8
SUMAS	615.9
% Error	0.00
% PASA TAMIZ N°200	14.0

D10	
D30	
D60	

Cu	
Cc	

CLASIFICACION	
U.S.C.	GP
I. G.	
AASHTO	A-1-b

T.M	T.M.N
2"	1 1/2"

La información aquí reportada pertenece unicamente a la muestra analizada y no podrá ser reproducida parcial o totalmente sin la autorización escrita de INCONTECH SAS

ING. LINA GOMEZ
DIRECTORA Y/O AUXILIAR TECNICA

ING. JUAN ESTEBAN SALAS
JEFE DE LABORATORIO Y/O AUXILIAR

17092

OT 1249-26 **INC 3213-26**


INCONTECH SAS			
	INCONTECH SAS	Código:	SIG-OPS-F008
	NIT 901376424-1	Version:	2
	DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO Y PLASTICO	Fecha:	28/04/2025
	SISTEMA INTEGRAL DE GESTION	Pagina:	1 de 1

OBRA:	"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META"	NORMA:	INV-E125/126
CLIENTE:	CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	OT:	1249-26
LOCALIZACION:	PUERTO GAITÁN - META	INFORME N°:	INC 3213-26
DESCRIPCION:	MATERIAL DE ARRECIFE	Fecha Informe:	10/04/2026
FECHA DE RECIBIDO:	4/04/2026		

LÍMITE LÍQUIDO			
N° Golpes			
N° Recipiente			
Wmh+Wr		NP	
Wms+Wr			
Wr			
W %			

LÍMITE PLÁSTICO
NP

LÍMITE LÍQUIDO	%	CLASIFICACIÓN U.S.C.	
LÍMITE PLÁSTICO	%	INDICE DE TENACIDAD	
INDICE DE PLASTICIDAD	%	INDICE DE COMPRESIBILIDA	
		INDICE DE FLUIDEZ	

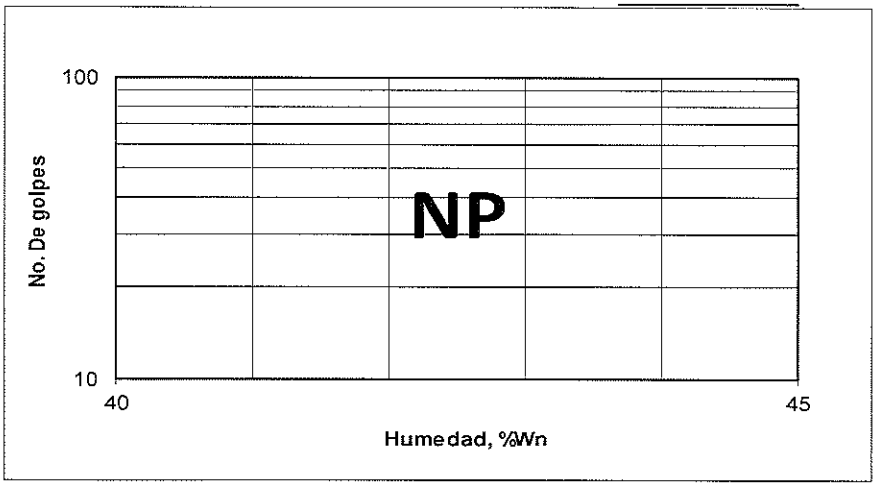

La información aquí reportada pertenece unicamente a la muestra analizada y no podrá ser reproducida parcial o totalmente sin la autorización escrita de INCONTECH S.A.S

ING. LINA GOMEZ	ING. JUAN ESTEBAN SALAS
DIRECTORA Y/O AUXILIAR TECNICA	JEFE DE LABORATORIO Y/O AUXILIAR

INCONTECH SAS LABORATORIO DE SUELOS CONCRETOS Y PAVIMENTOS	INCONTECH SAS	CODIGO: SIG-OPS-F087
	LABORATORIO DE SUELOS CONCRETOS Y PAVIMENTOS	FECHA DE VIGENCIA: 05/01/2023
	CARACTERIZACION DE MATERIALES	VERSIÓN: 001
NIT 901376424-1	"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META"	

OT 1249-26 INC 3213-26

INCONTECH SAS	INCONTECH SAS NIT: 901376424-1	Codigo:	SIG-OPS-F031
		version:	2
	DETERMINACION DE TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DELEZNABLES EN LOS AGREGADOS	Fecha:	28/04/2025
		Pagina:	1 de 1
	SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN		

OBRA:	"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META"	NORMA:	INV-211
		OT	1249-26
CLIENTE:	CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	N° INFORME	INC 3213-26
LOCALIZACION:	PUERTO GAITÁN - META		
DESCRIPCION:	MATERIAL DE ARRECIFE	FECHA INFORME:	10-abr-26
FECHA DE RECIBO:	4-abr-26	FECHA ENSAYO	4-abr-26
OBSERVACIONES:	0		

TABLA DE DATOS

TAMIZ MATERIAL	Mayores a 1 1/2"	(1 1/2" - 3/4")	(3/4" -3/8")	(3/8" -N°4)
TAMIZ DE LAVADO	N°4	N°4	N°4	N°8
MASA DE LA MUESTRA DE ENSAYO	5000.2	3000.4	2001.1	1000.4
MASA DE LAS PARTICULAS RETENIDAS	4958.1	2977.5	1983.6	990.5
PORCENTAJE DE TERRONES DE ARCILLA	0.84	0.76	0.87	0.99

PROMEDIO =	0.87

$$\%\ \text{TERRONES} = \frac{(\text{MASA MUESTRA} - \text{MASA RETENIDA})}{\text{MASA MUESTRA}} * 100$$

OBSERVACIONES:
- SE REALIZA MINIMO DOS VECES EL ENSAYO PARA COMPROBAR RESULTADOS ARROJADOS
- EN LOS PESOS OBTENIDOS Y ESTABLECER UN PROMEDIO DEL ENSAYO
- EL MATERIAL CUMPLE CON EL REQUISITO MAXIMO DE LA NORMA

La información aquí reportada pertenence unicamente a la muestra analizada y no podrá ser reproducida parcial o totalmente sin la autorización escrita de INCONTECH S.A.S

ING. LINA GOMEZ
DIRECTORA Y/O AUXILIAR TECNICA

ING. JUAN ESTEBAN SALAS
JEFE DE LABORATORIO Y/O AUXILIAR

OT 1249-26 **INC 3213-26**

INCONTECH SAS	INCONTECH S.A.S NIT 901376424-1 ENSAYO DE PROCTOR SISTEMA INTEGRAL DE GESTION	Codigo: SIG-OPS-F012 version: 2 Fecha: 28/04/2025 Pagina: 1 de 1

OBRA:	"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META"	NORMA:	INV-142-13
CLIENTE:	CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025		
LOCALIZACION:	PUERTO GAITÁN - META		
DESCRIPCION:	MATERIAL ARRECIFE	N° OT:	1249.26
FECHA DE TOMA:	4/04/2026	N° DE INFORME:	INC 3213-26
OBSERVACIONES:		FECHA INFORME:	10/04/2026

PROCTOR				
	MODIFICADO	X	MARTILLO	10lbs
	ESTANDAR		CAIDA	18"
	NORMA	E-142	No CAPAS	5
	METODO COMPACTACION	C	GOLPES x CAPA	56
	METODO PREPARACION	VIA SECA		

COMPACTACIÓN DE LAS MUESTRAS

MOLDE		1	2	3	4	5
MATERIAL PASA EL TAMIZ 3/4"	grs	6000	6000	6000	6000	6000
MUESTRA HUMEDA + MOLDE	grs	11005	11217	11411	11387	11297
PESO DEL MOLDE	grs	6430	6430	6430	6430	6430
PESO MUESTRA HUMEDA	grs	4575	4787	4981	4957	4867
PESO MUESTRA SECA	grs	4411.5	4533.8	4647.1	4543.1	4421.1
PESO MUESTRA SECA	lbs	9.705	9.974	10.224	9.995	9.726
VOLUMEN DEL MOLDE	cm3	2294.0	2294.0	2294.0	2294.0	2294.0

DETERMINACIÓN DEL PESOS UNITARIOS DE LOS ESPECÍMENES


DENSIDAD MUESTRA HUMEDA	grs/cm^3	**1.994**	**2.087**	**2.171**	**2.161**	**2.122**
DENSIDAD MUESTRA SECA	lbs/pie^3	**120.0**	**123.3**	**126.4**	**123.6**	**120.3**
DENSIDAD MUESTRA SECA	grs/cm^3	**1.923**	**1.976**	**2.026**	**1.980**	**1.927**
DENSIDAD MUESTRA SECA	kN/m3	**18.8586**	**19.3815**	**19.8662**	**19.4216**	**18.8998**

CALCULO DE CONTENIDO DE HUMEDAD (%W)

RECIPIENTE		A	R	X	G	T
P1 MATERIAL HUMEDO + RECIPIENTE	gr	688.40	597.60	642.80	755.80	523.40
P2 MATERIAL SECO + RECIPIENTE	gr	665.6	569.5	604.2	697.4	481.2
P3 PESO RECIPIENTE	gr	50.6	66.4	66.9	58.5	62.8
P4 PESO DE AGUA	gr	22.80	28.10	38.60	58.20	42.20
P5 PESO MATERIAL SECO	gr	615.0	503.1	537.3	638.9	418.4
PORCENTAJE DE HUMEDAD, (W%)	%	**3.7**	**5.6**	**7.2**	**9.1**	**10.1**

HUMEDAD DE SATURACIÓN

HUMEDAD DE SATURACIÓN	%	**11.5**	**10.5**	**9.5**	**10.4**	**11.4**

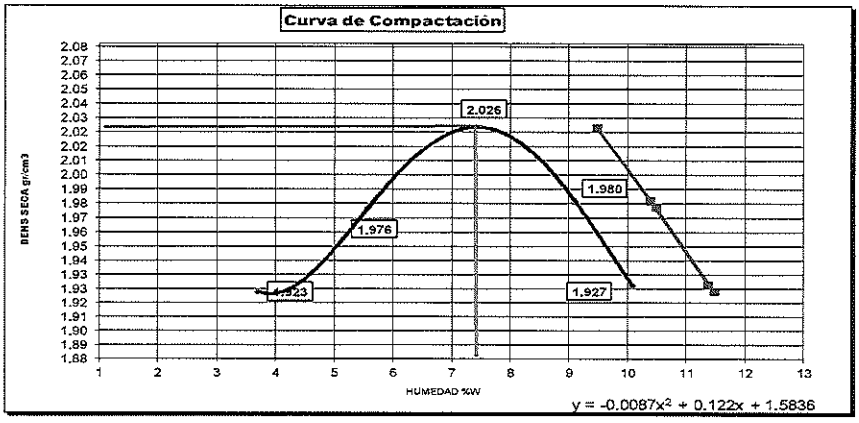

GRAVEDAD ESPECIFICA	2.486
MASA SECA MATERIAL (MSFE)	3862.0
MASA SECA MATERIAL FRACCION GRUESA (MSFC)	3216.0
MASA SECA MATERIAL FRACCION FINA (MSFE)	646.0
GRUESA PFG (%)	83.3
FINA PFE (%)	16.7
PESO UNITARIO SECO MÁXIMO	
DENS MAX gr/cm3	**2.027**
DENS MAX lb/pie3=	126.7
DENS MAX kN/m3	19.9
W OPTIMA%	7.30
PESO UNITARIO SECO MÁXIMO CORREGIDO INV E - 143 -13	
REQUIERE	SI
DENS MAX kN/m3	23.48
DENS MAX gr/cm3	2.394

La información aquí reportada pertenece unicamente a la muestra analizada y no podrá ser reproducida parcial o totalmente sin la autorización escrita de INCONTECH SAS.

ING. LINA GOMEZ
DIRECTORA Y/O AUXILIAR TECNICA

ING. JUAN SALAS
JEFE DE LABORATORIO Y/O AUXILIAR

INCONTECH SAS LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS NIT 901376424-1	INCONTECH SAS	CÓDIGO: SIG-OPS-F087
	LABORATORIO DE SUELOS CONCRETOS Y PAVIMENTOS	FECHA DE VIGENCIA: 05/01/2023
	CARACTERIZACION DE MATERIALES	VERSIÓN: 001
	"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META"	

1245

OT 1249-26 **INC 3213-26**

INCONTECH SAS LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS	INCONTECH SAS	Codigo:	SIG-OPS-F026
	NIT 901376424-1	Version:	2
	GRAVEDAD ESPECIFICA Y ABSORCION DE AGREGADOS GRUESOS	Fecha:	28/04/2025
	SISTEMA INTEGRAL DE GESTION	Pagina:	1 de 1

OBRA:	"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META"	NORMA:	NTC 176 / 237; INV-222/223
CLIENTE:	CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	ORD. TRABAJO N°	1249.26
LOCALIZACION:	PUERTO GAITÁN - META		
DESCRIPCION:	MATERIAL ARRECIFE		
FECHA DE TOMA:	4 de abril de 2026	Fecha de recibo:	4-abr-26
OBSERVACIONES:	0	Fecha Informe:	10-abr-26

Peso de la canastilla seca, (grs)	1040.2	T° del agua, °C.	
Peso de la canastilla en el agua (gr)	908.6		

AGREGADO GRUESO	ENSAYO No. 1	No. 2	No. 3
Material sss + tara	2855.8		
material sss + canastilla en H2O	2640		
material seco + tara	2795.1		
tara	180.3		
material seco	2614.8		
Gravedad aparente	**2.486**		
Gravedad nominal	**2.628**		
% Absorcion			

Gravedad aparente	2.486
Gravedad nominal	2.628
Gravedad aparente s.s.s	2.540
% Absorcion	

OBSERVACIONES:

ING. LINA GOMEZ
DIRECTORA Y/O AUXILIAR TECNICA

ING. JUAN ESTEBAN SALAS
JEFE DE LABORATORIO Y/O AUXILIAR

La información aquí reportada pertenence unicamente a la muestra analizada y no podrá ser reproducida parcial o totalmente sin la autorización escrita de INCONTECH S.A.S

Villavicencio, Abril 10 del 2026

Señor(es):
CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

Referencia: "CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META".

Tema: Control de calidad del material tipo Arena.

A continuación, presentamos el informe de los resultados obtenidos de ensayos de caracterización en laboratorio, realizados al material tipo Arena para su respectivo control de calidad.

Los ensayos realizados bajo la normatividad del INVIAS

Los ensayos están basados en los procedimientos para ensayos de la Norma INVIAS y corresponde exclusivamente a las muestras analizadas en terreno y laboratorio.

En espera de sus comentarios, y dispuestos en aclarar cualquier duda.

Atentamente

ING. LINA GÓMEZ
DIRECTORA TÉCNICA
INCONTECH SAS
OT 1249-26

CERTIFICADO ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS
CO24.00584

INCONTECH SAS cuenta con un Sistema de Gestion de calidad certificado bajo la norma ISO 9001: 2015 por Bureau Veritas Certification.

OT 1249-26 **INC 3214-26**

TABLA RESUMEN INVIAS		
TIPO DE ENSAYO	NORMA	VAL. ENSAYO
AGREGADO FINO ARENA	**INVIAS-2022**	**RESULTADOS LABORATORIO**
LIMITE LIQUIDO, MAXIMO %	INV-E-125	**N.P**
INDICE DE PLASTICIDAD, MAXIMO %	INV-E-125 Y 126	**N.P**
CONTENIDO DE TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DELEZNABLES, MAXIMO %	INV-E-211	**0.83%**
CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA, MAX%	INV-E-212	**1**
MATERIAL QUE PASA TAMIZ DE 0,075 mm (N°200), MAXIMO %	INV-E-214	**7.75%**
PERDIDA EN EL ENSAYO DE SOLIDEZ EN SULFATO DE SODIO, MÁXIMO %	INV-E-220	**1.47%**
PERDIDA EN EL ENSAYO DE SOLIDEZ EN SULFATO DE MAGNESIO, MÁXIMO %	INV-E-220	**1.65%**
PARTÍCULAS LIVIANAS, MÁXIMO (%)	INV-E-221	**0.33%**
EQUIVALENTE DE ARENA, MÍNIMO %	INV-E-133	**82.47%**
Vo. Bo.		**INCONTECH SAS**

GRANULOMETRIA		
TIPO DE GRADACION	NORMA	% PASA GRANULOMETRIA
3/8"	INV-213	100.00
No 4		79.30
No 8		65.83
No 16		56.64
No 30		40.39
No 50		20.11
No 100		10.82
No 200		7.75
Vo. Bo.	**INCONTECH SAS**	

"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META".

OT 1249-26 **INC 3214-26**

INCONTECH SAS	INCONTECH SAS NIT 901376424-1 ENSAYO DE GRADACION-CLASIFICACION SISTEMA INTEGRAL DE GESTION	Código	SIG-OPS-F030
		Versión	2
		Fecha	28/04/2025
		Página	1 de 1

OBRA:	"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META"	NORMA:	INV-123
CLIENTE:	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	OT:	1249-26
LOCALIZACION:	PUERTO GAITÁN - META		
DESCRIPCION:	ARENA	N° INFORME	INC 3214-26
FECHA RECIBO:	4 de abril de 2026	FECHA INFORME	10/04/2026
OBSERVACIONES:			

2. LAVADO SOBRE LA MALLA 200	
Muestra seca gr	3105.0
Wr Des. Lav. gr	2864.3
Sumas	3105.0
% Error	0.00

3. HUMEDAD	
P1	3392.5
P2	3302.0
P3	197.0
W %	2.91

D10	0.15
D30	0.41
D60	1.60

5. COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD Y COEFICIENTE DE CURVATURA	
Cu	10.7
Cc	0.7

6. CLASIFICACIÓN	
U.S.C.	SM-SP
INDICE DE GRUPO	0
AASHTO	A-2


7. PORCENTAJES DEL MATERIAL	
> 3"	0.00
GRAVA	20.70
ARENA	71.55
FINOS	7.75

8. TAMAÑOS	
T.M.	3/8"
T.N.	N°4
M.F.	3.98

4. GRANULOMETRIA

NORMA	TAMIZ	PESO RET.	% RETEN.	% RET. ACUM.	% PASA
INVIAS					
	3/8"	3.5	0.1	0.1	99.9
	N° 4	639.2	20.6	20.7	79.3
	N° 8	418.4	13.5	34.2	65.8
	N° 16	285.1	9.2	43.4	56.6
	N° 30	504.6	16.3	59.6	40.4
	N° 50	629.7	20.3	79.9	20.1
	N° 100	288.4	9.3	89.2	10.8
	N° 200	95.4	3.1	92.2	7.8
	FONDO	240.7	7.8	100.0	0.0
	SUMAS	3105.0	100.0		

CURVA DE GRADACION INVIAS AGREGADO FINO ARENA 3/4"

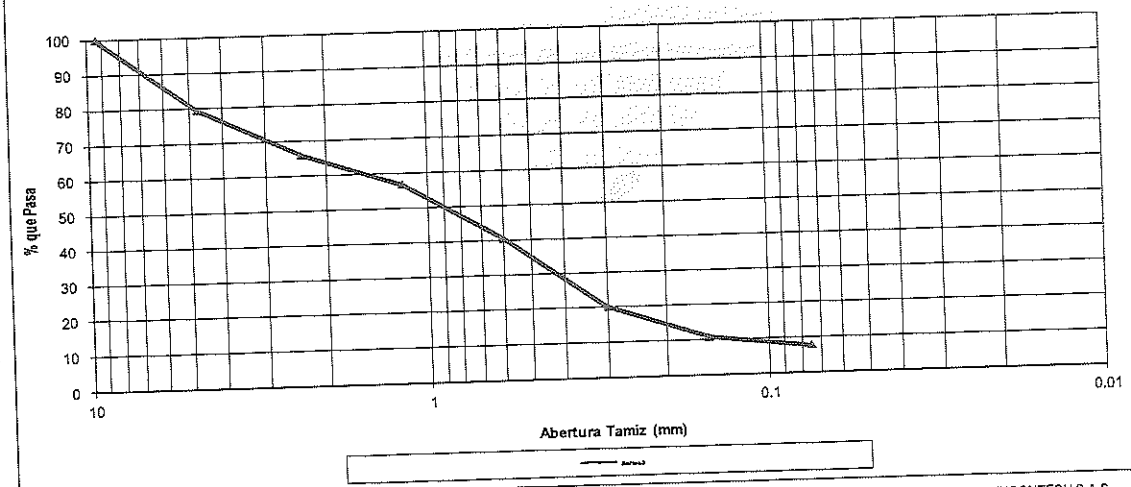

La información aquí reportada pertenece únicamente a la muestra analizada y no podrá ser reproducida parcial o totalmente sin la autorización escrita de INCONTECH S.A.S

ING. LINA GOMEZ
DIRECTORA Y/O AUXILIAR TECNICA

ING. JUAN ESTEBAN SALAS
JEFE DE LABORATORIO

OT 1249-26 **INC 3214-26**

INCONTECH SAS	INCONTECH SAS	Código:	SIG-OFS-F008
	NIT 901376424-1	Version:	2
	DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO Y PLASTICO	Fecha:	28/04/2025
	SISTEMA INTEGRAL DE GESTION	Pagina:	1 de 1


OBRA:	"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META"	NORMA:	INV-E125/126
CLIENTE:	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	OT:	1249-26
LOCALIZACION:	PUERTO GAITÁN - META	INFORME N°:	INC 3214-26
DESCRIPCION:	ARENA	Fecha Informe:	10/04/2026
FECHA DE RECIBIDO:	4/04/2026		

LÍMITE LÍQUIDO			
N° Golpes			
N° Recipiente			
Wmh+Wr		NP	
Wms+Wr			
Wr			
W %			

LÍMITE PLÁSTICO
NP

LÍMITE LÍQUIDO _____ %
LÍMITE PLÁSTICO _____ %
INDICE DE PLASTICIDAD _____ %

CLASIFICACIÓN U.S.C. _____
INDICE DE TENACIDAD _____
INDICE DE COMPRESIBILIDAD _____
INDICE DE FLUIDEZ _____

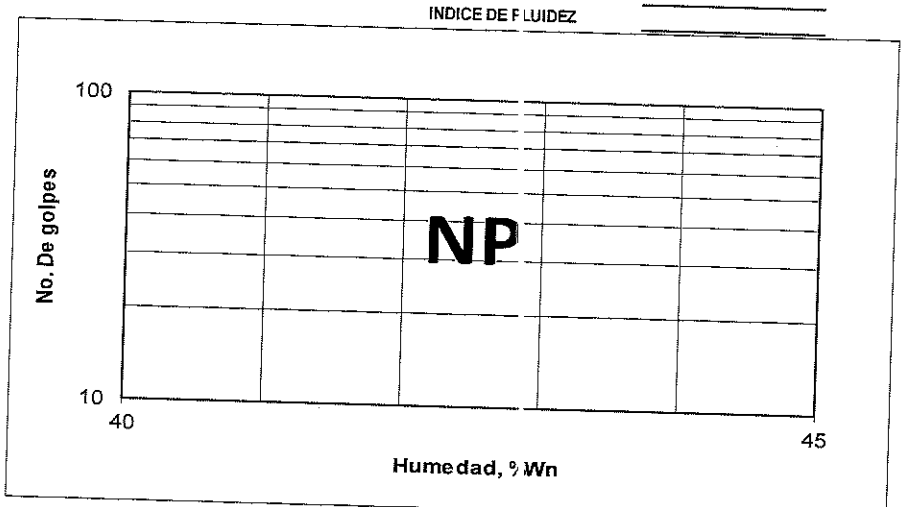

La información aquí reportada pertenece unicamente a la muestra analizada y no podrá ser reproducida parcial o totalmente sin la autorización escrita de INCONTECH S.A.S

ING. LINA GOMEZ
DIRECTORA Y/O AUXILIAR TECNICA

ING. JUAN ESTEBAN SALAS
JEFE DE LABORATORIO Y/O AUXILIAR

12048

"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META".

OT 1249-26 **INC 3214-26**

INCONTECH SAS LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS	INCONTECH SAS NIT: 901376424-1	Codigo:	SIG-OPS-F106
		version:	1
	DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE MATERIAL QUE PASA EL TAMIZ DE 75 (N°200)	Fecha:	28/04/2025
	SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN	Pagina:	1 de 1

OBRA:	"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META"
CLIENTE:	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025
LOCALIZACION:	PUERTO GAITÁN - META
DESCRIPCION:	ARENA
FECHA DE RECIBIDO:	4-abr-26
OBSERVACIONES:	0

TABLA DE DATOS

PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	I
MASA ORIGINAL DE LA MUESTRA SECA (gr)	3105.0
MASA DE LA MUESTRA SECA DESPUES DE LAVADA (gr)	2864.3

PORCENTAJE DEL MATERIAL FINO QUE PASA EL TAMIZ DE 75 mm(N° 200), OBTENIDO POR LAVADO	**7.75**

ING. LINA GOMEZ
DIRECTORA Y/O AUXILIAR TECNICA

ING. JUAN ESTEBAN SALAS
JEFE DE LABORATORIO Y/O AUXILIAR

INCONTECH SAS		
NIT 901376424-1	LABORATORIO DE SUELOS CONCRETOS Y PAVIMENTOS	CODIGO: SIG-CPS-F087
		FECHA DE VIGENCIA: 05/01/2023
	CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES	VERSIÓN: 001
	"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META".	

INCONTECH SAS			
	INCONTECH SAS	Codigo:	SIG-CPS-F014
	NIT 901376424-1	Version:	01
	CONTENIDO APROXIMADO DE MATERIA ORGANICA POR COLORIMETRIA	Fecha:	5.01.2023
	SISTEMA INTEGRAL DE GESTION	Pagina:	1 de 1

OT 1249-26 **INC 3214-26**

OBRA:	"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META"	NORMA:	INV E-121
CLIENTE:	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	OT Nº	1249-26
LOCALIZACION:	PUERTO GAITÁN - META	Nº INFORME	INC 3214-26
DESCRIPCION:	ARENA	FECHA INFORME:	10-abr-26
FECHA RECIBO:	4 de abril de 2026		
OBSERVACIONES:	0		

DESCRIPCION DEL COLOR	COLOR GARDNER ESTÁNDAR	PLACA ORGANICA No.
Color de la solución	5	1
Amarillo claro	8	2
Amarillo	11	3(estandar)
Amarillo oscuro	14	4
Ambar	16	5

VALOR DEL ENSAYO EN LABORATORIO	5	1

OBSERVACIONES: La Norma exige para la elaboración del concreto Máximo el No. 3 estandar

La información aquí reportada pertenece unicamente a la muestra analizada y no podrá ser reproducida parcial o totalmente sin la autorización escrita de INCONTECH S.A.S

ING. LINA GOMEZ
DIRECTORA Y/O AUXILIAR TECNICA

ING. JUAN ESTEBAN SALAS
JEFE DE LABORATORIO Y/O AUXILIAR

INCONTECH SAS LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS	INCONTECH SAS	CODIGO: SIG-OPS-F037	
	LABORATORIO DE SUELOS CONCRETOS Y PAVIMENTOS	FECHA DE VIGENCIA	05/01/2023
	CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES	VERSIÓN:	001
NIT 901376424-1	"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META".		

12049

OT 1249-26 INC 3214-26

INCONTECH SAS LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS	INCONTECH SAS	Codigo:	SIG-OPS-F038
	NIT 901376424-1	Version:	1
	CALCULO DEL EQUIVALENTE DE ARENA	Fecha:	5/01/2023
	SISTEMA INTEGRAL DE GESTION	Pagina:	1 de 1

OBRA:	"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META"	NORMA:	INV-133
CLIENTE:	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	**OT:**	1249-26
LOCALIZACION:	PUERTO GAITÁN - META		
DESCRIPCION:	ARENA	**N° INFORME:**	INC 3214-26
FECHA DE RECIBIDO:	4/04/2026	**Fecha de recibo:**	4/04/2026
OBSERVACIONES:	0	**Fecha Informe:**	10/04/2026

TABLA DE DATOS

ENSAYOS	1	2	3
Solución Stock Conc. (Sol./Agua)	88 c.c./ 3.785 Lts.	88 c.c./ 3.785 Lts.	88 c.c./ 3.785 Lts.
TIEMPO	30 min.	30 min.	30 min.
LECTURA ARCILLA	4.70	4.40	4.60
LECTURA ARENA	3.90	3.60	3.80
% EQUIV. ARENA	82.98	81.82	82.61

PROMEDIO % E.A. = 82.47

$$\text{EQUIVALENTE DE ARENA E.A.} = \frac{\text{LECTURA ARENA}}{\text{LECTURA ARCILLA}} * 100$$

OBSERVACIONES: Se realiza mínimo dos veces el ensayo para comprobar resultados arrojados en las lecturas, y establecer un promedio del ensayo.

La información aquí reportada pertenece únicamente a la muestra analizada y no podrá ser reproducida parcial o totalmente sin la autorización escrita de INCONTECH SAS
Este informe no es valido sin la firma del laboratorio INCONTECH SAS

ING. LINA GOMEZ
DIRECTORA Y/O AUXILIAR TECNICA

ING. JUAN ESTEBAN SALAS
JEFE DE LABORATORIO Y/O AUXILIAR

INCONTECH SAS LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS	INCONTECH SAS	CODIGO: SIG-OPS-F031	
	LABORATORIO DE SUELOS CONCRETOS Y PAVIMENTOS	FECHA DE VIGENCIA	05/01/2023
	CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES	VERSIÓN:	001
NIT 901376424-1	"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META".		

OT 1249-26 INC 3214-26

INCONTECH SAS LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS	INCONTECH SAS NIT: 901376424-1	Codigo:	SIG-OPS-F031
		Version:	2
	DETERMINACION DE TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DELEZNABLES EN LOS AGREGADOS	Fecha:	28/04/2025
		Pagina:	1 de 1
	SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN		

OBRA:	"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META"	NORMA:	INV-211
		OT	1249-26
CLIENTE:	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	N° INFORME	INC 3214-26
LOCALIZACION:	PUERTO GAITÁN - META		
DESCRIPCION:	ARENA	FECHA INFORME	10-abr-26
FECHA DE RECIBO:	4 de abril de 2026	FECHA ENSAYO	4-abr-26
OBSERVACIONES:	0		

TABLA DE DATOS

TAMIZ MATERIAL	(3/8" - N°4	N°16	N°16
TAMIZ DE LAVADO	N°8	N°20	N°20
MASA DE LA MUESTRA DE ENSAYO	1000.1	200	200.7
MASA DE LAS PARTICULAS RETENIDAS	993.6	198.2	198.8
PORCENTAJE DE TERRONES DE ARCILLA	0.65	0.90	0.95

PROMEDIO =	**0.83**

$$\%\ \text{TERRONES} = \frac{(\text{MASA MUESTRA} - \text{MASA RETENIDA})}{\text{MASA MUESTRA}} * 100$$

OBSERVACIONES:

SE REALIZA MINIMO DOS VECES EL ENSAYO PARA COMPROBAR RESULTADOS ARROJADOS
EN LOS PESOS OBTENIDOS Y ESTABLECER UN PROMEDIO DEL ENSAYO
EL MATERIAL CUMPLE CON EL REQUISITO MAXIMO DE LA NORMA

La información aquí reportada pertenece unicamente a la muestra analizada y no podrá ser reproducida parcial o totalmente sin la autorización escrita de INCONTECH S.A.S

ING. LINA GOMEZ
DIRECTORA Y/O AUXILIAR TECNICA

ING. JUAN ESTEBAN SALAS
JEFE DE LABORATORIO Y/O AUXILIAR

INCONTECH SAS LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS NIT 901376424-1	INCONTECH SAS LABORATORIO DE SUELOS CONCRETOS Y PAVIMENTOS CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES	CODIGO: SIG-OPS-F087 FECHA DE VIGENCIA: 05/01/2023 VERSIÓN: 001
	"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META".	

12050

OT 1249-26 **INC 3214-26**

INCONTECH SAS	INCONTECH S.A.S	Codigo:	SIG-OPS-F032
	NIT: 901376424-1	Version:	2
	SANIDAD DE LOS AGREGADOS FRENTE A LA ACCION DE LOS SULFATOS	Fecha:	28/04/2025
	SISTEMA INTEGRAL DE GESTION	Pagina:	1 de 1

OBRA:	"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META"	NORMA:	INV E 220
CLIENTE:	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	OT	1249-26
LOCALIZACION:	PUERTO GAITAN - META	N° INFORME	INC 3214-26
DESCRIPCION:	ARENA	FECHA INFORME	10/04/2026
OBSERVACIONES:	SULFATO DE SODIO %		
	0		

AGREGADOS GRUESOS

Tamiz		Gradacion Muestra Or. %	Peso Fraccion Antes ensayo (gr)	Peso Fraccion Despues ensayo (gr)	% Perdida D= 100(B-C)	AD/100
Pasa	Retenido	A	B	C	D	
1"	3/4"					
3/4"	1/2"					
1/2"	3/8"					
3/8"	N. 4	20.6	300.3	299.2	0.4	1.10
RESULTADO SANIDAD AGREGADO GRUESO		1.1				

AGREGADOS FINOS

Tamiz		Gradacion Muestra Or. %	Peso Fraccion Antes ensayo (gr)	Peso Fraccion Despues ensayo (gr)	% Perdida D= 100(B-C)	AD/100
Pasa	Retenido	A	B	C	D	
N° 4	N°8	13.5	100.0	99.5	0.5	0.50
N°8	N°16	9.2	100.0	99.2	0.8	0.80
N°16	N°30	16.3	100.0	98.7	1.3	0.21
N°30	N°50	20.3	100.0	99	1.0	0.20
N°50	N°100	9.3	100.0	98.6	1.4	0.13
TOTAL						
RESULTADO SANIDAD AGREGADO FINO		1.84				

	ESPECIFICACION			1.47	CUMPLE
AFIRMADO - SUB BASE - BASE	12 % Sulfato de sodio	18 % Sulfato magnesio			
CONCRETO	10 % Sulfato sodio	15 % Sulfato magnesio			SI

OBSERVACIONES: EL MATERIAL CUMPLE CON LA ESPECIFICACION DE LA NORMA

La información aqui reportada pertenence unicamente a la muestra analizada y no podrá ser reproducida parcial o totalmente sin la autorización escrita de INCONTECH S.AS.

ING. LINA GOMEZ DIRECTORA Y/O AXILIAR TECNICA	ING.JUAN ESTEBAN SALAS JEFE DE LABORATORIO Y/O AUXILIAR

INCONTECH SAS LABORATORIO DE SUELOS CONCRETOS Y PAVIMENTOS	INCONTECH SAS	CODIGO: SIG-OPS-F087	
	LABORATORIO DE SUELOS CONCRETOS Y PAVIMENTOS	FECHA DE VIGENCIA	05/01/2023
	CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES	VERSIÓN:	001
NIT 901376424-1	"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META".		

OT 1249-26 INC 3214-26

INCONTECH SAS LABORATORIO DE SUELOS CONCRETOS Y PAVIMENTOS	INCONTECH S.A.S	Codigo:	SIG-OPS-F032
	NIT: 901376424-1	Version:	2
	SANIDAD DE LOS AGREGADOS FRENTE A LA ACCION DE LOS SULFATOS	Fecha:	28/04/2025
	SISTEMA INTEGRAL DE GESTION	Pagina:	1 ce 1

OBRA:	"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META"	NORMA:	INV E 220
CLIENTE:	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	OT	1249-26
LOCALIZACION:	PUERTO GAITÁN - META	N° INFORME	INC 3214-26
DESCRIPCION:	ARENA	FECHA INFORME	10/04/2026
OBSERVACIONES:	SULFATO DE MAGNESIO %		
	0		

AGREGADOS GRUESOS

Tamiz		Gradacion Muestra Or. %	Peso Fraccion Antes ensayo (gr)	Peso Fraccion Despues ensayo (gr)	% Perdida D= 100(B-C)	AD/100
Pasa	Retenido	A	B	C	D	
1"	3/4"					
3/4"	1/2"					
1/2"	3/8"					
3/8"	N. 4	20.6	100.5	299	0.5	1.50
RESULTADO SANIDAD AGREGADO GRUESO			1.5			

AGREGADOS FINOS

Tamiz		Gradacion Muestra Or. %	Peso Fraccion Antes ensayo (gr)	Peso Fraccion Despues ensayo (gr)	% Perdida D= 100(B-C)	AD/100
Pasa	Retenido	A	B	C	D	
N° 4	N°8	13.5	100.0	99.5	0.5	0.50
N°8	N°16	9.2	100.5	99.7	0.8	0.80
N°16	N°30	16.3	100.0	98.9	1.1	0.18
N°30	N°50	20.3	100.2	99.1	1.10	0.22
N°50	N°100	9.3	100.0	99	1.00	0.09
TOTAL						
RESULTADO SANIDAD AGREGADO FINO			1.79			

	ESPECIFICACION			CUMPLE
			1.65	
AFIRMADO - SUB BASE - BASE	12 % Sulfato de sodio	18 % Sulfato magnesio		
CONCRETO	10 % Sulfato sodio	15 % Sulfato magnesio		SI

OBSERVACIONES: EL MATERIAL CUMPLE CON LA ESPECIFICACION DE LA NORMA

La información aquí reportada pertenence unicamente a la muestra analizada y no podrá ser reproducida parcial o totalmente sin la autorización escrita de INCONTECH S.AS.

ING. LINA GOMEZ DIRECTORA Y/O AXILIAR TECNICA	ING.JUAN ESTEBAN SALAS JEFE DE LABORATORIO Y/O AUXILIAR

INCONTECH SAS LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS NIT 901376424-1	INCONTECH SAS	CODIGO: SIG-OPS-F087
	LABORATORIO DE SUELOS CONCRETOS Y PAVIMENTOS	FECHA DE VIGENCIA: 05/01/2023
	CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES	VERSIÓN: 001
	"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META".	

12051

OT 1249-26 INC 3214-26

INCONTECH SAS LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS	INCONTECH S.A.S NIT 901376424-1	Codigo:	SIG-OPS-F037
		Version:	2
	PORCENTAJE DE PARTICULAS LIVIANAS EN AGREGADOS	Fecha:	28/04/2025
	SISTEMA INTEGRAL DE GESTION	Pagina:	1 de 1

OBRA:	"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META"			NORMA:	INV-221
CLIENTE:	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025			N° CONTRATO:	1249-26
LOCALIZACION:	PUERTO GAITÁN - META				
DESCRIPCION:	ARENA	TIPO DE MUESTRA	SUELOS ☐	CONCRETOS ☐	ASFALTOS ☐
FECHA DE RECIBIDO:	4/04/2026			N INFORME	INC 3214-26
OBSERVACIONES:				Fecha Informe:	10-abr-26

AGREGADO FINO			AGREGADO GRUESO		
% DE PARTICULAS LIVIANAS DEL AGREGADO FINO	1	2	% DE PARTICULAS LIVIANAS DEL AGREGADO GRUESO	1	2
Reactivo	Bromuro de zinc	Bromuro de zinc	Reactivo		
M1= Peso seco de particulas retenidas en el colador	0.35	0.29	M1= Peso seco de particulas retenidas en el colador		
M2= Peso de la muestra seca retenida en el tamiz N°50	97.8	96.1	M2= Peso de la muestra seca retenida en el tamiz N°4		
L= Porcentaje de particulas livianas	0.36	0.30	L= Porcentaje de particulas livianas		
PROMEDIO P.L.A.f	0.33		PROMEDIO P.L.A.g		

$$\% \text{ PARTICULAS LIVIANAS} = \frac{\text{PESO SECO PART. RETENIDAS}}{\text{PESO MUESTRA SECA RET. TAMIZ}} * 100$$

OBSERVACIONES: Se realizo minimo dos veces el ensayo para comprobar los resultados y establecer un promedio del ensayo

El material cumple con el requisito maximo requerido en la norma

La información aquí reportada pertenece unicamente a la muestra analizada y no podrá ser reproducida parcial o totalmente sin la autorización escrita de INCONTECH SAS

Este informe no es valido sin la firma del laboratorio INCONTECH SAS

ING. LINA GOMEZ DIRECTORA Y/O AUXILIAR TECNICA	ING. JUAN ESTEBAN SALAS JEFE DE LABORATORIO Y/O AUXILIAR


1205

ANEXO 8. REGISTRO FOTOGRÁFICO.



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1


RESGUARDO AWALIBA

EQUIPO DE BOMBEO Y SISTEMA DE ENERGÍA SOLAR

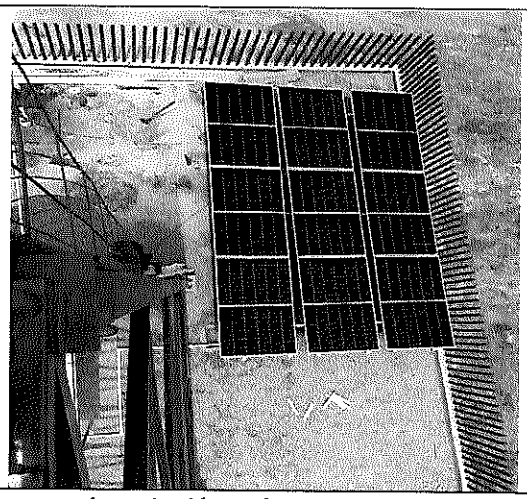COMUNIDAD MAKAPAY
Ítem 2,6) SUMINISTRO E INSTALACION MODULOS SOLARES DE 570 WATTIOS MONOCRISTALINOS, TENSIÓN A MÁXIMA POTENCIA (VMP) 42.24 V

Instalación módulos solares

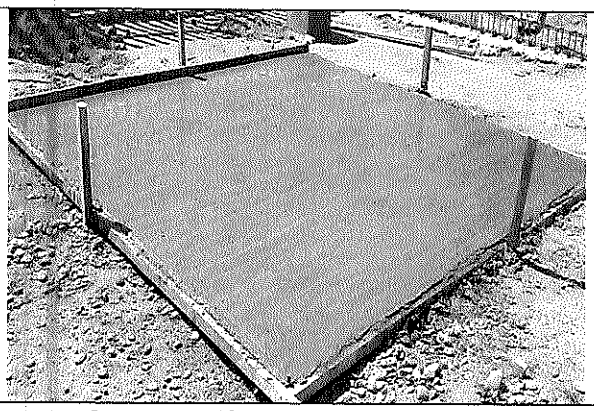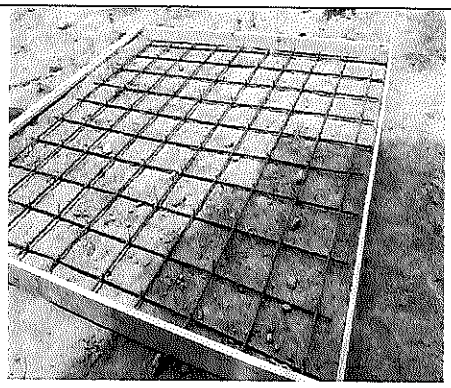SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA



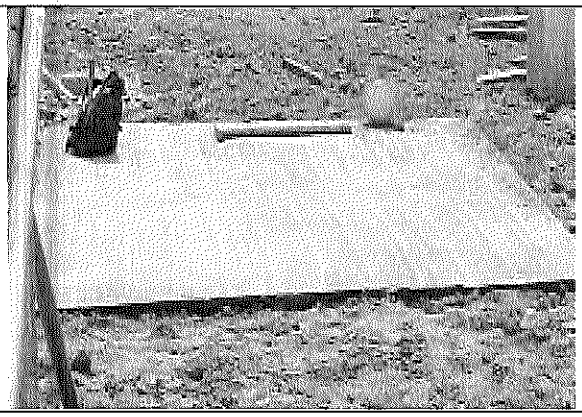
COMUNIDAD AWALIBA CENTRAL	
Ítem 3,4) PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20,7 Mpa (3000 psi) MEZCLADO EN OBRA, SUMINISTRO Y CONTRUCCION PARA SOPORTE FILTROS	**Ítem 3,5)** ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO ARMADO, COLOCACION Y AMARRE.
	
Construcción Placa de contrapiso	*Instalación acero de refuerzo*

COMUNIDAD PUNTO GRILLO	
Ítem 3,4) PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20,7 Mpa (3000 psi) MEZCLADO EN OBRA, SUMINISTRO Y CONTRUCCION PARA SOPORTE FILTROS	**Ítem 3,5)** ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO ARMADO, COLOCACION Y AMARRE.
	
Construcción Placa de contrapiso	*Instalación acero de refuerzo*

RESGUARDO DOMOPLANAS

POZO PROFUNDO





COMUNIDAD LAS BRISAS	
Ítem 1,2) INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS	**Ítem 1,3** PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO.
	
Construcción piscina de lodos	*perforación de prueba*

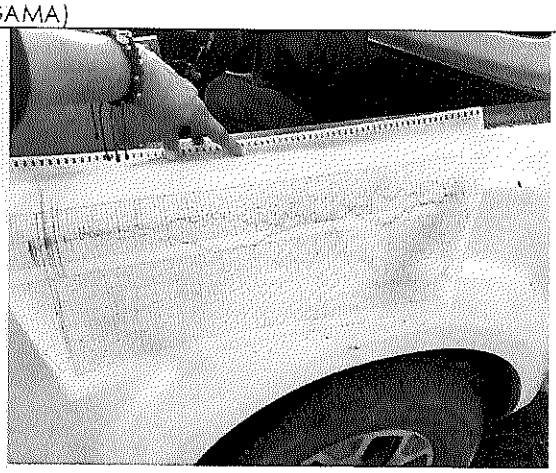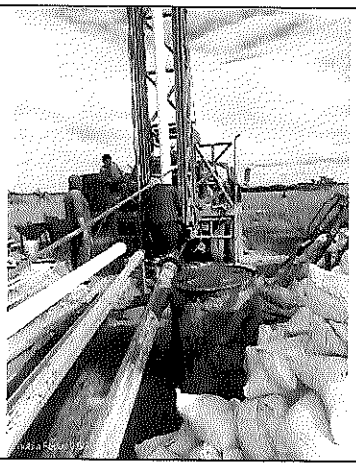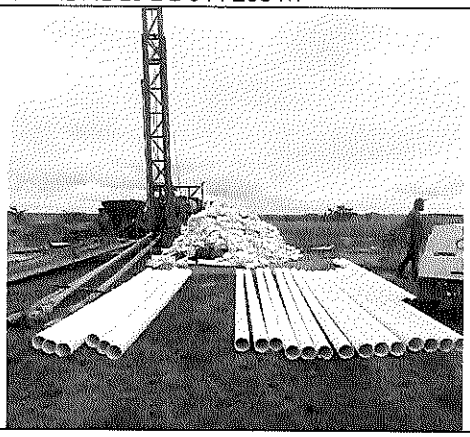Ítem 1,5 EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA)	**Ítem 1,6** AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"
	
Registro eléctrico	***Ampliación perforación***
Ítem 1,7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN PARA PROFUNDIDADES DE 0 A 200 M	**Ítem 1,10** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESION
	
Suministro tubería 6"	***Instalación filtro tubería***





Ítem 1,11 SUMINISTRO DE GRAVIILA TAMIZADA, SELECCIONADA Y SIN CALCÁREOS.



Suministro gravilla

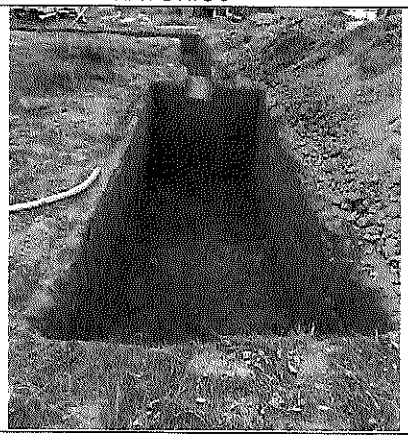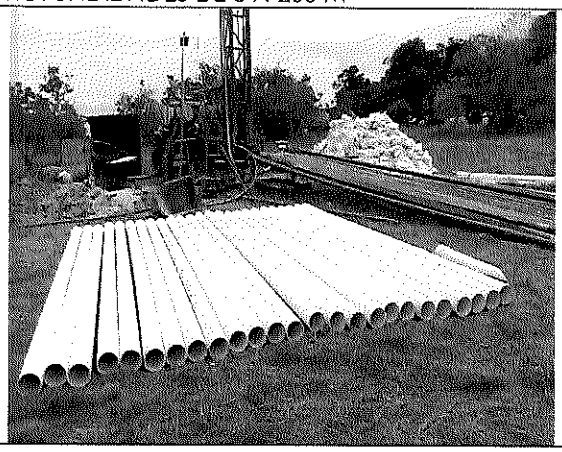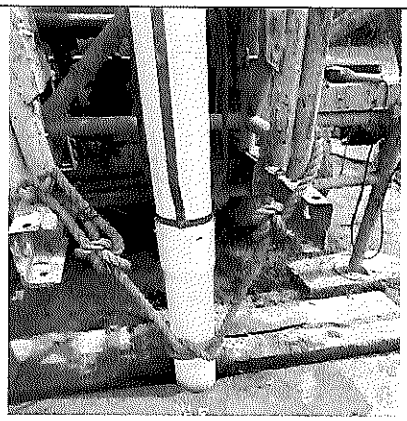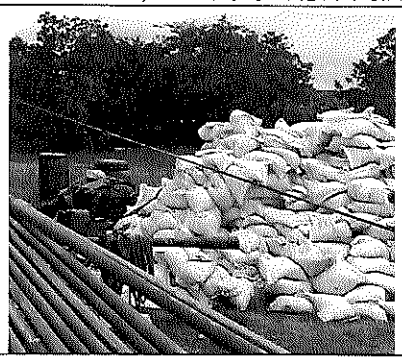COMUNIDAD CUMARALITO	
Ítem 1,2) INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS	**Ítem 1,6** AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"
	
Construcción piscina de lodos	***Ampliación perforación***
Ítem 1,7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN PARA PROFUNDIDADES DE 0 A 200 M	**Ítem 1,10** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESION
	
Suministro tubería 6"	***Instalación filtro tubería***
Ítem 1,11 SUMINISTRO DE GRAVIILA TAMIZADA, SELECCIONADA Y SIN CALCÁREOS.	
	
Suministro gravilla	

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

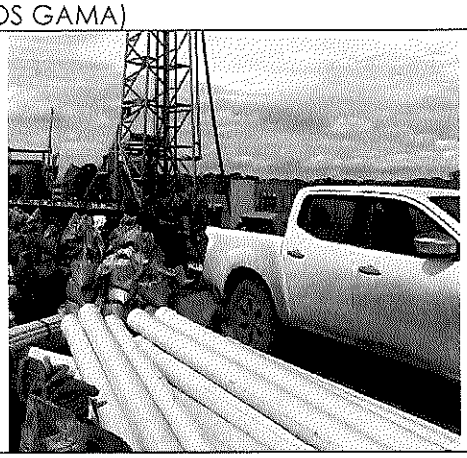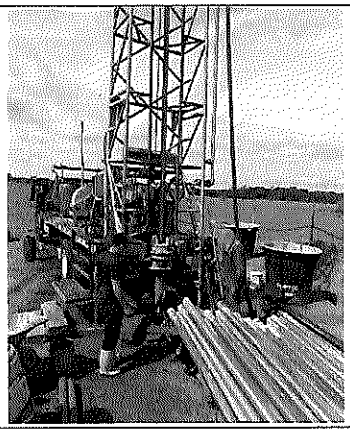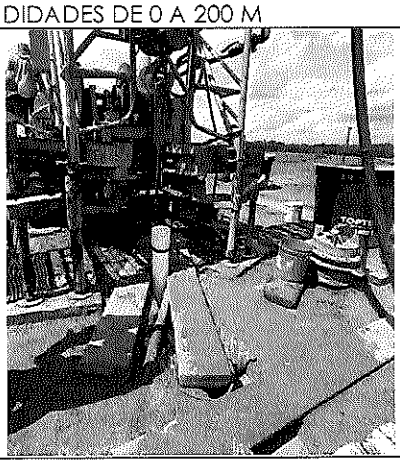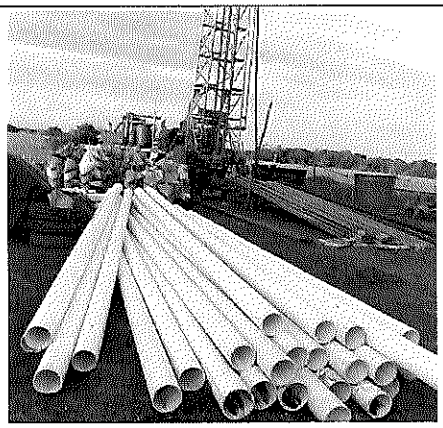
COMUNIDAD CERRITO	
Ítem 1,5 EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA)	**Ítem 1,6** AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"
	
Registro eléctrico	***Ampliación perforación***
Ítem 1,7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN PARA PROFUNDIDADES DE 0 A 200 M	**Ítem 1,10** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESION
	
Suministro tubería 6"	***Instalación filtro tubería***
Ítem 1,11 SUMINISTRO DE GRAVIILA TAMIZADA, SELECCIONADA Y SIN CALCÁREOS.	
	
Suministro gravilla	

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1


REDES DE ACUEDUCTO

COMUNIDAD OLIVOS	
Ítem 4,4) CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	**Ítem 4,5** RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL.
	
Camada de arena	*Relleno proveniente de la excavación*
Ítem 4,8 TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN	**Ítem 4,15** EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE.
	
Instalación tubería 2"	*Excavación mecánica*


COMUNIDAD PARAISO	
Ítem 4,4) CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	**Ítem 4,8** TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN
	
Camada de arena	***Instalación tubería 2"***
Ítem 4,15) EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE.	**Ítem 4,16)** ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M, ACCESORIOS Y REGISTRO)
	
Excavación mecánica	***Instalación domiciliarias***

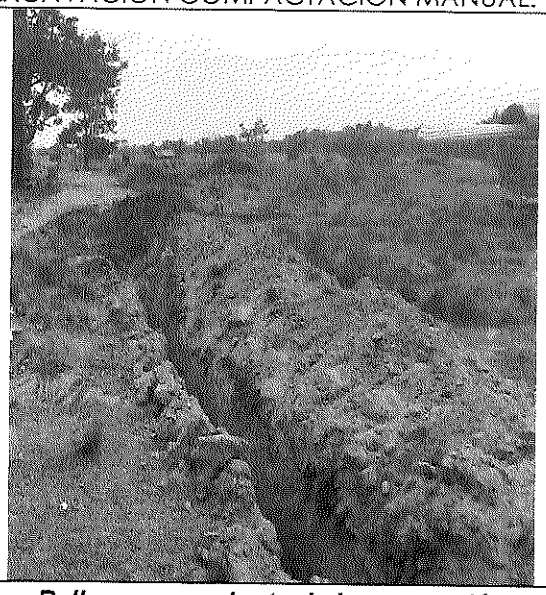COMUNIDAD YATARROBO	
Ítem 4,4) CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	**Ítem 4,5** RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL.
	
Camada de arena	*Relleno proveniente de la excavación*




Ítem 4,8 TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN


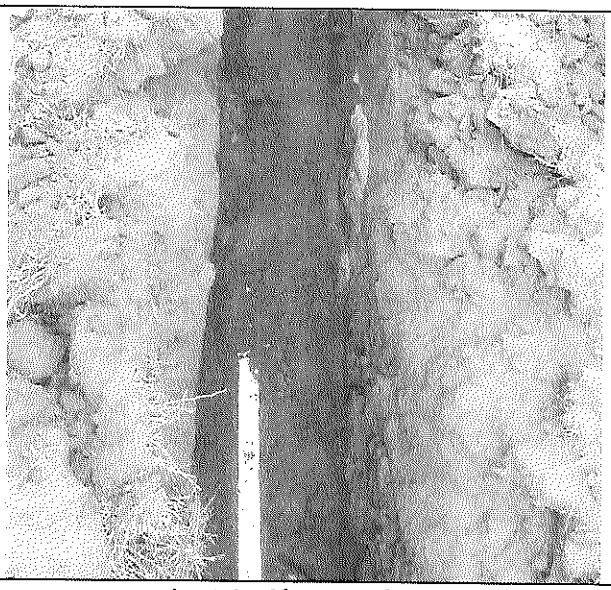


Instalación tubería 2"

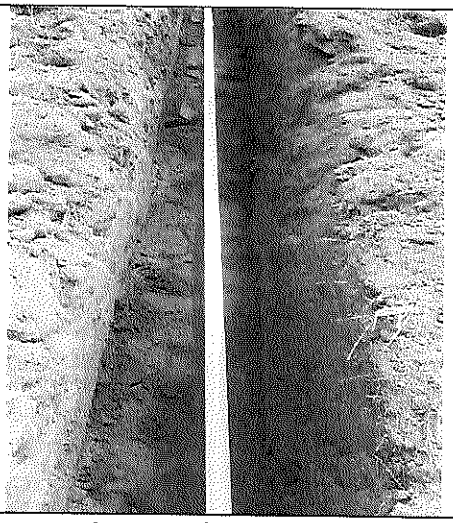COMUNIDAD CACHAMITAS	
Ítem 4,4) CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	**Ítem 4,8** TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN
	
Camada de arena	*Instalación tubería 2"*
Ítem 4,15) EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE.	**Ítem 4,16)** ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M, ACCESORIOS Y REGISTRO)
	
Excavación mecánica	*Instalación domiciliarias*

TANQUE ELEVADO

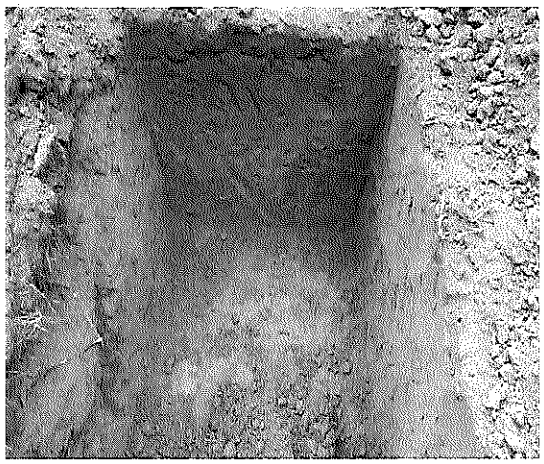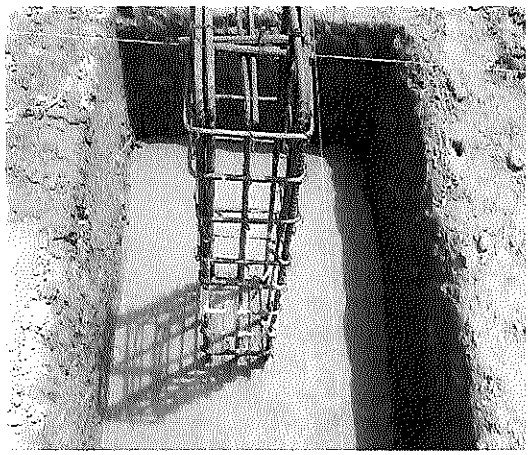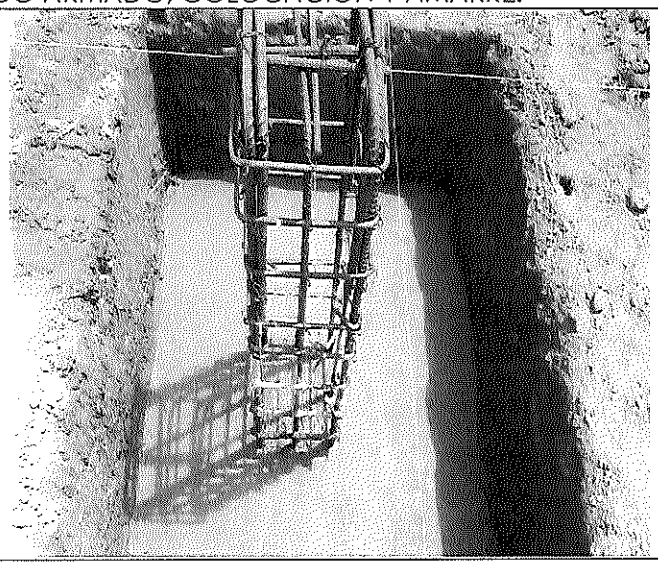COMUNIDAD PARAISO	
Ítem 5,3 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN	**Ítem 5,5** ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN
	
Excavación manual	***Construcción zapata en concreto***
Ítem 5,7 ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO ARMADO, COLOCACION Y AMARRE.	
	
Instalación acero refuerzo	


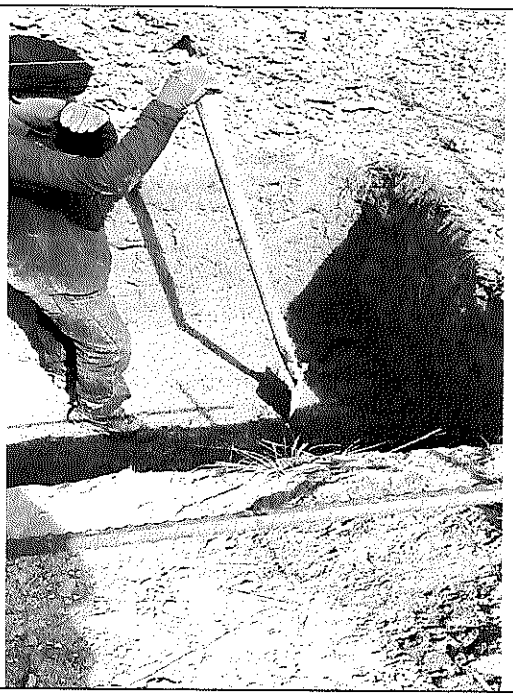
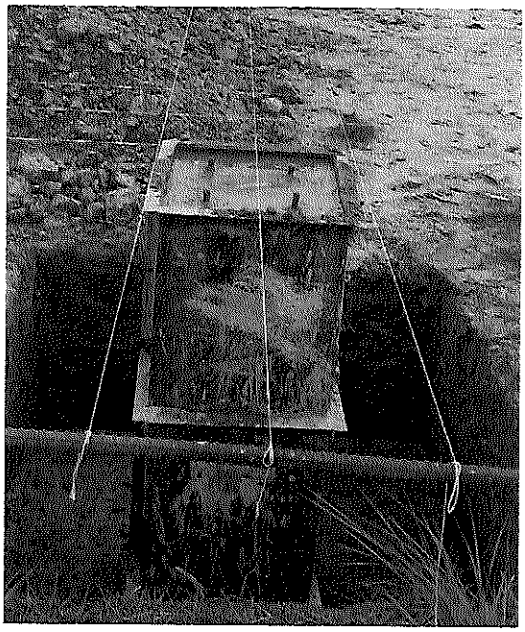
COMUNIDAD CUMARALITO	
Ítem 5,3 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN	**Ítem 5,5** ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN
	
Excavación manual	***Construcción zapata en concreto***



Ítem 5,6 COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN





Construcción columna en concreto

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

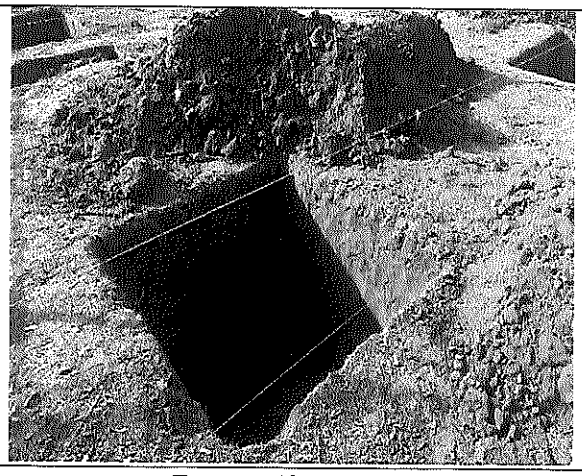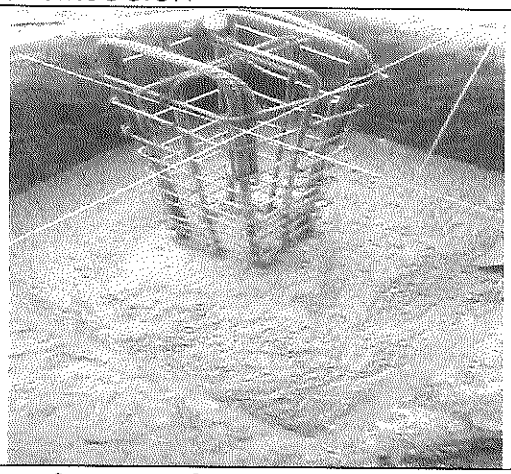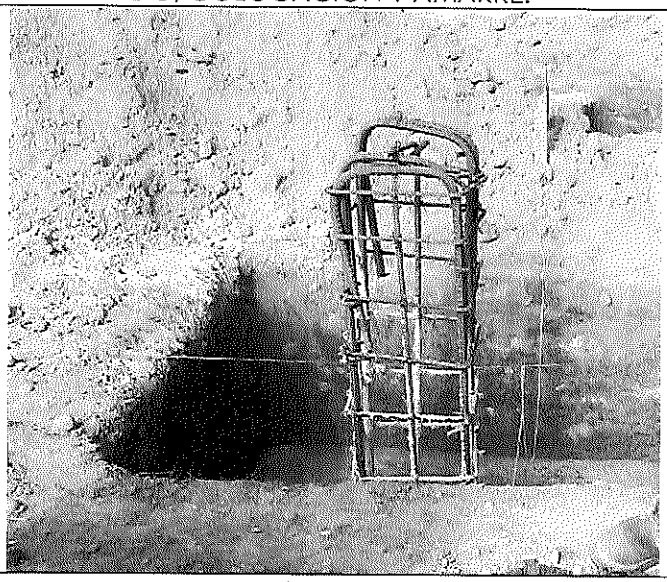COMUNIDAD CERRITO	
Ítem 5,3 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN	**Ítem 5,5** ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN
	
Excavación manual	***Construcción zapata en concreto***
Ítem 5,7 ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO ARMADO, COLOCACION Y AMARRE.	
	
Instalación acero refuerzo	

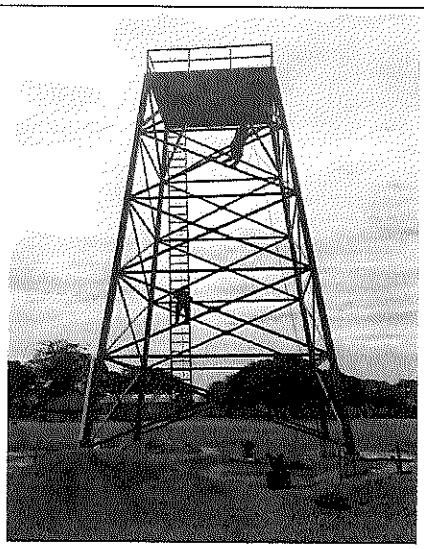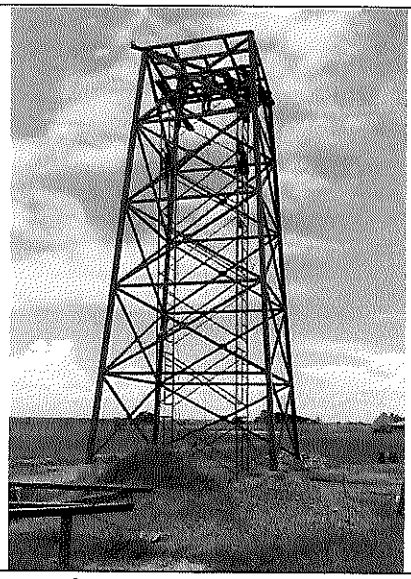COMUNIDAD PUERTO GAVILAN	
Ítem 5,1) PLATAFORMA EN LÁMINA ALFAJOR	**Ítem 5,9** ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A500 **Ítem 5,10** ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A588
	
Instalación plataforma	*Instalación estructura acero estructural*

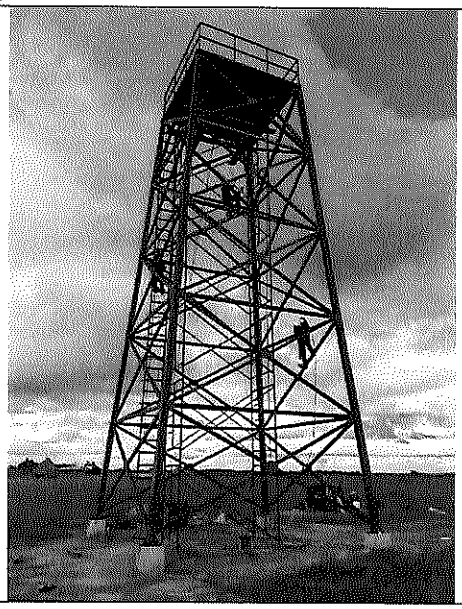COMUNIDAD LAS DELICIAS	
Ítem 5,1) PLATAFORMA EN LÁMINA ALFAJOR	**Ítem 5,9** ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A500 **Ítem 5,10** ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A588
	
Instalación plataforma	*Instalación estructura acero estructural*

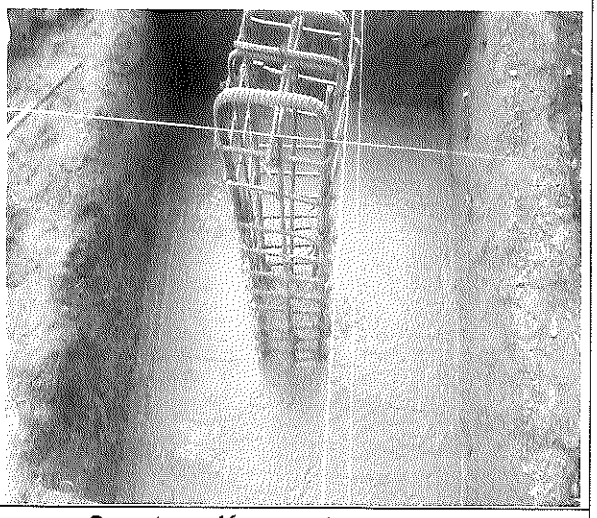
COMUNIDAD CACHAMITAS	
Ítem 5,3 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN	**Ítem 5,5** ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN
	
Excavación manual	*Construcción zapata en concreto*
Ítem 5,7 ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO ARMADO, COLOCACION Y AMARRE.	
	
Instalación acero refuerzo	



12067

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1


RESGUARDO WACOYO

POZO PROFUNDO

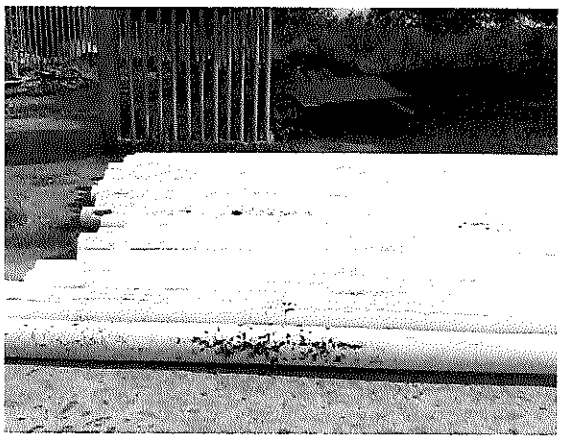COMUNIDAD KALIWIRNAE	
Ítem 1,5 EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA)	**Ítem 1,6** AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"
	
Registro eléctrico	*Ampliación perforación*
Ítem 1,7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN PARA PROFUNDIDADES DE 0 A 200 M	**Ítem 1,10** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESION
	
Suministro tubería 6"	*Instalación filtro tubería*

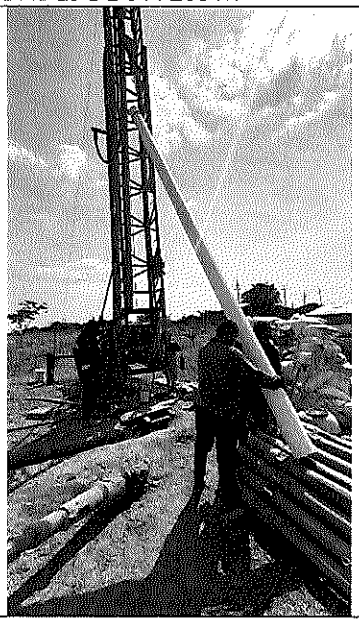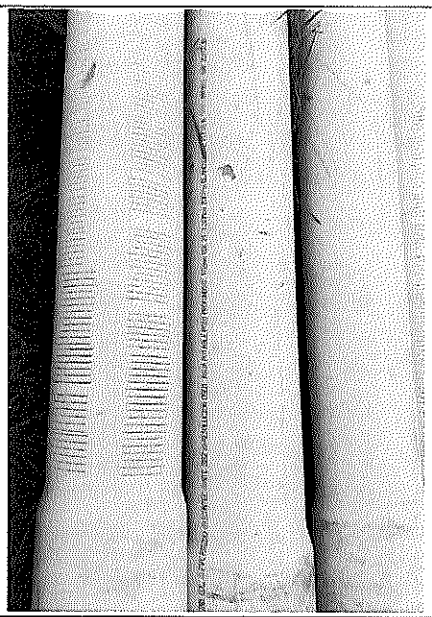COMUNIDAD ALGARROBO	
Ítem 1,7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN PARA PROFUNDIDADES DE 0 A 200 M	**Ítem 1,10** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESION
	
Instalación tubería pvc 6"	*Instalación filtro tubería*
Ítem 1,9) CONSTRUCCIÓN DE CABEZA DE POZO Y SELLO SANITARIO E INSTALACIÓN DE GRAVLLLADORES	
	
Cabeza de pozo	







TANQUE ELEVADO

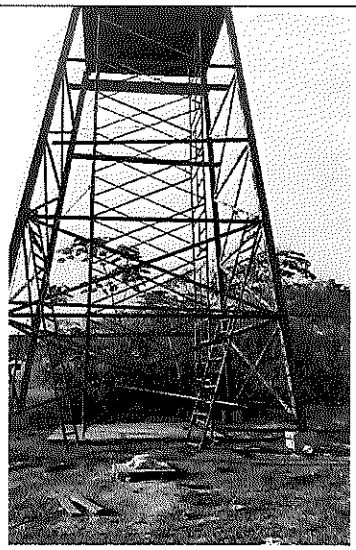COMUNIDAD LA UNIÓN	
Ítem 5,1) PLATAFORMA EN LÁMINA ALFAJOR	**Ítem 5,9** ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A500 **Ítem 5,10** ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A588
	
Instalación plataforma	*Instalación estructura acero estructural*


COMUNIDAD LA CAIMANA	
Ítem 5,1) PLATAFORMA EN LÁMINA ALFAJOR	**Ítem 5,9** ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A500 **Ítem 5,10** ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A588
	
Instalación plataforma	*Instalación estructura acero estructural*

RESGUARDO ASEINPOME

TANQUE ELEVADO

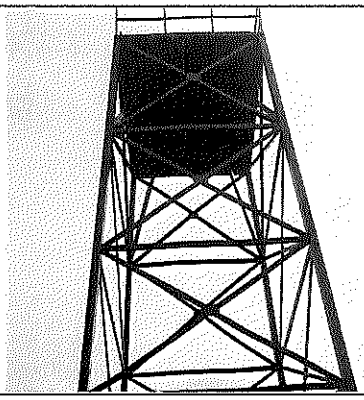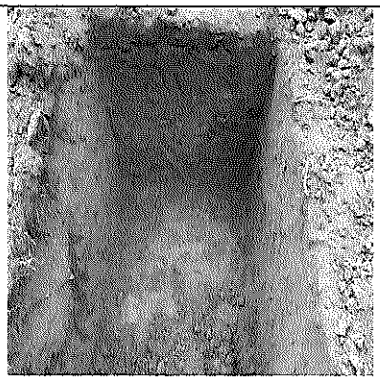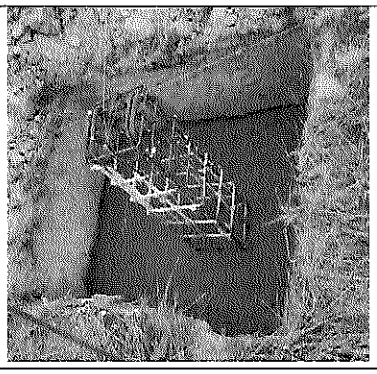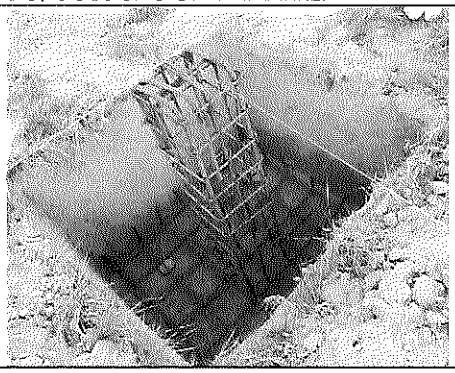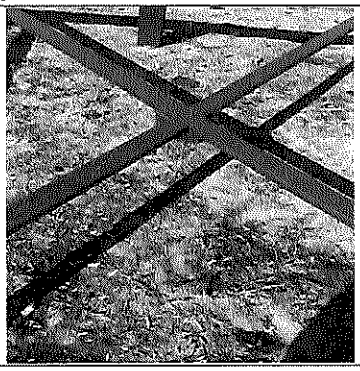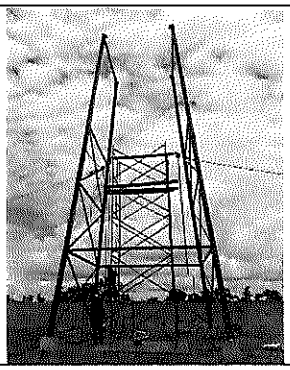COMUNIDAD KEKO A ASEINPOME	
Ítem 5,1) PLATAFORMA EN LÁMINA ALFAJOR	**Ítem 5,3** EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN
	
Instalación plataforma	*Excavación manual*
Ítem 5,5 ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	**Ítem 5,7** ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO ARMADO, COLOCACION Y AMARRE.
	
Construcción zapata en concreto	*Instalación acero refuerzo*
Ítem 5,9 ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A500	**Ítem 5,10** ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A588
	
Instalación estructura acero estructural	*Instalación estructura acero estructural*

REDES DE ACUEDUCTO

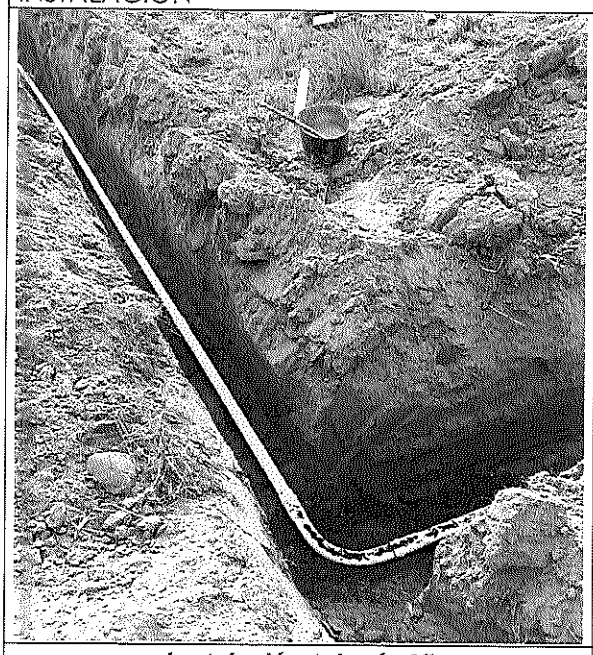COMUNIDAD SIETE RODRIGUEZ	
Ítem 4,4) CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	**Ítem 4,7** TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR
	
Camada de arena	*Transporte material*
Ítem 4,8 TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN	**Ítem 4,15** EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE.
	
Instalación tubería 2"	*Excavación mecánica*

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

INSTALACIÓN VALLA INFORMATIVA



Valla informativa

1103

ANEXO 9. COPIA DE LA BITACORA.

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META	OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE	RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO
FECHA: Viernes 01 de mayo de 2026 (festivo)	HORAS DE LLUVIA:

PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	246	DIAS PENDIENTES		210

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	3	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
ESQUEMA DE OBRA				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme		FIRMA RESIDENTE 1 OBRA ING.GUILLERMO ALBERTO OSORIO	FIRMA RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING.JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE	
NC: No Conforme				
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara				

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

1205

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META	OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META
RESIDENTE 2: FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ	RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA
FECHA: sabado 02 de mayo de 2026	HORAS DE LLUVIA: 1h

PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	247	DIAS PENDIENTES		209

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	3	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
INSTALACION Y ADECUACION DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS	UND	COMUNIDAD KALIWIRNAE		
PERFORACION DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO	ML	COMUNIDAD KALIWIRNAE		

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.


REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

ESQUEMA DE OBRA

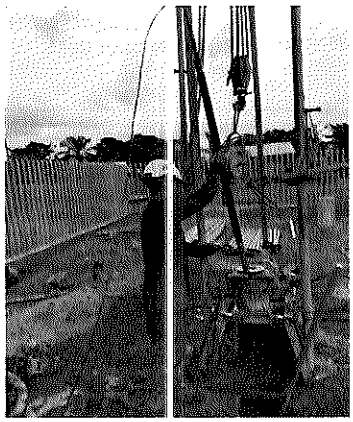

OBSERVACIONES:			
C: Conforme		FIRMA RESIDENTE 2 OBRA ING.VANESA GARZON GARCIA	FIRMA RESIDENTE 2 INTERVENTORIA ING.FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ
NC: No Conforme			

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

12016

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META	OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE	RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO
FECHA: Domingo 03 de Mayo de 2026	HORAS DE LLUVIA:

PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	248	DIAS PENDIENTES		208

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	3	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO .IBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Int raestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Vers on:04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERV SIÓN DIARIA DE OBRA				
ESC UEMA DE OBRA				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme		FIRMA	FIRMA	
NC: No Conforme		RESIDENTE 1 OBRA ING.GUILLERMO ALBERTO OSC RIO	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING.JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE	
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara				

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META	OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META
RESIDENTE 2: FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ	RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA
FECHA: Lunes 04 de mayo de 2026	HORAS DE LLUVIA: 3h

PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	249	DIAS PENDIENTES		207

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	3	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
CONTINUACION PERFORACION DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO	ML	COMUNIDAD KALIWIRNAE		
ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO	ML	COMUNIDAD KALIWIRNAE		
AMPLIACION DE LA PERFORACION EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"	ML	COMUNIDAD KALIWIRNAE		

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación SI se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA		Puerto Gaitán
	Infraestructura		
Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

ESQUEMA DE OBRA



OBSERVACIONES:			
C: Conforme		FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		RESIDENTE 2 OBRA ING.VANESA GARZON GARCIA	RESIDENTE 2 INTERVENTORIA ING.FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META	OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META
RESIDENTE 2: FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ	RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA
FECHA: Martes 05 de mayo de 2026	HORAS DE LLUVIA:2h

PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	250	DIAS PENDIENTES		206

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	3	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
CONTINUACIÓN AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"	ML	COMUNIDAD KALIWIRNAE		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN	ML	COMUNIDAD KALIWIRNAE		
SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESION	ML	COMUNIDAD KALIWIRNAE		

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.


REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

ESQUEMA DE OBRA

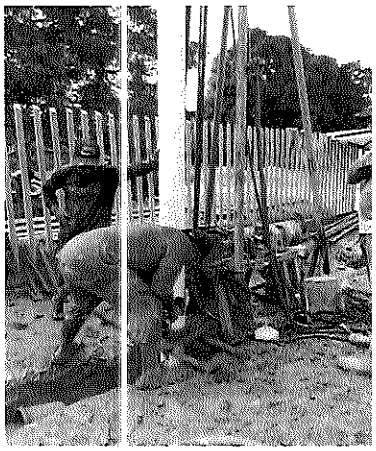

OBSERVACIONES:		
C: Conforme	FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme	RESIDENTE 2 OBRA ING.VANESA GARZON GARCIA	RESIDENTE 2 INTERVENTORIA ING.FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

12079

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META	OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE	RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO
FECHA: Miercoles 06 de mayo de 2026	HORAS DE LLUVIA:2h

PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	251	DIAS PENDIENTES		205

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	3	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
INCIA EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN PARA TANQUE	M3	COMUNIDAD CACHAMITAS		
ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO ARMADO, COLOCACION Y AMARRE.	KG	COMUNIDAD CACHAMITAS		
SOLADO,LIMPIEZA CONCRETO 13,8 Mpa (2000 PSI)	M3	COMUNIDAD CACHAMITAS		

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación SI se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.


REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA		
	Ir fraestructura		
	Codigo:INF-FR-12	Ver: ion:04	Vigencia: 10-01-2025

SUPER' ISIÓN DIARIA DE OBRA

ES QUEMA DE OBRA

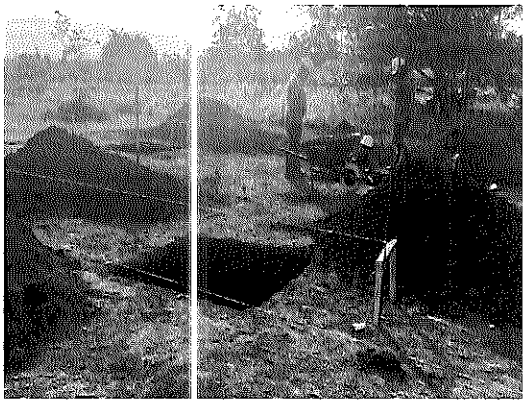

OBSERVACIONES:			
C: Conforme		FIRMA RESIDENTE 1 OBRA ING.GUILLERMO ALBERTO OS(IRIO	FIRMA RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING.JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE
NC: No Conforme			

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

12080

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META	OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE	RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO
FECHA: Jueves 07 de mayo de 2026	HORAS DE LLUVIA:1h

PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	252	DIAS PENDIENTES		204

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	3	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN PARA TANQUE	M3	COMUNIDAD CACHAMITAS		

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.


REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

ESQUEMA DE OBRA

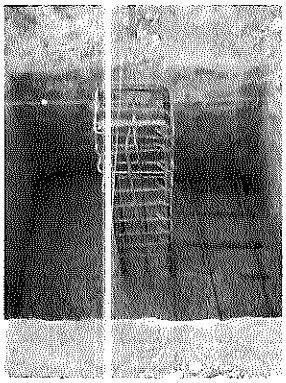

OBSERVACIONES:			
C: Conforme		FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		RESIDENTE 1 OBRA ING.GUILLERMO ALBERTO OSORIO	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING.JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

1261

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META	OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META
RESIDENTE 2: FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ	RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA
FECHA: Viernes 08 de mayo de 2026	HORAS DE LLUVIA:1h

PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	253	DIAS PENDIENTES		203

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	3	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A500 (MONTAJE Y PINTURA)	KG	COMUNIDAD PALOGRANDE WALABO		
ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A588 (MONTAJE Y PINTURA)	KG	COMUNIDAD PALOGRANDE WALABO		

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.


REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	In raestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Vers on:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERV SIÓN DIARIA DE OBRA

ES UEMA DE OBRA

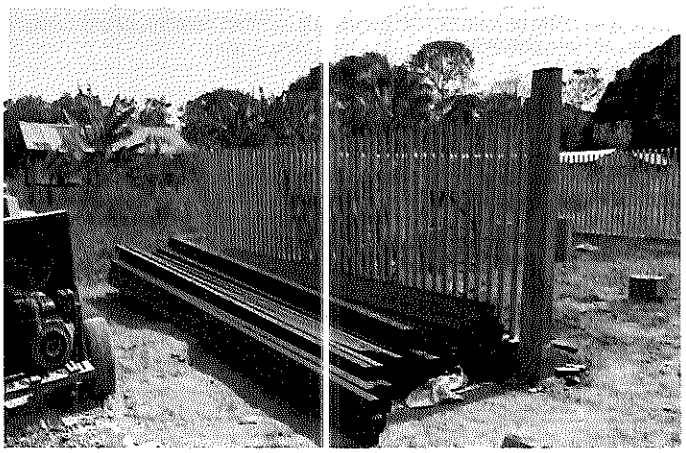

OBSERVACIONES:			
C: Conforme		FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		RESIDENTE 2 OBRA ING.VANESA GARZON GARC A	RESIDENTE 2 INTERVENTORIA ING.FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

12082

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META	OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META
RESIDENTE 2: FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ	RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA
FECHA: sabado 09 de mayo de 2026	HORAS DE LLUVIA: 2h y 30m

PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	254	DIAS PENDIENTES		202

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	3	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A500 (MONTAJE Y PINTURA)	KG	COMUNIDAD LA CAIMANA		
ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A588 (MONTAJE Y PINTURA)	KG	COMUNIDAD LA CAIMANA		

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA		
	In raestructura		
	Codigo:INF-FR-12	Vers ion:04	Vigencia: 10-01-2025

SUPER\ ISIÓN DIARIA DE OBRA

ES QUEMA DE OBRA



OBSERVACIONES:		
C: Conforme	FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme	RESIDENTE 2 OBRA ING.VANESA GARZON GARC A	RESIDENTE 2 INTERVENTORIA ING.FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

1283

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META	**OBJETO:** CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE	RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO
FECHA: Domingo 10 de Mayo de 2026	HORAS DE LLUVIA:

PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	255	DIAS PENDIENTES		201

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	3	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO _IBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	In raestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Vers on:04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPER\ SIÓN DIARIA DE OBRA				
ES\ UEMA DE OBRA				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme		FIRMA	FIRMA	
NC: No Conforme		RESIDENTE 1 OBRA ING.GUILLERMO ALBERTO OSC RIO	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING.JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE	
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara				

ALCALDÍA DE PUERTO GAITAN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

1206

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META	OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META
RESIDENTE 2: FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ	RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA
FECHA: Lunes 11 de mayo de 2026	HORAS DE LLUVIA: 2h

PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	256	DIAS PENDIENTES		200

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	3	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A500 (MONTAJE Y PINTURA)	KG	COMUNIDAD LA UNIÓN		
ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A588 (MONTAJE Y PINTURA)	KG	COMUNIDAD LA UNIÓN		

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.


REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

ESQUEMA DE OBRA

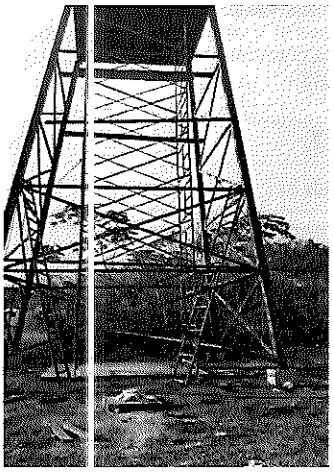

OBSERVACIONES:		
C: Conforme	FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme	RESIDENTE 2 OBRA ING.VANESA GARZON GARCIA	RESIDENTE 2 INTERVENTORIA ING.FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA		Puerto Gaitán
	Infraestructura		
Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

1005

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META	OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META
RESIDENTE 2: FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ	RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA
FECHA: Martes 12 de mayo de 2026	HORAS DE LLUVIA:

PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	257	DIAS PENDIENTES		199

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	3	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
CONTINUACIÓN ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A500 (MONTAJE Y PINTURA)	KG	COMUNIDAD LA UNIÓN		
CONTINUACIÓN ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A588 (MONTAJE Y PINTURA)	KG	COMUNIDAD LA UNIÓN		

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación SI se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.


REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA		
	Infraestructura		
Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	Puerto Gaitán

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

ESQUEMA DE OBRA

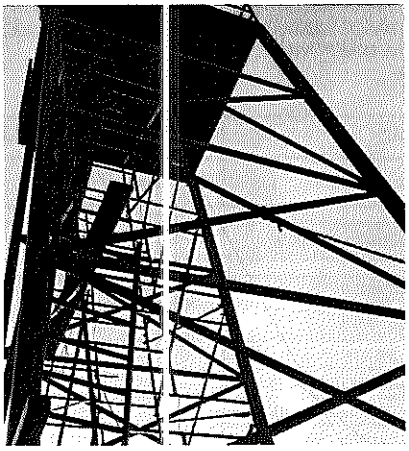

OBSERVACIONES:			
C: Conforme		FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		RESIDENTE 2 OBRA ING.VANESA GARZON GARCI	RESIDENTE 2 INTERVENTORIA ING.FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

12086

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META	OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META
RESIDENTE 2: FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ	RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA
FECHA: Miercoles 13 de mayo de 2026	HORAS DE LLUVIA: 4h

PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	258	DIAS PENDIENTES		198

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	3	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN	ML	COMUNIDAD ALGARROBO		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESION	ML	COMUNIDAD ALGARROBO		

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.


REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

ESQUEMA DE OBRA

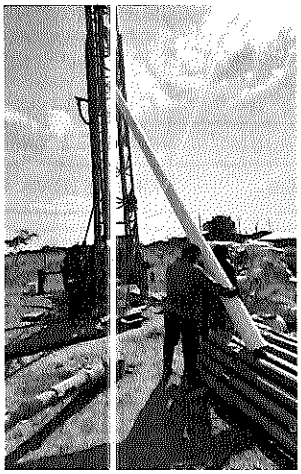

OBSERVACIONES:			
C: Conforme		FIRMA RESIDENTE 2 OBRA ING.VANESA GARZON GARCI	FIRMA RESIDENTE 2 INTERVENTORIA ING.FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ
NC: No Conforme			

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

12087

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META	OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META
RESIDENTE 2: FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ	RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA
FECHA: Jueves 14 de mayo de 2026	HORAS DE LLUVIA:

PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	259	DIAS PENDIENTES		197

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	3	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
CONTINUACIÓN INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN	ML	COMUNIDAD ALGARROBO		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESION	ML	COMUNIDAD ALGARROBO		
SUMINISTRO DE GRAVIILA TAMIZADA, SELECCIONADA Y SIN CALCÁREOS.	M3	COMUNIDAD ALGARROBO		

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.


REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA		Puerto Gaitán
	Infraestructura		
Codigo:INF-FR-12	Versión:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

ESQUEMA DE OBRA

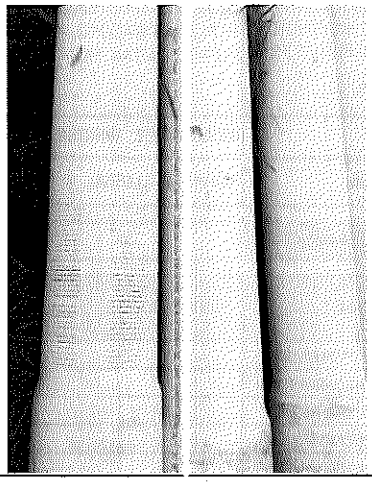

OBSERVACIONES:		
C: Conforme	FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme	RESIDENTE 2 OBRA ING.VANESA GARZON GARCIA	RESIDENTE 2 INTERVENTORIA ING.FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

12088

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META	OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META
RESIDENTE 2: FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ	RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA
FECHA: Viernes 15 de mayo de 2026	HORAS DE LLUVIA:3h

PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	260	DIAS PENDIENTES		196

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	3	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
INCIA EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN PARA TANQUE	M3	COMUNIDAD KEKO A ASEINPOME		
ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO ARMADO,	KG	COMUNIDAD KEKO A ASEINPOME		
SOLADO,LIMPIEZA CONCRETO 13,8 Mpa (2000 PSI)	M3	COMUNIDAD KEKO A ASEINPOME		

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.


REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

ESQUEMA DE OBRA

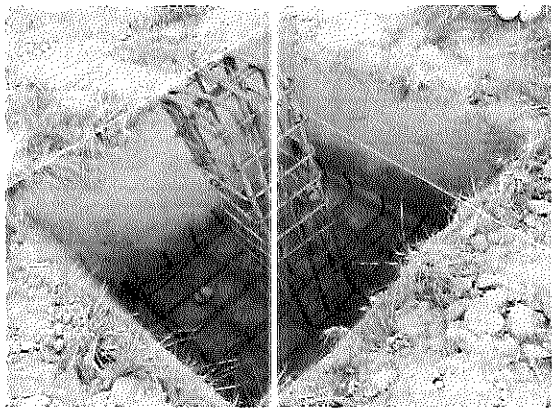

OBSERVACIONES:		
C: Conforme	FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme	RESIDENTE 2 OBRA ING.VANESA GARZON GARCIA	RESIDENTE 2 INTERVENTORIA ING.FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

12089

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META	**OBJETO:** CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE	RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO
FECHA: sabado 16 de mayo de 2026	HORAS DE LLUVIA: 2h

PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	261	DIAS PENDIENTES		195

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	3	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLATAFORMA EN LÁMINA ALFAJOR PARA TANQUE	M2	COMUNIDAD LAS DELICIAS		


LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Versión:04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
ESQUEMA DE OBRA				

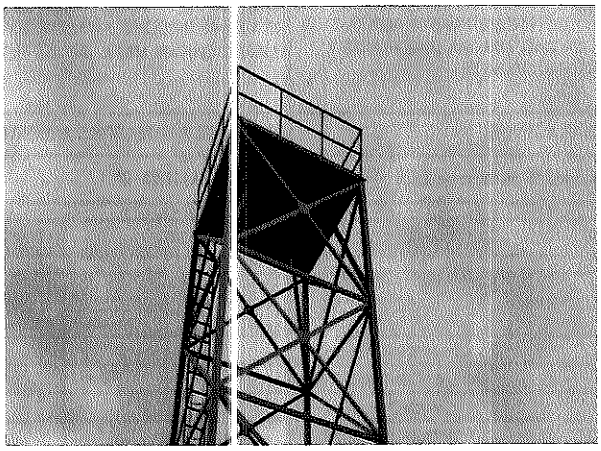

OBSERVACIONES:			
C: Conforme		FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		RESIDENTE 1 OBRA ING.GUILLERMO ALBERTO OSORIO	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING.JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

1090

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META	OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE	RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO
FECHA: Domingo 17 de Mayo de 2026	HORAS DE LLUVIA:

PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	262	DIAS PENDIENTES		194

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	3	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
ESQUEMA DE OBRA				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme		FIRMA		FIRMA
NC: No Conforme		RESIDENTE 1 OBRA ING.GUILLERMO ALBERTO OSORIO		RESIDENTE 1 INTERVENTORÍA ING.JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara				

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán Potencia Mundial
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META	OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META
RESIDENTE 2: FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ	RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA
FECHA: Lunes 18 de mayo de 2026 (festivo)	HORAS DE LLUVIA:

PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	263	DIAS PENDIENTES		193

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	3	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Ir fraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Ver: ion:04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPER ISIÓN DIARIA DE OBRA				
ES QUEMA DE OBRA				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme		FIRMA RESIDENTE 2 OBRA ING.VANESA GARZON GARC IA	FIRMA RESIDENTE 2 INTERVENTORIA ING.FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ	
NC: No Conforme				
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara				

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

1092

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META	OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META
RESIDENTE 2: FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ	RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA
FECHA: Martes 19 de mayo de 2026	HORAS DE LLUVIA: 3h

PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	264	DIAS PENDIENTES		192

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	3	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN PARA TANQUE	M3	COMUNIDAD KEKO A ASEINPOME		
ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO ARMADO, COLOCACION Y AMARRE.	KG	COMUNIDAD KEKO A ASEINPOME		

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.


REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA		Puerto Gaitán
	Infraestructura		
	Codigo:INF-FR-12	Versión:04	Vigencia: 10-01-2025

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

ESQUEMA DE OBRA

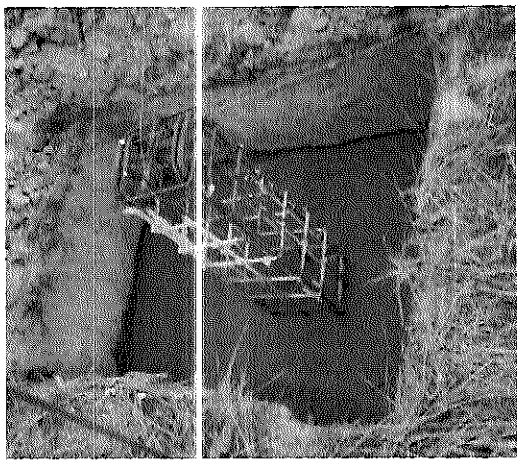

OBSERVACIONES:			
C: Conforme		FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		RESIDENTE 2 OBRA ING.VANESA GARZON GARCIA	RESIDENTE 2 INTERVENTORIA ING.FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

12093

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META	OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META
RESIDENTE 2: FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ	RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA
FECHA: Miercoles 20 de mayo de 2026	HORAS DE LLUVIA: 4h

PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	265	DIAS PENDIENTES	191

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	3	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
INICIO INSTALACIÓN TUBERÍA PVCP RDE 21 2"	ML	COMUNIDAD SIETE RODRIGUEZ		
INICIO INSTALACIÓN CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	COMUNIDAD SIETE RODRIGUEZ		
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE	M3	COMUNIDAD SIETE RODRIGUEZ		

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.


REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Versión:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

ESQUEMA DE OBRA

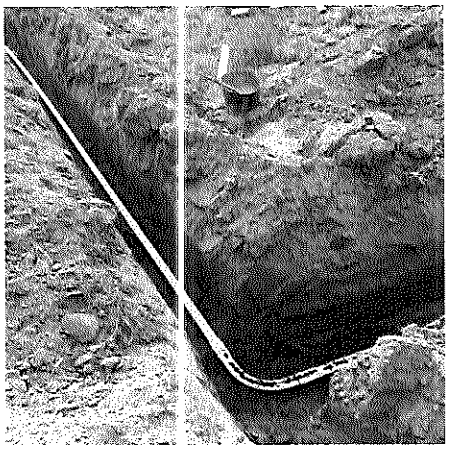

OBSERVACIONES:			
C: Conforme		FIRMA RESIDENTE 2 OBRA ING.VANESA GARZON GARCI.	FIRMA RESIDENTE 2 INTERVENTORIA ING.FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ
NC: No Conforme			

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán Tierra Mágica
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META	OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META
RESIDENTE 2: FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ	RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA
FECHA: Jueves 21 de mayo de 2026	HORAS DE LLUVIA:

PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	266	DIAS PENDIENTES		190

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	3	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
CONTINUACIÓN EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE	M3	COMUNIDAD SIETE RODRIGUEZ		
CONTINUACIÓN INSTALACIÓN TUBERÍA PVCP RDE	ML	COMUNIDAD SIETE RODRIGUEZ		
CONTINUACIÓN INSTALACIÓN CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	COMUNIDAD SIETE RODRIGUEZ		
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	COMUNIDAD SIETE RODRIGUEZ		

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.


REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATC LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Ii fraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Ver ion:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPER /ISIÓN DIARIA DE OBRA

ES QUEMA DE OBRA

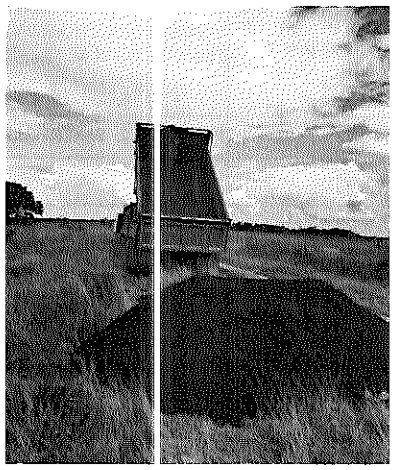

OBSERVACIONES:			
C: Conforme		FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		RESIDENTE 2 OBRA ING.VANESA GARZON GARC IA	RESIDENTE 2 INTERVENTORIA ING.FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META	OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE	RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO
FECHA: Viernes 22 de mayo de 2026	HORAS DE LLUVIA: 1h

PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	267	DIAS PENDIENTES		189

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	3	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
INICIO INSTALACIÓN TUBERÍA PVCP RDE 21 2"	ML	COMUNIDAD OLIVOS		
INICIO INSTALACIÓN CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	COMUNIDAD OLIVOS		
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE	M3	COMUNIDAD OLIVOS		

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.


REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Ir fraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Ver ion:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPER ISIÓN DIARIA DE OBRA

ES QUEMA DE OBRA

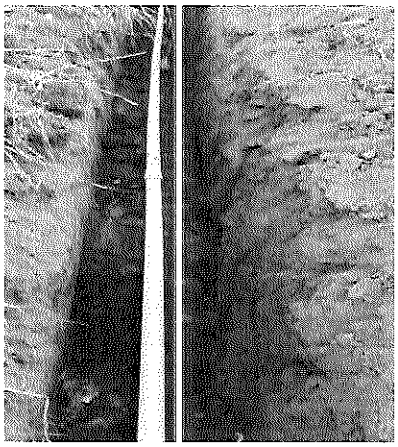

OBSERVACIONES:			
C: Conforme		FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		RESIDENTE 1 OBRA ING.GUILLERMO ALBERTO OS RIO	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING.JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

1006

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META	**OBJETO:** CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META
RESIDENTE 2: FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ	**RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA**
FECHA: sabado 23 de mayo de 2026	**HORAS DE LLUVIA: 1h**

PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	268	DIAS PENDIENTES		188

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	3	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A500 (MONTAJE Y PINTURA)	KG	COMUNIDAD KEKO A ASEINPOME		
ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A588 (MONTAJE Y PINTURA)	KG	COMUNIDAD KEKO A ASEINPOME		

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.


REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Versión:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

ESQUEMA DE OBRA

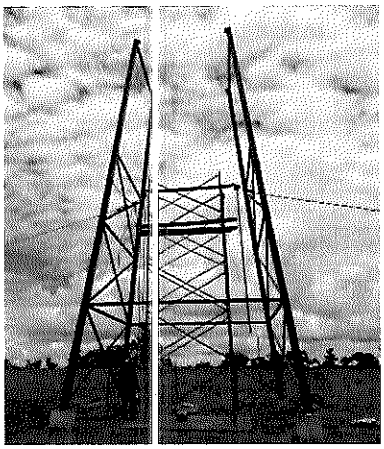

OBSERVACIONES:			
C: Conforme		FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		RESIDENTE 2 OBRA ING.VANESA GARZON GARCIA	RESIDENTE 2 INTERVENTORIA ING.FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META	OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE	RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO
FECHA: Domingo 24 de Mayo de 2026	HORAS DE LLUVIA:

PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	269	DIAS PENDIENTES		187

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	3	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
ESQUEMA DE OBRA				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme		FIRMA		FIRMA
NC: No Conforme		RESIDENTE 1 OBRA ING.GUILLERMO ALBERTO OSORIO		RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING.JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara				

12098

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META	**OBJETO:** CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE	**RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO**
FECHA: Lunes 25 de mayo de 2026	**HORAS DE LLUVIA: 2h**

PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	270	DIAS PENDIENTES		186

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	3	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
CONTINUACIÓN EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE	M3	COMUNIDAD OLIVOS		
CONTINUACIÓN INSTALACIÓN TUBERÍA PVCP RDE	ML	COMUNIDAD OLIVOS		
CONTINUACIÓN INSTALACIÓN CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	COMUNIDAD OLIVOS		

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Versión:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

ESQUEMA DE OBRA



OBSERVACIONES:			
C: Conforme		FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		RESIDENTE 1 OBRA ING.GUILLERMO ALBERTO OSORIO	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING.JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

1299

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META	**OBJETO:** CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META
RESIDENTE 2: FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ	RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA
FECHA: Martes 26 de mayo de 2026	HORAS DE LLUVIA:

PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	271	DIAS PENDIENTES	185

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	3	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
CONTINUACIÓN EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE	M3	COMUNIDAD SIETE RODRIGUEZ		
CONTINUACIÓN INSTALACIÓN TUBERÍA PVCP RDE	ML	COMUNIDAD SIETE RODRIGUEZ		
CONTINUACIÓN INSTALACIÓN CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	COMUNIDAD SIETE RODRIGUEZ		

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.


REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Versión:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

ESQUEMA DE OBRA

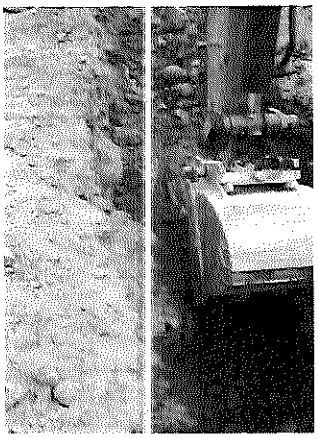

OBSERVACIONES:			
C: Conforme		FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		RESIDENTE 2 OBRA ING.VANESA GARZON GARCIA	RESIDENTE 2 INTERVENTORIA ING.FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA		
	Infraestructura		
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025

Puerto Gaitán

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META	OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE	RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO
FECHA: Miercoles 27 de mayo de 2026	HORAS DE LLUVIA: 3h

PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	272	DIAS PENDIENTES		184

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	3	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
CONTINUACIÓN EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE	M3	COMUNIDAD PARAISO		
CONTINUACIÓN INSTALACIÓN TUBERÍA PVCP RDE	ML	COMUNIDAD PARAISO		
CONTINUACIÓN INSTALACIÓN CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	COMUNIDAD PARAISO		


LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
ESQUEMA DE OBRA				



OBSERVACIONES:			
C: Conforme		FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		RESIDENTE 1 OBRA ING.GUILLERMO ALBERTO OSORIO	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING.JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META	OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE	RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO
FECHA: Jueves 28 de mayo de 2026	HORAS DE LLUVIA: 4h

PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	273	DIAS PENDIENTES		183

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	3	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
INSTALACION Y ADECUACION DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS	UND	COMUNIDAD LAS BRISAS		
PERFORACION DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO	ML	COMUNIDAD LAS BRISAS		

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.


REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA		
	Infraestructura		
Codigo:INF-FR-12	Versión:04	Vigencia: 10-01-2025	Puerto Gaitán

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

ESQUEMA DE OBRA

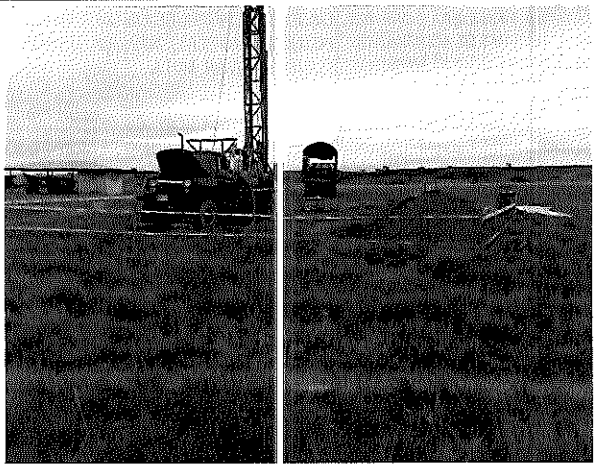

OBSERVACIONES:

C: Conforme		FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		RESIDENTE 1 OBRA ING.GUILLERMO ALBERTO OSORIO	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING.JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán Tierra Natural
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

1102

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META	OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE	RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO
FECHA: Viernes 29 de mayo de 2026	HORAS DE LLUVIA:

PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	274	DIAS PENDIENTES		182

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	3	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
CONTINUACION PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO	ML	COMUNIDAD LAS BRISAS		
ANALISIS LITOLOGICO Y GRANULOMETRICO DEL POZO	ML	COMUNIDAD LAS BRISAS		
AMPLIACION DE LA PERFORACION EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"	ML	COMUNIDAD LAS BRISAS		

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.


REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA		
	Infraestructura		
Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

ESQUEMA DE OBRA

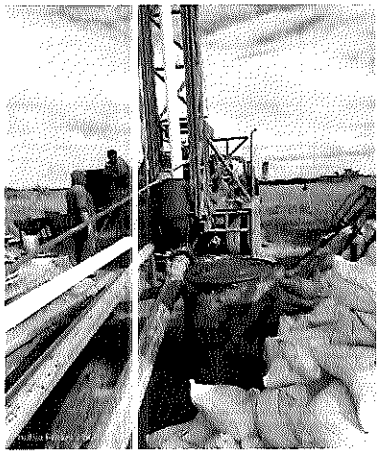

OBSERVACIONES:		
C: Conforme	FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme	RESIDENTE 1 OBRA ING.GUILLERMO ALBERTO OSORIO	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING.JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

12403

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META	**OBJETO:** CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE	**RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO**
FECHA: sabado 30 de mayo de 2026	**HORAS DE LLUVIA: 1h y 30m**

PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	275	DIAS PENDIENTES		181

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	3	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN	ML	COMUNIDAD LAS BRISAS		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESION	ML	COMUNIDAD LAS BRISAS		

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.


REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

ESQUEMA DE OBRA

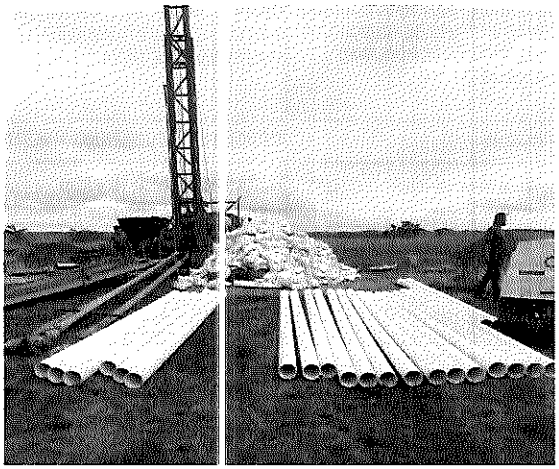

OBSERVACIONES:		
C: Conforme	FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme	RESIDENTE 1 OBRA ING.GUILLERMO ALBERTO OSORIO	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING.JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

1104

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025
OBJETO:INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META	OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META
RESIDENTE 2: FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ	RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA
FECHA: Domingo 31 de Mayo de 2026	HORAS DE LLUVIA:

PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	276	DIAS PENDIENTES		180

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	3	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO _IBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	In raestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Vers on:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPER\ ISIÓN DIARIA DE OBRA

ES\ UEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:		
C: Conforme	FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme	RESIDENTE 2 OBRA ING.VANESA GARZON GARC A	RESIDENTE 2 INTERVENTORIA ING.FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

1205

ANEXO 10. APROBACIÓN CONTRATO FIDUCIARIO Y SOPORTES PAGOS DE FIDUCIA

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	COMUNICACIÓN OFICIAL			Puerto Gaitán
	GESTIÓN DOCUMENTAL			
	Código: GDO-FR-13	Versión: 05	Vigencia: 07/01/2025	

12106

Puerto Gaitán, 27 de agosto de 2025

Señores
CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025
NIT 800.079.035-1 R/L LUIS FERNNDO MUÑOZ MURCIA
C.C. 86.051.533 de Villavicencio
Calle 15 No. 40-01 Centro Comercial Primavera Urbana
Celular 3123143658
Consorcioaguasgaitan2025@gmail.com
Villavicencio Meta

Asunto: ACEPTACION DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE PARA LA ADMINISTRACION Y PAGO DE LOS RECURSOS RECIBIDOS A TITULO DE ANTICIPO, CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA POPULAR S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA Y LOS FIDEICOMITENTES DEL CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 (CONTRATO DE OBRA No. 0821 de 2025).

Cordial saludo

Teniendo en cuenta que ustedes atendieron cabalmente los requerimientos que le hiciere la Administración Municipal contenidos en el parágrafo de la cláusula cuarta del contrato de Obra No. 0821 de 2025, cuyo objeto es " **CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META** " y de conformidad al Art. 91 de la Ley 1474 de 2011, "En los contratos de obra, concesión, salud, o los que se realicen por licitación pública, el contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente, salvo que el contrato sea de menor o mínima cuantía. El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista" y que, frente a nuestro deber legal de pronunciamos como entidad contratante, debemos indicar que el Municipio de Puerto Gaitán (Meta) por medio la Secretaria de Contratación, responde POSITIVAMENTE a la aceptación del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de administración y pagos, para la Administración de los recursos entregados como anticipo, celebrado entre FIDUCIARIA POPULAR S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA Y LOS FIDEICOMITENTES DEL CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025.

La mencionada aceptación, se efectúa de conformidad con el Decreto Administrativo No. 001 del siete (07) de enero de 2025, por medio del cual se deroga el Decreto No. 0180 del tres (3) de julio de 2024, y se delegan unas facultades en materia de contratación pública y ordenación del gasto en el municipio de Puerto Gaitán - Meta

Con todo respeto,

ALEJANDRA CASTILLO BLANDON
Secretaria de Contratación

Elaboró: Herder Fabian Burgos Garcia	Revisó: Alejandra Castillo Blandón	Aprobó: Alejandra Castillo Blandón
Cargo: CPS SC	Cargo: Secretaria de Contratación	Cargo: Secretaria de Contratación

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

AVAL Fiduciaria | Asset Management

12/07

Hola **3 1 P126331 ANT CONS AGUAS GAITAN 2025,**

¡Buenas noticias! Tu solicitud de pago número 412013 en el portal y número interno de Aval Fiduciaria 830257, donde generaste la instrucción de giro al beneficiario **ANCIZAR GUILLERMO ARREDONDO ARBOLEDA**, identificado con número de documento **17416479**, con la forma de pago **TRANSFERENCIA BANCARIA**, por un valor de **$10096319**, fue **ENVIADA** a la entidad financiera **BANCOLOMBIA CH 28995117209** el día **05-05-2026**. Todo el proceso interno de Aval Fiduciaria se ha completado exitosamente.

Si tienes alguna inquietud sobre este comprobante, por favor comunícate con tu analista de gestión o con nuestra Línea de Servicio al Cliente en Bogotá **(601) 755 0340**, a la Línea nacional gratuita **01 8000 189 799** o desde su celular **#432.**

¡Gracias por confiar en nosotros!

12/08

Cuenta de Cobro Nª 003-2026

Puerto Gaitán, 24 de abril de 2026

CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025
NIT 901.965.630 – 1

Debe a:

ANCIZAR GUILLERMO ARREDONDO ARBOLEDA
C.C. 17.416.479

La suma de: Diez millones trescientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos M/cte. ($10.399.999)

Concepto: Pago final por Acta de liquidación del contrato DE OBRA CIVIL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS N° 013 DEL 2025 cuyo objeto es "CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO CON TUBERIA EN PVC 6" EN LA COMUNIDAD FACUNAE DEL RESGUARDO AWALIBA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN".

Ancizar Guillermo Arredondo Arboleda
c.c. 17.416.479 de Acacias - Meta
Celular 321 261 6048

AVAL Fiduciaria | Asset Management

12109

Hola **3 1 P126331 ANT CONS AGUAS GAITAN 2025,**

¡Buenas noticias! Tu solicitud de pago número 412053 en el portal y número interno de Aval Fiduciaria 830263, donde generaste la instrucción de giro al beneficiario **ANGY XIMENA CASTILLO BLANDON**, identificado con número de documento **1121932438**, con la forma de pago **TRANSFERENCIA BANCARIA**, por un valor de **$885000.0**, fue **ENVIADA** a la entidad financiera **BANCOLOMBIA CH 39586743477** el día **05-05-2026**. Todo el proceso interno de Aval Fiduciaria se ha completado exitosamente.

Si tienes alguna inquietud sobre este comprobante, por favor comunícate con tu analista de gestión o con nuestra Línea de Servicio al Cliente en Bogotá **(601) 755 0340**, a la Línea nacional gratuita **01 8000 189 799** o desde su celular **#432.**

¡Gracias por confiar en nosotros!

ANGY XIMENA CASTILLO BLANDÓN
Contadora Publica
Especialista en Gerencia Y Administración Tributaria
Especialista en Gerencia Estratégica
Máster en Dirección Y Organización De Proyectos

1210

Cuenta de Cobro No. 008

CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025
NIT 901.965.630

DEBE A
ANGY XIMENA CASTILLO BLANDÓN
C.C 1.121.932.438 De Villavicencio
CALLE 03 SUR NUMERO 51 03 BARRIO LLANO LINDO
TEL. 311 441 7025
VILLAVICENCIO, COLOMBIA.

PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON LAS NORMAS FISCALES ME PERMITO INFORMAR: *Yo, **ANGY XIMENA CASTILLO BLANDÓN** identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1.121.932.438 de Villavicencio pertenezco al régimen no responsable de IVA*		
CONCEPTO *Honorarios como contadora publica*		
VALOR	*$1.000.000*	*Un millón de pesos MCTE*
PERIODO:	*Del 01 al 30 de abril del 2026*	

NOTA: Por favor practicar retención en la fuente del 10% de acuerdo Artículo 1.2.4.3.1. del DUR 1625 de 2016 y Art 392 E.T.

Se suscribe a los veintisiete (28) días del mes de abril del 2026, en la ciudad de Villavicencio.

FIRMA DEL CONTRATISTA	***Cédula No.***
	1.121.932.438

Correo: ximenacas13@hotmail.com
Villavicencio – Meta
Celular: 311 441 7025

AVAL Fiduciaria | Asset Management

Hola **3 1 P126331 ANT CONS AGUAS GAITAN 2025,**

¡Buenas noticias! Tu solicitud de pago número 412062 en el portal y número interno de Aval Fiduciaria 830259, donde generaste la instrucción de giro al beneficiario **SANOSOL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS**, identificado con número de documento **901975926**, con la forma de pago **TRANSFERENCIA BANCARIA**, por un valor de **$149032016.58**, fue **ENVIADA** a la entidad financiera **BANCOLOMBIA CH 84400008288** el día **05-05-2026**. Todo el proceso interno de Aval Fiduciaria se ha completado exitosamente.

Si tienes alguna inquietud sobre este comprobante, por favor comunícate con tu analista de gestión o con nuestra Línea de Servicio al Cliente en Bogotá **(601) 755 0340**, a la Línea nacional gratuita **01 8000 189 799** o desde su celular **#432.**

¡Gracias por confiar en nosotros!

SANOSOL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS
NIT 901.975.926-7
CL 16 6 27
Tel: 3165200933 - Ext. undefined
Puerto Gaitán - Colombia
SANOSOLINGENIERIA@GMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. FE 21

212

Señores	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025		
NIT	901.965.630-1	**Teléfono**	(608) 3123143658 - Ext. 000
Dirección	CL 15 40 01	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/04/2026, 12:11
Expedición	28/04/2026, 12:20
Vencimiento	28/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Acta parcial No. 1 del Contrato de Obra No. 023 de 2026 cuyo objeto es Construcción redes de acueducto, cimentación de estructuras para tanque elevado y cerramientos, en comunidades indígenas de los resguardos Awaliba y Domoplanas ubicados en la zona rural del municipio del Puerto Gaitán.	1.00	128,742,239.62	129,720,680.64

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento cuarenta y nueve millones treinta y dos mil dieciseis pesos m/cte con cincuenta y ocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-28 por $ 149,032,016.58

Total Bruto	128,742,239.62
Administración 10.00%	12,874,223.96
Imprevistos 1.00%	1,287,422.40
Utilidad 4.00%	5,149,689.58
IVA 19%	978,441.02
Total a Pagar	**149,032,016.58**

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764097143444 aprobado en 20250815 prefijo FE desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: f71fe7030781a355e40e7e94ff9ff03b0c3060dd238fec087c7114ef66b033d736108c1d963f81f2e5cc1569c71699d5

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S. - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

AVAL Fiduciaria | Asset Management

1213

Hola **3 1 P126331 ANT CONS AGUAS GAITAN 2025,**

¡Buenas noticias! Tu solicitud de pago número 412066 en el portal y número interno de Aval Fiduciaria 830258, donde generaste la instrucción de giro al beneficiario **CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025**, identificado con número de documento **901965630**, con la forma de pago **TRANSFERENCIA BANCARIA**, por un valor de **$99372546**, fue **ENVIADA** a la entidad financiera **BANCO DAVIVIENDA CC 098469997740** el día **05-05-2026**. Todo el proceso interno de Aval Fiduciaria se ha completado exitosamente.

Si tienes alguna inquietud sobre este comprobante, por favor comunícate con tu analista de gestión o con nuestra Línea de Servicio al Cliente en Bogotá **(601) 755 0340**, a la Línea nacional gratuita **01 8000 189 799** o desde su celular **#432.**

¡Gracias por confiar en nosotros!

CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025
NIT: 901965630 - 1
Dirección: CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA U

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 00000380
FECHA: 22/04/2026

CODIGO	CC	NUMERO	DETALLE	NIT	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501001	1	44675-7	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE 17267667		VELANDIA CASTILLO JIMY	99,372,546.00	
111505001	1	44675-7	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE 17267667		VELANDIA CASTILLO JIMY		99,372,546.00
VALOR :		99,372,546.00			SUMAS IGUALES:	99,372,546.00	99,372,546.00

OBS: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE CON FACT. N° FE 19, CON CHEQUE N° 44675-7.

Elaboro	Reviso
Aprobo	Audito

Jimmy Velandia
Recibio C.C / Nit: 1720106[illegible]

Recibido
Favorable
Con Tacha

JIMY AURELIO VELANDIA CASTILLO
NIT 17267667-0
VEREDA LAS VILLAS, Puerto Gaitán, Meta,
Tel: +573507358686
jimmyv9285@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE19

No responsable de IVA

12/15

SEÑOR(ES)	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA, Colombia, Villavicencio, Meta		20/04/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3123143658	**NIT** 901965630-1	20/05/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Transporte de Material Pétreo a Comunidades Indígenas del Municipio de Puerto Gaitán - Meta	Servicio	$101.556.000	1		$101.556.000

Moneda: COP
Generado: 2026-04-20 17:47:37-05:00
Validación DIAN: 2026-04-20 17:48:38-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

CUFE: 401e164b94fa7e1dfbd5527348214d92556e555774db0d9587de44404684b071ef892109b4283563627402e099915fd5

Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$101.556.000
Total	$101.556.000

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764108678707 de 2026-04-20 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE18 hasta FE100 con vigencia hasta 2026-10-20

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.533.038-2

AVAL Fiduciaria | Asset Management

12116

Hola **3 1 P126331 ANT CONS AGUAS GAITAN 2025,**

¡Buenas noticias! Tu solicitud de pago número 413019 en el portal y número interno de Aval Fiduciaria 831030, donde generaste la instrucción de giro al beneficiario **M&G INGENIERIA S.AS** , identificado con número de documento **900974864**, con la forma de pago **TRANSFERENCIA BANCARIA**, por un valor de **$25000000**, fue **ENVIADA** a la entidad financiera **BANCO DAVIVIENDA CH 098470022017** el día **06-05-2026**. Todo el proceso interno de Aval Fiduciaria se ha completado exitosamente.

Si tienes alguna inquietud sobre este comprobante, por favor comunícate con tu analista de gestión o con nuestra Línea de Servicio al Cliente en Bogotá **(601) 755 0340**, a la Línea nacional gratuita **01 8000 189 799** o desde su celular **#432.**

¡Gracias por confiar en nosotros!

M&G Ingeniería
NIT. 900974864-0 S.A.S.

1217

Villavicencio, 29 de abril de 2026

CUENTA DE COBRO No. 001

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

DEBE A:

M&G INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 900.974.864 – 0

POR CONCEPTO DE:

Anticipo correspondiente al contrato N° 024 DEL 2026, que tiene por objeto "CONSTRUCCION REDES DE ACUEDUCTO PARA COMUNIDADES INDIGENAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN".

POR UN VALOR DE:

VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($25.000.000,00).

Cordialmente,

ANDREA GUALTEROS ZAPATA
R.L. M&G INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 900.974.864 – 0

AVAL Fiduciaria | Asset Management

12/18

Hola **3 1 P126331 ANT CONS AGUAS GAITAN 2025,**

¡Buenas noticias! Tu solicitud de pago número 413022 en el portal y número interno de Aval Fiduciaria 831032, donde generaste la instrucción de giro al beneficiario **GEODELTA SAS**, identificado con número de documento **901658784**, con la forma de pago **TRANSFERENCIA BANCARIA**, por un valor de **$25409809**, fue **ENVIADA** a la entidad financiera **BANCO DAVIVIENDA CH 0550108900765083** el día **06-05-2026**. Todo el proceso interno de Aval Fiduciaria se ha completado exitosamente.

Si tienes alguna inquietud sobre este comprobante, por favor comunícate con tu analista de gestión o con nuestra Línea de Servicio al Cliente en Bogotá **(601) 755 0340**, a la Línea nacional gratuita **01 8000 189 799** o desde su celular **#432.**

¡Gracias por confiar en nosotros!

GEODELTA SAS
NIT 901.658.784-9
Calle 19 No. 39 03 Brr Camoa
Tel: (608) 3142098182
Villavicencio - Colombia
geodeltasas@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. GEO 112

Señores	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025		
NIT	901.965.630-1	Teléfono	(000) 3123143658
Dirección	CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA	Ciudad	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/04/2026, 09:50
Expedición	29/04/2026, 09:50
Vencimiento	27/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Obra Civil - SEGUN CONTRATO DE OBRA No: 010 DE 2026 - ACTA: DE PAGO PARCIAL No. 1 - CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO CON TUBERIA EN PVC 6 EN LA COMUNIDAD MATAPALITO DEL RESGUARDO WACOYO EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN	1.00	61,696,767.26

Total items: 1

Valor en Letras:
Setenta y tres millones novecientos veinte mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-27 por $ 73,920,000.00

Total Bruto	61,116,163.70
Administración 10.00%	6,111,616.37
Imprevistos 5.00%	3,055,808.19
Utilidad 5.00%	3,055,808.18
IVA 19%	580,603.56
Total a Pagar	73,920,000.00

Observaciones:
VALOR INICIAL $92.400.000
VALOR ACTUALIZADO $ 92.400.000
ANTICIPO $ 46.200.000
% AVANCE DE OBRA 80%
VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL $ 73.920.000
ANTICPO AMORTIZADO PRESENTE ACTA $ 46.200.000
VALOR A PAGAR ANTES DE RETENCIONES PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL $ 27.720.000

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764106354676 aprobado en 20260224 prefijo GEO desde el número 103 al 1000 Vigencia: 12 Meses**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

AVAL Fiduciaria | Asset Management

Hola **3 1 P126331 ANT CONS AGUAS GAITAN 2025,**

¡Buenas noticias! Tu solicitud de pago número 413748 en el portal y número interno de Aval Fiduciaria 834076, donde generaste la instrucción de giro al beneficiario **JULIAN HERNEY LOZANO GUTIERREZ**, identificado con número de documento **86049229**, con la forma de pago **TRANSFERENCIA BANCARIA**, por un valor de **$34968584**, fue **ENVIADA** a la entidad financiera **BANCOLOMBIA CH 05707417431** el día **13-05-2026**. Todo el proceso interno de Aval Fiduciaria se ha completado exitosamente.

Si tienes alguna inquietud sobre este comprobante, por favor comunícate con tu analista de gestión o con nuestra Línea de Servicio al Cliente en Bogotá **(601) 755 0340**, a la Línea nacional gratuita **01 8000 189 799** o desde su celular **#432.**

¡Gracias por confiar en nosotros!

PROFORMA

NO 005

FECHA 28/04/2026
VENCIMIENTO 28/05/2026

DEPOSITO Y MATERIALES LA 35
NIT. 86.049.229
CONSTRUYENDO AL META
CRA 35A N° 27-31 SAN ISIDRO
TEL 3154664115
EMAIL: DEPOSITOLA-35@HOTMAIL.COM

CLIENTE
CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT: 901965630
CLL 15 40 01 CC PRIMAVERA URBANA
PUERTO GAITAN
3111111

CODIGO	NOMBRE	% IVA	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
7895499	CHEQUE CORTINA 1 1/4	19	28	82,773	2,317,647
4584899	TEE REDUCIDA GALVANIZADA 1 1/4 X 1/2	19	28	7,983	223,529
15489669	BUSHING GLVNZ 1/2 X 1/4	19	28	2,353	65,882
66566659	REGISTRO CORTINA X 1 1/4	19	28	73,950	2,070,588
56566336	MANOMETRO 1/4 X 2.50 X 0.300	19	28	73,950	2,070,588
66566366	REGISTRO MET BOLA 1 1/4	19	28	68,908	1,929,412
655264566	CHEQUE FILTRO X 1 1/4 TP Y	19	28	115,966	3,247,059
1215563	MEDIDOR 1 1/2	19	23	788,235	18,129,412
100172	TEE PRESION 1 1/4	19	13	3,025	39,328

TREINTA Y CINCO MILLONES OCHO CIENTOS ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y OCHC CENTAVOS

Impreso por PUNTOFACTURACION

Subtotal	30,093,445
IVA	5,717,755
Descuento	0
Retencion	752,336
Total	35,058,864

Forma de pago: Transferencia (CONTADO) CUENTA BANCOLOMBIA AHORRO NO 05707417431

La presente proforma no constituye una factura de venta, sino una cotización detallada de los productos solicitados. Los precios y condiciones aquí estipulados tienen una validez de [30 días] a partir de la fecha de emisión.

Agradecemos su interés y quedamos atentos a cualquier ajuste o confirmación de la propuesta.

AVAL Fiduciaria | Asset Management

1212

Hola **3 1 P126331 ANT CONS AGUAS GAITAN 2025,**

¡Buenas noticias! Tu solicitud de pago número 414795 en el portal y número interno de Aval Fiduciaria 834079, donde generaste la instrucción de giro al beneficiario **CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025**, identificado con número de documento **901965630**, con la forma de pago **TRANSFERENCIA BANCARIA**, por un valor de **$25064458**, fue **ENVIADA** a la entidad financiera **BANCOLOMBIA CH 84400008225** el día **13-05-2026**. Todo el proceso interno de Aval Fiduciaria se ha completado exitosamente.

Si tienes alguna inquietud sobre este comprobante, por favor comunícate con tu analista de gestión o con nuestra Línea de Servicio al Cliente en Bogotá **(601) 755 0340**, a la Línea nacional gratuita **01 8000 189 799** o desde su celular **#432.**

¡Gracias por confiar en nosotros!

RELACION PAGOS PARA REEMBOLSO						
DESCRIPCIÓN	PERSONAL	MES O PERIODO	VALOR	METODO DE PAGO		
				PAGO POR CONSIGNACIÓN A CUENTA BANCARIA	PAGO EN EFECTIVO	PAGO POR PSE
	FRANCY CAROLINA AREVALO	16-30 ABRIL 2026	$ 929.964	$ 929.964		
	GUILLERMO ALBERTO OSORIO	16-30 ABRIL 2026	$ 1.236.506	$ 1.236.506		
	ROSEMBERG MURCIA JOJOA	16-30 ABRIL 2026	$ 1.048.923	$ 1.048.923		
	WENDY GARZON GARCIA	16-30 ABRIL 2026	$ 1.236.506	$ 1.236.506		
	GUSTAVO MEDINA	16-30 ABRIL 2026	$ 1.381.544	$ 1.381.544		
	EDWIN BARRIOS	01-30 ABRIL 26	$ 1.951.928	$ 1.951.928		
	DIOSID CORREA	01-30 ABRIL 26	$ 2.151.928	$ 2.151.928		
	YEFERSON GALVAN	01-30 ABRIL 26	$ 2.059.928	$ 2.059.928		
	DUVAN ROMERO	01-30 ABRIL 26	$ 1.959.928	$ 1.959.928		
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL		ABRIL	$ 8.690.100			$ 8.690.100
DOTACIÓN	PLUXEE COLOMBIA	ABRIL	$ 1.508.623			$ 1.508.623
MATERIAL	PUNTO MADERIN	8-may	$ 908.580	$ 908.580		
TOTAL			$ 25.064.458,00			

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025

NIT. 901.065.630-1

Nomina del día 16 al 30 de Abril de 2.026

				DEVENGADO								DEDUCCIONES							
Nombre del Empleado	No. Identificación	Cargo	Días	Salario Básico	Días Trabajados	Total Básico	Auxilio de Transporte	Licencia Remunerada	Incapacidad (EPS/ARL)	Auxilio Cesantías y Intereses a las CS	Total Devengado	Salud	Pensión	Fondo Solidaridad Pensional	Retención en la Fuente	Anticipo de Nómina	Total Deducciones	Neto Pagado	OBSERVACIONES
AREVALO GARZON FRANCY CAROLINA	40.326.478	DIRECTOR DE OBRA	6	$ 1.750.905	15	$ 875.453	$ 124.548	$ -	$ -	$ -	$ 1.000.000	$ 35.018	$ 35.018	$ -		$ -	$ 70.036	$ 929.964	Se envia desprendible de nómina al correo: CAROLINA05_INGCIVIL@hotmail.com
GARZO GARCIA WENDY VANESA	1.121.902.403	INGENIERO RESIDENTE 2	5	$ 2.417.300	15	$ 1.208.650	$ 124.548	$ -	$ -	$ -	$ 1.333.198	$ 48.346	$ 48.346	$ -		$ -	$ 96.692	$ 1.236.506	Se envia desprendible de nómina al correo: Ing.wvg2@gmail.com
MEDINA PARDO GUSTAVO ADOLFO	1.121.869.898	COORDINADOR SST	5	$ 2.732.600	15	$ 1.366.300	$ 124.548	$ -	$ -	$ -	$ 1.490.848	$ 54.652	$ 54.652	$ -		$ -	$ 109.304	$ 1.381.544	Se envia desprendible de nómina al correo: g.pardo09@gmail.com
MUÑOZMURCIA LUIS FERNANDO	86.051.533	REPRESENTANTE LEGAL	1	$ 11.561.000	15	$ 5.780.500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.780.500	$ 231.220	$ 231.220	$ 57.805	$ 254.000	$ -	$ 774.245	$ 5.006.255	Se envia desprendible de nómina al correo: Ingluisfernandom@gmail.com
MURCIA JOJOA ROSEMBERG	17.497.322	CONDUCTOR	5	$ 2.009.512	15	$ 1.004.756	$ 124.548	$ -	$ -	$ -	$ 1.129.304	$ 40.190	$ 40.190	$ -		$ -	$ 80.380	$ 1.048.923	Se envia desprendible de nómina al correo: asesoriasfym@outlook.com
OSORIO VARGAS GUILLERMO ALBERTO	1.121.834.340	INGENIERO RESIDENTE 1	5	$ 2.417.300	15	$ 1.208.650	$ 124.548	$ -	$ -	$ -	$ 1.333.198	$ 48.346	$ 48.346	$ -			$ 96.692	$ 1.236.506	Se envia desprendible de nómina al correo: oskp07@hotmail.com
TOTALES						$ 11.444.369	$ 622.738	$ -		$ -	$ 12.067.046	$ 457.772	$ 457.772	$ 57.805		$ -	$ 1.227.350	$ 10.839.696	

A cargo del empleador								
Seguridad Social			%	Valor	Provisiones Prest. Soc y Vac.	%		Valor
Salud			0,0%	$ 0	Cesantías	8,330%		$ 1.005.185
Fondo de Pensiones			12%	$ 1.373.317	Intereses sobre cesantías	1%		$ 120.670
ARL (riesgos laborales)	Seleccione la tarifa:	I	0,522%	$ 30.174	Prima	8,330%		$ 1.005.185
		IV	4,350%	$ 0	Vacaciones	4,170%		$ 477.228
		V	8,560%	$ 394.201				
Total Seguridad Social				$ 1.797.692	Total prestaciones sociales			$ 2.608.268
Parafiscales				%	Valor			
Caja Compensación FamTar				4%	$ 457.772			
ICBF				0%	$ 0			
SENA				0%	$ 0			
Total Parafiscales					$ 457.772			
Total a cargo del empleador				$ 4.863.733				

Salario Mínimo Legal Vigente 2026	$ 1.750.905
Auxilio de transporte	$ 249.095

RIESGO ARL		
Tipo		Tarifa
I		0,52%
II		1,04%
III		2,44%
IV		4,35%
V		6,96%

FECHA ENVIO DESPRENDIBLES DE NOMINA
FECHA DE CONSIGNACIÓN DE LA NOMINA
30/01/2026

IMPORTANTE!	
Se encuentra exonerado de pago de aporte de Parafiscales y Salud Ley 1607 de 2012?	
marque con una "x" si es así.	
SI	X

Días de la nomina	30
Horas trabajadas en el día	7,33

NOVEDAD	
INCAPACIDAD GENERAL	
ANTICIPO A NOMINA	

NOMBRE DEL EMPLEADO	No. Identificación	Cargo	Días	Salario Básico	Días Trabajados	Total Básico	Auxilio de Transporte	Licencia Remunerada	Incapacidad (EPS/ARL)	Auxilio Cesantías y Intereses a las CS	Total Devengado	Total Deducciones	Neto Pagado
AREVALO GARZON FRANCY CAROLINA	40.326.478	DIRECTOR DE OBRA	6	$ 1.750.905	15	$ 875.453	$ 124.548	$ -	$ -	$ -	$ 1.000.000	$ 70.036	$ 929.964
GARZO GARCIA WENDY VANESA	1.121.902.403	INGENIERO RESIDENTE 2	5	$ 2.417.300	15	$ 1.208.650	$ 124.548	$ -	$ -	$ -	$ 1.333.198	$ 96.692	$ 1.236.506
MEDINA PARDO GUSTAVO ADOLFO	1.121.869.898	COORDINADOR SST	5	$ 2.732.600	15	$ 1.366.300	$ 124.548	$ -	$ -	$ -	$ 1.490.848	$ 109.304	$ 1.381.544
MUÑOZMURCIA LUIS FERNANDO	86.051.533	REPRESENTANTE LEGAL	1	$ 11.561.000	15	$ 5.780.500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.780.500	$ 774.245	$ 5.006.255
MURCIA JOJOA ROSEMBERG	17.497.322	CONDUCTOR	5	$ 2.009.512	15	$ 1.004.756	$ 124.548	$ -	$ -	$ -	$ 1.129.304	$ 80.380	$ 1.048.923
OSORIO VARGAS GUILLERMO ALBERTO	1.121.834.340	INGENIERO RESIDENTE 1	5	$ 2.417.300	15	$ 1.208.650	$ 124.548	$ -	$ -	$ -	$ 1.333.198	$ 96.692	$ 1.236.506
TOTALES						$ 11.444.369	$ 622.738	$ -		$ -	$ 12.067.046	$ 1.227.350	$ 10.839.696

DIVA YAHIRA MACHADO TEJEIRO
Vía' CONTADORA

CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025

NIT. 901,965,630-1

Nomina del día 01 al 30 de Abril de 2.026

NOMINA MENSUAL

				DEVENGADO						DEDUCCIONES						
Nombre del Empleado	No. Identificación	Cargo	Nivel	Sueldo básico	Días trabajados	Total básico	Aux. de transporte	Pago No Salarial	Total Devengado	Salud	Pensión	Fondo Solidaridad Pensional	Retefuente Laboral	Total Deducciones	Neto Pagado	OBSERVACIONES
BARIRIOS POLOCHE EDWIN ALEJANDRO	1.120.864.265	OFICIAL DE OBRA	5	$ 1.850.905	30	$ 1.850.905	$ 249.095	$ -	$ 2.100.000	$ 74.036	$ 74.036	$ -	$ -	$ 148.072	$ 1.951.928	Se envia desprendible de nómina al correo: vanessazuarez1981@gmail.com
CORREA OJEDA MIGUEL DIOSID	1.103.470.729	OFICIAL DE OBRA	5	$ 1.850.905	30	$ 1.850.905	$ 249.095	$ 200.000	$ 2.300.000	$ 74.036	$ 74.036	$ -	$ -	$ 148.072	$ 2.151.928	Se envia desprendible de nómina al correo: tanianarianiscorreasuarez@gmail.com
GALVAN MONTES YEFERSON ENRIQUE	78.646.546	OPERADOR DE MAQUINARIA	5	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 200.000	$ 2.200.000	$ 70.036	$ 70.036	$ -	$ -	$ 140.072	$ 2.059.928	Se envia desprendible de nómina al correo: jeffersong1984@gmail.com
ROMERO AREVALO DUVAN ARLEY	1.004.619.005	AYUDANTE DE OBRA	5	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 100.000	$ 2.100.000	$ 70.036	$ 70.036	$ -	$ -	$ 140.072	$ 1.959.928	Se envia desprendible de nómina al correo: duvan260425@hotmail.com
						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	Se envia desprendible de nómina al correo: duvan260425@hotmail.com
TOTALES						$ 7.203.620	$ 996.380	$ 500.000	$ 8.700.000	$ 288.145	$ 288.145	$ -	$ -	$ 576.290	$ 8.123.710	

Total a cargo del empleador	$ 3.402.462

Dias de la nomina		30
Horas trabajadas en el día		7,33

SE INDICA SI HUBO HORAS EXTRAS PARA UNO O VARIOS TRABAJADORES

NOMBRE DEL EMPLEADO	No. Identificación	Sueldo	Valor Hora ordinaria	Cantidad horas extras diurnas	Valor horas extra diurnas	Cantidad horas extras nocturnas	Valor horas extras nocturnas	Cantidad horas extras dominicales	Valor horas extras dominicales	TOTAL HORAS EXTRAS
BARIRIOS POLOCHE EDWIN ALEJANDRO	1.120.864.265	$ 1.850.905	8.417	0	-	0	-	0	-	-
CORREA OJEDA MIGUEL DIOSID	1.103.470.729	$ 1.850.905	8.417	0	-	0	-	0	-	-
GALVAN MONTES YEFERSON ENRIQUE	78.646.546	$ 1.750.905	7.962	0	-	0	-	0	-	-
ROMERO AREVALO DUVAN ARLEY	1.004.619.005	$ 1.750.905	7.962	0	-	0	-	0	-	-
0	-			0		0		0		
TOTALES				0		0		0		

NOVEDAD	
RETIRO	

DIVA YANIRA MACHADO TEJEIRO

VB° CONTADORA

12126

aportes en línea

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
NIT 901965630	1	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VILLAVICENCIO	CL 15 40 01	VILLAVICENCIO-META	3142334798

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	2026-04	Periodo Salud	2026-05
Fecha límite de pago	2026/05/11	Fecha de pago	2026/05/05
Dias de mora	0	Tasa de mora	26.16%

TOTALES	
Valor a pagar	$8,690,100
Intereses de mora	$0
Saldos e incapacidades	$0
Valor total	$8,690,100

DATOS DE LA TRANSACCION	
Clave planilla	9504376908
Clave de pago	282975211
Banco	BANCO DAVIVIENDA

2026/05/05 04:55 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

12/23

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901965630	1	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VILLAVICENCIO	CL 15 40 01	VILLAVICENCIO-META	3142334798	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	282975211	9504376908	E	2026/05/11	2026/05/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$8,690,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.		Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: VILLAVICENCIO (1 Afiliados)																								$11,561,000	$1,965,600			$11,561,000	$462,500			$11,561,000	$462,500			$11,561,000		$60,400		$0	$0		$2,951,000
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (1 Afiliados)																								$11,561,000	$1,965,600			$11,561,000	$462,500			$11,561,000	$462,500			$11,561,000		$60,400		$0	$0		$2,951,000
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																								$11,561,000	$1,965,600			$11,561,000	$462,500			$11,561,000	$462,500			$11,561,000		$60,400		$0	$0		$2,951,000
1	CC	86051533	MUÑOZ MURCIA LUIS FERNANDO																			230301	30	$11,561,000	$1,965,600	EPS005	30	$11,561,000	$462,500	CCF34	30	$11,561,000	$462,500	14-11	30	$11,561,000	0.522%	$60,400	30	$0	$0	SI	$2,951,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.		Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CAG RESGUARDOS INDIGENAS (9 Afiliados)																								$18,531,237	$2,965,500			$18,531,237	$741,700			$18,531,237	$741,700			$18,531,237		$1,290,200		$0	$0		$5,739,100
Centro de Trabajo: CAG RESGUARDOS INDIGENAS (9 Afiliados)																								$18,531,237	$2,965,500			$18,531,237	$741,700			$18,531,237	$741,700			$18,531,237		$1,290,200		$0	$0		$5,739,100
Ciudad: PUERTO GAITAN Depto: META (9 Afiliados)																								$18,531,237	$2,965,500			$18,531,237	$741,700			$18,531,237	$741,700			$18,531,237		$1,290,200		$0	$0		$5,739,100
2	CC	40326478	AREVALO GARZON FRANCY CAROLINA																			25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
3	CC	1120864265	BARRIOS POLOCHE EDWIN ALEJANDRO																			230301	30	$1,850,905	$296,200	EPS002	30	$1,850,905	$74,100	CCF34	30	$1,850,905	$74,100	14-11	30	$1,850,905	6.960%	$128,900	30	$0	$0	SI	$573,300
4	CC	1103470729	CORREA OJEDA MIGUEL DIOSID																			230301	30	$1,850,905	$296,200	CCFC55	30	$1,850,905	$74,100	CCF34	30	$1,850,905	$74,100	14-11	30	$1,850,905	6.960%	$128,900	30	$0	$0	SI	$573,300
5	CC	78646546	GALVAN MONTES YEFERSON ENRIQUE																			231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
6	CC	1121902403	GARZON GARCIA WENDY VANESA																			230301	30	$2,417,300	$386,800	EPS005	30	$2,417,300	$96,700	CCF34	30	$2,417,300	$96,700	14-11	30	$2,417,300	6.960%	$168,300	30	$0	$0	SI	$748,500
7	CC	1121869998	MEDINA PARDO GUSTAVO ADOLFO																			230301	30	$2,732,600	$437,300	EPS005	30	$2,732,600	$109,400	CCF34	30	$2,732,600	$109,400	14-11	30	$2,732,600	6.960%	$190,200	30	$0	$0	SI	$846,300
8	CC	17497322	MURCIA JOJOA ROSEMBERG																			230301	30	$2,009,512	$321,600	EPS005	30	$2,009,512	$80,400	CCF34	30	$2,009,512	$80,400	14-11	30	$2,009,512	6.960%	$139,900	30	$0	$0	SI	$622,300
9	CC	1121834340	OSORIO VARGAS GUILLERMO ALBERTO																			25-14	30	$2,417,300	$386,800	EPS037	30	$2,417,300	$96,700	CCF34	30	$2,417,300	$96,700	14-11	30	$2,417,300	6.960%	$168,300	30	$0	$0	SI	$748,500
10	CC	1004819005	ROMERO AREVALO DUVAN ARLEY																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
Total			**Afiliados(10)**																					$30,092,237	$4,931,100			$30,092,237	$1,204,200			$30,092,237	$1,204,200			$30,092,237		$1,350,600		$0	$0		$8,690,100

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

24 Abr 2026 11:47
NIT: 901965630
Usuario: LUIS FERNANDO MUNOZ MURCIA

Pago exitoso
CUS 250166543

Comercio
PLUXEE COLOMBIA S.A.S

Referencia 1
10.245.190.165

Fecha
24 Abr 2026 11:47

Referencia 2
NIT

Número de factura
552847

Referencia 3
901965630

Descripción del pago
Pago del Carro de Compras del Contacto DIVA MACHADO con documento No 901965630

Valor del Pago
$1.508.623

Número de comprobante
552847

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 8225**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

pluxee

Pluxee Colombia S.A.S
NIT 800.219.876-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. VCE954971

c64a455d8ccb3560aab82818b44a31b4d4425c9a2043a296db95b41f68a0b47c069cc4d41d3173fae535739db528a0c7

CLIENTE CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025		FECHA DE EMISIÓN
DIRECCIÓN CALLE 15 # 40 - 01 C C. PRIMAVERA URBANA	**TIPO DOCUMENTO** NIT	25/04/2026
CONTACTO DIVA MACHADO	**NÚMERO** 901965630	FECHA DE VENCIMIENTO
FORMA DE PAGO A CREDITO	**CIUDAD** VILLAVICENCIO	27/04/2026
	MEDIO DE PAGO Consignación Bancaria	

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

PEDIDO No.	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR FACIAL
1296459	T.PLUXEE DOTACI?N AD	1	1,400,000.00
		TOTAL VALOR FACIAL	1,400,000.00

IMPORTANTE: SEGÚN ACUERDO DE CONDICIONES COMERCIALES CELEBRADO ENTRE USTEDES Y PLUXEE COLOMBIA S.A.S., EL VALOR FACIAL NO CONSTITUYE INGRESO PROPIO PARA PLUXEE, SINO UN INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS; POR TANTO, ABSTENERSE DE EFECTUAR ALGÚN TIPO DE RETENCIÓN SOBRE ESTE CONCEPTO.

INGRESOS PROPIOS

CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
COMISION	1	77,280.00
ENTREGAS ADICIONALES	1	14,000.00

OBSERVACIONES
Factura SME

Total items: 3

SUBTOTAL		91,280.00
IVA	19	17,343.00
RETEFUENTE		0.00
RETE. ICA		0.00
RETE. IVA		0.00
TOTAL INGRESOS PROPIOS		108,623.00

TOTAL FACTURA ELECTRONICA No. VCE954971 1,508,623.00

Fecha y Hora de Generación: 25/04/2026 12:00 a. m. Fecha y Hora de Expedición: 25/04/2026 10:32 a. m.

IVA REGIMEN COMUN, AUTORRETENEDORES - RES. No. 2649 NOV 24/1997. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No. 000200 DEL DIC 27/2024. FACTURA GENERADA ELECTRONICAMENTE POR PLUXEE COLOMBIA S.A.S. AUTORIZACION DE FACTURACION ELECTRONICA AUTOR. No. 18764095269329 DEL 07/07/2025 VIGENCIA18 MESES VCE 871782 AL VCE 1000000 ACTIVIDAD ECONOMICA: 8299 TARIFA 9.66/1000. AGENTES RETENEDORES DE I.V.A. AUTORRETENEDORES DE ICA BQUILLA DECRETO 924 OCT/11.AUTORRETENEDORES DE ICA MEDELLIN RES. No. 202050056223 SEP 24/2020. SSOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DEL ICA EN CALI RES. No. 4131.040.21.1 DIC 27/2024

ACEPTAMOS DE MANERA EXPRESA EL CONTENIDO DE LA PRESENTE FACTURA Y LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS QUE EN ESTA SE ESTIPULAN. VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA INTERES MENSUAL POR MORA Y ESTE SERA EL MAXIMO LEGAL

pluxee

BOGOTA D.C.
Aut. Norte no. 114 44 piso 4
Tel: (601) 7946480
Pbx:6414100

Portal Recaudos

Para realizar el pago de tus facturas, da click en la y registra tú código de empresa CL-038338 y sigue los pasos para finalizar el trámite.

GRANDES CONTRIBUYENTES EN BOGOTA SEG RES. NO.DDI-032117 OCT 25/2019

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT 860.028.580-2 Software: fact-ok

Comprobante de la transacción

DAVIVIENDA

12:30

Transferencia realizada

Número de Aprobación: 71668995

Fecha y Hora de la transacción: 8 de Mayo, 2026 - 11:38.AM

Valor

$ 908,580.00

Origen

Consorcio Aguas Gaitan 2025

Nit: 901965630-1

Banco Davivienda

Cuenta Corriente | 560098469997740

Destino

Punto Maderin Sas

Nit: 901696345-0

Banco Davivienda

Cuenta De Ahorros | 108900321184

Tenga presente que las transacciones realizadas a otros bancos se abonarán en la cuenta destino conforme a los ciclos y horarios de procesamiento establecidos.

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PUNTO MADEMARIN

Cotización

No. C-1-1425

1231

PUNTO MADEMARIN SAS
NIT 901.696.345-0
MZ 57 BODEGA 16
Tel: (601) 3202207831
Puerto Gaitán - Colombia

Para : CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025
Nit : 901.965.630-1
Fecha : 2026-05-05

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	N20	BOCEL 1"X1"X3 MTS	8.00	7,000.00	56,000.00	58,800.00
2	N1	TABLA BURRA 30CMX2.5CMX3 MTS ORDINARIO	24.00	34,000.00	816,000.00	856,800.00

Total Bruto	872,000.00
Subtotal	872,000.00
IVA 5%	43,600.00
Total a Pagar	**915,600.00**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Leidy Viviana Diaz
puntomademarin@gmail.com
(3202207831)
3202207831

AVAL Fiduciaria | Asset Management

12132

Hola **3 1 P126331 ANT CONS AGUAS GAITAN 2025,**

¡Buenas noticias! Tu solicitud de pago número 414399 en el portal y número interno de Aval Fiduciaria 834084, donde generaste la instrucción de giro al beneficiario **CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025**, identificado con número de documento **901965630**, con la forma de pago **TRANSFERENCIA BANCARIA**, por un valor de **$15639901**, fue **ENVIADA** a la entidad financiera **BANCO DAVIVIENDA CC 098469997740** el día **13-05-2026**. Todo el proceso interno de Aval Fiduciaria se ha completado exitosamente.

Si tienes alguna inquietud sobre este comprobante, por favor comunícate con tu analista de gestión o con nuestra Línea de Servicio al Cliente en Bogotá **(601) 755 0340**, a la Línea nacional gratuita **01 8000 189 799** o desde su celular **#432.**

¡Gracias por confiar en nosotros!

RELACION PAGOS PARA REEMBOLSO					
DESCRIPCIÓN	PERSONAL	MES O PERIODO	VALOR	METODO DE PAGO	
				PAGO POR CONSIGNACIÓN A CUENTA BANCARIA	PAGO POR PSE
NOMINA CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	LUIS FERNANDO MUÑOZ	16-30 DE ABRIL 2026	$ 5.006.255	$ 5.006.255	
FIC-SENA		ABRIL	$ 437.726		$ 437.726
MATERIAL	ENERGITEL	6/05/2026	$ 10.195.920	$ 10.195.920	
TOTAL			$ 15.639.901,00		

12136

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025

NIT. 901.965.630-1

Nomina del día 16 al 30 de Abril de 2.026

				DEVENGADO								DEDUCCIONES							
Nombre del Empleado	No. Identificación	Cargo	Nivel	Sueldo básico	Días trabajados	Total básico	Aux de transporte	Licencias Remuneradas	Incapacidad (EPS/ARL)	devolucion y retencion ajuste $$	Total Devengado	Salud	Pension	Fondo Solidaridad Pensional	Retencion en la Fuente	Anticipo o la Nómina	Total Deducciones	Neto Pagado	OBSERVACIONES
AREVALO GARZON FRANCY CAROLINA	40.326.478	DIRECTOR DE OBRA	5	$ 1.750.905	15	$ 875.453	$ 124.548	$ -	$ -	$ -	$ 1.000.000	$ 35.018	$ 35.018	$ -		$ -	$ 70.036	$ 929.964	Se envia desprendible de nómina al correo: CAROLINA05_INGCIVIL@hotmail.com
GARZO GARCIA WENDY VANESA	1.121.902.403	INGENIERO RESIDENTE 2	5	$ 2.417.300	15	$ 1.208.650	$ 124.548	$ -	$ -	$ -	$ 1.333.198	$ 48.346	$ 48.346	$ -		$ -	$ 96.692	$ 1.236.506	Se envia desprendible de nómina al correo: ing.wvg2@gmail.com
MEDINA PARDO GUSTAVO ADOLFO	1.121.859.998	COORDINADOR SST	5	$ 2.732.600	15	$ 1.366.300	$ 124.548	$ -	$ -	$ -	$ 1.490.848	$ 54.652	$ 54.652	$ -		$ -	$ 109.304	$ 1.381.544	Se envia desprendible de nómina al correo: g.pardo09@gmail.com
MUÑOZMURCIA LUIS FERNANDO	86.051.533	REPRESENTANTE LEGAL	1	$ 11.561.000	15	$ 5.780.500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.780.500	$ 231.220	$ 231.220	$ 57.805	$ 254.000	$ -	$ 774.245	$ 5.006.255	Se envia desprendible de nómina al correo: ingluisfernandom@gmail.com
MURCIA JOJOA ROSEMBERG	17.497.322	CONDUCTOR	5	$ 2.009.512	15	$ 1.004.756	$ 124.548	$ -	$ -	$ -	$ 1.129.304	$ 40.190	$ 40.190	$ -		$ -	$ 80.380	$ 1.048.923	Se envia desprendible de nómina al correo: asesoriasfym@outlook.com
OSORIO VARGAS GUILLERMO ALBERTO	1.121.834.340	INGENIERO RESIDENTE 1	5	$ 2.417.300	15	$ 1.208.650	$ 124.548	$ -	$ -	$ -	$ 1.333.198	$ 48.346	$ 48.346	$ -			$ 96.692	$ 1.236.506	Se envia desprendible de nómina al correo: eskp87@hotmail.com
TOTALES						$ 11.444.309	$ 622.738	$ -		$ -	$ 12.067.046	$ 457.772	$ 457.772	$ 57.805		$ -	$ 1.227.360	$ 10.839.686	

A cargo del empleador								
Seguridad Social			%	Valor	Provisiones Prest. Soc y Vac.	%		Valor
Salud			0,0%	$ 0	Cesantías	8,330%		$ 1.005.185
Fondo de Pensiones			12%	$ 1.373.317	Intereses sobre cesantías	1%		$ 120.670
ARL (riesgos laborales)	Seleccione la tarifa:	I	0,522%	$ 30.174	Prima	8,330%		$ 1.005.185
		IV	4,350%	$ 0	Vacaciones	4,170%		$ 477.226
		V	6,960%	$ 394.201				
Total Seguridad Social				$ 1.797.692	Total prestaciones sociales			$ 2.608.269
Parafiscales				%	Valor			
Caja Compensación Familiar				4%	$ 457.772			
ICBF				0%	$ 0			
SENA				0%	$ 0			
Total Parafiscales					$ 457.772			

Salario Mínimo Legal Vigente 2026	$ 1.750.905
Auxilio de transporte	$ 249.095

RIESGO ARL		
Tipo		Tarifa
I		0,52%
II		1,04%
III		2,44%
IV		4,35%
V		6,96%

FECHA ENVIO DESPRENDIBLES DE NOMINA
FECHA DE CONSIGNACIÓN DE LA NOMINA
30/01/2026

IMPORTANTE!	
Se encuentra exonerado de pago de aporte de Parafiscales y Salud Ley 1607 de 20127	
marque con una "X" si es así.	
SI	X

Total a cargo del empleador	$ 4.863.733

Días de la nomina	30
Horas trabajadas en el día	7,33

NOVEDAD	
INCAPACIDAD GENERAL	
ANTICIPO A NOMINA	

NOMBRE DEL EMPLEADO	No. Identificación	Cargo	Valor hora ordinaria	Cantidad HORAS EXTRAS	Valor hora extra	Cantidad horas recargo nocturno	Valor hora recargo nocturno	Cantidad horas recargo festivo	Valor hora recargo festivo	Cantidad horas recargo nocturno festivo	Valor hora recargo nocturno festivo	TOTAL HORAS EXTRAS
AREVALO GARZON FRANCY CAROLINA	40.326.478	$ 1.750.905	7.662	0	-	0	-	0	-	0	-	-
GARZO GARCIA WENDY VANESA	1.121.902.403	$ 2.417.300	10.993	0	-	0	-	0	-	0	-	-
MEDINA PARDO GUSTAVO ADOLFO	1.121.859.998	$ 2.732.600	12.427	0	-	0	-	0	-	0	-	-
MUÑOZMURCIA LUIS FERNANDO	86.051.533	$ 11.561.000	52.574	0	-	0	-	0	-	0	-	-
MURCIA JOJOA ROSEMBERG	17.497.322	$ 2.009.512	9.139	0	-	0	-	0	-	0	-	-
OSORIO VARGAS GUILLERMO ALBERTO	1.121.834.340	$ 2.417.300	10.993	0	-	0	-	0	-	0	-	-
TOTALES				0	-	0	-	0	-	0	-	-

DIVA YAMIRA MACHADO TEJEIRO
V°B° CONTADORA

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO DAVIVIENDA	161693006	288883400	07/05/2026

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901965630**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **190.159.137.73**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 437,726.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 437,726.00	COP$ 437,726.00

12136

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 437.726,00

Número de aprobación
00883400

Motivo
Pago Ordinario - FIC

Fecha del pago
07/05/2026

Referencia 1
190.159.137.73

Hora del pago
09:37 AM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********7740

Referencia 3
901965630

Destino del pago
SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Código único CUS
288883400

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

ENERGITEL®

Código: TL-F-04
Ultima Actualización:13-Octubre de 2023
Versión:2

12134

ENERGITEL SAS
NIT: 816004795 - 5
Calle 12 No.6-182 Bodega 203 Zona Industrial Antigua Plaza de Ferias
Teléfono: (606) 3401297
DOSQUEBRADAS

PROFORMA FOTOVOLTAICA No. B - 705

Autoretenedores del impuesto de renta - Resolución No.012125 del 31 de diciembre de 2021

Señores: CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025
Atn:
Nit / C.C.: 901965630 - 1
email:

Dirección: CALLE 15 No. 40- 01
Fecha: 29-abr.-26
Teléfono: - 3123143658
Ciudad: 50001

Cordial saludo,

Por medio de la presente; queremos dar respuesta a su solicitud de cotización y para ello, nos permitimos presentar la siguiente oferta:

CANTIDAD	UND	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
144	und	ERHSSPFSOH30	End-clamp altura 30mm ; marca SOEN; Incluye tornillo Allen en acero inoxidable de 5/16 con guasa y tuerca (Nut)	$ 3.825,00	$ 550.800,00
144	und	ERHSSPISOMC	Mid-clamp altura de 30 a 40mm; marca SOEN®; Incluye tornillo Allen en acero inoxidable de 5/16 con guasa y tuerca de aluminio cuadrada (Nut)	$ 4.675,00	$ 673.200,00
72	und	ERHSSRSORAILB4900BANZ	Riel Tipo B2 de 4.9 m Anodizado fijacion por tres lados marca SOEN®	$ 102.000,00	$ 7.344.000,00

INFORMACION PARA PAGO

Consignación de recaudo empresarial Bancolombia Cuenta Corriente 11518144474 a nombre de Energitel SAS
Convenio 22733
Referencia Nit. 901112103
Consignación Banco Davivienda Cuenta corriente No. 127469997473
Boton de pagos PSE en www.energitel.com

VALOR BRUTO:	$	8.568.000,00
FLETE:	$	0,00
I.V.A.	$	1.627.920,00
TOTAL:	$	**10.195.920,00**

CONDICIONES COMERCIALES

Validez de la Oferta: 15-may.-26 **Facturación y Moneda:** COP **Forma de Pago:** TRANSFERENCIA
Observación Forma de Pago:
Tiempo de entrega:
Sitio de entrega: VILLAVICENCIO
Observaciones Adicionales:

OBSERVACIONES GENERALES: Por favor leer con atención: (1). Vigencia: Favor tener en cuenta la vigencia de la presente cotización para realizar sus pedidos. Si la fecha está fuera de la vigencia, consulte nuevamente precios con su Ejecutivo Comercial. (2). Disponibilidad: Stock sujeto a rotación de inventario; importante consultar con su Ejecutivo Comercial, la disponibilidad del material antes de realizar su pedido. (3). Precios: Los precios aquí descritos aplican para las cantidades totales cotizadas, nos reservamos el derecho de modificar los precios si las cantidades disminuyen. (4). Fletes: Despachos a nivel nacional menores o iguales a $1.000.000 (sin incluir IVA), flete por cuenta del cliente. Aplican condiciones especiales para territorios de difícil acceso o aéreos. (5). Forma de pago: Sin excepción todo pedido por un valor igual o inferior a $500.000 (sin incluir IVA), debe ser pagado de contado. (6). Descargue: Montacargas y personal auxiliar por cuenta del cliente o según negociación (aplica para cables de fibra óptica, material estibado y vinipelado o que el volumen y peso lo amerite). (7). Requisitos mínimos: Favor indicar en su orden de compra, dirección y contacto completo de quien recibe, y todos los detalles y/o documentos a tener en cuenta en la entrega del material. (8). Devoluciones: El término máximo para realizar devoluciones será de cinco días hábiles contados a partir de la entrega del producto y están sujetas a previo análisis de las causas por parte de nuestro departamento de "calidad" y "soporte técnico". (9) Términos de garantía: para mayor información consulte el siguiente enlace - www.energitel.com. ENERGITEL S.A.S, en cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y su decreto reglamentario 1377 de 2013, asume la responsabilidad como custodios de los datos de las personas con quienes hemos interactuado en el marco de nuestras actividades comerciales, estatutarias y académicas. Por lo tanto, consideramos a cada uno de ustedes como parte integral de nuestros clientes. Siguiendo lo establecido en la legislación mencionada, requerimos su autorización para continuar gestionando sus datos personales. Agradecemos su pronta respuesta para poder mantenerlo informado sobre asuntos relevantes para usted. Para brindarnos su consentimiento, basta con enviar un correo electrónico indicando su autorización con el uso de sus datos personales conforme a la normativa vigente, el aviso de privacidad y política de tratamiento de datos personales publicados en la página web, en el siguiente enlace: www.energitel.com. Es importante destacar que, según lo dispuesto en el artículo 10, numeral 4 del Decreto 1377, si en un plazo de 30 días hábiles no recibimos su autorización expresa, entenderemos que acepta nuestra política de manejo de datos y continuaremos en contacto con usted, respetando en todo momento las disposiciones legales aplicables.

Cordialmente,

HERNANDEZ MARTINEZ VANESSA
comercialinsumos@energitel.com
Cel.

12138

Transacciones Realizadas en el Portal PYME

Fecha: 6/05/2026 11:56:10

Transacciones Desde: 04/05/2026 **Hasta:** 06/05/2026

DAVIVIENDA

Fecha	Documento	Estado	Tipo de Transacción	Tipo Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor
06/05/2026 11:55:07	71608238	Transferencia Realizada	Transferencias Cuenta Inscrita	CUENTA CORRIENTE	8160047955	ENERGITEL SAS	10195920

AVAL Fiduciaria | Asset Management

12139

Hola **3 1 P126331 ANT CONS AGUAS GAITAN 2025,**

¡Buenas noticias! Tu solicitud de pago número 415001 en el portal y número interno de Aval Fiduciaria 835481, donde generaste la instrucción de giro al beneficiario **GILBERTO PIÑEROS CASTRO**, identificado con número de documento **9620227**, con la forma de pago **TRANSFERENCIA BANCARIA**, por un valor de **$52800000**, fue **ENVIADA** a la entidad financiera **BANCO AGRARIO CH 445240097186** el día **14-05-2026**. Todo el proceso interno de Aval Fiduciaria se ha completado exitosamente.

Si tienes alguna inquietud sobre este comprobante, por favor comunícate con tu analista de gestión o con nuestra Línea de Servicio al Cliente en Bogotá **(601) 755 0340**, a la Línea nacional gratuita **01 8000 189 799** o desde su celular **#432.**

¡Gracias por confiar en nosotros!

12140

SERVIPOZOS GP

PIÑEROS CASTRO GILBERTO
NIT 9.620.227-8
CALLE 8 911 BRR EL TRIUNFO
Tel: 3203008846
Puerto Gaitán - Colombia
servipozosgpgaitan28@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 6

Señores	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025		
NIT	901.965.630-1	**Teléfono**	(608) 3123143658 - Ext. 000
Dirección	CL 15 40 01	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/04/2026, 16:59
Expedición	27/04/2026, 17:03
Vencimiento	27/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACATA PARCIAL No. 1 DEL CONTRATO 021 DE 2026 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO CON TUBERIA EN PVC 6" EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN.	1.00	44,000,000.00

Total items: 1

Valor en Letras: Cincuenta y dos millones ochocientos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-27 por $ 52,800,000.00

Total Bruto	44,000,000.00
Administración 10.00%	4,400,000.00
Imprevistos 5.00%	2,200,000.00
Utilidad 5.00%	2,200,000.00
Total a Pagar	**52,800,000.00**

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764101951318 aprobado en 20251123 prefijo FEV desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses**

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa

CUFE: ba1e4425002f388056e905677008342b8067f48ee6ef83012da688a07c89132983251d6e73f96a3b3f9c966b7db12838

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.040.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

AVAL Fiduciaria | Asset Management

1214

Hola **3 1 P126331 ANT CONS AGUAS GAITAN 2025,**

¡Buenas noticias! Tu solicitud de pago número 415020 en el portal y número interno de Aval Fiduciaria 835469, donde generaste la instrucción de giro al beneficiario **FUENTEVIVA INVERSIONES SAS**, identificado con número de documento **901678453**, con la forma de pago **TRANSFERENCIA BANCARIA**, por un valor de **$10000000**, fue **ENVIADA** a la entidad financiera **BANCOLOMBIA CH 84900003827** el día **13-05-2026**. Todo el proceso interno de Aval Fiduciaria se ha completado exitosamente.

Si tienes alguna inquietud sobre este comprobante, por favor comunícate con tu analista de gestión o con nuestra Línea de Servicio al Cliente en Bogotá **(601) 755 0340**, a la Línea nacional gratuita **01 8000 189 799** o desde su celular **#432.**

¡Gracias por confiar en nosotros!

FUENTEVIVA
INVERSIONES S.A.S
Nit.901.678.453-1

12142

CUENTA DE COBRO No. 002

8 DE MAYO DE 2026

LA EMPRESA:

CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025
NIT. 901.965.630-1

DEBE A:

NOMBRE DEL BENEFICIARIO	FUENTEVIVA INVERSIONES S.A.S
NIT.	901.678.453-1
DIRECCIÓN BENEFICIARIO	CRA 9 # 20 –05 Camelias
TELÉFONO	3118538859 - 3212575842
CORREO ELECTRÓNICO	fuentevivasas@gmail.com
MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO	VILLAVICENCIO – META

POR CONCEPTO DE:

ANTICIPO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Nº. 026 DE 2026 ENTRE CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 Y FUENTEVIVA INVERSIONES S.A.S; OBJETO: "CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE EN ACERO INOX. CON CAPACIDADES DE 0.5 LPS Y 1.0 LPS EN RESGUARDOS INDIGENAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META".

LA SUMA DE:

$10.000.000

VALOR EN LETRAS:

DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE.

PARA EFECTOS DE PAGO

NOMBRE ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA
NUMERO DE CUENTA BANCARIA	84900003827
TIPO DE CUENTA BANCARIA	CUENTA DE AHORROS

FUENTEVIVA INVERSIONES S.A.S
R.L. LUCELY FONSECA ANGULO
C.C. 46.647.599
CEL. 3212575842

AVAL Fiduciaria | Asset Management

1243

Hola **3 1 P126331 ANT CONS AGUAS GAITAN 2025,**

¡Buenas noticias! Tu solicitud de pago número 415023 en el portal y número interno de Aval Fiduciaria 835465, donde generaste la instrucción de giro al beneficiario **BRAYAN SNEIDER MURCIA TOBON**, identificado con número de documento **1121886701**, con la forma de pago **TRANSFERENCIA BANCARIA**, por un valor de **$24946426**, fue **ENVIADA** a la entidad financiera **BANCOLOMBIA CC 28919617371** el día **13-05-2026**. Todo el proceso interno de Aval Fiduciaria se ha completado exitosamente.

Si tienes alguna inquietud sobre este comprobante, por favor comunícate con tu analista de gestión o con nuestra Línea de Servicio al Cliente en Bogotá **(601) 755 0340**, a la Línea nacional gratuita **01 8000 189 799** o desde su celular **#432.**

¡Gracias por confiar en nosotros!

BRAYAN SNEIDER MURCIA TOBON
NIT 1.121.886.701-7
DG 10 12-53 BRR MANACACIAS
Tel: (608) 5568426
Puerto Gaitán - Colombia
precisaopcionsas@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. 588

Señores	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025		
NIT	901.965.630-1	**Teléfono**	(608) 3123143658 - Ext. 000
Dirección	CL 15B 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/04/2026, 18:15
Expedición	29/04/2026, 18:15
Vencimiento	29/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO	1.00	25,494,560.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Veinticinco millones cuatrocientos noventa y cuatro mil quinientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-29 por $ 25,494,560.00

Observaciones:

Total Bruto	25,494,560.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**25,494,560.00**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764103308464 aprobado en 20251217 prefijo desde el número 501 al 5000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4923 Transporte de carga por carretera Tarifa
CUFE: bd02dcc9da24c6c2b15d38bb01f428f02af5d7f105f0d1cedbed6de524f6405bebfd0214f4fb281f0514871bd9bb4073

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

AVAL Fiduciaria | Asset Management

1245

Hola **3 1 P126331 ANT CONS AGUAS GAITAN 2025,**

¡Buenas noticias! Tu solicitud de pago número 415354 en el portal y número interno de Aval Fiduciaria 835482, donde generaste la instrucción de giro al beneficiario **ELIZABETH ARIAS PARRA**, identificado con número de documento **40333384**, con la forma de pago **TRANSFERENCIA BANCARIA**, por un valor de **$77913336**, fue **ENVIADA** a la entidad financiera **BANCO DAVIVIENDA CH 550488424102165** el día **14-05-2026**. Todo el proceso interno de Aval Fiduciaria se ha completado exitosamente.

Si tienes alguna inquietud sobre este comprobante, por favor comunícate con tu analista de gestión o con nuestra Línea de Servicio al Cliente en Bogotá **(601) 755 0340**, a la Línea nacional gratuita **01 8000 189 799** o desde su celular **#432.**

¡Gracias por confiar en nosotros!



ELIZABETH ARIAS PARRA
NIT 40.333.384-8
KM 1 VIA PTO LOPEZ
Tel: (608) 3143504339
Puerto Gaitán - Colombia
ariaselizabeth537@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FEV 321

Señores	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025		
NIT	901.965.630-1	**Teléfono**	(000) 3123143658 - Ext. 000
Dirección	CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/04/2026, 17:44
Expedición	29/04/2026, 17:44
Vencimiento	29/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO	1.00	79,625,280.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Setenta y nueve millones seiscientos veinticinco mil doscientos ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-29 por $ 79,625,280.00

Total Bruto	79,625,280.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**79,625,280.00**

Observaciones:
SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO DEL 16 AL 17 DE ABRIL DE 2026. FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No. 488424102165 DEL BANCO DAVIVIENDA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764105471975 aprobado en 20260203 prefijo FEV desde el número 305 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4923 Transporte de carga por carretera Tarifa
CUFE: 21c68c5368c78c48b8df31dc756109ab13f09dd7aca878d82454d07534db0120a2cfae07f9a4ef43fd50e2248469f63a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

AVAL Fiduciaria | Asset Management

165

12147

Hola **3 1 P126331 ANT CONS AGUAS GAITAN 2025,**

¡Buenas noticias! Tu solicitud de pago número 415356 en el portal y número interno de Aval Fiduciaria 835490, donde generaste la instrucción de giro al beneficiario **SANOSOL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS**, identificado con número de documento **901975926**, con la forma de pago **TRANSFERENCIA BANCARIA**, por un valor de **$8000000.0**, fue **ENVIADA** a la entidad financiera **BANCOLOMBIA CH 84400008288** el día **19-05-2026**. Todo el proceso interno de Aval Fiduciaria se ha completado exitosamente.

Si tienes alguna inquietud sobre este comprobante, por favor comunícate con tu analista de gestión o con nuestra Línea de Servicio al Cliente en Bogotá **(601) 755 0340**, a la Línea nacional gratuita **01 8000 189 799** o desde su celular **#432.**

¡Gracias por confiar en nosotros!

SANOSOL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS
NIT 901.975.926-7
CL 16 6 27
Tel: 3165200933 - Ext. undefined
Puerto Gaitán - Colombia
SANOSOLINGENIERIA@GMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. FE 23

Señores	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025		
NIT	901.965.630-1	**Teléfono**	(608) 3123143658 - Ext. 000
Dirección	CL 15 40 01	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/05/2026, 09:31
Expedición	11/05/2026, 09:38
Vencimiento	11/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Acta finalizacion del contrato n 011-2026 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA TANQUES ELEVADOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 6M3, EN LAS COMUNIDADES PUERTO LOPEZ Y FACUNAE DEL RESGUARDO INDIGENA AWALIBA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN	1.00	6,361,323.15	6,409,669.21

Total items: 1

Valor en Letras:
Ocho millones de pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-11 por $ 8,000,000.00

Observaciones:

Total Bruto	6,361,323.15
Administración 20.00%	1,272,264.63
Imprevistos 1.00%	63,613.23
Utilidad 4.00%	254,452.93
IVA 19%	48,346.06
Total a Pagar	**8,000,000.00**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764097143444 aprobado en 20250815 prefijo FE desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 43e4539bb30dd9f4a1b5273c24eb76b6751c6ccc1aa7e82efc6344563db50f35b20fe063b509e0987c99046255459c09

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

AVAL Fiduciaria | Asset Management

Sino 106

12149

Hola **3 1 P126331 ANT CONS AGUAS GAITAN 2025,**

¡Buenas noticias! Tu solicitud de pago número 415359 en el portal y número interno de Aval Fiduciaria 835483, donde generaste la instrucción de giro al beneficiario **SANOSOL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS**, identificado con número de documento **901975926**, con la forma de pago **TRANSFERENCIA BANCARIA**, por un valor de **$8000000.0**, fue **ENVIADA** a la entidad financiera **BANCOLOMBIA CH 84400008288** el día **19-05-2026**. Todo el proceso interno de Aval Fiduciaria se ha completado exitosamente.

Si tienes alguna inquietud sobre este comprobante, por favor comunícate con tu analista de gestión o con nuestra Línea de Servicio al Cliente en Bogotá **(601) 755 0340**, a la Línea nacional gratuita **01 8000 189 799** o desde su celular **#432.**

¡Gracias por confiar en nosotros!

SANOSOL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS
NIT 901.975.926-7
CL 16 6 27
Tel: 3165200933 - Ext. undefined
Puerto Gaitán - Colombia
SANOSOLINGENIERIA@GMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. FE 24

Señores	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025		
NIT	901.965.630-1	**Teléfono**	(608) 3123143658 - Ext. 000
Dirección	CL 15 40 01	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/05/2026, 09:48
Expedición	11/05/2026, 09:51
Vencimiento	11/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Acta final contrato n 006-2026 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA TANQUES ELEVADOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 6M3, EN LAS COMUNIDADES MACAPAY Y PUNTO GRILLO DEL RESGUARDO INDIGENA AWALIBA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN"	1.00	6,361,323.15	6,409,669.21

Total items: 1

Valor en Letras:
Ocho millones de pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-11 por $ 8,000,000.00

Observaciones:

Total Bruto	6,361,323.15
Administración 20.00%	1,272,264.63
Imprevistos 1.00%	63,613.23
Utilidad 4.00%	254,452.93
IVA 19%	48,346.06
Total a Pagar	**8,000,000.00**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764097143444 aprobado en 20250815 prefijo FE desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 37d4e5331eb5022127fa4f3357e391c6896cb0751adela69deb140fad9ce0633fd09fd3aa10c1c5b338ec2f8ddeba491

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

AVAL Fiduciaria | Asset Management

1251

Hola **3 1 P126331 ANT CONS AGUAS GAITAN 2025,**

¡Buenas noticias! Tu solicitud de pago número 415435 en el portal y número interno de Aval Fiduciaria 835488, donde generaste la instrucción de giro al beneficiario **EDUAR BENJAMIN PEREZ SANCHEZ**, identificado con número de documento **17414465**, con la forma de pago **TRANSFERENCIA BANCARIA**, por un valor de **$48650000**, fue **ENVIADA** a la entidad financiera **BANCOLOMBIA CH 89000027015** el día **19-05-2026**. Todo el proceso interno de Aval Fiduciaria se ha completado exitosamente.

Si tienes alguna inquietud sobre este comprobante, por favor comunícate con tu analista de gestión o con nuestra Línea de Servicio al Cliente en Bogotá **(601) 755 0340**, a la Línea nacional gratuita **01 8000 189 799** o desde su celular **#432.**

¡Gracias por confiar en nosotros!

EDUAR BENJAMIN PEREZ SANCHEZ
INGENIERO MECANICO
MP. 230-26000 CN NIT. 17414465-0
e-mail: eduarpperforaciones@hotmail.com
Calle 8 N° 22-29 Acacias Meta
Cel. 3103450460

Villavicencio, 11 de mayo de 2026

CUENTA DE COBRO No. 027-001

CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025
Nit. 901.965.630-1
DEBE A:
EDUAR BENJAMIN PEREZ SANCHEZ
Nit. 17414465-0

Por concepto de:

Anticipo del contrato N°027-2026, que tiene por objeto "CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO CON TUBERIA EN PVC 6" EN LA COMUNIDAD LAS BRISAS DEL RESGUARDO DOMOPLANAS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN".

Por un valor de: CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MLCTE ($48.650.000).

Cordialmente,

EDUAR BENJAMIN PEREZ SANCHEZ
C.C. 17.414.465 DE ACACIAS

AVAL Fiduciaria | Asset Management

1253

Hola **3 1 P126331 ANT CONS AGUAS GAITAN 2025,**

¡Buenas noticias! Tu solicitud de pago número 415448 en el portal y número interno de Aval Fiduciaria 835475, donde generaste la instrucción de giro al beneficiario **TERRACQUA SAS**, identificado con número de documento **900769044**, con la forma de pago **TRANSFERENCIA BANCARIA**, por un valor de **$25794069**, fue **ENVIADA** a la entidad financiera **BANCO DAVIVIENDA CH 0550108900051534** el día **13-05-2026**. Todo el proceso interno de Aval Fiduciaria se ha completado exitosamente.

Si tienes alguna inquietud sobre este comprobante, por favor comunícate con tu analista de gestión o con nuestra Línea de Servicio al Cliente en Bogotá **(601) 755 0340**, a la Línea nacional gratuita **01 8000 189 799** o desde su celular **#432.**

¡Gracias por confiar en nosotros!

TERRACQUA SAS
NIT 900.769.044-1
CR 55 153 15 TO 2 OF 1801
Tel: (57) 3013708701
Bogotá - Colombia
terracquasas@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. TRQ 5

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764101287067 aprobado en 20251107 prefijo TRQ desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 - Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica

Fecha y hora Factura
Generación: 12/05/2026, 08:39
Expedición: 12/05/2026, 08:39

Nombre del Cliente CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	**Nit ó C.C.** 901.965.630-1	**Fecha de Vencimiento** 2026-05-26
Razón Social CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	**Dirección** Cl 15 40 - 01 C.C PRIMAVERA URB	**Teléfono** (608) 6849992 - Ext. 000
Correo consorcioaguasgaitan2025@gmail.com	**Vendedor** TERRACQUA SAS	**Centro de Costo** 0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Código	Descripción	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	001	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01 - CONTRATO No. 009 -2026 - CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO CON TUBERIA EN PVC 6 EN LA COMUNIDAD PARAISO DEL RESGUARDO DOMOPLANAS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN	59,579,198.10	566,002.38	60,145,200.48

Total items: 1

OBSERVACIONES:
VALOR ANTICIPO AMORTIZADO $46.900.000

Valor en Letras:
Setenta y cinco millones cuarenta mil pesos m/cte con un cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-05-26 por $ 75,040,000.01

Total Bruto	59,579,198.10
Administración 10.00%	5,957,919.81
Imprevistos 10.00%	5,957,919.81
Utilidad 5.00%	2,978,959.91
IVA 19%	566,002.38
Total a Pagar	**75,040,000.01**

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: 7637575b22bb215cffeeb9cd3e7f08f02b18836f97a173d06b0677d97018e981bc7a44eeffb9e2b4580497c1a2720dcb

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

AVAL Fiduciaria | Asset Management

12457

Hola **3 1 P126331 ANT CONS AGUAS GAITAN 2025,**

¡Buenas noticias! Tu solicitud de pago número 415614 en el portal y número interno de Aval Fiduciaria 835477, donde generaste la instrucción de giro al beneficiario **TERRACQUA SAS**, identificado con número de documento **900769044**, con la forma de pago **TRANSFERENCIA BANCARIA**, por un valor de **$55334291**, fue **ENVIADA** a la entidad financiera **BANCO DAVIVIENDA CH 0550108900051534** el día **14-05-2026**. Todo el proceso interno de Aval Fiduciaria se ha completado exitosamente.

Si tienes alguna inquietud sobre este comprobante, por favor comunícate con tu analista de gestión o con nuestra Línea de Servicio al Cliente en Bogotá **(601) 755 0340**, a la Línea nacional gratuita **01 8000 189 799** o desde su celular **#432.**

¡Gracias por confiar en nosotros!

12156

TERRACQUA SAS
NIT 900.769.044-1
CR 55 153 15 TO 2 OF 1801
Tel: (57) 3013708701
Bogotá - Colombia
terracquasas@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. TRQ 7

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764101287067 aprobado en 20251107 prefijo TRQ desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 - Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica

Fecha y hora Factura
Generación: 12/05/2026, 08:45
Expedición: 12/05/2026, 08:45

Nombre del Cliente CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	**Nit ó C.C.** 901.965.630-1	**Fecha de Vencimiento** 2026-05-26
Razón Social CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	**Dirección** CI 15 40 - 01 C.C PRIMAVERA URB	**Teléfono** (608) 6849992 - Ext. 000
Correo consorcioaguasgaitan2025@gmail.com	**Vendedor** TERRACQUA SAS	**Centro de Costo** 0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Código	Descripción	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	001	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01 - CONTRATO No. 016 - 2026 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO CON TUBERIA EN PVC 6 EN LA COMUNIDAD BUENAVISTA DEL RESGUARDO DOMOPLANAS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN	45,351,329.90	430,837.63	45,782,167.53

Total items: 1

OBSERVACIONES:
Valor en Letras:
Cincuenta y siete millones ciento veinte mil pesos m/cte con un cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-05-26 por $ 57,120,000.01

Total Bruto	45,351,329.90
Administración 10.00%	4,535,132.99
Imprevistos 10.00%	4,535,132.99
Utilidad 5.00%	2,267,566.50
IVA 19%	430,837.63
Total a Pagar	**57,120,000.01**

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: e027ae1e52bd3a1000bf7e2e8851ef9a5b58fb08dd46771c11566668facc5d4f9b60f00752c7986413b56d2121ce0b19

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

AVAL Fiduciaria | Asset Management

Hola **3 1 P126331 ANT CONS AGUAS GAITAN 2025,**

¡Buenas noticias! Tu solicitud de pago número 415622 en el portal y número interno de Aval Fiduciaria 835473, donde generaste la instrucción de giro al beneficiario **TERRACQUA SAS**, identificado con número de documento **900769044**, con la forma de pago **TRANSFERENCIA BANCARIA**, por un valor de **$49909361**, fue **ENVIADA** a la entidad financiera **BANCO DAVIVIENDA CH 0550108900051534** el día **13-05-2026**. Todo el proceso interno de Aval Fiduciaria se ha completado exitosamente.

Si tienes alguna inquietud sobre este comprobante, por favor comunícate con tu analista de gestión o con nuestra Línea de Servicio al Cliente en Bogotá **(601) 755 0340**, a la Línea nacional gratuita **01 8000 189 799** o desde su celular **#432.**

¡Gracias por confiar en nosotros!

TERRACQUA SAS
NIT 900.769.044-1
CR 55 153 15 TO 2 OF 1801
Tel: (57) 3013708701
Bogotá - Colombia
terracquasas@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. TRQ 8

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764101287067 aprobado en 20251107 prefijo TRQ desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 - Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica

Fecha y hora Factura
Generación: 12/05/2026, 08:47
Expedición: 12/05/2026, 08:47

Nombre del Cliente CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	**Nit ó C.C.** 901.965.630-1	**Fecha de Vencimiento** 2026-05-26
Razón Social CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	**Dirección** Cl 15 40 - 01 C.C PRIMAVERA URB	**Teléfono** (608) 6849992 - Ext. 000
Correo consorcioaguasgaitan2025@gmail.com	**Vendedor** TERRACQUA SAS	**Centro de Costo** 0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Código	Descripción	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	001	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01 - CONTRATO No. 017 - 2026 - CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO CON TUBERIA EN PVC 6 EN LA COMUNIDAD SAN GIL DEL RESGUARDO AWALIBA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN	40,905,121.08	388,598.65	41,293,719.73

Total ítems: 1

OBSERVACIONES:
Valor en Letras:
Cincuenta y un millones quinientos veinte mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-05-26 por $ 51,520,000.00

Total Bruto	40,905,121.08
Administración 10.00%	4,090,512.11
Imprevistos 10.00%	4,090,512.11
Utilidad 5.00%	2,045,256.05
IVA 19%	388,598.65
Total a Pagar	**51,520,000.00**

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: 83bb53afc92b6fe751265ba69dc54b3aab10d9a22e52048d1e54e4f1c776dcdfe29588dc397ffdb94bc16efe12bfa51d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

AVAL Fiduciaria | Asset Management

12159

Hola **3 1 P126331 ANT CONS AGUAS GAITAN 2025,**

¡Buenas noticias! Tu solicitud de pago número 415627 en el portal y número interno de Aval Fiduciaria 835485, donde generaste la instrucción de giro al beneficiario **TERRACQUA SAS**, identificado con número de documento **900769044**, con la forma de pago **TRANSFERENCIA BANCARIA**, por un valor de **$19249306**, fue **ENVIADA** a la entidad financiera **BANCO DAVIVIENDA CH 0550108900051534** el día **19-05-2026**. Todo el proceso interno de Aval Fiduciaria se ha completado exitosamente.

Si tienes alguna inquietud sobre este comprobante, por favor comunícate con tu analista de gestión o con nuestra Línea de Servicio al Cliente en Bogotá **(601) 755 0340**, a la Línea nacional gratuita **01 8000 189 799** o desde su celular **#432.**

¡Gracias por confiar en nosotros!

TERRACQUA SAS
NIT 900.769.044-1
CR 55 153 15 TO 2 OF 1801
Tel: (57) 3013708701
Bogotá - Colombia
terracquasas@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. TRQ 9

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764101287067 aprobado en 20251107 prefijo TRQ desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 - Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica

Fecha y hora Factura
Generación: 12/05/2026, 10:07
Expedición: 12/05/2026, 10:07

Nombre del Cliente CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	**Nit ó C.C.** 901.965.630-1	**Fecha de Vencimiento** 2026-05-27
Razón Social CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	**Dirección** CI 15 40 - 01 C.C PRIMAVERA URB	**Teléfono** (608) 6849992 - Ext. 000
Correo consorcioaguasgaitan2025@gmail.com	**Vendedor** TERRACQUA SAS	**Centro de Costo** 0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Código	Descripción	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	001	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01 CONTRATO No. 014 - 2026 - CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO CON TUBERIA EN PVC 6 EN LA COMUNIDAD LOS OLIVOS DEL RESGUARDO DOMOPLANAS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN	44,462,088.13	422,389.84	44,884,477.97

Total items: 1

OBSERVACIONES:
VR. ANTICIPO AMORTIZADO $35.000.000
Valor en Letras:
Cincuenta y seis millones de pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-05-27 por $ 56,000,000.00

Total Bruto	44,462,088.13
Administración 10.00%	4,446,208.81
Imprevistos 10.00%	4,446,208.81
Utilidad 5.00%	2,223,104.41
IVA 19%	422,389.84
Total a Pagar	**56,000,000.00**

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: c606a1a0f7fda4436c67bea5a408ffb210bed3703883dd64691cb7d86dff2ef7b9f574ef7893db7c438dc1ed12cf6595

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

AVAL Fiduciaria | Asset Management

Hola **3 1 P126331 ANT CONS AGUAS GAITAN 2025,**

¡Buenas noticias! Tu solicitud de pago número 417186 en el portal y número interno de Aval Fiduciaria 839267, donde generaste la instrucción de giro al beneficiario **ARCOE S.A.S**, identificado con número de documento **900783521**, con la forma de pago **TRANSFERENCIA BANCARIA**, por un valor de **$25913724**, fue **ENVIADA** a la entidad financiera **BANCOLOMBIA CC 36452637120** el día **22-05-2026**. Todo el proceso interno de Aval Fiduciaria se ha completado exitosamente.

Si tienes alguna inquietud sobre este comprobante, por favor comunícate con tu analista de gestión o con nuestra Línea de Servicio al Cliente en Bogotá **(601) 755 0340**, a la Línea nacional gratuita **01 8000 189 799** o desde su celular **#432.**

¡Gracias por confiar en nosotros!

FERREMETALICAS COLOMBIA

ARCOE SAS

NIT. 900.783.521-1

REGIMEN COMUN

PROFORMA

CLIENTE **PROFORMA** 108782

CLIENTE	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025
NIT	901965630 1
Dirección	CALL 15 4001C PRIMAVERA
Ciudad	VILLAVICENCIO
	3123143658

FECHA 15MAYO 2026

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
31	LAM ALF 6MM 1.20*3	652,168	20,217,208
110	PLATINA 3/4 *3/16	14,173	1,559,030
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
		Subtotal	21,776,238
		RTE	
		IVA 19%	4,137,486.00
		TOTAL	25,913,724

Observaciones:

Consignar a Arcoe S.A.S

Banco Bogota Cta Cte 636- 49067 4 RECAUDO

Banco BBVA Cta Cte 764000725 Convenio 20195

Bancolombia Cta Cte 36452637120 Convenio 63712

Sello

Cordialmente,

DIOGENES PARRADO

3128903844

Vigencia 12-05-2012(12)

AVAL Fiduciaria | Asset Management

Hola **3 1 P126331 ANT CONS AGUAS GAITAN 2025,**

¡Buenas noticias! Tu solicitud de pago número 417191 en el portal y número interno de Aval Fiduciaria 839269, donde generaste la instrucción de giro al beneficiario **LUZ DARY CASTELLANOS PAEZ**, identificado con número de documento **37832768**, con la forma de pago **TRANSFERENCIA BANCARIA**, por un valor de **$2092117.0**, fue **ENVIADA** a la entidad financiera **BANCO CAJA SOCIAL CH 24134849832** el día **22-05-2026**. Todo el proceso interno de Aval Fiduciaria se ha completado exitosamente.

Si tienes alguna inquietud sobre este comprobante, por favor comunícate con tu analista de gestión o con nuestra Línea de Servicio al Cliente en Bogotá **(601) 755 0340**, a la Línea nacional gratuita **01 8000 189 799** o desde su celular **#432.**

¡Gracias por confiar en nosotros!

LUZ DARY CASTELLANOS PAEZ
NIT 37.832.768-2
carrera 10 # 14 - 20
Tel: (undefined) 3504361296 - Ext. undefined - 3158986954
Puerto Gaitán - Colombia
dotasem@hotmail.com

DOTASEM L.C

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
No. FE 13232

Señores	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025		
NIT	901.965.630-1	**Teléfono**	(608) 3123143658
Dirección	CL 15 40 01 OCC EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/04/2026, 14:32
Expedición	21/04/2026, 14:33
Vencimiento	21/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CASCO ARMADURA TP CAPITAN AMARILLO RATCHET	1.00	18,487.39	19 %	22,000.00
2	TAPABOCAS NEGRO INDUSTRIAL ECONOMICO X 100 UNIDADES	1.00	67,226.89	19 %	80,000.00
3	CAPUCHON ENTERIZO	1.00	11,764.71	19 %	14,000.00
4	GUANTE NITRILO PRECISION SOSEGA (DOCENA)	2.00	100,840.34	19 %	240,000.00
5	BOTA SEGURIDAD CON PUNTERA GM NEGRA TALLA 42	1.00	67,226.89	19 %	80,000.00
6	GUANTE VAQUETA SENCILLO (DOCENA) CORTO	3.00	85,714.29	19 %	306,000.00
7	CAMISA JEAN CABALLERO TALLA L + BORDADO	1.00	35,294.12	19 %	42,000.00
8	PANTALON JEAN CABALLERO CLASICO 14 ONZAS PRELAVADO TALLA 32	1.00	31,092.44	19 %	37,000.00
9	GAFA SEGURIDAD ECONOMICA L OSCURO	6.00	4,201.68	19 %	30,000.00
10	GAFA SEGURIDAD ECONOMICA L CLARO	6.00	4,201.68	19 %	30,000.00

Total items: 10

Valor en Letras:
Ochocientos ochenta y un mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-21 por $ 881,000.00

Total Bruto	740,336.13
IVA 19%	140,663.87
Total a Pagar	**881,000.00**

Observaciones:
Despacho realizado bajo los siguientes soportes:
RM No. 1-842
RM No. 1-838

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764096092938 aprobado en 20250725 prefijo FE desde el número 12001 al 14000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4771 Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel) en establecimientos especializados Tarifa 7 * 1.000
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 48bf8c2470b1fda91d51d4a79f99a1b62998e09d1acd631106cadcd38091e7a41669a26e17b38fee36db11f0d399aafb

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830048145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

LUZ DARY CASTELLANOS PAEZ
NIT 37.832.768-2
carrera 10 # 14 - 20
Tel: (undefined) 3504361296 - Ext. undefined - 3158986954
Puerto Gaitán - Colombia
dotasem@hotmail.com

DOTASEM L.C

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
No. FE 13299

Señores	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025		
NIT	901.965.630-1	**Teléfono**	(608) 3123143658
Dirección	CL 15 40 01 OCC EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/05/2026, 10:45
Expedición	14/05/2026, 10:45
Vencimiento	13/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	GAFA SEGURIDAD ECONOMICA L OSCURO	6.00	4,201.68	19 %	30,000.00
2	GAFA SEGURIDAD ECONOMICA L CLARO	6.00	4,201.68	19 %	30,000.00
3	GUANTE VAQUETA SENCILLO (DOCENA)	2.00	85,714.29	19 %	204,000.00
4	GUANTE NITRILO SOSEGA - PRECISION (DOCENA)	1.00	100,840.34	19 %	120,000.00
5	TAPABOCAS NEGRO INDUSTRIAL ECONOMICO X 100 UND	1.00	67,226.89	19 %	80,000.00
6	PANTALON JEAN CABALLERO CLASICO 14 ONZAS PRELAVADO T-28	1.00	31,092.44	19 %	37,000.00
7	PANTALON JEAN CABALLERO CLASICO 14 ONZAS PRELAVADO T-30	1.00	31,092.44	19 %	37,000.00
8	PANTALON JEAN CABALLERO CLASICO 14 ONZAS PRELAVADO T-34	2.00	31,092.44	19 %	74,000.00
9	CAMISA JEAN CABALLERO T-S + BORDADO	1.00	35,294.12	19 %	42,000.00
10	CAMISA JEAN CABALLERO T-M + BORDADO	1.00	35,294.12	19 %	42,000.00
11	CAMISA JEAN CABALLERO T-XL + BORDADO	2.00	35,294.12	19 %	84,000.00
12	BOTA SEGURIDAD CON PUNTERA GM NEGRA T-38,40,40,42	4.00	67,226.89	19 %	320,000.00
13	CAPUCHON ENTERIZO	4.00	11,764.71	19 %	56,000.00
14	CASCO ARMADURA TP CAPITAN AMARILLO RATCHET	4.00	18,487.39	19 %	88,000.00

Total items: 14

Total Bruto	1,045,378.15
IVA 19%	198,621.85
Total a Pagar	**1,244,000.00**

Valor en Letras:
Un millón doscientos cuarenta y cuatro mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-13 por $ 1,244,000.00

Observaciones:
Despacho realizado bajo los siguientes soportes:
RM No. 1- 841
RM No. 1- 839

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764096092938 aprobado en 20250725 prefijo FE desde el número 12001 al 14000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4771 Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel) en establecimientos especializados Tarifa 7 * 1.000
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: bb18cf6a5ebc02365d039e957bc661fb382898df5b26df232be6ff74ca9ca00f2a2852aefccfff371a25ee009debdb44

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Siigo Nube, Firma electrónica: ver en el XML

AVAL Fiduciaria | Asset Management

Hola **3 1 P126331 ANT CONS AGUAS GAITAN 2025,**

¡Buenas noticias! Tu solicitud de pago número 417403 en el portal y número interno de Aval Fiduciaria 839272, donde generaste la instrucción de giro al beneficiario **SOLUCIONES INDUSTRIALES REHOBOT S.A.S**, identificado con número de documento **901263052**, con la forma de pago **TRANSFERENCIA BANCARIA**, por un valor de **$914800.0**, fue **ENVIADA** a la entidad financiera **BANCOLOMBIA CC 36400011192** el día **25-05-2026**. Todo el proceso interno de Aval Fiduciaria se ha completado exitosamente.

Si tienes alguna inquietud sobre este comprobante, por favor comunícate con tu analista de gestión o con nuestra Línea de Servicio al Cliente en Bogotá **(601) 755 0340**, a la Línea nacional gratuita **01 8000 189 799** o desde su celular **#432.**

¡Gracias por confiar en nosotros!

12167

Rehobot

Dirección:Cra 34 No. 22 - 83 LOCAL 1
Celular: 3102174053
Email: ventas@rehobotsi.com

Factura Electrónica De Venta No

SIR 13142

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764082118481 que habilita desde SIR 10001 hasta SIR 15000. Vence 2026-10-24

SOLUCIONES INDUSTRIALES REHOBOT S.A.S

Nit 901263052

Responsables IVA - No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4771 6.00 X 1000

CLIENTE	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025
NIT	901965630 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELEFONO	EMAIL
) 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA	Villavicencio	3123143658	consorcioaguasgaitan2025@gmail.com

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA	FORMA DE PAGO
08/05/2026	07/06/2026		Credito

Item	Codigo	Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1010180	CAMISETA POLO POLUX LAFAYETTE M/C T. S-XL NEGRA TALLA M/1 XL/2 CON BORDADO PECHO CONSORCIO AGUAS	3	46.218	19%	8.782	138.655

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**138.655**
DESCUENTO	**0**
IVA	**26.345**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**165.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCION	**165.000**

Valor en Letras
CIENTO SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

Favor consignar en cuenta corriente 36400011192 Bancolombia a nombre de SOLUCIONES INDUSTRIALES REHOBOT SAS

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 08/05/2026 16:48:58
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Firma Recibido_____

CUFE: 0428e2f69b833adda49d7d2cd1c6981ab6cdc50a418d697ba48a10c4fb8c908e39c088e9236921447fd1a382f2f37f0a --Expedición: 08/05/2026 05:01 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

1168

Rehobot

Dirección:Cra 34 No. 22 - 83 LOCAL 1
Celular: 3102174053
Email: ventas@rehobotsi.com

Factura Electrónica De Venta No

SIR 13145

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764082118481 que habilita desde SIR 10001 hasta SIR 15000. Vence 2026-10-24

SOLUCIONES INDUSTRIALES REHOBOT S.A.S

Nit 901263052

Responsables IVA - No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4771 6.00 X 1000

CLIENTE	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025		
NIT	901965630 1		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	EMAIL
) 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA	Villavicencio	3123143658	consorcioaguasgaitan2025@gmail.com

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA	FORMA DE PAGO
08/05/2026	07/06/2026		Credito

Item	Codigo	Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1010234	PANTALON JEAN LICRADO T. 28-36 TALLA 34	1	36.975	19%	7.025	36.975
2	1010144	CAMISA JEAN CABALLERO S-XL TALLA L CON BORDADO CONSTRUCIVIL PECHO	1	34.454	19%	6.546	34.454
3	2010139	BOTA BRONCO ALPACA REF 822	1	71.429	19%	13.571	71.429

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	**142.857**
DESCUENTO	**0**
IVA	**27.143**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**170.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCION	**170.000**

Valor en Letras
CIENTO SETENTA MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

Favor consignar en cuenta corriente 36400011192 Bancolombia a nombre de SOLUCIONES INDUSTRIALES REHOBOT SAS

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 08/05/2026 17:04:35
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Firma Recibido_____

CUFE: d5bc61167ea6a522139facca004d8a280b18da09714b52fd1398561d2289ec28af0d473ecbb598da24e74b119cc25e2a --Expedición: 08/05/2026 05:10 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Rehobot

Dirección:Cra 34 No. 22 - 83 LOCAL 1
Celular: 3102174053
Email: ventas@rehobotsi.com

Factura Electrónica De Venta No

SIR 13146

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764082118481 que habilita desde SIR 10001 hasta SIR 15000. Vence 2026-10-24

SOLUCIONES INDUSTRIALES REHOBOT S.A.S

Nit 901263052

Responsables IVA - No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4771 6.00 X 1000

CLIENTE	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025
NIT	901965630 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELEFONO	EMAIL
) 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA	Villavicencio	3123143658	consorcioaguasgaitan2025@gmail.com

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA	FORMA DE PAGO
08/05/2026	07/06/2026		Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	8010132	ABRIGO IMPERMEABLE CAL 18	1	37.815	19%	7.185	37.815
2	2010133	BOTAS WORKMAN SAFETY WATERPROOF TALLA 43/1	1	61.008	19%	11.592	61.008

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	98.824
DESCUENTO	0
IVA	18.776
TOTAL DE LA OPERACIÓN	117.600
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCION	117.600

Valor en Letras
CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

Favor consignar en cuenta corriente 36400011192 Bancolombia a nombre de SOLUCIONES INDUSTRIALES REHOBOT SAS

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 08/05/2026 17:13:01
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Firma Recibido_____

CUFE: e4d4d7122ae3b7e350bfdbdc87982fea2270e21b7a5d566cb6898333d5f1b87fa7c93bda75bfc4bb8e4500e5ee938fb6 --Expedición: 08/05/2026 05:14 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

12190

Rehobot

Dirección:Cra 34 No. 22 - 83 LOCAL 1
Celular: 3102174053
Email: ventas@rehobotsi.com

Factura Electrónica De Venta No

SIR 13147

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764082118481 que habilita desde SIR 10001 hasta SIR 15000. Vence 2026-10-24

SOLUCIONES INDUSTRIALES REHOBOT S.A.S

Nit 901263052

Responsables IVA - No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4771 6.00 X 1000

CLIENTE	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025
NIT	901965630 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	EMAIL
) 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA	Villavicencio	3123143658	consorcioaguasgaitan2025@gmail.com

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA	FORMA DE PAGO
08/05/2026	07/06/2026		Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1010234	PANTALON JEAN LICRADO T. 28-36 TALLA 30/1	1	36.975	19%	7.025	36.975
2	1010195	CAMISETA POLO POLUX LAFAYETTE M/C XXL NEGRA SIN BORDAR	1	46.218	19%	8.782	46.218
3	1010144	CAMISA JEAN CABALLERO S-XL TALLA M CON BORDADO PECHO	1	34.454	19%	6.546	34.454
4	2010139	BOTA BRONCO ALPACA REF 822 TALLA 39	1	71.429	19%	13.571	71.429

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	189.076
DESCUENTO	0
IVA	35.924
TOTAL DE LA OPERACIÓN	225.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCION	225.000

Valor en Letras
DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

Favor consignar en cuenta corriente 36400011192 Bancolombia a nombre de SOLUCIONES INDUSTRIALES REHOBOT SAS

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 08/05/2026 17:19:26
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Firma Recibido_____

CUFE: 8868d2f477bd9c2175f069138f21b6e4c233d4d9e46760eb9f3c23746910f9307ef2be93024fcf3a58ddc4c9ef24417a –Expedición: 08/05/2026 05:27 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Rehobot

Dirección:Cra 34 No. 22 - 83 LOCAL 1
Celular: 3102174053
Email: ventas@rehobotsi.com

Factura Electrónica De Venta No

SIR 13148

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764082118481 que habilita desde SIR 10001 hasta SIR 15000. Vence 2026-10-24

SOLUCIONES INDUSTRIALES REHOBOT S.A.S

Nit 901263052

Responsables IVA - No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4771 6.00 X 1000

CLIENTE	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025
NIT	901965630 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	EMAIL
) 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA	Villavicencio	3123143658	consorcioaguasgaitan2025@gmail.com

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA	FORMA DE PAGO
08/05/2026	07/06/2026		Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	6010198	GUANTE LINK NITRILO REF. 7650	2	3.782	19%	718	7.563
2	8010132	ABRIGO IMPERMEABLE CAL 18	1	37.815	19%	7.185	37.815
3	4010130	GAFA LINK H020 CLARA	2	5.462	19%	1.038	10.924
4	2010133	BOTAS WORKMAN SAFETY WATERPROOF TALLA 39	1	61.008	19%	11.592	61.008
5	6010132	GUANTE INGENIERO REFORZADO	2	8.235	19%	1.565	16.471
6	6010198	GUANTE LINK NITRILO REF. 7650	4	3.782	19%	718	15.126
7	BORDADO	ESTAMPADO	1	4.202	19%	798	4.202

Total líneas o ítems: 7

SUBTOTAL	**153.109**
DESCUENTO	**0**
IVA	**29.091**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**182.200**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCION	**182.200**

Valor en Letras
CIENTO OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

Favor consignar en cuenta corriente 36400011192 Bancolombia a nombre de SOLUCIONES INDUSTRIALES REHOBOT SAS

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 08/05/2026 17:29:56
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Firma Recibido_____

CUFE: 3646728cda9283c2dd0f93045230586f471497dfe3ce911f52a45158013d0bf9674fa375f54c950f8b28834b5bfe3513 --Expedición: 08/05/2026 05:32 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Rehobot

Dirección:Cra 34 No. 22 - 83 LOCAL 1
Celular: 3102174053
Email: ventas@rehobotsi.com

Factura Electrónica De Venta No

SIR 13169

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764082118481 que habilita desde SIR 10001 hasta SIR 15000. Vence 2026-10-24

SOLUCIONES INDUSTRIALES REHOBOT S.A.S

Nit 901263052

Responsables IVA - No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4771 6.00 X 1000

CLIENTE	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025
NIT	901965630 1

DIRECCION	CIUDAD	TELÉFONO	EMAIL
) 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA	Villavicencio	3123143658	consorcioaguasgaitan2025@gmail.com

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA	FORMA DE PAGO
12/05/2026	11/06/2026		Credito

Item	Codigo	Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1010195	CAMISETA POLO POLUX LAFAYETTE M/C XXL	1	46.218	19%	8.782	46.218

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**46.218**
DESCUENTO	**0**
IVA	**8.782**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**55.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCION	**55.000**

Valor en Letras
CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

Favor consignar en cuenta corriente 36400011192 Bancolombia a nombre de SOLUCIONES INDUSTRIALES REHOBOT SAS

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/05/2026 08:54:29

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Firma Recibido_____

CUFE: b29a06058120df02a09f73ed00715ab167d169214e960657206a74d0a5c735fe883c8db73987c10c5abfc4467c43011c --Expedición: 12/05/2026 08:58 AM

AVAL Fiduciaria | Asset Management

12173

Hola **3 1 P126331 ANT CONS AGUAS GAITAN 2025,**

¡Buenas noticias! Tu solicitud de pago número 417410 en el portal y número interno de Aval Fiduciaria 839270, donde generaste la instrucción de giro al beneficiario **PREVENCION INTEGRAL EN SALUD IPS SAS**, identificado con número de documento **900547903**, con la forma de pago **TRANSFERENCIA BANCARIA**, por un valor de **$152918.0**, fue **ENVIADA** a la entidad financiera **BANCOLOMBIA CH 28900000345** el día **25-05-2026**. Todo el proceso interno de Aval Fiduciaria se ha completado exitosamente.

Si tienes alguna inquietud sobre este comprobante, por favor comunícate con tu analista de gestión o con nuestra Línea de Servicio al Cliente en Bogotá **(601) 755 0340**, a la Línea nacional gratuita **01 8000 189 799** o desde su celular **#432.**

¡Gracias por confiar en nosotros!

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FACTURA NRO: FEV20297
FECHA: 04/05/2026 11:44:00
MONEDA: COP
FORMA DE PAGO: Crédito, Vence: 03/06/2026

12174

PREVENCION INTEGRAL EN SALUD IPS S.A.S
NIT : 900547903-9 Cod. Prestador salud: 505680144301
CARRERA 36 NRO 33A - 19. BARZAL
Tel: 3154140634
Villavicencio, Meta, CO
Régimen Ordinario

Cliente: CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025
NIT : 901965630 - 1
CL 15 40 01. EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA
Tel: 3123143658
Villavicencio, Meta, CO

CUFE:
2187fe42a12ec7b6fde9e6b53473cfd495d2c172d8f81a3ca74a66306ec0fee63693b9eaa6fc21793a0639f6c57fbe3e

Nro.	Referencia	Descripción	Cant.	Precio	Dcto.	Total Dcto.	IVA	Subtotal
Periodo facturado desde 2026-04-01 **hasta** 2026-04-30								
Modalidad: Pago individual por caso / Conjunto integral de atenciones / Paquete / Canasta **Cobertura:** Otras pólizas en salud								
Datos del paciente: CC - 86065706 - IVAN DARIO VARGAS SABOGAL - Tomador / Amparado Planes voluntarios de salud								
1	903818	COLESTEROL TOTAL	1,00	$ 6.000,00	0,00 %	$ 0,00		$ 6.000,00
2	954107	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AEREOS YOSEOS CON ENMASCARAMIENTO(AUDIOMETRIA TONAL)	1,00	$ 16.000,00	0,00 %	$ 0,00		$ 16.000,00
3	903841	GLUCOSA EN SUERO U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA	1,00	$ 10.000,00	0,00 %	$ 0,00		$ 10.000,00
4	890262-01	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR Y CARDIOVASCULAR	1,00	$ 27.000,00	0,00 %	$ 0,00		$ 27.000,00
5	890208-01	VALORACION POR PSICOLOGIA OCUPACIONAL	1,00	$ 27.000,00	0,00 %	$ 0,00		$ 27.000,00
6	903815	COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD	1,00	$ 6.000,00	0,00 %	$ 0,00		$ 6.000,00
7	890207	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR OPTOMETRIA	1,00	$ 16.000,00	0,00 %	$ 0,00		$ 16.000,00
8	890208-05	VALORACION POR PSICOLOGIA OCUPACIONAL EXAMEN PSICOSENSOMETRICO	1,00	$ 27.000,00	0,00 %	$ 0,00		$ 27.000,00
9	902210	HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO	1,00	$ 10.000,00	0,00 %	$ 0,00		$ 10.000,00
10	903817	COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD(LDL) AUTOMATIZADO	1,00	$ 6.000,00	0,00 %	$ 0,00		$ 6.000,00
11	903868	TRIGLICERIDOS	1,00	$ 6.000,00	0,00 %	$ 0,00		$ 6.000,00
							Subtotal	**$ 157.000,00**
							Descuento	**$ 0,00**
							IVA	
							Total	**$ 157.000,00**

Numeración autorizada del FEV18007 al FEV100000 resolución DIAN #18764106670839 del 2026-03-03 hasta 2027-03-03.

Observación:
SERVICIO MEDICO OCUPACIONAL MES DE ABRIL 2026 - SEDE VILLAVICENCIO

AVAL Fiduciaria | Asset Management

12175

Hola **3 1 P126331 ANT CONS AGUAS GAITAN 2025,**

¡Buenas noticias! Tu solicitud de pago número 417417 en el portal y número interno de Aval Fiduciaria 839275, donde generaste la instrucción de giro al beneficiario **P&J CONSTRUCCIONES SAS**, identificado con número de documento **901643814**, con la forma de pago **TRANSFERENCIA BANCARIA**, por un valor de **$20000000**, fue **ENVIADA** a la entidad financiera **BANCOLOMBIA CH 28900004950** el día **26-05-2026**. Todo el proceso interno de Aval Fiduciaria se ha completado exitosamente.

Si tienes alguna inquietud sobre este comprobante, por favor comunícate con tu analista de gestión o con nuestra Línea de Servicio al Cliente en Bogotá **(601) 755 0340**, a la Línea nacional gratuita **01 8000 189 799** o desde su celular **#432.**

¡Gracias por confiar en nosotros!

VILLAVICENCIO, 19 de mayo de 2026

CUENTA DE COBRO N-003

CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025

NIT: 901965630-1

DEBE A:

P&J CONSTRUCCIONES SAS
NIT: 901643814-6

POR CONCEPTO DE: ANTICIPO DEL CONTRATO NUMERO 028 DE 2026, QUE TIENE POR OBJETO "CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA TANQUES ELEVADOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 6M3, EN LAS COMUNIDADES KEKO A ASEINPOME Y SIETE RODRIGUEZ DEL RESGUARDO INDIGENA KEKO, Y TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 10M3, EN LA COMUNIDAD ESMERALDA WALABO DEL RESGUARDO INDIGENA WACOYO DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN".

POR UN VALOR DE: VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 20.000.000,00).

CORDIALMENTE,

PEDRO RODRIGUEZ SALAMANCA

REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 8.192.939 DE PUERTO GAITÁN.

AVAL Fiduciaria | Asset Management

1277

Hola **3 1 P126331 ANT CONS AGUAS GAITAN 2025,**

¡Buenas noticias! Tu solicitud de pago número 418885 en el portal y número interno de Aval Fiduciaria 840583, donde generaste la instrucción de giro al beneficiario **INTEGRALIA DESARROLLO Y SOLUCIONES SAS**, identificado con número de documento **901724983**, con la forma de pago **TRANSFERENCIA BANCARIA**, por un valor de **$244247690**, fue **ENVIADA** a la entidad financiera **BANCO BBVA CC 0833044795** el día **27-05-2026**. Todo el proceso interno de Aval Fiduciaria se ha completado exitosamente.

Si tienes alguna inquietud sobre este comprobante, por favor comunícate con tu analista de gestión o con nuestra Línea de Servicio al Cliente en Bogotá **(601) 755 0340**, a la Línea nacional gratuita **01 8000 189 799** o desde su celular **#432.**

¡Gracias por confiar en nosotros!

INTEGRALIA DESARROLLO Y SOLUCIONES SAS
NIT 901.724.983-0
CL 77 7 44 TORRE SIETE 77 OF 1301
Tel: 3175131689
Bogotá - Colombia
asesorcontable@integraliasoluciones.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 24

Señores	Consorcio aguas gaitan 2025		
NIT	901.965.630-1	**Teléfono**	(601) 3123143658
Dirección	cl 15 40 01	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/05/2026, 09:12
Expedición	22/05/2026, 09:57
Vencimiento	22/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Transporte de material petreo a comunidades indigenas en el municipio de Puerto Gaitan - Meta en el mes de mayo	1.00	249,614,400.00	0 %	0 %	249,614,400.00

Total items: 1

Total Bruto	249,614,400.00
Total a Pagar	**249,614,400.00**

Valor en Letras:
Doscientos cuarenta y nueve millones seiscientos catorce mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-22 por $ 249,614,400.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764109425330 aprobado en 20260506 prefijo FEV desde el número 16 al 500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4669 Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. Tarifa
CUFE: 3d7c97ab97fd090026c17ce77154780927bfa81541165b690f12d11ca5050692ee68cb8ece23237a9b41cb66e385e6e3

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.018.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

AVAL Fiduciaria | Asset Management

12179

Hola **3 1 P126331 ANT CONS AGUAS GAITAN 2025,**

¡Buenas noticias! Tu solicitud de pago número 419680 en el portal y número interno de Aval Fiduciaria 841991, donde generaste la instrucción de giro al beneficiario **LA COMPUERTA SOLUCIONES S.A.S.**, identificado con número de documento **900777214**, con la forma de pago **TRANSFERENCIA BANCARIA**, por un valor de **$442681.0**, fue **ENVIADA** a la entidad financiera **BANCOLOMBIA CH 36432082096** el día **27-05-2026**. Todo el proceso interno de Aval Fiduciaria se ha completado exitosamente.

Si tienes alguna inquietud sobre este comprobante, por favor comunícate con tu analista de gestión o con nuestra Línea de Servicio al Cliente en Bogotá **(601) 755 0340**, a la Línea nacional gratuita **01 8000 189 799** o desde su celular **#432.**

¡Gracias por confiar en nosotros!

LA COMPUERTA
SOLUCIONES

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 1390

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764074861957 que habilita desde FEV 1001 hasta FEV 2000. Vence 2026-07-11

LA COMPUERTA SOLUCIONES S.A.S.

Nit 900777214

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes - No somos Autorretenedores

Actividad Económica ICA 4663 3.00 X 1000

CLIENTE	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025
NIT	901965630 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
0 - 01 CC y Empresarial Prima	Villavicencio	3123143658

POR CONCEPTO DE

Entrega en Av. Solicita Ing. Guillermo Osorio

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/05/2026	21/06/2026	MERLY GONZALEZ DIAZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PVC146	Tee presion acamp 2x2x2" UM	7,00	Und.	53.143	19%	10.097	372.001

Total Items 1

Valor en Letras

CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	372.001
DESCUENTO	0
IVA	70.680
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	442.681

La presente factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio (Art. 772 al 779 del C.C)

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/05/2026 10:26:28

Clle 10 No 45 a 25 Esperanza 3 Epa Villavicencio - Meta Teléfono 3138835451

Correo Electrónico administracion@lacompuerta.com.co

CUFE: 7a71ef7994b2f1a9717d3577b6f75d9ddcb97e44ce17db2c3efb354eaa0c99776034a43161cf142cc3c778966add6aea --Expedición: 22/05/2026 10:28 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

AVAL Fiduciaria | Asset Management

Hola **3 1 P126331 ANT CONS AGUAS GAITAN 2025,**

¡Buenas noticias! Tu solicitud de pago número 419704 en el portal y número interno de Aval Fiduciaria 841995, donde generaste la instrucción de giro al beneficiario **CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025**, identificado con número de documento **901965630**, con la forma de pago **TRANSFERENCIA BANCARIA**, por un valor de **$13591897**, fue **ENVIADA** a la entidad financiera **BANCO DAVIVIENDA CC 098469997740** el día **27-05-2026**. Todo el proceso interno de Aval Fiduciaria se ha completado exitosamente.

Si tienes alguna inquietud sobre este comprobante, por favor comunícate con tu analista de gestión o con nuestra Línea de Servicio al Cliente en Bogotá **(601) 755 0340**, a la Línea nacional gratuita **01 8000 189 799** o desde su celular **#432.**

¡Gracias por confiar en nosotros!

RELACION PAGOS PARA REEMBOLSO						
DESCRIPCIÓN	PERSONAL	MES O PERIODO	VALOR	METODO DE PAGO		
				PAGO POR CONSIGNACIÓN A CUENTA BANCARIA	PAGO EN EFECTIVO	PAGO POR PSE
NOMINA CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	LUIS FERNANDO MUÑOZ	01-15 DE MAYO 2026	$ 5.260.255	$ 5.260.255		
	FRANCY CAROLINA AREVALO	01-15 DE MAYO 2026	$ 929.964	$ 929.964		
	GUILLERMO ALBERTO OSORIO	01-15 DE MAYO 2026	$ 1.236.506	$ 1.236.506		
	ROSEMBERG MURCIA JOJOA	01-15 DE MAYO 2026	$ 1.048.923	$ 1.048.923		
	WENDY GARZON GARCIA	01-15 DE MAYO 2026	$ 1.236.506	$ 1.236.506		
	GUSTAVO MEDINA	01-15 DE MAYO 2026	$ 1.381.544	$ 1.381.544		
APOYO ADMINISTRATIVO	VIVIANA CAICEDO	ABRIL	$ 1.700.000	$ 1.700.000		
DOTACIÓN	MODA ACTUAL	may-26	$ 136.000		$ 136.000	
MATERIAL	LABORATORIOS	may-26	$ 292.128	$ 292.128		
	DISTRACOM	5-may	$ 189.960		$ 189.960	
		10-may	$ 150.000		$ 150.000	
		11-may	$ 30.111		$ 30.111	
TOTAL			$ 13.591.897,00			

12182

CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025

CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025

NIT. 901.965.630-1

Nomina del día 01 al 15 de Mayo de 2.026

				DEVENGADO								DEDUCCIONES						
Nombre del Empleado	No. Identificación	Cargo	RIESGO	Sueldo basico	Dias trabajados	Total basico	Aux de transporte	Licencia Remunerada	Incapacidad (EPS/ARL)	Pacto No Salarial	Total Devengado	Salud	Pension	Fondo Solidaridad Pensional	Anticipo a Nómina	Total Deducciones	Neto Pagado	OBSERVACIONES
AREVALO GARZON FRANCY CAROLINA	40.326.478	DIRECTOR DE OBRA	5	$ 1.750.905	15	$ 875.453	$ 124.548	$ -	$ -	$ -	$ 1.000.000	$ 35.018	$ 35.018	$ -	$ -	$ 70.036	$ 929.964	Se envia desprendible de nómina al correo: CAROLINA05_INGCIVIL@hotmail.com
GARZO GARCIA WENDY VANESA	1.121.902.403	INGENIERO RESIDENTE 2	5	$ 2.417.300	15	$ 1.208.650	$ 124.548	$ -	$ -	$ -	$ 1.333.198	$ 48.346	$ 48.346	$ -		$ 96.692	$ 1.236.506	Se envia desprendible de nómina al correo: Ing.wvg2@gmail.com
MEDINA PARDO GUSTAVO ADOLFO	1.121.869.998	COORDINADOR SST	5	$ 2.732.600	15	$ 1.366.300	$ 124.548	$ -	$ -	$ -	$ 1.490.848	$ 54.652	$ 54.652	$ -	$ -	$ 109.304	$ 1.381.544	Se envia desprendible de nómina al correo: g.pardo09@gmail.com
MUÑOZMURCIA LUIS FERNANDO	86.051.533	REPRESENTANTE LEGAL	1	$ 11.561.000	15	$ 5.780.500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.780.500	$ 231.220	$ 231.220	$ 57.805	$ -	$ 520.245	$ 5.260.255	Se envia desprendible de nómina al correo: inglulsfernandom@gmail.com
MURCIA JOJOA ROSEMBERG	17.497.322	CONDUCTOR	5	$ 2.009.512	15	$ 1.004.756	$ 124.548	$ -	$ -	$ -	$ 1.129.304	$ 40.190	$ 40.190	$ -	$ -	$ 80.380	$ 1.048.923	Se envia desprendible de nómina al correo: asesoriasfym@outlook.com
OSORIO VARGAS GUILLERMO ALBERTO	1.121.834.340	INGENIERO RESIDENTE 1	5	$ 2.417.300	15	$ 1.208.650	$ 124.548	$ -	$ -	$ -	$ 1.333.198	$ 48.346	$ 48.346	$ -	$ -	$ 96.692	$ 1.236.506	Se envia desprendible de nómina al correo: eskp87@hotmail.com
TOTALES						$ 11.444.309	$ 622.738	$ -		$ -	$ 12.067.048	$ 457.772	$ 457.772	$ 57.805	$ -	$ 973.350	$ 11.093.696	

A cargo del emplador

Seguridad Social			%	Valor	Provisiones Prest. Soc y Vac.	%		Valor
Salud			0,0%	$ 0	Cesantías	8,330%		$ 1.005.185
Fondo de Pensiones			12%	$ 1.373.317	Intereses sobre cesantías	1%		$ 120.670
ARL (riesgos laborales)	Seleccione la tarifa:	I	0,522%	$ 30.174	Prima	8,330%		$ 1.005.185
		IV	4,350%	$ 0	Vacaciones	4,170%		$ 477.228
		V	6,960%	$ 394.201				
Total Seguridad Social				$ 1.797.692	Total prestaciones sociales			$ 2.608.268

Parafiscales			%	Valor
Caja Compensación Familiar			4%	$ 457.772
ICBF			0%	$ 0
SENA			0%	$ 0
Total Parafiscales				$ 457.772

Total a cargo del empleador	$ 4.863.733

Salario Mínimo Legal Vigente 2026	$ 1.750.905
Auxilio de transporte	$ 249.095

RIESGO ARL	
Tipo	Tarifa
I	0,52%
II	1,04%
III	2,44%
IV	4,35%
V	6,96%

IMPORTANTE!	
Se encuentra exonerado de pago de aporte de Parafiscales y Salud Ley 1607 de 2012?	
marque con una "X" si es asi.	
SI	X

FECHA ENVIO DESPRENDIBLES DE NOMINA
FECHA DE CONSIGNACIÓN DE LA NOMINA

Días de la nomina	30
Horas trabajadas en el día	7,33

NOMBRE DEL EMPLEADO	No. Identificación	Bruto	Valor hora ordinaria	Cantidad horas extras diurnas	Valor hora extra diurna	Cantidad horas extras nocturnas	Valor hora extra nocturna	Cantidad horas recargo diurno	Valor hora recargo diurno	Cantidad horas recargo nocturno	Valor hora recargo nocturno festivo	TOTAL HORAS EXTRAS
AREVALO GARZON FRANCY CAROLINA	40.326.478	$ 1.750.905	7.992	0	-	0	-	0	-	0	-	-
GARZO GARCIA WENDY VANESA	1.121.902.403	$ 2.417.300	10.833	0	-	0	-	0	-	0	-	-
MEDINA PARDO GUSTAVO ADOLFO	1.121.869.998	$ 2.732.600	12.427	0	-	0	-	0	-	0	-	-
MUÑOZMURCIA LUIS FERNANDO	86.051.533	$ 11.561.000	52.574	0	-	0	-	0	-	0	-	-
MURCIA JOJOA ROSEMBERG	17.497.322	$ 2.009.512	9.135	0	-	0	-	0	-	0	-	-
OSORIO VARGAS GUILLERMO ALBERTO	1.121.834.340	$ 2.417.300	10.833	0	-	0	-	0	-	0	-	-
TOTALES				0	-	0	-	0	-	0	-	-

NOVEDAD	
LICENCIA REMUNERADA	
ANTICIPO A NOMINA	

DIVA YANIRA MACHADO TEJEIRO
"B" CONTADORA

CUENTA DE COBRO N° 001

Villavicencio, 29 de abril de 2026

CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025

NIT: 901.965.630

DEBE A:

VIVIANA MARIA CAICEDO MARTINEZ
CC. 1.121.883.626 de Villavicencio

POR CONCEPTO DE:

Apoyo en actividades administrativas en elaboración de formatos y archivo en la parte administrativa y SST por el mes de abril de 2026.

LA SUMA DE:

Un Millón Setecientos Mil pesos m/cte.
($1.700.000)

VIVIANA MARIA CAICEDO MARTINEZ
CC. 1.121.883.626 de Villavicencio

NOTA: *Certifico que NO tomaré costos y/o deducciones asociadas a los honorarios y/o servicios personales de la presente factura o cuenta de cobro, diferentes a los permitidos en la cedula laboral/rentas de, según artículo 383 de ET.*

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Consorcio Aguas Gait - Nit: 901965630
Viernes, 15 de mayo de 2026, 1:53:18 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
15 May 2026

Nombre del destinatario
Viviana Maria Caic

Identificación destinatario
1121883626

Producto destino
289 - 023122 - 10

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.700.000,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025
NIT: 901965630 - 1
Dirección: CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA U

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 00000445
FECHA: 16/05/2026

CODIGO	CC	NUMERO	DETALLE	NIT	TERCERO	DEBITO	CREDITO
142010008	1	61ME21	COMPRA DE DOTACION CAMIBUSOS	805006745	MODA ACTUAL SAS	114,350.00	
142010008	9	61ME21	COMPRA DE DOTACION CAMIBUSOS	805006745	MODA ACTUAL SAS	21,650.00	
110505001	1	61ME21	COMPRA DE DOTACION CAMIBUSOS	805006745	MODA ACTUAL SAS		136,000.00
VALOR :		136,000.00			SUMAS IGUALES:	136,000.00	136,000.00

OBS:

Elaboro	Reviso
Aprobo	Audito

Recibio C.C / Nit:

MODA ACTUAL SAS
NIT 805.006.745-6
AZUCAR VIVA VILLAVICENCIO
CALLE 7 45-185 CC VIVA V/CIO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 61ME2199

Caja : 061-01 Turno: 1 CEBALLOS
Consec. #: 80632 Fecha: 2026/05/16
Hora : 4:37 p
Vendedor : 2620 PESCADOR GINA
Cond.Pago: CONTADO
Cliente : CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025
NIT. : 901965630-1
Codigo : 901965630 -000

Reg	Item	Descripcion	UM	Total
001	18786	BOLSA PAPEL PEQUENA 20+12X25	UN	401 *
002	13876	NEG POLO M C M/C COLOR NEGRO	- UN	45066 *
003	13876	NEG POLO M C M/C COLOR NEGRO	- UN	45066 *
004	13876	NEG POLO M C M/C COLOR NEGRO	- UN	45067 *

T O T A L $135,600
Total Registros..... 0004
Total Cantidades..... 4

---------[DETALLE DE VALORES]---------

Vta Gravada (*).....	170,672	+
Dscto Global.....	56,722	-
I V A.....	21,650	+

--------[INFORMACION TRIBUTARIA]--------

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO

Efectivo	$136,000
CAMBIO	$400

Software SIESA 8.5 PDV
Fabricante del Software
Sistemas de Informacion Empresarial S.A.
NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing
NIT 890.319.193-3

Autorizacion Numeracion de Facturacion
Numero formulario 18764096095670
Vigente desde 2025-JUL-25
hasta 2026-JUL-25 - 12 meses
Numeracion: HABILITADA
Prefijo 61ME del No. 1869 al 100000

----- AVISO LEGAL -----
Dando cumplimiento a La Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, se le informa que sus datos personales son protegidos, circulados y tratados para fines societarios de MODA ACTUAL S.A.S., de acuerdo con la Politica de Proteccion de Datos Personales, la cual podra consultar o solicitar comunicandose al e-mail mausrbnd@azucarcolombia.com, y/o dirigirse a la sede fisica ubicada en la Carrera 7 # 12 - 34 Edificio Malca Cali, Valle del Cauca, Colombia.

---PQRS: www.azucarcolombia.com/PQRS---
Politica Comercial de Cambios Resumida:
MODA ACTUAL SAS permite el cambio de articulo por: 1) Talla, 2) Color o 3) Referencia, en un plazo maximo de 30

Cufe:d951fda5caf024a752cfac0dd6e69c717d8cbe0d4499338eaa069ce15ad5cb62ba471dd424de9b57c23a62586661fc77
Fecha de certificacion: 2026-05-16T16:37:00.

Firma digital: HHD/1BI6zrr5w8OZ1M2rFhyGqX7ZRW+1f+xKU4JhnM6p8fKViRLWTeFKCTpW4Na8wXraALY6KhdMPG2nPLLLn3GdCq6xhnzfdAkcpdrQm5X0xahK7jP9RlHzOza/fQGPvX5Nid8xByQcMD605Uc3HE8wLXOEk6z8B2AsUckaZmJfEC6BYaT5W+dV/v62xtXesD8qdpqji7SptRUn/URVnoQIqJeGH2RW++A4Dp7Ggfbf2j3Kf9+GzmAwaFERMcqfs+6/X0+OHymjXeVqH1V3keH5/2YWOkAMYxFKb2RPBSLWx5wht5ASnkwFX9dWmRLf6tqaqu5d7QCVmWGqJnhFKQ==

CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025
NIT: 901965630 - 1
Dirección: CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA U

CAUSACION DE GASTOS
NUMERO: 00000274
FECHA: 11/05/2026

CODIGO	CC	NUMERO	DETALLE	NIT	TERCERO	DEBITO	CREDITO
141501004	1	FEIC74	ENSAYO A LA COMPRENSION ED	901376424	INGENIERIA	272,000.00	
141501004	8	FEIC74	ENSAYO A LA COMPRENSION ED	901376424	INGENIERIA	51,680.00	
236515001	1	FEIC74	BASE $272.000 RTF HONORARIOS	901376424	INGENIERIA		29,920.00
236801005	1	FEIC74	BASE $272.000 RETEICA 6*1000	901376424	INGENIERIA		1,632.00
220501001	1	FEIC74	ENSAYO A LA COMPRENSION ED	901376424	INGENIERIA		292,128.00
VALOR :		292,128.00			SUMAS IGUALES:	323,680.00	323,680.00

OBS:

Elaboro Manuela	Reviso
Aprobo	Audito

Recibio C.C / Nit:

12187

INCONTECH SAS

Factura Electrónica De Venta No. FEIC746

Representación Gráfica

Forma de Pago: Crédito
Plazo: 5 Días
Método de Pago: Transferencia Débito Bancario
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación: 11/05/2026 11:09 AM
Fecha de Emisión: 11/05/2026 11:09 AM
Fecha de Vencimiento: 16/05/2026
Responsabilidad Tributaria: R-99-PN
Responsabilidad Tributaria: IVA
Régimen Fiscal: 48

Emisor: INGENIERIA, CONSTRUCCION Y SERVICIOS GEOTECNICOS SAS

Nombre Comercial: INGENIERIA, CONSTRUCCION Y SERVICIOS GEOTECNICOS SAS
Nit del Emisor: 901376424
Correo Electrónico: incontechsas@gmail.com
Teléfono: 301 7096659
Dirección: CRA 28D N 3B-08 BRR EL PALMAR
Departamento: META
Municipio: VILLAVICENCIO
Pais: Colombia

Receptor: CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025

Razón Social: CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025
Identificación: 901965630
Correo Electrónico: consorcioaguasgaitan2025@gmail.com
Teléfono: 312 3143658
Dirección: CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA
Régimen Fiscal: 48
Responsabilidad Tributaria: ZZ
Departamento: META
Municipio: VILLAVICENCIO
País: Colombia

#	Cod Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA	Total
1	1 SERVICIO ENSAYO A LA COMPRESION DE CILINDROS	Control de Calidad	32.00	unidad	8,500.00	272,000.00	51,680.00	323,680.00

Detalles:
Son: TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS
CUFE :
e9d5b48e1aa4bdd2148473186c326ea163d1333c33b958c9c37e533219da0e1f2cc54c0660cdc623d7c94992f4de21fa

Detalle de Venta

Subtotal:	COP 272,000.00
Monto Bruto:	COP 272,000.00
Monto IVA:	COP 51,680.00
Total Venta:	COP 323,680.00
Total a pagar:	COP 323,680.00
Saldo Restante:	COP 323,680.00

Firma Digital:
GoeIVmONz8sdowmFgglhmfWDSRGNQ+2XbvGOm+V93pHm9mee+FpYRwkJz0/NWx4 r8Qepra0cyB8mAqwHH8OdZO/IJdYBdVzNUVOl0evF1ZKgOL4IFs+N8KEg+zG3eVF 1D7k/G+nOgPW8zpNk/i20tFD9YvygbRbmFuf5rxl2MlBDn15/8oaaXSGqc178oM P1dNH4YOb+Nl67lw7Q6lll7PS4z8rfG5AST3rvIP0VAo+z1DlzOklNckZZOHtmOI 8/C0E1ehasMbTvwcVdRlp65cmys1Oz66SdOWY+fuakMe6TTcj68akRZXlf8/dgrZ 6LN0BrFa3YvbEDPJ7y8wOg==

12190

Comprobante de Transacción
Fecha: 8/05/2026 17:06:11

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025
Usuario: LUIS FERNANDO MUNOZ MURCIA
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: **********7740

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 292.128,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 08/05/2026
Hora: 17:05:39

Número de documento: 73363793

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1264	901376424	ING CONSTR Y SERV GEOTECNICOS	$ 292.128,00	Enviado a Otro Banco	

CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025
NIT: 901965630 - 1
Dirección: CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA U

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 00000430
FECHA: 05/05/2026

1291

CODIGO	CC	NUMERO	DETALLE	NIT	TERCERO	DEBITO	CREDITO
142065003	1	EFD298	COMPRA DE COMBUSTIBLE	811009788	DISTRACOM SA	189,960.00	
110505001	1	EFD298	COMPRA DE COMBUSTIBLE	811009788	DISTRACOM SA		189,960.00
VALOR :		189,960.00			SUMAS IGUALES:	189,960.00	189,960.00

OBS:

Elaboro	Reviso
Aprobo	Audito

Recibio C.C / Nit:

DISTRACOM S.A
NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
Según Res. No 000200 de 27 DIC 2024
Distribución y Transporte de Combustible
DISTRACOM MANACACIAS
CRA 10 # 35-36
Meta-Puerto Gaitan
Agentes Retenedores de IVA Art. 437-2 E.T.N
distracommanacacias@distracom.com.co
3104398353

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°. EFD2989527

Fecha de emisión: 2026-05-05 5:11:16 AM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2026-05-05
Fecha Factura: 2026-05-05
Vencimiento: 2026-05-05
Naturaleza: Contado
Medio de Pago: Tarjeta Débito

Adquiriente

Razón social: CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025
NIT: 901965630
Dirección: CALLE 15 # 40-01 CC Y
Contrato:
Placa: JJP298
Teléfonos:
Kms: 0.00
Correo: consorcioaguasgaitan2025@gmail.com
Validador: Cedula - Nit

Item	Ref	Codigo	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1	2	000002	DIESEL	DISTRACOM MANACACIAS	11.590	16,3900	189.960,00

Total Items Documento: 1

Observaciones

P: JJP298

Empleado: ARELIS DIAZ CASTRO
Panel: MFC557 Dispositivo: RBHAND0139I-14

Autorización de numeración de facturación electrónica
N°. 18764098870140
De. 2025-09-19
Vigencia 18 Meses
Desde EFD2707893
Hasta EFD2999999

Total	
Subtotal:	189.960,00
Base Iva:	0,00
IVA:	0,00
Total:	189.960,00

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

6317e6ee33736d752f1f0d6b8d0a815bd5c401da9b7d4845c349d1d42841842fc9b95aba9e1c8179873bf4f6759cf891

Sotfware: DistraElectronic2;DISTRACOM S.A.;Nit: 811009788-8

www.distracom.com.co

CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025
NIT: 901965630 - 1
Dirección: CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA U

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 00000428
FECHA: 10/05/2026

12193

CODIGO	CC	NUMERO	DETALLE	NIT	TERCERO	DEBITO	CREDITO
142065003	1	EGQR4	COMPRA DE COMBUSTIBLE	811009788	DISTRACOM SA	150,000.00	
110505001	1	EGQR4	COMPRA DE COMBUSTIBLE	811009788	DISTRACOM SA		150,000.00
VALOR :		150,000.00			SUMAS IGUALES:	150,000.00	150,000.00

OBS:

Elaboro	Reviso
Aprobo	Audito

Recibio C.C / Nit:

DISTRACOM S.A
NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
Según Res. No 000200 de 27 DIC 2024
Distribución y Transporte de Combustible
DISTRACOM NEBLINAS
KM 6 + 408 MTS ALTO DE NEBLINAS RUBIALES
Meta-Puerto Gaitan
Agentes Retenedores de IVA Art. 437-2 E.T.N
distracomneblinas@distracom.com.co
3127997642

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°. EGQR492807

12194

Fecha de emisión: 2026-05-10 6:29:01 AM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2026-05-10
Fecha Factura: 2026-05-10
Vencimiento: 2026-05-10
Naturaleza: Contado
Medio de Pago: Tarjeta Débito

Adquiriente

Razón social: CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025
NIT: 901965630
Dirección: CALLE 15 # 40-01 CC Y
Contrato:
Placa:
Teléfonos:
Kms: 0.00
Correo: consorcioaguasgaitan2025@gmail.com
Validador: Cedula - Nit

Item	Ref	Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1	2	000002	DIESEL	DISTRACOM NEBLINAS	11.790	12,7226	150.000,00

Total Items Documento: 1

Observaciones

Empleado: DORIAN ALFANY DURAN BLANCO
Panel: MFC107 Dispositivo: RBHAND324I-03

Autorización de numeración de facturación electrónica
N°. 18764098841761
De. 2025-09-18
Vigencia 18 Meses
Desde EGQR357500
Hasta EGQR999999

Total	
Subtotal:	150.000,00
Base Iva:	0,00
IVA:	0,00
Total:	150.000,00

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:
ed2d4232f3281f671925a8b2c1e87c6a2a6e9c9253aa7c5c35429300857b22ab512955601de3fd112a4121d7245c4ce5

Sotfware: DistraElectronic2;DISTRACOM S.A.;Nit: 811009788-8

www.distracom.com.co

CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 NIT: 901965630 - 1 Dirección: CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA U	COMPROBANTE DE EGRESO NUMERO: 00000431 FECHA: 11/05/2026

CODIGO	CC	NUMERO	DETALLE	NIT	TERCERO	DEBITO	CREDITO
142065003	1	EEX443	COMPRA DE COMBUSTIBLE	811009788	DISTRACOM SA	30,111.00	
110505001	1	EEX443	COMPRA DE COMBUSTIBLE	811009788	DISTRACOM SA		30,111.00
VALOR :		30,111.00			SUMAS IGUALES:	30,111.00	30,111.00

OBS:

Elaboro	Reviso
Aprobo	Audito

Recibio C.C / Nit:

DISTRACOM S.A
NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
Según Res. No 000200 de 27 DIC 2024
Distribución y Transporte de Combustible
DISTRACOM LOS CAZADORES
Av. 14 No. 14 - 83
Meta-Puerto lópez
Agentes Retenedores de IVA Art. 437-2 E.T.N
distracomloscazadores@distracom.com.co
3104397318

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°. EEX4432167

Fecha de emisión: 2026-05-11 10:03:15 PM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2026-05-11
Fecha Factura: 2026-05-11
Vencimiento: 2026-05-11
Naturaleza: Contado
Medio de Pago: Tarjeta Débito

1296

Adquiriente

Razón social: CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025
NIT: 901965630
Dirección: CALLE 15 # 40-01 CC Y
Contrato:
Placa:
Teléfonos:
Kms: 0.00
Correo: consorcioaguasgaitan2025@gmail.com
Validador: Cedula - Nit

Item	Ref.	Codigo	Producto	Estacion	Valor Unit	Cant.	Valor Total
1	2	000002	DIESEL	DISTRACOM LOS CAZADORES	10.890	2,7650	30.111,00

Total Items Documento: 1

Observaciones

Empleado: SANTIAGO CERQUERA CELIS
Panel: MFC731 Dispositivo: RBHAND0252I-08

Autorización de numeración de facturación electrónica
N°. 18764098206030
De. 2025-09-05
Vigencia 18 Meses
Desde EEX4322334
Hasta EEX4999999

Total	
Subtotal:	30.111,00
Base Iva:	0,00
IVA:	0,00
Total:	30.111,00

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

182925c0f6b7dbce1c79a26348af763e6f0ccd36c758d1ae747a1f2c8c5b365bb5bf0659dba3e02304b79ef48f02c953

Sotfware: DistraElectronic2;DISTRACOM S.A.;Nit: 811009788-8

www.distracom.com.co

AVAL Fiduciaria | Asset Management

12497

Hola **3 1 P126331 ANT CONS AGUAS GAITAN 2025,**

¡Buenas noticias! Tu solicitud de pago número 419901 en el portal y número interno de Aval Fiduciaria 842948, donde generaste la instrucción de giro al beneficiario **SANOSOL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS**, identificado con número de documento **901975926**, con la forma de pago **TRANSFERENCIA BANCARIA**, por un valor de **$31350000**, fue **ENVIADA** a la entidad financiera **BANCOLOMBIA CH 84400008288** el día **28-05-2026**. Todo el proceso interno de Aval Fiduciaria se ha completado exitosamente.

Si tienes alguna inquietud sobre este comprobante, por favor comunícate con tu analista de gestión o con nuestra Línea de Servicio al Cliente en Bogotá **(601) 755 0340**, a la Línea nacional gratuita **01 8000 189 799** o desde su celular **#432.**

¡Gracias por confiar en nosotros!

SANOSOL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS
NIT 901.975.926-7
CL 16 6 27
Tel: 3165200933 - Ext. undefined
Puerto Gaitán - Colombia
SANOSOLINGENIERIA@GMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. FE 26

Señores	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025		
NIT	901.965.630-1	**Teléfono**	(608) 3123143658 - Ext. 000
Dirección	CL 15 40 01	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	21/05/2026, 08:49
Expedición	21/05/2026, 08:53
Vencimiento	21/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO EN TRACTOR	1.00	31,350,000.00	31,350,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Treinta y un millones trescientos cincuenta mil pesos m/cte

Total Bruto	31,350,000.00
Total a Pagar	**31,350,000.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-21 por $ 31,350,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764097143444 aprobado en 20250815 prefijo FE desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: aabe292134748f01da9c8873a0e760aa3c854b4a298c5a5a4d8877ab4e20ba786301f71e4255968e2174075c68e9ca88

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.148.145-3. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

AVAL Fiduciaria | Asset Management

2199

Hola **3 1 P126331 ANT CONS AGUAS GAITAN 2025,**

¡Buenas noticias! Tu solicitud de pago número 419995 en el portal y número interno de Aval Fiduciaria 842951, donde generaste la instrucción de giro al beneficiario **SANOSOL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS**, identificado con número de documento **901975926**, con la forma de pago **TRANSFERENCIA BANCARIA**, por un valor de **$40000000**, fue **ENVIADA** a la entidad financiera **BANCOLOMBIA CH 84400008288** el día **28-05-2026**. Todo el proceso interno de Aval Fiduciaria se ha completado exitosamente.

Si tienes alguna inquietud sobre este comprobante, por favor comunícate con tu analista de gestión o con nuestra Línea de Servicio al Cliente en Bogotá **(601) 755 0340**, a la Línea nacional gratuita **01 8000 189 799** o desde su celular **#432.**

¡Gracias por confiar en nosotros!

SANOSOL
INGENIERÍA Y CONSTRUCCION

Puerto Gaitán, 26 de mayo de 2026

CUENTA DE COBRO N-005

CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025
NIT: 901965630-1

DEBE A:
SANOSOL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS
NIT: 901975926-7

POR CONCEPTO DE: ANTICIPO DEL 50% CONTRATO NUMERO 030 DE 2026, QUE TIENE POR OBJETO "CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA TANQUES ELEVADOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 6M3 Y 10M3, EN LAS COMUNIDADES VILLAMARCIA, CUMARALITO, YATARROBO Y CACHAMITAS DEL RESGUARDO INDIGENA DOMOPLANAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN".

POR UN VALOR DE: CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 40.000.000,00).
CORDIALMENTE,

MAYRA ALEJANDRA SANTIAGO ARÉVALO
Representante Legal
sanosolingenieria@gmail.com
Dirección: Calle 16 # 6-27
Celular 3165200933
Puerto Gaitán, Meta.

AVAL Fiduciaria | Asset Management

12201

Hola **3 1 P126331 ANT CONS AGUAS GAITAN 2025,**

¡Buenas noticias! Tu solicitud de pago número 420033 en el portal y número interno de Aval Fiduciaria 842956, donde generaste la instrucción de giro al beneficiario **CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025**, identificado con número de documento **901965630**, con la forma de pago **TRANSFERENCIA BANCARIA**, por un valor de **$96088700**, fue **ENVIADA** a la entidad financiera **BANCOLOMBIA CH 84400008225** el día **28-05-2026**. Todo el proceso interno de Aval Fiduciaria se ha completado exitosamente.

Si tienes alguna inquietud sobre este comprobante, por favor comunícate con tu analista de gestión o con nuestra Línea de Servicio al Cliente en Bogotá **(601) 755 0340**, a la Línea nacional gratuita **01 8000 189 799** o desde su celular **#432.**

¡Gracias por confiar en nosotros!

CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025
NIT: 901965630 - 1
Dirección: CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA U

CAUSACION DE GASTOS
NUMERO: 00000230
FECHA: 21/04/2026

CODIGO	CC	NUMERO	DETALLE	NIT	TERCERO	DEBITO	CREDITO
141501002	1	113	SERVICIO DE TRANSPORE DE	88217449	GONZALEZ GONZALEZ	98,200,000.00	
236525005	1	113	BASE $98.200.000 RTF 1%	88217449	GONZALEZ GONZALEZ		982,000.00
236801014	1	113	BASE $98.200.000 RETEICA 10*1000	88217449	GONZALEZ GONZALEZ		982,000.00
236801011	1	113	BASE $982.000 AVISOS Y TABLEROS	88217449	GONZALEZ GONZALEZ		147,300.00
220501001	1	113	SERVICIO DE TRANSPORE DE	88217449	GONZALEZ GONZALEZ		96,088,700.00
VALOR :			96,088,700.00		SUMAS IGUALES:	98,200,000.00	98,200,000.00

OBS:

Elaboro	Reviso
Aprobo	Audito

Recibio C.C / Nit:

Espacio para
Logo Corporativo

RITO CELIO GONZALEZ GONZALEZ
NIT 88.217.449-6
Puerto Gaitán
Tel: (608) 3164684501
Puerto Gaitán - Colombia
ritogonzalez01975@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 113

Señores	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025		
NIT	901.965.630-1	**Teléfono**	(608) 3123143658
Dirección	CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	21/04/2026, 14:55
Expedición	21/04/2026, 14:55
Vencimiento	21/05/2026

Ítem	Código	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	00058	Transporte de material pétreo a comunidades indígenas en el municipio de Puerto Gaitan-Meta	Transporte de material pétreo a comunidades indígenas en el municipio de Puerto Gaitan-Meta	1.00	98,200,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Noventa y ocho millones doscientos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-21 por $ 98,200,000.00

Observaciones:

Total Bruto	98,200,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**98,200,000.00**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764108721201 aprobado en 20260420 prefijo desde el número 113 al 2000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa
CUFE: 31a3070e36ecc9a1f4c3225a918d66d281e89b6a145a0895ebe0b093da26fd799a4b456fcfbc8918baef1c38fe90c227

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

AVAL Fiduciaria | Asset Management

Hola **3 1 P126331 ANT CONS AGUAS GAITAN 2025,**

¡Buenas noticias! Tu solicitud de pago número 420429 en el portal y número interno de Aval Fiduciaria 842953, donde generaste la instrucción de giro al beneficiario **ORLANDO BONILLA CASTELLANO**, identificado con número de documento **17627950**, con la forma de pago **TRANSFERENCIA BANCARIA**, por un valor de **$17968320**, fue **ENVIADA** a la entidad financiera **BANCOLOMBIA CC 28975311823** el día **28-05-2026**. Todo el proceso interno de Aval Fiduciaria se ha completado exitosamente.

Si tienes alguna inquietud sobre este comprobante, por favor comunícate con tu analista de gestión o con nuestra Línea de Servicio al Cliente en Bogotá **(601) 755 0340**, a la Línea nacional gratuita **01 8000 189 799** o desde su celular **#432.**

¡Gracias por confiar en nosotros!

FERTIAGRICOLA DEL LLANO

ORLANDO BONILLA CASTELLANO

NIT. 17.627.950-6

CARRERA 10 N° 12 - 25 B. MANACACIAS
TELEFONO: 6460301-3133940923-
3187956913 PUERTO GAITAN (META)
E-MAIL:fertiagricolallano_@hotmail.com

PROFORMA No.
40

12.25

CLIENTE	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	FECHA PROFORMA	martes, 26 de mayo de 2026
NIT	901965630 1		
DIRECCIO	CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA	FECHA VENCIMIENTO	26-may.-26
CIUDAD	Villavicencio	VENDEDOR	VALERIA PERALES PIDIACHE
TELEFON	3123143658		Contado
POR CONCEPTO DE PROFORMA CEMENTO		COTIZACIÓN	

Codigo	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Inc B	IVA	Valor U/ Iva	Total
CEMENTO0	CEMENTO 50 KG GRIS ARGOS **********	500,00 CERRAD	Und. ******	31.092 **	0	19%	37.000	18.500.000

Valor en Letras	**BASE 1,19**	**15.546.218**	**BASE 5%**	**0**	**EXENTO O EXCLUIDO DE IVA**	**0**	
DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE	**IVA 19%**	**2.953.782**	**IVA 5%**	**0**			

PRECIOS CON IVA INCLUIDO SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO. FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No. 28975311823 A NOMBRE DE ORLANDO BONILLA CASTELLANO	**SUBTOTAL**	**15.546.218**
	DESCUENTO	**0**
	IVA	**2.953.782**
CUENTA BANCARIA: BANCOLOMBIA CTA CTE 28975311823, BANCO BOGOTA CTA DE AHORRO No 804069573 A NOMBRE ORLANDO BONILLA CASTELLANO.	**TOTAL DOCUMENTO**	**18.500.000**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____ No TELEFONO_____

1206

CERTIFICACIÓN

CERTIFICADO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Con base en las obligaciones del **CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025** derivadas de la ejecución del **Contrato de Obra No. 0821 de 2025** cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META"**, en mi calidad de Interventor del Contrato de Obra me permito **CERTIFICAR** que:

Durante el periodo comprendido desde el 01 al 31 de mayo de 2026, la Interventoría realizó seguimiento a las actividades relacionadas con la gestión de residuos sólidos en los diferentes frentes de obra del proyecto.

Como resultado de las verificaciones, se evidenció que el contratista viene adelantó acciones orientadas a la separación en la fuente y al acopio temporal de los residuos generados según sus características, en condiciones que permiten su manejo controlado, considerando la ejecución de múltiples frentes de trabajo en zonas rurales del municipio de Puerto Gaitán.

A la fecha de corte del presente certificado, el contratista de obra prevé su entrega a gestores o empresas autorizadas una vez se consoliden volúmenes representativos o se finalicen las actividades en cada frente de trabajo. En este sentido, la Interventoría continuará realizando seguimiento a la gestión integral de los residuos, incluyendo la verificación de los respectivos soportes de disposición final.

El presente certificado se expide a los treinta y un (31) días del mes de mayo del año 2026, para los fines pertinentes.

Cordialmente:

JORGE ADELMO DIAZ SARMIENTO
Ingeniero Civil. M.P. No. 25202- 68120 CND
Director Interventoría
CONSORCIO INTERVENTORÍA AC INDÍGENAS 2025

207

CERTIFICACIÓN

CERTIFICADO DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES

Con base en las obligaciones del **CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025** derivadas de la ejecución del **Contrato de Obra No. 0821 de 2025** cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META"**, en mi calidad de Interventor del Contrato de Obra me permito CERTIFICAR que:

Durante el periodo comprendido desde el 01 al 31 de mayo de 2026, la Interventoría realizó seguimiento a las actividades relacionadas con el manejo de los materiales de excavación generados en los diferentes frentes de obra del proyecto, para los cuales el contratista adelantó acciones orientadas al manejo adecuado de los materiales provenientes de excavaciones y descapote, priorizando su reutilización en sitio para actividades de relleno, reconformación y nivelación de las áreas intervenidas.

En aquellos casos donde no es posible su aprovechamiento inmediato, se ha observado su acopio temporal en condiciones controladas y autorizadas por la comunidad. Así mismo, la disposición final de estos materiales se realiza en sitios definidos dentro del área de intervención, asegurando que no se generen afectaciones a drenajes naturales, fuentes hídricas o zonas ambientalmente sensibles.

A la fecha del presente certificado, estas actividades se desarrollan en el marco de las condiciones propias del proyecto, caracterizado por la ejecución en múltiples frentes de trabajo en zonas rurales dispersas. En este sentido, la Interventoría continuará realizando seguimiento al manejo y disposición de los materiales de excavación, con el fin de garantizar la adecuada reconformación de las áreas intervenidas y la prevención de impactos ambientales.

El presente certificado se expide a los treinta y un (31) días del mes de mayo del año 2026, para los fines pertinentes.

Cordialmente:

JORGE ADELMO DIAZ SARMIENTO
Ingeniero Civil. M.P. No. 25202- 68120 CND
Director Interventoría
CONSORCIO INTERVENTORÍA AC INDÍGENAS 2025

1208

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

En cumplimiento de las funciones de vigilancia, seguimiento y control de la ejecución contractual asignadas a la interventoría, y en mi calidad de **INTERVENTOR DEL CONTRATO DE OBRA No. 1004 DE 2025**,

CERTIFICO QUE:

El **CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025**, en el marco de la ejecución del contrato cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META"**, durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2026, fue objeto de seguimiento integral por parte de la Interventoría en los componentes técnico, administrativo, financiero, contable, ambiental y jurídico, respecto de las actividades ejecutadas en los diferentes frentes de obra del proyecto.

Con base en las verificaciones realizadas, se evidenció que el contratista ha venido ejecutando las actividades conforme a lo establecido en el contrato, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas, condiciones contractuales y lineamientos requeridos para la adecuada ejecución del proyecto, considerando su desarrollo en zonas rurales del municipio de Puerto Gaitán.

De igual manera, se constató el avance de las actividades constructivas, el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la adecuada gestión en los diferentes componentes objeto de interventoría, necesarios para la correcta ejecución del contrato. En este sentido, la Interventoría continuará realizando el seguimiento integral, con el fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones pactadas hasta la finalización del proyecto.

El presente certificado se expide a los treinta y un (31) días del mes de mayo del año 2026, para los fines pertinentes.

Cordialmente:

JORGE ADELMO DIAZ SARMIENTO
Ingeniero Civil. M.P. No. 25202- 68120 CND
Director Interventoría
CONSORCIO INTERVENTORÍA AC INDÍGENAS 2025

12209

CERTIFICACIÓN

CERTIFICADO DE INTERVENTORIA AVALANDO EQUIPOS Y MAQUINARIA PROPUESTOS EN EL CONTRATO DE OBRA

Durante el mes de mayo de 2026, una vez analizada y verificada en campo la información y la documentación presentada por el contratista **CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025** frente a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones y el anexo técnico del proceso de licitación pública No. LP-SIP-005-2025, el **CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025**, identificado con NIT. 901.965.630 - 1 representado legalmente por **LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA** identificado con cedula de ciudadanía No. 86.051.533, certificamos que se **CUMPLIÓ** con los requisitos exigidos respecto a la maquinaria y equipos establecidos durante el mes de mayo de 2026. Así las cosas, a continuación, enumeramos uno a uno la maquinaria y equipos colocados en la obra en la siguiente tabla:

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD
CAMIONETA	TOYOTA HILUX	1
CAMION ESTACAS	CHEVROLET	1
EQUIPO DE PERFORACION	PORTADRILL 502, MOTOR DIESEL, BOMBA DE LODOS GARDNER DENVER 5 x 8	1
EQUIPO DE PERFORACION	DEUTZ, MOTOR DIESEL, BOMBA DE LODOS GARDNER DENVER 4 x 6	1
EQUIPO DE PERFORACIÓN	REO, MOTOR DIESEL, BOMBA DE LODOS GARDNER DENVER 4 x 6	1
RETROEXCAVADORA	HITACHI	1
RETROEXCAVADORA	CARTERPILLA	1

El presente certificado se expide a los treinta y un (31) días del mes de mayo del año 2026, para los fines pertinentes.

Cordialmente:

JORGE ADELMO DIAZ SARMIENTO
Ingeniero Civil. M.P. No. 25202- 68120 CND
Director Interventoría
CONSORCIO INTERVENTORÍA AC INDÍGENAS 2025

12210

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE PERMISOS Y LICENCIAS AMBIENTALES Y PREDIALES PARA LA EJECUCIÓN TOTAL DEL PROYECTO Y SU VIGENCIA

Teniendo en cuenta las obligaciones del **CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025** derivadas de la ejecución del **Contrato de Obra No. 0821 de 2025** cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META"**, particularmente la establecida en la *CLAUSULA OCTAVA – OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA*, numeral 34. *"EL CONTRATISTA debe realizar los trámites y atender los requerimientos que le realice la Corporación para el desarrollo sostenible del área de manejo especial "La Macarena"-CORMACARENA y las entidades y/o autoridades con las que se tengan permisos, licencias o autorizaciones";* en mi calidad de Interventor del contrato mencionado, para el periodo comprendido desde el 01 al 31 de mayo de 2026, me permito **CERTIFICAR** el cumplimiento de esta obligación en relación a los permisos de prospección y exploración de aguas subterráneas tramitados por el municipio de Puerto Gaitán ante la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena -CORMACARENA, los cuales se encuentran vigentes y amparan las actividades desarrolladas durante el periodo evaluado, conforme a la siguiente relación:

EXPEDIENTE	RESOLUCIÓN	FECHA	VIGENCIA	RESGUARDO INDÍGENA	POZO COMUNIDAD
3.37.2.6.025.001	PS-GJ. 1.2.6.25.0361	30/04/2025	1 AÑO (VIGENTE)	WACOYO	KALIWIRNAE – ESMERALDA WALABO – PALOGRANDE WALABO – LA UNION – PUNTO GRILLO – ALGARROBO – MATAPALITO – LA PORIFA – LA CAIMANA
3.37.2.6.025.004	PS-GJ. 1.2.6.25.0359	30/04/2025	1 AÑO (VIGENTE)	AWALIBA	MAKAPAY – AWALIBA CENTRAL – PUERTO LOPEZ – PUNTO GRILLO – SAN GIL – FACUNAE
3.37.2.6.025.002	PS-GJ. 1.2.6.25.0416	19/05/2025	1 AÑO (VIGENTE)	DOMOPLANAS	OLIVOS – PARAISO – BUENA VISTA – VILLAMARCIA – LAS BRISAS – CUMARALITO – YATARROBO – CERRITO – PUERTO GAVILAN – LAS DELICIAS – CACHAMITAS
3.37.2.6.025.005	PS-GJ. 1.2.6.25.0369	06/05/2025	1 AÑO (VIGENTE)	ASEINPOME	KEKO ASEINPOME – SIETE RODRIGUEZ

Así mismo, se verificó que las actividades ejecutadas en obra se desarrollan dentro del alcance de los permisos otorgados y conforme a los lineamientos establecidos por la autoridad ambiental competente.

El presente certificado se expide a los treinta y un (31) días del mes de mayo del año 2026, para los fines pertinentes.

JORGE ADELMO DIAZ SARMIENTO
Ingeniero Civil. M.P. No. 25202- 68120 CND
Director Interventoría - CONSORCIO INTERVENTORÍA AC INDÍGENAS 2025

12211

CERTIFICACIÓN DE AVANCE DE OBRA

El suscrito, certifica el actual estado de la obra que a continuación se especifica:

CONTRATO DE OBRA No.: No. 821 DE 2025
OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META"
CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS GAITÁN 202
INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENTORÍA AC INDÍGENAS 2025
FECHA DE CORTE: 31 de mayo de 2026
PERIODO EVALUADO: Del 01 al 31 de mayo de 2026

En cumplimiento de las funciones de seguimiento, control y vigilancia de la ejecución contractual, la interventoría certifica el avance financiero del contrato, con base en la programación aprobada y la inversión física ejecutada durante el periodo evaluado.

Tabla: Avance financiero (Programado vs Ejecutado en %)

AVANCE CON RESPECTO A VALOR DEL CONTRATO	SEGUN PROGRAMACION	SEGUN AVANCE FISICO
INVERSION DEL 1 AL 31 DE MAYO 2026	8,34%	8,10%
INVERSION ACUMULADA	48,07%	58,43%
ADELANTO EN PROGRAMACION	10,36%	

Fuente: Elaboración propia consorcio interventoría AC indígenas 2025.

Para la fecha de corte del presente informe, el proyecto presenta un balance general muy favorable. Mientras la programación exigía un avance financiero/físico del 48.07% ($ 20.387.173.611) para la fecha de corte, el contratista ha logrado ejecutar un 58.43% ($ 24.779.519.044). Esto otorga al proyecto un margen a favor o adelanto del 10.36% ($ 4.392.345.434). Esta condición evidencia un desempeño superior al programado y reduce el riesgo de incumplimiento de los plazos contractuales.

El presente certificado se expide a los treinta y un (31) días del mes de mayo del año 2026, para los fines pertinentes.

Cordialmente:

JORGE ADELMO DIAZ SARMIENTO
Ingeniero Civil. M.P. No. 25202- 68120 CND
Director Interventoría - CONSORCIO INTERVENTORÍA AC INDÍGENAS 2025
