ANEXO 25

GESTIÓN DE EGRESOS DEL PROYECTO

Seguimiento de Egresos

PERIODO Agosto de 2026

Valor del Proyecto*	Fecha entrada Concesión	Fecha entrada operación
$ 12.945.270.024.404	Octubre de 2020	Marzo 2028

AVANCE FINANCIERO

Ejecutado acumulado	% avance financiera acumulado
$ 4.602.868.185.833	35,56%

Avance financiero del proyecto en $Dic/17

Concepto	Presupuesto CAPEX Proyecto	Pagos acumuladas	% Avance
Concesión (*)	$ 10.418.888.721.921	$ 2.951.867.378.782	28,33%
Traslado anticipado de Redes	$ 321.459.114.850	$ 294.316.937.319	91,56%
Gestión Social y Predial	$ 1.522.680.827.486	$ 1.102.864.975.544	72,43%
Interventoría	$ 267.669.719.459	$ 134.597.798.934	50,29%
PMO	$ 90.888.581.873	$ 72.882.851.809	80,19%
Otros contratos y contingencias	$ 323.683.058.812	$ 46.338.243.445	14,32%
Total	**$ 12.945.270.024.401**	**$ 4.602.868.185.833**	**35,56%**

(*) Las redes secundarias estan consideradas en el presupuesto comprometido del Contrato 163 de 2019 de Concesión

Cifras de pagos


Concepto	Pagos acumulados		Pagos del período	
	pesos corrientes	$dic/17	pesos corrientes	$dic/17
Concesión	$ 4.373.237.376.076	$ 2.923.886.937.883	$ -	
Redes Secundarias - Concesión	$ 41.972.096.794	$ 27.980.440.899	$ 2.123.101.864	$ 1.357.228.386
Traslado anticipado de Redes	$ 336.906.060.963	$ 294.316.937.319	$ 81.290.700	$ 49.386.916
Gestión Social y Predial	$ 1.301.709.990.025	$ 1.102.864.975.544	$ 3.600.049.594	$ 2.187.154.809
Interventoría	$ 187.631.307.844	$ 134.597.798.934	$ 3.704.310.792	$ 2.269.792.899
PMO	$ 93.679.508.830	$ 72.882.851.809	$ 1.765.582.086	$ 1.123.794.679
Otros contratos y contingencias	$ 53.628.565.504	$ 46.338.243.445	$ 613.649.083	$ 372.813.070
Total	**$ 6.388.764.906.036**	**$ 4.602.868.185.833**	**$ 11.887.984.119**	**$ 7.360.170.759**

Cifras de obligaciones

Concepto	Obligaciones acumuladas		Obligaciones del período	
	pesos corrientes	$dic/17	pesos corrientes	$dic/17
Concesión	$ 5.552.460.468.995	$ 3.640.305.806.846	$ 1.179.223.092.919	$ 716.418.868.963
Redes Secundarias - Concesión	$ 41.972.096.794	$ 27.980.440.899	$ -	$ -
Traslado anticipado de Redes	$ 336.906.060.963	$ 295.094.114.484	$ 65.213.790	$ 39.619.636
Gestión Social y Predial	$ 1.302.366.327.045	$ 1.105.319.116.036	$ 1.890.029.605	$ 1.148.258.442
Interventoría	$ 191.404.619.937	$ 136.898.634.000	$ 3.791.643.839	$ 2.312.542.451
PMO	$ 95.441.438.555	$ 74.006.287.231	$ 1.761.929.725	$ 1.121.469.948
Otros contratos y contingencias	$ 53.673.689.324	$ 46.402.515.198	$ 329.752.498	$ 200.336.063
Total	**$ 7.574.224.701.613**	**$ 5.326.006.914.694**	**$ 1.187.061.662.376**	**$ 721.241.095.503**

(*) Las redes secundarias estan consideradas en el presupuesto comprometido del Contrato 163 de 2019 de Concesión

Avance pagos Contrato Concesión por Componente

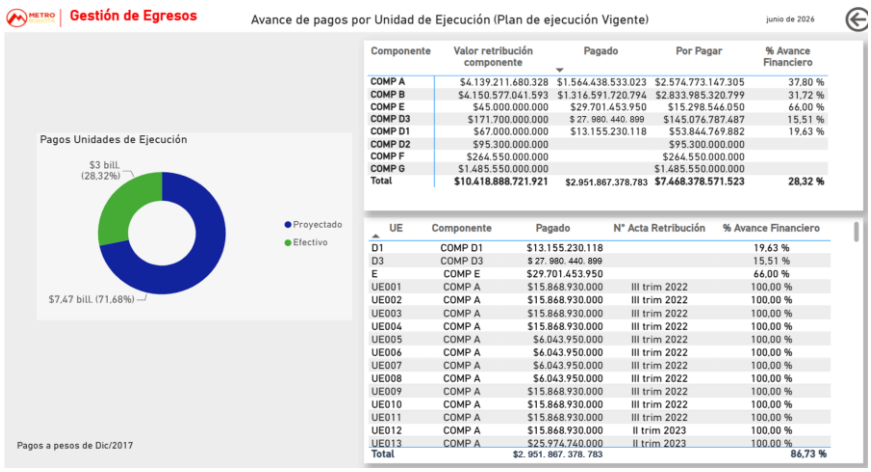

Componente	Valor retribución componente	Pagado	Por Pagar	% Avance Financiero
COMP A	$4.139.211.680.328	$1.564.438.533.023	$2.574.773.147.305	37,80 %
COMP B	$4.150.577.041.593	$1.316.591.720.794	$2.833.985.320.799	31,72 %
COMP E	$45.000.000.000	$29.701.453.950	$15.298.546.050	66,00 %
COMP D3	$171.700.000.000	$ 27. 980. 440. 899	$145.076.787.487	15,51 %
COMP D1	$67.000.000.000	$13.155.230.118	$53.844.769.882	19,63 %
COMP D2	$95.300.000.000		$95.300.000.000	
COMP F	$264.550.000.000		$264.550.000.000	
COMP G	$1.485.550.000.000		$1.485.550.000.000	
Total	$10.418.888.721.921	$2.951.867.378.783	$7.468.378.571.523	28,32 %

UE	Componente	Pagado	N° Acta Retribución	% Avance Financiero
D1	COMP D1	$13.155.230.118		19,63 %
D3	COMP D3	$ 27. 980. 440. 899		15,51 %
E	COMP E	$29.701.453.950		66,00 %
UE001	COMP A	$15.868.930.000	III trim 2022	100,00 %
UE002	COMP A	$15.868.930.000	III trim 2022	100,00 %
UE003	COMP A	$15.868.930.000	III trim 2022	100,00 %
UE004	COMP A	$15.868.930.000	III trim 2022	100,00 %
UE005	COMP A	$6.043.950.000	III trim 2022	100,00 %
UE006	COMP A	$6.043.950.000	III trim 2022	100,00 %
UE007	COMP A	$6.043.950.000	III trim 2022	100,00 %
UE008	COMP A	$6.043.950.000	III trim 2022	100,00 %
UE009	COMP A	$15.868.930.000	III trim 2022	100,00 %
UE010	COMP A	$15.868.930.000	III trim 2022	100,00 %
UE011	COMP A	$15.868.930.000	III trim 2022	100,00 %
UE012	COMP A	$15.868.930.000	II trim 2023	100,00 %
UE013	COMP A	$25.974.740.000	II trim 2023	100,00 %
Total		$2. 951. 867. 378. 783		86,73 %

Actas de retribución suscritas a la fecha

La tabla muestra el avance financiero del componente B en pesos de diciembre de 2017 y en USD

	Componente	Moneda	Presupuesto	Total pagado al 31/07/2026	% Avance financiero contrato
A	Obra Civil	COP	4.139.211.680.328	1.564.438.533.023	37,80%
D1	Adecuación y Reparación de Desvios	COP	67.000.000.000	13.155.230.118	19,63%
D2	Intersecciones Especiales	COP	95.300.000.000		0,00%
D3	Redes	COP	171.700.000.000	27.980.440.899	16,30%
E		COP	45.000.000.000	29.701.453.950	66,00%
F		COP	264.550.000.000		0,00%
G		COP	1.485.550.000.000		0,00%
	Total Componentes	**COP**	**6.268.311.680.328**	**1.635.275.657.990**	**26,09%**
B	Equivalencia Componente B	COP	4.150.577.041.593	1.316.591.720.794	31,72%
	Total Contrato Concesión $dic/17	**COP**	**10.418.888.721.921**	**2.951.867.378.783**	**28,33%**
B	Componente B (USD)	USD	990.000.000	386.005.950	38,99%


Nota: la información de las actas de la retribución que se menciona, es sólo con carácter de información, no están contenidas en los valores reportados que forman parte del avance financiero. Estos se consideran solo una vez pagados, de acuerdo con la información reportada por la EMB

Avance financiero respecto de los compromisos contractuales en $Dic/17


Concepto	Total Compromisos acumulados Proyecto en $/dic17	Pagos acumuladas $/dic17	% Avance
Concesión	$ 10.416.478.767.999	$ 2.951.867.378.782	28,34%
Traslado anticipado de Redes	$ 315.913.684.507	$ 294.316.937.319	93,16%
Gestión Social y Predial	$ 1.166.151.757.823	$ 1.102.864.975.544	94,57%
Interventoría	$ 267.669.719.459	$ 134.597.798.934	50,29%
PMO	$ 90.888.581.873	$ 72.882.851.809	80,19%
Otros contratos y contingencias	$ 50.388.734.350	$ 46.338.243.445	91,96%
Total	**$ 12.307.491.246.011**	**$ 4.602.868.185.833**	**37,40%**

Pagos acumulados por Fuente de Financiamiento


Fuente		Pagos en $/dic17
0201	Aportes Nación	$ 475.031.868.304
0202	Aportes Distrito	$ 3.135.797.603.008
0301	Banca Multilateral	$ 992.038.714.522
Total		**$ 4.602.868.185.834**




Seguimiento flujos de Egresos proyectado L1MB





Seguimiento Avance Financiero y Egresos proyectado por actor

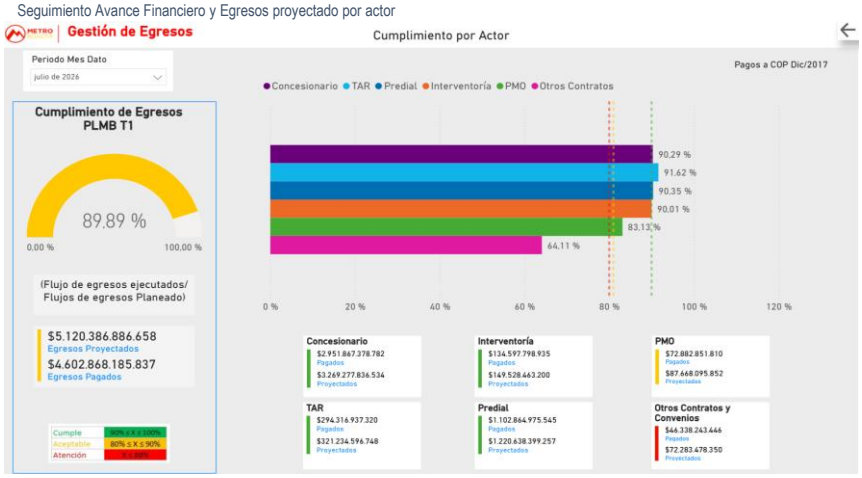


















Fuente:
Datos EMB, GF-GCT-FR-042 Base de Información Detallada der Ejecución de Contratos, periodo julio de 2026
Linea Base de egresos vigente de acuerdo con el POAI_corte junio 2026_EIA enviado el 07-09-2026
Plan de Ejecución V16, No objetado

Observaciones:
Corresponde la información contable a julio de 2026 información disponible a la fecha de cierre del informe.
El indice utilizado para deflactar a $/dic17 los valores expresados en el presente informe, corresponde al indice del mes anterior, es decir, de junio de 2026 1,64599669831

INDICADORES

Indicador	may-26	jun-26	jul-26
Cumplimiento de Egresos	97%	90%	90%
Desviación componente 1	5%	-13%	-13%
Desviación componente 2	29%	17%	17%
Desviación componente 3	8%	8%	8%
Desviación componente 4	9%	9%	10%
Desviación componente 5	18%	18%	18%

Cumple	Atención	No Cumple
90% < X ≤ 100%	80% < X ≤ 90%	80 > X
95% < X ≤ 100%	90% < X ≤ 95%	90 > X y X > 100%
95% < X ≤ 100%	90% < X ≤ 95%	90 > X y X > 100%
95% < X ≤ 100%	90% < X ≤ 95%	90 > X y X > 100%
95% < X ≤ 100%	90% < X ≤ 95%	90 > X y X > 100%
95% < X ≤ 100%	90% < X ≤ 95%	90 > X y X > 100%

ALERTAS

ID	Descripción de la Alerta Temprana	Acción de Respuesta
1	No se registran alertas durante el periodo	

RECOMENDACIONES

ID	Recomendación
1	no se registran recomendaciones durante el periodo

CONCLUSIONES

o	
1	El proyecto presenta un avance financiero 35,56% con información de pagos a julio de 2026, de un planeado de 39,55% con un cumplimiento de 90% acumulado, que reporta un semáforo amarillo de cumplimiento
2	A julio de 2026 el contrato de concesión presenta avance financiero de 28,33% de un planeado de 31,38%, con un cumplimiento de 90,3%, de acuerdo con el plan de ejecución V16. Durante el periodo se registraron pagos de la retribución al contrato de concesión para el componente D3 redes del concesionario. El avance financiero por componente del contrato de concesión a la fecha es, Componente A: 37,80%; Componente D1: 19,63%, Componente D3: 16,30%, componente B: 38,99% respecto del valor en USD y respecto al valor en pesos de dic2017 de 31,72% y el componente E: 66,00%. Los valores no contemplan pagos por operación, mantenimiento, ni TPEs.
3	Con datos a julio de 2026 el componente de TAR tiene un cumplimiento acumulado de 91,6%, con un avance financiero de 91,6%. El Componentes de gestión predial presenta un cumplimiento acumulado de 90,4% con un avance de 72,4%. El Contrato de interventoría tiene un avance financiero de 50,3% con un cumplimiento acumulado de 90% y PMO un avance de 80,2% con un cumplimiento acumulado de 83%.

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE EN EL PERIODO

	Descripción de la Actividad
1	Actualización y validación de la ejecución de los egresos del proyecto considerando la información reportada por la EMB julio de 2026
2	Actualización de los egresos en panel de indicadores en Power Bi
3	Actualización de la línea base de egresos según POAI corte junio2026

CONSORCIO CONSULTORES PMO BOGOTA	
Isabel Medina Gerente de Gestión de Proyecto PMO	Daniel Gomez Coordinador de Finanzas y de control de presupuesto PMO
Revisión PMO	Elaboración PMO
