ANEXO 3

INGENIERÍA
CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
NO. 033-00-A-COFAC-DIFRA-2026

SOPORTES DE CORTE PARCIAL DE OBRA Y PAGO (CUANDO APLIQUE)

ANEXO 3.A

INGENIERÍA
CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN


CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 033-00-A-COFAC-DIFRA-2026

Formato Memorias Corte de Obra (GA-JELOG-FR-098)

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	035-00-A-COFAC-DIFRA-2026
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO PARA SOLDADOS PROFESIONALES EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 EN PUERTO SALGAR – CUNDINAMARCA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO ALOJAMIENTO FAC 26
SUPERVISOR	CAPITAN ANDERSON VERA
INTERVENTOR	DBB INGENIERIA S.A.S.

ÍTEM Nº	1.1	UND:	m²
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DESCAPOTE H= 0.20 MTS, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES		
MEMORIAS:	CORTE No. 1	FECHA :	12/09/2026



PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	ALOJAMIENTO A1 Y A2 SECTOR OCCIDENTAL ZONA BAÑOS Y ANDENES SUR	14.02	29.80		417.80	1	417.80
	ALOJAMIENTO A1 Y A2 SECTOR SUR ZONA ANDENES	4.49	23.90		107.31	1	107.31
	AREA PARQUEADERO Y ACCESOS						
	ANDEN DESDE LAS EDIFICACIONES AL PARQUEADERO Y ZONA PARQUEADERO				752.06	1	752.06
	DESCAPOTE ZONA DE TANQUE	10.0	7.00		70.00		0.00
						TOTAL	1277.17

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:






Elaboró::  **EDGAR JEREZ TAMI** Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: **YUDI ANGELA RENTERIA TRUJILLO** Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma
Revisó:  **ARIOLFO ANTONIO TOVAR PARDO** Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó:  **DONAL BOGOTA BAUTISTA** Director de Interventoría Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	035-00-A-COFAC-DIFRA-2026
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO PARA SOLDADOS PROFESIONALES EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 EN PUERTO SALGAR – CUNDINAMARCA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO ALOJAMIENTO FAC 26
SUPERVISOR	CAPITAN ANDERSON VERA
INTERVENTOR	DBB INGENIERIA S.A.S.

ÍTEM Nº	1.2	UND:	un
DESCRIPCIÓN ÍTEM	CAMPAMENTO DE 72 M2		
MEMORIAS:	CORTE No. 1	FECHA :	12/09/2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	CAMPAMENTO OBRA					1	1
						TOTAL	1

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:









Elaboró:: EDGAR JEREZ T **EDGAR JEREZ TAMI** Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: **YUDI ANGELA RENTERIA TRUJILLO** Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma
Revisó: **ARIOLFO ANTONIO TOVAR PARDO** Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: **DONAL BOGOTÁ BAUTISTA** Director de Interventoría Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	035-00-A-COFAC-DIFRA-2026
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO PARA SOLDADOS PROFESIONALES EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 EN PUERTO SALGAR – CUNDINAMARCA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO ALOJAMIENTO FAC 26
SUPERVISOR	CAPITAN ANDERSON VERA
INTERVENTOR	DBB INGENIERÍA S.A.S.

ÍTEM Nº	1.3	UND:	m²
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DEMOLICIÓN ANDÉN ESPESOR HASTA 25 CM, INCLUYE RETIRO		
MEMORIAS:	CORTE No. 1	FECHA :	12/09/2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	ANDEN_ EJE 1	1.26	22.40		28.22	1	28.22
	ANDEN_ EJE A	1.50	24.70		37.05	1	37.05
						TOTAL	65.27

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:








Elaboró:: EDGAR JEREZ T **EDGAR JEREZ TAMI** Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: **YUDI ANGELA RENTERIA TRUJILLO** Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma
Revisó: **ARIOLFO ANTONIO TOVAR PARDO** Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: **DONAL BOGOTA BAUTISTA** Director de Interventoría Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	035-00-A-COFAC-DIFRA-2026
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO PARA SOLDADOS PROFESIONALES EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 EN PUERTO SALGAR – CUNDINAMARCA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO ALOJAMIENTO FAC 26
SUPERVISOR	CAPITAN ANDERSON VERA
INTERVENTOR	DBB INGENIERIA S.A.S.

ÍTEM Nº	1.4	UND:	un
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DEMOLICION DE CAJAS DE INSPECCION, INCLUYE RETIRO		
CORTE Nº:	1	FECHA :	12/09/2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	DEMOLICION DE CAJAS DE INSPECCION SANITARIAS					3	3
					TOTAL		3

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:





Elaboró:

EDGAR JEREZ T

EDGAR JEREZ TAMI
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:

YUDI ANGELA RENTERIA TRUJILLO
Residente de Interventoría o Supervisor
Firma y Posfirma

Revisó:

ARIOLFO ANTONIO TOVAR PARDO
Director de Obra
Firma y Posfirma

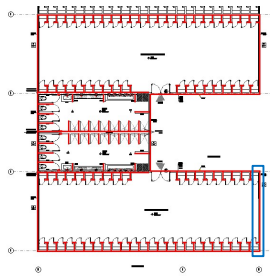
Autorizó:

DONALD BOGOTA BAUTISTA
Director de Interventoría
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	035-00-A-COFAC-DIFRA-2026
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO PARA SOLDADOS PROFESIONALES EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 EN PUERTO SALGAR – CUNDINAMARCA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO ALOJAMIENTO FAC 26
SUPERVISOR	CAPITAN ANDERSON VERA
INTERVENTOR	DBB INGENIERÍA S.A.S.
ÍTEM Nº	1.5 — UND: m²
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL, INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL.
MEMORIAS:	CORTE No. 1 — FECHA : 12/09/2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



UBICACIÓN	DIMENSIONES Ancho	Longitud	Altura	MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
ALOJAMIENTO 1_EJE 1		22.40	4.62	103.00	1	103.49
ALOJAMIENTO 1_EJE 2		22.40	4.62	103.00	1	103.49
Descuento puerta alojamiento		-1.96	2.00	-4.00	-1	3.92
ALOJAMIENTO 1_EJE A		-1.20	2.08	-2.00	1	-2.50
Descuento ventana		7.58	4.60	35.00	-1	-34.87
ALOJAMIENTO 1_EJE B		-7.58	2.22	-17.00	1	-16.83
ALOJAMIENTO 1_EJE C		7.58	0.96	7.00	1	7.28
ALOJAMIENTO 2_EJE 4		22.40	4.62	103.00	1	103.49
Descuento puerta alojamiento		-1.96	2.00	-4.00	-1	3.92
Descuento puerta bateria sanitaria		-1.20	2.08	-2.00	-1	2.50
ALOJAMIENTO 2_EJE A		7.58	4.60	35.00	1	34.87
Descuento ventana		-7.58	2.22	-17.00	-1	16.83
ALOJAMIENTO 2_EJE B		7.58	0.96	7.00	1	7.28
ALOJAMIENTO 2_EJE C		7.58	3.59	27.00	1	27.21
Descuento ventana		-7.58	1.21	-9.00	-1	9.17
BAÑOS_EJE A		7.56	4.60	35.00	1	34.78
BAÑOS_MUROS DIV SANITARIOS		1.33	1.76	2.00	6	14.04
BAÑOS_MUROS DIV DUCHAS		0.96	1.80	2.00	16	27.65
BAÑOS_MUROS DIV LAVAMANOS		0.64	1.46	1.00	4	3.74
BAÑOS_MUROS SOPORTE LAV		0.51	0.65	0.00	12	3.98
BAÑOS_MUROS ACCESO		0.67	1.95	1.00	2	2.61
BAÑOS_MUROS ACCESO		1.32	1.80	2.00	2	4.75
BAÑOS_EJE 3		11.00	3.10	34.00	1	34.10
BAÑOS_EJE B		7.56	4.62	35.00	1	34.93
COMODAS ALOJAMIENTOS_P		22.13	0.72	16.00	4	63.73
COMODAS ALOJAMIENTOS_P		9.27	0.72	7.00	4	26.70
COMODAS ALOJAMIENTOS_P		8.32	0.72	6.00	4	23.96
COMODAS ALOJAMIENTOS_M		0.83	1.85	2.00	84	128.98
				TOTAL		749.22

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:












Elaboró:: EDGAR JEREZ T.	VoBo:
EDGAR JEREZ TAMI Residente de Obra Firma y Posfirma	**YUDI ANGELA RENTERIA TRUJILLO** Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma
Revisó:	Autorizó:
ARIOLFO ANTONIO TOVAR PARDO Director de Obra Firma y Posfirma	**DONAL BOGOTA BAUTISTA** Director de Interventoría Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	035-00-A-COFAC-DIFRA-2026
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO PARA SOLDADOS PROFESIONALES EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 EN PUERTO SALGAR – CUNDINAMARCA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO ALOJAMIENTO FAC 26
SUPERVISOR	CAPITAN ANDERSON VERA
INTERVENTOR	DBB INGENIERIA S.A.S.

ÍTEM Nº	1.6	UND:	un
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.INCLUYE RETIRO.		
MEMORIAS:	CORTE No. 1	FECHA :	12/09/2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	BAÑOS ALOJAMIENTO 1 Y 2 GRUCE					14	14
						TOTAL	14

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:












Elaboró:: EDGAR JEREZ T **EDGAR JEREZ TAMI** Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: **YUDI ANGELA RENTERIA TRUJILLO** Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma
Revisó: **ARIOLFO ANTONIO TOVAR PARDO** Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: **DONAL BOGOTA BAUTISTA** Director de Interventoría Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	035-00-A-COFAC-DIFRA-2026
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO PARA SOLDADOS PROFESIONALES EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 EN PUERTO SALGAR – CUNDINAMARCA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO ALOJAMIENTO FAC 26
SUPERVISOR	CAPITAN ANDERSON VERA
INTERVENTOR	DBB INGENIERIA S.A.S.

ÍTEM Nº	1.8	UND:	m²
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA Y RETIRO.		
MEMORIAS:	CORTE No. 1	FECHA :	12/09/2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	ALOJAMIENTOS 1	7.58	22.13			1	167.75
	ALOJAMIENTOS 2	7.58	22.13			1	167.75
					TOTAL		335.49

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:









Elaboró:: EDGAR JEREZ T **EDGAR JEREZ TAMI** Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: **YUDI ANGELA RENTERIA TRUJILLO** Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma
Revisó: **ARIOLFO ANTONIO TOVAR PARDO** Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: **DONAL BOGOTA BAUTISTA** Director de Interventoría Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	035-00-A-COFAC-DIFRA-2026
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO PARA SOLDADOS PROFESIONALES EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 EN PUERTO SALGAR – CUNDINAMARCA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO ALOJAMIENTO FAC 26
SUPERVISOR	CAPITAN ANDERSON VERA
INTERVENTOR	DBB INGENIERIA S.A.S.

ÍTEM Nº	1.10	UND:	m²
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DESMONTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE CUBIERTA EN TEJA DE ASBESTO-CEMENTO, INCLUYENDO EL RETIRO DE LAS CERCHAS Y TODOS LOS ACCESORIOS , MANEJO Y TRANSPORTE CONFORME A LA NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE, Y ENTREGA DE CERTIFICACIÓN DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS.		
MEMORIAS:	CORTE No. 1	FECHA :	12/09/2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	ALOJAMIENTO 1 Y 2_A1	24.70	12.96		320.11	1.00	320.11
	ALOJAMIENTO 1_A2	10.76	13.35		143.65	1.00	143.65
	ALOJAMIENTO 2_A3	9.50	13.35		126.83	1.00	126.83
	BATERIA_A4	5.20	2.76		14.35	1.00	14.35
						TOTAL	604.94

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:












Elaboró:: EDGAR JEREZ T **EDGAR JEREZ TAMI** Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: **YUDI ANGELA RENTERIA TRUJILLO** Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma
Revisó: **ARIOLFO ANTONIO TOVAR PARDO** Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: **DONAL BOGOTÁ BAUTISTA** Director de Interventoría Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	035-00-A-COFAC-DIFRA-2026
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO PARA SOLDADOS PROFESIONALES EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 EN PUERTO SALGAR – CUNDINAMARCA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO ALOJAMIENTO FAC 26
SUPERVISOR	CAPITAN ANDERSON VERA
INTERVENTOR	DBB INGENIERÍA S.A.S.

ÍTEM Nº	1.11	UND:	m²
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DEMOLICIÓN PLACA EN CONCRETO ESPESOR HASTA 25 CM, INCLUYE RETIRO		
MEMORIAS:	CORTE No. 1	FECHA :	12/09/2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	ALOJAMIENTOS 1 Y 2	7.58	22.40			2	339.58
	BATERIAS DE BAÑOS	7.56	11.00			1	83.16
	ANDEN ALOJAMIENTO 1Y 2 EJE 2Y 4	7.56	11.04			1	83.46
						TOTAL	506.21

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:








Elaboró:: EDGAR JEREZ TAMI Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: YUDI ANGELA RENTERIA TRUJILLO Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma
Revisó: ARIOLFO ANTONIO TOVAR PARDO Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: DONAL BOGOTA BAUTISTA Director de Interventoría Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	035-00-A-COFAC-DIFRA-2026
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO PARA SOLDADOS PROFESIONALES EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 EN PUERTO SALGAR – CUNDINAMARCA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO ALOJAMIENTO FAC 26
SUPERVISOR	CAPITAN ANDERSON VERA
INTERVENTOR	DBB INGENIERIA S.A.S.

ÍTEM Nº	1.12	UND:	glb
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DESVÍO INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EXISTENTE		
MEMORIAS:	CORTE No. 1	FECHA :	12/09/2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	REPARACION DE DIFERENTES TUBERIAS AFECTADAS POR QUE NO EXISTIA LA UBICACIÓN NI LA CAMTIDAD DE REDES EN ESTE SECTOR. LO ANTERIOR GARANTIZANDO EL NORMAL FUNCIONAMIENTO Y SUMINISTRO DEL SERVICIO A LAS ZONAS AFECTADAS					1	1
						TOTAL	1.00

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:












Elaboró:: EDGAR JEREZ T **EDGAR JEREZ TAMI** Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: **YUDI ANGELA RENTERIA TRUJILLO** Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma
Revisó: **ARIOLFO ANTONIO TOVAR PARDO** Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: **DONAL BOGOTA BAUTISTA** de Interventoría Firma y Posfirma Director

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	035-00-A-COFAC-DIFRA-2026
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO PARA SOLDADOS PROFESIONALES EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 EN PUERTO SALGAR – CUNDINAMARCA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO ALOJAMIENTO FAC 26
SUPERVISOR	CAPITAN ANDERSON VERA
INTERVENTOR	DBB INGENIERÍA S.A.S.

ÍTEM N°	2.1	UND:	m³
DESCRIPCIÓN ÍTEM	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONSISTENTE, INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCISION FINAL DE EXCAVACION (m³)		
MEMORIAS:	CORTE No. 1	FECHA :	12/09/2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	EXCAVACIÓN PARA ZAPATAS						
	Z1 (**A1**)	2.7	2.7	0.6	4.37	1.00	4.37
	Z1 (A4)	2.7	2.7	0.6	4.37	1.00	4.37
	Z1 (A5)	2.7	2.7	0.6	4.37	1.00	4.37
	Z1 (A8)	2.7	2.7	0.6	4.37	1.00	4.37
	Z2 (B1)	2.9	3.0	0.6	5.24	1.00	5.24
	Z2 (**C1**)	2.9	3.0	0.6	5.24	1.00	5.24
	Z2 (**J1**)	2.9	3.0	0.6	5.24	1.00	5.24
	Z2 (A2)	2.9	3.0	0.6	5.24	1.00	5.24
	Z2 (D3)	2.9	3.0	0.6	5.24	1.00	5.24
	Z2 (D6)	2.9	3.0	0.6	5.24	1.00	5.24
	Z2 (A7)	2.9	3.0	0.6	5.24	1.00	5.24
	Z2 (B8)	2.9	3.0	0.6	5.24	1.00	5.24
	Z2 (C8)	2.9	3.0	0.6	5.24	1.00	5.24
	Z2 (J8)	2.9	3.0	0.6	5.24	1.00	5.24
							
	Z3 (**E1**)	3.2	3.2	0.6	6.14	1.00	6.14
	Z3 (**F1**)	3.2	3.2	0.6	6.14	1.00	6.14
	Z3 (**G1**)	3.2	3.2	0.6	6.14	1.00	6.14
	Z3 (**I1**)	3.2	3.2	0.6	6.14	1.00	6.14
	Z3 (**J2**)	3.2	3.2	0.6	6.14	1.00	6.14
	Z3 (J3)	3.2	3.2	0.6	6.14	1.00	6.14
	Z3 (-B4)	3.2	3.2	0.6	6.14	1.00	6.14
	Z3 (B5)	3.2	3.2	0.6	6.14	1.00	6.14
	Z3 (J6)	3.2	3.2	0.6	6.14	1.00	6.14
	Z3 (J7)	3.2	3.2	0.6	6.14	1.00	6.14
	Z3 (E8)	3.2	3.2	0.6	6.14	1.00	6.14
	Z3 (F8)	3.2	3.2	0.6	6.14	1.00	6.14
	Z3 (G8)	3.2	3.2	0.6	6.14	1.00	6.14
	Z3 (I8)	3.2	3.2	0.6	6.14	1.00	6.14
	Z4 (B2)	3.2	3.2	0.6	6.14	1.00	6.14
	Z4 (**C2**)	3.2	3.2	0.6	6.14	1.00	6.14
	Z4 (**E2**)	3.2	3.2	0.6	6.14	1.00	6.14
	Z4 (**F2**)	3.2	3.2	0.6	6.14	1.00	6.14
	Z4 (**G2**)	3.2	3.2	0.6	6.14	1.00	6.14
	Z4 (**H2**)	3.2	3.2	0.6	6.14	1.00	6.14
	Z4 (**I2**)	3.2	3.2	0.6	6.14	1.00	6.14
	Z4 (B7)	3.2	3.2	0.6	6.14	1.00	6.14
	Z4 (I7)	3.2	3.2	0.6	6.14	1.00	6.14
	Z4 (C7)	3.2	3.2	0.6	6.14	1.00	6.14
	Z4 (E7)	3.2	3.2	0.6	6.14	1.00	6.14
	Z4 (F7)	3.2	3.2	0.6	6.14	1.00	6.14
	Z4 (G7)	3.2	3.2	0.6	6.14	1.00	6.14
	Z4 (H7)	3.2	3.2	0.6	6.14	1.00	6.14
	Z5 (H8)	3.4	3.4	0.6	6.94	1.00	6.94
	Z5 (**H1**)	3.4	3.4	0.6	6.94	1.00	6.94
	Z6 (E3)	3.5	3.5	0.6	7.35	1.00	7.35
	Z6 (G3)	3.5	3.5	0.6	7.35	1.00	7.35
	Z6 (I3)	3.5	3.5	0.6	7.35	1.00	7.35
						TOTAL	277.73

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:








Elaboró::

EDGAR JEREZ T

EDGAR JEREZ TAMI
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:

YUDI ANGELA RENTERIA TRUJILLO
Residente de Interventoría o Supervisor
Firma y Posfirma

Revisó:

ARIOLFO ANTONIO TOVAR PARDO
Director de Obra
Firma y Posfirma

Autorizó:


DONAL BOGOTÁ BAUTISTA
Director de Interventoría
Firma y Posfirma

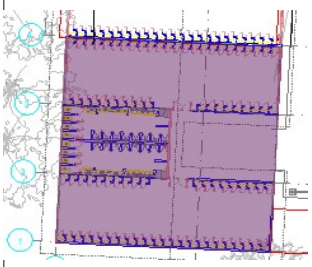
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	035-00-A-COFAC-DIFRA-2026
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO PARA SOLDADOS PROFESIONALES EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 EN PUERTO SALGAR – CUNDINAMARCA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO ALOJAMIENTO FAC 26
SUPERVISOR	CAPITAN ANDERSON VERA
INTERVENTOR	DBB INGENIERÍA S.A.S.

ÍTEM Nº	2.2	UND:	m³
DESCRIPCIÓN ÍTEM	EXCAVACION MECANICA , INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCISIÓN FINAL DE EXCAVACION (m³)		
MEMORIAS:	CORTE No. 1	FECHA :	12/09/2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
EXCAVACIÓN PARA ZAPATAS						
Z1 (**A1**)	2.7	2.7	0.6	4.37	1.00	4.37
Z1 (A4)	2.7	2.7	0.6	4.37	1.00	4.37
Z1 (A5)	2.7	2.7	0.6	4.37	1.00	4.37
Z1 (A8)	2.7	2.7	0.6	4.37	1.00	4.37
Z2 (B1)	2.9	3.0	0.6	5.24	1.00	5.24
Z2 (**C1**)	2.9	3.0	0.6	5.24	1.00	5.24
Z2 (**J1**)	2.9	3.0	0.6	5.24	1.00	5.24
Z2 (A2)	2.9	3.0	0.6	5.24	1.00	5.24
Z2 (D3)	2.9	3.0	0.6	5.24	1.00	5.24
Z2 (D6)	2.9	3.0	0.6	5.24	1.00	5.24
Z2 (A7)	2.9	3.0	0.6	5.24	1.00	5.24
Z2 (B8)	2.9	3.0	0.6	5.24	1.00	5.24
Z2 (C8)	2.9	3.0	0.6	5.24	1.00	5.24
Z2 (J8)	2.9	3.0	0.6	5.24	1.00	5.24
Z3 (**E1**)	3.2	3.2	0.6	6.14	1.00	6.14
Z3 (**F1**)	3.2	3.2	0.6	6.14	1.00	6.14
Z3 (**G1**)	3.2	3.2	0.6	6.14	1.00	6.14
Z3 (**I1**)	3.2	3.2	0.6	6.14	1.00	6.14
Z3 (**J2**)	3.2	3.2	0.6	6.14	1.00	6.14
Z3 (J3)	3.2	3.2	0.6	6.14	1.00	6.14
Z3 (-B4)	3.2	3.2	0.6	6.14	1.00	6.14
Z3 (B5)	3.2	3.2	0.6	6.14	1.00	6.14
Z3 (J6)	3.2	3.2	0.6	6.14	1.00	6.14
Z3 (J7)	3.2	3.2	0.6	6.14	1.00	6.14
Z3 (E8)	3.2	3.2	0.6	6.14	1.00	6.14
Z3 (F8)	3.2	3.2	0.6	6.14	1.00	6.14
Z3 (G8)	3.2	3.2	0.6	6.14	1.00	6.14
Z3 (I8)	3.2	3.2	0.6	6.14	1.00	6.14
Z4 (B2)	3.2	3.2	0.6	6.14	1.00	6.14
Z4 (**C2**)	3.2	3.2	0.6	6.14	1.00	6.14
Z4 (**E2**)	3.2	3.2	0.6	6.14	1.00	6.14
Z4 (**F2**)	3.2	3.2	0.6	6.14	1.00	6.14
Z4 (**G2**)	3.2	3.2	0.6	6.14	1.00	6.14
Z4 (**H2**)	3.2	3.2	0.6	6.14	1.00	6.14
Z4 (**I2**)	3.2	3.2	0.6	6.14	1.00	6.14
Z4 (B7)	3.2	3.2	0.6	6.14	1.00	6.14
Z4 (B7)	3.2	3.2	0.6	6.14	1.00	6.14
Z4 (C7)	3.2	3.2	0.6	6.14	1.00	6.14
Z4 (E7)	3.2	3.2	0.6	6.14	1.00	6.14
Z4 (F7)	3.2	3.2	0.6	6.14	1.00	6.14
Z4 (G7)	3.2	3.2	0.6	6.14	1.00	6.14
Z4 (H7)	3.2	3.2	0.6	6.14	1.00	6.14
Z5 (H8)	3.4	3.4	0.6	6.94	1.00	6.94
Z5 (**H1**)	3.4	3.4	0.6	6.94	1.00	6.94
Z6 (E3)	3.5	3.5	0.6	7.35	1.00	7.35
Z6 (G3)	3.5	3.5	0.6	7.35	1.00	7.35
Z6 (I3)	3.5	3.5	0.6	7.35	1.00	7.35
Z6 (E6)	3.5	3.5	0.6	7.35	1.00	7.35
Z6 (G6)	3.5	3.5	0.6	7.35	1.00	7.35
Z7 (F3)	3.6	3.6	0.6	7.78	1.00	7.78
Z7 (H3)	3.6	3.6	0.6	7.78	1.00	7.78
Z7 (F6)	3.6	3.6	0.6	7.78	1.00	7.78
Z7 (H6)	3.6	3.6	0.6	7.78	1.00	7.78
Z7 (I6)	3.6	3.6	0.6	7.78	1.00	7.78
Z8 (C4)	2.4	2.9	0.6	4.18	1.00	4.18
Z8 (C5)	2.4	2.9	0.6	4.18	1.00	4.18
ALOJAMIENTO 1 Y 2	23.91	24.85	0.50	297.08	1.0	297.08
ANDEN COSTADO SUR	4.63	23.90	0.50	55.33	1.0	55.33
					TOTAL	692.1

OBSERVACIONES:

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	035-00-A-COFAC-DIFRA-2026		
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO PARA SOLDADOS PROFESIONALES EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 EN PUERTO SALGAR – CUNDINAMARCA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.		
CONTRATISTA	CONSORCIO ALOJAMIENTO FAC 26		
SUPERVISOR	CAPITAN ANDERSON VERA		
INTERVENTOR	DBB INGENIERIA S.A.S.		
ÍTEM Nº	2.2	UND:	m³
DESCRIPCIÓN ÍTEM	EXCAVACION MECANICA , INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCISIÓN FINAL DE EXCAVACION (m³)		
MEMORIAS:	CORTE No. 1	FECHA :	12/09/2026

REGISTRO FOTOGRAFICO:



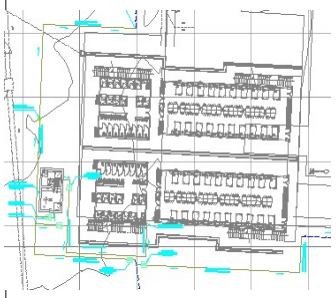


Elaboró:: EDGAR JEREZ **EDGAR JEREZ TAMI** Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: **YUDI ANGELA RENTERIA TRUJILLO** Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma
Revisó: **ARIOLFO ANTONIO TOVAR PARDO** Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: **DONAL BOGOTÁ BAUTISTA** Director de Interventoría Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	035-00-A-COFAC-DIFRA-2026
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO PARA SOLDADOS PROFESIONALES EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 EN PUERTO SALGAR – CUNDINAMARCA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO ALOJAMIENTO FAC 26
SUPERVISOR	CAPITAN ANDERSON VERA
INTERVENTOR	DBB INGENIERIA S.A.S.

ÍTEM Nº	2.3	UND:	m³
DESCRIPCIÓN ÍTEM	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONSISTENTE, NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCISION FINAL DE EXCAVACION		
MEMORIAS:	CORTE No. 1	FECHA :	12/09/2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	EXCAVACION TUBERIA SANITARIA 8 DE LA CAJA 3 AL POZO EYECTOR	0.6	55.63	0.95	31.7091	1	31.710
	EXCAVACION TUBERIA SANITARIA 8 DE LA CAJA 3 LA CAJA 4	0.6	12.2	0.56	4.0992	1	4.100
	EXCAVACION TUBERIA SANITARIA 8 DE LA CAJA 3 LA CAJA 2	0.6	32	0.5	9.6	1	9.600
	EXCAVACION TUBERIA SANITARIA 8 DE LA CAJA 2 LA CAJA 1	0.6	12	0.465	3.348	1	3.350
	EXCAVACION TUBERIA AGUA POTABLE DE LA SECTOR OCCIDENTAL	0.6	41	0.9	22.14	1	22.140
	EXCAVACION TUBERIA AGUA POTABLE DE LA SECTOR NORTE	0.6	17.6	1.025	10.824	1	10.820
	EXCAVACION TUBERIA AGUA POTABLE DE LA SECTOR SUR	0.6	19.8	0.95	11.286	1	11.290
						TOTAL	93.01

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:

	#¡DESCONOCIDO!	#¡DESCONOCIDO!

Elaboró::

EDGAR JEREZ T

EDGAR JEREZ TAMI
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:

YUDI ANGELA RENTERIA TRUJILLO
Residente de Interventoría o Supervisor
Firma y Posfirma

Revisó:

ARIOLFO ANTONIO TOVAR PARDO
Director de Obra
Firma y Posfirma

Autorizó:

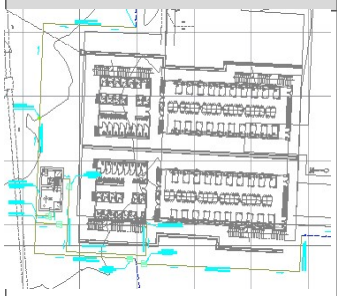
DONAL BOGOTA BAUTISTA
Director de Interventoría
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	035-00-A-COFAC-DIFRA-2026
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO PARA SOLDADOS PROFESIONALES EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 EN PUERTO SALGAR – CUNDINAMARCA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO ALOJAMIENTO FAC 26
SUPERVISOR	CAPITAN ANDERSON VERA
INTERVENTOR	DBB INGENIERIA S.A.S.

ÍTEM Nº	2.4	UND:	m³
DESCRIPCIÓN ÍTEM	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO		
MEMORIAS:	CORTE No. 1	FECHA :	12/09/2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
RELLENO TUBERIA SANITARIA 8 DE LA CAJA 3 AL POZO EYECTOR	0.6	55.63	0.95	31.7091	1	31.71
RELLENO TUBERIA SANITARIA 8 DE LA CAJA 3 LA CAJA 4	0.6	12.2	0.56	4.0992	1	4.10
RELLENO TUBERIA SANITARIA 8 DE LA CAJA 3 LA CAJA 2	0.6	32	0.5	9.6	1	9.60
RELLENO TUBERIA SANITARIA 8 DE LA CAJA 2 LA CAJA 1	0.6	12	0.465	3.348	1	3.35
RELLENO TUBERIA AGUA POTABLE DE LA SECTOR OCCIDENTAL	0.6	41	0.9	22.14	1	22.14
RELLENO TUBERIA AGUA POTABLE DE LA SECTOR NORTE	0.6	17.6	1.025	10.824	1	10.82
RELLENO TUBERIA AGUA POTABLE DE LA SECTOR SUR	0.6	19.8	0.95	11.286	1	11.29
DESCUENTO TUBERIAS Y RELLENO ARENA						
RELLENO TUBERIA SANITARIA 8 DE LA CAJA 3 AL POZO EYECTOR	0.6	55.63	0.4	13.3512	-1	-13.35
RELLENO TUBERIA SANITARIA 8 DE LA CAJA 3 LA CAJA 4	0.6	12.2	0.4	2.928	-1	-2.93
RELLENO TUBERIA SANITARIA 8 DE LA CAJA 3 LA CAJA 2	0.6	32	0.4	7.68	-1	-7.68
RELLENO TUBERIA SANITARIA 8 DE LA CAJA 2 LA CAJA 1	0.6	12	0.4	2.88	1	2.88
RELLENO TUBERIA AGUA POTABLE DE LA SECTOR OCCIDENTAL	0.6	41	0.3	7.38	-1	-7.38
RELLENO TUBERIA AGUA POTABLE DE LA SECTOR NORTE	0.6	17.6	0.3	3.168	-1	-3.17
RELLENO TUBERIA AGUA POTABLE DE LA SECTOR SUR	0.6	19.8	0.3	3.564	-1	-3.56
					TOTAL	57.82

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:









Elaboró::

EDGAR JEREZ

EDGAR JEREZ TAMI
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:

YUDI ANGELA RENTERIA TRUJILLO
Residente de Interventoría o Supervisor
Firma y Posfirma

Revisó:

ARIOLFO ANTONIO TOVAR PARDO
Director de Obra
Firma y Posfirma

Autorizó:

DONAL BOGOTA BAUTISTA
Director de Interventoría
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	035-00-A-COFAC-DIFRA-2026
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO PARA SOLDADOS PROFESIONALES EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 EN PUERTO SALGAR – CUNDINAMARCA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO ALOJAMIENTO FAC 26
SUPERVISOR	CAPITAN ANDERSON VERA
INTERVENTOR	DBB INGENIERIA S.A.S.

ÍTEM Nº	2.5	UND:	m³
DESCRIPCIÓN ÍTEM	TRANSPORTE DE MATERIAL/SOBRANTE U OTRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO.		
MEMORIAS:	CORTE No. 1	FECHA :	12/09/2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	DESCUENTO TUBERIAS Y RELLENO ARENA						
	RELLENO TUBERIA SANITARIA 8 DE LA CAJA 3 AL POZO EYECTOR	0.6	55.63	0.4	13.35	1.25	16.69
	RELLENO TUBERIA SANITARIA 8 DE LA CAJA 3 LA CAJA 4	0.6	12.2	0.4	2.93	1.25	3.66
	RELLENO TUBERIA SANITARIA 8 DE LA CAJA 3 LA CAJA 2	0.6	32	0.4	7.68	1.25	9.6
	RELLENO TUBERIA SANITARIA 8 DE LA CAJA 2 LA CAJA 1	0.6	12	0.4	2.88	1.25	3.6
					0.00		
	RELLENO TUBERIA AGUA POTABLE DE LA SECTOR OCCIDENTAL	0.6	41	0.3	7.38	1.25	9.23
	RELLENO TUBERIA AGUA POTABLE DE LA SECTOR NORTE	0.6	17.6	0.3	3.17	1.25	3.96
	RELLENO TUBERIA AGUA POTABLE DE LA SECTOR SUR	0.6	19.8	0.3	3.56	1.25	4.45
						TOTAL	51.19

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:






Elaboró::
EDGAR JEREZ 4
EDGAR JEREZ TAMI
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:
YUDI ANGELA RENTERIA TRUJILLO
Residente de Interventoría o Supervisor
Firma y Posfirma

Revisó:
ARIOLFO ANTONIO TOVAR PARDO
Director de Obra
Firma y Posfirma

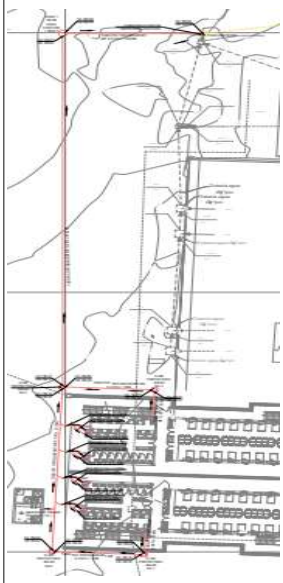
Autorizó:
DONAL BOGOTA BAUTISTA
Director de Interventoría
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	035-00-A-COFAC-DIFRA-2026
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO PARA SOLDADOS PROFESIONALES EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 EN PUERTO SALGAR – CUNDINAMARCA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO ALOJAMIENTO FAC 26
SUPERVISOR	CAPITAN ANDERSON VERA
INTERVENTOR	DBB INGENIERÍA S.A.S.

ÍTEM Nº	2.6	UND:	m³
DESCRIPCIÓN ÍTEM	CIMENTACION Y ATRAQUE DE TUBERIA.		
MEMORIAS:	CORTE No. 1	FECHA :	12/09/2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



UBICACIÓN	DIMENSIONES Ancho	Longitud	Altura	MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
CIMENTACION TUBERIA EN ARENA						
RELLENO TUBERIA SANITARIA 8 DE LA CAJA 3 AL POZO EYECTOR	0.6	55.63	0.4	13.3512	1	13.35
RELLENO TUBERIA SANITARIA 8 DE LA CAJA 3 LA CAJA 4	0.6	12.2	0.4	2.928	1	2.93
RELLENO TUBERIA SANITARIA 8 DE LA CAJA 3 LA CAJA 2	0.6	32	0.4	7.68	1	7.68
RELLENO TUBERIA SANITARIA 8 DE LA CAJA 2 LA CAJA 1	0.6	12	0.4	2.88	1	2.88
RELLENO TUBERIA AGUA POTABLE DE LA SECTOR OCCIDENTAL	0.6	41	0.3	7.38	1	7.38
RELLENO TUBERIA AGUA POTABLE DE LA SECTOR NORTE	0.6	17.6	0.3	3.168	1	3.17
RELLENO TUBERIA AGUA POTABLE DE LA SECTOR SUR	0.6	19.8	0.3	3.564	1	3.56

	DIMENSIONES Ancho	Longitud	AREA TRANSVERSAL	MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
DESCUENTO TUBERIA						
RELLENO TUBERIA SANITARIA 8 DE LA CAJA 3 AL POZO EYECTOR		55.63	0.031416	1.74767208	-1	-1.75
RELLENO TUBERIA SANITARIA 8 DE LA CAJA 3 LA CAJA 4		12.2	0.031416	0.3832752	-1	-0.38
RELLENO TUBERIA SANITARIA 8 DE LA CAJA 3 LA CAJA 2		32	0.031416	1.005312	-1	-1.01
RELLENO TUBERIA SANITARIA 8 DE LA CAJA 2 LA CAJA 1		12	0.031416	0.376992	-1	-0.38
RELLENO TUBERIA AGUA POTABLE DE LA SECTOR OCCIDENTAL		41	0.01853544	0.75995304	-1	-0.76
RELLENO TUBERIA AGUA POTABLE DE LA SECTOR NORTE		17.6	0.01853544	0.32622374	-1	-0.33
RELLENO TUBERIA AGUA POTABLE DE LA SECTOR SUR		19.8	0.01853544	0.36700171	-1	-0.37
					TOTAL	35.97

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:






Elaboró::
EDGAR JEREZ T
EDGAR JEREZ TAMI
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:
YUDI ANGELA RENTERIA TRUJILLO
Residente de Interventoría o Supervisor
Firma y Posfirma


Revisó:
ARIOLFO ANTONIO TOVAR PARDO
Director de Obra
Firma y Posfirma

Autorizó:
DONAL BOGOTA BAUTISTA
Director de Interventoría
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	035-00-A-COFAC-DIFRA-2026
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO PARA SOLDADOS PROFESIONALES EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 EN PUERTO SALGAR – CUNDINAMARCA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO ALOJAMIENTO FAC 26
SUPERVISOR	CAPITAN ANDERSON VERA
INTERVENTOR	DBB INGENIERÍA S.A.S.

ÍTEM Nº	3.4	UND:	m²
DESCRIPCIÓN ÍTEM	GEOTEXTIL NT2500 O SIMILAR		
MEMORIAS:	CORTE No. 1	FECHA :	12/09/2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
							
	Z1 (**A1**)	10.8		1.4	15.12	1.00	15.12
	Z1 (A4)	10.8		1.4	15.12	1.00	15.12
	Z1 (A5)	10.8		1.4	15.12	1.00	15.12
	Z1 (A8)	10.8		1.4	15.12	1.00	15.12
							0.00
	Z2 (B1)	11.8		1.4	16.55	1.00	16.55
	Z2 (**C1**)	11.8		1.4	16.55	1.00	16.55
	Z2 (**J1**)	11.8		1.4	16.55	1.00	16.55
	Z2 (A2)	11.8		1.4	16.55	1.00	16.55
	Z2 (D3)	11.8		1.4	16.55	1.00	16.55
	Z2 (D6)	11.8		1.4	16.55	1.00	16.55
	Z2 (A7)	11.8		1.4	16.55	1.00	16.55
	Z2 (B8)	11.8		1.4	16.55	1.00	16.55
	Z2 (C8)	11.8		1.4	16.55	1.00	16.55
	Z2 (J8)	11.8		1.4	16.55	1.00	16.55
	Z3 (**E1**)	12.8		1.4	17.92	1.00	17.92
	Z3 (**F1**)	12.8		1.4	17.92	1.00	17.92
	Z3 (**G1**)	12.8		1.4	17.92	1.00	17.92
	Z3 (**I1**)	12.8		1.4	17.92	1.00	17.92
	Z3 (**J2**)	12.8		1.4	17.92	1.00	17.92
	Z3 (J3)	12.8		1.4	17.92	1.00	17.92
	Z3 (-B4)	12.8		1.4	17.92	1.00	17.92
	Z3 (B5)	12.8		1.4	17.92	1.00	17.92
	Z3 (J6)	12.8		1.4	17.92	1.00	17.92
	Z3 (J7)	12.8		1.4	17.92	1.00	17.92
	Z3 (E8)	12.8		1.4	17.92	1.00	17.92
	Z3 (F8)	12.8		1.4	17.92	1.00	17.92
	Z3 (G8)	12.8		1.4	17.92	1.00	17.92
	Z3 (I8)	12.8		1.4	17.92	1.00	17.92
							0.00
	Z4 (B2)	12.8		1.4	17.92	1.00	17.92
	Z4 (**C2**)	12.8		1.4	17.92	1.00	17.92
	Z4 (**E2**)	12.8		1.4	17.92	1.00	17.92
	Z4 (**F2**)	12.8		1.4	17.92	1.00	17.92
	Z4 (**G2**)	12.8		1.4	17.92	1.00	17.92
	Z4 (**H2**)	12.8		1.4	17.92	1.00	17.92
	Z4 (**I2**)	12.8		1.4	17.92	1.00	17.92
	Z4 (B7)	12.8		1.4	17.92	1.00	17.92
	Z4 (B7)	12.8		1.4	17.92	1.00	17.92
	Z4 (C7)	12.8		1.4	17.92	1.00	17.92
	Z4 (E7)	12.8		1.4	17.92	1.00	17.92
	Z4 (F7)	12.8		1.4	17.92	1.00	17.92
	Z4 (G7)	12.8		1.4	17.92	1.00	17.92
	Z4 (H7)	12.8		1.4	17.92	1.00	17.92
							0.00
	Z5 (H8)	13.6		1.4	19.04	1.00	19.04
	Z5 (**H1**)	13.6		1.4	19.04	1.00	19.04
	Z6 (E3)	14.0		1.4	19.60	1.00	19.60
	Z6 (G3)	14.0		1.4	19.60	1.00	19.60
	Z6 (I3)	14.0		1.4	19.60	1.00	19.60
	Z6 (E6)	14.0		1.4	19.60	1.00	19.60
	Z6 (G6)	14.0		1.4	19.60	1.00	19.60
	Z7 (F3)	14.4		1.4	20.16	1.00	20.16
	Z7 (H3)	14.4		1.4	20.16	1.00	20.16
	Z7 (F6)	14.4		1.4	20.16	1.00	20.16
	Z7 (H6)	14.4		1.4	20.16	1.00	20.16
	Z7 (I6)	14.4		1.4	20.16	1.00	20.16
	Z1 (**A1**)	2.7	2.7		7.29	1.00	7.29
	Z1 (A4)	2.7	2.7		7.29	1.00	7.29
	Z1 (A5)	2.7	2.7		7.29	1.00	7.29
	Z1 (A8)	2.7	2.7		7.29	1.00	7.29
							0.00
	Z2 (B1)	2.9	3.0		8.73	1.00	8.73
	Z2 (**C1**)	2.9	3.0		8.73	1.00	8.73
	Z2 (**J1**)	2.9	3.0		8.73	1.00	8.73
	Z2 (A2)	2.9	3.0		8.73	1.00	8.73
	Z2 (D3)	2.9	3.0		8.73	1.00	8.73
	Z2 (D6)	2.9	3.0		8.73	1.00	8.73
	Z2 (A7)	2.9	3.0		8.73	1.00	8.73
	Z2 (B8)	2.9	3.0		8.73	1.00	8.73
	Z2 (C8)	2.9	3.0		8.73	1.00	8.73
	Z2 (J8)	2.9	3.0		8.73	1.00	8.73
	Z3 (**E1**)	3.2	3.2		10.24	1.00	10.24
	Z3 (**F1**)	3.2	3.2		10.24	1.00	10.24
	Z3 (**G1**)	3.2	3.2		10.24	1.00	10.24
	Z3 (**I1**)	3.2	3.2		10.24	1.00	10.24
	Z3 (**J2**)	3.2	3.2		10.24	1.00	10.24
	Z3 (J3)	3.2	3.2		10.24	1.00	10.24
	Z3 (-B4)	3.2	3.2		10.24	1.00	10.24
	Z3 (B5)	3.2	3.2		10.24	1.00	10.24

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	035-00-A-COFAC-DIFRA-2026
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO PARA SOLDADOS PROFESIONALES EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 EN PUERTO SALGAR – CUNDINAMARCA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO ALOJAMIENTO FAC 26
SUPERVISOR	CAPITAN ANDERSON VERA
INTERVENTOR	DBB INGENIERIA S.A.S.

ÍTEM Nº	3.4	UND:	m²
DESCRIPCIÓN ÍTEM	GEOTEXTIL NT2500 O SIMILAR		
MEMORIAS:	CORTE No. 1	FECHA :	12/09/2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Z3 (J6)	3.2	3.2		10.24	1.00	10.24
	Z3 (J7)	3.2	3.2		10.24	1.00	10.24
	Z3 (E8)	3.2	3.2		10.24	1.00	10.24
	Z3 (F8)	3.2	3.2		10.24	1.00	10.24
	Z3 (G8)	3.2	3.2		10.24	1.00	10.24
	Z3 (I8)	3.2	3.2		10.24	1.00	10.24
	Z4 (B2)	3.2	3.2		10.24	1.00	10.24
	Z4 (**C2**)	3.2	3.2		10.24	1.00	10.24
	Z4 (**E2**)	3.2	3.2		10.24	1.00	10.24
	Z4 (**F2**)	3.2	3.2		10.24	1.00	10.24
	Z4 (**G2**)	3.2	3.2		10.24	1.00	10.24
	Z4 (**H2**)	3.2	3.2		10.24	1.00	10.24
	Z4 (**I2**)	3.2	3.2		10.24	1.00	10.24
	Z4 (B7)	3.2	3.2		10.24	1.00	10.24
	Z4 (B7)	3.2	3.2		10.24	1.00	10.24
	Z4 (C7)	3.2	3.2		10.24	1.00	10.24
	Z4 (E7)	3.2	3.2		10.24	1.00	10.24
	Z4 (F7)	3.2	3.2		10.24	1.00	10.24
	Z4 (G7)	3.2	3.2		10.24	1.00	10.24
	Z4 (H7)	3.2	3.2		10.24	1.00	10.24
	Z5 (H8)	3.4	3.4		11.56	1.00	11.56
	Z5 (**H1**)	3.4	3.4		11.56	1.00	11.56
	Z6 (E3)	3.5	3.5		12.25	1.00	12.25
	Z6 (G3)	3.5	3.5		12.25	1.00	12.25
	Z6 (I3)	3.5	3.5		12.25	1.00	12.25
	Z6 (E6)	3.5	3.5		12.25	1.00	12.25
	Z6 (G6)	3.5	3.5		12.25	1.00	12.25
	Z7 (F3)	3.6	3.6		12.96	1.00	12.96
	Z7 (H3)	3.6	3.6		12.96	1.00	12.96
	Z7 (F6)	3.6	3.6		12.96	1.00	12.96
	Z7 (H6)	3.6	3.6		12.96	1.00	12.96
	Z7 (I6)	3.6	3.6		12.96	1.00	12.96
						TOTAL	1516.94

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:







Elaboró::

EDGAR JEREZ

EDGAR JEREZ TAMI
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:

YUDI ANGELA RENTERIA TRUJILLO
Residente de Interventoría o Supervisor
Firma y Posfirma

Revisó:

ARIOLFO ANTONIO TOVAR PARDO
Director de Obra
Firma y Posfirma


Autorizó:

DONAL BOGOTA BAUTISTA
Director de Interventoría
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	035-00-A-COFAC-DIFRA-2026
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO PARA SOLDADOS PROFESIONALES EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 EN PUERTO SALGAR – CUNDINAMARCA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO ALOJAMIENTO FAC 26
SUPERVISOR	CAPITAN ANDERSON VERA
INTERVENTOR	DBB INGENIERÍA S.A.S.

ÍTEM Nº	3.7	UND:	m³
DESCRIPCIÓN ÍTEM	CONCRETO CICLÓPEO DE 2500 PSI (60% CONCRETO Y 40% PIEDRA PEQUEÑA) SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS.		
MEMORIAS:	CORTE No. 1	FECHA :	12/09/2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Z1 (**A1**)	1.8	1.8	0.5	1.62	1.00	1.62
	Z1 (A4)	1.8	1.8	0.5	1.62	1.00	1.62
	Z1 (A5)	1.8	1.8	0.5	1.62	1.00	1.62
	Z1 (A8)	1.8	1.8	0.5	1.62	1.00	1.62
							0.00
	Z2 (B1)	2.0	2.0	0.5	2.00	1.00	2.00
	Z2 (**C1**)	2.0	2.0	0.5	2.00	1.00	2.00
	Z2 (**J1**)	2.0	2.0	0.5	2.00	1.00	2.00
	Z2 (A2)	2.0	2.0	0.5	2.00	1.00	2.00
	Z2 (D3)	2.0	2.0	0.5	2.00	1.00	2.00
	Z2 (D6)	2.0	2.0	0.5	2.00	1.00	2.00
	Z2 (A7)	2.0	2.0	0.5	2.00	1.00	2.00
	Z2 (B8)	2.0	2.0	0.5	2.00	1.00	2.00
	Z2 (C8)	2.0	2.0	0.5	2.00	1.00	2.00
	Z2 (J8)	2.0	2.0	0.5	2.00	1.00	2.00
	Z3 (**E1**)	2.3	2.3	0.5	2.65	1.00	2.65
	Z3 (**F1**)	2.3	2.3	0.5	2.65	1.00	2.65
	Z3 (**G1**)	2.3	2.3	0.5	2.65	1.00	2.65
	Z3 (**I1**)	2.3	2.3	0.5	2.65	1.00	2.65
	Z3 (**J2**)	2.3	2.3	0.5	2.65	1.00	2.65
	Z3 (J3)	2.3	2.3	0.5	2.65	1.00	2.65
	Z3 (-B4)	2.3	2.3	0.5	2.65	1.00	2.65
	Z3 (B5)	2.3	2.3	0.5	2.65	1.00	2.65
	Z3 (J6)	2.3	2.3	0.5	2.65	1.00	2.65
	Z3 (J7)	2.3	2.3	0.5	2.65	1.00	2.65
	Z3 (E8)	2.3	2.3	0.5	2.65	1.00	2.65
	Z3 (F8)	2.3	2.3	0.5	2.65	1.00	2.65
	Z3 (G8)	2.3	2.3	0.5	2.65	1.00	2.65
	Z3 (I8)	2.3	2.3	0.5	2.65	1.00	2.65
							0.00
	Z4 (B2)	2.3	2.3	0.5	2.65	1.00	2.65
	Z4 (**C2**)	2.3	2.3	0.5	2.65	1.00	2.65
	Z4 (**E2**)	2.3	2.3	0.5	2.65	1.00	2.65
	Z4 (**F2**)	2.3	2.3	0.5	2.65	1.00	2.65
	Z4 (**G2**)	2.3	2.3	0.5	2.65	1.00	2.65
	Z4 (**H2**)	2.3	2.3	0.5	2.65	1.00	2.65
	Z4 (**I2**)	2.3	2.3	0.5	2.65	1.00	2.65
	Z4 (B7)	2.3	2.3	0.5	2.65	1.00	2.65
	Z4 (B7)	2.3	2.3	0.5	2.65	1.00	2.65
	Z4 (C7)	2.3	2.3	0.5	2.65	1.00	2.65
	Z4 (E7)	2.3	2.3	0.5	2.65	1.00	2.65
	Z4 (F7)	2.3	2.3	0.5	2.65	1.00	2.65
	Z4 (G7)	2.3	2.3	0.5	2.65	1.00	2.65
	Z4 (H7)	2.3	2.3	0.5	2.65	1.00	2.65
							0.00
	Z5 (H8)	2.5	2.5	0.5	3.13	1.00	3.13
	Z5 (**H1**)	2.5	2.5	0.5	3.13	1.00	3.13
	Z6 (E3)	2.6	2.6	0.5	3.38	1.00	3.38
	Z6 (G3)	2.6	2.6	0.5	3.38	1.00	3.38
	Z6 (I3)	2.6	2.6	0.5	3.38	1.00	3.38
	Z6 (E6)	2.6	2.6	0.5	3.38	1.00	3.38
	Z6 (G6)	2.6	2.6	0.5	3.38	1.00	3.38
	Z7 (F3)	2.7	2.7	0.5	3.65	1.00	3.65
	Z7 (H3)	2.7	2.7	0.5	3.65	1.00	3.65
	Z7 (F6)	2.7	2.7	0.5	3.65	1.00	3.65
	Z7 (H6)	2.7	2.7	0.5	3.65	1.00	3.65
	Z7 (I6)	2.7	2.7	0.5	3.65	1.00	3.65
						TOTAL	141.92

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:








Elaboró:: EDGAR JEREZ T	VoBo:
EDGAR JEREZ TAMI Residente de Obra Firma y Posfirma	**YUDI ANGELA RENTERIA TRUJILLO** Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma
Revisó:	Autorizó:
ARIOLFO ANTONIO TOVAR PARDO Director de Obra Firma y Posfirma	**DONAL BOGOTÁ BAUTISTA** Director de Interventoría Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	035-00-A-COFAC-DIFRA-2026
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO PARA SOLDADOS PROFESIONALES EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 EN PUERTO SALGAR – CUNDINAMARCA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO ALOJAMIENTO FAC 26
SUPERVISOR	CAPITAN ANDERSON VERA
INTERVENTOR	DBB INGENIERÍA S.A.S.

ÍTEM Nº	3.8	UND:	m³
DESCRIPCIÓN ÍTEM	ZAPATA EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS. INCLUYE, MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO		
MEMORIAS:	CORTE No. 1	FECHA :	12/09/2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Z1 (**A1**)	1.8	1.8	0.4	1.30	1.00	1.30
	Z2 (B1)	2.0	2.0	0.4	1.60	1.00	1.60
	Z2 (**C1**)	2.0	2.0	0.4	1.60	1.00	1.60
	Z2 (**J1**)	2.0	2.0	0.4	1.60	1.00	1.60
	Z2 (J8)	2.0	2.0	0.4	1.60	1.00	1.60
	Z3 (**E1**)	2.3	2.3	0.4	2.12	1.00	2.12
	Z3 (**F1**)	2.3	2.3	0.4	2.12	1.00	2.12
	Z3 (**G1**)	2.3	2.3	0.4	2.12	1.00	2.12
	Z3 (**I1**)	2.3	2.3	0.4	2.12	1.00	2.12
	Z3 (**J2**)	2.3	2.3	0.4	2.12	1.00	2.12
	Z3 (J3)	2.3	2.3	0.4	2.12	1.00	2.12
	Z3 (J6)	2.3	2.3	0.4	2.12	1.00	2.12
	Z3 (J7)	2.3	2.3	0.4	2.12	1.00	2.12
	Z3 (I8)	2.3	2.3	0.4	2.12	1.00	2.12
	Z4 (**G2**)	2.3	2.3	0.4	2.12	1.00	2.12
	Z4 (**H2**)	2.3	2.3	0.4	2.12	1.00	2.12
	Z4 (**I2**)	2.3	2.3	0.4	2.12	1.00	2.12
	Z4 (I7)	2.3	2.3	0.4	2.12	1.00	2.12
	Z5 (**H1**)	2.5	2.5	0.4	2.50	1.00	2.50
	Z6 (I3)	2.6	2.6	0.4	2.70	1.00	2.70
	Z6 (G6)	2.6	2.6	0.4	2.70	1.00	2.70
		0.0	0.0				0.00
	Z7 (F3)	2.7	2.7	0.5	3.65	1.00	0.00
	Z7 (H3)	2.7	2.7	0.5	3.65	1.00	0.00
	Z7 (F6)	2.7	2.7	0.5	3.65	1.00	3.65
	Z7 (H6)	2.7	2.7	0.5	3.65	1.00	3.65
	Z7 (I6)	2.7	2.7	0.5	3.65	1.00	3.65
	Z8 (C4)	1.5	2.0	0.5	1.50	1.00	0.00
	Z8 (C5)	1.5	2.0	0.5	1.50	1.00	0.00
						TOTAL	54.05

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:







Elaboró::

EDGAR JEREZ

EDGAR JEREZ TAMI
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:

YUDI ANGELA RENTERIA TRUJILLO
Residente de Interventoría o Supervisor
Firma y Posfirma

Revisó:

ARIOLFO ANTONIO TOVAR PARDO
Director de Obra
Firma y Posfirma

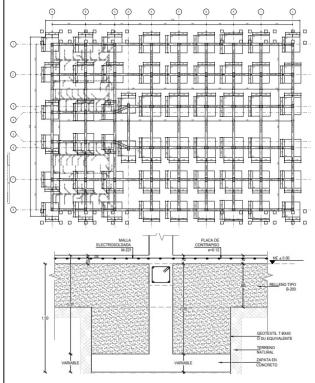
Autorizó:

DONAL BOGOTÁ BAUTISTA
Director de Interventoría
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	035-00-A-COFAC-DIFRA-2026
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO PARA SOLDADOS PROFESIONALES EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 EN PUERTO SALGAR – CUNDINAMARCA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO ALOJAMIENTO FAC 26
SUPERVISOR	CAPITAN ANDERSON VERA
INTERVENTOR	DBB INGENIERÍA S.A.S.

ÍTEM Nº	4.1.1	UND:	m³
DESCRIPCIÓN ÍTEM	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNA EN CONCRETO DE 4.000 PSI SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO		
MEMORIAS:	CORTE No. 1	FECHA :	10/08/2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	COLUMNA 0,4X 0,3 SON 15 G-1, A-5, J-7, E-8, G-8, J-2, H-8, I-8, J-3, J--8, E-1, H-1, I-1, A-2, A-7	0.4	0.3	0.8		9	0.864
	COLUMNA 0,4X 0,3 SON 11 F-8, C-1, J-1, J-6, C-8, B-8, A-8, F-1,A-4,A-1,B-1,	0.4	0.3	0.8		6	0.576
	COLUMNA 0,3X 0,5 SON 17 G-2, G-7, C-2, C-4, B-5, C-7, E-2, F-2, H-2, I-2, E-7,F-7, H-7,I-7,B-2,B-4, B-7	0.3	0.5	0.8		2	0.24
	COLUMNA 0,3X 0,5 SON 13 E-3, F-3, G-3, H-3, I-3, D-3, E-6, F-6, G-6,H-6, I-6, S-5, D-6	0.3	0.5	0.8		2	0.24
					TOTAL		1.92

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:








Elaboró:: EDGAR JEREZ T **EDGAR JEREZ TAMI** Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: **YUDI ANGELA RENTERIA TRUJILLO** Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma
Revisó: **ARIOLFO ANTONIO TOVAR PARDO** Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: **DONAL BOGOTÁ BAUTISTA** Director de Interventoría Firma y Posfirma

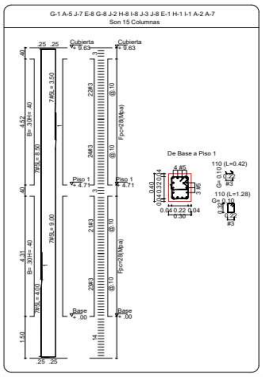
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

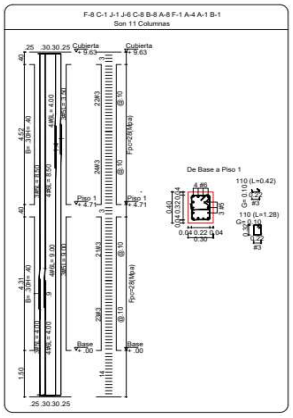
CONTRATO No.	035-00-A-COFAC-DIFRA-2026
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO PARA SOLDADOS PROFESIONALES EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 EN PUERTO SALGAR – CUNDINAMARCA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO ALOJAMIENTO FAC 26
SUPERVISOR	CAPITAN ANDERSON VERA
INTERVENTOR	DBB INGENIERÍA S.A.S.

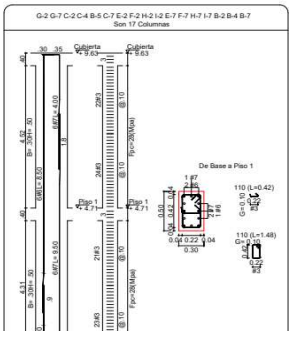
ÍTEM Nº	4.2.1	UND:	kg
DESCRIPCIÓN ÍTEM	ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420 MPA GR 60 -NTC 2289 INCLUYE ALAMBRE NEGRO . TRASIEGO, MANEJO		
MEMORIAS:	CORTE No. 1	FECHA :	12/09/2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	DESCRIPCION	DIAMETRO (P	LONGITUD (ml)	PESO (kg)	NUEMRO DE REPETICIONES	CANTIDADA DE ELEMENTOS	PESO TOTAL PARCIAL (KG)
	ZAPATAS Z1 (A-1, A-4, A-5, A-8)						
	LONGITUDINAL	,5/8"	2.22	1.55	9	1	30.97
	TRANSVERSAL	,5/8"	2.22	1.55	9	1	30.97
	ZAPATAS Z2 (B-1, C-1, A-2, J-1, B-8, C-8,A-7,J-8)						
	LONGITUDINAL	,5/8"	2.42	1.55	11	4	165.04
	TRANSVERSAL	,5/8"	2.42	1.55	11	4	165.04
	ZAPATAS Z3 (E-1,F-1, G-1, J-2, J-3, B-4, C-4, E-8, F-8, G-8, J-7, J-5, B-5, C-5)						
	LONGITUDINAL	,5/8"	2.72	1.55	12	8	404.74
	TRANSVERSAL	,5/8"	2.72	1.55	12	8	404.74
	ZAPATAS Z4 (B-2, C-2, E-2, F-2, G-2, H-2, I-2, B-8, C-7, E-7,F-7, G-7,H-7,I-7)						
	LONGITUDINAL	,5/8"	2.72	1.55	12	4	202.37
	TRANSVERSAL	,5/8"	2.72	1.55	12	4	202.37
	ZAPATAS Z5 (H-1, H-8)						
	LONGITUDINAL	,5/8"	2.92	1.55	12	2	108.62
	TRANSVERSAL	,5/8"	2.92	1.55	12	2	108.62
	ZAPATAS Z6 (E-3, G-3, I-3,E-6,G-6, I-6)						
	LONGITUDINAL	,5/8"	3.02	1.55	13	4	243.41
	TRANSVERSAL	,5/8"	3.02	1.55	13	4	243.41
	ZAPATAS Z7 (F-3, H-3, F-6-H-6)						
	LONGITUDINAL	,5/8"	3.12	1.55	13	1	62.87
	TRANSVERSAL	,5/8"	3.12	1.55	13	1	62.87
	COLUMNA 0,4X 0,3 SON 15 G-1, A-5, J-7, E-8, G-8, J-2, H-8, I-8, J-3, J--8, E-1, H-1, I-1, A-2, A-7						
	VERTICAL	,5/8"	4	1.55	7	9	390.6
	VERTICAL	,5/8"	8.5	1.55	7	9	830.03
	VERTICAL	,5/8"	9	1.55	7	9	878.85
	VERTICAL	,5/8"	3.5	1.55	7	9	341.78
	ESTRIBOS	,3/8"	1.28	0.56	14	9	90.32
	GANCHO	,3/8"	0.42	0.56	14	9	29.64
	COLUMNA 0,4X 0,3 SON 11 F-8, C-1, J-1, J-6, C-8, B-8, A-8, F-1,A-4,A-1,B-1,						
	VERTICAL	,5/8"	4	1.55	3	6	111.6
	VERTICAL	,5/8"	8.5	1.55	3	6	237.15
	VERTICAL	,5/8"	9	1.55	3	6	251.1
	VERTICAL	,5/8"	3.5	1.55	3	6	97.65
	VERTICAL	,3/4"	4	2.235	4	6	214.56
	VERTICAL	,3/4"	8.5	2.235	4	6	455.94
	VERTICAL	,3/4"	9	2.235	4	6	482.76
	VERTICAL	,3/4"	3.5	2.235	4	6	187.74
	ESTRIBOS	,3/8"	1.28	0.56	14	6	60.21
	GANCHO	,3/8"	0.42	0.56	14	6	19.76








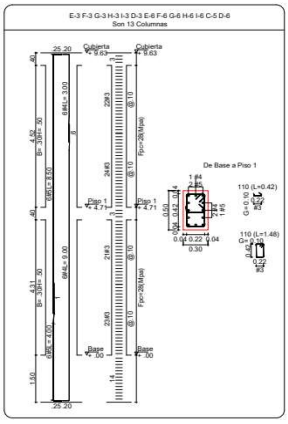


	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	035-00-A-COFAC-DIFRA-2026
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO PARA SOLDADOS PROFESIONALES EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 EN PUERTO SALGAR – CUNDINAMARCA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO ALOJAMIENTO FAC 26
SUPERVISOR	CAPITAN ANDERSON VERA
INTERVENTOR	DBB INGENIERIA S.A.S.

ÍTEM Nº	4.2.1	UND:	kg
DESCRIPCIÓN ÍTEM	ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420 MPA GR 60 -NTC 2289 INCLUYE ALAMBRE NEGRO . TRASIEGO, MANEJO		
MEMORIAS:	CORTE No. 1	FECHA :	12/09/2026





COLUMNA 0,3X 0,5 SON 17 G-2, G-7, C-2, C-4, B-5, C-7, E-2, F-2, H-2, I-2, E-7,F-7, H-7,I-7,B-2,B-4, B-7						
VERTICAL	.3/4	4	2.235	6	2	107.28
VERTICAL	.3/4	8.5	2.235	6	2	227.97
VERTICAL	,7/8"	9.5	3.042	6	2	346.79
VERTICAL	,7/8"	4	3.042	6	2	146.02
ESTRIBOS	,3/8"	1.48	0.56	14	2	23.21
GANCHO	,3/8"	0.42	0.56	14	2	6.59
COLUMNA 0,3X 0,5 SON 13 E-3, F-3, G-3, H-3, I-3, D-3, E-6, F-6, G-6,H-6, I-6, S-5, D-6						
VERTICAL	,5/8"	4	1.55	6	2	74.4
VERTICAL	,5/8"	8.5	1.55	6	2	158.1
VERTICAL	,1/2"	9	1	6	2	108
VERTICAL	,1/2"	3	1	6	2	36
ESTRIBOS	,3/8"	1.48	0.56	14	2	23.21
GANCHO	,3/8"	0.42	0.56	14	2	6.59
VIGAS AEREAS V-113 0,3X0,4 PISO 1						
LONGITUDINAL	,5/8"	9	1.55	2	1	27.9
LONGITUDINAL	,3/4"	9.1	2.235	2	1	40.68
LONGITUDINAL	,1/2"	8.9	1	4	1	35.6
ESTRIBOS	,3/8"	1.28	0.56	65	1	46.59
GANCHO	,3/8"	0.53	0.56	44	1	13.06
					TOTAL	8543.72

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:







Elaboró::

EDGAR JEREZ TAMI
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:

YUDI ANGELA RENTERIA TRUJILLO
Residente de Interventoría o Supervisor
Firma y Posfirma

Revisó:

ARIOLFO ANTONIO TOVAR PARDO
Director de Obra
Firma y Posfirma


Autorizó:

DONAL BOGOTA BAUTISTA
Director de Interventoría
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	035-00-A-COFAC-DIFRA-2026
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO PARA SOLDADOS PROFESIONALES EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 EN PUERTO SALGAR – CUNDINAMARCA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO ALOJAMIENTO FAC 26
SUPERVISOR	CAPITAN ANDERSON VERA
INTERVENTOR	DBB INGENIERÍA S.A.S.

ÍTEM Nº	6.1.7	UND:	ml
DESCRIPCIÓN ÍTEM	TUBERÍA NOVAFORT 8", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION		
MEMORIAS:	CORTE No. 1	FECHA :	10/08/2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	TUBERIA SANITARIA 8 DE LA CAJA 3 AL POZO EYECTOR		55.63		55.63	1	55.63
	TUBERIA SANITARIA 8 DE LA CAJA 3 LA CAJA 4		12.2		12.2	1	12.2
	TUBERIA SANITARIA 8 DE LA CAJA 3 LA CAJA 2		32		32	1	32
	TUBERIA SANITARIA 8 DE LA CAJA 2 LA CAJA 1		12		12	1	12
						TOTAL	111.83

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:








Elaboró:: EDGAR JEREZ **EDGAR JEREZ TAMI** Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: **YUDI ANGELA RENTERIA TRUJILLO** Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma
Revisó: **ARIOLFO ANTONIO TOVAR PARDO** Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: **DONAL BOGOTÁ BAUTISTA** Director de Interventoría Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	035-00-A-COFAC-DIFRA-2026
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO PARA SOLDADOS PROFESIONALES EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 EN PUERTO SALGAR – CUNDINAMARCA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO ALOJAMIENTO FAC 26
SUPERVISOR	CAPITAN ANDERSON VERA
INTERVENTOR	DBB INGENIERÍA S.A.S.

ÍTEM Nº	6.2.4	UND:	ml
DESCRIPCIÓN ÍTEM	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 1-1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		
MEMORIAS:	CORTE No. 1	FECHA :	12/09/2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	TUBERIA AGUA POTABLE DE LA SECTOR OCCIDENTAL		41		41	1	41
	TUBERIA AGUA POTABLE DE LA SECTOR NORTE		17.6		17.6	1	17.6
	TUBERIA AGUA POTABLE DE LA SECTOR SUR		19.8		19.8	1	19.8
						TOTAL	78.4

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:








Elaboró:: EDGAR JEREZ T.	VoBo:
EDGAR JEREZ TAMI Residente de Obra Firma y Posfirma	**YUDI ANGELA RENTERIA TRUJILLO** Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma
Revisó:	Autorizó:
ARIOLFO ANTONIO TOVAR PARDO Director de Obra Firma y Posfirma	**DONAL BOGOTÁ BAUTISTA** Director de Interventoría Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	035-00-A-COFAC-DIFRA-2026
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO PARA SOLDADOS PROFESIONALES EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 EN PUERTO SALGAR – CUNDINAMARCA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO ALOJAMIENTO FAC 26
SUPERVISOR	CAPITAN ANDERSON VERA
INTERVENTOR	DBB INGENIERIA S.A.S.

ÍTEM Nº	6.2.6	UND:	ml
DESCRIPCIÓN ÍTEM	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		
MEMORIAS:	CORTE No. 1	FECHA :	12/09/2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	TUBERIA AGUA POTABLE DE LA SECTOR OCCIDENTAL		41		41	1	41
	TUBERIA AGUA POTABLE DE LA SECTOR NORTE		17.6		17.6	1	17.6
	TUBERIA AGUA POTABLE DE LA SECTOR SUR		19.8		19.8	1	19.8
						TOTAL	78.4

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:








Elaboró:: EDGAR JEREZ T **EDGAR JEREZ TAMI** Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: **YUDI ANGELA RENTERIA TRUJILLO** Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma
Revisó: **ARIOLFO ANTONIO TOVAR PARDO** Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: **DONAL BOGOTÁ BAUTISTA** Director de Interventoría Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	035-00-A-COFAC-DIFRA-2026
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO PARA SOLDADOS PROFESIONALES EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 EN PUERTO SALGAR – CUNDINAMARCA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO ALOJAMIENTO FAC 26
SUPERVISOR	CAPITAN ANDERSON VERA
INTERVENTOR	DBB INGENIERÍA S.A.S.

ÍTEM Nº	6.2.15	UND:	un
DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALVULA DE CHEQUE COTRINA Ø 4"		
MEMORIAS:	CORTE No. 1	FECHA :	12/09/2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	TUBERIA AGUA POTABLE DE LA SECTOR SUR					1	1
						TOTAL	1

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:








Elaboró:: EDGAR JEREZ T **EDGAR JEREZ TAMI** Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: **YUDI ANGELA RENTERIA TRUJILLO** Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma
Revisó: **ARIOLFO ANTONIO TOVAR PARDO** Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: **DONAL BOGOTA BAUTISTA** Director de Interventoría Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	035-00-A-COFAC-DIFRA-2026
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO PARA SOLDADOS PROFESIONALES EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 EN PUERTO SALGAR – CUNDINAMARCA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO ALOJAMIENTO FAC 26
SUPERVISOR	CAPITAN ANDERSON VERA
INTERVENTOR	DBB INGENIERÍA S.A.S.

ÍTEM Nº	6.2.16	UND:	un
DESCRIPCIÓN ÍTEM	CONEXIÓN A RED HIDRÁULICA EXISTENTE Ø 4" .		
MEMORIAS:	CORTE No. 1	FECHA :	10/08/2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	CONEXIÓN RED HIDRAULICA 4"					1	1
						TOTAL	1

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:








Elaboró:: EDGAR JEREZ T **EDGAR JEREZ TAMI** Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: **YUDI ANGELA RENTERIA TRUJILLO** Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma
Revisó: **ARIOLFO ANTONIO TOVAR PARDO** Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: **DONAL BOGOTA BAUTISTA** Director de Interventoría Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	035-00-A-COFAC-DIFRA-2026
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO PARA SOLDADOS PROFESIONALES EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 EN PUERTO SALGAR – CUNDINAMARCA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO ALOJAMIENTO FAC 26
SUPERVISOR	CAPITAN ANDERSON VERA
INTERVENTOR	DBB INGENIERIA S.A.S.

ÍTEM Nº	7.1.4	UND:	un
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DESINSTALACIÓN Y RETRO TABLERO Y CABLEADO EN BAJA TENSIÓN EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE TODOS LOS CIRCUITOS EN LA TRAYECTORIA Y ENTREGA A GRUPO DE APOYO O SUPERVISOR.		
MEMORIAS:	CORTE No. 1	FECHA :	10/08/2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	DESINSTALACIÓN Y RETRO TABLERO Y CABLEADO EN BAJA TENSIÓN EXISTENTE					1	1
						TOTAL	1

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:




Elaboró:: EDGAR JEREZ **EDGAR JEREZ TAMI** Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: **YUDI ANGELA RENTERIA TRUJILLO** Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma
Revisó: **ARIOLFO ANTONIO TOVAR PARDO** Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: **DONAL BOGOTÁ BAUTISTA** Director de Interventoría Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	035-00-A-COFAC-DIFRA-2026
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO PARA SOLDADOS PROFESIONALES EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 EN PUERTO SALGAR – CUNDINAMARCA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO ALOJAMIENTO FAC 26
SUPERVISOR	CAPITAN ANDERSON VERA
INTERVENTOR	DBB INGENIERÍA S.A.S.

ÍTEM Nº	7.1.5	UND:	glb
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DESMONTE Y RETIRO DE TABLEROS Y SALIDAS ELÉCTRICAS EN EL SITIO A INTERVENIR (TOMACORRIENTES, LUMINARIAS, INTERRUPTORES, ETC)		
MEMORIAS:	CORTE No. 1	FECHA :	12/09/2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	RETIRO DE TBLEROS ELECTRICOS					1	1
						TOTAL	1

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:



Elaboró:: EDGAR JEREZ T **EDGAR JEREZ TAMI** Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: **YUDI ANGELA RENTERIA TRUJILLO** Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma
Revisó: **ARIOLFO ANTONIO TOVAR PARDO** Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: **DONAL BOGOTÁ BAUTISTA** Director de Interventoría Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	035-00-A-COFAC-DIFRA-2026
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO PARA SOLDADOS PROFESIONALES EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 EN PUERTO SALGAR – CUNDINAMARCA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO ALOJAMIENTO FAC 26
SUPERVISOR	CAPITAN ANDERSON VERA
INTERVENTOR	DBB INGENIERÍA S.A.S.

ÍTEM Nº	23.7	UND:	un
DESCRIPCIÓN ÍTEM	TALA DE ÁRBOLES PORTE MEDIO Y ALTO, INCLUYE PICADO DE MATERIAL, DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL Y COMPENSACION.		
MEMORIAS:	CORTE No. 1	FECHA :	12/09/2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	TALA DE ARBOLES					20	20
						TOTAL	20

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:






Elaboró:: EDGAR JEREZ T **EDGAR JEREZ TAMI** Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: **YUDI ANGELA RENTERIA TRUJILLO** Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma
Revisó: **ARIOLFO ANTONIO TOVAR PARDO** Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: **DONAL BOGOTA BAUTISTA** Director de Interventoría Firma y Posfirma

ANEXO 3.B

INGENIERÍA
CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 033-00-A-COFAC-DIFRA-2026

Formato Corte Parcial - Final de Obra (GA-JELOG-FR-101)

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-101
	FORMATO CORTE PARCIAL - FINAL DE OBRA	Versión No.	6
		Vigencia	20/12/2024

CONTRATO No.	035-00-A-COFAC-DIFRA-2026
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALOJAMIENTO PARA SOLDADOS PROFESIONALES EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 EN
CONTRATISTA	CONSORCIO ALOJAMIENTO FAC 26
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	DBB INGENIERIA SAS
FECHA DE CORTE	12/09/2026
CORTE DE OBRA No.	CORTE No. 1

OBRA

No.ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			BALANCE A LA FECHA			OBRA EJECUTADA			OBRA POR EJECUTAR		
									PRESENTE CORTE (Del 22 de julio al 10 de septiembre del 2026)			SALDO		
			CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR	MAYORES (+) Y MENORES(-) CANTIDADES	CANTIDAD REAL	VALOR REAL	CANTIDAD	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANT	VALOR TOTAL	% POR EJECUTAR
1	**PRELIMINARES**					-	-	$ -	-	$ -		-	$ -	
1.1	DESCAPOTE H= 0.20 MTS, INCLUYE RETIRO DE	m²	1,123.73	$ 17,486.00	$ 19,649,543.00	153.44	1,277.17	$ 22,332,595.00	1,277.17	$ 22,332,595.00	113.65%	-	$ -	0.00%
1.2	CAMPAMENTO DE 72 M2	un	1.00	$ 14,468,757.00	$ 14,468,757.00	-	1.00	$ 14,468,757.00	1.00	$ 14,468,757.00	100.00%	-	$ -	0.00%
1.3	DEMOLICIÓN ANDÉN ESPESOR HASTA 25 CM,	m²	137.03	$ 43,444.00	$ 5,953,131.00	- 71.76	65.27	$ 2,835,590.00	65.27	$ 2,835,590.00	47.63%	-	$ -	0.00%
1.4	DEMOLICION DE CAJAS DE INSPECCION,	un	2.00	$ 37,430.00	$ 74,860.00	3.00	5.00	$ 187,150.00	3.00	$ 112,290.00	150.00%	2.00	$ 74,860.00	40.00%
1.5	DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO	m²	578.00	$ 22,381.00	$ 12,936,218.00	199.25	777.25	$ 17,395,632.00	749.22	$ 16,768,293.00	129.62%	28.03	$ 627,339.00	3.61%
1.6	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y	un	14.00	$ 13,573.00	$ 190,022.00	-	14.00	$ 190,022.00	14.00	$ 190,022.00	100.00%	-	$ -	0.00%
1.7	DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y	m²	206.00	$ 22,595.00	$ 4,654,570.00	- 206.00	-	$ -	-	$ -	0.00%	-	$ -	
1.8	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE	m²	293.00	$ 11,075.00	$ 3,244,975.00	42.49	335.49	$ 3,715,552.00	335.49	$ 3,715,552.00	114.50%	-	$ -	0.00%
1.9	DESMONTE DE VENTANERIA, INCLUYE VIDRIO Y	m²	94.00	$ 10,509.00	$ 987,846.00	- 94.00	-	$ -	-	$ -	0.00%	-	$ -	
1.10	DESMONTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE CUBIERTA	m²	331.00	$ 34,809.00	$ 11,521,779.00	273.94	604.94	$ 21,057,356.00	604.94	$ 21,057,356.00	182.76%	-	$ -	0.00%
1.11	DEMOLICIÓN PLACA EN CONCRETO ESPESOR	m²	600.00	$ 21,620.00	$ 12,972,000.00	- 93.79	506.21	$ 10,944,260.00	506.21	$ 10,944,260.00	84.37%	-	$ -	0.00%
1.12	DESVÍO INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	glb	1.00	$ 1,037,519.00	$ 1,037,519.00	-	1.00	$ 1,037,519.00	1.00	$ 1,037,519.00	100.00%	-	$ -	0.00%
2	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**					-	-	$ -	-			-	$ -	
2.1	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO	m³	279.28	$ 101,053.00	$ 28,222,082.00	-	279.28	$ 28,222,082.00	277.73	$ 28,065,450.00	99.45%	1.55	$ 156,632.00	0.55%
2.2	EXCAVACION MECANICA , INCLUYE CARGUE,	m³	710.00	$ 61,806.00	$ 43,882,260.00	-	710.00	$ 43,882,260.00	692.10	$ 42,775,933.00	97.48%	17.90	$ 1,106,327.00	2.52%
2.3	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO	m³	398.00	$ 66,435.00	$ 26,441,130.00	-	398.00	$ 26,441,130.00	93.01	$ 6,179,119.00	23.37%	304.99	$ 20,262,011.00	76.63%
2.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE	m³	217.00	$ 23,267.00	$ 5,048,939.00	-	217.00	$ 5,048,939.00	57.82	$ 1,345,298.00	26.65%	159.18	$ 3,703,641.00	73.35%
2.5	TRANSPORTE DE MATERIAL/SOBRANTE U OTRO	m³	153.00	$ 62,880.00	$ 9,620,640.00	-	153.00	$ 9,620,640.00	51.19	$ 3,218,827.00	33.46%	101.81	$ 6,401,813.00	66.54%
2.6	CIMENTACION Y ATRAQUE DE TUBERIA.	m³	81.00	$ 233,250.00	$ 18,893,250.00	-	81.00	$ 18,893,250.00	35.97	$ 8,390,003.00	44.41%	45.03	$ 10,503,247.00	55.59%
3	**CIMENTACION**					-	-	$ -	-			-	$ -	
3.1	COMPACTACIÓN DE CAPA SUBRASANTE HASTA	m²	1,238.75	$ 15,541.00	$ 19,251,414.00	-	1,238.75	$ 19,251,414.00	-	$ -	0.00%	1,238.75	$ 19,251,414.00	100.00%
3.2	RELLENO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR	m³	950.00	$ 126,766.00	$ 120,427,700.00	-	950.00	$ 120,427,700.00	-	$ -	0.00%	950.00	$ 120,427,700.00	100.00%
3.3	SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO DE 2.000	m²	420.00	$ 33,376.00	$ 14,017,920.00	-	420.00	$ 14,017,920.00	-	$ -	0.00%	420.00	$ 14,017,920.00	100.00%
3.4	GEOTEXTIL NT2500 O SIMILAR	m²	1,750.00	$ 9,410.00	$ 16,467,500.00	-	1,750.00	$ 16,467,500.00	1,516.94	$ 14,274,405.00	86.68%	233.06	$ 2,193,095.00	13.32%
3.5	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3.000	m²	640.00	$ 167,043.00	$ 106,907,520.00	-	640.00	$ 106,907,520.00	-	$ -	0.00%	640.00	$ 106,907,520.00	100.00%
3.6	VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE	m³	38.00	$ 1,169,739.00	$ 44,450,082.00	-	38.00	$ 44,450,082.00	-	$ -	0.00%	38.00	$ 44,450,082.00	100.00%
3.7	CONCRETO CICLÓPEO DE 2500 PSI (60%	m³	150.00	$ 635,447.00	$ 95,317,050.00	- 5.08	144.92	$ 92,088,979.00	141.92	$ 90,179,461.00	94.61%	3.01	$ 1,909,518.00	2.07%
3.8	ZAPATA EN CONCRETO DE 4.000 PSI	m³	97.00	$ 1,197,152.00	$ 116,123,744.00	18.93	115.93	$ 138,785,831.00	54.05	$ 64,702,474.00	55.72%	61.88	$ 74,083,357.00	53.38%
4	**ESTRUCTURA**					-	-	$ -	-			-	$ -	
4.1	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**					-	-	$ -	-			-	$ -	
4.1.1	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNA EN CONCRETO	m³	84.00	$ 1,464,247.00	$ 122,996,748.00	-	84.00	$ 122,996,748.00	1.92	$ 2,811,354.00	2.29%	82.08	$ 120,185,394.00	97.71%
4.1.2	CONSTRUCCIÓN DE VIGAS AEREAS EN	m³	85.00	$ 1,402,574.00	$ 119,218,790.00	-	85.00	$ 119,218,790.00	-	$ -	0.00%	85.00	$ 119,218,790.00	100.00%
4.1.3	CONSTRUCCION DE PLACA DE ENTREPISO	m²	650.00	$ 204,684.00	$ 133,044,600.00	-	650.00	$ 133,044,600.00	-	$ -	0.00%	650.00	$ 133,044,600.00	100.00%
4.1.4	PLACA DE MACIZA SOBRE TERRENO EN	m²	53.00	$ 233,035.00	$ 12,350,855.00	-	53.00	$ 12,350,855.00	-	$ -	0.00%	53.00	$ 12,350,855.00	100.00%
4.1.5	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO	m²	27.00	$ 325,233.00	$ 8,781,291.00	-	27.00	$ 8,781,291.00	-	$ -	0.00%	27.00	$ 8,781,291.00	100.00%
4.1.6	MURO EN CONCRETO DE 4.000 PSI	m³	23.00	$ 1,438,071.00	$ 33,075,633.00	-	23.00	$ 33,075,633.00	-	$ -	0.00%	23.00	$ 33,075,633.00	100.00%
4.1.7	BANDA TERMOPLASTICA DE CLORURO DE	ml	26.00	$ 85,023.00	$ 2,210,598.00	-	26.00	$ 2,210,598.00	-	$ -	0.00%	26.00	$ 2,210,598.00	100.00%
4.1.8	CARCAMO EN CONCRETO DE 3.000 PSI 40cm x	ml	121.00	$ 136,605.00	$ 16,529,205.00	-	121.00	$ 16,529,205.00	-	$ -	0.00%	121.00	$ 16,529,205.00	100.00%
4.1.9	PEDESTAL EN CONCRETO DE 3.000 PSI SEGÚN	m³	3.00	$ 1,143,587.00	$ 3,430,761.00	-	3.00	$ 3,430,761.00	-	$ -	0.00%	3.00	$ 3,430,761.00	100.00%
4.2	**ACERO DE REFUERZO - ANCLAJES**					-		$ -	-			-	$ -	
4.2.1	ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420	kg	62,000.00	$ 8,230.00	$ 510,260,000.00	-	62,000.00	$ 510,260,000.00	8,543.72	$ 70,314,816.00	13.78%	53,456.28	$ 439,945,184.00	86.22%
4.2.2	MALLA ELECTROSOLDADA FY 485 MPA -NTC	kg	4,500.00	$ 8,052.00	$ 36,234,000.00	-	4,500.00	$ 36,234,000.00	-	$ -	0.00%	4,500.00	$ 36,234,000.00	100.00%
4.2.3	ESCALERA METALICA EN PERFILES METALICOS	kg	3,700.00	$ 12,604.00	$ 46,634,800.00	-	3,700.00	$ 46,634,800.00	-	$ -	0.00%	3,700.00	$ 46,634,800.00	100.00%
5	**MAMPOSTERIA**					-	-	$ -	-	$ -		-	$ -	
5.1	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO.5	m²	1,948.00	$ 170,931.00	$ 332,973,588.00	-	1,948.00	$ 332,973,588.00	-	$ -	0.00%	1,948.00	$ 332,973,588.00	100.00%
5.2	DINTELES EN CONCRETO DE 3.000 PSI 10 CM X	ML	784.00	$ 69,322.00	$ 54,348,448.00	-	784.00	$ 54,348,448.00	-	$ -	0.00%	784.00	$ 54,348,448.00	100.00%
6	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**					-	-	$ -	-	$ -		-	$ -	
6.1	**INSTALACIONES SANITARIAS**					-	-	$ -	-	$ -		-	$ -	
6.1.1	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2", INCLUYE	ml	149.00	$ 31,247.00	$ 4,655,803.00	-	149.00	$ 4,655,803.00	-	$ -	0.00%	149.00	$ 4,655,803.00	100.00%
6.1.2	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 3", INCLUYE	ml	124.00	$ 45,747.00	$ 5,672,628.00	-	124.00	$ 5,672,628.00	-	$ -	0.00%	124.00	$ 5,672,628.00	100.00%
6.1.3	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4", INCLUYE	ml	111.00	$ 79,300.00	$ 8,802,300.00	-	111.00	$ 8,802,300.00	-	$ -	0.00%	111.00	$ 8,802,300.00	100.00%
6.1.4	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 6", INCLUYE	ml	103.00	$ 74,631.00	$ 7,686,993.00	-	103.00	$ 7,686,993.00	-	$ -	0.00%	103.00	$ 7,686,993.00	100.00%
6.1.5	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 8", INCLUYE	ml	12.00	$ 285,955.00	$ 3,431,460.00	-	12.00	$ 3,431,460.00	-	$ -	0.00%	12.00	$ 3,431,460.00	100.00%
6.1.6	BAJANTE PVC AGUAS NEGRAS Ø 6" (INCLUYE	ml	9.00	$ 128,970.00	$ 1,160,730.00	-	9.00	$ 1,160,730.00	-	$ -	0.00%	9.00	$ 1,160,730.00	100.00%
6.1.7	TUBERÍA NOVAFORT 8", INCLUYE ACCESORIOS	ml	304.00	$ 142,174.00	$ 43,220,896.00	-	304.00	$ 43,220,896.00	111.83	$ 15,899,318.00	36.79%	192.17	$ 27,321,578.00	63.21%
6.1.8	PUNTO SANITARIO Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS	un	64.00	$ 72,704.00	$ 4,653,056.00	-	64.00	$ 4,653,056.00	-	$ -	0.00%	64.00	$ 4,653,056.00	100.00%
6.1.9	PUNTO SANITARIO Ø 4" , INCLUYE ACCESORIOS	un	32.00	$ 82,168.00	$ 2,629,376.00	-	32.00	$ 2,629,376.00	-	$ -	0.00%	32.00	$ 2,629,376.00	100.00%
6.1.10	SIFÓN Ø 4X3" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU	un	68.00	$ 117,396.00	$ 7,982,928.00	-	68.00	$ 7,982,928.00	-	$ -	0.00%	68.00	$ 7,982,928.00	100.00%
6.1.11	TAPÓN DE INSPECCIÓN PVC Ø 4" INCLUYE	un	2.00	$ 30,469.00	$ 60,938.00	-	2.00	$ 60,938.00	-	$ -	0.00%	2.00	$ 60,938.00	100.00%
6.1.12	TAPÓN NO INSPECCIONABLE PVC Ø 4" INCLUYE	un	6.00	$ 15,016.00	$ 90,096.00	-	6.00	$ 90,096.00	-	$ -	0.00%	6.00	$ 90,096.00	100.00%
6.1.13	TAPÓN DE INSPECCIÓN PVC Ø 6" INLCUYE	un	6.00	$ 33,937.00	$ 203,622.00	-	6.00	$ 203,622.00	-	$ -	0.00%	6.00	$ 203,622.00	100.00%
6.1.14	TAPÓN NO INSPECCIONABLE PVC Ø 6" INCLUYE	un	6.00	$ 28,403.00	$ 170,418.00	-	6.00	$ 170,418.00	-	$ -	0.00%	6.00	$ 170,418.00	100.00%
6.1.15	TUBERÍA DE VENTILACIÓN Ø 2", INCLUYE	ml	267.00	$ 32,394.00	$ 8,649,198.00	-	267.00	$ 8,649,198.00	-	$ -	0.00%	267.00	$ 8,649,198.00	100.00%
6.1.16	TUBERÍA DE VENTILACIÓN Ø 3", INCLUYE	ml	81.00	$ 35,768.00	$ 2,897,208.00	-	81.00	$ 2,897,208.00	-	$ -	0.00%	81.00	$ 2,897,208.00	100.00%
6.1.17	CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO	un	1.00	$ 146,605.00	$ 146,605.00	-	1.00	$ 146,605.00	-	$ -	0.00%	1.00	$ 146,605.00	100.00%
6.1.18	CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 X 0.60 MTS. (0,0 a 1 m)	un	7.00	$ 716,054.00	$ 5,012,378.00	-	7.00	$ 5,012,378.00	-	$ -	0.00%	7.00	$ 5,012,378.00	100.00%
6.1.19	POZO EYECTOR EN CONCRETO CONCRETO DE	m	1.00	$ 8,605,490.00	$ 8,605,490.00	-	1.00	$ 8,605,490.00	-	$ -	0.00%	1.00	$ 8,605,490.00	100.00%
6.1.20	SOPORTE TUBERÍA COLGANTE Ø 2"INCLUYE	un	133.00	$ 15,991.00	$ 2,126,803.00	-	133.00	$ 2,126,803.00	-	$ -	0.00%	133.00	$ 2,126,803.00	100.00%
6.1.21	SOPORTE TUBERÍA COLGANTE Ø 3" INCLUYE	un	72.00	$ 30,624.00	$ 2,204,928.00	-	72.00	$ 2,204,928.00	-	$ -	0.00%	72.00	$ 2,204,928.00	100.00%
6.1.22	SOPORTE TUBERÍA COLGANTE Ø 4" INCLUYE	un	35.00	$ 43,405.00	$ 1,519,175.00	-	35.00	$ 1,519,175.00	-	$ -	0.00%	35.00	$ 1,519,175.00	100.00%
6.1.23	SOPORTE TUBERÍA COLGANTE Ø 6" INCLUYE	un	43.00	$ 69,561.00	$ 2,991,123.00	-	43.00	$ 2,991,123.00	-	$ -	0.00%	43.00	$ 2,991,123.00	100.00%
6.1.24	PASO PLASTICO POZO EYECTOR	un	13.00	$ 138,823.00	$ 1,804,699.00	-	13.00	$ 1,804,699.00	-	$ -	0.00%	13.00	$ 1,804,699.00	100.00%
6.1.25	ENTIBADO TIPO 2	m²	23.00	$ 34,474.00	$ 792,902.00	-	23.00	$ 792,902.00	-	$ -	0.00%	23.00	$ 792,902.00	100.00%
6.2	**INSTALACIÓN HIDRAULICA**					-		$ -	-	$ -		-	$ -	
6.2.1	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2", INCLUYE	ml	222.00	$ 14,772.00	$ 3,279,384.00	-	222.00	$ 3,279,384.00	-	$ -	0.00%	222.00	$ 3,279,384.00	100.00%
6.2.2	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 3/4", INCLUYE	ml	126.00	$ 12,644.00	$ 1,593,144.00	-	126.00	$ 1,593,144.00	-	$ -	0.00%	126.00	$ 1,593,144.00	100.00%
6.2.3	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 1", INCLUYE	ml	157.00	$ 15,878.00	$ 2,492,846.00	-	157.00	$ 2,492,846.00	-	$ -	0.00%	157.00	$ 2,492,846.00	100.00%
6.2.4	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 1-1/2",	ml	50.00	$ 29,871.00	$ 1,493,550.00	79.00	129.00	$ 3,853,359.00	78.40	$ 2,341,886.00	156.80%	50.60	$ 1,511,473.00	39.22%
6.2.5	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 2", INCLUYE	ml	67.00	$ 44,289.00	$ 2,967,363.00	-	67.00	$ 2,967,363.00	-	$ -	0.00%	67.00	$ 2,967,363.00	100.00%
6.2.6	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 4", INCLUYE	ml	75.00	$ 107,031.00	$ 8,027,325.00	79.00	154.00	$ 16,482,774.00	78.40	$ 8,391,230.00	104.53%	75.60	$ 8,091,544.00	49.09%
6.2.7	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2" , INCLUYE	un	148.00	$ 20,516.00	$ 3,036,368.00	-	148.00	$ 3,036,368.00	-	$ -	0.00%	148.00	$ 3,036,368.00	100.00%
6.2.8	REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 1"	un	8.00	$ 177,454.00	$ 1,419,632.00	-	8.00	$ 1,419,632.00	-	$ -	0.00%	8.00	$ 1,419,632.00	100.00%
6.2.9	REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 1-	un	4.00	$ 545,875.00	$ 2,183,500.00	-	4.00	$ 2,183,500.00	-	$ -	0.00%	4.00	$ 2,183,500.00	100.00%
6.2.10	REGISTRO DE 1 1/2" PARA EXTERIOR INCLUYE	un	1.00	$ 649,547.00	$ 649,547.00	-	1.00	$ 649,547.00	-	$ -	0.00%	1.00	$ 649,547.00	100.00%
6.2.11	REGISTRO DE 2" PARA EXTERIOR INCLUYE TAPA	un	3.00	$ 757,358.00	$ 2,272,074.00	-	3.00	$ 2,272,074.00	-	$ -	0.00%	3.00	$ 2,272,074.00	100.00%
6.2.12	REGISTRO DE 4" PARA EXTERIOR INCLUYE TAPA	un	1.00	$ 1,793,275.00	$ 1,793,275.00	-	1.00	$ 1,793,275.00	-	$ -	0.00%	1.00	$ 1,793,275.00	100.00%
6.2.13	VALVULA DE CHEQUE CORTINA Ø 1 1/2"	un	1.00	$ 119,124.00	$ 119,124.00	-	1.00	$ 119,124.00	-	$ -	0.00%	1.00	$ 119,124.00	100.00%
6.2.14	VALVULA DE CHEQUE CORTINA Ø 2"	un	3.00	$ 641,764.00	$ 1,925,292.00	-	3.00	$ 1,925,292.00	-	$ -	0.00%	3.00	$ 1,925,292.00	100.00%
6.2.15	VALVULA DE CHEQUE COTRINA Ø 4"	un	1.00	$ 2,956,868.00	$ 2,956,868.00	-	1.00	$ 2,956,868.00	1.00	$ 2,956,868.00	100.00%	-	$ -	0.00%
6.2.16	CONEXIÓN A RED HIDRÁULICA EXISTENTE Ø 4" .	un	1.00	$ 344,647.00	$ 344,647.00	1.00	2.00	$ 689,294.00	1.00	$ 344,647.00	100.00%	1.00	$ 344,647.00	50.00%
6.2.17	DESINFECCIÓN RED HIDRÁULICA	ml	696.00	$ 6,843.00	$ 4,762,728.00	-	696.00	$ 4,762,728.00	-	$ -	0.00%	696.00	$ 4,762,728.00	100.00%
6.2.18	IMPERMEABILIZACIÓN CON MORTERO FLEXIBLE	m²	63.00	$ 152,654.00	$ 9,617,202.00	-	63.00	$ 9,617,202.00	-	$ -	0.00%	63.00	$ 9,617,202.00	100.00%
6.2.19	SOPORTE TUBERÍA COLGANTE Ø 3/4"	un	47.00	$ 13,069.00	$ 614,243.00	-	47.00	$ 614,243.00	-	$ -	0.00%	47.00	$ 614,243.00	100.00%
6.2.20	SOPORTE TUBERÍA COLGANTE Ø 1"	un	64.00	$ 13,539.00	$ 866,496.00	-	64.00	$ 866,496.00	-	$ -	0.00%	64.00	$ 866,496.00	100.00%
6.2.21	SOPORTE TUBERÍA COLGANTE Ø 1 1/2"	un	13.00	$ 17,066.00	$ 221,858.00	-	13.00	$ 221,858.00	-	$ -	0.00%	13.00	$ 221,858.00	100.00%

OBRA

No.ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			BALANCE A LA FECHA			OBRA EJECUTADA			OBRA POR EJECUTAR		
									PRESENTE CORTE (Del 22 de julio al 10 de septiembre del 2026)			SALDO		
			CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR	MAYORES (+) Y MENORES(-) CANTIDADES	CANTIDAD REAL	VALOR REAL	CANTIDAD	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANT	VALOR TOTAL	% POR EJECUTAR
6.2.22	TAPA EN LÁMINA ALFAJOR CALIBRE 18 DE 1.20 X	un	2.00	$ 691,065.00	$ 1,382,130.00	-	2.00	$ 1,382,130.00	-	$ -	0.00%	2.00	$ 1,382,130.00	100.00%
6.2.23	PASO PLASTICO PARA TANQUE Y CUARTO DE	un	17.00	$ 138,823.00	$ 2,359,991.00	-	17.00	$ 2,359,991.00	-	$ -	0.00%	17.00	$ 2,359,991.00	100.00%
6.3	**INFRAESTRUCTURA AGUAS LLUVIAS**					-		$ -	-	$ -		-	$ -	
6.3.1	REJILLA PARA CÁRCAMO TRAFICO LIVIANO DE	ml	151.00	$ 76,016.00	$ 11,478,416.00	-	151.00	$ 11,478,416.00	-	$ -	0.00%	151.00	$ 11,478,416.00	100.00%
6.4	**INSTALACIÓN DE EQUIPOS HIDRAULICOS**					-		$ -	-	$ -		-	$ -	
6.4.1	INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE	un	1.00	$ 11,740,165.00	$ 11,740,165.00	-	1.00	$ 11,740,165.00	-	$ -	0.00%	1.00	$ 11,740,165.00	100.00%
6.4.2	INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE	un	1.00	$ 730,619.00	$ 730,619.00	-	1.00	$ 730,619.00	-	$ -	0.00%	1.00	$ 730,619.00	100.00%
6.4.3	INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE	un	1.00	$ 931,066.00	$ 931,066.00	-	1.00	$ 931,066.00	-	$ -	0.00%	1.00	$ 931,066.00	100.00%
7	**INSTALACIONES ELECTRICAS**					-	-	$ -	-	$ -		-	$ -	
7.1	**PRELIMINARES**					-	-	$ -	-	$ -		-	$ -	
7.1.1	EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN EN	m³	93.00	$ 63,496.00	$ 5,905,128.00	-	93.00	$ 5,905,128.00	-	$ -	0.00%	93.00	$ 5,905,128.00	100.00%
7.1.2	EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN EN	m³	17.00	$ 141,648.00	$ 2,408,016.00	-	17.00	$ 2,408,016.00	-	$ -	0.00%	17.00	$ 2,408,016.00	100.00%
7.1.3	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA MEDIA Y	un	7.00	$ 2,309,668.00	$ 16,167,676.00	-	7.00	$ 16,167,676.00	-	$ -	0.00%	7.00	$ 16,167,676.00	100.00%
7.1.4	DESINSTALACIÓN Y RETIRO TABLERO Y	un	1.00	$ 55,178.00	$ 55,178.00	-	1.00	$ 55,178.00	1.00	$ 55,178.00	100.00%	-	$ -	0.00%
7.1.5	DESMONTE Y RETIRO DE TABLEROS Y SALIDAS	glb	1.00	$ 500,228.00	$ 500,228.00	-	1.00	$ 500,228.00	1.00	$ 500,228.00	100.00%	-	$ -	0.00%
7.1.6	INSTALACIÓN DE CIRCUITOS EXISTENTES EN	glb	1.00	$ 979,896.00	$ 979,896.00	-	1.00	$ 979,896.00	-	$ -	0.00%	1.00	$ 979,896.00	100.00%
7.1.7	PEDESTAL PARA SOPORTAR TABLEROS	un	1.00	$ 463,156.00	$ 463,156.00	-	1.00	$ 463,156.00	-	$ -	0.00%	1.00	$ 463,156.00	100.00%
7.2	**BANCO DE DUCTERÍAS INTERNAS-EXTERNAS**					-		$ -	-	$ -		-	$ -	
7.2.1	BANCO DE DUCTOS PVC - TDP DE 1XØ1"	ml	5.00	$ 27,982.00	$ 139,910.00	-	5.00	$ 139,910.00	-	$ -	0.00%	5.00	$ 139,910.00	100.00%
7.2.2	BANCO DE DUCTOS PVC - TDP DE 1XØ2"	ml	38.00	$ 18,551.00	$ 704,938.00	-	38.00	$ 704,938.00	-	$ -	0.00%	38.00	$ 704,938.00	100.00%
7.2.3	BANCO DE DUCTOS PVC - TDP DE 1XØ3"	ML	7.00	$ 43,361.00	$ 303,527.00	-	7.00	$ 303,527.00	-	$ -	0.00%	7.00	$ 303,527.00	100.00%
7.2.4	BANCO DE DUCTOS PVC - TDP DE 2XØ2"	ml	60.00	$ 50,091.00	$ 3,005,460.00	-	60.00	$ 3,005,460.00	-	$ -	0.00%	60.00	$ 3,005,460.00	100.00%
7.2.5	BANCO DE DUCTOS PVC - DB DE 4XØ4" INCLUYE	ml	120.00	$ 130,049.00	$ 15,605,880.00	-	120.00	$ 15,605,880.00	-	$ -	0.00%	120.00	$ 15,605,880.00	100.00%
7.2.6	DUCTERÍA TIPO PVC DE 1 X Ø3/4" INCLUYE	ml	341.00	$ 13,545.00	$ 4,618,845.00	-	341.00	$ 4,618,845.00	-	$ -	0.00%	341.00	$ 4,618,845.00	100.00%
7.2.7	DUCTERÍA TIPO EMT DE 1 X Ø 3/4" INCLUYE	ml	598.00	$ 18,654.00	$ 11,155,092.00	-	598.00	$ 11,155,092.00	-	$ -	0.00%	598.00	$ 11,155,092.00	100.00%
7.2.8	CORAZA FLEXIBLE LIQUID TIGHT 1XØ 3/4",	ml	15.00	$ 20,531.00	$ 307,965.00	-	15.00	$ 307,965.00	-	$ -	0.00%	15.00	$ 307,965.00	100.00%
7.3	**TABLEROS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN Y**					-		$ -	-	$ -		-	$ -	
7.3.1	GABINETE LAMINADO EN FRIO TRIFÁSICO TIPO	un	1.00	$ 12,550,424.00	$ 12,550,424.00	-	1.00	$ 12,550,424.00	-	$ -	0.00%	1.00	$ 12,550,424.00	100.00%
7.3.2	TABLERO ENCHUFABLE DE TRIFASICO CON 36	un	3.00	$ 526,516.00	$ 1,579,548.00	-	3.00	$ 1,579,548.00	-	$ -	0.00%	3.00	$ 1,579,548.00	100.00%
7.3.3	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	un	108.00	$ 41,362.00	$ 4,467,096.00	-	108.00	$ 4,467,096.00	-	$ -	0.00%	108.00	$ 4,467,096.00	100.00%
7.3.4	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO INDUSTRIAL	un	2.00	$ 329,610.00	$ 659,220.00	-	2.00	$ 659,220.00	-	$ -	0.00%	2.00	$ 659,220.00	100.00%
7.3.5	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO INDUSTRIAL	un	2.00	$ 714,989.00	$ 1,429,978.00	-	2.00	$ 1,429,978.00	-	$ -	0.00%	2.00	$ 1,429,978.00	100.00%
7.3.6	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO INDUSTRIAL	un	1.00	$ 710,270.00	$ 710,270.00	-	1.00	$ 710,270.00	-	$ -	0.00%	1.00	$ 710,270.00	100.00%
7.3.7	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO INDUSTRIAL	un	4.00	$ 714,610.00	$ 2,858,440.00	-	4.00	$ 2,858,440.00	-	$ -	0.00%	4.00	$ 2,858,440.00	100.00%
7.3.8	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO INDUSTRIAL	un	1.00	$ 816,540.00	$ 816,540.00	-	1.00	$ 816,540.00	-	$ -	0.00%	1.00	$ 816,540.00	100.00%
7.3.9	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO INDUSTRIAL	un	2.00	$ 1,570,250.00	$ 3,140,500.00	-	2.00	$ 3,140,500.00	-	$ -	0.00%	2.00	$ 3,140,500.00	100.00%
7.3.10	DPS CLASE II, SEGÚN NORMA IEC 61643-1,	un	1.00	$ 1,437,901.00	$ 1,437,901.00	-	1.00	$ 1,437,901.00	-	$ -	0.00%	1.00	$ 1,437,901.00	100.00%
7.4	**ACOMETIDAS ELÉCTRICAS**					-		$ -	-	$ -		-	$ -	
7.4.1	ACOMETIDA EN CABLE 3N4/0 Cu AWG PE-HFFR-	ML	120.00	$ 636,422.00	$ 76,370,640.00	-	120.00	$ 76,370,640.00	-	$ -	0.00%	120.00	$ 76,370,640.00	100.00%
7.4.2	ACOMETIDA EN CABLE 3N1/0 Cu AWG PE-HFFR-	ML	38.00	$ 322,801.00	$ 12,266,438.00	-	38.00	$ 12,266,438.00	-	$ -	0.00%	38.00	$ 12,266,438.00	100.00%
7.4.3	ACOMETIDA EN CABLE 3N8 Cu AWG PE-HFFR-LS	ML	60.00	$ 62,604.00	$ 3,756,240.00	-	60.00	$ 3,756,240.00	-	$ -	0.00%	60.00	$ 3,756,240.00	100.00%
7.4.4	ACOMETIDA EN CABLE 3N10 Cu AWG PE-HFFR-	ML	20.00	$ 43,997.00	$ 879,940.00	-	20.00	$ 879,940.00	-	$ -	0.00%	20.00	$ 879,940.00	100.00%
7.4.5	ACOMETIDA EN CABLE 1N12 Cu AWG PE-HFFR-	ml	889.00	$ 30,616.00	$ 27,217,624.00	-	889.00	$ 27,217,624.00	-	$ -	0.00%	889.00	$ 27,217,624.00	100.00%
7.6	**SALIDAS ELÉCTRICAS INSTALADAS EN**					-		$ -	-	$ -		-	$ -	
7.6.1	INTERRUPTOR SENCILLO 15A, 120V, INCLUYE	un	11.00	$ 97,855.00	$ 1,076,405.00	-	11.00	$ 1,076,405.00	-	$ -	0.00%	11.00	$ 1,076,405.00	100.00%
7.6.2	INTERRUPTOR SENCILLO, EN SALIDA DE	un	1.00	$ 136,028.00	$ 136,028.00	-	1.00	$ 136,028.00	-	$ -	0.00%	1.00	$ 136,028.00	100.00%
7.6.3	SENSOR DE MOVIMIENTO, EN SALIDA DE	un	78.00	$ 158,511.00	$ 12,363,858.00	-	78.00	$ 12,363,858.00	-	$ -	0.00%	78.00	$ 12,363,858.00	100.00%
7.6.4	INTERRUPTOR CUATRO VÍAS, 120V, INCLUYE	un	16.00	$ 125,731.00	$ 2,011,696.00	-	16.00	$ 2,011,696.00	-	$ -	0.00%	16.00	$ 2,011,696.00	100.00%
7.6.5	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA	un	292.00	$ 121,750.00	$ 35,551,000.00	-	292.00	$ 35,551,000.00	-	$ -	0.00%	292.00	$ 35,551,000.00	100.00%
7.6.6	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA	un	16.00	$ 218,437.00	$ 3,494,992.00	-	16.00	$ 3,494,992.00	-	$ -	0.00%	16.00	$ 3,494,992.00	100.00%
7.6.7	LUMINARIA LED SYLVANIA HERMETICA 2X18W T8	un	142.00	$ 232,702.00	$ 33,043,684.00	-	142.00	$ 33,043,684.00	-	$ -	0.00%	142.00	$ 33,043,684.00	100.00%
7.6.8	LUMINARIA LED SYLVANIA TORTUGA 12W DL MV,	un	86.00	$ 143,559.00	$ 12,346,074.00	-	86.00	$ 12,346,074.00	-	$ -	0.00%	86.00	$ 12,346,074.00	100.00%
7.6.9	LUMINARIA LED SYLVANIA EMERGENCIA	un	116.00	$ 245,696.00	$ 28,500,736.00	-	116.00	$ 28,500,736.00	-	$ -	0.00%	116.00	$ 28,500,736.00	100.00%
7.7	**PROTECCIONES, PARARRAYOS Y PUESTAS A**					-		$ -	-	$ -		-	$ -	
7.7.1	PUESTA TIERRA MEDIANTE UNA (01) VARILLAS	un	15.00	$ 594,999.00	$ 8,924,985.00	-	15.00	$ 8,924,985.00	-	$ -	0.00%	15.00	$ 8,924,985.00	100.00%
7.7.2	CAJA DE INSPECCIÓN DE (0,30X0,30)M CON	un	15.00	$ 151,784.00	$ 2,276,760.00	-	15.00	$ 2,276,760.00	-	$ -	0.00%	15.00	$ 2,276,760.00	100.00%
7.7.3	CABLE DE COBRE DESNUDO AWG NO. 2/0 PARA	ml	295.00	$ 107,543.00	$ 31,725,185.00	-	295.00	$ 31,725,185.00	-	$ -	0.00%	295.00	$ 31,725,185.00	100.00%
7.7.4	PUNTO DE INTERCONEXIÓN PARA EL CABLEADO	un	15.00	$ 72,431.00	$ 1,086,465.00	-	15.00	$ 1,086,465.00	-	$ -	0.00%	15.00	$ 1,086,465.00	100.00%
7.7.5	PUNTA CAPTADORA DE 600 MM EN ALUMINIO DE	un	36.00	$ 149,740.00	$ 5,390,640.00	-	36.00	$ 5,390,640.00	-	$ -	0.00%	36.00	$ 5,390,640.00	100.00%
7.7.6	ALAMBRÓN DE ALUMINIO DE 8 MM DE	ml	390.00	$ 22,771.00	$ 8,880,690.00	-	390.00	$ 8,880,690.00	-	$ -	0.00%	390.00	$ 8,880,690.00	100.00%
7.7.7	BAJANTE DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO	un	12.00	$ 685,474.00	$ 8,225,688.00	-	12.00	$ 8,225,688.00	-	$ -	0.00%	12.00	$ 8,225,688.00	100.00%
7.7.8	SPARK GAP (VIA DE CHISPAS), PARA	un	12.00	$ 800,696.00	$ 9,608,352.00	-	12.00	$ 9,608,352.00	-	$ -	0.00%	12.00	$ 9,608,352.00	100.00%
7.9	**SISTEMA CONTRA INCENDIOS**					-		$ -	-	$ -		-	$ -	
7.9.1	PANEL CENTRAL DE INCENDIOS INTEGRABLE	un	1.00	$ 21,243,833.00	$ 21,243,833.00	-	1.00	$ 21,243,833.00	-	$ -	0.00%	1.00	$ 21,243,833.00	100.00%
7.9.2	TECLADO REMOTO PANEL INCENDIO, INCLUYE	un	3.00	$ 10,872,333.00	$ 32,616,999.00	-	3.00	$ 32,616,999.00	-	$ -	0.00%	3.00	$ 32,616,999.00	100.00%
7.9.3	FUENTES DE PODER USO CERTIFICADO	un	1.00	$ 4,474,447.00	$ 4,474,447.00	-	1.00	$ 4,474,447.00	-	$ -	0.00%	1.00	$ 4,474,447.00	100.00%
7.9.4	DETECTORES HUMO BASE CONVENCIONAL	un	40.00	$ 745,770.00	$ 29,830,800.00	-	40.00	$ 29,830,800.00	-	$ -	0.00%	40.00	$ 29,830,800.00	100.00%
7.9.5	ESTACIONES MANUALES, INCLUYE ACCESORIOS	un	8.00	$ 700,720.00	$ 5,605,760.00	-	8.00	$ 5,605,760.00	-	$ -	0.00%	8.00	$ 5,605,760.00	100.00%
7.9.6	CUBIERTAS ESTACION MANUAL STOPPER,	un	8.00	$ 393,397.00	$ 3,147,176.00	-	8.00	$ 3,147,176.00	-	$ -	0.00%	8.00	$ 3,147,176.00	100.00%
7.9.7	SIRENA PARED SIRENA/LUZ ESTROBOSCOPIA,	un	8.00	$ 693,064.00	$ 5,544,512.00	-	8.00	$ 5,544,512.00	-	$ -	0.00%	8.00	$ 5,544,512.00	100.00%
7.9.8	SIRENA TECHO SIRENA/LUZ ESTROBOSCOPIA,	un	4.00	$ 601,421.00	$ 2,405,684.00	-	4.00	$ 2,405,684.00	-	$ -	0.00%	4.00	$ 2,405,684.00	100.00%
7.9.9	MÓDULOS DE CONTROL PARA SIRENAS,	un	1.00	$ 1,557,328.00	$ 1,557,328.00	-	1.00	$ 1,557,328.00	-	$ -	0.00%	1.00	$ 1,557,328.00	100.00%
7.9.10	MODULO MONITOREO DOBLE ENTRADA,	un	1.00	$ 838,160.00	$ 838,160.00	-	1.00	$ 838,160.00	-	$ -	0.00%	1.00	$ 838,160.00	100.00%
7.9.11	BATERIAS DE RESPLADO 12 VOLTIOS 38	un	1.00	$ 673,791.00	$ 673,791.00	-	1.00	$ 673,791.00	-	$ -	0.00%	1.00	$ 673,791.00	100.00%
7.9.12	CABLE SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS	ml	171.00	$ 17,225.00	$ 2,945,475.00	-	171.00	$ 2,945,475.00	-	$ -	0.00%	171.00	$ 2,945,475.00	100.00%
9	**INSTALACIONES MECANICAS**					-	-	$ -	-	$ -		-	$ -	
9.1	INSTALACION DE VENTILADOR DE PARED	un	40.00	$ 28,645.00	$ 1,145,800.00	-	40.00	$ 1,145,800.00	-	$ -	0.00%	40.00	$ 1,145,800.00	100.00%
10	**PAÑETES**					-	-	$ -	-	$ -		-	$ -	
10.1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15	m²	4,318.08	$ 25,022.00	$ 108,046,998.00	-	4,318.08	$ 108,046,998.00	-	$ -	0.00%	4,318.08	$ 108,046,998.00	100.00%
11	**CIELO RASO**					-	-	$ -	-	$ -		-	$ -	
11.1	CIELO RASO PVC 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA	m²	1,207.00	$ 127,172.00	$ 153,496,604.00	-	1,207.00	$ 153,496,604.00	-	$ -	0.00%	1,207.00	$ 153,496,604.00	100.00%
12	**ACABADO E IMPERMEABIZACIONES**					-	-	$ -	-	$ -		-	$ -	
12.1	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5	m²	1,315.00	$ 38,900.00	$ 51,153,500.00	-	1,315.00	$ 51,153,500.00	-	$ -	0.00%	1,315.00	$ 51,153,500.00	100.00%
13	**ACABADOS DE MUROS, PINTURA Y/O ENCHAPES**					-	-	$ -	-	$ -		-	$ -	
13.1	BALDOSA GRANO DE MÁRMOL PERLATO HUILA	m²	819.28	$ 122,914.00	$ 100,700,982.00	-	819.28	$ 100,700,982.00	-	$ -	0.00%	819.28	$ 100,700,982.00	100.00%
13.2	GUARDAESCOBA GRANO DE MÁRMOL PERLATO	ML	629.16	$ 26,543.00	$ 16,699,794.00	-	629.16	$ 16,699,794.00	-	$ -	0.00%	629.16	$ 16,699,794.00	100.00%
13.3	CERÁMICA PISO MANCORA ARD CAFE CD 33.8 X	m²	420.98	$ 111,916.00	$ 47,114,398.00	-	420.98	$ 47,114,398.00	-	$ -	0.00%	420.98	$ 47,114,398.00	100.00%
13.4	CERAMICA PARED PLANA BLANCO ACABADO	m²	1,206.48	$ 77,240.00	$ 93,188,515.00	-	1,206.48	$ 93,188,515.00	-	$ -	0.00%	1,206.48	$ 93,188,515.00	100.00%
13.5	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE	m²	1,613.16	$ 39,058.00	$ 63,006,803.00	-	1,613.16	$ 63,006,803.00	-	$ -	0.00%	1,613.16	$ 63,006,803.00	100.00%
13.6	ESTUCO NEVADO Y PINTURA EXTERIORES	m²	1,935.66	$ 77,419.00	$ 149,856,862.00	-	1,935.66	$ 149,856,862.00	-	$ -	0.00%	1,935.66	$ 149,856,862.00	100.00%
14	**CARPINTERIA MADERA**					-	-	$ -	-	$ -		-	$ -	
14.1	BASE SIMPLE MUEBLES (POYOS) EN COCRETO	m²	116.00	$ 80,078.00	$ 9,289,048.00	-	116.00	$ 9,289,048.00	-	$ -	0.00%	116.00	$ 9,289,048.00	100.00%
14.2	PUERTAS PARA BAÑO FABRICADAS EN LÁMINA	m²	141.00	$ 342,691.00	$ 48,319,431.00	-	141.00	$ 48,319,431.00	-	$ -	0.00%	141.00	$ 48,319,431.00	100.00%
14.3	DIVISIÓN DE ORINAL FABRICADAS EN LÁMINA	m²	10.00	$ 323,523.00	$ 3,235,230.00	-	10.00	$ 3,235,230.00	-	$ -	0.00%	10.00	$ 3,235,230.00	100.00%
15	**CARPINTERIA METALICA**					-	-	$ -	-	$ -		-	$ -	
15.1	PUERTA ENTAMBORADA EN LÁMINA C.R.	m²	66.64	$ 528,167.00	$ 35,197,049.00	-	66.64	$ 35,197,049.00	-	$ -	0.00%	66.64	$ 35,197,049.00	100.00%
15.2	COMODA METÁLICA, EN LAMINA GALVANIZADA	un	160.00	$ 3,240,984.00	$ 518,557,440.00	-	160.00	$ 518,557,440.00	-	$ -	0.00%	160.00	$ 518,557,440.00	100.00%
15.3	MUEBLE DE METÁLICO TIPO (M1) ESTRUCTURA	un	8.00	$ 2,444,817.00	$ 19,558,536.00	-	8.00	$ 19,558,536.00	-	$ -	0.00%	8.00	$ 19,558,536.00	100.00%
15.4	MUEBLE DE METÁLICO TIPO (M2), ESTRUCTURA	un	4.00	$ 9,773,108.00	$ 39,092,432.00	-	4.00	$ 39,092,432.00	-	$ -	0.00%	4.00	$ 39,092,432.00	100.00%
16	**CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO**					-	-	$ -	-	$ -		-	$ -	
16.1	REJILLA EN ALUMINIO CON ANGEO INT. TEJIDO	m²	386.34	$ 237,290.00	$ 91,674,619.00	-	386.34	$ 91,674,619.00	-	$ -	0.00%	386.34	$ 91,674,619.00	100.00%
16.2	VENTANA CON MARCO EN ALUMINIO CON	m²	122.12	$ 155,439.00	$ 18,982,211.00	-	122.12	$ 18,982,211.00	-	$ -	0.00%	122.12	$ 18,982,211.00	100.00%
17	**CARPINTERIA ACERO INOXIDABLE**					-	-	$ -	-	$ -		-	$ -	
17.1	JABONERA EN ACERO INOXIDABLE	un	48.00	$ 46,886.00	$ 2,250,528.00	-	48.00	$ 2,250,528.00	-	$ -	0.00%	48.00	$ 2,250,528.00	100.00%
17.2	REJILLA S 3 X 2 ALUMINIO SIFÓN	un	54.00	$ 50,826.00	$ 2,744,604.00	-	54.00	$ 2,744,604.00	-	$ -	0.00%	54.00	$ 2,744,604.00	100.00%
17.3	BARANDA EN ACERO DE 1 METRO DE ALTURA	ml	190.14	$ 414,539.00	$ 78,820,445.00	-	190.14	$ 78,820,445.00	-	$ -	0.00%	190.14	$ 78,820,445.00	100.00%
18	**CUBIERTAS**					-	-	$ -	-	$ -		-	$ -	
18.1	CUBIERTA TIPO KING ROOF ECO O SIMILAR TIPO	m²	1,388.88	$ 217,508.00	$ 302,092,511.00	-	1,388.88	$ 302,092,511.00	-	$ -	0.00%	1,388.88	$ 302,092,511.00	100.00%

OBRA

No.ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			BALANCE A LA FECHA			OBRA EJECUTADA			OBRA POR EJECUTAR		
									PRESENTE CORTE (Del 22 de julio al 10 de septiembre del 2026)			SALDO		
			CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR	MAYORES (+) Y MENORES(-) CANTIDADES	CANTIDAD REAL	VALOR REAL	CANTIDAD	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANT	VALOR TOTAL	% POR EJECUTAR
18.2	ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN PERFILES	kg	15,300.00	$ 17,353.00	$ 265,500,900.00	-	15,300.00	$ 265,500,900.00	-	$ -	0.00%	15,300.00	$ 265,500,900.00	100.00%
19	**APARATOS SANITARIOS**					-	-	$ -	-	$ -		-	$ -	
19.1	LAVAMANOS CORRIDO EN CONCRETO, SEGÚN	ml	21.00	$ 681,110.00	$ 14,303,310.00	-	21.00	$ 14,303,310.00	-	$ -	0.00%	21.00	$ 14,303,310.00	100.00%
19.2	GRIFERÍA ULTRA AHORRADORA PARA	un	24.00	$ 65,403.00	$ 1,569,672.00	-	24.00	$ 1,569,672.00	-	$ -	0.00%	24.00	$ 1,569,672.00	100.00%
19.3	SANITARIO ECOCLEAN SINGLE BLANCO	un	32.00	$ 910,534.00	$ 29,137,088.00	-	32.00	$ 29,137,088.00	-	$ -	0.00%	32.00	$ 29,137,088.00	100.00%
19.4	ORINAL ARRECIFE ENTRADA SUPERIOR REF	un	36.00	$ 641,469.00	$ 23,092,884.00	-	36.00	$ 23,092,884.00	-	$ -	0.00%	36.00	$ 23,092,884.00	100.00%
19.5	DUCHA ANTIVANDÁLICA CON REGADERA DE	un	48.00	$ 282,010.00	$ 13,536,480.00	-	48.00	$ 13,536,480.00	-	$ -	0.00%	48.00	$ 13,536,480.00	100.00%
19.6	LAVADERO EN CONCRETO, SEGÚN DISEÑO,	un	4.00	$ 743,262.00	$ 2,973,048.00	-	4.00	$ 2,973,048.00	-	$ -	0.00%	4.00	$ 2,973,048.00	100.00%
20	**VIDRIOS Y ESPEJOS**					-	-	$ -	-	$ -		-	$ -	
20.1	ESPEJO BISELADO E= 4 MM (FLOTADO EN	m²	17.00	$ 228,939.00	$ 3,891,963.00	-	17.00	$ 3,891,963.00	-	$ -	0.00%	17.00	$ 3,891,963.00	100.00%
21	**CERRADURAS**					-	-	$ -	-	$ -		-	$ -	
21.1	BARRA DOBLE ANTIPÁNICO DE DOS PUNTOS	un	20.00	$ 2,273,849.00	$ 45,476,980.00	-	20.00	$ 45,476,980.00	-	$ -	0.00%	20.00	$ 45,476,980.00	100.00%
22	**OBRAS GENERALES**				$ -	-	-	$ -	-	$ -		-	$ -	
22.1	AVISOS ACRILICOS IMPRESIÓN DIGITAL 25X9	un	20.00	$ 136,400.00	$ 2,728,000.00	-	20.00	$ 2,728,000.00	-	$ -	0.00%	20.00	$ 2,728,000.00	100.00%
23	**URBANISMO**					-	-	$ -	-	$ -		-	$ -	
23.1	NIVELACIÓN, CONFORMACIÓN Y	m²	598.75	$ 14,478.00	$ 8,668,703.00	-	598.75	$ 8,668,703.00	-	$ -	0.00%	598.75	$ 8,668,703.00	100.00%
23.2	SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE	m³	190.92	$ 135,881.00	$ 25,942,401.00	-	190.92	$ 25,942,401.00	-	$ -	0.00%	190.92	$ 25,942,401.00	100.00%
23.3	SUBBASE GRANULAR PEATONAL	m³	172.78	$ 261,608.00	$ 45,200,630.00	-	172.78	$ 45,200,630.00	-	$ -	0.00%	172.78	$ 45,200,630.00	100.00%
23.4	ANDEN EN CONCRETO DE 3000 PSI, E=0,10M .	m²	70.34	$ 115,113.00	$ 8,097,048.00	-	70.34	$ 8,097,048.00	-	$ -	0.00%	70.34	$ 8,097,048.00	100.00%
23.5	BORDILLO PREFABRICADO TIPO A-80, INCLUYE	ml	253.34	$ 78,937.00	$ 19,997,900.00	-	253.34	$ 19,997,900.00	-	$ -	0.00%	253.34	$ 19,997,900.00	100.00%
23.6	CONSTRUCCIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN.	ml	224.13	$ 19,284.00	$ 4,322,123.00	-	224.13	$ 4,322,123.00	-	$ -	0.00%	224.13	$ 4,322,123.00	100.00%
23.7	TALA DE ÁRBOLES PORTE MEDIO Y ALTO,	un	27.00	$ 2,843,578.00	$ 76,776,606.00	-	27.00	$ 76,776,606.00	20.00	$ 56,871,560.00	74.07%	7.00	$ 19,905,046.00	25.93%
24	**ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS**					-	-	$ -	-	$ -		-	$ -	
24.1	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL	m²	1,108.00	$ 5,021.00	$ 5,563,268.00	-	1,108.00	$ 5,563,268.00	-	$ -	0.00%	1,108.00	$ 5,563,268.00	100.00%
24.2	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	m³	56.00	$ 62,880.00	$ 3,521,280.00	-	56.00	$ 3,521,280.00	-	$ -	0.00%	56.00	$ 3,521,280.00	100.00%
25	**VIA - PARQUEADERO**					-	-	$ -	-	$ -		-	$ -	
25.1	NIVELACIÓN, CONFORMACIÓN Y	m²	624.98	$ 15,541.00	$ 9,712,814.00	-	624.98	$ 9,712,814.00	-	$ -	0.00%	624.98	$ 9,712,814.00	100.00%
25.2	SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE	m³	174.58	$ 106,378.00	$ 18,571,471.00	-	174.58	$ 18,571,471.00	-	$ -	0.00%	174.58	$ 18,571,471.00	100.00%
25.3	SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE	m³	201.18	$ 228,892.00	$ 46,048,493.00	-	201.18	$ 46,048,493.00	-	$ -	0.00%	201.18	$ 46,048,493.00	100.00%
25.4	SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE	m³	92.45	$ 221,517.00	$ 20,479,247.00	-	92.45	$ 20,479,247.00	-	$ -	0.00%	92.45	$ 20,479,247.00	100.00%
25.5	GEOTEXTIL TIPO FORTEX BX40 O SIMILAR.	m²	565.68	$ 19,716.00	$ 11,152,947.00	-	565.68	$ 11,152,947.00	-	$ -	0.00%	565.68	$ 11,152,947.00	100.00%
25.6	IMPRIMACION CON EMULSIÓN ASFALTICA (CRL)	m²	483.00	$ 27,864.00	$ 13,458,312.00	-	483.00	$ 13,458,312.00	-	$ -	0.00%	483.00	$ 13,458,312.00	100.00%
25.7	SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE	m³	66.40	$ 1,532,221.00	$ 101,745,568.00	- 24.19	42.21	$ 64,678,434.00	-	$ -	0.00%	42.21	$ 64,678,434.00	100.00%
25.8	MARCAS VIALES CON PINTURA TRAFICO	m²	280.81	$ 33,774.00	$ 9,484,077.00	-	280.81	$ 9,484,077.00	-	$ -	0.00%	280.81	$ 9,484,077.00	100.00%
25.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL TIPO	ML	105.42	$ 84,971.00	$ 8,957,643.00	-	105.42	$ 8,957,643.00	-	$ -	0.00%	105.42	$ 8,957,643.00	100.00%
25.10	BORDILLO PREFABRICADO BAJO RAMPA TIPO A-	ML	7.98	$ 79,880.00	$ 637,442.00	-	7.98	$ 637,442.00	-	$ -	0.00%	7.98	$ 637,442.00	100.00%
25.11	BORDILLO PREFABRICADO DE TRANSICION A-	ml	2.10	$ 86,538.00	$ 181,730.00	-	2.10	$ 181,730.00	-	$ -	0.00%	2.10	$ 181,730.00	100.00%
25.12	TOPELLENTA 45CM X 11CM X 10CM. INCLUYE	un	6.00	$ 55,143.00	$ 330,858.00	-	6.00	$ 330,858.00	-	$ -	0.00%	6.00	$ 330,858.00	100.00%
			-	$ -	$ -	-	-	$ -	-	$ -		-	$ -	
	TOTAL COSTO DIRECTO OBRA				**$ 5,716,556,497.00**			**$ 5,716,556,497.00**		**$ 513,080,289.00**			**$ 5,203,476,208.00**	
	ADMINISTRACIÓN			**16.29%**										
	IMPREVISTOS			**1.00%**										
	UTILIDADES			**4.00%**										
	IVA SOBRE UTILIDAD			**19.00%**	**$ 35,819,795.00**			**$ 35,819,795.00**		**$ 3,214,948.00**			**$ 32,604,847.00**	
	VALOR TOTAL OBRA CONTRACTUAL				**$ 5,752,376,292.00**		**SUBTOTAL**	**$ 5,752,376,292.00**	**SUBTOTAL**	**$ 516,295,237.00**	**8.98%**	**SUBTOTAL**	**$ 5,236,081,055.00**	**91.02%**

EQUIPOS

No.	DESCRIPCION EQUIPO	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			BALANCE A LA FECHA			EQUIPOS ENTREGADOS			EQUIPOS POR ENTREGAR		
									PRESENTE CORTE			SALDO		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	MAYORES (+) Y MENORES(-) CANTIDADES	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	CANTIDAD EJECUTA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANT	VALOR TOTAL	% POR EJECUTAR
26	**EQUIPOS**					-	-	$ -		$ -		-	$ -	
26.1	**EQUIPOS MECANICOS**					-	-	$ -		$ -		-	$ -	
26,1,1	VENTILADOR DE PARED INDUSTRIAL 26	un	40.00	$ 470,799.00	$ 18,831,960.00	-	40.00	$ 18,831,960.00		$ -	0.00%	40.00	$ 18,831,960.00	100.00%
26.2	**EQUIPOS HIDROSANITARIOS**					-	-	$ -		$ -		-	$ -	
26,2,1	**SISTEMA HIDRONEUMÁTICO**					-	-	$ -		$ -		-	$ -	
26,2,1,1	ELECTROBOMBA ALTA PRESION EN HIERRO	un	2.00	$ 5,570,848.00	$ 11,141,696.00	-	2.00	$ 11,141,696.00		$ -	0.00%	2.00	$ 11,141,696.00	100.00%
26,2,1,2	TABLERO DE CONTROL PARA SISTEMA DE	un	1.00	$ 14,594,800.00	$ 14,594,800.00	-	1.00	$ 14,594,800.00		$ -	0.00%	1.00	$ 14,594,800.00	100.00%
26,2,1,3	TANQUE HIDRONEUMATICO CON MEMBRANA	un	1.00	$ 3,923,334.00	$ 3,923,334.00	-	1.00	$ 3,923,334.00		$ -	0.00%	1.00	$ 3,923,334.00	100.00%
26,2,2	SISTEMA EYECTOR CUARTO EQUIPOS TANQUE					-	-	$ -		$ -		-	$ -	
26,2,2,1	BOMBA PEARL SUMREGUIBLE DE 1,0 HP 220V	un	1.00	$ 958,720.00	$ 958,720.00	-	1.00	$ 958,720.00		$ -	0.00%	1.00	$ 958,720.00	100.00%
26,2,2,2	TABLERO INTELIGENTE MULTIFUNCION	un	1.00	$ 753,280.00	$ 753,280.00	-	1.00	$ 753,280.00		$ -	0.00%	1.00	$ 753,280.00	100.00%
26,2,3	**SISTEMA EYECTOR POZO AGUA RESIDUAL**					-	-	$ -		$ -		-	$ -	
26,2,3,1	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE EN HIERRO	un	2.00	$ 9,005,120.00	$ 18,010,240.00	-	2.00	$ 18,010,240.00		$ -	0.00%	2.00	$ 18,010,240.00	100.00%
26,2,3,2	TALBERO DE CONTOL INTELIGENTE PARA DOS	un	1.00	$ 3,698,918.00	$ 3,698,918.00	-	1.00	$ 3,698,918.00		$ -	0.00%	1.00	$ 3,698,918.00	100.00%
			-	$ -	$ -		-	$ -		$ -		-	$ -	
	TOTAL COSTO DIRECTO EQUIPOS				**$ 71,912,948.00**			**$ 71,912,948.00**		**$ -**			**$ 71,912,948.00**	
	IVA	**19.00%**			**$ 13,663,460.00**			**$ 13,663,460.00**		**$ -**			**$ 13,663,460.00**	
	SUBTOTALES EQUIPOS				**$ 85,576,408.00**			**$ 85,576,408.00**		**$ -**			**$ 85,576,408.00**	100.00%
	TOTALES (OBRA + EQUIPOS) CONTRACTUAL				**$ 5,837,952,700.00**		**SUBTOTAL**	**$5,837,952,700**	**SUBTOTAL**	**$ 516,295,237.00**	**8.84%**	**SUBTOTAL**	**$ 5,321,657,463.00**	**91.16%**

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

% ANTICIPO	VALOR ANTICIPO	% A AMORTIZAR	VALOR A AMORTIZAR PRESENTE CORTE	VALOR A PAGAR DESPUES DE AMORTIZACIÓN PRESENTE CORTE
0.00%	$ -	0.00%	-	$ -

Solicita:

JAIME ALBERTO GALAN VILLAMIZAR
Representante Legal Contratista
Firma y postfirma

Autoriza:

DONAL BOGOTA BAUTISTA
Representante Legal Interventoria o supervisor
Firma y postfirma

ANEXO 3.C

INGENIERÍA
CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 033-00-A-COFAC-DIFRA-2026

Formato Acta de Recibo a Satisfacción (DE-DEAJU-FR-006)

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
PARCIAL: __X___ TOTAL: _____	**FECHA 25/09/2026**
CONTRATO No.	035-00-A-COFAC-DIFRA-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	22/06/2026
OBJETO	LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO PARA SOLDADOS PROFESIONALES EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 EN PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
FORMA DE PAGO	Se proyecta el pago del valor total del contrato hasta por la suma de CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE. ($5.837.952.700.00), la cual se cancelará de la siguiente forma: **Pagos parciales de acuerdo con la ejecución de obra.** Se realizarán Pagos Parciales de Obra hasta por el valor total adjudicado, los cuales para ser obligados y pagados deberán presentar recibo a satisfacción parcial del avance de obra y cumplimiento de los demás trámites administrativos, los cuales serán pagados con cargo al PAC distribuido como se relaciona a continuación: Nota: Los pagos parciales podrán ser mensuales, bimestrales, trimestrales. En todo caso, los pagos deberán ser evaluados por la interventoría, quien de acuerdo con rendimiento de obra podrá definir en qué momento de la vigencia se efectuará el corte parcial de obra. **CORTES PARCIALES DE OBRA:** Pagos con cargo al Tercer Trimestre 2026: Hasta por el 30% del valor adjudicado,

	pagaderos en los meses de julio, agosto y septiembre. Pagos con cargo al Cuarto Trimestre 2026: Hasta por el 30% del valor adjudicado, pagaderos en los meses de octubre, noviembre y diciembre. **SALDO:** Pago de los recursos no obligados dentro de los pagos parciales, es decir, el valor del saldo final del contrato para ser cancelado con cargo al PAC del mes de diciembre de 2026 y/o Cuentas por Pagar pagaderas en el primer trimestre de 2027, previo recibo a satisfacción final o total de la obra.
CONTRATISTA	CONSORCIO ALOJAMIENTO FAC 26
INTERVENTOR	DBB INGENIERIA SAS
SUPERVISOR	CAPITÁN ANDERSON VERA
VALOR INICIAL	$ 5.837.952.700
FECHA DE INICIO	22/julio/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2026.

MODIFICACIONES AL CONTRATO		
Modificatorio No. 1	N/A.	N/A.
Modificatorio No. 2	N/A.	N/A.
Modificatorio No. 3	N/A.	N/A..

SUSPENSIÓN Y REINICIOS	
Suspensión No. 1	N/A.
Ampliación Suspensión	N/A.
Reinicio	N/A.

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO	
FORMA DE PAGO FINAL	Se proyecta el pago del valor total del contrato hasta por la suma de CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE.

	($5.837.952.700.00), la cual se cancelará de la siguiente forma: **Pagos parciales de acuerdo con la ejecución de obra.** Se realizarán Pagos Parciales de Obra hasta por el valor total adjudicado, los cuales para ser obligados y pagados deberán presentar recibo a satisfacción parcial del avance de obra y cumplimiento de los demás trámites administrativos, los cuales serán pagados con cargo al PAC distribuido como se relaciona a continuación: Nota: Los pagos parciales podrán ser mensuales, bimestrales, trimestrales. En todo caso, los pagos deberán ser evaluados por la interventoría, quien de acuerdo con rendimiento de obra podrá definir en qué momento de la vigencia se efectuará el corte parcial de obra. **CORTES PARCIALES DE OBRA:** Pagos con cargo al Tercer Trimestre 2026: Hasta por el 30% del valor adjudicado, pagaderos en los meses de julio, agosto y septiembre. Pagos con cargo al Cuarto Trimestre 2026: Hasta por el 30% del valor adjudicado, pagaderos en los meses de octubre, noviembre y diciembre. **SALDO:** Pago de los recursos no obligados dentro de los pagos parciales, es decir, el valor del saldo final del contrato para ser cancelado con cargo al PAC del mes de diciembre de 2026 y/o Cuentas por Pagar pagaderas en el primer trimestre de 2027, previo recibo a satisfacción final o total de la obra.
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2026.

VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 5.837.952.700

En Puerto Salgar Cundinamarca, a los quince (15) días del mes de septiembre de 2026, el señora **CORONEL MARIBEL SILVA BARRERA** en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor **CAPITAN ANDERSON VERA**, en su calidad de SUPERVISOR por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA,** DONAL BOGOTA BAUTISTA representante legal de la empresa DBB INGENIERÍA S.A.S., en su calidad de INTERVENTOR y el señor JAIME ALBERTO GALAN VILLAMIZAR en su calidad de CONTRATISTA Representante Legal del Consorcio Alojamiento FAC 26; efectúan el correspondiente recibo parcial, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Descripción de obra descritas en el contrato principal y avance recibido a satisfacción	Un global	Se anexa cuadro de ejecución de actividades de obra (Corte parcial No. 1) y documentos que reportan lo referenciado. Activo Fijo No 1615000003590
	CANTIDAD	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	**NO APLICA**	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	**NO APLICA**	NO APLICA
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	**NO APLICA**	**NO APLICA**

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)

ARIOLFO ANTONIO TOVAR PARDO	DIRECTOR DE OBRA	INGENIERO CIVIL
EDGAR JEREZ TAMI	RESIDENTE DE OBRA	ARQUITECTO
EDWIN PINTO MORENO	INSPECTOR SISOMA	INGENIERO INDUSTRIAL
JAIRO ANTONIO RIVERA CARVAJAL	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	INGENIERO CIVIL
WENTZER MAURICIO LEON TORRES	ESPECIALISTA HIDROSANITARIO	INGENIERO CIVIL
ISLEY RINCON SUAREZ	ESPECIALISTA EN VIAS	INGENIERA CIVIL
GERSON JHAIR CUADROS LUNA	ESPECIALISTA AMBIENTAL	INGENIERO AMBIENTAL

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

  SI: ____ NO: _x__
  Valor del incremento: $_____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

  SI: ____ NO: _x__ Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI____ NO _X__

SITUACIÓN FINANCIERA

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 5.837.952.700,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$	

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	09
		Vigencia:	08-09-2026

VALOR FINAL	$	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE Y/O NOVIEMBRE	$ 516.295.237,00	Valor Corte $ 516.295.237,00 Valor legalización: $ 0,00 Valor por pagar $ 516.295.237,00
PAGO SALDO PAC	**$ 5.321.657.463,00**	

OBSERVACIONES

NO APLICA

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JAIME ALBERTO GALAN VILLAMIZAR CONSORCIO ALOJAMIENTO FAC 26 **CONTRATISTA DE OBRA**	DONAL BOGOTÁ BAUTISTA DBB INGENIERIA SAS **INTERVENTOR**

CORONEL MARIBEL SILVA BARRERA
ORDENADOR DEL GASTO

ANEXO 3.D

INGENIERÍA
CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 033-00-A-COFAC-DIFRA-2026


Formato Imputación Presupuestal (GA-JEADA-FR-132)

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	**JELOG**
Nombre del Supervisor de Contrato	**DBB INGENIERIA SAS**
Ordenador del Gasto	**DIFRA**
No. Contrato	**035-00-A-COFAC-DIFRA-2026**
Objeto del contrato	**OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO PARA SOLDADOS PROFESIONALES EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 EN PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES GENERALES DEL PROCESO.**
Valor inicial del contrato	**$ 5.837.952.700,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 5.837.952.700,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)	RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
1505-0100-1-1-20109B-1505044-02	10	02-01-01-001-001-07	VIVIENDA PARA PERSONAL MILITAR	DIFRA- OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN ALOJAMIENTO PARA SOLDADOS PROFESIONALES EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 EN PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA	**$ 5.752.376.292,00**
1505-0100-1-1-20109B-1505044-02	10	02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	VENTILADOR DE PARED INDUSTRIAL 26 PULGADAS	**$ 22.410.032,00**
1505-0100-1-1-20109B-1505044-02	10	02-01-01-004-003-02	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	ELECTROBOMBA ALTA PRESION EN HIERRO CON MOTOR ELECTRICO TRIFASICO A 220/440V DE 7,5 HP	**$ 13.258.618,00**
1505-0100-1-1-20109B-1505044-02	10	02-01-01-004-003-02	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	TANQUE HIDRONEUMATICO CON MEMBRANA INTERCAMBIABLE DE 500 LITROS CONEXIÓN 1 1/4 VERTICAL	**$ 4.668.767,00**
1505-0100-1-1-20109B-1505044-02	10	02-01-01-004-003-02	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	BOMBA PEARL SUMERGIBLE DE 1,0HP 220V	**$ 1.140.877,00**
1505-0100-1-1-20109B-1505044-02	10	02-01-01-004-003-02	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE EN HIERRO FUNDIDO PARA AGUAS RESIDUALES CON MOTOR ELECTRICO TRIFASICO 220 V DE 3.0 HP	**$ 21.432.186,00**
1505-0100-1-1-20109B-1505044-02	10	02-01-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	TABLERO DE CONTROL PARA SISTEMA DE PRESION CONSTANTE VARIAD...	**$ 17.367.812,00**
1505-0100-1-1-20109B-1505044-02	10	02-01-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	TABLERO INTELIGENTE MULTIFUNCION	**$ 896.403,00**
1505-0100-1-1-20109B-1505044-02	10	02-01-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	TABLERO DE CONTROL INTELIGENTE PARA DOS BOMBAS 3.0 HP TRIFÁSICO 220V ALTERNACIÓN AUTOMÁTICA	**$ 4.401.713,00**
TOTAL VIGENCIA **2026**					**$ 5.837.952.700,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 5.837.952.700,00**
			Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	OCTUBRE y/o NOVIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	1505-0100-1-1-20109B-1505044-02-10	02-01-01-001-001-07	DIFRA- OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN ALOJAMIENTO PARA SOLDADOS PROFESIONALES EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 EN PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA	$ 516.295.237,00	$ 516.295.237,00	$ 5.236.081.055,00
TOTALES							**$ 516.295.237,00**	**$ 516.295.237,00**	**$ 5.321.657.463,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	DBB INGENIERIA SAS
FECHA	1/10/2026

ANEXO 3.E

INGENIERÍA
CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 033-00-A-COFAC-DIFRA-2026

Soportes Parafiscales y Laborales (Certificación y Planillas PILA)

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

PERSONA JURIDICA

Señores
EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Ciudad


Con el objetivo de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre del 2002, todo lo consignado a continuación queda previsto bajo la gravedad de juramento.

Yo, JAIME ALBERTO GALAN VILLAMIZAR, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.185.747 Puerto Berrio - Antioquia, en mi condición de representante Legal de CONSORCIO ALOJAMIENTO FAC 26 identificado con NIT 902.077.300-8, certifico que durante los dos últimos (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Dada en Bucaramanga, a los catorce (14) días del mes de septiembre del 2026


Actuando en calidad de:

Representante Legal.



JAIME ALBERTO GALAN VILLAMIZAR
C.C. 71.185.747 Puerto Berrio - Antioquia

Contador



SONIA RINCON SUAREZ
C.C. 60.283.924
Tarjeta Profesional No. 53604 – T

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 902077300	8	CONSORCIO ALOJAMIENTOS FAC 26	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO ALOJAMIENTOS FAC 26	CR 12 # 34-67 OF 402 ED LOS CASTELLANOS	PUERTO SALGAR-CUNDINAMARCA	3183308643	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	07793031	9507793031	E	2026/07/02	2026/07/30	BANCO AV VILLAS	28	$278,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONSORCIO ALOJAMIENTOS FAC 26 (2 Afiliados)																								$1,108,907	$177,500			$1,108,907	$44,500			$1,108,907	$44,500			$1,108,907	$5,900				$0	$0		$272,400
Centro de Trabajo: ADMON (2 Afiliados)																								$1,108,907	$177,500			$1,108,907	$44,500			$1,108,907	$44,500			$1,108,907	$5,900				$0	$0		$272,400
Ciudad: PUERTO SALGAR Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados)																								$1,108,907	$177,500			$1,108,907	$44,500			$1,108,907	$44,500			$1,108,907	$5,900				$0	$0		$272,400
1	CC	71185747	GALAN JAIME	X																	25-14	9	$1,050,543	$168,100	EPS046	9	$1,050,543	$42,100	CCF26	9	$1,050,543	$42,100	14-11	9	$1,050,543	0.522%	$5,500	9	$0	$0	Si	$257,800
2	CC	1005297037	PRADA ROUSS	X	X																230201	1	$58,364	$9,400	EPS005	1	$58,364	$2,400	CCF26	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	0.522%	$400	1	$0	$0	Si	$14,600
Total			**Afiliados(2)**																				$1,108,907	$177,500			$1,108,907	$44,500			$1,108,907	$44,500			$1,108,907	$5,900				$0	$0		$272,400

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$177,500	$3,700	$0	$181,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$168,100	$3,500	$0	$171,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$9,400	$200	$0	$9,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$5,900	$200	$0	$6,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$5,900	$200	$0	$6,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$44,500	$1,000	$0	$45,500
COMFACUNDI	CCF26	860,045,904	7	2	$44,500	$1,000	$0	$45,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$44,500	$1,000	$0	$45,500
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$42,100	$900	$0	$43,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$2,400	$100	$0	$2,500
TOTAL				**2**	**$272,400**	**$5,900**	**$0**	**$278,300**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 902077300	8	CONSORCIO ALOJAMIENTOS FAC 26	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO ALOJAMIENTOS FAC 26	CR 12 # 34-67 OF 402 ED LOS CASTELLANOS	PUERTO SALGAR-CUNDINAMARCA	3183308643	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	09322131	9509322131	E	2026/08/04	2026/08/11	BANCO AV VILLAS		$1,722,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONSORCIO ALOJAMIENTOS FAC 26 (2 Afiliados)																								$4,027,082	$644,400			$4,027,082	$161,200			$4,027,082	$161,200			$4,027,082		$21,100			$0	$0		$987,900
Centro de Trabajo: ADMON (2 Afiliados)																								$4,027,082	$644,400			$4,027,082	$161,200			$4,027,082	$161,200			$4,027,082		$21,100			$0	$0		$987,900
Ciudad: PUERTO SALGAR Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados)																								$4,027,082	$644,400			$4,027,082	$161,200			$4,027,082	$161,200			$4,027,082		$21,100			$0	$0		$987,900
1	CC	71185747	GALAN JAIME																		25-14	30	$3,501,810	$560,300	EPS046	30	$3,501,810	$140,100	CCF26	30	$3,501,810	$140,100	14-11	30	$3,501,810	0.522%	$18,300	30	$0	$0	Si	$858,800
2	CC	13499454	RIVERA JAIRO	X																	230301	9	$525,272	$84,100	EPS037	9	$525,272	$21,100	CCF26	9	$525,272	$21,100	14-11	9	$525,272	0.522%	$2,800	9	$0	$0	Si	$129,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: FAC TECNICO (8 Afiliados)																								$2,334,542	$374,000			$2,334,542	$93,900			$2,334,542	$93,900			$2,334,542		$162,800			$0	$0		$724,600
Centro de Trabajo: FAC TECNICO (8 Afiliados)																								$2,334,542	$374,000			$2,334,542	$93,900			$2,334,542	$93,900			$2,334,542		$162,800			$0	$0		$724,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (8 Afiliados)																								$2,334,542	$374,000			$2,334,542	$93,900			$2,334,542	$93,900			$2,334,542		$162,800			$0	$0		$724,600
3	CC	80721397	CASTRO FREDDY	X	X																230201	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF26	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	6.960%	$4,100	1	$0	$0	Si	$18,300
4	CC	1102356716	CUADROS GERSON	X																	25-14	9	$525,272	$84,100	EPS037	9	$525,272	$21,100	CCF26	9	$525,272	$21,100	14-11	9	$525,272	6.960%	$36,600	9	$0	$0	Si	$162,900
5	CC	1054546875	CUENCA ADIAN	X																	25-14	4	$233,454	$37,400	EPS037	4	$233,454	$9,400	CCF26	4	$233,454	$9,400	14-11	4	$233,454	6.960%	$16,300	4	$0	$0	Si	$72,500
6	CC	1007329672	FLOREZ MARCO	X																	230301	4	$233,454	$37,400	EPS037	4	$233,454	$9,400	CCF26	4	$233,454	$9,400	14-11	4	$233,454	6.960%	$16,300	4	$0	$0	Si	$72,500
7	CC	91205625	JEREZ EDGAR	X																	230201	8	$466,908	$74,800	EPS037	8	$466,908	$18,700	CCF26	8	$466,908	$18,700	14-11	8	$466,908	6.960%	$32,500	8	$0	$0	Si	$144,700
8	CC	1073325721	PANCHA LUIS	X	X																230301	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF26	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	6.960%	$4,100	1	$0	$0	Si	$18,300
9	CC	84076850	PINTO EDWIN	X																	230301	9	$525,272	$84,100	EPS017	9	$525,272	$21,100	CCF26	9	$525,272	$21,100	14-11	9	$525,272	6.960%	$36,600	9	$0	$0	Si	$162,900
10	CC	3133482	ROSAS ROBIRO	X																	230301	4	$233,454	$37,400	EPS037	4	$233,454	$9,400	CCF26	4	$233,454	$9,400	14-11	4	$233,454	6.960%	$16,300	4	$0	$0	Si	$72,500
Total			**Afiliados(10)**																				$6,361,624	$1,018,400			$6,361,624	$255,100			$6,361,624	$255,100			$6,361,624		$183,900			$0	$0		$1,712,500

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$1,018,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$681,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$252,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$84,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$183,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$183,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$255,100
COMFACUNDI	CCF26	860,045,904	7	10	$255,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$255,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$21,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$93,900
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$140,100
TOTAL				**10**	**$1,712,500**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 902077300	8	CONSORCIO ALOJAMIENTOS FAC 26	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO ALOJAMIENTOS FAC 26	CR 12 # 34-67 OF 402 ED LOS CASTELLANOS	PUERTO SALGAR-CUNDINAMARCA	3183308643	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-09	11092646	9511092646	E	2026/09/02	2026/09/17	BANCO AV VILLAS	15	$4,900,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONSORCIO ALOJAMIENTOS FAC 26 (3 Afiliados)																							$5,252,716	$840,500			$3,501,810	$140,100			$5,252,716	$210,300			$7,003,620		$36,700		$0	$0		$1,227,600
Centro de Trabajo: ADMON (3 Afiliados)																							$5,252,716	$840,500			$3,501,810	$140,100			$5,252,716	$210,300			$7,003,620		$36,700		$0	$0		$1,227,600
Ciudad: PUERTO SALGAR Depto: CUNDINAMARCA (3 Afiliados)																							$5,252,716	$840,500			$3,501,810	$140,100			$5,252,716	$210,300			$7,003,620		$36,700		$0	$0		$1,227,600
1	CC	1102356716	CUADROS GERSON																		25-14	9	$875,453	$140,100		0	$0	$0	CCF26	9	$875,453	$35,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	9	$0	$0	No	$184,400
2	CC	71185747	GALAN JAIME																		25-14	30	$3,501,810	$560,300	EPS046	30	$3,501,810	$140,100	CCF26	30	$3,501,810	$140,100	14-11	30	$3,501,810	0.522%	$18,300	30	$0	$0	Si	$858,800
3	CC	13499454	RIVERA JAIRO																		230301	9	$875,453	$140,100		0	$0	$0	CCF26	9	$875,453	$35,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	9	$0	$0	No	$184,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: FAC TECNICO (18 Afiliados)																							$11,672,704	$1,868,400			$11,672,704	$468,200			$11,672,704	$468,200			$11,672,704		$813,400		$0	$0		$3,618,200
Centro de Trabajo: FAC TECNICO (18 Afiliados)																							$11,672,704	$1,868,400			$11,672,704	$468,200			$11,672,704	$468,200			$11,672,704		$813,400		$0	$0		$3,618,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (18 Afiliados)																							$11,672,704	$1,868,400			$11,672,704	$468,200			$11,672,704	$468,200			$11,672,704		$813,400		$0	$0		$3,618,200
4	CC	78759834	ALVAREZ JUAN	X																	230301	13	$758,726	$121,400	EPS041	13	$758,726	$30,400	CCF26	13	$758,726	$30,400	14-11	13	$758,726	6.960%	$52,900	13	$0	$0	Si	$235,100
5	CC	1066269288	BALCAZAR YOSIMAR	X	X																231001	6	$350,181	$56,100	EPS002	6	$350,181	$14,100	CCF26	6	$350,181	$14,100	14-11	6	$350,181	6.960%	$24,400	6	$0	$0	Si	$108,700
6	CC	1049392180	BOCOTA KEVIN	X																	230301	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF26	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	6.960%	$4,100	1	$0	$0	Si	$18,300
7	CC	1003230486	CELEDON JESUS	X																	230301	13	$758,726	$121,400	EPS017	13	$758,726	$30,400	CCF26	13	$758,726	$30,400	14-11	13	$758,726	6.960%	$52,900	13	$0	$0	Si	$235,100
8	CC	1065659974	CORONADO ALEXANDER	X																	230301	13	$758,726	$121,400	CCFC55	13	$758,726	$30,400	CCF26	13	$758,726	$30,400	14-11	13	$758,726	6.960%	$52,900	13	$0	$0	Si	$235,100
9	CC	1054546875	CUENCA ADIAN		X																25-14	6	$350,181	$56,100	EPS037	6	$350,181	$14,100	CCF26	6	$350,181	$14,100	14-11	6	$350,181	6.960%	$24,400	6	$0	$0	Si	$108,700
10	CC	1073328215	FLOREZ JEAN	X	X																230301	6	$350,181	$56,100	EPS037	6	$350,181	$14,100	CCF26	6	$350,181	$14,100	14-11	6	$350,181	6.960%	$24,400	6	$0	$0	Si	$108,700
11	CC	1007329672	FLOREZ MARCO		X																230301	6	$350,181	$56,100	EPS037	6	$350,181	$14,100	CCF26	6	$350,181	$14,100	14-11	6	$350,181	6.960%	$24,400	6	$0	$0	Si	$108,700
12	CC	1054555781	GALLEGO JAIR	X	X																230301	6	$350,181	$56,100	EPS017	6	$350,181	$14,100	CCF26	6	$350,181	$14,100	14-11	6	$350,181	6.960%	$24,400	6	$0	$0	Si	$108,700
13	CC	1127360497	GARCIA OSCAR	X																	230301	13	$758,726	$121,400	EPS037	13	$758,726	$30,400	CCF26	13	$758,726	$30,400	14-11	13	$758,726	6.960%	$52,900	13	$0	$0	Si	$235,100
14	CC	91205625	JEREZ EDGAR																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF26	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
15	CC	1003697761	MARROQUIN CRISTIAN	X																	230301	18	$1,050,543	$168,100	EPS002	18	$1,050,543	$42,100	CCF26	18	$1,050,543	$42,100	14-11	18	$1,050,543	6.960%	$73,200	18	$0	$0	Si	$325,500
16	CC	1003617120	PINEDA KEVIN	X																	230301	18	$1,050,543	$168,100	EPS002	18	$1,050,543	$42,100	CCF26	18	$1,050,543	$42,100	14-11	18	$1,050,543	6.960%	$73,200	18	$0	$0	Si	$325,500
17	CC	84076850	PINTO EDWIN																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF26	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
18	CC	1118368518	RODRIGUEZ ORLANDO	X																	230301	13	$758,726	$121,400	EPS005	13	$758,726	$30,400	CCF26	13	$758,726	$30,400	14-11	13	$758,726	6.960%	$52,900	13	$0	$0	Si	$235,100
19	CC	1115794487	RODRIGUEZ YEFFERSON	X	X																230301	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF26	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	6.960%	$4,100	1	$0	$0	Si	$18,300
20	CC	1115794497	RODRIGUEZ YEFFERSON	X	X																230301	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF26	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	6.960%	$4,100	1	$0	$0	Si	$18,300
21	CC	3133482	ROSAS ROBIRO		X																230301	6	$350,181	$56,100	EPS037	6	$350,181	$14,100	CCF26	6	$350,181	$14,100	14-11	6	$350,181	6.960%	$24,400	6	$0	$0	Si	$108,700
Total			**Afiliados(21)**																				$16,925,420	$2,708,900			$15,174,514	$608,300			$16,925,420	$678,500			$18,676,324		$850,100		$0	$0		$4,845,800

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				21	$2,708,900	$30,500	$0	$2,739,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$56,100	$700	$0	$56,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$756,500	$8,500	$0	$765,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	16	$1,616,100	$18,100	$0	$1,634,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$3,200	$0	$283,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$850,100	$9,500	$0	$859,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	21	$850,100	$9,500	$0	$859,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$678,500	$7,600	$0	$686,100
COMFACUNDI	CCF26	860,045,904	7	21	$678,500	$7,600	$0	$686,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				19	$608,300	$7,100	$0	$615,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$114,600	$1,300	$0	$115,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$164,100	$1,900	$0	$166,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$30,400	$400	$0	$30,800
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	1	$30,400	$400	$0	$30,800
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$140,100	$1,600	$0	$141,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$98,300	$1,100	$0	$99,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$30,400	$400	$0	$30,800
TOTAL				**21**	**$4,845,800**	**$54,700**	**$0**	**$4,900,500**

ANEXO 3.F

INGENIERÍA
CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 033-00-A-COFAC-DIFRA-2026

Certificado Fiduciario e Intereses (Extracto y Rendimientos del Anticipo) No aplica

ANEXO 4

INGENIERÍA
CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 033-00-A-COFAC-DIFRA-2026

FORMATOS DE CONTROL TÉCNICO POR CAPÍTULO DE EJECUCIÓN (MAISO)

ANEXO 4.A

INGENIERÍA
CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 033-00-A-COFAC-DIFRA-2026

GA-JELOG-FR-055: Formato Acta de Vecindad

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-055
	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

LUGAR Y FECHA	PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA
CONTRATO No.	No. 035-00-A-COFAC-DIFRA-2026
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO PARA SOLDADOS PROFESIONALES EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 EN PUERTO SALGAR – CUNDINAMARCA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
VALOR DEL CONTRATO	$ 5.837.952.699,72
CONTRATISTA	CONSORCIO ALOJAMIENTO FAC 26
INTERVENTOR ó SUPERVISOR	DBB INGENIERÍA S.A.S.
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA	COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 EN PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA
PLAZO DE ENTREGA	SEIS (6) MESES O HASTA EL QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE 2026

El día 30 del mes de JUNIO del 2026 a las 9:00 AM, se reunieron: Por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA, Capitan Anderson Vera, en sus calidad de capitan y supervisor , asi mismo Donal Bogotá Bautista, representante legal DBB INGENIERÍA S.A.S., Pilar Rubiano Diaz, en calidad de interventor , y Ariolfo Antonio Tovar Pardo, director de obra, Rouss Azul Prada Naranjo, Profesional en topografia, en calidad de contratista con el fin de REALIZAR UNA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PUNTOS CARDINALES DEL LUGAR DONDE SE EJECUTA LA OBRA, ADJUNTANDO DESCRIPCIÓN ESCRITA Y FOTOGRÁFICA ACTUAL DE LAS OBRAS EN SU ALREDEDOR.

Edificios y zonas exteriores presentes al Norte	Registro fotografico
El área objeto de intervención colinda con el Alojamiento No. 3. Durante la inspección de vecindad realizada se identificaron las siguientes condiciones preexistentes: Se observan luminarias desprendidas de su sistema de fijación. Se evidencian ventiladores desprendidos de su sistema de anclaje. En el muro contiguo al área de duchas se identifican grietas de orientación vertical, localizadas sobre el nicho correspondiente al vano de la puerta. La ventana del Alojamiento No. 3 presenta desprendimiento en su parte superior, evidenciándose una separación entre el marco de la ventana y el elemento constructivo. En la cubierta se observan varias tejas fracturadas. Las condiciones descritas fueron debidamente registradas mediante el correspondiente registro fotográfico, el cual forma parte integral de la presente Acta de Vecindad y constituye el soporte del estado físico del inmueble al momento de la inspección.	     

Edificios y zonas exteriores presentes al Sur	Registro fotografico
En el costado sur del área objeto de intervención se localiza una zona verde con presencia de árboles y cobertura vegetal. Durante la inspección se identificó que algunos de los individuos arbóreos existentes se encuentran contemplados para tala y/o poda, de conformidad con el permiso expedido por la entidad competente y suministrado por la Entidad Contratante. Las condiciones actuales de la zona verde y de los árboles existentes quedaron registradas mediante el correspondiente registro fotográfico, el cual hace parte integral de la presente Acta de Vecindad.	 

Edificios y zonas exteriores presentes al Este	Registro fotografico
El área objeto de intervención colinda con una edificación de un (1) piso destinada a oficina. Durante la inspección de vecindad realizada se identificaron las siguientes condiciones preexistentes: Se observan varias tejas de la cubierta fracturadas. Se identifica una fisura en una de las vigas que conforman la estructura de la edificación. En los muros se evidencian grietas visibles de diferentes dimensiones. Las condiciones descritas fueron debidamente registradas mediante el correspondiente registro fotográfico, el cual forma parte integral de la presente Acta de Vecindad y constituye el soporte del estado físico del inmueble al momento de la inspección.	   

Edificios y zonas exteriores presentes al Oeste	Registro fotografico
El área objeto de intervención colinda con una zona verde en la que se localizan varios individuos arbóreos contemplados para poda, de conformidad con el permiso otorgado por la autoridad competente. Durante la inspección de vecindad se identificó, además, que los andenes existentes presentan un estado de deterioro, evidenciándose sectores con desgaste superficial, fisuras y otras afectaciones propias de su estado de conservación. Las condiciones descritas fueron debidamente registradas mediante el correspondiente registro fotográfico, el cual forma parte integral de la presente Acta de Vecindad y constituye el soporte del estado físico del área colindante al momento de la inspección.	   

ANEXOS

*Los que estime la unidad
*Si no aplica colocar N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

JAIME ALBERTO GALAN VILLAMIZAR Representante Legal Contratista Firma y posfirma	ARIOLFO ANTONIO TOVAR PARDO Director de Obra Firma y posfirma
DONAL BOGOTÁ BAUTISTA Representante Legal Interventoría Firma y posfirma	PILAR RUBIANO DIAZ ingeniera Apoyo Interventoría Firma y posfirma

CT. VERA ANDERSON
Supervisor - FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA
Firma y posfirma



ANEXO 4.B

INGENIERÍA
CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 033-00-A-COFAC-DIFRA-2026

GA-JELOG-FR-056: Revisión y Aprobación de Actividades Preliminares

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-056
	FORMATO REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTIVIDADES PRELIMINARES	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO N°	**035-00-A-COFAC-DIFRA-2026**
OBJETO DEL CONTRATO	**OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN ALOJAMIENTO PARA SOLDADOS PROFESIONALES EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1 (SEGÚN ANEXO TÉCNICO)**
CONTRATISTA	**CONSORCIO ALOJAMIENTO FAC 26**
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**DBB INGENIERIA SAS**

ÍTEM	PROCEDIMIENTO	REVISADO Y APROBADO		FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
		SI	NO			
1	**PRELIMINARES**					
1,1	DESCAPOTE H= 0.20 MTS, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	x		28/08/2026	Actividad ejecutada parcialmente.	Registro fotografico y anotación en bitácora
1,2	CAMPAMENTO DE 72 M2	x		21/08/2026	Actividad ejecutada. Campamento de obra construido y operativo.	Registro fotografico y anotación en bitácora
1,3	DEMOLICIÓN ANDÉN ESPESOR HASTA 25 CM, INCLUYE RETIRO	x		11/08/2026	Actividad ejecutada.	Registro fotografico y anotación en bitácora
1,4	DEMOLICION DE CAJAS DE INSPECCION, INCLUYE RETIRO	x		5/08/2026	Actividad ejecutada.	Registro fotografico y anotación en bitácora
1,5	DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL, INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL.	x		6/08/2026	Actividad ejecutada.	Registro fotografico y anotación en bitácora
1,6	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.INCLUYE RETIRO.	x		27/07/2026	Se desmontaron los aparatos sanitarios. Pendiente disposición final	Registro fotográfico y anotación en bitácora
1,7	DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES, INCLUYE RETIRO		x	31/08/2026	N/A (No aplica para esta obra)	N/A (No aplica para esta obra)
1,8	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA Y RETIRO.	x		30/07/2026	Actividad ejecutada.	Registro fotográfico y anotación en bitácora
1,9	DESMONTE DE VENTANERIA, INCLUYE VIDRIO Y ANGEOS INCLUYE RETIRO.		x	31/08/2026	N/A (No aplica para esta obra)	N/A (No aplica para esta obra)
1.10	DESMONTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE CUBIERTA EN TEJA DE ASBESTO-CEMENTO, INCLUYENDO EL RETIRO DE LAS CERCHAS Y TODOS LOS ACCESORIOS , MANEJO Y TRANSPORTE CONFORME A LA NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE, Y ENTREGA DE CERTIFICACIÓN DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS.	x		4/08/2026	Actividad ejecutada.	Registro fotografico y anotación en bitácora
1,11	DEMOLICIÓN PLACA EN CONCRETO ESPESOR HASTA 25 CM, INCLUYE RETIRO	x		11/08/2026	Actividad ejecutada.	Registro fotografico y anotación en bitácora
1,12	DESVÍO INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EXISTENTE	x		19/08/2026	Actividad ejecutada.	Registro fotografico y anotación en bitácora

ELABORÓ: YUDI ANGELA RENTERIA Residente de Interventoría Firma y Posfirma	REVISÓ: DONAL BOGOTA BAUTISTA Director de Interventoria Firma y Posfirma

ANEXO 4.C

INGENIERÍA
CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 033-00-A-COFAC-DIFRA-2026

GA-JELOG-FR-057: Revisión y Aprobación de Excavaciones

ANEXO 4.D

INGENIERÍA
CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
NO. 033-00-A-COFAC-DIFRA-2026

GA-JELOG-FR-058 / 059 / 060: Revisión y Aprobación de Cimentaciones (Superficial, Ciclópeos, Caissons o Pilotes)

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-058
	FORMATO REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE LAS ARMADURAS DE CIMENTACIÓN	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO N°	035-00-A-COFAC-DIFRA-2026
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN ALOJAMIENTO PARA SOLDADOS PROFESIONALES EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1 (SEGÚN ANEXO TÉCNICO)
CONTRATISTA	CONSORCIO ALOJAMIENTO FAC 26
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	DBB INGENIERIA SAS

ÍTEM	PROCEDIMIENTO	REVISADO Y APROBADO SI	REVISADO Y APROBADO NO	FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	OBSERVACIONES						EVIDENCIA
3	ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE LAS ARMADURAS DE CIMENTACIÓN										
3.1	DETALLE ESTRUCTURA				(Fy)	DIÁMETROS (Pulgadas)	NÚMERO	LONGITUD (m)	KG HIERRO	DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES	
	ZAPATAS ALOJAMIENTO 2										
	Z1 (A1)				FY: 420 MPA	5/8	18	2,22	62,02		
	Z1 (A4)				FY: 420 MPA	5/8	18	3,22	89,95		
	Z2 (B1)				FY: 420 MPA	5/8	22	2,42	82,63		
	Z2 (C1)				FY: 420 MPA	5/8	22	2,42	82,63		
	Z2 (J1)				FY: 420 MPA	5/8	22	2,42	82,63		
	Z2 (A2)				FY: 420 MPA	5/8	22	2,42	82,63		
	Z3 (E1)				FY: 420 MPA	5/8	24	2,72	101,31		
	Z3 (F1)				FY: 420 MPA	5/8	24	2,72	101,31		
	Z3 (G1)				FY: 420 MPA	5/8	24	2,72	101,31		
	Z3 (I1)				FY: 420 MPA	5/8	24	2,72	101,31		
	Z3 (J2)				FY: 420 MPA	5/8	24	2,72	101,31		
	Z3 (J3)				FY: 420 MPA	5/8	24	2,72	101,31		
	Z4 (G2)				FY: 420 MPA	5/8	24	2,72	101,31		
	Z4 (H2)				FY: 420 MPA	5/8	24	2,72	101,31		
	Z4 (I2)				FY: 420 MPA	5/8	24	2,72	101,31		
	Z5 (H1)				FY: 420 MPA	5/8	24	2,92	108,76		
	Z6 (I3)				FY: 420 MPA	5/8	26	3,02	121,86		
	Z7 (H3)				FY: 420 MPA	5/8	26	3,12	125,90		
	ZAPATAS ALOJAMIENTO 1										
	Z1 (A8)				FY: 420 MPA	5/8	18	2,22	62,02		
	Z2 (A7)				FY: 420 MPA	5/8	22	2,42	82,63		
	Z2 (B8)				FY: 420 MPA	5/8	22	2,42	82,63		
	Z2 (C8)				FY: 420 MPA	5/8	22	2,42	82,63		
	Z2 (J8)				FY: 420 MPA	5/8	22	2,42	82,63		
	Z3 (J6)				FY: 420 MPA	5/8	24	2,72	101,31		
	Z3 (J7)				FY: 420 MPA	5/8	24	2,72	101,31		
	Z4 (F7)				FY: 420 MPA	5/8	24	2,72	101,31		
	Z4 (G7)				FY: 420 MPA	5/8	24	2,72	101,31		
	Z4 (H7)				FY: 420 MPA	5/8	24	2,72	101,31		
	Z4 (I7)				FY: 420 MPA	5/8	24	2,72	101,31		
	Z5 (H8)				FY: 420 MPA	5/8	24	2,92	108,76		
	Z6 (G6)				FY: 420 MPA	5/8	26	3,02	121,86		
	Z7 (H6)				FY: 420 MPA	5/8	26	3,12	125,90		
	Z7 (I6)				FY: 420 MPA	5/8	26	3,12	125,90		
					TOTAL KG DE HIERRO				3.233,62		
3.2	EMPALMES				N/A						
3.3	TRASLAPOS				N/A						
3.4	CONEXIONES MECÁNICAS O SOLDADAS				N/A						
3.5	RECUBRIMIENTOS				RECUBRIMIENTO (m)	DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES					
3.5.1	ZAPATAS (Las anteriores menciondas)				0,04 m	Se cumple recubrimiento laterial de 4 cm y recubrimiento de 7 cm inferior contra el ciclopeo					
3.6	DISTANCIA ENTRE BARRAS				DIST HORIZ (cm)	DIST VERT (cm)	DIST LONGITUDINAL (cm)	DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES			
3.6.1	ZAPATAS (Las anteriores menciondas)				20	N/A	20	Se cumple con la distancia entre varillas cada 20 cm, en ambos sentidos			
3.7	LIMPIEZA DE LAS BARRAS EN GENERAL				CUMPLE						
3.8	LIMPIEZA ZONA DE VACIADO				CUMPLE						
3.9	ASPECTO SUPERFICIAL				CUMPLE - Libre de contaminantes y óxido perjudicial						
3.10	AUTORIZACIÓN DEL ESTUDIO				N/A						
3.11	INFORME A SUPERVISOR				Informe Interventoria Mes2_ Septiembre						

ELABORÓ:

YUDI ANGELA RENTERIA
Residente de Interventoría
Firma y Posfirma

REVISÓ:

DONAL BOGOTA BAUTISTA
Director de Interventoria
Firma y Posfirma

ANEXO 4.E

INGENIERÍA
CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
NO. 033-00-A-COFAC-DIFRA-2026

GA-JELOG-FR-061 / 062 / 063: Revisión de Armaduras, Formaletas y Mezclado/Curado de Concretos Estructurales

ANEXO 4.D

INGENIERÍA
CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
NO. 033-00-A-COFAC-DIFRA-2026

GA-JELOG-FR-064 / 065: Revisión de Muros de Mampostería y Colocación de Morteros

NO APLICA PARA EL PERIODO

ANEXO 4.E

INGENIERÍA
CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 033-00-A-COFAC-DIFRA-2026

GA-JELOG-FR-066: Revisión de Montaje de Estructura Metálica y Cubierta

NO APLICA PARA EL PERIODO

ANEXO 4.F

INGENIERÍA
CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 033-00-A-COFAC-DIFRA-2026

GA-JELOG-FR-067: Revisión de Acabados, Pintura, Enchapes, Pisos y Cielo Rasos

NO APLICA PARA EL PERIODO

ANEXO 4.G

INGENIERÍA
CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 033-00-A-COFAC-DIFRA-2026

GA-JELOG-FR-068 / 069: Revisión de Instalaciones Hidrosanitarias, Aguas Lluvias y Gas

NO APLICA PARA EL PERIODO

ANEXO 4.H

INGENIERÍA
CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
NO. 033-00-A-COFAC-DIFRA-2026

GA-JELOG-FR-070 / 071: Revisión de Acometidas e Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones

NO APLICA PARA EL PERIODO

ANEXO 4.I

INGENIERÍA
CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 033-00-A-COFAC-DIFRA-2026

GA-JELOG-FR-072 / 073: Revisión de Carpintería en Madera y Metálica

NO APLICA PARA EL PERIODO

ANEXO 4.J

INGENIERÍA
CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 033-00-A-COFAC-DIFRA-2026

GA-JELOG-FR-074 / 075: Revisión de Aparatos, Equipos y Obras Exteriores

NO APLICA PARA EL PERIODO

ANEXO 4.K

INGENIERÍA
CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 033-00-A-COFAC-DIFRA-2026

GA-JELOG-FR-109: Formato Evaluación Cumplimiento Obligaciones del Contratista
