
CRONOGRAMA DE OBRA RINCON SANTO

Duración: 60 días calendario | Programación por días relativos | Jornada: lunes a sábado

.

Ítem	Nombre de tarea	Und.	Cantidad	Duración	Inicio	Fin
0	**CRONOGRAMA DE OBRA**			**60 dc**	**D1**	**D60**
1	**PRELIMINARES**			**13 dc**	**D1**	**D13**
1.1	Cerca en tela verde H=2.10 m (ICCU CONST 1.8)	ML	10.54	1 dc	D1	D1
1.2	Demolición de baldosa H=0.04 m, incluye retiro (1.11)	M2	28.00	2 dc	D3	D4
1.3	Demolición de pañete, incluye retiro (1.13)	M2	50.00	2 dc	D4	D5
1.4	Demolición de mampostería 0.15 m, incluye retiro (1.16)	M2	53.80	2 dc	D8	D9
1.5	Demolición de placa maciza 0.30 m, incluye retiro (1.24)	M2	17.24	3 dc	D4	D6
1.6	Demolición de placa de piso 0.10 m, incluye retiro (1.26)	M2	26.80	2 dc	D10	D11
1.7	Desmonte de cubierta de asbesto cemento, incluye retiro (1.34)	M2	16.26	2 dc	D2	D3
1.8	Desmonte de marcos y puertas, incluye retiro (1.38)	UN	1.00	1 dc	D2	D2
1.9	Desmonte de ventanas, incluye retiro (1.39)	M2	2.20	1 dc	D2	D2
1.10	Demolición de vigas y columnas, incluye retiro (1.29)	M3	4.03	2 dc	D10	D11
1.11	Demolición de cimiento enterrado, incluye retiro (2.4)	M3	1.20	1 dc	D12	D12
1.12	Localización y replanteo de cimientos con precisión (1.41)	M2	16.26	1 dc	D13	D13
2	**CONCRETOS**			**25 dc**	**D15**	**D39**
2.1	Excavación manual H=0-2 m, retiro a menos de 5 km (16.4)	M3	36.29	4 dc	D15	D18
2.2	Base en concreto pobre 1500 PSI (4.29)	M3	0.57	1 dc	D19	D19
2.3	Concreto ciclópeo 2500 PSI, 50% rajón (APU 1)	M3	3.22	1 dc	D20	D20
2.4	Zapatas en concreto 3500 PSI (2.8)	M3	2.57	1 dc	D22	D22
2.5	Viga de amarre en concreto 3500 PSI (2.7)	M3	3.22	2 dc	D23	D24
2.6	Subbase granular (ICCU INV 3.2)	M3	8.40	3 dc	D29	D31
2.7	Placa de contrapiso 3000 PSI E=0.10 m (APU 2)	M2	28.00	1 dc	D33	D33
2.8	Columnas en concreto 3500 PSI (4.3)	M3	2.74	2 dc	D25	D26
2.9	Muro en bloque No. 5 E=0.12 m (5.17)	M2	67.08	6 dc	D34	D39
2.10	Viga aérea en concreto 3500 PSI (4.26)	M3	4.43	4 dc	D27	D30
2.11	Entrepiso placa maciza 3500 PSI E=0.12 m (4.16)	M2	19.59	4 dc	D27	D30

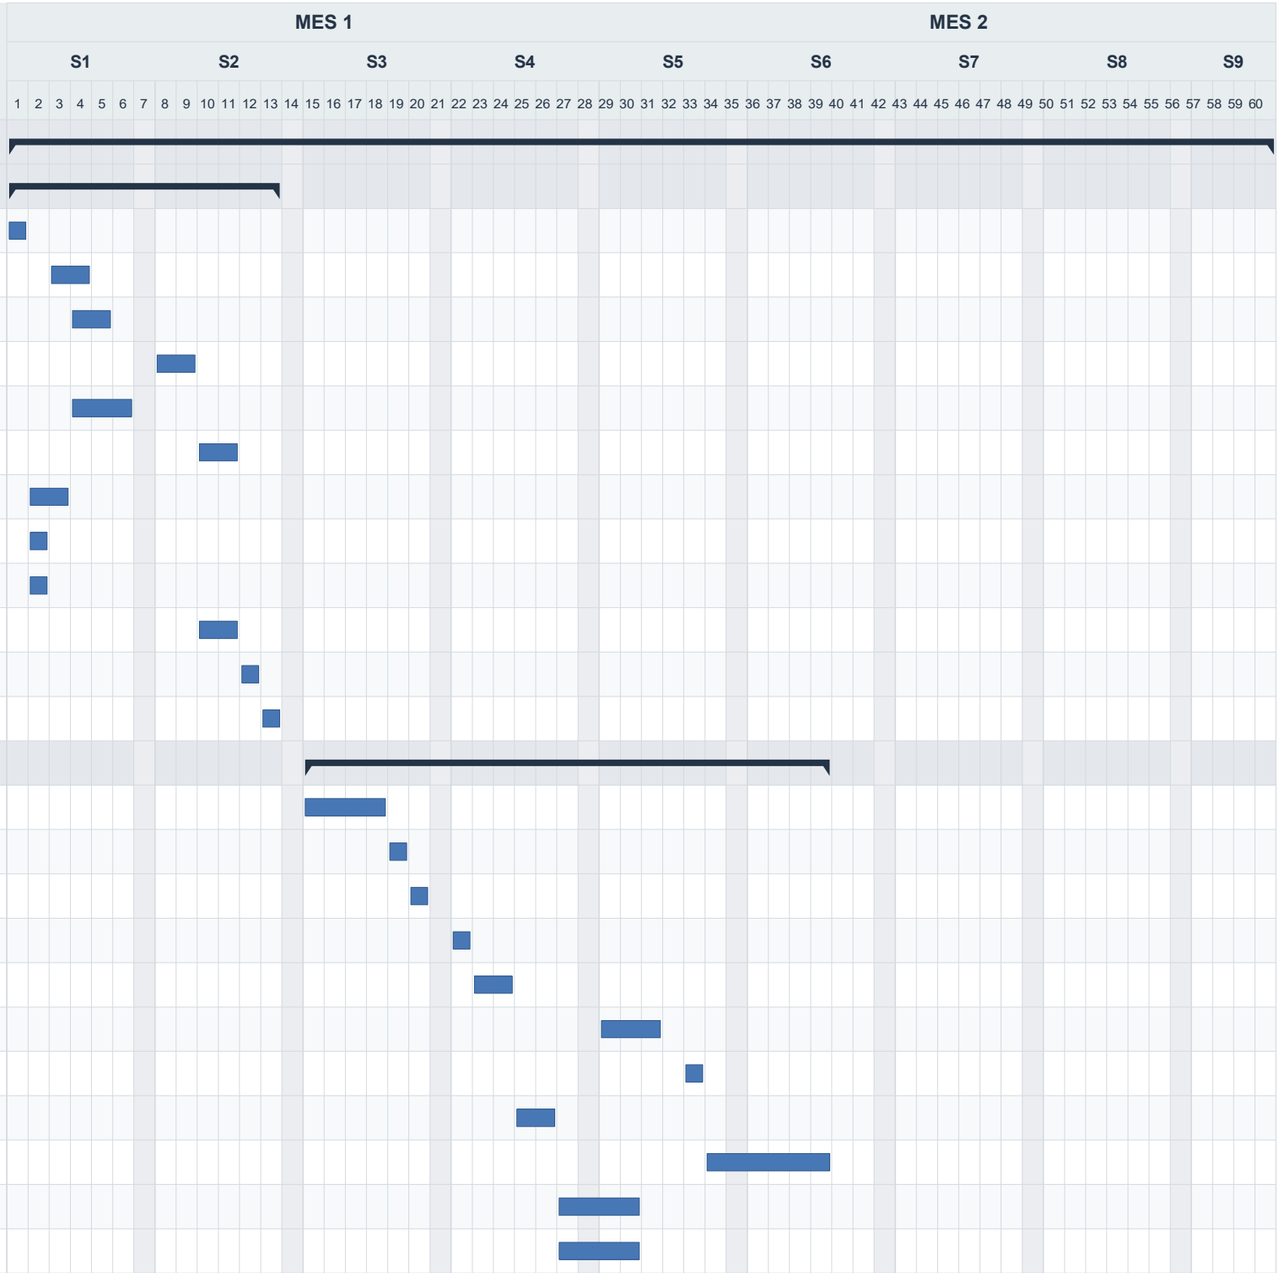


.

CRONOGRAMA DE OBRA RINCON SANTO

Duración: 60 días calendario | Programación por días relativos | Jornada: lunes a sábado

.

Ítem	Nombre de tarea	Und.	Cantidad	Duración	Inicio	Fin
3	**ACEROS Y CUBIERTA**			**32 dc**	**D15**	**D46**
3.1 a	Acero figurado 60000 PSI: cimentación (4.22)	KG	1,100.00	8 dc	D15	D22
3.1 b	Acero figurado 60000 PSI: columnas (4.22)	KG	550.00	2 dc	D23	D24
3.1 c	Acero figurado 60000 PSI: vigas y entrepiso (4.22)	KG	667.22	5 dc	D25	D29
3.2	Refuerzo de malla electrosoldada (4.23)	KG	57.96	1 dc	D32	D32
3.3	Estructura metálica para cubierta; tubo abierto 4×2, 15 mm (7.32)	M2	25.30	4 dc	D40	D43
3.4	Teja de fibrocemento No. 6 (7.23)	M2	25.30	2 dc	D44	D45
3.5	Caballete articulado de fibrocemento (7.6)	ML	4.32	1 dc	D46	D46
4	**ACABADOS**			**19 dc**	**D40**	**D58**
4.1	Alistado impermeabilizado de pisos 1:3 E=0.04 m (13.2)	M2	42.35	3 dc	D41	D43
4.2	Baldosa cerámica piso-pared 30×60 primera calidad (APU 3)	M2	42.35	4 dc	D50	D53
4.3	Baldosa cerámica piso-pared 30×60 lineal (APU 4)	ML	28.00	2 dc	D54	D55
4.4	Pañete impermeabilizado de muros 1:3 E=1.5 cm (6.15)	M2	144.36	6 dc	D40	D45
4.5	Pañete impermeabilizado lineal 1:3 E=1.5 cm (6.16)	ML	116.00	7 dc	D40	D46
4.6	Vinilo sobre pañete, dos manos (18.23)	M2	144.36	5 dc	D54	D58
4.7	Vinilo sobre pañete lineal, dos manos (18.24)	ML	116.00	5 dc	D54	D58
4.8	Escalera en acero cold rolled, pasos galvanizados, descanso 1.2×1.2 m y baranda (APU 5)	UND	1.00	2 dc	D47	D48
4.9	Cielo raso PVC E=9 mm, incluye estructura (APU 6)	M2	35.85	5 dc	D47	D51
4.10	Cornisa para cielo raso PVC (APU 7)	ML	27.00	1 dc	D52	D52
4.11	Puerta corrediza en aluminio negro (APU 8)	M2	3.96	2 dc	D53	D54
4.12	Ventana en aluminio y vidrio incoloro E=4 mm (APU 9)	M2	14.40	3 dc	D50	D52
5	**ELÉCTRICOS**			**34 dc**	**D25**	**D58**
5.1	Salida de toma doble PVC completa (12.9)	UND	8.00	5 dc	D54	D58
5.2	Salida de lámpara panel de incrustar (APU 10)	UND	8.00	6 dc	D53	D58
5.3	Tubería PVC conduit 1/2, incluye accesorios (12.16)	ML	15.00	16 dc	D25	D40
5.4	Tablero parcial de cuatro circuitos, incluye breaker (12.13)	UND	1.00	1 dc	D58	D58
6	**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS**			**60 dc**	**D1**	**D60**
H1	Curado, seguimiento y liberación de estructura	—		28 dc	D31	D58
G1	Compras, despieces y fabricación externa	—		39 dc	D1	D39
G2	Pruebas, limpieza, correcciones y entrega	—		2 dc	D59	D60

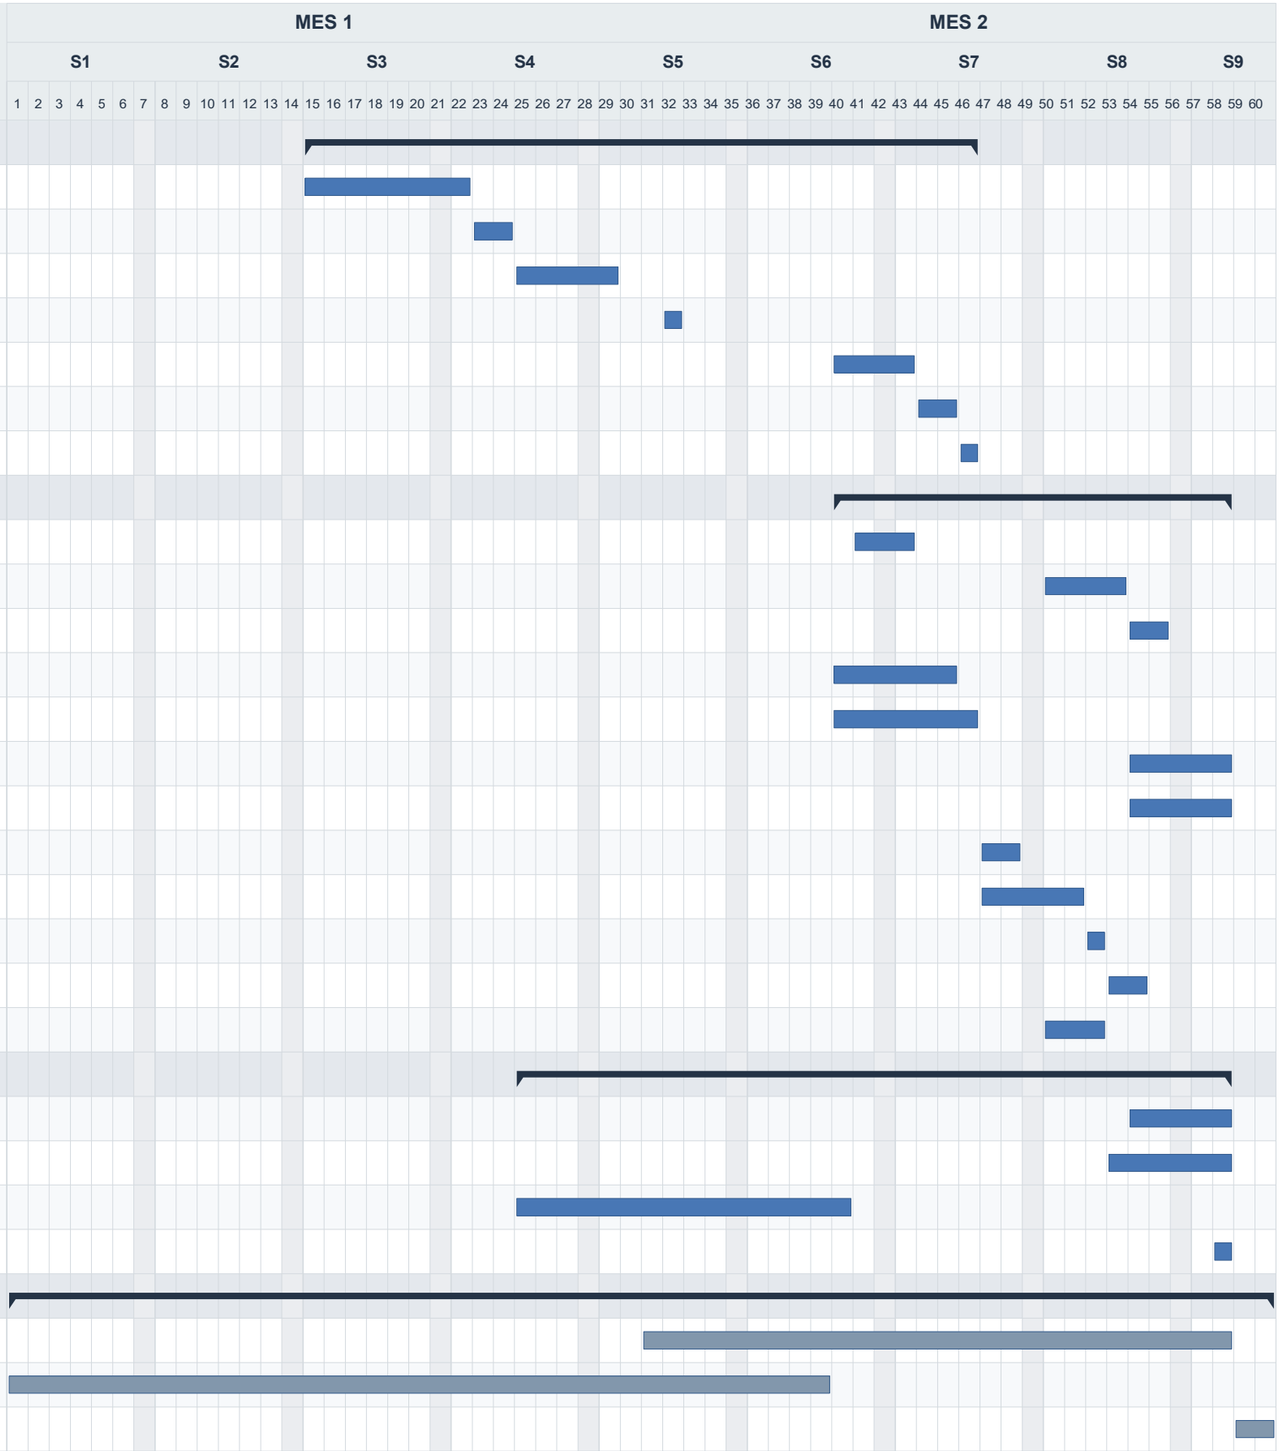

.
