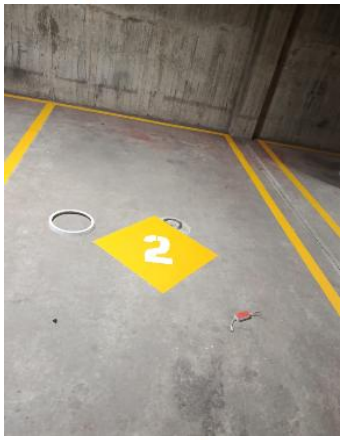
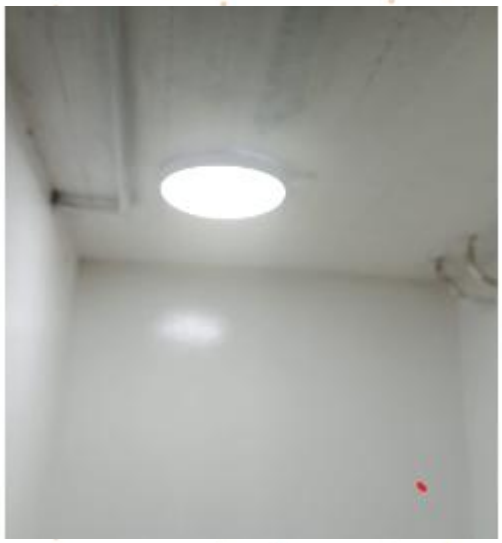
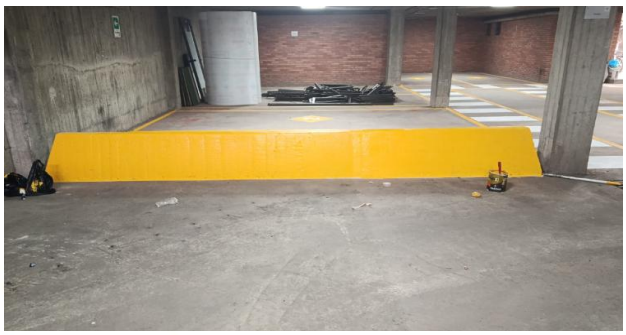
INFORME SEMANAL Nº8

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

OBJETO: "Contratar en nombre de LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, el mejoramiento y mantenimiento de infraestructura física propia en las sedes judiciales de Chiquinquirá, Pauna y Ráquira, en el departamento de Boyacá."	
CONTRATO	028 DE 2026
INFORME NÚMERO	8
PERIODO	Del 5 al 9 de octubre
ELABORO	PALOMA ARRAZOLA
TOTAL, PERSONAL DE OBRA	5
MAQUINARIA EN OBRA	ANDAMIOS- ARNES- ESLINGAS Y HERRAMIENTA MENOR
CLIMA	
LUNES	SOLEADO
MARTES	SOLEADO
MIERCOLES	SOLEADO
JUEVES	SOLEADO
VIERNES	SOLEADO
SABADO	SOLEADO
ACTIVIDADES DE OBRA	
DESCRIPCIÓN	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
1. Demarcación de parqueaderos del sótano Se realizó la pintura de la numeración de los parqueaderos ubicados en el sótano, con el fin de facilitar la identificación de los espacios y mejorar la organización y señalización del área de estacionamiento.	

2. Construcción de rampa de acceso al cuarto de aseo Se ejecutó la construcción de una rampa de acceso al cuarto de aseo ubicado en el sótano, con el propósito de facilitar el ingreso y mejorar las condiciones de accesibilidad al espacio.	
3. Instalación del escudo de la Rama Judicial Se realizó la instalación del escudo institucional de la Rama Judicial en la fachada del juzgado, como parte de las actividades de adecuación y mejoramiento de la presentación exterior de las instalaciones	
4. Mantenimiento de iluminación en el cuarto de aseo Se efectuó el desmonte del panel existente y la instalación de un panel LED redondo de sobreponer en el cuarto de aseo, con el fin de mejorar las condiciones de iluminación del espacio.	

5. Aplicación de pintura epóxica en el cuarto de residuos Se realizó el suministro y aplicación de pintura epóxica en la parte inferior de la placa del cuarto de residuos, como parte de las actividades de adecuación y mantenimiento del área, buscando mejorar el acabado y facilitar las labores de limpieza.	
6. Sondeo de bajantes de la terraza principal Se iniciaron las labores de sondeo en las bajantes de la terraza principal del juzgado, con el propósito de revisar las condiciones de las tuberías y verificar su funcionamiento. Posteriormente, se finalizaron estas actividades, dando continuidad a las labores de mantenimiento del sistema de evacuación de aguas lluvias.	
7. Instalación de guardaescoba en el hall del primer piso Se realizó la instalación del guardaescoba en el hall del primer piso, como parte de los trabajos de acabado y adecuación de las áreas interiores del juzgado, contribuyendo a mejorar la presentación y protección de la parte inferior de los muros.	
8. Desmonte de división en aluminio	

Se efectuó el desmonte de una división en aluminio ubicada en una oficina del primer piso, como parte de las actividades de adecuación de los espacios interiores, de acuerdo con las necesidades de intervención identificadas.	
9. Pintura de muro divisorio en el parqueadero Se realizaron trabajos de pintura en el muro divisorio del parqueadero, con el fin de mejorar el acabado de la superficie y las condiciones de presentación y mantenimiento del área intervenida.	

ELABORO: **PALOMA ARRAZOLA**	**REVISO:** **FERNANDO BOHORQEZ**	**APROBO:** **RAFAEL MATHEUS**
FIRMA:	**FIRMA:**	**FIRMA:**
RESIDENTE DE OBRA	**R/L FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS**	**R/L CONSORCIO INTERVENTORIA 2026**
