Villa de San Diego de Ubaté, 13 de octubre de 2026.
SOP–519-2026.

Señor.
RICHARD ALEXANDER BERNAL
Alcalde Municipal
Municipio de Ubaté


Asunto: Solicitud de Prorroga N.° 01 al Contrato de Obra SOP-375-2026 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA SOAGA SECTOR EL TABLÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA VOLCÁN SECTOR GETSEMANÍ EL BOQUERÓN DEL MUNICIPIO DE VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE (SEGÚN CONVENIOS ICCU No. 1270 Y 1482 DE 2025)"

Cordial saludo,

Con el fin de garantizar la correcta ejecución del **CONTRATO DE OBRA SOP-375-2026**, el cual tiene por objeto **"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA SOAGA SECTOR EL TABLÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA VOLCÁN SECTOR GETSEMANÍ EL BOQUERÓN DEL MUNICIPIO DE VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE (SEGÚN CONVENIOS ICCU No. 1270 Y 1482 DE 2025)"**, se solicita de manera cordial la **prórroga N.° 01 del contrato**, teniendo en cuenta las condiciones que actualmente afectan el normal desarrollo de las actividades previstas para la ejecución de la placa huella en la **vereda Soagá sector El Tablón del municipio de Villa de san Diego de Ubaté – Cundinamarca.**

Durante los últimos quince (15) días se han presentado fuertes precipitaciones en el municipio de Villa de San Diego de Ubaté, Cundinamarca, situación que ha generado afectaciones en diferentes tramos de vías rurales, incluyendo sectores donde se han ejecutado obras de placa huella. Esta condición ha requerido destinar maquinaria a la ejecución de actividades de reconformación y recuperación de los tramos afectados, con el propósito de restablecer condiciones adecuadas de transitabilidad y atender las necesidades de movilidad de las comunidades.

Como soporte gráfico complementario de las condiciones de precipitación en el municipio, se incorpora la imagen consultada en la plataforma WeatherSpark, correspondiente al comportamiento de la precipitación para el periodo representado en dicha gráfica. Este elemento se presenta como referencia complementaria a las condiciones climáticas evidenciadas y a las afectaciones atendidas por la Secretaría de Obras Públicas.

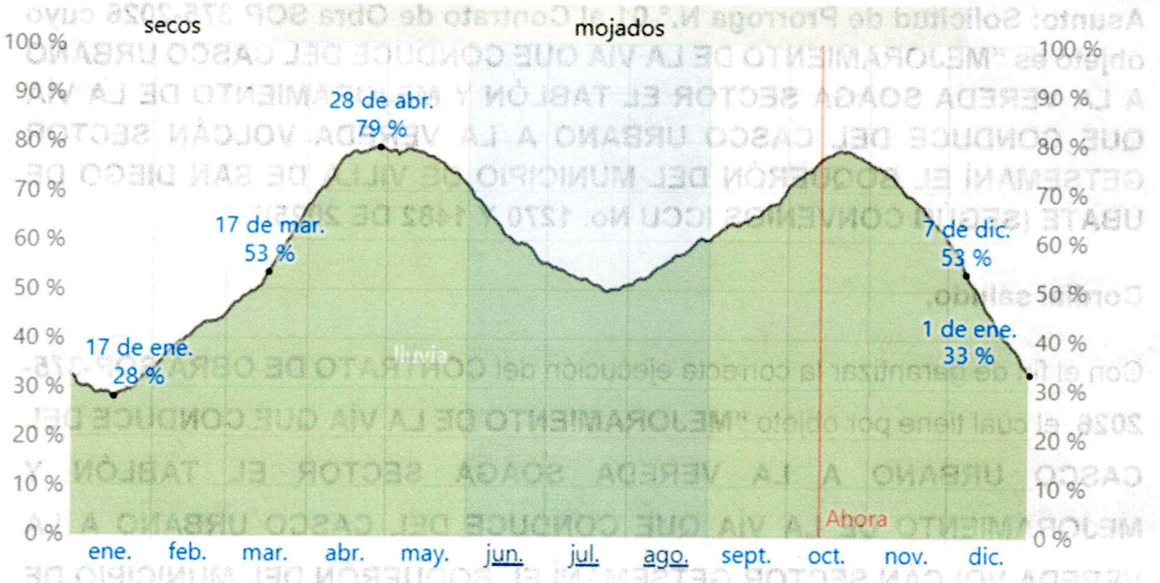

Fuente: https://es.weatherspark.com/y/24309/Tiempo-promedio-en-Ubat%C3%A9-Colombia-durante-todo-el-a%C3%B1o#Figures-PrecipitationProbability

Como consecuencia de las condiciones anteriormente descritas y de la necesidad de atender prioritariamente las afectaciones ocasionadas por las lluvias en otros sectores, la disponibilidad de maquinaria para continuar con las actividades de conformación de la vía en el sector El Tablón, vereda Soaga, se ha visto limitada. Lo anterior ha impedido culminar oportunamente esta actividad, necesaria para dar continuidad a la construcción de las placas huella contempladas en el contrato.

Esta situación ha reducido el tiempo efectivo disponible para la ejecución de las actividades constructivas pendientes, correspondientes a aproximadamente ciento sesenta y ocho (168) metros lineales de placa huella, cuya construcción requiere la culminación previa de la conformación de la vía y la disponibilidad de las condiciones técnicas y operativas necesarias.

En virtud de lo expuesto, y con el fin de culminar las actividades pendientes y garantizar la correcta ejecución del objeto contractual, **solicito respetuosamente su consideración y aprobación para tramitar la Prórroga No. 01 al contrato SOP-375-2026, desde la suscripción del acta correspondiente y hasta el veintiséis (26) de noviembre de 2026**, plazo previsto para finalizar la construcción del tramo de placa huella restante.

Anexos: Solicitud por parte de contratista y cronograma de obra actualizado.

Cordialmente,

ING. KARLA ROCIO PACHON CENDALES
Secretaria de Obras Públicas

SERVIDOR PÚBLICO	TRANSCRIBIO	REVISADO	APROBADO
Nombres	Freddy Alexander Moreno Rodríguez	Natalia Güalteros Ferro	Ing. Karla Rocio Pachon cendales
Cargo	Técnico Operativo	CPS Jurídica de la Secretaria de Obras Públicas	Secretaria de Obras Públicas
Fecha	13 de octubre de 2026	13 de octubre de 2026	13 de octubre de 2026
Firma			
