
CONTRATO DE INTERVENTORIA
084-2025 INT (119251)

OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

TORRES Y ASOCIADOS S.A.S

APROBO	ELABORO
Karen criado	
KAREN DAYANA CRIADO VEGA Representante Legal	MARIA AUXILIADORA CARDENAS LIZARAZO Residente de Interventoría

INFORME MENSUAL TECNICO N° 4
PERIODO: 01/ JULIO/25 AL 31/JULIO/25
VERSIÓN 0

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción
2. Componente técnico: Descripción de actividades Contratista
3. Actividades ejecutadas por interventoría.
4. Segmentos viales contractuales
5. Comité de obra
6. Ítems No Previstos
7. Matriz de Correspondencia
8. Registro fotográfico
9. Conclusiones y Recomendaciones
10. Anexos
    - Informes Semanales
    - Informes Diarios
    - Informe ejecutivo
    - Bitácoras
    - Actas de comité
    - Correspondencia enviada

1. INTRODUCCION

El factor movilidad al interior de la Localidad de Suba y las facilidades de comunicación con el resto de la ciudad, son clave para el bienestar y productividad de los ciudadanos, para el acceso a los barrios y la oportuna atención de emergencias y otras actividades propias de la comunidad, además de los altos costos en la movilidad, por lo que, la recuperación de la malla vial se convierte en una necesidad de interés general en tanto mejora la movilidad y transporte de las personas que transitan por la Localidad, ya sean residentes o habitantes en tránsito (población flotante), lo que también se ve reflejado en el empleo de un menor tiempo de recorrido de las rutas de transporte público, lo que redunda en el mejoramiento de la calidad de vida de la población de la localidad. Por lo anterior y teniendo en cuenta que una de las demandas más frecuentes de la comunidad de la localidad de Suba es la del mejoramiento de la malla vial y el espacio público; la Administración Local se ha venido encargando de promover el desarrollo de ciertas acciones que aporten a solucionar en cierto grado la problemática que surja al respecto desde la comunidad, considerando que el programa "Mejor Movilidad para Todos" reconoce justamente al barrio; unidad local por excelencia, como estructura básica de interacción y de identificación de los ciudadanos; dada esta iniciativa de brindar un mejor estado de nuestras vías el FDLS durante el año 2024 opto por invertir en un nuevo proyecto de construcción de segmentos viales bajo el contrato de obra 1010-2024.

El contrato 1010-2024 cuyo objeto contractual es EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO. A la fecha de este informe inicio actividades en Casablanca, Parque Piloto, Niza sur, Potosí, Bochalema y Costa azul. El contratista Consorcio Conservación PG cuenta con un plazo de 10 meses para la ejecución de las obras, teniendo en cuenta que el acta de inicio se firmó el 02/abril/2025. El valor total del contrato en mención es igual a TRECE MIL TREINTA Y TRES MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($ 13.033.377.846,00) M/CTE.

2. COMPONENTE TECNICO


En el marco de este contrato, la interventoría adelantó un conjunto de actividades técnicas, administrativas, financieras y ambientales, orientadas a garantizar el cumplimiento de los términos contractuales, la calidad de las obras ejecutadas y la optimización de los recursos públicos invertidos. Para tal fin, se implementaron mecanismos de seguimiento permanente, incluyendo visitas de campo, revisión documental, análisis de informes, control de cronogramas y validación de cantidades ejecutadas. Estas acciones permitieron verificar el adecuado desarrollo de las actividades por parte del contratista, en concordancia con los lineamientos establecidos en el anexo técnico, los diseños aprobados y la normatividad vigente.

A continuación, se describen las actividades realizadas por el contratista durante el lapso de tiempo correspondiente a este informe:

- Se realiza recorrido de verificación de los entornos escolares adjudicados al contrato de obra 1010-2024 y se toma el respectivo registro de estos para llevar a cabo el reporte en los formatos correspondientes exigidos por la entidad. Adicional a esto se realizan las mediciones debidas para el control presupuestal.

CASABLANCA

11005566, 11014376, 11005623, 11005728 Y 11005765

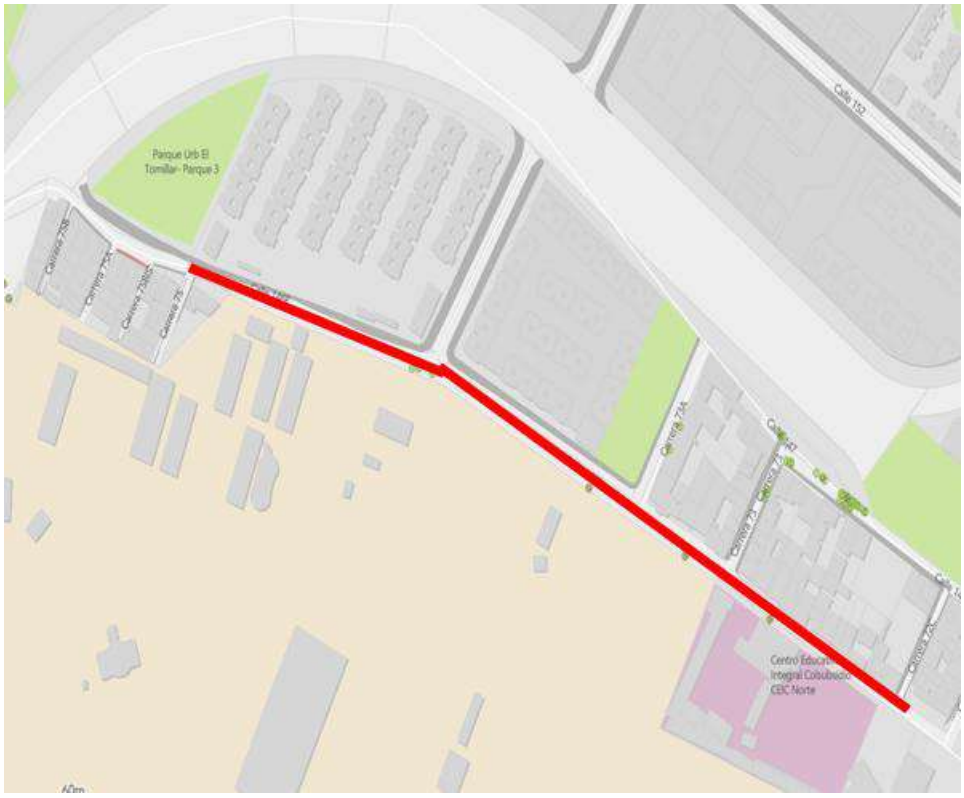


En el frente de trabajo correspondiente al sector **Casablanca**, ubicado en la Localidad de Suba, la interventoría realizó una supervisión integral y detallada sobre las actividades ejecutadas por el contratista, entre las cuales se incluyeron:

- ✓ Excavación mecánica
- ✓ Retiro de material.
- ✓ Instalación de Geotextil
- ✓ Instalación de Geocelda
- ✓ Instalación de Rajón
- ✓ Instalación de SBG PEA
- ✓ Instalación de tubería 12"
- ✓ Filtro

Durante el seguimiento a las actividades ejecutadas por el contratista, la interventoría realizó control técnico y supervisión permanente en campo sobre la excavación mecánica, verificando profundidades, dimensiones y estabilidad de taludes conforme a los diseños aprobados. Se inspeccionó el retiro de material garantizando su disposición adecuada y cumpliendo con la normatividad ambiental. En la instalación de geotextil, se comprobó la correcta colocación, traslapes y anclajes, asegurando su función de separación y refuerzo. Para la instalación de geoceldas, se verificó el armado, expansión y fijación en la superficie, así como el llenado uniforme con material granular. En el suministro e instalación de rajón, se controló la granulometría, compactación y espesor de capa. Durante la instalación de la Subbase Granular PEA (SBG PEA), se supervisó el cumplimiento de los espesores y densidades requeridas. En la colocación de tubería de 12", se revisaron alineación, pendiente y hermeticidad de uniones, y en la instalación del filtro, se validó el tipo de material, envoltura y disposición correcta para garantizar la funcionalidad del sistema de drenaje.


ESTRUCTURA DE PAVIMENTO 11005623, 11005728 Y 11005765

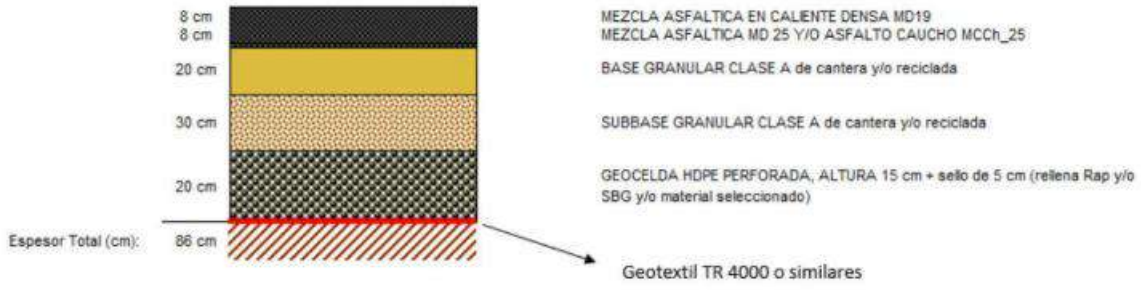


SECCION



ESTRUCTURA DE PAVIMENTO 11005566

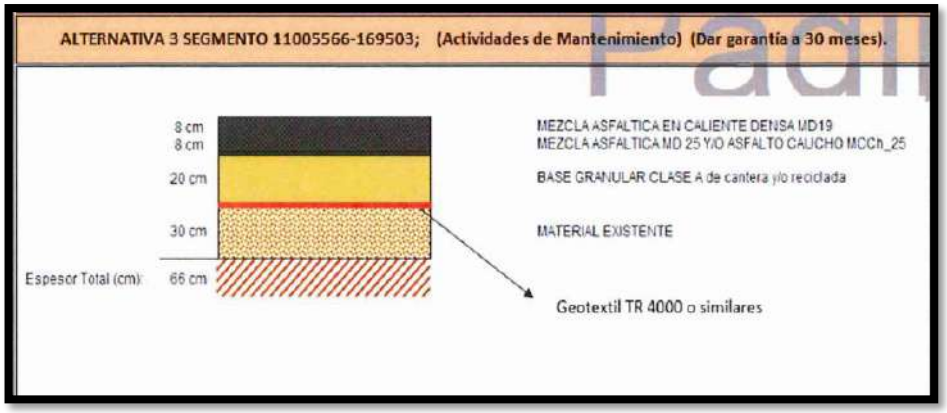

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO 11004376

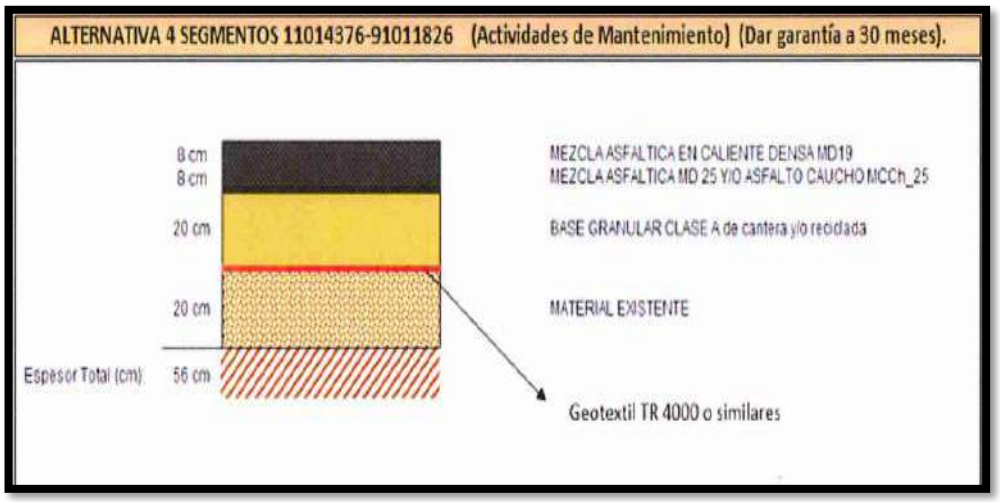

TIBABUYES (PARQUE PILOTO)

11006438, 11011976, 11011977, 11006546, 11011978, 11006617.






En el frente de obra Parque Piloto, el contratista ejecutó actividades de excavación mecánica, retiro de material y posterior instalación de rajón para la estabilización de la subrasante. La excavación mecánica se desarrolló con maquinaria especializada, cumpliendo las profundidades y dimensiones establecidas en los planos de diseño. El retiro de material incluyó la carga, transporte y disposición final en los sitios autorizados, garantizando la limpieza del área de intervención. La instalación de rajón se realizó mediante el extendido y nivelación del material pétreo, asegurando una distribución homogénea para conformar la capa de soporte.

Por su parte, la interventoría llevó a cabo la supervisión y control técnico de cada una de estas actividades, verificando en campo el cumplimiento de las especificaciones establecidas en el contrato. Durante la excavación, se inspeccionaron las cotas, alineaciones y estabilidad de taludes. En el retiro de material, se validó que la disposición se realizara en sitios autorizados y que no quedaran residuos que afectaran la ejecución posterior. En la instalación de rajón, se revisó la calidad del material, su granulometría, el espesor de capa y la compactación, garantizando que la conformación de la subrasante cumpliera con los parámetros técnicos exigidos para el correcto desempeño estructural de la vía.

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

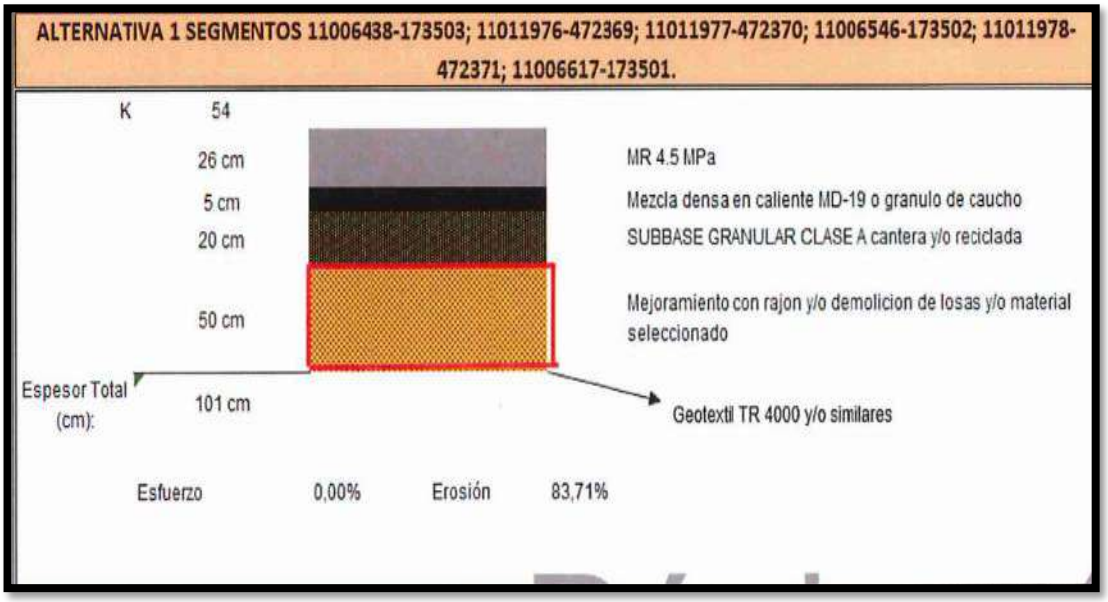


SECCION



COSTA AZUL


11005215

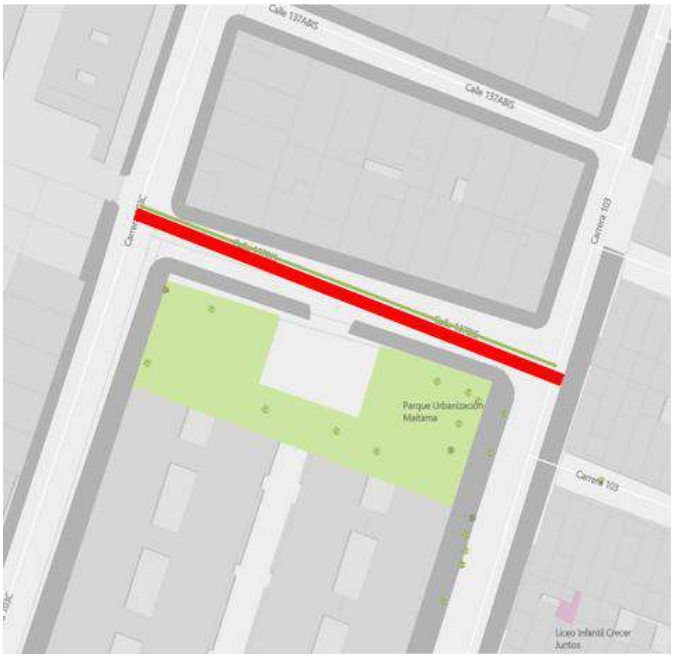


En el frente de obra Costa Azul, durante el presente mes el contratista ejecutó la instalación de sardineles, realizando actividades de replanteo, alineación y nivelación, así como el vaciado y curado del concreto para garantizar su resistencia y durabilidad. De igual manera, se adelantó la compactación del material granular correspondiente a la estructura vial, controlando espesores, humedad y densidad para asegurar la estabilidad de la capa. Actualmente, se encuentra pendiente la instalación del acabado final, con el cual se culminará la intervención de este tramo.

Por su parte, la interventoría desarrolló el seguimiento y control técnico de las actividades ejecutadas, verificando en la instalación de sardineles el cumplimiento de los parámetros establecidos en los diseños, la correcta preparación de la superficie y la calidad del concreto empleado. En cuanto a la compactación del material granular, supervisó que se respetaran los espesores definidos, se controlara adecuadamente la humedad y se alcanzaran los valores de densidad requeridos, dejando soporte fotográfico y documental de los avances y controlando el cumplimiento del cronograma para la posterior instalación del acabado pendiente.

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

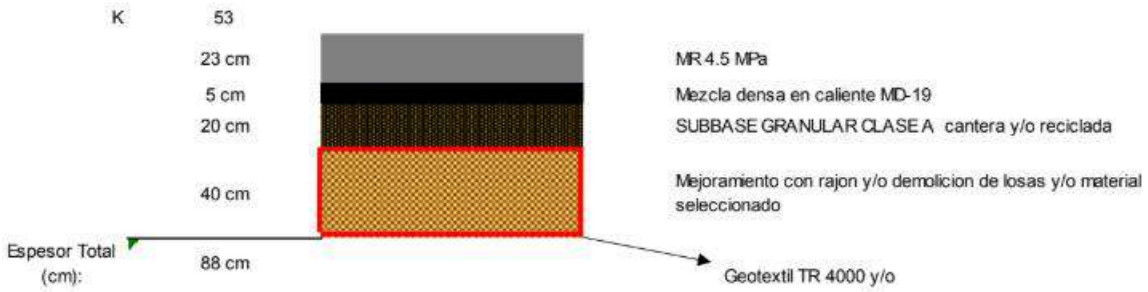


SECCION



POTOSI


11011188

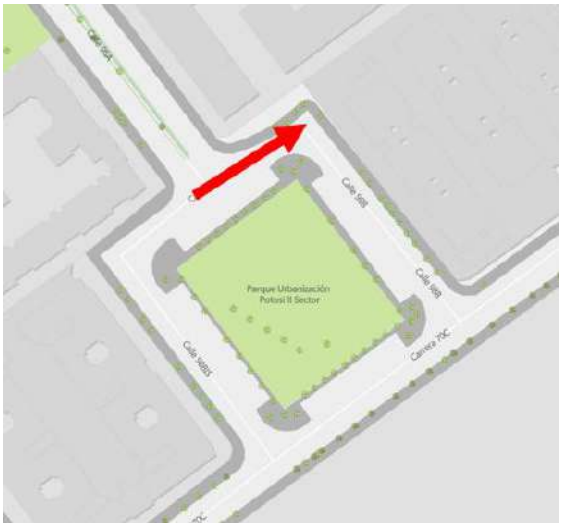

En el frente de obra de Potosí, el contratista ejecutó la instalación de bordillo, realizando el replanteo, alineación y nivelación de acuerdo con los diseños, así como el vaciado y curado del concreto para garantizar su resistencia. Adicionalmente, se efectuó el suministro de base granular para la nivelación de la superficie y su posterior compactación, asegurando la conformación adecuada de la capa estructural.

La interventoría, por su parte, realizó el seguimiento y control técnico de estas actividades, verificando que la instalación del bordillo cumpliera con las dimensiones, alineaciones y acabados establecidos, y que el concreto empleado correspondiera a la resistencia especificada. En la colocación y compactación de la base granular, supervisó el control de espesores, humedad y densidad, validando la calidad del material y dejando registro fotográfico y documental del proceso para garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato.

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO



EL POA

11004156, 11013439, 11004110, 11004080








En el frente de obra de POA, el contratista ejecutó la instalación del Plan de Manejo de Tráfico (PMT) para garantizar la seguridad vial y peatonal durante la intervención, así como la colocación del cerramiento perimetral del área de trabajo. Posteriormente, se desarrollaron labores de excavación mecánica conforme a los diseños aprobados, seguidas del retiro y transporte del material resultante hacia los sitios autorizados para su disposición final.

Por su parte, la interventoría realizó la supervisión y control de cada una de estas actividades, verificando que la instalación del PMT cumpliera con la señalización, ubicación y elementos de seguridad establecidos; que el cerramiento perimetral garantizara la delimitación y protección de la zona intervenida; y que la excavación mecánica se ejecutara con las cotas, alineaciones y dimensiones definidas en los planos. Asimismo, controló que el retiro y transporte del material se realizara de forma segura, cumpliendo con la normatividad ambiental y contractual, dejando registro fotográfico y documental de todo el proceso.

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

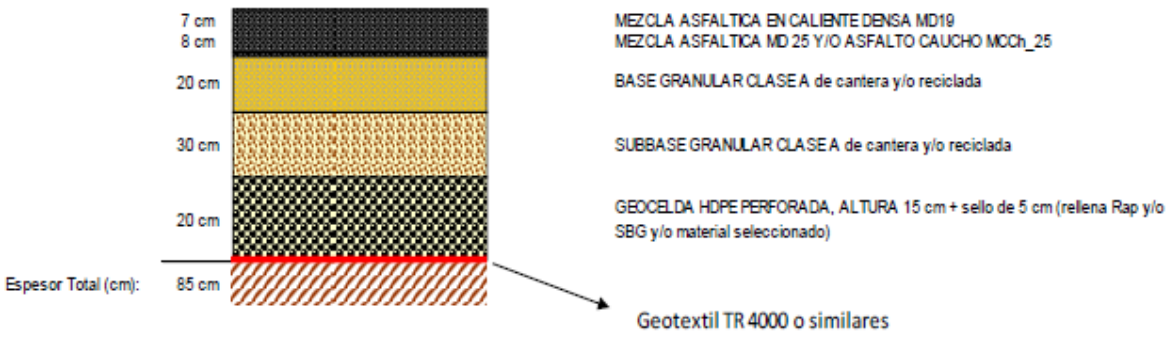

NIZA SUR

11010613



En el frente de obra de Niza Sur, el contratista ejecutó la instalación de cerramiento perimetral para la delimitación y seguridad del área de intervención, seguida de la excavación mecánica según las especificaciones de diseño. Posteriormente, se realizó el retiro del material producto de la excavación y su transporte a los sitios autorizados. Se instaló geotextil como elemento de separación y refuerzo, y se procedió con la colocación y compactación de la base granular para conformar la capa estructural. En la abscisa K0+062, debido a condiciones encontradas en campo, fue necesario modificar la estructura, instalando rajón para el mejoramiento de la subrasante y un cárcamo de protección para la tubería sanitaria expuesta.

La interventoría, por su parte, llevó a cabo la supervisión y control de todas estas actividades, verificando que el cerramiento cumpliera con la altura, resistencia y continuidad requerida; que la excavación mecánica respetara las cotas y dimensiones de diseño; y que el retiro del material se realizara cumpliendo con las disposiciones ambientales. En la instalación del geotextil, se controló la correcta colocación, traslapes y fijaciones; mientras que en la base granular se supervisó la calidad del material, espesor, compactación y control de humedad. Para la intervención en la abscisa K0+062, la interventoría verificó la adecuada colocación y compactación del rajón, así como la correcta instalación del cárcamo, asegurando la protección y funcionalidad de la tubería sanitaria.

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

La estructura planteada desde la abscisa K0+000 a la K0+062 es la siguiente:



Teniendo en cuenta la aparición de material arcilloso en el tramo a partir de la K0+062 se debió implementar otra estructura con el fin de estabilizar esta subrasante:




En lo que respecta a los segmentos viales programados para la fase 2 del proyecto, la interventoría ha culminado el proceso de revisión y validación técnica de las estructuras de pavimento, otorgando su aprobación luego de verificar que los diseños cumplen con las especificaciones técnicas, normativas vigentes y parámetros de calidad establecidos en el contrato. Esta aprobación incluye la evaluación de criterios como capacidad estructural, materiales propuestos, espesores de capas y adecuación a las condiciones particulares de cada tramo, garantizando que las soluciones planteadas respondan a las necesidades de durabilidad y funcionalidad de la vía. Los segmentos que conforman esta fase han sido priorizados estratégicamente para dar continuidad al plan de mejoramiento vial, optimizando la inversión de recursos y asegurando que las actividades constructivas


puedan desarrollarse de manera planificada, segura y conforme a los estándares técnicos avalados por la interventoría. A continuación, se describen dichas estructuras:

- **SECTOR EL PAO SEGMENTO 11004672-173797**

ALTERNATIVA 1: Material de mejoramiento + Subbase granular + Base granular + Carpeta asfáltica y/o granulo de caucho.

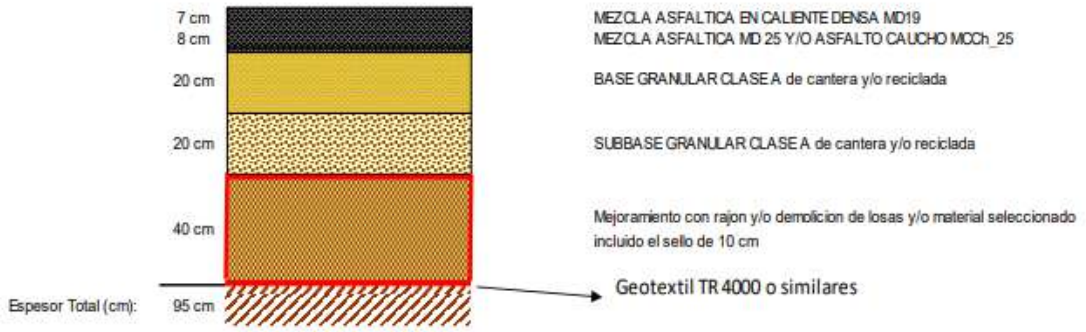


ALTERNATIVA 2: Geocelda+ Subbase granular + Base granular + Carpeta asfáltica y/o granulo de caucho.

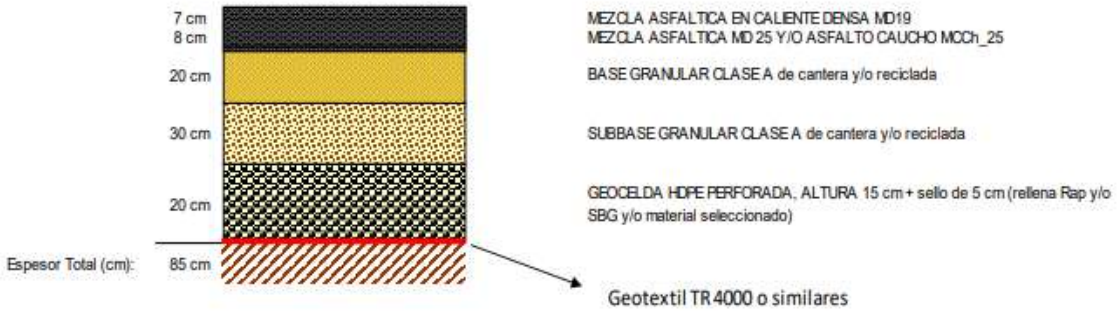

- **SECTOR PRADO VERANIEGO SEGMENTO 11010147-167437.**

  ALTERNATIVA 3: Material existente + Base granular + Carpeta asfáltica. (Actividades de Mantenimiento) (Dar garantía a 30 meses) (segmento 11010147-167437).


  Se presenta la alternativa 3 como una actividad de Mantenimiento Periódico, para dar póliza de estabilidad de 30 meses, en la cual se plantea la demolición de la capa de pavimento flexible existente (10 cm) y parte del granular (25cm) con el fin de posteriormente, verificar el material granular de existente en mínimo 20 cm, reemplazar en 20 cm de una Base granular clase A, compactar, imprimar e instalar 15 cm de mezcla asfáltica, la cual se instalará en dos capas como mínimo a continuación, como se presenta en el siguiente esquema:

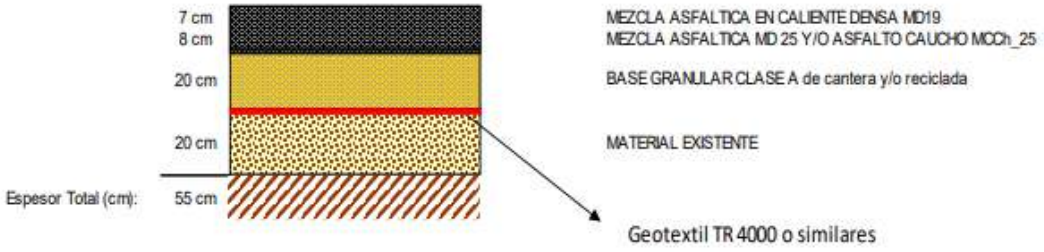

- **SECTOR LA GAITANA SEGMENTO 11005262-173654**

  ALTERNATIVA 3: Material existente + Base granular + Carpeta asfáltica. (Actividades de Mantenimiento) (Dar garantía a 30 meses) (segmento 11005262-173654).

  Se presenta la alternativa 3 como una actividad de Mantenimiento Periódico, para dar póliza de estabilidad de 30 meses, en la cual se plantea la demolición de la capa de pavimento flexible existente (12cm) y parte del granular (23cm) con el fin de posteriormente, verificar el material granular de existente en mínimo 35 cm, reemplazar en 20 cm de una Base granular clase A, compactar, imprimar e instalar 15 cm de mezcla asfáltica, la cual se instalará en dos capas como mínimo a continuación, como se presenta en el siguiente esquema:

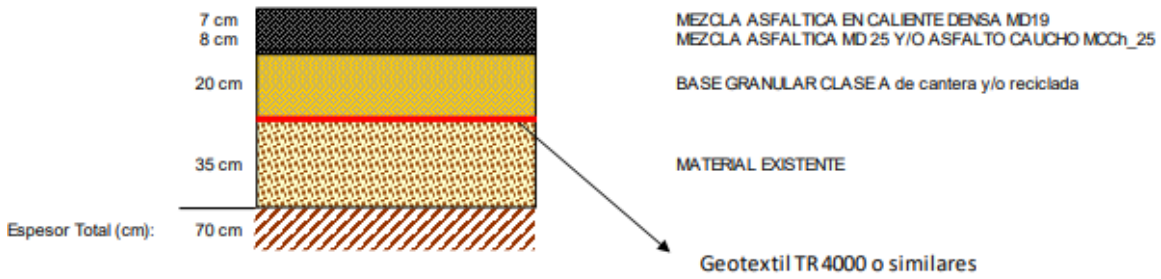

No	SECTOR	SEGMENTO	ELEMENTO	ALTERNATIVA DE INTERVENCIÓN PROPUESTA (MANTENIMIENTO PERIÓDICO)
2	COLINA CAMPESTRE	11008694	167909	**INTERVENCIÓN TIPO IV**: Fresado Total de la carpeta asfáltica en un espesor de 7 cm + 23 cm de material granular, compactación del material granular; se reporta un índice de plasticidad de 15% se deberá reemplazar el material granular en 20 cm por un material de Base granular BG- A, posteriormente realizar compactación del material; riego de liga; instalar 15 cm de mezcla asfáltica (La mezcla asfáltica debe ser instalada en 2 capas entre bases y rodaduras; puede ser MD-19, ó MD-25 ó Mezcla asfáltica modificada con caucho MCCh 25 para base)
4	LA CAMPIÑA	11003955	176248	**INTERVENCIÓN TIPO III:** Fresado parcial de la carpeta asfáltica en 10 cm, parcheo y/o reparación en zonas donde persista la fisuración, sello de fisuras, reposición del espesor fresado instalar en 10 cm de mezcla asfáltica (La mezcla asfáltica puede ser MD-19, ó MD-25 ó Mezcla asfáltica modificada con caucho MCCh25 para bases.) De acuerdo con el apique quedara una capa remanente de mezcla asfáltica de 5cm , durante el proceso constructivo se deberá garantizar la adecuada liga y la existencia de este espesor de mezcla asfáltica, para al final quedar un espesor de capa asfáltica de 15cm.*Es importante resaltar que dada la heterogeneidad de las estructuras de pavimento tanto en capa de rodadura como material granular, es necesario que una vez se realice el fresado se evalúe el estado y espesor de la capa asfáltica remanente, en el caso en el cual se detecten espesores remanentes inferiores a 5.0cm, se deberá fresar la totalidad del espesor, así mismo si el espesor remanente presenta agrietamientos y fisuramientos severos, éstos se deberán reparar puntualmente, las fisuras deberán sellarse antes de la instalación de la capa asfáltica, es importante resaltar que en estos tratamientos las fisuras finalmente se reflejarán en la carpeta asfáltica pasado el tiempo, lo cual generara un mantenimiento rutinario mayor.
5	NIZA SUR	11010612	168694	**INTERVENCIÓN TIPO III:** Fresado parcial de la carpeta asfáltica en 10 cm, parcheo y/o reparación en zonas donde persista la fisuración, sello de fisuras, reposición del espesor fresado instalar en 10 cm de mezcla asfáltica (La mezcla asfáltica puede ser MD-19, ó MD-25 ó Mezcla asfáltica modificada con caucho MCCh25 para bases.) De acuerdo con el apique quedara una capa remanente de mezcla asfáltica de 5cm , durante el proceso constructivo se deberá garantizar la adecuada liga y la existencia de este espesor de mezcla asfáltica, para al final quedar un espesor de capa asfáltica de 15cm.*Es importante resaltar que dada la heterogeneidad de las estructuras de pavimento tanto en capa de rodadura como material granular, es necesario que una vez se realice el fresado se evalúe el estado y espesor de la capa asfáltica remanente, en el caso en el cual se detecten espesores remanentes inferiores a 5.0cm, se deberá fresar la totalidad del espesor, así mismo si el espesor remanente presenta agrietamientos y fisuramientos severos, éstos se deberán reparar puntualmente, las fisuras deberán sellarse antes de la instalación de la capa asfáltica, es importante resaltar que en estos tratamientos las fisuras finalmente se reflejarán en la carpeta asfáltica pasado el tiempo, lo cual generara un mantenimiento rutinario mayor.
7	EL RECREO DE LOS FRAILES	11010586	167135	**INTERVENCIÓN TIPO IV**: Fresado Total de la carpeta asfáltica en un espesor de 10 cm + 5 cm de material granular, compactación del material granular; riego de liga; instalar 15 m de mezcla asfáltica (La mezcla asfáltica debe ser instalada en 2 capas entre bases y rodaduras; puede ser MD-19, ó MD-25 ó Mezcla asfáltica modificada con caucho MCCh 25 para base)
8	EL RECREO DE LOS FRAILES	11010578	167136	**INTERVENCIÓN TIPO IV**: Fresado Total de la carpeta asfáltica en un espesor de 9 cm + 6 cm de material granular, compactación del material granular; riego de liga; instalar 15 m de mezcla asfáltica (La mezcla asfáltica debe ser instalada en 2 capas entre bases y rodaduras; puede ser MD-19, ó MD-25 ó Mezcla asfáltica modificada con caucho MCCh 25 para base)

No	SECTOR	SEGMENTO	ELEMENTO	ALTERNATIVA DE INTERVENCIÓN PROPUESTA (MANTENIMIENTO PERIÓDICO)
9	EL RECREO DE LOS FRAILES	11010602	167018	**INTERVENCIÓN TIPO IV**: Fresado Total de la carpeta asfáltica en un espesor de 10 cm + 5 cm de material granular, compactación del material granular; riego de liga; instalar 15 m de mezcla asfáltica (La mezcla asfáltica debe ser instalada en 2 capas entre bases y rodaduras; puede ser MD-19, ó MD-25 ó Mezcla asfáltica modificada con caucho MCCh 25 para base)
10	EL RECREO DE LOS FRAILES	11010587	167019	**INTERVENCIÓN TIPO IV**: Fresado Total de la carpeta asfáltica en un espesor de 12 cm + 3 cm de material granular, compactación del material granular; se reporta un índice de plasticidad de 8% se recomienda en esta zona reemplazar el material granular realizando un bache y reemplazando el material en 20cm por un material de Base granular BG- A, posteriormente realizar compactación del material; riego de liga; instalar 15 cm de mezcla asfáltica (La mezcla asfáltica debe ser instalada en 2 capas entre bases y rodaduras; puede ser MD-19, ó MD-25 ó Mezcla asfáltica modificada con caucho MCCh 25 para base)

OTRAS ACTIVIDADES

Como parte de las labores desarrolladas durante el mes, la interventoría realizó directamente la ejecución de apiques en los frentes de Niza Sur (CIV 11010621) y POA, con el propósito de inspeccionar y evaluar las condiciones reales del terreno y de las estructuras existentes en el subsuelo. Esta actividad permitió obtener información precisa sobre la estratificación, la presencia de redes y posibles interferencias, facilitando la toma de decisiones técnicas y la definición de medidas correctivas o preventivas para optimizar el desarrollo de las obras, garantizar la seguridad en la ejecución y asegurar el cumplimiento de las especificaciones contractuales.

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR INTERVENTORIA

Durante el mes de julio, la interventoría llevó a cabo un conjunto de actividades técnicas, administrativas y de control orientadas a garantizar que la ejecución de las obras se realice en estricto cumplimiento de las especificaciones contractuales, los plazos establecidos y las normativas vigentes. Estas acciones estuvieron encaminadas a verificar la calidad de los materiales y procesos constructivos, supervisar el avance real frente a la programación aprobada, controlar el cumplimiento de obligaciones ambientales, sociales y de seguridad industrial, así como mantener una comunicación fluida y documentada entre las partes involucradas. A continuación, se detallan las principales actividades desarrolladas:

- **Supervisión directa en campo de los avances constructivos** en los distintos frentes de obra, realizando inspecciones diarias y verificaciones puntuales sobre la correcta ejecución de las actividades, el cumplimiento de las especificaciones de diseño y la calidad de los procesos constructivos.
- **Revisión y aprobación de diseños** geométricos, estructurales, de señalización y de pavimentos entregados por el contratista, asegurando que cumplan con los lineamientos técnicos, normativos y contractuales antes de su implementación en obra.
- **Control y validación de la calidad de materiales** mediante la revisión de certificados de conformidad, ejecución de ensayos de laboratorio y pruebas in situ, para verificar que los insumos cumplan con las características y resistencias requeridas.
- **Evaluación de listas de chequeo semanales y mensuales** en los componentes técnico, ambiental, social, de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y de Plan de Manejo de Tráfico (PMT), consolidando los porcentajes de cumplimiento y generando observaciones para corregir desviaciones.
- **Verificación del cumplimiento de obligaciones ambientales**, incluyendo la disposición adecuada y trazable de residuos de construcción y demolición (RCD), el manejo de zonas verdes, control de emisiones y prevención de afectaciones al entorno.

- **Seguimiento a planes de manejo** ambiental, social, SST y PMT, evaluando la aplicación de medidas preventivas, correctivas y mitigantes, así como su efectividad frente a los impactos identificados.
- **Gestión de correspondencia oficial** mediante la emisión de observaciones, requerimientos, solicitudes de información y aprobaciones dirigidas al contratista, con registro de radicados y control de respuestas.
- **Participación y coordinación en comités de obra y reuniones técnicas**, asegurando la revisión del avance físico y financiero, la definición de compromisos y la formalización de acuerdos mediante actas debidamente suscritas.
- **Elaboración y entrega de informes mensuales y parciales** de carácter técnico, financiero, social y ambiental, consolidando la información generada por los equipos especializados y respondiendo a los requerimientos de la entidad contratante.
- **Registro fotográfico y documental** de las actividades ejecutadas, hallazgos, incidencias y avances, como soporte para la trazabilidad de los procesos y para respaldar la toma de decisiones técnicas.

4. SEGMENTOS VIALES CONTRACTUALES

N°	ID	CIV	PK_ID	ELEMENTO	TRAMO	DESDE	HASTA	BARRIO
1	4	11014399	91013890	CALZADA	CLL 146 A	CALLE 146	KR 81 BIS	SAN FRANCISCO
2	5	11014396	91013885	CALZADA	CLL 146 A	KR 81 BIS	KR 81 A	SAN FRANCISCO
3	6	11014397	91013842	CALZADA	CLL 146 A	KR 81 A	LINDERO	SAN FRANCISCO
4	7	11006438	173503	CALZADA	CLL 129 D	KR 1222	KR 121 C	TIBABUYES
5	8	11011976	472369	CALZADA	CLL 129 D	KR 121 C	KR 121 C	TIBABUYES
6	9	11011977	472370	CALZADA	CLL 129 D	KR 121	KR 121 C	TIBABUYES
7	10	11006546	173502	CALZADA	CLL 129 D	KR 121	KR 121	TIBABUYES
8	11	11011978	472371	CALZADA	CLL 129 D	TRV 120 A	KR 121	TIBABUYES
9	12	11006617	173501	CALZADA	CLL 129 D	KR 120	TRV 120 A	TIBABUYES
10	18	11011188	168477	CALZADA	KR 70 D	CLL 98 A	CLL 98 B	POTOSI
11	19	11006116	53781	CALZADA	CLL 133	KR 98 B	KR 99	LA CHUCUA
12	20	11004672	173797	CALZADA	KR 101 B	CLL 140 A	CLL 140 B	EL POA

13	27	11005215	800044	CALZADA	CLL 137 BIS	CRA 103	CRA 103 C	COSTA AZUL
14	28	11008694	167909	CALZADA	KR 57 B	CLL 131 B	CLL 133	COLINA CAMPESTRE
15	29	11010147	167437	CALZADA	KR 51	CLL 128	CLL128 A	PRADO VERANIEGO
16	34	11004156	173807	CALZADA	CLL 141	KR 101 B	KR 101 C	EL POA
17	35	11013439	91020581	CALZADA	CLL 141	KR 101 C	KR 101 C	EL POA
18	36	11004110	173808	CALZADA	CLL 141	KR 101 C	KR 102	EL POA
19	37	11004080	173809	CALZADA	CLL 141	KR 102	KR 102 A	EL POA
20	49	11005418	171265	CALZADA	CLL 145 A	CRA 90 A	CRA 91	SUBA CENTRO
21	50	11005417	171267	CALZADA	KR 90 A	CLL 145 A	LINDERO NORTE	SUBA CENTRO
22	51	11005536	171266	CALZADA	KR 90 A	CLL 145 A	LINDERO SUR	SUBA CENTRO
23	52	11005794	172488	CALZADA	KR 98	CLL 136	CLL 137A	LA CHUCUA
24	53	11003955	176248	CALZADA	KR 98 B	CLL 147	CLL 147 C	LA CAMPIÑA
25	66	11010612	168694	CALZADA	KR 70 G	CL 119	CL 119	NIZA SUR
26	73	11009243	170403	CALZADA	CL 128B	KR 84C	KR 85	CIUDAD HUNZA
27	74	11009180	170384	CALZADA	CL 128B	KR 84	KR 84A	CIUDAD HUNZA
28	75	11009224	170385	CALZADA	CL 128B	KR 84B	KR 84A	CIUDAD HUNZA
29	76	11009242	170386	CALZADA	CL 128B	KR 84C	KR 84B	CIUDAD HUNZA
30	83	11013565	52298	ANDEN	TV 94	CL 129A	CL 129B	EL RINCÓN
31	84	11008140	52290	ANDEN	TV 94	KR 93D BIS A	KR 93D	EL RINCÓN
32	85	11008154	52288	ANDEN	TV 94	CL 128D	KR 93D BIS A	EL RINCÓN
33	86	11008062	52294	ANDEN	DG 129B BIS	KR 93C	KR 93B	EL RINCÓN
34	87	11007844	51210	ANDEN	CL 130D	KR 88C	KR 88B	TABERIN
35	88	11007885	51745	ANDEN	KR 89	CL 130B BIS	CL 130C	NARANJOS
36	89	11006690	52944	ANDEN	CL 132C	KR 92A	KR 93 BIS	VILLA ELISA
37	90	11006280	52970	ANDEN	CL 135	KR 94C	KR 94F	VILLA ELISA
38	91	11004054	56027	ANDEN	KR 111A	CL 139	CL 140	LAS FLORES
39	92	11009644	515990	ANDEN	CL 129	KR 56	KR 56A	PRADO VERANIEGO
40	93	11009650	515930	ANDEN	CL 129	AK 55	KR 55B	PRADO VERANIEGO
41	94	11009653	515910	ANDEN	CL 129	KR 55 B	KR 55B	PRADO VERANIEGO
42	95	11010114	45831	ANDEN	KR 53A	CL 128	CL 128 A	PRADO VERANIEGO
43	104	11004461	56171	ANDEN	TV 126	CL 134	CL 135B	LA GAITANA
44	109	11005104	55555	ANDEN	CL 124	CL 132C BIS	CL 132D	LA GAITANA

45	110	11014679	55494	ANDEN	CL 132D	KR 118	KR 124	LA GAITANA
46	111	11005262	173654	ANDEN	KR 124C	CL 131A	CL 132BIS	LA GAITANA
47	112	11007171	53561	ANDEN	KR 100A	CL 130	CL 130C	LAGO DE SUBA
48	113	11007373	53559	ANDEN	KR 100A	CL 129C	CL 130	LAGO DE SUBA
49	114	11007426	52761	ANDEN	CL 129C	KR 99A	KR 100A	LAGO DE SUBA
50	115	11006499	54069	ANDEN	KR 102	CL 131	CL 131B	AURES
51	116	11007528	53375	ANDEN	TV 102A	CL 128C	CL 128B	EL RINCÓN
52	117	11008687	51343	ANDEN	CL 128BIS	KR 93D	KR 93A	EL RINCÓN
53	118	11008803	51341	ANDEN	CL 128BIS	KR 93A	KR 93	EL RINCÓN
54	119	11004800	55745	ANDEN	CL 140A	KR 100	KR 100A	EL POA
55	120	11004755	55781	ANDEN	KR 100A	CL 140A	CL 140A BIS	EL POA
56	121	11004799	55734	ANDEN	KR 100	CL 140A	CL 140A BIS	EL POA
57	122	11007176	52412	ANDEN	CL 130C	KR 98	KR 98A	AURES
58	123	11007276	92074905	ANDEN	KR 97	CL 130B	CL 130C	AURES
59	127	11009086	50696	ANDEN	CL 128B	CL 87D	CL 88	CIUDAD HUNZA
60	128	11009172	50604	ANDEN	KR 86B	CL 128B	CL 128B BIS	CIUDAD HUNZA
61	129	11009208	50602	ANDEN	KR 86B	CL 128	CL 128B	CIUDAD HUNZA
62	130	11008562	92064676	ANDEN	KR 84A	CL 129A	CL 129C	CIUDAD HUNZA
63	131	11008818	51476	ANDEN	KR 93	CL 128BIS	CL 128BIS	EL RINCÓN
64	132	11014651	55697	ANDEN	CL 136A	KR 112	KR 118	VILLA MARIA I
65	139	11008662	46033	ANDEN	KR 53	CL 135	CL 136	PRADO VERANIEGO
66	140	11008527	45971	ANDEN	CL 136	KR 53	KR 53B	PRADO VERANIEGO
67	141	11008663	45956	ANDEN	CL 135	KR 53	KR 53B	PRADO VERANIEGO
68	142	11004683	173291	CALZADA	KR 109 A	CL 136A	CL 139	VILLA MARIA I
69	144	11005331	172977	CALZADA	KR 92	CL 145A	CL 145B	SUBA CENTRO
70	152	11003803	171249	CALZADA	CL 148	KR 91	KR 92	LA CAMPIÑA
71	153	11010414	167430	CALZADA	KR 51A	CL 127	CL 127A	ATABANZA
72	154	11010586	167135	CALZADA	KR 54A	CL 122A	CL 124A	EL RECREO DE LOS FRAILES
73	155	11010578	167136	CALZADA	KR 54B	CL 122A	CL 124A	EL RECREO DE LOS FRAILES
74	156	11010602	167018	CALZADA	CL 122A	KR 54	KR 54A	EL RECREO DE LOS FRAILES
75	157	11010587	167019	CALZADA	CL 122A	KR 54A	KR 54B	EL RECREO DE LOS FRAILES
76	158	11010613	168611	CALZADA	CL 119	KR 70G	KR 71A	NIZA SUR
77	159	11010621	168609	CALZADA	CL 119	KR 70	KR 70C	NIZA SUR
78	160	11005566	169503	CALZADA	CL 146F	KR 75	KR 74	CASABLANCA
79	161	11014376	91011826	CALZADA	CL 146F	KR 74	KR 73A	CASABLANCA
80	162	11005623	169502	CALZADA	CL 146F	KR 73A	KR 73	CASABLANCA

81	163	11005728	169501	CALZADA	CL 146F	KR 73	KR 72C	CASABLANCA
82	164	11005765	169500	CALZADA	CL 146F	KR 72C	KR 72B	CASABLANCA

PRIORIZACION 1

PRIORIZACION 1							
CIV	**PK_ID**	**ELEMENTO**	**TRAMO**	**DESDE**	**HASTA**	**BARRIO**	**INTERVENCION**
11006438	173503	CALZADA	CLL 129 D	KR 1222	KR 121 C	TIBABUYES	RECONSTRUCCIÓN
11011976	472369	CALZADA	CLL 129 D	KR 121 C	KR 121 C	TIBABUYES	RECONSTRUCCIÓN
11011977	472370	CALZADA	CLL 129 D	KR 121	KR 121 C	TIBABUYES	RECONSTRUCCIÓN
11006546	173502	CALZADA	CLL 129 D	KR 121	KR 121	TIBABUYES	RECONSTRUCCIÓN
11011978	472371	CALZADA	CLL 129 D	TRV 120 A	KR 121	TIBABUYES	RECONSTRUCCIÓN
11006617	173501	CALZADA	CLL 129 D	KR 120	TRV 120 A	TIBABUYES	RECONSTRUCCIÓN
11011188	168477	CALZADA	KR 70 D	CLL 98 A	CLL 98 B	POTOSI	RECONSTRUCCIÓN
11005215	800044	CALZADA	CLL 137 BIS	CRA 103	CRA 103 C	COSTA AZUL	MANTENIMIENTO PERIÓDICO
11004156	173807	CALZADA	CLL 141	KR 101 B	KR 101 C	BOCHALEMA	MANTENIMIENTO PERIÓDICO
11013439	91020581	CALZADA	CLL 141	KR 101 C	KR 101 C	BOCHALEMA	MANTENIMIENTO PERIÓDICO
11004110	173808	CALZADA	CLL 141	KR 101 C	KR 102	BOCHALEMA	MANTENIMIENTO PERIÓDICO
11004080	173809	CALZADA	CLL 141	KR 102	KR 102 A	BOCHALEMA	MANTENIMIENTO PERIÓDICO
11010613	168611	CALZADA	CL 119	KR 70G	KR 71A	NIZA SUR	MANTENIMIENTO PERIÓDICO
11010621	168609	CALZADA	CL 119	KR 70	KR 70C	NIZA SUR	MANTENIMIENTO PERIÓDICO
11005566	169503	CALZADA	CL 146F	KR 75	KR 74	CASABLANCA	RECONSTRUCCIÓN
11014376	91011826	CALZADA	CL 146F	KR 74	KR 73A	CASABLANCA	RECONSTRUCCIÓN
11005623	169502	CALZADA	CL 146F	KR 73A	KR 73	CASABLANCA	RECONSTRUCCIÓN
11005728	169501	CALZADA	CL 146F	KR 73	KR 72C	CASABLANCA	RECONSTRUCCIÓN
11005765	169500	CALZADA	CL 146F	KR 72C	KR 72B	CASABLANCA	MANTENIMIENTO PERIÓDICO

PRIORIZACION 2

PRIORIZACION 2							
CIV	**PK_ID**	**ELEMENTO**	**TRAMO**	**DESDE**	**HASTA**	**BARRIO**	**INTERVENCION**
11004672	173797	CALZADA	KR 101 B	CLL 140 A	CLL 140 B	EL POA	ACCIÓN DE MOVILIDAD
11008694	167909	CALZADA	KR 57 B	CLL 131 B	CLL 133	COLINA CAMPESTRE	MANTENIMIENTO PERIÓDICO
11010147	167437	CALZADA	KR 51	CLL 128	CLL128 A	PRADO VERANIEGO	MANTENIMIENTO PERIÓDICO
11003955	176248	CALZADA	KR 98 B	CLL 147	CLL 147 C	LA CAMPIÑA	MANTENIMIENTO PERIÓDICO

11010612	168694	CALZADA	KR 70 G	CL 119	CL 119	NIZA SUR	MANTENIMIENTO PERIÓDICO
11005262	173654	CALZADA	KR 124C	CLL 131A	CLL 132 BIS	LA GAITANA	RECONSTRUCCION
11010586	167135	CALZADA	KR 54A	CL 122A	CL 124A	EL RECREO DE LOS FRAILES	REHABILITACIÓN
11010578	167136	CALZADA	KR 54B	CL 122A	CL 124A	EL RECREO DE LOS FRAILES	REHABILITACIÓN
11010602	167018	CALZADA	CL 122A	KR 54	KR 54A	EL RECREO DE LOS FRAILES	REHABILITACIÓN
11010587	167019	CALZADA	CL 122A	KR 54A	KR 54B	EL RECREO DE LOS FRAILES	REHABILITACIÓN
11005331	172977	CALZADA	KR 92	CL 145A	CL 145B	SUBA CENTRO	RECONSTRUCCIÓN

PRIORIZACION 3

PRIORIZACION 3							
CIV	**PK_ID**	**ELEMENTO**	**TRAMO**	**DESDE**	**HASTA**	**BARRIO**	**INTERVENCION**
11006690	52944	ANDEN	CL 132C	KR 92A	KR 93 BIS	VILLA ELISA	REHABILITACIÓN
11006280	52970	ANDEN	CL 135	KR 94C	KR 94F	VILLA ELISA	REHABILITACIÓN
11004054	56027	ANDEN	KR 111A	CL 139	CL 140	LAS FLORES	RECONSTRUCCIÓN
11010114	45831	ANDEN	KR 53A	CL 128	CL 128 A	PRADO VERANIEGO	REHABILITACIÓN
11007171	53561	ANDEN	KR 100A	CL 130	CL 130C	LAGO DE SUBA	RECONSTRUCCIÓN
11007373	53559	ANDEN	KR 100A	CL 129C	CL 130	LAGO DE SUBA	RECONSTRUCCIÓN
11007426	52761	ANDEN	CL 129C	KR 99A	KR 100A	LAGO DE SUBA	RECONSTRUCCIÓN
11004800	55745	ANDEN	CL 140A	KR 100	KR 100A	EL POA	REHABILITACIÓN
11004755	55781	ANDEN	KR 100A	CL 140A	CL 140A BIS	EL POA	REHABILITACIÓN
11004799	55734	ANDEN	KR 100	CL 140A	CL 140A BIS	EL POA	REHABILITACIÓN
11008662	46033	ANDEN	KR 53	CL 135	CL 136	PRADO VERANIEGO	REHABILITACIÓN
11008527	45971	ANDEN	CL 136	KR 53	KR 53B	PRADO VERANIEGO	REHABILITACIÓN
11008663	45956	ANDEN	CL 135	KR 53	KR 53B	PRADO VERANIEGO	REHABILITACIÓN
11006499	54069	ANDEN	KR 102	CL 131	CL 131B	AURES	REHABILITACIÓN

PRIORIZACIÓN FASE 4							
CIV	PK_ID	ELEMENTO	TRAMO	DESDE	HASTA	INTERVENCIÓN	BARRIO
11004461	56171	ANDEN	TV 126	CL 134	CL 135B	RECONSTRUCCIÓN	LA GAITANA
11005104	55555	ANDEN	CL 124	CL 132C BIS	CL 132D	RECONSTRUCCIÓN	LA GAITANA
11014679	55494	ANDEN	CL 132D	KR 118	KR 124	RECONSTRUCCIÓN	LA GAITANA
11007176	52412	ANDEN	CL 130C	KR 98	KR 98A	REHABILITACIÓN	AURES
11007276	92074905	ANDEN	KR 97	CL 130B	CL 130C	REHABILITACIÓN	AURES
11008062	52294	ANDEN	DG 129B BIS	KR 93C	KR 93B	REHABILITACIÓN	EL RINCÓN
11008140	52290	ANDEN	TV 94	KR 93D BIS A	KR 93D	REHABILITACIÓN	EL RINCÓN
11008154	52288	ANDEN	TV 94	CL 128D	KR 93D BIS A	REHABILITACIÓN	EL RINCÓN
11008687	51343	ANDEN	CL 128BIS	KR 93D	KR 93A	REHABILITACIÓN	EL RINCÓN
11008803	51341	ANDEN	CL 128BIS	KR 93A	KR 93	REHABILITACIÓN	EL RINCÓN
11008818	51476	ANDEN	KR 93	CL 128BIS	CL 128BIS	REHABILITACIÓN	EL RINCÓN
11007528	53375	ANDEN	TV 102A	CL 128C	CL 128B	REHABILITACIÓN	EL RINCÓN
11013565	52298	ANDEN	TV 94	CL 129A	CL 129B	REHABILITACIÓN	EL RINCÓN
11008562	92064676	ANDEN	KR 84A	CL 129A	CL 129C	REHABILITACIÓN	CIUDAD HUNZA
11009086	50696	ANDEN	CL 128B	CL 87D	CL 88	RECONSTRUCCIÓN	CIUDAD HUNZA
11009172	50604	ANDEN	KR 86B	CL 128B	CL 128B BIS	REHABILITACIÓN	CIUDAD HUNZA
11009180	170384	CALZADA	CL 128B	KR 84	KR 84A	RECONSTRUCCIÓN	CIUDAD HUNZA
11009208	50602	ANDEN	KR 86B	CL 128	CL 128B	REHABILITACIÓN	CIUDAD HUNZA
11009224	170385	CALZADA	CL 128B	KR 84B	KR 84A	RECONSTRUCCIÓN	CIUDAD HUNZA
11009242	170386	CALZADA	CL 128B	KR 84C	KR 84B	RECONSTRUCCIÓN	CIUDAD HUNZA
11009243	170403	CALZADA	CL 128B	KR 84C	KR 85	MANTENIMIENTO PERIÓDICO	CIUDAD HUNZA

11005794	172488	CALZADA	KR 98	CLL 136	CLL 137A	MANTENIMIENTO PERIÓDICO	LA CHUCUA
11007844	51210	ANDEN	CL 130D	KR 88C	KR 88B	REHABILITACIÓN	TABERIN
11007885	51745	ANDEN	KR 89	CL 130B BIS	CL 130C	REHABILITACIÓN	NARANJOS
11004683	173291	CALZADA	KR 109 A	CL 136A	CL 139	REHABILITACIÓN	VILLA MARIA I
11014651	55697	ANDEN	CL 136A	KR 112	KR 118	RECONSTRUCCIÓN	VILLA MARIA I
11003803	171249	CALZADA	CL 148	KR 91	KR 92	RECONSTRUCCIÓN	LA CAMPIÑA
11010414	167430	CALZADA	KR 51A	CL 127	CL 127A	RECONSTRUCCIÓN	ATABANZA
PRIORIZACION FASE 5							
CIV	**PK_ID**	**ELEMENTO**	**TRAMO**	**DESDE**	**HASTA**	**INTERVENCIÓN**	**BARRIO**
11014399	91013890	CALZADA	CLL 146 A	CALLE 146	KR 81 BIS	ACCIÓN DE MOVILIDAD	SAN FRANCISCO
11014396	91013885	CALZADA	CLL 146 A	KR 81 BIS	KR 81 A	ACCIÓN DE MOVILIDAD	SAN FRANCISCO
11014397	91013842	CALZADA	CLL 146 A	KR 81 A	LINDERO	ACCIÓN DE MOVILIDAD	SAN FRANCISCO
11005418	171265	CALZADA	CLL 145 A	CRA 90 A	CRA 91	RECONSTRUCCIÓN	SUBA CENTRO
11005417	171267	CALZADA	KR 90 A	CLL 145 A	LINDERO NORTE	RECONSTRUCCIÓN	SUBA CENTRO
11005536	171266	CALZADA	KR 90 A	CLL 145 A	LINDERO SUR	RECONSTRUCCIÓN	SUBA CENTRO
11006116	53781	CALZADA	CLL 133	KR 98 B	KR 99	RECONSTRUCCIÓN	LA CHUCUA
11009644	515990	ANDEN	CL 129	KR 56	KR 56A	REHABILITACIÓN	PRADO VERANIEGO
11009650	515930	ANDEN	CL 129	AK 55	KR 55B	REHABILITACIÓN	PRADO VERANIEGO
11009653	515910	ANDEN	CL 129	KR 55 B	KR 55B	REHABILITACIÓN	PRADO VERANIEGO

5. COMITES DE OBRA


FECHA	TEMA
04/07/25	Comité Integral
11/07/23	Comité Integral
18/07/23	Comité Integral
25/07/23	Comité Integral

6. AVANCE FINANCIERO

TORRES Y ASOCIADOS 084-2025					
«INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO»					
Representante Legal	FRANCISCO JAVIER GUEVERA MENDEZ		**Director de Interventoría**	CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL	
NIT:	**829000727-3**	**Fecha pago** SS: <!2/m **Primeros 3 días del mes**	**Duración:** 11 meses	**Valor inicial**	$ 1.629.172.198,00
Fecha inicio	2/04/2025	**Prorroga 1**	N.A	**Valor adicional**	$ -
Fecha terminación inicial	1/03/2026	**Prorroga 2**	N.A	**Valor total**	$ 1.629.172.198,00
Fecha terminación final	1/03/2026	**Plazo ejecucion**	11 meses.	**Valor total**	$ 1.629.172.198,00
No Radicado	**Fecha radicado**	**PERIODO**	**No PAGO**	**Valor de la cuenta**	**SALDO**
20256110118182	6/05/2025	02/04/2025 AL 30/04/2025	PAGO 1	$ 111.079.923,00	$ 1.518.092.275,00
20256110147632	12/06/2025	01/05/2025 al 31/05/2025	PAGO 2	$ 111.079.923,00	$ 1.407.012.352,00
2025-611-018447-2	17/07/2025	01/06/2025 al 30/06/2025	PAGO 3	$ 111.079.923,00	$ 1.295.932.429,00
			PAGO A LA FECHA	**$ 333.239.769,00**	
			VALOR POR COBRAR	$1.295.932.429,0	
			% FINANCIERO	20,45%	

CONSORCIO CONSERVACIÓN PG 1010-2024					
"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAS EN EL ANEXO TECNICO"					
Representante Legal			**Director de obra**		
NIT:		**Fecha pago** SS: <!2/m	Primeros 3 días del mes	**Valor inicial**	
Fecha inicio	1/04/2025	**Prórroga 1**		**Valor adicional**	
Fecha terminación	7/10/2024	**Prórroga 2**		**Valor total**	$ -
No Radicado	**Fecha radicado**	**No PAGO**	**PERIODO**	**Valor de la cuenta**	**SALDO**
		PAGO 1			$ -
		PAGO 2			$ -
			PAGO A LA FECHA	**$ -**	
			VALOR POR COBRAR	$ -	
			% FINANCIERO	$ -	

CURVA S

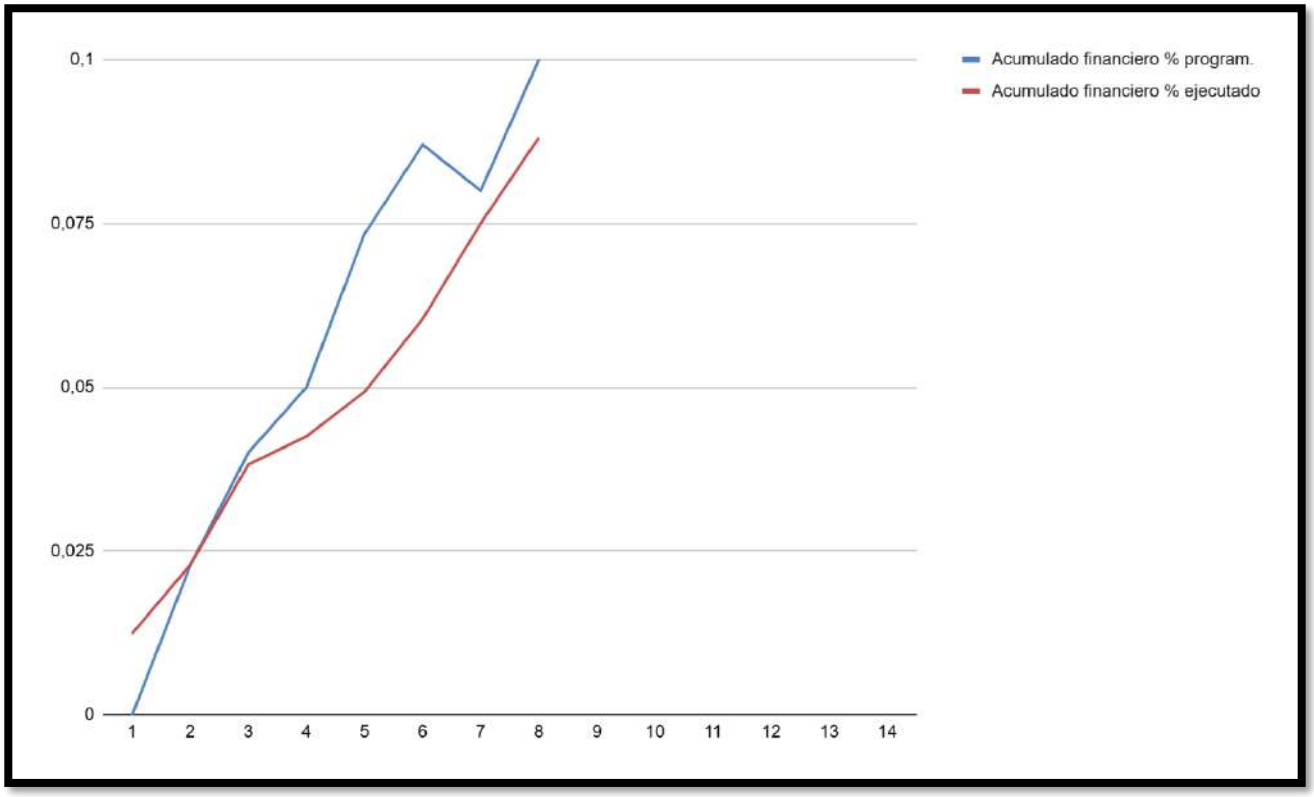

7. AVANCE FISICO

AVANCE POR CIV CORTE 31/07/2025					
	CIV	BARRIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	ATRASO/ ADELANTO
1	11014399	SAN FRANCISCO	0%	0%	0%
2	11014396	SAN FRANCISCO	0%	0%	0%
3	11014397	SAN FRANCISCO	0%	0%	0%
4	11006438	TIBABUYES	25%	20%	5%
5	11011976	TIBABUYES	25%	20%	5%
6	11011977	TIBABUYES	35%	45%	-10%
7	11006546	TIBABUYES	25%	10%	15%
8	11011978	TIBABUYES	25%	10%	15%
9	11006617	TIBABUYES	20%	10%	10%
10	11011188	POTOSI	75%	82%	-7%
11	11006116	LA CHUCUA	0%	0%	0%
12	11004672	EL POA	3%	3%	0%
13	11005215	COSTA AZUL	80%	80%	0%
14	11008694	COLINA CAMPESTRE	3%	3%	0%

15	11010147	PRADO VERANIEGO	3%	3%	0%
16	11004156	EL POA	10%	6%	4%
17	11013439	EL POA	10%	6%	4%
18	11004110	EL POA	10%	6%	4%
19	11004080	EL POA	10%	10%	0%
20	11005418	SUBA CENTRO	0%	0%	0%
21	11005417	SUBA CENTRO	0%	0%	0%
22	11005536	SUBA CENTRO	0%	0%	0%
23	11005794	LA CHUCUA	0%	0%	0%
24	11003955	LA CAMPIÑA	3%	3%	0%
25	11010612	NIZA SUR	3%	3%	0%
26	11009243	CIUDAD HUNZA	0%	0%	0%
27	11009180	CIUDAD HUNZA	0%	0%	0%
28	11009224	CIUDAD HUNZA	0%	0%	0%
29	11009242	CIUDAD HUNZA	0%	0%	0%
30	11013565	EL RINCÓN	0%	0%	0%
31	11008140	EL RINCÓN	0%	0%	0%
32	11008154	EL RINCÓN	0%	0%	0%
33	11008062	EL RINCÓN	0%	0%	0%
34	11007844	TABERIN	0%	0%	0%
35	11007885	NARANJOS	0%	0%	0%
36	11006690	VILLA ELISA	0%	0%	0%
37	11006280	VILLA ELISA	0%	0%	0%
38	11004054	LAS FLORES	0%	0%	0%
39	11009644	PRADO VERANIEGO	0%	0%	0%
40	11009650	PRADO VERANIEGO	0%	0%	0%
41	11009653	PRADO VERANIEGO	0%	0%	0%
42	11010114	PRADO VERANIEGO	0%	0%	0%
43	11004461	LA GAITANA	0%	0%	0%
44	11005104	LA GAITANA	0%	0%	0%
45	11014679	LA GAITANA	0%	0%	0%
46	11005262	LA GAITANA	0%	3%	0%
47	11007171	LAGO DE SUBA	0%	0%	0%
48	11007373	LAGO DE SUBA	0%	0%	0%
49	11007426	LAGO DE SUBA	0%	0%	0%
50	11006499	AURES	0%	0%	0%
51	11007528	EL RINCÓN	0%	0%	0%
52	11008687	EL RINCÓN	0%	0%	0%
53	11008803	EL RINCÓN	0%	0%	0%
54	11004800	EL POA	0%	0%	0%

55	11004755	EL POA	0%	0%	0%
56	11004799	EL POA	0%	0%	0%
57	11007176	AURES	0%	0%	0%
58	11007276	AURES	0%	0%	0%
59	11009086	CIUDAD HUNZA	0%	0%	0%
60	11009172	CIUDAD HUNZA	0%	0%	0%
61	11009208	CIUDAD HUNZA	0%	0%	0%
62	11008562	CIUDAD HUNZA	0%	0%	0%
63	11008818	EL RINCÓN	0%	0%	0%
64	11014651	VILLA MARIA I	0%	0%	0%
65	11008662	PRADO VERANIEGO	0%	0%	0%
66	11008527	PRADO VERANIEGO	0%	0%	0%
67	11008663	PRADO VERANIEGO	0%	0%	0%
68	11004683	VILLA MARIA I	0%	0%	0%
69	11005331	SUBA CENTRO	3%	3%	0%
70	11003803	LA CAMPIÑA	0%	0%	0%
71	11010414	ATABANZA	0%	0%	0%
72	11010586	EL RECREO DE LOS FRAILES	3%	3%	0%
73	11010578	EL RECREO DE LOS FRAILES	3%	3%	0%
74	11010602	EL RECREO DE LOS FRAILES	3%	3%	0%
75	11010587	EL RECREO DE LOS FRAILES	3%	3%	0%
76	11010613	NIZA SUR	50%	50%	0%
77	11010621	NIZA SUR	10%	6%	4%
78	11005566	CASABLANCA	50%	18%	32%
79	11014376	CASABLANCA	50%	25%	25%
80	11005623	CASABLANCA	60%	57%	3%
81	11005728	CASABLANCA	60%	70%	-10%
82	11005765	CASABLANCA	60%	70%	-10%
TOTAL			**10,00%**	**8,81%**	**-1,19%**

Teniendo en cuenta lo anterior se evidencia un atraso a la fecha del 1.19% en relación con la programación remitida.

8. ITEMS NO PREVISTOS

Dentro del desarrollo del proyecto se han identificado ítems no previstos, entendidos como actividades, cantidades de obra o suministros que no fueron contemplados inicialmente en el presupuesto oficial ni en el alcance contractual aprobado, pero que resultan necesarios para garantizar la correcta ejecución, funcionalidad y calidad de las obras. Estos ítems surgen generalmente a partir de condiciones imprevistas en campo, ajustes derivados de hallazgos técnicos, interferencias con redes existentes o cambios en las especificaciones, y requieren para su ejecución un análisis técnico, presupuestal y contractual que permita su justificación, valoración y aprobación por parte de la entidad contratante, asegurando que su incorporación no afecte el equilibrio económico ni el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Hasta la fecha se tienen los siguientes:

Ítem	Descripción	Unidad	Precio Unitario Pactado
NP 01	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 16" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCL MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL. IVA	ML	$ 20.205,00
NP 02	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 18" Y 36" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCLUYE MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL IVA	ML	$ 21.734,00
NP 03	EQUIPO VACTOR - SONDEO - LIMPIEZA - RECOLECCIÓN DE LODOS NO PELIGROSOS (No incluye agua).	HR	$ 380.000,00
NP 04	PISO EN CONCRETO COLOR GRIS MR41 (280 Kg/Cm2) GRAVA 1" 28 DIAS ESTAMPADO e=0.10m (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, JUEGO DE MOLDES, DESMOLDANTE EN POLVO, CURADOR PARA CONCRETO, INCLUYE CORTE Y SELLADO DE JUNTAS.	M2	$ 183.039,00
NP 05	BOLARDO EN HIERRO TIPO M62 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 3000 PSI, HECHO EN OBRA)	UN	$ 238.567,00
NP 06	PISO EN CONCRETO MR45 (315 Kg/Cm2) GRAVA COMÚN ACELERADO A 7 DÍAS, ESTAMPADO PARA POMPEYANOS Y VIAS A DESNIVEL, COLOR OCRE (Incluye suministro y colocación de concreto, juego de moldes, desmoldante en polvo, curador para concreto, corte y sellado de juntas)	M2	$ 300.992,00
NP 07	GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEODREN (RED DRENANTE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PEAD-HDPE Y GEOTEXTIL NO TEJIDO) CON ALTURA DE 1.0 M Y TUBERIA FLEXIBLE CORRUGADA DE DRENAJE CON DIAMETRO DE 200 MM. (INCLUYE EXCAVACION MANUAL DE 30CM DE ANCHO Y RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION).	ML	$ 192.207,00
NP 08	PISO EN LOSETA PREFABRICADA A60 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO 2000 PSI Y ARENA DE SELLO)	M2	$ 138.637,00
NP 09	PISO EN LOSETA PREFABRICADA A50 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO 2000 PSI Y ARENA DE SELLO)	M2	$ 124.657,00
NP 10	ADOQUIN EN CONCRETO 200X100X60MM A25 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO 2000 PSI Y ARENA DE SELLO).	M2	$ 128.641,00

NP 11	RETIRO DE ADOQUIN SOBRE MORTERO	M2	$	2.923,00
NP 12	RETIRO DE ADOQUIN SOBRE ARENA	M2	$	1.760,00
NP 13	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES	M3	$	38.781,00
NP 14	GEOMALLA BIAXIAL CON RESISTENCIA ULTIMA A LA TENSIÓN, SENTIDO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL ENTRE 50 KN/m y 55 KN/m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	$	18.328,00
NP 15	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL	M3	$	122.468,00
NP 16	FRANJA DE AJUSTE DE ANCHO VARIABLE ENTRE 0,10 MT A 0,18 MT Y PROFUNDIDAD VARIABLE ENTRE 0,06 Y 0,15 MT EN CONCRETO DE 2500 PSI HECHO EN OBRA	ML	$	11.029,00
NP 17	LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 3 DÍAS (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO Y JUNTAS)	M3	$	970.435,00
NP 18	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$	63.957,00
NP 19	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 12" (TIPO PLACA) NORMA EAAB NS-090	ML	$	238.084,00
NP 20	TRANSPORTE DE MAQUINARIA DE 6 A 9 TONELADAS. INCLUYE ESCOLTA. VIAJE IDA Y VUELTA	VIAJE	$	1.840.000,00

Nota: *Los ítems no previstos identificados se encuentran actualmente en proceso de revisión técnica, financiera y contractual por parte de la interventoría, con el fin de consolidar la justificación y documentación de soporte necesaria para su radicación formal ante la entidad contratante.*

9. CORRESPONDENCIA

❖ CORRESPONDENCIA ENVIADA

FECHA	REFERENCIA	RADICADO	ASUNTO
01-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-170		Observaciones informe N.2 radicado en fisico
01-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-171		Solicitud respuesta derecho de peticiòn
01-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-172		Observaciones inventario forestal
01-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-173		Aprobacion Documentos Gestores RCD
02-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-174		Aprobación documentación de ingreso de personal, maquinaria y vehículos - contrato de obra 1010-2024 – LP (119226)
02-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-176	**2025-611-016333-2**	Radicacion inventario forestal Atabanza y Niza Sur (Permiso forestal SDA)
02-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-177		Aprobacion inventario forestal Atabanza y Niza Sur (Permiso forestal SDA) y solicitud de documentacion
03-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-178		Aprobacion de Programacion de obra
03-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-179		Observaciones al Informe mensual Junio de PMT
03-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-180		Aprobación documentación de ingreso de personal y volqueta- contrato de obra 1010-2024 – LP (119226)
03-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-181		Aprobaciòn actas de vecindad costa azul

03-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-182		Rta Derecho de Peticion JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE SUBA DP25-JALP-98
04-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-183		Aprobación Radicación solicitud de permiso de intervención silvicultural
04-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-184		Aprobaciòn informe mensual social N2
04-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-185		Radicaciòn al FDLS , Informe social N2
04-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-186		Aprobación documentación de ingreso de personal y volqueta- contrato de obra 1010-2024 – LP (119226)
07-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-187		Aprobación documentación de ingreso de personal - contrato de obra 1010-2024 – LP (119226)
07-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-188		llamado de atenciòn componente social
07-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-189		Observaciones al informe tecnico mensual de junio
07-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-190		Observaciones al informe ambiental N°3 junio
07-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-191		Observaciones informe mensual SST N° 3- Versión 1 Rta Oficio D-115-2025-50 contrato de obra Contrato de obra 1010-2024-LP (119226)
07-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-192		Aprobación documentación de ingreso de personal y volquetas - contrato de obra 1010-2024 – LP (119226)
07-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-193		Remision revision y aprobacion PMT Portico - rta a observaciones SDM PMT Portico
08-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-194		Observaciones al informe ambiental N°3 v2 junio
08-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-195		Rta Alternativas de estructura de pavimento con base en resultados de deflectometria , Paque Piloto, tibabuyes costa azul,niza sur (2), casablanca, y POA portico

09-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-196	**2025-611-017114-2**	Rad informes semanales 10, 11,12, 13 intv
09-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-197	**2025-611-017117-2**	Rad programacion de obra
09-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-198	**2025-611-017120-2**	Rad Plan de calidad contratista
09-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-199		Aprobación documentación de ingreso de personal y vehículos contrato de obra 1010-2024 – LP (119226)
09-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-200		Aprobacion informe PMT mes de junio
09-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-201		Incumplimiento en el inicio de actividades de Parque piloto, Poa Y NIZA SUR
09-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-202		Citación a comite Representante Legal COP
09-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-203		Solicitud de caracterizacion Material "rajon" Tibabuyes
09-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-204	**2025-611-017377-2**	Radicacion de informe PMT No3 de interventoria
09-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-205	**2025-611-017378-2**	Radicacion de informe tecnico No 3 de interventoria
09-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-206		Incumplimiento entrega informes mensuales
09-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-207		Aprobación hoja de Vida Cambio Profesional Ambiental Rta oficio D-111-2025-50 asunto: “solicitud cambio residente ambiental”
10-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-208		observaciones documentación de ingreso de personal y maquinaria contrato de obra 1010-2024 – LP (119226)
10-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-209		Aprobacion documentos gestores RCD
11-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-210		observaciones informe social mensual N.3
11-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-211		Solicitud de caracterizacion de B200 en TIBABUYES COSTA AZUL 11005215

11-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-212	**2025-611-017591-2**	Radicacion de Informe PMT JUNIO contrato 1010
11-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-213	**2025-611-017593-2**	Radicacion informe ambiental N°3 Junio
11-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-214	**2025-611-017584-2**	Radicaciòn informe mensual social de interventoria N.3 Junio_48 folios
11-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-215		Observaciones Informe Tecncio mensual contrato 1010
11-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-216		Aprobación de personal contrato de obra 1010-2024 – LP (119226
11-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-217		Aprobacion de APUS CONTRACTUALES
11-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-218		Aprobación Informe SST Mensual No3– V2
11-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-219		SOLICITUD PLAN DE CONTINGENCIA
12-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-220		Solicitud Medidas Correctivas y Cumplimiento Listas de Chequeo Componente A&SST Contrato de Obra No. 1010 de 2024.
12-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-221	**RAD CDI**	Remisión Trazabilidad y Oficios de Respuesta IDIGER correspondiente al CIV 11004683 Villa María 1.
14-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-222		Aprobacion Inventario de sumideros POTOSI
14-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-223		Aprobación documentación de ingreso de personal y maquinaria -contrato de obra 1010-2024 – LP (119226)
14-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-224		Observaciones Documentos Ingreso Personal y vehiculos
14-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-225		Observaciones actas de vecindad potosi
14-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-226		Remisiòn derecho de peticiòn Nancy Yazmin
14-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-226		Remisiòn derecho de peticiòn Nancy Yazmin

14-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-227		Aprobacion informe tecnico mensual junio contratista
14-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-228		Solcitud de radicacion de informe de exclusion en fisico
15-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-229		Aprobación documentación de ingreso de personal y maquinaria -contrato de obra 1010-2024 – LP (119226)
15-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-230		Aprobacion informe ambiental mensual junio contratista
15-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-231		Aprobacion inventario forestal Potosi
15-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-232		Remisión Concepto Informe de Geotecnia y Pavimentos SUBA -111 - Respuesta oficio D-136-2025-50.
16-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-233	2025-611-018200-2	Radicación Informe Mensual SST N°3 de interventoría – Contrato 084-2025 – INT (119251)
16-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-234	2025-611-018203-2	Radicación en fisico Hoja de Vida cambio residente ambiental contratista de obra 1010-2024 – LP (119226)
16-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-235	2025-611-018447-2	Radicación Acta de cobro 3 interventoria
16-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-236		Aprobación documentación de ingreso de vehículos Rta correo Observaciones documentación de ingreso de personal y vehículos -contrato de obra 1010-2024 – LP (119226)
16-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-237		Observaciones informe social contratista N.3 junio v1
16-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-238		Observacion ocupacion zonas verdes- Frente Casablanca
17-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-239		Citación a comite Representante Legal y especialista Paviemntos COP
17-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-240		Documentación Ingreso maquinaria -contrato de obra 1010-2024 – LP (119226)
17-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-241		Aprobacion inventario de sumideros Niza sur y Parque Piloto
17-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-242	2025-611-018602-2	Radicacion informe ambiental Contratista N°3 Junio
17-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-243		Remisión documentación PMT Suba Centro CIV 11005331

17-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-244		Remisión Rad 202531208313691 SDM ASUNTO: Incumplimientos en la implementación del plan de manejo de tránsito (PMT). CIV 11005215 Calle 137Bis entre Carrera 103 y Carrera 103C
18-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-245		Aprobacion inventario forestal Niza sur y Parque Piloto
18-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-246		Aprobación documentación de ingreso de personal
21-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-247	2025-611-018960-2	Radicación Informe Mensual SST N°3 V2 - Rta Oficio D-149-2025-50 Contrato de obra 1010-2024-LP (119226)
21-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-248		Aprobación documentación de ingreso de personal -contrato de obra 1010-2024 – LP (119226)
22-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-249		Remisión Concepto Informe de Geotecnia y Pavimentos SUBA -113 - Respuesta oficio D-136-2025-50. y complemento oficio TYA-FDLS-084-2025-232 POA PORTICO
22-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-250		Aprobación documentación de ingreso de personal -contrato de obra 1010-2024 – LP (119226)
22-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-251		REMISIÓN RAD SDM 202531208354421 - ASUNTO: Incumplimientos en la implementación del plan de manejo de tránsito (PMT). RAD 202561201393072 Calle 146F entre Carrera 72B y Carrera 73A - Calle 146F entre Carrera 73A y 140m al Occidente Calle 146F entre 15m y 118m al Oriente de la Carrera 75
23-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-252		Icumplimiento actividades preliminares componente social frente tibabuyes_parque piloto
23-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-253		Icumplimiento actividades preliminares componente medidas de seguridad y salud en el trabajo Parque Piloto CIV 11006546
23-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-254		Solicitud Acompañamiento al Frente de Obra Tibabuyes – Costa Azul CIV 11005215
23-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-255		Aprobaciòn informe mensual social contratista N.3 V2
23-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-256		Radicaciòn al FDLS informe mensual social contratista N.3
23-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-257		Aprobación documentación de ingreso de personal y maquinaria -contrato de obra 1010-2024 – LP (119226)
25-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-259		APROBACION DE INFORME DE EXCLUSION Y SOLICITUD RADICACIÓN ACTA DE EXCLUSIÓN

25-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-260		SOLICITUD DE AJUSTE DE FECHA DE APUS CONTRACTUALES
25-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-261		Radicacion de informe mensual tecnico contrato 1010
28-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-262		Aprobacion inventario de sumideros POA-Portico
28-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-263		Devoluciòn actas de vecindad Niza Sur CIVS; 11010621_11010613
28-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-264		Devoluciòn actas de vecindad Parque piloto CIV 11011977
28-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-265		Observaciones documentación de ingreso de personal, maquinaria y vehículos - contrato de obra 1010-2024 – LP (119226)
29-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-266		Requerimiento autorizacion acopio de materiales
29-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-267		Aprobación documentación de ingreso de personal y vehículos -contrato de obra 1010-2024 – LP (119226)
29-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-268		Aprobación hoja de Vida Cambio Residente de Obra 2 y Auxiliar Social - Rta oficio D-153-2025-50
29-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-269		Aprobación PMT SUBA CENTRO V3- RTA correo “asunto: atención de Observaciones SMD Radicación PMT 03/ Suba Centro - Radicado SDM-202561202508102”
30-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-270		Aprobación documentación de ingreso de personal y maquinaria -contrato de obra 1010-2024 – LP (119226)
30-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-271	2025-611-020277-2 del 30/07/2025	Radicación en fisico Hoja de Vida cambio residente obra y auxiliar social contratista de obra 1010-2024 – LP (119226)
31-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-272		Remisión Concepto Informe de Geotecnia y Pavimentos para segmentos viales priorizados FASE 2 SUBA -117 - Rta oficio D-143-2025-50.
31-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-273		Devoluviòn actas de vecindad POA

31-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-274		Solicitud Plan de Acción Correctivo frente al Atraso en el frente de obra POTOSÍ, alcance a los oficios D-152- 2025-50 y D-165-2025-50
31-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-275		Solicitud radicados documentacion forestal ante la SDA
31-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-276	2025-611-020466-2 del 31/07/2025	Radicacion de informe de exclusion
31-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-277	2025-611-020467-2 del 31/07/2025	Radicación apus contractuales

❖ CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FECHA	COMUNICADO	ASUNTO	OFICIO RESPUESTA	COMPONENTE
01/07/2025	D-113-2025-50	Entrega Programacion general del proyecto	TYA-FDLS-084-2025-178	TECNICO
02/07/2025	ingenieria@promciviles.com 2/02/2025	INFORME MENSUAL 3 PMT	TYA-FDLS-084-2025-179	PMT
02/07/2025	"sisoma@promotorapuga.com 2/07/2025"	Documentos Operador y Volquetas	TYA-FDLS-084-2025-174	SSTA
02/07/2025	"sisoma@promotorapuga.com 2/07/2025"	Documentos Personal, Volquetas y Maquinaria 02-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-174	SSTA
02/07/2025	"sisoma@promotorapuga.com 2/07/2025"	Documentos Volquetas	TYA-FDLS-084-2025-174	SSTA
02/07/2025	"sisoma@promotorapuga.com 2/07/2025"	DOCUMENTACION VEHICULOS	TYA-FDLS-084-2025-180	SSTA
03/07/2025	D-115-2025-50	Entrega de informe mensual SST 03 de Julio 2025	TYA-FDLS-084-2025-191	SSTA
03/07/2025	D-116-2025-50	Entrega informe mensual ambiental #3	TYA-FDLS-084-2025-190	AMBIENTAL
03/07/2025	D-117-2025-52	Informe mensual No2 Social V2 con anexos	TYA-FDLS-084-2025-185	SOCIAL
04/07/2025	"sisoma@promotorapuga.com 4/07/2025"	Documentación Personal y Maquinaria	TYA-FDLS-084-2025-186	SOCIAL
05/07/2025	"sisoma@promotorapuga.com 5/07/2025"	Documentos Personal	TYA-FDLS-084-2025-187	SSTA
05/07/2025	"residenteccpgt2@gmail.com 5/07/2025"	ENTREGA INFORME TÉCNICO No. 3	TYA-FDLS-084-2025-189	TECNICO

05/07/2025	D-119-2025-50	Alternativas de estructura de pavimento con base en resultados de deflectometria , Paque Piloto, tibabuyes costa azul,niza sur (2), casablanca, y POA portico	TYA-FDLS-084-2025-195	TECNICO
07/07/2025	D-120-2025-50	Rad en fisico programación Rta TYA-FDLS-084-2025-178	TYA-FDLS-084-2025-197	TECNICO
07/07/2025	"sisoma@promotorapuga.com 7/07/2025"	Documentación Personal y Vehículos	TYA-FDLS-084-2025-192	SSTA
07/07/2025	"sisoma@promotorapuga.com 7/07/2025"	Documentación personal y vehiculos	TYA-FDLS-084-2025-192	SSTA
07/07/2025	"sisoma@promotorapuga.com 7/07/2025"	Documentación Personal	TYA-FDLS-084-2025-192	SSTA
07/07/2025	EMAIL proyectosaprovar@gmail.com 07/07/2025	ATENCION DE OBSERVACIONES RADICADO 202561202036542 - PORTICO SUBSANACION ONBSERVACIONES SDM	TYA-FDLS-084-2025-193	PMT
08/07/2025	D-121-2025-50	Entrega Informe Mensual Ambiental No3 Junio	TYA-FDLS-084-2025-194	AMBIENTAL
08/07/2025	D-122-2025-50	Rta TYA-FDLS-084-2025-152 Rta a D-91-2025-50 Analisis de precios unitarios - Atencion observaciones	TYA-FDLS-084-2025-217	TECNICO
09/07/2025	D-123-2025-50	Documentos Gestores RCD	TYA-FDLS-084-2025-209	AMBIENTAL
09/07/2025	"sisoma@promotorapuga.com 9/07/2025"	Documentos Personal 09-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-199	SSTA
09/07/2025	"sisoma@promotorapuga.com 9/07/2025"	Documentación	TYA-FDLS-084-2025-199	SSTA

10/07/2025	proyectosaprovar@gmail.com 9/07/2025"	atención de observaciones al PMT3 correspondiente a la KR 92 (Subazar) Rta alcance oficio TYA- FDLS -084-2025-102	INFORMATIVO	PMT
10/07/2025	"sisoma@promotorapuga.com 10/07/2025"	Documentación Personal y Maquinaria	TYA-FDLS-084-2025-208	SSTA
10/07/2025	D-124-2025-50	Hoja de vida cambio residente ambiental	TYA-FDLS-084-2025-207	ADMINISTRATIVO
10/07/2025	D-125-2025-50	Informe mensual PMT de Junio	TYA-FDLS-084-2025-212	PMT
10/07/2025	D-126-2025-50	Acta de no previstos No.1		TECNICO
10/07/2025	D-128-2025-50	Entrega informe mensual No3 SST	TYA-FDLS-084-2025-218	SSTA
10/07/2025	D-129-2025-50	Rta TYA-FDLS-084-2025-203 asunto atencionde solicitud al material de mejoramiento de la subrasante instalado en Tibabuyes		TECNICO
10/07/2025	D-130-2025-50	Inventario forestal Potosi	TYA-FDLS-084-2025-231	AMBIENTAL
10/07/2025	D-131-2025-50	Informe Mensual Ambiental No 3 Junio V3 y anexos	TYA-FDLS-084-2025-230	AMBIENTAL
10/07/2025	residenteccpgt2@gmail.com 10/07/2025	informe técnico mensual No. 3 versión 2 RTA TYA- FDLS -084-2025-189 subsanacion observaciones realizadas.	TYA-FDLS-084-2025-215	TECNICO
10/07/2025	D-132-2025-50	Procedimeinto para corte y tratamiento de raices	INFORMATIVO	AMBIENTAL

10/07/2025	consorcioconservacionpg@gmail.com 10/07/2025	Informe mensual Social contratista N.3	TYA-FDLS-084-2025-210	SOCIAL
10/07/2025	ingenieria@promotorapuga.com 10/07/2025	respuesta frente a las observaciones presentadas por el especialista de pavimentos para su respectiva revisión del frente de obra POA-Pórtico: 11004156-173807; 11013439-91020581; 11004110-173808; 11004080-173809.		TECNICO
11/07/2025	"sisoma@promotorapuga.com 11/07/2025"	Documentos Ingreso Personal 11-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-216	SSTA
11/07/2025	"sisoma@promotorapuga.com 11/07/2025"	Documentos Personal y Maquinaria para Aprobación 11-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-223	SSTA
11/07/2025	"sisoma@promotorapuga.com 11/07/2025"	Documentos personal	TYA-FDLS-084-2025-223	SSTA
11/07/2025	"sisoma@promotorapuga.com 11/07/2025"	Observaciones documentación de ingreso de personal y maquinaria contrato de obra 1010-2024 – LP (119226)	TYA-FDLS-084-2025-223	SSTA
11/07/2025	nancygs1978@hotmail.com 11/07/2025"	DERECHO DE PETICION CASABLANCA Nancy Yazmin Coy inmueble ubicado en la CALLE 146 F 73 A 20 TORRE 12 APARTAMENTO 402.	TYA-FDLS-084-2025-226	SOCIAL
11/07/2025	D-133-2025-50	Inventario sumideros Potosi	TYA-FDLS-084-2025-222	AMBIENTAL
11/07/2025	D-134-2025-50	Radicación de informes de laboratorio para la caracterizacion inicial de los materiales granulares -subbase granular peatonañ AR y Arena NP 040		TECNICO
11/07/2025	D-135-2025-50	Rta TYA-FDLS-084-2025-166 asunto Remisión Concepto Informe de Geotecnia y Pavimentos Sector NIZA SUR y POA PORTICO - Respuesta oficio D-103-2025-50.		TECNICO

11/07/2025	D-136-2025-50	Rta TYA-FDLS-084-2025-166 asunto Remisión Concepto Informe de Geotecnia y Pavimentos Sector NIZA SUR y POA PORTICO - Respuesta oficio D-103-2025-50.	TYA-FDLS-084-2025-232 TYA-FDLS-084-2025-249	TECNICO
11/07/2025	D-137-2025-50	Rta TYA-FDLS-084-2025-211 solicitud de caracterización al material B200- Tibabuyes 11005215 - Atenciaon a la solicitud y remision de informes y ensayos de laboratorio		TECNICO
12/07/2025	"sisoma@promotorapuga.com 12/07/2025"	Documentos Ingreso Personal y vehiculos	TYA-FDLS-084-2025-224	SSTA
12/07/2025	residenteccpgt2@gmail.com 10/07/2025	Rta informe técnico mensual No. 3 versión 3 TYA- FDLS -084-2025-215 subsanacion observaciones realizadas.	TYA-FDLS-084-2025-227	TECNICO
12/07/2025	D-138-2025-50	Rta TYA-FDLS-084-2025-166 asunto Remisión Concepto Informe de Geotecnia y Pavimentos Sector NIZA SUR y POA PORTICO - Respuesta oficio D-103-2025-50.		TECNICO
12/07/2025	D-139-2025-50	Rta TYA-FDLS-084-2025-123 asunto "observaciones informe de exclusión - Rta D-54-2025-50 Informe de segmentos de excusión"	TYA-FDLS-084-2025-228	TECNICO
12/07/2025	D-140-2025-50	Rta TYA-FDLS-084-2025-195 de fecha 9.307.2025 observaciones wmitidas mediante comunicado RVR-SUBA 110 y mesa de trabajo del 04.07.2025		
14/07/2025	"sisoma@promotorapuga.com 14/07/2025"	Documentación Personal y Maquinaria	TYA-FDLS-084-2025-229	SSTA
14/07/2025	"sisoma@promotorapuga.com 14/07/2025"	INGRESO DE PERSONAL	TYA-FDLS-084-2025-229	SSTA
14/07/2025	"sisoma@promotorapuga.com 14/07/2025"	Planilla SS OMR	TYA-FDLS-084-2025-229	SSTA
15/07/2025	"sisoma@promotorapuga.com 15/07/2025"	Rta TYA-FDLS-084-2025-224 Observaciones documentación de ingreso de personal y vehículos -contrato de obra 1010-2024 – LP (119226)	TYA-FDLS-084-2025-236	SSTA
15/07/2025	consorcioconservacionpg@gmail.com 15/07/20255	Entrega de subsanaciones informe mensual social contratista No.3 V 1	TYA-FDLS-084-2025-237	SOCIAL
16/07/2025	D-141-2025-50	Informe de exclusion (concepoto especialista)	TYA-FDLS-084-2025-259	TECNICO
16/07/2025	D-142-2025-50	Aprobación PUs contractales	TYA-FDLS-084-2025-260	TECNICO

16/07/2025	D-143-2025-50	Informe de geotecnia y pavimentos para segmentos viales priorizados Fase 2	TYA-FDLS-084-2025-274	TECNICO
16/07/2025	D-144-2025-50	Informe mensual ambiental No3 junio	TYA-FDLS-084-2025-242	AMBIENTAL
16/07/2025	D-145-2025-50	Radicación de informes de laboratorio para la caracterizacion inicial de los materiales granulares -subbase granular y base granular		TECNICO
16/07/2025	D-146-2025-50	Entrega parcial de actas de vecindad NIza Sur 1 y 2	TYA-FDLS-084-2025-263	SOCIAL
16/07/2025	D-147-2025-50	Inventario de sumideros Niza Sur y Parque Piloto	TYA-FDLS-084-2025-241	AMBIENTAL
16/07/2025	D-148-2025-50	Inventario forestal Niza Sur y Parque Piloto	TYA-FDLS-084-2025-245	AMBIENTAL
17/07/2025	"sisoma@promotorapuga.com 17/07/2025"	Documentación Maquinaria	TYA-FDLS-084-2025-240	SSTA
17/07/2025	SDM RADICADO 202531208313691 17/07/2025	RAD SDM 202531208313691 - ASUNTO: Incumplimientos en la implementación del plan de manejo de tránsito (PMT). RAD 202561201393072 Calle 137Bis entre Carrera 103 y Carrera 103C	TYA-FDLS-084-2025-244	PMT
17/07/2025	"sisoma@promotorapuga.com 17/07/2025"	Documentación Personal	TYA-FDLS-084-2025-246	SSTA
18/07/2025	D-149-2025-50	Radicación en físico Informe SST Mensual No3– V2	TYA-FDLS-084-2025-247	SSTA
18/07/2025	D-150-2025-50	Radicación en físico Informe Tecnico Mensual No3– V	TYA-FDLS-084-2025-261	TECNICO
18/07/2025	D-152-2025-50	RTA COMUNICADO TYA-FDLS-084-2025-219 DE FECHA 11.07.2025 CON ASUNTO SOLICITUD PLAN DE CONTINGENCIA	TYA-FDLS-084-2025-274	TECNICO
18/07/2025	D-153-2025-50	REMISIÓN HOJA DE VIDA RESIDENTE Y AUXILIAR SOCIAL	TYA-FDLS-084-2025-268	ADMINISTRATIVO
19/07/2025	consorcioconservacionpg@gmail.com 19/07/2025	Entrega del informe social No. 3 V2	TYA-FDLS-084-2025-256	SOCIAL
21/07/2025	"sisoma@promotorapuga.com 21/07/2025"	Ingreso personal	TYA-FDLS-084-2025-248	SSTA
21/07/2025	D-154-2025-50	Radicación de informes de laboratorio para caracterización inicial de los materiales granulares -subbase granular con agregados reciclados , base granular con agregados reciclados y subbase granular clase A- proveedor CODEOBRAS		TECNICO
22/07/2025	"sisoma@promotorapuga.com 22/07/2025"	DOCUMENTOS DE INGRESO BRANDON_SILVA	TYA-FDLS-084-2025-250	SSTA

22/07/2025	"sisoma@promotorapuga.com 22/07/2025"	Documentación de ingreso - Jose Ceron	TYA-FDLS-084-2025-250	SSTA
22/07/2025	SDM RADICADO 202531208354421 22/07/2025	RAD SDM 202531208354421 - ASUNTO: Incumplimientos en la implementación del plan de manejo de tránsito (PMT). 202561201393072 Calle 146F entre Carrera 72B y Carrera 73A - Calle 146F entre Carrera 73A y 140m al Occidente Calle 146F entre 15m y 118m al Oriente de la Carrera 75	TYA-FDLS-084-2025-251	PMT
22/07/2025	D-155-2025-50	Entrega informe mensual social N.3V2	TYA-FDLS-084-2025-255	SOCIAL
23/07/2025	"sisoma@promotorapuga.com 23/07/2025"	Documentos Personal 23-07-2025	TYA-FDLS-084-2025-257	SSTA
23/07/2025	D-156-2025-50	Radicación de certificado del densimetro nuclear para la toma de densidades		TECNICO
23/07/2025	"sisoma@promotorapuga.com 23/07/2025"	Documentos Personal	TYA-FDLS-084-2025-257	SSTA
24/07/2025	D-157-2025-50	Entrega parcial de actas de vecindad Parque Piloto	TYA-FDLS-084-2025-264	SOCIAL
25/07/2025	D-158-2025-50	Entrega de Consolidado de personal nuevo ingresado al componente social	TYA-FDLS-084-2025-268	SSTA
25/07/2025	D-159-2025-50	REVISAR		TECNICO
25/07/2025	D-160-2025-50	REVISAR		TECNICO
25/07/2025	D-161-2025-50	Rta TYA-FDLS-084-2025-238 Observacion ocupacion zonas verdes-Frente Casablanca	TYA-FDLS-084-2025-266	AMBIENTAL
25/07/2025	D-162-2025-50	Inventario sumideros portico	TYA-FDLS-084-2025-262	AMBIENTAL
25/07/2025	D-163-2025-50	Entrega parcial Actas de vecindad POA	TYA-FDLS-084-2025-273	SOCIAL
28/07/2025	D-164-2025-50	Entrega Analisis de precios unitarios (APUs)	TYA-FDLS-084-2025-277	TECNICO
28/07/2025	D-165-2025-50	Alcance comunicado D-152-2025-50 DE FECHA 18.07.2025 dando atención al comunicado No TYA-FDLS-084-2025-219 de fecha 11.07.2025 con asunto "SOLICITUD PLAN DE CONTINGENCIA"	TYA-FDLS-084-2025-274	TECNICO
28/07/2025	"sisoma@promotorapuga.com 28/07/2025"	Documentos Personal y Volqueta 28/07/2025	TYA-FDLS-084-2025-267	SSTA

29/07/2025	"sisoma@promotorapuga.com 29/07/2025"	Documentos Auxiliar de Tráfico 29/07/2025	TYA-FDLS-084-2025-270	SSTA
29/07/2025	"sisoma@promotorapuga.com 29/07/2025"	Documentos Personal y Minicargador 29/07/2025	TYA-FDLS-084-2025-270	SSTA
30/07/2025	"sisoma@promotorapuga.com 30/07/2025"	Documentos vibrocompactador	TYA-FDLS-084-2025-270	SSTA
30/07/2025	D-166-2025-50	Radicacion Acta de formalizacion de inclusion de segmentos viales	TYA-FDLS-084-2025-276	TECNICO
30/07/2025	D-167-2025-50	|Rta al comunicado TYA-FDLS-084-2025-268 del 29.07.2025 cuyo asunto es "Aprobación hoja de Vida Cambio Residente de Obra 2 y Auxiliar Social - Rta oficio D-153-2025-50"	TYA-FDLS-084-2025-271	ADMINISTRATIVO

10. REGISTRO FOTOGRAFICO
CASABLANCA 11005566,11014376,11005623, 11005728, 11005765.

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.	**Interventoría contrato FDLS-CTO-084-2025**
	CONTRATO 084 DE 2025 INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2
	Informe No.4: 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025
FRENTE CASABLANCA CIVS 11005566, 11014376, 11005623, 11005728, 11005765.	     

COSTA AZUL 1100525

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.	**Interventoría contrato FDLS-CTO-084-2025**
	CONTRATO 084 DE 2025 INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2
	Informe No.4: 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025
FRENTE COSTA AZUL CIV 11005215	     

POTOSI 11011188

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.	**Interventoría contrato FDLS-CTO-084-2025**
	CONTRATO 084 DE 2025 INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2
	Informe No.4: 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025
FRENTE POTOSI CIV 11011188	    

PARQUE PILOTO 11011976, 11006438, 11011977, 11006546, 11011978 Y 11006617

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.	**Interventoría contrato FDLS-CTO-084-2025**
	CONTRATO 084 DE 2025 INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2
	Informe No.4: 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025
FRENTE TIBABUYES (PARQUE PILOTO) CIVS 11006438, 11011976, 11011977,11006546, 11011978 Y 11006617	  

POA 11004080, 11004110, 11004156 Y 11013439

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.	**Interventoría contrato FDLS-CTO-084-2025**
	CONTRATO 084 DE 2025 INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2
	Informe No.4: 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025
FRENTE EL POA CIVS 11004156, 11013439, 11004110 Y 11004080	  

NIZA SUR 11010613

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.	**Interventoría contrato FDLS-CTO-084-2025**
	CONTRATO 084 DE 2025 INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2
	Informe No.4: 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025
FRENTES NIZA SUR CIVS 11010613	   

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ La interventoría ha llevado a cabo el acompañamiento correspondiente con su personal técnico dentro del cual se encuentra residente, topografía e inspector.
- ✓ Actualmente el contrato de obra 1010-2024 se encuentra en fase de ejecución.
- ✓ Durante el mes de julio se ejecutaron las actividades correspondientes para el desarrollo de los diagnósticos de fase 2.
- ✓ Durante el mes evaluado, se evidenció un avance significativo en varios frentes de obra, con ejecución de actividades correspondientes a excavaciones, instalación de estructuras de pavimento, elementos de urbanismo y trabajos de estabilización de subrasante, cumpliendo en su mayoría con las especificaciones técnicas y de diseño aprobadas.

- ✓ La interventoría mantuvo un control permanente en campo y en gabinete, verificando la calidad de los materiales, la correcta ejecución de las actividades y el cumplimiento de los cronogramas, lo cual permitió identificar a tiempo inconsistencias y generar las observaciones correspondientes.

- ✓ Algunos frentes presentaron retrasos asociados a la entrega tardía de información, subsanaciones y respuesta a requerimientos, lo cual generó reprogramaciones puntuales y ajustes en la secuencia constructiva.

- ✓ Se aprobaron las estructuras de pavimento correspondientes a los segmentos de fase 2, lo que permite la programación de su ejecución en el corto plazo.

- ✓ Se identificaron ítems no previstos que requieren análisis técnico y presupuestal, actualmente en revisión por parte de la interventoría para su radicación ante la entidad contratante.

- ✓ Se realizaron visitas técnicas con entidades externas como Vanti, con presencia de la interventoría para coordinar la gestión de interferencias con redes de servicios.

- ✓ La interventoría llevó a cabo una gestión documental activa con la emisión de más de 80 oficios entre el 3 y el 26 de junio de 2025, abordando temas como ingreso de personal, radicación de informes, revisión de diseños y cumplimiento de obligaciones contractuales.

- ✓ Se dejaron constancias formales sobre retrasos, incumplimientos y deficiencias logísticas, fortaleciendo la trazabilidad y el debido proceso entre las partes.

- ✓ Se recomienda al contratista realizar mesas de trabajo en conjunto con la interventoría para aclarar todas las dudas que tenga sobre documentación y el desarrollo de actividades.

- ✓ Se recomienda al contratista informar con una anterioridad mínima de 3 días calendario sobre cualquier actividad que se vaya a realizar y que no esté dentro de las contractuales.

- ✓ Se recomienda al contratista aumentar la disponibilidad de personal técnico y operativo en los frentes de trabajo, con el fin de mejorar la eficiencia en la ejecución de actividades y evitar retrasos en el cronograma general del proyecto. Este refuerzo debe incluir mano de obra calificada para la ejecución de actividades específicas, como pavimentación, obras complementarias y manejo de redes.

- ✓ Se ha identificado la necesidad de contar con un equipo social activo en los frentes de obra, especialmente para el levantamiento de actas de vecindad antes del inicio de intervenciones. Este proceso es fundamental para dejar constancia del estado inicial de los predios aledaños y evitar conflictos con la comunidad durante o después de la ejecución. Se recomienda al contratista designar de manera prioritaria personal social capacitado para esta labor

- ✓ Se recomienda al contratista revisar y, de ser necesario, ajustar los diseños estructurales conforme a las especificaciones técnicas del contrato y las recomendaciones del interventor especializado, garantizando así la seguridad, funcionalidad y durabilidad de las obras.

- ✓ Fortalecer la planeación de actividades por parte del contratista, priorizando la entrega oportuna de información, subsanaciones y documentación requerida, para evitar retrasos y reprogramaciones.

- ✓ Mantener la coordinación y comunicación efectiva entre el contratista, la interventoría y la entidad contratante, especialmente en lo relacionado con la ejecución de los segmentos de fase 2.

- ✓ Garantizar la aplicación de las medidas de seguridad industrial, ambiental y social en todos los frentes, reforzando el cumplimiento de las listas de chequeo y las medidas preventivas.

- ✓ Avanzar en la gestión y definición de los ítems no previstos, asegurando que cuenten con la justificación técnica y económica antes de su ejecución.

- ✓ Continuar con el seguimiento riguroso de las actividades en campo y la verificación de la calidad de los materiales, para asegurar la durabilidad y funcionalidad de las intervenciones.

ANEXO 1: INFORMES SEMANALES

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROCESO** Contrato de obra **OFICINA DE INFRAESTRUCTURA** **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA**	**Versión 0** **26/5/2021**

SEMANA No. 15 (Consecutivo) **DEL** 7/7/2025 (dd-mm-aa) **AL** 13/7/2025 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 084 DE 2025 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 1010 DE 2024 (Número de Contrato)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

El objeto del Contrato es: **EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO.**

CONTRATISTA CONSORCIO CONSERVACION PG. (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) **NIT** 901001320-5 (Escriba el NIT del Contratista)

INTERVENTOR TORRES Y ASOCIADOS S.A.S (Escriba el nombre o razón social del Interventor) **NIT** 829000727-3 (Escriba el NIT del Interventor)

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Valor Inicial	$ 13.033.377.846,00	Valor Inicial	$ 1.629.172.198,00
Valor Adicional 1	$ -	Valor Adicional 1	$ -
Valor Adicional 2	$ -	Valor Adicional 2	$ -
Valor Adicional 3	$ -	Valor Adicional 3	$ -
Valor Actualizado	$ 13.033.377.846,00	Valor Actualizado	$ 1.629.172.198,00
Plazo Inicial	DIEZ (10) MESES	Plazo Inicial	ONCE (11) MESES
Plazo Prórroga 1	0	Plazo Prorroga 1	0
Plazo Prórroga 2	0	Plazo Prorroga 1	0
Plazo Actualizado	DIEZ (10) MESES	Plazo Actualizado	ONCE (11) MESES
Fecha de Iniciación	2/4/2025	Fecha de Iniciación	2/4/2025
Fecha de Terminación Inicial	1/2/2026	Fecha de Terminación Inicial	1/3/2026
Fecha de Terminación Actual	1/2/2026	Fecha de Terminación Actual	1/3/2026

Apoyo a la supervision de la oficina de infraestructura Fondo de Desarrollo Local de Suba - FDLS: ING. EXMELIN HAMID LEMUS FRANCO

Coordinador oficina de infraestructura Fondo de Desarrollo Local de Suba - FDLS: ING. ALEJANDRO SAMUEL VICTORIA

2. AVANCES DEL CONTRATO

AVANCE GENERAL

Actividades realizadas por el contratista durante el periodo del informe semanal:

Durante el periodo evaluado, el contratista CONSORCIO CONSERVACION PG remitió a esta interventoría diversa correspondencia relacionada con la atención de observaciones técnicas, entrega de informes mensuales, documentación de personal, avances ambientales y sociales, así como la radicación de documentos asociados a la operación y ejecución del contrato. A continuación, se relacionan los radicados más relevantes:

07/07/2025 – Oficio D-120-2025-50: Radicación física de programación – Respuesta a oficio TYA-FDLS-084-2025-178

07/07/2025 – Correo sisoma@promotorapuga.com: Documentación personal y vehículos

07/07/2025 – Correo proyectosaprovar@gmail.com: Subsanación observaciones SDM – Radicado 20256120203654 2

08/07/2025 – Oficio D-121-2025-50: Entrega informe mensual ambiental No. 3 (junio)

08/07/2025 – Oficio D-122-2025-50: Respuesta a observaciones de análisis de precios unitarios

09/07/2025 – Oficio D-123-2025-50: Documentos Gestores RCD

09/07/2025 – Correo sisoma@promotorapuga.com: Documentos personal y documentación general

10/07/2025 – Oficio D-124-2025-50: Hoja de vida – Cambio de residente ambiental

10/07/2025 – Oficio D-125-2025-50: Informe mensual PMT junio

10/07/2025 – Oficio D-126-2025-50: Acta de no previstos No. 1

10/07/2025 – Oficio D-128-2025-50: Informe mensual SST No. 3

10/07/2025 – Oficio D-129-2025-50: Respuesta sobre material de subrasante Tibabuyes

10/07/2025 – Oficio D-130-2025-50: Inventario forestal – Potosí

10/07/2025 – Oficio D-131-2025-50: Informe mensual ambiental No. 3 V3 y anexos

10/07/2025 – Correo residenteccpgt2@gmail.com: Informe técnico mensual No. 3 V2 – Subsanación de observaciones

A continuación, se presenta la descripción de las actividades ejecutadas en obra por parte del contratista durante el periodo evaluado, en el marco del contrato de obra No. 1010-2024-LP. Estas acciones corresponden al desarrollo físico del proyecto y hacen parte del cumplimiento del cronograma establecido, conforme a los frentes de trabajo habilitados, las autorizaciones otorgadas por la interventoría y la disponibilidad de recursos técnicos, operativos y administrativos reportados. La verificación de estas actividades se realizó mediante visitas de campo, revisión de registros fotográficos, actas y demás soportes entregados.

11005728, 11005765, 11005623 (Casablanca): Se realiza traslado de red de vanti y retiro de material RCD acopiado. Se evidencia bajo rendimiento.

11014376 y 11005566 (Casablanca): Sin actividad.

11005215 (Tibabuyes): Se realiza instalacion de geotextil, material de mejoramiento de subrasante y sello correspondiente.

11010613 y 11010621 (Niza Sur): Se inicia la instalacion de PMT.

11006438, 11011976, 11011977, 11011978, 11006546 y 11006617: Se inicia con instalacion de PMT.

11011188 (Potosi): Se realiza demolicion de pavimento existente y retiro.

Esta informacion se encuentra en gestion y tramite por parte del contratista de obra.

SEMANA No. 15 (Consecutivo) **DEL** 7/7/2025 (dd-mm-aa) **AL** 13/7/2025 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 084 DE 2025 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 1010 DE 2024 (Número de Contrato)

Tabla 1 Resumen de PMT aprobados y vigentes

N°	COI No.	Frente	CIV	Vía	Desde	Hasta	Radicado SDM
1	21	POTOSI	**11011188**	KR 70D CL 98A HASTA KR 70D CL 98B	23-may-2025	4-sep-2025	202561201393072
2	21	COSTA AZUL	**11005215**	CL 137BIS KR 103 HASTA CL 137BIS KR 103C	23-may-2025	4-sep-2025	202561201393072
3	21	CASABLANCA	**11005765 - 11005623**	CL 146F KR 72B HASTA CL 146F KR 73A	23-may-2025	4-sep-2025	202561201393072
4	21	CASABLANCA	**50009380 (PMT ALEDAÑO A INTERVENCION)**	CL 146F KR 73A HASTA CL 146F 140m AL OCCIDENTE	23-may-2025	4-sep-2025	202561201393072
5	21	CASABLANCA	**11005566**	CL 146F 15m AL ORIENTE DE LA KR 75 HASTA CL 146F 118m AL ORIENTE DE LA KR 75	23-may-2025	4-sep-2025	202561201393072
6	21	CASABLANCA	**11005566**	CL 146F KR 75 HASTA CL 146F 15m AL ORIENTE DE LA KR 75	23-may-2025	4-sep-2025	202561201393072
7	27	TIBABUYES (PARQUE PILOTO)	**11006546-11006438**	CL 129D KR 121 CL 129D 30m AL OCCIDENTE DE LA KR 121C	4-jul-2025	23-oct-25	202561201657052 202561202137792
8	27	NIZA SUR	**11010613**	CL 119 KR 70G CL 119 97m AL OCCIDENTE	4-jul-2025	2-oct-25	2,02561E+14
9	27	NIZA SUR	**11010613**	CL 119 KR 71A CL 119 96m ALORIENTE	4-jul-2025	2-oct-25	2,02561E+14
10	27	NIZA SUR	**11010621**	CL 119 KR 70 CL 119 96m ALOCCIDENTE	4-jul-2025	2-oct-25	2,02561E+14
11	27	NIZA SUR	**11010621**	CL 119 KR 70C CL 119 96m ALORIENTE	4-jul-2025	2-oct-25	2,02561E+14

Actividades realizadas por interventoría:

Durante la semana del 07 al 13 de julio de 2025, la interventoría llevó a cabo una gestión activa en el seguimiento y control del contrato de obra No. 1010-2024 – LP (119226), mediante la emisión de diversos oficios técnicos y administrativos dirigidos al contratista. Estas comunicaciones abarcaron la aprobación y observación de documentación de ingreso de personal, maquinaria y vehículos; la evaluación de informes mensuales de los componentes técnico, social, ambiental y de SST; la solicitud de medidas correctivas ante incumplimientos detectados; así como el requerimiento de información técnica complementaria para garantizar la adecuada ejecución del contrato. A continuación, se relaciona la correspondencia remitida durante el periodo: 07/07/2025 – TYA-FDLS-084-2025-187: Aprobación documentación de ingreso de personal – Contrato 1010-2024

07/07/2025 – TYA-FDLS-084-2025-188: Llamado de atención – Componente social

07/07/2025 – TYA-FDLS-084-2025-189: Observaciones al informe técnico mensual de junio

07/07/2025 – TYA-FDLS-084-2025-190: Observaciones al informe ambiental N°3 (junio)

07/07/2025 – TYA-FDLS-084-2025-191: Observaciones informe mensual SST N°3 – Versión 1

07/07/2025 – TYA-FDLS-084-2025-192: Aprobación documentación de ingreso de personal y volquetas

07/07/2025 – TYA-FDLS-084-2025-193: Remisión revisión y aprobación PMT Pórtico – Respuesta a observaciones SDM

08/07/2025 – TYA-FDLS-084-2025-194: Observaciones al informe ambiental N°3 versión 2 (junio)

08/07/2025 – TYA-FDLS-084-2025-195: Respuesta a alternativas de estructura de pavimento – varios sectores

09/07/2025 – TYA-FDLS-084-2025-196: Radicación informes semanales 10, 11, 12, 13

09/07/2025 – TYA-FDLS-084-2025-197: Radicación programación de obra

09/07/2025 – TYA-FDLS-084-2025-198: Radicación Plan de Calidad del contratista

09/07/2025 – TYA-FDLS-084-2025-199: Aprobación documentación de ingreso de personal y vehículos

Durante el desarrollo del Comité No. 13 se revisaron los compromisos establecidos en el Comité anterior, evidenciándose múltiples incumplimientos por parte del contratista en la entrega de documentos clave y en el inicio de actividades programadas, como las obras en POA, Niza Sur y Potosí, así como la radicación del informe de exclusión. La Interventoría manifestó su preocupación por la falta de compromiso y propuso evaluar el inicio de un proceso de incumplimiento contractual. Se reportaron incidentes técnicos en Casablanca y Tibabuyes, afectaciones a redes de gas y bajo rendimiento de obra. En el componente social, se evidenció rezago en la elaboración de actas de vecindad y ausencia de soportes del MONC. En el frente ambiental y de SST, se resaltó el impacto negativo de la no entrega de inventarios forestales y documentación incompleta. La Interventoría exigió la presentación de un plan de contingencia, el cumplimiento riguroso de listas de chequeo y reiteró que no se dará aval a nuevos frentes hasta que se subsanen los pendientes. Finalmente, se pactaron nuevos compromisos con fechas específicas de cumplimiento, incluyendo entrega de informes, actas, inventarios y caracterizaciones técnicas.

Durante la semana el equipo de interventoría llevó a cabo actividades de seguimiento técnico en los distintos frentes de obra, con énfasis en el acompañamiento en campo a las labores de excavación, verificación de condiciones iniciales y control de calidad de los materiales. Se realizaron recorridos topográficos para validar alineaciones, cotas de referencia y puntos críticos de intervención, especialmente en los sectores de Tibabuyes, Potosí, Casablanca y Parque Piloto. Adicionalmente, se efectuaron revisiones a los informes técnicos, sociales y ambientales entregados por el contratista, se emitieron observaciones formales, y se participó en mesas de trabajo con especialistas para la definición de estructuras de pavimento. La interventoría también adelantó seguimiento documental, revisión de listados de chequeo y coordinación con entidades externas en temas ambientales y de permisos requeridos.

En la siguiente tabla se resume el estado de los productos.

Tabla 4. Estado de los productos (Todavía no hay información al respecto sobre este ítem)

		Estado	Comentarios
1	**Revisión entregables etapa de preliminares contratista de obra.**		

AVANCE FINANCIERO

	PROGRAMADO		EJECUTADO		
OBRA	**SEMANAL**	**ACUMULADO**	**SEMANAL**	**ACUMULADO**	**Atraso /Avance**
Obra Programada ($)					

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROCESO** Contrato de obra **OFICINA DE INFRAESTRUCTURA** **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA**	**Versión 0** **26/5/2021**


SEMANA No. 15 (Consecutivo) **DEL** 7/7/2025 (dd-mm-aa) **AL** 13/7/2025 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 084 DE 2025 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 1010 DE 2024 (Número de Contrato)

Obra Programada (%)

Gráfica porcentanje de ejecución Vs porcentaje programado

A la fecha no se ha dado inicio a las actividades de obra por lo cual no se tiene informacion de avance.



Sem.	Desde	Hasta	Acumulado financiero	
			% program.	% ejecutado
1	9/6/2025	15/6/2025	0,00%	1,24%
2	16/6/2025	22/6/2025	2,28%	2,29%
3	23/6/2025	29/6/2025	4,00%	3,82%
4	30/6/2025	6/7/2025	5,00%	4,25%
5	7/7/2025	13/7/2025	7,34%	4,93%
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

COMPONENTE DE TRÁNSITO:

Se realizo la radicacion del informe mensual PMT del contratista de obra a la entidad correspondiente.

FORESTAL:

El contratista presento el inventario forestal de los frentes de obra de Atabanza (CIV 11010414) y Niza sur (CIV 11010613-11010621) con sus respectivas fichas, formatos y planos que fue aprobado por esta interventoria por medio del oficio TYA-FDLS-084-2025-177 al igual se radico al FDLS bajo numero 2025-611-016333-2 y el contratista presento los documentos ante la SDA, en espera de una respuesta.

COMPONENTE AMBIENTAL:

-El contratista presento el informe menusal #3 correspondiente al mes de junio mediante oficio D-116-2025-50, se dio respuesta con observaciones mediante oficio TYA-FDLS-084-2025-190 el 7 de julio, el contratista envio subsanado el informe por medio del oficio D-121-2025-50, el cual no cumplio con lo solicitado y se volvio a mandar observaciones mediante oficio TYA-FDLS-084-2025-194 el 8 de julio y el dia 11 de julio el contratista vuelve a enviar el informe subsanado para su revision mediante oficio D-131-2025-50

-El contratista presento dos gestores o sitios de disposicion final para el material RCD de los frentes de obra, por lo que remitio los documentos de CORESA S,A y MAQUINAS AMARILLAS SAS que fueron aprobados por medio del oficio TYA-FDLS-084-2025-209 el dia 10 de julio

-Se envia mediante el oficio TYA-FDLS-084-2025-220 la Solicitud de tomar las Medidas Correctivas para el Cumplimiento Listas de Chequeo Componente A&SST Contrato de Obra No. 1010 de 2024 al contratista el dia 12 de julio

- Se participa en comite de obra, en el componente ambiental, se evidencio la lista de chequeo semana vencida que fue del 96% y se solicito el inventario forestal por lo menos de la fase 1 completo para su debida aprobacion.

COMPONENTE SOCIAL:

- Se llevo a cabo recorrido de obra desde el componente social; verificacion de vallas, PSI y atencion a la comunidad.
-El contratista llevo a cabo reunión extraordinaria con Fundación Amor por Colombia - ICBF y Representante Gestión Social Contratista PRONG - Codensa. Tema principal: corte de suministro electrico en casa blanca.
-Se realiza entrega copia de actas de vecindad sector casa Blanca.
-contratista remite la primera versiòn del informe social mes de junio, e interventoria emite observaciones.
-Se continua con actividad de levantamiento actas de vecindad sectores Niza sur y tibabuyes.
-Se abre la 1 PQR, por derecho de peticiòn por parte de la señora Nancy Coy.
-Se radico al FDLS informe mensual de interventoria correspondiente al mes de junio.
-Se remitiò oficio de incumplimiento al contratista por la no entrega oportuna de los informes mensuales.
-Se realizò comite de seguimiento social.
-Se asistiò a comite de obra desde el componente social.

COMPONENTE SST:

-Revisión y aprobación de documentación inicial (Exámenes médicos ocupacionales, certificados de ARL y/o planillas de pago de seguridad social) al personal de obra del contratista y vehículos mediante los oficio TYA-FDLS-084-2025-187 / TYA-FDLS-084-2025-192 / TYA-FDLS-084-2025-199 / TYA-FDLS-084-2025-208 / TYA-FDLS-084-2025-216.
-Se realiza recorrido de obra en Casablanca CIV 11005765 - 11005623 - 11005566, Tibabuyes_Costa Azul CIV 11005215 y Potosí CV 11011188 el Lunes 07 de Julio, donde se le recalca al contratista la importancia de contar con las Unidades Sanitarias Portátiles y señalización SST en el frente de obra de Potosí CV 11011188.
-Se realizan observaciones y aprobación al informe mensual SST correspondiente al mes de Junio mediante los oficios TYA-FDLS-084-2025-191 / TYA-FDLS-084-2025-218

4. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES (CAUSAS ATRASO, ETC)

OBSERVACIONES, ACLARACIONES Y/O CONCLUSIONES:

RECOMENDACIONES:

5. ANEXOS

No.	Nombre anexo
1	
2	
3	

Nota :

Firmado en el mes de: JULIO (Mes en letras) de 2025 (Año de firma del informe)

CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
TORRES Y ASOCIADOS

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROCESO** Contrato de obra **OFICINA DE INFRAESTRUCTURA** **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA**	**Versión 0** **26/5/2021**

SEMANA No. 14 (Consecutivo) **DEL** 30/6/2025 (dd-mm-aa) **AL** 6/7/2025 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 084 DE 2025 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 1010 DE 2024 (Número de Contrato)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

El objeto del Contrato es: **EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO.**

CONTRATISTA CONSORCIO CONSERVACION PG. (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) **NIT** 901001320-5 (Escriba el NIT del Contratista)

INTERVENTOR TORRES Y ASOCIADOS S.A.S (Escriba el nombre o razón social del Interventor) **NIT** 829000727-3 (Escriba el NIT del Interventor)

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Valor Inicial	$ 13.033.377.846,00	Valor Inicial	$ 1.629.172.198,00
Valor Adicional 1	$ -	Valor Adicional 1	$ -
Valor Adicional 2	$ -	Valor Adicional 2	$ -
Valor Adicional 3	$ -	Valor Adicional 3	$ -
Valor Actualizado	$ 13.033.377.846,00	Valor Actualizado	$ 1.629.172.198,00
Plazo Inicial	DIEZ (10) MESES	Plazo Inicial	ONCE (11) MESES
Plazo Prórroga 1	0	Plazo Prorroga 1	0
Plazo Prórroga 2	0	Plazo Prorroga 1	0
Plazo Actualizado	DIEZ (10) MESES	Plazo Actualizado	ONCE (11) MESES
Fecha de Iniciación	2/4/2025	Fecha de Iniciación	2/4/2025
Fecha de Terminación Inicial	1/2/2026	Fecha de Terminación Inicial	1/3/2026
Fecha de Terminación Actual	1/2/2026	Fecha de Terminación Actual	1/3/2026

Apoyo a la supervision de la oficina de infraestructura Fondo de Desarrollo Local de Suba - FDLS: ING. EXMELIN HAMID LEMUS FRANCO

Coordinador oficina de infraestructura Fondo de Desarrollo Local de Suba - FDLS: ING. ALEJANDRO SAMUEL VICTORIA

2. AVANCES DEL CONTRATO

AVANCE GENERAL

Actividades realizadas por el contratista durante el periodo del informe semanal:

En cumplimiento de las actividades de seguimiento y control establecidas en el marco del contrato de interventoria, se relaciona a continuacion la correspondencia remitida por parte del contratista CONSORCIO CONSERVACION PG a esta interventoria durante el periodo comprendido entre el 30 de junio y el 6 de julio de 2025. La documentación recibida corresponde a programación general del proyecto, informes mensuales de avance y soporte técnico-operativo, necesarios para la verificación del cumplimiento contractual.

01/07/2025 – Oficio D-113-2025-50: Entrega Programación general del proyecto

02/07/2025 – Correo ingenieria@promciviles.com: Informe mensual 3 PMT

02/07/2025 – Correo sisoma@promotorapuga.com: Documentos Operador y Volquetas

02/07/2025 – Correo sisoma@promotorapuga.com: Documentos Personal, Volquetas y Maquinaria

02/07/2025 – Correo sisoma@promotorapuga.com: Documentos Volquetas

02/07/2025 – Correo sisoma@promotorapuga.com: Documentación Vehículos

03/07/2025 – Oficio D-115-2025-50: Entrega de informe mensual SST

03/07/2025 – Oficio D-116-2025-50: Entrega informe mensual ambiental No. 3

03/07/2025 – Oficio D-117-2025-52: Informe mensual No. 2 Social V2 con anexos

04/07/2025 – Correo sisoma@promotorapuga.com: Documentación Personal y Maquinaria

05/07/2025 – Correo sisoma@promotorapuga.com: Documentos Personal

05/07/2025 – Correo residenteccpat2@gmail.com: Entrega Informe Técnico No. 3

A continuación, se presenta la descripción de las actividades ejecutadas en obra por parte del contratista durante el periodo evaluado, en el marco del contrato de obra No. 1010-2024-LP. Estas acciones corresponden al desarrollo físico del proyecto y hacen parte del cumplimiento del cronograma establecido, conforme a los frentes de trabajo habilitados, las autorizaciones otorgadas por la interventoría y la disponibilidad de recursos técnicos, operativos y administrativos reportados. La verificación de estas actividades se realizó mediante visitas de campo, revisión de registros fotográficos, actas y demás soportes entregados.

11005728, 11005765, 11005623 (Casablanca): Se realiza traslado de red de vanti y retiro de material RCD acopiado. Se evidencia bajo rendimiento.

11014376 y 11005566 (Casablanca): Sin actividad.

11005215 (Tibabuyes): Se realiza excavacion mecanica de via y retiro de material RCD, se lleva a cabo el perfilado de la excavacion, cambio de tuberia de 6" de domiciliarias.

11011188 (Potosi): Sin actividad.

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROCESO** Contrato de obra **OFICINA DE INFRAESTRUCTURA** **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA**	**Versión 0** **26/5/2021**

SEMANA No. **14** Consecutivo **DEL** 30/6/2025 dd-mm-aa **AL** 6/7/2025 dd-mm-aa

CONTRATO DE INTERVENTORIA No **084 DE 2025** (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** **1010 DE 2024** (Número de Contrato)

Esta informacion se encuentra en gestion y tramite por parte del contratista de obra.

Tabla 1 Resumen de PMT aprobados y vigentes

N°	COI No.	Frente	CIV	Vía	Desde	Hasta	Radicado SDM
1	21	POTOSI	**11011188**	KR 70D CL 98A HASTA KR 70D CL 98B	23-may-2025	4-sep-2025	202561201393072
2	21	COSTA AZUL	**11005215**	CL 137BIS KR 103 HASTA CL 137BIS KR 103C	23-may-2025	4-sep-2025	202561201393072
3	21	CASABLANCA	**11005765 - 11005623**	CL 146F KR 72B HASTA CL 146F KR 73A	23-may-2025	4-sep-2025	202561201393072
4	21	CASABLANCA	**50009380 (PMT ALEDAÑO A INTERVENCION)**	CL 146F KR 73A HASTA CL 146F 140m AL OCCIDENTE	23-may-2025	4-sep-2025	202561201393072
5	21	CASABLANCA	**11005566**	CL 146F 15m AL ORIENTE DE LA KR 75 HASTA CL 146F 118m AL ORIENTE DE LA KR 75	23-may-2025	4-sep-2025	202561201393072
6	21	CASABLANCA	**11005566**	CL 146F KR 75 HASTA CL 146F 15m AL ORIENTE DE LA KR 75	23-may-2025	4-sep-2025	202561201393072
7	27	TIBABUYES (PARQUE PILOTO)	**11006546-11006438**	CL 129D KR 121 CL 129D 30m AL OCCIDENTE DE LA KR 121C	4-jul-2025	23-oct-25	202561201657052 202561202137792
8	27	NIZA SUR	**11010613**	CL 119 KR 70G CL 119 97m AL OCCIDENTE	4-jul-2025	2-oct-25	2,02561E+14
9	27	NIZA SUR	**11010613**	CL 119 KR 71A CL 119 96m ALORIENTE	4-jul-2025	2-oct-25	2,02561E+14
10	27	NIZA SUR	**11010621**	CL 119 KR 70 CL 119 96m ALOCCIDENTE	4-jul-2025	2-oct-25	2,02561E+14
11	27	NIZA SUR	**11010621**	CL 119 KR 70C CL 119 96m ALORIENTE	4-jul-2025	2-oct-25	2,02561E+14

Actividades realizadas por interventoría:

En desarrollo de las funciones asignadas en el marco del contrato de interventoría y con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista, a continuación se relaciona la correspondencia remitida por esta interventoría durante el periodo comprendido entre el 1 y el 4 de julio de 2025. Los oficios enviados incluyen observaciones a productos entregados, aprobaciones de documentos técnicos y sociales, y comunicaciones asociadas al avance del proceso constructivo.

01/07/2025 – Oficio TYA-FDLS-084-2025-170: Observaciones informe N.2 radicado en físico

01/07/2025 – Oficio TYA-FDLS-084-2025-171: Solicitud respuesta derecho de petición

01/07/2025 – Oficio TYA-FDLS-084-2025-172: Observaciones inventario forestal

01/07/2025 – Oficio TYA-FDLS-084-2025-173: Aprobación Documentos Gestores RCD

02/07/2025 – Oficio TYA-FDLS-084-2025-174: Aprobación documentación de ingreso de personal, maquinaria y vehículos

02/07/2025 – Oficio TYA-FDLS-084-2025-176: Radicación inventario forestal Atabanza y Niza Sur (Permiso forestal SDA)

02/07/2025 – Oficio TYA-FDLS-084-2025-177: Aprobación inventario forestal Atabanza y Niza Sur y solicitud de documentación

03/07/2025 – Oficio TYA-FDLS-084-2025-178: Aprobación de Programación de obra

03/07/2025 – Oficio TYA-FDLS-084-2025-179: Observaciones al Informe mensual de junio – PMT

03/07/2025 – Oficio TYA-FDLS-084-2025-180: Aprobación documentación de ingreso de personal y volqueta

03/07/2025 – Oficio TYA-FDLS-084-2025-181: Aprobación actas de vecindad – Costa Azul

03/07/2025 – Oficio TYA-FDLS-084-2025-182: Respuesta Derecho de Petición – Junta Administradora Local de Suba (DP25-JALP-98)

Durante el Comité No. 12 se evidenciaron varios incumplimientos del contratista CONSORCIO CONSERVACIÓN PG, especialmente en el inicio de obra en POA, la entrega del inventario forestal, el informe de exclusión y las actas de vecindad. Se registraron entregas incompletas y atrasos en componentes técnicos, sociales y ambientales.

La interventoría reportó bajo rendimiento en ejecución de obra (avance del 3.82%) y falta de continuidad en frentes como Potosí y Casablanca. Persisten pendientes en el PMT de POA y Suba Centro, y las listas de chequeo de los componentes PMT, SST, social y ambiental presentan avances entre el 94% y 98%.

Se reiteró la necesidad de cumplir con los compromisos adquiridos, regularizar el envío de documentación y mejorar la ejecución en los frentes activos. Se establecieron nuevos compromisos con fechas específicas para su cumplimiento.

Durante la semana el equipo de interventoría llevó a cabo actividades de seguimiento técnico en los distintos frentes de obra, con énfasis en el acompañamiento en campo a las labores de excavación, verificación de condiciones iniciales y control de calidad de los materiales. Se realizaron recorridos topográficos para validar alineaciones, cotas de referencia y puntos críticos de intervención, especialmente en los sectores de Potosí, Casablanca y Parque Piloto. Adicionalmente, se efectuaron revisiones a los informes técnicos, sociales y ambientales entregados por el contratista, se emitieron observaciones formales, y se participó en mesas de trabajo con especialistas para la definición de estructuras de pavimento. La interventoría también adelantó seguimiento documental, revisión de listados de chequeo y coordinación con entidades externas en temas ambientales y de permisos requeridos.

En la siguiente tabla se resume el estado de los productos.

Tabla 4. Estado de los productos (Todavía no hay información al respecto sobre este item)

		Estado	Comentarios
1	**Revisión entregables etapa de preliminares contratista de obra.**		

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROCESO** Contrato de obra **OFICINA DE INFRAESTRUCTURA** **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA**	**Versión 0** **26/5/2021**

SEMANA No. 14 (Consecutivo) **DEL** 30/6/2025 (dd-mm-aa) **AL** 6/7/2025 (dd-mm-aa)


CONTRATO DE INTERVENTORIA No 084 DE 2025 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 1010 DE 2024 (Número de Contrato)

AVANCE FINANCIERO

	PROGRAMADO		EJECUTADO		
OBRA	**SEMANAL**	**ACUMULADO**	**SEMANAL**	**ACUMULADO**	**Atraso /Avance**
Obra Programada ($)					
Obra Programada (%)					

Gráfica porcentanje de ejecución Vs porcentaje programado

A la fecha no se ha dado inicio a las actividades de obra por lo cual no se tiene informacion de avance.



Sem.	Desde	Hasta	Acumulado financiero	
			% program.	% ejecutado
1	9/6/2025	15/6/2025	0,00%	1,24%
2	16/6/2025	22/6/2025	2,28%	2,29%
3	23/6/2025	29/6/2025	4,00%	3,82%
4	30/6/2025	6/7/2025	5,00%	4,25%
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

COMPONENTE DE TRÁNSITO:

Se dio aprobacion por parte de la secretaria de movilidad de los PMT de parque piloto y niza sur.

FORESTAL:

El contratista presento el inventario forestal de los frentes de obra de Atabanza (CIV 11010414) y Niza sur (CIV 11010613-11010621) con sus respectivas fichas, formatos y planos que fue aprobado por esta interventoria el dia 02 de julio por medio del oficio TYA-FDLS-084-2025-177 con asunto "Aprobacion inventario forestal Atabanza y Niza Sur (Permiso forestal SDA) y solicitud de documentacion" al igual se realizo el respectivo radicado al FDLS bajo numero 2025-611-016333-2 del 02/072025 y el contratista presento los documentos ante la SDA

COMPONENTE AMBIENTAL:

- El contratista presento el inventario forestal de los frentes de obra de Atabanza (CIV 11010414) y Niza sur (CIV 11010613-11010621) con sus respectivas fichas, formatos y planos que fue aprobado por esta interventoria el dia 02 de julio por medio del oficio TYA-FDLS-084-2025-177 con asunto "Aprobacion inventario forestal Atabanza y Niza Sur (Permiso forestal SDA) y solicitud de documentacion" al igual se realizo el respectivo radicado al FDLS bajo numero 2025-611-016333-2 del 02/072025 y el contratista presento los documentos ante la SDA

- El contratista presento dos gestores o sitios de disposicion final para el material RCD de los frentes de obra, por lo que remitio los documentos de Puente Piedra SAS y Tecnominerales ARENAS Y GRAVAS SAS que fueron aprobados por medio del oficio TYA-FDLS-084-2025-173 el dia 1 de julio

-El contratista presento el informe menusal #3 correspondiente al mes de junio mediante oficio D-116-2025-50 el dia 3 de julio, esta en revision por parte de esta interventoria.

- Se participa en comite de obra, en el componente ambiental, se evidencio la lista de chequeo semana vencida que fue del 98% y se solicito el inventario forestal por lo menos de la fase 1 completo para su debida aprobacion.

COMPONENTE SOCIAL:

- Se llevo a cabo recorrido de obra desde el componente social; verificaciòn de vallas, PSI y atenciòn a la comunidad.
-Se realizò nitificaciòn de levantamiento actas de vecindad en el sector Niza Sur y Tibabuyes.
-Se continuò conactividad de levantamiento actas de vecindad sector poa y tibabuyes.
-Se emitiò al contratista llamado de atenciòn `por incumplimiento en actividades sociales.
-Se realizò comite de seguimiento social.

COMPONENTE SST:

-Revisión y aprobación de documentación inicial (Exámenes médicos ocupacionales, certificados de ARL y/o planillas de pago de seguridad social) al personal de obra del contratista, vehículos y maquinaria mediante los oficio TYA-FDLS-084-2025-174 / TYA-FDLS-084-2025-180 / TYA-FDLS-084-2025-186.
-Se realiza recorrido de obra en Casablanca CIV 11005765 - 11005623 - 11005566, Tibabuyes_Costa Azul CIV 11005215 y Potosí CV 11011188 el Martes 01 de Julio, donde se le indica al contratista la implementación del MEDEVAC, listado de personal, permisos de trabajo (ATS) y preoperacionales en el frente de obra de Casablanca CIV 11005765 - 11005623 - 11005566, Tibabuyes_Costa Azul CIV 11005215.
-Lista de chequeo con puntaje 96% (30 de Junio al 06 de julio del 2025)

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROCESO** Contrato de obra **OFICINA DE INFRAESTRUCTURA** **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA**	**Versión 0** **26/5/2021**

SEMANA No. 14 (Consecutivo) **DEL** 30/6/2025 (dd-mm-aa) **AL** 6/7/2025 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No **084 DE 2025** (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** **1010 DE 2024** (Número de Contrato)

4. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES (CAUSAS ATRASO, ETC)

OBSERVACIONES, ACLARACIONES Y/O CONCLUSIONES:

RECOMENDACIONES:

5. ANEXOS

No.	Nombre anexo
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Nota :

Firmado en el mes de: JULIO (Mes en letras) de 2025 (Año de firma del informe)

CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
TORRES Y ASOCIADOS

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROCESO** Contrato de obra **OFICINA DE INFRAESTRUCTURA** **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA**	**Versión 0** **26/5/2021**

SEMANA No. 17 Consecutivo **DEL** 21/7/2025 dd-mm-aa **AL** 27/7/2025 dd-mm-aa

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 084 DE 2025 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 1010 DE 2024 (Número de Contrato)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

El objeto del Contrato es: **EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO.**

CONTRATISTA CONSORCIO CONSERVACION PG. (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) **NIT** 901001320-5 (Escriba el NIT del Contratista)

INTERVENTOR TORRES Y ASOCIADOS S.A.S (Escriba el nombre o razón social del Interventor) **NIT** 829000727-3 (Escriba el NIT del Interventor)

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Valor Inicial	$ 13.033.377.846,00	Valor Inicial	$ 1.629.172.198,00
Valor Adicional 1	$ -	Valor Adicional 1	$ -
Valor Adicional 2	$ -	Valor Adicional 2	$ -
Valor Adicional 3	$ -	Valor Adicional 3	$ -
Valor Actualizado	$ 13.033.377.846,00	Valor Actualizado	$ 1.629.172.198,00
Plazo Inicial	DIEZ (10) MESES	Plazo Inicial	ONCE (11) MESES
Plazo Prórroga 1	0	Plazo Prorroga 1	0
Plazo Prórroga 2	0	Plazo Prorroga 1	0
Plazo Actualizado	DIEZ (10) MESES	Plazo Actualizado	ONCE (11) MESES
Fecha de Iniciación	2/4/2025	Fecha de Iniciación	2/4/2025
Fecha de Terminación Inicial	1/2/2026	Fecha de Terminación Inicial	1/3/2026
Fecha de Terminación Actual	1/2/2026	Fecha de Terminación Actual	1/3/2026

Apoyo a la supervision de la oficina de infraestructura Fondo de Desarrollo Local de Suba - FDLS: ING. EXMELIN HAMID LEMUS FRANCO

Coordinador oficina de infraestructura Fondo de Desarrollo Local de Suba - FDLS: ING. ALEJANDRO SAMUEL VICTORIA

2. AVANCES DEL CONTRATO

AVANCE GENERAL

Actividades realizadas por el contratista durante el periodo del informe semanal:

En seguimiento a las actividades contractuales y de conformidad con los compromisos establecidos en el marco del contrato, a continuación se relaciona la correspondencia remitida por el contratista durante la semana comprendida entre el 21 y el 27 de julio de 2025, incluyendo comunicaciones por correo electrónico y radicados oficiales que dan cuenta del avance de actividades técnicas, sociales y administrativas del proyecto.

Correspondencia remitida por el contratista – Semana del 21 al 27 de julio de 2025:

21/07/2025 – Correo: sisoma@promotorapuga.com – Ingreso de personal.

21/07/2025 – Radicado D-154-2025-50 – Informes de laboratorio para caracterización inicial de materiales granulares (subbase y base con agregados reciclados y subbase granular clase A - proveedor CODEOBRAS).

22/07/2025 – Correo: sisoma@promotorapuga.com – Documentos de ingreso: Brandon Silva.

22/07/2025 – Correo: sisoma@promotorapuga.com – Documentación de ingreso: José Cerón.

22/07/2025 – Radicado SDM 20253120835442l – Comunicación sobre incumplimientos en la implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) en varios tramos de la Calle 146F.

22/07/2025 – Radicado D-155-2025-50 – Entrega del informe mensual social No. 3 versión 2.

23/07/2025 – Correo: sisoma@promotorapuga.com – Documentos de ingreso de personal.

23/07/2025 – Radicado D-156-2025-50 – Radicación del certificado del densímetro nuclear para la toma de densidades.

23/07/2025 – Correo: sisoma@promotorapuga.com – Documentación adicional de ingreso de personal.

24/07/2025 – Radicado D-157-2025-50 – Entrega parcial de actas de vecindad del Parque Piloto.

25/07/2025 – Radicado D-158-2025-50 – Entrega del consolidado de personal nuevo ingresado al componente social.

25/07/2025 – Radicado D-159-2025-50 – (Asunto por revisar).

A continuación, se presenta la descripción de las actividades ejecutadas en obra por parte del contratista durante el periodo evaluado, en el marco del contrato de obra No. 1010-2024-LP. Estas acciones corresponden al desarrollo físico del proyecto y hacen parte del cumplimiento del cronograma establecido, conforme a los frentes de trabajo habilitados, las autorizaciones otorgadas por la interventoría y la disponibilidad de recursos técnicos, operativos y administrativos reportados. La verificación de estas actividades se realizó mediante visitas de campo, revisión de registros fotográficos, actas y demás soportes entregados.

11005728, 11005765, 11005623 (Casablanca): Se realizan llenos de la estructura con la instalación de geotextil, geocelda y sbg, adicional a esto se continua con la excavación mecanica en el tramo continuo y el retiro del material RCd.

11014376 y 11005566 (Casablanca): Sin actividad.

11005215 (Tibabuyes): se lleva a cabo la instalación de sardinel.

11010613 y 11010621 (Niza Sur): Se inicia la excavacion mecanica del tramo y el retiro de RCD asimismo se colocan los llenos correspondientes de Base Granular, teniendo en cuenta el cambio de material del civ y la presencia de arcilla se realiza la excavaciín de la nueva estructura desde la K0+062, en el 11010621 no se realizan actividades.

11006438, 11011976, 11011977, 11011978, 11006546 y 11006617: Se inicia con instalacion de cerramiento y demolición de pavimento existente.

11011188 (Potosi): Excavación de sardinel se evidencia bajo rendimiento en este frente de obra.

SEMANA No. 17 (Consecutivo) **DEL** 21/7/2025 (dd-mm-aa) **AL** 27/7/2025 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No **084 DE 2025** (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** **1010 DE 2024** (Número de Contrato)

Esta informacion se encuentra en gestion y tramite por parte del contratista de obra.

Tabla 1 Resumen de PMT aprobados y vigentes

N°	COI No.	Frente	CIV	Vía	Desde	Hasta	Radicado SDM
1	21	POTOSI	**11011188**	KR 70D CL 98A HASTA KR 70D CL 98B	23-may-2025	4-sep-2025	202561201393072
2	21	COSTA AZUL	**11005215**	CL 137BIS KR 103 HASTA CL 137BIS KR 103C	23-may-2025	4-sep-2025	202561201393072
3	21	CASABLANCA	**11005765 - 11005623**	CL 146F KR 72B HASTA CL 146F KR 73A	23-may-2025	4-sep-2025	202561201393072
4	21	CASABLANCA	**50009380 (PMT ALEDAÑO A INTERVENCION)**	CL 146F KR 73A HASTA CL 146F 140m AL OCCIDENTE	23-may-2025	4-sep-2025	202561201393072
5	21	CASABLANCA	**11005566**	CL 146F 15m AL ORIENTE DE LA KR 75 HASTA CL 146F 118m AL ORIENTE DE LA KR 75	23-may-2025	4-sep-2025	202561201393072
6	21	CASABLANCA	**11005566**	CL 146F KR 75 HASTA CL 146F 15m AL ORIENTE DE LA KR 75	23-may-2025	4-sep-2025	202561201393072
7	27	TIBABUYES (PARQUE PILOTO)	**11006546-11006438**	CL 129D KR 121 CL 129D 30m AL OCCIDENTE DE LA KR 121C	4-jul-2025	23-oct-25	202561201657052 202561202137792
8	27	NIZA SUR	**11010613**	CL 119 KR 70G CL 119 97m AL OCCIDENTE	4-jul-2025	2-oct-25	2,02561E+14
9	27	NIZA SUR	**11010613**	CL 119 KR 71A CL 119 96m ALORIENTE	4-jul-2025	2-oct-25	2,02561E+14
10	27	NIZA SUR	**11010621**	CL 119 KR 70 CL 119 96m ALOCCIDENTE	4-jul-2025	2-oct-25	2,02561E+14
11	27	NIZA SUR	**11010621**	CL 119 KR 70C CL 119 96m ALORIENTE	4-jul-2025	2-oct-25	2,02561E+14
12	29	POA (PORTICO)	**11004080-11004156**	CL 141 KR 102A CL 141 KR 101B	18-jul-2025	16-oct-25	202561202399392

Actividades realizadas por interventoría:

En cumplimiento de las funciones de seguimiento, control y supervisión del contrato de obra 1010-2024-LP (119226), durante la semana del 21 al 27 de julio de 2025, la interventoría emitió la siguiente correspondencia relacionada con la radicación de informes, conceptos técnicos, observaciones contractuales y aprobación de documentos. A continuación, se detalla el consolidado correspondiente:

Correspondencia remitida por la interventoría – Semana del 21 al 27 de julio de 2025:
21/07/2025 – TYA-FDLS-084-2025-247
Asunto: Radicación Informe Mensual SST N°3 V2 – Respuesta al oficio D-149-2025-50 – Contrato de obra 1010-2024-LP (119226).

21/07/2025 – TYA-FDLS-084-2025-248
Asunto: Aprobación de documentación de ingreso de personal – Contrato de obra 1010-2024-LP (119226).

22/07/2025 – TYA-FDLS-084-2025-249
Asunto: Remisión de concepto técnico del informe de geotecnia y pavimentos SUBA-113 – Respuesta al oficio D-136-2025-50 y complemento al oficio TYA-FDLS-084-2025-232 – POA PÓRTICO.

22/07/2025 – TYA-FDLS-084-2025-250
Asunto: Aprobación de documentación de ingreso de personal – Contrato de obra 1010-2024-LP (119226).

22/07/2025 – TYA-FDLS-084-2025-251
Asunto: Remisión de radicado SDM 20253120835442l – Incumplimientos en la implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) – RAD 202561201393072 – Calle 146F (varios tramos).

23/07/2025 – TYA-FDLS-084-2025-252
Asunto: Observación por incumplimiento de actividades preliminares – Componente social – Frente Tibabuyes, Parque Piloto.

23/07/2025 – TYA-FDLS-084-2025-253
Asunto: Observación por incumplimiento de actividades preliminares – Componente de seguridad y salud en el trabajo – Parque Piloto CIV 11006546.

23/07/2025 – TYA-FDLS-084-2025-254
Asunto: Solicitud de acompañamiento al frente de obra Tibabuyes – Costa Azul – CIV 11005215.

Durante el Comité de Seguimiento N.º 15, realizado el 25 de julio de 2025, se revisó el cumplimiento de compromisos anteriores, destacando avances como el inicio de obra en POA, ejecución de apiques, y la subsanación del informe mensual social de junio. Sin embargo, se evidenciaron pendientes en la entrega de informes a la SDM, radicación completa de actas de vecindad, informes CCTV y diagnóstico Fase 1 y 2. En cuanto a la ejecución por frentes de obra, se reportaron actividades en Casablanca, Tibabuyes, Niza Sur, Potosí y Parque Piloto, con observaciones técnicas, bajo rendimiento en algunos casos, y necesidad de ajustes estructurales. Se discutió el estado de los informes técnicos y presupuestales, los cuales deberán ser entregados a más tardar el 1 de agosto. En el componente PMT se resaltó la necesidad de dar pronta respuesta a la SDM y mantener el cumplimiento de los lineamientos aprobados. A nivel social, se reiteraron los incumplimientos en las listas de chequeo, la importancia de actualizar vallas, programar comités de participación y avanzar en la recepción de actas. En el componente ambiental, se informó que se daría respuesta a las observaciones de la SDA sobre el trámite forestal de Atabanza. Finalmente, en SST se identificaron múltiples incumplimientos para el inicio de actividades en Parque Piloto, los cuales deberán ser subsanados antes del 26 de julio. Se establecieron nuevos compromisos con fechas específicas para su cumplimiento, relacionados con informes técnicos, radicación de documentos y subsanación de hallazgos.

Durante la semana el equipo de interventoría llevó a cabo actividades de seguimiento técnico en los distintos frentes de obra, con énfasis en el acompañamiento en campo a las labores de excavación, verificación de condiciones iniciales y control de calidad de los materiales. Se realizaron recorridos topográficos para validar alineaciones, cotas de referencia y puntos críticos de intervención, especialmente en los sectores de Tibabuyes, Potosí, Casablanca y Parque Piloto. Adicionalmente, se efectuaron revisiones a los informes técnicos, sociales y ambientales entregados por el contratista, se emitieron observaciones formales, y se participó en mesas de trabajo con especialistas para la definición de estructuras de pavimento. La interventoría también adelantó seguimiento documental, revisión de listados de chequeo y coordinación con entidades externas en temas ambientales y de permisos requeridos.

En la siguiente tabla se resume el estado de los productos.

Tabla 4. Estado de los productos (Todavía no hay información al respecto sobre este item)

	Revisión entregables etapa de preliminares contratista de obra.	Estado	Comentarios

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROCESO** Contrato de obra **OFICINA DE INFRAESTRUCTURA** **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA**	**Versión 0** **26/5/2021**


SEMANA No. 17 (Consecutivo) **DEL** 21/7/2025 (dd-mm-aa) **AL** 27/7/2025 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 084 DE 2025 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 1010 DE 2024 (Número de Contrato)

AVANCE FINANCIERO

	PROGRAMADO			EJECUTADO		
OBRA	**SEMANAL**	**ACUMULADO**		**SEMANAL**	**ACUMULADO**	**Atraso /Avance**
Obra Programada ($)	$ 77.695.247,24	$ 887.945.682,70		$ 162.050.087,09	$ 832.449.077,53	$ 55.496.605,17
Obra Programada (%)	-0,70%	8,00%		1,46%	7,50%	**0,50%**

Gráfica porcentanje de ejecución Vs porcentaje programado

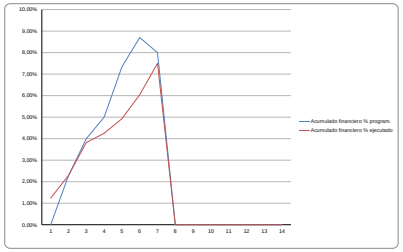

Sem.	Desde	Hasta	Acumulado financiero	
			% program.	% ejecutado
1	9/6/2025	15/6/2025	0,00%	1,24%
2	16/6/2025	22/6/2025	2,28%	2,29%
3	23/6/2025	29/6/2025	4,00%	3,82%
4	30/6/2025	6/7/2025	5,00%	4,25%
5	7/7/2025	13/7/2025	7,34%	4,93%
6	14/7/2025	20/7/2025	8,70%	6,04%
7	20/7/2025	27/7/2025	8,00%	7,50%
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

COMPONENTE DE TRÁNSITO:

Durante esta semana se evidencio el incumplimiento los pmts de casablanca y tibabuyes, nos encontramos a la espera de la subsanacion y respuesta a la SDM.

FORESTAL:

El contratista presento el inventario forestal de los frentes de obra de Atabanza (CIV 11010414) y Niza sur (CIV 11010613-11010621) con sus respectivas fichas, formatos y planos que fue aprobado por esta interventoria por medio del oficio TYA-FDLS-084-2025-177 al igual se radico al FDLS bajo numero 2025-611-016333-2 y el contratista presento los documentos ante la SDA, en espera de una respuesta.

COMPONENTE AMBIENTAL:

Se realizo una observación por la ocupación de las zonas verdes como acopio de materiales de construcción en el frente de obra de Casablanca mediante oficio TYA-FDLS-084-2025-238 el día 16 de julio y se recibio respuesta por parte del contratista el dia 25 de julio mediante el oficio D-161-2025-50

El contratista presento el inventario de sumideros de POA- Portico el dia 25 de julio mediante oficio D-162-2025-50

Se participa en comité de obra, en el componente ambiental, se evidencio la lista de chequeo semana vencida que fue del 85%

COMPONENTE SOCIAL:

-Se llevo a cabo recorrido de obra componente social; verificaciòn valla mòvil, puntos satelites de informaciòn y atenciòn a la comunidad.
-se realizò acompañamiento a reuniòn extraordinaria en compañia del FDLS y contratista , en frente de obra casa blanca, con el fin de dar atenciòn a varias inquietudes de la comunidad.
-Se realizò acercamiento con el área sst a predios con cercas que representan riesgo para los peatones.
-Se realizò divulgaciòn de piezas comunicativas referentes a inicio de obra y pmt, en los frentes de obra parque piloto y niza.
-Se realizò mantenimiento a puntos satelites de informaciòn.
- se continuo con actividades de levantamiento de actas de vecindad en sector poa y niza sur.
-se realizò levantamiento de acta de vecindad a solicitud de la propietaria Nancy yazmin, por medio de derecho de peticiòn, sector casa Blanca.
-contratista radico el informe mensual n3, v2 correspondiente al mes de junio
-se participò desde el componente social en comitè de obra

COMPONENTE SST:

-Revisión y aprobación de documentación inicial (Exámenes médicos ocupacionales, certificados de ARL y/o planillas de pago de seguridad social) al personal de obra del contratista, vehículos y maquinaria mediante los oficio TYA-FDLS-084-2025-248 / TYA-FDLS-084-2025-250 / TYA-FDLS-084-2025-257.
-Se realiza recorrido de obra en Casablanca CIV 11005765 - 11005623 - 11005566, Tibabuyes_Costa Azul CIV 11005215 y Potosí CV 11011188 y Niza Sur CIV 11010613 - 11010621 el Lunes 21 de Julio, donde se le indica al contratista mejorar el paso peatonal en el frente de obra de Casablanca CIV 11005765 - 11005623 - 11005566, rotular sustancias químicas en el frente de obra de Tibabuyes_Costa Azul CIV 11005215 y se les hace la recomendación de que todas las maquinarias que se encuentran activas en los frentes de obra deben contar con el sticker de identificación.
-Se envía oficio TYA- FDLS -084-2025-253 de Incumplimiento Actividades Preliminares Medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo(SST)- Parque Piloto CIV 11006546 debido a que se identifica el inicio de actividades en el frente de obra con maquinaria sin contar con el cerramiento perimetral completo en el costado correspondiente al paso peatonal y se identifica inicio de actividades sin contar con los elementos mínimos necesarios para el cumplimiento de las condiciones básicas de seguridad y salud en el trabajo.
Específicamente, se observa la ausencia de: -Unidad Sanitaria portátil para el uso de personal. - Campamento o área habilitada para el resguardo de los trabajadores. - Equipos de emergencia (Camilla, Inmovilizadores, extintores, botiquín) - Señalización correspondiente a SST, tanto preventiva como informativa. -Se evidencias sustancias químicas sin su respectiva FDS y rotulación.

4. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES (CAUSAS ATRASO, ETC)

OBSERVACIONES, ACLARACIONES Y/O CONCLUSIONES:

RECOMENDACIONES:

SEMANA No. **17** (Consecutivo) **DEL** 21/7/2025 (dd-mm-aa) **AL** 27/7/2025 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No **084 DE 2025** (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** **1010 DE 2024** (Número de Contrato)

5. ANEXOS

No.	Nombre anexo
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Nota :

Firmado en el mes de: JULIO (Mes en letras) de 2025 (Año de firma del informe)

CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
TORRES Y ASOCIADOS

ANEXO 2: INFORMES DIARIOS

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de Interventoría 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA	martes 01	07	2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
11005728	soleada	soleado	No	S

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
11005728	1	1 cl=2	1	1	3	1	1		2	

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO
JCD-3-C-X	11005728	1	1.5	cargue bolsacretos

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

activo cargue de bolsacretos materia de excavacion acumulado

ERNESTO ENRIQUE G
ELABORO

REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de Interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA: 02 / 07 / 2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
11005728	soleada	soleada	No	S

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
11005728	1	1 C-1=2	1	1	3	1	1		2	

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO
CAT 1.30	11005728	1	1	perfilado

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

CAT 1.30 retro 11005728 perfilado excavación y excavación manual para traslado manguera red gas 4"

ERNESTO FRANCO G
ELABORO

REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA	Jueves 03	07	2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
11005623	soleado	soleado	no	S

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
11005623	1	1-CL=2	1	1	3	1	1		2	

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO
retro JCB 3-C-X	11005623	1	1	excavacion

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

11005623 retro excavacion mecanica y manual red gas a' Instalo

ERNELBENTO FRANCO G
ELABORO

REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de Interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA	viernes 04	07	2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
1100623	soleada	soleada	no	S

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
1100623	1	1	1	1	3	1	1		2	

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

1100623 excavacion manual red gas 4" para profundizar manguera y Traslado

EDILBERTO FRANCO G
ELABORO

REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. ghacla LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA: 05 / 07 / 2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
11005623	Soleada		4h	S

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
11005623	1	1	1		3		1		2	

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

11005623 excavacion manual red gas 6" para preparacion sobre ancho y instalacion

ETHELBERTO FRANCO G
ELABORO

REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO.
LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA	lunes 07	07	2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
11005623	soleada	soleada	no	S

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
11005623	1		1		1		1		3	

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

11005623 mantenimiento patisonbraal

ETHELBERTO FRANCO G
ELABORO

REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de Interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA	miercoles 08	07	2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
11005623	soleado	soleada	no	S

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
11005623	1				2		1		2	

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

11005623 se continua con excavacion parcial y manual red gas de 8" para traslado

ESNEIDER FRANCO G
ELABORO

REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de Interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO.

miercoles LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA: 09 / 07 / 2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
11005623	soleado	soleado	Moderna 1/2	S
11005765	"	"	"	"

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
11005623	1	1	1		2	1	1		3	
11005765	"	"	"		"	"			"	

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO
retro CAT 420	11005765	1	1/2	cargue de bolsones

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

11005623 se hace avance en excavacion manual para profundizar
11005765 manguera red gas 4"
11005765 retro cargue de bolsones con material acopiado de excavacion

ELABORO

REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de Interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA	Jueves 10	07	2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
11005765	soleado	soleada	no	S
11005623	"	"	"	"

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
11005765	1	1	1	1	2	2	1		3	
11005628	"	"		"	"	"	"		"	

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO
retro CTA 430	11005765	1	8	cargue bolquetas
compactador	11005728	1	8	compactacion via

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

retro 11005765 cargue de bolqueta de material acopiado de excavacion
11005728 perfilado excavacion con retro y se compacta

ETHELBERTO FONSECA G.
ELABORO

REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de Interventoría 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA	11	07	2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
11005765	nublada			
11005729	"			

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
11005765	1	1		1	3	2	1		3	
11005728	"	"		"	"	"	"		"	

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO
retro CAT 1.30	11005765	1		cargue de bolquetas retro
" "	11005728	"		excavacion mecanica

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

11005765 cargue de bolquetas retro con material de excavación
11005728 retro excavacion mecanico y cargue parcial

ETHELBERTO FRANCO G
ELABORO

REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO.

sabado LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA: 12 / 07 / 2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
11005728	Soleado		no	S

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
11005728	1	1		1	3	Alo	1		2	

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

11005728 se hace perfilacion, alc y la subrazante manual con hilos desde referencias alc vivo

ELABORO

REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO.
LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA: lunes 14 07 2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
11005728	soleada	soleada	no	S

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
ROTO 11005728 CAT 312 DL	1	1		1	3	2	1		2	

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO
ROTO 11005728 312-DL	11005728	1	2	excavacion y cargue

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

11005728 ROTO se hace excavacion parcial mecanica y cargue de escombros

ELABORO: RUBELBERTO BLANCO G

REVISO: Maira

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de Interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO.

martes LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA	15	07	2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
U005665	soleada	soleada	no	S

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
U005665	1			1	3	2	1		2	

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO
RETRO CAT 312-D-2L	U005665	1	3	excavación y cargue

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

Retro cat U005665 se inicia excavación mecanica y cargue de volquetas

ERNESTO FRANCO G
ELABORO

REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA	miercoles 16	07	2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
11005728	soleada	soleada	no	S

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
11005728	1	1	1	1	3	2	1		2	

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO
Retro CAT 312	11005728	1	5	excavacion mixta
compactador SD-45	"	1	1	compactacion mixta
mini cargador CAT	"	1	3	extendido pea

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

11005728 Retro excavacion mecanica para cabezales y cargue de bateas
" Compactador se hace compactacion de la subrasante
" mini cargador CAT extendido de material pea y instalacion geotextil y geoceldas

ETHELBERTO FRANCO G
ELABORO

REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de Interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA	Jueves 17	07	2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
11005728	soleada	soleada	no	S

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
11005728	1	1	1	1	3	3	1		2	

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO
Retro [illegible]	11005728	1	4	excavacion via
compactador SD-45	11	1	1	compactacion via
minicargador CAT	11	1	2.5	cargue y extendida pea

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

11005728 Retro excavacion mecanica y cargue de bodegueros
11 compactador compactacion subrasante via y sello de pear
11 minicargador CAT cargue y demo en geoestilla de material pea

ETHELBERTO FRANCO C
ELABORO

REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA	viernes 19	07	2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
11005728	soleada	soleada	NO	Se

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
11005728	1	1	1	1	3	3	1		2	

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO
RETRO CAT 312	11005728	1	5	excavacion y
compactadora SD 45	11	1	1	compactacion via
minicargador CAT	4	1	1.5	cargue pca

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

CIV 11005728 retro excavación mecanica parcial y cargue de bolquetas
11 compactador se hace compactacion de la subrazante
11 minicargador cargue de material pca via con ya se instalo
geotextil y geoestera portal

ETHELBERTO FRANCO G
ELABORO

Maria M
REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO.

Sabado LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA: 19 / 07 / 2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
11005728	Soleada	Soleada	No	S

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
11005728	1	1	1	1	3	1	1		2	

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO
Retro CAT 310	11005728	1	1.5	excavación mia
compactador	11	1	1/2	compactacion subrazante

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

CIV 11005728 Retro excavación mecanica y cargue bateros
11 compactador compactacion de la subrazante

ERNESTO FRANCO S
ELABORO

REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de Interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA: Lunes 21 - 07 - 2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
11005765	soleada	soleada	no	S
11005728	"	"	"	"

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
11005765	1	1	1	1	3	2	1		2	
11005728	"	"	"	"	"	"	"		"	

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO
RETRO CAT 412	11005765	1	11.5	excavacion via

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

11005765 excavacion mecanica parcial y cargue de bolsacretos con retro
11005728 instalacion geotextil y geoceldas y llenado con material pta parcial

ESTEBAN GARCIA G
ELABORO

Maria AC
REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de Interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA	martes 22	07	2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
11005623	soleada	soleada	NO	S
11005728	"	"	"	"

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
11005623	1	1	1	1	3	3	1		1	
11005728	"	"	"	"	"	"	"		"	

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO
retro CAT 312	11005623	1	3	excavacion viga
minicargador HOLLAND 218	11005728	1	2	extraccion pca

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

CIV 11005623 retro CAT excavacion mecanica pozo y y zanjas
CIV 11005728 minicargador retiro de material pca a gravetela

ETHELVINTO FRANCO G
ELABORO

Maria AC
REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de Interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA	miercoles 23	02	2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
11005765	soleado	soleada	NO	S
11005623	"	"	"	"

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
11005765	1	1	1	1	3	2	1		2	
11005623	11	11	11	11	11	12	11		11	

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO
Retro JCB 3cx	11005765	1	1	retiro material saturado

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

CU 11005765 RETRO retiro de material saturado y filtracion agua
CU 11005765 excavacion manual sumidero
CU 11005623 sin actividad

ELABORO: EDILBERTO FRANCO C

REVISO: Marica AC

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de Interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA	Jueves 24	02	2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
11005765	Soleada	Soleada	No	S
11005623	"	"	"	"

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
11005765	1	1	1	1	3	2	1		2	
11005623	"	"	"	"	"	"	"		"	

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO
Retro JCB - 3 - C - K	11005623	1	2	excavación vía

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

11005765 excavación manual Tramo sumidero porvenir - -
y 11005623 excavación mecanica perfil y cargue de bolquetas

ETHELBERTO ERAZO G
ELABORO

REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de Interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA	25	07	2025

viernes

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
11005765	Soleado	Soleado	no	S
11005623	"	"	"	"

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
11005765	1	1	1	1	3	2	1		2	
11005623	"	"	"	"	"	"	"		"	

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO
Retro JCB-J.U-L	11005623	1	2	excavación mecánica parcial

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

CIV-11003765 excavación manual Tramo peatonal sumidero
CIV-11005623 excavación mecánica parcial y cargue de bolsacretas

ETHELBERTO FRANCO G
ELABORO

Maira AC
REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de Interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO.

sabado LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA: 26 / 07 / 2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
11005765	sabado	sabado	NO	S
11005623	"	"	"	"

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
11005765	1	1	1	1	3	2	1		2	
11005623	"	"	"	"	"	1	"		"	

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO
RETRO JCB-3-U-X	11005623	1	1/2	excavación via

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

11005765 excavación manual sumidero pluvial c sur — 11005623 RETRO JCB - excavación parcial y mecanica vía y cargue de bateria

ELABORO

REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de Interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA	lunes 28	07	2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
11005765	soleada	soleada	no	S
11005623	"	"	"	"

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
11005765	1		1	1	3	2	1		1	
11005623	"		"	"	"	"	"		"	

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO
retro JCB3TM-K	11005623	1	3	excavacion - vias

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

civ 11005765 pendiente instalacion tuberia pluvial tramo sumidero
civ 11005623 retro excavacion mecanica parcial y cargue de bodquetas

ETIVEL BERTO FRANCO G.
ELABORO

REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de Interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA	miercoles 29	07	2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
11005765	Soleada	Soleada	NO	S

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
11005765	1	1	1	1	3	3	1		2	

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO
RETRO JCB-3-C-X	11005765	1	1	Traslado Rejón
minicargador CAT 236	"	1	1	acopio excavacion

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

CIV 11005765 retro traslado de rejon para lleno enfaldo
" minicargador retiro de excavacion manual sumidero

ETHELBERTO FRANCO
ELABORO

REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de interventoría 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO.

miercoles LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA	30	07	2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
11005765	Soleada	Soleado	no	S
11005623	Soleada	Soleado	no	S

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
11005765	1	1	1	1	3	3	2		2	
11005623	1	1	1	1	1	1	1		1	

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO
RETROEXCAVADORA 3-CAT	11005765	2	1	Traslado material pra
RETRO Y compactador 50 45	11005623	2	1/2	excavacion mecanica y compactacion

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

CIV 11005765 RETRO Traslado de material pra Lleno Tramo pluvial Sumpedero
11005623 RETRO excavacion parcial y mecanica vía
11005623 compactador Se hace compactacion de la subrasante
h Tc

EDILBERTO FRANCO C
ELABORO

REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA	Jueves 31	07	2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
11005765	soleada	Tarde soleada	No	S

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
11005765										

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO
RETRO 5CX 3-E-4	11005765	1	4.5	excavacion vial

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

CIV 11005765 RETRO excavacion parcial y cargue de bodegueros

ETHELBERTO FRANCO C
ELABORO

REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de Interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA	sábado 12	07	2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
C.C. 1100617	soleado	soleado	no	S
1101978	"	"	"	"
1100546	"	"	"	"

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
1100617			1		3					
1101978			"		"					
1100546			"		"					

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

1100617
1101978 instalación SST parcial
1100546
" "

ERNESTO ERAZO G
ELABORO

Maria Paz
REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA	lunes 14	07	2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
CIV 1006617	Soleada	Soleada	No	S

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
1006617	1		1		3					

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

CIV 1006617 Se continua con instalación PMT peatonal

ETHELBERTO FRANCO C
ELABORO

REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA: MARTES 15 | 07 | 2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
1100617	Soleada	Soleada	No	S
1101978	"	"	"	"
1100586	"	"	"	"
1101977	"	"	"	"
1101976	"	"	"	"
1100638	"	"	"	"

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

CIV 1100617 Obra sin actividad
1101978 " "
1100586 " "
1101977 " "
1101976 " "
1100638

GILBERTO
ELABORO

Maria DC
REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA	16	07	2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
1101977	Soleado	Soleada	No	S
1011926	"	"	"	"
1006438	"	"	"	"

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

CIV - 1101977 obra sin actividad residente PMT
1011926 "
1006436 "

ETHELBERTO FRANCO G
ELABORO

Maira M
REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUÉ SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA	Jueves 17	07	2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
11006617	Soleada	Soleada	NO	S
11001978	"	"	"	"
11006506	"	"	"	"
11011977	"	"	"	"
11011976	"	"	"	"
11006438	"	"	"	"

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

11006617	Obra	Sin actividad
11001978	"	"
11006506	"	"
11011977	"	"
11011976	"	"
11006438	"	"

ERNEBERTO FRANCO
ELABORO

REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA	viernes 18	07	2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
11006617	Soleada	Soleada	No	S
11001978	"	"	"	"
11006546	"	"	"	"
11011977	"	"	"	"
11011976	"	"	"	"
11006438	"	"	"	"

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

CIV 11006617	obra sin actividad
11001978	"
11006546	"
11011977	"
11011976	"
11006438	"

ETHELBERTO FRANCO G
ELABORO

REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de Interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA	sabado 19	07	2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
1101977	Soleada	Soleada	no	S
1101976	"	"	"	"

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
1101977			1		3					
1101976			"		"					

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

1101977 Se continua con instalacion PMT poste 1
1101976 "

ETHELBERTO FRANCO G
ELABORO

REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO.

Lunes LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA	21	07	2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
11011977	Soleada	Soleada	No	S
11011976	"	"	"	"

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
11011977			1		4					
11011976										

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

CIV 11011977 instalacion PMT parcial y colocacion de vrallas
CIV 11011976 "

EDILBERTO FRANCO G
ELABORO

REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA	martes 22	04	2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
1101977	soleada	soleada	1100	S
1101976	11	11	11	11

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
1101977	1	1	1	1	3					
1101976										

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

CIV 1101977 se continua con instalacion trafitubos y polisombra
CIV 1101976 11 11

ERNESTO FRANCO G
ELABORÓ

Maria M
REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. miercoles LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA	23	07	2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
1101477	soleada	soleada	no	S

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
1101477		1		1	2	1	1		2	

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO
Retrocargador HOLLINDZIA	1101477	1	5	demolición placa

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

civ 1101477 minicargador demolición de placa concreto y carpeta asfaltica

ETHELBERTO FRANCO
ELABORO

REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA	Zd	07	2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
11011977	soleada	soleada	NO	S

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
11011977	1	1		1	2	2	1		2	

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO
RETRO SONTUI 75	11011977	1	6	excavacion via
minicargador 249	u	1	5	demolicion

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

11011977 retro cargue y excavación mecanica con retro
11011977 minicargador demolición asfalto y concreto

ETHELBERTO FRANCO
ELABORO

REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de Interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA	viernes 25	07	2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
1101977	Soleada	Soleada	no	S

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
1101977	1	1	1	1	2	2			2	

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO
RETRO SOATTIL 345	1101977	1	6	excavacion via

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

civ 1101977 Retro excavacion mecanica y cargue baldetas

ERNESTO FRANCO G
ELABORO

REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de Interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO.

Sabado LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA	25	07	2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
CIV 11011977	soleada	soleada	NO	S

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
11011977		1-C-1	1	1	2	2			2	

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO
RETRO SONTUI-75	11011977	1	3	EXCAVACION VIA
MINICARGADOR KUCLIANO	11	1	2	DEMOLICION CONCRETO

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

CIV 11011977 RETRO EXCAVACION MECANICA VIA Y CARGUE DE BOLQUETAS
CIV 11011977 MINICARGADOR DEMOLICION ASFALTO Y CONCRETO

ETHELBERTO FRANCO G
ELABORO

Maria M
REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de Interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO.

Lote 2 LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA	28	07	2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
11011477	Soleada	Soleada	No	S

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
11011477	1	1-CC-1		1	2	2	1		2	

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO
Retro Sonlui 75	11011477	1	6	excavacion via

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

CIV 11011477 Retro excavacion mecanica y cargue de bolquetas

ETHELBERTO FRANCO C.
ELABORO

REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de interventoría 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA: martes 29 / 07 / 2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
1101977	soleado	soleado	NO	S

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
1101977	1	1	1	1	2	1	1		2	

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO
RETRO SANTUY 75	1101977	1	6	excavacion via
MINICARGADOR UNIVO 218	11	1	2	picada de materiales

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

CIV 1101977 excavación mecanica parcial y cargue (bolqueros
CIV 1101977 cargue de material y demolición placa en concreto

ETHELBERTO FRANCO G
ELABORO

REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de interventoría 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO.

LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA	miercoles 30	07	2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
1101977	Soleada	Soleada	no	S

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	i. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
1101977	1	1 cL		1	2	2			2	

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO
Retro sant. ñ 75	1101977	1	5	excavacion via
min-cargador HOLLAND 217	11	1	2	demolicion concreto

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

CIV 1101977 Retro excavacion parcial y cargue de escombros
11 11 minicargador demolicion concreto y carpeta asfaltica

ELIZABETH FRANCO G
ELABORO

REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de Interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA	Jueves 31	07	2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
11011977	soleada	soleado	No	S

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
11011977		1		1	2	2			2	

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO
Retro Sonte 75	11011977	1	5	excavacion via
minicargador volquete 247	11	1	2	demolicion

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

CIV 11011977 Retro excavacion mecanica y cargue de bolsuetas
y minicargador demolicion carpeta asfaltica y placa en
concreto

ELABORO

REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA: 07 / 07 / 2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
1100 5215	Soleada			S
1100 4156	Soleada			S
1101188		Soleado		S

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
1101188						1			1	

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO
Retro JCB 3CX	1101188	1	2	excavacion de loza

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

Recorrido por CIV 1100 5215 costanzul, 1100 4156 portico, 1101188 potosi

en CIV 1101188 se hace retiro de loseta y ladrillo

Michael Sierra
ELABORO

Maria
REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA: 08 / 07 / 2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
11011188	Soleado			S
1100 52 15		nublado		S

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
11011188						1			1	
1100 52 15				1	3	1			1	

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO
Retro JCB 3CX	11011188	1	2	acopio de lozeta
Shantui SE 75	1100 52 15	1	1	excavacion y cargue de volquetas

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

en CIV 11011188 se acopio lozeta para cargue de volqueta

en CIV 1100 52 15 se continuo con excavacion y cargue de volquetas

Michael Sierra
ELABORO

REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de Interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA: 09 / 07 / 2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
11011188	Nublado			S.
11006438		Nublado		S
11005215		nublado		S.

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
11011188						1			1	

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO
Retro JCB 3CX	11011188	1		Sin actividad

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

CIV 11011188 se perfilaron los bordes manualmente

CIV 11006438 se hace recorrido pero no se han empezado actividades como tal

CIV 11005215 se hace precensia en la visita de Vanti para traslado de la manguera de gas q pasa por pozo

Michael Sierra
ELABORO

Nana M
REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA: 10 / 07 / 2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
11011188	soleado			S
11005765	soleado			S
11005215		nublado		S

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
11011188		1	1		1	1			1	

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO
Retro JCB 3CX	11011188	1	0	Ninguno

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

CIV 11011188 se evidencia que la topografia deja niveles para excavacion

CIV 11005765 poca actividad se hace recorrido evidenciando labora

CIV 11005215 se evidencia capa de rajon o material reciclable

Michael Sierra
ELABORO

Maria M
REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA: 11 / 07 / 2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
11011188	soleado			S
11005215	Soleado			S
11010613		nublado		0
11010621		nublado		S
11005215		nublado		S

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
11011188			1		1	1			1	

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO
Retro JCB 3cx	11011188	1		inactiva

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

CIV 11010613 y 11010621 se hace acompañamiento para señalizacion ole pmt

Michael Sierra
ELABORO

Maria
REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA: 12 / 07 / 2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
1100515	Soleado			S

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
1100515		cd #1 2		1	2	1			1	

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

CIV 1100515

se libera 20 metros de base

Michael Sierra
ELABORO

María
REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA: 14 / 07 / 2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
1100 5215	Soleado	nublado		S

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
11 00 52 15				1	3					
1100 5566	1			1	3				1	

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

1100 52 15 Se realiza instalación de Bordillo

1100 5566 Sereo para entrega de cajeo

Michael Sierra
ELABORO

REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA: 15 / 07 / 2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
11005215	nublado			S

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
11005215		Cade 1/2		1	2				1	

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

11005215 Se continua con instalacion de Bordillo

Michael Sierra
ELABORO

REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de Interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO, LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA: 16 | 07 | 2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
11011188	Nublado			S
11010613		Soleado		S

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
11011188					1	1			1	
11010613	1	1		1	3				1	

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO
Retro JCB 3CX		1		quieta
Retro Hitachi US 75		1	3	excavación

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

CIV 11011188 se hace excavacion manual y se perfila para bordillo

CIV 11010613 se inicia con excavación de Calda Asfaltica

Michael Sierra
ELABORO

Maria
REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de Interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA: 17 | 07 | 2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
11010613	Nublado			3
11011188		Soleado		3

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
11010613			1	1	3	1			1	
11011188					1	1				

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO
Retro hitachi us 75		1	2	excavacion
Retro JCB 3 CX		1	1	quieta

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

CIV 11010613 se continua con excavacion de cajeo y carpeta Asfaltica

CIV 11011188 se hace acopio para material y bordillos

Michael Sierra
ELABORO

REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA: 18 / 07 / 2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
11011188		nublado		
11010613		nublado		
11005215		soleado		

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
11011188					1	1				
11010613					3			1	1	

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO
Retro JCB 3CX	11011188	1		cuneta
Retro hitachi us 75	11010613	1	2	excavación

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

CIV 11011188 desmonoción de actividades

CIV 11010613 se continua con excavacion de cajeo y carpeta Asfaltica

CIV11005215 se continua con puesta de bordillo

Michael Sierra
ELABORO

REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de Interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA: 19 / 07 / 2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
11010613	nublado			S

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
11010613					3			1		1

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO
Retro hitachi us75	11010613	1	1	excavacion y cargue

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

Civ 11010613 se continua con excavacion de carpeta Asfaltica y cajeo mas cargue de volquetas

Michael Sierra
ELABORO

REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de Interventoría 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA: 21 / 07 / 2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
11010613	Nublado			3

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
11010613		2	1		3	1		1	1	

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO
Retro hitachi zx75	11010613	1	2	Retiro de carpeta asfaltica

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

CIV 11010613 Se hace liberacion de cajeo desde la K0+000 hasta la K0+0.60 y se continua con excavacion

Michael Sierra
ELABORO

Maria M
REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA: 22 / 07 / 2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
11011188	nublado			S
11006938		soleado		S

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
11011188					1					
11006938					3					

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

CIV 11011188 se evidencia poco personal y desmincón de actividad

CIV 11006438 se inicia con señalización de PMT y trolicos para cerramiento

Michael Sierra
ELABORO

Nara A
REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA: 23 / 07 / 2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
11010613	nublado			2
11006546		nublado		3

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boat	R. SST
11010613					3			1		
11006546					2				2	

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO
hitachi us 75	11010613	1	2	excavacion

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

CVI 11010613 desde la K0+065 hasta la K0+080 Se evidencia material de arcilla y red sanitaria

CIV 11006546 Se evidencia cerramiento

Michael Sierra
ELABORO

Maria
REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA: 24 / 07 / 2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
1101188	Soleado			S
1100 4080		Soleado		S

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
1101188				1	1					

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

CIV 1101188 se inicia con puesta ole Bordillo

CIV 1100 4080 se evidencia instalación ole PMT

Michael Sierra
ELABORO

Maria
REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de Interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA: 25 / 07 / 2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
11011188	Soleado			S
11010613		Soleado		S

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
11011188		1		1	1					
11010613		1	1		3			1		

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

CIV 11011188 Se deja instalada una cara de bordillo y se hace liberacion de bordillo y bajo rampa

CIV 11010613 Se hace liberacion de cajco desde la K0+080 hasta la K0+100

Michael Sierra
ELABORO

Maria A
REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2.

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA: 26 / 07 / 2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
11011188	Nublado			S

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
11011188				1	1					

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

CIV 11011188 se evidencia el fraguo de los bordillos

Michael Sierra
ELABORO

Nana AC
REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA: 28 / 07 / 2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
11010613	Soleado			S

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
11010613					3	2				

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO
Mini Cargador CAT 236B	11010613	1	1	Cerco
HAMM HD 100 vibro	11010613	1	1	Compactando base

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

CIV 11010613 se hace cerco de sob base y se libera base desde la K0+005 hasta la K0+060

Michael Sierra
ELABORO

María M
REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de Interventoría 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA: 29 / 07 / 2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
11011188	soleado			S
11010613		soleado		S

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
11011188				1	1	1				
11010613					3			1		

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO
MINI CAT 2346	11011188	1	2	Acopiando material

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

CIV 11011188 Se hacen Acopio para material de excavación

CIV 11010613 Se evidencian las densidades de la base y liberacion de sello rajon de la K0+065 A K0+085

Michael Sierra
ELABORO

Maria M
REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA: 30 / 07 / 2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
11011188	Soleado			S
11010613	Soleado			S
11005765		Nublado		S

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
11011188				1	1	2				
11010613					3	1		1		
11005765	1		1		3	1	1		3	

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO
CAT mini 236D vibro	11011188	1	2	
Vibro HCO 58645	11011188	1	1	

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

CIV 11011188 Se toman niveles para ver como esta la base aplicada

CIV 11010613 Se aplica agua para dar vibro compactador

CIV 11005765 Se hace liberación de tubería para sumidero

Michael Sierra
ELABORO

Nana
REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de Interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA: 31 / 07 / 2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
11011188	soleado			S

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
11011188	1		1	1	2	2				
11010613					3			1	1	
11004080				1	1					

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO
mini CAT 236 B	11011188	1	3	demolicion

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

CIV 11011188 se hace demolicion de loceta costado norte

CIV 11010613 se inicia con bordillo por costado izquierdo y se deja carcamo listo para fundir

CIV 11004080 se hace cerramiento

Michael Sierra
ELABORO

REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de Interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA: 01 Julio 2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
11005728	Sol			S
11005623	Sol			S

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
11005728	1	1	1	1	3	1	1		2	
11005623	1	1	1	1	3	1	1		2	

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO
Retro CAT 312	11005728	1	1	Excavación

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

CIV 11005728 Se continua con la excavación mecánica y manual para el traslado de la red de 4" de Vent. hacia la zona verde.

CIV 11005623 Se continua con la excavación mecánica y manual para el traslado de la red de 4" de Vent. hacia la zona verde.

S.M

Hector Dario Reyes Delgado
ELABORO

Maria PC
REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de Interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA: 03 Julio 2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
11005623	Sol			S
11005215	Sol			S

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
11005623	1	1	1	1	3	1	1		2	
11005215				1	5	1			1	

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO
Retro Cotepillar 312	11005623	1	3	Excavación
Retro Shootcat 6575	11005215	1	4	Demolición y excavación

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

CIV 11005623 Se continua con la excavación mecánica y manual para el Traslado de la red de Vapri de 4" hacia la zona Verde.

CIV 11005215 Se continua con la demolición del pavimento existente y la excavación mecánica, la excavación se inicio el 2 de julio. El contratista rompe una toma de 3" de acueducto, el mismo contratista lo repara.

514

Hector Oxio Reyes Delgado
ELABORO

REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de Interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA: 04 Julio 2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
11005215	Sol			S

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
11005215				1	5	1			1	

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO
Retro Shioitari 6E75	11005215	1	4	Demolición y excavación

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

CIV 11005215 se continúa con la demolición del pavimento existente y la excavación mecánica, se va perfilando la excavación con hilos.

614

Hector Oscar Reyes Delgado
ELABORO

REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA: 05 Julio 2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
11005215	Sol			S

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
11005215				1	5	1		1	1	

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO
Retro Shorsi 6E75	11005215	1	1	Demolición y excavación

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

CIV 11005215 Se continua con la demolición del pavimento existente y la excavación mecanica, el contratista compe nuevamente la tubería de 3" de acueducto, el mismo contratista la separa.

614

Hector Oscar Reyes Delgado
ELABORO

REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA: 07 Julio 2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
11005215	Sol			S

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
11005215					5	1		1	1	

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO
Retro Shiorui 6E75	11005215	1	4	Demolición y excavación

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

CIV 11005215 Se continua con la demolición del pavimento existente y la excavación mecánica.
Se realiza liberación de la excavación entre las abscisas pmts - 0+058.
Se realiza lavado de tubería sanitaria de 8" (colector) y posteriormente se realiza inspección CCTV.
Se empieza a extraer Geotextil.
Se empieza a extraer material de mejoramiento razón (material resultado de demolición).

515

Herrac Daso Reyes Delgado
ELABORO

REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA: 08 Julio 2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
11005215	Sol			S

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
11005215					5	1		1	1	

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO
Retro Shantui SE 75	11005215	1	4	Extiende material

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

CIV 11005215 Se continúa extendiendo material de mejoramiento

Se realiza excavación manual y se reemplaza un tubo de 8" del colector sanitario, se instala un tubo completo de 6 metros

Se realiza excavación manual y se reemplaza un tubo de 6" de una domiciliaria en el predio 103-10, se instala un tubo completo de 6 metros.

515

Hector Oswo Reyes Delgado
ELABORO

REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA: 09 Julio 2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
11005215	Sol			S

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
11005215					5	1		1	1	

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO
Retro Shorui 6E75	11005215	1	4	Extracción material y excava

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

CIV 11005215 Se continua extracción material de mejoramiento.

Se termina la excavación mecánica.

Se realiza liberación de la excavación entre las abscisas 0+000 y 0+015

Se continua extracción material.

515

Hector Oscar Reyes Delgado
ELABORO

REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de Interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA: 10 Julio 2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
11005215	Sol			S

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
11005215					5	1		1	1	

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO
Retro Shiroi SE75	11005215	1	4	Extiende material

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

CIV 11005215 Se continua extendiendo material de mejoramiento.

Se continua extendido Geotextil

Se instala un tubo de 6" para la domiciliaria del predio 103-06, Se instala un tubo completo de 6 metros.

Vanti realiza la reparacion de una red de 2" que cruza la via y este cabebida en un Pozo, el contratista la compio.

Se empieza a extender material para sello (B-200) de razon.

SLS

Hector Dario Rojas Delgado
ELABORO

Maria M
REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA: 11 Julio 2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
11005215	Sol			S

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
11005215					5	1		1	1	

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO
Rana Chicago SF75	11005215	1	2	Extender material recibo
Minicargador New Holland SL-218	11005215	1	2	Extender material B-200

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

CIV 11005215 Se continua extendido material de mejoramiento

Se continua extendido material

Se continua extendido material para sello (B-200)

515

Hector Dario Reyes Delgado
ELABORO

REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA: 14 Julio 2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
11005215	Sol	lluvia	2	SS
11005728	Sol			S

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
11005215					6	2		1	1	
11005728					4	1		1	2	

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO
Mini New Holland E6-318	11005215	1	4	Extender material B-200
Vibro JCB VMT 269-120	11005215	1	2	compacta B-200 y subbase C-A
Retro CAT 312	11005728	1	3	Excavación

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

CIV 11005215 Se extiende subbase clase - A
Se termina de extender material de sello B-200

CIV 11005728 Se continúa con la excavación mecánica

516

Hector Dario Reyes Delgado
ELABORO

Maria AL
REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de Interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA: 15 Julio 2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
1100 5215	Sol	Lluvia	2	SS

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
1100 5215					6	2		1	1	

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO
Mini New Holland E1-218	1100 5215	1	2	Extender subbase C-A
Vibro JCB VMT 260-120	1100 5215	1	2	compacta subbase C-A

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

CIV 1100 5215 Se Tomas de extender y cerear la subbase agregados clase A

Se resuelve el cargue de un pozo

Se empieza a instalar bordillo

SJG

Hector Dario Reyes Delgado
ELABORO

REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de Interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA: 16 Julio 2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
11005215	Sol			S

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
11005215					6			1	1	

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

CIV 11005215 se continúa con la instalación del bazillo.

se compre una manguera de Vapor

526

Hector Dario Reyes Delgado
ELABORO

REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA: 17 Julio 2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
11005215	Sol			S

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
11005215					5			1	1	

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

CIV 11005215 se continua con la instalación de bordillo.

516

Hector Dario Reyes Delgado
ELABORO

Maria
REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de Interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA: 18 Julio 2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
11005215	Sol			S

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
11005215					5			1	1	

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

CIV 11005215 Se continua con la instalación del sardinel.

Se decide dejar bagacampo y no cerrar el acceso a la bahia vehicular, esto se decide en comite hoy, tambien se acuerda instalar un sumidero.

516

Hector Dario Reyes Delgado
ELABORO

Maria M
REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA: 19 Julio 2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
11005215	6a			S

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
11005215				1	3			1	1	

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

CIV 11005215 se continua con la instalación de sardinel

516

Hector Dario Reyes Delgado
ELABORO

Maria
REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA: 21 Julio 2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
11005215	Sol			6

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
11005215					7			1	1	

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

CIV 11005215 Se continua con la instalacion de bordillos

Se realiza limpieza de un pozo sanitario ubicado en el cruce de la carrera 103C con calle 153B15

517

Hector Dario Reyes Delgado
ELABORO

REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA: 22 Julio 2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
1100 5215	Sol			S

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
1100 5215				1	2			1	1	

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

CIV 1100 5215 Se continua con la instalación de bacillos

617

Hector Dario Reyes Delgado
ELABORO

REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA: 23 Julio 2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
11005215	Sol			S

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
11005215				1	2			1	1	

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

CIV 11005215 Se continua con la instalación de bordillos, se instalan las rampas de las anclas y el bajo rampa de acceso a la vahia vehicular

SST

Hector Dario Reyes Delgado
ELABORO

REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de Interventoría 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA: 24 Julio 2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
11005215	Sol			S
11011188	Sol			S

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
11005215				1	1				1	
11011188				1	1					

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

CIV 11005215 Se continúa con la instalación de sardinel

CIV 11011188 Se define en conjunto con interventoría la cabeza de la vía y se empieza a instalar sardinel.

SLT

Hector Dario Reyes Delgado
ELABORO

Maria MK
REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de interventoría 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA: 25 Julio 2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
11005765	Sol			S
11005623	Sol			S

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
11005765					4			1	1	
11005623						1			1	

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO
CIV 11005623		Retro JCB 3dx	2	Excavación

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

CIV 11005765 Se continua con la excavación para instalar un sumidero

CIV 11005623 Se continua con la excavación mecánica

SST

Hector Dario Reyes Delgado
ELABORO

REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA: 28 Julio 2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
11005623	Sol			S

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
11005623			1		3	1			2	

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO
Retro JCB 3dx	11005623	1	5	Excavación

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

CIV 11005623 Se continua con la excavación mecánica.

Hector Dario Reyes Delgado
ELABORO

REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA: 28 Julio 2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
Parque Pilato 11011977	Soleada	Soleada		

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
Parque Pilato 11011977	1	2	1	1	1	3			2	

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO
Retroexcavadora	11011977	1	7	Excavacion cota fondo - Cargue
Minicargador - Martillo	11011977	1	4	Demolicion placa concreto 0.20
Minicargador	11011977	1	4	Regado y acopio de material

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

Parque Pilato CIV 11011977 - Excavacion cota fondo
- Regado de Bajon
- Cargue de material
- Chequeo de cotas
- Ajuste cotas de diseño

Fabian Latorre
ELABORO

REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de Interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA: 29 Julio 2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
Parque Pilata 11011977	Soleada	Soleada		Seco

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
Parque Pilata 11011977	1	2	1	1	1	3	1		2	

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO
Retroexcavadora	11011977	1	7	Excavacion cota fondo - Cargue
Municargador - Martillo	11011977	1	3	Demolicion placa concreto
Municargador	11011977	1	3	Riego de riego

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

Parque Pilata CIV 11011977 - Excavaciones cota Fondo
- Riego de Riego
- Cargue de Material
- Chequeo cotas de diseño
- Control de excavacion
- Se libero excavacion Ko+150 - Ko+175

ELABORÓ

REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA: 30 | Julio | 2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
Costa Azul 11005215	Soleada	Soleada		Seco
Parque Pilato 11011977	Soleada	Soleada		Seco

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
Costa Azul 11005215		2		2	2				1	
Parque Pilato 11011977	1	2	1	1	1	3			2	

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO
Retroexcavadora	11011977	1	4	Excavacion cota fondo - Cargue
Minicargador - Martillo	11011977	1	2	Demolicion placa concreto
Minicargador	11011977	1	2	Regado de Rajon

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

Costa Azul CIV 11005215 - Excavaciones manuales, Tuberia y sumideros
- Limpieza General
- Control Topografico

Parque Pilato CIV 11011977 - Reparacion Tuberia acueducto
- Reparacion Tuberia Gas -
- Excavacion cota fondo
- Demolicion placa
- Regado de rajon
- Control de circulacion

Toro Intero
ELABORO

REVISO

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

Contrato de interventoria 084 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

INFORME DIARIO DE INSPECCION

FECHA: 31 | Julio | 2025

HOJA: 1 DE 1

I. INFORMACION METEOROLOGICA

CIV	MAÑANA	TARDE	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO
Costa Azul 1105215	Soleada	Soleada		Seco
Parque Piloto 1011977	Soleada	Soleada		Seco

Estado del Suelo: Seco (S), Semiseco (SS), Saturado (ST), Inundado (I)

II. INFORMACION DEL PERSONAL

CIV	Residente	Topografo	Inspector	Oficial	Ayudante	Operador	I. SST	J. cuadrilla	Boal	R. SST
Costa Azul 1105215				2	2				1	
Parque Piloto 1011977	1	2	1	1	1	3	1		1	1

III. INFORMACION DE EQUIPO

DESCRIPCION	CIV	CANTIDAD	HORAS	TRABAJO EJECUTADO
Retrocargadora	1011977	1	8	Excavación cota fondo - Cargue
Minicargador - Martillo	1011977	1	4	Demolicion placa concreto
Minicargador	1011977	1	3	Acopio de Material

IV INFORMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

Costa Azul CIV 1105215 - Excavación manual, Sumidero y Tuberia

Parque Piloto CIV 1011977 - Excavacion cota fondo
- Demolicion Placa
- Control de excavacion
- Liberacion Excavacion K0+175 - K0+215

Jefe Interv
ELABORO

REVISO

ANEXO 3: INFORME EJECUTIVO

INFORME EJECUTIVO - CONTRATO DE

No.	ORD.	CIV	VIA	DESDE	HASTA	PK_ID	BARRIO	AREA INTERVENCIÓN (m²)	LONGITUD (m)	AREA INTERVENCIÓN VÍA (m²)	KM/CARRIL	MATERIAL	DISEÑOS FDLS	PRIORIZACION	INSPECCION	PMT	EXCLUIDOS	CONSTRUCCION	REHABILITACIÓN	MANTENIMIENTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINA	DÍAS DE EJECUCIÓN
1	1	11006438	CLL 129 D	KR 1222	KR 121 C	173503	TIBABUYES	865,9	84,60	865,9	0,25	MR 45		X	X				X		30/06/2025	28/11/2025	151
2	2	11011976	CLL 129 D	KR 121 C	KR 121 C	472369	TIBABUYES	176,12	16,80	176,1	0,05	MR 45		X	X				X		30/06/2025	28/11/2025	151
3	3	11011977	CLL 129 D	KR 121	KR 121 C	472370	TIBABUYES	958,99	95,60	959,0	0,27	MR 45		X	X				X		30/06/2025	28/11/2025	151
4	4	11006546	CLL 129 D	KR 121	KR 121	173502	TIBABUYES	141,26	14,10	141,3	0,04	MR 45		X	X				X		30/06/2025	28/11/2025	151
5	5	11011978	CLL 129 D	TRV 120 A	KR 121	472371	TIBABUYES	669,44	68,00	669,4	0,19	MR 45		X	X				X		30/06/2025	28/11/2025	151
6	6	11006617	CLL 129 D	KR 120	TRV 120 A	173501	TIBABUYES	472,92	39,40	472,9	0,14	MR 45		X	X				X		30/06/2025	28/11/2025	151
7	7	11011188	KR 70 D	CLL 98 A	CLL 98 B	168477	POTOSI	265,05	29,20	265,1	0,08	MD19		X	X				X		23/06/2025	19/09/2025	88
8	8	11004672	KR 101 B	CLL 140 A	CLL 140 B	173797	EL POA	251,18	68,5	251,2	0,07	MD19		X	X				X		30/07/2025	18/11/2025	111
9	9	11005215	CLL 137 BIS	CRA 103	CRA 103 C	800044	COSTA AZUL	379,27	58,30	379,3	0,11	MR 45		X	X				X		16/06/2025	8/08/2025	53
10	10	11008694	KR 57 B	CLL 131 B	CLL 133	167909	COLINA CAMPESTRE	896,82	138,10	896,8	0,26	MD19		X	X				X		28/07/2025	9/01/2026	165
11	11	11010147	KR 51	CLL 128	CLL128 A	167437	PRADO VERANIEGO	619,79	91,1	619,8	0,18	MD19		X	X				X		26/08/2025	10/11/2025	76
12	12	11004156	CLL 141	KR 101 B	KR 101 C	173807	EL POA	200,58	25,3	200,6	0,06			X	X				X		23/06/2025	24/10/2025	123
13	13	11013439	CLL 141	KR 101 C	KR 101 C	91020581	EL POA	86,47	10,6	86,5	0,02			X					X		23/06/2025	24/10/2025	123
14	14	11004110	CLL 141	KR 101 C	KR 102	173808	EL POA	136,07	17,6	136,1	0,04			X	X				X		23/06/2025	24/10/2025	123
15	15	11004080	CLL 141	KR 102	KR 102 A	173809	EL POA	280,26	37,10	280,3	0,08			X	X				X		23/06/2025	24/10/2025	123
16	16	11005794	KR 98	CLL 136	CLL 137A	172488	LA CHUCUA	802,32	123,0	802,3	0,23			X	X				X		12/12/2025	29/01/2026	48
17	17	11003955	KR 98 B	CLL 147	CLL 147 C	176248	LA CAMPIÑA	667,09	129,3	667,1	0,19	MD19		X	X				X		1/09/2025	2/02/2026	154
18	18	11010612	KR 70 G	CL 119	CL 119	168694	NIZA SUR	134,47	21	134,5	0,04	MD19		X	X				X		28/08/2025	12/11/2025	76
19	19	11009243	CL 128B	KR 84C	KR 85	170403	CIUDAD HUNZA	68,39	10,2	68,4	0,02			X	X				X		31/12/2025	30/01/2026	30
20	20	11009180	CL 128B	KR 84	KR 84A	170384	CIUDAD HUNZA	217,98	47,6	218,0	0,06			X	X				X		31/12/2025	30/01/2026	30
21	21	11009224	CL 128B	KR 84B	KR 84A	170385	CIUDAD HUNZA	200,04	46,3	200,0	0,06			X	X				X		31/12/2025	30/01/2026	30
22	22	11009242	CL 128B	KR 84C	KR 84B	170386	CIUDAD HUNZA	130,4	25,4	130,4	0,04			X					X		31/12/2025	30/01/2026	30
23	23	11013565	TV 94	CL 129A	CL 129B	52298	EL RINCÓN	171,15	35,3	171,2	0,05			X					X		21/11/2025	29/01/2026	69
24	24	11008140	TV 94	KR 93D BIS A	KR 93D	52290	EL RINCÓN	62,19	42,1	62,2	0,02			X					X		21/11/2025	29/01/2026	69
25	25	11008154	TV 94	CL 128D	KR 93D BIS A	52288	EL RINCÓN	193,55	59,4	193,6	0,06			X	X				X		21/11/2025	29/01/2026	69
26	26	11008062	DG 129B BIS	KR 93C	KR 93B	52294	EL RINCÓN	544,8	50,0	544,8	0,16			X					X		21/11/2025	29/01/2026	69
27	27	11007844	CL 130D	KR 88C	KR 88B	51210	TABERIN	57,61	57,3	57,6	0,02			X					X		12/12/2025	29/01/2026	48
28	28	11007885	KR 89	CL 130B BIS	CL 130C	51745	NARANJOS	13,22	12,9	13,2	0,00			X					X		12/12/2025	29/01/2026	48
29	29	11006690	CL 132C	KR 92A	KR 93 BIS	52944	VILLA ELISA	115,84	57,7	115,8	0,03			X					X		27/10/2025	26/01/2026	91
30	30	11006280	CL 135	KR 94C	KR 94F	52970	VILLA ELISA	175,52	111,7	175,5	0,05			X					X		27/10/2025	26/01/2026	91
31	31	11004054	KR 111A	CL 139	CL 140	56027	LAS FLORES	315,63	124,3	315,6	0,09			X					X		1/12/2025	30/01/2026	60
32	32	11010114	KR 53A	CL 128	CL 128 A	45831	PRADO VERANIEGO	199,93	82,2	199,9	0,06			X					X		1/12/2025	30/01/2026	60
33	33	11004461	TV 126	CL 134	CL 135B	56171	LA GAITANA	307,15	147,5	307,2	0,09			X					X		12/12/2025	29/01/2026	48

INFORME EJECUTIVO - CONTRATO DE

No.	ORD.	CIV	VIA	DESDE	HASTA	PK_ID	BARRIO	AREA INTERVENCIÓN (m²)	LONGITUD (m)	AREA INTERVENCIÓN VÍA (m²)	KM/CARRIL	MATERIAL	DISEÑOS FDLS	PRIORIZACION	INSPECCION	PMT	EXCLUIDOS	CONSTRUCCION	REHABILITACIÓN	MANTENIMIENTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINA	DÍAS DE EJECUCIÓN
34	34	11005104	CL 124	CL 132C BIS	CL 132D	55555	LA GAITANA	44	17,4	44,0	0,01			X					X		12/12/2025	29/01/2026	48
35	35	11014679	CL 132D	KR 118	KR 124	55494	LA GAITANA	217,77	127,5	217,8	0,06			X					X		12/12/2025	29/01/2026	48
36	36	11005262	KR 124C	CL 131A	CL 132BIS	173654	LA GAITANA	245,33	91,2	245,3	0,07	MD19		X					X		15/09/2025	23/01/2026	130
37	37	11007171	KR 100A	CL 130	CL 130C	53561	LAGO DE SUBA	419,54	29,8	419,5	0,12			X					X		1/12/2025	30/01/2026	60
38	38	11007373	KR 100A	CL 129C	CL 130	53559	LAGO DE SUBA	406,97	111,2	407,0	0,12			X					X		1/12/2025	30/01/2026	60
39	39	11007426	CL 129C	KR 99A	KR 100A	52761	LAGO DE SUBA	274,57	85,8	274,6	0,08			X					X		1/12/2025	30/01/2026	60
40	40	11006499	KR 102	CL 131	CL 131B	54069	AURES	172,28	86,1	172,3	0,05			X					X		1/12/2025	30/01/2026	60
41	41	11007528	TV 102A	CL 128C	CL 128B	53375	EL RINCÓN	102,56	25,4	102,6	0,03			X					X		21/11/2025	29/01/2026	69
42	42	11008687	CL 128BIS	KR 93D	KR 93A	51343	EL RINCÓN	318,24	144,4	318,2	0,09			X					X		21/11/2025	29/01/2026	69
43	43	11008803	CL 128BIS	KR 93A	KR 93	51341	EL RINCÓN	188,18	105,3	188,2	0,05			X					X		21/11/2025	29/01/2026	69
44	44	11004800	CL 140A	KR 100	KR 100A	55745	EL POA	71,37	35,85	71,4	0,02			X					X		1/12/2025	30/01/2026	60
45	45	11004755	KR 100A	CL 140A	CL 140A BIS	55781	EL POA	78,95	33,53	79,0	0,02			X					X		1/12/2025	30/01/2026	60
46	46	11004799	KR 100	CL 140A	CL 140A BIS	55734	EL POA	112,21	43,91	112,2	0,03			X					X		1/12/2025	30/01/2026	60
47	47	11007176	CL 130C	KR 98	KR 98A	52412	AURES	80,04	37,12	80,0	0,02			X					X		12/12/2025	30/01/2026	49
48	48	11007276	KR 97	CL 130B	CL 130C	92074905	AURES	577,2	110,78	577,2	0,16			X					X		12/12/2025	30/01/2026	49
49	49	11009086	CL 128B	CL 87D	CL 88	50696	CIUDAD HUNZA	84,18	40,93	84,2	0,02			X					X		31/12/2025	30/01/2026	30
50	50	11009172	KR 86B	CL 128B	CL 128B BIS	50604	CIUDAD HUNZA	124	59,83	124,0	0,04			X					X		31/12/2025	30/01/2026	30
51	51	11009208	KR 86B	CL 128	CL 128B	50602	CIUDAD HUNZA	178,98	90,89	179,0	0,05			X					X		31/12/2025	30/01/2026	30
52	52	11008562	KR 84A	CL 129A	CL 129C	92064676	CIUDAD HUNZA	73,08	36,47	73,1	0,02			X					X		31/12/2025	30/01/2026	30
53	53	11008818	KR 93	CL 128BIS	CL 128BIS	51476	EL RINCÓN	46,59	17,8	46,6	0,01			X					X		21/11/2025	29/01/2026	69
54	54	11014651	CL 136A	KR 112	KR 118	55697	VILLA MARIA I	139,72	69,3	139,7	0,04			X					X		28/11/2025	29/01/2026	62
55	55	11008662	KR 53	CL 135	CL 136	46033	PRADO VERANIEGO	166,44	62,3	166,4	0,05			X					X		1/12/2025	30/01/2026	60
56	56	11008527	CL 136	KR 53	KR 53B	45971	PRADO VERANIEGO	326,37	99,2	326,4	0,09			X					X		1/12/2025	30/01/2026	60
57	57	11008663	CL 135	KR 53	KR 53B	45956	PRADO VERANIEGO	258,28	99,6	258,3	0,07			X					X		1/12/2025	30/01/2026	60
58	58	11004683	KR 109 A	CL 136A	CL 139	173291	VILLA MARIA I	904,13	170,7	904,1	0,26			X					X		28/11/2025	29/01/2026	62
59	59	11005331	KR 92	CL 145A	CL 145B	172977	SUBA CENTRO	191,04	43,2	191,0	0,05			X					X		24/09/2025	20/01/2026	118

INFORME EJECUTIVO - CONTRATO DE																							
No.	ORD.	CIV	VIA	DESDE	HASTA	PK_ID	BARRIO	AREA INTERVENCIÓN (m²)	LONGITUD (m)	AREA INTERVENCIÓN VÍA (m²)	KM/CARRIL	MATERIAL	DISEÑOS FDLS	PRIORIZACION	INSPECCION	PMT	EXCLUIDOS	CONSTRUCCION	REHABILITACIÓN	MANTENIMIENTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINA	DÍAS DE EJECUCIÓN
60	60	11003803	CL 148	KR 91	KR 92	171249	LA CAMPIÑA	389,68	91,2	389,7	0,11			X					X		25/12/2025	30/01/2026	36
61	61	11010414	KR 51A	CL 127	CL 127A	167430	ATABANZA	2267,19	215,3	2267,2	0,65			X					X		15/12/2025	30/01/2026	46
62	62	11010586	KR 54A	CL 122A	CL 124A	167135	RECREO DE LOS FRAIL	996,62	61,60	996,6	0,28	MD19		X					X		2/09/2025	30/01/2026	150
63	63	11010578	KR 54B	CL 122A	CL 124A	167136	RECREO DE LOS FRAIL	1517,46	164,00	1517,5	0,43	MD19		X					X		2/09/2025	30/01/2026	150
64	64	11010602	CL 122A	KR 54	KR 54A	167018	RECREO DE LOS FRAIL	410,93	68,80	410,9	0,12	MD19		X					X		2/09/2025	30/01/2026	150
65	65	11010587	CL 122A	KR 54A	KR 54B	167019	RECREO DE LOS FRAIL	379,47	64,40	379,5	0,11	MD19		X					X		2/09/2025	30/01/2026	150
66	66	11010613	CL 119	KR 70G	KR 71A	168611	NIZA SUR	1236,92	192,80	1236,9	0,35	MD19		X					X		8/07/2025	8/09/2025	62
67	67	11010621	CL 119	KR 70	KR 70C	168609	NIZA SUR	1214,83	190,50	1214,8	0,35	MD19		X					X		8/07/2025	8/09/2025	62
68	68	11005566	CL 146F	KR 75	KR 74	169503	CASABLANCA	786,24	145,40	786,2	0,22	MD19		X					X		9/06/2025	17/10/2025	130
69	69	11014376	CL 146F	KR 74	KR 73A	91011826	CASABLANCA	1242,26	133,30	1242,3	0,35	MD19		X					X		9/06/2025	17/10/2025	130
70	70	11005623	CL 146F	KR 73A	KR 73	169502	CASABLANCA	434,38	61,10	434,4	0,12	MD19		X					X		9/06/2025	17/10/2025	130
71	71	11005728	CL 146F	KR 73	KR 72C	169501	CASABLANCA	757,44	113,90	757,4	0,22	MD19		X					X		9/06/2025	17/10/2025	130
72	72	11005765	CL 146F	KR 72C	KR 72B	169500	CASABLANCA	187,95	27,10	188,0	0,05	MD19		X					X		9/06/2025	17/10/2025	130
SEGMENTO																							
73	73	11014399	CLL 146 A	CALLE 146	KR 81 BIS	91013890	SAN FRANCISCO	210,97	61,1	211,0	0,06			X	X		X				5/01/2026	30/01/2026	25
74	74	11014396	CLL 146 A	KR 81 BIS	KR 81 A	91013885	SAN FRANCISCO	149,55	47,3	149,6	0,04			X	X		X				5/01/2026	30/01/2026	25
75	75	11014397	CLL 146 A	KR 81 A	LINDERO	91013842	SAN FRANCISCO	277,28	57,9	277,3	0,08			X	X		X				5/01/2026	30/01/2026	25
76	76	11006116	CLL 133	KR 98 B	KR 99	53781	LA CHUCUA	253,26	45,50	136,0	0,04			X	X		X				5/01/2026	30/01/2026	25
77	77	11005418	CLL 145 A	CRA 90 A	CRA 91	171265	SUBA CENTRO	218,04	36,50	218,0	0,06			X	X		X		X		5/01/2026	30/01/2026	25
78	78	11005417	KR 90 A	CLL 145 A	LINDERO NORTE	171267	SUBA CENTRO	229,39	77,9	229,4	0,07			X	X		X		X		5/01/2026	30/01/2026	25
79	79	11005536	KR 90 A	CLL 145 A	LINDERO SUR	171266	SUBA CENTRO	203,85	67,3	203,9	0,06			X	X		X		X		5/01/2026	30/01/2026	25
80	80	11009644	CL 129	KR 56	KR 56A	515990	PRADO VERANIEGO	88,96	26,3	89,0	0,03			X			X				5/01/2026	30/01/2026	25
81	81	11009650	CL 129	AK 55	KR 55B	515930	PRADO VERANIEGO	183,92	52,1	183,9	0,05			X			X				5/01/2026	30/01/2026	25
82	82	11009653	CL 129	KR 55 B	KR 55B	515910	PRADO VERANIEGO	383,03	99,4	383,0	0,11			X			X				5/01/2026	30/01/2026	25

OBRA 460 DE 2023 - LOCALIDAD DE SUBA

CIV	GDC	MD19 (CM)	CONCRETO 3000	MR 45 (cm)	AR_BG estabcement+SOLID (cm)	AR_BG (cm)	AR_SBG (cm)	Geotextil sep.	Rajón incluye sello (cm)	Material selec (cm)	GEOCELDA	Geosintético	Prof. Intervención (m)	SARDINEL	DEMARCACION	OBSERVACIÓN	% EJECUTADO	VALOR EJECUTADO Y RECIBIDO	VALOR EN EJECUCIÓN PROGRAMADO	VALOR POR EJECUTAR	VALOR TOTAL
11006438		5		26			30	SI			20		81	-	-		20%	$ 159.361.197	$ 23.904.180	$ 637.444.788	$ 796.805.985,00
11011976		5		26			30	SI			20		81	-	-		20%	$ 112.427.865	$ 16.864.180	$ 449.711.459	$ 562.139.324,00
11011977		5		26			30	SI			20		81	-	-		45%	$ 195.960.879	$ 13.064.059	$ 239.507.741	$ 435.468.620,00
11006546		5		26			30	SI			20		81	-	-		10%	$ 43.971.662	$ 13.191.499	$ 395.744.958	$ 439.716.620,00
11011978		5		26			30	SI			20		81	-	-		10%	$ 46.249.956	$ 13.874.987	$ 416.249.604	$ 462.499.560,00
11006617		5		26			30	SI			20		81	-	-		10%	$ 55.937.753	$ 16.781.326	$ 503.439.775	$ 559.377.528,00
11011188	8	9						SI					17	-	-		82%	$ 90.528.648	$ 33.120.237	$ 19.872.142	$ 110.400.790,00
11004672	8	7				20	30	SI			20		85	-	-		3%	$ 8.593.437	$ 8.593.437	$ 277.854.464	$ 286.447.901,00
11005215		5		23			20	SI	40				88	-	-		80%	$ 294.466.497	$ 110.424.936	$ 73.616.624	$ 368.083.120,90
11008694	8	7				20		SI					35	-	-		3%	$ 9.137.250	$ 9.137.250	$ 295.437.742	$ 304.574.992,00
11010147	8	7				20		SI					35	-	-		3%	$ -	$ -	$ -	$ -
11004156													-	-	-		6%	$ 10.182.740	$ 5.091.370	$ 159.529.594	$ 169.712.334,00
11013439													-	-	-		6%	$ 9.224.302	$ 4.612.151	$ 144.514.062	$ 153.738.364,00
11004110													-	-	-		6%	$ 7.802.139	$ 3.901.069	$ 122.233.503	$ 130.035.642,00
11004080													-				10%	$ 19.399.056	$ 5.819.717	$ 174.591.507	$ 193.990.563,00
11005794													-				0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11003955	8	7											15				3%	$ 4.824.650	$ 4.824.650	$ 155.997.005	$ 160.821.655,00
11010612	8	7											15				3%	$ 795.738	$ 795.738	$ 25.728.850	$ 26.524.588,00
11009243													-				0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11009180													-				0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11009224													-				0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11009242													-				0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11013565													-				0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11008140													-				0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11008154													-				0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11008062													-				0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11007844													-				0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11007885													-				0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11006690													-				0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11006280													-				0%	$ -	$ -	$ 14.475.887	$ 14.475.887,00
11004054													-				0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11010114													-				0%	$ -	$ -	$ 19.067.072	$ 19.067.072,00
11004461													-			Página 4	0%	$ -	$ -	$ -	$ -

OBRA 460 DE 2023 - LOCALIDAD DE SUBA

CIV	GDC	MD19 (CM)	CONCRETO 3000	MR 45 (cm)	AR_BG estabcement+SOLID (cm)	AR_BG (cm)	AR_SBG (cm)	Geotextil sep.	Rajón incluye sello (cm)	Material selec (cm)	GEOCELDA	Geosintético	Prof. Intervención (m)	SARDINEL	DEMARCACION	OBSERVACIÓN	% EJECUTADO	VALOR EJECUTADO Y RECIBIDO	VALOR EN EJECUCIÓN PROGRAMADO	VALOR POR EJECUTAR	VALOR TOTAL
11005104													-				0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11014679													-				0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11005262	8	7				20							35				3%	$ 5.522.568	$ -	$ 178.563.034	$ 184.085.602,00
11007171													-				0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11007373													-				0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11007426													-				0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11006499													-				0%	$ -	$ -	$ 5.755.970	$ 5.755.970,00
11007528													-				0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11008687													-				0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11008803													-				0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11004800													-				0%	$ -	$ -	$ 16.946.134	$ 16.946.134,00
11004755													-				0%	$ -	$ -	$ 25.029.547	$ 25.029.547,00
11004799													-				0%	$ -	$ -	$ 33.636.385	$ 33.636.385,00
11007176													-				0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11007276													-				0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11009086													-				0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11009172													-				0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11009208													-				0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11008562													-				0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11008818													-				0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11014651													-				0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11008662													-				0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11008527													-				0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11008663													-				0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11004683													-				0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11005331													-			Página 5	3%	$ -	$ -	$ -	$ -

OBRA 460 DE 2023 - LOCALIDAD DE SUBA

CIV	GDC	MD19 (CM)	CONCRETO 3000	MR 45 (cm)	AR_BG estab cement+SOLID (cm)	AR_BG (cm)	AR_SBG (cm)	Geotextil sep.	Rajón incluye sello (cm)	Material selec (cm)	GEOCELDA	Geosintético	Prof. Intervención (m)	SARDINEL	DEMARCACION	OBSERVACIÓN	% EJECUTADO	VALOR EJECUTADO Y RECIBIDO	VALOR EN EJECUCIÓN PROGRAMADO	VALOR POR EJECUTAR	VALOR TOTAL
11003803													-				0%	$ -	$ -	$ 60.489.584	$ 60.489.584,00
11010414													-				0%	$ -	$ -	$ 1.866.842.247	$ 1.866.842.247,00
11010586	8	7						SI					15				3%	$ 8.535.416	$ 8.535.416	$ 275.978.452	$ 284.513.868,00
11010578	8	7						SI					15				3%	$ 12.463.057	$ 12.463.057	$ 402.972.163	$ 415.435.220,00
11010602	8	7						SI					15				3%	$ 6.148.720	$ 6.148.720	$ 198.808.609	$ 204.957.329,00
11010587	8	7				20		SI					35				3%	$ 3.828.729	$ 3.828.729	$ 123.795.561	$ 127.624.290,00
11010613	7	7				20	20	SI	40				94				50%	$ 347.368.175	$ 20.842.091	$ 347.368.175	$ 694.736.350,00
11010621	7	7				20	20	SI	40				94				6%	$ -	$ -	$ -	$ -
11005566	8	8				20		SI					36				18%	$ 82.866.655	$ 82.866.655	$ 377.503.649	$ 460.370.303,18
11014376	8	8				20		SI					36				25%	$ 119.758.014	$ 86.225.770	$ 359.274.043	$ 479.032.056,90
11005623	8	8				20	30	SI			20		86				57%	$ 173.909.985	$ 137.297.357	$ 131.195.252	$ 305.105.236,97
11005728	8	8				20	30	SI			20		86				70%	$ 373.248.476	$ 239.945.449	$ 159.963.632	$ 533.212.108,00
11005765	8	8				20	30	SI			20		86				70%	$ 145.320.663	$ 93.420.426	$ 62.280.284	$ 207.600.947,00
)S EXCLUIDOS																					
11014399													-	-	-		0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11014396													-	-	-		0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11014397													-	-	-		0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11006116													-	-	-		0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11005418													-				0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11005417													-				0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11005536													-				0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11009644													-				0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11009650													-				0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11009653													-				0%	$ -	$ -	$ -	$ -

ANEXO 4: BITACORAS

equipo 1 retroexcavadora

actividad

se continua con excavación mecánica y manual para traslado red gas 4" personal 1 residente 1 inspector 1 SST 1 Topografa 2-cadenero 1 operador 1 oficial 3 oyudantes 2 boa/ civil 1100572828 — —

ETHELBERTO FRANCO G inspector interv Maria A

Nota#18 martes 01/07/2025 civil 1100572828

clima lluvioso ipermitente durante el día

equipo 2 retros

actividad excavación manual para traslado red gas 4" y excavacion mecanica parcial y cargue —

COPY PAC

Powered by CamScanner

de bolquetas personal 1 residente 1 SST 1 inspector
1 oficial 3 ayudantes 2 boad 2 operadores 1 topografo
2 al ETHELBERTO FRANCO 6 inspecto inter V

Maria AC

NOTA #18 miercoles 02/07/2025
clima soleado mañana
tarde nublada
equipo 2 retros
actividad CIV 11005728
excavacion manual para continuar traslado
red gas de 4" y excavacion mecanica para 1 al
personal 1 residente 1 SST 1 Topografo C.L=2 1 inspector
1 oficial 4 oyudantes 2 operadores 2 boad
ETHELBERTO FRANCO 6 inspector inter V

Maria AC

NOTA #19 Jueves 03/07/2025
clima soleada mañana
tarde soleada
equipo 2 retros
ACTIVIDAD CIV 11005728 sin actividad CIV 11005623
excavacion manual y mecanica para traslado y profundi
zar manguera red gas personal 1 residente 1 Topografo
1 SST 1 inspector C.L=2 1 oficial 3 oyudantes 2 boad
2 operadores ETHELBERTO FRANCO 6 inspector inter V

Maria AC

NOTA #20 viernes 04/07/2025
clima soleado durante el dia
equipo NO
ACTIVIDA 11005623
excavacion manual para traslado manguera 4" gas
CIV 11005728 SIN actividad personal 1 residente 1 SST
1 inspector 1 topografo 1 oficial 2 oyudantes 2 boad
ETHELBERTO FRANCO 6 inspector inter V.

Maria AC

NOTA #21 sabado 05/07/2025
clima soleado

PAC

Powered by CamScanner

equipo NO
ACTIVIDAD se continua con excavacion manual para profundizar manguera gaz 4" personal 2 boal 2 oyudantes 1 residente 1 SST 1 inspector civ 11005623 civ 11005728 sin activid
ETHELBERTO FRANCO G inspector interv

Maria AC

nota #22 lunes 07/07/2025
clima soleado
equipo NO
obra sin actividad
ETHELBERTO FRANCO G inspector interventoria

Maria AC

Nota #23 martes 08/07/2025 civ 11005623
clima soleado
equipo NO
Actividad:
se continua con excavacion manual red de gaz 4" para profundizar manguera:
personal 1 residente 2 boal 2 oyudantes -
NOTA se le recomienda al contratista el tema de postes luz y teletonos que estan al borde de los excavaciones tanto manual como mecanica para evitar accidentes especialmente el que se encuentra frente al PK 0+255 costado sur ETHELBERTO FRANCO G inspector interv

Maria AC

nota #24 miercoles 09/07/2025
clima soleado en la mañana
Tarde nublada con lloviznas ipermitentes
equipo retro
Actividad:
cargue de bolquetas de excavacion acumulada civ 11005623 y se continua con excavacion manual para profundizar manguera gaz 4" civ 11005728 persona 1 residente 1 topografo 1 inspector 1 ambiental 2 oyudantes 1 operador 2 boal

PAC

Powered by CamScanner

ETHELBERTO FRANCO G inspector inter V

Nota #25 Jueves 10/07/2025 CIV N0005728
clima soleado durante el dia
equi retro CAT 1.30 y compactador
Actividad:
se hace perfilada excavacion parcial y cargue de bolquetas y en el civ0005623 se continua con la profundizada . de manguera gor 4" se evidencia poca rendimiento y solo 2 personas en labor llego un Tercera persona sobre los 10:00 AM — —
ETHELBERTO FRANCO G inspector inter V
Nota ubo rotura manguera gor 4" en el momento del cargue de la excavacion en el Km 4+70 aprox costado sur

Nota #26 viernes 11/07/2025
clima en la mañana nublado
Tarde nubla llovienos 2:00 pm A 2:15 PM
equipo retro CAT 312 y compactador
Actividad:
civ 0005728 se continua con excavacion mecanica parcial y cargue de bolquetas se recibe subrasante TC por parte de interventoria del Km 3+95 al Km 4+25 —
ETHELBERTO FRANCO G inspector inter V

Nota #27 sabado 12/07/2025 civ 0005728
clima soleado
equipo NO
Actividad:
chequeo de niveles con hilos manual para nivelacion de la subrasante personal 1 residente 1 SST — 2 boal 3 oyudantes 1 operador 1 oficial —
ETHELBERTO FRANCO G inspector inter V

Nota #28 Lunes 14/07/2025

clima soleado durante el día
equipo si retro CAT
Actividad:
CIV 11005728 se continua con excavación mecanica parcial personal 1 residente 1 SST 1 operador / 2 boad 1 oficial 3 oyudantes ETHELBERTO FRANCO G inspector
Maria AC

NOTA #29- martes 15/07/2025
clima soleado durante el día
equipo retro CAT 1 compactador
actividad:
se hace excavación en el civ 11005765 parcial y se compacta la subrasante se evidencia de la llegada de material pca — —
ETHELBERTO FRANCO G inspector interv
Maria AC

NOT #30 miercoles 16/07/2025
clima soleado durante el día
equipo retro CAT y compactador
Actividad civ 11005728:
se comienza con instalación de geotextil y geoceldo y lleno con material pca y en el civ 11005623 se comienza excavación parcial nota se le informa al contratista hacer la reparación de la red de energía y que la retro dañó uno de los ductos ETHELBERTO FRANCO G inspector interv
Maria AC

Nota #31 Jueves 17/07/2025
clima soleado durante el día
equipo retr compactador mini cargador
Actividad:
civ 11005728 se continua con excavación mecanica parcial y instalacion geotextil y geoceldo y lleno con material pca y se compacta nota a este material pca le hace falta que sea humectado ETHELBERTO FRANCO G inspector
Maria AC

PAC

CamScanner
Powered by

NOTA #32 viernes 18/07/2025
clima Soleado durante el día
equipo retro CAT compactador minicargador
Actividad:
se hace excavación parcial y mecanica se compacta subrasante se continua con la instalacion de geotextil y geoselda y lleno con material pca parcial y cargue con bolquetas ETHELBERTO FRANCO G insp interv
Maria AC

NOTA #33 Sabado 19/07/2025
clima soleado
Actividad excavación mecanica parcial y compactación de la subrasante con bibio compactador
ETHELBERTO FRANCO G inspect interv
Maria AC

NOTA #34 lunes 21/07/2025
clima Soleado durante el dia
equipo retro CAT compactador y minicargador
Actividad:
excavación parcial y mecanica civ 1100572-8 y instalación geotextil y geoselda extendida a lleno de material pca con minicargador y retro y sellado con el compactador
ETHELBERTO FRANCO G inspect interv
Maria AC

NOTA #35 martes 22/07/2025
clima nublado en mañana tarde soleada
equipo retro CAT compactador retro pequeña 2 minicargadores
Actividad:
civ 1100562-3 se continua con excavación mecanica y cargue de bolquetas parcial civ 1100572-8 instalación geotextil y geoselda parcial y lleno con material pca ETHELBERTO FRANCO G inspector interv
Maria AC

NOTA #36 miercoles 23/07/2025
clima soleado durante el dia
equipo 1 retro 1 minicargador
PAC

CamScanner
Powered by

Actividad:
ciu 11005726 se continua con nivelación pca
equipo retro JCB y minicargador cotarpilar per-
sonal 2 residentes 1 inspector 1 SST 2 operadores
2 board 1 oficial 3 ayudantes —
ETHELBENTO FRANCO G inspector interv

Nota #36
Jueves 24/07/2025
clima soleado durante el día
equipo Retro JCB
Actividad:
excavación tallo ciu 11005765 y excavación manual
sumidero csur ciu 11005623 se continua con excavación
mecánica parcial y el mismo personal día anterior
ETHELBENTO FRANCO G inspector interv

Nota #37
viernes 25/07/2025
clima soleado durante el día
equipo 1 retro 1 minicargador
Actividad:
ciu 11005765 se continua excavación manual
Tramo pluvial sumidero y ciu 11005728 -
nivelación pca ETHELBENTO FRANCO G inspector interv

Nota #38
sabado 26/07/2025
clima soleado
equipo retro JCB
Actividad:
ciu 11005728 se continua con excavacion manual
tramo pluvial sumidero ciu 11005623 excavacion-
mecanica parcial ETHELBENTO FRANCO G inspector interv

Nota #39
lunes 28/07/2025
clima soleado
Actividad:
se comienza excavacion para Tramo sumidero -
ciu 11005765 parcial personal 1 residente 1 topografo

1 inspector 2 operadores 1 oficial 3 oyudantes 2 boad
ETHELBERTO FRANCO G inspector INTEV

Nota 1 martes 29/07/2025
clima soleado
equipo 1 minicargador 1 retro 1 compactador —
personal 2 residentes 1 SST 1 Topografo 1 inspector
3 operadores 1 oficial 3 oyudantes 2 boad —
Actividad:
Lleno de Rajón en fondo y colocación geodren
y colocación Triturado ETHELBERTO FRANCO G inspector INTEV

Nota 1 miercoles 30/07/2025
clima soleado
equipo 1 minicargador 1 compactador 1 retro
personal 1 residente 1 inspector 1 Topografo 1 SST
1 ambiental 3 operadores 1 oficial 3 oyudantes
Actividad:
instalacion tuveria matator 12" con su cama en Triturado
y ataque y lleno civ 11005765 en el civ 11005623
se continua con excavación mecanica parcial —
ETHELBERTO FRANCO G inspector INTEV

Nota 2 Jueves 31/07/2025
clima soleado
equipo RETRO JCB-3-X-C y compactador
personal 1 Residente 1 inspector 1 SST 2 operadores —
1 oficial 1 oyudante 2 boad 1 residente aux —
Actividad:
excavacion mecanica civ 11005765 y civ 11005623
Nota rotura tubo agua potable
ETHELBERTO FRANCO G inspector INTEV

Nota 3 Viernes 01/08/2025
clima soleado
maquinaria No

Powered by CamScanner

Nota # 1 11/07/2025 viernes
clima soleado
equipo NO
personal:
1 inspector 3 oyudante 1 conductor
Actividad instalacion PMT parcial
ETIMELBERTO FRAUCO & inspector INTEV
Maria

NOTA # 2 lunes 14/07/2025
clima soleado
equipo NO
actividad:
se continua con instolacion del PMT
personal 1 inspector 3 oyudantes 1
conducior ETIMELBERTO FRAUCO & inspc inte
ventoría
Maria

NOTA # 3 martes 15/07/2025
ACTIVIDAD NO
clima soleado
equipo NO
NOTA desde el dia 15 de fecha ya —
mencionada hasta el dia sobado 19 de julio
obra sin labor ETIMELBERTO FRAUCO &
INSPECT INTEV
Maria

Nota # 4 23 07 2025
Clima parcialmente nublado
personal: 2 trafico 1 operador 2 oficiales
2 ayudantes
descripcon: se da inicio ala demolicion
de pavimento existente sin el previo
cumplimiento ala lista de chequeo preliminar
esto teniendo en cuenta que

Powered by CamScanner

riloto

no se ha finalizado con las actas de vecindad, no se tiene campamento ni baño no se evidencia barricadas y valla movil instaladas y el cerramiento perimetral incompleto adicional a esto el personal en obra no tienen carnet de identificación, por lo cual las actividades realizadas no estan autorizadas por la interventoria.

Maria AC

Nota #5 Jueves 24/07/2025
clima soleado durante el dia
maquina o equipo minicargador
Actividad:
se inicio con demolición de placas en concreto existentes en mal estado personal 1 residente 2 oficiales 2 oyudantes 1 operador 2 boal y servicio de bachar y carretillero
ETHELBERTO FRANCO G inspector inte y

Maria AC

Nota # 6 viernes 25/07/2025
clima soleado
equipo RETRO 25 sonsui 1 minicargador
personal 1 residente 1 oficial 3 oyudantes 2 boal 2 operadores
Actividad:
demolición placa concreto existente y excavacion mecanica!
ETHELBERTO FRANCO G inspector inte y

Maria AC

Nota # 7 sabado 26/07/2025
clima soleado

equipo retro sontui 75 y minicargador
personal 1 oficial 3 ayudantes 2-
operadores 1 residente 2 boal —
ACTIVIDAD:
instalacion geotextil y material reciclado
parcial CIV 11011477
ETHELBERTO FRANCO G inspector INTEVI
Maria AC

NOTA #8
lunes 28/07/2025
clima soleado
equipo RETRO SONTUI 75 y minicargador
personal 1 oficial 3 ayudantes 2 —
operadores 2 boal
ACTIVIDAD:
CIV 11011477 instalacion geotextil y —
material reciclado y excavacion mecanica
parcial ETHELBERTO FRANCO G inspector INTEVI
Maria AC

NOTA #9
martes 29/07/2025
clima soleado
equipo retro sontui 75 y minicargador —
personal mismo del dia anterior —
ACTIVIDAD:
se continua con excavación parcial
y colocacion geotextil y lleno con —
material reciclado — —
ETHELBERTO FRANCO G
Maria AC

NOTA #10
miercoles 30/07/2025
clima soleado
equipo retro y minicargador
personal 1 topo 1 cadenero 1 oficial
3 ayudantes 2 operadores 1 boal —
Actividad:
se continua con excavacion mecanica

Powered by CamScanner

porcial y colocacion geotextil y lleno
con material resiclado — —
ETHELBERTO FRANCO 6 NOTA daño Red goz

NOTA # 11 Jueves 31/07/2025
clima soleado
equipo retrosanmi 75 y minicargador
personal 1 Topografo 1 cadete 1 oficial —
2 ayudantes 2 operadores 2 boal —
Actividad:
excavacion mecanica y cargue instalacion
geotextil y lleno en material resiclado
ETHELBERTO FRANCO 6 inspector inter 4

NOTA # 12 Viernes 1/08/2025
clima soleado
equipo retro sanmi 75 y minicargador
Personal 1 Topografo 1 cadete 1 oficial 3 ayudante
2 boal 1 residente 1 SST 1 inspector 2 operador
Actividad excavacion mecanica porcial colo-
cacion geotextil y resiclado porcial
ETHELBERTO FRANCO 6 inspector inter 4

NOTA # 13 Sabado 2/08/2025
clima soleado
equipo retr sanmi 75
personal 1 oficial 3 ayudantes 1 topogra
fo un cadenero 1 1operador 2 boal — —
Actividad:
excavacion mecanica porcial y cargue —
ETHELBERTO FRANCO 6

NOTA # 14 Lunes 04/08/2025
clima soleado
equipo retro y minicargador

Powered by CamScanner

NOTA #1

viernes 27/06/2025
clima mañana con lluvias
tarde nublado
equipo NO
actividad instalación pmt y se
comienza cierre con rollitos y
polisombra ETHELBERTO FRANCO G
inspector inte v
CamilaDiaz Maria M

NOTA #2 sabado 28/06/2025 civil 11005215
clima nublado
equipo NO
actividad:
Se continua con la instalación de
rollitos y polisombra parcial
ETHELBERTO FRANCO G inspector inte v
CamilaDiaz Maria M

NOTA #3 martes 01/07/2025
clima:
lluvias ligeras durante el día
equipo NO
actividad:

Norma

Se continua con instalacion malla
y polisombra para completar cierre obra
ETHELBERTO FRANCO 6 inspector
interv Camilo Bedoya Maria R
nota 4 miercoles 02/07/2025
clima soleado mañana
tarde nublada
equipo 1 retro
actividad:
Se continua con excavacion
mecanica parcial:
ETHELBERTO FRANCO 6 inspector interv
Camilo Bedoya Maria R
nota 5 Jueves 03/07/2025 CIU 11005215
clima soleado en el dia
equipo retro 1 SE 75 SHANTUI
Actividad se continua con ex
cavacion mecanica parcial personal
1 boal 1 residente 1 inspector
Boyudantes ETHELBERTO FRANCO 6
Camilo Bedoya Maria R
nota 6 viernes 04/07/2025

Tibaújes

clima:
soleado durante el día
equipo retro SE-75
actividad se continua con la ex
cavación mecanica parcial se
evidencia algunos domiciliarios rotos
por la maquina que esta en ex
cavacion y 2 postes luz en pe
ligro de caer x la excavación se
recomienda asegurarlos para evitar
un accidente: tambien rotura gas 3/4
ETHELBERTO FRANCO GUZMAN inspec

Camilo Diaz R Maria AC

nota #7 sabado 05/07/2025 cli4 11005215
clima soleado
equipo retro SE 75
actividad:
se sigue con excavacion mecanica
y arreglo de domiciliarios residen
ales que acabaron personal
3 ayudantes 1 operador 1 boal
nota rotura Tubo agua potable 3"

Norma

ETHELBERTO FRANCO G inspector inter

Nota # 8 lunes 07/07/2025
clima soleado durante el día
equipo retro SE 75
actividad se continua con excavación mecanica y Tuberias residuales ETHELBERTO FRANCO G
inspector inter v

Nota # 9 martes 08/07/2025 cu u000s215
clima soleado mañana
tarde soleada Horarios de 330 A 4:00 pm
equipo NO
actividad se continuo con excavación mecanica paralel y arreglo de domiciliarios residuales paralel
ETHELBERTO FRANCO G inspector interv

Nota # 10 miercoles 09/07/2025
clima soleado en la mañana tarde soleada Horarios de 330 pm a 4:0 pm

Norma

C.U 11005215

equipo retro excavadora
Actividad:
Se continua con la instalación de geotex
til y material resiclado para esta-
bilizar y arreglo domiciliarios resi-
duales y instalacion 1 Tubo de 8" no
valor red risidual del contratiista per
sonal 2 C.L 3 ayudantes 1 inspector
1 boal ETHELBERTO FRANCO O inspecto
interv

Nota
#11 Jueves 10/07/2025
clima soleado durante el dia
equipo retro CAT 130 y compactador
Actividad
se hace excavacion parcial via
y se inicio con material B200 para
sello parcial personal 1 inspector
C.L=2 1 boal 1 operador 3 ayudantes
1 boal ETHELBERTO FRANCO O inspector interv
Nota: se le informa al contratista que
los domiciliarios residuales que fueron

reparadas en 6" se debe hacer construcción de cárcamo

Maria AC

Nota # 12 Viernes 11/07/2025

Clima soleado todo el día

Equipos retro shintau 6E75, vibro compactador JCB y minicargador New Holland.

Actividades:

Se continua extendiendo Geotextil, se continua extendiendo material de mejoramiento y se continua extendiendo material para sello de rasante (B-200)

Personal: 2 cadeneros, 3 ayudantes, 1 maestro, 2 operadores

1 boal. Dario Reyes Topo interv

Maria AC

Nota # 13 Sabado 12/07/2025

Clima soleado en la mañana

Equipos: Vibro compactador JCB y minicargador New Holland

Actividades: Se continúa extendiendo material para sello (B-200), se construyen 3 cárcamos, predios 103-16, 103-10 y 103-06.

Personal: 2 cadeneros, 1 maestro, 3 ayudantes, 2 operadores

1 boal. Dario Reyes Topo interv

Maria AC

Norma

Scanned with CamScanner

Tibabuyes CIV 11005215

Día #14 Lunes 14/07/2025

Clima: Soleado todo el día

Equipos: Vibro compactador JCB y minicargador New Holland

Actividades: Se termina de extender Geotextil, se termina de extender material de mejoramiento, se termina de extender material para sello (B-200), se continua extendiendo subbase Granular clase A.

Personal: 2 cadeneros, 1 maestro, 4 ayudantes, 1 operador y 1 bodl. Dario Reyes Topógrafo interventoría

CamiloEDiazR Maria M

Día #15 Martes 15/07/2025

Clima: Soleado en la mañana y leve lluvia en la tarde

Equipos: Vibro compactador JCB, minicargador New Holland

Actividades: Se termina de extender y cescar la subbase granular clase A, se recnivela el cargue de un pozo, se empieza a instalar bádinel.

Personal: 2 cadeneros, 1 maestro, 5 ayudantes, 1 operador, 1 bodl. Dario Reyes Topógrafo interventoría.

CamiloEDiazR Maria M

Norma

Scanned with CamScanner

Nota # 16 Miercoles 16/07/2025

Clima: Sol durante el día.

Equipos: No hay maquinaria.

Actividades: Se continúa con la instalación del sostinel, durante la excavación se rompio una red de Varri, en la red de Varri realizo la reparación.

Personal: 2 cadeneros, 1 maestro, 4 ayudantes, 1 boal

Dario Reyes Topo interv

Camilo Pedraza Maria

Nota # 17 Jueves 17/07/2025

Tiempo: Sol durante el día.

Equipos: No hay maquinaria

Actividades: Se continua con la instalación del sostinel.

Personal: 2 cadeneros, 1 maestro, 3 ayudantes, 1 boal.

Dario Reyes Topo interv

Camilo Pedraza Maria

Nota #18 Viernes 18/07/2025

Tiempo: Sol Todo el día

Equipos:

Actividades: Se continua con la instalación de solarnet, se define en comite instalar bajo rampa y no cerrar el acceso vehicular a la vahia que esta en la zona verde.

Personal: 2 cadeneros, 1 maestro, 3 ayudantes, 1 boal

Dario Reyes Topo interv ; se acordo instalar 1 sumidero.

CamiloEDiazR

Maria MC

Nota#19 sábado 19/07/2025

Tiempo: Sol en la mañana

Equipos:

Actividades: Se continua con la instalacion de solarnet

Personal: 2 cadeneros, 1 maestro, 3 ayudantes, 1 boal

Dario Reyes Topo interv

CamiloEDiazR Maria MC

Norma

Nota # 20 Lunes 21/07/2025

Tiempo: Sol Todo el día

Equipos:

Actividades: Se continua con la instalación de sardinel, se realiza limpieza de un pozo sanitario en el cruce de la carrera 103C con calle 137Bis, esto para inspeccionarlo. Se realiza una cuvion para definir a donde se puede conectar el sumidero que se planea construir en este cruce.

Mario Reyes Topo Interv Camilo Bedoya Maria AL

Nota #21 Martes 22/07/2025

Tiempo: llovia leve en la tarde

Equipos: No

Actividades: Se continua con la instalación de Sardinel, se plantea la instalacion del sumidero el cual conectara con el pozo sanitario ubicado en el croce entre la carrera 103C con calle 137Bis

Eric Poveda Topo Interv

Camilo Bedoya Maria AL

Norma

Scanned with CamScanner

Nota #22 Miercoles 23/07/2025

Tiempo: Sol Todo el dia

Equipos: No

Actividades: Se continua con la instalacion de sardinel y se define la ubicación dd Sumidero por parte de la Topografia del contratista.

Personal: 2 Cadeneros, 2 Oficiales, 2 Ayudante, 1 bodl

Eric Poveda Topo Interv

CampoDiazR

Nota #23 Jueves 24/07/2025

Tiempo: Sol Todo el dia

Equipos: No

Actividades: Se continua con la instalacion de sardinel

Personal: 2 cadeneros, 2 oficiales, 2 Ayudantes, 1 bodl

Eric Poveda Topo Interv

CampoDiazR

Scanned with CamScanner

Nota #25 Viernes 25/07/2025

Tiempo: Sol Todo el dia

Equipos:

Actividades: Se continua con la instalación de sardinele, y se realizan labores de limpieza

Personal: 2 Oficiales, 2 Ayudantes, 1 boal

Eric Poveda Topo Intero

CamiloEDiazR Maria

Nota #25 Sabado 26/07/2025

Tiempo: Soleado

Equipo:

Actividades: Se continua con la instalacion de sardinel

Personal: 2 oficiales, 2 Ayudantes, 1 boal

Eric Poveda Topo Intero

CamiloEDiazR Maria

Nota #26 Lunes 28/07/2025

Tiempo: Soleado Equipo: No

Actividad: Se inician Excavaciones para la Instalacion del Sumidero y Tuberia

Eric Poveda Topo Intero

CamiloEDiazR Maria

C D E F G HI JK L M NÑ O PQ R S T UV WX YZ

Scanned with CamScanner

Nota #27 Martes 29/07/2025

Tiempo: Soleado Todo el dia

Equipo: No

Actividades: Se continua la excavación manual para la instalacion del sumidero y la Tuberia

Personal: 1 Topo, 1 cadenero, 2 Oficiales, 2 Ayudtes, 1 bod

Eric Poveda Topo Interv

CamiloEDIGER

Nota #28 Miercoles 30/07/2025

Tiempo:

Equipo:

Actividades: Se continua con la excabacion manual para el sumidero y se instala la tuberia

Personal: 2 Oficiales, 2 Ayudantes, 1 bod

Eric Poveda Topo Interv

CamiloEDIGER

Nota #29 Jueves 31/07/2025

Tiempo

Equipo

Actividades: Se rellena y compacta la excavacion de la Tuberia del sumidero. Se realizan actividades de limpieza

Eric Poveda Topo Interv

CamiloEDIGER

Scanned with CamScanner

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE CONSERVACION: 1010-2024

OBJETO: Ejecutar a precios unitarios las actividades para la conservacion de la malla vial local e intermedia, y espacio Publico (lote2) en la localidad de Suba en la Ciudad de Bogota DC y las demas actividado que se detallen en el anexo tecnico.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 084-2025

OBJETO: Interventoria Integral para ejecutar a precios unitarios las actividades para la conservacion de la malla vial e intermedia, puentes y espacio publico (lote1 y 2) en la localidad de suba en la ciudad de Bogota D.C. y las demas actividades que se detallan en el anexo tecnico lote2.

CIVs: 1100415, 11013489, 1100411O y 1100 4080 Poa.

FIRMAS AUTORIZADAS.

CONTRATISTA:

Ing. Mauricio Romero → Director de obra.
Ing Javier Agudelo → Residente de obra.
Ing Camilo Diaz → Residente de obra.
Ing Liz Murillo → Residente Ambiental.
Ing Paul Rangel → Residente SST.
T.S Gladys Becerra → Residente Social.

CamiloEDiazR

INTERVENTORIA:

Ing Christian Barrera → Director Interventoria →
Ing Maria Cardenas → Residente Interventoria →
Ing. Christian Rodriguez → Residente Ambiental
Ing Angie Toro → Residente SST
P.S Angie Henao → Residente Social

Maria AC

Nota: Firmas que no se encuentren autorizadas deben ser soportadas por el residente.

Scanned with CamScanner

Nota # 1 Jueves / 24 / 07 / 2025 /
Clima: Soleado
Equipo & NO
Actividad: Instalacion de señalización de PMT. Michael Sierra cadenero 1 interventoria
CamiloEDiazR Maria M

Nota # 2 Viernes / 25 / 07 / 25 /
Clima: Soleado
Equipo: NO
Actividad: Se continua con instalacion de señaleacion de PMT — o — o —
Michael Sierra cadenero # 1 interventoría
CamiloEDiazR Maria M

Nota #3 Sabado / 26 / 07 / 25 /
Clima: Soleado
Equipo: No
Actividad: No se reporta Actividad
Eric Poveda Topo Interv
CamiloEDiazR Maria M

Nota # 4 Lunes / 28 / 07 / 25 /
Clima: Soleado
Equipo: No
Actividad: Instalacion de postes para el cerramiento
Personal: 1 Oficial, 1 Ayudante
Eric Poveda Topo Interv
CamiloEDiazR Maria M

Nota # 5 Martes / 29 / 07 / 25 /
Clima: Soleado
Equipo: No
Actividad: Se continua la instalación de postes para el cerramiento
Personal: 1 Oficial, 1 Ayudante
CamiloEDiazR Maria M

Scanned with CamScanner

Nota # 6 Miercoles / 30/08/25/
Clima: Soleado
Equipo: No
Actividad: No se reporta actividades
Eric Poveda Topo Interv
CamiloEDiazR Maria M

Nota # 7 Jueves /31/07/25/
Clima: Soleado
Equipo: No
Actividad: Se continua con la instalación de postes para el cerramiento e instalacion de Polisombra
Personal: 1 Oficial, 1 Ayudante
Eric Poveda Topo Interv
CamiloEDiazR Maria M

Nota #8 Viernes /01/08/25/
Clima: Soleado
Equipo: No
Actividad: Se continua con la instalación de la polisombra y se realizan apiques manuales
Personal: 1 Oficial, 1 Ayudante
Eric Poveda Topo Interv
CamiloEDiazR Maria M

Nota #9 Sabado /02/08/25/
clima: Soleado
Equipo: No
Actividad: Se continuan realizando apiques manuales
Personal: 1 Oficial, 1 Ayudante
Eric Poveda Topo Interv
CamiloEDiazR Maria M

Scanned with CamScanner

equipo NO
obra sin actividad:
ETHELBERTO FRANCO G inspector inteli
Maria AC

nota #4 sabado 28/06/2025
clima nublado
equipo NO
obra sin actividad
ETHELBERTO FRANCO G inspector inteli
Maria AC

nota #5 martes 01/07/2025
clima:
llovizna intermitentes durante el día
equipo NO
obra sin actividad
ETHELBERTO FRANCO G inspector inteli
Maria AC

nota #6 miercoles 02/07/2025
clima: r
mañana soleada
tarde soleada
obra sin actividad ETHELBERTO FRANCO G
Maria AC

NOTA #7

Jueves 03/07/2025 CIV 11011188

clima

soleado durante el día

equipo NO

obra sin actividad:

ETHELBERTO FRANCO G inspector inte y

MariaAL

NOTA #8

viernes 04/07/2025

clima soleado durante el día

equipo NO

Actividad NO

obra sin labor

ETHELBERTO FRANCO G inspector inte y

MariaAL

NOTA #9

sabado 05/07/2025

clima:

soleado durante el día

equipo NO

NOTA: obra sin labor

ETHELBERTO FRANCO G inspector inte y

MariaAL

NOTA 10

lunes 07/07/2025

Norma

Scanned with CamScanner

clima soleado durante el día
equipo no en horas de la tarde
actividad:
se comienza con retro JCB a de-
montar tableta prefabricada existente
personal 1 operador 1 inspector
ETHELBERTO FRANCO G inspector
INTOUR
Maria M
NOTA # 11 PIEDRAS 08/07/2025 C.I. 11011188
clima soleado mañana
Tarde soleada Horizontes de 330 PM a 4.00 PM
equipo RETRO JCB 3-C-X
ACTIVIDAD:
cargue de escombros por c/u -
ETHELBERTO FRANCO G inspector INTOUR
Maria AC
NOTA # 12 miercoles 09/07/2025 POTOSI
clima soleado en la mañana Tarde
Soleada Horizontes de 330 PM A 4.00 PM
equipo retro JCB-3-C-X
ACTIVIDAD:
se continua con el cargue de escombros
ETHELBERTO FRANCES, inspector INTOUR
Maria AC

potosi

:13 Jueves 10/07/2025 CIV 11011188
clima soleado durante el día
equipo retro JCB-3-cx
actividad NO
se evidencia bajo rendimiento
Maria

Nota #14 Potosí
Viernes / 11/07/2025 CIV 11011188
Clima: Completamente nublado
Equipo: Retro J.C.B.-3-cx
Actividad: Se dejan niveles para excavación
Michael Sierra cadenero 1 interventoria
Maria

Potosí
Nota #15 Sabado / 12/07/2025 CIV 11011188
Clima: parcialmente nublado
Equipo: Retro J.C.B-3 cx
Actividad: no se realizaron Actividades como tal

Michael Sierra Cadenero #1 interventoria
Maria

Norma

Potosí

Nota #16 lunes / 14 / 07 / 2025 CIV 11011188

Clima: soleado

Equipo: JBB - 3cx

Actividad: se evidencio personal pero no actividad como tal

Michael Sierra cadenero #1 interventoria

Maria MC

Potosí

Nota #17 Martes / 15 / 07 / 2025 CIV 11011188

Clima: frio y nublado

Equipo: Retro JCB - 3cx

Actividad: se descarga bordillo se hace cerramiento

Maria MC

Michael Sierra cadenero #1 interventoria

Potosí

Nota #18 Miercoles / 16 / 07 / 2025 CIV 11011188

Clima: total mente nublado

Equipo: Retro JCB - 3cx

Actividad: Excavacion manual para Bordillo

Michael Sierra cadenero #1 interventoria

Maria MC

Norma

Scanned with CamScanner

Potosí

Nota #19 Jueves / 17/07/2025 CIV 11011188
Clima: Soleado en la mañana y en la tarde nublado
Equipo: Retro JCB 3CX
Actividad: se hace corte de lozeta con pulidora
Michael Sierra Cadenero #1 inteventoria
Maria

Nota #20 Viernes / 18/07/2025 CIV 11011188
Clima: Nublado
Equipo: Retro JCB 3CX
Actividad: Retiro de lozeta cortada con polidora y perfilado
Maria
Michael Sierra cadenero #1 intaventoria

Nota #21 Sabado / 19/07/2025 CIV 11011188
Clima: Soleado y Nublado
Equipo: Retro JCB 3XC
Actividad: perfilado de bordillo en excavación
Michael Sierra cadenero1 inteventoria
Maria

Norma

Nota #22 lunes 21/07 2025 CIV MD11188
Clima: Soleado y lloviona en la tarde
Equipo: no hay
Actividad: Se demolieron 30centimetros mas de loceta y se acopia
Michael Sierra cadenero 1 interventoria
Maria

Nota #23 Martes/22/07/2025/
Se evidencia muy poca Actividad en el frente de trabajo
Michael Sierra cadenero #1 interventoria
Maria

Nota# 24 Miercoles 23 07 2025
Clima: parcialmente nublado
Equipo: no hay
Actividad: no se evidencia Actividades
Michael Sierra cadenero #1 interventoria
Maria

Nota# 25 Jueves 24 07 2025
Clima nublado y soleado en la tarde
Equipo no hay

Norma

Scanned with CamScanner

Actividad: Se hace instalación de Bordillo costado oriental. Michael Sierra cadenero #1 interventoria

Nota #26 Viernes / 25 / 07 / 2025 /

Clima: Soleado

Equipo: NO

Actividad: Se libera bordillo y bajo rampa Michael Sierra cadenero 1 interventoria

Nota 27 Sabado / 26 / 07 / 2025 /

Clima: nublado

Equipo: NO

Actividad: Se hace traqueo de bordillo y se resibe viaje de base Michael Sierra cadenero #1 interventoria

Nota #28 Lunes / 28 / 07 / 2025 /

Clima: Soleado

Equipo: NO

Actividad: Se embequilla bordillo costado oriental y se adecuan lozetas existentes. Michael Sierra cadenero, interventoria

Nota #29

Martes / 29 / 07 / 2025 /
Clima: parcialmente nublado
Equipo: New Holland L220
Actividad: Se estiende base granular. Michael Sierra cadenero #1 interventoria

Maria AC

Nota #30

Miercoles / 30 / 07 / 2025 /
Clima: Soleado
Equipo: new Holland L220, DYNAPAC HCO 53645
Actividad: Se evidencia que la topografia deja niveles para puesta de bordillo costado norte. Michael Sierra cadenero #1 interventoria

Maria AC

Nota # 31

Jueves / 31 / 07 / 2025 /
Clima: bastante Soleado
Equipo: new Holland L220, DYNAPAC HCO53645
Actividad: demolicion de bozeta y Asfalto existente y acceso de rampa para salida de vehiculos costado Oriental Michael Sierra cadenero #1 interventoria

Maria AC

Norma

Scanned with CamScanner

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE CONSERVACION 1010-2024
OBJETO EJECUTAR apreciós unitarios las actividades para la conservación de la malla vial - local e intermedia y espacio publico (lote2) en la localidad de suba en la ciudad de - Bogota DC y las demas actividades que se - de tallen en el anexo Tecnico

contrato de interventoria 084-2025
OBJETO interventoria integral para la ejecución apreciós unitarios las actividadel para la - conservacion de la malla vial e intermedia - puentes y espacio publico (lote1 y lote2) en en la localidad de suba en la ciudad de - Bogota DC y las demas actividades que se - detallan en el anexo Tecnico lote 2

CIV 11010613 y 11010621 y 11010612
Niza Sur

FIRMAS AUTORIZADAS
CONTRATISTA:
ing mauricio ROMERO - Director de obra →
ing Javier agudelo - Residente de obra
ing camilo diaz - Residente de obra
ing liz murillo - Residente ambiental
ing Raul Rangel - Residente ambiental
TS gladys Becerra - Residente social

INTERVENTORIA:
ing cristian - Borrero - director de la interventoria
ing maria A cordenas - Residente d interventoria
ing - Angie paola toro Residente SST →
ing - cristian Rodriguez Residente ambiental →

Scanned with CamScanner

PS ang c Mendo - Estudiante social →

Nota: Firmas que no se encuentran autorizadas de Leos ser respaldadas por el residente o director
FDLS

Nota # 1
Viernes / 11 / 07 / 2025
Clima: nublado
Equipo: NO
Actividad: Se hace instalación de PMT y se hace instalacion de viollizos y polisombra parcial: — — — —
Michael Sierra cadenero # 1 interventoria
Maria AL

Nota # 2
Sabado / 12 / 07 / 2025
Clima: Soleado en la mañana nublado en la tarde
Equipo: NO
Actividad: Se continua con instalación de viollizos
Michael Sierra cadenero # 1 interventoria
Maria AL

Nota # 3
lunes / 14 / 07 / 2025 /
Clima: parcialmente nublado
Equipo: NO
Actividad: Se termina con cerramiento — o —
Michael Sierra cadenero # 1 interventoria
Maria AL

Nota # 4
Martes / 15 / 07 / 2025 /
Clima: Soleado todo el dia
Equipo: NO
Actividad: Se inicia con cerramiento para protección de arboles — o — o — o — o —
Michael Sierra cadenero # 1 interventoria
Maria AL

Nota # 5
Miercoles / 16 / 07 / 2025 /
Clima: nublado
Equipo: Hitachi - os 75
Actividad: inicio de demolicion de carpeta Asfaltica — o — o — o — o — o — o — o
Michael Sierra cadenero # 1 interventoria
Maria AL

Scanned with CamScanner

Nota #6 Jueves / 17 / 07 / 2025 /
Clima: Soleado
Equipo: Hitachí US 75
Actividad: Se continua con excavacion de carpeta Asfaltica. Michael Sierra cadenero #1 interventoria
Maria M

Nota #7 Viernes / 18 / 07 / 2025 /
Clima: nublado
Equipo: Hitachí US 75
Actividad: Se continua con excavacion de carpeta Asfaltica y cargue de volquetas —o—o—o—
Michael Sierra cadenero #1 interventoria
Maria M

Nota # 8 Sabado / 19 / 07 / 2025 /
Clima: en la mañana soleado nublado en la tarde
Equipo: Hitachí US 75
Actividad Cargue de volquetas y excavacion —o—o
Michael Sierra cadenero #1 interventoria
Maria M

Nota # 9 lunes / 21 / 07 / 2025 /
Clima: Soleado
Equipo: Hitachí US 75
Actividad: Se hace excavación para cajeo y manual para perfilar —o—o—o—o—o—
Michael Sierra cadenero #1 interventoria
Maria M

Nota # 10 Martes / 22 / 07 / 2025 /
Clima: nublado
Equipo: Hitachí US 75
Actividad: Se realiza excavacion para cajeo y se continua con excavacion de carpeta Asfaltica.
Michael Sierra cadenero1 interventoria
Maria M

Scanned with CamScanner

Nota 11

22/07/2025

Clima: Nublado.

Personal:

Descripción:

Una vez evidenciada la presencia de arcilla en el tramo desde la K0+060 se deja claridad que debe realizarse el mejoramiento correspondiente de la subrasante con raton por recomendacion del especialista de pavimentos ya que el material encontrado no es optimo para la estructura de la via.

Maria

UNA VEZ REALIZADA LA EXCAVACION ENTRE LAS ABSCISAS K0+060 Y K0+100, SE EVIDENCIO LA AUSENCIA DE UNA ESTRUCTURA GRANULAR MINIMA DESCRITA DE 40 CM, ENCONTRANDOSE EN SU LUGAR LA PRESENCIA DE MATERIALES ARCILLOSOS NO APTOS PARA CONFORMAR UNA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO ESTABLE. ANTE ESTA CONDICION GEOTECNICA NO PREVISTA, Y CON EL FIN DE GARANTIZAR LA ESTABILIDAD Y DURABILIDAD DE LA VIA, SE CONSIDERA NECESARIO IMPLEMENTAR LA ALTERNATIVA 1 ESTABLECIDA EN EL DISEÑO APROBADO, LA CUAL CONTEMPLA LA SIGUIENTE CONFORMACION ESTRUCTURAL:

- ESTABILIZACION CON RAJON: 40 CM
- SUB BASE GRANULAR: 30 CM.
- BASE GRANULAR: 20 CM.
- CAPA EN ASFALTO CAUCHO: 8 CM.
- CARPETA DE RODADURA EN MEZCLA DENSA TIPO MD-19: 7 CM.

ESTA SOLUCION SE BASA EN LAS RECOMENDACIONES DADAS EN EL COMUNICADO No. D-119-2025-50, EN EL CUAL SE RECOMIENDA ESTA ALTERNATIVA CON EL PROPOSITO DE MITIGAR LOS RIESGOS ESTRUCTURALES ASOCIADOS AL TIPO DE SUELO ENCONTRADO.

Maria

Jorge Castillo
Rte. de Obra
CCPG.

Nota # 12 Miercoles / 23 / 07 / 2025 /
Clima: Soleado
Equipo: Hitachí US 75
Actividad: Se continua con excavacion para cajeo de la K0+65 hasta la K0+85 — o — o
Michael Sierra cadenero 1 interventoria
Maria AC

Nota # 13 Jueves / 24 / 07 / 2025 /
Clima: Soleado
Equipos Hitachí US 75
Actividad: Se hace chequeo de cajeo para liberación y se continua con excavación
Michael Sierra cadenero 1 interventoria
Maria AC

Nota # 14 Viernes / 25 / 07 / 2025 /
Clima: Soleado
Equipo: Hitachí US 75
Actividad: Se hace liberación de cajeo desde la K0+080 hasta la K0+100
Michael Sierra cadenero 1 interventoria
Maria AC

Nota # 15 Sabado / 26 / 07 / 2025 /
Clima: Retro hitachí US 75, mini cargador CAT 236 B3, Vibio HAMM HD
Equipos: nublado
Actividad: Se estiende material de mejoramiento y se termina con excavación de cajeo
Michael Sierra cadenero #1 interventoria
Maria AC

Nota # 16 lones / 28 / 07 / 2025 /
Clima Soleado
Equipos: Retro hitachí US75, mini cargador CAT 236B3, vibio HAMM HD100
Actividad Sereo para entrega de liberacion de base Michael Sierra cadenero 1 interventoria
Maria AC

Scanned with CamScanner

Nota # 17

Martes / 29 / 07 / 2025 /

Clima: Soleado

Equipos: Mini cargador CAT 236D3, Vibro HAMM HD 100

Actividad: Se hace liberación de sello rajon desde la KOT 065 A KOT 085 y se evidencian deñadades

Michad Sierra cadenero # 1 interventoria

Maria M

Nota # 18

Miercoles / 30 / 07 / 2025 /

Clima:

Equipos:

Actividad: Se evidencia excavación manual para bordillo y se monta madera para calcamo —o—

Michad Sierra cadenero # 1 interventoria

Maria M

Nota # 19

Jueves / 31 / 07 / 2025 /

Clima: Soleado

Equipos: Vibro HAMM HD 100

Actividad: Se hace instalación de bordillo y se aplica concreto para calcamo —o—o—

Michael Sierra cadenero # 1 interventoria

Maria M

Nota # 20

Viernes / 01 / 08 / 2025 /

Clima: lluvioso, paracialmente nublado

Equipos:

Actividad: Se hace liberacion de bordillo y bajoi rampa y se hace lleno para tapar el calcamo —o—o—o—o—o—

Michael Sierra cadenero 1 interventoria

Maria M

Nota # 21

Sabado / 02 / 08 / 2025 /

Clima: nublado

Equipo: NO

Actividad: Excavacion manual para bordillo y enboquillado

Michad Sierra cadenero # 1 interventoria

Maria M

Scanned with CamScanner

ANEXO 5: ACTAS DE COMITÉ

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo de desarrollo local de Suba.
FECHA: 18/07/2025 LUGAR: Hangar.
OBJETO DE LA REUNIÓN: Comite de Seguimiento
HORA DE INICIO: 11:05 am HORA DE FINALIZACIÓN:

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESION	TÉCNICO/N	AUXILIAR	CARRERA	PROVISION	LIBRE	CONTRATIS				
Maria A Cardenas Lizarazo			Y							Torres y Asociados	subatorresyasociados2025@gmail.com	3174752609	Maria M
Christian Fabian Barrera Dorcel			X							Torres y Asociados SAS	Subatorres2025@gmail.com	3132771470	
Luis Emiro Blanco M.			X							Torres y Asociados SAS	subatorresyasociados2025@...	3102009455	
Claudia Marcela Forero Castro			X							Torres y Asociados	subatorresyasociados2025@gmail.com	3115236633	
Robinson Villamil Rojas										Torres y Asociados	robinsoon@...	3004978501	
Daniel Felipe Suarez Forero			X							Torres y Asociados	subatorresyasociados2025@gmail.com	3115236633	
Angie Henao Cardona			X							Torres y Asociados SAS	subatorresyasociados2025@gmail.com	3106773812	Angie H
Gladys Becerra			X							CSO Conservacion P.G.	Conservacionpg@...	3103103497	
Luz Manuel Murillo Naranjo			X							CSO Conservacion PG	murillonaranjo@gmail.com	3132588369	
Paul Rangel Paez			X							CSO Conservacion PG	Sisonadepromotor@... .com	3228410657	
Mauricio Romero V			X							CSO conservacion PG	ing.mromero@gmail.com	3208859244	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo de desarrollo local de Suba
FECHA: 18/07/2025 LUGAR: Hangar.
OBJETO DE LA REUNIÓN: Comite de seguimiento.
HORA DE INICIO: 11:05 am HORA DE FINALIZACIÓN:

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESION	TÉCNICO/N	AUXILIAR	CARRERA	PROVISION	LIBRE	CONTRATIS				
Lucia C Moreno Castiblanco			X							Consorcio Conservación PG	lucia.moreno@ausultar.com	3174014655	
Ricardo A Mendoza B.			X							Consorcio Conservación PG	gerencia@ausultar.com	3152969527	
Ariel J Jaramillo G			X							CSO Conservación PG	residentecc4gt@gmail.com	3212028305	
Exmelin Hamid Lemus F			X							FDLS - Inspector	[illegible]	3107142839	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C SECRETARÍA DE GOBIERNO	**EVIDENCIA DE REUNIÓN**

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

SE DA INICIO AL COMITÉ NO 14 CON LA LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA, TENIENDO EN CUENTA LA PRESENCIA DE LOS ESPECIALISTAS DE PAVIMENTOS TANTO DE LA INTERVENTORÍA COMO DEL CONTRATISTA DE OBRA, PARA TRATAR EL TEMA RELACIONADO A LAS ESTRUCTURAS DE PAVIMENTOS DE LOS FRENTES DE OBRA NIZA SUR 2 (CIV 11010621) Y POA (CIV 11004080, 11004110, 11004156, 11013439)

1. INTERVENCIÓN DE LOS ESPECIALISTAS
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE SE REALIZO UNA PEQUEÑA MESA DE TRABAJO EN LA CUAL SE TOCARON LAS ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO DE NIZA SUR 11010621, POA 11004156,11013439,11004110 Y 11004080 LAS CUALES SE ENCUENTRAN PENDIENTES POR DEFINIR DE LA FASE 1.
LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE LAS ESTRUCTURAS DE PARQUE PILOTO, CASABLANCA, COSTA AZUL, NIZA SUR 11010613 YA SE ENCUENTRAN APROBADAS.
LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE CON RESPECTO A LAS ESTRUCTURAS QUE ESTÁN PENDIENTES POR DEFINIR SE PROPONE LA REALIZACIÓN DE UNOS APIQUES PARA VERIFICAR EL MATERIAL EXISTENTE, LA IDEA ES INICIAR LA EXCAVACIÓN Y UNA VEZ ABIERTA LA CAJA IR AL SITIO E INSPECCIONAR EL MATERIAL QUE SE VISUALICE, ESTO CON EL FIN DE ACLARAR SI ES OPTIMO PARA REUTILIZACIÓN O SI SE DEBE HACER EL CAMBIO.
• EL CONTRATISTA INDICA QUE LA DUDA REAL ES SI SE DEBE O NO HACER EL MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE, PUESTO QUE EN LA SABANA SE EVIDENCIA EN MUCHAS OCASIONES UN MATERIAL EN UN PUNTO DE UN TRAMO Y A 5 METROS OTRO TIPO, POR LO CUAL LO MAS ACERTADO ES IR A INSPECCIONAR EN EL SITIO EL MATERIAL EXISTENTE UNA VEZ SE ESTE ABIERTA LA CAJA.
• LA ENTIDAD MENCIONA NO ESTAR DE ACUERDO CON LA PROPUESTA HECHA POR LA INTERVENTORÍA Y EL CONTRATISTA, PUESTO QUE SE ENTENDÍA QUE CON LA DEFLECTOMETRÍA YA ESTABA CLARA LA ESTRUCTURA.
• LA ENTIDAD INDAGA A LA INTERVENTORÍA SOBRE CUANTOS APIQUES HA REALIZADO PARA LA VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN ENTREGADA POR EL CONTRATISTA DE OBRA, ESTO TENIENDO EN CUENTA QUE EL CONTRATO TIENE UNA BOLSA PARA REALIZACIÓN DE LOS LABORATORIOS. LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE NO SE HAN HECHO POR PARTE DE TORRES Y ASOCIADOS.
• LA ENTIDAD INDICA QUE EL CONTRATO SOLO TENIA 2 MESES PARA LOS DIAGNÓSTICOS Y ESTE PLAZO YA SE CUMPLIÓ EN ESTE MOMENTO ESTAMOS EN EL MES 3.
• LA ENTIDAD MENCIONA QUE ADEMÁS DE LA IMPORTANCIA DE DEFINIR LA ESTRUCTURA, DURANTE LAS REUNIONES DE INICIO SE DEBE SOCIALIZAR LAS ESTRUCTURAS YA APROBADAS PARA EVITAR MALOS COMENTARIOS DE LA COMUNIDAD.
• EL CONTRATISTA INDICA QUE LA PROPUESTA DADA POR ELLOS ES LO QUE CONSIDERAN OPTIMO PARA IMPLEMENTAR EN LAS VÍAS CON EL FIN DE OFRECER LOS 5 AÑOS DE GARANTÍA QUE SE SOLICITAN.
• LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE SE REALIZARAN LOS APIQUES CORRESPONDIENTES EN POA Y NIZA SUR EL DIA SÁBADO 19/07/2025 Y EL DIA LUNES 21/07/2025 SE ESTARÍA REMITIENDO EL INFORME DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE DADA LA CLASIFICACIÓN DE FASES DE PRIORIZACIÓN EL CONTRATISTA ESTA DEMORADO EN EMITIR LOS CONCEPTOS DE FASE 3,4 Y 5. ESTO TENIENDO EN CUENTA QUE PARA ANDENES ES SOLO IMPLEMENTAR LA CARTILLA DE ANDENES.
LA ENTIDAD INDAGA SOBRE CUANDO SE DARA EL INICIO EN POA, EL CONTRATISTA MENCIONA QUE EL DIA 21 DE JULIO 2025 SE INICIARA CON INSTALACIÓN DE PMT Y CERRAMIENTO.
LA ENTIDAD INDAGA SOBRE CUANDO SE RADICARA A LA ENTIDAD EL INFORME DE DIAGNÓSTICOS, LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE ESTE TEMA YA SE HABÍA HABLADO Y QUE POR AHORA SE DEBE ENTREGAR EL INFORME DE FASE1 Y 2.

SE CONTINUA CON EL ORDEN DEL DÍA, SE INDAGA SI EXISTE ALGUNA OBSERVACION AL ACTA DE COMITÉ 13.

EL CONTRATISTA INDICA: QUE, SI EXISTEN OBSERVACIONES EN EL COMPONENTE SOCIA, *"POR PARTE DE LA ENTIDAD SE RECOMIENDA NO PROGRAMAR MÁS REUNIONES DE INICIO HASTA QUE NO SUBSANE LOS ATRASOS PRESENTADOS A LA FECHA"*. LO CUAL SE REVISARÁ Y AJUSTARÁ LA OBSERVACIÓN EN EL ACTA No. 13

POR PARTE DEL FDLS NO HAY OBSERVACIONES.

COMO PUNTO SEGUIDO SE MENCIONAN LOS COMPROMISOS QUE SE PACTARON EL COMITÉ ANTERIOR, LOS CUALES SON:

NO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	CUMPLIÓ
1	INICIO DE OBRA POA	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	VIERNES 18/07/2025	EN PIE
2	INFORME DE ESTRUCTURAS	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	VIERNES 11/07/25	SI 12/06/25
3	INFORME MENSUAL SOCIAL JUNIO	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	LUNES 14/07/25	SI (CON OBSERVACIONES)
4	INFORME DE EXCLUSIÓN	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	MIÉRCOLES 17/07/25	SI
5	ENTREGA DE INVENTARIO FORESTAL Y DE SUMIDEROS	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	MIÉRCOLES 16/07/25	SI
6	INFORME MENSUAL TÉCNICO SUBSANADO	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	SÁBADO 12/07/2025	SI (PENDIENTE RADICADO FISICO)
7	PLAN DE CONTINGENCIA	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	LUNES 14/07/2025	NO
8	INICIO DE EXCAVACIONES PARQUE PILOTO Y NIZA SUR	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	MIÉRCOLES 16/07/2025	NIZA SUR SI PARQUE PILOTO NO
9	DISEÑOS FASE 2	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	VIERNES 11/07/2025	SI 17/07/25

10	INFORMES CCTV CASABLANCA, TIBABUYES Y PARQUE PILOTO	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	MIÉRCOLES 16/07/2025	NO
11	INFORME PRELIMINAR	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	VIERNES 18/07/2025	EN PIE
12	INFORME DIAGNOSTICO FASE 1 Y 2	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	VIERNES 18/07/2025	EN PIE
13	RESPUESTA A DERECHO DE PETICIÓN DE CASABLANCA	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	VIERNES 25/07/2025	EN PIE
14	RADICACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD DE NIZA SUR	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	MIÉRCOLES 16/07/2025	SI
15	RADICACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD DE POA	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	VIERNES 18/07/2025	NO
16	RECORRIDO DE VERIFICACIÓN DE LISTA DE CHEQUEO PRELIMINAR PARA NIZA SUR Y PARQUE PILOTO	TORRES Y ASOCIADOS	MARTES 15/07/2025	NO

REVISIÓN DE COMPROMISOS

LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE EL CONTRATISTA DE OBRA TIENE EL COMPROMISO DE INICIÓ LA ETAPA DE OBRA EN POA QUE PARA EL DIA DE HOY 18/07/2025.

- EL CONTRATISTA INDICA QUE ESTE INICIO SE DARA EL 21/07/2025 TENIENDO EN CUENTA QUE YA SE APROBÓ EL PMT POR PARTE DE LA SDM.

LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EL INFORME DE ESTRUCTURAS DE PAVIMENTOS RESULTANTE DE LOS ENSAYOS INICIALES Y COMPLEMENTARIOS (DEFLECTOMETRÍA), FUE REMITIDO POR EL CONTRATISTA DE OBRA EL DIA 12/07/2025 Y ESTE ESTA EN REVISIÓN POR EL ESPECIALISTA DE PAVIMENTOS.

LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE EL INFORME MENSUAL SOCIAL DE JUNIO FUE REMITIDO POR CORREO SIN EMBARGO AUN NO SE HA DADO APROBACIÓN PARA LA RADICACIÓN EN FISICO YA QUE EXISTEN OBSERVACIONES.

LA INTERVENTORÍA INDICA QUE SE DIO CUMPLIMIENTO A LA ENTREGA DEL INFORME DE EXCLUSIÓN DE SEGMENTOS, ESTE SE ENCUENTRA EN REVISIÓN POR PARTE DEL ESPECIALISTA DE PAVIMENTOS DE TORRES Y ASOCIADOS.

LA INTERVENTORÍA INDICA QUE SE REMITIÓ POR PARTE DEL CONTRATISTA EL INVENTARIO FORESTAL Y DE SUMIDEROS DE PARQUE PILOTO, Y POA.

LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE EL PLAN DE CONTINGENCIA SOLICITADO SE ENVIÓ POR PARTE DEL CONTRATISTA EL DIA DE HOY 18/07/2025.

LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE EL CONTRATISTA INICIÓ LA EXCAVACIÓN MECÁNICA EN NIZA SUR, SIN EMBARGO, EN PARQUE PILOTO AUN NO SE EVIDENCIA ESTA ACTIVIDAD.

LA INTERVENTORÍA INDICA QUE LOS DISEÑOS DE FASE 2 YA FUERON ENTREGADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA, ESTOS SE ENCUENTRAN EN REVISION POR PARTE DEL ESPECIALISTA DE PAVIMENTOS DE TORRES Y ASOCIADOS.

LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE LOS INFORMES CCTV SOLICITADOS AUN NO HAN SIDO ALLEGADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA, ESTOS DEBEN SER ENTREGADOS A MAS TARDAR EL 22 DE JULIO 2025.

LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE POR PARTE DEL CONTRATISTA SE REMITIÓ LA PRIMERA VERSION DEL INFORME PRELIMINAR EL DIA 17/07/2025 EL CUAL ESTA SIENDO REVISADO.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EL INFORME DE DIAGNOSTICO DE FASE 1 Y 2 NO HA SIDO REMITIDO AUN POR EL CONTRATISTA DE OBRA, POR LO CUAL SE SOLICITA LA PRONTA RADICACIÓN DE ESTE DOCUMENTO, LA FECHA PLAZO PARA ESTA ES DEL 24/07/2025.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE LA RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN DE CASABLANCA SIGUE EN PIE.
LA INTERVENTORIA MENCIONA QUE LAS ACTAS DE VECINDAD DE NIZA SUR SE RADICARON PARA REVISION LAS DEL SEGMENTO 11010613 SIN EMBARGO LAS DEL 11010621 AUN NO HAN SIDO ALLEGADAS.
LA INTERVENTORIA INDICA QUE LAS ACTAS DE VECINDAD DE POA NO HAN SIDO ALLEGADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA.
LA INTERVENTORIA INDICA QUE SE REALIZO EL RECORRIDO DE VERIFICACION DE LA LISTA DE CHEQUEO PREVIA AL INICIO DE ACTIVIDADES PARA LOS FRENTES DE PARQUE PILOTO, NIZA SUR Y POA.
COMPONENTE TÉCNICO
1. CASABLANCA
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE SE DIO INICIO A LA INSTALACION DE GEOCELDA Y SBG, DE IGUAL FORMA SE CONTINUA CON LA EXCAVACIÓN MECANICA EN EL SIGUIENTE TRAMO.
LA INTERVENORIA MENCIONA QUE EL BAJO RENDIMIENTO REPORTADO PARA ESTE FRENTE LA SEMANA PASADA, SE HA VENIDO SUBSANANDO DURANTE ESTA SEMANA LO CUAL SE HA EVIDENCIADO EN CAMPO.
2. TIBABUYES
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE ESTE FRENTE ES EL MAS AVANZADO EN ESTE MOMENTO SE ESTAN INSTALANDO LOS SARDINELES.
LA INTERVENTORÍA INDAGA SI LA BAHIA EXISTENTE DEBE QUEDAR HABILITADA O NO, LA ENTIDAD INDICA QUE ALLI YA SE TIENEN UNOS DERECHOS ADQUIRIDOS POR LO CUAL SI SE DEBE DEJAR EL INGRESO CORRESPONDIENTE.
LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE SE DEBE CONSTRUIR UN SUMIDERO EN ESTE TRAMO CON EL FIN DE EVACUAR ADECUADAMENTE EL AGUA Y EVITAR EMPOZAMIENTOS.
• EL CONTRATISTA INDICA QUE YA SE VERIFCO EL TEMA Y QUE EN DADO CASO SE HARA LA CONEXIÓN DE ESTE SUMIDERO AL POZO EXISTENTE QUE ESTA FUERA DEL CIV LO QUE SUMA APROXIMADAMENTE 6 ML.
LA INTERVENTORIA INDICA QUE LAS DENSIDADES DEBEN SER ACOMPAÑADAS POR EL PERSONAL TECNICO DE TORRES Y ASOCIADOS, POR LO CUAL ESTE ENSAYO DEBE SER REPETIDO PARA LA SBG DEL FRENTE DE OBRA.
3. NIZA SUR 11010613
LA INTERVENTORIA INDICA QUE EN ESTE FRENTE DE OBRA YA SE DIO INICIO A LA DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE Y A LA EXCAVACION MECANICA CORRESPONDIENTE, EL AVANCE DURANTE LA SEMANA HA SIDO ALTO.
4. POTOSÍ
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EN POTOSÍ SE EVIDENCIA BAJO RENDIMIENTO, SOLO SE CUENTA CON 1 OFICIAL EN CAMPO REALIZANDO EXCAVACION MANUAL Y EL TRAFICO, POR LO CUAL SE SOLICITA AMPLIAR LA EJECUCIÓN DE OBRA.
5. PARQUE PILOTO
LA INTERVENTORIA INDICA QUE SE DIO INICIO A LA INSTALACION DE PMT Y ROLLIZOS PARA CERRAMIENTO, SIN EMBARGO, SE DEJA LA CLARIDAD QUE EN ESTE FRENTE NO SE HAN FINALIZADO LAS ACTAS DE VECINDAD.
6. OTROS
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE SE TIENEN 4 FRENTES DE OBRA EN ACTIVIDAD Y 2 POR INICIAR LA PROXIMA SEMANA.
LA ENTIDAD SOLICITA SE LE REMITA EL CUADRO DE AVANCE POR CIV EL CUAL FUE REMITIDO EL 22 DE JUNIO A LA INTERVENTORIA.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE LA BITACORA DE NIZA SUR NO SE HA ALLEGADO, POR OTRA PARTE, ES IMPORTANTE QUE LOS RESIDENTES FIRMEN DICHO DOCUMENTO.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EL AVANCE PARA LA SEMANA DEL 07 DE JULIO AL 13 DE JULIO 2025 QUEDO EN PROGRAMADO DEL 7.34% Y EJECUTADO DEL 4.93% LO CUAL ARROJA UN ATRASO DEL 2.41%.
COMPONENTE PMT
LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE EL PMT DE POA SE APROBO POR PARTE DE LA SDM EL DIA DE AYER 17/07/2025.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EL DIA DE AYER 17/07/2025 SE RADICO EL PMT DE SUBA CENTRO A LA SDM Y A TRANSMILENIO.

LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE SE ALLEGO UN INCUMPLIMIENTO AL PMT DE TIBABUYES COSTA AZUL DE LA SDM, EL CUAL SE OBSERVA LA FALTA DE SENDEROS PEATONALES, BROCHES NO APTOS Y MATERIAL FUERA DEL CIV Y BARRICADAS EN SITIOS NO APROBADOS.
• EL CONTRATISTA INDICA QUE ESTE SERA SUBSANADO DE INMEDIATO Y QUE EL DIA 23/07/2025 SE REMITIRÁ EL RADICADO DE LA SUBSANACIÓN ANTE LA SDM A LA INTERVENTORÍA.
LA INTERVENTORÍA PREGUNTA POR EL AVANCE DEL DISEÑO Y EL PRESUPUESTO DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DE CADA UNO DE LOS CIVS.
• EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE REALIZARÁ LA CONSULTA CON SU ESPECIALISTA SI YA SE CUENTA CON LA TOTALIDAD DEL INVENTARIO DE SEÑALIZACIÓN DE LA SDM.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE LA LISTA DE CHEQUEO QUEDO EN EL 100%.
COMPONENTE SOCIAL
LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE EN CUANTO ACTAS DE VECINDAD SE ESTA AVANZANDO EN NIZA SUR 43 DE 55, POA 7 DE 18 Y TIBABUYES 118 DE 76, PARA UN TOTAL PENDIENTE DE 65.
LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE NO SE PUEDE INICIAR PARQUE PILOTO SIN LA DEBIDA RADICACION DE ESTAS A LA INTERVENTORIA.
EL CONTRATISTA INDICA QUE EL MARTES 22/07/2025 SE RADICARA A LA INTERVENTORIA LAS DE PARQUE PILOTO Y POA, Y NIZA SUR PARA EL DIA VIERNES 25/07/2025.
LA INTERVENTORIA INDICA QUE EL MONC SE ESTA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES.
LA INTERVENTORIA INDICA QUE DE ACTIVIDADES SOCIALES YA SE DEBEN EMPEZAR A PROGRAMAR LAS REUNIONES DE PARTICIPACION Y AVANCE.
LA LISTA DE CHEQUEO QUEDO EL 97.4% AFECTO LA NO RADICACION DEL INFORME MENSUAL SOCIAL A LA ENTIDAD.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE SE DEBEN CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES SOCIALES PREVIAS AL INICIO DE OBA. ESTO AFECTA LA LISTA DE CHEQUEO.
COMPONENTE AMBIENTAL
LA INTERVENTORÍA INDAGA COMO VA EL TEMA DE PERMISO FORESTAL, EL CONTRATISTA INDICA QUE AUN NO HAN DADO RESPUESTA.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE LA LISTA DE CHEQUEO QUEDO EN 98%.
COMPONENTE SST
LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE LA LISTA DE CHEQUEO QUEDO EN EL 98%.
LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE SE RECUERDA LA IMPLEMENTACION DEL CARNET DE IDENTIFICACION A LOS TRABAJADORES DEBE SER SUBSANADO PARA EL DIA 21 DE JULIO 2025.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE SE DEBE IMPLEMENTAR LOS EPP CORRESPONDIENTES EN OBRA.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE SE DEBE ACTUALIZAR LA DOCUMENTACION DE LA MAQUINARIA QUE SE LE VENCE EL SOAT.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

NO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	CUMPLIÓ
1	INICIO DE OBRA POA	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	LUNES 21/07/2025	
2	APIQUES INTERVENTORÍA	TORRES Y ASOCIADOS	SABADO 19/07/25	
3	SUBSANACION INFORME MENSUAL SOCIAL JUNIO	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	LUNES 21/07/25	

4	INFORME DE APIQUES INTERVENTORÍA	TORRES Y ASOCIADOS	LUNES 21/07/25	
5	ENTREGA DE RESPUESTA A LA SDM	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	MIÉRCOLES 23/07/25	
6	RADICACION DE ACTAS DE VECINDAD POA Y PARQUE PILOTO	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	MARTES 22/07/2025	
7	INFORMES CCTV CASABLANCA, TIBABUYES Y PARQUE PILOTO	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	MARTES 22/07/2025	
8	INFORME DIAGNOSTICO FASE 1 Y 2	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	JUEVES 24/07/2025	
9	RESPUESTA A DERECHO DE PETICIÓN DE CASABLANCA	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	VIERNES 25/07/2025	
10	RADICACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD DE NIZA SUR	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	VIERNES 25/07/2025	
11	CARNET IDENTIFICACIÓN DE PERSONAL	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	LUNES 21/07/25	

Elaborada por: María A. Cárdenas Interventoría

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo de desarrollo local de Suba
FECHA: 25/07/2025 LUGAR: Hangar.
OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de seguimiento
HORA DE INICIO: 11:00 am HORA DE FINALIZACIÓN:

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESION	TÉCNICO/N	AUXILIAR	CARRERA	PROVISION	LIBRE	CONTRATIS				
Claudia Marcela Forero C			X							Torres y Asociados	2batorres y asociados 2025@gmail.com	3155236633	
Angie Paola Toro Cardona			X							Torres y Asociados	subatorres y asociados 2025@gmail.com	3146035999	
Angie Henao Cardona			X						X	Torres y Asociados	subatorresyasociados 2025@gmail.com	3106273812	
Gladys Barrera			X							CSO conservación PG	consocioconservacionpg@gmail.com		
Paul Rangel Páez			X							CSO Conservación PG	sisoma@promotoraguga.com	3228740852	
Liz Marivel Murillo Naranjo			X							CSO Conservación PG	sisoma@promotoraguga.com	3132528838	
Camilo Eduardo Diaz Reyes				X						CSO Conservación PG		3043893242	CamiloEDiazR
OSCAR HENRICUEZ HOYOS				X						CSO CONSERVACIÓN PG	ingenieria@picacion	3202406705	
[illegible]			X							CSO Conservación PG	[illegible]	3212029305	
EXMELINA HAMID LEMUS FONSECA			X							INFRAESTRUCTURA - FDL	ing.lamidlemus@hotmail.com	3107144660	
Felipe Chitiva Ángel			X						X	FDLS - Infraestr	luis. Chitiva@gobiernobogota.gov	3057888867	

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C SECRETARÍA DE GOBIERNO	**EVIDENCIA DE REUNIÓN**

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

SE DA INICIO AL COMITÉ N° 15 CON LA LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA,

SE INDAGA SI EXISTE ALGUNA OBSERVACIÓN AL ACTA DE COMITÉ 14 EL CONTRATISTA Y EL FDLS INDICA NO HAY OBSERVACIONES.

PUNTO SEGUIDO SE MENCIONAN LOS COMPROMISOS QUE SE PACTARON EL COMITÉ ANTERIOR, LOS CUALES SON:

NO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	CUMPLIÓ
1	INICIO DE OBRA POA	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	LUNES 21/07/2025	SI 24/07/2025
2	APIQUES INTERVENTORÍA	TORRES Y ASOCIADOS	sábado 19/07/25	SI
3	SUBSANACIÓN INFORME MENSUAL SOCIAL JUNIO	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	LUNES 21/07/25	SI
4	INFORME DE APIQUES INTERVENTORÍA	TORRES Y ASOCIADOS	LUNES 21/07/25	SI
5	ENTREGA DE RESPUESTA A LA SDM	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	MIÉRCOLES 23/07/25	NO
6	RADICACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD POA Y PARQUE PILOTO	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	MARTES 22/07/2025	ENTREGA PARCIAL PARQUE PILOTO PENDIENTE POA
7	INFORMES CCTV CASABLANCA, TIBABUYES Y PARQUE PILOTO	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	MARTES 22/07/2025	NO
8	INFORME DIAGNOSTICO FASE 1 Y 2	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	JUEVES 24/07/2025	NO
9	RESPUESTA A DERECHO DE PETICIÓN DE CASABLANCA	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	VIERNES 25/07/2025	SIGUE EN PIE
10	RADICACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD DE NIZA SUR 2	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	VIERNES 25/07/2025	SIGUE EN PIE

11	CARNET IDENTIFICACIÓN DE PERSONAL	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	LUNES 21/07/25	SI	

REVISIÓN DE COMPROMISOS

LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE EL INICIO DE OBRA EN POA SE LLEVO A CABO EL DIA 24/07/2025 CON LA INSTALACIÓN DEL PMT.

LA INTERVENTORÍA INDICA QUE SE EJECUTARON LOS APIQUES CORRESPONDIENTES POR PARTE DE TORRES Y ASOCIADOS EN NIZA SUR Y POA.

LA INTERVENTORÍA INDICA QUE SE SUBSANO EL INFORME MENSUAL SOCIAL DE JUNIO Y ESTE FUE RADICADO A LA ENTIDAD EL DÍA 23 DE JULIO DE 2025.

LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE EL INFORME DE LOS APIQUES FUE REMITIDO AL ESPECIALISTA DE PAVIMENTOS PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN.

LA INTERVENTORÍA INDICA QUE SE DIO CUMPLIMIENTO A LA ENTREGA DEL INFORME DE EXCLUSIÓN DE SEGMENTOS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA, ESTE SE ENCUENTRA EN REVISIÓN POR PARTE DEL ESPECIALISTA DE PAVIMENTOS DE TORRES Y ASOCIADOS.

LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE LA RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS HECHOS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PMT DE LOS FRENTES DE TIBABUYES – COSTA AZUL Y CASABLANCA NO SE HAN REMITIDO A LA SDM Y A LA INTERVENTORÍA.

- EL CONTRATISTA INDICA QUE SE SUBSANO LO REQUERIDO POR LA SDM Y QUE EL DIA MARTES 29 DE JULIO 2025 SE ENVIARA LA RESPUESTA CORRESPONDIENTE.

LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE A LA FECHA NO SE HAN RADICADO LAS ACTAS DE VECINDAD DEL FRENTE DE OBRA EL POA Y PARQUE PILOTO, POR LO CUAL SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA LA REMISIÓN PRONTA DE ESTAS TENIENDO EN CUENTA QUE YA SE INICIARON ACTIVIDADES DE OBRA EN LOS FRENTES YA MENCIONADOS.

- EL CONTRATISTA MENCIONA QUE LAS ACTAS DE PARQUE PILOTO FUERON RADICADAS PARCIALMENTE Y LAS DE POA SERÁN RADICADAS EL LUNES 28/07/2025.

LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE LOS INFORMES CCTV SOLICITADOS FUERON ENTREGADOS PARCIALMENTE, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRA LOS DE LOS FRENTES DE OBRA DE TIBABUYES Y POTOSÍ, LOS FALTANTES SERÁN CARGADOS EL DIA MARTES 29/07/2025.

LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EL INFORME DE DIAGNOSTICO DE FASE 1 Y 2 NO HA SIDO RADICADO AUN POR EL CONTRATISTA DE OBRA, POR LO CUAL SE SOLICITA LA PRONTA RADICACIÓN EN FISICO DE ESTE DOCUMENTO, LA FECHA DE COMPROMISO ERA PARA EL DIA 24/07/2025.
EL INFORME DE DIAGNÓSTICOS DE FASE 1 ESTA SIENDO AJUSTADO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA INTERVENTORÍA, Y SERA RADICADO EL DIA MIÉRCOLES 30/07/2025.
EL INFORME DE FASE 2 ESTARÁ SUJETO A LA APROBACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS POR PARTE DEL ESPECIALISTA DE PAVIMENTOS DE TORRES Y ASOCIADOS.

LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE LA RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN DE CASABLANCA SIGUE EN PIE Y EN ESPERA DE LA RESPUESTA POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA.

LA INTERVENTORÍA INDICA QUE LA RADICACIÓN DE LAS ACTAS DE VECINDAD DE NIZA SUR YA FUERON REMITIDAS EL DÍA DE HOY 25 DE JULIO 2025 EN HORAS DE LA MAÑANA.

LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE LOS CARNETS DE IDENTIFICACIÓN YA FUERON ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA A LOS TRABAJADORES.

COMPONENTE TÉCNICO

1. CASABLANCA

LA INTERVENTORÍA INDICA QUE SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE LLENOS CON SUBBASE GRANULAR (SBG) EN ESTE FRENTE DE OBRA Y LA EXCAVACIÓN MECÁNICA DEL TRAMO CONTINUO.

LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE DURANTE LAS EXCAVACIONES SE EVIDENCIÓ UN AFLORAMIENTO DE AGUA EL CUAL ESTA REVISANDO LA CONSTRUCCIÓN DE UN FILTRO, ESTA SIENDO CON LA AYUDA DE LAS COMISIONES DE TOPOGRAFÍA EN CAMPO, PARA VERIFICAR EL DESCOLE DE DICHO ELEMENTO.

2. TIBABUYES

LA INTERVENTORÍA INDICA QUE SE TIENE PREVISTA UNA REUNIÓN CON EL EAAB PARA DEFINIR EL TEMA DEL SUMIDERO, PUESTO QUE LA CONEXIÓN PLUVIAL MAS CERCANA SE ENCUENTRA A 50 ML APROXIMADAMENTE.

LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE EN ESTE FRENTE SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE SARDINEL Y EL AVANCE SE HA EVIDENCIADO DURANTE LOS DIFERENTES RECORRIDOS REALIZADOS.

3. NIZA SUR 11010613

LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EN NIZA SUR SE EVIDENCIÓ MATERIAL ARCILLOSO DESDE LA K0+062 EL CUAL NO ES OPTIMO PARA LA ESTRUCTURA A INSTALAR, POR LO CUAL SE DEBIÓ IMPLEMENTAR UNA EXCAVACIÓN MAYOR A PARTIR DE ESTA ABSCISA Y UNA ESTRUCTURA APROXIMADA DE 0.94 M INCLUIDO EL MEJORAMIENTO CON RAJÓN.

LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE LLEVANDO A CABO LA EXCAVACIÓN SE ENCONTRÓ LA TUBERÍA SANITARIA, LA CUAL QUEDARA EXPUESTA DENTRO DE LA ESTRUCTURA, POR LO CUAL SE DEBE CONSTRUIR UN CÁRCAMO DE PROTECCIÓN.

4. POTOSÍ

LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EN POTOSÍ SE EVIDENCIA BAJO RENDIMIENTO, SOLO SE CUENTA CON 2 OFICIALES EN CAMPO REALIZANDO EXCAVACIÓN MANUAL E INSTALACIÓN DE SARDINEL.

5. PARQUE PILOTO

LA INTERVENTORÍA INDICA QUE SE REALIZÓ LA INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO Y SE INICIÓ LA DEMOLICIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE, SIN EMBARGO, SE DEJA CLARIDAD QUE NO SE CUMPLIERON CON LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA LISTA DE CHEQUEO PRELIMINAR.

6. OTROS

LA INTERVENTORÍA INDICA QUE UNA VEZ REALIZADOS LOS APIQUES CORRESPONDIENTES EN NIZA SUR 11010621 Y POA (PÓRTICO), EL ESPECIALISTA DE TORRES Y ASOCIADOS ENTREGARA EL INFORME DEFINITIVO Y ESTE SERA REMITIDO EL DIA SÁBADO 26/07/2025 AL CONTRATISTA. EN ESTE SE MENCIONA QUE SE DA APROBACIÓN A LA ALTERNATIVA 1 EN NIZA SUR 11010621 Y A LAS DOS ALTERNATIVAS PROPUESTAS EN POA (PÓRTICO).

- LA ENTIDAD INDAGA SOBRE CUAL DE LAS DOS ALTERNATIVAS PROPUESTAS EN POA (PÓRTICO) ES MÁS ECONÓMICA.
- LA INTERVENTORÍA INDICA QUE UNA VEZ SEA ENTREGADO EL INFORME DE LAS ESTRUCTURAS POR EL ESPECIALISTA DE PAVIMENTOS SE EVALUARA EL COSTO Y SE PRESENTARA ESTE EJERCICIO PRESUPUESTAL A LA ENTIDAD.

• LA ENTIDAD INDAGA SOBRE CUANDO LA INTERVENTORÍA REMITIRÁ A LA ENTIDAD EL INFORME DE DIAGNOSTICO CON TODO EL EJERCICIO PRESUPUESTAL Y LAS ESTRUCTURAS APROBADAS.
• LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE EL DIA VIERNES 01/08/2025 SERA REMITIDO ESTE DOCUMENTO CON TODOS LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES.
EL CONTRATISTA INDAGA SI LA ENTIDAD RECIBE MATERIAL DE FRESADO, LA ENTIDAD MANIFIESTA QUE SE PUEDEN RECIBIR ENTRE 8 A 9 VIAJES.
LA ENTIDAD INDAGA SI YA SE RADICO EL INFORME DE EXCLUSIÓN, LA INTERVENTORÍA LE MANIFIESTA QUE EL INFORME YA SE ENCUENTRA APROBADO Y SE ESTA A LA ESPERA DEL ACTA DE EXCLUSIÓN LA CUAL ESTA SIENDO DILIGENCIADA POR EL CONTRATISTA Y SE ESPERA EL DIA LUNES 28/07/2025 QUEDE RADICADA.
LA INTERVENTORÍA RECUERDA QUE EL INFORME MENSUAL DE JULIO DEBE SER ENTREGADO APROBADO A MAS TARDAR EL 5 DE AGOSTO DEL 2025.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EL AVANCE PARA LA SEMANA DEL 14 DE JULIO AL 20 DE JULIO 2025 QUEDO EN PROGRAMADO DEL 8.70% Y EJECUTADO DEL 6.04% LO CUAL ARROJA UN ATRASO DEL 2.66%.
COMPONENTE PMT
LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE SE DEBE DAR PRONTA RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE CASABLANCA Y TIBABUYES Y SE RECOMIENDA IMPLEMENTAR LOS PMTS TAL COMO SE APRUEBAN POR LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE, CON EL FIN DE EVITAR SANCIONES QUE LLEVEN A LA NO APROBACIÓN DE FUTUROS PMT.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE LOS PMTS DE FASE 1 YA ESTÁN TODOS APROBADOS.
LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE SE HA TENIDO UN GRAN AVANCE CON RESPECTO AL PMT DE SUBA CENTRO, AL CUAL SE LE DIO UN AJUSTE SOLICITADOS POR TRANSMILENIO.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE LA LISTA DE CHEQUEO QUEDO EN EL 90.91%.
COMPONENTE SOCIAL
LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE CON RESPECTO AL MONC SE TIENEN 17 PERSONAS DE LAS CUALES 13 SON DE LA LOCALIDAD Y MUJERES 9.
LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE SE REMITIÓ UN OFICIO POR INCUMPLIMIENTO A LA LISTA DE CHEQUEO PRELIMINAR TENIENDO EN CUENTA LAS REITERACIONES EMITIDAS AL CONTRATISTA.
LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE YA SE DEBEN PROGRAMAR COMITÉS DE PARTICIPACIÓN Y DE AVANCE.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE SE REITERA LA IMPORTANCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LAS VALLAS INFORMATIVAS.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE DE ACTIVIDADES SOCIALES YA SE DEBEN EMPEZAR A PROGRAMAR LAS REUNIONES DE PARTICIPACIÓN Y AVANCE.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE NO SE HA RECIBIDO LAS ACTAS DE DESVIO DE PARQUE PILOTO, EL CONTRATISTA MANIFIESTA IR AL SITIO A VERIFICAR EL TEMA CON EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO.
LA LISTA DE CHEQUEO QUEDO EL 86% AFECTO EL NO CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTO PREVIOS DE INICIO DE OBRA.
COMPONENTE AMBIENTAL

LA INTERVENTORÍA INDAGA SOBRE EL ESTADO DEL TRAMITE FORESTAL DE ATABANZA, EL CONTRATISTA INDICA QUE EL MIÉRCOLES 23/07/2025 SE RECIBIERON OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SECRETARIA DE AMBIENTE. ESTAS SERÁN REMITIDAS EL LUNES 28/07/2025.

LA INTERVENTORÍA INDICA QUE LA LISTA DE CHEQUEO QUEDO EN 84% SE AFECTO POR NO PRESENCIA DE BOAL, MATERIAL SIN RETIRAR.

COMPONENTE SST

LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE LA LISTA DE CHEQUEO QUEDO EN EL 84%.

LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE SE INCUMPLIÓ CON LA LISTA DE CHEQUEO PRELIMINAR PARA INICIO EN PARQUE PILOTO, YA QUE NO SE TENIA BAÑO, CAMPAMENTO, KIT DE EMERGENCIAS, DE IGUAL FORMA SE EVIDENCIA QUE LA MAQUINA NO TIENE ALARMA DE REVERSA Y HAY SUSTANCIAS QUÍMICAS SIN CLASIFICAR.

- EL CONTRATISTA INDICA QUE ESTO SERA SUBSANADO A MAS TARDAR EL DIA SÁBADO 26/07/2025.

LA INTERVENTORÍA INDICA QUE SE DEBEN ENTREGAR LOS CHALECOS CORRESPONDIENTES A CADA PERSONAL, ESTO TENIENDO EN CUENTA QUE EL TOPÓGRAFO Y PARTE TÉCNICA TIENEN CHALECOS DE COMPONENTE SOCIAL.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

NO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	CUMPLIÓ
1	INFORME DE DIAGNOSTICO APROBADO	TORRES Y ASOCIADOS	VIERNES 01/08/25	
2	ACTA DE EXCLUSIÓN (FORMATO EXCEL)	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	LUNES 28/07/25	
3	INFORMES MENSUALES APROBADOS	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	MARTES 05/08/25	
4	ENTREGA DE RESPUESTA A LA SDM – OBSERVACIONES PMT	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	MARTES 29/07/25	
5	RADICACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD POA	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	LUNES 28/07/2025	
6	INFORMES CCTV FALTANTES	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	MARTES 29/07/2025	

7	INFORME DIAGNOSTICO FASE 1	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	MIÉRCOLES 30/07/2025	
8	RESPUESTA A OBSERVACIONES DE LA SDA ATABANZA	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	LUNES 28/07/2025	
9	SUBSANACIÓN SST OBSERVACIONES EN CAMPO FRENTE - PARQUE POLOTO	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	LUNES 28/07/2025	
11	CALIFICACIÓN DE LISTA DE CHEQUEO PRELIMINAR POA	TORRES Y ASOCIADOS	LUNES 28/07/25	

Elaborada por: María A. Cárdenas Interventoría

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo de desarrollo local de suba
FECHA: 4/07/2025 LUGAR: Hangar.
OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de seguimiento contrato 1010
HORA DE INICIO: 11:30 am HORA DE FINALIZACIÓN:

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONA	TÉCNICO/TE	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONA	LIBRE NOMB.	CONTRATIST				
Maria A Cardenas			X							Torres y Asociados	subatorresyasociados2025@gmail.com	3112752664	Maria
Felipe Chitiva			X						X	FDLS - Infraestructura	luis.chitiva@gobiern	3057748762	
Ingeniero Residente			X							FDLS - INFRAESTRUCTURA	ing.lemuberto@gmail.com	31-314 2031	
Oscar Moreno			X							~~FDLS~~ CSO conservación PG	ingenieria@promotorapargy.com	3203406068	
Ramiro Romero V			X							Cscio conservacion PG	ing.mromero@gmail.com	3208059264	
Paul Rangel Páez			X							CSO Conservación PG	Sisoma@promotorapargy.com	3208741659	
Daniel Alejandro Espitia			X							CSO Consorcio Conservación PG	Residente2@gmail.com	3212028705	
Angie Heredia Cardona			X			X				Torres y Asociados	subatorresyasociados2025@	3106233842	Angie
Angie Paola Toro C.			X							Torres y Asociados	subatorresyasociados2025@g	3146603599	
Daniel felipe suarez J			X							Torres y Asociados	subatorresyAsociados2025@gm	3145225699	
Claudia M. Forero C										Torres y Asociados	subatorresyasociados2025@gmail.com	3152866888	
Christian Fabian Barrera Ponul			X							Torres y Asociados SAS	subatorresyasociados2025@	3132431470	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo de desarrollo local suba.
FECHA: 4/07/2025 LUGAR: Hangar
OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de seguimiento
HORA DE INICIO: 11:30 HORA DE FINALIZACIÓN:

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/TE	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATIST				
Luis Eduardo Blanco			X							Inventario.	Sbotanes y uscocds@gmail.com	3102009455	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C SECRETARÍA DE GOBIERNO	**EVIDENCIA DE REUNIÓN**

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

SE DA INICIO AL COMITÉ NO 11 CON LA LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA, ADICIONAL A ESTO SE INDAGA SI EXISTE ALGUNA OBSERVACIÓN AL ACTA DE COMITÉ 10 Y 11 SIN EMBARGO EL CONTRATISTA INDICA QUE NO EXISTEN OBSERVACIONES Y COMO PUNTO SEGUIDO SE MENCIONAN LOS COMPROMISOS QUE SE PACTARON EL COMITÉ ANTERIOR, LOS CUALES SON:

NO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	CUMPLIÓ
1	INICIO DE OBRA POA	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	MARTES 01/07/2025	NO
2	INFORME DE FWD	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	VIERNES 04/07/25	SIGUE EN PIE
3	INFORME MENSUAL SOCIAL	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	VIERNES 27/06/25	SI (INCOMPLETO)
4	INFORME DE EXCLUSIÓN	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	JUEVES 26/06/25	NO
5	ENTREGA DE INVENTARIO FORESTAL Y DE SUMIDEROS	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	MIÉRCOLES 02/07/25	NO
6	APIQUES FALTANTES FASE 2	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	VIERNES 27/06-/2025	NO
7	PROGRAMACIÓN GENERAL PROYECTO	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	JUEVES 26/06/2025	SI
8	PRESUPUESTO DE VANTI	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	JUEVES 26/06-/2025	NO
9	DISEÑOS FASE 2	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	VIERNES 11/07/2025	SIGUE EN PIE
10	REUNIÓN DE INICIO PARQUE PILOTO	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	JUEVES 26/06/2025	SI
11	INICIO DE ACTAS DE VECINDAD POA	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	MARTES 01/07/2025	NO

12	REPORTE DE MONC	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	MARTES 01/07/2025	SI (03/07/2025)
13	RADICACIÓN DE SUBSANACIONES AMBIENTALES DE ATABANZA	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	JUEVES 26/06/2025	SI

REVISIÓN DE COMPROMISOS
LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE EL CONTRATISTA DE OBRA NO INICIO LA ETAPA DE OBRA EN POA QUE ESTABA PARA EL MARTES 1 DE JULIO DE 2025 ESTE COMPROMISO NO SE DIO CUMPLIMIENTO
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EL INFORME FWD POR PARTE DEL CONSORCIO ESTABA PARA HOY VIERNES 04 DE JULIO 2025 DE LO CUAL SE DEJA CLARIDAD QUE ACABAMOS DE SALIR DE UNA DE UNA MESA DE TRABAJO O UN COMITÉ DE ESPECIALISTAS EN DONDE SE DIO CLARIDAD Y SE LOGRÓ UNIFICAR ALGUNOS CRITERIOS CON RESPECTO A LAS ESTRUCTURAS PLANTEADAS POR EL CONTRATISTA, DIGAMOS QUE LOS RANGOS QUE DIO LA REFLECTOMETRÍA EN ALGUNOS CASOS TRATA DE MEJORAR LA ESTRUCTURA COMO TAL QUE ERA LO QUE SE QUERÍA, EL DÍA DE HOY 04 DE JULIO 2025 NOS VAN A PRESENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA YA LOS ESQUEMAS DE CÓMO VAN A QUEDAR LOS TRAMOS DE POA, NIZA SUR Y CASABLANCA LOS SEIS CIVS QUE HACÍAN FALTA COMO TAL Y LO MISMO EN POTOSÍ ENTONCES PARA EL DÍA MIÉRCOLES 09 DE JULO 2025 ESTÁ EL COMPROMISO DE ENTREGAR LOS INFORMES YA DETALLADOS DE LA PARTE DE DISEÑO DE PAVIMENTOS PARA QUE SEA REVISADO Y AVALADO DEFINITIVAMENTE POR PARTE DE NUESTRO ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS, PUES EN LA MESA DE TRABAJO, ELLOS LOGRARON PRESENTAR CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LOS RESULTADOS QUE SE OBTUVIERON EN LOS ENSAYOS DE FWD Y PUES EN OTROS CASOS DONDE HICIERON EL LWD; SE LOGRÓ ADEMÁS VERIFICAR EL TEMA DE CASA BLANCA, QUE HAY QUE MANEJAR COMO DOS ESTRUCTURAS, HAY QUE REVISAR EL TEMA DEL TRAMO DÓNDE ESTÁ EL ASFALTO SOBRE LOS CONJUNTOS RESIDENCIALES Y QUÉ TIPO DE INTERVENCIÓN SE VA A HACER AHÍ PORQUE DECÍA EL ESPECIALISTA QUE MÍNIMO ESA CARPETA DEBE SER DE 20 CM DE ASFALTO.
LA ENTIDAD INDAGA SOBRE SI EL CONTRATO TIENE NPS APROBADOS, SE LE DEJA CLARIDAD POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE AUN NO, POR LO QUE LA ENTIDAD SOLICITA SE HAGA UNA MESA DE TRABAJO CON EL CONTRATISTA CON EL FIN DE REALIZAR UN INFORME DETALLADO DE ESOS ÍTEMS NO PREVISTOS.
LA ENTIDAD MENCIONA QUE LA ADMINISTRACIÓN NO AVALA PAGOS PARCIALES AL EJECUTOR, NO SE PUEDE DAR AVANCE DE CANTIDADES SIN QUE SE HAYAN SIDO EJECUTADAS Y RECIBIDAS A SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.
LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE EL INFORME MENSUAL SOCIAL SE ENTREGO INCOMPLETO Y HASTA AYER 03 DE JULIO 2025 EN LA TARDE LLEGÓ EL COMPLEMENTO DE LOS SOPORTES PARA HOY 04 DE JULIO 2025 PODERLO RADICAR.
LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE EL CONTRATISTA NO HA REMITIDO EL INFORME DE EXCLUSIÓN CON LOS SOPORTES SOLICITADOS.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE NO SE REMITIÓ POR PARTE DEL CONTRATISTA EL INVENTARIO FORESTAL Y DE SUMIDEROS CON LAS SUBSANACIONES CORRESPONDIENTES. EL CONTRATISTA INDICA QUE PARA EL VIERNES 11 DE JULIO 2025 ESTE SERA REMITIDO.
LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE EL APIQUE DE SUBA CENTRO NO SE PUDO LLEVAR A CABO POR EL TEMA CLIMÁTICO, ESTAMOS A LA ESPERA DE LA REPROGRAMACIÓN DE ESTA ACTIVIDAD.
LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE EL CONTRATISTA PRESENTÓ LA PROGRAMACIÓN DE OBRA Y YA FUE REVISADA POR LA INTERVENTORÍA Y AVALADA, OBVIAMENTE UNA VEZ EL MIÉRCOLES 09 DE JULIO 2025 ENTREGUEN LAS ESTRUCTURAS SE DEBE ACTUALIZAR ESTA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EL PRESUPUESTO DE VANTI NO FUE ALLEGADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA, ADICIONAL A ESTO SE DEJA CLARIDAD QUE EL CONSORCIO PG REALIZO EL TRASLADO DE LA TUBERÍA DE GAS SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA INTERVENTORÍA.
LA ENTIDAD MANIFIESTA QUE TENIENDO EN CUENTA LAS DEMORAS POR PARTE DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS PUES SI ERA MEJOR REALIZAR EL TRASLADO DE LA RED POR PARTE DEL CONTRATISTA Y ESTO TENIENDO EN CUENTA QUE LOS COSTOS PLANTEADOS POR VANTI SON EXAGERADOS.
LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE POR PARTE DEL CONTRATISTA NO SE HA REMITIDO LA PROGRAMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO TIENE OBSERVACIONES EN LAS FECHAS DE INICIO DE LAS FASE DE DIAGNOSTICO, LA CUALES DEBEN SER SUBSANADAS EL 26 DE JUNIO DE 2025.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE SIN EMBARGO ESTA ACTIVIDAD DEBIÓ SER REPORTADA, TENIENDO EN CUENTA QUE TAMBIÉN SE PUDO HABER GENERADO UNA AFECTACIÓN A LOS INDIVIDUOS ARBÓREOS EXISTENTES, POR LO CUAL SE LE REITERA AL

CONTRATISTA LA SOLICITUD DE ENTREGA DEL INFORME FORESTAL DE LAS ACTIVIDADES A LLEVAR A CABO PARA PROTEGER ESTOS ARBOLES EN CASABLANCA.
LA ENTIDAD INDICA QUE CUALQUIER AFECTACIÓN QUE LES OCURRA A ESOS ARBOLES ES RESPONSABILIDAD ÚNICAMENTE DEL CONTRATISTA DE OBRA.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE LA ENTREGA DE LOS DISEÑOS DE FASE 2 SIGUE EN PIE PARA EL VIERNES 11 DE JULIO 2025.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE POR PARTE DEL CONTRATISTA NO SE HA INICIADO LAS ACTAS DE VECINDAD EN EL SECTOR DEL POA COMO SE TENIA PREVISTO.
LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE SE REALIZO LA REUNIÓN DE INICIO DE PARQUE PILOTO EN LA FECHA ESTABLECIDA.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE NO SE HA INICIADO LAS ACTAS DE VECINDAD DE POA. EL CONTRATISTA INDICA QUE SE INICIARON EL DIA DE HOY 04 DE JULIO 2025.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EL REPORTE DEL MONC SE REMITIÓ.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE LA RADICACIÓN DE LAS SUBSANACIONES FORESTALES A LA SECRETARÍA DE AMBIENTE (SDA) SE CUMPLIÓ POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA.
COMPONENTE TÉCNICO
1. CASABLANCA
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE DADA LA REUNIÓN DEL DÍA DE HOY 04 DE JULIO 2025 YA SE CUENTA CON UNA ESTRUCTURA PARA LOS SEGMENTOS PENDIENTES, ESTO CON EL FIN DE INICIAR LAS ACTIVIDADES LO MAS PRONTO POSIBLE.
EL CONTRATISTA INDICA QUE EL MURO DE PIEDRA UNA VEZ SE REALIZÓ LA EXCAVACIÓN DE GAS SE AFECTO.
EL CONTRATISTA INDICA QUE LA VIGA DE CIMENTACIÓN DE LA ESPOL QUE COLINDA CON LA INTERVENCIÓN PRESENTA FISURAS, LA ENTIDAD SOLICITA REVISAR EL ACTA DE VECINDAD Y REMITIR UN COMUNICADO CON ESTA INFORMACIÓN A QUIEN CORRESPONDA.
2. TIBABUYES
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE SE TIENE UNA TUBERÍA DE OCHO PULGADAS, PERO PUES NO SE HA HECHO LLEGAR AL RESULTADO DEL INFORME CCTV, ESTO TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE SABE SI LA RED ES SANITARIA O PLUVIAL DE LO CUAL SE DEJA CLARIDAD QUE SI ES PLUVIAL POR NORMA DEBERÍA CAMBIARSE Y AUMENTAR SU DIÁMETRO A 12" AUNQUE EN SU ENTREGA SEAN MENORES DIÁMETROS.
EL CONTRATISTA INDICA QUE POR PARTE DE ELLOS NO SE TIENE PREVISTO REALIZAR ESE CAMBIO PUESTO QUE LA TUBERÍA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO.
LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE DURANTE LAS EXCAVACIONES EL POSTE QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL CIV FUE AFECTADO PERDIENDO SU ESTABILIDAD, POR LO CUAL SE SOLICITA REALIZAR UN ATRAQUE ADECUADO PARA EVITAR ACCIDENTES.
3. POTOSÍ
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EN POTOSÍ SE REALIZO EL CERRAMIENTO Y LA INSTALACIÓN DE PMT Y A LA FECHA NO HA HABIDO MAS ACTIVIDADES.
LA ENTIDAD INDICA QUE EN VISTA DE ESTE ABANDONO EN EL FRENTE DE OBRA LA COMUNIDAD YA SE ENCUENTRA QUEJÁNDOSE AL RESPECTO, POR LO CUAL LE RECUERDA AL CONTRATISTA LA IMPORTANCIA DE CUMPLIR CON SUS COMPROMISOS ADQUIRIDOS.
4. OTROS
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EL RENDIMIENTO DE OBRA ES BAJO EN CUANTO A LAS ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN INICIANDO POR POTOSÍ, PUES SE HIZO EL CERRAMIENTO Y NO HAY NINGUNA ACTIVIDAD, EN COSTA AZUL TAMBIÉN DURO VARIOS DÍAS SIN NINGUNA ACTIVIDAD HASTA EL DÍA MARTES FUE QUE INICIARON CON LAS EXCAVACIONES MECÁNICAS Y EN CASABLANCA, PUES LA ÚNICA ACTIVIDAD QUE LITERALMENTE SE ESTÁ HACIENDO ES EL TEMA DE LA RED DE GAS ENTONCES PUES POR PARTE DE NOSOTROS NO HEMOS VISTO GRAN AVANCE EN CUANTO A LA EJECUCIÓN DE OBRA.
EL CONTRATISTA INDICA QUE EL DIA 8 DE JULIO 2025 SE ESTARÁ INICIANDO LABORES EN PARQUE PILOTO Y NIZA SUR, Y QUE TENIENDO EN CUENTA LA REUNIÓN DE LOS ESPECIALISTAS EL DIA DE HOY EN POTOSÍ EL DIA LUNES 07 DE JULIO 2025 SE DARA INICIO A LA EXCAVACIÓN EN EL TRAMO. ASIMISMO, MENCIONA QUE DEBIDO A LOS CIERRES DE LAS ESCOMBRERAS EL MATERIAL ACOPIADO ES MUCHO POR LO CUAL NO SE HA PODIDO AVANZAR CON LAS ACTIVIDADES EN CASABLANCA.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EL PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO ES IGUAL AL 3.82% PARA EL CORTE DE LA SEMANA PASADA.
COMPONENTE PMT
LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE AUN NO SE TIENE APROBADO EL PMT DE POA POR LO CUAL TAMPOCO ESTA APROBADO EL INICIO DE OBRA EN EL FRENTE.

LA INTERVENTORÍA INDAGA SOBRE EL PMT DE SUBA CENTRO, A LO CUAL SE LE MENCIONA QUE EL ESPECIALISTA DE TRANSITO SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN ESO PARA RADICAR LO MAS PRONTO POSIBLE.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EL INFORME MENSUAL YA FUE REVISADO Y ENVIADAS LAS OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES, EL CONTRATISTA INDICA QUE EL DIA LUNES 07 DE JULIO SE REMITIRÁ SUBSANADO.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE LA LISTA DE CHEQUEO QUEDO EN EL 95.45% TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE HAN IMPLEMENTADO LAS BARRICADAS DE DESVIO. Y LA LISTA ACUMULADA DE JUNIO QUEDO EN 94.32%.
COMPONENTE SOCIAL
LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE EN CUANTO A REUNIONES DE INICIO PUES TODAVÍA NO HA REMITIDO PROGRAMACIÓN.
LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE SE INCUMPLIÓ CON EL INICIO DE LAS ACTAS DE VECINDAD DE POA.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EL INFORME MENSUAL QUEDARA RADICADO HOY 04 DE JULIO 2025 A LA ENTIDAD.
LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE SE ESTA DANDO CUMPLIMIENTO AL PORCENTAJE DE MUJERES DEL CONTRATO Y DE LA LOCALIDAD, PERO QUE SIN EMBARGO AUN NO SE CUENTA CON PORCENTAJE DE CONFLICTO ARMADO Y VULNERABILIDAD, ADICIONAL A ESTO NO SE HAN REMITIDO EN SU TOTALIDAD LOS CERTIFICADOS DE RESIDENCIA DE LOS 16 EMPLEADOS DE LA LOCALIDAD.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE LAS ACTAS DE VECINDAD DE PARQUE PILOTO ESTÁN ATRASADOS NO LLEVAN NI EL 50% DE LAS ACTAS, POR OTRA PARTE, LAS ACTAS DE POA NO SE HAN INICIADO TENIENDO EN CUENTA QUE YA SE HIZO REUNIÓN DE INICIO Y SE TIENE FECHA DE INICIO EL 1 DE JULIO DEL 2025.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE NO SE HA ENTREGADO EL INFORME MENSUAL SOCIAL DE JUNIO, SE INDICA QUE EL DIA LUNES 7 DE JULIO 2025 SE ESTARÁ ENVIANDO
LA LISTA DE CHEQUEO QUEDO EN EL 94%.
COMPONENTE AMBIENTAL
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE LA LISTA DE CHEQUEO QUEDO EN 98% TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE HA REMITIDO LA SUBSANACIÓN DEL INVENTARIO FORESTAL.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE LA DOCUMENTACIÓN DE ATABANZA FUE RADICADA A LA ENTIDAD PARA LA FIRMA CORRESPONDIENTE CON EL FIN DE DAR EL TRAMITE A LA SDA.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE NO SE HA REMITIDO EL INFORME TÉCNICO DE CASABLANCA DE LOS ARBOLES EXISTENTES Y LAS MEDIDAS TOMADAS PARA NO AFECTARLOS. ESTE SERA REMITIDO EL JUEVES 10 DE JULIO 2025.
COMPONENTE SST
LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE LA LISTA DE CHEQUEO QUEDO EN EL 98%.
LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE SE DEBE TENER LAS CARPETAS SST, CAMPAMENTO, LA SEÑALIZACIÓN SST EN CADA FRENTE DE OBRA QUE VAYA A DAR INICIO.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE SE DEBE ACTUALIZAR LA MATRIZ DE PERSONAL.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE SE REMITIÓ EL INFORME SST DE JUNIO EL CUAL ESTA EN REVISIÓN Y EL DIA DE HOY 04 DE JULIO SE REMITIRÁN LAS OBSERVACIONES SI APLICA.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

NO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	CUMPLIÓ
1	INICIO DE OBRA POA	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	MARTES 08/07/2025	
2	INFORME DE ESTRUCTURAS	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	MIÉRCOLES 09/07/25	

3	RADICACIÓN DE INFORME MENSUAL SOCIAL	TORRES Y ASOCIADOS	VIERNES 04/07/25	
4	INFORME DE EXCLUSIÓN	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	MARTES 08/07/25	
5	ENTREGA DE INVENTARIO FORESTAL Y DE SUMIDEROS	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	VIERNES 11/07/25	
6	APIQUES FALTANTES FASE 2	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	LUNES 07/07-/2025	
7	INFORME FORESTAL DE CASABLANCA	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	JUEVES 10/07/2025	
8	INICIO DE OBRA PARQUE PILOTO Y NIZA SUR	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	MARTES 08/07-/2025	
9	DISEÑOS FASE 2	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	VIERNES 11/07/2025	
10	INICIO DE EXCAVACIÓN POTOSÍ	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	LUNES 07/07/2025	
11	INFORME MENSUAL SOCIAL JUNIO	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	LUNES 07/07/2025	
12	INFORME MENSUAL TÉCNICO JUNIO	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	SÁBADO 05/07/2025	
13	OBSERVACIONES A INFORME SST Y AMBIENTAL	TORRES Y ASOCIADOS	SÁBADO 05/07/2025	

Elaborada por: María A. Cárdenas Interventoría

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo de desarrollo local de Suba
FECHA: 11/07/2025 LUGAR: Oficina Interventoria
OBJETO DE LA REUNIÓN: Comite de Seguimiento
HORA DE INICIO: 1:05 pm HORA DE FINALIZACIÓN:

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESION	TÉCNICO/N	AUXILIAR	CARRERA	PROVISION	LIBRE	CONTRATIS				
Maria A Cardenas			X							Torres y Asociados SAS	subatorres y Asociados 2025@gmail.com	3114752669	
Angie Paola Too Cardona			X							Torres y Asoaados SAS	subatorresyasociados2025	3146603599	
Gladys Bocanegra			X							CSO conservación PG	conservacionpg@gmail.com	3058034490	
Felipe Chitiva			X						X	FOLS - Infraestructura	luis.chitiva@gobiernobo	3017970867	
Ernesto Hamon Lemus F			X							FOLS - INTRAPOLIT	ing.lemusfernandez@gmail.com	3103142720	
Claudia Marcela Forero C			X							Torres y Asociados	subatorres y asociados 2025@gmail.com	8115236630	
Daniel Felipe Suarez Justo			X							Torres y Asociados	subatorres y asociados 2025@gmail.com	3112276	
Christian Felipe Rodriguez			X							Torres y Asociados	subatorres y asociados 2025@gmail.com	3108689061	
Jorge Daniel Suarez			X							CSO Conservación PG	Residente Ambiental	3212288305	
Luz Manuel Murillo Naranjo			X							CSO Conservación PG	Residente Ambiental	3132588369	
Mauricio Romero			X							Cso conservación PG	Director Ambiental	3208859294	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Foro de desarrollo local de Suba
FECHA: 11/07/2025 LUGAR: Oficina Interventoría
OBJETO DE LA REUNIÓN:
HORA DE INICIO: 1:55 pm HORA DE FINALIZACIÓN:

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESION	TÉCNICO/N	AUXILIAR	CARRERA	PROVISION	LIBRE	CONTRATIS				
Oscar Mora			x							CSO Conservación PG	ingenieria@promotora	3203460228	
Paul Rangel Páez			x							CSO Conservación PG	Sisoma@promotora puga.com	3228710637	
Angie Henao Cardona			x			x				Torres y Asociados	Subalcaldes y asociados 2025@gmail.com	3106273842	Angie H
Luis Enrico Blanco			x							Torres y Asociados	Subalcaldes y asociados 2025@gmail.com	3102009455	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C SECRETARÍA DE GOBIERNO	**EVIDENCIA DE REUNIÓN**

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

SE DA INICIO AL COMITÉ NO 13 CON LA LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA, ADICIONAL A ESTO SE INDAGA SI EXISTE ALGUNA OBSERVACIÓN AL ACTA DE COMITÉ 12 SIN EMBARGO EL CONTRATISTA INDICA QUE NO EXISTEN OBSERVACIONES Y COMO PUNTO SEGUIDO SE MENCIONAN LOS COMPROMISOS QUE SE PACTARON EL COMITÉ ANTERIOR, LOS CUALES SON:

NO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	CUMPLIÓ
1	INICIO DE OBRA POA	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	MARTES 08/07/2025	NO
2	INFORME DE ESTRUCTURAS	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	MIÉRCOLES 09/07/25	NO
3	RADICACIÓN DE INFORME MENSUAL SOCIAL MAYO	TORRES Y ASOCIADOS	VIERNES 04/07/25	SI
4	INFORME DE EXCLUSIÓN	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	MARTES 08/07/25	NO
5	ENTREGA DE INVENTARIO FORESTAL Y DE SUMIDEROS	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	VIERNES 11/07/25	NO
6	APIQUES FALTANTES FASE 2	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	LUNES 07/07-/2025	SI
7	INFORME FORESTAL DE CASABLANCA	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	JUEVES 10/07/2025	NO
8	INICIO DE OBRA PARQUE PILOTO Y NIZA SUR	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	MARTES 08/07-/2025	PARQUE PILOTO SI (10/07/2025) NIZA SUR NO
9	DISEÑOS FASE 2	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	VIERNES 11/07/2025	SIGUE EN PIE
10	INICIO DE EXCAVACIÓN POTOSÍ	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	LUNES 07/07/2025	NO
11	INFORME MENSUAL SOCIAL JUNIO	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	LUNES 07/07/2025	NO
12	INFORME MENSUAL TÉCNICO JUNIO	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	SÁBADO 05/07/2025	SI
13	OBSERVACIONES A INFORME SST Y AMBIENTAL	TORRES Y ASOCIADOS	SÁBADO 05/07/2025	SI

REVISIÓN DE COMPROMISOS
LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE EL CONTRATISTA DE OBRA NO INICIÓ LA ETAPA DE OBRA EN POA QUE ESTABA PARA EL MARTES 8 DE JULIO DE 2025 NO SE DA CUMPLIMIENTO ESTE COMPROMISO
• EL CONTRATISTA INDICA QUE NO SE HA APROBADO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD (SDM) Y ESTE SE RADICÓ NUEVAMENTE AYER JUEVES 10 DE JULIO.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EL INFORME DE ESTRUCTURAS DE PAVIMENTOS RESULTANTE DE LOS ENSAYOS INICIALES Y COMPLEMENTARIOS (DEFLECTOMETRÍA), NO FUE REMITIDO EN LA FECHA ESTABLECIDA EL CONTRATISTA, DICHO DOCUMENTO LLEGO A LA INTERVENTORÍA EL VIERNES 11 DE JULIO 2025 PREVIO AL COMITÉ, SE REMITIRÁ A REVISIÓN POR PARTE DE NUESTRO ESPECIALISTA DE PAVIMENTOS.
LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE EL INFORME MENSUAL SOCIAL DE MAYO FUE RADICADO A LA ENTIDAD EN LA FECHA ESTABLECIDA.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE A LA FECHA NO SE HA DADO CUMPLIMIENTO A LA ENTREGA DEL INFORME DE EXCLUSIÓN DE SEGMENTOS, ESTE COMPROMISO SE HA INCUMPLIDO DE MANERA REITERATIVA DURANTE VARIOS COMITÉS DE OBRA.
• LA ENTIDAD MANIFIESTA, QUE AL NO ENTREGAR ESTE INFORME EL CONTRATISTA ESTA INCUMPLIENDO CON LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO. ESTO TENIENDO EN CUENTA QUE DE ESTE INFORME DEPENDE LA INFORMACIÓN PARA AJUSTAR EL BALANCE PRESUPUESTAL.
• EL CONTRATISTA INDICA QUE PARA EL JUEVES 17 DE JULIO 2025 ESTE DOCUMENTO SERA REMITIDO A LA INTERVENTORÍA.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE NO SE REMITIÓ POR PARTE DEL CONTRATISTA EL INVENTARIO FORESTAL Y DE SUMIDEROS DE PARQUE PILOTO, Y POA.
LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE EL APIQUE DE SUBA CENTRO SE LLEVÓ A CABO EN LA FECHA ESTABLECIDA.
LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE EL CONTRATISTA PRESENTÓ EL INFORME FORESTAL SOLICITADO DE CASABLANCA EL CUAL ESTA EN REVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EL INICIO DE OBRA DE PARQUE PILOTO SE DIO EL 10 DE JULIO DE 2025 Y NIZA SUR HASTA HOY 11 DE JULIO 2025.
LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE LA ENTREGA DE LOS DISEÑOS DE FASE 2 SIGUE EN PIE PARA EL DIA DE HOY 11 DE JULIO 2025, EL CONTRATISTA INDICA QUE SE ENVIARA EN EL TRANSCURSO DEL DIA.
LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE POR PARTE DEL CONTRATISTA NO SE HA INICIADO CON LAS ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN EN POTOSÍ COMO SE TENIA PREVISTO.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EL INFORME MENSUAL SOCIAL DE JUNIO FUE REMITIDO HASTA EL DIA 10 DE JULIO 2025 Y A ESTE YA SE LE REMITIERON OBSERVACIONES POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA. LAS CUALES EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE SERÁN SUBSANADAS EL LUNES 14 DE JULIO 2025.
LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE EL INFORME MENSUAL TÉCNICO DE JUNIO FUE REMITIDO EL DIA SÁBADO 05 DE JULIO Y A ESTE SE LE ENVIARON OBSERVACIONES, LAS CUALES FUERON SUBSANADAS Y ENVIADAS EL DIA 11 DE JULIO 2025 Y SE LE REITERARON ALGUNAS OBSERVACIONES LAS CUALES EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE QUEDARAN SUBSANADAS EL DIA 12 DE JULIO 2025.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE LAS OBSERVACIONES A LOS INFORMES SST Y AMBIENTAL FUERON REMITIDAS EN LA FECHA ESTABLECIDA.
LA ENTIDAD INDAGA SOBRE SI LAS LISTAS DE CHEQUEO SE ESTÁN VIENDO AFECTADAS POR EL NO CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA.
• LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE EFECTIVAMENTE ESTAS LISTAS SE HAN CASTIGADO POR LA NO ENTREGA DE LO REQUERIDO EN CADA COMPONENTE.
LA ENTIDAD INDICA QUE SEGÚN LO MANIFESTADO POR LA INTERVENTORÍA SOLICITA QUE SE PRONUNCIE SI ES NECESARIO INICIAR UN PROCESO DE INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO.
• LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE VE CON PREOCUPACIÓN LA FALTA DE COMPROMISO EN ENTREGAR LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS COMO LO ES EL INFORME DE EXCLUSIÓN, INFORME DE DIAGNOSTICO, INFORME PRELIMINAR, ASIMISMO EL NO CIERRE DE LAS ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO DE FASE 1 DE LAS CUALES AUN ESTA PENDIENTE NIZA SUR 11010621 Y POA.
• LA INTERVENTORÍA INDICA QUE SE HAN REALIZADO LAS MESAS DE TRABAJO REQUERIDAS PARA SUBSANAR RÁPIDAMENTE LAS OBSERVACIONES SIN EMBARGO LA ENTREGA DEL INFORME NO ESTA SIENDO RÁPIDA.
LA ENTIDAD INDAGA SOBRE LAS PRUEBAS REALIZADAS CON EL FWD Y LWD SI SON CONFIABLES. EL CONTRATISTA INDICA QUE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LA DEFLECTOMETRÍA SON MUY ACERTADOS Y CON REFERENCIA A ESTE SE ESTÁN DANDO LAS PROPUESTAS CORRESPONDIENTES.

LA INTERVENTORÍA PROPONE UNA MESA DE TRABAJO PRESENCIAL CON LOS ESPECIALISTAS CON EL FIN DE DEFINIR LAS ESTRUCTURAS FALTANTES.
LA ENTIDAD INDAGA SI SE PUEDE INICIAR POA AL DIA VIERNES 18 DE JULIO 2025, SIN EMBARGO, SE LE MENCIONA POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE AUN NO SE TIENE PMT APROBADO Y SE TIENE PREVISTO QUE ESTE SALGA APROBADO AL DIA JUEVES 17 DE JULIO 2025.
LA ENTIDAD MANIFIESTA QUE, SI AL DIA MARTES NO SE HA SUBSANADO LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA, LA INTERVENTORÍA DEBE ENTREGAR EL DIA VIERNES 18 DE JULIO 2025 EL INFORME DE INCUMPLIMIENTO CORRESPONDIENTE.
LA ENTIDAD INDAGA SOBRE EL INICIO DE PARQUE PILOTO, EL CONTRATISTA INDICA QUE YA SE INICIO INSTALACIÓN DE PMT. SIN EMBARGO, NO SE PUEDE INICIAR EXCAVACIONES AUN PUESTO QUE NO HA TERMINADO ACTAS DE VECINDAD.
• LA INTERVENTORÍA INDICA QUE SOLO SE TIENEN 2 EQUIPOS, PERO SIN EMBARGO SOLO SE CUENTA CON 1 TÉCNICO PARA ESTA ACTIVIDAD, ADICIONAL A ESTO ESTÁN REALIZANDO DICHAS ACTAS DE FORMA ESPORÁDICA POR LO CUAL LA COMUNIDAD MANIFIESTA SU INCONFORMIDAD YA QUE ELLOS SE PROGRAMAN PARA LA ACTIVIDAD Y SE INCUMPLE.
LA ENTIDAD TENIENDO EN CUENTA EL INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN Y EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES PREVIAS AL INICIO DE OBRA SOLICITA QUE LA INTERVENTORÍA OFICIE AL CONTRATISTA CON EL FIN DE QUE PRESENTE LA REMISIÓN DE UN PLAN DE CONTINGENCIA, EL CUAL DEBE SER ENVIADO A MAS TARDAR EL DIA LUNES 14 DE JULIO 2025.
LA ENTIDAD INDAGA SOBRE CUANDO SE TENDRÁ MAQUINARIA EN PARQUE PILOTO, EL CONTRATISTA INDICA QUE EL DIA MIÉRCOLES 16 DE JULIO 2025.
LA ENTIDAD INDAGA SOBRE EL INICIO DE EXCAVACIONES EN NIZA SUR, EL CONTRATISTA MENCIONA QUE DE IGUAL FORMA EL DIA MIÉRCOLES 16 DE JULIO SE ALLEGARA LA MAQUINARIA EN EL 11010613.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EL CONTRATISTA NO SE LE AUTORIZARA INICIO DE OBRA EN NINGÚN FRENTE, HASTA TANTO NO DE CUMPLIMIENTO A LA LISTA DE CHEQUEO PRELIMINAR QUE SE TIENE POR COMPONENTE.
LA ENTIDAD MENCIONA QUE SEGÚN LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO SE DEBE TENER EN CUENTA QUE LA MAYOR PERMANENCIA DE LA INTERVENTORÍA POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL FDLS DEBE SER PAGADA POR EL CONTRATISTA DE OBRA EN CASO DE REQUERIR UNA PRORROGA.
LA INTERVENTORÍA INDAGA SOBRE LOS INFORMES CTVS. PENDIENTES POR ENTREGAR, EL CONTRATISTA INDICA QUE AL DIA MIÉRCOLES 16 DE JULIO 2025 SE HARÁ LA REMISIÓN A LA INTERVENTORÍA.
LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE SE DEBE ENTREGAR LAS ACTAS DE VECINDAD ANTES DEL INICIO DE LOS FRENTES MENCIONADOS, ESTO TENIENDO EN CUENTA QUE A LA FECHA EL CONTRATISTA ESTA REALIZANDO LA ACTIVIDAD CON 2 EQUIPOS EN ROTACIÓN DE UN FRENTE A OTRO LO CUAL SE HA VUELTO MOLESTO PARA LA COMUNIDAD Y ESTA GENERANDO UN BAJO RENDIMIENTO EN LA ACTIVIDAD.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EL CONTRATISTA YA TENIA RELACIONADA LA LISTA DE CHEQUEO PRELIMINAR DESDE ANTES DE INICIAR LAS ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN, SIN EMBARGO, AL PARECER NO LA TIENE CLARA, POR LO CUAL LA INTERVENTORÍA REITERA QUE NO SE DARA AVAL AL INICIO DE OBRA HASTA TANTO NO SE DE EL DEBIDO CUMPLIMIENTO A ESTA.
LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE POR PARTE DE TORRES Y ASOCIADOS SE HA HECHO LA GESTIÓN CORRESPONDIENTE PARA QUE EL CONTRATISTA DE CUMPLIMIENTO A LO REQUERIDO, ESTO TENIENDO EN CUENTA EL APREMIO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO REMITIDO, EL OFICIO DE INCUMPLIMIENTO EN INICIO DE OBRA Y DEL COMPONENTE SOCIAL DEL CUAL SE DEJA LA TRAZABILIDAD EN EL APEX DE LA SEMANA.
COMPONENTE TÉCNICO
1. CASABLANCA
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE SE GENERÓ UNA AFECTACIÓN EN EL TUBO DE GAS DE 4" POR PARTE DE LA MAQUINA QUE ESTABA HACIENDO LOS CARGUES DE MATERIAL RCD, UNA VEZ EVIDENCIADA LA FUGA SE HIZO EL REPORTE CORRESPONDIENTE A VANTI Y A LOS BOMBEROS, LOS CUALES ACUDIERON AL SITIO PARA HACER EL MANEJO Y ARREGLO CORRESPONDIENTE.
LA ENTIDAD INDAGA SOBRE EL OFICIO DE TRAZABILIDAD A VANTI POR LA UBICACIÓN DE LA RED EN LA VÍA, LA INTERVENTORÍA INDICA QUE SE REMITIÓ ESTE COMUNICADO LA SEMANA PASADA.
LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE EN CASABLANCA SE HA EVIDENCIADO BAJO RENDIMIENTO, ESTO TENIENDO EN CUENTA QUE SOLO HAY 2 PERSONAS LABORANDO Y EL FRENTE ESTA LLENO DE ACOPIOS DE RCD LOS CUALES NO HAN SIDO RETIRADOS PARA AVANZAR CON LAS ACTIVIDADES, LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA INCONFORME CON ESTE TEMA.
EL CONTRATISTA INDICA QUE EN LAS ESCOMBRERAS NO ESTÁN RECIBIENDO MATERIAL HÚMEDO POR ESO SE HA RETRASADO EL RETIRO DEL MATERIAL.
LA ENTIDAD MENCIONA QUE EL JUEVES 17 DE JULIO 2025 EL ALCALDE HARÁ UNA VISITA AL FRENTE DE OBRA DE CASABLANCA A LAS 7 AM.

LA INTERVENTORÍA INDICA QUE SE HAN HECHO LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITÁCORA.
2. TIBABUYES
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE SE TUVO UN INCIDENTE IGUALMENTE CON LA RED DE GAS, ESTO TENIENDO EN CUENTA QUE SE AFECTO EL TUBO CON ROTOMARTILLO, SIN EMBARGO, SE REPORTO EL INCIDENTE Y SE HICIERON LAS REPARACIONES CORRESPONDIENTES POR PARTE DE VANTI.
LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE LA TUBERÍA DOMICILIARIA EN PVC DE 6" QUE ESTÁN EXPUESTAS DENTRO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO SE LE DEBE HACER CÁRCAMO DE PROTECCIÓN.
LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE EXISTE INCONFORMIDAD POR LA COMUNIDAD CON REFERENCIA EN LOS ANDENES PUESTO QUE QUEDA UNA MUELA ENTRE EL PAVIMENTO Y LA RAMPA QUE TIENEN PARA ACCESOS, SIN EMBARGO, LA POSTURA DEL CONTRATISTA ES DEJAR EL BAJO RAMPA Y QUE LOS PROPIETARIOS SE ENCARGUEN DE ARREGLAR.
3. POTOSÍ
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EN POTOSÍ SE EVIDENCIA BAJO RENDIMIENTO, ESTO TENIENDO EN CUENTA QUE A LA FECHA NO SE HA INICIADO CON LAS EXCAVACIONES Y LA UNICA ACTIVIDAD REALIZADA ES LA DEMOLICIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE.
4. OTROS
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE NO SE HA ENTREGADO POR PARTE DEL CONTRATISTA LA CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES A IMPLEMENTAR, POR LO CUAL SE DEJA CLARIDAD QUE CUALQUIER MATERIAL INSTALADO SIN LA DEBIDA APROBACIÓN DE LA INTERVENTORÍA NO SERÁ PAGADO.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EL INFORME PRELIMINAR NO HA SIDO ENTREGADO POR LO CUAL SOLICITA LA FECHA DE ENTREGA, EL CONTRATISTA MENCIONA QUE EL DIA 18 DE JULIO 2025 SERA ENVIADO.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EL INFORME DE DIAGNÓSTICOS DE FASE 1 Y 2 DE IGUAL FORMA ESTA PENDIENTE, EL CONTRATISTA MENCIONA QUE EL DIA 18 DE JULIO 2025 SERA REMITIDO.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EL AVANCE PARA LA SEMANA DEL 30 DE JUNIO AL 6 DE JULIO 2025 QUEDO EN PROGRAMADO DEL 5% Y EJECUTADO DEL 4.25% LO CUAL ARROJA UN ATRASO DEL 0.75%.
COMPONENTE PMT
LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE EL PMT DE POA SE DEBIÓ RADICAR NUEVAMENTE ESTO DADO QUE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD CERRO SUBSANACIONES LA SEMANA PASADA.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE CON RESPECTO AL PMT DE SUBA CENTRO E L INGENIERO ESPECIALISTA DEL CONTRATISTA YA REMITIÓ UNA NUEVA PROPUESTA LA CUAL SERA REVISADA.
LA INTERVENTORÍA INDAGA SOBRE LA GESTIÓN DE LOS DISEÑOS DE SEÑALIZACIÓN, EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE YA SE ESTA TRABAJANDO EN ESTO.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EL INFORME MENSUAL YA FUE REVISADO Y RADICADO A LA ENTIDAD.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE LA LISTA DE CHEQUEO QUEDO EN EL 95.45% TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE CUMPLIÓ CON LA FECHA DE ENTREGA DEL INFORME.
COMPONENTE SOCIAL
LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA LAS ACTAS DE VECINDAD SE HAN VENIDO HACIENDO DE MANERA ESPORÁDICA EN LOS FRENTES DE PARQUE PILOTO, POA Y NIZA SUR.
LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE EN CUANTO AL MONC SE TIENEN 14 PERSONAS 13 DE LA LOCALIDAD 3 EN VULNERABILIDAD Y 3 MUJERES, SIN EMBARGO, NO SE CUENTA CON LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES PARA VERIFICAR LOS PORCENTAJES, ESTA INFORMACIÓN FUE SOLICITADA EL COMITÉ PASADO.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE SE TIENE LA PRIMERA PQR DE CASABLANCA, EN DONDE SE SOLICITA LA REALIZACIÓN DEL ACTA DE VECINDAD YA QUE CUANDO SE TENIA PREVISTA LA REALIZACIÓN DE DICHAS ACTAS, LA ADMINISTRACIÓN DEL CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE GRANADA NO PERMITIÓ EL INGRESO HACIA LOS APARTAMENTOS.
• LA INTERVENTORÍA RECOMIENDA SIN EMBARGO QUE EL CONTRATISTA REALICE ESTAS ACTAS DE VECINDAD PENDIENTES O SOLICITADAS POR LOS PROPIETARIOS PARA TENER EL SOPORTE CORRESPONDIENTE DE LAS VIVIENDAS. SIN EMBARGO, ES A CRITERIO DEL CONTRATISTA SI QUIERE HACERLO.
• EL CONTRATISTA MANIFIESTA HABER CUMPLIDO CON LAS 3 VISITAS DE NOTIFICACIÓN POR LO CUAL YA NO ES OBLIGACIÓN DE EL REALIZARLAS.
• LA INTERVENTORÍA SOLICITA LA RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN ALLEGADO, EL CONTRATISTA INDICA QUE EL 25 DE JULIO 2025 SE REMITIRÁ LA RESPUESTA.

LA LISTA DE CHEQUEO QUEDO EL 86% AFECTÁNDOSE POR EL NO CUMPLIMIENTO EN EL CRONOGRAMA DE ACTAS DE VECINDAD, POR EL NO CUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS PARA INICIAR ACTAS DE VECINDAD, POR LA NO RADICACIÓN DE LOS INVENTARIOS PREDIALES, POR LA NO ENTREGA OPORTUNA DEL INFORME, SOPORTES DE MONC.
LA INTERVENTORÍA RECOMIENDA IMPLEMENTAR MAS PERSONAL SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES. DE IGUAL FORMA SE DEJA CLARIDAD QUE CUALQUIER REUNIÓN EXTRAORDINARIA O ACTIVIDAD CON LA COMUNIDAD DEBE SER AVISADA PREVIAMENTE ALA INTERVENTORÍA.
LA INTERVENTORÍA INDAGA SOBRE CUANDO SERÁN REMITIDAS LAS ACTAS DE VECINDAD DE LOS FRENTES A INICIAR, EL CONTRATISTA INDICA QUE EL 16 DE JULIO 2025 SE RETIRAN NIZA SUR Y EL 18 DE JULIO POA.
LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE A LA FECHA AUN NO SE TIENEN PROGRAMACIÓN DE MAS REUNIONES DE INICIO.
COMPONENTE AMBIENTAL
LA INTERVENTORÍA INDICA ESTA PENDIENTE LA ENTREGA DE LOS INVENTARIOS FORESTALES DE POA Y PARQUE PILOTO, ESTO TENIENDO EN CUENTA QUE SE HA AFECTADO LA LISTA DE CHEQUEO DURANTE 3 SEMANAS CONSECUTIVAS POR LE MISMO TEMA.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE DE ACUERDO CON EL PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL 3 ACTIVIDADES O ítems DE LA LISTA DE CHEQUEO EN 0 DURANTE 3 SEMANAS CONSECUTIVAS GENERA UN PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, POR LO CUAL SE LE REMITIRÁ ESTE DOCUMENTO AL CONTRATISTA PARA DEJAR LOS SOPORTES DE LAS SOLICITUDES Y LLAMADOS DE ATENCIÓN QUE HA HECHO LA INTERVENTORÍA.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EL 16 DE JULIO 2025 SE REMITIRÁ POR PARTE DEL CONTRATISTA LA INFORMACIÓN REQUERIDA.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE LA LISTA DE CHEQUEO QUEDO EN EL 96% AFECTÁNDOSE, POR EL INVENTARIO FORESTAL EN LA PARTE AMBIENTAL.
LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE EL REPORTE DEL PIN SE RELACIONÓ DENTRO DEL INFORME, SIN EMBARGO, NO ESTÁN LOS SOPORTES, SE DEJA CLARIDAD QUE DENTRO DE LOS MENSUALES DEBEN RELACIONARSE, SI NO SE TIENEN SE DEBE ANEXAR EL DOCUMENTO DE SOLICITUD.
EL CONTRATISTA INDICA EL CAMBIO DE PROFESIONAL AMBIENTAL PARA PODER SUBSANAR TODAS LAS OBSERVACIONES Y PENDIENTES QUE SE TIENEN EN EL COMPONENTE.
COMPONENTE SST
LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE LA LISTA DE CHEQUEO QUEDO EN EL 96%.
LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE SE SUBSANO EL INFORME MENSUAL SST Y EL DIA 11 DE JULIO SERA REMITIDO EL OFICIO DE APROBACIÓN SI NO EXISTEN MAS OBSERVACIONES.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE CON RESPECTO A LA DOCUMENTACIÓN ALLEGADA EL DIA DE AYER 10 DE JULIO SE EVIDENCIO EL FALTANTES DE ALGUNOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL VIBROCOMPACTADOR Y OPERADOR QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN TIBABUYES, POR LO CUAL NO SE AUTORIZA QUE ESTA PERSONA SIGA CON ACTIVIDADES.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EL 15 DE JULIO 2025 SE VA A HACER LA REVISIÓN DE LO REQUERIDO PARA DAR INICIO EL MIÉRCOLES 16 DE JULIO EN LOS FRENTES MENCIONADOS.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

NO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	CUMPLIÓ
1	INICIO DE OBRA POA	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	VIERNES 18/07/2025	
2	INFORME DE ESTRUCTURAS	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	VIERNES 11/07/25	

3	INFORME MENSUAL SOCIAL JUNIO	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	LUNES 14/07/25	
4	INFORME DE EXCLUSIÓN	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	MIÉRCOLES 17/07/25	
5	ENTREGA DE INVENTARIO FORESTAL Y DE SUMIDEROS	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	MIÉRCOLES 16/07/25	
6	INFORME MENSUAL TÉCNICO SUBSANADO	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	SÁBADO 12/07/2025	
7	PLAN DE CONTINGENCIA	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	LUNES 14/07/2025	
8	INICIO DE EXCAVACIONES PARQUE PILOTO Y NIZA SUR	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	MIÉRCOLES 16/07/2025	
9	DISEÑOS FASE 2	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	VIERNES 11/07/2025	
10	INFORMES CCTV CASABLANCA, TIBABUYES Y PARQUE PILOTO	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	MIÉRCOLES 16/07/2025	
11	INFORME PRELIMINAR	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	VIERNES 18/07/2025	
12	INFORME DIAGNOSTICO FASE 1 Y 2	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	VIERNES 18/07/2025	
13	RESPUESTA A DERECHO DE PETICIÓN DE CASABLANCA	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	VIERNES 25/07/2025	

14	RADICACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD DE NIZA SUR	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	MIÉRCOLES 16/07/2025	
15	RADICACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD DE POA	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	VIERNES 18/07/2025	
16	RECORRIDO DE VERIFICACIÓN DE LISTA DE CHEQUEO PRELIMINAR PARA NIZA SUR Y PARQUE PILOTO	TORRES Y ASOCIADOS	MARTES 15/07/2025	

Elaborada por: María A. Cárdenas Interventoría
