ACTA PARCIAL No 002
PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA

Email: oficinah2m@hotmail.com
CARRERA 14 NO 11-08 BARRIO SAN FRANCISCO
FLORENCIA - CAQUETÁ

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

ACTA PARCIAL N002

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3		
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA		
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2	**CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CI 001 del 03 de Octubre de 2025
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA TERMINACIÓN FINAL**	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE REINICIO:**	24 DE FEBRERO DE 2026	**ACTA PARCIAL No.2**	02 DE MARZO DE 2026
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE TERMINACION FINAL**	26 DE ABRIL DE 2026		
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **LA ESPERANZA**	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDADES			VALORES		ACTA PARCIAL No 2		ACUMUADO ACTAS		POR COBRAR		CANT ACTUALIZADA	VALOR TOTAL ACTUALIZADO
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	+/	MAY (+)	MEN (-)	MAY (+)	MEN (-)	CANT	SUBTOTAL	CANT		CANT	SUBTOTAL		
1	**PRELIMINARES**				**33,995,622.00**				**3,754,643.00**	**- 3,422,818.00**		-		**34,327,445.00**				**34,327,445.00**
1.01	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS (LAVAMANOS, INODOROS, ORINALES).	UND	5.00	32,866.00	164,330.00	-	-	-	-	-		-	5.00	164,330.00	-	-	5.00	164,330.00
1.02	DESMONTE Y RETIRO DE CUBIIERTA EXISTENTE. INCLUYE TEJA, ESTRUCTURA, TEMPLETES, ANCLAJES, CABALLETES, LIMAOYAS Y LIMATESAS).	M2	255.85	62,219.00	15,918,731.00	-	-	- 51.63	-	- 3,212,367.00		-	204.22	12,706,364.00	-	-	204.22	12,706,364.00
1.03	DEMOLICIÓN DE PISO ESMALTADO, CERAMICA, BALDOSA CEMENTO O MORTERO NIVELACIÓN. INCLUYE RETIRO	M2	154.83	33,225.00	5,144,227.00	+	43.06	-	1,430,669.00	-		-	197.89	6,574,895.00	-	-	197.89	6,574,895.00
1.04	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PLACA EN CONCRETO, ANDENES EN CONCRETO, RAMPAS EN CONCRETO. (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO).	M2	154.83	38,190.00	5,912,958.00	+	49.43	-	1,887,732.00	-		-	204.26	7,800,689.00	-	-	204.26	7,800,689.00
1.05	DESMONTE DE PUERTA Y VENTANAS (INCLUYE MARCOS, VIDRIOS, NAVES).	M2	31.74	30,009.00	952,486.00	+	0.55	-	16,505.00	-		-	32.29	968,991.00	-	-	32.29	968,991.00
1.06	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO).	M2	48.76	28,401.00	1,384,833.00	-	-	- 7.41	-	- 210,451.00		-	41.35	1,174,381.00	-	-	41.35	1,174,381.00
1.07	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA, CON Y SIN PAÑETE, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO	M2	54.84	33,225.00	1,822,059.00	+	2.66	-	88,378.00	-		-	57.50	1,910,438.00	-	-	57.50	1,910,438.00
1.08	DEMOLICIÓN DE MESONES EN CONCRETO, LAVADEROS EN CONCRETO, POCETAS EN CONCRETO. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO.	und	2.00	54,836.00	109,672.00	+	1.00	-	54,836.00	-		-	3.00	164,508.00	-	-	3.00	164,508.00
1.09	DEMONTE, RETIRO Y DESHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA INTERNA EXISTENTE.	m2	90.00	23,044.00	2,073,960.00	-	-	-	-	-		-	90.00	2,073,960.00	-	-	90.00	2,073,960.00
1.10	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMUN ALTURA HASTA 1,00 m.	M3	4.53	77,181.00	349,630.00	+	2.61	-	201,442.00	-		-	7.14	551,072.00	-	-	7.14	551,072.00
1.11	RELLENO MATERIAL PREEXCAVADO, INCLUYE COMPATACIÓN MECANICA.	M3	4.53	35,924.00	162,736.00	+	2.09	-	75,081.00	-		-	6.62	237,817.00	-	-	6.62	237,817.00

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

ACTA PARCIAL N002

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3		
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA		
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2	**CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CI 001 del 03 de Octubre de 2025
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA TERMINACIÓN FINAL**	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE REINICIO:**	24 DE FEBRERO DE 2026	**ACTA PARCIAL No.2**	02 DE MARZO DE 2026
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE TERMINACION FINAL**	26 DE ABRIL DE 2026		
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **LA ESPERANZA**	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDADES			VALORES		ACTA PARCIAL No 2		ACUMULADO ACTAS		POR COBRAR		CANT ACTUALIZADA	VALOR TOTAL ACTUALIZADO
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	+/	MAY (+)	MEN (-)	MAY (+)	MEN (-)	CANT	SUBTOTAL			CANT	SUBTOTAL		
2	**CONCRETOS**				**32,517,211.00**				**7,098,952.00**	**- 3,839,680.00**		**409,086.00**	-	**35,777,263.00**	-	-		**35,777,263.00**
2.01	PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO 3000PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 5 mm. ESPESOR 10 cm	M2	159.06	154,372.00	24,554,410.00	+	36.80	-	5,680,890.00	-	2.65	409,086.00	195.86	30,235,300.00	-	-	195.86	30,235,300.00
2.02	ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 1,25X1,25X0,35 m NO INCLUYE REFUERZO.	UND	1.00	786,957.00	786,957.00	-	-	-	-	-	-	-	1.00	786,957.00	-	-	1.00	786,957.00
2.03	COLUMNA DE 0,25X0,25 m, EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, INCLUYE FORMALETA EN MADERA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	4.00	218,334.00	873,336.00	-	-	-	-	-	-	-	4.00	873,336.00	-	-	4.00	873,336.00
2.04	LOSA AEREA DE 0,10m EN CONCRETO 3000psi REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM 15X15. INCLUYE FORMALETA.	M2	1.56	311,790.00	486,392.00	-	-	- 0.00	-	- 779.00	-	-	1.56	486,392.00	-	-	1.56	486,392.00
2.05	ACERO DE REFUERZO CORRUGADO FY420MPA, FIGURADO E INSTALADO, INCLUYE ALAMBRE PARA AMARRE, BARRAS LONGITUDINALES Y ESTRIBOS.	KG	68.16	19,546.00	1,332,255.00	+	72.55	-	1,418,062.00	-		-	140.71	2,750,318.00	-	-	140.71	2,750,318.00
2.06	VIGA AEREA DE 0.25X0.25 m EN CONCRETO DE 3000 PSI. INCLUYE FORMALETA, NO INCLUYE REFUERZO.	ML	2.50	257,984.00	644,960.00	-	-	-	-	-		-	2.50	644,960.00	-	-	2.50	644,960.00
2.07	ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 4 mm, Espesor 10 cm. Escobeado y Ratoneado	M2	25.03	153,372.00	3,838,901.00	-	-	- 25.03	-	- 3,838,901.00		-	-	-	-	-	0.00	-
3	**MAMPOSTERÍA Y ACABADOS DE MUROS**				**34,850,355.00**				**9,161,759.00**	**- 2,988,132.00**	-	**21,751,409.00**	-	**21,751,409.00**	-	**19,272,573.00**		**41,023,982.00**
3.01	MURO EN BLOQUE No 4	M2	36.42	75,960.00	2,766,463.00	+	42.16	-	3,202,474.00	-	78.58	5,968,937.00	78.58	5,968,937.00	-	-	78.58	5,968,937.00
3.02	PAÑETE EN MOTERO IMPERMEABILIZADO 1:4	M2	72.84	49,975.00	3,640,179.00	+	5.74	-	286,857.00	-	78.58	3,927,036.00	78.58	3,927,036.00	-	-	78.58	3,927,036.00
3.03	ENCHAPE MURO FORMATO MÍNIMO .25X.30	M2	59.02	129,190.00	7,624,794.00	-	-	- 17.01	-	- 2,197,522.00	-	-	-	-	42.01	5,427,272.00	42.01	5,427,272.00
3.04	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS TIPO I	M2	61.49	36,157.00	2,223,294.00	+	96.19	-	3,477,942.00	-	157.68	5,701,236.00	157.68	5,701,236.00	-	-	157.68	5,701,236.00
3.05	ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES TIPO KORAZA	M2	185.24	41,028.00	7,600,027.00	-	-	- 19.27	-	- 790,610.00	150.00	6,154,200.00	150.00	6,154,200.00	15.97	655,217.00	165.97	6,809,417.00

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

ACTA PARCIAL N002

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3		
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA		
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1.886,044,345.00)		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2	**CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CI 001 del 03 de Octubre de 2025
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA TERMINACIÓN FINAL**	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE REINICIO:**	24 DE FEBRERO DE 2026	**ACTA PARCIAL No.2**	02 DE MARZO DE 2026
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE TERMINACION FINAL**	26 DE ABRIL DE 2026		
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **LA ESPERANZA**	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDADES			VALORES		ACTA PARCIAL No 2		ACUMUADO ACTAS		POR COBRAR		CANT ACTUALIZADA	VALOR TOTAL ACTUALIZADO
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	+/	MAY (+)	MEN (-)	MAY (+)	MEN (-)	CANT	SUBTOTAL			CANT	SUBTOTAL		
3.06	ESTUCO Y PINTURA DE ALTA ASEPSIA 3 MANOS	M2	188.06	42,735.00	8,036,744.00	+	50.49	-	2,157,690.00	-		-	-	-	238.55	10,194,434.00	238.55	10,194,434.00
3.07	ESTUCO Y PINTURA TIPO ESMALTE SOBRE MUROS	M2	69.20	42,758.00	2,958,854.00	+	0.86	-	36,796.00	-		-	-	-	70.06	2,995,650.00	70.06	2,995,650.00
4	**CUBIERTAS Y CIELO RASOS**				**138,342,058.00**				**4,355.00**	**- 44,029,108.00**		**21,393,651.00**	-	**83,397,254.00**		**10,920,051.00**		**94,317,305.00**
4.01	ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN PERFIL REF: (PAG_C 120X60_ 2.00 mm) CALIBRE 14, PINTADO CON ANTICORROSIVO O WASH PRIMER. INCLUYE ANCLAJES EN VARILLA EN MUROS CULATAS.	ML	483.12	138,830.00	67,071,550.00	-	-	- 243.18	-	- 33,760,679.00	8.00	1,110,640.00	239.94	33,310,870.00	-	-	239.94	33,310,870.00
4.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA EN LAMINA MASTER 1000 CALIBRE 28 PREPINTADA, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	M2	281.44	135,775.00	38,212,516.00	-	-	- 63.54	-	- 8,627,144.00	8.44	1,145,941.00	217.90	29,585,373.00	-	-	217.90	29,585,373.00
4.03	CABALLETE EN LAMINA METALICA PINTADA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	20.13	67,723.00	1,363,264.00	+	0.01	-	677.00	-		-	20.14	1,363,941.00	-	-	20.14	1,363,941.00
4.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 CON DESARROLLO DE 0,60 M INCLUYE GANCHO DE FIJACION, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	ML	40.26	183,898.00	7,403,733.00	+	0.02	-	3,678.00	-		-	-	-	40.28	7,407,411.00	40.28	7,407,411.00
4.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN 3"	ML	20.80	39,312.00	817,690.00	-	-	-	-	-		-	-	-	20.80	817,690.00	20.80	817,690.00
4.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS DE ANCLAJE, UNIONES, RINCONERAS.	M2	208.52	112,571.00	23,473,305.00	-	-	- 14.58	-	- 1,641,285.00	170.00	19,137,070.00	170.00	19,137,070.00	23.94	2,694,950.00	193.94	21,832,020.00
5	**PISOS Y ENCHAPES**				**35,438,333.00**				**10,545,575.00**	**- 1,478,178.00**		**25,732,000.00**	-	**38,165,773.00**		**6,339,955.00**		**44,505,728.00**
5.01	NIVELACION PARA PISO E=0,05 a 0,07 m	M2	154.76	69,323.00	10,728,427.00	+	24.60	-	1,705,346.00	-	-	-	179.36	12,433,773.00	-	-	179.36	12,433,773.00

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

ACTA PARCIAL N002

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3		
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA		
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2	**CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CI 001 del 03 de Octubre de 2025
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA TERMINACIÓN FINAL**	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE REINICIO:**	24 DE FEBRERO DE 2026	**ACTA PARCIAL No.2**	02 DE MARZO DE 2026
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE TERMINACION FINAL**	26 DE ABRIL DE 2026		
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **LA ESPERANZA**	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDADES			VALORES		ACTA PARCIAL No 2		ACUMUADO ACTAS		POR COBRAR		CANT ACTUALIZADA	VALOR TOTAL ACTUALIZADO
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	+/-	MAY (+)	MEN (-)	MAY (+)	MEN (-)	CANT	SUBTOTAL			CANT	SUBTOTAL		
5.02	BALDOSA CERAMICA PARA PISOS FORMATO CUADRADO MINIMO .45X.45m TRAFICO COMERCIAL, PRIMERA CALIDAD	M2	154.76	128,660.00	19,911,422.00	+	68.71	-	8,840,229.00	-	200.00	25,732,000.00	200.00	25,732,000.00	23.47	3,019,650.00	223.47	28,751,650.00
5.03	GUARDAESCOBA EN CERAMICA	ML	115.76	41,452.00	4,798,484.00	-	-	- 35.66	-	- 1,478,178.00		-	-	-	80.10	3,320,305.00	80.10	3,320,305.00
6	**CARPINTERIA METALICA**				**36,189,373.00**				**15,527,206.00**	**- 4,383,280.00**		**33,672,330.00**	**-**	**33,672,330.00**		**13,660,996.00**		**47,333,326.00**
6.01	6 Puertas Metalica entablerado en lamina galvanizada Calibre 20, Con cerradura. Incluye Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. Tragaluz, y marcos.	M2	7.35	1,035,624.00	7,611,836.00	+	3.19	-	3,303,641.00	-	10.54	10,915,477.00	10.54	10,915,477.00	-	-	10.54	10,915,477.00
6.02	Suministro e Instalación de 13 Ventanas Lamina Galvanizada Calibre 20. Corredera o Fija, Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. Incluye Vidrio 4 mm, pelicula de seguridad acabado sandblasting y marco.	M2	20.99	1,293,003.00	27,140,133.00	-	-	- 3.39	-	- 4,383,280.00	17.60	22,756,853.00	17.60	22,756,853.00	-	-	17.60	22,756,853.00
6.03	1 Puerta En Marco y contramarco de Aluminio Blanco, con vidrio 5mm + pelicula tipo sandblasting, Con cerradura tipo bola. Tragaluz en Vidrio.	M2	1.33	1,080,775.00	1,437,404.00	+	11.31	-	12,223,565.00	-	-	-	-	-	12.64	13,660,996.00	12.64	13,660,996.00
7	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**28,542,806.00**				**2,876,449.00**	**- 168,214.00**		**5,717,443.00**	**-**	**5,717,443.00**		**25,533,598.00**		**31,251,041.00**
7.01	Conexión Acometida Parcial del Poste a la Caja de Medidor, en Cable Monofasico Encauchetado No 8, Cable No 8, Tensores para Cable, Tubo IMC 3/4", Capasete 3/4", Boquilla IMC 3/4".	ML	30.00	156,698.00	4,700,940.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00	4,700,940.00	30.00	4,700,940.00
7.02	Suministro e instalación de Caja Medidor Monofasica, con pin de corte 1x40 amp, incluye instalación del sistema de Puesta a Tierra, incluye conector de cobre, cable AWG No 8 por 3 lineas, y Varilla de cobre 2.40m.	UND	1.00	1,048,233.00	1,048,233.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	1,048,233.00	1.00	1,048,233.00

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

ACTA PARCIAL N002

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3		
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA		
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2	**CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CI 001 del 03 de Octubre de 2025
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA TERMINACIÓN FINAL**	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE REINICIO:**	24 DE FEBRERO DE 2026	**ACTA PARCIAL No.2**	02 DE MARZO DE 2026
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE TERMINACIÓN FINAL**	26 DE ABRIL DE 2026		
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **LA ESPERANZA**	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDADES			VALORES		ACTA PARCIAL No 2		ACUMUADO ACTAS		POR COBRAR		CANT ACTUALIZADA	VALOR TOTAL ACTUALIZADO
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	+/-	MAY (+)	MEN (-)	MAY (+)	MEN (-)	CANT	SUBTOTAL			CANT	SUBTOTAL		
7.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE 12 CTOS (INCLUYE: CAJA DE BREAKERS BIFASICA, BREAKERS 1X20 AMP, 1X30 AMP)	UND	1.00	814,573.00	814,573.00	-	-	-	-	-	1.00	814,573.00	1.00	814,573.00	-	-	1.00	814,573.00
7.04	Suministro e Instalación de Punto Electrico de iluminación. Incluye Luminaria Led de 18w. Redonda o Cuadrada o similar, de empotrar o sobreponer, según aplique. Incluye interruptor, y Alambre No 14 Awg por 2 Lineas hasta por 3 metros y tubería PVC de 1/2" hasta por 3 m.	UND	32.00	199,160.00	6,373,120.00	+	4.00	-	796,640.00	-	-	-	-	-	36.00	7,169,760.00	36.00	7,169,760.00
7.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 110 V (INCLUYE ACCEOSRIOS, ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS, ALAMBRE AWG No 14 POR 1 LINEA, Y TUBERIA PVC HASTA POR 3 METROS).	UND	33.00	163,429.00	5,393,157.00	+	5.00	-	817,145.00	-	30.00	4,902,870.00	30.00	4,902,870.00	8.00	1,307,432.00	38.00	6,210,302.00
7.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 220V (INCLUYE ACCEOSRIOS, CABLE AWG No 10 POR 2 LINEAS, ALAMBRE AWG No 14 POR 1 LINEA, Y TUBERIA PVC).	UND	6.00	168,214.00	1,009,284.00	-	-	- 1.00	-	- 168,214.00	-	-	-	-	5.00	841,070.00	5.00	841,070.00
7.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA MANUAL PARA PLANTA ELECTRICA, INCLUYE TOMA 3x50 CODELCA, CAJA 2400, CAJA METALICA DE 25X25 X15, Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	UND	1.00	773,886.00	773,886.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	773,886.00	1.00	773,886.00
7.08	ACOMETIDA PARA CONEXIÓN PLANTA ELECTRICA, DESDE TABLERO DISTRIBUCIÓN HASTA TRANSFERENCIA MANUAL. INCLUYE CABLE No 8 AWG POR 6 LINEAS.	ML	5.00	125,182.00	625,910.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00	625,910.00	5.00	625,910.00

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

ACTA PARCIAL N002

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3		
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA		
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2	**CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CI 001 del 03 de Octubre de 2025
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA TERMINACIÓN FINAL**	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE REINICIO:**	24 DE FEBRERO DE 2026	**ACTA PARCIAL No.2**	02 DE MARZO DE 2026
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE TERMINACIÓN FINAL**	26 DE ABRIL DE 2026		
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **LA ESPERANZA**	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDADES			VALORES		ACTA PARCIAL No 2		ACUMUADO ACTAS		POR COBRAR		CANT ACTUALIZADA	VALOR TOTAL ACTUALIZADO
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	+/-	MAY (+)	MEN (-)	MAY (+)	MEN (-)	CANT	SUBTOTAL			CANT	SUBTOTAL		
7.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONCHERA DE POSTE PARA CONEXIÓN DE LA RED DE INTERCONEXIÓN DEL DEPARTAMENTO CON EL PUESTO DE SALUD. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1.00	788,903.00	788,903.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	788,903.00	1.00	788,903.00
7.10	ACOMETIDA DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN A USO FINAL PARA TOMA CORRIENTES Y LUMINARIAS. INCLUYE TUBERÍA PVC, ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS Y ALAMBRE No 14 POR 1 LINEA Y ACCESORIOS.	ML	100.00	70,148.00	7,014,800.00	+	18.00	-	1,262,664.00	-	-	-	-	-	118.00	8,277,464.00	118.00	8,277,464.00
8	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS**				**29,517,685.00**				**4,251,224.00**	**- 23,966.00**	-	-	-	**15,219,384.00**	**-**	**18,525,559.00**		**33,744,943.00**
8.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE DE SOBRE PONER EN MUEBLE CON PUERTAS Y CAJONERAS EN RH. INCLUYE POCETAS Y ACCESORIOS DE GRIFERIA Y DESAGUES. HERRAJES EN	ML	4.20	2,212,207.00	9,291,269.00	+	0.65	-	1,437,935.00	-		-	-	-	4.85	10,729,204.00	4.85	10,729,204.00
8.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO BLANCO DE PUSH INCLUYE GRIFERIA	UND	2.00	683,090.00	1,366,180.00	+	1.00	-	683,090.00	-		-	-	-	3.00	2,049,270.00	3.00	2,049,270.00

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

ACTA PARCIAL N002

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3		
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA		
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2	**CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CI 001 del 03 de Octubre de 2025
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA TERMINACIÓN FINAL**	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE REINICIO:**	24 DE FEBRERO DE 2026	**ACTA PARCIAL No.2**	02 DE MARZO DE 2026
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE TERMINACIÓN FINAL**	26 DE ABRIL DE 2026		
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **LA ESPERANZA**	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDADES			VALORES		ACTA PARCIAL No 2		ACUMUADO ACTAS		POR COBRAR		CANT ACTUALIZADA	VALOR TOTAL ACTUALIZADO
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	+/	MAY (+)	MEN (-)	MAY (+)	MEN (-)	CANT	SUBTOTAL			CANT	SUBTOTAL		
8.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND	8.00	391,827.00	3,134,616.00	-	-	-	-	-		-	-	-	8.00	3,134,616.00	8.00	3,134,616.00
8.04	SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE BARRA DE 60CM X2 DE SEGURIDAD PARA PARED, EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS	UND	1.00	893,899.00	893,899.00	-	-	-	-	-		-	-	-	1.00	893,899.00	1.00	893,899.00
8.05	Punto Hidraulico de 1/2", incluye accesorios PVC	UND	16.00	73,236.00	1,171,776.00	+	5.00	-	366,180.00	-		-	21.00	1,537,956.00	-	-	21.00	1,537,956.00
8.06	Punto Sanitario de 2", incluye accesorios PVC	UND	17.00	91,076.00	1,548,292.00	+	1.00	-	91,076.00	-	-	-	18.00	1,639,368.00	-	-	18.00	1,639,368.00
8.07	Punto Sanitario de 4", incluye accesorios PVC	UND	2.00	164,156.00	328,312.00	+	1.00	-	164,156.00	-	-	-	3.00	492,468.00	-	-	3.00	492,468.00
8.08	Suministro e Instalación de Tanque Plastico de 1000lts, incluye Fluidmaster, Tapa, y accesorios PVC para la correcta conexión a la red de distribución.	UND	1.00	1,074,233.00	1,074,233.00	-	-	-	-	-	-	-	1.00	1,074,233.00	-	-	1.00	1,074,233.00
8.09	Acometida hidraulica de distribución en tubo PVC-P 3/4"	ML	57.67	38,063.00	2,195,093.00	+	4.33	-	164,813.00	-		-	62.38	2,374,370.00	- 0.38	- 14,464.00	62.00	2,359,906.00
8.10	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria 4".	ML	40.77	74,289.00	3,028,763.00	+	14.79	-	1,099,079.00	-		-	48.00	3,565,872.00	7.56	561,970.00	55.56	4,127,842.00
8.11	Suministro e instalación de lavatraperos prefabricado.	UND	1.00	617,223.00	617,223.00	-	-	-	-	-		-	1.00	617,223.00	-	-	1.00	617,223.00
8.12	Suministro e instalación de Ducha tipo regadera y teleducha independiente.	UND	1.00	804,497.00	804,497.00	-	-	-	-	-	-	-	1.00	804,497.00	-	-	1.00	804,497.00
8.13	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria de 2"	ML	21.48	49,930.00	1,072,496.00	-	-	- 0.48	-	- 23,966.00	-	-	21.01	1,049,029.00	- 0.01	- 499.00	21.00	1,048,530.00
8.14	Construcción de Caja de Inspecicón de 0,60x0,60 en concreto.	und	2.00	803,452.00	1,606,904.00	-	-	-	-	-		-	2.00	1,606,904.00	-	-	2.00	1,606,904.00
8.15	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria de 3"	ml	4.34	48,979.00	212,569.00	+	5.00	-	244,895.00	-	-	-	9.34	457,464.00	-	-	9.34	457,464.00
8.16	Suministro e Instalación de PRESURIZADOR MINI SMAR AUTOMATICO 1X127V 245W O SIMILAR.	und	1.00	1,171,563.00	1,171,563.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	1,171,563.00	1.00	1,171,563.00
9	ITEMS NO PREVISTOS				-				7,112,400.00	-		1,294,800.00	-	7,112,400.00	-	-		7,112,400.00

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

ACTA PARCIAL N002

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3		
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA		
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2	**CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CI 001 del 03 de Octubre de 2025
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA TERMINACIÓN FINAL**	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE REINICIO:**	24 DE FEBRERO DE 2026	**ACTA PARCIAL No.2**	02 DE MARZO DE 2026
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE TERMINACIÓN FINAL**	26 DE ABRIL DE 2026		
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDADES			VALORES		ACTA PARCIAL No 2		ACUMUADO ACTAS		POR COBRAR		CANT ACTUALIZADA	VALOR TOTAL ACTUALIZADO
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	+/	MAY (+)	MEN (-)	MAY (+)	MEN (-)	CANT	SUBTOTAL			CANT	SUBTOTAL		
NP-01	VIGA CINTA EN CONCRETO DOSIFICACIÓN 1:2:3 DE 0,12X0,20 INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML		192,000.00	-	+	30.30	-	5,817,600.00	-		-	30.30	5,817,600.00	-	-	30.30	5,817,600.00
NP-02	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 0,2 X 0,10m EN CONCRETO DE 3000 psi, incluye acero de refuerzo en 4 varillas de 3/8", con fiejes @0,15 m en varilla de 1/4".	ML		130,000.00	-	+	9.96	-	1,294,800.00	-	9.96	1,294,800.00	9.96	1,294,800.00	-	-	9.96	1,294,800.00
											-	-	-	-	-	-		-
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**369,393,433.00**				**60,333,375.00**	**- 60,333,375.00**	**% EJE ACTA 2**	**109,970,719.00**	**% ACUM**	**275,140,701.00**	**POR COBRA**	**94,252,732.00**		**369,393,433.00**
	ADMINISTRACION			**28.23%**	**104,279,766.00**				**17,032,112.00**	**- 17,032,112.00**	-	**31,044,734.00**		**77,672,220.00**	-	**26,607,546.00**		**104,279,766.00**
	IMPREVISTOS			**1.00%**	**3,693,934.00**				**603,334.00**	**- 603,334.00**	-	**1,099,707.00**		**2,751,407.00**	-	**942,527.00**		**3,693,934.00**
	UTILIDAD			**5.00%**	**18,469,672.00**				**3,016,669.00**	**- 3,016,669.00**		**5,498,536.00**		**13,757,035.00**		**4,712,637.00**		**18,469,672.00**
	TOTAL OBRA				**495,836,805.00**				**80,985,490.00**	**- 80,985,490.00**	**29.77%**	**147,613,696.00**	**74.48%**	**369,321,363.00**	**25.52%**	**126,515,442.00**	**100.00%**	**495,836,805.00**

RESUMEN FINANCIERO LA ESPERANZA		
Valor Inicial Contrato:	$	**495,836,805.00**
Valor Adicional Contrato:	$	**-**
Valor Final Contrato:	$	**495,836,805.00**
Valor Acta No 001	$	**221,707,667.00**
Valor Acta No 002	$	**147,613,696.00**
Valor A Girar Acta No 002	$	**147,613,696.00**
Valor Acumulado Actas	$	**369,321,363.00**
% Ejecución Acumulado		**74.48%**
Saldo Por Ejecutar	$	**126,515,442.00**

LA PRESENTE ACTA PARCIAL No 002 FUE **REVISADA** Y **APROBADA** POR LA INTERVENTORÍA, POR UN VALOR DE CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE.**($147.613.696,00)** CON UN PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL **74.48%**. APROBADO LO ANTERIOR, SE FIRMA A LOS DOS (2) DÍAS, DEL MES DE MARZO DEL 2026 EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, CAQUETA.

CONTRATISTA:

JOHAN LOPEZ MENDEZ
1.117.508.596 DE FLORENCIA
Representante Legal
H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS

VoBo DIRECTOR DE OBRA

Adriana Marcela G

ING. ADRIANA GALVEZ OSORIO
C.C. 28.550.973 DE IBAGUE
M.P. 70202138618 TLM

INTERVENTORÍA

JHONATTAN HOYOS MARQUEZ
C.C.1.018.439.570 de Bogotá D.C.
M.P. 25202-260849 CND
Director y Rep. Legal
UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25

ENTIDAD CONTRATANTE

MARIA PAULA RUIZ TRIANA
C.C. 1.075.311.783 de Neiva
GERENTE
ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

VoBo Supervisión ESE HMHOO

ALEXANDER VILLOTA FAJARDO
Supervisor Contrato CI 001

JOSE RICARDO SANCHEZ GOMEZ
Apoyo a la Supervisión

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA ESPERANZA DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT.901.994.584-2
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA
CAPITULO	CONCRETOS	**FECHA**	02 de marzo 2026
ÍTEM	2,01 — PLACA EN CONCRETO 3000PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 5 mm. ESPESOR 10 cm	**Unidad Medida**	M2







Localización	Dimensiones			CANT	Medida Tota
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
TOMA DE MUESTRAS	3,47		3,42	1,00	11,87
WC	3,17		1,30	1,00	4,12
WC DISC	3,16		2,14	1,00	6,76
CONSULTORIO ODONTOLOGICO	3,16		3,40	1,00	10,74
SALA DE ESPERA	6,64		9,40	1,00	62,42
PLACA LAVADERO	2,14		1,70	1,00	3,64
	2,56		1,00	1,00	2,56
BODEGA	2,05		3,14	1,00	6,44
WC 2	1,30		2,05	1,00	2,67
CONSULTORIO VACUNACION	5,17		2,05	1,00	10,60
	4,20		0,98	1,00	4,12
	2,21		2,18	1,00	4,82
CONSULTORIO 2	4,25		2,06	1,00	8,76
	3,15		2,08	1,00	6,55
CONSULTORIO 1	4,29		3,16	1,00	13,56
CIRCULACION	5,60		0,96	1,00	5,38
INGRESO	3,15		1,00	1,00	3,15
ANDEN POSTERIOR	8,74		1,00	1,00	8,74
ANDEN FRONTAL	9,19		0,90	1,00	8,27
	6,49		0,90	1,00	5,84
	0,92		0,50	1,00	0,46
	2,23		1,98	1,00	4,42

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**195,86**
COBRO ACTA N.1	193,21
ACTA N.2	**2,65**
TOTAL CONTRACTUAL	159,06

Elaboró
Fabian Martinez
FABIAN MARTINEZ MARTINEZ
Residente de Obra


Avaló
RUDY YANSETH MOLINA QUINTERO
INTERVENTOR

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA ESPERANZA DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3		**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT.901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA		**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	CONCRETOS		**FECHA**	02 de marzo 2026	
ÍTEM	2,01	PLACA EN CONCRETO 3000PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 5 mm. ESPESOR 10 cm	**Unidad Medida**	M2	

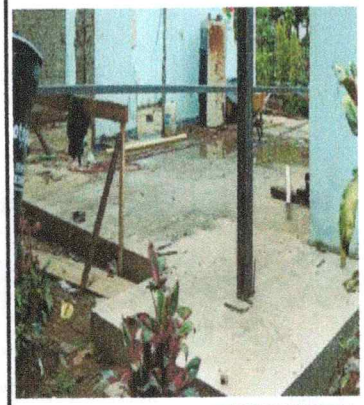





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Tota
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
TOMA DE MUESTRAS	3,47		3,42	1,00	11,87
WC	3,17		1,30	1,00	4,12
WC DISC	3,16		2,14	1,00	6,76
CONSULTORIO ODONTOLOGICO	3,16		3,40	1,00	10,74
SALA DE ESPERA	6,64		9,40	1,00	62,42
PLACA LAVADERO	2,14		1,70	1,00	3,64
	2,56		1,00	1,00	2,56
BODEGA	2,05		3,14	1,00	6,44
WC 2	1,30		2,05	1,00	2,67
CONSULTORIO VACUNACION	5,17		2,05	1,00	10,60
	4,20		0,98	1,00	4,12
	2,21		2,18	1,00	4,82
CONSULTORIO 2	4,25		2,06	1,00	8,76
	3,15		2,08	1,00	6,55
CONSULTORIO 1	4,29		3,16	1,00	13,56
CIRCULACION	5,60		0,96	1,00	5,38
INGRESO	3,15		1,00	1,00	3,15
ANDEN POSTERIOR	8,74		1,00	1,00	8,74
ANDEN FRONTAL	9,19		0,90	1,00	8,27
	6,49		0,90	1,00	5,84
	0,92		0,50	1,00	0,46
	2,23		1,98	1,00	4,42

TOTAL DE ACTIVIDAD	**195,86**
COBRO ACTA N.1	193,21
ACTA N.2	**2,65**
TOTAL CONTRACTUAL	159,06

OBSERVACIONES:

Elaboró
FABIAN MARTINEZ MARTINEZ
Residente de Obra




Avaló
RUDY YANSETH MOLINA QUINTERO
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA ESPERANZA DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3		**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT.901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA		**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	MAMPOSTERÍA Y ACABADOS DE MUROS		**FECHA**	02 de marzo 2026	
ÍTEM	3,02	PAÑETE EN MOTERO IMPERMEABILIZADO 1:4	**Unidad Medida**	M2	

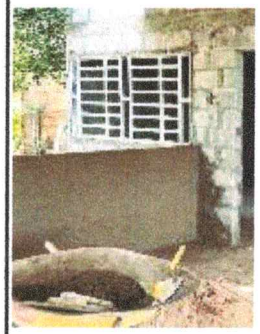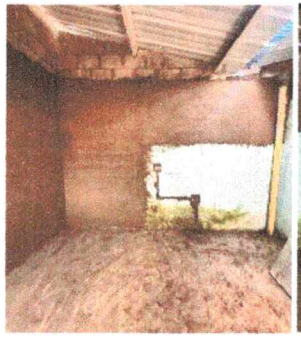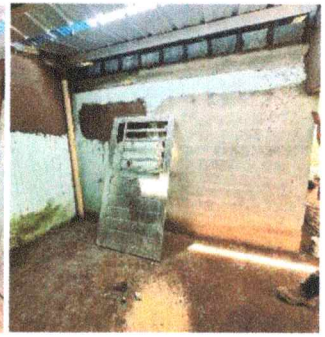


Localización	Dimensiones			CANT	Medida Tota
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
MURO CONSUL 1 Y 2	1,10	2,00		1,00	2,20
CONSULTORIO	1,00	3,00		1,00	3,00
WC CONTIGUO A LA	0,52	2,00		1,00	1,04
	1,00	2,76		1,00	2,76
	2,04	2,76		1,00	5,63
BODEGA	0,80	2,00		2,00	3,20
TOMA DE MUESTRAS	3,16	0,20		1,00	0,63
WC DIS	3,02	3,16		1,00	9,54
	3,16	2,60		1,00	8,22
PUERTA	1,00	2,00		- 1,00	- 2,00
CONSULTORIO	3,40	2,90		1,00	9,86
	3,40	0,50		1,00	0,85
	3,40	3,40		1,00	11,56
	3,40	0,20		1,00	0,68
VENTANA	1,80	1,00		- 1,00	- 1,80
PUERTA	0,98	2,00		- 1,00	- 1,96
	2,01	1,1		2	2,21
MURO LAVADERO	5,44	1,00		1,00	5,44
	1,37	1,00		1,00	1,37
CUARTO DE RESIDUOS	2,18	2,76		1,00	6,02
	2,10	2,76		1,00	5,80
	1,46	2,76		1,00	4,03
PUERTA	0,98	2,00		- 1,00	- 1,96
LUCETA	1,30	0,50		- 1,00	- 0,65
VENTANA	1,09	0,85		1,00	0,93
FACHADA POSTERIOR	9,95	0,20		1,00	1,99

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**78,58**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	**78,58**
TOTAL CONTRACTUAL	72,84

Elaboró
Fabian Martinez
FABIAN MARTINEZ MARTINEZ
Residente de Obra


Avaló
RUDY YANSETH MOLINA QUINTERO
INTERVENTOR

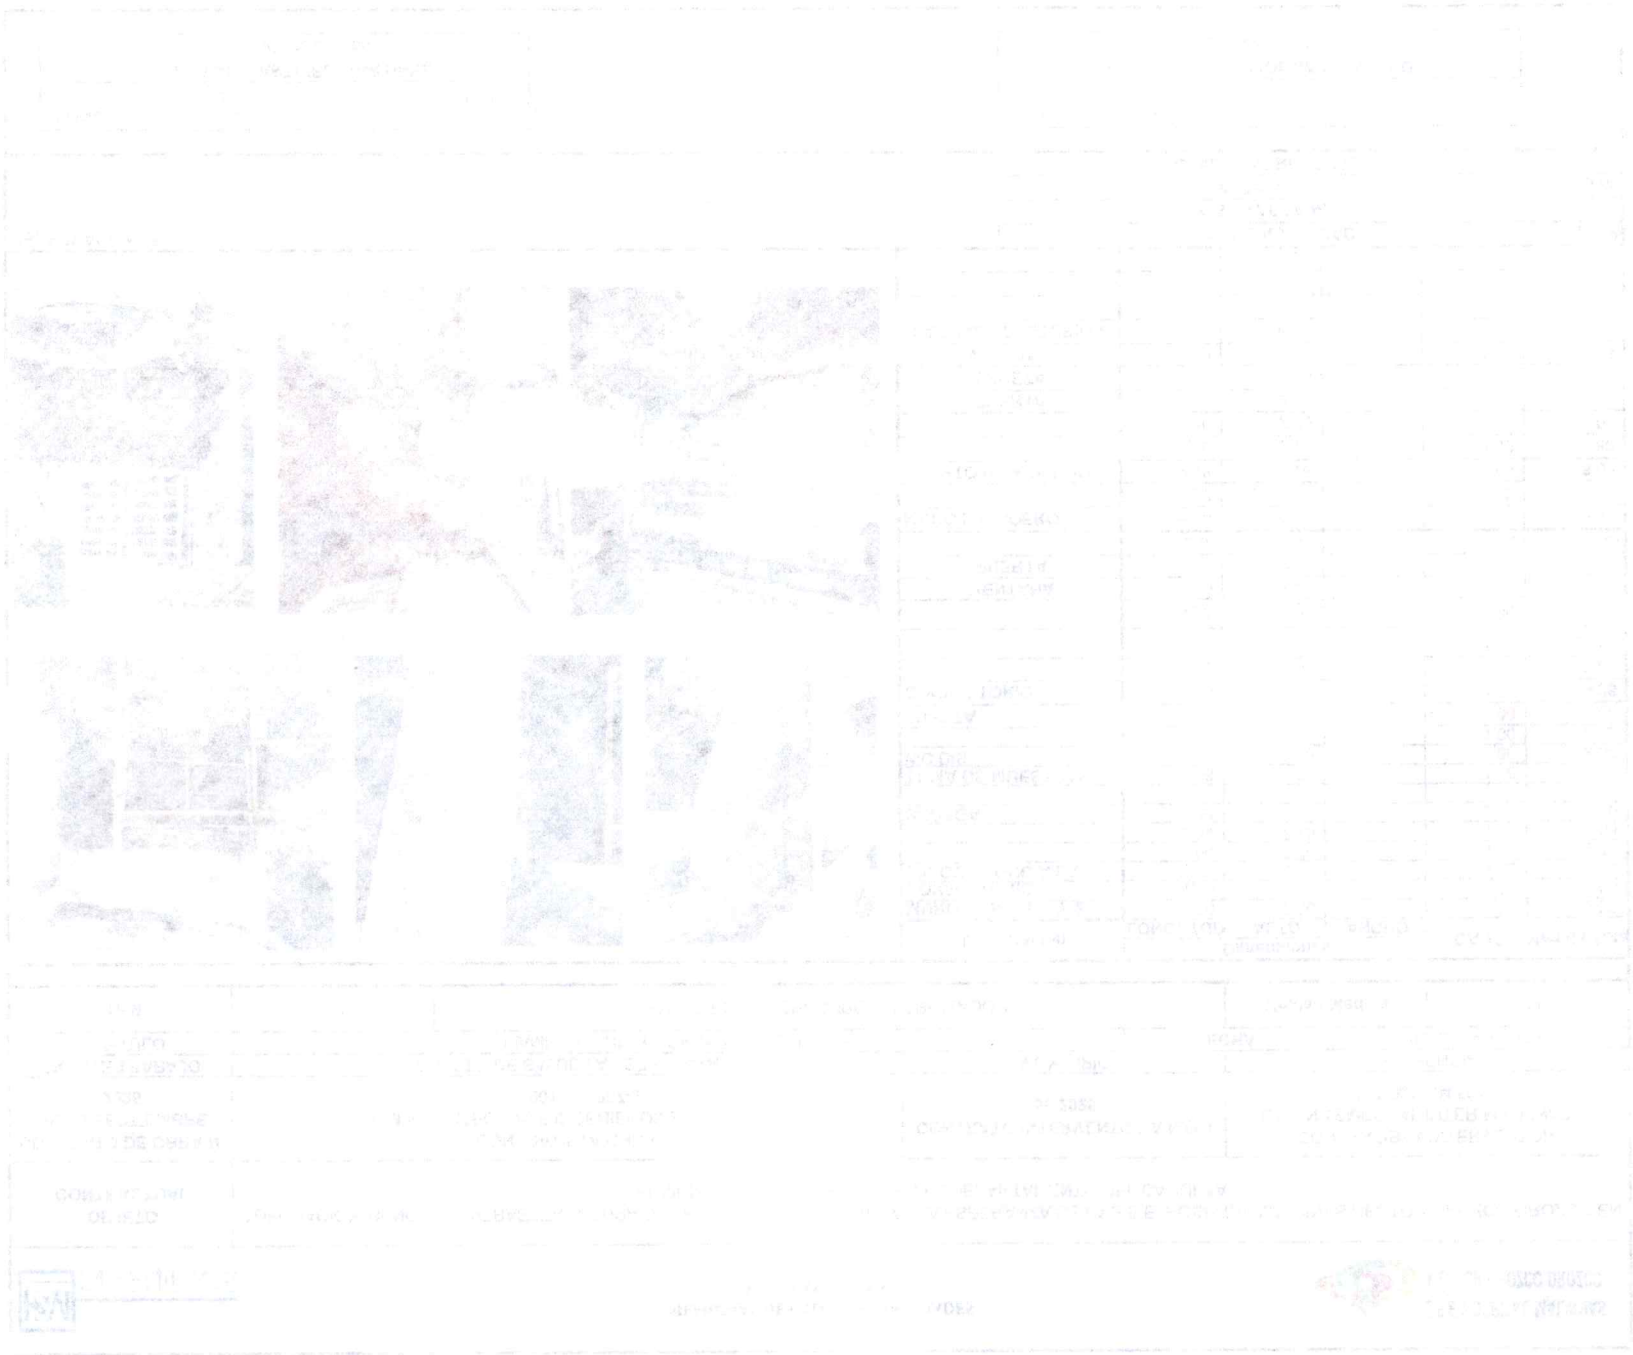


MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA ESPERANZA DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT.901.994.584-2
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA
CAPITULO	MAMPOSTERÍA Y ACABADOS DE MUROS	**FECHA**	02 de marzo 2026
ÍTEM	3,04	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS TIPO I	**Unidad Medida** M2

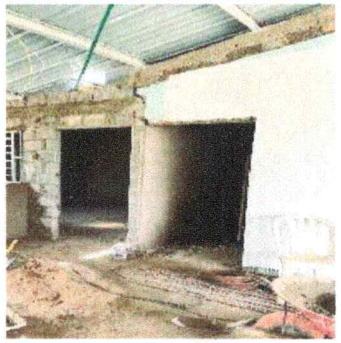

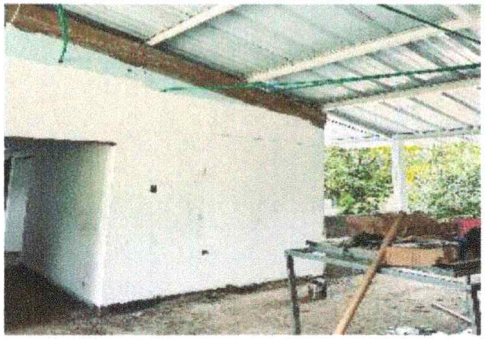



Localización	Dimensiones			CANT	Medida Tota
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
CUARTO DE RESIDUOS	6,06	2,60		1,00	15,76
	1,00	0,85		1,00	0,85
WC1	7,94	0,80		1,00	6,35
	1,00	0,80		1,00	
WC2	5,70	0,80		1,00	4,56
	1,00	0,80		1,00	0,80
PMR	9,60	0,80		1,00	7,68
	1,00	0,80		1,00	0,80
BODEGA	9,38	2,60		1,00	24,39
	1,00	0,80		1,00	0,80
CIRCULACION 1	11,78	3,00		1,00	35,34
SALA DE ESPERA	20,25	3,00		1,00	60,75
VENTANA PMR	1,00	0,40		- 1,00	- 0,40
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**157,68**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	**157,68**
TOTAL CONTRACTUAL	61,49

Elaboró
Fabian Martinez
FABIAN MARTINEZ MARTINEZ
Residente de Obra

Avaló
RUDY YANSETH MOLINA QUINTERO
INTERVENTOR




H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA ESPERANZA DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT.901.994.584-2
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA
CAPITULO	MAMPOSTERÍA Y ACABADOS DE MUROS	**FECHA**	02 de marzo 2026
ÍTEM	3,05	ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES TIPO KORAZA	**Unidad Medida** M2



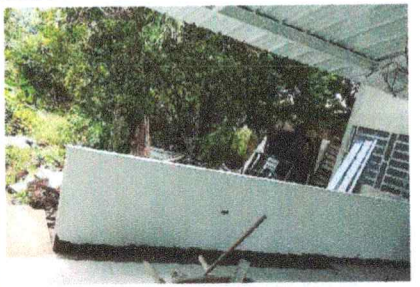



Localización	Dimensiones LONGUTUD	ALTO	AREA	CANT	Medida Tota
FACHADA FRONTAL	8,21	2,50		1,00	20,53
	3,47	2,50		1,00	8,68
VENTANAS	1,30	0,40		- 1,00	- 0,52
	2,10	1,10		- 3,00	- 6,93
FACHADA POSTERIOR	8,21	2,50		1,00	20,53
MURO LAVADERO	6,81	1,00		1,00	6,81
VENTANAS	2,10	0,56		- 1,00	- 1,18
	1,90	1,10		- 2,00	- 4,18
	1,28	0,40		- 1,00	- 0,51
FACHADA LAT IZQ	7,90	2,69		2,00	42,50
PUERTAS	1,00	2,15		- 1,00	- 2,15
FACHADA LAT DER	10,91	2,69		2,00	58,70
PUERTAS	1,00	2,15		- 4,00	- 8,60
VENTANAS	1,00	0,40		- 1,00	- 0,40
	1,80	1,15		- 1,00	- 2,07
CULATAS			4,48	3,00	13,44
			3,68	1,00	3,68
CONSULTORIO ODONTOLOGICO	3,40	2,90		1,00	9,86
	3,40	3,40		1,00	11,56
VENTANA	1,80	1,00		- 1,00	- 1,80
PUERTA	0,98	2,00		- 1,00	- 1,96
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**165,97**
COBRO ACTA N.1	0,00
ACTA N.2	**150,00**
TOTAL CONTRACTUAL	185,24

Elaboró
Fabian Martinez
FABIAN MARTINEZ MARTINEZ
Residente de Obra

Avaló
RUDY YANSETH MOLINA QUINTERO
INTERVENTOR

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA ESPERANZA DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT.901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	CUBIERTAS Y CIELO RASOS	**FECHA**	02 de marzo 2026	
ÍTEM	4,01	ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN PERFIL REF: (PAG_C 120X60_ 1,9 mm) CALIBRE 14, PINTADO CON ANTICORROSIVO O WASH PRIMER.	**Unidad Medida**	ml








Localización	Dimensiones			CANT	Medida Tota
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
Correas Metalicas	20,14			11,00	221,54
	4,00			2,00	8,00
	10,40			1,00	10,40
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**239,94**
COBRO ACTA N.1	231,94
ACTA N.2	**8,00**
TOTAL CONTRACTUAL	483,12

Elaboró fabian Martinez
FABIAN MARTINEZ MARTINEZ
Residente de Obra

Avaló
RUDY YANSETH MOLINA QUINTERO
INTERVENTOR

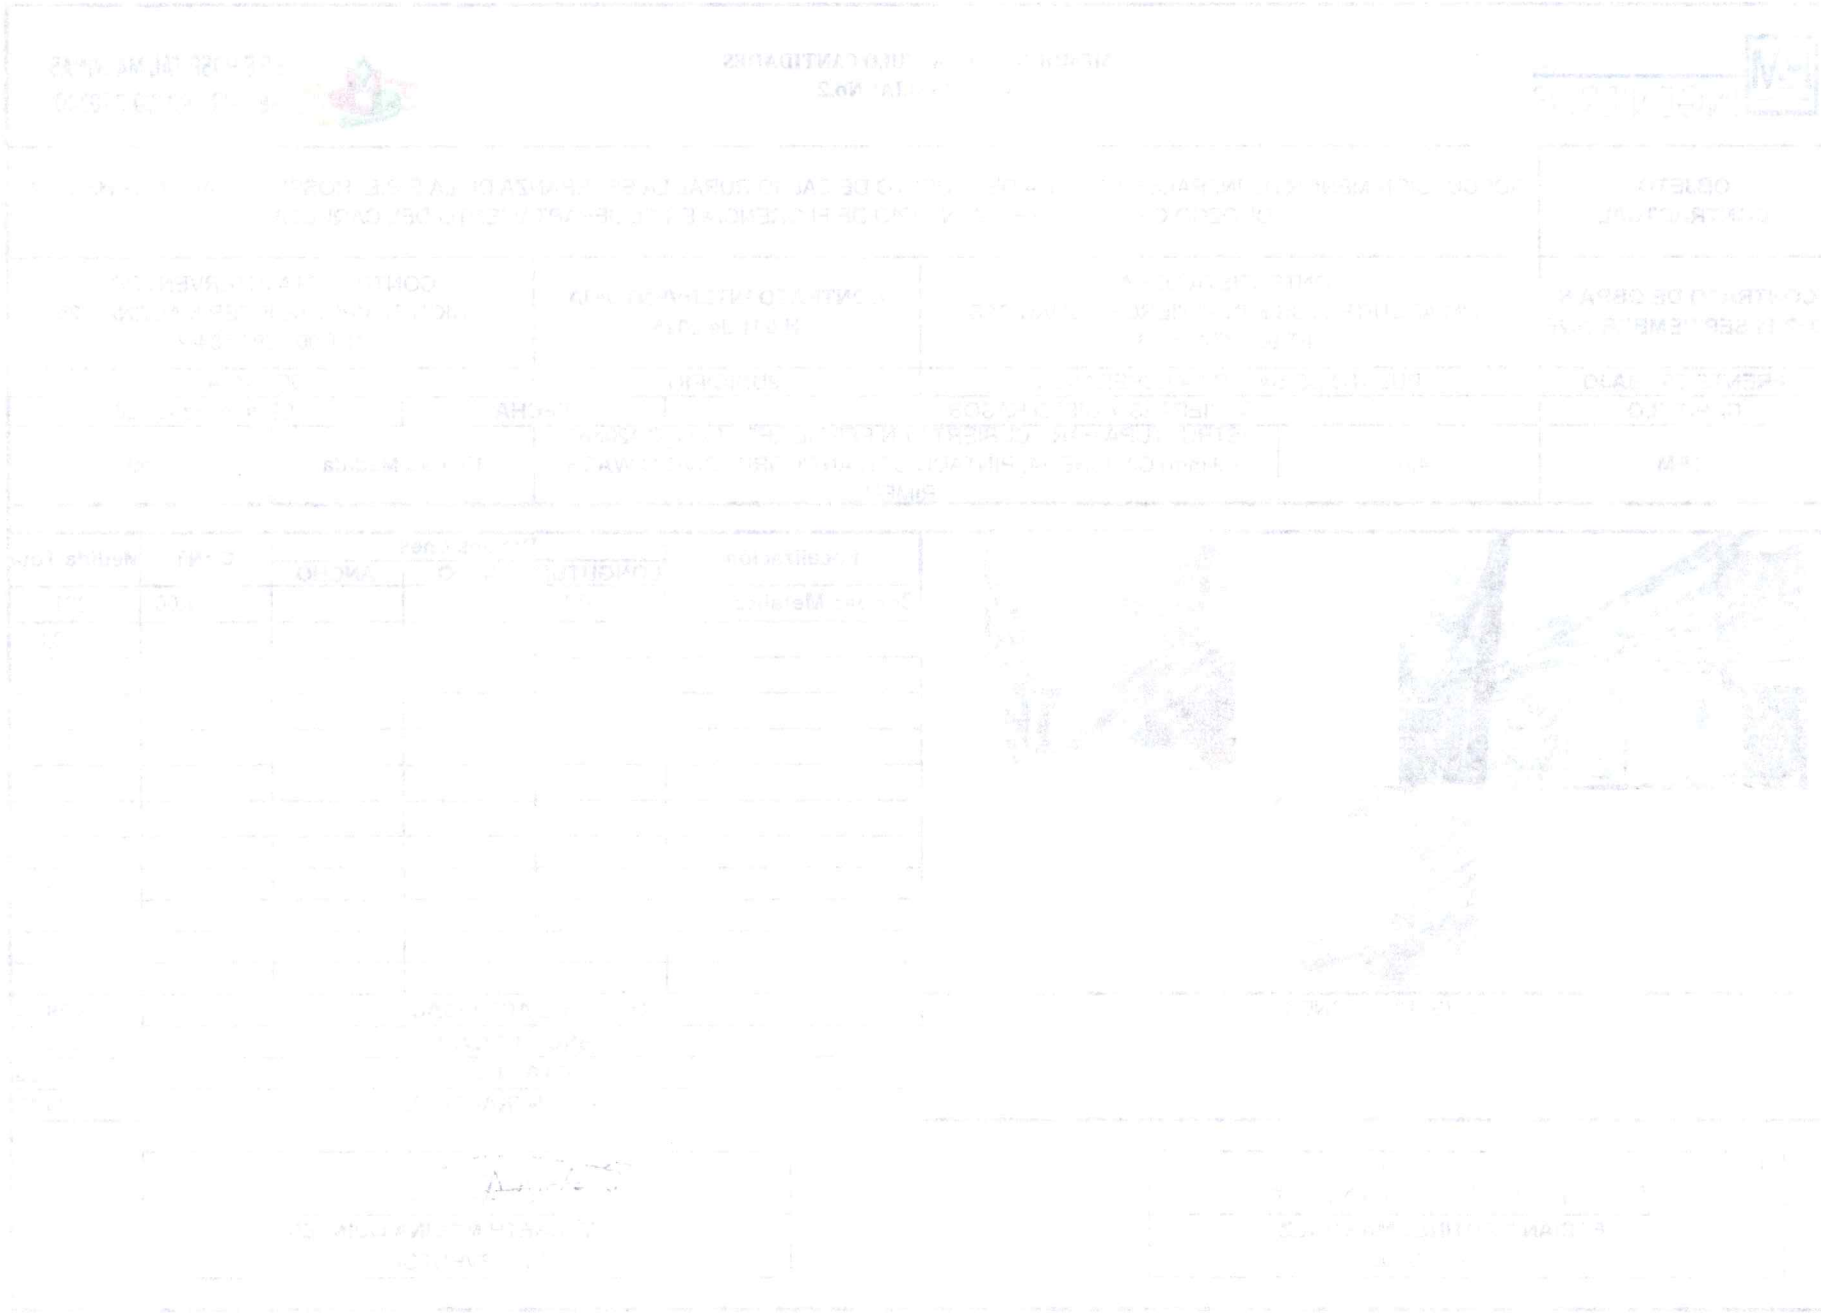

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA ESPERANZA DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT.901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	CUBIERTAS Y CIELO RASOS	**FECHA**	02 de marzo 2026	
ÍTEM	4,02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA EN LAMINA MASTER 1000 CALIBRE 28 PREPINTADA.	**Unidad Medida**	m2





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Tota
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
Cubierta	5,45		20,14	1,00	109,76
	4,95		20,14	1,00	99,69
	4,00		2,11	1,00	8,44
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES: Se plantean las Correas en pacha.

TOTAL DE ACTIVIDAD	**217,90**
COBRO ACTA N.1	209,46
ACTA N.2	**8,44**
TOTAL CONTRACTUAL	281,44

Elaboró
Fabian Martinez
FABIAN MARTINEZ MARTINEZ
Residente de Obra

Avaló
RUDY YANSETH MOLINA QUINTERO
INTERVENTOR

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA ESPERANZA DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT.901.994.584-2
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA
CAPITULO	CUBIERTAS Y CIELO RASOS	**FECHA**	02 de marzo 2026
ÍTEM	4,06 — SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC	**Unidad Medida**	m2





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Tota
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
ANDEN FRONTAL	9,19		0,90	1,00	8,27
	6,49		0,90	1,00	5,84
	0,92		0,50	1,00	0,46
ZONA 1	10,91		3,47	1,00	37,86
ZONA 2	10,19		7,90	1,00	80,50
SALA DE ESPERA	9,40		6,49	1,00	61,01

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**193,94**
COBRO ACTA N.1	0,00
ACTA N.2	**170,00**
TOTAL CONTRACTUAL	208,52

Elaboró
Fabian Martinez
FABIAN MARTINEZ MARTINEZ
Residente de Obra

Avaló
RUDY YANSETH MOLINA QUINTERO
INTERVENTOR

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA ESPERANZA DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT.901.994.584-2		
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA		
CAPITULO	PISOS Y ENCHAPES		**FECHA**	02 de marzo 2026	
ÍTEM	5,02	BALDOSA CERAMICA PARA PISOS	**Unidad Medida**	m2	







Localización	Dimensiones			CANT	Medida Tota
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
ZONA 1	10,91		3,47	1,00	37,86
ZONA 2	10,19		7,90	1,00	80,50
SALA DE ESPERA	9,40		6,49	1,00	61,01
BODEGA	3,14		2,05	1,00	6,44
CUARTO DE RESIDUOS	2,08		1,30	1,00	2,70
PISO LAVADERO	1,15		2,60	1,00	2,99
	1,00		1,10	1,00	1,10
ANDEN FRONTAL	9,19		0,90	1,00	8,27
	6,49		0,90	1,00	5,84
	0,92		0,50	1,00	0,46
	2,23		1,98	1,00	4,42
ANDEN POSTERIOR	8,74		1,00	1,00	8,74
INGRESO	3,15		1,00	1,00	3,15
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**223,47**
COBRO ACTA N.1	0,00
ACTA N.2	**200,00**
TOTAL CONTRACTUAL	154,76

Elaboró
fabian martinez
FABIAN MARTINEZ MARTINEZ
Residente de Obra

Avaló
RUDY YANSETH MOLINA QUINTERO
INTERVENTOR

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS ZOMAC SAS

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA ESPERANZA DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT.901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	CARPINTERIA METALICA		**FECHA**	02 de marzo 2026
ÍTEM	6,01	Puerta Metalica entablerado en lamina galvanizada Calibre 20, Con cerradura. Incluye Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. Tragaluz en Vidrio 4 mm	**Unidad Medida**	M2





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Tota
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
BODEGA	0,98	2,15		1,00	2,11
CUARTO DE RESIDUOS	0,98	2,15		1,00	2,11
WC1	0,98	2,15		1,00	2,11
WC2	0,98	2,15		1,00	2,11
PMR	0,98	2,15		1,00	2,11
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**10,54**
COBRO ACTA N.1	**0,00**
ACTA N.2	**10,54**
TOTAL CONTRACTUAL	10,02

Elaboró
fabian Martinez
FABIAN MARTINEZ MARTINEZ
Residente de Obra

Avaló
RYM
RUDY YANSETH MOLINA QUINTERO
INTERVENTOR



H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA ESPERANZA DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT.901.994.584-2
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA
CAPITULO	CARPINTERIA METALICA	**FECHA**	02 de marzo 2026
ÍTEM	6,02	Suministro e Instalación de Ventana Lamina Galvanizada Calibre 20. Corredera o Fija, Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. Incluye Vidrio 4 mm, pelicula de seguridad acabado sandblasting.	**Unidad Medida** M2








Localización	Dimensiones LONGUTUD	ALTO	ANCHO	CANT	Medida Total
VENTANAS FRONTALES	2,10	1,20		3,00	7,56
	1,50	0,40		1,00	0,60
VENTANAS POSTERIOR	2,50	0,60		1,00	1,50
	1,35	0,48		1,00	0,64
	2,00	1,10		2,00	4,40
	2,00	1,20		1,00	2,40
VENTANA LATERAL DER	1,00	0,50		1,00	0,50
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**17,60**
COBRO ACTA N.1	0,00
ACTA N.2	**17,60**
TOTAL CONTRACTUAL	23,44


Elaboró
Fabian Martnez
FABIAN MARTINEZ MARTINEZ
Residente de Obra

Avaló
RUDY YANSETH MOLINA QUINTERO
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA ESPERANZA DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT.901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS	**FECHA**	02 de marzo 2026	
ÍTEM	7,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE 12 CTOS (INCLUYE: CAJA DE BREAKERS BIFASICA, BREAKERS 1X20 AMP, 1X30 AMP)	**Unidad Medida**	UND

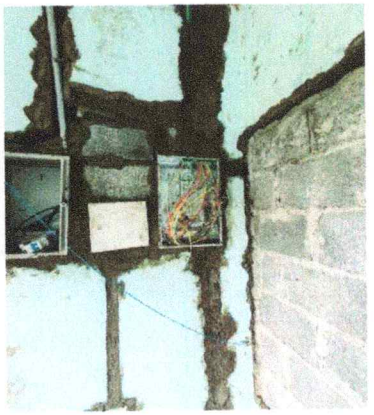

Localización	Dimensiones			CANT	Medida Tota
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
PUESTO SALUD				1,00	1,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**1,00**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	1,00
TOTAL CONTRACTUAL	1,00
TOTAL ACTIVIDAD	**2,00**

Elaboró
Fabian Martinez
FABIAN MARTINEZ MARTINEZ
Residente de Obra

Avaló
RUDY YANSETH MOLINA QUINTERO
INTERVENTOR




H2M ARQUITECTOS INGENIEROS ZOMAC SAS

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA ESPERANZA DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT.901.994.584-2
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA
CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS	**FECHA**	02 de marzo 2026
ÍTEM	7,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 110 V (INCLUYE ACCEOSRIOS, ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS, ALAMBRE AWG No 14 POR 1 LINEA, Y TUBERIA PVC HASTA POR 3 METROS).	**Unidad Medida** UND

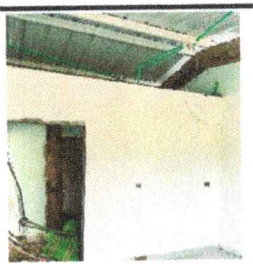

Localización	Dimensiones			CANT	Medida Tota
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
PUESTO SALUD			-	37,00	37,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**37,00**
COBRO ACTA N.1	0,00
ACTA N.2	**30,00**
TOTAL CONTRACTUAL	33,00

Elaboró
fabian Martinez
FABIAN MARTINEZ MARTINEZ
Residente de Obra

Avaló
RUDY YANSETH MOLINA QUINTERO
INTERVENTOR

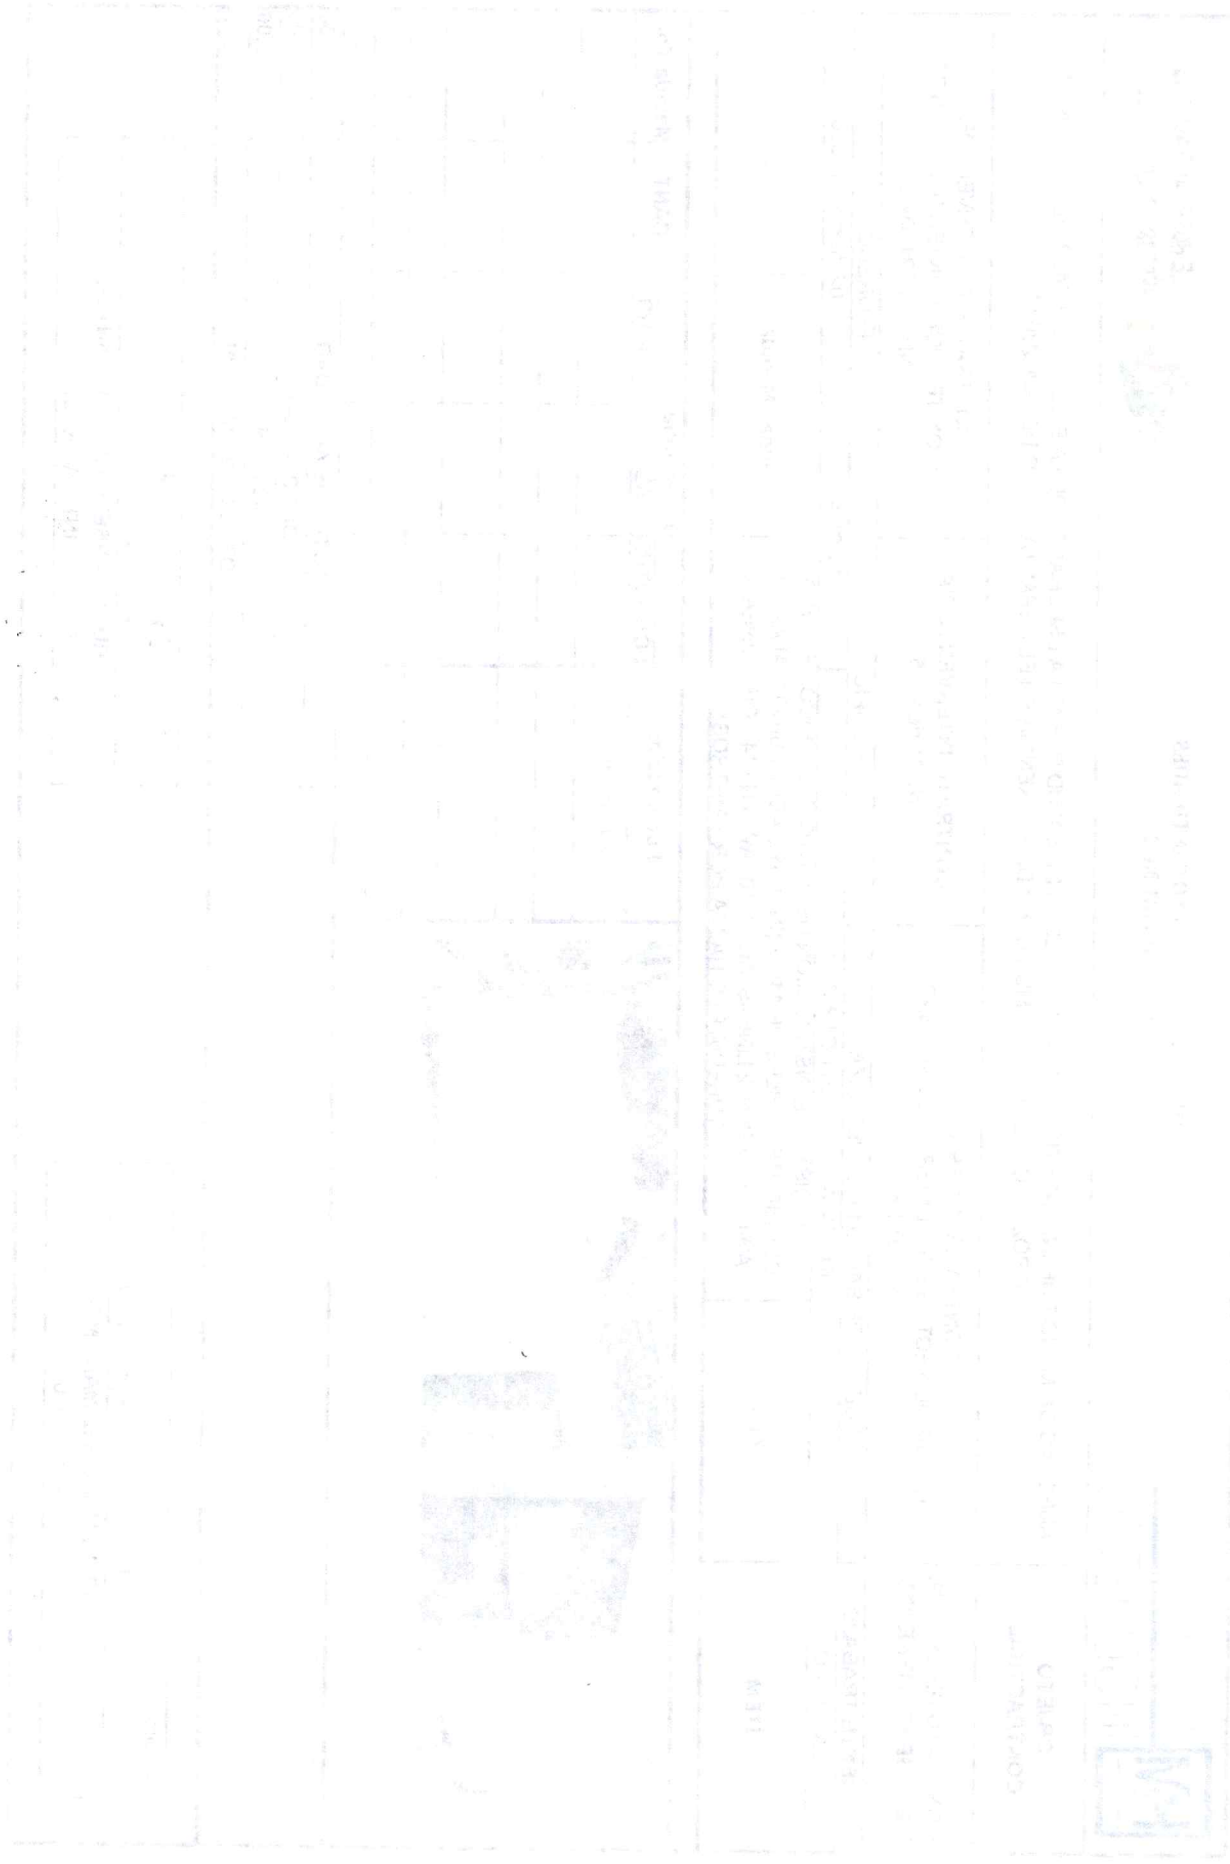

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA ESPERANZA DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT.901.994.584-2
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA
CAPITULO	CONCRETOS	**FECHA**	02 de marzo 2026
ÍTEM	NP2	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 0,2 X 0,10m EN CONCRETO DE 3000 psi, incluye acero de refuerzo en 4 varillas de 3/8", con flejes @0,15 m en varilla de 1/4".	**Unidad Medida** ML





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Tota
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
VIGA CONFINAMIENTO CONSULTORIO ODONTOLOGICO	3,40			2,00	6,80
	3,16			1,00	3,16

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**9,96**
COBRO ACTA N.1	0,00
ACTA N.2	**9,96**
TOTAL CONTRACTUAL	0,00

Elaboró
Fabian Martinez
FABIAN MARTINEZ MARTINEZ
Residente de Obra

Avaló
RUDY YANSETH MOLINA QUINTERO
INTERVENTOR

BITÁCORA LA ESPERANZA

Email: oficinah2m@hotmail.com

CARRERA 14 NO 11-08 BARRIO SAN FRANCISCO
FLORENCIA - CAQUETÁ

Contrato de obra N° 002 2025 11/sept/2025

Contratante: Ese Hospital Malvinas Héctor Orozco Orozco

Contratista de obra: H2H Arquitectos e ingenieros Zomac S.A.S. (H2MAE)

Contratista de interventoria: Unión Temporal Inter Malvinas 25.

Puesto de Salud la Esperanza Florencia

Acta de inicio: 06 octubre 2025

Residente de obra:

Residente de interventoria:

Scanned with CamScanner

Lunes, 06 octubre 2025

Se Firma acta de inicio de actividades y revisión Preliminar de documentación técnica

Residente de obra
Crishan A Otavoz

Residente de interventoría

Martes, 07 octubre 2025

Gestión de programación para la socialización comunitaria, también se realiza acercamiento con los líderes para coordinar convocatorias.

Cristian Otavoz
~~Residente obra~~

~~Residente interventoría~~

Miercoles, 08 octubre 2025

Seguimiento de la logistica para la socialización Presencial, tambien se realiza solicitud y verificación de disponibilidad de materiales

Crishan A Otavoz
~~Residente de obra~~

~~Residente de interventoría~~

Jueves, 09 octubre 2025

Ajuste en el cronograma interno debido a no ejecución de labores, comunicación con el contratante para definir fecha socialización

Cristian Otavoz
~~Residente obra~~

~~Residente interventoría~~

Viernes, 10 octubre 2025

Continuación de actividades administrativas a la espera de la socialización y gestión

Scanned with CamScanner

de proveedores sobre tiempo estimado de entrega de materiales Residente obra Residente int.

Sábado, 11 octubre 2025

Revisión técnica de planos y de especificaciones en oficinas y planeación de actividades a ejecutar posterior a la socialización.

Cristian Otavoz
Residente de obra

Residente de interventoría

Domingo, 12 atubre 2025

No se realizan actividades

Cristian A Otavoz
Residente de obra

Residente de interventoría

Lunes; 13 octubre 2025

Actividades administrativas en espera de autorización para inicio efectivo y seguimiento a disponibilidad de mano de obra local.

Cristian A Otavoz
Residente de obra

Residente de interventoría

Martes, 14 octubre 2025

Consolidación de documentos para la presentación a la comunidad e impresión de planos y contratos.

Residente de obra
Cristian A Otavoz

Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Miercoles, 15 octubre 2025

Se realiza coordinación operativa para la jornada de socialización del día siguiente con el acompañamiento de interventoría y contratante ESE MALLINAS Residente obra ~~R. Interv~~

Jueves, 16 octubre 2025

Realización de la socialización formal del proyecto con la comunidad, levantamiento de observaciones y aweros para el inicio de actividades de obra.

Cristian A Otavo
Residente obra

Residente interventoría

Viernes, 17 octubre 2025.

Coordinación preliminar con el contratista de interventoría para definir la logística administrativa de inicio de obra

Cristian A Otavo
Residente de obra

Residente de interventoría

Sábado, 18 octubre 2025

Gestión administrativa para la organización del equipo técnico y administrativo y verificación de mano de obra local

Cristian A Otavo
Residencia obra

Residente interventoría

Scanned with CamScanner

Domingo, 19 octubre 2025

No se ejecuta actividades

Cristian A Otavoz
Residente obra

Residente interventoria

Lunes, 20 octubre 2025

Continuación del proceso de vinculación de mano de obra local (oficial y ayudantes) Inicio de tramite de afiliaciones.

Cristian A Otavoz
Residente obra

Residente interventoria

Martes, 21 octubre 2025.

Gestión administrativa para formalización de documentos del personal.

Residente obra Residente interventoria

Miercoles, 22 octubre 2025

Organización interna de observaciones técnicas y administrativas presentadas en campo.

Cristian A Otavoz
Residente obra

Residente interventoria

Jueves, 23 octubre 2025

Se continua con los gestiones de planeación logistica, administrativa y operativa para inicio.

Cristian A Otavoz
Residente de obra

Residente interventoria

Scanned with CamScanner

Viernes, 24 octubre 2025

Se presenta dificultades en la disponibilidad de personal local para la ejecución de actividades. Por tal razón, se coordina gestionar traslado de personal desde la zona urbana.

Cristian A Otavot
Residente obra

Residente interventoría

Sábado, 25 octubre 2025

Continuación de gestiones para organizar el equipo de trabajo en campo, seguimiento a disponibilidad de perfiles, cubierta y material pétreo.

Cristian A Otavot
Residente obra

Residente interventoría

Domingo 26 octubre 2025

No se ejecuta actividades

Cristian A Otavot
Residente obra

Residente interventoría

Lunes 27 octubre 2025

Avance en la planeación operativa para reorganizar frentes de trabajo según la disponibilidad de insumos. Se realiza gestión de alternativas de transporte debido a las restricciones del Retén Aviapero.

Cristian A Otavot
Residente obra

Residente interventoría

Scanned with CamScanner

Martes,	28 octubre 2025 Seguimiento al pedido de perfiles y cubierta afectados por el agotamiento de materiales en el departamento. Se coordina el traslado del personal contratado hacia la zona rural. Cristian ADtavoz Residente obra Residente interventoría.
Miercoles	29 octubre 2025. Confirmación de entrega del material pétreo programado para el 31 octubre por disponibilidad de cantera. Cristian ADtavoz Residente de obra Residente interventoría.
Jueves	30 octubre 2025 Se recibe material petreo. Cristian ADtavoz Residente obra Residente interventoría
Viernes	31 octubre 2025 Actividades: Inicio administrativo y contratación de personal Se realizó la contratación formal del personal operativo y el proceso de ingreso legal. Verifico afiliaciones a seguridad

Scanned with CamScanner

social y entrego EPP para garantizar la seguridad en el frente de trabajo.

Cristhan A Otavoz
Residente Obra

Residente Interventoria

01-11-2025

Actividades: Socialización y logistica de seguridad.

Se realizo la socialización de los actividades con el equipo de trabajo y el personal del centro de salud. Establezco las rutas de evacuación de escombros para no inferir con la operación hospitalaria.

Cristhan A Otavoz
Residente Obra

Residente Interventoria

02/11/2025

No se trabaja día de descanso dominical

Cristhan A Otavoz
Residente Obra

Residente Interventoria.

Scanned with CamScanner

03 / 11 / 2025

Actividades: Inicio de desmonte de carpintería metalica.

Se realizo desmonte de marcos y ventanas metálicos existentes. Inicio el acopio de material recuperable y la demolición controlada de muros no estructurales en áreas comunes.

Cristhan A Otavoz
Residente Obra

Residente Interventoria.

04/11/2025

Actividades: Demolición de áreas comunes. Se continuó con la remoción de elementos arquitectónicos en zonas comunes. Detecta posibles demoras en el suministro de materiales regionales y activo plan de contingencia logística.

Cristian A Otavoz
Residente Obra

Residente Interventoria.

Scanned with CamScanner

05/11/2025

Actividades: Limpieza y retiro de escombros.

Se Coordino el retiro manual de escombros para mantener la higiene del área de salud. Se Superviso que las áreas de trabajo queden despejados para el inicio de las fases de cimentación

Crishan A Otavo2 — Residente Obra

Residente Interventoria

06/11/2025

Actividades: Cierre de semana preliminar Finalizo la primera fase de desmonte Refuerzo de la planificación operativa ante la interventoría para prevenir retrasos por falta de materiales en la región.

Crishan A Otavo2 — Residente Obra

Residente Interventoria

Scanned with CamScanner

07/11/2025

Actividades: Demolición de pisos en sala de espera.
Inicio la demolición de los acabados de piso. Se evidencia que la dureza del material requiere mayor tiempo de ejecución del proyecto.

Cristian A Otavoz — Residente Obra

Residente interventoría

08/11/2025

Actividades: Retiro de aparatos sanitarios. Superviso el desmonte de baterías sanitarias antiguas. Registro una limitación en la disponibilidad de mano de obra calificada en la zona, lo cual afecta el rendimiento diario.

Cristian A Otavoz — Residente Obra

Residente Interventoría

Scanned with CamScanner

10 / 11 / 2025

Achvidades: Conhnuación de demoliciones generales.

Los achvidades de desmonte se exhenden por segwnda semana consecuhva, superando los hempos establecidos originalmente en el cronograma.

Crishan A Otavoz
Residente Obra

Residente Interventoria

11 / 11 / 2025

Achvidades: Remoción de enchapes y limpieza
Se conhnvá con el desmonte de encha pes en muros. Se coordina el rehro de matenales sobiantes para liberar frenks de trabajo de cimentación

Crishan A Otavoz
Residente Obra

Residente Interventoria

Scanned with CamScanner

12/11/2025

Actividades: Gestión de materiales de cimentación.

Se presentan retrazos críticos en la entrega de materiales requeridos para iniciar las etapas construtivas (cemento y agregados).

Cristian A Otavo2 — Residente Obra

Residente Interventoria

13/11/2025

Actividades: Balance de avance

Se repoita un avance ejecutado del 10%. frente al 25%. programado. El atraso del 15%. se atribuye a la falta de suministro oportuno y personal suficiente. implemento plan de choque con herramientas eléctricas para recuperar tiempo.

Cristián A Otavo2 — Residente Obra

Residente Interventoria

Scanned with CamScanner

28/11/2025

Actividades: Excavación para zapata de tanque y red sanitaria.

Se inicio la excavación para la conexión de la red hidrosanitaria principal. Simultaneamente, Supervise la excavación para la zapata del tanque elevado y la fundición del concreto de limpieza.

Crishan A Olavoz
Residente Obra

Residente Interventoría

29/11/2025

Actividades: Replanteo por visita del Ministerio de salud

Se ajusto cantidades de obra (bloque, tubería y concreto) debido a los cambios de diseño solicitados para alcanzar las condiciones ideales de atención.

Crishan A Olavoz
Residente Obra

Residente Interventoría

Scanned with CamScanner

01/12/2025.

Actividades: Terminacion de placa de contrapiso.
Fundicion de placa de contrapiso en áreas internas. Verifico que los niveles cumplan con la pendiente necesaria para el drenaje de las áreas hospitalarias.

Cristhan A Otavoz
Residente Obra

Residente Interventoría

02/12/2025

Se inicio el levante de muros con bloque N°4 para la batería Sanitaria y la rehubicación del cuarto de aseo y residuos, siguiendo el diseño actualizado.

Cristhan A. Otavoz
Residente Obra

Residente Interventoría

03/12/2025

Actividades: Instalación de tubería adicional

Scanned with CamScanner

Se procede con la instalación de redes hidrosanitarias adicionales según las recomendaciones de la supervisión. Se dejo los espacios listos para la ejecución de las siguientes achvidades estructurales.

Crishan A Otavor — Residente Obra

Residente Interventoría

04 / 12 / 2025

El proyecto alcanza un 23% de avance real frente al 30% programado. Se ha realizado balance de cantidades para optimizar los recursos y asegurar la culminación en el plazo restante de 32 días.

Crishan A Otavor — Residente Obra

Residente Interventoría

05 / 12 / 2025

Achvidades: Concexion de tubería Sanitaria

Scanned with CamScanner

profunda.
Se realizo la conexión a la red de alcantarillado municipal a una profundidad de 1.90m. Se superviso el entibado y la seguridad del personal en la exlavación profunda.

Cristian A Octavo
Residente Obra

Residente Interventoría

06/12/2025
Actividades: Armado de vigas de apoyo para cubierta.
Como obra adicional para mejorar el refuerzo de la cubierta, se ordeno el figurado de aceros para las vigas de apoyo de las correas.

Cristian A Octavo
Residente Obra

Residente Interventoría

08/12/2025
Actividades: Fundición de vigas de apoyo

Scanned with CamScanner

Se aprovecho la jornada festiva para fundir las vigas de soporte de las correas. Se reporta retraso en la llegada de la cubierta por temas de logística de transporte.

Crishan A Otavoz
Residente Obra

Residente Interventoría

09/12/2025
Actividades: Fundicion de cajas de inspección.
Se realizo fundicion de las cajas de inspección sanitaria y el inicio de la demolición de muros para el consultorio odontologico.

Crishan A Otavoz
Residente Obra

Residente Interventoría

10/12/2025
Actividades: Refuerzo de concreto en áreas existentes.

Scanned with CamScanner

Se aplico concreto de refuerzo para consolidar áreas preexistentes con la nueva intervención. Se proyecta un avance adicional del 10%. para el cierre de la jornada.

Cristian A Otavot
Residente Obra

3
Residente Interventoría

11/12/2025
Al cierre de hoy registramos un 38%. de avance real frente al 50%. programado. El atraso del 12%. se debe a la demora en la entrega de la cubierta, aunque la estructura de apoyo ya está lista. Nos restan 25 días para finalizar.

Cristian A Otavot
Residente Obra

3
Residente Interventoría

12/12/2025
Se registrarón dificultades en el cronograma debido al retraso en el suministro de perfilería, el transporte hacia la zona

Scanned with CamScanner

rural del proyecto se vió restringido por un paro a nivel departamental en el cagueta.

Cristian AOtavoz — Residente Obra
Residente Interventoría
13/12/2025

Se registraron dificultades en el cronograma debido al retraso en el suministro de perfilería. Pero se realizaron labores de preparación para el apoyo estructural de correas de la cubierta.

Continúo la afectación por el paro armado, limitando el acceso de materiales e insumos necesarios para el levantamiento de muros

Cristian AOtavoz — Residente Obra
Residente Interventoría.
15/12/2025

Se (continuo) ejecutó la fundación de cinta cubata.

Scanned with CamScanner

Se construyeron tres (3) elementos de sección 13*20cm para servir como apoyo estructural.
Se dio inicio a la instalación de pañetería metálica de acuerdo con los planos del proyecto.

Crishan A Otavoz
Residente Obra

Residente Interventoría

16/12/2025

Se realizaron trabajos de adecuación técnica para las áreas internas del puesto de salud.
Se preparó el terreno para la fundición de concreto en zonas específicas de atención.

Crishan A Otavoz
Residente Obra

Residente Interventoría.

17/12/2025

Se realizó fundición del concreto de contrapiso en el consultorio odontológico
Se ejecutaron actividades como la

Scanned with CamScanner

fundición de placa en el área de lavatraperas, garantizando las condiciones técnicas de los siguientes etapas

Cristian A Otavoz
Residente Obra

Residente Interventor

18/12/2025
Se realizó la inspección de la viga de apoyo de las correas.
Se confirmó que el paro departamental fue levantado tras la concertación de términos, permitiendo el restablecimiento del tránsito vehicular.
Cierre del periodo con un avance real del 41% frente a un 70% programado.
Se formalizó la solicitud de suspensión del contrato para gestionar el trámite administrativo hacia la vigencia 2026.

Cristian A Otavoz
Residente Obra

Residente Interventoría.

Scanned with CamScanner

19/12/2025.

Se realizaron actividades de instalación de perfilería en la cubierta del Puesto de salud. Sin embargo, el proceso se vio limitado por las constantes lluvias registradas en la zona, las cuales generaron improvistos para las labores de soldadura en las estructuras.

Cristian A Otavo3 — Residente Obra

Residente Interventoría.

20/12/2025

Se continuó con la instalación de perfiles para la cubierta, buscando avanzar en actividades paralelas que no se vieran tan afectadas por el clima. A pesar de contar con el material en obra, las lluvias persistentes impidieron el desarrollo normal de las soldaduras de perfilería.

Cristian A Otavo3 — Residente Obra

Residente Interventoría

22/12/2025.

Se dio inicio a la instalación de cubierta propiamente dicha, con el objetivo de finalizar esta etapa al terminar la semana y así poder continuar con las actividades de mampostería programadas. Se mantuvo la supervisión sobre la perfilería instalada para asegurar el cumplimiento de los planos.

Cristhan A Otavo
Residente Obra

Residente Interventoría

23/12/2025.

Se prosiguió con la instalación de perfiles y los trabajos en la cubierta, alcanzando al cierre de la jornada un avance físico del 52% frente al 85% programado. La interventoría recomendó agilizar la construcción de muros e instalaciones eléctricas para recuperar el tiempo perdido por los factores climáticos

Scanned with CamScanner

Cristian A Otavoz.
Residente Obra

Residente Interventoría

Scanned with CamScanner
