UNIÓN TEMPORAL
INTER-MALVINAS 25

Florencia, 13 Mayo 2026

UTIM30-1305-2026

Señores:
E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO
Dr. Alexander Villota Fajardo
Supervisor Contrato CI 001 del 03-10-25
La Ciudad

Asunto: Entrega Acta parcial No 003 del contrato de Obra CO No 002 de 2025.

Cordial Saludo,

En calidad de Interventoría del Contrato de Obra CO No. 002 del 11 de septiembre de 2025, cuyo objeto corresponde a "*REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ*", nos permitimos remitir el Acta Parcial de Obra No 003, la cual ha sido revisada y avalada por parte de esta interventoría para el respectivo pago, por lo tanto se adjunta como soporte los siguientes documentos que conforman el acta parcial de obra:

- Acta Parcial No 003 por Puesto de Salud
- Memorias de Cantidades de Obra por Puesto de Salud
- Factura Electrónica por Puesto de Salud
- Certificado pago parafiscales.
- Certificado bancario
- Pagos Planillas seguridad Social
- Rut

Adicional anexamos por parte de la interventoría:

- Certificado de cumplimiento y aval para el pago del Acta Parcial de obra emitido por UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25.

La presente se firma a los 13 días del mes de Mayo de 2026, en el municipio de Florencia, Caquetá.

Atentamente,

JHONATTAN HOYOS MARQUEZ
Representante legal
UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25

CL 10 B 2 D 04, Florencia, Caquetá
construmaterialesing@hotmail.com – 302-832-0309

UNIÓN TEMPORAL
INTER-MALVINAS 25

Florencia, 17 ABRIL 2026

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE INTERVENTORÍA

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25, EN CALIDAD DE INTERVENTOR DEL CONTRATO DE OBRA No CO No 002 del 2025 CUYO OBJETO ES:

REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOSDE SALUD DE MARACAIBO, EL PARÁ, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.

CERTIFICA QUE,

Se revisó el informe y Acta Parcial No 003, para pago, entregado por el Contratista H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS Nit. 901.372.267-3, junto con los documentos que conforman el Acta Parcial No 003 con fecha de corte 17 de ABRIL de 2026, y que los mismos cumplen con las condiciones establecidas en el contrato de obra No CO No 002 del 2025, y al avance físico y financiero de ejecución de la obra el cual corresponde un porcentaje general ACUMULADO del 89.51%, discriminado de la siguiente manera:

PUESTO DE SALUD	VR. CONTRACTUAL	VR. ACTA 1	VR. ACTA 2	VR. ACTA No 00 3	% ACTA PARCIAL No 003	VR. ACUMULADO ACTAS	% ACUMULADO	% POR COBRAR
L PARÁ	482,074,914.00	109,487,351.00	156,632,282.00	110,881,285.00	23.00%	377,000,918.00	78.20%	21.80%
LA ESPERANZA	495,836,805.00	221,707,667.00	147,613,696.00	126,515,442.00	25.52%	495,836,805.00	100.00%	0.00%
MARACAIBO	449,420,888.00	220,599,159.00	142,722,519.00	86,099,210.00	19.16%	449,420,888.00	100.00%	0.00%
NORCASIA	458,711,738.00	64,601,401.00	97,856,682.00	203,544,296.00	44.37%	366,002,379.00	79.79%	20.21%
TOTAL	**1,886,044,345.00**	**616,395,578.00**	**544,825,179.00**	**527,040,233.00**	**27.94%**	**1,688,260,990.00**	**89.51%**	**10.49%**

y que por lo anterior se AUTORIZA el pago de las facturas emitidas por el contratista para cada frente de trabajo de manera independiente, correspondiente al ACTA PARCIAL No 003.

Atentamente,

JHONATTAN HOYOS MARQUEZ
Representante legal
UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25
CI 001 DE 2025

CL 10 B 2 D 04, Florencia, Caquetá
construmaterialesing@hotmail.com – 302-832-0309

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

ACTA PARCIAL No 003

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3		
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA		
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2	**CONTRATO DE INTERVENTORIA :**	CI 001 del 03 de Octubre de 2025
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE REINICIO:**	24 DE FEBRERO DE 2026	**ACTA PARCIAL No.3**	17 DE ABRIL 2026
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE TERMINACION FINAL:**	26 DE ABRIL DE 2026		
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **MARACAIBO**	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDADES			VALORES		ACTA PARCIAL NO 3		ACUMULADO		POR COBRAR		CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR TOTAL ACTUALIZADO
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	+/-	MAY (+)	MEN (-)	MAY (+)	MEN (-)	CANT	SUBTOTAL	CANT	SUBTOTAL	CANT	SUBTOTAL		
1	**PRELIMINARES**				**21,703,827.00**				**307,593.00**	**- 13,573.00**		-		**21,997,849.00**				**21,997,849.00**
1.01	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS (LAVAMANOS, INODOROS, ORINALES).	UND	5.00	31,642.00	158,210.00	-	-	-	-	-		-	5.00	158,210.00	-	-	5.00	158,210.00
1.02	DESMONTE Y RETIRO DE CUBIIERTA EXISTENTE. INCLUYE TEJA, ESTRUCTURA, TEMPLETES, ANCLAJES, CABALLETES, LIMAOYAS Y LIMATESAS).	M2	162.15	60,470.00	9,805,211.00	-	-	-	-	-		-	162.15	9,805,211.00	-	-	162.15	9,805,211.00
1.03	DEMOLICIÓN DE PISO ESMALTADO, CERAMICA, BALDOSA CEMENTO O MORTERO NIVELACIÓN. INCLUYE RETIRO	M2	101.31	32,175.00	3,259,649.00	-	-	-	-	-		-	101.31	3,259,649.00	-	-	101.31	3,259,649.00
1.04	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PLACA EN CONCRETO, ANDENES EN CONCRETO, RAMPAS EN CONCRETO. (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO)	M2	97.05	36,895.00	3,580,660.00	-	-	-	-	-		-	97.05	3,580,660.00	-	-	97.05	3,580,660.00
1.05	DESMONTE DE PUERTA Y VENTANAS (INCLUYE MARCOS, VIDRIOS, NAVES).	M2	26.69	28,959.00	772,916.00	-	-	-	-	-		-	26.69	772,916.00	-	-	26.69	772,916.00
1.06	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO).	M2	27.92	27,352.00	763,668.00	-	-	-	-	-		-	27.92	763,668.00	-	-	27.92	763,668.00
1.07	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA, CON Y SIN PAÑETE, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO	M2	12.12	32,175.00	389,961.00	+	9.56	-	307,593.00	-		-	21.68	697,554.00	-	-	21.68	697,554.00
1.08	DEMOLICIÓN DE MESONES EN CONCRETO, LAVADEROS EN CONCRETO, POCETAS EN CONCRETO. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO.	und	3.00	52,561.00	157,683.00	-	-	-	-	-		-	3.00	157,683.00	-	-	3.00	157,683.00
1.09	DEMONTE, RETIRO Y DESHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA INTERNA EXISTENTE.	m2	78.24	22,519.00	1,761,887.00	-	-	-	-	-		-	78.24	1,761,887.00	-	-	78.24	1,761,887.00
1.10	DESMONTE Y RETIRO DE TANQUE ELEVADO EXISTENTE	UND	1.00	100,150.00	100,150.00	-	-	-	-	-		-	1.00	100,150.00	-	-	1.00	100,150.00
1.11	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMUN ALTURA HASTA 1,00 m.	M3	10.72	77,181.00	827,380.00	-	-	- 0.12	-	- 9,262.00		-	10.60	818,119.00	-	-	10.60	818,119.00
1.12	RELLENO MATERIAL PREEXCAVADO, INCLUYE COMPACTACIÓN MECANICA.	M3	3.52	35,924.00	126,452.00	-	-	- 0.12	-	- 4,311.00		-	3.40	122,142.00	-	-	3.40	122,142.00
2	**CONCRETOS**				**26,670,680.00**				**9,048,277.00**	**- 1,249,114.00**		**389,424.00**	-	**34,469,843.00**		-	-	**34,469,843.00**
2.01	PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO 3000PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 5 mm. ESPESOR 10 cm	M2	21.37	149,823.00	3,201,716.00	+	52.89	-	7,924,664.00	-	0.47	70,942.00	74.26	11,126,381.00	-	-	74.26	11,126,381.00

ACTA PARCIAL No 003

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3		
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA		
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2	**CONTRATO DE INTERVENTORIA :**	CI 001 del 03 de Octubre de 2025
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE REINICIO:**	24 DE FEBRERO DE 2026	**ACTA PARCIAL No.3**	17 DE ABRIL 2026
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE TERMINACION FINAL:**	26 DE ABRIL DE 2026		
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **MARACAIBO**	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDADES			VALORES		ACTA PARCIAL NO 3		ACUMULADO		POR COBRAR		CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR TOTAL ACTUALIZADO
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	+/-	MAY (+)	MEN (-)	MAY (+)	MEN (-)	CANT	SUBTOTAL	CANT	SUBTOTAL	CANT	SUBTOTAL		
2.02	ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 4 mm, Espesor 10 cm. Escobeado y Ratoneado	m2	34.06	148,823.00	5,068,911.00	+	7.27	-	1,081,943.00	-	- 1.06	- 157,752.00	41.33	6,150,855.00	-	-	41.33	6,150,855.00
2.03	RAMPA 10CM EN CONCRETO 3000 PSI, RATONEADA Y ESCOBEADA. INCLUYE EXCAVACIÓN, MALLA ELECTROSOLDADA 4 MM, RELLENO, COMPACTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2	8.72	148,823.00	1,297,737.00	+	0.28	-	41,670.00	-	3.20	476,234.00	9.00	1,339,407.00	-	-	9.00	1,339,407.00
2.04	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,30X0,30m EN CONCRETO DE 3000 psi, incluye acero de refuerzo en 4 varillas de 1/2", con flejes @0,15 m en varilla de 3/8".	ML	80.00	198,165.00	15,853,200.00	-	-	-	-	-	-	-	80.00	15,853,200.00	-	-	80.00	15,853,200.00
2.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO, REF. A10 DE 50X20X80 cm. INCLUYE EXCAVACIÓN, Y ATRAQUE PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	8.72	143,247.00	1,249,114.00	-	-	- 8.72	-	- 1,249,114.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3	**MAMPOSTERÍA Y ACABADOS DE MUROS**				**72,109,365.00**				**7,049,270.00**	**- 15,837,124.00**		**31,604,480.00**	-	**63,321,511.00**		-	-	**63,321,511.00**
3.01	MURO EN BLOQUE No 4	M2	102.51	73,861.00	7,571,491.00	-	-	- 2.69	-	- 198,686.00		-	99.82	7,372,805.00	-	-	99.82	7,372,805.00
3.02	PAÑETE EN MOTERO IMPERMEABILIZADO 1:4	M2	345.59	47,876.00	16,545,467.00	-	-	-186.05	-	- 8,907,330.00		-	159.54	7,638,137.00	-	-	159.54	7,638,137.00
3.03	ENCHAPE MURO FORMATO MÍNIMO 25X.30	M2	39.00	126,916.00	4,949,724.00	-	-	- 24.52	-	- 3,111,980.00		-	14.48	1,837,744.00	-	-	14.48	1,837,744.00
3.04	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS TIPO I	M2	37.01	34,933.00	1,292,870.00	+	52.03	-	1,817,564.00	-		-	89.04	3,110,434.00	-	-	89.04	3,110,434.00
3.05	ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES TIPO KORAZA	M2	80.05	39,803.00	3,186,230.00	+	131.44	-	5,231,706.00	-		-	211.49	8,417,936.00	-	-	211.49	8,417,936.00
3.06	ESTUCO Y PINTURA DE ALTA ASEPSIA 3 MANOS	M2	141.22	41,511.00	5,862,183.00	-	-	- 60.76	-	- 2,522,208.00		-	80.46	3,339,975.00	-	-	80.46	3,339,975.00
3.07	ESTUCO Y PINTURA TIPO ESMALTE SOBRE MUROS	M2	26.30	41,708.00	1,096,920.00	-	-	- 26.30	-	- 1,096,920.00		-	-	-	-	-	-	-
3.08	Malla eslabonada h=1,65m, con marco en angulo, para cerramiento perimetral, incluye tubería galvanizada cada 2,00 m y anclaje en concreto.	ml	80.00	395,056.00	31,604,480.00	-	-	-	-	-	80.00	31,604,480.00	80.00	31,604,480.00	-	-	80.00	31,604,480.00
4	**CUBIERTAS Y CIELO RASOS**				**73,383,270.00**				**228,944.00**	**- 455,891.00**		**5,506,426.00**	-	**73,156,323.00**		-	-	**73,156,323.00**
4.01	ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN PERFIL REF: (PAG_C 120X60_2.00 mm) CALIBRE 14, PINTADO CON ANTICORROSIVO O WASH PRIMER. INCLUYE ANCLAJES EN VARILLA EN MUROS CULATAS.	ML	269.00	135,331.00	36,404,039.00	-	-	- 1.90	-	- 257,129.00		-	267.10	36,146,910.00	-	-	267.10	36,146,910.00

ACTA PARCIAL No 003

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3		
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA		
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2	**CONTRATO DE INTERVENTORIA :**	CI 001 del 03 de Octubre de 2025
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE REINICIO:**	24 DE FEBRERO DE 2026	**ACTA PARCIAL No.3**	17 DE ABRIL 2026
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE TERMINACION FINAL:**	26 DE ABRIL DE 2026		
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **MARACAIBO**	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDADES			VALORES		ACTA PARCIAL NO 3		ACUMULADO		POR COBRAR		CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR TOTAL ACTUALIZADO
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	+/-	MAY (+)	MEN (-)	MAY (+)	MEN (-)	CANT	SUBTOTAL	CANT	SUBTOTAL	CANT	SUBTOTAL		
4.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA EN LAMINA MASTER 1000 CALIBRE 28 PREPINTADA, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	M2	143.15	131,577.00	18,835,248.00	+	1.74	-	228,944.00	-		-	144.89	19,064,192.00	-	-	144.89	19,064,192.00
4.03	CABALLETE EN LAMINA METALICA PINTADA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	13.00	65,973.00	857,649.00	-	-	-	-	-		-	13.00	857,649.00	-	-	13.00	857,649.00
4.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 CON DESARROLLO DE 0,60 M INCLUYE GANCHO DE FIJACION, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	ML	26.00	180,924.00	4,704,024.00	-	-	-	-	-	26.00	4,704,024.00	26.00	4,704,024.00	-	-	26.00	4,704,024.00
4.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN 3"	ML	20.80	38,577.00	802,402.00	-	-	-	-	-	20.80	802,402.00	20.80	802,402.00	-	-	20.80	802,402.00
4.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS DE ANCLAJE, UNIONES, RINCONERAS	M2	109.05	106,023.00	11,779,908.00	-	-	- 1.84	-	- 196,762.00		-	107.21	11,581,146.00	-	-	107.21	11,581,146.00
5	**PISOS Y ENCHAPES**				**26,001,953.00**				-	- **10,982,254.00**		-	-	**15,019,698.00**		-	-	**15,019,698.00**
5.01	NIVELACION PARA PISO E=0,05 a 0.07 m	M2	109.42	65,999.00	7,221,611.00	-	-	- 27.64	-	- 1,824,212.00		-	81.78	5,397,398.00	-	-	81.78	5,397,398.00
5.02	BALDOSA CERAMICA PARA PISOS FORMATO CUADRADO MINIMO .45X.45m TRAFICO COMERCIAL, PRIMERA CALIDAD.	M2	109.00	124,287.00	13,547,283.00	-	-	- 31.58	-	- 3,924,983.00	-	-	77.42	9,622,300.00	-	-	77.42	9,622,300.00
5.03	GUARDAESCOBA EN CERAMICA	ML	131.23	39,877.00	5,233,059.00	-	-	-131.23	-	- 5,233,059.00	-	-	-	-	-	-	-	-
6	**CARPINTERIA METALICA**				**63,138,484.00**				**690,864.00**	- **3,780,782.00**		**8,530,502.00**	-	**60,048,566.00**		-	-	**60,048,566.00**
6.01	1 Puerta Metalica entabierado en lamina galvanizada Calibre 20, Con cerradura. Incluye Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. Tragaluz, y marcos.	M2	1.89	1,031,425.00	1,949,393.00	+	0.17	-	175,342.00	-	2.06	2,124,736.00	2.06	2,124,736.00	-	-	2.06	2,124,736.00
6.02	Suministro e Instalación de 13 Ventanas Lamina Galvanizada Calibre 20. Corredera o Fija, Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. Incluye Vidrio 4 mm, pelicula de seguridad acabado sandblasting y marco.	M2	31.71	1,288,804.00	40,867,975.00	+	0.40	-	515,522.00	-	0.40	515,522.00	32.11	41,383,496.00	-	-	32.11	41,383,496.00
6.03	1 Portón Metalico entamborado en lamina galvanizada Calibre 20, Con cerradura Doble Macho. Incluye Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. 1,40mX2,40m, incluye tragaluz superior en vidrio 4mm y marcos, pelicula de seguridad transparente para vidrios.	UND	1.00	3,195,771.00	3,195,771.00	-	-	-	-	-	1.00	3,195,771.00	1.00	3,195,771.00	-	-	1.00	3,195,771.00

ACTA PARCIAL No 003

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3		
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA		
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2	**CONTRATO DE INTERVENTORIA :**	CI 001 del 03 de Octubre de 2025
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE REINICIO:**	24 DE FEBRERO DE 2026	**ACTA PARCIAL No.3**	17 DE ABRIL 2026
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE TERMINACION FINAL:**	26 DE ABRIL DE 2026		
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **MARACAIBO**	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDADES			VALORES		ACTA PARCIAL NO 3		ACUMULADO		POR COBRAR		CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR TOTAL ACTUALIZADO
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	+/-	MAY (+)	MEN (-)	MAY (+)	MEN (-)	CANT	SUBTOTAL	CANT	SUBTOTAL	CANT	SUBTOTAL		
6.04	7 Puertas En Marco y contramarco de Aluminio Blanco, con vidrio 5mm + pelicula tipo sandblasting, Con cerradura tipo bola. Tragaluz en Vidrio.	M2	16.08	1,065,009.00	17,125,345.00	-	-	- 3.55	-	- 3,780,782.00	2.53	2,694,473.00	12.53	13,344,563.00	-	-	12.53	13,344,563.00
7	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**26,983,900.00**				-	- **13,955,320.00**		- **397,902.00**	-	**13,026,580.00**		-	-	**13,028,580.00**
7.01	Conexión Acometida Parcial del Poste a la Caja de Medidor, en Cable Monofasico Encauchetado No 8, Cable No 8, Tensores para Cable, Tubo IMC 3/4", Capasete 3/4", Boquilla IMC 3/4".	ML	14.00	153,374.00	2,147,236.00	-	-	- 14.00	-	- 2,147,236.00		-	-	-	-	-	-	-
7.02	Suministro e instalación de Caja Medidor Monofasica, con pin de corte 1x40 amp, incluye instalación del sistema de Puesta a Tierra, incluye conector de cobre, cable AWG No 8 por 3 lineas, y Varilla de cobre 2,40m.	UND	1.00	1,043,675.00	1,043,675.00	-	-	- 1.00	-	- 1,043,675.00	- 1.00	- 1,043,675.00	-	-	-	-	-	-
7.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE 12 CTOS (INCLUYE: CAJA DE BREAKERS BIFASICA, BREAKERS 1X20 AMP, 1X30 AMP)	UND	1.00	811,074.00	811,074.00	-	-	-	-	-		-	1.00	811,074.00	-	-	1.00	811,074.00
7.04	Suministro e Instalación de Punto Electrico de iluminación. Incluye Luminaria Led de 18w. Redonda o Cuadrada o similar, de empotrar o sobreponer, según aplique. Incluye interruptor, y Alambre No 14 Awg por 2 Lineas hasta por 3 metros y tuberia PVC de 1/2" hasta por 3 m.	UND	38.00	195,661.00	7,435,118.00	-	-	- 16.00	-	- 3,130,576.00	2.00	391,322.00	22.00	4,304,542.00	-	-	22.00	4,304,542.00
7.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 110 V (INCLUYE ACCEOSRIOS, ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS, ALAMBRE AWG No 14 POR 1 LINEA, Y TUBERIA PVC HASTA POR 3 METROS).	UND	35.00	159,930.00	5,597,550.00	-	-	- 15.00	-	- 2,398,950.00		-	20.00	3,198,600.00	-	-	20.00	3,198,600.00
7.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 220V (INCLUYE ACCEOSRIOS, CABLE AWG No 10 POR 2 LINEAS, ALAMBRE AWG No 14 POR 1 LINEA, Y TUBERIA PVC).	UND	5.00	164,715.00	823,575.00	-	-	- 1.00	-	- 164,715.00	- 1.00	- 164,715.00	4.00	658,860.00	-	-	4.00	658,860.00
7.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA MANUAL PARA PLANTA ELECTRICA, INCLUYE TOMA 3x50 CODELCA, CAJA 2400, CAJA METALICA DE 25X25 X15, Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	UND	1.00	769,337.00	769,337.00	-	-	-	-	-		-	1.00	769,337.00	-	-	1.00	769,337.00

ACTA PARCIAL No 003

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3		
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA		
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2	**CONTRATO DE INTERVENTORIA :**	CI 001 del 03 de Octubre de 2025
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE REINICIO:**	24 DE FEBRERO DE 2026	**ACTA PARCIAL No.3**	17 DE ABRIL 2026
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE TERMINACION FINAL:**	26 DE ABRIL DE 2026		
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **MARACAIBO**	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDADES			VALORES		ACTA PARCIAL NO 3		ACUMULADO		POR COBRAR		CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR TOTAL ACTUALIZADO
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	+/-	MAY (+)	MEN (-)	MAY (+)	MEN (-)	CANT	SUBTOTAL	CANT	SUBTOTAL	CANT	SUBTOTAL		
7.08	ACOMETIDA PARA CONEXIÓN PLANTA ELECTRICA, DESDE TABLERO DISTRIBUCIÓN HASTA TRANSFERENCIA MANUAL. INCLUYE CABLE No 8 AWG POR 6 LINEAS.	ML	7.00	121,683.00	851,781.00	-	-	-	-	-		-	7.00	851,781.00	-	-	7.00	851,781.00
7.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONCHERA DE POSTE PARA CONEXIÓN DE LA RED DE INTERCONEXIÓN DEL DEPARTAMENTO CON EL PUESTO DE SALUD. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1.00	787,154.00	787,154.00	-	-	- 1.00	-	- 787,154.00	-	-	-	-	-	-	-	-
7.10	ACOMETIDA DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN A USO FINAL PARA TOMA CORRIENTES Y LUMINARIAS. INCLUYE TUBERÍA PVC, ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS Y ALAMBRE No 14 POR 1 LINEA Y ACCESORIOS.	ML	100.00	67,174.00	6,717,400.00	-	-	- 63.76	-	- 4,283,014.00	6.24	419,166.00	36.24	2,434,386.00	-	-	36.24	2,434,386.00
8	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS**				**25,147,140.00**				**251,732.00**	**- 5,318,308.00**		**10,942,777.00**	**-**	**20,080,563.00**		**-**	**-**	**20,080,563.00**
8.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE DE SOBRE PONER EN MUEBLE CON PUERTAS Y CAJONERAS EN RH. INCLUYE POCETAS Y ACCESORIOS DE GRIFERIA Y DESAGUES, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE. ALTURA: 0,90 m. ANCHO: 0,60 m.	ML	4.77	2,208,708.00	10,535,537.00	-	-	- 1.77	-	- 3,909,413.00	3.00	6,626,124.00	3.00	6,626,124.00	-	-	3.00	6,626,124.00
8.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO BLANCO DE PUSH INCLUYE GRIFERIA	UND	2.00	679,941.00	1,359,882.00	-	-	- 1.00	-	- 679,941.00	1.00	679,941.00	1.00	679,941.00	-	-	1.00	679,941.00
8.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND	5.00	388,678.00	1,943,390.00	-	-	-	-	-	5.00	1,943,390.00	5.00	1,943,390.00	-	-	5.00	1,943,390.00
8.04	SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE BARRA DE 60CM X2 DE SEGURIDAD PARA PARED, EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS	UND	1.00	892,324.00	892,324.00	-	-	-	-	-	1.00	892,324.00	1.00	892,324.00	-	-	1.00	892,324.00
8.05	Punto Hidraulico de 1/2", incluye accesorios PVC	UND	12.00	71,487.00	857,844.00	-	-	- 1.00	-	- 71,487.00	-	-	11.00	786,357.00	-	-	11.00	786,357.00
8.06	Punto Sanitario de 2", incluye accesorios PVC	UND	9.00	89,326.00	803,934.00	+	1.00	-	89,326.00	-	-	-	10.00	893,260.00	-	-	10.00	893,260.00
8.07	Punto Sanitario de 4", incluye accesorios PVC	UND	2.00	162,406.00	324,812.00	+	1.00	-	162,406.00	-	-	-	3.00	487,218.00	-	-	3.00	487,218.00

ACTA PARCIAL No 003

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3		
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA		
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2	**CONTRATO DE INTERVENTORIA :**	CI 001 del 03 de Octubre de 2025
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE REINICIO:**	24 DE FEBRERO DE 2026	**ACTA PARCIAL No.3**	17 DE ABRIL 2026
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE TERMINACION FINAL:**	26 DE ABRIL DE 2026		
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **MARACAIBO**	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDADES			VALORES		ACTA PARCIAL NO 3		ACUMULADO		POR COBRAR		CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR TOTAL ACTUALIZADO
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	+/-	MAY (+)	MEN (-)	MAY (+)	MEN (-)	CANT	SUBTOTAL	CANT	SUBTOTAL	CANT	SUBTOTAL		
8.08	Suministro e Instalación de Tanque Plastico de 1000lts, incluye Fluidmaster, Tapa, y accesorios PVC para la correcta conexión a la red de distribución.	UND	1.00	1,068,984.00	1,068,984.00	-	-	-	-	-		-	1.00	1,068,984.00	-	-	1.00	1,068,984.00
8.09	Acometida hidraulica de distribución en tubo PVC-P 3/4"	ML	19.53	36,138.00	705,775.00	-	-	- 0.80	-	- 28,910.00		-	18.73	676,865.00	-	-	18.73	676,865.00
8.10	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria 4".	ML	7.64	72,364.00	552,861.00	-	-	- 0.20	-	- 14,473.00		-	7.44	538,388.00	-	-	7.44	538,388.00
8.11	Suministro e instalación de lavatraperos prefabricado.	UND	1.00	613,724.00	613,724.00	-	-	-	-	-		-	1.00	613,724.00	-	-	1.00	613,724.00
8.12	Suministro e instalación de Ducha tipo regadera y teleducha independiente.	UND	1.00	800,998.00	800,998.00	-	-	-	-	-	1.00	800,998.00	1.00	800,998.00	-	-	1.00	800,998.00
8.13	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria de 2"	ML	8.95	47,656.00	426,521.00	-	-	- 0.24	-	- 11,437.00		-	8.71	415,084.00	-	-	8.71	415,084.00
8.14	Construcción de Caja de Inspecición de 0,60x0,60 en concreto.	und	2.00	798,203.00	1,596,406.00	-	-	-	-	-		-	2.00	1,596,406.00	-	-	2.00	1,596,406.00
8.15	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria PVC pesada 6".	ml	15.76	109,368.00	1,723,640.00	-	-	- 4.50	-	- 491,947.00		-	11.26	1,231,692.00	-	-	11.26	1,231,692.00
8.16	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria de 3"	ml	4.37	40,093.00	175,206.00	-	-	- 1.10	-	- 44,102.00		-	3.27	131,104.00	-	-	3.27	131,104.00
8.17	Suministro e Instalación de Tubería Hidraulica de 1/2"	ml	13.33	57,412.00	765,302.00	-	-	- 1.16	-	- 66,598.00		-	12.17	698,704.00	-	-	12.17	698,704.00
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**				-				**34,015,686.00**	-		**7,629,521.00**	-	**34,015,686.00**		-	-	**34,015,686.00**
NP1	COLUMNA DE 0,2 X 0,20m EN CONICRETO DE 3000 psi, incluye acero de refuerzo en 4 varillas de 3/8", con flejes @0.15 m en varilla de 1/4".	ML		304,367.00		+	23.00	-	7,000,441.00	-		-	23.00	7,000,441.00	-	-	23.00	7,000,441.00
NP2	COLUMNA DE 0,1 X 0,20m EN CONCRETO DE 3000 psi, incluye acero de refuerzo en 4 varillas de 3/8", con flejes @0,15 m en varilla de 1/4".	ML		125,000.00		+	18.00	-	2,250,000.00	-	-	-	18.00	2,250,000.00	-	-	18.00	2,250,000.00
NP3	Suministro e instalación Sistema Septico integrado de 1650 lts Rotoplast incluye Tanque pozo septico rotoplast de 1650 lts, Trampa de grasas, Excavación y rellenos del pozo.	Und		12,206,924.00		+	1.00	-	12,206,924.00	-		-	1.00	12,206,924.00	-	-	1.00	12,206,924.00
NP4	VIGA DE 0,2 X 0,20m EN CONCRETO DE 3000 psi, incluye acero de refuerzo en 4 varillas de 3/8", con flejes @0,15 m en varilla de 1/4".	ML		305,000.00		+	16.16	-	4,928,800.00	-		-	16.16	4,928,800.00	-	-	16.16	4,928,800.00
NP5	Conexión Acometida Parcial del Poste a la Caja de Medidor, en Cable Monofasico Encauchetado No 8, Cable No 8, Tensores para Cable, Tubo IMC 3/4", Capasete 3/4", Boquilla IMC 3/4".	ML		416,675.00		+	15.70	-	6,539,838.00	-	15.70	6,539,838.00	15.70	6,539,838.00	-	-	15.70	6,539,838.00
NP6	Suministro e instalación de Caja Medidor Monofasica, con pin de corte 1x40 amp, incluye instalación del sistema de Puesta a Tierra, incluye conector de cobre, cable AWG No 8 por 3 lineas, y Varilla de cobre 2.40m.	UND		$ 1,089,683.00		+	1.00	-	1,089,683.00	-	1.00	1,089,683.00	1.00	1,089,683.00	-	-	1.00	1,089,683.00

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

ACTA PARCIAL No 003

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE REINICIO:**	24 DE FEBRERO DE 2026
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE TERMINACION FINAL:**	26 DE ABRIL DE 2026
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **MARACAIBO**	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA

ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CONDICIONES CONTRACTUALES**			**CANTIDADES**			**VALORES**		**ACTA PARCIAL NO 3**		**ACUMULADO**		**POR COBRAR**		**CANTIDAD ACTUALIZADA**	**VALOR TOTAL ACTUALIZADO**
			CANT	**V/UNITARIO**	**V/TOTAL**	**+/-**	**MAY (+)**	**MEN (-)**	**MAY (+)**	**MEN (-)**	**CANT**	**SUBTOTAL**	**CANT**	**SUBTOTAL**	**CANT**	**SUBTOTAL**		
TOTAL COSTOS DIRECTOS					**335,138,619.00**				**51,592,366.00**	**- 51,592,366.00**	**% EJE ACTA 3**	**64,205,228.00**	**ACUMULADO**	**335,138,619.00**	**POR COBRAR**	**-**	**% BALANCE**	**335,138,619.00**
ADMINISTRACION				**28.10%**	**94,173,952.00**				**14,497,455.00**	**- 14,497,455.00**		**18,041,669.00**		**94,173,952.00**		**-**		**94,173,952.00**
IMPREVISTOS				**1.00%**	**3,351,386.00**				**515,924.00**	**- 515,924.00**		**642,052.00**		**3,351,386.00**		**-**		**3,351,386.00**
UTILIDAD				**5.00%**	**16,756,931.00**				**2,579,618.00**	**- 2,579,618.00**		**3,210,261.00**		**16,756,931.00**		**-**		**16,756,931.00**
TOTAL OBRA					**449,420,888.00**				**69,185,363.00**	**- 69,185,363.00**	**19.16%**	**86,099,210.00**	**100.00%**	**449,420,888.00**	**0.00%**	**-**	**100.00%**	**449,420,888.00**

$ -

RESUMEN FINANCIERO MARACAIBO		
Valor Inicial Contrato:	**$**	**449,420,888.00**
Valor Adicional Contrato:	**$**	**-**
Valor Final Contrato:	**$**	**449,420,888.00**
Valor Acta No 001	**$**	**220,599,159.00**
Valor Acta No 002	**$**	**142,722,519.00**
Valor Acta No 003	**$**	**86,099,210.00**
Valor A Girar Acta No 003	**$**	**86,099,210.00**
Valor Acumulado Actas	**$**	**449,420,888.00**
% Ejecución Acumulado		**100.00%**
Saldo Por Ejecutar	**$**	**-**

LA PRESENTE ACTA PARCIAL No 003 FUE **REVISADA Y APROBADA** POR LA INTERVENTORÍA, POR UN VALOR DE **OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS ($ 86,099,210)**. CON UN PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL **100%**. APROBADO LO ANTERIOR, SE FIRMA A LOS VEINTE (20) DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL 2026 EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, CAQUETA.

CONTRATISTA:

JOHAN LOPEZ MENDEZ
1.117.508.596 DE FLORENCIA
Representante Legal
H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS

VoBo DIRECTOR DE OBRA

ING. ADRIANA GALVEZ OSORIO
C.C. 28.550.973 DE IBAGUE
M.P. 70202138618 TLM
H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS

INTERVENTORÍA

JHONATTAN HOYOS MARQUEZ
C.C.1.018.439.570 de Bogotá D.C.
M.P. 25202-260849 CND
Director y Rep. Legal
UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25

ENTIDAD CONTRATANTE

MARIA PAULA RUIZ TRIANA
C.C. 1.075.311.783 de Neiva
GERENTE
ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

VoBo Supervisión ESE HMHOO

ALEXANDER VILLOTA FAJARDO
Supervisor Contrato CI 001

JOSE RICARDO SANCHEZ GOMEZ
Apoyo a la Supervisión

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA MARACAIBO DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD MARACAIBO	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	CONCRETOS	**FECHA**	17-abr-26	
ÍTEM	2.01	PLACA EN CONCRETO 3000PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 5 mm. ESPESOR 10 cm	**Unidad Medida**	M2





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
BAÑOS	1.70		2.05	1.00	3.49
COCINETA	2.98		2.20	1.00	6.56
	3.40		2.13	1.00	7.24
VACUNACIÓN	3.82		3.31	1.00	12.64
	3.61		1.58	1.00	5.70
CONSULTORIO 2	3.87		3.33	1.00	12.89
SALA DE ESPERA	5.11		3.58	1.00	18.29
PASILLO	2.20		1.20	1.00	2.64
CUARTO DE RESIDUOS	2.61		1.84	1.00	4.80

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**74.26**
COBRO ACTA N.1	71.25
ACTA N.2	**2.54**
ACTA N.3	**0.47**
TOTAL CONTRACTUAL	

Elaboró
ADRIANA CASTRO
Residente de Obra

Avaló
Daniela Onatra
DANIELA ONATRA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA MARACAIBO DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD MARACAIBO	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	CONCRETOS	**FECHA**	17-abr-26	
ÍTEM	2.02	ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 4 mm, Espesor 10 cm. Escobeado y Ratoneado	**Unidad Medida**	M2





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
ANDENES	12.60		1.00	1.00	12.60
	9.00		1.00	2.00	18.00
	3.40		0.90	1.00	3.06
	6.67		1.15	1.00	7.67

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**41.33**
COBRO ACTA N.1	**42.13**
ACTA N.2	**0.26**
AJUSTE ACTA N°3	**-1.06**
TOTAL CONTRACTUAL	**34.06**


Elaboró
ADRIANA CASTRO
Residente de Obra

Avaló Daniela Onatra
DANIELA ONATRA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA MARACAIBO DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570		
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD MARACAIBO	**MUNICIPIO**	FLORENCIA		
CAPITULO	CONCRETOS	**FECHA**	17-abr-26		
ÍTEM	2.03	RAMPA 10CM EN CONCRETO 3000 PSI, RATONEADA Y ESCOBEADA. INCLUYE EXCAVACIÓN, MALLA ELECTROSOLDADA 4 MM, RELLENO, COMPACTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	**Unidad Medida**	M2	

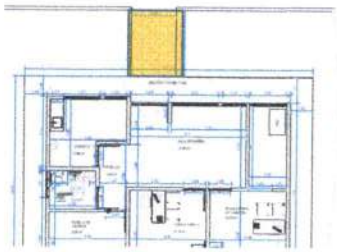



Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
RAMPA	2.95		3.05	1.00	9.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**9.00**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	5.80
ACTA N.3	**3.20**
TOTAL CONTRACTUAL	8.72

Elaboró
ADRIANA CASTRO
Residente de Obra

Avaló Daniela Onatra
DANIELA ONATRA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA MARACAIBO DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570		
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD MARACAIBO	**MUNICIPIO**	FLORENCIA		
CAPITULO	MAMPOSTERIA Y ACABADOS DE MURO		**FECHA**	17-abr-26	
ÍTEM	3.08	Malla eslabonada h=1,65m, con marco en angulo, para cerramiento perimetral, incluye tubería galvanizada cada 2,00 m y anclaje en concreto.	**Unidad Medida**	ML	



Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
CERRAMIENTO	80.00			1.00	80.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**80.00**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	
ACTA N.3	**80.00**
TOTAL ACTIVIDAD	**80.00**

Elaboró
ADRIANA CASTRO
Residente de Obra

Avaló
DANIELA ONATRA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA MARACAIBO DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD MARACAIBO	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	CUBIERTAS Y CIELO RASOS	**FECHA**	17-abr-26	
ÍTEM	4.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANOERA EN LAMINA LATON GALVANIZADA CALIBRE 20 CON DESARROLLO DE 0,60 M INCLUYE GANCHO DE FIJACION, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	**Unidad Medida**	ml





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
CANAL A.LL	13.00			2.00	26.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**26.00**
ACTA N.1	
ACTA N.2	
ACTA N.3	**26.00**
TOTAL ACTIVIDAD CONTRACTUAL	**26.00**

Elaboró
ADRIANA CASTRO
Residente de Obra

Avaló Daniela Onatra
DANIELA ONATRA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA MARACAIBO DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**		CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD MARACAIBO	**MUNICIPIO**		FLORENCIA	
CAPITULO	CUBIERTAS Y CIELO RASOS		**FECHA**	17-abr-26	
ÍTEM	4.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN 3"	**Unidad Medida**	ml	





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
bajantes canal	3.00			4.00	12.00
Muñeco bajantes	1.00			4.00	4.00
Bajante en piso	1.20			4.00	4.80
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**20.80**
ACTA N.1	
ACTA N.2	
ACTA N.3	**20.80**
TOTAL ACTIVIDAD CONTRACTUAL	**20.80**

Elaboró
ADRIANA CASTRO
Residente de Obra

Avaló
Daniela Onatra
DANIELA ONATRA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA MARACAIBO DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD MARACAIBO	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	CARPINTERIA METALICA	**FECHA**	17-abr-26	
ÍTEM	6.01	Puerta Metalica entablerado en lamina galvanizada Calibre 20, Con cerradura. Incluye Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. Tragaluz en Vidrio 4 mm	**Unidad Medida**	M2



Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
Zona de bodega	0.98	2.10		1.00	2.06
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**2.06**
ACTA N.1	
ACTA N.2	
ACTA N.3	**2.06**
TOTAL ACTIVIDAD CONTRACTUAL	1.89

Elaboró
ADRIANA CASTRO
Residente de Obra

Avaló
Daniela Onatra
DANIELA ONATRA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA MARACAIBO DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD MARACAIBO	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	CARPINTERIA METALICA	**FECHA**	02 de marzo 2026	
ÍTEM	6.02	Suministro e Instalación de Ventana Lamina Galvanizada Calibre 20. Corredera o Fija, Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. Incluye Vidrio 4 mm, pelicula de seguridad acabado sandblasting.	**Unidad Medida**	M2







Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
V1		0.50	1.61	3.00	2.42
V2		1.70	1.70	1.00	2.89
V3		1.70	1.58	2.00	5.37
V4		1.70	1.07	1.00	1.82
V5		0.50	1.70	2.00	1.70
V6		1.70	1.88	1.00	3.20
V7		1.70	1.55	1.00	2.64
V8-V10		1.70	1.67	2.00	5.68
V9-V11		1.70	1.62	2.00	5.51
V12-V13		0.50	0.90	2.00	0.90
					0.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**32.11**
COBRO ACTA N.1	**25.00**
ACTA N.2	**6.71**
TOTAL CONTRACTUAL	31.71
ACTA N. 003	**0.40**

Elaboró
ADRIANA CASTRO
Residente de Obra

Avaló
Daniela Onatra
DANIELA ONATRA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA MARACAIBO DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**		CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD MARACAIBO	**MUNICIPIO**		FLORENCIA	
CAPITULO	CARPINTERIA METALICA		**FECHA**	17-abr-26	
ÍTEM	6.03	Portón Metalico entablerado en lamina galvanizada Calibre 20, Concerradurad Doble Macho. Incluye Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. 1,60mX2,50m	**Unidad Medida**	UND	



Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
INGRESO PRINCIPAL				1.00	1.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**1.00**
ACTA N.1	
ACTA N.2	
ACTA N.3	**1.00**
TOTAL ACTIVIDAD CONTRACTUAL	**1.00**

Elaboró
ADRIANA CASTRO
Residente de Obra

Avaló
Daniela Onatra
DANIELA ONATRA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA MARACAIBO DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**		CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD MARACAIBO	**MUNICIPIO**		FLORENCIA	
CAPITULO	CARPINTERIA METALICA		**FECHA**	17-abr-26	
ÍTEM	6.04	Puerta En Marco de Aluminio Blanco, con vidrio 5mm + pelicula tipo sandblasting, Con cerradura. Tragaluz en Vidrio 4 mm	**Unidad Medida**	M2	





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
COCINETA	0.98	2.15		1	2.11
PMR	0.98	2.15		1	2.11
BODEGA DE INSUMOS	0.95	2.15		1	2.04
CONSULTORIO 2	0.98	2.15		1	2.11
CONSULTORIO VACUNACION	0.98	2.15		2	4.21
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**12.53**
ACTA N.1	
ACTA N.2	**10.00**
ACTA N.3	**2.53**
TOTAL ACTIVIDAD CONTRACTUAL	16.08

Elaboró
ADRIANA CASTRO
Residente de Obra

Avaló Daniela Onatra
DANIELA ONATRA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA MARACAIBO DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD MARACAIBO	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS	**FECHA**	17-abr-26	
ÍTEM	7.04	Suministro e Instalación de Punto Electrico de iluminación. Incluye Luminaria Led de 18w. Redonda o Cuadrada o similar, de empotrar o sobreponer, según aplique. Incluye interruptor, y Alambre No 14 Awg por 2 Lineas hasta por 3 metros y tuberia PVC de 1/2" hasta por 3 m.	**Unidad Medida**	UND





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
Exterior				7.00	7.00
COCINETA				2.00	2.00
Baños				1.00	1.00
PASILLO				1.00	1.00
BODEGA				2.00	2.00
CONSULTORIO 2				2.00	2.00
CONSULTORIO VACUNACION				3.00	3.00
SALA DE ESPERA				3.00	3.00
Cuarto de Aseo				1.00	1.00
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**22.00**
ACTA N.1	**10.00**
ACTA N.2	**10.00**
ACTA N.3	**2.00**
TOTAL CONTRACTUAL	38.00

Elaboró
ADRIANA CASTRO
Residente de Obra

Avaló
Daniela Onatra
DANIELA ONATRA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA MARACAIBO DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD MARACAIBO	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS	**FECHA**	17 de abril 2026	
ÍTEM	7.10	ACOMETIDA DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN A USO FINAL PARA TOMA CORRIENTES Y LUMINARIAS. INCLUYE TUBERÍA PVC, ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS Y ALAMBRE No 14 POR 1 LINEA Y ACCESORIOS.	**Unidad Medida**	ML







Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
N°12	18.12			1.00	18.12
N°14	18.12			1.00	18.12
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**36.24**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	**30.00**
ACTA N.3	**6.24**
TOTAL CONTRACTUAL	100.00

Elaboró
ADRIANA CASTRO
Residente de Obra

Avaló
Daniela Onatra
DANIELA ONATRA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA MARACAIBO DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**		CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD MARACAIBO	**MUNICIPIO**		FLORENCIA	
CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS		**FECHA**	17-abr-26	
ÍTEM	8.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON DE EMPOTRAR, EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE POCETAS Y ACCESORIOS DE GRIFERIA Y DESAGUES.	**Unidad Medida**	ML	





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
VACUNACIÓN	1.60			1.00	1.60
COCINETA	1.40			1.00	1.40
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**3.00**
ACTA N.1	
ACTA N.2	
ACTA N.3	**3.00**
TOTAL ACTIVIDAD CONTRACTUAL	**4.77**

Elaboró
ADRIANA CASTRO
Residente de Obra

Avaló Daniela Onatra
DANIELA ONATRA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA MARACAIBO DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD MARACAIBO	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS	**FECHA**	17-abr-26	
ÍTEM	8.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO INSTITUCIONAL BLANCO DE PUSH INCLUYE GRIFERIA	**Unidad Medida**	UND



Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
BAÑOS				1.00	1.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**1.00**
ACTA N.1	
ACTA N.2	
ACTA N.3	**1.00**
TOTAL ACTIVIDAD CONTRACTUAL	**1.00**

Elaboró
ADRIANA CASTRO
Residente de Obra

Avaló
DANIELA ONATRA
INTERVENTOR


MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA MARACAIBO DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3		**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD MARACAIBO		**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS		**FECHA**	17-abr-26	
ÍTEM	8.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	**Unidad Medida**	UND	







Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
BAÑOS				1.00	1.00
CONSULTORIO				2.00	2.00
COCINETA				1.00	1.00
BODEGA				1.00	1.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**5.00**
ACTA N.1	
ACTA N.2	
ACTA N.3	5.00
TOTAL ACTIVIDAD CONTRACTUAL	**5.00**

Elaboró
ADRIANA CASTRO
Residente de Obra

Avaló
Daniela Onatra
DANIELA ONATRA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA MARACAIBO DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD MARACAIBO	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS	**FECHA**	17-abr-26	
ÍTEM	8.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE SEGURIDAD PARA PERSONA DISCAPACITADA EN ACERO INOXIDABLE.	**Unidad Medida**	UND





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
BAÑO				1.00	1.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**1.00**
ACTA N.1	
ACTA N.2	
ACTA N.3	**1.00**
TOTAL ACTIVIDAD CONTRACTUAL	**1.00**

Elaboró

ADRIANA CASTRO
Residente de Obra

Avaló Daniela Onatra

DANIELA ONATRA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA MARACAIBO DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD MARACAIBO	**MUNICIPIO**	FLORENCIA
CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS	**FECHA**	17-abr-26
ÍTEM	8.12 — Suministro e instalación de Ducha tip regadera y teleducha independiente.	**Unidad Medida**	UND





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
Baño Ducha				1.00	1.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**1.00**
ACTA N.1	
ACTA N.2	
ACTA N.3	**1.00**
TOTAL ACTIVIDAD CONTRACTUAL	**1.00**

Elaboró
ADRIANA CASTRO
Residente de Obra

Avaló
Daniela Onatra
DANIELA ONATRA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA MARACAIBO DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD MARACAIBO	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	CONCRETOS	**FECHA**	17-abr-26	
ÍTEM	NP5	Conexión Acometida Parcial del Poste a la Caja de Medidor, en Cable Monofasico Encauchetado No 8, Cable No 8, Tensores para Cable, Tubo IMC 3/4", Capasete 3/4", Boquilla IMC 3/4".	**Unidad Medida**	ML



Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
FACHADA FRONTAL	15.70				15.70
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**15.70**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	
ACTA N.3	**15.70**
TOTAL CONTRACTUAL	

Elaboró
ADRIANA CASTRO
Residente de Obra

Avaló
Daniela Onatra
DANIELA ONATRA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA MARACAIBO DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD MARACAIBO	**MUNICIPIO**	FLORENCIA
CAPITULO	CONCRETOS	**FECHA**	17-abr-26
ÍTEM	NP6	Suministro e instalación de Caja Medidor bi-fasica, con pin de corte 2x40 amp, incluye instalación del sistema de Puesta a Tierra, incluye conector de cobre, cable AWG No 8 por 2 lineas, y Varilla de cobre 2,40m.	**Unidad Medida** und



Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
fachada frontal				1.00	1.00

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**1.00**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	**0.00**
ACTA N.3	**1.00**
TOTAL CONTRACTUAL	

Elaboró
ADRIANA CASTRO
Residente de Obra

Avaló
Daniela Onatra
DANIELA ONATRA
INTERVENTOR

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

ACTA PARCIAL N. 003

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	03 DE OCTUBRE DE 2025		
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3		
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA		
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2	**CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CI 001 del 03 de Octubre de 2025
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE REINICIO:**	24 DE FEBRERO DE 2026	**ACTA PARCIAL No.3**	17 DE ABRIL DE 2026
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE TERMINACION FINAL**	26 DE ABRIL DE 2026		
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **NORCASIA**	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			ACTA PARCIAL No 3		ACUMULADO		POR COBRAR		CANTIDAD ACTUALIZADA BALANCE No2	VALOR TOTAL ACUMULADO
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT	SUBTOTAL	CANT	SUBTOTAL	CANT	SUBTOTAL		
1	**PRELIMINARES**				**25,117,715.00**		**2,802,620.00**		**27,645,606.00**		**274,729.00**		**27,920,335.00**
1.01	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS (LAVAMANOS, INODOROS, ORINALES).	UND	2.00	31,642.00	63,284.00		-	2.00	63,284.00	-	-	2.00	63,284.00
1.02	DESMONTE Y RETIRO DE CUBIIERTA EXISTENTE. INCLUYE TEJA, ESTRUCTURA, TEMPLETES, ANCLAJES, CABALLETES, LIMAOYAS Y LIMATESAS).	M2	119.41	60,470.00	7,220,723.00		-	119.41	7,220,723.00	-	-	119.41	7,220,723.00
1.03	DEMOLICIÓN DE PISO ESMALTADO, CERAMICA, BALDOSA CEMENTO O MORTERO NIVELACIÓN. INCLUYE RETIRO	M2	91.16	32,175.00	2,933,073.00		-	91.16	2,933,073.00	-	-	91.16	2,933,073.00
1.04	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PLACA EN CONCRETO, ANDENES EN CONCRETO, RAMPAS EN CONCRETO. (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO).	M2	55.79	36,895.00	2,058,372.00		-	55.79	2,058,372.00	-	-	55.79	2,058,372.00
1.05	DESMONTE DE PUERTA Y VENTANAS (INCLUYE MARCOS, VIDRIOS, NAVES).	M2	28.17	28,959.00	815,775.00		-	28.17	815,775.00	-	-	28.17	815,775.00
1.06	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO).	M2	11.92	27,352.00	326,036.00		-	11.92	326,036.00	-	-	11.92	326,036.00
1.07	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA, CON Y SIN PAÑETE, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO	M2	15.48	32,175.00	498,069.00		-	15.48	498,069.00	-	-	15.48	498,069.00
1.08	DEMOLICIÓN DE MESONES EN CONCRETO, LAVADEROS EN CONCRETO, POCETAS EN CONCRETO. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO.	und	3.00	52,561.00	157,683.00		-	3.00	157,683.00	-	-	3.00	157,683.00
1.09	DEMONTE, RETIRO Y DESHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA INTERNA EXISTENTE.	m2	90.00	22,519.00	2,026,710.00		-	90.00	2,026,710.00	-	-	90.00	2,026,710.00
1.10	DESCAPOTE MATERIAL VEGETAL INCLUYE RETIRO	M2	734.92	11,566.00	8,500,085.00		-	734.92	8,500,085.00	-	-	734.92	8,500,085.00
1.11	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMUN ALTURA HASTA 1.00 m.	M3	2.15	77,181.00	165,939.00	12.43	959,360.00	14.58	1,125,299.00	-	-	14.58	1,125,299.00
1.12	RELLENO MATERIAL PREEXCAVADO, INCLUYE COMPATACIÓN MECANICA.	M3	2.15	35,924.00	77,237.00	51.31	1,843,260.00	53.46	1,920,497.00	-	-	53.46	1,920,497.00
1.13	DESMONTE, RETIRO Y DESHABILITACIÓN DE MALLA DE ALAMBRE EXISTENTE.	ML	23.29	11,796.00	274,729.00		-	-	-	23.29	274,729.00	23.29	274,729.00
2	**CONCRETOS**				**53,110,702.00**		**14,960,398.00**	-	**36,395,053.00**	-	**11,926,010.00**		**48,323,063.00**
2.01	PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO 3000PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 5 mm. ESPESOR 10 cm	M2	115.83	149,823.00	17,353,998.00	30.00	4,494,690.00	140.00	20,975,220.00	79.61	11,928,010.00	219.61	32,903,230.00
2.02	ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 4 mm, Espesor 10 cm Escobeado y Ratoneado	M2	117.85	148,823.00	17,536,791.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-
2.03	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI, RATONEADA Y ESCOBEADA. CON BORDILLO LATERAL. INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO, COMPACTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2	19.40	148,823.00	2,887,166.00	8.06	1,199,513.00	8.06	1,199,513.00	-	-	8.06	1,199,513.00
2.04	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,25X0,25m EN CONCRETO DE 3000 psi, incluye acero de refuerzo en 4 varillas de 1/2", con flejes @0,15 m en varilla de 3/8".	ML	53.31	198,165.00	10,564,176.00	46.76	9,266,195.00	71.76	14,220,320.00	-	-	71.76	14,220,320.00
2.05	ZAPATA DE 0,60X0,60X0,25, INCLUYE DADO DE 0,20X0,20 PARA COLUMNA METALICA. INCLUYE PARRILLA INFERIOR EN 4 BARRAS DE 3/8" @0,15., INCLUYE PLATINA METALICA DE 2,5 mm CON BARRAS DE ANCLAJE. INCLUYE EXCAVACIÓN PROFUNDIDAD 0.50M.	UND	9.00	529,619.00	4,766,571.00		-	-	-	-	-	0.00	-
3	**MAMPOSTERÍA Y ACABADOS DE MUROS**				**35,241,857.00**	-	**22,654,406.00**	-	**33,350,886.00**	-	**9,070,583.00**		**42,421,469.00**
3.01	MURO EN BLOQUE No 4	M2	38.60	73,861.00	2,851,035.00	16.62	1,227,570.00	96.62	7,136,450.00	-	-	96.62	7,136,450.00
3.02	PAÑETE EN MOTERO IMPERMEABILIZADO 1:4	M2	106.12	47,876.00	5,080,601.00	43.49	2,082,127.00	143.49	6,869,727.00	-	-	143.49	6,869,727.00
3.03	ENCHAPE MURO FORMATO MÍNIMO .25X.30	M2	44.39	126,916.00	5,633,801.00	31.35	3,978,817.00	31.35	3,978,817.00	-	-	31.35	3,978,817.00
3.04	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS TIPO I	M2	31.73	34,933.00	1,108,424.00	113.64	3,969,786.00	113.64	3,969,786.00	-	-	113.64	3,969,786.00
3.05	ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES TIPO KORAZA	M2	176.31	39,803.00	7,017,667.00	184.17	7,330,519.00	184.17	7,330,519.00	-	-	184.17	7,330,519.00
3.06	ESTUCO Y PINTURA DE ALTA ASEPSIA 3 MANOS	M2	133.52	41,511.00	5,542,549.00	97.94	4,065,587.00	97.94	4,065,587.00	-	-	97.94	4,065,587.00
3.07	ESTUCO Y PINTURA TIPO ESMALTE SOBRE MUROS	M2	49.59	41,708.00	2,068,300.00		-	-	-	75.07	3,131,103.00	75.07	3,131,103.00
3.08	Malla eslabonada h=1,65m, con marco en angulo, para cerramiento perimetral, incluye tubería galvanizada cada 2,00 m y anclaje en concreto.	ML	15.71	378,070.00	5,939,480.00		-	-	-	15.71	5,939,480.00	15.71	5,939,480.00
4	**CUBIERTAS Y CIELO RASOS**				**104,337,854.00**	-	**33,476,840.00**	-	**69,275,822.00**	-	**6,560,630.00**		**75,836,452.00**

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

ACTA PARCIAL N. 003

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	03 DE OCTUBRE DE 2025		
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3		
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA		
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2	**CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CI 001 del 03 de Octubre de 2025
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE REINICIO:**	24 DE FEBRERO DE 2026	**ACTA PARCIAL No.3**	17 DE ABRIL DE 2026
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE TERMINACION FINAL**	26 DE ABRIL DE 2026		
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **NORCASIA**	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			ACTA PARCIAL No 3		ACUMULADO		POR COBRAR		CANTIDAD ACTUALIZADA BALANCE No2	VALOR TOTAL ACUMULADO
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT	SUBTOTAL	CANT	SUBTOTAL	CANT	SUBTOTAL		
4.01	ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN PERFIL REF: (PAG_C 120X60_ 2.00 mm) CALIBRE 14, PINTADO CON ANTICORROSIVO O WASH PRIMER. INCLUYE ANCLAJES EN VARILLA EN MUROS CULATAS.	ML	229.35	135,331.00	31,038,165.00	61.12	8,271,431.00	187.52	25,377,269.00	-	-	187.52	25,377,269.00
4.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA EN LAMINA MASTER 1000 CALIBRE 28 PREPINTADA, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	M2	246.57	131,577.00	32,442,941.00	35.14	4,623,616.00	177.21	23,316,760.00	-	-	177.21	23,316,760.00
4.03	CABALLETE EN LAMINA METALICA PINTADA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	24.45	65,973.00	1,613,040.00	12.64	833,899.00	12.64	833,899.00	-	-	12.64	833,899.00
4.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 CON DESARROLLO DE 0,60 M INCLUYE GANCHO DE FIJACION, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	ML	51.33	180,924.00	9,286,829.00		-	-	-	32.04	5,796,805.00	32.04	5,796,805.00
4.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN 3"	ML	64.00	38,577.00	2,468,928.00	-	-	-	-	19.80	763,825.00	19.80	763,825.00
4.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS DE ANCLAJE, UNIONES, RINCONERAS.	M2	112.99	108,023.00	12,205,519.00	166.05	17,937,219.00	166.05	17,937,219.00	-	-	166.05	17,937,219.00
4.07	COLUMNAS EN PERFIL 120X120 mm x 2,5 mm. Incluye anclaje en dado e concreto, protección en anticorrosivo y acabado en pintura a base de aceite.	ML	27.00	152,595.00	4,120,065.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-
4.08	PERFIL 100X100 X 2,00 mm, PARA VIGAS, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA A BASE DE ACEITE.	ML	75.21	148,416.00	11,162,367.00	12.20	1,810,675.00	12.20	1,810,675.00	-	-	12.20	1,810,675.00
5	**PISOS Y ENCHAPES**				**20,721,154.00**	-	**23,691,881.00**	-	**29,961,786.00**	-	-		**29,961,786.00**
5.01	NIVELACION PARA PISO E=0,05 a 0,07 m	M2	92.18	65,999.00	6,083,788.00	40.79	2,692,099.00	135.79	8,962,004.00	-	-	135.79	8,962,004.00
5.02	BALDOSA CERAMICA PARA PISOS FORMATO CUADRADO MINIMO .45X.45m TRAFICO COMERCIAL, PRIMERA CALIDAD.	M2	92.18	124,287.00	11,456,776.00	126.79	15,758,349.00	126.79	15,758,349.00	-	-	126.79	15,758,349.00
5.03	GUARDAESCOBA EN CERAMICA	ML	79.76	39,877.00	3,180,590.00	131.44	5,241,433.00	131.44	5,241,433.00	-	-	131.44	5,241,433.00
6	**CARPINTERIA METALICA**				**52,321,669.00**	-	**22,069,514.00**	-	**22,069,514.00**	-	**16,743,429.00**		**38,812,943.00**
6.01	2 Puertas Metalica entablerado en lamina galvanizada Calibre 20, Con cerradura. Incluye Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. Tragaluz, y marcos.	M2	3.78	1,031,425.00	3,898,787.00	6.84	7,054,947.00	6.84	7,054,947.00	-	-	6.84	7,054,947.00
6.02	Suministro e instalación de 13 Ventanas Lamina Galvanizada Calibre 20. Corredera o Fija, Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. Incluye Vidrio 4 mm, pelicula de seguridad acabado sandblasting y marco.	M2	21.68	1,288,804.00	27,941,271.00	11.65	15,014,567.00	11.65	15,014,567.00	-	-	11.65	15,014,567.00
6.03	2 Portón Metalico entablerado en lamina galvanizada Calibre 20, Concerradurad Doble Macho. Incluye Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. 1,40mX2,40m, incluye tragaluz superior en vidrio 4mm y marcos.	UND	2.00	3,195,771.00	6,391,542.00	-	-	-	-	2.00	6,391,542.00	2.00	6,391,542.00
6.04	7 Puertas En Marco y contramarco de Aluminio Blanco, con vidrio 5mm + pelicula tipo sandblasting, Con cerradura tipo bola. Tragaluz en Vidrio.	M2	13.23	1,065,009.00	14,090,069.00	-	-	-	-	9.72	10,351,887.00	9.72	10,351,887.00
7	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**26,545,451.00**		**11,088,319.00**	-	**18,611,795.00**	-	-		**18,611,795.00**
7.01	Conexión Acometida Parcial del Poste a la Caja de Medidor, en Cable Monofasico Encauchetado No 8, Cable No 8, Tensores para Cable, Tubo IMC 3/4", Capasete 3/4", Boquilla IMC 3/4".	ML	30.00	153,374.00	4,601,220.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-
7.02	Suministro e instalación de Caja Medidor Monofasica, con pin de corte 1x40 amp, incluye instalación del sistema de Puesta a Tierra, incluye conector de cobre, cable AWG No 8 por 3 lineas, y Varilla de cobre 2,40m.	UND	1.00	1,043,675.00	1,043,675.00	1.00	1,043,675.00	-	-	-	-	0.00	-
7.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE 12 CTOS (INCLUYE: CAJA DE BREAKERS BIFASICA, BREAKERS 1X20 AMP, 1X30 AMP)	UND	1.00	811,074.00	811,074.00	-	-	1.00	811,074.00	-	-	1.00	811,074.00
7.04	Suministro e instalación de Punto Electrico de iluminación. Incluye Luminaria Led de 18w. Redonda o Cuadrada o similar, de empotrar o sobreponer, según aplique. Incluye Interruptor, y Alambre No 14 Awg por 2 Lineas hasta por 3 metros y tubería PVC de 1/2" hasta por 3 m.	UND	31.00	195,661.00	6,065,491.00	14.00	2,739,254.00	24.00	4,695,864.00	-	-	24.00	4,695,864.00
7.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 110 V (INCLUYE ACCEOSRIOS, ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS, ALAMBRE AWG No 14 POR 1 LINEA, Y TUBERIA PVC HASTA POR 3 METROS).	UND	27.00	159,930.00	4,318,110.00	5.00	799,650.00	15.00	2,398,950.00	-	-	15.00	2,398,950.00

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

ACTA PARCIAL N. 003

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	03 DE OCTUBRE DE 2025		
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	NIT:	901.372.267-3		
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	C.C.:	1.117.508.598 DE FLORENCIA		
PLAZO:	TRES (3) MESES	VALOR DEL CONTRATO:	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	NIT:	901.994.584-2	CONTRATO DE INTERVENTORIA	CI 001 del 03 de Octubre de 2025
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	26 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	FECHA DE REINICIO:	24 DE FEBRERO DE 2026	ACTA PARCIAL No.3	17 DE ABRIL DE 2026
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	FECHA DE TERMINACION FINAL	26 DE ABRIL DE 2026		
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD NORCASIA	MUNICIPIO:	FLORENCIA		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			ACTA PARCIAL No 3		ACUMULADO		POR COBRAR		CANTIDAD ACTUALIZADA BALANCE No2	VALOR TOTAL ACUMULADO
			CANT	VAUNITARIO	VITOTAL	CANT	SUBTOTAL	CANT	SUBTOTAL	CANT	SUBTOTAL		
7.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 220V (INCLUYE ACCEOSRIOS, CABLE AWG No 10 POR 2 LINEAS, ALAMBRE AWG No 14 POR 1 LINEA, Y TUBERIA PVC).	UND	5.00	164,715.00	823,575.00	4.00	658,860.00	4.00	658,860.00	-	-	4.00	658,860.00
7.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA MANUAL PARA PLANTA ELECTRICA, INCLUYE TOMA 3x50 CODELCA, CAJA 2400, CAJA METALICA DE 25X25 X15, Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	UND	1.00	769,337.00	769,337.00	-	-	1.00	769,337.00	-	-	1.00	769,337.00
7.08	ACOMETIDA PARA CONEXIÓN PLANTA ELECTRICA, DESDE TABLERO DISTRIBUCIÓN HASTA TRANSFERENCIA MANUAL. INCLUYE CABLE No 8 AWG POR 6 LINEAS.	ML	5.00	121,683.00	608,415.00	10.00	1,216,830.00	10.00	1,216,830.00	-	-	10.00	1,216,830.00
7.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONCHERA DE POSTE PARA CONEXIÓN DE LA RED DE INTERCONEXIÓN DEL DEPARTAMENTO CON EL PUESTO DE SALUD. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1.00	787,154.00	787,154.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-
7.10	ACOMETIDA DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN A USO FINAL PARA TOMA CORRIENTES Y LUMINARIAS. INCLUYE TUBERÍA PVC, ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS Y ALAMBRE No 14 POR 1 LINEA Y ACCESORIOS.	ML	100.00	67,174.00	6,717,400.00	100.00	6,717,400.00	120.00	8,060,880.00	-	-	120.00	8,060,880.00
8	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS**				**24,008,583.00**		**4,876,440.00**	-	**11,729,463.00**	-	**9,384,187.00**		**21,113,650.00**
8.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE DE SOBRE PONER EN MUEBLE CON PUERTAS Y CAJONERAS EN RH. INCLUYE POCETAS Y ACCESORIOS DE GRIFERIA Y DESAGUES, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE. ALTURA: 0.90 m. ANCHO: 0.60 m.	ML	3.54	2,208,708.00	7,818,826.00	-	-	-	-	3.50	7,730,478.00	3.50	7,730,478.00
8.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO BLANCO DE PUSH INCLUYE GRIFERIA	UND	2.00	679,941.00	1,359,882.00	1.00	679,941.00	1.00	679,941.00	-	-	1.00	679,941.00
8.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND	7.00	388,678.00	2,720,746.00	4.00	1,554,712.00	4.00	1,554,712.00	-	-	4.00	1,554,712.00
	SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE BARRA DE 60CM X2 DE SEGURIDAD PARA PARED, EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS	UND	1.00	892,324.00	892,324.00	1.00	892,324.00	1.00	892,324.00	-	-	1.00	892,324.00
	Punto Hidraulico de 1/2", incluye accesorios PVC	UND	15.00	71,467.00	1,072,305.00	-	-	11.00	786,357.00	-	-	11.00	786,357.00
8.06	Punto Sanitario de 2", incluye accesorios PVC	UND	14.00	89,326.00	1,250,564.00	-	-	8.00	714,608.00	-	-	8.00	714,608.00
8.07	Punto Sanitario de 4", incluye accesorios PVC	UND	2.00	162,406.00	324,812.00	-	-	2.00	324,812.00	-	-	2.00	324,812.00
8.08	Suministro e Instalación de Tanque Plastico de 1000lts, incluye Fluidmaster, Tapa, y accesorios PVC para la correcta conexión a la red de distribución.	UND	1.00	1,068,984.00	1,068,984.00	1.00	1,068,984.00	1.00	1,068,984.00	-	-	1.00	1,068,984.00
8.09	Acometida hidraulica de distribución en tubo PVC-P 3/4"	ML	31.17	36,138.00	1,126,421.00	18.83	680,479.00	50.00	1,806,900.00	-	-	50.00	1,806,900.00
8.10	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria 4".	ML	19.90	72,364.00	1,440,044.00		-	21.64	1,565,957.00	-	-	21.64	1,565,957.00
8.11	Suministro e instalación de lavatraperos prefabricado.	UND	1.00	613,724.00	613,724.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-
8.12	Suministro e instalación de Ducha tipo regadera y teleducha independiente.	UND	1.00	800,998.00	800,998.00	-	-	-	-	1.00	800,998.00	1.00	800,998.00
8.13	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria de 2"	ML	11.13	47,656.00	530,411.00	-	-	25.21	1,201,408.00	1.14	54,508.00	26.35	1,255,916.00
8.14	Construcción de Caja de Inspecición de 0,60x0,60 en concreto.	und	2.00	798,203.00	1,596,406.00	-	-	1.00	798,203.00	1.00	798,203.00	2.00	1,596,406.00
8.15	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria de 3"	ml	3.95	56,727.00	224,072.00	-	-	5.91	335,257.00	-	-	5.91	335,257.00
8.16	Suministro e Instalación de PRESURIZADOR MINI SMAR AUTOMATICO 1X127V 245W O SIMILAR.	und	1.00	1,168,064.00	1,168,064.00	-	-	-	-	-	-		-
NP	**NO PREVISTOS**					-	**15,871,318.00**	-	**23,364,348.00**	-	-		**38,403,492.00**
NP01	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO DE 0,12X0,20 m, EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, INCLUYE FORMALETA EN MADERA.INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ml		125,000.00		11.15	1,393,750.00	31.15	3,893,750.00	-	-	31.15	3,893,750.00
NP02	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 0,12X0,20 m, EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, INCLUYE FORMALETA EN MADERA.INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ml		127,000.00			-	20.89	2,653,030.00	-	-	20.89	2,653,030.00
NP03	VIGA CINTA 0,12X0,20 m, EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, INCLUYE FORMALETA EN MADERA.INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ml		130,000.00			-	18.00	2,340,000.00	-	-	18.00	2,340,000.00

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

ACTA PARCIAL N. 003

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	03 DE OCTUBRE DE 2025		
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3		
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA		
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2	**CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CI 001 del 03 de Octubre de 2025
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE REINICIO:**	24 DE FEBRERO DE 2026	**ACTA PARCIAL No.3**	17 DE ABRIL DE 2026
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE TERMINACION FINAL**	26 DE ABRIL DE 2026		
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **NORCASIA**	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			ACTA PARCIAL No 3		ACUMULADO		POR COBRAR		CANTIDAD ACTUALIZADA BALANCE No2	VALOR TOTAL ACUMULADO
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT	SUBTOTAL	CANT	SUBTOTAL	CANT	SUBTOTAL		
NP04	ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 1,25X1,25X0,35 m NO INCLUYE REFUERZO.	UND		786,957.00	-	1.00	786,957.00	1.00	786,957.00	-	-	1.00	786,957.00
NP05	COLUMNA DE 0,25X0,25 m, EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, INCLUYE FORMALETA EN MADERA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML		218,334.00	-	4.00	873,336.00	4.00	873,336.00	-	-	4.00	873,336.00
NP06	LOSA AEREA DE 0,10m EN CONCRETO 3000psi REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM 15X15. INCLUYE FORMALETA.	M2		311,790.00	-	1.56	486,392.00	1.56	486,392.00	-	-	1.56	486,392.00
NP07	ACERO DE REFUERZO CORRUGADO FY420MPA, FIGURADO E INSTALADO, INCLUYE ALAMBRE PARA AMARRE, BARRAS LONGITUDINALES Y ESTRIBOS.	KG		19,546.00	-	140.71	2,750,318.00	140.71	2,750,318.00	-	-	140.71	2,750,318.00
NP08	DADO DE 03x0,3x0,4 PARA COLUMNA METALICA. INCLUYE 4 BARRAS DE 3/8" Y FLEJES @0,10. INCLUYE EXCAVACIÓN PROFUNDIDAD 0.50M.	UND		429,230.50	-		-	-	-	8.00	3,433,844.00	8.00	3,433,844.00
NP09	CONEXIÓN ACOMETIDA BI-FASICA DEL POSTE A LA CAJA DE MEDIDOR, EN CABLE CONCÉNTRICO TRIFILAR 2X8+8,TENSORES TUBO IMC 3/4", TUBERÍA SCH40, CURVAS SCH 40, CAPASETE 3/4", BOQUILLA IMC 3/4", PIN DE CORTE TRIFILAR 2X40, SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, CON VARILLA DE COBRE 2*40 CON SU RESPECTIVO CONECTOR, Y CABLE #8 DE COBRE	ML		414,475.00	-	2.00	828,950.00	2.00	828,950.00	28.00	11,605,300.00	30.00	12,434,250.00
NP10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA MEDIDOR BI-FASICA, CON PIN DE CORTE 2X40 AMP, INCLUYE INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE CONECTOR DE COBRE, CABLE AWG NO 8 POR 2 LINEAS, Y VARILLA DE COBRE 2,40M	UND		1,097,483.00	-	1.00	1,097,483.00	1.00	1,097,483.00	-	-	1.00	1,097,483.00
NP11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO PREFABRICADO	UND		794,800.00	-	1.00	794,800.00	1.00	794,800.00	-	-	1.00	794,800.00
NP12	MAMPOSTERIA EN BLOQUE, EN ANCHOS NO MAYORES A 0,60 M.	ML		44,316.60		106.49	4,719,275.00	106.49	4,719,275.00	-		106.49	4,719,275.00
NP13	PAÑETE EN MORTERO PARA CARTERAS, VANOS, Y FILOS EN ANCHOS NO MAYORES A 0,60M.	ML		28,725.60		74.50	2,140,057.00	74.50	2,140,057.00	-		74.50	2,140,057.00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**341,404,985.00**	**% EJE ACTA 3**	**151,491,736.00**	**ACUMULADO**	**272,404,271.00**	**POR COBRAR**	**53,961,568.00**	**% DE BALANCE**	**341,404,985.00**
	ADMINISTRACION			**28.36%**	**96,822,454.00**		**42,963,056.00**		**77,253,851.00**		**15,303,501.00**		**96,822,454.00**
	IMPREVISTOS			**1.00%**	**3,414,050.00**		**1,514,917.00**		**2,724,043.00**		**539,616.00**		**3,414,050.00**
	UTILIDAD			**5.00%**	**17,070,249.00**		**7,574,587.00**		**13,620,214.00**		**2,698,078.00**		**17,070,249.00**
	TOTAL OBRA				**458,711,738.00**	**44.37%**	**203,544,296.00**	**79.79%**	**366,002,379.00**	**15.81%**	**72,502,763.00**	**100.00%**	**458,711,738.00**

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

ACTA PARCIAL N. 003

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	03 DE OCTUBRE DE 2025		
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3		
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA		
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcle ($1,886,044,345.00)		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2	**CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CI 001 del 03 de Octubre de 2025
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE REINICIO:**	24 DE FEBRERO DE 2026	**ACTA PARCIAL No.3**	17 DE ABRIL DE 2026
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE TERMINACION FINAL**	26 DE ABRIL DE 2026		
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **NORCASIA**	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			ACTA PARCIAL No 3		ACUMULADO		POR COBRAR		CANTIDAD ACTUALIZADA BALANCE No2	VALOR TOTAL ACUMULADO
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT	SUBTOTAL	CANT	SUBTOTAL	CANT	SUBTOTAL		

RESUMEN FINANCIERO NORCASIA		
Valor Inicial Contrato:	$	458,711,738.00
Valor Adicional Contrato:	$	-
Valor Final Contrato:	$	458,711,738.00
Valor Acta No 001	$	64,601,401.00
Valor Acta No 002	$	97,856,682.00
Valor Acta No 003	$	203,544,296.00
Valor A Girar Acta No 003	$	203,544,296.00
Valor Acumulado Actas	$	366,002,379.00
% Ejecución Acumulado		79.79%
Saldo Por Ejecutar	$	72,502,763.00

LA PRESENTE ACTA PARCIAL No 003 FUE **REVISADA Y APROBADA** POR LA INTERVENTORÍA, POR UN VALOR DEDOSCIENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE..**($203,544,296.00).** CON UN PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL 79.79**%**. APROBADO LO ANTERIOR, SE FIRMA A LOS DIECISIETE (17) DÍAS, DEL MES DE ABRIL DEL 2026 EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, CAQUETA.

CONTRATISTA:

JOHAN LOPEZ MENDEZ
1.117.508.596 DE FLORENCIA
Representante Legal
H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS

VoBo DIRECTOR DE OBRA

ING. ADRIANA GALVEZ OSORIO
C.C. 26.550.973 DE IBAGUE
M.P. 73202138618 TLM
H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS

INTERVENTORÍA

JHONATTAN HOYOS MARQUEZ
C.C. 1.018.439.570 DE BOGOTA
M.P. 25202-280849 CND
Director y Rep. Legal
UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25

ENTIDAD CONTRATANTE

MARIA PAULA RUIZ TRIANA
C.C. 1.075.311.783 de Neiva
GERENTE
ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

VoBo Supervisión ESE HMHOO

ALEXANDER VILLOTA FAJARDO
Supervisor Contrato CI 001

JOSE RICARDO SANCHEZ GOMEZ
Apoyo a la Supervisión

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL NORCASIA DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD DE NORCASIA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	PRELIMINARES	**FECHA**	17 de abril 2026	
ÍTEM	1.11	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMUN ALTURA HASTA 1,00 m.	**Unidad Medida**	M3





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
CONSULTORIO 1	5.05	0.30	0.30	1.00	0.45
CONSULTORIO 2	5.45	0.30	0.30	1.00	0.49
CUARTO DE ASEO	3.35	0.30	0.30	1.00	0.30
TOMA DE MUESTRAS	2.48	0.30	0.30	1.00	0.22
	2.73	0.30	0.30	1.00	0.25
BAÑO DISCAPACITADOS	2.94	0.30	0.30	1.00	0.26
	2.58	0.30	0.30	1.00	0.23
	0.70	0.30	0.30	1.00	0.06
EXCAVACIÓN MURO DE CONTENCIÓN PARA ANDEN	12.00	0.60	0.30	1.00	2.16
	9.00	0.60	0.30	1.00	1.62
RAMPA	5.20	0.15	1.55	1.00	1.21
PLACA EXTERIOR	7.00	0.60	1.00	1.00	4.20
	5.20	0.60	1.00	1.00	3.12

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**14.58**
COBRO ACTA N.1	**2.15**
ACTA N.2	
ACTA N.3	**12.43**
TOTAL CONTRACTUAL	**2.15**

Elaboró
MARIA XIMENA VARGAS
Residente de Obra

Avaló
Alan Mosquera
ALAN MOSQUERA GARCÍA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL NORCASIA DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD DE NORCASIA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	PRELIMINARES	**FECHA**	17 de abril 2026	
ÍTEM	1.12	RELLENO MATERIAL PREEXCAVADO, INCLUYE COMPATACIÓN MECANICA.	**Unidad Medida**	M3





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
CONSULTORIO 1	5.05	0.30	0.30	1.00	0.45
CONSULTORIO 2	5.45	0.30	0.30	1.00	0.49
CUARTO DE ASEO	2.00	0.30	0.30	1.00	0.18
TOMA DE MUESTRAS	2.48	0.30	0.30	1.00	0.22
	2.73	0.30	0.30	1.00	0.25
BAÑO DISCAPACITADOS	2.94	0.30	0.30	1.00	0.26
	2.58	0.30	0.30	1.00	0.23
	0.70	0.30	0.30	1.00	0.06
MURO DE CONTENCIÓN PARA ANDEN	12.00	1.00	0.80	1.00	9.60
	9.00	1.00	0.80	1.00	7.20
	12.00	1.00	1.00	1.00	12.00
CUARTO DE ASEO	1.35	1.00	1.00	1.00	1.35
CUARTO DE RESIDUOS	2.20	3.00	1.00	1.00	6.60
PLACA EXTERIOR	7.00	0.40	5.20	1.00	14.56

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**53.46**
COBRO ACTA N.1	**2.15**
ACTA N.2	
ACTA N.3	**51.31**
TOTAL CONTRACTUAL	**2.15**

Elaboró
MARIA XIMENA VARGAS
Residente de Obra

Avaló
Alan Mosquera
ALAN MOSQUERA GARCÍA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL NORCASIA DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570		
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD DE NORCASIA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA		
CAPITULO	CONCRETOS		**FECHA**	17 de abril 2026	
ÍTEM	2.01	PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO 3000PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 5 mm. ESPESOR 10 cm	**Unidad Medida**	M2	





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
CUARTO DISPOSICION	2.80		2.04	1.00	5.71
CUARTO DE ASEO	1.50		1.00	1.00	1.50
CENTRO DE SALUD	11.24		8.31	1.00	93.40
ANDEN FRONTAL	12.83		1.20	1.00	15.40
	6.10		0.40	1.00	2.44
ANDEN POSTERIOR	12.58		1.00	1.00	12.58
ANDEN LATERAL DERECHO	8.31		0.60	1.00	4.99
ANDEN LATERAL IZQUIERDO	8.75		0.80	1.00	7.00
ANDEN CUARTO DISPOSICION	2.93		0.97	1.00	2.84
PLACA EXTERIOR	7.00		7.00	1.00	49.00
	4.13		6.00	1.00	24.75

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**219.61**
COBRO ACTA N.1	**110.00**
ACTA N.2	
ACTA N.3	**30.00**
TOTAL CONTRACTUAL	**219.61**

Elaboró
MARIA XIMENA VARGAS
Residente de Obra

Avaló Alan Mosquera
ALAN MOSQUERA GARCIA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL NORCASIA DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD DE NORCASIA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	CONCRETOS	**FECHA**	17 de abril 2026	
ÍTEM	2.03	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI, RATONEADA Y ESCOBEADA. CON BORDILLO LATERAL. INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO, COMPACTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	**Unidad Medida**	M2





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
RAMPA FRONTAL	5.20		1.55	1.00	8.06

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**8.06**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	
ACTA N.3	**8.06**
TOTAL ACTIVIDAD	**19.40**

Elaboró

MARIA XIMENA VARGAS
Residente de Obra

Avaló Alan Mosquera

ALAN MOSQUERA GARCÍA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA MARACAIBO DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD DE NORCASIA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	CONCRETOS	**FECHA**	17 de abril 2026	
ÍTEM	2.04	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,25X0,25m EN CONCRETO DE 3000 psi, incluye acero de refuerzo en 4 varillas de 1/2", con flejes @0,15 m en varilla de 3/8".	**Unidad Medida**	ML





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
FACHADA POSTERIOR	12.58			2.00	25.16
FACHADA LATERAL DERECHA	8.80			2.00	17.60
CUARTO DE ASEO	4.60			1.00	4.60
PLACA EXERIOR	7.00			2.00	14.00
	5.20			2.00	10.40

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**71.76**
COBRO ACTA N.1	0.00
ACTA N.2	**25.00**
ACTA N.3	**46.76**
TOTAL CONTRACTUAL	53.31

Elaboró

MARIA XIMENA VARGAS
Residente de Obra

Avaló

ALAN MOSQUERA GARCIA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA MARACAIBO DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD DE NORCASIA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA
CAPITULO	CONCRETOS	**FECHA**	17 de abril 2026
ÍTEM	3.01 MURO EN BLOQUE No 4	**Unidad Medida**	M2





Localización	Dimensiones LONGUTUD	ALTO	ANCHO	CANT	Medida Total
CUARTO DE ASEO	1.60	3.80		1.00	6.08
	1.10	3.60		2.00	7.92
	1.10	0.20		2.00	0.11
	0.80	0.37		- 1.00	- 0.30
CONSULTORIO 1	0.91	3.50		1.00	3.19
TOMA DE MUESTRAS	2.60	3.20		1.00	8.32
BAÑO DISCAPACITADOS	2.60	2.12		1.00	5.51
FRONTAL	2.60	2.60		1.00	6.76
LAT DERECHO	5.70	2.60		1.00	14.82
	1.40	0.50		1.00	0.70
	0.25	1.40		1.00	0.18
VENTANA 1	1.20	0.40		- 1.00	0.24
	0.80	0.40		- 1.00	0.16
LAT IZQUIERDO	4.15	2.60		1.00	10.79
	4.15	0.80		1.00	1.66
	4.23	2.60		1.00	11.00
	4.23	0.80		1.00	1.69
					-
PUERTA	0.98	2.20		- 1.00	- 2.16
VENTANA	1.85	1.00		- 2.00	- 3.70
LADRILLO MURO DE CONTENCION ANDEN POSTERIOR	12.58	0.82		1.00	10.32
LADRILLO MURO DE CONTENCION ANDEN LATERAL DERECHO	8.40	0.82		1.00	6.89
CUARTO DE RESIDUOS	3.09	0.45		1.00	1.39
	1.60	2.20		2.00	1.76
	3.00	2.20		1.00	3.30

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**96.62**
COBRO ACTA N.1	0.00
ACTA N.2	**80.00**
ACTA N.3	**16.62**
TOTAL CONTRACTUAL	38.60

Elaboró
MARIA XIMENA VARGAS
Residente de Obra

Avaló
ALAN MOSQUERA GARCÍA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA MARACAIBO DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**		CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD DE NORCASIA	**MUNICIPIO**		FLORENCIA	
CAPITULO	CONCRETOS		**FECHA**	17 de abril 2026	
ÍTEM	3.02	PAÑETE EN MOTERO IMPERMEABILIZADO 1:4		**Unidad Medida**	M2





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
CUARTO DE ASEO	1.60	3.80		2.00	12.16
	1.10	3.60		4.00	15.84
	1.10	0.20		4.00	0.11
	0.80	0.37		- 1.00	- 0.30
CONSULTORIO 1	0.91	3.50		2.00	6.37
TOMA DE MUESTRAS	2.60	3.20		2.00	16.64
BAÑO DISCAPACITADOS	1.60	3.20		2.00	10.24
CUARTO DE RESIDUOS	3.09	0.45		2.00	2.78
	1.60	2.20		4.00	14.08
	3.00	2.20		2.00	13.20
PUERTA	0.98	2.20		- 1.00	- 2.16
VENTANA	1.85	1.00		- 2.00	- 3.70
LAT DERECHO	5.70	2.60		1.00	14.82
	1.40	0.50		1.00	0.70
	0.25	1.40		1.00	0.18
VENTANA 1	1.20	0.40		- 1.00	- 0.24
	0.80	0.40		- 1.00	- 0.16
LAT IZQUIERDO	4.15	2.60		1.00	10.79
	4.15	0.80		1.00	1.66
	4.23	2.60		1.00	11.00
	4.23	0.80		1.00	1.69
MURO DE CONTENCION ANDEN POSTERIOR	12.58	1.20		1.00	7.55
MURO DE CONTENCION ANDEN LATERAL DERECHO	8.40	1.20		1.00	5.04
MURO EXTERIOR	13.00	0.8		1	5.20
MALLA ESLABONADA	15.71	1		2	15.71

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**143.49**
COBRO ACTA N.1	0.00
ACTA N.2	**100.00**
ACTA N.3	**43.49**
TOTAL CONTRACTUAL	106.12

Elaboró
MARIA XIMENA VARGAS
Residente de Obra

Avaló
ALAN MOSQUERA GARCIA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA MARACAIBO DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD DE NORCASIA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	CONCRETOS	**FECHA**	17 de abril 2026	
ÍTEM	3.03	ENCHAPE MURO FORMATO MÍNIMO .25X.30	**Unidad Medida**	M2





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
BAÑO DISCAPACI.	8.44	2.60		1.00	21.94
	0.80	0.40		- 1.00	- 0.32
TOMA DE MUESTRAS SALPICADERO	2.10	1.00		1.00	2.10
CONSULTORIO 1 SALPICADERO	2.60	1.00		1.00	2.60
CUARTO DE ASEO	3.35	1.50		1.00	5.03

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**31.35**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	
ACTA N.3	**31.35**
TOTAL CONTRACTUAL	44.39

Elaboró
MARIA XIMENA VARGAS
Residente de Obra

Avaló
ALAN MOSQUERA GARCÍA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA MARACAIBO DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD DE NORCASIA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	CONCRETOS	**FECHA**	17 de abril 2026	
ÍTEM	3.04	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS TIPO I	**Unidad Medida**	M2





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
SALA DE ESPERA	4.98	2.60		2.00	25.90
	3.87	2.60		1.00	10.06
	2.40	2.60		1.00	6.24
PUERTAS	0.98	2.00		- 2.00	- 3.92
	1.00	2.00		- 1.00	- 2.00
VENTANA	1.00	1.55		- 2.00	- 3.10
BODEGA	3.57	2.60		2.00	18.56
	2.62	2.60		2.00	13.62
VENTANA	0.40	1.20		- 2.00	- 0.96
CORREDOR FRENTE PMR	0.66	2.60		1.00	1.72
	1.60	2.60		1.00	4.16
	0.69	2.60		1.00	1.79
	1.11	2.60		1.00	2.89
CUARTO DE ASEO	1.00	2.90		2.00	5.80
	1.00	0.10		2.00	0.10
	1.35	3.00		1.00	4.05
VENTANA	0.37	0.80		- 1.00	- 0.30
CUARTO DE RESIDUOS	2.80	2.85		1.00	7.98
	2.80	3.30		1.00	9.24
	2.20	2.85		1.00	6.27
	2.20	3.30		1.00	7.26
	2.20	0.45		2.00	0.99
PUERTA	1.13	2.40		- 1.00	- 2.71
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**113.64**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	
ACTA N.3	**113.64**
TOTAL CONTRACTUAL	**31.73**

Elaboró
MARIA XIMENA VARGAS
Residente de Obra

Avaló
Alan Mosquera
ALAN MOSQUERA GARCÍA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA MARACAIBO DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3		**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD DE NORCASIA		**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	CONCRETOS		**FECHA**	17 de abril 2026	
ÍTEM	3.05	ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES TIPO KORAZA	**Unidad Medida**	M2	







Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
CUARTO DE RESIDUOS	3.00	2.85		1.00	8.55
	3.00	3.70		1.00	11.10
	2.20	2.85		2.00	12.54
	2.20	0.85		2.00	3.74
PUERTA	1.13	2.40		- 1.00	- 2.71
CUARTO DE ASEO	4.00	1.60		1.00	6.40
	1.10	3.85		2.00	8.47
	1.10	0.10		2.00	0.11
VENTANA	0.80	0.37		- 1.00	- 0.30
POSTERIOR Y FRONTAL	11.23	2.60		2.00	58.40
LATERALES	4.15	2.60		2.00	21.58
	4.15	0.80		2.00	6.64
	4.23	2.60		2.00	22.00
	4.23	0.80		2.00	6.77
VENTANAS	1.00	1.55		- 3.00	- 4.65
	0.40	1.20		- 1.00	- 0.48
	1.00	1.80		- 3.00	- 5.40
MALLA ESLABONADA	15.71	1.00		2.00	31.42
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**184.17**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	
ACTA N.3	**184.17**
TOTAL ACTIVIDAD	**176.31**


Elaboró
MARIA XIMENA VARGAS
Residente de Obra

Avaló
ALAN MOSQUERA GARCIA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA MARACAIBO DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD DE NORCASIA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA
CAPITULO	CONCRETOS	**FECHA**	17 de abril 2026
ÍTEM	3.06	ESCTUCO Y PINTURA DE ALTA ASEPSIA 3 MANOS	**Unidad Medida** M2

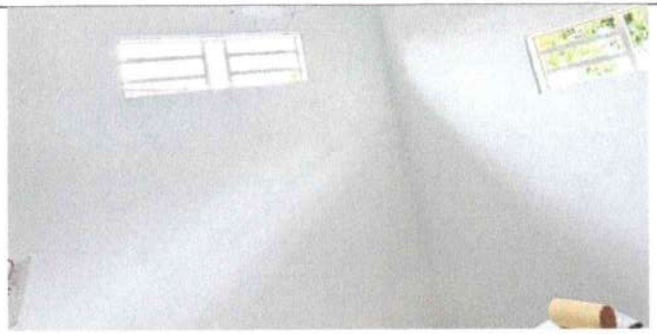



Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
CONSULTORIO 1	4.05	2.60		2.00	21.06
	3.62	2.60		2.00	18.82
PUERTA	0.95	2.00		- 1.00	- 1.90
	0.98	2.00		- 1.00	- 1.96
	1.20	3.20		- 1.00	- 3.84
VENTANA	1.00	1.80		- 1.00	- 1.80
CONSULTORIO 2	3.52	2.60		2.00	18.30
	4.05	2.60		2.00	21.06
PUERTA	0.98	2.00		- 1.00	- 1.96
TOMA DE MUESTRAS	3.57	2.60		2.00	18.56
	2.94	2.60		2.00	15.29
PUERTA	0.95	2.00		- 1.00	- 1.90
VENTANA	1.00	1.80		- 1.00	- 1.80

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**97.94**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	
ACTA N.3	**97.94**
TOTAL ACTIVIDAD	**133.52**

Elaboró

MARIA XIMENA VARGAS
Residente de Obra

Avaló

ALAN MOSQUERA GARCÍA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA MARACAIBO DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570		
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD DE NORCASIA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA		
CAPITULO	CUBIERTAS Y CIELO RASOS		**FECHA**	17 de abril 2026	
ÍTEM	4.01	ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN PERFIL REF: (PAG_C 120X60_ 1,9 mm) CALIBRE 14, PINTADO CON ANTICORROSIVO O WASH PRIMER.	**Unidad Medida**	ml	







Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
CENTRO SALUD	12.64			10.00	126.40
	10.10			2.00	20.20
	3.05			4.00	12.20
	1.40			8.00	11.20
CUARTO DE ASEO	2.76			2.00	5.52
CUARTO DISPOSICION	4.00			3.00	12.00

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**187.52**
COBRO ACTA N.1	0.00
ACTA N.2	**126.40**
ACTA N.3	**61.12**
TOTAL CONTRACTUAL	229.35

Elaboró

MARIA XIMENA VARGAS
Residente de Obra

Avaló

ALAN MOSQUERA GARCÍA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA MARACAIBO DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD DE NORCASIA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	CUBIERTAS Y CIELO RASOS	**FECHA**	17 de abril 2026	
ÍTEM	4.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA EN LAMINA MASTER 1000 CALIBRE 28 PREPINTADA, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**Unidad Medida**	m2



Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
CUARTO DE ASEO	3.50		1.50	1.00	5.25
CUARTO DISPOSICION	4.20		3.80	1.00	15.96
CENTRO DE SALUD	13.00		12.00	1.00	156.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**177.21**
COBRO ACTA N.1	0.00
ACTA N.2	**142.07**
ACTA N.3	**35.14**
TOTAL CONTRACTUAL	246.57

Elaboró.
MARIA XIMENA VARGAS
Residente de Obra

Avaló
ALAN MOSQUERA GARCIA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL NORCASIA DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**		CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD DE NORCASIA	**MUNICIPIO**		FLORENCIA	
CAPITULO	CUBIERTAS Y CIELO RASOS		**FECHA**	17 de abril 2026	
ÍTEM	4.03	CABALLETE EN LAMINA METALICA PINTADA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	**Unidad Medida**	ml	



Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
Caballete	12.64			1.00	12.64

OBSERVACIONES: Se plantean las Correas en pacha.

TOTAL DE ACTIVIDAD	**12.64**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	
ACTA N.3	**12.64**
TOTAL ACTIVIDAD	**24.45**

Elaboró
MARIA XIMENA VARGAS
Residente de Obra

Avaló
ALAN MOSQUERA GARCIA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL NORCASIA DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD DE NORCASIA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	CUBIERTAS Y CIELO RASOS	**FECHA**	17 de abril 2026	
ÍTEM	4.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS DE ANCLAJE, UNIONES, RINCONERAS.	**Unidad Medida**	m2





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
CUARTO DE ASEO	2.10		1.50	1.00	3.15
CUARTO DE DISPOSICION	3.00		2.30	1.00	6.90
CENTRO DE SALUD	13.00		12.00	1.00	156.00

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**166.05**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	
ACTA N.3	166.05
TOTAL ACTIVIDAD	**112.99**

Elaboró

MARIA XIMENA VARGAS
Residente de Obra

Avaló

ALAN MOSQUERA GARCIA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL NORCASIA DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3		**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD DE NORCASIA		**MUNICIPIO**	. FLORENCIA	
CAPITULO	CUBIERTAS Y CIELO RASOS		**FECHA**	17 de abril 2026	
ÍTEM	4.08	PERFIL 100X100 X 2,00 mm, PARA VIGAS, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA A BASE DE ACEITE.	**Unidad Medida**	ML	





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
FACHADA POSTERIOR Y FRONTAL	3.05			4.00	12.20

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**12.20**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	
ACTA N.3	**12.20**
TOTAL CONTRACTUAL	75.21

Elaboró
MARIA XIMENA VARGAS
Residente de Obra

Avaló
ALAN MOSQUERA GARCIA
INTERVENTOR


MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA MARACAIBO DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD DE NORCASIA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA
CAPITULO	PISOS Y ENCHAPES	**FECHA**	17 de abril 2026
ÍTEM	5.01	NIVELACION PARA PISO E=0,05 M	**Unidad Medida** m2







Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
CUARTO DE ASEO	1.35		1.00	1.00	1.35
CUARTO DE DISPOSICION	2.80		2.04	1.00	5.71
CENTRO DE SALUD	11.11		8.31	1.00	92.32
PLACA EXTERIOR	5.20		7.00	1.00	36.40

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**135.79**
COBRO ACTA N.1	25.00
ACTA N.2	**70.00**
ACTA N.3	**40.79**
TOTAL CONTRACTUAL	92.18

Elaboró

MARIA XIMENA VARGAS
Residente de Obra

Avaló

ALAN MOSQUERA GARCÍA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL NORCASIA DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD DE NORCASIA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	PISOS Y ENCHAPES	**FECHA**	17 de abril 2026	
ÍTEM	5.02	BALDOSA CERAMICA PARA PISOS FORMATO CUADRADO MINIMO .45X.45m TRAFICO COMERCIAL, PRIMERA CALIDAD	**Unidad Medida**	m2





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
CUARTO DE ASEO	1.35		1.00	1.00	1.35
CUARTO DE DISPOSICION	2.80		2.04	1.00	5.71
CENTRO DE SALUD	11.11		8.31	1.00	92.32
ANDEN POSTERIOR	12.58		1.00	1.00	12.58
ANDEN LATERAL DERECHO	8.31		0.60	1.00	4.99
ANDEN LATERAL IZQUIERDO	8.75		0.80	1.00	7.00
ANDEN CUARTO DISPOSICION	2.93		0.97	1.00	2.84

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**126.79**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	
ACTA N.3	126.79
TOTAL CONTRACTUAL	**92.18**

Elaboró
MARIA XIMENA VARGAS
Residente de Obra


Avaló Alan Mosquera
ALAN MOSQUERA GARCÍA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL NORCASIA DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD DE NORCASIA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	PISOS Y ENCHAPES	**FECHA**	17 de abril 2026	
ÍTEM	5.03	GUARDAESCOBA EN CERAMICA	**Unidad Medida**	ml



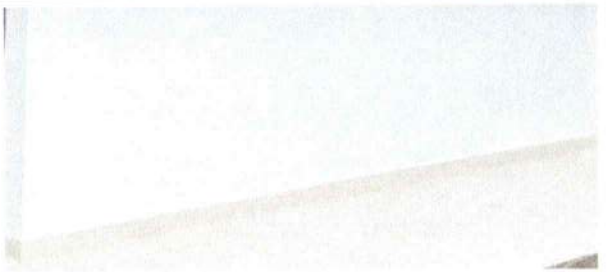

Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
TOMA DE MUESTRAS	2.60			1.00	2.60
	2.94			1.00	2.94
	3.57			1.00	3.57
	2.94			1.00	2.94
CONSULTORIO 2	2.54			1.00	2.54
	4.05			1.00	4.05
	3.52			1.00	3.52
	4.05			1.00	4.05
CONSULTORIO 1	4.05			1.00	4.05
	4.05			1.00	4.05
	0.87			1.00	0.87
	0.57			1.00	0.57
	2.24			1.00	2.24
	0.68			1.00	0.68
ALMACENAMIENTO	0.87			1.00	0.87
	3.87			1.00	3.87
	3.87			1.00	3.87
	2.07			1.00	2.07
SALA DE ESPERA	18.98			1.00	18.98
BODEGA	11.43			1.00	11.43
CUARTO DE RESIDUOS	9.68			1.00	9.68
PUESTO DE SALUD	42.00			1.00	42.00

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**131.44**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	
ACTA N.3	**131.44**
TOTAL CONTRACTUAL	79.76

Elaboró

MARIA XIMENA VARGAS
Residente de Obra

Avaló

ALAN MOSQUERA GARCÍA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL NORCASIA DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD DE NORCASIA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	CARPINTERIA METALICA	**FECHA**	17 de abril 2026	
ÍTEM	6.01	Puerta Metalica entablerado en lamina galvanizada Calibre 20, Con cerradura. Incluye Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. Tragaluz en Vidrio 4 mm	**Unidad Medida**	M2





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
PUERTA PRINCIPAL		2.20	1.00	1.00	2.20
CUARTO DISPOSICION		2.40	1.13	1.00	2.71
CONSULTORIO 1		2.03	0.95	1.00	1.93

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**6.84**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	
ACTA N.3	**6.84**
TOTAL CONTRACTUAL	**3.78**

Elaboró

MARIA XIMENA VARGAS
Residente de Obra

Avaló

ALAN MOSQUERA GARCÍA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL NORCASIA DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**		CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD DE NORCASIA	**MUNICIPIO**		FLORENCIA	
CAPITULO	CARPINTERIA METALICA		**FECHA**	17 de abril 2026	
ÍTEM	6.02	Suministro e Instalación de Ventana Lamina Galvanizada Calibre 20 Corredera o Fija, Acabado en Anticorrosivo y Esmalte Incluye Vidrio 4 mm, pelicula de seguridad acabado sandblasting.		**Unidad Medida**	M2





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
BODEGA		0.40	1.20	2.00	0.96
BAÑOS DISCAPACI.		0.40	0.80	1.00	0.32
TOMA DE MUESTRAS		1.80	1.00	1.00	1.80
CONSULTORIO 2		1.80	1.00	1.00	1.80
CONSULTORIO 1		1.80	1.00	1.00	1.80
ALMACENAMIENTO		1.55	1.00	1.00	1.55
SALA DE ESPERA		1.55	1.00	2.00	3.10
CUARTO DE ASEO		0.40	0.80	1.00	0.32
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**11.65**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	
ACTA N.3	**11.65**
TOTAL CONTRACTUAL	21.68

Elaboró

MARIA XIMENA VARGAS
Residente de Obra

Avaló Alan Mosquera

ALAN MOSQUERA GARCÍA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL NORCASIA DE LA E S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**		CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD DE NORCASIA	**MUNICIPIO**		FLORENCIA	
CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS		**FECHA**	17 de abril 2026	
ÍTEM	7.04	Suministro e Instalación de Punto Electrico de iluminación. Incluye Luminaria Led de 18w. Redonda o Cuadrada o similar, de empotrar o sobreponer, según aplique. Incluye interruptor, y Alambre No 14 Awg por 2 Lineas hasta por 3 metros y tubería PVC de 1/2" hasta por 3 m.	**Unidad Medida**		UND







Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
CUARTO DE ASEO				1.00	1.00
CUARTO DE DISPOSICION				1.00	1.00
TOMA DE MUESTRAS				2.00	2.00
BAÑO DISCAP.				1.00	1.00
BODEGA				2.00	2.00
CONSULTORIO 1				2.00	2.00
CONSULTORIO 2				2.00	2.00
CUARTO DE				1.00	1.00
SALA DE ESPERA				4.00	4.00
ZONA DE				1.00	1.00
ZONA EXTERIOR				7.00	7.00

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**24.00**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	
ACTA N.3	**14.00**
TOTAL CONTRACTUAL	**31.00**

Elaboró

MARIA XIMENA VARGAS
Residente de Obra

Avaló

ALAN MOSQUERA GARCIA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA MARACAIBO DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD DE NORCASIA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA
CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS	**FECHA**	17 de abril 2026
ÍTEM	7.05 — SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 110 V (INCLUYE ACCEOSRIOS, ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS, ALAMBRE AWG No 14 POR 1 LINEA, Y TUBERIA PVC HASTA POR 3 METROS).	**Unidad Medida**	UND







Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
CUARTO DE ASEO				1.00	1.00
TOMA DE MUESTRAS				3.00	3.00
CONSULTORIO 2				4.00	4.00
CONSULTORIO 1				4.00	4.00
SALA DE ESPERA				2.00	2.00
BODEGA				1.00	1.00

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**15.00**
COBRO ACTA N.1	10.00
ACTA N.2	
ACTA N.3	**5.00**
TOTAL CONTRACTUAL	27.00

Elaboró
MARIA XIMENA VARGAS
Residente de Obra

Avaló
ALAN MOSQUERA GARCIA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL NORCASIA DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD DE NORCASIA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS	**FECHA**	17 de abril 2026	
ÍTEM	7.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 220V (INCLUYE ACCEOSRIOS, CABLE AWG No 10 POR 2 LINEAS, ALAMBRE AWG No 14 POR 1 LINEA, Y TUBERIA PVC).	**Unidad Medida**	UND





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
ALMACENAMIENTO				1.00	1.00
CONSULTORIO1				1.00	1.00
CONSULTORIO 2				1.00	1.00
TOMA DE MUESTRAS				1.00	1.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**4.00**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	
ACTA N.3	4.00
TOTAL CONTRACTUAL	**4.00**

Elaboró

MARIA XIMENA VARGAS
Residente de Obra

Avaló

ALAN MOSQUERA GARCÍA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL NORCASIA DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD DE NORCASIA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS	**FECHA**	17 de abril 2026	
ÍTEM	7.08	ACOMETIDA PARA CONEXIÓN PLANTA ELECTRICA, DESDE TABLERO DISTRIBUCIÓN HASTA TRANSFERENCIA MANUAL. INCLUYE CABLE No 8 AWG POR 6 LINEAS.	**Unidad Medida**	ML





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
PLANTA ELECTRICA	10.00			1.00	10.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**10.00**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	
ACTA N.3	10.00
TOTAL CONTRACTUAL	**5.00**

Elaboró

MARIA XIMENA VARGAS
Residente de Obra

Avaló

ALAN MOSQUERA GARCÍA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL NORCASIA DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD DE NORCASIA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS	**FECHA**	17 de abril 2026	
ÍTEM	7.10	ACOMETIDA DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN A USO FINAL PARA TOMA CORRIENTES Y LUMINARIAS. INCLUYE TUBERÍA PVC, ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS Y ALAMBRE No 14 POR 1 LINEA Y ACCESORIOS.	**Unidad Medida**	ml







Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
ACOMETIDAS PARA	120.00			1.00	120.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**120.00**
COBRO ACTA N.1	**20.00**
ACTA N.2	
ACTA N.3	100.00
TOTAL CONTRACTUAL	**100.00**

Elaboró
MARIA XIMENA VARGAS
Residente de Obra

Avaló
ALAN MOSQUERA GARCÍA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL NORCASIA DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD DE NORCASIA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS	**FECHA**	17 de abril 2026	
ÍTEM	8.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO BLANCO DE PUSH INCLUYE GRIFERIA	**Unidad Medida**	UND



Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
BAÑO DISCAPACITADOS				1.00	1.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**1.00**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	
ACTA N.3	1.00
TOTAL CONTRACTUAL	**1.00**

Elaboró

MARIA XIMENA VARGAS
Residente de Obra

Avaló

ALAN MOSQUERA GARCÍA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL NORCASIA DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD DE NORCASIA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS	**FECHA**	17 de abril 2026	
ÍTEM	8.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	**Unidad Medida**	UND





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
BAÑO DISCAPAC.				1.00	1.00
CONSULTORIOS				2.00	2.00
TOMA DE MUESTRAS				1.00	1.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**4.00**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	
ACTA N.3	4.00
TOTAL CONTRACTUAL	**7.00**

Elaboró

MARIA XIMENA VARGAS
Residente de Obra

Avaló

ALAN MOSQUERA GARCÍA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL NORCASIA DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD DE NORCASIA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS	**FECHA**	17 de abril 2026	
ÍTEM	8.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE SEGURIDAD PARA PERSONA DISCAPACITADA EN ACERO INOXIDABLE.	**Unidad Medida**	UND



Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
BAÑO DISCAPACITA.				1.00	1.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**1.00**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	
ACTA N.3	1.00
TOTAL CONTRACTUAL	**1.00**

Elaboró

MARIA XIMENA VARGAS
Residente de Obra

Avaló

ALAN MOSQUERA GARCÍA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA MARACAIBO DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD DE NORCASIA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS	**FECHA**	17 de abril 2026	
ÍTEM	8.08	Suministro e Instalación de Tanque Plastico de 1000lts, incluye Fluidmaster	**Unidad Medida**	UND





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
TANQUE DE AGUA				1.00	1.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**1.00**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	
ACTA N.3	**1.00**
TOTAL CONTRACTUAL	**1.00**

Elaboró

MARIA XIMENA VARGAS
Residente de Obra

Avaló

ALAN MOSQUERA GARCÍA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL NORCASIA DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD DE NORCASIA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS	**FECHA**	17 de abril 2026	
ÍTEM	8.09	Acometida hidraulica de distribución en tubo PVC-P 3/4"	**Unidad Medida**	ml





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
SALIDA DE TANQUE	5.00			1.00	5.00
RED TANQUE	10.00			1.00	10.00
RED PRINCIPAL	35.00			1.00	35.00

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**50.00**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	**31.17**
ACTA N.3	**18.83**
TOTAL CONTRACTUAL	**31.17**

Elaboró

MARIA XIMENA VARGAS
Residente de Obra

Avaló

ALAN MOSQUERA GARCÍA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA MARACAIBO DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD DE NORCASIA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO		**FECHA**	17 de abril 2026	
ÍTEM	NP01	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO DE 0,12X0,20 m, EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, INCLUYE FORMALETA EN MADERA.INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	**Unidad Medida**	ML





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
FACHADA POSTERIOR	0.90			7.00	6.30
FACHADA LAT DERECHA	0.90			6.00	5.40
	3.10			2.00	6.20
FACHADA LAT IZQ	3.40			1.00	3.40
	2.45			1.00	2.45
	2.60			1.00	2.60
PLACA EXTERIOR	0.80			6.00	4.80

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**31.15**
COBRO ACTA N.1	0.00
ACTA N.2	**20.00**
ACTA N.3	**11.15**
TOTAL CONTRACTUAL	0.00

Elaboró

MARIA XIMENA VARGAS
Residente de Obra

Avaló

ALAN MOSQUERA GARCIA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

CAQUETÁ

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA ESPERANZA DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT.901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD NORCASIA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	CONCRETOS	**FECHA**	17 de abril 2026	
ÍTEM	NP04	ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 1,25X1,25X0,35 m NO INCLUYE REFUERZO.	**Unidad Medida**	UND



Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
Tanque elevado				1.00	1.00

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**1.00**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	
ACTA N.3	1.00
TOTAL CONTRACTUAL	**0.00**

Elaboró

MARIA XIMENA VARGAS
Residente de Obra

Avaló Alan Mosquera

ALAN MOSQUERA GARCÍA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

E.S.E HOSPITAL MALVINAS AS
HÉCTOR OROZCO OROZCO ;O

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA ESPERANZA DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT.901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD NORCASIA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	CONCRETOS	**FECHA**	17 de abril 2026	
ÍTEM	NP05	COLUMNA DE 0,25X0,25 m, EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, INCLUYE FORMALETA EN MADERA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	**Unidad Medida**	ML





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
Tanque elevado		4.00		1.00	4.00

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**4.00**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	
ACTA N.3	4.00
TOTAL CONTRACTUAL	**0.00**


Elaboró
MARIA XIMENA VARGAS
Residente de Obra

Avaló
ALAN MOSQUERA GARCÍA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA ESPERANZA DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT.901.994.584-2
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD LA NORCASIA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA
CAPITULO	CONCRETOS	**FECHA**	28-nov-25
ÍTEM	NP06	LOSA AEREA DE 0,10m EN CONCRETO 3000psi REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM 15X15. INCLUYE FORMALETA.	**Unidad Medida** M2

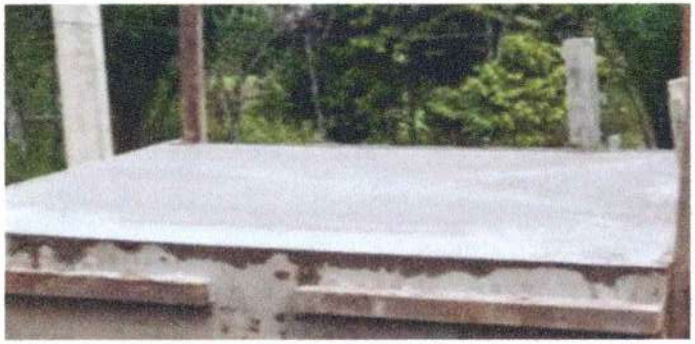

Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
	1.25		1.25		1.56

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**1.56**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	
ACTA N.3	1.56
TOTAL CONTRACTUAL	**0.00**

Elaboró

MARIA XIMENA VARGAS
Residente de Obra

Avaló

ALAN MOSQUERA GARCÍA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA ESPERANZA DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**		CONTRATISTA INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT.901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD NORCASIA	**MUNICIPIO**		FLORENCIA	
CAPITULO	CONCRETOS		**FECHA**	02 de marzo 2026	
ÍTEM	NP07	ACERO DE REFUERZO CORRUGADO FY420MPA, FIGURADO E INSTALADO, INCLUYE ALAMBRE PARA AMARRE, BARRAS LONGITUDINALES Y ESTRIBOS.	**Unidad Medida**	kg	







Localización	Dimensiones			CANT	medida total	peso Kg/m
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO			
Barra Longitudinal Columna Tanque #4	4.30			4.00	17.20	17.10
Estribos Columna #3	0.70			40.00	28.00	15.68
Parrilla Zapata #4	1.30			25.00	32.50	32.31
Viga Aerea Tanque #4	1.39			12.00	16.68	16.58
Estribos Viga #3	0.70			20.00	14.00	7.84
VIGA MURO	12.88			4.00	51.52	51.21

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**140.71**
COBRO ACTA No1	**0.00**
ACTA No2	
ACTA No3	140.71
TOTAL CONTRACTUAL	**0.00**

Elaboró
MARIA XIMENA VARGAS
Residente de Obra


Avaló
ALAN MOSQUERA GARCIA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA MARACAIBO DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA:	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001**	CONTRATISTA INTERVENTOR:	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD DE NORCASIA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO		**FECHA**	17 de abril 2026	
ÍTEM	NP09	CONEXIÓN ACOMETIDA BI-FASICA DEL POSTE A LA CAJA DE MEDIDOR, EN CABLE CONCÉNTRICO TRIFILAR 2X8+8,TENSORES TUBO IMC 3/4", TUBERÍA SCH40, CURVAS SCH 40, CAPASETE 3/4", BOQUILLA IMC 3/4", PIN DE CORTE TRIFILAR 2X40, SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, CON VARILLA DE COBRE 2*40 CON SU RESPECTIVO CONECTOR, Y CABLE #8 DE COBRE	**Unidad Medida**	ML



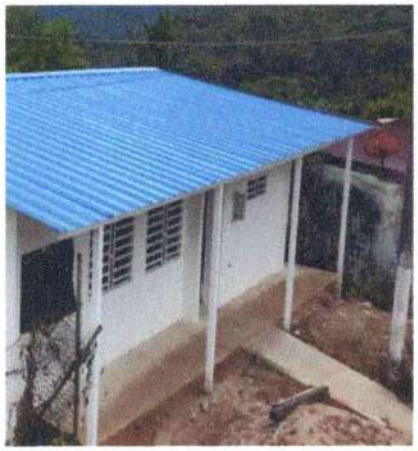

Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
PUESTO DE SALUD				30.00	30.00
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**30.00**
COBRO ACTA N.1	0.00
ACTA N.2	
ACTA N.3	**2.00**
TOTAL CONTRACTUAL	0.00

Elaboró

MARIA XIMENA VARGAS
Residente de Obra

Avaló

ALAN MOSQUERA GARCIA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA MARACAIBO DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS		
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA:	**CONTRATO INTERVENTORIA N.001**	CONTRATISTA INTERVENTOR:
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD DE NORCASIA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA
CAPITULO		**FECHA**	17 de abril 2026

ÍTEM	NP10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA MEDIDOR BI-FASICA, CON PIN DE CORTE 2X40 AMP, INCLUYE INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE CONECTOR DE COBRE, CABLE AWG NO 8 POR 2 LINEAS, Y VARILLA DE COBRE 2,40M	**Unidad Medida**	UND





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
PUESTO DE SALUD				1.00	1.00
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**1.00**
COBRO ACTA N.1	0.00
ACTA N.2	
ACTA N.3	**1.00**
TOTAL CONTRACTUAL	0.00

Elaboró

MARIA XIMENA VARGAS
Residente de Obra

Avaló Alan Mosquera

ALAN MOSQUERA GARCIA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA MARACAIBO DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA:	**CONTRATO INTERVENTORIA N.001**	CONTRATISTA INTERVENTOR:	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD DE NORCASIA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO		**FECHA**	17 de abril 2026	
ÍTEM	NP11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO PREFABRICADO	**Unidad Medida**	UND





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
PUESTO DE SALUD				1.00	1.00
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**1.00**
COBRO ACTA N.1	0.00
ACTA N.2	
ACTA N.3	**1.00**
TOTAL CONTRACTUAL	0.00

Elaboró

MARIA XIMENA VARGAS
Residente de Obra

Avaló

ALAN MOSQUERA GARCIA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA MARACAIBO DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD DE NORCASIA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO		**FECHA**	17 de abril 2026	
ÍTEM	NP12	MAMPOSTERIA EN BLOQUE, EN ANCHOS NO MAYORES A 0,60 M.	**Unidad Medida**	ML





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
FACHADA FRONTAL	11.23			3.00	33.69
LATERALES	5.70			2.00	11.40
CUCHILLAS	9.00			4.00	36.00
CUARTO DE	9.60			1.00	9.60
CUARTO DE ASEO	3.80			1.00	3.80
MURO EXTERIOR	12.00			1.00	12.00
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**106.49**
COBRO ACTA N.1	0.00
ACTA N.2	
ACTA N.3	**106.49**
TOTAL CONTRACTUAL	0.00

Elaboró

MARIA XIMENA VARGAS
Residente de Obra


Avaló

ALAN MOSQUERA GARCÍA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

CAQUETÁ CAQUETÁ E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA MARACAIBO DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA:	CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de	CONTRATISTA INTERVENTOR:	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD DE NORCASIA	MUNICIPIO	FLORENCIA	
CAPITULO		FECHA	17 de abril 2026	
ÍTEM	NP13	PAÑETE EN MORTERO PARA CARTERAS, VANOS, Y FILOS EN ANCHOS NO MAYORES A 0,60M.	Unidad Medida	ML

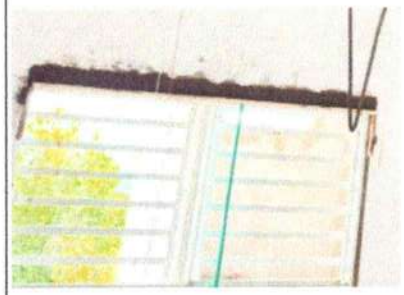







Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
PUERTA PRINCIPAL	5.40				5.40
CUARTO DISPOSICION	5.93				5.93
CONSULTORIO 1	5.01				5.01
BODEGA	4.00				4.00
BAÑOS DISCAPACI.	1.60				1.60
TOMA DE MUESTRAS	4.60				4.60
CONSULTORIO 2	4.60				4.60
CONSULTORIO 1	4.60				4.60
ALMACENAMIENTO	4.10				4.10
SALA DE ESPERA	8.20				8.20
CUARTO DE ASEO	1.60				1.60
CONSULTORIO 1	4.98				4.98
CONSULTORIO 2	4.98				4.98
TOMA DE MUESTRAS	4.97				4.97
BAÑO DISCAPACI.	4.98				4.98
BODEGA	4.95				4.95
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	74.50
COBRO ACTA N.1	0.00
ACTA N.2	
ACTA N.3	74.50
TOTAL CONTRACTUAL	0.00

Elaboró

MARIA XIMENA VARGAS
Residente de Obra

Avaló Alan Mosquera

ALAN MOSQUERA GARCIA
INTERVENTOR

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO | UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25 | **ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO** | H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

ACTA PARCIAL No.003

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	03 DE OCTUBRE DE 2025		
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3		
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA		
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2	**CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CI 001 del 03 de Octubre de 2025
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACION INICIAL:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE REINICIO:**	24 DE FEBRERO DE 2026	**ACTA PARCIAL No.2**	17 DE ABRIL 2026
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE TERMINACION FINAL**	26 DE ABRIL DE 2026		
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **EL PARÁ**	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			ACTA PARCIAL No 3		ACUMULADO		POR COBRAR	SUBTOTAL	CANTIDAD ACTUALIZADA BALANCE No3	VALOR TOTAL BALANCE
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT	SUBTOTAL	CANT	SUBTOTAL				
1	**PRELIMINARES**				**35,234,729.00**		**85,671.00**		**20,080,675.00**	-	-		**20,080,675.00**
1.01	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS (LAVAMANOS, INODOROS, ORINALES).	UND	5.00	32,516.00	162,580.00		-	5.00	162,580.00	-	-	5.00	162,580.00
1.02	DESMONTE Y RETIRO DE CUBIERTA EXISTENTE. INCLUYE TEJA, ESTRUCTURA, TEMPLETES, ANCLAJES, CABALLETES, LIMAOYAS Y LIMATESAS).	M2	218.00	61,719.00	13,454,742.00		-	112.42	6,938,450.00	-	-	112.42	6,938,450.00
1.03	DEMOLICIÓN DE PISO ESMALTADO, CERAMICA, BALDOSA CEMENTO O MORTERO NIVELACIÓN. INCLUYE RETIRO	M2	173.07	32,925.00	5,698,330.00		-	102.67	3,380,410.00	-	-	102.67	3,380,410.00
1.04	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PLACA EN CONCRETO, ANDENES EN CONCRETO, RAMPAS EN CONCRETO. (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO).	M2	178.61	37,820.00	6,755,030.00		-	93.19	3,524,446.00	-	-	93.19	3,524,446.00
1.05	DESMONTE DE PUERTA Y VENTANAS (INCLUYE MARCOS, VIDRIOS, NAVES).	M2	34.19	29,709.00	1,015,751.00		-	34.19	1,015,751.00	-	-	34.19	1,015,751.00
1.06	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO).	M2	22.60	28,102.00	635,105.00		-	22.60	635,105.00	-	-	22.60	635,105.00
1.07	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA, CON Y SIN PAÑETE. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO	M2	31.80	32,925.00	1,047,015.00		-	27.56	907,413.00	-	-	27.56	907,413.00
1.08	DEMOLICIÓN DE MESONES EN CONCRETO, LAVADEROS EN CONCRETO, POCETAS EN CONCRETO. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO.	und	1.00	54,186.00	54,186.00		-	1.00	54,186.00	-	-	1.00	54,186.00
1.09	DEMONTE, RETIRO Y DESHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA INTERNA EXISTENTE.	m2	188.09	22,894.00	4,306,132.00		-	112.42	2,573,743.00	-	-	112.42	2,573,743.00
1.10	DESMONTE DE MUROS EN LAMINA METALICAS, INCLUYE RETIRO	M2	94.03	16,079.00	1,511,908.00		-	-	-	-	-	0.00	-
1.11	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMUN ALTURA HASTA 1,00 m.	M3	5.48	77,181.00	422,952.00	1.11	85,671.00	8.86	683,824.00	-	-	8.86	683,824.00
1.12	RELLENO MATERIAL PREEXCAVADO, INCLUYE COMPATACIÓN MECANICA.	M3	4.76	35,924.00	170,998.00		-	5.70	204,767.00		-	5.70	204,767.00
2	**CONCRETOS**				**12,672,670.00**		**- 6,356,610.00**		**29,274,679.00**		-		**29,274,679.00**
2.01	PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO 3000PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 5 mm. ESPESOR 10 cm	M2	21.80	153,072.00	3,336,970.00		-	108.79	16,652,703.00		-	108.79	16,652,703.00
2.02	ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 4 mm, Espesor 10 cm. Escobeado y Ratoneado	M2	61.39	152,072.00	9,335,700.00	- 41.80	- 6,356,610.00	83.00	12,621,976.00		-	83.00	12,621,976.00
3	**MAMPOSTERÍA Y ACABADOS DE MUROS**				**50,137,829.00**		**24,112,943.00**		**43,853,078.00**		-		**43,853,078.00**
3.01	MURO EN BLOQUE No 4	M2	130.98	75,360.00	9,870,653.00		-	127.57	9,613,675.00	-	-	127.57	9,613,675.00

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

ACTA PARCIAL No.003

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	03 DE OCTUBRE DE 2025
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2
CONTRATO DE INTERVENTORIA	CI 001 del 03 de Octubre de 2025		
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACION INICIAL:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE REINICIO:**	24 DE FEBRERO DE 2026
ACTA PARCIAL No.2	17 DE ABRIL 2026		
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE TERMINACION FINAL**	26 DE ABRIL DE 2026
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **EL PARÁ**	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			ACTA PARCIAL No 3		ACUMULADO		POR COBRAR	SUBTOTAL	CANTIDAD ACTUALIZADA BALANCE No3	VALOR TOTAL BALANCE
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT	SUBTOTAL	CANT	SUBTOTAL				
3.02	PAÑETE EN MOTERO IMPERMEABILIZADO 1:4	M2	249.96	49,375.00	12,341,775.00	206.23	10,182,606.00	256.23	12,651,356.00	-	-	256.23	12,651,356.00
3.03	ENCHAPE MURO FORMATO MÍNIMO .25X.30	M2	74.31	128,540.00	9,551,807.00	11.87	1,525,770.00	25.87	3,325,330.00	-	-	25.87	3,325,330.00
3.04	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS TIPO I	M2	117.26	35,807.00	4,198,729.00	29.26	1,047,713.00	79.26	2,838,063.00		-	79.26	2,838,063.00
3.05	ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES TIPO KORAZA	M2	193.23	40,678.00	7,860,210.00	61.70	2,509,833.00	161.70	6,577,633.00	-	-	161.70	6,577,633.00
3.06	ESTUCO Y PINTURA DE ALTA ASEPSIA 3 MANOS	M2	123.83	42,385.00	5,248,535.00	208.73	8,847,021.00	208.73	8,847,021.00	-	-	208.73	8,847,021.00
3.07	ESTUCO Y PINTURA TIPO ESMALTE SOBRE MUROS	M2	25.11	42,458.00	1,066,120.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-
4	**CUBIERTAS Y CIELO RASOS**				**125,459,871.00**		**30,169,166.00**		**105,534,306.00**		-		**105,534,306.00**
4.01	ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN PERFIL REF: (PAG_C 120X60_ 2.00 mm) CALIBRE 14, PINTADO CON ANTICORROSIVO O WASH PRIMER. INCLUYE ANCLAJES EN VARILLA EN MUROS CULATAS.	ML	466.00	137,831.00	64,229,246.00	99.22	13,675,592.00	339.22	46,755,032.00	-	-	339.22	46,755,032.00
4.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA EN LAMINA MASTER 1000 CALIBRE 26 PREPINTADA, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	M2	219.03	134,576.00	29,476,181.00	37.17	5,002,190.00	246.17	33,128,574.00		-	246.17	33,128,574.00
4.03	CABALLETE EN LAMINA METALICA PINTADA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	22.60	67,223.00	1,519,240.00		-	12.00	806,676.00	-	-	12.00	806,676.00
4.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 CON DESARROLLO DE 0,60 M INCLUYE GANCHO DE FIJACION, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	ML	48.06	183,048.00	8,797,287.00	35.71	6,536,644.00	35.71	6,536,644.00	-	-	35.71	6,536,644.00
4.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN 3"	ML	30.00	39,102.00	1,173,060.00	20.00	782,040.00	20.00	782,040.00	-	-	20.00	782,040.00
4.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS DE ANCLAJE, UNIONES, RINCONERAS.	M2	182.12	111,272.00	20,264,857.00	37.50	4,172,700.00	157.50	17,525,340.00		-	157.50	17,525,340.00
5	**PISOS Y ENCHAPES**				**31,570,619.00**		**2,954,358.00**		**20,304,606.00**		-		**20,304,606.00**
5.01	NIVELACION PARA PISO E=0,05 a 0,07 m	M2	169.25	68,373.00	11,572,130.00		-	104.68	7,157,368.00	-	-	104.68	7,157,368.00
5.02	BALDOSA CERAMICA PARA PISOS FORMATO CUADRADO MINIMO .45X.45m TRAFICO COMERCIAL, PRIMERA CALIDAD.	M2	137.24	127,411.00	17,485,886.00	13.72	1,748,079.00	93.72	11,940,959.00		-	93.72	11,940,959.00
5.03	GUARDAESCOBA EN CERAMICA	ML	61.28	41,002.00	2,512,603.00	29.42	1,206,279.00	29.42	1,206,279.00	-	-	29.42	1,206,279.00
6	**CARPINTERIA METALICA**				**53,264,252.00**		**20,614,453.00**		**20,614,453.00**		**54,447,866.00**		**75,062,319.00**

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO | UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25 | **ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO** | H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

ACTA PARCIAL No.003

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	03 DE OCTUBRE DE 2025		
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3		
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA		
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2	**CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CI 001 del 03 de Octubre de 2025
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACION INICIAL:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE REINICIO:**	24 DE FEBRERO DE 2026	**ACTA PARCIAL No.2**	17 DE ABRIL 2026
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE TERMINACION FINAL**	26 DE ABRIL DE 2026		
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **EL PARÁ**	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			ACTA PARCIAL No 3		ACUMULADO		POR COBRAR	SUBTOTAL	CANTIDAD ACTUALIZADA BALANCE No3	VALOR TOTAL BALANCE
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT	SUBTOTAL	CANT	SUBTOTAL				
6.01	2 Puertas Metalica entablerado en lamina galvanizada Calibre 20, Con cerradura. Incluye Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. Tragaluz, y marcos.	M2	4.20	1,034,425.00	4,344,585.00	4.34	4,489,405.00	4.34	4,489,405.00	-	-	4.34	4,489,405.00
6.02	Suministro e Instalación de 16 Ventanas Lamina Galvanizada Calibre 20. Corredera o Fija, Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. Incluye Vidrio 4 mm, pelicula de seguridad acabado sandblasting y marco.	M2	20.99	1,291,803.00	27,114,945.00	10.00	12,918,030.00	10.00	12,918,030.00	29.36	37,927,336.00	39.36	50,845,366.00
6.03	Portón Metalico entamborado en lamina galvanizada Calibre 20, Con cerradura Doble Macho. Incluye Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. 1,40mX2,40m, incluye tragaluz superior en vidrio 4mm y marcos, pelicula de seguridad transparente para vidrios.	UND	1.00	3,207,018.00	3,207,018.00	1.00	3,207,018.00	1.00	3,207,018.00	-	-	1.00	3,207,018.00
6.04	8 Puertas En Marco y contramarco de Aluminio Blanco, con vidrio 5mm + pelicula tipo sandblasting, Con cerradura tipo bola. Tragaluz en Vidrio.	M2	17.28	1,076,256.00	18,597,704.00	-	-	-	-	15.35	16,520,530.00	15.35	16,520,530.00
7	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**30,152,053.00**	-	**2,229,571.00**	-	**14,809,146.00**		**10,503,469.00**		**25,312,615.00**
7.01	Conexión Acometida Parcial del Poste a la Caja de Medidor, en Cable Monofasico Encauchetado No 8, Cable No 8, Tensores para Cable, Tubo IMC 3/4", Capasete 3/4", Boquilla IMC 3/4".	ML	40.00	155,748.00	6,229,920.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-
7.02	Suministro e instalación de Caja Medidor Monofasica, con pin de corte 1x40 amp, incluye instalación del sistema de Puesta a Tierra, incluye conector de cobre, cable AWG No 8 por 3 lineas, y Varilla de cobre 2,40m.	UND	1.00	1,046,924.00	1,046,924.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-
7.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE 12 CTOS (INCLUYE: CAJA DE BREAKERS BIFASICA, BREAKERS 1X20 AMP, 1X30 AMP)	UND	1.00	813,573.00	813,573.00		-	1.00	813,573.00	-	-	1.00	813,573.00
7.04	Suministro e Instalación de Punto Electrico de iluminación. Incluye Luminaria Led de 18w. Redonda o Cuadrada o similar, de empotrar o sobreponer, según aplique. Incluye interruptor, y Alambre No 14 Awg por 2 Lineas hasta por 3 metros y tubería PVC de 1/2" hasta por 3 m.	UND	39.00	198,161.00	7,728,279.00		-	22.00	4,359,542.00	30.00	5,944,830.00	52.00	10,304,372.00
7.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 110 V (INCLUYE ACCEOSRIOS, ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS, ALAMBRE AWG No 14 POR 1 LINEA, Y TUBERIA PVC HASTA POR 3 METROS).	UND	27.00	162,429.00	4,385,583.00	-	-	20.00	3,248,580.00	11.00	1,786,719.00	31.00	5,035,299.00

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO | UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25 | **ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO** | H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

ACTA PARCIAL No.003

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	03 DE OCTUBRE DE 2025		
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372 267-3		
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA		
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2	**CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CI 001 del 03 de Octubre de 2025
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACION INICIAL:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE REINICIO:**	24 DE FEBRERO DE 2026	**ACTA PARCIAL No.2**	17 DE ABRIL 2026
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE TERMINACION FINAL**	26 DE ABRIL DE 2026		
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **EL PARÁ**	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			ACTA PARCIAL No 3		ACUMULADO		POR COBRAR	SUBTOTAL	CANTIDAD ACTUALIZADA BALANCE No3	VALOR TOTAL BALANCE
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT	SUBTOTAL	CANT	SUBTOTAL				
7.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 220V (INCLUYE ACCEOSRIOS, CABLE AWG No 10 POR 2 LINEAS, ALAMBRE AWG No 14 POR 1 LINEA, Y TUBERIA PVC).	UND	5.00	167,214.00	836,070.00	5.00	836,070.00	5.00	836,070.00	-	-	5.00	836,070.00
7.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA MANUAL PARA PLANTA ELECTRICA, INCLUYE TOMA 3x50 CODELCA, CAJA 2400, CAJA METALICA DE 25X25 X15, Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	UND	1.00	772,586.00	772,586.00	1.00	772,586.00	1.00	772,586.00	-	-	1.00	772,586.00
7.08	ACOMETIDA PARA CONEXIÓN PLANTA ELECTRICA, DESDE TABLERO DISTRIBUCIÓN HASTA TRANSFERENCIA MANUAL. INCLUYE CABLE No 8 AWG POR 6 LINEAS.	ML	5.00	124,183.00	620,915.00	5.00	620,915.00	5.00	620,915.00	-	-	5.00	620,915.00
7.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONCHERA DE POSTE PARA CONEXIÓN DE LA RED DE INTERCONEXIÓN DEL DEPARTAMENTO CON EL PUESTO DE SALUD. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1.00	788,403.00	788,403.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-
7.10	ACOMETIDA DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN A USO FINAL PARA TOMA CORRIENTES Y LUMINARIAS. INCLUYE TUBERÍA PVC, ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS Y ALAMBRE No 14 POR 1 LINEA Y ACCESORIOS.	ML	100.00	69,298.00	6,929,800.00	-	-	60.00	4,157,880.00	40.00	2,771,920.00	100.00	6,929,800.00
8	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS**				**26,053,435.00**		**8,892,405.00**		**14,642,813.00**		**7,960,345.00**		**22,603,158.00**
8.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE DE SOBRE PONER EN MUEBLE CON PUERTAS Y CAJONERAS EN RH. INCLUYE POCETAS Y ACCESORIOS DE GRIFERIA Y DESAGUES, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE. ALTURA: 0,90 m. ANCHO: 0,60 m.	ML	4.16	2,211,207.00	9,198,621.00	-	-	-	-	3.60	7,960,345.00	3.60	7,960,345.00
8.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO BLANCO DE PUSH INCLUYE GRIFERIA	UND	3.00	682,190.00	2,046,570.00	2.00	1,364,380.00	2.00	1,364,380.00	-	-	2.00	1,364,380.00
8.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND	7.00	390,928.00	2,736,496.00	6.00	2,345,568.00	6.00	2,345,568.00	-	-	6.00	2,345,568.00
8.04	SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE BARRA DE 60CM X2 DE SEGURIDAD PARA PARED, EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS	UND	1.00	893,449.00	893,449.00	1.00	893,449.00	1.00	893,449.00	-	-	1.00	893,449.00
8.05	Punto Hidraulico de 1/2", incluye accesorios PVC	UND	16.00	72,736.00	1,163,776.00		-	12.00	872,832.00		-	12.00	872,832.00

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO | UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25 | **ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO** | H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

ACTA PARCIAL No.003

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	03 DE OCTUBRE DE 2025
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACION INICIAL :**	26 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE REINICIO:**	24 DE FEBRERO DE 2026
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE TERMINACION FINAL**	26 DE ABRIL DE 2026
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **EL PARÁ**	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA

ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES**			**ACTA PARCIAL No 3**		**ACUMULADO**		**POR COBRAR**	**SUBTOTAL**	**CANTIDAD ACTUALIZADA BALANCE No3**	**VALOR TOTAL BALANCE**
			CANT	**V/UNITARIO**	**V/TOTAL**	**CANT**	**SUBTOTAL**	**CANT**	**SUBTOTAL**				
8.06	Punto Sanitario de 2", incluye accesorios PVC	UND	15.00	90,576.00	1,358,640.00		-	11.00	996,336.00		-	11.00	996,336.00
8.07	Punto Sanitario de 4", incluye accesorios PVC	UND	3.00	163,656.00	490,968.00		-	2.00	327,312.00		-	2.00	327,312.00
8.08	Acometida hidraulica de distribución en tubo PVC-P 3/4"	ML	27.58	37,513.00	1,034,609.00	14.36	538,687.00	14.36	538,687.00	-	-	14.36	538,687.00
8.09	Suministro e instalación de Tubería Sanitaria 4".	ML	9.01	73,739.00	664,388.00		-	7.00	516,173.00		-	7.00	516,173.00
8.10	Suministro e instalación de lavatraperos prefabricado.	UND	1.00	616,223.00	616,223.00		-	-	-	-	-	0.00	-
8.11	Suministro e instalación de Ducha tipo regadera y teleducha independiente.	UND	2.00	803,497.00	1,606,994.00	2.00	1,606,994.00	2.00	1,606,994.00	-	-	2.00	1,606,994.00
8.12	Suministro e instalación de Tubería Sanitaria de 2"	ML	12.38	49,280.00	610,086.00		-	14.17	698,298.00		-	14.17	698,298.00
8.13	Construcción de Caja de Inspecicón de 0,60x0,60 en concreto.	und	2.00	801,952.00	1,603,904.00		-	1.00	801,952.00		-	1.00	801,952.00
8.14	Suministro e instalación de Tubería Sanitaria PVC pesada 6".	ml	6.00	111,867.00	671,202.00	16.04	1,794,347.00	16.04	1,794,347.00	-	-	16.04	1,794,347.00
8.15	Suministro e instalación de Tubería Hidráulica 1/2"	ml	19.41	58,661.00	1,138,610.00		-	26.21	1,537,505.00	-	-	26.21	1,537,505.00
8.16	Suministro e instalación de Tubería Sanitaria de 3"	ml	4.52	48,429.00	218,899.00	7.21	348,980.00	7.21	348,980.00	-	-	7.21	348,980.00
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**						**1,146,565.00**		**15,974,659.00**		**6,545,363.00**		**22,520,022.00**
NP01	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO DE 0,15X0,22 m, EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, INCLUYE FORMALETA EN MADERA.INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ml		128,100.00			-	36.53	4,679,493.00	-	-	36.53	4,679,493.00
NP02	Punto Sanitario de 3", incluye accesorios PVC	UND		162,055.00		3.00	486,165.00	3.00	486,165.00	-	-	3.00	486,165.00
NP03	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 0,12X0,20 m, EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI. INCLUYE FORMALETA EN MADERA.INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML		127,000.00		5.20	660,400.00	31.20	3,962,400.00	-	-	31.20	3,962,400.00
NP04	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,25X0,25m EN CONCRETO DE 3000 psi, incluye acero de refuerzo en 4 varillas de 1/2", con flejes @0,15 m en varilla de 3/8".	ML		198,165.00			-	34.55	6,846,601.00	-	-	34.55	6,846,601.00
NP05	CONEXIÓN ACOMETIDA BI-FASICA DEL POSTE A LA CAJA DE MEDIDOR, EN CABLE CONCÉNTRICO TRIFILAR 2*8+8,TENSORES PARA CABLE, TUBO IMC 3/4", CAPASETE 3/4", BOQUILLA IMC 3/4", PIN DE CORTE TRIFILAR 2*40, SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, CON VARILLA DE COBRE 2*40 CON SU RESPECTIVO CONECTOR, Y CABLE #8 DE COBRE	ML		420,875.00				-	-	11.96	5,033,962.00	11.96	5,033,962.00
NP06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA CAJA DE MEDIDOR BI-FASICA, CON PIN DE CORTE 2*40 AMP, SISTEMA DE PUESTA A TIERRA QUE INCLUYE VARILLA DE COBRE DE 2.40 MTS CON CONECTOR DE COBRE Y CONDUCTOR CALIBRE #8 AWG.	UND		1,102,683.00				-	-	1.00	1,102,683.00	1.00	1,102,683.00

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO | UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25 | **ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO** | H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

ACTA PARCIAL No.003

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	03 DE OCTUBRE DE 2025
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACION INICIAL :**	26 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE REINICIO:**	24 DE FEBRERO DE 2026
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE TERMINACION FINAL**	26 DE ABRIL DE 2026
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **EL PARÁ**	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA

ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES**			**ACTA PARCIAL No 3**		**ACUMULADO**		**POR COBRAR**	**SUBTOTAL**	**CANTIDAD ACTUALIZADA BALANCE No3**	**VALOR TOTAL BALANCE**
			CANT	**V/UNITARIO**	**V/TOTAL**	**CANT**	**SUBTOTAL**	**CANT**	**SUBTOTAL**				
NP07	RAMPA 10CM EN CONCRETO 3000 PSI, RATONEADA Y ESCOBEADA. INCLUYE EXCAVACIÓN, MALLA ELECTROSOLDADA 4 MM, RELLENO, COMPACTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2		158,418.00				-	-	2.58	408,718.00	2.58	408,718.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS					**364,545,458.00**	**% EJE ACTA 3**	**83,848,522.00**	**ACUMULADO**	**285,088,413.00**	**POR COBRAR**	**79,457,045.00**	**% BALANCE**	**364,545,458.00**
	ADMINISTRACION			**26.24%**	**95,656,728.00**		**22,001,852.00**		**74,807,200.00**		**20,849,529.00**		**95,656,728.00**
	IMPREVISTOS			**1.00%**	**3,645,455.00**		**838,485.00**		**2,850,884.00**		**794,570.00**		**3,645,455.00**
	UTILIDAD			**5.00%**	**18,227,273.00**		**4,192,426.00**		**14,254,421.00**		**3,972,852.00**		**18,227,273.00**
	TOTAL OBRA				**482,074,914.00**	**23.00%**	**110,881,285.00**	**78.20%**	**377,000,918.00**	**21.80%**	**105,073,996.00**	**100.00%**	**482,074,914.00**

$ -

RESUMEN FINANCIERO EL PARÁ		
Valor Inicial Contrato:	$	**482,074,914.00**
Valor Adicional Contrato:	$	-
Valor Final Contrato:	$	**482,074,914.00**
Valor Acta No 001	$	**109,487,351.00**
Valor Acta No 002	$	**156,632,282.00**
Valor Acta No 003	$	**110,881,285.00**
Valor A Girar Acta No 003	$	**110,881,285.00**
Valor Acumulado Actas	$	**377,000,918.00**
% Ejecución Acumulado		**78.20%**
Saldo Por Ejecutar	$	**105,073,996.00**

LA PRESENTE ACTA PARCIAL No 002 FUE REVISADA Y APROBADA POR LA INTERVENTORÍA, POR UN VALOR DE CIENTO DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS **($ 110.881.285,00).** CON UN PORCENTAJE ACUMULADO DE EJECUCIÓN DEL **78,20%.** APROBADO LO ANTERIOR, SE FIRMA A LOS DIECISIETE (17) DIAS DEL MES DE ABRIL DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, CAQUETA.

CONTRATISTA:

JOHAN LOPEZ MENDEZ
1.117.508.596 DE FLORENCIA
Representante Legal
H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS

VoBo DIRECTOR DE OBRA

ING. ADRIANA GALVEZ OSORIO
C.C. 28.550.973 DE IBAGUE
M.P. 70202138618 TLM
H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS

INTERVENTORÍA

JHONATTAN HOYOS MARQUEZ
C.C 1.018.439.570 de Bogotá D.C.
M.P. 25202-260849 CND
Director y Rep. Legal
UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25

ENTIDAD CONTRATANTE

MARIA PAULA RUIZ TRIANA
C.C. 1.075.311.783 de Neiva
GERENTE
ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

VoBo Supervisión ESE/HMHOO

ALEXANDER VILLOTA FAJARDO
Supervisor Contrato CI 001

JOSE RICARDO SANCHEZ GOMEZ
Apoyo a la Supervisión

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNION TEMPORAL

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3		**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**	UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA		**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	PRELIMINARES		**FECHA**	17-abr-26	
ÍTEM	1.11	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMUN ALTURA HASTA 1,00 m	**Unidad Medida**	M3	





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
Caja de inspección	0.80	1.00	0.80	1.00	0.64
Tubería Sanitaria	6.00	0.30	0.30	1.00	0.54
	0.89	0.30	0.30	1.00	0.08
	1.50	0.30	0.30	1.00	0.14
	1.45	0.30	0.30	1.00	0.13
	1.77	0.30	0.30	1.00	0.16
	9.12	0.30	0.30	1.00	0.82
	1.52	0.30	0.30	1.00	0.14
	1.32	0.30	0.30	1.00	0.12
	5.67	0.30	0.30	1.00	0.51
	1.29	0.30	0.30	1.00	0.12
	1.30	0.30	0.30	1.00	0.12
	4.05	0.30	0.30	1.00	0.36
	1.41	0.30	0.30	1.00	0.13
	1.66	0.30	0.30	1.00	0.15
	2.12	0.30	0.30	1.00	0.19
	7.15	0.30	0.30	1.00	0.64
Consultorio ginecología	5.00	0.30	0.30	3.00	1.35
	6.00	0.30	0.30	3.00	1.62
	1.85	0.30	0.30	1.00	0.17
Cuarto de aseo	4.14	0.30	0.30	2.00	0.75

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**8.86**
COBRO ACTA N.1	0.00
ACTA N.2	**7.75**
ACTA N.3	**1.11**
TOTAL CONTRACTUAL	5.48

Elaboró

JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra

Avaló

STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**		UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA	**MUNICIPIO**		FLORENCIA	
CAPITULO	MAMPOSTERÍA Y ACABADOS DE MURO		**FECHA**	17-abr-26	
ÍTEM	3.02	PAÑETE EN MOTERO IMPERMEABILIZADO 1:4	**Unidad Medida**	M2	







Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
CUARTO DISPOSICIÓN	1.50	2.10		1.00	3.15
	1.70	2.10		1.00	3.57
	0.90	2.10		1.00	1.89
	2.10	0.52		1.00	0.55
BAÑO DISCAPACITADO	2.20	3.00		2.00	13.20
	1.72	3.00		2.00	10.32
MURO CONSULTORIO 1	3.99	3.00		2.00	23.94
PUERTA CONSUL 1	0.90	1.00		2.00	1.80
PUERTA BAÑO DISCA.	0.90	1.00		2.00	1.80
PUERTA CONSUL 2	0.90	1.00		2.00	1.80
MURO CONSUL 2-3	0.90	3.00		2.00	5.40
PUERTA CONSUL 3	0.90	1.00		2.00	1.80
CONSULTORIO 4	5.00	3.50		4.00	70.00
	6.00	4.10		2.00	49.20
	6.00	3.50		2.00	42.00
BAÑO CONSULTORIO 4	2.55	3.00		2.00	15.30
MURO INTERMEDIO CONSULT 4	3.46	3.00		2.00	20.76
VENTANA	1.20	0.40		-4.00	-1.92
	1.64	1.60		-2.00	-5.25
	1.50	1.60		-1.00	-2.40
	1.70	0.40		-1.00	-0.68

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**256.23**
COBRO ACTA N.1	**0.00**
ACTA N.2	**50.00**
ACTA N.3	**206.23**
TOTAL CONTRACTUAL	249.96

Elaboró

JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra

Avaló

STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**		UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA	**MUNICIPIO**		FLORENCIA	
CAPITULO	MAMPOSTERÍA Y ACABADOS DE MURO		**FECHA**	17-abr-26	
ÍTEM	3.03	ENCHAPE MURO FORMATO MÍNIMO .25X.30	**Unidad Medida**	M2	





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
BAÑO DISCAPACITADOS	3.92	1.80		2.00	14.11
PUERTA	0.97	2.00		-1.00	- 1.94
VENTANA BAÑO	0.80	0.40		-1.00	- 0.32
MESÓN CONSUL. 02	2.00	0.90		1.00	1.80
MESÓN CONSUL. 01	2.00	0.90		1.00	1.80
MESÓN CONSUL. 04	1.60	0.70		1.00	1.12
BAÑO TM GINECO	2.00	1.80		1.00	3.60
	1.38	1.80		1.00	2.48
	1.05	1.80		1.00	1.89
VENTANA BAÑO GINECO	1.20	0.40		-1.00	- 0.48
LAVAMANOS CONSUL.3	2.00	0.90		1.00	1.80
CUARTO DISPO.	1.70	2.40		0.00	-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**25.87**
COBRO ACTA N.1	0.00
ACTA N.2	**14.00**
ACTA N.3	**11.87**
TOTAL CONTRACTUAL	74.31

Elaboró

JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra

Avaló

STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**	UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	MAMPOSTERÍA Y ACABADOS DE MURO	**FECHA**	17-abr-26	
ÍTEM	3.04	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS TIPO I	**Unidad Medida**	M2







Localización	Dimensiones LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANT	Medida Total
CUARTO DISPOSICION	1.74	2.50		2.00	8.70
	1.93	2.50		1.00	4.83
	1.74	0.42		1.00	0.37
	1.90	2.90		1.00	2.76
VENTANAS CUARTO DISPO	1.20	0.40		- 1.00	- 0.48
BODEGA	2.85	2.60		2.00	14.82
	2.01	2.60		2.00	10.45
PUERTA BODEGA	0.90	1.89		- 1.00	- 1.70
BAÑO DISCAPACITADOS	3.89	0.80		2.00	6.22
PUERTA BAÑO DISCAPACITADOS	1.94	2.00		- 1.00	- 3.88
SALA DE ESPERA	0.30	2.40		1.00	0.72
	1.00	2.60		1.00	2.60
	1.27	2.60		1.00	3.30
	2.13	2.60		1.00	5.54
	0.35	2.60		1.00	0.91
	1.65	2.60		1.00	4.29
	3.58	2.60		1.00	9.31
	1.62	1.00		1.00	1.62
	1.66	1.00		1.00	1.66
	1.67	1.00		1.00	1.67
	0.12	2.60		3.00	0.94
	0.89	2.60		2.00	4.63

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**79.26**
COBRO ACTA N.1	0.00
ACTA N.2	**50.00**
ACTA N.3	**29.26**
TOTAL CONTRACTUAL	**117.26**

Elaboró

JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra

Avaló

STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025	UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA	MUNICIPIO	FLORENCIA	
CAPITULO	MAMPOSTERÍA Y ACABADOS DE MURO	FECHA	17-abr-26	
ÍTEM	3.05	ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES TIPO KORAZA	Unidad Medida	M2







Localización	Dimensiones LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANT	Medida Total
CUARTO DISPOSICION	2.03	2.48		1.00	5.03
	1.84	2.48		2.00	9.13
	1.84	0.42		2.00	0.77
PUERTA CUARTO DISP	0.80	2.10		-1.00	- 1.68
VENTANAS C. DISPO.	1.20	0.40		-1.00	- 0.48
FACHADA POSTERIOR	10.04	2.60		1.00	26.10
VENTANAS FP	1.60	1.60		-5.00	- 12.80
FACHADA LAT	9.05	2.45		2.00	44.35
	1.55	4.55		4.00	28.21
	0.48	0.40		8.00	1.54
VENTANA FACHADA LAT IZQ	1.60	0.50		-1.00	- 0.80
FACHADA FRONTAL	8.42	2.80		1.00	23.58
VENTANAS F FRONTAL	1.60	1.60		-4.00	- 10.24
FACHADA FRONTAL CONSUL 4	6.00	2.80		1.00	16.80
VENTANAS F FRONTAL	1.60	1.60		-1.00	- 2.56
	1.20	1.60		-1.00	- 1.92
FACHADA POTERIOR CONSUL 4	2.89	4.10		1.00	11.85
	1.10	4.10		1.00	4.51
	2.03	1.20		1.00	2.44
VENTANA FACHADA POST	1.20	1.60		-1.00	- 1.92
FACHADA LAT CONSUL 4	2.45	4.00		2.00	19.60
	1.55	4.00		2.00	6.20
	0.55	0.40		6.00	0.66
VENTANAS FACHAADA LAT	1.10	1.60		-2.00	- 3.52
	1.20	0.40		-1.00	- 0.48
PUERTA TM GINECO	1.10	2.42		-1.00	- 2.66

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	161.70
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	100.00
ACTA N.3	61.70
TOTAL CONTRACTUAL	193.23

Elaboró
JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra

Avaló
STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**		UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA	**MUNICIPIO**		FLORENCIA	
CAPITULO	MAMPOSTERÍA Y ACABADOS DE MUROS		**FECHA**	17-abr-26	
ÍTEM	3.06	ESCTUCO Y PINTURA DE ALTA ASEPSIA 3 MANOS	**Unidad Medida**	M2	






Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
CONSULTORIO 3	3.87	2.60		2.00	20.12
	2.74	2.60		2.00	14.25
PUERTA CONSUL 3	0.89	1.98		- 1.00	- 1.76
VENTANA CONSUL 3	1.60	1.60		- 1.00	- 2.56
CONSULTORIO 2	3.36	2.60		2.00	17.47
	3.89	2.60		2.00	20.23
PUERTA CONSUL 2	0.95	1.98		- 2.00	- 3.76
VENTANA CONSUL 2	1.60	1.60		- 2.00	- 5.12
CONSULTORIO 1	3.38	2.60		2.00	17.58
	3.89	2.60		2.00	20.23
PUERTA CONSUL 1	0.95	1.98		- 1.00	- 1.88
VENTANAS CONSUL 1	1.60	1.60		- 2.00	- 5.12
CONSULTORIO 4	2.73	2.60		2.00	14.20
	5.70	2.60		2.00	29.64
PUERTA CONSUL 4	0.90	2.50		- 1.00	- 2.25
VENTANAS CONSUL 4	6.88	1.50		- 1.00	- 10.32
TM GINECOLOGIA	1.28	2.60		1.00	3.33
	2.80	2.60		3.00	21.84
	3.75	2.60		3.00	29.25
	1.53	2.60		1.00	3.98
	2.67	2.60		1.00	6.94
	1.95	2.60		1.00	5.07
PUERTA TM GINECO	0.98	2.00		- 1.00	- 1.96
VENTANA TM GINECO	1.60	1.50		- 1.00	- 2.40
ALMACENAMIENTO	3.56	2.60		2.00	18.51
	1.62	1.00		1.00	1.62
	0.62	2.60		1.00	1.61
VENTANAS ALMACE	1.60	1.60		- 1.00	- 2.56

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**208.73**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	
ACTA N.3	**208.73**
TOTAL ACTIVIDAD CONTRACTUAL	**123.83**

Elaboró
JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra

Avaló
STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**	UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	CUBIERTAS Y CIELO RASOS	**FECHA**	17-abr-26	
ÍTEM	4.01	ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN PERFIL REF: (PAG_C 120X60_ 1,9 mm) CALIBRE 14, PINTADO CON ANTICORROSIVO O WASH PRIMER. INCLUYE TENSOR EN L/2 ENTRE APOYOS, EN VARILLA DE 3/8"	**Unidad Medida**	ml







Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
PUESTO DE SALUD	8.71			10.00	87.10
	12.00			20.00	240.00
	3.03			4.00	12.12
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**339.22**
COBRO ACTA N.1	240.00
ACTA N.2	**0.00**
ACTA N.3	**99.22**
TOTAL CONTRACTUAL	466.00

Elaboró

JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra

Avaló

STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**	UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	CUBIERTAS Y CIELO RASOS	**FECHA**	17-abr-26	
ÍTEM	4.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA EN LAMINA MASTER 1000 CALIBRE 28 PREPINTADA, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**Unidad Medida**	m2





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
					-
PUESTO SALUD	12.00		5.29	1.00	63.48
	12.00		5.62	1.00	67.44
	7.90		6.00	2.00	94.80
	2.90		2.35	3.00	20.45
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**246.17**
COBRO ACTA N.1	129.00
ACTA N.2	**80.00**
ACTA N.3	**37.17**
TOTAL CONTRACTUAL	**219.03**

Elaboró

JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra

Avaló

STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÀ			
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**	UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	CUBIERTAS Y CIELO RASOS	**FECHA**	17-abr-26	
ÍTEM	4.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 CON DESARROLLO DE 0,60 M INCLUYE GANCHO DE FIJACION, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	**Unidad Medida**	ml





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
CUARTO DISPOSICION	3.00			1.00	3.00
MODULO 1	12.00			2.00	24.00
MODULO 2	8.71			1.00	8.71
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**35.71**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	
ACTA N.3	**35.71**
TOTAL ACTIVIDAD	**48.06**

Elaboró

JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra

Avaló

STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**		UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA	**MUNICIPIO**		FLORENCIA	
CAPITULO	CUBIERTAS Y CIELO RASOS		**FECHA**	17-abr-26	
ÍTEM	4.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN 3"	**Unidad Medida**	ml	







Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
					-
MMODULO 1	4.00			4.00	16.00
MODULO 2	4.00			1.00	4.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**20.00**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	
ACTA N.3	20.00
TOTAL ACTIVIDAD	**30.00**

Elaboró

JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra

Avaló

STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**		UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA	**MUNICIPIO**		FLORENCIA	
CAPITULO	CUBIERTAS Y CIELO RASOS		**FECHA**	17-abr-26	
ÍTEM	4.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC	**Unidad Medida**	m2	





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
MODULO 1	11.00		10.50	1.00	115.50
MODULO 2	5.00		7.20	1.00	36.00
CUARTO DE RESIDUOS	3.00		2.00	1.00	6.00

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**157.50**
COBRO ACTA N.1	0.00
ACTA N.2	**120.00**
ACTA N.3	**37.50**
TOTAL CONTRACTUAL	**182.12**

Elaboró

JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra

Arquitecta

Avaló

STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**	UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	PISOS Y ENCHAPES	**FECHA**	17-abr-26	
ÍTEM	5.02	BALDOSA CERAMICA PARA PISOS	**Unidad Medida**	m2









Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
CUARTO DISPOSICIÓN	1.80		1.80	1.00	3.24
BODEGA	2.01		2.85	1.00	5.73
BAÑO DISCAPACITADOS	1.71		2.18	1.00	3.73
CONSULTORIO 1	3.89		3.38	1.00	13.15
CONSULTORIO 2	3.89		3.36	1.00	13.07
CONSULTORIO 3	3.89		2.74	1.00	10.66
ALMACENAMIENTO	1.62		3.56	1.00	5.77
SALA DE ESPERA	6.08		2.25	1.00	13.68
	3.46		1.20	1.00	4.15
CONSULTORIO 4	3.75		2.80	1.00	10.50
TM GINECOLOGICAS	3.75		2.68	1.00	10.05

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**93.72**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	**80.00**
ACTA N.3	**13.72**
TOTAL CONTRACTUAL	137.24

Elaboró

JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra

Avaló

STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**	UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	PISOS Y ENCHAPES	**FECHA**	17-abr-26	
ÍTEM	5.03	GUARDAESCOBA EN CERAMICA	**Unidad Medida**	ml







Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
CUARTO DISÓSICIÓN	5.90			0.00	-
BODEGA	7.70			0.00	-
BAÑO DISCAPACITADOS	12.75			0.00	-
CONSULTORIO 1	13.10			0.00	-
CONSULTORIO 2	12.64			0.00	-
CONSULTORIO 3	9.40			0.00	-
ALMACENAMIENTO	12.86			0.00	-
SALA DE ESPERA	35.06			0.00	-
	15.10			0.00	-
CONSULTORIO 4	14.34			1.00	14.34
TM GINECOLOGICAS	15.08			1.00	15.08
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**29.42**
COBRO ACTA N.1	0.00
ACTA N.2	**0.00**
ACTA N.3	**29.42**
TOTAL CONTRACTUAL	61.28

Elaboró

JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra

Avaló

STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNION TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**	UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	CARPINTERIA METALICA	**FECHA**	17-abr-26	
ÍTEM	6.01	Puerta Metalica entablerado en lamina galvanizada Calibre 20, Con cerradura. Incluye Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. Tragaluz en Vidrio 4 mm	**Unidad Medida**	M2





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
INGRESO CONSUL 4	1.10	2.42			2.66
CUARTO DE RESIDUOS	0.80	2.10			1.68
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**4.34**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	
ACTA N.3	4.34
TOTAL ACTIVIDAD	**4.20**

Elaboró

JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra

Avaló

STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**	UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	CARPINTERIA METALICA	**FECHA**	17-abr-26	
ÍTEM	6.02	Suministro e Instalación de Ventana Lamina Galvanizada Calibre 20. Corredera o Fija, Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. Incluye Vidrio 4 mm, pelicula de seguridad acabado sandblasting.	**Unidad Medida**	M2







Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
CUARTO DISPOSICION	1.20	0.40		1.00	0.48
BODEGA	1.60	1.60		1.00	2.56
BAÑO DISCAPACITADOS	1.60	0.50		1.00	0.80
CONSULTORIO 3	1.60	1.60		1.00	2.56
CONSULTORIO 2	1.60	1.60		2.00	5.12
CONSULTORIO 1	1.60	1.60		2.00	5.12
ALMACENAMIENTO	1.60	1.60		1.00	2.56
SALA DE ESPERA	1.60	1.60		2.00	5.12
CONSULTORIO 4	1.60	1.60		3.00	7.68
	1.20	1.60		2.00	3.84
	1.10	1.60		2.00	3.52
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**39.36**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	
ACTA N.3	**10.00**
TOTAL ACTIVIDAD	**20.99**

Elaboró

JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra

Avaló

STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNION TEMPORAL INTERMALVINAS 25

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**	UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	CARPINTERIA METALICA	**FECHA**	17-abr-26	
ÍTEM	6.03	Portón Metalico entablerado en lamina galvanizada Calibre 20, Concerradurad Doble Macho. Incluye Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. 1,40mX2,40m, incluye trgaluz superior en vidrio 4mm	**Unidad Medida**	UND





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
INGRESO PRINCIPAL				1.00	1.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**1.00**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	
ACTA N.3	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	**1.00**

Elaboró


JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra

Avaló

STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**	UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS	**FECHA**	17-abr-26	
ÍTEM	7.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 220V (INCLUYE ACCEOSRIOS, CABLE AWG No 10 POR 2 LINEAS, ALAMBRE AWG No 14 POR 1 LINEA, Y TUBERIA PVC).	**Unidad Medida**	UND

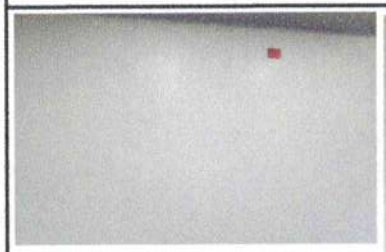





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
AIRES ACONDICIONADOS				5.00	5.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**5.00**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	
ACTA N.3	5.00
TOTAL ACTIVIDAD	**5.00**

Elaboró

JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra

Avaló

STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNION TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**	UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS	**FECHA**	17-abr-26	
ÍTEM	7.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA MANUAL PARA PLANTA ELECTRICA, INCLUYE TOMA 3x50 CODELCA, CAJA 2400, CAJA METALICA DE 25X25 X15, Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	**Unidad Medida**	UND





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
MODULO 1				1.00	1.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**1.00**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	
ACTA N.3	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	**1.00**

Elaboró

JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra

Avaló

STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**	UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS	**FECHA**	17-abr-26	
ÍTEM	7.08	ACOMETIDA PARA CONEXIÓN PLANTA ELECTRICA, DESDE TABLERO DISTRIBUCIÓN HASTA TRANSFERENCIA MANUAL. INCLUYE CABLE No 8 AWG POR 6 LINEAS.	**Unidad Medida**	ML





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
CAJA CENTRAL	5.00			1.00	5.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**5.00**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	
ACTA N.3	5.00
TOTAL ACTIVIDAD	**5.00**

Elaboró

JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra

Avaló

STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO


UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**	UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS	**FECHA**	17-abr-26	
ÍTEM	8.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO BLANCO DE PUSH INCLUYE GRIFERIA	**Unidad Medida**	UND



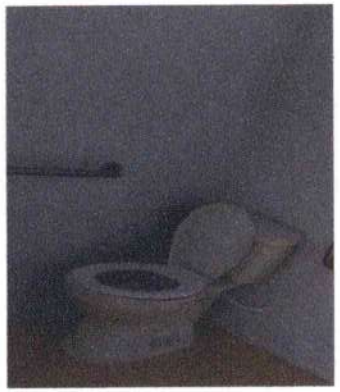

Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
BAÑOS				2.00	2.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**2.00**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	
ACTA N.3	**2.00**
TOTAL ACTIVIDAD	**3.00**

Elaboró

JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra

Avaló

STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNION TEMPORAL

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**	UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS	**FECHA**	17-abr-26	
ÍTEM	8.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	**Unidad Medida**	UND







Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
BAÑO DISCAPA.				1.00	1.00
CONSULTORIO 3				1.00	1.00
CONSULTORIO 2				1.00	1.00
BAÑO TM GINECO				1.00	1.00
CONSULTORIO 1				1.00	1.00
CONSULTORIO 4				1.00	1.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**6.00**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	
ACTA N.3	**6.00**
TOTAL ACTIVIDAD	**7.00**

Elaboró

JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra

Avaló

STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNION TEMPORAL

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**	UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS	**FECHA**	17-abr-26	
ÍTEM	8.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE SEGURIDAD PARA PERSONA DISCAPACITADA EN ACERO INOXIDABLE.	**Unidad Medida**	UND





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
BAÑO DISCAPA.				1.00	1.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**1.00**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	
ACTA N.3	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	**1.00**

Elaboró

JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra

Avaló Stephanie M

STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNION TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**	UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS	**FECHA**	17-abr-26	
ÍTEM	8.08	Acometida hidraulica de distribución en tubo PVC-P 3/4"	**Unidad Medida**	ml





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
TANQUE-MODULO 1	2.81			1.00	2.81
MODULO 1-2	5.00			1.00	5.00
MODULO 2	3.00			1.00	3.00
ELEVACIÓN DEL TANQUE	3.55			1.00	3.55
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**14.36**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	
ACTA N.3	**14.36**
TOTAL ACTIVIDAD	**27.58**

Elaboró

JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra

Avaló

STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNION TEMPORAL

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**		UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA	**MUNICIPIO**		FLORENCIA	
CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS		**FECHA**	17-abr-26	
ÍTEM	8.11	Suministro e instalación de Ducha tip regadera y teleducha independiente	**Unidad Medida**	UND	





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
BAÑO DISCAPACITADOS				1.00	1.00
BAÑO TM GINECO				1.00	1.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**2.00**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	
ACTA N.3	**2.00**
TOTAL ACTIVIDAD	**2.00**

Elaboró

JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra

Avaló

STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**	UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS	**FECHA**	17-abr-26	
ÍTEM	8.14	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria 6".	**Unidad Medida**	ML





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
CAJA DE INSPECICÓN	6.00			1.00	6.00
RED PRINCIPAL	9.12			1.00	9.12
	0.92			1.00	0.92
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**16.04**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	
ACTA N.3	16.04
TOTAL ACTIVIDAD	**6.00**

Elaboró

JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra

Avaló


STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO — UNIÓN TEMPORAL — H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**	UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS	**FECHA**	17-abr-26	
ÍTEM	8.16	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria de 3"	**Unidad Medida**	ML



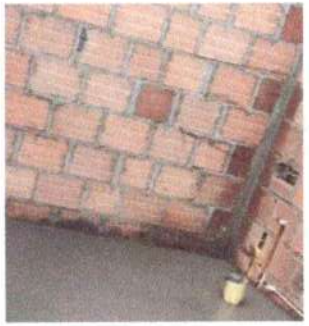

Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
BAÑO DISCAPACITADOS	1.38			1.00	1.38
RED A COLSULTORIOS	1.32			1.00	1.32
RED A COLSULTORIOS	1.50			1.00	1.50
DUCHA BAÑO TM GINECO	1.50			1.00	1.50
SIFON BAÑO TM	1.50			1.00	1.50
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**7.21**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	
ACTA N.3	**7.21**
TOTAL ACTIVIDAD	**4.52**

Elaboró
JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra

Avaló
STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO


UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**	UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS	**FECHA**	17-abr-26	
ÍTEM	NP02	Punto Sanitario de 3", incluye accesorios PVC	**Unidad Medida**	UND



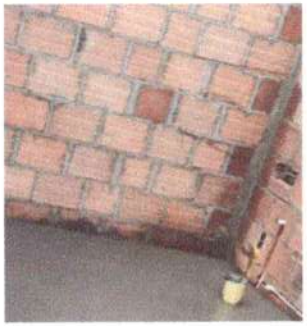

Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
DUCHA BD				1.00	1.00
DUCHA TM GINECO				1.00	1.00
SIFON TM GINECO				1.00	1.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**3.00**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	
ACTA N.3	3.00
TOTAL ACTIVIDAD	**3.00**

Elaboró

JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra

Avaló

STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**	UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	CONCRETOS	**FECHA**	17-abr-26	
ÍTEM	NP03	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 0,12X0,20 m, EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, INCLUYE FORMALETA EN MADERA.INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	**Unidad Medida**	UND





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
CONSULTORIO N° 4 Y GINECOLOGÍA	27.00			1.00	27.00
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS	2.10			2.00	4.20
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**31.20**
COBRO ACTA N.1	0.00
ACTA N.2	**26.00**
ACTA N.3	**5.20**
TOTAL CONTRACTUAL	0.00

Elaboró

JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra

Avaló Stephanie

STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25

ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

ACTA PARCIAL N003

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	NIT:	901.372.267-3		
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	C.C.:	1.117.508.596 DE FLORENCIA		
PLAZO:	TRES (3) MESES	VALOR DEL CONTRATO:	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	NIT:	901.994.584-2	CONTRATO DE INTERVENTORIA N.:	CI 001 del 03 de Octubre de 2025
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	26 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	FECHA DE REINICIO:	24 DE FEBRERO DE 2026	ACTA PARCIAL No.3	17 DE ABRIL DE 2026
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	FECHA DE TERMINACION FINAL	26 DE ABRIL DE 2026		
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **LA ESPERANZA**	MUNICIPIO:	FLORENCIA		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDADES			VALORES		ACTA PARCIAL No 3		ACUMULADO		POR COBRAR		CANTIDAD ACTUALIZADA BALANCE FINAL	VALOR TOTAL ACTUALIZADO
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	+/-	MAY (+)	MEN (-)	MAY (+)	MEN (-)	CANT	SUBTOTAL	CANT	SUBTOTAL	CANT	SUBTOTAL		
1	**PRELIMINARES**				**33,995,622.00**				**3,754,643.00**	**- 3,422,818.00**		-		**34,327,446.00**				**34,327,445.00**
1.01	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS (LAVAMANOS, INODOROS, ORINALES).	UND	5.00	32,866.00	164,330.00	-	-	-	-	-		-	5.00	164,330.00	-	-	5.00	164,330.00
1.02	DESMONTE Y RETIRO DE CUBIIERTA EXISTENTE. INCLUYE TEJA, ESTRUCTURA, TEMPLETES, ANCLAJES, CABALLETES, LIMAOYAS Y LIMATESAS).	M2	255.85	62,219.00	15,918,731.00	-	-	- 51.63	-	- 3,212,367.00		-	204.22	12,706,364.18	-	-	204.22	12,706,364.00
1.03	DEMOLICIÓN DE PISO ESMALTADO, CERAMICA, BALDOSA CEMENTO O MORTERO NIVELACIÓN. INCLUYE RETIRO	M2	154.83	33,225.00	5,144,227.00	+	43.06	-	1,430,689.00	-		-	197.89	6,574,895.25	-	-	197.89	6,574,895.00
1.04	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PLACA EN CONCRETO, ANDENES EN CONCRETO, RAMPAS EN CONCRETO. (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO).	M2	154.83	38,190.00	5,912,958.00	+	49.43	-	1,887,732.00	-		-	204.26	7,800,689.40	-	-	204.26	7,800,689.00
1.05	DESMONTE DE PUERTA Y VENTANAS (INCLUYE MARCOS, VIDRIOS, NAVES).	M2	31.74	30,009.00	952,486.00	+	0.55	-	16,505.00	-		-	32.29	968,990.61	-	-	32.29	968,991.00
1.06	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO).	M2	48.76	28,401.00	1,384,833.00	-	-	- 7.41	-	- 210,451.00		-	41.35	1,174,381.35	-	-	41.35	1,174,381.00
1.07	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA, CON Y SIN PAÑETE, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO	M2	54.84	33,225.00	1,822,059.00	+	2.66	-	88,378.00	-		-	57.50	1,910,437.50	-	-	57.50	1,910,438.00
1.08	DEMOLICIÓN DE MESONES EN CONCRETO, LAVADEROS EN CONCRETO, POCETAS EN CONCRETO. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO.	und	2.00	54,836.00	109,672.00	+	1.00	-	54,836.00	-		-	3.00	164,508.00	-	-	3.00	164,508.00
1.09	DEMONTE, RETIRO Y DESHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA INTERNA EXISTENTE	m2	90.00	23,044.00	2,073,960.00	-	-	-	-	-		-	90.00	2,073,960.00	-	-	90.00	2,073,960.00
1.10	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMUN ALTURA HASTA 1.00 m.	M3	4.53	77,181.00	349,630.00	+	2.61	-	201,442.00	-		-	7.14	551,072.34	-	-	7.14	551,072.00
1.11	RELLENO MATERIAL PREEXCAVADO, INCLUYE COMPATACIÓN MECANICA.	M3	4.53	35,924.00	162,736.00	+	2.09	-	75,081.00	-		-	6.62	237,816.88	-	-	6.62	237,817.00
2	**CONCRETOS**				**32,517,211.00**				**5,629,330.00**	**- 623,469.00**		**1,746,590.00**		**37,523,852.00**	-	-		**37,523,852.00**
2.01	PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO 3000PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 5 mm. ESPESOR 10 cm	M2	159.06	154,372.00	24,554,410.00	+	27.28	-	4,211,268.00	-	- 9.52	- 1,469,621.00	186.34	28,765,678.48	-	-	186.34	28,765,678.00
2.02	ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 1,25X1,25X0,35 m NO INCLUYE REFUERZO.	UND	1.00	786,957.00	786,957.00	-	-	-	-	-	-	-	1.00	786,957.00	-	-	1.00	786,957.00
2.03	COLUMNA DE 0,25X0,25 m, EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, INCLUYE FORMALETA EN MADERA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	4.00	218,334.00	873,336.00	-	-	-	-	-	-	-	4.00	873,336.00	-	-	4.00	873,336.00
2.04	LOSA AEREA DE 0,10m EN CONCRETO 3000psi REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM 15X15. INCLUYE FORMALETA.	M2	1.56	311,790.00	486,392.00	-	-	- 0.00	-	- 779.00	-	-	1.56	486,392.40	-	-	1.56	486,392.00

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25

ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

ACTA PARCIAL N003

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3		
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA		
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,686,044,345.00)		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N.:**	CI 001 del 03 de Octubre de 2025
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE REINICIO:**	24 DE FEBRERO DE 2026	**ACTA PARCIAL No.3**	17 DE ABRIL DE 2026
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE TERMINACION FINAL**	26 DE ABRIL DE 2026		
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **LA ESPERANZA**	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDADES			VALORES		ACTA PARCIAL No 3		ACUMULADO		POR COBRAR		CANTIDAD ACTUALIZADA BALANCE FINAL	VALOR TOTAL ACTUALIZADO
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	+/-	MAY (+)	MEN (-)	MAY (+)	MEN (-)	CANT	SUBTOTAL	CANT	SUBTOTAL	CANT	SUBTOTAL		
2.05	ACERO DE REFUERZO CORRUGADO FY420MPA, FIGURADO E INSTALADO, INCLUYE ALAMBRE PARA AMARRE, BARRAS LONGITUDINALES Y ESTRIBOS.	KG	68.16	19,548.00	1,332,255.00	+	72.55	-	1,418,062.00	-		-	140.71	2,750,317.66	-	-	140.71	2,750,318.00
2.06	VIGA AEREA DE 0.25X0.25 m EN CONCRETO DE 3000 PSI. INCLUYE FORMALETA, NO INCLUYE REFUERZO.	ML	2.50	257,984.00	644,960.00	-	-	-	-	-		-	2.50	644,960.00	-	-	2.50	644,960.00
2.07	ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 4 mm, Espesor 10 cm. Escobeado y Ratoneado	M2	25.03	153,372.00	3,838,901.00	-	-	- 4.06	-	- 622,690.00	20.97	3,216,211.00	20.97	3,216,210.84	-	-	20.97	3,216,211.00
3	**MAMPOSTERÍA Y ACABADOS DE MUROS**				**34,850,355.00**				**7,601,033.00**	**- 6,414,654.00**	**-**	**14,285,325.00**	**-**	**36,036,733.47**	**-**	**-**		**36,036,734.00**
3.01	MURO EN BLOQUE No 4	M2	36.42	75,960.00	2,766,463.00	+	42.16	-	3,202,474.00	-		-	78.58	5,968,936.80	-	-	78.58	5,968,937.00
3.02	PAÑETE EN MOTERO IMPERMEABILIZADO 1:4	M2	72.84	49,975.00	3,640,179.00	+	5.74	-	286,857.00	-		-	78.58	3,927,035.50	-	-	78.58	3,927,036.00
3.03	ENCHAPE MURO FORMATO MÍNIMO .25X.30	M2	59.02	129,190.00	7,624,794.00	-	-	- 20.63	-	- 2,665,190.00	38.39	4,959,604.00	38.39	4,959,604.10	-	-	38.39	4,959,604.00
3.04	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS TIPO I	M2	61.49	36,157.00	2,223,294.00	+	96.19	-	3,477,942.00	-		-	157.68	5,701,235.76	-	-	157.68	5,701,236.00
3.05	ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES TIPO KORAZA	M2	185.24	41,028.00	7,600,027.00	-	-	- 19.27	-	- 790,610.00	15.97	655,217.00	165.97	6,809,417.16	-	-	165.97	6,809,417.00
3.06	ESTUCO Y PINTURA DE ALTA ASEPSIA 3 MANOS	M2	188.06	42,735.00	8,036,744.00	+	14.83	-	633,760.00	-	202.89	8,670,504.00	202.89	8,670,504.15	-	-	202.89	8,670,504.00
3.07	ESTUCO Y PINTURA TIPO ESMALTE SOBRE MUROS	M2	69.20	42,758.00	2,958,854.00	-	-	- 69.20	-	- 2,958,854.00		-	-	-	-	-	0.00	-
4	**CUBIERTAS Y CIELO RASOS**				**138,342,058.00**				**205,099.00**	**- 51,432,841.00**		**3,717,062.00**		**87,114,315.66**		**-**	-	**87,114,316.00**
4.01	ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN PERFIL REF: (PAG_C 120X60_ 2.00 mm) CALIBRE 14, PINTADO CON ANTICORROSIVO O WASH PRIMER. INCLUYE ANCLAJES EN VARILLA EN MUROS CULATAS.	ML	483.12	138,830.00	67,071,550.00	-	-	- 243.18	-	- 33,760,679.00		-	239.94	33,310,870.20	-	-	239.94	33,310,870.00
4.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA EN LAMINA MASTER 1000 CALIBRE 28 PREPINTADA, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	M2	281.44	135,775.00	38,212,516.00	-	-	- 63.54	-	- 8,627,144.00		-	217.90	29,585,372.50	-	-	217.90	29,585,373.00
4.03	CABALLETE EN LAMINA METALICA PINTADA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	20.13	67,723.00	1,363,264.00	+	0.01	-	677.00	-		-	20.14	1,363,941.22	-	-	20.14	1,363,941.00
4.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 CON DESARROLLO DE 0,60 M INCLUYE GANCHO DE FIJACION, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	ML	40.26	183,898.00	7,403,733.00	-	-	- 40.26	-	- 7,403,733.00		-	-	-	-	-	0.00	-
4.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN 3"	ML	20.80	39,312.00	817,690.00	+	5.20	-	204,422.00	-	26.00	1,022,112.00	26.00	1,022,112.00	-	-	26.00	1,022,112.00

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL
INTER MALVINAS 25

ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

ACTA PARCIAL N003

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	NIT:	901.372.267-3		
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	C.C.:	1.117.508.596 DE FLORENCIA		
PLAZO:	TRES (3) MESES	VALOR DEL CONTRATO:	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	NIT:	901.994.584-2	CONTRATO DE INTERVENTORIA N.:	CI 001 del 03 de Octubre de 2025
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	26 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	FECHA DE REINICIO:	24 DE FEBRERO DE 2026	ACTA PARCIAL No.3	17 DE ABRIL DE 2026
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	FECHA DE TERMINACION FINAL	26 DE ABRIL DE 2026		
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **LA ESPERANZA**	MUNICIPIO:	FLORENCIA		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDADES			VALORES		ACTA PARCIAL No 3		ACUMULADO		POR COBRAR		CANTIDAD ACTUALIZADA BALANCE FINAL	VALOR TOTAL ACTUALIZADO
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	+/-	MAY (+)	MEN (-)	MAY (+)	MEN (-)	CANT	SUBTOTAL	CANT	SUBTOTAL	CANT	SUBTOTAL		
4.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS DE ANCLAJE, UNIONES, RINCONERAS.	M2	208.52	112,571.00	23,473,305.00	-	-	- 14.58	-	- 1,641,285.00	23.94	2,694,950.00	193.94	21,832,019.74	-	-	193.94	21,832,020.00
5	**PISOS Y ENCHAPES**				**35,438,333.00**				**9,421,086.00**	**- 1,478,178.00**		**5,215,467.00**		**43,381,240.28**		**-**		**43,381,240.00**
5.01	NIVELACION PARA PISO E=0,05 a 0,07 m	M2	154.76	69,323.00	10,728,427.00	+	24.60	-	1,705,346.00	-	-	-	179.36	12,433,773.28	-	-	179.36	12,433,773.00
5.02	BALDOSA CERAMICA PARA PISOS FORMATO CUADRADO MINIMO .45X.45m TRAFICO COMERCIAL, PRIMERA CALIDAD.	M2	154.76	128,660.00	19,911,422.00	+	59.97	-	7,715,740.00	-	14.73	1,895,162.00	214.73	27,627,161.80	-	-	214.73	27,627,162.00
5.03	GUARDAESCOBA EN CERAMICA	ML	115.76	41,452.00	4,798,484.00	-	-	- 35.66	-	- 1,478,178.00	80.10	3,320,305.00	80.10	3,320,305.20	-	-	80.10	3,320,305.00
6	**CARPINTERIA METALICA**				**36,189,373.00**				**13,970,101.00**	**- 4,383,280.00**		**12,103,891.00**		**45,776,221.00**		**-**		**45,776,221.00**
6.01	6 Puertas Metalica entablerado en lamina galvanizada Calibre 20, Con cerradura. Incluye Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. Tragaluz, y marcos.	M2	7.35	1,035,624.00	7,611,836.00	+	2.25	-	2,330,154.00	-	- 0.94	- 973,487.00	9.60	9,941,990.40	-	-	9.60	9,941,990.00
6.02	Suministro e Instalación de 13 Ventanas Lamina Galvanizada Calibre 20. Corredera o Fija, Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. Incluye Vidrio 4 mm, película de seguridad acabado sandblasting y marco.	M2	20.99	1,293,003.00	27,140,133.00	-	-	- 3.39	-	- 4,383,280.00		-	17.60	22,756,852.80	-	-	17.60	22,756,853.00
6.03	1 Puerta En Marco y contramarco de Aluminio Blanco, con vidrio 5mm + pelicula tipo sandblasting, Con cerradura tipo bola. Tragaluz en Vidrio.	M2	1.33	1,080,775.00	1,437,404.00	+	10.77	-	11,639,947.00	-	12.10	13,077,378.00	12.10	13,077,377.50	-	-	12.10	13,077,378.00
7	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**28,542,606.00**				**4,232,578.00**	**- 6,706,290.00**		**20,351,651.00**		**26,069,094.00**		**-**		**26,069,094.00**
7.01	Conexión Acometida Parcial del Poste a la Caja de Medidor, en Cable Monofasico Encauchetado No 8, Cable No 8, Tensores para Cable, Tubo IMC 3/4", Capasete 3/4", Boquilla IMC 3/4".	ML	30.00	156,698.00	4,700,940.00	-	-	- 30.00	-	- 4,700,940.00		-	-	-	-	-	0.00	-
7.02	Suministro e instalación de Caja Medidor Monofasica, con pin de corte 1x40 amp, incluye instalación del sistema de Puesta a Tierra, incluye conector de cobre, cable AWG No 8 por 3 lineas, y Varilla de cobre 2,40m.	UND	1.00	1,048,233.00	1,048,233.00	-	-	- 1.00	-	- 1,048,233.00		-	-	-	-	-	0.00	-
7.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE 12 CTOS (INCLUYE: CAJA DE BREAKERS BIFASICA, BREAKERS 1X20 AMP, 1X30 AMP)	UND	1.00	814,573.00	814,573.00	-	-	-	-	-		-	1.00	814,573.00	-	-	1.00	814,573.00

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25

ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

ACTA PARCIAL N003

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	NIT:	901.372.267-3		
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	C.C.:	1.117.508.596 DE FLORENCIA		
PLAZO:	TRES (3) MESES	VALOR DEL CONTRATO:	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	NIT:	901.994.584-2	CONTRATO DE INTERVENTORIA N.:	CI 001 del 03 de Octubre de 2025
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	26 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	FECHA DE REINICIO:	24 DE FEBRERO DE 2026	ACTA PARCIAL No.3	17 DE ABRIL DE 2026
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	FECHA DE TERMINACION FINAL	26 DE ABRIL DE 2026		
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA	MUNICIPIO:	FLORENCIA		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDADES			VALORES		ACTA PARCIAL No 3		ACUMULADO		POR COBRAR		CANTIDAD ACTUALIZADA BALANCE FINAL	VALOR TOTAL ACTUALIZADO
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	+/-	MAY (+)	MEN (-)	MAY (+)	MEN (-)	CANT	SUBTOTAL	CANT	SUBTOTAL	CANT	SUBTOTAL		
7.04	Suministro e Instalación de Punto Electrico de iluminación. Incluye Luminaria Led de 18w. Redonda o Cuadrada o similar, de empotrar o sobreponer, según aplique. Incluye interruptor, y Alambre No 14 Awg por 2 Lineas hasta por 3 metros y tubería PVC de 1/2" hasta por 3 m.	UND	32.00	199,160.00	6,373,120.00	+	2.00	-	398,320.00	-	34.00	6,771,440.00	34.00	6,771,440.00	-	-	34.00	6,771,440.00
7.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 110 V (INCLUYE ACCEOSRIOS, ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS, ALAMBRE AWG No 14 POR 1 LINEA, Y TUBERIA PVC HASTA POR 3 METROS).	UND	33.00	163,429.00	5,393,157.00	+	2.00	-	326,858.00	-	5.00	817,145.00	35.00	5,720,015.00	-	-	35.00	5,720,015.00
7.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 220V (INCLUYE ACCEOSRIOS, CABLE AWG No 10 POR 2 LINEAS, ALAMBRE AWG No 14 POR 1 LINEA, Y TUBERIA PVC).	UND	6.00	168,214.00	1,009,284.00	-	-	- 1.00	-	- 168,214.00	5.00	841,070.00	5.00	841,070.00	-	-	5.00	841,070.00
7.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA MANUAL PARA PLANTA ELECTRICA, INCLUYE TOMA 3x50 CODELCA, CAJA 2400, CAJA METALICA DE 25X25 X15, Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	UND	1.00	773,886.00	773,886.00	-	-	-	-	-	1.00	773,886.00	1.00	773,886.00	-	-	1.00	773,886.00
7.08	ACOMETIDA PARA CONEXIÓN PLANTA ELECTRICA, DESDE TABLERO DISTRIBUCIÓN HASTA TRANSFERENCIA MANUAL. INCLUYE CABLE No 8 AWG POR 6 LINEAS.	ML	5.00	125,182.00	625,910.00	-	-	-	-	-	5.00	625,910.00	5.00	625,910.00	-	-	5.00	625,910.00
7.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONCHERA DE POSTE PARA CONEXIÓN DE LA RED DE INTERCONEXIÓN DEL DEPARTAMENTO CON EL PUESTO DE SALUD. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1.00	788,903.00	788,903.00	-	-	- 1.00	-	- 788,903.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-
7.10	ACOMETIDA DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN A USO FINAL PARA TOMA CORRIENTES Y LUMINARIAS. INCLUYE TUBERÍA PVC, ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS Y ALAMBRE No 14 POR 1 LINEA Y ACCESORIOS.	ML	100.00	70,148.00	7,014,800.00	+	50.00	-	3,507,400.00	-	150.00	10,522,200.00	150.00	10,522,200.00	-	-	150.00	10,522,200.00

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25

ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

ACTA PARCIAL N003

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	NIT:	901.372.267-3		
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	C.C.:	1.117.508.596 DE FLORENCIA		
PLAZO:	TRES (3) MESES	VALOR DEL CONTRATO:	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	NIT:	901.994.584-2	CONTRATO DE INTERVENTORIA N.:	CI 001 del 03 de Octubre de 2025
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	26 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	FECHA DE REINICIO:	24 DE FEBRERO DE 2026	ACTA PARCIAL No.3	17 DE ABRIL DE 2026
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	FECHA DE TERMINACION FINAL	26 DE ABRIL DE 2026		
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **LA ESPERANZA**	MUNICIPIO:	FLORENCIA		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDADES			VALORES		ACTA PARCIAL No 3		ACUMULADO		POR COBRAR		CANTIDAD ACTUALIZADA BALANCE FINAL	VALOR TOTAL ACTUALIZADO
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	+/-	MAY (+)	MEN (-)	MAY (+)	MEN (-)	CANT	SUBTOTAL	CANT	SUBTOTAL	CANT	SUBTOTAL		
8	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS**				**29,517,685.00**				**3,703,718.00**	**- 1,586,857.00**	**-**	**16,415,162.00**	**-**	**31,634,546.05**	**-**	**-**		**31,634,546.00**
8.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE DE SOBRE PONER EN MUEBLE CON PUERTAS Y CAJONERAS EN RH. INCLUYE POCETAS Y ACCESORIOS DE GRIFERIA Y DESAGUES, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE. ALTURA: 0,90 m. ANCHO: 0,60 m.	ML	4.20	2,212,207.00	9,291,269.00	+	0.65	-	1,437,935.00	-	4.85	10,729,204.00	4.85	10,729,203.95	-	-	4.85	10,729,204.00
8.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO BLANCO DE PUSH INCLUYE GRIFERIA	UND	2.00	683,090.00	1,366,180.00	+	1.00	-	683,090.00	-	3.00	2,049,270.00	3.00	2,049,270.00	-	-	3.00	2,049,270.00
8.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND	8.00	391,827.00	3,134,616.00	-	-	- 1.00	-	- 391,827.00	7.00	2,742,789.00	7.00	2,742,789.00	-	-	7.00	2,742,789.00
8.04	SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE BARRA DE 60CM X2 DE SEGURIDAD PARA PARED, EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS	UND	1.00	893,899.00	893,899.00	-	-	-	-	-	1.00	893,899.00	1.00	893,899.00	-	-	1.00	893,899.00
8.05	Punto Hidraulico de 1/2", incluye accesorios PVC	UND	16.00	73,236.00	1,171,776.00	+	5.00	-	366,180.00	-		-	21.00	1,537,956.00	-	-	21.00	1,537,956.00
8.06	Punto Sanitario de 2", incluye accesorios PVC	UND	17.00	91,076.00	1,548,292.00	+	1.00	-	91,076.00	-	-	-	18.00	1,639,368.00	-	-	18.00	1,639,368.00
8.07	Punto Sanitario de 4", incluye accesorios PVC	UND	2.00	164,156.00	328,312.00	+	1.00	-	164,156.00	-	-	-	3.00	492,468.00	-	-	3.00	492,468.00
8.08	Suministro e Instalación de Tanque Plastico de 1000lts, incluye Fluidmaster, Tapa, y accesorios PVC para la correcta conexión a la red de distribución.	UND	1.00	1,074,233.00	1,074,233.00	-	-	-	-	-	-	-	1.00	1,074,233.00	-	-	1.00	1,074,233.00
8.09	Acometida hidraulica de distribución en tubo PVC-P 3/4"	ML	57.67	38,083.00	2,195,093.00	+	4.71	-	179,277.00	-	-	-	62.38	2,374,369.94	-	-	62.38	2,374,370.00
8.10	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria 4".	ML	40.77	74,289.00	3,028,763.00	+	7.23	-	537,109.00	-	-	-	48.00	3,565,872.00	-	-	48.00	3,565,872.00
8.11	Suministro e instalación de lavatraperos prefabricado.	UND	1.00	617,223.00	617,223.00	-	-	-	-	-	-	-	1.00	617,223.00	-	-	1.00	617,223.00
8.12	Suministro e instalación de Ducha tipo regadera y teleducha independiente.	UND	1.00	804,497.00	804,497.00	-	-	-	-	-	-	-	1.00	804,497.00	-	-	1.00	804,497.00
8.13	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria de 2"	ML	21.48	49,930.00	1,072,496.00	-	-	- 0.47	-	- 23,467.00	-	-	21.01	1,049,029.30	-	-	21.01	1,049,029.00
8.14	Construcción de Caja de Inspecicón de 0,60x0,60 en concreto.	und	2.00	803,452.00	1,606,904.00	-	-	-	-	-		-	2.00	1,606,904.00	-	-	2.00	1,606,904.00
8.15	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria de 3"	ml	4.34	48,979.00	212,569.00	+	5.00	-	244,895.00	-	-	-	9.34	457,463.86	-	-	9.34	457,464.00

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25

ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

ACTA PARCIAL N003

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3		
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA		
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)		
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N.:**	CI 001 del 03 de Octubre de 2025
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE REINICIO:**	24 DE FEBRERO DE 2026	**ACTA PARCIAL No.3**	17 DE ABRIL DE 2026
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE TERMINACION FINAL**	26 DE ABRIL DE 2026		
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **LA ESPERANZA**	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDADES			VALORES		ACTA PARCIAL No 3		ACUMULADO		POR COBRAR		CANTIDAD ACTUALIZADA BALANCE FINAL	VALOR TOTAL ACTUALIZADO
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	+/-	MAY (+)	MEN (-)	MAY (+)	MEN (-)	CANT	SUBTOTAL	CANT	SUBTOTAL	CANT	SUBTOTAL		
8.16	Suministro e instalación de PRESURIZADOR MINI SMAR AUTOMATICO 1X127V 245W O SIMILAR.	und	1.00	1,171,563.00	1,171,563.00	-	-	1.00	-	1,171,563.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-
9	**ITEMS NO PREVISTOS**				-				27,529,985.00	-		20,417,585.00		27,529,984.62	-	-		27,529,985.00
NP-01	VIGA CINTA EN CONCRETO DOSIFICACIÓN 1:2:3 DE 0,12X0,20 INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML		192,000.00	-	+	30.30	-	5,817,600.00	-		-	30.30	5,817,600.00	-	-	30.30	5,817,600.00
NP-02	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 0,2 X 0,10m EN CONCRETO DE 3000 psi, incluye acero de refuerzo en 4 varillas de 3/8", con flejes @0,15 m en varilla de 1/4".	ML		130,000.00	-	+	9.96	-	1,294,800.00	-		-	9.96	1,294,800.00	-	-	9.96	1,294,800.00
NP-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 CON DESARROLLO DE 0,73 M INCLUYE GANCHO DE FIJACION, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	ML		196,952.75	-	+	38.40	-	7,562,986.00	-	38.40	7,562,986.00	38.40	7,562,985.60	-	-	38.40	7,562,986.00
NP-04	RAMPA 10CM EN CONCRETO 3000 PSI, RATONEADA Y ESCOBEADA. INCLUYE EXCAVACIÓN, MALLA ELECTROSOLDADA 4 MM, RELLENO, COMPACTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2		158,418.00		+	2.49	-	394,461.00	-	2.49	394,461.00	2.49	394,460.82	-	-	2.49	394,461.00
NP05	CONEXIÓN ACOMETIDA BI-FASICA DEL POSTE A LA CAJA DE MEDIDOR, EN CABLE CONCÉNTRICO TRIFILAR 2*8+8,TENSORES TUBO IMC 3/4", TUBERÍA SCH40, CURVAS SCH 40, CAPASETE 3/4", BOQUILLA IMC 3/4", PIN DE CORTE TRIFILAR 2*40, SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, CON VARILLA DE COBRE 2*40 CON SU RESPECTIVO CONECTOR, Y CABLE #8 DE COBRE	ML		420,875.00		+	22.53	-	9,481,865.00	-	22.53	9,481,865.00	22.53	9,481,865.38	-	-	22.53	9,481,865.00
NP06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA CAJA DE MEDIDOR BI-FASICA, CON PIN DE CORTE 2*40 AMP, SISTEMA DE PUESTA A TIERRA QUE INCLUYE VARILLA DE COBRE DE 2.40 MTS CON CONECTOR DE COBRE Y CONDUCTOR CALIBRE #8 AWG.	UND		1,102,683.00		+	1.00	-	1,102,683.00	-	1.00	1,102,683.00	1.00	1,102,683.00	-	-	1.00	1,102,683.00
NP07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO PREFABRICADO	UND		800,000.00		+	1.00	-	800,000.00	-	1.00	800,000.00	1.00	800,000.00	-	-	1.00	800,000.00
NP08	ESCALERA EN CONCRETO DE 3.000 PSI INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	M2		195,918.00		+	5.49	-	1,075,590.00	-	5.49	1,075,590.00	5.49	1,075,589.82	-	-	5.49	1,075,590.00
											-	-	-	-	-	-		-

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25

ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

ACTA PARCIAL N003

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	NIT:	901.372.267-3		
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	C.C.:	1.117.508.596 DE FLORENCIA		
PLAZO:	TRES (3) MESES	VALOR DEL CONTRATO:	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	NIT:	901.994.584-2	CONTRATO DE INTERVENTORIA N.:	CI 001 del 03 de Octubre de 2025
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	26 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	FECHA DE REINICIO:	24 DE FEBRERO DE 2026	ACTA PARCIAL No.3	17 DE ABRIL DE 2026
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	FECHA DE TERMINACION FINAL	26 DE ABRIL DE 2026		
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **LA ESPERANZA**	MUNICIPIO:	FLORENCIA		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDADES			VALORES		ACTA PARCIAL No 3		ACUMULADO		POR COBRAR		CANTIDAD ACTUALIZADA BALANCE FINAL	VALOR TOTAL ACTUALIZADO
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	+/-	MAY (+)	MEN (-)	MAY (+)	MEN (-)	CANT	SUBTOTAL	CANT	SUBTOTAL	CANT	SUBTOTAL		
TOTAL COSTOS DIRECTOS					369,393,433.00				76,047,573.00	- 76,047,573.00	% EJE ACTA 3	94,252,732.00	ACUMULADO	369,393,433.00	POR COBRAR	-	% DE BALANCE	369,393,433.00
	ADMINISTRACION			28.23%	104,279,766.00				21,468,230.00	- 21,468,230.00		26,607,546.00		104,279,766.00				104,279,766.00
	IMPREVISTOS			1.00%	3,693,934.00				760,476.00	- 760,476.00		942,527.00		3,693,934.00				3,693,934.00
	UTILIDAD			5.00%	18,469,672.00				3,802,379.00	- 3,802,379.00		4,712,637.00		18,469,672.00				18,469,672.00
TOTAL OBRA					495,836,805.00				102,078,658.00	- 102,078,658.00	25.52%	126,515,442.00	100.00%	495,836,805.00	0.00%	-	100.00%	495,836,805.00

RESUMEN FINANCIERO LA ESPERANZA		
Valor Inicial Contrato:	$	495,836,805.00
Valor Adicional Contrato:	$	-
Valor Final Contrato:	$	495,836,805.00
Valor Acta No 001	$	221,707,667.00
Valor Acta No 002	$	147,613,696.00
Valor Acta No 003	$	126,515,442.00
Valor Acumulado Actas	$	495,836,805.00
% Ejecución Acumulado		100.00%
Saldo Por Ejecutar	$	-

LA PRESENTE ACTA PARCIAL No 002 FUE **REVISADA Y APROBADA** POR LA INTERVENTORÍA, POR UN VALOR DE CIENTO VEINTISÉIS MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS **($126.515.442,00)**.. CON UN PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL **100%**. APROBADO LO ANTERIOR, SE FIRMA A LOS DIECISIETE (17) DÍAS, DEL MES DE ABRIL DEL 2026 EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, CAQUETA.

CONTRATISTA:

JOHAN LOPEZ MENDEZ
1.117.508.596 DE FLORENCIA
Representante Legal
H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS

VoBo DIRECTOR DE OBRA

ING. ADRIANA GALVEZ OSORIO
C.C. 28.550.973 DE IBAGUE
M.P. 70202138618 TLM
H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS

INTERVENTORÍA

JHONATTAN HOYOS MARQUEZ
C.C.1.018.439.570 de Bogotá D.C.
M.P. 25202-260849 CND
Director y Rep. Legal
UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25

ENTIDAD CONTRATANTE

MARIA PAULA RUIZ TRIANA
C.C. 1.075.311.783 de Neiva
GERENTE
ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

VoBo Supervisión ESE HMHOO

ALEXANDER VILLOTA FAJARDO
Supervisor Contrato CI 001

JOSE RICARDO SANCHEZ GOMEZ
Apoyo a la Supervisión

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES ACTA N 003

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA ESPERANZA DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT.901.994.584-2
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA
CAPITULO	CONCRETOS	**FECHA**	17-abr-26
ÍTEM	2.01 — PLACA EN CONCRETO 3000PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 5 mm. ESPESOR 10 cm	**Unidad Medida**	M2







Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
TOMA DE MUESTRAS	3.47		3.42	1.00	11.87
WC	3.17		1.30	1.00	4.12
WC DISC	3.16		2.14	1.00	6.76
CONSULTORIO ODONTOLOGICO	3.16		3.40	1.00	10.74
SALA DE ESPERA	6.64		9.40	1.00	62.42
PLACA LAVADERO	2.14		1.70	1.00	3.64
	2.56		1.00	1.00	2.56
BODEGA	2.05		3.14	1.00	6.44
WC 2	1.30		2.05	1.00	2.67
CONSULTORIO VACUNACION	5.17		2.05	1.00	10.60
	4.20		0.98	1.00	4.12
	2.21		2.18	1.00	4.82
CONSULTORIO 2	4.25		2.06	1.00	8.76
	3.15		2.08	1.00	6.55
CONSULTORIO 1	4.29		3.16	1.00	13.56
CIRCULACION	5.60		0.96	1.00	5.38
INGRESO	3.15		1.00	1.00	3.15
ANDEN FRONTAL	9.19		0.90	1.00	8.27
	6.49		0.90	1.00	5.84
	0.92		0.50	1.00	0.46
	2.10		1.73	1.00	3.63

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**186.34**
COBRO ACTA N.1	193.21
ACTA N.2	**2.65**
ACTA N.3	**-9.52**
TOTAL CONTRACTUAL	159.06

Elaboró
FABIAN MARTINEZ MARTINEZ
Residente de Obra

Avaló
RUDY YANSETH MOLINA QUINTERO
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES ACTA N 003

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA ESPERANZA DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**		CONTRATISTA INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT.901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA	**MUNICIPIO**		FLORENCIA	
CAPITULO	CONCRETOS		**FECHA**	17-abr-26	
ÍTEM	2.07	ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 4 mm, Espesor 10 cm. Escobeado y Ratoneado	**Unidad Medida**	M2	





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Tota
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
Anden frontal de acceso	17.77		1.18		20.97

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**20.97**
COBRO ACTA N.1	0.00
ACTA N.2	**0.00**
ACTA N.3	**20.97**
TOTAL CONTRACTUAL	**25.03**

Elaboró

FABIAN MARTINEZ MARTINEZ
Residente de Obra

Avaló

RUDY YANSETH MOLINA QUINTERO
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES ACTA N 003

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA ESPERANZA DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT.901.994.584-2
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA
CAPITULO	MAMPOSTERÍA Y ACABADOS DE MUROS	**FECHA**	17-abr-26
ÍTEM	3.03 ENCHAPE MURO FORMATO MÍNIMO .25X.30	**Unidad Medida**	M2







Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
CONSULTORIO DE VACUNACIÓN	2.05	0.80		-	-
TOMA DE MUESTRAS	1.50	0.80		-	-
WC1	6.97	1.73		1.00	12.06
WC2	5.78	1.73		1.00	10.00
PMR	9.44	1.73		1.00	16.33
CONSULTORIO ODONTOLOGICO	1.30	0.80		-	-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**38.39**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	
ACTA N.3	**38.39**
TOTAL CONTRACTUAL	**59.02**

Elaboró
Fabian Martinez
FABIAN MARTINEZ MARTINEZ
Residente de Obra

Avaló
RYMQ
RUDY YANSETH MOLINA QUINTERO
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES ACTA N 003

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA ESPERANZA DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**		CONTRATISTA INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT.901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA	**MUNICIPIO**		FLORENCIA	
CAPITULO	MAMPOSTERÍA Y ACABADOS DE MUROS		**FECHA**	17-abr-26	
ÍTEM	3.05	ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES TIPO KORAZA		**Unidad Medida**	M2







Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	AREA		
FACHADA FRONTAL	8.21	2.50		1.00	20.53
	3.47	2.50		1.00	8.68
VENTANAS	1.30	0.40		- 1.00	- 0.52
	2.10	1.10		- 3.00	- 6.93
FACHADA POSTERIOR	8.21	2.50		1.00	20.53
MURO LAVADERO	6.81	1.00		1.00	6.81
VENTANAS	2.10	0.56		- 1.00	- 1.18
	1.90	1.10		- 2.00	- 4.18
	1.28	0.40		- 1.00	- 0.51
FACHADA LAT IZQ	7.90	2.69		2.00	42.50
PUERTAS	1.00	2.15		- 1.00	- 2.15
FACHADA LAT DER	10.91	2.69		2.00	58.70
PUERTAS	1.00	2.15		- 4.00	- 8.60
VENTANAS	1.00	0.40		- 1.00	- 0.40
	1.80	1.15		- 1.00	- 2.07
CULATAS			4.48	3.00	13.44
			3.68	1.00	3.68
CONSULTORIO ODONTOLOGICO	3.40	2.90		1.00	9.86
	3.40	3.40		1.00	11.56
VENTANA	1.80	1.00		- 1.00	- 1.80
PUERTA	0.98	2.00		- 1.00	- 1.96
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**165.97**
COBRO ACTA N.1	0.00
ACTA N.2	**150.00**
ACTA N.3	**15.97**
TOTAL CONTRACTUAL	185.24

Elaboró
Fabian Martinez
FABIAN MARTINEZ MARTINEZ
Residente de Obra

Avaló
RUDY YANSETH MOLINA QUINTERO
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES ACTA N 003

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA ESPERANZA DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT.901.994.584-2
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA
CAPITULO	MAMPOSTERÍA Y ACABADOS DE MUROS	**FECHA**	17-abr-26
ÍTEM	3.06 ESTUCO Y PINTURA DE ALTA ASEPSIA 3 MANOS	**Unidad Medida**	M2







Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
CONSULTORIO 1	14.90	2.60		1.00	38.74
PUERTA	0.96	1.96		- 1.00	- 1.88
CONSULTORIO2	23.08	2.60		1.00	60.01
PUERTA	0.96	1.96		- 1.00	- 1.88
CONSULTORIO DE VACUNACIÓN	19.02	2.60		1.00	49.45
PUERTA	0.96	1.96		- 2.00	- 3.76
TOMA DE MUESTRAS	13.18	2.60		1.00	34.27
PUERTA	0.96	1.96		- 2.00	- 3.76
CONSULTORIO ODONTOLOGICO	12.92	2.60		1.00	33.59
PUERTA	0.96	1.96		- 1.00	- 1.88
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**202.89**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	
ACTA N.3	202.89
TOTAL CONTRACTUAL	**188.06**

Elaboró

FABIAN MARTINEZ MARTINEZ
Residente de Obra

Avaló

RUDY YANSETH MOLINA QUINTERO
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES ACTA N 003

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA ESPERANZA DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT.901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	CUBIERTAS Y CIELO RASOS	**FECHA**	17-abr-26	
ÍTEM	4.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN 3"	**Unidad Medida**	ml







Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
bajantes canal	3.00			5.00	15.00
Muñeco bajantes	1.00			5.00	5.00
Bajante en piso	1.20			5.00	6.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**26.00**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	
ACTA N.3	26.00
TOTAL CONTRACTUAL	**20.80**

Elaboró

FABIAN MARTINEZ MARTINEZ
Residente de Obra

Avaló

RUDY YANSETH MOLINA QUINTERO
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES ACTA N 003

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA ESPERANZA DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**		CONTRATISTA INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT.901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA	**MUNICIPIO**		FLORENCIA	
CAPITULO	PISOS Y ENCHAPES		**FECHA**	17-abr-26	
ÍTEM	5.02	BALDOSA CERAMICA PARA PISOS	**Unidad Medida**	m2	





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
ZONA 1	10.91		3.47	1.00	37.86
ZONA 2	10.19		7.90	1.00	80.50
SALA DE ESPERA	9.40		6.49	1.00	61.01
BODEGA	3.14		2.05	1.00	6.44
CUARTO DE RESIDUOS	2.08		1.30	1.00	2.70
PISO LAVADERO	1.15		2.60	1.00	2.99
	1.00		1.10	1.00	1.10
ANDEN FRONTAL	9.19		0.90	1.00	8.27
	6.49		0.90	1.00	5.84
	0.92		0.50	1.00	0.46
	2.23		1.98	1.00	4.42
INGRESO	3.15		1.00	1.00	3.15
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**214.73**
COBRO ACTA N.1	0.00
ACTA N.2	**200.00**
ACTA N.3	**14.73**
TOTAL CONTRACTUAL	154.76

Elaboró
Fabian Martinez
FABIAN MARTINEZ MARTINEZ
Residente de Obra

Avaló
RYMQ
RUDY YANSETH MOLINA QUINTERO
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES ACTA N 003

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA ESPERANZA DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT.901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	PISOS Y ENCHAPES	**FECHA**	17-abr-26	
ÍTEM	5.03	GUARDAESCOBA EN CERAMICA	**Unidad Medida**	ml







Localización	Dimensiones			CANT	Medida Tota
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
CONSULTORIO 1	13.90				13.90
CONSULTORIO2	22.08				22.08
CONSULTORIO DE VACUNACIÓN	19.02				19.02
TOMA DE MUESTRAS	12.18				12.18
CONSULTORIO ODONTOLOGICO	12.92				12.92
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**80.10**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	
ACTA N.3	**80.10**
TOTAL CONTRACTUAL	**115.76**

Elaboró
Fabian Martinez
FABIAN MARTINEZ MARTINEZ
Residente de Obra

Avaló
RUDY YANSETH MOLINA QUINTERO
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES ACTA N 003

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA ESPERANZA DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT.901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	CARPINTERIA METALICA	**FECHA**	17-abr-26	
ÍTEM	6.01	Puerta Metalica entablerado en lamina galvanizada Calibre 20, Con cerradura. Incluye Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. Tragaluz en Vidrio 4 mm	**Unidad Medida**	M2





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
BODEGA	0.98	1.96		1.00	1.92
		1.96			
CUARTO DE RESIDUOS	0.98	1.96		1.00	1.92
WC1	0.98	1.96		1.00	1.92
WC2	0.98	1.96		1.00	1.92
PMR	0.98	1.96		1.00	1.92
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**9.60**
COBRO ACTA N.1	**0.00**
ACTA N.2	**10.54**
ACTA N.3	**-0.94**
TOTAL CONTRACTUAL	10.02

Elaboró

Fabian Martinez

FABIAN MARTINEZ MARTINEZ
Residente de Obra

Avaló

RUDY YANSETH MOLINA QUINTERO
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES ACTA N 003

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA ESPERANZA DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT.901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	CARPINTERIA METALICA	**FECHA**	17-abr-26	
ÍTEM	6.03	Puerta En Marco de Aluminio Blanco, con vidrio 5mm + pelicula tipo sandblasting, Con cerradura. Tragaluz en Vidrio 4 mm	**Unidad Medida**	M2





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
CONSULTORIO 1	0.98	1.96		1.00	1.92
CONSULTORIO2	0.98	1.96		1.00	1.92
CONSULTORIO DE VACUNACIÓN	0.98	2.55		1.00	2.50
TOMA DE MUESTRAS	0.98	1.96		2.00	3.84
CONSULTORIO ODONTOLOGICO	0.98	1.96		1.00	1.92
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**12.10**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	
ACTA N.3	**12.10**
TOTAL CONTRACTUAL	**1.33**

Elaboró
Fabian Martinez
FABIAN MARTINEZ MARTINEZ
Residente de Obra

Avaló
RYMQ
RUDY YANSETH MOLINA QUINTERO
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES ACTA N 003

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA ESPERANZA DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT.901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS	**FECHA**	17-abr-26	
ÍTEM	7.04	Suministro e Instalación de Punto Electrico de iluminación. Incluye Luminaria Led de 18w. Redonda o Cuadrada o similar, de empotrar o sobreponer, según aplique. Incluye interruptor, y Alambre No 14 Awg por 2 Lineas hasta por 3 metros y tubería PVC de 1/2" hasta por 3 m.	**Unidad Medida**	UND







Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
PUESTO SALUD				34.00	34.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**34.00**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	
ACTA N.3	**34.00**
TOTAL CONTRACTUAL	**32.00**

Elaboró

FABIAN MARTINEZ MARTINEZ
Residente de Obra

Avaló

RUDY YANSETH MOLINA QUINTERO
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES ACTA N 003


E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA ESPERANZA DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT.901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS	**FECHA**	17-abr-26	
ÍTEM	7.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 110 V (INCLUYE ACCEOSRIOS, ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS, ALAMBRE AWG No 14 POR 1 LINEA, Y TUBERIA PVC HASTA POR 3 METROS).	**Unidad Medida**	UND









Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
PUESTO SALUD				34.00	34.00
ELECTROBOMBA				1.00	1.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**35.00**
COBRO ACTA N.1	0.00
ACTA N.2	**30.00**
ACTA N.3	**5.00**
TOTAL CONTRACTUAL	33.00

Elaboró

FABIAN MARTINEZ MARTINEZ
Residente de Obra

Avaló


RUDY YANSETH MOLINA QUINTERO
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES ACTA N 003

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA ESPERANZA DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**		CONTRATISTA INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT.901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA	**MUNICIPIO**		FLORENCIA	
CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS		**FECHA**	17-abr-26	
ÍTEM	7.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 220V (INCLUYE ACCEOSRIOS, CABLE AWG No 10 POR 2 LINEAS, ALAMBRE AWG No 14 POR 1 LINEA, Y TUBERIA PVC).	**Unidad Medida**	UND	



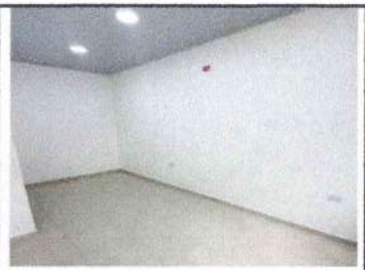



Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
AIRES ACONDICIONADOS				5.00	5.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**5.00**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	
ACTA N.3	5.00
TOTAL CONTRACTUAL	**5.00**

Elaboró
Fabian Martinez
FABIAN MARTINEZ MARTINEZ
Residente de Obra

Avaló
RUDY YANSETH MOLINA QUINTERO
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES ACTA N 003

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA ESPERANZA DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT.901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS	**FECHA**	17-abr-26	
ÍTEM	7.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA MANUAL PARA PLANTA ELECTRICA, INCLUYE TOMA 3x50 CODELCA, CAJA 2400, CAJA METALICA DE 25X25 X15, Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	**Unidad Medida**	UND





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
Planta electrica				1.00	1.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**1.00**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	
ACTA N.3	**1.00**
TOTAL CONTRACTUAL	**1.00**

Elaboró

Fabian Martinez

FABIAN MARTINEZ MARTINEZ
Residente de Obra

Avaló

RYMQ

RUDY YANSETH MOLINA QUINTERO
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES ACTA N 003

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA ESPERANZA DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT.901.994.584-2		
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA		
CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS		**FECHA**	17-abr-26	
ÍTEM	7.08	ACOMETIDA PARA CONEXIÓN PLANTA ELECTRICA, DESDE TABLERO DISTRIBUCIÓN HASTA TRANSFERENCIA MANUAL. INCLUYE CABLE No 8 AWG POR 6 LINEAS.	**Unidad Medida**	ML	





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
Planta electrica	5.00			1.00	5.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**5.00**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	
ACTA N.3	5.00
TOTAL CONTRACTUAL	**5.00**

Elaboró
Fabian Martinez
FABIAN MARTINEZ MARTINEZ
Residente de Obra

Avaló
RUDY YANSETH MOLINA QUINTERO
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES ACTA N 003

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA ESPERANZA DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT.901.994.584-2
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA
CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS	**FECHA**	17-abr-26
ÍTEM	7.10	ACOMETIDA DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN A USO FINAL PARA TOMA CORRIENTES Y LUMINARIAS. INCLUYE TUBERÍA PVC, ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS Y ALAMBRE No 14 POR 1 LINEA Y ACCESORIOS.	**Unidad Medida** ml





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
ACOMETIDAS PARA PUNTOS ELECTRICOS	150.00			1.00	150.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**150.00**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	
ACTA N.3	**150.00**
TOTAL CONTRACTUAL	**150.00**

Elaboró

FABIAN MARTINEZ MARTINEZ
Residente de Obra

Avaló

RUDY YANSETH MOLINA QUINTERO
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES ACTA N 003

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA ESPERANZA DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT.901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS	**FECHA**	17-abr-26	
ÍTEM	8.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON DE EMPOTRAR, EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE POCETAS Y ACCESORIOS DE GRIFERIA Y DESAGUES.	**Unidad Medida**	ML





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
CONSULTORIOS	2.05			1.00	2.05
	1.50			1.00	1.50
	1.30			1.00	1.30
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**4.85**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	
ACTA N.3	**4.85**
TOTAL CONTRACTUAL	**4.85**

Elaboró
Fabian Martinez
FABIAN MARTINEZ MARTINEZ
Residente de Obra

Avaló
RYMQ
RUDY YANSETH MOLINA QUINTERO
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES ACTA N 003

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA ESPERANZA DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT.901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS	**FECHA**	17-abr-26	
ÍTEM	8.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO BLANCO DE PUSH INCLUYE GRIFERIA	**Unidad Medida**	UND





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
WC1, DISC Y WC2				3.00	3.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**3.00**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	
ACTA N.3	3.00
TOTAL CONTRACTUAL	**3.00**

Elaboró
fabian martinez
FABIAN MARTINEZ MARTINEZ
Residente de Obra

Avaló
RUDY YANSETH MOLINA QUINTERO
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES ACTA N 003

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA ESPERANZA DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**		CONTRATISTA INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT.901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA	**MUNICIPIO**		FLORENCIA	
CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS		**FECHA**	17-abr-26	
ÍTEM	8.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	**Unidad Medida**	UND	









Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
WC1,WC2				2.00	2.00
WC DISC				1.00	1.00
CONSULTORIOS				4.00	4.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**7.00**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	
ACTA N.3	7.00
TOTAL CONTRACTUAL	**8.00**

Elaboró

FABIAN MARTINEZ MARTINEZ
Residente de Obra

Avaló

RUDY YANSETH MOLINA QUINTERO
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA ESPERANZA DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT.901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS	**FECHA**	28-nov-25	
ÍTEM	8.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE SEGURIDAD PARA PERSONA DISCAPACITADA EN ACERO INOXIDABLE.	**Unidad Medida**	UND



Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
WC				1.00	1.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**1.00**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	
ACTA N.3	1.00
TOTAL CONTRACTUAL	**1.00**

Elaboró
Fabian Martinez
FABIAN MARTINEZ MARTINEZ
Residente de Obra

Avaló
RUDY YANSETH MOLINA QUINTERO
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES ACTA N 003

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA ESPERANZA DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT.901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	CONCRETOS	**FECHA**	17-abr-26	
ÍTEM	NP3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 CON DESARROLLO DE 0,73 M INCLUYE GANCHO DE FIJACION, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	**Unidad Medida**	ML







Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
frontal	18.00			1.00	18.00
posterior	17.00			1.00	17.00
consultorio	3.40			1.00	3.40

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**38.40**
COBRO ACTA N.1	0.00
ACTA N.2	
ACTA N.3	**38.40**
TOTAL CONTRACTUAL	0.00

Elaboró

Fabian Martinez

FABIAN MARTINEZ MARTINEZ
Residente de Obra

Avaló

RUDY YANSETH MOLINA QUINTERO
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES ACTA N 003

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA ESPERANZA DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT.901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	CONCRETOS	**FECHA**	17-abr-26	
ÍTEM	NP4	RAMPA 10CM EN CONCRETO 3000 PSI, RATONEADA Y ESCOBEADA. INCLUYE EXCAVACIÓN, MALLA ELECTROSOLDADA 4 MM, RELLENO, COMPACTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓ	**Unidad Medida**	m2





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
Ingreso principal	1.87		1.33		2.49

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**2.49**
COBRO ACTA N.1	0.00
ACTA N.2	
ACTA N.3	**2.49**
TOTAL CONTRACTUAL	0.00

Elaboró

Fabian Martinez

FABIAN MARTINEZ MARTINEZ
Residente de Obra

Avaló

RUDY YANSETH MOLINA QUINTERO
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES ACTA N 003

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA ESPERANZA DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**		CONTRATISTA INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT.901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA	**MUNICIPIO**		FLORENCIA	
CAPITULO	CONCRETOS		**FECHA**	17-abr-26	
ÍTEM	NP5	CONEXIÓN ACOMETIDA BI-FASICA DEL POSTE A LA CAJA DE MEDIDOR, EN CABLE CONCÉNTRICO TRIFILAR 2*8+8,TENSORES TUBO IMC 3/4", TUBERÍA SCH40, CURVAS SCH 40, CAPASETE 3/4", BOQUILLA IMC 3/4", PIN DE CORTE TRIFILAR 2*40, SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, CON VARILLA DE COBRE 2*40 CON SU RESPECTIVO CONECTOR, Y CABLE #8 DE COBRE	**Unidad Medida**	ML	





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
Ingreso principal	22.53				22.53

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**22.53**
COBRO ACTA N.1	0.00
ACTA N.2	
ACTA N.3	**22.53**
TOTAL CONTRACTUAL	0.00

Elaboró

Fabian Martinez

FABIAN MARTINEZ MARTINEZ
Residente de Obra

Avaló

RUDY YANSETH MOLINA QUINTERO
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES ACTA N 003

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA ESPERANZA DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**		CONTRATISTA INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT.901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA	**MUNICIPIO**		FLORENCIA	
CAPITULO	CONCRETOS		**FECHA**	17-abr-26	
ÍTEM	NP6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA CAJA DE MEDIDOR BI-FASICA, CON PIN DE CORTE 2*40 AMP, SISTEMA DE PUESTA A TIERRA QUE INCLUYE VARILLA DE COBRE DE 2.40 MTS CON CONECTOR DE COBRE Y CONDUCTOR CALIBRE #8 AWG.	**Unidad Medida**	UND	





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
Ingreso principal				1.00	1.00

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**1.00**
COBRO ACTA N.1	0.00
ACTA N.2	
ACTA N.3	**1.00**
TOTAL CONTRACTUAL	0.00

Elaboró Fabian Martinez
FABIAN MARTINEZ MARTINEZ
Residente de Obra

Avaló
RUDY YANSETH MOLINA QUINTERO
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES ACTA N 003

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA ESPERANZA DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT.901.994.584-2
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA
CAPITULO	CONCRETOS	**FECHA**	17-abr-26
ÍTEM	NP7 — SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO PREFABRICADO	**Unidad Medida**	UND





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
Ingreso principal				1.00	1.00

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**1.00**
COBRO ACTA N.1	0.00
ACTA N.2	
ACTA N.3	**1.00**
TOTAL CONTRACTUAL	0.00

Elaboró
Fabian Martinez
FABIAN MARTINEZ MARTINEZ
Residente de Obra

Avaló
RUDY YANSETH MOLINA QUINTERO
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES ACTA N 003

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA ESPERANZA DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT.901.994.584-2
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA
CAPITULO	CONCRETOS	**FECHA**	17-abr-26
ÍTEM	NP8 — ESCALERA EN CONCRETO DE 3.000 PSI INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	**Unidad Medida**	M2





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
Acceso cuarto de aseo	2.46		2.23	1.00	5.49

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**5.49**
COBRO ACTA N.1	0.00
ACTA N.2	
ACTA N.3	**5.49**
TOTAL CONTRACTUAL	0.00

Elaboró

Fabian Martinez

FABIAN MARTINEZ MARTINEZ
Residente de Obra

Avaló

RUDY YANSETH MOLINA QUINTERO
INTERVENTOR
