ACEPTACIÓN DE OFERTA N°- 291 - 2026

"MEJORAMIENTO UNIDAD SANITARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL SAN JUAN VIDES (SEDE PRINCIPAL), DEL MUNICIPIO DE ORITO - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

INFORME TÉCNICO DE OBRA A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA N°- 291 - 2026

SEPTIEMBRE 14 2026 – SEPTIEMBRE 29 2026

CONTRATANTE:
ALCALDIA MUNICIPAL DE ORITO
NIT: 800.102.896-2

CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS INTEGRAL JM S.A.S – COINTE JM S.A.S
EVER ANDRADE ZAMBRANO
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR:
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNIPAL

ORITO PUTUMAYO – SEPTIEMBRE 2026

INTRODUCCIÓN

El presente informe de la **ACEPTACIÓN DE OFERTA N°- 291 – 2026,** del proyecto **"MEJORAMIENTO UNIDAD SANITARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL SAN JUAN VIDES (SEDE PRINCIPAL), DEL MUNICIPIO DE ORITO - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO ",** contrato suscrito entre el MUNICIPIO DE ORITO y la empresa CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS INTEGRAL JM S.A.S – COINTE JM S.A.S.

En el presente informe del contrato tiene por objeto suministrar información necesaria para la supervisión del proyecto, con el fin de suministrar a la entidad contratante el desarrollo de las actividades de tipo técnico, financiero y administrativo, ejecutadas en la **ACEPTACIÓN DE OFERTA N°- 291 – 2026**.

Se relacionan las actividades que se realizaron en el desarrollo del contrato en el periodo del 14 de septiembre hasta el 29 de septiembre 2026 , con el objeto de informar el avance realizado correspondiente a la ejecución de las actividades propuestas en la **ACEPTACIÓN DE OFERTA N°- 291 – 2026,** con objeto **"MEJORAMIENTO UNIDAD SANITARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL SAN JUAN VIDES (SEDE PRINCIPAL), DEL MUNICIPIO DE ORITO - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO ",** dando cumplimiento a las cláusulas contractuales y las normas que rigen dentro de las especificaciones técnicas, sin que se vean afectados los aspectos económicos de la obra; este proyecto se realiza en el área rural en la vereda San Juan Vides del municipio de orito.

- **DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO**

- **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.**

Orito está ubicado al suroccidente del departamento del Putumayo, tiene una extensión de 186.236 Hectáreas, es decir 1.862,36 Kilómetros cuadrados (IGAC, 2001). El Municipio limita por el norte, con el Municipio de Villa Garzón; por el oriente, con los Municipios de Puerto Caicedo y Puerto Asís; por el Sur, con el Municipio del Valle del Guamuez y la República del Ecuador; y por el occidente, con el Departamento de Nariño.

El proyecto se encuentra localizado en el Departamento del Putumayo, en el municipio de Orito. La obra se realiza en zona rural del Municipio de Orito, en la vereda alto simón Bolívar. A continuación, se muestra la localización aproximada del proyecto y del sitio donde se ejecutarán las actividades.

Imagen No. 1 Ubicación Orito - Putumayo.

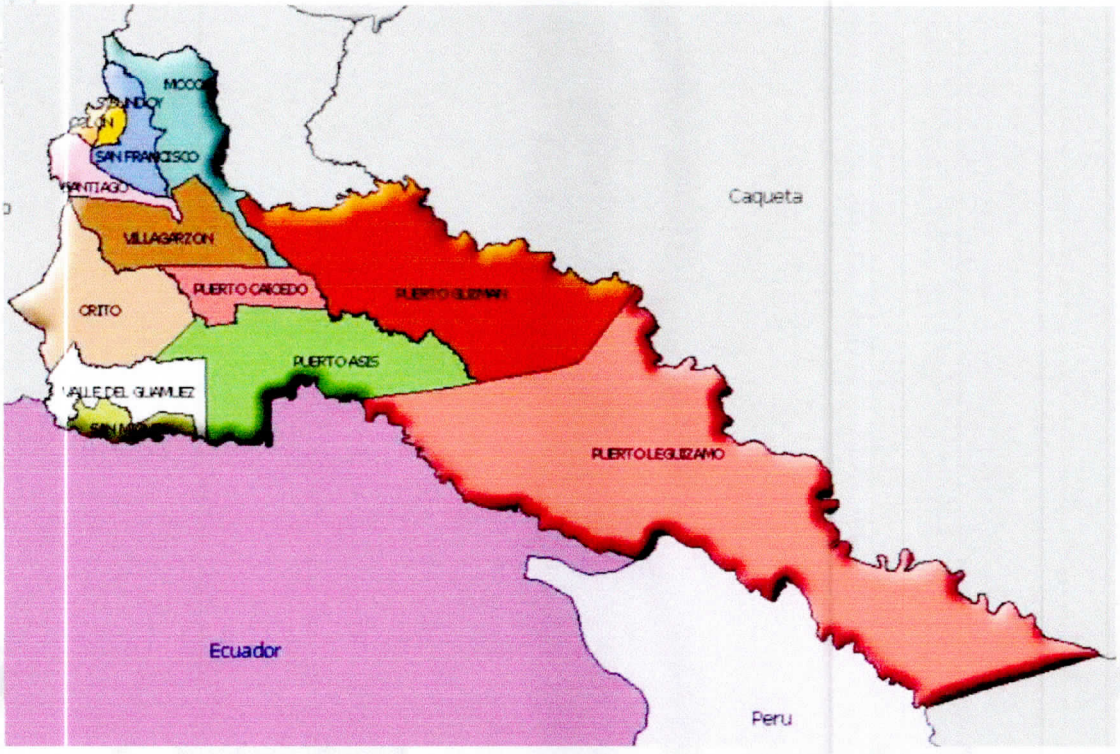


Imagen No.2 Ubicación Vereda San Juan Vides, Orito-Putumayo

Ilustración2. Se captura mediante satélite Google Earth.



- **ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO**

En el proyecto **" MEJORAMIENTO UNIDAD SANITARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL SAN JUAN VIDES (SEDE PRINCIPAL), DEL MUNICIPIO DE ORITO - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO "** Dando cumplimiento a lo estipulado en la programación de obra, se realiza socialización del proyecto con la comunidad de interés, se da a conocer el alcance e importancia del desarrollo de este proyecto en la sede educativa y a conocer las cantidades establecidas en el contrato.

Una vez socializado el proyecto se lleva a cabo la localización y replanteo del proyecto en donde se evidenciaron que algunas medidas no estaban acorde al proyecto, por esta razón el 18 de septiembre de 2026 se solicitó al supervisor del proyecto un comité técnico No. 1 para verificar las cantidades, el cual se llevó a cabo el día 22 de septiembre de 2026, en donde se dio conocer las necesidades encontradas en cuanto a cantidades del proyecto, por tal razón la necesidad de realizar un balance de mayores y menores del proyecto, en esta fecha se aprueba el acta de mayores y menores con el fin de garantizar la correcta ejecución del mismo.

Las ejecuciones de las cantidades contratadas se llevaron con normal desarrollo, cuyos valores se representan en un cuadro de actividades realizadas en el presente informe, el cual tiene un avance del 100%.

- **CARACTERISTICAS TECNICAS DEL CONTRATO**

A continuación, se representan las actividades contractuales iniciales, las cuales han llevado control y seguimiento como estipuladas en el contrato.

CUADRO DE CANTIDADES CONTRATADAS DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL SAN JUAN VIDES					
1,00	PRELIMINARES				
1.1	Limpieza y lavado de Muros, incluye equipos y materiales para su correcta ejecución.	M2	96,76	$ 6.932,91	$ 70.828,37
2,00	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				
2.2	Caja de inspección de 70x70cm en concreto de 3000psi	UN	3,00	$ 1.000.684,26	$ 3.002.052,78
3,00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
3,10	SANITARIO				

3.1.1	Tanque plástico de 1000 lt, Incluye Accesorios e Instalación.	UN	1,00	$ 1.222.767,21	$ 1.222.767,21
4,00	**ACUEDUCTO**				
4.1	Red suministro PVC 1/2"	M	50,00	$ 53.372,60	$ 2.668.630,00
5,00	**PISOS Y ENCHAPES**				
5.1	Piso en cerámica tráfico 5	M2	5,82	$ 156.524,00	$ 910.969,68
6,00	**ACABADOS**				
6.1	Pintura para exteriores e interiores sobre pañete 3 manos	M2	96,76	$ 33.556,43	$ 3.246.920,17
7,00	**SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL**				
7.1	Excavación manual en material común	M3	24,91	$ 66.903,36	$ 1.666.562,70
7.2	Suministro e Instalación de tanque séptico imhoff 2000 Lts , Incluye accesorios, según especificaciones	UND	1,00	$13.456.802,34	$ 13.456.802,34
7.3	Suministro e Instalación de Trampa De Grasas 105 Lts, Incluye accesorios	UND	1,00	$ 1.075.334,02	$ 1.075.334,02
7.4	Suministro e Instalación de Filtro Anaeróbico de Flujo Ascendente (FAFA) 2000Lts, Incluye accesorios	UND	1,00	$11.070.088,14	$ 11.070.088,14
7.5	Suministro e Instalación de Filtro Aeróbico 1000Lts, Incluye accesorios	UND	1,00	$ 2.197.003,14	$ 2.197.003,14
7.6	Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC 110mm	ML	80,83	$ 71.143,53	$ 5.750.531,53
7.7	Campo de infiltración 10 ML, tubería de drenajes PVC 4", incluye excavación y relleno material lecho filtrante Triturado/Grava Lavada, según especificaciones	UN	1,00	$ 1.916.280,92	$ 1.916.280,92
	TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU 30%				**$ 48.854.771,00**

CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA INTEGRALES
NIT. 900936435-2

COINTE JM S.A.S.
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA INTEGRALES
NIT. 900936435-2

CUADRO DE ACTIVIDADES DE ACUERDO AL CONTRATO MODIFICATORIO N°1

ACTIVIDADES		ACTIVIDADES CONTRACTUALES				MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS 01	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL	Más/Menos	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL	CANTIDAD	TOTAL
1,00	**PRELIMINARES**										
1.1	Limpieza y lavado de Muros, incluye equipos y materiales para su correcta ejecución.	M2	96,76	$ 6.932,91	$ 670.828,37	-	-56,65	$ 6.932,91	-$392.749,35	40,11	$278.079,02
2,00	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**										
2.2	Caja de inspección de 60x60cm en concreto de 3000psi	UN	3,00	$ 1.000.684,26	$ 3.002.052,78	-	0,00	$ 1.000.684,26	$0,00	3,00	$3.002.052,78
3,00	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**										
3.1	**SANITARIO**										
3.1.1	Tanque plástico de 1000 lt, Incluye Accesorios e Instalación.	UN	1,00	$ 1.222.767,21	$ 1.222.767,21	=	0,00	$ 1.222.767,21	$0,00	1,00	$1.222.767,21
4,00	**ACUEDUCTO**										
4.1	Red suministro PVC 1/2"	M	50,00	$ 53.372,60	$ 2.668.630,00	-	-6,00	$ 53.372,60	-$320.235,60	44,00	$2.348.394,40
5,00	**PISOS Y ENCHAPES**										
5.1	Piso en cerámica tráfico 5	M2	5,82	$ 156.524,00	$ 910.969,68	-	-1,11	$ 156.524,00	-$173.741,64	4,71	$737.228,04
6,00	**ACABADOS**										
6.1	Pintura para exteriores e interiores sobre pañete 3 manos	M2	96,76	$ 33.556,43	$ 3.246.920,17	-	-56,65	$ 33.556,43	-$1.900.971,76	40,11	$1.345.948,41
7,00	**SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL**										
7.1	Excavación manual en material común	M3	24,91	$ 66.903,36	$ 1.666.562,70	-	-2,38	$ 66.903,36	-$159.230,00	22,53	$1.507.332,70

CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA INTEGRALES
NIT. 900936435-2

7.2	Suministro e Instalación de tanque séptico imhoff 2000 Lts , Incluye accesorios, según especificaciones	UN	1,00	$ 13.456.802,34	$ 13.456.802,34	=	0,00	$ 13.456.802,34	$0,00	1,00	$13.456.802,34
7.3	Suministro e Instalación de Trampa De Grasas 105 Lts, Incluye accesorios	UN	1,00	$ 1.075.334,02	$ 1.075.334,02	-	-1,00	$ 1.075.334,02	-$1.075.334,02	0,00	$0,00
7.4	Suministro e Instalación de Filtro Anaeróbico de Flujo Ascendente (FAFA) 2000Lts, Incluye accesorios	UN	1,00	$ 11.070.088,14	$ 11.070.088,14	=	0,00	$ 11.070.088,14	$0,00	1,00	$11.070.088,14
7.5	Suministro e Instalación de Filtro Aeróbico 1000Lts, Incluye accesorios	UN	1,00	$ 2.197.003,14	$ 2.197.003,14	=	0,00	$ 2.197.003,14	$0,00	1,00	$2.197.003,14
7.6	Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC 110mm	M	80,83	$ 71.143,53	$ 5.750.531,53	+	0,00	$ 71.143,53	$0,00	80,83	$5.750.531,53
7.7	Campo de infiltración 10 ML, tubería de drenajes PVC 4", incluye excavación y relleno material lecho filtrante Triturado/Grava Lavada, según especificaciones	UN	1,00	$ 1.916.280,92	$ 1.916.280,92	=	0,00	$ 1.916.280,92	$0,00	1,00	$1.916.280,92
8,00	**ITEMS NUEVOS**										
8.1	Acarreo de Material	UN				+	1,00	$ 4.022.262,37	$4.022.262,37	1,00	$4.022.262,37
COSTO DIRECTO - INCLUYE A.I.U					**$48.854.771,00**				**$0,00**		**$48.854.771,00**

COINTE JM S.A.S.
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA INTEGRALES
NIT. 900936435-2

INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

A continuación, se relaciona la información contractual del Contratista de Obra:

NUMERO ACEPTACIÓN DE LA OFERTA:	No. 291/2026
ENTE CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORITO
NIT:	800.102.896-2
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS INTEGRAL JM S.A.S – COINTE JM S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL:	EVER ANDRADE ZAMBRANO
NIT:	900.936.435-2
OBJETO:	**" MEJORAMIENTO UNIDAD SANITARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL SAN JUAN VIDES (SEDE PRINCIPAL), DEL MUNICIPIO DE ORITO - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO "**
VALOR CONTRATO:	$ 48.854.771,0
PLAZO:	UN (01) MES
FECHA DE INICIO:	SEPTIEMBRE 14 DE 2026
TERMINACION:	OCTUBRE 13 DE 2026

- **CONTROL DE POLIZAS**

El contratista presento las siguientes pólizas de Seguro cumplimiento a favor de entidades estatales por la aseguradora; SEGUROS MUNDIAL, N° CHU-100088001, ANEXO 0.

Tabla. POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL, ANEXO 0.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
Cumplimiento de contrato	28/08/2026	28/01/2027
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnización laboral	28/08/2026	28/09/2029
Estabilidad y calidad de la obra	28/09/2026	28/09/2031

El contratista presento las siguientes pólizas de Seguro de responsabilidad civil extracontractual a favor de entidades estatales por la aseguradora; SEGUROS DEL ESTADO, N° CHU-100016928, ANEXO 0.

Tabla. POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, ANEXO 0.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
Predios labores y operaciones	28/08/2026	28/09/2026
RCE Patronal	28/08/2026	28/09/2026
Contratistas y subcontratistas	28/08/2026	28/09/2026
Vehículos propios y no propios	28/08/2026	28/09/2026

El contratista presento las siguientes pólizas de Seguro cumplimiento a favor de entidades estatales por la aseguradora; SEGUROS MUNDIAL, N° CHU-100088001, ANEXO 1, según anulación anexo 0.

Tabla. POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL, ANEXO 1.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
Cumplimiento de contrato	28/08/2026	28/01/2027
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnización laboral	28/08/2026	28/09/2029
Estabilidad y calidad de la obra	28/09/2026	28/09/2031

El contratista presento las siguientes pólizas de Seguro de responsabilidad civil extracontractual a favor de entidades estatales por la aseguradora; SEGUROS DEL ESTADO, N° CHU-100016928, ANEXO 1. según anulación anexo 0.

Tabla. POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, ANEXO 1.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
Predios labores y operaciones	28/08/2026	28/09/2026
RCE Patronal	28/08/2026	28/09/2026
Contratistas y subcontratistas	28/08/2026	28/09/2026
Vehículos propios y no propios	28/08/2026	28/09/2026

El contratista presento las siguientes pólizas de Seguro cumplimiento a favor de entidades estatales por la aseguradora; SEGUROS MUNDIAL, N° CHU-100088001, ANEXO 2, según acta de inicio.

Tabla. POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL, ANEXO 2.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
Cumplimiento de contrato	14/09/2026	14/02/2027
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnización laboral	14/09/2026	15/10/2029
Estabilidad y calidad de la obra	15/10/2026	15/10/2031

El contratista presento las siguientes pólizas de Seguro de responsabilidad civil extracontractual a favor de entidades estatales por la aseguradora; SEGUROS DEL ESTADO, N° CHU-100016928, ANEXO 2. según acta de inicio.

Tabla. POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, ANEXO 2.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
Predios labores y operaciones	14/09/2026	15/10/2026
RCE Patronal	14/09/2026	15/10/2026
Contratistas y subcontratistas	14/09/2026	15/10/2026
Vehículos propios y no propios	14/09/2026	15/10/2026

El contratista presento las siguientes pólizas de Seguro cumplimiento a favor de entidades estatales por la aseguradora; SEGUROS MUNDIAL, N° CHU-100088001, ANEXO 3, según modificatorio N°1, donde se ajusta acta de mayores y menores cantidades e ítems nuevos N°1.

Tabla. POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL, ANEXO 3.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
Cumplimiento de contrato	14/09/2026	14/02/2027
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnización laboral	14/09/2026	15/10/2029
Estabilidad y calidad de la obra	15/10/2026	15/10/2031

El contratista presento las siguientes pólizas de Seguro de responsabilidad civil extracontractual a favor de entidades estatales por la aseguradora; SEGUROS DEL ESTADO, N° CHU-100016928, ANEXO 2. según modificatorio N°1, donde se ajusta acta de mayores y menores cantidades e ítems nuevos N°1.

Tabla. POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, ANEXO 3.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
Predios labores y operaciones	14/09/2026	15/10/2026
RCE Patronal	14/09/2026	15/10/2026
Contratistas y subcontratistas	14/09/2026	15/10/2026
Vehículos propios y no propios	14/09/2026	15/10/2026

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

- **CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN**

En el presente periodo, se cumple con el cronograma de actividades y clausulas estipulados en la aceptación de oferta N° 291/2026 con objeto: **" MEJORAMIENTO UNIDAD SANITARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL SAN JUAN VIDES (SEDE PRINCIPAL), DEL MUNICIPIO DE ORITO - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO ".** Siguiendo las recomendaciones por parte de Supervisión en el aspecto técnico, administrativo y financiero.


EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL14 DE SEPTIEMBRE DE 2026 Y EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026 SE EJECUTÓ UN PORCENTAJE DE **100%** EQUIVALENTE A UN VALOR DE **$ 48.854.771,0**

En el siguiente cuadro se representa un resumen de valores ejecutados relacionados al presente periodo. **RESUMEN VALORES EJECUTADOS PRESENTE PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA.**


RESUMEN FINANCIERO Y PORCENTAJE EJECUTADO

MEJORAMIENTO UNIDAD SANITARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL SAN JUAN VIDES (SEDE PRINCIPAL), DEL MUNICIPIO DE ORITO - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO				
N° -	**OBRA**	**VALOR DEL CONTRATO**	**VALOR EJECUTADO PRESENTE INFORME**	**% EJECUCION PRESENTE INFORME**
291 DE 2026	**MEJORAMIENTO UNIDAD SANITARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL SAN JUAN VIDES (SEDE PRINCIPAL), DEL MUNICIPIO DE ORITO - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**	**48.854.771,0**	**48.854.771,0**	**100,0%**

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO	
VALOR CONTRATADO	$ 48.854.771,0
ANTICIPO 50%	$0,00
VALOR MODIFICATORIO N°1 FECHA 23/09/2026	$ 48.854.771,0
VALOR EJECUTADO MES 1	$ 48.854.771,0
SALDO POR EJECUTAR	0.0%
VALOR A PAGAR	$ 48.854.771,0
PORCENTAJE EJECUTADO	100%

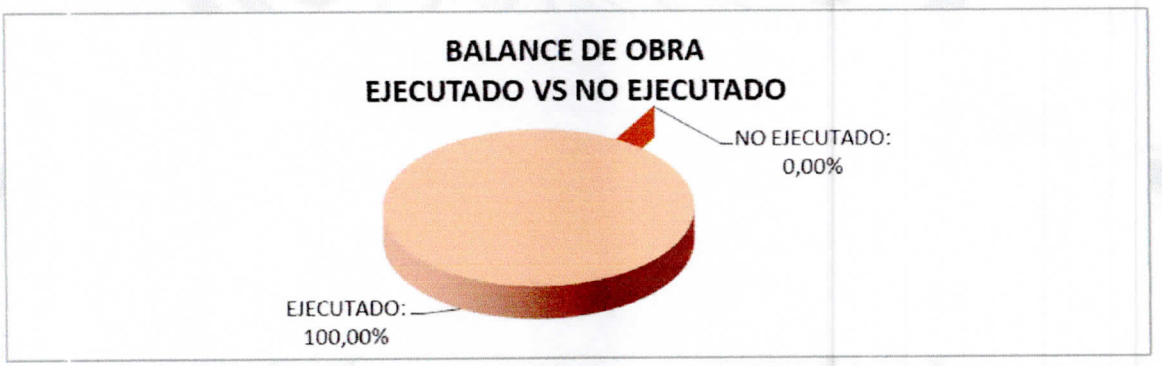

A continuación, se presenta el avance, tanto en tiempo, como físico y financiero del contrato.

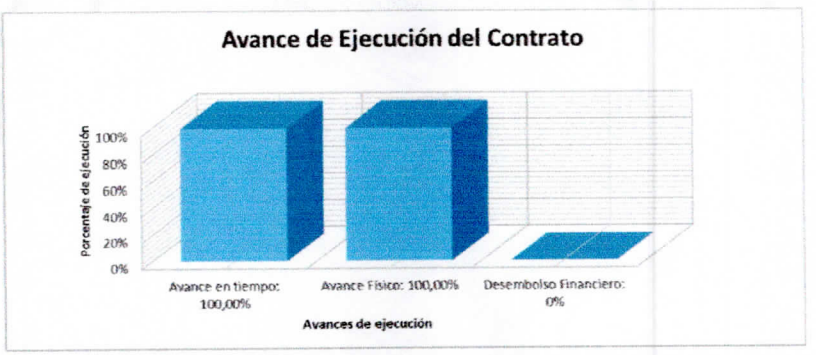

- **PRESTACIONES SOCIALES**

Cumplen con las exigencias contratadas afiliando al personal que trabaja en el proyecto, mano de obra calificada y no calificada, dando cumplimiento a las exigencias contempladas en la contratación.

- **HERRAMIENTAS Y EQUIPOS EN OBRA**

De acuerdo con la necesidad de la obra, se han previsto las necesidades de herramientas y equipo, se tiene disponible en obra la siguiente herramienta y equipos:

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1	Herramienta menor (Escaleras, Carretilla, martillos, palas, picos, Barras, extensiones eléctricas, etc.)	1

1. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

El objeto del contratista es cumplir con la labor contratada con todas las actividades que conllevan a la ejecución y cumplimiento de oferta No 291 de 2026 cuyo objeto es **"MEJORAMIENTO UNIDAD SANITARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL SAN JUAN VIDES (SEDE PRINCIPAL), DEL MUNICIPIO DE ORITO - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"** el cual fue ejecutando por el contratista CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS INTEGRAL JM S.A.S – COINTE JM S.A.S.

Las actividades del contratista, entre otras son las siguientes:

- ✓ Control permanente del personal de la obra que tenga su respectiva seguridad social e implementos de seguridad.
- ✓ Cumplimiento de cada una de cláusulas del contrato (pliego de condiciones, Especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios, presupuestos).
- ✓ En todas las actividades que se desarrollen se le exige al contratista el cumplimiento a Cabalidad de todas las sugerencias y procesos Constructivos. Que garanticen el buen desarrollo de la obra.
- ✓ Evaluación de las actividades, con el fin de tener un adecuado control de la obra ejecutada en desarrollo del contrato.
- ✓ Solución de diferentes interrogantes planteados por el personal

- ✓ Supervisión constante de las labores ejecutadas en el lugar de trabajo.
- ✓ Toma de Decisiones correctas para el buen manejo de los recursos públicos y los mejores procesos constructivos con la utilización de materiales de calidad.
- ✓ Ejecución a cabalidad de todas las actividades contratadas.

CONCLUSIONES

De acuerdo con el desarrollo de las actividades durante la ejecución de la oferta N° 291/2026, con objeto **" CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS INTEGRAL JM S.A.S – COINTE JM S.A.S,** se concluye lo siguiente:

- Se aprueba por parte de la supervisión de la obra en el presente informe de la ejecución de obra realizada por parte del contratista de obra.
- Se dio cumplimiento a las actividades propuestas de acuerdo con el seguimiento técnico dado por la supervisión.
- Las actividades realizadas a la fecha cumplen con los requerimientos de seguridad en el trabajo y con todos los requisitos técnicos para el control de la calidad.
- Se ha atendido todas las recomendaciones técnicas realizadas por la supervisión "secretaria de infraestructura"

EVER ANDRADE Z


EVER ANDRADE ZAMBRANO
representante legal
Contratista

ANEXOS
7.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO

1.1 Limpieza y lavado de Muros, incluye equipos y materiales para su correcta ejecución



2.1 Caja de inspección de 60x60cm en concreto de 3000psi

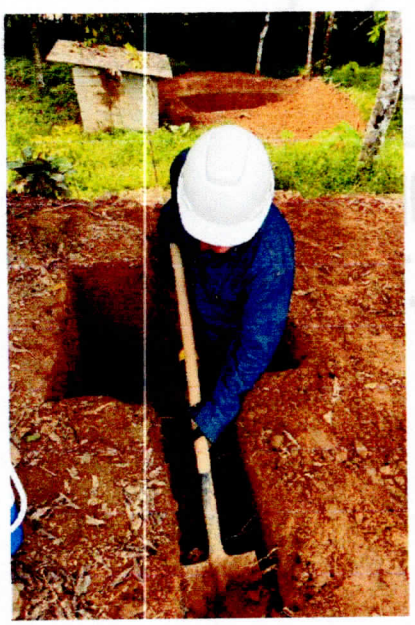









3.1.1 Tanque plástico de 1000 lt, Incluye Accesorios e Instalación.



4.1	Red suministro PVC 1/2"





5.1	Piso en cerámica tráfico 5





6.1	Pintura para exteriores e interiores sobre pañete 3 manos





7.1	Excavación manual en material común







7.2 Suministro e Instalación de tanque séptico imhoff 2000 Lts , Incluye accesorios.




7.3 Suministro e Instalación de Filtro Anaeróbico de Flujo Ascendente (FAFA) 2000Lts.





7.5 Suministro e Instalación de Filtro Aeróbico 1000Lts, Incluye accesorios.

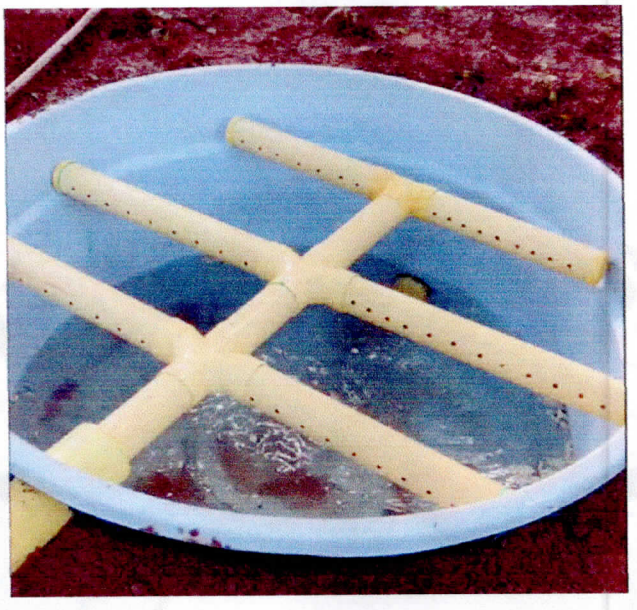



7.6 Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC 110mm.







7.7 Campo de infiltración 10 ML, tubería de drenajes PVC 4", incluye excavación y relleno material lecho filtrante Triturado/Grava Lavada, según especificaciones.

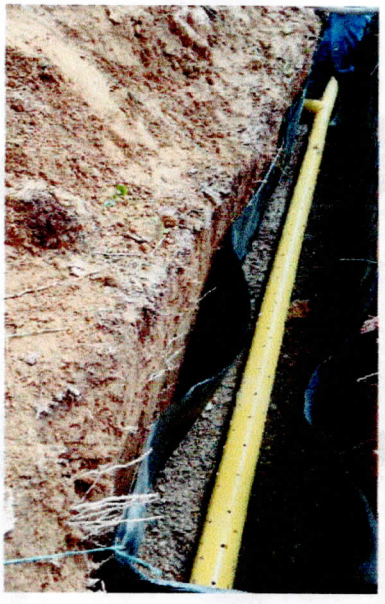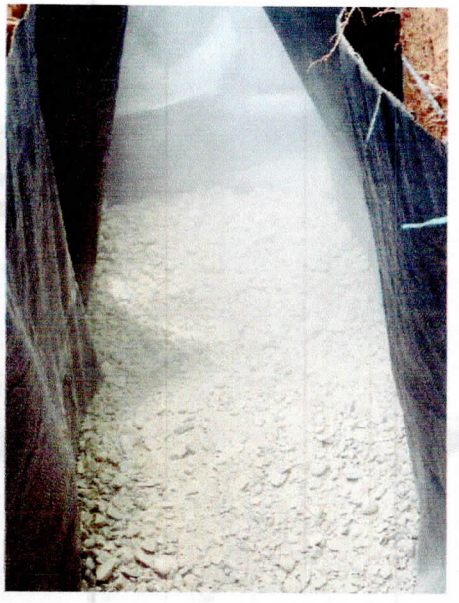
8.1 Acarreo de Material.



