352

	BITACORA DE OBRA Secretaria de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 2 de 2

FECHA	**HORA:**
CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025	**FECHA:** Jueves 11 Diciembre 2025.
OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".	
NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.	

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA
	*Tramo vial Vereda Mamato. Se dio inicio a la conformación de estructura existente y compactación de la misma. Esta actividad se llevó acabo en el tramo definido por la comunidad del sector. Una vez se conforma y nivela la rasante con motoniveladora se procede a realizar compactación de estructura con vibrocompactador de rodillo Dynapac. *Tramo vial vereda Quayabal. Se realizo conformación nivelación y compactación de rasante existente. Garantizando de esta manera uniformidad. En la misma para el manejo de aguas se llevó a cabo la conformación. Con maquinaria motoniveladora de cuchilla en terreno natural. Durante la ejecución de la actividad se contó con acompañamiento de pare-siga (PMIT).

ÍTEM	OBSERVACIONES

Firma Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz** Contratista.: **Consororcio CGJ**	Firma Nombre.: **Fabian Vivi Morales** Interventoría.. **Grupo Quimbaya Ingenieros**

3550

~~353~~

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 2

FECHA **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 **FECHA:** Viernes 12 Diciembre 2025.

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

Maquinaria Amarilla - Comisión topografica.

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra	Ing(s) Residente	Maestro(s)	Oficiales		Ayudantes		Otros:	

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA	OBSERVACIONES
	* Conformación, Nivelación y compactación de terreno existente.	

FOTOS / ESQUEMAS

Firma Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz** Contratista.: **Consororcio CGJ**	Firma Nombre.: **Fabian Vivi Morales** Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 2 de 2

FECHA **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 **FECHA:** Viernes 12 Diciembre 2025.

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA
	* Continuar labores de conformacion de cuneta en terreno natural para los tramos de la vereda Manrato - Se genera material sobrante, producto de la conformacion y excavacion de cunetas para manejo de aguas lluvias superficiales y se conforma superficie de la via. en la vereda Guayabal. * Durante la jornada se realizo implementacion de plan de manejo de transito. (PMT). con pare-siga al inicio y fin del tramo intervenido.

ÍTEM	OBSERVACIONES

Firma Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz** Contratista.: **Consororcio CGJ**	Firma Nombre.: **Fabian Viví Morales** Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 2

FECHA **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 **FECHA:** Sabado 13 Diciembre 2025.

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

Maquinaria Arcanilla – Comisión topografica.

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra	Ing(s) Residente	Maestro(s)	Oficiales	Ayudantes	Otros:

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA	OBSERVACIONES
	* Conformación, Nivelación y compactación terreno.	

FOTOS / ESQUEMAS

Firma Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz** Contratista.: **Consorcio CGJ**	Firma Nombre.: **Fabian Vivi Morales** Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

	BITACORA DE OBRA Secretaria de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 2 de 2

FECHA	**HORA:**	
CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025	**FECHA:** Sabado 13 Diciembe 2025.	
OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".		
NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.		

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA
	* Vereda Cocoyabal, Culmina actividad de conformación Sin novedad alguna y sin inconvenientes con la Comunidad. * Vereda maimoto. Se realiza conformación de cuneta, en terreno natural. Culminando actividad sin inconvenientes o informidades.

ÍTEM	OBSERVACIONES

Firma Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz** Contratista.: **Consorcio CGJ**	Firma Nombre.: **Fabian Vivi Morales** Interventoria.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

3552

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 2

FECHA **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 **FECHA:** Domingo 14 Dic. 2025

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

Maquinaria Amarilla – Comisión Topografica.

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra	Ing(s) Residente	Maestro(s)	Oficiales		Ayudantes		Otros:	

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA	OBSERVACIONES
	* No se programa labor.	

FOTOS / ESQUEMAS

Firma Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz** Contratista.: **Consororcio CGJ**	Firma Nombre.: **Fabian Vivi Morales** Interventoria.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

358

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 2 de 2

FECHA	**HORA:**
CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025	**FECHA:** Domingo 14 Dic. 2025
OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".	
NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.	

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA
	* Dia festivo - No se realizaron labores de campo.

ÍTEM	OBSERVACIONES

Firma Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz** Contratista.: **Consorcio CGJ**	Firma Nombre.: **Fabian Vivi Morales** Interventoria.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

3553

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 2

FECHA **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 **FECHA:** Lunes 15 Dic. 2025

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

Equipos pavimento – Maquinaria Amarilla – Comisión Topografica.

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra	Ing(s) Residente	Maestro(s)	Oficiales		Ayudantes		Otros:	

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA	OBSERVACIONES
	• Suministro instalación de Mezcla asfaltica MDC-19 • Imprimación con emulsión.	

FOTOS / ESQUEMAS

6

Firma Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz** Contratista.: **Consorcio CGJ**	Firma Nombre.: **Fabian Vivi Morales** Interventoria.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

360

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 2 de 2

FECHA **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 **FECHA:** Lunes 15 Dic 2025.

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA
	• Tramo N°1 y Tramo N°2. Vía El Caimo - Portugalito Se dio inicio a la imprimación con emulsión para la instalación de Mezcla asfaltica MDC-19. Se realiza Programación para dos (2) dias de actividad, la, cual se inicia desde PR1+150 con el ancho total de las dos (2) Calzadas - Carril. Durante la ejecución de la actividad, se llevo a cabo con el acompañamiento de la interventoria. Grupo Quimbaya - Para la cual cada suministro se realizo toma de temperatura para Liberación de aplicación realizando sellado y Compactación de mezcla. garantizando actividad del Tramo N°2 total - Durante la actividad se realizo implementación del (PMT)

ÍTEM	OBSERVACIONES

Firma Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz** Contratista.: **Consorcio CGJ**	Firma Nombre.: **Fabian Vivi Morales** Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

3554
~~361~~

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 2

FECHA **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 **FECHA:** Martes 16 Diciembre 2025.

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

Equipo pavimento - Maquinaria Amarilla.

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra	Ing(s) Residente	Maestro(s)	Oficiales	Ayudantes	Otros:

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA	OBSERVACIONES
	• Suministro instalación Mezcla asfaltica MDC-19 • Imprimación con emulsión • Implementación (PMT).	

FOTOS / ESQUEMAS

Firma	Firma
Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz**	Nombre.: **Fabian Vivi Morales**
Contratista.: **Consorcio CGJ**	Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

36r

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 2 de 2

FECHA	**HORA:**
CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025	**FECHA:** Martes 16 Diciembre 2025.
OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".	
NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.	

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA
	• Tramo N°1 entre 120+006. al PUT 2498. Se realiza instalación de mezcla asfaltica MDC-19 a un carril. Teniendo en cuenta observación del Ing Fabia Vivi de implementar el ancho de Via a 6,50 mts. • Se realizo instalación de mezcla asfaltica debidamente compactado y sellada con equipos. Previa verificación y aprobacion de interventoria en temperatura y caracteristicas de mezcla asfaltica suministrada – Durante ejecucion de la actividad se realizo implementación del PMT. - Queda pendiente carril izquierdo sentido 120+009 al KO+2495 – Se programa intervención de acceso al predio contiguo al tramo. para demolición y aplicación mezcla asfaltica en Sitio. verificado y aprobado por la Interventoria.

ÍTEM	OBSERVACIONES

Firma Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz** Contratista.: **Consorcio CGJ**	Firma Nombre.: **Fabian Vivi Morales** Interventoria.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

3555 305

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 2

FECHA **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 **FECHA:** MIERCOLES 17 DICIEMBRE 2025.

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

EQUIPO PAVIMENTO - MAQUINARIA AMARILLA - EQUIPO CORTE PAV.

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing(s) Residente		Maestro(s)		Oficiales		Ayudantes		Otros:	

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA	OBSERVACIONES
	○ CORTE CON DISCO. ○ SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEZCLA ○ DEMOLICIÓN PAVIMENTO EXISTENTE.	

FOTOS / ESQUEMAS

Firma	Firma
Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz**	Nombre.: **Fabian Vivi Morales**
Contratista.: **Consororcio CGJ**	Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 2 de 2

FECHA | **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 | **FECHA:** VIERNES 17 DICIEMBRE 2025.

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA
	• TRAMO N°1 120+666 AL 120+748. CARRIL IZQUIERDO • SE LLEVA A CABO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE MDC19. ACTIVIDAD QUE SE LLEVO A CABO EN CONJUNTO CON LA INTERVENTORIA, GRUPO QUIMBAYA LA CUAL VERIFICO, ESPESOR, CANTIDAD Y TEMPERATURA DE LA MEZCLA SUMINISTRADA. - FINALIZA ACTIVIDAD DE PAVIMENTO AL 100% DE TRAMO VIAL. • TRAMO ACCESO EL CAIMO SE PROCEDIO CON EL CORTE DE PAVIMENTO, DEMOLICIÓN, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, PARA LA IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN EN LA ZONA AFECTADA Y DEFINIDA PARA INTERVENCIÓN. EN ESTE TRAMO SE LLEVO A CABO LA INSTALACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA MDC19. DEBIDA COMPACTADA Y SELLADA CABE ANOTAR QUE LA ESTRUCTURA SOPORTE NO EVIDENCIO AFECTACIÓN ALGUNA POR FUNCIONAMIENTO O FALLO. FINALIZANDO ACTIVIDAD SIN INCONVENIENTE ALGUNO. - DURANTE EJECUCIÓN SE LLEVO A CABO ACOMPAÑAMIENTO O IMPLEMENTACIÓN DE PMT. (PLAN DE MANEJO DE TRANSITO).

ÍTEM	OBSERVACIONES

Firma Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz** Contratista.: **Consorcio CGJ**	Firma Nombre.: **Fabian Vivi Morales** Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

3556

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 2

FECHA **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 **FECHA:** Jueves 18 Diciembre 2025

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

Equipo Corte - herramienta menor.

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing(s) Residente		Maestro(s)		Oficiales		Ayudantes		Otros:	

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA	OBSERVACIONES
	Corte duro, pavimento Conformación cuneta Suministro base granular.	

FOTOS / ESQUEMAS

Firma Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz** Contratista.: **Consorcio CGJ**	Firma Nombre.: **Fabian Vivi Morales** Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 2 de 2

FECHA	**HORA:**
CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025	**FECHA:** Jueves 18 Diciembre 2025
OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".	
NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.	

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA
	Para la construcción de cuneta en concreto rimpa Figura triangular. Se llevo a cabo el corte con dicha para garantizar alineamiento y uniforme. La estructura de la cuneta a borde de via. Se realizo excavación manual para conformación de estructura Soporte de cuneta. esta actividad se lleva a cabo en el tramo #2. iniciando aguas abajo desde 20+050 al 12+100 - Durante la ejecución de actividades se implementa el plan de manejo de transito (PMT).

ÍTEM	OBSERVACIONES

Firma Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz** Contratista.: **Consorcio CGJ**	Firma Nombre.: **Fabian Vivi Morales** Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

3557

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 2

FECHA **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 **FECHA:** VIERNES 19 DICIEMBRE 2025.

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

EQUIPO CORTE PAVIMENTO - HERRAMIENTA MENOR.

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing(s) Residente		Maestro(s)		Oficiales		Ayudantes		Otros:	

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA	OBSERVACIONES
	◦ CORTE PAVIMENTO ◦ CONFORMACIÓN ESTRUCTURA ◦ BASE GRANULAR.	

FOTOS / ESQUEMAS

Firma	Firma
Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz**	Nombre.: **Fabian Vivi Morales**
Contratista.: **Consorcio CGJ**	Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 2 de 2

FECHA	**HORA:**
CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025	**FECHA:** VIERNES 19 DICIEMBRE 2025.
OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".	
NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.	

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA
	CONTINUA CORTE CON DUCO DE PAVIMENTO PARA CONFORMACIÓN DE CUNETA. MATERIAL EN CONCRETO DEL TRAMO Nº2 (120+650 AL 121+100) - SE COLOCA FORMALETA DE RESPALDAR DE CUNETA (PLANILLA) PARA CONFORMACIÓN Y ALISTAMIENTO - SE CONFORMO MATERIAL GRANULAR DE BASE. TIPO INVIAS. Y SE REALIZA IMPLEMENTACIÓN AMT DURANTE EJECUCION DE ACATIVIDAD.

ÍTEM	OBSERVACIONES

Firma Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz** Contratista.: **Consorcio CGJ**	Firma Nombre.: **Fabian Vivi Morales** Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

3558

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 2

FECHA **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 **FECHA:** SABADO 20 DICIEMBRE 2025.

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

EQUIPO CORTE **Horas de lluvia (señale con una X)**

Estado del tiempo				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

EQUIPO CORTE – H. MEDIDA.

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing(s) Residente		Maestro(s)		Oficiales		Ayudantes		Otros:	

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA	OBSERVACIONES
	• CORTE CON DISCO • CONFORMACIÓN SOPORTE.	

FOTOS / ESQUEMAS

Firma	Firma
Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz**	Nombre.: **Fabian Viví Morales**
Contratista.: **Consorcio CGJ**	Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 2 de 2

FECHA	**HORA:**
CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025	**FECHA:** SABADO 20 DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".	
NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.	

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA
	«TRAMO Nº 2 (600 - 1.150). SE CONFORMA ESTRUCTURA. SOPORTE DE CUNETA CONCRETO 2000 PSI. CON MATERIAL GRANULAR BASE TIPO INVIAS. PARA LA OBRA ARTE UBICADA K21+100 SE INICIO CON LA COLOCACIÓN ACERO PARA PLACA DE PISOS Y ALETAS EN CONCRETO. CUBRIENDO TUBERIA MANGUITO DIAM 36 PULGADAS PVC. SE PREPARA TRAMO DE CONSTRUCCIÓN: CUNETA EN CONCRETO.

ÍTEM	OBSERVACIONES

Firma Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz** Contratista.: **Consorcio CGJ**	Firma Nombre.: **Fabian Vivi Morales** Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

3559.

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 2

FECHA **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 **FECHA:** DOMINGO 21 DICIEMBRE 2025

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

EQUIPO CORTE - CONCRETADORA - HERRAMIENTA MENOR.

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing(s) Residente		Maestro(s)		Oficiales		Ayudantes		Otros:	

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA	OBSERVACIONES
	• CORTE CON DISCO. • IMPLEMENTACIÓN PMT.	

FOTOS / ESQUEMAS

Firma	Firma
Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz**	Nombre.: **Fabian Viví Morales**
Contratista.: **Consorcio CGJ**	Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 2 de 2

FECHA	HORA:
CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025	FECHA: Domingo 21 Oct 2025
OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".	
NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.	

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA
	• DIA FESTIVO - NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES.

ÍTEM	OBSERVACIONES

Firma Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz** Contratista.: **Consorcio CGJ**	Firma Nombre.: **Fabian Viví Morales** Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

3560

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 2

FECHA **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 **FECHA:** LUNES 22 DIC. / 2025

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

EQUIPO CORTE PAVIMENTO - HERRAMIENTA MENOR.

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing(s) Residente		Maestro(s)		Oficiales		Ayudantes		Otros:	

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA	OBSERVACIONES
	• CONSTRUCCION CUNETA ZIGZAG	
	• CONFORMACIÓN SUBBASE	
	• CORTE CON EQUIPO PAVIMENTO	

FOTOS / ESQUEMAS

Firma Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz** Contratista.: **Consorcio CGJ**	Firma Nombre.: **Fabian Viví Morales** Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 2 de 2

FECHA	**HORA:**
CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025	**FECHA:** JUEVES 22 OIC/ 2025
OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".	
NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.	

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA
	• PRANO Nº2 SE DIO INICIO A CONSTRUCCIÓN DE CUNETA EN CONCRETO DE RESISTENCIA 3000 PSI EL CUAL ES UTILIZADO CON PRENEZCLADO. SE CONTRUYE CUNETA PARA MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES CON ENTREGA DE CABEZAL DE DESCARGUE EXISTENTE. SE TOMA MUESTRA DE CONCRETO PARA CONTROL. DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN.
	• PRANO Nº1 SE REALIZA CORTE CON DISCO MARGEN IZQUIERDA PARA CONSTRUCCIÓN DE CUNETA EN CONCRETO.

ÍTEM	OBSERVACIONES

Firma Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz** Contratista.: **Consorcio CGJ**	Firma Nombre.: **Fabian Vivi Morales** Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 2

FECHA **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 **FECHA:** MARTES 23 DICIEMBRE 2025.

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

CARGADOR DAILGENTO – CARRETO PREVELCHADO.

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing(s) Residente		Maestro(s)		Oficiales		Ayudantes		Otros:	

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA	OBSERVACIONES
	• CORTE CON DISCO • CONFORMACIÓN SOPORTE DE CUNETA.	

FOTOS / ESQUEMAS

Firma	Firma
Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz**	Nombre.: **Fabian Vivi Morales**
Contratista.: **Consorcio CGJ**	Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 2 de 2

FECHA	**HORA:**
CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025	**FECHA:** MARTES 23 OCT/ 2025.
OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".	
NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.	

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA
	DRENO #2. SE REALIZA RETRO DE FORMALETA MADERA. EN EL TRAMO VACIADO. Y SE REALIZA CONFORMACIÓN DE ESTRUCTURA PARA COLOCACIÓN DE FORMALETA Y SE REALIZA CORTE EN EL TRAMO #1 PARA CUNETA.

ÍTEM	OBSERVACIONES

Firma Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz** Contratista.: **Consororcio CGJ**	Firma Nombre.: **Fabian Vivi Morales** Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

3562

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 2

FECHA **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 **FECHA:** MIERCOLES 24 DIC/2025.

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

CORTADORA PAVIMENTO – HERRAMIENTA MENOR.

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing(s) Residente		Maestro(s)		Oficiales		Ayudantes		Otros:	

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA	OBSERVACIONES
	• CORTE PAVIMENTO • CONSTRUCCION CUNETA VACIADO CONCRETO.	

FOTOS / ESQUEMAS

Firma	Firma
Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz**	Nombre.: **Fabian Viví Morales**
Contratista.: **Consorcio CGJ**	Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 2 de 2

FECHA	**HORA:**
CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025	**FECHA:** MIERCOLES 24 DIC/2025
OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".	
NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.	

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA
	PRIMO #2: SE REALIZA VACIADO O APLICACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA CONSTRUCCION DE CUNETA 2 LOSA. PREVIO AL VACIADO DE CONCRETO. SE PROCEDIO CON LA COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA Hierro. CON ABERTURAS 15X15 CM. SE GARANTIZADO ESPESOR DE ESPESOR 12 CMS - SE CONFORMA SOPORTE DE ESTRUCTURA PARA CONSTRUCCIÓN DE CUNETA.

ÍTEM	OBSERVACIONES

Firma Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz** Contratista.: **Consororcio CGJ**	Firma Nombre.: **Fabian Vivi Morales** Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

3563

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 2

FECHA **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 **FECHA:** JUEVES 25 DIC/2025.

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

EQUPO CORTE - HERRAMIENTA MENOR.

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing(s) Residente		Maestro(s)		Oficiales		Ayudantes		Otros:	

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA	OBSERVACIONES
	• NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD.	

FOTOS / ESQUEMAS

Firma	Firma
Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz**	Nombre.: **Fabian Vivi Morales**
Contratista.: **Consororcio CGJ**	Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 2 de 2

FECHA **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 **FECHA:** JUEVES 25 DIC/2025.

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA
	• DIA NAVIDAD, NO SE PROGRAMA ACTIVIDADES OBRA.

ÍTEM	OBSERVACIONES

Firma Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz** Contratista.: **Consorcio CGJ**	Firma Nombre.: **Fabian Viví Morales** Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

3564.

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 2

FECHA **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 **FECHA:** VIERNES 26 DIC 2025.

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing(s) Residente		Maestro(s)		Oficiales		Ayudantes		Otros:	

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA	OBSERVACIONES
	• NO SE REALIZAN LABORES	

FOTOS / ESQUEMAS

Firma	Firma
Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz**	Nombre.: **Fabian Viví Morales**
Contratista.: **Consorcio CGJ**	Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 2 de 2

FECHA **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 **FECHA:** VIERNES 26 DIC/2025.

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA
	- DIA FESTIVO, NO SE PROGRAMARÓN ACTIVIDADES.

ÍTEM	OBSERVACIONES

Firma Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz** Contratista.: **Consorcio CGJ**	Firma Nombre.: **Fabian Vivi Morales** Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

3565

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 2

FECHA **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 **FECHA:** SABADO 27 DIC/2025

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing(s) Residente		Maestro(s)		Oficiales		Ayudantes		Otros:	

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA	OBSERVACIONES
	NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD	

FOTOS / ESQUEMAS

Firma	Firma
Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz**	Nombre.: **Fabian Vivi Morales**
Contratista.: **Consororcio CGJ**	Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 2 de 2

FECHA	**HORA:**
CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025	**FECHA:** SABADO 27/ DIC 2025-
OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".	
NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.	

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA
	-NO SE REALIAN ACTIVIDADES EN OBRA

ÍTEM	OBSERVACIONES

Firma Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz** Contratista.: **Consororcio CGJ**	Firma Nombre.: **Fabian Vivi Morales** Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

3566

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 2

FECHA **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 **FECHA:** DOMINGO 28 DIC/2025

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing(s) Residente		Maestro(s)		Oficiales		Ayudantes		Otros:	

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA	OBSERVACIONES
	-NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD	

FOTOS / ESQUEMAS

Firma	Firma
Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz**	Nombre.: **Fabian Vivi Morales**
Contratista.: **Consororcio CGJ**	Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 2 de 2

FECHA **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 **FECHA:** Domingo 28 DIC/2025.

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA
	- DIA FESTIVO. NO SE PROGRAMA ACTIVIDADES.

ÍTEM	OBSERVACIONES

Firma Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz** Contratista.: **Consororcio CGJ**	Firma Nombre.: **Fabian Viví Morales** Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

3567

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 2

FECHA **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 **FECHA:** LUNES 29 DIC 2025.

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

CONFORMACIÓN – CONCRETO PREMEZCLADO

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing(s) Residente		Maestro(s)		Oficiales		Ayudantes		Otros:	

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA	OBSERVACIONES
	• CONFORMACIÓN • CONCRETO PREMEZCLADO.	

FOTOS / ESQUEMAS

Firma	Firma
Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz**	Nombre.: **Fabian Viví Morales**
Contratista.: **Consorcio CGJ**	Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 2 de 2

FECHA **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 **FECHA:** LUNES 29 DIC 2025

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA
	• TRAMO #2: SE REALIZA CONFORMACIÓN DE ESTRUCTURA SOPORTE PARA CUNETA EN CONCRETO 21 MPA Y APLICACIÓN DE BASE GRANULAR TIPO INVIAS. SE REALIZA APLICACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO. CON RESISTENCIA 21 MPA GARANTIZANDO SU ESPESOR Y HOMOGENEIDAD EN LA MEZCLA.

ÍTEM	OBSERVACIONES

Firma Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz** Contratista.: **Consorcio CGJ**	Firma Nombre.: **Fabian Viví Morales** Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

3568

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 2

FECHA **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 **FECHA:** MARTES 30 DE 2025.

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

CORTADORA PAVIMENTO - HERRAMIENTA MENOR.

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing(s) Residente		Maestro(s)		Oficiales		Ayudantes		Otros:	

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA

ITEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA	OBSERVACIONES
	• CONFORMACIÓN SUBBASE CONCRETO PREMEZCLADO.	

FOTOS / ESQUEMAS

Firma	Firma
Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz**	Nombre.: **Fabian Viví Morales**
Contratista.: **Consorcio CGJ**	Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 2 de 2

FECHA	**HORA:**
CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025	**FECHA:** MARTES 30 OCT 2025
OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".	
NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.	

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA
	. TRAMO #2 SE REALIZA CONFORMACIÓN, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE ESTRUCTURA SOPORTE PARA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CONCRETO - DURANTE LA JORNADA SE REALIZA IMPLEMENTACIÓN DE (PMT)

ÍTEM	OBSERVACIONES

Firma Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz** Contratista.: **Consorcio CGJ**	Firma Nombre.: **Fabian Vivi Morales** Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

3569

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 2

FECHA **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 **FECHA:** MIERCOLES 31 DE 2025.

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

CARTAPORA PAVIMENTO - HERRAMIENTA MENOR.

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing(s) Residente		Maestro(s)		Oficiales		Ayudantes		Otros:	

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA	OBSERVACIONES
	• CONFORMACIÓN SUPORTE • CUNETA CONCRETO.	

FOTOS / ESQUEMAS

Firma	Firma
Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz**	Nombre.: **Fabian Vivi Morales**
Contratista.: **Consorcio CGJ**	Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 2 de 2

FECHA	HORA:
CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025	FECHA: MIERCOLES 31/DIC 2025.

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA
	- EN EL TRAMO #2. SE REALIZA CONFORMACIÓN DE ESTRUCTURA SOPORTE E INSTALACIÓN DE BASE GRANULAR TPO INVIAS. EN AMBOS COSTADOS COSTADOS DE LA VIA. CONSTRUIDA PARA EL PROYECTO. SE REALIZO VACIADO DE CONCRETO 21 MPA PARA CONSTRUCCIÓN DE CUNETA TRIANGULAR.

ÍTEM	OBSERVACIONES

Firma	Firma
Nombre.: Jhoany Alexander Tabón Muñoz	Nombre.: Fabian Viví Morales
Contratista.: Consororgio CGJ	Interventoría.: Grupo Quimbaya Ingenieros

3570

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 2

FECHA **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 **FECHA:** JUEVES 1 ENERO 2026.

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing(s) Residente		Maestro(s)		Oficiales		Ayudantes		Otros:	

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA	OBSERVACIONES
	ASEO GENERAL PROYECTO.	

FOTOS / ESQUEMAS

Firma	Firma
Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz**	Nombre.: **Fabian Viví Morales**
Contratista.: **Consorcio CGJ**	Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 2 de 2

FECHA HORA:

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 **FECHA:** JUEVES 1 ENERO 2026

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA
	• DEBIDO A FESTIVIDAD DE FIN DE AÑO. SE REALIZA JORNADA DE ORDEN Y ASEO GENERAL DEL PROYECTO CO ANTERIOR TENIENDO EN CUENTA ZONA TURISTICA

ÍTEM	OBSERVACIONES

Firma Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz** Contratista.: **Consorcio CGJ**	Firma Nombre.: **Fabian Vivi Morales** Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

3571

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 2

FECHA **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 **FECHA:** VIERNES 2 ENERO 2026.

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing(s) Residente		Maestro(s)		Oficiales		Ayudantes		Otros:	

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA	OBSERVACIONES
	NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD.	

FOTOS / ESQUEMAS

Firma Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz** Contratista.: **Consorcio CGJ**	Firma Nombre.: **Fabian Vivi Morales** Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 2 de 2

FECHA **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 **FECHA:** VIERNES 2 ENERO 2026.

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA
	- DIA FESTIVO. NO SE PROGRAMA LABORES EN OBRA.

ÍTEM	OBSERVACIONES

Firma Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz** Contratista.: **Consorcio CGJ**	Firma Nombre.: **Fabian Vivi Morales** Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

3572

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 2

FECHA **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 **FECHA:** SABADO 03 ENERO 2026.

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

EQUIPO CORTE PAVIMENTO - CONCRETO PREMEZCLADO

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing(s) Residente		Maestro(s)		Oficiales		Ayudantes		Otros:	

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA	OBSERVACIONES
	• CONFORMACION ESTRUCTURA APLICACION BASE	

FOTOS / ESQUEMAS

Firma	Firma
Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz**	Nombre.: **Fabian Vivi Morales**
Contratista.: **Consorcio CGJ**	Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 2 de 2

FECHA	**HORA:**
CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025	**FECHA:** SABADO 03 ENERO 2026.
OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".	
NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.	

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA
	• SE REALIZO CONFORMACIÓN PARA SOPORTE Y CONSTRUCCIÓN DE CUNETA EN CONCRETO 2UNPA A BORDE DE VIA EN PAVIMENTO ASFALTICO – IMPLEMENTACIÓN (ANT).

ÍTEM	OBSERVACIONES

Firma Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz** Contratista.: **Consorcio CGJ**	Firma Nombre.: **Fabian Vivi Morales** Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

3573

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 2

FECHA **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 **FECHA:** DOMINGO 4 DICIEMBRE 2020.

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing(s) Residente		Maestro(s)		Oficiales		Ayudantes		Otros:	

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA	OBSERVACIONES
	NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD.	

FOTOS / ESQUEMAS

Firma	Firma
Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz**	Nombre.: **Fabian Vivi Morales**
Contratista.: **Consororcio CGJ**	Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 2 de 2

FECHA	**HORA:**
CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025	**FECHA:** DOMINGO 04 DE OCTUBRE DE 2026.
OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".	
NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.	

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA
1	DIA FESTIVO, NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD.

ÍTEM	OBSERVACIONES

Firma Nombre.: **Jhoany Alexander Tabón Muñoz** Contratista.: **Consororgio CGJ**	Firma Nombre.: **Fabian Viví Morales** Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

3574.

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 2

FECHA **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 **FECHA:** LUNES 05 ENERO 2026.

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

EQUIPO CORTE PAVIMENTO - 1 MENOR.

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing(s) Residente		Maestro(s)		Oficiales		Ayudantes		Otros:	

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA	OBSERVACIONES
	• BASE GRANULAR CONFORMACION CONCRETO 21 MPa.	

FOTOS / ESQUEMAS

Firma	Firma
Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz**	Nombre.: **Fabian Vivi Morales**
Contratista.: **Consorcio CGJ**	Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 2 de 2

FECHA	**HORA:**
CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025	**FECHA:** LUNES 05 ENERO 2026.
OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".	
NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.	

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA
	a) TRAMO #2. SE REALIZA VACIADO DE CONCRETO PREMEZCLADO CON RESISTENCIA 3000 PSI PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA HIDRAULICA – CUNETA TRIANGULAR Y SE INICIA A CARGO PREPARACIÓN DE TRAMOS PENDIENTES POR CONSTRUCCION DE CUNETA. SE REALIZA CORTE CON DISCO PARA PAVIMENTO EN EL TRAMO #1. COSTADO DERECHO PARALELO A ANDEN EXISTENTE PARA LA CONSTRUCCION DE BORDILLO EN CONCRETO. ESTE ELEMENTO CONTRIBUIRA AL CONTROL DE AGUAS SUPERFICIALES POR ESCORRENTIAS (MANEJO AGUAS).

ÍTEM	OBSERVACIONES

Firma Nombre.: Jhoany Alexander Tobón Muñoz Contratista.: **Consorcio CGJ**	Firma Nombre.: **Fabian Vivi Morales** Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

3575

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 2

FECHA **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 **FECHA:** MARTES 06 ENERO 2026.

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

EQUIPO PUNTE PAVIMENTO – CONCRETO PREMEZCLADO.

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing(s) Residente		Maestro(s)		Oficiales		Ayudantes		Otros:	

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA	OBSERVACIONES
	CONCRETO PREMEZCLADO BASE GRANULAR PERFORACIÓN (BROCA 1/2).	

FOTOS / ESQUEMAS

Firma Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz** Contratista.: **Consorcio CGJ**	Firma Nombre.: **Fabian Viví Morales** Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 2 de 2

FECHA	**HORA:**
CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025	**FECHA:** MARTES 6 ENERO 2026.
OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".	
NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.	

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA
	TRAMO #2. SE LLEVA A CABO VACIADO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS TRIANGULARES FINALIZA LA ACTIVIDAD PARA TRAMO #2. NOTA. QUEDA PENDIENTE LA CONSTRUCCION DE CUNETA DESDE EL 121+100 AL 121+150. ATRASADO A TEMA PRESUPUESTAL DEL PROYECTO.
	TRAMO #1 SE REALIZA PERFORACIONES POR BROCA N°1/2" PARA REALIZAR ANCLAJES DE ACERO TIPO "U" A CADA PAO (MTS) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SARDINEL EN CONCRETO

ÍTEM	OBSERVACIONES

Firma Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz** Contratista.: **Consorcio CGJ**	Firma Nombre.: **Fabian Vivi Morales** Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

3576

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 2

FECHA **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 **FECHA:** MIERCOLES 07 ENERO 2026.

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

CONCRETO PREMEZCLADO - HERRAMIENTA MENOR.

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing(s) Residente		Maestro(s)		Oficiales		Ayudantes		Otros:	

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA	OBSERVACIONES
	SARDINEL CONCRETO PERFORACIÓN ANCLAJE.	

FOTOS / ESQUEMAS

Firma	Firma
Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz**	Nombre.: **Fabian Vivi Morales**
Contratista.: **Consorcio CGJ**	Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 2 de 2

FECHA | **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 | **FECHA:** MIERCOLES 07 ENERO 2026.

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA
	• TRAMO #1. PERFORACIÓN ANCLAJE DE ACERO REFUERZO. PARA CONSTRUCCIÓN DE SARDINEL EN CONCRETO AL MARGEN. DERECHO DEL TRAMO #1. OBRA PARA CONTROL DE AGUA DE ESCORRENTIA - SE REALIZA CORTE CON UN DISCO Y DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE PARA CONSTRUCCIÓN DE TAPA EN CONCRETO TIPO MANHOLE UBICADA 120+038 Y- ZONA DONDE SE UBICA RECAMARA AGUA RESIDUAL Y LLUVIA DEL CORREGIMIENTO DEL CAIMO.

ÍTEM	OBSERVACIONES

Firma Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz** Contratista.: **Consorcio CGJ**	Firma Nombre.: **Fabian Viví Morales** Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

3577

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 2

FECHA **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 **FECHA:** JUEVES 08 ENERO 2026.

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

EQUIPO CORTE - CONCRETO.

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing(s) Residente		Maestro(s)		Oficiales		Ayudantes		Otros:	

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA	OBSERVACIONES
	PERFORACIÓN Y ANCLAJE #12 Y FORMALETA PARA SARDINEL CTO. EXCAVACIÓN.	

FOTOS / ESQUEMAS

Firma	Firma
Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz**	Nombre.: **Fabian Viví Morales**
Contratista.: **Consorcio CGJ**	Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 2 de 2

FECHA	**HORA:**
CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025	**FECHA:** JUEVES 08 ENERO 2026.
OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".	
NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.	

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA
	• TRAMO #1 SE REALIZA COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA CONSTRUCCIÓN DE TAPA EN CONCRETO MANHOLE UBICADA 120+038 MARGEN DERECHA Y SE REALIZA PERFORACIÓN EN SARDINEL O ANDEN EN CONCRETO EXISTENTE, PARA CONSTRUCCIÓN DE SARDINEL DE PROTECCIÓN MARGEN DERECHA DEL TRAMO #1 ANCLAJES A CADA 40 CMS. PROF 10 CMS. PARA COLOCACIÓN DE ACERO REFUERZO "VES" N°3 Y LONGI N°2 CORRIDA - SE INICIA CON LA COLOCACIÓN DE FORMALETA EN MADERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SARDINEL. EN CONCRETO.

ÍTEM	OBSERVACIONES

Firma Nombre.: Jhoany Alexander Tobón Muñoz Contratista.: Consorcio CGJ	Firma Nombre.: Fabian Vivi Morales Interventoría.: Grupo Quimbaya Ingenieros

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 2

FECHA **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 **FECHA:** VIERNES 09 ENERO 2026.

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

EQUIPO CONCRETO – EQUIPO CORTE.

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing(s) Residente		Maestro(s)		Oficiales		Ayudantes		Otros:	

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA	OBSERVACIONES
	○ CONSTRUCCIÓN DE SARDINEL EN CONCRETO. • PERFORACIÓN Y ANCLAJE • VACIADO TAPA CONCRETO ○ INSTALACIÓN TAPA POLIPROPILENO.	

FOTOS / ESQUEMAS

Firma	Firma
Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz**	Nombre.: **Fabian Viví Morales**
Contratista.: **Consorcio CGJ**	Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 2 de 2

FECHA	**HORA:**
CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025	**FECHA:** VIERNES 09 ENERO 2026.
OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".	
NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.	

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA
	TRAMO #1. SE VACEA CONCRETO PARA TIPO MANHOLE CON INSTALACIÓN DE TAPA PLASTICA VEHICULAR EN EL 120+035. Y SE VACEA CONCRETO PARA CONSTRUCCIÓN DE SARDINEL CONCRETO.

ÍTEM	OBSERVACIONES

Firma Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz** Contratista.: **Consorcio CGJ**	Firma Nombre.: **Fabian Viví Morales** Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

3579.

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 2

FECHA **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 **FECHA:** SABADO 10 ENERO 2026.

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

EQUIPO CORTE - HERRAMIENTA MENOR.

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing(s) Residente		Maestro(s)		Oficiales		Ayudantes		Otros:	

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA	OBSERVACIONES
	○ CONCRETO PARA SARDINEL. - ANCLAJE Y PERFORACIÓN.	

FOTOS / ESQUEMAS

Firma	Firma
Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz**	Nombre.: **Fabian Vivi Morales**
Contratista.: **Consorcio CGJ**	Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 2 de 2

FECHA	HORA:
CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025	FECHA: SABADO 10 ENERO 2026.
OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".	
NOTA: Realizar anotaciones día a día, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.	

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA
	TRAMO N°1. SE ENCOFRA CONCRETO 21 MPA PARA CONSTRUCCIÓN DE SARDINEL EN CONCRETO Y SE REALIZO PERFORACIÓN CON BROCA 1/2 DIAMETO A CADA 40 CM PARA ANCLAJE DE "U" CON EPOXICO ANCHOR FIX. SE PREPARA TRAMO PARA VACIADO DE CONCRETO. EN CONSTRUCCIÓN DE SARDINEL.

ÍTEM	OBSERVACIONES

Firma Nombre.: Jhoany Alexander Tobón Muñoz Contratista.: Consorcio CGJ	Firma Nombre.: Fabian Vivi Morales Interventoría.: Grupo Quimbaya Ingenieros

3580

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 2

FECHA **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 **FECHA:** DOMINGO 11 ENERO 2026 .

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vias Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing(s) Residente		Maestro(s)		Oficiales		Ayudantes		Otros:	

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA

ITEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA	OBSERVACIONES
	NO SE PROGRAMA ACTIVIDADES	

FOTOS / ESQUEMAS

Firma	Firma
Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz**	Nombre.: **Fabian Vivi Morales**
Contratista.: **Consorcio CGJ**	Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 2 de 2

FECHA **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 **FECHA:** Domingo 11 ENERO 2026.

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA
	DIA FESTIVO NO SE REALIZAN LABORES EN OBRA.

ÍTEM	OBSERVACIONES

Firma Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz** Contratista.: **Consorcio CGJ**	Firma Nombre.: **Fabian Vivi Morales** Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 2

FECHA	**HORA:**
CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025	**FECHA:** LUNES 12 ENERO 2026.
OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".	
NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.	

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing(s) Residente		Maestro(s)		Oficiales		Ayudantes		Otros:	

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA	OBSERVACIONES
	• PERFORACIÓN Y ANCLAJE PARA CONSTRUCCIÓN DE SARDINEL BORDILLO • FORMALETA, MADERA.	

FOTOS / ESQUEMAS

Firma	Firma
Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz**	Nombre.: **Fabian Viví Morales**
Contratista.: **Consorcio CGJ**	Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 2 de 2

FECHA	HORA:
CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025	FECHA: LUNES 12 ENERO 2026
OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".	
NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.	

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA
	TRAMO N°1 ENTRE PK 0+006 HASTA 1+004 HSS SE REALIZA PERFORACIONES CADA 40 CMS PARA COLOCACIÓN DE ACERO REFUERZO CON ADHESIVO EPOXICO SIKA ACERO DE REFUERZO N°3. (3/8"). Y LONGITUDINAL N°2 (1/4") SE COLOCA FORMALETA EN MADERA PARA CONSTRUCCIÓN DE SARDINEL, A MARGEN DERECHA. SOBRE ANDEN EXISTENTE.

ÍTEM	OBSERVACIONES

Firma Nombre.: Jhoany Alexander Tobón Muñoz Contratista.: Consororcio CGJ	Firma Nombre.: Fabian Viví Morales Interventoría.: Grupo Quimbaya Ingenieros

3582

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 2

FECHA **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 **FECHA:** MARTES 13 ENERO 2026

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing(s) Residente		Maestro(s)		Oficiales		Ayudantes		Otros:	

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA	OBSERVACIONES
	• CONSTRUCCIÓN SARDINEL SIN COMPLETOS	

FOTOS / ESQUEMAS

Firma	Firma
Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz**	Nombre.: **Fabian Viví Morales**
Contratista.: **Consorcio CGJ**	Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 2 de 2

FECHA | **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 | **FECHA:** MARTES. 13 ENERO 2026.

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA
	PLANO N°1 (9201458) SE REALIZA LA CONSTRUCCIÓN DE SARDINEL EN CONCRETO SOBRE MURO EXISTENTE PARA MANEJO DE AGUA DE ESCORRENTIA SUPERFICIAL PRODUCIDA POR LA LLUVIA - SE PREPARA PLANO SIGUIENTE PARA CONSTRUCCIÓN DE SARDINEL CON LA CONSTRUCCIÓN DE FORMALETA MADERA RESPETANDO EL BORDE DE VIA.

ÍTEM	OBSERVACIONES

Firma Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz** Contratista.: **Consororcio CGJ**	Firma Nombre.: **Fabian Vivi Morales** Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

3583.

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 2

FECHA **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 **FECHA:** MIERCOLES 14 ENERO 2026

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing(s) Residente		Maestro(s)		Oficiales		Ayudantes		Otros:	

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA	OBSERVACIONES
	ANCHAJE Y PERFORACION EN CONCRETO FORMALETA METALICA CONCRETO 21 MPA.	

FOTOS / ESQUEMAS

Firma Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz** Contratista.: **Consorcio CGJ**	Firma Nombre.: **Fabian Vivi Morales** Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 2 de 2

FECHA	**HORA:**
CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025	**FECHA:** MIERCOLES 14 ENERO 2026.
OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".	
NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.	

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA
	-DRENAJE Nº1 SE REALIZA COLOCACIÓN DE FORMALETA EN MADERA A BORDE DE VIA. CONSTRUIDA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SARDINEL. UBICADA SOBRE MURO EN CONCRETO EXISTENTE PARA CONTROL DE AGUAS POR ESCORRENTIA SUPERFICIAL.

ÍTEM	OBSERVACIONES

Firma Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz** Contratista.: **Consororcio CGJ**	Firma Nombre.: **Fabian Viví Morales** Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

3584

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 2

FECHA **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 **FECHA:** JUEVES 15 ENERO 2026.

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing(s) Residente		Maestro(s)		Oficiales		Ayudantes		Otros:	

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA	OBSERVACIONES
	VACIADO CONCRETO PARA SARDINEL	

FOTOS / ESQUEMAS

Firma Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz** Contratista.: **Consorcio CGJ**	Firma Nombre.: **Fabian Vivi Morales** Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 2 de 2

FECHA	**HORA:**
CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025	**FECHA:** JUEVES 15 ENERO 2026.
OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".	
NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.	

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA
	SE LLEVO A CABO LA PREPARACIÓN DE CONCRETO E INSTALACIÓN DEL MURO PARA VACIADO DE ESTRIBO TIPO SARDINEL UBICADO TRAMO N°1 (120+006 - 120+055). FINALIZA ACTIVIDAD POR CANTIDAD DE PRESUPUESTO SE DEJA DEBIDAMENTE SEÑALIZADA LA ZONA PARA EVITAR DAÑO DEL ESTRIBO.

ÍTEM	OBSERVACIONES

Firma Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz** Contratista.: **Consorcio CGJ**	Firma Nombre.: **Fabian Vivi Morales** Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

3585

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 2

FECHA **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 **FECHA:** VIERNES 16 ENERO 2026

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing(s) Residente		Maestro(s)		Oficiales		Ayudantes		Otros:	

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA

ITEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA	OBSERVACIONES
	PERFORACIÓN Y ANCLAJE DE ACERO REFUERZO PARA SARDINEL.	

FOTOS / ESQUEMAS

Firma	Firma
Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz**	Nombre.: **Fabian Vivi Morales**
Contratista.: **Consorcio CGJ**	Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 2 de 2

FECHA	HORA:
CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025	FECHA:
OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".	
NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.	

ITEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA
	• Se realizaron perforaciones con broca de 5 1/2" para instalación de "U" en acero N° 3. en la construcción de sardinel en concreto del tramo N° 1. Vía el mismo - Portugalito

ITEM	OBSERVACIONES

Firma Nombre.: Jhoany Alexander Tobón Muñoz Contratista.: Consororcio CGJ	Firma Nombre.: Fabian Vivi Morales Interventoría.: Grupo Quimbaya Ingenieros

3586

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 2

FECHA **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 **FECHA:** SABADO 17 ENERO 2026.

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing(s) Residente		Maestro(s)		Oficiales		Ayudantes		Otros:	

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA	OBSERVACIONES
	FORMALETA MADERA PARA CONSTRUCCIÓN DE SARDINEL CONCRETO 21MPA	

FOTOS / ESQUEMAS

Firma	Firma
Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz**	Nombre.: **Fabian Vivi Morales**
Contratista.: **Consorcio CGJ**	Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 2 de 2

FECHA	**HORA:**
CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025	**FECHA:** SACADO 17 ENERO 2026.
OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".	
NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.	

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA
	• SE REALIZA PERFORACIÓN PARA ANCLAJE DE ACERO DE REFUERZO EN LA CONSTRUCCIÓN DE SARDINEL PARA MANEJO DE AGUA SUPERFICIAL. CON LA CUAL, SE CONTROLA O CANALIZA, AGUA QUE ENTRABAN A PREDIOS ALEDAÑOS A LA VIA CONSTRUIDA, SE CONCRETA FORMALETA EN MADERA. SOBRE ANDEN EXISTENTE GARANTIZADO ALISTAMIENTO CON BORDE DE VIA. OBSERVACIÓN EL RENDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ES BAJO DEBIDO A LA GEOMETRIA DE LA VIA CORTADA LO CUAL GENERA PIEZAS PEQUEÑAS O CURTAS.

ÍTEM	OBSERVACIONES

Firma Nombre.: Jhoany Alexander Tobón Muñoz Contratista.: Consororcio CGJ	Firma Nombre.: Fabian Vivi Morales Interventoría.: Grupo Quimbaya Ingenieros

3587

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 2

FECHA **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 **FECHA:** Domingo 18 Enero 2026.

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing(s) Residente		Maestro(s)		Oficiales		Ayudantes		Otros:	

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA	OBSERVACIONES
	No se programan actividades.	

FOTOS / ESQUEMAS

Firma Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz** Contratista.: **Consororcio CGJ**	Firma Nombre.: **Fabian Vivi Morales** Interventoria.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 2 de 2

FECHA **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 **FECHA:** Domingo 18 Enero 2026.

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA
	Dia festivo - No se programan actividades

ÍTEM	OBSERVACIONES

Firma Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz** Contratista.: **Consororcio CGJ**	Firma Nombre.: **Fabian Vivi Morales** Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

3588

	BITACORA DE OBRA	Código: R-SI-POI-004
		Fecha: 14/10/2014
	Secretaría de Infraestructura	Versión: 004
	Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Página 1 de 2

FECHA **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 **FECHA:** lunes 19 Enero 2026.

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vias Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing(s) Residente		Maestro(s)		Oficiales		Ayudantes		Otros:	

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA	OBSERVACIONES
	Perforación y anclaje de acero de refuerzo para sardinel en concreto.	

FOTOS / ESQUEMAS

Firma Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz** Contratista.: **Consororcio CGJ**	Firma Nombre.: **Fabian Vivi Morales** Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 2 de 2

FECHA	**HORA:**
CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025	**FECHA:** Lunes 19 Enero 2026
OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".	
NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.	

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA
	Tramo #1. (K0+006 - K0+458). Continuan con la colocación de formaleta en madera para construcción de sardinel en concreto. - Se realiza perforación y anclaje de acero refuerzo N°3 cada 40 cms. anclado con epoxico SIKA.

ÍTEM	OBSERVACIONES

Firma	Firma
Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz**	Nombre.: **Fabian Vivi Morales**
Contratista.: **Consororcio CGJ**	Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

3589.

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 2

FECHA **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 **FECHA:** Martes 20 Enero 2026.

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing(s) Residente		Maestro(s)		Oficiales		Ayudantes		Otros:	

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA	OBSERVACIONES
	Sardinel en concreto 21MPa.	

FOTOS / ESQUEMAS

Firma	Firma
Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz**	Nombre.: **Fabian Vivi Morales**
Contratista.: **Consororcio CGJ**	Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 2 de 2

FECHA	**HORA:**
CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025	**FECHA:** Martes 20 Enero 2026.
OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".	
NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.	

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA
	• Se lleva a cabo la preparación de concreto para construcción de sardinel. Ubicado al margen derecha del tramo #1. Ubicado entre el K0+006 al K0+458. Durante la ejecución de la actividad. se realizó implementación del PMT aprobado.

ÍTEM	OBSERVACIONES

Firma Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz** Contratista.: **Consororcio CGJ**	Firma Nombre.: **Fabian Vivi Morales** Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

3590

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 2

FECHA **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 **FECHA:** Miercoles 21 Enero 2026.

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindio".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing(s) Residente		Maestro(s)		Oficiales		Ayudantes		Otros:	

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA	OBSERVACIONES
	Desencofrado de sardinel. y colocación acero reperzo.	

FOTOS / ESQUEMAS

Firma Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz** Contratista.: **Consororcio CGJ**	Firma Nombre.: **Fabian Vivi Morales** Interventoria.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

494

	BITACORA DE OBRA Secretaria de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 2 de 2

FECHA	**HORA:**
CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025	**FECHA:** Miercoles 21 Enero 2026.
OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".	
NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.	

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA
	- Se realizo retiro de formaleta metalta ubicada en el sardinel construido. Se realizo limpieza de la misma y alistamiento para proximo vaciado de elemento. - Se realizan perforaciones y anclajes para colocacion de acero refuerzo a cada 40cms con epoxico SIKA.

ÍTEM	OBSERVACIONES

Firma Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz** Contratista.: **Consororcio CGJ**	Firma Nombre.: **Fabian Vivi Morales** Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

3591

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 2

FECHA **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 **FECHA:** JUEVES 22 ENERO 2026.

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vias Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing(s) Residente		Maestro(s)		Oficiales		Ayudantes		Otros:	

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA	OBSERVACIONES
	Concreto para sardinel.	

FOTOS / ESQUEMAS

Firma Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz** Contratista.: **Consororcio CGJ**	Firma Nombre.: **Fabian Viví Morales** Interventoria.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 2 de 2

FECHA	**HORA:**
CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025	**FECHA:** JUEVES 22 ENERO 2026.
OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".	
NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.	

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA
	- SE PREPARA CONCRETO PARA CONSTRUCCIÓN DE SARDINEL. UBICADO EN EL TRAMO #1. (K0+006 - K0+038). DEL COSTADO DERECHO DEL TRAMO. SE GARANTIZA ALINEAMIENTO CON REFERENCIA AL BORDE DE VIA.

ÍTEM	OBSERVACIONES

Firma Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz** Contratista.: **Consororcio CGJ**	Firma Nombre.: **Fabian Vivi Morales** Interventoria.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

3592

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 2

FECHA **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 **FECHA:** VIERNES 23 ENERO 2026.

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing(s) Residente		Maestro(s)		Oficiales		Ayudantes		Otros:	

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA	OBSERVACIONES
	FORMALETA Y PERFORACIÓN DE BORDILLO EN CONCRETO.	

FOTOS / ESQUEMAS

Firma Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz** Contratista.: **Consororcio CGJ**	Firma Nombre.: **Fabian Vivi Morales** Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

138

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 2 de 2

FECHA **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 **FECHA:** VIERNES 23. ENERO 2026.

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vias Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA
	- SE RETIRA FORMALETA MADERA DE SARDINEL CONSTRUIDO EN EL TRMO #1. SE REALIZA LIMPIEZA Y PREPARACIAR PARA PROXIMO USO. - SE PREPARA UN DRAIN PARA PROXIMO VACIADO DE CONCRETO.

ÍTEM	OBSERVACIONES

Firma Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz** Contratista.: **Consororcio CGJ**	Firma Nombre.: **Fabian Vivi Morales** Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

3593

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 2

FECHA **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 **FECHA:** Sabado 24. Enero 2026.

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vias Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing(s) Residente		Maestro(s)		Oficiales		Ayudantes		Otros:	

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA	OBSERVACIONES
	Formaleta madera para sardinel concreto y preparación de concreto.	

FOTOS / ESQUEMAS

Firma Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz** Contratista.: **Consororcio CGJ**	Firma Nombre.: **Fabian Viví Morales** Interventoria.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

440

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 2 de 2

FECHA	**HORA:**
CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025	**FECHA:** Sabado 24. Enero 2026.
OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".	
NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.	

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA
	• Se prepara concreto para construcción de sardinel en el Tramo #1. - Se procede a vaciado de concreto y construcción de sardinel. - Se realiza aseo y orden general del Tramo.

ÍTEM	OBSERVACIONES

Firma Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz** Contratista.: **Consororcio CGJ**	Firma Nombre.: **Fabian Vivi Morales** Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

3594.

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 2

FECHA **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 **FECHA:** Domingo 25 Enero 2026.

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vias Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío"

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing(s) Residente		Maestro(s)		Oficiales		Ayudantes		Otros:	

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA	OBSERVACIONES
[redacted]	No se programan actividades.	

FOTOS / ESQUEMAS

Firma	Firma
Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz**	Nombre.: **Fabian Vivi Morales**
Contratista.: **Consororcio CGJ**	Interventoria.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

442

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 2 de 2

FECHA	**HORA:**
CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025	**FECHA:** Domingo 25 Enero 2026.
OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".	
NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.	

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA
	Día festivo – No se programan actividades.

ÍTEM	OBSERVACIONES

Firma Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz** Contratista.: **Consororcio CGJ**	Firma Nombre.: **Fabian Vivi Morales** Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

3595

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 2

FECHA **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 **FECHA:** Lunes 26 Enero 2026.

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra	Ing(s) Residente	Maestro(s)	Oficiales	Ayudantes	Otros:

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA	OBSERVACIONES
	Formaleta de madera para sardinel.	

FOTOS / ESQUEMAS

Firma Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz** Contratista.: **Consororcio CGJ**	Firma Nombre.: **Fabian Vivi Morales** Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

444

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 2 de 2

FECHA	**HORA:**
CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025	**FECHA:** Lunes 26 Enero 2026.
OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".	
NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.	

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA
	Se coloca Formaleta en madera para construcción de sardinel en concreto del tramo #1. Ubicado al margen derecho de la via - queda preparado y pendiente para vaciado el dia mañana

ÍTEM	OBSERVACIONES

Firma Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz** Contratista.: **Consororcio CGJ**	Firma Nombre.: **Fabian Vivi Morales** Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

3596.

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 2

FECHA **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 **FECHA:** Martes 27. Enero 2026.

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing(s) Residente		Maestro(s)		Oficiales		Ayudantes		Otros:	

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA	OBSERVACIONES
	Concreto 21 Mpa para sardinel.	

FOTOS / ESQUEMAS

Firma Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz** Contratista.: **Consororcio CGJ**	Firma Nombre.: **Fabian Vivi Morales** Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

446

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 2 de 2

FECHA **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 **FECHA:** Martes 27 Enero 2026.

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA
	Se prepara concreto 21 mpa para construcción de sardinel en concreto ubicado al margen derecho de vía El carimo - Portugalito Tramo #1 (0+006 → 0+458). Durante la actividad se señalizó y garantizó seguridad vial.

ÍTEM	OBSERVACIONES

Firma
Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz**
Contratista.: **Consororcio CGJ**

Firma
Nombre.: **Fabian Vivi Morales**
Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

3597

	BITACORA DE OBRA Secretaria de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 2

FECHA **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No. 003 de 2025 **FECHA:** Miercoles 28. Enero 2026.

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vias Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing(s) Residente		Maestro(s)		Oficiales		Ayudantes		Otros:	

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA	OBSERVACIONES
	Retiro de formaleta y preparación punto para preparar.	

FOTOS / ESQUEMAS

Firma Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz** Contratista.: **Consororcio CGJ**	Firma Nombre.: **Fabian Viví Morales** Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

448

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 2 de 2

FECHA **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 **FECHA:** Miercoles 28/01/2026.

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA
	Se retira formaleta en madera de sardinel en Concreto preparado el dia anterior. Se limpia formaleta y se aplica desmoldante para nuevo uso en la construcción de formaleta – Se prepara nuevo formo para vaciado de concreto y construcción de sardinel.

ÍTEM	OBSERVACIONES

Firma Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz** Contratista.: **Consororcio CGJ**	Firma Nombre.: **Fabian Vivi Morales** Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

3598

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 2

FECHA **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 **FECHA:** Jueves 29. enero 2026.

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing(s) Residente		Maestro(s)		Oficiales		Ayudantes		Otros:	

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA	OBSERVACIONES
	Preparación de concreto 21MPa.	

FOTOS / ESQUEMAS

Firma Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz** Contratista.: **Consororcio CGJ**	Firma Nombre.: **Fabian Viví Morales** Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

430

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 2 de 2

FECHA **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 **FECHA:** Jueves 29. Enero 2026.

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia. Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA
	• Se prepara concreto para elaboración de bordillo ó Sardinel. en concreto. del Tramo #1. Quedando listo y Finalizada. la actividad en el Tramo #1. margen der.

ÍTEM	OBSERVACIONES

Firma Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz** Contratista.: **Consororcio CGJ**	Firma Nombre.: **Fabian Viví Morales** Interventoria.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

3599.

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 2

FECHA **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 **FECHA:** Viernes 30 Enero 2026.

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing(s) Residente		Maestro(s)		Oficiales		Ayudantes		Otros:	

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA	OBSERVACIONES
	Suspensión de actividades. Contrato Obra 003/2025	

FOTOS / ESQUEMAS

Firma Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz** Contratista.: **Consororcio CGJ**	Firma Nombre.: **Fabian Vivi Morales** Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

452

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 2 de 2

FECHA	**HORA:**
CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025	**FECHA:** Viernes 30 Enero 2026.
OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".	
NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.	

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA
	Se suspende labores del contrato de Obra por motivo de gestión administrativa. Soportado en la necesidad de aprobación de recursos para la Construcción de Reductores de velocidad y el Suministro ó instalacion de señalizacion vertical. la wal aprueba secretaria transito armenia El contratista dejo el frente vial ordenado y limpio sin objetos que generen riesgo para los actores viales.

ÍTEM	OBSERVACIONES

Firma Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz** Contratista.: **Consororcio CGJ**	Firma Nombre.: **Fabian Vivi Morales** Interventoria.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

3600
453

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 2

FECHA **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 **FECHA:** lunes 16 marzo 2026.

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing(s) Residente		Maestro(s)		Oficiales		Ayudantes		Otros:	

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA	OBSERVACIONES
	Reinicio labores campo.	

FOTOS / ESQUEMAS

Firma Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz** Contratista.: **Consororcio CGJ**	Firma Nombre.: **Fabian Vivi Morales** Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

464

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 2 de 2

FECHA	**HORA:**
CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025	**FECHA:** Lunes 16 Marzo 2026.
OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".	
NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.	

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA
	• Se reinicia el contrato de Obra 003/2025. Una vez superadas y aprobadas las labores de aprobación frente a la secretaria de transito armenia se realizo inclusión de actividades correspondientes a la seguridad vial con la construcción de reductores de velocidad. suministro e instalación de señalización vertical 60x60 cms. y construcción de cuneta en concreto correspondiente al tramo #1. - Por parte del contratista Obra Consorcio CGJ. se organizan frentes de trabajo para la ejecución de actividades con fecha de terminación al 31/03/2026. Durante la finalización del proyecto se implementara el PMT aprobado para el proyecto.

ÍTEM	OBSERVACIONES

Firma	Firma
Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz**	Nombre.: **Fabian Vivi Morales**
Contratista.: **Consororcio CGJ**	Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

3601

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 2

FECHA	HORA:
CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025	FECHA: MARTES 3 MARZO 2026
OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vias Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".	
NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.	

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing(s) Residente		Maestro(s)		Oficiales		Ayudantes		Otros:	

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA	OBSERVACIONES
	CONFORMACION SOPORTE CUNETA PERFORACION Y ANCLAJE	

FOTOS / ESQUEMAS

Firma	Firma
Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz**	Nombre.: **Fabian Vivi Morales**
Contratista.: **Consororcio CGJ**	Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

FECHA	HORA: MARTES 17 MARZO 2026
CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025	FECHA:
OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".	
NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.	

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA
	Se procede con la preparación de superficie en la construcción de cuneta triangular del tramo intermedio del proyecto ubicado 120+488 – 120+645 En este tramo se realiza corte con disco en pavimento existente garantizando alineamiento entre borde vía margen izquierda tramo #1, margen derecha se procede a dar inicio con la perforación y anclaje de acero de refuerzo, en el tramo pendiente para cubrir tamaño.

ÍTEM	OBSERVACIONES

Firma Nombre.: Jhoany Alexander Tobón Muñoz Contratista.: Consororcio CGJ	Firma Nombre.: Fabian Vivi Morales Interventoría.: Grupo Quimbaya Ingenieros

3602

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 2

FECHA **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 **FECHA:** Miercoles 18 Marzo 2026

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing(s) Residente		Maestro(s)		Oficiales		Ayudantes		Otros:	

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA	OBSERVACIONES
	Perforación y anclaje para Sardinel. Excavación y conformación para soporte de cuneta	

FOTOS / ESQUEMAS

Firma	Firma
Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz**	Nombre.: **Fabian Vivi Morales**
Contratista.: **Consororcio CGJ**	Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 2 de 2

FECHA	**HORA:**
CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025	**FECHA:** Miercoles 15 enero 2026.
OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".	
NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.	

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA
	Tramo intermedio (entre tramo #1 y tramo #2.) se realiza adecuación y conformación de estructura soporte de la cuneta. En el tramo #1. Margen derecha se realiza perforaciones y anclajes con anchor tit para colocación de acero refuerzo, de sordinel en concreto. Durante la ejecución de la actividad se implementa (PMT).

ÍTEM	OBSERVACIONES

Firma Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz** Contratista.: **Consororcio CGJ**	Firma Nombre.: **Fabian Vivi Morales** Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

3603

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 2

FECHA **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 **FECHA:** JUEVES 19 MARZO 2026.

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing(s) Residente		Maestro(s)		Oficiales		Ayudantes		Otros:	

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA

ITEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA	OBSERVACIONES
	• CONFORMACIÓN DE ESTRUCTURA SOPORTE. PARA CUNETA EN CONCRETO • FORMALETA PARA SARDINEL CONCRETO • MEZCLA ASFALTICA PARA CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES VELOCIDAD.	

FOTOS / ESQUEMAS

Firma Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz** Contratista.: **Consororcio CGJ**	Firma Nombre.: **Fabian Vivi Morales** Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 2 de 2

FECHA	**HORA:**
CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025	**FECHA:** JUEVES 19 MARZO 2026
OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".	
NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.	

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA
	• EN EL PROYECTO SE ALOJARON LA CONSTRUCCION DE TRES UNIDADES DE REDUCTOR DE VELOCIDAD (DIMENSIONES SEGUN MANUAL) MOTIVO POR EL CUAL SE PROCEDE A REALIZAR SU CONSTRUCCIÓN CON MEZCLA ASFALTICA. DURANTE EL PROCESO SE REALIZA IMPRIMACION DE LA SUPERFICIE Y LA APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DEBIDAMENTE COMPACTADA. CABE ANOTAR QUE ESTA ACTIVIDAD CORRESPONDE A UN DERECHO DE PETICION DE LA COMUNIDAD PARA CONTROL DE LAS VELOCIDADES.

ÍTEM	OBSERVACIONES

Firma Nombre.: Jhoany Alexander Tobón Muñoz Contratista.: Consororcio CGJ	Firma Nombre.: Fabian Viví Morales Interventoría.: Grupo Quimbaya Ingenieros

3604.

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 2

FECHA **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 **FECHA:** Viernes 20 Marzo 2026.

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing(s) Residente		Maestro(s)		Oficiales		Ayudantes		Otros:	

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA

ITEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA	OBSERVACIONES
	Aplicacion base granular formaleta Sardinel Demolicion y extraccion para Sumidero Concreto.	

FOTOS / ESQUEMAS

Firma	Firma
Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz**	Nombre.: **Fabian Vivi Morales**
Contratista.: **Consororcio CGJ**	Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

463

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 2 de 2

FECHA	**HORA:**
CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025	**FECHA:** Viernes 20 Marzo 2026.
OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".	
NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.	

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA
	• Para la construcción de cuneta se aplica base granular de la estructura en concreto, garantizando su compactacion compactando con vibrocompactador tipo "rana" se procede a colocación de formaleta o plantilla de la cuneta triangular - Para la construcción del sardinel en concreto se prepara concreto insitu y se procede a vaciado de elemento garantizando alineamiento y a borde de via.

ÍTEM	OBSERVACIONES

Firma Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz** Contratista.: **Consororcio CGJ**	Firma Nombre.: **Fabian Vivi Morales** Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

3605

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 2

FECHA **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 **FECHA:** Sabado 21 Marzo

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing(s) Residente		Maestro(s)		Oficiales		Ayudantes		Otros:	

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA	OBSERVACIONES
	Concreto Premezclado 21mpa Sardinel Concreto Sumidero Concreto	

FOTOS / ESQUEMAS

Firma Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz** Contratista.: **Consororcio CGJ**	Firma Nombre.: **Fabian Vivi Morales** Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

464

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 2 de 2

FECHA	**HORA:**
CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025	**FECHA:** Sabado 21 Marzo 2026
OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".	
NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.	

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA
	• Se realiza la colocación de concreto Resistencia 3.000 PSI para Construcción de cunetas en el tramo intermedio del proyecto y se dio inicio a la preparación de la estructura Soporte de cuneta del tramo #1 margen Izquierda Durante ejecución de actividad se implementa PAET. Se realiza corte, Demolición y excavación para la Construcción de dos sumideros en concreto. Ubicados en margen derecha tramo #1 Exactamente donde se ubica obra transversal N°1 y N°2.

ÍTEM	OBSERVACIONES

Firma Nombre.: Jhoany Alexander Tobón Muñoz Contratista.: Consorcio CGJ	Firma Nombre.: Fabian Viví Morales Interventoría.: Grupo Quimbaya Ingenieros

3606

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 2

FECHA **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 **FECHA:** Domingo 22 Marzo 2026

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing(s) Residente		Maestro(s)		Oficiales		Ayudantes		Otros:	

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA	OBSERVACIONES
	No se programo actividades	

FOTOS / ESQUEMAS

Firma	Firma
Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz**	Nombre.: **Fabian Viví Morales**
Contratista.: **Consororcio CGJ**	Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

466

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 2 de 2

FECHA	**HORA:**
CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025	**FECHA:** Domingo 22 Marzo 2026.
OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".	
NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.	

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA
	Dia Festivo - No se realizan actividades.

ÍTEM	OBSERVACIONES

Firma Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz** Contratista.: **Consororcio CGJ**	Firma Nombre.: **Fabian Vivi Morales** Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

3607

	BITACORA DE OBRA	Código: R-SI-POI-004
	Secretaría de Infraestructura	Fecha: 14/10/2014
	Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Versión: 004
		Página 1 de 2

FECHA **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 **FECHA:** Lunes 23 de Feb 2026

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing(s) Residente		Maestro(s)		Oficiales		Ayudantes		Otros:	

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA	OBSERVACIONES
	Concreto premezclado para cuneta Construccion de sumidero	

FOTOS / ESQUEMAS

Firma	Firma
Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz**	Nombre.: **Fabian Vivi Morales**
Contratista.: **Consororcio CGJ**	Interventoria.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

168

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 2 de 2

FECHA HORA:

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 FECHA: Lunes 23 de Marzo 2026

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA
	• Se realiza aplicación para curado de concreto en el Tramo N°1 curado pequeño y se vacea concreto para La construcción de sumidero en la vía el Caimo - Portugalito.

ÍTEM	OBSERVACIONES

Firma Nombre.: Jhoany Alexander Tobón Muñoz Contratista.: Consororcio CGJ	Firma Nombre.: Fabian Vivi Morales Interventoría.: Grupo Quimbaya Ingenieros

3608

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 2

FECHA **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 **FECHA:** Martes 24 Marzo 2026

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing(s) Residente		Maestro(s)		Oficiales		Ayudantes		Otros:	

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA	OBSERVACIONES
	Concreto premezclado para cuneta	

FOTOS / ESQUEMAS

Firma	Firma
Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz**	Nombre.: **Fabian Vivi Morales**
Contratista.: **Consororcio CGJ**	Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 2 de 2

FECHA	HORA:
CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025	FECHA: Martes 24 Marzo 2026
OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".	
NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.	

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA
	Tramo N°1 (0+006 - 0+458) Se realiza la construcción de cunetas en concreto margen izquierda con concreto premezclado.

ÍTEM	OBSERVACIONES

Firma Nombre.: Jhoany Alexander Tobón Muñoz Contratista.: Consororcio CGJ	Firma Nombre.: Fabian Vivi Morales Interventoría.: Grupo Quimbaya Ingenieros

3609

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 2

FECHA **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 **FECHA:** Miercoles 25 Marzo 2026

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing(s) Residente		Maestro(s)		Oficiales		Ayudantes		Otros:	

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA	OBSERVACIONES
	Concreto premezclado para cunetas Excavacion y climatizacion para construccion sumidero	

FOTOS / ESQUEMAS

Firma	Firma
Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz**	Nombre.: **Fabian Vivi Morales**
Contratista.: **Consororcio CGJ**	Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 2 de 2

FECHA	**HORA:**
CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025	**FECHA:** Martes 25 de Marzo 2026.
OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".	
NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.	

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA
	Frente #1 Se vacea concreto para construcción de cunetas en concreto premezclado de resistencia 21 mpa. y se realiza corte y demolición de pavimento flexible para la construcción de sumidero ubicado en la obra transversal N°2 margen derecha.

ÍTEM	OBSERVACIONES

Firma Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz** Contratista.: **Consororcio CGJ**	Firma Nombre.: **Fabian Vivi Morales** Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

3618

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 2

FECHA **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 **FECHA:** Viernes 20 Marzo 2026.

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing(s) Residente		Maestro(s)		Oficiales		Ayudantes		Otros:	

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA	OBSERVACIONES
	Concreto para cuneta y Sumidero	

FOTOS / ESQUEMAS

Firma	Firma
Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz**	Nombre.: **Fabian Viví Morales**
Contratista.: **Consororcio CGJ**	Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 2 de 2

FECHA	**HORA:**
CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025	**FECHA:** Jueves 26 Marzo
OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".	
NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.	

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA
	• Se realiza la construcción de caja concreto de Sumidero antes se realizo la colocación de tuberia PVC. Novafort Diam 10" Conecta chacra entrada de obra arte y se realza Construcción de cuneta en concreto margen Izquierda del tramo No 1.

ÍTEM	OBSERVACIONES

Firma Nombre.: Jhoany Alexander Tobón Muñoz Contratista.: Consororcio CGJ	Firma Nombre.: Fabian Vivi Morales Interventoría.: Grupo Quimbaya Ingenieros

361

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 2

FECHA														**HORA:**												
CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025														**FECHA:** Viernes 27 Marzo 2026												
OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".																										
NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.																										
Horas de lluvia (señale con una X)																										
Estado del tiempo				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing(s) Residente		Maestro(s)		Oficiales		Ayudantes		Otros:	

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA	OBSERVACIONES
	Concreto para cuneta.	

FOTOS / ESQUEMAS

Firma	Firma
Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz**	Nombre.: **Fabian Vivi Morales**
Contratista.: **Consororcio CGJ**	Interventoria.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

476

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 2 de 2

FECHA	HORA:
CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025	FECHA: Viernes 27 Marzo 2026
OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".	
NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.	

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA
	Finaliza actividad de construcción de cuneta triangular en concreto para el tramo No1. De esta manera el proyecto cuenta con cuneta lateral a lo largo de la intervención - Se realiza jornada de limpieza orde y aseo: para la realización de aplicación de pintura.

ÍTEM	OBSERVACIONES

Firma Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz** Contratista.: Consororcio CGJ	Firma Nombre.: **Fabian Vivi Morales** Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

3612

	BITACORA DE OBRA	Código: R-SI-POI-004
	Secretaría de Infraestructura	Fecha: 14/10/2014
	Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Versión: 004
		Página 1 de 2

FECHA **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 **FECHA:** Sabado 28 Marzo 2026

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing(s) Residente		Maestro(s)		Oficiales		Ayudantes		Otros:	

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA	OBSERVACIONES
	Demarcación Vial Señalización Vertical.	

FOTOS / ESQUEMAS

Firma	Firma
Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz**	Nombre.: **Fabian Viví Morales**
Contratista.: **Consororcio CGJ**	Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

178

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 2 de 2

FECHA HORA:

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 FECHA: Sabado 28 Marzo 2026.

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

ITEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA
	• Se dio inicio a la demarcación vial desde el 120+000 y hasta el 121+150. con equipo de demarcación quedando la pintura finalizada en su totalidad se realiza excavación para instalación de señalización vertical de transito - Moto demarcación vial se lleva a cabo con tres (3) Lineas de pintura espesor o ancho 12cms con aplicación de microesferas.

ITEM	OBSERVACIONES

Firma Nombre.: Jhoany Alexander Tobón Muñoz Contratista.: Consororcio CGJ	Firma Nombre.: Fabian Viví Morales Interventoría.: Grupo Quimbaya Ingenieros

3613

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 2

FECHA **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 **FECHA:** Domingo 29 Marzo 2026.

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing(s) Residente		Maestro(s)		Oficiales		Ayudantes		Otros:	

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA	OBSERVACIONES
	No se programa actividad.	

FOTOS / ESQUEMAS

Firma	Firma
Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz**	Nombre.: **Fabian Viví Morales**
Contratista.: **Consororcio CGJ**	Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 2 de 2

FECHA	HORA:
CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025	FECHA: Domingo 29 Marzo 2026.
OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".	
NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.	

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA
	Dia Festivo No se programa actividad.

ÍTEM	OBSERVACIONES

Firma Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz** Contratista.: **Consororcio CGJ**	Firma Nombre.: **Fabian Vivi Morales** Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

3614
401

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 2

FECHA **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 **FECHA:** Lunes 30 Marzo 2026.

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing(s) Residente		Maestro(s)		Oficiales		Ayudantes		Otros:	

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA	OBSERVACIONES
	Pintura señalización horizontal e instalación de señalización vertical.	

FOTOS / ESQUEMAS

Firma Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz** Contratista.: **Consororcio CGJ**	Firma Nombre.: **Fabian Vivi Morales** Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 2 de 2

FECHA	**HORA:**
CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025	**FECHA:** Lunes 30 Marzo 2026
OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".	
NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.	

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA
	- Se realizo la demarcación y pintura de pictogramas en la via incluyendo la pintura de los reductores de velocidad y pasos peatonales entre 120+000 y hasta 121+150. De la misma manera se lleva a cabo la instalación de señalización vertical segun la aprobación de la entidad con 18 unidades a lo largo del tramo vial.

ÍTEM	OBSERVACIONES

Firma Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz** Contratista.: **Consororcio CGJ**	Firma Nombre.: **Fabian Viví Morales** Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

3615

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 2

FECHA **HORA:**

CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025 **FECHA:** Martes 31 Marzo 2026

OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing(s) Residente		Maestro(s)		Oficiales		Ayudantes		Otros:	

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA	OBSERVACIONES
	Cierre del proyecto.	

FOTOS / ESQUEMAS

Firma	Firma
Nombre.: **Jhoany Alexander Tobón Muñoz**	Nombre.: **Fabian Viví Morales**
Contratista.: **Consororcio CGJ**	Interventoría.: **Grupo Quimbaya Ingenieros**

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 2 de 2

FECHA	HORA:
CONTRATO DE OBRA.: No: 003 de 2025	FECHA: Martes 31 Marzo 2026
OBJETO DEL CONTRATO.: "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".	
NOTA: Realizar anotaciones día a día, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.	

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA
	• Se realizo recorrido en conjunto con la interventoria en el cual se recibio a satisfacción la obra fisica realizada durante la ejecución del proyecto sin novedades o reclamaciones por parte de la comunidad. Se da por terminado el contrato de obra N°003/2025 cuyo objeto fué "Adecuar y mejorar vias terciarias del Municipio de Armenia" Celebrando entre el consorcio (G) y la alcaldia de Armenia bajo interventoria tecnica del grupo Quimbaya ingenieros S.A.S.

ÍTEM	OBSERVACIONES

Firma Nombre.: Jhoany Alexander Tobón Muñoz Contratista.: Consororcio CGJ	Firma Nombre.: Fabian Vivi Morales Interventoría.: Grupo Quimbaya Ingenieros

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141220769193

(415)7707212489984(8020) 000014122076919 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 9 6 2 9 7	2	Impuestos y Aduanas de Manizales 1 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO CGJ

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Caldas 1 7	Manizales 0 0 1

41. Dirección principal
CR 13 18 31 OF 202

42. Correo electrónico Consorciocgj2025@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 1 8 0 0 3 2 9 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 5 0 7 2 8							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	14	42	48	55																					

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre TOBON MUÑOZ JHOANY ALEXANDER

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 14-11-2025 02:35:21PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141220769193

(415)7707212489984(8020) **000014122076919 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 9 9 6 2 9 7	2	Impuestos y Aduanas de Manizales	1 0	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 5 0 7 2 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 5 0 7 2 8	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 5 1 1 1 3		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141220769193

(415)7707212489984(8020) 000014122076919 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 9 6 2 9 7	2	Impuestos y Aduanas de Manizales 1 0	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 1 0 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	9 4 2 8 6 2 9 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
TOBON	MUÑOZ	JHOANY	ALEXANDER

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 5 0 7 2 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 2 3 1 1 2 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RODRIGUEZ	BONNETT	JAIME	ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141220769193

(415)7707212489984(8020) 000014122076919 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 9 9 6 2 9 7	2	Impuestos y Aduanas de Manizales	1 0	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 5 6 9 9 2 5	9	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: GOMPRO INGENIERIA S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 3	2 0 2 5 0 7 2 8	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadada 1 3	1 0 2 3 1 1 2 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
RODRIGUEZ	BONNETT	JAIME	ALBERTO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 4	2 0 2 5 0 7 2 8	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadada 1 3	7 5 0 8 6 7 3 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ARIAS	MENDOZA	CARLOS	MARIO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 3	2 0 2 5 0 7 2 8	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

INFORME ACTIVIDADES EJECUTADAS ACTA PAGO N° FINAL

"Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío."

Contrato N°003 de 2025

CONSORCIO CGJ
Jhoany Alexander Tobón Muñoz
Representante Legal

GRUPO QUIMBAYA INGENIEROS S.A.S.
Lina Mercedes Monsalve Escobar
Representante Legal

Armenia, Quindío.

Marzo 2026

"Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia, Quindío".

CONTROL DE VERSIONES

Tabla 1 Control de versiones

Versión	Fecha	Descripción	Folios
0	31/03/2026	Versión inicial para revisión	55

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

Tabla 2 Estado de revisión y aprobación

Elaboro	Juliana Giraldo Residente Obra	
Revisó y Aprobó	Jhoany Alexander Tobón M Representante Legal	

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 5
2. OBJETIVO 5
3. ALCANCE 6
4. RESUMEN EJECUTIVO 7
4.1. Avance físico acumulado 7
4.2. Avance del periodo 11
4.3. Monto acta parcial de pago 11
5. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO 13
5.1. Tabla de avance obra 15
6. MEDICIONES O CRITERIOS DE MEDICIÓN 18
6.1. Formulas o criterio de medición 18
7. REGISTRO FOTOGRÁFICO 19
8. REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD 44
8.1. Pruebas realizadas 44
8.2. Aceptación de la supervisión técnica 45
9. RECURSOS EMPLEADOS EN EL PERIODO 46
9.1. Mano de obra 46
9.2. Equipos 47
9.3. Materiales 47
10. AVANCE VS PROGRAMACIÓN 48
10.1. Curva "S" 48
10.2. Acciones correctivas o plan de recuperación 49
11. OBSERVACIONES Y NO CONFORMIDADES 49
11.1. Situaciones que afectan el avance 49

11.2. Notas de no conformidad y estado 49

12. CONCLUSIONES 49

13. ANEXOS 55

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como propósito contar, de manera clara y cercana, cómo se ha desarrollado la ejecución de las obras del contrato 003 de 2023, cuyo objetivo es mejorar las vías terciarias de nuestro municipio de Armenia. Sabemos que estas vías son el corazón de la movilidad rural, el acceso a los cultivos, las veredas y los hogares de muchas familias campesinas. Por eso, cada actividad aquí registrada representa un esfuerzo real por transformar caminos y dignificar el tránsito de quienes viven y trabajan en el campo.

Este informe sirve como sustento técnico y humano para dos momentos clave del contrato, los cuales, se encuentran como una de las obligaciones contractuales del proyecto y de estricto cumplimiento por parte del contratista de obra, quien, para este caso puntual es el Consorcio CGJ – RL Jhoany Alexander Tobón Muñoz.

Al cierre del presente informe se ha generado un pago parcial N°1, el cual correspondió al 79.66% del valor actualizado del proyecto y el cual cuenta con una inversión de $1.825.197.430. y para esta Acta de pago N°2 y FINAL, se reconocerá mediante las cantidades de obra y ejecución de las mismas, un monto del 20.34% restante para la ejecución total del proyecto. el cual, se ha recibido a satisfacción por parte de la Interventoría técnica del proyecto y la Entidad Contratante Alcaldía de Armenia.

Dichas cantidades correspondientes al documento en referencia esta previamente aprobadas por parte de la interventoría del proyecto. la cual, en conjunto con el contratista de obra, tomaron mediciones en campo para constatar la información reportada.

2. OBJETIVO

El presente informe de actividades tiene como propósito fundamental documentar y respaldar técnicamente la solicitud de cobro correspondiente al Acta Parcial de Pago N° 02 del Contrato de Obra N° 003/2025, en estricto cumplimiento de las cláusulas contractuales, el cronograma de ejecución y los procedimientos de medición y valorización establecidos.

Dentro de este contexto, los objetivos específicos que guían la elaboración de este informe y que sustentan la procedencia del acta parcial de pago son los siguientes.

1. Verificar y cuantificar el avance físico real alcanzado durante el período comprendido entre la fecha de corte del Acta N° 01 y la del Acta N° 02, desglosado por cada partida ejecutada, con base en mediciones directas de campo y registros de calidad aceptados por la supervisión.
2. Demostrar la correspondencia entre el avance ejecutado y el monto solicitado, aplicando los precios unitarios pactados en el contrato y las fórmulas de ajuste, sin incluir trabajos no ejecutados o mal ejecutados.

3. Presentar el respaldo documental, fotográfico y técnico que acredite la realización de las actividades reportadas, incluyendo memorias de cantidades, reportes diarios, pruebas de control de calidad y registros de recursos empleados (mano de obra, materiales y equipos).

4. Justificar cualquier desviación respecto a la programación base explicando las causas y las medidas correctivas adoptadas, de modo que la supervisión o el cliente cuenten con elementos de juicio para aprobar el pago sin contingencias.

5. Cumplir con los requisitos formales de presentación exigidos en el contrato 003/2025 para la liberación del pago parcial, minimizando observaciones y agilizando la revisión y trámite correspondiente.

En consecuencia, este capítulo de objetivos no solo orienta el contenido del informe, sino que también establece el compromiso del contratista de entregar una valoración veraz, medible y contractualmente válida, que permita a la supervisión certificar el Acta Parcial N° 02 y autorizar su pago en tiempo y forma.

3. ALCANCE

El presente capítulo tiene por objeto definir de manera precisa y delimitada el marco de acción del Informe de Ejecución de Actividades de Obra correspondiente al Acta Parcial N°2 y Final del Contrato 003 de 2023, cuyo objeto es "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia en el Departamento del Quindío".

En toda obra de infraestructura vial, resulta indispensable establecer con claridad los límites y el contenido del informe técnico que sustenta la solicitud de pago y la liquidación del contrato. La definición del alcance no solo cumple una función administrativa, sino que constituye una herramienta de gestión y control que evita ambigüedades, previene controversias posteriores y asegura que todas las partes involucradas (contratista, interventoría y supervisión) compartan un mismo entendimiento sobre lo ejecutado, lo pendiente y lo certificable.

Los límites temporales del informe: El periodo comprendido entre la expedición del Acta Parcial N°1 y la fecha de corte del Acta Final, con indicación expresa de la fecha de inicio y terminación de las actividades correspondientes al saldo contractual.

1. Los tramos específicos de las vías terciarias intervenidas durante esta última etapa, identificados mediante códigos de nomenclatura vial, hitos kilométricos y coordenadas de referencia.
2. La relación exhaustiva de los ítems de obra comprendidos en el saldo contractual, diferenciando aquellos que fueron ejecutados conforme a las especificaciones originales, aquellos que sufrieron modificaciones por ajustes de diseño, y aquellos

no previstos inicialmente pero que resultaron necesarios para la correcta terminación de la obra (obra no contratada ejecutada).

3. La precisión de que el valor de actas generadas

Concepto	Valor	Porcentaje
Valor total del contrato 003/2023	$1.825.197.430,00	100,00%
Valor ejecutado y pagado en Acta Parcial N°1	$1.454.004.682,00	79,66%
Valor del Acta Parcial N°2 y Final	**$371.192.748,00**	**20,34%**
Valor total ejecutado acumulado (Acta N°1 + Acta N°2)	**$1.825.197.430,00**	**100,00%**

4. La enunciación clara de aquellas actividades, zonas o conceptos que no forman parte del presente informe, ya sea por haber sido ejecutados en actas anteriores, por corresponder a obligaciones no contractuales, o por haber sido objeto de acuerdos de exclusión durante la ejecución.
5. Los requisitos técnicos, documentales y administrativos que deben cumplirse para que el Acta Final sea aprobada y pagada, incluyendo la verificación de calidad, la entrega de soportes documentales y la suscripción del recibo a satisfacción por parte de la interventoría y la supervisión.

Es preciso señalar que el alcance aquí definido constituye un documento vinculante para las partes, en la medida en que sirve de base para la expedición del Acta Final y para la posterior liquidación unilateral o bilateral del contrato. Por lo tanto, cualquier aspecto no contemplado expresamente en este capítulo se entenderá excluido del presente informe y deberá ser objeto de un tratamiento diferenciado, ya sea mediante actas adicionales, acuerdos extracontractuales o mecanismos de solución de controversias.

4. RESUMEN EJECUTIVO

4.1. Avance físico acumulado

Al cierre del presente informe de actividades, correspondiente al cobro del acta parcial de pago N° 2. Se cuenta en campo con la ejecución de las actividades en un 100% de las previstas para el proyecto. Sin embargo, teniendo en cuenta las condiciones de pago, únicamente se cobran actividades de obra, que cumplen con estas características de hasta el 90% del valor total del proyecto.

A continuación, se relacionan las actividades de obra, las cuales hacen parte del avance físico del proyecto denominado "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de

Armenia en el Departamento del Quindío". y cuyo numero de contrato de obra es el 003/2025.

Actividad	Unidad	Cantidad Contrato	Cantidad Ejecutada	Porcentaje (%) Ejecutado
I. PRELIMINARES				
Localización y replanteo	Mes	2,50	2,50	100%
II. DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y RETIROS				
Excavación a mano material común 0-2mts, incluye cargue para disposición final	M3	85,68	85,68	100%
Transporte de material de excavación y RCD	M3/KM	2.288,96	2.288,96	100%
Disposición final de material de excavación en sitio autorizado, incluye pago de derecho a disposición	M3	114,47	114,47	100%
III. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO				
Nivelación, conformación y compactación de la subrasante existente con maquinaria amarilla (puesta en obra)	M2	5.804,27	5.804,27	100%
Suministro, transporte e instalación de base granular	M3	1.577,56	1.577,56	100%
Imprimacion de asfalto o riego de liga con emulsión asfáltica de rotura lenta	M2	5.799,34	5.799,34	100%
Suministro, transporte e instalación de capa de rodadura tipo MDC-19 con asfalto 60/70	M3	434,95	434,95	100%
IV. ACERO				
Suministro e instalación de acero de refuerzo Fy=420MPa; para elementos en concreto reforzado	Kg	471,3508	471,35	99,9988%
V. OBRAS COMPLEMENTARIAS				
Construcción de cuneta triangular en concreto 21MPa. Incluye malla electrosoldada	ML	1.617,00	1.617,00	100%
Estructura en concreto de 21MPa de cajas de inspección, sumideros, cabezal de entrega	M3	3,21	3,21	100%
VI. SEÑALIZACIÓN				
Línea de demarcación vial con micro esferas con pintura tipo plástico en frio 12cm de ancho	ML	3.450,00	3.450,00	100%
Marca vial con micro esferas y pintura acrílica de demarcación pintura tipo plástico en frio	M2	57,00	57,00	100%

OBRA NO CONTRATADA Y EJECUTADA				
Demolición mecánica del pavimento flexible vial existente, incluye cargue del material en volqueta	M3	20,64	20,64	100%
Corte con disco de pavimento flexible	ML	1.903,00	1.903,00	100%
Limpieza de tubería diámetro 24" – (obras transversales)	ML	38,80	38,80	100%
Tubería en PVC Novafort D 36"	ML	6,50	6,50	100%
Lleno compactado con material de sitio	M3	14,31	14,31	100%
Perforación para anclajes ½" con epóxico AnchorFix o similar	UN	1.614,00	1.614,00	100%
Sardinel en concreto 3.000PSI, ancho hasta 15 centímetros y alto hasta 25 centímetros (no incluye acero de refuerzo)	ML	322,80	322,80	100%
Tapa en concreto tipo manhole 160x160 centímetros (incluye tapa vehicular en polipropileno)	UN	1,00	1,00	100%
Sumidero en concreto 21MPa, dimensiones 70x70 centímetros (incluye tapa vehicular en polipropileno)	UN	2,00	2,00	100%
Suministro e instalación de tubería PVC Novafort Diam 10 pulgadas pared estructural	ML	6,00	6,00	100%
Construcción de reductores de velocidad en mezcla asfáltica, no incluye pintura	ML	18,00	18,00	100%
Suministro e instalación de señalización vertical, dimensiones 60x60 centímetros. Inc. Estructura soporte metálica	UN	18,00	18,00	100%
VEREDA GUAYABAL				
Localización y replanteo	Mes	0,25	0,25	100%
Nivelación, conformación y compactación de la subrasante existente con maquinaria amarilla (puesta en obra)	M2	2.777,74	2.777,74	100%
Excavación a mano material común 0-2mts, incluye cargue para disposición final	M3	27,78	27,78	100%
Transporte de material de excavación y RCD	M3/KM	722,21	722,21	100%
Disposición final de material de excavación en sitio autorizado, incluye pago de derecho a disposición	M2	36,11	36,11	100%
VEREDA MARMATO				
Localización y replanteo	Mes	0,25	0,25	100%

Nivelación, conformación y compactación de la subrasante existente con maquinaria amarilla (puesta en obra)	M2	5.267,50	5.267,50	100%
Excavación a mano material común 0-2mts, incluye cargue para disposición final	M3	52,68	52,68	100%
Transporte de material de excavación y RCD	M3/KM	1.369,55	1.369,55	100%
Disposición final de material de excavación en sitio autorizado, incluye pago de derecho a disposición	M2	68,48	68,48	100%
VEREDA MURILLO				
Localización y replanteo	Mes	0,25	0,25	100%
Demolición mecánica del pavimento flexible vial existente, incluye cargue del material en volqueta	M3	21,16	21,16	100%
Nivelación, conformación y compactación de la subrasante existente con maquinaria amarilla (puesta en obra)	M2	0,00	0,00	100%
Excavación a mano material común 0-2mts, incluye cargue para disposición final	M3	46,02	46,02	100%
Transporte de material de excavación y RCD	M3/KM	1.196,60	1.196,60	100%
Disposición final de material de excavación en sitio autorizado, incluye pago de derecho a disposición	M2	59,83	59,83	100%
Suministro, transporte e instalación base granular	M3	46,02	46,02	100%
Imprimación de asfalto o riego de liga con emulsión asfáltica de rotura lenta	M2	423,20	423,20	100%
Suministro e instalación de capa de rodadura tipo MDC-19 con asfalto 60/70	M3	31,74	31,74	100%
EL CAIMO				
Localización y replanteo	Mes	0,25	0,25	100%
Demolición mecánica del pavimento flexible vial existente, incluye cargue del material en volqueta	M3	17,94	17,94	100%
Nivelación, conformación y compactación de la subrasante existente con maquinaria amarilla (puesta en obra)	M2	0,00	0,00	100%
Excavación a mano material común 0-2mts, incluye cargue para disposición final	M3	0,00	0,00	100%
Transporte de material de excavación y RCD	M3/KM	466,43	466,43	100%
Disposición final de material de excavación en sitio autorizado, incluye pago de derecho a disposición	M2	23,32	23,32	100%

Suministro, transporte e instalación base granular	M3	0,00	0,00	100%
Imprimación de asfalto o riego de liga con emulsión asfáltica de rotura lenta	M2	179,40	179,40	100%
Suministro e instalación de capa de rodadura tipo MDC-19 con asfalto 60/70	M3	18,47	18,47	100%

Cantidades de obra, correspondientes al avance físico del proyecto 003/2025.

4.2. Avance del periodo

A continuación, se relacionan los porcentajes de ejecución, hasta llegar el 100% del avance del proyecto de obra cuyo objeto es "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia en el Departamento del Quindío". con numero de contrato de obra 003/2025, donde el contratista ejecutor es el Consorcio CGJ cuyo representante legal es el ingeniero Jhoany Alexander Tobon Muñoz.

Estas cantidades obra, reflejan una ejecución de obra acumulada en recursos correspondientes al monto de **MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE $1.825.197.43**. Equivalentes al **100%** sobre el valor total actualizado del proyecto.

4.3. Monto acta parcial de pago

El monto del acta parcial de pago N° 2 y FINAL, corresponde al valor de **TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE $371.192.748**. El cual, equivale al **20.34%** sobre el monto o valor actualizado del proyecto. Cabe anotar que, el proyecto al cierre de este informe cuenta con un avance físico del 100% de las actividades previstas para la culminación del mismo. Sin embargo, de acuerdo a las condiciones de pago del proyecto, únicamente se pueden generar cobros hasta un monto acumulado que corresponde al 90% del valor total del proyecto y el 10% restante, hasta tanto se cuente con el recibido a satisfacción y entrega de física de obra, así como también se deberá contar con la respectiva liquidación del proyecto.

Debido a las condiciones de pago del proyecto, para esta acta parcial que se tramita ante la entidad contratante, únicamente genera el cobro con una de las actividades ejecutas en el proyecto y la cual corresponde a la actividad de construcción de cunetas en concreto en ambos costados de la vía construida, para el manejo de las aguas superficiales por escorrentía. Aunque al cierre del presente informe, se ejecutaron al 100% las actividades previstas para la ejecución del mismo, se contempla el cobro de las mismas en el acta parcial N°3 y final del proyecto.

A continuación, se relaciona la actividad que hace parte de la presente acta parcial de pago N° 2, y la cual como se menciona anteriormente asciende al valor de

TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE $371.192.748.

Actividad	Unidad	Cantidad	V. Unitario	Valor Parcial
I. PRELIMINARES				
Localización y replanteo con equipo de precisión	Mes	1,0	6.333.551,00	6.333.551,00
II. DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y RETIROS				
Excavación a mano de material común 0-2mts, incluye cargue para disposición final	M3	67,40	35.005	2.359.337,00
Transporte de material de excavación y RCD	M3*KM	2.288,96	1.710	3.914.121,06
Disposición final de material de excavación en sitio autorizado, incluye pago de derecho a disposición	M3	114,47	19.001	2.175.044,47
III. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO				
Suministro, transporte e instalación de base granular	M3	95,43	262.268	25.028.235,24
IV. ACERO				
Suministro e instalación de acero de refuerzo fy 420MPa para elementos en concreto reforzado	KG	471,35	8.998	4.241.207,30
V. OBRAS COMPLEMENTARIAS				
Construcción de cuneta triangular en concreto 21MPa. Incluye malla electrosoldada	ML	1.617	125.796	203.412.132
Estructura en concreto de 21MPa de cajas de inspección – sumideros – cabezal de entrega	M3	3,21	1.168.782	3.751.790,22
VI. SEÑALIZACIÓN				
Línea de demarcación vial con microesferas con pintura tipo plástico en frio 12cm de ancho	ML	3.450	8.542	4.228.469,16
Marca vial con microesferas y pintura acrílica de demarcación pintura tipo plástico en frio	M2	57,0	51.344	2.936.608
OBRA NO CONTRATADA Y EJECUTADA				
Demolición mecánica del pavimento flexible vial existente, incluye cargue del material en volqueta	M3	20,64	204.869	4.228.496,16
Corte con disco de pavimento asfaltico	ML	410	11.073	4.539.930

Lleno compactado con material de sitio	M3	2,52	34.587	87.159,24
Perforación para anclajes 1/2" con epóxico AnchorFix o similar	UND	1.614	8.070	13.024.980
Sardinel en concreto 3000PSI, ancho hasta 15 centímetros y alto hasta 25 centímetros (no incluye acero de refuerzo)	ML	322,80	45.531	14.697.406,80
Tapa en concreto tipo manhole 160x160centimetros (incluye tapa vehicular en polipropileno)	UND	1	2.345.589	2.345.589,00
Sumidero en concreto 21MPa, dimensiones 70x70centimetros (incluye tapa vehicular en polipropileno)	UND	2	1.745.500	3.497.000,00
Suministro e instalación de tubería PVC Novafort Diam 10 pulgadas pared estructural	ML	6	545.936	3.275.616,00
Construcción de reductores de velocidad en mezcla asfáltica, no incluye pintura	ML	18	672.500	12.102.000,00
Suministro e instalación de señalización vial vertical dimensiones 60x60centimentros incluye soporte metálico	UND	18	831.525	14.967.450,00
			PMT (INCLUYE ADMINISTRACIÓN)	**14.812.194,00**
			SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE AIU 34.5%)	356.380.554,00
			VALOR TOTAL ACTA N° 2 Y FINAL	**371.192.748,00**

Cantidades y valor acta N° 2 y Final – Contrato 003/2025.

5. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Para el desarrollo de actividades ejecutadas en el periodo del acta parcial N° 2, se desarrollaron actividades de obra que hacen parte del presente informe, sin embargo, es de tener en cuenta que únicamente se realizara el cobro correspondiente a una única actividad de obra como se relaciona en la anterior tabla. A continuación, se relacionan a discriminan las actividades que hicieron parte de la ejecución del periodo.

- **Localización y replanteo con equipo de precisión.**

Este ítem se lleva a cabo para el seguimiento y como su nombre lo indica, la localización de las actividades propias del proyecto. Cabe anotar que, corresponde a la georeferenciación de los tramos intervenidos, como lo fueron el contrato principal del tramo el Caimo – Portugalito, como la intervención de los cuatro (4) frentes de trabajo correspondientes a los presupuestos participativos en las vías del Municipio de Armenia, Quindío.

- **Suministro, transporte e instalación de base granular.**

Este ítem corresponde al suministro e instalación de material granular para el soporte de las cunetas en concreto de resistencia 21MPa. Las cuales, se ubican a los costados laterales de la vía construida entre las abscisas K0+006 y hasta el K1+150 del tramo vial El Caimo – Portugalito. Esta actividad corresponde a las especificaciones técnicas del proyecto, las cuales determinan un espesor mínimo de 10 centímetros de soporte para la construcción de cunetas.

- **Suministro e instalación de acero de refuerzo Fy=420MPa; para elementos en concreto reforzado.**

Este ítem corresponde al refuerzo de los elementos en concreto, los cuales, hacen parte integral de las obras hidráulicas del proyecto. Como lo son la construcción de obras de encole y descole de las obras transversales ubicadas en el K1+100 del tramo El Caimo – Portugalito. Así, como la construcción de los sardineles en concreto ubicados a la margen derecha y paralelos a los andenes en concreto existentes en el tramo denominado uno (1). El cual se ubica entre las abscisas K0+006 y hasta el K0+495.

- **Construcción de cuneta triangular en concreto 21 Mpa. Incluye malla electrosoldada**

Este ítem, como su nombre lo indica y referencia. Hace parte integral de las obras de manejo hidráulico del proyecto, las cuales se construyeron a los costados de la vía nueva construida en pavimento flexible. Estas cunetas en concreto se encuentran localizadas a lo largo del proyecto, desde las abscisas K0+006 y hasta la K1+150.

Es importante precisar que, en el tramo denominado uno (1) su construcción se llevo a cabo al margen izquierdo de la vía, así como en el tramo intermedio que se ubica entre las abscisas K0+495 y hasta la K0+645. Para el tramo denominado dos (2) se realizó la construcción de las cunetas en ambos costados del tramo, hasta el punto final de intervención del mismo.

- **Corte con disco de pavimento asfaltico**

Este ítem, corresponde al corte del pavimento flexible instalado en la ejecución del proyecto. Con el propósito de garantizar el alineamiento y la uniformidad de las cunetas a construir. Actividad que se adelanto para el presente informe de actividades ejecutadas sobre el tramo uno (1) de la vía El Caimo – Portugalito.

- **Perforación para anclajes 1/2" con epóxico AnchorFix o Similar**

Este ítem, corresponde a la realización de perforación con broca de concreto. La cual se hace necesaria para la realización de los anclajes con epóxico adhesivo en la construcción del sardinel en concreto de resistencia 21MPa sobre el anden en concreto de la margen derecha existente en el tramo denominado uno (1) de la vía El Caimo – Portugalito.

- **Sardinel en concreto 3.000PSI, ancho hasta 15 centímetros y alto hasta 25 centímetros (No incluye acero de refuerzo)**

Este ítem, hacen parte de la construcción del sardinel en concreto ubicado en la margen derecha del tramo un (1) sobre el anden en concreto existente en el proyecto. La realización de esta actividad obedece principalmente al control de las aguas de escorrentía sobre la vía, la cual, estaba generando afectaciones a los predios colindante con la construcción de la vía El Caimo – Portugalito. Es importante aclara que, los niveles de capa de rodadura del asfalto, se encuentran a nivel o por encima del andén existente.

- **Tapa en concreto Tipo ManHall 160x160 centímetros (Incluye tapara vehicular en polipropileno)**

Este ítem, corresponde a la construcción de una tapa en concreto sobre una recama de aguas residuales y lluvias. Bajo una necesidad y solicitud de la comunidad, la cual, manifestó una vez construida la vía del tramo El Caimo – Portugalito, la existencia de la misma. Por tal motivo, se hace necesaria la construcción de la tapa en concreto para la inspección y mantenimiento de la misma.

5.1. Tabla de avance obra

Actividad	Unidad	Cantidad Contrato	Cantidad Ejecutada	Porcentaje (%) Ejecutado
I. PRELIMINARES				
Localización y replanteo	Mes	2,50	2,50	100%
II. DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y RETIROS				
Excavación a mano material común 0-2mts, incluye cargue para disposición final	M3	85,68	85,68	100%
Transporte de material de excavación y RCD	M3/KM	2.288,96	2.288,96	100%
Disposición final de material de excavación en sitio autorizado, incluye pago de derecho a disposición	M3	114,47	114,47	100%
III. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO				
Nivelación, conformación y compactación de la subrasante existente con maquinaria amarilla (puesta en obra)	M2	5.804,27	5.804,27	100%
Suministro, transporte e instalación de base granular	M3	1.577,56	1.577,56	100%
Imprimacion de asfalto o riego de liga con emulsión asfáltica de rotura lenta	M2	5.799,34	5.799,34	100%

Suministro, transporte e instalación de capa de rodadura tipo MDC-19 con asfalto 60/70	M3	434,95	434,95	100%
IV. ACERO				
Suministro e instalación de acero de refuerzo Fy=420MPa; para elementos en concreto reforzado	Kg	471,3508	471,35	99,9968%
V. OBRAS COMPLEMENTARIAS				
Construcción de cuneta triangular en concreto 21MPa. Incluye malla electrosoldada	ML	1.617,00	1.617,00	100%
Estructura en concreto de 21MPa de cajas de inspección, sumideros, cabezal de entrega	M3	3,21	3,21	100%
VI. SEÑALIZACIÓN				
Línea de demarcación vial con micro esferas con pintura tipo plástico en frio 12cm de ancho	ML	3.450,00	3.450,00	100%
Marca vial con micro esferas y pintura acrílica de demarcación pintura tipo plástico en frio	M2	57,00	57,00	100%
OBRA NO CONTRATADA Y EJECUTADA				
Demolición mecánica del pavimento flexible vial existente, incluye cargue del material en volqueta	M3	20,64	20,64	100%
Corte con disco de pavimento flexible	ML	1.903,00	1.903,00	100%
Limpieza de tubería diámetro 24" – (obras transversales)	ML	38,80	38,80	100%
Tubería en PVC Novafort D 36"	ML	6,50	6,50	100%
Lleno compactado con material de sitio	M3	14,31	14,31	100%
Perforación para anclajes ½" con epóxico AnchorFix o similar	UN	1.614,00	1.614,00	100%
Sardinel en concreto 3.000PSI, ancho hasta 15 centímetros y alto hasta 25 centímetros (no incluye acero de refuerzo)	ML	322,80	322,80	100%
Tapa en concreto tipo manhole 160x160 centímetros (incluye tapa vehicular en polipropileno)	UN	1,00	1,00	100%
Sumidero en concreto 21MPa, dimensiones 70x70 centímetros (incluye tapa vehicular en polipropileno)	UN	2,00	2,00	100%
Suministro e instalación de tubería PVC Novafort Diam 10 pulgadas pared estructural	ML	6,00	6,00	100%
Construcción de reductores de velocidad en mezcla asfáltica, no incluye pintura	ML	18,00	18,00	100%

Suministro e instalación de señalización vertical, dimensiones 60x60 centímetros. Inc. Estructura soporte metálica	UN	18,00	18,00	100%
VEREDA GUAYABAL				
Localización y replanteo	Mes	0,25	0,25	100%
Nivelación, conformación y compactación de la subrasante existente con maquinaria amarilla (puesta en obra)	M2	2.777,74	2.777,74	100%
Excavación a mano material común 0-2mts, incluye cargue para disposición final	M3	27,78	27,78	100%
Transporte de material de excavación y RCD	M3/KM	722,21	722,21	100%
Disposición final de material de excavación en sitio autorizado, incluye pago de derecho a disposición	M2	36,11	36,11	100%
VEREDA MARMATO				
Localización y replanteo	Mes	0,25	0,25	100%
Nivelación, conformación y compactación de la subrasante existente con maquinaria amarilla (puesta en obra)	M2	5.267,50	5.267,50	100%
Excavación a mano material común 0-2mts, incluye cargue para disposición final	M3	52,68	52,68	100%
Transporte de material de excavación y RCD	M3/KM	1.369,55	1.369,55	100%
Disposición final de material de excavación en sitio autorizado, incluye pago de derecho a disposición	M2	68,48	68,48	100%
VEREDA MURILLO				
Localización y replanteo	Mes	0,25	0,25	100%
Demolición mecánica del pavimento flexible vial existente, incluye cargue del material en volqueta	M3	21,16	21,16	100%
Nivelación, conformación y compactación de la subrasante existente con maquinaria amarilla (puesta en obra)	M2	0,00	0,00	100%
Excavación a mano material común 0-2mts, incluye cargue para disposición final	M3	46,02	46,02	100%
Transporte de material de excavación y RCD	M3/KM	1.196,60	1.196,60	100%
Disposición final de material de excavación en sitio autorizado, incluye pago de derecho a disposición	M2	59,83	59,83	100%
Suministro, transporte e instalación base granular	M3	46,02	46,02	100%

Imprimación de asfalto o riego de liga con emulsión asfáltica de rotura lenta	M2	423,20	423,20	100%
Suministro e instalación de capa de rodadura tipo MDC-19 con asfalto 60/70	M3	31,74	31,74	100%
EL CAIMO				
Localización y replanteo	Mes	0,25	0,25	100%
Demolición mecánica del pavimento flexible vial existente, incluye cargue del material en volqueta	M3	17,94	17,94	100%
Nivelación, conformación y compactación de la subrasante existente con maquinaria amarilla (puesta en obra)	M2	0,00	0,00	100%
Excavación a mano material común 0-2mts, incluye cargue para disposición final	M3	0,00	0,00	100%
Transporte de material de excavación y RCD	M3/KM	466,43	466,43	100%
Disposición final de material de excavación en sitio autorizado, incluye pago de derecho a disposición	M2	23,32	23,32	100%
Suministro, transporte e instalación base granular	M3	0,00	0,00	100%
Imprimación de asfalto o riego de liga con emulsión asfáltica de rotura lenta	M2	179,40	179,40	100%
Suministro e instalación de capa de rodadura tipo MDC-19 con asfalto 60/70	M3	18,47	18,47	100%

Actividades de obra ejecutadas al cierre del presente informe, teniendo en cuenta acta de mayores y menores cantidades con fecha del 20/03/2026 realizada en conjunto entre Contratista e Interventoría del proyecto.

6. MEDICIONES O CRITERIOS DE MEDICIÓN

Para la realización de las memorias y cantidades de obra, se llevaron a cabo la toma de mediciones en campo. En conjunto entre Contratista e Interventoría del proyecto, con el propósito de asentar estos datos en las memorias de calculo que hacen parte del documento denominado Acta Parcial de Pago. Las cuales se relacionan a continuación.

6.1. Formulas o criterio de medición

En acuerdo con el documento Acta Parcial de Pago N° 2, y con la actividad que hace parte de documento soporte para su cobro. Se adjunta a continuación las memorias de calculo sobre la actividad que hace parte de este cobro y dicha actividad hace referencia al ítem de construcción de cuneta en concreto con resistencia 21MPa, la cual, incluye suministro e instalación de malla electrosoldada 4mm de abertura 15x15 centímetros.

ÍTEM 10. CONSTRUCCIÓN DE CUNETA TRIANGULAR EN CONCRETO 21MPa. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	Unidad Medida		ML	Cantidad Total		1.499,00
Localización y/o Ubicación	Cant	Long	Ancho	Ancho	Esp	Cant
Cuneta Tramo II M. Derecha (K0+648 al K1+150)		502,0				502,0
Cuneta Tramo II M. Izquierda (K0+648 al K1+150)		502,0				502,0
Cuneta Tramo Intermedio M. Izquierda (K0+498 al K0+648)		150,0				150,0
Cuneta Tramo I M. Izquierda (K0+035 al K1+498)		345,0				345,0

Memorias de cálculo para cobro de actividad, tomadas en campo entre Contratista e Interventoría del proyecto.

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Este capitulo relaciona las actividades ejecutadas durante el periodo del acta parcial N°2 y Final. El objetivo es evidenciar cada una de las labores realizadas para culminar a feliz termino el proyecto "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia en el Departamento del Quindío" bajo el contrato 003/2025. Celebrado entre la Alcaldía de Armenia y el Consorcio CGJ cuyo representante legal es el ingeniero Jhoany Alexander Tobón Muñoz y con el acompañamiento técnico de la Interventoría Grupo Quimbaya Ingenieros SAS cuyo representante legal es la ingeniera Lina Mercedez Monsalve Escobar.

A continuación, se evidencia mediante el registro fotográfico, las actividades ejecutadas durante el plazo contractual del proyecto.

Fotografía 1



Condiciones Iniciales K0+000

Fotografía 2




Condiciones Iniciales K0+000

Fotografía 3



Condiciones iniciales K0+010

Fotografía 4

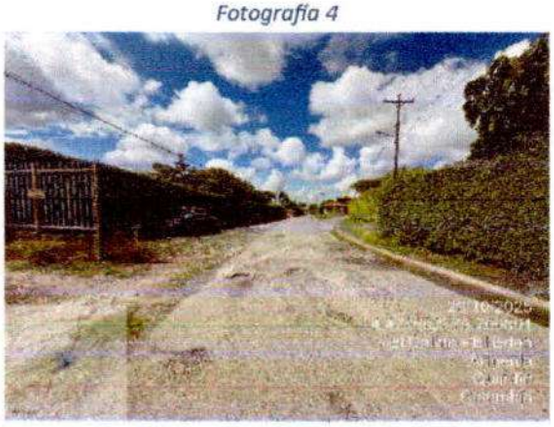

Condiciones iniciales K0+050

Fotografía 5




Condiciones iniciales K0+100

Fotografía 6




Condiciones iniciales K0+150

Fotografía 7

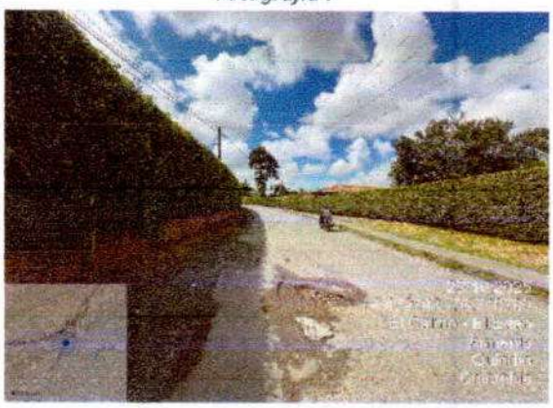

Condiciones iniciales K0+200

Fotografía 8

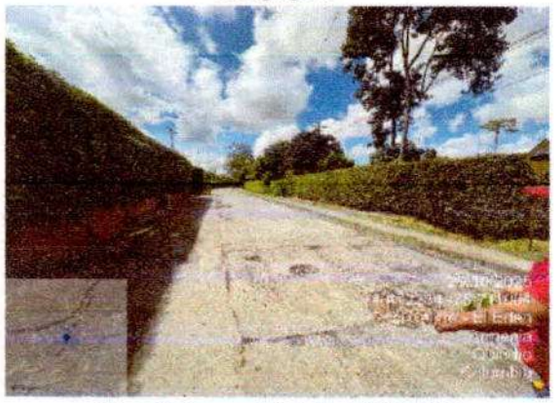


Condiciones iniciales K0+300

Fotografía 9



Condiciones iniciales K0+350

Fotografía 10

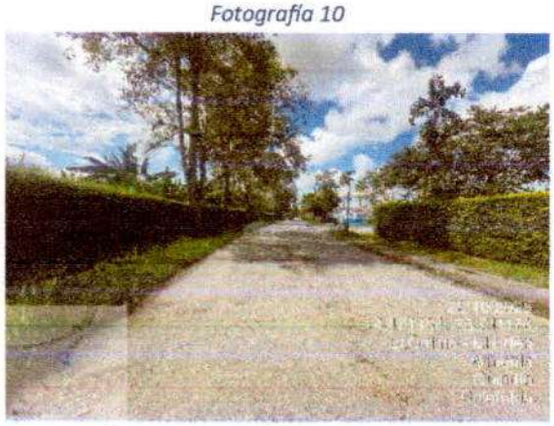

Condiciones iniciales K0+380

Fotografía 11



Condiciones iniciales K0+400

Fotografía 12



Condiciones iniciales K0+420

Fotografía 13



Condiciones iniciales K0+550

Fotografía 14



Condiciones iniciales K0+600

Fotografía 15




Condiciones iniciales K0+630

Fotografía 16




Condiciones iniciales K0+700

Fotografía 17

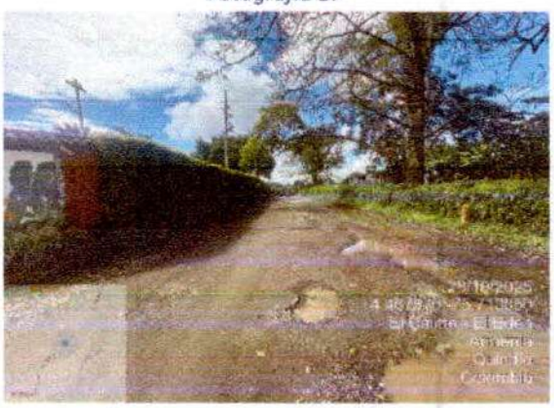

Condiciones iniciales K0+730

Fotografía 18

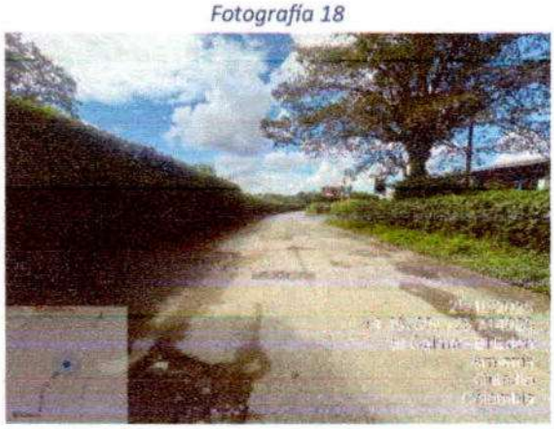


Condiciones iniciales K0+750

Fotografía 19



Condiciones iniciales K0+800

Fotografía 20

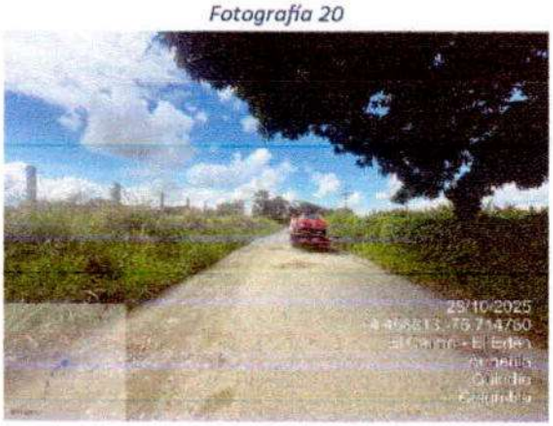

Condiciones iniciales K0+900

Fotografía 21



Condiciones iniciales K0+950

Fotografía 22



Condiciones iniciales K1+000

Fotografía 23



Condiciones iniciales K1+100

Fotografía 24



Condiciones iniciales K1+150

Fotografía 25



Platina de georeferenciación

Fotografía 26



Equipo de topografía RTK

Fotografía 27



Implementación de georeferenciación

Fotografía 28



Levantamientos topográficos

Fotografía 29



Comisión topográfica seguimiento

Fotografía 30




Comisión topográfica seguimiento

Fotografía 31



Chequeo de estructura existente

Fotografía 32

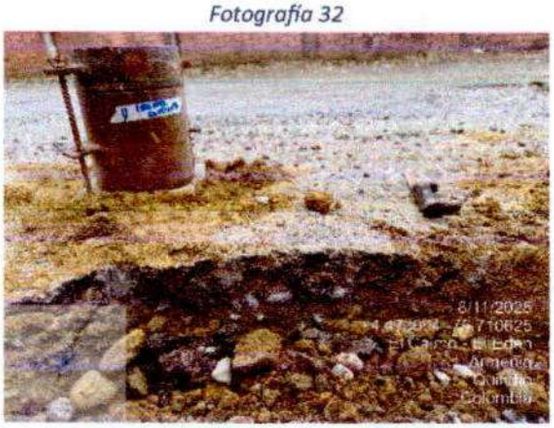


Verificación de estructura soporte

Fotografía 33



Verificación de estructura existente

Fotografía 34

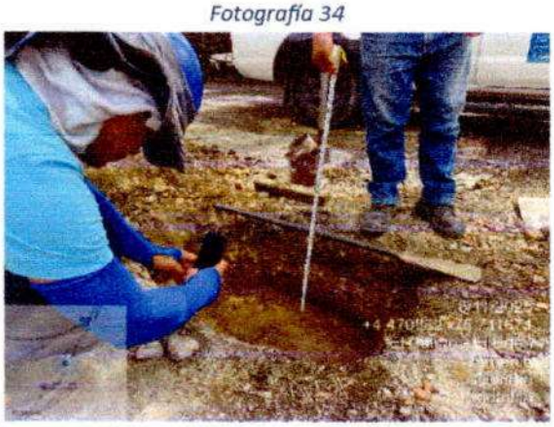

Estructura soporte existente

Fotografía 35



Cheque de estructura

Fotografía 36



Chequeo de estructura

Fotografía 37




Chequeo de estructura

Fotografía 38



Apiques para chequeo de estructura

Fotografía 39

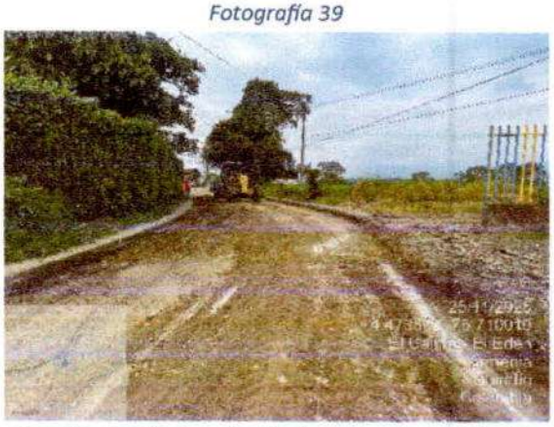

Conformacion y nivelacion de via existente

Fotografía 40




Conformacion y nivelacion con maquinaria

Fotografía 41



Conformacion de via existente

Fotografía 42

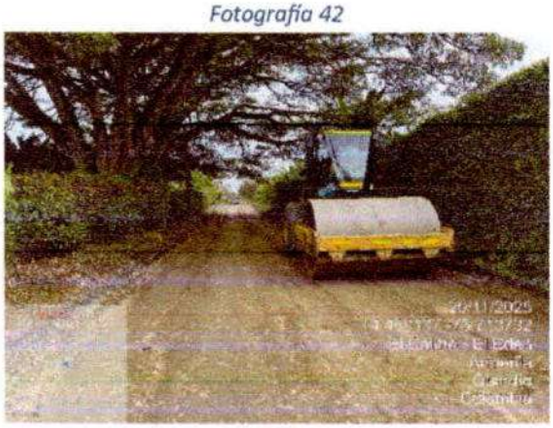


Compactacion de via existente – soporte

Fotografía 43




Compactacion de via existente – soporte

Fotografía 44

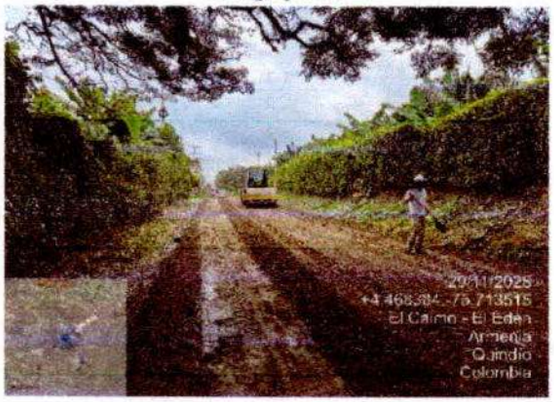

Compatacion de via existente - soporte

Fotografía 45

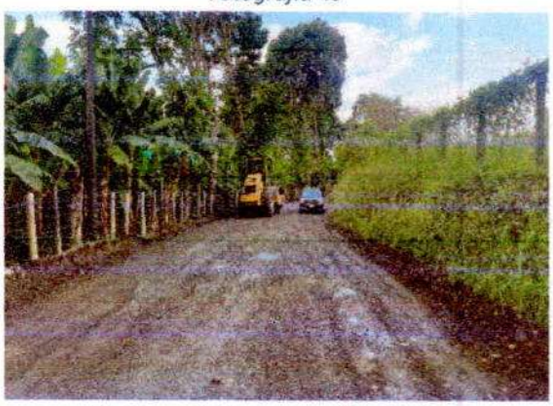

Compactacion y conformacion

Fotografía 46



Compactacion y conformacion

Fotografía 47



Material granular BASE – soporte

Fotografía 48



Compactacion material granular BASE

Fotografía 49




Extendida de material granular – soporte via

Fotografía 50



Compactacion de BASE granular

Fotografía 51

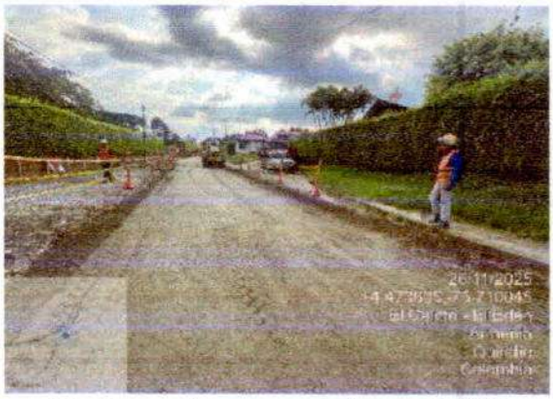

Conformacion y compactacion BASE

Fotografía 52




Conforacion y compactacion BASE

Fotografía 53




Obras de arte existentes

Fotografía 54

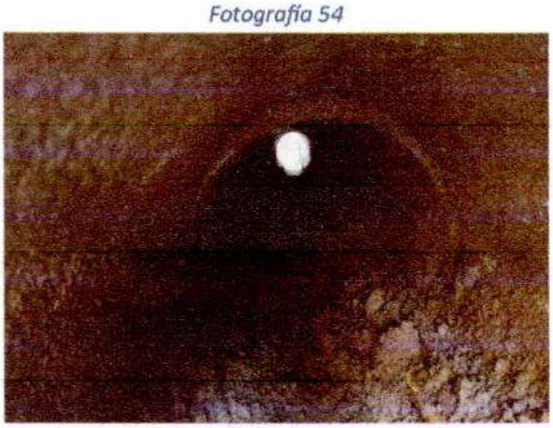

Tuberia existentes – tranversales

Fotografía 55

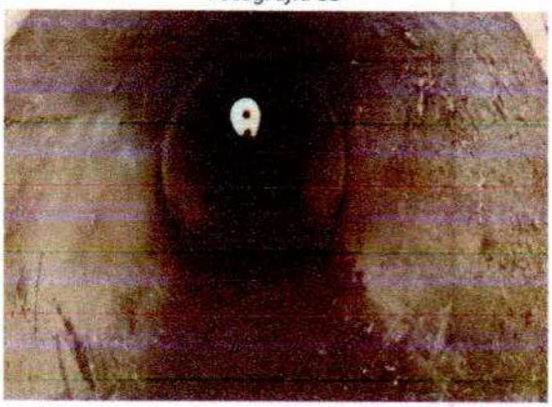

Limpieza de tuberias trasnversales 24"

Fotografía 56



Limpieza de obras arte existentes

Fotografía 57



Excavaciones para descole de obras arte

Fotografía 58



Excavaciones para descole de obras arte

Fotografía 59



Densidades de compactacion <95%

Fotografía 60



Densidades de compactacion <95%

Fotografía 61



Toma de densades – compactacion

Fotografía 62



Toma de desndiades en sitio

Fotografía 63



Excavaciones para instalacion tuberia 36"

Fotografía 64




Excavaciones para instalacion tuberia 36"

Fotografía 65



Excavaciones para tuberia 36"

Fotografía 66

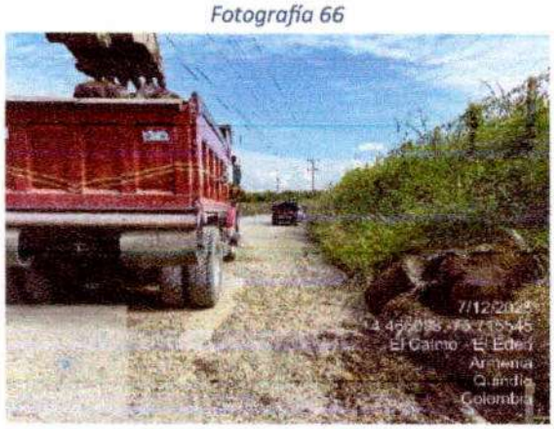

Cargue y retiro de material sobrante

Fotografía 67



Instalacion de acero refuerzo – obra arte

Fotografía 68



Tuberia PVC Novafort 36"

Fotografía 69




Toma de densidades

Fotografía 70



Toma de densidades

Fotografía 71

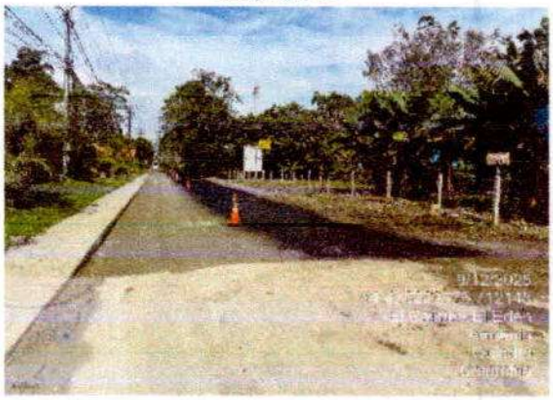


Imprimacion con emulsion asfaltica

Fotografía 72




Imprimacion con emulsion asfaltica

Fotografía 73

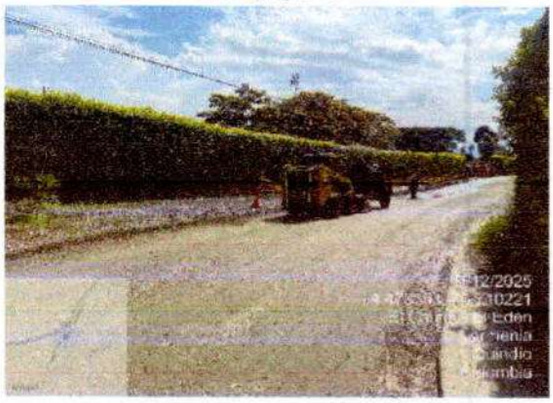

Imprimacion con esmulsion asfaltica

Fotografía 74

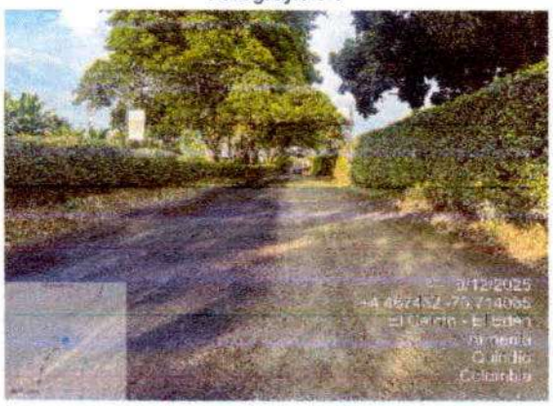

Imprimacion de rotuta lenta

Fotografía 75



Instalacion de mezcla asfaltica MDC19

Fotografía 76



Suministro de mezcla asfaltica MDC19

Fotografía 77




Suministro e instalacion MDC19

Fotografía 78



Suministro e instalacion mezcla MDC19

Fotografía 79

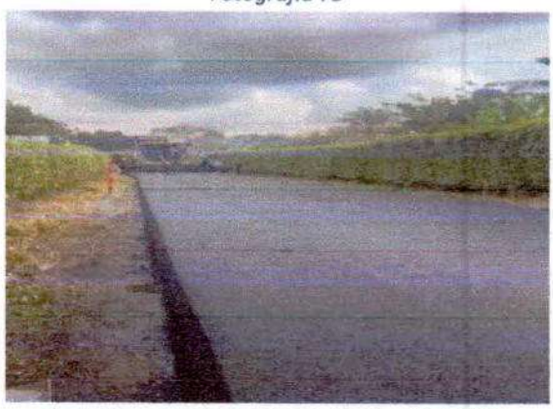

Instalacion de mezla asfaltica MDC19

Fotografía 80




Instalacion de mezcla asfaltica MDC19

Fotografía 81



Compactacion de mezcla asfaltica caliente

Fotografía 82

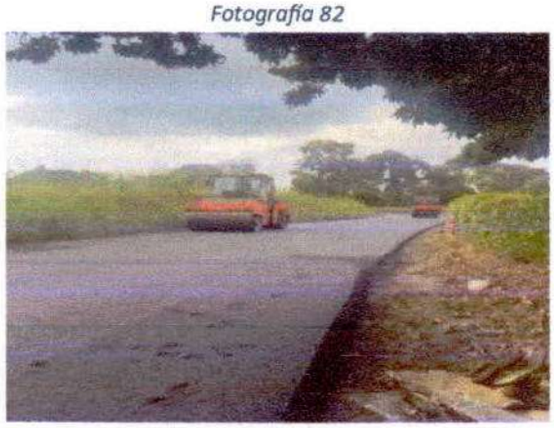

Compactacion de mezcla asfaltoca caliente

Fotografía 83



Sellado de mezcla asfaltica MDC19

Fotografía 84




Sellado de mezcla asfaltoca MDC19

Fotografía 85



Instalacion de mezcla asfaltica MDC19

Fotografía 86

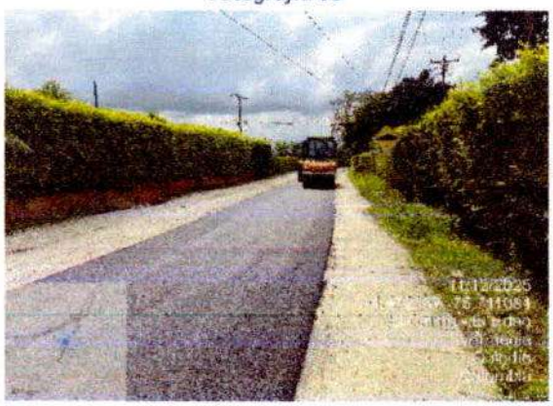

Compactacion de mezcla asfaltica MDC19

Fotografía 87



Mezcla sfaltica MDC19

Fotografía 88




Mezcla asfaltica MDC19

Fotografía 89



Sellado de mezcla asfaltica en caliente

Fotografía 90

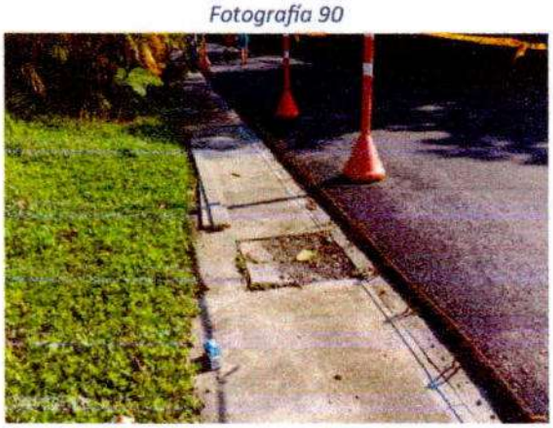

Sumnistro e instalacion de acero refuerzo

Fotografía 91



Conformacion material granular soporte

Fotografía 92



Construccion de cunetas 12MPa

Fotografía 93



Construccion de cunetas en concreto 21MPa

Fotografía 94




Instalacion de malla electrosoldada

Fotografía 95



Construccion de cunetas en concreto 21MPa

Fotografía 96

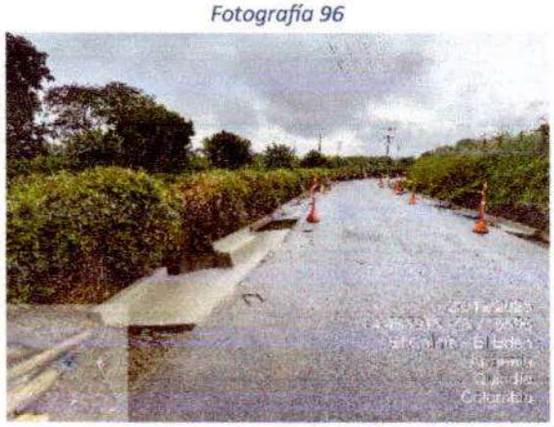

Construccion de cunetas en concreto 21MPa

Fotografía 97



Concreto premezclado 3000PSI

Fotografía 98



Construccion de cunetas en concreto 21MPa

Fotografía 99



Suministro de concreto premezclado

Fotografía 100




Construccion de cuneta triangular

Fotografía 101



Cunetas en concreto triangulares

Fotografía 102

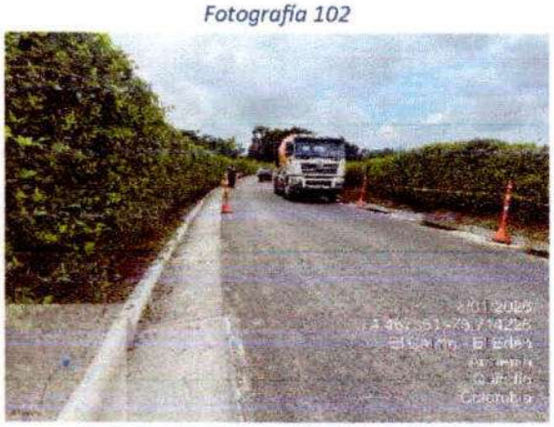

Cunetas en concreto triangulares

Fotografía 103



Cunetas en concreto triangulares

Fotografía 104




Cunetas en concreto triangulares

Fotografía 105



Cunetas en concreto triangulares

Fotografía 106

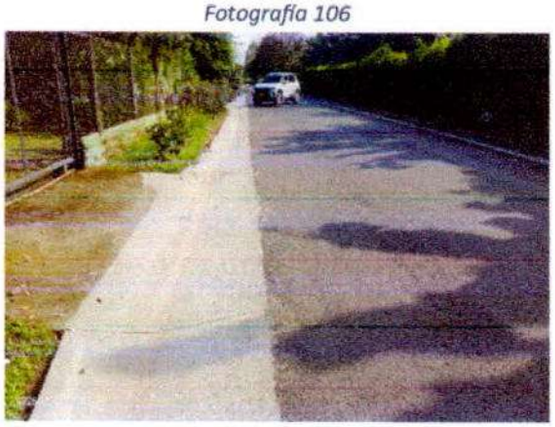


Cunetas en concreto triangulares

Fotografía 107



Cunetas en concreto triangulares

Fotografía 108

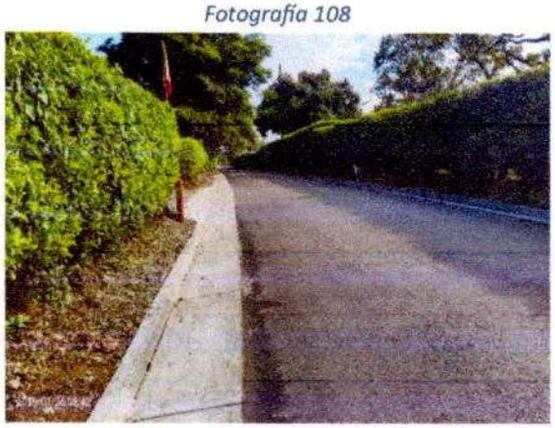

Cunetas en concreto triangulares

Fotografía 109



Corte con disco en pavimento flexible

Fotografía 110



Demolicion de carpeta asfaltica

Fotografía 111




Acero de refuerzo – camara inspeccion

Fotografía 112




Suminstro tapa plastica vehicular

Fotografía 113

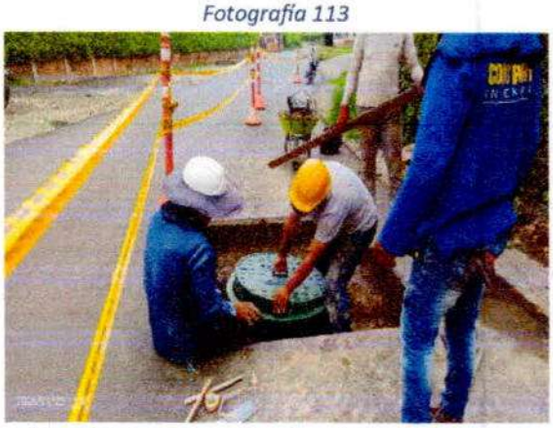

Suministro e instalacion de tapa plastica

Fotografía 114

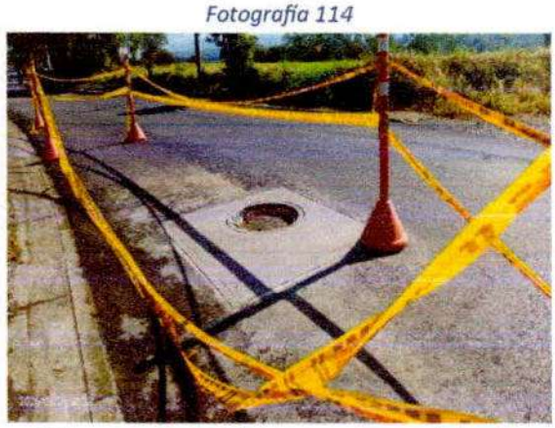

Tapa en concreto – recamara existente

Fotografía 115



Perforacion para instalacion de acero

Fotografía 116



Instalacio de acwero refuerzo sardinel

Fotografía 117



Instalacion de "U"es en acero - sardinel

Fotografía 118



Formaleta madera – sardinel

Fotografía 119



Sardinel en concreto altura variable

Fotografía 120



Retiro de madera – sardinel

Fotografía 121




Excavaciones para sumidero concreto

Fotografía 122



Tuberia PVC Novafort 10"

Fotografía 123

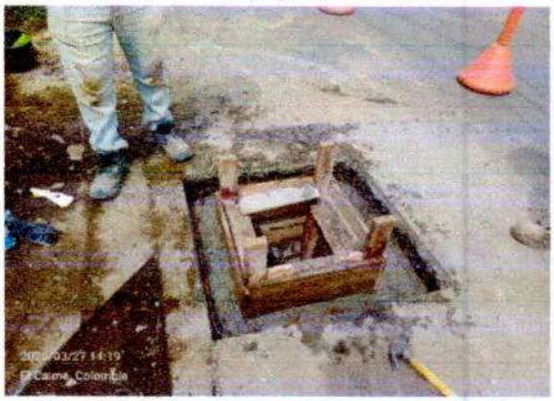


Construccion de sumidero en concreto

Fotografía 124



Suministro tapa plastica – sumidero

Fotografía 125

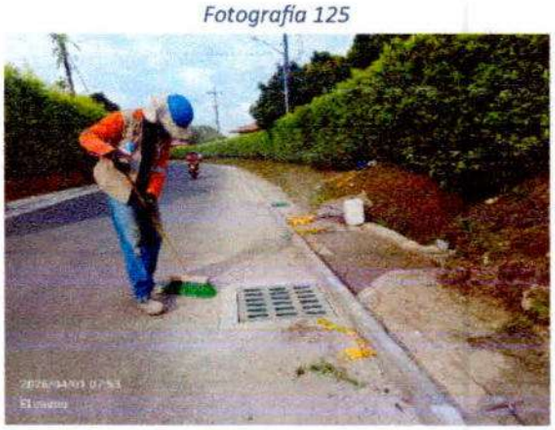

Sumideros en concreto

Fotografía 126




Suministro e instalcion de señalizacion

Fotografía 127




Pintura – demarcacion vial

Fotografía 128

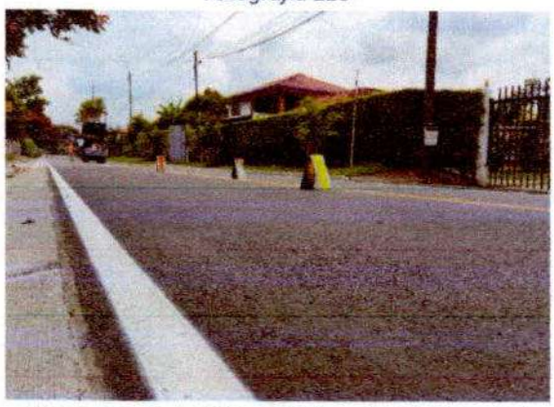

Demarcacion vial, señalizacion horizontal

Fotografía 129

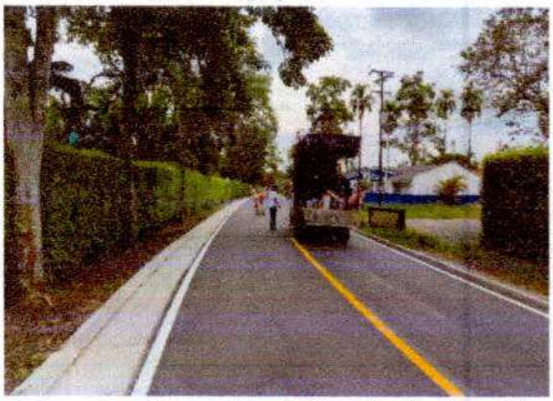


Demarcacion vial, señalizacion horizontal

Fotografía 130




Demarcacion vial, señalizacion horizontal

Fotografía 131

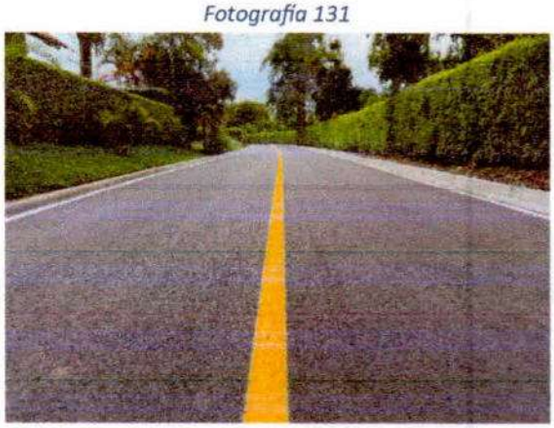


Demarcacion vial, señalizacion horizontal

Fotografía 132

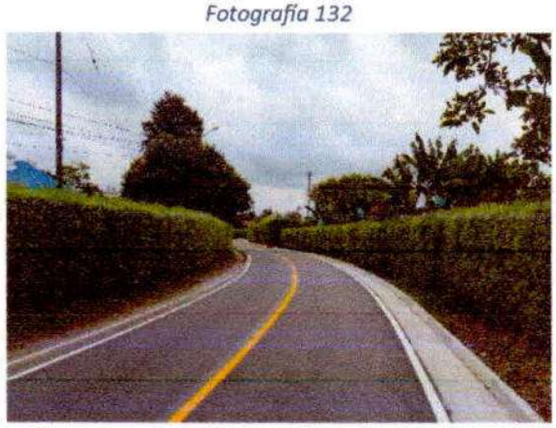


Demarcacion vial, señalizacion horizontal

Fotografía 133

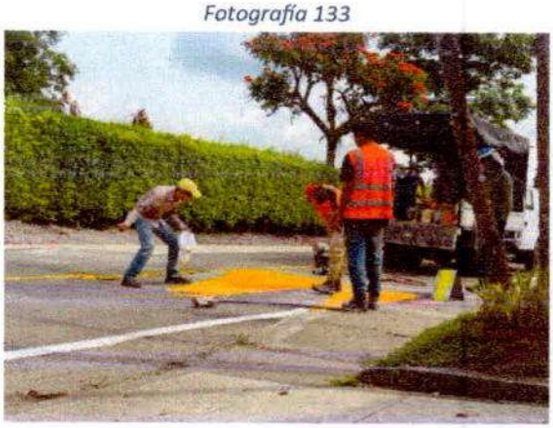

Demarcacion vial, señalizacion reductores

Fotografía 134

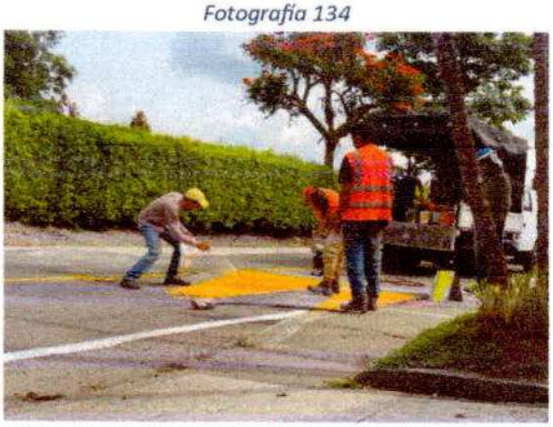

Demarcacion vial, señalizacion reductores

Fotografía 135



Condiciones finales – obra terminada

Fotografía 136




Condiciones finales – obra terminada

Fotografía 137



Condiciones finales – obra terminada

Fotografía 138

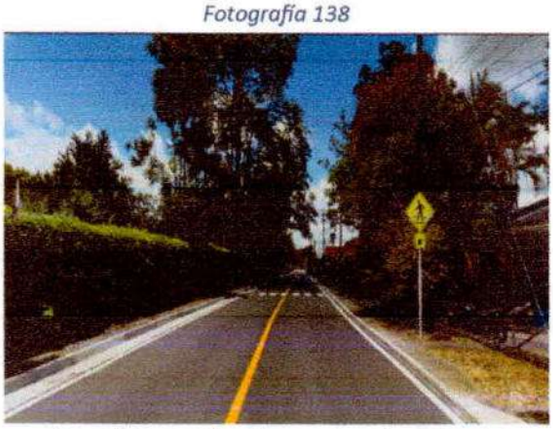


Condiciones finales – obra terminada

Fotografía 139



Condiciones finales – obra terminada

Fotografía 140

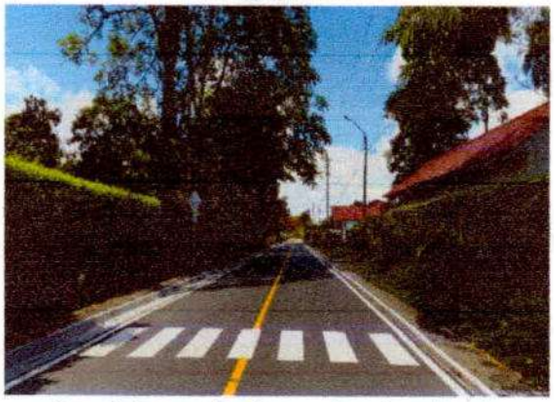

Condiciones finales – obra terminada

Fotografía 141




Condiciones finales – obra terminada

Fotografía 142




Condiciones finales – obra terminada

Fotografía 143

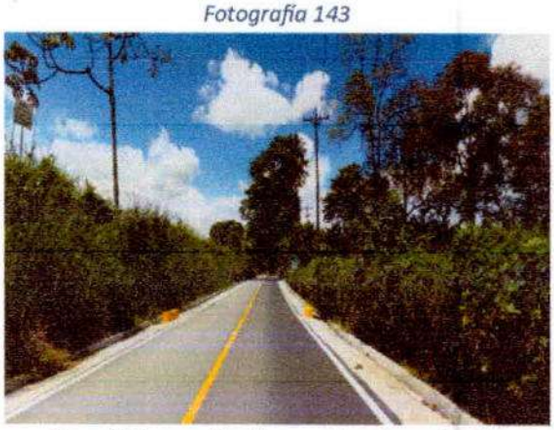

Condiciones finales – obra terminada

Fotografía 144

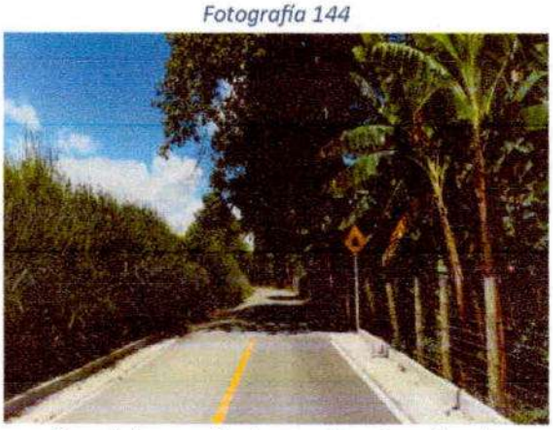

Condiciones finales – obra terminada

8. REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD

Para la construcción de las cunetas en concreto que hacen parte del proyecto en mención, se llevaron a cabo una serie de muestras de resistencia a la compresión. Las cuales se relacionan a continuación, con el propósito de verificar o validar la resistencia del mismo y cumplimiento de la resistencia de diseño.

Como anexo al presente informe, se involucran el documento de resultados a la compresión y el diseño de concreto para este tipo de elementos bajo la característica de concreto normal con una resistencia de 21Mpa.

8.1. Pruebas realizadas

Se realizaron pruebas de resistencia a la compresión de acuerdo con la normativa ASTM C39. Por lo cual, a continuación, se relacionan los resultados obtenidos en las muestras con edades de fallo a los 7, 14 y 21 días. Estos contados desde la fecha de elaboración de la muestra o vaciado en sitio del concreto, correspondiente a la construcción de cunetas en concreto para manejos de aguas superficiales por aguas de escorrentía.


CONTROL RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN ACI 318									
Edad		28días	Concreto para construcción de cunetas				Proyecto 003/2025 "Adecuar y Mejorar Vías Terciarias de Armenia Quindío"		
#	Fecha Toma	f´c Diseño	Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3	Promedio f´c	Desviación estándar	f´c min según ACI	Cumple No cumple
1	20/12/2025	21	18.9	18.9	19.2	19.0	0.2	17.9	Cumple
2	22/12/2025	21	21.4	20.2	20.7	20.8	0.6	18.9	Cumple
3	29/12/2025	21	20.1	20.6	22.0	20.9	1.0	19.8	Cumple
4	08/01/2026	21	20.4	21.1	19.1	20.2	1.0	19.8	Cumple
5	10/01/2026	21	19.2	19.2	19.2	19.2	0.0	17.6	Cumple
6	14/01/2026	21	21.0	20.4	21.0	21.6	0.6	19.0	Cumple
7	16/01/2026	21	22.0	23.0	22.3	22.4	0.5	18.7	Cumple
8	19/01/2026	21	21.0	19.3	19.6	20.3	0.5	18.7	Cumple
9	21/01/2026	21	22.1	21.1	22.1	22.0	0.1	17.8	Cumple

10	24/01/2026	21	20.9	21.0	21.6	21.1	0.4	18.4	Cumple

Control de muestras de concreto para la construcción de cunetas en concreto del proyecto 003/2025 estas muestras corresponden a resultados de 28 días.



Fotografía 145

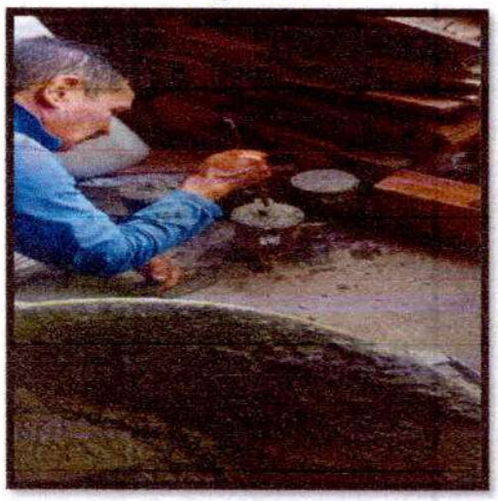

Toma de muestras en concreto insitu.

Fotografía 146



Desmonte de muestras tomadas insitu.

8.2. Aceptación de la supervisión técnica

Por parte de la interventoría del proyecto, la cual, es ejecutada por el Grupo Quimbaya Ingenieros SAS. No se presentaron novedades o inconformidades referentes a la calidad del concreto instalado en insitu. Cabe anotar que, el concreto que se utilizó en el proyecto, fue un concreto premezclado, con el propósito de garantizar su resistencia, homogeneidad y calidad del mismo.

El seguimiento de estas muestras, se lleva a cabo con el diseño de concreto para la resistencia del elemento según las especificaciones técnicas del proyecto. El cual,

contempla una resistencia de 21MPa, según el ítem de construcción de cunetas en concreto para el proyecto.

9. RECURSOS EMPLEADOS EN EL PERIODO

La ejecución de una obra vial no es solo cuestión de hombres y mujeres con cascos y chalecos. Detrás de cada metro lineal de cuneta, cada centímetro de carpeta asfáltica y cada tonelada de base granular bien compactada, hay un ejército silencioso de máquinas y equipos que trabajan al unísono con el talento humano. Sin ellos, el esfuerzo sería titánico; con ellos, la precisión, la velocidad y la calidad se vuelven posibles.

En el marco del Acta Parcial N°2 y Final del Contrato 003/2023, hemos dispuesto un parque de maquinaria que responde a las necesidades específicas de cada una de las actividades ejecutadas. Desde la estación total que nos permitió replantear con precisión milimétrica cada uno de los 1.617 metros lineales de cuneta, hasta la volqueta que transportó los 114,47 metros cúbicos de material de excavación a su disposición final autorizada, pasando por la mezcladora de concreto que durante 15 días produjo mezcla fresca para sumideros, sardineles y cajas de inspección.

Pero más allá de los nombres técnicos y las especificaciones de fábrica, queremos que quien lea este informe entienda lo siguiente: cada equipo fue seleccionado con criterio, operado por personal competente y mantenido en óptimas condiciones porque sabemos que la maquinaria no es un lujo, es una herramienta de trabajo que, bien usada, se traduce en obra bien hecha y comunidad satisfecha.

A continuación, presentamos un resumen consolidado de los equipos utilizados durante esta etapa final, organizados por tipo de actividad y con sus respectivas cantidades de operación (horas, días o meses). Este resumen no solo cumple con un requisito técnico-administrativo, sino que rinde un homenaje silencioso a esos fierros que, engrasados y calientes, nos ayudaron a cumplir la meta: entregar las vías terciarias de Armenia en las mejores condiciones posibles.

9.1. Mano de obra

El presente documento establece la dotación mínima de personal operativo requerida para la ejecución de las actividades comprendidas en el Acta Parcial N°2, la cual, por agotamiento del saldo contractual, constituye igualmente el Acta Final del contrato. La determinación de este personal se fundamenta en el análisis de los rendimientos esperados, la criticidad de las actividades programadas y las condiciones particulares de las vías terciarias intervenidas.

Es preciso señalar que la asignación del recurso humano no fue estática, sino que se ajustó dinámicamente según la fase de obra. No obstante, el esquema presentado a continuación refleja el personal mínimo indispensable para garantizar el cumplimiento de

los plazos, la calidad exigida por las especificaciones técnicas y la seguridad integral de las operaciones.

9.2. Equipos

RESUMEN EQUIPOS POR CATEGORÍA		
Tipo de equipos	Cantidad de referencias	Horas/Días/Meses estimados
Equipos de topografía	1. Estancación total 2. GPS diferencial 3. Nivel de ingeniero 4. Cinta métrica metálica	1 mes
Maquinaria pesada	1. Martillo hidráulico 2. Minicargador CAT 3. Cortadora de pavimento 4. Volqueta	18-16 horas cada una
Equipos de demolición y corte	1. Vibrocompactador tipo rana 2. Volqueta 3. Herramienta menor	12-24horas
Equipos para concreto	1. Mezcladora en concreto 2. Vibrador de concreto 3. Taladro percutor 4. Equipo para inyección de epóxico 5. Formaleta metálica – madera	24horas – 15días
Equipos de señalización	1. Maquina demarcadora de pintura en frio 2. Compresor de pintura 3. Pistola de pintura industrial 4. Equipo de seguridad vial para demarcación	12horas
Equipos de seguridad y apoyo	1. Sistema de comunicación (radios portátiles) 2. Camara fotográfica / smartphone con GPS 3. Computador portátil 4. Impresora multifuncional	Global

9.3. Materiales

El presente capítulo tiene por objeto relacionar y describir de manera técnica los materiales necesarios utilizados para la ejecución de las actividades comprendidas en esta Acta Final. Para efectos de claridad expositiva, los materiales se han agrupado según su destino funcional, a saber:

- ✓ **Materiales para obras preliminares y localización** Insumos de topografía y trazado.
- ✓ **Materiales para excavaciones, demoliciones y transporte** Insumos auxiliares y de señalización temporal.


- ✓ **Materiales para estructura de pavimento** Base granular, materiales bituminosos y agregados pétreos.
- ✓ **Materiales para acero de refuerzo y elementos estructurales en concreto** Acero grado 60 (fy=420 MPa), malla electrosoldada, concreto de 21 MPa (3000 PSI).
- ✓ **Materiales para obras complementarias (drenaje)** Tubería PVC Novafort, epóxico para anclajes (AnchorFix o similar), tapas vehiculares en polipropileno.
- ✓ **Materiales para señalización vial** Pintura termoplástica o acrílica en frío, microesferas reflectivas, señales verticales con soporte metálico.
- ✓ **Materiales para actividades no previstas inicialmente** Demolición, corte con disco, llenos compactados, sardineles y reductores de velocidad.

Es importante señalar que todos los materiales aquí relacionados fueron objeto de controles de calidad por parte de la interventoría, incluyendo ensayos de laboratorio, inspecciones visuales y verificaciones de cantidades recibidas contra las facturas de compra y los despachos a obra. Dichos controles se encuentran documentados en los anexos correspondientes, los cuales forman parte integral del presente informe de ejecución.

Adicionalmente, se debe precisar que los costos de adquisición, transporte, almacenamiento y manejo de los materiales se encuentran incluidos en los análisis de precios unitarios (APU) que sirvieron de base para la liquidación del contrato. Por lo tanto, los valores unitarios presentados en las tablas de medición ya contemplan la totalidad de los insumos requeridos para la ejecución de cada actividad.

10. AVANCE VS PROGRAMACIÓN

10.1. Curva "S"

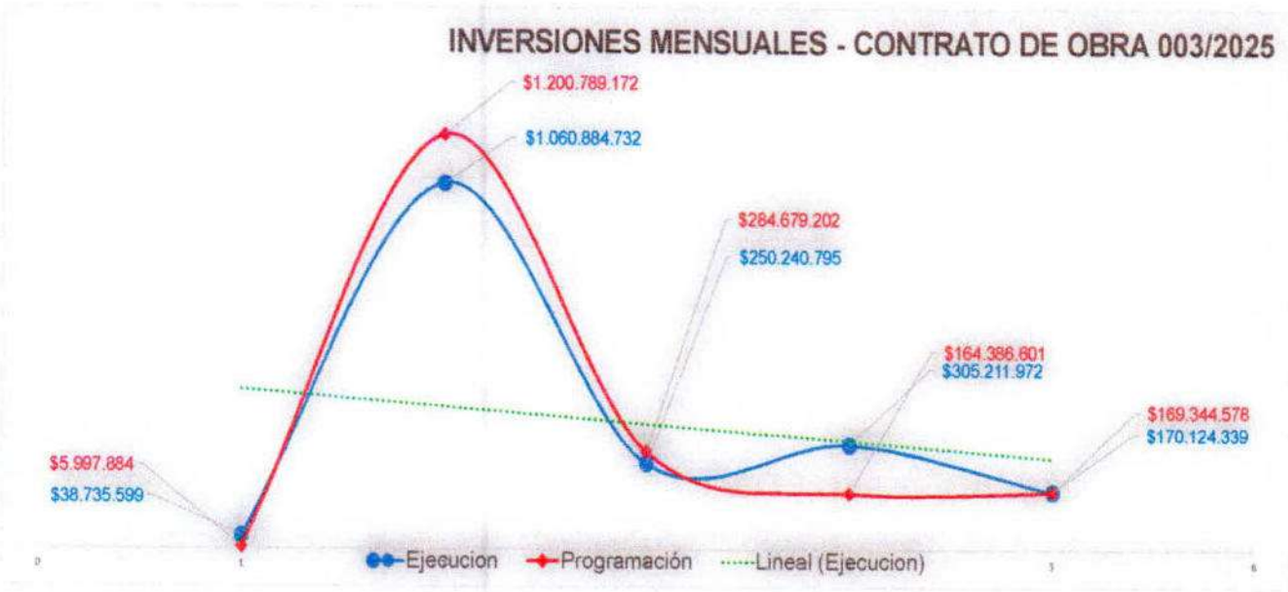

A la fecha de cierre del presente informe de actividades, el contratista de obra cumple a cabalidad con las actividades previstas para la ejecución del contrato de obra. Como se observa en la grafica anterior, el contrato fue ejecutado de acuerdo a las inversiones programadas y actualizadas según las modificaciones realizadas al contrato de obra, en cuento a recursos y plazos de ejecución.

10.2. Acciones correctivas o plan de recuperación

Para el presente informe correspondiente a las actividades generadas para el cobro del acta parcial N°2 y Final. No se presentaron atrasos respecto a la programación para la entrega del proyecto. por tal motivo no se generaron acciones o planes de recuperación.

11. OBSERVACIONES Y NO CONFORMIDADES

11.1. Situaciones que afectan el avance

Durante de la ejecución del periodo correspondiente a la realización de las actividades, no se presentaron novedades algunas que no permitieran el buen desarrollo del proyecto.

11.2. Notas de no conformidad y estado

No se presentaron durante la ejecución del proyecto NO Conformidades emitidas por parte de la interventoría y/o entidad contratante. Al cierre del presente informe el proyecto cuenta con acta de recibido a satisfacción.

12. CONCLUSIONES

En términos generales y con el objetivo de validar las actividades de obra ejecutadas para el documento denominado Acta de Pago N°2 y Final para el contrato de obra 003/2025 por un monto de $371.192.748. equivalente al 20.34% del valor actualizado del proyecto.

el cual cabe anotar que, llega a feliz término en la ejecución de las actividades propias del proyecto y que adicionalmente cuenta a la fecha con acta de recibido a satisfacción por parte de la Interventoría del proyecto, quien, para este contrato es el Grupo Quimbaya Ingenieros SAS.

A continuación, se relaciona un estado financiero del proyecto. mediante el cual, se evidencia que a la fecha únicamente se ha generado el pago del acta parcial de pago N°1 por un monto de 1.454.004.682. equivalente al 79.66% del valor actualizado del proyecto.

Concepto	Valor	Porcentaje
Valor total del contrato 003/2023	$1.825.197.430,00	100,00%
Valor ejecutado y pagado en Acta Parcial N°1	$1.454.004.682,00	79,66%
Valor del Acta Parcial N°2 y Final	**$371.192.748,00**	**20,34%**
Valor total ejecutado acumulado (Acta N°1 + Acta N°2)	**$1.825.197.430,00**	**100,00%**

Durante el periodo de ejecución, se llevaron a cabo actividades correspondientes a:

- ✓ **Localización y replanteo con equipo de precisión.** Este ítem se lleva a cabo para el seguimiento y como su nombre lo indica, la localización de las actividades propias del proyecto. Cabe anotar que, corresponde a la georeferenciación de los tramos intervenidos, como lo fueron el contrato principal del tramo el Caimo – Portugalito, como la intervención de los cuatro (4) frentes de trabajo correspondientes a los presupuestos participativos en las vías del Municipio de Armenia, Quindío.
- ✓ **Suministro, transporte e instalación de base granular.** Este ítem corresponde al suministro e instalación de material granular para el soporte de las cunetas en concreto de resistencia 21MPa. Las cuales, se ubican a los costados laterales de la vía construida entre las abscisas K0+006 y hasta el K1+150 del tramo vial El Caimo – Portugalito. Esta actividad corresponde a las especificaciones técnicas del proyecto, las cuales determinan un espesor mínimo de 10 centímetros de soporte para la construcción de cunetas.
- ✓ **Suministro e instalación de acero de refuerzo Fy=420MPa; para elementos en concreto reforzado.** Este ítem corresponde al refuerzo de los elementos en concreto, los cuales, hacen parte integral de las obras hidráulicas del proyecto. Como lo son la construcción de obras de encole y descole de las obras transversales ubicadas en el K1+100 del tramo El Caimo – Portugalito. Así, como la construcción de los sardineles en concreto ubicados a la margen derecha y

paralelos a los andenes en concreto existentes en el tramo denominado uno (1). El cual se ubica entre las abscisas K0+006 y hasta el K0+495.

- ✓ **Construcción de cuneta triangular en concreto 21 Mpa. Incluye malla electrosoldada.** Este ítem, como su nombre lo indica y referencia. Hace parte integral de las obras de manejo hidráulico del proyecto, las cuales se construyeron a los costados de la vía nueva construida en pavimento flexible. Estas cunetas en concreto se encuentran localizadas a lo largo del proyecto, desde las abscisas K0+006 y hasta la K1+150. Es importante precisar que, en el tramo denominado uno (1) su construcción se llevó a cabo al margen izquierdo de la vía, así como en el tramo intermedio que se ubica entre las abscisas K0+495 y hasta la K0+645. Para el tramo denominado dos (2) se realizó la construcción de las cunetas en ambos costados del tramo, hasta el punto final de intervención del mismo.
- ✓ **Corte con disco de pavimento asfaltico.** Este ítem, corresponde al corte del pavimento flexible instalado en la ejecución del proyecto. Con el propósito de garantizar el alineamiento y la uniformidad de las cunetas a construir. Actividad que se adelantó para el presente informe de actividades ejecutadas sobre el tramo uno (1) de la vía El Caimo – Portugalito.
- ✓ **Perforación para anclajes 1/2" con epóxico AnchorFix o Similar.** Este ítem, corresponde a la realización de perforación con broca de concreto. La cual se hace necesaria para la realización de los anclajes con epóxico adhesivo en la construcción del sardinel en concreto de resistencia 21MPa sobre el andén en concreto de la margen derecha existente en el tramo denominado uno (1) de la vía El Caimo – Portugalito.
- ✓ **Sardinel en concreto 3.000PSI, ancho hasta 15 centímetros y alto hasta 25 centímetros (No incluye acero de refuerzo).** Este ítem, hacen parte de la construcción del sardinel en concreto ubicado en la margen derecha del tramo un (1) sobre el andén en concreto existente en el proyecto. La realización de esta actividad obedece principalmente al control de las aguas de escorrentía sobre la vía, la cual, estaba generando afectaciones a los predios colindante con la construcción de la vía El Caimo – Portugalito. Es importante aclara que, los niveles de capa de rodadura del asfalto, se encuentran a nivel o por encima del andén existente.
- ✓ **Tapa en concreto Tipo ManHall 160x160 centímetros (Incluye tapara vehicular en polipropileno).** Este ítem, corresponde a la construcción de una tapa en concreto sobre una recama de aguas residuales y lluvias. Bajo una necesidad y solicitud de la comunidad, la cual, manifestó una vez construida la vía del tramo El Caimo – Portugalito, la existencia de la misma. Por tal motivo, se hace necesaria la construcción de la tapa en concreto para la inspección y mantenimiento de la misma.

A continuación, se relaciona mediante una tabla de actividades, cantidad y porcentaje de ejecución. Correspondiente a las labores propias del proyecto.

Actividad	Unidad	Cantidad Contrato	Cantidad Ejecutada	Porcentaje (%) Ejecutado
I. PRELIMINARES				
Localización y replanteo	Mes	2,50	2,50	100%
II. DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y RETIROS				
Excavación a mano material común 0-2mts, incluye cargue para disposición final	M3	85,68	85,68	100%
Transporte de material de excavación y RCD	M3/KM	2.288,96	2.288,96	100%
Disposición final de material de excavación en sitio autorizado, incluye pago de derecho a disposición	M3	114,47	114,47	100%
III. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO				
Nivelación, conformación y compactación de la subrasante existente con maquinaria amarilla (puesta en obra)	M2	5.804,27	5.804,27	100%
Suministro, transporte e instalación de base granular	M3	1.577,56	1.577,56	100%
Imprimacion de asfalto o riego de liga con emulsión asfáltica de rotura lenta	M2	5.799,34	5.799,34	100%
Suministro, transporte e instalación de capa de rodadura tipo MDC-19 con asfalto 60/70	M3	434,95	434,95	100%
IV. ACERO				
Suministro e instalación de acero de refuerzo Fy=420MPa; para elementos en concreto reforzado	Kg	471,3508	471,35	99,9988%
V. OBRAS COMPLEMENTARIAS				
Construcción de cuneta triangular en concreto 21MPa. Incluye malla electrosoldada	ML	1.617,00	1.617,00	100%
Estructura en concreto de 21MPa de cajas de inspección, sumideros, cabezal de entrega	M3	3,21	3,21	100%
VI. SEÑALIZACIÓN				
Línea de demarcación vial con micro esferas con pintura tipo plástico en frio 12cm de ancho	ML	3.450,00	3.450,00	100%
Marca vial con micro esferas y pintura acrílica de demarcación pintura tipo plástico en frio	M2	57,00	57,00	100%

OBRA NO CONTRATADA Y EJECUTADA				
Demolición mecánica del pavimento flexible vial existente, incluye cargue del material en volqueta	M3	20,64	20,64	100%
Corte con disco de pavimento flexible	ML	1.903,00	1.903,00	100%
Limpieza de tubería diámetro 24" – (obras transversales)	ML	38,80	38,80	100%
Tubería en PVC Novafort D 36"	ML	6,50	6,50	100%
Lleno compactado con material de sitio	M3	14,31	14,31	100%
Perforación para anclajes ½" con epóxico AnchorFix o similar	UN	1.614,00	1.614,00	100%
Sardinel en concreto 3.000PSI, ancho hasta 15 centímetros y alto hasta 25 centímetros (no incluye acero de refuerzo)	ML	322,80	322,80	100%
Tapa en concreto tipo manhole 160x160 centímetros (incluye tapa vehicular en polipropileno)	UN	1,00	1,00	100%
Sumidero en concreto 21MPa, dimensiones 70x70 centímetros (incluye tapa vehicular en polipropileno)	UN	2,00	2,00	100%
Suministro e instalación de tubería PVC Novafort Diam 10 pulgadas pared estructural	ML	6,00	6,00	100%
Construcción de reductores de velocidad en mezcla asfáltica, no incluye pintura	ML	18,00	18,00	100%
Suministro e instalación de señalización vertical, dimensiones 60x60 centímetros. Inc. Estructura soporte metálica	UN	18,00	18,00	100%
VEREDA GUAYABAL				
Localización y replanteo	Mes	0,25	0,25	100%
Nivelación, conformación y compactación de la subrasante existente con maquinaria amarilla (puesta en obra)	M2	2.777,74	2.777,74	100%
Excavación a mano material común 0-2mts, incluye cargue para disposición final	M3	27,78	27,78	100%
Transporte de material de excavación y RCD	M3/KM	722,21	722,21	100%
Disposición final de material de excavación en sitio autorizado, incluye pago de derecho a disposición	M2	36,11	36,11	100%
VEREDA MARMATO				
Localización y replanteo	Mes	0,25	0,25	100%

Nivelación, conformación y compactación de la subrasante existente con maquinaria amarilla (puesta en obra)	M2	5.267,50	5.267,50	100%
Excavación a mano material común 0-2mts, incluye cargue para disposición final	M3	52,68	52,68	100%
Transporte de material de excavación y RCD	M3/KM	1.369,55	1.369,55	100%
Disposición final de material de excavación en sitio autorizado, incluye pago de derecho a disposición	M2	68,48	68,48	100%
VEREDA MURILLO				
Localización y replanteo	Mes	0,25	0,25	100%
Demolición mecánica del pavimento flexible vial existente, incluye cargue del material en volqueta	M3	21,16	21,16	100%
Nivelación, conformación y compactación de la subrasante existente con maquinaria amarilla (puesta en obra)	M2	0,00	0,00	100%
Excavación a mano material común 0-2mts, incluye cargue para disposición final	M3	46,02	46,02	100%
Transporte de material de excavación y RCD	M3/KM	1.196,60	1.196,60	100%
Disposición final de material de excavación en sitio autorizado, incluye pago de derecho a disposición	M2	59,83	59,83	100%
Suministro, transporte e instalación base granular	M3	46,02	46,02	100%
Imprimación de asfalto o riego de liga con emulsión asfáltica de rotura lenta	M2	423,20	423,20	100%
Suministro e instalación de capa de rodadura tipo MDC-19 con asfalto 60/70	M3	31,74	31,74	100%
EL CAIMO				
Localización y replanteo	Mes	0,25	0,25	100%
Demolición mecánica del pavimento flexible vial existente, incluye cargue del material en volqueta	M3	17,94	17,94	100%
Nivelación, conformación y compactación de la subrasante existente con maquinaria amarilla (puesta en obra)	M2	0,00	0,00	100%
Excavación a mano material común 0-2mts, incluye cargue para disposición final	M3	0,00	0,00	100%
Transporte de material de excavación y RCD	M3/KM	466,43	466,43	100%
Disposición final de material de excavación en sitio autorizado, incluye pago de derecho a disposición	M2	23,32	23,32	100%

Suministro, transporte e instalación base granular	M3	0,00	0,00	100%
Imprimación de asfalto o riego de liga con emulsión asfáltica de rotura lenta	M2	179,40	179,40	100%
Suministro e instalación de capa de rodadura tipo MDC-19 con asfalto 60/70	M3	18,47	18,47	100%

El cierre del presente informe, el proyecto a llegado a feliz término, y cuenta con el debido recibido a satisfacción por parte de la interventoría del proyecto.

13. ANEXOS

- ✓ Soportes al pago de seguridad social de los colaboradores
- ✓ Certificado paz y salvo SENA
- ✓ Certificado paz y salvo ICBF
- ✓ Certificado paz y salvo caja de compensación
- ✓ Bitácora
- ✓ Certificados de calidad
- ✓ Diseño mezclas

Fin de informe

INFORME JUSTIFICACIÓN DEL USO DE IMPREVISTOS

"MEJORAR Y ADECUAR VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO"

CONTRATO DE OBRA
No. 003/2025

CONTRATISTA
CONSORCIO CGJ.
RL Jhoany Alexander Tobon Muñoz

INTERVENTORÍA
GRUPO QUIMBAYA INGENIEROS SAS.
RL Lina Mercedes Monsalve Escobar

ENTIDAD CONTRATANTE
ALCALDÍA DE ARMENIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Marzo 2026
Armenia, Quindío.

Índice de contenido

1. INTRODUCCIÓN 3
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 4
3. MODIFICACIONES AL CONTRATO DE OBRA 4
4. OBJETIVOS 5
4.1. Objetivo General 5
4.2. Objetivos Específicos 5
5. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA 5
5.1. Contingencias Materializadas Durante la Ejecución 5
5.2. El Hecho Generador del Uso de los Imprevistos 6
5.3. Análisis del Comportamiento Histórico del Incremento Salarial en Colombia 7
6. CUANTIFICACIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO 8
6.1. Análisis de Mano de Obra 2025 vs 2026 8
6.2. Análisis de Costos por Suspensión (PMT) 10
6.3. Tabla de Costos por Actividad - Ajuste de Mano de Obra 10
6.4. Resumen General de Costos Justificados 17
7. ANÁLISIS DE COSTOS NO CONSIDERADOS 17
7.1. Ejecución de Actividades en Horario Nocturno 17
7.2. Incremento en Precios de Materiales 17
8. CONCLUSIONES 18
9. SOLICITUD 18

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene por objeto exponer, desde una perspectiva técnica y financiera, las razones que sustentan la procedencia del reconocimiento del componente de Imprevistos (I) incluido dentro de la estructura del A.I.U. correspondiente al Contrato de Obra No. 003/2025, cuyo objeto consiste en *"Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia en el Departamento del Quindío"*.

Durante la ejecución contractual se materializaron diversas circunstancias extraordinarias, ajenas a la voluntad del contratista y no previstas al momento de estructurar la oferta económica, que incidieron directamente en los costos de ejecución, la programación de obra, la permanencia de personal, la logística constructiva y el rendimiento de las actividades. Tales situaciones fueron oportunamente informadas a la Entidad Contratante mediante los respectivos oficios y solicitudes, encontrándose plenamente documentadas dentro del expediente contractual.

Como resultado de la ejecución contractual y de las modificaciones aprobadas por la Entidad, la estructura económica definitiva del contrato quedó conformada de la siguiente manera.

Discriminación del AIU (34.5%)	
Costo directo	$1.346.010.600,00
Administración (28.5%)	$464.373.657,00
Imprevistos (1%)	$13.460.106,00
Utilidad (5%)	$67.300.530,00
VALOR TOTAL CONTRATO	**$1.825.197.437,00**

De acuerdo con la anterior composición financiera, el componente de Imprevistos corresponde únicamente al uno por ciento (1%) del costo directo, equivalente a la suma de **TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL CIENTO SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($13.460.106,00)**, porcentaje que resulta razonable y proporcional frente a los riesgos inherentes a la ejecución de una obra pública en entorno rural y que, además, se encuentra ampliamente soportado por las contingencias efectivamente ocurridas durante el desarrollo del contrato de obra.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato de Obra 003/2025	
Contrato Numero	N° 003/2025
Objeto	"Adecuar y Mejorar Vías Terciarias del Municipio de Armenia en el Departamento del Quindío"
Lugar ejecución	Vías terciarias del Municipio de Armenia – Corregimiento El Caimo
Fecha inicio	10 de octubre del 2025
Plazo de ejecución inicial	Tres meses o hasta el 31/12/2025
Prorrogas en tiempo	Prorroga N° 1 – 14 días, hasta el 14 de enero 2026 Prorroga N° 2 – 16 días, hasta el 31 de enero 2026 Prorroga N° 3 – 14 días, hasta el 31 de marzo 2026
Suspensión	Desde el 31 de enero 2025 y hasta el 16 de marzo 2026
Reinicio	16 de marzo del año 2026
Terminación final	31 de marzo del año 2026
Valor inicial proyecto	Mil trescientos setenta y cuatro millones doscientos setenta y seis mil ciento ochenta y cuatro pesos moneda corriente ($1.374.276.184)
Adicionales presupuestales	Adición presupuestal N° 1 - $280.796.914 Adición presupuestal N° 2 - $170.124.339
Valor final proyecto	Mil ochocientos veinte cinco millones ciento noventa y siete mil cuatrocientos treinta y siete pesos moneda corriente ($1.825.197.437)
Contratista	Consorcio CGJ – RL Jhoany Alexander Tobón Muñoz
Interventoría	Grupo Quimbaya Ingenieros SAS – RL Lina Mercedes Monsalve Escobar
Contratante	Alcaldía de Armenia – Secretaria de Infraestructura
Supervisor	Ingeniero William Andres Suarez Profesional Especializado

3. MODIFICACIONES AL CONTRATO DE OBRA

Descripción	Recursos	Acumulado	Porcentaje
Valor Inicial Contractual – Contrato Obra 003/2025	$ 1.374.276.184		100%
Adición Presupuestal N° 01	$ 280.796.914	$ 1.655.073.098	120.4%
Adición Presupuestal N° 02	$ 170.124.339	$ 1.825.197.437	132.8%
Valor Actualizado Contractual – Contrato Obra 003/2025		**$ 1.825.197.437**	**100%**

4. OBJETIVOS

4.1. Objetivo General

Demostrar técnica y financieramente que el componente de Imprevistos (I) previsto dentro del A.I.U. fue efectivamente ejecutado y absorbido por la ocurrencia de riesgos extraordinarios e imprevisibles durante la ejecución del Contrato de Obra No. 003/2025, razón por la cual resulta procedente su reconocimiento dentro de la liquidación contractual.

4.2. Objetivos Específicos

- Identificar las contingencias ocurridas durante la ejecución del contrato.
- Evidenciar que dichas contingencias no eran previsibles al momento de presentar la oferta.
- Demostrar que dichas circunstancias ocasionaron mayores costos asumidos por el contratista.
- Justificar técnicamente la utilización del componente de Imprevistos.
- Cuantificar el impacto económico de las contingencias y su relación con el valor del componente de imprevistos.

5. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA

La ejecución de un contrato estatal de obra pública implica la asunción de riesgos ordinarios propios de la actividad constructiva; sin embargo, cuando durante su desarrollo se presentan circunstancias excepcionales, extraordinarias e imprevisibles que exceden los riesgos normalmente asumidos por el contratista, surge la necesidad de reconocer los mecanismos económicos previstos contractualmente para preservar la ecuación financiera del contrato.

5.1. Contingencias Materializadas Durante la Ejecución

En el presente caso quedó demostrado que durante la ejecución contractual concurrieron múltiples circunstancias que alteraron significativamente las condiciones inicialmente previstas, entre ellas.

1. **Dificultades para acceder a los frentes de obra** por ocupación del espacio público.
2. **Prolongada temporada invernal** entre diciembre de 2025 y marzo de 2026.
3. **Múltiples prórrogas y una suspensión** del contrato, extendiendo la ejecución hasta el año 2026.

4. **Incremento extraordinario del salario mínimo** fijado mediante el Decreto 1469 de 2025, circunstancia no prevista en la matriz de riesgos.
5. **Incremento de los costos de mano de obra**.
6. **Mayores costos logísticos**.
7. **Incremento en el valor de materiales de construcción**, particularmente el concreto y otros insumos.

Todas estas circunstancias generaron mayores costos que fueron asumidos directamente por el **Consorcio CGJ** con el propósito de garantizar la continuidad de la obra y el cumplimiento del objeto contractual, sin que ello implicara reclamaciones adicionales diferentes al reconocimiento del componente de **Imprevistos** previsto dentro del A.I.U.

Una vez analizada la matriz de riesgo donde se encuentran **45 riesgos**, no se identificó el riesgo **"aumento de salario desproporcionado"**, razón por la cual su ocurrencia constituye un hecho ajeno a la planeación y a la voluntad del contratista.

El Consorcio CGJ, mediante el oficio correspondiente, solicitó prórroga a la entidad contratante, lo que conllevó a que la finalización del contrato de obra se extendiera hasta el año 2026. Dicho oficio fue radicado en la Subdirección Jurídica del Municipio de Armenia para la solicitud y elaboración del modificatorio.

Sin embargo, el día **29 de diciembre de 2025**, mediante el **Decreto 1469 de 2025**, se fijó un aumento salarial del **23%**, fecha posterior al modificatorio del contrato de obra No. 003/2025, donde **no se podía prever** en el momento de la elaboración del modificatorio un incremento salarial que superara el historial de aumento salarial en Colombia.

5.2. El Hecho Generador del Uso de los Imprevistos

El principal evento que justifica la utilización del componente de Imprevistos corresponde al **incremento extraordinario del salario mínimo decretado para la vigencia 2026**.

A diferencia de los incrementos ordinarios observados históricamente en Colombia, el aumento decretado para el año 2026 alcanzó el **veintitrés por ciento (23%)**, porcentaje que supera ampliamente el promedio histórico registrado durante los últimos once años, el cual fue aproximadamente del **7,97%**. Esta diferencia cercana a **quince puntos porcentuales** (15,03%) constituye un comportamiento absolutamente atípico que excede cualquier previsión razonable utilizada para la estructuración económica de una propuesta contractual.

Debe resaltarse que cuando fue solicitada y tramitada la prórroga contractual aún **no existía el acto administrativo** que fijó dicho incremento salarial; por consiguiente, tanto la Entidad como el Contratista estructuraron la modificación contractual sin conocer la magnitud del aumento que posteriormente sería decretado por el Gobierno Nacional.

En consecuencia, el incremento salarial constituye un hecho posterior a la celebración del modificatorio, ajeno a la voluntad de las partes, imprevisible y con incidencia económica directa sobre la ejecución contractual.

Es importante resaltar lo siguiente como base argumentativa de la presente justificación.

- No existía manera objetiva de prever un incremento del 23%.
- La matriz de riesgos nunca asignó ese riesgo al contratista.
- El aumento ocurrió después de solicitar la prórroga.
- No fue consecuencia de una mala planeación.
- No obedeció a errores del contratista.
- Fue una decisión soberana del Gobierno Nacional.
- Impactó directamente todos los costos de mano de obra.
- La diferencia frente al promedio histórico demuestra su carácter excepcional.
- Ese solo hecho consume prácticamente todo el componente de Imprevistos.

5.3. Análisis del Comportamiento Histórico del Incremento Salarial en Colombia

Como se evidencia en el siguiente cuadro, el aumento salarial promedio en los últimos once (11) años, del año 2015 al año 2025, presenta un promedio de **7,97%**:

TABLA OFICIAL DE SALARIOS E IPC EN COLOMBIA (2015 - 2026)

EL salario minimo y el IPC (inidce de precios al consumindor o inflacion anual) en colombia han tenido los siguientes valores y El incremento nominal del smmlv es igual al smmlv del año actual sobre el smmlv del año anterior menor el 100%. Por ejemplo, en

AÑO	Valor Salario	Incremento Nominal Salario	Inflacion Año Anterior	Diferencia Nominal Salario Minimo e Inflacion
2026	$ 1.750.905,00	23,00%	5,10%	17,90%
2025	$ 1.423.500,00	9,50%	5,20%	4,30%
2024	$ 1.300.000,00	12,07%	9,28%	2,79%
2023	$ 1.160.000,00	16,00%	13,12%	2,88%
2022	$ 1.000.000,00	10,07%	5,62%	4,45%
2021	$ 908.526,00	3,50%	1,61%	1,89%
2020	$ 877.803,00	6,00%	3,80%	2,20%
2019	$ 828.116,00	6,00%	3,18%	2,82%
2018	$ 781.242,00	5,90%	4,09%	1,81%
2017	$ 737.717,00	7,00%	5,75%	1,25%
2016	$ 689.455,00	7,00%	6,77%	0,23%
2015	$ 644.350,00	4,60%		

Porcentaje promerdio entre 2015 y 2025 **7,97%**



CÁLCULO VALOR PROMEDIO DEL 2015 AL 2025: 7,97%

6. CUANTIFICACIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO

6.1. Análisis de Mano de Obra 2025 vs 2026

Sustentados en el contrato de obra No. 003/2025, a través del componente de los imprevistos del 1% se legaliza la diferencia entre el **7,97%** promedio de incremento salarial vs el incremento salarial del **23%** del año 2026, correspondiente al **15,03%**.
