FINVERPAZ

FONDO MIXTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA

SÁBANA DE CANTIDADES

BPIN N/A **OBRA** 060 DE 2026 **INTERVENTORÍA** JOSÉ ALFONSO ARENAS JIMENEZ


OBJETO MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MEDIANTE EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE Y SOSTENIBLE, INCLUYENDO LA SEÑALIZACIÓN NECESARIA PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁFICO EN LOS PUNTOS INTERVENIDOS DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA, CESAR.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Vr. Unitario	CONDICIONES INICIALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO MES ANTERIOR		SEMANA 1 Desde / Hasta		SEMANA 2 Desde / Hasta		SEMANA 3 Desde / Hasta		SEMANA 4 Desde / Hasta		SEMANA 5 Desde / Hasta		ACUMULADO MENSUAL			NUEVO ACUMULADO TOTAL			PENDIENTE POR EJECUCIÓN		
												5/10/2026	11/10/2026															
				CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	%	CANT.	VR. PARCIAL	%	CANT.	VR. PARCIAL	%
1	**Sistema de semaforización inteligente y sostenible, incluyendo la señalización necesaria para la regulación del tráfico en los puntos intervenidos del municipio de Aguachica, Cesar.**																										
1,01	Controlador de tráfico de 8 grupos.	Und	$ 41.000.000,0	3	$ 123.000.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0	$ -	0,00%	0	$ -	0,00%	3,00	$ 123.000.000,00	100,00%
1,02	Programación, puesta en servicio.	Und	$ 3.000.000,0	3	$ 9.000.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0	$ -	0,00%	0	$ -	0,00%	3,00	$ 9.000.000,00	100,00%
1,03	Suministro e instalación de Poste tipo mástil 3,8mts H.	Und	$ 3.200.000,0	7	$ 22.400.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0	$ -	0,00%	0	$ -	0,00%	7,00	$ 22.400.000,00	100,00%
1,04	Suministro e instalación de Postes tipo ménsula brazo 4,5 mts.	Und	$ 3.900.000,0	7	$ 27.300.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0	$ -	0,00%	0	$ -	0,00%	7,00	$ 27.300.000,00	100,00%
1,05	Suministro e instalación de semáforo vehicular 3/200mm a ménsula.	Und	$ 2.000.000,0	8	$ 16.000.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0	$ -	0,00%	0	$ -	0,00%	8,00	$ 16.000.000,00	100,00%
1,06	Suministro e instalación de semáforo vehicular 3/200mm a mástil.	Und	$ 3.500.000,0	7	$ 24.500.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0	$ -	0,00%	0	$ -	0,00%	7,00	$ 24.500.000,00	100,00%
1,07	Suministro e instalación de semáforo peatonal dinámico con contador.	Und	$ 2.000.000,0	16	$ 32.000.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0	$ -	0,00%	0	$ -	0,00%	16,00	$ 32.000.000,00	100,00%
1,08	Soporte para semáforo vehicular.	Und	$ 500.000,0	7	$ 3.500.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0	$ -	0,00%	0	$ -	0,00%	7,00	$ 3.500.000,00	100,00%
1,09	Base para poste (incluye herraje)	Und	$ 750.000,0	14	$ 10.500.000,00		$ -		$ -		$ -	4	$ 3.000.000,00		$ -		$ -		$ -	4	$ 3.000.000,00	28,57%	4	$ 3.000.000,00	28,57%	10,00	$ 7.500.000,00	71,43%
1,1	Suministro e instalación de Cable 4x16 mm.	Ml	$ 19.000,0	1200	$ 22.800.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0	$ -	0,00%	0	$ -	0,00%	1200,00	$ 22.800.000,00	100,00%
1,11	Suministro e instalación de Cable 3x16 mm.	Ml	$ 15.000,0	800	$ 12.000.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0	$ -	0,00%	0	$ -	0,00%	800,00	$ 12.000.000,00	100,00%
1,12	Suministro e instalación de Cable 1*8+8 - Acometida.	Ml	$ 20.000,0	400	$ 8.000.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0	$ -	0,00%	0	$ -	0,00%	400,00	$ 8.000.000,00	100,00%
1,13	Suministro de dispositivo sonoro para invidentes.	Und	$ 1.823.000,0	14	$ 25.522.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0	$ -	0,00%	0	$ -	0,00%	14,00	$ 25.522.000,00	100,00%
1,14	Botón peatonal para llamado de semáforo.	Und	$ 1.213.700,0	14	$ 16.991.800,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0	$ -	0,00%	0	$ -	0,00%	14,00	$ 16.991.800,00	100,00%
1,15	Canalización en calzada.	Ml	$ 180.000,0	42	$ 7.560.000,00		$ -		$ -		$ -	42	$ 7.560.000,00		$ -		$ -		$ -	42	$ 7.560.000,00	100,00%	42	$ 7.560.000,00	100,00%	0,00	$ -	0,00%
1,16	Canalización en anden.	Ml	$ 90.000,0	60	$ 5.400.000,00		$ -		$ -		$ -	12,43	$ 1.118.700,00		$ -		$ -		$ -	12,43	$ 1.118.700,00	20,72%	12,43	$ 1.118.700,00	20,72%	47,57	$ 4.281.300,00	79,28%
1,17	Cajas de inspección.	Unidad	$ 450.000,0	14	$ 6.300.000,00		$ -		$ -		$ -	4	$ 1.800.000,00		$ -		$ -		$ -	4	$ 1.800.000,00	28,57%	4	$ 1.800.000,00	28,57%	10,00	$ 4.500.000,00	71,43%
1,18	Bases para controlador.	Unidad	$ 700.000,0	3	$ 2.100.000,00		$ -		$ -		$ -	1	$ 700.000,00		$ -		$ -		$ -	1	$ 700.000,00	33,33%	1	$ 700.000,00	33,33%	2,00	$ 1.400.000,00	66,67%
1,19	Mano de Obra para Construcción de 3 Cruces Semafóricos donde incluye, demarcación de cebra para los 3 pasos peatonales, (14 Tubería PVC trafico pesado, 40 Tubo Conduit 2" galvanizado = 2m, gravilla, cemento, arena, maquinaria, curvas PVC, mano de obra calificada, demás derivados de la construcción).	Gl.	$ 114.584.653,9	1	$ 114.584.653,90		$ -		$ -		$ -	0,12	$ 13.750.158,47		$ -		$ -		$ -	0,12	$ 13.750.158,47	12,00%	0,12	$ 13.750.158,47	12,00%	0,88	$ 100.834.495,43	88,00%
	SUBTOTAL				**$ 489.458.453,90**		$ -		$ -		$ -		**$ 27.928.858,47**		$ -		$ -		$ -		**$ 27.928.858,47**	**5,71%**		**$ 27.928.858,47**	**5,71%**		**$ 461.529.595,43**	**94,29%**
	COSTO DIRECTO OBRA CIVIL				**$ 489.458.453,90**		$ -		$ -		$ -		**$ 27.928.858,47**		$ -		$ -		$ -		**$ 27.928.858,47**	**5,71%**		**$ 27.928.858,47**	**5,71%**		**$ 461.529.595,43**	**94,29%**
	ADMINISTRACIÓN			**29%**	$ 141.942.951,63		$ -		$ -		$ -		$ 8.099.368,96		$ -		$ -		$ -		$ 8.099.368,96	5,71%		$ 8.099.368,96	5,71%		$ 133.843.582,67	94,29%
	IMPREVISTOS			**1%**	$ 4.894.584,54		$ -		$ -		$ -		$ 279.288,58		$ -		$ -		$ -		$ 279.288,58	5,71%		$ 279.288,58	5,71%		$ 4.615.295,95	94,29%
	UTILIDAD			**5%**	$ 24.472.922,70		$ -		$ -		$ -		$ 1.396.442,92		$ -		$ -		$ -		$ 1.396.442,92	5,71%		$ 1.396.442,92	5,71%		$ 23.076.479,77	94,29%
	VR TOTAL OBRA CIVIL				**$ 660.768.912,77**		$ -		$ -		$ -		**$ 37.703.958,93**		$ -		$ -		$ -		**$ 37.703.958,93**	**5,71%**		**$ 37.703.958,93**	**5,71%**		**$ 623.064.953,82**	**94,29%**
	% EJECUTADO ACUMULADO							**0,00%**			0,00%		5,71%															
	% PROGRAMADO ACUMULADO							**0%**					8%															

Edwin Camilo Quiñones

EDWIN CAMILO QUIÑONES
NOMBRE DEL PROFESIONAL
DIRECTOR DE OBRA

JOSÉ ALFONSO ARENAS JIMENEZ
NOMBRE DEL PROFESIONAL
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

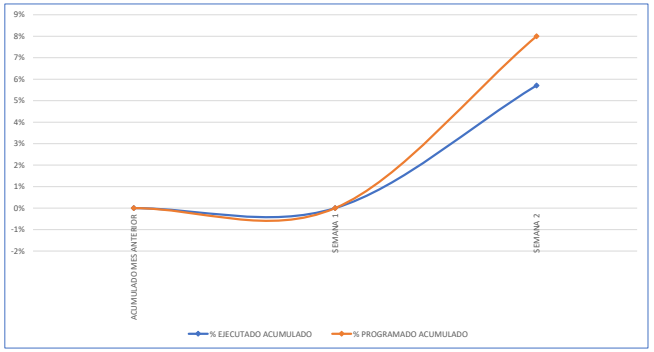



Item 1,09



Item 1,15





Item 1,16





Item 1,17





Item 1,18



REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO
