
Id	EDT	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1	**1**		**REINICIO PROYECTO FDLF-COP-485-2025**	**50 días**	**vie 16/10/26**	**mié 16/12/26**	
2	**1.2**		**CIV 9004962 - KR106**	**38 días**	**vie 16/10/26**	**mié 2/12/26**	
3	1.2.25		Socialización inicio actividades	1 día	vie 16/10/26	sáb 17/10/26	
4	1.2.26		Preliminares (PMT y cerramiento)	2 días	mar 20/10/26	jue 22/10/26	3FC+2 días
5	1.2.27		Demolición y excavación de vía	8 días	jue 22/10/26	sáb 31/10/26	4
6	1.2.28		Instalación de estructura de vía (Material granular o estabilizado)	12 días	sáb 31/10/26	mar 17/11/26	5
7	1.2.29		Instalación Bordillos (prefabricados o fundidos)	4 días	mar 17/11/26	sáb 21/11/26	6
8	1.2.30		Instalación de Pavimento	2 días	sáb 21/11/26	mar 24/11/26	7
9	1.2.31		Demolición de andenes	2 días	mar 24/11/26	jue 26/11/26	8
10	1.2.32		Conformación y Construcción de andenes	4 días	jue 26/11/26	mar 1/12/26	9
11	1.2.34		Remates y limpieza del tramo	1 día	mar 1/12/26	mié 2/12/26	10
12	**1.3**		**CIV 9001721 - KR112**	**33 días**	**sáb 31/10/26**	**vie 11/12/26**	
13	1.3.1		Socialización inicio actividades	1 día	sáb 31/10/26	mar 3/11/26	3FC+12 días
14	1.3.2		Preliminares (PMT y cerramiento)	2 días	mar 3/11/26	jue 5/11/26	13
15	1.3.3		Demolición y excavación de vía	4 días	jue 5/11/26	mar 10/11/26	14
16	1.3.4		Instalación de estructura de vía (Material granular o estabilizado)	6 días	mar 10/11/26	mié 18/11/26	15
17	1.3.5		Instalación Bordillos (prefabricados o fundidos)	2 días	mié 18/11/26	vie 20/11/26	16
18	1.3.6		Instalación de Pavimento	1 día	vie 20/11/26	sáb 21/11/26	17
19	1.3.7		Demolición de andenes	2 días	sáb 21/11/26	mar 24/11/26	18
20	1.3.8		Conformación y Construcción de andenes	4 días	mar 24/11/26	sáb 28/11/26	19
21	1.3.10		Remates y limpieza del tramo	1 día	jue 10/12/26	vie 11/12/26	20
22	**1.12**		**CIV 9000987 Y 9001016 - CLL18**	**21 días**	**mar 17/11/26**	**vie 11/12/26**	
23	1.12.1		Socialización inicio actividades	1 día	mar 17/11/26	mié 18/11/26	10FC-12 días
24	1.12.2		Preliminares (PMT y cerramiento)	2 días	mié 18/11/26	vie 20/11/26	23
25	1.12.3		Demolición y excavación de vía	4 días	vie 20/11/26	mié 25/11/26	24
26	1.12.4		Instalación de estructura de vía (Material granular o estabilizado)	4 días	mié 25/11/26	lun 30/11/26	25
27	1.12.5		Instalación Bordillos (prefabricados o fundidos)	2 días	lun 30/11/26	mié 2/12/26	26
28	1.12.6		Instalación de Pavimento	1 día	mié 2/12/26	jue 3/12/26	27
29	1.12.7		Demolición de andenes	2 días	jue 3/12/26	sáb 5/12/26	28
30	1.12.8		Conformación y Construcción de andenes	4 días	sáb 5/12/26	jue 10/12/26	29
31	1.12.1(		Remates y limpieza del tramo	1 día	jue 10/12/26	vie 11/12/26	30
32	1.21		**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DEFINITIVA 13 CIV**	8 días	lun 7/12/26	mié 16/12/26	30FC-3 días

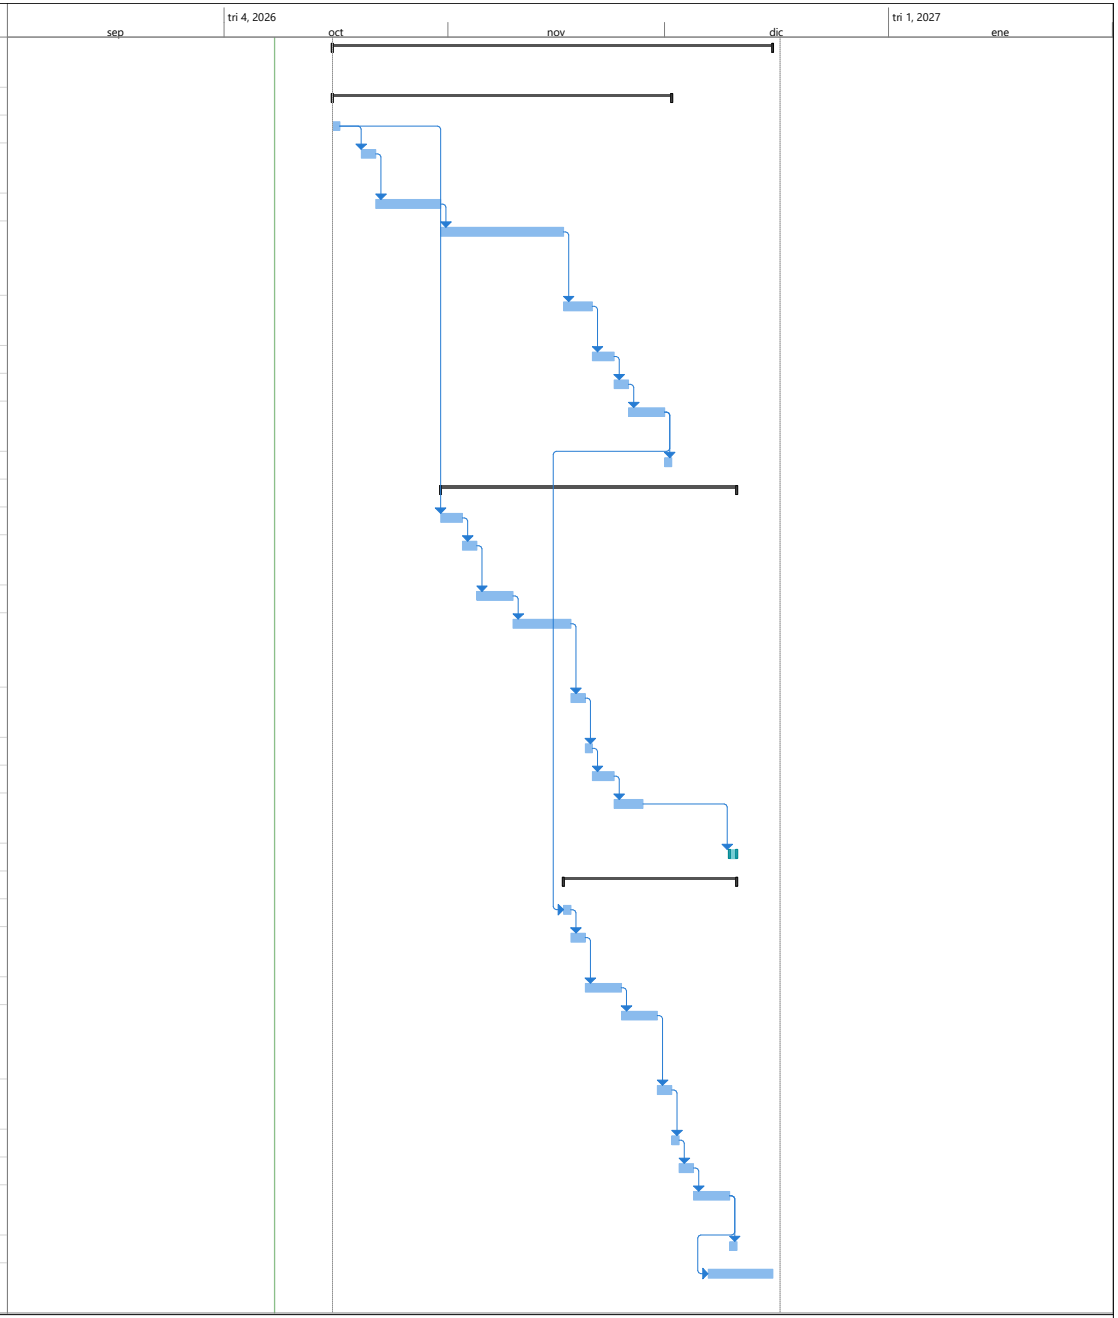

Proyecto: prorroga 2 meses - C
Fecha: jue 8/10/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual
