

CONSORCIO IE SANTOS
Calle 16A #121A-214 Of. 304 edificio Palo Alto Cali, Colombia
Tel. (2) 3735555
Tel. (2) 3735555
Email- consorcioiesantos@gmail.com



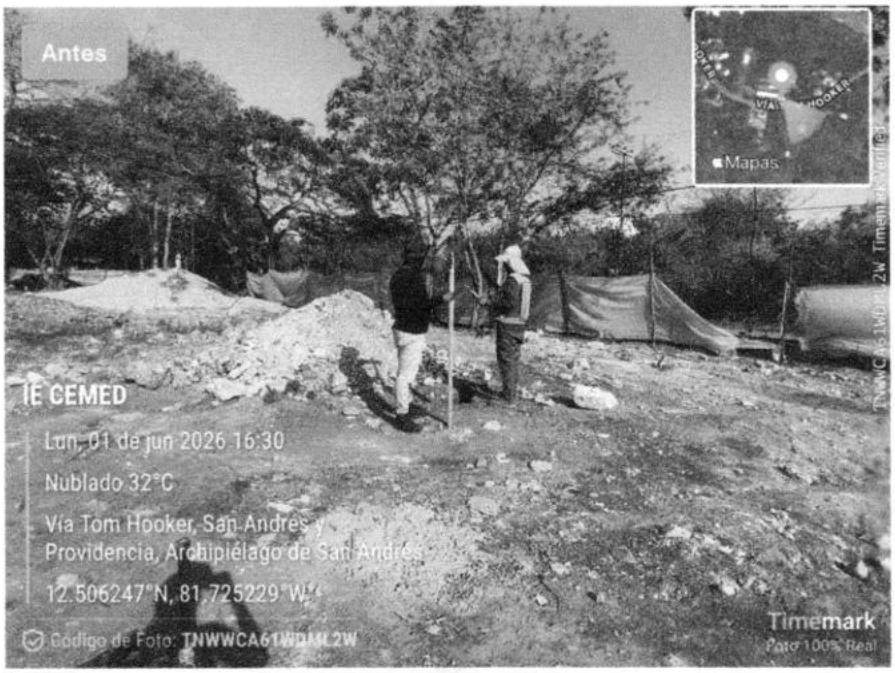

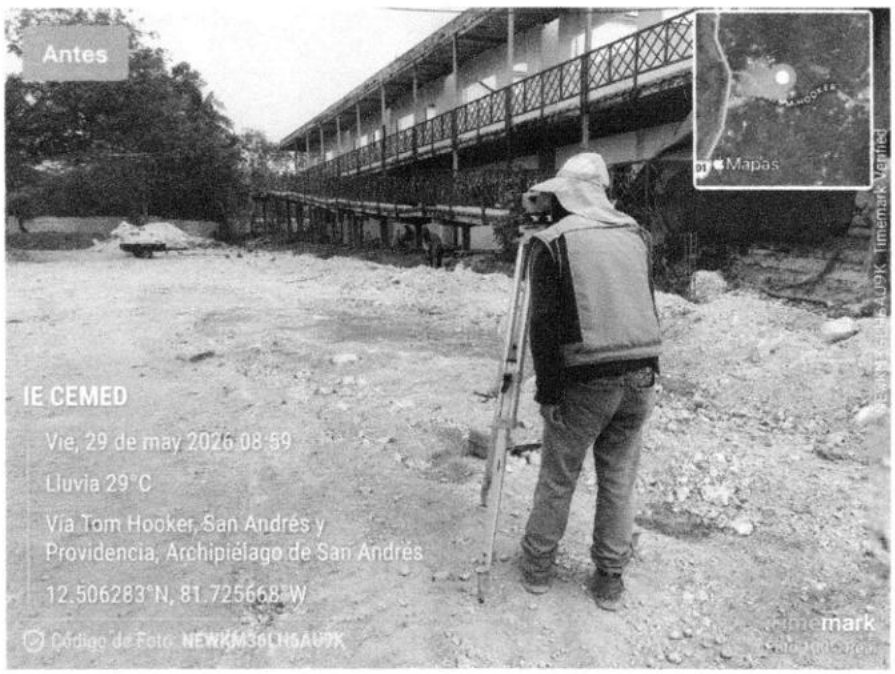

3. INVENTARIO FORESTAL DEL ÁREA DEL PROYECTO

3.1. Objetivo

El inventario forestal tuvo como finalidad **identificar, georreferenciar y caracterizar** los árboles presentes dentro del área de intervención del proyecto, con el fin de:

- Documentar las especies existentes.
- Registrar su ubicación precisa en el sistema **MAGNA-SIRGAS Oeste-Oeste**.
- Evaluar su estado general y su relación con las actividades de obra.
- Garantizar la trazabilidad ambiental del proyecto.

3.2. Metodología del inventario forestal

El inventario se realizó mediante:

a) Levantamiento GNSS RTK

Cada árbol fue georreferenciado utilizando el equipo GNSS **Allynav R26**, obteniendo coordenadas con precisión centimétrica. Los puntos fueron registrados en la pestaña **"arboles"** del archivo del proyecto.

b) Identificación de especies

La clasificación se realizó en campo, marcando cada árbol con su código (A1, A2, A3…) y registrando la especie correspondiente.

Las especies identificadas fueron:

- Mamón
- Jobo
- Acacia
- Guácimo
- Tamarindo
- Almendra
- Ceiba


c) Registro fotográfico

Cada árbol fue fotografiado, incluyendo:

- Código del árbol
- Coordenadas
- Especie
- Evidencia visual del entorno





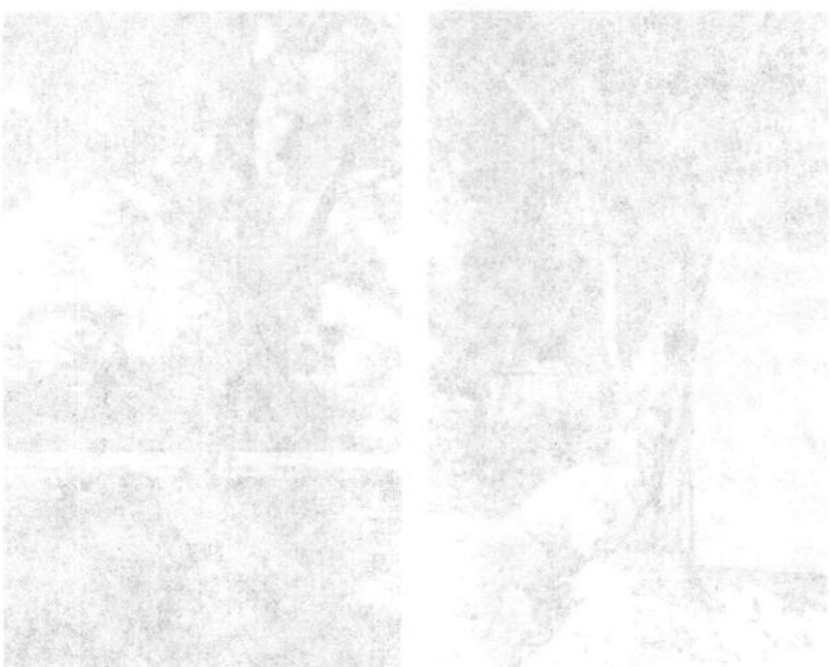

CONSORCIO IE SANTOS
Calle 16A #121A-214 Of. 304 edificio Palo Alto Cali, Colombia
Tel. (2) 3735555
Tel. (2) 3735555
Email- consorcioiesantos@gmail.com












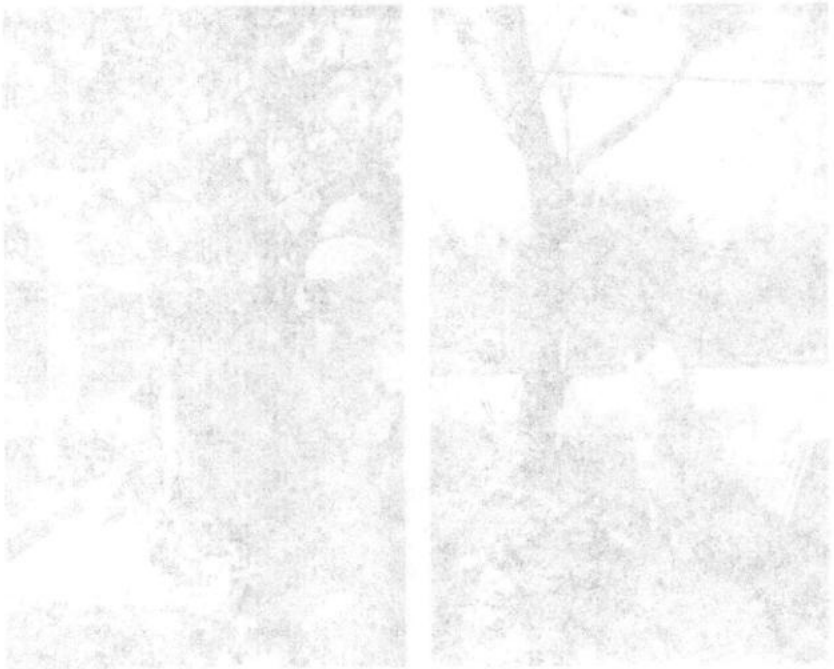

3.3. Tabla de árboles inventariados

PUNTO	ESTE	NORTE	COD
A1	820802.658	1875415.98	Mamón
A2	820802.233	1875408.62	Jobo
A3	820804.172	1875400.34	Mamón
A4	820806.426	1875408.56	Mamón
A5	820825.562	1875399.72	Acacia
A6	820842.714	1875393.21	Acacia
A7	820843.971	1875391.58	Acacia
A8	820861.716	1875390.85	Mamón
A9	820870.684	1875392.67	Jobo
A10	820874.2	1875391.24	Jobo
A11	820885.696	1875394.38	Guácimo
A12	820887.801	1875393.66	Guácimo
A13	820891.15	1875392.34	Jobo
A14	820905.714	1875391.1	Acacia
A15	820913.849	1875395.74	Tamarindo
A16	820915.953	1875400.81	Guácimo
A17	820916.953	1875403.54	Jobo
A18	820918.355	1875410.28	Jobo
A19	820916.821	1875421.31	Almendra
A20	820915.249	1875423.56	Ceiba
A21	820921.059	1875425.44	Mamón

3.4. Análisis general

El área del proyecto presenta una mezcla de especies nativas y naturalizadas, destacándose:

- **Mamón y jobo** como especies predominantes.
- **Acacia** presente en zonas de borde y transición.
- **Guácimo y tamarindo** en áreas de mayor cobertura vegetal.
- **Ceiba y almendra** como especies aisladas de mayor porte.

La distribución de los árboles coincide con zonas de sombra, bordes de cerramiento y áreas no intervenidas por la obra.

3.6. Relación del inventario con el proyecto

El inventario forestal permitió:

- Identificar árboles cercanos a zonas de excavación y replanteo.
- Documentar especies que podrían requerir protección durante la obra.
- Integrar la información ambiental con la cartografía del proyecto.
- Garantizar trazabilidad entre los puntos topográficos y los elementos naturales presentes.

4. REPLANTEO PLANIMÉTRICO Y ALTIMÉTRICO – RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN DE PUNTOS

4.1. Objetivo del replanteo

El replanteo tuvo como finalidad **materializar en campo** los elementos definidos en los planos del proyecto, garantizando que cada componente (edificio, vía, andenes, cerramiento y rampa) quedara ubicado en su posición exacta dentro del sistema de coordenadas **MAGNA-SIRGAS Oeste-Oeste**.

El proceso se realizó mediante:

- **GNSS RTK** para la planimetría.
- **Nivelación geométrica** para la altimetría.
- **Punto GPS 1** como amarre geodésico.

4.2. Clasificación de Puntos Replanteados

Los puntos del replanteo se encuentran organizados en la pestaña **"replanteo ec y via"**, donde cada punto incluye:

- **Código del punto (PTO)**
- **Coordenada Este (E)**
- **Coordenada Norte (N)**
- **Código del elemento (COD)**

A continuación, se presenta la clasificación por tipo de elemento.

4.3. Puntos de EDIFICIO

Estos puntos corresponden a la estructura principal del proyecto. Su ubicación define el perímetro y alineación del edificio.

Punto	Este (m)	Norte (m)
E1	820882.762	1875402.127
E2	820886.069	1875404.22
E3	820891.354	1875395.946
E4	820888.046	1875393.853
E5	820906.692	1875415.352
E6	820913.547	1875414.394
E7	820911.239	1875397.866
E8	820908.332	1875398.272
E9	820907.780	1875394.319
E10	820903.832	1875394.870

4.4. Puntos de VIA

Corresponden al trazado de la vía interna o de acceso, garantizando su correcta alineación y pendiente.

Punto	Este (m)	Norte (m)
V1	820911.223	1875392.782
V2	820911.677	1875393.775
V3	820911.939	1875394.836
V4	820913.342	1875404.553
V5	820914.745	1875414.269
V6	820919.336	1875413.606
V7	820917.966	1875404.216
V8	820916.610	1875394.823
V9	820916.393	1875394.855
V10	820916.807	1875392.675
V11	820918.214	1875391.208
V12	820920.422	1875390.667

4.5. Puntos de ANDENES

Los andenes delimitan las zonas peatonales y de circulación alrededor del edificio.

Punto	Este (m)	Norte (m)
N1	820800.954	1875400.139
N2	820805.834	1875401.044
N3	820809.495	1875405.019
N4	820815.543	1875410.799

N5	820823.683	1875412.734
N6	820825.037	1875412.750
N7	820813.652	1875397.676
N8	820815.804	1875400.425
N9	820816.953	1875402.034
N10	820818.393	1875403.389
N11	820831.135	1875404.758
N12	820851.155	1875401.763
N13	820870.070	1875399.128
N14	820874.284	1875397.241
N15	820876.871	1875395.163
N16	820879.691	1875391.305
N17	820867.224	1875391.109
N18	820845.676	1875392.416
N19	820824.246	1875395.621
N20	820822.044	1875398.544
N21	820813.252	1875396.277
N22	820813.908	1875394.978
N23	820880.180	1875390.049
N24	820880.025	1875388.710
B1	820871.156	1875403.371
B2	820876.179	1875401.219
B3	820880.383	1875397.729
B4	820882.726	1875394.523
B5	820884.942	1875391.491
B6	820887.331	1875389.857
B7	820890.070	1875388.921
B8	820901.314	1875389.569
B9	820906.564	1875389.914

4.6. Puntos de CERRAMIENTO

Definen el perímetro del cerramiento del proyecto.

Punto	Este (m)	Norte (m)
C1	820911.334	1875392.589
C2	820896.32	1875391.943
C3	820892.106	1875391.724
C4	820889.819	1875391.605
C5	820888.187	1875391.956
C6	820886.954	1875393.076

C7	820884.102	1875397.51
C8	820881.659	1875401.659
C9	820879.263	1875404.508
C10	820878.537	1875405.078
C11	820877.672	1875405.401
C12	820862.771	1875407.476
C13	820840.92	1875410.53
C14	820831.912	1875411.789

4.7. Puntos de RAMPA

Corresponden a la zona de transición entre niveles.

Punto	Este (m)	Norte (m)
B10	820891.05	1875390.366
B11	820894.991	1875390.568
B12	820896.062	1875389.227

4.8. Integración del Replanteo con el Proyecto

El replanteo permitió:

- Materializar en campo la geometría del edificio, vía, andenes y cerramiento.
- Verificar la correspondencia entre planos y terreno.
- Integrar los puntos con la nivelación geométrica para obtener cotas confiables.
- Relacionar los elementos construidos con el inventario forestal y las zonas de vegetación.

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES DE CAMPO (ILUSTRACIÓN DEL TRABAJO REALIZADO)

El siguiente registro fotográfico presenta una selección de imágenes tomadas durante las actividades de levantamiento, replanteo y nivelación geométrica realizadas en el área del proyecto. Las fotografías sirven como **evidencia visual** del trabajo ejecutado por la cuadrilla de topografía, mostrando el uso de equipos, las condiciones del terreno y las labores desarrolladas en diferentes momentos del proceso.


No se establece una secuencia cronológica, ya que las imágenes disponibles corresponden a días específicos y no abarcan la totalidad de las jornadas. Su función es ilustrativa y complementaria a la descripción técnica del informe.


5.1. Actividades de Replanteo y Levantamiento GNSS


Las imágenes muestran:


- Uso de antenas GNSS en modo RTK para captura de coordenadas.
- Personal operando vara y receptor en zonas de excavación, áreas despejadas y sectores con vegetación.
- Marcación de puntos en terreno irregular.
- Interacción entre topografía y obra civil.

Estas fotografías evidencian la aplicación de la metodología GNSS RTK para la georreferenciación precisa de los elementos del proyecto.

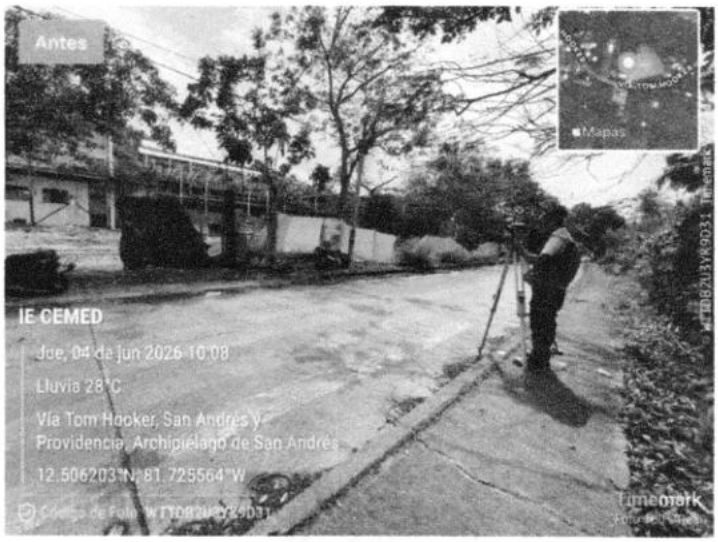

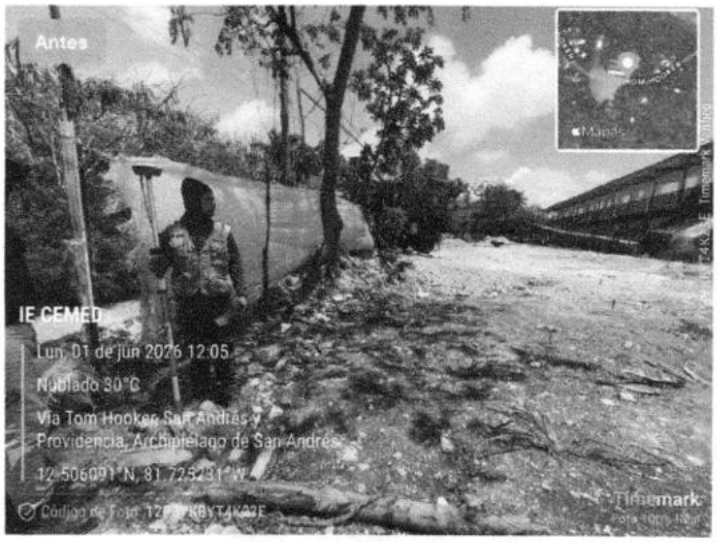

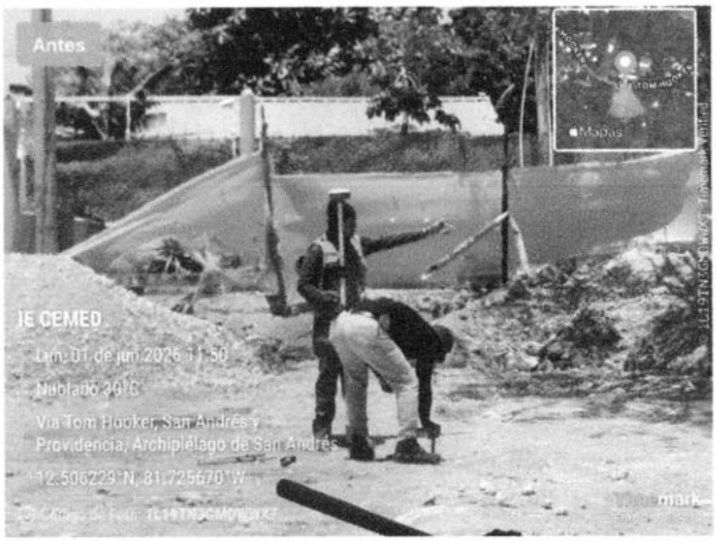

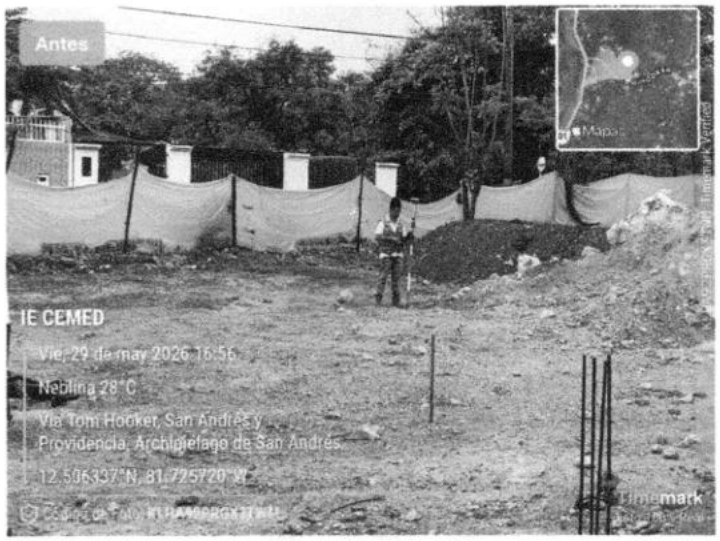


5.2. Actividades de Nivelación Geométrica

Las imágenes ilustran:

- Lecturas de nivelación en zonas de excavación y áreas delimitadas con malla verde.
- Verificación de alturas y control altimétrico en puntos clave del proyecto.

Estas fotografías complementan la descripción de la metodología de nivelación geométrica aplicada para garantizar la precisión vertical.



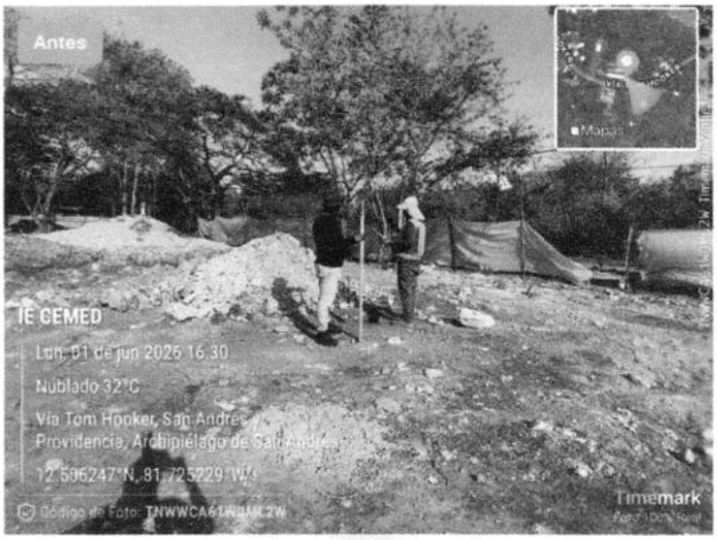

5.3. Condiciones del Terreno y Entorno de Trabajo

Las fotografías permiten observar:

- Terreno en proceso de limpieza y excavación.
- Presencia de material suelto, rocas y zonas intervenidas.
- Elementos de cerramiento provisional.
- Condiciones climáticas variables (lluvia, neblina, nublado).
- Actividades realizadas en áreas cercanas a edificaciones existentes.

Estas imágenes aportan contexto sobre el entorno físico donde se desarrollaron las labores topográficas.

6. ARCHIVOS ANEXOS

- CEMED-ENZO ROBINSON MAY.xlsx
- REGISTRO FOTOGRÁFICO INVENTARIO FORESTAL.docx
- COLEGIO CEMED-ENZO ROBINSON MAY.dwg

7. PROFESIONAL RESPONSABLE

Nombre: Enzo Wedmark Robinson May


Cédula de ciudadanía: 18.010.382

Profesión: Ingeniero Topográfico

Matrícula profesional COPNIA: 25335-347987 CND

Fecha de expedición de la matrícula: 30/12/2016

El profesional responsable certifica que las actividades de levantamiento, replanteo, nivelación geométrica e inventario forestal fueron realizadas conforme a los procedimientos técnicos establecidos y bajo el sistema de referencia MAGNA-SIRGAS Oeste-Oeste.

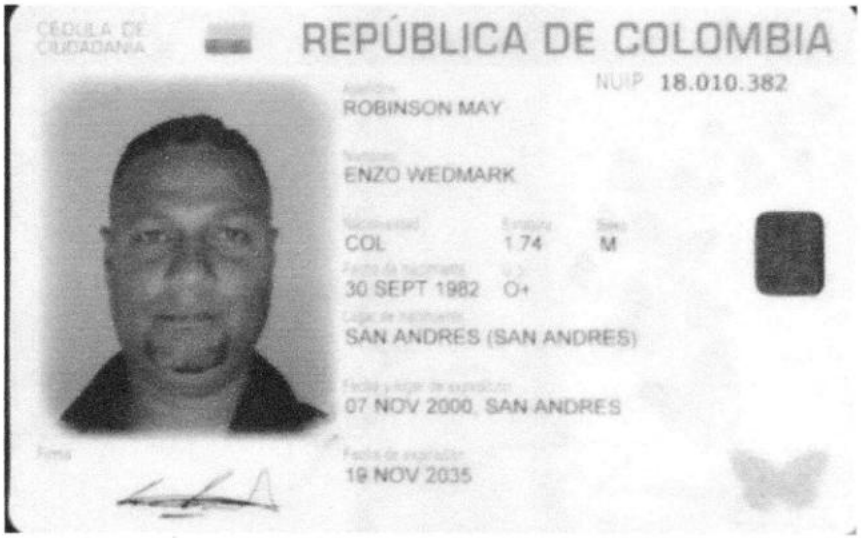



8. EQUIPOS UTILIZADOS

Para la ejecución de las actividades de levantamiento, replanteo y nivelación geométrica del proyecto, se emplearon los siguientes equipos topográficos:

8.1. Sistema GNSS RTK – Allynav R26

- Conjunto de antenas GNSS en configuración **Base + Rover**.
- Utilizadas para el levantamiento y replanteo planimétrico con precisión centimétrica.
- Equipadas con controlador para registro de coordenadas en tiempo real.
- Evidencia fotográfica incluida en los anexos.



8.2. Nivel automático – Topcon AT-B4

- Nivel óptico de alta precisión para nivelación geométrica.
- Utilizado para el control altimétrico de puntos de andenes, cerramiento y secciones.
- Evidencia fotográfica incluida en los anexos.



9. CONCLUSIONES

El presente informe recopila y documenta las actividades de **levantamiento, replanteo, nivelación geométrica e inventario forestal** realizadas en el área del proyecto, empleando metodologías y equipos de precisión bajo el sistema de referencia **MAGNA-SIRGAS Oeste-Oeste**.

Se integraron los datos obtenidos en campo, los registros fotográficos y los archivos técnicos anexos, garantizando la trazabilidad y confiabilidad de la información presentada.

El replanteo de los elementos del proyecto —edificio, vía, andenes, cerramiento y rampa— se ejecutó conforme a los planos suministrados y bajo supervisión profesional, asegurando la correcta materialización de la geometría en terreno.

El inventario forestal permitió identificar y georreferenciar las especies presentes en el área de intervención, aportando información ambiental relevante para el desarrollo del proyecto.

CONSORCIO IE SANTOS
Calle 16A #121A-214 Of. 304 edificio Palo Alto Cali, Colombia
Tel. (2) 3735555
Tel. (2) 3735555
Email- consorcioiesantos@gmail.com

Con la entrega de este informe y sus anexos, se certifica que las actividades topográficas fueron realizadas siguiendo los procedimientos técnicos establecidos y con el rigor profesional requerido.



ING. ENZO ROBINSON MAY

MP 25335-347897 CND

CONSORCIO IE SANTOS
Calle 16A #121A-214 Of. 304 edificio Palo Alto Cali, Colombia
Tel. (2) 3735555
Tel. (2) 3735555
Email- consorcioiesantos@gmail.com

REGISTRO FOTOGRÁFICO FORESTAL


16 DE JUNIO DEL 2026 AL 15 DE JULIO DEL 2026

CONSORCIO IE SANTOS
Calle 16A #121A-214 Of. 304 edificio Palo Alto Cali, Colombia
Tel. (2) 3735555
Tel. (2) 3735555
Email- consorcioiesantos@gmail.com

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL LEVANTAMIENTO, REPLANTEO NIVELACIÓN, GEOMÉTRICA E INVENTARIO FORESTAL




A 1

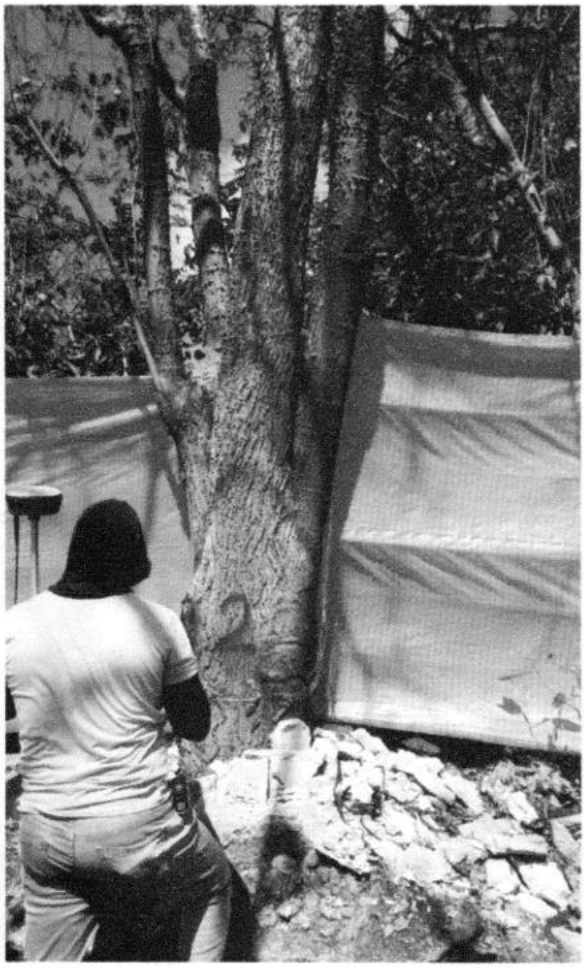

A 2




A 3

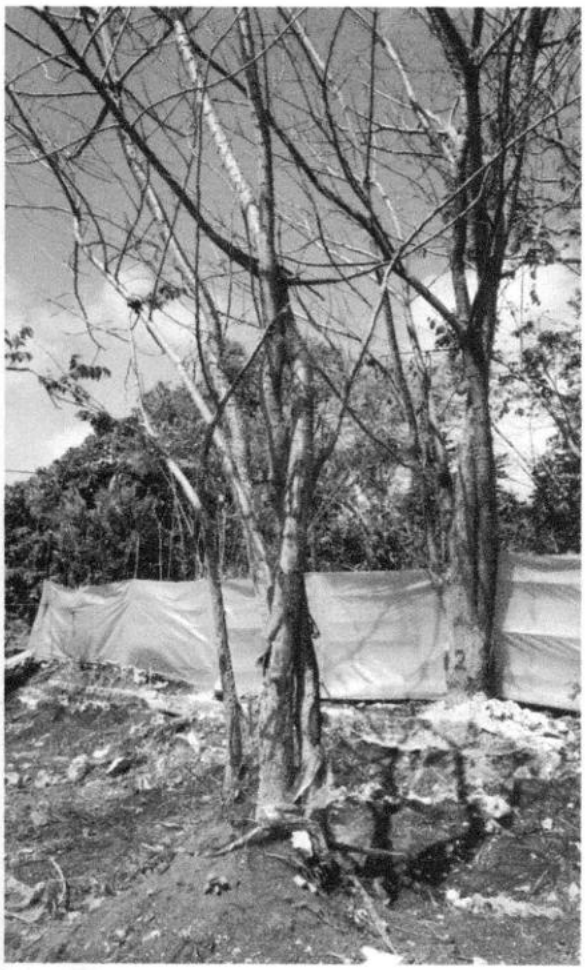

A 4



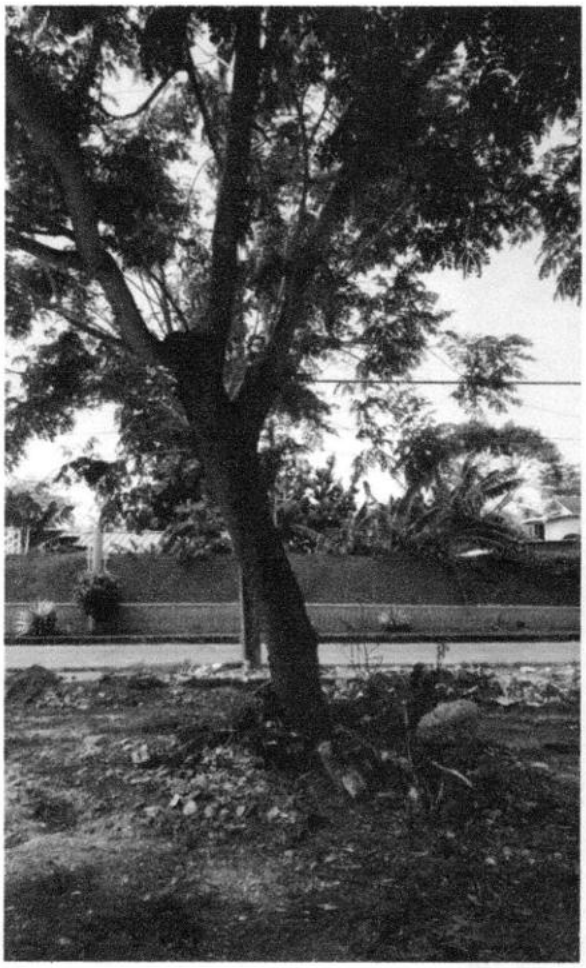


A 5




A 6





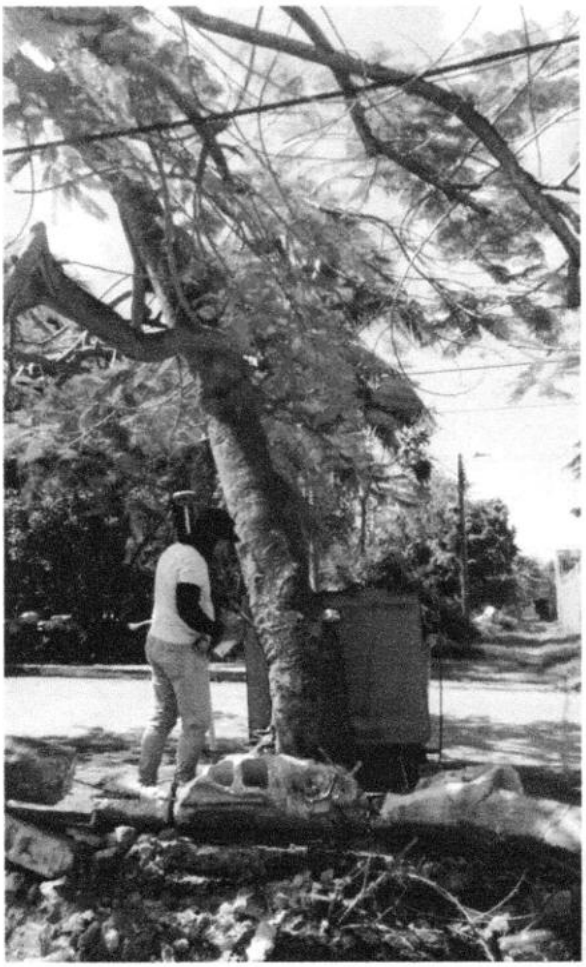


A 7

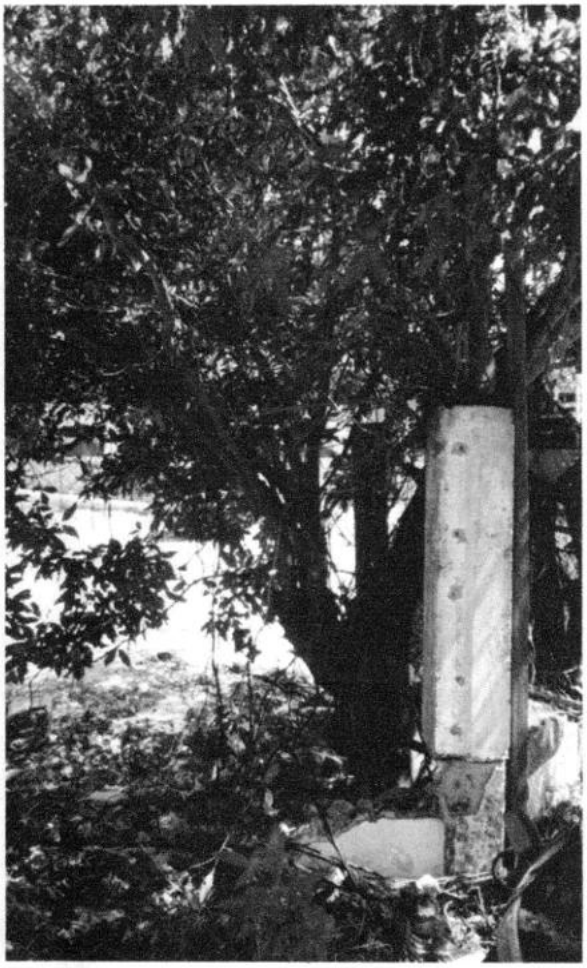

A 8



A 9

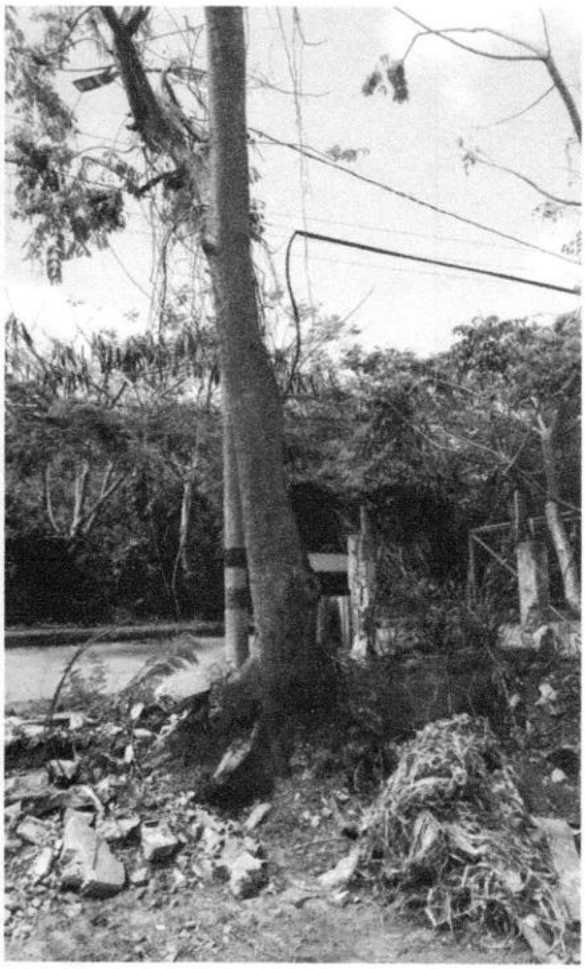

A 10






A 11




A 12




A 13

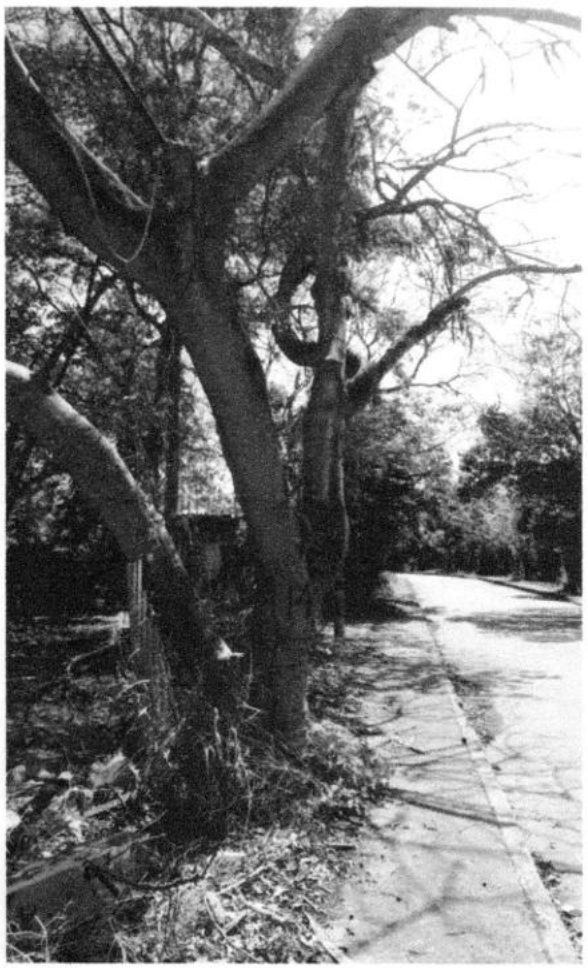


A 14

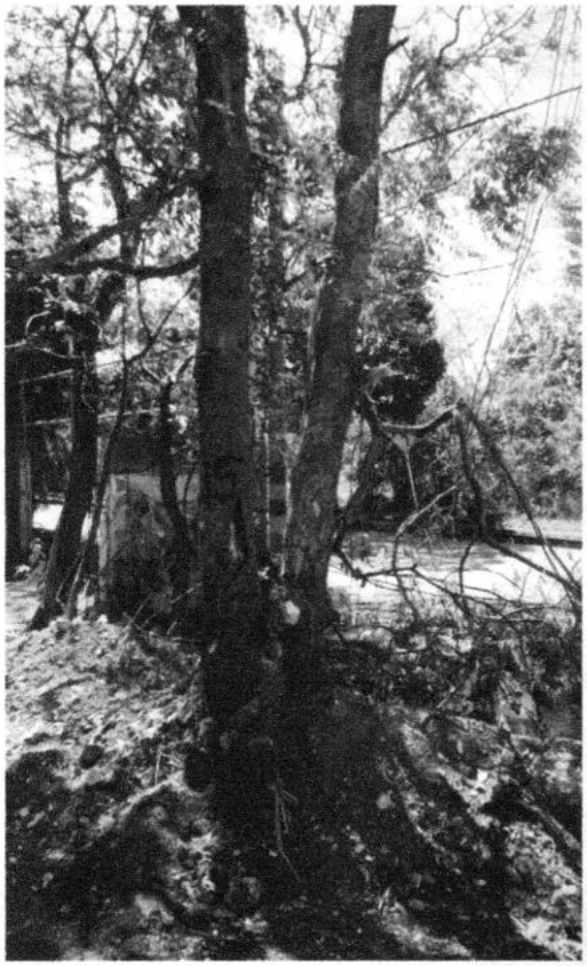



A 15

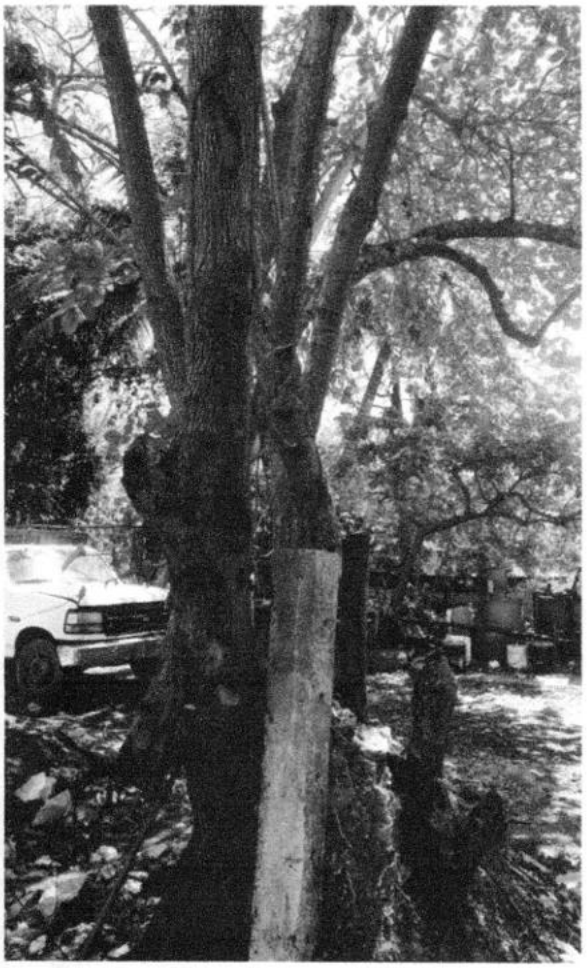

A 16

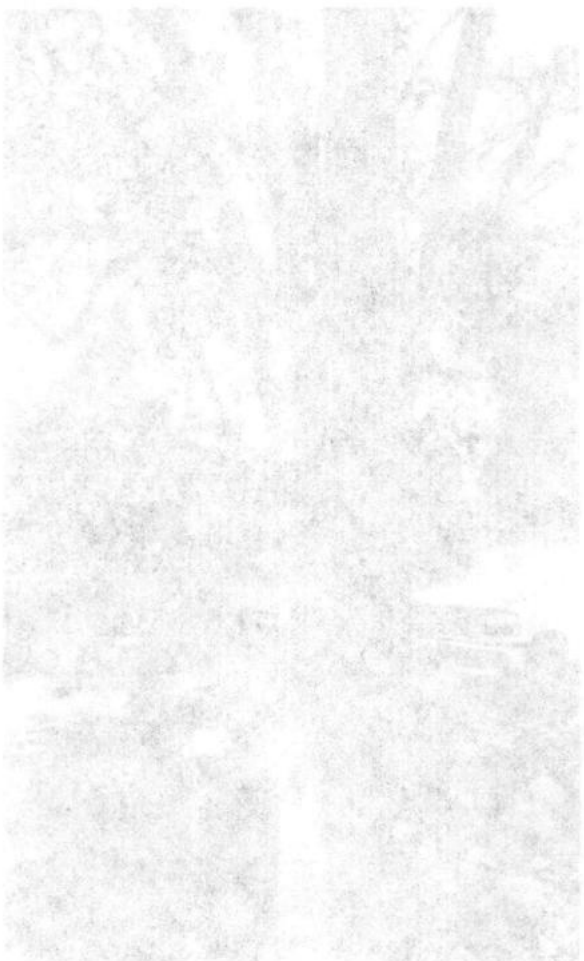

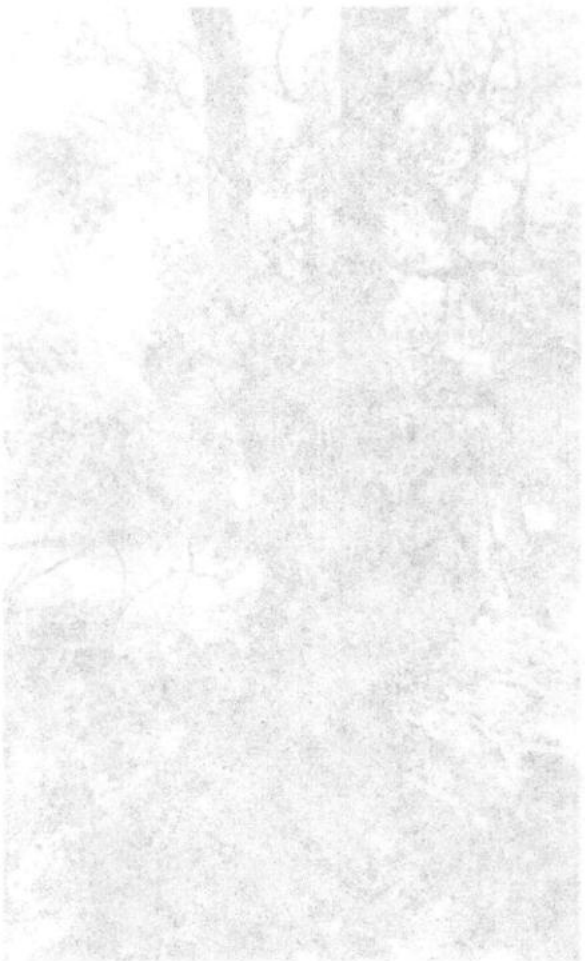


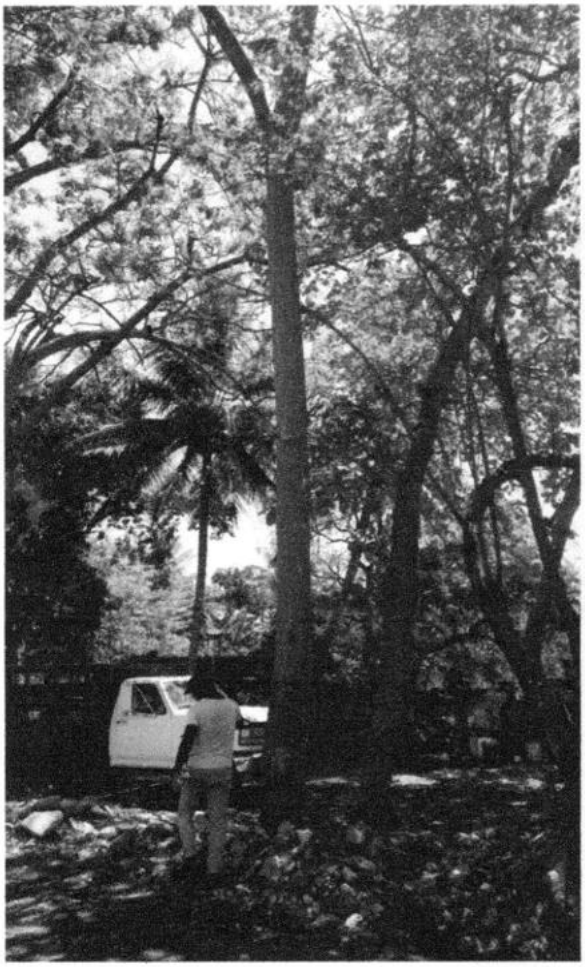

A 17



A 18

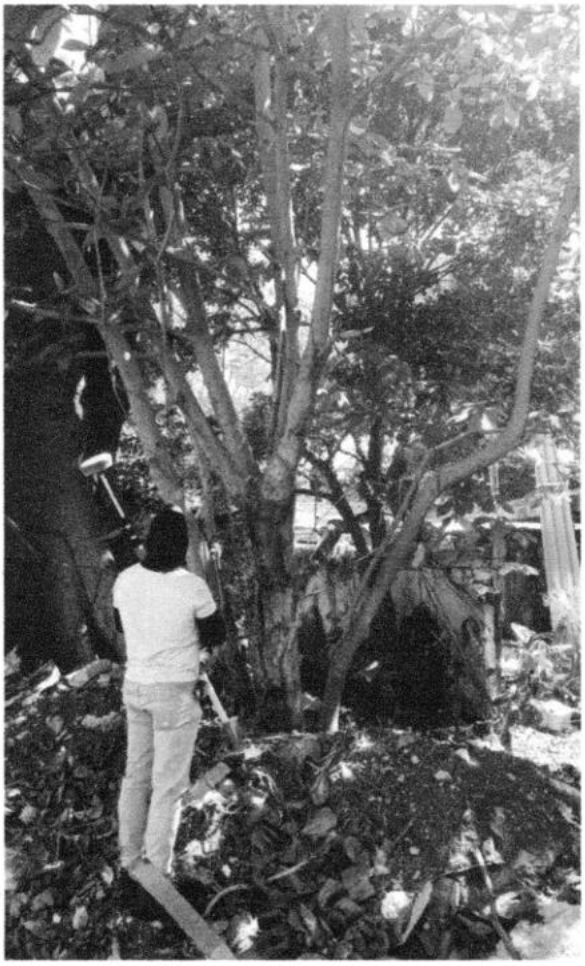

A 19




A 20





A 21

Ing Ricardo Neira
Director Obra

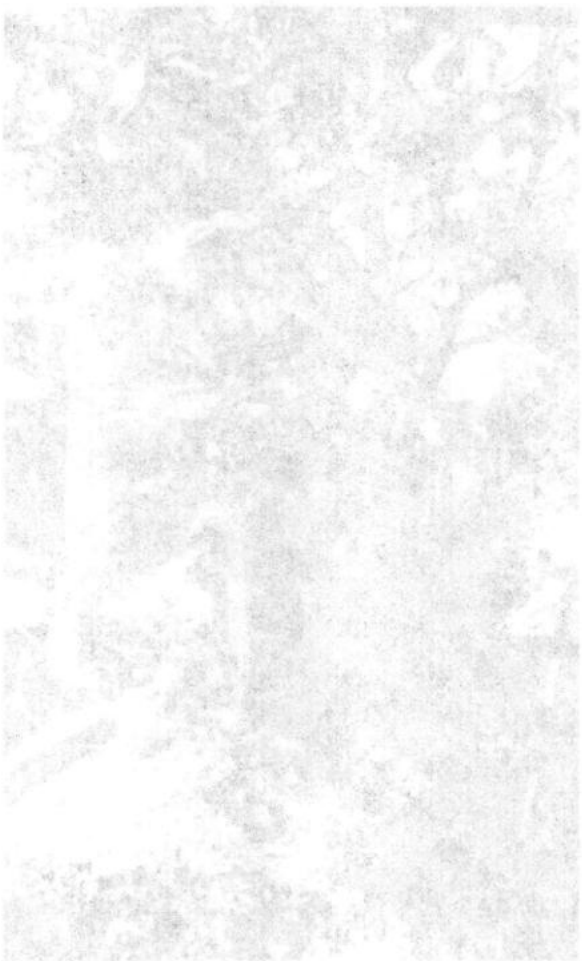

CONSORCIO IE SANTOS
Calle 16A #121A-214 Of. 304 edificio Palo Alto Cali, Colombia
Tel. (2) 3735555
Tel. (2) 3735555
Email- consorcioiesantos@gmail.com

INFORME SST

16 DE JUNIO DEL 2026 AL 15 DE JULIO DEL 2026


CONSORCIO IE SANTOS
Calle 16A #121A-214 Of. 304 edificio Palo Alto Cali, Colombia
Tel. (2) 3735555
Tel. (2) 3735555
Email- consorcioiesantos@gmail.com

INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO N°6

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8720108 DE 16 DE ENERO DE 2026

OBJETO:

CONSTRUCCION DE LA IE ANTONIO SANTOS CEMED EN LA FASE 1(BLOQUE Y OTRAS OBRAS DE URBANISMO EN SAN ANDRES ISLA)

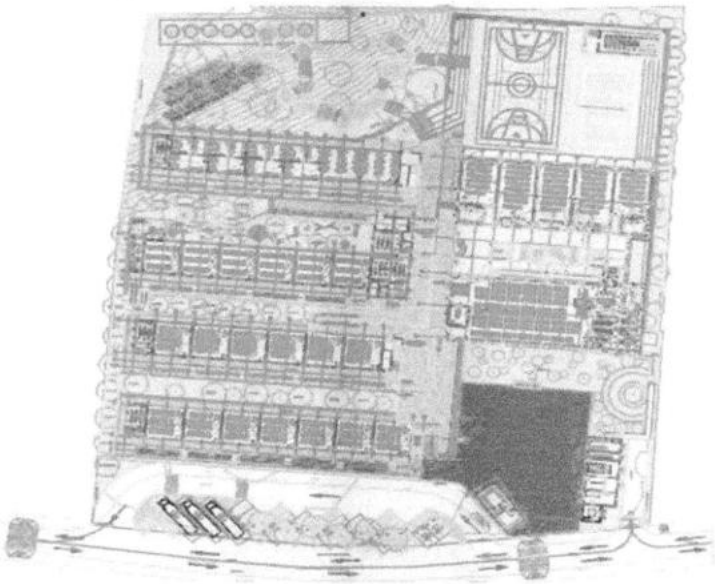

CONTRATISTA: **CONSORCIO IE SANTOS**

INTERVENTORÍA: **CONSORCIO INTER SAN ANDRÉS**

JUNIO 16 Al JULIO 15 2026

1. PROPÓSITO:

El presente documento describe la estructura y los lineamientos que conforman el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST, bajo los nuevos requisitos. El SG-SST se desarrolla bajo los parámetros del Modelo Integrado de Planeación y Gestión dispuesto por Gobierno Nacional bajo el Decreto 1499 de 2017 y la Legislación Colombiana aplicable a las actividades del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo Decreto Ley 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019. El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo estará basado en el modelo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar), modelo que proporcionará al CONSORCIO IE SANTOS un marco para la planificación de lo necesario para disminuir los riesgos asociados al desarrollo de las actividades de los funcionarios, contratistas y proveedores

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar los peligros, evaluar, valorar e intervenir los factores de riesgo presentes en las actividades que desarrollen los funcionarios, contratistas y demás que intervengan en el cumplimiento de la misión de la entidad.
- Cumplir la normativa nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.
- Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del SG-SST y la prevención de accidentes y en enfermedades laborales.
- Implementar estrategias y planes de acción para la intervención y reducción de los indicadores de accidentalidad

3. RESUMEN DE ACTIVIDADES A EJECUTAR.

Relación general de los aspectos más importantes que se realizaran en las actividades del proyecto:

- OBRAS PRELIMINARES.
- MOVIMIENTOS DE TIERRA
- ESTRUCTURAS DEN CONCRETO Y METALICAS.
- MAMPOSTERÍA.
- PAÑETES.
- CUBIERTA.
- CARPINTERIA EN PVC.
- BASES Y PISOS.
- INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
- INSTALACIONES ELECTRICAS.
- CIELOS RASOS.
- PINTURA.
- DOTACIÓN BAÑOS.
- ESPEJOS.
- OBRAS EXTERIORES.
- ASEO Y LIMPIEZA.

4. RELACIÓN DE PERSONAL DE LA OBRA.

Cargo	Nombre del Profesional
Representante Legal	Dr. Hernando Castellanos Z.
Director de Obra	Ing. Oscar Valdez
Residente de Obra	Ing. Ricardo Neira Serna
Auxiliar Residente	Ing. Stacy Cortes
Trabajadora Social	Caterine Corpus
Seguridad y salud en el trabajo. (SST)	Prof. SST Vilma Muñoz Domínguez
Almacenista	Valery Steele Corpus
Vigilante	Jonny Corpus (vigilante)

CUADRILLA 1		
NOMBRE	**CEDULA**	**CARGO**
KILBERTH MANUEL CORPUS	18.009.307	OFICIAL
JULIAN VANEGAS MOTATO	18.009.964	OFICIAL
MATTEUS POMARE LEVER	1.123.890-728	AYUDANTE
JOSE DAVID VARGAS OSPINA	1.123.891.077	AYUDANTE
CESAR BURGOS CARABALLO	1.123.621.347	AYUDANTE
JARRETH BOWDEN POMARE	1.123.890.586	AYUDANTE
DAIRO ARIZA SARMIENTO	73.192.188	OFICIAL
JOSE GUTIERREZ	1.006.950.436	OFICIAL

CUADRILLA 2		
NOMBRE	**CEDULA**	**CARGO**
JOSE GARCIA PEREZ	73.192.525	SOLDADOR
CARLOS MARTINEZ OLIVERA	1.052.087.669	SOLDADOR
CARLOS CESAR CARDENAS	1.052.087.669	SOLDADOR
JENNER VENNER SMITH	1.123.621.531	AYUDANTE
JULIAN NAVARRO	1.004.508.113	AYUDANTE

CUADRILLA 3		
NOMBRE	**CEDULA**	**CARGO**
STARLYN MAZA MERCADO	1.123.627.065	OFICIAL
JUSTINO LAMBIS POLO	18.011.557	OFICIAL

5.VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE OBRA

El contratista Consorcio IE Santos con el fin de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores se anexa soporte de planilla de pago mes de junio 2026.


Anexo:

La planilla de seguridad Contratista Consorcio IE Santos (incluye cuadrilla N°2)

La planilla de seguridad Cuadrilla N° 1

6. HIDRATACION

Se continua con la hidratación al personal en obra, especialmente en entornos calurosos y húmedos, Bajo la responsabilidad de los propios trabajadores el abastecimiento del mismo con recursos de la empresa

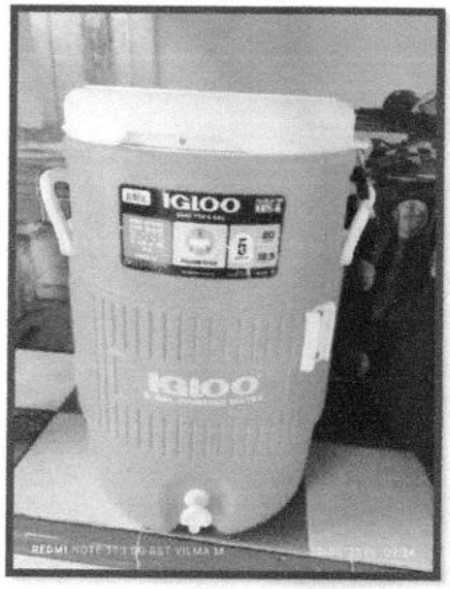



7. ACCIDENTES DE TRABAJO

Durante el periodo se presentó (0) Accidentes Laborales en donde no se vieron involucrados los trabajadores.

8. ENTREGA DE DOTACIÓN, ENTREGA DE EPP, Y REPOSICIÓN

Durante este periodo se hace entrega al personal de obra dotación y elementos de protección botas, jeans, casco, guantes y gafas:

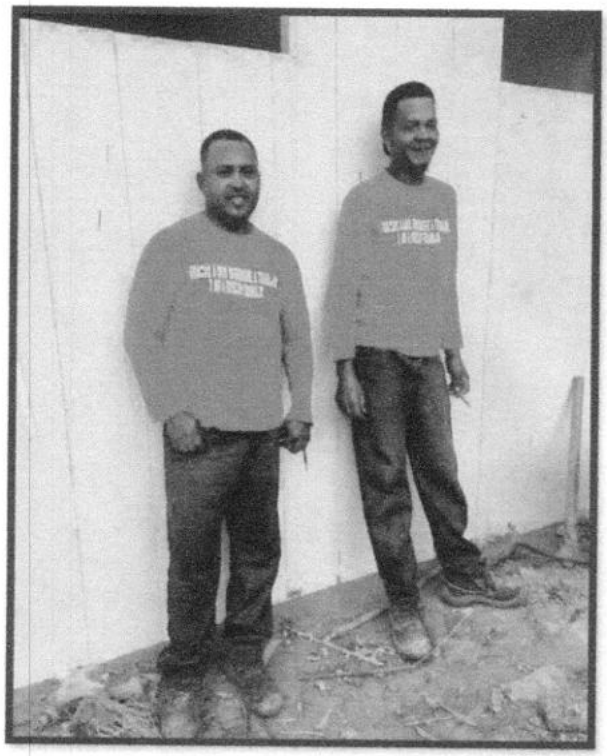


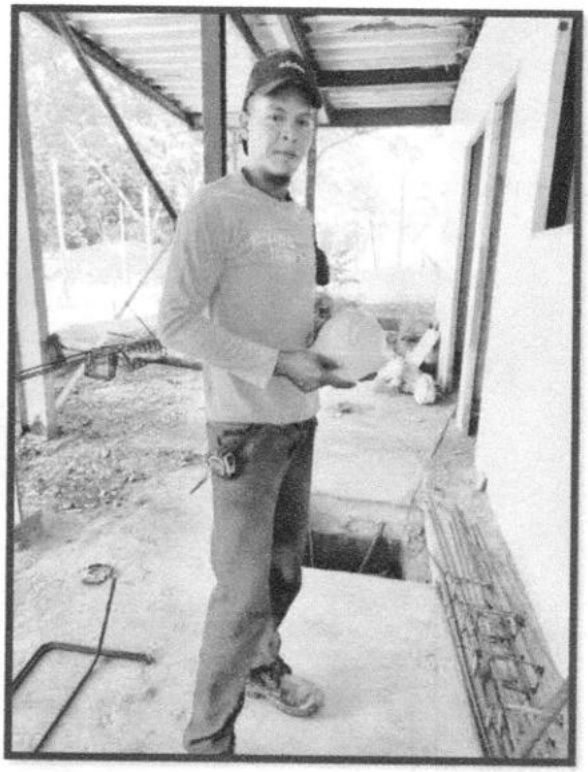





8. ORDEN Y ASEO


Se realizo limpieza de aseo en la obra, ya que es fundamental para mantener un entorno de trabajo limpio y seguro, reduce el riesgo de accidentes y lesiones.

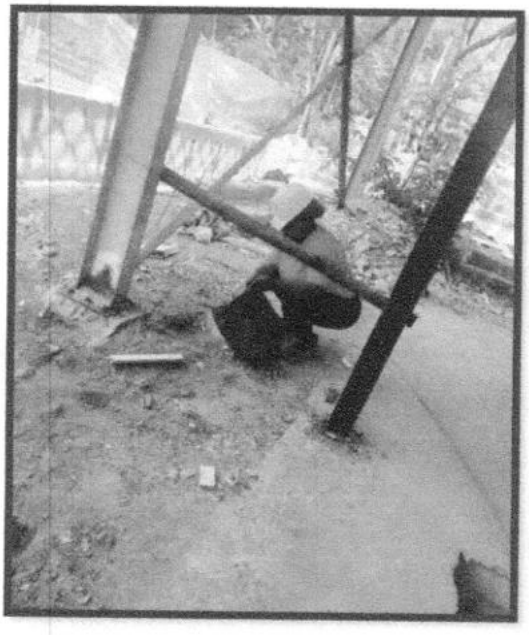

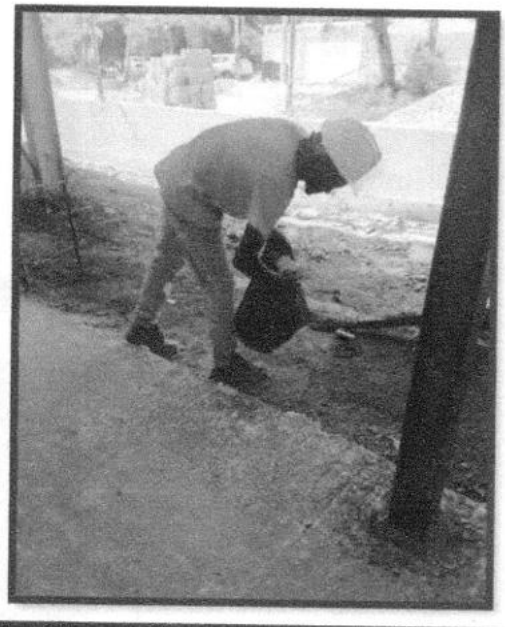

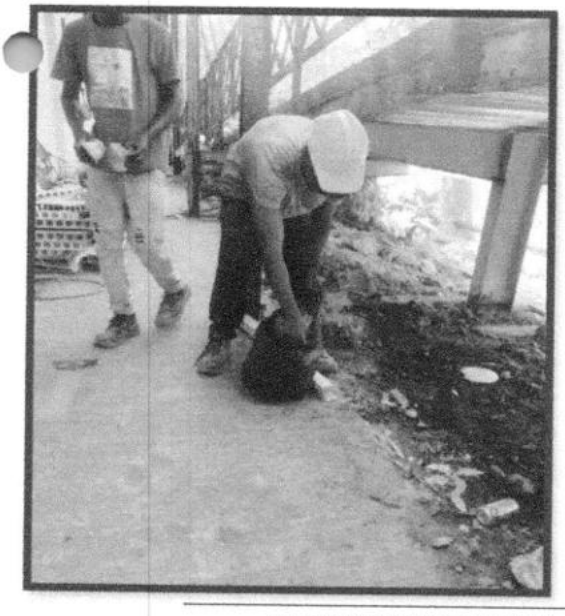





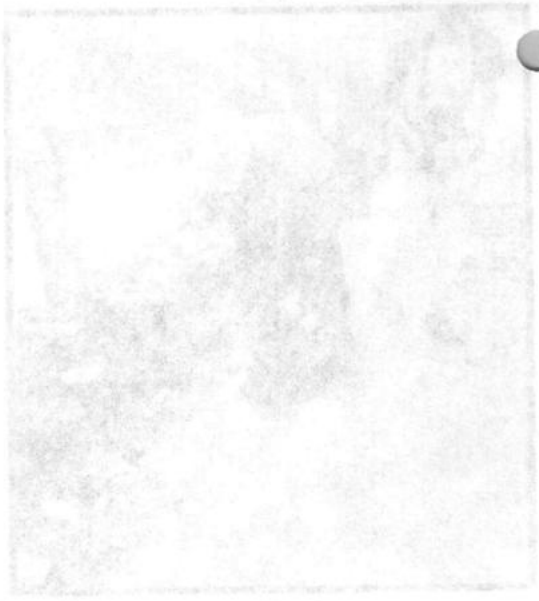



9. REGISTRO DE CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES:


Durante el periodo se realizó inducción, charlas de seguridad y integración que contribuyen a la salud y el bienestar de los trabajadores.

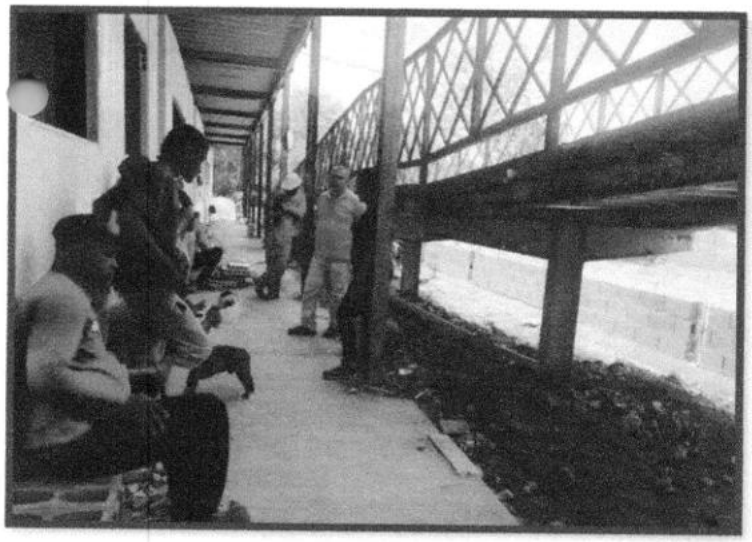


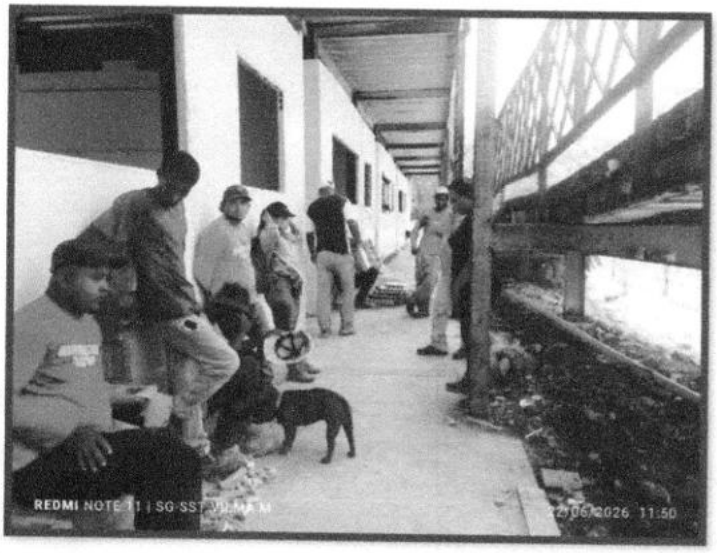


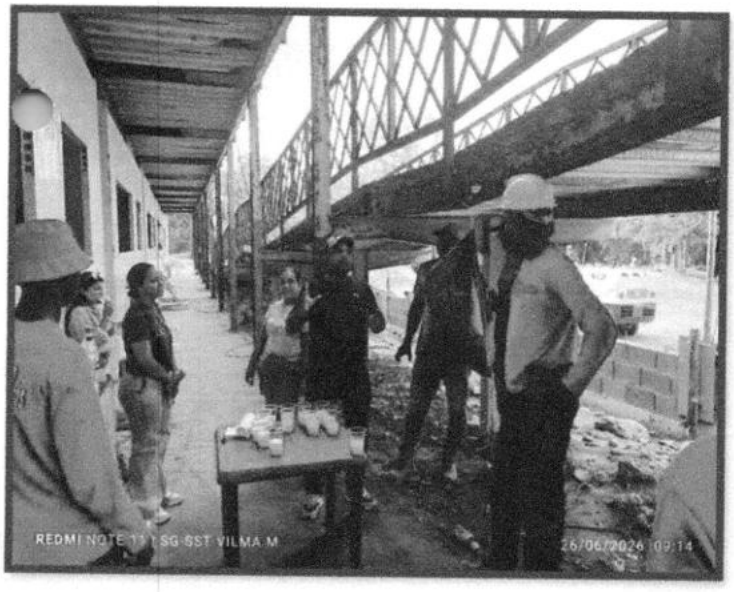


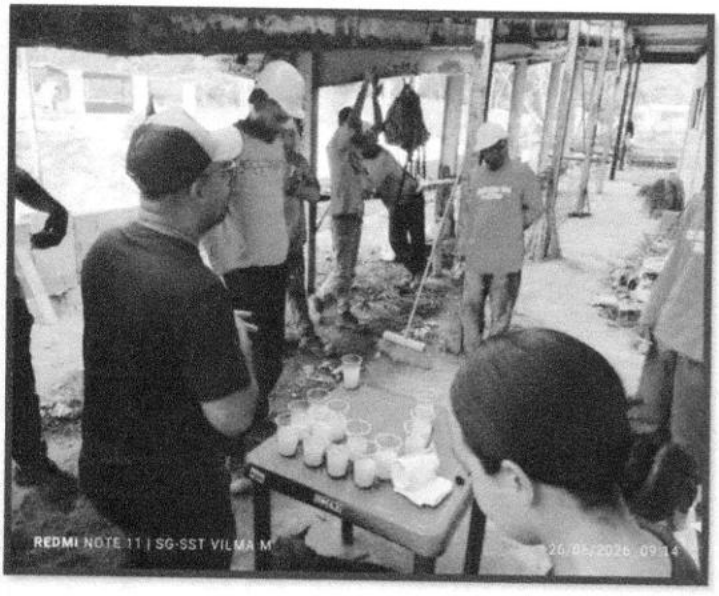


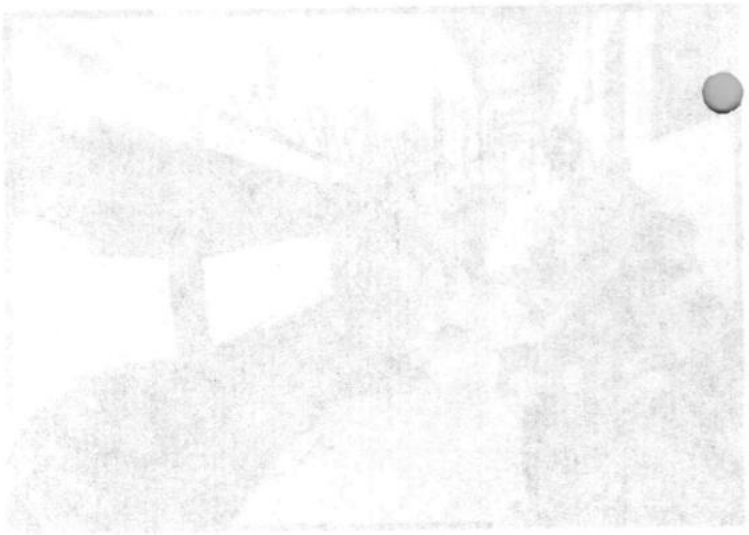


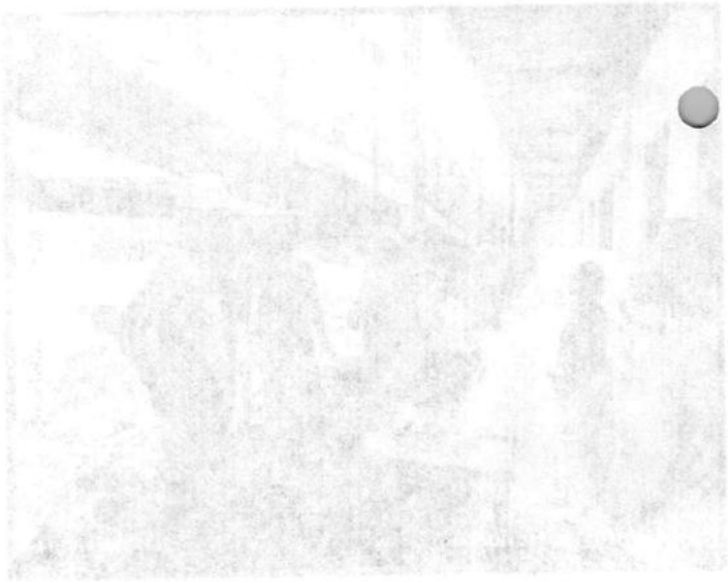


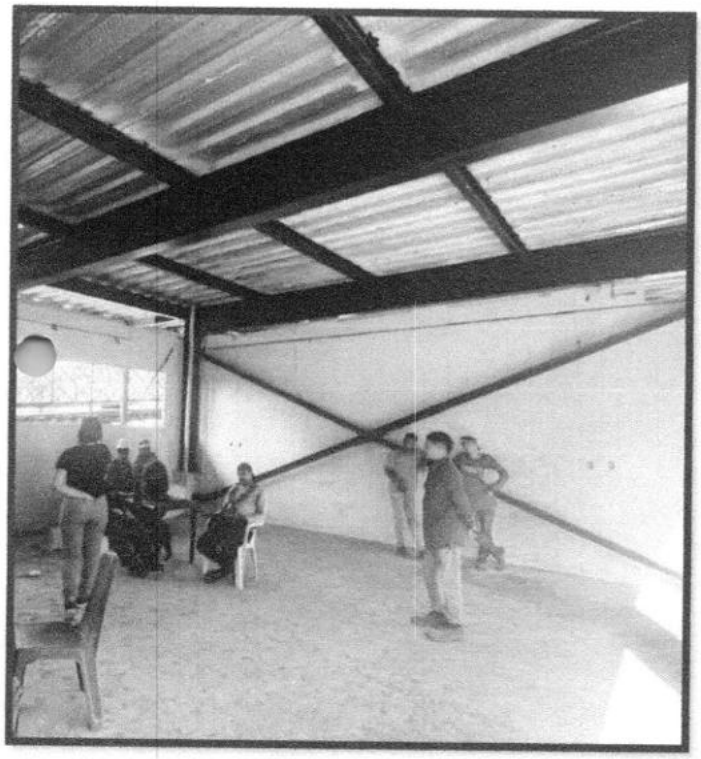


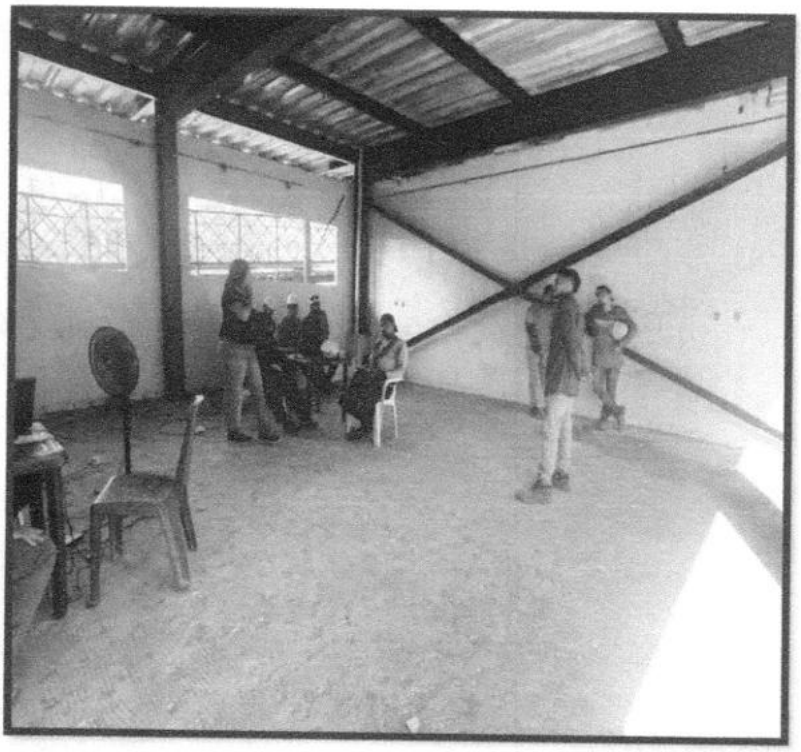

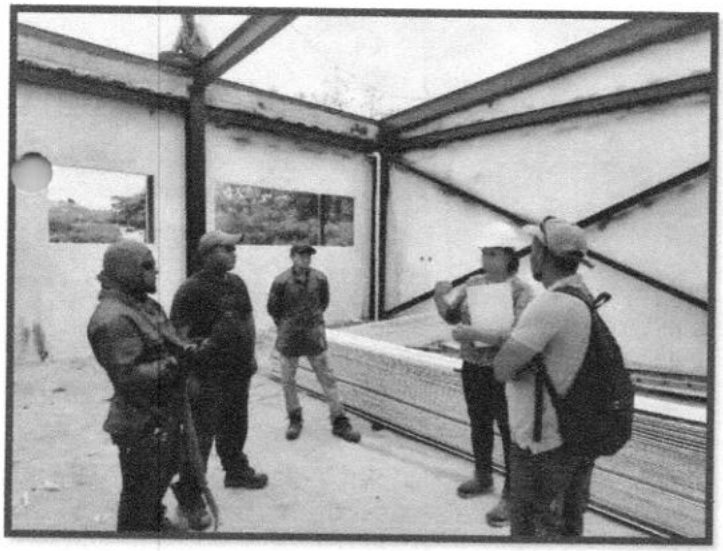

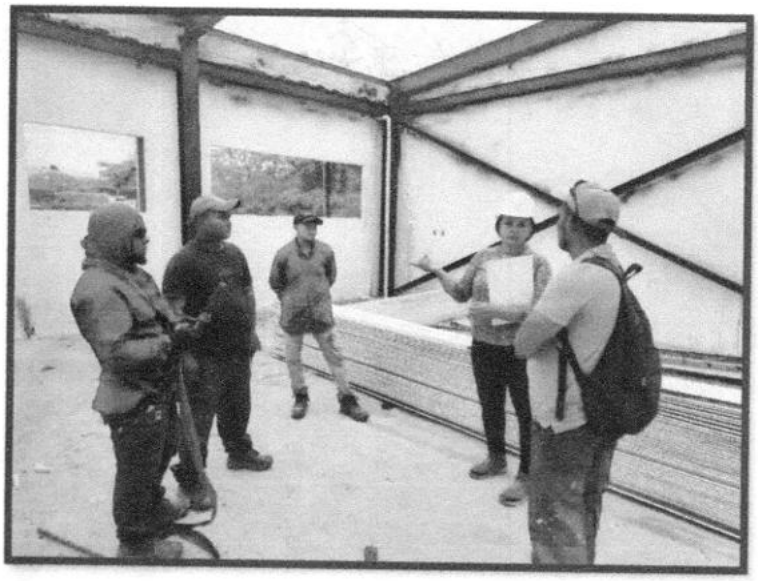

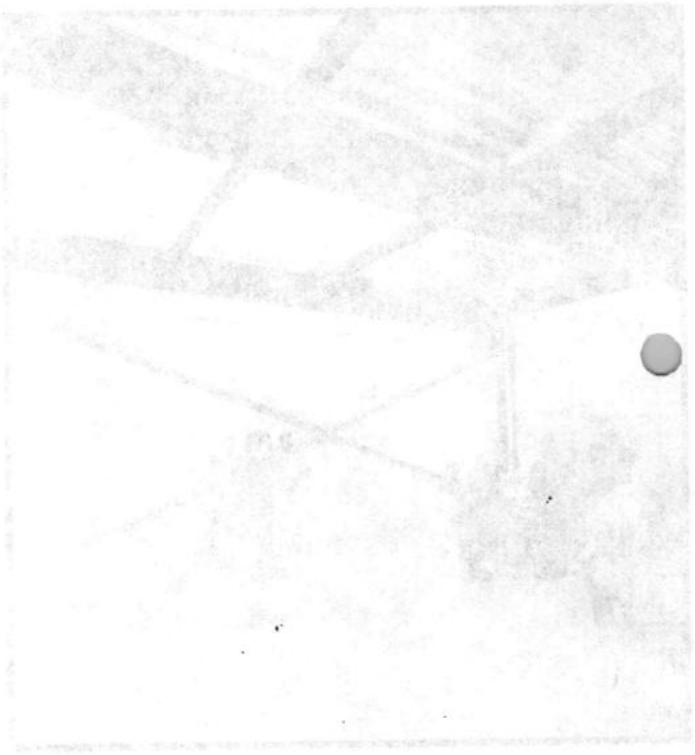

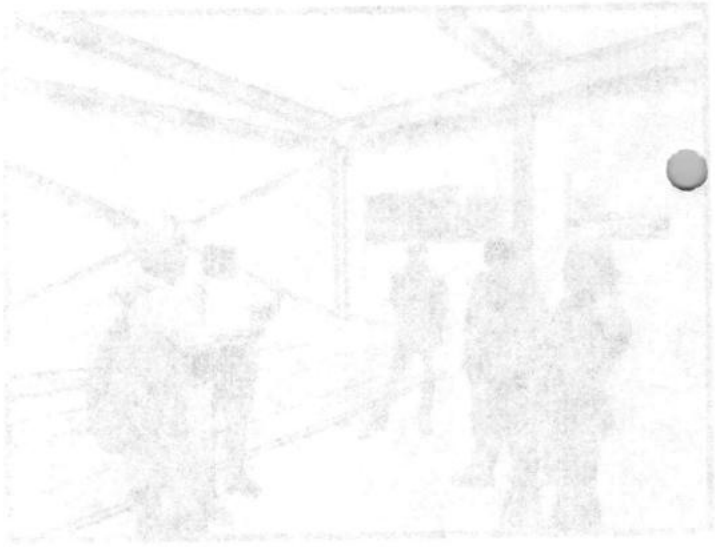

10. ANOTACIONES:

- Baño portátil
- Instalación de kit de señalizaciones de ruta evacuación, punto de encuentro, sustancias peligrosas y demás señalizaciones relacionadas SST en obra.

Profesional Siso
CEMED

Director Obra

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

Practica a realizar: Mantenimiento Estructuras Metalicas Sey Piso

Fecha: 2010 23 - 28 /2010


Area:

ACTIVIDADES (Discrimine el paso a paso de la actividad)
Revicion de Equipos
Uso de EPP
Revicion de Area
limpieza de Area
se procede a realizar la actividad

Peligros y Riesgos potenciales	SI	No
Atrapamientos por debajo o entre objetos		X
Caída de objetos	X	
Caídas de alturas	✓	
Caídas del mismo nivel	✓	
Contacto con materiales o sustancias peligrosas	✓	
Contacto con superficies calientes	✓	
Contacto directo o indirecto con electricidad		✓
Deficiencias de ventilación		✓
Derrames de sustancias químicas entre otras		✓
Espacios reducidos de trabajo		✓
Exposición a ruido	✓	
Exposición en vibraciones	✓	
Iluminación inadecuada		✓
Inhalación de gases, vapores, humos, y neblinas		✓
Instalaciones eléctricas en mal estado		✓
Levantamiento de cargas manuales		✓
Manejo de herramientas	✓	
Movimientos repetitivos y/o posturas inadecuadas de trabajo	✓	
Picaduras, Fluidos, Excrementos, Mordeduras		✓
Posibilidad de explosión y/o incendios		✓
Probabilidad de tormentas, lluvia o descargas eléctricas	✓	
Proyección de partículas y fragmentos	✓	
Superficies irregulares, lisas, obstruidas entre otras	✓	
Techos, muros, pisos o paredes en mal estado	✓	

Medidas preventivas / Recomendaciones de seguridad para evitar que se presente un incidente (Accidente)	SI	No
Adecuada disposición de residuos	✓	
Aplicación de procedimientos de trabajo seguro	✓	
Demarcar y señalizar el área de trabajo	✓	
Disponer de elementos de protección personal EPP	✓	
Disponer de Kit de emergencias	✓	
Disponer de puntos de anclaje fijos y portátiles	✓	
Disponer de sistemas de comunicación	✓	
Disponer de vigía en el exterior	✓	
Empleo de sistemas de acceso para alturas		✓
Equipos de protección de caídas adecuados para la labor específica		✓
Equipos y herramientas en buen estado		
Otros:		
LISTA DE CHEQUEO ANTES DE REALIZAR LA ACTIVIDAD		
Todos poseen los elementos de protección personal necesarios?	✓	
Todos conocen la actividad que van a realizar?	✓	
Disponen de sistemas preventivos contra caídas en la practica?	✓	
Dispone de equipos de seguridad necesarios para la actividad?	✓	
Todos identificaron los riesgos del área antes de la practica?	✓	
Dispone de equipos para extinguir conatos de incendio?	✓	
Otros:		

N#	cedula	Nombre y apellido
1	1075078665	Carly Martinez.
2	1131923232	DE Jesus P.
3	1018210031	Carlos Martinez
4		
5		
6		
7		

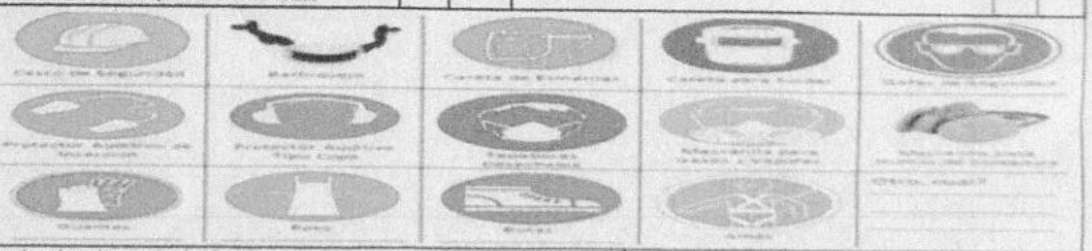

Nombre de quien realiza la identificacion: Carlos Martinez

Cargo: Prof. SST

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

Practica a realizar: Engrabado y Pintura

Fecha: Julio 9 al 12 / 2024

Área:

ACTIVIDADES (Discrimine el paso a paso de la actividad)
Revicion de Equipos uso de Epp limpieza de Material Pintura del Mismo

Peligros y Riesgos potenciales	Si	No
Atrapamientos por debajo o entre objetos		X
Caída de objetos	X	
Caídas de alturas	X	
Caídas del mismo nivel	X	
Contacto con materiales o sustancias peligrosas		X
Contacto con superficies calientes	X	
Contacto directo o indirecto con electricidad		X
Deficiencias de ventilación		X
Derrames de sustancias químicas entre otras		X
Espacios reducidos de trabajo		X
Exposición a ruido	X	
Exposición en vibraciones	X	
Iluminación inadecuada		X
Inhalación de gases, vapores, humos, y neblinas		X
Instalaciones eléctricas en mal estado		X
Levantamiento de cargas manuales		X
Manejo de herramientas	X	
Movimientos repetitivos y/o posturas inadecuadas de trabajo	X	
Picaduras, Fluidos, Excrementos, Mordeduras		X
Posibilidad de explosión y/o incendios		X
Probabilidad de tormentas, lluvia o descargas eléctricas	X	
Proyección de partículas y fragmentos	X	
Superficies irregulares, lisas, obstruidas entre otras	X	
Techos, muros, pisos o paredes en mal estado	X	

Medidas preventivas / Recomendaciones de seguridad para evitar que se presente un incidente (Accidente)	Si	No
Adecuada disposición de residuos	X	
Aplicación de procedimientos de trabajo seguro	X	
Demarcar y señalizar el área de trabajo	X	
Disponer de elementos de protección personal EPP	X	
Disponer de Kit de emergencias	X	
Disponer de puntos de anclaje fijos y portátiles	X	
Disponer de sistemas de comunicación	X	
Disponer de vigía en el exterior	X	
Empleo de sistemas de acceso para alturas		X
Equipos de protección de caídas adecuados para la labor especifica		X
Equipos y herramientas en buen estado	X	
Otros:		
LISTA DE CHEQUEO ANTES DE REALIZAR LA ACTIVIDAD		
Todos poseen los elementos de protección personal necesarios?	X	
Todos conocen la actividad que van a realizar?	X	
Disponen de sistemas preventivos contra caídas en la practica?	X	
Dispone de equipos de seguridad necesarios para la actividad?	X	
Todos identificaron los riesgos del área antes de la practica?	X	
Dispone de equipos para extinguir conatos de incendio?	X	
Otros:		

N#	cedula	Nombre y apellido
1	73134201	Carlos Cardenas
2	1052087666	Carlos Martinez
3	72197524	Jose Garcia
4		
5		
6		
7		



Nombre de quien realiza la identificacion: Oilma Mena

Cargo: Prof SST

aportes en línea

Planilla Resumen

OS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
901946623	7	CONSORCIO ECI 25	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	SAN ANDRES	SAN ANDRES-SAN ANDRES	3114358677	SI

OS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
nsión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
-06	2026-07			E	2026/07/07				

SUMEN DE PAGO

SGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
(ADMINISTRADORAS: 3)				19	$5,032,700	$0	$0	$5,032,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$242,900	$0	$0	$242,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	15	$4,229,400	$0	$0	$4,229,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$560,400	$0	$0	$560,400
(ADMINISTRADORAS: 1)				19	$2,189,500	$0	$0	$2,189,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	19	$2,189,500	$0	$0	$2,189,500
(ADMINISTRADORAS: 1)				19	$1,259,000	$0	$0	$1,259,000
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	19	$1,259,000	$0	$0	$1,259,000
(ADMINISTRADORAS: 8)				19	$1,259,000	$0	$0	$1,259,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$70,100	$0	$0	$70,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$70,100	$0	$0	$70,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	$268,700	$0	$0	$268,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$479,000	$0	$0	$479,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$60,800	$0	$0	$60,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	2	$170,100	$0	$0	$170,100
TA.				19	$9,740,200	$0	$0	$9,740,200

2026/07/24 02:59 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

OS GENERALES DEL APORTANTE

entificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
01946623	7	CONSORCIO ECI 25	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	SAN ANDRES	SAN ANDRES-SAN ANDRES	3114358677	SI

OS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
nsión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
-06	2026-07			E	2026/07/07				

UIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
CC	1050284187	ARAGON CARLOS																	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC07	30	$1,750,905	$70,100	CCF64	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
CC	73434201	CARDENAS CARLOS																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS048	30	$1,750,905	$70,100	CCF64	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
CC	73433291	CARDENAS HERNAN																	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC07	30	$1,750,905	$70,100	CCF64	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
CC	73103048	CUADRADO JOSE		X															25-14	25	$1,459,088	$233,500	EPS037	25	$1,459,088	$58,400	CCF64	25	$1,459,088	$58,400	14-11	25	$1,459,088	$101,600	25	$0	$0	SI	$451,900
CC	1006868471	DE LA HOZ YAMID		X															25-14	1	$58,364	$9,400	EPS041	1	$58,364	$2,400	CCF64	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	$4,100	1	$0	$0	SI	$18,300
CC	73192525	GARCIA JOSE																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF64	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
CC	1002067158	GONZALEZ CLEIMER																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF64	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
CC	1002441493	GUZMAN JUAN																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF64	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
CC	1007624934	MARES PAULA																	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF64	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000
CC	1052087669	MARTINEZ CARLOS																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF64	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
CC	8540597	MIRANDA LLENDER																	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF64	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
CC	1004508113	NAVARRO JULIO																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF64	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
CC	72095833	NORIEGA ALEX	X																230201	30	$1,750,905	$280,200	ESSC07	30	$1,750,905	$70,100	CCF64	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
CC	1085230807	PEREZ JOSE																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF64	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
CC	1123630642	PITALUA MIGUEL																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF64	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
CC	1007128591	RODRIGUEZ EDUARDO																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF64	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
CC	1007162135	SANTA MARIA JESUS		X															230301	25	$1,459,088	$233,500	ESSC07	25	$1,459,088	$58,400	CCF64	25	$1,459,088	$58,400	14-11	25	$1,459,088	$101,600	25	$0	$0	SI	$451,900
CC	1123621531	VENNER JENNER																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF64	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
CC	1043849832	VILLEGAS ENDRYS		X															230301	25	$1,459,088	$233,500	EPS041	25	$1,459,088	$58,400	CCF64	25	$1,459,088	$58,400	14-11	25	$1,459,088	$101,600	25	$0	$0	SI	$451,900
Afiliados(19)																					$31,448,298	$5,032,700			$31,448,298	$1,259,000			$31,448,298	$1,259,000			$31,448,298	$2,189,500		$0	$0		$9,740,200

2026/07/24 02:59 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901519128	1	ICH INGENIERIA Y PROYECTOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ICH INGENIERIA Y PROYECTOS SAS	CALLE 16 A N 121 A 214	SAN ANDRES-SAN ANDRES	3104891728	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	468848573	9507775923	E	2026/07/07	2026/07/10	BANCOLOMBIA	3	$9,505,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ICH INGENIERIA Y PROYECTOS SAS (15 Afiliados)					$36,909,412	$5,906,200			$36,909,412	$1,477,100			$36,909,412	$1,477,100			$36,909,412	$193,700		$0	$0
Centro de Trabajo: OBRA (15 Afiliados)					**$36,909,412**	**$5,906,200**			**$36,909,412**	**$1,477,100**			**$36,909,412**	**$1,477,100**			**$36,909,412**	**$193,700**		**$0**	**$0**
Ciudad: SAN ANDRES Depto: SAN ANDRES (15 Afiliados)					**$36,909,412**	**$5,906,200**			**$36,909,412**	**$1,477,100**			**$36,909,412**	**$1,477,100**			**$36,909,412**	**$193,700**		**$0**	**$0**
1	CC	1123625218	ALVAREZ MARTINEZ ISHA VICTORIA	25-14	30	$4,300,000	$688,000	EPS005	30	$4,300,000	$172,000	CCF64	30	$4,300,000	$172,000	14-11	30	$4,300,000	$22,500	30	$0	$0
2	CC	73192188	ARIZA SARMIENTO DAIRO LUIS	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF64	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
3	CC	1123890586	BOWDEN POMARE JARRETH LINDON	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF64	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
4	CC	1123621347	BURGOS CARABALLO CESAR AGUSTO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF64	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
5	CC	18004536	CORPUS GORDON JOHNNY JONES	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF64	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
6	CC	1123638365	CORTES GUTIERREZ STACY	230201	30	$4,200,000	$672,000	EPS037	30	$4,200,000	$168,000	CCF64	30	$4,200,000	$168,000	14-11	30	$4,200,000	$22,000	30	$0	$0
7	CC	1006950430	GUTIERREZ JOSE ALEXANDER	230201	24	$1,400,724	$224,200	EPS005	24	$1,400,724	$56,100	CCF64	24	$1,400,724	$56,100	14-11	24	$1,400,724	$7,400	24	$0	$0
8	CC	18011557	LAMBIS POLO JUSTINO ANTONIO	230301	24	$1,400,724	$224,200	EPS037	24	$1,400,724	$56,100	CCF64	24	$1,400,724	$56,100	14-11	24	$1,400,724	$7,400	24	$0	$0
9	CC	1006869064	MARSIGLIA MUÑOZ SHELSY JHOVANA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF64	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
10	CC	1123627065	MAZA MERCADO STARLYN	230301	24	$1,400,724	$224,200	EPS005	24	$1,400,724	$56,100	CCF64	24	$1,400,724	$56,100	14-11	24	$1,400,724	$7,400	24	$0	$0
11	CC	40990058	MUÑOZ DOMINGUEZ VILMA ESTER	230301	30	$4,200,000	$672,000	EPS037	30	$4,200,000	$168,000	CCF64	30	$4,200,000	$168,000	14-11	30	$4,200,000	$22,000	30	$0	$0
12	CC	7562523	NEIRA SERNA RICARDO	25-14	30	$6,000,000	$960,000	EPS010	30	$6,000,000	$240,000	CCF64	30	$6,000,000	$240,000	14-11	30	$6,000,000	$31,400	30	$0	$0
13	CC	1123890728	POMARE LEVER MATTHEWS	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF64	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
14	CC	1123633383	STEELE CORPUS VALERY ELIZABETH	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF64	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
15	CC	1123891077	VARGAS OSPINA JOSE DAVID	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF64	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CALI (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)					**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$70,100**			**$1,750,905**	**$70,100**			**$1,750,905**	**$9,200**		**$0**	**$0**
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$70,100**			**$1,750,905**	**$70,100**			**$1,750,905**	**$9,200**		**$0**	**$0**
16	CC	1006109130	RAMIREZ RAMIREZ LAURA VANESSA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
Total	**Afiliados(16)**				**$38,660,317**	**$6,186,400**			**$38,660,317**	**$1,547,200**			**$38,660,317**	**$1,547,200**			**$38,660,317**	**$202,900**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				16	$6,186,400	$13,700	$0	$6,200,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$2,208,400	$4,900	$0	$2,213,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$2,801,600	$6,200	$0	$2,807,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,176,400	$2,600	$0	$1,179,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$202,900	$500	$0	$203,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	16	$202,900	$500	$0	$203,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				16	$1,547,200	$3,500	$0	$1,550,700
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	15	$1,477,100	$3,300	$0	$1,480,400
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	$70,100	$200	$0	$70,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				16	$1,547,200	$3,700	$0	$1,550,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$240,000	$600	$0	$240,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$742,600	$1,700	$0	$744,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$140,200	$400	$0	$140,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$424,400	$1,000	$0	$425,400
TOTAL				16	$9,483,700	$21,400	$0	$9,505,100

CONSORCIO IE SANTOS	REGISTRO DE CAPACITACIÓN	05-FOR-01 Fecha: 21-03-2019 REV. 1

Fecha: 23-06-2026	Hora: 10:30 AM	Duración	11:30 AM
Lugar: Obra			
Temas: Reglamento interno. Horario laboral, uso EPP Respeto entre compañeros y Administrativo.			

Cap. Interna [ ] Sensibilización [/] Cap. Externa [ ]

Observaciones

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	CEDULA
1	Jose Garcia Perez	Soldador	Jose Garcia	73192525
2	Yuleivi Steele C.	Almacenista		1123633883
3	Jose Gutierrez	Oficial		1006950430
4	Carlos Martinez	Soldador	Carlos Martinez	1.052.08669
5	Stuarlyn Maza	Oficial	Stuarlyn Maza	1123627063
6	Jose Vargas		Jose	73192501
7	Jestino Cambis	Oficial	Jestino	18011557
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

REALIZADO POR: (INSTRUCTOR)

CONSORCIO IE SANTOS	REGISTRO DE CAPACITACIÓN	05-FOR-01 Fecha: 21-03-2019 REV. 1

Fecha: 27 Junio/2019 Hora: 8:20 AM | Duración 9:15 AM

Lugar:

Temas: CUIDANOS del mejor compañero ideal para resaltar la union y el apoyo mutuo en el trabajo

Cap. Interna ☐ Sensibilización ☐ Cap. Externa ☐

Observaciones

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	CEDULA
1	Jose Garcia Perez	Soldador	Jose Garcia	73192526
2	Valeny Steele	Almacenista		1123633383
3	[illegible] MAZA	oficial	[illegible]	38048900
4	Jose Gutierrez	Oficial		10.695043
5	Carlos Martinez	soldador	Carlos Martinez	7052080669
6	Matthew Pomale		Matthews	
7	Carlos Cesar Cardenas T.			
8	Jarreth Bowden Pomare			
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

REALIZADO POR: (INSTRUCTOR)

CONSORCIO III SANTOS	REGISTRO DE CAPACITACIÓN	05-FOR-01 Fecha: 21-03-2019 REV. 1

Fecha: 5 de septiembre de 2019 Hora: 8:00 AM Duración: 8:30 AM

Lugar:

Temas: Charla seguridad sobre Gradas. — protección ocular - Rotura alambres

Cap. Interna [ ] Sensibilización [/] Cap. Externa [ ]

Observaciones

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	CEDULA
1	Hernan Cordero	SST	Hernan	73433781
2	Jose Garcia perez	Soldador	Jose Garcia	73192525
3	Carlos Martinez	Soldador	Carlos Martinez	1.082.765
4	Carlos Carrillo	Soldador	Carlos	1062[illegible]
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
6				
7				
8				

IZADO POR: (INSTRUCTOR)

Hernan

CONSORCIO II SANTOS	REGISTRO DE CAPACITACIÓN	05-FOR-01 Fecha: 21-03-2019 REV. 1

Fecha: 14-01-2026 Hora: 8:00 a.m. Duración 0:20 min

Lugar: obra

Temas: Mitigacion de emision del polvo, equipos proteccion

Cap. Interna [ ] Sensibilización [/] Cap. Externa [ ]

Observaciones

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	CEDULA
1	Carlos MARTINEZ	Soldador	Carlos Martinez	1.052.098.669
2	JOSE GARCIA PEREZ	soldador	Jose Garcia	73191525
3	Carlos Aragon	Ayudante C	Carlos Aragon	1050234187
4	Hernan Cardenas	Soldador	Hernan	73.423.251
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

REALIZADO POR: (INSTRUCTOR)

Carlos Martinez

CONSORCIO IE SANTOS
Calle 16A #121A-214 Of. 304 edificio Palo Alto Cali, Colombia
Tel. (2) 3735555
Tel. (2) 3735555
Email- consorcioiesantos@gmail.com

INFORME SOCIAL

16 DE JUNIO DEL 2026 AL 15 DE JULIO DEL 2026

CONSORCIO IE SANTOS
Calle 16A #121A-214 Of. 304 edificio Palo Alto Cali, Colombia
Tel. (2) 3735555
Tel. (2) 3735555
Email- consorcioiesantos@gmail.com

INFORME SOCIAL

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA IE ANTONIA SANTOS CEMED EN LA FASE 1 (BLOQUE A Y OTRAS OBRAS DE URBANISMO) EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS.

CONTRATISTA: CONSORCIO IE SANTOS

INTERVENTORIA: CONSORCIO EDUCATIVO SAI.

INFORME MENSUAL N°6

PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2026

Contenido

CONSORCIO IE SANTOS 1
INFORME SOCIAL 1
1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 3
2. INTRODUCCIÓN 7
3. JUSTIFICACIÓN 8
4. OBJETIVOS 9
4.1 Objetivo general 9
4.2 Objetivos específicos 9
5. Actividades Ejecutadas 10
5.2 GESTION PARA ACTIVIDAD COMUNITARIA. 10
5.3 CHARLA SOBRE LA PREVEENCION DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS DURANTE LA JORNADA LABORAL.. 11
5.4 INSTALACION DEL BUZON DE SUGERENCIA. 12
5.5 REUNION CON PRESIDENTA DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL ..... **¡Error! Marcador no definido.**
6. CONCLUSIÓN 14
CONSORCIO IE SANTOS 16
RECOMENDACIONES ..... **¡Error! Marcador no definido.**

CONSORCIO IE SANTOS
Calle 16A #121A-214 Of. 304 edificio Palo Alto Cali, Colombia
Tel. (2) 3735555
Tel. (2) 3735555
Email- consorcioiesantos@gmail.com

1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

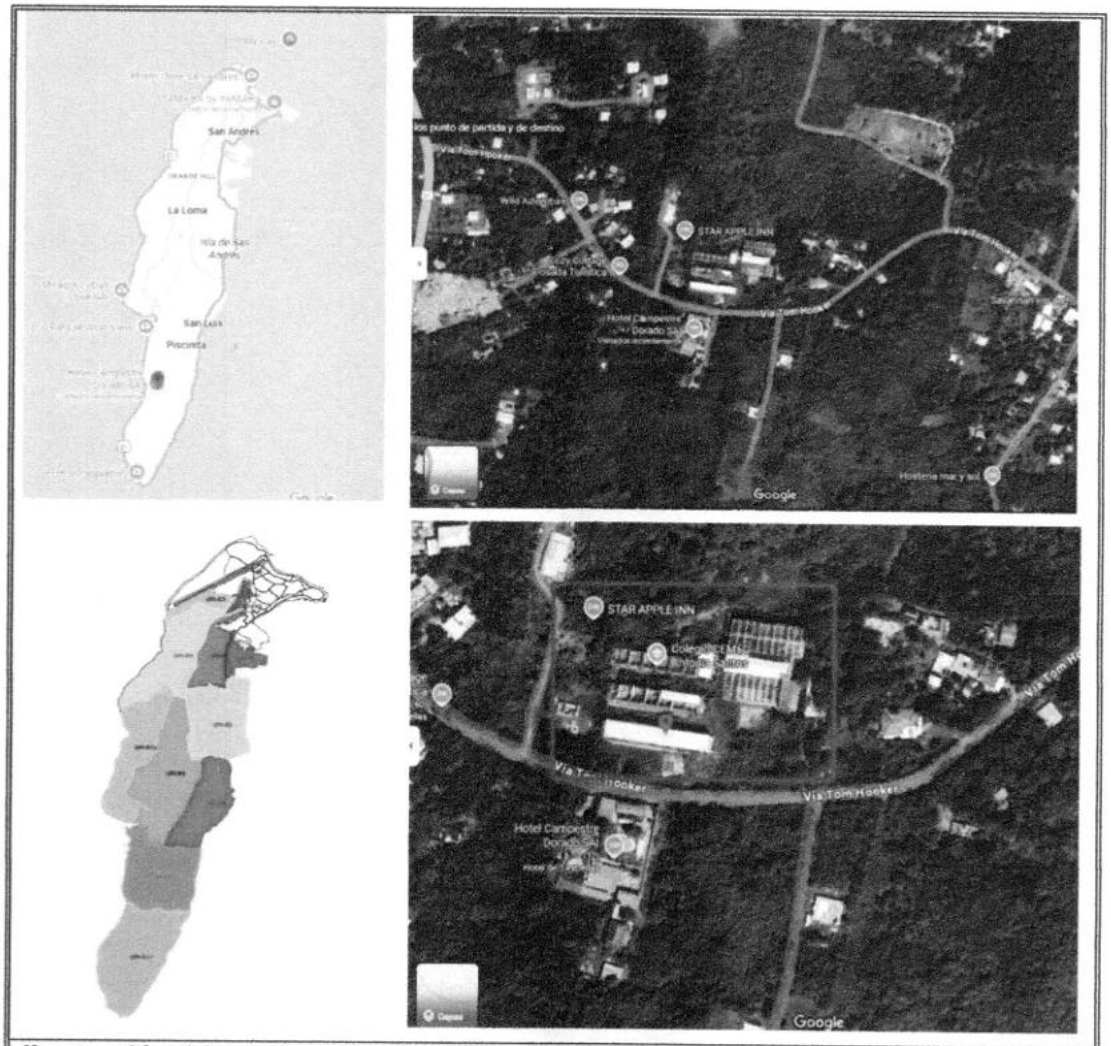


Ilustración 1 Localización del Proyecto

El proyecto se ubica en las coordenadas 12°30'22.6"N 81°43'32.3"W, dentro de la Unidad de Planificación Insular Rural (UPI-R10), según lo establecido en el Decreto 0363 de 2007, el cual ajusta las disposiciones del Decreto 325 de 2003. Más específicamente en el K00+500 de la vía Tom Hooker. Encontramos en la

ubicación la infraestructura existente compuesta por bloques de aulas escolares los cuales no se encuentran acondicionados para su adecuado uso, así como las obras complementarias como cerramientos y urbanismo.

Tabla 1 NORMATIVIDAD URBANISTICA PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL NORMATIVIDAD URBANISTICA PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

UPI-R 10 AGROPECUARIA PRIMARIA 1- CORREDOR SUBURBANO PEPPER HILL – FOUR CORNER – TOM HOOKER

Los indices establecidos son para el uso secundario.

Los corredores suburbanos Pepper Hill, Four Comer, Tom Hooker, vía circunvalar se encuentra Determinada por una franja de 50 metros a partir del borde de la vía, a ambos lados de la misma, en la cual se desarrollaran los usos secundarios incluyendo los predios que posean más del 80% de su área dentro de la franja de los 50 m.

Para los predios ubicados en el área de litoral se deberá dar aplicación al lo establecido en el articulo No. 63 del presente decreto.

Uso principal:	Agricultura
Usos secundarios:	Ganadería, vivienda (rural), institucional (Educativo), comercio-vivienda, avicultura, porcicultura, hostal – posada nativa.
Usos prohibidos:	todos los no especificados en los usos principales y secundarios.
Áreas de Cesión:	
Andenes:	2.0 Metros
Área mínima de lote vivienda rural	
(Corredor sub urbano Pepper Hill, Four Corner,	
Tom Hooker, Vía circunvalar)	300 M²
Indice de ocupación máximo:	0.4 del área del lote
Indice de construcción máximo:	0.8
Frente mínimo de lote:	15m
Área mínima de lote vivienda Rural Asoc. Agric.	3000 M² al interior de la zona
Indice de ocupación máximo:	0.05 del área del lote
Indice de construcción máximo:	0.1
Frente mínimo de lote:	30m
Indice de ocupación máximo:	0.4 del área del lote
Indice de construcción máximo:	0.8
Aislamientos:	frente: 4 m
	Lateral: 1.50 a cada lado
	Posterior: 4 m
Voladizos:	1.5 m sobre el retiro frontal
Altura máxima:	2 pisos

1. INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

A continuación, se describen en detalle las condiciones actuales de la infraestructura del Bloque A y el urbanismo del MEGACOLEGIO "CEMED" Antonia Santos, ubicado en el sector de San Luis, en la isla de San Andrés. Este informe tiene como objetivo exponer con profundidad el estado físico, funcional y estético de cada uno de los componentes que conforman este complejo educativo, con el fin de establecer un diagnóstico integral que permita la posterior formulación de propuestas de intervención, mantenimiento o rehabilitación.



La necesidad de ejecutar la adecuación del bloque del Megacolegio "CEMED" Antonia Santos se fundamenta en el estado actual de deterioro evidente que presenta la infraestructura, el cual afecta directamente la seguridad, funcionalidad y habitabilidad del plantel. Tras una inspección técnica detallada, se identificaron múltiples deficiencias en los componentes arquitectónicos, estructurales y de instalaciones, que impiden el uso adecuado de los espacios para fines educativos.



Los pisos de los salones se encuentran en condiciones insalubres, con presencia de humedad, moho, suciedad acumulada y elementos oxidados, lo cual representa un riesgo para la salud de los estudiantes
y docentes.

Las ventanas carecen de elementos de cerramiento seguros y presentan signos de corrosión en los marcos metálicos, permitiendo la entrada de agua y vegetación, además de comprometer la ventilación y la iluminación natural adecuadas.

En cuanto a las instalaciones hidrosanitarias, los baños están inoperativos, invadidos por vegetación y sin conexiones visibles de agua ni drenaje funcional. Esto impide brindar condiciones básicas de salubridad, higiene y dignidad para la comunidad educativa. Por su parte, las redes eléctricas se encuentran expuestas, incompletas y en avanzado estado de oxidación, lo cual representa un riesgo eléctrico inminente y pone en peligro la integridad de las personas y de los equipos que se pretendan instalar.

Dadas estas condiciones, el bloque en mención no cumple con los mínimos técnicos, normativos ni de habitabilidad exigidos para un establecimiento educativo. La intervención propuesta permitirá recuperar y garantizar un espacio adecuado, seguro y funcional, acorde con los estándares requeridos para el desarrollo de actividades académicas, en un entorno digno y propicio para el aprendizaje.

2. INTRODUCCIÓN

En el marco del componente social del proyecto, durante el periodo correspondiente se desarrollaron diversas actividades orientadas a fortalecer la participación comunitaria, la transparencia institucional y la adecuada socialización de la obra ante los actores involucrados. Estas acciones se enmarcan en el cumplimiento del Plan de Gestión Social, promoviendo espacios de diálogo, control social y acceso a la información.

En este sentido, se llevó a cabo una reunión con la Contraloría, con el fin de articular lineamientos de seguimiento y control al proyecto; asimismo, se impulsó la conformación del Comité de Veeduría Ciudadana, como mecanismo de participación que permite a la comunidad ejercer vigilancia sobre la ejecución de la obra. De igual manera, se realizó la instalación del aviso de inicio de obra, garantizando la divulgación oportuna de la información relevante del proyecto, y se efectuó la entrega formal del Plan de Gestión Social, documento que orienta las estrategias de intervención social durante el desarrollo del mismo.

Estas actividades reflejan el compromiso con la gestión social responsable, la inclusión de la comunidad y el cumplimiento de los principios de transparencia y participación ciudadana.

3. JUSTIFICACIÓN

El presente Informe Social se desarrolla en el marco de la ejecución del proyecto **"Construcción de la IE Antonia Santos CEMED en la Fase 1 (Bloque A y otras obras de urbanismo) en la Isla de San Andrés"**, con el propósito de evidenciar las acciones adelantadas por el componente social del **Consorcio IE Santos**, orientadas al fortalecimiento de las relaciones con la comunidad del área de influencia directa del proyecto, la atención oportuna de situaciones sociales derivadas de las actividades constructivas y el cumplimiento de los compromisos establecidos dentro del Plan de Gestión Social.

Durante el periodo reportado, el componente social acompañó el desarrollo de las actividades de obra mediante procesos de información, comunicación y participación comunitaria, garantizando espacios de diálogo con los habitantes cercanos al proyecto, trabajadores y demás actores involucrados. Estas acciones permitieron prevenir y gestionar posibles impactos sociales asociados a la ejecución de las actividades constructivas, promoviendo relaciones basadas en el respeto, la transparencia y la adecuada comunicación.

Asimismo, se realizaron actividades encaminadas a fortalecer la convivencia laboral, sensibilizar al personal vinculado al proyecto frente a sus responsabilidades sociales y ambientales, atender requerimientos comunitarios, realizar acompañamiento en campo y brindar respuesta a situaciones que pudieran afectar la percepción de la comunidad frente al desarrollo de la obra.

En este sentido, el presente informe constituye una herramienta de seguimiento y verificación de la gestión social realizada por el contratista, reflejando el compromiso del **Consorcio IE Santos** con la ejecución responsable del proyecto, la participación comunitaria y la implementación de estrategias que contribuyan al desarrollo adecuado de la obra,

minimizando impactos y fortaleciendo la confianza entre la comunidad y el equipo ejecutor.

4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo general

Fortalecer la gestión social del proyecto mediante la implementación de estrategias de información, participación ciudadana y articulación institucional, que garanticen la transparencia, el control social y la adecuada relación con la comunidad durante el desarrollo de la obra.

4.2 Objetivos específicos

- Promover espacios de articulación institucional a través de la realización de reuniones con entes de control, como la Contraloría, con el fin de asegurar el seguimiento adecuado al proyecto.

- Fomentar la participación ciudadana mediante la conformación del Comité de Veeduría, incentivando el ejercicio de control social por parte de la comunidad.

- Garantizar el acceso a la información del proyecto a través de la instalación del aviso de inicio de obra, permitiendo a la comunidad conocer aspectos relevantes de su ejecución.

- Socializar y formalizar la implementación del Plan de Gestión Social, estableciendo lineamientos claros para la intervención comunitaria durante el desarrollo del proyecto.

5. Actividades Ejecutadas.

5.2 GESTION PARA ACTIVIDAD COMUNITARIA.

Se realizó la planeación, coordinación y gestión logística de la actividad comunitaria, estableciendo comunicación con líderes comunitarios y actores del área de influencia para definir la fecha, el lugar y la convocatoria. Asimismo, se preparó el material informativo y de apoyo requerido, se coordinó la participación del equipo técnico y social del proyecto, y se verificaron las condiciones necesarias para el desarrollo de la jornada, con el propósito de promover la participación ciudadana, fortalecer la comunicación entre la comunidad y el proyecto, y generar espacios de diálogo orientados a la socialización de las actividades de la obra y la atención de inquietudes.

Como parte de las acciones preparatorias para el desarrollo de la actividad comunitaria, se realizó la gestión y coordinación con la presidenta de la Junta de Acción Comunal, quien además hace parte del Comité de Veeduría del proyecto. Durante el encuentro se socializó el objetivo de la jornada, se concertó la fecha, hora y lugar de realización, y se solicitó su apoyo en el proceso de convocatoria de la comunidad del área de influencia. Esta articulación permitió fortalecer la participación ciudadana, garantizar una adecuada difusión de la actividad y promover el trabajo conjunto entre la comunidad organizada y el equipo social del proyecto.

Adicionalmente, se realizaron reuniones de articulación con el equipo técnico del contratista y la interventoría, con el propósito de coordinar los aspectos operativos y metodológicos de la actividad comunitaria. En este espacio se definieron los roles y responsabilidades de los participantes, se revisó la logística requerida, se establecieron los temas a socializar y se acordaron las estrategias de acompañamiento durante la jornada, garantizando una ejecución organizada, el cumplimiento de los objetivos planteados y la articulación entre los componentes técnico, social y de interventoría.

Conclusión: Como resultado de las gestiones adelantadas y de la coordinación entre la Junta de Acción Comunal, el Comité de Veeduría, el equipo del contratista y la interventoría, se acordó aplazar la realización de la actividad comunitaria hasta tanto se disponga de un espacio que reúna las condiciones adecuadas para su desarrollo. Esta decisión se adoptó con el fin de garantizar una participación segura, organizada y efectiva de la comunidad, asegurando el cumplimiento de los objetivos planteados para la jornada.

5.3 CHARLA SOBRE LA PREVEENCION DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS DURANTE LA JORNADA LABORAL.

Como parte de las acciones de fortalecimiento del componente social y de promoción de entornos laborales seguros, se desarrolló una charla de sensibilización dirigida al personal operativo y administrativo de la obra sobre la prevención del consumo de sustancias psicoactivas durante la jornada laboral. La actividad tuvo como propósito general conciencia sobre los riesgos que representa el consumo de estas sustancias para la salud física y mental de los trabajadores, así como para la seguridad en la ejecución de las actividades, el bienestar colectivo y el cumplimiento de las normas establecidas dentro del proyecto.

Durante la jornada se abordaron temas relacionados con los efectos del consumo de sustancias psicoactivas en el desempeño laboral, el incremento del riesgo de accidentes de trabajo, el impacto en la convivencia, la responsabilidad individual y colectiva frente a la seguridad y la importancia de adoptar hábitos de vida saludables. Asimismo, se reiteró el compromiso de la organización con la promoción de ambientes de trabajo libres de consumo de alcohol y drogas, fomentando la cultura del autocuidado, el respeto por la vida y el cumplimiento de las políticas de seguridad y salud en el trabajo.

CONCLUSION

La actividad permitió sensibilizar a los trabajadores sobre la importancia de prevenir el consumo de sustancias psicoactivas durante la jornada laboral, fortaleciendo el compromiso con el autocuidado, la seguridad y la responsabilidad en el desarrollo de sus funciones. Asimismo, se promovió la reflexión sobre las consecuencias personales, familiares y laborales asociadas al consumo de estas sustancias, contribuyendo al fortalecimiento de una cultura preventiva y de un ambiente de trabajo dentro del proyecto.

5.4 INSTALACION DEL BUZON DE SUGERENCIAS.

En el marco de la ejecución del Plan de Gestión Social, se realizó la instalación del buzón de sugerencia en un lugar visible y de fácil acceso dentro de la obra, con el propósito de fortalecer los canales de comunicación entre el proyecto, los trabajadores y la comunidad del área de influencia. Esta herramienta fue implementada como un mecanismo participativo para facilitar la recepción de sugerencias, inquietudes, observaciones, felicitaciones y demás aportes relacionado con el desarrollo de las actividades del proyecto. las metas establecidas. Durante la jornada se socializo con los trabajadores y con los actores comunitarios el objetivo del buzón, su forma de uso y la importancia de emplearlo como un medio de comunicación que contribuya a la identificación oportuna de situaciones susceptibles de mejora. Asimismo, se informó que las comunicaciones recibidas serán revisadas y gestionadas conforme a los procedimientos establecidos, garantizando su adecuada atención y seguimiento.

CONCLUSION:

La instalación del Buzón de Sugerencias fortaleció los mecanismos de participación ciudadana y comunicación entre el proyecto y sus grupos de interés, promoviendo una cultura de diálogo, transparencia y mejora continua. Esta herramienta permitirá identificar oportunamente las inquietudes y aportes de la comunidad y de los trabajadores, facilitando su gestión y contribuyendo al fortalecimiento de las relaciones con el entorno social y al adecuado desarrollo del proyecto

5.5 REUNION CON PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL

En el marco de las acciones de relacionamiento comunitario contempladas en el Plan de Gestión Social, se llevó a cabo una reunión con el presidente de la Junta de Acción Comunal del área de influencia del proyecto, con el propósito de socializar la programación de la actividad comunitaria prevista y fortalecer los canales de comunicación con la comunidad. Durante el encuentro se dialogó sobre la importancia de la participación activa de los habitantes en las actividades desarrolladas por el proyecto y se reiteró el compromiso de mantener una comunicación permanente con los representantes comunitarios.

Asimismo, se abordó el tema de la vinculación de mano de obra local, destacando el interés del contratista en priorizar la contratación de personal residente en el área de influencia, siempre que los perfiles requeridos se ajusten a las necesidades técnicas y operativas de la obra. En este sentido, se acordó mantener un canal de comunicación con la Junta de Acción Comunal para la recepción y remisión de hojas de vida, con el fin de facilitar la identificación de candidatos y promover oportunidades de empleo para la comunidad.

CONCLUSIÓN

La reunión permitió fortalecer la articulación entre el proyecto y la Junta de Acción Comunal, consolidando un espacio de diálogo para tratar aspectos relacionados con la participación comunitaria y la vinculación de mano de obra local. Como resultado, se reafirmó el compromiso de mantener una comunicación fluida y transparente, favoreciendo la participación de la comunidad y contribuyendo al desarrollo adecuado del proyecto mediante procesos de contratación acordes con los requerimientos técnicos de la obra y los principios del Plan de Gestión Social.

6 CONCLUSIÓN



Durante el periodo reportado, el componente social desarrolló las actividades programadas en el Plan de Gestión Social, orientadas a fortalecer la comunicación, la participación comunitaria y la articulación entre el contratista, la interventoría y los diferentes actores del área de influencia del proyecto. Se realizaron jornadas de sensibilización dirigidas a los trabajadores, reuniones de coordinación con representantes comunitarios, instalación de mecanismos de participación ciudadana como el buzón de sugerencias y acciones de gestión encaminadas a la adecuada planificación de las actividades comunitarias. Asimismo, se dio continuidad al acompañamiento social de las actividades de obra y a la atención de las inquietudes de la comunidad, promoviendo el diálogo permanente y la prevención de situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proyecto. En términos generales, las acciones ejecutadas contribuyeron al fortalecimiento de las relaciones con la comunidad, al cumplimiento de los objetivos del Plan de Gestión Social y al desarrollo responsable y participativo de la obra.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

CATHERINE CORPUS VALLARINO
PROFESIONAL SOCIAL

Ing Ricardo Nerc
Director Obra

GESTION ACTIVIDAD COMUNITARIA	
	

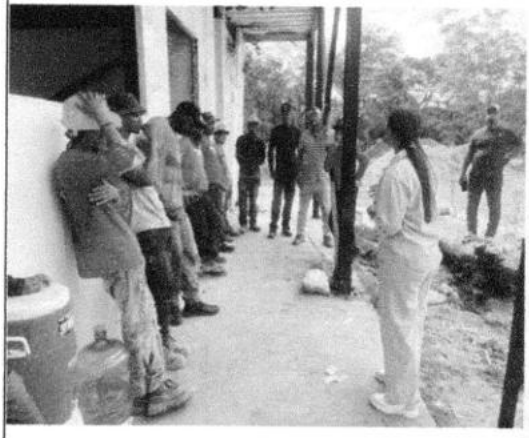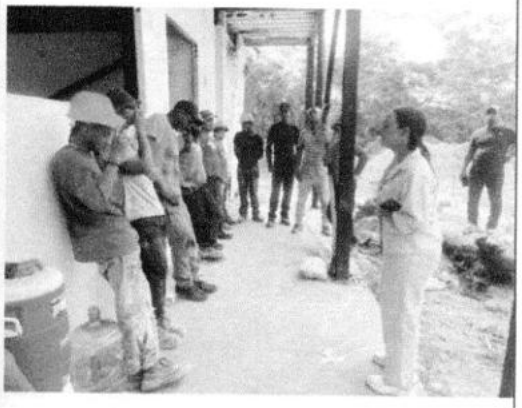CHARLA PREVENCION DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	
	






CONSORCIO IE SANTOS
Calle 16A #121A-214 Of. 304 edificio Palo Alto Cali, Colombia
Tel. (2) 3735555
Tel. (2) 3735555
Email- consorcioiesantos@gmail.com

INSTALACION DEL BUZON DE SUGERENCIA




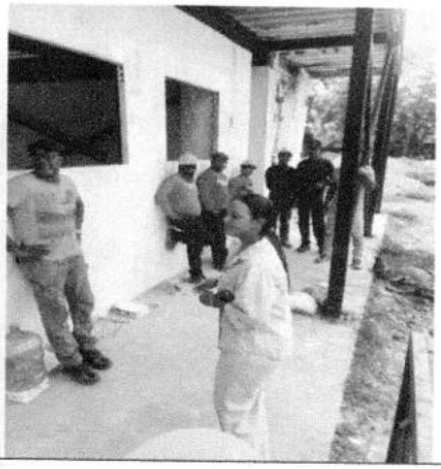

REUNION PRESIDENTA DE JAC





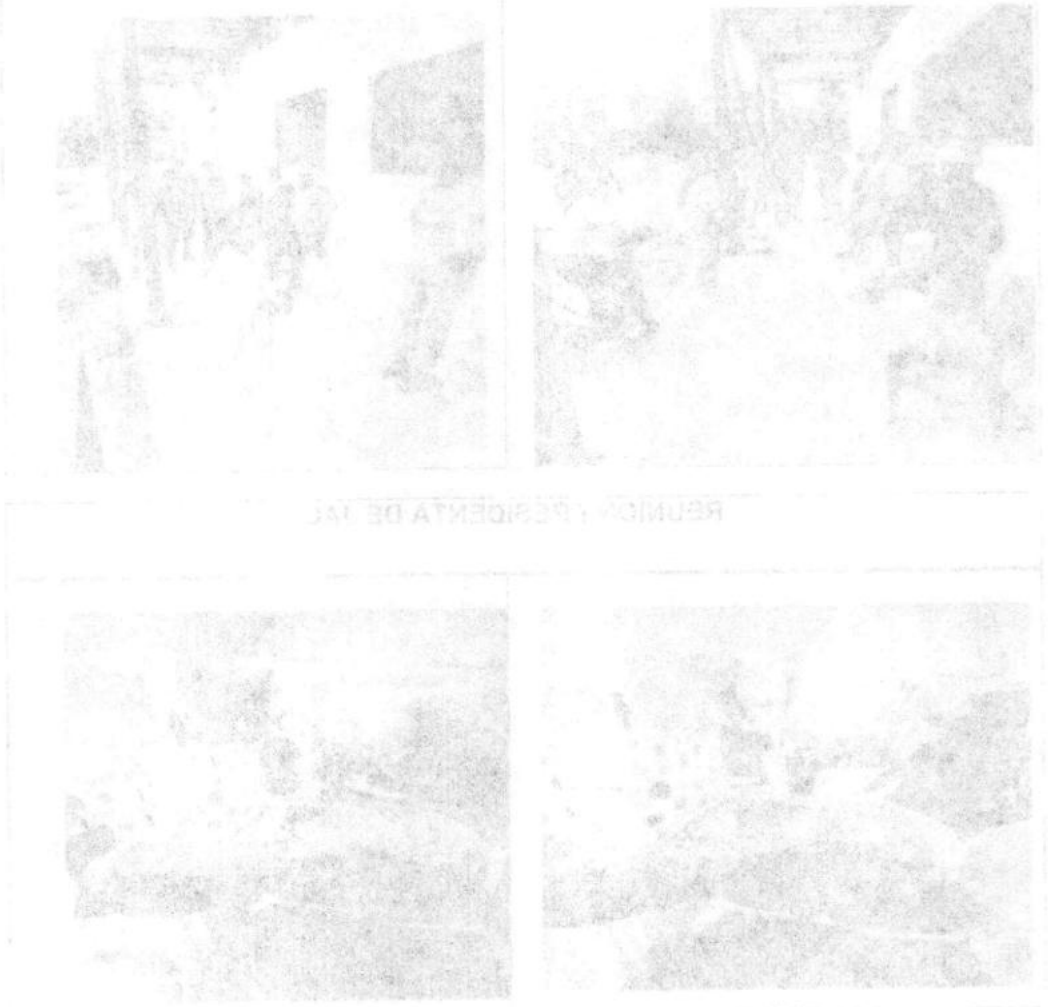

	FORMATO DE ACTA DE REUNION	

ACTA DE REUNION

FECHA: 18 JULIO 2024	HORA: 8:30 AM
ACTIVIDAD: charla prevencion del consumo de sustancias y inflacion barzon	
LUGAR: CEMED	

NOMBRE	CARGO	FIRMA
JUSTINO LAMBIS	OFICIAL	
Julio A. Navarro N	Aux. Metalmecanica	Julio A. Navarro N.
Jose Vargas	Ayudante	Jose
Jose Gutierrez	oficial	
Darneth Linton Bowden	oficial	
Gaston MAZA	oficil	
Cesar Burgos. C	Ayujante	
DAINO ARIZA S.	OFICIAL	
Edwin Valero	contratista	
Carlos MARTINEZ	Soldador	Carlos MARTINEZ
Wilberth Manuel	Contratista	
[illegible]	SST	
Stacy Cortes Gutierrez	Residente	Stacy Cortes Gutierrez.
Maria Camila Gonzalez	Social - Intervencion	

	FORMATO DE ACTA DE REUNION	

ACTA DE REUNION

FECHA: 25-Junio-2026	HORA: 9:00 am
ACTIVIDAD: Construcción de actividad comunitaria.	
LUGAR: Room Hooker	

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Catherine Corpus	Profesional social	Catherine Co
Delis Luz Hernandez Reyne	Delegada J.A.C	
Mario Camilo Gonzalez	Intervontoria	

CONSORCIO IE SANTOS
Calle 16A #121A-214 Of. 304 edificio Palo Alto Cali, Colombia
Tel. (2) 3735555
Tel. (2) 3735555
Email- consorcioiesantos@gmail.com

BITÁCORA

16 DE JUNIO DEL 2026 AL 15 DE JULIO DEL 2026

de cimentación para muro de cerramiento en malla elaborada frente aulas 2, 3 y 4 del 1er piso.
- Continúa corte, figuración y armado de acero de refuerzo para viga de cimentación frente aula 7.
- Continúa desencofrado de formaleta de vigas de cimentación vaciadas el día de ayer.
- Continúa aplicación de sandblasting sobre estructura metálica de cubierta de aula N=2 - 2do piso.
- Continúa granallada de estructura metálica interior con pulidora de aulas del 2do piso-blq-A.
* Personal de obra → Director de obra, Residente, sisa, 3 sobreros F.M, 2 oficiales, 4 ayudantes, almacenista.
* Personal Interventoría → Residente Interventoría.

Stany Gitis Estevez
RESIDENTE

Carlos A. Montaño
INTERVENTORÍA

DOMINGO 14 DE JUNIO/2026
- El día de hoy no se realizó ninguna actividad.

LUNES 15 DE JUNIO/2026 (FESTIVO)
- El día de hoy no se realizó ninguna actividad.

MARTES 16 DE JUNIO/2026
- Continúa pega de bloque de 15 para muro de cerramiento en malla elaborada frente a rampa.
- Continúa vaciado de concreto preparado en obra (Grumpa) para franja de viga de cimentación.
- Se realiza colocación de solado en concreto pobre para franja de viga de cimentación de cerramiento sobre lindero oriental - junto taller.
- Continúa granallada con pulidora de estructura metálica interior de aulas del 2do piso-blq-A.
- Continúa aplicación de pintura epóxica de protección sobre estructura metálica de aulas - 2do piso.
* Personal de obra → Director de obra, Residente, sisa, 3 sobreros F.M, 4 oficiales, 4 ayudantes, almacenista.
* Personal Interventoría → Residente Interventoría
* CLIMA: Mañana → Sol y algunas nubes Tarde → Lluvias

MIERCOLES 17 DE JUNIO/2026

- Continúa pega de bloque de 15 para muro d. cerramiento en malla elaborada paralelo a rampa.
- Se realiza preparación de concreto pobre y colocación d. solado de 7cm para muro de viga de cimentación para muro de cerramiento de lindero oriental.
- Continúa riego de subbase granular con retiro d. llantas (personal) en zona de parqueadero frente m.
- Continúa corte, figuración y amarre de acero de refuerzo para vigas de cimentación de cerramiento.
- Continúa aplicación de sandblasting sobre estructura metálica de cubierta de aula 2-2do piso.
- Continúa granateada con pulidora de estructura metálica interior de aula N° 7 - 2do piso - bloque A
- Se realiza cargue en volqueta y retiro de material orgánico (bajo) para conformación de terraza junto a vía auxiliar y donde quedará el cuarto de bom.
- Se realiza instalación de formaleta de madera para construcción de tramo de viga de cimentación muro
* Personal de obra: Director de obra, Residente, SISO, 3 oficios EM, 4 oficiales, 4 ayudantes, almacenista.
* Personal Interventoría: Director Interventoría, Residente
* CIMA: Mañana: Secomgel Tarde: Secomgel

Stray Cortes Gutierrez
CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

JUEVES 18 DE JUNIO/2026

- Se realiza preparación de concreto en obra (rompa) y vaciado de tramo de viga de cimentación para muro de cerramiento junto a inicio de rampa.
- Se realiza colocación de solado de limpieza para tramo de viga de cimentación de cerramiento oriental.
- El día de hoy se realizó charla con el personal de labores por parte de la profesional social del Contratista, acerca del no uso ni consumo de sustancias psicoactivas en jornada laboral.
- Continúa corte y figuración de acero de refuerzo para armado de vigas de cimentación - cerramiento

- Continúa el vaciado de subbase granular con retro de llantas (graderia) en zona de parqueadero, frente a rampa.
- Continúa pega de bloque de 15 para construcción de muro de cerramiento paralelo a rampa de acceso.
- Continúa la aplicación de sandblasting sobre estructura metálica de cubierta, aula N° 2 - 2do piso
- Continúa instalación de parrilla de refuerzo de viga de cimentación sobre lindero oriental del colegio.
- Empieza a realizarse relleno en material de excavación para zapata de viga de cimentación - lindero occidental.

* Personal de obra → Director de obra, Residente, SISO, 3 obreros E.M, 4 oficiales, 4 ayudantes, almacenista.
* Personal Interventoría → Residente Interventoría.
* CIMA: Mañana → Sereno sol Tarde → Sereno

Stacy Cortes Gutierrez
CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

VIERNES 19 DE JUNIO/2026

- El día de hoy se recibe la visita de los vecinos y la comunidad, los cuales realizaron recorrido interno de la obra, para supervisar el avance.
- Continúa relleno en material de excavación y compactación para construcción de viga de cimentación sobre lindero occidental del lote del megacolegio.
- Continúa pega de bloque de 15 para muro de cerramiento paralelo a rampa de acceso.
- Se realiza preparación en obra (Trompo) de concreto y fundida de tramo de viga de cimentación
- Continúa corte y figuración de acero de refuerzo y amarre para vigas de cimentación de muro.

* Personal de obra → Director de obra, Residente, SISO 3 obreros E.M, 4 oficiales, 4 ayudantes, almacenista.
* Personal Interventoría → Residente Interventoría
* CIMA: Mañana → Nublado sin lluvia Tarde → Sereno

Stacy Cortes Gutierrez
CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

SÁBADO 20 DE JUNIO/2026

- Continúa colocación y compactación de relleno en material de excavación para construcción de tramo

de viga de cimentación sobre lindero occidental
- Continúa pegado de bloque de 15 para muro de cerramiento en malla, paralelo a rampa de acceso.
- Se realiza desencofrado de tramo de viga de cimentación ubicado el día de ayer y se vuelve a instalar formaleta para otro tramo de viga.
- Se realiza colocación de solado de limpieza en concreto pobre para construcción de viga de cimentación sobre lindero occidental.
- Se realiza preparación de concreto en obra (trompo) y se funde tramo de viga de cimentación sobre lindero oriental, junto a taller.

* Personal obra ⇒ Director de obra, Residente, 4 oficiales, 4 ayudantes, almacenista, vigilante
* Personal Interventoría ⇒ Residente Interventoría
* CLIMA: Mañana ⇒ Seco con sol Tarde ⇒ Seco con sol

Jhoy Cote Gutiérrez CONTRATISTA — INTERVENTORÍA

DOMINGO 21 DE JUNIO 2026

- El día de hoy no se realizó ninguna actividad

LUNES 22 DE JUNIO 2026

* INTERVENTORÍA ⇒ Se pudo evidenciar que desde el día viernes 19 de junio se suspendieron los trabajos de mantenimiento en la estructura metálica, al parecer por inconvenientes económicos. Se le recuerda al Contratista que esta situación solo causa más atraso del que presenta en la actualidad y puede generar sanciones contractuales por incumplimiento del contrato.
- Empieza aplicación de pintura anticorrosiva a tubería galvanizada de 2" para cerramiento en malla.
- Continúa corte y figuración de acero de refuerzo y armado de viga de cimiento para cerramiento
- Continúa excavación manual para viga de cimentación lindero occidental junto a bloque A.
- Se realiza colocación de solado de nivelación en

concreto pobre para viga de cimentación de cerramiento sobre lindero occidental - punto abloque A.
- Continúa instalación de parrilles de viga de cimentación de cerramiento sobre lindero occidental.
- Continúa instalación de tubería galvanizada ϕ 2" dentro de pedestales de cerramiento - Frente a rampa.
* Personal de obra ⇒ Director de obra, Residente, siso, 4 oficiales, 4 ayudantes, almacenista, vigilante.
* Personal Interventoría ⇒ Residente de Interventoría.
* CLIMA: Mañana ⇒ Nublado sin lluvia Tarde ⇒ Lluvia

Stacy Gites Gutierrez
CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

MARTES 23 DE JUNIO/2026

- Continúa corte y figuración de acero de refuerzo y armado de vigas de cimentación para cerramiento.
- Continúa instalación de parrilles de vigas para cerramiento occidental desde la vía hasta bloque A.
- Empieza instalación y fijación de formaleta de madera para tramo de viga de cimentación sobre lindero occidental desde andén vía principal.
- Se realiza vaciado de concreto preparado en obra (Grompo) para tramo de viga de cimentación de lindero occidental desde la vía principal.
- Continúa instalación de tubería galvanizada ϕ 2" dentro de pedestales de cerramiento - rampa.
* Personal de obra ⇒ Director de obra, Residente, siso, 4 oficiales, 4 ayudantes, almacenista, vigilante.
* Personal Interventoría ⇒ Residente e Interventor, siso
* CLIMA: Mañana ⇒ Lluvias intermitentes Tarde ⇒ Nublado sin lluvia

Stacy Gites Guevara
CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

MIÉRCOLES 24 DE JUNIO/2026

- El día de hoy se reanudan los trabajos de mantenimiento de la estructura metálica, en la aplicación de sandblasting sobre estructura metálica de cubierta de aula Nº 2 (2do piso) y granallada en policarbo de estructura interior aula Nº 6 - 2do piso.
- Continúa instalación de formaleta de madera

sobre. TRAMOS de viga de cimentación sobre lind. occidental para cerramiento en malla eslabon.
- Se realiza vaciado de concreto preparado en obra (trompo) para TRAMO de viga de cimentación hasta lindero junto a bloque A.
- Empieza instalación y fijación de formaleta para construcción de pedestales de muro de cerramiento en malla eslabonada - FRENTE rampa
- Se continúa trabajos de nivelación de TERRAZA con retro de llantas (grapanta) donde quedará ubicada caseta de cuarto de bombas
* Personal de obra: Director de obra, Residente, sis 4 oficiales, 4 ayudantes, 2 obreros E.M, almacenis
* Personal Interventoría: Residentes, siso, social
* CLIMA: Mañana: Nublado sin lluvia Tarde: Nubl

Stacy Gites Gutierrez CONTRATISTA — Cam A. Mun A. INTERVENTORÍA

JUEVES 25 DE JUNIO / 2023

- Continúa nivelación del TERRAZA con retro de llantas (grapanta) en TERRAZA de cuarto de bombas
- Se realiza desencofrado de formaleta de pedestales de muro de vigas de cimentación vaciadas el día anterior
- Continúa excavación manual de TRAMO de viga de cimentación sobre lindero occidental - bloque A
- Continúa fijación de formaleta para pedestales de muro de cerramiento FRENTE a rampa
- Continúa corte y figuración de acero de refuerzo para vigas de caseta y cuarto de bombas.
- Continúa vaciado de TRAMO de viga de cimentación para muro de cerramiento FRENTE a baños - lleno
- Se realiza chequeo de niveles de subbase en zona de parqueaderos, por comisión de topografía.
- Continúa llegando viajes de subbase granular.
* Personal de obra: Director de obra, Residente, siso 4 oficiales, 4 ayudantes, 3 obreros E.M, almacenista
* Personal Interventoría: Residente Interventoría
* CLIMA: Mañana: Sol con cal... Tarde: Sol con cal...

Stacy Gites Gutierrez

VIERNES 26 DE JUNIO/2026

- El día de hoy se realiza comité técnico con supervisora de la secretaría de Infraestructura, representante de la interventoría y el contratista.
- Continúa llegando viajes de subbase granular.
- Continúa cargue y retiro de la obra con pasanta de material proveniente de la excavación del tanque
- Continúa corte y figuración de acero de refuerzo para vigas de fachada, portería y cuarto de bombas.
- Continúa aplicación de sandblasting sobre estructura metálica de cubierta de aula Nº 3 - 2do piso.
- Continúa aplicación de pintura epóxica de protección sobre estructura metálica de aula Nº 2.
- Se realiza vaciado de concreto preparado en obra para columnetas de anclaje de muro de cerramiento en malla eslabonada frente a rampa.

* Personal obra → Director obra, Residente, Siso, 4 oficiales, 4 ayudantes, 8 obreros E.T., almacenista.
* Personal Interventoría → Residente, social, siso.
* CLIMA: Mañana → Seco con el Tarde → Seco con

Stacy Cotes Gutierrez
CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

SÁBADO 27 DE JUNIO/2026

- Continúa vaciado de columnetas de anclaje de muro de cerramiento en malla - frente a rampa.
- Empieza pegada de bloque de 15 para construcción de muro de cerramiento en malla eslabonada sobre lindero oriental - junto a taller de equipos.
- Empieza colocación de pañete sobre tramo de muro de cerramiento en malla - frente aula Nº 1 - 1er piso.
- Continúa aplicación de sandblasting sobre estructura metálica de cubierta de aula Nº 3 - 2do piso.
- Continúa aplicación de pintura epóxica para protección de estructura metálica de aula 2 - 2do piso.
- Continúa formaleteada de vigas de cimentación para cerramiento de lindero occidental junto a bloque A.

* Personal de obra → Director obra, Residente, Siso,

4 oficiales, 4 ayudantes, 3 obreros E.M, almacenis
* Personal Interventoría) Residente Interventor.
* CLIMA: Mañana) Seco consol, Tarde) Consol
Stacy Cortes Gutierrez CONTRATISTA
Cmte A. Mena A. INTERVENTORÍA

DOMINGO 28 DE JUNIO/2026
- El día de hoy no se desarrolló ninguna activ

LUNES 29 DE JUNIO/2026 (FESTIV
- El día de hoy no se realizó ninguna activid

MARTES 30 DE JUNIO/2026
- Empieza colocación de estribos sobre columnas de muro de cerramiento de lindero oriental - Tall
- Continúa colocación de pañete sobre lado interior de muro de cerramiento - frente aula Nº2 - le
- Continúa corte y figuración de acero de refue y armada de vigas de cimentación - cuarto bomb
- Continúa aplicación de sandblasting sobre estructura de cubierta metálica de aula Nº4 - 2do
- Continúa aplicación de pintura epóxica de pro. tección sobre estructura metálica de aula Nº2.
* Personal de obra) Director obra, Residente, Sis 4 oficiales, 4 ayudantes, 3 obreros E.M, almacé
* Personal Interventoría) Residente Interventor
* CLIMA: Mañana) Seco consol Tarde) Consol
Stacy Cortes Gutierrez CONTRATISTA
Cmte A. Mena A. INTERVENTORÍA

MIÉRCOLES 01 DE JULIO/2026
- Se realiza vaciado de concreto preparado en obra para tramo de viga de cimentación de lindero occidental - junto a bloque A.
- Se realiza formaleteada de columnetas de tramo de muro de cerramiento sobre lindero oriental - junto a taller de varos.
- Continúa corte y figuración de acero de refue y armado de vigas de cimentación - cuarto bomb
- Continúa aplicación de pañete sobre muro

de cerramiento en malla frente a aula N°3 - 1er piso.
* Personal de obra ⇒ Director de obra, Residente, sisa, 4 oficiales, 4 ayudantes, 3 obreros F.M, almacenista.
* Personal Interventoría ⇒ Residente Interventoría.
* CLIMA: Mañana ⇒ Seco en sol Tarde ⇒ Seco en sol

Stacy Brito Gutierrez CONTRATISTA — Ing. A. Nuñez A. INTERVENTORIA

JUEVES 02 DE JULIO 2026

- Se realiza vaciado de concreto preparado en obra (trompa) para columnetas de amarre de muro de cerramiento sobre lindero oriental - taller.
- Continúa aplicación de pañete (1 cara) sobre muro de cerramiento en malla, frente aula No 4 - 1er piso.
- Empieza pega de bloque de 15 sobre viga de cimentación, para construcción de muro de cerramiento sobre lindero occidental - frente a baños.
- Llegan a la obra varios viajes de subbase granular.
- Se reanudan los trabajos con retro de llantas (pajarita), raspando el terreno alto frente a entrada.
- Se realiza cargue en volquetas de material de excavación con retro de llantas (pajarita) y retiro.
* Personal de obra ⇒ Director de obra, Residente, sisa, 4 oficiales, 3 ayudantes, 3 obreros F.M, almacenista
* Personal Interventoría ⇒ Residente Interventoría.
* CLIMA: Mañana ⇒ Llovizna intermitente Tarde ⇒ Nublado sin lluvia

Stacy Brito Gutierrez CONTRATISTA — Ing. A. Nuñez A. INTERVENTORIA

VIERNES 03 DE JULIO 2026

- Empieza corte y soldadura de perfiles en C para instalación de correas de cubierta - bloque A.
- Continúa aplicación de pañete sobre cara interior de muro (3 hiladas) de cerramiento frente a rampa.
- Continúa pega de bloque de 15 para construcción de muro de cerramiento (3 hiladas) sobre lindero occidental, desde la vía hasta edificio - bloque A.
- Continúa aplicación de sand blasting sobre estructura metálica de cubierta - aula No 3 - 2do piso.
- Continúa aplicación de pintura epóxica para

protección de estructura metálica aula N°6 - 2do piso
* Personal (de obra) ⇒ Director obra, Residente, SISO, 4 oficiales, 3 ayudantes, 3 obreros E.M, almacenista
* Personal Interventoría ⇒ Residente Interventoría
* CLIMA: Mañana ⇒ Nublado sin lluvia Tarde ⇒ lluvias intermitentes

Stacy Cortes Gutierrez CONTRATISTA

Cam A. Mun A. INTERVENTORÍA

SÁBADO 04 DE JULIO 2026

- Continúa aplicación de pañete sobre muro (3 hiladas) de cerramiento frente aula N° 6 y 7, junto a rampa
- Continúa pega de bloque de 15 para construcción de muro (3 hiladas) de cerramiento sobre lindero occidental, desde la vía hasta edificio bloque B
- Continúa corte y soldadura de perfiles en C para construcción de correas de cubierta del bloque A.

* Personal de obra ⇒ Residente de obra, SISO, vigilante, 4 oficiales, 3 ayudantes, 3 obreros E.M, almacenista
* CLIMA: Mañana ⇒ Todo la mañana lluvias FUERTES Tarde ⇒ lluvias toda la tarde

Stacy Cortes Gutierrez CONTRATISTA

Cam A. Mun A. INTERVENTORÍA

DOMINGO 05 DE JULIO 2026

- El día de hoy no se realizó ninguna actividad.

LUNES 06 DE JULIO 2026

- Continúa aplicación de pañete sobre muro (3 hiladas) de cerramiento frente aula N°7, junto a rampa
- Continúa corte y soldadura de perfiles en C, para construcción de correas de cubierta del bloque A
- Continúa pega de bloque de 15 para construcción de muro de cerramiento sobre lindero occidental
- Continúa grateada de estructura metálica con pulidora de aula N°7, 2do piso bloque B

* Personal de obra ⇒ Director obra, Residente, SISO, 4 oficiales, 4 ayudantes, 3 obreros E.M, almacenista
* Personal Interventoría ⇒ Director, Residente, SISO
* CLIMA ⇒ Mañana ⇒ Nublado sin lluvia Tarde ⇒ lluvias intermitentes

Stacy Cortes Gutierrez CONTRATISTA

Cam A. Mun A. INTERVENTORÍA

MARTES 07 DE JULIO/2026

- Continúa corte y soldadura de perfiles en C para elaboración de correas de cubierta del bloque A.
- El día de hoy se recibe la visita de dos veedores de la comunidad, los cuales se reunen con el director.
- Continúa aplicación de pañete sobre muro de cerramiento (cara exterior), frente aula Nº 7 - 1er piso.
- Inicia aplicación de pañete sobre muro de cerramiento (cara interna) sobre lindero oriental (Talle).
- Continúa pega de bloque de 15 para construcción de muro de cerramiento sobre lindero occidental.

* Personal de obra ⇒ Director obra, Residente, SISO, 4 oficiales, 3 ayudantes, 3 obreros E.M, almacenista
* Personal Interventoría ⇒ Residente Interventoría
* CLIMA: Mañana ⇒ Nublado sin lluvia Tarde ⇒ lluvias intermitentes

Stay Cote, Gabriel CONTRATISTA — Cam A. Muñoz A. INTERVENTORÍA

MIÉRCOLES 08 DE JULIO/2026

- Continúa picada con manillo demoledor de roca al fondo del tanque para nivelación.
- Continúa pega de bloque de 15 para construcción de muro de cerramiento sobre lindero occidental.
- Continúa aplicación de pañete sobre muro (cara exterior) de cerramiento frente aula Nº 6 - 1er piso.
- Continúa corte y soldadura de perfiles en C para construcción de correas de cubierta - bloque A.
- Continúa granceada con pulidora de estructura metálica de aula Nº 7 (interior) - 2do piso.

* Personal de obra ⇒ Director de obra, Residente, SISO, 4 oficiales, 4 ayudantes, 3 obreros E.M, almacenista.
* Personal Interventoría ⇒ Residente Interventoría, SISO
* CLIMA: Mañana ⇒ Seco con sol Tarde ⇒ Llovizna

Stay Cote, Gabriel CONTRATISTA — Cam A. Muñoz A. INTERVENTORÍA

JUEVES 09 DE JULIO/2026

- Se realiza perfilación del terreno y colocación de solado en concreto pobre para toma de viga de cimentación para cerramiento sobre vía - lado suroeste.

- Continúa corte y soldadura de perfiles en C para construcción de correas de cubierta - Bloque A
- Continúa picada de roca con martillo hidráulico al fondo de tanque de almacenamiento para nivelar
- Llega a la obra camión con bloque N°6 - mampostería
- Continúa pega de bloque para construcción de cerramiento (3 hiladas) Frente a baños - 1er piso.
- Continúa instalación y fijación de Formaleta para construcción de columnetas de amarre de muro de cerramiento sobre lindero suroccidental.
- Continúa grafitada con pulidora de estructura metálica interior de cubierta N°7, 2do piso - bloque A
- * Personal trabaja ⇒ Dimar trabaja, Residente, Sisa, 4 oficiales, 4 ayudantes, 3 sobreros E.M, almacenista
- * Personal Interventoría ⇒ Residente Interventoría
- * CLIMA: Mañana ⇒ Sucesos nublado Tarde ⇒ sin lluvia

Stany Cortés Gutiérrez
CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

VIERNES 10 DE JULIO 2026

- Continúa aplicación de pintura sobre muro de cerramiento (3 hiladas) cara exterior, sobre lindero Tall
- Empieza aplicación de pintura epóxica de protección sobre perfiles en C, para correa de cubierta - Bloque
- Continúa instalación y fijación de formaletas para columnetas de amarre de muro cerramiento - lado occi
- Se realiza instalación de acero de refuerzo para tramo de viga de cimentación sobre vía Tamboral
- Se realiza instalación de formaleta y vaciado de concreto preparado en obra para viga de cimentación sobre vía Tamboral - lado suroriental
- Continúa grafitada con pulidora de estructura metálica interior de cubierta N°6 - 2do piso - bloque A.
- Continúa llegada a la obra volqueta con sub-base granular y se acopia en zona de parqueadero
- El día de hoy se presenta la visita a la obra de dos funcionarios de prensa de Televisión, los cuales realizan recorrido con la residente y toman fotos

* Personal de obra ⇒ Director de obra, Residente de obra, sisa, 4 oficiales, 4 ayudantes, 3 obreros E.M, almacenista.
* Personal Interventoría ⇒ Director Interventoría, Residente
* CLIMA: Mañana ⇒ Nublado sin lluvias Tarde ⇒ lluvias intermitentes.

Stay Cote, Esthere CONTRATISTA — Carl A. Hurtado INTERVENTORÍA

SÁBADO 11 DE JULIO 2026

- Se realiza vaciada de concreto preparado en obra (trompo) para columnetas de amarre de paño de muro de cerramiento - lindero occidental.
- Continúa pega de bloque de 15 para muro de cerramiento (3 hiladas) sobre viga tope Hooker - lado este.
- Continúa aplicación de pintura epóxica para protección sobre perfiles en C, para correas de cubierta.
- Continúa aplicación de pañete sobre muro de cerramiento (cara exterior) frente aulas Nº 5 y Nº 4, bloque A.
- Continúa granallada con pulidora de estructura metálica interior de aula Nº 6 - 2do piso del bloque A.

* Personal de obra ⇒ Director, Residente obra, sisa, 4 oficiales, 4 ayudantes, 3 obreros E.M, almacenista.
* Personal Interventoría ⇒ Director Interventoría, Residente
* CLIMA: Mañana ⇒ lloviznas Tarde ⇒ lluvias intermitentes

Stay Cote, Esthere CONTRATISTA — Carl A. Hurtado INTERVENTORÍA

DOMINGO 12 DE JULIO 2026

- El día de hoy no se realizó ninguna actividad.

LUNES 13 DE JULIO 2026 (FESTIVO)

- El día de hoy no se realizó ninguna actividad sobre

MARTES 14 DE JULIO 2026

* INTERVENTORÍA ⇒ Se le recomienda al contratista aumentar el personal de obra y dar inicio a frentes nuevos que ya se pueden iniciar como la construcción del tanque de almacenamiento de agua, muro de cerramiento lado norte y oriental, caseta cuarto de bombas. Es importante que el contratista inicie estas actividades antes que empiecen las lluvias,

y también para reflejar un mayor avance de
y así evitar volver a presentar atrasos.
- Continúa soldadura de perfiles metálicos pa
construcción de correas de cubierta de bloque A.
- Continúa aplicación de pañete sobre muro d
cerramiento (cara interna) sobre lindero occidental
- Continúa formaleteada y fundida de concreto
para columnetas de cerramiento occidental - bloque
- Continúa granallada con pulidora de estructura
tálica de aulas (parte interior) del 2do piso bloq
* Personal obra ⇒ Director obra, Residente, si
4 oficiales, 4 ayudantes, 3 obreros E.M, vigilante.
* Personal Interventoría ⇒ Residente Interventoría, s
* CLIMA: Mañana ⇒ Nublado sin lluvia Tarde ⇒ lluvias

Stay Cortes Gutierrez
CONTRATISTA

A. M. A.
INTERVENTORÍA

MIÉRCOLES 15 DE JULIO/2026

- Continúa aplicación de pañete sobre muro (cara
interna) de cerramiento sobre lindero occidental
- Continúa soldadura de perfiles metálicos para
construcción de correas de cubierta del bloque A
- Se reanudan los trabajos de aplicación de
sandblasting sobre estructura metálica de
cubierta del aula No 4 del 2do piso bloque A.
- Continúa granallada con pulidora de estructura
metálica interior de aula No 6 - 2do piso bloque
- Continúa aplicación de pintura epóxica de
protección sobre correas metálicas de cubierta
* Personal Interventoría ⇒ Residente Interventor
* Personal obra ⇒ Director obra, Residente, si
4 oficiales, 4 ayudantes, 5 obreros E.M, vigilante,
* CLIMA: Mañana ⇒ lluvias intermitentes Tarde ⇒ N-3 lo

Stay Cortes Gutierrez
CONTRATISTA

A. M. A.
INTERVENTORÍA

JUEVES 16 DE JULIO/2026

- Continúa corte y soldadura de perfiles metá-
licos para construcción de correas para cubierta.
- Continúa aplicación de pintura epóxica de pro-
