JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
VEREDA LA PLANTA
NIT 900040473-6

CUENTA DE COBRO N 01

MUNICIPIO DE GIRALDO ANTIOQUIA

NIT: 890983786

DEBE A:

JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA LA PLANTA

NIT:900.040.473-6

LA SUMA DE:

$30.464.049

Treinta millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil cuarenta y nueve pesos

POR CONCEPTO DE

CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No. 004 DE 2026 AUNAR ESFUERZOS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA PLANTA PARA LA CONSTRUCCION DE POZO SEPTICO PARA EL MANEJO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA PLANTA DEL MPIO DE GIRALDO, EN CUMPLIMIENTO CON EL PLAN DE DESARROLLO MPAL GIRALDO SOCIAL E INCLUYENTE 2024-2027 202500000002209.

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA NUMERO **24000001945**

Cristina S.S.
Aura Cristina Sepulveda Sepulveda
C.C. 1.041.176.894 de Giraldo
Presidenta JAC Vereda La Planta
Municipio de Giraldo

JAC VEREDA LA PLANTA
MUNICIPIO DE GIRALDO

INFORME EJECUCIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

Entidad contratante: Municipio de Giraldo, Antioquia.
Convenio: Convenio Solidario para la Ejecución de Obras No. 004 de 2026.
Organización comunitaria: Junta de Acción Comunal de la vereda La Planta.
Objeto: Aunar esfuerzos con la Junta de Acción Comunal de la vereda La Planta para la construcción de un pozo séptico para el manejo de aguas residuales en la vereda La Planta del municipio de Giraldo, en cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal "Giraldo Social e Incluyente 2024-2027"

2. OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el informe de ejecución del Convenio Solidario para la Ejecución de Obras No. 004 de 2026, cuyo propósito es aunar esfuerzos entre el municipio de Giraldo y la Junta de Acción Comunal de la vereda La Planta para la construcción de un pozo séptico destinado al manejo adecuado de las aguas residuales, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones sanitarias y ambientales de la comunidad.

3. DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN

En el marco del Convenio Solidario para la Ejecución de Obras No. 004 de 2026, suscrito entre el municipio de Giraldo y la Junta de Acción Comunal de la vereda La Planta, se adelantan acciones conjuntas orientadas a la construcción de un pozo séptico para el manejo de las aguas residuales generadas en la vereda.

La ejecución del convenio busca fortalecer la participación comunitaria mediante la articulación de esfuerzos entre la Administración Municipal y la organización comunal, promoviendo el trabajo conjunto para atender las necesidades de saneamiento básico de la población beneficiaria.

La construcción de esta infraestructura sanitaria tiene como finalidad contribuir al manejo adecuado de las aguas residuales, prevenir la disposición inadecuada de vertimientos y disminuir los posibles impactos negativos sobre el suelo, las fuentes hídricas y el entorno natural de la vereda.

EVIDENCIAS EJECUCIÓN

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
VEREDA LA PLANTA
NIT 900040473-6










JAC VEREDA LA PLANTA
MUNICIPIO DE GIRALDO

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
VEREDA LA PLANTA
NIT 900040473-6

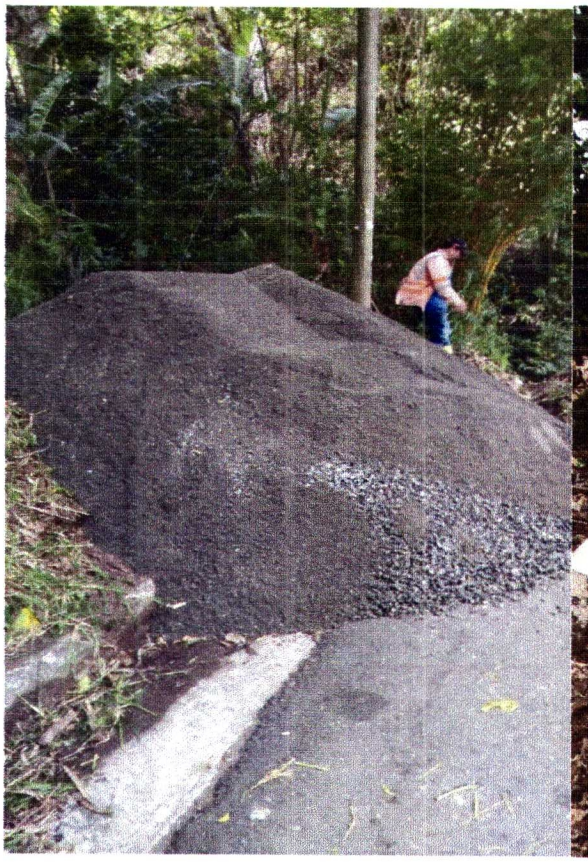







JAC VEREDA LA PLANTA
MUNICIPIO DE GIRALDO






JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
VEREDA LA PLANTA
NIT 900040473-6



Cristina S.S.
Aura Cristina Sepulveda Sepulveda
C.C. 1.041.176.894 de Giraldo
Presidenta JAC Vereda La Planta
Municipio de Giraldo

Cristina S.S

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE GIRALDO

PROYECTO: CONSTRUCCION DE POZO SEPTICO EN VEREDA LA PLANTA DEL MUNICIPIO DE GIRALDO - ANTIOQUIA

ALCALDÍA DE GIRALDO

PRESUPUESTO GENERAL

No.	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA #1 CANTIDAD	ACTA #1 VALOR
1	1.1	Excavacion manual para cimentaciones	m3	45.19	$ 37,275	$ 1,684,457	45.19	$ 1,684,457
2	1.2	Vaciado de concreto clase E para solado de limpieza, mezcla in situ	m3	1.89	$ 573,355	$ 1,083,641	1.89	$ 1,083,641
3	1.3	Suministro, corte e instalacion de acero de refuerzo Fy = 4.200 kg/cm2	Kg	1,869.25	$ 9,124	$ 17,055,037	1869.25	$ 17,055,037
4	1.4	Vaciado de concreto en 3000 PSI o 21 Mpa, no incluye acero de refuerzo.	m3	9.72	$ 939,158	$ 9,128,616	5.92	$ 5,563,572
					SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 28,951,751	TOTAL A PAGAR ACTA #1	$ 25,386,707
					% ADMINISTRACION 20.0%	$ 5,790,350		$ 5,077,341
					VALOR COSTO TOTAL	$ 34,742,101		$ 30,464,049
					SUBSIDIO AL DIGNATARIO	$ 257,899		
					VALOR TOTAL DEL PROYECTO	$ 35,000,000		$ 30,464,049

RESPONSABLE: Henry johan Cumplido Sepulveda
secretario de planeación e infraestructura
M.P. 013597-0547312 ANT

Cristina S.S.

AURA CRSITINA SEPÚLVEDA SEPULVEDA
PRESIDENTA JAC PLANTA
NIT: 9000404773-6

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE GIRALDO

PROYECTO: CONSTRUCCION DE POZO SEPTICO EN VEREDA LA PLANTA DEL MUNICIPIO DE GIRALDO - ANTIOQUIA

ALCALDÍA DE GIRALDO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO DIRECTO
1.1	Excavacion manual para cimentaciones	m3	45.19	$ 37,275

1. COSTOS DIRECTOS

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HEQ001	HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA MANO DE OBRA)	%	5%	$ 29,500	$ 1,475
				SUBTOTAL	$1,475.

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DESP.	PRECIO UNIT.	VR. UNITARIO
						$ 0
					SUBTOTAL	

III. TRANSPORTES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	VOLUMEN/PESO	DISTANCIA	TARIFA	VR. UNITARIO
						$ 0
					SUBTOTAL	

IV. MANO DE OBRA

CÓDIGO	CARGOS PERSONAL	CANTIDAD	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
	OFICIAL DE OBRA CIVIL	1.00	$ 195,000	10.00	$ 19,500
	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	1.00	$ 100,000	10.00	$ 10,000
				SUBTOTAL	$29,500.

V. SERVICIOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VR. UNITARIO
	Disposicion final del material, derecho de botadero	M3	1.40000	$ 4,500	$ 6,300
				SUBTOTAL	$6,300.

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 37,275

2. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR TOTAL
ADMINISTRACION		$0.
IMPREVISTOS		$0.
UTILIDADES		
TOTAL COSTO INDIRECTO		
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO		

RESPONSABLE: Henry Johan Cumplido Sepulveda
secretario de planeación e infraestructura
M.P. 013597-0547312 ANT

FIRMA RESPONSABLE

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE GIRALDO

PROYECTO: CONSTRUCCION DE POZO SEPTICO EN VEREDA LA PLANTA DEL MUNICIPIO DE GIRALDO - ANTIOQUIA

ALCALDÍA DE GIRALDO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO DIRECTO
1.2	**Vaciado de concreto clase E para solado de limpieza, mezcla in situ**	m3	1.89	$ 573,355

1. COSTOS DIRECTOS

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
	Mezcladora de concreto tipo trompo		$ 6,500	1.00	$ 6,500
	Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp, mangueras de 4 a 6 metros		$ 9,200	1.00	$ 9,200
	HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA MANO DE OBRA)	%	5%	$ 159,000	$ 7,950
				SUBTOTAL	**$23,650.**

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DESP.	PRECIO UNIT.	VR. UNITARIO
	Agregado grueso (grava, grava triturada y/o roca triturada)	m3	0.84		$ 100,000	$ 84,000
MA022	Agua	L	185.00		$ 150	$ 27,750
	Agregado fino para concreto (tamaño máximo 4,75mm - arena natural o trituración de roca, gravas, y/o escorias)	m3	0.63		$ 115,000	$ 72,450
	Cemento hidráulico NTC 121 tipo UG	kg	260.00	5%	$ 750	$ 204,750
					SUBTOTAL	**$388,950.**

III. TRANSPORTES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	OLUMEN/PE	DISTANCIA	TARIFA	VR. UNITARIO
	Transporte de material de excavación		1.30000	1.00000	$ 1,350	$ 1,755
					SUBTOTAL	**$1,755.**

IV. MANO DE OBRA

CÓDIGO	CARGOS PERSONAL	CANTIDAD	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
	OFICIAL OBRA CIVIL	1.00	$ 195,000	5.00	$ 39,000
	AYUDANTE RASO	6.00	$ 100,000	5.00	$ 120,000
				SUBTOTAL	**$159,000.**

V. SERVICIOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VR. UNITARIO
					$ 0
				SUBTOTAL	
TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 573,355**

2. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR TOTAL
ADMINISTRACION		$0.
IMPREVISTOS		$0.
UTILIDADES		
TOTAL COSTO INDIRECTO		
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO		

RESPONSABLE: Henry Johan Cumplido Sepulveda
secretario de planeación e infraestructura
M.P. 013597-0547312 ANT

FIRMA RESPONSABLE

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE GIRALDO

PROYECTO: CONSTRUCCION DE POZO SEPTICO EN VEREDA LA PLANTA DEL MUNICIPIO DE GIRALDO - ANTIOQUIA

ALCALDÍA DE GIRALDO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO DIRECTO
1.3	**Suministro, corte e instalacion de acero de refuerzo Fy = 4.200 kg/cm2**	Kg	1,869.25	$ 9,124

1. COSTOS DIRECTOS

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
	Pulidora de mano		$ 35,000	120.00	$ 292
	HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA MANO DE OBRA)	%	5%	$ 2,458	$ 123
				SUBTOTAL	**$415.**

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DESP.	PRECIO UNIT.	VR. UNITARIO
	Acero de refuerzo PDR-60, Fy: 4200 kg/cm2	Kg	1.00	5%	$ 5,500	$ 5,775
	Alambre negro para amarre calibre 18	kg	0.05		$ 6,800	$ 340
	Disco de corte para pulidora	Un	0.03		$ 4,500	$ 135
					SUBTOTAL	**$6,250.**

III. TRANSPORTES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	OLUMEN/PE	DISTANCIA	TARIFA	VR. UNITARIO
	Transporte de acero		1.05	1.00	$ 0.90	$ 0.95
					SUBTOTAL	**$0.95.**

IV. MANO DE OBRA

CÓDIGO	CARGOS PERSONAL	CANTIDAD	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
	OFICIAL OBRA CIVIL	1.00	$ 195,000	120.00	$ 1,625
	AYUDANTE RASO	1.00	$ 100,000	120.00	$ 833
				SUBTOTAL	**$2,458.**

V. SERVICIOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VR. UNITARIO
					$ 0
				SUBTOTAL	

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 9,124**

2. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR TOTAL
ADMINISTRACION		$0.
IMPREVISTOS		$0.
UTILIDADES		
TOTAL COSTO INDIRECTO		
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO		

RESPONSABLE: Henry johan Cumplido Sepulveda
secretario de planeación e infraestructura
M.P. 013597-0547312 ANT

FIRMA RESPONSABLE

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE GIRALDO

PROYECTO: CONSTRUCCION DE POZO SEPTICO EN VEREDA LA PLANTA DEL MUNICIPIO DE GIRALDO - ANTIOQUIA

ALCALDÍA DE GIRALDO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO DIRECTO
1.4	**Vaciado de concreto en 3000 PSI o 21 Mpa, no incluye acero de refuerzo.**	m3	9.72	$ 939,158

1. COSTOS DIRECTOS

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
	Mezcladora de concreto tipo trompo		$ 6,500	2.00	$ 3,250
	Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp, mangueras de 4 a 6 metros		$ 9,200	2.00	$ 4,600
	Aspersor manual de 20 litros		$ 4,200	2.00	$ 2,100
	HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA MANO DE OBRA)	%	5%	$ 227,143	$ 11,357
				SUBTOTAL	**$21,307.**

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DESP.	PRECIO UNIT.	VR. UNITARIO
	Concreto resistencia 21 Mpa	m3	1.00	5%	$ 650,000	$ 682,500
	Emulsion acuosa de parafina para curado de concreto, que evite la pérdida prematura de humedad de concretos y morteros	Kg	0.10		$ 8,500	$ 850
	Formaleta para concreto	m2	4.50		$ 1,250	$ 5,625
					SUBTOTAL	**$688,975.**

III. TRANSPORTES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	OLUMEN/PE	DISTANCIA	TARIFA	VR. UNITARIO
	Transporte de agregados		1.05000	1.00000	$ 1,650	$ 1,733
					SUBTOTAL	**$1,733.**

IV. MANO DE OBRA

CÓDIGO	CARGOS PERSONAL	CANTIDAD	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
	OFICIAL OBRA CIVIL	1.00	$ 195,000	3.50	$ 55,714
	AYUDANTE RASO	6.00	$ 100,000	3.50	$ 171,429
				SUBTOTAL	**$227,143.**

V. SERVICIOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VR. UNITARIO
					$ 0
				SUBTOTAL	
TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 939,158**

2. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR TOTAL
ADMINISTRACION		$0.
IMPREVISTOS		$0.
UTILIDADES		
TOTAL COSTO INDIRECTO		
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO		

RESPONSABLE: Henry johan Cumplido Sepulveda
secretario de planeación e infraestructura
M.P. 013597-0547312 ANT

FIRMA RESPONSABLE

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE GIRALDO

PROYECTO: CONSTRUCCION DE POZO SEPTICO EN VEREDA LA PLANTA DEL MUNICIPIO DE GIRALDO - ANTIOQUIA

MEMORIAS DE OBRA

ALCALDÍA DE GIRALDO

No.	DESCRIPCIÓN	ÍTEM DE PAGO	UNIDAD	CANTIDAD
1	Excavacion manual para cimentaciones	1.1	m3	45.19

DETALLE		CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	PROFUNDIDAD	TOTAL
Excavacion para caja de inspeccion		1.00	1.20	1.20	1.00	1.44
Excavaciones para pozo septico		1.00	7.00	2.50	2.50	43.75
						0.00
						0.00
					CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD No 1	45.19






RESPONSABLE: Henry johan Cumplido Sepulveda
secretario de planeación e infraestructura
M.P. 013597-0547312 ANT

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE GIRALDO

PROYECTO: CONSTRUCCION DE POZO SEPTICO EN VEREDA LA PLANTA DEL MUNICIPIO DE GIRALDO - ANTIOQUIA

MEMORIAS DE OBRA

ALCALDÍA DE GIRALDO

No.	DESCRIPCIÓN	ÍTEM DE PAGO	UNIDAD	CANTIDAD
2	Vaciado de concreto clase E para solado de limpieza, mezcla in situ	1.2	m3	1.89

DETALLE		CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	TOTAL
solado para caja de inspeccion		1.00	1.20	1.20	0.10	0.14
Solado para pozo septico		1.00	7.00	2.50	0.10	1.75
						0.00
						0.00
				CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD No 2		1.89







RESPONSABLE: Henry Johan Cumplido Sepulveda
Secretario de planeación e infraestructura
M.P. 013597-0547312 ANT

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE GIRALDO


PROYECTO: CONSTRUCCION DE POZO SEPTICO EN VEREDA LA PLANTA DEL MUNICIPIO DE GIRALDO - ANTIOQUIA

MEMORIAS DE OBRA

ALCALDÍA DE GIRALDO

No.	DESCRIPCIÓN	ÍTEM DE PAGO	UNIDAD	CANTIDAD
3	Suministro, corte e instalacion de acero de refuerzo Fy = 4.200 kg/cm2	1.3	Kg	1,869.25

DETALLE	NUM	DIAMETRO Ø	CANTIDAD	LONGITUD	Kg/M	TOTAL
Refuerzo doble parrilla placa inferior caja de inspeccion	2.00	5/8	16.00	1.40	1.552	69.53
Refuerzo vertical paredes caja de inspeccion	4.00	5/8	8.00	1.40	1.552	69.53
Refuerzo horizontal paredes caja de inspeccion	1.00	3/8	8.00	4.40	0.56	19.71
Refuerzo tapa superior caja de inspeccion	1.00	1/2	16.00	1.40	0.994	22.27
Refuerzo longitudinal doble parrilla placa inferior pozo septico	2.00	5/8	15.00	7.40	1.552	344.54
Refuerzo transversal doble parrilla placa inferior pozo septico	2.00	5/8	44.00	2.50	1.552	341.44
Refuerzo vertical paredes laterales pozo septico	2.00	5/8	44.00	2.50	1.552	341.44
Refuerzo horizontal paredes laterales pozo septico	2.00	3/8	15.00	7.40	0.56	124.32
Refuerzo vertical paredes transversales pozo septico	4.00	5/8	15.00	2.50	1.552	232.80
Refuerzo horizontal paredes transversales pozo septico	4.00	3/8	15.00	2.50	0.56	84.00
Refuerzo longitudinal tapa pozo septico	1.00	1/2	15.00	7.40	0.994	110.33
Refuerzo transversal tapa pozo septico	1.00	1/2	44.00	2.50	0.994	109.34
					CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD No 3	1,869.25







RESPONSABLE: Henry johan Cumplido Sepulveda
secretario de planeación e infraestructura
M.P. 013597-0547312 ANT

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE GIRALDO


PROYECTO: CONSTRUCCION DE POZO SEPTICO EN VEREDA LA PLANTA DEL MUNICIPIO DE GIRALDO - ANTIOQUIA



MEMORIAS DE OBRA

ALCALDÍA DE GIRALDO

No.	DESCRIPCIÓN	ÍTEM DE PAGO	UNIDAD	CANTIDAD
4	Vaciado de concreto en 3000 PSI o 21 Mpa, no incluye acero de refuerzo.	1.4	m3	9.72

DETALLE		CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	TOTAL
Placa inferior caja de inspeccion		1.00	1.20	1.20	0.20	0.29
paredes laterales caja de inspeccion		4.00	1.10	1.10	0.10	0.48
Placa tapa superior caja de inspeccion		1.00	1.20	1.20	0.10	0.14
Placa inferior pozo septico		1.00	6.80	2.20	0.20	2.99
Paredes laterales pozo septico		2.00	6.80	2.00	0.10	2.72
Paredes transversales pozo septico		4.00	2.00	2.00	0.10	1.60
Tapa superior pozo septico		1.00	6.80	2.20	0.10	1.50
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
				CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD No 4		9.72

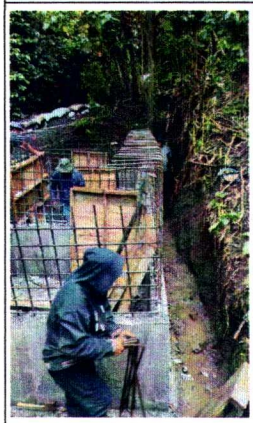

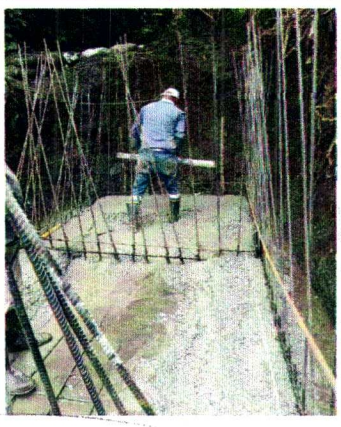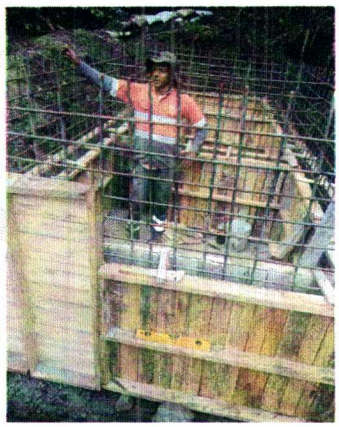RESPONSABLE: Henry johan Cumplido Sepulveda
secretario de planeación e infraestructura
M.P. 013597-0547312 ANT

Certificación Bancaria

Bancolombia

Santa Fe de Antioquia, 2 de Octubre de 2026.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PLANTA identificado(a) con NIT No. 900040473 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA AHORROS PERSONA JURIDICA	24000001945	2021/09/08	A ACTIVA

BANCOLOMBIA
Santafe De Antioquia - Of. 240 Santafe De Antioquia

Auxiliar de Operaciones N° 131
Cédula N°

VIGILADO

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: En Bogotá (601) 343 0000, Medellín (604) 510 9000, Cali (602) 554 0505, Barranquilla (605) 361 8888, Bucaramanga (607) 697 2525, Cartagena (605) 693 4400, Resto del país 018000912345.
Sede principal Carrera 48 # 26-85 Torre Norte. Medellín – Colombia

CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE PARAFISCALES, APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL
Agosto 27 de 2026

Giraldo,

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICA QUE:

La **JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PLANTA DEL MUNICIPIO DE GIRALDO**, Identificado con Nº de NIT 900040473– 6 del Municipio de Giraldo Antioquia, **NO** Realiza Aportes por los Siguientes Conceptos, por consiguiente se encuentra al día.

* Aportes Seguridad social en Salud
* Aportes a Fondos de Pensiones
* Aportes a Administración de Riesgos Profesionales
* Aportes Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF, SENA, Esap e Institutos Técnicos).

Atentamente,

Natalia Manco Q.
NATALIA MANCO QUIROZ
Contador Público
TP 162205-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5071D4C97EB671E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NATALIA MANCO QUIROZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1017164984 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 162205-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****


Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Junio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

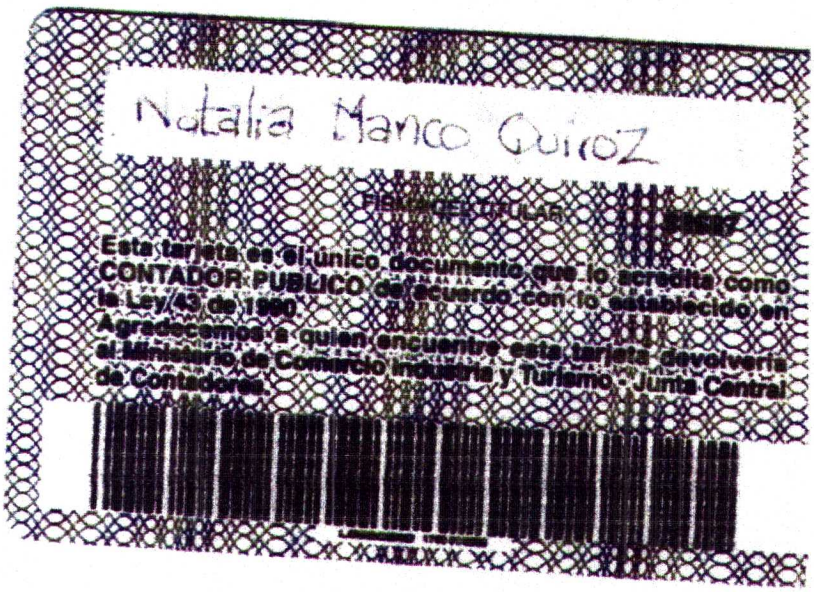
Natalia Manco Quiroz
FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1980
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.
