EMPEN ESP EMPRESAS PÚBLICAS DE PENSILVANIA ESP	**INFORME DE ACTIVIDADES** **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

CONTRATO Nº	FECHA CONTRATO	VALOR CONTRATO	PERIODO DE INFORME
031-2026	29-01-2026	$38.299.994	1 de Abril al 30 de abril

NOMBRE DEL CONTRATISTA	IDENTIFICACIÓN
BERNARDO ABAD OSPINA ARISTIZABAL	9.858.754

OBJETO DEL CONTRATO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO ELECTRICISTA EN LOS PROCESOS OPERATIVOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 076-2026 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PENSILVANIA Y LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE PENSILVANIA.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

N°	ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEGÚN CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1	Realizar la instalación, revisión y mantenimiento del alumbrado público de Pensilvania.	1. Se retira una luminaria en buen estado que no era necesaria en el sector Buriticá y se reubica en la carrera 4A con calle 7, debido a fallas en la luminaria existente en este punto. 2. Se realiza cambio de fotocelda a luminaria en el sector colegio del corregimiento de Bolivia. 3. Se efectúa cambio de luminaria por humedad en la vereda La Soledad del corregimiento de Bolivia. 4. Se realiza cambio de fotocelda a luminaria en la vereda La Soledad del corregimiento de Bolivia. 5. Se efectúa cambio de fotocelda a luminaria en el sector colegio del corregimiento de Bolivia. 6. Se realiza revisión y reparación del circuito de alumbrado público en el sector Ecobetania, incluyendo el cambio de 2 conectores tipo piercing. 7. Se efectúa cambio de fotocelda a luminaria en el sector Ecobetania. 8. Se realiza cambio de luminaria por humedad en el sector Ecobetania. 9. Se instala luminaria en la calle 2 con carrera 6 (expansión). 10. Se realiza cambio de fotocelda a luminaria en la calle principal del corregimiento de Pueblo Nuevo. 11. Se instala luminaria en el sector puente, salida hacia Pensilvania, en el corregimiento de Pueblo Nuevo (expansión).


			12. Se reubica un poste que había sido retirado del parque principal del corregimiento de Pueblo Nuevo y se le instala luminaria nueva en el sector Los Corrales. 13. Se realiza cambio de luminaria y de 2 conectores tipo piercing en el sector Los Corrales del corregimiento de Pueblo Nuevo. 14. Se instalan 2 luminarias (expansión) en el sector cementerio del corregimiento de Pueblo Nuevo. 15. Se instala un reflector de 400 W y se repara la conexión de otro reflector en la cancha de fútbol del corregimiento de Pueblo Nuevo. 16. Se realiza cambio de luminaria por humedad, reemplazándola por una luminaria previamente reparada, en el sector vía Politécnico del municipio. 17. Se instalan 3 reflectores de 30 W en la fuente del parque principal del municipio. 18. Se retiran 3 reflectores de los árboles del parque principal del municipio por labores de poda y posteriormente se reinstalan.
	2	Utilizar su experiencia e idoneidad en la ejecución de las actividades del contrato	La experiencia de más de 10 años, permite al coordinador de Alumbrado Público, garantizar el cumplimiento de las actividades de manera idónea y segura.
	3	Cumplir con las normas técnicas de seguridad y señalización requeridas en el desarrollo de sus actividades.	Se da cumplimiento a todas las normas técnicas de seguridad y señalización durante la ejecución de las actividades de mantenimiento. Asimismo, se garantiza el uso adecuado de los equipos de seguridad y los elementos de protección personal por parte del personal encargado.
	4	Utilizar las herramientas de dotación adecuadas para el desarrollo de sus actividades.	El equipo de trabajo cuenta con todo el equipamiento necesario para realizar de manera segura las actividades de mantenimiento, mejoramiento y optimización del alumbrado público.
	5	Cumplir con las normas técnicas establecidas por el ordenamiento jurídico colombiano, especialmente las contempladas.	Todas las actividades que se vienen desarrollando se ejecutan en cumplimiento de la normativa establecida en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE).
	6	Presentar los informes técnicos que le sean solicitados por el supervisor del Contrato	Solicitud por la comunidad del corregimiento de pueblo Nuevo, para una nueva luminaria frente a la casa cural, ya que este lugar se encuentra muy oscuro.


	7	Elaborar los presupuestos para la construcción de obras necesarias de realizar durante la ejecución del contrato	No se han presentado.
	8	Acompañar técnicamente en el diagnóstico del alumbrado sobre las necesidades y plan de inversiones.	La comunidad del corregimiento de pueblo Nuevo, solicita intervención del parque principal en su iluminación, ya que esta presenta un gran deterioro.
	9	Las demás responsabilidades que le asigne el Supervisor o el Gerente	1. Se realiza la ubicación y fijación de cajas de salidas eléctricas que se encontraban sueltas en el call center. 2. Se efectúa visita al colegio John F. Kennedy del corregimiento de Bolivia, con el fin de realizar diagnóstico por alto consumo de energía. 3. Se realiza instalación eléctrica en la sala de sistemas de la escuela del corregimiento de Pueblo Nuevo. 4. Se lleva a cabo instalación y corrección eléctrica en una de las aulas del corregimiento de Pueblo Nuevo. 5. Se realiza cambio de panel LED de 36 W en la Secretaría de Salud de la alcaldía municipal. 6. Se efectúa la reubicación de un panel de 60x60 cm que presentó fallas; queda pendiente su reposición. Actualmente se encuentra instalado de manera provisional en zonas comunes de la oficina de Juntas de Acción Comunal del municipio. 7. Se realiza cambio de panel LED de 12 W en la zona de baños del call center. 8. Se lleva a cabo revisión periódica y prueba de encendido de la planta de emergencia del call center.


DIFICULTADES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO
No se han presentado dificultades en la ejecución del contrato


ANEXOS
Constancias de afiliación al sistema de seguridad social.
Anexa planilla de pago de seguridad social.
Anexo fotográfico


FIRMA CONTRATISTA	NOMBRE SUPERVISOR	V° B° SUPERVISOR
Bernardo Ospina		

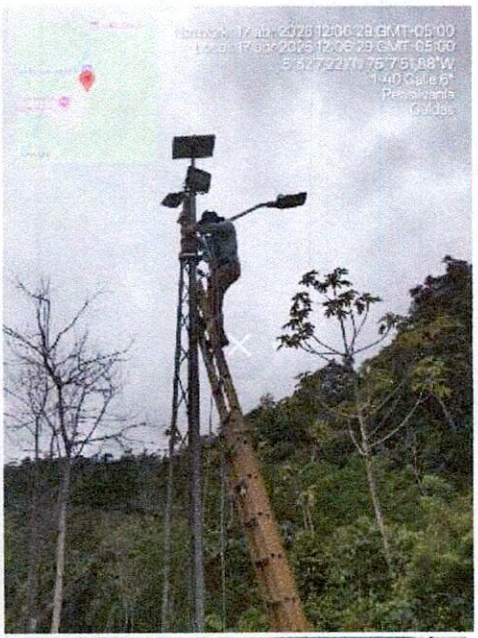


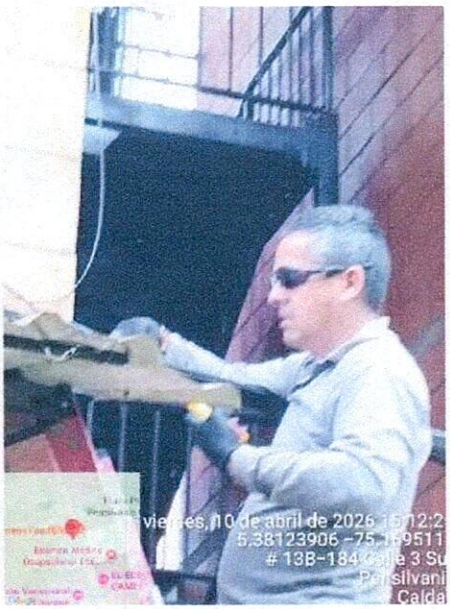
viernes, 10 de abril de 2026
5.38123906 -75.
13B-184 Calle 3 Su
Pensilvani
Caldas

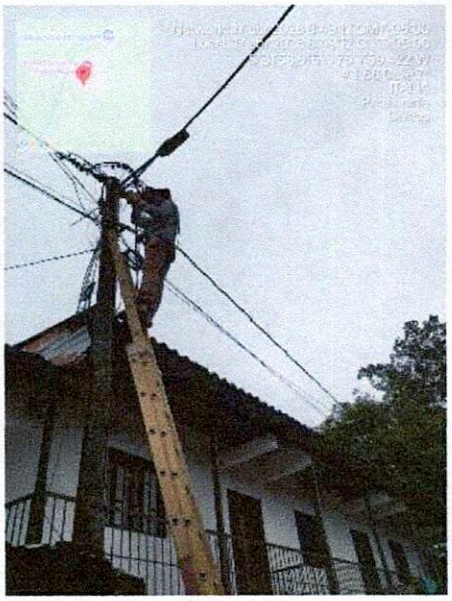

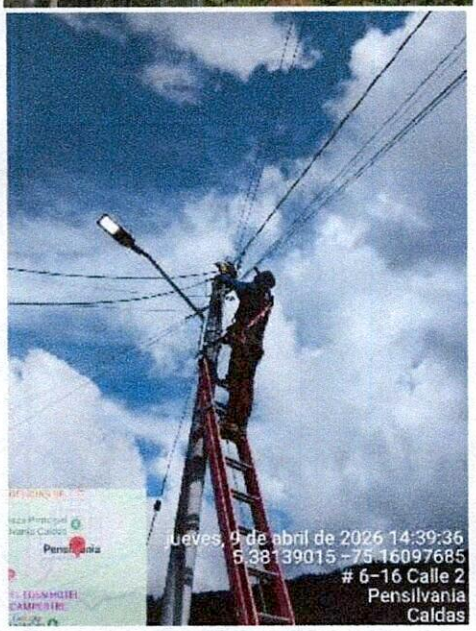
Jueves, 9 de abril de 2026 14:39:36
5.38139015 -75.16097685
6-16 Calle 2
Pensilvania
Caldas

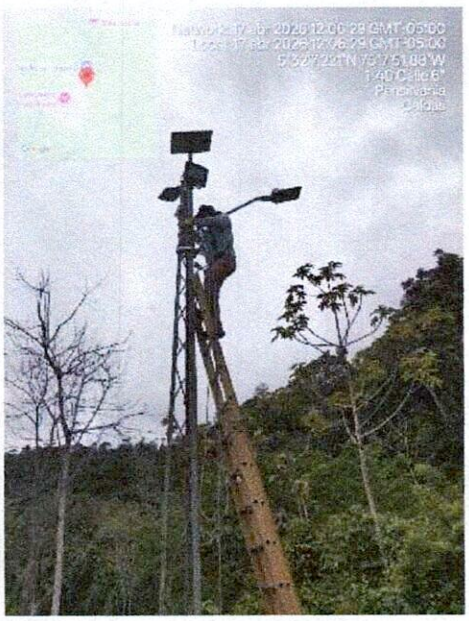

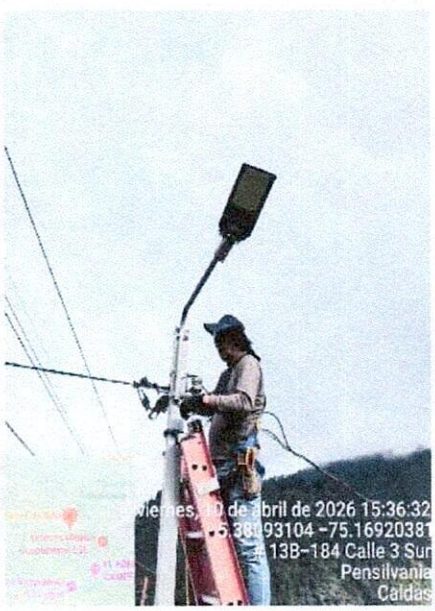
Viernes, 10 de abril de 2026 15:36:32
5.38193104 -75.16920381
13B-184 Calle 3 Sur
Pensilvania
Caldas
