EMPEN ESP EMPRESAS PÚBLICAS DE PENSILVANIA ESP	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATO Nº	FECHA CONTRATO	VALOR CONTRATO	PERIODO DE INFORME
031-2026	29-01-2026	$38.299.994	1 de mayo al 31 de mayo

NOMBRE DEL CONTRATISTA	IDENTIFICACIÓN
BERNARDO ABAD OSPINA ARISTIZABAL	9.858.754

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO ELECTRICISTA EN LOS PROCESOS OPERATIVOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 076-2026 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PENSILVANIA Y LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE PENSILVANIA.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES


N°	ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEGÚN CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1	Realizar la instalación, revisión y mantenimiento del alumbrado público de Pensilvania.	1. Se realiza diagnóstico a luminaria en punto de apoyo impactado por vehículo, en el sector Robledales. El contratista encargado de reemplazar el apoyo realizó el traslado de la luminaria. 2. Cambio de fotocelda a luminaria que permanecía encendida 24/7 en el sector San Bernardo. 3. Luminaria que se encontraba girada es ubicada de manera correcta y se le realiza mantenimiento preventivo, en el sector San Bernardo. 4. Se realiza mantenimiento preventivo a cuatro (4) luminarias que habían sido retiradas por humedad, quedando funcionales para ser instaladas nuevamente donde se requiera. 5. Se realiza mantenimiento preventivo a las cajas de derivación de los postes en la Avenida La Salle. 6. Cambio de fotocelda a luminaria que permanecía encendida en el sector San Bernardo. 7. Reparación de la conexión de dos faroles en el sector Coliseo de Ferias. 8. Cambio de fotocelda a luminaria en el sector Las Areneras. 9. Cambio de fotocelda a luminaria que permanecía encendida 24/7 en el sector Chiquinquirá. 10. Se traslada luminaria de panel solar del sendero vía al polideportivo y se instala sobre la carretera


		hacia el mismo lugar, debido a que en este punto la luminaria existente presentó falla. En el lugar de donde fue reubicada queda pendiente la instalación de una nueva luminaria. 11. Cambio de fotocelda y reparación en la conexión de luminaria en el sector Partida hacia Arboleda y San Daniel. Queda pendiente el cambio del cable de alimentación, ya que se encuentra deteriorado. 12. Cambio de luminaria por humedad en la Calle Real. 13. Instalación de luminaria que había sido retirada por falla en la estructura, en la Calle Real.
2	Utilizar su experiencia e idoneidad en la ejecución de las actividades del contrato	La experiencia de más de 10 años, permite al coordinador de Alumbrado Público, garantizar el cumplimiento de las actividades de manera idónea y segura.
3	Cumplir con las normas técnicas de seguridad y señalización requeridas en el desarrollo de sus actividades.	Se da cumplimiento a todas las normas técnicas de seguridad y señalización durante la ejecución de las actividades de mantenimiento. Asimismo, se garantiza el uso adecuado de los equipos de seguridad y los elementos de protección personal por parte del personal encargado.
4	Utilizar las herramientas de dotación adecuadas para el desarrollo de sus actividades.	El equipo de trabajo cuenta con todo el equipamiento necesario para realizar de manera segura las actividades de mantenimiento, mejoramiento y optimización del alumbrado público.
5	Cumplir con las normas técnicas establecidas por el ordenamiento jurídico colombiano, especialmente las contempladas.	Todas las actividades que se vienen desarrollando se ejecutan en cumplimiento de la normativa establecida en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE).
6	Presentar los informes técnicos que le sean solicitados por el supervisor del Contrato	No se han presentado.
7	Elaborar los presupuestos para la construcción de obras necesarias de realizar durante la ejecución del contrato	No se han presentado.
8	Acompañar técnicamente en el diagnóstico del alumbrado sobre las necesidades y plan de inversiones.	No se han presentado.


	9	Las demás responsabilidades que le asigne el Supervisor o el Gerente	1. Cambio de panel LED de 24W en la oficina del despacho del alcalde Municipal. 2. Instalación de panel LED de 36W y sensor de movimiento en el lugar donde se ubican las motos inmovilizadas. 3. Instalación de panel LED de 18W y un tomacorriente en la oficina de archivo de la Alcaldía Municipal. 4. Cambio de panel LED de 48W tipo 60x60 en la oficina de la Personería Municipal. 5. Cambio de tres (3) paneles LED de 12W en los baños de hombres del Call Center. 6. Se fija pulsador de alarma de incendios en el Call Center. 7. Cambio de panel LED de 48W tipo 60x60 en el Call Center. 8. Realización de adecuaciones para la exposición equina en el Coliseo de Ferias y Exposiciones.

DIFICULTADES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO
No se han presentado dificultades en la ejecución del contrato

ANEXOS		
Constancias de afiliación al sistema de seguridad social.		
Anexa planilla de pago de seguridad social.		
Anexo fotográfico		
FIRMA CONTRATISTA	**NOMBRE SUPERVISOR**	**Vº Bº SUPERVISOR**

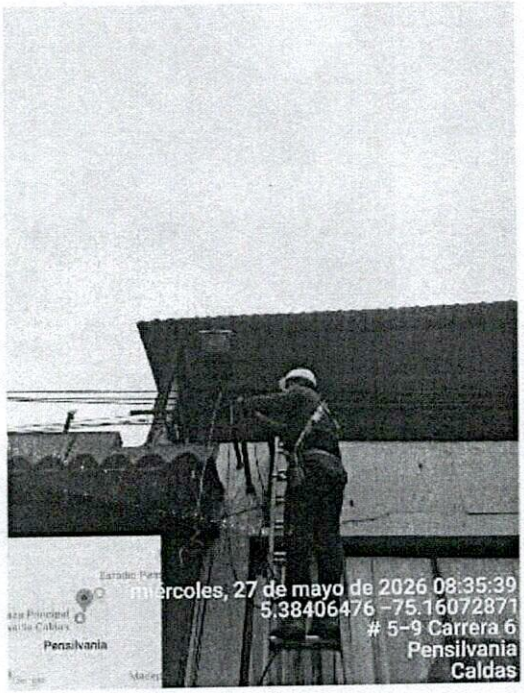


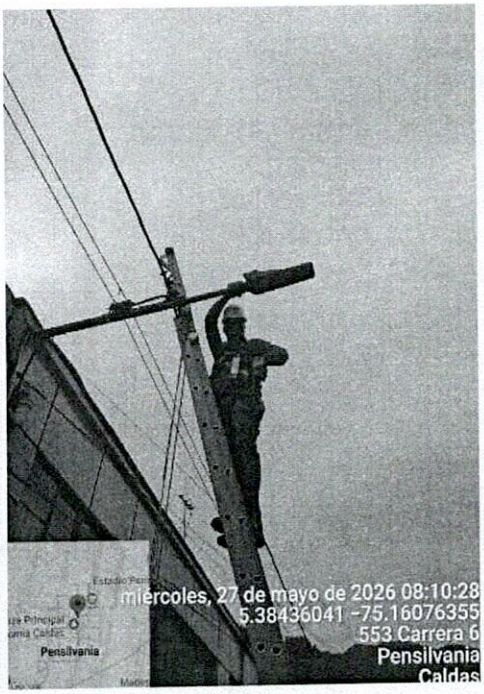

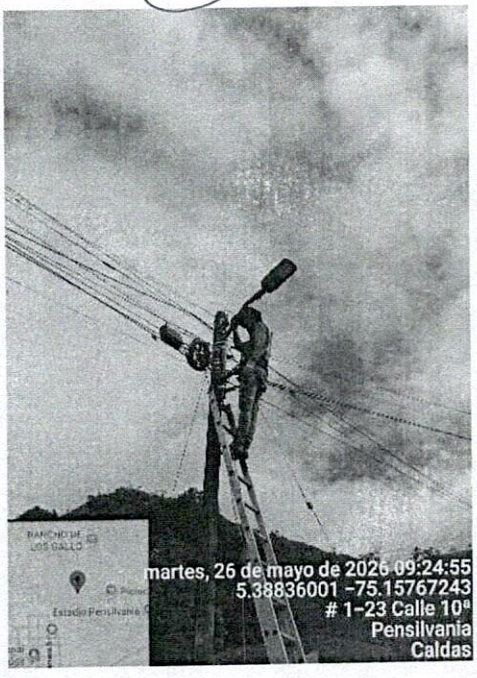


martes, 26 de mayo de 2026 07:13:25
5.38762983 -75.1572


Local: 21 may 2026 11:38:45 GMT-05:00

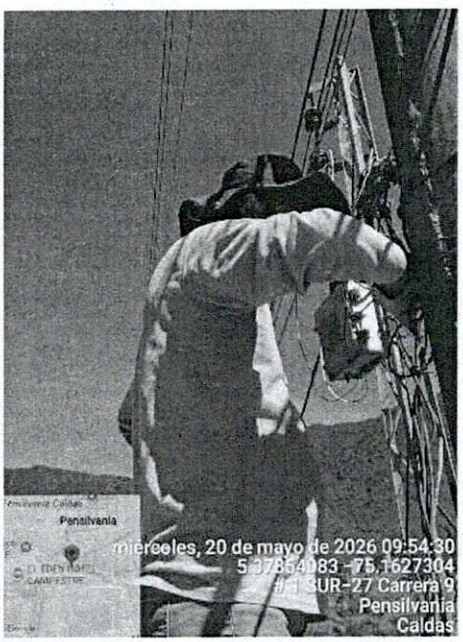
Pensilvania
miércoles, 20 de mayo de 2026 09:54:30
5.37854083 -75.1627304
#1 SUR-27 Carrera 9
Pensilvania
Caldas
