LISTA DE CHEQUEO - INFORME MENSUAL DE CONTRATO DE INTERVENTORIA
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos

Contratista	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO				
Supervisor	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA				
Número de contrato/vigencia	No. CO1.PCCNTR.8169110 - INTERVENTORIA - LOTE 6				
Informe N°	12	Periodo del informe	6/09/2026	Hasta el	5/10/2026

CONTENIDO	Contiene	No contiene	Observaciones	Folio
1. Aspectos Generales Del Proyecto	SI		CUMPLE	
2. Aspectos Generales Del Contrato De La Interventoría			CUMPLE	123 - 131
Obligaciones específicas del contrato	SI		CUMPLE	132- 142
Informes semanales	SI		CUMPLE	412 - 546
Personal Aprobado	SI		CUMPLE	150
Verificación de licencias y permisos vigentes	N.A.		N.A.	
Pólizas actualizadas con modificaciones	SI		CUMPLE	144 - 146
Cumplimiento articulo 3 del decreto 332 del 2020	SI		CUMPLE	150
Directiva distrital N° 1 de 2011	N.A.		N.A.	
Incumplimientos o apremios del contrato vigilado	N.A.		N.A.	
Verificacion de la matriz de riesgos	SI		CUMPLE	152 - 155
Descripción de actividades desarrolladas en el periodo	SI		CUMPLE	38 - 41
Actas de comité generadas en el desarrollo del contrato	SI		CUMPLE	750 - 779
Relación de correspondencia (entrada, salida e interna)	SI		CUMPLE	837 - 847
Bitácora	SI		CUMPLE	396 - 411
Reseña fotográfica del periodo por semana	SI		CUMPLE	828 - 836
Actividades no previstas del proyecto	N.A.		N.A.	
Ponderación de elementos de calidad	SI		CUMPLE	152 - 155
Dificultades presentadas durante el desarrollo del contrato del interventor	N.A.		N.A.	
Programación y control de obra	SI		CUMPLE	41 - 111
Aspectos Técnicos				
Control del plan de calidad y ensayos de material	SI		CUMPLE	152 - 155
Estado de Servicios públicos, trámites y licencias	N.A.		N.A.	
Pago Parafiscales	SI		CUMPLE	791 - 799
Verificación de la amortización del anticipo	N.A.		N.A.	
Estado financiero del contrato	SI		CUMPLE	152
Aspectos Sociales	SI		CUMPLE	160 - 167
Aspectos ambientales PIGA (Plan Institucional de Gestión Ambiental) Y PGRCD (Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición)	SI		CUMPLE	152 - 155
Seguridad y salud en el trabajo -	SI		CUMPLE	160 - 167
Tabla de control de personal reportando el movimiento del personal en cada período.	SI		CUMPLE	167
Cuadro consolidado de profesionales y trabajadores, y pago de salarios: cuadro con nombre, cédula, cargo, salario, vinculo laboral y firma del profesional y de	SI		CUMPLE	150
Escaner de Planillas de pagos al SGSS de todo el personal que laboró o labora con la Interventoría.	SI		CUMPLE	780 - 790
Cuadro consolidado de las actividades y capacitaciones desarrolladas por la Interventoría.	SI		CUMPLE	800 - 827
Verificación de buen uso de los elementos de Protección personal en obra y la gestión adelantada por la Interventoría.	SI		CUMPLE	160 - 167
CD con todos los soportes requeridos.	SI		CUMPLE	182
Certificación en la que conste que lo cotizado corresponde al valor de lo contratado y reportado en las planillas de pago de la Seguridad Social de todo el personal ofertado en la Propuesta.	N.A.		N.A.	
Certificación de la Interventoría de revalidación de la información de cantidades de Obra y actividades desarrolladas en el marco del Contrato de Obra	N.A.		N.A.	
4. Conclusiones y recomendaciones				
5. Anexos				
6. Documentos Secop II				
Acta de inicio	SI		CUMPLE	
Garantías	SI		CUMPLE	
Designación del supervisor	SI		CUMPLE	
Informes mensuales	SI		CUMPLE	
Actas parciales	SI		CUMPLE	
Modificaciones	SI		CUMPLE	
Suspensión (si aplica)	N.A.		N.A.	
Prorroga a la suspensión	N.A.		N.A.	
Acta de terminación	N.A.		N.A.	
Acta de entrega	N.A.		N.A.	
Reinicio a la suspensión	N.A.		N.A.	
Acta de liquidación	N.A.		N.A.	

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.8169110	**Aprobó**	**Revisó.**
JOHN CASTAÑEDA		
Elaboró: Residente de Interventoría	Director de Interventoría	Apoyo a la Supervisión.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CO1.PCCNTR.8169110

"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE NO. 2"

INTERVENTOR:
CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO

CONTRATISTA DE OBRA:
CONSORCIO PAIS
LOTE: 6

INFORME MENSUAL No. 12
PERIODO REPORTADO 06/09/2026- 05/10/2026

BOGOTA D.C.

ÍNDICE DE REVISIONES INFORME DE INTERVENTORÍA No. 12			
NÚMERO DE REVISIÓN	**CAPÍTULO MODIFICADO**	**FECHA DE MODIFICACIÓN**	**OBSERVACIONES**
0	Documento Original	8/10/2026	

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

Título Documento		**INFORME MENSUAL 12 DE INTERVENTORÍA**
REVISIÓN		
Responsable Elaboración Componente Técnico	Nombre	Ing. John Castañeda
	Firma	JOHN CASTAÑEDA
	Fecha	20/10/2026
Responsable de la Elaboración del Componente Ambiental	Nombre	Ing. Luis Gónzález Camargo
	Firma	
	Fecha	20/10/2026
Responsable de la Revisión del Informe	Nombre	Arq. Héctor Villazón
	Firma	
	Fecha	20/10/2026
Responsable de la Aprobación del Informe	Nombre	Arq. Santiago Ángel
	Firma	
	Fecha	21/10/2026

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 8

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 11

2.1 LOCALIZACIÓN 12

2.2 ESTADO INICIAL 14

2.3 CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 15

2.3.1 Colegio Arborizadora Baja 16
..... 16
2.3.2 Colegio Buenavista I.E.D Calasanz 17
2.3.3 Colegio Estrella del Sur Sede A. 18
2.3.4 Colegio Estrella Del Sur Sede B 19
2.3.5 Colegio Sierra Morena Sede C 20
2.3.6 Colegio Unión Europea Sede B 21
2.3.7 Colegio Fabio Lozano Simonelli Sede A 22
2.3.8 Colegio Orlando Fals Borda 23
2.3.9 Colegio Santa Librada 24
2.3.10 Colegio Guillermo Cano Izasa Sede A 25
2.3.11 Colegio Tenerife Granda Sur Sede A 26
2.3.12 Colegio Ciudad de Villavicencio, Sede B – Puerta al Llano 27

2.4 EMERGENCIAS 30

3. CONTRATO DE OBRA 31

3.1 INFORMACIÓN GENERAL 31

3.1.1 GARANTÍAS 32

3.2 DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 38

INFORME DE AVANCE 41

3.2.1 CONTROL DE PROGRAMACIÓN 42
3.2.2 AVANCE DE OBRAS EJECUTADAS Y ACUMULADAS 43
3.2.3 OBRAS PROGRAMADAS PARA EL PRESENTE PERIODO 44
3.2.4 OBRAS PROGRAMADAS POR EMERGENCIA 111

3.3 RECURSOS DEL CONTRATISTA 112

3.3.1 EQUIPO 112
3.3.2 PERSONAL 112

3.4 INFORMACIÓN FINANCIERA 113

3.4.1 PRESUPUESTO GENERAL 113
3.4.2 PRESUPUESTO POR SEDES 113
3.4.3 PRESUPUESTO POR EMERGENCIAS 114

3.4.4 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 115
3.4.5 ESTADO FINANCIERO 122
3.5 ESTADO DEL TIEMPO 123
3.6 RESULTADOS DE LABORATORIO 123
3.7 OBLIGACIONES GENERALES 123
3.8 OBLIGACIONES ESPECIFICAS 132
4. CONTRATO DE INTERVENTORÍA 143
4.1. INFORMACIÓN GENERAL 143
4.1.1. GARANTÍAS 144
4.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA 146
4.2.1 ADMINISTRATIVAS 146
4.2.2 TÉCNICAS 147
4.2.3 CONTROL PRESUPUESTAL Y FINANCIERO 148
4.2.4 LEGAL 148
4.3 RECURSOS DEL INTERVENTOR 149
4.3.1 PERSONAL APROBADO POR INTERVENTORIA 149
4.3.2 EQUIPO 150
4.4 INFORMACION FINANCIERA 151
4.4.1 PRESUPUESTO 151
4.4.2 ESTADO FINANCIERO 152
A. PAGOS EFECTUADOS 152
5. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA 152
6. GESTIÓN AMBIENTAL EN LAS ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN. 155
7. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) 160
8. OBLIGACIONES GENERALES 167
9. OBLIGACIONES ESPECIFICAS 174
10. REGISTRO FOTOGRAFICO 182
11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 182

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Sedes Educativas 14
Tabla 2. Información general contrato de obra 32
Tabla 3. Pólizas contrato de obra - Contratista 38
Tabla 4- Avance Financiero 41
Tabla 5. Porcentajes Acumulados 42
Tabla 6 - Certificado disponibilidad presupuestal 115
Tabla 7 - Listado APU´S 121
Tabla 8 - Pagos Realizados 122
Tabla 9 - Obligaciones Generales Contratista 131
Tabla 10 - Obligaciones Especificas Contratista 142
Tabla 11 - Información general contrato de Interventoría - CO1.PCCNTR.8169110 144
Tabla 12 - Pólizas Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110 146
Tabla 13 - Personal de Interventoría 150
Tabla 14 - Certificado de disponibilidad presupuestal - Contrato de interventoría 151
Tabla 15. Pagos realizados a la interventoría 152
Tabla 16 - Obligaciones Generales - Interventoría 174
Tabla 17 - Obligaciones Especificas - Interventoría 182
Tabla 18 - Registro fotográfico Colegio Guillermo Cano Isaza 199
Tabla 19 - Registro fotográfico Colegio Ciudad de Villavicencio 200
Tabla 20 - Registro fotográfico Colegio Ciudad de Villavicencio 201
Tabla 21 - Registro fotográfico Colegio Ciudad de Villavicencio 202
Tabla 22 - Registro fotográfico Colegio Eduardo Umaña Mendoza 203
Tabla 23 - Registro fotográfico Colegio Santa Librada 204

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización de las Localidades de Ciudad Bolívar y Usme 12
Ilustración 2. Localización de las Escuelas en las Localidades 13
Ilustración 3. Esquema de Distribución Colegio Arborizadora Baja 16
Ilustración 4. Esquema de Distribución Colegio Buenavista I.E.D Calasanz 17
Ilustración 5. Esquema de Distribución Colegio Estrella del Sur Sede A 18
Ilustración 6. Esquema de Distribución Colegio Estrella del Sur Sede B 19
Ilustración 7. Esquema de Distribución Colegio Sierra Morena Sede C 20
Ilustración 8. Esquema de Distribución Colegio Unión Europea Sede B 21
Ilustración 9. Esquema de Distribución Colegio Fabio Lozano Simonelli sede A 22

Ilustración 10. Esquema de Distribución Colegio Orlando Fals Borda 23
Ilustración 11. Esquema de Distribución Colegio Santa Librada 24
Ilustración 12 Esquema de Distribución Colegio Guillermo Cano Izasa 25
Ilustración 13 Esquema de Distribución Colegio Tenerife Granda Sur Sede A 26
Ilustración 14 - Esquema de Distribución Colegio Ciudad de Villavicencio, Sede b – Puerta al Llano 27
Ilustración 15 - Esquema de Distribución Colegio Rafael Uribe Uribe, Sede A 28
Ilustración 16 - Esquema de Distribución Colegio Los Comuneros Oswaldo Guayasamin, Sede b- 29
Ilustración 17 Flujo de Caja Semanal 42
Ilustración 18 Curva s – Programado vs ejecutado 43
Ilustración 19 - Actividades Orlando Fals 46
Ilustración 20- Actividades Sierra Morena 51
Ilustración 21 - Actividades Unión Europea Sede B 58
Ilustración 22 - Actividades Arborizadora Baja 68
Ilustración 23 - Actividades Fabio Lozano Simonelli 80
Ilustración 24 - Actividades Estrellas del Sur Sede B 84
Ilustración 25 - Actividades Calasanz (Buenavista) 88
Ilustración 26 - Actividades Santa Librada 92
Ilustración 27 Actividades Estrella del Sur Sede A 97
Ilustración 28 Actividades Guillermo Cano Isaza 103
Ilustración 29 Actividades Tenerife – Granda Sur 105
Ilustración 30 Actividades Ciudad de Villavicencio 108
Ilustración 31 Actividades Colegio Rafael Uribe Uribe 110
Ilustración 32 Actividades Colegio Oswaldo Guayasmin 111
Ilustración 33 - *Presupuestos actualizados emergencias* 111

TABLA DE ANEXOS

Anexo 1. Modificatorio No.3 Contrato de obra 32
Anexo 2. Actualización Pólizas Contrato de Obra 38
Anexo 3. Bitácora de obra 44
Anexo 4. Informe Semanal 44
Anexo 5. Acta Parcial de Obra 122
Anexo 6. Modificatorio No.3 de Interventoría 144
Anexo 7. Actualización de póliza de Interventoría 146
Anexo 8. Actas de comité 146
Anexo 9. Planillas de pago 150

Anexo 10. Certificado pago Parafiscales 150
Anexo 11. Acta de Interventoría 152
Anexo 12. Registro Capacitaciones 165
Anexo 13. Registro fotográfico 182
Anexo 14. Relación de Correspondencia 185

1. INTRODUCCIÓN

La **SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO**, es un organismo del Sector Central del Distrito Capital con autonomía administrativa y financiera encargada del Sector Educativo, la cual tiene por objeto orientar y liderar la formulación y ejecución de políticas, planes y programas para garantizar el derecho a la educación y asegurar a la población el acceso al conocimiento y la formación integral, esto de acuerdo con el decreto 310 de 2022.

Es por esto que la **SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO,** a través de la **DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS (DCCEE)**, es la encargada de liderar, planificar y ejecutar proyectos de construcción, adecuación, ampliación, reparación y mantenimiento de los bienes inmuebles educativos y administrativos del Distrito. En desarrollo de estas funciones y con base en los diagnósticos realizados por los gestores territoriales y especialistas de la DCCEE, se ha determinado la conveniencia de adelantar un programa de **ADECUACIONES, MEJORAMIENTOS Y MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS** que permitan garantizar la funcionalidad, seguridad y habitabilidad de las sedes, en concordancia con los lineamientos técnicos y normativos vigentes.

El presente proyecto corresponde al proceso contractual **SED-LP-OP-DCCEE-012-2025**, mediante el cual se seleccionará a los contratistas encargados de ejecutar las obras de **ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO**, así como la **ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y OBRAS MENORES PRIORITARIAS**, necesarias para asegurar la prestación continua y eficiente del servicio educativo en Bogotá D.C.

De acuerdo con lo anterior, la **SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO**, mediante la **LICITACIÓN PUBLICA No. SED-LP-OP-DCCEE-012-2025,** cuyo objeto es: **"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS**" - **LOTE NO. 6** se adjudicó al **CONSORCIO PAIS,** representado legalmente por **Juan Carlos Velásquez Forero** identificado con No. CC 80.217.561 de Bogotá, consorcio integrado por (CONSTRUCTORA PAIS identificada con NIT. 901.063.647-3 con una participación del 30%, CONSTRUCOL S.A.S identificada con

NIT.1.053.341.203 con una participación del 30%, CONSTRUCCIONES VYP S.A.S identificada con NIT. 901.368.837-6, con una participación del 10%, FAPAIS S.A.S identificada con NIT. 901.762.077-4) por un valor total de la propuesta económica de DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL VEINTITRÉS PESOS M/CTE ($2.232.049.023,00) y un valor de emergencias de CIEN MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS ($100.000.000,00), valor que no sobrepasa el presupuesto oficial y que no fue objeto de corrección aritmética, con un plazo de ejecución de siete (7) meses para la intervención de Nueve (9) instituciones educativas y que para su efectiva supervisión integral se debe de contar con una interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera. Mediante la Modificación No. 1 al contrato, se aprobó una adición presupuestal por valor de SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE ($785.001.422,00), así como una ampliación del plazo de ejecución por un término de un (1) mes y quince (15) días. Como resultado de esta modificación, el valor total del contrato ascendió a la suma de TRES MIL CIENTO DIECISIETE MILLONES CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($3.117.050.445,00). Posteriormente, las partes suscribieron la Modificación No. 2, mediante la cual se otorgó una nueva prórroga al plazo contractual por un término de tres (3) meses y diez (10) días, con el propósito de garantizar la culminación de las actividades pendientes y el cumplimiento del objeto contractual. Finalmente, mediante la Modificación No. 3, se aprobó una nueva prórroga del plazo de ejecución por un término de tres (3) meses, así como una adición presupuestal por valor de CUATROCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($460.000.000,00), con el fin de dar continuidad a la ejecución contractual y garantizar el desarrollo de las actividades requeridas para el cumplimiento del objeto del contrato.

Del mismo modo, la **SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO** luego de adjudicado el contrato de interventoría **CO1.PCCNTR.8169110** al CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO, adelanto el proceso de contratación a través de convocatoria concurso de méritos abierto No. **SED-CM-A-DCCEE-018-2025** y que mediante **RESOLUCIÓN 0073 DE 05 DE AGOSTO DE 2025** por medio de la cual se adjudica el proceso cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" – LOTE No. 2** al proponente **CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO,** representado legalmente por el señor ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX, identificado con CC. 79.602.923 de Bogotá

D.C., (Consorcio integrado por **SEIING SAS BIC** identificado con Nit. 900.208.425-6, con participación del 50% y **ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO SAS** identificada con Nit. 901.094.289-2, con un porcentaje de participación del 50%) por valor de SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE **($796.278.928,00),** incluido IVA y demás tributos que se causen o se generen con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del contrato por un plazo de SIETE (7) meses.

Mediante el comunicado No. SERINCO-SED-INT-2025-121 del 4 de diciembre de 2025, el CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO tramitó y formalizó la Modificación No. 01 del Contrato de Interventoría No. **CO1.PCCNTR.8169110 de 2025**, con el fin de prorrogar su vigencia por un término de uno punto cinco (1.5) meses, fijando como nueva fecha de finalización el 20 de junio de 2026, así como adicionar la suma de **CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($128.425.720,00)** IVA incluido, con el fin de garantizar la continuidad y adecuado cumplimiento de las obligaciones contractuales durante el plazo adicional aprobado, quedando el valor total del contrato en la suma de **NOVECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($924.704.648,00).**

Mediante el comunicado **No. SERINCO-SED-INT-2025-400** del 9 de abril de 2026, el **CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO** tramitó y formalizó la Modificación No. 02 del Contrato de Interventoría No. **CO1.PCCNTR.8169110** de 2025, con el fin de prorrogar su vigencia por un término de tres punto cinco (3.5) meses, fijando como nueva fecha de finalización el 05 de octubre de 2026, así como adicionar la suma de CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE **($162.875.214,00)** IVA incluido, con el fin de garantizar la continuidad y adecuado cumplimiento de las obligaciones contractuales durante el plazo adicional aprobado, quedando el valor total del contrato en la suma de UN MIL OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE **($ 1.087.485.065,00).**

Mediante el comunicado **No. SERINCO-SED-INT-2025-651** del 13 de agosto y **SERINCO-SED-INT-2025-675** del 24 de agosto de 2026, el **CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO** tramitó y formalizó la Modificación No. 03 del Contrato de Interventoría No. **CO1.PCCNTR.8169110 de 2025**, con el fin de prorrogar su vigencia por un término de dos (2) meses y veinticinco (25) dias, fijando como nueva fecha de finalización el 30 de diciembre de 2026, así como adicionar la suma de ***CIENTO TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE***

($131.696.241) IVA incluido, con el fin de garantizar la continuidad y adecuado cumplimiento de las obligaciones contractuales durante el plazo adicional aprobado, quedando el valor total del contrato en la suma de ***MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($1.219.181.306)***.

Con este informe, ***CONSORCIO PAIS*** *y* ***CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO*** presentan el resumen de las actividades realizadas en función de los contratos de obra e interventoría, para el periodo comprendido entre el 06 de septiembre y el 05 de octubre del año 2026.

La interventoría ***CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO*** será la encargada de realizar la supervisión a cada una de las actividades de obra, verificando el cumplimento de la normas y especificaciones técnicas, de igual forma el cumplimento de lo estipulado en los pliegos y demás documentos técnicos entregados por la **SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.**

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El presente proyecto tiene como propósito adelantar obras de **ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO** de las plantas físicas adscritas a la **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO**, así como la ejecución de **OBRAS MENORES Y LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS** que surjan en las instituciones educativas distritales y en las sedes administrativas. Estas intervenciones buscan garantizar el adecuado funcionamiento, la seguridad, la operatividad y la continuidad en la prestación del servicio educativo, asegurando que la infraestructura física cumpla con las condiciones de habitabilidad, accesibilidad y sostenibilidad requeridas para el desarrollo integral de las actividades pedagógicas y administrativas.

De manera general, el proyecto comprende la ejecución de **ACCIONES CONSTRUCTIVAS, CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS** orientadas a conservar, rehabilitar y optimizar los espacios educativos, promoviendo entornos seguros, dignos y funcionales que contribuyan a mejorar la calidad de la educación y el bienestar de la comunidad escolar. Asimismo, el alcance del proyecto se extiende a la **ATENCIÓN OPORTUNA DE SITUACIONES IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR** que puedan afectar la infraestructura institucional, permitiendo una respuesta inmediata y eficiente ante eventos que comprometan la prestación del servicio educativo o la integridad de las instalaciones.

2.1 LOCALIZACIÓN

Las obras objeto del presente proyecto se desarrollarán en la ciudad de **BOGOTÁ D.C**., el proyecto abarca dos (2) de las veinte (20) localidades que conforman el territorio distrital, las cuales se encuentran ubicadas en el sector sur de la ciudad: **CIUDAD BOLÍVAR** y **USME**. Estas localidades presentan una alta densidad poblacional, un número significativo de planteles educativos de gran cobertura y condiciones de infraestructura que requieren acciones inmediatas de mejoramiento y mantenimiento para garantizar la prestación eficiente del servicio educativo.

- En la localidad de **CIUDAD BOLÍVAR**, se intervendrán **siete (7)** instituciones educativas, localizadas en distintos barrios de la zona sur,

- En la localidad de **USME**, se contempla la intervención de **Cinco (5)** instituciones educativas, solo en el área urbana.

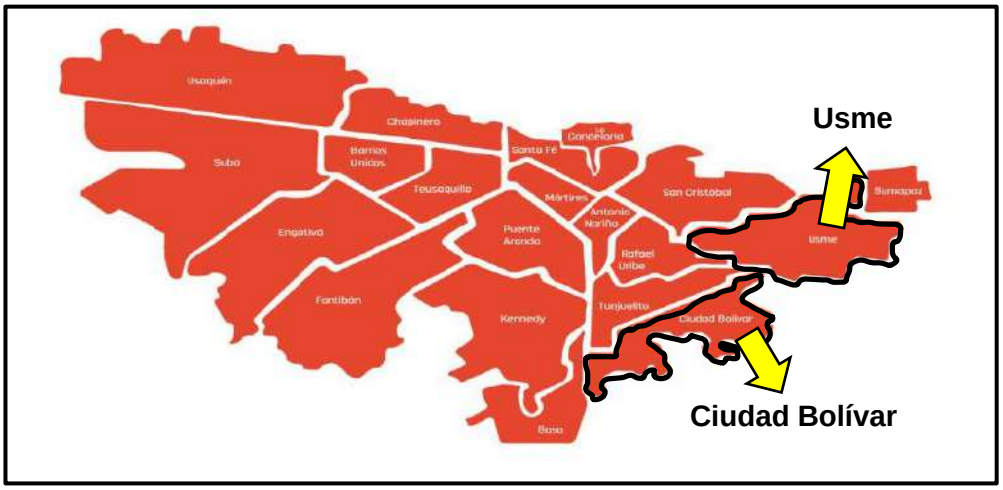


Ilustración 1. Localización de las Localidades de Ciudad Bolívar y Usme
Fuente: Elaboración propia con base en argis

Adicionalmente, se presenta en la ilustración 2 la localización de cada una de las instituciones educativas a intervenir a través de una imagen satelital extraída de Google Earth.

Se deja claridad que de acuerdo con la adición firmada el día 12 de diciembre de 2025 se añaden dos nuevos colegios uno en la localidad de Ciudad Bolívar y un colegio en la Localidad de Usme.

Para la prórroga firmada en el mes de mayo del año 2026 se incluye un nuevo colegio en la localidad de Usme – Colegio Ciudad de Villavicencio Sede b.

Para el modificatorio No.3, la secretaria de educación Firma la prórroga y adición, añadiendo dos nuevos colegios: Colegio Rafale Uribe Uribe de la localidad de Ciudad Bolívar, y el Colegio Los comuneros Oswaldo Guayasamin de la localidad de Usme.



Ilustración 2. Localización de las Escuelas en las Localidades
Fuente: Elaboración propia con base en Google Earth

Por otra parte, en la **Tabla No. 1** se consolida la información de las instituciones educativas distritales que serán intervenidas en el marco del presente proyecto, precisando para cada sede su nombre, ubicación, localidad y el tiempo programado para el desarrollo de las actividades contractuales.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	TIEMPO APROXIMADO DE EJECUCIÓN
Colegio Arborizadora Baja	A	Calle 59 a Bis Sur # 45 -16	Ciudad Bolívar	14 Semanas
Colegio Buena Vista I.E.D Calasanz	A	Cra. 17f # 77A - 13 Sur	Ciudad Bolívar	15 Semanas
Colegio Estrella del Sur Seda A	A	Cra.7 P No. 72-25 Sur	Ciudad Bolívar	5 Semanas
Colegio Estrella del Sur Seda b	B	Calle 75 sur # 18 B - 45	Ciudad Bolívar	15 Semanas
Colegio Sierra Morena Sede C	C	Carrera 46A No. 79D- 15 Sur	Ciudad Bolívar	23 Semanas
Colegio Unión europea Sede B	B	Calle 69B sur # 17 N 92	Ciudad Bolívar	14 Semanas
Colegio Fabio Lozano Simónelli Sede A	A	Calle 65 Sur # 5-65	Usme	19 Semanas
Colegio Orlando Fals Borda	A	Cra 12 # 72-60 Sur	Usme	15 Semanas
Colegio Santa Librada	A	Calle 75A Sur # 9A-45	Usme	18 Semanas
Colegio Guillermo Cano Izasa	A	Cra. 16ª # 62-35 Sur	Ciudad Bolívar	23 Semanas
Tenerife Granada Sur	A	Cra. 14b Bis # 91 sur 14	Usme	12 Semanas
Ciudad de Villavicencio	B	Calle 114 A Sur No. 7F Este 60	Usme	15 Semanas
Rafael Uribe Uribe	A	Diagonal 71 B Sur No. 18I - 20	Ciudad Bolívar	13 Semanas
Los Comuneros Oswaldo Guayasamin	B	Calle 94 Sur No. 3 B -53	Usme	13 Semanas

Tabla 1. Sedes Educativas
Fuente: Propia

2.2 ESTADO INICIAL

La Secretaría de Educación del Distrito (SED), a través de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos (DCCEE), solicitó realizar visitas de

diagnóstico técnico con el acompañamiento de la interventoría y del contratista, con el propósito de exponer y precisar los alcances de intervención de cada uno de los colegios incluidos en el contrato.

Estas visitas permitieron verificar las condiciones físicas y funcionales de las edificaciones y, al mismo tiempo, clarificar para el contratista los lineamientos, actividades y componentes específicos a intervenir en cada institución educativa. De esta manera, se busca garantizar que el diagnóstico realizado sea coherente con las necesidades reales de cada sede y con los criterios técnicos establecidos por la SED.

Durante las jornadas de campo, se efectuaron recorridos técnicos, levantamientos fotográficos y la identificación de daños o deterioros en los diferentes sistemas constructivos, lo que permitió consolidar información precisa sobre el estado inicial de las edificaciones.

Los resultados de estas visitas constituyen la base técnica para la planeación, programación y ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo, asegurando una intervención pertinente, oportuna y ajustada a las condiciones específicas de cada institución educativa.

2.3 CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

El presente proyecto se enmarca en las acciones adelantadas por la Secretaría de Educación del Distrito (SED), a través de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos (DCCEE), con el objetivo de garantizar la funcionalidad, seguridad y mantenimiento integral de la infraestructura educativa distrital.

Teniendo en cuenta los informes preliminares presentados por el contratista, en los cuales se recopila la información técnica obtenida durante las visitas de diagnóstico, se establecen las características generales y particulares que definirán la intervención de cada uno de los proyectos. Dichas características comprenden aspectos relacionados con la localización, alcance de las obras, componentes constructivos a intervenir, tiempos de ejecución, condiciones técnicas específicas que orientan el desarrollo del contrato.

2.3.1 Colegio Arborizadora Baja



Ilustración 3. Esquema de Distribución Colegio Arborizadora Baja
Fuente: Propia

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- Cambio de la cubierta en el Área de preescolar y sus baños adjuntos.
- Reparación de la cancha en la zona de bachillerato, este ítem incluye: Adecuación de la gradería
- Demolición y reconstrucción de una placa
- Remplazo de los marcos de futbol, baloncesto y suministro de los parales y malla para la cancha de voleibol.

2.3.2 Colegio Buenavista I.E.D Calasanz

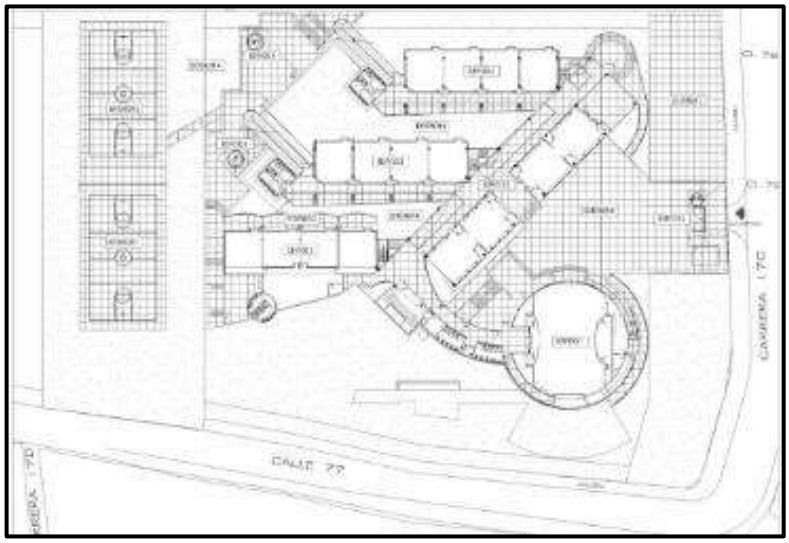


Ilustración 4. Esquema de Distribución Colegio Buenavista I.E.D Calasanz
Fuente: *Propia*

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- El trabajo por realizar en la sede educativa es el cambio de la cubierta de la zona del comedor
- El contratista deberá contemplar un cerramiento perimetral para mitigar el ingreso de palomas al área.

2.3.3 Colegio Estrella del Sur Sede A.

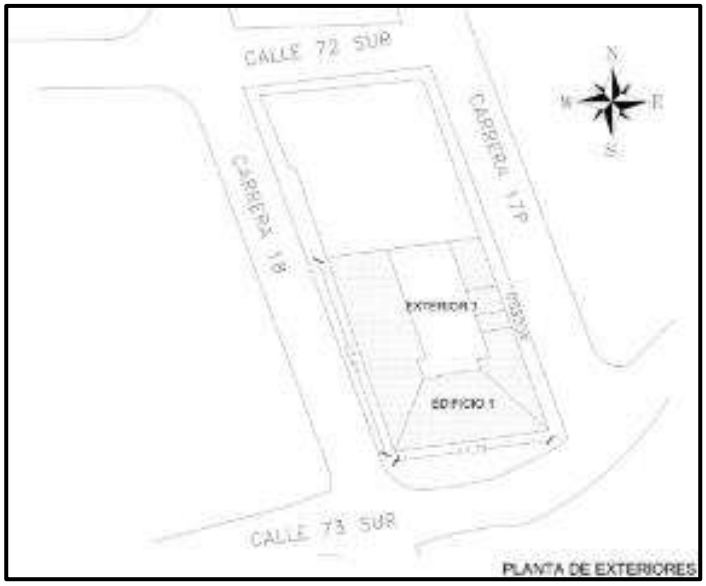


Ilustración 5. Esquema de Distribución Colegio Estrella del Sur Sede A
Fuente: Propia

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- Cambio de la puerta principal de la entrada
- Cambio total de las dos baterías sanitarias

2.3.4 Colegio Estrella Del Sur Sede B

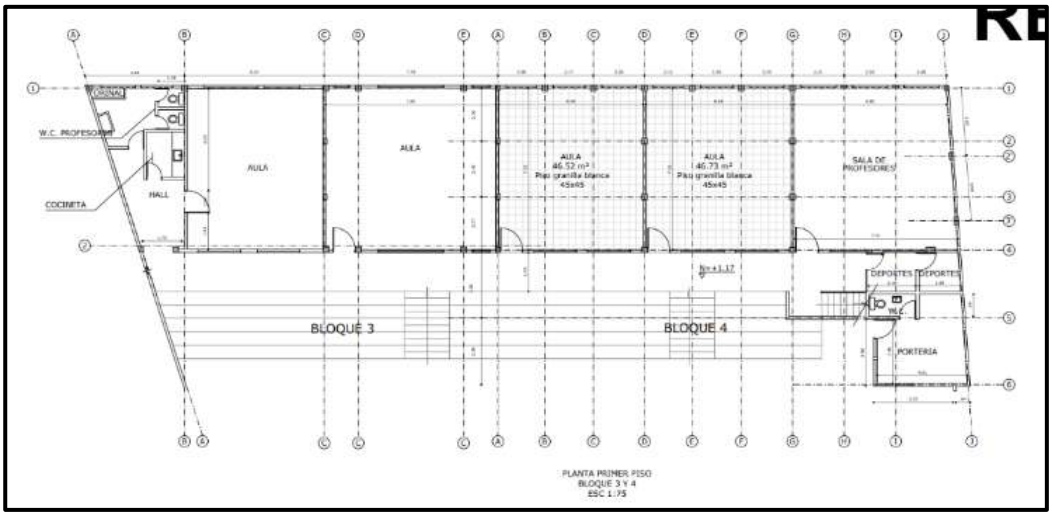


Ilustración 6. Esquema de Distribución Colegio Estrella del Sur Sede B
Fuente: Propia

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- Cambio de puertas y ventanas en todas las aulas que allí se encuentran y de igual forma en el área administrativa.
- Cambio de la puerta principal de entrada del colegio.

2.3.5 Colegio Sierra Morena Sede C

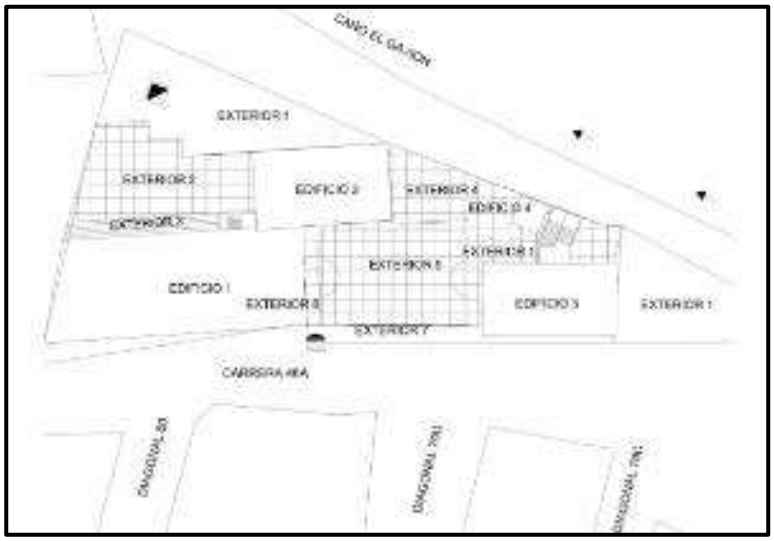


Ilustración 7. Esquema de Distribución Colegio Sierra Morena Sede C
Fuente: Propia

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- Adecuación del cuarto de basuras
- Adecuación de la rampa de acceso, incluyendo de igual forma la instalación de barandas metálicas
- Revisión de la aplicación de pintura para los salones, el contratista tendrá la misión de analizar el estado de esta, ya que de acuerdo con la visita los salones se encuentran en buen estado.

2.3.6 Colegio Unión Europea Sede B

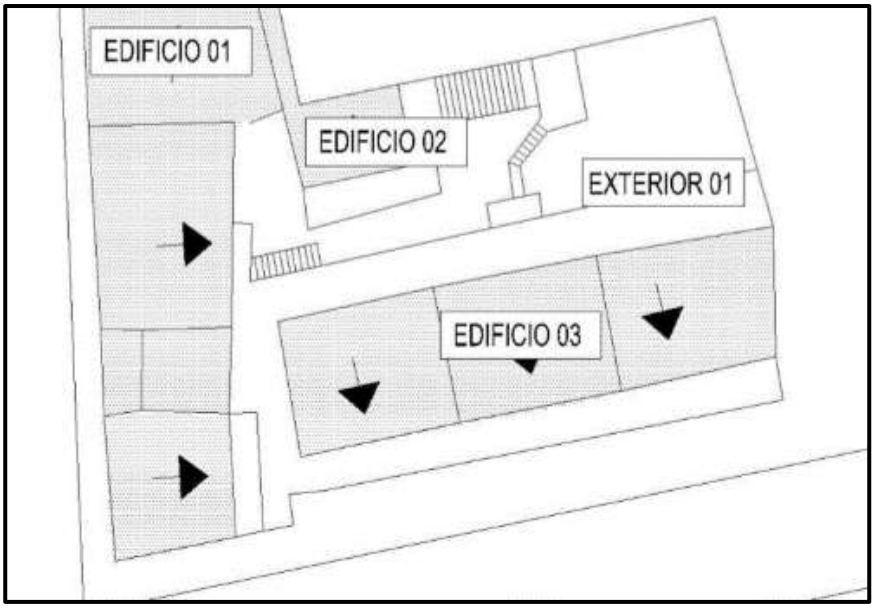


Ilustración 8. Esquema de Distribución Colegio Unión Europea Sede B
Fuente: Propia

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- El trabajo para realizar en la sede educativa es el cambio de cubierta ubicado en tres aulas, para una mejor ubicación es donde se encuentra el aula de informática

2.3.7 Colegio Fabio Lozano Simonelli Sede A

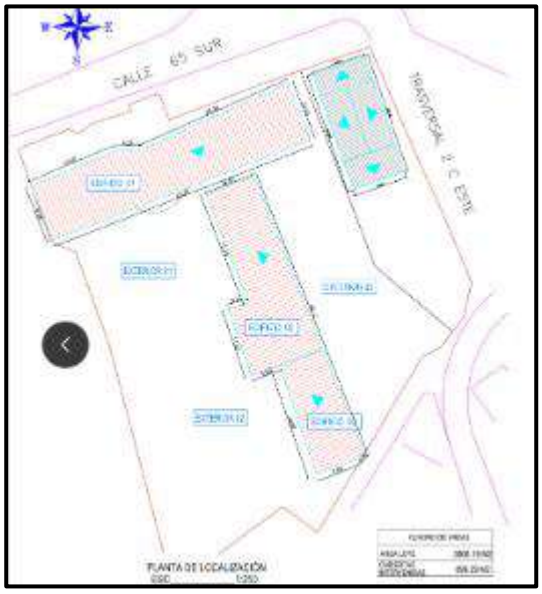


Ilustración 9. Esquema de Distribución Colegio Fabio Lozano Simonelli sede A
Fuente: Propia

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- Manejo de aguas lluvias en la cancha colindante con el salón de los laboratorios
- Cambio total de las dos baterías sanitarias del tercer piso
- Sustitución de los pisos en todos los salones del tercer piso.

2.3.8 Colegio Orlando Fals Borda

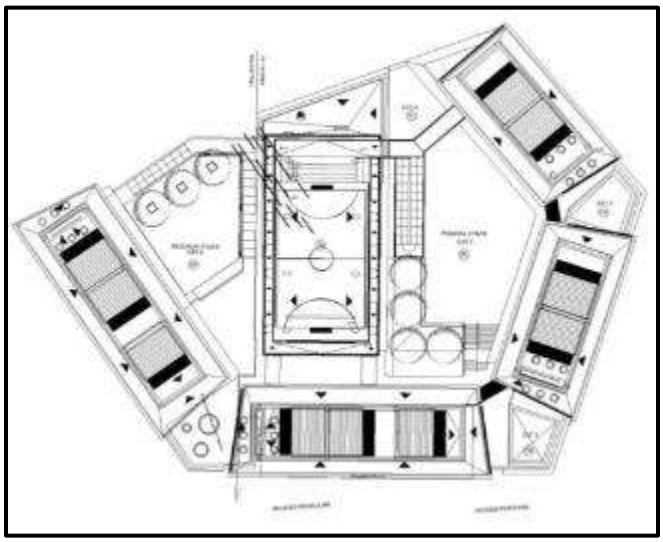


Ilustración 10. Esquema de Distribución Colegio Orlando Fals Borda
Fuente: Propia

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- El trabajo por realizar consiste en la impermeabilización de la placa ubicada en la terraza debido a que se presenta empozamientos en la misma y esta filtra hacia el área de recreación del colegio, además de ello se encuentra afectando los techos de los salones.

2.3.9 Colegio Santa Librada



Ilustración 11. Esquema de Distribución Colegio Santa Librada
Fuente: Propia

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- Impermeabilización de la terraza del comedor, previa verificación técnica que evidencia filtraciones por la junta de dilatación entre dos estructuras.
- Impermeabilización de la terraza en la zona de las materas.

2.3.10 Colegio Guillermo Cano Izasa Sede A



Ilustración 12 Esquema de Distribución Colegio Guillermo Cano Izasa
Fuente: Propia

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- Mejoramiento de Baterías Sanitarias en bloque bachillerato
- Mejoramiento de instalaciones Hidrosanitarias
- Adecuación de la red eléctrica – Baterías Sanitarias.

2.3.11 Colegio Tenerife Granda Sur Sede A

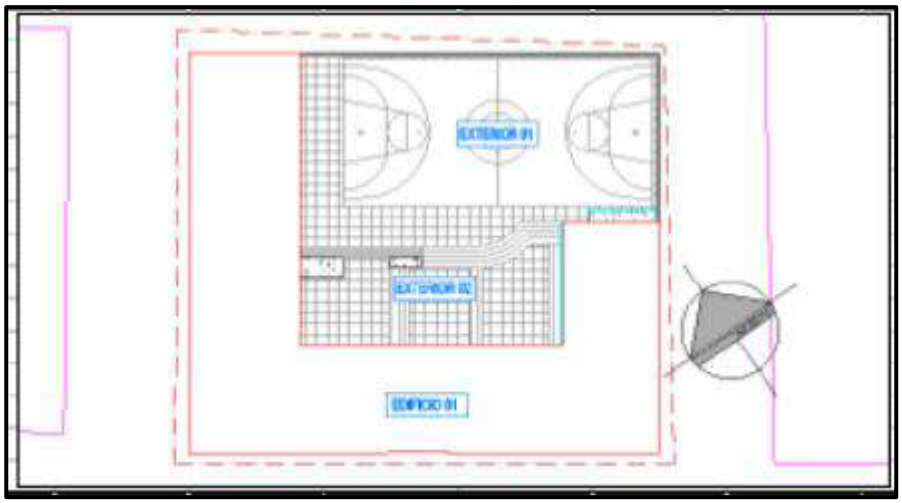


Ilustración 13 Esquema de Distribución Colegio Tenerife Granda Sur Sede A
Fuente: Propia

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- Impermeabilización Tanque aguas potable
- Mantenimiento correctivo motobombas
- Mejoramiento de barandas

2.3.12 Colegio Ciudad de Villavicencio, Sede B – Puerta al Llano

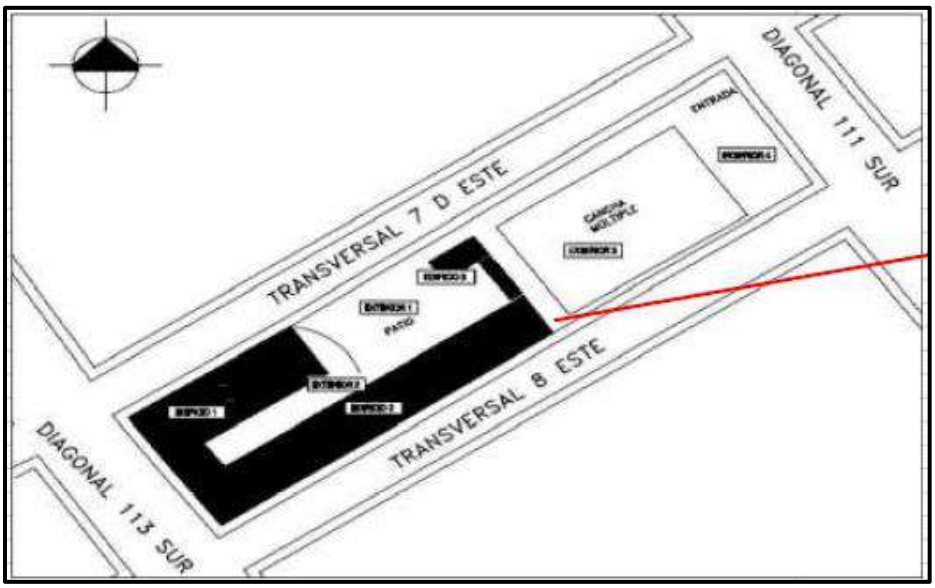


Ilustración 14 - Esquema de Distribución Colegio Ciudad de Villavicencio, Sede b – Puerta al Llano
Fuente: Propia

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- Mejoramiento correctivo de los pisos en acceso y corredor principal
- Mejoramiento correctivo del cerramiento metálico
- Mejoramiento de las redes de aguas lluvias

2.3.13 Colegio Rafael Uribe Uribe, Sede A

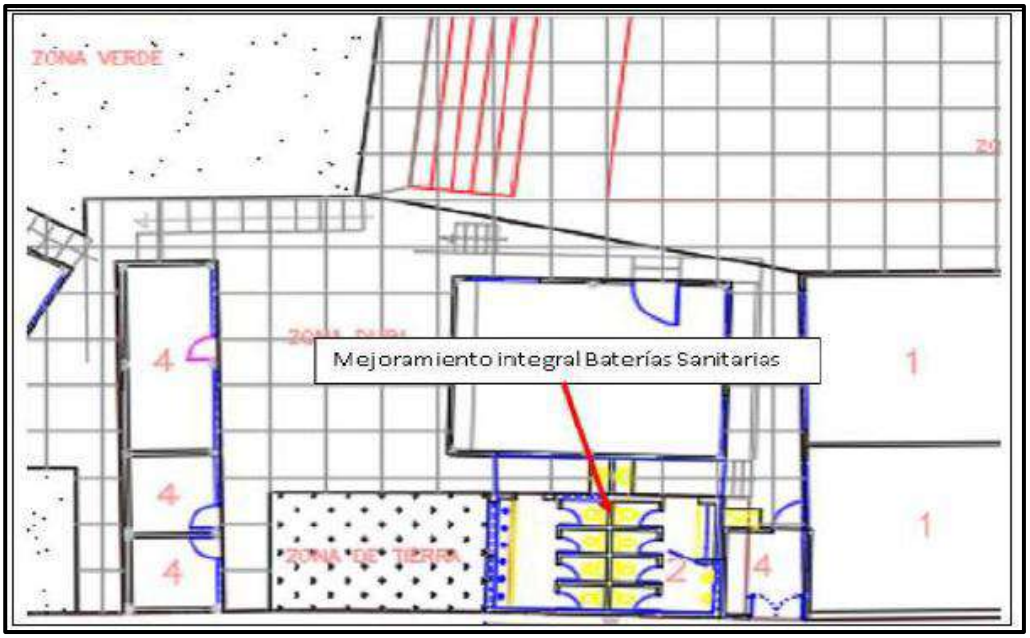


Ilustración 15 - Esquema de Distribución Colegio Rafael Uribe Uribe, Sede A
Fuente: Propia

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- Adecuación Baterías Sanitarias de niños y niñas del bloque de preescolar (Ciclo I).
- Cambio de Cubierta y adecuación de instalaciones eléctricas asociadas a las baterías sanitarias del bloque de Preescolar (Ciclo I).

2.3.14 Colegio Los Comuneros Oswaldo Guayasamin, Sede B

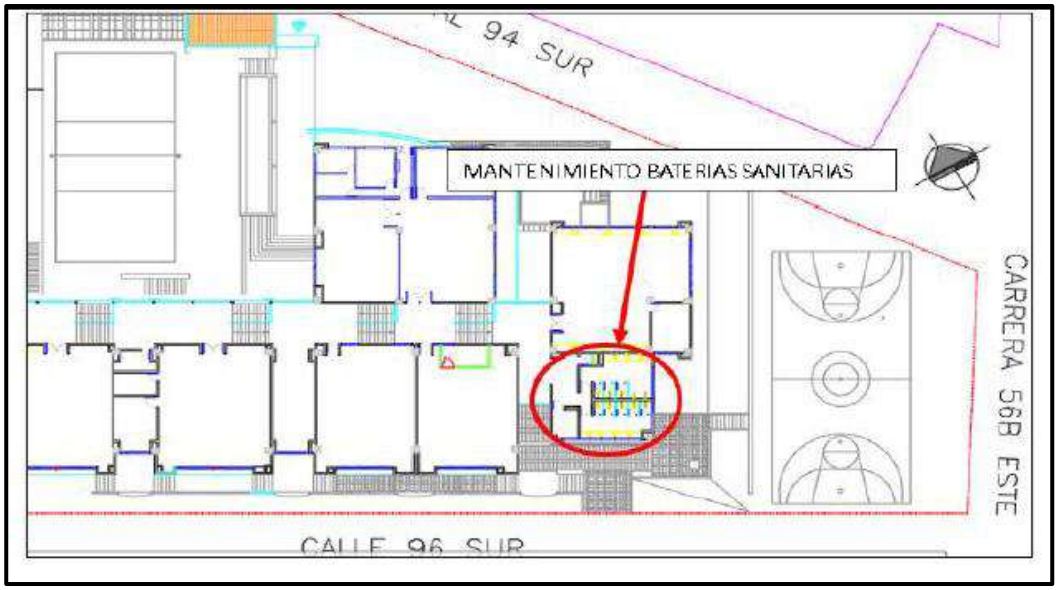


Ilustración 16 - Esquema de Distribución Colegio Los Comuneros Oswaldo Guayasamin, Sede B
Fuente: Propia

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- Adecuación de las baterías sanitarias de niños y niñas ubicadas en el bloque de bachillerato, primer piso.
- Adecuación baño para población con movilidad reducida.

2.4 EMERGENCIAS

En el marco de la ejecución del contrato, la Secretaría de Educación del Distrito (SED), a través de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos (DCCEE), contempla la atención de emergencias en la infraestructura educativa distrital, con el objetivo de garantizar la continuidad y seguridad en la prestación del servicio educativo.

Estas emergencias corresponden a situaciones imprevistas o de fuerza mayor que afectan las condiciones físicas de las edificaciones como daños estructurales, filtraciones, desprendimientos, fallas en cubiertas o deterioro de redes eléctricas e hidrosanitarias las cuales requieren una intervención inmediata y coordinada.

Para el desarrollo de este componente, el contrato cuenta con un presupuesto asignado de ***CUATROCIENTOS DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($ 416.900.290,00)*** destinado exclusivamente a la atención de emergencias, el cual será utilizado conforme a las necesidades que se presenten y de acuerdo con los procedimientos establecidos por la SED y la interventoría.

De acuerdo con el Modificatorio No.3 suscrito, se cuenta con una adición para concepto de emergencia por un valor de ***CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 160.000.000,00)***

3. CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA	
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS". LOTE No.6
CONTRATISTA	CONSORCIO PAIS - NIT 901.974.049-8
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.8154780
VALOR INICIAL	DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL VEINTITRÉS PESOS M/CTE. ($2.332.049.023).INC IVA
VALOR ADICIÓN No.1	SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE ($785.001.422) INC A.I.U
VALOR ADICIÓN No.2	CUATROCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($460.000.000) INC A.I.U
VALOR FINAL	TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 3.577.050.445) INC A.I.U
PLAZO INICIAL	SIETE (7) MESES
PLAZO ADICIÓN No.1	UN MES (01) Y QUINCE (15) DIAS
PLAZO PRORROGA No.2	TRES (03) MESES Y DIEZ (10) DIAS
PLAZO PRORROGA – MODIFICATORIO No.3	TRES (03) MESES
FECHA DE INICIACIÓN	06 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INCIAL	05 DE MAYO DE 2026

CONTRATO DE OBRA	
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.1	20 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.2	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	30 DE DICIEMBRE DE 2026
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	LOCALIDADES DE CIUDAD BOLIVAR Y USME

Tabla 2. Información general contrato de obra
Fuente: Propia

Anexo 1. Modificatorio No.3 Contrato de obra

3.1.1 GARANTÍAS

A continuación, se presentan las garantías exigidas por la Secretaría de Educación del Distrito (SED) al contratista, con el propósito de asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, técnicas, administrativas, laborales y financieras establecidas en el marco del presente proyecto.

Estas garantías tienen como finalidad respaldar la correcta ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas a cargo de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos (DCCEE).

Para la fecha del presente informe, las garantías se encuentran vigentes y actualizadas, conforme a lo estipulado en el Acta de Inicio del contrato, suscrita el 06 de octubre de 2025, y cumplen con los requerimientos establecidos por la SED en materia de cumplimiento, calidad de los trabajos, manejo de anticipo y responsabilidad civil extracontractual, como se puede evidenciar en la tabla No. 3.

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**		
PÓLIZA DE SEGURO CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No.	39-44-101175397 -Anexo 0		
TIPO DE MODIFICACIÓN	POR SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO		
FECHA DE EXPEDICIÓN	05/09/2025		
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/08/2025	05/12/2026	$ 466.409.804,60
PAGOS DE SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29/08/2025	05/04/2029	$ 233.204.902,30
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	05/04/2026	05/04/2028	$ 466.409.804,60

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**		
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL No.	39-40-101045911 -Anexo 0		
TIPO DE MODIFICACIÓN	POR SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO		
FECHA DE EXPEDICIÓN	05/09/2025		
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
PREDIOS, LABORES Y OPEROPERACIONES	03/09/2025	05/04/2026	$ 427.050.000,00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	03/09/2025	05/04/2026	$ 427.050.000,00
PREJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	03/09/2025	05/04/2026	$ 427.050.000,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS MUNDIAL**		
PÓLIZA DE SEGURO DE TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE	BY - 100000027 -Anexo 0		
TIPO DE MODIFICACIÓN	POR SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO		
FECHA DE EXPEDICIÓN	24/09/2025		
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
DAÑOS MATERIALES	03/09/2025	10/06/2026	$ 2.332.049.023,00
TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCIÓN VOLCANICA	03/09/2025	10/06/2026	$ 2.332.049.023,00
CICLÓN, HURACAN, INUNDACIÓN, TEMPESTAD, ENFANGAMIENTO Y DESL	03/09/2025	10/06/2026	$ 2.332.049.023,00
AMIT – HMACC	03/09/2025	10/06/2026	$ 2.332.049.023,00
MANTENIMIENTO	03/09/2025	10/06/2026	$ 2.332.049.023,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS MATERIALES	03/09/2025	10/06/2026	$ 466.409.804,06
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS PERSONALES	03/09/2025	10/06/2026	$ 466.409.804,06
REMOCIÓN DE ESCOMBROS	03/09/2025	10/06/2026	$ 349.807.353,45
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**		

PÓLIZA DE SEGURO CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No.	39-44-101175397 -Anexo 6		
TIPO DE MODIFICACIÓN	POR ACTA DE INICIO		
FECHA DE EXPEDICIÓN	24/10/2025		
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/10/2025	12/01/2027	$ 466.409.804,60
PAGOS DE SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/10/2025	13/05/2029	$ 233.204.902,30
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	05/05/2026	05/05/2028	$ 466.409.804,60
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**		
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL No.	39-40-101045911 -Anexo 7		
TIPO DE MODIFICACIÓN	POR ACTA DE INICIO		
FECHA DE EXPEDICIÓN	05/09/2025		
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
PREDIOS, LABORES Y OPEROPERACIONES	06/10/2025	08/05/2026	$ 427.050.000,00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	06/10/2025	08/05/2026	$ 427.050.000,00
PREJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	06/10/2025	08/05/2026	$ 427.050.000,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS MUNDIAL**		
PÓLIZA DE SEGURO DE TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE	BY - 100000027 -Anexo 0		
TIPO DE MODIFICACIÓN	POR SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO		
FECHA DE EXPEDICIÓN	24/09/2025		
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
DAÑOS MATERIALES	03/09/2025	10/06/2026	$ 2.332.049.023,00
TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCIÓN VOLCANICA	03/09/2025	10/06/2026	$ 2.332.049.023,00
CICLÓN, HURACAN, INUNDACIÓN, TEMPESTAD, ENFANGAMIENTO Y DESL	03/09/2025	10/06/2026	$ 2.332.049.023,00
AMIT – HMACC	03/09/2025	10/06/2026	$ 2.332.049.023,00
MANTENIMIENTO	03/09/2025	10/06/2026	$ 2.332.049.023,00

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS MATERIALES	03/09/2025	10/06/2026	$ 466.409.804,06
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS PERSONALES	03/09/2025	10/06/2026	$ 466.409.804,06
REMOCIÓN DE ESCOMBROS	03/09/2025	10/06/2026	$ 349.807.353,45

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**		
PÓLIZA DE SEGURO CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No.	39-44-101175397 -Anexo 8		
TIPO DE MODIFICACIÓN	POR ACTA DE MODIFICACIÓN No.1 ADICIÓN Y PRORROGA		
FECHA DE EXPEDICIÓN	24/12/2025		
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/10/2025	27/02/2027	$ 623.410.089,00
PAGOS DE SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	06/10/2025	28/06/2029	$ 311.705.044,50
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	05/05/2026	05/05/2028	$ 623.410.089,00

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**		
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL No.	39-40-101045911 -Anexo 11		
TIPO DE MODIFICACIÓN	POR ACTA DE MODIFICACIÓN No.1 ADICIÓN Y PRORROGA		
FECHA DE EXPEDICIÓN	05/01/2025		
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
PREDIOS, LABORES Y OPEROPERACIONES	06/10/2025	23/06/2026	$ 511.771.500,00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	06/10/2025	23/06/2026	$ 511.771.500,00
PREJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	06/10/2025	23/06/2026	$ 511.771.500,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS MUNDIAL**		
PÓLIZA DE SEGURO DE TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE	BY - 100000027 -Anexo 5		
TIPO DE MODIFICACIÓN	POR ACTA DE MODIFICACIÓN No.1 ADICIÓN Y PRORROGA		
FECHA DE EXPEDICIÓN	05/01/2025		

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	INICIAL	FINAL	
DAÑOS MATERIALES	13/07/2026	20/08/2026	$ 3.117.050.445,00
TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCIÓN VOLCANICA	13/07/2026	20/08/2026	$ 3.117.050.445,00
CICLÓN, HURACAN, INUNDACIÓN, TEMPESTAD, ENFANGAMIENTO Y DESL	13/07/2026	20/08/2026	$ 3.117.050.445,00
AMIT – HMACC	13/07/2026	20/08/2026	$ 3.117.050.445,00
MANTENIMIENTO	13/07/2026	20/08/2026	$ 3.117.050.445,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS MATERIALES	13/07/2026	20/08/2026	$ 466.409.804,06
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS PERSONALES	13/07/2026	20/08/2026	$ 466.409.804,06
REMOCIÓN DE ESCOMBROS	13/07/2026	20/08/2026	$ 349.807.353,45
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**		
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL	39-44-101175397 - Anexo 1		
TIPO DE MODIFICACIÓN	POR ACTA DE MODIFICACIÓN No.2 PRORROGA		
FECHA DE EXPEDICIÓN	27/05/2026		
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/10/2025	07/06/2027	$ 623.410.089,00
PRESTACIONES SOCIALES	13/07/2026	08/10/2029	$ 311.705.044,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	13/07/2026	05/05/2028	$ 623.410.089,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**		
PÓLIZA DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO	39-40-101045911		
TIPO DE MODIFICACIÓN	POR ACTA DE MODIFICACIÓN No.2 PRORROGA		
FECHA DE EXPEDICIÓN	27/05/2026		
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	06/10/2025	05/10/2026	$ 511.771.500,00

DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	06/10/2025	05/10/2026	$ 511.771.500,00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	06/10/2025	05/10/2026	$ 511.771.500,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS MUNDIAL**		
PÓLIZA TODO RIESGO CONSTRUCCION Y MONTAJE	BY - 100000027		
TIPO DE MODIFICACIÓN	POR ACTA DE MODIFICACIÓN No.2 PRORROGA		
FECHA DE EXPEDICIÓN	29/05/2026		
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**INICIAL**	
DAÑOS MATERIALES	20/08/2026	30/11/2026	$ 3.117.050.445,00
TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCIO VOLC	20/08/2026	30/11/2026	$ 3.117.050.445,00
CICLON, HURACAN, INUNDACION, TEMPESTAD, ENFANGAMIENTO Y DESLIZAMIENTO	20/08/2026	30/11/2026	$ 3.117.050.445,00
AMIT - HMACC	20/08/2026	30/11/2026	$ 3.117.050.445,00
MANTENIMIENTO	20/08/2026	30/11/2026	$ 3.117.050.445,00
RCE POR DAÑOS MATERIALES	20/08/2026	30/11/2026	$ 466.409.804,06
RCE POR DAÑOS PERSONALES	20/08/2026	30/11/2026	$ 466.409.804,06
REMOCION DE ESCOMBROS	20/08/2026	30/11/2026	$ 349.807.353,45
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**		
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL	39-44-101175397 - Anexo 13		
TIPO DE MODIFICACIÓN	POR ACTA DE MODIFICACIÓN No.3 PRORROGA		
FECHA DE EXPEDICIÓN	15/10/2026		
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/10/2025	07/06/2027	$ 715.410.089,00
PRESTACIONES SOCIALES	13/07/2026	08/10/2029	$ 357.705.044,50
ESTABILIDAD DE LA OBRA	13/07/2026	05/05/2028	$ 715.410.089,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**		
PÓLIZA DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO	39-40-101045911		

TIPO DE MODIFICACIÓN	POR ACTA DE MODIFICACIÓN No.3 PRORROGA		
FECHA DE EXPEDICIÓN	15/10/2026		
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	06/10/2025	07/01/2027	$ 525.271.500,00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	06/10/2025	07/01/2027	$ 525.271.500,00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	06/10/2025	07/01/2027	$ 525.271.500,00

Tabla 3. Pólizas contrato de obra - Contratista
Fuente: Propia

Anexo 2. Actualización Pólizas Contrato de Obra

3.2 DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

En el periodo comprendido entre el 06 de septiembre y el 05 de octubre de 2026, se realizaron actividades de visita en las sedes subrayadas, resaltadas en negrilla y cursiva, además de ello el contratista de obra realizó las siguientes tareas en cada una de las instituciones educativas.

- CPF 1904 – Colegio Arborizadora Baja
- CPF 1913 – Colegio Sierra Morena Sede C
- CPF 1930 – Colegio Unión Europea Sede B
- CPF 581 – Colegio Orlando Fals Borda
- CPF 523 – Colegio Fabio Lozano Simonelli
- CPF 1918 – Colegio Estrella del Sur Sede B
- CPF 1974 – Colegio Calasanz (Buena Vista)
- CPF 546 – Colegio Santa Librada
- CPF 1917 – Colegio Estrella del Sur Sede A
- CPF 1959 – Colegio Guillermo Cano Isaza
- CPF 548 – Colegio Tenerife Granada Sur Sede A
- CPF 545 – Colegio Ciudad de Villavicencio Sede B
- CPF 1943 – Colegio Rafael Uribe Uribe
- CPF 561 – Colegio Los Comuneros Oswaldo Guayasamin

Además de ello el contratista de obra CONSORCIO PAIS realizo las siguientes actividades referentes a cada una de las instituciones educativas mencionadas a continuación:

- **CPF 581 – Colegio Orlando Fals Borda**

A la fecha del presente informe, el frente de obra cuenta con las actividades al 100%.

- **CPF 1913 – Colegio Sierra Morena Sede C**

A la fecha del presente informe, el frente de obra cuenta con las actividades al 100%.

- **CPF 1930 – Colegio Unión Europea Sede B**

Frente de obra al 100% de las actividades

- **CPF 1904 – Colegio Arborizadora Baja**

Frente de obra al 100% de las actividades

- **CPF 523 – Colegio Fabio Lozano Simonelli**

Frente de obra al 100% de las actividades

- **CPF 1918 – Colegio Estrella del Sur Sede B**

Frente de obra al 100% de las actividades

- **CPF 1974 – Colegio Calasanz (Buena Vista)**

A la fecha del presente informe el frente de obra cuenta con el 100% de las actividades.

- **CPF 546 – Colegio Santa Librada**

Frente de obra al 100% de las actividades

- **CPF 1917 – Colegio Estrella del Sur Sede A**

Frente de obra al 100% de las actividades.

- **CPF 1959 – Colegio Guillermo Cano Isaza**

A la fecha de elaboración del presente informe, es posible señalar que se ha dado continuidad a las actividades mencionadas en el mes anterior, específicamente en lo relacionado con la reparación de la fuga detectada. Una vez concluidos los trabajos correspondientes, se llevó a cabo una inspección de carácter semanal con el propósito de verificar que la reparación se hubiera ejecutado de manera adecuada y que no se presentaran novedades posteriores.

Tras confirmar el éxito de dicha intervención, se procedió a la reparación de las zonas afectadas por la fuga, labores que ya se encuentran finalizadas. En la actualidad, únicamente resta ejecutar algunos remates de pintura en el techo, así como realizar la limpieza general del área, con el fin de llevar a cabo la entrega formal al colegio de la zona correspondiente al bloque B, segundo piso. Se espera que estas últimas actividades se completen en el menor plazo posible para dar cierre definitivo a esta intervención

- **CPF 548 – Colegio Tenerife Granda Sur Sede A**

Frente de obra al 100% de las actividades

- **CPF 545 – Colegio Ciudad de Villavicencio Sede B**

A la fecha de elaboración del presente informe, se puede evidenciar que el contratista ha culminado satisfactoriamente con la instalación de la grama en la zona de las bajantes ubicada al frente del aula. De igual manera, se completó la instalación del piso vinilo en el aula destinada a la ludoteca, así como la instalación del piso tipo chip en el área del parque de juegos infantiles.

Asimismo, el contratista finalizó la construcción de dos cuartos en material superbord, los cuales estarán destinados al almacenamiento de los refrigerios. Cabe señalar que el frente de obra ya dio por concluidas todas las actividades programadas y, en la actualidad, se encuentra a la espera de que se realice la entrega formal de los trabajos ejecutados, situación que se presenta debido a que la institución se encuentra en periodo de receso. Una vez finalizado dicho periodo, se procederá con la verificación y entrega correspondiente.

- **CPF 1943 – Colegio Rafael Uribe Uribe**

Durante el periodo correspondiente al presente informe, se dio inicio a las actividades de obra programadas. En primera instancia, se llevó a cabo el cerramiento del área de las

baterías sanitarias, con el fin de delimitar y asegurar la zona de intervención. Posteriormente, el contratista procedió con el desmonte de las puertas existentes y, de igual manera, con el retiro de los aparatos sanitarios instalados en dicho espacio.

Una vez concluidas estas labores preliminares, se iniciaron las actividades de demolición, las cuales abarcaron muros, enchapes y pañetes. A la fecha, se cuenta con un avance porcentual en las demoliciones ejecutadas, dentro de las que también se incluye la demolición de los mesones de los lavamanos. Se espera continuar con las siguientes fases de la obra conforme al cronograma establecido.

- **CPF 561 – Colegio Los Comuneros Oswaldo Guayasamin**

Durante el periodo correspondiente al presente informe, se dio continuidad a las actividades de demolición previamente iniciadas, entre las que se incluyen la demolición de muros divisorios, la demolición de enchapes y la demolición de pañetes. A la fecha, dichas labores presentan un avance de ejecución aproximado del 80%, lo que refleja un progreso significativo dentro del cronograma establecido.

De igual manera, continuaron las actividades de desmonte de aparatos sanitarios, puertas y demás elementos existentes en la zona intervenida. Se espera que, una vez finalizadas estas tareas, se pueda dar inicio a las siguientes fases de la obra, conforme a lo programado.

INFORME DE AVANCE

Durante el presente periodo se desarrollaron las actividades anteriormente mencionadas, con corte al Informe Semanal No. 47. se cuenta con los siguientes porcentajes de la Tabla No. 4

% Programado	% Ejecutado
$ 2,680,312,191.05 (89,99%)	$ 2,658,007,293.44 (89.24%)
Atraso de $ 298.306,619.00 (0,75%)	

Tabla 4. Avance Financiero
Fuente: Propia

Se cuentan con los siguientes porcentajes por frentes de obra acumulados al cierre del periodo reflejados en la siguiente tabla:

AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS POR SEDE - Octubre 04 2026						
SEDE EDUCATIVA	PROGRAMADO ACUMULADO		EJECUTADO ACUMULADO		TOTAL POR SEDE	% DE ADELANTO O ATRASO
ORLANDO FALS BORDA	$ 156,929,148.00	100.00%	$ 156,929,147.99	100.00%	$ 156,929,148.00	ENTREGADO
UNION EUROPEA	$ 169,766,274.00	100.00%	$ 169,766,274.00	100.00%	$ 169,766,274.00	ENTREGADO
SIERRA MORENA	$ 118,699,548.00	100.00%	$ 118,699,548.00	100.00%	$ 118,699,548.00	ENTREGADO
FABIO LOZANO	$ 245,187,661.00	100.00%	$ 245,187,661.00	100.00%	$ 245,187,661.00	ENTREGADO
ARBORIZADORA BAJA	$ 630,139,470.00	100.00%	$ 630,139,470.00	100.00%	$ 630,139,470.00	ENTREGADO
BUENAVISTA	$ 186,826,436.00	100.00%	$ 186,826,436.00	100.00%	$ 186,826,436.00	ENTREGADO
ESTRELLA DEL SUR - B	$ 78,637,768.00	100.00%	$ 78,637,768.00	100.00%	$ 78,637,768.00	ENTREGADO
SANTA LIBRADA	$ 223,822,666.00	100.00%	$ 223,822,666.00	100.00%	$ 223,822,666.00	ENTREGADO
ESTRELLA DEL SUR - A	$ 76,163,937.00	100.00%	$ 76,163,937.00	100.00%	$ 76,163,937.00	ENTREGADO
TENERIFE GRANADA SUR SEDE A	$ 88,940,710.00	100.00%	$ 88,940,710.00	100.00%	$ 88,940,710.00	ENTREGADO
GUILLERMO CANO ISAZA SEDE A	$ 354,505,537.00	100.00%	$ 354,373,946.66	99.96%	$ 354,505,537.00	-0.04%
CIUDAD DE VILLAVICENCIO	$ 349,000,000.00	100.00%	$ 325,265,295.61	93.20%	$ 349,000,000.00	-6.80%
RAFAEL URIBE URIBE (IED)	$ 739,437.66	0.43%	$ 1,525,771.39	0.90%	$ 170,000,000.00	0.46%
LOS COMUNEROS - OSWALDO GUAYAZAMIN (IED)	$ 953,598.38	0.73%	$ 1,728,661.77	1.33%	$ 130,000,000.00	0.60%
TOTALES	$ 2,680,312,191.05	89.99%	$ 2,658,007,293.44	89.24%	$ 2,978,619,155.00	-0.75%

Tabla 5. Porcentajes Acumulados
Fuente: Propia

3.2.1 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

Para el presente periodo y de acuerdo con el flujo de caja del cronograma de obra se cuenta con el siguiente control de acuerdo a la ilustración No.17 e Ilustración No.18

FLUJO DE CAJA SEMANAL	SEMANA 44	SEMANA 45	SEMANA 46	SEMANA 47
	7-sep-26	14-sep-26	21-sep-26	28-sep-26
	13-sep-26	20-sep-26	27-sep-26	4-oct-26
FLUJO SEMANAL	$ 34,444,444.44	$ 31,444,444.44	$ 29,444,444.44	$ 31,137,480.49
	1.29%	1.17%	1.10%	1.16%
FLUJO ACUMULADO	$ 2,588,285,821.67	$ 2,619,730,266.11	$ 2,649,174,710.56	$ 2,680,312,191.05
	86.90%	87.95%	88.94%	89.99%

Ilustración 17 Flujo de Caja Semanal
Fuente: Propia

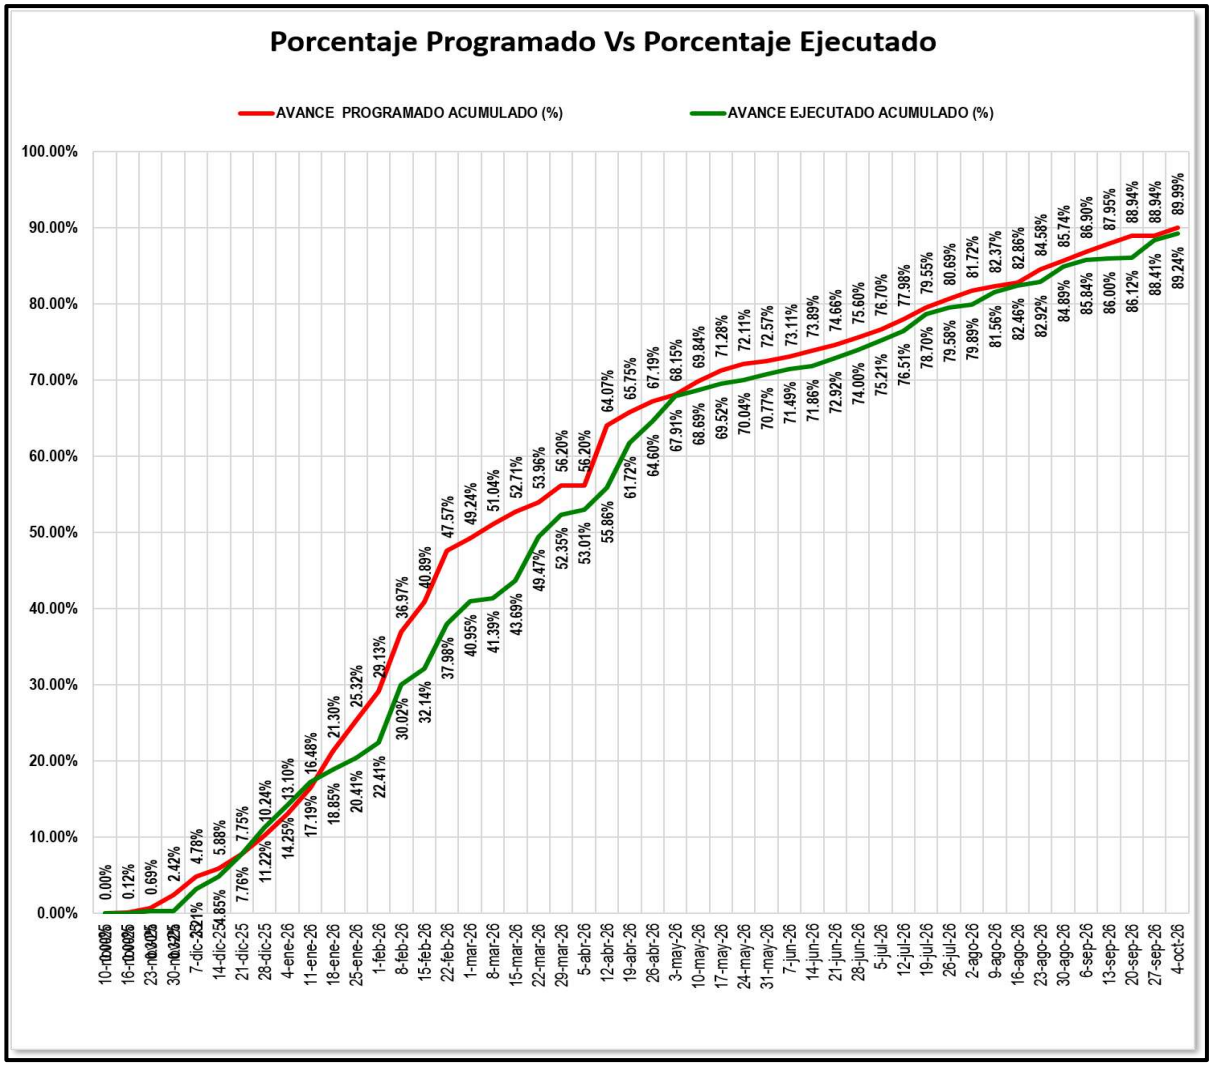


Ilustración 18 Curva s – Programado vs ejecutado
Fuente: Propia

3.2.2 AVANCE DE OBRAS EJECUTADAS Y ACUMULADAS

Para el presente periodo tal y como se mencionó en el punto 3.3 cuenta con ese porcentaje de avance de igual forma en el anexo No.04 se presentarán los informes semanales en donde se evidencian los avances del contratista Consorcio País semana por semana.

Anexo 3. Bitácora de obra
Anexo 4. Informe Semanal

3.2.3 OBRAS PROGRAMADAS PARA EL PRESENTE PERIODO

Para la fecha del presente periodo, y dando alcance al cronograma de obra vigente, el contratista debería llevar en ejecución las siguientes actividades de acuerdo con cada institución educativa, pero como se evidencia en los puntos anteriores se cuenta con un atraso debido a que no ha realizado en su totalidad las actividades programadas.

Se presentarán las Ilustraciones No.19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,31,32 y33 en donde se evidencias las actividades realizadas y los porcentajes ejecutadas de cada una, a la fecha del presente informe.

CPF	581	IED			ORLANDO FALS BORDA			SEMANA 47			
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero
REPLANTEO	m2	36,50	225,50	262,00	262,00		$ 4.233,48	$ 1.109.170,66	$ (954.648,79)	717,81 %	717,81%
CERRAMIENTO EN LONA	M	91,00	(62,60)	28,40	28,40		$ 31.110,25	$ 883.530,99	$ 1.947.501,40	100,00 %	100,00%
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	36,50	211,26	247,76	247,76		$ 18.044,21	$ 4.470.634,09	$ (3.812.020,33)	678,79 %	678,79%
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M YGUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	301,34	(266,74)	34,60	34,60		$ 33.201,35	$ 1.148.766,74	$ 8.856.128,37	11,48%	11,48%
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A	M2	79,20	40,80	120,00	120,00		$ 69.099,55	$ 8.291.946,35	$ (2.819.261,76)	151,52 %	151,52%

CPF	581	IED			ORLANDO FALS BORDA			SEMANA 47			
SITIOS AUTORIZADOS)											
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	34,00	199,20	233,20	216,59		$ 107.273,69	$ 23.234.421,60	$ (19.587.116,26)	637,03%	637,03%
PERFORACIÓN NÚCLEO 4" E= 0.10 M	UN	16,00	(13,00)	3,00	3,00		$ 166.952,47	$ 500.857,42	$ 2.170.382,16	18,75%	18,75%
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M	1,50			1,50		$ 62.023,52	$ 93.035,29	$ -	100,00%	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	34,00			34,00		$ 91.590,40	$ 3.114.073,57	$ -	100,00%	100,00%
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	0,30			0,30		$ 135.394,33	$ 40.618,30	$ -	100,00%	100,00%
RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	0,24			0,24		$ 181.045,17	$ 43.450,84	$ -	100,00%	100,00%
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	15,00			15,00		$ 22.829,47	$ 342.442,05	$ -	100,00%	100,00%

CPF	581	IED			ORLANDO FALS BORDA			SEMANA 47			
PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	19,00			19,00		$ 19.858,75	$ 377.316,29	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO LAMINADO 3 + 3 DIMENSIONES 1.00 M. X 1.00 M.	M2	15,36			15,36		$ 177.336,50	$ 2.723.888,59	$ -	100,00 %	100,00%
MEDIACAÑA VERTICAL EN CONCRETO 3000 PSI	M	58,50	136,16	194,66	194,66		$ 27.185,71	$ 5.291.971,11	$ (3.701.606,83)	100,00 %	100,00%
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	73,00	189,00	249,56	239,56		$ 45.289,29	$ 10.849.501,59	$ (7.543.383,64)	328,16 %	328,16%
DILATACIÓN EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 3 MM PROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM	M			127,20	127,20		$ 4.291,49	$ 545.877,16	$ (545.877,16)	100,00 %	100,00%
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	344,96			340,58		$ 4.663,84	$ 1.588.397,08	$ 20.440,72	98,73%	98,73%
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	262,00	20,37	252,37	255,37		$ 361.355,09	$ 92.279.248,29	$ 2.395.784,22	97,47%	97,47%
	SUBTOTAL I.E.D. SUBTOTAL I.E.D. ORLANDO FALS BORDA							**$ 156.929.147,99**			

Ilustración 19 - *Actividades Orlando Fals*
Fuente: Propia

CPF	1913	IED			SIERRA MORENA			SEMANA 47			
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	47,37	223,92	271,29	271,29		$ 7.045,00	$ 1.911.238,10	$ (1.577.516,00)	572,70%	572,70 %
CERRAMIENTO EN LONA	M	60,00	13,00	73,00	73,00		$ 31.110,25	$ 2.271.047,96	$ (404.433,20)	121,67%	121,67 %

CPF	1913	IED			SIERRA MORENA			SEMANA 47			
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	m3	1,76	(1,76)	-	-		$ 274.656,52	$ -	$ 483.395,00	0,00%	0,00%
DESMONTE DE BARANDA METÁLICA ALTURA NO MAYOR A 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	20,80	7,20	28,00	28,00		$ 21.488,46	$ 601.677,01	$ (154.716,95)	134,62%	134,62 %
DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	12,60			12,60		$ 11.376,96	$ 143.349,70	$ -	100,00%	100,00 %
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	36,84			36,84		$ 107.273,69	$ 3.951.962,61	$ -	100,00%	100,00 %
DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.30 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	32,64	0,72	31,92	-		$ 93.547,94	$ -	$ 3.053.405,00	0,00%	0,00%
CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	7,20			3,40		$ 15.633,37	$ 53.153,46	$ 59.407,00	47,22%	47,22%
DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5,29			4,00		$ 11.761,45	$ 47.045,82	$ 15.172,00	75,61%	75,61%
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	1,76	6,86	8,62	4,57		$ 91.988,38	$ 420.527,47	$ (258.627,91)	259,75%	259,75 %
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	m3	24,87	-9,60	15,27	15,27		$ 21.702,97	$ 331.382,67	$ 208.370,00	61,40%	61,40%
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	m2	11,84			11,84		$ 165.931,21	$ 1.964.625,47	$ -	100,00%	100,00 %
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	m3	7,00	7,00	14,00	14,00		$ 176.060,25	$ 2.464.579,38	$ (1.232.158,00)	199,98%	199,98 %

CPF	1913	IED			SIERRA MORENA			SEMANA 47			
MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	12,60	3,76	16,36	16,36		$ 146.133,16	$ 2.390.738,55	$ (549.461,00)	129,84%	129,84 %
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	m	6,00			-		$ 78.726,73	$ -	$ 472.360,38	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"	un	8,00			-		$ 28.310,86	$ -	$ 226.487,00	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	un	2,00			-		$ 129.729,46	$ -	$ 259.458,91	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	m	29,00			-		$ 14.988,50	$ -	$ 434.667,00	0,00%	0,00%
RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INLUYE REFUERZO).	M2	42,05	8,55	50,60	50,60		$ 193.996,53	$ 9.816.224,55	$ (1.658.670,00)	120,33%	120,33 %
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	11,84			11,84		$ 165.931,21	$ 1.964.625,47	$ -	100,00%	100,00 %
CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA (TRÁFICO PESADO) ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO, PENDIENTADO Y MEDIA CAÑA.	M	2,96			2,96		$ 592.067,38	$ 1.752.519,43	$ -	100,00%	100,00 %
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	420,50	(366,54)	53,96	53,96		$ 7.255,46	$ 391.504,61	$ 2.659.416,00	12,83 %	12,83%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	91,39			91,39		$ 7.103,01	$ 649.144,22	$ -	100,00%	100,00 %
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-S 6" INCLUYE ACCESORIOS	M	6,00	10,00	16,00	16,00		$ 143.600,90	$ 2.297.614,44	$ (1.436.009,00)	266,67%	266,67 %
CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 M X 0.60 M EN CONCRETO REFORZADO < = 1,00 M CON MARCO Y TAPA METÁLICA E= 0.20 M	un	4,00	-4,00	0,00	-		$ 1.618.437,02	$ -	$ 6.473.748,09	0,00%	0,00%
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	3,00			2,00		$ 875.947,70	$ 1.751.895,39	$ 875.948,00	66,67 %	66,67%

CPF	1913	IED			SIERRA MORENA			SEMANA 47			
CANAL EN PVC AMAZONAS O EQUIVALENTE, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	3,60			3,60		$ 68.114,71	$ 245.212,96	$ -	100,00%	100,00%
MURO EN SUPERBOARD DE 8 MM INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA, MASILLA, CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA, VISTO DOS CARAS E= 12 CM	M2	15,77	1,25	17,02	17,02		$ 159.158,72	$ 2.708.881,47	$ (198.948,00)	107,93%	107,93%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA, EL TUBO PASAMANOS DE 2" CALIBRE 18 AL IGUAL QUE LOS TUBOS PEDESTALES CON PLATINA DE FIJACIÓN Y TRAVESAÑOS VERTICALES EN TUBERÍA DE 3/4" CON SEPARACIÓN CADA 9CM, PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS.	M	33,78			36,35		$ 1.120.163,13	$ 40.719.658,08	$ (2.880.548,00)	107,61%	107,61%
PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	172,00	(172,00)	-	-		$ 65.757,83	$ -	$ 11.310.347,00	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO (RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA CANCHA MULTIPLE INCLUYE DEMARCACIONES BALONCESTO - VOLEYBOL)	M2			146,06	156,06		$ 77.589,44	$ 12.108.607,88	$ (12.108.608,00)	106,85%	106,85%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	14,08	2,72	16,80	16,80		$ 98.222,57	$ 1.650.139,25	$ (267.165,00)	119,32%	119,32%
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	4,08			4,08		$ 45.289,29	$ 184.780,29	$ -	100,00%	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	4,84			4,84		$ 126.224,49	$ 610.926,55	$ -	100,00%	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1,00			1,00		$ 572.567,48	$ 572.567,48	$ -	100,00%	100,00%

CPF	1913	IED			SIERRA MORENA			SEMANA 47			
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	24,00			24,00		$ 23.315,15	$ 559.563,51	$ -	100,00%	100,00 %
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	24,00			24,00		$ 20.790,98	$ 498.983,52	$ -	100,00%	100,00 %
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	5,08	0,05	5,13	5,13		$ 798.362,30	$ 4.095.598,62	$ (39.918,00)	100,98%	100,98 %
PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	193,76	-98,31	95,45	105,45		$ 29.785,43	$ 3.140.873,57	$ 2.630.351,00	54,42 %	54,42%
PINTURA DE ACEITE SOBRE PAÑETE (2 MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	61,76	14,44	76,20	86,20		$ 29.785,43	$ 2.567.504,05	$ (727.956,00)	139,57%	139,57 %
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	kg	226,80	92,51	319,31	319,31		$ 23.042,63	$ 7.357.741,55	$ (2.131.674,00)	140,79%	140,79 %
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARÁ SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	36,84	-23,74	13,10	15,10		$ 264.771,67	$ 3.998.052,18	$ 5.756.136,00	40,99 %	40,99%
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	537,24			537,24		$4.663,84	$ 2.505.600,70	$ -	100,00%	100,00 %
	SUBTOTAL I.E.D. SUBTOTAL I.E.D. SIERRA MORENA							**$118.699.548,00**			

Ilustración 20. Actividades Sierra Morena
Fuente: Propia

CPF	1930	IED			UNIÓN EUROPEA			SEMANA 47			
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	168,00	10,14	178,14	178,14		$ 4.233,48	$ 754.151,38	$ (42.927,00)	106,04 %	106,04%
CERRAMIENTO EN LONA	M	45,00	7,80	52,80	23,83		$ 31.110,25	$ 741.422,37	$ 658.538,70	52,96%	52,96%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	136,13	(104,13)	32,00	32,00		$ 3.248,63	$ 103.956,25	$ 338.280,13	23,51%	23,51%
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5,83	-	5,83	-		$ 144.722,0 0	$ -	$ 843.729,29	0,00%	0,00%
DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	36,30			36,30		$ 26.782,33	$ 972.198,70	$ -	100,00 %	100,00%
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y	M	5,15	7,35	12,50	12,50		$ 27.938,51	$ 349.231,40	$ (205.348,06)	242,72 %	242,72%

CPF	1930	IED			UNIÓN EUROPEA			SEMANA 47			
RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)											
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	m2	168,00	5,63	173,63	183,63		$ 36.752,18	$ 6.748.803,22	$ (574.436,61)	109,30 %	109,30%
DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	un	18,00	6,00	24,00	24,00		$ 11.967,87	$ 287.228,79	$ (71.807,20)	133,33 %	133,33%
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	un	18,00	6,00	24,00	24,00		$ 7.469,97	$ 179.279,20	$ (44.819,80)	133,33 %	133,33%
DESMONTE DE TABLERO ELÉCTRICO DE 12-18 CIRCUITOS DETERIORADO, INCLUYE RETIRO DE PROTECCIONES Y DISPOSICIÓN DE RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN	un	1,00			-		$ 55.922,89	$ -	$ 55.922,89	0,00%	0,00%

CPF	1930	IED			UNIÓN EUROPEA			SEMANA 47			
A SITIOS AUTORIZADOS, NO INCLUYE RESANES NI PINTURAS.											
DEMOLICIÓN ALFAJÍA EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE COSNTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	7,00	0,00	7,00	-		$ 32.498,47	$ -	$ 227.489,29	0,00%	0,00%
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	m	3,90	-3,90	0,00	-		$ 18.687,73	$ -	$ 72.882,16	0,00%	0,00%
PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	19,43			19,43		$ 21.844,63	$ 424.441,11	$ -	100,00 %	100,00%

CPF	1930	IED			UNIÓN EUROPEA			SEMANA 47			
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	4,00			4,00		$ 126.905,79	$ 507.623,16	$ -	100,00 %	100,00%
EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	3,90			3,90		$ 89.839,27	$ 350.373,14	$ -	100,00 %	100,00%
CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (INCLUYE FORMALETAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	M	19,43			19,43		$ 42.469,67	$ 825.185,65	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	kg	3515,11	-1076,19	2438,92	2.608,92		$ 23.042,63	$ 60.116.373,04	$ (84.914.618,87)	-242,42 %	-242,42%
CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (INCLUYE FORMALETAS Y TODO LO	M	19,43			19,43		$ 42.469,67	$ 825.185,65	$ (825.185,65)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

CPF	1930	IED			UNIÓN EUROPEA			SEMANA 47			
REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO).											
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO (35 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR.	M	0,50			0,50		$ 341.855,19	$ 170.927,60	$ (170.927,60)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	m	26,40	18,13	44,53	44,53		$ 91.590,40	$ 4.078.520,47	$ (1.660.533,93)	245,62%	245,62%
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	1,00	-1,00	0,00			$ 875.947,70	$ -	$ 875.947,70	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS	kg	213,75	0,29	214,04	214,04		$ 264.771,67	$ 56.671.727,78	$ (76.783,78)	100,14%	100,14%

CPF	1930	IED			UNIÓN EUROPEA			SEMANA 47			
PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARÁ SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).											
FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	18,15			18,15		$ 106.267,26	$ 1.928.750,73	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	34,90			34,9		$ 91.590,40	$ 3.196.504,93	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	42,00			42		$ 23.315,15	$ 979.236,14	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 2N°10 (F) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	42,00			42		$ 20.790,98	$ 873.221,16	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA	UN	21,00	3,00	24,00	24		$ 180.330,15	$ 4.327.923,59	$ (540.990,45)	114,29 %	114,29%

CPF	1930	IED			UNIÓN EUROPEA			SEMANA 47			
CONEXIÓN E INSTALACIÓN.											
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	21,00	3,00	24,00	24		$ 238.055,44	$ 5.713.330,57	$ (714.166,32)	114,29 %	114,29%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M	22,50	8,50	31,00	30		$ 304.166,74	$ 9.125.002,11	$ (2.281.250,53)	133,33 %	133,33%
SUMINISTRO E INSTALACION MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA, PERFILES ESTUCTURALES DE ACERO GALVANIZADO PGU, MONTANTES, TORNILLOS PARA ESTRUCTURA, CLAVO IMPACTADO. ACABADO A DOS MANOS CON PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO.	M2	32,35	0,75	33,10	33,1		$ 222.048,37	$ 7.349.801,01	$ (166.536,28)	102,32 %	102,32%

CPF	1930	IED			UNIÓN EUROPEA			SEMANA 47			
PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M2	61,70			65,10		$ 17.207,77	$ 1.120.195,60	$ (58.476,16)	105,51 %	105,51%
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	224,21			224,21		$ 4.663,84	$ 1.045.679,27	$ -	100,00 %	100,00%
	SUBTOTAL I.E.D. SUBTOTAL I.E.D. UNION EUROPEA							**$ 169.766.274,00**			

Ilustración 21. Actividades Unión Europea Sede B
Fuente: Propia

CPF	1904	IED			ARBORIZADORA BAJA			SEMANA 47			
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	786,72	463,91	1250,63	1.250,63		$ 7.045,00	$ 8.810.688,60	$ (3.268.246,00)	158,97 %	158,97%
CERRAMIENTO EN LONA	M	96,25	73,00	169,25	169,25		$ 31.110,25	$ 5.265.409,14	$ (2.271.047,96)	175,84 %	175,84%
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	466,58	9,42	476,00	476,00		$ 107.273,69	$ 51.062.274,77	$ (1.010.518,00)	102,02 %	102,02%
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	5,25			-		$ 22.300,62	$ -	$ 117.078,27	0,00%	0,00%
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE	M2	145,00	6,23	151,23	151,23		$ 32.594,26	$ 4.929.229,33	$ (203.062,21)	104,30 %	104,30%

CPF	1904	IED			ARBORIZADORA BAJA			SEMANA 47			
CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)											
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	145,00	123,77	21,23	21,23		$ 42.650,45	$ 905.469,00	$ 5.278.845,87	14,64%	14,64%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO CON FIBRA SINTÉTICA ESPESOR 4 CM	M2	130,00			130,00		$ 69.868,54	$ 9.082.910,19	$ -	100,00 %	100,00%
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	m2	323,02			323,02		$ 36.752,18	$ 11.871.653,14	$ 37,00	100,00 %	100,00%
DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA (INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	35,50			35,50		$ 8.680,11	$ 308.143,88	$ -	100,00 %	100,00%
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	un	25,00			25,00		$ 7.469,97	$ 186.749,17	$ -	100,00 %	100,00%
DESMONTE CANCHA MULTIPLE (ARCO DE MICROFUTBOL Y ARO DE BALONCESTO)	un	2,00			2,00		$ 398.950,46	$ 797.900,91	$ -	100,00 %	100,00%

CPF	1904	IED			ARBORIZADORA BAJA			SEMANA 47			
(INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)											
DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	21,00			-		$ 11.761,45	$ -	$ 246.991,00	0,00%	0,00%
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	16,80	5,76	22,56	22,56		$ 91.988,38	$ 2.075.257,93	$ (529.853,00)	134,29 %	134,29%
EXCAVACIÓN MECÁNICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	258,10	(36,51)	221,59	221,59		$ 79.962,51	$ 17.718.891,73	$ 2.919.431,00	85,85%	85,85%
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	22,83			22,83		$ 135.394,33	$ 3.091.052,48	$ -	100,00 %	100,00%
EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	15,52			2,22		$ 66.591,58	$ 147.833,30	$ 885.668,00	14,30%	14,30%

CPF	1904	IED			ARBORIZADORA BAJA			SEMANA 47			
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	m3	103,10	68,26	171,36	171,36		$ 176.060,25	$ 30.169.684,13	$ (12.017.873,00)	166,21 %	166,21%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAJÓN DE PIEDRA	m3	129,05	25,90	154,95	154,95		$ 176.060,25	$ 27.280.535,46	$ (4.559.960,00)	120,07 %	120,07%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BORDILLO PREFABRICADO A80	m	87,00			87,00		$ 76.033,93	$ 6.614.951,64	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M	90,00			90,00		$ 97.085,28	$ 8.737.675,50	$ -	100,00 %	100,00%
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	18,70	5,00	23,70	23,70		$ 165.931,21	$ 3.932.569,57	$ (829.656,00)	126,74 %	126,74%
CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI ANCHO 0.50 M E= 0.07 M (NO INCLUYE REFUERZO)	M	90,00			90,00		$ 164.788,52	$ 14.830.966,59	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO (45 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3 MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR.	M	1,52			1,52		$ 358.768,86	$ 545.328,67	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PEATONAL DE ANGULOS Y PLATINAS DE ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO	M	0,90			0,90		$ 156.990,72	$ 141.291,65	$ -	100,00 %	100,00%

CPF	1904	IED			ARBORIZADORA BAJA			SEMANA 47			
Y PINTURA COLOR PARA CARCAMO ANCHO 40 CM											
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	kg	1809,76	-142,50	1667,26	1.667,26		$ 23.042,63	$ 38.418.051,96	$ 3.283.574,00	92,13%	92,13%
CAJA DE INSPECCION 100 X 100 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	2,00					$ 1.088.548,32	$ -	$ 2.177.097,00	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	m2	684,78	-162,78	522,00	522,00		$ 11.730,42	$ 6.123.281,59	$ 1.909.479,00	76,23%	76,23%
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	m	3,00			2,00		$ 5.565,04	$ 11.130,08	$ 5.565,00	66,67%	66,67%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU	m2	323,02			323,02		$ 264.771,67	$ 85.526.544,13	$ -	100,00 %	100,00%

CPF	1904	IED			ARBORIZADORA BAJA			SEMANA 47			
CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).											
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	m	35,50			35,50		$ 305.515,84	$ 10.845.812,21	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN ASFALTO MD-10 PARA CANCHA DEPORTIVA E=8 CM, (INCLUYE: EMULSION ASFALTICA, ASFALTO MD-10 Y ACABADO CON SLURRY	m2	484,50	-43,86	440,64	440,64		$ 225.361,76	$ 99.303.405,31	$ 9.884.367,00	90,95%	90,95%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO (RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA CANCHA MULTIPLE INCLUYE DEMARCACIONE	M2	484,50	-484,50	0,00	-		$ 77.589,44	$ -	$ 37.592.083,00	0,00%	0,00%

CPF	1904	IED			ARBORIZADORA BAJA			SEMANA 47			
S BALONCESTO - VOLEYBOL)											
PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	714,00			680,68		$ 65.757,83	$ 44.760.026,89	$ 2.191.065,00	95,33%	95,33%
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M	66,67			66,67		$ 62.023,52	$ 4.135.108,31	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	620,45			620,45		$ 7.255,46	$ 4.501.650,03	$ -	100,00 %	100,00%
DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	353,72			353,72		$ 18.365,30	$ 6.496.173,31	$ -	100,00 %	100,00%
CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL (INC. DOS UNIDADES FIJAS DE MICROBALONCESTO - MALLA PARA MICRO FUTBOL - JUEGO DE POSTES Y MALLA PARA VOLEIBOL -	UN	2,00	-1,00	1,00	1,00		$ 12.850.061,48	$ 12.850.061,48	$ 12.850.061,00	50,00%	50,00%

CPF	1904	IED			ARBORIZADORA BAJA			SEMANA 47			
DEMARCACIÓN DE LA CANCHA - TRANSPORTE - E INSTALACIÓN)											
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	5,00			4,00		$ 126.905,79	$ 507.623,16	$ 126.906,00	80,00%	80,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1,00			1,00		$ 572.567,48	$ 572.567,48	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	118,00			118,00		$ 15.217,85	$ 1.795.706,06	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	118,00			118,00		$ 16.070,48	$ 1.896.316,55	$ -	100,00 %	100,00%

CPF	1904	IED			ARBORIZADORA BAJA			SEMANA 47			
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	25,00			25,00		$ 180.330,15	$ 4.508.253,74	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	22,00			22,00		$ 238.055,44	$ 5.237.219,69	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER 2X20W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	3,00			3,00		$ 193.810,36	$ 581.431,07	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE	M	194,18			194,18		$ 9.167,13	$ 1.780.074,18	$ -	100,00 %	100,00%

CPF	1904	IED			ARBORIZADORA BAJA			SEMANA 47			
CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)											
CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H= 5.00 M (ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO DE 3" E= 3,81 MM ASTM A500 Y CAMISA DE REFUERZO DE 4", VARILLA REDONDA DE 3/4" C./.14 EJES. VIGA 40X30 Y PILOTES CONCRETO 3000 PSI) SEGÚN DETALLES IDRD.	M2	17,50			16,95		$ 2.042.059,82	$ 34.612.913,93	$ 1.123.133,00	96,86%	96,86%
CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H= 2.50 M (ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO DE 2-1/2" Y PROTECCIÓ N EN VARILLA REDONDA DE 3/4" C./0.14 m EJES. VIGA=30*30 CONCRETO 3000PSI) SEGÚN DETALLES IDRD.	M2	17,50			16,95		$ 1.257.854,97	$ 21.320.641,75	$ 691.820,00	96,86%	96,86%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO HETEROGENEO ALTO TRÁFICO	M2	130,00			125,78		$ 237.210,90	$ 29.836.007,59	$ 1.001.410,00	96,75%	96,75%
LAVADO Y LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE EN EL COLEGIO ARBORIZADORA BAJA (INCLUYE INSUMOS)	ML	197,54			194,54		$ 5.046,98	$ 981.840,09	$ 15.141,00	98,48%	98,48%
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1.078,76			1.078,76		$ 4.663,84	$ 5.031.162,64	$ -	100,00 %	100,00%
	SUBTOTAL I.E.D. SUBTOTAL I.E.D. ARBORIZADORA BAJA							**$ 630.139.470,00**			

Ilustración 22 - Actividades Arborizadora Baja
Fuente: *Propia*

CPF	523	IED			Fabio Lozano Simonelli			SEMANA 47			
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	1201,02	10,05	1211,07	1.211,07		$ 4.233,48	$ 5.127.035,54	$ (42.546,00)	100,00 %	100,00%
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	51,83	81,17	133,00	133,00		$ 31.110,25	$ 4.137.662,72	$ (2.525.218,67)	256,61 %	256,61%
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	235,29	11,28	246,57	246,57		$ 32.594,26	$ 8.036.765,70	$ (367.663,21)	100,00 %	100,00%
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2			68,70	68,70		$ 107.273,69	$ 7.369.702,26	$ (7.369.702,26)	100,00 %	100,00%

CPF	523	IED			Fabio Lozano Simonelli			SEMANA 47			
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN ASITIOS AUTORIZADOS)	M2	28,64	1,35	29,99	29,99		$ 22.300,62	$ 668.795,68	$ (30.105,84)	100,00 %	100,00%
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	55,48	30,02	85,50	85,50		$ 12.649,16	$ 1.081.503,32	$ (379.727,83)	154,11 %	154,11%
DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	28,00			28,00		$ 20.708,69	$ 579.843,18	$ -	100,00 %	100,00%
EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)}	M3	15,05	0,08	15,13	15,13		$ 66.591,58	$ 1.007.530,54	$ (5.327,33)	100,53 %	100,53%
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	17,32			17,32		$ 33.174,37	$ 574.580,07	$ -	100,00 %	100,00%

CPF	523	IED			Fabio Lozano Simonelli			SEMANA 47			
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	UN	28,00			28,00		$ 27.281,50	$ 763.882,01	$ -	100,00 %	100,00%
DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2			3,00	3,00		$ 25.731,38	$ 77.194,15	$ -	100,00 %	100,00%
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	66,00			66,00		$ 27.938,51	$ 1.843.941,79	$ -	100,00 %	100,00%
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3			63,85	63,85		$ 34.724,48	$ 2.217.158,36	$ -	100,00 %	100,00%
CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A	M			120,60	120,60		$ 15.633,37	$ 1.885.384,52	$ -	100,00 %	100,00%

CPF	523	IED			Fabio Lozano Simonelli			SEMANA 47			
SITIOS AUTORIZADOS)											
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	8,00			8,00		$ 7.469,97	$ 59.759,73	$ -	100,00 %	100,00%
DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	55,30	-5,16	50,14	50,14		$ 32.569,97	$ 1.633.058,41	$ 168.061,06	90,67%	90,67%
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	22,90			22,90		$ 18.687,73	$ 427.949,09	$ -	100,00 %	100,00%
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2			2,80	2,80		$ 18.044,21	$ 50.523,80	$ -	100,00 %	100,00%

CPF	523	IED			Fabio Lozano Simonelli			SEMANA 47			
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	12,80	2,49	15,29	15,29		$ 135.394,33	$ 2.070.179,26	$ (337.131,87)	119,45 %	119,45%
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 m	M2	194,67			194,67		$ 42.650,45	$ 8.302.762,60	$ -	100,00 %	100,00%
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	49,31			49,31		$ 45.289,29	$ 2.233.214,74	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO CON FIBRA SINTÉTICA ESPESOR 4 CM	M2	548,06	(548,06)	-			$ 69.868,54	$ -	$ 38.292.151,98	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	158,76	(56,05)	102,71	102,71		$ 7.103,01	$ 729.550,31	$ 398.123,79	64,70%	64,70%
CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI ANCHO 0.50 M E= 0.07 M (NO INCLUYE REFUERZO)	M	171,60	(44,68)	126,92	122,00		$ 164.788,52	$ 20.104.199,16	$ 8.173.510,48	71,10%	71,10%
PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2			0,64	0,64		$ 115.264,41	$ 73.769,22	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PEATONAL DE ANGULOS Y PLATINAS DE ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR PARA CARCAMO ANCHO 40 CM	M			13,00	13,00		$ 156.990,72	$ 2.040.879,36	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE	M			20,50	20,57		$ 24.290,55	$ 499.656,52	$ (1.700,34)	100,34 %	100,34%

CPF	523	IED			Fabio Lozano Simonelli			SEMANA 47			
CONCRETO A INTEMPERIE											
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2,00			2,00		$ 126.905,79	$ 253.811,58	$ (253.811,58)	100,00 %	100,00%
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00			1,00		$ 253.721,19	$ 253.721,19	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	M	1,00			1,00		$ 572.567,48	$ 572.567,48	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE	M	8,00			8,00		$ 180.330,15	$ 1.442.641,20	$ -	100,00 %	100,00%

CPF	523	IED			Fabio Lozano Simonelli			SEMANA 47			
SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.											
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	32,00	-27,00	5,00	5,00		$ 23.315,15	$ 116.575,73	$ 629.508,95	15,63%	15,63%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M			55,00	55,00		$ 33.700,52	$ 1.853.528,49	$ (1.853.528,49)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	32,00	(12,00)	20,00	20,00		$ 20.790,98	$ 415.819,60	$ 249.491,76	62,50%	62,50%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA	UN			8,00	8,00		$ 198.607,76	$ 1.588.862,05	$ -	100,00 %	100,00%

CPF	523	IED			Fabio Lozano Simonelli			SEMANA 47			
CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS											
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	8,00	-5,00	3,00	3,00		$ 238.055,44	$ 714.166,32	$ 1.190.277,20	37,50%	37,50%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL TOTALIZADOR 3X125 A. MATERIALES CERTIFICADOS RETIE E INSTALADOS SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UN			1,00	1,00		$ 781.835,83	$ 781.835,83	$ (781.835,83)	100,00 %	100,00%
ACOMETIDA TRIFASICA EN 4#8 + 1#10 CABLE LIBRE DE HALOGENOS. INCLUYE CONECTORES TUBULARES Y AISLAMIENTO AUTOFUNDENTE INCLUYE MANIOBRAS DE CANALIZACIÓN	M			60,00	60,00		$ 57.049,39	$ 3.422.963,50	$ (3.422.963,50)	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	15,00	(2,42)	12,58	12,58		$ 361.355,09	$ 4.545.846,98	$ 874.479,31	83,87%	83,87%
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	1,00			1,00		$ 875.947,70	$ 875.947,70	$ -	100,00 %	100,00%

CPF	523	IED			Fabio Lozano Simonelli			SEMANA 47			
CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	55,30	-5,16	50,14	50,14		$ 130.345,99	$ 6.535.548,17	$ 672.585,33	90,67%	90,67%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	226,69	12,39	239,08	239,08		$ 126.224,49	$ 30.177.196,69	$ (1.563.366,10)	105,46 %	105,46%
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	17,44	76,23	93,67	93,67		$ 33.727,50	$ 3.159.254,93	$ (2.571.047,33)	537,10 %	537,10%
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M			39,00	39,00		$ 22.829,47	$ 890.349,34	$ (890.349,34)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M2	0,00	5,29	5,29	5,29		$ 62.023,52	$ 328.104,44	$ (328.104,44)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
WIN DE ALUMINIO	M	18,00	2,90	20,90	20,90		$ 15.372,99	$ 321.295,59	$ (44.581,68)	116,11 %	116,11%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	131,00	(37,64)	93,36	93,36		$ 98.222,57	$ 9.170.059,56	$ 3.697.097,71	71,27%	71,27%

CPF	523	IED			Fabio Lozano Simonelli			SEMANA 47			
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO CON DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	11,73	-5,49	6,24	6,24		$ 1.127.900,21	$ 7.038.097,34	$ 6.192.172,18	53,20%	53,20%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	47,82	-8,24	39,58	40,99		$ 989.338,00	$ 40.552.909,59	$ 6.757.233,57	85,72%	85,72%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	1,80	0,30	1,50	1,50		$ 989.338,00	$ 1.484.007,00	$ 296.801,40	83,33%	83,33%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	3,00			3,00		$ 772.427,21	$ 2.317.281,62	$ -	100,00 %	100,00%

CPF	523	IED			Fabio Lozano Simonelli			SEMANA 47			
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL BLANCO DE 2 CUERPOS CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA, DESCARGA SENCILLA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, BRIDA, ACOPLE Y VALVULA PLASTICA DE 1/2" PARA REGULACION DE PRESION. CONSUMO DE AGUA DE 4.8 LTS POR DESCARGA, CAPACIDAD MINIMA DE EVACUACION DE SOLIDOS 400 GRAMOS	UN	11,00			11,00		$ 1.117.185,66	$ 12.289.042,29	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, CON DOS PERSIANAS INFERIOR Y SUPERIOR DE 30CM X 60CM. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2			3,84	3,84		$ 798.362,30	$ 3.065.711,25	$ -	100,00 %	100,00%

CPF	523	IED			Fabio Lozano Simonelli			SEMANA 47			
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	14,00			14,00		$ 404.611,28	$ 5.664.557,91	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M			102,46	102,46		$ 91.590,40	$ 9.384.352,28	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M			1,65	1,65		$ 78.726,73	$ 129.899,11	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M			24,00	24,00		$ 51.125,49	$ 1.227.011,85	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1-1/2 "	UN	11,00			11,00		$ 18.869,86	$ 207.568,48	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1/2"	UN	28,00			28,00		$ 4.998,42	$ 139.955,63	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	14,00			14,00		$ 63.533,17	$ 889.464,33	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	14,00			14,00		$ 63.533,17	$ 889.464,33	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	7,20	0,56	7,76	7,76		$ 123.260,52	$ 956.501,65	$ (69.025,89)	107,78 %	107,78%
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	66,72	216,43	283,15	283,15		$ 20.236,50	$ 5.729.964,98	$ (4.379.785,70)	424,39 %	424,39%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN			24,00	24,00		$ 33.569,66	$ 805.671,73	$ -	100,00 %	100,00%
PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	-		22,64	22,64		$ 32.026,28	$ 725.075,09	$ (725.075,09)	100,00 %	100,00%
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M			122,00	122,00		$ 32.026,28	$ 3.907.206,76	$ -	100,00 %	100,00%

CPF	523	IED			Fabio Lozano Simonelli			SEMANA 47			
PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN).	M2	176,38			176,38		$ 6.610,59	$ 1.165.975,86	$ -	100,00 %	100,00%
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1.201,02			1.201,02		$ 4.663,84	$ 5.601.363,56	$ -	100,00 %	100,00%
	SUBTOTAL I.E.D. SUBTOTAL I.E.D. FABIO SIMONELLI							**$ 245.187.661,00**			

Ilustración 23 - Actividades Fabio Lozano Simonelli
Fuente: *Propia*

CPF	1918	IED			Estrella del Sur Sede B			SEMANA 47			
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	557,28	20,48	577,76	577,76		$ 4.233,48	$ 2.445.932,98	$ (86.702,00)	103,67 %	103,67%
CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo drywall 1 1/2").	M	88,20	-88,20	0,00	-		$ 154.730,98	$ -	$ (13.647.272,19)	0,00%	0,00%

CPF	1918	IED			Estrella del Sur Sede B			SEMANA 47			
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	54,17			33,24		$ 33.174,37	$ 1.102.716,03	$ 694.339,54	61,36%	61,36%
DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	95,99	-32,70	63,29	63,29		$ 29.391,49	$ 1.860.302,19	$ 960.987,18	65,94%	65,94%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS,	M2	28,37					$ 707.267,02	$ -	$ 20.065.165,47	0,00%	0,00%

CPF	1918	IED			Estrella del Sur Sede B			SEMANA 47			
ANGULOS Y # DE HOJAS.											
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON DOBLE ANTI MACHUCON, REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	25,81	6,00	31,81	35,81		$ 829.259,39	$ 29.695.861,74	$ (8.292.676,84)	138,75 %	138,75%

CPF	1918	IED			Estrella del Sur Sede B			SEMANA 47			
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1,43			1,43		$ 798.362,30	$ 1.145.011,22	$ (3.353,12)	100,29 %	100,29%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO, CUERPOS FIJOS, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A DISEÑO SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	87,25			69,15		$ 467.649,33	$ 32.338.268,71	$ 8.464.135,19	79,26%	79,26%
ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM	M	141,20			141,20		$ 9.408,62	$ 1.328.459,99	$ 37,63	100,00 %	100,00%
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	141,20			148,20		$ 22.829,47	$ 3.383.236,17	$ (159.714,97)	104,95 %	104,95%
PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3	M	141,20			148,20		$ 17.207,77	$ 2.550.122,76	$ (120.385,56)	104,95 %	104,95%

CPF	1918	IED			Estrella del Sur Sede B			SEMANA 47			
MANOS - (HASTA 60 CM)											
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	577,76			597,76		$ 4.663,84	$ 2.787.856,22	$ (93.276,77)	103,46 %	103,46%
	SUBTOTAL I.E.D. SUBTOTAL I.E.D. ESTRELLA DEL SUR - B							**$ 78.637.768,00**			

Ilustración 24 - Actividades Estrellas del Sur Sede B
Fuente: *Propia*

CPF	1974	IED			CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)			SEMANA 47			
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	538,32	-88,32	450,00	450,00		$ 4.233,48	$ 1.905.064,11	$ 373.901,00	83,59%	83,59%
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5"anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	78,28	11,72	90,00	95,00		$ 31.137,23	$ 2.958.036,66	$ (520.614,00)	121,36 %	121,36%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	538,32					$ 3.248,63	$ -	$ 1.748.804,00	0,00%	0,00%

CPF	1974	IED			CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)			SEMANA 47			
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	12,00	(1,00)	11,00	11,00		$ 7.469,97	$ 82.169,63	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M			5,00	5,00		$ 23.315,15	$ 116.575,73	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 2N°10 (F) + 1N°12 (T) AWG THHN	M			20,00	20,00		$ 20.790,98	$ 415.819,60	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES 50W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	1,00			1,00		$ 101.214,88	$ 101.214,88	$ -	100,00 %	100,00%
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	M2	538,82	-134,52	404,30	408,30		$ 36.752,18	$ 15.005.915,99	$ 4.796.895,00	75,78%	75,78%

CPF	1974	IED			CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)			SEMANA 47			
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	1841,40	-941,87	899,53	902,53		$ 23.042,63	$ 20.796.663,05	$ 21.634.032,15	49,01%	49,01%
CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	44,00			46,69		$ 130.345,99	$ 6.086.241,01	$ (351.017,24)	106,12 %	106,12%
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	633,15			632,63		$ 4.663,84	$ 2.950.473,25	$ 2.436,22	99,92%	99,92%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUAYA METÁLICA PARA CERCHA METÁLICA	M2	30,00			30,00		$ 37.696,55	$ 1.130.896,57	$ -	100,00 %	100,00%
FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2			87,00	87,00		$ 106.267,26	$ 9.245.251,44	$ (9.245.251,44)	100,00 %	100,00%

CPF	1974	IED			CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)			SEMANA 47			
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARÁ SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	KG	538,31	-538,31	0,00	-		$ 264.771,67	$ -	$ 142.529.236,49	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 50 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR 50 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 24 PINTADOS DOS (2) CARAS CON	KG	0,00	0,00	410,94	410,94		$ 306.692,25	$ 126.032.114,08	$ (126.032.114,08)	100,00 %	100,00%

CPF	1974	IED			CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)			SEMANA 47			
PINTURA POLIESTER LIBRE DDE AACEITES (NNCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARÁ LOS METROS CUADRADOS RALMENTE INSTALADOS)											
	SUBTOTAL I.E.D. SUBTOTAL I.E.D. CALASANZ BUENA VISTA							$ 186.826.436,00			

Ilustración 25 - Actividades Calasanz (Buenavista)
Fuente: *Propia*

CPF	546	IED			SANTA LIBRADA (IED)			SEMANA 47			
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	557,28			557,28		$ 4.233,48	$ 2.359.231,39	$ -	100,00 %	100,00%
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5"anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	128,18	-78,18	50,00	50,00		$ 31.110,25	$ 1.555.512,30	$ 2.432.199,03	39,01 %	39,01%
CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	65,03	-39,70	25,33	25,33		$ 15.633,37	$ 395.993,28	$ 620.644,82	38,95 %	38,95%

CPF	546	IED			SANTA LIBRADA (IED)			SEMANA 47			
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	67,90		0,80	0,80		$ 32.594,26	$ 26.075,40	$ 2.187.074,58	1,18%	1,18%
PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	27,20			13,34		$ 21.844,63	$ 291.407,33	$ 302.766,53	49,04 %	49,04%
PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	372,13			334,28		$ 13.385,77	$ 4.474.588,57	$ 506.658,09	89,83 %	89,83%
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M			18,00	18,00		$ 22.829,47	$ 410.930,46	$ (410.930,46)	100,00 %	100,00%
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	63,87	28,85	92,72	92,72		$ 34.724,48	$ 3.219.654,24	$ (1.001.801,39)	145,17 %	145,17%
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2			73,27	73,27		$ 36.752,18	$ 2.692.832,39	$ -	100,00 %	100,00%

CPF	546	IED			SANTA LIBRADA (IED)			SEMANA 47			
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	16,47	(16,47)	-			$ 18.044,21	$ -	$ -	0,00%	0,00%
DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	194,87			194,87		$ 9.443,70	$ 1.840.293,82	$ 1.840.293,82	100,00 %	100,00%
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	59,96			59,96		$ 91.988,38	$ 5.515.765,80	$ 5.515.765,80	100,00 %	100,00%
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	100,00	(20,61)	79,39	79,39		$ 53.568,71	$ 4.252.820,18	$ 4.252.820,18	79,39 %	79,39%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M	63,33			13,44		$ 91.988,38	$ 1.236.323,87	$ 1.236.323,87	21,22 %	21,22%
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	281,83	(180,01)	96,22	96,22		$ 45.289,29	$ 4.357.735,20	$ 4.357.735,20	34,14 %	34,14%
RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INLUYE REFUERZO).	M2			12,54	12,54		$ 193.996,53	$ 2.432.716,52	$ 2.432.716,52	100,00 %	100,00%
PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 M (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE}	M2	333,93	-143,06	190,87	190,87		$ 69.679,67	$ 13.299.757,83	$ 13.299.757,83	57,16 %	57,16%
MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	208,04			118,00		$ 25.122,94	$ 2.964.506,94	$ 2.964.506,94	56,72 %	56,72%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M			19,35	19,35		$ 91.590,40	$ 1.772.274,22	$ 1.772.274,22	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M			8,10	8,10		$ 78.726,73	$ 637.686,52	$ 637.686,52	100,00 %	100,00%
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO=	M	19,60			13,44		$ 62.023,52	$ 833.596,15	$ 833.596,15	68,57 %	68,57%

CPF	546	IED			SANTA LIBRADA (IED)			SEMANA 47			
30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).											
Demolición de Materas en concreto o fibrocemento 1.2x1.2x0.3 m y 1x0.7x0.7 m	M	48,00			37,00		$ 16.863,75	$ 623.958,75	$ 623.958,75	77,08 %	77,08%
TRATAMIENTO DE PISOS EN LADRILLO O ADOQUIN: LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS y REEMBOQUILLADO DE JUNTAS, (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN,	M	110,00	69,08	179,08	179,08		$ 16.863,75	$ 3.019.960,35	$ 3.019.960,35	162,80 %	162,80%
JUNTA DE DILATACIÓN INDUCIDA PISO EN CONCRETO ALLANADO (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, MARCACIÓN DE DILATACIONES Y SELLADO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN).	M	356,60	-300,35	56,25	59,92		$ 34.369,67	$ 2.059.599,55	$ 2.059.599,55	16,80 %	16,80%
CANAL EN PVC AMAZONAS O EQUIVALENTE, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	6,00	(6,00)	-	-		$ 68.114,71	$ -	$ -	0,00%	0,00%
DOMO EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 5 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	7,20	-1,32	5,88	5,88		$ 157.817,72	$ 927.968,18	$ 927.968,18	81,67 %	81,67%
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	67,71			67,71		$ 5.565,04	$ 376.808,69	$ 376.808,69	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CERCHA PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO,	M	6,00	-0,12	5,88	5,88		$ 101.978,47	$ 599.633,40	$ 599.633,40	98,00 %	98,00%

CPF	546	IED			SANTA LIBRADA (IED)			SEMANA 47			
ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 4.5 KG/M											
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M			17,20	20,20		$ 305.515,84	$ 6.171.419,91	$ 6.171.419,91	117,44 %	117,44%
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	335,60	(23,61)	311,99	311,99		$ 361.355,09	$ 112.739.173,09	$ 112.739.173,09	92,96 %	92,96%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	M2			190,00	190,00		$ 11.730,42	$ 2.228.757,19	$ 2.228.757,19	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN			8,00	8,00		$ 33.502,20	$ 268.017,60	$ 268.017,60	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TIERRA NEGRA ABONADA, INCLUYE CONFORMACIÓN DE TERRENO Y COMPACTACIÓN MANUAL DE TIERRA.	M3			37,42	37,42		$ 258.201,55	$ 9.661.902,03	$ 9.661.902,03	100,00 %	100,00%
SUMNINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN EN PASTO KIKUYO	M2			190,84	200,84		$ 29.001,60	$ 5.824.681,89	$ 5.824.681,89	105,24 %	105,24%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ZANJA DE 0.3 X 0.3 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000, GRAVA 3/4" Y PASES PVC LONGITUD MAX 0.3 M CADA 3 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	130,00			130,00		$ 89.213,28	$ 11.597.727,02	$ 11.597.727,02	100,00 %	100,00%
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	617,33			586,46		$ 4.663,84	$ 2.735.154,84	$ 2.735.154,84	95,00 %	95,00%
	SUBTOTAL I.E.D. SUBTOTAL I.E.D. SANTA LIBRADA							**$ 213.404.464,93**			

Ilustración 26 - Actividades Santa Librada
Fuente: Propia

CPF	1917	IED			ESTRELLA DEL SUR (IED) A			SEMANA 47			
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	20,56			20,56		$ 4.233,48	$ 87.040,26	$ -	100,00 %	100,00%
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	40,30	-31,81	8,49	8,49		$ 31.110,25	$ 264.138,88	$ 989.604,00	21,07%	21,07%
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19,52	-2,22	17,30	17,30		$ 32.594,26	$ 563.880,63	$ 72.359,00	88,63%	88,63%
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19,52	-5,96	13,56	13,56		$ 22.300,62	$ 302.396,45	$ 132.912,00	69,47%	69,47%

CPF	1917	IED			ESTRELLA DEL SUR (IED) A			SEMANA 47			
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	40,65	-2,49	38,16	38,16		$ 12.649,16	$ 482.692,01	$ 31.496,00	93,87%	93,87%
DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19,52	-4,52	15,00	15,00		$ 20.708,69	$ 310.630,28	$ 93.603,00	76,84%	76,84%
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	11,36	-5,02	6,34	6,34		$ 33.174,37	$ 210.325,50	$ 166.535,00	55,81%	55,81%
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	15,00			15,00		$ 27.281,50	$ 409.222,50	$ -	100,00 %	100,00%
SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	15,00			15,00		$ 182.479,27	$ 2.737.188,99	$ -	100,00 %	100,00%

CPF	1917	IED			ESTRELLA DEL SUR (IED) A			SEMANA 47			
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	19,52			19,52		$ 42.650,45	$ 832.536,73	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	19,52	(1,99)	17,53	17,53		$ 126.224,49	$ 2.212.715,38	$ 251.187,00	89,81%	89,81%
MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2	0,80			0,80		$ 67.218,91	$ 53.775,13	$ -	100,00 %	100,00%
WIN DE ALUMINIO	M	3,00			3,00		$ 15.372,99	$ 46.118,98	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	44,84			40,81		$ 116.158,86	$ 4.740.210,72	$ 468.353,00	91,01%	91,01%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	2,00			2,00		$ 41.130,01	$ 82.260,02	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	5,20			5,20		$ 707.267,02	$ 3.677.788,50	$ -	100,00 %	100,00%

CPF	1917	IED			ESTRELLA DEL SUR (IED) A			SEMANA 47			
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	2,16	0,12	2,28	2,38		$ 1.127.967,67	$ 2.680.941,73	$ (244.532,00)	110,04 %	110,04%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	7,00	1,00	8,00	8,00		$ 873.470,75	$ 6.987.765,98	$ (873.471,00)	114,29 %	114,29%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2,00			2,00		$ 616.820,66	$ 1.233.641,32	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	5,00			5,00		$ 404.611,28	$ 2.023.056,40	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE	UN	2,00			2,00		$ 41.130,01	$ 82.260,02	$ -	100,00 %	100,00%

CPF	1917	IED			ESTRELLA DEL SUR (IED) A			SEMANA 47			
20 X 20 PLÁSTICA											
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	28,82	12,82	41,64	42,64		$ 989.338,20	$ 42.185.380,90	$ (13.672.654,00)	147,95 %	147,95%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	1,80	(0,80)	1,00	1,00		$ 989.338,20	$ 989.338,20	$ 791.471,00	55,56%	55,56%
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	44,84			40,81		$ 36.193,65	$ 1.476.990,67	$ 145.933,00	91,01%	91,01%
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	35,50			35,10		$ 21.599,09	$ 758.128,09	$ 8.640,00	98,87%	98,87%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	2,16			2,16		$ 123.260,52	$ 266.242,73	$ -	100,00 %	100,00%
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	111,32			100,19		$ 4.663,84	$ 467.270,00	$ 51.909,00	90,00%	90,00%
	SUBTOTAL I.E.D. SUBTOTAL I.E.D. ESTRELLA DEL SUR - A							**$ 76.163.937,00**			

Ilustración 27 Actividades Estrella del Sur Sede A
Fuente: *Propia*

CPF	1959	IED			GUILLERMO CANO ISAZA (IED)			SEMANA 47			
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	125.48			125.48		$ 4,233.48	$ 531,216.54	$ -	100.00%	100.00%
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	68.00			32.20		$ 31,110.25	$ 1,001,749.92	$ 1,113,747.00	47.35%	47.35%
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	129.54	18.57	148.11	148.11		$ 32,594.26	$ 4,827,535.26	$ (605,275.00)	114.34%	114.34%
DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	150.00			150.00		$ 11,376.96	$ 1,706,544.05	$ -	100.00%	100.00%
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	40.00			40.00		$ 7,469.97	$ 298,798.67	$ -	100.00%	100.00%
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	100.00			100.00		$ 18,687.73	$ 1,868,773.32	$ -	100.00%	100.00%
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	95.87	17.32	113.19	113.19		$ 22,300.62	$ 2,524,207.52	$ (386,247.00)	118.07%	118.07%
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	364.26	(31.38)	332.88	364.26		$ 12,649.16	$ 4,607,583.60	$ -	100.00%	100.00%

CPF	1959	IED			GUILLERMO CANO ISAZA (IED)			SEMANA 47			
CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)											
MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2	7.20	3.16	10.36	10.20		$ 65,869.81	$ 671,872.04	$ (197,609.00)	141.67%	141.67%
DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND	22.00	37.00	59.00	37.00		$ 20,708.69	$ 766,221.35	$ (310,630.00)	168.18%	168.18%
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	26.61			26.11		$ 33,174.37	$ 866,182.77	$ 16,587.00	98.12%	98.12%
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	78.00			53.00		$ 27,281.50	$ 1,445,919.51	$ 682,038.00	67.95%	67.95%
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M			15.00	15.00		$ 20,708.69	$ 310,630.28	$ -	100.00%	100.00%
DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M			19.00	19.00		$ 11,967.87	$ 227,389.46	$ -	100.00%	100.00%
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN			16.00	16.00		$ 7,469.97	$ 119,519.47	$ -	100.00%	100.00%
DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M			58.00	58.00		$ 4,391.32	$ 254,696.59	$ -	100.00%	100.00%
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3	M2	35.00	118.18	153.18	153.18		$ 61,099.39	$ 9,359,204.54	$ (7,220,726.00)	437.66%	437.66%

CPF	1959	IED			GUILLERMO CANO ISAZA (IED)			SEMANA 47			
IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M											
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	129.54	30.05	159.59	159.59		$ 126,224.49	$ 20,144,167.03	$ (3,793,046.00)	123.20%	123.20%
WIN DE ALUMINIO	M	30.00	52.83	82.83	55.00		$ 15,372.99	$ 845,514.70	$ (384,325.00)	183.33%	183.33%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISIÓN POR MÓDULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM	M	7.20	16.32	23.52	23.52		$ 1,128,300.90	$ 26,537,637.11	$ (18,413,871.00)	326.67%	326.67%
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	364.26			364.26		$ 36,193.65	$ 13,183,900.70	$ -	100.00%	100.00%
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	119.96	(45.93)	74.03	68.55	9.45	$ 21,599.09	$ 1,480,617.69	$ 1,110,409.00	57.14%	57.14%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	135.38			135.38		$ 989,338.20	$ 133,939,109.55	$ (2,504.00)	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1-1/2 "	UN	37.00			37.00		$ 18,869.86	$ 698,184.88	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	37.00			37.00		$ 63,533.17	$ 2,350,727.15	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	22.00	7.00	29.00	29.00		$ 63,533.17	$ 1,842,461.82	$ (444,732.00)	131.82%	131.82%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	UN	37.00			37.00		$ 181,838.44	$ 6,728,022.41	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN	38.00			38.00		$ 97,295.74	$ 3,697,238.23	$ -	100.00%	100.00%
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	22.00			22.00		$ 5,565.04	$ 122,430.83	$ -	100.00%	100.00%

CPF	1959	IED			GUILLERMO CANO ISAZA (IED)			SEMANA 47			
ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE EN CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	74.03	-30.18	43.85	43.85	22.79	$ 13,044.45	$ 571,999.04	$ 393,681.00	59.23%	59.23%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	20.88			20.88		$ 123,260.52	$ 2,573,679.69	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN			13.00	6.00		$ 192,677.11	$ 1,156,062.68	$ (1,156,063.00)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	3.00			3.00		$ 572,567.48	$ 1,717,702.45	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	50.00	56.00	106.00	90.00		$ 23,315.15	$ 2,098,363.16	$ (932,606.00)	180.00%	180.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	50.00	56.00	106.00	90.00		$ 20,790.98	$ 1,871,188.21	$ (831,639.00)	180.00%	180.00%
PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS,	M	36.90			36.90		$ 21,844.63	$ 806,066.74	$ -	100.00%	100.00%

CPF	1959	IED			GUILLERMO CANO ISAZA (IED)			SEMANA 47			
TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)											
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	32.00			34.00		$ 180,330.15	$ 6,131,225.09	$ (360,660.00)	106.25%	106.25%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	24.00			24.00		$ 198,607.76	$ 4,766,586.16	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	20.00			8.00		$ 180,330.15	$ 1,442,641.20	$ 2,163,962.00	40.00%	40.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	5.40	0.60	6.00	5.00		$ 989,338.20	$ 4,946,691.01	$ 395,735.00	92.59%	92.59%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	12.00			10.00		$ 772,427.21	$ 7,724,272.05	$ 1,544,854.00	83.33%	83.33%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	12.00			5.00		$ 41,130.01	$ 205,650.06	$ 287,910.00	41.67%	41.67%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL BLANCO DE 2 CUERPOS CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA, DESCARGA SENCILLA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, BRIDA, ACOPLE Y VALVULA PLASTICA DE 1/2 PARA REGULACION DE PRESION. CONSUMO DE AGUA DE 4.8 LTS POR DESCARGA, CAPACIDAD	UN	45.00	-8.00	37.00	37.00		$ 1,117,185.66	$ 41,335,869.52	$ 8,937,485.00	82.22%	82.22%

CPF	1959	IED			GUILLERMO CANO ISAZA (IED)			SEMANA 47			
MINIMA DE EVACUACION DE SOLIDOS 400 GRAMOS											
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	m2	364.26	(24.03)	340.23	340.23		$ 98,222.57	$ 33,418,266.56	$ 2,360,288.00	100.00%	100.00%
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	m2	205.61			139.29		$ 4,663.84	$ 649,626.09	$ 309,306.00	67.74%	67.74%
	SUBTOTAL I.E.D. SUBTOTAL I.E.D. GUILLERMO CANO ISAZA							$ 354,373,946.66			

Ilustración 28 Actividades Guillermo Cano Isaza
Fuente: *Propia*

CPF	548	IED			TENERIFE - GRANADA SUR (IED)			SEMANA 47			
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	193,00	41,34	234,34	234,34		$ 4.233,48	$ 992.072,72	$ (175.012,00)	121,42 %	121,42%
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	39,00			26,00		$ 31.110,25	$ 808.866,40	$ 404.433,00	66,67%	66,67%
TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	24,83	65,79	90,62	90,62		$ 38.696,24	$ 3.506.652,84	$ (2.545.825,00)	364,96 %	364,96%

CPF	548	IED			TENERIFE - GRANADA SUR (IED)			SEMANA 47			
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	44,28	25,88	70,16	55,16		$ 361.355,09	$ 19.932.346,54	$ (3.931.543,00)	124,57%	124,57%
PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	44,28	25,88	70,16	70,16		$ 65.757,83	$ 4.613.569,51	$ (1.701.813,00)	158,45%	158,45%
PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	412,00	(366,94)	45,06	45,06		$ 32.026,28	$ 1.443.104,40	$ 11.751.725,00	10,94%	10,94%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA DE 1-1/4" PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR CON SOPORTES PLÁSTICO. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS	M	43,00	-7,64	35,36	30,36		$ 190.851,78	$ 5.794.260,06	$ 2.412.367,00	70,60%	70,60%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA, EL TUBO PASAMANOS DE 2" CALIBRE 18 AL IGUAL QUE LOS TUBOS PEDESTALES CON PLATINA DE FIJACIÓN Y TRAVESAÑOS VERTICALES EN TUBERÍA DE 3/4" CON SEPARACIÓN CADA 9CM, PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR. INSTALADO.	M	5,50	-0,80	4,70	4,70		$ 1.120.163,13	$ 5.264.766,69	$ 896.131,00	85,45%	85,45%

CPF	548	IED			TENERIFE - GRANADA SUR (IED)			SEMANA 47			
VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS.											
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	964,27	(570,86)	393,41	393,41		$ 4.663,84	$ 1.834.783,56	$ 2.662.416,00	40,80%	40,80%
SUMINISTRO E INSTALACION MEMBRANA PVC PLASTIFICADO SIKAPLAN 15 PR O SIMILAR	M3	150,00	(15,20)	134,80	116,77		$ 383.249,63	$ 44.750.287,29	$ 12.737.157,00	77,84%	77,84%
	SUBTOTAL I.E.D. SUBTOTAL I.E.D. TENERIFE GRANADA SUR							**$ 88.940.710,00**			

Ilustración 29 Actividades Tenerife – Granda Sur
Fuente: *Propia*

CPF	545	IED	CIUDAD DE VILLAVICENCIO (IED)					SEMANA 47			
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	540.76			540.76		$ 4,233.48	$ 2,289,294.37	$ -	100.00%	100.00%
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	35.00			35.00		$ 31,110.25	$ 1,088,858.61	$ -	100.00%	100.00%
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	107.30		-	307.00		$ 69,099.55	$ 21,213,562.74	$ (13,799,181.00)	286.11%	286.11%
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) +	M2	361.42			361.42		$ 32,594.26	$ 11,780,216.00	$ -	100.00%	100.00%

CPF	545	IED	CIUDAD DE VILLAVICENCIO (IED)					SEMANA 47			
DEMOLICIÓN Y/O DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE COMPUESTO POR MALLA ESLABONADA, ANTEPECHO EN LADRILLO, VIGA DE CIMENTACIÓN Y COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO, PARAL GALVANIZADO Y CONCERTINA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	120.00			120.00		$ 108,358.36	$ 13,003,003.55	$ -	100.00%	100.00%
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	37.24			36.65		$ 91,988.38	$ 3,371,374.26	$ 54,273.00	98.42%	98.42%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	22.04			32.04		$ 176,060.25	$ 5,640,970.35	$ (1,760,602.00)	145.37%	145.37%
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	9.00	(1.00)	8.00	8.00		$ 875,947.70	$ 7,007,581.56	$ 875,948.00	88.89%	88.89%
CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI ANCHO 0.50 M E= 0.07 M (NO INCLUYE REFUERZO)	M	50.40			50.40		$ 164,788.00	$ 8,305,315.20	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL REFORZADO EN MALLA PREONDULADA CALIBRE 8 HUECO 2", ÁNGULO 1" X 1/8" PISA MALLA EN ÁNGULO DE 3/4" X 1/4", PARALES DE 2 1/2" X 2 1/2" EN 3 MM CON SUJETADORES DE VARILLA DE 5/8" Y REFUERZOS DIAGONALES EN PLATINA DE 1-1/2"* 1/8" (INCLUYE TODOS LOS INSUMOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE)	M2	120.00			120.00		$ 503,048.36	$ 60,365,803.28	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CÁRCAMO EN CONCRETO (25 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR.	M	9.00	1.50	10.50	12.50		$ 320,598.77	$ 4,007,484.69	$ (1,122,096.00)	138.89%	138.89%

CPF	545	IED	CIUDAD DE VILLAVICENCIO (IED)					SEMANA 47			
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	m3	94.84			93.39		$ 34,724.48	$ 3,242,919.64	$ 50,351.00	98.47%	98.47%
RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INLUYE REFUERZO).	M2	6.30			6.30		$ 193,997.00	$ 1,222,181.10	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ZANJA DE 0.3 X 0.3 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000, GRAVA 3/4" Y PASES PVC LONGITUD MAX 0.3 M CADA 3 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	54.00			57.40		$ 89,213.28	$ 5,120,842.55	$ (303,325.00)	106.30%	106.30%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	M2	25.00			25.00		$ 11,730.42	$ 293,260.61	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	45.00	20.35	65.35	85.35		$ 91,590.40	$ 7,817,240.55	$ (3,695,673.00)	189.67%	189.67%
ZAPATA EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	1.92			1.92		$ 1,023,205.00	$ 1,964,553.60	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	767.00	75.00	842.00	842.00		$ 7,103.01	$ 5,980,735.68	$ (532,726.00)	109.78%	109.78%
DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE COMPUESTO POR MALLA ESLABONADA Y PARAL EN PERFIL DE ACERO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2			116.85	136.85		$ 62,810.05	$ 8,595,555.16	$ (1,256,201.00)	117.12%	117.12%
PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2	373.66		405.33	405.33		$ 115,264.41	$ 46,720,121.60	$ (3,650,424.00)	108.48%	108.48%
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	224.08		120.00	85.00		$ 21,599.09	$ 1,835,922.74	$ 3,004,002.00	70.83%	70.83%
PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M	36.48		207.47	207.47		$ 17,208.00	$ 3,570,143.76	$ (2,942,396.00)	100.00%	100.00%

CPF	545	IED	CIUDAD DE VILLAVICENCIO (IED)					SEMANA 47			
SUMNINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO 50 MM FILTRO UV. INCLUYE RELLENO EN CAUCHO GRANULAR.	M2	26.70			26.70		$ 274,938.00	$ 7,340,844.60	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO HETEROGENEO ALTO TRÁFICO	M2	36.69			36.69		$ 237,210.00	$ 8,703,234.90	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 3 CM PARA EXTERIORES	M2	116.34			116.34	54.85	$ 575,981.00	$ 67,009,629.54	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA, PERFILES ESTUCTURALES DE ACERO GALVANIZADO PGU, MONTANTES, TORNILLOS PARA ESTRUCTURA, CLAVO IMPACTADO. ACABADO A DOS MANOS CON PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO.	M2	31.60			23.54	11.06	$ 222,048.00	$ 5,227,009.92	$ 1,789,707.00	74.49%	74.49%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS - BARANDA PERIMETRAL EN PLATINAS + TUBULARES METÁLICOS H= 1.20 M. PLATINA SUPERIOR E INFERIOR A= 2 1/2" + TUBOS VERTICALES REDONDOS Ø3/4" CADA 9 CM, INCLUYE ANCLAJES A ESTRUCTURAS DE SOPORTE	M	3.86			3.86	0.66	$ 753,890.00	$ 2,910,015.40	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 6" INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE RELLENO)	M	68.00			68.00		$ 141,729.70	$ 9,637,619.63	$ -	100.00%	100.00%
	SUBTOTAL I.E.D. SUBTOTAL I.E.D. CIUDAD DE VILLAVICENCIO							$ 325,265,295.61			

Ilustración 30 Actividades Ciudad de Villavicencio
Fuente: *Propia*

CPF	1943	IED	RAFAEL URIBE URIBE (IED)					SEMANA 47			
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	52.03			52.03	52.03	$ 4,233.48	$ 220,267.75	$ -	100.00%	100.00%
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	14.00			14.00	14.00	$ 31,110.25	$ 435,543.44	$ -	100.00%	100.00%
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	21.78			5.45	5.45	$ 22,300.62	$ 121,538.40	$ 364,236.00	25.02%	25.02%
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	44.18			12.46	12.46	$ 12,649.16	$ 157,608.55	$ 401,231.00	28.20%	28.20%
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	7.56			3.78	3.78	$ 33,174.37	$ 125,399.11	$ 125,399.00	50.00%	50.00%
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	22.00			7.00	7.00	$ 27,281.50	$ 190,970.50	$ 409,223.00	31.82%	31.82%
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	36.28			8.42	8.42	$ 32,594.26	$ 274,443.64	$ 908,076.00	23.21%	23.21%
	SUBTOTAL I.E.D. SUBTOTAL I.E.D. RAFAEL URIBE							$ 1,525,771.39			

Ilustración 31 Actividades Colegio Rafael Uribe Uribe
Fuente: *Propia*

CPF	561	IED	LOS COMUNEROS - OSWALDO GUAYAZAMIN (IED)					SEMANA 47			
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	51.32			51.32	51.32	$ 4,233.48	$ 217,261.98	$ -	100.00%	100.00%
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	22.00			22.00	22.00	$ 31,110.25	$ 684,425.41	$ -	100.00%	100.00%
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	21.78		-	3.29	3.29	$ 22,300.62	$ 73,369.05	$ 412,339.00	15.11%	15.11%
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	76.20			14.10	14.10	$ 12,649.16	$ 178,315.23	$ 785,551.00	18.50%	18.50%
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	7.82			2.81	2.81	$ 33,174.37	$ 93,219.98	$ 166,204.00	35.93%	35.93%
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	22.00			10.00	10.00	$ 27,281.50	$ 272,815.00	$ 327,378.00	45.45%	45.45%

CPF	561	IED	LOS COMUNEROS - OSWALDO GUAYAZAMIN (IED)					SEMANA 47			
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	51.32			6.42	6.42	$ 32,594.26	$ 209,255.12	$ 1,463,482.00	12.51%	12.51%
	SUBTOTAL I.E.D. SUBTOTAL I.E.D. OSWLADO GUAYAZAMIN							$ 1,728,661.77			

Ilustración 32 Actividades Colegio Oswaldo Guayasmin
Fuente: *Propia*

3.2.4 OBRAS PROGRAMADAS POR EMERGENCIA

Para el presente periodo encontramos que al contratista CONSORCIO PAIS, le fueron asignadas las siguientes emergencias, adicionales a las relacionadas en la siguiente tabla y que ya fueron finalizadas:

CPF 546 IED Santa Librada, Sede A
CPF 567 IED San José de Usme -Sede A, San José Monteblanco (Don Bosco II)
CPF 575 IED Eduardo Umaña Mendoza, Sede A Villa Alemania

IED EMERGENCIAS	Presupuesto Actualizado	Porcentaje Ejecutado (%)
DIRECCION LOCAL DE EDUCACION DE USME	$ 27.970.936,00	100%
ARBORIZADORA BAJA (IED)	$ 54.989.304,00	100%
CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)	$ 62.743.230,00	100%
DIRECCION LOCAL DE EDUCACION DE USME	$ 2.036.406,00	100%
CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)	$ 7.916.830,00	100%
GUILLERMO CANO ISAZA (IED)	$ 12.144.175,00	100%
CUNDINAMARCA (IED)	$ 18.773.665,00	100%
LUIS EDUARDO MORA OSEJO (IED)	$ 50.000.000,00	100%
CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)	$ 13.517.897,01	100%
SAN JOSE DE USME	$ 27.446.204,00	100%
SANTA LIBRADA	$ 27.129.711,00	100%
EDUARDO UMAÑA MENDOZA	$ 85.000.009,00	52.22%

Ilustración 33 - *Presupuestos actualizados emergencias*
Fuente: *Propia*

3.3 RECURSOS DEL CONTRATISTA

El contratista de obra dispone para el presente periodo con los recursos necesarios para la ejecución de las actividades.

3.3.1 EQUIPO

El contratista ha utilizado los equipos necesarios para la realización de las actividades que se encuentran en cada uno de los frentes de obra.

3.3.2 PERSONAL

Teniendo en cuenta el documento Estudios y Documentos previos, en el numeral de personal clave se menciona:

El proponente con la presentación de su propuesta manifiesta que conoce y cuenta con los requisitos mínimos que deben cumplirse para el personal clave para cada cargo, los cuales se detallan en esta sección

El personal clave para el Grupo 2, Ciudad Bolívar y Usme corresponde al siguiente:

- Un (1) Director de obra.
- Un (1) Residente de obra.
- Un (1) Especialista estructural.
- Un (1) Especialista Ambiental.
- Un (1) Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Un (1) Especialista en redes eléctricas, telefónicas, voz y datos.
- Un (1) Especialista en redes hidrosanitarias, gas y red contra incendios.
- Un (1) Profesional de costos, presupuestos y programación de obra.
- Dos (2) técnicos en Seguridad y Salud en el trabajo.
- Dos (2) Inspectores técnicos de obra.

Mediante comunicado **SERINCO-SDE-2025-043-L6- REMISIÓN DE HOJAS DE VIDA - LOTE 6**, enviado a la Secretaría de Educación Distrital SED se dio aprobación a los profesionales del contratista, sin embargo posteriormente, mediante oficio **SERINCO-SDE-2025-330-L6 CAMBIO DE HOJAS DE VIDA DE PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTO E INSPECTOR - LOTE 6**, se realizó el cambio de los profesionales correspondientes a residente e inspector; por lo tanto, esta interventoría dio aprobación a las siguientes hojas de vida:

PERSONAL MINIMO DE OBRA		
CARGO	**NOMBRE**	**DEDICACIÓN**
DIRECTOR	WILSON LEONARDO PARRA ROBLES	100%
RESIDENTE	FABIO ALBEIRO AGREDO FAJARDO	100%
ESTRUCTURAL	JIMMY VERGARA SILVA	10%
AMBIENTAL	JEISSON ARNULFO SIERRA LEÓN	20%
PROF. SST	YONH JAIRO GUARIN PATERNINA	10%
ESP. ELÉCTRICO	CAMILO ANDRES LANCHEROS COY	10%
ESP. HIDROSANITARIO	JEISSON ARNULFO SIERRA LEÓN	10%
PROF. DE COSTOS	JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO	10%
TÉCNICO SST 1	CINDY LORENA RIVERA	100%
TÉCNICO SST 2	EDINSON FABER FORERO BARRANTE	100%
INSPECTOR DE OBRA 1	ALVARO ZAMIR BENITEZ MENDOZA	100%
INSPECTOR DE OBRA 2	IVAN BAUTISTA MACIAS	100%

3.4 INFORMACIÓN FINANCIERA

3.4.1 PRESUPUESTO GENERAL

La propuesta económica de CONSORCIO PAIS es de: VALOR TOTAL DEL CONTRATO: DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE MILLONES CINETO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TRENITA Y TRES PESOS M/CTE. ($2.215.148.733)

Y se cuenta con dos adiciones una por un valor de SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE ($785.001.422) INC.IVA, una segunda adición por un valor de CUATROCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($460´000.000). INC. IVA

3.4.2 PRESUPUESTO POR SEDES

Los presupuestos de obra correspondientes a cada una de las sedes intervenidas fueron debidamente revisados y aprobados por esta interventoría, verificando su coherencia técnica, financiera y contractual. En consecuencia, los mismos fueron remitidos

formalmente a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO a través del oficio SERINCO-SDE-L5-2025-074

3.4.3 PRESUPUESTO POR EMERGENCIAS

Para este mismo periodo se cuenta con un presupuesto aproximado, el cual se va a incluir en el Modificatorio No. 3 por un valor de $ 160.000.000). De las emergencias relacionadas anteriormente que corresponden a la vigencia actual, Santa Librada, Sede A, San José de Usme, Sede A y Eduardo Umaña Mendoza, Sede A, Consorcio País no ha remitido la documentación sobre los alcances, presupuestos y programaciones de estas sedes.

IED EMERGENCIAS	Presupuesto Actualizado	Porcentaje Ejecutado (%)
DIRECCION LOCAL DE EDUCACION DE USME	$ 27.970.936,00	100%
ARBORIZADORA BAJA (IED)	$ 54.989.304,00	100%
CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)	$ 62.743.230,00	100%
DIRECCION LOCAL DE EDUCACION DE USME	$ 2.036.406,00	100%
CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)	$ 7.916.830,00	100%
GUILLERMO CANO ISAZA (IED)	$ 12.144.175,00	100%
CUNDINAMARCA (IED)	$ 18.773.665,00	100%
LUIS EDUARDO MORA OSEJO (IED)	$ 50.000.000,00	100%
CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)	$ 13.517.897,01	100%
SAN JOSE DE USME	$ 27.446.204,00	100%
SANTA LIBRADA	$ 27.129.711,00	100%
EDUARDO UMAÑA MENDOZA	$ 85.000.009,00	52.22%

Para el desarrollo de este componente, el contrato cuenta con un presupuesto total asignado de ***CUATROCIENTOS DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($416.900.290,00),*** destinado exclusivamente a la atención de emergencias, el cual será utilizado conforme a las necesidades que se presenten y de acuerdo con los procedimientos establecidos por la SED y la interventoría.

Para la ejecución del contrato la entidad dispone los recursos mediante el certificado disponibilidad presupuestal según como se indica en la Tabla No.6 Certificado disponibilidad presupuestal – Contrato de obra CO1.PCCNTR.8154780.

CDP	FECHA	RP	FECHA	VALOR RP
1642	20/02/2025	4924	03/09/2025	$2.332.049.023
3697	05/12/2025	7577	22/12/2025	$785.001.422
1116	27/07/2026	5819	28/09/2026	460.000.000
TOTAL				$3.577.050.445

Tabla 6 - *Certificado disponibilidad presupuestal*
Fuente: *Propia*

3.4.4 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

El contratista envía Análisis de Precios Unitarios Contractuales por medio de correo electrónico, el cual, una vez recibido, es revisado y mediante oficio enviado mediante correo electrónico se envían las observaciones generales a los Análisis de Precios Unitarios.

Se realiza mesa de trabajo entre contratista e interventoría y el contratista realiza los cambios correspondientes, los cuales de nuevo remite a esta interventoría y una vez recibida la información se verifica las subsanaciones y son avalados los siguientes APUS:

LISTADO DE ITEMS DE APU´s APROBADOS	
ITEM	**DESCRIPCION**
1.1.3	Cerramiento en lona (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro no18 -altura del cerramiento 2m). nota: el ítem incluye revisión periódica de su estado físico.
1.1.6	Suministro e instalación de lona o polisombra (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de áreas de intervención)
1.2.4	Demolición de placa de contrapiso reforzada hasta e= 0.20 m (incluye alistado y acabado existente, cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
1.2.6	Demolición placa maciza h= 0,08 a 0,10 m (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
1.2.8	Demolición de alistado de piso e= 0.04 a 0.06 m (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
1.2.9	Demolición de acabado y alistado de piso e= 0.08 m a 0.12 m y guardaescoba (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
1.2.10	Demolición de muro en mampostería con acabados desde e= 0.13 hasta e= 0.17 m (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
1.2.13	Demolición de enchape de muros y pega (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
1.2.17	Demolición de encorozado de cubierta (incluye cargue y retiro de residuos de

LISTADO DE ITEMS DE APU´s APROBADOS	
ITEM	**DESCRIPCION**
	construcción a sitios autorizados y andamios certificados)
1.2.18	Desmonte de puertas existentes con marco de todo tamaño en madera, metal y aluminio metálicas (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
1.2.19	Desmonte de ventanas todo tamaño metálicas - madera, incluido rejas (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
1.2.20	Desmonte y desconexión de aparatos sanitarios y equipos como lavaplatos, lavamanos, sanitarios, estufas, etc. (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
1.2.21	Desmonte retiro de tuberías hidrosanitarias existentes de 6", 4", 3", 2" (incluye excavación, cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
1.2.23	Desmonte de todo tipo de cubierta existente, incluye andamios certificados y el desmonte de la estructura metálica o de madera, los amarres, cerchas, correas y/o perfilería metálica, instalaciones eléctricas o tuberías adosadas, canales y bajantes etc (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
1.2.24	Desmonte de todo tipo de cielo raso existente (durastic, madera, dry wall, plástico, incluye andamio certificado, retiro de estructura, accesorios, aparatos eléctricos incrustados, cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
1.2.32	Desmonte de lámparas (incluye andamios certificados)
1.2.33	Desmonte de red eléctrica (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios y andamios autorizados)
1.2.36	Retiro de manto de aluminio sobre cubiertas (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
1.2.40	Desmonte de griferías existentes incrustadas en muro tipo lavamanos u orinales corridos (incluye retiro de las mismas)
1.2.41	Desmonte y reinstalación de todo tipo de adoquines usados (incluye conformación de nivel)
1.2.47	Demolición de alistado de piso e= 0.01 a 0.05 m (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
1.3.1	Mantenimiento cerramiento metálico existente (incluye soldaduras, reposición de elementos en mal estado, pintura anticorrosiva y esmalte de acabado)
1.4.1	Perforación regatas en muros, pisos y/o cielo raso, ancho <= 15 cm, profundidad <= 10 cm (incluye corte con pulidora, andamio certificado, cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados, transporte, resane y acabado de la superficie afectada)
1.4.2	Corte y regatas en concreto para instalación tubería hasta 2" de profundidad.

LISTADO DE ITEMS DE APU´s APROBADOS	
ITEM	**DESCRIPCION**
	incluye corte con pulidora, cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados
1.4.4	Picado de membrana y placa en terrazas, para mejoramiento de adherencia con el pendientado nuevo (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
1.4.7	Descapote manual y/o maquina desde h= 15 cms hasta h= 20 cms (incluye cargue y retiro de residuos a sitios autorizados)
2.1.1	Excavación manual en material común (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
2.1.2	Excavación manual en recebo compactado (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
2.1.6	Relleno con material seleccionado
2.1.8	Suministro e instalación de subbase granular tipo idu (suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación)
2.2.1	Concreto corriente grava común 3000 psi mezclado en sitio (no incluye acero)
2.2.4	Viga de cimentación en concreto 3000 psi de 20 x 15 cm (incluye formaleta, vibrado, no incluye acero)
2.2.7	Suministro e instalación de viga cinta de confinamiento 12 x 20 cm en concreto de 3000 psi. no incluye refuerzo.
2.2.13	Placa contrapiso de 10 cm - concreto 3000 psi. incluye corte y dilatación.
2.3.5	Cinta de confinamiento en concreto de 3000 psi de 10 x 12 cm (incluye formaletas y todo lo requerido para su correcta ejecución y funcionamiento).
2.4.1	Suministro e instalación acero de refuerzo de 60000 psi
2.4.2	Suministro e instalación malla electrosoldada 5 mm, de 0.15 x 0.15 m
2.5.1	Suministro e instalación de estructura metálica. incluye izaje, soldadura, anticorrosivo y esmalte de acabado final (aplica para todo tipo de estructura)
3.1.4	Muro ladrillo prensado macizo
3.1.7	Pañete liso 1:3 sobre muros en área de culatas (hasta 30 cm). incluye filos y dilataciones.
4.2.3	Suministro e instalación tubería PVCS 4" incluye accesorios
4.2.4	Suministro e instalación accesorios PVC-S 4"
4.2.11	Suministro e instalación sifón de piso 4" incluye accesorios
4.5.1	Suministro e instalación punto agua fría sanitario tanque 1/2"
4.5.2	Suministro e instalación punto agua fría lavamanos 1/2"
4.5.5	Suministro e instalación punto sanitario 4"
4.5.6	Suministro e instalación punto sanitario 2"
4.6.1	Suministro e instalación registro válvula de bola 1-1/2"

LISTADO DE ITEMS DE APU´s APROBADOS	
ITEM	**DESCRIPCION**
4.7.1	Caja de inspección 60 x 60 cm, incluye tapa prefabricada
4.7.3	Caja de inspección 80 x 80 en mampostería. incluye tapa prefabricada
4.7.7	Limpieza de cajas de inspección (incluye retiro de residuos y disposición final de escombros a sitios autorizados)
4.8.1	Suministro e instalación de filtro zanja de 0.3 x 0.3 m incluye geotextil nt-2000, grava 3/4" y pases PVC longitud max 0.3 m cada 3 m (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
4.8.2	Suministro e instalación geotextil nt 1600
4..9.12	Sondeo y revisión de desagües
5.1.1	Suministro e instalación de interruptor sencillo tipo institucional, con aparato, cable de cobre aislado libre de halógenos calibre n°12 THHN y tubería PVC ø3/4" hasta 4m. incluye caja, conectores, soportes, accesorios necesarios para la conexión e instalación.
5.1.3	Suministro e instalación de interruptor doble tipo institucional, con aparato, cable de cobre aislado calibre n°12 libre de halógenos y tubería PVC ø3/4" hasta 4m. incluye caja, conectores, soportes, accesorios necesarios para la conexión e instalación.
5.1.5	Salida para tomacorriente doble normal tipo institucional 5-15r, con cable de cobre aislado calibre 1n°12 (f) + 1n°12 (n) + 1n°12 (t) libre de halógenos y tubería EMT ø3/4" hasta 4m. incluye aparato, conectores, soportes, accesorios necesarios para la conexión e instalación.
5.1.10	Suministro e instalación de tablero principal de distribución tipo panel de 12 circuitos con espacio para totalizador puerta y chapa, barrajes de neutro y puesta a tierra
5.1.15	Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo enchufable de 1x30a 10 ka
5.1.25	Suministro e instalación de tubería metálica galvanizada EMT Conduit de 1/2". incluye soportes, accesorios necesarios para la instalación.
5.1.26	Suministro e instalación de tubería metálica galvanizada EMT Conduit de 3/4". incluye soportes, accesorios necesarios para la instalación.
5.1.38	Suministro e instalación de salida para luminaria, con cable de cobre libre de halógenos calibre 1n°12 (f) + 1n°12 (n) + 1n°12 (t) AWG THHN y tubería EMT ø3/4" hasta 4m. incluye prensa estopa, caja Rawelt, cable encauchetado, conectores, soportes, accesorios necesarios para la conexión e instalación.
5.1.40	Suministro e instalación de panel led de sobreponer 120 x 30cm, 40 w. incluye marco, soportes, accesorios necesarios para la conexión e instalación y andamios certificados
5.1.46	Suministro e instalación cable desnudo #8 en cobre

LISTADO DE ITEMS DE APU´s APROBADOS	
ITEM	**DESCRIPCION**
5.1.47	Suministro e instalación de breaker industrial totalizador 3x125 a. materiales certificados Retie e instalados según reglamentación ntc 2050.
7.1.1	Alistado de pisos en mortero 1:3 e= 0.04
7.2.1	Suministro e instalación baldosa granito 33 x 33 pulido, incluye pulido y brillado
7.2.10	Suministro e instalación piso en vinilo tráfico pesado espesor 4 mm
7.2.15	Suministro e instalación enchape para piso formato 45 x45, incluye guardaescoba
7.2.17	Suministro e instalación de piso en caucho elaborado con llanta de carro reciclada EPDM Chips fundible de 3 cm para exteriores
7.2.37	Suministro e instalación enchape pared blanca 30x45
9.1.1	Suministro e instalación de reja metálica modelo persiana construida con marco de tubo HRO 2"x5", tubos horizontales cuadrados de 3/4", rigidizador interior cada metro, incluye terminada con anticorrosivo, pintada e instalada - verificar en obra medidas, ángulos y # de hojas.
9.1.2	Suministro e instalación de puerta metálica con marco en lámina Cold Rolled lisa calibre 18, entamborada con refuerzo interno, bisagras, incluye cerradura de seguridad tipo tejo llave exterior y mariposa interna, doble manija interior - exterior, terminada con anticorrosivo, pintura al horno e instalada - verificar en obra medidas, ángulos y # de hojas.
9.2.2	Suministro e instalación de ventanería en aluminio con cuerpos fijos y corredizos, con cuerpos de rejilla superior o inferior y alfajía, incluye vidrio de 4 mm incoloro con película de seguridad y herrajes. instalada y sellada contra entrada de humedad, verificar en obra medidas, ángulos y de acuerdo a modelos de diseño sed. (aplica color crudo o blanco)
9.3.7	Suministro e instalación cerramiento perimetral reforzado en malla preondulada calibre 8 hueco 2", ángulo 1" x 1/8" pisa malla en ángulo de 3/4" x 1/4", parales de 2 1/2" x 2 1/2" en 3 mm con sujetadores de varilla de 5/8" y refuerzos diagonales en platina de 1-1/2"* 1/8" (incluye todos los insumos, materiales, mano de obra y transporte)
9.3.10	Suministro e instalación de divisiones de orinales en acrílico recuperado de 10 mm diseño de animales, módulos de 40 x 90 x 1 cm, incluye soportes en acero inoxidable de 1-1/2" anclado al piso
10.1.5	Suministro e instalación taza institucional línea adulto color blanco (incluye válvula de control y descarga tipo push, brida de 4" y sellante)
10.1.7	Suministro e instalación orinal línea adulto color blanco (incluye grifería tipo push)
10.1.11	Suministro e instalación lavamanos corrido en policuarzo con subdivisión por módulo de servicio, faldón frontal de 30 cm, salpicadero de 6 cm, reengruese de

LISTADO DE ITEMS DE APU´s APROBADOS	
ITEM	**DESCRIPCION**
	3 c
10.1.12	Suministro e instalación de grifería de lavamanos (incluye grifería tipo push, acople y sifón)
10.1.15	Suministro e instalación de tapa registro de 20 x 20 plástica
10.1.16	Suministro e instalación de rejilla con sosco de 4" a 3"
11.1.4	Suministro e instalación de divisiones para baño institucional compuesta de puertas y paneles en acero inoxidable tipo 304 antiácido, calibre 20, entamborado de 1"
11.1.10	Desinstalación de parque infantil en zona verde.
11.1.10	Desinstalación e instalación de parque infantil en zona verde.
12.1.2	Pañete muro acabado liso 1:4 impermeabilizado, incluye filos y dilataciones (incluye andamio certificado)
12.1.7	Estuco filos sobre pañete (incluye andamios certificados) inferiores a ,60 cm
12.1.9	Pañete carteras muros, culatas, columnas y vigas acabado liso 1:4 hasta 0,60 m de ancho (incluye andamio certificado)
12.2.1	Vinilo tipo 1 a tres manos (incluye andamios certificados)
12.2.2	Pintura vinilo sobre muros interiores 3 manos - (hasta 60 cm)
12.2.3	Pintura epóxica a 3 manos, incluye andamio certificado
12.2.4	Pintura para exteriores de alta resistencia a dos manos (incluye andamios certificados)
12.2.5	Pintura para exteriores de alta resistencia a tres manos (a = 0.6 m) (incluye andamios certificados)
12.3.1	Esmalte sobre puertas y marcos metálicas dos caras
12.3.2	Esmalte sobre ventanería y rejas de seguridad metálica
14.1.2	Suministro e instalación espejos biselados 1.5 de e= 4 mm
16.1.1	Flanche lámina galvanizada cl. 20 - desarrollo 80 cm incluye andamio certificado
16.1.3	Bajante en PVC blanco (incluye andamios certificados)
16.1.11	Suministro y montaje de estructura metálica en perfil estructural en c para cubierta, incluye andamio certificado, anticorrosivo y pintura esmalte en una cuantía de 11 kg/m2
16.1.13	Tratamiento de fisuras mediante un sellador Elastomérico monocomponente a base de poliuretano (incluye imprimante de alta adherencia con el concreto existente)
16.1.15	Suministro e instalación de lámina policarbonato con protección uv, calibre 8 mm, traslúcido blanco, incluye accesorios necesarios para su correcta instalación

LISTADO DE ITEMS DE APU´s APROBADOS	
ITEM	**DESCRIPCION**
16.1.18	Suministro e instalación de cubierta modular tipo sándwich (ancho = 300 a 400 mm) con aislante en poliuretano con un espesor entre 30 mm y 40 mm. panel metálico inferior y superior en aluzinc calibre 26 pintados dos (2) caras con pintura poliéster libre de aceites - fijación con clips invisibles en lámina galvanizada calibre 22 (incluye tapas de borde de cubierta y los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. se pagará según los metros cuadrados realmente instalados).
16.1.19	Suministro e instalación de caballetes para cubierta modular tipo sándwich
16.1.20	Suministro e instalación de platina de 2"x1/8" sobre correas para fijación de teja termoacústica
16.1.21	Suministro e instalación de membrana impermeabilizante poliurea pura de alto desempeño e= 2 mm
16.1.22	Suministro e instalación de canal galvanizada calibre 18 desarrollo (80 a 100 cm). incluye soportes metálicos para fijar la canal en la fachada, anticorrosivo y pintura en esmalte.
16.1.25	Afinado impermeabilizado pendientado mortero 1:3 e= 0.10 m para cubierta no transitable de bloque 11 (cocina)
18.1.1	Aseo general final y limpieza
18.1.4	Protección provisional de elementos y superficies existentes con cartón corrugado, plástico o similar (incluye retiro y disposición).

Tabla 7 - Listado APU´S
Fuente: *Elaboración Propia*

Para las obras programadas, el contratista CONSORCIO PAIS presentó por medio de correo electrónico para la aprobación el informe preliminar de obra, la interventoría realizó el estudio, revisión y observaciones del documento entregado por el contratista que incluye:

El informe contiene un análisis de la anterior información incluyendo las observaciones, conclusiones y recomendaciones pertinentes para el normal desarrollo del contrato objeto de obra en cada sede a intervenir.

Una vez recibida y revisada la información, de acuerdo con las observaciones realizadas, el contratista subsana la información y la remite para revisión y a la misma se proporciona aprobación. En consecuencia, los mismos fueron remitidos formalmente a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO a través del oficio SERINCO-SDE-L6-2025-040.

3.4.5 ESTADO FINANCIERO

A. EJECUCION DEL CONTRATO

A la fecha del presente informe lo que el contratista Consorcio País a ejecutado se puede evidenciar en el anexo No.4 Informes Semanales.

B. FORMA DE PAGOS EFECTUADOS

(…) El valor del contrato será pagado por la Secretaría de Educación, al contratista, mediante pagos realizados por el Sistema de Pagos de la S.H.D., en la cuenta indicada por él en su propuesta, así: a. La SED pagará al contratista el valor del contrato, por el sistema de precios unitarios sin fórmula de reajuste. b. La Entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos hasta por el 95% del valor total estimado, de acuerdo con las cantidades de obra efectivamente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior. Estas cantidades deberán ser verificables y soportarse en Actas parciales de Obra, de conformidad con los Precios Unitarios y el valor del AIU pactado. c. La Entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por ciento (5 %) del valor total ejecutado del Contrato, el cual se hará a la una vez suscrita el acta de liquidación del contrato. d. Dicha información será verificada por parte del interventor de la SED y se procederá a dar visto bueno para el trámite de la cuenta. El Contratista deberá cumplir con los requisitos de pago.

ACTA	%	VALOR	ESTADO
1	11,60%	$ 361.723.907,00	PAGADO
2	13,97%	$ 435.348.486,00	PAGADO
3	25,07%	$ 781.384.254,00	PAGADO
4	15,80 %	$ 492.623.060,00	PAGADO
5	6,72%	$ 209.434.074,00	PAGADO
6	4.85%	$ 151.233.507,00	PAGADO
7	7,09%	$ 220.733.879,00	EN TRAMITE
TOTAL	**85,10%**	**$ 2.652.481.167,00**	

Tabla 8 - *Pagos Realizados*
Fuente: *Elaboración Propia*

Anexo 5. Acta Parcial de Obra

Para el periodo del presente informe el contratista Consorcio País presentó ante la interventoría el acta parcial No. 8, la cual ya fue enviada a la SED para el trámite de pago respectivo.

3.5 ESTADO DEL TIEMPO

Se presentan lluvias aisladas en el presente periodo las cuales no han impactado la normal ejecución de las actividades. Dicho reporte está estipulado en las diferentes bitácoras de cada una de las obras que se han iniciado en los diferentes colegios.

3.6 RESULTADOS DE LABORATORIO

El contratista de obra **CONSORCIO PAÍS**, en el informe técnico, presenta las fichas técnicas de los materiales utilizados en las actividades de obra, los ensayos de laboratorio realizados se evidencian en los informes mensuales anteriores.

3.7 OBLIGACIONES GENERALES

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Constituir en favor de BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL – SECRETARIA DE EDUCACIÓN, con NIT. 899.999.061-9, las garantías para avalar la adecuada ejecución del contrato y las obligaciones contraídas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto 1082 de 2015. Estas garantías deberán constituirse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato y requerirá ser aprobada por la Secretaría de Educación del Distrito. Las garantías deberán cubrir los amparos señalados en los estudios previos y el pliego de condiciones de la licitación Pública. El contratista será responsable de la autenticidad y veracidad de las garantías.	Si cumple, el contratista consorcio País subió las pólizas a la plataforma SECOP II, las cuales fueron aprobadas el día 29/10/2025	
2	Cumplir a cabalidad el contrato, de acuerdo con los términos y condiciones pactadas, las cuales solamente podrán ser modificadas previo cumplimiento del trámite establecido para tal fin por la SED y con fundamento en los respectivos soportes.	Cumple con lo estipulado en el contrato	

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
3	Acreditar durante la ejecución del contrato y como requisito previo para el pago de cada una de las ACTAS PARCIALES DE OBRA el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social (Salud, pensión y ARL) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA y Fondo Para la industria de la Construcción – FIC cuando haya lugar a ello), de todo el personal a cargo del contratista de la obra. Dicha acreditación para el caso de persona natural será mediante la presentación de los comprobantes de pago, si se trata de persona jurídica se acreditará mediante la certificación expedida por el revisor fiscal cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley quien deberá aportar fotocopia de la cédula y tarjeta profesional o por el representante legal según corresponda. De conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificada por Decreto 2106 de 2019, artículo 23 y 32 de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes.	Cumple aplica para el presente periodo	Al momento del presente periodo se ha realizado el pago del acta parcial No.1, y el pago del acta parcial No.2, el pago del acta parcial No.3, pago de acta No. 4 y pago de acta No.5
4	Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del contrato, cuando a esta hubiere lugar.	No aplica para el presente periodo	
5	Presentar la respectiva factura o su documento equivalente cuando esté obligado a ello, de acuerdo con el régimen tributario aplicable al objeto contratado, acompañada de los documentos soporte que permitan establecer el cumplimiento de las condiciones pactadas, incluido el Registro Único Tributario (RUT) expedido por la DIAN y el Registro de Información Tributaria (RIT) expedido por la Dirección Distrital de Impuestos, requisitos sin los cuales no se podrá tramitar el respectivo pago. Es obligación del contratista conocer y presupuestar todos los gravámenes de los cuales es responsable al momento de celebrar el presente Contrato, por tanto, asumirá la responsabilidad y los costos, multas y/o sanciones que llegaren a generarse por la inexactitud de la información fiscal que se haya entregado.	Cumple	
6	Mantener a la SED libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes (si fueren autorizados). En consecuencia, EL CONTRATISTA mantendrá indemne a la SED contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros incluido el personal de la SED, ocasionados por EL CONTRATISTA o por	El contratista a la fecha cumple con lo estipulado en la obligación	

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
	sus subcontratistas o dependientes (si fueren autorizados) en la ejecución del objeto y las obligaciones contractuales.		
7	Constituir y mantener vigentes las garantías estipuladas y cumplir todos los requisitos para hacerlas efectivas, si a ello hubiere lugar. En ese orden, el Contratista debe mantener actualizadas las vigencias y el monto de los amparos de las garantías expedidas con ocasión de la suscripción del contrato, teniendo en consideración el plazo, el valor, así como las eventuales prórrogas, adiciones	Cumple a la fecha el contratista cuenta con la aprobación de las garantías de acuerdo al contrato y acta de inicio.	
8	Entregar al interventor del Contrato los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos cuando así se requiera, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud.	No aplica para el presente periodo	
9	Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato le imparta la SED a través de la interventoría del mismo, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.	a la fecha del presente informe cumple con los requerimientos	
10	Ejecutar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones contractuales, aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento	Cumple Parcialmente	De acuerdo a los avances presentados debe presentar un plan de contingencia para cumplir con la obligación
11	Guardar estricta reserva sobre toda la información y documentos que tenga acceso, maneje en desarrollo de su actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato y que no tenga el carácter de pública. En consecuencia, se obliga a no divulgar por ningún medio dicha información o documentos a terceros, sin la previa autorización escrita de la SED. Esta obligación permanecerá vigente aún después de la terminación por cualquier causa de la vinculación que ligue a las partes. Por lo tanto, en caso de que el contratante tenga prueba de que el contratista ha divulgado cualquier tipo de documentación o información que en forma alguna se relacione con el presente contrato, el contratista indemnizará los perjuicios que con tal hecho cause al contratante. No se considerará incumplida esta cláusula cuando la información o documentos deban ser revelados por mandato judicial y/o legal o cuando la información manejada tenga el carácter de pública.	Cumple	

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
12	Cumplir con la política de buen trato para con los demás colaboradores internos y externos de la SED, y actuar con responsabilidad, eficiencia y transparencia., ubicada en la página web de la SED, mediante el siguiente Link: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia-politicas lineamientos-manuales-planes-estrategicos-sectoriales-institucionales	Cumple, a la fecha no se han presentado reportes negativos de acuerdo a la obligación.	
13	Respetar la política medioambiental de la SED, política que incluye todas las normas internas sobre el uso de los recursos ambientales y públicos, como el agua y la energía, racionamiento de papel, normas sobre parqueaderos y manejo de desechos residuales y manejo del ruido, ubicada en la página web de la SED, mediante el siguiente Link: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_ institucional/transparencia-políticas lineamientos-manuales-planes-estrategicos-sectoriales-institucionales	A la fecha el contratista cumple con lo estipulado en la obligación	
14	Cumplir con todas las condiciones técnicas contempladas en la propuesta presentada y todas las condiciones establecidas en los documentos previos, evaluada y aprobada por la SED, así como ejecutar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto contractual, el alcance y las obligaciones derivadas del mismo, aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento, siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza del Contrato.	A la fecha cumple con lo estipulado en la obligación	
15	Cumplir con los ofrecimientos hechos en el proceso de selección y por los cuales obtuvo puntaje en los factores de ponderación que dieron lugar a la adjudicación del proceso a su favor.	Cumple a la fecha con la obligación	
16	Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo -SST respetar la política de Seguridad y Salud de la SED, con el objetivo de ofrecer entornos de trabajo seguros y saludables, promoviendo la cultura del autocuidado, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales, condiciones que fortalecen la productividad y el bienestar físico y mental. política ubicada en la página web de la SED mediante el siguiente Link: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia politicas-lineamientos-manuales-planes-estrategicos-sectoriales-institucionales	Cumple a la fecha con la obligación	
17	Vincular y mantener durante la ejecución del contrato el equipo de trabajo mínimo de mujeres, conforme a lo establecido en el Decreto Distrital 332 del 29 de diciembre de 2020, "Por medio del	Cumple	Se presentan en el informe mensual del contratista

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
	cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital", modificado por el Decreto 634 de 2023 o las normas que lo modifiquen, deroguen o sustituyan, so pena de la imposición de multas, sanciones y demás consecuencias previstas en el contrato y en las demás normas aplicables.		
18	Reportar la contratación del porcentaje de mujeres vinculadas, mediante la manifestación que bajo juramento presenten, bimestralmente, el representante legal y del revisor fiscal del contratista, sin perjuicio de los otros mecanismos de verificación que establezca la supervisión o interventoría.	Cumple para el presente periodo del informe	
19	Registrar a las mujeres contratadas en el micrositio BOGOTÁ TRABAJA de la Secretaría de Desarrollo Económico. El cumplimiento de esta obligación deberá surtirse dentro del primer mes de ejecución del contrato lo cual será verificado por la supervisión y/o interventoría y conforme a las implementaciones que sobre el particular defina la Secretaría de Desarrollo Económico, en cumplimiento del artículo 3, del parágrafo sexto del Decreto 634 de 2023. Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 332 de 2020, que establece medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital.	No aplica para el presente periodo.	
20	El contratista tiene la obligación en relación con sus colaborades, evitar cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado. También evitará cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las personas por razón de su condición social, económica o política. Igualmente, deberá facilitar y promover la denuncia ante el acaecimiento de cualquiera de las circunstancias descritas o las dispuestas en la Ley 1257 de 2008.	Cumple no se ha reportado nada referente a la obligación	
21	Promover entre su equipo de trabajo el uso de lenguaje no discriminatorio por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.	Cumple no se ha reportado nada referente a la obligación	
22	El contratista deberá contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.	Cumple	

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
23	Garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad destinadas a mitigar, evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de las emergencias sanitarias o ambientales presentadas en el país, según lo establezca las medidas adoptadas por el gobierno Nacional y/o Distrital cuando aplique.	Cumple	
24	Dar cumplimiento al objeto y alcance del Contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y en sus anexos.	Cumple a la fecha con la obligación	
25	Facilitar la labor de seguimiento y control, atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen por parte de la Interventoría o la Entidad contratante.	Cumple a la fecha con la obligación	
26	Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.	Cumple	
27	Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.	Cumple	
28	Acreditar el cumplimiento del factor de sostenibilidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.	Cumple	
29	Identificar e implementar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.	Cumple	
30	Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.	Cumple a la fecha la obligación	
31	Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus derivados. El Contratista promoverá el uso de materias primas que no atenten contra la salud pública de conformidad con la Ley Aplicable. Por el contrario, el contratista se compromete a utilizar elementos y procedimientos que recomienden los fabricantes con el fin de cumplir a cabalidad con los lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo.	No aplica.	A la fecha no a realizado la instalación de alguno de los materiales que en la obligación mencionan.
32	Comunicarle a la Interventoría para su respectiva corroboración, cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecución del Contrato.	Cumple	
33	Informar trimestralmente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica,	No aplica	No se ha presentado aun la información que la obligación requiere.

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
	comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.		
34	Informar a la Interventoría y a la Entidad contratante, a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.	No aplica para el presente periodo.	
35	Informar a la Interventoría y a la Entidad contratante, a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de la notificación del auto de iniciación de procesos concursales, de reorganización o liquidación del Contratista o de alguno de sus integrantes en caso de tratarse de una figura Plural.	No aplica para el presente periodo.	
36	Comunicar durante la ejecución del contrato a la interventoría y/o a la Entidad dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a su conocimiento cualquier inhabilidad sobreviniente que afecta su capacidad para ejecutar el contrato. En el caso de consorcio o uniones temporales esta obligación se extiende a cualquiera de sus integrantes.	No aplica para el presente periodo.	
37	Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo requerido por la Entidad Estatal.	No aplica para el presente periodo.	
38	Cumplir con las diferentes normas vigentes relacionadas con las actividades que se desarrollen en el marco del objeto contractual y su alcance.	Cumple	
39	Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del Contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por la Entidad, el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (artículo 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.	A la fecha cumple con el personal, presentado en cada uno de los frentes de obra.	
40	Asumir especial cuidado de la infraestructura y los muebles de la zona a intervenir, comprometiéndose a no afectar ningún elemento o lugar que no corresponda a la ejecución de las actividades. En consecuencia, estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su responsabilidad se produzca daño o pérdida, sin que esto	Cumple, de haber afectaciones el contratista deberá reparar o restituir lo que llegase a dañar.	

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
	excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar.		
41	Vincular y mantener durante la ejecución del contrato, el porcentaje de personal indicado por la Entidad, consistente en personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad, con formación para el trabajo en el sector de la construcción, conforme a los numerales 2.2 y 2.2.1 del Decreto Distrital 380 de 2015.	No aplica para el presente periodo.	
42	Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de la Entidad, durante el desempeño de las actividades objeto a contratar; la Secretaría de Educación del Distrito se reserva el derecho a verificar durante la ejecución del contrato el cumplimiento de estos requisitos de acuerdo con lo descrito en la normatividad referente al SG-SST, aplicable en la SED.	Cumple	
43	Presentar a la interventoría el certificado de inhabilidades por delitos sexuales (ley 1918 de 20185) de todo el personal no calificado, técnico y profesional que se vincule para la ejecución de las obras. El personal del Contratista no podrá ingresar a las instituciones educativas sin que se haya realizado la verificación de estos antecedentes por parte de la Interventoría, por lo tanto, el Contratista deberá remitir los certificados con la antelación suficiente que no afecte las actividades programadas.	Cumple, se presenta cada mes y cada vez que un nuevo personal ingresa a los frentes de obra.	
44	Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada, en un porcentaje a convenir con la interventoría dependiendo de las condiciones del mercado laboral y del porcentaje de inclusión de las demás poblaciones específicas, vinculando a la ejecución del contrato jóvenes de la región, entre los 18 y 28 años, priorizando a aquellos que no tienen experiencia con la labor a contratar. El Contratista deberá realizar capacitaciones, inducciones o actividades que permitan alcanzar el aprendizaje de la labor a realizar y de esta manera lograr calificar a su personal en el oficio en cuestión.	Cumple para el periodo del presente informe	
45	Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región (Bogotá D.C.) en un porcentaje no inferior al treinta por ciento (30%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el diez por ciento (10%) de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres.	Cumple para el periodo del presente informe	

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
46	Destinar a la ejecución del contrato en un porcentaje del cinco por ciento (5%) sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional: víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, los adultos mayores, las personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros definidos así por la Ley o la jurisprudencia, de esta manera.	No aplica para el presente periodo.	
47	Incorporar como mínimo el porcentaje ofertado en el formato "PROMOCION_A_LA_INDUSTRIA_NACIONAL" de personal calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.	Cumple	
48	El contratista deberá responder en un plazo máximo de tres (3) días hábiles a cualquier requerimiento realizado por la interventoría o la Entidad contratante en relación con la calidad y estabilidad de la obra. En caso de no dar respuesta dentro de dicho plazo, la SED podrá iniciar el correspondiente proceso administrativo sancionatorio contractual, basado en el informe de presunto incumplimiento emitido por la interventoría y conforme a las condiciones estipuladas en el contrato.	A la fecha el contratista no ha requerido de dar respuesta en los días que estipula la obligación	
49	Realizar, a través de sus profesionales, un seguimiento diario al cronograma y a las actividades programadas, de acuerdo con las asignaciones efectuadas, el plazo establecido en el Anexo Técnico para su intervención y conforme a la programación presentada por el contratista para cada una de las actividades de las IED. Lo anterior con el acompañamiento y supervisión integral de la interventoría.	Se cuenta con el avance semanal que realiza la interventoría	
50	El contratista deberá efectuar el pago del impuesto de timbre dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la expedición del Formato de Conceptos Varios por parte de la Secretaría de Educación del Distrito, de conformidad con lo previsto en el artículo 519 del Estatuto Tributario y en el Decreto 175 de 2025.	Cumple	

Tabla 9 - *Obligaciones Generales Contratista*
Fuente: *Elaboración Propia*

3.8 OBLIGACIONES ESPECIFICAS

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Obligaciones previas para la suscripción del contrato Finalizado el proceso de selección, para la elaboración y firma del contrato, el proponente seleccionado, una vez surtida la notificación de la Resolución de Adjudicación de este, deberá realizar: 1. Suscripción del contrato Deberá realizarse en el término dispuesto por la Entidad, el cual no podrá superar los tres (3) días hábiles Para el caso de uniones temporales o consorcios se podrá ampliar el plazo anteriormente indicado, únicamente si dentro del mismo periodo de suscripción (3 días hábiles) se solicitó atención en el sistema de agendamiento de citas de la DIAN para la obtención del RUT, y esta fue asignada con posterioridad a los tres (3) días hábiles establecidos. Si el adjudicatario injustificadamente no firma el contrato dentro del plazo fijado, la Secretaría de Educación del Distrito podrá, mediante acto administrativo debidamente motivado, adjudicar el contrato, dentro de los quince (15) días siguientes, al proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, en concordancia con el articulo 30 numeral 12 de la Ley 80 de 1993. La no firma del contrato por parte del adjudicatario, dará lugar a que la Secretaría de Educación del Distrito declare el siniestro y haga efectiva la garantía de seriedad de la oferta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados no cubiertos por el valor de la garantía. (Art. 30, Numeral 12 Ley 80/93).	Cumple, el contratista realizo la entrega de los documentos estipulados en la obligación	
2	Obligaciones previas a la suscripción del acta de inicio: Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, el contratista deberá radicar en la Oficina de Contratos de la SED y publicar en la plataforma transaccional del SECOP II todas las garantías solicitadas en el presente documento. La Oficina de Contratos de la SED, a más tardar a los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de su radicación realizará su revisión y comunicará al contratista cualquier observación al respecto. El contratista tendrá dos (2) días hábiles para realizar las correcciones a las pólizas y radicarlas nuevamente en la SED. Una vez el	El contratista realizo la entrega de la documentación requerida en la obligación y subió las pólizas a la plataforma SECOP II, las cuales fueron aprobadas el día 29/10/2025	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
	contratista entregue a satisfacción de la SED los documentos requeridos, la Entidad tendrá un plazo máximo de dos (2) días hábiles para su aprobación. De esta manera, se establece el proceso para la corrección y ajustes a las garantías establecidas el cual no deberá superar los plazos establecidos en el párrafo anterior.		
3	Obligaciones para la suscripción del Acta de inicio: Se suscribirá el acta de inicio una vez que se cumplan los siguientes requisitos: 1. Aprobación de las garantías por parte de la Entidad. 2. Expedición del Registro Presupuestal. 3. Suscripción Acta de inicio del contrato de Interventoría de obra. 4. El Contratista deberá entregar a la secretaria de Educación del Distrito el comprobante de pago del impuesto de timbre ante la secretaria de Hacienda con ocasión a la suscripción del contrato, teniendo en cuenta que el valor estimado del contrato a celebrar es superior a 6.000 UVT ($298.794.000). Ahora, ya que la entidad es exenta del pago del impuesto, el porcentaje de dicho impuesto debe ser por el 0,5% del valor del contrato sin IVA de conformidad con lo señalado en el ET. Art. 519 como requisito para la suscripción del acta de inicio.	El contratista realizo la entrega de la documentación requerida en la obligación a la entidad y subió el acta de inicio a la plataforma SECOP II, el día 09/10/2025	
4	Obligaciones posteriores a la suscripción del acta de inicio: Al día siguiente de la suscripción del acta de inicio, el CONTRATISTA recibirá un comunicado por parte de la Interventoría, en el que se enunciará la lista de documentos técnicos a presentar para su validación y aprobación con los respectivos plazos, los cuales deberán ser entregados en su totalidad en máximo diez (10) días hábiles. La Interventoría revisará la documentación entregada por el contratista y realizará las observaciones dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su recepción, en el caso de las hojas de vida del personal mínimo requerido, y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su recepción para el resto de los documentos. El contratista deberá realizar las correcciones y/o modificaciones solicitadas por el interventor a más tardar tres (3) días hábiles después de la notificación de las observaciones. El interventor aprobará los documentos dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. Este proceso establece un plazo total máximo de 21 días hábiles para que el contratista entregue los documentos requeridos para el inicio de la ejecución de actividades, y para que la	La interventoría remitió mediante oficio SERINCO-SDE-L6-2025-012 en el cual se le requería al contratista la documentación mencionada en la obligación mencionada.	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
	interventoría los revise y realice las observaciones pertinentes. El contratista deberá atender los requerimientos del interventor, responder a las observaciones y entregar los documentos corregidos en tiempo y forma, con el fin de no superar el plazo establecido.		
5	Obligaciones Relacionadas con la Gestión Ambiental 1. Ambientales El contratista deberá realizar la obra de conformidad con la legislación vigente (orden nacional, departamental, municipal y/o distrital) conforme el objeto y alcance del contrato a intervenir en especial en materia ambiental y recursos hídricos.	Cumple	
6	Obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual. 1. Información sobre el personal profesional 2. Personal Clave 3. Requisitos del personal del Contratista para cada uno de los lotes 4. Actividades mínimas del personal Clave 5. Verificación de la Experiencia del Personal Clave 6. Otras obligaciones del Contratista frente al Personal Clave.	Cumple	
7	Maquinaria mínima del proyecto. Para el desarrollo de la obra, el contratista deberá contar con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos necesarios para la ejecución de cada actividad prevista en las sedes a intervenir, de acuerdo con lo indicado en el anexo técnico. Además, deberá suministrar estos elementos en las fechas estipuladas en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente con el envío y recepción de los mismos en el sitio de la obra. De igual manera, por proceso, método constructivo, ajuste en insumos o de actividad especifica, el contratista de obra garantizará el suministro de equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos necesarios, garantizando una correcta ejecución y desarrollo del proyecto dentro del plazo contractual, sin que esto genere costos adicionales para las partes. De ser necesario, por la magnitud de la obra, condiciones de movilidad y/o avance del proyecto, el contratista podrá plantear la utilización de equipos que permitan optimizar los procesos constructivos, sin que esto genere costos adicionales para las partes.	Cumple con la obligación	
8	Examen del sitio de la obra. Es responsabilidad del Contratista conocer la ubicación y situaciones particulares donde se adelantan las obras e informarse sobre la forma y	Cumple con la obligación	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
	características del sitio, localización y naturaleza de la obra, vías de acceso, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto, así como los sitios autorizados para hacer la disposición de los residuos de construcción y demolición (RCD) y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta y las condiciones particulares del proyecto de obra pública.		
9	Señalización De ser necesario, son de cargo del Contratista todos los costos requeridos para instalar y mantener la señalización de la obra, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes. Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar. Dar cumplimiento a la Resolución 4474 del 2021 expedida por la Secretaría Distrital de Ambiente "Por la cual se modifica la Resolución 5453 de 2009 respecto de las condiciones y requisitos de ubicación de los pendones y pasacalles en el distrito capital".	Cumple con la obligación	
10	Obligaciones relacionadas con Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). El contratista deberá cumplir con las obligaciones de afiliación y cotización al sistema de seguridad social Integral respecto del personal a su cargo (Salud, pensión y riesgos laborales).	Cumple con la obligación	
11	Gestión Social a. El contratista deberá ejecutar el plan pedagógico de acciones adecuadas para prevención de accidentes y el plan de emergencia, el cual socializará de forma clara y oportuna a todos los trabajadores vinculados en las obras y a la comunidad de la zona de influencia del proyecto. b. El contratista realizará los levantamientos de las actas de vecindad y las vías aledañas al lote donde se ejecutarán las obras. c. El contratista deberá asegurar y tener en óptimas condiciones el cerramiento de obra, para evitar que la población aledaña ingrese de forma no autorizada al lugar de las obras. d. El Contratista deberá atender las observaciones, inquietudes y peticiones que interpongan los integrantes de la comunidad educativa o los	Cumple con la obligación	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
	habitantes de la zona de influencias del proyecto, en cuanto a la ejecución de las obras previa aprobación de la Interventoría y validado por la SED. e. El Contratista deberá tener especial atención con la población estudiantil en condición de discapacidad, de tal forma que se garantice su inclusión en la capacitación de acciones adecuadas y prevención de accidentes producto de la ejecución de la obra y que en el plan de contingencia se tengan en cuenta las necesidades especiales de dicha población. f. El contratista se obliga a elaborar, difundir e implementar un reglamento interno de trabajo, conforme a las Resoluciones 2413 de 1979 emitida por el Ministerio del Trabajo, por la cual se dicta el Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción, y la Resolución 2013 de 1986 emitida por la misma cartera ministerial, por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo. Así mismo, el contratista implementará un plan de convivencia con el fin de que las personas a su cargo conozcan y respeten las normas de seguridad industrial y gestión de seguridad y salud en el trabajo. g. El contratista se obliga a implementar un comité de higiene y seguridad industrial o comité paritario (Decreto 586/1983), el cual debe reunirse como mínimo dos (2) veces al mes con el fin de exponer los diferentes puntos a corregir o incentivar, liderado por el Profesional designado para tal fin.		
12	Obligaciones relacionadas con la adecuación del lugar de la obra. a. Durante la ejecución de las actividades de mejoramiento programado el Contratista deberá mantener la ejecución simultanea de obras programadas, en las sedes asignadas distribuidos entre las sedes educativas y administrativas. Estas sedes deberán contar con personal permanente dedicado al desarrollo de las actividades, y el número de frentes podrá incrementarse según las necesidades de atención de emergencias que requiera la SED. El Contratista deberá asignar el personal operativo conforme a lo indicado en el pliego de condiciones, garantizando la dedicación exclusiva de dicho personal para cada sede en intervención, con el fin de cumplir con el alcance del objeto contractual. b. Con antelación a la ejecución de las obras de mejoramiento programadas, el	Cumple con la obligación	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
	contratista deberá informar al rector y/o coordinador de la sede, con mínimo cinco días (5) hábiles de antelación, sobre el desarrollo de las mismas. c. El Contratista deberá realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas a intervenir, de acuerdo con las especificaciones proporcionadas, con el fin de proteger el sitio de construcción del acceso de personas ajenas a los trabajos, evitar perturbaciones al tránsito y minimizar las incomodidades para terceros. El cerramiento deberá tener una altura mínima de dos (2) metros y contar con toda la señalización preventiva necesaria para garantizar la circulación segura del personal de obra, los vecinos, terceros y la población estudiantil. Asimismo, el Contratista será responsable del mantenimiento del campamento y del cerramiento durante toda la ejecución de la obra. d. Previo al inicio de las obras el contratista hará el registro de los sumideros aledaños a las sedes de obra y los mantendrá en iguales o mejores condiciones a las iniciales, hasta la finalización de las obras. e. Igualmente, previo al inicio de actividades el contratista hará el registro de las vías de acceso aledañas, las cuales serán mantenidas permanentemente libres de residuos de material particulado proveniente de las obras.		
13	Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de construcción. a. El Contratista deberá ejecutar las obras utilizando todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato. b. El Contratista deberá suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas establecidas en su cronograma de obra, para cada sede a intervenir. c. El Contratista deberá garantizar la calidad de los materiales y elementos utilizados en la ejecución de la obra. En este sentido, no se aceptarán saldos de materiales o en condiciones inadecuadas. d. El Contratista será responsable de realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las pruebas necesarias o solicitadas para verificar la calidad de los materiales y demás elementos que se instalen en la obra.	Cumple	
14	Obligaciones relacionadas con la demolición de elementos no estructurales. (Cuando a ello hubiere lugar) a. Ejecutar	Cumple con la obligación	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
	las reparaciones o demoliciones adoptando las medidas de seguridad necesarias para garantizar que no se ponga en riesgo al personal a su cargo ni a las personas de la comunidad educativa. Para ello, deberá aislar el área de trabajo mediante un cerramiento provisional, de manera que se impida el acceso al lugar de la reparación o demolición a personal no autorizado. Esta medida debe estar reflejada en el Plan de Seguridad Industrial y en la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. b. Cumplir con la normativa vigente relacionada con el transporte y la disposición adecuada de los escombros generados, conforme a las "Obligaciones Relacionadas con la Gestión Ambiental" especificadas en el presente estudio previo. c. Gestionar ante las autoridades correspondientes la obtención de los permisos necesarios para la ejecución de las obras. d. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado de limpieza, dentro de un plazo no mayor a 5 días. e. Mantener las medidas de seguridad en las áreas de intervención durante la ejecución de la obra. f. Realizar las reparaciones necesarias en las áreas intervenidas, como consecuencia de defectos de estabilidad, así como en las áreas contiguas que presenten deterioro. g. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, cualquier actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad o que no cumpla con las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por problemas con los insumos o con la mano de obra, dentro del plazo indicado por el interventor o la SED. Igualmente, deberá reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo afectadas por las intervenciones realizadas. h. Entregar las instalaciones a la interventoría y a la SED en funcionamiento, con todas las conexiones a servicios públicos completas y operativas.		
15	Obligaciones relacionadas con la ejecución de obras y protocolo de atención de emergencias.	Cumple con la obligación	
16	Obligaciones relacionadas con el Cableado Estructurado de las Redes LAN en los Colegios de la SED. El Contratista de Obra deberá cumplir con los "Lineamientos para proyectos de Cableado Estructurado de las Redes LAN en los Colegios de la SED", elaborados por la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (OTIC). En caso de no cumplir con esta obligación, el	Cumple con la obligación	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
	contratista asumirá los costos por los posibles daños que puedan generarse como resultado de la falta de coordinación.		
17	Obligaciones en Materia de Servicios Públicos. a. Realizar cuando sea necesario, las adecuaciones provisionales requeridas para utilizar los servicios públicos de la sede del colegio o la sede administrativa a intervenir, previa autorización de la SED. Dichas adecuaciones no podrán alterar ni modificar el servicio continuo de las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias de la edificación. Al finalizar las obras, el contratista deberá retirar las instalaciones provisionales que haya implementado y garantizar el adecuado funcionamiento de las redes que haya intervenido. Además, deberá solicitar la liquidación de los consumos pagados por la SED y realizar el pago correspondiente como requisito para obtener el Paz y Salvo. b. Estar a Paz y Salvo por concepto del consumo de servicios públicos utilizados durante la ejecución de la obra como requisito previo para la suscripción del acta de liquidación. Para ello, la SED y la interventoría contratada verificarán que se hayan pagado los consumos de los servicios provisionales, que estos hayan sido desconectados y que se haya solicitado la paz y salvo a la empresa respectiva. En caso de no haberse contado con servicios provisionales, se establecerá un sistema de medición de los consumos atribuibles al Contratista, cuyo valor será liquidado por la interventoría y facturado por el área de servicios públicos de la DCCEE para su pago. c. Tramitar todos los permisos necesarios para la realización de las obras que impliquen la obtención de servicios públicos domiciliarios. Asimismo, deberá notificar oportunamente a la SED sobre los trámites que realice, para que la SED pueda acompañar este proceso.	No aplica para el presente periodo	
18	Obligaciones de información. a. Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría y contener, como mínimo, la siguiente información por cada sede de trabajo: b. Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la interventoría y contener como mínimo: c. Llevar una bitácora de obra, que será una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los	Cumple con la obligación	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
	trabajos. En ella se deberán registrar las órdenes de la interventoría, los conceptos de los especialistas (si fueran necesarios), las visitas de funcionarios relacionados con el proyecto, etc., de manera que se logre una comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades, conforme a la programación detallada. La bitácora deberá estar debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de la interventoría. Los delegados de la SED podrán acceder a ella cuando lo requieran. d. Elaborar durante todo el proceso de la obra un manual de uso y mantenimiento en el que se especifiquen los materiales de obra de uso permanente (pisos, muros, cubiertas, aparatos, etc.), su funcionamiento y mantenimiento. Este manual deberá incluir las especificaciones y garantías de todos los equipos, además de los planos arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios y de equipos especiales, en una escala reducida pero legible. El manual deberá contar con la aprobación de la interventoría. e. Presentar quincenalmente un registro fotográfico y de video que muestre el avance de la ejecución de la obra, procurando capturar el progreso desde el mismo punto de vista, para facilitar la comparación del avance. f. Elaborar y presentar, junto con la interventoría, las actas de entrega física de obra, y acta de liquidación, las cuales deberán ser radicadas en la SED dentro de los plazos establecidos.		
19	Aprobación de ítems no previstos del Contrato Los ítems o actividades no previstas son aquellas obras que no fueron pactadas al inicio del contrato debido a que resultaban imposibles de prever o contemplar previamente. No obstante, estas actividades son necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, debido a su conveniencia y oportunidad técnica.	No aplica para el presente periodo	
20	Análisis de precios unitarios y listado de precios de los insumos para la obra. El contratista de obra presentará a la interventoría correspondiente, para su aprobación, los análisis de precios unitarios de su propuesta económica, dentro del plazo establecido en el numeral "g.4.1. Documentos requeridos para el inicio de ejecución de actividades." del presente documento. Así mismo, deberá presentar el listado de precios de la totalidad de los insumos	Cumple con la obligación	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
	(materiales, equipo, transporte de equipo especial y mano de obra) utilizados para la elaboración de los análisis de precios unitarios, de conformidad con las especificaciones técnicas, cualquier insumo no registrado y que a juicio de la Interventoría es parte esencial de la ejecución de la actividad, será asumida en su totalidad por EL CONTRATISTA, dentro del valor unitario de la actividad.		
21	Obligaciones en materia de documentos para la terminación y liquidación del contrato. Teniendo en cuenta que corresponde a la Secretaría de Educación del Distrito realizar la verificación de la entrega material de la obra, a través de la interventoría contratada para tal fin, y asegurar la entrega a la entidad de los soportes o productos documentales correspondientes, la SED ha establecido un procedimiento para llevar a cabo el proceso de entrega y recepción de las obras, el cual deberá completarse en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contados a partir del vencimiento del plazo de ejecución para cada una de las Sedes.	No aplica para el presente periodo	
22	Documentos mínimos requeridos para la terminación y liquidación del contrato	No aplica para el presente periodo	
23	Advertencia anticipada. El contratista deberá advertir al interventor en un término no mayor tres (3) días hábiles a partir de que tenga conocimiento sobre posibles eventos o circunstancias específicas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, el cronograma planteado y los demás elementos del contrato, y las estrategias a implementar para ser analizadas por parte del interventor y la SED para reducir el impacto en el desarrollo del proyecto de dicho evento.	No aplica para el presente periodo	
24	Obligaciones especiales El contratista será responsable de todos los objetos de valor arqueológico que encuentre en los sitios de trabajo o que descubra durante la ejecución del contrato, debiendo dar cuenta de ello inmediatamente al Interventor y/o supervisión y/o apoyo a la supervisión, mediante informe con el levantamiento y conservación de los restos.	No aplica para el presente periodo	
25	Obligaciones en materia de participación comunitaria y divulgación. El Contratista deberá participar junto con la SED, el Interventor, y/o supervisión y/o apoyo a la supervisión y la Dirección de Construcción de	Cumple con la obligación	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
	Establecimientos Educativos, en tres (3) socializaciones, al inicio de las obras, durante su ejecución y en la entrega a la comunidad y las actividades correspondientes de promoción de la apropiación y sostenibilidad de las obras programadas. El contratista, deberá suministrar la dotación a los trabajadores que ejecuten la obra. Será facultativo marcar los uniformes del personal de obra con identidad visual del Distrito capital, con base en el Manual de Imagen Institucional de la Alcaldía Mayor de Bogotá vigente al momento de suscribir el acta de inicio.		
26	Obligaciones de trámites y permisos El contratista deberá efectuar los siguientes trámites y permisos ante las Entidades correspondientes si aplica en cumplimiento de la normatividad vigente	Cumple con la obligación	
27	Obligaciones posteriores a la entrega de la obra y liquidación del contrato. El contratista se compromete a realizar las reparaciones necesarias por defectos en los procesos constructivos o por la calidad deficiente de los materiales utilizados en la obra, durante un periodo de dos (2) años a partir de la recepción satisfactoria de la obra por parte de la interventoría y de la SED.	No aplica para el presente periodo	
28	Obligaciones en materia logística del contrato. Para la ejecución de contratos de obras de mejoramiento en varias sedes de colegios distritales, al contratista se le asignará un espacio en cada sede a intervenir, destinado a que sea utilizado para el almacenamiento de materiales, equipos y herramientas durante la ejecución de las obras. Al finalizar la intervención en la sede respectiva, el contratista deberá entregar el sitio de almacenamiento en iguales o mejores condiciones en las cuales fue entregado al iniciar las obras. La seguridad y vigilancia de los materiales, equipos y herramientas será de su completa responsabilidad, la SED no se hará responsable ni hará pago alguno de reconocimiento de materiales.	Cumple con la obligación	
29	Cumplimiento de los códigos y normativas. Para el desarrollo del proyecto, el contratista será responsable de aplicar la normativa técnica correspondiente a cada una de las disciplinas, en las versiones vigentes y actualizadas.	Cumple con la obligación	

Tabla 10 - *Obligaciones Especificas Contratista*
Fuente: *Elaboración Propia*

4. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
OBJETO	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS "
CONTRATISTA	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO - NIT 901.977.271-0
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.8169110
VALOR INICIAL	SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($796.184.131.00) INC. IVA
ADICIÓN No. 1	CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($ 128.425.720,00) INC. IVA
PLAZO INICIAL	SIETE (7) MESES
VALOR FINAL No. 1	NOVECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS NUEVE PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS M/CTE ($ 924.609.851,00) INC. IVA
PRORROGA No. 1	45 DÍAS
FECHA DE INICIACIÓN	06 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	05 DE MAYO DE 2026
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	04 DE JUNIO DE 2026
ADICIÓN No. 2	CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS MCTE ($ 162.875.214,00) INC. IVA
VALOR FINAL No. 2	UN MIL OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SESENTA Y CINCO PESOS MCTE ($ 1,087,485,065.00)
PRORROGA No. 2	107 DIAS

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	05 DE OCTUBRE DE 2026
ADICIÓN No. 3	CIENTO TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS MCTE ($ 131.696.241,00) INC. IVA
VALOR FINAL No. 2	UN MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SEIS PEOS MCTE ($ 1.219.181.306,00)
PRORROGA No. 3	85 DÍAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2026

Tabla 11 - *Información general contrato de Interventoría - CO1.PCCNTR.8169110*
Fuente: *Propia.*

Anexo 6. Modificatorio No.3 de Interventoría

4.1.1. GARANTÍAS

A continuación, se encontrarán las garantías que exige la **SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO** al interventor con el propósito de asegurar el cumplimiento de las obligaciones que se asumen por medio del contrato, para la fecha del presente informe se encuentran actualizadas según el ACTA DE INICIO suscrita el 6 de octubre de 2025.

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS MUNDIAL**		
PÓLIZA DE SEGURO CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No.	BCH – 100046043 – Anexo 0		
TIPO DE MODIFICACION	POR SUSCRIPCION DE CONTRATO		
FECHA DE EXPEDICION	09/09/2025		
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
CUMPLIMIENTO	04/09/2025	04/10/2026	$ 159.236.827,00
PRESTACIONES SOCIALES	04/09/2025	04/04/2029	$ 79.618.414,00
CALIDAD DEL SERVICIO	04/04/2026	04/04/2031	$ 159.236.827,00
ACTA DE INICIO			
PÓLIZA DE SEGURO CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No.	BCH – 100046043 – Anexo 1 y 2		
TIPO DE MODIFICACION	POR ACTA DE INICIO		
FECHA DE EXPEDICION	08/10/2025		
AMPAROS	**VIGENCIA**		

	INICIAL	FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	06/10/2025	05/11/2026	$ 159.236.827,00
PRESTACIONES SOCIALES	06/10/2025	06/05/2029	$ 79.618.414,00
CALIDAD DEL SERVICIO	06/05/2026	06/05/2031	$ 159.236.827,00
MODIFICACION No.1 – ADICION Y PRORROGA			
PÓLIZA DE SEGURO CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No.	BCH – 100046043 – Anexo 6		
TIPO DE MODIFICACION	POR MOFICICACION No.1 – ADICION Y PRORROGA		
FECHA DE EXPEDICION	31/12/2025		
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEFGURADO**
	INICIO	**FINAL**	
CUMPLIMIENTO	04/09/2025	20/12/2026	$ 184.921.970,20
PRESTACIONES SOCIALES	04/09/2025	20/06/2029	$ 92.460.985,10
CALIDAD DEL SERVICIO	20/06/2026	20/06/2031	$ 184.921.970,20
MODIFICACION No.2 – ADICION Y PRORROGA			
PÓLIZA DE SEGURO CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No.	BCH – 100046043 – Anexo 7		
TIPO DE MODIFICACION	POR MOFICICACION No.2 – ADICION Y PRORROGA		
FECHA DE EXPEDICION	11/06/2026		
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEFGURADO**
	INICIO	**FINAL**	
CUMPLIMIENTO	04/09/2025	05/04/2027	$ 217.497.013,00
PRESTACIONES SOCIALES	04/09/2025	05/10/2029	$ 108.748.506,50
CALIDAD DEL SERVICIO	20/06/2026	05/10/2031	$ 217.497.013,00
MODIFICACION No.3 – ADICION Y PRORROGA			
PÓLIZA DE SEGURO CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No.	BCH – 100046043 – Anexo 9		
TIPO DE MODIFICACION	POR MOFICICACION No.3 – ADICION Y PRORROGA		
FECHA DE EXPEDICION	09/10/2026		
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEFGURADO**
	INICIO	**FINAL**	
CUMPLIMIENTO	04/09/2025	30/06/2027	$ 243.836.261,20
PRESTACIONES SOCIALES	04/09/2025	30/12/2029	$ 121.918.130,60

CALIDAD DEL SERVICIO	05/10/2025	30/12/2031	$ 243.836.261,20

Tabla 12 - *Pólizas Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110*
Fuente: *Propia*

Anexo 7. Actualización de póliza de Interventoría

4.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

4.2.1 ADMINISTRATIVAS

Esta interventoría ha ejecutado actividades administrativas según las obligaciones contractuales como lo son:

- Revisión de balances y alcances de actividades para cada IED. Se realizan revisiones, se enuncian las respectivas observaciones y se celebran mesas de trabajo para aterrizar los balances de cada sede. Se presentaron balances ajustados por parte del contratista consorcio País, los cuales se encuentran en revisión.
- Revisión y trámite de solicitudes de ingreso de personal del contratista.
- Programación y visitas técnicas para los frentes de obra y de las emergencias asignadas.
- Elaboración de informes semanales de interventoría No.43, No.44, No.45, No.46.
- Seguimiento de actividades realizadas en cada una de las instituciones educativas mencionadas anteriormente.
- Elaboración de comunicaciones referentes a estados de cada frente de obra, solicitudes de planes de contingencia teniendo en cuenta los atrasos en cada frente
- Elaboración de comités de obra.
- Elaboración de informes Mensuales de acuerdo con el periodo de corte.

Anexo 8. Actas de comité

Durante el periodo del presente informe la interventoría realizó las siguientes actividades en el área SST Y ambiental:

- Se valida y se da aprobación del Plan de Gestión De Seguridad y Salud en el Trabajo del Contratista de obra Consorcio País.
- Se valida y se da aprobación del personal de ingreso operativo del contratista de obra Consorcio País.
- Se realiza inducción y notificación de riesgos al personal contractual de la interventoría Consorcio Serinco Educativo.

- Se realizan las afiliaciones al sistema general de riesgos laborales, exámenes médicos de ingreso del personal de interventoría.
- Se valida planilla de Seguridad Social del contratista de obra Consorcio País.
- Se valida el alcance de los documentos de trabajo seguro en alturas emitido por el contratista de obra Consorcio País.
- Solicitud del personal contractual completo del contratista
- Verificación y aprobación de afiliaciones y exámenes de los subcontratistas.
- Organización documental.
- Se realiza seguimiento al plan ambiental con enfoque PIGA.
- Se identifica la adecuación de puntos de acopio para la acumulación de los materiales RCD generados a partir de las demoliciones realizadas.
- Se realiza retiro de material RCD.
- Se identifica ingreso de material pétreo a la obra.
- No se realiza aprovechamiento ni circularidad de RCD por el contratista de obra en el presente periodo.
- El contratista da cumplimiento al cronograma de capacitaciones ambientales y el plan de trabajo de este.

4.2.2 TÉCNICAS

Esta interventoría ha ejecutado actividades técnicas según las obligaciones contractuales como lo son:

- Visitas técnicas de verificación de cantidades y avances en cada una de las instituciones educativas, en cuanto a mantenimientos y emergencias.
- Acompañamiento técnico en campo para la verificación de condiciones estructurales y constructivas, con participación de los residentes y director de la interventoría, registrando observaciones que deberán ser atendidas por el contratista.
- Revisión y validación de los APUs técnicos correspondientes a cada sede, verificando la coherencia entre los precios, las cantidades y los recursos propuestos, de igual forma revisión y validación de ítems No previstos.
- Verificación de cumplimiento normativo en materia de seguridad, calidad y medio ambiente, previo al inicio de las actividades constructivas.
- Revisión y trámite de solicitudes de ingreso de personal del contratista y subcontratistas, verificando cumplimiento en materia de seguridad social y exámenes médicos ocupacionales.
- Revisión de acta de corte de obra y de igual forma revisión de informes mensuales de cada uno de los componentes

- Revisión de presupuestos y balances finales para cada una de las sedes
- Revisión de los ítems no previstos.

4.2.3 CONTROL PRESUPUESTAL Y FINANCIERO

Esta interventoría ha ejecutado actividades técnicas según las obligaciones contractuales como lo son:

- La Interventoría efectuó la revisión detallada del alcance técnico y económico del contrato, verificando que las actividades descritas en las especificaciones y planos correspondan con las cantidades de obra incluidas en el presupuesto. Se elaboró registro de observaciones en caso de inconsistencias o diferencias entre el alcance contractual y los documentos de soporte técnico.
- Se llevó a cabo la revisión técnica de la programación presentada por el contratista, verificando su coherencia con el plazo contractual, los hitos definidos y la secuencia lógica de las actividades constructivas. Se realizaron observaciones respecto al orden de ejecución, distribución de recursos y cumplimiento de tiempos previstos, con el fin de garantizar una adecuada planeación del proyecto antes del inicio de las actividades en campo.
- La Interventoría adelantó la revisión técnica y económica de los APU remitidos por el contratista, verificando que los insumos, rendimientos, costos horarios de maquinaria y porcentajes de AIU se encuentren acordes con el mercado y con lo estipulado en los documentos contractuales, y de igual forma se realizó la revisión de los ítems no previstos para ser aprobados por parte de la supervisión
- La Interventoría realizó la revisión técnica y económica de los presupuestos discriminados por institución educativa, de igual forma cada uno de los balances de acuerdo con las actividades que se encuentran en ejecución con el fin de verificar la correspondencia entre las cantidades de obra, las actividades descritas en los diseños y especificaciones técnicas, y los valores unitarios.
- Revisión semana por semana para verificación de actividades realizadas y de avances de obra.
- Revisión de acta parcial de obra, para el respectivo trámite ante la entidad contratante.

4.2.4 LEGAL

Esta interventoría ha revisado según las obligaciones contractuales como lo son:

- La verificación durante la ejecución y vigencia de los contratos de obra e interventoría, que se encuentren vigentes las pólizas y/o mecanismo de cobertura establecidas en los mismos y requerir a los contratistas en los casos en que sea necesaria su ampliación en valor o plazo, el cual se encuentran aprobadas y en cubrimiento las pólizas actualizadas de los contratos.
- Revisar, verificar y corroborar la autenticidad y veracidad de la información que sea allegada por el contratista de obra en cumplimiento de sus actividades y obligaciones.
- Realizar el proceso de seguimiento, evaluación, control y aprobación de los productos entregables establecidos, conforme al cronograma aprobado.
- Se realiza la revisión de los informes mensuales de acuerdo al periodo.
- Se realiza la elaboración de los informes mensuales de acuerdo a cada uno de los periodos incluyendo el de mención del 06 de agosto de 2026 al 05 de septiembre de 2026. En el cual se consolida la información técnica, administrativa, legal, financiera y ambiental.

4.3 RECURSOS DEL INTERVENTOR

Los recursos con los cuales ha contado CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO para el desarrollo del contrato de Interventoría y la supervisión del contrato de obra son los siguientes:

4.3.1 PERSONAL APROBADO POR INTERVENTORIA

Teniendo en cuenta los estudios previos el cual menciona en el G.7 EQUIPO DE TRABAJO, y en el literal G.7.1 personal Clave, La planta mínima de personal que el INTERVENTOR debe garantizar para alcanzar el objeto del contrato será la siguiente:

- Un (1) Director de interventoría
- Un (1) Profesional de Apoyo Técnico
- Un (1) Residentes de interventoría
- Un (1) Especialista ambiental
- Un (1) Técnico en Seguridad y Salud en el trabajo.
- Dos (2) Inspectores de interventoría

Mediante comunicados, ***SERINCO-SDE-L6-2025-005-REMISION DE DOCUMENTOS PARA SUSCRIPCION DE ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA***, ***SERINCO-SDE-2025-010-INT-REMISION DE HOJAS DE VIDA INTERVENTORIA, SERINCO-SDE-2025-023-INT-REMISION DE HOJAS DE VIDA DE INTERVENTORIA***, ***SERINCO-SDE-2025-027-INT-REMISION DE HOJAS DE VIDA DE INTERVENTORIA*** se radicaron ante la Secretaría de Educación Distrital las hojas de vida de los profesionales que harán parte del contrato de interventoría, la entidad por medio de comunicados No. S-

2025-320192_RTA da respuesta mencionando que como resultado al análisis realizado a las hojas de vida presentadas por el CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO y de acuerdo con los criterios establecidos en la minuta del contrato en el numeral G.4 en la página No. 19 en la obligaciones posteriores a la suscripción del acta de inicio cita lo siguientes: *" El Interventor deberá presentar el día hábil siguiente a la suscripción del Acta de inicio, las hojas de vida y los soportes del personal mínimo requerido, diferente al Director y al profesional de apoyo. La supervisión revisará las hojas de vida, con sus soportes, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la presentación de la documentación por parte de la interventoría. De presentarse observaciones estás deberán subsanarse por el contratista interventor en el término de tres (3) días hábiles. Recibidas las subsanaciones, la supervisión tendrá un (1) día hábil para la aprobación definitiva del personal mínimo requerido".* Posteriormente, mediante el oficio SERINCO-SED-2025-265-INT-RADICACIÓN DE CAMBIO DE HOJAS DE VIDA DE INTERVENTORÍA, la interventoría solicitó el cambio de seis (6) profesionales, correspondientes a tres (3) Inspectores de Obra y tres (3) Técnicos SST, presentando las respectivas hojas de vida y soportes para su evaluación. En respuesta, la entidad mediante comunicado No. S-2026-55580 emitió concepto favorable y aprobó los profesionales propuestos, al verificar el cumplimiento de los perfiles y requisitos contractuales establecidos. Por tal motivo, se presenta la tabla de los siguientes profesionales que cumplen con los requisitos exigidos. Por tal motivo se presenta la tabla de los siguientes profesionales que cumplen.

CARGO	NOMBRE	DEDICACIÓN
Director de Interventoría	Héctor Villazón Gutiérrez	100%
Profesional de apoyo	Viviana Miranda Cañón	100%
Residentes de Interventoría	César Carvajal González	100%
	Jhon Quintero Acevedo	
Especialista Ambiental	Luis González Camargo	15%
Técnicos en Seguridad y salud en el trabajo	Fabian Adolfo Paredes Serrano	100%
Inspectores de Interventoría	Camilo Andrés Cárdenas	100%

Tabla 13 - *Personal de Interventoría*
Fuente: *Propia*

Anexo 9. Planillas de pago
Anexo 10. Certificado pago Parafiscales

4.3.2 EQUIPO

CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO ha suministrado todos los recursos tecnológicos y de comunicación necesarios para la correcta y oportuna ejecución de las actividades.

4.4 INFORMACION FINANCIERA

4.4.1 PRESUPUESTO

La propuesta económica de la interventoría corresponde a un valor de SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($796.184.131,00).

Y se cuenta con tres adiciones, una adición por un valor de CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($128.425.720,00) INC.IVA, una segunda adición por un valor de CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS MCTE ($ 162.875.214,00) INC. IVA, y una última adición por un valor de CIENTO TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($131.696.241) INC.IVA.

Para la ejecución del contrato la entidad dispone los recursos mediante el certificado de disponibilidad presupuestal detallado en *Tabla 14. Certificado de disponibilidad presupuestal - Contrato de interventoría*

CDP	FECHA	RP	FECHA	VALOR RP
1984	05/03/2025	5012	05/09/2025	$ 796.184.131
3698	5/12/2025	7587	23/12/2025	$ 128.425.720
514	12/03/2026	3267	09/06/2026	$ 162.875.214
1606	02/09/2026	5975	02/10/2026	$ 131.696.241
TOTAL				1.219.181.306

Tabla 14 - *Certificado de disponibilidad presupuestal - Contrato de interventoría*
Fuente: *Propia.*

4.4.2 ESTADO FINANCIERO

A. PAGOS EFECTUADOS

ACTA	%	VALOR	VALOR VARIABLE – LOTE6	PAGO
Costo fijo No. 1	4,18%	$45.496.236	N/A	$45.496.236
Costo fijo No. 2	4,18%	$45.496.236	N/A	$45.496.236
Costo fijo No. 3	4,18%	$45.496.236,06	N/A	$45.496.236,06
Costo Variable No. 3	8,84%	$96.091.514,94	$18.180.024,14	$96.091.514,94
Costo fijo No. 4	4,18%	$45.496.236	N/A	$45.496.236
Costo Variable No. 4	3,10%	$33.730.926	$8.792.235,88	$33.730.926
Costo Fijo No.5	4,18%	$45.496.236	N/A	$45.496.236
Costo Variable No.5	2,10%	$22.792.645	N/A	$22.792.645
Costo Fijo No.6	8,37%	$90.992.472	N/A	$90.992.472
Costo Variable No.6	16,05%	$174.562.766	$112.122.614	$174.562.766
Costo Fijo No.7	3,15%	$34.246.858,95	N/A	$34.246.858,95
Costo Variable No.7	12,93%	$140.657.293,05	N/A	$140.657.293,05
Costo Fijo No.8	2,04%	$22.210.575	N/A	$22.210.575
Costo Variable No.8	9,16%	$99.580.187	$10.531.876,13	$99.580.187
Costo Fijo No.9	1,71%	$18.614.310,17	N/A	$18.614.310,17
Costo Variable No.9	4,17%	$45.379.804,83	$13.765.710,64	$45.379.804,83
Costo Fijo No.10	1,28%	$15.642.277,45	N/A	$15.642.277,45
Costo Variable No.10	3,58%	$43.631.472,55	$7.601.130,84	$43.631.472,55
TOTAL		**$1.065.614.283**	**$170.993.591,63**	**$1.065.614.283**

Tabla 15. *Pagos realizados a la interventoría*
Fuente: *Elaboración Propia*

Anexo 11. Acta de Interventoría

5. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA

En el plan de calidad el contratista del CONSORCIO PAIS, especifica las compras, almacén, calidad, pruebas, procedimientos, controles, seguimientos, preservación y mejoras de los materiales que usará en la realización del proyecto. El contrato deberá presentar a esta interventoría las fichas técnicas de los materiales además del seguimiento

de materiales llevada a cabo por la interventoría que implica tomar medidas para asegurar que los materiales utilizados en el proyecto cumplan con los estándares de calidad requeridos y se utilicen de manera adecuada. Algunos de los controles y procesos de control de los materiales que se llevará a cabo incluyen:

- Inspección de los materiales a su llegada al sitio del proyecto para verificar que correspondan a los requerimientos especificados en los planos y especificaciones técnicas.
- Realización de pruebas de laboratorio para determinar las propiedades físicas y químicas de los materiales, como resistencia, densidad, durabilidad, etc.
- Verificación de la procedencia de los materiales, asegurando que provengan de proveedores autorizados y cumplan con las normativas legales y de calidad establecidas.
- Supervisión de la correcta manipulación y almacenamiento de los materiales, garantizando que no se dañen o contaminen y que se conserven en condiciones óptimas.
- Registro y control de la cantidad de materiales utilizados en cada etapa del proyecto, asegurando que se utilicen las cantidades adecuadas y evitando desperdicios o malgastos.
- Seguimiento de los procedimientos de instalación o utilización de los materiales, verificando que se sigan las indicaciones del fabricante y las normativas técnicas correspondientes.
- Realización de inspecciones periódicas durante la ejecución del proyecto para asegurar que los materiales se estén utilizando de acuerdo a las especificaciones y que se estén cumpliendo las normas de calidad establecidas.
- Elaboración de informes de avance y control de materiales para documentar el cumplimiento de los requisitos y el estado de los materiales utilizados en el proyecto.

En atención a lo establecido en los documentos contractuales en los cuales, se solicita la presentación de el Plan de Aseguramiento para el desarrollo de las actividades de obra (sub-numerales del a hasta la x) y al requerimiento de entregar Plan de calidad técnico de obra que requiere los ensayos y controles que se realizaran para cada una de las actividades, la interventoría, ha realizado la respectiva revisión de los documentos.

EL contratista presenta el documento ***PLAN DE CALIDAD*** mediante correo electrónico, una vez recibida la información se realiza la respectiva revisión, se envían observaciones las cuales el contratista subsana, por lo cual se encuentra en proceso de ajuste según las últimas observaciones.


A continuación, se presenta cuadro con el resumen de las revisiones realizadas por la interventoría a los lotes designados para la firma.

CONTRATISTA	CONTRATO	LOTE	FECHA DE ENTREGA	VERSIONES	ESTADO
CONSORCIO ADECUACIONES ARSAF 2025	CO1.PCCNTR.8155135	4	26 de septiembre de 2025 3 de octubre de 2025 8 de octubre de 2025 23 de octubre de 2025	V0 V1 V2 V3	PARCIALMENTE APROBADO
CONSORCIO FORTALEZA	CO1.PCCNTR.8154895	5	15 de octubre de 20225 23 de octubre de 2025	V0 V1	PARCIALMENTE APROBADO
CONSORCIO PAIS	CO1.PCCNTR.8154780	6	22 de septiembre de 2025 22 de octubre de 2025	V0 V1	APROBADO

***Tabla 14**. Plan calidad*
***Fuente:** Propia*

TRAZABILIDAD DE LAS REVISIONES AL LOTE 6

El contratista realiza la entrega de la información mediante un link que comparte la información con: El documento con el aseguramiento a la calidad y anexan los controles y puntos de inspección de las actividades del proyecto, según la siguiente imagen.



El documento entregado presenta el siguiente contenido:

1. Alcance
2. Descripción del proyecto
3. Necesidad
4. Conveniencia
5. Impacto del proyecto
6. Directrices organizacionales
7. Sistema de Gestión de la calidad y enfoque de procesos
8. Liderazgo y compromiso
9. Entradas del Plan de Calidad
10. Roles y autoridades
11. Objetivos de calidad y planificación para lograrlos
12. Planificación de cambios

13. Apoyo
14. Operación
15. Auditorias
16. Ponderación
17. Registros

El contratista entrega un Plan integral con el desarrollo de la mayoría de los contenidos requeridos para el aseguramiento de la calidad. Se solicita complementar el manejo e implementación clara de la propiedad del cliente y la preservación del producto teniendo en cuenta que el objeto del proyecto se desarrolla en edificaciones existentes de la secretaria de educación. Adicionalmente se solicita la revisión del alcance de los controles de los ensayos e inspecciones de las actividades según la normativa. El contratista hace la subsanación y complementación y se aprueba.

6. GESTIÓN AMBIENTAL EN LAS ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN.

PROGRAMA D1: MANEJO DE DEMOLICIONES, ESCOMBROS Y DESECHOS DE CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS Y DESECHOS DE CONSTRUCCIÓN.

MANEJO DE DEMOLICIONES.

Para este periodo el contratista realizó actividades de demolición, en los siguientes colegios, así mismo, se realizaron actividades de orden y aseo.

- Guillermo Cano Isaza, demolición de baños y salones.

Sin embargo, el material producto de las actividades propias del contrato fue acopiado temporalmente en sitio y retirado en menos de 24 horas.

El contratista remitió certificados pendientes del periodo correspondiente a agosto de 2026, MAQUINAS AMARILLAS por 7m3 – 8.98Ton, así mismo, cabe mencionar que el contratista remite los anexos del Decreto 507 de 2023 debidamente diligenciados, ya que para el periodo de septiembre relaciona el retiro y disposición final de 14m3 Toneladas (Máquinas amarillas y SECAM).

Es importante señalar que, el contratista se encuentra al día con los reportes mensuales de RCD (agosto 2026), en la plataforma web de la Secretaría Distrital de Ambiente.

MANEJO DE ESCOMBRO.

Este proyecto contempla un volumen estimado de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) de aproximadamente 1521 Toneladas, según los estudios técnicos preliminares realizados.

Los escombros generados durante este período fueron retirados en un plazo máximo de 24 horas tras su producción, dado que el proyecto se desarrolla en una zona de alto tránsito peatonal.

Para el mes de agosto, el Consorcio País realizó la disposición final de RCD correspondientes en la escombrera Máquinas Amarillas, por una cantidad de 14m3.

El contratista CONSORCIO PAÍS, no dispuso residuos de construcción en zonas verdes que no son intervenidas por el proyecto.





TRANSPORTE DE ESCOMBROS.

Durante este periodo, se llevó a cabo la disposición final de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) generados en la obra, asegurando su traslado hasta los sitios de disposición (Máquinas Amarillas). Esta labor se ejecutó utilizando volqueta sencilla, las cuales se encontraban debidamente carpadas, sin exceder su capacidad.

Máquinas amarillas – 14m3.

El transporte de los escombros se efectuó en horarios planificados para evitar interferencias con las horas pico del tráfico vehicular y respetando los horarios de descanso de los residentes del sector. Además, se dio cumplimiento a los lineamientos establecidos por las autoridades de tránsito competentes.

- **PROGRAMA D2. ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.**

FUENTES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.

Para el presente periodo, el contratista Consorcio País, manifiesta que no hubo ingreso de materiales pétreos ni no pétreos.

- **PROGRAMA D3. MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES**

El contratista Consorcio País, cuenta con varios sitios de almacenamiento temporal para el proyecto, dado que el contrato se desarrolla en varias instituciones educativas, los cuales de igual forma garantizan orden y aseo, y de igual forma están establecidos en espacios que no interrumpa el tráfico peatonal.

MANEJO DE CAMPAMENTO O SITIO DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIALES.

CONSORCIO PAÍS, cuenta con el Plan de Gestión Integral de residuos sólidos y peligroso – PGIRS Y RESPEL. Allí estará descrito todas las actividades a realizar para la clasificación y separación de los residuos sólidos aprovechable, no aprovechables y peligrosos entregado en el PIPMA.

Por otro lado, y mediante Resolución 2184 de 2019 "Por la cual se modifica la resolución 668 de 2016 sobre el uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones, los residuos no reciclables, se almacenarán en bolsas adecuadas para posteriormente ser evacuados por los vehículos recolectores de basura de cada uno de los sectores donde se encuentran realizando actividades del contrato.

El área de acopio de materiales mantuvo condiciones de orden y limpieza adecuadas. Los residuos ordinarios se separaron según el PGIRS y se entregaron a cada una de las empresas recolectoras de basuras de la ciudad de Bogotá.

DESMANTELAMIENTO.

No aplico en el periodo. Sin embargo, Al finalizar la obra el Consorcio País, estará en el deber de desmontar el campamento o sitio de almacenamiento temporal de materiales, como también de recuperar y restaurar el espacio afectado y el área del campamento o sitio de almacenamiento temporal de materiales de acuerdo con su uso.

PROGRAMA D4. MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y TRANSPORTE

OPERACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS.

Dado que las actividades se realizan al interior de las instituciones educativas, no se han realizado actividades que requieran de retroexcavadoras, ni vibrocompactadores, por tanto, no se tienen establecidos Planes Estratégicos Viales.

Sin embargo, para el retiro de residuos de construcción y demolición, si se hace uso de volquetas sencillas, las cuales realizan el transporte de dichos residuos a los sitios autorizados, los cuales, tal y como se mencionó con anterioridad al retirarse de los sitios de obra, van debidamente carpados y sin exceso de carga, las cuales dan cumplimiento a las normativas de tránsito.

No se reportaron eventos de fuga de aceites ni derrames.

EQUIPOS Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN A UTILIZAR.

Para este periodo se trabajó con la siguiente maquinaria amarilla y volquetas:

- Volquetas sencillas.

PROGRAMA D5. MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLES, ACEITES Y SUSTANCIAS QUÍMICAS

MANEJO DE COMBUSTIBLES, ACEITES Y SUSTANCIAS DERIVADAS.

Durante el presente periodo, dado que no se hizo uso de maquinaria en el contrato, no hubo manejo de combustibles, aceites o sustancias derivadas, de igual forma, las volquetas que realizan el retiro de RCD, realizan el suministro del combustible en lugares externos a los sitios de trabajo del contrato de obra.

MANEJO DE AGUAS RESIDUALES

Durante el presente periodo, no se hizo disposición de aguas residuales, dado que el contrato no hace uso de baterías sanitarias portátiles.

PROGRAMA D6. MANEJO DE ESTRUCTURAS Y ASEO DE LA OBRA

CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA OBRA.

Para el presente periodo, el contratista realizó capacitaciones en los siguientes temas ambientales:

- MANEJO de ruido, ahorro y uso eficiente de agua.

MEDIDAS Y DISPOSICIÓN DE RECURSOS.

Durante el periodo evaluado, se identificaron actividades de manejo y disposición de los residuos generados en obra, así como medidas de orden, aseo y limpieza en cada uno de los frentes de trabajo.

PROGRAMA D8. MANEJO DE EXCAVACIONES Y RELLENOS

EXCAVACIONES.

En el presente periodo reportado, se realizaron excavaciones en el Colegio Ciudad de Villavicencio.

Tal como se ha mencionado en el desarrollo del informe, dicho material de excavación se ha dispuesto debidamente en los sitios autorizados.

RELLENOS.

Durante el presente periodo, no se realizaron actividades de relleno, de acuerdo con lo reportado por el contratista.

PROGRAMA D9. CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO

De manera semanal, el contratista ejecutó labores de limpieza, organización y mantenimiento en las vías de acceso de entrada y salida, garantizando que permanecieran libres de escombros y materiales en las zonas donde se realizaron retiros de RCD.

PROGRAMA D10. MANEJO DE REDES DE SERVICIO PÚBLICO

PRELIMINARES.

No aplico en el periodo.

DURANTE LAS LABORES DE EXCAVACIÓN.

Para este periodo no se presentaron afectaciones a redes

EN CASO DE PRESENTARSE ACCIDENTES

No aplico en el periodo.

Si llegado el caso de que este CONSORCIO realizando cualquier actividad del proyecto, ocurriera alguna afectación accidental a una línea de servicios públicos, se avisará de inmediato al Residente Ambiental y al profesional de Seguridad Industrial del mismo, quien avisará a la empresa de servicios correspondiente y pondrá en marcha las acciones previstas en el Plan de Contingencia.

7. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

El seguimiento al Programa de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se realizará conforme al Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, considerando las siguientes actividades y programas:

Actividades Principales

- Evaluación inicial.
- Identificación de riesgos y peligros.
- Definición de la política y los objetivos.
- Elaboración del plan de trabajo anual.
- Programa de capacitación.

- Plan de manejo de emergencias.
- Reporte e investigación de incidentes y accidentes.
- Adquisición de bienes y contratación de servicios relacionados con la seguridad.
- Medición y evaluación de la gestión.
- Implementación de acciones preventivas y/o correctivas.

Seguimiento de Programas

1. Sistema General de Seguridad Social: Verificación de afiliaciones, certificaciones y prestaciones sociales.
2. Programa de Capacitación: Revisión de informes del contratista y seguimiento a la ejecución de las capacitaciones.
3. Programa de Inspecciones: Control de inspecciones periódicas en el lugar de trabajo para identificar riesgos y aplicar medidas preventivas o correctivas.
4. Programa de Monitoreo de Seguridad y Salud Ocupacional:

    - Verificación del cumplimiento de exámenes médicos ocupacionales.
    - Seguimiento al proceso de gestión de la salud de los trabajadores.
    - Control de actividades de alto riesgo mediante:
    - Inventario de tareas, equipos y procedimientos de alto riesgo.
    - Análisis de Trabajo Seguro (ATS).
    - Validación de documentación del personal idóneo.
    - Permisos de trabajo seguro en alturas.
    - Permisos de trabajo de alto riesgo y responsables de las actividades
    - Revisión de certificados y documentos de equipos de protección contra caídas.

Actividades de Seguimiento

Durante el presente periodo se realizaron actividades de seguimiento relacionadas con la gestión del SG-SST por parte del contratista y subcontratistas, incluyendo:

- Radicación de documentos.
- Revisiones técnicas.
- Observaciones y correcciones.
- Mejora continua.
- Aprobaciones finales.

Estas acciones garantizaron el cumplimiento de la normatividad vigente y la adecuada implementación de los programas de SST.

6		CIUDAD BOLIVAR	CIUDAD VILLAVICENCIO	CIUDAD VILLAVICENCIO	CL 114ª Sur # 7f este 60

COLEGIO CIUDAD VILLAVICENCIO
ACTIVIDAD PREPARACIÓN Y MEZCLA DE CONCRETO.














Observación del hallazgo:
Durante la interventoría se observó cerramiento y punto de acopio en desorden y mal estado y el no uso adecuado de los elementos de protección personal por parte de uno de los operarios quien era personal nuevo en la obra y no contaba con su dotación obligatoria. Posterior a esto se le comunica al personal del consorcio país que se debe realizar la acción correctiva de las no conformidades evidenciadas, y efectivamente de forma eficiente el consorcio doto al nuevo personal operativo con sus correspondientes epp y realizo actividades de orden y aseo, retirando en su totalidad la poli sombra y recogiendo todos los elementos que se encontraban en el punto de acopio y de esta manera disminuyo el riesgo de caída al mismo nivel.

6	1959	CUIDAD BOLIVAR	GUILLERMO CANO ISAZA	A – GUILLERMO CANO	KR 16ª # 62-35 SUR

COLEGIO GUILLERMO CANO ISAZA
ACTIVIDAD EN ORDEN Y ASEO











Observación del hallazgo:
Durante la revisión de interventoría se evidencia que el personal recogió la poli sombra y realizo orden y aseo, ya que habían finalizado actividades en todos los frentes de trabajo.

Destacando la intervención del personal operativo en la presentación optima del producto final y el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo.

6		CIUDAD BOLIVAR	Eduardo Umaña Mendoza.	Eduardo Umaña Mendoza.	Cl. 114a Sur #7f Este60, Bogotá





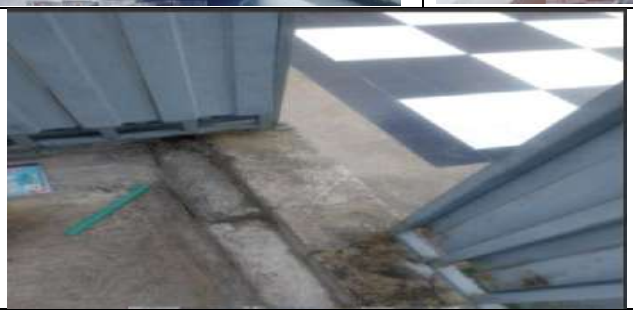

Observación del hallazgo:
Durante la interventoría se le comunica al personal sst del consorcio país, el deber de implementar un sistema de protección contra caídas como por ejemplo: la instalación de una línea de vida y el uso obligatorio de los elementos de protección contra caídas y de esta manera cumplir con la resolución 4272 de 2021 la cual obliga a utilizar sistemas de ingeniería para disminuir el riesgo de caídas a distinto nivel.

Anexo 12. Registro Capacitaciones

REVISIÓN APROBACION UNO A UNO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA EN OBRA

Durante el presente periodo el Contratista gestiono varios procesos de gestión documental para la aprobación del personal en las obras, y así poder permitir el acceso e inicio de los trabajadores en obra. Los cuales quedan registrados los siguientes registros de aprobaci6n de personal en obra.

REPORTE DIRARIO DE VISITAS COLEGIOS

Fecha	Colegio	Contratista	Lote	Hora Ingreso	Hora Salida	Actividades Supervisadas	Permisos Revisados	Hallazgos	Observaciones emitidas	SST Responsable	Registro Fotográfico (descripción)
7/09/2026	Guillermo icanolzasa	Consorcio país	6	12:00 p. m.	1:00 p. m.	Actividad orden y aseo	Ats	Se evidencia personal realizando orden aseo en areas	Se realiza seguimiento a la actividad.	Faber Forero	
9/09/2026	Colegio ciudad de villavicencio	Consorcio país	6	1:00 p. m.	2:00 p. m.	preparación y mezcla de concreto	Ats	cerramiento en mal estado	Se recomienda realizar jornada de orden y aseo	Faber Forero	
15/09/2026	Guillermo icanolzasa	Consorcio país	6	3:30 p. m.	4:00 p. m.	No se evidencia actividades	N/A	Se evidencia areas intervenidas y cerco de acopios	N/A	Faber Forero	
17/09/2026	colegio Eduardo umaña mendoza.	Consorcio país	6	1:00 p. m.	2:00 p. m.	Actividad en alturas reparación de cubiertas	Ats y permiso de trabajo en alturas	Se debe instalar lineas de vidas por corredores donde estan	Se recomienda señalizar el área y el uso obligatorio de los elementos de protección contra	Faber Forero	
23/09/2026	Colegio Eduardo umaña	Consorcio país	6	1:00 p. m.	2:00 p. m.	Actividades de inspección por parte del contratista	Ats	Se evidencia personal sin el uso de los elementos de protección	Se recomienda implementar un sistema de proteccion contra caidas para el desarrollo de las	Faber Forero	
23/09/2026	Colegio ciudad de villavicencio	Consorcio país	6	2:00 p. m.	3:00 p. m.	Actividad demolición de concreto	Ats	Durante la revisión de interventoria se evidencia uno de los	Se recomienda implementar el uso adecuado de los epp e instalar la guarda en la pulidora para el	Faber Forero	
25/09/2026	Colegio ciudad de villavicencio	Consorcio país	6	2:00 p. m.	3:00 p. m.	Entrega de epp y actividades de orden y aseo.	Ats	Se evidencia cierre del hallazgo del día 23 de sep del 2026 ya que se	Se recomienda no olvidar el uso de la guarda en la pulidora al momento de realizar actividades de corte.	Faber Forero	
29/09/2026	Arbolizadora alta	Ansel	4	1:00 p. m.	2:00 p. m.	No se evidencia actividades	N/A	Se evidencia que no se a realizado orden y aseo en los puntos	Se recomienda arreglar cerramiento. o implementar cinta de señalización y realizar orden y aseo para	Adrian	

DOMINGO LIÑAN	18.001.061	CONSTRUCCIONES MONTAJES Y SONSULTORIAS JRS SAS
JOSE SILGADO	1.143.333.075	CONSTRUCCIONES MONTAJES Y SONSULTORIAS JRS SAS
JOVANNY RODRIGUEZ	85.461.472	CONSTRUCCIONES MONTAJES Y SONSULTORIAS JRS SAS
LEIVER GUERRERO	10.944.358	CONSTRUCCIONES MONTAJES Y SONSULTORIAS JRS SAS
YOVANNY RODRIGUEZ	85.461.472	CONSTRUCCIONES MONTAJES Y SONSULTORIAS JRS SAS
ALEXANDER GONZALEZ	14.281.335	IGT SAS / CONSORCIO PAIS
LUIS HERNANDO PRIETO	79.859.370	IGT SAS / CONSORCIO PAIS
LUIS EDUARDO SANCHEZ	1.012.431.988	IGT SAS / CONSORCIO PAIS
VICTOR ALONSO HERNANDEZ	1.031.154.946	IGT SAS / CONSORCIO PAIS
YEIMER EDILSON RODRIGUEZ	1.075.674.156	CONSORCIO PAIS
YEISSON MAURICIO PEREZ	1.075.661.215	CONSORCIO PAIS
ARIS NELSON MOGOLLON	1.101.546.591	CONSORCIO PAIS
FABIAN DAVID JARA	1.078.367.125	CONSORCIO PAIS
EDWIN FABIAN RODRIGUEZ	1.075.660.607	CONSORCIO PAIS
LUIS ALFONSO GORODO	79.165.624	CONSTRUCCIONES MONTAJES Y SONSULTORIAS JRS SAS
ALVEIRO JIMENEZ	85.201.574	CONSTRUCCIONES MONTAJES Y SONSULTORIAS JRS SAS
LUIS MARINO JOSSA GUERRERO	12.984.086	SORCIO PAIS / CONSTRUCCIONES MONTAJES Y CONSULTORIAS JRS
JOSE GREGORIO LARIOS CARRANZA	1.063.958.262	SORCIO PAIS / CONSTRUCCIONES MONTAJES Y CONSULTORIAS JRS
VICTOR MUÑOS	17.668.699	SORCIO PAIS / CONSTRUCCIONES CONSULTORIA Y MONTAJES J.R.S

8. OBLIGACIONES GENERALES

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Constituir en favor de BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL – SECRETARIA DE EDUCACIÓN, con NIT. 899.999.061-9, las garantías para avalar la adecuada ejecución del contrato y las obligaciones contraídas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo de la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto 1082 de 2015. Estas garantías deberán constituirse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato y requerirá ser aprobadas por la Secretaría de Educación de Distrito. Las garantías deberán cubrir los amparos señalados en los estudios previos y el pliego de condiciones del presente proceso. El contratista será responsable de la autenticidad y veracidad de las garantías.	El Consorcio Serinco Educativo remitió las pólizas a la entidad y subió las mismas a la plataforma SECOP II, el día 27/10/2025	
2	Cumplir a cabalidad el objeto del contrato de acuerdo con los términos y condiciones pactadas, las cuales solamente podrán ser modificadas, previo al cumplimiento del trámite establecido para tal fin por la SED y con fundamento en los respectivos soportes.	Cumple con la obligación	

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
3	Acreditar, durante la ejecución del contrato y como requisito previo para el pago de cada una de las ACTAS PARCIALES, el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social (Salud, pensión y ARL) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA y Fondo Para la Industria de la Construcción - FIC cuando haya lugar a ello), de todo el personal a cargo del contratista. Dicha acreditación para el caso de persona natural será mediante la presentación de los comprobantes de pago, si se trata de persona jurídica se acreditará mediante la certificación expedida por el revisor fiscal cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley quien deberá aportar fotocopia de la cédula y tarjeta profesional o por el representante legal según corresponda; de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificada por Decreto 2106 de 2019, artículo 23 y 32 de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes.	Para el presente periodo se cuenta con el pago de cuatro actas dentro de las cuales se encuentra el pago fijo y el pago variables según el avance de obra. y se encuentra pendiente el pago de una quinta acta.	
4	Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del contrato, cuando a este hubiere lugar.	No aplica para el presente periodo	
5	Presentar la respectiva factura o su documento equivalente cuando esté obligado a ello, de acuerdo con el régimen tributario aplicable al objeto contratado, acompañada de los documentos soporte que permitan establecer el cumplimiento de las condiciones pactadas, incluido el Registro Único Tributario (RUT) expedido por la DIAN y el Registro de Información Tributaria (RIT) expedido por la Dirección Distrital de Impuestos, requisitos sin los cuales no se podrá tramitar el respectivo pago. Es obligación del contratista, conocer y presupuestar todos los gravámenes de los cuales es responsable al momento de celebrar el presente contrato, por tanto, asumirá la responsabilidad y los costos, multas y/o sanciones que llegaren a generarse por la inexactitud de la información fiscal que se haya entregado.	No aplica para el presente periodo	
6	Mantener a la SED libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes (si fueren autorizados). En consecuencia, LA INTERVENTORÍA mantendrá indemne a la SED contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, incluido el personal de la SED, ocasionados por La Interventoría o por sus	Se cumple con la obligación de acuerdo con el presente periodo	

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
	subcontratistas o dependientes (si fueren autorizados) en la ejecución del objeto y las obligaciones contractuales.		
7	Constituir y mantener vigentes las garantías estipuladas y cumplir todos los requisitos para hacerlas efectivas, si a ello hubiere lugar. En ese orden, el Interventor debe mantener actualizadas las vigencias y el monto de los amparos de las garantías expedidas con ocasión de la suscripción del contrato, teniendo en consideración el plazo, el valor, así como las eventuales prórrogas, adiciones, modificaciones, suspensiones, etc, que puedan afectar precisamente su vigencia o monto.	Se cumple con la obligación	
8	Entregar a la SED los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos cuando así se requiera, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud.	Se cumple con la obligación de acuerdo al presente periodo	
9	Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato le imparta la SED a través del supervisor del mismo, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.	Se cumple con la obligación	
10	Ejecutar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones contractuales, aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento, siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza y objeto del Contrato.	Se cumple con la obligación	
11	Guardar estricta reserva sobre toda la información y documentos a los que tenga acceso, maneje en desarrollo de su actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato y que no tenga el carácter de pública. En consecuencia, se obliga a no divulgar por ningún medio dicha información o documentos a terceros, sin la previa autorización escrita de la 1SED. Esta obligación permanecerá vigente aún después de la terminación por cualquier causa de la vinculación que ligue a las partes. Por lo tanto, en caso de que la ENTIDAD tenga prueba de que La Interventoría ha divulgado cualquier tipo de documentación o información que en forma alguna se relacione con el presente contrato, La Interventoría indemnizará los perjuicios que con tal hecho cause a la ENTIDAD. No se considerará incumplida esta cláusula cuando la información o documentos deban ser revelados por mandato judicial y/o legal o cuando la información manejada tenga el carácter de pública.	Se cumple con la obligación	

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
12	Cumplir con la política de buen trato para con los demás colaboradores internos y externos de la SED, y actuar con responsabilidad, eficiencia y transparencia, ubicada en la página web de la SED, mediante el siguiente Link: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia-politicas-lineamientos-manuales-planes-estrategicos-sectoriales-institucionales	Se cumple con la obligación	
13	Respetar la política medioambiental de la SED, política que incluye todas las normas internas sobre el uso de los recursos ambientales y públicos, como el agua y la energía, racionamiento de papel, normas sobre parqueaderos y manejo de desechos residuales y manejo del ruido ubicada en la página web de la SED, mediante el siguiente Link: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia-politicas-lineamientos-manuales-planes-estrategicos-sectoriales-institucionales	Se cumple con la obligación	
14	Cumplir con todas las condiciones técnicas contempladas en la propuesta presentada y todas las condiciones establecidas en los Documentos Previos, evaluada y aprobada por la SED, así como ejecutar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto contractual, el alcance y las obligaciones derivadas del mismo, aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento,2 siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza del contrato.	Se cumple con la obligación	
15	Cumplir con los ofrecimientos hechos en el proceso de selección y por los cuales obtuvo puntaje en los factores de ponderación que dieron lugar a la adjudicación del proceso a su favor.3	Se cumple con la obligación	
16	Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo –SST–, respetar la política de Seguridad y Salud de la SED, con el objetivo de ofrecer entornos de trabajo seguros y saludables, promoviendo la cultura del autocuidado, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales, condi5ciones que fortalecen la productividad y el bienestar físico y mental, política ubicada en la página web de la SED mediante el siguiente Link: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia-politicas-lineamientos-manuales-planes-estrategicos-sectoriales-institucionales	Se cumple con la obligación	

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
17	Vincular, mantener y garantizar que, dentro del personal vinculado para el desarrollo del contrato, se contrate el porcentaje de mujeres establecido en el Decreto 634 del 28 de diciembre de 2023 y en los estudios previos de acuerdo con cada una de las ramas de actividad económica a la cual corresponda el objeto a contratar, o el indicado en las normas que adicionen, modifiquen, deroguen o sustituyan al referido decreto, so pena de la imposición de multas, sanciones y demás consecuencias previstas en el contrato y en las demás normas aplicables.	Se cumple con la obligación	
18	Reportar la contratación del porcentaje de mujeres vinculadas, mediante la manifestación que bajo juramento presenten bimestralmente, el representante legal y del revisor fiscal de la interventoría, sin perjuicio de otros mecanismos de verificación que establezca la supervisión.	Se cumple con la obligación	
19	Registrar las mujeres contratadas en el micrositio BOGOTÁ TRABAJA de la Secretaría de Desarrollo Económico. El cumplimiento de esta obligación deberá surtirse dentro del primer mes de ejecución del contrato lo cual será verificado por la supervisión o quien esta designe y conforme a las implementaciones que sobre el particular defina la Secretaría de Desarrollo Económico; en cumplimiento del artículo 3, del parágrafo sexto del Decreto 634 de 2023. Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 332 de 2020, que establece medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital.	Se cumple con la obligación	
20	La Interventoría tiene la obligación en relación con sus colaboradores, evitar cualquier acción u omisión, que les cause muerte, daño o sufrimiento (físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado. También evitará cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las personas por razón de su condición social, económica o política. Igualmente, deberá facilitar y promover la denuncia ante el acaecimiento de cualquiera de las circunstancias descritas o las dispuestas en la Ley 1257 de 2008.	Se cumple con la obligación	

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
21	Promover entre su equipo de trabajo el uso de lenguaje no discriminatorio por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.	Se cumple con la obligación	
22	Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.	Se cumple con la obligación	
23	Garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad destinadas a mitigar, evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de las emergencias sanitarias o ambientales, presentadas en el país, según lo establezca las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y/o Distrital cuando aplique.	Se cumple con la obligación	
24	Dar cumplimiento al objeto y alcance del Contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y en sus anexos.	Se cumple con la obligación	
25	Permitir la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando respuesta a las observaciones o requerimientos que se realicen.	Se cumple con la obligación	
26	Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.	Se cumple con la obligación	
27	Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.	No aplica para el presente periodo	
28	Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo requerido por la Entidad.	Se cumple con la obligación	
29	Cumplir con las diferentes normas vigentes relacionadas con las actividades que se desarrollen en el marco del objeto contractual y su alcance.6	Se cumple con la obligación	
30	Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del Contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuan8do sea requerido por la Entidad, el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (artículo 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.	Se cumple con la obligación	

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
31	Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de la Entidad, durante el desempeño de las actividades objeto a contratar; la Secretaría de Educación del Distrito se reserva el derecho a verificar durante la ejecución del contrato el cumplimiento de estos requisitos de acuerdo con lo descrito en la normatividad referente al SG-SST, aplicable en la SED.	Se cumple con la obligación	
32	Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las actividades de la sociedad, su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona jurídica o sus representantes legales, socios accionistas.	No aplica para el presente periodo	
33	Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo definidos en el estudio previo y en el "Anexo 1 – Anexo Técnico", en los plazos acordados con la Entidad.	Se cumple con la obligación	
34	Informar a la supervisión del contrato, a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de que tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes Contratista.	No aplica para el presente periodo	
35	Informar a la supervisión del contrato, a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de la notificación del auto de iniciación de procesos concursales, de reorganización o liquidación del Contratista o de alguno de sus integrantes en caso de tratarse de una figura Plural.	No aplica para el presente periodo	
36	Comunicar a la Entidad de manera inmediata dentro de las veinticuatro 24 horas siguientes a acaecimiento cualquier inhabilidad sobreviniente que afecte su capacidad para ejecutar el contrato. En el caso de consorcio o uniones temporales esta obligación se extiende a cualquiera de sus integrantes.	No aplica para el presente periodo	
37	Presentar a la Entidad el certificado de inhabilidades por delitos sexuales (Ley 1918 de 20185) de todo el personal no calificado, técnico y profesional del equipo de interventoría; e igualmente revisar el certificado de inhabilidades por delitos sexuales (Ley 1918 de 20185) del contratista de obra.	Se cumple con la obligación	

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
38	La Interventoría deberá velar en todo momento por el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con las obligaciones generales, por parte del contratista de obra de acuerdo con los términos y condiciones contenidos en el negocio jurídico referido y sus anexos.	Se cumple con la obligación	

Tabla 16 - *Obligaciones Generales - Interventoría*
Fuente: *Propia.*

9. OBLIGACIONES ESPECIFICAS

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Cumplir con las disposiciones establecidas en la NSR10 frente a los apartados que corresponde en el marco de las intervenciones locativas.	No aplica para el presente periodo	
2	Conocer y aplicar las disposiciones del Manual Integrado de Contratación y el manual de Interventoría de la SED, ubicado en la página web de la SED, mediante el siguiente Link: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-files/PW_Manual_Integrado_Contratacion_SED_v1.PDF	Se cumple con la obligación	
3	Entregar a la supervisión del contrato todos los productos que le sean requeridos en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, con ocasión al seguimiento del contrato principal, consistentes en informes, revisiones, verificaciones y/o resultados obtenidos en el desarrollo del contrato (laboratorios, pruebas, ensayos, etc) y cuando así se requiera, atendiendo y dando respuesta de fondo a los requerimientos y recomendaciones que durante el desarrollo del contrato le imparta la SED a través de la supervisión o quien este designe, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.	Se cumple con la obligación	
4	Velar por el cumplimiento de todas las obligaciones y condiciones contenidas en el Contrato de obra, así como en los documentos previos y normas aplicables que hacen parte integral del mismo.	Se cumple con la obligación	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
5	Revisar, verificar y corroborar la autenticidad y veracidad de la información que sea allegada por el contratista de obra en cumplimiento de sus actividades y obligaciones.	Se cumple con la obligación	
6	Presentar los informes respecto de la ejecución del contrato de obra y de Interventoría, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, en el momento en que sea requerido por el director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos o quien este designe.	Se cumple con la obligación	
7	Aprobar y garantizar el cumplimiento del cronograma de trabajo de campo durante la ejecución del contrato de obra, el cual deberá incluir como mínimo: La descripción de la forma como pretende acometer los trabajos de manera simultánea en las sedes que le sean asignadas en de cada lote o grupo, el organigrama propuesto para la ejecución de estos, el plan de calidad e indicadores de gestión del proyecto que deben ser presentados en el informe mensual de Interventoría.	Se cumple con la obligación	
8	Pagar oportunamente los honorarios o salarios según corresponda de su personal a cargo, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución y liquidación del contrato. El interventor debe garantizar que el personal se encuentre debidamente afiliado al sistema de seguridad social integral (Salud, pensión y ARL). Es entendido que todos estos gastos han sido estimados integralmente por el Interventor e incluidos en el precio de su oferta económica.	Se cumple con la obligación	
9	Realizar el pago del impuesto del timbre durante los 10 días calendario siguientes a la expedición del Formato de Conceptos Varios hechos por la Secretaría de Educación del Distrito en virtud de lo establecido en el Decreto 175 de 2025 y en el artículo 519 del Estatuto Tributario.	Se cumple con la obligación	
10	Revisar y verificar que las garantías del contrato de obra cumplan con las disposiciones establecidas en el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 del 2015, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y lo dispuesto por	Se cumple con la obligación	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
	los documentos previos del proceso, observando su vigencia y condiciones para hacerlas efectivas, si a ello hubiere lugar, teniendo en consideración el plazo, el valor, así como las eventuales prórrogas, adiciones, modificaciones, suspensiones, etc., que puedan afectar las condiciones del contrato. Así mismo, la Interventoría deberá reportar el incumplimiento de estas disposiciones, con el fin de adelantar el Procedimiento Administrativo Sancionatorio Contractual pertinente.		
11	Proyectar y suscribir las actas de inicio, reinicio, suspensión, entrega final o parcial, entre otras, del contrato de Interventoría y de obra.	Se cumple con la obligación	
12	Revisar, estudiar y solicitar al contratista de obra, reporte sobre las consultas a las Entidades competentes sobre la norma urbanística aplicable para el predio, así como las posibles afectaciones involucradas.	Se cumple con la obligación	
13	Realizar el proceso de seguimiento, evaluación, control y aprobación de los productos entregables establecidos, conforme al cronograma aprobado.	Se cumple con la obligación	
14	Emitir y exigir el cumplimiento de todas las obligaciones técnicas, administrativas, financieras, ambientales, jurídicas y sociales en cuanto a calidad, presupuesto y programación durante todo el contrato de obra.	Se cumple con la obligación	
15	El Interventor tendrá la responsabilidad directa de garantizar la ejecución de la obra con los materiales especificados y aprobados en las diferentes etapas de la obra.	Se cumple con la obligación	
16	Establecer la línea de base del presupuesto y la programación para poder ejercer las funciones de monitoreo y control al desempeño del contrato de obra, informando oportuna y continuamente al Supervisor o a quien este designe, sobre los aspectos relevantes del desempeño del contrato de obra, su problemática y alternativas de solución, rindiendo informe por lo menos una vez al mes.	Se cumple con la obligación	
17	En caso de presentarse retrasos en el desarrollo del cronograma de actividades de las IED y/o sedes administrativas a cargo de los contratistas de obra, el interventor deberá solicitar al contratista la entrega de un plan de contingencia en un plazo máximo de dos (2)	Se cumple con la obligación	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
	días hábiles, el cual deberá ser aprobado por la interventoría en un plazo de un (1) día hábil. Si los atrasos en la ejecución de las actividades de obra persisten, el interventor deberá radicar ante la SED, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a partir de la ocurrencia del hecho, un informe con la solicitud de inicio del procedimiento administrativo sancionatorio contra el contratista de obra.		
18	Acompañar, apoyar y emitir conceptos dentro de los procesos administrativos, judiciales y extrajudiciales, respecto de la ejecución del contrato de obra, durante su vigencia y en la etapa postcontractual en los plazos establecidos por la Entidad.	No aplica para el presente periodo	
19	Mantener el equipo profesional y técnico propuesto para el correcto desempeño del contrato de Interventoría, durante la ejecución del contrato, de tal manera que las sedes de obra activas simultáneas cuenten con el seguimiento adecuado.	Se cumple con la obligación	
20	Programar y presidir los comités técnicos de acuerdo con la agenda preestablecida y el orden del día programado, citando anticipadamente al contratista de obra, al Supervisor o quien este designe y al personal de apoyo que se requiera, con el fin de llevar a cabo el control permanente del desempeño del contratista.	Se cumple con la obligación	
21	Presentar al supervisor o quien este designe, un resumen gráfico semanal del avance técnico, administrativo y financiero, evidenciando entre otros aspectos, el estado de avance presupuestal y de programación del contrato de obra comparado con la propuesta económica y el plazo contractual.	Se cumple con la obligación	
22	Efectuar las revisiones periódicas que estime necesario a las cantidades de obra y calidad de los materiales, haciendo seguimiento a la toma de pruebas, ensayos, controles y resultados.	Se cumple con la obligación	
23	Efectuar vigilancia y control a la bitácora única de obra, donde se consignarán todas las instrucciones impartidas, las solicitudes, observaciones y recomendaciones formuladas, los acuerdos y demás determinaciones tomadas en relación con la ejecución de los proyectos.	Se cumple con la obligación	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
24	Mantener un archivo organizado de la Interventoría, respecto de la correspondencia, informes, resúmenes gráficos, fotografías, solicitudes, requerimientos, quejas, planos, cálculos, memorias e inventarios detallados que sirven de base para efectuar el recibo mensual de las obras ejecutadas, el cual debe ser entregado al finalizar el contrato.	Se cumple con la obligación	
25	Revisar, autorizar o rechazar las actas mensuales de pago parcial presentadas por el contratista de obra, conforme al cronograma de ejecución, dentro de un plazo máximo de tres (3) días hábiles, siguientes a la fecha de presentación del acta mensual de pago, en tal caso el interventor está en la obligación de presentar a la SED un informe de las cantidades de obra ejecutada y aprobada por la Interventoría para este período. Una vez aprobadas las actas parciales de obra, la Interventoría acompañará el trámite para el correcto cumplimiento de los pagos.	Se cumple parcialmente, debido a que se encuentra en verificación el acta parcial de obra.	
26	Elaborar y presentar oportunamente las actas mensuales de pago parcial de Interventoría, conforme a la forma de pago establecida en el contrato, dentro de un plazo máximo de tres (3) días hábiles, siguientes a la fecha de presentación del acta mensual de pago.	Se cumple con la obligación	
27	Elaborar y presentar para aprobación del supervisor o quien este designe, los informes semanales, mensuales, y final de Interventoría de acuerdo con la estructura y requisitos exigidos. La presentación y aprobación por parte del supervisor de estos informes mes a mes serán requisito para la tramitación de las cuentas parciales y/o Facturas o documento equivalente, las cuales serán tramitadas una vez se encuentre aprobado el informe, debiéndose cargar a la plataforma Secop II dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la del informe (mensual o de periodicidad mayor que no supere los 6 meses) que sustente los respectivos cobros.	Se cumple con la obligación	
28	Apoyar a la SED en la respuesta de reclamaciones, demandas y acciones surgidas por perjuicios causados a terceros por parte del contratista de obra, con ocasión del desarrollo del contrato, acompañando a la SED	No aplica para el presente periodo	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
	hasta finalizar los procesos o controversias, o hasta la caducidad de las acciones.		
29	Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista de obra, cuando sea pertinente emitir el concepto técnico y/o jurídico o el que corresponda y dar traslado a la SED dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recibo. Así mismo, apoyar a la SED en la respuesta a reclamaciones que surjan, posterior a la entrega de la obra en el plazo establecido para ello.	No aplica para el presente periodo	
30	Brindar oportuno a las reclamaciones que formule la comunidad, los Entes de control o los contratistas con respecto a la ejecución de las obras, acompañando a la SED en la proyección de las respuestas que deban ser emitidas en el plazo establecido para ello.	No aplica para el presente periodo	
31	Reportar a la SED, de los hechos corroborados de fuerza mayor o caso fortuito dentro de un plazo máximo de dos (2) días hábiles siguientes al recibo del reporte realizado por el contratista de obra, conceptuando acerca de la evaluación de los hechos acaecidos, las causas y la diligencia con que el contratista actuó ante la ocurrencia de éstos y emitir recomendaciones sobre las medidas a tomar.	No aplica para el presente periodo	
32	Revisar, corroborar y conceptuar, en un término no mayor a tres (3) días hábiles, acerca de los informes de eventos eximentes de responsabilidad que alegue el contratista de obra, comunicando a la Supervisión del contrato de manera completa y oportuna su procedencia.	No aplica para el presente periodo	
33	Responder por el comportamiento del personal a su cargo en horas de trabajo en el sitio de la obra.	Se cumple con la obligación	
34	Vigilar y aprobar el protocolo y/o plan de manejo arqueológico que el contratista de obra implemente y ejecute en caso de que llegaren a encontrar en los sitios de trabajo o que se descubran durante la ejecución del contrato de obra, objetos, zonas o monumentos de interés arqueológico, histórico o turístico, para lo cual el interventor deberá presentar un informe detallado a la supervisión.	Se cumple con la obligación	
35	Dar respuesta de manera eficiente y eficaz a las solicitudes presentadas por el contratista de obra o la	Se cumple con la obligación	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
	SED dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recibo, de manera que no generen atrasos a las obras o ampliaciones en el plazo establecido.		
36	Certificar mediante documento en el cual garantice que los insumos utilizados en el análisis de precios unitarios concuerdan con el valor de la actividad o ítem propuesto por el contratista de obra en su oferta económica.	Se cumple con la obligación	
37	Realizar el acompañamiento y la respectiva verificación de las actas de vecindad presentadas por el contratista de obra, para todos los predios aledaños, espacio público, vías de acceso, y zonas del colegio que no se intervendrán, las cuales deberán ser allegadas por el contratista de obra para su aprobación dentro del primer mes de la etapa constructiva.	Se cumple con la obligación	
38	Utilizar el software que la SED requiera para el seguimiento y control de la ejecución del proyecto, el cual deberá permitir el uso compartido del contratista de obra y la SED.	Se cumple con la obligación	
39	Evaluar, aprobar y/o rechazar motivadamente la solicitud que realice el contratista de obra sobre la inclusión de maquinaria y/o personal para labores nocturnas y días feriados. En caso de ser viable, el interventor deberá poner a disposición personal en obra para labores nocturnas y días feriados, previo a los permisos otorgados por las entidades pertinentes.	Se cumple con la obligación	
40	En caso de presentarse solicitud de modificación, suspensión o reinicio del contrato, la Interventoría se encargará de emitir concepto técnico y jurídico con la recomendación al respecto. Así mismo, la Interventoría deberá emitir un concepto sin que sea requerido, cuando evidencie alguna situación que requiera la modificación, suspensión o reinicio del contrato, esto en un término no mayor a tres (3) días hábiles una vez conocida la situación. Las solicitudes de modificación contractual y demás novedades contractuales deberán ser radicadas en la SED una vez se evidencie la necesidad y hasta mínimo 15 días hábiles antes de la finalización del contrato.	Se cumple con la obligación	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
41	Elaborar y suscribir el acta de recibo definitivo de la obra, con las constancias a que hubiere lugar. En caso de que el contratista de obra se abstenga de suscribir cualquier acta, la Interventoría deberá certificar por escrito tal hecho de manera inmediata.	No aplica para el presente periodo	
42	Para la etapa de liquidación, el interventor deberá certificar que las cantidades ejecutadas en obra corresponden a las realmente ejecutadas, así como la idoneidad y los correctos procesos constructivos desarrollados en la obra.	No aplica para el presente periodo	
43	Diligenciar la documentación necesaria para la liquidación del contrato de obra, y elaborar las correspondientes actas, en donde se hará constar: a) El recibo definitivo y a satisfacción de las obras, b) Las modificaciones en adiciones y precios, los ajustes, las prórrogas, el número y cuantía de las actas parciales y recibo final de pagos, reconocimientos y demás, c) Los acuerdos, conciliaciones y transacciones entre las partes, d) El valor final del contrato, e) La extensión o ampliación de las vigencias de las garantías del contrato objeto de interventoría.	No aplica para el presente periodo	
44	En el caso de requerirse durante la ejecución del contrato la entrega de informes contables, el Interventor cuenta con un término de diez (10) días calendario para la entrega de estos, una vez realizado el requerimiento por la supervisión.	No aplica para el presente periodo	
45	En el evento que se presente una modificación a los cronogramas de obra, por causas imputables al contratista, la Interventoría deberá requerirlo para que presente en un término de tres (3) días hábiles un Plan de Contingencia detallado. El Interventor deberá revisarlo y aprobarlo en un plazo de dos (2) días hábiles En el evento que se deban efectuar correcciones o ajustes, el contratista contará con un (1) día hábil para atender las observaciones.	No aplica para el presente periodo	
46	El interventor, con el acompañamiento y supervisión integral de la SED, debe realizar un seguimiento diario al cronograma y a las actividades programadas, de acuerdo con las asignaciones efectuadas y el plazo previsto para la actividad de mejoramiento de la IED, el cual no podrá coincidir con el plazo total de ejecución	Se cumple con la obligación	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
	contractual. Esto con el objetivo de planificar adecuadamente los insumos, materiales, equipos y mano de obra necesaria para el desarrollo de los trabajos.		

Tabla 17 - *Obligaciones Especificas - Interventoría*
Fuente: *Propia.*

10. REGISTRO FOTOGRAFICO

El registro fotográfico se realizó durante las visitas de seguimiento en la etapa de ejecución de las obras en las diferentes sedes educativas, con el fin de documentar el avance y el estado de las intervenciones. Este material permite respaldar las observaciones técnicas, evidenciar las actividades ejecutadas, identificar situaciones relevantes en campo y servir como soporte visual.

Anexo 13. Registro fotográfico

Se adjunta video mediante el cual se evidencian los avances de obra correspondientes a cada sede intervenida, el cual podrá ser consultado a través del siguiente enlace:

- Link de acceso:

https://drive.google.com/drive/folders/1KA1RQ6YkWR7Uyyv9PIE0I6Z_K_5LHhKB?usp=drive_link

Lo anterior, en cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con el registro audiovisual del progreso de ejecución.

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Durante el periodo reportado, el contratista CONSORCIO PAÍS ha ejecutado actividades en las catorce (14) instituciones educativas que conforman el Lote No. 06, distribuidas en las localidades de Ciudad Bolívar y Usme. A la fecha de corte, el avance financiero ejecutado acumulado corresponde a $2.658.007.293,44, equivalente al 89,24% del valor programado, mientras que el avance programado acumulado era de

$2.680.312.191,05 (89,99%), lo que evidencia un atraso del 0,75% ($298.306.619,00) respecto a lo planificado.

2. Se concluye que las sedes educativas Orlando Fals Borda, Unión Europea Sede B, Sierra Morena Sede C, Fabio Lozano Simonelli, Arborizadora Baja, Buenavista (Calasanz), Estrella del Sur Sede B, Santa Librada, Estrella del Sur Sede A y Tenerife Granada Sur Sede A se encuentran al 100% de ejecución y han sido entregadas. En el caso del Colegio Guillermo Cano Isaza, el avance es del 99,96%, encontrándose pendiente únicamente remates de pintura y aseo general para la entrega formal del bloque B, segundo piso.

3. Los colegios Ciudad de Villavicencio Sede B (93,20%), Rafael Uribe Uribe (0,90%) y Los Comuneros Oswaldo Guayasamín (1,33%) presentan avances inferiores al 100%. En particular, los dos últimos iniciaron actividades recientemente, por lo que sus porcentajes de ejecución son aún muy bajos en relación con el total contratado.

4. El contrato CO1.PCCNTR.8154780 presenta un valor final de $3.117.050.445,00, con un plazo inicial de siete (7) meses, una adición de un (1) mes y quince (15) días, una prórroga de tres (3) meses y diez (10) días, y una prórroga adicional de tres (3) meses, estableciéndose como fecha de terminación final el 30 de diciembre de 2026. Las garantías del contrato se encuentran vigentes y actualizadas conforme a las modificaciones suscritas.

5. El contrato CO1.PCCNTR.8169110, suscrito con el CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO, tiene un valor final de $1.219.181.306,00 (incluido IVA), con fecha de terminación al 30 de diciembre de 2026. Se han realizado diez (10) pagos que suman $1.006.340.533,00, y el personal clave mínimo se encuentra aprobado y vinculado al proyecto.

6. El CONSORCIO PAÍS ha cumplido con la ejecución de las actividades contratadas, logrando la entrega de la mayoría de los frentes de obra dentro de los plazos establecidos. El cumplimiento de las obligaciones generales y específicas del contrato, en los aspectos técnicos, financieros y administrativos, se encuentra dentro de los parámetros establecidos, a excepción de los atrasos iniciales que han sido gestionados mediante la solicitud de planes de contingencia.

7. En términos generales, tanto el contratista de obra como la interventoría cumplen con las obligaciones generales y específicas derivadas del contrato. Se destaca que las

garantías del contrato se encuentran vigentes y actualizadas conforme a las modificaciones y prórrogas realizadas. El personal clave mínimo requerido ha sido aprobado y se encuentra vinculado a la ejecución del proyecto.

8. El contratista de obra ha dispuesto del personal mínimo requerido, previamente aprobado por la interventoría y la SED.

9. Se reitera la necesidad de subsanar oportunamente las observaciones a los Manuales de Mantenimiento y a los APU´s de Ítems No Previstos.

10. Hemos reiterado al contratista de obra la necesidad de actualizar el balance la reprogramación de acuerdo con las cantidades reales a ejecutar para que no se sigan presentando atrasos en el comparativo programado vs ejecutado.

11. La Interventoría mantuvo el seguimiento a la programación contractual, verificando el comportamiento de los avances, la disponibilidad de recursos y la ejecución de las actividades previstas, con el propósito de identificar oportunamente posibles desviaciones y promover las acciones necesarias para garantizar la culminación de los frentes pendientes dentro del plazo contractual vigente.

12. En materia de calidad, se realizó seguimiento a las observaciones formuladas por la Interventoría y la Secretaría de Educación del Distrito, verificando la ejecución de actividades de corrección, ajuste, terminación y remate. Estas acciones deberán mantenerse hasta garantizar que las obras cumplan con las especificaciones técnicas, condiciones de funcionalidad y requisitos establecidos en los documentos contractuales.

13. En el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo se verificó la implementación de las medidas establecidas por el contratista, incluyendo afiliaciones, capacitaciones, inspecciones, documentación para trabajos en alturas, equipos de protección contra caídas, análisis de trabajo seguro y delimitación de los frentes de obra. Durante el periodo reportado no se registraron accidentes laborales ni incidentes reportados.

14. En el componente ambiental se realizó seguimiento a la implementación de las medidas contempladas en el PIGA y el PMA-RCD, al manejo de los residuos de construcción y demolición y a las condiciones de cerramiento de los frentes de trabajo, manteniendo el control sobre las obligaciones ambientales asociadas a las actividades ejecutadas.

15. En materia social se evidenció la coordinación de visitas a las instituciones educativas y la gestión de actas de apertura y actas de vecindad, con acompañamiento de la Interventoría y la supervisión, procurando una adecuada articulación con las comunidades educativas durante el desarrollo de las intervenciones.

16. En términos generales, la Interventoría considera que durante el periodo evaluado se mantuvo un control integral del contrato, con seguimiento permanente a la ejecución de las actividades, la documentación, la programación y las evidencias asociadas al desarrollo de las obras.

17. Fortalecer el acompañamiento a las instituciones educativas durante los procesos de entrega y socialización, verificando que las intervenciones sean recibidas en condiciones adecuadas de funcionalidad, seguridad, limpieza y terminación, y dejando debidamente documentados los requerimientos que puedan surgir durante dichos procesos.

18. Mantener actualizados y organizados los soportes técnicos, administrativos, fotográficos y financieros del contrato, garantizando la trazabilidad de las actividades ejecutadas y facilitando los procesos de cierre, recibo y posterior liquidación contractual.

19. Finalmente, se recomienda al contratista concentrar sus esfuerzos en el cierre efectivo de las actividades pendientes y en la atención oportuna de las observaciones aún abiertas, manteniendo una coordinación permanente con la Interventoría y la Secretaría de Educación del Distrito, con el fin de garantizar que la totalidad de las intervenciones sean entregadas en condiciones satisfactorias de calidad, funcionalidad, seguridad y cumplimiento contractual.

Anexo 14. Relación de Correspondencia

ANEXO No. 01. MODIFICATORIO No. 3 DE OBRA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Radicado Nº I-2026-118531
Fecha: 11-09-2026 - 12:40
Folios: 207 Anexos: 206
Radicador: ANDRES IVANNO GALEANO TORO - 4300
Destino: 5220 - OFICINA DE CONTRATOS
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el codigo de verificación: 77PSM

MEMORANDO

Para: **ANA MARÍA BRICEÑO CAMPOS**
Jefe Oficina de Contratos - SED

DE: **ANDRÉS IVANNÓ GALEANO TORO**
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Secretaría de Educación del Distrito.

Asunto: **Remisión de solicitud de modificación contractual No 3 del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR. 8154780 de septiembre de 2025** cuyo objeto es: **"***Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas". – LOTE 6.*

Respetada Ana María,

Conforme a su competencia, remito para su trámite la solicitud de modificación contractual No 3 del contrato indicado en el asunto. Lo anterior tiene como propósito efectuar una prórroga de tres (3) meses, así como la adición del contrato por un valor ***CUATROCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 460.000.000,00)*** incluido impuestos, tasas y contribuciones, y todos los costos directos e indirectos a que haya lugar, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato.

En consecuencia, el plazo total de ejecución del contrato será de catorce (14) meses y veinticinco (25) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

Cordialmente,

ANDRÉS IVANNÓ GALEANO TORO.
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos

Anexo: Solicitud de modificación contractual y anexos

Proyectó: Santiago Ángel Uribe – Contratista DCCEE SED

Revisó: Paola Ruiz Manotas – Contratista DCCEE

Revisó: Paula Andrea Panesso Sánchez – Líder jurídico DCCEE

FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	
1. DATOS DEL CONTRATO.	
NO. CONTRATO:	CO1.PCCNTR.8154780 DE 2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CONSORCIO PAÍS conformado por: **CONSTRUCTORA PAIS NIT. 901.063.647-3** — **30%** **NYS CONSTRUCOL SAS NIT. 901.306.834-9** — **30%** **CONSTRUCCIONES VYP SAS NIT. 901.368.837-6** — **10%** **FAPAIS SAS NIT. 901.762.077-4** — **30%**
NOMBRE IDENTITARIO[1]:	N/A
SUPERVISOR/INTERVENTOR	**INTERVENTORÍA CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO** CO1.PCCNTR.8169110 DE 2025
OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS". – LOTE 6
VALOR INICIAL:	**DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL VEINTITRÉS PESOS M/CTE. ($2.332.049.023,00)** incluido impuestos, tasas y contribuciones, y todos los costos directos e indirectos a que haya lugar derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato.
PLAZO INICIAL:	Siete (7) meses
FECHA DE INICIO:	6 de octubre de 2025

1.1. GESTIÓN DEL TIEMPO:

Acto que afecta el plazo (prórroga/suspensión)	Fecha de suscripción	Impacto en el plazo.
MODIFICACIÓN CONTRACTUAL No. 1 - Prórroga	22-12-2025	El contrato fue prorrogado por el término de 1 mes y 15 días calendario, quedando como fecha de terminación el 20 de junio de 2026.
MODIFICACIÓN CONTRACTUAL No. 2 - Prórroga	27-05-2026	El contrato fue prorrogado por el término de 3 meses y 10 días calendario, quedando como fecha de terminación el 30 de septiembre de 2026.

1.2. GESTIÓN DE COSTOS

Acto que afecta el valor del contrato (Adición/Disminución)	Fecha de suscripción	Impacto en el valor
MODIFICACIÓN CONTRACTUAL No. 1 - Adición	22-12-2025	Se adicionó el valor del contrato por la suma de **SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE ($785.001.422)** equivalente a **551.46 SMMLV** para la vigencia 2025, quedando el valor total del contrato en la suma de **TRES MIL**

[1] Numeral 5 Directiva 005 de 2021 Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. - Secretaría Distrital de Planeación

		CIENTO DIECISIETE MILLONES CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 3.117.050.445) INCLUIDO AIU.
1.3. GESTIÓN DE ALCANCE/CALIDAD.		
Acto que afecta el alcance del contrato (Modificaciones, cesiones, aclaratorios).	**Fecha de suscripción.**	**Impacto en las condiciones del contrato**
MODIFICACIÓN CONTRACTUAL No. 1	22-12-2025	Se realizaron ajustes y aclaraciones a los ítems contractuales 7.1.1, 7.1.5, 7.2.30, 7.2.31, 7.2.32, 7.2.33 y 16.1.25 del Anexo de Especificaciones Técnicas Generales del contrato No. CO1.PCCNTR.8154780, con el fin de precisar su alcance y facilitar su correcta ejecución, control y pago durante el desarrollo del contrato. Se aprobó la inclusión de dos nuevos frentes de obra: **IED GUILLERMO CANO ISAZA SEDE A** - CPF 1959 en el que se realizaron actividades correspondientes a la adecuación de las baterías sanitarias en el bloque de Bachillerato. **IED TENERIFE GRANADA SUR SEDE A - CPF 548** en el que se realizaron actividades correspondientes a la impermeabilización de tanque subterráneo y el suministro e instalación de barandas en los puntos fijos Finalmente, y en atención a la necesidad planteada por la Secretaría de Educación del Distrito - SED, de contar con la posibilidad de atender las emergencias que se pudieran presentar en las IED y sedes administrativas a cargo de la entidad, se contemplaron recursos adicionales a la bolsa de emergencias del Contrato de Obra CO1.PCCNTR.8154780 de 2025, por valor de **DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000*).***
MODIFICACIÓN CONTRACTUAL No. 2	27-05-2026	Se realizó ajuste y aclaración al ítem contractual 3.3.2. del Anexo de Especificaciones Técnicas Generales del contrato No. CO1.PCCNTR.8154780, con el fin de precisar su alcance y facilitar su correcta ejecución, control y pago durante el desarrollo del contrato. Así mismo, se aprobó la inclusión de un (1) nuevo frente de obra:

<table>
<tr><td></td><td></td><td>IED CIUDAD DE VILLAVICENCIO SEDE B – CPF 545: en el que contempló como alcance la adecuación del piso en plazoleta y circulación y la adecuación de bajantes y cajas de inspección</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.4 FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN:</td><td>1.5 VALOR ACTUAL</td></tr>
<tr><td colspan="2">30 DE SEPTIEMBRE DE 2026</td><td>TRES MIL CIENTO DIECISIETE MILLONES CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($3.117.050.445) INCLUIDO AIU, IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES, Y TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS A QUE HAYA LUGAR DERIVADOS DE LA CELEBRACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.</td></tr>
<tr><td colspan="3">2. GESTIÓN DE INTEGRACIÓN DEL CONTRATO</td></tr>
<tr><td>AVANCE FÍSICO - EJECUCIÓN:</td><td colspan="2">AVANCE FINANCIERO</td></tr>
<tr><td>El contrato de obra CO1.PCCNTR.8154780 de 2025 presenta un avance de ejecución del 95.45% conforme al informe semanal No. 43 con fecha de corte al 6 de septiembre de 2026, lo que representa una diferencia positiva de 0.11%, frente al avance programado del 95.34%

En este contexto, el avance reportado en el Informe Semanal No. 43 resulta consistente con el desarrollo de las actividades de obra previstas, lo que no afecta el cumplimiento del contrato dentro del tiempo establecido y con los alcances acordados.

El contrato cuenta con doce (12) frentes contractuales así:

1. IED ORLANDO FALS BORDA: Finalizado
2. IED UNIÓN EUROPEA B: Finalizado
3. IED SIERRA MORENA C: Finalizado
4. IED FABIO LOZANO SIMONELLI A: Finalizado
5. IED ARBORIZADORA BAJA A: Finalizado
6. IED CALASANZ BUENAVISTA: Finalizado
7. IED ESTRELLA DEL SUR B: Finalizado
8. IED SANTA LIBRADA: En ejecución con el Finalizado
9. IED ESTRELLA DEL SUR A: Finalizado
10. IED TENERIFE GRANADA SUR A: Finalizado
11. IED GUILLERMO CANO ISAZA: En ejecución con el 99.96% de avance
12. IED CIUDAD DE VILLAVICENCIO B: En ejecución con el 65.13% de avance</td><td colspan="2">A la fecha el avance de ejecución financiero es del 78.01% equivalente a $ 2.431.747.288, lo que corresponde a:

- ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1 por $361´723.907, valor ya pagado por la entidad.
- ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2 por $435´348.486, valor ya pagado por la entidad.
- ACTA PARCIAL DE OBRA No. 3 por $781´384.254, valor ya pagado por la entidad.
- ACTA PARCIAL DE OBRA No. 4 por $492´623.060, valor ya pagado por la entidad.
- ACTA PARCIAL DE OBRA No. 5 por $209´434.074, valor ya pagado por la entidad.
- ACTA PARCIAL DE OBRA No. 6 por $151.233.507, valor ya pagado por la entidad

Pendiente por ejecución financiera $685.303.157 correspondiente a un 21.99%

La diferencia entre los porcentajes de ejecución física y ejecución financiera obedece al corte de los informes que contractualmente se vienen empleando para ello. Fecha del corte físico fue 6/09/2026 y la fecha del corte financiero fue 12/08/2026.

Valor pagado: $2.431.747.288

Valor pendiente de Pago: $685.303.157</td></tr>
</table>

Así las cosas, de los doce (12) frentes de obra contractuales, se ha realizó la entrega a satisfacción de diez (10) sedes. Las dos (2) restantes, se encuentran en ejecución con fecha máxima de entrega al 30 de septiembre de 2026.		

3. GESTIÓN DE RIESGOS

3.1 GARANTÍAS

Amparos	Último anexo	Vigencia final	Valor asegurado final.	Fecha de aprobación.
Póliza de Cumplimiento No. 39-44-101175397 Cumplimiento	Anexo No. 09	07-06-2027	$ 623´410.089,00	17 de julio de 2026
Póliza de Cumplimiento No.39-44-101175397 **Pagos de salarios y prestaciones**		08-10-2029	$ 311´705.044,50	
Póliza de Cumplimiento No.39-44-101175397 **Estabilidad y Calidad de Obras**		05-05-2028	$ 623´410.089,00	
Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. 39-40-101045911	Anexo No.15	05-10-2026	$ 525´271.500,00	17 de julio de 2026
Póliza Todo Riesgo Constructor No. BY-100000027	Anexo No.07	30-11-2026	$ 3.117´050.445,00	17 de julio de 2026

3.2 RIESGOS.

Una vez revisada la matriz de riesgos incorporada en los documentos del proceso de contratación del cual se derivó el Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8154780 de 2025, así como el alcance de la modificación contractual propuesta, se observa que esta no introduce tipologías de riesgo distintas a las inicialmente identificadas, ni altera su asignación entre las partes.

En efecto, la modificación obedece a la necesidad de atender e incorporar dos nuevas sedes educativas, manteniéndose el objeto contractual, las condiciones técnicas de ejecución y el esquema económico basado en precios unitarios vigentes, sin que ello implique reajustes por cambio de anualidad. En ese contexto, las actividades adicionales se enmarcan en las mismas categorías de riesgo previamente analizadas, sin que se evidencie la generación de riesgos autónomos o no contemplados en la estructuración inicial.

Ahora bien, la incorporación de dos sedes al alcance inicial no implica una variación de los riesgos previamente identificados, en consideración al porcentaje de ejecución del contrato y al nivel de cumplimiento evidenciado por el contratista. En ese sentido, no se advierte que dicha modificación altere la naturaleza, asignación o mecanismos de tratamiento de tales riesgos, los cuales se mantienen idóneos para su adecuada gestión.

De otra parte, las necesidades que dan lugar a la modificación corresponden a situaciones advertidas durante la ejecución contractual que no implican incumplimiento del contratista ni de la interventoría, sino ajustes propios de la dinámica de un contrato a monto agotable, en el cual las cantidades de obra pueden variar sin desbordar el objeto ni las condiciones inicialmente pactadas.

En consecuencia, la adición de recursos, la ampliación del plazo contractual y la inclusión de dos nuevas sedes educativas no modifican los riesgos inicialmente identificados ni generan riesgos distintos a los previstos en la matriz, toda vez que las actividades a ejecutar se mantienen dentro del objeto y alcance contractual y bajo las mismas condiciones de ejecución. Por tanto, se mantienen vigentes la asignación entre las partes y los mecanismos de tratamiento de los riesgos definidos desde la etapa precontractual, sin que se requiera la actualización de la matriz de riesgos.

4. TIPO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

OPCIÓN 1. ADICIÓN O DISMINUCIÓN DE VALOR	**CDP No.**	1116
	Opción 1. Valor de la adición:	**CUATROCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($460´000.000),** incluido AIU.

<table>
<tr><td></td><td>Porcentaje de la adición:</td><td>14.76%</td></tr>
<tr><td></td><td>Valor final del contrato:</td><td>TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($3.577.050.445) incluido AIU</td></tr>
<tr><td rowspan="4">OPCIÓN 2. PRÓRROGA</td><td>Plazo inicial:</td><td>11 meses y 25 días</td></tr>
<tr><td>Plazo por prorrogar:</td><td>CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO, prorrogar el contrato por el término de TRES (3) MESES, contados a partir del 01 de octubre de 2026; por lo tanto, el plazo general del contrato será de CATORCE (14) meses y VEINTICINCO (25) días, hasta el 30 de diciembre de 2026.</td></tr>
<tr><td>Porcentaje de la prórroga:</td><td>25.35%</td></tr>
<tr><td>Fecha de terminación prevista teniendo en cuenta la prórroga:</td><td>30 DE DICIEMBRE DE 2026</td></tr>
<tr><td>OPCIÓN 5. OTRAS MODIFICACIONES.</td><td colspan="2">
1. INCLUSIÓN DE DOS NUEVAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES COMO FRENTES DE INTERVENCIÓN PRIORIZADOS.

En el marco de la presente modificación contractual, se incluyen en el alcance del contrato dos (02) Instituciones Educativas Distritales - IED RAFAEL URIBE URIBE SEDE A – CPF 1943 y IED LOS COMUNEROS OSWALDO GUAYASAMIN SEDE B – CPF 561, ubicadas en la localidad de Ciudad Bolívar y Usme, como frentes de obra adicionales.

Así las cosas, se incluye dentro del cuadro de proyectos del Lote 6 de la Cláusula 24. Lugar de ejecución, establecida en el Anexo 4 – Minuta del contrato, DOS (02) nuevas sedes educativas, como se indica a continuación:

“(…) d. LUGAR DE EJECUCIÓN: “Las obras por ejecutar se encuentran ubicadas en la ciudad de Bogotá D.C., distribuidas de acuerdo con la siguiente georreferenciación:”

Lote 6

<table>
<tr><th>CPF</th><th>Localidad</th><th>Colegio</th><th>Sede Educativa</th><th>Dirección</th><th>Zona</th></tr>
<tr><td>523</td><td>USME</td><td>FABIO LOZANO SIMONELLI</td><td>SEDE A – FABIO LOZANO SIMONELLI</td><td>CL 65 SUR No. 5 65</td><td>SUR</td></tr>
<tr><td>1904</td><td>CIUDAD BOLIVAR</td><td>ARBORIZADORA BAJA</td><td>SEDE A – ARBORIZADORA BAJA</td><td>CL 59 A BIS SUR No. 45 16</td><td>SUR</td></tr>
<tr><td>1974</td><td>CIUDAD BOLIVAR</td><td>CALASANZ BUENAVISTA</td><td>SEDE A – BUENAVISTA (CALASANZ)</td><td>KR 17F No. 77 A 13 SUR</td><td>SUR</td></tr>
<tr><td>1930</td><td>CIUDAD BOLIVAR</td><td>UNION EUROPEA</td><td>SEDE B – MARIA CANO</td><td>CL 69B SUR No. 17N 92</td><td>SUR</td></tr>
<tr><td>1918</td><td>CIUDAD BOLIVAR</td><td>ESTRELLA DEL SUR</td><td>SEDE B – ESTRELLA II</td><td>CL 75 SUR No. 18B 45</td><td>SUR</td></tr>
<tr><td>581</td><td>USME</td><td>ORLANDO FALS BORDA</td><td>SEDE A – BARRANQUILLITA NUEVO</td><td>KR 12 No. 72 60 SUR</td><td>SUR</td></tr>
<tr><td>546</td><td>USME</td><td>SANTA LIBRADA</td><td>SEDE A – SANTA LIBRADA</td><td>CL 75 A SUR No. 9 A 45</td><td>SUR</td></tr>
<tr><td>1917</td><td>CIUDAD BOLIVAR</td><td>ESTRELLA DEL SUR</td><td>SEDE A – ESTRELLA I</td><td>KR 17P No. 72 25 SUR</td><td>SUR</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

1913	*CIUDAD BOLIVAR*	*SIERRA MORENA*	*SEDE C – DIVINO NIÑO*	*KR 46 A No. 79D 15 SUR*	*SUR*
1959	*CIUDAD BOLIVAR*	*GUILLERMO CANO ISAZA*	*SEDE A – GUILLERMO CANO ISAZA*	*CL. 63 Sur No 16 C 08*	*SUR*
548	*USME*	*TENERIFE GRANADA SUR*	*SEDE A - TENERIFE*	*CL 91 A Sur No. 1 20*	*SUR*
545	*USME*	*CIUDAD DE VILLAVICENCIO*	*SEDE B – PUERTA AL LLANO*	*Kr 114 A Sur No 7F Este 60*	*SUR*
1943	***CIUDAD BOLIVAR***	***RAFAEL URIBE URIBE***	***SEDE A – RAFAEL URIBE***	**DG 71B SUR No, 18 I 20**	***SUR***
561	***USME***	***LOS COMUNEROS OSWALDO GUAYASAMIN***	***SEDE B – VIRREY ULTIMA ETAPA***	**DG 93B SUR No 4 A 45 ESTE**	***SUR***

(…)"

5. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:

5.1 JUSTIFICACIÓN Y/O CONCEPTOS DE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN No. 03 PRESENTADA POR EL CONTRATISTA E INTERVENTOR

A. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN No. 03 PRESENTADA POR EL CONTRATISTA DE OBRA

En virtud del radicado S-2026-241315 del 30 de julio de 2026, la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos de la Secretaría de Educación del Distrito solicitó adelantar el trámite de la Modificación No. 3 al Contrato de Obra N° CO1.PCCNTR.8154780 de 2025, CONSORCIO PAIS - Lote 6. En este sentido, el contratista de interventoría CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO, mediante comunicado No. SERINCO-SED-L6-2025-629A de fecha 30 de julio de 2026 requirió al contratista de obra para que efectuara el análisis de la solicitud presentada**.**

El Contratista de obra CONSORCIO PAIS, mediante comunicación OFI-SED-L6-261 del 19 de agosto de 2026, presentó ante el Contratista Interventor la Solicitud de Modificación No. 03, en la cual se incorporan el presupuesto y el cronograma de actividades requeridos para la suscripción de la Modificación No. 03 del contrato de obra CO1.PCCNTR.8154780-2025. Lo anterior se sustenta en los siguientes argumentos:


"La presente solicitud obedece a que la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO ha identificado la persistencia de necesidades de intervención en diferentes Instituciones Educativas Distritales ubicadas en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar, relacionadas con obras de adecuación, mejoramiento, mantenimiento correctivo y atención de situaciones de emergencia que requieren intervención prioritaria, con el fin de garantizar la seguridad, funcionalidad y óptimas condiciones de la infraestructura educativa. En este sentido, manifestamos nuestra disposición para ejecutar los nuevos frentes de trabajo que se han definido por la Entidad, garantizando el cumplimiento de las condiciones técnicas, administrativas y contractuales establecidas.

Por lo anterior, se evidencia la necesidad de incorporar dentro del alcance del Contrato de Obra las siguientes instituciones educativas, conforme a la información suministrada por la Entidad Contratante – Secretaría de Educación del Distrito:

Colegio ***IED RAFAEL URIBE URIBE SEDE A - CPF 1943***

Alcance:
1. *Cambio de cubierta y adecuación de instalaciones eléctricas asociadas a las baterías sanitarias del bloque de Preescolar (Ciclo I).*
2. *Adecuación integral de las baterías sanitarias de niños y niñas del bloque de Preescolar (Ciclo I), incluyendo demoliciones, revisión de redes hidrosanitarias, suministro e instalación de aparatos sanitarios, mesones, orinales, griferías, enchapes de pisos y muros, así como divisiones sanitarias en acero inoxidable.*

Áreas de Intervención:

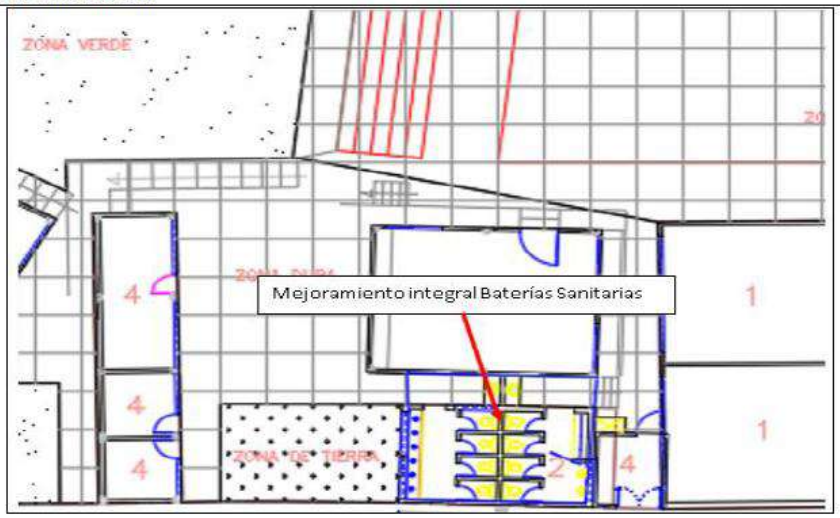


Registro Fotográfico:



*Colegio **IED LOS COMUNEROS OSWALDO GUAYASAMIN SEDE B - CPF 0561***

***Alcance:** Adecuación baterías sanitarias, de niños y niñas del bloque bachillerato piso 1, el cual contempla el baño para personas con movilidad reducida (Incluye demoliciones, enchapes, desmontes, retiros, instalación puertas, trabajos eléctricos, hidráulicos, instalación de aparatos sanitarios, divisiones de baño, pintura).*

Áreas de Intervención:

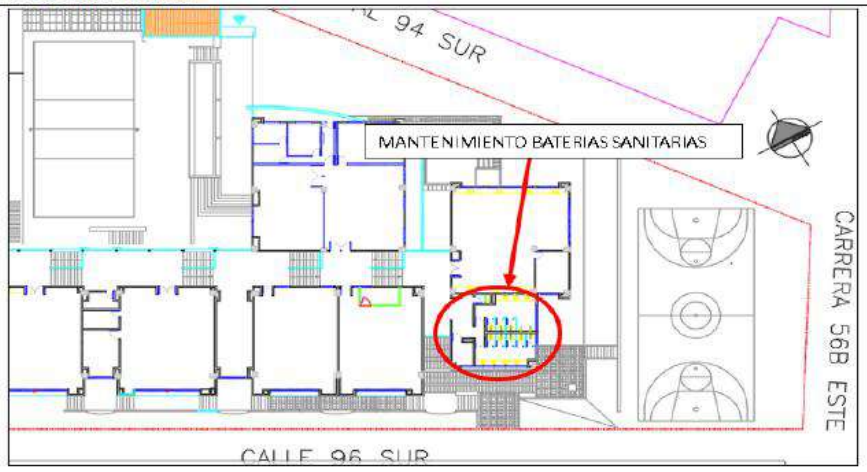

Registro Fotográfico:



VALOR ESTIMADO ADICIÓN POR FRENTE DE OBRA

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	SEDE	PRESUPUESTO
1943	CIUDAD BOLIVAR	RAFAEL URIBE URIBE	SEDE A	$ 170.000.000
561	USME	LOSCOMUNEROS OSWALDOGUAYASAMIN	SEDE B	$ 130.000.000
TOTAL (INCLUYE AIU)				**$ 300.000.000,00**

En concordancia con lo expuesto y de acuerdo con las actividades descritas para las nuevas Instituciones Educativas Distritales que se propone incluir dentro del alcance del objeto contractual denominado: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS", se considera procedente solicitar la adición al Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8154780-2025-Lote 6, por valor de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($300´000.000), destinados a la ejecución de las actividades de las intervenciones requeridas en las sedes educativas priorizadas por la entidad.

De igual manera, se acepta la asignación de recursos por valor de CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($160´000.000), destinados a la atención de situaciones de emergencia que puedan presentarse y sean requeridas por la Entidad durante el plazo contractual vigente, conforme a las necesidades identificadas y la priorización técnica establecida.

Cabe resaltar que la presente solicitud se encuentra debidamente soportada y viabilizada mediante el presupuesto y cronograma adjunto. Así mismo, se precisa que la presente modificación contempla la ampliación del plazo contractual por un término de tres (03) meses, esto en atención a la necesidad de planificar y ejecutar las actividades de manera articulada con las Instituciones Educativas Distritales (IED), garantizando la mitigación de impactos sobre el calendario académico.

En razón a lo antes expuesto, y en cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de obra No. ***CO1.PCCNTR.8154780 de 2025-Lote 6*** *del 3 de septiembre de 2025, nos permitimos solicitar la modificación contractual mediante la adición de recursos y prórroga en tiempo del contrato de la referencia suscrito entre la Secretaría de Educación del Distrito (SED), con NIT 860.532.363, en calidad de contratante, y el* ***Consorcio País****, con NIT 901.974.049-8, en calidad de contratista, para adicionar el presupuesto del contrato en* ***$460.000.000,00*** *y se realice una prórroga en tiempo de* ***03 meses*** *a partir del 1 de octubre del 2026, teniendo como nueva fecha prevista de terminación el 30 de diciembre de 2026. De igual forma, se deja claridad en que no se realizará una reprogramación del contrato ni de los frentes de obra actualmente en ejecución, conservándose el cronograma inicial aprobado por la interventoría."*

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	***SEDE***	***CPF***	***LOCALIDAD***	***VALOR ESTIMADO INCLUIDO AIU***
RAFEL URIBE URIBE	A	1943	CIUDAD BOLÍVAR	$ 170.000.000,00
LOS COMUNEROS OSWALDO GUAYASAMIN	B	561	USME	$ 130.000.000,00
ADICIONES PARA ATENCIÓN POR CONCEPTO EMERGENCIA				$ 160.000.000,00
VALOR TOTAL DE LA ADICIÓN				$ 460.000.000,00

B. ANÁLISIS Y CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA A LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN No. 03 DEL CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154780-2025

Por lo anterior, el contratista interventor mediante comunicado **SERINCO-SED-L6-2025-671** del 24 de agosto de 2026, avaló los documentos presentados por el contratista de obra, y remitió la documentación pertinente para la adición y prórroga del contrato de obra **No. CO1.PCCNTR.8154780-2025**. Para este fin, manifestó lo siguiente:

"En atención al contrato de referencia, suscrito entre ***SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE DISTRITO y CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO****, en atención a que la Secretaría De Educación Del Distrito (SED), ha identificado la necesidad de mejoras en las condiciones físicas de los planteles educativos* ***IED Rafael Uribe Uribe, Sede A*** *con cambio de cubierta y adecuación de instalaciones eléctricas asociadas a las baterías sanitarias del bloque de Preescolar (Ciclo I), y la Adecuación integral de las baterías sanitarias de niños y niñas del bloque de Preescolar (Ciclo I), incluyendo demoliciones, revisión de redes hidrosanitarias, suministro e instalación de aparatos sanitarios, mesones, orinales, griferías, enchapes de pisos y muros, así como divisiones sanitarias en acero inoxidable. y en la* ***IED Los Comuneros – Oswaldo Guayazamin, Sede B Virrey Última Etapa*** *con la Adecuación baterías sanitarias, de niños y niñas del bloque bachillerato piso 1, el cual contempla el baño para personas con movilidad reducida (Incluye demoliciones, enchapes, desmontes, retiros, instalación puertas, trabajos eléctricos, hidráulicos, instalación de aparatos sanitarios, divisiones de baño, pintura).*

En aras de dar cumplimiento a los lineamientos contractuales, el Contratista de obra solicita una adición y prórroga del ***CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR. 8154780*** *que mediante la Resolución 0012 del 28 de marzo de 2025 la Entidad abrió el Proceso de Contratación SED-LP-OP-DCCEE-012-2025 y que por medio de la Resolución 0068 del 25 de julio de 2025, corregida mediante Resolución 0071 del 5 de agosto de 2025, la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista. entre la Secretaría De Educación Del Distrito (SED) con Nit. 860.532.363 quien actúa en calidad de contratante y el* ***CONSORCIO PAIS*** *identificado con NIT. 901.974.049-8 quien actúa en calidad de contratista, de cual esta interventoría se permite conceptuar:*

(…)

2. ANTECEDENTES

(…)

2.6 *Teniendo en consideración lo expuesto anteriormente y las actividades requeridas para la inclusión de dos (2) nuevas Instituciones Educativas Distritales dentro del alcance contractual, se establece una adición para mejoramientos al Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8154780-2025 por valor de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($300.000.000), y de CIENTO SESENTA*

MILLONES ($160.000.000) para la atención de emergencias, incluido AIU, impuestos, tasas y contribuciones, y todos los costos directos e indirectos a que haya lugar derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, los cuales serán destinados a la ejecución de las actividades de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo requeridas en las IED Rafael Uribe Uribe y Los Comuneros Oswaldo Guayasamin más el rubro destinado para emergencias. Lo anterior, con el propósito de garantizar la disponibilidad de recursos necesarios para atender las intervenciones requeridas y dar cumplimiento a los fines de la contratación estatal.

***2.7** El Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.8154780-2025, a la fecha cuenta con un porcentaje programado acumulado de 91,56% y un porcentaje ejecutado acumulado de 91,67%, para un adelanto general del contrato del 0,11% reportado por la Interventoría en el Informe Semanal No. 40 con fecha de corte hasta el 16 de agosto de 2026.*

***2.8** Ahora bien, y partiendo del objeto y el alcance del Contrato de obra están determinados y su destinación es específica, es decir, que a pesar de que la ejecución del Contrato está definida mediante la modalidad de monto agotable, la Entidad contratante SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, previamente estableció y priorizó la ejecución de las actividades de obra señaladas con las cantidades contenidas en el Formulario 1 – formulario del proceso licitatorio, conforme al presupuesto oficial.*

***2.9** No obstante, y en consonancia con la dinámica del Contrato de obra, la Entidad contratante SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ha identificado que siguen persistiendo necesidades dentro de la localidad de Ciudad Bolívar y Usme, las cuales, son susceptibles de intervención, presentando necesidades particulares en cuanto a obras de adecuación, mejoramiento y/o mantenimiento correctivo y/o lo que sea requerido, con el fin de mantener en óptimas condiciones la infraestructura para la prestación del servicio; plantas físicas distritales, diferentes a las establecidas previamente en el alcance del contrato.*

***2.10** Por lo anterior, se evidencia la necesidad de incorporar dentro del alcance del Contrato de Obra la siguiente institución educativa, conforme a la información suministrada por la Entidad Contratante – Secretaría de Educación del Distrito:*

NOMBRE SEDE EDUCATIVA	SEDE	DIRECCIÓN	LOCALIDAD
CPF 1943 Rafael Uribe Uribe	A	Diagonal 71B Sur No.	Ciudad Bolívar
CPF 0561 Los Comuneros – Oswaldo Guayazamin	B	Transversal 4A Este No. 2 98	Usme

3. MOTIVACIONES

A partir de lo anterior, y en concordancia a lo informado por la Entidad contratante, se expone la presente solicitud de adición y prórroga, acorde a las siguientes motivaciones:

***3.1.** Es menester de la Secretaría de Educación del Distrito – SED, mejorar las condiciones actuales de las instituciones educativas; en este caso, las pertenecientes a la localidad de Ciudad Bolívar y Usme, con el fin de garantizar el confort de los estudiantes, y reducir costos de mejoramientos y/o mantenimientos, cuya intervención es viable de acuerdo con el alcance del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.8154780-2025 en etapa de ejecución.*

***3.2.** Es importante mencionar la necesidad actual de la institución a intervenir por medio del contrato de obra No CO1.PCCNTR.8154780-2025 en ejecución, las cuales, fueron viabilizadas por la entidad contratante, así:*

- **CPF 1943 Rafael Uribe Uribe, Sede A**

  El alcance de las obras a ejecutar en esta sede educativa son los siguientes:
  - Cambio de cubierta y adecuación de instalaciones eléctricas asociadas a las baterías sanitarias del bloque de Preescolar (Ciclo I).
  - Adecuación integral de las baterías sanitarias de niños y niñas del bloque de Preescolar (Ciclo I), incluyendo demoliciones, revisión de redes hidrosanitarias, suministro e instalación de aparatos sanitarios, mesones, orinales, griferías, enchapes de pisos y muros, así como divisiones sanitarias en acero inoxidable.

- **CPF 0561 Los Comuneros – Oswaldo Guayazamin, Sede B**

  El alcance de las obras a ejecutar en esta sede educativa son los siguientes:
  - Adecuación baterías sanitarias, de niños y niñas del bloque bachillerato piso 1, el cual contempla el baño para personas con movilidad reducida (Incluye demoliciones, enchapes, desmontes, retiros, instalación puertas, trabajos eléctricos, hidráulicos, instalación de aparatos sanitarios, divisiones de baño, pintura).

3.3 Teniendo en cuenta los alcances indicados anteriormente, más el rubro de los CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS $160.000.000 destinados para la atención de emergencias que puedan presentarse en los colegios de las localidades de Usme y Ciudad Bolívar que hacen parte del alcance del contrato de obra CO1.PCCNTR.8154780 DE 2025, se relaciona a continuación el balance financiero de estas intervenciones:

NOMBRE SEDE EDUCATIVA	SEDE	LOCALIDAD	PRESUPUESTO
CPF 1943 Rafael Uribe Uribe	A	Ciudad Bolívar	$170.000.000
CPF 0561 Los Comuneros – Oswaldo Guayazamin	B	Usme	$130.000.000
Emergencias			$160.000.000
		Valor Total, Inc. IVA	**$460.000.000**

*Por lo tanto, se avala la adición requerida que corresponde a la suma de **CUATROCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($460.000.000)**, incluido el porcentaje de Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU), impuestos, tasas, contribuciones y demás costos directos e indirectos a que haya lugar, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Este valor corresponde a la distribución de recursos previamente descrita, destinada a la ejecución de las actividades de intervención requeridas en la Instituciones Educativas Distritales priorizadas y una prórroga en tiempo de **TRES (3) MESES, es** decir, hasta el 30 de diciembre de 2026.*

De acuerdo con las motivaciones descritas y necesidades propias de la Entidad SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, frente a las instituciones educativas priorizadas y los recursos requeridos para su ejecución, la Interventoría concluye lo siguiente:

4. CONCLUSIONES

Teniendo en consideración la solicitud realizada por el Contratista de obra CONSORCIO PAIS y, conforme a las necesidades de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, la Interventoría CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO, manifiesta que, revisó y validó, los argumentos expuestos por el Contratista en su comunicado con consecutivo OFI-SED-L6-261 de fecha 19 de agosto de 2026 asunto: "Solicitud Modificatorio No. 3 Adición y Prorroga", por lo cual, se emite concepto favorable a la inclusión de los frentes de obra: IED Rafael Uribe Uribe CPF 1943 y Los Comuneros Oswaldo Guayasamin CPF 561.

Dado lo anterior, la Interventoría considera viable que la solicitud se encuentre debidamente soportada y viabilizada mediante el cronograma adjunto, en el cual se detalla el flujo de inversión y el presupuesto preliminar correspondiente a la intervención proyectada.

Asimismo, se precisa se establece como nueva fecha de terminación contractual el 30 de diciembre de 2026. De igual forma, se deja claridad que los trabajos en esta sede se desarrollarán de acuerdo con la programación del contrato para este frente especifico, por otro lado los frentes de obra actualmente en ejecución conservarán el cronograma inicial aprobado por la interventoría.

NOMBRE SEDE EDUCATIVA	SEDE	DIRECCIÓN	LOCALIDAD
CPF 1943 Rafael Uribe Uribe	A	Diagonal 71B Sur No.	Ciudad Bolívar
CPF 0561 Los Comuneros – Oswaldo Guayazamin	B	Transversal 4A Este No. 2 98	Usme

5. SOLICITUDES.

De lo anteriormente expuesto, la Interventoría respetuosamente, pone a consideración de la Entidad Contratante SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, lo siguiente:

***5.1. INCLUSIÓN DE LAS PLANTAS FISICAS:** Incluir en el alcance del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.8154780 los siguientes establecimientos educativos, los valores y tiempos establecidos*

NOMBRE SEDE EDUCATIVA	LOCALIDAD	VALOR PRESUPUESTAL	TIEMPO
CPF 1943 Rafael Uribe Uribe	Ciudad Bolívar	$170.000.000	Tres (3) Meses
CPF 0561 Los Comuneros – Oswaldo Guayazamin	Usme	$130.000.000	Tres (3) Meses
	Emergencias	$160.000.000	
	Valor Total Adición	**$460.000.000**	

5.2. ADICIÓN: *Con el fin de cumplir con los alcances necesarios en las sedes educativas planteadas, se solicita la adición, por concepto de mantenimientos al contrato de obra No. CO1.PCCNTR.8154780 por un valor de* ***TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS MDA/CTE ($ 300.000.000,00) INCLUIDO AIU.***

Por otro lado, se solicita incorporar recursos por valor de ***CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($160´000.000),*** *destinados a la atención de situaciones de emergencia que puedan presentarse y sean requeridas por la Entidad durante el plazo contractual vigente, conforme a las necesidades identificadas y la priorización técnica establecida, para un total de* ***CUATROCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS ($460´000.000).***

5.3. PRORROGA: *Teniendo en cuenta el plazo necesario para la ejecución de las obras de adecuación, mantenimiento y/o mejoramiento en las sedes educativas, avalamos otorgar una prórroga al contrato de obra No. CO1.PCCNTR. 8154780 por el término de* ***TRES MESES****, es decir hasta el 30 de diciembre de 2026."*

5.2. CONCEPTO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS COMO SUPERVISOR DESIGNADO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.8169110 DE 2025

El Supervisor del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110-2025, designado mediante memorando I-2025-166630 del 4 de diciembre de 2025, con el respaldo del equipo de Apoyo a la Supervisión responsable del seguimiento a las actividades del contrato de obra e interventoría, una vez analizados los soportes documentales y los conceptos relacionados, se permite manifestar que la inclusión de dos nuevas Instituciones Educativas Distritales obedece a la priorización efectuada de manera conjunta entre la Institución Educativa y el equipo de Conservación de la DCCEE, durante la ejecución contractual, esto con fundamento en la actualización de las necesidades de mantenimiento consignadas en los documentos CPF 1943_RAFAEL URIBE y CPF 561_LOS COMUNEROS OSWALDO GUAYASAMIN, producto de visitas técnicas, verificaciones en sitio.

Estas sedes se encuentran ubicadas en las localidades de Ciudad Bolívar y Usme, es decir, que corresponden a la zona sur de la ciudad, zona a la que le correspondió el lote 6, razón por la cual, estas sedes deben intervenirse en el marco de este contrato de obra correspondiente al lote 6. Si bien las sedes no hicieron parte del alcance inicialmente previsto, como ya se explicó, durante la ejecución del contrato se evidenció la necesidad de intervenirlas de manera prioritaria, en atención a los requerimientos técnicos y sanitarios identificados y a la necesidad de garantizar condiciones adecuadas para la prestación del servicio educativo.

En ese sentido, teniendo en cuenta que la Entidad cuenta con un contrato vigente cuyo objeto y alcance permiten atender este tipo de intervenciones, resulta técnica, jurídica y administrativamente procedente incorporar la sede mediante la presente modificación, evitando diferir su atención hasta la celebración de un nuevo proceso contractual, en aplicación de los principios de economía, eficacia y celeridad que orientan la función administrativa.

5.2.1. ADICIÓN DEL CONTRATO DE OBRA – VALOR

Con base en los comunicados No. OFI-SED-L6-261 de fecha 19 de agosto de 2026, y No. SERINCO-SED-L6-2025-671 de fecha 24 de agosto de 2026, se validaron los documentos presentados por el contratista de obra y aprobados por la interventoría, respecto a la necesidad de adicionar al Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8154780-2025 por la suma de **CUATROCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($460´000.000).**

Luego de identificar la necesidad presentada de las instituciones educativas a intervenir, de manera conjunta con el Grupo de Conservación de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos de la SED, se establecieron y priorizaron las actividades requeridas en las dos nuevas sedes, las cuales son verificadas en sitio por los contratistas de obra e interventoría.

Con fundamento en dichas verificaciones se elaboró el presupuesto preliminar de las intervenciones, aplicando a las cantidades de obra estimadas las mismas condiciones y precios unitarios pactados en el contrato, sin modificación de los análisis de precios unitarios. Como resultado, se estimó un valor de $170.000.000 para la IED Rafael Uribe Uribe – Sede A y de $130.000.000 para la IED Los Comuneros Oswaldo Guayasamín – Sede B, para un total de $300.000.000, incluido AIU. Este presupuesto fue presentado por el contratista y revisado y avalado por la interventoría.

Adicionalmente, se destinarán $160.000.000 al fortalecimiento de la bolsa para la atención de emergencias, con lo cual el valor total de la adición asciende a $460.000.000.

En este sentido, revisada la documentación presentada y los análisis efectuados por la interventoría, la supervisión encuentra que la solicitud de adicionar un rubro para intervenir dos nuevas sedes y atender emergencias se encuentra debidamente soportada y responde a necesidades reales, actuales y sobrevinientes identificadas durante la ejecución contractual, atendiendo los criterios de priorización establecidos en el contrato.

Recordemos que el Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR. 8154780 de 2025 fue estructurado bajo la modalidad de **monto agotable,** como se indica en la Cláusula 7. FORMA DE PAGO, el cual cuenta con dos modalidades de obra a saber: 1. Programada y 2. Por

emergencia/Necesidad, como se encuentra señalado en la Cláusula 5 VALOR DEL CONTRATO, destacando que esta adición se solicita para ambas modalidades, una vez verificadas ambas necesidades.

Por su parte, mediante el oficio No. S-2026-208639 del 22 de junio de 2026, la Secretaría de Educación del Distrito solicitó a la Secretaría Distrital de Planeación y a la Secretaría Distrital de Hacienda el retiro de la solicitud de vigencias futuras del Proyecto de Inversión 7638, con el propósito de priorizar otras solicitudes dentro del marco de gasto de la Entidad. El retiro de la solicitud de vigencias futuras modificó la programación inicialmente prevista para garantizar la continuidad de la atención de las necesidades de infraestructura educativa, haciendo necesario adoptar medidas que permitan asegurar dicha atención durante el resto de la vigencia 2026.

En este contexto, y con el fin de garantizar el cumplimiento de las funciones asignadas a la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos mediante el artículo 32 del Decreto Distrital 650 de 2025, se requiere ampliar la bolsa destinada a la atención de emergencias del presente contrato, hasta el límite de las adiciones permitido por el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993.

Al respecto, el contrato contempló inicialmente un rubro para la atención de emergencias por valor de $216.900.290, al cual, mediante la Modificación No. 1, se adicionó la suma de $200.000.000, para un total de $416.900.290. A la fecha se han ejecutado $413.242.463 por este concepto, valor que se encuentra reflejado y actualizado en las actas parciales y en los informes mensuales y semanales del contrato. En consecuencia, la bolsa destinada a emergencias se encuentra prácticamente agotada, mientras persiste la necesidad de garantizar su atención durante el plazo restante de ejecución contractual.

Por lo expuesto, la ampliación de la bolsa resulta pertinente y necesaria, toda vez que permitirá mantener la capacidad operativa del contrato y garantizar la continuidad de las intervenciones requeridas para atender las situaciones de emergencia que se presenten en las instituciones educativas distritales durante el plazo de ejecución contractual.

Esta adición resulta técnica, financiera y jurídicamente procedente, toda vez que las actividades continuarán ejecutándose bajo las mismas condiciones contractuales, especificaciones técnicas y precios unitarios pactados, sin que se genere modificación de los análisis de precios unitarios

Ahora bien, teniendo en cuenta que el valor inicial del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8154780-2025 correspondió a la suma de **DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL VEINTITRÉS PESOS M/CTE ($2.332´049.023)**, y que durante la ejecución contractual se han efectuado adiciones por valor de **SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE ($785´001.422)**, con la presente solicitud de adición por valor de **CUATROCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($460´000.000)**, el valor acumulado de las adiciones contractuales asciende a la suma de **MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE ($ 1.245´001.422).**

En este sentido, se evidencia que la sumatoria de las adiciones no supera el límite establecido en el Parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, el cual establece lo siguiente: *"… Los contratos no podrán adicionarse en más de cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado este en salarios mínimos legales mensuales…",* el cual para este caso corresponde a **819.01 SMMLV.**

Así entonces, para efectos de verificación en salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV), se tiene que el valor inicial del contrato equivale a **1638.26 SMMLV**, mientras que la adición No. 1 corresponde a **551.46 SMMLV** y la adición No. 2 a **262.86 SMMV,** para una sumatoria total de adiciones de **814.32 SMMLV,** razón por la cual la presente adición resulta jurídicamente viable, al encontrarse dentro de los parámetros establecidos en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993.

Por tanto, el valor final del contrato asciende a la suma de **TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($3.577´050.445).**

5.2.2. PRÓRROGA DEL CONTRATO DE OBRA – PLAZO DE EJECUCIÓN

El contratista de obra, mediante el comunicado OFI-SED-L6-261 de fecha 19 de agosto de 2026, solicitó la Modificación No. 03 del Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.8154780 de 2025, con el fin de prorrogar su vigencia por tres (3) meses, plazo aprobado por la interventoría mediante comunicado SERINCO-SED-L6-2025-671 de fecha 24 de agosto de 2026.

En cuanto a la prórroga solicitada y acorde a los cronogramas presentados por el contratista de Obra para cada una de las nuevas sedes a incluir, avalados por la Interventoría, se concluye que el termino de 3 de meses de plazo se encuentra adecuado para llevar a cabo las actividades propuestas para el mejoramiento de las condiciones de la infraestructura educativa, esto garantizando el cumplimiento del objeto contractual y la calidad y prestación del servicio educativo, así como la atención oportuna de las emergencias que se presenten durante el tiempo a prorrogarse.

5.2.3 DEL ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN EN CUANTO AL OBJETO

Con base en los comunicados **SERINCO-SED-L6-2025-671 del 24 de agosto de 2026** y **OFI-SED-L6-261** del 19 de agosto de 2026, se validaron los documentos presentados por el contratista de obra, aprobados por la interventoría, en concordancia y de manera consensuada, respecto de las siguientes sedes educativas:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	CPF	LOCALIDAD
IED RAFAEL URIBE URIBE	A	1943	CIUDAD BOLÍVAR
IED LOS COMUNEROS OSWALGO GUAYASAMIN	B	561	USME

Dichas necesidades corresponden a actividades complementarias, inminentes y prioritarias, orientadas a optimizar las condiciones físicas del plantel educativo ubicado en la localidad de Usme. Así, en el marco de la atención del Plan de Desarrollo Distrital (PDD), resulta viable técnica y jurídicamente la adición y prorroga propuesta para atender dicha necesidad bajo las mismas condiciones y precios unitarios vigentes, sin reajuste por cambio de anualidad; en consecuencia, se prioriza la ejecución de dos (02) nuevas sedes, las cuales se integran al alcance propuesto en la presente modificación.

Teniendo en cuenta que el contrato se estructuró a monto agotable para intervenir las sedes educativas de la zona Sur, durante su ejecución y con base en la gestión territorial en el marco del seguimiento a necesidades, así como en visitas de la Secretaría de Salud sobre las condiciones de las IED, y en diagnósticos y verificaciones en sitio, se identificaron necesidades nuevas y sobrevinientes, propias del tipo de intervención sobre infraestructuras existentes, que no eran previsibles ni cuantificables en su totalidad al momento de la suscripción.

Por lo anterior, el Supervisor designado, junto con su equipo de Apoyo a la Supervisión y con el respaldo del gestor territorial asignado a las respectivas sedes educativas, con base en el presupuesto preliminar y al cronograma presentado por el contratista de obra, avalado por la interventoría, consideran procedente la inclusión de dos (02) nuevos frentes de obra a los doce (12) inicialmente previstos en la cláusula 24 de la Minuta del Contrato de obra CO1.PCCNTR.8154780-2025, los cuales se relaciona a continuación:

IED RAFAEL URIBE URIBE SEDE A - CPF 1943

- Adecuación integral de las baterías sanitarias de niños y niñas del bloque de Preescolar (Ciclo I), incluyendo demoliciones, revisión de redes hidrosanitarias, suministro e instalación de aparatos sanitarios, mesones, orinales, griferías, enchapes de pisos y muros, así como divisiones sanitarias en acero inoxidable.
- Cambio de cubierta y adecuación de instalaciones eléctricas asociadas a las baterías sanitarias del bloque de Preescolar (Ciclo I).
- Adecuación integral de las baterías sanitarias de niños y niñas de primer piso del bloque de bachillerato, incluyendo actividades de demolición, reposición de acabados, suministro e instalación de aparatos sanitarios, mesones, griferías, enchapes, divisiones sanitarias y demás actividades complementarias necesarias para garantizar su correcto funcionamiento.

IED LOS COMUNEROS OSWALDO GUAYSAMIN SEDE B – CPF 561

- Adecuación integral de las baterías sanitarias de niños y niñas ubicadas en el bloque de bachillerato, primer piso, incluyendo actividades de demolición, revisión de redes hidrosanitarias, suministro e instalación de aparatos sanitarios, mesones de lavamanos, orinales, griferías, enchapes de pisos y muros, divisiones sanitarias en acero inoxidable y puertas de acceso. La intervención deberá contemplar la adecuación de cajas de inspección existentes de ser necesario
- Adecuación baño movilidad reducida

En este orden de ideas y teniendo en cuenta el presupuesto preliminar consolidado y el cronograma de obra presentado por el contratista de obra, previamente avalado por la interventoría, mediante comunicación No. **SERINCO-SED-L6-2025-671 del 24 de agosto de 2026**, el Supervisor y el Apoyo a la Supervisión, acogen la recomendación de la Interventoría, una vez efectuados los análisis y validaciones correspondientes, lo anterior con el propósito de atender las necesidades de adecuación y mejoramiento de las condiciones de infraestructura por ser necesarias, y con el fin de garantizar la calidad y adecuada prestación del servicio educativo.

Así entonces, consideran viable y oportuno priorizar dos (02) nuevas sedes educativas, enlistadas a continuación:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	*SEDE*	*CPF*	*DIRECCIÓN*	*LOCALIDAD*
IED RAFAEL URIBE URIBE	A	1943	DG 71B SUR No, 18 I 20	CIUDAD BOLÍVAR
IED LOS COMUNEROS OSWALDO GUAYASAMIN	B	561	DG 93B SUR No 4 A 45 ESTE	USME

5.2.4 DEL FUNDAMENTO LEGAL DE LA MODIFICACIÓN

En relación con las modificaciones contractuales permitidas dentro del régimen de contratación estatal establecido por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993), la Corte Constitucional, mediante sentencia C-300 de 2012 señaló lo siguiente: *"…2.6.1. Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para "evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación" entre otros".* En el mismo sentido, en la sentencia C-949 de 2001, la Corte Constitucional señaló que *"las prórrogas de los contratos –como especie de modificación- pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal."*

Por otra parte, la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, mediante Concepto 112 de 2024, señaló en cuanto a la procedencia de la prórroga del contrato estatal que *"… La Ley 80 de 1993 no se refirió a la posibilidad de prorrogar los contratos estatales, al igual que tampoco lo prohibió. En vista de ello, es necesario partir de las remisiones que hace la Ley 80 de 1993 al derecho privado y al principio de la autonomía de la voluntad para llenar este aspecto—arts. 13, 32 y 40—. De esta manera, los particulares tienen amplia libertad para prorrogar el plazo de cualquier contrato y, salvo ciertas disposiciones específicas de algunas tipologías contractuales, no existen criterios que determinen límites a esta posibilidad ni a su alcance, de manera que el principio de la autonomía de la voluntad en este aspecto despliega ampliamente sus efectos, lo que a su vez es trasladable, como principio, a los contratos estatales…"*

Bajo este contexto, se concluye que para el caso concreto se cumplen los presupuestos legales en los que debe estar enmarcada esta modificación toda vez que, la ampliación del alcance obedece a una necesidad ya justificada que permite ser desarrollada dentro del objeto del contrato, no existe diferencia en la ecuación contractual con respecto a la pactada inicialmente y el valor de la adición no supera el 50% del valor inicial del contrato.

Por su parte, verificadas las garantías que amparan la ejecución del presente contrato, se encuentra que las mismas fueron aprobadas el 17 de Julio de 2026, encontrándose vigentes, y pueden ser consultadas en el siguiente link:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8154780&AwardContractDetailId=6329406&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#ContractExecution

6. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

El Contrato de Obra No. **CO1.PCCNTR.8154780-2025** presenta un avance físico programado del **95.34%** y un avance ejecutado del **95.45%,** de acuerdo con lo reportado en el Informe Semanal No. 43 de la interventoría, con corte al 6 de septiembre de 2026.

A la fecha el contratista de obra se encuentra ejecutando obra en tres de los frentes de obra asignados dentro del alcance del contrato, cumpliendo con las obligaciones técnicas y administrativas, llevando a cabo la ejecución de los alcances proyectados en cada una de las sedes, dentro de los tiempos establecidos en cronogramas.

El contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8154780-2025 de 2025 no presenta multas ni sanciones, ni procesos administrativos sancionatorios en curso.

7. NOTAS DE DILIGENCIAMIENTO Y TRÁMITE:

Nota 1: Conforme al artículo 1060 del Código de Comercio, el CONTRATISTA deberá mantener vigentes las garantías a que se refiere esta modificación y la suficiencia de estas. Será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se imponga, prórrogas o suspensiones, así como mantener informada a su garante de cualquier cambio del riesgo asegurado.

Nota 2: Una vez perfeccionada la modificación, el supervisor/interventor deberá remitir copia de la modificación suscrita al respectivo garante, conforme el Artículo 1060 del Código de Comercio, a fin de que la aseguradora expida el respectivo certificado para su posterior remisión a la Oficina de Contratos para su posterior archivo.

Nota 3: Las demás cláusulas del contrato de obra No. CO1.PCCNTR- 8154780 de 2025se mantienen iguales.

Nota 4: En caso de que la presente modificación implique liberación de saldos, el supervisor procederá a solicitarla conforme al procedimiento que la Dirección Financiera establezca para tal efecto.

8. ANEXOS:
1. Comunicación S-2026-241315. Solicitud de modificación del CO 8154780-2025 – Folio 18 2. Comunicación SERINCO-SED-L6-2025-629A – Solicitud del contratista de interventoría al contratista de obra – Folio 22 3. Comunicación OFI-SED-L6-261 – Aceptación contratista de obra – Folio 24 4. Comunicación SERINCO-SED-L6-2025-671 – Aval contratista de interventoría – Folio 29 5. Informe Semanal No. 43 - LOTE 6 – Avance físico obra – Folio 37 6. Presupuesto y Programación IED Rafael Uribe Uribe – Folio 70 7. Presupuesto y Programación IED Oswaldo Guayasamin – Folio 77 8. DOCUMENTOS CONSORCIO PAIS – Documentos del contratista – Folio 83 9. CDP No. 1116 – Folio 190 10. CPF 1943_RAFAEL URIBE – Información de intervención – Folio 191 11. CPF 561_LOS COMUNEROS OSWALDO GUAYASAMIN - Información de intervención – Folio 192 12. I-2025-166630 Designación de la supervisión del contrato de interventoría – Folio 194 13. Aprobación por parte de la SAP – Folio 196 14. Aprobación Grupo Administrativo y Financiero – Folio 197

JORGE ALBERTO MORENO
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos.
Secretaría de Educación del Distrito
Supervisor Designado – Contrato de Interventoría
No. CO1.PCCNTR.8169110 de 2025

Revisó: Paula Andrea Panesso Sánchez – Líder Grupo Jurídico DCCEE SED

Paola Margarita Ruiz Manotas – Contratista DCCEE SED

Elaboró: Santiago Ángel Uribe – Contratista DCCEE SED

Bogotá D.C., julio de 2026

Radicado Nº S-2026-241315
Fecha: 30-07-2026 - 21:11
Folios: 3 Anexos: NO
Radicador: ANDRES IVANNO GALEANO TORO - 4300
Destino: CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co
opción CONSULTA TRÁMITE
con el codigo de verificación: VO1P9

Señor
ERICK JOSE CASTILLO COURIEUX
Representante legal - Consorcio SERINCO EDUCATIVO
Dirección: Carrera 28 Bis No. 49A - 13
Tel: 3142190224
Correo: serinco.educativo@gmail.com
Ciudad

Referencia: **Contrato de Interventoría No. C01.PCCNTR. 8169110 del 2025,** "*Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la secretaría de educación del distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas", Lote 6*

Asunto: Solicitud de modificación y/o adición presupuestal No. 3 al Contrato De Obra N° CO1.PCCNTR. 8154780 de 2025

Respetado señor Castillo,

En el marco de la ejecución del **CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR. 8154780** de 2025, cuyo objeto contractual es "*Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la secretaría de educación del distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas. Lote 6*", y en desarrollo de las actividades adelantadas por la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos, se identificó la necesidad de ampliar los frentes inicialmente previsto, de acuerdo con lo manifestado desde el equipo de Gestión territorial de la Zona Sur, de acuerdo con mesas de trabajo relacionadas con los colegios IED Rafael Uribe Uribe – Sede A CPF 1943 e IED Oswaldo Guayasamin – Los Comuneros – Sede B CPF 561

Durante la visita técnica y el seguimiento efectuado al **Grupo 06,** correspondiente a las instituciones priorizadas dentro del contrato, se evidenció que, dentro del territorio asignado, se requiere la ejecución de obras de mejoramiento en los Colegios IED Rafael Uribe Uribe – Sede A CPF 1943 e IED Oswaldo Guayasamin – Los Comuneros – Sede B CPF 561 de las Localidades de Ciudad Bolívar y Usme respectivamente, y que corresponden a los siguientes alcances:

Colegio Rafael Uribe Uribe – Sede A

- Cambio de cubiertas bloque primera infancia y bloque administrativo.
- Mantenimiento correctivo de 2 baterías sanitarias en bloque bachillerato.
- Tratamiento y reparación de grietas y muros de fachada en ladrillo a la vista incluye reposición de emboquillado con mortero de reparación estructural. Área estimada a intervenir: 140 m².

Colegio Oswaldo Guayasamin – Los Comuneros – Sede B

- Adecuación de 1 batería sanitaria, de niños ubicada en el bloque bachillerato piso 2, la cual contempla la intervención del espacio destinado para la poceta lava traperos y baño para personas con movilidad reducida

Rubro de emergencias

- En cumplimiento de los principios de planeación y economía, y considerando la necesidad de la SED de contar con la posibilidad de atender las emergencias que se puedan dar en las IED y sedes administrativas a cargo de la entidad, se considera adecuado incluir dentro del alcance unos recursos adicionales a la bolsa de emergencias del Contrato de Obra por un valor de CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS M/Cte. ($ 160.000.000).

La adición solicitada permitirá garantizar la ejecución y atención de necesidades de los colegios a cargo de la SED asegurando, la protección de la infraestructura institucional y la prestación adecuada del servicio educativo en condiciones de seguridad y funcionalidad con el fin de que dicha dependencia pueda adelantar el trámite correspondiente, se solicita remitir la siguiente documentación:

1. Oficio de aceptación y/o justificación de la solicitud de adición incluyendo presupuesto y programación de obra por parte del contratista de obra
2. Oficio de aceptación y/o justificación de la solicitud de adición por parte de la interventoría
3. Documentos de identificación y existencia (persona jurídica)
   - Certificado de existencia y representación legal vigente.
   - Copia de la cédula del representante legal
4. Seguridad social y parafiscales
   - Certificación de pago de aportes a seguridad social integral y parafiscales (según corresponda, firmada por el representante legal y/o revisor fiscal/contador).
   - Documentos del contador/revisor fiscal que suscribe la certificación (tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, si aplica).
5. Consultas y autorizaciones

Certificados de consultas de persona jurídica y del representante legal:

- CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES (Contraloría).
- CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS (Procuraduría).
- CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES (Policía).
- CERTIFICADO ANTECEDENTES RNMC.
- Autorización firmada por el representante legal para realizar la consulta del Registro de Inhabilidades por Delitos Sexuales.

6. En caso de Consorcio o Unión Temporal (Para cada una de las empresas que integran el Consorcio/UT):
   - Certificado de existencia y representación legal vigente.
   - Cédula del representante legal de cada empresa.
   - Certificación de parafiscales y seguridad social de cada empresa (con sus respectivos soportes de contador/revisor fiscal, según corresponda).
7. Pólizas / Garantías

Se precisa que, para la suscripción del modificatorio, las pólizas deben encontrarse vigentes y ajustadas en sus amparos conforme al aumento del salario mínimo de la vigencia actual con la de la suscripción del Contrato (2025 a 2026).

Agradezco su valioso apoyo para compilar y remitir la documentación relacionada en la mayor brevedad posible, con el fin de evitar reprocesos y asegurar la continuidad del trámite**. Para lo cual, se concede un plazo máximo de 4 días hábiles posteriores a la visita de diagnóstico a realizarse el 31 de julio de 2026 (06/08/2026)**

Cordialmente.

ANDRÉS IVANNÓ GALEANO TORO.
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos

Proyectó: Santiago Ángel Uribe - Contratista DCCEE- SED
Revisó: Arq. Jorge Alberto Moreno Aldana –Profesional DCCEE– SED
Aprobó: Ing. Carolina Machado Valdés – DCCEE– SED.

CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO
NIT: 901.977.271- 0
Dirección: Calle 98 No. 70-91
Correo: serinco.educativo@gmail.com

SERINCO-SED-L6-2025-629A

Bogotá D.C., 30 de julio de 2026

Señores(a):
CONSORCIO PAIS
Atn. Ing. Juan Carlos Velásquez Forero
Representante Legal
Bogotá D.C.

Referencia 1: Contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110 de 2025
"Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la secretaría de educación del distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas. Lote No. 6."

Referencia 2: Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR. 8154780 de 2025
"Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la secretaría de educación del distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas"

Asunto: Traslado Radicado No- S-2026-241315 - Solicitud de Modificación y/o Adición Presupuestal No. 3 al Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR. 8154780 de 2025

Respetado Ingeniero,

En atención al oficio S-2026-241315 con asunto "Solicitud de Modificación y/o Adición Presupuestal No. 3 al Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR. 8154780 de 2025" remitido por la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos de la Secretaría de Educación del Distrito el día 30 de julio del 2026, mediante el cual se solicita adelantar el trámite de Modificación y/o Adición No. 3 al Contrato de Obra N° CO1.PCCNTR.8154780 de 2025, Consorcio País - Lote 6, nos permitimos informar que dicha solicitud obedece a la necesidad de *"…ampliar los frentes inicialmente previsto, de acuerdo con lo manifestado desde el equipo de Gestión territorial de la Zona Sur, de acuerdo con mesas de trabajo relacionadas con los colegios IED Rafael Uribe Uribe – Sede A CPF 1943 e IED Oswaldo Guayasamin – Los Comuneros – Sede B CPF 561…"*, así como ampliar el plazo de ejecución de los contratos, con el fin de garantizar la continuidad en la atención de las necesidades prioritarias de infraestructura física de la Entidad.

Durante la visita técnica y el seguimiento efectuado al Grupo 06, correspondiente a las instituciones priorizadas dentro del contrato, se evidenció que, dentro del territorio asignado, se requiere la ejecución de obras de mejoramiento en los IED Rafael Uribe Uribe – Sede A CPF

1943 e IED Oswaldo Guayasamin – Los Comuneros – Sede B CPF 561 de las localidades de Ciudad Bolívar y Usme respectivamente y que corresponden a los siguientes alcances:

Colegio Rafael Uribe Uribe – Sede A

- Cambio de cubiertas bloque primera infancia y bloque administrativo.
- Mantenimiento correctivo de 2 baterías sanitarias en bloque bachillerato.
- Tratamiento y reparación de grietas y muros de fachada en ladrillo a la vista, incluye reposición de emboquillado con mortero de reparación estructural. área estimada a intervenir: 140 m2.

Colegio Oswaldo Guayasamin – Los Comuneros – Sede B

- Adecuación de 1 batería sanitaria de niños ubicada en el bloque bachillerato piso 2, la cual contempla la intervención del espacio destinado para la poceta lava traperos y baño para personas con movilidad reducida.

(…)

> ***Rubro de emergencias***
>
> *En cumplimiento de los principios de planeación y economía, y considerando la necesidad de la SED de contar con la posibilidad de atender las emergencias que se puedan dar en las IED y sedes administrativas a cargo de la entidad, se considera adecuado incluir dentro del alcance unos recursos adicionales a la bolsa de emergencias del Contrato de Obra por un valor de CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS M/cte. ($ 160.000.000).*

En consecuencia, y con el propósito de continuar con el trámite administrativo correspondiente, solicitamos emitir un pronunciamiento formal respecto de la solicitud de Modificación y/o Adición No. 3, manifestando su aceptación o, en caso de considerarlo pertinente, las observaciones o justificaciones que estimen procedentes.

De igual manera, agradecemos remitir la documentación requerida por la Secretaría de Educación del Distrito para la suscripción del modificatorio contractual, la cual comprende, entre otros, los siguientes documentos:

1. Oficio de aceptación y/o justificación de la solicitud de adición incluyendo presupuesto y programación de obra por parte del contratista de obra

2. Oficio de aceptación y/o justificación de la solicitud de adición por parte de la interventoría

3. Documentos de identificación y existencia (persona jurídica)
   - Certificado de existencia y representación legal vigente.
   - Copia de la cédula del representante legal

4. Seguridad social y parafiscales

- Certificación de pago de aportes a seguridad social integral y parafiscales (según corresponda, firmada por el representante legal y/o revisor fiscal/contador).
- Documentos del contador/revisor fiscal que suscribe la certificación (tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, si aplica).

5. Consultas y autorizaciones Certificados de consultas de persona jurídica y del representante legal:
   - CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES (Contraloría).
   - CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS (Procuraduría).
   - CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES (Policía).
   - CERTIFICADO ANTECEDENTES RNMC.
   - Autorización firmada por el representante legal para realizar la consulta del Registro de Inhabilidades por Delitos Sexuales.

6. En caso de Consorcio o Unión Temporal (Para cada una de las empresas que integran el Consorcio/UT):
   - Certificado de existencia y representación legal vigente.
   - Cédula del representante legal de cada empresa.
   - Certificación de parafiscales y seguridad social de cada empresa (con sus respectivos soportes de contador/revisor fiscal, según corresponda).

7. Pólizas/ Garantías

Agradecemos remitir el pronunciamiento y la documentación requerida dentro del plazo establecido por la Secretaría de Educación del Distrito, la cual estableció *"…un plazo máximo de 4 días hábiles posteriores a la visita de diagnóstico a realizarse el 31 de julio de 2026 (06/08/2026) …"*, con el fin de evitar reprocesos y garantizar la continuidad del trámite de la Adición No. 3.

Cordialmente,

HECTOR JOSE VILLAZON GUTIERREZ
Consorcio Serinco Educativo
Director de Interventoría

CC Consecutivo

CALLE 18 N. 7-28 Centro
Chiquinquirá, Boyacá
constructurapais@hotmail.com

Bogotá D.C. 19 de agosto de 2026

OFI-SED-L6-261

SEÑOR
ERICK CASTILLO
R/L CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO - interventoría
serinco.educativo@gmail.com

REF: CONT. CO1.PCCNTR8154780 L6. ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS, LOTE 6.

ASUNTO: Solicitud Modificatorio No. 3 Adición y prorroga.

Cordial saludo,

La presente solicitud obedece a que la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO ha identificado la persistencia de necesidades de intervención en diferentes Instituciones Educativas Distritales ubicadas en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar, relacionadas con obras de adecuación, mejoramiento, mantenimiento correctivo y atención de situaciones de emergencia que requieren intervención prioritaria, con el fin de garantizar la seguridad, funcionalidad y óptimas condiciones de la infraestructura educativa. En este sentido, manifestamos nuestra disposición para ejecutar los nuevos frentes de trabajo que se han definido por la Entidad, garantizando el cumplimiento de las condiciones técnicas, administrativas y contractuales establecidas.

Por lo anterior, se evidencia la necesidad de incorporar dentro del alcance del Contrato de Obra las siguientes instituciones educativas, conforme a la información suministrada por la Entidad Contratante – Secretaría de Educación del Distrito:


Colegio **IED RAFAEL URIBE URIBE SEDE A - CPF 1943**

Alcance:

1. Cambio de cubierta y adecuación de instalaciones eléctricas asociadas a las baterías sanitarias del bloque de Preescolar (Ciclo I).
2. Adecuación integral de las baterías sanitarias de niños y niñas del bloque de Preescolar (Ciclo I), incluyendo demoliciones, revisión de redes hidrosanitarias, suministro e instalación de aparatos sanitarios, mesones, orinales, griferías, enchapes de pisos y muros, así como divisiones sanitarias en acero inoxidable.

CALLE 18 N. 7-28 Centro
Chiquinquirá, Boyacá
constructurapais@hotmail.com

Áreas de Intervención:

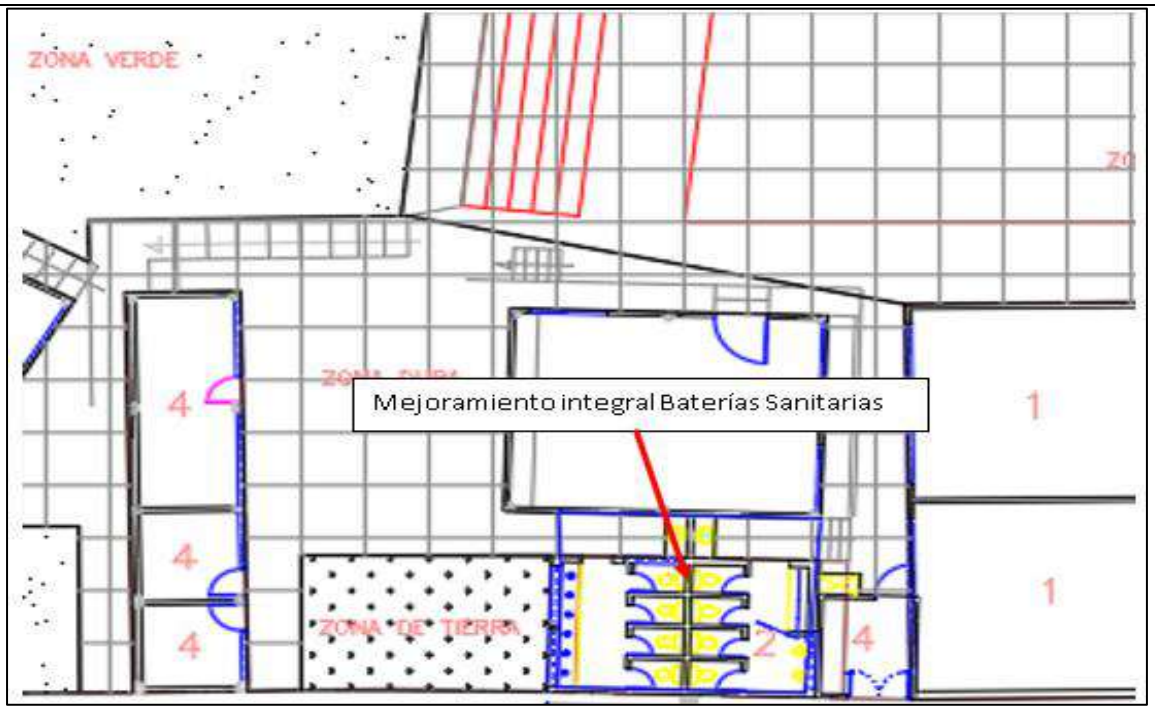

Registro Fotográfico:












CALLE 18 N. 7-28 Centro
Chiquinquirá, Boyacá
constructurapais@hotmail.com

Colegio **IED LOS COMUNEROS OSWALDO GUAYASAMIN SEDE B - CPF 0561**

Alcance: Adecuación baterías sanitarias, de niños y niñas del bloque bachillerato piso 1, el cual contempla el baño para personas con movilidad reducida (Incluye demoliciones, enchapes, desmontes, retiros, instalación puertas, trabajos eléctricos, hidráulicos, instalación de aparatos sanitarios, divisiones de baño, pintura).

Áreas de Intervención:

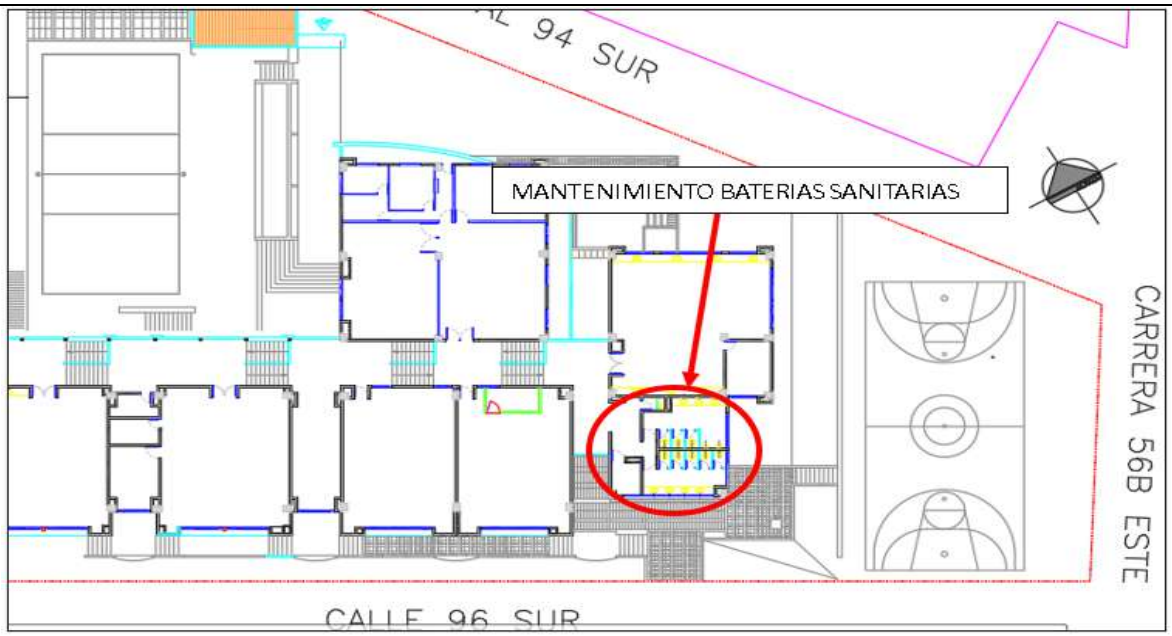

Registro Fotográfico:



CALLE 18 N. 7-28 Centro
Chiquinquirá, Boyacá
constructurapais@hotmail.com

VALOR ESTIMADO ADICIÓN POR FRENTE DE OBRA

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	SEDE	PRESUPUESTO
1943	CIUDAD BOLIVAR	RAFAEL URIBE URIBE	SEDE A	$ 170.000.000
561	USME	LOSCOMUNEROS OSWALDOGUAYASAMIN	SEDE B	$ 130.000.000
TOTAL (INCLUYE AIU)				**$ 300.000.000,00**

En concordancia con lo expuesto y de acuerdo con las actividades descritas para las nuevas Instituciones Educativas Distritales que se propone incluir dentro del alcance del objeto contractual denominado: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS", se considera procedente solicitar la adición al Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8154780-2025-Lote 6, por valor de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($300´000.000), destinados a la ejecución de las actividades de las intervenciones requeridas en las sedes educativas priorizadas por la entidad.

De igual manera, se acepta la asignación de recursos por valor de CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($160´000.000), destinados a la atención de situaciones de emergencia que puedan presentarse y sean requeridas por la Entidad durante el plazo contractual vigente, conforme a las necesidades identificadas y la priorización técnica establecida.

Cabe resaltar que la presente solicitud se encuentra debidamente soportada y viabilizada mediante el presupuesto y cronograma adjunto. Así mismo, se precisa que la presente modificación contempla la ampliación del plazo contractual por un término de tres (03) meses, esto en atención a la necesidad de planificar y ejecutar las actividades de manera articulada con las Instituciones Educativas Distritales (IED), garantizando la mitigación de impactos sobre el calendario académico.

En razón a lo antes expuesto, y en cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de obra No. **CO1.PCCNTR.8154780 de 2025-Lote 6** del 3 de septiembre de 2025, nos permitimos solicitar la modificación contractual mediante la adición de recursos y prórroga en tiempo del contrato de la referencia suscrito entre la Secretaría de Educación del Distrito (SED), con NIT 860.532.363, en calidad de contratante, y el **Consorcio País**, con NIT 901.974.049-8, en calidad

CALLE 18 N. 7-28 Centro
Chiquinquirá, Boyacá
constructurapais@hotmail.com

de contratista, para adicionar el presupuesto del contrato en **$ 460.000.000,00** y se realice una prórroga en tiempo de **03 meses** a partir del 1 de octubre del 2026, teniendo como nueva fecha prevista de terminación el 30 de diciembre de 2026. De igual forma, se deja claridad en que no se realizará una reprogramación del contrato ni de los frentes de obra actualmente en ejecución, conservándose el cronograma inicial aprobado por la interventoría.

INSTITUCION EDUATIVA	*SEDE*	*CPF*	*LOCALIDAD*	*VALOR ESTIMADO INCLUIDO AIU*
RAFEL URIBE URIBE	A	1943	CIUDAD BOLIVAR	$ 170.000.000,00
LOS COMUNEROS OSWALDO GUAYASAMIN	B	561	USME	$ 130.000.000,00
ADICIONES PARA ATENCION POR CONCEPTO EMERGENCIA				$ 160.000.000,00
VALOR TOTAL DE LA ADICION				$ 460.000.000,00

Cordialmente,

JUAN CALOS VELASQUEZ FORERO
R/L CONSORCIO PAIS
Contratista

Elaboró: wlpr

CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO
NIT: 901.977.271- 0
Dirección: Calle 98 No. 70-91
Correo: serinco.educativo@gmail.com

SERINCO-SED-L6-2025-671

Bogotá D.C., 24 de agosto de 2026

Señores(a):
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE DISTRITO
ARQ. SANTIAGO ANGEL URIBE
Apoyo a la Supervisión
Dirección de Construcción y Conservación de
Establecimientos Educativos – DCCEE

REFERENCIA: *"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"*

GRUPO 2 - LOTE 6

ASUNTO: Traslado de Comunicado OFI-SED-L6-261 Solicitud Modificatorio No. 3 Adición y Prórroga.

Respetado Arquitecto,

En atención al contrato de referencia, suscrito entre **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE DISTRITO y CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO**, en atención a que la Secretaría De Educación Del Distrito (SED), ha identificado la necesidad de mejoras en las condiciones físicas de los planteles educativos ***IED Rafael Uribe Uribe, Sede A*** con Cambio de cubierta y adecuación de instalaciones eléctricas asociadas a las baterías sanitarias del bloque de Preescolar (Ciclo I), y la Adecuación integral de las baterías sanitarias de niños y niñas del bloque de Preescolar (Ciclo I), incluyendo demoliciones, revisión de redes hidrosanitarias, suministro e instalación de aparatos sanitarios, mesones, orinales, griferías, enchapes de pisos y muros, así como divisiones sanitarias en acero inoxidable. y en la ***IED Los Comuneros – Oswaldo Guayazamin, Sede B Virrey Última Etapa*** con la Adecuación baterías sanitarias, de niños y niñas del bloque bachillerato piso 1, el cual contempla el baño para personas con movilidad reducida (Incluye demoliciones, enchapes, desmontes, retiros, instalación puertas, trabajos eléctricos, hidráulicos, instalación de aparatos sanitarios, divisiones de baño, pintura).

En aras de dar cumplimiento a los lineamientos contractuales, el Contratista de obra solicita una adición y prórroga del ***CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR. 8154780*** que mediante la Resolución 0012 del 28 de marzo de 2025 la Entidad abrió el Proceso de Contratación SED-LP-OP-DCCEE-012-2025 y que por medio de la Resolución 0068 del 25 de julio de 2025, corregida mediante Resolución 0071 del 5 de agosto de 2025, la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista. entre la Secretaría De Educación Del Distrito (SED) con Nit. 860.532.363 quien actúa en calidad de

contratante y el ***CONSORCIO PAIS*** identificado con NIT. 901.974.049-8 quien actúa en calidad de contratista, de cual esta interventoría se permite conceptuar:

1. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA	
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS". LOTE No.6
CONTRATISTA	CONSORCIO PAIS - NIT 901.974.049-8
CONTRATO No.	N° CO1.PCCNTR.8154780
VALOR INICIAL	DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL VEINTITRÉS PESOS M/CTE. ($2.332.049.023).
PLAZO INICIAL	SIETE (7) MESES
FECHA DE INICIO	06 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	05 DE MAYO DE 2026
ADICION Y PRORROGA No. 01	22 DE DICIEMBRE DE 2025
PRORROGA EN DÍAS	UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	20 DE JUNIO DE 2026
ADICION No. 1	$ 785.001.422,00
VALOR FINAL INCLUIDA LA ADICION No. 1	$ 3.117.050.445,00 incluido AIU
PRORROGA No. 02	27 DE MAYO DE 2026
PRORROGA EN DÍAS	TRES (3) MESES Y DOCE (12) DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
VALOR FINAL INCLUIDA LA PRORROGA No. 2	$ 3.117.050.445,00 incluido AIU
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	LOCALIDADES DE CIUDAD BOLIVAR Y USME

Conforme con lo indicado anteriormente y en consideración a lo informado por la Entidad contratante Secretaría de Educación del Distrito – SED, en referencia a la necesidad de atender necesidades de nuevas plantas físicas a cargo del distrito, y ante la manifestación de interés de ejecutar nuevos frentes de obra por parte del Contratista de Obra CONSORCIO PAIS mediante comunicación ***OFI-***

SED-L6-261, con fecha 19 de agosto de 2026, y asunto: ***"Solicitud Modificatorio No. 3 Adición y Prórroga"*** contratista que, actualmente tiene a su cargo la ejecución del ***contrato de obra N° CO1.PCCNTR. 8154780-2025*** cuyo objeto es, ""ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS", al respecto, por medio de la presente, la Interventoría del contrato en mención, CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO, a continuación, emite el respectivo concepto.

2. ANTECEDENTES

2.1. Según lo establecido en los estudios previos se tiene que de conformidad con el Decreto Ley 1421 de 1993, el Acuerdo 257 de 2006, y con las políticas y metas fijadas por el Plan de Desarrollo Distrital y el Plan Sectorial de Educación, está el Desarrollo de estrategias que garanticen el acceso y permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo, así como la pertinencia, calidad y equidad de la educación en sus diferentes formas, niveles y modalidades. Aunado a lo anterior, el Plan de Desarrollo Distrital "Bogotá Camina Segura" (2024–2027), cumpliendo con el Programa 024-2027 "4.30. Atención del déficit social para un hábitat digno" Objetivo estratégico: "4. Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática", estableció dentro de sus metas "Intervenir 310 sedes educativas y sedes administrativas con acciones de mejoramiento a la infraestructura y/o dotaciones para el aprendizaje".

2.2. Como acciones tendientes a garantizar la permanencia escolar, promoción de la calidad educativa, prever y asegurar el funcionamiento normal, la eficiencia y la buena presentación de las plantas físicas educativas y administrativas, la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos, adelantó la priorización de obras menores y de mejoramiento con características de reparaciones locativas en las diferentes localidades de Bogotá, intervenciones que contribuyen a mejorar las infraestructuras educativas en temas tales como, la atención prioritaria a las observaciones efectuadas por parte de Secretaría Distrital de Salud, obras menores de mitigación ante posibles riesgos y el mantenimiento correctivo, entre otros aspectos relacionados, obteniendo como resultado para el presente proceso, la selección y evaluación de las necesidades generales de las sedes educativas a cargo de la SED, en sus veinte (20) localidades de Bogotá D.C.

2.3. De acuerdo a lo anterior, la Entidad Contratante adelantó la licitación pública bajo proceso No SED-LP-OP-DCCEE-012-2025 cuyo objeto consistió en "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.", en cumplimiento de las normas y principios que rigen la contratación pública, para lo cual, adjudicó a la firma ***CONSORCIO PAIS, mediante el contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.***

8154780. La SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO de conformidad con lo establecido en el Decreto 330 del 2008 tiene por objeto orientar y liderar la formulación y ejecución de políticas, planes y programas para garantizar el derecho a la educación y asegurar a la población el acceso al conocimiento y la formación integral. De igual forma mejorar acciones tendientes a garantizar la permanencia escolar, promoción de la calidad educativa, prever y asegurar el funcionamiento normal, eficiencia y la buena presentación de las plantas físicas educativas y administrativas, la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos, ha priorizado las obras menores y de mejoramiento con características de Reparaciones Locativas en las diferentes localidades de Bogotá, intervenciones que contribuyen a mejorar la infraestructura educativa en temas tales como, la atención prioritaria a las observaciones efectuadas por parte de Secretaria Distrital de Salud, obras menores de mitigación ante posibles riesgos y el mantenimientos correctivo, entre otros aspectos relacionados.

2.4. Mediante el ***Modificatorio No. 1*** de fecha 22 de diciembre de 2025 se dio aprobación a una adición presupuestal, al contrato de obra No. CO1.PCCNTR.8154780, por valor de ***SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS MDA/CTE ($ 785.001.422)*** y una prórroga de ***UN (1) MES Y (15) QUINCE DÍAS***. El nuevo valor del contrato incluida la adición corresponde a ***TRES MIL CIENTO DIECISIETE MILLONES CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($ 3.117.050.445)*** con una nueva fecha de finalización para el 20 de junio de 2026

2.5. Mediante el ***Modificatorio No. 2*** de fecha 27 de mayo de 2026 se dio aprobación a una prórroga, al contrato de obra No. CO1.PCCNTR.8154780, de ***TRES (3) MESES Y DOCE (12) DÍAS***. El valor del contrato incluida la prórroga se mantiene en ***TRES MIL CIENTO DIECISIETE MILLONES CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($ 3.117.050.445)*** con una nueva fecha de finalización para el 30 de septiembre de 2026.

2.6. Teniendo en consideración lo expuesto anteriormente y las actividades requeridas para la inclusión de dos (2) nuevas Instituciones Educativas Distritales dentro del alcance contractual, se establece una adición para mejoramientos al Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8154780-2025 por valor de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($300.000.000), y de CIENTO SESENTA MILLONES ($160.000.000) para la atención de emergencias, incluido AIU, impuestos, tasas y contribuciones, y todos los costos directos e indirectos a que haya lugar derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, los cuales serán destinados a la ejecución de las actividades de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo requeridas en las IED Rafael Uribe Uribe y Los Comuneros Oswaldo Guayasamin más el rubro destinado para emergencias. Lo anterior, con el propósito de garantizar la disponibilidad de recursos necesarios para atender las intervenciones requeridas y dar cumplimiento a los fines de la contratación estatal.

2.7. El Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.8154780-2025, a la fecha cuenta con un porcentaje programado acumulado de 91,56% y un porcentaje ejecutado acumulado de 91,67%, para un adelanto general del contrato del 0,11% reportado por la Interventoría en el Informe Semanal No. 40 con fecha de corte hasta el 16 de agosto de 2026.

2.8. Ahora bien, y partiendo del objeto y el alcance del Contrato de obra están determinados y su destinación es específica, es decir, que a pesar de que la ejecución del Contrato está definida

mediante la modalidad de monto agotable, la Entidad contratante SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, previamente estableció y priorizó la ejecución de las actividades de obra señaladas con las cantidades contenidas en el Formulario 1 – formulario del proceso licitatorio, conforme al presupuesto oficial.

2.9. No obstante, y en consonancia con la dinámica del Contrato de obra, la Entidad contratante SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ha identificado que siguen persistiendo necesidades dentro de la localidad de Ciudad Bolívar y Usme, las cuales, son susceptibles de intervención, presentando necesidades particulares en cuanto a obras de adecuación, mejoramiento y/o mantenimiento correctivo y/o lo que sea requerido, con el fin de mantener en óptimas condiciones la infraestructura para la prestación del servicio; plantas físicas distritales, diferentes a las establecidas previamente en el alcance del contrato.

2.10. Por lo anterior, se evidencia la necesidad de incorporar dentro del alcance del Contrato de Obra la siguiente institución educativa, conforme a la información suministrada por la Entidad Contratante – Secretaría de Educación del Distrito:

NOMBRE SEDE EDUCATIVA	SEDE	DIRECCIÓN	LOCALIDAD
CPF 1943 Rafael Uribe Uribe	A	Diagonal 71B Sur No.	Ciudad Bolívar
CPF 0561 Los Comuneros – Oswaldo Guayazamin	B	Transversal 4A Este No. 2 98	Usme

3. MOTIVACIONES

A partir de lo anterior, y en concordancia a lo informado por la Entidad contratante, se expone la presente solicitud de adición y prórroga, acorde a las siguientes motivaciones:

3.1. Es menester de la Secretaría de Educación del Distrito – SED, mejorar las condiciones actuales de las instituciones educativas; en este caso, las pertenecientes a la localidad de Ciudad Bolívar y Usme, con el fin de garantizar el confort de los estudiantes, y reducir costos de mejoramientos y/o mantenimientos, cuya intervención es viable de acuerdo con el alcance del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.8154780-2025 en etapa de ejecución.

3.2. Es importante mencionar la necesidad actual de la institución a intervenir por medio del contrato de obra No CO1.PCCNTR.8154780-2025 en ejecución, las cuales, fueron viabilizadas por la entidad contratante, así:

- **CPF 1943 Rafael Uribe Uribe, Sede A**

  El alcance de las obras a ejecutar en esta sede educativa son los siguientes:
  - Cambio de cubierta y adecuación de instalaciones eléctricas asociadas a las baterías sanitarias del bloque de Preescolar (Ciclo I).
  - Adecuación integral de las baterías sanitarias de niños y niñas del bloque de Preescolar (Ciclo I), incluyendo demoliciones, revisión de redes hidrosanitarias, suministro e instalación de aparatos sanitarios, mesones, orinales, griferías, enchapes de pisos y muros, así como divisiones sanitarias en acero inoxidable.

- **CPF 0561 Los Comuneros – Oswaldo Guayazamin, Sede B**

  El alcance de las obras a ejecutar en esta sede educativa son los siguientes:

  - Adecuación baterías sanitarias, de niños y niñas del bloque bachillerato piso 1, el cual contempla el baño para personas con movilidad reducida (Incluye demoliciones, enchapes, desmontes, retiros, instalación puertas, trabajos eléctricos, hidráulicos, instalación de aparatos sanitarios, divisiones de baño, pintura).

3.3. Teniendo en cuenta los alcances indicados anteriormente, más el rubro de los CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS $160.000.000 destinados para la atención de emergencias que puedan presentarse en los colegios de las localidades de Usme y Ciudad Bolívar que hacen parte del alcance del contrato de obra CO1.PCCNTR.8154780 DE 2025, se relaciona a continuación el balance financiero de estas intervenciones:

NOMBRE SEDE EDUCATIVA	SEDE	LOCALIDAD	PRESUPUESTO
CPF 1943 Rafael Uribe Uribe	A	Ciudad Bolívar	$170.000.000
CPF 0561 Los Comuneros – Oswaldo Guayazamin	B	Usme	$130.000.000
Emergencias			$160.000.000
		Valor Total, Inc. IVA	**$460.000.000**

Por lo tanto, se avala la adición requerida que corresponde a la suma de ***CUATROCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($460.000.000)***, incluido el porcentaje de Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU), impuestos, tasas, contribuciones y demás costos directos e indirectos a que haya lugar, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Este valor corresponde a la distribución de recursos previamente descrita, destinada a la ejecución de las actividades de intervención requeridas en la Instituciones Educativas Distritales priorizadas y una prórroga en tiempo de ***TRES (3) MESES, es*** decir, hasta el 30 de diciembre de 2026.

De acuerdo con las motivaciones descritas y necesidades propias de la Entidad SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, frente a las instituciones educativas priorizadas y los recursos requeridos para su ejecución, la Interventoría concluye lo siguiente:

4. CONCLUSIONES

Teniendo en consideración la solicitud realizada por el Contratista de obra CONSORCIO PAIS y, conforme a las necesidades de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, la Interventoría CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO, manifiesta que, revisó y validó, los argumentos expuestos por el Contratista en su comunicado con consecutivo OFI-SED-L6-261 de fecha 19 de agosto de 2026 asunto: “Solicitud Modificatorio No. 3 Adición y Prorroga”, por lo cual, se emite concepto favorable a la inclusión de los frentes de obra: IED Rafael Uribe Uribe CPF 1943 y Los Comuneros Oswaldo Guayasamin CPF 561.

Dado lo anterior, la Interventoría considera viable que la solicitud se encuentre debidamente soportada y viabilizada mediante el cronograma adjunto, en el cual se detalla el flujo de inversión y el presupuesto preliminar correspondiente a la intervención proyectada.

Asimismo, se precisa se establece como nueva fecha de terminación contractual el 30 de diciembre de 2026. De igual forma, se deja claridad que los trabajos en esta sede se desarrollarán de acuerdo con la programación del contrato para este frente especifico, por otro lado los frentes de obra actualmente en ejecución conservarán el cronograma inicial aprobado por la interventoría.

NOMBRE SEDE EDUCATIVA	SEDE	DIRECCIÓN	LOCALIDAD
CPF 1943 Rafael Uribe Uribe	A	Diagonal 71B Sur No.	Ciudad Bolívar
CPF 0561 Los Comuneros – Oswaldo Guayazamin	B	Transversal 4A Este No. 2 98	Usme

5. SOLICITUDES

De lo anteriormente expuesto, la Interventoría respetuosamente, pone a consideración de la Entidad Contratante SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, lo siguiente:

5.1. ***INCLUSIÓN DE LAS PLANTAS FISICAS***: Incluir en el alcance del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.8154780 los siguientes establecimientos educativos, los valores y tiempos establecidos

NOMBRE SEDE EDUCATIVA	LOCALIDAD	VALOR PRESUPUESTAL	TIEMPO
CPF 1943 Rafael Uribe Uribe	Ciudad Bolívar	$170.000.000	Tres (3) Meses
CPF 0561 Los Comuneros – Oswaldo Guayazamin	Usme	$130.000.000	Tres (3) Meses
	Emergencias	$160.000.000	
	Valor Total Adición	**$460.000.000**	

5.2. ***ADICIÓN:*** Con el fin de cumplir con los alcances necesarios en las sedes educativas planteadas, se solicita la adición, por concepto de mantenimientos al contrato de obra No. CO1.PCCNTR.8154780 por un valor de ***TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS MDA/CTE ($ 300.000.000,00) INCLUIDO AIU.***

Por otro lado se solicita incorporar recursos por valor de ***CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($160´000.000)***, destinados a la atención de situaciones de emergencia que puedan presentarse y sean requeridas por la Entidad durante el plazo contractual vigente, conforme a las necesidades identificadas y la priorización técnica establecida, para un total de ***CUATROCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS ($460´000.000).***

5.3. ***PRORROGA:*** Teniendo en cuenta el plazo necesario para la ejecución de las obras de adecuación, mantenimiento y/o mejoramiento en las sedes educativas, avalamos otorgar una prórroga al contrato de obra No. CO1.PCCNTR. 8154780 por el término de ***TRES MESES,*** es decir hasta el 30 de diciembre de 2026.

6. ANEXOS

Como soporte de la presente solicitud se anexa a la presente:

6.1. Solicitud presentada por el contratista mediante comunicado OFI-SED-L6-261 - Solicitud Modificatorio No. 3 Adición y Prorroga, fechada el 19-ago-2026
6.2. Presupuesto y Programación IED Rafael Uribe Uribe
6.3. Presupuesto y Programación IED Los Comuneros Oswaldo Guayasamin
6.4. Certificados de Antecedentes
6.4.1 Documentos de Identificación y Existencia (Persona Jurídica) Construcciones V&P SAS
6.4.2 Documentos de Identificación y Existencia (Persona Jurídica) Constructora País
6.4.3 Documentos de Identificación y Existencia (Persona Jurídica) Fapaís
6.4.4. Documentos de Identificación y Existencia (Persona Jurídica) NYS Construcol
6.4.5. RUT Consorcio País
6.4.6. Antecedentes de Representante Legal de Construcciones V&P SAS
6.4.7. Antecedentes de Representante Legal de Constructora País
6.4.8. Antecedentes de Representante Legal de Fapaís
6.4.9. Antecedentes de Representante Legal de NYS y Consorcio País
6.4.10 Seguridad y parafiscales
6.5. 20260816 Informe Semana No. 40 - Lote 6

Cordialmente;

HECTOR JOSE VILLAZON GUTIERREZ
Consorcio Serinco Educativo
Director de Interventoría

Cc Consecutivo
Anexo: Según indica

FECHA:	6/09/2026
DIAS RESTANTES	24 Dias
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
SUBSECRETARÍA DE ACESO Y PERMANANCIA
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME
APOYO A LA SUPERVISION

GRUPO 2

CORTE DEL INFORME:	CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO PAIS
6 de septiembre de 2026	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO

FECHAS DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8169110	CO1.PCCNTR.8154780
INICIO	6 de octubre de 2025	6 de octubre de 2025
TERMINACION INICIAL	5 de mayo de 2026	5 de mayo de 2026
TERMINACION FINAL	5 de octubre de 2026	30 de septiembre de 2026

PLAZOS EN DIAS ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
INICIAL	211	211
SUSPENSIONES		
PRÓRROGAS	153	148
TOTAL	364	359

VALOR CONTRATO ETAPA	INTERVENTORIA	OBRA
INICIAL	$ 796,184,131.00	$ 2,332,049,023.00
ADICIONES	$ 291,300,934.00	$ 785,001,422.00
TOTAL	$ 1,087,485,065.00	$ 3,117,050,445.00

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1	23-dic-25	$ 128,425,720.00	46	
2	5-jun-26	$ 162,875,214.00	107	
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA	OTRO ASPECTO
1	22-dic-25	$ 785,001,422.00	46	
2	27-may-26		102	
3				
4				

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	GARANTE:	SEGUROS MUNDIAL

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	CALIDAD DEL SERVICIO DESDE	CALIDAD DEL SERVICIO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA
BCH-100046043	6 10 2025	20 12 2026	20 6 2026	20 6 2031	6 10 2025	20 6 2029

POLIZAS CONTRATO DE OBRA												
POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE		CUMPLIMIENTO HASTA			SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE		SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA HASTA	
39-44-101175397	6	10 2025	27	2 2027		6	10 2025	28	6 2029	5 5 2026	5 5 2028	

POLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE	RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA
39-40-101045911	6 10 2025	23 6 2026

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (06/09/2026)		PROGR %		EJECUTADO VS PROG	Vlr FRENTE APROBADO	Vlr FRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA	oct-2025	nov-2025	nov-2025	dic-2025	dic-2025	ene-2026	ene-2026	feb-2026	feb-2026	mar-2026	mar-2026	abr-2026	abr-2026	may-2026	jun-2026	jul-2026	ago-2026	sep-2026
581	ORLANDO FALS BORDA (IED)	USME	A	Barranquillita Nuevo	100.00%	100.00%		100.00%			$ 156,929,148.00	$ 156,929,147.99	10/11/2025	28/02/2026																	
1930	UNION EUROPEA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	B	Maria Cano	100.00%	100.00%		100.00%			$ 169,766,274.00	$ 169,766,274.00	18/11/2025	21/02/2026																	
1913	SIERRA MORENA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	C	Divino Niño	100.00%	100.00%		100.00%			$ 118,699,548.00	$ 118,699,548.00	10/11/2025	18/04/2026																	
523	FABIO LOZANO SIMONELLI (IED)	USME	A	Fabio Lozano Simonelli	100.00%	100.00%		100.00%			$ 245,187,661.00	$ 245,187,661.00	1/12/2025	11/04/2026																	
1904	ARBORIZADORA BAJA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Arborizadora Baja	100.00%	100.00%		100.00%			$ 630,139,470.00	$ 630,139,470.00	24/11/2025	28/02/2026																	
1974	CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Buenavista (Calasanz)	100.00%	100.00%		100.00%			$ 186,826,436.00	$ 186,826,436.00	10/12/2025	21/03/2026																	
1918	ESTRELLA DEL SUR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	B	Estrella II	100.00%	100.00%		100.00%			$ 78,637,768.00	$ 78,637,768.00	1/12/2025	14/03/2026																	
546	SANTA LIBRADA (IED)	USME	A	Santa Librada	100.00%	100.00%		100.00%			$ 223,822,666.00	$ 223,822,666.00	15/01/2026	2/05/2026																	
1917	ESTRELLA DEL SUR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Estrella I	100.00%	100.00%		100.00%			$ 76,163,937.00	$ 76,163,937.00	15/01/2026	28/02/2026																	
548	TENERIFE - GRANADA SUR (IED)	.USME	A	Tenerife	100.00%	100.00%		100.00%			$ 88,940,710.00	$ 88,940,710.00	9/03/2026	7/06/2026																	
1959	GUILLERMO CANO ISAZA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Guillermo Cano Isaza	99.40%	99.96%		100.00%			$ 354,505,537.00	$ 354,373,946.66	13/01/2026	19/06/2026																	
545	CIUDAD DE VILLAVICENCIO (IED)	USME	C	Puerta al Llano	57.46%	65.13%		64.25%			$ 349,000,000.00	$ 227,296,087.56	3/06/2026	30/09/2026																	
TOTAL FRENTES DE OBRA						95.45%		95.34%			$ 2,678,619,155.00	$ 2,556,783,652.22																			
EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO																														
590	DIRECCION LOCAL DE EDUCACION DE USME	USME	D L E	CADEL USME	100.00%	100.00%		100.00%			$ 28,072,878.00	$ 28,072,878.00	26/01/2026	1/03/2026																	
1904	ARBORIZADORA BAJA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Arborizadora Baja	100.00%	100.00%		100.00%			$ 52,071,222.00	$ 52,071,222.00	6/04/2026	14/05/2026																	
1974	CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Buenavista (Calasanz)	100.00%	100.00%		100.00%			$ 63,396,903.00	$ 63,396,903.00	7/04/2026	22/05/2026																	
590	DIRECCION LOCAL DE EDUCACION DE USME	USME	D L E	CADEL USME	100.00%	100.00%		100.00%			$ 2,038,265.00	$ 2,038,265.00	27/07/2026	1/08/2026																	
1974	CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Buenavista (Calasanz)	100.00%	100.00%		100.00%			$ 5,260,774.00	$ 5,260,774.00	22/05/2026	6/06/2026																	
1959	GUILLERMO CANO ISAZA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Guillermo Cano Isaza	100.00%	100.00%		100.00%			$ 11,337,220.00	$ 11,337,220.00	27/05/2026	20/06/2026																	
1980	CUNDINAMARCA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	La Riviera del Sur	100.00%	100.00%		100.00%			$ 18,125,874.00	$ 18,125,874.00	16/06/2026	27/06/2026																	
566	LUIS EDUARDO MORA OSEJO (IED)	USME	A	Nuevo Monteblanco- Eduardo Mora Osejo	100.00%	100.00%		100.00%			$ 70,007,566.00	$ 70,007,566.00	23/06/2026	7/07/2026																	
567	SAN JOSE DE USME - DON BOSCO 2 (CED)	.USME	A	San José Monteblanco (Don Bosco II)							$ 24,867,651.00																				
1974	CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Buenavista (Calasanz)	100.00%	100.00%		100.00%			$ 12,664,106.00	$ 12,664,106.00	22/06/2026	27/06/2026																	
575	EDUARDO UMAÑA MENDOZA (IED)	USME	A	Villa Alemania	6.00%	14.24%		35.00%			$ 85,000,009.00	$ 12,105,962.82	24/08/2026	22/09/2026																	
546	SANTA LIBRADA (IED)	USME	A	Santa Librada	2.54%	22.85%		40.00%			$ 27,347,458.00	$ 6,249,308.85	24/08/2026	16/09/2026																	
TOTAL FRENTES DE OBRA						70.30%		88.64%			$ 400,189,926.00	$ 281,330,079.67																			

ACUMULADO FRENTES DE OBRA

TERMINADAS	EN EJECUCION	POR INICIAR	TOTAL	VALOR
2	7	0	9	$ 2,556,783,652
ACUMULADO EMERGENCIAS				
9	2	0	11	$ 281,330,080
TOTAL				
11	9	0	20	$ 2,838,113,732
FRENTES POR LOCALIDAD				


RELACION DE PAGOS EFECTUADOS

No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR
1	$ 361,723,907.00	12		1	$ 45,496,236.00	12		23		34	
2	$ 435,348,486.00	13		2	$ 45,496,236.00	13		24		35	
3	$ 781,384,254.00	14		3	$ 141,587,750.94	14		25		36	
4	$ 492,623,060.00	15		4	$ 79,227,162.00	15		26		37	
5	$ 209,434,074.00	16		5	$ 68,268,881.00	16		27		38	
6	$ 151,233,507.00	17		6	$ 265,555,238.00	17		28		39	
7		18		7	$ 174,904,152.00	18		29		40	
8		19		8	$ 121,790,762.00	19		30		TOTAL INTERVENTORIA	
9		20		9		20		31		$ 942,346,418	
10		TOTAL OBRA		10		21		32			
11		$ 2,431,747,288.00		11		22		33			


AVANCE GENERAL

	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO
AVANCE	95.45%	78.01%	68.52%
PROGRAMADO	95.34%		
ATRASO	0.11%	EN EJECUCION	
FECHA APROBACION CRONOGRAMA			


AVANCE GENERAL




EMERGENCIAS



AVANCE FÍSICO



AVANCE DE LOS FRENTES



OBSERVACIONES:

FECHA:	6/09/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	195 días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO			
REGISTRO FOTOGRAFICO		SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA			GRUPO 2
		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS			
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
1A 100.00%	ORLANDO FALS BORDA (IED)		 	  	FRENTE AL 100%
2C 100.00%	SIERRA MORENA (IED)	* ADECUACION DE CUARTOS DE BASURA * ACCESIBILIDAD REDUCIDA RAMPAS * PINTURA 4 AULAS	 	 	FRENTE AL 100%

28072879
52071222
63396903
2038265
5260774
11337220
18125874
70007566
24,867,651.00
12664106
76,878,564.00

FECHA: 6/09/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES: 196 días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO 2
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
3B 100.00%	UNION EUROPEA (IED)	* CAMBIO DE CUBIERTA PARA 3 AULAS, INCLUYE LA EDECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS	 364721023 	 	FRENTE AL 100%
4A 100.00%	ARBORIZADORA BAJA (IED)	* CAMBIO DE CUBIERTA BLOQUE PRIMERA INFANCIA, INCLUYE MEJORAMIENTO ELECTRICO * ADECUACIÓN CANCHA DEPROTIVA	 	 	FRENTE AL 100%

FECHA: 6/09/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES: 196 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA			GRUPO 2	
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
5A 100.00%	FABIO LOZANO SIMONELLI (IED)	* CAMBIO DE PISOS AULAS DE 3ER PISO BLOQUE A * MANEJO AGUAS LLUVIAS CANCHA * MEJORAMIENTO BATERIAS SANITARIAS 3ER PISO B	 	 	FRENTE AL 100%
6B 100.00%	ESTRELLA DEL SUR (IED) SEDE B	* CAMBIO DE PUERTAS Y VENTANA DE LA SEDE * CAMBIO DEL PORTON PRINCIPAL	 	 	FRENTE AL 100%

FECHA: 6/09/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES: 166 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO					
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO	2
CORTE DEL INFORME	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
7A **100.00%**	**CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)**	* CAMBIO DE CUBIERTA AULA MULTIPLE	 	 	**FRENTE AL 100%**
8A **100.00%**	**SANTA LIBRADA (IED)**	* MANTENIMIENTO CORRECTIVO TERRAZAS Y JARDINERA * ADECUACIÓN JUNTA ESTRUCTURAL COMEDOR	 	 	**FRENTE AL 100%**

FECHA: 6/09/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES: 166 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO 2
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
9A 100.00%	IED ESTRELLA DEL SUR, SEDE A	* ADEACUACIÓN BATERIAS SANITARIAS * ADECUACIÓN PORTON PRINCIPAL	 	 	FRENTE AL 100%
10A 100.00%	DIRECCION LOCAL DE EDUCACION DE USME - EMERGENCIA	* IMPERMEABILIZACIÓN PLACA TANQUES DE AGUA POTABLE * RESANE HUMEDAD BAÑO MUJERES	 	 	EMERGENCIA AL 100%

FECHA:	6/09/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	166 días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO			
REGISTRO FOTOGRAFICO		SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA			GRUPO 2
		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS			
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
11A 99.96%	GUILLERMO CANO ISAZA (IED)	* ADECUACIÓN BATERIAS SANITARIAS BLOQUE BACHILLERATO	 	 	  
12A 100.00%	TENERIFE - GRANADA SUR (IED)	* IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE * Instalación Barandas Metalicas	 	 	FRENTE AL 100%

FECHA: 6/09/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES: 196 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO 2
CORTE DEL INFORME	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA: CONSORCIO PAIS		
5/4/26		CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR: CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO		

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
13A 100.00%	CALASANZ (BUENAVISTA) (CED) EMERGENCIA	* INSTALACIÓN DIVISIONES DE BAÑOS *AMPLIACIÓN CAPACIDAD TANQUE DE AGUA *ADECUACION RAMPA PARA ENTRADA AULA MULTIPLE	 	 	EMERGENCIA AL 100%
14A 100.00%	ARBORIZADORA BAJA (IED)	* ADECUACIÓN GRADERIAS, REEMPLAZO ESCALERA TARIMA, ADECUACIÓN TARIMA *MEJORAMIENTO DEL TERRENO AL REDEDRO DE LA TARIMA EMERGENCIA	 	 	EMERGENCIA AL 100%

FECHA: 6/09/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES: 195 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO 2
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
15A 100.00%	GUILLERMO CANO ISAZA (IED)	*CAMBIO DE PISO AULA BLOQUE DE PRIMARIA SEGUNDO PISO EMERGENCIA	 	 	EMERGENCIA AL 100%
16A 65.13%	CIUDAD DE VILAVICENCIO - PUERTA AL LLANO	☐Mejoramiento correctivo de los pisos en acceso y corredor principal ☐Mejoramiento correctivo del cerramiento metálico ☐Mejoramiento de las redes de aguas lluvias	 	 	  

FECHA: 6/09/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES: 195 Días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO 2
CORTE DEL INFORME	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
5/4/26	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
17A 100.00%	CUNDINAMARCA (IED)	□Adecuación de una estructura en cielo raso PVC, para mitigar el ingreo de palomas al comedor de la institución	 	 	EMERGENCIA AL 100%
17A 100.00%	LUIS EDUARDO MORA OSEJO (IED)	* Cambio de tablero Principal electrico * Adecuación acometidas electricas según alcance de la ficha electrica	 	 	EMERGENCIA AL 100%

FECHA: 6/09/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES: 195 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA			GRUPO 2	
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
18A 100.00%	CALASANZ (BUENAVISTA) (CED) - EMERGENCIA	* cambio y suministro e instalación de motobombas para tanque de agua potable	 	 	EMERGENCIA AL 100%
18A 0.00%	EDUARDO UMAÑA MENDOZA (IED)	* Impermeabilización con manto en aluminio, bloque	 	 	  

FECHA:	6/09/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	166 días					
REGISTRO FOTOGRAFICO						GRUPO 2
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780		CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110		INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
18A 0.00%	SANTA LIBRADA (IED)	* Impermeabilización cuarto zona ludica	 	 	  

CONTRATO DE OBRA		CO1.PCCNTR.8154780					CONTRATO DE INTERVENTORIA	CO1.PCCNTR.8169110			VIGENCIA	2025
CPF	581	IED			ORLANDO FALS BORDA			SEMANA 43				
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
REPLANTEO	m2	36.50	225.50	262.00	262.00		$ 4,233.48	$ 1,109,170.66	$ (954,648.79)	717.81%	717.81%	
CERRAMIENTO EN LONA	M	91.00	(62.60)	28.40	28.40		$ 31,110.25	$ 883,530.99	$ 1,947,501.40	100.00%	100.00%	
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	36.50	211.26	247.76	247.76		$ 18,044.21	$ 4,470,634.09	$ (3,812,020.33)	678.79%	678.79%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M YGUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	301.34	(266.74)	34.60	34.60		$ 33,201.35	$ 1,148,766.74	$ 8,856,128.37	11.48%	11.48%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	79.20	40.80	120.00	120.00		$ 69,099.55	$ 8,291,946.35	$ (2,819,261.76)	151.52%	151.52%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	34.00	199.20	233.20	216.59		$ 107,273.69	$ 23,234,421.60	$ (19,587,116.26)	637.03%	637.03%	
PERFORACIÓN NÚCLEO 4" E= 0.10 M	UN	16.00	(13.00)	3.00	3.00		$ 166,952.47	$ 500,857.42	$ 2,170,382.16	18.75%	18.75%	
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M	1.50			1.50		$ 62,023.52	$ 93,035.29	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	34.00			34.00		$ 91,590.40	$ 3,114,073.57	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	0.30			0.30		$ 135,394.33	$ 40,618.30	$ -	100.00%	100.00%	
RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	0.24			0.24		$ 181,045.17	$ 43,450.84	$ -	100.00%	100.00%	
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	15.00			15.00		$ 22,829.47	$ 342,442.05	$ -	100.00%	100.00%	
PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	19.00			19.00		$ 19,858.75	$ 377,316.29	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO LAMINADO 3 + 3 DIMENSIONES 1.00 M. X 1.00 M.	M2	15.36			15.36		$ 177,336.50	$ 2,723,888.59	$ -	100.00%	100.00%	
MEDIACAÑA VERTICAL EN CONCRETO 3000 PSI	M	58.50	136.16	194.66	194.66		$ 27,185.71	$ 5,291,971.11	$ (3,701,606.83)	100.00%	100.00%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	73.00	189.00	249.56	239.56		$ 45,289.29	$ 10,849,501.59	$ (7,543,383.64)	328.16%	328.16%	
DILATACIÓN EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 3 MM PROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM	M			127.20	127.20		$ 4,291.49	$ 545,877.16	$ (545,877.16)	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	344.96			340.58		$ 4,663.84	$ 1,588,397.08	$ 20,440.72	98.73%	98.73%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	262.00	20.37	252.37	255.37		$ 361,355.09	$ 92,279,248.29	$ 2,395,784.22	97.47%	97.47%	
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ORLANDO FALS BORDA							$ 156,929,147.99				
CPF	1913	IED			SIERRA MORENA			SEMANA 43				
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	47.37	223.92	271.29	271.29		$ 7,045.00	$ 1,911,238.10	$ (1,577,516.00)	572.70%	572.70%	
CERRAMIENTO EN LONA	M	60.00	13.00	73.00	73.00		$ 31,110.25	$ 2,271,047.96	$ (404,433.20)	121.67%	121.67%	
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	m3	1.76	(1.76)	-	-		$ 274,656.52	$ -	$ 483,395.00	0.00%	0.00%	
DESMONTE DE BARANDA METÁLICA ALTURA NO MAYOR A 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	20.80	7.20	28.00	28.00		$ 21,488.46	$ 601,677.01	$ (154,716.95)	134.62%	134.62%	
DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	12.60			12.60		$ 11,376.96	$ 143,349.70	$ -	100.00%	100.00%	

DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	36.84			36.84		$ 107,273.69	$ 3,951,962.61	$ -	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.30 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	32.64	0.72	31.92	-		$ 93,547.94	$ -	$ 3,053,405.00	0.00%	0.00%	
CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	7.20			3.40		$ 15,633.37	$ 53,153.46	$ 59,407.00	47.22%	47.22%	
DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5.29			4.00		$ 11,761.45	$ 47,045.82	$ 15,172.00	75.61%	75.61%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	1.76	6.86	8.62	4.57		$ 91,988.38	$ 420,527.47	$ (258,627.91)	259.75%	259.75%	
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	m3	24.87	-9.60	15.27	15.27		$ 21,702.97	$ 331,382.67	$ 208,370.00	61.40%	61.40%	
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	m2	11.84			11.84		$ 165,931.21	$ 1,964,625.47	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	m3	7.00	7.00	14.00	14.00		$ 176,060.25	$ 2,464,579.38	$ (1,232,158.00)	199.98%	199.98%	
MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	12.60	3.76	16.36	16.36		$ 146,133.16	$ 2,390,738.55	$ (549,461.00)	129.84%	129.84%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	m	6.00			-		$ 78,726.73	$ -	$ 472,360.38	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"	un	8.00			-		$ 28,310.86	$ -	$ 226,487.00	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	un	2.00			-		$ 129,729.46	$ -	$ 259,458.91	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	m	29.00			-		$ 14,988.50	$ -	$ 434,667.00	0.00%	0.00%	
RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INLUYE REFUERZO).	M2	42.05	8.55	50.60	50.60		$ 193,996.53	$ 9,816,224.55	$ (1,658,670.00)	120.33%	120.33%	
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	11.84			11.84		$ 165,931.21	$ 1,964,625.47	$ -	100.00%	100.00%	
CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA (TRÁFICO PESADO) ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO, PENDIENTADO Y MEDIA CAÑA.	M	2.96			2.96		$ 592,067.38	$ 1,752,519.43	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	420.50	(366.54)	53.96	53.96		$ 7,255.46	$ 391,504.61	$ 2,659,416.00	12.83%	12.83%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	91.39			91.39		$ 7,103.01	$ 649,144.22	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-S 6" INCLUYE ACCESORIOS	M	6.00	10.00	16.00	16.00		$ 143,600.90	$ 2,297,614.44	$ (1,436,009.00)	266.67%	266.67%	
CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 M X 0.60 M EN CONCRETO REFORZADO < = 1,00 M CON MARCO Y TAPA METÁLICA E= 0.20 M	un	4.00	(4.00)	-	-		$ 1,618,437.02	$ -	$ 6,473,748.09	0.00%	0.00%	
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	3.00			2.00		$ 875,947.70	$ 1,751,895.39	$ 875,948.00	66.67%	66.67%	
CANAL EN PVC AMAZONAS O EQUIVALENTE, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	3.60			3.60		$ 68,114.71	$ 245,212.96	$ -	100.00%	100.00%	
MURO EN SUPERBOARD DE 8 MM INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA , MASILLA , CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA, VISTO DOS CARAS E= 12 CM	M2	15.77	1.25	17.02	17.02		$ 159,158.72	$ 2,708,881.47	$ (198,948.00)	107.93%	107.93%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA, EL TUBO PASAMANOS DE 2" CALIBRE 18 AL IGUAL QUE LOS TUBOS PEDESTALES CON PLATINA DE FIJACIÓN Y TRAVESAÑOS VERTICALES EN TUBERÍA DE 3/4" CON SEPARACIÓN CADA 9CM, PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS.	M	33.78			36.35		$ 1,120,163.13	$ 40,719,658.08	$ (2,880,548.00)	107.61%	107.61%	
PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	172.00	(172.00)	-	-		$ 65,757.83	$ -	$ 11,310,347.00	0.00%	0.00%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO (RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA CANCHA MULTIPLE INCLUYE DEMARCACIONES BALONCESTO - VOLEYBOL)	M2			146.06	156.06		$ 77,589.44	$ 12,108,607.88	$ (12,108,608.00)	106.85%	106.85%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	14.08	2.72	16.80	16.80		$ 98,222.57	$ 1,650,139.25	$ (267,165.00)	119.32%	119.32%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	4.08			4.08		$ 45,289.29	$ 184,780.29	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	4.84			4.84		$ 126,224.49	$ 610,926.55	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1.00			1.00		$ 572,567.48	$ 572,567.48	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	UN	1.00			24.00		$ 23,315.15	$ 559,563.51	$ (536,248.00)	2400.00%	2400.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	24.00			24.00		$ 20,790.98	$ 498,983.52	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	5.08	0.05	5.13	5.13		$ 798,362.30	$ 4,095,598.62	$ (39,918.00)	100.98%	100.98%	
PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	193.76	(98.31)	95.45	105.45		$ 29,785.43	$ 3,140,873.57	$ 2,630,351.00	54.42%	54.42%	
PINTURA DE ACEITE SOBRE PAÑETE (2 MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	61.76	14.44	76.20	86.20		$ 29,785.43	$ 2,567,504.05	$ (727,956.00)	139.57%	139.57%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	kg	226.80	92.51	319.31	319.31		$ 23,042.63	$ 7,357,741.55	$ (2,131,674.00)	140.79%	140.79%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	36.84	-23.74	13.10	15.10		$ 264,771.67	$ 3,998,052.18	$ 5,756,136.00	40.99%	40.99%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	537.24			537.24		$ 4,663.84	$ 2,505,600.70	$ -	100.00%	100.00%	
					SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. SIERRA MORENA			**$ 118,699,548.00**				
CPF	**1930**	**IED**			**UNIÓN EUROPEA**			**SEMANA 43**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	168.00	10.14	178.14	178.14		$ 4,233.48	$ 754,151.38	$ (42,927.00)	106.04%	106.04%	
CERRAMIENTO EN LONA	M	45.00	7.80	52.80	23.83		$ 31,110.25	$ 741,422.37	$ 658,538.70	52.96%	52.96%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorias para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	136.13	(104.13)	32.00	32.00		$ 3,248.63	$ 103,956.25	$ 338,280.13	23.51%	23.51%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5.83	-	5.83	-		$ 144,722.00	$ -	$ 843,729.29	0.00%	0.00%	
DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	36.30			36.30		$ 26,782.33	$ 972,198.70	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	5.15	7.35	12.50	12.50		$ 27,938.51	$ 349,231.40	$ (205,348.06)	242.72%	242.72%	

DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	m2	168.00	5.63	173.63	183.63		$ 36,752.18	$ 6,748,803.22	$ (574,436.61)	109.30%	109.30%	
DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	un	18.00	6.00	24.00	24.00		$ 11,967.87	$ 287,228.79	$ (71,807.20)	133.33%	133.33%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	un	18.00	6.00	24.00	24.00		$ 7,469.97	$ 179,279.20	$ (44,819.80)	133.33%	133.33%	
DESMONTE DE TABLERO ELÉCTRICO DE 12-18 CIRCUITOS DETERIORADO, INCLUYE RETIRO DE PROTECCIONES Y DISPOSICIÓN DE RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, NO INCLUYE RESANES NI PINTURAS.	un	1.00			-		$ 55,922.89	$ -	$ 55,922.89	0.00%	0.00%	
DEMOLICIÓN ALFAJÍA EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE COSNTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	7.00	0.00	7.00	-		$ 32,498.47	$ -	$ 227,489.29	0.00%	0.00%	
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	m	3.90	-3.90	0.00	-		$ 18,687.73	$ -	$ 72,882.16	0.00%	0.00%	
PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	19.43			19.43		$ 21,844.63	$ 424,441.11	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	4.00			4.00		$ 126,905.79	$ 507,623.16	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	3.90			3.90		$ 89,839.27	$ 350,373.14	$ -	100.00%	100.00%	
CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (INCLUYE FORMALETAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	M	19.43			19.43		$ 42,469.67	$ 825,185.65	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	kg	3515.11	-1076.19	2438.92	2,608.92		$ 23,042.63	$ 60,116,373.04	$ (84,914,618.87)	-242.42%	-242.42%	
CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (INCLUYE FORMALETAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	M	19.43			19.43		$ 42,469.67	$ 825,185.65	$ (825,185.65)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO (35 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR.	M	0.50			0.50		$ 341,855.19	$ 170,927.60	$ (170,927.60)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	m	26.40	18.13	44.53	44.53		$ 91,590.40	$ 4,078,520.47	$ (1,660,533.93)	245.62%	245.62%	
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	1.00	-1.00	0.00			$ 875,947.70	$ -	$ 875,947.70	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FUACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	kg	213.75	0.29	214.04	214.04		$ 264,771.67	$ 56,671,727.78	$ (76,783.78)	100.14%	100.14%	

FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	18.15			18.15		$ 106,267.26	$ 1,928,750.73	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	34.90			34.90		$ 91,590.40	$ 3,196,504.93	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	42.00			42		$ 23,315.15	$ 979,236.14	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 2N°10 (F) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	42.00			42.00		$ 20,790.98	$ 873,221.16	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	21.00	3.00	24.00	24		$ 180,330.15	$ 4,327,923.59	$ (540,990.45)	114.29%	114.29%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	21.00	3.00	24.00	24		$ 238,055.44	$ 5,713,330.57	$ (714,166.32)	114.29%	114.29%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M	22.50	8.50	31.00	30		$ 304,166.74	$ 9,125,002.11	$ (2,281,250.53)	133.33%	133.33%	
SUMINISTRO E INSTALACION MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA, PERFILES ESTUCTURALES DE ACERO GALVANIZADO PGU, MONTANTES, TORNILLOS PARA ESTRUCTURA, CLAVO IMPACTADO. ACABADO A DOS MANOS CON PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO.	M2	32.35	0.75	33.10	33.1		$ 222,048.37	$ 7,349,801.01	$ (166,536.28)	102.32%	102.32%	
PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M2	61.70			65.10		$ 17,207.77	$ 1,120,195.60	$ (58,476.16)	105.51%	105.51%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	224.21			224.21		$ 4,663.84	$ 1,045,679.27	$ -	100.00%	100.00%	
					SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. UNION EUROPEA			**$ 169,766,274.00**				
CPF	**1904**	**IED**			**ARBORIZADORA BAJA**			**SEMANA 43**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	786.72	463.91	1250.63	1,250.63		$ 7,045.00	$ 8,810,688.60	$ (3,268,246.00)	158.97%	158.97%	
CERRAMIENTO EN LONA	M	96.25	73.00	169.25	169.25		$ 31,110.25	$ 5,265,409.14	$ (2,271,047.96)	175.84%	175.84%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	466.58	9.42	476.00	476.00		$ 107,273.69	$ 51,062,274.77	$ (1,010,518.00)	102.02%	102.02%	
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	5.25			-		$ 22,300.62	$ -	$ 117,078.27	0.00%	0.00%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	145.00	6.23	151.23	151.23		$ 32,594.26	$ 4,929,229.33	$ (203,062.21)	104.30%	104.30%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	145.00	123.77	21.23	21.23		$ 42,650.45	$ 905,469.00	$ 5,278,845.87	14.64%	14.64%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO CON FIBRA SINTÉTICA ESPESOR 4 CM	M2	130.00			130.00		$ 69,868.54	$ 9,082,910.19	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	m2	323.02			323.02		$ 36,752.18	$ 11,871,653.14	$ 37.00	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA (INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	35.50			35.50		$ 8,680.11	$ 308,143.88	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	un	25.00			25.00		$ 7,469.97	$ 186,749.17	$ -	100.00%	100.00%	

DESMONTE CANCHA MULTIPLE (ARCO DE MICROFUTBOL Y ARO DE BALONCESTO) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	un	2.00			2.00		$ 398,950.46	$ 797,900.91	$ -	100.00%	100.00%	
DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	21.00			-		$ 11,761.45	$ -	$ 246,991.00	0.00%	0.00%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	16.80	5.76	22.56	22.56		$ 91,988.38	$ 2,075,257.93	$ (529,853.00)	134.29%	134.29%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	258.10	(36.51)	221.59	221.59		$ 79,962.51	$ 17,718,891.73	$ 2,919,431.00	85.85%	85.85%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	22.83			22.83		$ 135,394.33	$ 3,091,052.48	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	15.52			2.22		$ 66,591.58	$ 147,833.30	$ 885,668.00	14.30%	14.30%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	m3	103.10	68.26	171.36	171.36		$ 176,060.25	$ 30,169,684.13	$ (12,017,873.00)	166.21%	166.21%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAJÓN DE PIEDRA	m3	129.05	25.90	154.95	154.95		$ 176,060.25	$ 27,280,535.46	$ (4,559,960.00)	120.07%	120.07%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BORDILLO PREFABRICADO A80	m	87.00			87.00		$ 76,033.93	$ 6,614,951.64	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M	90.00			90.00		$ 97,085.28	$ 8,737,675.50	$ -	100.00%	100.00%	
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	18.70	5.00	23.70	23.70		$ 165,931.21	$ 3,932,569.57	$ (829,656.00)	126.74%	126.74%	
CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI ANCHO 0.50 M E= 0.07 M (NO INCLUYE REFUERZO)	M	90.00			90.00		$ 164,788.52	$ 14,830,966.59	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO (45 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3 MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR.	M	1.52			1.52		$ 358,768.86	$ 545,328.67	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PEATONAL DE ANGULOS Y PLATINAS DE ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR PARA CARCAMO ANCHO 40 CM	M	0.90			0.90		$ 156,990.72	$ 141,291.65	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	kg	1809.76	-142.50	1667.26	1,667.26		$ 23,042.63	$ 38,418,051.96	$ 3,283,574.00	92.13%	92.13%	
CAJA DE INSPECCION 100 X 100 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	2.00					$ 1,088,548.32	$ -	$ 2,177,097.00	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	m2	684.78	-162.78	522.00	522.00		$ 11,730.42	$ 6,123,281.59	$ 1,909,479.00	76.23%	76.23%	
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	m	3.00			2.00		$ 5,565.04	$ 11,130.08	$ 5,565.00	66.67%	66.67%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	m2	323.02			323.02		$ 264,771.67	$ 85,526,544.13	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	m	35.50			35.50		$ 305,515.84	$ 10,845,812.21	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN ASFALTO MD-10 PARA CANCHA DEPORTIVA E=8 CM, (INCLUYE: EMULSION ASFALTICA, ASFALTO MD-10 Y ACABADO CON SLURRY	m2	484.50	-43.86	440.64	440.64		$ 225,361.76	$ 99,303,405.31	$ 9,884,367.00	90.95%	90.95%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO (RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA CANCHA MULTIPLE INCLUYE DEMARCACIONES BALONCESTO - VOLEYBOL)	M2	484.50	-484.50	0.00	-		$ 77,589.44	$ -	$ 37,592,083.00	0.00%	0.00%	
PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	714.00			680.68		$ 65,757.83	$ 44,760,026.89	$ 2,191,065.00	95.33%	95.33%	
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M	66.67			66.67		$ 62,023.52	$ 4,135,108.31	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	620.45			620.45		$ 7,255.46	$ 4,501,650.03	$ -	100.00%	100.00%	
DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	353.72			353.72		$ 18,365.30	$ 6,496,173.31	$ -	100.00%	100.00%	
CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL (INC. DOS UNIDADES FIJAS DE MICROBALONCESTO - MALLA PARA MICRO FUTBOL - JUEGO DE POSTES Y MALLA PARA VOLEIBOL - DEMARCACIÓN DE LA CANCHA - TRANSPORTE - E INSTALACIÓN)	UN	2.00	-1.00	1.00	1.00		$ 12,850,061.48	$ 12,850,061.48	$ 12,850,061.00	50.00%	50.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	5.00			4.00		$ 126,905.79	$ 507,623.16	$ 126,906.00	80.00%	80.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1.00			1.00		$ 572,567.48	$ 572,567.48	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	118.00			118.00		$ 15,217.85	$ 1,795,706.06	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	118.00			118.00		$ 16,070.48	$ 1,896,316.55	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	25.00			25.00		$ 180,330.15	$ 4,508,253.74	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	22.00			22.00		$ 238,055.44	$ 5,237,219.69	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER 2X20W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	3.00			3.00		$ 193,810.36	$ 581,431.07	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	194.18			194.18		$ 9,167.13	$ 1,780,074.18	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H= 5.00 M (ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO DE 3" E= 3,81 MM ASTM A500 Y CAMISA DE REFUERZO DE 4", VARILLA REDONDA DE 3/4" C./.14 EJES. VIGA 40X30 Y PILOTES CONCRETO 3000 PSI) SEGÚN DETALLES IDRD.	M2	17.50			16.95		$ 2,042,059.82	$ 34,612,913.93	$ 1,123,133.00	96.86%	96.86%	
CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H= 2.50 M (ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO DE 2-1/2" Y PROTECCIÓ N EN VARILLA REDONDA DE 3/4" C./0.14 m EJES. VIGA=30*30 CONCRETO 3000PSI) SEGÚN DETALLES IDRD.	M2	17.50			16.95		$ 1,257,854.97	$ 21,320,641.75	$ 691,820.00	96.86%	96.86%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO HETEROGENEO ALTO TRÁFICO	M2	130.00			125.78		$ 237,210.90	$ 29,836,007.59	$ 1,001,410.00	96.75%	96.75%	
LAVADO Y LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE EN EL COLEGIO ARBORIZADORA BAJA (INCLUYE INSUMOS)	ML	197.54			194.54		$ 5,046.98	$ 981,840.09	$ 15,141.00	98.48%	98.48%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1,078.76			1,078.76		$ 4,663.84	$ 5,031,162.64	$ -	100.00%	100.00%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ARBORIZADORA BAJA	**$ 630,139,470.00**				
CPF	**523**	**IED**			**Fabio Lozano Simonelli**			**SEMANA 43**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	1201.02	10.05	1211.07	1,211.07		$ 4,233.48	$ 5,127,035.54	$ (42,546.00)	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	51.83	81.17	133.00	133.00		$ 31,110.25	$ 4,137,662.72	$ (2,525,218.67)	256.61%	256.61%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	235.29	11.28	246.57	246.57		$ 32,594.26	$ 8,036,765.70	$ (367,663.21)	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2			68.70	68.70		$ 107,273.69	$ 7,369,702.26	$ (7,369,702.26)	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN ASITIOS AUTORIZADOS)	M2	28.64	1.35	29.99	29.99		$ 22,300.62	$ 668,795.68	$ (30,105.84)	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	55.48	30.02	85.50	85.50		$ 12,649.16	$ 1,081,503.32	$ (379,727.83)	154.11%	154.11%	
DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	28.00			28.00		$ 20,708.69	$ 579,843.18	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)}	M3	15.05	0.08	15.13	15.13		$ 66,591.58	$ 1,007,530.54	$ (5,327.33)	100.53%	100.53%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	17.32			17.32		$ 33,174.37	$ 574,580.07	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	UN	28.00			28.00		$ 27,281.50	$ 763,882.01	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2			3.00	3.00		$ 25,731.38	$ 77,194.15	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	66.00			66.00		$ 27,938.51	$ 1,843,941.79	$ -	100.00%	100.00%	
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3			63.85	63.85		$ 34,724.48	$ 2,217,158.36	$ -	100.00%	100.00%	
CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M			120.60	120.60		$ 15,633.37	$ 1,885,384.52	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	8.00			8.00		$ 7,469.97	$ 59,759.73	$ -	100.00%	100.00%	

DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	55.30	-5.16	50.14	50.14		$ 32,569.97	$ 1,633,058.41	$ 168,061.06	90.67%	90.67%	
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	22.90			22.90		$ 18,687.73	$ 427,949.09	$ -	100.00%	100.00%	
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2			2.80	2.80		$ 18,044.21	$ 50,523.80	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	12.80	2.49	15.29	15.29		$ 135,394.33	$ 2,070,179.26	$ (337,131.87)	119.45%	119.45%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 m	M2	194.67			194.67		$ 42,650.45	$ 8,302,762.60	$ -	100.00%	100.00%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	49.31			49.31		$ 45,289.29	$ 2,233,214.74	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO CON FIBRA SINTÉTICA ESPESOR 4 CM	M2	548.06	(548.06)	-			$ 69,868.54	$ -	$ 38,292,151.98	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	158.76	(56.05)	102.71	102.71		$ 7,103.01	$ 729,550.31	$ 398,123.79	64.70%	64.70%	
CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI ANCHO 0.50 M E= 0.07 M (NO INCLUYE REFUERZO)	M	171.60	(44.68)	126.92	122.00		$ 164,788.52	$ 20,104,199.16	$ 8,173,510.48	71.10%	71.10%	
PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2			0.64	0.64		$ 115,264.41	$ 73,769.22	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PEATONAL DE ANGULOS Y PLATINAS DE ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR PARA CARCAMO ANCHO 40 CM	M			13.00	13.00		$ 156,990.72	$ 2,040,879.36	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M			20.50	20.57		$ 24,290.55	$ 499,656.52	$ (1,700.34)	100.34%	100.34%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2.00			2.00		$ 126,905.79	$ 253,811.58	$ (253,811.58)	100.00%	100.00%	
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00			1.00		$ 253,721.19	$ 253,721.19	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	M	1.00			1.00		$ 572,567.48	$ 572,567.48	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	M	8.00			8.00		$ 180,330.15	$ 1,442,641.20	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	32.00	-27.00	5.00	5.00		$ 23,315.15	$ 116,575.73	$ 629,508.95	15.63%	15.63%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M			55.00	55.00		$ 33,700.52	$ 1,853,528.49	$ (1,853,528.49)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	32.00	(12.00)	20.00	20.00		$ 20,790.98	$ 415,819.60	$ 249,491.76	62.50%	62.50%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN			8.00	8.00		$ 198,607.76	$ 1,588,862.05	$ -	100.00%	100.00%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	8.00	-5.00	3.00	3.00		$ 238,055.44	$ 714,166.32	$ 1,190,277.20	37.50%	37.50%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL TOTALIZADOR 3X125 A. MATERIALES CERTIFICADOS RETIE E INSTALADOS SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UN			1.00	1.00		$ 781,835.83	$ 781,835.83	$ (781,835.83)	100.00%	100.00%	
ACOMETIDA TRIFASICA EN 4#8 + 1#10 CABLE LIBRE DE HALOGENOS. INCLUYE CONECTORES TUBULARES Y AISLAMIENTO AUTOFUNDENTE INCLUYE MANIOBRAS DE CANALIZACIÓN	M			60.00	60.00		$ 57,049.39	$ 3,422,963.50	$ (3,422,963.50)	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	15.00	(2.42)	12.58	12.58		$ 361,355.09	$ 4,545,846.98	$ 874,479.31	83.87%	83.87%	
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	1.00			1.00		$ 875,947.70	$ 875,947.70	$ -	100.00%	100.00%	
CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	55.30	-5.16	50.14	50.14		$ 130,345.99	$ 6,535,548.17	$ 672,585.33	90.67%	90.67%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	226.69	12.39	239.08	239.08		$ 126,224.49	$ 30,177,196.69	$ (1,563,366.10)	105.46%	105.46%	
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	17.44	76.23	93.67	93.67		$ 33,727.50	$ 3,159,254.93	$ (2,571,047.33)	537.10%	537.10%	
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M			39.00	39.00		$ 22,829.47	$ 890,349.34	$ (890,349.34)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M2	-	5.29	5.29	5.29		$ 62,023.52	$ 328,104.44	$ (328,104.44)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
WIN DE ALUMINIO	M	18.00	2.90	20.90	20.90		$ 15,372.99	$ 321,295.59	$ (44,581.68)	116.11%	116.11%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	131.00	(37.64)	93.36	93.36		$ 98,222.57	$ 9,170,059.56	$ 3,697,097.71	71.27%	71.27%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	11.73	-5.49	6.24	6.24		$ 1,127,900.21	$ 7,038,097.34	$ 6,192,172.18	53.20%	53.20%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	47.82	-8.24	39.58	40.99		$ 989,338.00	$ 40,552,909.59	$ 6,757,233.57	85.72%	85.72%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	1.80	0.30	1.50	1.50		$ 989,338.00	$ 1,484,007.00	$ 296,801.40	83.33%	83.33%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	3.00			3.00		$ 772,427.21	$ 2,317,281.62	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL BLANCO DE 2 CUERPOS CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA, DESCARGA SENCILLA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, BRIDA, ACOPLE Y VALVULA PLASTICA DE 1/2" PARA REGULACION DE PRESION. CONSUMO DE AGUA DE 4.8 LTS POR DESCARGA, CAPACIDAD MINIMA DE EVACUACION DE SOLIDOS 400 GRAMOS	UN	11.00			11.00		$ 1,117,185.66	$ 12,289,042.29	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, CON DOS PERSIANAS INFERIOR Y SUPERIOR DE 30CM X 60CM. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2			3.84	3.84		$ 798,362.30	$ 3,065,711.25	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	14.00			14.00		$ 404,611.28	$ 5,664,557.91	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M			102.46	102.46		$ 91,590.40	$ 9,384,352.28	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M			1.65	1.65		$ 78,726.73	$ 129,899.11	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M			24.00	24.00		$ 51,125.49	$ 1,227,011.85	$ -	100.00%	100.00%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1-1/2 "	UN	11.00			11.00		$ 18,869.86	$ 207,568.48	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1/2"	UN	28.00			28.00		$ 4,998.42	$ 139,955.63	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	14.00			14.00		$ 63,533.17	$ 889,464.33	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	14.00			14.00		$ 63,533.17	$ 889,464.33	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	7.20	0.56	7.76	7.76		$ 123,260.52	$ 956,501.65	$ (69,025.89)	107.78%	107.78%	
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	66.72	216.43	283.15	283.15		$ 20,236.50	$ 5,729,964.98	$ (4,379,785.70)	424.39%	424.39%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN			24.00	24.00		$ 33,569.66	$ 805,671.73	$ -	100.00%	100.00%	
PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	-		22.64	22.64		$ 32,026.28	$ 725,075.09	$ (725,075.09)	100.00%	100.00%	
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M			122.00	122.00		$ 32,026.28	$ 3,907,206.76	$ -	100.00%	100.00%	
PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN).	M2	176.38			176.38		$ 6,610.59	$ 1,165,975.86	$ -	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1,201.02			1,201.02		$ 4,663.84	$ 5,601,363.56	$ -	100.00%	100.00%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. FABIO SIMONELLI	**$ 245,187,661.00**				
CPF	**1918**	**IED**			**Estrella del Sur Sede B**			**SEMANA 43**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	557.28	20.48	577.76	577.76		$ 4,233.48	$ 2,445,932.98	$ (86,702.00)	103.67%	103.67%	
CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2").	M	88.20	-88.20	0.00	-		$ 154,730.98	$ -	$ (13,647,272.19)	0.00%	0.00%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	54.17			33.24		$ 33,174.37	$ 1,102,716.03	$ 694,339.54	61.36%	61.36%	
DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	95.99	-32.70	63.29	63.29		$ 29,391.49	$ 1,860,302.19	$ 960,987.18	65.94%	65.94%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	28.37					$ 707,267.02	$ -	$ 20,065,165.47	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON DOBLE ANTI MACHUCON, REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	25.81	6.00	31.81	35.81		$ 829,259.39	$ 29,695,861.74	$ (8,292,676.84)	138.75%	138.75%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1.43			1.43		$ 798,362.30	$ 1,145,011.22	$ (3,353.12)	100.29%	100.29%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO, CUERPOS FIJOS, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A DISEÑO SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	87.25			69.15		$ 467,649.33	$ 32,338,268.71	$ 8,464,135.19	79.26%	79.26%	

ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM	M	141.20			141.20		$ 9,408.62	$ 1,328,459.99	$ 37.63	100.00%	100.00%	
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	141.20			148.20		$ 22,829.47	$ 3,383,236.17	$ (159,714.97)	104.95%	104.95%	
PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M	141.20			148.20		$ 17,207.77	$ 2,550,122.76	$ (120,385.56)	104.95%	104.95%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	577.76			597.76		$ 4,663.84	$ 2,787,856.22	$ (93,276.77)	103.46%	103.46%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ESTRELLA DEL SUR - B	**$ 78,637,768.00**				
CPF	**1974**	**IED**			**CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)**			**SEMANA 43**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	538.32	-88.32	450.00	450.00		$ 4,233.48	$ 1,905,064.11	$ 373,901.00	83.59%	83.59%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5"anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	78.28	11.72	90.00	95.00		$ 31,137.23	$ 2,958,036.66	$ (520,614.00)	121.36%	121.36%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	538.32					$ 3,248.63	$ -	$ 1,748,804.00	0.00%	0.00%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	12.00	(1.00)	11.00	11.00		$ 7,469.97	$ 82,169.63	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M			5.00	5.00		$ 23,315.15	$ 116,575.73	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 2N°10 (F) + 1N°12 (T) AWG THHN	M			20.00	20.00		$ 20,790.98	$ 415,819.60	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES 50W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	1.00			1.00		$ 101,214.88	$ 101,214.88	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	M2	538.82	-134.52	404.30	408.30		$ 36,752.18	$ 15,005,915.99	$ 4,796,895.00	75.78%	75.78%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	1841.40	-941.87	899.53	902.53		$ 23,042.63	$ 20,796,663.05	$ 21,634,032.15	49.01%	49.01%	
CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	44.00			46.69		$ 130,345.99	$ 6,086,241.01	$ (351,017.24)	106.12%	106.12%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	633.15			632.63		$ 4,663.84	$ 2,950,473.25	$ 2,436.22	99.92%	99.92%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUAYA METÁLICA PARA CERCHA METÁLICA	M2	30.00			30.00		$ 37,696.55	$ 1,130,896.57	$ -	100.00%	100.00%	
FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2			87.00	87.00		$ 106,267.26	$ 9,245,251.44	$ (9,245,251.44)	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	KG	538.31	-538.31	0.00	-		$ 264,771.67	$ -	$ 142,529,236.49	0.00%	0.00%	

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 50 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR 50 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 24 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA LOS METROS CUADRADOS RALMENTE INSTALADOS)	KG	0.00	0.00	410.94	410.94		$ 306,692.25	$ 126,032,114.08	$ (126,032,114.08)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. CALASANZ BUENA VISTA							**$ 186,826,436.00**				
CPF	**546**	**IED**			**SANTA LIBRADA (IED)**			**SEMANA 43**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	557.28			557.28		$ 4,233.48	$ 2,359,231.39	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5"anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	128.18	-78.18	50.00	50.00		$ 31,110.25	$ 1,555,512.30	$ 2,432,199.03	39.01%	39.01%	
CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	65.03	-39.70	25.33	25.33		$ 15,633.37	$ 395,993.28	$ 620,644.82	38.95%	38.95%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	67.90		0.80	0.80		$ 32,594.26	$ 26,075.40	$ 2,187,074.58	1.18%	1.18%	
PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	27.20			13.34		$ 21,844.63	$ 291,407.33	$ 302,766.53	49.04%	49.04%	
PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	372.13			371.00		$ 13,385.77	$ 4,966,120.74	$ 15,125.92	99.70%	99.70%	
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M			18.00	18.00		$ 22,829.47	$ 410,930.46	$ (410,930.46)	100.00%	100.00%	
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	63.87	28.85	92.72	92.72		$ 34,724.48	$ 3,219,654.24	$ (1,001,801.39)	145.17%	145.17%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2			73.27	73.27		$ 36,752.18	$ 2,692,832.39	$ -	100.00%	100.00%	
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	16.47	(16.47)	-			$ 18,044.21	$ -	$ -	0.00%	0.00%	
DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	194.87			194.87		$ 9,443.70	$ 1,840,293.82	$ 1,840,293.82	100.00%	100.00%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	59.96			59.96		$ 91,988.38	$ 5,515,765.80	$ 5,515,765.80	100.00%	100.00%	
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	100.00	(20.61)	79.39	79.39		$ 53,568.71	$ 4,252,820.18	$ 4,252,820.18	79.39%	79.39%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M	63.33			13.44		$ 91,988.38	$ 1,236,323.87	$ 1,236,323.87	21.22%	21.22%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	281.83	(180.01)	96.22	96.22		$ 45,289.29	$ 4,357,735.20	$ 4,357,735.20	34.14%	34.14%	

RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INLUYE REFUERZO).	M2			12.54	12.54		$ 193,996.53	$ 2,432,716.52	$ 2,432,716.52	100.00%	100.00%	
PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 M (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE}	M2	333.93	-143.06	190.87	190.87		$ 69,679.67	$ 13,299,757.83	$ 13,299,757.83	57.16%	57.16%	
MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	208.04			205.00		$ 25,122.94	$ 5,150,202.74	$ 5,150,202.74	98.54%	98.54%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M			19.35	19.35		$ 91,590.40	$ 1,772,274.22	$ 1,772,274.22	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M			8.10	8.10		$ 78,726.73	$ 637,686.52	$ 637,686.52	100.00%	100.00%	
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M	19.60			13.44		$ 62,023.52	$ 833,596.15	$ 833,596.15	68.57%	68.57%	
Demolición de Materas en concreto o fibrocemento 1.2x1.2x0.3 m y 1x0.7x0.7 m	M	48.00			44.00		$ 16,863.75	$ 742,005.00	$ 742,005.00	91.67%	91.67%	
TRATAMIENTO DE PISOS EN LADRILLO O ADOQUIN: LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS y REEMBOQUILLADO DE JUNTAS, (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN,	M	110.00	69.08	179.08	179.08		$ 16,863.75	$ 3,019,960.35	$ 3,019,960.35	162.80%	162.80%	#####
JUNTA DE DILATACIÓN INDUCIDA PISO EN CONCRETO ALLANADO (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, MARCACIÓN DE DILATACIONES Y SELLADO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN).	M	356.60	-300.35	56.25	59.92		$ 34,369.67	$ 2,059,599.55	$ 2,059,599.55	16.80%	16.80%	
CANAL EN PVC AMAZONAS O EQUIVALENTE, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	6.00	(6.00)	-	-		$ 68,114.71	$ -	$ -	0.00%	0.00%	
DOMO EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 5 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	7.20	-1.32	5.88	5.88		$ 157,817.72	$ 927,968.18	$ 927,968.18	81.67%	81.67%	
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	67.71			67.71		$ 5,565.04	$ 376,808.69	$ 376,808.69	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CERCHA PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 4.5 KG/M	M	6.00	-0.12	5.88	5.88		$ 101,978.47	$ 599,633.40	$ 599,633.40	98.00%	98.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M			20.20	20.20		$ 305,515.84	$ 6,171,419.91	$ 6,171,419.91	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	335.60	(23.61)	315.08	315.08		$ 361,355.09	$ 113,857,372.13	$ 113,857,372.13	93.89%	93.89%	
PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2			96.73	96.73		$ 65,757.83	$ 6,360,755.11	$ 6,360,755.11	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	M2			190.00	190.00		$ 11,730.42	$ 2,228,757.19	$ 2,228,757.19	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN			8.00	8.00		$ 33,502.20	$ 268,017.60	$ 268,017.60	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TIERRA NEGRA ABONADA, INCLUYE CONFORMACIÓN DE TERRENO Y COMPACTACIÓN MANUAL DE TIERRA.	M3			37.42	37.42		$ 258,201.55	$ 9,661,902.03	$ 9,661,902.03	100.00%	100.00%	
SUMNINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN EN PASTO KIKUYO	M2			190.84	200.84		$ 29,001.60	$ 5,824,681.89	$ 5,824,681.89	105.24%	105.24%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ZANJA DE 0.3 X 0.3 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000, GRAVA 3/4" Y PASES PVC LONGITUD MAX 0.3 M CADA 3 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	130.00			130.00		$ 89,213.28	$ 11,597,727.02	$ 11,597,727.02	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	617.33			617.33	30.87	$ 4,663.84	$ 2,879,127.54	$ 2,879,127.54	100.00%	100.00%	
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. SANTA LIBRADA							**$ 223,822,666.00**				

CPF	1917	IED			ESTRELLA DEL SUR (IED) A			SEMANA 43				
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	20.56			20.56		$ 4,233.48	$ 87,040.26	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	40.30	-31.81	8.49	8.49		$ 31,110.25	$ 264,138.88	$ 989,604.00	21.07%	21.07%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19.52	-2.22	17.30	17.30		$ 32,594.26	$ 563,880.63	$ 72,359.00	88.63%	88.63%	
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19.52	-5.96	13.56	13.56		$ 22,300.62	$ 302,396.45	$ 132,912.00	69.47%	69.47%	
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	40.65	(2.49)	38.16	38.16		$ 12,649.16	$ 482,692.01	$ 31,496.00	93.87%	93.87%	
DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19.52	-4.52	15.00	15.00		$ 20,708.69	$ 310,630.28	$ 93,603.00	76.84%	76.84%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	11.36	-5.02	6.34	6.34		$ 33,174.37	$ 210,325.50	$ 166,535.00	55.81%	55.81%	
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	15.00			15.00		$ 27,281.50	$ 409,222.50	$ -	100.00%	100.00%	
SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	15.00			15.00		$ 182,479.27	$ 2,737,188.99	$ -	100.00%	100.00%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	19.52			19.52		$ 42,650.45	$ 832,536.73	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	19.52	(1.99)	17.53	17.53		$ 126,224.49	$ 2,212,715.38	$ 251,187.00	89.81%	89.81%	
MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2	0.80			0.80		$ 67,218.91	$ 53,775.13	$ -	100.00%	100.00%	
WIN DE ALUMINIO	M	3.00			3.00		$ 15,372.99	$ 46,118.98	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	44.84			40.81		$ 116,158.86	$ 4,740,210.72	$ 468,353.00	91.01%	91.01%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	2.00			2.00		$ 41,130.01	$ 82,260.02	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	5.20			5.20		$ 707,267.02	$ 3,677,788.50	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	2.16	0.12	2.28	2.38		$ 1,127,967.67	$ 2,680,941.73	$ (244,532.00)	110.04%	110.04%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	7.00	1.00	8.00	8.00		$ 873,470.75	$ 6,987,765.98	$ (873,471.00)	114.29%	114.29%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2.00			2.00		$ 616,820.66	$ 1,233,641.32	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	5.00			5.00		$ 404,611.28	$ 2,023,056.40	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	2.00			2.00		$ 41,130.01	$ 82,260.02	$ -	100.00%	100.00%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	28.82	12.82	41.64	42.64		$ 989,338.20	$ 42,185,380.90	$ (13,672,654.00)	147.95%	147.95%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	1.80	(0.80)	1.00	1.00		$ 989,338.20	$ 989,338.20	$ 791,471.00	55.56%	55.56%	
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	44.84			40.81		$ 36,193.65	$ 1,476,990.67	$ 145,933.00	91.01%	91.01%	
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	35.50			35.10		$ 21,599.09	$ 758,128.09	$ 8,640.00	98.87%	98.87%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	2.16			2.16		$ 123,260.52	$ 266,242.73	$ -	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	111.32			100.19		$ 4,663.84	$ 467,270.00	$ 51,909.00	90.00%	90.00%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ESTRELLA DEL SUR - A	**$ 76,163,937.00**				
CPF	**1959**	**IED**			**GUILLERMO CANO ISAZA (IED)**			**SEMANA 43**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	125.48			125.48		$ 4,233.48	$ 531,216.54	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	68.00			32.20		$ 31,110.25	$ 1,001,749.92	$ 1,113,747.00	47.35%	47.35%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	129.54	18.57	148.11	148.11		$ 32,594.26	$ 4,827,535.26	$ (605,275.00)	114.34%	114.34%	
DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	150.00			150.00		$ 11,376.96	$ 1,706,544.05	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	40.00			40.00		$ 7,469.97	$ 298,798.67	$ -	100.00%	100.00%	
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	100.00			100.00		$ 18,687.73	$ 1,868,773.32	$ -	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	95.87	17.32	113.19	113.19		$ 22,300.62	$ 2,524,207.52	$ (386,247.00)	118.07%	118.07%	
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	364.26	(31.38)	332.88	364.26		$ 12,649.16	$ 4,607,583.60	$ -	100.00%	100.00%	
MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2	7.20	3.16	10.36	10.20		$ 65,869.81	$ 671,872.04	$ (197,609.00)	141.67%	141.67%	
DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND	22.00	37.00	59.00	37.00		$ 20,708.69	$ 766,221.35	$ (310,630.00)	168.18%	168.18%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	26.61			26.11		$ 33,174.37	$ 866,182.77	$ 16,587.00	98.12%	98.12%	
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	78.00			53.00		$ 27,281.50	$ 1,445,919.51	$ 682,038.00	67.95%	67.95%	
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M			15.00	15.00		$ 20,708.69	$ 310,630.28	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M			19.00	19.00		$ 11,967.87	$ 227,389.46	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN			16.00	16.00		$ 7,469.97	$ 119,519.47	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M			58.00	58.00		$ 4,391.32	$ 254,696.59	$ -	100.00%	100.00%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	35.00	118.18	153.18	153.18		$ 61,099.39	$ 9,359,204.54	$ (7,220,726.00)	437.66%	437.66%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	129.54	30.05	159.59	159.59		$ 126,224.49	$ 20,144,167.03	$ (3,793,046.00)	123.20%	123.20%	
WIN DE ALUMINIO	M	30.00	52.83	82.83	55.00		$ 15,372.99	$ 845,514.70	$ (384,325.00)	183.33%	183.33%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISIÓN POR MÓDULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM	M	7.20	16.32	23.52	23.52		$ 1,128,300.90	$ 26,537,637.11	$ (18,413,871.00)	326.67%	326.67%	
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	364.26			364.26		$ 36,193.65	$ 13,183,900.70	$ -	100.00%	100.00%	
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	119.96	(45.93)	74.03	68.55	9.45	$ 21,599.09	$ 1,480,617.69	$ 1,110,409.00	57.14%	57.14%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	135.38			135.38		$ 989,338.20	$ 133,939,109.55	$ (2,504.00)	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1-1/2 "	UN	37.00			37.00		$ 18,869.86	$ 698,184.88	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	37.00			37.00		$ 63,533.17	$ 2,350,727.15	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	22.00	7.00	29.00	29.00		$ 63,533.17	$ 1,842,461.82	$ (444,732.00)	131.82%	131.82%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	UN	37.00			37.00		$ 181,838.44	$ 6,728,022.41	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN	38.00			38.00		$ 97,295.74	$ 3,697,238.23	$ -	100.00%	100.00%	
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	22.00			22.00		$ 5,565.04	$ 122,430.83	$ -	100.00%	100.00%	
ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE EN CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	74.03	-30.18	43.85	43.85	22.79	$ 13,044.45	$ 571,999.04	$ 393,681.00	59.23%	59.23%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	20.88			20.88		$ 123,260.52	$ 2,573,679.69	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN			13.00	6.00		$ 192,677.11	$ 1,156,062.68	$ (1,156,063.00)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	3.00			3.00		$ 572,567.48	$ 1,717,702.45	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	50.00	56.00	106.00	90.00		$ 23,315.15	$ 2,098,363.16	$ (932,606.00)	180.00%	180.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	50.00	56.00	106.00	90.00		$ 20,790.98	$ 1,871,188.21	$ (831,639.00)	180.00%	180.00%	
PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	36.90			36.90		$ 21,844.63	$ 806,066.74	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	32.00			34.00		$ 180,330.15	$ 6,131,225.09	$ (360,660.00)	106.25%	106.25%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	24.00			24.00		$ 198,607.76	$ 4,766,586.16	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	20.00			8.00		$ 180,330.15	$ 1,442,641.20	$ 2,163,962.00	40.00%	40.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	5.40	0.60	6.00	5.00		$ 989,338.20	$ 4,946,691.01	$ 395,735.00	92.59%	92.59%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	12.00			10.00		$ 772,427.21	$ 7,724,272.05	$ 1,544,854.00	83.33%	83.33%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	12.00			5.00		$ 41,130.01	$ 205,650.06	$ 287,910.00	41.67%	41.67%	


SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL BLANCO DE 2 CUERPOS CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA, DESCARGA SENCILLA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, BRIDA, ACOPLE Y VALVULA PLASTICA DE 1/2 PARA REGULACION DE PRESION. CONSUMO DE AGUA DE 4.8 LTS POR DESCARGA, CAPACIDAD MINIMA DE EVACUACION DE SOLIDOS 400 GRAMOS	UN	45.00	-8.00	37.00	37.00		$ 1,117,185.66	$ 41,335,869.52	$ 8,937,485.00	82.22%	82.22%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	m2	364.26	(24.03)	340.23	340.23		$ 98,222.57	$ 33,418,266.56	$ 2,360,288.00	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	m2	205.61			139.29		$ 4,663.84	$ 649,626.09	$ 309,306.00	67.74%	67.74%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. GUILLERMO CANO ISAZA	**$ 354,373,946.66**				
CPF	**548**	**IED**			**TENERIFE - GRANADA SUR (IED)**			**SEMANA 43**				**Observ**
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	193.00	41.34	234.34	234.34		$ 4,233.48	$ 992,072.72	$ (175,012.00)	121.42%	121.42%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	39.00			26.00		$ 31,110.25	$ 808,866.40	$ 404,433.00	66.67%	66.67%	
TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	24.83	65.79	90.62	90.62		$ 38,696.24	$ 3,506,652.84	$ (2,545,825.00)	364.96%	364.96%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	44.28	25.88	70.16	55.16		$ 361,355.09	$ 19,932,346.54	$ (3,931,543.00)	124.57%	124.57%	
PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	44.28	25.88	70.16	70.16		$ 65,757.83	$ 4,613,569.51	$ (1,701,813.00)	158.45%	158.45%	
PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	412.00	(366.94)	45.06	45.06		$ 32,026.28	$ 1,443,104.40	$ 11,751,725.00	10.94%	10.94%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA DE 1-1/4" PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR CON SOPORTES PLÁSTICO. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS	M	43.00	-7.64	35.36	30.36		$ 190,851.78	$ 5,794,260.06	$ 2,412,367.00	70.60%	70.60%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA, EL TUBO PASAMANOS DE 2" CALIBRE 18 AL IGUAL QUE LOS TUBOS PEDESTALES CON PLATINA DE FIJACIÓN Y TRAVESAÑOS VERTICALES EN TUBERÍA DE 3/4" CON SEPARACIÓN CADA 9CM, PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS.	M	5.50	(0.80)	4.70	4.70		$ 1,120,163.13	$ 5,264,766.69	$ 896,131.00	85.45%	85.45%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	964.27	(570.86)	393.41	393.41		$ 4,663.84	$ 1,834,783.56	$ 2,662,416.00	40.80%	40.80%	
SUMINISTRO E INSTALACION MEMBRANA PVC PLASTIFICADO SIKAPLAN 15 PR O SIMILAR	M3	150.00	(15.20)	134.80	116.77		$ 383,249.63	$ 44,750,287.29	$ 12,737,157.00	77.84%	77.84%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. TENERIFE GRANADA SUR	**$ 88,940,710.00**				
CPF	**545**	**IED**			**CIUDAD DE VILLAVICENCIO (IED)**			**SEMANA 43**				**Observ**
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	540.76			540.76		$ 4,233.48	$ 2,289,294.37	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M)	M	35.00			35.00		$ 31,110.25	$ 1,088,858.61	$ -	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	107.30		-	307.00		$ 69,099.55	$ 21,213,562.74	$ (13,799,181.00)	286.11%	286.11%	
DEMOLICION DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	361.42			361.42		$ 69,099.55	$ 24,973,960.41	$ -	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN Y/O DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE COMPUESTO POR MALLA ESLABONADA, ANTEPECHO EN LADRILLO, VIGA DE CIMENTACIÓN Y COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO	M2	120.00			120.00		$ 108,358.36	$ 13,003,003.55	$ -	100.00%	100.00%	


EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	37.24			36.65		$ 91,988.38	$ 3,371,374.26	$ 54,273.00	98.42%	98.42%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	22.04			32.04		$ 176,060.25	$ 5,640,970.35	$ (1,760,602.00)	145.37%	145.37%	
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	9.00	(1.00)	8.00	8.00		$ 875,947.70	$ 7,007,581.56	$ 875,948.00	88.89%	88.89%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL REFORZADO EN MALLA PREONDULADA CALIBRE 8 HUECO 2", ÁNGULO 1" X 1/8" PISA MALLA EN ÁNGULO DE 3/4" X 1/4", PARALES DE 2 1/2" X 2 1/2" EN 3 MM CON SUJETADORES DE VARILLA DE 5/8" Y REFUERZOS DIAGONALES EN PLATINA DE 1-1/2"* 1/8" (INCLUYE TODOS LOS INSUMOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE)	M2	120.00			120.00		$ 503,048.36	$ 60,365,803.28	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CÁRCAMO EN CONCRETO (25 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR.	M	9.00	1.50	10.50	12.50		$ 320,598.77	$ 4,007,484.69	$ (1,122,096.00)	138.89%	138.89%	
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	m3	94.84			93.39		$ 34,724.48	$ 3,242,919.64	$ 50,351.00	98.47%	98.47%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ZANJA DE 0.3 X 0.3 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000, GRAVA 3/4" Y PASES PVC LONGITUD MAX 0.3 M CADA 3 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	54.00			57.40		$ 89,213.28	$ 5,120,842.55	$ (303,325.00)	106.30%	106.30%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	M2	25.00			25.00		$ 11,730.42	$ 293,260.61	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	45.00	20.35	65.35	85.35		$ 91,590.40	$ 7,817,240.55	$ (3,695,673.00)	189.67%	189.67%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	767.00	75.00	842.00	842.00		$ 7,103.01	$ 5,980,735.68	$ (532,726.00)	109.78%	109.78%	
DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE COMPUESTO POR MALLA ESLABONADA Y PARAL EN PERFIL DE ACERO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2			116.85	136.85		$ 62,810.05	$ 8,595,555.16	$ (1,256,201.00)	117.12%	117.12%	
PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2	373.66			378.66	209.90	$ 115,264.41	$ 43,646,019.90	$ (576,322.00)	101.34%	101.34%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 6" INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE RELLENO)	M	68.00			68.00		$ 141,729.70	$ 9,637,619.63	$ -	100.00%	100.00%	
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. TENERIFE GRANADA SUR							**$ 227,296,087.56**				

PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA		**95.45%**
ACUMULADO EJECUTADO A LA FECHA	**$**	**2,556,783,652.22**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**2,678,619,155.00**


AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS POR SEDE - Septiembre 06 2026						
SEDE EDUCATIVA	PROGRAMADO ACUMULADO		EJECUTADO ACUMULADO		TOTAL POR SEDE	% DE ADELANTO O ATRASO
ORLANDO FALS BORDA	$ 156,929,148.00	100.00%	$ 156,929,147.99	100.00%	$ 156,929,148.00	ENTREGADO
UNION EUROPEA	$ 169,766,274.00	100.00%	$ 169,766,274.00	100.00%	$ 169,766,274.00	ENTREGADO
SIERRA MORENA	$ 118,699,548.00	100.00%	$ 118,699,548.00	100.00%	$ 118,699,548.00	ENTREGADO
FABIO LOZANO	$ 245,187,661.00	100.00%	$ 245,187,661.00	100.00%	$ 245,187,661.00	ENTREGADO
ARBORIZADORA BAJA	$ 630,139,470.00	100.00%	$ 630,139,470.00	100.00%	$ 630,139,470.00	ENTREGADO
BUENAVISTA	$ 186,826,436.00	100.00%	$ 186,826,436.00	100.00%	$ 186,826,436.00	ENTREGADO
ESTRELLA DEL SUR - B	$ 78,637,768.00	100.00%	$ 78,637,768.00	100.00%	$ 78,637,768.00	ENTREGADO
SANTA LIBRADA	$ 223,822,666.00	100.00%	$ 223,822,666.00	100.00%	$ 223,822,666.00	0.00%
ESTRELLA DEL SUR - A	$ 76,163,937.00	100.00%	$ 76,163,937.00	100.00%	$ 76,163,937.00	ENTREGADO
TENERIFE GRANADA SUR SEDE A	$ 88,940,710.00	100.00%	$ 88,940,710.00	100.00%	$ 88,940,710.00	ENTREGADO
GUILLERMO CANO ISAZA SEDE A	$ 354,505,537.00	100.00%	$ 354,373,946.66	99.96%	$ 354,505,537.00	-0.04%
CIUDAD DE VILLAVICENCIO	$ 224,222,222.22	64.25%	$ 227,296,087.56	65.13%	$ 349,000,000.00	0.88%
TOTALES	**$ 2,553,841,377.22**	**95.34%**	**$ 2,556,783,652.22**	**95.45%**	**$ 2,678,619,155.00**	0.11%

OBSERVACIONES: Al final de la presente semana, como aparece consignado en la tabla anterior, encontramos que en la ***IED Guillermo Cano Isaza*** se encuentra practicamente nivelada la ejecución con la programación, mientras que la ***IED Ciudad de Villavicencio*** presenta un adelanto cercano al 1%. El contrato en general presenta un adelanto del 0.11%.

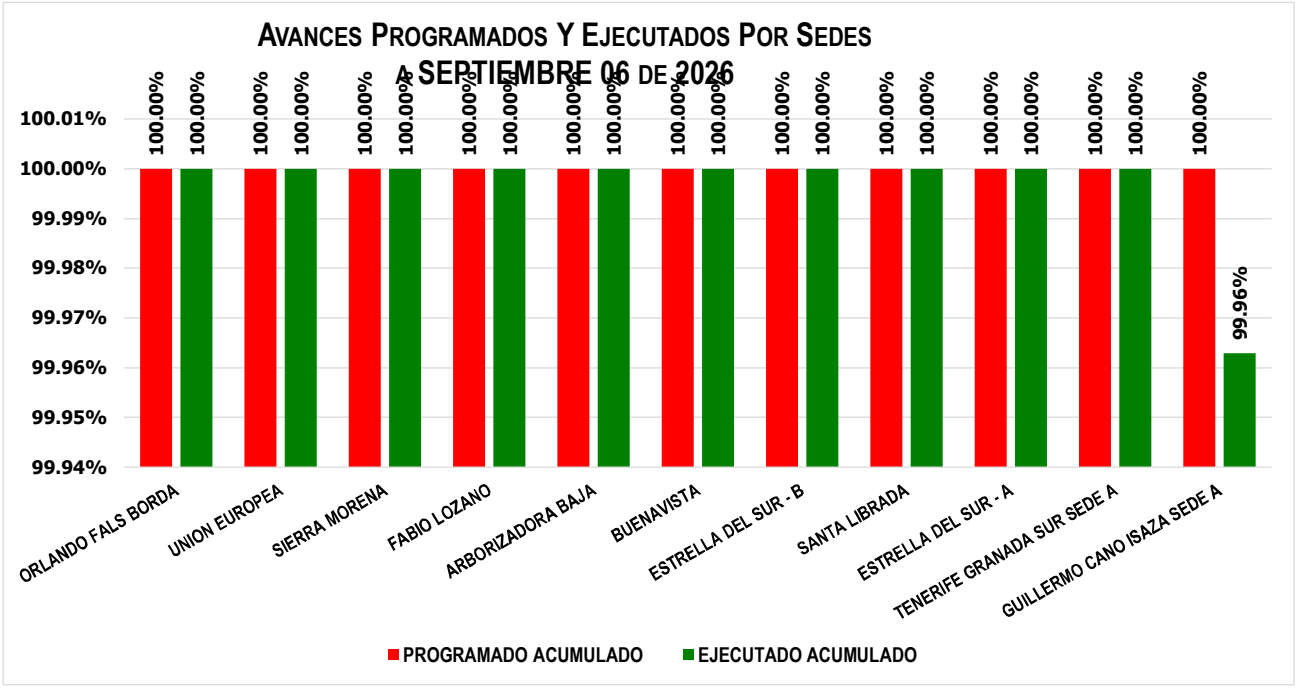

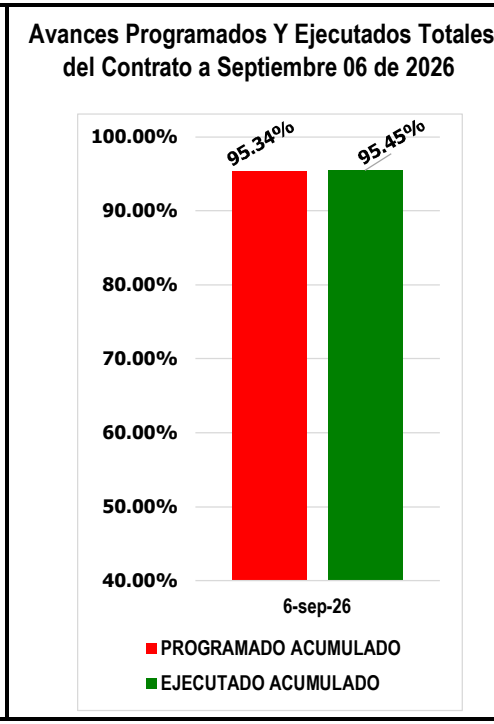

AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS TOTALES - Septiembre 06 2026

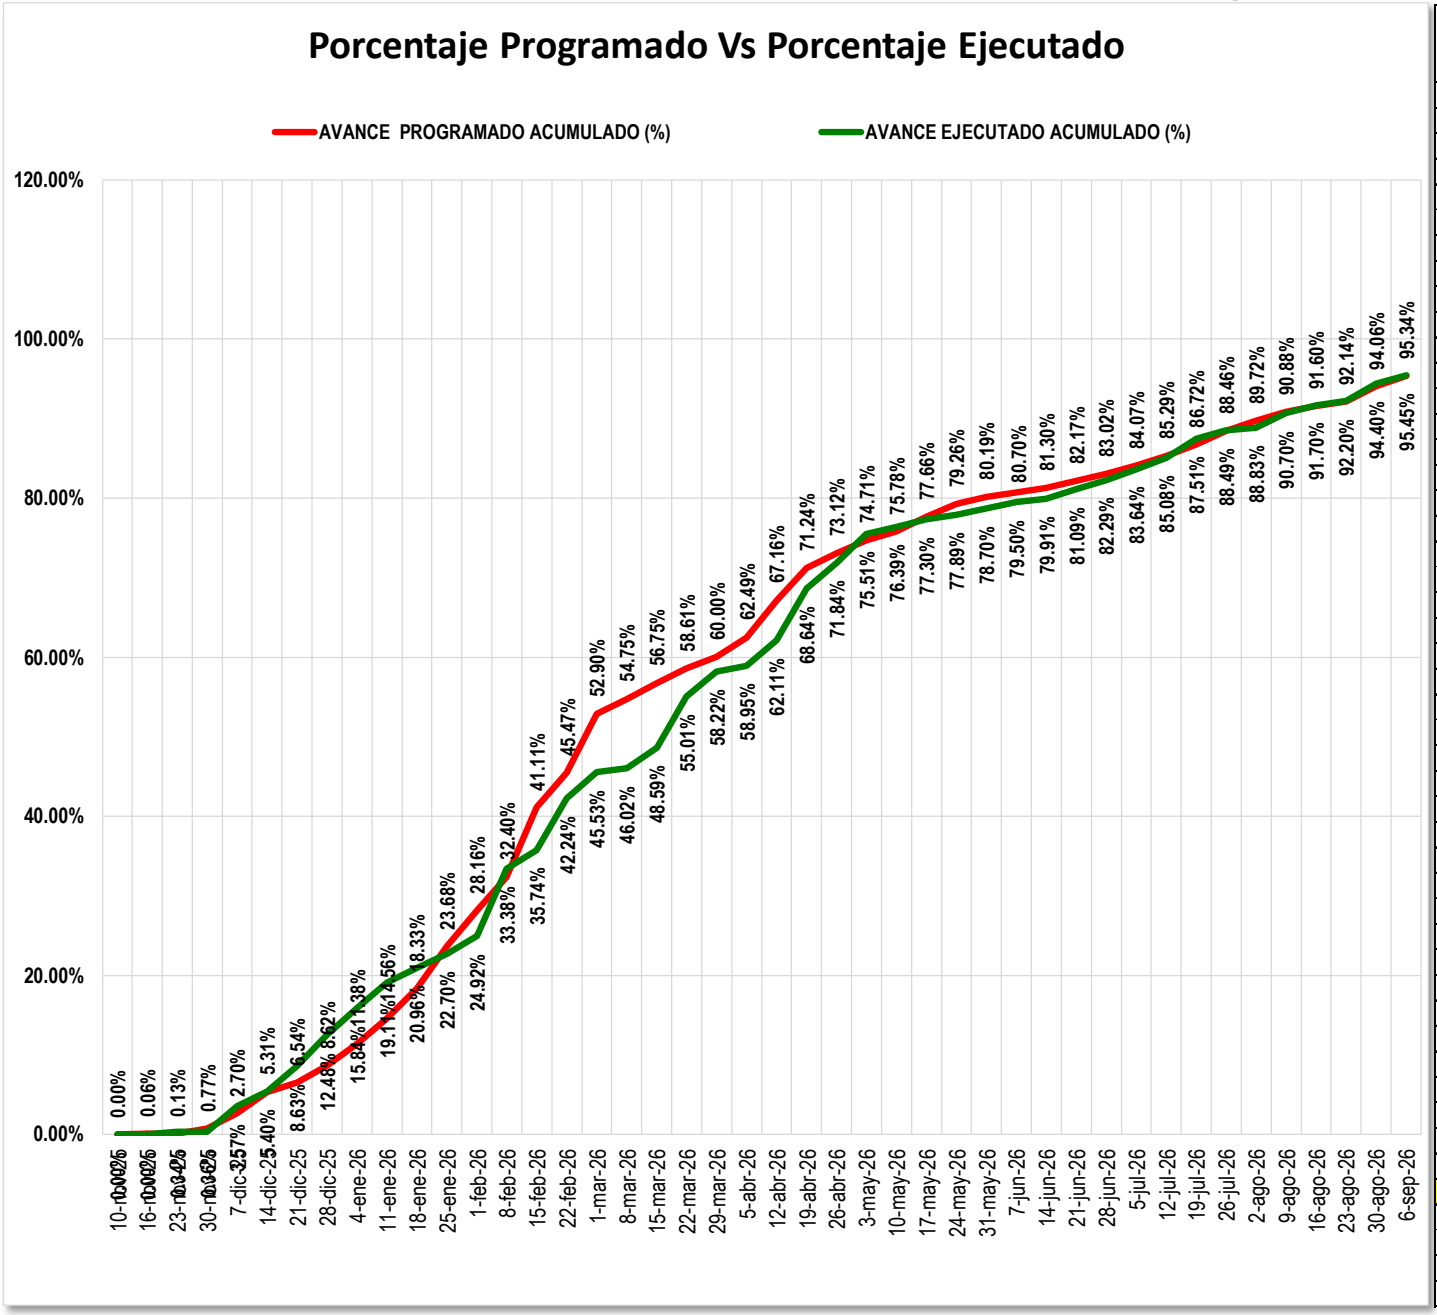

FECHA	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (%)	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO (%)
10-nov-25	0.00%	0.00%
16-nov-25	0.06%	0.00%
23-nov-25	0.13%	0.34%
30-nov-25	0.77%	0.36%
7-dic-25	2.70%	3.57%
14-dic-25	5.31%	5.40%
21-dic-25	6.54%	8.63%
28-dic-25	8.62%	12.48%
4-ene-26	11.38%	15.84%
11-ene-26	14.56%	19.11%
18-ene-26	18.33%	20.96%
25-ene-26	23.68%	22.70%
1-feb-26	28.16%	24.92%
8-feb-26	32.40%	33.38%
15-feb-26	41.11%	35.74%
22-feb-26	45.47%	42.24%
1-mar-26	52.90%	45.53%
8-mar-26	54.75%	46.02%
15-mar-26	56.75%	48.59%
22-mar-26	58.61%	55.01%
29-mar-26	60.00%	58.22%
5-abr-26	62.49%	58.95%
12-abr-26	67.16%	62.11%
19-abr-26	71.24%	68.64%
26-abr-26	73.12%	71.84%
3-may-26	74.71%	75.51%
10-may-26	75.78%	76.39%
17-may-26	77.66%	77.30%
24-may-26	79.26%	77.89%
31-may-26	80.19%	78.70%
7-jun-26	80.70%	79.50%
14-jun-26	81.30%	79.91%
21-jun-26	82.17%	81.09%
28-jun-26	83.02%	82.29%
5-jul-26	84.07%	83.64%
12-jul-26	85.29%	85.08%
19-jul-26	86.72%	87.51%
26-jul-26	88.46%	88.49%
2-ago-26	89.72%	88.83%
9-ago-26	90.88%	90.70%
16-ago-26	91.60%	91.70%
23-ago-26	92.14%	92.20%
30-ago-26	94.06%	94.40%
6-sep-26	**95.34%**	**95.45%**
13-sep-26	96.63%	0.00%
20-sep-26	97.80%	0.00%
27-sep-26	98.90%	0.00%
30-sep-26	100.00%	0.00%

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

CONTRATO CO1.PCCNTR.8154780 - LOTE No. 6

COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE SEDE A

OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

VALOR PRESUPUESTO PRELIMINAR

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	52.03	$ 3,138.00	$ 163,264.00
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	14.00	$ 23,060.00	$ 322,840.00
1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	30.00	$ 2,408.00	$ 72,240.00
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	36.28	$ 24,160.00	$ 876,476.00
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	24.12	$ 16,530.00	$ 398,694.00
1.2.12	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	71.34	$ 20,391.00	$ 1,454,694.00
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	44.18	$ 9,376.00	$ 414,196.00
1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	19.00	$ 15,350.00	$ 291,650.00
1.2.17	DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	28.00	$ 19,852.00	$ 555,856.00
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	7.56	$ 24,590.00	$ 185,979.00
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	22.00	$ 20,222.00	$ 444,884.00
1.2.21	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	34.00	$ 15,350.00	$ 521,900.00
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	36.31	$ 27,242.00	$ 989,266.00
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	7.00	$ 8,871.00	$ 62,097.00
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	8.00	$ 5,537.00	$ 44,296.00
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	8.00	$ 3,255.00	$ 26,040.00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

CONTRATO CO1.PCCNTR.8154780 - LOTE No. 6

COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE SEDE A

OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

VALOR PRESUPUESTO PRELIMINAR

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.3.1	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE SOLDADURAS, REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE DE ACABADO)	M2	14.46	$ 39,921.00	$ 577,258.00
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	50.00	$ 16,192.00	$ 809,600.00
1.4.2	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	50.00	$ 13,852.00	$ 692,600.00
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	100.00	$ 11,588.00	$ 1,158,800.00
2.3.8	PERFORACIÓN NÚCLEO 4" E= 0.10 M	UN	2.00	$ 123,751.00	$ 247,502.00
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	570.55	$ 17,080.00	$ 9,745,028.00
3.1.4	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	19.20	$ 108,319.00	$ 2,079,725.00
3.1.7	PAÑETE LISO 1:3 SOBRE MUROS EN AREA DE CULATAS (HASTA 30 CM). INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	M	18.00	$ 11,346.00	$ 204,228.00
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	35.00	$ 67,890.00	$ 2,376,150.00
4.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	UN	12.00	$ 30,208.00	$ 362,496.00
4.2.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 4" INCLUYE ACCESORIOS	UN	3.00	$ 137,028.00	$ 411,084.00
4.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1-1/2 "	UN	17.00	$ 13,987.00	$ 237,779.00
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	17.00	$ 47,093.00	$ 800,581.00
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	9.00	$ 47,093.00	$ 423,837.00
4.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	UN	9.00	$ 134,785.00	$ 1,213,065.00
4.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN	9.00	$ 72,119.00	$ 649,071.00
4.6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 3/4"	UN	4.00	$ 60,308.00	$ 241,232.00
4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	17.00	$ 4,125.00	$ 70,125.00
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2.00	$ 94,067.00	$ 188,134.00
5.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2.00	$ 142,819.00	$ 285,638.00
5.1.7	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2.00	$ 188,067.00	$ 376,134.00
5.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	2.00	$ 424,407.00	$ 848,814.00
5.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN	2.00	$ 21,737.00	$ 43,474.00
5.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 3X30A 10 KA	UN	1.00	$ 136,773.00	$ 136,773.00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

CONTRATO CO1.PCCNTR.8154780 - LOTE No. 6

COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE SEDE A

OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

VALOR PRESUPUESTO PRELIMINAR

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	100.00	$ 17,282.00	$ 1,728,200.00
5.1.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	10.00	$ 24,980.00	$ 249,800.00
5.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	104.00	$ 11,912.00	$ 1,238,848.00
5.1.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	40.00	$ 15,411.00	$ 616,440.00
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	10.00	$ 133,667.00	$ 1,336,670.00
5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	10.00	$ 147,215.00	$ 1,472,150.00
5.1.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL TOTALIZADOR 3X125 A. MATERIALES CERTIFICADOS RETIE E INSTALADOS SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UN	2.00	$ 579,624.00	$ 1,159,248.00
5.1.49	ACOMETIDA TRIFASICA EN 4#8 + 1#10 CABLE LIBRE DE HALOGENOS. INCLUYE CONECTORES TUBULARES Y AISLAMIENTO AUTOFUNDENTE INCLUYE MANIOBRAS DE CANALIZACIÓN	M	60.00	$ 42,827.00	$ 2,569,620.00
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	40.37	$ 33,570.00	$ 1,355,288.00
7.2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	40.37	$ 93,562.00	$ 3,777,285.00
7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	12.00	$ 11,395.00	$ 136,740.00
7.2.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	70.47	$ 72,806.00	$ 5,130,879.00
9.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS EN ALUMINIO TIPO PERSIANA	M2	1.96	$ 554,909.00	$ 1,087,622.00
10.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	8.00	$ 647,447.00	$ 5,179,576.00
10.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2.00	$ 457,209.00	$ 914,418.00
10.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISIÓN POR MÓDULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM	M	8.67	$ 836,336.00	$ 7,251,033.00
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	10.00	$ 299,912.00	$ 2,999,120.00
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	4.00	$ 30,487.00	$ 121,948.00
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	2.00	$ 24,883.00	$ 49,766.00
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	26.52	$ 733,332.00	$ 19,449,725.00
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	1.00	$ 733,332.00	$ 733,332.00
12.1.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	70.47	$ 26,828.00	$ 1,890,658.00
12.1.10	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE EN CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	24.64	$ 9,669.00	$ 238,244.00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

CONTRATO CO1.PCCNTR.8154780 - LOTE No. 6

COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE SEDE A

OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

VALOR PRESUPUESTO PRELIMINAR

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	34.85	$ 16,010.00	$ 557,993.00
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	11.84	$ 23,739.00	$ 280,994.00
14.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	10.80	$ 91,365.00	$ 986,742.00
15.1.11	SUMNINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO 50 MM FILTRO UV. INCLUYE RELLENO EN CAUCHO GRANULAR.	M2	39.11	$ 203,794.00	$ 7,970,383.00
16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	7.00	$ 78,769.00	$ 551,383.00
16.1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	97.03	$ 196,258.00	$ 19,042,914.00
16.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M	14.00	$ 226,459.00	$ 3,170,426.00
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	83.04	$ 3,457.00	$ 287,072.00
18.1.4	PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN).	M2	23.61	$ 5,315.00	$ 125,487.00
NP-19	DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE COMPUESTO POR MALLA ESLABONADA Y PARAL EN PERFIL DE ACERO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	28.92	$ 46,557.00	$ 1,346,428.00

SUB-TOTAL MANTENIMIENTOS	**$ 126,009,932.00**
SUB-TTOTAL EMERGENCIAS	**$ -**
TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 126,009,932.00**

		DESCRIPCION	PORCENTAJE	
		ADMINISTRACIÓN	28.91%	**$ 36,429,471.00**
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación están en porcentaje (%).		IMPREVISTO	1.00%	**$ 1,260,099.00**
		UTILIDAD	5.00%	**$ 6,300,497.00**
	SUB-TOTAL COSTOS INDIRECTOS	TOTAL A.I.U	34.91%	**$ 43,990,068.00**
	TOTAL PROYECTO (costos directos + AIU)			**$ 170,000,000.00**

WILSON LEONARDO PARRA ROBLES
DIRECTOR OBRA - CONSORCIO PAIS
CONSTRUCTOR

HÉCTOR VILLAZÓN GUTIÉRREZ
DIRECTOR CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO
INTERVENTORIA

VISITA DE INSPECCIÓN EMERGENCIA
CONSORCIO PAIS

INFORME PRELIMINAR Y DE DIAGNOSTICO

CONTRATO SED-8154780-2025-L6

OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

CPF	COLEGIO	SEDE		NOMBRE SEDE	TOTAL COSTO
1943	RAFAEL URIBE URIBE	A		RAFAEL URIBE URIBE	$ 170,000,000.00
ALCANCE ESPECIFICO		1. Adecuación integral de las baterías sanitarias de niños y niñas del bloque de Preescolar (Ciclo I),			
		2. Cambio de cubierta y adecuación de instalaciones eléctricas asociadas a las baterías sanitarias del bloque de Preescolar (Ciclo I).			

REGISTRO FOTOGRAFICO:




ESTADO ACTUAL DE LA SEDE

De acuerdo con la inspección realizada en el Colegio RAFAEL URIBE URIBE, se observa la necesidad de la Intervención general de las unidades sanitarias del bloque de preescolar (ciclo I) ya que por el largo tiempo de uso, presentan en la actualidad bastantes deficiencias funcionales, por lo que generan constantes arreglos puntuales y mantenimientos.

RECOMENDACIÓN TÉCNICA DE SOLUCIÓN

Se recomienda adelantar las actividades pertinentes para mejoramiento o mantenimiento correctivo general a las unidades sanitarias del piso 1.

PROGRAMACIÓN ESTIMADA MEJORAMIENTO UNIDADES SANITARIAS

ITEM	ACTIVIDAD		CANT	FECHA INICIO	FECHA FIN
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	52.03	1/10/2026	3/10/2026
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	14.00	3/10/2026	3/10/2026
1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	30.00	3/10/2026	30/12/2026
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	36.28	15/11/2026	21/11/2026
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	24.12	6/10/2026	7/10/2026
1.2.12	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	71.34	9/10/2026	12/10/2026
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	44.18	8/10/2026	14/10/2026
1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	19.00	8/10/2026	8/10/2026
1.2.17	DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	28.00	12/10/2026	13/10/2026
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	7.56	5/10/2026	6/10/2026
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	22.00	6/10/2026	10/10/2026
1.2.21	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	34.00	19/10/2026	24/10/2026

VISITA DE INSPECCIÓN EMERGENCIA
CONSORCIO PAIS

INFORME PRELIMINAR Y DE DIAGNOSTICO

CONTRATO SED-8154780-2025-L6

OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	36.31	12/11/2026	13/11/2026
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	7.00	25/10/2026	26/10/2026
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	8.00	24/10/2026	24/10/2026
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	8.00	25/10/2026	27/10/2026
1.3.1	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE SOLDADURAS, REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE DE ACABADO)	M2	14.46	13/11/2026	24/11/2026
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	50.00	27/10/2026	7/11/2026
1.4.2	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	50.00	27/10/2026	31/10/2026
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	100.00	29/10/2026	2/11/2026
2.3.8	PERFORACIÓN NÚCLEO 4" E= 0.10 M	UN	2.00	6/11/2026	6/11/2026
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	570.55	13/11/2026	16/11/2026
3.1.4	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	19.20	30/10/2026	10/11/2026
3.1.7	PAÑETE LISO 1:3 SOBRE MUROS EN AREA DE CULATAS (HASTA 30 CM). INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	M	18.00	17/11/2026	21/11/2026
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	35.00	7/11/2026	7/11/2026
4.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	UN	12.00	7/11/2026	7/11/2026
4.2.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 4" INCLUYE ACCESORIOS	UN	3.00	7/11/2026	7/11/2026
4.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1-1/2 "	UN	17.00	7/11/2026	8/11/2026
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	17.00	9/11/2026	9/11/2026
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	9.00	9/11/2026	9/11/2026
4.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	UN	9.00	7/11/2026	12/11/2026
4.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN	9.00	7/11/2026	10/11/2026
4.6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 3/4"	UN	4.00	10/11/2026	11/11/2026
4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	17.00	7/11/2026	11/11/2026
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2.00	14/12/2026	14/12/2026
5.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2.00	15/12/2026	15/12/2026
5.1.7	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2.00	15/12/2026	15/12/2026
5.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	2.00	15/12/2026	15/12/2026
5.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN	2.00	15/12/2026	15/12/2026
5.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 3X30A 10 KA	UN	1.00	15/12/2026	15/12/2026
5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	100.00	15/12/2026	19/12/2026
5.1.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	10.00	15/12/2026	18/12/2026
5.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	104.00	15/12/2026	18/12/2026
5.1.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	40.00	15/12/2026	17/12/2026
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	10.00	16/12/2026	17/12/2026

VISITA DE INSPECCIÓN EMERGENCIA
CONSORCIO PAIS

INFORME PRELIMINAR Y DE DIAGNOSTICO

CONTRATO SED-8154780-2025-L6

OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	10.00	18/12/2026	19/12/2026
5.1.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL TOTALIZADOR 3X125 A. MATERIALES CERTIFICADOS RETIE E INSTALADOS SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UN	2.00	15/12/2026	16/12/2026
5.1.49	ACOMETIDA TRIFASICA EN 4#8 + 1#10 CABLE LIBRE DE HALOGENOS. INCLUYE CONECTORES TUBULARES Y AISLAMIENTO AUTOFUNDENTE INCLUYE MANIOBRAS DE CANALIZACIÓN	M	60.00	14/12/2026	17/12/2026
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	40.37	23/11/2026	26/11/2026
7.2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	40.37	7/12/2026	13/12/2026
7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	12.00	23/12/2026	23/12/2026
7.2.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	70.47	26/11/2026	6/12/2026
9.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS EN ALUMINIO TIPO PERSIANA	M2	1.96	21/12/2026	21/12/2026
10.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	8.00	21/12/2026	23/12/2026
10.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2.00	23/12/2026	23/12/2026
10.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISIÓN POR MÓDULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM	M	8.67	26/12/2026	27/12/2026
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	10.00	16/12/2026	17/12/2026
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	4.00	16/12/2026	17/12/2026
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	2.00	20/12/2026	21/12/2026
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	26.52	28/12/2026	30/12/2026
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	1.00	28/12/2026	29/12/2026
12.1.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	70.47	12/11/2026	22/11/2026
12.1.10	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE EN CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	24.64	23/12/2026	26/12/2026
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	34.85	23/12/2026	26/12/2026
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	11.84	23/12/2026	26/12/2026
14.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	10.80	23/12/2026	23/12/2026
15.1.11	SUMNINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO 50 MM FILTRO UV. INCLUYE RELLENO EN CAUCHO GRANULAR.	M2	39.11	14/12/2026	19/12/2026
16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	7.00	18/11/2026	18/11/2026
16.1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	97.03	16/11/2026	18/11/2026
16.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M	14.00	18/11/2026	19/11/2026
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	103.94	28/12/2026	30/12/2026
18.1.4	PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN).	M2	23.61	19/12/2026	30/12/2026
NP-19	DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE COMPUESTO POR MALLA ESLABONADA Y PARAL EN PERFIL DE ACERO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	28.92	13/11/2026	3/12/2026

CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO PAIS
WILSON LEONARDO PARRA ROBLES

INTERVENTORIA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO
HÉCTOR VILLAZÓN GUTIÉRREZ

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

CONTRATO CO1.PCCNTR.8154780 - LOTE No. 6

COLEGIO LOS COMUNEROS OSWALDO GUAYASAMIN SEDE B

OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

VALOR PRESUPUESTO PRELIMINAR

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	51.32	$ 3,138.00	$ 161,042.00
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	22.00	$ 23,060.00	$ 507,320.00
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	51.32	$ 24,160.00	$ 1,239,891.00
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	21.78	$ 16,530.00	$ 359,974.00
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	125.96	$ 8,433.00	$ 1,062,211.00
1.2.12	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	76.20	$ 20,391.00	$ 1,553,819.00
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	76.20	$ 9,376.00	$ 714,462.00
1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	21.00	$ 15,350.00	$ 322,350.00
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	7.82	$ 24,590.00	$ 192,392.00
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	21.00	$ 20,222.00	$ 424,662.00
1.2.21	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	38.00	$ 15,350.00	$ 583,300.00
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	10.00	$ 8,871.00	$ 88,710.00
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	10.00	$ 5,537.00	$ 55,370.00
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	10.00	$ 3,255.00	$ 32,550.00
1.4.2	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	50.00	$ 13,852.00	$ 692,600.00
3.1.7	PAÑETE LISO 1:3 SOBRE MUROS EN AREA DE CULATAS (HASTA 30 CM). INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	M	15.00	$ 11,346.00	$ 170,190.00
4.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1-1/2 "	UN	19.00	$ 13,987.00	$ 265,753.00
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	9.00	$ 47,093.00	$ 423,837.00
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	10.00	$ 47,093.00	$ 470,930.00
4.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	UN	9.00	$ 134,785.00	$ 1,213,065.00
4.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN	9.00	$ 72,119.00	$ 649,071.00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

CONTRATO CO1.PCCNTR.8154780 - LOTE No. 6

COLEGIO LOS COMUNEROS OSWALDO GUAYASAMIN SEDE B

OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

VALOR PRESUPUESTO PRELIMINAR

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 3/4"	UN	3.00	$ 60,308.00	$ 180,924.00
4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	19.00	$ 4,125.00	$ 78,375.00
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	3.00	$ 94,067.00	$ 282,201.00
5.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2.00	$ 142,819.00	$ 285,638.00
5.1.7	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	5.00	$ 188,067.00	$ 940,335.00
5.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	2.00	$ 424,407.00	$ 848,814.00
5.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN	2.00	$ 21,737.00	$ 43,474.00
5.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 3X30A 10 KA	UN	2.00	$ 136,773.00	$ 273,546.00
5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	140.00	$ 17,282.00	$ 2,419,480.00
5.1.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	6.00	$ 24,980.00	$ 149,880.00
5.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	146.00	$ 11,912.00	$ 1,739,152.00
5.1.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	20.00	$ 15,411.00	$ 308,220.00
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	12.00	$ 133,667.00	$ 1,604,004.00
5.1.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA TIPO LED 0.60 X 0.60 M - HERMETICA, INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	12.00	$ 185,136.00	$ 2,221,632.00
5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	12.00	$ 147,215.00	$ 1,766,580.00
5.1.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL TOTALIZADOR 3X125 A. MATERIALES CERTIFICADOS RETIE E INSTALADOS SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UN	2.00	$ 579,624.00	$ 1,159,248.00
5.1.49	ACOMETIDA TRIFASICA EN 4#8 + 1#10 CABLE LIBRE DE HALOGENOS. INCLUYE CONECTORES TUBULARES Y AISLAMIENTO AUTOFUNDENTE INCLUYE MANIOBRAS DE CANALIZACIÓN	M	30.00	$ 42,827.00	$ 1,284,810.00
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	42.92	$ 33,570.00	$ 1,440,824.00
7.2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	51.92	$ 93,562.00	$ 4,857,739.00
7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	6.00	$ 11,395.00	$ 68,370.00
7.2.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	84.05	$ 72,806.00	$ 6,119,483.00
9.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS EN ALUMINIO TIPO PERSIANA	M2	3.92	$ 554,909.00	$ 2,175,243.00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

CONTRATO CO1.PCCNTR.8154780 - LOTE No. 6

COLEGIO LOS COMUNEROS OSWALDO GUAYASAMIN SEDE B

OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

VALOR PRESUPUESTO PRELIMINAR

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2.00	$ 572,550.00	$ 1,145,100.00
10.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE FLUXOMETRO, SISTEMA DE INSTALACIÓN EP/ES, ASIENTO SANITARIO)	UN	1.00	$ 1,985,047.00	$ 1,985,047.00
10.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISIÓN POR MÓDULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM	M	8.33	$ 836,336.00	$ 6,966,679.00
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	8.00	$ 299,912.00	$ 2,399,296.00
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	5.00	$ 30,487.00	$ 152,435.00
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	43.01	$ 733,332.00	$ 31,539,143.00
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	0.60	$ 733,332.00	$ 439,999.00
12.1.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	70.35	$ 26,828.00	$ 1,887,221.00
12.1.10	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE EN CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	4.80	$ 9,669.00	$ 46,411.00
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	41.65	$ 16,010.00	$ 666,815.00
14.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	6.72	$ 91,365.00	$ 613,973.00
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	152.29	$ 3,457.00	$ 526,451.00
18.1.4	PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN).	M2	26.61	$ 5,315.00	$ 141,432.00
NP -01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL BLANCO DE 2 CUERPOS CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA, DESCARGA SENCILLA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, BRIDA, ACOPLE Y VALVULA PLASTICA DE 1/2 PARA REGULACION DE PRESION. CONSUMO DE AGUA DE 4.8 LTS POR DESCARGA, CAPACIDAD MINIMA DE EVACUACION DE SOLIDOS 400 GRAMOS	un	8	$ 802,383.00	$ 6,419,064.00

SUB-TOTAL MANTENIMIENTOS	**$ 96,360,537.00**
SUB-TTOTAL EMERGENCIAS	**$ -**
TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 96,360,537.00**

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación están en porcentaje (%).

DESCRIPCION	PORCENTAJE	
ADMINISTRACIÓ	28.91%	**$ 27,857,831.00**
IMPREVISTO	1.00%	**$ 963,605.00**
UTILIDAD	5.00%	**$ 4,818,027.00**
TOTAL A.I.U	34.91%	**$ 33,639,463.00**
SUB-TOTAL COSTOS INDIRECTOS		
TOTAL PROYECTO (costos directos + AIU)		**$ 130,000,000.00**

WILSON LEONARDO PARRA ROBLES
DIRECTOR OBRA - CONSORCIO PAIS
CONSTRUCTOR

HECTOR VILLAZON GUTIERREZ
DIRECTOR CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO
INTERVENTORIA

VISITA DE INSPECCIÓN EMERGENCIA
CONSORCIO PAIS

INFORME PRELIMINAR Y DE DIAGNOSTICO

CONTRATO SED-8154780-2025-L6

OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

CPF	COLEGIO	SEDE		NOMBRE SEDE	TOTAL COSTO
567	LOS COMUNEROS OSWALDO GUAYASAMIN (USME)	B		OSWALDO GUAYASAMIN	$ 130,000,000.00
ALCANCE ESPECIFICO		Adecuación baterías sanitarias, de niños y niñas del bloque bachillerato piso Adecuación del baño para personas con movilidad reducida			

REGISTRO FOTOGRAFICO:





ESTADO ACTUAL DE LA SEDE

De acuerdo con la inspección realizada en el Colegio LOS COMUNEROS OSWALDOGUAYASAMIN, se observa la necesidad de la Intervención general de las unidades sanitarias del piso 1 ya que tienen bastante edad de uso por lo que presentan en la actualidad bastantes deficiencias funcionales, por lo que generan constantes arreglos puntuales y mantenimiento.

RECOMENDACIÓN TÉCNICA DE SOLUCIÓN

Se recomienda adelantar las actividades pertinentes para mejoramiento o mantenimiento correctivo general a las unidades sanitarias del piso 1.

PROGRAMACIÓN ESTIMADA ADECUACION UNIDADES SANITARIAS

ITEM	ACTIVIDAD		CANT	FECHA INICIO	FECHA FIN
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	51.32	1/10/2026	3/10/2026
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	22.00	4/10/2026	4/10/2026
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	51.32	17/11/2026	25/11/2026
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	21.78	8/10/2026	9/10/2026
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	125.96	19/10/2026	22/10/2026
1.2.12	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	76.20	13/10/2026	19/10/2026
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	76.20	10/10/2026	14/10/2026
1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	21.00	22/10/2026	23/10/2026
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	7.82	5/10/2026	6/10/2026
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	21.00	23/10/2026	27/10/2026
1.2.21	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	38.00	9/11/2026	10/11/2026

CPF	COLEGIO	SEDE		NOMBRE SEDE	TOTAL COSTO
567	LOS COMUNEROS OSWALDO GUAYASAMIN (USME)	B		OSWALDO GUAYASAMIN	$ 130,000,000.00
ALCANCE ESPECIFICO		Adecuación baterías sanitarias, de niños y niñas del bloque bachillerato piso Adecuación del baño para personas con movilidad reducida			
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	10.00	28/10/2026	31/10/2026
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	10.00	2/11/2026	3/11/2026
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	10.00	31/10/2026	3/11/2026
1.4.2	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	50.00	5/11/2026	9/11/2026
3.1.7	PAÑETE LISO 1:3 SOBRE MUROS EN AREA DE CULATAS (HASTA 30 CM). INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	M	15.00	17/11/2026	28/11/2026
4.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1-1/2 "	UN	19.00	15/11/2026	26/11/2026
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	9.00	17/11/2026	20/11/2026
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	10.00	19/11/2026	23/11/2026
4.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	UN	9.00	27/11/2026	1/12/2026
4.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN	9.00	21/11/2026	2/12/2026
4.6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 3/4"	UN	3.00	20/11/2026	1/12/2026
4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	19.00	15/11/2026	16/11/2026
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	3.00	17/12/2026	17/12/2026
5.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2.00	17/12/2026	17/12/2026
5.1.7	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	5.00	17/12/2026	17/12/2026
5.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	2.00	17/12/2026	18/12/2026
5.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN	2.00	18/12/2026	18/12/2026
5.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 3X30A 10 KA	UN	2.00	18/12/2026	18/12/2026
5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	140.00	17/12/2026	22/12/2026
5.1.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	6.00	17/12/2026	17/12/2026
5.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	146.00	18/12/2026	21/12/2026
5.1.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	20.00	18/12/2026	19/12/2026
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	12.00	18/12/2026	20/12/2026
5.1.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA TIPO LED 0.60 X 0.60 M - HERMETICA, INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	12.00	21/12/2026	21/12/2026
5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	12.00	21/12/2026	21/12/2026
5.1.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL TOTALIZADOR 3X125 A. MATERIALES CERTIFICADOS RETIE E INSTALADOS SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UN	2.00	21/12/2026	21/12/2026
5.1.49	ACOMETIDA TRIFASICA EN 4#8 + 1#10 CABLE LIBRE DE HALOGENOS. INCLUYE CONECTORES TUBULARES Y AISLAMIENTO AUTOFUNDENTE INCLUYE MANIOBRAS DE CANALIZACIÓN	M	30.00	17/12/2026	21/12/2026
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	42.92	28/11/2026	2/12/2026
7.2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	51.92	9/12/2026	16/12/2026
7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	6.00	18/12/2026	29/12/2026
7.2.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	84.05	2/12/2026	13/12/2026
9.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS EN ALUMINIO TIPO PERSIANA	M2	3.92	23/12/2026	23/12/2026
10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2.00	22/12/2026	23/12/2026
10.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE FLUXOMETRO, SISTEMA DE INSTALACIÓN EP/ES, ASIENTO SANITARIO)	UN	1.00	22/12/2026	23/12/2026
10.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISIÓN POR MÓDULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM	M	8.33	18/12/2026	19/12/2026
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	8.00	18/12/2026	29/12/2026
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	5.00	23/12/2026	23/12/2026
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	43.01	21/12/2026	28/12/2026
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	0.60	28/12/2026	28/12/2026
12.1.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	70.35	24/11/2026	5/12/2026

CPF	COLEGIO	SEDE		NOMBRE SEDE	TOTAL COSTO
567	LOS COMUNEROS OSWALDO GUAYASAMIN (USME)	B		OSWALDO GUAYASAMIN	$ 130,000,000.00
ALCANCE ESPECIFICO		Adecuación baterías sanitarias, de niños y niñas del bloque bachillerato piso Adecuación del baño para personas con movilidad reducida			
12.1.10	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE EN CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	4.80	24/12/2026	28/12/2026
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	41.65	24/12/2026	28/12/2026
14.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	6.72	28/12/2026	28/12/2026
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	152.29	29/12/2026	30/12/2026
18.1.4	PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN).	M2	26.61	23/12/2026	30/12/2026
NP -01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL BLANCO DE 2 CUERPOS CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA, DESCARGA SENCILLA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, BRIDA, ACOPLE Y VALVULA PLASTICA DE 1/2 PARA REGULACION DE PRESION. CONSUMO DE AGUA DE 4.8 LTS POR DESCARGA, CAPACIDAD MINIMA DE EVACUACION DE SOLIDOS 400 GRAMOS	un	8.00	26/12/2026	29/12/2026

CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO PAIS
WILSON LEONARDO PARRA ROBLES

INTERVENTORIA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO
HÉCTOR VILLAZÓN GUTIÉRREZ



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.010.200.976**

PACHON RONCANCIO

APELLIDOS

JUAN FRANCISCO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-ENE-1992**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 ESTATURA

B+ G.S. RH

M SEXO

20-ENE-2010 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1500150-00214422-M-1010200976-20100213 **00208**64018A 1 34111937

CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 09/09/2026 - 14:59:07
Recibo No. S001173548, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN hS9FPv8xnZ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siifront.confecamaras.co/cv/38 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

EL PRIMER JUEVES HABIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRA JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA. LA INSCRIPCION DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE, ESTO ES, DESDE EL 16 DE OCTUBRE Y HASTA EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2026 - OFICIO 2026-01-132881 DEL 25 DE MARZO DE 2026 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES.

PARA INFORMACION DETALLADA PODRA COMUNICARSE AL TELEFONO 3183435422 ó 7474660 EXT 133 O DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL, A LAS SEDES AUTORIZADAS PARA ESTE EFECTO, O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB www.cctunja.org.co

****

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : CONSTRUCCIONES V&P S.A.S
Nit : 901368837-6
Domicilio: Chiquinquirá, Boyacá

MATRÍCULA

Matrícula No: 178739
Fecha de matrícula: 17 de febrero de 2020
Ultimo año renovado: 2026
Fecha de renovación: 23 de febrero de 2026
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CARRERA 3 7 08
Barrio : EL BOSQUE
Municipio : Chiquinquirá, Boyacá
Correo electrónico : construccionesvyp2000@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3213231992
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CARRERA 3 7 08
Municipio : Chiquinquirá, Boyacá
Correo electrónico de notificación : construccionesvyp2000@gmail.com

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado del 10 de febrero de 2020 de la Acto Constitutivo de Chiquinquira, inscrito en esta Cámara de Comercio el 17 de febrero de 2020, con el No. 33401 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada CONSTRUCCIONES V&P S.A.S.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 2 del 04 de enero de 2021 de la Asamblea General De Accionistas de Chiquinquira, inscrito en esta Cámara de Comercio el 22 de febrero de 2021, con el No. 35367 del Libro IX, se decretó REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS ARTICULO 28

Por Acta No. 3 del 27 de septiembre de 2021 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas de Chiquinquira, inscrito en esta Cámara de Comercio el 05 de octubre de 2021, con el No. 36817 del Libro IX, se decretó REFORMA DE ESTATUTOS- ARTICULO 5- AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO

Por Acta No. 001 del 30 de marzo de 2024 de la Asamblea De Accionistas de Chiquinquira, inscrito en esta Cámara de Comercio el 15 de abril de 2024, con el No. 42509 del Libro IX, se decretó REFORMA ESTATUTARIA DEL ARTICULO 3,CAMBIO DE DOMICILIO PRINCIPAL, DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA (BOYACA) AL NUEVO DOMICILIO EL MUNICIPIO DE MUZO (BOYACA).

Por Acta No. 002 del 09 de julio de 2025 de la Asamblea General De Accionistas de Chiquinquira, inscrito en esta Cámara de Comercio el 21 de julio de 2025, con el No. 46008 del Libro IX, se reforma Estatutaria, Articulo 3. Domicilio, Articulo 28. Representación Legal,Articulo 29.Facultades del Representante Legal.(Acta Aclaratoria)

Por Acta No. 002 del 09 de julio de 2025 de la Asamblea General De Accionistas de Chiquinquira, inscrito en esta Cámara de Comercio el 21 de julio de 2025, con el No. 46009 del Libro IX, se reforma estatutaria Articulo 3 por cambio de domicilio dentro de la Jurisdiccion, del municipio de Muzo al municipio de Chiquinquira-Boyaca.(Acta Aclaratoria)

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

objeto social. La sociedad tendrá como objeto principal la construcción de carreteras y vías de ferrocarril, la construcción de proyectos de servicio público, la construcción de edificios residenciales y no residenciales y las actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica. Así mismo, podrá

realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

CAPITAL

	* CAPITAL AUTORIZADO *
Valor	$ 30.000.000.000,00
No. Acciones	100.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 300.000,00

	* CAPITAL SUSCRITO *
Valor	$ 30.000.000,00
No. Acciones	100,00
Valor Nominal Acciones	$ 300.000,00

	* CAPITAL PAGADO *
Valor	$ 30.000.000,00
No. Acciones	100,00
Valor Nominal Acciones	$ 300.000,00

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien no tendrá suplentes, designado para un término indefinido por la asamblea general de accionistas. La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 3 del 19 de marzo de 2025 de la Asamblea General De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 02 de abril de 2025 con el No. 45082 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO	C.C. No. 1.010.200.976

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
*) Acta No. 2 del 04 de enero de 2021 de la Asamblea General De Accionistas	35367 del 22 de febrero de 2021 del libro IX
*) Acta No. 3 del 27 de septiembre de 2021 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas	36817 del 05 de octubre de 2021 del libro IX
*) Acta No. 002 del 09 de julio de 2025 de la Asamblea General De Accionistas	46008 del 21 de julio de 2025 del libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: F4220
Actividad secundaria Código CIIU: F4111
Otras actividades Código CIIU: F4210 M7112

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona jurídica, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

SUCURSALES Y AGENCIAS

Nombre: CONSTRUCCIONES V&P OTANCHE
Matrícula No.: 188467
Fecha de Matrícula: 22 de febrero de 2021
Último año renovado: 2024
Categoría: Sucursal
Dirección : AVENIDA 6 10 25
Barrio : DANUBIO
Municipio: Otanche, Boyacá

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA – TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $196.810.315,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo – CIIU : F4220.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio


Fecha expedición: 09/09/2026 - 14:59:07
Recibo No. S001173548, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN hS9FPv8xnZ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siifront.confecamaras.co/cv/38 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.



Yeny Alejandra López Rivera

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141211204158

(415)7707212489984(8020) 000014121120415 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 6 8 8 3 7	6	Impuestos y Aduanas de Tunja 2 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUCCIONES V&P S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Chiquinquirá 1 7 6

41. Dirección principal
CL 3 7 08

42. Correo electrónico construccionesvyp2000@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 2 5 9 5 5 0 2	3 2 2 2 1 8 6 3 2 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 2 0	2 0 2 0 0 2 1 4	4 1 1 1	2 0 2 0 0 2 1 0	7 0 2 0	4 2 9 0			2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1 4	4 2	4 7	4 8	5 2	5 5																			

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
47 - Régimen Simple de Tributación - SIM
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2025-09-26 / 03:16:59PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PACHON RONCANCIO JUAN FRANCISCO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141211204158

(415)7707212489984(8020) **000014121120415 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 3 6 8 8 3 7	6	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 2 0 0 2 1 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 0 0 2 1 7	
77. No. Matrícula mercantil	1 7 8 7 3 9	
78. Departamento	1 5	
79. Ciudad/Municipio	3 8	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 0 0 2 1 7	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 2 0 3 2 3		-
2	1 0 1	2 0 2 4 0 1 1 8		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141211204158

(415)7707212489984(8020) **000014121120415 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 6 8 8 3 7	6	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 0 4 0 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 1 0 2 0 0 9 7 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PACHON	RONCANCIO	JUAN	FRANCISCO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141211204158

(415)7707212489984(8020) **000014121120415 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 6 8 8 3 7	6	Impuestos y Aduanas de Tunja 2 0	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 5 3 3 2 4 5 6 8		1 8 6 5 7 9

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
RAMIREZ	CASTELLANOS	JULIAN	CAMILO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 1 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141211204158

(415)7707212489984(8020) **000014121120415 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 6 8 8 3 7	6	Impuestos y Aduanas de Tunja 2 0	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Sucursal 1 0	Construcción de proyectos de servicio público 4 2 2 0

162. Nombre del establecimiento: CONSTRUCCIONES V&P OTANCHE

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Boyacá 1 5	Otanche 5 0 7

165. Dirección: AV 6 10 25

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
1 8 8 4 6 7	2 0 2 1 0 2 2 2
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 0 2 5 9 5 5 0 2	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3

162. Nombre del establecimiento: FERRETERIA Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCION V&P

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Boyacá 1 5	Chiquinquirá 1 7 6

165. Dirección: CL 18 7 28 BRR CANTA RANA

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
2 0 6 9 4 8	2 0 2 2 1 1 2 4
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 0 2 5 9 5 5 0 2	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 303377949

PIB
11:50:55

Bogotá DC, 22 de septiembre del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona CONSTRUCCIONES V&P S.A.S identificado(a) con NIT número 9013688376:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 22 de septiembre de 2026, a las 08:41:42, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	9013688376
Código de Verificación	901368837626092208414 2

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

Policía Nacional de Colombia

(https://www.policia.gov.co/)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano


La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 22/09/2026 08:47:01 a. m. para **- NIT, sin digito de verificación:** Nº. **9013688376**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **148155151** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

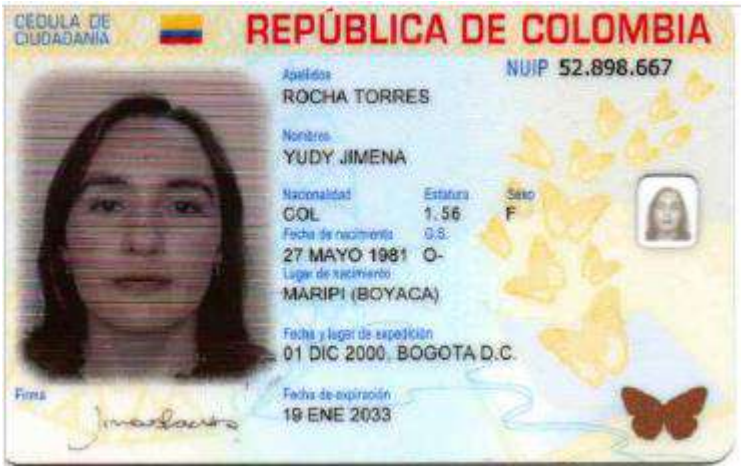
CEDULA DE CIUDADANIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 52.898.667

Apellidos
ROCHA TORRES

Nombres
YUDY JIMENA

Nacionalidad
COL

Estatura
1.56

Sexo
F

Fecha de nacimiento
27 MAYO 1981

G.S.
O-

Lugar de nacimiento
MARIPI (BOYACA)

Fecha y lugar de expedición
01 DIC 2000. BOGOTA D.C.

Firma

Fecha de expiración
19 ENE 2033


.00

0133353775

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL0133537750150O1<<<<<<<<<<<
8105277F3301199COL52898667<<<4
ROCHA<TORRES<<YUDY<JIMENA<<<<<

CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 24/08/2026 - 09:07:47
Recibo No. S001169019, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 15CgRSGvHm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siifront.confecamaras.co/cv/38 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

EL PRIMER JUEVES HABIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRA JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA. LA INSCRIPCION DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE, ESTO ES, DESDE EL 16 DE OCTUBRE Y HASTA EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2026 - OFICIO 2026-01-132881 DEL 25 DE MARZO DE 2026 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES.

PARA INFORMACION DETALLADA PODRA COMUNICARSE AL TELEFONO 3183435422 ó 7474660 EXT 133 O DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL, A LAS SEDES AUTORIZADAS PARA ESTE EFECTO, O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB www.cctunja.org.co

****

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : CONSTRUCTORA PAIS S.A.S
Nit : 901063647-3
Domicilio: Chiquinquirá, Boyacá

MATRÍCULA

Matrícula No: 147538
Fecha de matrícula: 10 de marzo de 2017
Ultimo año renovado: 2026
Fecha de renovación: 13 de febrero de 2026
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CL 2 A 2 23
Barrio : APALLARES
Municipio : Chiquinquirá, Boyacá
Correo electrónico : constructorapais.contable@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3202680071
Teléfono comercial 2 : 3166925077
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CL 2 A 2 23
Barrio : APALLARES
Municipio : Chiquinquirá, Boyacá
Correo electrónico de notificación : constructorapais.contable@gmail.com

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado del 03 de marzo de 2017 de la Asamblea Constitutiva de Chiquinquira, inscrito en esta Cámara de Comercio el 10 de marzo de 2017, con el No. 27762 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada CONSTRUCTORA PAIS S.A.S.

REFORMAS ESPECIALES

Por Certificación del 12 de febrero de 2019 de la Contador Publico de Chiquinquira, inscrito en esta Cámara de Comercio el 13 de febrero de 2019, con el No. 31323 del Libro IX, se decretó CERTIFICADO AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

Por Certificación de capital del 27 de diciembre de 2021 de la Revisor Fical de Chiquinquira, inscrito en esta Cámara de Comercio el 03 de marzo de 2022, con el No. 37497 del Libro IX, se decretó CERTIFICACION AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

Por Acta No. 10 del 15 de mayo de 2025 de la Asamblea General de Chiquinquira, inscrito en esta Cámara de Comercio el 12 de junio de 2025, con el No. 45796 del Libro IX, se reforma Estatutaria, Articulo 29. Facultades del Representante Legal.

Por Acta No. 11 del 09 de junio de 2025 de la Asamblea De Accionistas de Chiquinquira, inscrito en esta Cámara de Comercio el 17 de julio de 2025, con el No. 46002 del Libro IX, se reforma Estatutaria, Articulo 28. Representación Legal.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

objeto social. La sociedad tendrá como objeto principal la construcción de carreteras y vías de ferrocarril, la construcción de proyectos de servicio público, la construcción de edificios residenciales y no residenciales y las actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *	
Valor	$ 10.500.000.000,00
No. Acciones	3.500,00
Valor Nominal Acciones	$ 3.000.000,00
* CAPITAL SUSCRITO *	
Valor	$ 1.020.000.000,00
No. Acciones	340,00
Valor Nominal Acciones	$ 3.000.000,00
* CAPITAL PAGADO *	
Valor	$ 1.020.000.000,00
No. Acciones	340,00
Valor Nominal Acciones	$ 3.000.000,00

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien no tendrá suplentes, designado para un término indefinido por la asamblea general de accionistas. La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 12 del 20 de noviembre de 2025 de la Asamblea General De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 11 de diciembre de 2025 con el No. 46772 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	YUDY JIMENA ROCHA TORRES	C.C. No. 52.898.667

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 3 del 20 de marzo de 2020 de la Asamblea Ordinaria De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 19 de mayo de 2020 con el No. 33709 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL	JEHISSON EDGARDO POVEDA CASTRO	C.C. No. 1.053.328.390	212722-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
*) Acta No. 10 del 15 de mayo de 2025 de la Asamblea General	45796 del 12 de junio de 2025 del libro IX
*) Acta No. 11 del 09 de junio de 2025 de la Asamblea De Accionistas	46002 del 17 de julio de 2025 del libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: F4210
Actividad secundaria Código CIIU: F4220
Otras actividades Código CIIU: F4112 F4111

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA – TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $2.979.784.952,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo – CIIU : F4210.


Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.



Yeny Alejandra López Rivera

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141229878685

(415)7707212489984(8020) 000014122987868 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 6 3 6 4 7	3	Impuestos y Aduanas de Tunja 2 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUCTORA PAIS S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Chiquinquirá 1 7 6

41. Dirección principal
CL 2 A 2 23

42. Correo electrónico constructorapais.contable@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 5 1 7 6	3 1 4 3 8 0 8 2 9 7	3 1 1 5 0 8 8 8 6 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 1 7 0 3 0 3	4 2 2 0	2 0 1 7 0 3 0 3		4 2 9 0	4 9 2 3		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	2	4	7	4	8	5	2	5	5													

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
47 - Régimen Simple de Tributación - SIM
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2026-01-16 / 05:48:46PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ROCHA TORRES YUDY JIMENA
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141229878685

(415)7707212489984(8020) **000014122987868 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 6 3 6 4 7	3	Impuestos y Aduanas de Tunja 2 0	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 7 0 3 0 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 7 0 3 1 0	
77. No. Matrícula mercantil	1 4 7 5 3 8	
78. Departamento	1 5	
79. Ciudad/Municipio	3 8	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 7 0 3 1 0	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 2 2 0 3 0 4		-
2	1 0 1	2 0 2 6 0 1 1 6		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141229878685

(415)7707212489984(8020) **000014122987868 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 6 3 6 4 7	3	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 1 2 1 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	5 2 8 9 8 6 6 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ROCHA	TORRES	YUDY	JIMENA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141229878685

(415)7707212489984(8020) **000014122987868 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 6 3 6 4 7	3	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 5 3 3 2 8 3 9 0		2 1 2 7 2 2 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
POVEDA	CASTRO	JEHISSON	EDGARDO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 0 0 3 2 0

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 5 3 3 2 4 5 6 8		1 8 6 5 7 9

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
RAMIREZ	CASTELLANOS	JULIAN	CAMILO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 9 0 3 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 302581982

PIB
16:27:23

Bogotá DC, 08 de septiembre del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona CONSTRUCTORA PAIS S.A.S. identificado(a) con NIT número 9010636473:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 22 de septiembre de 2026, a las 09:18:19, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	901063647
Código de Verificación	901063647260922091819

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

Policía Nacional de Colombia

(https://www.policia.gov.co/)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 22/09/2026 09:04:16 a. m. para **- NIT, sin digito de verificación:** Nº. **901063647**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **148157402** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **4.158.923**

PAEZ RAMOS

APELLIDOS

ISDUAR HUMBERTO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **30-SEP-1976**

MARIPI
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.81	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

19-MAY-1995 MARIPI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0705200-00184246-M-0004158923-20091008 **0016**974217A 2 30028364

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 7 de septiembre de 2026 Hora: 20:57:16
Recibo No. AB26584102
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B265841024F5D2

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

****

EL JUEVES 3 DE DICIEMBRE DE 2026, SE ELEGIRÁ JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE HASTA EL 3 DE NOVIEMBRE ACORDE CON EL OFICIO 303-256110 DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. PARA INFORMACIÓN DETALLADA PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO (601) 5941000 EXT. 2597, AL CORREO ELECCIONJUNTADIRECTIVA@CCB.ORG.CO, DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL (AVENIDA EL DORADO #68D-35, PISO 8), O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCB.ORG.CO/ELECCIONES2026

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: FAPAIS SAS
Nit: 901762077 4 Administración : Direccion Seccional De Impuestos De Bogota
Domicilio principal: Cucunubá (Cundinamarca)

MATRÍCULA

Matrícula No.	03740891
Fecha de matrícula:	10 de octubre de 2023
Último año renovado:	2026
Fecha de renovación:	4 de marzo de 2026
Grupo NIIF:	Grupo III.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal:	Carrera 5 1 56
Municipio:	Cucunubá (Cundinamarca)
Correo electrónico:	fapais.contable@gmail.com
Teléfono comercial 1:	3105602030
Teléfono comercial 2:	No reportó.
Teléfono comercial 3:	No reportó.

Dirección para notificación judicial: Carrera 5 1 56

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 7 de septiembre de 2026 Hora: 20:57:16
Recibo No. AB26584102
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B265841024F5D2

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Municipio:	Cucunubá (Cundinamarca)
Correo electrónico de notificación:	fapais.contable@gmail.com
Teléfono para notificación 1:	3105602030
Teléfono para notificación 2:	No reportó.
Teléfono para notificación 3:	No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 28 de septiembre de 2023 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 10 de octubre de 2023, con el No. 03025290 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada FAPAIS SAS.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 1 del 04 de junio de 2024 de la Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 16 de Julio de 2024 , con el No. 03139146 del libro IX, la sociedad de la referencia trasladó su domicilio de la ciudad de: Bogotá D.C. al municipio de: Cucunubá (Cundinamarca).

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad puede realizar, en Colombia y en el exterior cualquier actividad lícita, comercial o civil. La sociedad podrá ejecutar y desarrollar, cualquier acto lícito de comercio, incluyendo: a) la

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 7 de septiembre de 2026 Hora: 20:57:16
Recibo No. AB26584102
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B265841024F5D2

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

comercialización y venta de productos adquiridos en Colombia b) comercialización dentro y fuera del país de productos agrícolas c) Cualquier tipo de actividad que comprenda la inversión de capitales dirigidos o negocios de construcción, diseño y administración de obras civiles, arquitectónicas y otras que se deriven del ejercicio de negociación de bienes muebles, inmuebles y prestación de servicios en general. La sociedad podrá ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos civiles y comerciales y negocios relacionados con su objeto social y que sean necesarios y conducentes al logro de su fin Adicionalmente Formará parte del objeto social de la sociedad: 1. Gestión de proyectos productivos ante entidades públicas y privadas. 2. Participación en Licitaciones públicas y privadas 3. inversión en toda clase de bienes muebles e inmuebles, para lo cual podrá adquirirlos o enajenarlos a cualquier título oneroso, así como administrarlos por cuenta propia o a nombre de terceros. 4. Formar parte de otras sociedades que se propongan actividades semejantes, complementarias, o accesorias de la empresa social o que sea de conveniencia general para los asociados o absorber tales empresas. 5. Transporte terrestre de pasajeros. 6. Transporte terrestre de carga. 7. Compra y venta de terrenos urbanos y rurales, vehículos, y transporte de todo tipo de materiales relacionados con su objeto social. 8. Inversión en toda clase de mobiliarios tales como: acciones, bonos, cédulas, certificados de depósito, pagarés, letras de cambio y en general toda clase de títulos valores. 9. Compra, venta, arriendo, reparación de maquinaria, propios o de terceros. 10. La inversión y participación en sociedades comerciales que tengan relación con el objeto social. 11. La importación y exportación de bienes, maquinaria y equipos para el desarrollo del objeto social. 12. Comercializar los bienes y productos que adquiera a cualquier título y abrir establecimientos de comercio con tal fin. 13. Intervenir ante terceros, sean ellos personas naturales o jurídicas y en especial ante entidades bancarias y crediticias como deudora de toda clase de operaciones de crédito, otorgando las garantías del caso cuando a ello hubiere lugar. 14. Ejecución de actos y contratos convenientes o que fueren necesarios para el cabal cumplimiento de su objeto social y que tengan relación directa con el objeto de la sociedad. 15. Realización de actividades complementarias, conexas o útiles para el desarrollo del objeto social. 16. Representación nacional y extranjera de empresas relacionadas con su objeto social. 17. Dar y recibir dinero en mutuo con interés o sin interés para lo cual deberá exigir las garantías reales o personales que se requieran en cada caso. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad

económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : $10.000.000.000,00
No. de acciones : 5.000,00
Valor nominal : $2.000.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : $200.000.000,00
No. de acciones : 100,00
Valor nominal : $2.000.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $0,00
No. de acciones : 0,00
Valor nominal : $0,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La administración y representación legal de la sociedad está en cabeza del representante legal, quien no tendrá suplentes.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y

contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 2 del 27 de junio de 2024, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 16 de julio de 2024 con el No. 03139147 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	Isduar Humberto Paez Ramos	C.C. No. 4158923

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
Acta No. 1 del 4 de junio de 2024 de la Asamblea de Accionistas	03139146 del 16 de julio de 2024 del Libro IX
Acta No. 2 del 7 de julio de 2025 de la Asamblea de Accionistas	03277119 del 16 de julio de 2025 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 7 de septiembre de 2026 Hora: 20:57:16
Recibo No. AB26584102
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B265841024F5D2

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4210
Actividad secundaria Código CIIU: 4290
Otras actividades Código CIIU: 7112

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Microempresa

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 1.195.416.171
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4210

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 11 de octubre de 2023. Fecha de envío de información a Planeación : 29 de julio de 2025. \n \n Señor

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 7 de septiembre de 2026 Hora: 20:57:16
Recibo No. AB26584102
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B265841024F5D2

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141249814722

(415)7707212489984(8020) 000014124981472 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 6 2 0 7 7	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
FAPAIS SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Cucunubá 2 2 4

41. Dirección principal
CR 5 1 56

42. Correo electrónico FAPAIS.CONTABLE@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 5 6 0 2 0 3 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 3 0 9 2 8							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	2	4	7	4	8	5	2															

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
47 - Régimen Simple de Tributación - SIM
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2026-05-05 / 08:19:02AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PAEZ RAMOS ISDUAR HUMBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141249814722

(415)7707212489984(8020) **000014124981472 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 6 2 0 7 7	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	0	
73. Fecha	2 0 2 3 0 9 2 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 3 1 0 1 0	
77. No. Matrícula mercantil	0 3 7 4 0 8 9 1	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	1 0 1	2 0 2 4 0 1 1 8		-
2	8 1	2 0 2 4 0 1 1 8		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141249814722

(415)7707212489984(8020) **000014124981472 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 6 2 0 7 7	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 7 1 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	4 1 5 8 9 2 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PAEZ	RAMOS	ISDUAR	HUMBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 302205017

PIB
16:07:43

Bogotá DC, 01 de septiembre del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona FAPAIS SAS identificado(a) con NIT número 9017620774:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 22 de septiembre de 2026, a las 09:17:14, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	901762077
Código de Verificación	901762077260922091714

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

Policía Nacional de Colombia

(https://www.policia.gov.co/)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 22/09/2026 09:06:19 a. m. para **- NIT, sin digito de verificación:** Nº. **901762077**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **148157650** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir


CÉDULA DE CIUDADANÍA
REPÚBLICA DE COLOMBIA
NUIP 80.217.561
Apellidos
VELASQUEZ FORERO
Nombres
JUAN CARLOS
Nacionalidad
COL
Estatura
1.75
Sexo
M
Fecha de nacimiento
08 JUN 1981
G.S.
A+
Lugar de nacimiento
BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)
Fecha y lugar de expedición
15 JUN 1999, BOGOTA D.C.
Firma
Fecha de expiración
09 SEPT 2032


.CO
004994626
REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha
ICCOL004994626215001<<<<<<<<<<<
8106089M3209099COL80217561<<<9
VELASQUEZ<FORERO<<JUAN<CARLOS<

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 24 de agosto de 2026 Hora: 09:15:25
Recibo No. AB26500325
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2650032508B6A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

****

EL JUEVES 3 DE DICIEMBRE DE 2026, SE ELEGIRÁ JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE HASTA EL 3 DE NOVIEMBRE ACORDE CON EL OFICIO 303-256110 DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. PARA INFORMACIÓN DETALLADA PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO (601) 5941000 EXT. 2597, AL CORREO ELECCIONJUNTADIRECTIVA@CCB.ORG.CO, DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL (AVENIDA EL DORADO #68D-35, PISO 8), O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCB.ORG.CO/ELECCIONES2026

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: NYS CONSTRUCOL S.A.S
Nit: 901306834 9
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No.	04118641
Fecha de matrícula:	19 de junio de 2026
Último año renovado:	2026
Fecha de renovación:	19 de febrero de 2026
Grupo NIIF:	Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal:	Cr 82A No 82A-04
Municipio:	Bogotá D.C.
Correo electrónico:	nysconstrucol.contable@gmail.com
Teléfono comercial 1:	3102595502
Teléfono comercial 2:	3166925077
Teléfono comercial 3:	No reportó.

Dirección para notificación judicial:	Cr 82A No 82A-04
Municipio:	Bogotá D.C.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 24 de agosto de 2026 Hora: 09:15:25
Recibo No. AB26500325
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2650032508B6A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Correo electrónico de notificación: nysconstrucol.contable@gmail.com
Teléfono para notificación 1: 3102595502
Teléfono para notificación 2: 3166925077
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 18 de julio de 2019 de Asamblea de Accionistas, inscrito en la Cámara de Comercio de Tunja, el 25 de julio de 2019, con el No. 32436 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada NYS CONSTRUCOL S.A.S.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 007 del 15 de mayo de 2024, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 19 de Junio de 2026 , con el No. 03406279 del Libro IX, la Sociedad cambió su domicilio de Tunja (Boyacá) a Coper (Boyacá).

Por Acta No. 012 del 23 de abril de 2026, de Asamblea de Accionista, inscrita inicialmente en la Cámara de Comercio de Tunja, el 22 de mayo de 2026 y posteriormente inscrita en esta Cámara de Comercio, el 19 de Junio de 2026 , con el No. 03406279 del Libro IX, la Sociedad trasladó su domicilio de Coper (Boyacá) a Bogotá D.C.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 24 de agosto de 2026 Hora: 09:15:25
Recibo No. AB26500325
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2650032508B6A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La Sociedad tendrá como objeto principal la construcción de carreteras y vías de ferrocarril, la construcción de proyectos de servicio público, la construcción de edificios residenciales y no residenciales y las actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica licita tanto en Colombia como en el extranjero. La Sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la Sociedad.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : $20.000.000.000,00
No. de acciones : 10.000,00
Valor nominal : $2.000.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : $1.000.000.000,00
No. de acciones : 500,00
Valor nominal : $2.000.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $1.000.000.000,00
No. de acciones : 500,00
Valor nominal : $2.000.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la Sociedad por Acciones Simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien no tendrá suplentes.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 24 de agosto de 2026 Hora: 09:15:25
Recibo No. AB26500325
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2650032508B6A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La Sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el Representante Legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el Representante Legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia el funcionamiento de la Sociedad. El represente legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la Sociedad. En las relaciones frente a terceros, la Sociedad quedara obligada por los actos y contratos celebrados por el Representante Legal.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 011 del 11 de noviembre de 2025, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 19 de junio de 2026 con el No. 03406279 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	Velasquez Forero Juan Carlos	C.C. No. 80217561

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 006 del 29 de febrero de 2024, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 19 de junio de 2026 con el No. 03406279 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal	Yulian Fabian Forero Vargas	C.C. No. 1055963807 T.P. No. 305777-T

Por Acta No. 010 del 8 de junio de 2025 de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 19 de junio de 2026, con el

No. 03406279 del Libro IX, se removió del cargo a Yulian Fabian Forero Vargas.

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
Acta No. 004 del 8 de marzo de 2022 de la Asamblea de Accionistas	03406279 del 19 de junio de 2026 del Libro IX
Acta No. 007 del 15 de mayo de 2024 de la Asamblea de Accionistas	03406279 del 19 de junio de 2026 del Libro IX
Acta No. 010 del 8 de junio de 2025 de la Asamblea de Accionistas	03406279 del 19 de junio de 2026 del Libro IX
Acta No. 012 del 23 de abril de 2026 de la Asamblea de Accionistas	03406279 del 19 de junio de 2026 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4210

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 24 de agosto de 2026 Hora: 09:15:25
Recibo No. AB26500325
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2650032508B6A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Actividad secundaria Código CIIU: 4220
Otras actividades Código CIIU: 4111, 4112

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Pequeña

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 1.916.476.104
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4210

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre Planeación son informativos: Fecha de envío de información a Planeación : 2 de julio de 2026. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 24 de agosto de 2026 Hora: 09:15:25
Recibo No. AB26500325
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2650032508B6A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 09 Solicitud de actualización de datos de identificación

4. Número de formulario 141268560983

(415)7707212489984(8020) 000014126856098 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 0 6 8 3 4	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
NYS CONSTRUCOL S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 82 A 82 A 04

42. Correo electrónico nysconstrucol.contable@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 2 5 9 5 5 0 2	3 1 6 6 9 2 5 0 7 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 2 1 0	2 0 1 9 0 7 1 8	4 2 2 0	2 0 1 9 0 7 1 8		4 1 1 1	4 1 1 2

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	2	4	7	4	8	5	2	5	5													

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
47 - Régimen Simple de Tributación - SIM
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☐ 60. No. de Folios: 61. Fecha 2026-08-14 / 03:26:18PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre VELANDIA GALINDO JUDITH LILIANA

985. Cargo Gestor I

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141268560983

(415)7707212489984(8020) **000014126856098 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 0 6 8 3 4	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número		0 1 2
73. Fecha	2 0 1 9 0 7 1 8	2 0 2 6 0 4 2 3
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 9 0 7 2 5	2 0 2 6 0 6 1 9
77. No. Matrícula mercantil	1 7 3 5 1 9	0 4 1 1 8 6 4 1
78. Departamento	1 5	1 1
79. Ciudad/Municipio	3 8	4
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 9 0 7 2 5	2 0 1 9 0 7 2 5
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 9 0 7 1 8		-
2	1 0 1	2 0 2 4 0 1 0 3		-
3	4 8	2 0 1 9 0 7 1 8		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141268560983

(415)7707212489984(8020) **000014126856098 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 0 6 8 3 4	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 6 0 6 1 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 2 1 7 5 6 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VELASQUEZ	FORERO	JUAN	CARLOS

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141268560983

(415)7707212489984(8020) **000014126856098 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 0 6 8 3 4	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 5 3 3 2 4 5 6 8		1 8 6 5 7 9

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
RAMIREZ	CASTELLANOS	JULIAN	CAMILO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 0 1 0 2

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 302299758

PIB
08:19:21

Bogotá DC, 03 de septiembre del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona NYS CONSTRUCOL S.A.S. identificado(a) con NIT número 9013068349:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx



Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 22 de septiembre de 2026, a las 09:16:01, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	901306834
Código de Verificación	901306834260922091601

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

Policía Nacional de Colombia

(https://www.policia.gov.co/)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 22/09/2026 09:07:55 a. m. para **- NIT, sin digito de verificación:** Nº. **901306834**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **148157862** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir


CÉDULA DE CIUDADANÍA
REPÚBLICA DE COLOMBIA
NUIP 80.217.561
Apellidos
VELASQUEZ FORERO
Nombres
JUAN CARLOS
Nacionalidad
COL
Estatura
1.75
Sexo
M
Fecha de nacimiento
08 JUN 1981
G.S.
A+
Lugar de nacimiento
BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)
Fecha y lugar de expedición
15 JUN 1999, BOGOTA D.C.
Firma
Fecha de expiración
09 SEPT 2032


.CO
004994626
REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha
ICCOL004994626215001<<<<<<<<<<<
8106089M3209099COL80217561<<<9
VELASQUEZ<FORERO<<JUAN<CARLOS<



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.010.200.976**

PACHON RONCANCIO

APELLIDOS

JUAN FRANCISCO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-ENE-1992**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 ESTATURA

B+ G.S. RH

M SEXO

20-ENE-2010 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1500150-00214422-M-1010200976-20100213 **00208**64018A 1 34111937

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 25 — Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio

4. Número de formulario: 141194787342

(415)7707212489984(8020) 000014119478734 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
901974049	8	Impuestos de Bogotá 32	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: CONSORCIO PAIS

36. Nombre comercial	37. Sigla
CONSORCIO PAIS	CP

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Bogotá D.C. 11	Bogotá, D.C. 001

41. Dirección principal: CR 82 A # 82 A - 04 CA 2 PISO

42. Correo electrónico: CONSTRUCTORAPAIS@HOTMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
111031	3102595502	3222186323

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4210	20250725	4220	20250725	4290				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	8	9	14	16	33	48	55																		

07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
33- Impuesto nacional al consumo
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0 — 61. Fecha: 2025-08-04 / 02:42:32PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: VELASQUEZ FORERO JUAN CARLOS

985. Cargo: Representante Legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141194787342

(415)7707212489984(8020) **000014119478734 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 7 4 0 4 9	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 5 0 6 2 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 5	
79. Ciudad/Municipio	1 7 6	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 5 0 6 2 5
81. Hasta	2 0 3 0 0 7 2 5

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141194787342

(415)7707212489984(8020) **000014119478734 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 7 4 0 4 9	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 0 6 2 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 2 1 7 5 6 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VELASQUEZ	FORERO	JUAN	CARLOS

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 5 0 6 2 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 1 0 2 0 0 9 7 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PACHON	RONCANCIO	JUAN	FRANCISCO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141194787342

(415)7707212489984(8020) **000014119478734 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 7 4 0 4 9	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 0 6 3 6 4 7	3	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCTORA PAIS S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 0	2 0 2 5 0 6 2 5	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 3 6 8 8 3 7	6	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCCIONES V&P S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 5 0 6 2 5	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 3 0 6 8 3 4	9	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: NYS CONSTRUCOL SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 0	2 0 2 5 0 6 2 5	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 7 6 2 0 7 7	4	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: FAPAIS SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 0	2 0 2 5 0 6 2 5	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.010.200.976**

PACHON RONCANCIO

APELLIDOS

JUAN FRANCISCO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-ENE-1992**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 ESTATURA

B+ G.S. RH

M SEXO

20-ENE-2010 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1500150-00214422-M-1010200976-20100213 **00208**64018A 1 34111937

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 22 de septiembre de 2026, a las 09:20:07, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	010200976
Código de Verificación	010200976260922092007

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 303376777

PIB
11:44:19

Bogotá DC, 22 de septiembre del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1010200976:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx



Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D.C.

CERTIFICA

Que una vez consultado el sistema de Registro de Sanciones e Inhabilidades Disciplinarias de la Personería de Bogotá D.C., el señor(a) **JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO,** quien se identifica con

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **1010200976** de BOGOTA D.C.
(MIL DIEZ MILLONES DOSCIENTOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS)
NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

Esta Certificación es válida, siempre y cuando el número consignado en el respectivo documento de identificación, coincida con el aquí registrado. El certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Personería de Bogotá D.C., contiene las anotaciones de sanciones e inhabilidades disciplinarias que reporten las Entidades Distritales y las dependencias de la Personería de Bogotá D.C., con atribuciones Disciplinarias.

ADVERTENCIAS:

* El certificado de antecedentes disciplinarios ordinario deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes (Inciso 3°, artículo 238 - Ley 1952 de 2019).

* Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro, en el certificado de antecedentes disciplinarios especial (Inciso 4°, artículo 238 - Ley 1952 de 2019).

* Tres o más sanciones disciplinarias en los últimos cinco (5) años por faltas graves o leves dolosas o por ambas, constituye inhabilidad para desempeñar cargos públicos. Esta inhabilidad tendrá una duración de tres (3) años contados a partir de la ejecutoria de la última sanción. (numeral 2°, artículo 42 - Ley 1952 de 2019).

* Certificado expedido de conformidad con el numeral 5, artículo 102 del Decreto Ley 1421 de 1993, artículo 238 de la Ley 1952 de 2019, numeral 4.5, artículo 16 y numeral 6, artículo 21 del Acuerdo Distrital 755 de 2019.

* Para todos los efectos esta certificación debe ser complementada con la expedida por la Procuraduría General de la Nación.

* Certificado expedido sin costo alguno.

JAIRO AGUIRRE GONZÁLEZ
Personero Delegado (E) Para El Juzgamiento Disciplinario I

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 09:58:25 horas del 22/09/2026, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **1010200976,** Apellidos y Nombres **PACHON RONCANCIO JUAN FRANCISCO**

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **CONSORCIO PAIS**, con NIT **901974049-8** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 *"por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones"* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *"por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018"*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

© 2026 Policía Nacional de Colombia - Grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones DIJIN

Policía Nacional de Colombia

(https://www.policia.gov.co/)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 22/09/2026 09:59:54 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **1010200976** y Nombre: **JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **148165019** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales


La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 09:51:48 AM horas del 22/09/2026, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **1010200976**
Apellidos y Nombres: **PACHON RONCANCIO JUAN FRANCISCO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

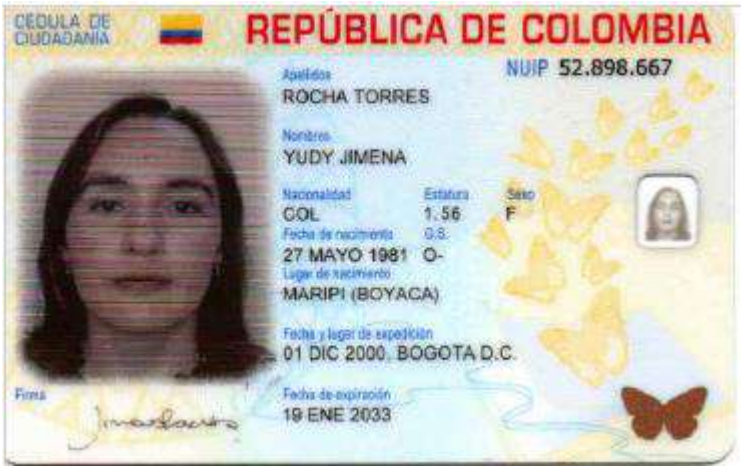
CEDULA DE CIUDADANIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 52.898.667

Apellidos
ROCHA TORRES

Nombres
YUDY JIMENA

Nacionalidad
COL

Estatura
1.56

Sexo
F

Fecha de nacimiento
27 MAYO 1981

G.S.
O-

Lugar de nacimiento
MARIPI (BOYACA)

Fecha y lugar de expedición
01 DIC 2000. BOGOTA D.C.

Firma

Fecha de expiración
19 ENE 2033


.00

0133353775

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL0133537750150O1<<<<<<<<<<<
8105277F3301199COL52898667<<<4
ROCHA<TORRES<<YUDY<JIMENA<<<<<

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 302582169

PIB
16:28:16

Bogotá DC, 08 de septiembre del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) YUDY JIMENA ROCHA TORRES identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 52898667:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 22 de septiembre de 2026, a las 09:21:20, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	52898667
Código de Verificación	52898667260922092120

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D.C.

CERTIFICA

Que una vez consultado el sistema de Registro de Sanciones e Inhabilidades Disciplinarias de la Personería de Bogotá D.C., el señor(a) **YUDY JIMENA ROCHA TORRES,** quien se identifica con

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **52898667** de BOGOTA D.C.

(CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE)

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

Esta Certificación es válida, siempre y cuando el número consignado en el respectivo documento de identificación, coincida con el aquí registrado. El certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Personería de Bogotá D.C., contiene las anotaciones de sanciones e inhabilidades disciplinarias que reporten las Entidades Distritales y las dependencias de la Personería de Bogotá D.C., con atribuciones Disciplinarias.

ADVERTENCIAS:

* El certificado de antecedentes disciplinarios ordinario deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes (Inciso 3°, artículo 238 - Ley 1952 de 2019).

* Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro, en el certificado de antecedentes disciplinarios especial (Inciso 4°, artículo 238 - Ley 1952 de 2019).

* Tres o más sanciones disciplinarias en los últimos cinco (5) años por faltas graves o leves dolosas o por ambas, constituye inhabilidad para desempeñar cargos públicos. Esta inhabilidad tendrá una duración de tres (3) años contados a partir de la ejecutoria de la última sanción. (numeral 2°, artículo 42 - Ley 1952 de 2019).

* Certificado expedido de conformidad con el numeral 5, artículo 102 del Decreto Ley 1421 de 1993, artículo 238 de la Ley 1952 de 2019, numeral 4.5, artículo 16 y numeral 6, artículo 21 del Acuerdo Distrital 755 de 2019.

* Para todos los efectos esta certificación debe ser complementada con la expedida por la Procuraduría General de la Nación.

* Certificado expedido sin costo alguno.

JAIRO AGUIRRE GONZÁLEZ
Personero Delegado (E) Para El Juzgamiento Disciplinario I

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 09:55:39 horas del 22/09/2026, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **52898667,**
Apellidos y Nombres **ROCHA TORRES YUDY JIMENA**

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **CONSORCIO PAIS**, con NIT **901974049-8** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 *"por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones"* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *"por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018"*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

© 2026 Policía Nacional de Colombia - Grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones DIJIN

Policía Nacional de Colombia

(https://www.policia.gov.co/)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 22/09/2026 10:01:55 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **52898667** y Nombre: **YUDY JIMENA ROCHA TORRES.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **148165270** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 09:50:25 AM horas del 22/09/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **52898667**

Apellidos y Nombres: **ROCHA TORRES YUDY JIMENA**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **4.158.923**

PAEZ RAMOS

APELLIDOS

ISDUAR HUMBERTO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **30-SEP-1976**

MARIPI
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.81	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

19-MAY-1995 MARIPI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0705200-00184246-M-0004158923-20091008 **0016**974217A 2 30028364

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 302205376

PIB
16:09:26

Bogotá DC, 01 de septiembre del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ISDUAR HUMBERTO PAEZ RAMOS identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 4158923:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 22 de septiembre de 2026, a las 09:22:48, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	4158923
Código de Verificación	4158923260922092248

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D.C.

CERTIFICA

Que una vez consultado el sistema de Registro de Sanciones e Inhabilidades Disciplinarias de la Personería de Bogotá D.C., el señor(a) **ISDUAR HUMBERTO PAEZ RAMOS,** quien se identifica con

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **4158923** de MARIPI

(CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES)

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

Esta Certificación es válida, siempre y cuando el número consignado en el respectivo documento de identificación, coincida con el aquí registrado. El certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Personería de Bogotá D.C., contiene las anotaciones de sanciones e inhabilidades disciplinarias que reporten las Entidades Distritales y las dependencias de la Personería de Bogotá D.C., con atribuciones Disciplinarias.

ADVERTENCIAS:

* El certificado de antecedentes disciplinarios ordinario deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes (Inciso 3°, artículo 238 - Ley 1952 de 2019).

* Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro, en el certificado de antecedentes disciplinarios especial (Inciso 4°, artículo 238 - Ley 1952 de 2019).

* Tres o más sanciones disciplinarias en los últimos cinco (5) años por faltas graves o leves dolosas o por ambas, constituye inhabilidad para desempeñar cargos públicos. Esta inhabilidad tendrá una duración de tres (3) años contados a partir de la ejecutoria de la última sanción. (numeral 2°, artículo 42 - Ley 1952 de 2019).

* Certificado expedido de conformidad con el numeral 5, artículo 102 del Decreto Ley 1421 de 1993, artículo 238 de la Ley 1952 de 2019, numeral 4.5, artículo 16 y numeral 6, artículo 21 del Acuerdo Distrital 755 de 2019.

* Para todos los efectos esta certificación debe ser complementada con la expedida por la Procuraduría General de la Nación.

* Certificado expedido sin costo alguno.

JAIRO AGUIRRE GONZÁLEZ
Personero Delegado (E) Para El Juzgamiento Disciplinario I

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 09:57:12 horas del 22/09/2026, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **4158923,**
Apellidos y Nombres **PAEZ RAMOS ISDUAR HUMBERTO**

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **CONSORCIO PAIS**, con NIT **901974049-8** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 *"por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones"* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *"por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018"*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

© 2026 Policía Nacional de Colombia - Grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones DIJIN

Policía Nacional de Colombia

(https://www.policia.gov.co/)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 22/09/2026 10:00:52 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **4158923** y Nombre: **ISDUAR HUMBERTO PAEZ RAMOS.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **148165141** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 09:51:03 AM horas del 22/09/2026, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **4158923**
Apellidos y Nombres: **PAEZ RAMOS ISDUAR HUMBERTO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.


CÉDULA DE CIUDADANÍA
REPÚBLICA DE COLOMBIA
NUIP 80.217.561
Apellidos
VELASQUEZ FORERO
Nombres
JUAN CARLOS
Nacionalidad
COL
Estatura
1.75
Sexo
M
Fecha de nacimiento
08 JUN 1981
G.S.
A+
Lugar de nacimiento
BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)
Fecha y lugar de expedición
15 JUN 1999, BOGOTA D.C.
Firma
Fecha de expiración
09 SEPT 2032


.CO
004994626
REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha
ICCOL004994626215001<<<<<<<<<<<
8106089M3209099COL80217561<<<9
VELASQUEZ<FORERO<<JUAN<CARLOS<

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 302299826

PIB
08:20:14

Bogotá DC, 03 de septiembre del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 80217561:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx



Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 22 de septiembre de 2026, a las 09:23:29, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	80217561
Código de Verificación	80217561260922092329

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D.C.

CERTIFICA

Que una vez consultado el sistema de Registro de Sanciones e Inhabilidades Disciplinarias de la Personería de Bogotá D.C., el señor(a) **JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO,** quien se identifica con

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **80217561** de BOGOTA D.C.
(OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO)
NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

Esta Certificación es válida, siempre y cuando el número consignado en el respectivo documento de identificación, coincida con el aquí registrado. El certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Personería de Bogotá D.C., contiene las anotaciones de sanciones e inhabilidades disciplinarias que reporten las Entidades Distritales y las dependencias de la Personería de Bogotá D.C., con atribuciones Disciplinarias.

ADVERTENCIAS:

* El certificado de antecedentes disciplinarios ordinario deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes (Inciso 3°, artículo 238 - Ley 1952 de 2019).

* Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro, en el certificado de antecedentes disciplinarios especial (Inciso 4°, artículo 238 - Ley 1952 de 2019).

* Tres o más sanciones disciplinarias en los últimos cinco (5) años por faltas graves o leves dolosas o por ambas, constituye inhabilidad para desempeñar cargos públicos. Esta inhabilidad tendrá una duración de tres (3) años contados a partir de la ejecutoria de la última sanción. (numeral 2°, artículo 42 - Ley 1952 de 2019).

* Certificado expedido de conformidad con el numeral 5, artículo 102 del Decreto Ley 1421 de 1993, artículo 238 de la Ley 1952 de 2019, numeral 4.5, artículo 16 y numeral 6, artículo 21 del Acuerdo Distrital 755 de 2019.

* Para todos los efectos esta certificación debe ser complementada con la expedida por la Procuraduría General de la Nación.

* Certificado expedido sin costo alguno.

JAIRO AGUIRRE GONZÁLEZ
Personero Delegado (E) Para El Juzgamiento Disciplinario I

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 09:49:40 AM horas del 22/09/2026, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **80217561**
Apellidos y Nombres: **VELASQUEZ FORERO JUAN CARLOS**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 09:53:44 horas del 22/09/2026, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **80217561,**
Apellidos y Nombres **VELASQUEZ FORERO JUAN CARLOS**

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **CONSORCIO PAIS**, con NIT **901974049-8** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 *"por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones"* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *"por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018"*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

© 2026 Policía Nacional de Colombia - Grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones DIJIN

Policía Nacional de Colombia

(https://www.policia.gov.co/)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 22/09/2026 10:02:46 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **80217561** y Nombre: **JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **148165398** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

CALLE 18 N. 7-28 Centro
Chiquinquirá, Boyacá
constructurapais@hotmail.com

CONSORCIO PAIS
NIT. 901974049-8

CONTRATO SED - 8154780-2025- Lote No. 6

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO identificado con C.C. 80.217.561 de Bogotá D.C. en mi condición de representante legal de **CONSORCIO PAIS,** identificado con el NIT 901974049-8, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de firma de la presente. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Chiquinquirá, a los 22 días del mes de septiembre del 2026.

JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO
C.C 80.217.561 de Bogotá D.C.
R/L: CONSORCIO PAIS

CALLE 18 N. 7-28 Centro
Chiquinquirá, Boyacá
constructurapais@hotmail.com

CONSORCIO PAIS
NIT. 901974049-8

CONTRATO SED - 8154780-2025- Lote No. 6

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

JEHISSON EDGARDO POVEDA CASTRO identificado con C.C. 1.053.328.390 de Chiquinquirá, y con tarjeta profesional 212722-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor riscal de **CONSTRUCTORA PAÍS S.A.S** identificada con el NIT 901063647-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de TUNJA, luego de examinar los estados financieros de la compañía de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, bajo la gravedad de juramento, certificó el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de firma de la presente. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Chiquinquirá - Boyacá, a los 22 días del mes de septiembre del 2026.

JEHISSON EDGARDO POVEDA CASTRO
C.C. 1.053.328.390 de Chiquinquirá
T.P. 212722-T
REVISOR FISCAL

CALLE 18 N. 7-28 Centro
Chiquinquirá, Boyacá
constructurapais@hotmail.com

CONSORCIO PAIS
NIT. 901974049-8

CONTRATO SED - 8154780-2025- Lote No. 6

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO identificado con C.C. 80.217.561 de Bogotá D.C. en mi condición de representante legal de **NYS CONSTRUCOL S.A.S** identificada con el NIT 901306834-9, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de TUNJA, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de firma de la presente. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma Chiquinquirá-Boyacá, a los 22 días del mes de septiembre del 2026.

JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO
C.C 80.217.561 de Bogotá D.C.
R/L: CONSORCIO PAIS

CALLE 18 N. 7-28 Centro
Chiquinquirá, Boyacá
constructurapais@hotmail.com

CONSORCIO PAIS
NIT. 901974049-8

CONTRATO SED - 8154780-2025- Lote No. 6

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

ISDUAR HUMBERTO PAEZ RAMOS identificado con C.C. 4.158.923 de Maripi en mi condición de representante legal de **FAPAIS S.A.S** identificada con el NIT 901762077-4, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre de la presente. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Chiquinquirá-Boyacá, a los 22 días del mes de septiembre del 2026.

ISDUAR HUMBERTO PAEZ RAMOS
C.C 4.158.923 DE MARIPI
R/L: FAPAIS S.A.S

CALLE 18 N. 7-28 Centro
Chiquinquirá, Boyacá
constructurapais@hotmail.com

CONSORCIO PAIS
NIT. 901974049-8

CONTRATO SED - 8154780-2025- Lote No. 6

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO identificado con C.C. 1.010.200.976 de Bogotá D.C. en mi condición de representante legal de **CONSTRUCCIONES VYP S.A.S** identificada con el NIT 901368837-6, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre de la presente. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma Chiquinquirá-Boyacá, a los 22 días del mes de septiembre del 2026.

JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO
C.C. 1.010.200.976 de Bogotá D.C.
R/L: CONSTRUCCIONES VYP S.A.S

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5300159A4CC0626EF

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES


CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JEHISSON EDGARDO POVEDA CASTRO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1053328390 de CHIQUINQUIRA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 212722-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

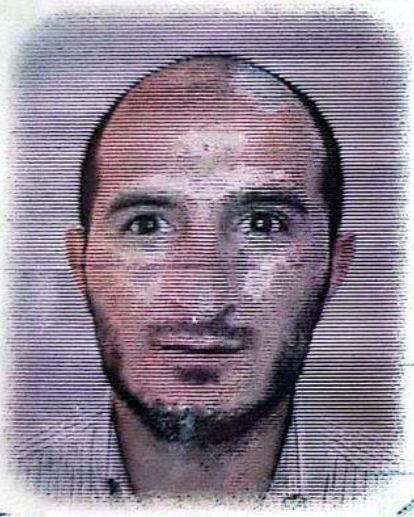

NUIP 1.053.328.390

Apellidos
POVEDA CASTRO

Nombres
JEHISSON EDGARDO

Nacionalidad	Estatura	Sexo
COL	1.66	M

Fecha de nacimiento
04 NOV 1987

G.S.
A+

Lugar de nacimiento
BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)

Fecha y lugar de expedición
09 FEB 2006, CHIQUINQUIRA

Firma

Fecha de expiración
03 FEB 2031

.CO

000120317

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL000120317407067<<<<<<<<<<<
8711049M3102031COL1053328390<0
POVEDA<CASTRO<<JEHISSON<EDGARD



NO VALIDA SIN FIRMA



compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901063647-3	CONSTRUCTORA PAIS SAS	CLL 18 7 28	3202680071	CONSTRUCTORAPAIS@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 cot	UNICA / SUC UNICA	BOYACÁ	CHIQUINQUIRÁ		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95076311	10/09/2026	12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$18,103,519	$5.607.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	301.600	0		0		0	0	0	0	301.600	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	149.600	0		0		0	0	0	0	149.600	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	133.300	0		0		0	0	0	0	133.300	4
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.136.400	0	0	0	0	0	0		1.136.400	3
230301	Porvenir	800224808-8	635.300	0	0	0	0	0	0		635.300	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.125.500	0	0	0	0	0	0		1.125.500	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	1.260.500				1.260.500	0	0	1.260.500			12.605	1.260.500	12

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	724.700	0	0	724.700	12

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	724.700	724.700
Pensión	3	2.897.200	2.897.200
Riesgos Laborales	1	1.260.500	1.260.500
CCF	1	724.700	724.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	5.607.100	5.607.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901063647-3	CONSTRUCTORA PAIS SAS		CLL 18 7 28	3202680071	CONSTRUCTORAPAIS@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 cot	UNICA	SUC UNICA	BOYACÁ	CHIQUINQUIRÁ	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95076311	10/09/2026	12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$18,103,519	$5.607.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1003699260	FUQUENE FUQUENE SERGIO ANDRES	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	5	121.900	CCF10	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 1053340500	MARIN SOTELO SONIA MALENA	1	0			S																	230201	3.600.000	30	576.000	0	0	0	0	EPS005	3.600.000	30	144.000	14-4	3.600.000	30	5	250.600	CCF10	3.600.000	30	144.000	0	0	0	0	0
3	CC 1055553141	MURCIA RONCANCIO MIGUEL ANGEL	1	0			S	X																230301	350.181	6	56.100	0	0	0	0	EPS037	350.181	6	14.100	14-4	350.181	6	5	24.400	CCF10	350.181	6	14.100	0	0	0	0	0
4	CC 1072748167	BELTRAN BELTRAN DIDIER STEVEN	1	0			S	X																230301	641.999	11	102.800	0	0	0	0	EPS017	641.999	11	25.700	14-4	641.999	11	5	44.700	CCF10	641.999	11	25.700	0	0	0	0	0
5	CC 11355388	VILLAMIL RODRIGUEZ LUIS	1	0			S	X																25-14	700.362	12	112.100	0	0	0	0	EPS017	700.362	12	28.100	14-4	700.362	12	5	48.800	CCF10	700.362	12	28.100	0	0	0	0	0
6	CC 3174280	VILLAMIL RODRIGUEZ WILSON RICARDO	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	5	121.900	CCF10	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
7	CC 3193029	GUARIN GUARIN DARIO RAFAEL	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS041	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	5	121.900	CCF10	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
8	CC 5978646	TRUJILLO PEÑA WILLAN	1	0			S	X																25-14	641.999	11	102.800	0	0	0	0	EPS037	641.999	11	25.700	14-4	641.999	11	5	44.700	CCF10	641.999	11	25.700	0	0	0	0	0
9	CC 7169242	CASTIBLANCO GOMEZ JOSE ALBERTO	1	0			S	X																230301	641.999	11	102.800	0	0	0	0	EPS017	641.999	11	25.700	14-4	641.999	11	5	44.700	CCF10	641.999	11	25.700	0	0	0	0	0
10	CC 7278308	PARRA ROBLES WILSON LEONARDO	1	0			S																	25-14	3.939.724	30	630.400	0	0	0	0	EPS005	3.939.724	30	157.600	14-4	3.939.724	30	5	274.300	CCF10	3.939.724	30	157.600	0	0	0	0	0
11	CC 79004700	ANGULO HERRERA EBER HERNAN	1	0			S	X	X															230301	583.635	10	93.400	0	0	0	0	EPS037	583.635	10	23.400	14-4	583.635	10	5	40.700	CCF10	583.635	10	23.400	0	0	0	0	0
12	PT 4821955	GALIANO BRICEÑO MANUEL ALEXANDER	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPSC34	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	5	121.900	CCF10	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901762077-4	FAPAIS SAS	TV 34 A 41 43 S	3105602030	fapais.contable@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOYACÁ	CHIQUINQUIRÁ		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95149522	14/09/2026	17	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$26,578,493	$7.894.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC55	Proteger EPS	901543211-6	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	218.100	0		0		0	0	0	0	218.100	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	144.900	0		0		0	0	0	0	144.900	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	306.100	0		0		0	0	0	0	306.100	5
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	28.100	0		0		0	0	0	0	28.100	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	156.600	0		0		0	0	0	0	156.600	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	592.000	0	0	0	0	0	0		592.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	3.101.000	0	0	0	0	0	0		3.101.000	14
231001	Colfondos	800227940-6	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.512.500				1.512.500	0	0	1.512.500			15.125	1.512.500	17

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	1.064.100	0	0	1.064.100	17

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	1.064.100	1.064.100
Pensión	4	4.253.400	4.253.400
Riesgos Laborales	1	1.512.500	1.512.500
CCF	1	1.064.100	1.064.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	14	7.894.100	7.894.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901762077-4	FAPAIS SAS	TV 34 A 41 43 S	3105602030	fapais.contable@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOYACÁ	CHIQUINQUIRÁ		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95149522	14/09/2026	17	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$26,578,493	$7.894.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1000123863	CARRANZA PACHON ANDIRI ANETH	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	ESSC24	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF10	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 1002603380	GONZALEZ FONSECA LUIS ALBERTO	1	0			S	x																230301	700.362	12	112.100	0	0	0	0	EPS042	700.362	12	28.100	14-11	700.362	12	5	48.800	CCF10	700.362	12	28.100	0	0	0	0	0
3	CC 1007973351	BARON CABEZA JOSEPH CALEB	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF10	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
4	CC 1010218702	ANAYA FRANCO ANDRES DAVID	1	0			S																	231001	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF10	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
5	CC 1022973256	PARADA NARVAEZ WILSON	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF10	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
6	CC 1050603140	ROJAS PAIPILLA YAIHR GUSTAVO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	CCFC55	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF10	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
7	CC 1055206036	ROJAS FONSECA GERARDO	1	0			S		x															230301	408.545	7	65.400	0	0	0	0	ESSC24	408.545	7	16.400	14-11	408.545	7	5	28.500	CCF10	408.545	7	16.400	0	0	0	0	0
8	CC 1055963439	MATALLANA RINCON YEIMY YAMILE	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	ESSC24	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF10	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
9	CC 1055963752	CASALLAS ROBAYO ILBAR FERNANDO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF10	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
10	CC 1057608238	ROJAS SUAREZ DAIRO YAIR	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF10	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
11	CC 1070328680	MERLO ROJAS LUIS ALBERTO	1	0			S	x	x															230301	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS017	116.727	2	4.700	14-11	116.727	2	5	8.200	CCF10	116.727	2	4.700	0	0	0	0	0
12	CC 1143442963	CHAMORRO MANGA FREIDER	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS041	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF10	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
13	CC 33703778	RUIZ GARCIA MARIA ISABEL	1	0			S																	230201	3.700.000	30	592.000	0	0	0	0	EPS005	3.700.000	30	148.000	14-11	3.700.000	30	5	257.600	CCF10	3.700.000	30	148.000	0	0	0	0	0
14	CC 4158923	PAEZ RAMOS ISDUAR HUMBERTO	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF10	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
15	CC 74343330	ROJAS FONSECA GUSTAVO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF10	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
16	CC 80181087	ROMERO VIVAS CRISTIAN MARLON	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF10	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
17	CC 9399276	MONTAÑA VALDERRAMA DANILO	1	0			S	x	x															230301	641.999	11	102.800	0	0	0	0	EPS037	641.999	11	25.700	14-11	641.999	11	5	44.700	CCF10	641.999	11	25.700	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901306834-9	NYS CONSTRUCOL SAS	CARRERA 2B 42A 32	3202680071	nysconstrucol.contable@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	B – menos de 200 cot		BOYACÁ	TUNJA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95035016	09/09/2026	2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$3,501,810	$1.085.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	70.100	0		0		0	1	100	0	70.200	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	70.100	0		0		0	1	100	0	70.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	560.400	0	0	0	0	1	500	0	560.900	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	243.800				243.800	1	200	244.000			2.438	244.000	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	70.100	1	100	70.200	1
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	70.100	1	100	70.200	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	140.200	140.400
Pensión	1	560.400	560.900
Riesgos Laborales	1	243.800	244.000
CCF	2	140.200	140.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	1.084.600	1.085.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901306834-9	NYS CONSTRUCOL SAS	CARRERA 2B 42A 32	3202680071	nysconstrucol.contable@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	B – menos de 200 cot		BOYACÁ	TUNJA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95035016	09/09/2026	2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$3,501,810	$1.085.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Excepción	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1030690187	BENITEZ MENDOZA ALVARO ZAMIR	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS041	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF10	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 80217561	VELASQUEZ FORERO JUAN CARLOS	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901368837-6	VYP CONSTRUCCIONES SAS	CALLE 4 N 5 - 90	3212837104	construccionesvyp2000@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOYACÁ	CHIQUINQUIRÁ		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94624655	14/09/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$1,750,905	$431.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	70.100	0		0		0	5	300	0	70.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	280.200	0	0	0	0	5	1.100	0	281.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	9.200				9.200	5	100	9.300			92	9.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	70.100	5	300	70.400	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	5	0	0	0
ICBF				
0	5	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	70.100	70.400
Pensión	1	280.200	281.300
Riesgos Laborales	1	9.200	9.300
CCF	1	70.100	70.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	429.600	431.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901368837-6	VYP CONSTRUCCIONES SAS	CALLE 4 N 5 - 90	3212837104	construccionesvyp2000@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOYACÁ	CHIQUINQUIRÁ		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94624655	14/09/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$1,750,905	$431.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Excenvalo	IND	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1056412289	GARCIA BENITEZ IVETH DAYANA	1	0			5																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF10	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

0112 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

UNIDAD EJECUTORA 01

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número : 1116

CRISTIAN OSWALDO CARMONA SANCHEZ

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2026 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
O230117220120200008	Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C.	O2320202005040154129 Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales	1-100-F039 VA-CRÉDITO	460.000.000
			Total	**460.000.000**

Objeto:

MODIFICACION No.3_ ADICION CONTRATO DE OBRA No.8154780 DE 2025 CUYO OBJETO ES: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE 6.

Se expide a solicitud de ABEL REINERIO MATIZ SALAZAR Cargo SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA, mediante oficio número 1101 de JULIO 23 DE 2026.

Bogotá D.C. JULIO 26 DE 2026

Documento firmado por: CRISTIAN OSWALDO CARMONA SANCHEZ / Cargo: RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Aprobó: CCARMONA 27.07.2026

Elaboró: RHERNANDEZ 26.07.2026

Impresión:27.07.2026-23:14:33 CCARMONA 0000901143 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION
DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

BOGOTA

AREA DE CONSERVACION - GESTION TERRITORIAL

EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN COLEGIOS DISTRITALES

INFORMACION GENERAL DE INTERVENCION EN INFRAESTRUCTURA

N°	LOC.	CPF	NOMBRE DEL COLEGIO	SEDE	NOMBRE SEDE	EJE TEMATICO	TOTAL COSTOS DIRECTOS	VALOR TOTAL
4	Ciudad Bolívar	1943	RAFAEL URIBE URIBE	A	Rafael Uribe Uribe		$ 131.656.325	$ 173.786.349

AREA APROXIMADA	120,00 M2	ALCANCE ESPECIFICO	Adecuación integral de las baterías sanitarias de niños y niñas del bloque de Preescolar (Ciclo I), incluyendo demoliciones, revisión de redes hidrosanitarias, suministro e instalación de aparatos sanitarios, mesones, orinales, griferías, enchapes de pisos y muros, así como divisiones sanitarias en acero inoxidable. Cambio de cubierta y adecuación de instalaciones eléctricas asociadas a las baterías sanitarias del bloque de Preescolar (Ciclo I).		
ALUMNOS BENEFICIADOS	856	REQUIERE LICENCIA DE CONSTRUCCION	SI		De acuerdo al articulo 8 de la ley 810 de 2003 las reparaciones locativas o mejoras locales que tienen como finalidad mantener el inmueble en debidas condiciones de higiene y ornato, sin afectar su estructura portante, distribución interior y sus características funcionales, formales y/o volumétricas NO requieren Licencia de Construcción.
			NO	X	

LOCALIZACION GENERAL

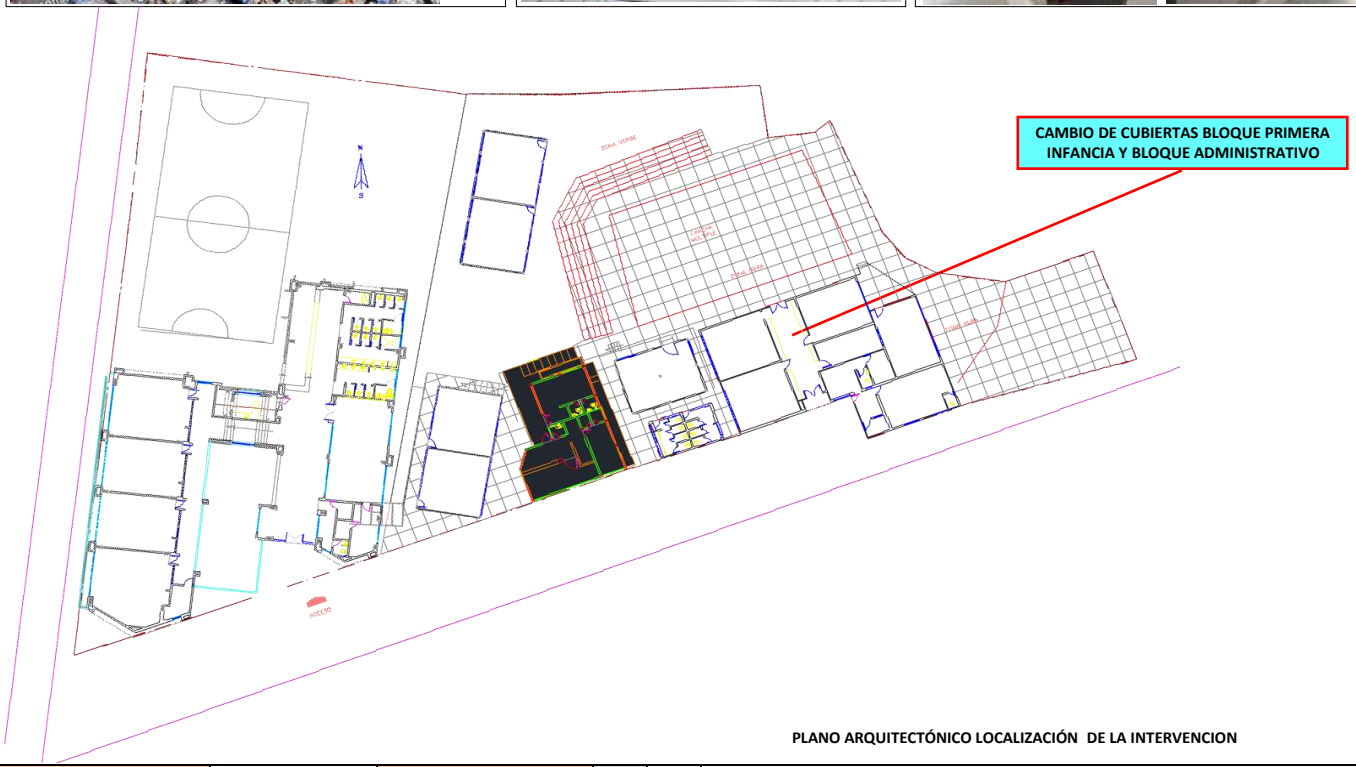


FOTO PROBLEMATICA 1



FOTO PROBLEMATICA 2





PLANO ARQUITECTÓNICO LOCALIZACIÓN DE LA INTERVENCION

PLAZO ESTIMADO DE EJECUCION	120 DÍAS	REQUIERE PLAN DE CONTINGENCIA	SI		POR QUÉ?
			NO	X	

NOTA: El presente presupuesto corresponde a una estimación preliminar formulada con base en la inspección visual realizada en sitio y en la información disponible al momento de su elaboración, considerando un posible proceso constructivo para el desarrollo de la intervención, por lo que su alcance, cantidades y valores se entienden de carácter referencial. En consecuencia, durante el desarrollo de las actividades podrán evidenciarse condiciones técnicas o constructivas no visibles en la fase de diagnóstico, lo que podrá dar lugar a ajustes en los alcances, cantidades, valores y en el proceso constructivo inicialmente previsto, conforme a las condiciones reales encontradas en el área de intervención.

Proyectó: LGUILLERMO ARCINIEGAS
Gestora Territorial - Localidad Ciudad Bolivar

V°/B°: LUISA F LEON OSPINA
Contratista Lider Territorio SUR

FECHA:	23/07/2026

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION
DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

AREA DE CONSERVACION - GESTION TERRITORIAL

EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN COLEGIOS DISTRITALES

INFORMACION GENERAL DE INTERVENCION EN INFRAESTRUCTURA

N°	LOC.	CPF	NOMBRE DEL COLEGIO	SEDE	NOMBRE SEDE	EJE TEMATICO	TOTAL COSTOS DIRECTOS	VALOR TOTAL
4	5	0561	LOS COMUNEROS - OSWALDO GUAYAZAMIN	B	Virrey Ultima Etapa (Oswaldo Guayasamin)	Formación de seres integrales para la vida y la paz, a través de la comunicación, el arte, el deporte y el emprendimiento, desde un enfoque diferencial e inclusivo.	$ 98.566.491	$ 130.107.768

AREA APROXIMADA	74,00 M2	ALCANCE ESPECIFICO	1.Adecuación baterías sanitaria, de niños y niñas del bloque bachillerato piso 1, la cual incluye el baño para personas con movilidad reducida (Incluye demoliciones, enchapes, desmontes, retiros, instalación puertas, trabajos eléctricos, hidráulicos, instalación de aparatos sanitarios, divisiones de baño, pintura, en cumplimiento con las especificaciones de la SED).		
ALUMNOS BENEFICIADOS		REQUIERE LICENCIA DE CONSTRUCCION	SI		De acuerdo al articulo 8 de la ley 810 de 2003 las reparaciones locativas o mejoras locales que tienen como finalidad mantener el inmueble en debidas condiciones de higiene y ornato, sin afectar su estructura portante, distribución interior y sus características funcionales, formales y/o volumétricas NO requieren Licencia de Construcción.
			NO	X	

LOCALIZACION GENERAL



FOTO LOCALIZACION 1 - piso 2



FOTO 2 PROBLEMATICA BATERIAS SANITARIAS



fOTO 3: PROBLEMATICA :BATERIAS SANITARIAS





fOTO 4: PROBLEMATICA : BATERIAS SANITARIAS



fOTO 5: PROBLEMATICA -

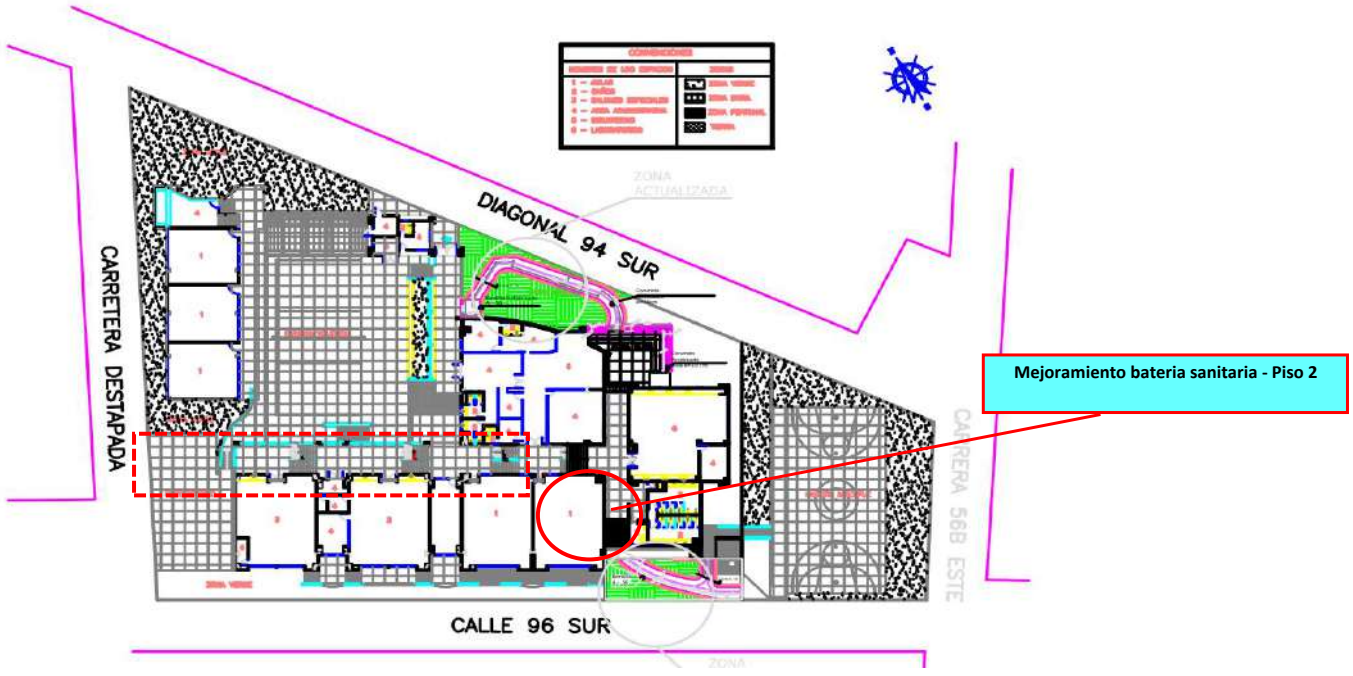

PLANO ARQUITECTÓNICO LOCALIZACIÓN DE LA INTERVENCION


PLAZO ESTIMADO DE EJECUCION	60 DÍAS	REQUIERE PLAN DE CONTINGENCIA	SI		POR QUÉ?
			NO	X	

NOTA: El presente presupuesto corresponde a una estimación preliminar formulada con base en la inspección visual realizada en sitio y en la información disponible al momento de su elaboración, considerando un posible proceso constructivo para el desarrollo de la intervención, por lo que su alcance, cantidades y valores se entienden de carácter referencial. En consecuencia, durante el desarrollo de las actividades podrán evidenciarse condiciones técnicas o constructivas no visibles en la fase de diagnóstico, lo que podrá dar lugar a ajustes en los alcances, cantidades, valores y en el proceso constructivo inicialmente previsto, conforme a las condiciones reales encontradas en el área de intervención.

Proyectó: JOHN ALEJANDRO ALVAREZ
Gestora Territorial - Localidad Usme

V°/B°: LUISA F LEON OSPINA
Contratista Lider Territorio SUR

FECHA:	30/07/2026

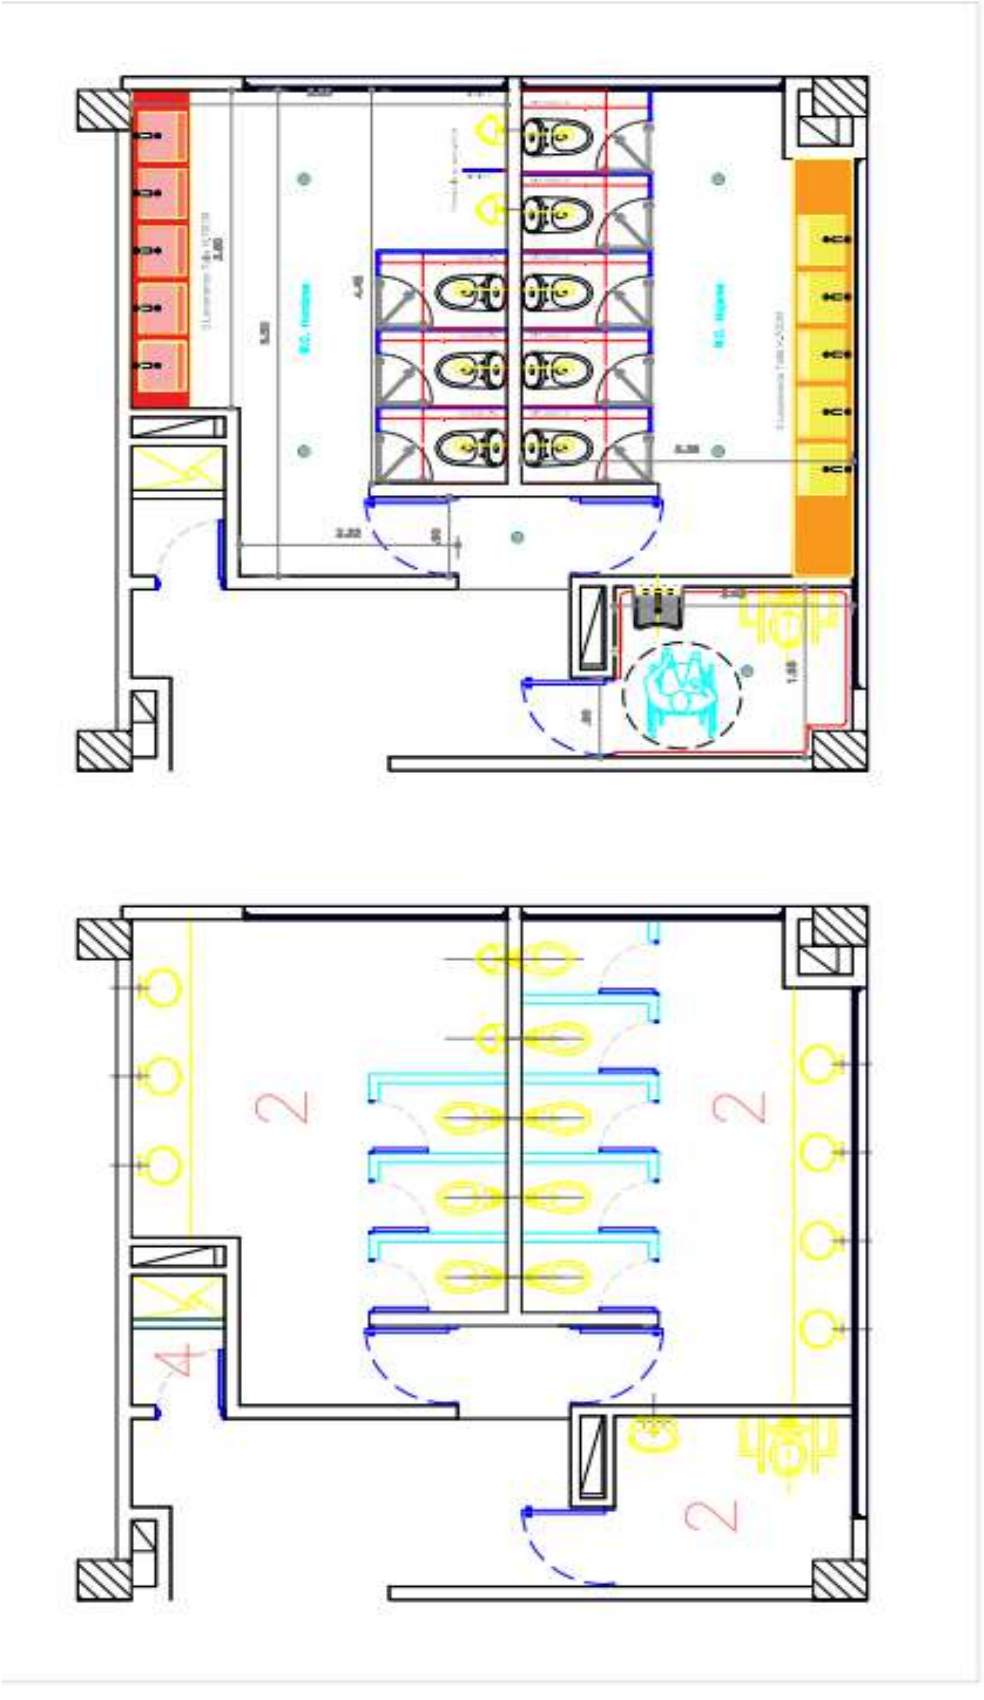

DISEÑO ENTREGADO POR PARTE DEL EQUIPO BASE MEJORAMIENTOS.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

RADICACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA	
Radicado	I-2025-166630
Fecha	04/12/2025
No. Referencia	

MEMORANDO

PARA: **JORGE ALBERTO MORENO ALDANA**
Profesional Especializado - Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE

DE: **ABEL REINERIO MATIZ SALAZAR**
Subsecretario de Acceso y Permanecía

FECHA: Bogotá D.C. noviembre de 2025

ASUNTO: Designación Supervisión Contratos No. CO1.PCCNTR.8168824, CO1.PCCNTR.8169110 y CO1.PCCNTR.8169112 de 2025.

Reciba un cordial saludo:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Manual de Supervisión e Interventoría de la Secretaría de Educación del Distrito, adoptado mediante Resolución 1035 del 12 de junio de 2018, y atendiendo a una necesidad del servicio, me permito comunicar la designación en calidad de SUPERVISOR de los contratos de interventoría que se relacionan a continuación:

NUMERO DE CTO	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	LOTES
CO1.PCCNTR.8168824	EMPRESAS GRUPO ROMERO SAS	1
CO1.PCCNTR.8169110	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	2
CO1.PCCNTR.8169112	ELSA TORRES ARENALES	4

La designación tendrá vigencia a partir de la presente comunicación y hasta la terminación de los contratos relacionados en el asunto.

Es preciso señalar que el ejercicio de la supervisión deberá realizarse con estricto cumplimiento de lo previsto en los artículos 83 al 85 de la Ley 1474 de 2011, así como en el Manual de Supervisión e Interventoría de la SED. Para efectos de consulta, los documentos contractuales se encuentran disponibles en la Plataforma Transaccional SECOP II.

Una vez notificada la presente designación, deberá realizar su publicación en la Plataforma Transaccional SECOP II dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. Asimismo, deberá garantizar que, durante toda su gestión y dentro de los términos establecidos contractual y legalmente, se

realice el cargue completo y oportuno de los documentos relacionados con la ejecución contractual.

Finalmente, se precisa que la presente designación no requiere modificación alguna al contrato, conforme a lo establecido en el numeral 10. Supervisión, nota 4, del Estudio Previo que soportó la celebración de los contratos, el cual indica: *"NOTA 4: El ordenador del gasto podrá modificar la designación de la supervisión cuando así lo requiera, sin que ello implique modificación contractual alguna. Para el efecto bastará una comunicación escrita del Ordenador del Gasto al nuevo supervisor designado, con copia a la Dirección de Contratación y a la Dirección Financiera".*

Cordialmente,

ABEL REINERIO MATIZ SALAZAR
Subsecretario de Acceso y Permanencia

Aprobó: Andrés Ivannó Galeano Toro – Director de DCCEE

Revisó: Juan David Vélez Bolívar – Contratista SAP

Revisó: Abg. Paula Andrea Panesso Sánchez – Líder jurídica contratista DCCEE-SED
Ing. Carolina Machado Valdes – Asesora técnica contratista DCCEE-SED

Elaboró Ing. Jenny Paola Falla – Contratista DCCEE-SED

Copia: Oficina de Contratos - Dra. Ana María Briceño Campos
Dirección Financiera- Dr. Cristian Oswaldo Carmona Sánchez

Outlook

RE: MODIFICATORIO No. 3 CTO DE OBRA 8154780 LOTE 6 - CONSORCIO PAIS

Desde MATEO GIUSEPPE ENRIQUEZ ENRIQUEZ <menriquez@educacionbogota.gov.co>
Fecha Mié 09/09/2026 11:37
Para PAULA PANESSO SANCHEZ <ppanesso@educacionbogota.gov.co>
CC SANTIAGO ANGEL URIBE <sangelu@educacionbogota.gov.co>; JORGE ALBERTO MORENO ALDANA <jamorenoa@educacionbogota.gov.co>; PAOLA MARGARITA RUIZ MANOTAS <pruiz@educacionbogota.gov.co>

Buenos días Paula,

No tengo observaciones a la SOC. Favor continuar con el trámite.

Un cordial saludo,

Mateo Giuseppe Enríquez
Asesor SAP

De: PAULA PANESSO SANCHEZ <ppanesso@educacionbogota.gov.co>
Enviado: martes, 8 de septiembre de 2026 17:53
Para: MATEO GIUSEPPE ENRIQUEZ ENRIQUEZ <menriquez@educacionbogota.gov.co>
Cc: SANTIAGO ANGEL URIBE <sangelu@educacionbogota.gov.co>; JORGE ALBERTO MORENO ALDANA <jamorenoa@educacionbogota.gov.co>; PAOLA MARGARITA RUIZ MANOTAS <pruiz@educacionbogota.gov.co>
Asunto: RE: MODIFICATORIO No. 3 CTO DE OBRA 8154780 LOTE 6 - CONSORCIO PAIS

Buenas tardes Mateo,

Se remite para revisión el documento del asunto, quedamos atentos a tus consideraciones.

LOTE 06_8154780

Cordialmente,

Paula Andrea Panesso Sánchez
Líder jurídica - Contratista
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos DCCEE
Av. El Dorado N. 66-63
PBX 6013241000
Celular 3002187659

De: PAOLA MARGARITA RUIZ MANOTAS <pruiz@educacionbogota.gov.co>
Enviado: martes, 8 de septiembre de 2026 10:46
Para: PAULA PANESSO SANCHEZ <ppanesso@educacionbogota.gov.co>

Outlook

RE: Solicitud validación financiera de los contratos de mejoramiento Lotes 4, 5 , 6, 7 y 9 de obra, y Lote 2 de interventoría.

Desde CLAUDIA MARCELA DUARTE CEPEDA <cduartec@educacionbogota.gov.co>
Fecha Mar 22/09/2026 16:25
Para PAULA PANESSO SANCHEZ <ppanesso@educacionbogota.gov.co>
CC HERNANDO JOSE LONDONO EBRATT <hlondono@educacionbogota.gov.co>; PAOLA MARGARITA RUIZ MANOTAS <pruiz@educacionbogota.gov.co>; MARIA AYDE JIMENEZ PORRAS <mjimenez@educacionbogota.gov.co>


Buenas tardes Pau,


Cordial saludo, una vez se realizó la verificación:

LOTE 4

1. CDP No. 1120 del 27 de julio por valor de $209.000.000

2. A la fecha el CDP No. 1120 cuenta con un valor total de $209.000.000 y no presenta liberaciones o anulaciones al valor inicial.

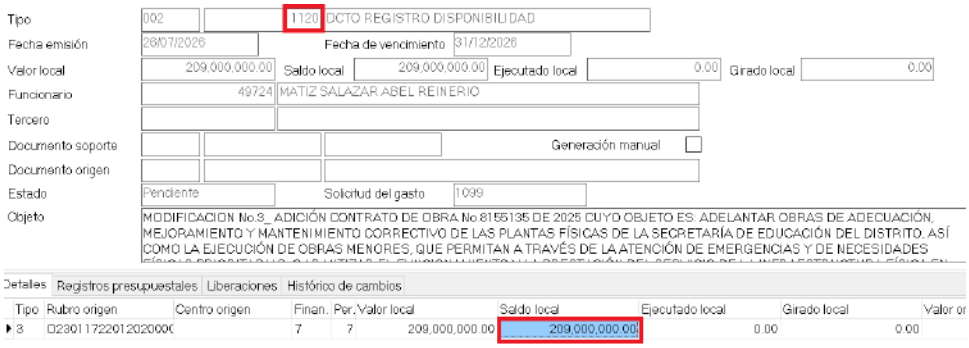

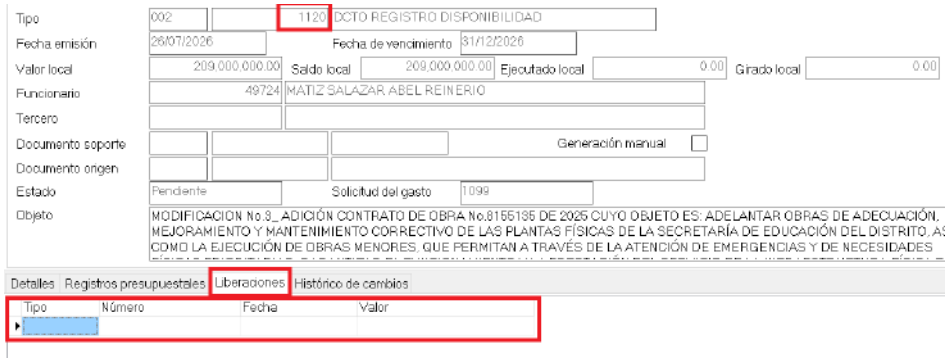

3. Balance Financiero del Contrato a la Fecha:

CONTRATISTA:	**CONSORCIO ADECUACIONES ARSAF 2025**
No. CONTRATO	CO1.PCCNTR.8155135/25
LOTE	4
VALOR INICIAL	2.703.337.443,00
VALOR MODIFICACIONES	1.342.467.488,00
VALOR A LA FECHA	4.045.804.931,00
EJECUTADO A LA FECHA	3.808.711.605,00
% EJECUCIÓN FINANCIERO	94,14%

DISPONIBILIDAD			REGISTRO			
NUMERO	**FECHA**	**VALOR**	**NUMERO**	**FECHA**	**VALOR INICIAL**	**SALDO ACTUAL 22/9/2026**
1642	21-feb-25	43.607.327.343,00	4985	5-sep-25	2.703.337.443,00	-
3694	5-dic-25	480.000.000,00	7553	18-dic-25	479.467.488,00	-
512	12-mar-26	863.575.583,00	3198	27-may-26	863.000.000,00	237.093.326,00
					4.045.804.931,00	**237.093.326,00**


Una vez se realizó la verificación de valores con respecto al SOC estos se encuentran acorde con el CDP. A la fecha hay una diferencia con respecto a la revisión financiera dado que a la fecha de corte del SOC 12 de agosto de 2026 no se habían radicado las actas parciales No. 7 y 8. **Se**


recomienda ajustar la información que el pago 7 ya se encuentra pagado.

LOTE 5

1. CDP No. 1115 del 27 de julio por valor de $140.000.000

2. A la fecha el CDP No. 1115 cuenta con un valor total de $140.000.000 y no presenta liberaciones o anulaciones al valor inicial

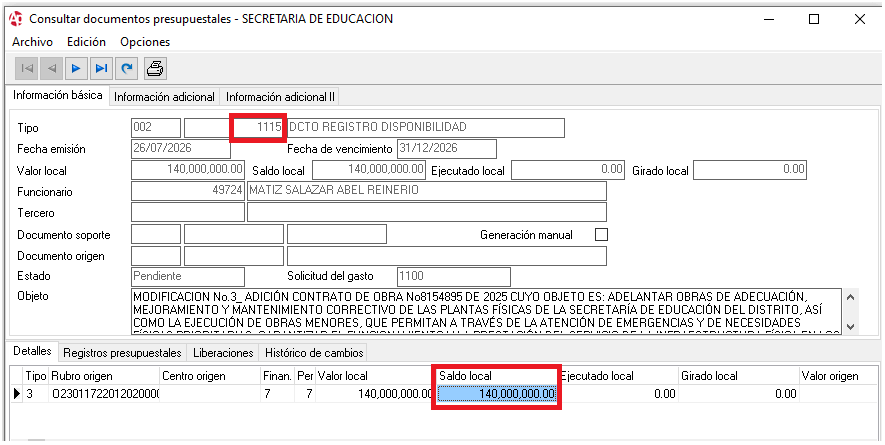

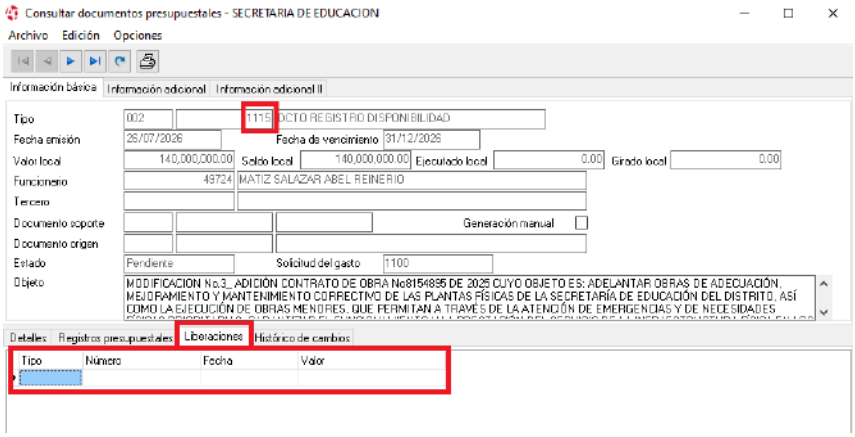

3. Balance Financiero del Contrato a la Fecha:

CONTRATISTA:	**CONSORCIO FORTALEZA**
No. CONTRATO	CO1.PCCNTR.8154895/25
LOTE	5
VALOR INICIAL	2.269.368.717,00
VALOR MODIFICACIONES	1.132.000.000,00
VALOR A LA FECHA	3.401.368.717,00
EJECUTADO A LA FECHA	3.097.932.699,00
% EJECUCIÓN FINANCIERO	91,08%


DISPONIBILIDAD			REGISTRO			
NUMERO	**FECHA**	**VALOR**	**NUMERO**	**FECHA**	**VALOR INICIAL**	**SALDO ACTUAL 22/9/2026**
1642	21-feb-25	43.607.327.343,00	4923	3-sep-25	2.269.368.717,00	-
3695	5-dic-25	515.000.000,00	7600	23-dic-25	515.000.000,00	-
513	12-mar-26	617.108.181,00	3150	20-may-26	617.000.000,00	303.436.018,00
					3.401.368.717,00	**303.436.018,00**


Una vez se realizó la verificación de valores con respecto al SOC estos se encuentran acorde con el CDP. A la fecha hay una diferencia con respecto a la revisión financiera dado que a la fecha de corte del SOC 10 de agosto de 2026 no se había radicado el acta parcial No. 8**.**

LOTE 6

1. CDP No. 1116 del 27 de julio por valor de $460.000.000

2. A la fecha el CDP No. 1116 cuenta con un valor total de $460.000.000 y no presenta liberaciones o anulaciones al valor inicial

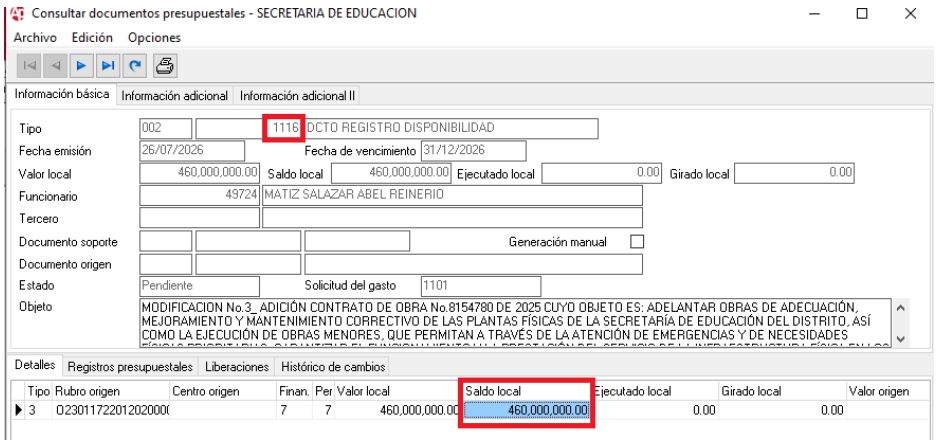

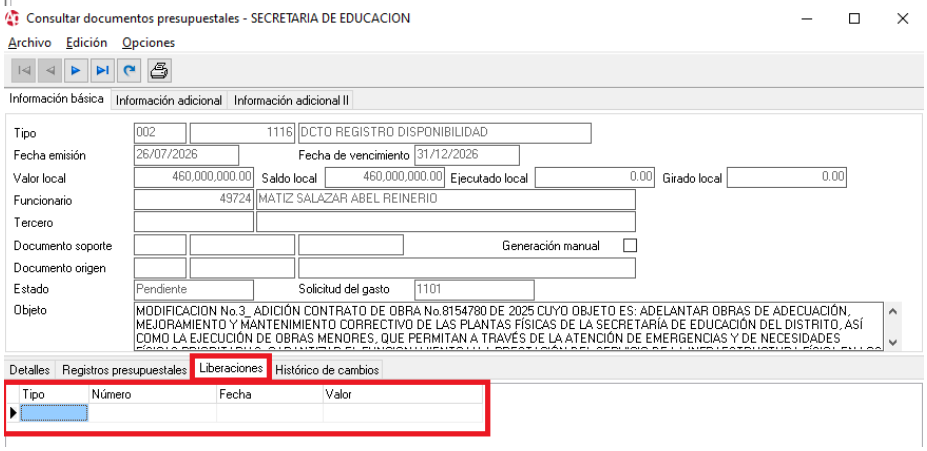

3. Balance Financiero del Contrato a la Fecha:

CONTRATISTA:	**CONSORCIO PAIS**
No. CONTRATO	CO1.PCCNTR.8154780/25
LOTE	6
VALOR INICIAL	2.332.049.023,00
VALOR MODIFICACIONES	785.001.422,00
VALOR A LA FECHA	3.117.050.445,00
EJECUTADO A LA FECHA	2.431.747.288,00
% EJECUCIÓN FINANCIERO	78,01%


DISPONIBILIDAD			REGISTRO			
NUMERO	**FECHA**	**VALOR**	**NUMERO**	**FECHA**	**VALOR INICIAL**	**SALDO ACTUAL 22/9/2026**
1642	21-feb-25	43.607.327.343,00	4924	3-sep-25	2.332.049.023,00	-
3697	5-dic-25	785.889.443,00	7577	22-dic-25	785.001.422,00	685.303.157,00
					3.117.050.445,00	**685.303.157,00**


Una vez se realizó la verificación de valores con respecto al SOC estos se encuentran acorde con el CDP. A la fecha hay una diferencia con respecto a la revisión financiera dado que a la fecha de corte del SOC 12 de agosto de 2026 no se había radicado el acta parcial No. 6**.**

LOTE 7

1. CDP No. 1117 del 27 de julio por valor de $300.000.000

2. A la fecha el CDP No. 1117 cuenta con un valor total de $300.000.000 y no presenta liberaciones o anulaciones al valor inicial.

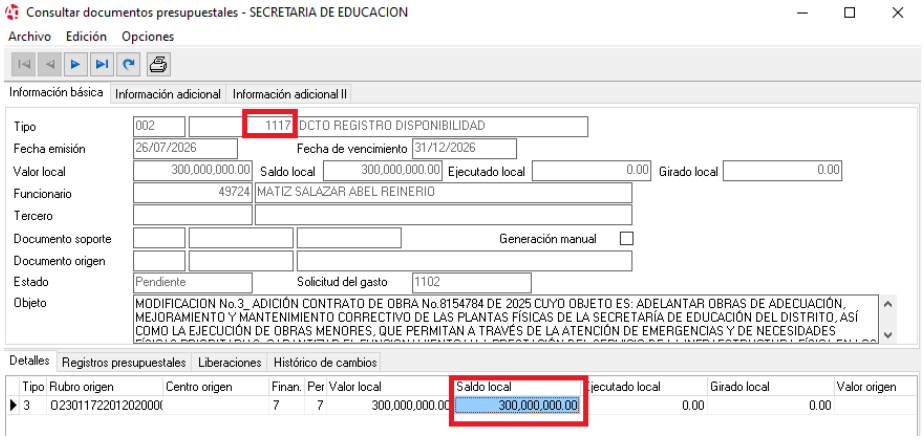

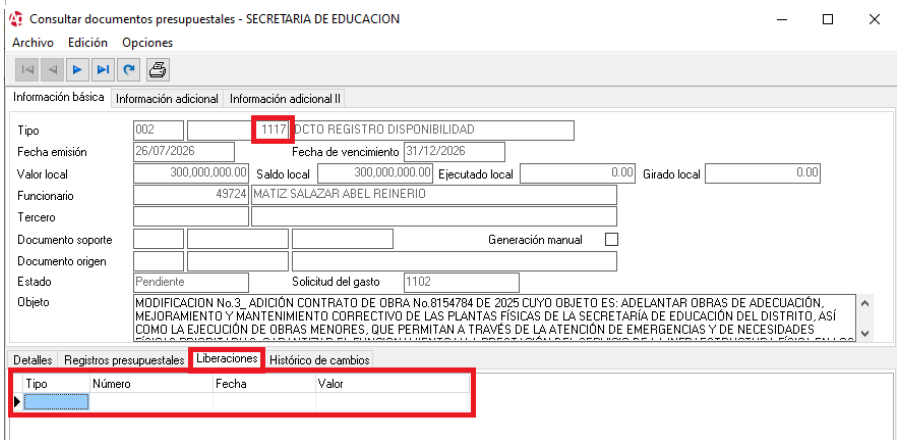

3. Balance Financiero del Contrato a la Fecha:

CONTRATISTA:	**CONSORCIO EDU 2025**
No. CONTRATO	CO1.PCCNTR.8154784/25
LOTE	7
VALOR INICIAL	2.451.846.958,00
VALOR MODIFICACIONES	1.076.612.050,00
VALOR A LA FECHA	3.528.459.008,00
EJECUTADO A LA FECHA	2.831.803.603,00
% EJECUCIÓN FINANCIERO	80,26%


DISPONIBILIDAD			REGISTRO			
NUMERO	**FECHA**	**VALOR**	**NUMERO**	**FECHA**	**VALOR INICIAL**	**SALDO ACTUAL 22/9/2026**
1642	21-feb-25	43.607.327.343,00	4984	5-sep-25	2.451.846.958,00	-
3699	5-dic-25	523.987.595,00	7608	24-dic-25	523.987.595,00	144.030.950,00
515	12-mar-26	552.624.455,00	3204	28-may-26	552.624.455,00	552.624.455,00
					3.528.459.008,00	**696.655.405,00**


Una vez realizada la verificación de los valores registrados en el SOC, se evidenció que estos se encuentran acordes con el CDP solicitado. La diferencia identificada corresponde a la radicación del Acta Parcial de Pago No. 7, realizada el 21 de septiembre, por un valor de $180.631.448,00, valor que, a la fecha de corte al 13 de septiembre aún no se encontraba reflejado en el SOC.

LOTE 9

1. CDP No. 1118 del 27 de julio por valor de $92.000.000

2. A la fecha el CDP No. 1118 cuenta con un valor total de $92.000.000 y no presenta liberaciones o anulaciones al valor inicial.

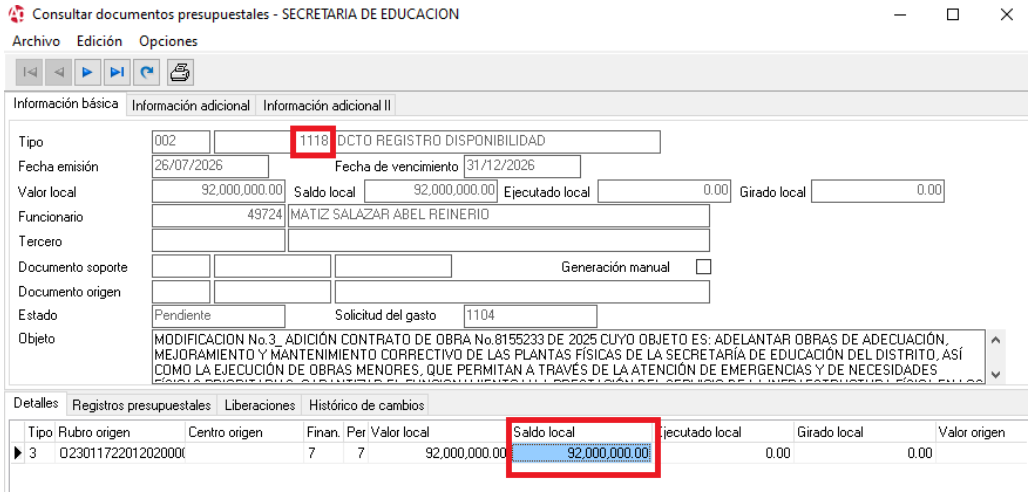

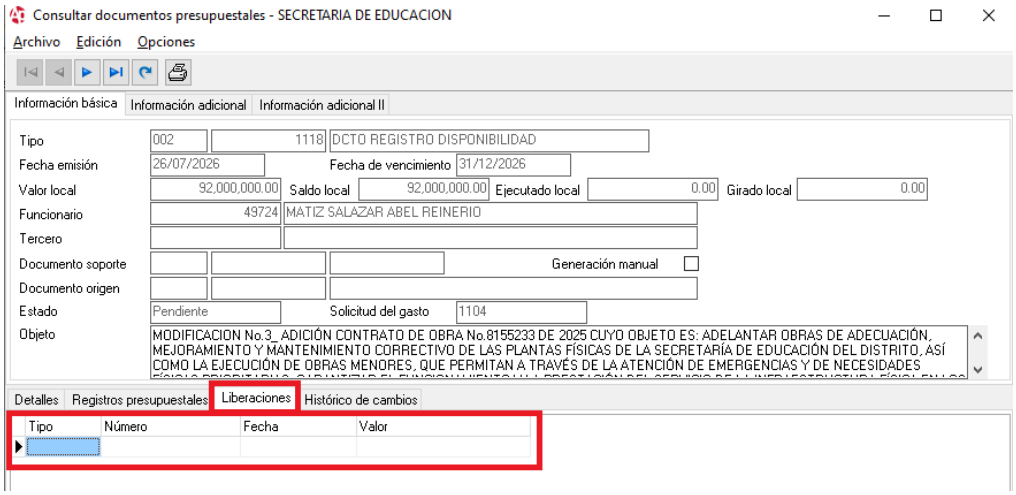

3. Balance Financiero del Contrato a la Fecha:

CONTRATISTA:	**CONSORCIO OBRAS EDUCATIVAS DT**
No. CONTRATO	CO1.PCCNTR.8155233/25
LOTE	9
VALOR INICIAL	2.426.857.240,00
VALOR MODIFICACIONES	1.210.358.967,00
VALOR A LA FECHA	3.637.216.207,00
EJECUTADO A LA FECHA	3.163.249.974,00
% EJECUCIÓN FINANCIERO	86,97%


DISPONIBILIDAD			REGISTRO			
NUMERO	**FECHA**	**VALOR**	**NUMERO**	**FECHA**	**VALOR INICIAL**	**SALDO ACTUA 22/9/2026**
1642	21-feb-25	43.607.327.343,00	4987	5-sep-25	2.426.857.240,00	-
3700	5-dic-25	822.324.262,00	7628	29-dic-25	822.324.262,00	85.931.528,00
516	12-mar-26	388.034.705,00	3206	28-may-26	388.034.705,00	388.034.705,0(
					3.637.216.207,00	**473.966.23**


Una vez realizada la verificación de los valores registrados en el SOC, se evidenció que estos se encuentran acordes con el CDP solicitado. La diferencia identificada corresponde a la radicación del Acta Parcial de Pago No. 8, realizada el 18 de septiembre, por un valor de $ 296.805.568,00 valor que, a la fecha de corte señalada 13 de mayo , aún no se encontraba reflejado en el SOC (Verificar porcentaje de avance financiero).

LOTE 2 INTERVENTORÍA

1. CDP No. 1606 del 02 de septiembre de 2026 por valor de $ 131.696.241

2. A la fecha el CDP No. 1606 cuenta con un valor total de $ 131.696.241 y no presenta liberaciones o anulaciones al valor inicial.

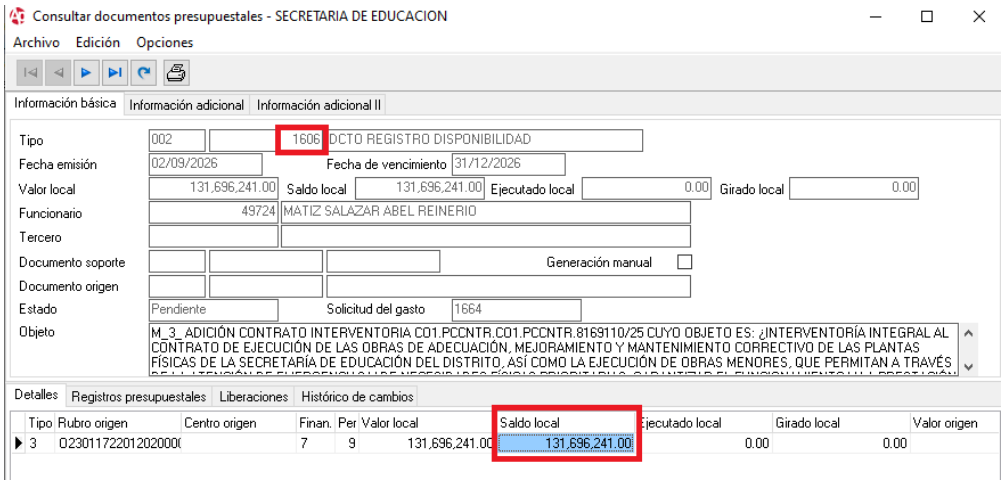

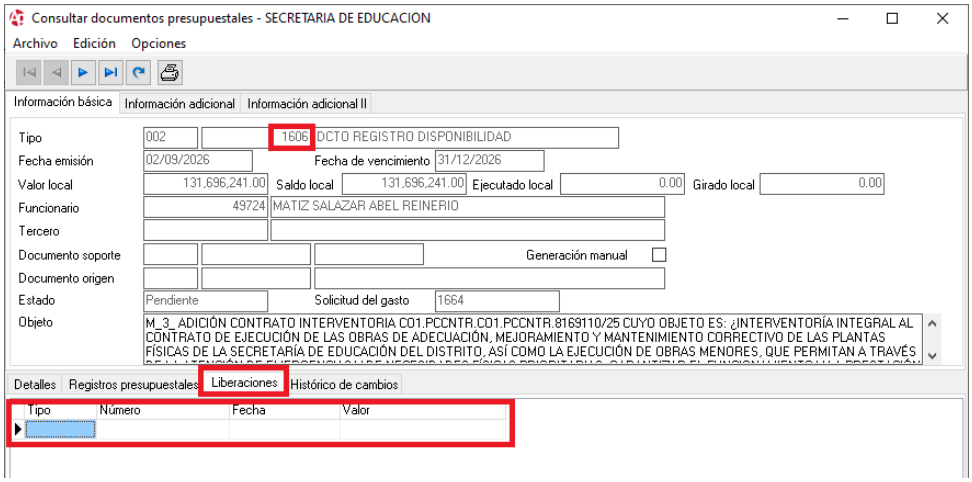

3. Balance Financiero del Contrato a la Fecha:

CONTRATISTA:	**CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO**
No. CONTRATO	CO1.PCCNTR.8169110/25
LOTE	2
VALOR INICIAL	796.184.131,00
VALOR MODIFICACIONES	291.300.934,00
VALOR A LA FECHA	1.087.485.065,00
EJECUTADO A LA FECHA	943.485.175,00
% EJECUCIÓN FINANCIERO	86,76%

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
NUMERO	**FECHA**	**VALOR**	**NUMERO**	**FECHA**	**VALOR INICIAL**
1984	10-mar-25	4.777.673.568,00	5012	5-sep-25	796.184.131,00
3698	5-dic-25	128.507.632,00	7587	23-dic-25	128.425.720,00
514	12-mar-26	162.875.214,00	3267	9-jun-26	162.875.214,00
					1.087.485.065,00

Una vez realizada la verificación de los valores registrados en el SOC, se evidenció que estos se encuentran acordes con el CDP solicitado. La diferencia identificada corresponde a la radicación del Acta Parcial de Pago No. 9, realizada el 18 de agosto, por un valor de $ 59.273.750,00 valor que se encuentra en estado pagado a la fecha. **Se recomienda realizar ajuste en el SOC.**

Atentamente,

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Claudia Marcela Duarte Cepeda
Contratista
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 3142
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

De: PAULA PANESSO SANCHEZ <ppanesso@educacionbogota.gov.co>
Enviado el: lunes, 21 de septiembre de 2026 3:40 p. m.
Para: CLAUDIA MARCELA DUARTE CEPEDA <cduartec@educacionbogota.gov.co>
CC: HERNANDO JOSE LONDONO EBRATT <hlondono@educacionbogota.gov.co>; PAOLA MARGARITA RUIZ MANOTAS <pruiz@educacionbogota.gov.co>
Asunto: Solicitud validación financiera de los contratos de mejoramiento Lotes 4, 5 , 6, 7 y 9 de obra, y Lote 2 de interventoría.
Importancia: Alta

Buenas tardes Clau,

En atención a la solicitud efectuada por el Director de contar con un control financiero previo a la radicación en la Oficina de Contratos de cualquier novedad que implique adición de recursos, solicito tu amable colaboración a fin de que, nos apoyes con la verificación de:

1. CDP asociado a la novedad
2. Valor asignado al CDP y disponibilidad del mismo
3. Balance general del contrato, verificando que los datos financieros incluidos en el SOC se ajusten a l información contractual

Los contratos objeto de validación son: Lotes 4, 5 , 6, 7 y 9 de obra, y Lote 2 de interventoría, que pueden ser consultados en el siguiente link:

CONJUNTO MODIFICACIONES 3

Cordialmente,

Paula Andrea Panesso Sánchez
Líder jurídica - Contratista
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos DCCEE
Av. El Dorado N. 66-63
PBX 6013241000
Celular 3002187659

Por favor evita imprimir, a menos que sea estrictamente necesario, al preferir el uso de documentos digitales se ahorra agua, energía y recursos forestales. _____ La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co

ANEXO No. 02. ACTUALIZACION POLIZA CONTRATO DE OBRA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
TUNJA	**TUNJA**	**39**	**39-40-101045911**	**18**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
15	**10**	**2026**	**01**	**10**	**2025**	**00:00**	**07**	**01**	**2027**	**23:59**	**ANEXO NO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO PAIS		**NIT: 901.974.049-8**
DIRECCIÓN: CL 18 NRO. 7 - 28 CENTRO	CIUDAD: CHIQUINQUIRA, BOYACA	TELÉFONO:	3102595502

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION		**NIT: 899.999.061-9**
DIRECCIÓN: Avenida El Dorado No. 68-63	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3241000
BENEFICIARIO:	899999061 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN LA MINUTA SED-LPOP-DCCEE-012-2025 REFERENTE SEGUN OBJETO ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE 6.

EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL CONTIENE Y AMPARA COMO MNIMO LOS AMPAROS DESCRITOS EN EL ARTCULO 2.2.1.2.3.1.17 DEL DECRETO 1082 DE 2015.

BENEFICIARIOS TERCEROS AFECTADOS
SECRETARIA DE EDUCACION NIT. 899.999.061-9

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**06/10/2025**	**07/01/2027**	**$525,271,500.00**	**$525,271,500.00**
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**06/10/2025**	**07/01/2027**	**$525,271,500.00**	**$525,271,500.00**
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**06/10/2025**	**07/01/2027**	**$525,271,500.00**	**$525,271,500.00**

ACLARACIONES

SE ACLARA ASEGURADOS son: BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION O SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL CON NIT: 899.999.061-9 y CONTRATISTA: NOMBRE : CONSORCIO PAIS NIT.901.974.049-8
LAS DEMAS CONDICIONES DEBEN PERMANECER SIN MODIFICACION.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ******525,271,500.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ASESORIAS MILER COMPAÑIA LTDA	153972	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO 21-33 LOCAL 108 - TELEFONO: (608) 7409488 - TUNJA

39-40-101045911

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
TUNJA	TUNJA	39	39-40-101045911	18

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
15	10	2026	01	10	2025	00:00	07	01	2027	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO PAIS		**NIT: 901.974.049-8**
DIRECCIÓN: CL 18 NRO. 7 - 28 CENTRO	**CIUDAD:** CHIQUINQUIRA, BOYACA	**TELÉFONO:**	3102595502

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION	IDENTIFICACIÓN	**NIT: 899.999.061-9**
DIRECCIÓN: Avenida El Dorado No. 68-63	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3241000

BENEFICIARIO: 899999061 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**06/10/2025**	**07/01/2027**	**$525,271,500.00**	**$525,271,500.00**
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**06/10/2025**	**07/01/2027**	**$525,271,500.00**	**$525,271,500.00**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**06/10/2025**	**07/01/2027**	**$525,271,500.00**	**$525,271,500.00**

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO 21-33 LOCAL 108 - TELEFONO: (608) 7409488 - TUNJA

39-40-101045911

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
TUNJA	TUNJA	39	39-40-101045911	18

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
15	10	2026	01	10	2025	00:00	07	01	2027	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO PAIS — IDENTIFICACIÓN **NIT: 901.974.049-8**

DIRECCIÓN: CL 18 NRO. 7 - 28 CENTRO — **CIUDAD:** CHIQUINQUIRA, BOYACA — **TELÉFONO:** 3102595502

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION — IDENTIFICACIÓN **NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN: Avenida El Dorado No. 68-63 — **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — **TELÉFONO:** 3241000

BENEFICIARIO: 899999061 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
CONSTRUCTORA PAIS SAS	901063647-3	30.00
N Y S CONSTRUCOL SAS	901306834-9	30.00
CONSTRUCCIONES V&P SAS	901368837-6	10.00
FAPAIS SAS	901762077-4	30.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO 21-33 LOCAL 108 - TELEFONO: (608) 7409488 - TUNJA

39-40-101045911

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
TUNJA	**TUNJA**	**39**	**39-44-101175397**	**13**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
15	**10**	**2026**	**06**	**10**	**2025**	**00:00**	**07**	**01**	**2030**	**23:59**	**ANEXO NO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO PAIS		**NIT: 901.974.049-8**
DIRECCIÓN: CL 18 NRO. 7 - 28 CENTRO	CIUDAD: CHIQUINQUIRA, BOYACA	TELÉFONO:	3102595502

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION		**NIT: 899.999.061-9**
DIRECCIÓN: Avenida El Dorado No. 68-63	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3241000
ADICIONAL:			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO, EL PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES Y LA ESTABILIDAD EN EL PROCESO DE CONTRATACION SED-LPOP- DCCEE-012-2025 REFERENTE SEGUN OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**06/10/2025**	**07/09/2027**	**$715,410,089.00**	**$715,410,089.00**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**06/10/2025**	**07/01/2030**	**$357,705,044.50**	**$357,705,044.50**
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**05/05/2026**	**05/05/2028**	**$715,410,089.00**	**$715,410,089.00**

ACLARACIONES

EL PRESENTE ANEXO ACLARA QUE LA ESTABILIDAD DE LA OBRA CUBRIRA DESDE EL 30/12/2026 HASTA EL 30/12/2028 FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA EL ACTA DE MODIFICATORIO No. 3 ADICION Y PRORROGA DEL CONTRATO DE OBRA No.CO1.PCCNTR.8154780 DE 2025 - LOTE 6.DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026
EL PRESENTE ANEXO ACLARA QUE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SE ACTUALIZARA CON LA FECHA DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****1,788,525,222.50	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
ASESORIAS MILER COMPAÑIA LTDA	153972	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO 21-33 LOCAL 108 - TELEFONO: (608) 7409488 - TUNJA

39-44-101175397

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
TUNJA	TUNJA	39	39-44-101175397	13

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
15	10	2026	06	10	2025	00:00	07	01	2030	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO PAIS		**NIT: 901.974.049-8**
DIRECCIÓN: CL 18 NRO. 7 - 28 CENTRO	**CIUDAD:** CHIQUINQUIRA, BOYACA	**TELÉFONO:**	3102595502

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION		**NIT: 899.999.061-9**
DIRECCIÓN: Avenida El Dorado No. 68-63	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3241000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
CONSTRUCTORA PAIS SAS	901063647-3	30.00
N Y S CONSTRUCOL SAS	901306834-9	30.00
CONSTRUCCIONES V&P SAS	901368837-6	10.00
FAPAIS SAS	901762077-4	30.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO 21-33 LOCAL 108 - TELEFONO: (608) 7409488 - TUNJA

39-44-101175397

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO No. 03. BITACORA DE OBRA

personal operativo
1 oficial ayudante
actividades: aplicacion de estuco, resane pintura techo y cinta baños profesores y pasillos baños nivel 2

John C
maestro
mano de obra

08/09/2026
personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1sst
personal operativo
1 oficial
actividades: aplicacion pintura baños niñas y niños techos nivel 2, aplicacion granito pasillo y cinta acceso a baños nivel 2, cubre baños profesores y profesoras

John C
maestro
mano de obra

08/09/2026
personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1sst
personal operativo
1 oficial
actividades: cubre baños profesores y profesoras pintura techo baños niñas, entrega baños concha.

John C
maestro
mano de obra

09/09/2026
personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1sst
personal operativo
2 oficiales
actividades: retiro pelicula divisiones y brillo baños niñas y niños, baños profesores nivel 2 instalacion tapas registro e instalacion enchape zona registro en el pasillo, cubre

John C
maestro

n. obra

10/09/2026
personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 SST
personal operativo
1 oficial
actividades: remate, pintura baño profesores nivel 2
Bloque 2

Jesus C
Inspector

R. obra

23/09/2026
personal administrativo
1 Residente 1 inspector 1 SST
personal operativo
1 oficial
actividades: cambio enchape piso acceso a Hol
y baño niños, seguimiento a la humedad pres
en el techo del baño de las niños nivel 2
se tiene perforacion y goteo.

Jesus C
Inspector

R. ob

24/09/2026
personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 SST
personal operativo
1 oficial
actividades: se realizo el levantamiento de la tub
tusa o sanitario en el nivel 3, se retira el enchap
de piso y se encuentra la fuga en la tuberia hidra
una T. se procede a realizar la correccion hidrau

Jesus C
Inspector

R. obra

28/09/2026
personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 SST
personal operativo
1 oficial
actividades: reseña remota placa punto donde se encontro la fuga, en el registro del baño de las niñas nivel 2 se evidencia fuga.

John C
inspec

L. obra

26/09/2026
personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 SST
personal operativo
1 oficial
actividades: se realiza cambio del registro del baño de las niñas nivel 2, seguimiento a que sague la placa para resanar y remates por la parte interna baño de las niñas

John C
inspec

L. obra

28/09/2026
personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 SST
personal operativo
1 oficial
actividades: se identifica que en el registro instalado en el baño de las niñas presenta fuga en la vertical se debe intervenir mas abajo afectado o realizando perforacion en el muro, la humedad de la placa se evidencia que esta en proceso de secado

John C
inspec

L. obra.

30/09/2026
Personal administrativo
1 Residente, 1 Inspector, 1 SST
Personal Operativo
1 Plomero
Actividad. Se realiza el arreglo de la tubería fisurada y el baño de las niñas.

Jesus C
Interno

R. Obra

03/10/2026
Personal administrativo
1 residente, 1 inspector, 1 SST
Personal operativo
1 oficial
Actividad. Despues de resolver el problema de humedad y arreglo de tubería fisurada, se procede a enchapar la pa afectada y tapar el hueco que se realizó en el segundo piso dejando el colegio listo para entregar

Jesus C
Interno

R. Obra

Scanned with CamScanner

1 Residente, 1 inspector, 1 SST
personal operativo
1 oficial 2 ayudantes
actividades: Retiro RCD colegio santa librada, aseo
Sector donde estaban ocupadas

John C
Inspector

R. Obra.

Emergencia colegio Eduardo Umaña Mendoza 11/09/2026
Estado del Tiempo: Nublado
personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 SST
personal operativo
1 oficial, 1 ayudante.
actividades: instalacion manto asfaltico 2mc 1 y 2.

John C
Inspector

R. Obra

Emergencia colegio Eduardo Umaña Mendoza 12/09/2026
personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 SST
personal operativo
1 Oficial, 1 ayudante.
Actividades: instalacion manto asfaltico, nivelacion de superficie, mejoramiento de pendientes

John C
Inspector

R. Obra.

Emergencia colegio Eduardo Umaña Mendoza 14/09/2026
personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 SST
personal operativo
1 oficial, 1 ayudante
actividades: demolicion alistado deteriorado, limpieza y nivelacion de pozos entre vigas existentes, alistado y mortero para mejoramiento pendientes zona 3

R. Obra

Norma

Scanned with CamScanner

Emergencia colegio Santa Libarada 14/09/2026
personal administrativo
1 Residente, 1 Inspector, 1 SST
personal operativo
1 Oficial
actividades: alistado adoquin acceso a jardin e isla
3

John E
Interno

R. Obra

Emergencia colegio Eduardo Umaña Mendoza 15/09/2026
personal administrativo
1 Residente, 1 Inspector, 1 SST
personal operativo
1 oficial
Actividades: alistado pasos entre vigas, pasos existentes
retiro manto asfaltico existente zona 3, aplicacion
Emulsion asfaltica

John E
Interno

R. Obra

Emergencia colegio Santa Libarada 16/09/2026
personal administrativo
1 Residente, 1 Inspector, 1 SST
personal operativo
1 Oficial 2 ayudantes
Actividades: aplicacion hidrofugo adoquin acceso
a jardin ludico, polimero jardin ludico

John E
Interno

R. Obra

Emergencia colegio Eduardo Umaña Mendoza 16/09/2026
personal administrativo
1 Residente, 1 Inspector, 1 SST
personal operativo
1 Oficial 1 ayudante
Actividades: alistado de piso zona 3, aplicacion
Emulsion asfaltica e instalacion manto asfaltico
zona 2.

Norma

Scanned with CamScanner

R. obra.

Emergencia colegio Edgardo Umaña Mendoza 17/09/2026
personal administrativo
1 Residente. 1 Inspector, 1 SST
personal operativo
1 Oficial. 1 ayudante.
Actividades: se realiza retoro flanches sobre marquesina zona 1. ajustado piso zona 2. retiro flanche zona 2.

John C Interno

R. obra

Emergencia colegio Edgardo Umaña Mendoza 18/09/2026
personal administrativo
1 Residente. 1 Inspector. 1 SST
personal operativo
1 oficial. 1 ayudante.
Actividades: Instalacion mento asfaltico e instalacion flanche zona 2, limpieza zona marquesina y señalizacion area trabajo.

John C Interno

R. obra.

Emergencia colegio San jose de Usme 19/09/2026
personal administrativo
1 Residente 1 Inspector
Actividades: se realiza el acta de vecindad. conjunto representativo colegio, compensar, interventoria y contratista

John C Interno

R. obra.

Emergencia colegio San jose de Usme 21/09/2026
personal administrativo
1 Residente. 1 Inspector. 1 SST
personal operativo
1 soldadora.
Actividades: corte lamina Alfajor pasillo acceso a cocina para instalacion cerramo, se lzbuno

hasta las 2 pm, motivo representante de
compañía programación hasta las 2.
R. obra
22/09/2026

Emergencia colegio Eduardo Umaña Mendoza
personal administrativo
1 Residente, 1 Inspector, 1 SST
personal operativo
1 oficial 1 ayudante
Actividades: Instalación mantenimiento asfaltico, instalación
flanche, aplicación polimero en frio zona 3 aledaña
a la margen inclinada existente

Jony C
Inspector
R. obra

Emergencia colegio San José de Usme 22/09/2026
personal administrativo
1 Residente, 1 Inspector, 1 SST
personal operativo
1 Oficial, 1 Soldador
Actividades: cortes lamina alfajor para instalación
cerramos en acero inoxidable, desconexión tornos
a tubería para área trabajo, instalación cerramiento

Jony C
Inspector
R. obra

Emergencia colegio Eduardo Umaña M. 23/09/2026
personal administrativo
1 Residente, 1 Inspector, 1 SST
personal operativo
1 oficial 1 ayudante
Actividades: aplicación emulsión asfaltica, instalación
mantenimiento asfaltico, silicona juntas margen zona
1, se presenten para aplicación baja...

Jony C
Inspector
R. obra

Emergencia colegio San José de Usme 23/09/2026
personal administrativo

1 Residente, 1 Inspector, 1 SST
personal operativo
1 Soldador, 1 ayudante
actividades: Corte láminas, alfajor para instalación
Cascomo sector pasillo acceso cocina.

John C
Inspector

Robra

Emergencia colegio San José Usme 24/09/2026
personal administrativo
1 Residente, 1 Inspector, 1 SST
personal operativo
1 oficial 1 soldador
actividades: instalación cascomo y rejillas de los
mismos

John C
Inspector

Robra

Emergencia colegio Eduardo Umaña Mendoza 24/09/2026
personal administrativo
1 Residente, 1 Inspector, 1 SST
personal operativo
1 oficial 1 ayudante
actividades: instalación manto asfaltico entre
placa y zona aledaña a Marquesina, aplicación
silicona Vidrio marquesina, instalación flanches
zona t

John C
Inspector

Robra.

Emergencia colegio Santa Librada 24/09/2026
personal administrativo
1 Residente, 1 Inspector, 1 SST
personal operativo
1 oficial 1 ayudante
actividades: aplicación pintura adyacente acceso
a Jardín Infantil

John C
Inspector

Robra.

Norma

Scanned with CamScanner

Emergencia colegio San José Usme 25/09/2026
personal administrativo
1 Residente, 1 Inspector, 1 SST
personal operativo
1 Soldador 1 ayudante
Actividades: Instalacion rejillas carcamos, sellado
Armado marcos para rejillas cerramiento metalico parte
inferior.

Jefe de Interv. — R. Obra

Emergencia colegio Eduardo Umaña Mendoza 25/09/2026
personal administrativo
1 Residente 1 Inspector 1 SST
personal operativo
1 oficial, 1 ayudante
Actividades: Aislado para aplicacion de poliurea
zona 3

Jefe de Interv. — R. Obra.

Emergencia colegio Eduardo Umaña Mendoza 28/09/2026
personal administrativo
1 Residente, 1 Inspector, 1 SST
personal operativo
1 Oficial 1 ayudante
Actividades: Aplicacion poliurea zona 3 se
suspendieron actividades por precipitaciones

Jefe de Interv. — R. Obra

Emergencia colegio San José Usme 29/09/2026
personal administrativo
1 Residente, 1 Inspector, 1 SST
personal operativo
1 Oficial 1 ayudante
Actividades: Instalacion tuberia sanitaria descarga
carcamo instalado, marcos para cerramiento

R. Obra

Norma

Scanned with CamScanner

Emergencia Eduardo Umaña Mendoza. 29/09/2026
personal administrativo
1 residente. 1 inspector, 1 sst
personal operativo
1 oficial. 1 ayudante.
actividades: aplicacion poliurea en tres areas acordadas con interventoria

Jose R obra.

Emergencia Colegio San José de Usme 30/09/2026
Personal administrativo
1residente, 1 inspector, 1 SST
Personal operativo
1 soldador, 1 ayudante, 1 Oficial, 1 ayudante
Actividades: Se realiza instalacion tuberia sanitaria de descargue de cárcamos, desmonte marcos de cerramiento

Jose R. Obra

Emergencia Colegio Eduardo Umaña Mendoza 30/09/2026
Personal administrativo
1 Residente, 1 Inspector, 1 SST.
Personal operativo
1 oficial. 1 ayudante.
Actividades: Aplicacion poliurea zona 3, se realiza limpieza de la zona

Jose C R. Obra

Emergencia Colegio San José de Usme 01/10/2026
Personal administrativo
1 residente, 1 inspector, 1 SST
Personal operativo
1 soldador, 1 ayudante.
Se continua con el arreglo, desmonte e instalacion de marcos de cerramiento

Jose C R. Obra.

Emergencia Colegio Eduardo Umaña Mendoza 01/10/2026
Personal operativo
1 oficial 1 ayudante
Personal administrativo
1 Residente, 1 Inspector, 1 SST.
Actividades: Se continúa con la pintura en poliurea de zona 3

Jairo C (interno) R. Obra

Emergencia San José de Usme 02/10/2026
Personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 SST
Se finalizan actividades de instalación y se realiza limpieza del sitio, se levanta cerramiento instalado para delimitar la zona.

Jairo C (interno) R. Obra

Emergencia Colegio Eduardo Umaña Mendoza 02/10/2026
Personal administrativo
1 residente, 1 Inspector, 1 SST
Personal operativo
1 ayudante, 1 Oficial.
Se continúa con actividades de limpieza en los canales y aplicación de poliurea

Jairo C (interno) R. Obra

Emergencia Colegio Eduardo Umaña Mendoza 03/10/2026
Personal administrativo
1 residente, 1 Inspector, 1 SST
Personal operativo
1 oficial 1 ayudante.
Actividades: Se continua con pintura de poliurea en zona 3

Jairo C (interno) R. Obra

Norma

Scanned with CamScanner

Emergencia Colegio Eduardo Umaña mendoza 05/10/2026

Personal administrativo

1 Residente, 1 Layudante/ inspector, 1 SST

Personal Operativo

1 Opical, 1 ayudante.

Actividades: Se realiza la pintura de poliurea en zona 3

John C
Tasista

R. Obra.

Personal administrativo
1 residente, 1 inspector, 1 SST
Actividad. Se realiza acta de veracidad el cual nos indica que los baños a intervenir son los baños de los niños y niñas, de morbilidad Predecible se toma registro fotográfico y se levanta acta.

Jorge C — R. Obra
Interventor

02/10/2026

Personal administrativo
1 residente, 1 inspector, 1 SST
Personal operativo
2 ayudantes
Se inicia con la demolición de las paredes y muros, desmonte de puertas en el baño de las niñas

Jorge C — R. Obra
Interventor

03/10/2026

Personal administrativo
1 Residente Obra, 1 inspector, 1 SST
Personal operativo
2 ayudantes
Se realiza desmonte de baterías sanitarias en el baño de las niñas

Jorge C — R. Obra
Interventor

Personal administrativo
1 residente, 1 inspector, 1 SST
Personal operativo
2 ayudantes
Se realiza demolición de muros, enchapes, pañete y pisos en el baño de las niñas

Jorge C
Interventor

Scanned with CamScanner

01/10/2026

Personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 SST
Actividades: Se realiza la visita al colegio donde nos indican la zona a intervenir la cual son baños para niños y niñas pequeños se realiza el debido registro fotográfico y se hace el levantamiento del acta de vecindad

Jony C
Interna

R. Obra

02/10/26

Personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 SST
Personal operativo
1 ayudante
Se inicia con el cerramiento de la zona a intervenir y desmonte de puertas colegio Rafael Uribe, baño niñas

Jony C
Interna

R. Obra

03/10/2026

Personal administrativo
1 residente, 1 inspector, 1 SST
Personal operativo
1 ayudante
Se continúa con desmonte de puertas y demolición de muros y paredes baño niñas

Jony C
Interna

R. Obra

05/10/2026

Personal administrativo
1 residente, 1 inspector, 1 SST
Personal operativo
1 ayudante.
Actividad. Demolición pañetes, muros y pisos en baño de niñas

Jony C
Interna

R. Obra

Scanned with CamScanner

ANEXO No. 04. INFORMES SEMANALES

FECHA:	13/09/2026
DIAS RESTANTES	17 Dias
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME APOYO A LA SUPERVISION

GRUPO 2

CORTE DEL INFORME:	CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO PAIS
13 de septiembre de 2026	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO

FECHAS DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8169110	CO1.PCCNTR.8154780
INICIO	6 de octubre de 2025	6 de octubre de 2025
TERMINACION INICIAL	5 de mayo de 2026	5 de mayo de 2026
TERMINACION FINAL	5 de octubre de 2026	30 de septiembre de 2026

PLAZOS EN DIAS ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
INICIAL	211	211
SUSPENSIONES		
PRÓRROGAS	153	148
TOTAL	364	359

VALOR CONTRATO ETAPA	INTERVENTORIA	OBRA
INICIAL	$ 796,184,131.00	$ 2,332,049,023.00
ADICIONES	$ 291,300,934.00	$ 785,001,422.00
TOTAL	$ 1,087,485,065.00	$ 3,117,050,445.00

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1	23-dic-25	$ 128,425,720.00	46	
2	5-jun-26	$ 162,875,214.00	107	
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA	OTRO ASPECTO
1	22-dic-25	$ 785,001,422.00	46	
2	27-may-26		102	
3				
4				

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	GARANTE:	SEGUROS MUNDIAL

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	CALIDAD DEL SERVICIO DESDE	CALIDAD DEL SERVICIO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA
BCH-100046043	6 10 2025	20 12 2026	20 6 2026	20 6 2031	6 10 2025	20 6 2029

POLIZAS CONTRATO DE OBRA										
POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA			SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE		SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA HASTA
39-44-101175397	6 10 2025	27 2 2027			6 10 2025		28 6 2029		5 5 2026	5 5 2028

POLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE	RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA
39-40-101045911	6 10 2025	23 6 2026

SEGUROS DEL ESTADO

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (13/09/2026)		PROGR %	EJECUTADO VS PROG	Vlr FRENTE APROBADO	Vlr FRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA	oct-2025	nov-2025	nov-2025	dic-2025	dic-2025	ene-2026	ene-2026	feb-2026	feb-2026	mar-2026	mar-2026	abr-2026	abr-2026	may-2026	jun-2026	jul-2026	ago-2026	sep-2026
581	ORLANDO FALS BORDA (IED)	USME	A	Barranquillita Nuevo	100.00%	100.00%		100.00%		$ 156,929,148.00	$ 156,929,147.99	10/11/2025	28/02/2026																		
1930	UNION EUROPEA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	B	Maria Cano	100.00%	100.00%		100.00%		$ 169,766,274.00	$ 169,766,274.00	18/11/2025	21/02/2026																		
1913	SIERRA MORENA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	C	Divino Niño	100.00%	100.00%		100.00%		$ 118,699,548.00	$ 118,699,548.00	10/11/2025	18/04/2026																		
523	FABIO LOZANO SIMONELLI (IED)	USME	A	Fabio Lozano Simonelli	100.00%	100.00%		100.00%		$ 245,187,661.00	$ 245,187,661.00	1/12/2025	11/04/2026																		
1904	ARBORIZADORA BAJA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Arborizadora Baja	100.00%	100.00%		100.00%		$ 630,139,470.00	$ 630,139,470.00	24/11/2025	28/02/2026																		
1974	CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Buenavista (Calasanz)	100.00%	100.00%		100.00%		$ 186,826,436.00	$ 186,826,436.00	10/12/2025	21/03/2026																		
1918	ESTRELLA DEL SUR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	B	Estrella II	100.00%	100.00%		100.00%		$ 78,637,768.00	$ 78,637,768.00	1/12/2025	14/03/2026																		
546	SANTA LIBRADA (IED)	USME	A	Santa Librada	100.00%	100.00%		100.00%		$ 223,822,666.00	$ 223,822,666.00	15/01/2026	2/05/2026																		
1917	ESTRELLA DEL SUR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Estrella I	100.00%	100.00%		100.00%		$ 76,163,937.00	$ 76,163,937.00	15/01/2026	28/02/2026																		
548	TENERIFE - GRANADA SUR (IED)	.USME	A	Tenerife	100.00%	100.00%		100.00%		$ 88,940,710.00	$ 88,940,710.00	9/03/2026	7/06/2026																		
1959	GUILLERMO CANO ISAZA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Guillermo Cano Isaza	99.96%	99.96%		100.00%		$ 354,505,537.00	$ 354,373,946.66	13/01/2026	19/06/2026																		
545	CIUDAD DE VILLAVICENCIO (IED)	USME	C	Puerta al Llano	65.13%	66.53%		74.12%		$ 349,000,000.00	$ 232,206,112.00	3/06/2026	30/09/2026																		
TOTAL FRENTES DE OBRA						95.63%		96.63%		$ 2,678,619,155.00	$ 2,561,693,676.66																				
EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO																													
590	DIRECCION LOCAL DE EDUCACION DE USME	USME	D L E	CADEL USME	100.00%	100.00%		100.00%		$ 28,072,878.00	$ 28,072,878.00	26/01/2026	1/03/2026																		
1904	ARBORIZADORA BAJA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Arborizadora Baja	100.00%	100.00%		100.00%		$ 52,071,222.00	$ 52,071,222.00	6/04/2026	14/05/2026																		
1974	CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Buenavista (Calasanz)	100.00%	100.00%		100.00%		$ 63,396,903.00	$ 63,396,903.00	7/04/2026	22/05/2026																		
590	DIRECCION LOCAL DE EDUCACION DE USME	USME	D L E	CADEL USME	100.00%	100.00%		100.00%		$ 2,038,265.00	$ 2,038,265.00	27/07/2026	1/08/2026																		
1974	CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Buenavista (Calasanz)	100.00%	100.00%		100.00%		$ 5,260,774.00	$ 5,260,774.00	22/05/2026	6/06/2026																		
1959	GUILLERMO CANO ISAZA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Guillermo Cano Isaza	100.00%	100.00%		100.00%		$ 11,337,220.00	$ 11,337,220.00	27/05/2026	20/06/2026																		
1980	CUNDINAMARCA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	La Riviera del Sur	100.00%	100.00%		100.00%		$ 18,125,874.00	$ 18,125,874.00	16/06/2026	27/06/2026																		
566	LUIS EDUARDO MORA OSEJO (IED)	USME	A	Nuevo Monteblanco- Eduardo Mora Osejo	100.00%	100.00%		100.00%		$ 70,007,566.00	$ 70,007,566.00	23/06/2026	7/07/2026																		
567	SAN JOSE DE USME - DON BOSCO 2 (CED)	.USME	A	San José Monteblanco (Don Bosco II)						$ 24,867,651.00																					
1974	CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Buenavista (Calasanz)	100.00%	100.00%		100.00%		$ 12,664,106.00	$ 12,664,106.00	22/06/2026	27/06/2026																		
575	EDUARDO UMAÑA MENDOZA (IED)	USME	A	Villa Alemania	14.24%	23.37%		55.00%		$ 85,000,009.00	$ 19,861,851.67	24/08/2026	22/09/2026																		
546	SANTA LIBRADA (IED)	USME	A	Santa Librada	22.85%	97.19%		85.00%		$ 27,347,458.00	$ 26,579,947.39	24/08/2026	16/09/2026																		
TOTAL FRENTES DE OBRA						77.32%		94.55%		$ 400,189,926.00	$ 309,416,607.06																				

ACUMULADO FRENTES DE OBRA

TERMINADAS	EN EJECUCION	POR INICIAR	TOTAL	VALOR
2	7	0	9	$ 2,561,693,677
ACUMULADO EMERGENCIAS				
9	2	0	11	$ 309,416,607
TOTAL				
11	9	0	20	$ 2,871,110,284
FRENTES POR LOCALIDAD				

RELACION DE PAGOS EFECTUADOS

No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR
1	$ 361,723,907.00	12		1	$ 45,496,236.00	12		23		34	
2	$ 435,348,486.00	13		2	$ 45,496,236.00	13		24		35	
3	$ 781,384,254.00	14		3	$ 141,587,750.94	14		25		36	
4	$ 492,623,060.00	15		4	$ 79,227,162.00	15		26		37	
5	$ 209,434,074.00	16		5	$ 68,268,881.00	16		27		38	
6	$ 151,233,507.00	17		6	$ 265,555,238.00	17		28		39	
7		18		7	$ 174,904,152.00	18		29		40	
8		19		8	$ 121,790,762.00	19		30		TOTAL INTERVENTORIA	
9		20		9		20		31		$ 942,346,418	
10		TOTAL OBRA		10		21		32			
11		$ 2,431,747,288.00		11		22		33			


AVANCE GENERAL

	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO
AVANCE	95.63%	78.01%	95.26%
PROGRAMADO	96.63%		
ATRASO	-0.99%	EN EJECUCION	
FECHA APROBACION CRONOGRAMA			


AVANCE GENERAL




EMERGENCIAS



AVANCE FÍSICO



AVANCE DE LOS FRENTES



OBSERVACIONES:

FECHA:	13/09/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	195 días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO			
REGISTRO FOTOGRAFICO		SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA			GRUPO 2
		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS			
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
1A 100.00%	ORLANDO FALS BORDA (IED)		 	  	FRENTE AL 100%
2C 100.00%	SIERRA MORENA (IED)	* ADECUACION DE CUARTOS DE BASURA * ACCESIBILIDAD REDUCIDA RAMPAS * PINTURA 4 AULAS	 	 	FRENTE AL 100%

28072879
52071222
63396903
2038265
5260774
11337220
18125874
70007566
24,867,651.00
12664106
76,878,564.00

FECHA: 13/09/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES: 195 Días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO 2
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
3B 100.00%	UNION EUROPEA (IED)	* CAMBIO DE CUBIERTA PARA 3 AULAS, INCLUYE LA EDECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS	 364721023 	 	FRENTE AL 100%
4A 100.00%	ARBORIZADORA BAJA (IED)	* CAMBIO DE CUBIERTA BLOQUE PRIMERA INFANCIA, INCLUYE MEJORAMIENTO ELECTRICO * ADECUACIÓN CANCHA DEPROTIVA	 	 	FRENTE AL 100%

FECHA: 13/09/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES: 195 Días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA			GRUPO 2	
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
5A 100.00%	FABIO LOZANO SIMONELLI (IED)	* CAMBIO DE PISOS AULAS DE 3ER PISO BLOQUE A * MANEJO AGUAS LLUVIAS CANCHA * MEJORAMIENTO BATERIAS SANITARIAS 3ER PISO B	 	 	FRENTE AL 100%
6B 100.00%	ESTRELLA DEL SUR (IED) SEDE B	* CAMBIO DE PUERTAS Y VENTANA DE LA SEDE * CAMBIO DEL PORTON PRINCIPAL	 	 	FRENTE AL 100%

FECHA: 13/09/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES: 195 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO					
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO	2
CORTE DEL INFORME	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
7A **100.00%**	**CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)**	* CAMBIO DE CUBIERTA AULA MULTIPLE	 	 	**FRENTE AL 100%**
8A **100.00%**	**SANTA LIBRADA (IED)**	* MANTENIMIENTO CORRECTIVO TERRAZAS Y JARDINERA * ADECUACIÓN JUNTA ESTRUCTURAL COMEDOR	 	 	**FRENTE AL 100%**

FECHA:	13/09/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	195 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO		SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO 2
		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS		
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO		

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
9A 100.00%	IED ESTRELLA DEL SUR, SEDE A	* ADEACUACIÓN BATERIAS SANITARIAS * ADECUACIÓN PORTON PRINCIPAL	 	 	FRENTE AL 100%
10A 100.00%	DIRECCION LOCAL DE EDUCACION DE USME - EMERGENCIA	* IMPERMEABILIZACIÓN PLACA TANQUES DE AGUA POTABLE * RESANE HUMEDAD BAÑO MUJERES	 	 	EMERGENCIA AL 100%

FECHA:	13/09/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	166 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO			
REGISTRO FOTOGRAFICO		SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA			GRUPO 2
		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS			
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
11A 99.96%	GUILLERMO CANO ISAZA (IED)	* ADECUACIÓN BATERIAS SANITARIAS BLOQUE BACHILLERATO	 	 	FALTAN DETALLES PARA REALIZAR LA ENTREGA DE LAS BATERIAS SANITARIAS DEL BLOQUE B, SEGUNDO PISO, YA SE REALIZO LA ENTREGA DE LA BATERIA SANITARIA DEL BLOQUE C PRIMER PISO  
12A 100.00%	TENERIFE - GRANADA SUR (IED)	* IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE * Instalación Barandas Metalicas	 	 	FRENTE AL 100%

FECHA: 13/09/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES: 195 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA			GRUPO 2	
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
13A 100.00%	CALASANZ (BUENAVISTA) (CED) EMERGENCIA	* INSTALACIÓN DIVISIONES DE BAÑOS *AMPLIACIÓN CAPACIDAD TANQUE DE AGUA *ADECUACION RAMPA PARA ENTRADA AULA MULTIPLE	 	 	EMERGENCIA AL 100%
14A 100.00%	ARBORIZADORA BAJA (IED)	* ADECUACIÓN GRADERIAS, REEMPLAZO ESCALERA TARIMA, ADECUACIÓN TARIMA *MEJORAMIENTO DEL TERRENO AL REDEDRO DE LA TARIMA EMERGENCIA	 	 	EMERGENCIA AL 100%


FECHA: 13/09/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES: 195 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO 2
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
15A 100.00%	GUILLERMO CANO ISAZA (IED)	*CAMBIO DE PISO AULA BLOQUE DE PRIMARIA SEGUNDO PISO EMERGENCIA	 	 	EMERGENCIA AL 100%
16A 66.53%	CIUDAD DE VILAVICENCIO - PUERTA AL LLANO	☐Mejoramiento correctivo de los pisos en acceso y corredor principal ☐Mejoramiento correctivo del cerramiento metálico ☐Mejoramiento de las redes de aguas lluvias	 	 	    

FECHA: 13/09/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES: 195	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO 2
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
17A 100.00%	CUNDINAMARCA (IED)	Adecuación de una estructura en cielo raso PVC, para mitigar el ingreo de palomas al comedor de la institución	 	 	EMERGENCIA AL 100%
17A 100.00%	LUIS EDUARDO MORA OSEJO (IED)	* Cambio de tablero Principal electrico * Adecuación acometidas electricas según alcance de la ficha electrica	 	 	EMERGENCIA AL 100%

FECHA:	13/09/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	195 días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO		SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO 2
		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS		
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO		

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
18A 100.00%	CALASANZ (BUENAVISTA) (CED) - EMERGENCIA	* cambio y suministro e instalación de motobombas para tanque de agua potable	 	 	EMERGENCIA AL 100%
18A 23.37%	EDUARDO UMAÑA MENDOZA (IED)	* Impermeabilización con manto en aluminio, bloque	 	 	    

FECHA:	13/09/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	166 días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO			
REGISTRO FOTOGRAFICO		SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA			GRUPO 2
		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS			
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
18A **97.19%**	**SANTA LIBRADA (IED)**	* Impermeabilización cuarto zona ludica	 	 	   

CONTRATO DE OBRA		CO1.PCCNTR.8154780					CONTRATO DE INTERVENTORIA	CO1.PCCNTR.8169110			VIGENCIA	2025
CPF	581	IED			ORLANDO FALS BORDA			SEMANA 44				
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
REPLANTEO	m2	36.50	225.50	262.00	262.00		$ 4,233.48	$ 1,109,170.66	$ (954,648.79)	717.81%	717.81%	
CERRAMIENTO EN LONA	M	91.00	(62.60)	28.40	28.40		$ 31,110.25	$ 883,530.99	$ 1,947,501.40	100.00%	100.00%	
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	36.50	211.26	247.76	247.76		$ 18,044.21	$ 4,470,634.09	$ (3,812,020.33)	678.79%	678.79%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M YGUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	301.34	(266.74)	34.60	34.60		$ 33,201.35	$ 1,148,766.74	$ 8,856,128.37	11.48%	11.48%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	79.20	40.80	120.00	120.00		$ 69,099.55	$ 8,291,946.35	$ (2,819,261.76)	151.52%	151.52%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	34.00	199.20	233.20	216.59		$ 107,273.69	$ 23,234,421.60	$ (19,587,116.26)	637.03%	637.03%	
PERFORACIÓN NÚCLEO 4" E= 0.10 M	UN	16.00	(13.00)	3.00	3.00		$ 166,952.47	$ 500,857.42	$ 2,170,382.16	18.75%	18.75%	
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M	1.50			1.50		$ 62,023.52	$ 93,035.29	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	34.00			34.00		$ 91,590.40	$ 3,114,073.57	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	0.30			0.30		$ 135,394.33	$ 40,618.30	$ -	100.00%	100.00%	
RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	0.24			0.24		$ 181,045.17	$ 43,450.84	$ -	100.00%	100.00%	
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	15.00			15.00		$ 22,829.47	$ 342,442.05	$ -	100.00%	100.00%	
PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	19.00			19.00		$ 19,858.75	$ 377,316.29	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO LAMINADO 3 + 3 DIMENSIONES 1.00 M. X 1.00 M.	M2	15.36			15.36		$ 177,336.50	$ 2,723,888.59	$ -	100.00%	100.00%	
MEDIACAÑA VERTICAL EN CONCRETO 3000 PSI	M	58.50	136.16	194.66	194.66		$ 27,185.71	$ 5,291,971.11	$ (3,701,606.83)	100.00%	100.00%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	73.00	189.00	249.56	239.56		$ 45,289.29	$ 10,849,501.59	$ (7,543,383.64)	328.16%	328.16%	
DILATACIÓN EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 3 MM PROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM	M			127.20	127.20		$ 4,291.49	$ 545,877.16	$ (545,877.16)	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	344.96			340.58		$ 4,663.84	$ 1,588,397.08	$ 20,440.72	98.73%	98.73%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	262.00	20.37	252.37	255.37		$ 361,355.09	$ 92,279,248.29	$ 2,395,784.22	97.47%	97.47%	
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ORLANDO FALS BORDA							$ 156,929,147.99				
CPF	1913	IED			SIERRA MORENA			SEMANA 44				
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	47.37	223.92	271.29	271.29		$ 7,045.00	$ 1,911,238.10	$ (1,577,516.00)	572.70%	572.70%	
CERRAMIENTO EN LONA	M	60.00	13.00	73.00	73.00		$ 31,110.25	$ 2,271,047.96	$ (404,433.20)	121.67%	121.67%	
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	m3	1.76	(1.76)	-	-		$ 274,656.52	$ -	$ 483,395.00	0.00%	0.00%	
DESMONTE DE BARANDA METÁLICA ALTURA NO MAYOR A 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	20.80	7.20	28.00	28.00		$ 21,488.46	$ 601,677.01	$ (154,716.95)	134.62%	134.62%	
DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	12.60			12.60		$ 11,376.96	$ 143,349.70	$ -	100.00%	100.00%	

DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	36.84			36.84		$ 107,273.69	$ 3,951,962.61	$ -	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.30 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	32.64	0.72	31.92	-		$ 93,547.94	$ -	$ 3,053,405.00	0.00%	0.00%	
CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	7.20			3.40		$ 15,633.37	$ 53,153.46	$ 59,407.00	47.22%	47.22%	
DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5.29			4.00		$ 11,761.45	$ 47,045.82	$ 15,172.00	75.61%	75.61%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	1.76	6.86	8.62	4.57		$ 91,988.38	$ 420,527.47	$ (258,627.91)	259.75%	259.75%	
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	m3	24.87	-9.60	15.27	15.27		$ 21,702.97	$ 331,382.67	$ 208,370.00	61.40%	61.40%	
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	m2	11.84			11.84		$ 165,931.21	$ 1,964,625.47	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	m3	7.00	7.00	14.00	14.00		$ 176,060.25	$ 2,464,579.38	$ (1,232,158.00)	199.98%	199.98%	
MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	12.60	3.76	16.36	16.36		$ 146,133.16	$ 2,390,738.55	$ (549,461.00)	129.84%	129.84%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	m	6.00			-		$ 78,726.73	$ -	$ 472,360.38	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"	un	8.00			-		$ 28,310.86	$ -	$ 226,487.00	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	un	2.00			-		$ 129,729.46	$ -	$ 259,458.91	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	m	29.00			-		$ 14,988.50	$ -	$ 434,667.00	0.00%	0.00%	
RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INLUYE REFUERZO).	M2	42.05	8.55	50.60	50.60		$ 193,996.53	$ 9,816,224.55	$ (1,658,670.00)	120.33%	120.33%	
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	11.84			11.84		$ 165,931.21	$ 1,964,625.47	$ -	100.00%	100.00%	
CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA (TRÁFICO PESADO) ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO, PENDIENTADO Y MEDIA CAÑA.	M	2.96			2.96		$ 592,067.38	$ 1,752,519.43	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	420.50	(366.54)	53.96	53.96		$ 7,255.46	$ 391,504.61	$ 2,659,416.00	12.83%	12.83%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	91.39			91.39		$ 7,103.01	$ 649,144.22	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-S 6" INCLUYE ACCESORIOS	M	6.00	10.00	16.00	16.00		$ 143,600.90	$ 2,297,614.44	$ (1,436,009.00)	266.67%	266.67%	
CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 M X 0.60 M EN CONCRETO REFORZADO < = 1,00 M CON MARCO Y TAPA METÁLICA E= 0.20 M	un	4.00	(4.00)	-	-		$ 1,618,437.02	$ -	$ 6,473,748.09	0.00%	0.00%	
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	3.00			2.00		$ 875,947.70	$ 1,751,895.39	$ 875,948.00	66.67%	66.67%	
CANAL EN PVC AMAZONAS O EQUIVALENTE, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	3.60			3.60		$ 68,114.71	$ 245,212.96	$ -	100.00%	100.00%	
MURO EN SUPERBOARD DE 8 MM INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA , MASILLA , CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA, VISTO DOS CARAS E= 12 CM	M2	15.77	1.25	17.02	17.02		$ 159,158.72	$ 2,708,881.47	$ (198,948.00)	107.93%	107.93%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA, EL TUBO PASAMANOS DE 2" CALIBRE 18 AL IGUAL QUE LOS TUBOS PEDESTALES CON PLATINA DE FIJACIÓN Y TRAVESAÑOS VERTICALES EN TUBERÍA DE 3/4" CON SEPARACIÓN CADA 9CM, PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS.	M	33.78			36.35		$ 1,120,163.13	$ 40,719,658.08	$ (2,880,548.00)	107.61%	107.61%	
PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	172.00	(172.00)	-	-		$ 65,757.83	$ -	$ 11,310,347.00	0.00%	0.00%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO (RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA CANCHA MULTIPLE INCLUYE DEMARCACIONES BALONCESTO - VOLEYBOL)	M2			146.06	156.06		$ 77,589.44	$ 12,108,607.88	$ (12,108,608.00)	106.85%	106.85%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	14.08	2.72	16.80	16.80		$ 98,222.57	$ 1,650,139.25	$ (267,165.00)	119.32%	119.32%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	4.08			4.08		$ 45,289.29	$ 184,780.29	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	4.84			4.84		$ 126,224.49	$ 610,926.55	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1.00			1.00		$ 572,567.48	$ 572,567.48	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	UN	1.00			24.00		$ 23,315.15	$ 559,563.51	$ (536,248.00)	2400.00%	2400.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	24.00			24.00		$ 20,790.98	$ 498,983.52	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	5.08	0.05	5.13	5.13		$ 798,362.30	$ 4,095,598.62	$ (39,918.00)	100.98%	100.98%	
PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	193.76	(98.31)	95.45	105.45		$ 29,785.43	$ 3,140,873.57	$ 2,630,351.00	54.42%	54.42%	
PINTURA DE ACEITE SOBRE PAÑETE (2 MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	61.76	14.44	76.20	86.20		$ 29,785.43	$ 2,567,504.05	$ (727,956.00)	139.57%	139.57%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	kg	226.80	92.51	319.31	319.31		$ 23,042.63	$ 7,357,741.55	$ (2,131,674.00)	140.79%	140.79%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	36.84	-23.74	13.10	15.10		$ 264,771.67	$ 3,998,052.18	$ 5,756,136.00	40.99%	40.99%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	537.24			537.24		$ 4,663.84	$ 2,505,600.70	$ -	100.00%	100.00%	
					SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. SIERRA MORENA			**$ 118,699,548.00**				
CPF	**1930**	**IED**			**UNIÓN EUROPEA**			**SEMANA 44**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	168.00	10.14	178.14	178.14		$ 4,233.48	$ 754,151.38	$ (42,927.00)	106.04%	106.04%	
CERRAMIENTO EN LONA	M	45.00	7.80	52.80	23.83		$ 31,110.25	$ 741,422.37	$ 658,538.70	52.96%	52.96%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	136.13	(104.13)	32.00	32.00		$ 3,248.63	$ 103,956.25	$ 338,280.13	23.51%	23.51%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5.83	-	5.83	-		$ 144,722.00	$ -	$ 843,729.29	0.00%	0.00%	
DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	36.30			36.30		$ 26,782.33	$ 972,198.70	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	5.15	7.35	12.50	12.50		$ 27,938.51	$ 349,231.40	$ (205,348.06)	242.72%	242.72%	

DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	m2	168.00	5.63	173.63	183.63		$ 36,752.18	$ 6,748,803.22	$ (574,436.61)	109.30%	109.30%	
DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	un	18.00	6.00	24.00	24.00		$ 11,967.87	$ 287,228.79	$ (71,807.20)	133.33%	133.33%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	un	18.00	6.00	24.00	24.00		$ 7,469.97	$ 179,279.20	$ (44,819.80)	133.33%	133.33%	
DESMONTE DE TABLERO ELÉCTRICO DE 12-18 CIRCUITOS DETERIORADO, INCLUYE RETIRO DE PROTECCIONES Y DISPOSICIÓN DE RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, NO INCLUYE RESANES NI PINTURAS.	un	1.00			-		$ 55,922.89	$ -	$ 55,922.89	0.00%	0.00%	
DEMOLICIÓN ALFAJÍA EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE COSNTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	7.00	0.00	7.00	-		$ 32,498.47	$ -	$ 227,489.29	0.00%	0.00%	
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	m	3.90	-3.90	0.00	-		$ 18,687.73	$ -	$ 72,882.16	0.00%	0.00%	
PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	19.43			19.43		$ 21,844.63	$ 424,441.11	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	4.00			4.00		$ 126,905.79	$ 507,623.16	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	3.90			3.90		$ 89,839.27	$ 350,373.14	$ -	100.00%	100.00%	
CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (INCLUYE FORMALETAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	M	19.43			19.43		$ 42,469.67	$ 825,185.65	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	kg	3515.11	-1076.19	2438.92	2,608.92		$ 23,042.63	$ 60,116,373.04	$ (84,914,618.87)	-242.42%	-242.42%	
CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (INCLUYE FORMALETAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	M	19.43			19.43		$ 42,469.67	$ 825,185.65	$ (825,185.65)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO (35 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR.	M	0.50			0.50		$ 341,855.19	$ 170,927.60	$ (170,927.60)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	m	26.40	18.13	44.53	44.53		$ 91,590.40	$ 4,078,520.47	$ (1,660,533.93)	245.62%	245.62%	
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	1.00	-1.00	0.00			$ 875,947.70	$ -	$ 875,947.70	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FUACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	kg	213.75	0.29	214.04	214.04		$ 264,771.67	$ 56,671,727.78	$ (76,783.78)	100.14%	100.14%	

FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	18.15			18.15		$ 106,267.26	$ 1,928,750.73	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	34.90			34.90		$ 91,590.40	$ 3,196,504.93	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	42.00			42		$ 23,315.15	$ 979,236.14	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 2N°10 (F) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	42.00			42.00		$ 20,790.98	$ 873,221.16	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	21.00	3.00	24.00	24		$ 180,330.15	$ 4,327,923.59	$ (540,990.45)	114.29%	114.29%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	21.00	3.00	24.00	24		$ 238,055.44	$ 5,713,330.57	$ (714,166.32)	114.29%	114.29%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M	22.50	8.50	31.00	30		$ 304,166.74	$ 9,125,002.11	$ (2,281,250.53)	133.33%	133.33%	
SUMINISTRO E INSTALACION MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA, PERFILES ESTUCTURALES DE ACERO GALVANIZADO PGU, MONTANTES, TORNILLOS PARA ESTRUCTURA, CLAVO IMPACTADO. ACABADO A DOS MANOS CON PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO.	M2	32.35	0.75	33.10	33.1		$ 222,048.37	$ 7,349,801.01	$ (166,536.28)	102.32%	102.32%	
PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M2	61.70			65.10		$ 17,207.77	$ 1,120,195.60	$ (58,476.16)	105.51%	105.51%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	224.21			224.21		$ 4,663.84	$ 1,045,679.27	$ -	100.00%	100.00%	
					SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. UNION EUROPEA			**$ 169,766,274.00**				
CPF	**1904**	**IED**			**ARBORIZADORA BAJA**			**SEMANA 44**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	786.72	463.91	1250.63	1,250.63		$ 7,045.00	$ 8,810,688.60	$ (3,268,246.00)	158.97%	158.97%	
CERRAMIENTO EN LONA	M	96.25	73.00	169.25	169.25		$ 31,110.25	$ 5,265,409.14	$ (2,271,047.96)	175.84%	175.84%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	466.58	9.42	476.00	476.00		$ 107,273.69	$ 51,062,274.77	$ (1,010,518.00)	102.02%	102.02%	
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	5.25			-		$ 22,300.62	$ -	$ 117,078.27	0.00%	0.00%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	145.00	6.23	151.23	151.23		$ 32,594.26	$ 4,929,229.33	$ (203,062.21)	104.30%	104.30%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	145.00	123.77	21.23	21.23		$ 42,650.45	$ 905,469.00	$ 5,278,845.87	14.64%	14.64%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO CON FIBRA SINTÉTICA ESPESOR 4 CM	M2	130.00			130.00		$ 69,868.54	$ 9,082,910.19	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	m2	323.02			323.02		$ 36,752.18	$ 11,871,653.14	$ 37.00	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA (INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	35.50			35.50		$ 8,680.11	$ 308,143.88	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	un	25.00			25.00		$ 7,469.97	$ 186,749.17	$ -	100.00%	100.00%	

DESMONTE CANCHA MULTIPLE (ARCO DE MICROFUTBOL Y ARO DE BALONCESTO) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	un	2.00			2.00		$ 398,950.46	$ 797,900.91	$ -	100.00%	100.00%	
DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	21.00			-		$ 11,761.45	$ -	$ 246,991.00	0.00%	0.00%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	16.80	5.76	22.56	22.56		$ 91,988.38	$ 2,075,257.93	$ (529,853.00)	134.29%	134.29%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	258.10	(36.51)	221.59	221.59		$ 79,962.51	$ 17,718,891.73	$ 2,919,431.00	85.85%	85.85%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	22.83			22.83		$ 135,394.33	$ 3,091,052.48	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	15.52			2.22		$ 66,591.58	$ 147,833.30	$ 885,668.00	14.30%	14.30%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	m3	103.10	68.26	171.36	171.36		$ 176,060.25	$ 30,169,684.13	$ (12,017,873.00)	166.21%	166.21%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAJÓN DE PIEDRA	m3	129.05	25.90	154.95	154.95		$ 176,060.25	$ 27,280,535.46	$ (4,559,960.00)	120.07%	120.07%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BORDILLO PREFABRICADO A80	m	87.00			87.00		$ 76,033.93	$ 6,614,951.64	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M	90.00			90.00		$ 97,085.28	$ 8,737,675.50	$ -	100.00%	100.00%	
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	18.70	5.00	23.70	23.70		$ 165,931.21	$ 3,932,569.57	$ (829,656.00)	126.74%	126.74%	
CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI ANCHO 0.50 M E= 0.07 M (NO INCLUYE REFUERZO)	M	90.00			90.00		$ 164,788.52	$ 14,830,966.59	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO (45 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3 MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR.	M	1.52			1.52		$ 358,768.86	$ 545,328.67	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PEATONAL DE ANGULOS Y PLATINAS DE ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR PARA CARCAMO ANCHO 40 CM	M	0.90			0.90		$ 156,990.72	$ 141,291.65	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	kg	1809.76	-142.50	1667.26	1,667.26		$ 23,042.63	$ 38,418,051.96	$ 3,283,574.00	92.13%	92.13%	
CAJA DE INSPECCION 100 X 100 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	2.00					$ 1,088,548.32	$ -	$ 2,177,097.00	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	m2	684.78	-162.78	522.00	522.00		$ 11,730.42	$ 6,123,281.59	$ 1,909,479.00	76.23%	76.23%	
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	m	3.00			2.00		$ 5,565.04	$ 11,130.08	$ 5,565.00	66.67%	66.67%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	m2	323.02			323.02		$ 264,771.67	$ 85,526,544.13	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	m	35.50			35.50		$ 305,515.84	$ 10,845,812.21	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN ASFALTO MD-10 PARA CANCHA DEPORTIVA E=8 CM, (INCLUYE: EMULSION ASFALTICA, ASFALTO MD-10 Y ACABADO CON SLURRY	m2	484.50	-43.86	440.64	440.64		$ 225,361.76	$ 99,303,405.31	$ 9,884,367.00	90.95%	90.95%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO (RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA CANCHA MULTIPLE INCLUYE DEMARCACIONES BALONCESTO - VOLEYBOL)	M2	484.50	-484.50	0.00	-		$ 77,589.44	$ -	$ 37,592,083.00	0.00%	0.00%	
PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	714.00			680.68		$ 65,757.83	$ 44,760,026.89	$ 2,191,065.00	95.33%	95.33%	
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M	66.67			66.67		$ 62,023.52	$ 4,135,108.31	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	620.45			620.45		$ 7,255.46	$ 4,501,650.03	$ -	100.00%	100.00%	
DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	353.72			353.72		$ 18,365.30	$ 6,496,173.31	$ -	100.00%	100.00%	
CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL (INC. DOS UNIDADES FIJAS DE MICROBALONCESTO - MALLA PARA MICRO FUTBOL - JUEGO DE POSTES Y MALLA PARA VOLEIBOL - DEMARCACIÓN DE LA CANCHA - TRANSPORTE - E INSTALACIÓN)	UN	2.00	-1.00	1.00	1.00		$ 12,850,061.48	$ 12,850,061.48	$ 12,850,061.00	50.00%	50.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	5.00			4.00		$ 126,905.79	$ 507,623.16	$ 126,906.00	80.00%	80.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1.00			1.00		$ 572,567.48	$ 572,567.48	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	118.00			118.00		$ 15,217.85	$ 1,795,706.06	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	118.00			118.00		$ 16,070.48	$ 1,896,316.55	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	25.00			25.00		$ 180,330.15	$ 4,508,253.74	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	22.00			22.00		$ 238,055.44	$ 5,237,219.69	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER 2X20W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	3.00			3.00		$ 193,810.36	$ 581,431.07	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	194.18			194.18		$ 9,167.13	$ 1,780,074.18	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H= 5.00 M (ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO DE 3" E= 3,81 MM ASTM A500 Y CAMISA DE REFUERZO DE 4", VARILLA REDONDA DE 3/4" C./.14 EJES. VIGA 40X30 Y PILOTES CONCRETO 3000 PSI) SEGÚN DETALLES IDRD.	M2	17.50			16.95		$ 2,042,059.82	$ 34,612,913.93	$ 1,123,133.00	96.86%	96.86%	
CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H= 2.50 M (ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO DE 2-1/2" Y PROTECCIÓ N EN VARILLA REDONDA DE 3/4" C./0.14 m EJES. VIGA=30*30 CONCRETO 3000PSI) SEGÚN DETALLES IDRD.	M2	17.50			16.95		$ 1,257,854.97	$ 21,320,641.75	$ 691,820.00	96.86%	96.86%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO HETEROGENEO ALTO TRÁFICO	M2	130.00			125.78		$ 237,210.90	$ 29,836,007.59	$ 1,001,410.00	96.75%	96.75%	
LAVADO Y LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE EN EL COLEGIO ARBORIZADORA BAJA (INCLUYE INSUMOS)	ML	197.54			194.54		$ 5,046.98	$ 981,840.09	$ 15,141.00	98.48%	98.48%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1,078.76			1,078.76		$ 4,663.84	$ 5,031,162.64	$ -	100.00%	100.00%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ARBORIZADORA BAJA	**$ 630,139,470.00**				
CPF	**523**	**IED**			**Fabio Lozano Simonelli**			**SEMANA 44**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	1201.02	10.05	1211.07	1,211.07		$ 4,233.48	$ 5,127,035.54	$ (42,546.00)	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	51.83	81.17	133.00	133.00		$ 31,110.25	$ 4,137,662.72	$ (2,525,218.67)	256.61%	256.61%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	235.29	11.28	246.57	246.57		$ 32,594.26	$ 8,036,765.70	$ (367,663.21)	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2			68.70	68.70		$ 107,273.69	$ 7,369,702.26	$ (7,369,702.26)	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN ASITIOS AUTORIZADOS)	M2	28.64	1.35	29.99	29.99		$ 22,300.62	$ 668,795.68	$ (30,105.84)	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	55.48	30.02	85.50	85.50		$ 12,649.16	$ 1,081,503.32	$ (379,727.83)	154.11%	154.11%	
DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	28.00			28.00		$ 20,708.69	$ 579,843.18	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)}	M3	15.05	0.08	15.13	15.13		$ 66,591.58	$ 1,007,530.54	$ (5,327.33)	100.53%	100.53%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	17.32			17.32		$ 33,174.37	$ 574,580.07	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	UN	28.00			28.00		$ 27,281.50	$ 763,882.01	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2			3.00	3.00		$ 25,731.38	$ 77,194.15	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	66.00			66.00		$ 27,938.51	$ 1,843,941.79	$ -	100.00%	100.00%	
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3			63.85	63.85		$ 34,724.48	$ 2,217,158.36	$ -	100.00%	100.00%	
CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M			120.60	120.60		$ 15,633.37	$ 1,885,384.52	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	8.00			8.00		$ 7,469.97	$ 59,759.73	$ -	100.00%	100.00%	

DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	55.30	-5.16	50.14	50.14		$ 32,569.97	$ 1,633,058.41	$ 168,061.06	90.67%	90.67%	
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	22.90			22.90		$ 18,687.73	$ 427,949.09	$ -	100.00%	100.00%	
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2			2.80	2.80		$ 18,044.21	$ 50,523.80	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	12.80	2.49	15.29	15.29		$ 135,394.33	$ 2,070,179.26	$ (337,131.87)	119.45%	119.45%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 m	M2	194.67			194.67		$ 42,650.45	$ 8,302,762.60	$ -	100.00%	100.00%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	49.31			49.31		$ 45,289.29	$ 2,233,214.74	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO CON FIBRA SINTÉTICA ESPESOR 4 CM	M2	548.06	(548.06)	-			$ 69,868.54	$ -	$ 38,292,151.98	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	158.76	(56.05)	102.71	102.71		$ 7,103.01	$ 729,550.31	$ 398,123.79	64.70%	64.70%	
CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI ANCHO 0.50 M E= 0.07 M (NO INCLUYE REFUERZO)	M	171.60	(44.68)	126.92	122.00		$ 164,788.52	$ 20,104,199.16	$ 8,173,510.48	71.10%	71.10%	
PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2			0.64	0.64		$ 115,264.41	$ 73,769.22	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PEATONAL DE ANGULOS Y PLATINAS DE ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR PARA CARCAMO ANCHO 40 CM	M			13.00	13.00		$ 156,990.72	$ 2,040,879.36	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M			20.50	20.57		$ 24,290.55	$ 499,656.52	$ (1,700.34)	100.34%	100.34%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2.00			2.00		$ 126,905.79	$ 253,811.58	$ (253,811.58)	100.00%	100.00%	
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00			1.00		$ 253,721.19	$ 253,721.19	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	M	1.00			1.00		$ 572,567.48	$ 572,567.48	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	M	8.00			8.00		$ 180,330.15	$ 1,442,641.20	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	32.00	-27.00	5.00	5.00		$ 23,315.15	$ 116,575.73	$ 629,508.95	15.63%	15.63%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M			55.00	55.00		$ 33,700.52	$ 1,853,528.49	$ (1,853,528.49)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	32.00	(12.00)	20.00	20.00		$ 20,790.98	$ 415,819.60	$ 249,491.76	62.50%	62.50%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN			8.00	8.00		$ 198,607.76	$ 1,588,862.05	$ -	100.00%	100.00%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	8.00	-5.00	3.00	3.00		$ 238,055.44	$ 714,166.32	$ 1,190,277.20	37.50%	37.50%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL TOTALIZADOR 3X125 A. MATERIALES CERTIFICADOS RETIE E INSTALADOS SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UN			1.00	1.00		$ 781,835.83	$ 781,835.83	$ (781,835.83)	100.00%	100.00%	
ACOMETIDA TRIFASICA EN 4#8 + 1#10 CABLE LIBRE DE HALOGENOS. INCLUYE CONECTORES TUBULARES Y AISLAMIENTO AUTOFUNDENTE INCLUYE MANIOBRAS DE CANALIZACIÓN	M			60.00	60.00		$ 57,049.39	$ 3,422,963.50	$ (3,422,963.50)	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	15.00	(2.42)	12.58	12.58		$ 361,355.09	$ 4,545,846.98	$ 874,479.31	83.87%	83.87%	
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	1.00			1.00		$ 875,947.70	$ 875,947.70	$ -	100.00%	100.00%	
CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	55.30	-5.16	50.14	50.14		$ 130,345.99	$ 6,535,548.17	$ 672,585.33	90.67%	90.67%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	226.69	12.39	239.08	239.08		$ 126,224.49	$ 30,177,196.69	$ (1,563,366.10)	105.46%	105.46%	
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	17.44	76.23	93.67	93.67		$ 33,727.50	$ 3,159,254.93	$ (2,571,047.33)	537.10%	537.10%	
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M			39.00	39.00		$ 22,829.47	$ 890,349.34	$ (890,349.34)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M2	-	5.29	5.29	5.29		$ 62,023.52	$ 328,104.44	$ (328,104.44)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
WIN DE ALUMINIO	M	18.00	2.90	20.90	20.90		$ 15,372.99	$ 321,295.59	$ (44,581.68)	116.11%	116.11%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	131.00	(37.64)	93.36	93.36		$ 98,222.57	$ 9,170,059.56	$ 3,697,097.71	71.27%	71.27%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	11.73	-5.49	6.24	6.24		$ 1,127,900.21	$ 7,038,097.34	$ 6,192,172.18	53.20%	53.20%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	47.82	-8.24	39.58	40.99		$ 989,338.00	$ 40,552,909.59	$ 6,757,233.57	85.72%	85.72%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	1.80	0.30	1.50	1.50		$ 989,338.00	$ 1,484,007.00	$ 296,801.40	83.33%	83.33%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	3.00			3.00		$ 772,427.21	$ 2,317,281.62	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL BLANCO DE 2 CUERPOS CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA, DESCARGA SENCILLA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, BRIDA, ACOPLE Y VALVULA PLASTICA DE 1/2" PARA REGULACION DE PRESION. CONSUMO DE AGUA DE 4.8 LTS POR DESCARGA, CAPACIDAD MINIMA DE EVACUACION DE SOLIDOS 400 GRAMOS	UN	11.00			11.00		$ 1,117,185.66	$ 12,289,042.29	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, CON DOS PERSIANAS INFERIOR Y SUPERIOR DE 30CM X 60CM. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2			3.84	3.84		$ 798,362.30	$ 3,065,711.25	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	14.00			14.00		$ 404,611.28	$ 5,664,557.91	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M			102.46	102.46		$ 91,590.40	$ 9,384,352.28	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M			1.65	1.65		$ 78,726.73	$ 129,899.11	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M			24.00	24.00		$ 51,125.49	$ 1,227,011.85	$ -	100.00%	100.00%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1-1/2 "	UN	11.00			11.00		$ 18,869.86	$ 207,568.48	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1/2"	UN	28.00			28.00		$ 4,998.42	$ 139,955.63	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	14.00			14.00		$ 63,533.17	$ 889,464.33	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	14.00			14.00		$ 63,533.17	$ 889,464.33	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	7.20	0.56	7.76	7.76		$ 123,260.52	$ 956,501.65	$ (69,025.89)	107.78%	107.78%	
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	66.72	216.43	283.15	283.15		$ 20,236.50	$ 5,729,964.98	$ (4,379,785.70)	424.39%	424.39%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN			24.00	24.00		$ 33,569.66	$ 805,671.73	$ -	100.00%	100.00%	
PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	-		22.64	22.64		$ 32,026.28	$ 725,075.09	$ (725,075.09)	100.00%	100.00%	
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M			122.00	122.00		$ 32,026.28	$ 3,907,206.76	$ -	100.00%	100.00%	
PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN).	M2	176.38			176.38		$ 6,610.59	$ 1,165,975.86	$ -	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1,201.02			1,201.02		$ 4,663.84	$ 5,601,363.56	$ -	100.00%	100.00%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. FABIO SIMONELLI	**$ 245,187,661.00**				
CPF	**1918**	**IED**			**Estrella del Sur Sede B**			**SEMANA 44**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	557.28	20.48	577.76	577.76		$ 4,233.48	$ 2,445,932.98	$ (86,702.00)	103.67%	103.67%	
CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2").	M	88.20	-88.20	0.00	-		$ 154,730.98	$ -	$ (13,647,272.19)	0.00%	0.00%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	54.17			33.24		$ 33,174.37	$ 1,102,716.03	$ 694,339.54	61.36%	61.36%	
DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	95.99	-32.70	63.29	63.29		$ 29,391.49	$ 1,860,302.19	$ 960,987.18	65.94%	65.94%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	28.37					$ 707,267.02	$ -	$ 20,065,165.47	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON DOBLE ANTI MACHUCON, REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	25.81	6.00	31.81	35.81		$ 829,259.39	$ 29,695,861.74	$ (8,292,676.84)	138.75%	138.75%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1.43			1.43		$ 798,362.30	$ 1,145,011.22	$ (3,353.12)	100.29%	100.29%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO, CUERPOS FIJOS, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A DISEÑO SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	87.25			69.15		$ 467,649.33	$ 32,338,268.71	$ 8,464,135.19	79.26%	79.26%	

ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM	M	141.20			141.20		$ 9,408.62	$ 1,328,459.99	$ 37.63	100.00%	100.00%	
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	141.20			148.20		$ 22,829.47	$ 3,383,236.17	$ (159,714.97)	104.95%	104.95%	
PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M	141.20			148.20		$ 17,207.77	$ 2,550,122.76	$ (120,385.56)	104.95%	104.95%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	577.76			597.76		$ 4,663.84	$ 2,787,856.22	$ (93,276.77)	103.46%	103.46%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ESTRELLA DEL SUR - B	**$ 78,637,768.00**				
CPF	**1974**	**IED**			**CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)**			**SEMANA 44**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	538.32	-88.32	450.00	450.00		$ 4,233.48	$ 1,905,064.11	$ 373,901.00	83.59%	83.59%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5"anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	78.28	11.72	90.00	95.00		$ 31,137.23	$ 2,958,036.66	$ (520,614.00)	121.36%	121.36%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	538.32					$ 3,248.63	$ -	$ 1,748,804.00	0.00%	0.00%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	12.00	(1.00)	11.00	11.00		$ 7,469.97	$ 82,169.63	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M			5.00	5.00		$ 23,315.15	$ 116,575.73	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 2N°10 (F) + 1N°12 (T) AWG THHN	M			20.00	20.00		$ 20,790.98	$ 415,819.60	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES 50W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	1.00			1.00		$ 101,214.88	$ 101,214.88	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	M2	538.82	-134.52	404.30	408.30		$ 36,752.18	$ 15,005,915.99	$ 4,796,895.00	75.78%	75.78%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	1841.40	-941.87	899.53	902.53		$ 23,042.63	$ 20,796,663.05	$ 21,634,032.15	49.01%	49.01%	
CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	44.00			46.69		$ 130,345.99	$ 6,086,241.01	$ (351,017.24)	106.12%	106.12%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	633.15			632.63		$ 4,663.84	$ 2,950,473.25	$ 2,436.22	99.92%	99.92%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUAYA METÁLICA PARA CERCHA METÁLICA	M2	30.00			30.00		$ 37,696.55	$ 1,130,896.57	$ -	100.00%	100.00%	
FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2			87.00	87.00		$ 106,267.26	$ 9,245,251.44	$ (9,245,251.44)	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	KG	538.31	-538.31	0.00	-		$ 264,771.67	$ -	$ 142,529,236.49	0.00%	0.00%	

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 50 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR 50 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 24 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA LOS METROS CUADRADOS RALMENTE INSTALADOS)	KG	0.00	0.00	410.94	410.94		$ 306,692.25	$ 126,032,114.08	$ (126,032,114.08)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. CALASANZ BUENA VISTA							**$ 186,826,436.00**				
CPF	**546**	**IED**			**SANTA LIBRADA (IED)**			**SEMANA 44**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	557.28			557.28		$ 4,233.48	$ 2,359,231.39	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5"anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	128.18	-78.18	50.00	50.00		$ 31,110.25	$ 1,555,512.30	$ 2,432,199.03	39.01%	39.01%	
CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	65.03	-39.70	25.33	25.33		$ 15,633.37	$ 395,993.28	$ 620,644.82	38.95%	38.95%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	67.90		0.80	0.80		$ 32,594.26	$ 26,075.40	$ 2,187,074.58	1.18%	1.18%	
PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	27.20			13.34		$ 21,844.63	$ 291,407.33	$ 302,766.53	49.04%	49.04%	
PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	372.13			371.00		$ 13,385.77	$ 4,966,120.74	$ 15,125.92	99.70%	99.70%	
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M			18.00	18.00		$ 22,829.47	$ 410,930.46	$ (410,930.46)	100.00%	100.00%	
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	63.87	28.85	92.72	92.72		$ 34,724.48	$ 3,219,654.24	$ (1,001,801.39)	145.17%	145.17%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2			73.27	73.27		$ 36,752.18	$ 2,692,832.39	$ -	100.00%	100.00%	
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	16.47	(16.47)	-			$ 18,044.21	$ -	$ -	0.00%	0.00%	
DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	194.87			194.87		$ 9,443.70	$ 1,840,293.82	$ 1,840,293.82	100.00%	100.00%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	59.96			59.96		$ 91,988.38	$ 5,515,765.80	$ 5,515,765.80	100.00%	100.00%	
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	100.00	(20.61)	79.39	79.39		$ 53,568.71	$ 4,252,820.18	$ 4,252,820.18	79.39%	79.39%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M	63.33			13.44		$ 91,988.38	$ 1,236,323.87	$ 1,236,323.87	21.22%	21.22%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	281.83	(180.01)	96.22	96.22		$ 45,289.29	$ 4,357,735.20	$ 4,357,735.20	34.14%	34.14%	

RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INLUYE REFUERZO).	M2			12.54	12.54		$ 193,996.53	$ 2,432,716.52	$ 2,432,716.52	100.00%	100.00%	
PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 M (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE}	M2	333.93	-143.06	190.87	190.87		$ 69,679.67	$ 13,299,757.83	$ 13,299,757.83	57.16%	57.16%	
MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	208.04			205.00		$ 25,122.94	$ 5,150,202.74	$ 5,150,202.74	98.54%	98.54%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M			19.35	19.35		$ 91,590.40	$ 1,772,274.22	$ 1,772,274.22	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M			8.10	8.10		$ 78,726.73	$ 637,686.52	$ 637,686.52	100.00%	100.00%	
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M	19.60			13.44		$ 62,023.52	$ 833,596.15	$ 833,596.15	68.57%	68.57%	
Demolición de Materas en concreto o fibrocemento 1.2x1.2x0.3 m y 1x0.7x0.7 m	M	48.00			44.00		$ 16,863.75	$ 742,005.00	$ 742,005.00	91.67%	91.67%	
TRATAMIENTO DE PISOS EN LADRILLO O ADOQUIN: LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS y REEMBOQUILLADO DE JUNTAS, (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN,	M	110.00	69.08	179.08	179.08		$ 16,863.75	$ 3,019,960.35	$ 3,019,960.35	162.80%	162.80%	#####
JUNTA DE DILATACIÓN INDUCIDA PISO EN CONCRETO ALLANADO (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, MARCACIÓN DE DILATACIONES Y SELLADO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN).	M	356.60	-300.35	56.25	59.92		$ 34,369.67	$ 2,059,599.55	$ 2,059,599.55	16.80%	16.80%	
CANAL EN PVC AMAZONAS O EQUIVALENTE, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	6.00	(6.00)	-	-		$ 68,114.71	$ -	$ -	0.00%	0.00%	
DOMO EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 5 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	7.20	-1.32	5.88	5.88		$ 157,817.72	$ 927,968.18	$ 927,968.18	81.67%	81.67%	
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	67.71			67.71		$ 5,565.04	$ 376,808.69	$ 376,808.69	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CERCHA PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 4.5 KG/M	M	6.00	-0.12	5.88	5.88		$ 101,978.47	$ 599,633.40	$ 599,633.40	98.00%	98.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M			20.20	20.20		$ 305,515.84	$ 6,171,419.91	$ 6,171,419.91	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	335.60	(23.61)	315.08	315.08		$ 361,355.09	$ 113,857,372.13	$ 113,857,372.13	93.89%	93.89%	
PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2			96.73	96.73		$ 65,757.83	$ 6,360,755.11	$ 6,360,755.11	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	M2			190.00	190.00		$ 11,730.42	$ 2,228,757.19	$ 2,228,757.19	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN			8.00	8.00		$ 33,502.20	$ 268,017.60	$ 268,017.60	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TIERRA NEGRA ABONADA, INCLUYE CONFORMACIÓN DE TERRENO Y COMPACTACIÓN MANUAL DE TIERRA.	M3			37.42	37.42		$ 258,201.55	$ 9,661,902.03	$ 9,661,902.03	100.00%	100.00%	
SUMNINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN EN PASTO KIKUYO	M2			190.84	200.84		$ 29,001.60	$ 5,824,681.89	$ 5,824,681.89	105.24%	105.24%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ZANJA DE 0.3 X 0.3 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000, GRAVA 3/4" Y PASES PVC LONGITUD MAX 0.3 M CADA 3 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	130.00			130.00		$ 89,213.28	$ 11,597,727.02	$ 11,597,727.02	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	617.33			617.33	30.87	$ 4,663.84	$ 2,879,127.54	$ 2,879,127.54	100.00%	100.00%	
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. SANTA LIBRADA							**$ 223,822,666.00**				

CPF	1917	IED			ESTRELLA DEL SUR (IED) A			SEMANA 44				
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	20.56			20.56		$ 4,233.48	$ 87,040.26	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	40.30	-31.81	8.49	8.49		$ 31,110.25	$ 264,138.88	$ 989,604.00	21.07%	21.07%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19.52	-2.22	17.30	17.30		$ 32,594.26	$ 563,880.63	$ 72,359.00	88.63%	88.63%	
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19.52	-5.96	13.56	13.56		$ 22,300.62	$ 302,396.45	$ 132,912.00	69.47%	69.47%	
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	40.65	(2.49)	38.16	38.16		$ 12,649.16	$ 482,692.01	$ 31,496.00	93.87%	93.87%	
DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19.52	-4.52	15.00	15.00		$ 20,708.69	$ 310,630.28	$ 93,603.00	76.84%	76.84%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	11.36	-5.02	6.34	6.34		$ 33,174.37	$ 210,325.50	$ 166,535.00	55.81%	55.81%	
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	15.00			15.00		$ 27,281.50	$ 409,222.50	$ -	100.00%	100.00%	
SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	15.00			15.00		$ 182,479.27	$ 2,737,188.99	$ -	100.00%	100.00%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	19.52			19.52		$ 42,650.45	$ 832,536.73	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	19.52	(1.99)	17.53	17.53		$ 126,224.49	$ 2,212,715.38	$ 251,187.00	89.81%	89.81%	
MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2	0.80			0.80		$ 67,218.91	$ 53,775.13	$ -	100.00%	100.00%	
WIN DE ALUMINIO	M	3.00			3.00		$ 15,372.99	$ 46,118.98	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	44.84			40.81		$ 116,158.86	$ 4,740,210.72	$ 468,353.00	91.01%	91.01%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	2.00			2.00		$ 41,130.01	$ 82,260.02	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	5.20			5.20		$ 707,267.02	$ 3,677,788.50	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	2.16	0.12	2.28	2.38		$ 1,127,967.67	$ 2,680,941.73	$ (244,532.00)	110.04%	110.04%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	7.00	1.00	8.00	8.00		$ 873,470.75	$ 6,987,765.98	$ (873,471.00)	114.29%	114.29%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2.00			2.00		$ 616,820.66	$ 1,233,641.32	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	5.00			5.00		$ 404,611.28	$ 2,023,056.40	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	2.00			2.00		$ 41,130.01	$ 82,260.02	$ -	100.00%	100.00%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	28.82	12.82	41.64	42.64		$ 989,338.20	$ 42,185,380.90	$ (13,672,654.00)	147.95%	147.95%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	1.80	(0.80)	1.00	1.00		$ 989,338.20	$ 989,338.20	$ 791,471.00	55.56%	55.56%	
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	44.84			40.81		$ 36,193.65	$ 1,476,990.67	$ 145,933.00	91.01%	91.01%	
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	35.50			35.10		$ 21,599.09	$ 758,128.09	$ 8,640.00	98.87%	98.87%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	2.16			2.16		$ 123,260.52	$ 266,242.73	$ -	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	111.32			100.19		$ 4,663.84	$ 467,270.00	$ 51,909.00	90.00%	90.00%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ESTRELLA DEL SUR - A	**$ 76,163,937.00**				
CPF	**1959**	**IED**			**GUILLERMO CANO ISAZA (IED)**			**SEMANA 44**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	125.48			125.48		$ 4,233.48	$ 531,216.54	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	68.00			32.20		$ 31,110.25	$ 1,001,749.92	$ 1,113,747.00	47.35%	47.35%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	129.54	18.57	148.11	148.11		$ 32,594.26	$ 4,827,535.26	$ (605,275.00)	114.34%	114.34%	
DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	150.00			150.00		$ 11,376.96	$ 1,706,544.05	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	40.00			40.00		$ 7,469.97	$ 298,798.67	$ -	100.00%	100.00%	
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	100.00			100.00		$ 18,687.73	$ 1,868,773.32	$ -	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	95.87	17.32	113.19	113.19		$ 22,300.62	$ 2,524,207.52	$ (386,247.00)	118.07%	118.07%	
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	364.26	(31.38)	332.88	364.26		$ 12,649.16	$ 4,607,583.60	$ -	100.00%	100.00%	
MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2	7.20	3.16	10.36	10.20		$ 65,869.81	$ 671,872.04	$ (197,609.00)	141.67%	141.67%	
DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND	22.00	37.00	59.00	37.00		$ 20,708.69	$ 766,221.35	$ (310,630.00)	168.18%	168.18%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	26.61			26.11		$ 33,174.37	$ 866,182.77	$ 16,587.00	98.12%	98.12%	
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	78.00			53.00		$ 27,281.50	$ 1,445,919.51	$ 682,038.00	67.95%	67.95%	
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M			15.00	15.00		$ 20,708.69	$ 310,630.28	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M			19.00	19.00		$ 11,967.87	$ 227,389.46	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN			16.00	16.00		$ 7,469.97	$ 119,519.47	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M			58.00	58.00		$ 4,391.32	$ 254,696.59	$ -	100.00%	100.00%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	35.00	118.18	153.18	153.18		$ 61,099.39	$ 9,359,204.54	$ (7,220,726.00)	437.66%	437.66%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	129.54	30.05	159.59	159.59		$ 126,224.49	$ 20,144,167.03	$ (3,793,046.00)	123.20%	123.20%	
WIN DE ALUMINIO	M	30.00	52.83	82.83	55.00		$ 15,372.99	$ 845,514.70	$ (384,325.00)	183.33%	183.33%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISIÓN POR MÓDULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM	M	7.20	16.32	23.52	23.52		$ 1,128,300.90	$ 26,537,637.11	$ (18,413,871.00)	326.67%	326.67%	
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	364.26			364.26		$ 36,193.65	$ 13,183,900.70	$ -	100.00%	100.00%	
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	119.96	(45.93)	74.03	68.55	9.45	$ 21,599.09	$ 1,480,617.69	$ 1,110,409.00	57.14%	57.14%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	135.38			135.38		$ 989,338.20	$ 133,939,109.55	$ (2,504.00)	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1-1/2 "	UN	37.00			37.00		$ 18,869.86	$ 698,184.88	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	37.00			37.00		$ 63,533.17	$ 2,350,727.15	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	22.00	7.00	29.00	29.00		$ 63,533.17	$ 1,842,461.82	$ (444,732.00)	131.82%	131.82%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	UN	37.00			37.00		$ 181,838.44	$ 6,728,022.41	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN	38.00			38.00		$ 97,295.74	$ 3,697,238.23	$ -	100.00%	100.00%	
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	22.00			22.00		$ 5,565.04	$ 122,430.83	$ -	100.00%	100.00%	
ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE EN CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	74.03	-30.18	43.85	43.85	22.79	$ 13,044.45	$ 571,999.04	$ 393,681.00	59.23%	59.23%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	20.88			20.88		$ 123,260.52	$ 2,573,679.69	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN			13.00	6.00		$ 192,677.11	$ 1,156,062.68	$ (1,156,063.00)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	3.00			3.00		$ 572,567.48	$ 1,717,702.45	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	50.00	56.00	106.00	90.00		$ 23,315.15	$ 2,098,363.16	$ (932,606.00)	180.00%	180.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	50.00	56.00	106.00	90.00		$ 20,790.98	$ 1,871,188.21	$ (831,639.00)	180.00%	180.00%	
PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	36.90			36.90		$ 21,844.63	$ 806,066.74	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	32.00			34.00		$ 180,330.15	$ 6,131,225.09	$ (360,660.00)	106.25%	106.25%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	24.00			24.00		$ 198,607.76	$ 4,766,586.16	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	20.00			8.00		$ 180,330.15	$ 1,442,641.20	$ 2,163,962.00	40.00%	40.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	5.40	0.60	6.00	5.00		$ 989,338.20	$ 4,946,691.01	$ 395,735.00	92.59%	92.59%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	12.00			10.00		$ 772,427.21	$ 7,724,272.05	$ 1,544,854.00	83.33%	83.33%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	12.00			5.00		$ 41,130.01	$ 205,650.06	$ 287,910.00	41.67%	41.67%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL BLANCO DE 2 CUERPOS CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA, DESCARGA SENCILLA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, BRIDA, ACOPLE Y VALVULA PLASTICA DE 1/2 PARA REGULACION DE PRESION. CONSUMO DE AGUA DE 4.8 LTS POR DESCARGA, CAPACIDAD MINIMA DE EVACUACION DE SOLIDOS 400 GRAMOS	UN	45.00	-8.00	37.00	37.00		$ 1,117,185.66	$ 41,335,869.52	$ 8,937,485.00	82.22%	82.22%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	m2	364.26	(24.03)	340.23	340.23		$ 98,222.57	$ 33,418,266.56	$ 2,360,288.00	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	m2	205.61			139.29		$ 4,663.84	$ 649,626.09	$ 309,306.00	67.74%	67.74%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. GUILLERMO CANO ISAZA	**$ 354,373,946.66**				
CPF	**548**	**IED**			**TENERIFE - GRANADA SUR (IED)**			**SEMANA 44**				**Observ**
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	193.00	41.34	234.34	234.34		$ 4,233.48	$ 992,072.72	$ (175,012.00)	121.42%	121.42%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	39.00			26.00		$ 31,110.25	$ 808,866.40	$ 404,433.00	66.67%	66.67%	
TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	24.83	65.79	90.62	90.62		$ 38,696.24	$ 3,506,652.84	$ (2,545,825.00)	364.96%	364.96%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	44.28	25.88	70.16	55.16		$ 361,355.09	$ 19,932,346.54	$ (3,931,543.00)	124.57%	124.57%	
PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	44.28	25.88	70.16	70.16		$ 65,757.83	$ 4,613,569.51	$ (1,701,813.00)	158.45%	158.45%	
PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	412.00	(366.94)	45.06	45.06		$ 32,026.28	$ 1,443,104.40	$ 11,751,725.00	10.94%	10.94%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA DE 1-1/4" PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR CON SOPORTES PLÁSTICO. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS	M	43.00	-7.64	35.36	30.36		$ 190,851.78	$ 5,794,260.06	$ 2,412,367.00	70.60%	70.60%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA, EL TUBO PASAMANOS DE 2" CALIBRE 18 AL IGUAL QUE LOS TUBOS PEDESTALES CON PLATINA DE FIJACIÓN Y TRAVESAÑOS VERTICALES EN TUBERÍA DE 3/4" CON SEPARACIÓN CADA 9CM, PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS.	M	5.50	(0.80)	4.70	4.70		$ 1,120,163.13	$ 5,264,766.69	$ 896,131.00	85.45%	85.45%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	964.27	(570.86)	393.41	393.41		$ 4,663.84	$ 1,834,783.56	$ 2,662,416.00	40.80%	40.80%	
SUMINISTRO E INSTALACION MEMBRANA PVC PLASTIFICADO SIKAPLAN 15 PR O SIMILAR	M3	150.00	(15.20)	134.80	116.77		$ 383,249.63	$ 44,750,287.29	$ 12,737,157.00	77.84%	77.84%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. TENERIFE GRANADA SUR	**$ 88,940,710.00**				
CPF	**545**	**IED**			**CIUDAD DE VILLAVICENCIO (IED)**			**SEMANA 44**				**Observ**
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	540.76			540.76		$ 4,233.48	$ 2,289,294.37	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M)	M	35.00			35.00		$ 31,110.25	$ 1,088,858.61	$ -	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	107.30		-	307.00		$ 69,099.55	$ 21,213,562.74	$ (13,799,181.00)	286.11%	286.11%	
DEMOLICION DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	361.42			361.42		$ 69,099.55	$ 24,973,960.41	$ -	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN Y/O DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE COMPUESTO POR MALLA ESLABONADA, ANTEPECHO EN LADRILLO, VIGA DE CIMENTACIÓN Y COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO	M2	120.00			120.00		$ 108,358.36	$ 13,003,003.55	$ -	100.00%	100.00%	


EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	37.24			36.65		$ 91,988.38	$ 3,371,374.26	$ 54,273.00	98.42%	98.42%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	22.04			32.04		$ 176,060.25	$ 5,640,970.35	$ (1,760,602.00)	145.37%	145.37%	
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	9.00	(1.00)	8.00	8.00		$ 875,947.70	$ 7,007,581.56	$ 875,948.00	88.89%	88.89%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL REFORZADO EN MALLA PREONDULADA CALIBRE 8 HUECO 2", ÁNGULO 1" X 1/8" PISA MALLA EN ÁNGULO DE 3/4" X 1/4", PARALES DE 2 1/2" X 2 1/2" EN 3 MM CON SUJETADORES DE VARILLA DE 5/8" Y REFUERZOS DIAGONALES EN PLATINA DE 1-1/2"* 1/8" (INCLUYE TODOS LOS INSUMOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE)	M2	120.00			120.00		$ 503,048.36	$ 60,365,803.28	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CÁRCAMO EN CONCRETO (25 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR.	M	9.00	1.50	10.50	12.50		$ 320,598.77	$ 4,007,484.69	$ (1,122,096.00)	138.89%	138.89%	
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	m3	94.84			93.39		$ 34,724.48	$ 3,242,919.64	$ 50,351.00	98.47%	98.47%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ZANJA DE 0.3 X 0.3 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000, GRAVA 3/4" Y PASES PVC LONGITUD MAX 0.3 M CADA 3 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	54.00			57.40		$ 89,213.28	$ 5,120,842.55	$ (303,325.00)	106.30%	106.30%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	M2	25.00			25.00		$ 11,730.42	$ 293,260.61	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	45.00	20.35	65.35	85.35		$ 91,590.40	$ 7,817,240.55	$ (3,695,673.00)	189.67%	189.67%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	767.00	75.00	842.00	842.00		$ 7,103.01	$ 5,980,735.68	$ (532,726.00)	109.78%	109.78%	
DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE COMPUESTO POR MALLA ESLABONADA Y PARAL EN PERFIL DE ACERO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2			116.85	136.85		$ 62,810.05	$ 8,595,555.16	$ (1,256,201.00)	117.12%	117.12%	
PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2	373.66		405.33	405.33	26.67	$ 115,264.41	$ 46,720,121.60	$ (3,650,424.00)	108.48%	108.48%	
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2			120.00	85.00	85.00	$ 21,599.09	$ 1,835,922.74	$ (1,835,923.00)	70.83%	70.83%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 6" INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE RELLENO)	M	68.00			68.00		$ 141,729.70	$ 9,637,619.63	$ -	100.00%	100.00%	
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. TENERIFE GRANADA SUR							**$ 232,206,112.00**				


PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA		**95.63%**
ACUMULADO EJECUTADO A LA FECHA	**$**	**2,561,693,676.66**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**2,678,619,155.00**

AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS POR SEDE - Septiembre 13 2026


SEDE EDUCATIVA	PROGRAMADO ACUMULADO		EJECUTADO ACUMULADO		TOTAL POR SEDE	% DE ADELANTO O ATRASO
ORLANDO FALS BORDA	$ 156,929,148.00	100.00%	$ 156,929,147.99	100.00%	$ 156,929,148.00	ENTREGADO
UNION EUROPEA	$ 169,766,274.00	100.00%	$ 169,766,274.00	100.00%	$ 169,766,274.00	ENTREGADO
SIERRA MORENA	$ 118,699,548.00	100.00%	$ 118,699,548.00	100.00%	$ 118,699,548.00	ENTREGADO
FABIO LOZANO	$ 245,187,661.00	100.00%	$ 245,187,661.00	100.00%	$ 245,187,661.00	ENTREGADO
ARBORIZADORA BAJA	$ 630,139,470.00	100.00%	$ 630,139,470.00	100.00%	$ 630,139,470.00	ENTREGADO
BUENAVISTA	$ 186,826,436.00	100.00%	$ 186,826,436.00	100.00%	$ 186,826,436.00	ENTREGADO
ESTRELLA DEL SUR - B	$ 78,637,768.00	100.00%	$ 78,637,768.00	100.00%	$ 78,637,768.00	ENTREGADO
SANTA LIBRADA	$ 223,822,666.00	100.00%	$ 223,822,666.00	100.00%	$ 223,822,666.00	0.00%
ESTRELLA DEL SUR - A	$ 76,163,937.00	100.00%	$ 76,163,937.00	100.00%	$ 76,163,937.00	ENTREGADO
TENERIFE GRANADA SUR SEDE A	$ 88,940,710.00	100.00%	$ 88,940,710.00	100.00%	$ 88,940,710.00	ENTREGADO
GUILLERMO CANO ISAZA SEDE A	$ 354,505,537.00	100.00%	$ 354,373,946.66	99.96%	$ 354,505,537.00	-0.04%
CIUDAD DE VILLAVICENCIO	$ 258,666,666.67	74.12%	$ 232,206,112.00	66.53%	$ 349,000,000.00	-7.58%
TOTALES	**$ 2,588,285,821.67**	**96.63%**	**$ 2,561,693,676.66**	**95.63%**	**$ 2,678,619,155.00**	-0.99%

OBSERVACIONES: Al final de la presente semana, como aparece consignado en la tabla anterior, encontramos que en la ***IED Guillermo Cano Isaza,*** igual que en el periodo anterior se encuentra practicamente nivelada la ejecución con la programación, mientras que la ***IED Ciudad de Villavicencio*** presenta un atraso que supera el 7.5%. El contrato en general presenta un atraso cercano al 1%.

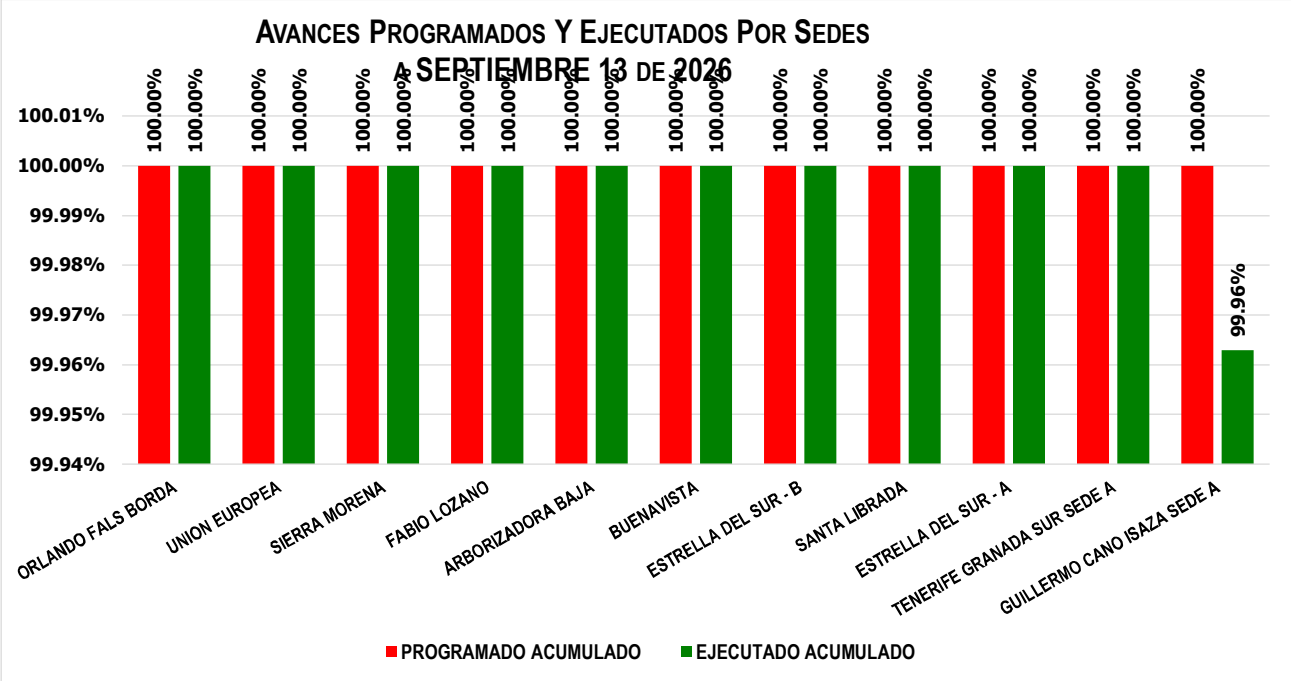

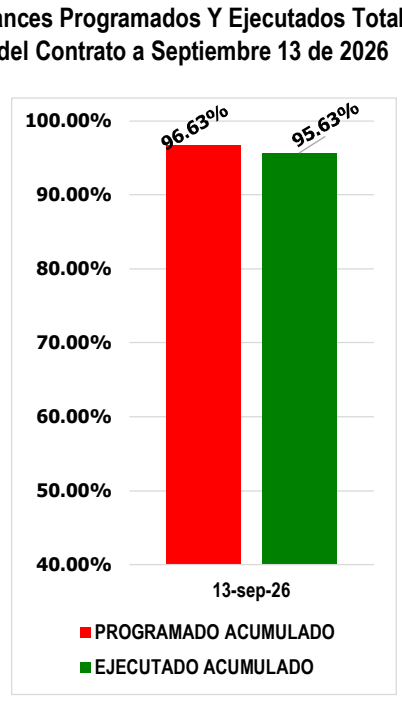

AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS TOTALES - Septiembre 13 2026

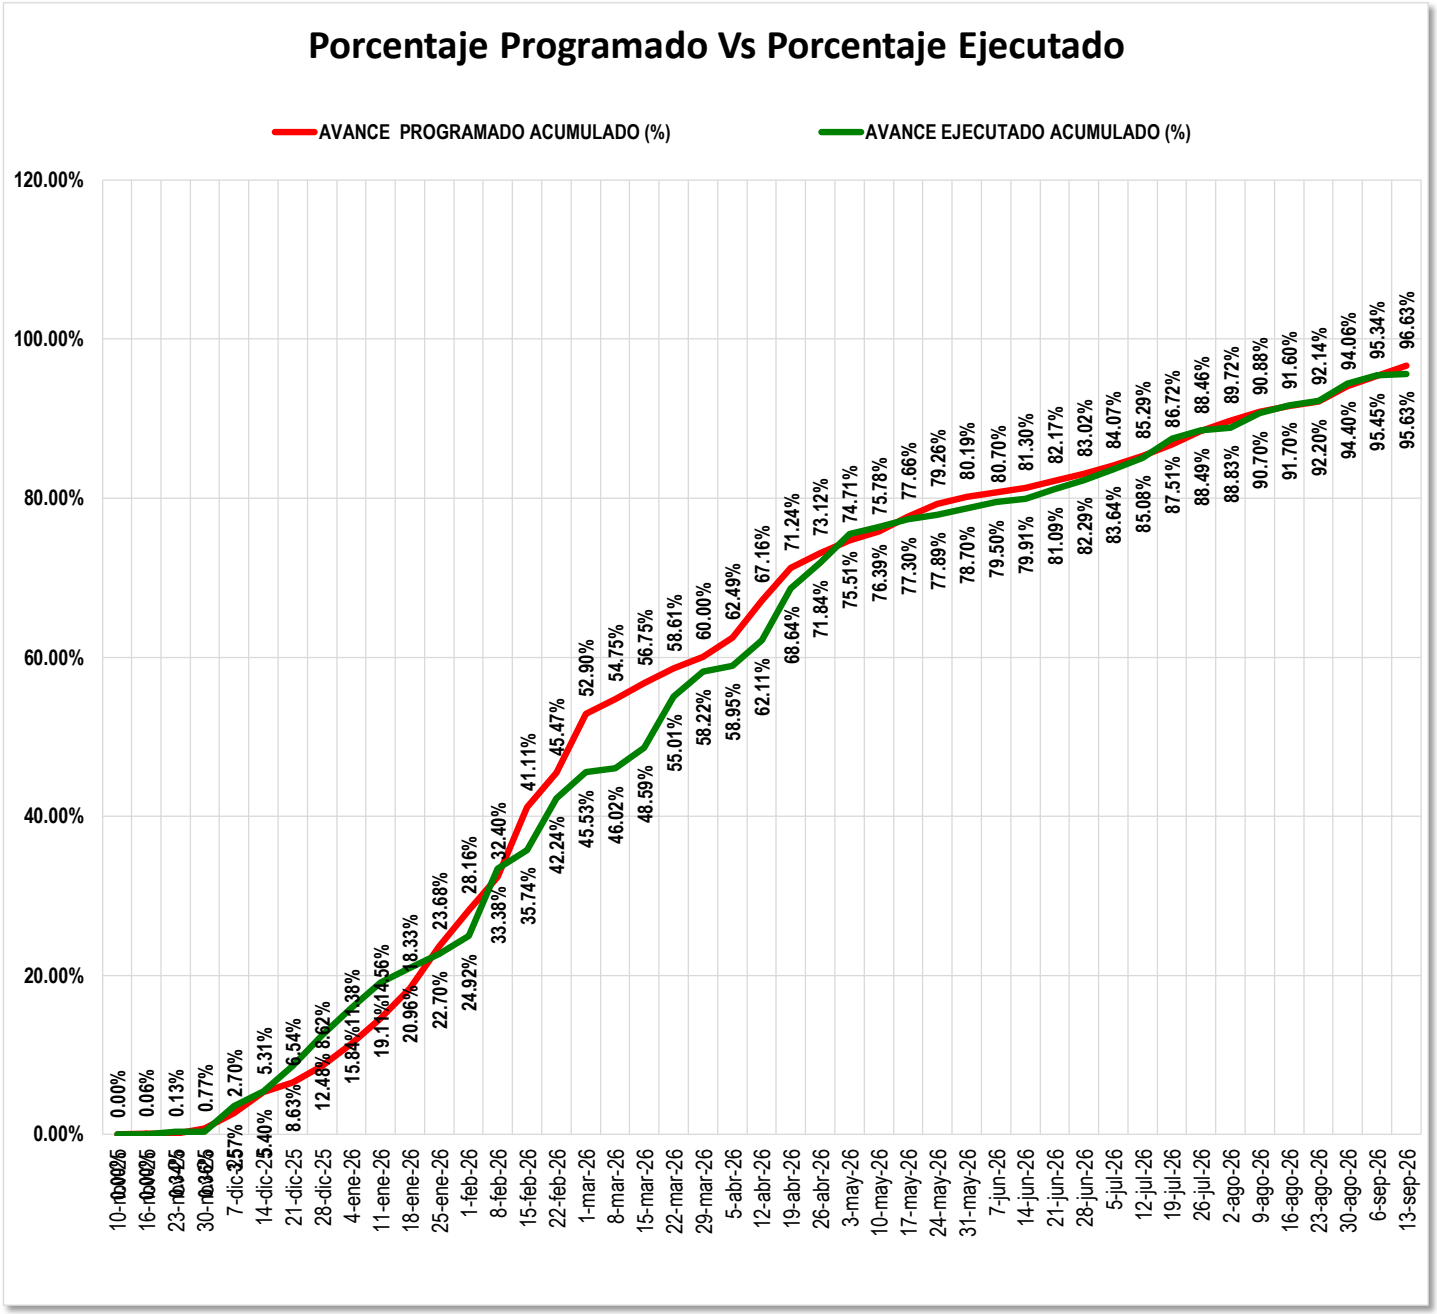

FECHA	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (%)	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO (%)
10-nov-25	0.00%	0.00%
16-nov-25	0.06%	0.00%
23-nov-25	0.13%	0.34%
30-nov-25	0.77%	0.36%
7-dic-25	2.70%	3.57%
14-dic-25	5.31%	5.40%
21-dic-25	6.54%	8.63%
28-dic-25	8.62%	12.48%
4-ene-26	11.38%	15.84%
11-ene-26	14.56%	19.11%
18-ene-26	18.33%	20.96%
25-ene-26	23.68%	22.70%
1-feb-26	28.16%	24.92%
8-feb-26	32.40%	33.38%
15-feb-26	41.11%	35.74%
22-feb-26	45.47%	42.24%
1-mar-26	52.90%	45.53%
8-mar-26	54.75%	46.02%
15-mar-26	56.75%	48.59%
22-mar-26	58.61%	55.01%
29-mar-26	60.00%	58.22%
5-abr-26	62.49%	58.95%
12-abr-26	67.16%	62.11%
19-abr-26	71.24%	68.64%
26-abr-26	73.12%	71.84%
3-may-26	74.71%	75.51%
10-may-26	75.78%	76.39%
17-may-26	77.66%	77.30%
24-may-26	79.26%	77.89%
31-may-26	80.19%	78.70%
7-jun-26	80.70%	79.50%
14-jun-26	81.30%	79.91%
21-jun-26	82.17%	81.09%
28-jun-26	83.02%	82.29%
5-jul-26	84.07%	83.64%
12-jul-26	85.29%	85.08%
19-jul-26	86.72%	87.51%
26-jul-26	88.46%	88.49%
2-ago-26	89.72%	88.83%
9-ago-26	90.88%	90.70%
16-ago-26	91.60%	91.70%
23-ago-26	92.14%	92.20%
30-ago-26	94.06%	94.40%
6-sep-26	95.34%	95.45%
13-sep-26	**96.63%**	**95.63%**
20-sep-26	97.80%	0.00%
27-sep-26	98.90%	0.00%
30-sep-26	100.00%	0.00%

FECHA: 20/09/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES 10 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARÍA DE ACESO Y PERMANANCIA		GRUPO 2
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS		

CORTE DEL INFORME:	CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO PAIS
20 de septiembre de 2026	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO

FECHAS			PLAZOS EN DIAS			VALOR CONTRATO		
DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8169110	CO1.PCCNTR.8154780	INICIAL	211	211	INICIAL	$ 796,184,131.00	$ 2,332,049,023.00
INICIO	6 de octubre de 2025	6 de octubre de 2025	SUSPENSIONES			ADICIONES	$ 291,300,934.00	$ 785,001,422.00
TERMINACION INICIAL	5 de mayo de 2026	5 de mayo de 2026	PRÓRROGAS	153	148	TOTAL	$ 1,087,485,065.00	$ 3,117,050,445.00
TERMINACION FINAL	5 de octubre de 2026	30 de septiembre de 2026	TOTAL	364	359			

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1	23-dic-25	$ 128,425,720.00	46	
2	5-jun-26	$ 162,875,214.00	107	
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA	OTRO ASPECTO
1	22-dic-25	$ 785,001,422.00	46	
2	27-may-26		102	
3				
4				

| POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA | | | |

FECHA:	20/09/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	195 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO			
REGISTRO FOTOGRAFICO		SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA			GRUPO 2
		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS			
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
1A 100.00%	ORLANDO FALS BORDA (IED)		 	  	FRENTE AL 100%
2C 100.00%	SIERRA MORENA (IED)	* ADECUACION DE CUARTOS DE BASURA * ACCESIBILIDAD REDUCIDA RAMPAS * PINTURA 4 AULAS	 	 	FRENTE AL 100%

28072879
52071222
63396903
2038265
5260774
11337220
18125874
70007566
24,867,651.00
12664106
76,878,564.00

FECHA: 20/09/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES: 195 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO 2
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
3B 100.00%	UNION EUROPEA (IED)	* CAMBIO DE CUBIERTA PARA 3 AULAS, INCLUYE LA EDECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS	 364721023 	 	FRENTE AL 100%
4A 100.00%	ARBORIZADORA BAJA (IED)	* CAMBIO DE CUBIERTA BLOQUE PRIMERA INFANCIA, INCLUYE MEJORAMIENTO ELECTRICO * ADECUACIÓN CANCHA DEPROTIVA	 	 	FRENTE AL 100%

FECHA: 20/09/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES: 166 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA			GRUPO 2	
CORTE DEL INFORME	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
5/4/26	CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA: CONSORCIO PAIS			
	CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR: CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO			

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
5A 100.00%	FABIO LOZANO SIMONELLI (IED)	* CAMBIO DE PISOS AULAS DE 3ER PISO BLOQUE A * MANEJO AGUAS LLUVIAS CANCHA * MEJORAMIENTO BATERIAS SANITARIAS 3ER PISO B	 	 	FRENTE AL 100%
6B 100.00%	ESTRELLA DEL SUR (IED) SEDE B	* CAMBIO DE PUERTAS Y VENTANA DE LA SEDE * CAMBIO DEL PORTON PRINCIPAL	 	 	FRENTE AL 100%

FECHA: 20/09/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES: 195 Días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO					
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO	2
CORTE DEL INFORME	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS					
5/4/26	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO		

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
7A **100.00%**	**CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)**	* CAMBIO DE CUBIERTA AULA MULTIPLE	 	 	**FRENTE AL 100%**
8A **100.00%**	**SANTA LIBRADA (IED)**	* MANTENIMIENTO CORRECTIVO TERRAZAS Y JARDINERA * ADECUACIÓN JUNTA ESTRUCTURAL COMEDOR	 	 	**FRENTE AL 100%**

FECHA: 20/09/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES: 195 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO 2
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
9A 100.00%	IED ESTRELLA DEL SUR, SEDE A	* ADEACUACIÓN BATERIAS SANITARIAS * ADECUACIÓN PORTON PRINCIPAL	 	 	**FRENTE AL 100%**
10A 100.00%	DIRECCION LOCAL DE EDUCACION DE USME - EMERGENCIA	* IMPERMEABILIZACIÓN PLACA TANQUES DE AGUA POTABLE * RESANE HUMEDAD BAÑO MUJERES	 	 	**EMERGENCIA AL 100%**

FECHA:	20/09/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	196 días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO			
REGISTRO FOTOGRAFICO		SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA			GRUPO 2
		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS			
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
11A 99.96%	GUILLERMO CANO ISAZA (IED)	* ADECUACIÓN BATERIAS SANITARIAS BLOQUE BACHILLERATO	 	 	FALTAN DETALLES PARA REALIZAR LA ENTREGA DE LAS BATERIAS SANITARIAS DEL BLOQUE B, SEGUNDO PISO, YA SE REALIZO LA ENTREGA DE LA BATERIA SANITARIA DEL BLOQUE C PRIMER PISO  
12A 100.00%	TENERIFE - GRANADA SUR (IED)	* IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE * Instalación Barandas Metalicas	 	 	FRENTE AL 100%

FECHA: 20/09/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES: 195 Días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO 2
CORTE DEL INFORME	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26		CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
13A 100.00%	CALASANZ (BUENAVISTA) (CED) EMERGENCIA	* INSTALACIÓN DIVISIONES DE BAÑOS *AMPLIACIÓN CAPACIDAD TANQUE DE AGUA *ADECUACION RAMPA PARA ENTRADA AULA MULTIPLE	 	 	EMERGENCIA AL 100%
14A 100.00%	ARBORIZADORA BAJA (IED)	* ADECUACIÓN GRADERIAS, REEMPLAZO ESCALERA TARIMA, ADECUACIÓN TARIMA *MEJORAMIENTO DEL TERRENO AL REDEDRO DE LA TARIMA EMERGENCIA	 	 	EMERGENCIA AL 100%

FECHA: 20/09/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES: 195 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO 2
CORTE DEL INFORME	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
5/4/26	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
15A 100.00%	GUILLERMO CANO ISAZA (IED)	*CAMBIO DE PISO AULA BLOQUE DE PRIMARIA SEGUNDO PISO EMERGENCIA	 	 	EMERGENCIA AL 100%
16A 67.56%	CIUDAD DE VILAVICENCIO - PUERTA AL LLANO	☐Mejoramiento correctivo de los pisos en acceso y corredor principal ☐Mejoramiento correctivo del cerramiento metálico ☐Mejoramiento de las redes de aguas lluvias	 	 	  

FECHA:	20/09/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	195 días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO		SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO 2
		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS		
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO		

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
17A **100.00%**	**CUNDINAMARCA (IED)**	Adecuación de una estructura en cielo raso PVC, para mitigar el ingreo de palomas al comedor de la institución	 	 	**EMERGENCIA AL 100%**
17A **100.00%**	**LUIS EDUARDO MORA OSEJO (IED)**	* Cambio de tablero Principal electrico * Adecuación acometidas electricas según alcance de la ficha electrica	 	 	**EMERGENCIA AL 100%**

FECHA: 20/09/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES: 195 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO 2
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
18A 100.00%	CALASANZ (BUENAVISTA) (CED) - EMERGENCIA	* cambio y suministro e instalación de motobombas para tanque de agua potable	 	 	EMERGENCIA AL 100%
18A 28.25%	EDUARDO UMAÑA MENDOZA (IED)	* Impermeabilización con manto en aluminio, bloque	 	 	   

FECHA:	20/09/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	166 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO			
REGISTRO FOTOGRAFICO		SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA			GRUPO 2
		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS			
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
18A 100.00%	SANTA LIBRADA (IED)	* Impermeabilización cuarto zona ludica	 	 	  

CONTRATO DE OBRA		CO1.PCCNTR.8154780					CONTRATO DE INTERVENTORIA	CO1.PCCNTR.8169110				VIGENCIA	2025
CPF	581	IED			ORLANDO FALS BORDA			SEMANA 45					
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones	
REPLANTEO	m2	36.50	225.50	262.00	262.00		$ 4,233.48	$ 1,109,170.66	$ (954,648.79)	717.81%	717.81%		
CERRAMIENTO EN LONA	M	91.00	(62.60)	28.40	28.40		$ 31,110.25	$ 883,530.99	$ 1,947,501.40	100.00%	100.00%		
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	36.50	211.26	247.76	247.76		$ 18,044.21	$ 4,470,634.09	$ (3,812,020.33)	678.79%	678.79%		
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M YGUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	301.34	(266.74)	34.60	34.60		$ 33,201.35	$ 1,148,766.74	$ 8,856,128.37	11.48%	11.48%		
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	79.20	40.80	120.00	120.00		$ 69,099.55	$ 8,291,946.35	$ (2,819,261.76)	151.52%	151.52%		
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	34.00	199.20	233.20	216.59		$ 107,273.69	$ 23,234,421.60	$ (19,587,116.26)	637.03%	637.03%		
PERFORACIÓN NÚCLEO 4" E= 0.10 M	UN	16.00	(13.00)	3.00	3.00		$ 166,952.47	$ 500,857.42	$ 2,170,382.16	18.75%	18.75%		
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M	1.50			1.50		$ 62,023.52	$ 93,035.29	$ -	100.00%	100.00%		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	34.00			34.00		$ 91,590.40	$ 3,114,073.57	$ -	100.00%	100.00%		
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	0.30			0.30		$ 135,394.33	$ 40,618.30	$ -	100.00%	100.00%		
RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	0.24			0.24		$ 181,045.17	$ 43,450.84	$ -	100.00%	100.00%		
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	15.00			15.00		$ 22,829.47	$ 342,442.05	$ -	100.00%	100.00%		
PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	19.00			19.00		$ 19,858.75	$ 377,316.29	$ -	100.00%	100.00%		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO LAMINADO 3 + 3 DIMENSIONES 1.00 M. X 1.00 M.	M2	15.36			15.36		$ 177,336.50	$ 2,723,888.59	$ -	100.00%	100.00%		
MEDIACAÑA VERTICAL EN CONCRETO 3000 PSI	M	58.50	136.16	194.66	194.66		$ 27,185.71	$ 5,291,971.11	$ (3,701,606.83)	100.00%	100.00%		
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	73.00	189.00	249.56	239.56		$ 45,289.29	$ 10,849,501.59	$ (7,543,383.64)	328.16%	328.16%		
DILATACIÓN EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 3 MM PROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM	M			127.20	127.20		$ 4,291.49	$ 545,877.16	$ (545,877.16)	100.00%	100.00%		
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	344.96			340.58		$ 4,663.84	$ 1,588,397.08	$ 20,440.72	98.73%	98.73%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	262.00	20.37	252.37	255.37		$ 361,355.09	$ 92,279,248.29	$ 2,395,784.22	97.47%	97.47%		
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ORLANDO FALS BORDA							$ 156,929,147.99					
CPF	1913	IED			SIERRA MORENA			SEMANA 45					
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones	
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	47.37	223.92	271.29	271.29		$ 7,045.00	$ 1,911,238.10	$ (1,577,516.00)	572.70%	572.70%		
CERRAMIENTO EN LONA	M	60.00	13.00	73.00	73.00		$ 31,110.25	$ 2,271,047.96	$ (404,433.20)	121.67%	121.67%		
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	m3	1.76	(1.76)	-	-		$ 274,656.52	$ -	$ 483,395.00	0.00%	0.00%		
DESMONTE DE BARANDA METÁLICA ALTURA NO MAYOR A 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	20.80	7.20	28.00	28.00		$ 21,488.46	$ 601,677.01	$ (154,716.95)	134.62%	134.62%		
DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	12.60			12.60		$ 11,376.96	$ 143,349.70	$ -	100.00%	100.00%		

DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	36.84			36.84		$ 107,273.69	$ 3,951,962.61	$ -	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.30 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	32.64	0.72	31.92	-		$ 93,547.94	$ -	$ 3,053,405.00	0.00%	0.00%	
CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	7.20			3.40		$ 15,633.37	$ 53,153.46	$ 59,407.00	47.22%	47.22%	
DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5.29			4.00		$ 11,761.45	$ 47,045.82	$ 15,172.00	75.61%	75.61%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	1.76	6.86	8.62	4.57		$ 91,988.38	$ 420,527.47	$ (258,627.91)	259.75%	259.75%	
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	m3	24.87	-9.60	15.27	15.27		$ 21,702.97	$ 331,382.67	$ 208,370.00	61.40%	61.40%	
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	m2	11.84			11.84		$ 165,931.21	$ 1,964,625.47	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	m3	7.00	7.00	14.00	14.00		$ 176,060.25	$ 2,464,579.38	$ (1,232,158.00)	199.98%	199.98%	
MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	12.60	3.76	16.36	16.36		$ 146,133.16	$ 2,390,738.55	$ (549,461.00)	129.84%	129.84%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	m	6.00			-		$ 78,726.73	$ -	$ 472,360.38	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"	un	8.00			-		$ 28,310.86	$ -	$ 226,487.00	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	un	2.00			-		$ 129,729.46	$ -	$ 259,458.91	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	m	29.00			-		$ 14,988.50	$ -	$ 434,667.00	0.00%	0.00%	
RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INLUYE REFUERZO).	M2	42.05	8.55	50.60	50.60		$ 193,996.53	$ 9,816,224.55	$ (1,658,670.00)	120.33%	120.33%	
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	11.84			11.84		$ 165,931.21	$ 1,964,625.47	$ -	100.00%	100.00%	
CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA (TRÁFICO PESADO) ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO, PENDIENTADO Y MEDIA CAÑA.	M	2.96			2.96		$ 592,067.38	$ 1,752,519.43	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	420.50	(366.54)	53.96	53.96		$ 7,255.46	$ 391,504.61	$ 2,659,416.00	12.83%	12.83%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	91.39			91.39		$ 7,103.01	$ 649,144.22	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-S 6" INCLUYE ACCESORIOS	M	6.00	10.00	16.00	16.00		$ 143,600.90	$ 2,297,614.44	$ (1,436,009.00)	266.67%	266.67%	
CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 M X 0.60 M EN CONCRETO REFORZADO < = 1,00 M CON MARCO Y TAPA METÁLICA E= 0.20 M	un	4.00	(4.00)	-	-		$ 1,618,437.02	$ -	$ 6,473,748.09	0.00%	0.00%	
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	3.00			2.00		$ 875,947.70	$ 1,751,895.39	$ 875,948.00	66.67%	66.67%	
CANAL EN PVC AMAZONAS O EQUIVALENTE, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	3.60			3.60		$ 68,114.71	$ 245,212.96	$ -	100.00%	100.00%	
MURO EN SUPERBOARD DE 8 MM INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA , MASILLA , CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA, VISTO DOS CARAS E= 12 CM	M2	15.77	1.25	17.02	17.02		$ 159,158.72	$ 2,708,881.47	$ (198,948.00)	107.93%	107.93%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA, EL TUBO PASAMANOS DE 2" CALIBRE 18 AL IGUAL QUE LOS TUBOS PEDESTALES CON PLATINA DE FIJACIÓN Y TRAVESAÑOS VERTICALES EN TUBERÍA DE 3/4" CON SEPARACIÓN CADA 9CM, PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS.	M	33.78			36.35		$ 1,120,163.13	$ 40,719,658.08	$ (2,880,548.00)	107.61%	107.61%	
PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	172.00	(172.00)	-	-		$ 65,757.83	$ -	$ 11,310,347.00	0.00%	0.00%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO (RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA CANCHA MULTIPLE INCLUYE DEMARCACIONES BALONCESTO - VOLEYBOL)	M2			146.06	156.06		$ 77,589.44	$ 12,108,607.88	$ (12,108,608.00)	106.85%	106.85%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	14.08	2.72	16.80	16.80		$ 98,222.57	$ 1,650,139.25	$ (267,165.00)	119.32%	119.32%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	4.08			4.08		$ 45,289.29	$ 184,780.29	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	4.84			4.84		$ 126,224.49	$ 610,926.55	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1.00			1.00		$ 572,567.48	$ 572,567.48	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	UN	1.00			24.00		$ 23,315.15	$ 559,563.51	$ (536,248.00)	2400.00%	2400.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	24.00			24.00		$ 20,790.98	$ 498,983.52	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	5.08	0.05	5.13	5.13		$ 798,362.30	$ 4,095,598.62	$ (39,918.00)	100.98%	100.98%	
PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	193.76	(98.31)	95.45	105.45		$ 29,785.43	$ 3,140,873.57	$ 2,630,351.00	54.42%	54.42%	
PINTURA DE ACEITE SOBRE PAÑETE (2 MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	61.76	14.44	76.20	86.20		$ 29,785.43	$ 2,567,504.05	$ (727,956.00)	139.57%	139.57%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	kg	226.80	92.51	319.31	319.31		$ 23,042.63	$ 7,357,741.55	$ (2,131,674.00)	140.79%	140.79%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	36.84	-23.74	13.10	15.10		$ 264,771.67	$ 3,998,052.18	$ 5,756,136.00	40.99%	40.99%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	537.24			537.24		$ 4,663.84	$ 2,505,600.70	$ -	100.00%	100.00%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. SIERRA MORENA	**$ 118,699,548.00**				
CPF	**1930**	**IED**			**UNIÓN EUROPEA**			**SEMANA 45**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	168.00	10.14	178.14	178.14		$ 4,233.48	$ 754,151.38	$ (42,927.00)	106.04%	106.04%	
CERRAMIENTO EN LONA	M	45.00	7.80	52.80	23.83		$ 31,110.25	$ 741,422.37	$ 658,538.70	52.96%	52.96%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	136.13	(104.13)	32.00	32.00		$ 3,248.63	$ 103,956.25	$ 338,280.13	23.51%	23.51%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5.83	-	5.83	-		$ 144,722.00	$ -	$ 843,729.29	0.00%	0.00%	
DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	36.30			36.30		$ 26,782.33	$ 972,198.70	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	5.15	7.35	12.50	12.50		$ 27,938.51	$ 349,231.40	$ (205,348.06)	242.72%	242.72%	

DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	m2	168.00	5.63	173.63	183.63		$ 36,752.18	$ 6,748,803.22	$ (574,436.61)	109.30%	109.30%	
DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	un	18.00	6.00	24.00	24.00		$ 11,967.87	$ 287,228.79	$ (71,807.20)	133.33%	133.33%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	un	18.00	6.00	24.00	24.00		$ 7,469.97	$ 179,279.20	$ (44,819.80)	133.33%	133.33%	
DESMONTE DE TABLERO ELÉCTRICO DE 12-18 CIRCUITOS DETERIORADO, INCLUYE RETIRO DE PROTECCIONES Y DISPOSICIÓN DE RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, NO INCLUYE RESANES NI PINTURAS.	un	1.00			-		$ 55,922.89	$ -	$ 55,922.89	0.00%	0.00%	
DEMOLICIÓN ALFAJÍA EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE COSNTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	7.00	0.00	7.00	-		$ 32,498.47	$ -	$ 227,489.29	0.00%	0.00%	
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	m	3.90	-3.90	0.00	-		$ 18,687.73	$ -	$ 72,882.16	0.00%	0.00%	
PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	19.43			19.43		$ 21,844.63	$ 424,441.11	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	4.00			4.00		$ 126,905.79	$ 507,623.16	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	3.90			3.90		$ 89,839.27	$ 350,373.14	$ -	100.00%	100.00%	
CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (INCLUYE FORMALETAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	M	19.43			19.43		$ 42,469.67	$ 825,185.65	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	kg	3515.11	-1076.19	2438.92	2,608.92		$ 23,042.63	$ 60,116,373.04	$ (84,914,618.87)	-242.42%	-242.42%	
CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (INCLUYE FORMALETAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	M	19.43			19.43		$ 42,469.67	$ 825,185.65	$ (825,185.65)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO (35 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR.	M	0.50			0.50		$ 341,855.19	$ 170,927.60	$ (170,927.60)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	m	26.40	18.13	44.53	44.53		$ 91,590.40	$ 4,078,520.47	$ (1,660,533.93)	245.62%	245.62%	
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	1.00	-1.00	0.00			$ 875,947.70	$ -	$ 875,947.70	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	kg	213.75	0.29	214.04	214.04		$ 264,771.67	$ 56,671,727.78	$ (76,783.78)	100.14%	100.14%	

FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	18.15			18.15		$ 106,267.26	$ 1,928,750.73	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	34.90			34.90		$ 91,590.40	$ 3,196,504.93	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	42.00			42		$ 23,315.15	$ 979,236.14	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 2N°10 (F) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	42.00			42.00		$ 20,790.98	$ 873,221.16	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	21.00	3.00	24.00	24		$ 180,330.15	$ 4,327,923.59	$ (540,990.45)	114.29%	114.29%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	21.00	3.00	24.00	24		$ 238,055.44	$ 5,713,330.57	$ (714,166.32)	114.29%	114.29%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M	22.50	8.50	31.00	30		$ 304,166.74	$ 9,125,002.11	$ (2,281,250.53)	133.33%	133.33%	
SUMINISTRO E INSTALACION MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA, PERFILES ESTUCTURALES DE ACERO GALVANIZADO PGU, MONTANTES, TORNILLOS PARA ESTRUCTURA, CLAVO IMPACTADO. ACABADO A DOS MANOS CON PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO.	M2	32.35	0.75	33.10	33.1		$ 222,048.37	$ 7,349,801.01	$ (166,536.28)	102.32%	102.32%	
PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M2	61.70			65.10		$ 17,207.77	$ 1,120,195.60	$ (58,476.16)	105.51%	105.51%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	224.21			224.21		$ 4,663.84	$ 1,045,679.27	$ -	100.00%	100.00%	
					SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. UNION EUROPEA			**$ 169,766,274.00**				
CPF	**1904**	**IED**			**ARBORIZADORA BAJA**			**SEMANA 45**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	786.72	463.91	1250.63	1,250.63		$ 7,045.00	$ 8,810,688.60	$ (3,268,246.00)	158.97%	158.97%	
CERRAMIENTO EN LONA	M	96.25	73.00	169.25	169.25		$ 31,110.25	$ 5,265,409.14	$ (2,271,047.96)	175.84%	175.84%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	466.58	9.42	476.00	476.00		$ 107,273.69	$ 51,062,274.77	$ (1,010,518.00)	102.02%	102.02%	
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	5.25			-		$ 22,300.62	$ -	$ 117,078.27	0.00%	0.00%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	145.00	6.23	151.23	151.23		$ 32,594.26	$ 4,929,229.33	$ (203,062.21)	104.30%	104.30%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	145.00	123.77	21.23	21.23		$ 42,650.45	$ 905,469.00	$ 5,278,845.87	14.64%	14.64%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO CON FIBRA SINTÉTICA ESPESOR 4 CM	M2	130.00			130.00		$ 69,868.54	$ 9,082,910.19	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	m2	323.02			323.02		$ 36,752.18	$ 11,871,653.14	$ 37.00	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA (INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	35.50			35.50		$ 8,680.11	$ 308,143.88	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	un	25.00			25.00		$ 7,469.97	$ 186,749.17	$ -	100.00%	100.00%	

DESMONTE CANCHA MULTIPLE (ARCO DE MICROFUTBOL Y ARO DE BALONCESTO) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	un	2.00			2.00		$ 398,950.46	$ 797,900.91	$ -	100.00%	100.00%	
DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	21.00			-		$ 11,761.45	$ -	$ 246,991.00	0.00%	0.00%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	16.80	5.76	22.56	22.56		$ 91,988.38	$ 2,075,257.93	$ (529,853.00)	134.29%	134.29%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	258.10	(36.51)	221.59	221.59		$ 79,962.51	$ 17,718,891.73	$ 2,919,431.00	85.85%	85.85%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	22.83			22.83		$ 135,394.33	$ 3,091,052.48	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	15.52			2.22		$ 66,591.58	$ 147,833.30	$ 885,668.00	14.30%	14.30%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	m3	103.10	68.26	171.36	171.36		$ 176,060.25	$ 30,169,684.13	$ (12,017,873.00)	166.21%	166.21%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAJÓN DE PIEDRA	m3	129.05	25.90	154.95	154.95		$ 176,060.25	$ 27,280,535.46	$ (4,559,960.00)	120.07%	120.07%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BORDILLO PREFABRICADO A80	m	87.00			87.00		$ 76,033.93	$ 6,614,951.64	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M	90.00			90.00		$ 97,085.28	$ 8,737,675.50	$ -	100.00%	100.00%	
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	18.70	5.00	23.70	23.70		$ 165,931.21	$ 3,932,569.57	$ (829,656.00)	126.74%	126.74%	
CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI ANCHO 0.50 M E= 0.07 M (NO INCLUYE REFUERZO)	M	90.00			90.00		$ 164,788.52	$ 14,830,966.59	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO (45 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3 MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR.	M	1.52			1.52		$ 358,768.86	$ 545,328.67	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PEATONAL DE ANGULOS Y PLATINAS DE ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR PARA CARCAMO ANCHO 40 CM	M	0.90			0.90		$ 156,990.72	$ 141,291.65	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	kg	1809.76	-142.50	1667.26	1,667.26		$ 23,042.63	$ 38,418,051.96	$ 3,283,574.00	92.13%	92.13%	
CAJA DE INSPECCION 100 X 100 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	2.00					$ 1,088,548.32	$ -	$ 2,177,097.00	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	m2	684.78	-162.78	522.00	522.00		$ 11,730.42	$ 6,123,281.59	$ 1,909,479.00	76.23%	76.23%	
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	m	3.00			2.00		$ 5,565.04	$ 11,130.08	$ 5,565.00	66.67%	66.67%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	m2	323.02			323.02		$ 264,771.67	$ 85,526,544.13	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	m	35.50			35.50		$ 305,515.84	$ 10,845,812.21	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN ASFALTO MD-10 PARA CANCHA DEPORTIVA E=8 CM, (INCLUYE: EMULSION ASFALTICA, ASFALTO MD-10 Y ACABADO CON SLURRY	m2	484.50	-43.86	440.64	440.64		$ 225,361.76	$ 99,303,405.31	$ 9,884,367.00	90.95%	90.95%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO (RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA CANCHA MULTIPLE INCLUYE DEMARCACIONES BALONCESTO - VOLEYBOL)	M2	484.50	-484.50	0.00	-		$ 77,589.44	$ -	$ 37,592,083.00	0.00%	0.00%	
PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	714.00			680.68		$ 65,757.83	$ 44,760,026.89	$ 2,191,065.00	95.33%	95.33%	
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M	66.67			66.67		$ 62,023.52	$ 4,135,108.31	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	620.45			620.45		$ 7,255.46	$ 4,501,650.03	$ -	100.00%	100.00%	
DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	353.72			353.72		$ 18,365.30	$ 6,496,173.31	$ -	100.00%	100.00%	
CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL (INC. DOS UNIDADES FIJAS DE MICROBALONCESTO - MALLA PARA MICRO FUTBOL - JUEGO DE POSTES Y MALLA PARA VOLEIBOL - DEMARCACIÓN DE LA CANCHA - TRANSPORTE - E INSTALACIÓN)	UN	2.00	-1.00	1.00	1.00		$ 12,850,061.48	$ 12,850,061.48	$ 12,850,061.00	50.00%	50.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	5.00			4.00		$ 126,905.79	$ 507,623.16	$ 126,906.00	80.00%	80.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1.00			1.00		$ 572,567.48	$ 572,567.48	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	118.00			118.00		$ 15,217.85	$ 1,795,706.06	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	118.00			118.00		$ 16,070.48	$ 1,896,316.55	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	25.00			25.00		$ 180,330.15	$ 4,508,253.74	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	22.00			22.00		$ 238,055.44	$ 5,237,219.69	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER 2X20W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	3.00			3.00		$ 193,810.36	$ 581,431.07	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	194.18			194.18		$ 9,167.13	$ 1,780,074.18	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H= 5.00 M (ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO DE 3" E= 3,81 MM ASTM A500 Y CAMISA DE REFUERZO DE 4", VARILLA REDONDA DE 3/4" C./.14 EJES. VIGA 40X30 Y PILOTES CONCRETO 3000 PSI) SEGÚN DETALLES IDRD.	M2	17.50			16.95		$ 2,042,059.82	$ 34,612,913.93	$ 1,123,133.00	96.86%	96.86%	
CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H= 2.50 M (ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO DE 2-1/2" Y PROTECCIÓ N EN VARILLA REDONDA DE 3/4" C./0.14 m EJES. VIGA=30*30 CONCRETO 3000PSI) SEGÚN DETALLES IDRD.	M2	17.50			16.95		$ 1,257,854.97	$ 21,320,641.75	$ 691,820.00	96.86%	96.86%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO HETEROGENEO ALTO TRÁFICO	M2	130.00			125.78		$ 237,210.90	$ 29,836,007.59	$ 1,001,410.00	96.75%	96.75%	
LAVADO Y LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE EN EL COLEGIO ARBORIZADORA BAJA (INCLUYE INSUMOS)	ML	197.54			194.54		$ 5,046.98	$ 981,840.09	$ 15,141.00	98.48%	98.48%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1,078.76			1,078.76		$ 4,663.84	$ 5,031,162.64	$ -	100.00%	100.00%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ARBORIZADORA BAJA	**$ 630,139,470.00**				
CPF	**523**	**IED**			**Fabio Lozano Simonelli**			**SEMANA 45**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	1201.02	10.05	1211.07	1,211.07		$ 4,233.48	$ 5,127,035.54	$ (42,546.00)	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	51.83	81.17	133.00	133.00		$ 31,110.25	$ 4,137,662.72	$ (2,525,218.67)	256.61%	256.61%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	235.29	11.28	246.57	246.57		$ 32,594.26	$ 8,036,765.70	$ (367,663.21)	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2			68.70	68.70		$ 107,273.69	$ 7,369,702.26	$ (7,369,702.26)	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN ASITIOS AUTORIZADOS)	M2	28.64	1.35	29.99	29.99		$ 22,300.62	$ 668,795.68	$ (30,105.84)	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	55.48	30.02	85.50	85.50		$ 12,649.16	$ 1,081,503.32	$ (379,727.83)	154.11%	154.11%	
DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	28.00			28.00		$ 20,708.69	$ 579,843.18	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)}	M3	15.05	0.08	15.13	15.13		$ 66,591.58	$ 1,007,530.54	$ (5,327.33)	100.53%	100.53%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	17.32			17.32		$ 33,174.37	$ 574,580.07	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	UN	28.00			28.00		$ 27,281.50	$ 763,882.01	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2			3.00	3.00		$ 25,731.38	$ 77,194.15	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	66.00			66.00		$ 27,938.51	$ 1,843,941.79	$ -	100.00%	100.00%	
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3			63.85	63.85		$ 34,724.48	$ 2,217,158.36	$ -	100.00%	100.00%	
CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M			120.60	120.60		$ 15,633.37	$ 1,885,384.52	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	8.00			8.00		$ 7,469.97	$ 59,759.73	$ -	100.00%	100.00%	

DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	55.30	-5.16	50.14	50.14		$ 32,569.97	$ 1,633,058.41	$ 168,061.06	90.67%	90.67%	
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	22.90			22.90		$ 18,687.73	$ 427,949.09	$ -	100.00%	100.00%	
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2			2.80	2.80		$ 18,044.21	$ 50,523.80	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	12.80	2.49	15.29	15.29		$ 135,394.33	$ 2,070,179.26	$ (337,131.87)	119.45%	119.45%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 m	M2	194.67			194.67		$ 42,650.45	$ 8,302,762.60	$ -	100.00%	100.00%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	49.31			49.31		$ 45,289.29	$ 2,233,214.74	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO CON FIBRA SINTÉTICA ESPESOR 4 CM	M2	548.06	(548.06)	-			$ 69,868.54	$ -	$ 38,292,151.98	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	158.76	(56.05)	102.71	102.71		$ 7,103.01	$ 729,550.31	$ 398,123.79	64.70%	64.70%	
CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI ANCHO 0.50 M E= 0.07 M (NO INCLUYE REFUERZO)	M	171.60	(44.68)	126.92	122.00		$ 164,788.52	$ 20,104,199.16	$ 8,173,510.48	71.10%	71.10%	
PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2			0.64	0.64		$ 115,264.41	$ 73,769.22	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PEATONAL DE ANGULOS Y PLATINAS DE ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR PARA CARCAMO ANCHO 40 CM	M			13.00	13.00		$ 156,990.72	$ 2,040,879.36	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M			20.50	20.57		$ 24,290.55	$ 499,656.52	$ (1,700.34)	100.34%	100.34%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2.00			2.00		$ 126,905.79	$ 253,811.58	$ (253,811.58)	100.00%	100.00%	
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00			1.00		$ 253,721.19	$ 253,721.19	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	M	1.00			1.00		$ 572,567.48	$ 572,567.48	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	M	8.00			8.00		$ 180,330.15	$ 1,442,641.20	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	32.00	-27.00	5.00	5.00		$ 23,315.15	$ 116,575.73	$ 629,508.95	15.63%	15.63%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M			55.00	55.00		$ 33,700.52	$ 1,853,528.49	$ (1,853,528.49)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	32.00	(12.00)	20.00	20.00		$ 20,790.98	$ 415,819.60	$ 249,491.76	62.50%	62.50%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN			8.00	8.00		$ 198,607.76	$ 1,588,862.05	$ -	100.00%	100.00%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	8.00	-5.00	3.00	3.00		$ 238,055.44	$ 714,166.32	$ 1,190,277.20	37.50%	37.50%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL TOTALIZADOR 3X125 A. MATERIALES CERTIFICADOS RETIE E INSTALADOS SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UN			1.00	1.00		$ 781,835.83	$ 781,835.83	$ (781,835.83)	100.00%	100.00%	
ACOMETIDA TRIFASICA EN 4#8 + 1#10 CABLE LIBRE DE HALOGENOS. INCLUYE CONECTORES TUBULARES Y AISLAMIENTO AUTOFUNDENTE INCLUYE MANIOBRAS DE CANALIZACIÓN	M			60.00	60.00		$ 57,049.39	$ 3,422,963.50	$ (3,422,963.50)	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	15.00	(2.42)	12.58	12.58		$ 361,355.09	$ 4,545,846.98	$ 874,479.31	83.87%	83.87%	
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	1.00			1.00		$ 875,947.70	$ 875,947.70	$ -	100.00%	100.00%	
CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	55.30	-5.16	50.14	50.14		$ 130,345.99	$ 6,535,548.17	$ 672,585.33	90.67%	90.67%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	226.69	12.39	239.08	239.08		$ 126,224.49	$ 30,177,196.69	$ (1,563,366.10)	105.46%	105.46%	
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	17.44	76.23	93.67	93.67		$ 33,727.50	$ 3,159,254.93	$ (2,571,047.33)	537.10%	537.10%	
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M			39.00	39.00		$ 22,829.47	$ 890,349.34	$ (890,349.34)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M2	-	5.29	5.29	5.29		$ 62,023.52	$ 328,104.44	$ (328,104.44)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
WIN DE ALUMINIO	M	18.00	2.90	20.90	20.90		$ 15,372.99	$ 321,295.59	$ (44,581.68)	116.11%	116.11%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	131.00	(37.64)	93.36	93.36		$ 98,222.57	$ 9,170,059.56	$ 3,697,097.71	71.27%	71.27%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	11.73	-5.49	6.24	6.24		$ 1,127,900.21	$ 7,038,097.34	$ 6,192,172.18	53.20%	53.20%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	47.82	-8.24	39.58	40.99		$ 989,338.00	$ 40,552,909.59	$ 6,757,233.57	85.72%	85.72%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	1.80	0.30	1.50	1.50		$ 989,338.00	$ 1,484,007.00	$ 296,801.40	83.33%	83.33%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	3.00			3.00		$ 772,427.21	$ 2,317,281.62	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL BLANCO DE 2 CUERPOS CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA, DESCARGA SENCILLA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, BRIDA, ACOPLE Y VALVULA PLASTICA DE 1/2" PARA REGULACION DE PRESION. CONSUMO DE AGUA DE 4.8 LTS POR DESCARGA, CAPACIDAD MINIMA DE EVACUACION DE SOLIDOS 400 GRAMOS	UN	11.00			11.00		$ 1,117,185.66	$ 12,289,042.29	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, CON DOS PERSIANAS INFERIOR Y SUPERIOR DE 30CM X 60CM. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2			3.84	3.84		$ 798,362.30	$ 3,065,711.25	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	14.00			14.00		$ 404,611.28	$ 5,664,557.91	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M			102.46	102.46		$ 91,590.40	$ 9,384,352.28	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M			1.65	1.65		$ 78,726.73	$ 129,899.11	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M			24.00	24.00		$ 51,125.49	$ 1,227,011.85	$ -	100.00%	100.00%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1-1/2 "	UN	11.00			11.00		$ 18,869.86	$ 207,568.48	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1/2"	UN	28.00			28.00		$ 4,998.42	$ 139,955.63	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	14.00			14.00		$ 63,533.17	$ 889,464.33	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	14.00			14.00		$ 63,533.17	$ 889,464.33	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	7.20	0.56	7.76	7.76		$ 123,260.52	$ 956,501.65	$ (69,025.89)	107.78%	107.78%	
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	66.72	216.43	283.15	283.15		$ 20,236.50	$ 5,729,964.98	$ (4,379,785.70)	424.39%	424.39%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN			24.00	24.00		$ 33,569.66	$ 805,671.73	$ -	100.00%	100.00%	
PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	-		22.64	22.64		$ 32,026.28	$ 725,075.09	$ (725,075.09)	100.00%	100.00%	
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M			122.00	122.00		$ 32,026.28	$ 3,907,206.76	$ -	100.00%	100.00%	
PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN).	M2	176.38			176.38		$ 6,610.59	$ 1,165,975.86	$ -	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1,201.02			1,201.02		$ 4,663.84	$ 5,601,363.56	$ -	100.00%	100.00%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. FABIO SIMONELLI	**$ 245,187,661.00**				
CPF	**1918**	**IED**			**Estrella del Sur Sede B**			**SEMANA 45**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	557.28	20.48	577.76	577.76		$ 4,233.48	$ 2,445,932.98	$ (86,702.00)	103.67%	103.67%	
CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2").	M	88.20	-88.20	0.00	-		$ 154,730.98	$ -	$ (13,647,272.19)	0.00%	0.00%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	54.17			33.24		$ 33,174.37	$ 1,102,716.03	$ 694,339.54	61.36%	61.36%	
DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	95.99	-32.70	63.29	63.29		$ 29,391.49	$ 1,860,302.19	$ 960,987.18	65.94%	65.94%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	28.37					$ 707,267.02	$ -	$ 20,065,165.47	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON DOBLE ANTI MACHUCON, REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	25.81	6.00	31.81	35.81		$ 829,259.39	$ 29,695,861.74	$ (8,292,676.84)	138.75%	138.75%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1.43			1.43		$ 798,362.30	$ 1,145,011.22	$ (3,353.12)	100.29%	100.29%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO, CUERPOS FIJOS, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A DISEÑO SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	87.25			69.15		$ 467,649.33	$ 32,338,268.71	$ 8,464,135.19	79.26%	79.26%	

ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM	M	141.20			141.20		$ 9,408.62	$ 1,328,459.99	$ 37.63	100.00%	100.00%	
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	141.20			148.20		$ 22,829.47	$ 3,383,236.17	$ (159,714.97)	104.95%	104.95%	
PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M	141.20			148.20		$ 17,207.77	$ 2,550,122.76	$ (120,385.56)	104.95%	104.95%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	577.76			597.76		$ 4,663.84	$ 2,787,856.22	$ (93,276.77)	103.46%	103.46%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ESTRELLA DEL SUR - B	**$ 78,637,768.00**				
CPF	**1974**	**IED**			**CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)**			**SEMANA 45**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	538.32	-88.32	450.00	450.00		$ 4,233.48	$ 1,905,064.11	$ 373,901.00	83.59%	83.59%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5"anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	78.28	11.72	90.00	95.00		$ 31,137.23	$ 2,958,036.66	$ (520,614.00)	121.36%	121.36%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	538.32					$ 3,248.63	$ -	$ 1,748,804.00	0.00%	0.00%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	12.00	(1.00)	11.00	11.00		$ 7,469.97	$ 82,169.63	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M			5.00	5.00		$ 23,315.15	$ 116,575.73	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 2N°10 (F) + 1N°12 (T) AWG THHN	M			20.00	20.00		$ 20,790.98	$ 415,819.60	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES 50W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	1.00			1.00		$ 101,214.88	$ 101,214.88	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	M2	538.82	-134.52	404.30	408.30		$ 36,752.18	$ 15,005,915.99	$ 4,796,895.00	75.78%	75.78%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	1841.40	-941.87	899.53	902.53		$ 23,042.63	$ 20,796,663.05	$ 21,634,032.15	49.01%	49.01%	
CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	44.00			46.69		$ 130,345.99	$ 6,086,241.01	$ (351,017.24)	106.12%	106.12%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	633.15			632.63		$ 4,663.84	$ 2,950,473.25	$ 2,436.22	99.92%	99.92%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUAYA METÁLICA PARA CERCHA METÁLICA	M2	30.00			30.00		$ 37,696.55	$ 1,130,896.57	$ -	100.00%	100.00%	
FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2			87.00	87.00		$ 106,267.26	$ 9,245,251.44	$ (9,245,251.44)	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	KG	538.31	-538.31	0.00	-		$ 264,771.67	$ -	$ 142,529,236.49	0.00%	0.00%	

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 50 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR 50 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 24 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA LOS METROS CUADRADOS RALMENTE INSTALADOS)	KG	0.00	0.00	410.94	410.94		$ 306,692.25	$ 126,032,114.08	$ (126,032,114.08)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. CALASANZ BUENA VISTA							**$ 186,826,436.00**				
CPF	**546**	**IED**			**SANTA LIBRADA (IED)**			**SEMANA 45**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	557.28			557.28		$ 4,233.48	$ 2,359,231.39	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5"anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	128.18	-78.18	50.00	50.00		$ 31,110.25	$ 1,555,512.30	$ 2,432,199.03	39.01%	39.01%	
CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	65.03	-39.70	25.33	25.33		$ 15,633.37	$ 395,993.28	$ 620,644.82	38.95%	38.95%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	67.90		0.80	0.80		$ 32,594.26	$ 26,075.40	$ 2,187,074.58	1.18%	1.18%	
PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	27.20			13.34		$ 21,844.63	$ 291,407.33	$ 302,766.53	49.04%	49.04%	
PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	372.13			371.00		$ 13,385.77	$ 4,966,120.74	$ 15,125.92	99.70%	99.70%	
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M			18.00	18.00		$ 22,829.47	$ 410,930.46	$ (410,930.46)	100.00%	100.00%	
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	63.87	28.85	92.72	92.72		$ 34,724.48	$ 3,219,654.24	$ (1,001,801.39)	145.17%	145.17%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2			73.27	73.27		$ 36,752.18	$ 2,692,832.39	$ -	100.00%	100.00%	
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	16.47	(16.47)	-			$ 18,044.21	$ -	$ -	0.00%	0.00%	
DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	194.87			194.87		$ 9,443.70	$ 1,840,293.82	$ 1,840,293.82	100.00%	100.00%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	59.96			59.96		$ 91,988.38	$ 5,515,765.80	$ 5,515,765.80	100.00%	100.00%	
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	100.00	(20.61)	79.39	79.39		$ 53,568.71	$ 4,252,820.18	$ 4,252,820.18	79.39%	79.39%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M	63.33			13.44		$ 91,988.38	$ 1,236,323.87	$ 1,236,323.87	21.22%	21.22%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	281.83	(180.01)	96.22	96.22		$ 45,289.29	$ 4,357,735.20	$ 4,357,735.20	34.14%	34.14%	

RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INLUYE REFUERZO).	M2			12.54	12.54		$ 193,996.53	$ 2,432,716.52	$ 2,432,716.52	100.00%	100.00%	
PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 M (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE}	M2	333.93	-143.06	190.87	190.87		$ 69,679.67	$ 13,299,757.83	$ 13,299,757.83	57.16%	57.16%	
MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	208.04			205.00		$ 25,122.94	$ 5,150,202.74	$ 5,150,202.74	98.54%	98.54%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M			19.35	19.35		$ 91,590.40	$ 1,772,274.22	$ 1,772,274.22	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M			8.10	8.10		$ 78,726.73	$ 637,686.52	$ 637,686.52	100.00%	100.00%	
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M	19.60			13.44		$ 62,023.52	$ 833,596.15	$ 833,596.15	68.57%	68.57%	
Demolición de Materas en concreto o fibrocemento 1.2x1.2x0.3 m y 1x0.7x0.7 m	M	48.00			44.00		$ 16,863.75	$ 742,005.00	$ 742,005.00	91.67%	91.67%	
TRATAMIENTO DE PISOS EN LADRILLO O ADOQUIN: LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS y REEMBOQUILLADO DE JUNTAS, (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN,	M	110.00	69.08	179.08	179.08		$ 16,863.75	$ 3,019,960.35	$ 3,019,960.35	162.80%	162.80%	#####
JUNTA DE DILATACIÓN INDUCIDA PISO EN CONCRETO ALLANADO (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, MARCACIÓN DE DILATACIONES Y SELLADO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN).	M	356.60	-300.35	56.25	59.92		$ 34,369.67	$ 2,059,599.55	$ 2,059,599.55	16.80%	16.80%	
CANAL EN PVC AMAZONAS O EQUIVALENTE, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	6.00	(6.00)	-	-		$ 68,114.71	$ -	$ -	0.00%	0.00%	
DOMO EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 5 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	7.20	-1.32	5.88	5.88		$ 157,817.72	$ 927,968.18	$ 927,968.18	81.67%	81.67%	
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	67.71			67.71		$ 5,565.04	$ 376,808.69	$ 376,808.69	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CERCHA PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 4.5 KG/M	M	6.00	-0.12	5.88	5.88		$ 101,978.47	$ 599,633.40	$ 599,633.40	98.00%	98.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M			20.20	20.20		$ 305,515.84	$ 6,171,419.91	$ 6,171,419.91	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	335.60	(23.61)	315.08	315.08		$ 361,355.09	$ 113,857,372.13	$ 113,857,372.13	93.89%	93.89%	
PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2			96.73	96.73		$ 65,757.83	$ 6,360,755.11	$ 6,360,755.11	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	M2			190.00	190.00		$ 11,730.42	$ 2,228,757.19	$ 2,228,757.19	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN			8.00	8.00		$ 33,502.20	$ 268,017.60	$ 268,017.60	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TIERRA NEGRA ABONADA, INCLUYE CONFORMACIÓN DE TERRENO Y COMPACTACIÓN MANUAL DE TIERRA.	M3			37.42	37.42		$ 258,201.55	$ 9,661,902.03	$ 9,661,902.03	100.00%	100.00%	
SUMNINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN EN PASTO KIKUYO	M2			190.84	200.84		$ 29,001.60	$ 5,824,681.89	$ 5,824,681.89	105.24%	105.24%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ZANJA DE 0.3 X 0.3 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000, GRAVA 3/4" Y PASES PVC LONGITUD MAX 0.3 M CADA 3 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	130.00			130.00		$ 89,213.28	$ 11,597,727.02	$ 11,597,727.02	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	617.33			617.33	30.87	$ 4,663.84	$ 2,879,127.54	$ 2,879,127.54	100.00%	100.00%	
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. SANTA LIBRADA							**$ 223,822,666.00**				

CPF	1917	IED			ESTRELLA DEL SUR (IED) A			SEMANA 45				
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	20.56			20.56		$ 4,233.48	$ 87,040.26	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	40.30	-31.81	8.49	8.49		$ 31,110.25	$ 264,138.88	$ 989,604.00	21.07%	21.07%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19.52	-2.22	17.30	17.30		$ 32,594.26	$ 563,880.63	$ 72,359.00	88.63%	88.63%	
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19.52	-5.96	13.56	13.56		$ 22,300.62	$ 302,396.45	$ 132,912.00	69.47%	69.47%	
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	40.65	(2.49)	38.16	38.16		$ 12,649.16	$ 482,692.01	$ 31,496.00	93.87%	93.87%	
DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19.52	-4.52	15.00	15.00		$ 20,708.69	$ 310,630.28	$ 93,603.00	76.84%	76.84%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	11.36	-5.02	6.34	6.34		$ 33,174.37	$ 210,325.50	$ 166,535.00	55.81%	55.81%	
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	15.00			15.00		$ 27,281.50	$ 409,222.50	$ -	100.00%	100.00%	
SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	15.00			15.00		$ 182,479.27	$ 2,737,188.99	$ -	100.00%	100.00%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	19.52			19.52		$ 42,650.45	$ 832,536.73	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	19.52	(1.99)	17.53	17.53		$ 126,224.49	$ 2,212,715.38	$ 251,187.00	89.81%	89.81%	
MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2	0.80			0.80		$ 67,218.91	$ 53,775.13	$ -	100.00%	100.00%	
WIN DE ALUMINIO	M	3.00			3.00		$ 15,372.99	$ 46,118.98	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	44.84			40.81		$ 116,158.86	$ 4,740,210.72	$ 468,353.00	91.01%	91.01%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	2.00			2.00		$ 41,130.01	$ 82,260.02	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	5.20			5.20		$ 707,267.02	$ 3,677,788.50	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	2.16	0.12	2.28	2.38		$ 1,127,967.67	$ 2,680,941.73	$ (244,532.00)	110.04%	110.04%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	7.00	1.00	8.00	8.00		$ 873,470.75	$ 6,987,765.98	$ (873,471.00)	114.29%	114.29%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2.00			2.00		$ 616,820.66	$ 1,233,641.32	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	5.00			5.00		$ 404,611.28	$ 2,023,056.40	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	2.00			2.00		$ 41,130.01	$ 82,260.02	$ -	100.00%	100.00%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	28.82	12.82	41.64	42.64		$ 989,338.20	$ 42,185,380.90	$ (13,672,654.00)	147.95%	147.95%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	1.80	(0.80)	1.00	1.00		$ 989,338.20	$ 989,338.20	$ 791,471.00	55.56%	55.56%	
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	44.84			40.81		$ 36,193.65	$ 1,476,990.67	$ 145,933.00	91.01%	91.01%	
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	35.50			35.10		$ 21,599.09	$ 758,128.09	$ 8,640.00	98.87%	98.87%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	2.16			2.16		$ 123,260.52	$ 266,242.73	$ -	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	111.32			100.19		$ 4,663.84	$ 467,270.00	$ 51,909.00	90.00%	90.00%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ESTRELLA DEL SUR - A	**$ 76,163,937.00**				
CPF	**1959**	**IED**			**GUILLERMO CANO ISAZA (IED)**			**SEMANA 45**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	125.48			125.48		$ 4,233.48	$ 531,216.54	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	68.00			32.20		$ 31,110.25	$ 1,001,749.92	$ 1,113,747.00	47.35%	47.35%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	129.54	18.57	148.11	148.11		$ 32,594.26	$ 4,827,535.26	$ (605,275.00)	114.34%	114.34%	
DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	150.00			150.00		$ 11,376.96	$ 1,706,544.05	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	40.00			40.00		$ 7,469.97	$ 298,798.67	$ -	100.00%	100.00%	
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	100.00			100.00		$ 18,687.73	$ 1,868,773.32	$ -	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	95.87	17.32	113.19	113.19		$ 22,300.62	$ 2,524,207.52	$ (386,247.00)	118.07%	118.07%	
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	364.26	(31.38)	332.88	364.26		$ 12,649.16	$ 4,607,583.60	$ -	100.00%	100.00%	
MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2	7.20	3.16	10.36	10.20		$ 65,869.81	$ 671,872.04	$ (197,609.00)	141.67%	141.67%	
DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND	22.00	37.00	59.00	37.00		$ 20,708.69	$ 766,221.35	$ (310,630.00)	168.18%	168.18%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	26.61			26.11		$ 33,174.37	$ 866,182.77	$ 16,587.00	98.12%	98.12%	
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	78.00			53.00		$ 27,281.50	$ 1,445,919.51	$ 682,038.00	67.95%	67.95%	
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M			15.00	15.00		$ 20,708.69	$ 310,630.28	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M			19.00	19.00		$ 11,967.87	$ 227,389.46	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN			16.00	16.00		$ 7,469.97	$ 119,519.47	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M			58.00	58.00		$ 4,391.32	$ 254,696.59	$ -	100.00%	100.00%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	35.00	118.18	153.18	153.18		$ 61,099.39	$ 9,359,204.54	$ (7,220,726.00)	437.66%	437.66%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	129.54	30.05	159.59	159.59		$ 126,224.49	$ 20,144,167.03	$ (3,793,046.00)	123.20%	123.20%	
WIN DE ALUMINIO	M	30.00	52.83	82.83	55.00		$ 15,372.99	$ 845,514.70	$ (384,325.00)	183.33%	183.33%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISIÓN POR MÓDULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM	M	7.20	16.32	23.52	23.52		$ 1,128,300.90	$ 26,537,637.11	$ (18,413,871.00)	326.67%	326.67%	
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	364.26			364.26		$ 36,193.65	$ 13,183,900.70	$ -	100.00%	100.00%	
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	119.96	(45.93)	74.03	68.55		$ 21,599.09	$ 1,480,617.69	$ 1,110,409.00	57.14%	57.14%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	135.38			135.38		$ 989,338.20	$ 133,939,109.55	$ (2,504.00)	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1-1/2 "	UN	37.00			37.00		$ 18,869.86	$ 698,184.88	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	37.00			37.00		$ 63,533.17	$ 2,350,727.15	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	22.00	7.00	29.00	29.00		$ 63,533.17	$ 1,842,461.82	$ (444,732.00)	131.82%	131.82%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	UN	37.00			37.00		$ 181,838.44	$ 6,728,022.41	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN	38.00			38.00		$ 97,295.74	$ 3,697,238.23	$ -	100.00%	100.00%	
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	22.00			22.00		$ 5,565.04	$ 122,430.83	$ -	100.00%	100.00%	
ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE EN CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	74.03	-30.18	43.85	43.85		$ 13,044.45	$ 571,999.04	$ 393,681.00	59.23%	59.23%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	20.88			20.88		$ 123,260.52	$ 2,573,679.69	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN			13.00	6.00		$ 192,677.11	$ 1,156,062.68	$ (1,156,063.00)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	3.00			3.00		$ 572,567.48	$ 1,717,702.45	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	50.00	56.00	106.00	90.00		$ 23,315.15	$ 2,098,363.16	$ (932,606.00)	180.00%	180.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	50.00	56.00	106.00	90.00		$ 20,790.98	$ 1,871,188.21	$ (831,639.00)	180.00%	180.00%	
PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	36.90			36.90		$ 21,844.63	$ 806,066.74	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	32.00			34.00		$ 180,330.15	$ 6,131,225.09	$ (360,660.00)	106.25%	106.25%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	24.00			24.00		$ 198,607.76	$ 4,766,586.16	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	20.00			8.00		$ 180,330.15	$ 1,442,641.20	$ 2,163,962.00	40.00%	40.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	5.40	0.60	6.00	5.00		$ 989,338.20	$ 4,946,691.01	$ 395,735.00	92.59%	92.59%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	12.00			10.00		$ 772,427.21	$ 7,724,272.05	$ 1,544,854.00	83.33%	83.33%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	12.00			5.00		$ 41,130.01	$ 205,650.06	$ 287,910.00	41.67%	41.67%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL BLANCO DE 2 CUERPOS CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA, DESCARGA SENCILLA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, BRIDA, ACOPLE Y VALVULA PLASTICA DE 1/2 PARA REGULACION DE PRESION. CONSUMO DE AGUA DE 4.8 LTS POR DESCARGA, CAPACIDAD MINIMA DE EVACUACION DE SOLIDOS 400 GRAMOS	UN	45.00	-8.00	37.00	37.00		$ 1,117,185.66	$ 41,335,869.52	$ 8,937,485.00	82.22%	82.22%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	m2	364.26	(24.03)	340.23	340.23		$ 98,222.57	$ 33,418,266.56	$ 2,360,288.00	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	m2	205.61			139.29		$ 4,663.84	$ 649,626.09	$ 309,306.00	67.74%	67.74%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. GUILLERMO CANO ISAZA	**$ 354,373,946.66**				
CPF	**548**	**IED**			**TENERIFE - GRANADA SUR (IED)**			**SEMANA 45**				**Observ**
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	193.00	41.34	234.34	234.34		$ 4,233.48	$ 992,072.72	$ (175,012.00)	121.42%	121.42%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	39.00			26.00		$ 31,110.25	$ 808,866.40	$ 404,433.00	66.67%	66.67%	
TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	24.83	65.79	90.62	90.62		$ 38,696.24	$ 3,506,652.84	$ (2,545,825.00)	364.96%	364.96%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	44.28	25.88	70.16	55.16		$ 361,355.09	$ 19,932,346.54	$ (3,931,543.00)	124.57%	124.57%	
PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	44.28	25.88	70.16	70.16		$ 65,757.83	$ 4,613,569.51	$ (1,701,813.00)	158.45%	158.45%	
PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	412.00	(366.94)	45.06	45.06		$ 32,026.28	$ 1,443,104.40	$ 11,751,725.00	10.94%	10.94%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA DE 1-1/4" PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR CON SOPORTES PLÁSTICO. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS	M	43.00	-7.64	35.36	30.36		$ 190,851.78	$ 5,794,260.06	$ 2,412,367.00	70.60%	70.60%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA, EL TUBO PASAMANOS DE 2" CALIBRE 18 AL IGUAL QUE LOS TUBOS PEDESTALES CON PLATINA DE FIJACIÓN Y TRAVESAÑOS VERTICALES EN TUBERÍA DE 3/4" CON SEPARACIÓN CADA 9CM, PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS.	M	5.50	(0.80)	4.70	4.70		$ 1,120,163.13	$ 5,264,766.69	$ 896,131.00	85.45%	85.45%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	964.27	(570.86)	393.41	393.41		$ 4,663.84	$ 1,834,783.56	$ 2,662,416.00	40.80%	40.80%	
SUMINISTRO E INSTALACION MEMBRANA PVC PLASTIFICADO SIKAPLAN 15 PR O SIMILAR	M3	150.00	(15.20)	134.80	116.77		$ 383,249.63	$ 44,750,287.29	$ 12,737,157.00	77.84%	77.84%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. TENERIFE GRANADA SUR	**$ 88,940,710.00**				
CPF	**545**	**IED**	**CIUDAD DE VILLAVICENCIO (IED)**					**SEMANA 45**				**Observ**
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	540.76			540.76		$ 4,233.48	$ 2,289,294.37	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M)	M	35.00			35.00		$ 31,110.25	$ 1,088,858.61	$ -	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	107.30		-	307.00		$ 69,099.55	$ 21,213,562.74	$ (13,799,181.00)	286.11%	286.11%	
DEMOLICION DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.06 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	361.42			361.42		$ 69,099.55	$ 24,973,960.41	$ -	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN Y/O DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE COMPUESTO POR MALLA ESLABONADA, ANTEPECHO EN LADRILLO, VIGA DE CIMENTACIÓN Y COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO	M2	120.00			120.00		$ 108,358.36	$ 13,003,003.55	$ -	100.00%	100.00%	


EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	37.24			36.65		$ 91,988.38	$ 3,371,374.26	$ 54,273.00	98.42%	98.42%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	22.04			32.04		$ 176,060.25	$ 5,640,970.35	$ (1,760,602.00)	145.37%	145.37%	
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	9.00	(1.00)	8.00	8.00		$ 875,947.70	$ 7,007,581.56	$ 875,948.00	88.89%	88.89%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL REFORZADO EN MALLA PREONDULADA CALIBRE 8 HUECO 2", ÁNGULO 1" X 1/8" PISA MALLA EN ÁNGULO DE 3/4" X 1/4", PARALES DE 2 1/2" X 2 1/2" EN 3 MM CON SUJETADORES DE VARILLA DE 5/8" Y REFUERZOS DIAGONALES EN PLATINA DE 1-1/2"* 1/8" (INCLUYE TODOS LOS INSUMOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE)	M2	120.00			120.00		$ 503,048.36	$ 60,365,803.28	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CÁRCAMO EN CONCRETO (25 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR.	M	9.00	1.50	10.50	12.50		$ 320,598.77	$ 4,007,484.69	$ (1,122,096.00)	138.89%	138.89%	
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	m3	94.84			93.39		$ 34,724.48	$ 3,242,919.64	$ 50,351.00	98.47%	98.47%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ZANJA DE 0.3 X 0.3 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000, GRAVA 3/4" Y PASES PVC LONGITUD MAX 0.3 M CADA 3 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	54.00			57.40		$ 89,213.28	$ 5,120,842.55	$ (303,325.00)	106.30%	106.30%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	M2	25.00			25.00		$ 11,730.42	$ 293,260.61	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	45.00	20.35	65.35	85.35		$ 91,590.40	$ 7,817,240.55	$ (3,695,673.00)	189.67%	189.67%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	767.00	75.00	842.00	842.00		$ 7,103.01	$ 5,980,735.68	$ (532,726.00)	109.78%	109.78%	
DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE COMPUESTO POR MALLA ESLABONADA Y PARAL EN PERFIL DE ACERO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2			116.85	136.85		$ 62,810.05	$ 8,595,555.16	$ (1,256,201.00)	117.12%	117.12%	
PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2	373.66		405.33	405.33		$ 115,264.41	$ 46,720,121.60	$ (3,650,424.00)	108.48%	108.48%	
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	224.08		120.00	85.00		$ 21,599.09	$ 1,835,922.74	$ 3,004,002.00	70.83%	70.83%	
PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M	36.48		207.47	207.47	207.47	$ 17,208.00	$ 3,570,143.76	$ (2,942,396.00)	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 6" INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE RELLENO)	M	68.00			68.00		$ 141,729.70	$ 9,637,619.63	$ -	100.00%	100.00%	
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. TENERIFE GRANADA SUR							**$ 235,776,255.76**				


PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA	**95.77%**
ACUMULADO EJECUTADO A LA FECHA $	**2,565,263,820.42**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $	**2,678,619,155.00**

AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS POR SEDE - Septiembre 20 2026


SEDE EDUCATIVA	PROGRAMADO ACUMULADO		EJECUTADO ACUMULADO		TOTAL POR SEDE	% DE ADELANTO O ATRASO
ORLANDO FALS BORDA	$ 156,929,148.00	100.00%	$ 156,929,147.99	100.00%	$ 156,929,148.00	ENTREGADO
UNION EUROPEA	$ 169,766,274.00	100.00%	$ 169,766,274.00	100.00%	$ 169,766,274.00	ENTREGADO
SIERRA MORENA	$ 118,699,548.00	100.00%	$ 118,699,548.00	100.00%	$ 118,699,548.00	ENTREGADO
FABIO LOZANO	$ 245,187,661.00	100.00%	$ 245,187,661.00	100.00%	$ 245,187,661.00	ENTREGADO
ARBORIZADORA BAJA	$ 630,139,470.00	100.00%	$ 630,139,470.00	100.00%	$ 630,139,470.00	ENTREGADO
BUENAVISTA	$ 186,826,436.00	100.00%	$ 186,826,436.00	100.00%	$ 186,826,436.00	ENTREGADO
ESTRELLA DEL SUR - B	$ 78,637,768.00	100.00%	$ 78,637,768.00	100.00%	$ 78,637,768.00	ENTREGADO
SANTA LIBRADA	$ 223,822,666.00	100.00%	$ 223,822,666.00	100.00%	$ 223,822,666.00	0.00%
ESTRELLA DEL SUR - A	$ 76,163,937.00	100.00%	$ 76,163,937.00	100.00%	$ 76,163,937.00	ENTREGADO
TENERIFE GRANADA SUR SEDE A	$ 88,940,710.00	100.00%	$ 88,940,710.00	100.00%	$ 88,940,710.00	ENTREGADO
GUILLERMO CANO ISAZA SEDE A	$ 354,505,537.00	100.00%	$ 354,373,946.66	99.96%	$ 354,505,537.00	-0.04%
CIUDAD DE VILLAVICENCIO	$ 290,111,111.11	83.13%	$ 235,776,255.76	67.56%	$ 349,000,000.00	-15.57%
TOTALES	**$ 2,619,730,266.11**	**97.80%**	**$ 2,565,263,820.42**	**95.77%**	**$ 2,678,619,155.00**	-2.03%

OBSERVACIONES: Al final de este periodo, como aparece consignado en la tabla anterior, encontramos que en la ***IED Guillermo Cano Isaza,*** igual que en el periodo anterior se encuentra practicamente nivelada la ejecución con la programación, mientras que la ***IED Ciudad de Villavicencio*** presenta un atraso que supera el 15.5%. El contrato en general presenta un atraso por encima del 2%.

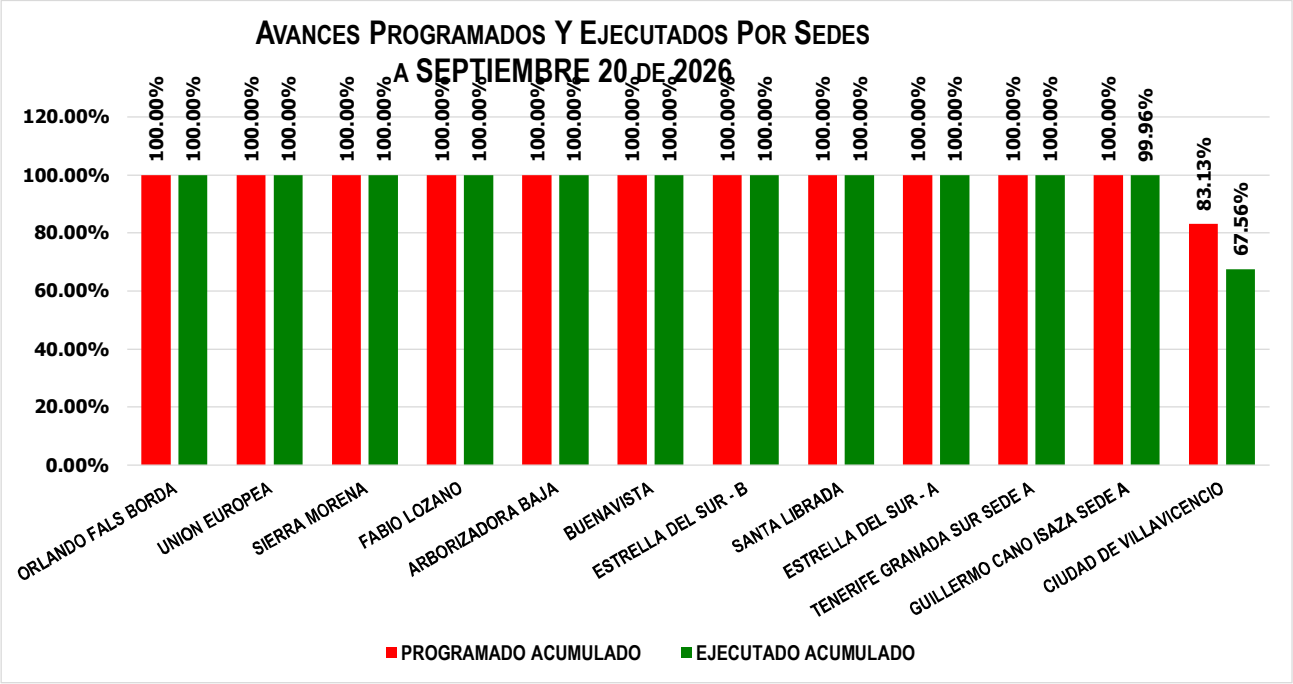

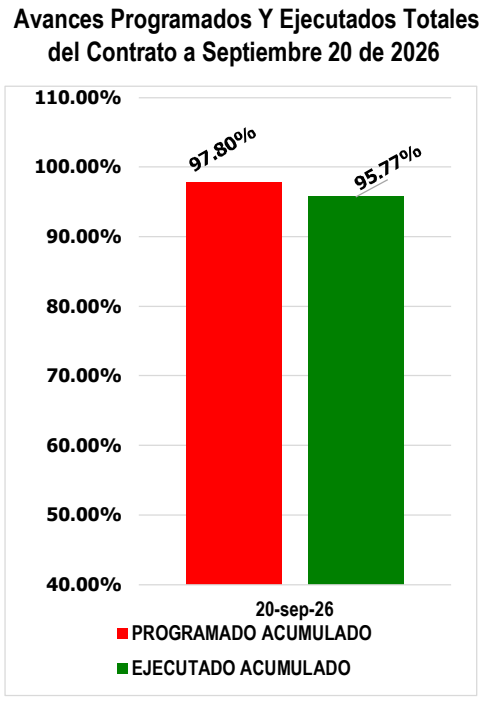

AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS TOTALES - Septiembre 20 2026

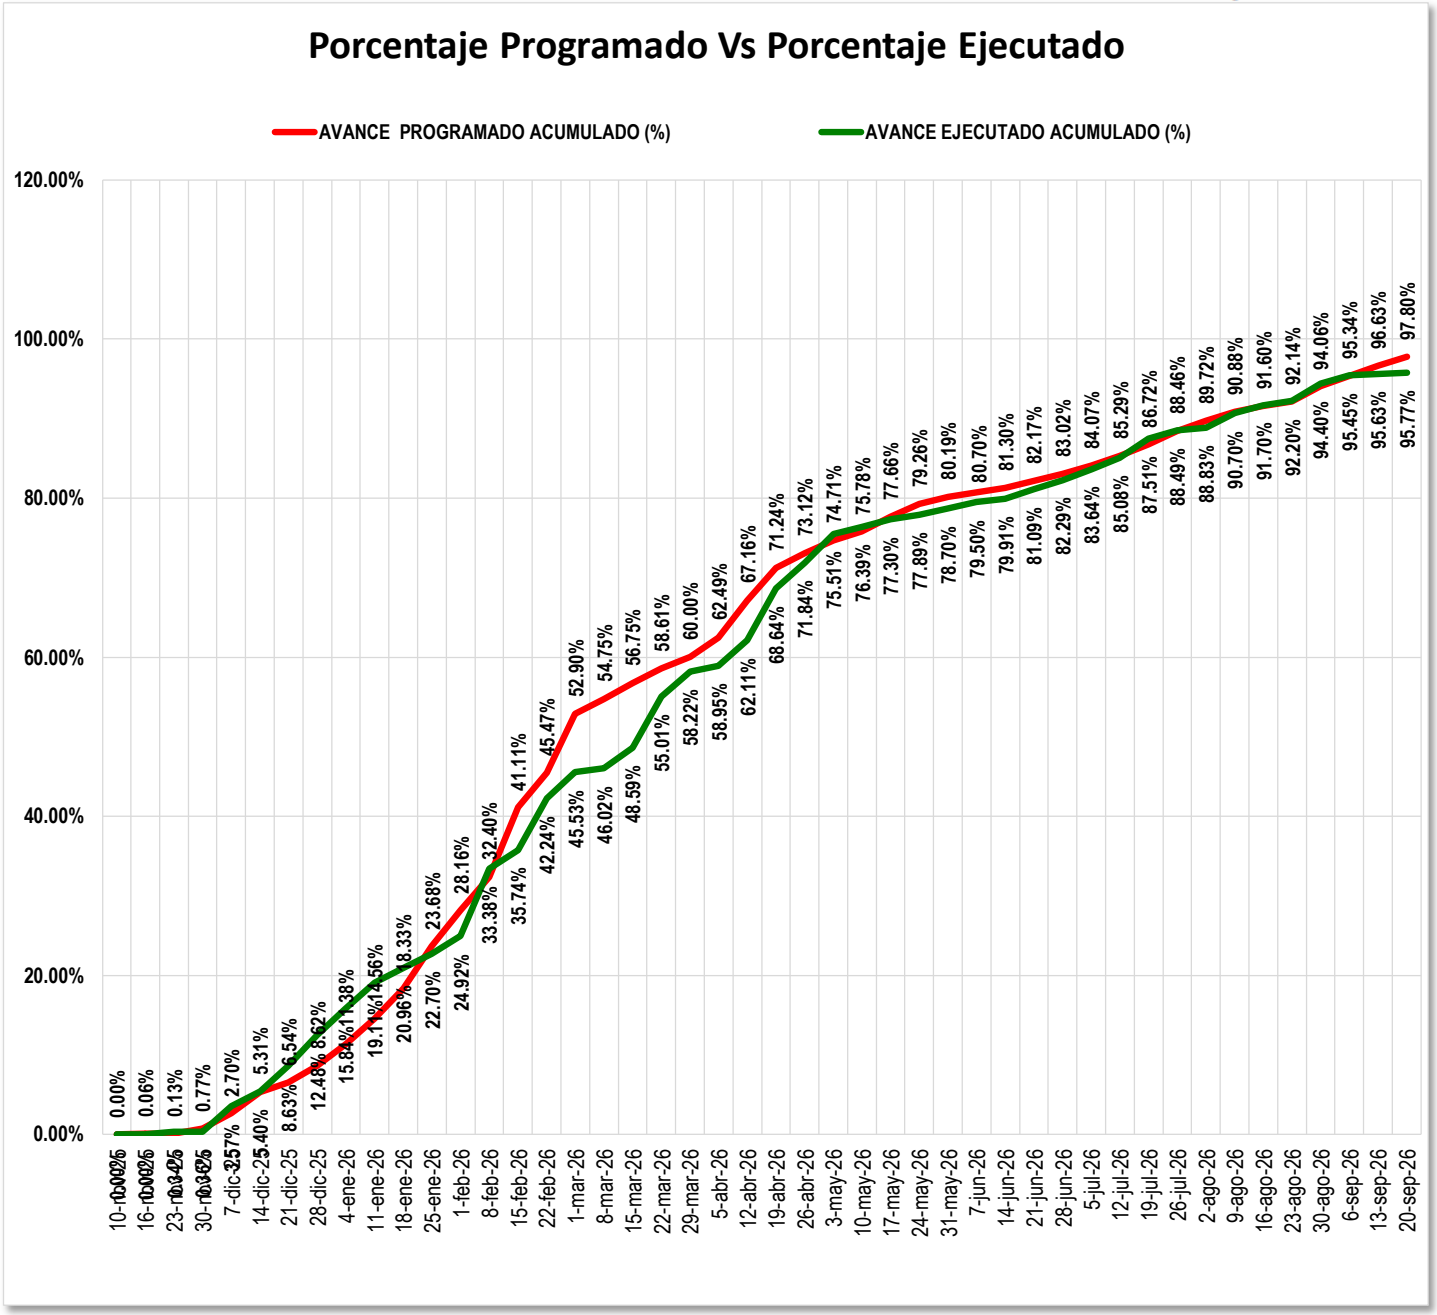

FECHA	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (%)	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO (%)
16-nov-25	0,00%	0,00%
23-nov-25	0,13%	0,34%
30-nov-25	0,77%	0,36%
7-dic-25	2,70%	3,57%
14-dic-25	5,31%	5,40%
21-dic-25	8,54%	8,63%
28-dic-25	8,62%	12,48%
4-ene-26	11,38%	15,84%
11-ene-26	14,56%	19,11%
18-ene-26	18,33%	20,96%
25-ene-26	23,68%	22,70%
1-feb-26	28,16%	24,92%
8-feb-26	32,40%	33,38%
15-feb-26	41,11%	35,74%
22-feb-26	45,47%	42,24%
1-mar-26	52,90%	45,53%
8-mar-26	54,75%	46,02%
15-mar-26	56,75%	48,59%
22-mar-26	58,61%	55,01%
29-mar-26	60,00%	58,22%
5-abr-26	62,49%	58,95%
12-abr-26	67,16%	62,11%
19-abr-26	71,24%	68,64%
26-abr-26	73,12%	71,84%
3-may-26	74,71%	75,51%
10-may-26	75,78%	76,39%
17-may-26	77,66%	77,30%
24-may-26	79,26%	77,89%
31-may-26	80,19%	78,70%
7-jun-26	80,70%	79,50%
14-jun-26	81,30%	79,91%
21-jun-26	82,17%	81,09%
28-jun-26	83,02%	82,29%
5-jul-26	84,07%	83,64%
12-jul-26	85,29%	85,08%
19-jul-26	86,72%	87,51%
26-jul-26	88,46%	88,49%
2-ago-26	89,72%	88,83%
9-ago-26	90,88%	90,70%
16-ago-26	91,60%	91,70%
23-ago-26	92,14%	92,20%
30-ago-26	94,06%	94,40%
6-sep-26	95,34%	95,45%
13-sep-26	96,63%	95,63%
20-sep-26	**97,80%**	**95,77%**
27-sep-26	98,90%	0,00%
30-sep-26	100,00%	0,00%

FECHA: 27/09/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES 3 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO		GRUPO 2
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA		
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS		

CORTE DEL INFORME:	CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO PAIS
27 de septiembre de 2026	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO

FECHAS			PLAZOS EN DIAS			VALOR CONTRATO		
DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8169110	CO1.PCCNTR.8154780	INICIAL	211	211	INICIAL	$ 796,184,131.00	$ 2,332,049,023.00
INICIO	6 de octubre de 2025	6 de octubre de 2025	SUSPENSIONES			ADICIONES	$ 291,300,934.00	$ 785,001,422.00
TERMINACION INICIAL	5 de mayo de 2026	5 de mayo de 2026	PRÓRROGAS	153	148	TOTAL	$ 1,087,485,065.00	$ 3,117,050,445.00
TERMINACION FINAL	5 de octubre de 2026	30 de septiembre de 2026	TOTAL	364	359			

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1	23-dic-25	$ 128,425,720.00	46	
2	5-jun-26	$ 162,875,214.00	107	
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA	OTRO ASPECTO
1	22-dic-25	$ 785,001,422.00	46	
2	27-may-26		102	
3				
4				

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	GARANTE:	SEGUROS MUNDIAL

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	CALIDAD DEL SERVICIO DESDE	CALIDAD DEL SERVICIO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA
BCH-100046043	6 10 2025	20 12 2026	20 6 2026	20 6 2031	6 10 2025	20 6 2029

| POLIZAS CONTRATO DE OBRA | | | |

FECHA:	27/09/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	195 días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO			
REGISTRO FOTOGRAFICO		SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA			GRUPO 2
		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS			
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
1A 100.00%	ORLANDO FALS BORDA (IED)		 	  	FRENTE AL 100%
2C 100.00%	SIERRA MORENA (IED)	* ADECUACION DE CUARTOS DE BASURA * ACCESIBILIDAD REDUCIDA RAMPAS * PINTURA 4 AULAS	 	 	FRENTE AL 100%

28072879
52071222
63396903
2038265
5260774
11337220
18125874
70007566
24,867,651.00
12664106
76,878,564.00

FECHA: 27/09/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES: 195 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO 2
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
3B 100.00%	UNION EUROPEA (IED)	* CAMBIO DE CUBIERTA PARA 3 AULAS, INCLUYE LA EDECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS	 364721023 	 	FRENTE AL 100%
4A 100.00%	ARBORIZADORA BAJA (IED)	* CAMBIO DE CUBIERTA BLOQUE PRIMERA INFANCIA, INCLUYE MEJORAMIENTO ELECTRICO * ADECUACIÓN CANCHA DEPROTIVA	 	 	FRENTE AL 100%

FECHA:	27/09/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	195 días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO			
REGISTRO FOTOGRAFICO		SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA			GRUPO 2
		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS			
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
5A 100.00%	FABIO LOZANO SIMONELLI (IED)	* CAMBIO DE PISOS AULAS DE 3ER PISO BLOQUE A * MANEJO AGUAS LLUVIAS CANCHA * MEJORAMIENTO BATERIAS SANITARIAS 3ER PISO B	 	 	FRENTE AL 100%
6B 100.00%	ESTRELLA DEL SUR (IED) SEDE B	* CAMBIO DE PUERTAS Y VENTANA DE LA SEDE * CAMBIO DEL PORTON PRINCIPAL	 	 	FRENTE AL 100%

FECHA: 27/09/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES: 195 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO					
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO	2
CORTE DEL INFORME	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
7A **100.00%**	**CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)**	* CAMBIO DE CUBIERTA AULA MULTIPLE	 	 	**FRENTE AL 100%**
8A **100.00%**	**SANTA LIBRADA (IED)**	* MANTENIMIENTO CORRECTIVO TERRAZAS Y JARDINERA * ADECUACIÓN JUNTA ESTRUCTURAL COMEDOR	 	 	**FRENTE AL 100%**

FECHA: 27/09/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES: 195 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA			GRUPO 2	
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
9A 100.00%	IED ESTRELLA DEL SUR, SEDE A	* ADEACUACIÓN BATERIAS SANITARIAS * ADECUACIÓN PORTON PRINCIPAL	 	 	**FRENTE AL 100%**
10A 100.00%	DIRECCION LOCAL DE EDUCACION DE USME - EMERGENCIA	* IMPERMEABILIZACIÓN PLACA TANQUES DE AGUA POTABLE * RESANE HUMEDAD BAÑO MUJERES	 	 	**EMERGENCIA AL 100%**

FECHA:	27/09/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	195 días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO			
REGISTRO FOTOGRAFICO		SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA			GRUPO 2
		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS			
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
11A 99.96%	GUILLERMO CANO ISAZA (IED)	* ADECUACIÓN BATERIAS SANITARIAS BLOQUE BACHILLERATO	 	 	FALTAN DETALLES PARA REALIZAR LA ENTREGA DE LAS BATERIAS SANITARIAS DEL BLOQUE B, SEGUNDO PISO, YA SE REALIZO LA ENTREGA DE LA BATERIA SANITARIA DEL BLOQUE C PRIMER PISO  
12A 100.00%	TENERIFE - GRANADA SUR (IED)	* IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE * Instalación Barandas Metalicas	 	 	FRENTE AL 100%

FECHA: 27/09/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES: 195 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO					
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO 2	
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS					
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS		
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO		

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
13A 100.00%	CALASANZ (BUENAVISTA) (CED) EMERGENCIA	* INSTALACIÓN DIVISIONES DE BAÑOS *AMPLIACIÓN CAPACIDAD TANQUE DE AGUA *ADECUACION RAMPA PARA ENTRADA AULA MULTIPLE	 	 	EMERGENCIA AL 100%
14A 100.00%	ARBORIZADORA BAJA (IED)	* ADECUACIÓN GRADERIAS, REEMPLAZO ESCALERA TARIMA, ADECUACIÓN TARIMA *MEJORAMIENTO DEL TERRENO AL REDEDRO DE LA TARIMA EMERGENCIA	 	 	EMERGENCIA AL 100%

FECHA:	27/09/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	195 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO			
REGISTRO FOTOGRAFICO		SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA			GRUPO 2
		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS			
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
15A 100.00%	GUILLERMO CANO ISAZA (IED)	*CAMBIO DE PISO AULA BLOQUE DE PRIMARIA SEGUNDO PISO EMERGENCIA	 	 	EMERGENCIA AL 100%
16A 87.08%	CIUDAD DE VILAVICENCIO - PUERTA AL LLANO	☐Mejoramiento correctivo de los pisos en acceso y corredor principal ☐Mejoramiento correctivo del cerramiento metálico ☐Mejoramiento de las redes de aguas lluvias	 	 	    



FECHA: 27/09/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES: 195 Días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA			GRUPO 2	
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
17A **100.00%**	**CUNDINAMARCA (IED)**	Adecuación de una estructura en cielo raso PVC, para mitigar el ingreo de palomas al comedor de la institución	 	 	**EMERGENCIA AL 100%**
17A **100.00%**	**LUIS EDUARDO MORA OSEJO (IED)**	* Cambio de tablero Principal electrico * Adecuación acometidas electricas según alcance de la ficha electrica	 	 	**EMERGENCIA AL 100%**

FECHA: 27/09/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES: 195 Días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO 2
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
18A 100.00%	CALASANZ (BUENAVISTA) (CED) - EMERGENCIA	* cambio y suministro e instalación de motobombas para tanque de agua potable	 	 	EMERGENCIA AL 100%
18A 52.22%	EDUARDO UMAÑA MENDOZA (IED)	* Impermeabilización con manto en aluminio, bloque	 	 	    

FECHA: 27/09/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES: 195 Días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO 2
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

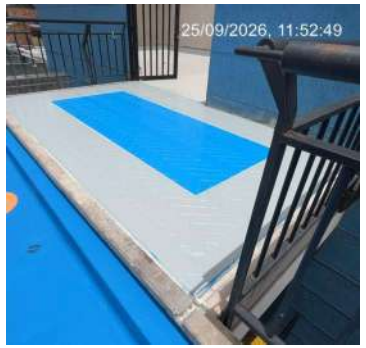TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
18A 100.00%	SANTA LIBRADA (IED)	* Impermeabilización cuarto zona ludica	 	 	 
19A 32.58%	SAN JOSE DE USME - DON BOSCO 2 (CED)	Suministro e instalación de Cácacmo en acero Inox. Suministro e instalación de Lava ollas acero Inox. Revisión y reemplazo de tuberias hidráulicas y sanitarias	 	 	   

CONTRATO DE OBRA		CO1.PCCNTR.8154780					CONTRATO DE INTERVENTORIA	CO1.PCCNTR.8169110				VIGENCIA	2025
CPF	581	IED			ORLANDO FALS BORDA			SEMANA 46					
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones	
REPLANTEO	m2	36.50	225.50	262.00	262.00		$ 4,233.48	$ 1,109,170.66	$ (954,648.79)	717.81%	717.81%		
CERRAMIENTO EN LONA	M	91.00	(62.60)	28.40	28.40		$ 31,110.25	$ 883,530.99	$ 1,947,501.40	100.00%	100.00%		
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	36.50	211.26	247.76	247.76		$ 18,044.21	$ 4,470,634.09	$ (3,812,020.33)	678.79%	678.79%		
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M YGUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	301.34	(266.74)	34.60	34.60		$ 33,201.35	$ 1,148,766.74	$ 8,856,128.37	11.48%	11.48%		
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	79.20	40.80	120.00	120.00		$ 69,099.55	$ 8,291,946.35	$ (2,819,261.76)	151.52%	151.52%		
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	34.00	199.20	233.20	216.59		$ 107,273.69	$ 23,234,421.60	$ (19,587,116.26)	637.03%	637.03%		
PERFORACIÓN NÚCLEO 4" E= 0.10 M	UN	16.00	(13.00)	3.00	3.00		$ 166,952.47	$ 500,857.42	$ 2,170,382.16	18.75%	18.75%		
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M	1.50			1.50		$ 62,023.52	$ 93,035.29	$ -	100.00%	100.00%		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	34.00			34.00		$ 91,590.40	$ 3,114,073.57	$ -	100.00%	100.00%		
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	0.30			0.30		$ 135,394.33	$ 40,618.30	$ -	100.00%	100.00%		
RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	0.24			0.24		$ 181,045.17	$ 43,450.84	$ -	100.00%	100.00%		
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	15.00			15.00		$ 22,829.47	$ 342,442.05	$ -	100.00%	100.00%		
PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	19.00			19.00		$ 19,858.75	$ 377,316.29	$ -	100.00%	100.00%		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO LAMINADO 3 + 3 DIMENSIONES 1.00 M. X 1.00 M.	M2	15.36			15.36		$ 177,336.50	$ 2,723,888.59	$ -	100.00%	100.00%		
MEDIACAÑA VERTICAL EN CONCRETO 3000 PSI	M	58.50	136.16	194.66	194.66		$ 27,185.71	$ 5,291,971.11	$ (3,701,606.83)	100.00%	100.00%		
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	73.00	189.00	249.56	239.56		$ 45,289.29	$ 10,849,501.59	$ (7,543,383.64)	328.16%	328.16%		
DILATACIÓN EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 3 MM PROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM	M			127.20	127.20		$ 4,291.49	$ 545,877.16	$ (545,877.16)	100.00%	100.00%		
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	344.96			340.58		$ 4,663.84	$ 1,588,397.08	$ 20,440.72	98.73%	98.73%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	262.00	20.37	252.37	255.37		$ 361,355.09	$ 92,279,248.29	$ 2,395,784.22	97.47%	97.47%		
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ORLANDO FALS BORDA							$ 156,929,147.99					
CPF	1913	IED			SIERRA MORENA			SEMANA 46					
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones	
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	47.37	223.92	271.29	271.29		$ 7,045.00	$ 1,911,238.10	$ (1,577,516.00)	572.70%	572.70%		
CERRAMIENTO EN LONA	M	60.00	13.00	73.00	73.00		$ 31,110.25	$ 2,271,047.96	$ (404,433.20)	121.67%	121.67%		
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	m3	1.76	(1.76)	-	-		$ 274,656.52	$ -	$ 483,395.00	0.00%	0.00%		
DESMONTE DE BARANDA METÁLICA ALTURA NO MAYOR A 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	20.80	7.20	28.00	28.00		$ 21,488.46	$ 601,677.01	$ (154,716.95)	134.62%	134.62%		
DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	12.60			12.60		$ 11,376.96	$ 143,349.70	$ -	100.00%	100.00%		

DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	36.84			36.84		$ 107,273.69	$ 3,951,962.61	$ -	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.30 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	32.64	0.72	31.92	-		$ 93,547.94	$ -	$ 3,053,405.00	0.00%	0.00%	
CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	7.20			3.40		$ 15,633.37	$ 53,153.46	$ 59,407.00	47.22%	47.22%	
DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5.29			4.00		$ 11,761.45	$ 47,045.82	$ 15,172.00	75.61%	75.61%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	1.76	6.86	8.62	4.57		$ 91,988.38	$ 420,527.47	$ (258,627.91)	259.75%	259.75%	
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	m3	24.87	-9.60	15.27	15.27		$ 21,702.97	$ 331,382.67	$ 208,370.00	61.40%	61.40%	
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	m2	11.84			11.84		$ 165,931.21	$ 1,964,625.47	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	m3	7.00	7.00	14.00	14.00		$ 176,060.25	$ 2,464,579.38	$ (1,232,158.00)	199.98%	199.98%	
MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	12.60	3.76	16.36	16.36		$ 146,133.16	$ 2,390,738.55	$ (549,461.00)	129.84%	129.84%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	m	6.00			-		$ 78,726.73	$ -	$ 472,360.38	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"	un	8.00			-		$ 28,310.86	$ -	$ 226,487.00	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	un	2.00			-		$ 129,729.46	$ -	$ 259,458.91	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	m	29.00			-		$ 14,988.50	$ -	$ 434,667.00	0.00%	0.00%	
RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INLUYE REFUERZO).	M2	42.05	8.55	50.60	50.60		$ 193,996.53	$ 9,816,224.55	$ (1,658,670.00)	120.33%	120.33%	
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	11.84			11.84		$ 165,931.21	$ 1,964,625.47	$ -	100.00%	100.00%	
CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA (TRÁFICO PESADO) ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO, PENDIENTADO Y MEDIA CAÑA.	M	2.96			2.96		$ 592,067.38	$ 1,752,519.43	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	420.50	(366.54)	53.96	53.96		$ 7,255.46	$ 391,504.61	$ 2,659,416.00	12.83%	12.83%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	91.39			91.39		$ 7,103.01	$ 649,144.22	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-S 6" INCLUYE ACCESORIOS	M	6.00	10.00	16.00	16.00		$ 143,600.90	$ 2,297,614.44	$ (1,436,009.00)	266.67%	266.67%	
CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 M X 0.60 M EN CONCRETO REFORZADO < = 1,00 M CON MARCO Y TAPA METÁLICA E= 0.20 M	un	4.00	(4.00)	-	-		$ 1,618,437.02	$ -	$ 6,473,748.09	0.00%	0.00%	
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	3.00			2.00		$ 875,947.70	$ 1,751,895.39	$ 875,948.00	66.67%	66.67%	
CANAL EN PVC AMAZONAS O EQUIVALENTE, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	3.60			3.60		$ 68,114.71	$ 245,212.96	$ -	100.00%	100.00%	
MURO EN SUPERBOARD DE 8 MM INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA , MASILLA , CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA, VISTO DOS CARAS E= 12 CM	M2	15.77	1.25	17.02	17.02		$ 159,158.72	$ 2,708,881.47	$ (198,948.00)	107.93%	107.93%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA, EL TUBO PASAMANOS DE 2" CALIBRE 18 AL IGUAL QUE LOS TUBOS PEDESTALES CON PLATINA DE FIJACIÓN Y TRAVESAÑOS VERTICALES EN TUBERÍA DE 3/4" CON SEPARACIÓN CADA 9CM, PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS.	M	33.78			36.35		$ 1,120,163.13	$ 40,719,658.08	$ (2,880,548.00)	107.61%	107.61%	
PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	172.00	(172.00)	-	-		$ 65,757.83	$ -	$ 11,310,347.00	0.00%	0.00%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO (RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA CANCHA MULTIPLE INCLUYE DEMARCACIONES BALONCESTO - VOLEYBOL)	M2			146.06	156.06		$ 77,589.44	$ 12,108,607.88	$ (12,108,608.00)	106.85%	106.85%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	14.08	2.72	16.80	16.80		$ 98,222.57	$ 1,650,139.25	$ (267,165.00)	119.32%	119.32%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	4.08			4.08		$ 45,289.29	$ 184,780.29	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	4.84			4.84		$ 126,224.49	$ 610,926.55	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1.00			1.00		$ 572,567.48	$ 572,567.48	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	UN	1.00			24.00		$ 23,315.15	$ 559,563.51	$ (536,248.00)	2400.00%	2400.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	24.00			24.00		$ 20,790.98	$ 498,983.52	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	5.08	0.05	5.13	5.13		$ 798,362.30	$ 4,095,598.62	$ (39,918.00)	100.98%	100.98%	
PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	193.76	(98.31)	95.45	105.45		$ 29,785.43	$ 3,140,873.57	$ 2,630,351.00	54.42%	54.42%	
PINTURA DE ACEITE SOBRE PAÑETE (2 MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	61.76	14.44	76.20	86.20		$ 29,785.43	$ 2,567,504.05	$ (727,956.00)	139.57%	139.57%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	kg	226.80	92.51	319.31	319.31		$ 23,042.63	$ 7,357,741.55	$ (2,131,674.00)	140.79%	140.79%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	36.84	-23.74	13.10	15.10		$ 264,771.67	$ 3,998,052.18	$ 5,756,136.00	40.99%	40.99%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	537.24			537.24		$ 4,663.84	$ 2,505,600.70	$ -	100.00%	100.00%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. SIERRA MORENA	**$ 118,699,548.00**				
CPF	**1930**	**IED**				**UNIÓN EUROPEA**		**SEMANA 46**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	168.00	10.14	178.14	178.14		$ 4,233.48	$ 754,151.38	$ (42,927.00)	106.04%	106.04%	
CERRAMIENTO EN LONA	M	45.00	7.80	52.80	23.83		$ 31,110.25	$ 741,422.37	$ 658,538.70	52.96%	52.96%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	136.13	(104.13)	32.00	32.00		$ 3,248.63	$ 103,956.25	$ 338,280.13	23.51%	23.51%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5.83	-	5.83	-		$ 144,722.00	$ -	$ 843,729.29	0.00%	0.00%	
DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	36.30			36.30		$ 26,782.33	$ 972,198.70	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	5.15	7.35	12.50	12.50		$ 27,938.51	$ 349,231.40	$ (205,348.06)	242.72%	242.72%	

DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	m2	168.00	5.63	173.63	183.63		$ 36,752.18	$ 6,748,803.22	$ (574,436.61)	109.30%	109.30%	
DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	un	18.00	6.00	24.00	24.00		$ 11,967.87	$ 287,228.79	$ (71,807.20)	133.33%	133.33%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	un	18.00	6.00	24.00	24.00		$ 7,469.97	$ 179,279.20	$ (44,819.80)	133.33%	133.33%	
DESMONTE DE TABLERO ELÉCTRICO DE 12-18 CIRCUITOS DETERIORADO, INCLUYE RETIRO DE PROTECCIONES Y DISPOSICIÓN DE RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, NO INCLUYE RESANES NI PINTURAS.	un	1.00			-		$ 55,922.89	$ -	$ 55,922.89	0.00%	0.00%	
DEMOLICIÓN ALFAJÍA EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE COSNTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	7.00	0.00	7.00	-		$ 32,498.47	$ -	$ 227,489.29	0.00%	0.00%	
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	m	3.90	-3.90	0.00	-		$ 18,687.73	$ -	$ 72,882.16	0.00%	0.00%	
PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	19.43			19.43		$ 21,844.63	$ 424,441.11	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	4.00			4.00		$ 126,905.79	$ 507,623.16	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	3.90			3.90		$ 89,839.27	$ 350,373.14	$ -	100.00%	100.00%	
CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (INCLUYE FORMALETAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	M	19.43			19.43		$ 42,469.67	$ 825,185.65	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	kg	3515.11	-1076.19	2438.92	2,608.92		$ 23,042.63	$ 60,116,373.04	$ (84,914,618.87)	-242.42%	-242.42%	
CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (INCLUYE FORMALETAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	M	19.43			19.43		$ 42,469.67	$ 825,185.65	$ (825,185.65)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO (35 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR.	M	0.50			0.50		$ 341,855.19	$ 170,927.60	$ (170,927.60)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	m	26.40	18.13	44.53	44.53		$ 91,590.40	$ 4,078,520.47	$ (1,660,533.93)	245.62%	245.62%	
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	1.00	-1.00	0.00			$ 875,947.70	$ -	$ 875,947.70	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	kg	213.75	0.29	214.04	214.04		$ 264,771.67	$ 56,671,727.78	$ (76,783.78)	100.14%	100.14%	

FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	18.15			18.15		$ 106,267.26	$ 1,928,750.73	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	34.90			34.90		$ 91,590.40	$ 3,196,504.93	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	42.00			42		$ 23,315.15	$ 979,236.14	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 2N°10 (F) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	42.00			42.00		$ 20,790.98	$ 873,221.16	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	21.00	3.00	24.00	24		$ 180,330.15	$ 4,327,923.59	$ (540,990.45)	114.29%	114.29%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	21.00	3.00	24.00	24		$ 238,055.44	$ 5,713,330.57	$ (714,166.32)	114.29%	114.29%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M	22.50	8.50	31.00	30		$ 304,166.74	$ 9,125,002.11	$ (2,281,250.53)	133.33%	133.33%	
SUMINISTRO E INSTALACION MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA, PERFILES ESTUCTURALES DE ACERO GALVANIZADO PGU, MONTANTES, TORNILLOS PARA ESTRUCTURA, CLAVO IMPACTADO. ACABADO A DOS MANOS CON PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO.	M2	32.35	0.75	33.10	33.1		$ 222,048.37	$ 7,349,801.01	$ (166,536.28)	102.32%	102.32%	
PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M2	61.70			65.10		$ 17,207.77	$ 1,120,195.60	$ (58,476.16)	105.51%	105.51%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	224.21			224.21		$ 4,663.84	$ 1,045,679.27	$ -	100.00%	100.00%	
					SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. UNION EUROPEA			**$ 169,766,274.00**				
CPF	**1904**	**IED**			**ARBORIZADORA BAJA**			**SEMANA 46**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	786.72	463.91	1250.63	1,250.63		$ 7,045.00	$ 8,810,688.60	$ (3,268,246.00)	158.97%	158.97%	
CERRAMIENTO EN LONA	M	96.25	73.00	169.25	169.25		$ 31,110.25	$ 5,265,409.14	$ (2,271,047.96)	175.84%	175.84%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	466.58	9.42	476.00	476.00		$ 107,273.69	$ 51,062,274.77	$ (1,010,518.00)	102.02%	102.02%	
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	5.25			-		$ 22,300.62	$ -	$ 117,078.27	0.00%	0.00%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	145.00	6.23	151.23	151.23		$ 32,594.26	$ 4,929,229.33	$ (203,062.21)	104.30%	104.30%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	145.00	123.77	21.23	21.23		$ 42,650.45	$ 905,469.00	$ 5,278,845.87	14.64%	14.64%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO CON FIBRA SINTÉTICA ESPESOR 4 CM	M2	130.00			130.00		$ 69,868.54	$ 9,082,910.19	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	m2	323.02			323.02		$ 36,752.18	$ 11,871,653.14	$ 37.00	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA (INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	35.50			35.50		$ 8,680.11	$ 308,143.88	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	un	25.00			25.00		$ 7,469.97	$ 186,749.17	$ -	100.00%	100.00%	

DESMONTE CANCHA MULTIPLE (ARCO DE MICROFUTBOL Y ARO DE BALONCESTO) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	un	2.00			2.00		$ 398,950.46	$ 797,900.91	$ -	100.00%	100.00%	
DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	21.00			-		$ 11,761.45	$ -	$ 246,991.00	0.00%	0.00%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	16.80	5.76	22.56	22.56		$ 91,988.38	$ 2,075,257.93	$ (529,853.00)	134.29%	134.29%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	258.10	(36.51)	221.59	221.59		$ 79,962.51	$ 17,718,891.73	$ 2,919,431.00	85.85%	85.85%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	22.83			22.83		$ 135,394.33	$ 3,091,052.48	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	15.52			2.22		$ 66,591.58	$ 147,833.30	$ 885,668.00	14.30%	14.30%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	m3	103.10	68.26	171.36	171.36		$ 176,060.25	$ 30,169,684.13	$ (12,017,873.00)	166.21%	166.21%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAJÓN DE PIEDRA	m3	129.05	25.90	154.95	154.95		$ 176,060.25	$ 27,280,535.46	$ (4,559,960.00)	120.07%	120.07%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BORDILLO PREFABRICADO A80	m	87.00			87.00		$ 76,033.93	$ 6,614,951.64	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M	90.00			90.00		$ 97,085.28	$ 8,737,675.50	$ -	100.00%	100.00%	
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	18.70	5.00	23.70	23.70		$ 165,931.21	$ 3,932,569.57	$ (829,656.00)	126.74%	126.74%	
CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI ANCHO 0.50 M E= 0.07 M (NO INCLUYE REFUERZO)	M	90.00			90.00		$ 164,788.52	$ 14,830,966.59	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO (45 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3 MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR.	M	1.52			1.52		$ 358,768.86	$ 545,328.67	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PEATONAL DE ANGULOS Y PLATINAS DE ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR PARA CARCAMO ANCHO 40 CM	M	0.90			0.90		$ 156,990.72	$ 141,291.65	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	kg	1809.76	-142.50	1667.26	1,667.26		$ 23,042.63	$ 38,418,051.96	$ 3,283,574.00	92.13%	92.13%	
CAJA DE INSPECCION 100 X 100 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	2.00					$ 1,088,548.32	$ -	$ 2,177,097.00	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	m2	684.78	-162.78	522.00	522.00		$ 11,730.42	$ 6,123,281.59	$ 1,909,479.00	76.23%	76.23%	
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	m	3.00			2.00		$ 5,565.04	$ 11,130.08	$ 5,565.00	66.67%	66.67%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	m2	323.02			323.02		$ 264,771.67	$ 85,526,544.13	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	m	35.50			35.50		$ 305,515.84	$ 10,845,812.21	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN ASFALTO MD-10 PARA CANCHA DEPORTIVA E=8 CM, (INCLUYE: EMULSION ASFALTICA, ASFALTO MD-10 Y ACABADO CON SLURRY	m2	484.50	-43.86	440.64	440.64		$ 225,361.76	$ 99,303,405.31	$ 9,884,367.00	90.95%	90.95%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO (RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA CANCHA MULTIPLE INCLUYE DEMARCACIONES BALONCESTO - VOLEYBOL)	M2	484.50	-484.50	0.00	-		$ 77,589.44	$ -	$ 37,592,083.00	0.00%	0.00%	
PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	714.00			680.68		$ 65,757.83	$ 44,760,026.89	$ 2,191,065.00	95.33%	95.33%	
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M	66.67			66.67		$ 62,023.52	$ 4,135,108.31	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	620.45			620.45		$ 7,255.46	$ 4,501,650.03	$ -	100.00%	100.00%	
DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	353.72			353.72		$ 18,365.30	$ 6,496,173.31	$ -	100.00%	100.00%	
CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL (INC. DOS UNIDADES FIJAS DE MICROBALONCESTO - MALLA PARA MICRO FUTBOL - JUEGO DE POSTES Y MALLA PARA VOLEIBOL - DEMARCACIÓN DE LA CANCHA - TRANSPORTE - E INSTALACIÓN)	UN	2.00	-1.00	1.00	1.00		$ 12,850,061.48	$ 12,850,061.48	$ 12,850,061.00	50.00%	50.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	5.00			4.00		$ 126,905.79	$ 507,623.16	$ 126,906.00	80.00%	80.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1.00			1.00		$ 572,567.48	$ 572,567.48	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	118.00			118.00		$ 15,217.85	$ 1,795,706.06	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	118.00			118.00		$ 16,070.48	$ 1,896,316.55	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	25.00			25.00		$ 180,330.15	$ 4,508,253.74	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	22.00			22.00		$ 238,055.44	$ 5,237,219.69	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER 2X20W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	3.00			3.00		$ 193,810.36	$ 581,431.07	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	194.18			194.18		$ 9,167.13	$ 1,780,074.18	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H= 5.00 M (ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO DE 3" E= 3,81 MM ASTM A500 Y CAMISA DE REFUERZO DE 4", VARILLA REDONDA DE 3/4" C./.14 EJES. VIGA 40X30 Y PILOTES CONCRETO 3000 PSI) SEGÚN DETALLES IDRD.	M2	17.50			16.95		$ 2,042,059.82	$ 34,612,913.93	$ 1,123,133.00	96.86%	96.86%	
CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H= 2.50 M (ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO DE 2-1/2" Y PROTECCIÓ N EN VARILLA REDONDA DE 3/4" C./0.14 m EJES. VIGA=30*30 CONCRETO 3000PSI) SEGÚN DETALLES IDRD.	M2	17.50			16.95		$ 1,257,854.97	$ 21,320,641.75	$ 691,820.00	96.86%	96.86%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO HETEROGENEO ALTO TRÁFICO	M2	130.00			125.78		$ 237,210.90	$ 29,836,007.59	$ 1,001,410.00	96.75%	96.75%	
LAVADO Y LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE EN EL COLEGIO ARBORIZADORA BAJA (INCLUYE INSUMOS)	ML	197.54			194.54		$ 5,046.98	$ 981,840.09	$ 15,141.00	98.48%	98.48%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1,078.76			1,078.76		$ 4,663.84	$ 5,031,162.64	$ -	100.00%	100.00%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ARBORIZADORA BAJA	**$ 630,139,470.00**				
CPF	**523**	**IED**			**Fabio Lozano Simonelli**			**SEMANA 46**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	1201.02	10.05	1211.07	1,211.07		$ 4,233.48	$ 5,127,035.54	$ (42,546.00)	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	51.83	81.17	133.00	133.00		$ 31,110.25	$ 4,137,662.72	$ (2,525,218.67)	256.61%	256.61%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	235.29	11.28	246.57	246.57		$ 32,594.26	$ 8,036,765.70	$ (367,663.21)	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2			68.70	68.70		$ 107,273.69	$ 7,369,702.26	$ (7,369,702.26)	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN ASITIOS AUTORIZADOS)	M2	28.64	1.35	29.99	29.99		$ 22,300.62	$ 668,795.68	$ (30,105.84)	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	55.48	30.02	85.50	85.50		$ 12,649.16	$ 1,081,503.32	$ (379,727.83)	154.11%	154.11%	
DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	28.00			28.00		$ 20,708.69	$ 579,843.18	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)}	M3	15.05	0.08	15.13	15.13		$ 66,591.58	$ 1,007,530.54	$ (5,327.33)	100.53%	100.53%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	17.32			17.32		$ 33,174.37	$ 574,580.07	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	UN	28.00			28.00		$ 27,281.50	$ 763,882.01	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2			3.00	3.00		$ 25,731.38	$ 77,194.15	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	66.00			66.00		$ 27,938.51	$ 1,843,941.79	$ -	100.00%	100.00%	
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3			63.85	63.85		$ 34,724.48	$ 2,217,158.36	$ -	100.00%	100.00%	
CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M			120.60	120.60		$ 15,633.37	$ 1,885,384.52	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	8.00			8.00		$ 7,469.97	$ 59,759.73	$ -	100.00%	100.00%	

DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	55.30	-5.16	50.14	50.14		$ 32,569.97	$ 1,633,058.41	$ 168,061.06	90.67%	90.67%	
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	22.90			22.90		$ 18,687.73	$ 427,949.09	$ -	100.00%	100.00%	
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2			2.80	2.80		$ 18,044.21	$ 50,523.80	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	12.80	2.49	15.29	15.29		$ 135,394.33	$ 2,070,179.26	$ (337,131.87)	119.45%	119.45%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 m	M2	194.67			194.67		$ 42,650.45	$ 8,302,762.60	$ -	100.00%	100.00%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	49.31			49.31		$ 45,289.29	$ 2,233,214.74	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO CON FIBRA SINTÉTICA ESPESOR 4 CM	M2	548.06	(548.06)	-			$ 69,868.54	$ -	$ 38,292,151.98	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	158.76	(56.05)	102.71	102.71		$ 7,103.01	$ 729,550.31	$ 398,123.79	64.70%	64.70%	
CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI ANCHO 0.50 M E= 0.07 M (NO INCLUYE REFUERZO)	M	171.60	(44.68)	126.92	122.00		$ 164,788.52	$ 20,104,199.16	$ 8,173,510.48	71.10%	71.10%	
PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2			0.64	0.64		$ 115,264.41	$ 73,769.22	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PEATONAL DE ANGULOS Y PLATINAS DE ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR PARA CARCAMO ANCHO 40 CM	M			13.00	13.00		$ 156,990.72	$ 2,040,879.36	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M			20.50	20.57		$ 24,290.55	$ 499,656.52	$ (1,700.34)	100.34%	100.34%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2.00			2.00		$ 126,905.79	$ 253,811.58	$ (253,811.58)	100.00%	100.00%	
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00			1.00		$ 253,721.19	$ 253,721.19	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	M	1.00			1.00		$ 572,567.48	$ 572,567.48	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	M	8.00			8.00		$ 180,330.15	$ 1,442,641.20	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	32.00	-27.00	5.00	5.00		$ 23,315.15	$ 116,575.73	$ 629,508.95	15.63%	15.63%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M			55.00	55.00		$ 33,700.52	$ 1,853,528.49	$ (1,853,528.49)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	32.00	(12.00)	20.00	20.00		$ 20,790.98	$ 415,819.60	$ 249,491.76	62.50%	62.50%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN			8.00	8.00		$ 198,607.76	$ 1,588,862.05	$ -	100.00%	100.00%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	8.00	-5.00	3.00	3.00		$ 238,055.44	$ 714,166.32	$ 1,190,277.20	37.50%	37.50%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL TOTALIZADOR 3X125 A. MATERIALES CERTIFICADOS RETIE E INSTALADOS SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UN			1.00	1.00		$ 781,835.83	$ 781,835.83	$ (781,835.83)	100.00%	100.00%	
ACOMETIDA TRIFASICA EN 4#8 + 1#10 CABLE LIBRE DE HALOGENOS. INCLUYE CONECTORES TUBULARES Y AISLAMIENTO AUTOFUNDENTE INCLUYE MANIOBRAS DE CANALIZACIÓN	M			60.00	60.00		$ 57,049.39	$ 3,422,963.50	$ (3,422,963.50)	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	15.00	(2.42)	12.58	12.58		$ 361,355.09	$ 4,545,846.98	$ 874,479.31	83.87%	83.87%	
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	1.00			1.00		$ 875,947.70	$ 875,947.70	$ -	100.00%	100.00%	
CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	55.30	-5.16	50.14	50.14		$ 130,345.99	$ 6,535,548.17	$ 672,585.33	90.67%	90.67%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	226.69	12.39	239.08	239.08		$ 126,224.49	$ 30,177,196.69	$ (1,563,366.10)	105.46%	105.46%	
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	17.44	76.23	93.67	93.67		$ 33,727.50	$ 3,159,254.93	$ (2,571,047.33)	537.10%	537.10%	
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M			39.00	39.00		$ 22,829.47	$ 890,349.34	$ (890,349.34)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M2	-	5.29	5.29	5.29		$ 62,023.52	$ 328,104.44	$ (328,104.44)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
WIN DE ALUMINIO	M	18.00	2.90	20.90	20.90		$ 15,372.99	$ 321,295.59	$ (44,581.68)	116.11%	116.11%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	131.00	(37.64)	93.36	93.36		$ 98,222.57	$ 9,170,059.56	$ 3,697,097.71	71.27%	71.27%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	11.73	-5.49	6.24	6.24		$ 1,127,900.21	$ 7,038,097.34	$ 6,192,172.18	53.20%	53.20%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	47.82	-8.24	39.58	40.99		$ 989,338.00	$ 40,552,909.59	$ 6,757,233.57	85.72%	85.72%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	1.80	0.30	1.50	1.50		$ 989,338.00	$ 1,484,007.00	$ 296,801.40	83.33%	83.33%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	3.00			3.00		$ 772,427.21	$ 2,317,281.62	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL BLANCO DE 2 CUERPOS CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA, DESCARGA SENCILLA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, BRIDA, ACOPLE Y VALVULA PLASTICA DE 1/2" PARA REGULACION DE PRESION. CONSUMO DE AGUA DE 4.8 LTS POR DESCARGA, CAPACIDAD MINIMA DE EVACUACION DE SOLIDOS 400 GRAMOS	UN	11.00			11.00		$ 1,117,185.66	$ 12,289,042.29	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, CON DOS PERSIANAS INFERIOR Y SUPERIOR DE 30CM X 60CM. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2			3.84	3.84		$ 798,362.30	$ 3,065,711.25	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	14.00			14.00		$ 404,611.28	$ 5,664,557.91	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M			102.46	102.46		$ 91,590.40	$ 9,384,352.28	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M			1.65	1.65		$ 78,726.73	$ 129,899.11	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M			24.00	24.00		$ 51,125.49	$ 1,227,011.85	$ -	100.00%	100.00%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1-1/2 "	UN	11.00			11.00		$ 18,869.86	$ 207,568.48	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1/2"	UN	28.00			28.00		$ 4,998.42	$ 139,955.63	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	14.00			14.00		$ 63,533.17	$ 889,464.33	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	14.00			14.00		$ 63,533.17	$ 889,464.33	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	7.20	0.56	7.76	7.76		$ 123,260.52	$ 956,501.65	$ (69,025.89)	107.78%	107.78%	
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	66.72	216.43	283.15	283.15		$ 20,236.50	$ 5,729,964.98	$ (4,379,785.70)	424.39%	424.39%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN			24.00	24.00		$ 33,569.66	$ 805,671.73	$ -	100.00%	100.00%	
PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	-		22.64	22.64		$ 32,026.28	$ 725,075.09	$ (725,075.09)	100.00%	100.00%	
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M			122.00	122.00		$ 32,026.28	$ 3,907,206.76	$ -	100.00%	100.00%	
PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN).	M2	176.38			176.38		$ 6,610.59	$ 1,165,975.86	$ -	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1,201.02			1,201.02		$ 4,663.84	$ 5,601,363.56	$ -	100.00%	100.00%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. FABIO SIMONELLI	**$ 245,187,661.00**				
CPF	**1918**	**IED**			**Estrella del Sur Sede B**			**SEMANA 46**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	557.28	20.48	577.76	577.76		$ 4,233.48	$ 2,445,932.98	$ (86,702.00)	103.67%	103.67%	
CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2").	M	88.20	-88.20	0.00	-		$ 154,730.98	$ -	$ (13,647,272.19)	0.00%	0.00%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	54.17			33.24		$ 33,174.37	$ 1,102,716.03	$ 694,339.54	61.36%	61.36%	
DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	95.99	-32.70	63.29	63.29		$ 29,391.49	$ 1,860,302.19	$ 960,987.18	65.94%	65.94%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	28.37					$ 707,267.02	$ -	$ 20,065,165.47	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON DOBLE ANTI MACHUCON, REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	25.81	6.00	31.81	35.81		$ 829,259.39	$ 29,695,861.74	$ (8,292,676.84)	138.75%	138.75%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1.43			1.43		$ 798,362.30	$ 1,145,011.22	$ (3,353.12)	100.29%	100.29%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO, CUERPOS FIJOS, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A DISEÑO SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	87.25			69.15		$ 467,649.33	$ 32,338,268.71	$ 8,464,135.19	79.26%	79.26%	

ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM	M	141.20			141.20		$ 9,408.62	$ 1,328,459.99	$ 37.63	100.00%	100.00%	
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	141.20			148.20		$ 22,829.47	$ 3,383,236.17	$ (159,714.97)	104.95%	104.95%	
PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M	141.20			148.20		$ 17,207.77	$ 2,550,122.76	$ (120,385.56)	104.95%	104.95%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	577.76			597.76		$ 4,663.84	$ 2,787,856.22	$ (93,276.77)	103.46%	103.46%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ESTRELLA DEL SUR - B	**$ 78,637,768.00**				
CPF	**1974**	**IED**			**CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)**			**SEMANA 46**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	538.32	-88.32	450.00	450.00		$ 4,233.48	$ 1,905,064.11	$ 373,901.00	83.59%	83.59%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5"anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	78.28	11.72	90.00	95.00		$ 31,137.23	$ 2,958,036.66	$ (520,614.00)	121.36%	121.36%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	538.32					$ 3,248.63	$ -	$ 1,748,804.00	0.00%	0.00%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	12.00	(1.00)	11.00	11.00		$ 7,469.97	$ 82,169.63	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M			5.00	5.00		$ 23,315.15	$ 116,575.73	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 2N°10 (F) + 1N°12 (T) AWG THHN	M			20.00	20.00		$ 20,790.98	$ 415,819.60	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES 50W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	1.00			1.00		$ 101,214.88	$ 101,214.88	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	M2	538.82	-134.52	404.30	408.30		$ 36,752.18	$ 15,005,915.99	$ 4,796,895.00	75.78%	75.78%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	1841.40	-941.87	899.53	902.53		$ 23,042.63	$ 20,796,663.05	$ 21,634,032.15	49.01%	49.01%	
CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	44.00			46.69		$ 130,345.99	$ 6,086,241.01	$ (351,017.24)	106.12%	106.12%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	633.15			632.63		$ 4,663.84	$ 2,950,473.25	$ 2,436.22	99.92%	99.92%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUAYA METÁLICA PARA CERCHA METÁLICA	M2	30.00			30.00		$ 37,696.55	$ 1,130,896.57	$ -	100.00%	100.00%	
FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2			87.00	87.00		$ 106,267.26	$ 9,245,251.44	$ (9,245,251.44)	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	KG	538.31	-538.31	0.00	-		$ 264,771.67	$ -	$ 142,529,236.49	0.00%	0.00%	

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 50 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR 50 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 24 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA LOS METROS CUADRADOS RALMENTE INSTALADOS)	KG	0.00	0.00	410.94	410.94		$ 306,692.25	$ 126,032,114.08	$ (126,032,114.08)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
						SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. CALASANZ BUENA VISTA		**$ 186,826,436.00**				
CPF	**546**	**IED**			**SANTA LIBRADA (IED)**			**SEMANA 46**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	557.28			557.28		$ 4,233.48	$ 2,359,231.39	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5"anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	128.18	-78.18	50.00	50.00		$ 31,110.25	$ 1,555,512.30	$ 2,432,199.03	39.01%	39.01%	
CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	65.03	-39.70	25.33	25.33		$ 15,633.37	$ 395,993.28	$ 620,644.82	38.95%	38.95%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	67.90		0.80	0.80		$ 32,594.26	$ 26,075.40	$ 2,187,074.58	1.18%	1.18%	
PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	27.20			13.34		$ 21,844.63	$ 291,407.33	$ 302,766.53	49.04%	49.04%	
PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	372.13			371.00		$ 13,385.77	$ 4,966,120.74	$ 15,125.92	99.70%	99.70%	
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M			18.00	18.00		$ 22,829.47	$ 410,930.46	$ (410,930.46)	100.00%	100.00%	
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	63.87	28.85	92.72	92.72		$ 34,724.48	$ 3,219,654.24	$ (1,001,801.39)	145.17%	145.17%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2			73.27	73.27		$ 36,752.18	$ 2,692,832.39	$ -	100.00%	100.00%	
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	16.47	(16.47)	-			$ 18,044.21	$ -	$ -	0.00%	0.00%	
DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	194.87			194.87		$ 9,443.70	$ 1,840,293.82	$ 1,840,293.82	100.00%	100.00%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	59.96			59.96		$ 91,988.38	$ 5,515,765.80	$ 5,515,765.80	100.00%	100.00%	
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	100.00	(20.61)	79.39	79.39		$ 53,568.71	$ 4,252,820.18	$ 4,252,820.18	79.39%	79.39%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M	63.33			13.44		$ 91,988.38	$ 1,236,323.87	$ 1,236,323.87	21.22%	21.22%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	281.83	(180.01)	96.22	96.22		$ 45,289.29	$ 4,357,735.20	$ 4,357,735.20	34.14%	34.14%	

RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INLUYE REFUERZO).	M2			12.54	12.54		$ 193,996.53	$ 2,432,716.52	$ 2,432,716.52	100.00%	100.00%	
PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 M (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE}	M2	333.93	-143.06	190.87	190.87		$ 69,679.67	$ 13,299,757.83	$ 13,299,757.83	57.16%	57.16%	
MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	208.04			205.00		$ 25,122.94	$ 5,150,202.74	$ 5,150,202.74	98.54%	98.54%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M			19.35	19.35		$ 91,590.40	$ 1,772,274.22	$ 1,772,274.22	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M			8.10	8.10		$ 78,726.73	$ 637,686.52	$ 637,686.52	100.00%	100.00%	
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M	19.60			13.44		$ 62,023.52	$ 833,596.15	$ 833,596.15	68.57%	68.57%	
Demolición de Materas en concreto o fibrocemento 1.2x1.2x0.3 m y 1x0.7x0.7 m	M	48.00			44.00		$ 16,863.75	$ 742,005.00	$ 742,005.00	91.67%	91.67%	
TRATAMIENTO DE PISOS EN LADRILLO O ADOQUIN: LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS y REEMBOQUILLADO DE JUNTAS, (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN,	M	110.00	69.08	179.08	179.08		$ 16,863.75	$ 3,019,960.35	$ 3,019,960.35	162.80%	162.80%	#####
JUNTA DE DILATACIÓN INDUCIDA PISO EN CONCRETO ALLANADO (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, MARCACIÓN DE DILATACIONES Y SELLADO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN).	M	356.60	-300.35	56.25	59.92		$ 34,369.67	$ 2,059,599.55	$ 2,059,599.55	16.80%	16.80%	
CANAL EN PVC AMAZONAS O EQUIVALENTE, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	6.00	(6.00)	-	-		$ 68,114.71	$ -	$ -	0.00%	0.00%	
DOMO EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 5 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	7.20	-1.32	5.88	5.88		$ 157,817.72	$ 927,968.18	$ 927,968.18	81.67%	81.67%	
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	67.71			67.71		$ 5,565.04	$ 376,808.69	$ 376,808.69	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CERCHA PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 4.5 KG/M	M	6.00	-0.12	5.88	5.88		$ 101,978.47	$ 599,633.40	$ 599,633.40	98.00%	98.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M			20.20	20.20		$ 305,515.84	$ 6,171,419.91	$ 6,171,419.91	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	335.60	(23.61)	315.08	315.08		$ 361,355.09	$ 113,857,372.13	$ 113,857,372.13	93.89%	93.89%	
PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2			96.73	96.73		$ 65,757.83	$ 6,360,755.11	$ 6,360,755.11	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	M2			190.00	190.00		$ 11,730.42	$ 2,228,757.19	$ 2,228,757.19	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN			8.00	8.00		$ 33,502.20	$ 268,017.60	$ 268,017.60	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TIERRA NEGRA ABONADA, INCLUYE CONFORMACIÓN DE TERRENO Y COMPACTACIÓN MANUAL DE TIERRA.	M3			37.42	37.42		$ 258,201.55	$ 9,661,902.03	$ 9,661,902.03	100.00%	100.00%	
SUMNINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN EN PASTO KIKUYO	M2			190.84	200.84		$ 29,001.60	$ 5,824,681.89	$ 5,824,681.89	105.24%	105.24%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ZANJA DE 0.3 X 0.3 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000, GRAVA 3/4" Y PASES PVC LONGITUD MAX 0.3 M CADA 3 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	130.00			130.00		$ 89,213.28	$ 11,597,727.02	$ 11,597,727.02	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	617.33			617.33	30.87	$ 4,663.84	$ 2,879,127.54	$ 2,879,127.54	100.00%	100.00%	
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. SANTA LIBRADA							**$ 223,822,666.00**				

CPF	1917	IED			ESTRELLA DEL SUR (IED) A			SEMANA 46				
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	20.56			20.56		$ 4,233.48	$ 87,040.26	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	40.30	-31.81	8.49	8.49		$ 31,110.25	$ 264,138.88	$ 989,604.00	21.07%	21.07%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19.52	-2.22	17.30	17.30		$ 32,594.26	$ 563,880.63	$ 72,359.00	88.63%	88.63%	
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19.52	-5.96	13.56	13.56		$ 22,300.62	$ 302,396.45	$ 132,912.00	69.47%	69.47%	
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	40.65	(2.49)	38.16	38.16		$ 12,649.16	$ 482,692.01	$ 31,496.00	93.87%	93.87%	
DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19.52	-4.52	15.00	15.00		$ 20,708.69	$ 310,630.28	$ 93,603.00	76.84%	76.84%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	11.36	-5.02	6.34	6.34		$ 33,174.37	$ 210,325.50	$ 166,535.00	55.81%	55.81%	
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	15.00			15.00		$ 27,281.50	$ 409,222.50	$ -	100.00%	100.00%	
SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	15.00			15.00		$ 182,479.27	$ 2,737,188.99	$ -	100.00%	100.00%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	19.52			19.52		$ 42,650.45	$ 832,536.73	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	19.52	(1.99)	17.53	17.53		$ 126,224.49	$ 2,212,715.38	$ 251,187.00	89.81%	89.81%	
MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2	0.80			0.80		$ 67,218.91	$ 53,775.13	$ -	100.00%	100.00%	
WIN DE ALUMINIO	M	3.00			3.00		$ 15,372.99	$ 46,118.98	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	44.84			40.81		$ 116,158.86	$ 4,740,210.72	$ 468,353.00	91.01%	91.01%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	2.00			2.00		$ 41,130.01	$ 82,260.02	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	5.20			5.20		$ 707,267.02	$ 3,677,788.50	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	2.16	0.12	2.28	2.38		$ 1,127,967.67	$ 2,680,941.73	$ (244,532.00)	110.04%	110.04%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	7.00	1.00	8.00	8.00		$ 873,470.75	$ 6,987,765.98	$ (873,471.00)	114.29%	114.29%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2.00			2.00		$ 616,820.66	$ 1,233,641.32	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	5.00			5.00		$ 404,611.28	$ 2,023,056.40	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	2.00			2.00		$ 41,130.01	$ 82,260.02	$ -	100.00%	100.00%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	28.82	12.82	41.64	42.64		$ 989,338.20	$ 42,185,380.90	$ (13,672,654.00)	147.95%	147.95%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	1.80	(0.80)	1.00	1.00		$ 989,338.20	$ 989,338.20	$ 791,471.00	55.56%	55.56%	
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	44.84			40.81		$ 36,193.65	$ 1,476,990.67	$ 145,933.00	91.01%	91.01%	
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	35.50			35.10		$ 21,599.09	$ 758,128.09	$ 8,640.00	98.87%	98.87%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	2.16			2.16		$ 123,260.52	$ 266,242.73	$ -	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	111.32			100.19		$ 4,663.84	$ 467,270.00	$ 51,909.00	90.00%	90.00%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ESTRELLA DEL SUR - A	**$ 76,163,937.00**				
CPF	**1959**	**IED**			**GUILLERMO CANO ISAZA (IED)**			**SEMANA 46**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	125.48			125.48		$ 4,233.48	$ 531,216.54	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	68.00			32.20		$ 31,110.25	$ 1,001,749.92	$ 1,113,747.00	47.35%	47.35%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	129.54	18.57	148.11	148.11		$ 32,594.26	$ 4,827,535.26	$ (605,275.00)	114.34%	114.34%	
DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	150.00			150.00		$ 11,376.96	$ 1,706,544.05	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	40.00			40.00		$ 7,469.97	$ 298,798.67	$ -	100.00%	100.00%	
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	100.00			100.00		$ 18,687.73	$ 1,868,773.32	$ -	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	95.87	17.32	113.19	113.19		$ 22,300.62	$ 2,524,207.52	$ (386,247.00)	118.07%	118.07%	
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	364.26	(31.38)	332.88	364.26		$ 12,649.16	$ 4,607,583.60	$ -	100.00%	100.00%	
MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2	7.20	3.16	10.36	10.20		$ 65,869.81	$ 671,872.04	$ (197,609.00)	141.67%	141.67%	
DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND	22.00	37.00	59.00	37.00		$ 20,708.69	$ 766,221.35	$ (310,630.00)	168.18%	168.18%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	26.61			26.11		$ 33,174.37	$ 866,182.77	$ 16,587.00	98.12%	98.12%	
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	78.00			53.00		$ 27,281.50	$ 1,445,919.51	$ 682,038.00	67.95%	67.95%	
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M			15.00	15.00		$ 20,708.69	$ 310,630.28	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M			19.00	19.00		$ 11,967.87	$ 227,389.46	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN			16.00	16.00		$ 7,469.97	$ 119,519.47	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M			58.00	58.00		$ 4,391.32	$ 254,696.59	$ -	100.00%	100.00%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	35.00	118.18	153.18	153.18		$ 61,099.39	$ 9,359,204.54	$ (7,220,726.00)	437.66%	437.66%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	129.54	30.05	159.59	159.59		$ 126,224.49	$ 20,144,167.03	$ (3,793,046.00)	123.20%	123.20%	
WIN DE ALUMINIO	M	30.00	52.83	82.83	55.00		$ 15,372.99	$ 845,514.70	$ (384,325.00)	183.33%	183.33%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISIÓN POR MÓDULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM	M	7.20	16.32	23.52	23.52		$ 1,128,300.90	$ 26,537,637.11	$ (18,413,871.00)	326.67%	326.67%	
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	364.26			364.26		$ 36,193.65	$ 13,183,900.70	$ -	100.00%	100.00%	
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	119.96	(45.93)	74.03	68.55		$ 21,599.09	$ 1,480,617.69	$ 1,110,409.00	57.14%	57.14%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	135.38			135.38		$ 989,338.20	$ 133,939,109.55	$ (2,504.00)	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1-1/2 "	UN	37.00			37.00		$ 18,869.86	$ 698,184.88	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	37.00			37.00		$ 63,533.17	$ 2,350,727.15	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	22.00	7.00	29.00	29.00		$ 63,533.17	$ 1,842,461.82	$ (444,732.00)	131.82%	131.82%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	UN	37.00			37.00		$ 181,838.44	$ 6,728,022.41	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN	38.00			38.00		$ 97,295.74	$ 3,697,238.23	$ -	100.00%	100.00%	
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	22.00			22.00		$ 5,565.04	$ 122,430.83	$ -	100.00%	100.00%	
ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE EN CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	74.03	-30.18	43.85	43.85		$ 13,044.45	$ 571,999.04	$ 393,681.00	59.23%	59.23%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	20.88			20.88		$ 123,260.52	$ 2,573,679.69	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN			13.00	6.00		$ 192,677.11	$ 1,156,062.68	$ (1,156,063.00)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	3.00			3.00		$ 572,567.48	$ 1,717,702.45	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	50.00	56.00	106.00	90.00		$ 23,315.15	$ 2,098,363.16	$ (932,606.00)	180.00%	180.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	50.00	56.00	106.00	90.00		$ 20,790.98	$ 1,871,188.21	$ (831,639.00)	180.00%	180.00%	
PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	36.90			36.90		$ 21,844.63	$ 806,066.74	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	32.00			34.00		$ 180,330.15	$ 6,131,225.09	$ (360,660.00)	106.25%	106.25%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	24.00			24.00		$ 198,607.76	$ 4,766,586.16	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	20.00			8.00		$ 180,330.15	$ 1,442,641.20	$ 2,163,962.00	40.00%	40.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	5.40	0.60	6.00	5.00		$ 989,338.20	$ 4,946,691.01	$ 395,735.00	92.59%	92.59%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	12.00			10.00		$ 772,427.21	$ 7,724,272.05	$ 1,544,854.00	83.33%	83.33%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	12.00			5.00		$ 41,130.01	$ 205,650.06	$ 287,910.00	41.67%	41.67%	


SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL BLANCO DE 2 CUERPOS CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA, DESCARGA SENCILLA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, BRIDA, ACOPLE Y VALVULA PLASTICA DE 1/2 PARA REGULACION DE PRESION. CONSUMO DE AGUA DE 4.8 LTS POR DESCARGA, CAPACIDAD MINIMA DE EVACUACION DE SOLIDOS 400 GRAMOS	UN	45.00	-8.00	37.00	37.00		$ 1,117,185.66	$ 41,335,869.52	$ 8,937,485.00	82.22%	82.22%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	m2	364.26	(24.03)	340.23	340.23		$ 98,222.57	$ 33,418,266.56	$ 2,360,288.00	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	m2	205.61			139.29		$ 4,663.84	$ 649,626.09	$ 309,306.00	67.74%	67.74%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. GUILLERMO CANO ISAZA	**$ 354,373,946.66**				
CPF	**548**	**IED**			**TENERIFE - GRANADA SUR (IED)**			**SEMANA 46**				**Observ**
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	193.00	41.34	234.34	234.34		$ 4,233.48	$ 992,072.72	$ (175,012.00)	121.42%	121.42%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	39.00			26.00		$ 31,110.25	$ 808,866.40	$ 404,433.00	66.67%	66.67%	
TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	24.83	65.79	90.62	90.62		$ 38,696.24	$ 3,506,652.84	$ (2,545,825.00)	364.96%	364.96%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	44.28	25.88	70.16	55.16		$ 361,355.09	$ 19,932,346.54	$ (3,931,543.00)	124.57%	124.57%	
PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	44.28	25.88	70.16	70.16		$ 65,757.83	$ 4,613,569.51	$ (1,701,813.00)	158.45%	158.45%	
PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	412.00	(366.94)	45.06	45.06		$ 32,026.28	$ 1,443,104.40	$ 11,751,725.00	10.94%	10.94%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA DE 1-1/4" PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR CON SOPORTES PLÁSTICO. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS	M	43.00	-7.64	35.36	30.36		$ 190,851.78	$ 5,794,260.06	$ 2,412,367.00	70.60%	70.60%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA, EL TUBO PASAMANOS DE 2" CALIBRE 18 AL IGUAL QUE LOS TUBOS PEDESTALES CON PLATINA DE FIJACIÓN Y TRAVESAÑOS VERTICALES EN TUBERÍA DE 3/4" CON SEPARACIÓN CADA 9CM, PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS.	M	5.50	(0.80)	4.70	4.70		$ 1,120,163.13	$ 5,264,766.69	$ 896,131.00	85.45%	85.45%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	964.27	(570.86)	393.41	393.41		$ 4,663.84	$ 1,834,783.56	$ 2,662,416.00	40.80%	40.80%	
SUMINISTRO E INSTALACION MEMBRANA PVC PLASTIFICADO SIKAPLAN 15 PR O SIMILAR	M3	150.00	(15.20)	134.80	116.77		$ 383,249.63	$ 44,750,287.29	$ 12,737,157.00	77.84%	77.84%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. TENERIFE GRANADA SUR	**$ 88,940,710.00**				
CPF	**545**	**IED**	**CIUDAD DE VILLAVICENCIO (IED)**					**SEMANA 46**				**Observ**
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	540.76			540.76		$ 4,233.48	$ 2,289,294.37	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M)	M	35.00			35.00		$ 31,110.25	$ 1,088,858.61	$ -	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	107.30		-	307.00		$ 69,099.55	$ 21,213,562.74	$ (13,799,181.00)	286.11%	286.11%	
DEMOLICION DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.06 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	361.42			361.42		$ 69,099.55	$ 24,973,960.41	$ -	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN Y/O DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE COMPUESTO POR MALLA ESLABONADA, ANTEPECHO EN LADRILLO, VIGA DE CIMENTACIÓN Y COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO	M2	120.00			120.00		$ 108,358.36	$ 13,003,003.55	$ -	100.00%	100.00%	


EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	37.24			36.65		$ 91,988.38	$ 3,371,374.26	$ 54,273.00	98.42%	98.42%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	22.04			32.04		$ 176,060.25	$ 5,640,970.35	$ (1,760,602.00)	145.37%	145.37%	
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	9.00	(1.00)	8.00	8.00		$ 875,947.70	$ 7,007,581.56	$ 875,948.00	88.89%	88.89%	
CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI ANCHO 0.50 M E= 0.07 M (NO INCLUYE REFUERZO)	M	50.40			50.40		$ 164,788.00	$ 8,305,315.20	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL REFORZADO EN MALLA PREONDULADA CALIBRE 8 HUECO 2", ÁNGULO 1" X 1/8" PISA MALLA EN ÁNGULO DE 3/4" X 1/4", PARALES DE 2 1/2" X 2 1/2" EN 3 MM CON SUJETADORES DE VARILLA DE 5/8" Y REFUERZOS DIAGONALES EN PLATINA DE 1-1/2"* 1/8" (INCLUYE TODOS LOS INSUMOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE)	M2	120.00			120.00		$ 503,048.36	$ 60,365,803.28	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CÁRCAMO EN CONCRETO (25 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR.	M	9.00	1.50	10.50	12.50		$ 320,598.77	$ 4,007,484.69	$ (1,122,096.00)	138.89%	138.89%	
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	m3	94.84			93.39		$ 34,724.48	$ 3,242,919.64	$ 50,351.00	98.47%	98.47%	
RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INLUYE REFUERZO).	M2	6.30			6.30		$ 193,997.00	$ 1,222,181.10	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ZANJA DE 0.3 X 0.3 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000, GRAVA 3/4" Y PASES PVC LONGITUD MAX 0.3 M CADA 3 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	54.00			57.40		$ 89,213.28	$ 5,120,842.55	$ (303,325.00)	106.30%	106.30%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	M2	25.00			25.00		$ 11,730.42	$ 293,260.61	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	45.00	20.35	65.35	85.35		$ 91,590.40	$ 7,817,240.55	$ (3,695,673.00)	189.67%	189.67%	
ZAPATA EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	1.92			1.92		$ 1,023,205.00	$ 1,964,553.60	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	767.00	75.00	842.00	842.00		$ 7,103.01	$ 5,980,735.68	$ (532,726.00)	109.78%	109.78%	
DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE COMPUESTO POR MALLA ESLABONADA Y PARAL EN PERFIL DE ACERO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2			116.85	136.85		$ 62,810.05	$ 8,595,555.16	$ (1,256,201.00)	117.12%	117.12%	
PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2	373.66		405.33	405.33		$ 115,264.41	$ 46,720,121.60	$ (3,650,424.00)	108.48%	108.48%	
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	224.08		120.00	85.00		$ 21,599.09	$ 1,835,922.74	$ 3,004,002.00	70.83%	70.83%	
PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M	36.48		207.47	207.47		$ 17,208.00	$ 3,570,143.76	$ (2,942,396.00)	100.00%	100.00%	
SUMNINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO 50 MM FILTRO UV. INCLUYE RELLENO EN CAUCHO GRANULAR.	M2	26.70			26.70	26.70	$ 274,938.00	$ 7,340,844.60	$ -	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO HETEROGENEO ALTO TRÁFICO	M2	36.69			36.69	36.69	$ 237,210.00	$ 8,703,234.90	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 3 CM PARA EXTERIORES	M2	116.34			61.49	61.49	$ 575,981.00	$ 35,417,071.69	$ 31,592,558.00	52.85%	52.85%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA, PERFILES ESTUCTURALES DE ACERO GALVANIZADO PGU, MONTANTES, TORNILLOS PARA ESTRUCTURA CLAVO IMPACTADO ACABADO A DOS	M2	31.60			12.48	12.48	$ 222,048.00	$ 2,771,159.04	$ 4,245,558.00	39.49%	39.49%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS - BARANDA PERIMETRAL EN PLATINAS + TUBULARES METÁLICOS H= 1.20 M. PLATINA SUPERIOR E INFERIOR A= 2 1/2" + TUBOS VERTICALES REDONDOS Ø3/4" CADA 0 CM	M	3.86			3.20	3.20	$ 753,890.00	$ 2,412,448.00	$ 497,567.00	82.90%	82.90%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 6" INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE RELLENO)	M	68.00			68.00		$ 141,729.70	$ 9,637,619.63	$ -	100.00%	100.00%	
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. TENERIFE GRANADA SUR							**$ 303,913,063.89**				

PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA	**98.31%**
ACUMULADO EJECUTADO A LA FECHA $	**2,633,400,628.55**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $	**2,678,619,155.00**


AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS POR SEDE - Septiembre 27 2026						
SEDE EDUCATIVA	PROGRAMADO ACUMULADO		EJECUTADO ACUMULADO		TOTAL POR SEDE	% DE ADELANTO O ATRASO
ORLANDO FALS BORDA	$ 156,929,148.00	100.00%	$ 156,929,147.99	100.00%	$ 156,929,148.00	ENTREGADO
UNION EUROPEA	$ 169,766,274.00	100.00%	$ 169,766,274.00	100.00%	$ 169,766,274.00	ENTREGADO
SIERRA MORENA	$ 118,699,548.00	100.00%	$ 118,699,548.00	100.00%	$ 118,699,548.00	ENTREGADO
FABIO LOZANO	$ 245,187,661.00	100.00%	$ 245,187,661.00	100.00%	$ 245,187,661.00	ENTREGADO
ARBORIZADORA BAJA	$ 630,139,470.00	100.00%	$ 630,139,470.00	100.00%	$ 630,139,470.00	ENTREGADO
BUENAVISTA	$ 186,826,436.00	100.00%	$ 186,826,436.00	100.00%	$ 186,826,436.00	ENTREGADO
ESTRELLA DEL SUR - B	$ 78,637,768.00	100.00%	$ 78,637,768.00	100.00%	$ 78,637,768.00	ENTREGADO
SANTA LIBRADA	$ 223,822,666.00	100.00%	$ 223,822,666.00	100.00%	$ 223,822,666.00	0.00%
ESTRELLA DEL SUR - A	$ 76,163,937.00	100.00%	$ 76,163,937.00	100.00%	$ 76,163,937.00	ENTREGADO
TENERIFE GRANADA SUR SEDE A	$ 88,940,710.00	100.00%	$ 88,940,710.00	100.00%	$ 88,940,710.00	ENTREGADO
GUILLERMO CANO ISAZA SEDE A	$ 354,505,537.00	100.00%	$ 354,373,946.66	99.96%	$ 354,505,537.00	-0.04%
CIUDAD DE VILLAVICENCIO	$ 319,555,555.56	91.56%	$ 303,913,063.89	87.08%	$ 349,000,000.00	-4.48%
TOTALES	$ 2,649,174,710.56	98.90%	$ 2,633,400,628.55	98.31%	$ 2,678,619,155.00	-0.59%

OBSERVACIONES: Al final de este periodo, como aparece consignado en la tabla anterior, encontramos que en la ***IED Guillermo Cano Isaza,*** igual que en el periodo anterior se encuentra practicamente nivelada la ejecución con la programación, mientras que la ***IED Ciudad de Villavicencio*** presenta un atraso por encima del 4%. El contrato en general presenta un atraso inferior al 1%.

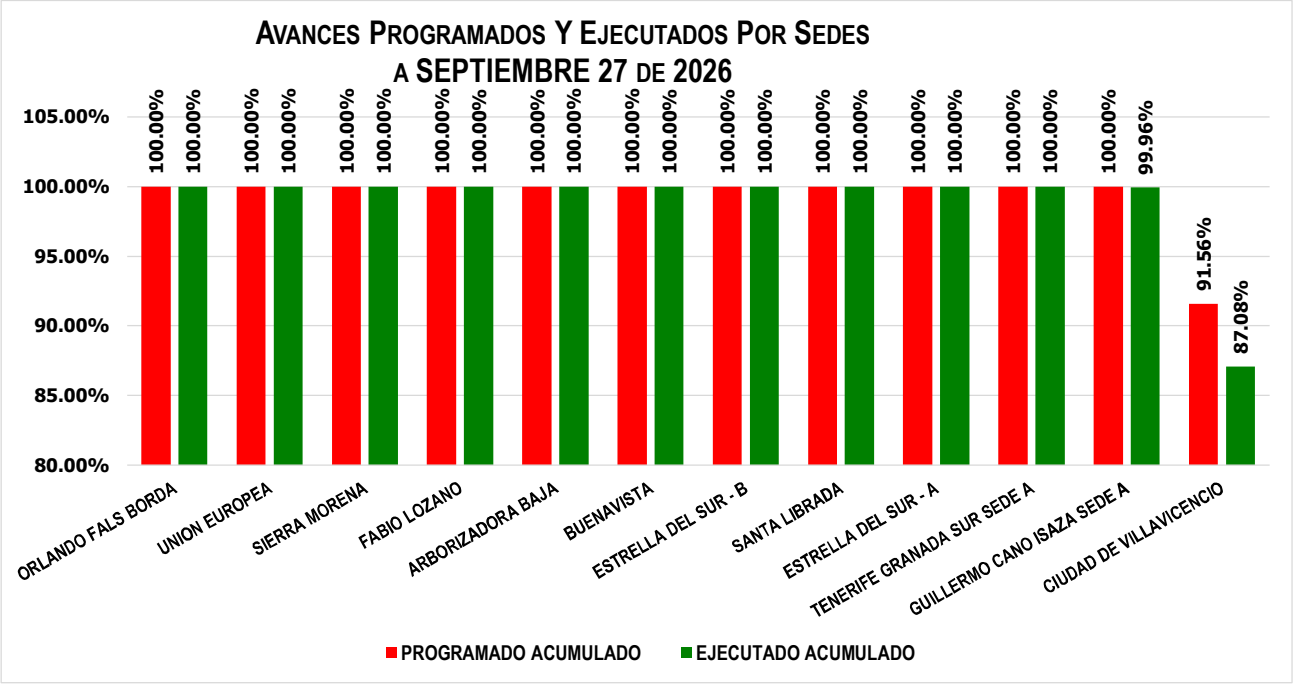

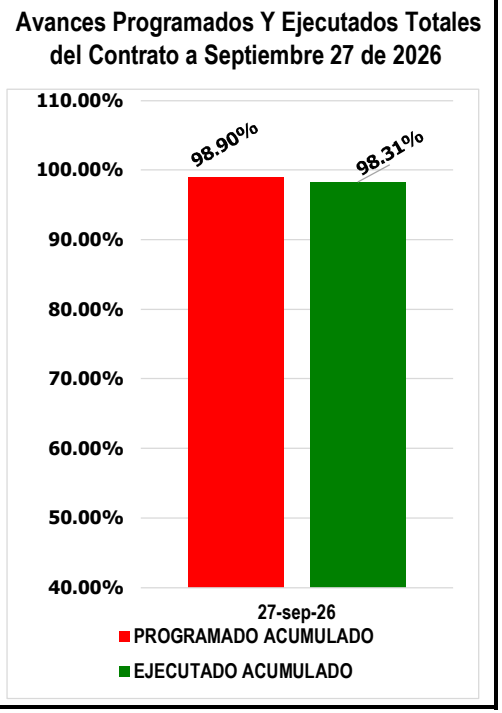

AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS TOTALES - Septiembre 27 2026

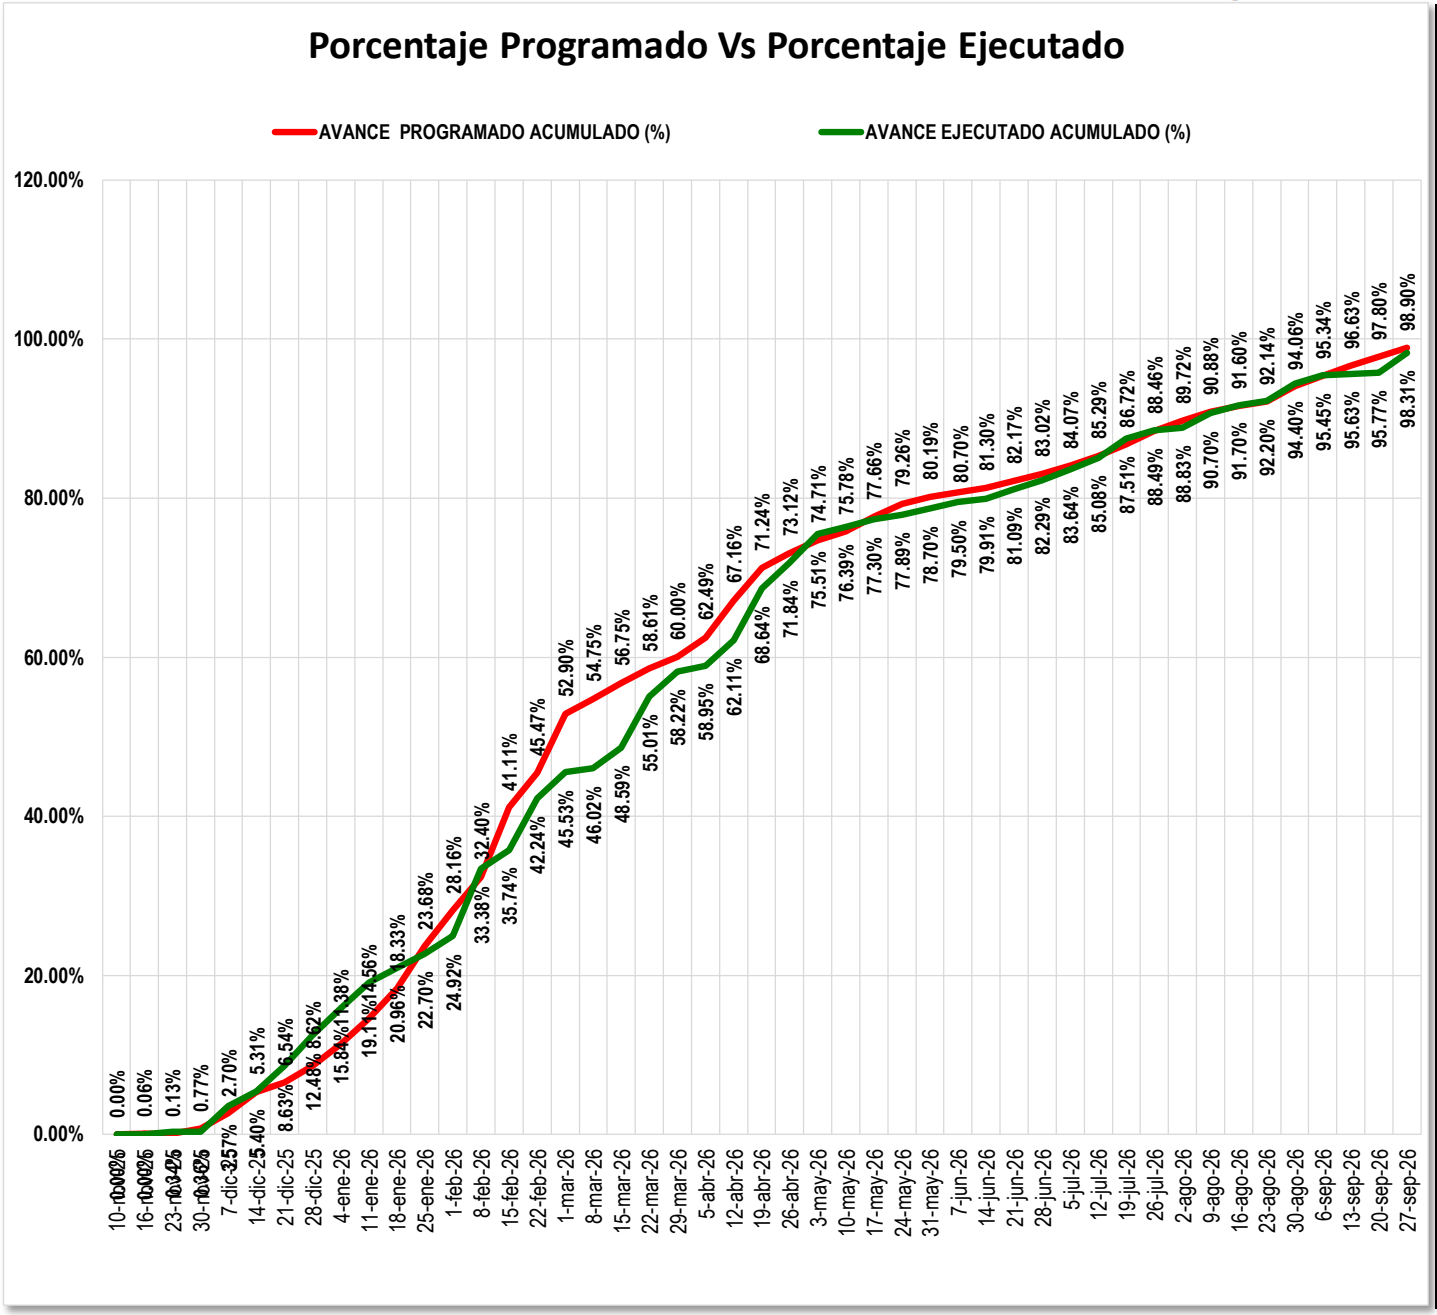

FECHA	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (%)	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO (%)
10-nov-25	0.00%	0.00%
16-nov-25	0.06%	0.00%
23-nov-25	0.13%	0.34%
30-nov-25	0.77%	0.36%
7-dic-25	2.70%	3.57%
14-dic-25	5.31%	5.40%
21-dic-25	6.54%	8.63%
28-dic-25	8.62%	12.48%
4-ene-26	11.38%	15.84%
11-ene-26	14.56%	19.11%
18-ene-26	18.33%	20.96%
25-ene-26	23.68%	22.70%
1-feb-26	28.16%	24.92%
8-feb-26	32.40%	33.38%
15-feb-26	41.11%	35.74%
22-feb-26	45.47%	42.24%
1-mar-26	52.90%	45.53%
8-mar-26	54.75%	46.02%
15-mar-26	56.75%	48.59%
22-mar-26	58.61%	55.01%
29-mar-26	60.00%	58.22%
5-abr-26	62.49%	58.95%
12-abr-26	67.16%	62.11%
19-abr-26	71.24%	68.64%
26-abr-26	73.12%	71.84%
3-may-26	74.71%	75.51%
10-may-26	75.78%	76.39%
17-may-26	77.66%	77.30%
24-may-26	79.26%	77.89%
31-may-26	80.19%	78.70%
7-jun-26	80.70%	79.50%
14-jun-26	81.30%	79.91%
21-jun-26	82.17%	81.09%
28-jun-26	83.02%	82.29%
5-jul-26	84.07%	83.64%
12-jul-26	85.29%	85.08%
19-jul-26	86.72%	87.51%
26-jul-26	88.46%	88.49%
2-ago-26	89.72%	88.83%
9-ago-26	90.88%	90.70%
16-ago-26	91.60%	91.70%
23-ago-26	92.14%	92.20%
30-ago-26	94.06%	94.40%
6-sep-26	95.34%	95.45%
13-sep-26	96.63%	95.63%
20-sep-26	97.80%	95.77%
27-sep-26	**98.90%**	**98.31%**
30-sep-26	100.00%	0.00%

FECHA: 4/10/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS		INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES 87 Dias ESTADO GENERAL DEL PROYECTO			GRUPO 2

CORTE DEL INFORME:	CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO PAIS	
4 de octubre de 2026	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

FECHAS			PLAZOS EN DIAS			VALOR CONTRATO		
DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8169110	CO1.PCCNTR.8154780	INICIAL	211	211	INICIAL	$ 796,184,131.00	$ 2,332,049,023.00
INICIO	6 de octubre de 2025	6 de octubre de 2025	SUSPENSIONES			ADICIONES	$ 422,997,175.00	$ 1,085,001,422.00
TERMINACION INICIAL	5 de mayo de 2026	5 de mayo de 2026	PRORROGAS	239	239	TOTAL	$ 1,219,181,306.00	$ 3,417,050,445.00
TERMINACION FINAL	30 de diciembre de 2026	30 de diciembre de 2026	TOTAL	450	450			

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1	23-dic-25	$ 128,425,720.00	46	
2	5-jun-26	$ 162,875,214.00	107	
3	2-oct-26	$ 131,696,241.00	86	
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA	OTRO ASPECTO
1	22-dic-25	$ 785,001,422.00	46	
2	27-may-26		102	
3	28-sep-26	$ 300,000,000.00	91	
4				

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA — GARANTE: SEGUROS MUNDIAL

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	CALIDAD DEL SERVICIO DESDE	CALIDAD DEL SERVICIO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA
BCH-100046043	6 10 2025	20 12 2026	20 6 2026	20 6 2031	6 10 2025	20 6 2029

POLIZAS CONTRATO DE OBRA — SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA HASTA	POLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE	RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA
39-44-101175397	6 10 2025	27 2 2027	6 10 2025	28 6 2029	5 5 2026	5 5 2028	39-40-101045911	6 10 2025	23 6 2026

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (04/10/2026)		PROGR %	EJECUTADO VS PROG	Vlr FRENTE APROBADO	Vlr FRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA	oct-2025	nov-2025	nov-2025	dic-2025	dic-2025	ene-2026	ene-2026	feb-2026	feb-2026	mar-2026	mar-2026	abr-2026	abr-2026	may-2026	jun-2026	jul-2026	ago-2026	sep-2026	oct-2026	nov-2026	dic-2026
581	ORLANDO FALS BORDA (IED)	USME	A	Barranquillita Nuevo	100.00%	100.00%		100.00%		$ 156,929,148.00	$ 156,929,147.99	10/11/2025	28/02/2026																					
1930	UNION EUROPEA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	B	Maria Cano	100.00%	100.00%		100.00%		$ 169,766,274.00	$ 169,766,274.00	18/11/2025	21/02/2026																					
1913	SIERRA MORENA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	C	Divino Niño	100.00%	100.00%		100.00%		$ 118,699,548.00	$ 118,699,548.00	10/11/2025	18/04/2026																					
523	FABIO LOZANO SIMONELLI (IED)	USME	A	Fabio Lozano Simonelli	100.00%	100.00%		100.00%		$ 245,187,661.00	$ 245,187,661.00	1/12/2025	11/04/2026																					
1904	ARBORIZADORA BAJA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Arborizadora Baja	100.00%	100.00%		100.00%		$ 630,139,470.00	$ 630,139,470.00	24/11/2025	28/02/2026																					
1974	CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Buenavista (Calasanz)	100.00%	100.00%		100.00%		$ 186,826,436.00	$ 186,826,436.00	10/12/2025	21/03/2026																					
1918	ESTRELLA DEL SUR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	B	Estrella II	100.00%	100.00%		100.00%		$ 78,637,768.00	$ 78,637,768.00	1/12/2025	14/03/2026																					
546	SANTA LIBRADA (IED)	USME	A	Santa Librada	100.00%	100.00%		100.00%		$ 223,822,666.00	$ 223,822,666.00	15/01/2026	2/05/2026																					
1917	ESTRELLA DEL SUR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Estrella I	100.00%	100.00%		100.00%		$ 76,163,937.00	$ 76,163,937.00	15/01/2026	28/02/2026																					
548	TENERIFE - GRANADA SUR (IED)	.USME	A	Tenerife	100.00%	100.00%		100.00%		$ 88,940,710.00	$ 88,940,710.00	9/03/2026	7/06/2026																					
1959	GUILLERMO CANO ISAZA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Guillermo Cano Isaza	99.96%	99.96%		100.00%		$ 354,505,537.00	$ 354,373,946.66	13/01/2026	19/06/2026																					
545	CIUDAD DE VILLAVICENCIO (IED)	USME	C	Puerta al Llano	67.56%	93.20%		100.00%		$ 349,000,000.00	$ 325,265,295.61	3/06/2026	30/09/2026																					
1943	RAFAEL URIBE URIBE (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Rafael Uribe Uribe	0.00%	0.90%		0.43%		$ 170,000,000.00	$ 1,525,771.39	1/10/2026	30/12/2026																					
561	LOS COMUNEROS - OSWALDO GUAYAZAMIN (IED)	USME	B	Virrey Ultima Etapa (Oswaldo Guayasamín)	0.00%	1.33%		0.73%		$ 130,000,000.00	$ 1,728,661.77	1/10/2026	30/12/2026																					
TOTAL FRENTES DE OBRA						89.24%		89.99%		$ 2,978,619,155.00	$ 2,658,807,293.44																							
EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO																																
590	DIRECCION LOCAL DE EDUCACION DE USME	USME	D L E	CADEL USME	100.00%	100.00%		100.00%		$ 28,072,878.00	$ 28,072,878.00	26/01/2026	1/03/2026																					
1904	ARBORIZADORA BAJA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Arborizadora Baja	100.00%	100.00%		100.00%		$ 52,071,222.00	$ 52,071,222.00	6/04/2026	14/05/2026																					
1974	CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Buenavista (Calasanz)	100.00%	100.00%		100.00%		$ 63,396,903.00	$ 63,396,903.00	7/04/2026	22/05/2026																					
590	DIRECCION LOCAL DE EDUCACION DE USME	USME	D L E	CADEL USME	100.00%	100.00%		100.00%		$ 2,038,265.00	$ 2,038,265.00	27/07/2026	1/08/2026																					
1974	CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Buenavista (Calasanz)	100.00%	100.00%		100.00%		$ 5,260,774.00	$ 5,260,774.00	22/05/2026	6/06/2026																					
1959	GUILLERMO CANO ISAZA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Guillermo Cano Isaza	100.00%	100.00%		100.00%		$ 11,337,220.00	$ 11,337,220.00	27/05/2026	20/06/2026																					
1980	CUNDINAMARCA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	La Riviera del Sur	100.00%	100.00%		100.00%		$ 18,125,874.00	$ 18,125,874.00	16/06/2026	27/06/2026																					
566	LUIS EDUARDO MORA OSEJO (IED)	USME	A	Nuevo Monteblanco- Eduardo Mora Osejo	100.00%	100.00%		100.00%		$ 70,007,566.00	$ 70,007,566.00	23/06/2026	7/07/2026																					
1974	CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Buenavista (Calasanz)	100.00%	100.00%		100.00%		$ 12,664,106.00	$ 12,664,106.00	22/06/2026	27/06/2026																					
575	EDUARDO UMAÑA MENDOZA (IED)	USME	A	Villa Alemania	52.22%	52.22%		100.00%		$ 85,000,009.00	$ 44,388,990.75	24/08/2026	22/09/2026																					
546	SANTA LIBRADA (IED)	USME	A	Santa Librada	100.00%	100.00%		100.00%		$ 27,347,458.00	$ 27,347,458.00	24/08/2026	16/09/2026																					
567	SAN JOSE DE USME - DON BOSCO 2 (CED)	.USME	A	San José Monteblanco (Don Bosco II)	32.58%	91.80%		100.00%		$ 35,510,091.00	$ 32,598,263.54	21/09/2026	30/09/2026																					
TOTAL FRENTES DE OBRA						89.41%		100.00%		$ 410,832,366.00	$ 367,309,520.29																							

ACUMULADO FRENTES DE OBRA


TERMINADAS	EN EJECUCION	POR INICIAR	TOTAL	VALOR
2	7	0	9	$ 2,658,007,293
ACUMULADO EMERGENCIAS				
10	2	0	12	$ 367,309,520
TOTAL				
12	9	0	21	$ 3,025,316,814
FRENTES POR LOCALIDAD				


RELACION DE PAGOS EFECTUADOS


No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA INTERVENTOR	VALOR	No ACTA INTERVENTOR A	VALOR	No ACTA INTERVENTOR A	VALOR	No ACTA INTERVENTOR	VALOR
1	$ 361,723,907.00	12		1	$ 45,496,236.00	12		23		34	
2	$ 435,348,486.00	13		2	$ 45,496,236.00	13		24		35	
3	$ 781,384,254.00	14		3	$ 141,587,750.94	14		25		36	
4	$ 492,623,060.00	15		4	$ 79,227,162.00	15		26		37	
5	$ 209,434,074.00	16		5	$ 68,288,881.00	16		27		38	
6	$ 151,233,507.00	17		6	$ 265,555,238.00	17		28		39	
7		18		7	$ 174,904,152.00	18		29		40	
8		19		8	$ 121,790,762.00	19		30		TOTAL INTERVENTORIA	
9		20		9		20		31			
10		TOTAL OBRA		10		21		32			
11		$ 2,431,747,288.00		11		22		33		$ 942,346,418	


AVANCE GENERAL

	TECNICO		FINANCIERO	TIEMPO
AVANCE	89.24%		71.17%	80.67%
PROGRAMADO	89.99%			
ATRASO	-0.75%		EN EJECUCION	
FECHA APROBACION CRONOGRAMA				









OBSERVACIONES:

FECHA:	4/10/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	195 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO			
REGISTRO FOTOGRAFICO		SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA			GRUPO 2
		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS			
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
1A 100.00%	ORLANDO FALS BORDA (IED)		 	  	FRENTE AL 100%
2C 100.00%	SIERRA MORENA (IED)	* ADECUACION DE CUARTOS DE BASURA * ACCESIBILIDAD REDUCIDA RAMPAS * PINTURA 4 AULAS	 	 	FRENTE AL 100%

28072879
52071222
63396903
2038265
5260774
11337220
18125874
70007566
24,867,651.00
12664106
76,878,564.00

FECHA: 4/10/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES: 196 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO 2
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
3B 100.00%	UNION EUROPEA (IED)	* CAMBIO DE CUBIERTA PARA 3 AULAS, INCLUYE LA EDECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS	 364721023 	 	FRENTE AL 100%
4A 100.00%	ARBORIZADORA BAJA (IED)	* CAMBIO DE CUBIERTA BLOQUE PRIMERA INFANCIA, INCLUYE MEJORAMIENTO ELECTRICO * ADECUACIÓN CANCHA DEPROTIVA	 	 	FRENTE AL 100%

FECHA: 4/10/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES: 195 Días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO 2
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
5A 100.00%	FABIO LOZANO SIMONELLI (IED)	* CAMBIO DE PISOS AULAS DE 3ER PISO BLOQUE A * MANEJO AGUAS LLUVIAS CANCHA * MEJORAMIENTO BATERIAS SANITARIAS 3ER PISO B	 	 	FRENTE AL 100%
6B 100.00%	ESTRELLA DEL SUR (IED) SEDE B	* CAMBIO DE PUERTAS Y VENTANA DE LA SEDE * CAMBIO DEL PORTON PRINCIPAL	 	 	FRENTE AL 100%

FECHA: 4/10/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES: 195 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO					
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO	2
CORTE DEL INFORME	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
7A **100.00%**	**CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)**	* CAMBIO DE CUBIERTA AULA MULTIPLE	 	 	**FRENTE AL 100%**
8A **100.00%**	**SANTA LIBRADA (IED)**	* MANTENIMIENTO CORRECTIVO TERRAZAS Y JARDINERA * ADECUACIÓN JUNTA ESTRUCTURAL COMEDOR	 	 	**FRENTE AL 100%**

FECHA: 4/10/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES: 166 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO 2
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
9A 100.00%	IED ESTRELLA DEL SUR, SEDE A	* ADEACUACIÓN BATERIAS SANITARIAS * ADECUACIÓN PORTON PRINCIPAL	 	 	**FRENTE AL 100%**
10A 100.00%	DIRECCION LOCAL DE EDUCACION DE USME - EMERGENCIA	* IMPERMEABILIZACIÓN PLACA TANQUES DE AGUA POTABLE * RESANE HUMEDAD BAÑO MUJERES	 	 	**EMERGENCIA AL 100%**

FECHA:	4/10/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	195 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO			
REGISTRO FOTOGRAFICO		SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA			GRUPO 2
		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS			
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
11A 99.96%	GUILLERMO CANO ISAZA (IED)	* ADECUACIÓN BATERIAS SANITARIAS BLOQUE BACHILLERATO	 	 	FALTAN DETALLES PARA REALIZAR LA ENTREGA DE LAS BATERIAS SANITARIAS DEL BLOQUE B, SEGUNDO PISO, YA SE REALIZO LA ENTREGA DE LA BATERIA SANITARIA DEL BLOQUE C PRIMER PISO  
12A 100.00%	TENERIFE - GRANADA SUR (IED)	* IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE * Instalación Barandas Metalicas	 	 	FRENTE AL 100%

FECHA: 4/10/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES: 195	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO 2
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
13A 100.00%	CALASANZ (BUENAVISTA) (CED) EMERGENCIA	* INSTALACIÓN DIVISIONES DE BAÑOS *AMPLIACIÓN CAPACIDAD TANQUE DE AGUA *ADECUACION RAMPA PARA ENTRADA AULA MULTIPLE	 	 	EMERGENCIA AL 100%
14A 100.00%	ARBORIZADORA BAJA (IED)	* ADECUACIÓN GRADERIAS, REEMPLAZO ESCALERA TARIMA, ADECUACIÓN TARIMA *MEJORAMIENTO DEL TERRENO AL REDEDRO DE LA TARIMA EMERGENCIA	 	 	EMERGENCIA AL 100%

FECHA:	4/10/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS			INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	166 Dias				
REGISTRO FOTOGRAFICO					GRUPO 2
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
15A 100.00%	GUILLERMO CANO ISAZA (IED)	*CAMBIO DE PISO AULA BLOQUE DE PRIMARIA SEGUNDO PISO EMERGENCIA	 	 	EMERGENCIA AL 100%
16A 93.20%	CIUDAD DE VILAVICENCIO - PUERTA AL LLANO	☐Mejoramiento correctivo de los pisos en acceso y corredor principal ☐Mejoramiento correctivo del cerramiento metálico ☐Mejoramiento de las redes de aguas lluvias	 	 	   

FECHA: 4/10/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES: 195 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO 2
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
17A 100.00%	CUNDINAMARCA (IED)	Adecuación de una estructura en cielo raso PVC, para mitigar el ingreo de palomas al comedor de la institución	 	 	EMERGENCIA AL 100%
18A 100.00%	LUIS EDUARDO MORA OSEJO (IED)	* Cambio de tablero Principal electrico * Adecuación acometidas electricas según alcance de la ficha electrica	 	 	EMERGENCIA AL 100%

FECHA: 4/10/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES: 195 días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO 2
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
19A 100.00%	CALASANZ (BUENAVISTA) (CED) - EMERGENCIA	* cambio y suministro e instalación de motobombas para tanque de agua potable	 	 	**EMERGENCIA AL 100%**
20A 52.22%	EDUDARDO UMAÑA MENDOZA (IED)	* Impermeabilización con manto en aluminio, bloque	 	 	 

FECHA: 4/10/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES: 195 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA			GRUPO	2
CORTE DEL INFORME	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
5/4/26	CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA: CONSORCIO PAIS			
	CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR: CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO			

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
21A 100.00%	SANTA LIBRADA (IED)	* Impermeabilización cuarto zona ludica	 	 	EMERGENCIA AL 100%
22A 91.80%	SAN JOSE DE USME - DON BOSCO 2 (CED)	Suministro e instalación de Cácacmo en acero Inox. Suministro e instalación de Lava ollas acero Inox. Revisión y reemplazo de tuberías hidráulicas y sanitarias	 	 	  

FECHA: 4/10/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES: 166 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO 2
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
23A 0.00%	RAFAEL URIBE URIBE (IED)	Adecuación Baterias sanitarias niños y niñas bloque preescolar	 	 	  
24A 0.00%	LOS COMUNEROS - OSWALDO GUAYAZAMIN (IED)	Adecuación Baterias sanitarias niños y niñas, Baño PMR bloque Bachillerato piso 1	 	 	   

CONTRATO DE OBRA		CO1.PCCNTR.8154780					CONTRATO DE INTERVENTORIA	CO1.PCCNTR.8169110			VIGENCIA	2025
CPF	581	IED			ORLANDO FALS BORDA			SEMANA 47				
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
REPLANTEO	m2	36.50	225.50	262.00	262.00		$ 4,233.48	$ 1,109,170.66	$ (954,648.79)	717.81%	717.81%	
CERRAMIENTO EN LONA	M	91.00	(62.60)	28.40	28.40		$ 31,110.25	$ 883,530.99	$ 1,947,501.40	100.00%	100.00%	
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	36.50	211.26	247.76	247.76		$ 18,044.21	$ 4,470,634.09	$ (3,812,020.33)	678.79%	678.79%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M YGUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	301.34	(266.74)	34.60	34.60		$ 33,201.35	$ 1,148,766.74	$ 8,856,128.37	11.48%	11.48%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	79.20	40.80	120.00	120.00		$ 69,099.55	$ 8,291,946.35	$ (2,819,261.76)	151.52%	151.52%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	34.00	199.20	233.20	216.59		$ 107,273.69	$ 23,234,421.60	$ (19,587,116.26)	637.03%	637.03%	
PERFORACIÓN NÚCLEO 4" E= 0.10 M	UN	16.00	(13.00)	3.00	3.00		$ 166,952.47	$ 500,857.42	$ 2,170,382.16	18.75%	18.75%	
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M	1.50			1.50		$ 62,023.52	$ 93,035.29	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	34.00			34.00		$ 91,590.40	$ 3,114,073.57	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	0.30			0.30		$ 135,394.33	$ 40,618.30	$ -	100.00%	100.00%	
RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	0.24			0.24		$ 181,045.17	$ 43,450.84	$ -	100.00%	100.00%	
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	15.00			15.00		$ 22,829.47	$ 342,442.05	$ -	100.00%	100.00%	
PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	19.00			19.00		$ 19,858.75	$ 377,316.29	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO LAMINADO 3 + 3 DIMENSIONES 1.00 M. X 1.00 M.	M2	15.36			15.36		$ 177,336.50	$ 2,723,888.59	$ -	100.00%	100.00%	
MEDIACAÑA VERTICAL EN CONCRETO 3000 PSI	M	58.50	136.16	194.66	194.66		$ 27,185.71	$ 5,291,971.11	$ (3,701,606.83)	100.00%	100.00%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	73.00	189.00	249.56	239.56		$ 45,289.29	$ 10,849,501.59	$ (7,543,383.64)	328.16%	328.16%	
DILATACIÓN EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 3 MM PROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM	M			127.20	127.20		$ 4,291.49	$ 545,877.16	$ (545,877.16)	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	344.96			340.58		$ 4,663.84	$ 1,588,397.08	$ 20,440.72	98.73%	98.73%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	262.00	20.37	252.37	255.37		$ 361,355.09	$ 92,279,248.29	$ 2,395,784.22	97.47%	97.47%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ORLANDO FALS BORDA	**$ 156,929,147.99**				
CPF	1913	IED			SIERRA MORENA			SEMANA 47				
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	47.37	223.92	271.29	271.29		$ 7,045.00	$ 1,911,238.10	$ (1,577,516.00)	572.70%	572.70%	
CERRAMIENTO EN LONA	M	60.00	13.00	73.00	73.00		$ 31,110.25	$ 2,271,047.96	$ (404,433.20)	121.67%	121.67%	
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	m3	1.76	(1.76)	-	-		$ 274,656.52	$ -	$ 483,395.00	0.00%	0.00%	
DESMONTE DE BARANDA METÁLICA ALTURA NO MAYOR A 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	20.80	7.20	28.00	28.00		$ 21,488.46	$ 601,677.01	$ (154,716.95)	134.62%	134.62%	
DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	12.60			12.60		$ 11,376.96	$ 143,349.70	$ -	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	36.84			36.84		$ 107,273.69	$ 3,951,962.61	$ -	100.00%	100.00%	

DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.30 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	32.64	0.72	31.92	-		$ 93,547.94	$ -	$ 3,053,405.00	0.00%	0.00%	
CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	7.20			3.40		$ 15,633.37	$ 53,153.46	$ 59,407.00	47.22%	47.22%	
DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5.29			4.00		$ 11,761.45	$ 47,045.82	$ 15,172.00	75.61%	75.61%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	1.76	6.86	8.62	4.57		$ 91,988.38	$ 420,527.47	$ (258,627.91)	259.75%	259.75%	
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	m3	24.87	-9.60	15.27	15.27		$ 21,702.97	$ 331,382.67	$ 208,370.00	61.40%	61.40%	
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	m2	11.84			11.84		$ 165,931.21	$ 1,964,625.47	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	m3	7.00	7.00	14.00	14.00		$ 176,060.25	$ 2,464,579.38	$ (1,232,158.00)	199.98%	199.98%	
MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	12.60	3.76	16.36	16.36		$ 146,133.16	$ 2,390,738.55	$ (549,461.00)	129.84%	129.84%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	m	6.00			-		$ 78,726.73	$ -	$ 472,360.38	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"	un	8.00			-		$ 28,310.86	$ -	$ 226,487.00	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	un	2.00			-		$ 129,729.46	$ -	$ 259,458.91	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	m	29.00			-		$ 14,988.50	$ -	$ 434,667.00	0.00%	0.00%	
RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INLUYE REFUERZO).	M2	42.05	8.55	50.60	50.60		$ 193,996.53	$ 9,816,224.55	$ (1,658,670.00)	120.33%	120.33%	
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	11.84			11.84		$ 165,931.21	$ 1,964,625.47	$ -	100.00%	100.00%	
CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA (TRÁFICO PESADO) ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO, PENDIENTADO Y MEDIA CAÑA.	M	2.96			2.96		$ 592,067.38	$ 1,752,519.43	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	420.50	(366.54)	53.96	53.96		$ 7,255.46	$ 391,504.61	$ 2,659,416.00	12.83%	12.83%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	91.39			91.39		$ 7,103.01	$ 649,144.22	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-S 6" INCLUYE ACCESORIOS	M	6.00	10.00	16.00	16.00		$ 143,600.90	$ 2,297,614.44	$ (1,436,009.00)	266.67%	266.67%	
CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 M X 0.60 M EN CONCRETO REFORZADO < = 1,00 M CON MARCO Y TAPA METÁLICA E= 0.20 M	un	4.00	(4.00)	-	-		$ 1,618,437.02	$ -	$ 6,473,748.09	0.00%	0.00%	
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	3.00			2.00		$ 875,947.70	$ 1,751,895.39	$ 875,948.00	66.67%	66.67%	
CANAL EN PVC AMAZONAS O EQUIVALENTE, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	3.60			3.60		$ 68,114.71	$ 245,212.96	$ -	100.00%	100.00%	
MURO EN SUPERBOARD DE 8 MM INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA , MASILLA , CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA, VISTO DOS CARAS E= 12 CM	M2	15.77	1.25	17.02	17.02		$ 159,158.72	$ 2,708,881.47	$ (198,948.00)	107.93%	107.93%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA, EL TUBO PASAMANOS DE 2" CALIBRE 18 AL IGUAL QUE LOS TUBOS PEDESTALES CON PLATINA DE FIJACIÓN Y TRAVESAÑOS VERTICALES EN TUBERÍA DE 3/4" CON SEPARACIÓN CADA 9CM, PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS.	M	33.78			36.35		$ 1,120,163.13	$ 40,719,658.08	$ (2,880,548.00)	107.61%	107.61%	
PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	172.00	(172.00)	-	-		$ 65,757.83	$ -	$ 11,310,347.00	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO (RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA CANCHA MULTIPLE INCLUYE DEMARCACIONES BALONCESTO - VOLEYBOL)	M2			146.06	156.06		$ 77,589.44	$ 12,108,607.88	$ (12,108,608.00)	106.85%	106.85%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	14.08	2.72	16.80	16.80		$ 98,222.57	$ 1,650,139.25	$ (267,165.00)	119.32%	119.32%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	4.08			4.08		$ 45,289.29	$ 184,780.29	$ -	100.00%	100.00%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	4.84			4.84		$ 126,224.49	$ 610,926.55	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1.00			1.00		$ 572,567.48	$ 572,567.48	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	UN	1.00			24.00		$ 23,315.15	$ 559,563.51	$ (536,248.00)	2400.00%	2400.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	24.00			24.00		$ 20,790.98	$ 498,983.52	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	5.08	0.05	5.13	5.13		$ 798,362.30	$ 4,095,598.62	$ (39,918.00)	100.98%	100.98%	
PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	193.76	(98.31)	95.45	105.45		$ 29,785.43	$ 3,140,873.57	$ 2,630,351.00	54.42%	54.42%	
PINTURA DE ACEITE SOBRE PAÑETE (2 MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	61.76	14.44	76.20	86.20		$ 29,785.43	$ 2,567,504.05	$ (727,956.00)	139.57%	139.57%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	kg	226.80	92.51	319.31	319.31		$ 23,042.63	$ 7,357,741.55	$ (2,131,674.00)	140.79%	140.79%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	36.84	-23.74	13.10	15.10		$ 264,771.67	$ 3,998,052.18	$ 5,756,136.00	40.99%	40.99%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	537.24			537.24		$ 4,663.84	$ 2,505,600.70	$ -	100.00%	100.00%	
					SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. SIERRA MORENA			**$ 118,699,548.00**				
CPF	**1930**	**IED**			**UNIÓN EUROPEA**			**SEMANA 47**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	168.00	10.14	178.14	178.14		$ 4,233.48	$ 754,151.38	$ (42,927.00)	106.04%	106.04%	
CERRAMIENTO EN LONA	M	45.00	7.80	52.80	23.83		$ 31,110.25	$ 741,422.37	$ 658,538.70	52.96%	52.96%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	136.13	(104.13)	32.00	32.00		$ 3,248.63	$ 103,956.25	$ 338,280.13	23.51%	23.51%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5.83	-	5.83	-		$ 144,722.00	$ -	$ 843,729.29	0.00%	0.00%	
DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	36.30			36.30		$ 26,782.33	$ 972,198.70	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	5.15	7.35	12.50	12.50		$ 27,938.51	$ 349,231.40	$ (205,348.06)	242.72%	242.72%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	m2	168.00	5.63	173.63	183.63		$ 36,752.18	$ 6,748,803.22	$ (574,436.61)	109.30%	109.30%	
DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	un	18.00	6.00	24.00	24.00		$ 11,967.87	$ 287,228.79	$ (71,807.20)	133.33%	133.33%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	un	18.00	6.00	24.00	24.00		$ 7,469.97	$ 179,279.20	$ (44,819.80)	133.33%	133.33%	

DESMONTE DE TABLERO ELÉCTRICO DE 12-18 CIRCUITOS DETERIORADO, INCLUYE RETIRO DE PROTECCIONES Y DISPOSICIÓN DE RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, NO INCLUYE RESANES NI PINTURAS.	un	1.00			-		$ 55,922.89	$ -	$ 55,922.89	0.00%	0.00%	
DEMOLICIÓN ALFAJÍA EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE COSNTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	7.00	0.00	7.00	-		$ 32,498.47	$ -	$ 227,489.29	0.00%	0.00%	
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	m	3.90	-3.90	0.00	-		$ 18,687.73	$ -	$ 72,882.16	0.00%	0.00%	
PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	19.43			19.43		$ 21,844.63	$ 424,441.11	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	4.00			4.00		$ 126,905.79	$ 507,623.16	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	3.90			3.90		$ 89,839.27	$ 350,373.14	$ -	100.00%	100.00%	
CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (INCLUYE FORMALETAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	M	19.43			19.43		$ 42,469.67	$ 825,185.65	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	kg	3515.11	-1076.19	2438.92	2,608.92		$ 23,042.63	$ 60,116,373.04	$ (84,914,618.87)	-242.42%	-242.42%	
CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (INCLUYE FORMALETAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	M	19.43			19.43		$ 42,469.67	$ 825,185.65	$ (825,185.65)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO (35 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR.	M	0.50			0.50		$ 341,855.19	$ 170,927.60	$ (170,927.60)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	m	26.40	18.13	44.53	44.53		$ 91,590.40	$ 4,078,520.47	$ (1,660,533.93)	245.62%	245.62%	
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	1.00	-1.00	0.00			$ 875,947.70	$ -	$ 875,947.70	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	kg	213.75	0.29	214.04	214.04		$ 264,771.67	$ 56,671,727.78	$ (76,783.78)	100.14%	100.14%	
FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	18.15			18.15		$ 106,267.26	$ 1,928,750.73	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	34.90			34.90		$ 91,590.40	$ 3,196,504.93	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	42.00			42		$ 23,315.15	$ 979,236.14	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 2N°10 (F) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	42.00			42.00		$ 20,790.98	$ 873,221.16	$ -	100.00%	100.00%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	21.00	3.00	24.00	24		$ 180,330.15	$ 4,327,923.59	$ (540,990.45)	114.29%	114.29%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	21.00	3.00	24.00	24		$ 238,055.44	$ 5,713,330.57	$ (714,166.32)	114.29%	114.29%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M	22.50	8.50	31.00	30		$ 304,166.74	$ 9,125,002.11	$ (2,281,250.53)	133.33%	133.33%	
SUMINISTRO E INSTALACION MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA, PERFILES ESTUCTURALES DE ACERO GALVANIZADO PGU, MONTANTES, TORNILLOS PARA ESTRUCTURA, CLAVO IMPACTADO. ACABADO A DOS MANOS CON PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO.	M2	32.35	0.75	33.10	33.1		$ 222,048.37	$ 7,349,801.01	$ (166,536.28)	102.32%	102.32%	
PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M2	61.70			65.10		$ 17,207.77	$ 1,120,195.60	$ (58,476.16)	105.51%	105.51%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	224.21			224.21		$ 4,663.84	$ 1,045,679.27	$ -	100.00%	100.00%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. UNION EUROPEA	**$ 169,766,274.00**				
CPF	**1904**	**IED**			**ARBORIZADORA BAJA**			**SEMANA 47**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	786.72	463.91	1250.63	1,250.63		$ 7,045.00	$ 8,810,688.60	$ (3,268,246.00)	158.97%	158.97%	
CERRAMIENTO EN LONA	M	96.25	73.00	169.25	169.25		$ 31,110.25	$ 5,265,409.14	$ (2,271,047.96)	175.84%	175.84%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	466.58	9.42	476.00	476.00		$ 107,273.69	$ 51,062,274.77	$ (1,010,518.00)	102.02%	102.02%	
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	5.25			-		$ 22,300.62	$ -	$ 117,078.27	0.00%	0.00%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	145.00	6.23	151.23	151.23		$ 32,594.26	$ 4,929,229.33	$ (203,062.21)	104.30%	104.30%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	145.00	123.77	21.23	21.23		$ 42,650.45	$ 905,469.00	$ 5,278,845.87	14.64%	14.64%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO CON FIBRA SINTÉTICA ESPESOR 4 CM	M2	130.00			130.00		$ 69,868.54	$ 9,082,910.19	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	m2	323.02			323.02		$ 36,752.18	$ 11,871,653.14	$ 37.00	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA (INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	35.50			35.50		$ 8,680.11	$ 308,143.88	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	un	25.00			25.00		$ 7,469.97	$ 186,749.17	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE CANCHA MULTIPLE (ARCO DE MICROFUTBOL Y ARO DE BALONCESTO) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	un	2.00			2.00		$ 398,950.46	$ 797,900.91	$ -	100.00%	100.00%	
DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	21.00			-		$ 11,761.45	$ -	$ 246,991.00	0.00%	0.00%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	16.80	5.76	22.56	22.56		$ 91,988.38	$ 2,075,257.93	$ (529,853.00)	134.29%	134.29%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	258.10	(36.51)	221.59	221.59		$ 79,962.51	$ 17,718,891.73	$ 2,919,431.00	85.85%	85.85%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	22.83			22.83		$ 135,394.33	$ 3,091,052.48	$ -	100.00%	100.00%	

EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	15.52			2.22		$ 66,591.58	$ 147,833.30	$ 885,668.00	14.30%	14.30%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	m3	103.10	68.26	171.36	171.36		$ 176,060.25	$ 30,169,684.13	$ (12,017,873.00)	166.21%	166.21%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAJÓN DE PIEDRA	m3	129.05	25.90	154.95	154.95		$ 176,060.25	$ 27,280,535.46	$ (4,559,960.00)	120.07%	120.07%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BORDILLO PREFABRICADO A80	m	87.00			87.00		$ 76,033.93	$ 6,614,951.64	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M	90.00			90.00		$ 97,085.28	$ 8,737,675.50	$ -	100.00%	100.00%	
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	18.70	5.00	23.70	23.70		$ 165,931.21	$ 3,932,569.57	$ (829,656.00)	126.74%	126.74%	
CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI ANCHO 0.50 M E= 0.07 M (NO INCLUYE REFUERZO)	M	90.00			90.00		$ 164,788.52	$ 14,830,966.59	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO (45 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3 MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR.	M	1.52			1.52		$ 358,768.86	$ 545,328.67	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PEATONAL DE ANGULOS Y PLATINAS DE ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR PARA CARCAMO ANCHO 40 CM	M	0.90			0.90		$ 156,990.72	$ 141,291.65	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	kg	1809.76	-142.50	1667.26	1,667.26		$ 23,042.63	$ 38,418,051.96	$ 3,283,574.00	92.13%	92.13%	
CAJA DE INSPECCION 100 X 100 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	2.00					$ 1,088,548.32	$ -	$ 2,177,097.00	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	m2	684.78	-162.78	522.00	522.00		$ 11,730.42	$ 6,123,281.59	$ 1,909,479.00	76.23%	76.23%	
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	m	3.00			2.00		$ 5,565.04	$ 11,130.08	$ 5,565.00	66.67%	66.67%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	m2	323.02			323.02		$ 264,771.67	$ 85,526,544.13	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	m	35.50			35.50		$ 305,515.84	$ 10,845,812.21	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN ASFALTO MD-10 PARA CANCHA DEPORTIVA E=8 CM, (INCLUYE: EMULSION ASFALTICA, ASFALTO MD-10 Y ACABADO CON SLURRY	m2	484.50	-43.86	440.64	440.64		$ 225,361.76	$ 99,303,405.31	$ 9,884,367.00	90.95%	90.95%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO (RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA CANCHA MULTIPLE INCLUYE DEMARCACIONES BALONCESTO - VOLEYBOL)	M2	484.50	-484.50	0.00	-		$ 77,589.44	$ -	$ 37,592,083.00	0.00%	0.00%	
PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	714.00			680.68		$ 65,757.83	$ 44,760,026.89	$ 2,191,065.00	95.33%	95.33%	
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M	66.67			66.67		$ 62,023.52	$ 4,135,108.31	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	620.45			620.45		$ 7,255.46	$ 4,501,650.03	$ -	100.00%	100.00%	
DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	353.72			353.72		$ 18,365.30	$ 6,496,173.31	$ -	100.00%	100.00%	

CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL (INC. DOS UNIDADES FIJAS DE MICROBALONCESTO - MALLA PARA MICRO FUTBOL - JUEGO DE POSTES Y MALLA PARA VOLEIBOL - DEMARCACIÓN DE LA CANCHA - TRANSPORTE - E INSTALACIÓN)	UN	2.00	-1.00	1.00	1.00		$ 12,850,061.48	$ 12,850,061.48	$ 12,850,061.00	50.00%	50.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	5.00			4.00		$ 126,905.79	$ 507,623.16	$ 126,906.00	80.00%	80.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1.00			1.00		$ 572,567.48	$ 572,567.48	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	118.00			118.00		$ 15,217.85	$ 1,795,706.06	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	118.00			118.00		$ 16,070.48	$ 1,896,316.55	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	25.00			25.00		$ 180,330.15	$ 4,508,253.74	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	22.00			22.00		$ 238,055.44	$ 5,237,219.69	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER 2X20W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	3.00			3.00		$ 193,810.36	$ 581,431.07	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	194.18			194.18		$ 9,167.13	$ 1,780,074.18	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H= 5.00 M (ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO DE 3" E= 3,81 MM ASTM A500 Y CAMISA DE REFUERZO DE 4", VARILLA REDONDA DE 3/4" C./.14 EJES. VIGA 40X30 Y PILOTES CONCRETO 3000 PSI) SEGÚN DETALLES IDRD.	M2	17.50			16.95		$ 2,042,059.82	$ 34,612,913.93	$ 1,123,133.00	96.86%	96.86%	
CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H= 2.50 M (ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO DE 2-1/2" Y PROTECCIÓ N EN VARILLA REDONDA DE 3/4" C./0.14 m EJES. VIGA=30*30 CONCRETO 3000PSI) SEGÚN DETALLES IDRD.	M2	17.50			16.95		$ 1,257,854.97	$ 21,320,641.75	$ 691,820.00	96.86%	96.86%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO HETEROGENEO ALTO TRÁFICO	M2	130.00			125.78		$ 237,210.90	$ 29,836,007.59	$ 1,001,410.00	96.75%	96.75%	
LAVADO Y LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE EN EL COLEGIO ARBORIZADORA BAJA (INCLUYE INSUMOS)	ML	197.54			194.54		$ 5,046.98	$ 981,840.09	$ 15,141.00	98.48%	98.48%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1,078.76			1,078.76		$ 4,663.84	$ 5,031,162.64	$ -	100.00%	100.00%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ARBORIZADORA BAJA	**$ 630,139,470.00**				

CPF	**523**	**IED**			**Fabio Lozano Simonelli**			**SEMANA 47**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	1201.02	10.05	1211.07	1,211.07		$ 4,233.48	$ 5,127,035.54	$ (42,546.00)	100.00%	100.00%	

CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	51.83	81.17	133.00	133.00		$ 31,110.25	$ 4,137,662.72	$ (2,525,218.67)	256.61%	256.61%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	235.29	11.28	246.57	246.57		$ 32,594.26	$ 8,036,765.70	$ (367,663.21)	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2			68.70	68.70		$ 107,273.69	$ 7,369,702.26	$ (7,369,702.26)	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN ASITIOS AUTORIZADOS)	M2	28.64	1.35	29.99	29.99		$ 22,300.62	$ 668,795.68	$ (30,105.84)	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	55.48	30.02	85.50	85.50		$ 12,649.16	$ 1,081,503.32	$ (379,727.83)	154.11%	154.11%	
DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	28.00			28.00		$ 20,708.69	$ 579,843.18	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)}	M3	15.05	0.08	15.13	15.13		$ 66,591.58	$ 1,007,530.54	$ (5,327.33)	100.53%	100.53%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	17.32			17.32		$ 33,174.37	$ 574,580.07	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	UN	28.00			28.00		$ 27,281.50	$ 763,882.01	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2			3.00	3.00		$ 25,731.38	$ 77,194.15	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	66.00			66.00		$ 27,938.51	$ 1,843,941.79	$ -	100.00%	100.00%	
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3			63.85	63.85		$ 34,724.48	$ 2,217,158.36	$ -	100.00%	100.00%	
CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M			120.60	120.60		$ 15,633.37	$ 1,885,384.52	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	8.00			8.00		$ 7,469.97	$ 59,759.73	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	55.30	-5.16	50.14	50.14		$ 32,569.97	$ 1,633,058.41	$ 168,061.06	90.67%	90.67%	
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	22.90			22.90		$ 18,687.73	$ 427,949.09	$ -	100.00%	100.00%	
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2			2.80	2.80		$ 18,044.21	$ 50,523.80	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	12.80	2.49	15.29	15.29		$ 135,394.33	$ 2,070,179.26	$ (337,131.87)	119.45%	119.45%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 m	M2	194.67			194.67		$ 42,650.45	$ 8,302,762.60	$ -	100.00%	100.00%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	49.31			49.31		$ 45,289.29	$ 2,233,214.74	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO CON FIBRA SINTÉTICA ESPESOR 4 CM	M2	548.06	(548.06)	-			$ 69,868.54	$ -	$ 38,292,151.98	0.00%	0.00%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	158.76	(56.05)	102.71	102.71		$ 7,103.01	$ 729,550.31	$ 398,123.79	64.70%	64.70%	
CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI ANCHO 0.50 M E= 0.07 M (NO INCLUYE REFUERZO)	M	171.60	(44.68)	126.92	122.00		$ 164,788.52	$ 20,104,199.16	$ 8,173,510.48	71.10%	71.10%	
PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2			0.64	0.64		$ 115,264.41	$ 73,769.22	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PEATONAL DE ANGULOS Y PLATINAS DE ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR PARA CARCAMO ANCHO 40 CM	M			13.00	13.00		$ 156,990.72	$ 2,040,879.36	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M			20.50	20.57		$ 24,290.55	$ 499,656.52	$ (1,700.34)	100.34%	100.34%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2.00			2.00		$ 126,905.79	$ 253,811.58	$ (253,811.58)	100.00%	100.00%	
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00			1.00		$ 253,721.19	$ 253,721.19	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	M	1.00			1.00		$ 572,567.48	$ 572,567.48	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	M	8.00			8.00		$ 180,330.15	$ 1,442,641.20	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	32.00	-27.00	5.00	5.00		$ 23,315.15	$ 116,575.73	$ 629,508.95	15.63%	15.63%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M			55.00	55.00		$ 33,700.52	$ 1,853,528.49	$ (1,853,528.49)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	32.00	(12.00)	20.00	20.00		$ 20,790.98	$ 415,819.60	$ 249,491.76	62.50%	62.50%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN			8.00	8.00		$ 198,607.76	$ 1,588,862.05	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	8.00	-5.00	3.00	3.00		$ 238,055.44	$ 714,166.32	$ 1,190,277.20	37.50%	37.50%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL TOTALIZADOR 3X125 A. MATERIALES CERTIFICADOS RETIE E INSTALADOS SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UN			1.00	1.00		$ 781,835.83	$ 781,835.83	$ (781,835.83)	100.00%	100.00%	
ACOMETIDA TRIFASICA EN 4#8 + 1#10 CABLE LIBRE DE HALOGENOS. INCLUYE CONECTORES TUBULARES Y AISLAMIENTO AUTOFUNDENTE INCLUYE MANIOBRAS DE CANALIZACIÓN	M			60.00	60.00		$ 57,049.39	$ 3,422,963.50	$ (3,422,963.50)	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	15.00	(2.42)	12.58	12.58		$ 361,355.09	$ 4,545,846.98	$ 874,479.31	83.87%	83.87%	
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	1.00			1.00		$ 875,947.70	$ 875,947.70	$ -	100.00%	100.00%	
CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	55.30	-5.16	50.14	50.14		$ 130,345.99	$ 6,535,548.17	$ 672,585.33	90.67%	90.67%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	226.69	12.39	239.08	239.08		$ 126,224.49	$ 30,177,196.69	$ (1,563,366.10)	105.46%	105.46%	
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	17.44	76.23	93.67	93.67		$ 33,727.50	$ 3,159,254.93	$ (2,571,047.33)	537.10%	537.10%	

PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M			39.00	39.00		$ 22,829.47	$ 890,349.34	$ (890,349.34)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M2	-	5.29	5.29	5.29		$ 62,023.52	$ 328,104.44	$ (328,104.44)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
WIN DE ALUMINIO	M	18.00	2.90	20.90	20.90		$ 15,372.99	$ 321,295.59	$ (44,581.68)	116.11%	116.11%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	131.00	(37.64)	93.36	93.36		$ 98,222.57	$ 9,170,059.56	$ 3,697,097.71	71.27%	71.27%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	11.73	-5.49	6.24	6.24		$ 1,127,900.21	$ 7,038,097.34	$ 6,192,172.18	53.20%	53.20%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	47.82	-8.24	39.58	40.99		$ 989,338.00	$ 40,552,909.59	$ 6,757,233.57	85.72%	85.72%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	1.80	0.30	1.50	1.50		$ 989,338.00	$ 1,484,007.00	$ 296,801.40	83.33%	83.33%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	3.00			3.00		$ 772,427.21	$ 2,317,281.62	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL BLANCO DE 2 CUERPOS CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA, DESCARGA SENCILLA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, BRIDA, ACOPLE Y VALVULA PLASTICA DE 1/2" PARA REGULACION DE PRESION. CONSUMO DE AGUA DE 4.8 LTS POR DESCARGA, CAPACIDAD MINIMA DE EVACUACION DE SOLIDOS 400 GRAMOS	UN	11.00			11.00		$ 1,117,185.66	$ 12,289,042.29	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, CON DOS PERSIANAS INFERIOR Y SUPERIOR DE 30CM X 60CM. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2			3.84	3.84		$ 798,362.30	$ 3,065,711.25	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	14.00			14.00		$ 404,611.28	$ 5,664,557.91	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M			102.46	102.46		$ 91,590.40	$ 9,384,352.28	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M			1.65	1.65		$ 78,726.73	$ 129,899.11	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M			24.00	24.00		$ 51,125.49	$ 1,227,011.85	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1-1/2 "	UN	11.00			11.00		$ 18,869.86	$ 207,568.48	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1/2"	UN	28.00			28.00		$ 4,998.42	$ 139,955.63	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	14.00			14.00		$ 63,533.17	$ 889,464.33	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	14.00			14.00		$ 63,533.17	$ 889,464.33	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	7.20	0.56	7.76	7.76		$ 123,260.52	$ 956,501.65	$ (69,025.89)	107.78%	107.78%	
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	66.72	216.43	283.15	283.15		$ 20,236.50	$ 5,729,964.98	$ (4,379,785.70)	424.39%	424.39%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN			24.00	24.00		$ 33,569.66	$ 805,671.73	$ -	100.00%	100.00%	
PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	-		22.64	22.64		$ 32,026.28	$ 725,075.09	$ (725,075.09)	100.00%	100.00%	
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M			122.00	122.00		$ 32,026.28	$ 3,907,206.76	$ -	100.00%	100.00%	
PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN).	M2	176.38			176.38		$ 6,610.59	$ 1,165,975.86	$ -	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1,201.02			1,201.02		$ 4,663.84	$ 5,601,363.56	$ -	100.00%	100.00%	
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. FABIO SIMONELLI							**$ 245,187,661.00**				
CPF	**1918**	**IED**			**Estrella del Sur Sede B**			**SEMANA 47**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**

REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	557.28	20.48	577.76	577.76		$ 4,233.48	$ 2,445,932.98	$ (86,702.00)	103.67%	103.67%	
CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2").	M	88.20	-88.20	0.00	-		$ 154,730.98	$ -	$ (13,647,272.19)	0.00%	0.00%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	54.17			33.24		$ 33,174.37	$ 1,102,716.03	$ 694,339.54	61.36%	61.36%	
DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	95.99	-32.70	63.29	63.29		$ 29,391.49	$ 1,860,302.19	$ 960,987.18	65.94%	65.94%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	28.37					$ 707,267.02	$ -	$ 20,065,165.47	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON DOBLE ANTI MACHUCON, REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	25.81	6.00	31.81	35.81		$ 829,259.39	$ 29,695,861.74	$ (8,292,676.84)	138.75%	138.75%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1.43			1.43		$ 798,362.30	$ 1,145,011.22	$ (3,353.12)	100.29%	100.29%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO, CUERPOS FIJOS, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A DISEÑO SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	87.25			69.15		$ 467,649.33	$ 32,338,268.71	$ 8,464,135.19	79.26%	79.26%	
ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM	M	141.20			141.20		$ 9,408.62	$ 1,328,459.99	$ 37.63	100.00%	100.00%	
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	141.20			148.20		$ 22,829.47	$ 3,383,236.17	$ (159,714.97)	104.95%	104.95%	
PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M	141.20			148.20		$ 17,207.77	$ 2,550,122.76	$ (120,385.56)	104.95%	104.95%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	577.76			597.76		$ 4,663.84	$ 2,787,856.22	$ (93,276.77)	103.46%	103.46%	
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ESTRELLA DEL SUR - B							**$ 78,637,768.00**				

CPF	1974	IED			CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)			SEMANA 47				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	538.32	-88.32	450.00	450.00		$ 4,233.48	$ 1,905,064.11	$ 373,901.00	83.59%	83.59%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5"anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	78.28	11.72	90.00	95.00		$ 31,137.23	$ 2,958,036.66	$ (520,614.00)	121.36%	121.36%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	538.32					$ 3,248.63	$ -	$ 1,748,804.00	0.00%	0.00%	
DESMONTE DE LÀMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	12.00	(1.00)	11.00	11.00		$ 7,469.97	$ 82,169.63	$ -	100.00%	100.00%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M			5.00	5.00		$ 23,315.15	$ 116,575.73	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 2N°10 (F) + 1N°12 (T) AWG THHN	M			20.00	20.00		$ 20,790.98	$ 415,819.60	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES 50W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	1.00			1.00		$ 101,214.88	$ 101,214.88	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	M2	538.82	-134.52	404.30	408.30		$ 36,752.18	$ 15,005,915.99	$ 4,796,895.00	75.78%	75.78%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	1841.40	-941.87	899.53	902.53		$ 23,042.63	$ 20,796,663.05	$ 21,634,032.15	49.01%	49.01%	
CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	44.00			46.69		$ 130,345.99	$ 6,086,241.01	$ (351,017.24)	106.12%	106.12%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	633.15			632.63		$ 4,663.84	$ 2,950,473.25	$ 2,436.22	99.92%	99.92%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUAYA METÁLICA PARA CERCHA METÁLICA	M2	30.00			30.00		$ 37,696.55	$ 1,130,896.57	$ -	100.00%	100.00%	
FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2			87.00	87.00		$ 106,267.26	$ 9,245,251.44	$ (9,245,251.44)	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	KG	538.31	-538.31	0.00	-		$ 264,771.67	$ -	$ 142,529,236.49	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 50 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR 50 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 24 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA LOS METROS CUADRADOS RALMENTE INSTALADOS)	KG	0.00	0.00	410.94	410.94		$ 306,692.25	$ 126,032,114.08	$ (126,032,114.08)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
						SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. CALASANZ BUENA VISTA		**$ 186,826,436.00**				
CPF	**546**	**IED**			**SANTA LIBRADA (IED)**			**SEMANA 47**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	557.28			557.28		$ 4,233.48	$ 2,359,231.39	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5"anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	128.18	-78.18	50.00	50.00		$ 31,110.25	$ 1,555,512.30	$ 2,432,199.03	39.01%	39.01%	
CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	65.03	-39.70	25.33	25.33		$ 15,633.37	$ 395,993.28	$ 620,644.82	38.95%	38.95%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	67.90		0.80	0.80		$ 32,594.26	$ 26,075.40	$ 2,187,074.58	1.18%	1.18%	

PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	27.20			13.34		$ 21,844.63	$ 291,407.33	$ 302,766.53	49.04%	49.04%	
PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	372.13			371.00		$ 13,385.77	$ 4,966,120.74	$ 15,125.92	99.70%	99.70%	
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M			18.00	18.00		$ 22,829.47	$ 410,930.46	$ (410,930.46)	100.00%	100.00%	
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	63.87	28.85	92.72	92.72		$ 34,724.48	$ 3,219,654.24	$ (1,001,801.39)	145.17%	145.17%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2			73.27	73.27		$ 36,752.18	$ 2,692,832.39	$ -	100.00%	100.00%	
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	16.47	(16.47)	-			$ 18,044.21	$ -	$ -	0.00%	0.00%	
DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	194.87			194.87		$ 9,443.70	$ 1,840,293.82	$ 1,840,293.82	100.00%	100.00%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	59.96			59.96		$ 91,988.38	$ 5,515,765.80	$ 5,515,765.80	100.00%	100.00%	
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	100.00	(20.61)	79.39	79.39		$ 53,568.71	$ 4,252,820.18	$ 4,252,820.18	79.39%	79.39%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M	63.33			13.44		$ 91,988.38	$ 1,236,323.87	$ 1,236,323.87	21.22%	21.22%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	281.83	(180.01)	96.22	96.22		$ 45,289.29	$ 4,357,735.20	$ 4,357,735.20	34.14%	34.14%	
RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INLUYE REFUERZO).	M2			12.54	12.54		$ 193,996.53	$ 2,432,716.52	$ 2,432,716.52	100.00%	100.00%	
PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 M (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE}	M2	333.93	-143.06	190.87	190.87		$ 69,679.67	$ 13,299,757.83	$ 13,299,757.83	57.16%	57.16%	
MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	208.04			205.00		$ 25,122.94	$ 5,150,202.74	$ 5,150,202.74	98.54%	98.54%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M			19.35	19.35		$ 91,590.40	$ 1,772,274.22	$ 1,772,274.22	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M			8.10	8.10		$ 78,726.73	$ 637,686.52	$ 637,686.52	100.00%	100.00%	
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M	19.60			13.44		$ 62,023.52	$ 833,596.15	$ 833,596.15	68.57%	68.57%	
Demolición de Materas en concreto o fibrocemento 1.2x1.2x0.3 m y 1x0.7x0.7 m	M	48.00			44.00		$ 16,863.75	$ 742,005.00	$ 742,005.00	91.67%	91.67%	
TRATAMIENTO DE PISOS EN LADRILLO O ADOQUIN: LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS y REEMBOQUILLADO DE JUNTAS, (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN,	M	110.00	69.08	179.08	179.08		$ 16,863.75	$ 3,019,960.35	$ 3,019,960.35	162.80%	162.80%	#####
JUNTA DE DILATACIÓN INDUCIDA PISO EN CONCRETO ALLANADO (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, MARCACIÓN DE DILATACIONES Y SELLADO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN).	M	356.60	-300.35	56.25	59.92		$ 34,369.67	$ 2,059,599.55	$ 2,059,599.55	16.80%	16.80%	
CANAL EN PVC AMAZONAS O EQUIVALENTE, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	6.00	(6.00)	-	-		$ 68,114.71	$ -	$ -	0.00%	0.00%	

DOMO EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 5 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	7.20	-1.32	5.88	5.88		$ 157,817.72	$ 927,968.18	$ 927,968.18	81.67%	81.67%	
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	67.71			67.71		$ 5,565.04	$ 376,808.69	$ 376,808.69	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CERCHA PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 4.5 KG/M	M	6.00	-0.12	5.88	5.88		$ 101,978.47	$ 599,633.40	$ 599,633.40	98.00%	98.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M			20.20	20.20		$ 305,515.84	$ 6,171,419.91	$ 6,171,419.91	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	335.60	(23.61)	315.08	315.08		$ 361,355.09	$ 113,857,372.13	$ 113,857,372.13	93.89%	93.89%	
PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2			96.73	96.73		$ 65,757.83	$ 6,360,755.11	$ 6,360,755.11	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	M2			190.00	190.00		$ 11,730.42	$ 2,228,757.19	$ 2,228,757.19	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN			8.00	8.00		$ 33,502.20	$ 268,017.60	$ 268,017.60	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TIERRA NEGRA ABONADA, INCLUYE CONFORMACIÓN DE TERRENO Y COMPACTACIÓN MANUAL DE TIERRA.	M3			37.42	37.42		$ 258,201.55	$ 9,661,902.03	$ 9,661,902.03	100.00%	100.00%	
SUMNINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN EN PASTO KIKUYO	M2			190.84	200.84		$ 29,001.60	$ 5,824,681.89	$ 5,824,681.89	105.24%	105.24%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ZANJA DE 0.3 X 0.3 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000, GRAVA 3/4" Y PASES PVC LONGITUD MAX 0.3 M CADA 3 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	130.00			130.00		$ 89,213.28	$ 11,597,727.02	$ 11,597,727.02	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	617.33			617.33	30.87	$ 4,663.84	$ 2,879,127.54	$ 2,879,127.54	100.00%	100.00%	
					SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. SANTA LIBRADA			**$ 223,822,666.00**				

CPF	1917	IED			ESTRELLA DEL SUR (IED) A			SEMANA 47				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	20.56			20.56		$ 4,233.48	$ 87,040.26	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	40.30	-31.81	8.49	8.49		$ 31,110.25	$ 264,138.88	$ 989,604.00	21.07%	21.07%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19.52	-2.22	17.30	17.30		$ 32,594.26	$ 563,880.63	$ 72,359.00	88.63%	88.63%	
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19.52	-5.96	13.56	13.56		$ 22,300.62	$ 302,396.45	$ 132,912.00	69.47%	69.47%	
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	40.65	(2.49)	38.16	38.16		$ 12,649.16	$ 482,692.01	$ 31,496.00	93.87%	93.87%	
DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19.52	-4.52	15.00	15.00		$ 20,708.69	$ 310,630.28	$ 93,603.00	76.84%	76.84%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	11.36	-5.02	6.34	6.34		$ 33,174.37	$ 210,325.50	$ 166,535.00	55.81%	55.81%	
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	15.00			15.00		$ 27,281.50	$ 409,222.50	$ -	100.00%	100.00%	
SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	15.00			15.00		$ 182,479.27	$ 2,737,188.99	$ -	100.00%	100.00%	

ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	19.52			19.52		$ 42,650.45	$ 832,536.73	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	19.52	(1.99)	17.53	17.53		$ 126,224.49	$ 2,212,715.38	$ 251,187.00	89.81%	89.81%	
MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2	0.80			0.80		$ 67,218.91	$ 53,775.13	$ -	100.00%	100.00%	
WIN DE ALUMINIO	M	3.00			3.00		$ 15,372.99	$ 46,118.98	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	44.84			40.81		$ 116,158.86	$ 4,740,210.72	$ 468,353.00	91.01%	91.01%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	2.00			2.00		$ 41,130.01	$ 82,260.02	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	5.20			5.20		$ 707,267.02	$ 3,677,788.50	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	2.16	0.12	2.28	2.38		$ 1,127,967.67	$ 2,680,941.73	$ (244,532.00)	110.04%	110.04%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	7.00	1.00	8.00	8.00		$ 873,470.75	$ 6,987,765.98	$ (873,471.00)	114.29%	114.29%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2.00			2.00		$ 616,820.66	$ 1,233,641.32	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	5.00			5.00		$ 404,611.28	$ 2,023,056.40	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	2.00			2.00		$ 41,130.01	$ 82,260.02	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	28.82	12.82	41.64	42.64		$ 989,338.20	$ 42,185,380.90	$ (13,672,654.00)	147.95%	147.95%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	1.80	(0.80)	1.00	1.00		$ 989,338.20	$ 989,338.20	$ 791,471.00	55.56%	55.56%	
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	44.84			40.81		$ 36,193.65	$ 1,476,990.67	$ 145,933.00	91.01%	91.01%	
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	35.50			35.10		$ 21,599.09	$ 758,128.09	$ 8,640.00	98.87%	98.87%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	2.16			2.16		$ 123,260.52	$ 266,242.73	$ -	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	111.32			100.19		$ 4,663.84	$ 467,270.00	$ 51,909.00	90.00%	90.00%	
					SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ESTRELLA DEL SUR - A			**$ 76,163,937.00**				

CPF	1959	IED			GUILLERMO CANO ISAZA (IED)			SEMANA 47				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	125.48			125.48		$ 4,233.48	$ 531,216.54	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	68.00			32.20		$ 31,110.25	$ 1,001,749.92	$ 1,113,747.00	47.35%	47.35%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	129.54	18.57	148.11	148.11		$ 32,594.26	$ 4,827,535.26	$ (605,275.00)	114.34%	114.34%	
DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	150.00			150.00		$ 11,376.96	$ 1,706,544.05	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	40.00			40.00		$ 7,469.97	$ 298,798.67	$ -	100.00%	100.00%	
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	100.00			100.00		$ 18,687.73	$ 1,868,773.32	$ -	100.00%	100.00%	

DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	95.87	17.32	113.19	113.19		$ 22,300.62	$ 2,524,207.52	$ (386,247.00)	118.07%	118.07%	
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	364.26	(31.38)	332.88	364.26		$ 12,649.16	$ 4,607,583.60	$ -	100.00%	100.00%	
MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2	7.20	3.16	10.36	10.20		$ 65,869.81	$ 671,872.04	$ (197,609.00)	141.67%	141.67%	
DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND	22.00	37.00	59.00	37.00		$ 20,708.69	$ 766,221.35	$ (310,630.00)	168.18%	168.18%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	26.61			26.11		$ 33,174.37	$ 866,182.77	$ 16,587.00	98.12%	98.12%	
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	78.00			53.00		$ 27,281.50	$ 1,445,919.51	$ 682,038.00	67.95%	67.95%	
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M			15.00	15.00		$ 20,708.69	$ 310,630.28	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M			19.00	19.00		$ 11,967.87	$ 227,389.46	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN			16.00	16.00		$ 7,469.97	$ 119,519.47	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M			58.00	58.00		$ 4,391.32	$ 254,696.59	$ -	100.00%	100.00%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	35.00	118.18	153.18	153.18		$ 61,099.39	$ 9,359,204.54	$ (7,220,726.00)	437.66%	437.66%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	129.54	30.05	159.59	159.59		$ 126,224.49	$ 20,144,167.03	$ (3,793,046.00)	123.20%	123.20%	
WIN DE ALUMINIO	M	30.00	52.83	82.83	55.00		$ 15,372.99	$ 845,514.70	$ (384,325.00)	183.33%	183.33%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISIÓN POR MÓDULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM	M	7.20	16.32	23.52	23.52		$ 1,128,300.90	$ 26,537,637.11	$ (18,413,871.00)	326.67%	326.67%	
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	364.26			364.26		$ 36,193.65	$ 13,183,900.70	$ -	100.00%	100.00%	
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	119.96	(45.93)	74.03	68.55		$ 21,599.09	$ 1,480,617.69	$ 1,110,409.00	57.14%	57.14%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	135.38			135.38		$ 989,338.20	$ 133,939,109.55	$ (2,504.00)	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1-1/2 "	UN	37.00			37.00		$ 18,869.86	$ 698,184.88	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	37.00			37.00		$ 63,533.17	$ 2,350,727.15	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	22.00	7.00	29.00	29.00		$ 63,533.17	$ 1,842,461.82	$ (444,732.00)	131.82%	131.82%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	UN	37.00			37.00		$ 181,838.44	$ 6,728,022.41	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN	38.00			38.00		$ 97,295.74	$ 3,697,238.23	$ -	100.00%	100.00%	
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	22.00			22.00		$ 5,565.04	$ 122,430.83	$ -	100.00%	100.00%	
ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE EN CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	74.03	-30.18	43.85	43.85		$ 13,044.45	$ 571,999.04	$ 393,681.00	59.23%	59.23%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	20.88			20.88		$ 123,260.52	$ 2,573,679.69	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN			13.00	6.00		$ 192,677.11	$ 1,156,062.68	$ (1,156,063.00)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	3.00			3.00		$ 572,567.48	$ 1,717,702.45	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	50.00	56.00	106.00	90.00		$ 23,315.15	$ 2,098,363.16	$ (932,606.00)	180.00%	180.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	50.00	56.00	106.00	90.00		$ 20,790.98	$ 1,871,188.21	$ (831,639.00)	180.00%	180.00%	
PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	36.90			36.90		$ 21,844.63	$ 806,066.74	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	32.00			34.00		$ 180,330.15	$ 6,131,225.09	$ (360,660.00)	106.25%	106.25%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	24.00			24.00		$ 198,607.76	$ 4,766,586.16	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	20.00			8.00		$ 180,330.15	$ 1,442,641.20	$ 2,163,962.00	40.00%	40.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	5.40	0.60	6.00	5.00		$ 989,338.20	$ 4,946,691.01	$ 395,735.00	92.59%	92.59%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	12.00			10.00		$ 772,427.21	$ 7,724,272.05	$ 1,544,854.00	83.33%	83.33%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	12.00			5.00		$ 41,130.01	$ 205,650.06	$ 287,910.00	41.67%	41.67%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL BLANCO DE 2 CUERPOS CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA, DESCARGA SENCILLA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, BRIDA, ACOPLE Y VALVULA PLASTICA DE 1/2 PARA REGULACION DE PRESION. CONSUMO DE AGUA DE 4.8 LTS POR DESCARGA, CAPACIDAD MINIMA DE EVACUACION DE SOLIDOS 400 GRAMOS	UN	45.00	-8.00	37.00	37.00		$ 1,117,185.66	$ 41,335,869.52	$ 8,937,485.00	82.22%	82.22%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	m2	364.26	(24.03)	340.23	340.23		$ 98,222.57	$ 33,418,266.56	$ 2,360,288.00	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	m2	205.61			139.29		$ 4,663.84	$ 649,626.09	$ 309,306.00	67.74%	67.74%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. GUILLERMO CANO ISAZA	**$ 354,373,946.66**				

CPF	548	IED			TENERIFE - GRANADA SUR (IED)			SEMANA 47				Observa
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	193.00	41.34	234.34	234.34		$ 4,233.48	$ 992,072.72	$ (175,012.00)	121.42%	121.42%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	39.00			26.00		$ 31,110.25	$ 808,866.40	$ 404,433.00	66.67%	66.67%	
TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	24.83	65.79	90.62	90.62		$ 38,696.24	$ 3,506,652.84	$ (2,545,825.00)	364.96%	364.96%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	44.28	25.88	70.16	55.16		$ 361,355.09	$ 19,932,346.54	$ (3,931,543.00)	124.57%	124.57%	
PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	44.28	25.88	70.16	70.16		$ 65,757.83	$ 4,613,569.51	$ (1,701,813.00)	158.45%	158.45%	
PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	412.00	(366.94)	45.06	45.06		$ 32,026.28	$ 1,443,104.40	$ 11,751,725.00	10.94%	10.94%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA DE 1-1/4" PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR CON SOPORTES PLÁSTICO. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS	M	43.00	-7.64	35.36	30.36		$ 190,851.78	$ 5,794,260.06	$ 2,412,367.00	70.60%	70.60%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA, EL TUBO PASAMANOS DE 2" CALIBRE 18 AL IGUAL QUE LOS TUBOS PEDESTALES CON PLATINA DE FIJACIÓN Y TRAVESAÑOS VERTICALES EN TUBERÍA DE 3/4" CON SEPARACIÓN CADA 9CM, PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS.	M	5.50	(0.80)	4.70	4.70		$ 1,120,163.13	$ 5,264,766.69	$ 896,131.00	85.45%	85.45%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	964.27	(570.86)	393.41	393.41		$ 4,663.84	$ 1,834,783.56	$ 2,662,416.00	40.80%	40.80%	
SUMINISTRO E INSTALACION MEMBRANA PVC PLASTIFICADO SIKAPLAN 15 PR O SIMILAR	M3	150.00	(15.20)	134.80	116.77		$ 383,249.63	$ 44,750,287.29	$ 12,737,157.00	77.84%	77.84%	
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. TENERIFE GRANADA SUR							**$ 88,940,710.00**				
CPF	**545**	**IED**	**CIUDAD DE VILLAVICENCIO (IED)**					**SEMANA 47**				**Observa**
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	540.76			540.76		$ 4,233.48	$ 2,289,294.37	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5 x5 anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M)	M	35.00			35.00		$ 31,110.25	$ 1,088,858.61	$ -	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	107.30		-	307.00		$ 69,099.55	$ 21,213,562.74	$ (13,799,181.00)	286.11%	286.11%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)+	M2	361.42			361.42		$ 32,594.26	$ 11,780,216.00	$ -	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN Y/O DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE COMPUESTO POR MALLA ESLABONADA, ANTEPECHO EN LADRILLO, VIGA DE CIMENTACIÓN Y COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO, PARAL	M2	120.00			120.00		$ 108,358.36	$ 13,003,003.55	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	37.24			36.65		$ 91,988.38	$ 3,371,374.26	$ 54,273.00	98.42%	98.42%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	22.04			32.04		$ 176,060.25	$ 5,640,970.35	$ (1,760,602.00)	145.37%	145.37%	
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	9.00	(1.00)	8.00	8.00		$ 875,947.70	$ 7,007,581.56	$ 875,948.00	88.89%	88.89%	
CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI ANCHO 0.50 M E= 0.07 M (NO INCLUYE REFUERZO)	M	50.40			50.40		$ 164,788.00	$ 8,305,315.20	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL REFORZADO EN MALLA PREONDULADA CALIBRE 8 HUECO 2", ÁNGULO 1" X 1/8" PISA MALLA EN ÁNGULO DE 3/4" X 1/4", PARALES DE 2 1/2" X 2 1/2" EN 3 MM CON SUJETADORES DE VARILLA DE 5/8" Y REFUERZOS DIAGONALES EN PLATINA DE 1-1/2"* 1/8" (INCLUYE TODOS LOS INSUMOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE)	M2	120.00			120.00		$ 503,048.36	$ 60,365,803.28	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CÁRCAMO EN CONCRETO (25 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR.	M	9.00	1.50	10.50	12.50		$ 320,598.77	$ 4,007,484.69	$ (1,122,096.00)	138.89%	138.89%	
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	m3	94.84			93.39		$ 34,724.48	$ 3,242,919.64	$ 50,351.00	98.47%	98.47%	
RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INLUYE REFUERZO).	M2	6.30			6.30		$ 193,997.00	$ 1,222,181.10	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ZANJA DE 0.3 X 0.3 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000, GRAVA 3/4" Y PASES PVC LONGITUD MAX 0.3 M CADA 3 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	54.00			57.40		$ 89,213.28	$ 5,120,842.55	$ (303,325.00)	106.30%	106.30%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	M2	25.00			25.00		$ 11,730.42	$ 293,260.61	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	45.00	20.35	65.35	85.35		$ 91,590.40	$ 7,817,240.55	$ (3,695,673.00)	189.67%	189.67%	
ZAPATA EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	1.92			1.92		$ 1,023,205.00	$ 1,964,553.60	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	767.00	75.00	842.00	842.00		$ 7,103.01	$ 5,980,735.68	$ (532,726.00)	109.78%	109.78%	

DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE COMPUESTO POR MALLA ESLABONADA Y PARAL EN PERFIL DE ACERO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2			116.85	136.85		$ 62,810.05	$ 8,595,555.16	$ (1,256,201.00)	117.12%	117.12%	
PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2	373.66		405.33	405.33		$ 115,264.41	$ 46,720,121.60	$ (3,650,424.00)	108.48%	108.48%	
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	224.08		120.00	85.00		$ 21,599.09	$ 1,835,922.74	$ 3,004,002.00	70.83%	70.83%	
PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M	36.48		207.47	207.47		$ 17,208.00	$ 3,570,143.76	$ (2,942,396.00)	100.00%	100.00%	
SUMNINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO 50 MM FILTRO UV. INCLUYE RELLENO EN CAUCHO GRANULAR.	M2	26.70			26.70		$ 274,938.00	$ 7,340,844.60	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO HETEROGENEO ALTO TRÁFICO	M2	36.69			36.69		$ 237,210.00	$ 8,703,234.90	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 3 CM PARA EXTERIORES	M2	116.34			116.34	54.85	$ 575,981.00	$ 67,009,629.54	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA; PERFILES ESTUCTURALES DE ACERO GALVANIZADO PGU, MONTANTES, TORNILLOS PARA ESTRUCTURA, CLAVO IMPACTADO ACABADO A DOS	M2	31.60			23.54	11.06	$ 222,048.00	$ 5,227,009.92	$ 1,789,707.00	74.49%	74.49%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS - BARANDA PERIMETRAL EN PLATINAS + TUBULARES METÁLICOS H= 1.20 M. PLATINA SUPERIOR E INFERIOR A= 2 1/2" + TUBOS VERTICALES REDONDOS Ø3/4" CADA 9 CM	M	3.86			3.86	0.66	$ 753,890.00	$ 2,910,015.40	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 6" INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE RELLENO)	M	68.00			68.00		$ 141,729.70	$ 9,637,619.63	$ -	100.00%	100.00%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. CIUDAD DE VILLAVICENCIO	**$ 325,265,295.61**				

CPF	1943	IED	RAFAEL URIBE URIBE (IED)					SEMANA 47				Observa
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	52.03			52.03	52.03	$ 4,233.48	$ 220,267.75	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	14.00			14.00	14.00	$ 31,110.25	$ 435,543.44	$ -	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	21.78			5.45	5.45	$ 22,300.62	$ 121,538.40	$ 364,236.00	25.02%	25.02%	
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	44.18			12.46	12.46	$ 12,649.16	$ 157,608.55	$ 401,231.00	28.20%	28.20%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	7.56			3.78	3.78	$ 33,174.37	$ 125,399.11	$ 125,399.00	50.00%	50.00%	
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	22.00			7.00	7.00	$ 27,281.50	$ 190,970.50	$ 409,223.00	31.82%	31.82%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	36.28			8.42	8.42	$ 32,594.26	$ 274,443.64	$ 908,076.00	23.21%	23.21%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. RAFAEL URIBE	**$ 1,525,771.39**				


CPF	561	IED	LOS COMUNEROS - OSWALDO GUAYAZAMIN (IED)					SEMANA 47				Observa
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	51.32			51.32	51.32	$ 4,233.48	$ 217,261.98	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	22.00			22.00	22.00	$ 31,110.25	$ 684,425.41	$ -	100.00%	100.00%	


DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	21.78		-	3.29	3.29	$ 22,300.62	$ 73,369.05	$ 412,339.00	15.11%	15.11%	
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	76.20			14.10	14.10	$ 12,649.16	$ 178,315.23	$ 785,551.00	18.50%	18.50%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	7.82			2.81	2.81	$ 33,174.37	$ 93,219.98	$ 166,204.00	35.93%	35.93%	
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	22.00			10.00	10.00	$ 27,281.50	$ 272,815.00	$ 327,378.00	45.45%	45.45%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	51.32			6.42	6.42	$ 32,594.26	$ 209,255.12	$ 1,463,482.00	12.51%	12.51%	
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. OSWLADO GUAYAZAMIN							**$ 1,728,661.77**				

PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA	**89.24%**
ACUMULADO EJECUTADO A LA FECHA $	**2,658,007,293.44**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $	**2,978,619,155.00**


AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS POR SEDE - Octubre 04 2026						
SEDE EDUCATIVA	PROGRAMADO ACUMULADO		EJECUTADO ACUMULADO		TOTAL POR SEDE	% DE ADELANTO O ATRASO
ORLANDO FALS BORDA	$ 156,929,148.00	100.00%	$ 156,929,147.99	100.00%	$ 156,929,148.00	ENTREGADO
UNION EUROPEA	$ 169,766,274.00	100.00%	$ 169,766,274.00	100.00%	$ 169,766,274.00	ENTREGADO
SIERRA MORENA	$ 118,699,548.00	100.00%	$ 118,699,548.00	100.00%	$ 118,699,548.00	ENTREGADO
FABIO LOZANO	$ 245,187,661.00	100.00%	$ 245,187,661.00	100.00%	$ 245,187,661.00	ENTREGADO
ARBORIZADORA BAJA	$ 630,139,470.00	100.00%	$ 630,139,470.00	100.00%	$ 630,139,470.00	ENTREGADO
BUENAVISTA	$ 186,826,436.00	100.00%	$ 186,826,436.00	100.00%	$ 186,826,436.00	ENTREGADO
ESTRELLA DEL SUR - B	$ 78,637,768.00	100.00%	$ 78,637,768.00	100.00%	$ 78,637,768.00	ENTREGADO
SANTA LIBRADA	$ 223,822,666.00	100.00%	$ 223,822,666.00	100.00%	$ 223,822,666.00	ENTREGADO
ESTRELLA DEL SUR - A	$ 76,163,937.00	100.00%	$ 76,163,937.00	100.00%	$ 76,163,937.00	ENTREGADO
TENERIFE GRANADA SUR SEDE A	$ 88,940,710.00	100.00%	$ 88,940,710.00	100.00%	$ 88,940,710.00	ENTREGADO
GUILLERMO CANO ISAZA SEDE A	$ 354,505,537.00	100.00%	$ 354,373,946.66	99.96%	$ 354,505,537.00	-0.04%
CIUDAD DE VILLAVICENCIO	$ 349,000,000.00	100.00%	$ 325,265,295.61	93.20%	$ 349,000,000.00	-6.80%
RAFAEL URIBE URIBE (IED)	$ 739,437.66	0.43%	$ 1,525,771.39	0.90%	$ 170,000,000.00	0.46%
LOS COMUNEROS - OSWALDO GUAYAZAMIN (IED)	$ 953,598.38	0.73%	$ 1,728,661.77	1.33%	$ 130,000,000.00	0.60%
TOTALES	$ 2,680,312,191.05	89.99%	$ 2,658,007,293.44	89.24%	$ 2,978,619,155.00	-0.75%

OBSERVACIONES: Al final de este periodo, como aparece consignado en la tabla anterior, encontramos que en la ***IED Guillermo Cano Isaza,*** continúa con un minimo atraso a falta de entrega esta sede, mientras que la ***IED Ciudad de Villavicencio*** presenta un atraso cercano al 7%. En este ériodo iniciaron los frentes de las ***IED Rafael Uribe y Los Comuneros*** , los cuales registran adelantos en promedio del 0.5%. El contrato en general presenta un atraso inferior al 1%.

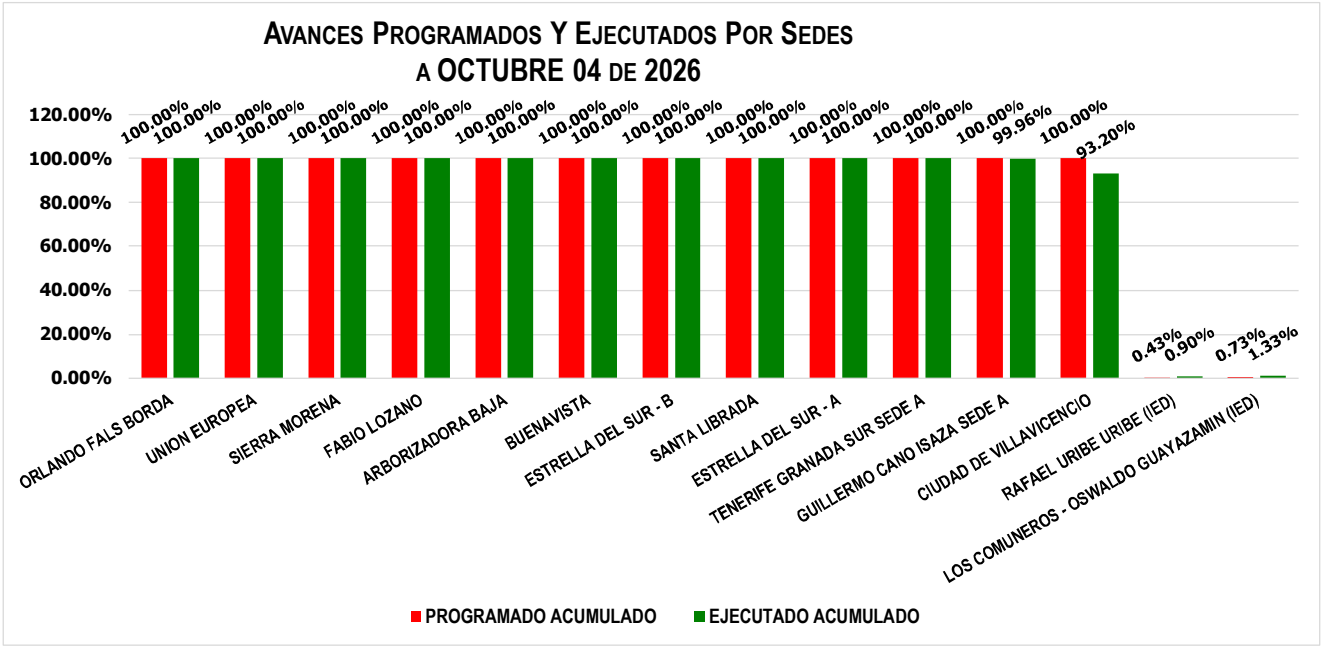

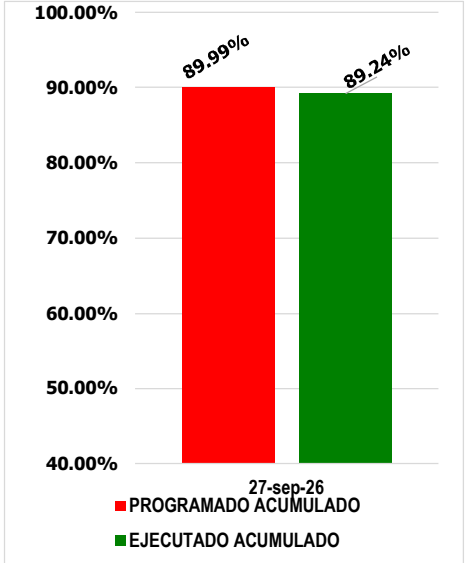

AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS TOTALES - Octubre 04 2026

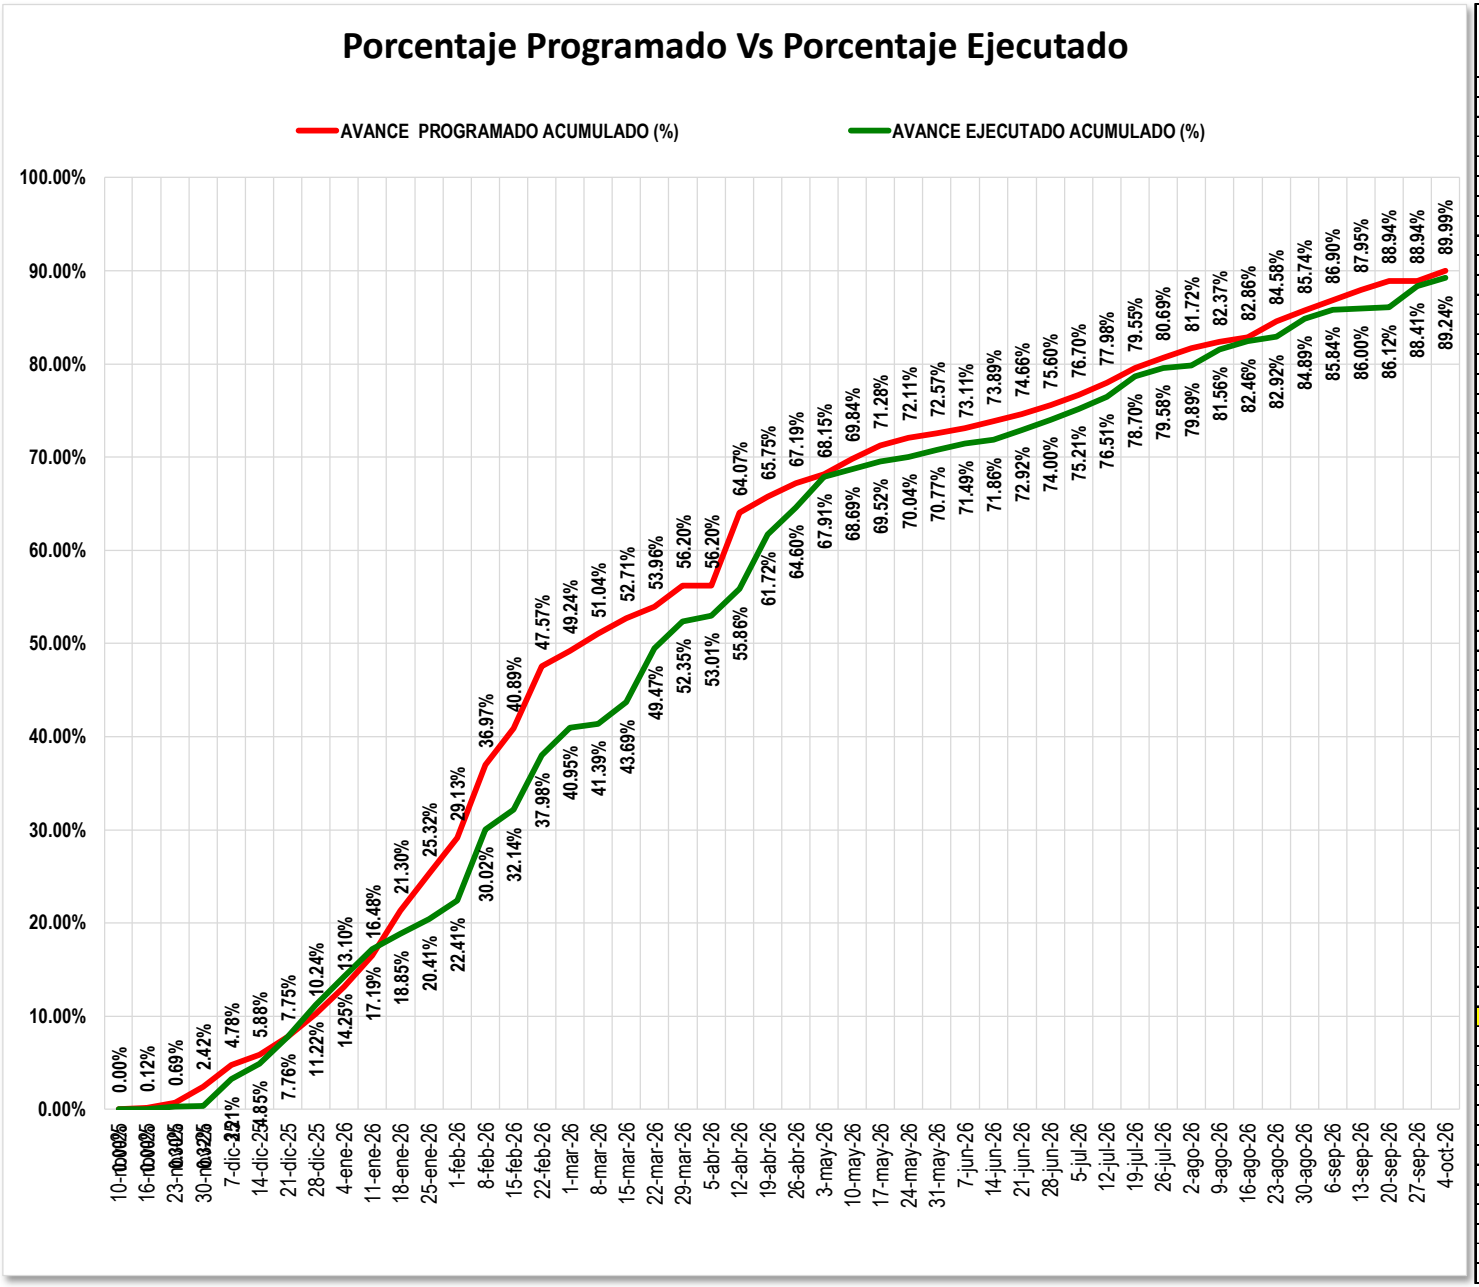

FECHA	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (%)	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO (%)
10-nov-25	0.00%	0.00%
16-nov-25	0.12%	0.00%
23-nov-25	0.69%	0.30%
30-nov-25	2.42%	0.32%
7-dic-25	4.78%	3.21%
14-dic-25	5.88%	4.85%
21-dic-25	7.75%	7.76%
28-dic-25	10.24%	11.22%
4-ene-26	13.10%	14.25%
11-ene-26	16.48%	17.19%
18-ene-26	21.30%	18.85%
25-ene-26	25.32%	20.41%
1-feb-26	29.13%	22.41%
8-feb-26	36.97%	30.02%
15-feb-26	40.89%	32.14%
22-feb-26	47.57%	37.98%
1-mar-26	49.24%	40.95%
8-mar-26	51.04%	41.39%
15-mar-26	52.71%	43.69%
22-mar-26	53.96%	49.47%
29-mar-26	56.20%	52.35%
5-abr-26	56.20%	53.01%
12-abr-26	64.07%	55.86%
19-abr-26	65.75%	61.72%
26-abr-26	67.19%	64.60%
3-may-26	68.15%	67.91%
10-may-26	69.84%	68.69%
17-may-26	71.28%	69.52%
24-may-26	72.11%	70.04%
31-may-26	72.57%	70.77%
7-jun-26	73.11%	71.49%
14-jun-26	73.89%	71.86%
21-jun-26	74.66%	72.92%
28-jun-26	75.60%	74.00%
5-jul-26	76.70%	75.21%
12-jul-26	77.98%	76.51%
19-jul-26	79.55%	78.70%
26-jul-26	80.69%	79.58%
2-ago-26	81.72%	79.89%
9-ago-26	82.37%	81.56%
16-ago-26	82.86%	82.46%
23-ago-26	84.58%	82.92%
30-ago-26	85.74%	84.89%
6-sep-26	86.90%	85.84%
13-sep-26	87.95%	86.00%
20-sep-26	88.94%	86.12%
27-sep-26	88.94%	88.41%
4-oct-26	**89.99%**	**89.24%**
11-oct-26	90.76%	0.00%
18-oct-26	91.53%	0.00%
25-oct-26	92.30%	0.00%
1-nov-26	93.07%	0.00%
8-nov-26	93.84%	0.00%
15-nov-26	94.61%	0.00%
22-nov-26	95.38%	0.00%
29-nov-26	95.38%	0.00%
6-dic-26	96.15%	0.00%
13-dic-26	96.92%	0.00%
20-dic-26	97.69%	0.00%
27-dic-26	98.46%	0.00%
30-dic-26	100.00%	0.00%

ANEXO No. 06. MODIFICATORIO No.3 DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Radicado N° I-2026-125967
Fecha: 25-09-2026 - 09:36
Folios: 199 Anexos: 198
Radicador: ANDRES IVANNO GALEANO TORO - 4300
Destino: 5220 - OFICINA DE CONTRATOS
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el codigo de verificación: GEPGV

MEMORANDO

Para: **ANA MARIA BRICEÑO CAMPOS**
Jefe Oficina de Contratos - SED

DE: **ANDRÉS IVANNÓ GALEANO TORO**
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Secretaría de Educación del Distrito.

Asunto: **Remisión de solicitud de modificación contractual No 3 del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR. 8169110 de septiembre de 2025** cuyo objeto es: **"***Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la secretaría de educación del distrito, así como la ejecución de obras menores, que permiten a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas"* – *Lote 2.*

Respetada Ana María,

Conforme a su competencia, remito para su trámite la solicitud de modificación contractual No. 3 del contrato indicado en el asunto. Lo anterior tiene como propósito efectuar una prórroga de 2 meses y 25 días, así como la adición del contrato por un valor ***CIENTO TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($131.696.241)*** incluido impuestos, tasas y contribuciones, y todos los costos directos e indirectos a que haya lugar, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato.

En consecuencia, el plazo total de ejecución del contrato será de catorce (14) meses y veinticinco (25) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

Cordialmente,

ANDRÉS IVANNÓ GALEANO TORO.
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos

Anexo: Solicitud de modificación contractual y anexos

Proyectó: Santiago Ángel Uribe – Contratista DCCEE

Revisó: Paola Ruiz Manotas – Contratista DCCEE

Revisó: Paula Andrea Panesso Sánchez – Líder jurídica contratista DCCEE

FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	
1. DATOS DEL CONTRATO.	
NO. CONTRATO:	CO1.PCCNTR.8169110 DE 2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO conformado por: **ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO SAS NIT. 901.094.289-2** — **50%** **SEIING SAS NIT. 900.208.425-6** — **50%**
NOMBRE IDENTITARIO[1]:	N/A
SUPERVISOR/INTERVENTOR	**ARQ. JORGE ALBERTO MORENO** Supervisor Designado Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITEN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS – LOTE 2
VALOR INICIAL:	**SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS M/CTE. ($796.184.131,00)** incluido IVA y demás tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación
PLAZO INICIAL:	Siete (7) meses
FECHA DE INICIO:	6 de octubre de 2025

1.1. GESTIÓN DEL TIEMPO:

Acto que afecta el plazo (prórroga/suspensión)	Fecha de suscripción	Impacto en el plazo.
MODIFICACIÓN CONTRACTUAL No. 1 - Prórroga	23-12-2025	El contrato fue prorrogado por el término de 1 mes y 15 días, quedando como fecha de terminación el 20 de junio de 2026.
MODIFICACIÓN CONTRACTUAL No. 2 - Prórroga	05-06-2026	El contrato fue prorrogado por el término de 3 meses y 15 días, quedando como fecha de terminación el 05 de octubre de 2026.

1.2. GESTIÓN DE COSTOS

Acto que afecta el valor del contrato (Adición/Disminución)	Fecha de suscripción	Impacto en el valor
MODIFICACIÓN CONTRACTUAL No. 1 - Adición	23-12-2025	Se adicionó el valor del contrato por la suma de **CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($128.425.720)** equivalente a **90.21 SMMLV** para la vigencia 2025, quedando el valor total del contrato en la suma de **NOVECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL**

[1] Numeral 5 Directiva 005 de 2021 Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. - Secretaría Distrital de Planeación

		OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($924.609.851) INCLUIDO AIU.
MODIFICACIÓN CONTRACTUAL No. 2 - Adición	05-06-2026	Se adicionó el valor del contrato por la suma de **CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($162.875.214)** equivalente a **93.02 SMMLV** para la vigencia 2026, quedando el valor total del contrato en la suma de **MIL OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1.087.485.065)** INCLUIDO AIU.
1.3. GESTIÓN DE ALCANCE/CALIDAD.		
Acto que afecta el alcance del contrato (Modificaciones, cesiones, aclaratorios).	**Fecha de suscripción.**	**Impacto en las condiciones del contrato**
MODIFICACIÓN CONTRACTUAL No. 1	23-12-2025	Se aprobó la modificación descrita con el fin de realizar la interventoría integral a los contratos de obra CO1.PCCNTR.8155135, CO1.PCCNTR.8154895 y CO1.PCCNTR.8154780 en la ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo a los frentes de obra a los que le fueron aprobados la ejecución de mayores cantidades de obra, así como la inclusión de nuevas sedes para su intervención así: **LOTE 4:** Mayores cantidades de obra para los colegios IED LOS TEJARES SEDE A - CPF 539 e IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A - CPF 576. **LOTE 5:** Mayores cantidades de obra para los colegios IED JOSÉ JAIME ROJAS - CPF 1934 e I ED LA JOYA DON BOSCO 1 - CPF 1973. **LOTE 6:** La inclusión de nuevos colegios IED GUILLERMO CANO ISAZA - CPF 1959 e IED TENERIFE GRANADA SUR SEDE A - CPF 548. .
MODIFICACIÓN CONTRACTUAL No. 2	05-06-2026	Se aprobó la modificación descrita con el fin de realizar la interventoría integral a los contratos de obra CO1.PCCNTR.8155135, CO1.PCCNTR.8154895 y CO1.PCCNTR.8154780 en la ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo a los frentes de obra a los que le fueron aprobados la ejecución de mayores cantidades de obra, así como la inclusión de nuevas sedes para su intervención así: **LOTE 4:** Mayores cantidades de obra para los colegios IED COMPARTIR EL RECUERDO SEDE A - CPF 1911 e IED

		CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE SEDE A - CPF 1912 y la inclusión de un nuevo colegio IED ARBORIZADORA ALTA SEDE B – CPF 1940 . **LOTE 5:** Mayores cantidades de obra para el colegio IED MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA SEDE A - CPF 540 y la inclusión de dos nuevos colegios IED PARAÍSO MIRADOR SEDE D - CPF 1982 e IED RODRIGO LARA BONILLA SEDE B – CPF 1921. **LOTE 6:** La inclusión de nuevo colegio IED CIUDAD DE VILLAVICENCIO SEDE B - CPF 545
1.4 FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN:		**1.5 VALOR ACTUAL**
05 DE OCTUBRE DE 2026		**MIL OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1.087.485.065)** incluido IVA.

2. GESTIÓN DE INTEGRACIÓN DEL CONTRATO

AVANCE FÍSICO - EJECUCIÓN:	**AVANCE FINANCIERO**	
El avance del contrato de interventoría es del 86.76% de acuerdo con el Acta Parcial de Interventoría No. 9 a corte del 05 de agosto de 2026 (SECOP II), y con respecto a los contratos de obra objeto de interventoría, se precisa: **Contrato de obra CO1.PCCNTR.8155135 de 2025:** presenta un avance de ejecución del 97.89% conforme al informe semanal No. 43 con fecha de corte al 6-09-2026, frente al avance programado del 97.19%. Presenta nueve (9) frentes contractuales así: 1. IED FANNY MICKEY: Finalizado 2. IED ESTRELLA DEL SUR D: Finalizado 3. IED ESTRELLA DEL SUR C: Finalizado 4. IED CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE: Finalizado 5. IED COMPARTIR EL RECUERDO A: Finalizado 6. IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR: Finalizado 7. IED OFELIA URIBE DE ACOSTA A: Finalizado 8. IED LOS TEJARES A: Finalizado 9. IED ARBORIZADORA ALTA B: En ejecución con el 83.26% de avance **Contrato de obra CO1.PCCNTR.8154895 de 2025**: presenta un avance de ejecución del **94.03%** conforme al informe semanal No. 43 con fecha de corte al 06-09-2026, frente al avance programado del 93.74% Presenta once (11) frentes contractuales así: 1. IED LA ARABIA: Finalizado 2. IED LUIS EDUARDO MORA OSEJO: Finalizado 3. IED BICENTENARIO TESORO DE LA CUMBRE: Finalizado 4. IED JOSÉ JAIME ROJAS: Finalizado	A la fecha el avance de ejecución financiero es del **81.3%** equivalente a $884.211.425, lo que corresponde a: - **ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 1** por $45´496.236, valor ya pagado por la entidad. - **ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 2** por $45´496.236, valor ya pagado por la entidad. - **ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 3** por $141´587.751, valor ya pagado por la entidad. - **ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 4** por $79´227.162, valor ya pagado por la entidad. - **ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 5** por $68´288.881, valor ya pagado por la entidad - **ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 6** por $265´552.288, valor ya pagado por la entidad - **ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 7** por $116´772.108, valor ya pagado por la entidad - **ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 8** por $121´790.763, valor ya pagado por la entidad Pendiente por ejecución financiera $203.273.640 correspondiente a un **18.7%** La diferencia entre el avance físico y el avance financiero del contrato obedece a que, al 7/09/2026, el acta parcial de obra No. 9, por $59.273.750, se encuentra en trámite de pago por la entidad.	
	Valor pagado:	**$884.211.425**
	Valor pendiente de Pago:	**$203.273.640**

5. IED MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA: En ejecución con el 84.96% de avance 6. IED JOSÉ MARÍA VARGAS VILA: Finalizado 7. IED ATABANZHA: Finalizado 8. IED LA JOYA DON BOSCO 1: Finalizado 9. IED BRASILIA: Finalizado 10. PARAISO MIRADOR: En ejecución con el 88.86% de avance 11. RODRIGO LARA BONILLA: En ejecución con el 61.54% de avance **Contrato de obra CO1.PCCNTR.8154780 de 2025**: presenta un avance de ejecución del 95.45**%** conforme al informe semanal No. 43 con fecha de corte al 06-09-2026, frente al avance programado del 95.34% El contrato cuenta con doce (12) frentes contractuales así: 1. IED ORLANDO FALS BORDA: Finalizado 2. IED UNION EUROPEA B: Finalizado 3. IED SIERRA MORENA C: Finalizado 4. IED FABIO LOZANO SIMONELLI A: Finalizado 5. IED ARBORIZADORA BAJA A: Finalizado 6. IED CALASANZ BUENAVISTA: Finalizado 7. IED ESTRELLA DEL SUR B: Finalizado 8. IED SANTA LIBRADA: En ejecución con el Finalizado 9. IED ESTRELLA DEL SUR A: Finalizado 10. IED TENERIFE GRANADA SUR A: Finalizado 11. IED GUILLERMO CANO ISAZA: En ejecución con el 99.96% de avance 12. IED CIUDAD DE VILLAVICENCIO B: En ejecución con el 65.13% de avance		

3. GESTIÓN DE RIESGOS

3.1 GARANTÍAS

Amparos	Último anexo	Vigencia final	Valor asegurado final.	Fecha de aprobación.
Póliza de Cumplimiento No. BCH100046043 **Cumplimiento**	Anexo No. 07	05-04-2027	$ 217´497.013,00	16 de junio de 2026
Póliza de Cumplimiento No. BCH100046043 **Pagos de salarios y prestaciones**		05-10-2029	$ 108´748.506,50	
Póliza de Cumplimiento No. BCH100046043 **Estabilidad y Calidad de Obras**		05-10-2031	$217´497.013,00	

3.2 RIESGOS.

Una vez revisada la matriz de riesgos incorporada en los documentos del proceso de contratación del cual se derivó el Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110 de 2025, así como el alcance de la modificación contractual propuesta, se observa que esta no introduce tipologías de riesgo distintas a las inicialmente identificadas, ni altera su asignación entre las partes.

La modificación solicitada tiene como finalidad garantizar la continuidad del seguimiento y control integral a los contratos de obra Nos. CO1.PCCNTR.8155135 de 2025, CO1PCCNTR.8154895 de 2025 y CO1.PCCNTR.8154780 de 2025, los cuales fueron objeto de modificación en valor y plazo para atender la incorporación de nuevos frentes de intervención. En este sentido, la presente modificación permite asegurar el acompañamiento técnico, administrativo, financiero jurídico, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo requerido durante el plazo adicional de ejecución de los contratos objeto de interventoría.

Así las cosas, la adición de recursos y prórroga del contrato de interventoría guardan correspondencia con la necesidad de mantener la vigilancia, control y verificación especializada sobre las obras a cargo, bajo las mismas condiciones contractuales y sin modificar el objeto ni la naturaleza del contrato. Por tanto, las actividades de interventoría que se desarrollarán durante el plazo adicional se enmarcan en las mismas obligaciones y funciones originalmente pactadas.

De otra parte, las circunstancias que dan lugar a la presente modificación corresponden a la dinámica propia de los contratos objeto de seguimiento, en los cuales se identificaron necesidades adicionales de intervención que requieren la continuidad del control integral por parte de la interventoría. En consecuencia, no se advierte que la modificación genere riesgos autónomos o no previstos en la etapa de estructuración, ni que implique una variación de las condiciones técnicas, jurídicas, financieras o administrativas inicialmente analizadas.

En consecuencia, se concluye que los mecanismos de asignación y tratamiento de riesgos definidos desde la etapa precontractual se mantienen vigentes y resultan suficientes frente a la modificación planteada, sin que se requiera la actualización de la matriz de riesgo.

4. TIPO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		
OPCIÓN 1. ADICIÓN O DISMINUCIÓN DE VALOR	**CDP No.**	1606
	Opción 1. Valor de la adición:	**CIENTO TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($131.696.241)** incluido IVA
	Porcentaje de la adición:	13.44%
	Valor final del contrato:	**MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($1.219.181.306)** incluido IVA, impuestos, tasas y contribuciones, y todos los costos directos e indirectos a que haya lugar.
OPCIÓN 2. PRÓRROGA	**Plazo inicial:**	12 meses
	Plazo por prorrogar:	2 meses y 25 días
	Porcentaje de la prórroga:	23.61%
	Fecha de terminación prevista teniendo en cuenta la prórroga:	**30 DE DICIEMBRE DE 2026**
OPCIÓN 6. OTRAS MODIFICACIONES.	**1. MODIFICACION DEL EQUIPO DE TRABAJO Y PORCENTAJE DE DEDICACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.8169110 – 2025** Se modifica el numeral “6.1. EQUIPO DE TRABAJO” del ANEXO TÉCNICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA y la cláusula 10, LITERAL “G.7. EQUIPO DE TRABAJO” de la MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA en el sentido de disminuir el equipo de trabajo, así como el porcentaje de dedicación del personal así:	

Cantidad.	**Cargo**	**Título profesional**	**Título de posgrado**	**Experiencia general (años mínimos)**	**Experiencia específica (años mínimos)**	**Porcentaje de dedicación durante la ejecución del proyecto.**	**Plazo de ejecución**

1	Director de Interventoría	Ingeniero Civil y/o Arquitecto y/o Constructo r en Ingeniería y Arquitectura	Posgrado en Gerencia de proyectos o afines.	Seis (6) años de experiencia a partir de la expedición de la tarjeta profesional conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 842 de 2003*	Dos (2) años de experiencia como director de interventoría en contratos de mejoramiento, y/o construcción, y/o reparaciones locativas y/o ampliación de edificaciones.	100%	2 meses y 25 días calendario
1	Profesional de Apoyo	Ingeniero Civil y/o Arquitecto y/o Constructor en Ingeniería y Arquitectura	N. A	Cuatro (4) años de experiencia a partir de la expedición de la tarjeta profesional conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 842 de 2003*	Un (1) año de experiencia como director y/o residente de interventoría en contratos de mejoramiento, y/o construcción, y/o reparaciones locativas y/o ampliación de edificaciones.	100% El Personal deberá ejercer sus obligacione s en obra durante la totalidad del plazo de ejecución del contrato	2 meses y 25 días calendario
1	Residente de Interventoría	Ingeniero Civil y/o Arquitecto y/o Constructor en Ingeniería y Arquitectura	N. A	Cuatro (4) años de experiencia a partir de la expedición de la tarjeta profesional conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 842 de 2003*	Tres (3) años de experiencia como residente de obra y/o interventoría en contratos de mejoramiento, y/o construcción, y/o reparaciones locativas y/o ampliación de edificaciones.	100% El Personal deberá ejercer sus obligaciones en obra durante la totalidad del plazo de ejecución del contrato	2 meses y 25 días calendario
1	Especialista ambiental	Ingeniero civil o ingeniero ambiental	Posgrado en el área del Medio Ambiente *(aplica para el ingeniero civil)*	Cinco (5) años de experiencia a partir de la expedición de la tarjeta profesional conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 842 de 2003*	Tres (3) años de experiencia a como Asesor ambiental y/o residente ambiental en contratos de mejoramiento, y/o construcción, y/o reparaciones locativas y/o ampliación de edificaciones.	15%	2 meses y 25 días calendario
1	Técnico en Seguridad y Salud en el trabajo.	Técnico o tecnólogo en Seguridad y Salud en el Trabajo o HSEQ o profesional en ingeniería o arquitectura Debe tener Licencia en Seguridad	N. A	Dos (2) años de experiencia a partir de la terminación de materias o la expedición de la matrícula y/o tarjeta profesional según	Un (1) año de experiencia en Seguridad y Salud en el Trabajo en contratos de MEJORAMIENTO, Y/O CONSTRUCCION, Y/O REPARACIONES LOCATIVAS Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.	100% El Personal deberá ejercer sus obligaciones en obra durante la totalidad del plazo de ejecución del contrato	2 meses y 25 días calendario

		y Salud en el Trabajo vigente		corresponda. En caso de que acredite título en ingeniería, la experiencia se contabiliza conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 842 de 2003*			
1	Inspector de interventoría	Técnico o tecnólogo profesional en Construcción	N. A	Dos (2) años de experiencia a partir de la expedición de la matrícula correspondiente.	Un (1) año de experiencia como inspector en construcción en contratos de mejoramiento, y/o construcción, y/o reparaciones locativas y/o ampliación de edificaciones.	100% El Personal deberá ejercer sus obligaciones en obra durante la totalidad del plazo de ejecución del contrato	2 meses y 25 días calendario

5. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:

5.1 JUSTIFICACIÓN Y/O CONCEPTOS DE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN No. 03 PRESENTADA POR EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

La Secretaría de Educación ha justificado la necesidad de prorrogar y adicionar los contratos de obra No. CO1.PCCNTR.8155135 de 2025, CO1.PCCNTR.8154895 de 2025 y CO1.PCCNTR.8154780 de 2025 para los lotes 4, 5 y 6, por lo cual es necesario continuar con la salvaguarda y seguimiento del control técnico, administrativo, financiero, y jurídico sobre estos.

En la actualidad debido a la carga y funciones que se vienen desempeñando por los funcionarios que integran la Dirección se identifica la necesidad de continuar con el acompañamiento especializado que se ha contratado con la interventoría, CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO a quienes se requirió mediante comunicación No. SERINCO-SED-INT-2025-675 de fecha 24 de agosto de 2026, referente a su capacidad y disponibilidad frente a la solicitud realizada para continuar con el seguimiento y acompañamiento de los contratos manifestado lo siguiente:

"(…)

Dicha modificación está basada en la necesidad manifestada por Entidad, así:

*1. Mejoras en las condiciones físicas del plantel educativo **I.E.D. JOSÉ CELESTINO MUTIS Sede A**, con actividades de impermeabilización integral de las cubiertas en placa correspondientes al Bloque 1 mediante sistema de manto asfáltico, incluido el retiro del sistema impermeabilizante existente, la preparación y adecuación de superficies y el tratamiento de puntos críticos, los cuales pertenecen a la adición del Lote 4.*

*2. Mejoras en las condiciones físicas del plantel educativo **I.E.D. NUEVO SAN ANDRÉS DE LOS ALTOS Sede A**, con actividades de adecuación del espacio destinado al sistema de almacenamiento de agua potable, suministro e instalación de tanques, redes y accesorios hidráulicos, sistema de drenaje y las instalaciones eléctricas requeridas para la operación del cuarto de motobombas, los cuales pertenecen a la adición del Lote 5.*

*3. Incluir las actividades a realizar en las instituciones educativas **I.E.D. RAFAEL URIBE URIBE Sede A**, con actividades de adecuación integral de baterías sanitarias de los bloques de Preescolar (Ciclo I) y de bachillerato, cambio de cubierta y adecuación de instalaciones eléctricas asociadas, e **I.E.D. OSWALDO GUAYASAMÍN – LOS COMUNEROS Sede B**, con actividades de adecuación integral de las baterías sanitarias del bloque de bachillerato de primer piso y adecuación de baño para población con movilidad reducida, los cuales pertenecen a la adición del Lote 6.*

*En aras de dar cumplimiento a los lineamientos contractuales y a razón de las adiciones y prórroga del **CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8155135**, **CONTRATO DE OBRA No.CO1.PCCNTR.8154895** y **CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8154780** que*

mediante la Resolución 0012 del 28 de marzo de 2025 la Entidad abrió el Proceso de Contratación SED-LPOP-DCCEE-012-2025 y que por medio de la Resolución 0068 del 25 de julio de 2025, corregida mediante Resolución 0071 del 5 de agosto de 2025, la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista, entre la Secretaría de Educación del Distrito (SED) con NIT. 860.532.363 quien actúa en calidad de contratante y los respectivos consorcios quienes actúan en calidad de contratista.

El Contratista de interventoría solicita una adición y prórroga del ***CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.8169110*** *que la Entidad abrió mediante el Proceso de selección de CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-018-2025 y que, en relación con la LICITACIÓN PÚBLICA No. SED-LP-OP-DCCEE-012-2025, posteriormente la Entidad adjudicó el Contrato a la interventoría entre la Secretaría de Educación del Distrito (SED) con NIT. 860.532.363 quien actúa en calidad de contratante y el CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO identificado con NIT. 901.977.271-0 quien actúa en calidad de interventoría, de lo cual esta interventoría se permite conceptuar:*

(…)

2. ANTECEDENTES

(…)

2.7. No obstante, y conforme con la dinámica del contrato de obra, la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO ha identificado que siguen persistiendo necesidades en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar, las cuales son susceptibles de intervención, con necesidades particulares en cuanto a obras de adecuación, mejoramiento y/o mantenimiento correctivo y/o el requerido, con el fin de mejorar las condiciones de las infraestructuras físicas distritales.

2.8. Por lo que se plantea la necesidad de incluir unas obras adicionales al alcance de los contratos de obra de las siguientes sedes educativas, de lo cual la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO planteó las necesidades de intervención adicional al presupuesto inicial:

LOTE 4:

NOMBRE SEDE EDUCATIVA	SEDE	DIRECCIÓN	LOCALIDAD
CPF 1985 José Celestino Mutis	A	Km 10 vía Quiba, Predio El Clavel – Mochuelo Bajo	Ciudad Bolívar

La adición del presente lote se justifica por la incorporación de nuevas actividades requeridas por el colegio anteriormente mencionado, situación que responde a las motivaciones expuestas en el cuerpo de este oficio. En consecuencia, como se indicó previamente, se adicionan actividades correspondientes a una sede adicional respecto de las ya contratadas.

LOTE 5:

NOMBRE SEDE EDUCATIVA	SEDE	DIRECCIÓN	LOCALIDAD
CPF 543 Nuevo San Andrés de los Altos	A	Calle 69 Sur No. 2 B - 15	Usme

La adición del presente lote se justifica por la incorporación de nuevas actividades requeridas por el colegio anteriormente mencionado, las cuales serán agregadas al presente contrato. Esta situación obedece a las motivaciones expuestas en el cuerpo de este oficio. En consecuencia, como se indicó previamente, se adicionan actividades correspondientes a una sede adicional respecto de las ya contratadas.

LOTE 6:

NOMBRE SEDE EDUCATIVA	SEDE	DIRECCIÓN	LOCALIDAD
CPF 1943 Rafael Uribe Uribe	A	Diagonal 71 B Sur No. 18 I - 20	Ciudad Bolívar
CPF 561 Los Comuneros – Oswaldo Guayasamín	B	Calle 94 Sur No. 3 B - 53	Usme

La adición del presente lote se justifica por la incorporación de nuevas actividades requeridas por los colegios anteriormente mencionados, las cuales serán agregadas al presente contrato, así como por la disponibilidad de recursos destinados a la atención de emergencias. Esta situación obedece a las motivaciones expuestas en el cuerpo de este oficio. En consecuencia, como se indicó previamente, se adicionan actividades correspondientes a dos sedes adicionales respecto de las ya contratadas.

3. MOTIVACIONES

De acuerdo con lo ya detallado y las necesidades planteadas por parte de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, se presenta la solicitud de prórroga y adición requerida para el contrato de interventoría, conforme con las siguientes motivaciones:

3.1. La SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO tiene dentro de sus obligaciones mejorar las condiciones actuales de las instituciones educativas y administrativas de las localidades de Usme y Ciudad Bolívar, con el fin de garantizar el derecho a la Educación de la comunidad educativa, condición que bajo la inclusión de recursos para mejoramientos al contrato de obra puede beneficiar a más población y que a su vez involucra a la interventoría como entidad de control ante los contratos de obra.

3.2. A continuación, se presentan las intervenciones propuestas por la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO y revisadas por parte de Contratista e Interventoría, las cuales son objeto de la solicitud de prórroga y adición:

Se recuerda que la adición de los lotes 4, 5 y 6 se justifica por la incorporación de nuevas actividades en los colegios anteriormente mencionados, situación que responde a las motivaciones expuestas en el cuerpo de este oficio, adicionándose actividades correspondientes a sedes adicionales respecto de las ya contratadas, como se observa a continuación:

➢ **CPF 1985 I.E.D. José Celestino Mutis - Sede A**

El alcance de las obras a ejecutar en esta sede educativa es el siguiente:

- Impermeabilización integral de las cubiertas en placa correspondientes al Bloque 1, mediante la instalación de sistema de manto asfáltico, incluyendo:
  - Retiro del sistema impermeabilizante existente.
  - Preparación y adecuación de superficies.
  - Ejecución de alistados, tratamiento de puntos críticos y actividades complementarias requeridas para garantizar la estanqueidad y el adecuado desempeño del sistema de impermeabilización.

➢ **CPF 543 I.E.D. Nuevo San Andrés de los Altos - Sede A**

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- Adecuación de un espacio destinado al sistema de almacenamiento de agua potable, que incluye:
  - Suministro e instalación de tanques con capacidad mínima de 2.000 litros hasta 4.000 litros.
  - Suministro, instalación y puesta en operación del sistema de abastecimiento hidráulico, incluyendo redes, accesorios, elementos de control, presurización (de ser requerida), sistema de drenaje y conexión a la red hidráulica existente.
  - Construcción de cajas de inspección, de ser necesario.
  - Adecuación e implementación de las instalaciones eléctricas requeridas para la conexión y operación del cuarto de motobombas.

➢ **CPF 1943 I.E.D. Rafael Uribe Uribe - Sede A**

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- Adecuación integral de las baterías sanitarias de niños y niñas del bloque de Preescolar (Ciclo I), incluyendo demoliciones, revisión de redes hidrosanitarias, suministro e instalación de aparatos sanitarios, mesones, orinales, griferías, enchapes de pisos y muros, así como divisiones sanitarias en acero inoxidable.
- Cambio de cubierta y adecuación de instalaciones eléctricas asociadas a las baterías sanitarias del bloque de Preescolar (Ciclo I).
- Adecuación integral de las baterías sanitarias de niños y niñas de primer piso del bloque de bachillerato, incluyendo actividades de demolición, reposición de acabados, suministro e instalación de aparatos sanitarios, mesones, griferías, enchapes, divisiones sanitarias y demás actividades complementarias necesarias para garantizar su correcto funcionamiento.

➢ **CPF 561 I.E.D. Los Comuneros – Oswaldo Guayasamín - Sede B**

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- Adecuación integral de las baterías sanitarias de niños y niñas ubicadas en el bloque de bachillerato, primer piso, incluyendo actividades de demolición, revisión de redes hidrosanitarias, suministro e instalación de aparatos sanitarios, mesones de lavamanos, orinales, griferías, enchapes de pisos y muros, divisiones sanitarias en acero inoxidable y puertas de acceso. La intervención deberá contemplar la adecuación de cajas de inspección existentes, de ser necesario.
- Adecuación de baño para población con movilidad reducida.

3.3. Teniendo en cuenta los alcances indicados, a continuación, se relaciona el balance financiero de cada una de las intervenciones:

De acuerdo con los alcances y estimaciones financieras de las cuatro (4) instituciones educativas relacionadas anteriormente, así como de los recursos destinados a la atención de emergencias, es necesario disponer de una adición presupuestal al contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110, de ***CIENTO TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE. ($131.696.241,00)*** *INCLUIDO IVA y una prórroga de OCHENTA Y CINCO (85) DÍAS CALENDARIO, comprendidos entre el 06 de octubre y el 30 de diciembre de 2026.*

Finalmente, conforme con las necesidades de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO respecto a las sedes a intervenir, esta interventoría concluye lo siguiente:

4. CONCLUSIONES

De acuerdo con las consideraciones expuestas por parte del Contratista y las necesidades requeridas por parte de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, esta Interventoría indica que se realizó la debida revisión de cada uno de los alcances planteados por los Contratistas mediante comunicado del asunto, por lo que emitimos concepto favorable para la inclusión de las siguientes sedes educativas conforme con las actividades contractuales establecidas en el Formulario 1 del proceso licitatorio:

LOTE 4:

NOMBRE SEDE EDUCATIVA	LOCALIDAD	VALOR PRESUPUESTAL	TIEMPO
CPF 1985 José Celestino Mutis – Sede A	Ciudad Bolívar	$ 209.000.000,00	89 días (ochenta y nueve días)

LOTE 5:

NOMBRE SEDE EDUCATIVA	LOCALIDAD	VALOR PRESUPUESTAL	TIEMPO
CPF 543 Nuevo San Andrés de los Altos – Sede A	Usme	$ 140.000.000,00	85 días (ochenta y cinco días)

LOTE 6:

NOMBRE SEDE EDUCATIVA	LOCALIDAD	VALOR PRESUPUESTAL	TIEMPO
CPF 1943 Rafael Uribe Uribe – Sede A	Ciudad Bolívar	$ 170.000.000,00	90 días (noventa días)
CPF 561 Los Comuneros – Oswaldo Guayasamín – Sede B	Usme	$ 130.000.000,00	85 días (ochenta y cinco días)
Atención de emergencias – Lote 6	Usme y Ciudad Bolívar	$ 160.000.000,00	85 días (ochenta y cinco días)

*Lo cual genera la necesidad de disponer de una adición presupuestal al contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110, de **CIENTO TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE. ($131.696.241,00)** INCLUIDO IVA y una prórroga de OCHENTA Y CINCO (85) DÍAS CALENDARIO, es decir, hasta el 30 de diciembre de 2026.*

5. SOLICITUDES

Esta interventoría, de manera atenta, pone a consideración de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO las siguientes solicitudes:

*5.1. ADICIÓN: Con el fin de cumplir con los alcances necesarios en cada una de las sedes educativas planteadas, se solicita disponer de una adición presupuestal al contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110, de **CIENTO TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE. ($131.696.241,00)** INCLUIDO IVA.*

*5.2. PRÓRROGA: Teniendo en cuenta el plazo necesario para la ejecución de las obras de adecuación, mantenimiento y/o mejoramiento en las sedes educativas, se solicita una prórroga al contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110 por el término de **OCHENTA Y CINCO (85) DÍAS CALENDARIO (2.83 MESES),** comprendidos entre el 06 de octubre y el 30 de diciembre de 2026, es decir, hasta el 30 de diciembre de 2026."*

5.2. CONCEPTO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS COMO SUPERVISOR DESIGNADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.8169110 DE 2025

El Supervisor del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110 del 4 de septiembre 2025, designado mediante memorando I-2025-166630 del 4 de diciembre de 2025, con el respaldo del equipo de Apoyo a la Supervisión responsable del seguimiento a las actividades de los contratos de obra, analizó los soportes documentales y los conceptos de conveniencia remitidos por la interventoría mediante el comunicado SERINCO-SED-INT-2025-675 del 24 de agosto de 2026, por medio de la cual sustentan la viabilidad de la Adición No. 3 y Prórroga No. 3 del contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110 de 2025, correspondientes al Modificatorio No. 3. Bajo ese contexto, se determinó lo siguiente:

5.2.1 GENERALIDADES DE LOS CONTRATOS DE OBRA

El Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110 del 4 de septiembre de 2025, fue suscrito para realizar el respectivo seguimiento integral a los contratos de obra No. CO1.PCCNTR.8155135 de 2025 (Lote 4), CO1.PCCNTR.8154895 de 2025 (Lote 5) y CO1.PCCNTR.8154780 de 2025 (Lote 6), los cuales han sido modificados como se describe a continuación:

1. En virtud del Modificatorio No. 03, el Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8155135 de 2025 (Lote No. 04) fue adicionado por la suma de **DOSCIENTOS NUEVE MILLONES DE PESOS ($209´000.000)** con el fin de garantizar la ejecución de un nuevo frente de obra, en consecuencia, el plazo contractual fue prorrogado por **2 MESES y 29 DIAS**, con el objetivo de que se ejecuten las actividades priorizadas por el equipo de conservación en la **IED José Celestino Mutis**, estableciendo como nueva fecha de terminación el 30 de diciembre de 2026. Esta fecha supera la vigencia del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110 de 2025, responsable del seguimiento integral y verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. Por tanto, se hace necesaria la continuidad de la supervisión técnica especializada hasta la finalización de las obras, dada la complejidad de las actividades sociales, ambientales, jurídicas, administrativas y financieras propias de su ejecución.

2. De igual forma, el Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8154895 de 2025 (Lote No. 05) fue adicionado por la suma de **CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS ($140´000.000)** con el fin de garantizar la ejecución de un nuevo frente de obra, en consecuencia, el plazo contractual fue prorrogado **2 MESES y 25 DÍAS**, con el objetivo de que se ejecuten las actividades priorizadas por el equipo de conservación en la **IED Nuevo San Andrés de los Altos**, estableciendo como nueva fecha de terminación al 30 de diciembre de 2026. Esta fecha también supera la vigencia del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110 de 2025, responsable del seguimiento integral y verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. Por tanto, se hace necesaria la continuidad de la supervisión técnica especializada hasta la finalización de las obras, dada la complejidad de las actividades sociales, ambientales, jurídicas, administrativas y financieras propias de su ejecución.

3. Asimismo, el Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8154780 de 2025 (Lote No. 06), fue adicionado por la suma de **CUATROCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS ($460´000.000),** con el fin de garantizar la ejecución de dos nuevos frentes y garantizar la atención de emergencias que se presenten en las sedes educativas y administrativas de la Zona Sur de Bogotá D.C., en consecuencia, el plazo contractual fue prorrogado **3 MESES**, con el objetivo de que se ejecuten las actividades priorizadas por el equipo de conservación en las **IED Rafael Uribe Uribe e IED Los Comuneros Oswaldo Guayasamin**, estableciendo como nueva fecha de terminación al 30 de diciembre de 2026, siendo también esta fecha posterior a la terminación del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110 de 2025, responsable del seguimiento integral y verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. Por tanto, se hace necesaria la continuidad de la supervisión técnica especializada hasta la finalización de las obras, dada la complejidad de las actividades sociales, ambientales, jurídicas, administrativas y financieras propias de su ejecución.

5.2.2 ADICIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA - VALOR

En virtud de la solicitud de modificación, el Supervisor del contrato, junto con el Apoyo a la Supervisión, remitieron al Equipo de Estudios Previos de la SED, mediante radicado I-2026-102081 del 13 de agosto de 2026, la propuesta económica presentada por la interventoría, mediante el comunicado **SERINCO-SED-INT-2025-651** de fecha 13 de agosto de 2026, esto para realizar el seguimiento de los contratos de obra mencionados, el cual fue objeto de alcance por parte de la interventoría mediante comunicado **SERINCO-SED-INT-2025-675** de fecha 24 de agosto de 2026

Sobre el particular el Equipo de Estudios Previos, a través del radicado I-2026-109600 del 27 agosto de 2026, indicó:

"En atención a la solicitud del asunto, el Grupo de Estudios Previos ha efectuado revisión al costeo recibido mediante radicado I-2026-102081 del 13 de agosto de 2026, y aclaración por parte del contratista, recibido mediante correo electrónico el 26 de agosto de 2026, para efectos de la modificación No. 3 (adición y prorroga) al Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR. 8169110 de 2025, de acuerdo con lo descrito en el oficio de interventoría SERINCO-SED-INT-2025-675, referente a la adición de frentes de obra a los colegios:

Lote 04:
• I.E.D. JOSE CELESTINO MUTIS - Sede A

Lote 05:
• I.E.D. NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS – Sede A

Lote 06:
• I.E.D RAFAEL URIBE URIBE -Sede A
• I.E.D LOS COMUNEROS – OSWALDO GUAYASAMÍN – Sede B
• Atención de emergencias – Lote 6

De esta manera, se realizó el cotejo respectivo frente a la información de la verificación aritmética del proceso CM-A-DCCEE-018-2025 encontrando correcta la aplicación de los precios contractuales.

En consecuencia, a partir de la información revisada y suministrada por el apoyo a la supervisión del proyecto, el Área de Estudios Previos concluye, que el valor resultante para la adición, en la verificación aritmética efectuada, es de ***CIENTO TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($131.696.241,00) INCLUIDO I.V.A. DEL 19%.****"*, valor que se encuentra relacionado en la comunicación **SERINCO-SED-INT-2025-675** de fecha 24 de agosto de 2026

OBJETO: "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."

VALOR OFERTA ECONOMICA - ZONA SUR II

Nº	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DEDICACION	PLAZO	PRECIO OFERTADO MES	VALOR TOTAL
1	**COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO**					
1.1	**PERSONAL PROFESIONAL**					
1.1.1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA Cantidad: 1 con una dedicación 100%	1	100%	2,830	$ 9.849.311,00	$ 27.873.550,00
1.1.2	PROFESIONAL DE APOYO Cantidad: 1 con una dedicación 100%	1	100%	2,830	$ 6.296.042,00	$ 17.817.799,00
1.1.3	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Cantidad: 1 con una dedicación 100%	1	100%	2,830	$ 8.930.074,95	$ 25.272.112,00
1.1.5	ESPECIALISTA AMBIENTAL Cantidad: 1 con una dedicación 15%	1	15%	2,830	$ 9.849.311,55	$ 4.181.033,00
1.2	**PERSONAL TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO**					
1.2.1	TÉCNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Cantidad: 1 con una dedicación 100%	1	100%	2,830	$ 2.422.509,00	$ 6.855.700,00
1.2.2	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA Cantidad: 1 con una dedicación 100%	1	100%	2,830	$ 2.734.046,00	$ 7.737.350,00
SUBTOTAL 1. COSTOS DE PROFESIONAL, TECNICO Y PERSONAL AUXILIAR						**$ 89.737.544,00**
2	**GASTOS ADMINISTRATIVOS**					
2.1	**GASTOS GENERALES**					
2.1.1	GASTOS GENERALES Y/O ADMINISTRATIVOS (OFICINA SENCILLA, PAPELERÍA, COMPUTADORES, SECUENCIA FOTOGRÁFICA, COSTOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL, COMUNICACIONES, IMPRESIÓN DE PLANOS PARA EL INTERVENTOR) IMPUESTOS, GARANTIAS Y TODOS LOS QUE SE REQUIERAN PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.			2,830	$ 7.396.313,09	$ 20.931.566,00
SUBTOTAL 2. GASTOS ADMINISTRATIVOS						**$ 20.931.566,00**
TOTAL COSTOS PERSONAL - ADMINISTRACIÓN - IMPUESTOS - GARANTÍAS - UTILIDAD ESTIMADA OFERTADA						**$ 110.669.110,00**
I.V.A. (19%)						**$ 21.027.131,00**
VALOR TOTAL OFERTADO						**$ 131.696.241,00**

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades. Todas las propuestas deben contemplar dentro de su OFERTA ECONÓMICA, la totalidad del personal mínimo exigido, los costos directos e indirectos y todos los demás gastos en que pueda incurrir el contratista durante la ejecución del contrato. Los proponentes que no diligencien la totalidad de los campos establecidos en el Formulario – "PROPUESTA ECONÓMICA", será objeto de subsanación, lo anterior teniendo en cuenta que la oferta económica corresponde a un requisito de carácter habilitante, que no otorga puntaje.

La SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO efectuará la revisión aritmética de la información contenida en la Propuesta Económica, para efectos del cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. Los valores propuestos deberán contemplar todos los costos directos e indirectos, para los cuales incurra el proponente en relación con la correcta ejecución del objeto de la presente contratación.

Los precios contenidos en la propuesta económica seleccionada NO ESTÁN SUJETOS A REAJUSTE ALGUNO durante la ejecución del contrato, por tal razón, el proponente deberá tener en cuenta en el momento de la elaboración de la propuesta, su irrevocabilidad y los posibles incrementos durante la ejecución del contrato. La propuesta debe presentarse en pesos colombianos.

El presente proceso de selección se adjudicará por el valor total de la oferta económica presentada y habilitada por el proponente seleccionado. La Propuesta Económica DEBERÁ SER DILIGENCIADA, FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y PRESENTADA DE FORMA COMPLETA JUNTO CON LA PROPUESTA AL MOMENTO DEL CIERRE

Siendo esto así, se considera procedente adicionar la suma de $131.696.241, correspondiente a los costos asociados a 2 meses y 25 días calendario para garantizar el seguimiento y control de la interventoría integral a las actividades de obra de los diferentes contratos bajo su supervisión, conforme a la propuesta económica allegada y verificada por el Equipo de Estudios Previos de la DCCEE.

Se concluye que el precio ofertado es el adecuado para remunerar las actividades que se desarrollarán durante esta modificación, debido al comportamiento anterior de los contratos de obra objeto de interventoría, en relación con las emergencias que se han presentado y atendido desde el inicio, lo que nos permite deducir cual será el comportamiento de las emergencias sobre las cuales se llevará a cabo el

seguimiento, con respecto a cada contrato de obra. Lo anterior, sin perjuicio de que los costos del presupuesto inicial se mantienen, ajustándolos a la cantidad de profesionales que se requieren para esta modificación y su porcentaje de dedicación, como ya se mencionó previamente.

5.2.3 PRÓRROGA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA – PLAZO DE EJECUCIÓN

La Secretaría recibió respuesta a la solicitud realizada a la interventoría, mediante el comunicado **SERINCO-SED-INT-2025-675** del 24 de agosto del 2026, en la cual manifiesta su intención frente a la posible Modificación No. 03 del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR 8169110 de 2025, con el fin de prorrogar su vigencia por **dos (2) meses y veinticinco (25) días calendario**.

En cuanto a la prórroga solicitada, se concluye que se requiere ampliar el plazo del contrato de interventoría, para que cubra el plazo por el cual se prorrogaron los contratos de obra mediante la modificación No 3, sobre los que recae el objeto del contrato de interventoría, destacando que los contratos de obra correspondientes a los lotes 4, 5 y 6 terminan el 30 de diciembre de 2026. En este sentido, el plazo del contrato de interventoría debe extenderse hasta el 30 de diciembre de 2026, fecha en la que culminan los contratos de obra que se vienen ejecutando.

5.2.4 DE LA MODIFICACION DEL EQUIPO DE TRABAJO

De acuerdo con la oferta presentada por el contratista de interventoría mediante el oficio **SERINCO-SED-INT-2025-675** del 24 de agosto del 2026, y una vez realizada la revisión y verificación del personal propuesto y su respectiva dedicación, se evidencia que las modificaciones a los contratos de obra correspondientes a los Lotes 4, 5 y 6 contemplan respectivamente adición y prórroga destinadas exclusivamente a la atención de 4 nuevos frentes de obra como la atención de emergencias y/o ejecución de obras prioritarias para el caso específico del Lote 6.

En este sentido, teniendo en cuenta el alcance y la naturaleza de las actividades previstas para el periodo objeto de la modificación, se presenta una disminución en las necesidades de personal y en su dedicación para el desarrollo de las actividades de seguimiento, control y supervisión por parte de la interventoría teniendo en cuenta las modificaciones a los contratos de obra sobre el que recae la presente interventoría. En consecuencia, el valor correspondiente a los servicios de interventoría se ajusta de acuerdo con las necesidades reales requeridas para el periodo de ejecución de la modificación.

Por lo anterior, una vez analizada la propuesta económica presentada por el contratista de interventoría, se considera que el costeo propuesto resulta acorde con el alcance de las actividades, la dedicación del personal y las necesidades de seguimiento previstas para las Modificaciones No. 3 de los contratos de obra de los Lotes 4, 5 y 6. Igualmente, verificados los costos del presupuesto relacionado con el equipo de trabajo, se aclara que este se mantiene en los mismos términos definidos en la oferta económica inicial, sin excederlos. Asimismo, se deja constancia de que se relacionan con las nuevas condiciones de plazo contractual, cantidad y dedicación de los profesionales, en concordancia con la presente modificación, para cumplir con la supervisión de los contratos de obra objeto de interventoría.

Así las cosas, con relación al equipo de trabajo propuesto por el contratista interventor para ejecutar las actividades propias de esta modificación, el Supervisor del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR. 8169110 de 2025, y su Apoyo a la Supervisión, consideran viable y oportuno seguir contando con los siguientes profesionales, para las condiciones que son objeto de esta modificación.

A continuación, se detalla en el siguiente cuadro comparativo la modificación de los profesionales que componen el equipo de trabajo y su dedicación:

INICIO DEL CONTRATO			**MODIFICACIÓN**		
CARGO	**CANTIDAD**	**DEDICACIÓN**	**CANTIDAD**	**DEDICACIÓN**	**JUSTIFICACIÓN**
Director de Interventoría	1	100%	1	100%	Se mantiene el profesional y su dedicación ya que apoyará las actividades de obra y administrativas para los tres contratos a cargo, cumpliendo a cabalidad con las obligaciones contractuales establecidas
Profesional de apoyo	1	100%	1	100%	Se mantiene el profesional de apoyo teniendo en cuenta que la interventoría debe continuar con el seguimiento administrativo y financiero de cada uno de los contratos de obra a cargo

Residente de Interventoría	3	100%	1	100%	Se disminuye el número de residentes toda vez que el seguimiento de la interventoría se limita a actividades en 4 frentes de obra y en la atención de emergencia que se asignen al lote 6, las cuales no se presentan con la misma periodicidad que una actividad programada
Especialista Estructural	1	30%	0	0%	Atendiendo a la naturaleza, magnitud, alcance y complejidad de las actividades previstas en las cuatro (4) sedes educativas que se incluyeron, y con fundamento en las verificaciones técnicas realizadas, se determinó que las intervenciones asociadas al componente estructural son puntuales y no comportan modificaciones sustanciales de las redes existentes que requieran la participación permanente de un especialista en esta materia. En consecuencia, se considera técnicamente justificado prescindir del Especialista Estructural como integrante permanente del equipo mínimo requerido, sin afectar las condiciones de calidad, funcionalidad, cumplimiento normativo y responsabilidad técnica exigibles al contratista.
Especialista ambiental	1	60%	1	15%	Se disminuye la dedicación del profesional toda vez que el seguimiento de la interventoría se reduce en la cantidad de frentes de obra activos durante la prórroga
Especialista en Redes Eléctricas, Telefónicas, Voz y Datos	1	30%	0	0%	Atendiendo a la naturaleza, magnitud, alcance y complejidad de las actividades previstas en las cuatro (4) sedes educativas que se incluyeron, y con fundamento en las verificaciones técnicas realizadas, se determinó que las intervenciones asociadas al componente eléctrico son puntuales y no comportan modificaciones sustanciales de las redes existentes que requieran la participación permanente de un especialista en esta materia. En consecuencia, se considera técnicamente justificado prescindir del Especialista en Redes Eléctricas, Telefónicas, Voz y Datos, como integrante permanente del equipo mínimo requerido, sin afectar las condiciones de calidad, funcionalidad, cumplimiento normativo y responsabilidad técnica exigibles al contratista.
Especialista en Redes Hidrosanitarias, de gas y red contra incendio	1	30%	0	0%	Atendiendo a la naturaleza, magnitud, alcance y complejidad de las actividades previstas en las cuatro (4) sedes educativas que se incluyeron, y con fundamento en las verificaciones técnicas realizadas, se determinó que las intervenciones asociadas al componente hidrosanitario son puntuales y no comportan modificaciones sustanciales de las redes existentes que requieran la participación permanente de un especialista en esta materia. En consecuencia, se considera técnicamente justificado prescindir del Especialista en Redes Hidrosanitarias como integrante permanente del equipo mínimo requerido, sin afectar las condiciones de calidad, funcionalidad, cumplimiento normativo

					y responsabilidad técnica exigibles al contratista.
Profesional en seguridad y salud en el trabajo.	1	30%	0	0%	Atendiendo a la naturaleza, magnitud, alcance y complejidad de las actividades previstas en las cuatro (4) sedes educativas que se incluyeron, y con fundamento en las verificaciones técnicas realizadas, se determinó que las intervenciones asociadas al componente SST son puntuales y no requieren la participación permanente de un especialista en esta materia. En consecuencia, se considera técnicamente justificado prescindir del Profesional en seguridad y salud en el trabajo como integrante permanente del equipo mínimo requerido, sin afectar las condiciones de calidad, funcionalidad, cumplimiento normativo y responsabilidad técnica exigibles al contratista.
Profesional de costos, presupuestos y programación de obra	1	30%	0	0%	Atendiendo a la naturaleza, magnitud, alcance y complejidad de las actividades previstas en las cuatro (4) sedes educativas que se incluyeron, y con fundamento en las verificaciones técnicas realizadas, se determinó que las intervenciones asociadas al componente de costos y presupuesto son puntuales y no requieren la participación permanente de un especialista en esta materia. En consecuencia, se considera técnicamente justificado prescindir del Profesional de costos, presupuestos y programación de obra como integrante permanente del equipo mínimo requerido, sin afectar las condiciones de calidad, funcionalidad, cumplimiento normativo y responsabilidad técnica exigibles al contratista.
Asesor jurídico	1	15%	0	0%	Atendiendo a la naturaleza, magnitud, alcance y complejidad de las actividades previstas en las cuatro (4) sedes educativas que se incluyeron, y con fundamento en las verificaciones técnicas realizadas, se determinó que las intervenciones asociadas al componente jurídico son puntuales y no requieren la participación permanente de un especialista en esta materia. En consecuencia, se considera técnicamente justificado prescindir del Profesional jurídico como integrante permanente del equipo mínimo requerido, sin afectar las condiciones de calidad, funcionalidad, cumplimiento normativo y responsabilidad técnica exigibles al contratista.
Técnico en Seguridad y Salud en el trabajo	6	100%	1	100%	Se disminuye el número de residentes toda vez que el seguimiento de la interventoría se limita a actividades en 4 frentes de obra y en la atención de emergencia que se asignen al lote 6, las cuales no se presentan con la misma periodicidad que una actividad programada

Inspector de interventoría	6	100%	1	100%	Se disminuye el número de residentes toda vez que el seguimiento de la interventoría se limita a actividades en 4 frentes de obra y en la atención de emergencia que se asignen al lote 6, las cuales no se presentan con la misma periodicidad que una actividad programada

Las demás condiciones asociadas al equipo de trabajo que no son objeto de la presente modificación, tales como la denominación de los cargos, requisitos de formación académica, experiencia general y especifica, perfiles, funciones y demás exigencias previstas en los documentos contractuales, se mantienen sin modificación y continúan rigiéndose por las condiciones inicialmente establecidas.

6. DEL FUNDAMENTO LEGAL DE LA MODIFICACIÓN

En relación con las modificaciones contractuales permitidas dentro del régimen de contratación estatal establecido por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993), y en particular respecto a la figura de la prórroga contractual, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-300 de 2012, precisó lo siguiente: *"… 2.6.1. Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para "(…) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación",* entre otros. En el mismo sentido, en la sentencia C-949 de 2001, la Corte Constitucional señaló que las prórrogas de los contratos –como especie de modificación- pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estat*al.*

Por otra parte, la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, mediante Concepto 112 de 2024, señaló en cuanto a la procedencia de la prórroga del contrato estatal que *"… La Ley 80 de 1993 no se refirió a la posibilidad de prorrogar los contratos estatales, al igual que tampoco lo prohibió. En vista de ello, es necesario partir de las remisiones que hace la Ley 80 de 1993 al derecho privado y al principio de la autonomía de la voluntad para llenar este aspecto—arts. 13, 32 y 40—. De esta manera, los particulares tienen amplia libertad para prorrogar el plazo de cualquier contrato y, salvo ciertas disposiciones específicas de algunas tipologías contractuales, no existen criterios que determinen límites a esta posibilidad ni a su alcance, de manera que el principio de la autonomía de la voluntad en este aspecto despliega ampliamente sus efectos, lo que a su vez es trasladable, como principio, a los contratos estatales…".*

Con todo, de conformidad con el artículo 85 de la Ley 1474 de 2011, "*Los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor podrá ajustarse en atención a las obligaciones del objeto de interventoría, sin que resulte aplicable lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993*", razón por la cual, al prorrogarse los contratos de obra objeto de interventoría, se hace viable jurídicamente la prórroga del contrato de interventoría CO1.PCCNTR. 8169110 de 2025.

En este sentido, se concluye que para el caso concreto se cumplen los presupuestos legales en los que debe estar enmarcada esta modificación toda vez que, verificados los costos del presupuesto relacionado con el equipo de trabajo y los gastos administrativos que presenta el interventor, se aclara que este se mantiene en los mismos términos definidos en la oferta económica inicial, sin excederlos, tal y como lo avaló el Grupo de Estudios Previos de la DCCEE bajo memorando I-2026-109600 del 27 de agosto de 2026. De igual manera tenemos que, al prorrogarse el plazo de los contratos de obra objeto de interventoría no existe impedimento para que también se prorrogue el plazo del contrato de interventoría bajo los mismos presupuestos del periodo inicial.

Finalmente, la modificación propuesta responde a las necesidades concretas derivadas de la ampliación del plazo y alcance de los contratos de obra objeto de vigilancia y se circunscribe a garantizar la continuidad de la interventoría durante dicho periodo. Las variaciones respecto del equipo de trabajo corresponden a las necesidades efectivas de seguimiento de los frentes que permanecen activos y garantizan el cumplimiento integral de las obligaciones de interventoría, en observancia de los principios que rigen la contratación estatal.

Verificadas las garantías que amparan la ejecución del presente contrato, se encuentra que las mismas están vigentes y pueden ser consultadas en el siguiente link:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8169110&AwardContractDetailId=6338109&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#ContractExecution.

6. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

A la fecha el contratista de interventoría CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO avala los avances de ejecución de obra en un 97.89% para el Lote 4 según Informe Semana No. 43, un 94.03% para el Lote 5 según el Informe Semanal No. 43 y un 95.45% para el Lote 6 según el Informe Semanal No. 43, adelantando una supervisión integral de los contratos de obra en cada uno de los frentes asignados dentro del

alcance de cada contrato, cumpliendo con las obligaciones técnicas y administrativas, supervisando la ejecución de los alcances proyectados en cada una de las sedes, dentro de los tiempos establecidos en cronograma y bajo las especificaciones técnicas exigidas.

El contrato de interventoría CO1.PCCNTR. 8169110 de 2025 no presenta multas ni sanciones, ni procesos administrativos sancionatorios en curso.

7. NOTAS DE DILIGENCIAMIENTO Y TRÁMITE:

Nota 1: Conforme al artículo 1060 del Código de Comercio, el CONTRATISTA deberá mantener vigentes las garantías a que se refiere esta modificación y la suficiencia de estas. Será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se imponga, prórrogas o suspensiones, así como mantener informada a su garante de cualquier cambio del riesgo asegurado.

Nota 2: Una vez perfeccionada la modificación, el supervisor/interventor deberá remitir copia de la modificación suscrita al respectivo garante, conforme el Artículo 1060 del Código de Comercio, a fin de que la aseguradora expida el respectivo certificado para su posterior remisión a la Oficina de Contratos para su posterior archivo.

Nota 3: Las demás cláusulas del contrato se mantienen iguales.

Nota 4: En caso de que la presente modificación implique liberación de saldos, el supervisor procederá a solicitarla conforme al procedimiento que la Dirección Financiera establezca para tal efecto

8. ANEXOS:

1. Comunicación SERINCO-SED-INT-2025-651 – Solicitud de modificación No 3 – Folio 20
2. Comunicación SERINCO-SED-INT-2025-675 – Solicitud de modificación No 3 – Folio 30
3. Comunicación I-2026-102081 - Remisión a EP de la solicitud y Propuesta Económica – Folio 40
4. Comunicación I-2026-109600 - Aval propuesta económica por parte de EP – Folio 41
5. INFORME SEMANAL No. 43 – LOTE 4 – Avance físico obra – Folio 54
6. INFORME SEMANAL No. 43 – LOTE 5 - Avance físico obra – Folio 81
7. INFORME SEMANAL No. 43 – LOTE 6 - Avance físico obra – Folio 104
8. CDP No.1606 – Folio 137
9. DOCUMENTOS SERINCO EDUCATIVO – Documentos del contratista – Folio 138
10. I-2025-166630 - Designación de la supervisión – Folio 190
11. Aprobación Subdirección de Acceso y Permanencia – Folio 192
12. Aprobación Grupo Administrativo y Financiero – Folio 193

JORGE ALBERTO MORENO
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos.
Secretaría de Educación del Distrito
Supervisor Designado – Contrato de Interventoría
No. CO1.PCCNTR.8169110 de 2025

Revisó: Paula Andrea Panesso Sánchez – Líder Grupo Jurídico DCCEE SED

Paola Margarita Ruiz Manotas – Contratista DCCEE SED

Elaboró: Santiago Ángel Uribe – Contratista DCCEE SED

CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO
NIT: 901.977.271-0
Dirección: Calle 98 No. 70-91
Correo: serinco.educativo@gmail.com

SERINCO-SED-INT-2025-651

Bogotá D.C., 13 de agosto de 2026

Señores(a):
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
ARQ. SANTIAGO ANGEL URIBE
Apoyo a la Supervisión
Dirección de Construcción y Conservación de
Establecimientos Educativos – DCCEE

REFERENCIA: ***"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".***

ASUNTO: Solicitud Modificatorio No. 03 Adición y Prórroga. - Cto Interventoría CO1.PCCNTR.8169110 Grupo 2

Respetado Arquitecto,

En atención al contrato de referencia, suscrito entre **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO y CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO**, la Secretaría de Educación del Distrito (SED) ha identificado que aún persiste la necesidad manifestada por dicha Entidad, así:

1. Mejoras en las condiciones físicas del plantel educativo **I.E.D. JOSÉ CELESTINO MUTIS Sede A**, con actividades de impermeabilización integral de las cubiertas en placa correspondientes al Bloque 1 mediante sistema de manto asfáltico, incluido el retiro del sistema impermeabilizante existente, la preparación y adecuación de superficies y el tratamiento de puntos críticos, los cuales pertenecen a la adición del Lote 4.

2. Mejoras en las condiciones físicas del plantel educativo ***I.E.D. NUEVO SAN ANDRÉS DE LOS ALTOS Sede A***, con actividades de adecuación del espacio destinado al sistema de almacenamiento de agua potable, suministro e instalación de tanques, redes y accesorios hidráulicos, sistema de drenaje y las instalaciones eléctricas requeridas para la operación del cuarto de motobombas, los cuales pertenecen a la adición del Lote 5.

3. Incluir las actividades a realizar en las instituciones educativas ***I.E.D. RAFAEL URIBE URIBE Sede A***, con actividades de adecuación integral de baterías sanitarias de los bloques de Preescolar (Ciclo I) y de bachillerato, cambio de cubierta y adecuación de instalaciones eléctricas asociadas, e ***I.E.D. OSWALDO GUAYASAMÍN – LOS COMUNEROS Sede B***, con actividades de adecuación integral de las baterías sanitarias del bloque de bachillerato de primer piso y adecuación de baño para población con movilidad reducida, los cuales pertenecen a la adición del Lote 6.

SERINCO-SED-INT-2026-651

En aras de dar cumplimiento a los lineamientos contractuales y a razón de las adiciones y prórroga del ***CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8155135***, ***CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8154895*** y ***CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8154780*** que mediante la Resolución 0012 del 28 de marzo de 2025 la Entidad abrió el Proceso de Contratación SED-LP-OP-DCCEE-012-2025 y que por medio de la Resolución 0068 del 25 de julio de 2025, corregida mediante Resolución 0071 del 5 de agosto de 2025, la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista, entre la Secretaría de Educación del Distrito (SED) con NIT. 860.532.363 quien actúa en calidad de contratante y los respectivos consorcios quienes actúan en calidad de contratista.

El Contratista de interventoría solicita una adición y prórroga del ***CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.8169110*** que la Entidad abrió mediante el Proceso de selección de CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-018-2025 y que, en relación con la LICITACIÓN PÚBLICA No. SED-LP-OP-DCCEE-012-2025, posteriormente la Entidad adjudicó el Contrato a la interventoría entre la Secretaría de Educación del Distrito (SED) con NIT. 860.532.363 quien actúa en calidad de contratante y el CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO identificado con NIT. 901.977.271-0 quien actúa en calidad de interventoría, de lo cual esta interventoría se permite conceptuar:

1. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
OBJETO	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
CONTRATISTA	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO - NIT 901.977.271-0
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.8169110
VALOR INICIAL	SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($796.184.131,00) INC. IVA
PLAZO INICIAL	SIETE (7) MESES
FECHA DE INICIACIÓN	06 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	05 DE MAYO DE 2026

MODIFICATORIO No. 1	ADICIÓN: CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. ($128.425.720,00) INC. IVA PRÓRROGA: 1.5 MESES
MODIFICATORIO No. 2	ADICIÓN: CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE. ($162.875.214,00) INC. IVA PRÓRROGA: CIENTO SIETE (107) DÍAS CALENDARIO (3.53 MESES)
VALOR TOTAL	MIL OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($1.087.485.065,00) INC. IVA
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	05 DE OCTUBRE DE 2026
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	LOCALIDADES DE CIUDAD BOLÍVAR Y USME

Conforme con lo indicado anteriormente y de acuerdo con las necesidades identificadas por parte de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, a continuación, se relacionan los antecedentes y requerimientos presentados por las partes, los cuales se requieren incluir dentro del alcance del contrato de interventoría, con base en la justificación presentada por el Contratista y concepto emitido por esta interventoría.

2. ANTECEDENTES

2.1. La SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, de conformidad con lo establecido en el Decreto 330 de 2008, tiene por objeto orientar y liderar la formulación y ejecución de políticas, planes y programas para garantizar el derecho a la educación y asegurar a la población el acceso al conocimiento y la formación integral. De igual forma, como acciones tendientes a garantizar la permanencia escolar, promoción de la calidad educativa, prever y asegurar el funcionamiento normal, eficiencia y la buena presentación de las plantas físicas educativas y administrativas, la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos ha priorizado las obras menores y de mejoramiento con características de Reparaciones Locativas en las diferentes localidades de Bogotá, intervenciones que contribuyen a mejorar la infraestructura educativa en temas tales como la atención prioritaria a las observaciones efectuadas por parte de la Secretaría Distrital de Salud, obras menores de mitigación ante posibles riesgos y el mantenimiento correctivo, entre otros aspectos relacionados.

2.2. Es así que la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO adelantó la licitación pública cuyo objeto consistió en la “INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA

DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" en cumplimiento de la normatividad vigente que rige la contratación pública, adjudicando a la firma CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO identificado con NIT. 901.977.271-0 mediante contrato No. CO1.PCCNTR.8169110.

2.3. El alcance proyectado contempla realizar las reparaciones locativas y atención de emergencias en los centros y sedes educativas y administrativas de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, en lo que se incluyen los mantenimientos programados y la atención de emergencias en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar, con el fin de mejorar las condiciones de cada una de las sedes intervenidas, por un valor de SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS M/CTE. ($796.184.131) inc. IVA.

2.4. Si bien el objeto y el alcance del contrato se encuentran determinados, así como la destinación específica del mismo, por la modalidad de oferta económica presentada en la licitación pública de manera discriminada, la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO estableció y priorizó la ejecución de actividades de obra con las cantidades contenidas en el Formulario 1 del proceso licitatorio, conforme con el presupuesto oficial.

2.5. Conforme a las necesidades identificadas en las sedes educativas intervenidas, se suscribió el **MODIFICATORIO No. 1**, consistente en una adición y prórroga al contrato, sustentado en la necesidad de atender mayores cantidades de obra y actividades no previstas inicialmente, por un valor de **CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. ($128.425.720,00) INC. IVA**, y una prórroga de **UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS**, requeridos para garantizar la adecuada ejecución de las intervenciones, mejorar las condiciones de la infraestructura educativa y dar respuesta a situaciones detectadas durante el desarrollo del contrato, en concordancia con las prioridades establecidas por la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

2.6. Posteriormente, y en atención a las nuevas necesidades priorizadas por la Entidad, se suscribió el **MODIFICATORIO No. 2**, consistente en una adición por valor de **CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE. ($162.875.214,00) INC. IVA** y una prórroga de **CIENTO SIETE (107) DÍAS CALENDARIO**, con lo cual el valor total del contrato de interventoría asciende a **MIL OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($1.087.485.065,00) INC. IVA** y su plazo se extiende hasta el 05 de octubre de 2026.

2.7. No obstante, y conforme con la dinámica del contrato de obra, la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO ha identificado que siguen persistiendo necesidades en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar, las cuales son susceptibles de intervención, con necesidades particulares en cuanto a obras de adecuación, mejoramiento y/o mantenimiento correctivo y/o el requerido, con el fin de mejorar las condiciones de las infraestructuras físicas distritales.

2.8. Por lo que se plantea la necesidad de incluir unas obras adicionales al alcance de los contratos de obra de las siguientes sedes educativas, de lo cual la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO planteó las necesidades de intervención adicional al presupuesto inicial:

LOTE 4:

NOMBRE SEDE EDUCATIVA	SEDE	DIRECCIÓN	LOCALIDAD
CPF 1985 José Celestino Mutis	**A**	**Km 10 vía Quiba, Predio El Clavel – Mochuelo Bajo**	**Ciudad Bolívar**

La adición del presente lote se justifica por la incorporación de nuevas actividades requeridas por el colegio anteriormente mencionado, situación que responde a las motivaciones expuestas en el cuerpo de este oficio. En consecuencia, como se indicó previamente, se adicionan actividades correspondientes a una sede adicional respecto de las ya contratadas.

LOTE 5:

NOMBRE SEDE EDUCATIVA	SEDE	DIRECCIÓN	LOCALIDAD
CPF 543 Nuevo San Andrés de los Altos	**A**	**Calle 69 Sur No. 2 B - 15**	**Usme**

La adición del presente lote se justifica por la incorporación de nuevas actividades requeridas por el colegio anteriormente mencionado, las cuales serán agregadas al presente contrato. Esta situación obedece a las motivaciones expuestas en el cuerpo de este oficio. En consecuencia, como se indicó previamente, se adicionan actividades correspondientes a una sede adicional respecto de las ya contratadas.

LOTE 6:

NOMBRE SEDE EDUCATIVA	SEDE	DIRECCIÓN	LOCALIDAD
CPF 1943 Rafael Uribe Uribe	**A**	**Diagonal 71 B Sur No. 18 I - 20**	**Ciudad Bolívar**
CPF 561 Los Comuneros – Oswaldo Guayasamín	**B**	**Calle 94 Sur No. 3 B - 53**	**Usme**

La adición del presente lote se justifica por la incorporación de nuevas actividades requeridas por los colegios anteriormente mencionados, las cuales serán agregadas al presente contrato, así como por la disponibilidad de recursos destinados a la atención de emergencias. Esta situación obedece a las motivaciones expuestas en el cuerpo de este oficio. En consecuencia, como se indicó previamente, se adicionan actividades correspondientes a dos sedes adicionales respecto de las ya contratadas.

3. MOTIVACIONES

De acuerdo con lo ya detallado y las necesidades planteadas por parte de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, se presenta la solicitud de prórroga y adición requerida para el contrato de interventoría, conforme con las siguientes motivaciones:

3.1. La SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO tiene dentro de sus obligaciones mejorar las condiciones actuales de las instituciones educativas y administrativas de las localidades de Usme y Ciudad Bolívar, con el fin de garantizar el derecho a la Educación de la comunidad educativa, condición que bajo la inclusión de recursos para mejoramientos al contrato de obra puede beneficiar a más población y que a su vez involucra a la interventoría como entidad de control ante los contratos de obra.

3.2. A continuación, se presentan las intervenciones propuestas por la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO y revisadas por parte de Contratista e Interventoría, las cuales son objeto de la solicitud de prórroga y adición:

Se recuerda que la adición de los lotes 4, 5 y 6 se justifica por la incorporación de nuevas actividades en los colegios anteriormente mencionados, situación que responde a las motivaciones expuestas en el cuerpo de este oficio, adicionándose actividades correspondientes a sedes adicionales respecto de las ya contratadas, como se observa a continuación:

➢ CPF 1985 I.E.D. José Celestino Mutis - Sede A

El alcance de las obras a ejecutar en esta sede educativa es el siguiente:

- Impermeabilización integral de las cubiertas en placa correspondientes al Bloque 1, mediante la instalación de sistema de manto asfáltico, incluyendo:
  - Retiro del sistema impermeabilizante existente.
  - Preparación y adecuación de superficies.
  - Ejecución de alistados, tratamiento de puntos críticos y actividades complementarias requeridas para garantizar la estanqueidad y el adecuado desempeño del sistema de impermeabilización.

➢ CPF 543 I.E.D. Nuevo San Andrés de los Altos - Sede A

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- Adecuación de un espacio destinado al sistema de almacenamiento de agua potable, que incluye:
  - Suministro e instalación de tanques con capacidad mínima de 2.000 litros hasta 4.000 litros.
  - Suministro, instalación y puesta en operación del sistema de abastecimiento hidráulico, incluyendo redes, accesorios, elementos de control, presurización (de ser requerida), sistema de drenaje y conexión a la red hidráulica existente.
  - Construcción de cajas de inspección, de ser necesario.
  - Adecuación e implementación de las instalaciones eléctricas requeridas para la conexión y operación del cuarto de motobombas.

➢ **CPF 1943 I.E.D. Rafael Uribe Uribe - Sede A**

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- Adecuación integral de las baterías sanitarias de niños y niñas del bloque de Preescolar (Ciclo I), incluyendo demoliciones, revisión de redes hidrosanitarias, suministro e instalación de aparatos sanitarios, mesones, orinales, griferías, enchapes de pisos y muros, así como divisiones sanitarias en acero inoxidable.
- Cambio de cubierta y adecuación de instalaciones eléctricas asociadas a las baterías sanitarias del bloque de Preescolar (Ciclo I).
- Adecuación integral de las baterías sanitarias de niños y niñas de primer piso del bloque de bachillerato, incluyendo actividades de demolición, reposición de acabados, suministro e instalación de aparatos sanitarios, mesones, griferías, enchapes, divisiones sanitarias y demás actividades complementarias necesarias para garantizar su correcto funcionamiento.

➢ **CPF 561 I.E.D. Los Comuneros – Oswaldo Guayasamín - Sede B**

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- Adecuación integral de las baterías sanitarias de niños y niñas ubicadas en el bloque de bachillerato, primer piso, incluyendo actividades de demolición, revisión de redes hidrosanitarias, suministro e instalación de aparatos sanitarios, mesones de lavamanos, orinales, griferías, enchapes de pisos y muros, divisiones sanitarias en acero inoxidable y puertas de acceso. La intervención deberá contemplar la adecuación de cajas de inspección existentes, de ser necesario.
- Adecuación de baño para población con movilidad reducida.

3.3. Teniendo en cuenta los alcances indicados, a continuación, se relaciona el balance financiero de cada una de las intervenciones:

De acuerdo con los alcances y estimaciones financieras de las cuatro (4) instituciones educativas relacionadas anteriormente, así como de los recursos destinados a la atención de emergencias, es necesario disponer de una adición presupuestal al contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110, de ***CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE. ($157.634.073,52)*** INCLUIDO IVA y una prórroga de OCHENTA Y CINCO (85) DÍAS CALENDARIO, comprendidos entre el 06 de octubre y el 30 de diciembre de 2026.

Finalmente, conforme con las necesidades de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO respecto a las sedes a intervenir, esta interventoría concluye lo siguiente:

4. CONCLUSIONES

De acuerdo con las consideraciones expuestas por parte del Contratista y las necesidades requeridas por parte de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, esta Interventoría indica que se realizó la debida revisión de cada uno de los alcances planteados por los Contratistas mediante comunicado del asunto, por lo que emitimos concepto favorable para

la inclusión de las siguientes sedes educativas conforme con las actividades contractuales establecidas en el Formulario 1 del proceso licitatorio:

LOTE 4:

NOMBRE SEDE EDUCATIVA	LOCALIDAD	VALOR PRESUPUESTAL	TIEMPO
CPF 1985 José Celestino Mutis – Sede A	**Ciudad Bolívar**	**$ 209.000.000,00**	**89 días (ochenta y nueve días)**

LOTE 5:

NOMBRE SEDE EDUCATIVA	LOCALIDAD	VALOR PRESUPUESTAL	TIEMPO
CPF 543 Nuevo San Andrés de los Altos – Sede A	**Usme**	**$ 140.000.000,00**	**85 días (ochenta y cinco días)**

LOTE 6:

NOMBRE SEDE EDUCATIVA	LOCALIDAD	VALOR PRESUPUESTAL	TIEMPO
CPF 1943 Rafael Uribe Uribe – Sede A	**Ciudad Bolívar**	**$ 170.000.000,00**	**90 días (noventa días)**
CPF 561 Los Comuneros – Oswaldo Guayasamín – Sede B	**Usme**	**$ 130.000.000,00**	**85 días (ochenta y cinco días)**
Atención de emergencias – Lote 6	**Usme y Ciudad Bolívar**	**$ 160.000.000,00**	**85 días (ochenta y cinco días)**

Lo cual genera la necesidad de disponer de una adición presupuestal al contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110, de ***CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE. ($157.634.073,52)*** INCLUIDO IVA y una prórroga de OCHENTA Y CINCO (85) DÍAS CALENDARIO, es decir, hasta el 30 de diciembre de 2026.

5. SOLICITUDES

Esta interventoría, de manera atenta, pone a consideración de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO las siguientes solicitudes:

5.1. ADICIÓN: Con el fin de cumplir con los alcances necesarios en cada una de las sedes educativas planteadas, se solicita disponer de una adición presupuestal al contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110, de ***CIENTO CINCUENTA Y SIETE***

MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE. ($157.634.073,52) INCLUIDO IVA.

5.2. PRÓRROGA: Teniendo en cuenta el plazo necesario para la ejecución de las obras de adecuación, mantenimiento y/o mejoramiento en las sedes educativas, se solicita una prórroga al contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110 por el término de **OCHENTA Y CINCO (85) DÍAS CALENDARIO (2.83 MESES)**, comprendidos entre el 06 de octubre y el 30 de diciembre de 2026, es decir, hasta el 30 de diciembre de 2026.

6. ANEXOS

Como soporte de la presente solicitud se anexa a la presente:

6.1. Propuesta económica.
6.2. Certificados de Antecedentes:
- Contraloría y Personería
- Procuraduría y Policía
- Inhabilidades y RNMC

Sin otro particular.

Cordialmente;

HECTOR JOSE VILLAZON GUTIERREZ
Consorcio Serinco Educativo
Director de Interventoría
Cc Consecutivo
Anexo: Según indica

OBJETO: "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."

VALOR OFERTA ECONOMICA - ZONA SUR II

Nº	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DEDICACION	PLAZO	PRECIO OFERTADO MES	VALOR TOTAL
1	**COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO**					
1.1	**PERSONAL PROFESIONAL**					
1.1.1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA Cantidad: 1 con una dedicación 100%	1	100%	2,83	$ 9.849.311,00	$ 27.912.947,00
1.1.2	PROFESIONAL DE APOYO Cantidad: 1 con una dedicación 100%	1	100%	2,83	$ 6.296.042,00	$ 17.842.983,00
1.1.3	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Cantidad: 1 con una dedicación 100%	1	100%	2,83	$ 8.930.074,95	$ 25.307.832,00
1.1.5	ESPECIALISTA AMBIENTAL Cantidad: 1 con una dedicación 60%	1	60%	2,83	$ 9.849.311,55	$ 16.747.769,00
1.2	**PERSONAL TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO**					
1.2.1	TÉCNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Cantidad: 1 con una dedicación 100%	1	100%	2,83	$ 2.422.509,00	$ 6.865.391,00
1.2.2	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA Cantidad: 1 con una dedicación 100%	1	100%	2,83	$ 2.734.046,00	$ 7.748.286,00
SUBTOTAL 1	**COSTOS DE PROFESIONAL, TECNICO Y PERSONAL AUXILIAR**					**$ 102.425.208,00**
2	**GASTOS ADMINISTRATIVOS**					
2.1	**GASTOS GENERALES**					
2.1.1	GASTOS GENERALES Y/O ADMINISTRATIVOS (OFICINA SENCILLA, PAPELERÍA, COMPUTADORES, SECUENCIA FOTOGRÁFICA, COSTOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL, COMUNICACIONES, IMPRESIÓN DE PLANOS PARA EL INTERVENTOR) IMPUESTOS, GARANTIAS Y TODOS LOS QUE SE REQUIERAN PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.			2,83	$ 10.600.000,00	$ 30.040.400,00
SUBTOTAL	**2. GASTOS ADMINISTRATIVOS**					**$ 30.040.400,00**

TOTAL COSTOS PERSONAL - ADMINISTRACIÓN - IMPUESTOS - GARANTÍAS - UTILIDAD ESTIMADA OFERTADA	**$**	**132.465.608,00**
I.V.A. (19%)	**$**	**25.168.465,52**
VALOR TOTAL OFERTADO	**$**	**157.634.073,52**

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

Todas las propuestas deben contemplar dentro de su OFERTA ECONÓMICA, la totalidad del personal mínimo exigido, los costos directos e indirectos y todos los demás gastos en que pueda incurrir el contratista durante la ejecución del contrato. Los proponentes que no diligencien la totalidad de los campos establecidos en el Formulario – "PROPUESTA ECONÓMICA", será objeto de subsanación, lo anterior teniendo en cuenta que la oferta económica corresponde a un requisito de carácter habilitante, que no otorga puntaje.

La SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO efectuará la revisión aritmética de la información contenida en la Propuesta Económica, para efectos del cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. Los valores propuestos deberán contemplar todos los costos directos e indirectos, para los cuales incurra el proponente en relación con la correcta ejecución del objeto de la presente contratación.

Los precios contenidos en la propuesta económica seleccionada NO ESTÁN SUJETOS A REAJUSTE ALGUNO durante la ejecución del contrato, por tal razón, el proponente deberá tener en cuenta en el momento de la elaboración de la propuesta, su irrevocabilidad y los posibles incrementos durante la ejecución del contrato.

La propuesta debe presentarse en pesos colombianos.

El presente proceso de selección se adjudicará por el valor total de la oferta económica presentada y habilitada por el proponente seleccionado. La Propuesta Económica DEBERÁ SER DILIGENCIADA, FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y PRESENTADA DE FORMA COMPLETA JUNTO CON LA PROPUESTA AL MOMENTO DEL CIERRE

CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO
NIT: 901.977.271-0
Dirección: Calle 98 No. 70-91
Correo: serinco.educativo@gmail.com

SERINCO-SED-INT-2025-675

Bogotá D.C., 24 de agosto de 2026

Señores(a):
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
ARQ. SANTIAGO ANGEL URIBE
Apoyo a la Supervisión
Dirección de Construcción y Conservación de
Establecimientos Educativos – DCCEE

REFERENCIA: ***"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".***

ASUNTO: Alcance al oficio SERINCO-SED-INT-2026-651 Solicitud Modificatorio No. 03 Adición y Prórroga. - Cto Interventoría CO1.PCCNTR.8169110 Grupo 2

Respetado Arquitecto,

En atención al contrato de referencia, suscrito entre **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO y CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO**, se da alcance al oficio **SERINCO-SED-INT-2025-651,** en el cual se realiza el ajuste a la propuesta económica de la interventoría según la solicitud manifestada por la Secretaría de Educación del Distrito (SED).

Dicha modificación esta basada en la necesidad manifestada por Entidad, así:

1. Mejoras en las condiciones físicas del plantel educativo **I.E.D. JOSÉ CELESTINO MUTIS Sede A**, con actividades de impermeabilización integral de las cubiertas en placa correspondientes al Bloque 1 mediante sistema de manto asfáltico, incluido el retiro del sistema impermeabilizante existente, la preparación y adecuación de superficies y el tratamiento de puntos críticos, los cuales pertenecen a la adición del Lote 4.

2. Mejoras en las condiciones físicas del plantel educativo ***I.E.D. NUEVO SAN ANDRÉS DE LOS ALTOS Sede A***, con actividades de adecuación del espacio destinado al sistema de almacenamiento de agua potable, suministro e instalación de tanques, redes y accesorios hidráulicos, sistema de drenaje y las instalaciones eléctricas requeridas para la operación del cuarto de motobombas, los cuales pertenecen a la adición del Lote 5.

3. Incluir las actividades a realizar en las instituciones educativas ***I.E.D. RAFAEL URIBE URIBE Sede A***, con actividades de adecuación integral de baterías sanitarias de los bloques de Preescolar (Ciclo I) y de bachillerato, cambio de cubierta y adecuación de

instalaciones eléctricas asociadas, e ***I.E.D. OSWALDO GUAYASAMÍN – LOS COMUNEROS Sede B***, con actividades de adecuación integral de las baterías sanitarias del bloque de bachillerato de primer piso y adecuación de baño para población con movilidad reducida, los cuales pertenecen a la adición del Lote 6.

En aras de dar cumplimiento a los lineamientos contractuales y a razón de las adiciones y prórroga del ***CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8155135***, ***CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8154895*** y ***CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8154780*** que mediante la Resolución 0012 del 28 de marzo de 2025 la Entidad abrió el Proceso de Contratación SED-LP-OP-DCCEE-012-2025 y que por medio de la Resolución 0068 del 25 de julio de 2025, corregida mediante Resolución 0071 del 5 de agosto de 2025, la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista, entre la Secretaría de Educación del Distrito (SED) con NIT. 860.532.363 quien actúa en calidad de contratante y los respectivos consorcios quienes actúan en calidad de contratista.

El Contratista de interventoría solicita una adición y prórroga del ***CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.8169110*** que la Entidad abrió mediante el Proceso de selección de CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-018-2025 y que, en relación con la LICITACIÓN PÚBLICA No. SED-LP-OP-DCCEE-012-2025, posteriormente la Entidad adjudicó el Contrato a la interventoría entre la Secretaría de Educación del Distrito (SED) con NIT. 860.532.363 quien actúa en calidad de contratante y el CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO identificado con NIT. 901.977.271-0 quien actúa en calidad de interventoría, de lo cual esta interventoría se permite conceptuar:

1. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
OBJETO	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
CONTRATISTA	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO - NIT 901.977.271-0
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.8169110
VALOR INICIAL	SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($796.184.131,00) INC. IVA
PLAZO INICIAL	SIETE (7) MESES

FECHA DE INICIACIÓN	06 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	05 DE MAYO DE 2026
MODIFICATORIO No. 1	ADICIÓN: CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. ($128.425.720,00) INC. IVA PRÓRROGA: 1.5 MESES
MODIFICATORIO No. 2	ADICIÓN: CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE. ($162.875.214,00) INC. IVA PRÓRROGA: CIENTO SIETE (107) DÍAS CALENDARIO (3.53 MESES)
VALOR TOTAL	MIL OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($1.087.485.065,00) INC. IVA
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	05 DE OCTUBRE DE 2026
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	LOCALIDADES DE CIUDAD BOLÍVAR Y USME

Conforme con lo indicado anteriormente y de acuerdo con las necesidades identificadas por parte de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, a continuación, se relacionan los antecedentes y requerimientos presentados por las partes, los cuales se requieren incluir dentro del alcance del contrato de interventoría, con base en la justificación presentada por el Contratista y concepto emitido por esta interventoría.

2. ANTECEDENTES

2.1. La SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, de conformidad con lo establecido en el Decreto 330 de 2008, tiene por objeto orientar y liderar la formulación y ejecución de políticas, planes y programas para garantizar el derecho a la educación y asegurar a la población el acceso al conocimiento y la formación integral. De igual forma, como acciones tendientes a garantizar la permanencia escolar, promoción de la calidad educativa, prever y asegurar el funcionamiento normal, eficiencia y la buena presentación de las plantas físicas educativas y administrativas, la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos ha priorizado las obras menores y de mejoramiento con características de Reparaciones Locativas en las diferentes localidades de Bogotá, intervenciones que contribuyen a mejorar la infraestructura educativa en temas tales como la atención prioritaria a las observaciones efectuadas por parte de la Secretaría Distrital de Salud, obras menores de mitigación ante posibles riesgos y el mantenimiento correctivo, entre otros aspectos relacionados.

2.2. Es así que la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO adelantó la licitación pública cuyo objeto consistió en la "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" en cumplimiento de la normatividad vigente que rige la contratación pública, adjudicando a la firma CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO identificado con NIT. 901.977.271-0 mediante contrato No. CO1.PCCNTR.8169110.

2.3. El alcance proyectado contempla realizar las reparaciones locativas y atención de emergencias en los centros y sedes educativas y administrativas de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, en lo que se incluyen los mantenimientos programados y la atención de emergencias en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar, con el fin de mejorar las condiciones de cada una de las sedes intervenidas, por un valor de SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS M/CTE. ($796.184.131) inc. IVA.

2.4. Si bien el objeto y el alcance del contrato se encuentran determinados, así como la destinación específica del mismo, por la modalidad de oferta económica presentada en la licitación pública de manera discriminada, la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO estableció y priorizó la ejecución de actividades de obra con las cantidades contenidas en el Formulario 1 del proceso licitatorio, conforme con el presupuesto oficial.

2.5. Conforme a las necesidades identificadas en las sedes educativas intervenidas, se suscribió el **MODIFICATORIO No. 1**, consistente en una adición y prórroga al contrato, sustentado en la necesidad de atender mayores cantidades de obra y actividades no previstas inicialmente, por un valor de **CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. ($128.425.720,00) INC. IVA**, y una prórroga de **UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS**, requeridos para garantizar la adecuada ejecución de las intervenciones, mejorar las condiciones de la infraestructura educativa y dar respuesta a situaciones detectadas durante el desarrollo del contrato, en concordancia con las prioridades establecidas por la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

2.6. Posteriormente, y en atención a las nuevas necesidades priorizadas por la Entidad, se suscribió el **MODIFICATORIO No. 2**, consistente en una adición por valor de **CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE. ($162.875.214,00) INC. IVA** y una prórroga de **CIENTO SIETE (107) DÍAS CALENDARIO**, con lo cual el valor total del contrato de interventoría asciende a **MIL OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($1.087.485.065,00) INC. IVA** y su plazo se extiende hasta el 05 de octubre de 2026.

2.7. No obstante, y conforme con la dinámica del contrato de obra, la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO ha identificado que siguen persistiendo necesidades en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar, las cuales son susceptibles de intervención,

con necesidades particulares en cuanto a obras de adecuación, mejoramiento y/o mantenimiento correctivo y/o el requerido, con el fin de mejorar las condiciones de las infraestructuras físicas distritales.

2.8. Por lo que se plantea la necesidad de incluir unas obras adicionales al alcance de los contratos de obra de las siguientes sedes educativas, de lo cual la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO planteó las necesidades de intervención adicional al presupuesto inicial:

LOTE 4:

NOMBRE SEDE EDUCATIVA	SEDE	DIRECCIÓN	LOCALIDAD
CPF 1985 José Celestino Mutis	**A**	**Km 10 vía Quiba, Predio El Clavel – Mochuelo Bajo**	**Ciudad Bolívar**

La adición del presente lote se justifica por la incorporación de nuevas actividades requeridas por el colegio anteriormente mencionado, situación que responde a las motivaciones expuestas en el cuerpo de este oficio. En consecuencia, como se indicó previamente, se adicionan actividades correspondientes a una sede adicional respecto de las ya contratadas.

LOTE 5:

NOMBRE SEDE EDUCATIVA	SEDE	DIRECCIÓN	LOCALIDAD
CPF 543 Nuevo San Andrés de los Altos	**A**	**Calle 69 Sur No. 2 B - 15**	**Usme**

La adición del presente lote se justifica por la incorporación de nuevas actividades requeridas por el colegio anteriormente mencionado, las cuales serán agregadas al presente contrato. Esta situación obedece a las motivaciones expuestas en el cuerpo de este oficio. En consecuencia, como se indicó previamente, se adicionan actividades correspondientes a una sede adicional respecto de las ya contratadas.

LOTE 6:

NOMBRE SEDE EDUCATIVA	SEDE	DIRECCIÓN	LOCALIDAD
CPF 1943 Rafael Uribe Uribe	**A**	**Diagonal 71 B Sur No. 18 I - 20**	**Ciudad Bolívar**
CPF 561 Los Comuneros – Oswaldo Guayasamín	**B**	**Calle 94 Sur No. 3 B - 53**	**Usme**

La adición del presente lote se justifica por la incorporación de nuevas actividades requeridas por los colegios anteriormente mencionados, las cuales serán agregadas al presente contrato, así como por la disponibilidad de recursos destinados a la atención de emergencias. Esta situación obedece a las motivaciones expuestas en el cuerpo de este oficio. En consecuencia, como se indicó previamente, se adicionan actividades correspondientes a dos sedes adicionales respecto de las ya contratadas.

3. MOTIVACIONES

De acuerdo con lo ya detallado y las necesidades planteadas por parte de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, se presenta la solicitud de prórroga y adición requerida para el contrato de interventoría, conforme con las siguientes motivaciones:

3.1. La SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO tiene dentro de sus obligaciones mejorar las condiciones actuales de las instituciones educativas y administrativas de las localidades de Usme y Ciudad Bolívar, con el fin de garantizar el derecho a la Educación de la comunidad educativa, condición que bajo la inclusión de recursos para mejoramientos al contrato de obra puede beneficiar a más población y que a su vez involucra a la interventoría como entidad de control ante los contratos de obra.

3.2. A continuación, se presentan las intervenciones propuestas por la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO y revisadas por parte de Contratista e Interventoría, las cuales son objeto de la solicitud de prórroga y adición:

Se recuerda que la adición de los lotes 4, 5 y 6 se justifica por la incorporación de nuevas actividades en los colegios anteriormente mencionados, situación que responde a las motivaciones expuestas en el cuerpo de este oficio, adicionándose actividades correspondientes a sedes adicionales respecto de las ya contratadas, como se observa a continuación:

➢ **CPF 1985 I.E.D. José Celestino Mutis - Sede A**

El alcance de las obras a ejecutar en esta sede educativa es el siguiente:

- Impermeabilización integral de las cubiertas en placa correspondientes al Bloque 1, mediante la instalación de sistema de manto asfáltico, incluyendo:
  - Retiro del sistema impermeabilizante existente.
  - Preparación y adecuación de superficies.
  - Ejecución de alistados, tratamiento de puntos críticos y actividades complementarias requeridas para garantizar la estanqueidad y el adecuado desempeño del sistema de impermeabilización.

➢ **CPF 543 I.E.D. Nuevo San Andrés de los Altos - Sede A**

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- Adecuación de un espacio destinado al sistema de almacenamiento de agua potable, que incluye:
  - Suministro e instalación de tanques con capacidad mínima de 2.000 litros hasta 4.000 litros.
  - Suministro, instalación y puesta en operación del sistema de abastecimiento hidráulico, incluyendo redes, accesorios, elementos de control, presurización (de ser requerida), sistema de drenaje y conexión a la red hidráulica existente.
  - Construcción de cajas de inspección, de ser necesario.

- Adecuación e implementación de las instalaciones eléctricas requeridas para la conexión y operación del cuarto de motobombas.

➢ **CPF 1943 I.E.D. Rafael Uribe Uribe - Sede A**

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- Adecuación integral de las baterías sanitarias de niños y niñas del bloque de Preescolar (Ciclo I), incluyendo demoliciones, revisión de redes hidrosanitarias, suministro e instalación de aparatos sanitarios, mesones, orinales, griferías, enchapes de pisos y muros, así como divisiones sanitarias en acero inoxidable.
- Cambio de cubierta y adecuación de instalaciones eléctricas asociadas a las baterías sanitarias del bloque de Preescolar (Ciclo I).
- Adecuación integral de las baterías sanitarias de niños y niñas de primer piso del bloque de bachillerato, incluyendo actividades de demolición, reposición de acabados, suministro e instalación de aparatos sanitarios, mesones, griferías, enchapes, divisiones sanitarias y demás actividades complementarias necesarias para garantizar su correcto funcionamiento.

➢ **CPF 561 I.E.D. Los Comuneros – Oswaldo Guayasamín - Sede B**

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- Adecuación integral de las baterías sanitarias de niños y niñas ubicadas en el bloque de bachillerato, primer piso, incluyendo actividades de demolición, revisión de redes hidrosanitarias, suministro e instalación de aparatos sanitarios, mesones de lavamanos, orinales, griferías, enchapes de pisos y muros, divisiones sanitarias en acero inoxidable y puertas de acceso. La intervención deberá contemplar la adecuación de cajas de inspección existentes, de ser necesario.
- Adecuación de baño para población con movilidad reducida.

3.3. Teniendo en cuenta los alcances indicados, a continuación, se relaciona el balance financiero de cada una de las intervenciones:

De acuerdo con los alcances y estimaciones financieras de las cuatro (4) instituciones educativas relacionadas anteriormente, así como de los recursos destinados a la atención de emergencias, es necesario disponer de una adición presupuestal al contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110, de ***CIENTO TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE. ($131.696.241,00)*** INCLUIDO IVA y una prórroga de OCHENTA Y CINCO (85) DÍAS CALENDARIO, comprendidos entre el 06 de octubre y el 30 de diciembre de 2026.

Finalmente, conforme con las necesidades de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO respecto a las sedes a intervenir, esta interventoría concluye lo siguiente:

4. CONCLUSIONES

De acuerdo con las consideraciones expuestas por parte del Contratista y las necesidades requeridas por parte de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, esta Interventoría indica que se realizó la debida revisión de cada uno de los alcances planteados por los

Contratistas mediante comunicado del asunto, por lo que emitimos concepto favorable para la inclusión de las siguientes sedes educativas conforme con las actividades contractuales establecidas en el Formulario 1 del proceso licitatorio:

LOTE 4:

NOMBRE SEDE EDUCATIVA	LOCALIDAD	VALOR PRESUPUESTAL	TIEMPO
CPF 1985 José Celestino Mutis – Sede A	**Ciudad Bolívar**	**$ 209.000.000,00**	**89 días (ochenta y nueve días)**

LOTE 5:

NOMBRE SEDE EDUCATIVA	LOCALIDAD	VALOR PRESUPUESTAL	TIEMPO
CPF 543 Nuevo San Andrés de los Altos – Sede A	**Usme**	**$ 140.000.000,00**	**85 días (ochenta y cinco días)**

LOTE 6:

NOMBRE SEDE EDUCATIVA	LOCALIDAD	VALOR PRESUPUESTAL	TIEMPO
CPF 1943 Rafael Uribe Uribe – Sede A	**Ciudad Bolívar**	**$ 170.000.000,00**	**90 días (noventa días)**
CPF 561 Los Comuneros – Oswaldo Guayasamín – Sede B	**Usme**	**$ 130.000.000,00**	**85 días (ochenta y cinco días)**
Atención de emergencias – Lote 6	**Usme y Ciudad Bolívar**	**$ 160.000.000,00**	**85 días (ochenta y cinco días)**

Lo cual genera la necesidad de disponer de una adición presupuestal al contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110, de ***CIENTO TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE. ($131.696.241,00)*** INCLUIDO IVA y una prórroga de OCHENTA Y CINCO (85) DÍAS CALENDARIO, es decir, hasta el 30 de diciembre de 2026.

5. SOLICITUDES

Esta interventoría, de manera atenta, pone a consideración de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO las siguientes solicitudes:

5.1. ADICIÓN: Con el fin de cumplir con los alcances necesarios en cada una de las sedes educativas planteadas, se solicita disponer de una adición presupuestal al contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110, de ***CIENTO TREINTA Y UN MILLONES***

SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE. ($131.696.241,00) INCLUIDO IVA.

5.2. PRÓRROGA: Teniendo en cuenta el plazo necesario para la ejecución de las obras de adecuación, mantenimiento y/o mejoramiento en las sedes educativas, se solicita una prórroga al contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110 por el término de **OCHENTA Y CINCO (85) DÍAS CALENDARIO (2.83 MESES)**, comprendidos entre el 06 de octubre y el 30 de diciembre de 2026, es decir, hasta el 30 de diciembre de 2026.

6. ANEXOS

Como soporte de la presente solicitud se anexa a la presente:

6.1. Propuesta económica.
6.2. Certificados de Antecedentes:
- Contraloría y Personería
- Procuraduría y Policía
- Inhabilidades y RNMC

Sin otro particular.

Cordialmente;

HECTOR JOSE VILLAZON GUTIERREZ
Consorcio Serinco Educativo
Director de Interventoría
Cc Consecutivo
Anexo: Según indica

OBJETO: "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."

VALOR OFERTA ECONOMICA - ZONA SUR II

Nº	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DEDICACION	PLAZO	PRECIO OFERTADO MES	VALOR TOTAL
1	**COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO**					
1.1	**PERSONAL PROFESIONAL**					
1.1.1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA Cantidad: 1 con una dedicación 100%	1	100%	2,830	$ 9.849.311,00	$ 27.873.550,00
1.1.2	PROFESIONAL DE APOYO Cantidad: 1 con una dedicación 100%	1	100%	2,830	$ 6.296.042,00	$ 17.817.799,00
1.1.3	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Cantidad: 1 con una dedicación 100%	1	100%	2,830	$ 8.930.074,95	$ 25.272.112,00
1.1.5	ESPECIALISTA AMBIENTAL Cantidad: 1 con una dedicación 15%	1	15%	2,830	$ 9.849.311,55	$ 4.181.033,00
1.2	**PERSONAL TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO**					
1.2.1	TÉCNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Cantidad: 1 con una dedicación 100%	1	100%	2,830	$ 2.422.509,00	$ 6.855.700,00
1.2.2	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA Cantidad: 1 con una dedicación 100%	1	100%	2,830	$ 2.734.046,00	$ 7.737.350,00
SUBTOTAL 1. COSTOS DE PROFESIONAL, TECNICO Y PERSONAL AUXILIAR						**$ 89.737.544,00**
2	**GASTOS ADMINISTRATIVOS**					
2.1	**GASTOS GENERALES**					
2.1.1	GASTOS GENERALES Y/O ADMINISTRATIVOS (OFICINA SENCILLA, PAPELERÍA, COMPUTADORES, SECUENCIA FOTOGRÁFICA, COSTOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL, COMUNICACIONES, IMPRESIÓN DE PLANOS PARA EL INTERVENTOR) IMPUESTOS, GARANTIAS Y TODOS LOS QUE SE REQUIERAN PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.			2,830	$ 7.396.313,09	$ 20.931.566,00
SUBTOTAL 2. GASTOS ADMINISTRATIVOS						**$ 20.931.566,00**
TOTAL COSTOS PERSONAL - ADMINISTRACIÓN - IMPUESTOS - GARANTÍAS - UTILIDAD ESTIMADA OFERTADA						**$ 110.669.110,00**
I.V.A. (19%)						**$ 21.027.131,00**
VALOR TOTAL OFERTADO						**$ 131.696.241,00**

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

Todas las propuestas deben contemplar dentro de su OFERTA ECONÓMICA, la totalidad del personal mínimo exigido, los costos directos e indirectos y todos los demás gastos en que pueda incurrir el contratista durante la ejecución del contrato. Los proponentes que no diligencien la totalidad de los campos establecidos en el Formulario – "PROPUESTA ECONÓMICA", será objeto de subsanación, lo anterior teniendo en cuenta que la oferta económica corresponde a un requisito de carácter habilitante, que no otorga puntaje.

La SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO efectuará la revisión aritmética de la información contenida en la Propuesta Económica, para efectos del cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. Los valores propuestos deberán contemplar todos los costos directos e indirectos, para los cuales incurra el proponente en relación con la correcta ejecución del objeto de la presente contratación.

Los precios contenidos en la propuesta económica seleccionada NO ESTÁN SUJETOS A REAJUSTE ALGUNO durante la ejecución del contrato, por tal razón, el proponente deberá tener en cuenta en el momento de la elaboración de la propuesta, su irrevocabilidad y los posibles incrementos durante la ejecución del contrato.

La propuesta debe presentarse en pesos colombianos.

El presente proceso de selección se adjudicará por el valor total de la oferta económica presentada y habilitada por el proponente seleccionado. La Propuesta Económica DEBERÁ SER DILIGENCIADA, FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y PRESENTADA DE FORMA COMPLETA JUNTO CON LA PROPUESTA AL MOMENTO DEL CIERRE

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Radicado Nº I-2026-102081
Fecha: 13-08-2026 - 13:15
Folios: 1 Anexos:
Radicador: SANTIAGO ANGEL URIBE - 4300
Destino: 4300 - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el codigo de verificación: 0O9Z0

MEMORANDO.

PARA: MARIA TEREZA RODRIGUEZ MIRKE.
Contratista DCCEE

DE: **SANTIAGO ANGEL URIBE**
Apoyo a la Supervisión Cto de Interventoría CO1.PCCNTR.8169110 DE 2025
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos

Asunto: REMISION DE PROPUESTA ECONOMICA MODIFICATORIO No 3 - ADICION Y PROROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA. CO1.PCCNTR.8169110 - GRUPO 2 - 2025 CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO

Cordial saludo,

En atención al asunto de la referencia, me permito remitir, como archivo anexo, el oficio con consecutivo **SERINCO-SED-INT-2025-651** de fecha 13 de agosto de 2026, presentado por la firma interventora **CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO**, mediante el cual fue allegada a esta supervisión - en cabeza de la DCCEE — la propuesta económica y su respectiva justificación, destinadas a sustentar la **Solicitud de Modificación No. 3 (Adición y Prórroga)** del Contrato de interventoría No. **CO1.PCCNTR.8169110 de 2025 – Grupo 2 – 2025**.

Dicha propuesta corresponde al objeto contractual consistente en la ***"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".***

En virtud de lo anterior, y conforme a sus competencias, solicito que la Oficina realice la evaluación presupuestal correspondiente y emita el aval requerido, a efectos de continuar con el trámite administrativo del modificatorio en curso y la solicitud para expedición del CDP correspondiente

Cordialmente,

SANTIAGO ANGEL URIBE
Contratista DCCEE
Apoyo a la Supervisión Contrato de Interventoría
CO1.PCCNTR.8169110 DE 2025

Anexo: COMUNICACION SERINCO-SED-INT-2025-651 (10 FOLIOS)

Radicado Nº I-2026-109600
Fecha: 27-08-2026 - 15:14
Folios: 1 Anexos: 1
Radicador: DEISI KATERINE SANCHEZ CANCELADO - 4300
Destino: 4300 - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el codigo de verificación: UTPWN

PARA: **SANTIAGO ÁNGEL URIBE**
Apoyo a la supervisión contrato CO1.PCCNTR. 8169110 de 2025

DE: **MARIA TERESA RODRÍGUEZ MIRKE**
Contratista DCCEE

ASUNTO: Revisión solicitud modificación No. 3 (adición y prorroga) del contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR. 8169110 de 2025 Contratista: CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO - Objeto: *"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".* LOTE No. 2.

Cordial saludo,

En atención a la solicitud del asunto, el Grupo de Estudios Previos ha efectuado revisión al costeo recibido mediante radicado I-2026-102081 del 13 de agosto de 2026, y aclaración por parte del contratista, recibido mediante correo electrónico el 26 de agosto de 2026, para efectos de la modificación No. 3 (adición y prorroga) al Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR. 8169110 de 2025, de acuerdo con lo descrito en el oficio de interventoría SERINCO-SED-INT-2025-675, referente a la adición de frentes de obra a los colegios:

Lote 04:
- I.E.D. JOSE CELESTINO MUTIS - Sede A

Lote 05:
- I.E.D. NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS – Sede A

Lote 06:
- I.E.D RAFAEL URIBE URIBE -Sede A
- I.E.D LOS COMUNEROS – OSWALDO GUAYASAMÍN – Sede B
- Atención de emergencias – Lote 6

De esta manera, se realizó el cotejo respectivo frente a la información de la verificación aritmética del proceso CM-A-DCCEE-018-2025 encontrando correcta la aplicación de los precios contractuales.

En consecuencia, a partir de la información revisada y suministrada por el apoyo a la supervisión del proyecto, el Área de Estudios Previos concluye, que el valor resultante para la adición, en la verificación aritmética efectuada, es de **CIENTO TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($131.696.241,00) INCLUIDO I.V.A. DEL 19%.**

No obstante, es importante aclarar que el Grupo de Estudios Previos no tiene la facultad de aprobar, modificar y/o autorizar los perfiles necesarios, ni la cantidad de personal, ni sus dedicaciones dentro de la adición requerida para el equipo mínimo de interventoría, así como tampoco modificaciones, gastos, prórrogas, adición de recursos o cualquier otra circunstancia particular en la que deban incurrir los contratistas de la Dirección de Construcciones para la debida ejecución de sus contratos, dado que el alcance del Grupo de Estudios Previos se limita a la revisión y análisis de requerimientos o metodologías presentadas por la supervisión.

Igualmente, será responsabilidad del supervisor del contrato o quien este designe verificar las condiciones contractuales, la pertinencia de la adición, así como la documentación allegada, de manera que sean acordes con la realidad del proyecto y se hayan enmarcado dentro de los principios de economía y eficiencia de los recursos contratados

Cordialmente,

MARIA TERESA RODRÍGUEZ MIRKE
CONTRATISTA DCCEE

Anexos: justificación remitida por la supervisión y propuesta económica.
Proyectó: Katerine Sánchez C– contratista DCCEE.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
OFERTA ECONOMICA INICIAL

OBJETO: "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."

VALOR OFERTA ECONOMICA - ZONA SUR II

Nº	DESCRIPCIÓN	PLAZO	PRECIO OFERTADO MES	VALOR TOTAL
1	**COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO**			
1.1	**PERSONAL PROFESIONAL**			
1.1.1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA Cantidad: 1 con una dedicación 100%	7	$ 9.849.311,00	$ 68.945.177,00
1.1.2	PROFESIONAL DE APOYO Cantidad: 1 con una dedicación 100%	7	$ 6.296.042,00	$ 44.072.294,00
1.1.3	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Cantidad: 3 con una dedicación 100%	6	$ 26.790.225,00	$ 160.741.350,00
1.1.4	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL Cantidad: 1 con una dedicación 30%	6	$ 2.954.703,00	$ 17.728.758,00
1.1.5	ESPECIALISTA AMBIENTAL Cantidad: 1 con una dedicación 60%	6	$ 5.909.587,00	$ 35.457.522,00
1.1.6	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOCantidad: 1 con una dedicación 30%	6	$ 2.954.703,00	$ 17.728.758,00
1.1.7	ESPECIALISTA EN REDES ELÉCTRICAS, TELEFÓNICAS, VOZ Y DATOS Cantidad: 1 con una dedicación 30%	6	$ 2.954.703,00	$ 17.728.758,00
1.1.8	ESPECIALISTA EN REDES HIDROSANITARAS GAS Y RED CONTRA INCENDIOS Cantidad: 1 con una dedicación 30%	6	$ 2.954.703,00	$ 17.728.758,00
1.1.9	PROFESIONAL EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA Cantidad: 1 con una dedicación 30%	7	$ 2.679.023,00	$ 18.753.161,00
1.1.10	ASESOR JURÍDICO Cantidad: 1 con una dedicación 15%	7	$ 1.477.397,00	$ 10.341.779,00
1.2	**PERSONAL TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO**			
1.2.1	TÉCNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Cantidad: 6 con una dedicación 100%	6	$ 14.535.054,00	$ 87.210.324,00
1.2.2	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA Cantidad: 6 con una dedicación 100%	6	$ 16.404.276,00	$ 98.425.656,00
SUBTOTAL	**1. COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO**			**$ 594.862.295,00**
2	**GASTOS ADMINISTRATIVOS**			
2.1	**GASTOS GENERALES**			
2.1.1	GASTOS GENERALES Y/O ADMINISTRATIVOS (OFICINA SENCILLA, PAPELERÍA, COMPUTADORES, SECUENCIA FOTOGRÁFICA, COSTOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL, COMUNICACIONES, IMPRESIÓN DE PLANOS PARA EL INTERVENTOR) IMPUESTOS, GARANTIAS Y TODOS LOS QUE SE REQUIERAN PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	7	$ 10.600.000,00	$ 74.200.000,00
SUBTOTAL	**2. GASTOS ADMINISTRATIVOS**			**$ 74.200.000,00**
	TOTAL COSTOS PERSONAL - ADMINISTRACIÓN - IMPUESTOS - GARANTÍAS - UTILIDAD ESTIMADA OFERTADA			**$ 669.062.295,00**
	I.V.A. (19%)			**$ 127.121.836,00**
	VALOR TOTAL OFERTADO			**$ 796.184.131,00**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
OFERTA ECONOMICA INICIAL DESGLOSADA

OBJETO: "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."

VALOR OFERTA ECONOMICA - ZONA SUR II

Nº	DESCRIPCIÓN	PLAZO	PRECIO OFERTADO MES DEDICACIÓN 100% CANTIDAD 1	CANTIDAD	% DEDICACION	VALOR TOTAL
1	**COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO**					
1.1	**PERSONAL PROFESIONAL**					
1.1.1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA Cantidad: 1 con una dedicación 100%	7	$ 9.849.311,00	1	100%	$ 68.945.177,00
1.1.2	PROFESIONAL DE APOYO Cantidad: 1 con una dedicación 100%	7	$ 6.296.042,00	1	100%	$ 44.072.294,00
1.1.3	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Cantidad: 3 con una dedicación 100%	6	$ 8.930.075,00	3	100%	$ 160.741.350,00
1.1.4	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL Cantidad: 1 con una dedicación 30%	6	$ 9.849.310,00	1	30%	$ 17.728.758,00
1.1.5	ESPECIALISTA AMBIENTAL Cantidad: 1 con una dedicación 60%	6	$ 9.849.311,67	1	60%	$ 35.457.522,00
1.1.6	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOCantidad: 1 con una dedicación 30%	6	$ 9.849.310,00	1	30%	$ 17.728.758,00
1.1.7	ESPECIALISTA EN REDES ELÉCTRICAS, TELEFÓNICAS, VOZ Y DATOS Cantidad: 1 con una dedicación 30%	6	$ 9.849.310,00	1	30%	$ 17.728.758,00
1.1.8	ESPECIALISTA EN REDES HIDROSANITARAS GAS Y RED CONTRA INCENDIOS Cantidad: 1 con una dedicación 30%	6	$ 9.849.310,00	1	30%	$ 17.728.758,00
1.1.9	PROFESIONAL EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA Cantidad: 1 con una dedicación 30%	7	$ 8.930.076,67	1	30%	$ 18.753.161,00
1.1.10	ASESOR JURÍDICO Cantidad: 1 con una dedicación 15%	7	$ 9.849.313,33	1	15%	$ 10.341.779,00
1.2	**PERSONAL TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO**					
1.2.1	TÉCNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Cantidad: 6 con una dedicación 100%	6	$ 2.422.509,00	6	100%	$ 87.210.324,00
1.2.2	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA Cantidad: 6 con una dedicación 100%	6	$ 2.734.046,00	6	100%	$ 98.425.656,00
SUBTOTAL	**1. COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO**					**$ 594.862.295,00**
2	**GASTOS ADMINISTRATIVOS**					
2.1	**GASTOS GENERALES**					
2.1.1	GASTOS GENERALES Y/O ADMINISTRATIVOS (OFICINA SENCILLA, PAPELERÍA, COMPUTADORES, SECUENCIA FOTOGRÁFICA, COSTOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL, COMUNICACIONES, IMPRESIÓN DE PLANOS PARA EL INTERVENTOR) IMPUESTOS, GARANTIAS Y TODOS LOS QUE SE REQUIERAN PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	7	$ 10.600.000,00			$ 74.200.000,00
SUBTOTAL	**2. GASTOS ADMINISTRATIVOS**					**$ 74.200.000,00**
	TOTAL COSTOS PERSONAL - ADMINISTRACIÓN - IMPUESTOS - GARANTÍAS - UTILIDAD ESTIMADA OFERTADA					**$ 669.062.295,00**
	I.V.A. (19%)					**$ 127.121.836,00**
	VALOR TOTAL OFERTADO					**$ 796.184.131,00**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
OFERTA ECONOMICA MODIFICATORIO No.3

OBJETO: "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."

VALOR OFERTA ECONOMICA - ZONA SUR II

Nº	DESCRIPCIÓN	PLAZO	PRECIO OFERTADO MES DEDICACIÓN 100% CANTIDAD 1	CANTIDAD	% DEDICACION	VALOR TOTAL
1	**COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO**					
1.1	**PERSONAL PROFESIONAL**					
1.1.1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA Cantidad: 1 con una dedicación 100%	2,83	$ 9.849.311,00	1	100%	$ 27.873.550,00
1.1.2	PROFESIONAL DE APOYO Cantidad: 1 con una dedicación 100%	2,83	$ 6.296.042,00	1	100%	$ 17.817.799,00
1.1.3	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Cantidad: 1 con una dedicación 100%	2,83	$ 8.930.075,00	1	100%	$ 25.272.112,00
1.1.4	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL Cantidad: 1 con una dedicación 30%					$ 0,00
1.1.5	ESPECIALISTA AMBIENTAL Cantidad: 1 con una dedicación 15%	2,83	$ 9.849.311,67	1	15%	$ 4.181.033,00
1.1.6	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOCantidad: 1 con una dedicación 30%					$ 0,00
1.1.7	ESPECIALISTA EN REDES ELÉCTRICAS, TELEFÓNICAS, VOZ Y DATOS Cantidad: 1 con una dedicación 30%					$ 0,00
1.1.8	ESPECIALISTA EN REDES HIDROSANITARAS GAS Y RED CONTRA INCENDIOS Cantidad: 1 con una dedicación 30%					$ 0,00
1.1.9	PROFESIONAL EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA Cantidad: 1 con una dedicación 30%					$ 0,00
1.1.10	ASESOR JURÍDICO Cantidad: 1 con una dedicación 15%					$ 0,00
1.2	**PERSONAL TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO**					
1.2.1	TÉCNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Cantidad: 1 con una dedicación 100%	2,83	$ 2.422.509,00	1	100%	$ 6.855.700,00
1.2.2	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA Cantidad: 1 con una dedicación 100%	2,83	$ 2.734.046,00	1	100%	$ 7.737.350,00
SUBTOTAL	**1. COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO**					**$ 89.737.544,00**
2	**GASTOS ADMINISTRATIVOS**					
2.1	**GASTOS GENERALES**					
2.1.1	GASTOS GENERALES Y/O ADMINISTRATIVOS (OFICINA SENCILLA, PAPELERÍA, COMPUTADORES, SECUENCIA FOTOGRÁFICA, COSTOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL, COMUNICACIONES, IMPRESIÓN DE PLANOS PARA EL INTERVENTOR) IMPUESTOS, GARANTIAS Y TODOS LOS QUE SE REQUIERAN PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	2,83	$ 7.396.313,00			$ 20.931.566,00
SUBTOTAL	**2. GASTOS ADMINISTRATIVOS**					**$ 20.931.566,00**
	TOTAL COSTOS PERSONAL - ADMINISTRACIÓN - IMPUESTOS - GARANTÍAS - UTILIDAD ESTIMADA OFERTADA					**$ 110.669.110,00**
	I.V.A. (19%)					**$ 21.027.131,00**
	VALOR TOTAL OFERTADO					**$ 131.696.241,00**

CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO
NIT: 901.977.271-0
Dirección: Calle 98 No. 70-91
Correo: serinco.educativo@gmail.com

SERINCO-SED-INT-2026-675

Bogotá D.C., 24 de agosto de 2026

Señores(a):
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
ARQ. SANTIAGO ANGEL URIBE
Apoyo a la Supervisión
Dirección de Construcción y Conservación de
Establecimientos Educativos – DCCEE

REFERENCIA: ***"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".***

ASUNTO: Alcance al oficio SERINCO-SED-INT-2026-651 Solicitud Modificatorio No. 03 Adición y Prórroga. - Cto Interventoría CO1.PCCNTR.8169110 Grupo 2

Respetado Arquitecto,

En atención al contrato de referencia, suscrito entre **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO y CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO**, se da alcance al oficio **SERINCO-SED-INT-2026-651,** en el cual se realiza el ajuste a la propuesta económica de la interventoría según la solicitud manifestada por la Secretaría de Educación del Distrito (SED).

Dicha modificación esta basada en la necesidad manifestada por Entidad, así:

1. Mejoras en las condiciones físicas del plantel educativo **I.E.D. JOSÉ CELESTINO MUTIS Sede A**, con actividades de impermeabilización integral de las cubiertas en placa correspondientes al Bloque 1 mediante sistema de manto asfáltico, incluido el retiro del sistema impermeabilizante existente, la preparación y adecuación de superficies y el tratamiento de puntos críticos, los cuales pertenecen a la adición del Lote 4.

2. Mejoras en las condiciones físicas del plantel educativo ***I.E.D. NUEVO SAN ANDRÉS DE LOS ALTOS Sede A***, con actividades de adecuación del espacio destinado al sistema de almacenamiento de agua potable, suministro e instalación de tanques, redes y accesorios hidráulicos, sistema de drenaje y las instalaciones eléctricas requeridas para la operación del cuarto de motobombas, los cuales pertenecen a la adición del Lote 5.

3. Incluir las actividades a realizar en las instituciones educativas ***I.E.D. RAFAEL URIBE URIBE Sede A***, con actividades de adecuación integral de baterías sanitarias de los bloques de Preescolar (Ciclo I) y de bachillerato, cambio de cubierta y adecuación de

instalaciones eléctricas asociadas, e ***I.E.D. OSWALDO GUAYASAMÍN – LOS COMUNEROS Sede B***, con actividades de adecuación integral de las baterías sanitarias del bloque de bachillerato de primer piso y adecuación de baño para población con movilidad reducida, los cuales pertenecen a la adición del Lote 6.

En aras de dar cumplimiento a los lineamientos contractuales y a razón de las adiciones y prórroga del ***CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8155135***, ***CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8154895*** y ***CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8154780*** que mediante la Resolución 0012 del 28 de marzo de 2025 la Entidad abrió el Proceso de Contratación SED-LP-OP-DCCEE-012-2025 y que por medio de la Resolución 0068 del 25 de julio de 2025, corregida mediante Resolución 0071 del 5 de agosto de 2025, la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista, entre la Secretaría de Educación del Distrito (SED) con NIT. 860.532.363 quien actúa en calidad de contratante y los respectivos consorcios quienes actúan en calidad de contratista.

El Contratista de interventoría solicita una adición y prórroga del ***CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.8169110*** que la Entidad abrió mediante el Proceso de selección de CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-018-2025 y que, en relación con la LICITACIÓN PÚBLICA No. SED-LP-OP-DCCEE-012-2025, posteriormente la Entidad adjudicó el Contrato a la interventoría entre la Secretaría de Educación del Distrito (SED) con NIT. 860.532.363 quien actúa en calidad de contratante y el CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO identificado con NIT. 901.977.271-0 quien actúa en calidad de interventoría, de lo cual esta interventoría se permite conceptuar:

1. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
OBJETO	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
CONTRATISTA	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO - NIT 901.977.271-0
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.8169110
VALOR INICIAL	SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($796.184.131,00) INC. IVA
PLAZO INICIAL	SIETE (7) MESES

FECHA DE INICIACIÓN	06 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	05 DE MAYO DE 2026
MODIFICATORIO No. 1	ADICIÓN: CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. ($128.425.720,00) INC. IVA PRÓRROGA: 1.5 MESES
MODIFICATORIO No. 2	ADICIÓN: CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE. ($162.875.214,00) INC. IVA PRÓRROGA: CIENTO SIETE (107) DÍAS CALENDARIO (3.53 MESES)
VALOR TOTAL	MIL OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($1.087.485.065,00) INC. IVA
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	05 DE OCTUBRE DE 2026
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	LOCALIDADES DE CIUDAD BOLÍVAR Y USME

Conforme con lo indicado anteriormente y de acuerdo con las necesidades identificadas por parte de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, a continuación, se relacionan los antecedentes y requerimientos presentados por las partes, los cuales se requieren incluir dentro del alcance del contrato de interventoría, con base en la justificación presentada por el Contratista y concepto emitido por esta interventoría.

2. ANTECEDENTES

2.1. La SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, de conformidad con lo establecido en el Decreto 330 de 2008, tiene por objeto orientar y liderar la formulación y ejecución de políticas, planes y programas para garantizar el derecho a la educación y asegurar a la población el acceso al conocimiento y la formación integral. De igual forma, como acciones tendientes a garantizar la permanencia escolar, promoción de la calidad educativa, prever y asegurar el funcionamiento normal, eficiencia y la buena presentación de las plantas físicas educativas y administrativas, la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos ha priorizado las obras menores y de mejoramiento con características de Reparaciones Locativas en las diferentes localidades de Bogotá, intervenciones que contribuyen a mejorar la infraestructura educativa en temas tales como la atención prioritaria a las observaciones efectuadas por parte de la Secretaría Distrital de Salud, obras menores de mitigación ante posibles riesgos y el mantenimiento correctivo, entre otros aspectos relacionados.

2.2. Es así que la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO adelantó la licitación pública cuyo objeto consistió en la "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" en cumplimiento de la normatividad vigente que rige la contratación pública, adjudicando a la firma CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO identificado con NIT. 901.977.271-0 mediante contrato No. CO1.PCCNTR.8169110.

2.3. El alcance proyectado contempla realizar las reparaciones locativas y atención de emergencias en los centros y sedes educativas y administrativas de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, en lo que se incluyen los mantenimientos programados y la atención de emergencias en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar, con el fin de mejorar las condiciones de cada una de las sedes intervenidas, por un valor de SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS M/CTE. ($796.184.131) inc. IVA.

2.4. Si bien el objeto y el alcance del contrato se encuentran determinados, así como la destinación específica del mismo, por la modalidad de oferta económica presentada en la licitación pública de manera discriminada, la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO estableció y priorizó la ejecución de actividades de obra con las cantidades contenidas en el Formulario 1 del proceso licitatorio, conforme con el presupuesto oficial.

2.5. Conforme a las necesidades identificadas en las sedes educativas intervenidas, se suscribió el **MODIFICATORIO No. 1**, consistente en una adición y prórroga al contrato, sustentado en la necesidad de atender mayores cantidades de obra y actividades no previstas inicialmente, por un valor de **CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. ($128.425.720,00) INC. IVA**, y una prórroga de **UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS**, requeridos para garantizar la adecuada ejecución de las intervenciones, mejorar las condiciones de la infraestructura educativa y dar respuesta a situaciones detectadas durante el desarrollo del contrato, en concordancia con las prioridades establecidas por la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

2.6. Posteriormente, y en atención a las nuevas necesidades priorizadas por la Entidad, se suscribió el **MODIFICATORIO No. 2**, consistente en una adición por valor de **CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE. ($162.875.214,00) INC. IVA** y una prórroga de **CIENTO SIETE (107) DÍAS CALENDARIO**, con lo cual el valor total del contrato de interventoría asciende a **MIL OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($1.087.485.065,00) INC. IVA** y su plazo se extiende hasta el 05 de octubre de 2026.

2.7. No obstante, y conforme con la dinámica del contrato de obra, la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO ha identificado que siguen persistiendo necesidades en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar, las cuales son susceptibles de intervención,

con necesidades particulares en cuanto a obras de adecuación, mejoramiento y/o mantenimiento correctivo y/o el requerido, con el fin de mejorar las condiciones de las infraestructuras físicas distritales.

2.8. Por lo que se plantea la necesidad de incluir unas obras adicionales al alcance de los contratos de obra de las siguientes sedes educativas, de lo cual la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO planteó las necesidades de intervención adicional al presupuesto inicial:

LOTE 4:

NOMBRE SEDE EDUCATIVA	SEDE	DIRECCIÓN	LOCALIDAD
CPF 1985 José Celestino Mutis	**A**	**Km 10 vía Quiba, Predio El Clavel – Mochuelo Bajo**	**Ciudad Bolívar**

La adición del presente lote se justifica por la incorporación de nuevas actividades requeridas por el colegio anteriormente mencionado, situación que responde a las motivaciones expuestas en el cuerpo de este oficio. En consecuencia, como se indicó previamente, se adicionan actividades correspondientes a una sede adicional respecto de las ya contratadas.

LOTE 5:

NOMBRE SEDE EDUCATIVA	SEDE	DIRECCIÓN	LOCALIDAD
CPF 543 Nuevo San Andrés de los Altos	**A**	**Calle 69 Sur No. 2 B - 15**	**Usme**

La adición del presente lote se justifica por la incorporación de nuevas actividades requeridas por el colegio anteriormente mencionado, las cuales serán agregadas al presente contrato. Esta situación obedece a las motivaciones expuestas en el cuerpo de este oficio. En consecuencia, como se indicó previamente, se adicionan actividades correspondientes a una sede adicional respecto de las ya contratadas.

LOTE 6:

NOMBRE SEDE EDUCATIVA	SEDE	DIRECCIÓN	LOCALIDAD
CPF 1943 Rafael Uribe Uribe	**A**	**Diagonal 71 B Sur No. 18 I - 20**	**Ciudad Bolívar**
CPF 561 Los Comuneros – Oswaldo Guayasamín	**B**	**Calle 94 Sur No. 3 B - 53**	**Usme**

La adición del presente lote se justifica por la incorporación de nuevas actividades requeridas por los colegios anteriormente mencionados, las cuales serán agregadas al presente contrato, así como por la disponibilidad de recursos destinados a la atención de emergencias. Esta situación obedece a las motivaciones expuestas en el cuerpo de este oficio. En consecuencia, como se indicó previamente, se adicionan actividades correspondientes a dos sedes adicionales respecto de las ya contratadas.

3. MOTIVACIONES

De acuerdo con lo ya detallado y las necesidades planteadas por parte de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, se presenta la solicitud de prórroga y adición requerida para el contrato de interventoría, conforme con las siguientes motivaciones:

3.1. La SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO tiene dentro de sus obligaciones mejorar las condiciones actuales de las instituciones educativas y administrativas de las localidades de Usme y Ciudad Bolívar, con el fin de garantizar el derecho a la Educación de la comunidad educativa, condición que bajo la inclusión de recursos para mejoramientos al contrato de obra puede beneficiar a más población y que a su vez involucra a la interventoría como entidad de control ante los contratos de obra.

3.2. A continuación, se presentan las intervenciones propuestas por la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO y revisadas por parte de Contratista e Interventoría, las cuales son objeto de la solicitud de prórroga y adición:

Se recuerda que la adición de los lotes 4, 5 y 6 se justifica por la incorporación de nuevas actividades en los colegios anteriormente mencionados, situación que responde a las motivaciones expuestas en el cuerpo de este oficio, adicionándose actividades correspondientes a sedes adicionales respecto de las ya contratadas, como se observa a continuación:

➢ **CPF 1985 I.E.D. José Celestino Mutis - Sede A**

El alcance de las obras a ejecutar en esta sede educativa es el siguiente:

- Impermeabilización integral de las cubiertas en placa correspondientes al Bloque 1, mediante la instalación de sistema de manto asfáltico, incluyendo:
  - Retiro del sistema impermeabilizante existente.
  - Preparación y adecuación de superficies.
  - Ejecución de alistados, tratamiento de puntos críticos y actividades complementarias requeridas para garantizar la estanqueidad y el adecuado desempeño del sistema de impermeabilización.

➢ **CPF 543 I.E.D. Nuevo San Andrés de los Altos - Sede A**

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- Adecuación de un espacio destinado al sistema de almacenamiento de agua potable, que incluye:
  - Suministro e instalación de tanques con capacidad mínima de 2.000 litros hasta 4.000 litros.
  - Suministro, instalación y puesta en operación del sistema de abastecimiento hidráulico, incluyendo redes, accesorios, elementos de control, presurización (de ser requerida), sistema de drenaje y conexión a la red hidráulica existente.
  - Construcción de cajas de inspección, de ser necesario.

- Adecuación e implementación de las instalaciones eléctricas requeridas para la conexión y operación del cuarto de motobombas.

➢ **CPF 1943 I.E.D. Rafael Uribe Uribe - Sede A**

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- Adecuación integral de las baterías sanitarias de niños y niñas del bloque de Preescolar (Ciclo I), incluyendo demoliciones, revisión de redes hidrosanitarias, suministro e instalación de aparatos sanitarios, mesones, orinales, griferías, enchapes de pisos y muros, así como divisiones sanitarias en acero inoxidable.
- Cambio de cubierta y adecuación de instalaciones eléctricas asociadas a las baterías sanitarias del bloque de Preescolar (Ciclo I).
- Adecuación integral de las baterías sanitarias de niños y niñas de primer piso del bloque de bachillerato, incluyendo actividades de demolición, reposición de acabados, suministro e instalación de aparatos sanitarios, mesones, griferías, enchapes, divisiones sanitarias y demás actividades complementarias necesarias para garantizar su correcto funcionamiento.

➢ **CPF 561 I.E.D. Los Comuneros – Oswaldo Guayasamín - Sede B**

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- Adecuación integral de las baterías sanitarias de niños y niñas ubicadas en el bloque de bachillerato, primer piso, incluyendo actividades de demolición, revisión de redes hidrosanitarias, suministro e instalación de aparatos sanitarios, mesones de lavamanos, orinales, griferías, enchapes de pisos y muros, divisiones sanitarias en acero inoxidable y puertas de acceso. La intervención deberá contemplar la adecuación de cajas de inspección existentes, de ser necesario.
- Adecuación de baño para población con movilidad reducida.

3.3. Teniendo en cuenta los alcances indicados, a continuación, se relaciona el balance financiero de cada una de las intervenciones:

De acuerdo con los alcances y estimaciones financieras de las cuatro (4) instituciones educativas relacionadas anteriormente, así como de los recursos destinados a la atención de emergencias, es necesario disponer de una adición presupuestal al contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110, de ***CIENTO TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE. ($131.696.241,00)*** INCLUIDO IVA y una prórroga de OCHENTA Y CINCO (85) DÍAS CALENDARIO, comprendidos entre el 06 de octubre y el 30 de diciembre de 2026.

Finalmente, conforme con las necesidades de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO respecto a las sedes a intervenir, esta interventoría concluye lo siguiente:

4. CONCLUSIONES

De acuerdo con las consideraciones expuestas por parte del Contratista y las necesidades requeridas por parte de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, esta Interventoría indica que se realizó la debida revisión de cada uno de los alcances planteados por los

Contratistas mediante comunicado del asunto, por lo que emitimos concepto favorable para la inclusión de las siguientes sedes educativas conforme con las actividades contractuales establecidas en el Formulario 1 del proceso licitatorio:

LOTE 4:

NOMBRE SEDE EDUCATIVA	LOCALIDAD	VALOR PRESUPUESTAL	TIEMPO
CPF 1985 José Celestino Mutis – Sede A	**Ciudad Bolívar**	**$ 209.000.000,00**	**89 días (ochenta y nueve días)**

LOTE 5:

NOMBRE SEDE EDUCATIVA	LOCALIDAD	VALOR PRESUPUESTAL	TIEMPO
CPF 543 Nuevo San Andrés de los Altos – Sede A	**Usme**	**$ 140.000.000,00**	**85 días (ochenta y cinco días)**

LOTE 6:

NOMBRE SEDE EDUCATIVA	LOCALIDAD	VALOR PRESUPUESTAL	TIEMPO
CPF 1943 Rafael Uribe Uribe – Sede A	**Ciudad Bolívar**	**$ 170.000.000,00**	**90 días (noventa días)**
CPF 561 Los Comuneros – Oswaldo Guayasamín – Sede B	**Usme**	**$ 130.000.000,00**	**85 días (ochenta y cinco días)**
Atención de emergencias – Lote 6	**Usme y Ciudad Bolívar**	**$ 160.000.000,00**	**85 días (ochenta y cinco días)**

Lo cual genera la necesidad de disponer de una adición presupuestal al contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110, de ***CIENTO TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE. ($131.696.241,00)*** INCLUIDO IVA y una prórroga de OCHENTA Y CINCO (85) DÍAS CALENDARIO, es decir, hasta el 30 de diciembre de 2026.

5. SOLICITUDES

Esta interventoría, de manera atenta, pone a consideración de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO las siguientes solicitudes:

5.1. ADICIÓN: Con el fin de cumplir con los alcances necesarios en cada una de las sedes educativas planteadas, se solicita disponer de una adición presupuestal al contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110, de ***CIENTO TREINTA Y UN MILLONES***

SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE. ($131.696.241,00) INCLUIDO IVA.

5.2. PRÓRROGA: Teniendo en cuenta el plazo necesario para la ejecución de las obras de adecuación, mantenimiento y/o mejoramiento en las sedes educativas, se solicita una prórroga al contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110 por el término de **OCHENTA Y CINCO (85) DÍAS CALENDARIO (2.83 MESES)**, comprendidos entre el 06 de octubre y el 30 de diciembre de 2026, es decir, hasta el 30 de diciembre de 2026.

6. ANEXOS

Como soporte de la presente solicitud se anexa a la presente:

6.1. Propuesta económica.
6.2. Certificados de Antecedentes:
- Contraloría y Personería
- Procuraduría y Policía
- Inhabilidades y RNMC

Sin otro particular.

Cordialmente;

HECTOR JOSE VILLAZON GUTIERREZ
Consorcio Serinco Educativo
Director de Interventoría
Cc Consecutivo
Anexo: Según indica

OBJETO: "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."

VALOR OFERTA ECONOMICA - ZONA SUR II

Nº	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DEDICACION	PLAZO	PRECIO OFERTADO MES	VALOR TOTAL
1	**COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO**					
1.1	**PERSONAL PROFESIONAL**					
1.1.1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA Cantidad: 1 con una dedicación 100%	1	100%	2,830	$ 9.849.311,00	$ 27.873.550,00
1.1.2	PROFESIONAL DE APOYO Cantidad: 1 con una dedicación 100%	1	100%	2,830	$ 6.296.042,00	$ 17.817.799,00
1.1.3	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Cantidad: 1 con una dedicación 100%	1	100%	2,830	$ 8.930.074,95	$ 25.272.112,00
1.1.5	ESPECIALISTA AMBIENTAL Cantidad: 1 con una dedicación 15%	1	15%	2,830	$ 9.849.311,55	$ 4.181.033,00
1.2	**PERSONAL TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO**					
1.2.1	TÉCNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Cantidad: 1 con una dedicación 100%	1	100%	2,830	$ 2.422.509,00	$ 6.855.700,00
1.2.2	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA Cantidad: 1 con una dedicación 100%	1	100%	2,830	$ 2.734.046,00	$ 7.737.350,00
SUBTOTAL 1. COSTOS DE PROFESIONAL, TECNICO Y PERSONAL AUXILIAR						**$ 89.737.544,00**
2	**GASTOS ADMINISTRATIVOS**					
2.1	**GASTOS GENERALES**					
2.1.1	GASTOS GENERALES Y/O ADMINISTRATIVOS (OFICINA SENCILLA, PAPELERÍA, COMPUTADORES, SECUENCIA FOTOGRÁFICA, COSTOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL, COMUNICACIONES, IMPRESIÓN DE PLANOS PARA EL INTERVENTOR) IMPUESTOS, GARANTIAS Y TODOS LOS QUE SE REQUIERAN PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.			2,830	$ 7.396.313,09	$ 20.931.566,00
SUBTOTAL 2. GASTOS ADMINISTRATIVOS						**$ 20.931.566,00**
	TOTAL COSTOS PERSONAL - ADMINISTRACIÓN - IMPUESTOS - GARANTÍAS - UTILIDAD ESTIMADA OFERTADA					**$ 110.669.110,00**
	I.V.A. (19%)					**$ 21.027.131,00**
	VALOR TOTAL OFERTADO					**$ 131.696.241,00**

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

Todas las propuestas deben contemplar dentro de su OFERTA ECONÓMICA, la totalidad del personal mínimo exigido, los costos directos e indirectos y todos los demás gastos en que pueda incurrir el contratista durante la ejecución del contrato. Los proponentes que no diligencien la totalidad de los campos establecidos en el Formulario – "PROPUESTA ECONÓMICA", será objeto de subsanación, lo anterior teniendo en cuenta que la oferta económica corresponde a un requisito de carácter habilitante, que no otorga puntaje.

La SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO efectuará la revisión aritmética de la información contenida en la Propuesta Económica, para efectos del cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. Los valores propuestos deberán contemplar todos los costos directos e indirectos, para los cuales incurra el proponente en relación con la correcta ejecución del objeto de la presente contratación.

Los precios contenidos en la propuesta económica seleccionada NO ESTÁN SUJETOS A REAJUSTE ALGUNO durante la ejecución del contrato, por tal razón, el proponente deberá tener en cuenta en el momento de la elaboración de la propuesta, su irrevocabilidad y los posibles incrementos durante la ejecución del contrato.

La propuesta debe presentarse en pesos colombianos.

El presente proceso de selección se adjudicará por el valor total de la oferta económica presentada y habilitada por el proponente seleccionado. La Propuesta Económica DEBERÁ SER DILIGENCIADA, FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y PRESENTADA DE FORMA COMPLETA JUNTO CON LA PROPUESTA AL MOMENTO DEL CIERRE

FECHA:	5/09/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANANCIA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	25 Dias		GRUPO 4
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO			

CORTE DEL INFORME:	CONTRATISTA DE OBRA:	consorcio adecuaciones ARSAF 2025
6 de septiembre de 2026	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	consorcio SERINCO educativo

FECHAS			PLAZOS EN DIAS		VALOR CONTRATO		
DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8169110	CO1.PCCNTR.8155135	INICIAL	211	211	INICIAL	$ 796,184,131.00	$ 2,703,337,443.00
INICIO	6 de octubre de 2025	6 de octubre de 2025	SUSPENSIONES			ADICIONES	$ 291,300,934.00	$ 1,342,467,488.00
TERMINACION INICIAL	5 de mayo de 2026	5 de mayo de 2026	PRÓRROGAS	153	149	TOTAL	$ 1,087,485,065.00	$ 4,045,804,931.00
TERMINACION FINAL	5 de octubre de 2026	1 de octubre de 2026	TOTAL	364	360			

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1	23-dic-25	$ 291,300,934.00	46	
2	5-jun-26	$ 162,875,214.00	107	
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA	OTRO ASPECTO
1	18-dic-25	$ 479,467,488.00	27	
2	27-may-26	$ 863,000,000.00	122	
3				
4				

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA — GARANTE: SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	CALIDAD DEL SERVICIO DESDE	CALIDAD DEL SERVICIO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA
BCH – 100046043 – Anexo 0	4 9 2025	4 10 2026	4 4 2026	4 4 2031	4 9 2025	4 4 2029

POLIZAS CONTRATO DE OBRA — BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA HASTA	POLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE	RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA
96098	4 9 2025	4 12 2026	4 9 2025	4 4 2029	4 4 2026	4 4 2028	27661	4 9 2025	4 4 2026

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (06-09-2026)		PROGR %	EJECUTADO VS PROG	Vlr FRENTE APROBADO	Vlr FRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA	oct-2025	oct-2025	nov-2025	nov-2025	dic-2025	dic-2025	ene-2026	ene-2026	feb-2026	feb-2026	mar-2026	abr-2026	may-2026	jun-2026	jul-2026	ago-2026	sep-2026	oct-2026
1981-L	FANNY MICKEY (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Villas del Diamante	100.00%	100.00%		100.00%		$ 823,617,481.00	$ 823,617,480.93	10/11/2025	11/04/2026																		
1962	ESTRELLA DEL SUR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	D	Estrella del Sur (4)	100.00%	100.00%		100.00%		$ 112,549,000.00	$ 112,549,000.00	2/02/2026	30/04/2026																		
1919	ESTRELLA DEL SUR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	C	Estrella III Sede C	100.00%	100.00%		100.00%		$ 79,889,305.00	$ 79,889,305.00	15/01/2026	28/03/2026																		
1912	CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Confederación Suiza	100.00%	100.00%		100.00%		$ 748,450,427.07	$ 748,450,427.07	18/11/2025	5/06/2026																		
1911	COMPARTIR RECUERDO (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Compartir Lucero Alto	100.00%	100.00%		100.00%		$ 457,805,803.07	$ 457,805,803.07	24/11/2025	20/08/2026																		
576	DIEGO MONTANA CUELLAR (IED)	USME	A	El Uval - Nuevo	100.00%	100.00%		100.00%		$ 418,236,131.23	$ 418,236,131.23	1/12/2025	1/06/2026																		
573	OFELIA URIBE DE ACOSTA (IED)	USME	A	El Bosque Nuevo	100.00%	100.00%		100.00%		$ 276,898,268.00	$ 276,898,268.00	24/11/2025	7/05/2026																		
539	LOS TEJARES (IED)	USME	A	Los Tejares	100.00%	100.00%		100.00%		$ 226,256,621.00	$ 226,256,621.00	1/12/2025	1/06/2026																		
1940	ARBORIZADORA ALTA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	B	Pradera Esperanza	68.45%	83.26%		77.66%		$ 452,673,691.63	$ 376,908,663.50	5/06/2026	1/10/2026																		
TOTAL FRENTES DE OBRA						97.89%		97.19%		$ 3,596,376,728.00	$ 3,520,611,699.79																				
EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO																														
527	FRANCISCO ANTONIO ZEA DE USME (IED)	USME	C	Maria Auxiliadora Sede C		100.00%		100.00%		$ 2,129,817	$ 2,129,817.00	23/11/2025	24/11/2025																		
577	CIUDAD DE VILLAVICENCIO (IED)	USME	A	lote - Puerta Al llano valle 12		100.00%		100.00%		$ 5,810,951	$ 5,810,951.00	22/11/2025	24/11/2025																		
1928	EL PARAISO DE MANUELA BELTRAN (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Manuela Beltrán		100.00%		100.00%		$ 52,871,886	$ 52,871,886.00	4/12/2025	7/01/2026																		
1911	COMPARTIR RECUERDO (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Compartir Lucero Alto		100.00%		100.00%		$ 11,256,017.56	$ 11,256,017.56	10/04/2026	16/04/2026																		
533	RURAL LA UNION USME (CED)	USME	A	La Unión Usme		100.00%		100.00%		$ 4,026,228	$ 4,026,228.00	15/05/2026	15/05/2026																		
533	RURAL LA UNION USME (CED)	USME	A	La Unión Usme		98.00%				$ 95,943,545.00	$ 94,024,674.10																				
1981-I	FANNY MICKEY (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Villas del Diamante		100.00%		100.00%		$ 3,852,781.00	$ 3,852,781.00	23/03/2026	13/04/2026																		
1911	COMPARTIR RECUERDO (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Compartir Lucero Alto		100.00%				$ 6,706,898.00	$ 6,706,898.00	18/05/2026	5/06/2026																		
1912	CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Confederación Suiza		90.00%				$ 78,134,766.00	$ 70,321,289.40	22/06/2026	13/07/2026																		
1911	COMPARTIR RECUERDO (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Compartir Lucero Alto		100.00%		100.00%		$ 40,163,790.00	$ 40,163,790.00	20/05/2026	18/06/2026																		
1962	ESTRELLA DEL SUR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	D	Estrella del Sur (4)		100.00%		100.00%		$ 38,540,608.07	$ 38,540,608.07	22/06/2026	10/07/2026																		
573	OFELIA URIBE DE ACOSTA (IED)	USME	A	El Bosque Nuevo		100.00%		100.00%		$ 7,564,823.31	$ 7,564,823.31	23/05/2026	24/05/2026																		
1981-I	FANNY MICKEY (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Villas del Diamante		100.00%				$ 39,213,599.00	$ 39,213,599.00	2/07/2026	22/07/2026																		
577	CIUDAD DE VILLAVICENCIO (IED)	USME	A	lote - Puerta Al llano valle 12		0.00%				$ 12,819,409.00		27/07/2026	8/08/2026																		
1915	COMPARTIR RECUERDO (IED)	CIUDAD BOLIVAR	B	El Recuerdo		95.00%				$ 32,057,446.00	$ 30,454,573.70	3/08/2026	29/08/2026																		
576	DIEGO MONTANA CUELLAR (IED)	USME	A	El Uval - Nuevo		95.00%				$ 1,914,749.00	$ 1,819,011.55																				
1940	ARBORIZADORA ALTA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	B	Pradera Esperanza		0.00%				$ 5,594,314.00																					
TOTAL FRENTES DE OBRA						86.94%		100.00%		$ 438,601,627.94	$ 408,756,947.69																				

ACUMULADO FRENTES DE OBRA


TERMINADAS	EN EJECUCION	POR INICIAR	TOTAL	VALOR
4	5	0	9	$ 3,520,611,700
ACUMULADO EMERGENCIAS				
11	400.00%	2	17	$ 408,756,948
TOTAL				
15	9	2	26	$ 3,929,368,647
FRENTES POR LOCALIDAD				


RELACION DE PAGOS EFECTUADOS


No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR
1		12		1		12		23		34	
2		13		2		13		24		35	
3		14		3		14		25		36	
4		15		4		15		26		37	
5		16		5		16		27		38	
6		17		6		17		28		39	
7		18		7		18		29		40	
8		19		8		19		30		TOTAL INTERVENTORIA	
9		20		9		20		31			
10		TOTAL OBRA		10		21		32			
11	$ -			11		22		33		$ -	


AVANCE GENERAL

	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO
AVANCE	97.89%	0.00%	93.06%
PROGRAMADO	97.19%		
ATRASO	0.70%	EN EJECUCION	
FECHA APROBACION CRONOGRAMA			










OBSERVACIONES:

FECHA: 5/09/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES 25 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				
REGISTRO FOTOGRAFICO	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				GRUPO 4
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8155135	CONTRATISTA:	consorcio adecuaciones ARSAF 2025	
9/8/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	consorcio SERINCO educativo	

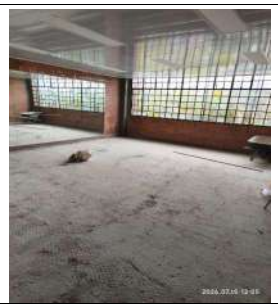TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
1A 100.00%	FANNY MICKEY	IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS Y TERRAZAS	 		
		INTERVENCION BATERIAS SANITARIAS (Cambio de sanitarios, orinales, lavamanos y griferia).	 	 	
2A 100.00%	CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE	IMPERMEABILIZACION DE CUPULAS (CUBIERTA)		 	
3A 100.00%	COMPARTIR EL RECUERDO	Cerramiento en lona verde, replanteo, retiro de aparatos sanitarios, demolicion de enchape de pared y de piso		 	

FECHA:	5/09/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	25 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA	
REGISTRO FOTOGRAFICO		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	GRUPO 4
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8155135	CONTRATISTA: consorcio adecuaciones ARSAF 2025
9/8/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR: consorcio SERINCO educativo

4A 100.00%	LOS TEJARES	CAMBIO DE CUBIERTA EDIFICIO No.2, INCLUYE MEJORAMIENTO ELETRICO DE LOS ESPACIOS A INTERVENIR (2 AULAS Y 2 COORDINACIONES)				
5A 100.00%	OFELIA URIBE DE ACOSTA	IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS Y TERRAZAS, MEJORAMIENTO DE CANALES Y BAJANTES, ADECUACION DE CARCAMOS,				
6A 100.00%	DIEGO MONTAÑA CUELLAR	ADECUACION BATERIA SANITARIA PARA MOVILIDAD REDUCIDA, ADECUACION RAMPA ACCESO AREA DE COMEDOR (AUDITORIO), MEJORAMIENTO DE CORNISAS				
7C 100.00%	ESTRELLA DEL SUR - C	MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE PORTONES PRINCIPALES CAMBIO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL				



FECHA:	5/09/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	25 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				
REGISTRO FOTOGRAFICO		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				GRUPO 4
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8155135	CONTRATISTA:	consorcio adecuaciones ARSAF 2025		
9/8/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	consorcio SERINCO educativo		

8C 100.00%	ESTRELLA DEL SUR - D	MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE PORTONES PRINCIPALES CAMBIO DE CUBIERTA				
9C 83.26%	ARBORIZADORA ALTA SEDE B	CAMBIO DE CUBIERTA, REMODELACION DE BATERIAS SANITARIAS, DEMOLICION DE PLACA DE CANCHA, CAMBIO DE CUBIERTA				
10A 100.00%	FRANCISCO ANTONIO ZEA DE USME	TALA DE UN ARBOL Y PODA DE UN ARBOL				
11A 100.00%	CIUDAD DE VILLAVICENCIO	ADECUACION BATERIA SANITARIA PARA MOVILIDAD REDUCIDA, ADECUACION RAMPA ACCESO AREA DE COMEDOR (AUDITORIO), MEJORAMIENTO DE CORNISAS				

FECHA:	5/09/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	25 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA	
REGISTRO FOTOGRAFICO		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	GRUPO 4
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8155135	CONTRATISTA: consorcio adecuaciones ARSAF 2025
9/8/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR: consorcio SERINCO educativo

12A 100.00%	EL PARAISO DE MANUELA BELTRAN	ADECUACION BATERIA SANITARIA PARA MOVILIDAD REDUCIDA, ADECUACION RAMPA ACCESO AREA DE COMEDOR (AUDITORIO), MEJORAMIENTO DE CORNISAS				
13A 100.00%	COMPARTIR EL RECUERDO (Emergencia 1)	RUPTURA DE TUBERÍA SOBRE BAÑO 2DO PISO Y EN PATIO PRINCIPAL, HUMEDAD SOBRE BAÑOS 2DO PISO				
14A 100.00%	FANNY MIKEY (Emergencia)	APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACION SOBRE COCINA DONDE SE ENCONTRABAN EQUIPOS DE COCINA				
15A 100.00%	COMPARTIR EL RECUERDO (Emergencia 2)	RETIRO DE PISO SALON DE DANZAS, INSTALACIÓN DE PISO NUEVO, RETIRO DE DIVISIONES METALICAS ENTRE SALONES, INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPERBOARD COMO REMPLAZO DE ESTAS				

FECHA:	5/09/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	25 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA	
REGISTRO FOTOGRAFICO		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	GRUPO 4
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8155135	CONTRATISTA: consorcio adecuaciones ARSAF 2025
9/8/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR: consorcio SERINCO educativo

16A 100.00%	RURAL LA UNION (Emergencia 1)	TALA DE UN (01) UN ELEMENTO ARBOREO				
17A 90.00%	CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE	REUBICACION BAJANTES AGUAS LLUVIAS EN SALONES DONDE ESTAS SE ENCUENTRAN AFECTADAS				
18A 98.00%	RURAL LA UNION (Emergencia 2)	DEMOLICION Y RECONSTRUCCION DE MURO AFECTADO POR GRIETAS, CARCAMO PERIMETRAL Y ANDEN DE CIRCULACION				
19A 100.00%	ESTRELLA DEL SUR SEDE D	CAMBIOR DE POLICARBONATO EN ZONA DE INGRESO A SALA DE SISTEMAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS				

FECHA: 5/09/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES 25 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA					
REGISTRO FOTOGRAFICO	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				GRUPO	4
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8155135	CONTRATISTA:	consorcio adecuaciones ARSAF 2025		
9/8/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	consorcio SERINCO educativo		

20A **95.00%**	COMPARTIR EL RECUERDO SEDE B	RETIRO DE CERRAMIENTO, CONSTURCCION DE VIGA DE CONFINAMIENTO, PAÑETE DE FACHADA, REPOSICION DE SANITARIO				

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA					VIGENCIA		2025
CPF	1981-L	IED	FANNY MIKEY		SEMANA No. 42						
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($) + AIU	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	mayores o menores cantidades de obra	Observaciones
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	119.00	299.51		$ 30,319.00	$ 9,080,843.69	$ (5,472,882.69)			MAYOR	
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS	M2	268.86	303.45	0	$ 17,585.00	$ 5,336,168.25	$ (608,265.15)			MAYOR	
DEMOLICION DE ACABADO DE PISO ÍTEM: 1.29	M2	0.00	725.46	0	$ 31,765.00	$ 23,044,236.90	$ (23,044,236.90)			MAYOR	
AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E= 0.10 M PARA CUBIERTA NO TRANSITABLE DE BLOQUE 11 (COCINA) ÍTEM: 16.1.25	M2	0.00	725.46		$ 110,795.00	$ 80,377,340.70	$ (80,377,340.70)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA 5MM, DE 0.15X 0.15 M	KG	0.00	1573.68		$ 7,344.00	$ 11,557,105.92	$ (11,557,105.92)			MAYOR	
DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	0.00	386.00		$ 28,441.00	$ 10,978,226.00	$ (10,978,226.00)			MAYOR	
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	0.00	333.88		$ 23,603.00	$ 7,880,569.64	$ (7,880,569.64)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	2142.18	1294.72		$ 352,164.00	$ 455,953,774.08	$ 298,444,903.44			MENOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	0.00	7.00		$ 851,255.00	$ 5,958,785.00	$ (5,958,785.00)			MAYOR	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	3.00	3.00		$ 601,133.00	$ 1,803,399.00	$ -			IGUAL	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE INCRUSTAR COLOR BLANCO (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA Y GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	17.00	16.00		$ 800,038.00	$ 12,800,608.00	$ 800,038.00			MENOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA ADRIATICA, INCLUYE ASIENTO SANITARIO ENTRADA SUPERIOR PARA FLUXOMETRO DE CORONA O SIMILAR	UN	2.00	17.00		$ 1,487,960.00	$ 25,295,320.00	$ (22,319,400.00)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	24.00	27.00		$ 418,333.00	$ 11,294,991.00	$ (1,254,999.00)			MAYOR	
DILATACIÓNENCONCRETOCONPULIDORAESPESORDE3MMPROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM	M	0.00	314.60		$ 4,436.00	$ 1,395,565.60	$ (1,395,565.60)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M	0.00	315.60		$ 25,116.00	$ 7,926,609.60	$ (7,926,609.60)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2.00	3.00		$ 752,783.00	$ 2,258,349.00	$ (752,783.00)			MAYOR	
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TOP COAT O SIMILAR, PARA EXTERIORES EN COLORES PRIMARIOS, NO INCLUYE DISEÑO	M2	0.00	970.18		$ 41,171.00	$ 39,943,280.78	$ (39,943,280.78)			MAYOR	

Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($) + AIU	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	mayores o menores cantidades de obra	Observaciones
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA TASA SANITARIO REF: CORONA O SIMILAR	UN	0.00	10.00		$ 713,949.00	$ 7,139,490.00	$ (7,139,490.00)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA TIPO PUSH PARA ORINAL LÍNEA INFANTIL	UN	0.00	4.00		$ 358,984.00	$ 1,435,936.00	$ (1,435,936.00)			MAYOR	
TRATAMIENTO DE PLACA EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: PULIDA DE SUPERFICIE, TRATAMIENTO DE JUNTAS, LAVADO PARA RETIRO DE SUCIEDAD, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN	M2	0.00	156.41		$ 46,488.00	$ 7,271,188.08	$ (7,271,188.08)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M	0.00	8.50		$ 29,027.00	$ 246,729.50	$ (246,729.50)			MAYOR	
DEMOLICIÓN DE PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA O MACIZA E= 0,15M A 0,20 M EXISTENTE EN CONCRETO REFORZADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0.00	303.56		$ 107,321.00	$ 32,578,362.76	$ (32,578,362.76)			MAYOR	
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	0.00	301.75		$ 161,712.00	$ 48,796,198.35	$ (48,796,198.35)			MAYOR	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	854.75	1296.16		$ 4,822.00	$ 6,250,083.52	$ (2,128,479.02)			MAYOR	
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND	21.00	84.00		$ 26,588.00	$ 2,233,392.00	$ (1,675,044.00)			MAYOR	63.00
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) CERTIFICADOS)	M2	16.00	2.88		$ 12,327.00	$ 35,501.76	$ 161,730.24			MENOR	
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	0.00	9.00		$ 8,731.00	$ 78,579.00	$ (78,579.00)			MAYOR	
PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE	M	0.00	9.00		$ 21,288.00	$ 191,592.00	$ (191,592.00)			MAYOR	
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	0.00	8.00		$ 8,731.00	$ 69,848.00	$ (69,848.00)			MAYOR	8.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1-1/4'' INCLUYE ACCESORIOS	M	0.00	7.76		$ 27,261.00	$ 211,545.36	$ (211,545.36)			MAYOR	7.76
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1-1/4 ''	UN	0.00	40.00		$ 13,976.00	$ 559,040.00	$ (559,040.00)			MAYOR	40.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 3/4'' INCLUYE ACCESORIOS	M	0.00	0.88		$ 15,333.00	$ 13,493.04	$ (13,493.04)			MAYOR	0.88
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 3/4'	UN	0.00	4.00		$ 6,383.00	$ 25,532.00	$ (25,532.00)			MAYOR	4.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 3/4"	UN	0.00	1.00		$ 84,122.00	$ 84,122.00	$ (84,122.00)			MAYOR	1.00
MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	0.00	119.84		$ 25,975.00	$ 3,112,844.00	$ (3,112,844.00)			MAYOR	119.84
SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	0.00	2.88		$ 113,205.00	$ 326,030.40	$ (326,030.40)			MAYOR	2.88

Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($) + AIU	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	mayores o menores cantidades de obra	Observaciones
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	0.00	1.00		$ 40,084.00	$ 40,084.00	$ (40,084.00)			MAYOR	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	0.00	1.00		$ 32,716.00	$ 32,716.00	$ (32,716.00)			MAYOR	1.00
					SUBTOTAL I.E.D. FANNY MIKEY	**$ 823,617,480.93**					
CPF	**1912**	**IED**	**CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE**			**SEMANA No. 42**					
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS	M2	1256.41	1963.82		$ 17,585.00	$ 34,533,792.46	$ (12,439,822.61)			MAYOR	
TRATAMIENTO DE PLACA EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: PULIDA DE SUPERFICIE, TRATAMIENTO DE JUNTAS, LAVADO PARA RETIRO DE SUCIEDAD, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN	M2	0.00	1605.59		$ 46,487.71	$ 74,640,075.47	$ (74,640,075.47)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	1256.41	1605.59		$ 352,164.00	$ 565,430,084.66	$ (122,967,713.42)			MAYOR	
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TOP COAT O SIMILAR, PARA EXTERIORES EN COLORES PRIMARIOS, NO INCLUYE DISEÑO	M2	0.00	1605.59		$ 41,171.43	$ 66,104,323.88	$ (66,104,323.88)			MAYOR	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	0.00	1605.59		$ 4,822.00	$ 7,742,150.60	$ (7,742,150.60)			MAYOR	
					SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. BRISAS DEL DIAMANTE	**$ 748,450,427.07**					
CPF	**1911**	**IED**	**OFELIA URIBE**			**SEMANA No. 42**					
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS	M2	409.70	394.25		$ 17,585.00	$ 6,932,886.25	$ 271,688.25			MENOR	-15.45
DEMOLICION DE ACABADO DE PISO ÍTEM: 1.2.8	M2	0.00	370.28		$ 31,765.00	$ 11,761,944.20	$ (11,761,944.20)			MAYOR	370.28
AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E= 0.10 M PARA CUBIERTA NO TRANSITABLE	M2	0.00	370.28		$ 110,795.00	$ 41,025,172.60	$ (41,025,172.60)			MAYOR	370.28
CERRAMIENTO EN LONA	M	30.00	105.46		$ 30,319.00	$ 3,197,441.74	$ (2,287,871.74)			MAYOR	75.46
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	UN	0.00	256.65		$ 23,603.00	$ 6,057,709.95	$ (6,057,709.95)			MAYOR	256.65
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	409.70	399.05		$ 352,164.00	$ 140,531,044.20	$ 3,750,546.60			MENOR	-10.65
ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	0.00	172.35		$ 12,208.00	$ 2,104,048.80	$ (2,104,048.80)			MAYOR	172.35
PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	0.00	438.79		$ 29,027.00	$ 12,736,699.28	$ (12,736,699.28)			MAYOR	438.79
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M	32.00	16.00		$ 297,746.00	$ 4,763,936.00	$ 4,763,936.00			MENOR	-16.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	0.00	44.92		$ 89,260.00	$ 4,009,559.20	$ (4,009,559.20)			MAYOR	44.92
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	0.00	30.00		$ 205,343.00	$ 6,160,290.00	$ (6,160,290.00)			MAYOR	30.00
DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0.00	172.35		$ 11,088.00	$ 1,911,016.80	$ (1,911,016.80)			MAYOR	172.35

Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($) + AIU	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	mayores o menores cantidades de obra	Observaciones
DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0.00	0.56		$ 14,297.00	$ 8,006.32	$ (8,006.32)			MAYOR	0.56
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y ...	M2	8.00	12.80		$ 35,817.00	$ 458,457.60	$ (171,921.60)			MAYOR	4.80
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	43.00	45.00		$ 7,280.00	$ 327,600.00	$ (14,560.00)			MAYOR	2.00
CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI MEZCLADO EN SITIO (NO INCLUYE ACERO)	M2	0.00	0.15		$ 625,445.00	$ 93,816.75	$ (93,816.75)			MAYOR	0.15
PERFORACIÓN NÚCLEO 4" E= 0.10 M	UN	0.00	15.00		$ 172,614.00	$ 2,589,210.00	$ (2,589,210.00)			MAYOR	15.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	UN	0.00	15.00		$ 39,716.00	$ 595,740.00	$ (595,740.00)			MAYOR	15.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M	0.00	1.10		$ 81,396.00	$ 89,535.60	$ (89,535.60)			MAYOR	1.10
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"	UN	0.00	2.00		$ 29,271.00	$ 58,542.00	$ (58,542.00)			MAYOR	2.00
UMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	0.00	8.00		$ 14,830.00	$ 118,640.00	$ (118,640.00)			MAYOR	8.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	0.00	8.00		$ 15,661.00	$ 125,288.00	$ (125,288.00)			MAYOR	8.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 18W REDONDO, DIÁMETRO 8", INCRUSTAR O SOBREPUESTO, TEMP 6500K, FLUJO 1300 LM, TEMP OPERACIÓN: -20ºA+40ºC. VOLTAJE 100- 240V, 30.000 HORAS, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN.	UN	16.00	15.00		$ 61,735.00	$ 926,025.00	$ 61,735.00			MENOR	-1.00
PINTURA DE ACEITE SOBRE PAÑETE (2 MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	0.00	414.92		$ 20,542.00	$ 8,523,286.64	$ (8,523,286.64)			MAYOR	414.92
PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	0.00	47.17		$ 20,533.00	$ 968,541.61	$ (968,541.61)			MAYOR	47.17
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	0.00	98.35		$ 33,842.00	$ 3,328,360.70	$ (3,328,360.70)			MAYOR	98.35
TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	0.00	37.19		$ 37,712.00	$ 1,402,509.28	$ (1,402,509.28)			MAYOR	37.19
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	0.00	929.27		$ 4,822.00	$ 4,480,952.96	$ (4,480,952.96)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA METALICA PARA CÁRCAMO EN CONCRETO PARA ANCHOS DE 40 CM A 45 CM, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE REJILLA EXISTENTE, APLICACIÓN DE PINTURA 3 EN 1, MALLA EXPANDIDA MT-30, MARCO EN ÁNGULO 1X1X1/8" Y ÁNGULO HORIZONTAL DE 1X1X1/8" CON SEPARACIÓN DE 2 CM, NO INCLUYE CONTRAMARCO. COL OFELIA URIBE DE ACOSTA	ML	0.00	18.33	18.33	$ 633,354.00	$ 11,612,006.52	$ (11,612,006.52)			MAYOR	
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. OFELIA URIBE					**$ 276,898,268.00**					

Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($) + AIU	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	mayores o menores cantidades de obra	Observaciones
CPF	573	IED	COMPARTIR EL RECUERDO			SEMANA No. 42					
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M2	30.00	24.00		$ 30,319.00	$ 727,656.00	$ 181,914.00			MENOR	-6.00
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0.00	19.60		$ 67,341.00	$ 1,319,883.60	$ (1,319,883.60)			MAYOR	19.60
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0.00	13.48	0	$ 110,911.00	$ 1,495,080.28	$ (1,495,080.28)			MAYOR	13.48
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	55.18	55.60		$ 31,765.00	$ 1,766,134.00	$ (13,341.30)			MAYOR	0.42
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	13.05	72.33		$ 21,734.00	$ 1,572,020.22	$ (1,288,391.52)			MAYOR	59.28
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	69.82	109.82		$ 12,327.00	$ 1,353,751.14	$ (493,080.00)			MAYOR	40.00
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	4.67	19.29		$ 24,459.07	$ 471,815.48	$ (357,591.62)			MAYOR	14.62
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	0.00	11.93		$ 139,987.00	$ 1,670,044.91	$ (1,670,044.91)			MAYOR	11.93
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND	30.00	30.00		$ 26,588.00	$ 797,640.00	$ -			IGUAL	0.00
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	70.00	48.84		$ 20,183.00	$ 985,737.72	$ 427,072.28			MENOR	-21.16
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	0.00	174.96		$ 139,987.00	$ 24,492,125.52	$ (24,492,125.52)			MAYOR	174.96
DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	134.23	225.60		$ 89,260.00	$ 20,137,056.00	$ (8,155,686.20)			MAYOR	91.37
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UND	0.00	22.00		$ 7,280.00	$ 160,160.00	$ (160,160.00)			MAYOR	22.00
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	60.00	116.50		$ 8,731.00	$ 1,017,161.50	$ (493,301.50)			MAYOR	56.50
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	0.00	13.35		$ 89,260.00	$ 1,191,621.00	$ (1,191,621.00)			MAYOR	13.35

Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($) + AIU	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	mayores o menores cantidades de obra	Observaciones
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	0.00	17.70		$ 49,826.00	$ 881,920.20	$ (881,920.20)			MAYOR	17.70
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UND	0.00	9.00		$ 94,820.00	$ 853,380.00	$ (853,380.00)			MAYOR	9.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	UND	0.00	4.00		$ 134,128.00	$ 536,512.00	$ (536,512.00)			MAYOR	4.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UND	0.00	7.00		$ 61,917.00	$ 433,419.00	$ (433,419.00)			MAYOR	7.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UND	0.00	10.00		$ 65,687.00	$ 656,870.00	$ (656,870.00)			MAYOR	10.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	0.00	58.49		$ 14,607.00	$ 854,363.43	$ (854,363.43)			MAYOR	58.49
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	UND	0.00	9.00		$ 188,006.00	$ 1,692,054.00	$ (1,692,054.00)			MAYOR	9.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UND	0.00	10.00		$ 94,820.00	$ 948,200.00	$ (948,200.00)			MAYOR	10.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	UND	8.00	8.00		$ 67,247.00	$ 537,976.00	$ -			IGUAL	0.00
CAJA DE INSPECCION 60 X 60 CM, INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UND	0.00	2.00		$ 674,511.00	$ 1,349,022.00	$ (1,349,022.00)			MAYOR	2.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM, DE 0.15X 0.15 M	KG	0.00	103.53		$ 7,344.00	$ 760,324.32	$ (760,324.32)			MAYOR	103.53
PLACA CONTRAPISO DE 10CM- CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2	0.00	41.93		$ 119,173.00	$ 4,996,923.89	$ (4,996,923.89)			MAYOR	41.93
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	0.00	56.90		$ 23,603.00	$ 1,343,010.70	$ (1,343,010.70)			MAYOR	56.90
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAJÓN DE PIEDRA	M3	0.00	20.49		$ 178,689.00	$ 3,661,337.61	$ (3,661,337.61)			MAYOR	20.49
PAÑETE LISO BAJO PLACA ACABADO LISO 1:4 (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	0.00	37.33		$ 40,541.00	$ 1,513,395.53	$ (1,513,395.53)			MAYOR	37.33
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	0.00	118.92		$ 101,554.00	$ 12,076,801.68	$ (12,076,801.68)			MAYOR	118.92
ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	0.00	50.00		$ 12,208.00	$ 610,400.00	$ (610,400.00)			MAYOR	50.00
RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	0.00	22.54		$ 187,185.00	$ 4,219,149.90	$ (4,219,149.90)			MAYOR	22.54
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM- CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	0.00	30.30		$ 161,712.00	$ 4,899,873.60	$ (4,899,873.60)			MAYOR	30.30
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	55.18	18.00		$ 44,137.00	$ 794,466.00	$ 1,641,013.66			MENOR	-37.18
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M2	41.56	25.00		$ 80,091.00	$ 2,002,275.00	$ 1,326,306.96			MENOR	-16.56
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	0.00	5.00		$ 851,255.00	$ 4,256,275.00	$ (4,256,275.00)			MAYOR	5.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	0.00	2.00		$ 601,133.00	$ 1,202,266.00	$ (1,202,266.00)			MAYOR	2.00
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	189.08	53.57		$ 4,127.00	$ 221,083.39	$ 559,249.77			MENOR	-135.51

Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($) + AIU	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	mayores o menores cantidades de obra	Observaciones
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	0.00	28.97		$ 3,360.00	$ 97,339.20	$ (97,339.20)			MAYOR	28.97
DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	40.00	32.00		$ 11,663.00	$ 373,216.00	$ 93,304.00			MENOR	-8.00
PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y / OCIELO RASO, ANCHO <=15 CM, PROFUNDIDAD<=10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	0.00	73.53		$ 21,288.00	$ 1,565,306.64	$ (1,565,306.64)			MAYOR	73.53
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20METROS	M3	0.00	8.00		$ 33,842.00	$ 270,736.00	$ (270,736.00)			MAYOR	8.00
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	0.00	71.57		$ 7,070.00	$ 505,999.90	$ (505,999.90)			MAYOR	71.57
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	55.18	19.60		$ 44,137.00	$ 865,085.20	$ 1,570,394.46			MENOR	-35.58
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADODE 1"	M2	0.00	41.21		$ 1,022,891.00	$ 42,153,338.11	$ (42,153,338.11)			MAYOR	41.21
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO=300A400mm)CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30mm y 40mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2)CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES-FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA YL OS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	149.68	231.70		$ 258,037.00	$ 59,787,172.90	$ (21,164,194.74)			MAYOR	82.02
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	0.00	4272.33		$ 22,456.00	$ 95,939,442.48	$ (95,939,442.48)			MAYOR	4272.33
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	149.68	231.70		$ 35,817.00	$ 8,298,798.90	$ (2,937,710.34)			MAYOR	82.02

Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($) + AIU	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	mayores o menores cantidades de obra	Observaciones
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL BLANCO DE TANQUE DE 2 CUERPOS, CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA A UNA DESCARGA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, BRIDA, ACOPLE Y VÁLVULA PLÁSTICA DE 1/2" PARA REGULACIÓN DE PRESIÓN. CONSUMO DE AGUA DE 4.8 LITROS POR DESCARGA CAPACIDAD MÍNIMA DE EVACUACIÓN DE SÓLIDOS DE 400 GRAMOS.	UN	0.00	10.00		$ 1,055,407.00	$ 10,554,070.00	$ (10,554,070.00)			MAYOR	10.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑOS ED, ESPESOR DE 1 CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	4.80	4.80		$ 1,099,280.00	$ 5,276,544.00	$ -			IGUAL	0.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	0.00	55.00	12.00	$ 175,743.00	$ 9,665,865.00	$ (9,665,865.00)			MAYOR	55.00
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS	M2	268.86	303.45	0	$ 17,585.00	$ 5,336,168.25	$ (608,265.15)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES EPOXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	CM	0.00	2460.00		$ 1,564.00	$ 3,847,440.00	$ (3,847,440.00)			MAYOR	2460.00
CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7MM - 10MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	0.00	255.58		$ 134,767.00	$ 34,443,749.86	$ (34,443,749.86)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS	M	0.00	9.30		$ 20,829.00	$ 193,709.70	$ (193,709.70)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1"	UND	0.00	9.30		$ 8,843.00	$ 82,239.90	$ (82,239.90)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	M	0.00	20.00		$ 18,843.00	$ 376,860.00	$ (376,860.00)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 3/4'	UND	0.00	20.00		$ 6,383.00	$ 127,660.00	$ (127,660.00)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1"	UND	8.00	4.00		$ 119,504.00	$ 478,016.00	$ 478,016.00			MENOR	-4.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 3/4"	UND	8.00	4.00		$ 84,122.00	$ 336,488.00	$ 336,488.00			MENOR	-4.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1/2"	UND	0.00	41.00		$ 4,870.00	$ 199,670.00	$ (199,670.00)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	0.00	5.00		$ 123,679.00	$ 618,395.00	$ (618,395.00)			MAYOR	

Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($) + AIU	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	mayores o menores cantidades de obra	Observaciones
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	8.00	1.00		$ 206,316.00	$ 206,316.00	$ 1,444,212.00			MENOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE ,	UN	0.00	10.00	3	$ 205,343.00	$ 2,053,430.00	$ (2,053,430.00)			MAYOR	10.00
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M	0.00	3.00		$ 64,127.00	$ 192,381.00	$ (192,381.00)			MAYOR	3.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2.00	2.00		$ 752,783.00	$ 1,505,566.00	$ -			IGUAL	0.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	0.45	2.16		$ 1,022,891.00	$ 2,209,444.56	$ (1,749,143.61)			MAYOR	1.71
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	0.00	10.00		$ 40,084.00	$ 400,840.00	$ (400,840.00)			MAYOR	10.00
PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	0.00	135.44		$ 31,211.00	$ 4,227,217.84	$ (4,227,217.84)			MAYOR	135.44
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	0.00	7.39		$ 120,125.00	$ 887,723.75	$ (887,723.75)			MAYOR	7.39
FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	0.00	60.20		$ 103,564.00	$ 6,234,552.80	$ (6,234,552.80)			MAYOR	60.20
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICHE	M	0.00	23.40		$ 133,042.00	$ 3,113,182.80	$ (3,113,182.80)			MAYOR	23.40
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	0.00	91.60		$ 4,822.00	$ 441,695.20	$ (441,695.20)			MAYOR	91.60
PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN).	M2	0.00	100.00		$ 7,413.00	$ 741,300.00	$ (741,300.00)			MAYOR	100.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120X30CM, 40W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	0.00	45.00		$ 232,000.00	$ 10,440,000.00	$ (10,440,000.00)			MAYOR	45.00
EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	kg	0.00	10164.73		$ 3,276.00	$ 33,299,655.46	$ (33,299,655.46)			MAYOR	10164.73
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. COMPARTIR EL RECUERDO					**$ 457,805,803.07**					
CPF	**539**	**IED**	**LOS TEJARES**			**SEMANA No. 42**					
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	30.00	26.20		$ 30,319.00	$ 794,357.80	$ 115,212.20			MENOR	-3.80
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	0.00	42.01		$ 21,734.00	$ 913,045.34	$ (913,045.34)			MAYOR	42.01

Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($) + AIU	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	mayores o menores cantidades de obra	Observaciones
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	149.68	248.29		$ 35,817.00	$ 8,893,002.93	$ (3,531,914.37)			MAYOR	98.61
DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	42.00	60.95		$ 26,101.00	$ 1,590,855.95	$ (494,613.95)			MAYOR	18.95
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	16.00	24.00		$ 7,280.00	$ 174,720.00	$ (58,240.00)			MAYOR	8.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	20.00	3630.35		$ 22,456.00	$ 81,523,076.55	$ (81,073,956.55)			MAYOR	3610.35
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO=300A400mm)CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30mm y 40mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2)CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES-FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA YL OS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	183.38	326.90		$ 258,037.00	$ 84,352,295.30	$ (37,033,470.24)			MAYOR	143.52
MURO EN SUPERBOARD DE 8 MM INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA, MASILLA, CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA, VISTO DOS CARAS E=12 CM	M2	0.00	24.32		$ 164,556.00	$ 4,001,837.36	$ (4,001,837.36)			MAYOR	24.32
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M2	30.00	43.00		$ 22,722.00	$ 977,046.00	$ (295,386.00)			MAYOR	13.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120X30CM, 40W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	M2	16.00	12.00		$ 232,000.00	$ 2,784,000.00	$ 928,000.00			MENOR	-4.00
PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M2	0.00	54.61		$ 16,770.00	$ 915,809.70	$ (915,809.70)			MAYOR	54.61
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	16.00	30.00		$ 175,743.00	$ 5,272,290.00	$ (2,460,402.00)			MAYOR	14.00
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	129.47	187.68		$ 21,050.00	$ 3,950,664.00	$ (1,225,320.50)			MAYOR	$ 58.21
PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A= 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	0.00	54.61		$ 20,533.00	$ 1,121,307.13	$ (1,121,307.13)			MAYOR	54.61
PLACA EN CONCRETO 3000 PSI DE 15CM SOBRE LAMINA COLABORANTE 2"	M2	0.00	9.00		$ 238,672.00	$ 2,148,048.00	$ (2,148,048.00)			MAYOR	9.00

Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($) + AIU	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	mayores o menores cantidades de obra	Observaciones
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA 5MM, DE 0.15X 0.15 M	KG	0.00	18.70		$ 7,344.00	$ 137,332.80	$ (137,332.80)			MAYOR	18.70
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120X30CM, 40W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	16.00	12.00		$ 232,000.00	$ 2,784,000.00	$ 928,000.00			MENOR	-4.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M	12.00	15.00		$ 29,027.00	$ 435,405.00	$ (87,081.00)			MAYOR	
DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0.00	7.20		$ 25,077.00	$ 180,554.40	$ (180,554.40)			MAYOR	
DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	0.00	3.00		$ 11,663.00	$ 34,989.00	$ (34,989.00)			MAYOR	
MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2	0.00	16.15		$ 69,499.00	$ 1,122,408.85	$ (1,122,408.85)			MAYOR	
MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	0.00	4.50		$ 151,090.00	$ 679,905.00	$ (679,905.00)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	ML	0.00	11.00		$ 89,260.00	$ 981,860.00	$ (981,860.00)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	UN	0.00	4.00	0	$ 39,716.00	$ 158,864.00	$ (158,864.00)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	0.00	9.00		$ 123,679.00	$ 1,113,111.00	$ (1,113,111.00)			MAYOR	
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	8.00	8.00		$ 206,316.00	$ 1,650,528.00	$ -			IGUAL	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN VINILO TRÁFICO PESADO ESPESOR 4 MM	M2	0.00	8.70	0	$ 238,656.00	$ 2,076,307.20	$ (2,076,307.20)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DOBLE CARA EN LÁMINA SUPERBOARD 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA, CINTA, MASILLA Y PRIMERA MANO DE PINTURA).	M2	0.00	8.73	0	$ 192,870.00	$ 1,683,755.10	$ (1,683,755.10)			MAYOR	
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	0.00	22.15	0	$ 42,602.00	$ 943,634.30	$ (943,634.30)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIO 5 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD	M2	0.00	2.76	0	$ 161.491	$ 445.72	$ (445.72)			MAYOR	
CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7MM - 10MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	0.00	12.50		$ 134,767.00	$ 1,684,587.50	$ (1,684,587.50)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE ,	UN	0.00	14.00	14	$ 205,343.00	$ 2,874,802.00	$ (2,874,802.00)			MAYOR	14.00

Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($) + AIU	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	mayores o menores cantidades de obra	Observaciones
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UND	0.00	1.00		$ 558,005.00	$ 558,005.00	$ (558,005.00)			MAYOR	1.00
EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	kg	0.00	2363.79		$ 3,276.00	$ 7,743,770.06	$ (7,743,770.06)			MAYOR	2363.79
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. LOS TEJARES					**$ 226,256,621.00**					
CPF	**576**	**IED**	**DIEGO MONTAÑA CUELLAR**			**SEMANA No. 42**					
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	16.32	16.66	0	$ 4,127.00	$ 68,755.82	$ (1,403.18)			MAYOR	0.34
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M2	30.00	150.00		$ 30,319.00	$ 4,547,850.00	$ (3,638,280.00)			MAYOR	120.00
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5.32	8.07		$ 67,341.00	$ 543,441.87	$ (185,187.75)			MAYOR	2.75
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	16.32	16.66		$ 31,765.00	$ 529,204.90	$ (10,800.10)			MAYOR	0.34
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	34.00	18.82	0	$ 21,734.00	$ 409,033.88	$ 329,922.12			MENOR	-15.18
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	41.18	31.05	0	$ 12,327.00	$ 382,753.35	$ 124,872.51			MENOR	-10.13
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	4.06	6.84	0	$ 32,330.00	$ 221,137.20	$ (89,877.40)			MAYOR	2.78
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND	8.00	10.00	0	$ 26,588.00	$ 265,880.00	$ (53,176.00)			MAYOR	2.00
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	0.00	57.96		$ 42,602.00	$ 2,469,211.92	$ (2,469,211.92)			MAYOR	57.96
MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2	0.00	7.26	0	$ 69,499.00	$ 504,562.74	$ (504,562.74)			MAYOR	7.26
MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	16.32	15.75	0	$ 44,137.00	$ 695,157.75	$ 25,158.09			MENOR	-0.57
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	0.00	40.59		$ 44,137.00	$ 1,791,520.83	$ (1,791,520.83)			MAYOR	40.59
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	16.32	15.80		$ 44,137.00	$ 697,364.60	$ 22,951.24			MENOR	-0.52
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	0.45	0.44		$ 1,022,891.00	$ 450,072.04	$ 10,228.91			MENOR	-0.01

Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($) + AIU	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	mayores o menores cantidades de obra	Observaciones
DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESTRUCTURA EXISTENTE Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA FIBRO CEMENTO A UNA CARA DE 1/2" CON ESTRUCTURA . INCLUYE ARME Y DESARME DE ANDAMIOS, PARA ALTURAS MAXIMAS DE 10 METROS CON ANDAMIO CERTIFICADO, PARA ANCHOS DE HASTA 60 CM, INCLUYE ESTUCO Y PINTURA PARA EXTERIORES, PARA IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A - OCALIDAD DE USME	M	0.00	1481.88		$ 219,057.00	$ 324,616,187.16	$ (324,616,187.16)			MAYOR	1481.88
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M2	20.60	22.41		$ 80,091.00	$ 1,794,839.31	$ (144,964.71)			MAYOR	1.81
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑOS ED, ESPESOR DE 1 CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	2.17	2.50		$ 1,099,280.00	$ 2,748,200.00	$ (362,762.40)			MAYOR	0.33
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	2.00	4.00		$ 418,333.00	$ 1,673,332.00	$ (836,666.00)			MAYOR	2.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2.00	2.00		$ 752,783.00	$ 1,505,566.00	$ -			IGUAL	0.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADODE 1"	M2	8.28	6.34		$ 964,177.00	$ 6,112,882.18	$ 1,870,503.38			MENOR	-1.94
DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	5.00	5.00		$ 11,663.00	$ 58,315.00	$ -			IGUAL	0.00
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	3.00	5.00		$ 7,280.00	$ 36,400.00	$ (14,560.00)			MAYOR	2.00
COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (NO INCLUYE ACERO)	ML	10.00	5.52		$ 57,553.00	$ 317,692.56	$ 257,837.44			MENOR	-4.48
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	40.00	21.82		$ 7,070.00	$ 154,267.40	$ 128,532.60			MENOR	-18.18
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	5.00	5.00		$ 65,687.00	$ 328,435.00	$ -			IGUAL	0.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	5.00	5.00		$ 61,917.00	$ 309,585.00	$ -			IGUAL	0.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN	5.00	7.00		$ 94,820.00	$ 663,740.00	$ (189,640.00)			MAYOR	2.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2.00	2.00		$ 123,679.00	$ 247,358.00	$ -			IGUAL	0.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE ,	UN	4.00	4.00		$ 205,343.00	$ 821,372.00	$ -			IGUAL	0.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE FLUXOMETRO, SISTEMA DE INSTALACIÓN EP/ES, ASIENTO SANITARIO)	UN	1.00	2.00		$ 2,609,918.00	$ 5,219,836.00	$ (2,609,918.00)			MAYOR	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DE TANQUE MOVILIDAD REDUCIDA (NO INCLUYE ACCESORIOS)	UN	0.00	1.00		$ 1,019,900.00	$ 1,019,900.00	$ (1,019,900.00)			MAYOR	1.00

Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($) + AIU	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	mayores o menores cantidades de obra	Observaciones
UMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, SIFÓN)	UN	1.00	1.00		$ 1,133,330.00	$ 1,133,330.00	$ -			IGUAL	0.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	2.00	2.00		$ 32,716.00	$ 65,432.00	$ -			IGUAL	0.00
PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	105.59	15.80		$ 29,027.00	$ 458,626.60	$ 2,606,334.33			MENOR	-89.79
SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M2	0.00	19.50		$ 26,548.00	$ 517,686.00	$ (517,686.00)			MAYOR	19.50
RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	0.00	2.95		$ 187,185.00	$ 552,195.75	$ (552,195.75)			MAYOR	2.95
PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN).	M2	0.00	809.15		$ 7,413.00	$ 5,998,228.95	$ (5,998,228.95)			MAYOR	809.15
RAMPA EN CONCRETO	M2	0.00	6.45		$ 151,202.00	$ 975,252.90	$ (975,252.90)			MAYOR	6.45
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	0.00	50.00		$ 8,731.00	$ 436,550.00	$ (436,550.00)			MAYOR	50.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA 5MM, DE 0.15X 0.15 M	KG	0.00	8.29		$ 7,344.00	$ 60,881.76	$ (60,881.76)			MAYOR	
TRATAMIENTO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: REEMBOQUILLADO JUNTAS, LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN, EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURA)	M2	0.00	1.20		$ 27,466.00	$ 32,959.20	$ (32,959.20)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	UND	0.00	3.00		$ 134,128.00	$ 402,384.00	$ (402,384.00)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	UND	5.00	5.00		$ 67,247.00	$ 336,235.00	$ -			IGUAL	0.00
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UND	0.00	1.00		$ 206,316.00	$ 206,316.00	$ (206,316.00)			MAYOR	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	4.00	2.00		$ 40,084.00	$ 80,168.00	$ 80,168.00			MENOR	-2.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA SIN MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, CON DOS PERSIANAS INFERIOR Y SUPERIOR DE 30CM X 60CM. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	0.00	2.10		$ 955,155.00	$ 2,005,825.50	$ (2,005,825.50)			MAYOR	2.10
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	0.00	2.40		$ 120,125.00	$ 288,300.00	$ (288,300.00)			MAYOR	2.40

Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($) + AIU	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	mayores o menores cantidades de obra	Observaciones
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	0.00	809.15		$ 4,822.00	$ 3,901,721.30	$ (3,901,721.30)			MAYOR	809.15
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE	UND	0.00	1.00		$ 721,458.00	$ 721,458.00	$ (721,458.00)			MAYOR	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE GALVANIZADO CALIBRE 22 DESARROLLO DE 100 CM, PARA ALTURAS HASTA DE 10 METROS CON ANDAMIO CERTIFICADO. NO INCLUYE PINTURA	M	0.00	117.16		$ 275,030.00	$ 32,222,514.80	$ (32,222,514.80)			MAYOR	117.16
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA, EL TUBO PASAMANOS DE 2" CALIBRE 18 AL IGUAL QUE LOS TUBOS PEDESTALES CON PLATINA DE FIJACIÓN Y TRAVESAÑOS VERTICALES EN TUBERÍA DE 3/4" CON SEPARACIÓN CADA 9CM, PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS.	M	0.00	5.73		$ 1,158,152.00	$ 6,636,210.96	$ (6,636,210.96)			MAYOR	5.73
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. DIEGO MONTAÑA CUELLAR					**$ 418,236,131.23**					
CPF	**1919**	**IED**	**ESTRELLA DEL SUR SEDE C**			**SEMANA No. 42**					
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	62.00	49.20		$ 30,319.00	$ 1,491,694.80	$ 388,083.20			MENOR	-12.80
DEMOLICIÓN Y/O DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE COMPUESTO POR MALLA ESLABONADA, ANTEPECHO EN LADRILLO, VIGA DE CIMENTACIÓN Y COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO, PARAL GALVANIZADO Y CONCERTINA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	47.25	92.75		$ 112,034.00	$ 10,390,790.41	$ (5,097,183.91)			MAYOR	45.50
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	16.15	16.15		$ 32,330.00	$ 522,129.50	$ -			IGUAL	0.00
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	130.05	325.70		$ 32,330.00	$ 10,529,881.00	$ (6,325,364.50)			MAYOR	195.65
Suministro e instalación de portón metálico plegable con marco montante en lámina Cold rolled lisa calibre 18. Incluye bisagras, cerradura, pasador superior e inferior, doble manija interior - exterior, terminada con anticorrosivo, pintura esmalte - verificar en obra medidas, ángulos y numero de hoja, color gris o similar	M2	0.00	17.15		$ 1,078,457.00	$ 18,495,537.55	$ (18,495,537.55)			MAYOR	17.15
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL REFORZADO EN MALLA PREONDULADA CALIBRE 8 HUECO 2", ÁNGULO 1" X 1/8" PISA MALLA EN ÁNGULO DE 3/4" X 1/4", PARALES DE 2 1/2" X 2 1/2" EN 3 MM CON SUJETADORES DE VARILLA DE 5/8" Y REFUERZOS DIAGONALES EN PLATINA DE 1-1/2"* 1/8" (INCLUYE TODOS LOS	M2	47.25	76.50		$ 393,484.64	$ 30,101,574.96	$ (11,509,425.72)			MAYOR	29.25
COLUMNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 20X25 CM (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO), ESTE ITEM CORRESPONDE AL COLEGIO ESTRELLA DEL SUR SEDE C, PARA UNA CANTIDAD TOTAL DE 3 METROS	ML	0.00	5.80		$ 119,563.00	$ 693,465.40	$ (693,465.40)			MAYOR	5.80
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 20 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO, ESTE ITEM CORRESPONDE AL COLEGIO ESTRELLA DEL SUR SEDE C	ML	0.00	29.70		$ 107,977.00	$ 3,206,916.90	$ (3,206,916.90)			MAYOR	29.70

Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($) + AIU	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	mayores o menores cantidades de obra	Observaciones
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	0.00	19.92		$ 42,602.00	$ 848,631.84	$ (848,631.84)			MAYOR	19.92
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	0.00	64.56		$ 23,603.00	$ 1,523,809.68	$ (1,523,809.68)			MAYOR	64.56
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	0.00	99.20		$ 4,822.00	$ 478,342.40	$ (478,342.40)			MAYOR	99.20
DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)}	M2	0.00	15.12		$ 11,088.00	$ 167,650.56	$ (167,650.56)			MAYOR	15.12
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES EPOXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	CM	0.00	920.00		$ 1,564.00	$ 1,438,880.00	$ (1,438,880.00)			MAYOR	920.00
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ESTRELLA DEL SUR SEDE C					**$ 79,889,305.00**					
CPF	**1962**		**ESTRELLA DEL SUR SEDE D**			**SEMANA No. 42**					
Suministro e instalación de portón metálico plegable con marco montante en lámina Cold rolled lisa calibre 18. Incluye bisagras, cerradura, pasador superior e inferior, doble manija interior - exterior, terminada con anticorrosivo, pintura esmalte - verificar en obra medidas, ángulos y numero de hoja, color gris o similar	M2		7.87		$ 1,078,457.00	$ 8,488,535.05	$ (8,488,535.05)				7.87
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	0.00	2538.11		$ 22,456.00	$ 56,995,805.33	$ (56,995,805.33)			MAYOR	2538.11
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	88.90	78.34		$ 35,817.00	$ 2,805,903.78	$ 378,227.52			MENOR	-10.56
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO=300A400mm)CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30mm y 40mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2)CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES-FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA YL OS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	88.23	125.45		$ 258,037.00	$ 32,371,075.84	$ (9,604,471.33)			MAYOR	37.22
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	8.00	25.00		$ 175,743.00	$ 4,393,575.00	$ (2,987,631.00)			MAYOR	17.00

Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($) + AIU	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	mayores o menores cantidades de obra	Observaciones
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120X30CM,40W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	8.00	25.00		$ 232,000.00	$ 5,800,000.00	$ (3,944,000.00)			MAYOR	17.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M2	45.00	50.00		$ 22,722.00	$ 1,136,100.00	$ (113,610.00)			MAYOR	5.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UND	0.00	1.00		$ 558,005.00	$ 558,005.00	$ (558,005.00)			MAYOR	1.00
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ESTRELLA DEL SUR SEDE D					**$ 112,549,000.00**					
CPF	**1962**		**ARBORIZADORA ALTA SEDE B**			**SEMANA No. 42**					
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	100.00	75.00	75.00	$ 30,319.00	$ 2,273,925.00	$ 757,975.00			MENOR	
CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA=2.4M (incluye parales de madera 5"x5"anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2").NOTA: el item incluye revision periodica de su estado fisico.	M	0.00	26.70	26.70	$ 159,977.00	$ 4,271,385.90	$ (4,271,385.90)			MAYOR	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16M HASTA H=0.30M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	400.00	700.00	100.00	$ 110,911.00	$ 77,637,700.00	$ (33,273,300.00)			MAYOR	$ 300.00
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	17.35	17.35	17.35	$ 67,341.00	$ 1,168,366.35	$ -			IGUAL	$ -
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	11.60	11.60	11.60	$ 21,734.00	$ 252,114.40	$ -			IGUAL	0.00
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) CERTIFICADOS)	M2	29.14	29.14	29.14	$ 12,327.00	$ 359,208.78	$ -			IGUAL	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	20.40	20.40	20.40	$ 24,459.07	$ 498,965.05	$ -			IGUAL	0.00
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND	9.00	9.00		$ 26,588.00	$ 239,292.00	$ -			IGUAL	0.00
DESMONTE CANCHA MULTIPLE (ARCO DE MICROFUTBOL Y ARO DE BALONCESTO) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND	2.00	2.00		$ 412,480.00	$ 824,960.00	$ -			IGUAL	0.00
MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2	0.00	48.76		$ 90,491.00	$ 4,412,522.14	$ (4,412,522.14)			MAYOR	48.76
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	303.85	243.08		$ 139,987.00	$ 34,028,039.96	$ 8,507,009.99			MENOR	-60.77


Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($) + AIU	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	mayores o menores cantidades de obra	Observaciones
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	UN	5.00	5.00		$ 94,820.00	$ 474,100.00	$ -			IGUAL	0.00
RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	303.85	303.27		$ 187,185.00	$ 56,767,594.95	$ 108,567.30			MENOR	-0.58
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	59.28	125.00		$ 7,070.00	$ 883,750.00	$ (464,640.40)			MAYOR	65.72
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	42.68	40.00		$ 139,987.00	$ 5,599,480.00	$ 375,165.16			MENOR	-2.68
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	30.58	30.00		$ 101,554.00	$ 3,046,620.00	$ 58,901.32			MENOR	-0.58
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	330.00	330.00		$ 161,712.00	$ 53,364,960.00	$ -			IGUAL	0.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA 5MM, DE 0.15X 0.15 M	KG	579.64	1159.28		$ 7,344.00	$ 8,513,752.32	$ (4,256,876.16)			MAYOR	579.64
MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	0.00	30.00		$ 151,090.00	$ 4,532,700.00	$ (4,532,700.00)			MAYOR	30.00
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	94.14	94.14		$ 35,817.00	$ 3,371,812.38	$ -			IGUAL	0.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	2490.59	2490.59	0.00	$ 22,456.00	$ 55,928,689.04	$ -			IGUAL	0.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	112.19	112.19		$ 258,037.00	$ 28,949,171.03	$ -			IGUAL	0.00
FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	14.80	14.80		$ 103,564.00	$ 1,532,747.20	$ -			IGUAL	0.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	4.00	4.00	4	$ 601,133.00	$ 2,404,532.00	$ -			IGUAL	0.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	27.96	25.00	25	$ 1,022,891.00	$ 25,572,275.00	$ 3,027,757.36			MENOR	-2.96
	SUBTOTAL I.E.D.ARBORIZADORA ALTA SEDE B					**$ 376,908,663.50**					


PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA	**97.89%**
ACUMULADO EJECUTADO A LA FECHA $	**3,520,611,699.79**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $	**3,596,376,728.00**

AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS POR SEDE - Septiembre 06 de 2026


SEDE EDUCATIVA	PROGRAMADO ACUMULADO		EJECUTADO ACUMULADO		TOTAL POR SEDE	% DE ADELANTO O ATRASO
FANNY MICKEY	$ 823,617,481.00	100.00%	$ 823,617,480.93	100.00%	$ 823,617,481.00	ENTREGADO
OFELIA URIBE	$ 276,898,268.00	100.00%	$ 276,898,268.00	100.00%	$ 276,898,268.00	ENTREGADO
BRISAS DEL DIAMANTE	$ 748,450,427.07	100.00%	$ 748,450,427.07	100.00%	$ 748,450,427.07	ENTREGADO
ESTRELLA DEL SUR - D	$ 112,549,000.00	100.00%	$ 112,549,000.00	100.00%	$ 112,549,000.00	ENTREGADO
LOS TEJARES - A	$ 226,256,621.00	100.00%	$ 226,256,621.00	100.00%	$ 226,256,621.00	ENTREGADO
COMPARTIR EL RDO - A	$ 457,805,803.07	100.00%	$ 457,805,803.07	100.00%	$ 457,805,803.07	ENTREGADO
DIEGO MONTAÑA - A	$ 418,236,131.23	100.00%	$ 418,236,131.23	100.00%	$ 418,236,131.23	ENTREGADO
ESTRELLA DEL SUR - C	$ 79,889,305.00	100.00%	$ 79,889,305.00	100.00%	$ 79,889,305.00	ENTREGADO
ARBORIZADORA ALTA	$ 351,568,053.38	77.66%	$ 376,908,663.50	83.26%	$ 452,673,691.63	5.60%
TOTALES	**$ 3,495,271,089.75**	**97.19%**	**$ 3,520,611,699.79**	**97.89%**	**$ 3,596,376,728.00**	0.70%

OBSERVACIONES: Al cierre de la semana No. 43 de ejecución de los mejoramientos, tenemos una (1) sede educativa, IED Arborizadora Alta , donde se siguen desarrollando actividades de obra, y refleja un adelanto superior del 5.60% comparado con lo programado para el cierre de este periodo. El contrato en general registra un adelanto ejecutado contra lo programado del 0.70%

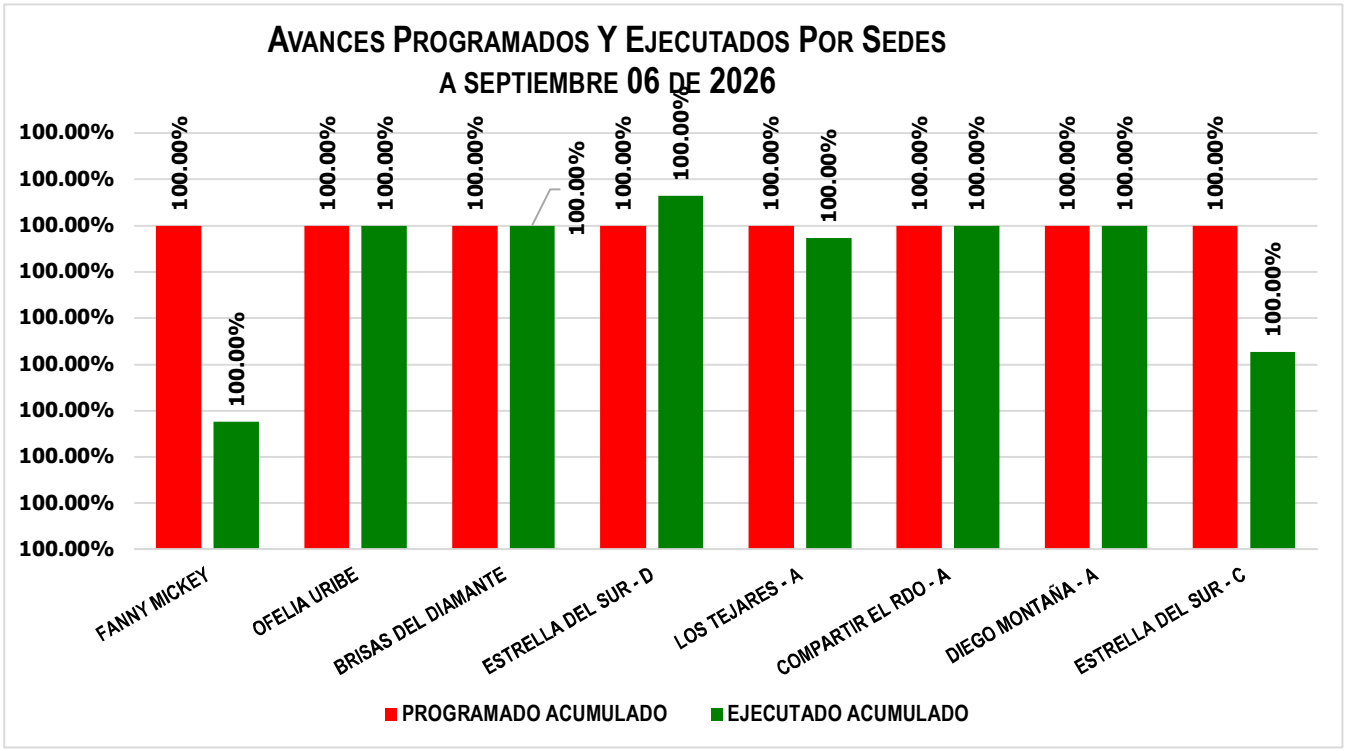

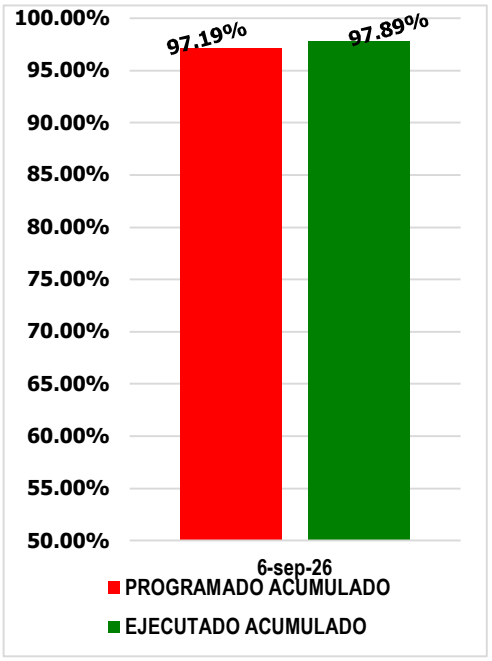

AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS TOTALES - Sep. 06 2026

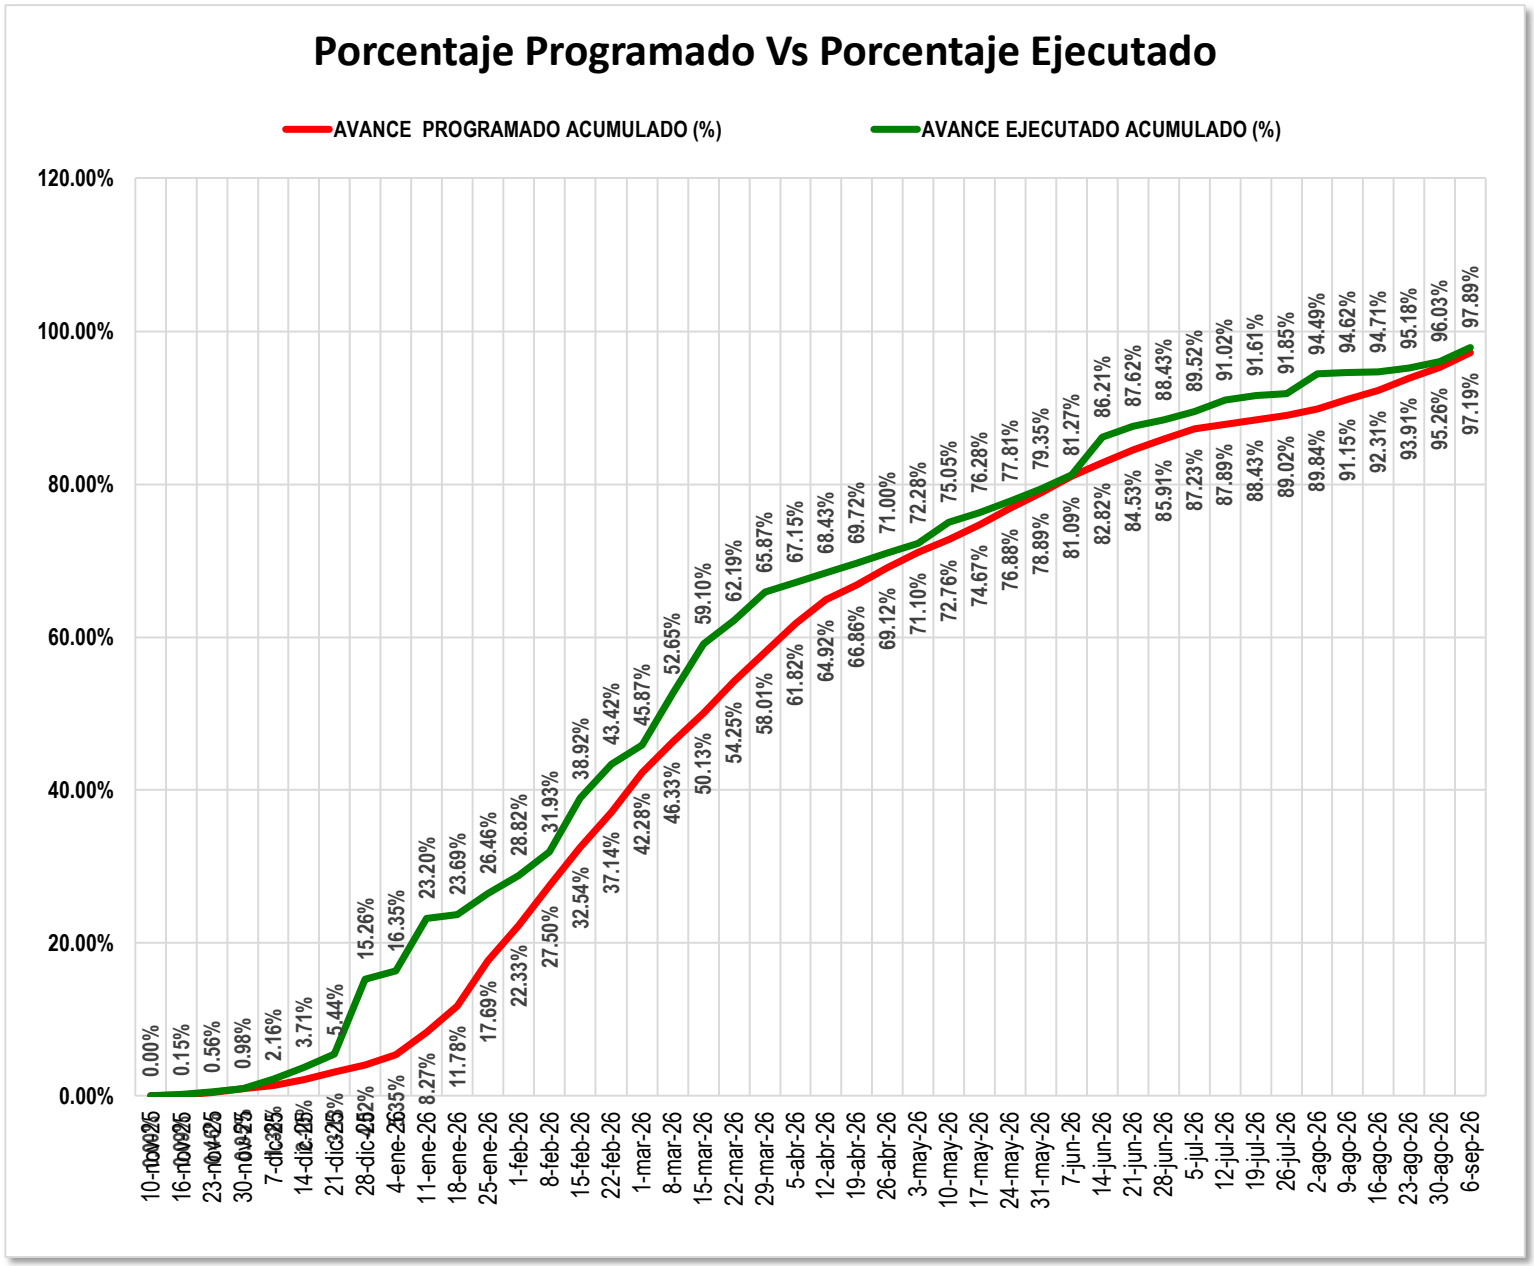

FECHA	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (%)	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO (%)
10-nov-25	0,00%	0,00%
16-nov-25	0,09%	0,15%
23-nov-25	0,46%	0,56%
30-nov-25	0,95%	0,98%
7-dic-25	1,38%	2,16%
14-dic-25	2,10%	3,71%
21-dic-25	3,13%	5,44%
28-dic-25	4,02%	15,26%
4-ene-26	5,35%	16,35%
11-ene-26	8,27%	23,20%
18-ene-26	11,78%	23,69%
25-ene-26	17,69%	26,46%
1-feb-26	22,33%	28,82%
8-feb-26	27,50%	31,93%
15-feb-26	32,54%	38,92%
22-feb-26	37,14%	43,42%
1-mar-26	42,28%	45,87%
8-mar-26	46,33%	52,65%
15-mar-26	50,13%	59,10%
22-mar-26	54,25%	62,19%
29-mar-26	58,01%	65,87%
5-abr-26	61,82%	67,15%
12-abr-26	64,92%	68,43%
19-abr-26	66,86%	69,72%
26-abr-26	69,12%	71,00%
3-may-26	71,10%	72,28%
10-may-26	72,76%	75,05%
17-may-26	74,67%	76,28%
24-may-26	76,88%	77,81%
31-may-26	78,89%	79,35%
7-jun-26	81,09%	81,27%
14-jun-26	82,82%	86,21%
21-jun-26	84,53%	87,62%
28-jun-26	85,91%	88,43%
5-jul-26	87,23%	89,52%
12-jul-26	87,89%	91,02%
19-jul-26	88,43%	91,61%
26-jul-26	89,02%	91,85%
2-ago-26	89,84%	94,49%
9-ago-26	91,15%	94,62%
16-ago-26	92,31%	94,71%
23-ago-26	93,91%	95,18%
30-ago-26	95,26%	96,03%
6-sep-26	**97,19%**	**97,89%**
13-sep-26	97,78%	
20-sep-26	99,25%	

FECHA: 6/09/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		INFORME
DIAS RESTANTES 118 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO		APOYO A LA SUPERVISION
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA		GRUPO 5
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS		

CORTE DEL INFORME:	CONTRATISTA DE OBRA:	consorcio FORTALEZA
9 de junio de 2026	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	consorcio SERINCO educativo

FECHAS			PLAZOS EN DIAS			VALOR CONTRATO		
DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8169110	CO1.PCCNTR.8154895	INICIAL	211	211	INICIAL	$ 796,184,131.00	$ 2,269,368,717.00
INICIO	6 de octubre de 2025	6 de octubre de 2025	SUSPENSIONES			ADICIÓNES	$ 291,300,934.00	$ 1,132,000,000.00
TERMINACION INICIAL	5 de mayo de 2026	5 de mayo de 2026	PRÓRROGAS	153	153	TOTAL	$ 1,087,485,065.00	$ 3,401,368,717.00
TERMINACION FINAL	5 de octubre de 2026	5 de octubre de 2026	TOTAL	364	364			

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1	23-dic-25	$ 128,425,720.00	46	
2	5-jun-26	$ 162,875,214.00	107	
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA	OTRO ASPECTO
1	23-dic-25	$ 515,000,000.00	46	
2	20-may-26	$ 617,000,000.00	107	
3				
4				

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA — **GARANTE:** SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	CALIDAD DEL SERVICIO DESDE	CALIDAD DEL SERVICIO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA
BCH – 100046043 – Anexo 0	4 9 2025	4 10 2026	4 4 2026	4 4 2031	4 9 2025	4 4 2029

POLIZAS CONTRATO DE OBRA — BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA HASTA
320 - 47 - 994000033722	1 9 2025	1 12 2026	3 9 2025	3 4 2029	3 4 2026	3 4 2028

POLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE	RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA
320 - 74 - 994000015128	1 9 2025	1 4 2026

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (06-09-2026)		PROGR %	EJECUTADO VS PROG	Vlr FRENTE APROBADO	Vlr FRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA
1923	LA ARABIA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	La Arabia	100.00%	100.00%		100.00%		$ 216,308,160.00	$ 216,308,158.83	24/11/2025	12/02/2026
1934	JOSE JAIME ROJAS (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	JOSE JAIME ROJAS (IED)	100.00%	100.00%		100.00%		$ 326,109,661.33	$ 326,109,661.33	18/11/2025	19/06/2026
540	MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (IED)	USME	A	Miguel de Cervantes Saavedra	83.43%	84.96%		91.30%		$ 855,799,629.42	$ 727,072,047.97	13/01/2026	5/10/2026
1983	JOSE MARIA VARGAS VILA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Jose Maria Vargas Vila - Bellaflor La torre - El Porvenir - Las margaritas	100.00%	100.00%		100.00%		$ 259,085,355.00	$ 259,085,206.18	10/11/2025	14/02/2026
550	ATABANZHA (IED)	USME	A	Valle de Cafam	100.00%	100.00%		100.00%		$ 154,311,171.56	$ 154,311,171.56	13/01/2026	18/04/2026
1973	DON BOSCO I	CIUDAD BOLIVAR	A	La Joya (Don Bosco I)	100.00%	100.00%		100.00%		$ 334,388,530.08	$ 334,388,530.08	10/11/2025	20/06/2026
508	BRASILIA - USME (IED)	USME	A	Brasilia	100.00%	100.00%		100.00%		$ 173,127,488.07	$ 173,127,488.07	15/12/2025	8/06/2026
566	LUIS EDUARDO MORA OSEJO (IED)	USME	A	Nuevo Monteblanco- Eduardo Mora Osejo	100.00%	100.00%		100.00%		$ 71,970,813.38	$ 71,970,813.38	24/11/2025	24/01/2026
1986-L	BICENTENARIO (IED)	CIUDAD BOLIVAR	C	La Esperanza - El tesoro - Lucero - La Joya	100.00%	100.00%		100.00%		$ 189,023,272.16	$ 189,023,272.16	19/01/2026	21/05/2026
1982	PARAISO MIRADOR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	D	Adicional Paraiso Mirador	86.45%	88.86%		67.55%		$ 252,000,000.00	$ 223,928,915.78	9/06/2026	5/10/2026
1921	RODRIGO LARA BONILLA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	B	José Celestino Mutis	53.85%	61.54%		75.28%		$ 65,000,000.00	$ 48,934,661.01	21/07/2026	5/10/2026
TOTAL FRENTES DE OBRA						94.03%		93.74%		$ 2,897,124,081.00	$ 2,724,259,926.35		
EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO													
1943	RAFAEL URIBE URIBE (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Rafael Uribe Uribe	100.00%	100.00%		100.00%		$ 26,296,962.26	$ 26,296,962.26	30/04/2026	2/05/2026
1931	EL MINUTO DE BUENOS AIRES (IED)	CIUDAD BOLIVAR	B	Minuto de Maria	100.00%	100.00%		100.00%		$ 68,294,820.29	$ 68,294,820	24/03/2026	8/05/2026
546	SANTA LIBRADA (IED)	USME	A	Santa Librada	100.00%	100.00%		100.00%		$ 2,568,580.29	$ 2,568,580	13/04/2026	7/05/2026
523	FABIO LOZANO SIMONELLI (IED)	USME	A	Fabio Lozano Simonelli	100.00%	100.00%		100.00%		$ 35,500,604.40	$ 35,500,604	6/04/2026	17/05/2026
564	TENERIFE - GRANADA SUR (IED)	USME	B	Granada Sur	100.00%	100.00%		100.00%		$ 6,137,000.00	$ 6,137,000.00	27/01/2026	28/01/2026
556	NUEVA ESPERANZA (IED)	USME	A	Nueva Esperanza	100.00%	100.00%		100.00%		$ 83,884,193.00	$ 83,884,193	27/04/2026	20/05/2026
1983	JOSE MARIA VARGAS VILA (IED)	USME	A	Jose Maria Vargas Vila - Bellaflor La torre - El Porvenir - Brasilia	100.00%	100.00%		100.00%		$ 3,210,976.32	$ 3,210,976.32	13/04/2026	29/04/2026
508	BRASILIA - USME (IED)	USME	A		100.00%	100.00%		100.00%		$ 45,513,490.13	$ 45,513,490	18/05/2026	24/07/2026
579	GABRIEL GARCIA MARQUEZ	USME	A	Villa Diana	100.00%	100.00%		100.00%		$ 27,520,772.50	$ 27,520,773	14/05/2026	25/05/2026
510	FERNANDO GONZALEZ OCHOA (IED)	USME	A	Chico Sur	100.00%	100.00%		100.00%		$ 52,668,674.15	$ 52,668,674	20/06/2026	12/08/2026
1923	LA ARABIA (IED) SEDE B	CIUDAD BOLIVAR	A	La Arabia	100.00%	100.00%		100.00%		$ 3,544,377.47	$ 3,544,377	5/05/2026	26/05/2026
1985-L	JOSE CELESTINO MUTIS (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	El clavel (Mochuelo)	100.00%	100.00%		100.00%		$ 7,017,203.76	$ 7,017,204	15/06/2026	14/07/2026
1985-L	JOSE CELESTINO MUTIS (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	El clavel (Mochuelo)	100.00%	100.00%		100.00%		$ 1,342,545.63	$ 1,342,546	5/05/2026	26/05/2026
1935	PARAISO MIRADOR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	B	Paraiso Mirador Primaria (sede b)	70.70%	84.40%		100.00%		$ 31,944,847.44	$ 26,962,234	14/07/2026	31/08/2026
579	GABRIEL GARCIA MARQUEZ	USME	A	Villa Diana	1.51%	22.80%		40.00%		$ 81,239,611.44	$ 18,525,084	3/08/2026	20/09/2026
TOTAL FRENTES DE OBRA						82.55%		96.00%		$ 476,684,659.07	$ 408,987,517.64		

ACUMULADO FRENTES DE OBRA


TERMINADAS	EN EJECUCION	POR INICIAR	TOTAL	VALOR
5	3	1	9	$ 2,724,259,926
ACUMULADO EMERGENCIAS				
11	4	0	15	$ 408,987,518
TOTAL				
16	7	1	24	$ 3,133,247,444
FRENTES POR LOCALIDAD				


RELACION DE PAGOS EFECTUADOS


No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR
1		12		1		12		23		34	
2		13		2		13		24		35	
3		14		3		14		25		36	
4		15		4		15		26		37	
5		16		5		16		27		38	
6		17		6		17		28		39	
7		18		7		18		29		40	
8		19		8		19		30	TOTAL INTERVENTORIA		
9		20		9		20		31			
10		TOTAL OBRA		10		21		32			
11		$ -		11		22		33	$ -		


AVANCE GENERAL

	TECNICO	FINANCIER	TIEMPO
AVANCE	94.03%	0.00%	67.58%
PROGRAMADO	93.74%		
ATRASO	0.29%	EN EJECUCION	
FECHA APROBACION CRONOGRAMA			







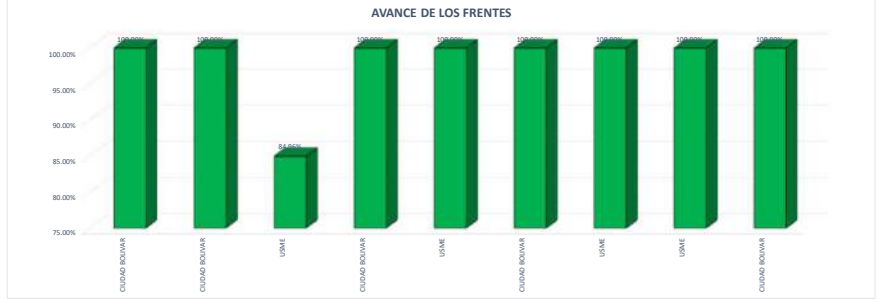

OBSERVACIONES:

FECHA: 31/08/2024	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME
DIAS RESTANTES 118 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANANCIA				APOYO A LA SUPERVISION
REGISTRO FOTOGRAFICO	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				GRUPO 5
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154895	CONTRATISTA:	0	
9/6/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	0	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
1A 100.00%	DON BOSCO I			FRENTE AL 100%	
2A 100.00%	JOSE MARIA VARGAS VILA (IED)	IED ENTREGADO.		FRENTE AL 100%	
3A 100.00%	JOSE JAIME ROJAS (IED)			FRENTE AL 100%	
4A 100.00%	LA ARABIA (IED)	IED ENTREGADO.		FRENTE AL 100%	

FECHA: 31/08/2024	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME
DIAS RESTANTES 118 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				APOYO A LA SUPERVISION
REGISTRO FOTOGRAFICO	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				GRUPO 5
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154895	CONTRATISTA:	0	
9/6/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	0	

5A 100.00%	LUIS EDUARDO MORA OSEJO (IED)	IED ENTREGADO.		FRENTE AL 100%
6A	BRASILIA - USME (IED)	IED ENTREGADO		FRENTE AL 100%
7A 100.00%	ATABANZHA (IED)	IED ENTREGADO.		FRENTE AL 100%
8A 83.43%	MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA	* Adecuacón zona parqeadero * Adecuación cubierta - zona comedor * Adecuación baterias sanitarias	   	
9A 100.00%	BICENTENARIO (IED)	A ESPERA DE ENTREGA.		FRENTE AL 100%

FECHA:	31/08/2024	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES	118 Dias					GRUPO	5
REGISTRO FOTOGRAFICO		CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154895	CONTRATISTA:	0		
CORTE DEL INFORME		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	0		
9/6/26							

10A 100.00%	EL MINUTO DE BUENOS AIRES (IED)	EMERGENCIA ENTREGADA.		EMERGENCIA ENTREGADA
11A 100.00%	TENERIFE - GRANADA SUR (IED)	EMERGENCIA ENTREGADA.		EMERGENCIA ENTREGADA
12A 100.00%	FABIO LOZANO SIMONELLI (IED)	EMERGENCIA ENTREGADA.		EMERGENCIA ENTREGADA
13A 100.00%	SANTA LIBRADA (IED)	EMERGENCIA ENTREGADA.		EMERGENCIA ENTREGADA
14A 100.00%	RAFAEL URIBE URIBE (IED)	EMERGENCIA ENTREGADA.		EMERGENCIA ENTREGADA
15A 100.00%	NUEVA ESPERANZA (IED)	EMERGENCIA ENTREGADA.		EMERGENCIA ENTREGADA


FECHA: 31/08/2024	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME
DIAS RESTANTES 118 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				APOYO A LA SUPERVISION
REGISTRO FOTOGRAFICO	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				GRUPO 5
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154895	CONTRATISTA:	0	
9/6/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	0	

16A 100.00%	BRASILIA - USME (IED)	ADECUACIÓN BATERIAS SANTARIAS		EMERGENCIA ENTREGADA
17A 100.00%	GABRIEL GARCIA MARQUEZ	EMERGENCIA ENTREGADA.		EMERGENCIA ENTREGADA
18A 100.00%	LA ARABIA (IED) SEDE B	EMERGENCIA ENTREGADA.		EMERGENCIA ENTREGADA
19A 100.00%	JOSE CELESTINO MUTIS (IED)	EMERGENCIA ENTREGADA.		EMERGENCIA ENTREGADA

FECHA: 31/08/2024	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME
DIAS RESTANTES 118 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				APOYO A LA SUPERVISION
REGISTRO FOTOGRAFICO	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				GRUPO 5
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154895	CONTRATISTA:	0	
9/6/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	0	

20A 100.00%	JOSE MARIA VARGAS VILA (IED)	EMERGENCIA ENTREGADA.		EMERGENCIA ENTREGADA
21A 88.86%	PARAISO MIRADOR (IED)	*ADECUACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL		  
22A 100.00%	JOSE CELESTINO MUTIS (IED)	EMERGENCIA ENTREGADA		EMERGENCIA ENTREGADA
23A 100.00%	FERNANDO GONZALEZ OCHOA (IED)	*CAMBIO CUBIERTA ZONA DE LA TERRAZA ZONA BLOQUE PRIMARIA * SUMINISTRO E INSTALACIÓ DE PISO TIPO VINILO EN DOS AULAS EN EL BLOQUE DE PRIMARIA		PENDIENTE POR ENTREGAR

FECHA: 31/08/2024	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME
DIAS RESTANTES 118 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				APOYO A LA SUPERVISION
REGISTRO FOTOGRAFICO	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				GRUPO 5
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154895	CONTRATISTA:	0	
9/6/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	0	

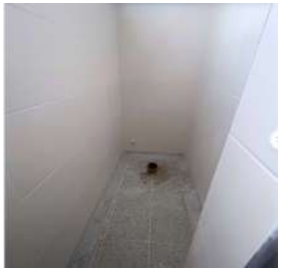24A 75.28%	RODRIGO LARA BONILLA (IED)	*CAMBIO DE FLANCHES PERIMETRALES CUBIERTA	 	   
25A 84.40%	PARAISO MIRADOR (IED)	*ADECUACIÓN BATERIAS SANITARIAS		  
26A 22.80%	GABRIEL GARCIA MARQUEZ	*IMPEREABILIZACIÓN BLOQUE 2		 

CONTRATO DE OBRA							CONTRATO DE INTERVENTORIA				VIGENCIA	2025
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
CPF	1973	IED				DON BOSCO I		SEMANA		43		
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	$ 175.12		175.12	310.26		$ 4,065.45	$ 1,261,347.98	$ (549,405.55)	177.17%	177.17%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	59.97		59.97	161.41		$ 29,861.65	$ 4,819,969.27	$ (3,029,165.99)	269.15%	269.15%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	175.12		175.12	163.23		$ 66,326.11	$ 10,826,411.26	$ 788,617.47	93.21%	93.21%	
DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	175.12		175.12	163.23		$ 27,546.47	$ 4,496,410.27	$ 327,527.53	93.21%	93.21%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	35.02	(40.98)	(5.96)	80.55		$ 129,963.14	$ 10,468,531.29	$ (5,917,221.97)	230.01%	230.01%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	2.11		2.11	2.11		$ 88,298.00	$ 186,308.78	$ -	100.00%	100.00%	
CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI E= 0.05 M	M2	163.23		163.23	159.20		$ 53,214.00	$ 8,471,668.80	$ 214,452.42	97.53%	97.53%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M2		(4.08)		4.08		$ 168,996.00	$ 689,503.68	$ (689,503.68)	-100.00%	-100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	M2	175.12		175.12	175.87		$ 11,259.00	$ 1,980,120.33	$ (8,444.25)	100.43%	100.43%	
CASETONES	M2	175.12		175.12	163.23		$ 47,415.00	$ 7,739,550.45	$ 563,764.35	93.21%	93.21%	
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	2,206.35		2,206.35	1,232.47		$ 6,964.00	$ 8,582,921.08	$ 6,782,100.32	55.86%	55.86%	
SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA DE 0.15X 0.15M	KG	365.02		365.02	466.55		$ 6,618.00	$ 3,087,627.90	$ (671,925.54)	127.81%	127.81%	
VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 3000 PSI DE 20 X15 CM (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO).	M	75.84		75.84	124.41		$ 55,214.00	$ 6,869,173.74	$ (2,681,743.98)	164.04%	164.04%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 1 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M	239.35		239.35	263.97		$ 93,190.00	$ 24,599,364.30	$ (2,294,337.80)	110.29%	110.29%	
PLACA CONTRA PISO DE 10 CM- CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2	175.12		175.12	184.32		$ 110,642.00	$ 20,393,533.44	$ (1,017,906.40)	105.25%	105.25%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	175.12		175.12	163.23		$ 40,939.00	$ 6,682,472.97	$ 486,764.71	93.21%	93.21%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	175.12		175.12	163.23		$ 202,089.00	$ 32,986,987.47	$ 2,402,838.21	93.21%	93.21%	
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS.	M3	137.11		137.11	137.11		$ 45,115.00	$ 6,185,717.65	$ -	100.00%	100.00%	
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACION DETUBERIAS DASTA 2" DE PROFUNDIDAD INCLUYE CORTE CON PULIDFORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	M	20.47		20.47	57.74		$ 17,938.00	$ 1,035,740.12	$ (668,549.26)	282.07%	282.07%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 5 CM PARA EXTERIORES	M2	159.61		159.61	143.12		$ 736,301.00	$ 105,379,399.12	$ 12,141,603.49	89.67%	89.67%	
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	14.00		14.00	14.00		$ 203,206.00	$ 2,844,884.00	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	47.80		47.80	47.80		$ 22,380.00	$ 1,069,764.00	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2" INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	60.61		60.61	60.61		$ 14,607.00	$ 885,330.27	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS presión constante Duplex. SE TRATA DE 2 BOMBAS C2P 4H, CON TANQUE MNX100H Y TABLERO DE CONTROL CON VARIADOR DE VELOCIDAD POR BOMBA. ACCESORIOS INCLUIDOS EN LA INSTALACIÓN 2 Válvulas de pie 2" 4m Tubería de succión TUBERÍA 2" ACEROINOXIDABLE 2 Registros succión 1-1/2" succión de c/bomba 1 Cheque a red 2" conexión a la red 1 Válvula a red 2" conexión a la red	GL	1.00		1.00	0.72		$ 85,014,508.73	$ 61,130,518.91	$ 23,883,989.81	71.91%	71.91%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	175.12		175.12	383.13		$ 4,477.00	$ 1,715,273.01	$ (931,260.77)	218.78%	218.78%	
				SUBTOTAL I.E.D. DON BOSCO - LA JOYA				$ 334,388,530.08				
CPF	1983	IED				JOSE MARIA VARGAS VILA		SEMANA		43		
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar	M2	3,001.00		3,001.00	525.00		$ 4,065.45	$ 2,134,363.71	$ 12,200,429.50	17.49%	17.49%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	45.00		45.00	42.00		$ 29,861.65	$ 1,254,189.39	$ 1,343,774.34	93.33%	93.33%	
MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE SOLDADURAS, REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE DE ACABADO)	M2	83.41		83.41	83.41		$ 51,695.35	$ 4,311,909.31	$ 4,311,909.31	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	219.55		219.55	270.00		$ 23,029.90	$ 6,218,072.97	$ 5,056,214.52	122.98%	122.98%	
ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METALICOS DOS CARAS	M2	24.84		24.84	24.84		$ 26,632.05	$ 661,540.05	$ 661,540.05	100.00%	100.00%	

CONTRATO DE OBRA							CONTRATO DE INTERVENTORIA				VIGENCIA	2025
TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	153.45		153.45	273.34		$ 37,143.16	$ 10,152,712.61	$ 5,699,618.61	178.13%	178.13%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	511.50		511.50	525.00		$ 346,857.39	$ 182,100,127.81	$ 177,417,553.10	102.64%	102.64%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA DE ALTO TRAFICO	M2	490.59		490.59	525.00		$ 30,742.21	$ 16,139,658.65	$ 15,081,819.31	107.01%	107.01%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA PREONDULADA GALVANIZADA CUADRADA 1 1/2" CAL 10	M2	11.56		11.56	15.00		$ 172,046.90	$ 2,580,703.49	$ 1,988,862.15	129.76%	129.76%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), DESMONTABLE PARA LIMPIEZA, INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2	212.00			330.00		$ 36,576.90	$ 12,070,376.94	$ 7,754,302.76	155.66%	155.66%	
TRATAMIENTO DE SUPERFICIE CON DESTRONCADO, INCLUYE DESBASTE Y PULIDO	M2	525.10			525.00		$ 36,402.14	$ 19,111,125.35	$ 19,114,765.56	99.98%	99.98%	
ASEO FINAL Y LIMPIEZA	M2	511.20		511.20	525.00		$ 4,477.00	$ 2,350,425.00		102.70%	102.70%	
	SUBTOTAL I.E.D. JOSÉ MARÍA VARGAS VILA							**$ 259,085,206.18**				
CPF	**1934**	**IED**			**JOSE JAIME ROJAS (IED)**			**SEMANA**	**43**			
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede	M2	475.39		475.39	420.08		$ 4,065.45	$ 1,707,816.20	$ 1,932,676.50	88.37%	88.37%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	95.38		95.38	20.81		$ 29,861.65	$ 621,420.98	$ 2,848,204.38	21.82%	21.82%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS	M2	398.60		398.60	348.13		$ 35,277.00	$ 12,280,981.18	$ 14,061,411.25	87.34%	87.34%	
DEMOLICION DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	101.22		101.22	83.04		$ 25,708.00	$ 2,134,792.32	$ 2,602,163.76	82.04%	82.04%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELO RASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRYWALL, PLASTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOR.)	M2	113.51		113.51	84.20		$ 31,263.00	$ 2,632,359.01	$ 3,548,663.13	74.18%	74.18%	
CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2			49.85	49.85		$ 130,887.05	$ 6,524,719.44	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS).	M	195.28		195.28	9.40		$ 4,215.00	$ 39,621.00	$ 823,105.20	4.81%	4.81%	
DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	6.00		6.00	6.00		$ 15,561.00	$ 93,366.00	$ 93,366.00	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	6.00		6.00	6.00		$ 9,715.00	$ 58,290.00	$ 58,290.00	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA INCLIYE IZAJE, SOLDADURA , ANTICORROZIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA).	KG	4,879.35		4,879.35	6,771.79		$ 22,117.00	$ 149,771,679.43	$ 107,916,583.95	138.78%	138.78%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERIA PVC Ø3/4" HASTA 4M. (INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONECXION E INS.	UN	14.00		14.00	2.00		$ 121,815.00	$ 243,630.00	$ 1,705,410.00	14.29%	14.29%	
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	32.00		32.00	6.00		$ 203,206.00	$ 1,219,236.00	$ 6,502,592.00	18.75%	18.75%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	10.00		10.00	54.64		$ 22,380.00	$ 1,222,843.20	$ 223,800.00	546.40%	546.40%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	30.00		30.00	41.00		$ 173,095.00	$ 7,096,895.00	$ 5,192,850.00	136.67%	136.67%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	6.00		6.00	18.00		$ 228,505.00	$ 4,113,090.00	$ 1,371,030.00	300.00%	300.00%	
PAÑETE LISO 1:3 SOBRE MUROS EN ÁREAS DE CULATAS (HASTA 30 CM) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M	74.86		74.86	198.76		$ 14,693.00	$ 2,920,380.68	$ 1,099,917.98	265.51%	265.51%	
VINILO TIPO 1 A TRE MANOS (INCLUYE ANDAMIOS)	M2	765.09		765.09	309.32		$ 20,733.00	$ 6,413,131.56	$ 15,862,610.97	40.43%	40.43%	
PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A=0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS	M	148.04	-424.53	148.04	572.57		$ 19,062.00	$ 10,914,329.34	$ 2,821,938.48	386.77%	386.77%	
FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL 20- DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	50.07		50.07	27.98		$ 102,002.00	$ 2,854,015.96	$ 5,107,240.14	55.88%	55.88%	
BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS).	M	24.00		24.00	5.00		$ 68,406.00	$ 342,030.00	$ 1,641,744.00	20.83%	20.83%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO) 300 A 400mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm Y 40 mm. PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC.	M2	224.22		224.22	409.96		$ 254,148.00	$ 104,190,514.08	$ 56,985,064.56	182.84%	182.84%	

CONTRATO DE OBRA							CONTRATO DE INTERVENTORIA				VIGENCIA	2025
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLÓ (80 A 100 CM) INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CAÑAL A LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE.	M	11.00		11.00	11.00		$ 293,259.00	$ 3,225,849.00	$ 3,225,849.00	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DOBLE CARA EN LÁMINA SUPERBOARD 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA, CINTA, MASILLA Y PRIMERA MANO DE PINTURA).	M2	8.75		8.75	17.86		$ 242,573.00	$ 4,332,353.78	$ 2,122,513.75	204.11%	204.11%	
PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR	M2	400.54		400.54	21.49		$ 6,882.00	$ 147,894.18	$ 2,756,516.28	5.37%	5.37%	
ASEO FINAL Y LIMPIEZA	M2	414.60		414.60	134.87		$ 7,477.00	$ 1,008,422.99	$ 3,099,964.20	32.53%	32.53%	
								$ 326,109,661.33				
CPF	**1923**	**IED**			**LA ARABIA (IED)**			**SEMANA**		**43**		
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede	M2	176.20		176.20	137.29		$ 4,065.45	$ 558,146.27	$ 716,333.11	77.92%	77.92%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	145.00	(36.80)	108.20	181.80		$ 29,861.65	$ 5,428,848.32	$ 4,329,939.53	125.38%	125.38%	
DEMOLICIÓN DE PLACA MACIZA H=0.08 A 0.10 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS).	M2	31.20		31.20	9.78		$ 66,326.11	$ 648,669.37	$ 2,069,374.68	31.35%	31.35%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	14.25		14.25	12.96		$ 31,843.58	$ 412,692.77	$ 453,770.99	90.95%	90.95%	
DESMONTE CERRAMIENTO EXISTENTE	M2	290.00		290.00	297.75		$ 47,789.75	$ 14,229,302.96	$ (370,275.00)	102.67%	102.67%	
DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	145.00		145.00	152.10		$ 11,290.07	$ 1,717,219.61	$ 1,637,060.11	104.90%	104.90%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	178.56		178.56	40.16		$ 129,963.14	$ 5,219,319.85	$ 23,206,218.94	22.49%	22.49%	
VIGAS DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M3	10.44		10.44	12.70		$ 1,005,997.50	$ 12,776,168.31	$ 10,502,613.95	121.65%	121.65%	
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	812.00	(758.00)	812.00	1,570.00		$ 6,964.51	$ 10,934,284.87	$ 5,655,184.28	193.35%	193.35%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL REFORZADO EN MALLA PREONDULADA CALIBRE 8 HUECO 2", ÁNGULO 1" X 1/8" PISA MALLA EN ÁNGULO DE 3/4" X 1/4", PARALES DE 2 1/2" X 2 1/2" EN 3 MM CON SUJETADORES DE VARILLA DE 5/8" Y REFUERZOS DIAGONALES EN PLATINA DE 1-1/2"* 1/8" (INCLUYE TODOS LOS INSUMOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE)	M2	362.50		362.50	303.00		$ 482,866.56	$ 146,308,566.36	$ 175,039,126.42	83.59%	83.59%	
PEDESTAL EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDANTE NO INCLUYE ACERO)	M3	5.18		5.18	5.18		$ 1,622,667.78	$ 8,397,305.75	$ 8,405,419.09	99.90%	99.90%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	14.25		14.25	12.96		$ 699,301.55	$ 9,062,948.15	$ 9,965,047.15	90.95%	90.95%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	393.70		393.70	137.29		$ 4,477.28	$ 614,686.25	$ 1,762,706.50	34.87%	34.87%	
								$ 216,308,158.83				
CPF	**566**	**IED**			**LUIS EDUARDO MORA OSEJO (IED)**			**SEMANA**		**43**		
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	145.00	52.06	197.06	68.00		$ 4,065.45	$ 276,450.92	$ 589,490.93	46.90%	46.90%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2	42.50		42.50	15.00		$ 2,206.81	$ 33,102.09	$ 93,789.27	35.29%	35.29%	
DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	56.00		56.00	5.00		$ 78,804.00	$ 394,020.00	$ 4,413,024.00	8.93%	8.93%	
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	17.00	(7.00)	17.00	24.00		$ 19,878.87	$ 477,092.82	$ 337,940.75	141.18%	141.18%	
DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TODO TIPO DE ADOQUINES USADOS (INCLUYE CONFORMACIÓN DE NIVEL)	M2	36.00		36.00	36.00		$ 63,157.47	$ 2,273,668.85	$ 2,273,668.85	100.00%	100.00%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	22.40		22.40	13.44		$ 88,297.99	$ 1,186,724.99	$ 1,977,874.99	60.00%	60.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	22.40		22.40	13.44		$ 168,996.00	$ 2,271,306.24	$ 3,785,510.40	60.00%	60.00%	
PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2	56.00		56.00	52.06		$ 110,642.00	$ 5,760,022.52	$ 6,195,952.00	92.96%	92.96%	
CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (INCLUYE FORMALETAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	M	25.00	5.12	25.00	10.00		$ 40,765.00	$ 407,650.00	$ 1,019,125.00	40.00%	40.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	350		350	35.65		$ 6,964.00	$ 248,266.60	$ 2,437,400.00	10.19%	10.19%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	534.80	118.50	534.80	477.50		$ 6,818.00	$ 3,255,595.00	$ 3,646,266.40	89.29%	89.29%	
MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	4.80	6.00	4.80	6.00		$ 140,270.00	$ 841,620.00	$ 673,296.00	125.00%	125.00%	

CONTRATO DE OBRA							CONTRATO DE INTERVENTORIA				VIGENCIA	2025
LAVADO CON HIDROFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	5.38		5.38			$ 9,334.00	$ -	$ 50,216.92	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	36.00		36.00	17.00		$ 87,915.00	$ 1,494,555.00	$ 3,164,940.00	47.22%	47.22%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	UN	18.00		18.00	13.00		$ 39,118.00	$ 508,534.00	$ 704,124.00	72.22%	72.22%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 4" INCLUYE ACCESORIOS	UN	4.00		4.00	4.00		$ 177,448.00	$ 709,792.00	$ 709,792.00	100.00%	100.00%	
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UND	1.00		1.00	1.00		$ 840,807.00	$ 840,807.00	$ 840,807.00	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	M2	67.20		67.20	52.00		$ 11,259.00	$ 585,468.00	$ 756,604.80	77.38%	77.38%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	56.00		56.00	52.00		$ 40,939.00	$ 2,128,828.00	$ 2,292,584.00	92.86%	92.86%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 5 CM PARA EXTERIORES	M2	56.00		56.00	52.06		$ 736,301.00	$ 38,331,830.06	$ 41,232,856.00	92.96%	92.96%	
SUMINISTRO E INSTALACIONDE REJA METÁLICA MODELO PERSIANA CONSTITUIDA CON MARCO DE TUBO HRO 2"X5" TUBOS HORIZONTALES CUADRADOS DE 3/4 ", RIGIDIZADOR INTERIOR CADA METRO, INCLUYE TERMINADA CON ANTICORROSIVO PINTADA E INSTALADA VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS	M2	2.50		2.50	4.77		$ 516,204.00	$ 2,462,293.08	$ 1,290,510.00	190.80%	190.80%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE REJILLACON SOSCO DE 4" A 3"	UN	4.00		4.00	4.00		$ 32,223.00	$ 128,892.00	$ 128,892.00	100.00%	100.00%	
DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ZONA VERDE.	UN	1.00		1.00	1.00		$ 3,424,439.00	$ 3,424,439.00	$ 3,424,439.00	100.00%	100.00%	
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	45.00		45.00	14.38		$ 39,551.00	$ 568,743.38	$ 1,779,795.00	31.96%	31.96%	
PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	20.40		20.40	23.54		$ 30,743.00	$ 723,690.22	$ 627,157.20	115.39%	115.39%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE DE FILTRO ZANJA DE 0,03 X 0,03 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000 GRAVA DE 3/4" Y PASES PVC LONGITUD MAXIMA 0,03 (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M	12.00		12.00	23.54		$ 85,635.00	$ 2,015,847.90	$ 1,027,620.00	196.17%	196.17%	
DEMOLICION DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTE DE ANCHO MENOR A 0.05 M (POR LAS 4 CARAS) INCLUYE CARGUE, DESCARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE LA ZONA DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS.	M	1.64		1.64	23.54		$ 26,405.00	$ 621,573.70	$ 43,304.20	1435.37%	1435.37%	
	SUBTOTAL I.E.D. LUIS EDUARDO MORA OSEJO							**$ 71,970,813.38**				
CPF	**508**	**IED**		**BRASILIA - USME (IED)**				**SEMANA**		**43**		
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	79.50		79.50	50.39		$ 4,065.00	$ 204,835.35	$ 323,167.50	63.38%	63.38%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2	44.16		44.16	5.40		$ 2,206.00	$ 11,912.40	$ 97,416.96	12.23%	12.23%	
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	34.00		34.00	40.00		$ 26,187.00	$ 1,047,480.00	$ 890,358.00	117.65%	117.65%	
DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	16.00		16.00	29.00		$ 14,081.00	$ 408,349.00	$ 225,296.00	181.25%	181.25%	
DEMOLICIÓN DE VIGA EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M3	0.13		0.13	0.13		$ 328,929.00	$ 42,760.77	$ 42,760.77	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	79.23		79.23	66.26		$ 31,286.00	$ 2,073,010.36	$ 2,478,789.78	83.63%	83.63%	
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	83.28		83.28	63.14		$ 21,406.00	$ 1,351,574.84	$ 1,782,691.68	75.82%	75.82%	
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	176.00		176.00	263.19		$ 12,141.00	$ 3,195,389.79	$ 2,136,816.00	149.54%	149.54%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	15.50		15.50	17.66		$ 31,843.00	$ 562,347.38	$ 493,566.50	113.94%	113.94%	
DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5.04		5.04	3.51		$ 28,212.00	$ 99,024.12	$ 142,188.48	69.64%	69.64%	
DESMONTE Y RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6" 4"3" 2"(INCLUYE EXCAVACIÓN CARGUÉ Y RETIRODE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS).	M	50.00		50.00	11.30		$ 26,930.00	$ 304,309.00	$ 1,346,500.00	22.60%	22.60%	
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACION DETUBERIAS DASTA 2" DE PROFUNDIDAD INCLUYE CORTE CON PULIDFORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	M	60.00		60.00	50.15		$ 17,938.00	$ 899,590.70	$ 1,076,280.00	83.58%	83.58%	
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE AGUA FRÍA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	18.00		18.00	15.00		$ 60,985.00	$ 914,775.00	$ 1,097,730.00	83.33%	83.33%	
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE AGUA FRÍA LAVAMANOS 1/2"	UN	20.00		20.00	27.00		$ 60,985.00	$ 1,646,595.00	$ 1,219,700.00	135.00%	135.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 4"	UN	18.00		18.00	16.00		$ 174,544.00	$ 2,792,704.00	$ 3,141,792.00	88.89%	88.89%	
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 2"	UN	24.00		24.00	20.00		$ 93,391.00	$ 1,867,820.00	$ 2,241,384.00	83.33%	83.33%	
SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	UN	12.00		12.00	10.00		$ 66,233.00	$ 662,330.00	$ 794,796.00	83.33%	83.33%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1"	UN	2.00		2.00	2.00		$ 110,947.00	$ 221,894.00	$ 221,894.00	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 3/4"	UN	1.00		1.00	1.00		$ 105,801.00	$ 105,801.00	$ 105,801.00	100.00%	100.00%	
CAJA DE INSPECCIÓN 80 X 80 EN MAMPOSTERÍA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	1.00		1.00	1.00		$ 840,807.00	$ 840,807.00	$ 840,807.00	100.00%	100.00%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E=0.04	M2	79.23		79.23	61.80		$ 40,939.00	$ 2,530,030.20	$ 3,243,596.97	78.00%	78.00%	

CONTRATO DE OBRA							CONTRATO DE INTERVENTORIA				VIGENCIA	2025
SUMINISTRO E INSTALACION BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	95.52		95.52	32.65		$ 202,089.00	$ 6,598,205.85	$ 19,303,541.28	34.18%	34.18%	
SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE PARED BLANCA 30 X 45	M2	198.00		198.00	138.00		$ 94,283.00	$ 13,011,054.00	$ 18,668,034.00	69.70%	69.70%	
SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI Y ACOPLE	UN	18.00		18.00	16.00		$ 1,066,706.00	$ 17,067,296.00	$ 19,200,708.00	88.89%	88.89%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	6.00		6.00	8.00		$ 741,439.00	$ 5,931,512.00	$ 4,448,634.00	133.33%	133.33%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISIÓN POR MÓDULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM	M	13.00		13.00	11.40		$ 1,083,037.00	$ 12,346,621.80	$ 14,079,481.00	87.69%	87.69%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	16.00		16.00	15.00		$ 388,380.00	$ 5,825,700.00		93.75%	93.75%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	12.00		12.00	6.00		$ 39,479.00	$ 236,874.00	$ 473,748.00	50.00%	50.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	81.43		81.43	66.98		$ 949,649.00	$ 63,607,490.02	$ 77,329,918.07	82.25%	82.25%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	8.00		8.00	7.00		$ 949,649.00	$ 6,647,543.00	$ 7,597,192.00	87.50%	87.50%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS	M	1.10		1.10	1.10		$ 26,196.00	$ 28,815.60	$ 28,815.60	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1"	UN	16.00		16.00	16.00		$ 11,798.00	$ 188,768.00	$ 188,768.00	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	M	0.56		0.56	0.56		$ 19,284.00	$ 10,799.04	$ 10,799.04	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 3/4'	UN	8.00		8.00	8.00		$ 8,027.00	$ 64,216.00	$ 64,216.00	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	35.71		35.71	35.71		$ 19,356.00	$ 691,202.76	$ 691,202.76	100.00%	100.00%	
ACCESORIO CPVC 1/2"	UN	63.00		63.00	63.00		$ 9,199.00	$ 579,537.00	$ 579,537.00	100.00%	100.00%	
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO INDLUYE FILOS DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	202.40		202.40	139.20		$ 39,551.00	$ 5,505,499.20	$ 8,005,122.40	68.77%	68.77%	
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	4.31		4.31	4.31		$ 29,685.00	$ 127,942.35	$ 127,942.35	100.00%	100.00%	
PINTURA EPOXICA 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO.	M2	64.00		64.00	19.59		$ 30,743.00	$ 602,255.37	$ 1,967,552.00	30.61%	30.61%	
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TUBERÍA RED AN - ALL - REVENTILACION 3" A 6" (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	11.61		11.61	11.61		$ 15,549.00	$ 180,523.89	$ 180,523.89	100.00%	100.00%	
ALQUILER BAÑO PORTÁTIL COMPLETO INCLUYE SANITARIO, ORINAL Y LAVAMANOS PARA OBRAS MODALIDAD DE EMERGENCIA EN CONDICIONES ESPECIALES, INCLUYE 8 ASEOS	MES	3.00		3.00	3.00		$ 1,177,272.00	$ 3,531,816.00	$ 3,531,816.00	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	14.00		14.00	4.63		$ 190,394.00	$ 881,859.30	$ 2,665,516.00	33.08%	33.08%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR. TERMINADA CON NTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1.46		1.46	1.46		$ 766,334.00	$ 1,118,847.64	$ 1,118,847.64	100.00%	100.00%	
MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 4	M2	4.51		4.51	4.85		$ 85,032.00	$ 412,405.20	$ 383,494.32	107.54%	107.54%	
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	7.72		7.72	7.72		$ 6,964.51	$ 53,766.04	$ 53,766.04	100.00%	100.00%	
COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO 300 PSI DE 10 X 12 CM (NO INCLUYE ACERO).	M	2.40		2.40	2.40		$ 76,792.00	$ 184,300.80	$ 184,300.80	100.00%	100.00%	
WIN DE ALUMINIO	M	8.65		8.65	8.65		$ 14,756.00	$ 127,639.40	$ 127,639.40	100.00%	100.00%	
ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM	M	16.64		16.64	30.20		$ 12,236.00	$ 369,527.20	$ 203,607.04	181.49%	181.49%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	3.21		3.21	3.21		$ 66,482.00	$ 213,407.22	$ 213,407.22	100.00%	100.00%	
ACCESORIO CPVC 2"	UN	12.00		12.00	12.00		$ 28,653.00	$ 343,836.00	$ 343,836.00	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	33.22		33.22	33.22		$ 106,864.00	$ 3,550,022.08	$ 3,550,022.08	100.00%	100.00%	
PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M	30.20		77.22	30.20		$ 16,517.00	$ 498,813.40	$ 498,813.40	100.00%	100.00%	
PINTURA DE ACEITE SOBRE PAÑETE 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	31.20		31.20	31.20		$ 25,835.00	$ 806,052.00	$ -	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	79.50		79.50			$ 4,477.28	$ -	$ 355,944.04	0.00%	0.00%	
					SUBTOTAL I.E.D. BRASILIA			**$ 173,127,488.07**				
CPF	**550**	**IED**			**ATABANZHA (IED)**			**SEMANA**		**43**		
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	434.06		434.06	348.56		$ 4,065.00	$ 1,416,896.40	$ 1,764,453.90	80.30%	80.30%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2	357.30		357.30	153.20		$ 2,606.00	$ 399,239.20	$ 931,123.80	42.88%	42.88%	
DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E=0.20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS EN CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS).	M2	166.80		166.80	116.80		$ 78,805.00	$ 9,204,424.00	$ 13,144,674.00	70.02%	70.02%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	66.72		66.72	28.33		$ 88,298.00	$ 2,501,482.34	$ 5,891,242.56	42.46%	42.46%	
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	33.36	$ (14.31)	33.36	14.31		$ 20,833.00	$ 298,120.23	$ 694,988.88	42.90%	42.90%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	33.36		33.36	124.19		$ 168,995.00	$ 20,987,489.05	$ 5,637,673.20	372.27%	372.27%	
PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2	166.80		166.80	123.28		$ 110,642.00	$ 13,639,945.76	$ 18,455,085.60	73.91%	73.91%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	1,501.20		1,501.20	293.00		$ 6,818.00	$ 1,997,674.00	$ 10,235,181.60	19.52%	19.52%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	M2	200.16		200.16	193.10		$ 11,259.00	$ 2,174,112.90	$ 2,253,601.44	96.47%	96.47%	

CONTRATO DE OBRA							CONTRATO DE INTERVENTORIA				VIGENCIA	2025
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E=0.04	M2	199.18		199.18	198.44		$ 40,439.00	$ 8,024,715.16	$ 8,054,640.02	99.63%	99.63%	
CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A5 CM (INCLUYE CARGUE Y FRETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M	16.61		16.61	16.61		$ 17,938.00	$ 297,950.18	$ 297,950.18	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN VINILO TRÁFICO PESADO ESPESOR 4 MM	M2	218.17		218.17	198.44		$ 221,569.00	$ 43,968,152.36	$ 48,339,708.73	90.96%	90.96%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 3 CM PARA EXTERIORES	M2	68.08		68.08	69.80		$ 552,873.00	$ 38,590,535.40	$ 37,639,593.84	102.53%	102.53%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON DOBLE ANTI MACHUCON, REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA-EXTERIOR	M2	10.50		10.50	8.98		$ 795,991.00	$ 7,147,999.18	$ 8,357,905.50	85.52%	85.52%	
PAÑETE LISO 1:3 SOBRE MUROS EN ÁREAS DE CULATAS (HASTA 30 CM) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M	26.00		26.00	19.80		$ 14,693.00	$ 290,921.40	$ 382,018.00	76.15%	76.15%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	7.00		7.00	7.00		$ 119,099.00	$ 833,693.00	$ 833,693.00	100.00%	100.00%	
DESINSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ZONA VERDE.	UN	1.00		1.00	1.00		$ 2,537,821.00	$ 2,537,821.00	$ 2,537,821.00	100.00%	100.00%	
				SUBTOTAL I.E.D. ATABANZHA				**$ 154,311,171.56**				
CPF	**540**	**IED**		**MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (IED)**				**SEMANA**		**43**		
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	1,121.25		731.25	1,209.03		$ 4,065.00	$ 4,914,706.95	$ 4,557,881.25	107.83%	107.83%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2	404.70	(110.06)	397.50	312.51		$ 2,606.00	$ 814,401.06	$ 1,054,648.20	77.22%	77.22%	
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	17.00		17.00	15.00		$ 26,187.00	$ 392,805.00	$ 445,179.00	88.24%	88.24%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	307.48			307.48		$ 66,326.00	$ 20,393,918.48	$ 20,393,918.48	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	10.00		10.00	6.00		$ 14,081.00	$ 84,486.00	$ 140,810.00	60.00%	60.00%	
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	78.00		78.00	53.78		$ 12,141.00	$ 652,942.98	$ 946,998.00	68.95%	68.95%	
DESMONTE DE DIVISION SENCILLA O DOBLE DIFERENTE MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS).	M2	16.57		16.57	16.57		$ 24,699.00	$ 409,262.43	$ 409,262.43	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	16.50		16.50	2.68		$ 31,843.00	$ 85,339.24	$ 525,409.50	16.24%	16.24%	
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	9.72		9.72	41.07		$ 21,406.00	$ 879,144.42	$ 208,066.32	422.53%	422.53%	
DESMONTE CANCA MÚLTIPLE (ARCO DE MICROFUTBOL Y ARO DE BALONCESTO) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS).	UN	1.00		1.00	2.00		$ 382,945.00	$ 765,890.00	$ 382,945.00	200.00%	200.00%	
DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	341.25		341.25	520.91		$ 27,546.00	$ 14,348,986.86	$ 9,400,072.50	152.65%	152.65%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	7.87		7.87	7.87		$ 42,383.00	$ 333,554.21	$ 333,554.21	100.00%	100.00%	
DEMOLICOION DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0,20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS).	M2	341.25		341.25	666.73		$ 78,805.00	$ 52,541,657.65	$ 26,892,206.25	195.38%	195.38%	
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	250.00		250.00	12.00		$ 19,819.00	$ 237,828.00	$ 4,954,750.00	4.80%	4.80%	
DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	8.40		8.40	6.42		$ 28,212.00	$ 181,121.04	$ 236,980.80	76.43%	76.43%	
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACION DETUBERIAS DASTA 2" DE PROFUNDIDAD INCLUYE CORTE CON PULIDFORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	M	5.80		5.80	15.20		$ 13,242.00	$ 201,278.40	$ 76,803.60	262.07%	262.07%	
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	83.25		83.25	89.93		$ 39,551.00	$ 3,556,821.43	$ 3,292,620.75	108.02%	108.02%	
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE AGUA FRÍA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	7.00		18.00	6.00		$ 60,985.00	$ 365,910.00	$ 426,895.00	85.71%	85.71%	
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE AGUA FRÍA LAVAMANOS 1/2"	UN	10.00		20.00	9.00		$ 60,985.00	$ 548,865.00	$ 609,850.00	90.00%	90.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	UN	5.00		12.00	4.00		$ 66,233.00	$ 264,932.00	$ 331,165.00	80.00%	80.00%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	136.50		136.50	137.87		$ 88,298.00	$ 12,173,645.26	$ 12,052,677.00	101.00%	101.00%	
RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	186.00	74.98	260.98	260.98		$ 173,782.00	$ 45,353,626.36	$ 32,323,452.00	140.31%	140.31%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	8.40		8.40	19.75		$ 21,239.00	$ 419,470.25	$ 178,407.60	235.12%	235.12%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 6" INCLUYE ACCESORIOS	M	8.40		8.40	49.44		$ 137,840.00	$ 6,814,809.60	$ 1,157,856.00	588.57%	588.57%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	60.00		60.00	132.45		$ 87,915.00	$ 11,644,341.75	$ 5,274,900.00	220.75%	220.75%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	UN	80.00		80.00	65.00		$ 39,119.00	$ 2,542,735.00	$ 3,129,520.00	81.25%	81.25%	

CONTRATO DE OBRA							CONTRATO DE INTERVENTORIA				VIGENCIA	2025
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	4.00		4.00	7.00		$ 840,807.00	$ 5,885,649.00	$ 3,363,228.00	175.00%	175.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ZANJA DE 0.3 X 0.3 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000, GRAVA 3/4" Y PASES PVC LONGITUD MAX 0.3 M CADA 3 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	35.00		35.00	62.51		$ 85,635.00	$ 5,353,043.85	$ 2,997,225.00	178.60%	178.60%	
CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI E= 0.05 M	M2	465.00		465.00	13.00		$ 53,214.00	$ 691,782.00	$ 24,052,728.00	2.80%	2.80%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELO RASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRYWALL, PLASTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOR.)	M2	23.30	(23.30)	23.30	23.30		$ 31,263.00	$ 728,427.90	$ 728,427.90	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 4" INCLUYE ACCESORIOS	UN	10.00		10.00	6.00		$ 130,987.00	$ 785,922.00	$ 1,309,870.00	60.00%	60.00%	
MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2	11.95		11.95	12.60		$ 87,409.00	$ 1,101,353.40	$ 1,044,537.55	105.44%	105.44%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	41.75		41.75	12.98		$ 202,089.00	$ 2,623,115.22	$ 8,437,215.75	31.09%	31.09%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	78.00	0.41	78.41	78.41		$ 94,283.00	$ 7,392,730.03	$ 7,354,074.00	100.53%	100.53%	
SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI Y ACOPLE	UN	8.00		8.00	8.00		$ 1,066,706.00	$ 8,533,648.00	$ 8,533,648.00	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	3.00		3.00	3.00		$ 741,439.00	$ 2,224,317.00	$ 2,224,317.00	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	1.00		1.00	1.00		$ 39,479.00	$ 39,479.00	$ 39,479.00	100.00%	100.00%	
WIN DE ALUMINIO	M	8.60		8.60	11.80		$ 14,756.00	$ 174,120.80	$ 126,901.60	137.21%	137.21%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	34.79	170.46	205.25	205.25		$ 30,220.00	$ 6,202,655.00	$ 1,051,353.80	589.97%	589.97%	
ACCESORIO CPVC 1/2"	UN	18.00		18.00	18.00		$ 9,199.00	$ 165,582.00	$ 165,582.00	100.00%	100.00%	
COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (NO INCLUYE ACERO)	M	2.60		2.60	5.20		$ 76,792.00	$ 399,318.40	$ 199,659.20	200.00%	200.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 4"	UN	16.00		16.00	16.00		$ 174,544.00	$ 2,792,704.00	$ 2,792,704.00	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN	10.00		10.00	1.00		$ 126,516.00	$ 126,516.00	$ 1,265,160.00	10.00%	10.00%	
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	14.40		14.40	36.00		$ 29,685.00	$ 1,068,660.00	$ 427,464.00	250.00%	250.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL TEJIDO 2400	M2	465.00		465.00	465.00		$ 15,956.00	$ 7,419,540.00	$ 7,419,540.00	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	3,241.88	(1,767.48)	1,474.40	1,474.40		$ 6,818.00	$ 10,052,459.20	$ 22,103,137.84	45.48%	45.48%	
MESÓN EN CONCRETO ACABADO EN GRANITO PULIDO BLANCO, LAVAMANOS A= 0.55 M. DESPENSAS A= 0.45 M, COCINA A= 0.60 M, AULAS A= 0.55 M (INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE).	M2	10.18		10.18	8.65		$ 293,243.00	$ 2,536,551.95	$ 2,985,213.74	84.97%	84.97%	
ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	17.21		17.21	18.35		$ 16,287.00	$ 298,866.45	$ 280,299.27	106.62%	106.62%	
ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM	M	3.08		3.08	7.11		$ 12,236.00	$ 86,997.96	$ 37,686.88	230.84%	230.84%	
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	14.62		14.62	14.62		$ 28,087.00	$ 410,631.94	$ 410,631.94	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI Y ACOPLE	UN	19.00		19.00	3.00		$ 1,066,706.00	$ 3,200,118.00	$ 20,267,414.00	15.79%	15.79%	
PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2	491.00		491.00	29.01		$ 110,642.00	$ 3,209,724.42	$ 54,325,222.00	5.91%	5.91%	
CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	3.03		3.03	3.03		$ 125,117.00	$ 379,104.51	$ 379,104.51	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO PLACA CONTRAPISO DE 15 CM CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE CORTE Y DILATACION)	M2	491.00		491.00	459.78		$ 215,770.00	$ 99,206,730.60	$ 105,943,070.00	93.64%	93.64%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, SIFÓN)		6.00		6.00	6.00		$ 882,544.00	$ 5,295,264.00	$ 5,295,264.00	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	7.00		7.00	6.00		$ 388,380.00	$ 2,330,280.00	$ 2,718,660.00	85.71%	85.71%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	5.00		5.00	2.00		$ 39,479.00	$ 78,958.00	$ 197,395.00	40.00%	40.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	19.28	(8.83)	10.45	10.45		$ 949,649.00	$ 9,923,832.05	$ 18,309,232.72	54.20%	54.20%	
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	77.22		77.22	27.96		$ 28,087.00	$ 785,312.52	$ 2,168,878.14	36.21%	36.21%	
PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M3	77.22		77.22	7.11		$ 16,517.00	$ 117,435.87	$ 1,275,442.74	9.21%	9.21%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	21.79		21.79	45.39		$ 106,864.00	$ 4,850,556.96	$ 2,328,566.56	208.31%	208.31%	
AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E= 0.10 M	M2	16.81		16.81	16.81		$ 106,864.00	$ 1,796,383.84	$ 1,796,383.84	100.00%	100.00%	
TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	M2	465.00		465.00	343.79		$ 116,516.00	$ 40,057,035.64	$ 54,179,940.00	73.93%	73.93%	
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	127.86		127.86	127.86		$ 45,115.00	$ 5,768,403.90	$ 5,768,403.90	100.00%	100.00%	
DESTRONQUE PLACAS DE CONCRETO	M2	170.28		170.46	170.46		$ 32,170.00	$ 5,483,698.20	$ 5,477,907.60	100.11%	100.11%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO (RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA CANCHA MULTIPLE INCLUYE DEMARCACIONES BALONCESTO - VOLEYBOL)	M2	170.46			170.46		$ 74,476.00	$ 12,695,178.96		100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	525.79		525.79	262.90		$ 4,477.28	$ 1,177,077.82	$ 2,354,110.88	50.00%	50.00%	
ACCESORIO TOMA CORRIENTE	UN	2.00		2.00	2.00			$ -	$ -	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
ACCESORIO INTERRUPTOR	UN	1.00		1.00	1.00			$ -	$ -	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
ENCHAPE MAMPOSTERIA LADRILLO A LA VISTA PRENSADO LIVIANO M-02	M2	12.46		12.46	20.52		$ 72,272.00	$ 1,483,021.44	$ 900,509.12	164.69%	164.69%	

CONTRATO DE OBRA							CONTRATO DE INTERVENTORIA				VIGENCIA	2025
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA INCLIYE IZAJE, SOLDADURA , ANTICORROZIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA).	KG	4,568.73	(1,091.48)	3,477.25	3,477.25		$ 22,117.00	$ 76,906,338.25	$ 101,046,601.41	76.11%	76.11%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	UN	3.00		3.00	3.00		$ 168,961.00	$ 506,883.00	$ 506,883.00	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	ML	453.30		453.30	453.30		$ 8,800.00	$ 3,989,040.00	$ 3,989,040.00	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELO RASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRYWALL, PLASTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOR.)	M2	53.53		53.53	53.53		$ 31,263.00	$ 1,673,508.39	$ 1,673,508.39	100.00%	100.00%	
MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E= 10 CM, LÁMINA DE FIBROCEMENTO RESISTENTE A LA HUMEDAD 1/2" INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2			29.40	29.40		$ 212,893.81	$ 6,259,078.14	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS	M2	322.42			322.42		$ 35,277.00	$ 11,374,009.57	$ 11,374,009.57	100.00%	100.00%	
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	ML	92.70			92.70		$ 59,535.00	$ 5,518,894.50	$ 5,518,894.50	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CÁRCAMO EN CONCRETO (35 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE CONCRETO.	ML	15.00			15.00		$ 282,709.00	$ 4,240,635.00	$ 4,240,635.00	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	270.00			270.00		$ 254,149.00	$ 68,620,230.00	$ 68,620,230.00	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M	52.00			52.00		$ 293,259.00	$ 15,249,468.00	$ 15,249,468.00	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	620.00			507.81		$ 4,477.00	$ 2,273,465.37	$ 2,775,740.00	81.90%	81.90%	
EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	KG			5,110.02	5,110.02		$ 3,227.00	$ 16,490,034.54	$ -	100.00%	100.00%	
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2			307.48	307.48		$ 159,275.00	$ 48,973,877.00	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO EN LÁMINA DE YESO DE 1/2" ST INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	75.99			72.04	52.81	$ 116,500.00	$ 8,392,660.00	$ 2,700,470.00	94.80%	94.80%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN			27.00	27.00	27.00	$ 173,095.00	$ 4,673,565.00	$ (4,673,565.00)	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN			27.00	10.00	10.00	$ 228,505.00	$ 2,285,050.00	$ (2,285,050.00)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A= 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	51.70		51.70	51.70		$ 73,320.00	$ 3,790,644.00	$ 3,790,644.00	100.00%	100.00%	
		SUBTOTAL I.E.D. MIGUEL CERVANTES SAAVEDRA.						**$ 727,072,047.97**				
CPF	**1986-L**	**IED**		**BICENTENARIO (IED)**				**SEMANA**	**43**			
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	179.34		179.34	191.20		$ 4,065.00	$ 777,228.00	$ 729,017.10	106.61%	106.61%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	96.00		96.00	125.82		$ 29,861.65	$ 3,757,193.07	$ 2,866,718.60	131.06%	131.06%	
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUÉ Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	179.34		179.34	193.54		$ 17,317.00	$ 3,351,532.18	$ 3,105,630.78	107.92%	107.92%	
DESMONTE CERRAMIENTO EXISTENTE	M2	95.00		95.00	104.12		$ 47,789.75	$ 4,975,868.94	$ (435,842.53)	109.60%	109.60%	
DESTRONQUE PLACAS DE CONCRETO	M2	6.00		6.00	42.84		$ 32,170.00	$ 1,378,162.80	$ (1,185,142.80)	714.00%	714.00%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS	M2	17.91		17.91	17.91		$ 35,277.00	$ 631,811.03	$ 631,811.03	100.00%	100.00%	
AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E=0,10 M PARA CUBIERTA NO TRANSITABLE.	M2	179.34		179.34	187.30		$ 109,110.00	$ 20,436,303.00	$ 19,567,787.40	104.44%	104.44%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M3	179.34		179.34	214.56		$ 346,806.00	$ 74,410,353.58	$ 62,196,188.04	119.64%	119.64%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	50.00		50.00	12.11		$ 87,915.00	$ 1,064,650.65	$ 4,395,750.00	24.22%	24.22%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	UN	7.00		7.00	23.00		$ 39,119.00	$ 899,737.00	$ 273,833.00	328.57%	328.57%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 4" INCLUYE ACCESORIOS	UN	2.00		2.00	2.00		$ 159,106.00	$ 318,212.00	$ 318,212.00	100.00%	100.00%	
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	274.00		274.00	40.00		$ 5,341.00	$ 213,640.00	$ 1,463,434.00	14.60%	14.60%	

CONTRATO DE OBRA							CONTRATO DE INTERVENTORIA				VIGENCIA	2025
PERFORACIÓN NUCLEO 4" E=10,873"0,10 M	UN	2.00		2.00	2.00		$ 160,254.00	$ 320,508.00	$ 320,508.00	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLÓ (80 A 100 CM) INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CAÑAL A LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE.	M	54.18		54.18	39.56		$ 293,259.00	$ 11,601,326.04	$ 15,888,772.62	73.02%	73.02%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	49.46		49.46	49.46		$ 29,962.00	$ 1,481,920.52	$ 1,481,920.52	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL REFORZADO EN MALLA PREONDULADA CALIBRE 8 HUECO 2", ÁNGULO 1" X 1/8" PISA MALLA EN ÁNGULO DE 3/4" X 1/4", PARALES DE 2 1/2" X 2 1/2" EN 3 MM CON SUJETADORES DE VARILLA DE 5/8" Y REFUERZOS DIAGONALES EN PLATINA DE 1-1/2"* 1/8" (INCLUYE TODOS LOS INSUMOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE)	M2	381.00		381.00	115.12		$ 482,866.56	$ 55,587,597.88	$ 183,972,157.70	30.22%	30.22%	
PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M	12.11		12.11	12.11		$ 16,517.00	$ 200,020.87	$ 200,020.87	100.00%	100.00%	
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	22.08		22.08	22.08		$ 28,087.00	$ 620,160.96	$ 620,160.96	100.00%	100.00%	
ESMALTE A DOS MANOS SOBRE CANAL METÁLICA EN ACERO GALVANIZADO EXISTENTES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS, PROCESO DE LIMPIEZA Y GRATA, WASH PRIMER Y CORRECCION DE ANCLAJE)	M2	35.28		35.28	35.28		$ 30,168.00	$ 1,064,327.04		100.00%	100.00%	
DESMONTE CERRAMIENTO EXISTENTE	M2	94.12		94.12	115.12		$ 47,789.75	$ 5,501,556.20	$ (1,003,584.78)	122.31%	122.31%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	413.94		413.94	96.30		$ 4,477.28	$ 431,162.40	$ 1,853,326.72	23.26%	23.26%	
								$ 189,023,272.16				

CPF	1982	IED		PARAISO MIRADOR (IED)				SEMANA		43		
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	115.00		115.00	287.23		$ 4,065.00	$ 1,167,589.95	$ 467,475.00	249.77%	249.77%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	178.39		178.39	90.00		$ 29,861.65	$ 2,687,548.69	$ 5,327,020.12	50.45%	50.45%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	25.00			20.36		$ 88,298.00	$ 1,797,747.28	$ 2,207,450.00	81.44%	81.44%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG			2,000.00	731.00	155.00	$ 22,116.83	$ 16,167,404.34	$ (3,428,108.99)	36.55%	36.55%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL REFORZADO EN MALLA PREONDULADA CALIBRE 8 HUECO 2", ÁNGULO 1" X 1/8" PISA MALLA EN ÁNGULO DE 3/4" X 1/4", PARALES DE 2 1/2" X 2 1/2" EN 3 MM CON SUJETADORES DE VARILLA DE 5/8" Y REFUERZOS DIAGONALES EN PLATINA DE 1-1/2"* 1/8" (INCLUYE TODOS LOS INSUMOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE)	M2	402.50	10.56	413.06	418.56	5.50	$ 482,866.56	$ 202,108,625.53	$ 191,698,022.59	103.99%	103.99%	
								$ 223,928,915.78				

CPF	1921	IED		RODRIGO LARA BONILLA (IED)				SEMANA		43		
FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	300.00	**$ 82.00**	382.00	340.00		$ 102,003.49	$ 34,681,187.01	$ 30,601,047.36	113.33%	113.33%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	40.00			40.00	30.00	$ 87,915.00	$ 3,516,600.00	$ 879,150.00	100.00%	100.00%	
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	624.00		624.00	312.00	312.00	$ 28,087.00	$ 8,763,144.00	$ 8,763,144.00	50.00%	50.00%	
MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2	35.00		35.00	30.00		$ 65,791.00	$ 1,973,730.00	$ 328,955.00	85.71%	85.71%	
								$ 48,934,661.01				

PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA	94.03%
ACUMULADO EJECUTADO A LA FECHA	$ 2,724,259,926.35
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 2,897,124,081.00

CPF	564	IED		TENERIFE - GRANADA SUR (IED)				SEMANA		43		
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS	M2	175.00		175.00	175.00		$ 20,000.00	$ 3,500,000.00	$ 3,500,000.00	100.00%	100.00%	
								$ 3,500,000.00				

CPF	1931	IED		EL MINUTO DE BUENOS AIRES (IED)				SEMANA		43		
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	211.54		211.54	151.48		$ 4,065.00	$ 615,766.20	$ 859,910.10	71.61%	71.61%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	27.09	12.70	27.09	18.67		$ 29,861.65	$ 557,517.04	$ 808,952.16	68.92%	68.92%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS	M2	211.54		211.54	150.26		$ 35,277.00	$ 5,300,721.66	$ 7,462,496.08	71.03%	71.03%	
DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	32.00		32.00	32.00		$ 15,561.00	$ 497,952.00	$ 497,952.00	100.00%	100.00%	

CONTRATO DE OBRA							CONTRATO DE INTERVENTORIA				VIGENCIA	2025
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	32.00		32.00	32.00		$ 9,714.00	$ 310,848.00	$ 310,848.00	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1.2 M (INCLUYE ANDAMIOS..	M	211.54		59.85	127.35		$ 8,800.00	$ 1,120,680.00	$ 1,861,552.00	60.20%	60.20%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO) 300 A 400mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm Y 40 mm. PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC.	M2	211.54		211.54	151.52		$ 254,148.00	$ 38,508,504.96	$ 53,762,467.92	71.63%	71.63%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLÓ (80 A 100 CM) INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CAÑAL A LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE.	M	54.18		54.18	35.60		$ 293,259.00	$ 10,440,020.40	$ 15,888,772.62	65.71%	65.71%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES	UN	16.00		16.00	24.00		$ 173,095.00	$ 4,154,280.00	$ 2,769,520.00	150.00%	150.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	56.08		56.08	56.08		$ 22,380.00	$ 1,255,070.40	$ 1,255,070.40	100.00%	100.00%	
FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL 20- DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	52.30		52.30	52.30		$ 102,002.00	$ 5,334,704.60	$ 5,334,704.60	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	150.26		150.26	151.48		$ 4,477.28	$ 678,218.90	$ 672,756.61	100.81%	100.81%	
	SUBTOTAL I.E.D. MINUTO DE BUENOS AIRES							**$ 68,774,284.17**				
CPF	**523**	**IED**		**FABIO LOZANO SIMONELLI (IED)**				**SEMANA**		**43**		
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	144.00		144.00	126.18		$ 4,065.00	$ 512,921.70	$ 585,360.00	87.63%	87.63%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado fisico.	M2	20.00		20.00	18.67		$ 29,861.65	$ 557,517.04	$ 597,233.04	93.35%	93.35%	
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	144.00		144.00	126.18		$ 17,319.00	$ 2,185,311.42	$ 2,493,936.00	87.63%	87.63%	
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	12.00		12.00	12.45		$ 19,878.00	$ 17,319.00	$ 238,536.00	7.26%	7.26%	
PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	144.00		144.00	126.18		$ 15,118.00	$ 1,907,589.24	$ 2,176,992.00	87.63%	87.63%	
AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E= 0.10 M PARA CUBIERTA NO TRANSITABLE DE BLOQUE 11 (COCINA)	M2	144.00		144.00	122.36		$ 109,126.00	$ 13,352,657.36	$ 15,714,144.00	84.97%	84.97%	
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	30.69		30.69	30.69		$ 6,964.51	$ 213,740.89	$ 213,740.89	100.00%	100.00%	
PLACA CONTRA PISO DE 10 CM- CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2	2.40		2.40	2.31		$ 110,642.00	$ 255,583.02	$ 9,957.78	96.25%	96.25%	
PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA,	M	5.00		5.00	3.18		$ 26,930.00	$ 85,637.40	$ 49,012.60	63.60%	63.60%	
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0.10		0.10	0.10		$ 12,141.00	$ 1,214.10	$ (24.28)	102.04%	102.04%	
MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2	144.00		144.00	127.04		$ 65,791.00	$ 8,358,088.64	$ 1,115,815.36	88.22%	88.22%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M	12.00		12.00	9.86		$ 55,782.00	$ 550,010.52	$ 119,373.48	82.17%	82.17%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"	UN	8.00		8.00	6.00		$ 20,061.00	$ 120,366.00	$ 40,122.00	75.00%	75.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS	ML	13.20		13.20	13.20		$ 26,195.00	$ 345,774.00	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1"	UN	16.00		16.00	16.00		$ 11,798.00	$ 188,768.00	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	ML	0.20		0.20	0.20		$ 19,491.00	$ 3,898.20	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1/2"	UN	1.00		1.00	1.00		$ 24,536.00	$ 24,536.00	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1"	UN	2.00		2.00	2.00		$ 110,947.00	$ 221,894.00	$ -	100.00%	100.00%	
PINTURA DE ACEITE SOBRE PAÑETE 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	32.00		32.00	87.45		$ 25,835.00	$ 2,259,270.75	$ (1,432,550.75)	273.28%	273.28%	
SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	ML	82.37		82.37	82.37		$ 33,389.00	$ 2,750,251.93	$ -	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	144.00		144.00	126.18		$ 4,477.28	$ 564,943.63	$ 644,728.82	87.63%	87.63%	
	SUBTOTAL I.E.D. FABIO LOZANO SIMONELLI							**$ 34,477,292.85**				
								i				
CPF	**546**	**IED**		**SANTA LIBRADA (IED)**				**SEMANA**		**43**		
DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	2.17		2.17	2.19		$ 27,546.47	$ 60,326.77	$ 59,706.97	101.04%	101.04%	
PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	8.67		8.67	8.76		$ 26,966.00	$ 236,222.16	$ 233,795.22	101.04%	101.04%	
PERFORACIÓN NÚCLEO 3" E= 0.10 M	UN	3.00		3.00	1.00		$ 148,483.00	$ 148,483.00	$ 445,449.00	33.33%	33.33%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M	6.00		6.00	1.27		$ 75,567.00	$ 95,970.09	$ 453,402.00	21.17%	21.17%	

CONTRATO DE OBRA							CONTRATO DE INTERVENTORIA				VIGENCIA	2025
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"	UN	12.00		12.00	7.00		$ 27,176.00	$ 190,232.00	$ 326,112.00	58.33%	58.33%	
AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E= 0.10 M PARA CUBIERTA NO TRANSITABLE DE BLOQUE 11 (COCINA)	M2	2.17		2.17	2.19		$ 109,126.00	$ 238,985.94	$ 236,530.61	101.04%	101.04%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE REJILLACON SOSCO DE 4" A 3"	UN	4.00		4.00	4.00		$ 32,223.00	$ 128,892.00	$ 128,892.00	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	UN	2.00		2.00	2.00		$ 124,525.00	$ 249,050.00	$ 249,050.00	100.00%	100.00%	
PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M	8.55		8.55	8.55		$ 16,517.00	$ 141,220.35	$ 141,220.35	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	UN	2.00		2.00	4.00		$ 168,961.00	$ 675,844.00	$ 337,922.00	200.00%	200.00%	
IMPERMEABILIZADO SOBRE ADOQUIN	M2	29.99		29.99	30.00		$ 168,962.00	$ 5,068,860.00	$ 5,067,170.38	100.03%	100.03%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	10.00		10.00	29.99		$ 4,477.28	$ 134,273.73	$ 44,772.83	299.90%	299.90%	
								$ 7,368,360.04				
CPF	**1943**	**IED**				**RAFAEL URIBE URIBE (IED)**		**SEMANA**			**43**	
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL BOMBAS (TG-BOMB), ARRANQUE DIRECTO CON ALTERNANCIA POR PLC, PARA 3 BOMBAS DE 3 HP, 208V	UN	2.00		2.00	2.00		$ 12,247,776.00	$ 24,495,552.00	$ 24,495,552.00	100.00%	100.00%	
VALVULA DE PIE	UN	1.00		1.00	1.00		$ 2,579,348.00	$ 2,579,348.00	$ 2,579,348.00	100.00%	100.00%	
VALVULA DE ALIVIO	UN	1.00		1.00	1.00		$ 1,926,451.00	$ 1,926,451.00	$ 1,926,451.00	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORASA AMERICANA EN CABLES VARIADORES Y TRANSDUCTOR DE PRESIÓN	UN	1.00		1.00	1.00		$ 177,330.00	$ 177,330.00	$ 177,330.00	100.00%	100.00%	
Medición de caudal, variación de presión en descarga y medición de presión 24 horas continuas Contempla medición por uiltrasonido no invasivo, equipo especializado y mano de obra con técnico especializado	UN	1.00		1.00	1.00		$ 6,502,560.00	$ 6,502,560.00	$ 6,502,560.00	100.00%	100.00%	
								$ 35,681,241.00				
CPF	**564**	**IED**				**NUEVA ESPERANZA (IED)**		**SEMANA**			**43**	
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	130.00		130.00	130.94		$ 4,065.00	$ 532,271.10	$ 528,450.00	100.72%	100.72%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	48.00		48.00	32.80		$ 29,861.65	$ 979,462.19	$ 1,433,359.30	68.33%	68.33%	
CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	48.00			22.58		$ 20,327.00	$ 458,983.66	$ 975,696.00	47.04%	47.04%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	130.00		130.00	9.06		$ 30,220.00	$ 273,793.20	$ 3,928,600.00	6.97%	6.97%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 5 CM PARA EXTERIORES	M2	130.00		130.00	130.94		$ 736,301.00	$ 96,411,252.94	$ (692,122.94)	100.72%	100.72%	
DESTRONQUE PLACAS DE CONCRETO	M2	2.07		2.07	2.07		$ 32,170.00	$ 66,591.90	$ -	100.00%	100.00%	
DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ZONA VERDE.	UN	1.00		1.00	1.00		$ 3,424,439.00	$ 3,424,439.00	$ -	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	130.00		130.00	130.94		$ 4,477.28	$ 586,255.50	$ 582,046.85	100.72%	100.72%	
								$ 102,733,049.49				
CPF	**1923**	**IED**				**LA ARABIA (IED) SEDE B**		**SEMANA**			**43**	
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	4.00		4.00	8.28		$ 4,065.00	$ 33,658.20	$ 16,260.00	207.00%	207.00%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	20.00		20.00	8.28		$ 31,286.00	$ 259,048.08	$ 625,720.00	41.40%	41.40%	
PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2	0.56		0.56	0.56		$ 110,642.00	$ 61,959.52	$ 61,959.52	100.00%	100.00%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	20.00		20.00	8.28		$ 30,220.00	$ 250,221.60	$ 604,400.00	41.40%	41.40%	
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	20.00		20.00	8.31		$ 39,551.00	$ 328,668.81	$ 791,020.00	41.55%	41.55%	
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	20.00		20.00	3.24		$ 29,685.00	$ 96,179.40	$ 593,700.00	16.20%	16.20%	
TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	M2	20.00		20.00	8.28		$ 116,516.00	$ 964,752.48	$ 2,330,320.00	41.40%	41.40%	
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	20.00		20.00	17.11		$ 28,087.00	$ 480,568.57	$ 561,740.00	85.55%	85.55%	
PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M3	20.00		20.00	14.40		$ 16,517.00	$ 237,844.80	$ 330,340.00	72.00%	72.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	20.00		20.00	8.28		$ 4,477.28	$ 37,071.91	$ 89,545.67	41.40%	41.40%	
								$ 2,749,973.37				
CPF	**508**	**IED**				**BRASILIA - USME (IED)**		**SEMANA**			**43**	
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	20.13		20.13	21.38		$ 4,065.00	$ 86,909.70	$ 81,828.45	106.21%	106.21%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	10.00		10.00	1.50		$ 29,861.65	$ 44,792.48	$ 298,616.52	15.00%	15.00%	
DEMOLICIÓN COLUMNA EXISTENTE EN CONCRETO DE DIMENSIONES DE 30 X 30 X 3 M HASTA 3.40 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1.90		1.90	1.90		$ 112,478.00	$ 213,708.20	$ 213,708.20	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5.36		5.36	5.36		$ 21,406.00	$ 114,736.16	$ 114,736.16	100.00%	100.00%	

CONTRATO DE OBRA							CONTRATO DE INTERVENTORIA				VIGENCIA	2025
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	67.62		67.62	67.62		$ 12,141.00	$ 820,974.42	$ 820,974.42	100.00%	100.00%	
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	13.00		13.00	13.00		$ 26,187.00	$ 340,431.00	$ 340,431.00	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	13.00		13.00	13.00		$ 33,459.00	$ 434,967.00	$ 434,967.00	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	6.00		6.00	6.00		$ 32,622.00	$ 195,732.00	$ 195,732.00	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	24.86		24.86	24.86		$ 31,286.00	$ 777,769.96	$ 777,769.96	100.00%	100.00%	
DEMOLICOION DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0,20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS).	M2						$ 78,805.00	$ -	$ -	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2			-			$ 66,326.11	$ -	$ -	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	2.86			2.86		$ 31,843.00	$ 91,070.98	$ 91,070.98	100.00%	100.00%	
COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (NO INCLUYE ACERO)	M	1.80		1.80	1.80		$ 76,792.00	$ 138,225.60	$ 138,225.60	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE AGUA FRÍA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	4.00		4.00	5.00		$ 60,985.00	$ 914,775.00	$ 1,097,730.00	83.33%	83.33%	
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE AGUA FRÍA LAVAMANOS 1/2"	UN	6.00		6.00	3.00		$ 60,985.00	$ 1,646,595.00	$ 1,219,700.00	135.00%	135.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	UN	2.00		2.00	2.00		$ 66,233.00	$ 662,330.00	$ 794,796.00	83.33%	83.33%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 3/4"	UN	2.00		2.00	2.00		$ 105,801.00	$ 105,801.00	$ 105,801.00	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI Y ACOPLE	UN	6.00			6.00		$ 1,066,706.00	$ 6,400,236.00	$ 6,400,236.00	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	3.00			3.00		$ 388,380.00	$ 1,165,140.00	$ 1,165,140.00	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	7.79	8.49	16.28	13.72		$ 949,649.00	$ 13,029,425.91	$ 7,397,765.71	176.13%	176.13%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	1.16		1.16	1.16		$ 949,650.00	$ 1,101,594.00	$ 1,101,594.00	100.00%	100.00%	
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	55.82		55.82	55.82		$ 39,551.00	$ 2,207,736.82	$ 2,207,736.82	100.00%	100.00%	
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	1.81		1.81	5.43		$ 29,685.00	$ 161,189.55	$ 53,729.85	300.00%	300.00%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	20.13		20.13	20.13		$ 30,220.00	$ 608,328.60	$ 608,328.60	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	20.13		20.13	20.24		$ 202,089.00	$ 2,623,115.22	$ 8,437,215.75	31.09%	31.09%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	55.82		55.82	55.82		$ 94,283.00	$ 3,270,677.27	$ 7,354,074.00	44.47%	44.47%	
PINTURA DE ACEITE SOBRE PAÑETE 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	14.56		14.56	14.56		$ 25,835.00	$ 376,157.60	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	14.92		14.92	14.92		$ 106,864.00	$ 1,594,410.88	$ 1,594,410.88	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISIÓN POR MÓDULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM	M	4.44		4.44	4.44		$ 1,083,037.00	$ 4,808,684.28	$ 4,808,684.28	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2.00		2.00	2.00		$ 741,439.00	$ 1,482,878.00	$ 1,482,878.00	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	21.24		21.24	21.24		$ 4,477.28	$ 95,097.50	$ 95,097.50	100.00%	100.00%	
				SUBTOTAL I.E.D. BRASILIA.				**$ 45,513,490.13**				
CPF	**579**	**IED**		**GABRIEL GARCIA MARQUEZ**				**SEMANA**	**43**			
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	99.29		99.29	99.29		$ 4,065.00	$ 403,613.85	$ 403,613.85	100.00%	100.00%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E=0.04	M2	99.29		99.29	99.29		$ 40,439.00	$ 4,015,188.31	$ 4,015,188.31	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN VINILO TRÁFICO PESADO ESPESOR 4 MM	M2	99.29		99.29	102.58		$ 221,569.00	$ 22,728,548.02	$ 21,999,586.01	103.31%	103.31%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	99.29		99.29	99.29		$ 4,477.28	$ 444,549.48	$ 444,549.48	100.00%	100.00%	
				SUBTOTAL I.E.D. GABRIEL GARCIA MARQUEZ.				**$ 27,591,899.66**				
CPF	**#¡REF!**	**IED**		**JOSE CELESTINO MUTIS (IED)**				**SEMANA**	**43**			
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	2.25		2.25	1.22		$ 4,065.00	$ 4,959.30	$ 9,146.25	54.22%	54.22%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	1.44		1.44	1.22		$ 66,326.00	$ 80,917.72	$ 95,509.44	84.72%	84.72%	
DESTRONQUE Y PULIDA DE GRANITO EXISTENTE DE 33 X 33	M2	0.72		0.72	2.30		$ 39,829.00	$ 91,606.70	$ 28,676.88	319.44%	319.44%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	1.15		1.15	1.30		$ 106,864.00	$ 138,923.20	$ 122,893.60	113.04%	113.04%	

CONTRATO DE OBRA							CONTRATO DE INTERVENTORIA				VIGENCIA	2025
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	1.44		1.44	1.22		$ 159,274.00	$ 194,314.28	$ 229,354.56	84.72%	84.72%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	1.44		1.44	1.22		$ 202,088.00	$ 246,547.36	$ 291,006.72	84.72%	84.72%	
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	50.00		50.00	5.90		$ 6,964.51	$ 41,090.62	$ 348,225.63	11.80%	11.80%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	2.25		2.25	1.99		$ 4,477.28	$ 8,909.79	$ 10,073.89	88.44%	88.44%	
	SUBTOTAL I.E.D.RURAL JOSE CELESTINO MUTIS.							**$ 807,268.98**				
CPF	**#¡REF!**	**IED**	**JOSE CELESTINO MUTIS (IED)**					**SEMANA**		**43**		
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	60.20		60.20	60.20		$ 4,065.00	$ 244,713.00	$ 244,713.00	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	9.80		9.80	9.80		$ 29,861.65	$ 292,644.19	$ 292,644.19	100.00%	100.00%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	13.22		7.41	7.41		$ 88,298.00	$ 654,288.18	$ 1,167,299.56	56.05%	56.05%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	20.00		42.62	42.62		$ 87,915.00	$ 3,746,686.69	$ 1,758,300.00	213.09%	213.09%	
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	10.00		10.00	10.00		$ 45,115.00	$ 451,150.00	$ 451,150.00	100.00%	100.00%	
MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	5.61		5.61	5.61		$ 140,270.00	$ 786,914.70	$ 786,914.70	100.00%	100.00%	
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	1.00		1.00	1.00		$ 840,807.00	$ 840,807.00	$ 840,807.00	100.00%	100.00%	
	SUBTOTAL I.E.D.RURAL JOSE CELESTINO MUTIS.							**$ 7,017,203.76**				
CPF	**510**	**IED**	**FERNANDO GONZALEZ OCHOA (IED)**					**SEMANA**		**43**		
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	113.60		113.60	103.36		$ 4,065.00	$ 420,158.40	$ 461,784.00	90.99%	90.99%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	10.00		10.00	3.00		$ 29,861.65	$ 89,584.96	$ 298,616.52	30.00%	30.00%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M3	113.60		113.60	113.60		$ 40,939.03	$ 4,650,674.26	$ 4,650,674.26	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	81.08		81.08	24.00		$ 35,276.39	$ 846,633.31	$ 2,860,209.54	29.60%	29.60%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	395.16		395.16	395.16		$ 22,116.83	$ 8,739,687.41	$ 8,739,687.41	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO HETEROGENEO ALTO TRÁFICO	M2	113.60		113.60	113.60		$ 227,693.91	$ 25,866,028.39	$ 25,866,028.39	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20. DESARROLLO 67,5 CM (INCLUYE SOSCO, TAPAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, AL IGUAL QUE HERRAMIENTA MENOR, TRANSPORTE DE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	ML	8.50		8.50	8.50		$ 185,742.00	$ 1,578,807.00	$ 1,578,807.00	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	3.00		3.00	3.00		$ 127,774.00	$ 383,322.00	$ 383,322.00	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER 2X20W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	3.00		3.00	3.00		$ 137,326.00	$ 411,978.00	$ 411,978.00	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00		1.00	1.00		$ 89,920.00	$ 89,920.00	$ 89,920.00	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	ML	5.00		5.00	5.00		$ 64,896.00	$ 324,480.00	$ 324,480.00	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DESNUDO #8 EN COBRE	ML	30.00		30.00	30.00		$ 10,269.00	$ 308,070.00	$ 308,070.00	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	ML	30.00		30.00	30.00		$ 10,782.00	$ 323,460.00	$ 323,460.00	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS HASTA 0,60 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	ML	23.55		23.55	23.55		$ 168,077.00	$ 3,957,900.57	$ 3,958,213.35	99.99%	99.99%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2,0 MM TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CABALLETE, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	32.52		32.52	32.52		$ 128,208.81	$ 4,169,350.44	$ 4,169,350.44	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	113.60		113.60	113.60		$ 4,477.28	$ 508,619.41	$ 508,619.41	100.00%	100.00%	
	SUBTOTAL I.E.D.FERNANDO GONZALEZ OCHOA							**$ 52,668,674.15**				


CPF	**1935**	**IED**	**PARAISO MIRADOR (IED)**					**SEMANA**		**43**		
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	22.96			22.96		$ 4,065.00	$ 93,332.40	$ 93,332.40	100.00%	100.00%	


CONTRATO DE OBRA							CONTRATO DE INTERVENTORIA				VIGENCIA	2025
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M	14.91	2.69	17.60	17.60		$ 2,206.81	$ 38,839.79	$ 32,903.48	118.04%	118.04%	
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	86.65	7.44	94.09	94.09		$ 12,140.82	$ 1,142,329.89	$ 1,052,002.17	108.59%	108.59%	
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	15.00			15.00		$ 26,186.35	$ 392,795.27	$ 392,795.27	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	18.06			18.06		$ 31.29	$ 565.02	$ 565.02	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	6.79			6.79		$ 31,843.58	$ 216,217.90	$ 216,217.90	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	8.00	3.00	11.00	12.00		$ 63,796.89	$ 765,562.65	$ 510,375.10	150.00%	150.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	3.00			3.00		$ 60,984.00	$ 182,952.00	$ 182,952.00	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	UN	8.00			8.00		$ 174,545.00	$ 1,396,360.00	$ 1,396,360.00	100.00%	100.00%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	18.05			18.05		$ 40,939.00	$ 738,948.95	$ 738,948.95	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	18.05		18.05	18.05		$ 202,089.00	$ 3,647,706.45	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN	8.00			4.00		$ 97,699.61	$ 390,798.44	$ 781,596.87	50.00%	50.00%	
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	94.09			94.09		$ 39,551.00	$ 3,721,353.59	$ 3,721,353.59	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	94.09		94.09	94.09	5.17	$ 94,283.00	$ 8,871,087.47	$ 8,383,644.36	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISIÓN POR MÓDULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM	M	3.50			3.50	3.50	$ 1,083,037.00	$ 3,790,629.50	$ -	100.00%	100.00%	
ALQUILER BAÑO PORTÁTIL COMPLETO INCLUYE SANITARIO, ORINAL Y LAVAMANOS PARA OBRAS MODALIDAD DE EMERGENCIA EN CONDICIONES ESPECIALES, INCLUYE 8 ASEOS	MES	4.00	(2.27)	1.73	1.73		$ 909,106.66	$ 1,572,754.52	$ 3,636,426.63	43.25%	43.25%	
	SUBTOTAL I.E.D.PARAISO MIRADOR SEDE B							**$ 26,962,233.81**				

VALOR TOTAL DE EMERGENCIAS. $ 415,844,971.39


AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS POR SEDE - Septiembre 06 2026						
SEDE EDUCATIVA	PROGRAMADO ACUMULADO		EJECUTADO ACUMULADO		TOTAL POR SEDE	% DE ADELANTO O ATRASO
LA ARABIA	$ 216,308,160.00	100.00%	$ 216,308,158.83	100.00%	$ 216,308,160.00	ENTREGADO
JOSE JAIME ROJAS	$ 326,109,661.33	100.00%	$ 326,109,661.33	100.00%	$ 326,109,661.33	0.00%
MIGUEL DE CERVANTES	$ 781,319,543.50	91.30%	$ 727,072,047.97	84.96%	$ 855,799,629.42	-6.34%
JOSE VARGAS VILA	$ 259,085,355.00	100.00%	$ 259,085,206.18	100.00%	$ 259,085,355.00	ENTREGADO
ATABANZHA	$ 154,311,171.56	100.00%	$ 154,311,171.56	100.00%	$ 154,311,171.56	ENTREGADO
DON BOSCO	$ 334,388,530.08	100.00%	$ 334,388,530.08	100.00%	$ 334,388,530.08	0.00%
BRASILIA	$ 173,127,488.07	100.00%	$ 173,127,488.07	100.00%	$ 173,127,488.07	0.00%
LUIS E MORA OSEJO	$ 71,970,813.38	100.00%	$ 71,970,813.38	100.00%	$ 71,970,813.38	ENTREGADO
BICENTENARIO - TESORO	$ 189,023,272.16	100.00%	$ 189,023,272.16	100.00%	$ 189,023,272.16	0.00%
PARAISO MIRADOR	$ 170,220,643.57	67.55%	$ 223,928,915.78	88.86%	$ 252,000,000.00	21.31%
RODRIGO LARA BONILLA	$ 40,000,000.00	61.54%	$ 48,934,661.01	75.28%	$ 65,000,000.00	13.75%
TOTALES	$ 2,715,864,638.65	93.74%	$ 2,724,259,926.35	94.03%	$ 2,897,124,081.00	0.29%

OBSERVACIONES: Al finalizar la presente semana, encontramos tres (3) instituciones educativas con actividades de mantenimientos, de las cuales, igual que en el periodo anterior, la ***IED Paraiso Mirador*** registra un adelanto superior al 21%. Por otro lado la ***IED Miguel de Cervantes Saavedra*** , nuevamente incrementó su atraso con relación al periodo pasado registrando un 6.34% de desviación negativa y por ultimo la ***IED Rodrigo Lara Bonilla*** registra un adelanto superior al 13% con relación a lo programado. El contrato en general conserva un adelanto del 0.29%.

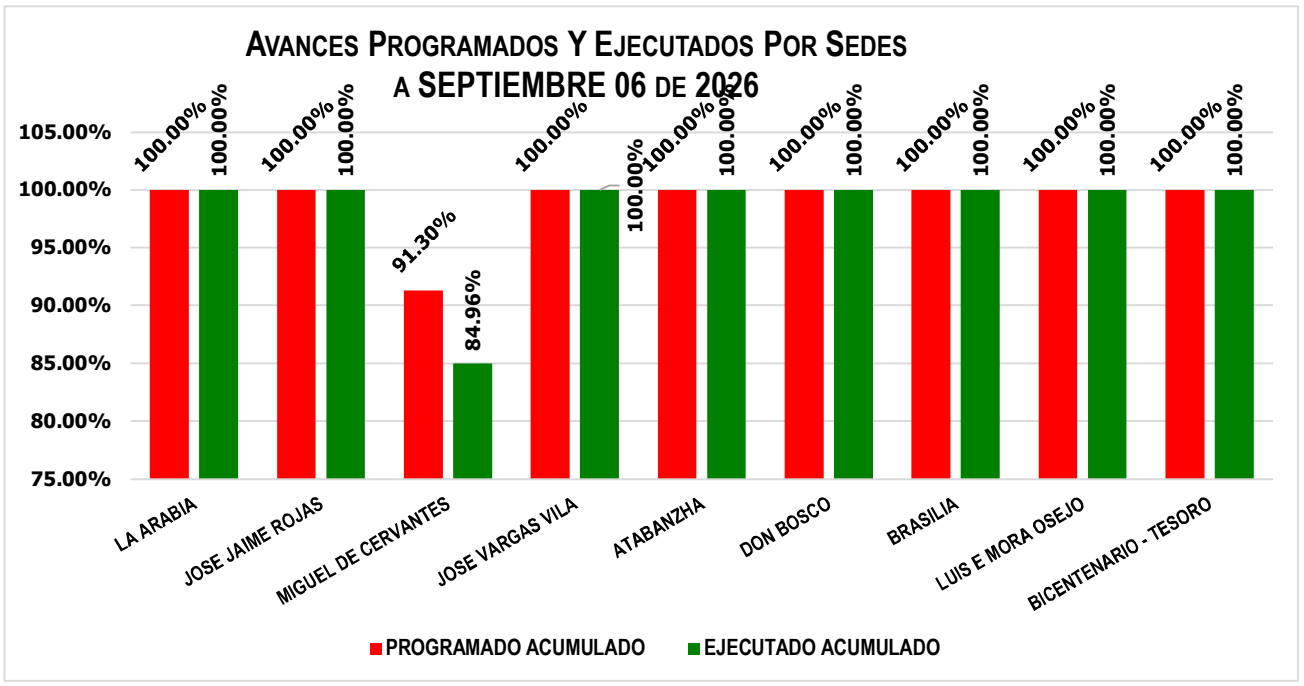

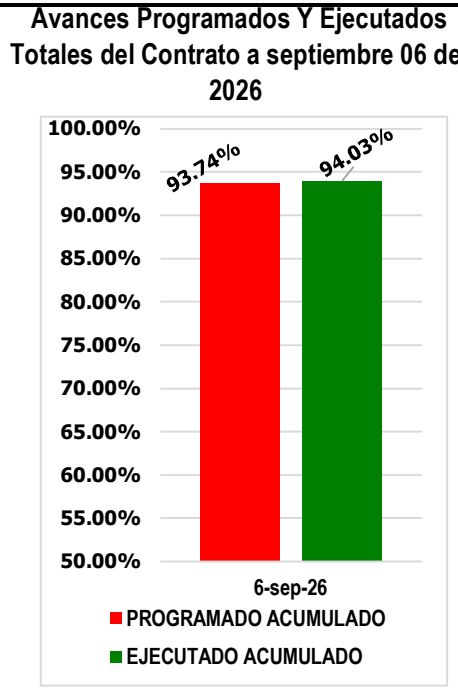

AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS TOTALES - Septiembre 06 2026

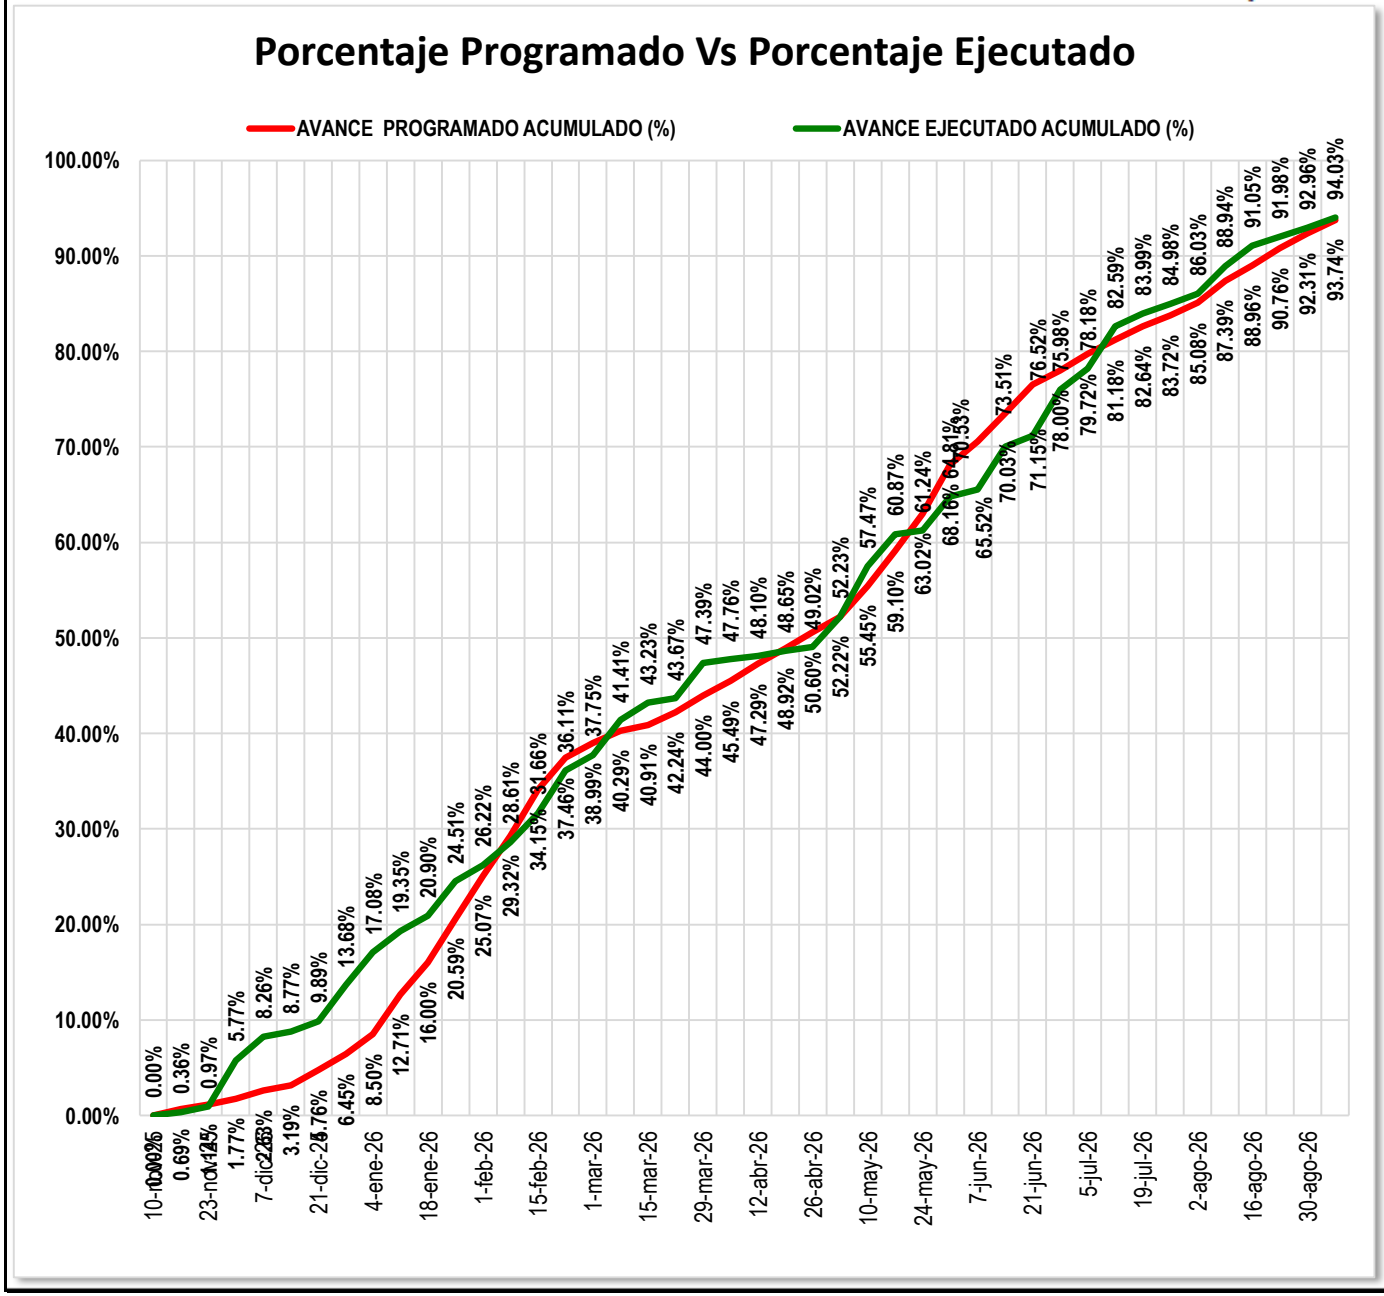

FECHA	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (%)	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO (%)
10-nov-25	0,00%	0,00%
16-nov-25	0,69%	0,36%
23-nov-25	1,14%	0,97%
30-nov-25	1,77%	5,77%
7-dic-25	2,63%	8,26%
14-dic-25	3,19%	8,77%
21-dic-25	4,76%	9,89%
28-dic-25	6,45%	13,68%
4-ene-26	8,50%	17,08%
11-ene-26	12,71%	19,35%
18-ene-26	16,00%	20,90%
25-ene-26	20,59%	24,51%
1-feb-26	25,07%	26,22%
8-feb-26	29,32%	28,61%
15-feb-26	34,15%	31,66%
22-feb-26	37,46%	36,11%
1-mar-26	38,99%	37,75%
8-mar-26	40,29%	41,41%
15-mar-26	40,91%	43,23%
22-mar-26	42,24%	43,67%
29-mar-26	44,00%	47,39%
5-abr-26	45,49%	47,76%
12-abr-26	47,29%	48,10%
19-abr-26	48,92%	48,65%
26-abr-26	50,60%	49,02%
3-may-26	52,22%	52,23%
10-may-26	55,45%	57,47%
17-may-26	59,10%	60,87%
24-may-26	63,02%	61,24%
31-may-26	68,16%	64,81%
7-jun-26	76,53%	65,52%
14-jun-26	73,51%	70,03%
21-jun-26	76,52%	71,15%
28-jun-26	78,00%	75,98%
5-jul-26	79,72%	78,18%
12-jul-26	81,18%	82,59%
19-jul-26	82,64%	83,99%
26-jul-26	83,72%	84,98%
2-ago-26	85,08%	86,03%
9-ago-26	87,39%	88,94%
16-ago-26	88,96%	91,05%
23-ago-26	90,76%	91,98%
30-ago-26	92,31%	92,96%
6-sep-26	**93,74%**	**94,03%**
13-sep-26	95,16%	0,00%
20-sep-26	96,96%	0,00%
27-sep-26	98,71%	0,00%
4-oct-26	99,48%	0,00%
5-oct-26	100,00%	0,00%

FECHA: 6/09/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES 113 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO		GRUPO 2
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA		
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS		
CORTE DEL INFORME:	CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO PAIS	
9 de junio de 2026	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

FECHAS			PLAZOS EN DIAS			VALOR CONTRATO		
DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8169110	CO1.PCCNTR.8154780	INICIAL	211	211	INICIAL	$ 796,184,131.00	$ 2,332,049,023.00
INICIO	6 de octubre de 2025	6 de octubre de 2025	SUSPENSIONES			ADICIONES	$ 291,300,934.00	$ 785,001,422.00
TERMINACION INICIAL	5 de mayo de 2026	5 de mayo de 2026	PRÓRROGAS	153	148	TOTAL	$ 1,087,485,065.00	$ 3,117,050,445.00
TERMINACION FINAL	5 de octubre de 2026	30 de septiembre de 2026	TOTAL	364	359			

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1	23-dic-25	$ 128,425,720.00	46	
2	5-jun-26	$ 162,875,214.00	107	
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA	OTRO ASPECTO
1	22-dic-25	$ 785,001,422.00	46	
2	27-may-26		102	
3				
4				

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	GARANTE:	SEGUROS MUNDIAL

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	CALIDAD DEL SERVICIO DESDE	CALIDAD DEL SERVICIO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA
BCH-100046043	6 10 2025	20 12 2026	20 6 2026	20 6 2031	6 10 2025	20 6 2029

POLIZAS CONTRATO DE OBRA												
POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA			SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE		SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA			ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA HASTA			POLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE		RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA		
39-44-101175397	6 10 2025	27 2 2027			6 10 2025		28 6 2029			5 5 2026		5 5 2028			39-40-101045911	6 10 2025		23 6 2026		

SEGUROS DEL ESTADO

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (06/09/2026)		PROGR %	EJECUTADO VS PROG	Vlr FRENTE APROBADO	Vlr FRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA	oct-2025	nov-2025	nov-2025	dic-2025	dic-2025	ene-2026	ene-2026	feb-2026	feb-2026	mar-2026	mar-2026	abr-2026	abr-2026	may-2026	jun-2026	jul-2026	ago-2026	sep-2026
581	ORLANDO FALS BORDA (IED)	USME	A	Barranquillita Nuevo	100.00%	100.00%		100.00%		$ 156,929,148.00	$ 156,929,147.99	10/11/2025	28/02/2026																		
1930	UNION EUROPEA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	B	Maria Cano	100.00%	100.00%		100.00%		$ 169,766,274.00	$ 169,766,274.00	18/11/2025	21/02/2026																		
1913	SIERRA MORENA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	C	Divino Niño	100.00%	100.00%		100.00%		$ 118,699,548.00	$ 118,699,548.00	10/11/2025	18/04/2026																		
523	FABIO LOZANO SIMONELLI (IED)	USME	A	Fabio Lozano Simonelli	100.00%	100.00%		100.00%		$ 245,187,661.00	$ 245,187,661.00	1/12/2025	11/04/2026																		
1904	ARBORIZADORA BAJA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Arborizadora Baja	100.00%	100.00%		100.00%		$ 630,139,470.00	$ 630,139,470.00	24/11/2025	28/02/2026																		
1974	CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Buenavista (Calasanz)	100.00%	100.00%		100.00%		$ 186,826,436.00	$ 186,826,436.00	10/12/2025	21/03/2026																		
1918	ESTRELLA DEL SUR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	B	Estrella II	100.00%	100.00%		100.00%		$ 78,637,768.00	$ 78,637,768.00	1/12/2025	14/03/2026																		
546	SANTA LIBRADA (IED)	USME	A	Santa Librada	100.00%	100.00%		100.00%		$ 223,822,666.00	$ 223,822,666.00	15/01/2026	2/05/2026																		
1917	ESTRELLA DEL SUR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Estrella I	100.00%	100.00%		100.00%		$ 76,163,937.00	$ 76,163,937.00	15/01/2026	28/02/2026																		
548	TENERIFE - GRANADA SUR (IED)	.USME	A	Tenerife	100.00%	100.00%		100.00%		$ 88,940,710.00	$ 88,940,710.00	9/03/2026	7/06/2026																		
1959	GUILLERMO CANO ISAZA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Guillermo Cano Isaza	99.40%	99.96%		100.00%		$ 354,505,537.00	$ 354,373,946.66	13/01/2026	19/06/2026																		
545	CIUDAD DE VILLAVICENCIO (IED)	USME	C	Puerta al Llano	57.46%	65.13%		64.25%		$ 349,000,000.00	$ 227,296,087.56	3/06/2026	30/09/2026																		
TOTAL FRENTES DE OBRA						95.45%		95.34%		$ 2,678,619,155.00	$ 2,556,783,652.22																				
EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO																													
590	DIRECCION LOCAL DE EDUCACION DE USME	USME	D L E	CADEL USME	100.00%	100.00%		100.00%		$ 28,072,878.00	$ 28,072,878.00	26/01/2026	1/03/2026																		
1904	ARBORIZADORA BAJA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Arborizadora Baja	100.00%	100.00%		100.00%		$ 52,071,222.00	$ 52,071,222.00	6/04/2026	14/05/2026																		
1974	CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Buenavista (Calasanz)	100.00%	100.00%		100.00%		$ 63,396,903.00	$ 63,396,903.00	7/04/2026	22/05/2026																		
590	DIRECCION LOCAL DE EDUCACION DE USME	USME	D L E	CADEL USME	100.00%	100.00%		100.00%		$ 2,038,265.00	$ 2,038,265.00	27/07/2026	1/08/2026																		
1974	CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Buenavista (Calasanz)	100.00%	100.00%		100.00%		$ 5,260,774.00	$ 5,260,774.00	22/05/2026	6/06/2026																		
1959	GUILLERMO CANO ISAZA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Guillermo Cano Isaza	100.00%	100.00%		100.00%		$ 11,337,220.00	$ 11,337,220.00	27/05/2026	20/06/2026																		
1980	CUNDINAMARCA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	La Riviera del Sur	100.00%	100.00%		100.00%		$ 18,125,874.00	$ 18,125,874.00	16/06/2026	27/06/2026																		
566	LUIS EDUARDO MORA OSEJO (IED)	USME	A	Nuevo Monteblanco- Eduardo Mora Osejo	100.00%	100.00%		100.00%		$ 70,007,566.00	$ 70,007,566.00	23/06/2026	7/07/2026																		
567	SAN JOSE DE USME - DON BOSCO 2 (CED)	.USME	A	San José Monteblanco (Don Bosco II)						$ 24,867,651.00																					
1974	CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Buenavista (Calasanz)	100.00%	100.00%		100.00%		$ 12,664,106.00	$ 12,664,106.00	22/06/2026	27/06/2026																		
575	EDUARDO UMAÑA MENDOZA (IED)	USME	A	Villa Alemania	6.00%	14.24%		35.00%		$ 85,000,009.00	$ 12,105,962.82	24/08/2026	22/09/2026																		
546	SANTA LIBRADA (IED)	USME	A	Santa Librada	2.54%	22.85%		40.00%		$ 27,347,458.00	$ 6,249,308.85	24/08/2026	16/09/2026																		
TOTAL FRENTES DE OBRA						70.30%		88.64%		$ 400,189,926.00	$ 281,330,079.67																				

ACUMULADO FRENTES DE OBRA

TERMINADAS	EN EJECUCION	POR INICIAR	TOTAL	VALOR
2	7	0	9	$ 2,556,783,652
ACUMULADO EMERGENCIAS				
9	2	0	11	$ 281,330,080
TOTAL				
11	9	0	20	$ 2,838,113,732

FRENTES POR LOCALIDAD


RELACION DE PAGOS EFECTUADOS

No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR
1	$ 361,723,907.00	12		1	$ 45,496,236.00	12		23		34	
2	$ 435,348,486.00	13		2	$ 45,496,236.00	13		24		35	
3	$ 781,384,254.00	14		3	$ 141,587,750.94	14		25		36	
4	$ 492,623,060.00	15		4	$ 79,227,162.00	15		26		37	
5	$ 209,434,074.00	16		5	$ 68,268,881.00	16		27		38	
6	$ 151,233,507.00	17		6	$ 265,555,238.00	17		28		39	
7		18		7	$ 174,904,152.00	18		29		40	
8		19		8	$ 121,790,762.00	19		30		TOTAL INTERVENTORIA	
9		20		9		20		31		$ 942,346,418	
10		TOTAL OBRA		10		21		32			
11		$ 2,431,747,288.00		11		22		33			


AVANCE GENERAL

	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO
AVANCE	95.45%	78.01%	68.52%
PROGRAMADO	95.34%		
ATRASO	0.11%	EN EJECUCION	
FECHA APROBACION CRONOGRAMA			


AVANCE GENERAL




EMERGENCIAS



AVANCE FÍSICO



AVANCE DE LOS FRENTES



OBSERVACIONES:

FECHA:	6/09/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	195 días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO			
REGISTRO FOTOGRAFICO		SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA			GRUPO 2
		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS			
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
1A 100.00%	ORLANDO FALS BORDA (IED)		 	  	FRENTE AL 100%
2C 100.00%	SIERRA MORENA (IED)	* ADECUACION DE CUARTOS DE BASURA * ACCESIBILIDAD REDUCIDA RAMPAS * PINTURA 4 AULAS	 	 	FRENTE AL 100%

28072879
52071222
63396903
2038265
5260774
11337220
18125874
70007566
24,867,651.00
12664106
76,878,564.00

FECHA: 6/09/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES: 196 días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO 2
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
3B 100.00%	UNION EUROPEA (IED)	* CAMBIO DE CUBIERTA PARA 3 AULAS, INCLUYE LA EDECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS	 364721023 	 	FRENTE AL 100%
4A 100.00%	ARBORIZADORA BAJA (IED)	* CAMBIO DE CUBIERTA BLOQUE PRIMERA INFANCIA, INCLUYE MEJORAMIENTO ELECTRICO * ADECUACIÓN CANCHA DEPROTIVA	 	 	FRENTE AL 100%

FECHA: 6/09/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES: 196 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA			GRUPO 2	
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
5A 100.00%	FABIO LOZANO SIMONELLI (IED)	* CAMBIO DE PISOS AULAS DE 3ER PISO BLOQUE A * MANEJO AGUAS LLUVIAS CANCHA * MEJORAMIENTO BATERIAS SANITARIAS 3ER PISO B	 	 	FRENTE AL 100%
6B 100.00%	ESTRELLA DEL SUR (IED) SEDE B	* CAMBIO DE PUERTAS Y VENTANA DE LA SEDE * CAMBIO DEL PORTON PRINCIPAL	 	 	FRENTE AL 100%

FECHA: 6/09/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES: 166 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO					
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO	2
CORTE DEL INFORME	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
7A **100.00%**	**CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)**	* CAMBIO DE CUBIERTA AULA MULTIPLE	 	 	**FRENTE AL 100%**
8A **100.00%**	**SANTA LIBRADA (IED)**	* MANTENIMIENTO CORRECTIVO TERRAZAS Y JARDINERA * ADECUACIÓN JUNTA ESTRUCTURAL COMEDOR	 	 	**FRENTE AL 100%**

FECHA: 6/09/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES: 166 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO 2
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
9A 100.00%	IED ESTRELLA DEL SUR, SEDE A	* ADEACUACIÓN BATERIAS SANITARIAS * ADECUACIÓN PORTON PRINCIPAL	 	 	FRENTE AL 100%
10A 100.00%	DIRECCION LOCAL DE EDUCACION DE USME - EMERGENCIA	* IMPERMEABILIZACIÓN PLACA TANQUES DE AGUA POTABLE * RESANE HUMEDAD BAÑO MUJERES	 	 	EMERGENCIA AL 100%

FECHA:	6/09/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	166 días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO			
REGISTRO FOTOGRAFICO		SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA			GRUPO 2
		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS			
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
11A 99.96%	GUILLERMO CANO ISAZA (IED)	* ADECUACIÓN BATERIAS SANITARIAS BLOQUE BACHILLERATO	 	 	  
12A 100.00%	TENERIFE - GRANADA SUR (IED)	* IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE * Instalación Barandas Metalicas	 	 	FRENTE AL 100%

FECHA: 6/09/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES: 196 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO 2
CORTE DEL INFORME	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA: CONSORCIO PAIS		
5/4/26		CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR: CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO		

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
13A 100.00%	CALASANZ (BUENAVISTA) (CED) EMERGENCIA	* INSTALACIÓN DIVISIONES DE BAÑOS *AMPLIACIÓN CAPACIDAD TANQUE DE AGUA *ADECUACION RAMPA PARA ENTRADA AULA MULTIPLE	 	 	EMERGENCIA AL 100%
14A 100.00%	ARBORIZADORA BAJA (IED)	* ADECUACIÓN GRADERIAS, REEMPLAZO ESCALERA TARIMA, ADECUACIÓN TARIMA *MEJORAMIENTO DEL TERRENO AL REDEDRO DE LA TARIMA EMERGENCIA	 	 	EMERGENCIA AL 100%

FECHA: 6/09/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES: 195 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO 2
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
15A 100.00%	GUILLERMO CANO ISAZA (IED)	*CAMBIO DE PISO AULA BLOQUE DE PRIMARIA SEGUNDO PISO EMERGENCIA	 	 	EMERGENCIA AL 100%
16A 65.13%	CIUDAD DE VILAVICENCIO - PUERTA AL LLANO	☐Mejoramiento correctivo de los pisos en acceso y corredor principal ☐Mejoramiento correctivo del cerramiento metálico ☐Mejoramiento de las redes de aguas lluvias	 	 	  

FECHA: 6/09/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES: 195 Días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO 2
CORTE DEL INFORME	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
5/4/26	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
17A 100.00%	CUNDINAMARCA (IED)	□Adecuación de una estructura en cielo raso PVC, para mitigar el ingreo de palomas al comedor de la institución	 	 	EMERGENCIA AL 100%
17A 100.00%	LUIS EDUARDO MORA OSEJO (IED)	* Cambio de tablero Principal electrico * Adecuación acometidas electricas según alcance de la ficha electrica	 	 	EMERGENCIA AL 100%

FECHA: 6/09/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES: 195 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA			GRUPO 2	
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
18A 100.00%	CALASANZ (BUENAVISTA) (CED) - EMERGENCIA	* cambio y suministro e instalación de motobombas para tanque de agua potable	 	 	EMERGENCIA AL 100%
18A 0.00%	EDUARDO UMAÑA MENDOZA (IED)	* Impermeabilización con manto en aluminio, bloque	 	 	  

FECHA:	6/09/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	166 días					
REGISTRO FOTOGRAFICO						GRUPO 2
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780		CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110		INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
18A 0.00%	SANTA LIBRADA (IED)	* Impermeabilización cuarto zona ludica	 	 	  

CONTRATO DE OBRA		CO1.PCCNTR.8154780					CONTRATO DE INTERVENTORIA	CO1.PCCNTR.8169110			VIGENCIA	2025
CPF	581	IED			ORLANDO FALS BORDA			SEMANA 43				
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
REPLANTEO	m2	36.50	225.50	262.00	262.00		$ 4,233.48	$ 1,109,170.66	$ (954,648.79)	717.81%	717.81%	
CERRAMIENTO EN LONA	M	91.00	(62.60)	28.40	28.40		$ 31,110.25	$ 883,530.99	$ 1,947,501.40	100.00%	100.00%	
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	36.50	211.26	247.76	247.76		$ 18,044.21	$ 4,470,634.09	$ (3,812,020.33)	678.79%	678.79%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M YGUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	301.34	(266.74)	34.60	34.60		$ 33,201.35	$ 1,148,766.74	$ 8,856,128.37	11.48%	11.48%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	79.20	40.80	120.00	120.00		$ 69,099.55	$ 8,291,946.35	$ (2,819,261.76)	151.52%	151.52%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	34.00	199.20	233.20	216.59		$ 107,273.69	$ 23,234,421.60	$ (19,587,116.26)	637.03%	637.03%	
PERFORACIÓN NÚCLEO 4" E= 0.10 M	UN	16.00	(13.00)	3.00	3.00		$ 166,952.47	$ 500,857.42	$ 2,170,382.16	18.75%	18.75%	
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M	1.50			1.50		$ 62,023.52	$ 93,035.29	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	34.00			34.00		$ 91,590.40	$ 3,114,073.57	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	0.30			0.30		$ 135,394.33	$ 40,618.30	$ -	100.00%	100.00%	
RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	0.24			0.24		$ 181,045.17	$ 43,450.84	$ -	100.00%	100.00%	
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	15.00			15.00		$ 22,829.47	$ 342,442.05	$ -	100.00%	100.00%	
PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	19.00			19.00		$ 19,858.75	$ 377,316.29	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO LAMINADO 3 + 3 DIMENSIONES 1.00 M. X 1.00 M.	M2	15.36			15.36		$ 177,336.50	$ 2,723,888.59	$ -	100.00%	100.00%	
MEDIACAÑA VERTICAL EN CONCRETO 3000 PSI	M	58.50	136.16	194.66	194.66		$ 27,185.71	$ 5,291,971.11	$ (3,701,606.83)	100.00%	100.00%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	73.00	189.00	249.56	239.56		$ 45,289.29	$ 10,849,501.59	$ (7,543,383.64)	328.16%	328.16%	
DILATACIÓN EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 3 MM PROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM	M			127.20	127.20		$ 4,291.49	$ 545,877.16	$ (545,877.16)	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	344.96			340.58		$ 4,663.84	$ 1,588,397.08	$ 20,440.72	98.73%	98.73%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	262.00	20.37	252.37	255.37		$ 361,355.09	$ 92,279,248.29	$ 2,395,784.22	97.47%	97.47%	
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ORLANDO FALS BORDA							$ 156,929,147.99				
CPF	1913	IED			SIERRA MORENA			SEMANA 43				
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	47.37	223.92	271.29	271.29		$ 7,045.00	$ 1,911,238.10	$ (1,577,516.00)	572.70%	572.70%	
CERRAMIENTO EN LONA	M	60.00	13.00	73.00	73.00		$ 31,110.25	$ 2,271,047.96	$ (404,433.20)	121.67%	121.67%	
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	m3	1.76	(1.76)	-	-		$ 274,656.52	$ -	$ 483,395.00	0.00%	0.00%	
DESMONTE DE BARANDA METÁLICA ALTURA NO MAYOR A 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	20.80	7.20	28.00	28.00		$ 21,488.46	$ 601,677.01	$ (154,716.95)	134.62%	134.62%	
DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	12.60			12.60		$ 11,376.96	$ 143,349.70	$ -	100.00%	100.00%	

DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	36.84			36.84		$ 107,273.69	$ 3,951,962.61	$ -	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.30 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	32.64	0.72	31.92	-		$ 93,547.94	$ -	$ 3,053,405.00	0.00%	0.00%	
CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	7.20			3.40		$ 15,633.37	$ 53,153.46	$ 59,407.00	47.22%	47.22%	
DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5.29			4.00		$ 11,761.45	$ 47,045.82	$ 15,172.00	75.61%	75.61%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	1.76	6.86	8.62	4.57		$ 91,988.38	$ 420,527.47	$ (258,627.91)	259.75%	259.75%	
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	m3	24.87	-9.60	15.27	15.27		$ 21,702.97	$ 331,382.67	$ 208,370.00	61.40%	61.40%	
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	m2	11.84			11.84		$ 165,931.21	$ 1,964,625.47	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	m3	7.00	7.00	14.00	14.00		$ 176,060.25	$ 2,464,579.38	$ (1,232,158.00)	199.98%	199.98%	
MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	12.60	3.76	16.36	16.36		$ 146,133.16	$ 2,390,738.55	$ (549,461.00)	129.84%	129.84%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	m	6.00			-		$ 78,726.73	$ -	$ 472,360.38	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"	un	8.00			-		$ 28,310.86	$ -	$ 226,487.00	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	un	2.00			-		$ 129,729.46	$ -	$ 259,458.91	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	m	29.00			-		$ 14,988.50	$ -	$ 434,667.00	0.00%	0.00%	
RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INLUYE REFUERZO).	M2	42.05	8.55	50.60	50.60		$ 193,996.53	$ 9,816,224.55	$ (1,658,670.00)	120.33%	120.33%	
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	11.84			11.84		$ 165,931.21	$ 1,964,625.47	$ -	100.00%	100.00%	
CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA (TRÁFICO PESADO) ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO, PENDIENTADO Y MEDIA CAÑA.	M	2.96			2.96		$ 592,067.38	$ 1,752,519.43	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	420.50	(366.54)	53.96	53.96		$ 7,255.46	$ 391,504.61	$ 2,659,416.00	12.83%	12.83%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	91.39			91.39		$ 7,103.01	$ 649,144.22	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-S 6" INCLUYE ACCESORIOS	M	6.00	10.00	16.00	16.00		$ 143,600.90	$ 2,297,614.44	$ (1,436,009.00)	266.67%	266.67%	
CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 M X 0.60 M EN CONCRETO REFORZADO < = 1,00 M CON MARCO Y TAPA METÁLICA E= 0.20 M	un	4.00	(4.00)	-	-		$ 1,618,437.02	$ -	$ 6,473,748.09	0.00%	0.00%	
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	3.00			2.00		$ 875,947.70	$ 1,751,895.39	$ 875,948.00	66.67%	66.67%	
CANAL EN PVC AMAZONAS O EQUIVALENTE, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	3.60			3.60		$ 68,114.71	$ 245,212.96	$ -	100.00%	100.00%	
MURO EN SUPERBOARD DE 8 MM INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA , MASILLA , CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA, VISTO DOS CARAS E= 12 CM	M2	15.77	1.25	17.02	17.02		$ 159,158.72	$ 2,708,881.47	$ (198,948.00)	107.93%	107.93%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA, EL TUBO PASAMANOS DE 2" CALIBRE 18 AL IGUAL QUE LOS TUBOS PEDESTALES CON PLATINA DE FIJACIÓN Y TRAVESAÑOS VERTICALES EN TUBERÍA DE 3/4" CON SEPARACIÓN CADA 9CM, PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS.	M	33.78			36.35		$ 1,120,163.13	$ 40,719,658.08	$ (2,880,548.00)	107.61%	107.61%	
PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	172.00	(172.00)	-	-		$ 65,757.83	$ -	$ 11,310,347.00	0.00%	0.00%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO (RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA CANCHA MULTIPLE INCLUYE DEMARCACIONES BALONCESTO - VOLEYBOL)	M2			146.06	156.06		$ 77,589.44	$ 12,108,607.88	$ (12,108,608.00)	106.85%	106.85%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	14.08	2.72	16.80	16.80		$ 98,222.57	$ 1,650,139.25	$ (267,165.00)	119.32%	119.32%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	4.08			4.08		$ 45,289.29	$ 184,780.29	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	4.84			4.84		$ 126,224.49	$ 610,926.55	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1.00			1.00		$ 572,567.48	$ 572,567.48	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	UN	1.00			24.00		$ 23,315.15	$ 559,563.51	$ (536,248.00)	2400.00%	2400.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	24.00			24.00		$ 20,790.98	$ 498,983.52	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	5.08	0.05	5.13	5.13		$ 798,362.30	$ 4,095,598.62	$ (39,918.00)	100.98%	100.98%	
PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	193.76	(98.31)	95.45	105.45		$ 29,785.43	$ 3,140,873.57	$ 2,630,351.00	54.42%	54.42%	
PINTURA DE ACEITE SOBRE PAÑETE (2 MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	61.76	14.44	76.20	86.20		$ 29,785.43	$ 2,567,504.05	$ (727,956.00)	139.57%	139.57%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	kg	226.80	92.51	319.31	319.31		$ 23,042.63	$ 7,357,741.55	$ (2,131,674.00)	140.79%	140.79%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	36.84	-23.74	13.10	15.10		$ 264,771.67	$ 3,998,052.18	$ 5,756,136.00	40.99%	40.99%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	537.24			537.24		$ 4,663.84	$ 2,505,600.70	$ -	100.00%	100.00%	
					SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. SIERRA MORENA			**$ 118,699,548.00**				
CPF	**1930**	**IED**			**UNIÓN EUROPEA**			**SEMANA 43**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	168.00	10.14	178.14	178.14		$ 4,233.48	$ 754,151.38	$ (42,927.00)	106.04%	106.04%	
CERRAMIENTO EN LONA	M	45.00	7.80	52.80	23.83		$ 31,110.25	$ 741,422.37	$ 658,538.70	52.96%	52.96%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorias para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	136.13	(104.13)	32.00	32.00		$ 3,248.63	$ 103,956.25	$ 338,280.13	23.51%	23.51%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5.83	-	5.83	-		$ 144,722.00	$ -	$ 843,729.29	0.00%	0.00%	
DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	36.30			36.30		$ 26,782.33	$ 972,198.70	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	5.15	7.35	12.50	12.50		$ 27,938.51	$ 349,231.40	$ (205,348.06)	242.72%	242.72%	

DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	m2	168.00	5.63	173.63	183.63		$ 36,752.18	$ 6,748,803.22	$ (574,436.61)	109.30%	109.30%	
DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	un	18.00	6.00	24.00	24.00		$ 11,967.87	$ 287,228.79	$ (71,807.20)	133.33%	133.33%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	un	18.00	6.00	24.00	24.00		$ 7,469.97	$ 179,279.20	$ (44,819.80)	133.33%	133.33%	
DESMONTE DE TABLERO ELÉCTRICO DE 12-18 CIRCUITOS DETERIORADO, INCLUYE RETIRO DE PROTECCIONES Y DISPOSICIÓN DE RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, NO INCLUYE RESANES NI PINTURAS.	un	1.00			-		$ 55,922.89	$ -	$ 55,922.89	0.00%	0.00%	
DEMOLICIÓN ALFAJÍA EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE COSNTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	7.00	0.00	7.00	-		$ 32,498.47	$ -	$ 227,489.29	0.00%	0.00%	
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	m	3.90	-3.90	0.00	-		$ 18,687.73	$ -	$ 72,882.16	0.00%	0.00%	
PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	19.43			19.43		$ 21,844.63	$ 424,441.11	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	4.00			4.00		$ 126,905.79	$ 507,623.16	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	3.90			3.90		$ 89,839.27	$ 350,373.14	$ -	100.00%	100.00%	
CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (INCLUYE FORMALETAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	M	19.43			19.43		$ 42,469.67	$ 825,185.65	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	kg	3515.11	-1076.19	2438.92	2,608.92		$ 23,042.63	$ 60,116,373.04	$ (84,914,618.87)	-242.42%	-242.42%	
CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (INCLUYE FORMALETAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	M	19.43			19.43		$ 42,469.67	$ 825,185.65	$ (825,185.65)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO (35 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR.	M	0.50			0.50		$ 341,855.19	$ 170,927.60	$ (170,927.60)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	m	26.40	18.13	44.53	44.53		$ 91,590.40	$ 4,078,520.47	$ (1,660,533.93)	245.62%	245.62%	
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	1.00	-1.00	0.00			$ 875,947.70	$ -	$ 875,947.70	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FUACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	kg	213.75	0.29	214.04	214.04		$ 264,771.67	$ 56,671,727.78	$ (76,783.78)	100.14%	100.14%	

FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	18.15			18.15		$ 106,267.26	$ 1,928,750.73	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	34.90			34.90		$ 91,590.40	$ 3,196,504.93	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	42.00			42		$ 23,315.15	$ 979,236.14	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 2N°10 (F) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	42.00			42.00		$ 20,790.98	$ 873,221.16	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	21.00	3.00	24.00	24		$ 180,330.15	$ 4,327,923.59	$ (540,990.45)	114.29%	114.29%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	21.00	3.00	24.00	24		$ 238,055.44	$ 5,713,330.57	$ (714,166.32)	114.29%	114.29%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M	22.50	8.50	31.00	30		$ 304,166.74	$ 9,125,002.11	$ (2,281,250.53)	133.33%	133.33%	
SUMINISTRO E INSTALACION MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA, PERFILES ESTUCTURALES DE ACERO GALVANIZADO PGU, MONTANTES, TORNILLOS PARA ESTRUCTURA, CLAVO IMPACTADO. ACABADO A DOS MANOS CON PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO.	M2	32.35	0.75	33.10	33.1		$ 222,048.37	$ 7,349,801.01	$ (166,536.28)	102.32%	102.32%	
PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M2	61.70			65.10		$ 17,207.77	$ 1,120,195.60	$ (58,476.16)	105.51%	105.51%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	224.21			224.21		$ 4,663.84	$ 1,045,679.27	$ -	100.00%	100.00%	
					SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. UNION EUROPEA			**$ 169,766,274.00**				
CPF	**1904**	**IED**			**ARBORIZADORA BAJA**			**SEMANA 43**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	786.72	463.91	1250.63	1,250.63		$ 7,045.00	$ 8,810,688.60	$ (3,268,246.00)	158.97%	158.97%	
CERRAMIENTO EN LONA	M	96.25	73.00	169.25	169.25		$ 31,110.25	$ 5,265,409.14	$ (2,271,047.96)	175.84%	175.84%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	466.58	9.42	476.00	476.00		$ 107,273.69	$ 51,062,274.77	$ (1,010,518.00)	102.02%	102.02%	
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	5.25			-		$ 22,300.62	$ -	$ 117,078.27	0.00%	0.00%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	145.00	6.23	151.23	151.23		$ 32,594.26	$ 4,929,229.33	$ (203,062.21)	104.30%	104.30%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	145.00	123.77	21.23	21.23		$ 42,650.45	$ 905,469.00	$ 5,278,845.87	14.64%	14.64%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO CON FIBRA SINTÉTICA ESPESOR 4 CM	M2	130.00			130.00		$ 69,868.54	$ 9,082,910.19	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	m2	323.02			323.02		$ 36,752.18	$ 11,871,653.14	$ 37.00	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA (INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	35.50			35.50		$ 8,680.11	$ 308,143.88	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	un	25.00			25.00		$ 7,469.97	$ 186,749.17	$ -	100.00%	100.00%	

DESMONTE CANCHA MULTIPLE (ARCO DE MICROFUTBOL Y ARO DE BALONCESTO) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	un	2.00			2.00		$ 398,950.46	$ 797,900.91	$ -	100.00%	100.00%	
DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	21.00			-		$ 11,761.45	$ -	$ 246,991.00	0.00%	0.00%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	16.80	5.76	22.56	22.56		$ 91,988.38	$ 2,075,257.93	$ (529,853.00)	134.29%	134.29%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	258.10	(36.51)	221.59	221.59		$ 79,962.51	$ 17,718,891.73	$ 2,919,431.00	85.85%	85.85%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	22.83			22.83		$ 135,394.33	$ 3,091,052.48	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	15.52			2.22		$ 66,591.58	$ 147,833.30	$ 885,668.00	14.30%	14.30%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	m3	103.10	68.26	171.36	171.36		$ 176,060.25	$ 30,169,684.13	$ (12,017,873.00)	166.21%	166.21%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAJÓN DE PIEDRA	m3	129.05	25.90	154.95	154.95		$ 176,060.25	$ 27,280,535.46	$ (4,559,960.00)	120.07%	120.07%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BORDILLO PREFABRICADO A80	m	87.00			87.00		$ 76,033.93	$ 6,614,951.64	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M	90.00			90.00		$ 97,085.28	$ 8,737,675.50	$ -	100.00%	100.00%	
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	18.70	5.00	23.70	23.70		$ 165,931.21	$ 3,932,569.57	$ (829,656.00)	126.74%	126.74%	
CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI ANCHO 0.50 M E= 0.07 M (NO INCLUYE REFUERZO)	M	90.00			90.00		$ 164,788.52	$ 14,830,966.59	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO (45 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3 MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR.	M	1.52			1.52		$ 358,768.86	$ 545,328.67	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PEATONAL DE ANGULOS Y PLATINAS DE ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR PARA CARCAMO ANCHO 40 CM	M	0.90			0.90		$ 156,990.72	$ 141,291.65	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	kg	1809.76	-142.50	1667.26	1,667.26		$ 23,042.63	$ 38,418,051.96	$ 3,283,574.00	92.13%	92.13%	
CAJA DE INSPECCION 100 X 100 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	2.00					$ 1,088,548.32	$ -	$ 2,177,097.00	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	m2	684.78	-162.78	522.00	522.00		$ 11,730.42	$ 6,123,281.59	$ 1,909,479.00	76.23%	76.23%	
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	m	3.00			2.00		$ 5,565.04	$ 11,130.08	$ 5,565.00	66.67%	66.67%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	m2	323.02			323.02		$ 264,771.67	$ 85,526,544.13	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	m	35.50			35.50		$ 305,515.84	$ 10,845,812.21	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN ASFALTO MD-10 PARA CANCHA DEPORTIVA E=8 CM, (INCLUYE: EMULSION ASFALTICA, ASFALTO MD-10 Y ACABADO CON SLURRY	m2	484.50	-43.86	440.64	440.64		$ 225,361.76	$ 99,303,405.31	$ 9,884,367.00	90.95%	90.95%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO (RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA CANCHA MULTIPLE INCLUYE DEMARCACIONES BALONCESTO - VOLEYBOL)	M2	484.50	-484.50	0.00	-		$ 77,589.44	$ -	$ 37,592,083.00	0.00%	0.00%	
PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	714.00			680.68		$ 65,757.83	$ 44,760,026.89	$ 2,191,065.00	95.33%	95.33%	
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M	66.67			66.67		$ 62,023.52	$ 4,135,108.31	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	620.45			620.45		$ 7,255.46	$ 4,501,650.03	$ -	100.00%	100.00%	
DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	353.72			353.72		$ 18,365.30	$ 6,496,173.31	$ -	100.00%	100.00%	
CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL (INC. DOS UNIDADES FIJAS DE MICROBALONCESTO - MALLA PARA MICRO FUTBOL - JUEGO DE POSTES Y MALLA PARA VOLEIBOL - DEMARCACIÓN DE LA CANCHA - TRANSPORTE - E INSTALACIÓN)	UN	2.00	-1.00	1.00	1.00		$ 12,850,061.48	$ 12,850,061.48	$ 12,850,061.00	50.00%	50.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	5.00			4.00		$ 126,905.79	$ 507,623.16	$ 126,906.00	80.00%	80.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1.00			1.00		$ 572,567.48	$ 572,567.48	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	118.00			118.00		$ 15,217.85	$ 1,795,706.06	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	118.00			118.00		$ 16,070.48	$ 1,896,316.55	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	25.00			25.00		$ 180,330.15	$ 4,508,253.74	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	22.00			22.00		$ 238,055.44	$ 5,237,219.69	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER 2X20W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	3.00			3.00		$ 193,810.36	$ 581,431.07	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	194.18			194.18		$ 9,167.13	$ 1,780,074.18	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H= 5.00 M (ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO DE 3" E= 3,81 MM ASTM A500 Y CAMISA DE REFUERZO DE 4", VARILLA REDONDA DE 3/4" C./.14 EJES. VIGA 40X30 Y PILOTES CONCRETO 3000 PSI) SEGÚN DETALLES IDRD.	M2	17.50			16.95		$ 2,042,059.82	$ 34,612,913.93	$ 1,123,133.00	96.86%	96.86%	
CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H= 2.50 M (ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO DE 2-1/2" Y PROTECCIÓ N EN VARILLA REDONDA DE 3/4" C./0.14 m EJES. VIGA=30*30 CONCRETO 3000PSI) SEGÚN DETALLES IDRD.	M2	17.50			16.95		$ 1,257,854.97	$ 21,320,641.75	$ 691,820.00	96.86%	96.86%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO HETEROGENEO ALTO TRÁFICO	M2	130.00			125.78		$ 237,210.90	$ 29,836,007.59	$ 1,001,410.00	96.75%	96.75%	
LAVADO Y LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE EN EL COLEGIO ARBORIZADORA BAJA (INCLUYE INSUMOS)	ML	197.54			194.54		$ 5,046.98	$ 981,840.09	$ 15,141.00	98.48%	98.48%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1,078.76			1,078.76		$ 4,663.84	$ 5,031,162.64	$ -	100.00%	100.00%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ARBORIZADORA BAJA	**$ 630,139,470.00**				
CPF	**523**	**IED**			**Fabio Lozano Simonelli**			**SEMANA 43**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	1201.02	10.05	1211.07	1,211.07		$ 4,233.48	$ 5,127,035.54	$ (42,546.00)	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	51.83	81.17	133.00	133.00		$ 31,110.25	$ 4,137,662.72	$ (2,525,218.67)	256.61%	256.61%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	235.29	11.28	246.57	246.57		$ 32,594.26	$ 8,036,765.70	$ (367,663.21)	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2			68.70	68.70		$ 107,273.69	$ 7,369,702.26	$ (7,369,702.26)	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN ASITIOS AUTORIZADOS)	M2	28.64	1.35	29.99	29.99		$ 22,300.62	$ 668,795.68	$ (30,105.84)	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	55.48	30.02	85.50	85.50		$ 12,649.16	$ 1,081,503.32	$ (379,727.83)	154.11%	154.11%	
DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	28.00			28.00		$ 20,708.69	$ 579,843.18	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)}	M3	15.05	0.08	15.13	15.13		$ 66,591.58	$ 1,007,530.54	$ (5,327.33)	100.53%	100.53%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	17.32			17.32		$ 33,174.37	$ 574,580.07	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	UN	28.00			28.00		$ 27,281.50	$ 763,882.01	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2			3.00	3.00		$ 25,731.38	$ 77,194.15	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	66.00			66.00		$ 27,938.51	$ 1,843,941.79	$ -	100.00%	100.00%	
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3			63.85	63.85		$ 34,724.48	$ 2,217,158.36	$ -	100.00%	100.00%	
CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M			120.60	120.60		$ 15,633.37	$ 1,885,384.52	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	8.00			8.00		$ 7,469.97	$ 59,759.73	$ -	100.00%	100.00%	

DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	55.30	-5.16	50.14	50.14		$ 32,569.97	$ 1,633,058.41	$ 168,061.06	90.67%	90.67%	
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	22.90			22.90		$ 18,687.73	$ 427,949.09	$ -	100.00%	100.00%	
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2			2.80	2.80		$ 18,044.21	$ 50,523.80	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	12.80	2.49	15.29	15.29		$ 135,394.33	$ 2,070,179.26	$ (337,131.87)	119.45%	119.45%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 m	M2	194.67			194.67		$ 42,650.45	$ 8,302,762.60	$ -	100.00%	100.00%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	49.31			49.31		$ 45,289.29	$ 2,233,214.74	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO CON FIBRA SINTÉTICA ESPESOR 4 CM	M2	548.06	(548.06)	-			$ 69,868.54	$ -	$ 38,292,151.98	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	158.76	(56.05)	102.71	102.71		$ 7,103.01	$ 729,550.31	$ 398,123.79	64.70%	64.70%	
CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI ANCHO 0.50 M E= 0.07 M (NO INCLUYE REFUERZO)	M	171.60	(44.68)	126.92	122.00		$ 164,788.52	$ 20,104,199.16	$ 8,173,510.48	71.10%	71.10%	
PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2			0.64	0.64		$ 115,264.41	$ 73,769.22	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PEATONAL DE ANGULOS Y PLATINAS DE ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR PARA CARCAMO ANCHO 40 CM	M			13.00	13.00		$ 156,990.72	$ 2,040,879.36	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M			20.50	20.57		$ 24,290.55	$ 499,656.52	$ (1,700.34)	100.34%	100.34%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2.00			2.00		$ 126,905.79	$ 253,811.58	$ (253,811.58)	100.00%	100.00%	
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00			1.00		$ 253,721.19	$ 253,721.19	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	M	1.00			1.00		$ 572,567.48	$ 572,567.48	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	M	8.00			8.00		$ 180,330.15	$ 1,442,641.20	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	32.00	-27.00	5.00	5.00		$ 23,315.15	$ 116,575.73	$ 629,508.95	15.63%	15.63%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M			55.00	55.00		$ 33,700.52	$ 1,853,528.49	$ (1,853,528.49)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	32.00	(12.00)	20.00	20.00		$ 20,790.98	$ 415,819.60	$ 249,491.76	62.50%	62.50%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN			8.00	8.00		$ 198,607.76	$ 1,588,862.05	$ -	100.00%	100.00%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	8.00	-5.00	3.00	3.00		$ 238,055.44	$ 714,166.32	$ 1,190,277.20	37.50%	37.50%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL TOTALIZADOR 3X125 A. MATERIALES CERTIFICADOS RETIE E INSTALADOS SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UN			1.00	1.00		$ 781,835.83	$ 781,835.83	$ (781,835.83)	100.00%	100.00%	
ACOMETIDA TRIFASICA EN 4#8 + 1#10 CABLE LIBRE DE HALOGENOS. INCLUYE CONECTORES TUBULARES Y AISLAMIENTO AUTOFUNDENTE INCLUYE MANIOBRAS DE CANALIZACIÓN	M			60.00	60.00		$ 57,049.39	$ 3,422,963.50	$ (3,422,963.50)	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	15.00	(2.42)	12.58	12.58		$ 361,355.09	$ 4,545,846.98	$ 874,479.31	83.87%	83.87%	
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	1.00			1.00		$ 875,947.70	$ 875,947.70	$ -	100.00%	100.00%	
CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	55.30	-5.16	50.14	50.14		$ 130,345.99	$ 6,535,548.17	$ 672,585.33	90.67%	90.67%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	226.69	12.39	239.08	239.08		$ 126,224.49	$ 30,177,196.69	$ (1,563,366.10)	105.46%	105.46%	
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	17.44	76.23	93.67	93.67		$ 33,727.50	$ 3,159,254.93	$ (2,571,047.33)	537.10%	537.10%	
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M			39.00	39.00		$ 22,829.47	$ 890,349.34	$ (890,349.34)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M2	-	5.29	5.29	5.29		$ 62,023.52	$ 328,104.44	$ (328,104.44)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
WIN DE ALUMINIO	M	18.00	2.90	20.90	20.90		$ 15,372.99	$ 321,295.59	$ (44,581.68)	116.11%	116.11%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	131.00	(37.64)	93.36	93.36		$ 98,222.57	$ 9,170,059.56	$ 3,697,097.71	71.27%	71.27%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	11.73	-5.49	6.24	6.24		$ 1,127,900.21	$ 7,038,097.34	$ 6,192,172.18	53.20%	53.20%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	47.82	-8.24	39.58	40.99		$ 989,338.00	$ 40,552,909.59	$ 6,757,233.57	85.72%	85.72%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	1.80	0.30	1.50	1.50		$ 989,338.00	$ 1,484,007.00	$ 296,801.40	83.33%	83.33%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	3.00			3.00		$ 772,427.21	$ 2,317,281.62	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL BLANCO DE 2 CUERPOS CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA, DESCARGA SENCILLA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, BRIDA, ACOPLE Y VALVULA PLASTICA DE 1/2" PARA REGULACION DE PRESION. CONSUMO DE AGUA DE 4.8 LTS POR DESCARGA, CAPACIDAD MINIMA DE EVACUACION DE SOLIDOS 400 GRAMOS	UN	11.00			11.00		$ 1,117,185.66	$ 12,289,042.29	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, CON DOS PERSIANAS INFERIOR Y SUPERIOR DE 30CM X 60CM. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2			3.84	3.84		$ 798,362.30	$ 3,065,711.25	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	14.00			14.00		$ 404,611.28	$ 5,664,557.91	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M			102.46	102.46		$ 91,590.40	$ 9,384,352.28	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M			1.65	1.65		$ 78,726.73	$ 129,899.11	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M			24.00	24.00		$ 51,125.49	$ 1,227,011.85	$ -	100.00%	100.00%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1-1/2 "	UN	11.00			11.00		$ 18,869.86	$ 207,568.48	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1/2"	UN	28.00			28.00		$ 4,998.42	$ 139,955.63	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	14.00			14.00		$ 63,533.17	$ 889,464.33	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	14.00			14.00		$ 63,533.17	$ 889,464.33	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	7.20	0.56	7.76	7.76		$ 123,260.52	$ 956,501.65	$ (69,025.89)	107.78%	107.78%	
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	66.72	216.43	283.15	283.15		$ 20,236.50	$ 5,729,964.98	$ (4,379,785.70)	424.39%	424.39%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN			24.00	24.00		$ 33,569.66	$ 805,671.73	$ -	100.00%	100.00%	
PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	-		22.64	22.64		$ 32,026.28	$ 725,075.09	$ (725,075.09)	100.00%	100.00%	
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M			122.00	122.00		$ 32,026.28	$ 3,907,206.76	$ -	100.00%	100.00%	
PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN).	M2	176.38			176.38		$ 6,610.59	$ 1,165,975.86	$ -	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1,201.02			1,201.02		$ 4,663.84	$ 5,601,363.56	$ -	100.00%	100.00%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. FABIO SIMONELLI	**$ 245,187,661.00**				
CPF	**1918**	**IED**			**Estrella del Sur Sede B**			**SEMANA 43**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	557.28	20.48	577.76	577.76		$ 4,233.48	$ 2,445,932.98	$ (86,702.00)	103.67%	103.67%	
CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2").	M	88.20	-88.20	0.00	-		$ 154,730.98	$ -	$ (13,647,272.19)	0.00%	0.00%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	54.17			33.24		$ 33,174.37	$ 1,102,716.03	$ 694,339.54	61.36%	61.36%	
DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	95.99	-32.70	63.29	63.29		$ 29,391.49	$ 1,860,302.19	$ 960,987.18	65.94%	65.94%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	28.37					$ 707,267.02	$ -	$ 20,065,165.47	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON DOBLE ANTI MACHUCON, REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	25.81	6.00	31.81	35.81		$ 829,259.39	$ 29,695,861.74	$ (8,292,676.84)	138.75%	138.75%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1.43			1.43		$ 798,362.30	$ 1,145,011.22	$ (3,353.12)	100.29%	100.29%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO, CUERPOS FIJOS, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A DISEÑO SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	87.25			69.15		$ 467,649.33	$ 32,338,268.71	$ 8,464,135.19	79.26%	79.26%	

ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM	M	141.20			141.20		$ 9,408.62	$ 1,328,459.99	$ 37.63	100.00%	100.00%	
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	141.20			148.20		$ 22,829.47	$ 3,383,236.17	$ (159,714.97)	104.95%	104.95%	
PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M	141.20			148.20		$ 17,207.77	$ 2,550,122.76	$ (120,385.56)	104.95%	104.95%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	577.76			597.76		$ 4,663.84	$ 2,787,856.22	$ (93,276.77)	103.46%	103.46%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ESTRELLA DEL SUR - B	**$ 78,637,768.00**				
CPF	**1974**	**IED**			**CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)**			**SEMANA 43**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	538.32	-88.32	450.00	450.00		$ 4,233.48	$ 1,905,064.11	$ 373,901.00	83.59%	83.59%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5"anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	78.28	11.72	90.00	95.00		$ 31,137.23	$ 2,958,036.66	$ (520,614.00)	121.36%	121.36%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	538.32					$ 3,248.63	$ -	$ 1,748,804.00	0.00%	0.00%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	12.00	(1.00)	11.00	11.00		$ 7,469.97	$ 82,169.63	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M			5.00	5.00		$ 23,315.15	$ 116,575.73	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 2N°10 (F) + 1N°12 (T) AWG THHN	M			20.00	20.00		$ 20,790.98	$ 415,819.60	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES 50W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	1.00			1.00		$ 101,214.88	$ 101,214.88	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	M2	538.82	-134.52	404.30	408.30		$ 36,752.18	$ 15,005,915.99	$ 4,796,895.00	75.78%	75.78%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	1841.40	-941.87	899.53	902.53		$ 23,042.63	$ 20,796,663.05	$ 21,634,032.15	49.01%	49.01%	
CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	44.00			46.69		$ 130,345.99	$ 6,086,241.01	$ (351,017.24)	106.12%	106.12%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	633.15			632.63		$ 4,663.84	$ 2,950,473.25	$ 2,436.22	99.92%	99.92%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUAYA METÁLICA PARA CERCHA METÁLICA	M2	30.00			30.00		$ 37,696.55	$ 1,130,896.57	$ -	100.00%	100.00%	
FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2			87.00	87.00		$ 106,267.26	$ 9,245,251.44	$ (9,245,251.44)	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	KG	538.31	-538.31	0.00	-		$ 264,771.67	$ -	$ 142,529,236.49	0.00%	0.00%	

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 50 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR 50 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 24 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA LOS METROS CUADRADOS RALMENTE INSTALADOS)	KG	0.00	0.00	410.94	410.94		$ 306,692.25	$ 126,032,114.08	$ (126,032,114.08)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. CALASANZ BUENA VISTA							**$ 186,826,436.00**				
CPF	**546**	**IED**			**SANTA LIBRADA (IED)**			**SEMANA 43**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	557.28			557.28		$ 4,233.48	$ 2,359,231.39	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5"anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	128.18	-78.18	50.00	50.00		$ 31,110.25	$ 1,555,512.30	$ 2,432,199.03	39.01%	39.01%	
CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	65.03	-39.70	25.33	25.33		$ 15,633.37	$ 395,993.28	$ 620,644.82	38.95%	38.95%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	67.90		0.80	0.80		$ 32,594.26	$ 26,075.40	$ 2,187,074.58	1.18%	1.18%	
PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	27.20			13.34		$ 21,844.63	$ 291,407.33	$ 302,766.53	49.04%	49.04%	
PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	372.13			371.00		$ 13,385.77	$ 4,966,120.74	$ 15,125.92	99.70%	99.70%	
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M			18.00	18.00		$ 22,829.47	$ 410,930.46	$ (410,930.46)	100.00%	100.00%	
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	63.87	28.85	92.72	92.72		$ 34,724.48	$ 3,219,654.24	$ (1,001,801.39)	145.17%	145.17%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2			73.27	73.27		$ 36,752.18	$ 2,692,832.39	$ -	100.00%	100.00%	
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	16.47	(16.47)	-			$ 18,044.21	$ -	$ -	0.00%	0.00%	
DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	194.87			194.87		$ 9,443.70	$ 1,840,293.82	$ 1,840,293.82	100.00%	100.00%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	59.96			59.96		$ 91,988.38	$ 5,515,765.80	$ 5,515,765.80	100.00%	100.00%	
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	100.00	(20.61)	79.39	79.39		$ 53,568.71	$ 4,252,820.18	$ 4,252,820.18	79.39%	79.39%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M	63.33			13.44		$ 91,988.38	$ 1,236,323.87	$ 1,236,323.87	21.22%	21.22%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	281.83	(180.01)	96.22	96.22		$ 45,289.29	$ 4,357,735.20	$ 4,357,735.20	34.14%	34.14%	

RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INLUYE REFUERZO).	M2			12.54	12.54		$ 193,996.53	$ 2,432,716.52	$ 2,432,716.52	100.00%	100.00%	
PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 M (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE}	M2	333.93	-143.06	190.87	190.87		$ 69,679.67	$ 13,299,757.83	$ 13,299,757.83	57.16%	57.16%	
MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	208.04			205.00		$ 25,122.94	$ 5,150,202.74	$ 5,150,202.74	98.54%	98.54%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M			19.35	19.35		$ 91,590.40	$ 1,772,274.22	$ 1,772,274.22	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M			8.10	8.10		$ 78,726.73	$ 637,686.52	$ 637,686.52	100.00%	100.00%	
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M	19.60			13.44		$ 62,023.52	$ 833,596.15	$ 833,596.15	68.57%	68.57%	
Demolición de Materas en concreto o fibrocemento 1.2x1.2x0.3 m y 1x0.7x0.7 m	M	48.00			44.00		$ 16,863.75	$ 742,005.00	$ 742,005.00	91.67%	91.67%	
TRATAMIENTO DE PISOS EN LADRILLO O ADOQUIN: LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS y REEMBOQUILLADO DE JUNTAS, (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN,	M	110.00	69.08	179.08	179.08		$ 16,863.75	$ 3,019,960.35	$ 3,019,960.35	162.80%	162.80%	#####
JUNTA DE DILATACIÓN INDUCIDA PISO EN CONCRETO ALLANADO (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, MARCACIÓN DE DILATACIONES Y SELLADO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN).	M	356.60	-300.35	56.25	59.92		$ 34,369.67	$ 2,059,599.55	$ 2,059,599.55	16.80%	16.80%	
CANAL EN PVC AMAZONAS O EQUIVALENTE, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	6.00	(6.00)	-	-		$ 68,114.71	$ -	$ -	0.00%	0.00%	
DOMO EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 5 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	7.20	-1.32	5.88	5.88		$ 157,817.72	$ 927,968.18	$ 927,968.18	81.67%	81.67%	
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	67.71			67.71		$ 5,565.04	$ 376,808.69	$ 376,808.69	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CERCHA PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 4.5 KG/M	M	6.00	-0.12	5.88	5.88		$ 101,978.47	$ 599,633.40	$ 599,633.40	98.00%	98.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M			20.20	20.20		$ 305,515.84	$ 6,171,419.91	$ 6,171,419.91	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	335.60	(23.61)	315.08	315.08		$ 361,355.09	$ 113,857,372.13	$ 113,857,372.13	93.89%	93.89%	
PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2			96.73	96.73		$ 65,757.83	$ 6,360,755.11	$ 6,360,755.11	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	M2			190.00	190.00		$ 11,730.42	$ 2,228,757.19	$ 2,228,757.19	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN			8.00	8.00		$ 33,502.20	$ 268,017.60	$ 268,017.60	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TIERRA NEGRA ABONADA, INCLUYE CONFORMACIÓN DE TERRENO Y COMPACTACIÓN MANUAL DE TIERRA.	M3			37.42	37.42		$ 258,201.55	$ 9,661,902.03	$ 9,661,902.03	100.00%	100.00%	
SUMNINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN EN PASTO KIKUYO	M2			190.84	200.84		$ 29,001.60	$ 5,824,681.89	$ 5,824,681.89	105.24%	105.24%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ZANJA DE 0.3 X 0.3 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000, GRAVA 3/4" Y PASES PVC LONGITUD MAX 0.3 M CADA 3 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	130.00			130.00		$ 89,213.28	$ 11,597,727.02	$ 11,597,727.02	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	617.33			617.33	30.87	$ 4,663.84	$ 2,879,127.54	$ 2,879,127.54	100.00%	100.00%	
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. SANTA LIBRADA							**$ 223,822,666.00**				

CPF	1917	IED			ESTRELLA DEL SUR (IED) A			SEMANA 43				
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	20.56			20.56		$ 4,233.48	$ 87,040.26	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	40.30	-31.81	8.49	8.49		$ 31,110.25	$ 264,138.88	$ 989,604.00	21.07%	21.07%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19.52	-2.22	17.30	17.30		$ 32,594.26	$ 563,880.63	$ 72,359.00	88.63%	88.63%	
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19.52	-5.96	13.56	13.56		$ 22,300.62	$ 302,396.45	$ 132,912.00	69.47%	69.47%	
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	40.65	(2.49)	38.16	38.16		$ 12,649.16	$ 482,692.01	$ 31,496.00	93.87%	93.87%	
DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19.52	-4.52	15.00	15.00		$ 20,708.69	$ 310,630.28	$ 93,603.00	76.84%	76.84%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	11.36	-5.02	6.34	6.34		$ 33,174.37	$ 210,325.50	$ 166,535.00	55.81%	55.81%	
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	15.00			15.00		$ 27,281.50	$ 409,222.50	$ -	100.00%	100.00%	
SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	15.00			15.00		$ 182,479.27	$ 2,737,188.99	$ -	100.00%	100.00%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	19.52			19.52		$ 42,650.45	$ 832,536.73	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	19.52	(1.99)	17.53	17.53		$ 126,224.49	$ 2,212,715.38	$ 251,187.00	89.81%	89.81%	
MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2	0.80			0.80		$ 67,218.91	$ 53,775.13	$ -	100.00%	100.00%	
WIN DE ALUMINIO	M	3.00			3.00		$ 15,372.99	$ 46,118.98	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	44.84			40.81		$ 116,158.86	$ 4,740,210.72	$ 468,353.00	91.01%	91.01%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	2.00			2.00		$ 41,130.01	$ 82,260.02	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	5.20			5.20		$ 707,267.02	$ 3,677,788.50	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	2.16	0.12	2.28	2.38		$ 1,127,967.67	$ 2,680,941.73	$ (244,532.00)	110.04%	110.04%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	7.00	1.00	8.00	8.00		$ 873,470.75	$ 6,987,765.98	$ (873,471.00)	114.29%	114.29%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2.00			2.00		$ 616,820.66	$ 1,233,641.32	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	5.00			5.00		$ 404,611.28	$ 2,023,056.40	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	2.00			2.00		$ 41,130.01	$ 82,260.02	$ -	100.00%	100.00%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	28.82	12.82	41.64	42.64		$ 989,338.20	$ 42,185,380.90	$ (13,672,654.00)	147.95%	147.95%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	1.80	(0.80)	1.00	1.00		$ 989,338.20	$ 989,338.20	$ 791,471.00	55.56%	55.56%	
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	44.84			40.81		$ 36,193.65	$ 1,476,990.67	$ 145,933.00	91.01%	91.01%	
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	35.50			35.10		$ 21,599.09	$ 758,128.09	$ 8,640.00	98.87%	98.87%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	2.16			2.16		$ 123,260.52	$ 266,242.73	$ -	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	111.32			100.19		$ 4,663.84	$ 467,270.00	$ 51,909.00	90.00%	90.00%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ESTRELLA DEL SUR - A	**$ 76,163,937.00**				
CPF	**1959**	**IED**			**GUILLERMO CANO ISAZA (IED)**			**SEMANA 43**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	125.48			125.48		$ 4,233.48	$ 531,216.54	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	68.00			32.20		$ 31,110.25	$ 1,001,749.92	$ 1,113,747.00	47.35%	47.35%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	129.54	18.57	148.11	148.11		$ 32,594.26	$ 4,827,535.26	$ (605,275.00)	114.34%	114.34%	
DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	150.00			150.00		$ 11,376.96	$ 1,706,544.05	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	40.00			40.00		$ 7,469.97	$ 298,798.67	$ -	100.00%	100.00%	
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	100.00			100.00		$ 18,687.73	$ 1,868,773.32	$ -	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	95.87	17.32	113.19	113.19		$ 22,300.62	$ 2,524,207.52	$ (386,247.00)	118.07%	118.07%	
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	364.26	(31.38)	332.88	364.26		$ 12,649.16	$ 4,607,583.60	$ -	100.00%	100.00%	
MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2	7.20	3.16	10.36	10.20		$ 65,869.81	$ 671,872.04	$ (197,609.00)	141.67%	141.67%	
DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND	22.00	37.00	59.00	37.00		$ 20,708.69	$ 766,221.35	$ (310,630.00)	168.18%	168.18%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	26.61			26.11		$ 33,174.37	$ 866,182.77	$ 16,587.00	98.12%	98.12%	
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	78.00			53.00		$ 27,281.50	$ 1,445,919.51	$ 682,038.00	67.95%	67.95%	
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M			15.00	15.00		$ 20,708.69	$ 310,630.28	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M			19.00	19.00		$ 11,967.87	$ 227,389.46	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN			16.00	16.00		$ 7,469.97	$ 119,519.47	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M			58.00	58.00		$ 4,391.32	$ 254,696.59	$ -	100.00%	100.00%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	35.00	118.18	153.18	153.18		$ 61,099.39	$ 9,359,204.54	$ (7,220,726.00)	437.66%	437.66%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	129.54	30.05	159.59	159.59		$ 126,224.49	$ 20,144,167.03	$ (3,793,046.00)	123.20%	123.20%	
WIN DE ALUMINIO	M	30.00	52.83	82.83	55.00		$ 15,372.99	$ 845,514.70	$ (384,325.00)	183.33%	183.33%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISIÓN POR MÓDULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM	M	7.20	16.32	23.52	23.52		$ 1,128,300.90	$ 26,537,637.11	$ (18,413,871.00)	326.67%	326.67%	
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	364.26			364.26		$ 36,193.65	$ 13,183,900.70	$ -	100.00%	100.00%	
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	119.96	(45.93)	74.03	68.55	9.45	$ 21,599.09	$ 1,480,617.69	$ 1,110,409.00	57.14%	57.14%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	135.38			135.38		$ 989,338.20	$ 133,939,109.55	$ (2,504.00)	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1-1/2 "	UN	37.00			37.00		$ 18,869.86	$ 698,184.88	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	37.00			37.00		$ 63,533.17	$ 2,350,727.15	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	22.00	7.00	29.00	29.00		$ 63,533.17	$ 1,842,461.82	$ (444,732.00)	131.82%	131.82%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	UN	37.00			37.00		$ 181,838.44	$ 6,728,022.41	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN	38.00			38.00		$ 97,295.74	$ 3,697,238.23	$ -	100.00%	100.00%	
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	22.00			22.00		$ 5,565.04	$ 122,430.83	$ -	100.00%	100.00%	
ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE EN CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	74.03	-30.18	43.85	43.85	22.79	$ 13,044.45	$ 571,999.04	$ 393,681.00	59.23%	59.23%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	20.88			20.88		$ 123,260.52	$ 2,573,679.69	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN			13.00	6.00		$ 192,677.11	$ 1,156,062.68	$ (1,156,063.00)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	3.00			3.00		$ 572,567.48	$ 1,717,702.45	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	50.00	56.00	106.00	90.00		$ 23,315.15	$ 2,098,363.16	$ (932,606.00)	180.00%	180.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	50.00	56.00	106.00	90.00		$ 20,790.98	$ 1,871,188.21	$ (831,639.00)	180.00%	180.00%	
PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	36.90			36.90		$ 21,844.63	$ 806,066.74	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	32.00			34.00		$ 180,330.15	$ 6,131,225.09	$ (360,660.00)	106.25%	106.25%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	24.00			24.00		$ 198,607.76	$ 4,766,586.16	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	20.00			8.00		$ 180,330.15	$ 1,442,641.20	$ 2,163,962.00	40.00%	40.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	5.40	0.60	6.00	5.00		$ 989,338.20	$ 4,946,691.01	$ 395,735.00	92.59%	92.59%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	12.00			10.00		$ 772,427.21	$ 7,724,272.05	$ 1,544,854.00	83.33%	83.33%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	12.00			5.00		$ 41,130.01	$ 205,650.06	$ 287,910.00	41.67%	41.67%	


SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL BLANCO DE 2 CUERPOS CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA, DESCARGA SENCILLA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, BRIDA, ACOPLE Y VALVULA PLASTICA DE 1/2 PARA REGULACION DE PRESION. CONSUMO DE AGUA DE 4.8 LTS POR DESCARGA, CAPACIDAD MINIMA DE EVACUACION DE SOLIDOS 400 GRAMOS	UN	45.00	-8.00	37.00	37.00		$ 1,117,185.66	$ 41,335,869.52	$ 8,937,485.00	82.22%	82.22%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	m2	364.26	(24.03)	340.23	340.23		$ 98,222.57	$ 33,418,266.56	$ 2,360,288.00	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	m2	205.61			139.29		$ 4,663.84	$ 649,626.09	$ 309,306.00	67.74%	67.74%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. GUILLERMO CANO ISAZA	**$ 354,373,946.66**				
CPF	**548**	**IED**			**TENERIFE - GRANADA SUR (IED)**			**SEMANA 43**				**Observ**
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	193.00	41.34	234.34	234.34		$ 4,233.48	$ 992,072.72	$ (175,012.00)	121.42%	121.42%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	39.00			26.00		$ 31,110.25	$ 808,866.40	$ 404,433.00	66.67%	66.67%	
TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	24.83	65.79	90.62	90.62		$ 38,696.24	$ 3,506,652.84	$ (2,545,825.00)	364.96%	364.96%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	44.28	25.88	70.16	55.16		$ 361,355.09	$ 19,932,346.54	$ (3,931,543.00)	124.57%	124.57%	
PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	44.28	25.88	70.16	70.16		$ 65,757.83	$ 4,613,569.51	$ (1,701,813.00)	158.45%	158.45%	
PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	412.00	(366.94)	45.06	45.06		$ 32,026.28	$ 1,443,104.40	$ 11,751,725.00	10.94%	10.94%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA DE 1-1/4" PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR CON SOPORTES PLÁSTICO. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS	M	43.00	-7.64	35.36	30.36		$ 190,851.78	$ 5,794,260.06	$ 2,412,367.00	70.60%	70.60%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA, EL TUBO PASAMANOS DE 2" CALIBRE 18 AL IGUAL QUE LOS TUBOS PEDESTALES CON PLATINA DE FIJACIÓN Y TRAVESAÑOS VERTICALES EN TUBERÍA DE 3/4" CON SEPARACIÓN CADA 9CM, PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS.	M	5.50	(0.80)	4.70	4.70		$ 1,120,163.13	$ 5,264,766.69	$ 896,131.00	85.45%	85.45%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	964.27	(570.86)	393.41	393.41		$ 4,663.84	$ 1,834,783.56	$ 2,662,416.00	40.80%	40.80%	
SUMINISTRO E INSTALACION MEMBRANA PVC PLASTIFICADO SIKAPLAN 15 PR O SIMILAR	M3	150.00	(15.20)	134.80	116.77		$ 383,249.63	$ 44,750,287.29	$ 12,737,157.00	77.84%	77.84%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. TENERIFE GRANADA SUR	**$ 88,940,710.00**				
CPF	**545**	**IED**			**CIUDAD DE VILLAVICENCIO (IED)**			**SEMANA 43**				**Observ**
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	540.76			540.76		$ 4,233.48	$ 2,289,294.37	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M)	M	35.00			35.00		$ 31,110.25	$ 1,088,858.61	$ -	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	107.30		-	307.00		$ 69,099.55	$ 21,213,562.74	$ (13,799,181.00)	286.11%	286.11%	
DEMOLICION DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	361.42			361.42		$ 69,099.55	$ 24,973,960.41	$ -	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN Y/O DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE COMPUESTO POR MALLA ESLABONADA, ANTEPECHO EN LADRILLO, VIGA DE CIMENTACIÓN Y COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO	M2	120.00			120.00		$ 108,358.36	$ 13,003,003.55	$ -	100.00%	100.00%	


EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	37.24			36.65		$ 91,988.38	$ 3,371,374.26	$ 54,273.00	98.42%	98.42%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	22.04			32.04		$ 176,060.25	$ 5,640,970.35	$ (1,760,602.00)	145.37%	145.37%	
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	9.00	(1.00)	8.00	8.00		$ 875,947.70	$ 7,007,581.56	$ 875,948.00	88.89%	88.89%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL REFORZADO EN MALLA PREONDULADA CALIBRE 8 HUECO 2", ÁNGULO 1" X 1/8" PISA MALLA EN ÁNGULO DE 3/4" X 1/4", PARALES DE 2 1/2" X 2 1/2" EN 3 MM CON SUJETADORES DE VARILLA DE 5/8" Y REFUERZOS DIAGONALES EN PLATINA DE 1-1/2"* 1/8" (INCLUYE TODOS LOS INSUMOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE)	M2	120.00			120.00		$ 503,048.36	$ 60,365,803.28	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CÁRCAMO EN CONCRETO (25 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR.	M	9.00	1.50	10.50	12.50		$ 320,598.77	$ 4,007,484.69	$ (1,122,096.00)	138.89%	138.89%	
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	m3	94.84			93.39		$ 34,724.48	$ 3,242,919.64	$ 50,351.00	98.47%	98.47%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ZANJA DE 0.3 X 0.3 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000, GRAVA 3/4" Y PASES PVC LONGITUD MAX 0.3 M CADA 3 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	54.00			57.40		$ 89,213.28	$ 5,120,842.55	$ (303,325.00)	106.30%	106.30%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	M2	25.00			25.00		$ 11,730.42	$ 293,260.61	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	45.00	20.35	65.35	85.35		$ 91,590.40	$ 7,817,240.55	$ (3,695,673.00)	189.67%	189.67%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	767.00	75.00	842.00	842.00		$ 7,103.01	$ 5,980,735.68	$ (532,726.00)	109.78%	109.78%	
DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE COMPUESTO POR MALLA ESLABONADA Y PARAL EN PERFIL DE ACERO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2			116.85	136.85		$ 62,810.05	$ 8,595,555.16	$ (1,256,201.00)	117.12%	117.12%	
PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2	373.66			378.66	209.90	$ 115,264.41	$ 43,646,019.90	$ (576,322.00)	101.34%	101.34%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 6" INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE RELLENO)	M	68.00			68.00		$ 141,729.70	$ 9,637,619.63	$ -	100.00%	100.00%	
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. TENERIFE GRANADA SUR							**$ 227,296,087.56**				

PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA		**95.45%**
ACUMULADO EJECUTADO A LA FECHA	**$**	**2,556,783,652.22**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**2,678,619,155.00**


AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS POR SEDE - Septiembre 06 2026						
SEDE EDUCATIVA	PROGRAMADO ACUMULADO		EJECUTADO ACUMULADO		TOTAL POR SEDE	% DE ADELANTO O ATRASO
ORLANDO FALS BORDA	$ 156,929,148.00	100.00%	$ 156,929,147.99	100.00%	$ 156,929,148.00	ENTREGADO
UNION EUROPEA	$ 169,766,274.00	100.00%	$ 169,766,274.00	100.00%	$ 169,766,274.00	ENTREGADO
SIERRA MORENA	$ 118,699,548.00	100.00%	$ 118,699,548.00	100.00%	$ 118,699,548.00	ENTREGADO
FABIO LOZANO	$ 245,187,661.00	100.00%	$ 245,187,661.00	100.00%	$ 245,187,661.00	ENTREGADO
ARBORIZADORA BAJA	$ 630,139,470.00	100.00%	$ 630,139,470.00	100.00%	$ 630,139,470.00	ENTREGADO
BUENAVISTA	$ 186,826,436.00	100.00%	$ 186,826,436.00	100.00%	$ 186,826,436.00	ENTREGADO
ESTRELLA DEL SUR - B	$ 78,637,768.00	100.00%	$ 78,637,768.00	100.00%	$ 78,637,768.00	ENTREGADO
SANTA LIBRADA	$ 223,822,666.00	100.00%	$ 223,822,666.00	100.00%	$ 223,822,666.00	0.00%
ESTRELLA DEL SUR - A	$ 76,163,937.00	100.00%	$ 76,163,937.00	100.00%	$ 76,163,937.00	ENTREGADO
TENERIFE GRANADA SUR SEDE A	$ 88,940,710.00	100.00%	$ 88,940,710.00	100.00%	$ 88,940,710.00	ENTREGADO
GUILLERMO CANO ISAZA SEDE A	$ 354,505,537.00	100.00%	$ 354,373,946.66	99.96%	$ 354,505,537.00	-0.04%
CIUDAD DE VILLAVICENCIO	$ 224,222,222.22	64.25%	$ 227,296,087.56	65.13%	$ 349,000,000.00	0.88%
TOTALES	**$ 2,553,841,377.22**	**95.34%**	**$ 2,556,783,652.22**	**95.45%**	**$ 2,678,619,155.00**	0.11%

OBSERVACIONES: Al final de la presente semana, como aparece consignado en la tabla anterior, encontramos que en la ***IED Guillermo Cano Isaza*** se encuentra practicamente nivelada la ejecución con la programación, mientras que la ***IED Ciudad de Villavicencio*** presenta un adelanto cercano al 1%. El contrato en general presenta un adelanto del 0.11%.

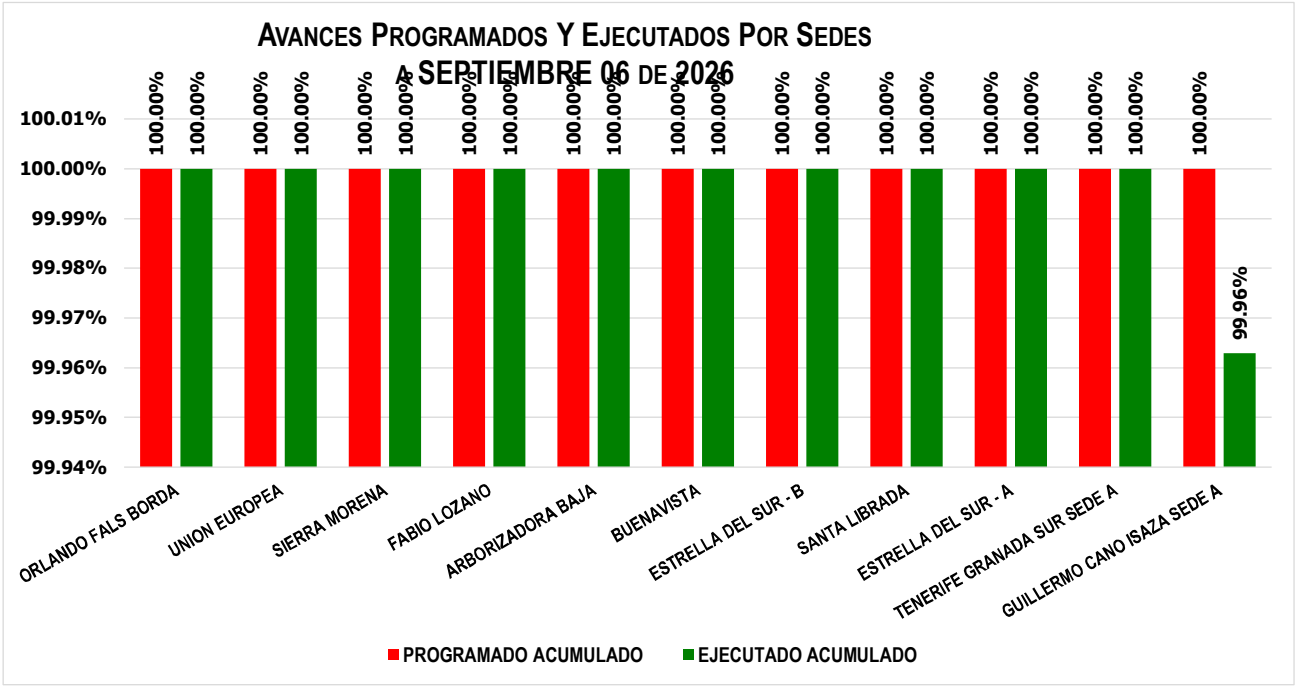

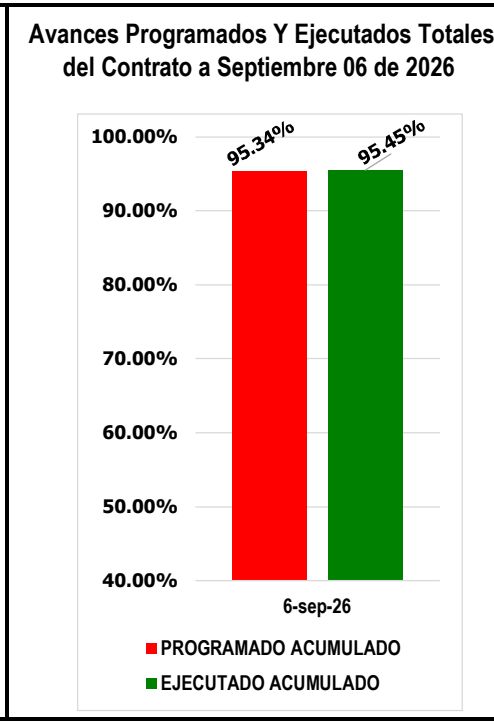

AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS TOTALES - Septiembre 06 2026

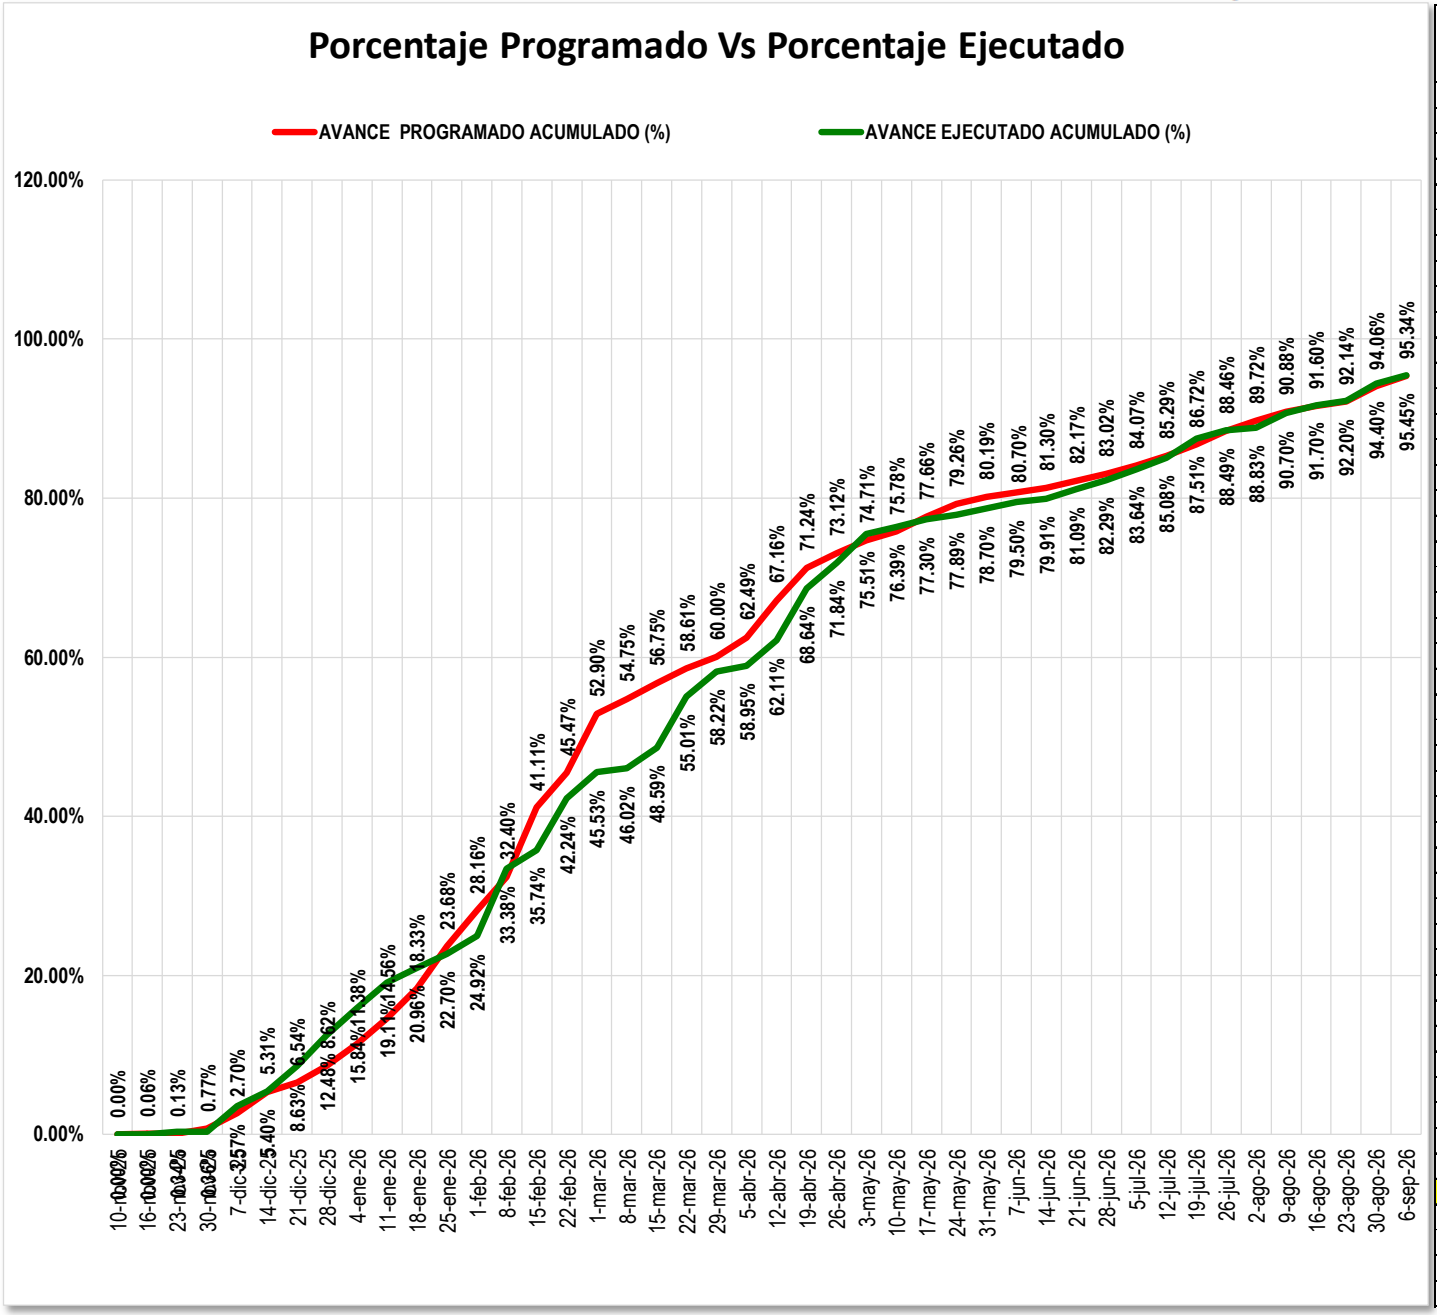

FECHA	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (%)	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO (%)
10-nov-25	0.00%	0.00%
16-nov-25	0.06%	0.00%
23-nov-25	0.13%	0.34%
30-nov-25	0.77%	0.36%
7-dic-25	2.70%	3.57%
14-dic-25	5.31%	5.40%
21-dic-25	6.54%	8.63%
28-dic-25	8.62%	12.48%
4-ene-26	11.38%	15.84%
11-ene-26	14.56%	19.11%
18-ene-26	18.33%	20.96%
25-ene-26	23.68%	22.70%
1-feb-26	28.16%	24.92%
8-feb-26	32.40%	33.38%
15-feb-26	41.11%	35.74%
22-feb-26	45.47%	42.24%
1-mar-26	52.90%	45.53%
8-mar-26	54.75%	46.02%
15-mar-26	56.75%	48.59%
22-mar-26	58.61%	55.01%
29-mar-26	60.00%	58.22%
5-abr-26	62.49%	58.95%
12-abr-26	67.16%	62.11%
19-abr-26	71.24%	68.64%
26-abr-26	73.12%	71.84%
3-may-26	74.71%	75.51%
10-may-26	75.78%	76.39%
17-may-26	77.66%	77.30%
24-may-26	79.26%	77.89%
31-may-26	80.19%	78.70%
7-jun-26	80.70%	79.50%
14-jun-26	81.30%	79.91%
21-jun-26	82.17%	81.09%
28-jun-26	83.02%	82.29%
5-jul-26	84.07%	83.64%
12-jul-26	85.29%	85.08%
19-jul-26	86.72%	87.51%
26-jul-26	88.46%	88.49%
2-ago-26	89.72%	88.83%
9-ago-26	90.88%	90.70%
16-ago-26	91.60%	91.70%
23-ago-26	92.14%	92.20%
30-ago-26	94.06%	94.40%
6-sep-26	**95.34%**	**95.45%**
13-sep-26	96.63%	0.00%
20-sep-26	97.80%	0.00%
27-sep-26	98.90%	0.00%
30-sep-26	100.00%	0.00%

0112 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

UNIDAD EJECUTORA 01

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número : 1606

CRISTIAN OSWALDO CARMONA SANCHEZ

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2026 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
O230117220120200008	Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C.	O232020200883310 Servicios de asesoría en ingeniería	1-100-F039 VA-CRÉDITO	131.696.241
			Total	**131.696.241**

Objeto:

M_3_ ADICIÓN CONTRATO INTERVENTORIA CO1.PCCNTR.CO1.PCCNTR.8169110/25 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 2

Se expide a solicitud de ANDRES IVANNO GALEANO TORO Cargo SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA (E), mediante oficio número 1664 de AGOSTO 28 DE 2026.

Bogotá D.C. SEPTIEMBRE 01 DE 2026

Documento firmado por: CRISTIAN OSWALDO CARMONA SANCHEZ / Cargo: RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Aprobó: CCARMONA 02.09.2026

Elaboró: RHERNANDEZ 01.09.2026

Impresión: 02.09.2026-19:50:27 CCARMONA 0000912859 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 79602923 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 24/09/2026 02:37 PM

Código Verificación: **U9WZ6CA4GX**

Válida hasta: **24/12/2026**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 11:59:23 horas del 18/09/2026, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **79602923,** Apellidos y Nombres **CASTILLO CURIEUX ERICK JOSE**

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **arinco** , con NIT **900208425-6** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 *"por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones"* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *"por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018"*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 12:04:22 PM horas del 18/09/2026, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **79602923**
Apellidos y Nombres: **CASTILLO CURIEUX ERICK JOSE**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Todos los derechos reservados.

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 18/09/2026 12:31:55 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **79602923** y Nombre: **ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **147990031** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Carrera 59 # 26 - 21
Centro Administrativo Nacional CAN , Bogotá D.C
Línea de atención: 018000-910112

GOV.CO

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 18/09/2026 12:35:26 p. m. para **- NIT, sin digito de verificación:** Nº. **9010942892**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **147990318** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Carrera 59 # 26 - 21
Centro Administrativo Nacional CAN , Bogotá D.C
Línea de atención: 018000-910112

GOV.CO

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 18 de septiembre de 2026, a las 11:50:03, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	79602923
Código de Verificación	796029232609181150003

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 18 de septiembre de 2026, a las 11:50:41, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	9010942892
Código de Verificación	901094289226091811504 1

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 303197441

PIB
12:10:39

Bogotá DC, 18 de septiembre del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79602923:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 303197625

PIB
12:11:52

Bogotá DC, 18 de septiembre del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S identificado(a) con NIT número 9010942892:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D.C.

CERTIFICA

Que una vez consultado el sistema de Registro de Sanciones e Inhabilidades Disciplinarias de la Personería de Bogotá D.C., el señor(a) **ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX,** quien se identifica con

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **79602923** de BOGOTA D.C.
(SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES)
NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

Esta Certificación es válida, siempre y cuando el número consignado en el respectivo documento de identificación, coincida con el aquí registrado. El certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Personería de Bogotá D.C., contiene las anotaciones de sanciones e inhabilidades disciplinarias que reporten las Entidades Distritales y las dependencias de la Personería de Bogotá D.C., con atribuciones Disciplinarias.

ADVERTENCIAS:

* El certificado de antecedentes disciplinarios ordinario deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes (Inciso 3°, artículo 238 - Ley 1952 de 2019).

* Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro, en el certificado de antecedentes disciplinarios especial (Inciso 4°, artículo 238 - Ley 1952 de 2019).

* Tres o más sanciones disciplinarias en los últimos cinco (5) años por faltas graves o leves dolosas o por ambas, constituye inhabilidad para desempeñar cargos públicos. Esta inhabilidad tendrá una duración de tres (3) años contados a partir de la ejecutoria de la última sanción. (numeral 2°, artículo 42 - Ley 1952 de 2019).

* Certificado expedido de conformidad con el numeral 5, artículo 102 del Decreto Ley 1421 de 1993, artículo 238 de la Ley 1952 de 2019, numeral 4.5, artículo 16 y numeral 6, artículo 21 del Acuerdo Distrital 755 de 2019.

* Para todos los efectos esta certificación debe ser complementada con la expedida por la Procuraduría General de la Nación.

* Certificado expedido sin costo alguno.

JAIRO AGUIRRE GONZÁLEZ
Personero Delegado (E) Para El Juzgamiento Disciplinario I

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de septiembre de 2026 Hora: 10:06:33
Recibo No. AB26571111
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2657111150E31

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

****

EL JUEVES 3 DE DICIEMBRE DE 2026, SE ELEGIRÁ JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE HASTA EL 3 DE NOVIEMBRE ACORDE CON EL OFICIO 303-256110 DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. PARA INFORMACIÓN DETALLADA PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO (601) 5941000 EXT. 2597, AL CORREO ELECCIONJUNTADIRECTIVA@CCB.ORG.CO, DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL (AVENIDA EL DORADO #68D-35, PISO 8), O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCB.ORG.CO/ELECCIONES2026

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S
Nit: 901094289 2 Administración : Direccion Seccional De Impuestos De Bogota
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 02836823
Fecha de matrícula: 5 de julio de 2017
Último año renovado: 2026
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2026
Grupo NIIF: Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Calle 98 70 91 Of 703
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: financieraconsorciosarinco@gmail.com
Teléfono comercial 1: 6013688490
Teléfono comercial 2: 3102228326
Teléfono comercial 3: No reportó.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de septiembre de 2026 Hora: 10:06:33
Recibo No. AB26571111
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2657111150E31

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Dirección para notificación judicial:	Calle 98 70 91 Of 703
Municipio:	Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación:	aic.gerencia.sas@gmail.com
Teléfono para notificación 1:	3688490
Teléfono para notificación 2:	3102228326
Teléfono para notificación 3:	No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 22 de junio de 2017 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 5 de julio de 2017, con el No. 02239524 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA S A S.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 03 del 18 de marzo de 2019 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 5 de abril de 2019, con el No. 02444870 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA S A S a ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La Sociedad tendrá como objeto social principal: El desarrollo y

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de septiembre de 2026 Hora: 10:06:33
Recibo No. AB26571111
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2657111150E31

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

ejecución de investigaciones, proyectos de ejecución de obras, proyectos de estudios, proyectos de estudios y diseños, proyectos de interventorías, proyectos de peritazgos, proyectos de estructuración financiera y legal, proyectos de publicidad y mercadeo que se relacionen con la rama de la ingeniería y arquitectura en general, edificaciones, edificaciones patrimoniales, espacio público, redes eléctricas, redes sanitarias, redes hidráulicas, proyectos hídricos, proyectos hidráulicos, proyectos electromecánicos, aires acondicionados, carreteras, vías urbanas, puentes, vías rurales, vías tercianas, todo tipo de concesiones. La promoción y gerencia de todo tipo de proyectos para la construcción de toda clase de edificios, urbanizaciones y obras civiles, así como desarrollos comerciales e institucionales. El desarrollo y exportación de toda actividad relacionada con la industria de la construcción, ya sea por cuenta propia, o por cuenta de terceros o en participación con ellos. La compraventa, la importación y exportación de toda clase de materiales e implementos destinados para los estudios, diseños, interventoría y construcción. La administración de toda clase de bienes muebles e inmuebles de terceros y de proyectos relacionados con el área de la ingeniería y la arquitectura en general. El ejercicio del mandato en su más amplia concepción. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita, tanto en Colombia como en el extranjero, en desarrollo de su objeto social, la sociedad podrá prestar servicios de transporte de personal terrestre, municipal e intermunicipal, otros tipos de transporte no regular individual de pasajeros, y otras actividades complementarias de transporte terrestre. Así mismo la sociedad podrá comercializar y/o distribuir cualquier clase de productos relacionados con el ramo de la construcción, licencias de obras debidamente autorizados y prestar servicios de instalación, mantenimiento y de asesoría profesional sobre el manejo de los mismos. En desarrollo de su objeto social, la sociedad podrá celebrar contratos con otras sociedades, adquirir, transferir, dar o tomar a cualquier título toda clase de bienes muebles e inmuebles. Dar o recibir dinero en préstamo. Dar garantía hipotecaria sus propios bienes y constituir prendas sobre los bienes de su propiedad, recibir en garantía de los contratos que celebre hipoteca, prendas, y causaciones sobre propiedad de terceros. Transigir y comprometer a cerca de sus derechos y acciones. Enajenar por motivos ajenos a especulación sus propios bienes. Girar, endosar, adquirir, aceptar, cobrar, protestar o pagar letras de cambio o de cualesquier otros instrumentos negociables. Constituir o fusionarse con toda clase de sociedades que se relacionen con el objeto social

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de septiembre de 2026 Hora: 10:06:33
Recibo No. AB26571111
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2657111150E31

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

de la compañía. Tomar o dar en arrendamiento toda clase de bienes muebles e inmuebles. Aceptar la gestión de derechos que otras personas naturales o jurídicas hagan a su favor. Contratar apoderados para la defensa de sus bienes y derechos, tomar dinero en mutuo con o sin garantía y en general, celebrar el contrato comercial de cambio en todas sus formas. Celebrar toda clase de contratos comerciales de cambio en todas sus formas licitas. Celebrar toda clase de contratos y operaciones con entidades bancarias o de crédito, la sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad tanto en Colombia como en el exterior. La sociedad no podré ser garante, fiadora o avalista de obligaciones de accionistas o terceros, salvo autorización expresa de la asamblea de accionistas.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : $200.000.000,00
No. de acciones : 200.000,00
Valor nominal : $1.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : $200.000.000,00
No. de acciones : 200.000,00
Valor nominal : $1.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $200.000.000,00
No. de acciones : 200.000,00
Valor nominal : $1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la Sociedad por Acciones Simplificada

estará a cargo del Gerente quien podrá ser una persona natural o jurídica, accionista o no, y podrá tener un suplente, que será el subgerente, si así lo determina la asamblea general de accionistas o la Junta Directiva. El suplente o subgerente tendrá las mismas facultades legales del gerente. Si el Gerente es una persona jurídica, podrá actuar a través de cualquiera de los Representantes Legales de la misma. El Gerente y el suplente del Gerente, serán designados para un término de un año por la Asamblea de Accionistas y se mantendrán en el cargo, a no ser que sean removidos o reemplazados.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

EL Gerente o Representante Legal Principal, podrá celebrar o ejecutar ampliamente todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social, o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad, sin limitación alguna, ni por la cuantía ni por el acto, contrato u operación comercial que realice relacionada con el Objeto Social. En ejercicio de su cargo, podrá ejecutar o celebrar cualquier acto, contrato u operación comercial relacionada con el Objeto Social. Podrá en consecuencia representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente, dar y tomar dinero en mutuo con o sin interés, transigir, comprometer a la sociedad y desistir; hacer empréstitos bancarios, girar, negociar, protestar, obtener y pagar títulos valores correspondientes a la sociedad. Además son atribuciones especiales del gerente las siguientes: 1) Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Junta Directiva la Asamblea General de Accionistas; 2) Convocar a la Asamblea General de Accionistas de acuerdo con lo previsto en los estatutos; 3) Dirigir y vigilar la actividad de la empresa y dar las instrucciones necesarias para que los objetivos de la misma se cumplan; 4) Recomendar a la Asamblea la adopción de nuevas políticas administrativas, financieras, operativas, comerciales etc.; 5) Elaborar mínimo una vez al año con destino a la Asamblea General de Accionistas un informe sobre su gestión conjuntamente con los estados financieros básicos aprobados por la Junta Directiva, en caso de existir; 6) Constituir apoderados judiciales y extrajudiciales que juzgue necesarios para la adecuada representación de la sociedad, delegándoles las facultades que estime convenientes, de aquellas que él mismo goza; 7) Delegar determinadas funciones propias de su cargo dentro de los límites señalados en los estatutos; 8) Velar porque todos los empleados de la

sociedad, cumplan estrictamente sus deberos y poner en conocimiento de la Asamblea General de Accionistas, las faltas graves que ocurran sobre este particular; 9) Constituir consorcios y uniones temporales sin limitación alguna, ni por la cuantía, ni por la naturaleza de sus actividades generadas y/o derivadas de cada consorcio; 10) Autorizar la contratación y remoción del personal de la empresa que contrate el Representen Legal y autorizar los cargos que el Gerente estime convenientes para el buen funcionamiento de la compañía; 11) Las demás que la ley o los estatutos le asigne. El subgerente o Representante Legal Suplente, tendrá las mismas facultades que el Gerente o Representante Legal principal. El Representante Legal Principal y su Suplente se entenderán investidos de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el Representante Legal.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Documento Privado del 22 de junio de 2017, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 5 de julio de 2017 con el No. 02239524 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente	Erick Jose Castillo Curieux	C.C. No. 79602923

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Subgerente	Miguel Angel Castillo Galvan	C.C. No. 17100644

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 02/2023 del 22 de mayo de 2023, de Asamblea de

Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 28 de junio de 2023 con el No. 02991429 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal	Maria Gladys Rincon Hurtado	C.C. No. 46674785 T.P. No. 126815-t

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
Acta No. 03 del 18 de marzo de 2019 de la Asamblea de Accionistas	02444870 del 5 de abril de 2019 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 7112
Actividad secundaria Código CIIU: 7710

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de septiembre de 2026 Hora: 10:06:33
Recibo No. AB26571111
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2657111150E31

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Otras actividades Código CIIU: 4290

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Pequeña

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 3.575.551.103
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 7112

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 5 de julio de 2017. Fecha de envío de información a Planeación : 31 de marzo de 2026. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de septiembre de 2026 Hora: 10:06:33
Recibo No. AB26571111
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2657111150E31

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO
NIT: 901.977.271-0
Dirección: Calle 98 No. 70-91
Correo: serinco.educativo@gmail.com

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTÍCULO 204 DE LA LEY 100 DE 1993
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

En mi condición de representante legal del **CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO** identificado con NIT. **901.977.271-0**, me permito certificar que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia y revisados los estados financieros del consorcio, con el propósito de verificar el pago efectuado por concepto de los aportes correspondiente a los sistemas de pensiones, Riesgos Profesionales, Cajas Compensación Familiar, el consorcio se encuentra paz y salvo en los últimos 6 meses, con el personal vinculado bajo nómina y ha realizado los respectivos pagos.

Se certifica que se encuentra al día en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, así como el pago de obligaciones de todo el personal vinculado directamente, incluido el personal independiente que prestó sus servicios para la ejecución del proyecto.
En mi condición de representante legal del **CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO** identificado con NIT. **901.977.271-0**, me permito certificar que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia y revisados los estados financieros del consorcio, con el propósito de verificar el pago efectuado por concepto de los aportes correspondiente a los sistemas de pensiones, Riesgos Profesionales, Cajas Compensacion Familiar, el consorcio se encuentra paz y salvo en los últimos 6 meses, con el personal vinculado bajo nómina y ha realizado los respectivos pagos.

Respecto a los pagos correspondientes al sistema de seguridad social en salud, al instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), pensiones, riesgos laborales y caja de compensación familiar de todo el personal vinculado directamente a la ejecución del contrato, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecución del contrato.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

Se expide en Bogotá D.C. a los 17 días del mes de septiembre de 2026.

JOSE DARIO CURIEUX MIRANDA.
CC. 79.768.840 DE BOGOTÁ
TP. 151.202-T
CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO

ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
CC. 79.602.923 DE BOGOTÁ
REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR
CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.768.840**

CURIEUX MIRANDA
APELLIDOS

JOSE DARIO
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-JUN-1977**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.82 ESTATURA | **A+** G.S. RH | **M** SEXO

07-JUL-1995 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1500119-42117876-M-0079768840-20031002 03871 03274B 01 150171711

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

151202-T

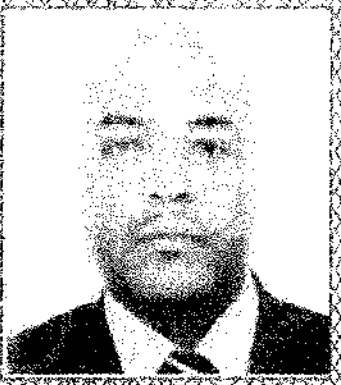

JOSE DARIO
CURIEUX MIRANDA
C.C. 79768840
RESOLUCION INSCRIPCION 204 **FECHA 01/07/2010**
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

PRESIDENTE LEONARDO SANCHEZ

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 161615

FIRMA DEL TITULAR **76162**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0A386E080D0EF8ABB

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOSE DARIO CURIEUX MIRANDA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79768840 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 151202-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

ARQUITECTURA e INGENIERIA de CONSULTA S.A.S

NIT 901.094.289-2

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSION, ARL Y APORTES PARAFISCALES

ARTÍCULO 204 DE LA LEY 100 DE 1993 -
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 - ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007.

En mi condición de Revisora Fiscal de la sociedad ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S, identificada con NIT. 901.094.289-2, me permito certificar que de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia y revisados los estados financieros de la compañía, con el propósito de verificar el pago efectuado por concepto de los aportes correspondiente a los sistemas de pensiones, Riesgos Profesionales, Cajas de Compensación Familiar, la empresa se encuentra a paz y salvo y ha realizado los respectivos pagos.

Se certifica que se encuentra al día en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, así como el pago de obligaciones de todo el personal vinculado directamente, incluido el personal independiente que prestó sus servicios para la ejecución del proyecto “Respecto a los pagos correspondientes al Régimen Contributivo de Salud de que trata el artículo 204 de la Ley 100 de 1993, acorde con el literal 3 del artículo 8 del Decreto 0862 del 26 de abril del 2013, y para los pagos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la empresa se encuentra exonerada de acuerdo con lo señalado taxativamente en el artículo 8. “Exoneración de aportes parafiscales” del Decreto 0862 del 26 de abril del 2013.

Así mismo, respecto a los pagos laborales, por prestación de servicios y no laborales del personal vinculado, la empresa se encuentra a paz y salvo por todo concepto prestacional y salarial.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

Se expide en Bogotá D.C. a los 17 días del mes de septiembre de 2026.

MARIA GLADYS RINCON HURTADO.
CC. 46.674.785 DE DUITAMA.
TP. 126815-T
Revisora Fiscal
ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO SAS

ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
CC. 79.602.923 DE BOGOTA
Representante Legal

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **46.674.785**

RINCON HURTADO

APELLIDOS

MARIA GLADYS

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **09-NOV-1978**

DUITAMA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57	**B+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

13-MAR-1997 DUITAMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0707900-00129117-F-0046674785-20081118 **00062**60471A 1 7300010240

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



126815-T

MARIA GLADYS
RINCON HURTADO
C.C. 46674785
RESOLUCION INSCRIPCION 142 FECHA 07/06/2007
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COL.

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 136938

FIRMA DEL TITULAR 48430

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

LITOFORMAS S.A. 1066 09/2005

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9B464C570D0C8960

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA GLADYS RINCON HURTADO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 46674785 de DUITAMA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 126815-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 80070003 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 24/09/2026 02:32 PM

Código Verificación: **KYH5ZJFRU3**

Válida hasta: **24/12/2026**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 12:02:22 horas del 18/09/2026, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **80070003,** Apellidos y Nombres **GONZALEZ CAMARGO LUIS ALEJANDRO**

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **arinco**, con NIT **901094289-2** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 *"por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones"* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *"por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018"*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 12:04:56 PM horas del 18/09/2026, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **80070003**
Apellidos y Nombres: **GONZALEZ CAMARGO LUIS ALEJANDRO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Todos los derechos reservados.

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 18/09/2026 12:33:00 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **80070003** y Nombre: **LUIS ALEJANDRO GONZALEZ CAMARGO.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **147990122** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Carrera 59 # 26 - 21
Centro Administrativo Nacional CAN , Bogotá D.C
Línea de atención: 018000-910112

GOV.CO

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 18/09/2026 12:36:51 p. m. para **- NIT, sin digito de verificación:** Nº. **9002084256**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **147990411** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Carrera 59 # 26 - 21
Centro Administrativo Nacional CAN , Bogotá D.C
Línea de atención: 018000-910112

GOV.CO

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 18 de septiembre de 2026, a las 11:50:16, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	80070003
Código de Verificación	800700032609181150l6

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 18 de septiembre de 2026, a las 11:50:58, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	9002084256
Código de Verificación	900208425626091811505 8

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 303197524

PIB
12:11:08

Bogotá DC, 18 de septiembre del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) LUIS ALEJANDRO GONZALEZ CAMARGO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 80070003:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 303197709

PIB
12:12:25

Bogotá DC, 18 de septiembre del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona SEIING S.A.S. BIC identificado(a) con NIT número 9002084256:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D.C.

CERTIFICA

Que una vez consultado el sistema de Registro de Sanciones e Inhabilidades Disciplinarias de la Personería de Bogotá D.C., el señor(a) **LUIS ALEJANDRO GONZALEZ CAMARGO,** quien se identifica con

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **80070003** de BOGOTA D.C.
(OCHENTA MILLONES SETENTA MIL TRES)
NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

Esta Certificación es válida, siempre y cuando el número consignado en el respectivo documento de identificación, coincida con el aquí registrado. El certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Personería de Bogotá D.C., contiene las anotaciones de sanciones e inhabilidades disciplinarias que reporten las Entidades Distritales y las dependencias de la Personería de Bogotá D.C., con atribuciones Disciplinarias.

ADVERTENCIAS:

* El certificado de antecedentes disciplinarios ordinario deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes (Inciso 3°, artículo 238 - Ley 1952 de 2019).

* Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro, en el certificado de antecedentes disciplinarios especial (Inciso 4°, artículo 238 - Ley 1952 de 2019).

* Tres o más sanciones disciplinarias en los últimos cinco (5) años por faltas graves o leves dolosas o por ambas, constituye inhabilidad para desempeñar cargos públicos. Esta inhabilidad tendrá una duración de tres (3) años contados a partir de la ejecutoria de la última sanción. (numeral 2°, artículo 42 - Ley 1952 de 2019).

* Certificado expedido de conformidad con el numeral 5, artículo 102 del Decreto Ley 1421 de 1993, artículo 238 de la Ley 1952 de 2019, numeral 4.5, artículo 16 y numeral 6, artículo 21 del Acuerdo Distrital 755 de 2019.

* Para todos los efectos esta certificación debe ser complementada con la expedida por la Procuraduría General de la Nación.

* Certificado expedido sin costo alguno.

JAIRO AGUIRRE GONZÁLEZ
Personero Delegado (E) Para El Juzgamiento Disciplinario I

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 15 de septiembre de 2026 Hora: 09:53:56
Recibo No. AB26619081
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2661908110104

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

****

EL JUEVES 3 DE DICIEMBRE DE 2026, SE ELEGIRÁ JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE HASTA EL 3 DE NOVIEMBRE ACORDE CON EL OFICIO 303-256110 DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. PARA INFORMACIÓN DETALLADA PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO (601) 5941000 EXT. 2597, AL CORREO ELECCIONJUNTADIRECTIVA@CCB.ORG.CO, DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL (AVENIDA EL DORADO #68D-35, PISO 8), O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCB.ORG.CO/ELECCIONES2026

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: SEIING S.A.S
Nit: 900208425 6, Regimen Comun
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No.	01785741
Fecha de matrícula:	19 de marzo de 2008
Último año renovado:	2026
Fecha de renovación:	27 de marzo de 2026
Grupo NIIF:	Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal:	Tv 52B #2 30 Ap 202
Municipio:	Bogotá D.C.
Correo electrónico:	seiing@yahoo.com
Teléfono comercial 1:	3142190224
Teléfono comercial 2:	3115646791
Teléfono comercial 3:	No reportó.

Dirección para notificación judicial:	Tv 52B #2 30 Ap 202
Municipio:	Bogotá D.C.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 15 de septiembre de 2026 Hora: 09:53:56
Recibo No. AB26619081
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2661908110104

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Correo electrónico de notificación: seiingcontabilidad@gmail.com
Teléfono para notificación 1: 3142190224
Teléfono para notificación 2: 3115646791
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado No. 0000000 del 17 de marzo de 2008 de Junta de Socios, inscrito en esta Cámara de Comercio el 19 de marzo de 2008, con el No. 01199909 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA SEIING LTDA..

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 03 del 15 de mayo de 2013 de Junta de Socios, inscrito en esta Cámara de Comercio el 4 de junio de 2013, con el No. 01736370 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA SEIING LTDA. a SEIING SAS.

Por Acta No. 03 de la Junta de Socios, del 15 de mayo de 2013, inscrito el 4 de junio de 2013, bajo el número 01736370 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de Sociedad Limitada a Sociedad por Acciones Simplificada bajo el nombre de: SEIING SAS.

Por Acta No. 001 del 19 de marzo de 2021 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 8 de abril de 2021, con el No. 02682825 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de SEIING SAS a SEIING S.A.S. BIC.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 15 de septiembre de 2026 Hora: 09:53:56
Recibo No. AB26619081
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2661908110104

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Por Acta No. 001 del 10 de abril de 2025 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 22 de abril de 2025, con el No. 03233327 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de SEIING S.A.S. BIC a SEIING S.A.S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá como objeto A) El diseño, construcción, interventoría, consultoría, suministro, licencia, asesoría, peritaje y estudios necesarios para cualquier tipo de proyecto de ingeniería en general, así como también la construcción y montaje de equipos dentro de las mismas áreas. B) La comercialización y suministro de materiales relacionados con la construcción, ferretería, mantenimiento, reforzamiento, remodelación y adecuación de obras civiles e instalaciones. Así como: 1, Suministro, construcción e instalación de enchapes, minerales, estructuras en concretos, impermeabilizantes, herramienta menor y mayor, maquinaria, pisos laminados y sintéticos, aparatos sanitarios, accesorios, mampostería, pañetes, muebles, cielo raso, cubiertas, elementos y accesorios eléctricos, gas, sanitarios e hidráulicos, sistema de aire acondicionado, carpintería metálica y madera, explotación y suministro de materiales de cantera. hierros y aceros, dotaciones deportivas, pinturas y vías. Y todo tipo de elementos en general. C) La importación, exportación y comercialización de productos, equipos y repuestos en general desde maquinaria pesada hasta artículos de aseo. D) Realización de todo tipo de actividades eléctricas, como suministro e instalación de cableado estructurado, accesorios, red lógica de voz y datos, mantenimiento de redes eléctricas, asesorías técnicas, #luminación, acometidas, alambrado, cuartos de control, circuitos, interruptores, postes, saudas especiales, transformadores, etc. E) Diseño y construcción de vías, puentes, obras de arte, muros de contención, gaviones, jarillones, aeropuertos, túneles, viaductos, edificaciones, piscinas, pozos y todo tipo de obras de ingeniería civil general y especial F) Diseño, construcción y mantenimiento de proyectos militares como alojamientos de tropa, alojamiento de

oficiales, suboficiales, casinos, ranchos de tropa, polvorines, caniles, plaza de armas, comandos, helipuertos, garitas, guardias, muros de conexión, depósitos de armamento e intendencia, casas fiscales, guarniciones, bunker, garitas, sección de transportes, piscinas, oficinas y en general todo tipo de instalaciones militares. G) Ventas, diseños e instalación de centros de cómputo, intranet, internet, telefonía, equipos de cómputo, equipos de comunicación, equipos de seguridad como alarmas, control de acceso, cctv, tv, red contra incendios, etc. Así como venta y mantenimiento de impresoras, escáner, computadores, periféricas, fotocopiadoras, etc. H) Comercialización de electrodomésticos en general incluidos en el objeto social o que de alguna manera estén relacionadas con la actividad comercial de la sociedad. I) Producción, fabricación, adquisición, confección, distribución y venta de toda clase de prendas de vestir, calzado y accesorios de uso para caballeros, damas, niños y animales, tanto para entidades privadas, publicas bien sea civil o militar, pudiendo desarrollar todas las actividades afines o complementarias a este objeto. 1. Venta y suministro de artículos de aseo como cremas, cepillos, espejos, toallas, jabones, betún, talcos, desodorantes, shampoo, etc., 2. Venta y suministro de víveres perecederos y no perecederos en general, al igual que el expendio de alimentos preparados para desayunos, almuerzos, cenas o casa de banquetes. 3. Venta y suministro de elementos de miscelánea para oficina como libros, artículos de papelería y escritorio, resmas, tintas de impresora, esferos, lápices, borradores, marcadores, cosedora, perforadoras, carpetas, AZ y demás artículos que estén relacionados con este objeto. 4. Venta y suministro de colchones y somieres y demás elementos relacionados como frazadas, mantas, cobijas, sabanas, banderas, manteles, servilletas, cortinas, toallas y similares. 5. Diseño, fabricación, venta y suministro de insignias militares, medallas, trofeos, escudos, emblemas, chapas, esculturas, bustos, vallas, logos y demás elementos de condecoración. 6. La venta el arrendamiento y/o administración de equipos y servicios en general. J) Construcción, mantenimiento y venta de mobiliario y bienes muebles e inmuebles. K) Suministro, instalación y/o mantenimiento de sistemas o autopartes de oficina abierta. L) Asumir la representación de Personas Naturales o Jurídicas nacionales o Extranjeras relacionadas o no con el objeto social de esta compañía. 1. Celebrar toda clase de contratos, bien sea civiles, oficiales, industriales, comerciales, o financieros que sean necesarios para el logro de los fines y que de una u otra forma se relacionen directa o indirectamente con el objeto social. 2.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 15 de septiembre de 2026 Hora: 09:53:56
Recibo No. AB26619081
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2661908110104

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Adquirir, enajenar, gravar, administrar, tomar y dar en arrendamientos los bienes muebles e inmuebles indispensables para con su objeto. 3. Celebrar y ejecutar todos los actos y contratos preparatorios, complementarios o accesorios de todas las anteriores que se relacionen con la existencia y funcionamiento de la sociedad y los demás que sean conducentes para el logro de sus funciones. 4. Celebrar con establecimientos de crédito y con compañías aseguradoras, todas las operaciones de crédito y seguro que se relacionen con los negocios y con los bienes sociales, girar, aceptar, endosar, anular, asegurar, cobrar y negociar en general, títulos valores y cualesquiera otra clase de títulos de créditos; formar parte o asociarse con otras sociedades que se propongan actividades semejantes, accesorias o complementarias de la empresa social o que sean de conveniencia general para los socios, o absorber tales empresas, transformarse en otro tipo legal de sociedad o fusionarse con otras sociedades, transigir, desistir y apelar decisiones de árbitros en cuestiones que tengan interés ante terceros, asociados, administradores y/o trabajadores. Así como celebrar y/o ejecutar todos los actos y contratos preparatorios, complementarios o accesorios de todas las anteriores que se relacionen con la existencia y el funcionamiento de la sociedad y los demás que sean conducentes para el logro de sus funciones. M. La sociedad podrá servir de garante al representante legal, socios y empleados de la sociedad para cualquier tipo de garantía que sea necesaria para salir del territorio colombiano. N. En desarrollo de su objeto, la sociedad podrá: adquirir bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, tangibles e intangibles; celebrar contratos de cuentas corrientes, depósitos bancarios, celebrar contratos de mutuo con o sin interés, dar en garantía sus bienes y celebrar toda clase de operaciones de crédito, celebrar contratos de prestaciones de servicios, adquirir, endosar, avalar, transferir, descontar, etc., cheques, letras de cambio, pagarés y en general toda clase de títulos valores; participar como socia en otras reuniones. Y en general celebrar o ejecutar toda clase de actos y contratos. Así mismo, podrá realizar cualesquier otra actividad económica lícita, tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad. O. El desarrollo y ejecución de investigaciones, proyectos, diseños, estudios, interventorías y peritazgos que se relacionen con

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 15 de septiembre de 2026 Hora: 09:53:56
Recibo No. AB26619081
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2661908110104

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

la rama de la ingeniería y arquitectura en general. la promoción y gerencia de todo tipo de proyectos para la construcción de toda clase de edificios, urbanizaciones y obras civiles, así como desarrollos comerciales e institucionales. P La prestación de servicios en rama de ingeniería civil y de arquitectura, construcción y comercialización de construcciones de edificios, urbanizaciones y demás obras de ingeniería civil, así como la interventoría, consultoría y asesorías relacionadas con el ramo de la ingeniería civil en general Q. El desarrollo y exportación de toda actividad relacionada con la industria de la construcción, ya sea por cuenta propia, ya por cuenta de terceros o en participación con ellos R. la compra y venta de bienes; muebles e inmuebles. la compra y venta, la importación y exportación de toda clase de materiales e implementos destinados para los estudios, diseños, interventoría y construcción. R. El ejercicio del mandato en su más amplia concepción. S. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. T. En desarrollo del objeto social, la sociedad podrá prestar servicios de transporte de personal terrestre municipal e intermunicipal, otros tipos de transporte no regular individual de pasajeros, y otras actividades complementarias de transporte terrestre. U. Actividades de servicios de laboratorio de suelos y concretos. V En desarrollo de sus actividades y para su cumplimiento, la sociedad podrá: adquirir, transferir, dar o tomar a cualquier titulo toda clase de bienes muebles o inmuebles. dar o recibir dinero en préstamo. Dar en garantía hipotecaria sus propios bienes y constituir prendas sobre los bienes de su propiedad, recibir en garantía de los contratos que celebre hipoteca, prendas, y cauciones sobre propiedad de terceros. transigir y comprometer acerca de sus derechos y acciones. W. Enajenar por motivos ajenos a especulación sus propios bienes. Girar, endosar, adquirir, aceptar, cobrar, protestar o pagar letras de cambio de cualesquier otros instrumentos negociables. constituir o fusionarse con toda clase de sociedades que se relacionen con el objeto social de la compañía.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : $300.000.000,00
No. de acciones : 300.000,00
Valor nominal : $1.000,00

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 15 de septiembre de 2026 Hora: 09:53:56
Recibo No. AB26619081
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2661908110104

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : $400.000.000,00
No. de acciones : 400.000,00
Valor nominal : $1.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $400.000.000,00
No. de acciones : 400.000,00
Valor nominal : $1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien tendrá un suplente, designados para un término de un año por la Asamblea General de Accionistas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La Sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales. El representante legal suplente

tendrá las mismas facultades asignadas al representante legal principal.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 03 del 30 de diciembre de 2016, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 7 de junio de 2017 con el No. 02232038 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	Edwin Fernando Sierra Hernandez	C.C. No. 80257171

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal Suplente	Luis Alejandro Gonzalez Camargo	C.C. No. 80070003

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 004 del 31 de mayo de 2023, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 1 de junio de 2023 con el No. 02982764 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal	Guzman Rojas Amaya	C.C. No. 79156095 T.P. No. 62392-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
Acta No. 03 del 15 de mayo de 2013	01736370 del 4 de junio de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 15 de septiembre de 2026 Hora: 09:53:56
Recibo No. AB26619081
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2661908110104

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

de la Junta de Socios	2013 del Libro IX
Acta No. 03 del 30 de diciembre de 2016 de la Asamblea de Accionistas	02232037 del 7 de junio de 2017 del Libro IX
Acta No. 003 del 12 de julio de 2019 de la Asamblea de Accionistas	02491659 del 31 de julio de 2019 del Libro IX
Acta No. 004 del 20 de septiembre de 2019 de la Asamblea de Accionistas	02508684 del 23 de septiembre de 2019 del Libro IX
Acta No. 001 del 19 de marzo de 2021 de la Asamblea de Accionistas	02682825 del 8 de abril de 2021 del Libro IX
Acta No. 001 del 10 de abril de 2025 de la Asamblea de Accionistas	03233327 del 22 de abril de 2025 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 7112
Actividad secundaria Código CIIU: 4290
Otras actividades Código CIIU: 7710

TAMAÑO EMPRESARIAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 15 de septiembre de 2026 Hora: 09:53:56
Recibo No. AB26619081
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2661908110104

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Pequeña

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 4.043.472.428
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 7112

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 18 de marzo de 2008. Fecha de envío de información a Planeación : 12 de abril de 2026. SE HA NOTIFICADO A PLANEACION DISTRITAL LA CREACION DE LA PERSONA O SOCIEDAD. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 15 de septiembre de 2026 Hora: 09:53:56
Recibo No. AB26619081
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2661908110104

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



CERTIFICADO DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES


ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)


GUZMAN ROJAS AMAYA, identificado con cedula de ciudadanía No 79.156.095 de Bogotá, y con tarjeta profesional No. 62392-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de SEIING SAS BIC identificada con NIT 900.208.425-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Bogotá, a los diecisiete (17) días del mes de septiembre de 2026**.**




GUZMAN ROJAS AMAYA
C.C. No.: 79.156.095 de Bogotá
Revisor Fiscal SEIING SAS BIC
Tarjeta profesional 62392-T

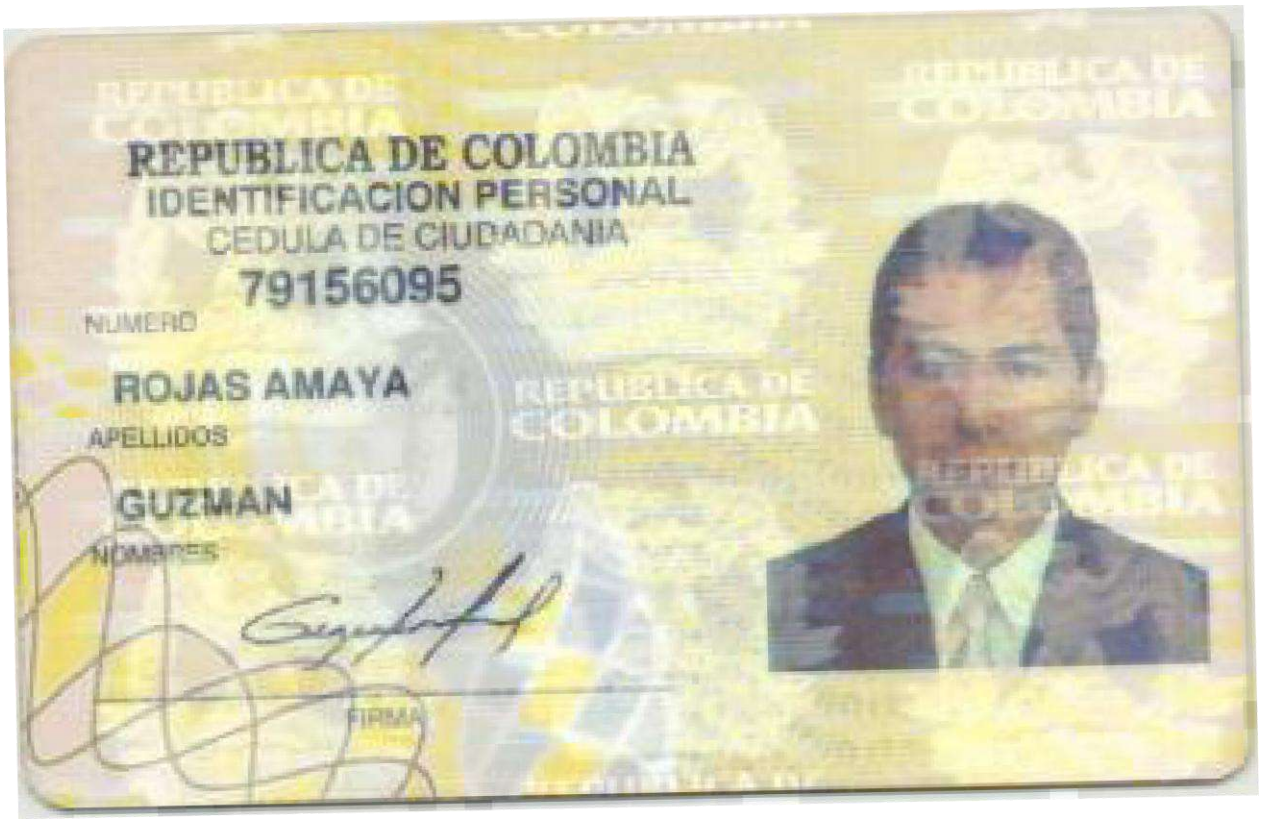

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
79156095
NUMERO
ROJAS AMAYA
APELLIDOS
GUZMAN
NOMBRES
FIRMA



INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 10-AGO-1962
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
13-ABR-1981 USAQUEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR
A-1500101-42101791-M-0079156085-20020411 04787 02100A 01 114045665

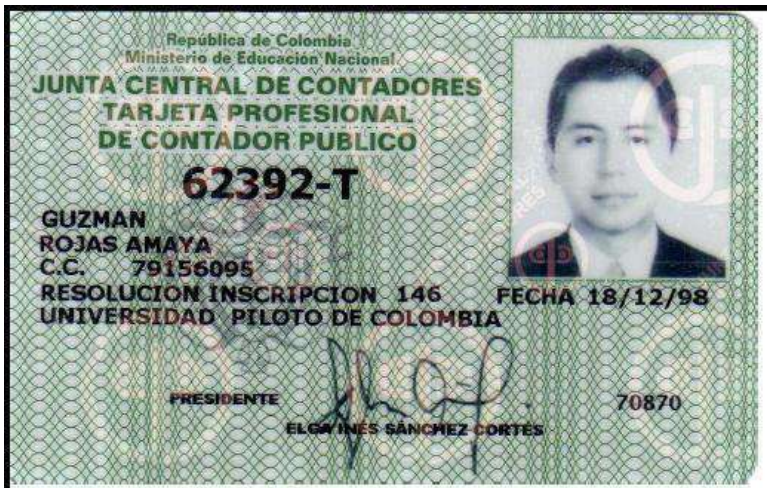

Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

62392-T

GUZMAN
ROJAS AMAYA
C.C. 79156095
RESOLUCION INSCRIPCION 146 FECHA 18/12/98
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

PRESIDENTE
ELGA INÉS SÁNCHEZ CORTES

70870



IDEOS

FIRMA DEL TITULAR

000319

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

DUPLICADO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9E33260D7BD6A77EE

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **GUZMAN ROJAS AMAYA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79156095 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 62392-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

RADICACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA	
Radicado	I-2025-166630
Fecha	04/12/2025
No. Referencia	

MEMORANDO

PARA: **JORGE ALBERTO MORENO ALDANA**
Profesional Especializado - Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE

DE: **ABEL REINERIO MATIZ SALAZAR**
Subsecretario de Acceso y Permanecía

FECHA: Bogotá D.C. noviembre de 2025

ASUNTO: Designación Supervisión Contratos No. CO1.PCCNTR.8168824, CO1.PCCNTR.8169110 y CO1.PCCNTR.8169112 de 2025.

Reciba un cordial saludo:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Manual de Supervisión e Interventoría de la Secretaría de Educación del Distrito, adoptado mediante Resolución 1035 del 12 de junio de 2018, y atendiendo a una necesidad del servicio, me permito comunicar la designación en calidad de SUPERVISOR de los contratos de interventoría que se relacionan a continuación:

NUMERO DE CTO	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	LOTES
CO1.PCCNTR.8168824	EMPRESAS GRUPO ROMERO SAS	1
CO1.PCCNTR.8169110	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	2
CO1.PCCNTR.8169112	ELSA TORRES ARENALES	4

La designación tendrá vigencia a partir de la presente comunicación y hasta la terminación de los contratos relacionados en el asunto.

Es preciso señalar que el ejercicio de la supervisión deberá realizarse con estricto cumplimiento de lo previsto en los artículos 83 al 85 de la Ley 1474 de 2011, así como en el Manual de Supervisión e Interventoría de la SED. Para efectos de consulta, los documentos contractuales se encuentran disponibles en la Plataforma Transaccional SECOP II.

Una vez notificada la presente designación, deberá realizar su publicación en la Plataforma Transaccional SECOP II dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. Asimismo, deberá garantizar que, durante toda su gestión y dentro de los términos establecidos contractual y legalmente, se

realice el cargue completo y oportuno de los documentos relacionados con la ejecución contractual.

Finalmente, se precisa que la presente designación no requiere modificación alguna al contrato, conforme a lo establecido en el numeral 10. Supervisión, nota 4, del Estudio Previo que soportó la celebración de los contratos, el cual indica: *"NOTA 4: El ordenador del gasto podrá modificar la designación de la supervisión cuando así lo requiera, sin que ello implique modificación contractual alguna. Para el efecto bastará una comunicación escrita del Ordenador del Gasto al nuevo supervisor designado, con copia a la Dirección de Contratación y a la Dirección Financiera".*

Cordialmente,

ABEL REINERIO MATIZ SALAZAR
Subsecretario de Acceso y Permanencia

Aprobó: Andrés Ivannó Galeano Toro – Director de DCCEE

Revisó: Juan David Vélez Bolívar – Contratista SAP

Revisó: Abg. Paula Andrea Panesso Sánchez – Líder jurídica contratista DCCEE-SED
Ing. Carolina Machado Valdes – Asesora técnica contratista DCCEE-SED

Elaboró Ing. Jenny Paola Falla – Contratista DCCEE-SED

Copia: Oficina de Contratos - Dra. Ana María Briceño Campos
Dirección Financiera- Dr. Cristian Oswaldo Carmona Sánchez

Outlook

RE: MODIFICATORIO No. 3 CTO DE INTERVENTORIA 8169110 LOTE 2 - CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO

Desde MATEO GIUSEPPE ENRIQUEZ ENRIQUEZ <menriquez@educacionbogota.gov.co>
Fecha Sáb 19/09/2026 16:14
Para PAULA PANESSO SANCHEZ <ppanesso@educacionbogota.gov.co>
CC SANTIAGO ANGEL URIBE <sangelu@educacionbogota.gov.co>; JORGE ALBERTO MORENO ALDANA <jamorenoa@educacionbogota.gov.co>; PAOLA MARGARITA RUIZ MANOTAS <pruiz@educacionbogota.gov.co>

1 archivo adjunto (2 MB)
18092026 SOC MODF 3 CO1.PCCNTR.8169110 DE 2025 lote 2.docx;

Buen día Paula,

Remito el documento con un comentario, favor ajustar y continuar con el trámite.

Un cordial saludo,

Mateo Giuseppe Enríquez
Asesor SAP

De: PAULA PANESSO SANCHEZ <ppanesso@educacionbogota.gov.co>
Enviado: viernes, 18 de septiembre de 2026 10:07
Para: MATEO GIUSEPPE ENRIQUEZ ENRIQUEZ <menriquez@educacionbogota.gov.co>
Cc: SANTIAGO ANGEL URIBE <sangelu@educacionbogota.gov.co>; JORGE ALBERTO MORENO ALDANA <jamorenoa@educacionbogota.gov.co>; PAOLA MARGARITA RUIZ MANOTAS <pruiz@educacionbogota.gov.co>
Asunto: RE: MODIFICATORIO No. 3 CTO DE INTERVENTORIA 8169110 LOTE 2 - CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO

Buenos días Mateo,

Se remite para revisión el documento del asunto, el cual puedes consultar en el siguiente enlace:

LOTE 2_8169110

Cordialmente,

Outlook

RE: Solicitud validación financiera de los contratos de mejoramiento Lotes 4, 5 , 6, 7 y 9 de obra, y Lote 2 de interventoría.

Desde CLAUDIA MARCELA DUARTE CEPEDA <cduartec@educacionbogota.gov.co>
Fecha Mar 22/09/2026 16:25
Para PAULA PANESSO SANCHEZ <ppanesso@educacionbogota.gov.co>
CC HERNANDO JOSE LONDONO EBRATT <hlondono@educacionbogota.gov.co>; PAOLA MARGARITA RUIZ MANOTAS <pruiz@educacionbogota.gov.co>; MARIA AYDE JIMENEZ PORRAS <mjimenez@educacionbogota.gov.co>


Buenas tardes Pau,


Cordial saludo, una vez se realizó la verificación:

LOTE 4

1. CDP No. 1120 del 27 de julio por valor de $209.000.000

2. A la fecha el CDP No. 1120 cuenta con un valor total de $209.000.000 y no presenta liberaciones o anulaciones al valor inicial.

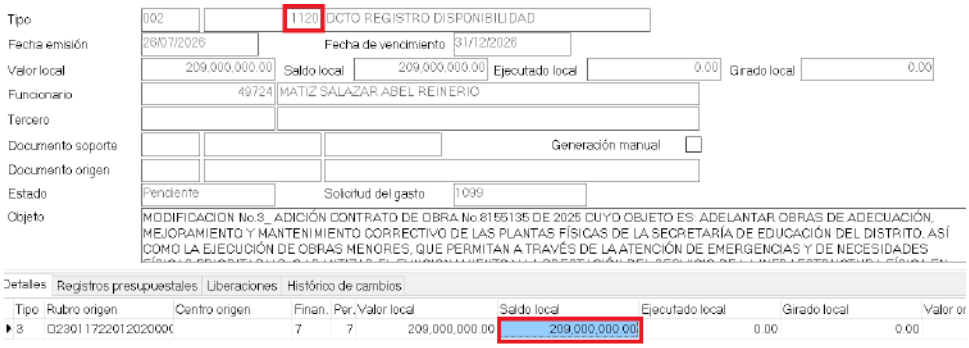

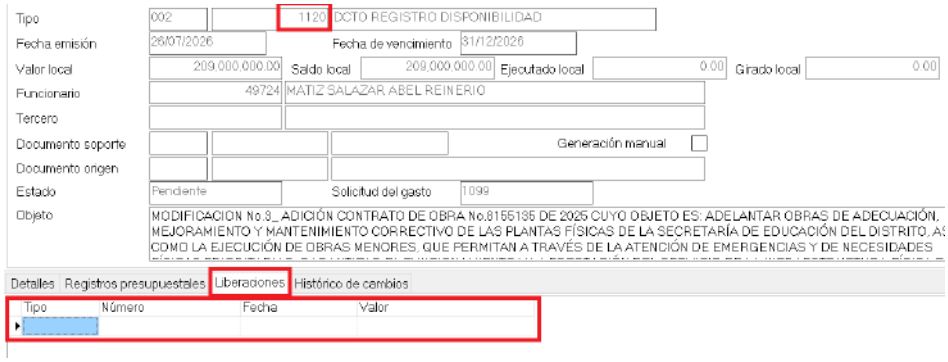

3. Balance Financiero del Contrato a la Fecha:

CONTRATISTA:	**CONSORCIO ADECUACIONES ARSAF 2025**
No. CONTRATO	CO1.PCCNTR.8155135/25
LOTE	4
VALOR INICIAL	2.703.337.443,00
VALOR MODIFICACIONES	1.342.467.488,00
VALOR A LA FECHA	4.045.804.931,00
EJECUTADO A LA FECHA	3.808.711.605,00
% EJECUCIÓN FINANCIERO	94,14%

DISPONIBILIDAD			REGISTRO			
NUMERO	**FECHA**	**VALOR**	**NUMERO**	**FECHA**	**VALOR INICIAL**	**SALDO ACTUAL 22/9/2026**
1642	21-feb-25	43.607.327.343,00	4985	5-sep-25	2.703.337.443,00	-
3694	5-dic-25	480.000.000,00	7553	18-dic-25	479.467.488,00	-
512	12-mar-26	863.575.583,00	3198	27-may-26	863.000.000,00	237.093.326,00
					4.045.804.931,00	**237.093.326,00**


Una vez se realizó la verificación de valores con respecto al SOC estos se encuentran acorde con el CDP. A la fecha hay una diferencia con respecto a la revisión financiera dado que a la fecha de corte del SOC 12 de agosto de 2026 no se habían radicado las actas parciales No. 7 y 8. **Se**


recomienda ajustar la información que el pago 7 ya se encuentra pagado.

LOTE 5

1. CDP No. 1115 del 27 de julio por valor de $140.000.000

2. A la fecha el CDP No. 1115 cuenta con un valor total de $140.000.000 y no presenta liberaciones o anulaciones al valor inicial

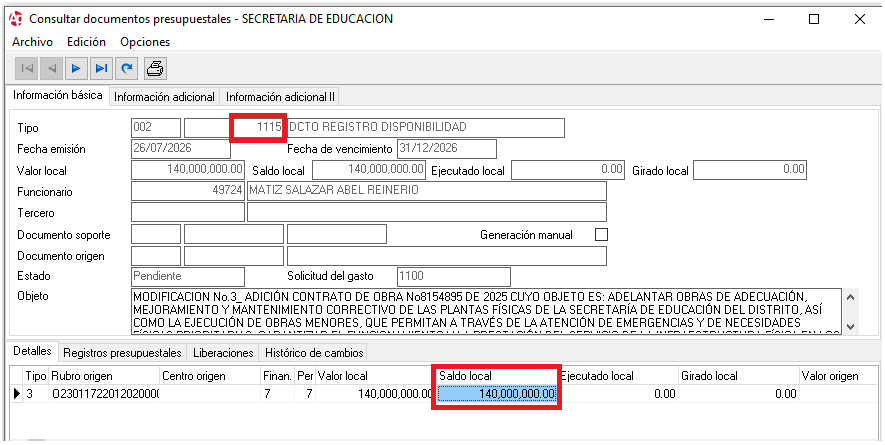

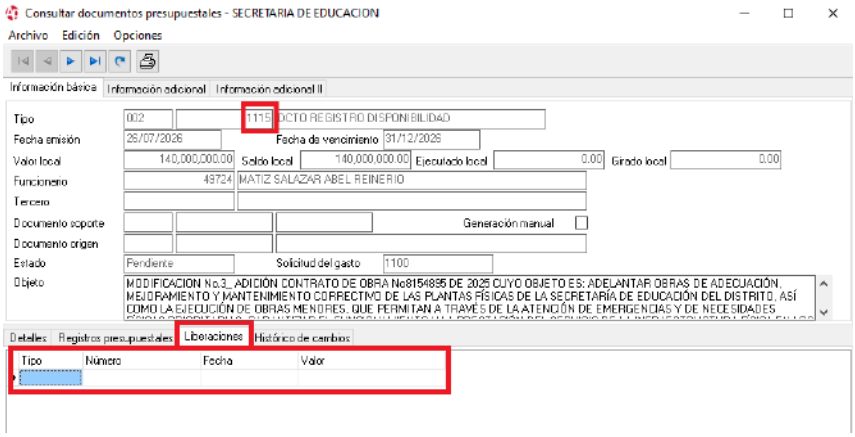

3. Balance Financiero del Contrato a la Fecha:

CONTRATISTA:	**CONSORCIO FORTALEZA**
No. CONTRATO	CO1.PCCNTR.8154895/25
LOTE	5
VALOR INICIAL	2.269.368.717,00
VALOR MODIFICACIONES	1.132.000.000,00
VALOR A LA FECHA	3.401.368.717,00
EJECUTADO A LA FECHA	3.097.932.699,00
% EJECUCIÓN FINANCIERO	91,08%


DISPONIBILIDAD			REGISTRO			
NUMERO	**FECHA**	**VALOR**	**NUMERO**	**FECHA**	**VALOR INICIAL**	**SALDO ACTUAL 22/9/2026**
1642	21-feb-25	43.607.327.343,00	4923	3-sep-25	2.269.368.717,00	-
3695	5-dic-25	515.000.000,00	7600	23-dic-25	515.000.000,00	-
513	12-mar-26	617.108.181,00	3150	20-may-26	617.000.000,00	303.436.018,00
					3.401.368.717,00	**303.436.018,00**


Una vez se realizó la verificación de valores con respecto al SOC estos se encuentran acorde con el CDP. A la fecha hay una diferencia con respecto a la revisión financiera dado que a la fecha de corte del SOC 10 de agosto de 2026 no se había radicado el acta parcial No. 8**.**

LOTE 6

1. CDP No. 1116 del 27 de julio por valor de $460.000.000

2. A la fecha el CDP No. 1116 cuenta con un valor total de $460.000.000 y no presenta liberaciones o anulaciones al valor inicial

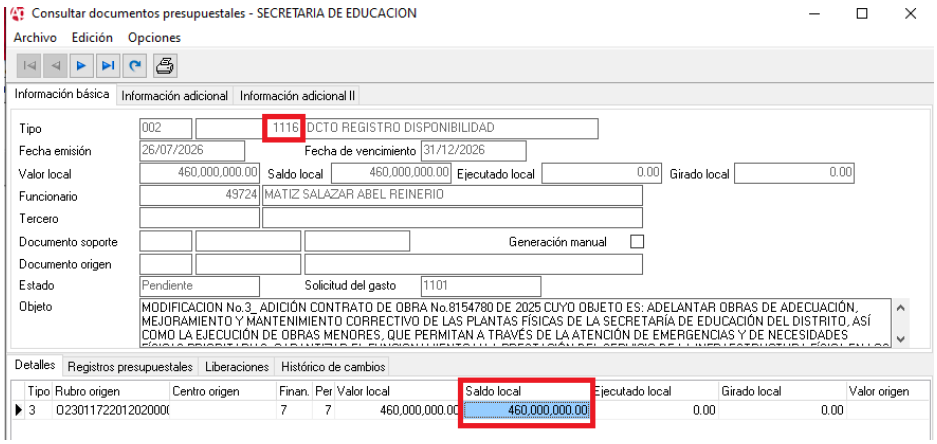

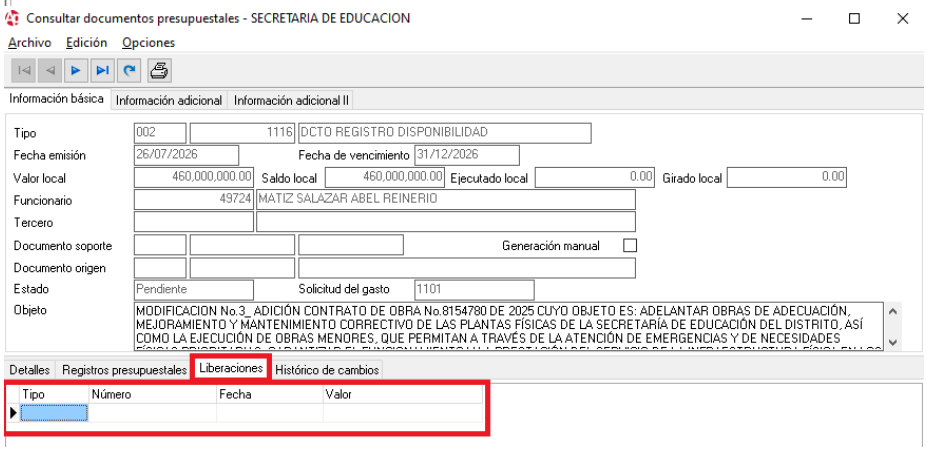

3. Balance Financiero del Contrato a la Fecha:

CONTRATISTA:	**CONSORCIO PAIS**
No. CONTRATO	CO1.PCCNTR.8154780/25
LOTE	6
VALOR INICIAL	2.332.049.023,00
VALOR MODIFICACIONES	785.001.422,00
VALOR A LA FECHA	3.117.050.445,00
EJECUTADO A LA FECHA	2.431.747.288,00
% EJECUCIÓN FINANCIERO	78,01%


DISPONIBILIDAD			REGISTRO			
NUMERO	**FECHA**	**VALOR**	**NUMERO**	**FECHA**	**VALOR INICIAL**	**SALDO ACTUAL 22/9/2026**
1642	21-feb-25	43.607.327.343,00	4924	3-sep-25	2.332.049.023,00	-
3697	5-dic-25	785.889.443,00	7577	22-dic-25	785.001.422,00	685.303.157,00
					3.117.050.445,00	**685.303.157,00**


Una vez se realizó la verificación de valores con respecto al SOC estos se encuentran acorde con el CDP. A la fecha hay una diferencia con respecto a la revisión financiera dado que a la fecha de corte del SOC 12 de agosto de 2026 no se había radicado el acta parcial No. 6**.**

LOTE 7

1. CDP No. 1117 del 27 de julio por valor de $300.000.000

2. A la fecha el CDP No. 1117 cuenta con un valor total de $300.000.000 y no presenta liberaciones o anulaciones al valor inicial.

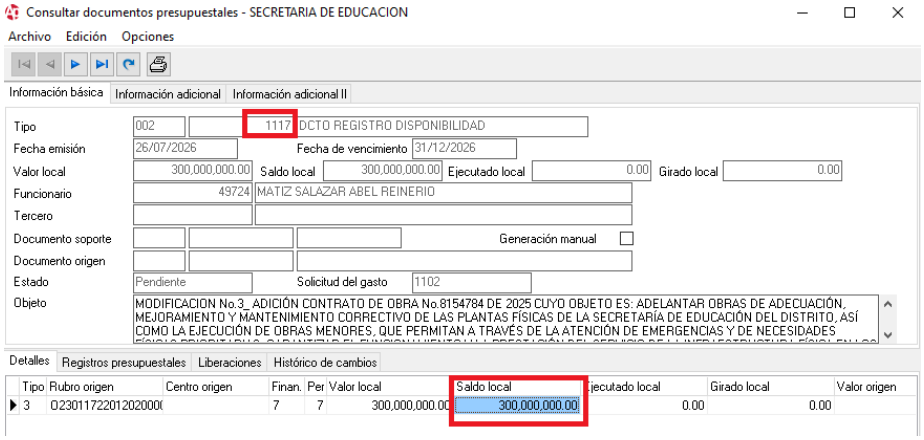

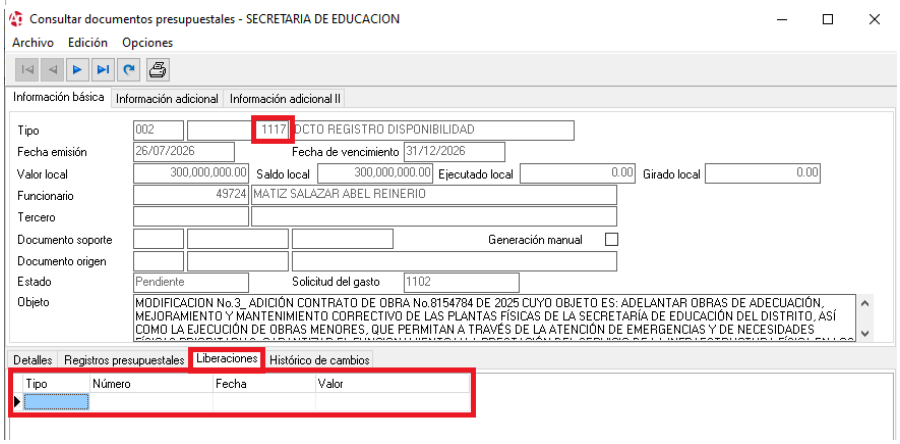

3. Balance Financiero del Contrato a la Fecha:

CONTRATISTA:	**CONSORCIO EDU 2025**
No. CONTRATO	CO1.PCCNTR.8154784/25
LOTE	7
VALOR INICIAL	2.451.846.958,00
VALOR MODIFICACIONES	1.076.612.050,00
VALOR A LA FECHA	3.528.459.008,00
EJECUTADO A LA FECHA	2.831.803.603,00
% EJECUCIÓN FINANCIERO	80,26%


DISPONIBILIDAD			REGISTRO			
NUMERO	**FECHA**	**VALOR**	**NUMERO**	**FECHA**	**VALOR INICIAL**	**SALDO ACTUAL 22/9/2026**
1642	21-feb-25	43.607.327.343,00	4984	5-sep-25	2.451.846.958,00	-
3699	5-dic-25	523.987.595,00	7608	24-dic-25	523.987.595,00	144.030.950,00
515	12-mar-26	552.624.455,00	3204	28-may-26	552.624.455,00	552.624.455,00
					3.528.459.008,00	**696.655.405,00**


Una vez realizada la verificación de los valores registrados en el SOC, se evidenció que estos se encuentran acordes con el CDP solicitado. La diferencia identificada corresponde a la radicación del Acta Parcial de Pago No. 7, realizada el 21 de septiembre, por un valor de $180.631.448,00, valor que, a la fecha de corte al 13 de septiembre aún no se encontraba reflejado en el SOC.

LOTE 9

1. CDP No. 1118 del 27 de julio por valor de $92.000.000

2. A la fecha el CDP No. 1118 cuenta con un valor total de $92.000.000 y no presenta liberaciones o anulaciones al valor inicial.

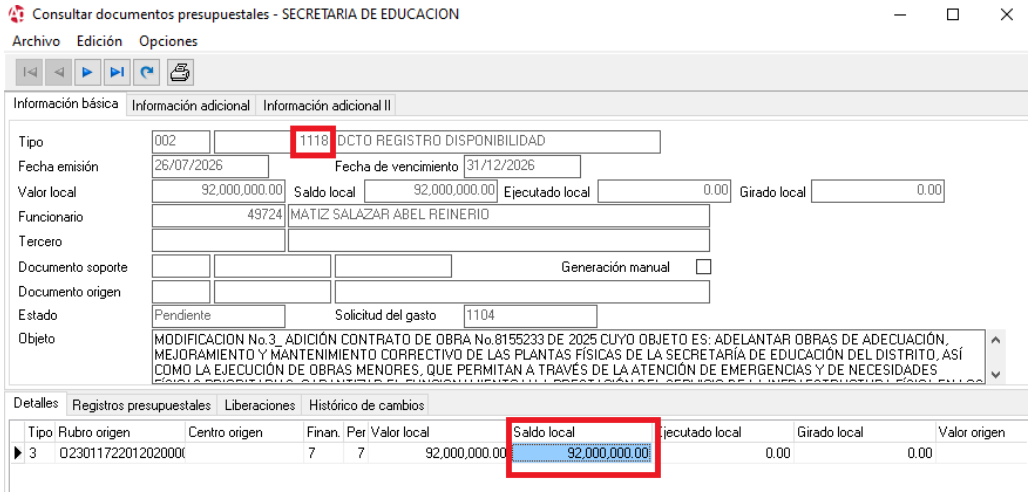

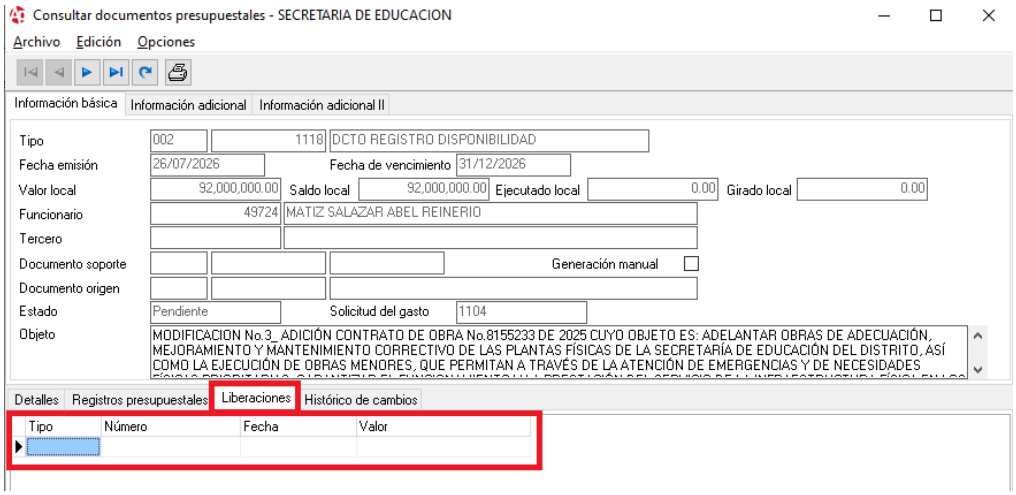

3. Balance Financiero del Contrato a la Fecha:

CONTRATISTA:	**CONSORCIO OBRAS EDUCATIVAS DT**
No. CONTRATO	CO1.PCCNTR.8155233/25
LOTE	9
VALOR INICIAL	2.426.857.240,00
VALOR MODIFICACIONES	1.210.358.967,00
VALOR A LA FECHA	3.637.216.207,00
EJECUTADO A LA FECHA	3.163.249.974,00
% EJECUCIÓN FINANCIERO	86,97%


DISPONIBILIDAD			REGISTRO			
NUMERO	**FECHA**	**VALOR**	**NUMERO**	**FECHA**	**VALOR INICIAL**	**SALDO ACTUA 22/9/2026**
1642	21-feb-25	43.607.327.343,00	4987	5-sep-25	2.426.857.240,00	-
3700	5-dic-25	822.324.262,00	7628	29-dic-25	822.324.262,00	85.931.528,00
516	12-mar-26	388.034.705,00	3206	28-may-26	388.034.705,00	388.034.705,0(
					3.637.216.207,00	**473.966.23**


Una vez realizada la verificación de los valores registrados en el SOC, se evidenció que estos se encuentran acordes con el CDP solicitado. La diferencia identificada corresponde a la radicación del Acta Parcial de Pago No. 8, realizada el 18 de septiembre, por un valor de $ 296.805.568,00 valor que, a la fecha de corte señalada 13 de mayo , aún no se encontraba reflejado en el SOC (Verificar porcentaje de avance financiero).

LOTE 2 INTERVENTORÍA

1. CDP No. 1606 del 02 de septiembre de 2026 por valor de $ 131.696.241

2. A la fecha el CDP No. 1606 cuenta con un valor total de $ 131.696.241 y no presenta liberaciones o anulaciones al valor inicial.

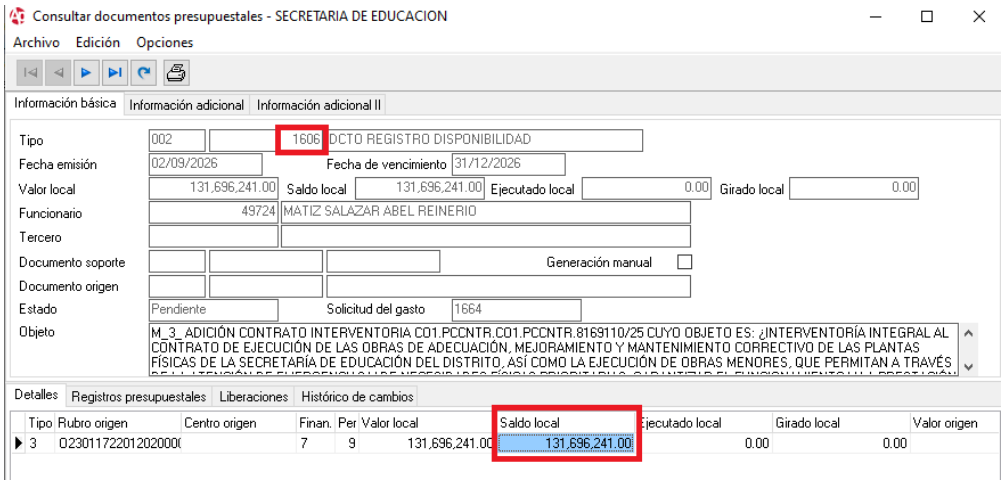

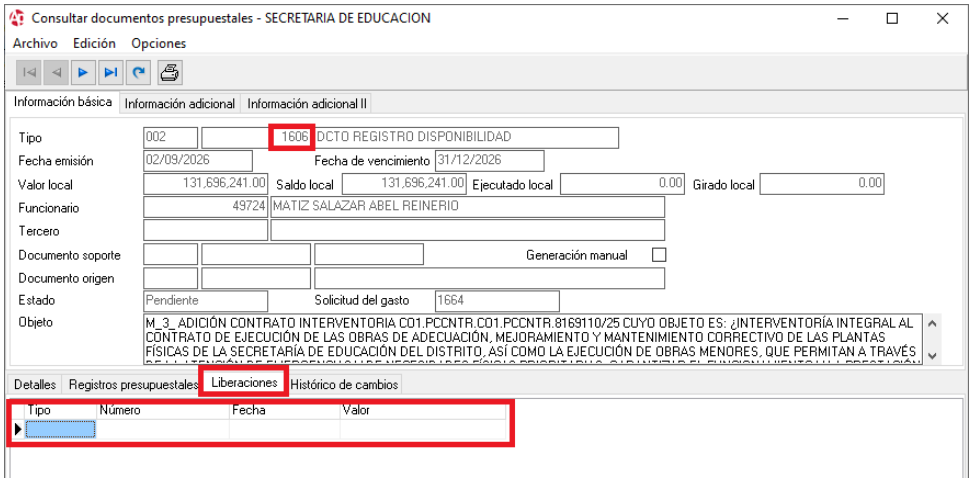

3. Balance Financiero del Contrato a la Fecha:

CONTRATISTA:	**CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO**
No. CONTRATO	CO1.PCCNTR.8169110/25
LOTE	2
VALOR INICIAL	796.184.131,00
VALOR MODIFICACIONES	291.300.934,00
VALOR A LA FECHA	1.087.485.065,00
EJECUTADO A LA FECHA	943.485.175,00
% EJECUCIÓN FINANCIERO	86,76%

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
NUMERO	**FECHA**	**VALOR**	**NUMERO**	**FECHA**	**VALOR INICIAL**
1984	10-mar-25	4.777.673.568,00	5012	5-sep-25	796.184.131,00
3698	5-dic-25	128.507.632,00	7587	23-dic-25	128.425.720,00
514	12-mar-26	162.875.214,00	3267	9-jun-26	162.875.214,00
					1.087.485.065,00

Una vez realizada la verificación de los valores registrados en el SOC, se evidenció que estos se encuentran acordes con el CDP solicitado. La diferencia identificada corresponde a la radicación del Acta Parcial de Pago No. 9, realizada el 18 de agosto, por un valor de $ 59.273.750,00 valor que se encuentra en estado pagado a la fecha. **Se recomienda realizar ajuste en el SOC.**

Atentamente,

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Claudia Marcela Duarte Cepeda
Contratista
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 3142
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

De: PAULA PANESSO SANCHEZ <ppanesso@educacionbogota.gov.co>
Enviado el: lunes, 21 de septiembre de 2026 3:40 p. m.
Para: CLAUDIA MARCELA DUARTE CEPEDA <cduartec@educacionbogota.gov.co>
CC: HERNANDO JOSE LONDONO EBRATT <hlondono@educacionbogota.gov.co>; PAOLA MARGARITA RUIZ MANOTAS <pruiz@educacionbogota.gov.co>
Asunto: Solicitud validación financiera de los contratos de mejoramiento Lotes 4, 5 , 6, 7 y 9 de obra, y Lote 2 de interventoría.
Importancia: Alta

Buenas tardes Clau,

En atención a la solicitud efectuada por el Director de contar con un control financiero previo a la radicación en la Oficina de Contratos de cualquier novedad que implique adición de recursos, solicito tu amable colaboración a fin de que, nos apoyes con la verificación de:

1. CDP asociado a la novedad
2. Valor asignado al CDP y disponibilidad del mismo
3. Balance general del contrato, verificando que los datos financieros incluidos en el SOC se ajusten a l información contractual

Los contratos objeto de validación son: Lotes 4, 5 , 6, 7 y 9 de obra, y Lote 2 de interventoría, que pueden ser consultados en el siguiente link:

CONJUNTO MODIFICACIONES 3

Cordialmente,

Paula Andrea Panesso Sánchez
Líder jurídica - Contratista
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos DCCEE
Av. El Dorado N. 66-63
PBX 6013241000
Celular 3002187659

Por favor evita imprimir, a menos que sea estrictamente necesario, al preferir el uso de documentos digitales se ahorra agua, energía y recursos forestales. _____ La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co

ANEXO No. 07. ACTUALIZACION DE POLIZA DE INTERVENTORIA

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: VxhHM+NlgyikymO4GutR3w==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	BCH-100046043	No. ANEXO	9	No. CERTIFICADO	97158854	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	09/10/2026	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA - CHICO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	04/09/2025	24:00 Horas Del	31/12/2031		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.977.271-0
DIRECCIÓN	TV 52 B # 2 - 30 AP 202	**TELÉFONO**	3142190224
ASEGURADO	BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	**No. DOC. IDENTIDAD**	899.999.061-9
DIRECCIÓN	CALLE 28 13A 35	**TELÉFONO**	6013693777
BENEFICIARIO	BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	**No. DOC. IDENTIDAD**	899.999.061-9
DIRECCIÓN	CALLE 28 13A 35	**TELÉFONO**	6013693777

OBJETO DE CONTRATO

SE ACLARA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CUMPLIMIENTO.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. CO1.PCCNTR.8169110 , CUYO OBJETO ES EL OBJETO DEL CONTRATO ES INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE NO. 2

TOMADOR: CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO CONFORMADO POR:
ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S NIT: 901.094.289-2 PART. 50 %

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 04/09/2025	24:00 Horas Del 30/06/2027	243.836.261,20	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 04/09/2025	24:00 Horas Del 30/12/2029	121.918.130,60	0,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 30/12/2026	24:00 Horas Del 30/12/2031	243.836.261,20	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 609.590.653,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
CPM ASESORES EN SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 08/10/2026

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	BCH-100046043	No. ANEXO	9	No. CERTIFICADO	97158854	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	09/10/2026	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA - CHICO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	04/09/2025	24:00 Horas Del	31/12/2031		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

SEIING SAS NIT: 900.208.425-6 PART. 50 %
ASEGURADO/BENEFICIARIO: BOGOTÁ D.C. - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO NIT: 899.999.061-9

NOTA: EL AMPARO DE PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES HACE REFERENCIA A PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO ES POR 5 AÑOS PLAZO DE GARANTÍA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO PRINCIPAL EN CUMPLIMIENTO

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

ANEXO No. 08. ACTAS DE COMITÉ

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 41

LUGAR DE LA REUNIÓN:	Reunión virtual	**FECHA:**	08	09	2026	**HORA INICIO:**	3:00 PM
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:	Realizar seguimiento del contrato de obra: CONSORCIO ARSAF Lote 4, CONSORCIO FORTALEZA Lote 5, CONSORCIO PAIS Lote 6.						
PRESIDE:	INTERVENTORIA	**SECRETARIO DE LA REUNIÓN:**	INTERVENTORIA				
PROYECTO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMINETO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS						

NOMBRE	COMPAÑIA	CARGO	FIRMA
Santiago Ángel Uribe	DCCEE	Supervisor Contrato de Interventoría	
Héctor Villazón Gutiérrez	Consorcio Serinco Educativo	Director de Interventoría	
John Castañeda	Consorcio Serinco Educativo	Residente de Interventoría – Lote 5 y 6	JOHN CASTAÑEDA
Cesar Carvajal	Consorcio Serinco Educativo	Residente de Interventoría – Lote 4	
Camilo Cárdenas	Consorcio Serinco Educativo	Inspector de Interventoría	
Nicolas Hernández	Consorcio Serinco Educativo	Coordinador – Lote 4	
Natalia Cañon	Consorcio Serinco Educativo	Coordinador– Lote 5	
Alejandra Otalora	Consorcio Serinco Educativo	Coordinador– Lote 6	
Julieth S Ceballos	Consorcio Serinco Educativo	Coordinadora	
Wilson Parra Robles	Consorcio País	Director de obra	
Fabio Fajardo	Consorcio País	Residente de obra	
Diego Pinzon	Consorcio ARSAF	Residente de obra	
Deiby Yecid Arias	Consorcio ARSAF	Director de obra	
Cristian Neira	Consorcio Fortaleza	Director de obra	
Jonathan Grajales	Consorcio Fortaleza	Residente de obra	

ORDEN DEL DIA	
1	Lote 4 – Seguimiento Sedes Educativas Activas
2	Lote 5 – Seguimiento Sedes Educativas Activas
3	Lote 6 – Seguimiento Sedes Educativas Activas
4	Temas Generales

DESARROLLO

1. LOTE 4 - Seguimiento Sedes Educativas Activas

Durante el desarrollo del comité se realizó seguimiento a las emergencias, actividades pendientes de ejecución, garantías, programación de frentes de obra y documentación administrativa del Lote 4, con énfasis en la actualización de balances, presupuestos y cronogramas requeridos para la legalización de las intervenciones.

- **Colegio Ciudad de Villavicencio (Emergencia)**

  Se revisó el balance disponible para la atención de la emergencia asociada al muro. Durante la reunión se indicó que el valor estimado de la intervención se encuentra alrededor de trece millones de pesos y que el saldo disponible de emergencias debe ser actualizado y conciliado, toda vez que los valores manejados durante el comité aún no se encontraban consolidados de manera definitiva.

  Se reiteró que, para la legalización de la emergencia, el contratista deberá presentar a la interventoría el presupuesto actualizado y el cronograma de ejecución, de forma que se cuente con trazabilidad administrativa y financiera antes de continuar con el cierre del balance.

  Respecto al alcance técnico, se confirmó que la intervención corresponde a la demolición y reconstrucción de los dos tramos de muro afectados, tal como lo solicitó el gestor territorial del colegio en la ficha SAE. El sistema constructivo deberá ser definido y ejecutado por el contratista, garantizando su estabilidad y correcto funcionamiento. Durante la visita previa se identificó adicionalmente la incidencia del agua proveniente de la pendiente posterior, por lo que se planteó evaluar la ejecución de un filtro francés detrás del muro como alternativa para captar y conducir el agua y reducir los empujes generados por humedad, situación que requiere la revisión del presupuesto

  Frente a las condiciones de relacionamiento con la institución educativa, se indicó que cualquier situación que interfiera técnicamente con la ejecución de la obra deberá manejarse de manera formal. En caso de presentarse impedimentos que comprometan el desarrollo de las actividades, el contratista deberá dejar constancia escrita y solicitar la intervención de la DCCEE antes de adoptar decisiones que afecten el frente de obra.

  En cuanto a los acabados, se señaló que el muro será ejecutado en bloque y deberá conservar una apariencia compatible con el elemento existente, contemplando pañete e hidrofugado según corresponda. Se estableció como plazo máximo de referencia el 30 de septiembre, procurando culminar la actividad en un término menor, esto teniendo en cuenta las limitantes de tiempo impuesta por la rectora, quien no permite se adelanten trabajos en los horarios de descanso que van desde las 10:00 am hasta las 11:00 am y de 3:30 a 4:30 pm

- **Colegio Los Tejares**

  Se revisó la programación de la actividad pendiente, teniendo en cuenta que para su ejecución se requiere disponer del tanque desocupado y coordinar con anticipación la afectación temporal del servicio. Se propuso ejecutar la intervención durante la semana de receso escolar de

octubre, con inicio previsto desde el viernes o sábado previo al 5 de octubre, de manera que la actividad pueda desarrollarse con menor interferencia sobre la operación del colegio.

El contratista deberá remitir a la interventoría el presupuesto y el cronograma ajustados de Tejares, incluyendo la fecha prevista para el vaciado de los tanques y la duración de la intervención. Se indicó además que el material impermeabilizante podrá coordinarse con la compra requerida para las cubiertas del Colegio José Celestino Mutis, buscando optimizar el suministro.

- **Colegio José Celestino Mutis**

Se confirmó que el inicio de actividades se encuentra previsto para el lunes 14 de septiembre. Para esa fecha deberán coordinarse las actas de vecindad de los frentes que inician simultáneamente, definiendo previamente los horarios de acompañamiento por parte de la interventoría.

Durante el comité se planteó realizar el acta de vecindad de esta sede a las 11:00 a. m. del 14 de septiembre. Adicionalmente, se solicitó consultar con el almacenista la ubicación definitiva del ciclo parqueadero y gestionar su fabricación con suficiente anticipación, de manera que pueda instalarse durante la ejecución de la obra.

- **Colegio Rural La Unión**

Se informó que se encuentran pendientes actividades menores de terminación, entre ellas la emboquillada del piso nuevo, ajustes periféricos del cielo raso, elementos asociados a la acometida y la instalación de las rejillas del cárcamo. Se indicó que las rejillas ya se encuentran en sitio.

Se acordó efectuar una visita de verificación el lunes 14 de septiembre en horas de la mañana, con participación de los responsables de obra e interventoría, con el propósito de revisar el estado final de la sede y definir la procedencia de su entrega.

- **Colegio Arborizadora Alta**

Se solicitó corregir la salida de una tubería que quedó embebida dentro de la placa, de manera que ésta atraviese y salga al costado requerido del sendero. Para ello deberá realizarse el ajuste del andén y reubicar la conducción conforme a lo indicado.

También deberá corregirse la unión deteriorada identificada dentro del cárcamo y culminarse los remates pendientes. Una vez ejecutadas las correcciones, el contratista deberá remitir registro de la subsanación.

- **Colegio Compartir B**

Se revisó la instalación del sanitario pendiente. Se informó que la actividad se programaría inicialmente para el día siguiente y, en caso de no ser posible el ingreso por actividades institucionales, se trasladaría al jueves de la misma semana.

- **Colegio Diego Montaña**

  Se indicó que la atención de la garantía se realizará durante el fin de semana con personal previamente aprobado, debido a que no se obtuvo respuesta del personal inicialmente asociado a dicha garantía y a que los baños permanecen en uso durante la semana.

- **Ítems No Previstos - Lote 4**

  Se informó que cinco (5) Ítems No Previstos se encontraban listos para radicación el mismo día del comité. Se solicitó que cada paquete se remita completo, incluyendo el documento en Word, la especificación técnica y los demás soportes necesarios para la revisión y trazabilidad ante el apoyo a la supervisión.

2. LOTE 5 - Seguimiento Sedes Educativas Activas

Durante el comité se realizó seguimiento a las entregas programadas, ajustes de cerramientos, actividades de pintura, atención de observaciones técnicas y coordinación de visitas con OTIC e instituciones educativas.

- **Colegio Miguel de Cervantes Saavedra**

  Se reiteró la entrega del parqueadero para el 14 de septiembre, fecha para la cual deberán estar instaladas las rejillas pendientes y el retiro completo de escombros. Se indicó que la placa ya se encuentra terminada y que únicamente debe cumplirse el período establecido para la verificación de su comportamiento y garantía.

  Se acordó elaborar un acta entre contratista de obra e interventoría que deje constancia del estado en que fue recibido el espacio, incluyendo el estado de los muros pintados, la placa sin fisuras y el correspondiente registro fotográfico, dejando claramente identificado que se encuentra pendiente el cumplimiento del término de garantía de la placa.

  Respecto a las manchas de pintura reportadas posteriormente en el sector intervenido, se señaló que la situación fue atribuida a actividades de mantenimiento de la institución y que se dejará claridad mediante comunicación a la gestora.

  Para el 9 de septiembre a las 8:00 a. m. se programó visita con OTIC para revisar los ajustes requeridos sobre el cableado existente en el área de comedor.

- **Colegio Santa Librada - Lote 5**

  La actividad inicialmente prevista para el 14 de septiembre fue reprogramada para el sábado 19 de septiembre, teniendo en cuenta la disponibilidad del personal especializado requerido y la necesidad de preparar previamente la superficie existente para garantizar la adherencia del tratamiento sobre el bloque previamente impermeabilizado.

- **Colegio Paraíso Mirador**

Se informó que el contratista se encuentra finalizando los ajustes del cerramiento. Durante la semana anterior fueron instalados postes adicionales y se avanzó en el retiro y limpieza de materiales sobrantes, manteniendo únicamente la polisombra necesaria para proteger el sector de una caseta desmontada.

Se programó una inspección del contratista para el 9 de septiembre y una posterior revisión de interventoría entre el jueves 10 y el viernes 11 de septiembre, con especial atención al acabado de pintura del cerramiento. Una vez se cuente con el aval de interventoría, deberá coordinarse la entrega con el rector durante la semana siguiente.

- **Colegio Rodrigo Lara Bonilla**

Se informó que se encontraban terminados dos salones del primer piso y tres del segundo piso, mientras se adelantaban actividades en un cuarto salón del segundo piso. La meta planteada es culminar la pintura durante la misma semana y programar la entrega total de la sede para el jueves o viernes de la semana siguiente, sujeto al avance efectivo.

La Coordinadora manifestó disponibilidad para recibir el jueves los salones que ya se encuentren terminados y pendientes de formalización. Se dejó constancia de que la suciedad generada por el uso posterior de los espacios no corresponde a defectos de ejecución de la pintura.

Adicionalmente, se reportó una situación de humedad evidenciada en una viga canal ubicada en un bloque distinto al inicialmente intervenido. Se aclara que el punto no hacía parte del alcance base y que, antes de definir una intervención adicional, deberá revisarse el balance disponible y verificar si la situación corresponde principalmente a un problema de bajantes.

3. LOTE 6 - Seguimiento Sedes Educativas Activas

Durante el comité se revisaron las condiciones de los frentes activos del Lote 6, haciendo énfasis en la subsanación de observaciones de cerramientos, la culminación de baterías sanitarias, la preparación de nuevos frentes y el seguimiento a filtraciones.

- **Colegio Ciudad de Villavicencio - Lote 6**

La interventoría reiteró que el cerramiento aún no ha sido recibido y que deberán subsanarse las observaciones identificadas. Se solicitó corregir mediante soldadura los módulos que presentan deficiencias, incluida una zona con malla floja, y posteriormente rectificar los acabados de pintura en los puntos intervenidos.

Se recordó que en el acta de socialización del 3 de junio establece como alcance el mantenimiento del cerramiento metálico, incluyendo soldadura, reposición de elementos en mal estado y pintura anticorrosiva, sin señalar una intervención sobre la totalidad del perímetro. Por tanto, la revisión deberá concentrarse en el alcance efectivamente definido y en la calidad de los elementos ejecutados.

El proveedor del cerramiento realizará una revisión durante el fin de semana. Asimismo, el contratista deberá retirar el escombro y los elementos de cerramiento desmontados a más

tardar el viernes, con el fin de permitir la corrección definitiva del módulo móvil utilizado para retiro de materiales.

Se indicó que la cuadrilla actual espera culminar durante la semana los concretos y la pintura, para posteriormente dar paso a las actividades de vinilo, piso caucho y grama. Aunque se comunicó una fecha de entrega al 9 de octubre, se planteó como meta interna procurar la terminación hacia el 30 de septiembre, sujeto a las condiciones reales de ejecución.

- **Colegio Guillermo Cano Isaza**

Se informó que los baños del primer piso pudieron ser entregados. Para los demás sectores se programaron actividades de aseo y brillo de divisiones entre el miércoles y el jueves, acompañadas de remates de pintura, buscando realizar entregas parciales y culminar la mayor cantidad posible de baterías sanitarias entre el viernes y el sábado.

En los baños de niñas del segundo piso se mantiene seguimiento al cielo raso, debido a la humedad observada previamente. Se indicó que el goteo ha cesado y que el concreto presenta un proceso progresivo de secado; no obstante, se recomendó verificar que la humedad se encuentre completamente estabilizada antes de realizar el remate definitivo, con el fin de evitar manchas posteriores y reclamaciones de garantía.

- **Colegio Rafael Uribe**

Se aclaró con la institución educativa que la intervención prevista corresponde únicamente a los baños de primaria y no a los baños de bachillerato. Se indicó que el frente deberá considerar de manera integral los trabajos asociados a cubiertas y manejo de aguas.

Debido a la disponibilidad limitada de servicios sanitarios para los trabajadores, se solicitó conservar temporalmente un sanitario durante el proceso de demolición y, cuando ello ya no sea posible, prever la instalación de un baño portátil. El contratista deberá definir su ubicación, cotizarlo e incorporarlo al presupuesto, salvo que técnicamente pueda mantenerse una solución sanitaria interna durante toda la ejecución.

- **Colegio Santa Librada - Lote 6**

Durante la visita realizada el mismo día del comité se verificaron las perforaciones ejecutadas en el aula 302. Se evidenció que la filtración ha disminuido significativamente y que únicamente permanece un goteo muy lento y puntual en una de las perforaciones. Se acordó mantener la observación durante la semana antes de definir una intervención adicional.

En relación con las zonas exteriores, se informó que en el jardín lúdico ya se habían aplicado dos capas de imprimante y que, si las condiciones climáticas lo permiten, se continuará con la aplicación del acabado previsto. También se contempló la aplicación de pintura en el corredor y sobre el adoquín para uniformar la apariencia de las áreas intervenidas.

Se solicitó al proveedor remitir una carta de colores para definir los tonos de acabado. Como criterio de diseño se planteó mantener una solución sencilla, incluyendo únicamente una figura

tipo tablero de ajedrez en la isla central y conservando las demás superficies con un tratamiento uniforme.

4. Temas generales

- **Ítems No Previstos y actas pendientes**
  Se solicitó a la interventoría remitir los Ítems No Previstos ya avalados correspondientes al Lote 6. Asimismo, se manifestó la intención de radicar el acta pendiente durante la noche del comité y se estableció como meta contar, a más tardar el viernes, con la totalidad de las actas requeridas para su radicación.

- **Reuniones de liquidación y próximo comité**
  Se acordó realizar el lunes 14 de septiembre reuniones específicas de liquidación por cada grupo, en franjas consecutivas de una hora entre las 3:00 p. m. y las 6:00 p. m. El orden de participación de los lotes será definido por los responsables.

  El siguiente comité de seguimiento con participación de todos los grupos se programó para el martes 15 de septiembre. Adicionalmente, se indicó que los compromisos tratados en las reuniones de seguimiento deberán mantenerse consolidados y resumidos para facilitar su control.

COMPROMISOS

#	ACTIVIDAD/Tarea	PRIORIDAD	RESPONSABLE	FECHA EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	Actualizar y conciliar el balance de emergencias y remitir presupuesto y cronograma de la emergencia del muro. CIUDAD DE VILLAVICENCIO - LOTE 4	Alta	Contratista de Obra - Lote 4	A la mayor brevedad	
2	Remitir presupuesto y cronograma ajustados para ejecutar la intervención durante la semana de receso, coordinando previamente el vaciado de los tanques. TEJARES	Alta	Contratista de Obra - Lote 4	Antes del 02/10/2026	
3	Realizar visita conjunta de verificación final para definir la entrega de la sede. RURAL LA UNIÓN	Alta	Obra e Interventoría - Lote 4	14/09/2026	
4	Coordinar acta de vecindad e inicio de actividades; consultar ubicación y gestionar fabricación del ciclo parqueadero. JOSÉ CELESTINO MUTIS	Alta	Obra e Interventoría - Lote 4	14/09/2026	Acta de vecindad prevista hacia las 11:00 a. m.

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 41

COMPROMISOS					
#	**ACTIVIDAD/Tarea**	**PRIORIDAD**	**RESPONSABLE**	**FECHA EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
5	Radicar cinco (5) Ítems No Previstos con paquete completo, incluyendo especificación técnica y soportes. LOTE 4	Alta	Contratista de Obra - Lote 4	08/09/2026	
6	Subsanar observaciones del cerramiento mediante soldadura y pintura; retirar escombros y elementos desmontados. CIUDAD DE VILLAVICENCIO - LOTE 6	Alta	Contratista de Obra - Lote 6	11/09/2026	Proveedor revisará el fin de semana.
7	Completar aseo, brillo de divisiones y remates, y definir entrega de baños verificando previamente el secado del cielo raso. GUILLERMO CANO ISAZA	Alta	Contratista de Obra - Lote 6	11-12/09/2026	Sujeto a estabilización de humedad.
8	Mantener seguimiento a la filtración del aula 302 y solicitar carta de colores para los acabados exteriores. SANTA LIBRADA - LOTE 6	Alta	Obra e Interventoría - Lote 6	Durante la semana	
9	Remitir Ítems No Previstos avalados y completar las actas pendientes para radicación.	Alta	Interventoría	11/09/2026	
10	Realizar reuniones de liquidación por grupos en franjas de 3:00 a 6:00 p. m.	Alta	Interventoría y Contratistas	14/09/2026	Una hora por grupo.

Convocatoria próximo comité:	15-09-2026
Hora de finalización:	4:17 pm

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 42

LUGAR DE LA REUNIÓN:	Reunión virtual	**FECHA:**	15	09	2026	**HORA INICIO:**	4:00 PM
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:	Realizar seguimiento del contrato de obra: CONSORCIO ARSAF Lote 4, CONSORCIO FORTALEZA Lote 5, CONSORCIO PAIS Lote 6.						
PRESIDE:	INTERVENTORIA	**SECRETARIO DE LA REUNIÓN:**	INTERVENTORIA				
PROYECTO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMINETO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS						

NOMBRE	COMPAÑIA	CARGO	FIRMA
Santiago Ángel Uribe	DCCEE	Supervisor Contrato de Interventoría	
Héctor Villazón Gutiérrez	Consorcio Serinco Educativo	Director de Interventoría	
John Castañeda	Consorcio Serinco Educativo	Residente de Interventoría – Lote 5 y 6	JOHN CASTAÑEDA
Cesar Carvajal	Consorcio Serinco Educativo	Residente de Interventoría – Lote 4	
Camilo Cárdenas	Consorcio Serinco Educativo	Inspector de Interventoría	
Nicolas Hernández	Consorcio Serinco Educativo	Coordinador – Lote 4	
Natalia Cañon	Consorcio Serinco Educativo	Coordinadora – Lote 5	
Alejandra Otalora	Consorcio Serinco Educativo	Coordinadora – Lote 6	
Julieth Ceballos	Consorcio Serinco Educativo	Coordinadora	
Wilson Parra Robles	Consorcio País	Director de obra	
Fabio Fajardo	Consorcio País	Residente de obra	
Diego Pinzon	Consorcio ARSAF	Residente de obra	
Deiby Yecid Arias	Consorcio ARSAF	Director de obra	
Cristian Neira	Consorcio Fortaleza	Director de obra	
Jonathan Grajales	Consorcio Fortaleza	Residente de obra	

ORDEN DEL DIA	
1	Lote 4 – Seguimiento Sedes Educativas Activas
2	Lote 5 – Seguimiento Sedes Educativas Activas
3	Lote 6 – Seguimiento Sedes Educativas Activas
4	Temas Generales

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 42

DESARROLLO

1. LOTE 4 - Seguimiento Sedes Educativas Activas

Durante el comité se realizó seguimiento a las actividades correspondientes al Lote 4, abordando principalmente aspectos relacionados con garantías, intervenciones eléctricas, atención de emergencias, entregas, programación y balances presupuestales.

- **Colegio Arborizadora Alta**

Se revisó la ubicación prevista para el nuevo tablero eléctrico de la institución. El contratista informó que la acometida principal será reubicada dentro del Bloque B en el segundo piso, con el propósito de disminuir el riesgo de afectaciones ocasionadas por impactos de balones, considerando las condiciones de uso de los espacios deportivos y de circulación de la institución. Se acordó mantener dicha ubicación como solución para la instalación del nuevo tablero.

Se informó que el jueves en horas de la mañana se dará inicio al desmonte del cerramiento existente. Las losetas retiradas serán organizadas para realizar la respectiva entrega. Frente a la posibilidad de que posteriormente se presenten afectaciones externas, tales como grafitis, o inconvenientes relacionados con la aceptación de la intervención por parte de la rectoría, se acordó realizar un registro fotográfico detallado del estado del área al momento de la entrega y elaborar un documento interno debidamente firmado que permita dejar constancia de las condiciones en las que se realiza la entrega y delimitar las responsabilidades frente a posibles daños posteriores.

Adicionalmente, se informó que se tiene prevista una visita de OTIC el jueves en horas de la mañana, con el propósito de revisar los aspectos relacionados con la instalación eléctrica. Se revisaron las condiciones técnicas para la protección eléctrica del tablero principal y la conexión de OTIC. Se propuso instalar una protección de 60 amperios en el tablero principal y disponer de una protección específica de 50 amperios para la unidad de respaldo donde se realizará la conexión de OTIC. Durante la revisión se manifestó preocupación respecto de la incidencia que podría tener la manipulación de la instalación por parte de terceros sobre las garantías contractuales.

En consecuencia, se acordó que la conexión podrá realizarse bajo condiciones claramente delimitadas, estableciendo que cualquier intervención o modificación realizada posteriormente por terceros sobre la instalación será responsabilidad de quien la ejecute y podrá afectar la garantía correspondiente a la sección intervenida. Deberán quedar claramente documentadas las condiciones técnicas y presupuestales de la intervención.

Se solicitó verificar la disponibilidad de la ficha definitiva emitida por la Secretaría para la atención de la emergencia correspondiente a Arborizadora Alta.

- **Colegio Rural La Unión**

Se informó sobre la recepción del video en el cual se evidencia presencia de agua empozada en un sector del colegio. Por lo que se programó una visita técnica para verificar directamente la situación y determinar si el agua corresponde a una filtración, acumulación ocasionada por lluvias o alguna condición asociada al sistema de drenaje existente. Durante la visita se deberá revisar

adicionalmente el estado de las mangueras y verificar el funcionamiento de la solución implementada, considerando que la pendiente se encuentra dirigida hacia la nueva cañuela.

La fecha prevista para la entrega definitiva es el 25 de septiembre. Se dejó constancia de que el acompañamiento presencial de la interventoría en dicha fecha deberá ser coordinado de acuerdo con la programación de actividades del Lote 6.

- **Colegio Confederación Brisas del Diamante**

Se revisó la fecha prevista para la entrega del aula de docentes. Como resultado de la coordinación realizada con el gestor, se acordó realizar la entrega para el 13 de octubre de 2026, aprovechando la semana de receso escolar. Se dejó establecido que esta programación estará condicionada a que el colegio hará la entrega del Aula de Docentes para su intervención el 21-09-2026, Cualquier retraso en la entrega del espacio y en la dificultad del desarrollo de las actividades atribuible a la institución educativa podrá generar el correspondiente desplazamiento de los plazos de entrega, lo cual deberá ser informado de INMEDIATO al apoyo a la supervisión.

- **Colegio Ciudad de Villavicencio**

Se informó que ya se realizó la llegada del ladrillo requerido para la intervención y que se encuentra en ejecución el armado de las nuevas columnas y vigas. De acuerdo con lo informado, las actividades se desarrollan sin inconvenientes a la fecha. Se programó una visita de inspección por parte del apoyo a la supervisión para el lunes 21 de septiembre, entre las 7:30 y 8:00 a. m., con el propósito de verificar en campo el avance de las actividades ejecutadas.

- **Colegio Diego Montaña**

Se realizó seguimiento al ingreso del personal requerido para atender las actividades asociadas a las garantías, particularmente en relación con el personal de Diego Montaña y la almacenista Valentina.

El contratista informó que ya fueron enviados al gestor los nombres y documentos de identidad correspondientes a John Mario Arias y Jaime Alejandro, con el fin de gestionar la autorización de ingreso a la institución.

Lo anterior se revisó debido a las observaciones presentadas por el gestor respecto a la ausencia de personal durante el fin de semana

- **Balance Financiero de Emergencias**

Se revisó el estado de los balances financieros.

El apoyo a supervisión Arq. Santiago Ángel informó que se identifica un sobrante aproximado de $3.000.000 y $7.000.000 aproximadamente en el componente de emergencias, para un excedente aproximado total de $10.000.000.

Tanto interventoría como el contratista quedaron en revisar los valores con el propósito de identificar el origen de las diferencias, ajustar los balances y determinar el manejo correspondiente de los recursos.

2. LOTE 5 - Seguimiento Sedes Educativas Activas

Durante el comité se realizó seguimiento a las actividades correspondientes al Lote 5, principalmente en relación con cerramientos, adecuaciones, atención de emergencias, aspectos técnicos de pisos y drenajes, terminación de actividades y conciliación de balances.

- **Colegio Paraíso Mirador, Sede D**

Se revisó el avance de las actividades relacionadas con el cerramiento de la sede. Se autorizó la instalación de parales adicionales, con el propósito de atender los requerimientos del rector acorde a las condiciones identificadas en el cerramiento y garantizar la correcta ejecución de la intervención.

El contratista quedó encargado de coordinar los trabajos de cerramiento y adecuación, así como de informar oportunamente a la rectoría sobre el inicio de las actividades.

- **Colegio Rodrigo Lara Bonilla**

Se informó que la rectora manifestó su aceptación frente a la reparación de los desniveles en corredores de circulación identificados en la institución. En consecuencia, se acordó coordinar el inicio de las actividades con el personal habitual de obra, procurando realizar la intervención de manera articulada con la institución educativa. Se analizó técnicamente la alternativa para solucionar el cambio de nivel entre el área existente y el piso tipo chip. En relación con los sifones existentes en el área, se determinó que estos pueden ser eliminados, teniendo en cuenta que el sector se encuentra cubierto y no recibe escurrimiento directo de aguas lluvias.

Se deberá validar en campo la condición final antes de ejecutar el cierre definitivo de estos elementos.

- **Colegio Paraíso Mirador, Sede B**

Se informó que para culminar las actividades se encuentra pendiente la llegada de los espejos, la corrección de una puerta y la ejecución de la limpieza general, estas actividades se encuentran previstas para ser culminadas durante la semana.

- **Colegio Gabriel García Márquez**

Se continua con el seguimiento de las actividades técnicas pendientes y con la coordinación necesaria para garantizar que las intervenciones se desarrollen de acuerdo con la programación establecida.

- **Balance financiero de Emergencias**

Se evidenció una diferencia aproximada de $27.000.000 entre la información registrada en los informes semanales de emergencias y los valores identificados en los registros propios de seguimiento.

La interventoría solicitó realizar una revisión detallada de los valores reportados, con el propósito de identificar el origen de las diferencias y ajustar los balances correspondientes.

3. LOTE 6 - Seguimiento Sedes Educativas Activas

Durante el comité se realizó seguimiento a las actividades correspondientes al Lote 6, con énfasis en las intervenciones de unas sedes, así como en los aspectos técnicos, programación, garantías y balances financieros.

- **Colegio Santa Librada**

Se realizó seguimiento al diseño definitivo correspondiente a la plazoleta superior de la institución.

El contratista consultó respecto al estado del diseño y se solicitó compartir en el grupo de trabajo la versión final del diseño de la plazoleta, con el propósito de que los participantes puedan realizar la revisión y contar con una misma versión de referencia para la ejecución y seguimiento de las actividades.

Se deberá continuar con el seguimiento de las actividades programadas en la institución y verificar que la información técnica compartida corresponda con las condiciones que serán ejecutadas en campo.

- **Colegio Guillermo Cano Isaza**

Se revisó la situación relacionada con la presencia de humedad en los baños de la institución, el contratista informó que la humedad se presenta de manera intermitente, lo cual dificulta identificar de manera inmediata el origen de la afectación. Ante esta situación, se solicitó intensificar las labores de inspección y de ser necesario, realizar una intervención adicional sobre la placa con el propósito de identificar el origen de la humedad y ejecutar la solución correctiva correspondiente.

Se autorizó continuar con las actividades de intervención necesarias y avanzar en la entrega de las llaves y de los baños de profesores del segundo nivel, una vez se verifique que las condiciones de funcionamiento sean adecuadas.

- **Colegio San José de Usme**

Se recordó el compromiso de realizar el acta de vecindad el sábado 19-09-2026 a las 9:00 am y coordinar el inicio de las actividades de obra para el lunes siguiente. Se deberá garantizar que el acta de vecindad sea diligenciada antes del inicio de las actividades, dejando registro de las condiciones existentes en el área de intervención.

- **Colegio Arborizadora Baja**

Se realizo el seguimiento y se informó que el colegio realizó una intervención sobre uno de los tableros eléctricos existentes. Ante esta situación, se reiteró que cualquier manipulación o modificación de las instalaciones eléctricas por parte de terceros puede afectar la garantía contractual correspondiente. En consecuencia, se deberá dejar debidamente documentado el estado de las instalaciones entregadas y cualquier intervención posterior realizada por terceros, con el fin de delimitar las responsabilidades y el alcance de las garantías.

- **Colegio Ciudad de Villavicencio**

Se estableció como requerimiento la instalación de una baranda, de acuerdo con las dimensiones previamente suministradas. Se encargó la gestión de esta actividad al contratista, quienes deberán realizar el contacto y coordinación con el proveedor para la fabricación y posterior instalación de la baranda.

- **Balance financiero de Emergencias**

Se revisó la información financiera correspondiente a las emergencias del Lote 6.

Se identificó una diferencia entre el valor reportado en el informe semanal, correspondiente aproximadamente a $400.000.000, y el valor registrado en las cotizaciones, cercano a $413.000.000, además de un sobrante aproximado de $3.600.000.

En consecuencia, se solicitó realizar una conciliación general de los balances de emergencias, verificando los valores registrados en informes, cotizaciones y demás soportes disponibles.

4. Temas generales

- **Actualización y conciliación de balances**

Se estableció como actividad prioritaria la actualización de los balances de todos los frentes de obra antes de finalizar el mes.

La revisión deberá permitir identificar diferencias entre los valores registrados en informes semanales, cotizaciones, presupuestos y demás soportes financieros, con el propósito de contar con información conciliada y evitar saldos o excedentes no identificados.

Asimismo, el Apoyo a supervisión Arq. Santiago Ángel deberá compartir con el equipo las imágenes y cifras registradas correspondientes a los balances de emergencias para facilitar la revisión.

- **Estado de actas parciales de obra**

  Se informó que la segunda versión del acta correspondiente al Lote 6 fue entregada el día anterior en horas de la tarde, por lo que se procederá con su revisión.

  Por otra parte, el acta correspondiente al Lote 4 continúa pendiente. Se deberá realizar seguimiento a la revisión, ajuste y formalización de las actas pendientes.

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 42

- **Documentación y firmas pendientes**

  Se solicitó a los participantes agilizar la revisión y firma de los documentos que han sido remitidos por la administración, con el propósito de evitar retrasos en los procesos administrativos y mantener actualizada la documentación contractual.

COMPROMISOS					
#	**ACTIVIDAD/Tarea**	**PRIORIDAD**	**RESPONSABLE**	**FECHA EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
1	Enviar nombres y documentos del personal requerido para gestionar autorizaciones de ingreso - ARBORIZADORA ALTA.	Alta	Contratista de Obra - Lote 4	A la mayor brevedad	
2	Remitir programación de actividades y presupuesto correspondiente. TEJARES	Alta	Contratista de Obra - Lote 4	A la mayor brevedad	
3	Compartir en el grupo el diseño final de la plazoleta superior. SANTA LIBRADA.	Alta	Contratista de Obra - Lote 6	A la mayor brevedad	
4	Elaborar acta de vecindad. SAN JOSE DE USME.	Alta	Contratista de Obra - Lote 6	19/09/2026	
5	Actualizar los balances de todos los frentes de obra y emergencias.	Alta	Todos los contratistas – Lote 4,5 y 6.	Antes de finalizar el mes.	
6	Revisar y firmar los documentos pendientes remitidos por la administración	Alta	Todos los contratistas – Lote 4,5 y 6.	A la mayor brevedad	

Convocatoria próximo comité:	22-09-2026
Hora de finalización:	5:00 pm

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 43

LUGAR DE LA REUNIÓN:	Reunión virtual	**FECHA:**	22	09	2026	**HORA INICIO:**	3:00 PM
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:	Realizar seguimiento del contrato de obra: CONSORCIO ARSAF Lote 4, CONSORCIO FORTALEZA Lote 5, CONSORCIO PAIS Lote 6.						
PRESIDE:	INTERVENTORIA	**SECRETARIO DE LA REUNIÓN:**	INTERVENTORIA				
PROYECTO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMINETO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS						

NOMBRE	COMPAÑIA	CARGO	FIRMA
Santiago Ángel Uribe	DCCEE	Supervisor Contrato de Interventoría	
Héctor Villazón Gutiérrez	Consorcio Serinco Educativo	Director de Interventoría	
John Castañeda	Consorcio Serinco Educativo	Residente de Interventoría – Lote 5 y 6	JOHN CASTAÑEDA
Cesar Carvajal	Consorcio Serinco Educativo	Residente de Interventoría – Lote 4	
Camilo Cárdenas	Consorcio Serinco Educativo	Inspector de Interventoría	
Nicolas Hernández	Consorcio Serinco Educativo	Coordinador – Lote 4	
Natalia Cañon	Consorcio Serinco Educativo	Coordinadora – Lote 5	
Alejandra Otalora	Consorcio Serinco Educativo	Coordinadora – Lote 6	
Julieth Ceballos	Consorcio Serinco Educativo	Coordinadora	
Wilson Parra Robles	Consorcio País	Director de obra	
Fabio Fajardo	Consorcio País	Residente de obra	
Diego Pinzon	Consorcio ARSAF	Residente de obra	
Deiby Yecid Arias	Consorcio ARSAF	Director de obra	
Cristian Neira	Consorcio Fortaleza	Director de obra	
Jonathan Grajales	Consorcio Fortaleza	Residente de obra	

ORDEN DEL DIA	
1	Temas Generales
2	Lote 5 – Seguimiento Sedes Educativas Activas
3	Lote 6 – Seguimiento Sedes Educativas Activas
4	Temas Generales

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 43

DESARROLLO

1. TEMAS GENERALES – PROGRAMACIÓN DE ENTREGAS

Programación de entregas: El Arq. Santiago Ángel, apoyo a la supervisión solicitó a los equipos de los diferentes lotes remitir, a más tardar el día siguiente a las 9:00 a.m., la programación de las actividades y entregas pendientes, indicando las fechas previstas para cada sede. Señaló que las actividades en ejecución deben finalizar dentro del plazo contractual, sin considerar para este efecto la modificación No. 3, y reiteró la necesidad de contar con una programación que permita diferenciar las situaciones en las que la institución educativa no se encuentre disponible para recibir de aquellas en las que el atraso corresponda al contratista o a la interventoría.

Santiago Ángel indicó igualmente que, antes de coordinar la entrega oficial con los rectores o responsables de las instituciones, las obras deben haber sido previamente revisadas y recibidas por la interventoría. Lo anterior, con el fin de evitar desplazamientos a las sedes cuando todavía existan actividades pendientes u observaciones por subsanar. Se solicitó a los equipos mantener comunicación permanente sobre cualquier situación que pueda afectar las fechas previstas y reportarla oportunamente.

Informes mensuales: También reiteró la obligación de presentar los informes mensuales dentro de los plazos establecidos, señalando que en un contrato anterior se presentó una situación disciplinaria relacionada con la entrega extemporánea y posterior publicación de los informes en SECOP. Indicó que, en caso de presentarse nuevamente retrasos, se dejará constancia de la fecha efectiva de radicación por parte de la interventoría y de las consecuencias que dicho retraso genere en el trámite correspondiente. Se informó que, para el periodo actual, la mayoría de los informes fueron presentados oportunamente, registrándose únicamente un caso de entrega posterior al plazo solicitado.

Modificatorios y pólizas: Se informó que el modificatorio correspondiente al Lote 6 había sido validado por la oficina de contratos y que la versión final ya se encontraba radicada, estimándose su aprobación para el viernes. Para el Lote 4 se encontraba pendiente la actualización por parte de Diego, posterior a lo cual se realizaría la radicación definitiva. En el Lote 5, Cristian informó que realizó durante la mañana los ajustes solicitados y que se encontraba pendiente la radicación de la versión final. También se indicó que los modificatorios de los demás lotes e interventorías continuarían posteriormente.

Santiago Ángel recordó que, una vez aprobados los modificatorios, los contratistas deberán realizar la actualización de las pólizas correspondientes y remitirlas para su revisión. Adicionalmente, informó que el formato utilizado para verificar la vigencia y los valores asegurados deberá ser diligenciado y firmado por contratista e interventoría, debido a la interpretación jurídica según la cual la supervisión del contrato corresponde a la interventoría y no directamente a la Secretaría.

Manuales y planos: El apoyo a la supervisión, Santiago Ángel recordó que los manuales de mantenimiento deben ser entregados mínimo dos días antes de la fecha programada para la entrega de cada sede, con el fin de permitir su revisión y realizar las observaciones correspondientes. Como ejemplo, señaló que si una sede se programa para entrega el día 30, el manual debe ser remitido a más tardar el día 28.

También se indicó que los planos de intervención deberán identificar de manera precisa los elementos y áreas intervenidas. Se mencionó como ejemplo la necesidad de señalar exactamente cuáles aparatos sanitarios fueron intervenidos en Fanny Mickey y cuáles fueron las áreas específicas objeto de impermeabilización en Eduardo Umaña. Debido al ingreso de nuevo personal a planoteca de la SED, se solicitó inicialmente remitir un plano representativo por cada lote en Autocad y PDF, con el propósito de validar los criterios de presentación antes de completar los demás documentos.

2. Lote 5 - Seguimiento Sedes Educativas Activas

El Arq. Santiago Ángel manifestó que, de manera general, no se identificaban inconvenientes relevantes respecto del avance del Lote 5, salvo la posibilidad de que los trabajos adicionales previstos en el colegio Rodrigo Lara Bonilla pudieran generar algún ajuste en la programación.

Se indicó que, en términos generales, los frentes actualmente en ejecución del Lote 5 presentan condiciones que permitirían avanzar hacia su entrega, siempre que se culminen las actividades pendientes y se realice previamente la revisión correspondiente por parte de la interventoría.

- **Colegio Paraíso Mirador, Sede D**

El Arq. Jonathan Grajales, residente de obra informó que la sede fue revisada inicialmente por el Ing. Camilo Cárdenas, inspector de interventoría y posteriormente por él, sin que quedaran observaciones pendientes de importancia. Señaló que algunas observaciones menores fueron comunicadas directamente al trabajador encargado y fueron corregidas inmediatamente. Asimismo, informó que se instalaron los 57 postes previstos, incluyendo sus anclajes y elementos complementarios, y que se instalaron los postes y la malla adicional solicitados durante la visita realizada con presencia del encargado de almacén. También se indicó que los tornillos o elementos de fijación que sobresalían fueron cortados y que se cuenta con registro fotográfico de estas actividades.

El Arq. Santiago Ángel indicó que, si se considera necesario, podrá realizarse una nueva revisión por parte de la interventoría. De no requerirse una nueva visita, el Arq. Jonathan Grajales deberá confirmar mediante correo electrónico la fecha a partir de la cual la sede se encuentra lista para entrega, con el fin de coordinar la visita con el rector. Se reiteró que antes de la entrega deberán verificarse las condiciones generales de la sede y retirar cualquier material o residuo de obra.

- **Colegio Paraíso Mirador, Sede B**

Se revisó el estado de las actividades pendientes relacionadas con vidrios, puertas, divisiones, espejos y lavamanos. Se informó que las instalaciones hidráulicas fueron verificadas sin evidenciar fugas y que permanecen algunos elementos por finalizar y ajustar antes de la entrega.

Se solicitó completar los acabados, realizar la limpieza final de las divisiones y mantener protegidas las áreas intervenidas hasta la entrega formal, evitando el uso de los elementos instalados por parte de la comunidad educativa antes de su recibo.

- **Colegio Brasilia – Solicitud de garantía**

La institución educativa informó sobre una solicitud de garantía relacionada con una puerta o división de baño que se desprendió y otra que presenta una condición similar. De acuerdo con lo

manifestado durante el comité, el encargado de almacén indicó que las divisiones vecinas cuentan con un mayor número de remaches y cuestionó las condiciones de instalación.

El apoyo a la supervisión, Arq. Santiago Ángel solicitó realizar una revisión técnica para establecer la causa de la afectación y no limitarse a la reposición del elemento. El residente de obra indicó que coordinaría la visita para el día siguiente o, de ser necesario, para el día posterior. En caso de verificarse que el sistema de fijación requiere refuerzo, se deberá determinar la solución correspondiente y dejar registro de la reparación ejecutada.

- **Colegio Rodrigo Lara Bonilla – Piso chip y saldos disponibles**

El Arq. Jonathan Grajales, residente de obra informó que continúan gestionando las actividades relacionadas con el Piso Chip y que podría presentarse una extensión en la ejecución. Se señaló que esta situación cuenta con justificación asociada al tiempo que tomó el rector para confirmar los trabajos requeridos.

En relación con los saldos disponibles para la atención de actividades adicionales y emergencias, durante el comité se revisó el estado de los recursos disponibles, indicando que se cuenta con un saldo aproximado de $110 millones. Al respecto, el Arq. Santiago Ángel solicitó al director de interventoría, Arq. Héctor Villazón, validar el valor exacto disponible y emitir una comunicación con la información correspondiente y las directrices de la entidad, con el propósito de definir las actividades que puedan ser atendidas con dichos recursos.

3. Lote 6 - Seguimiento Sedes Educativas Activas

Durante el comité se realizó seguimiento a las actividades correspondientes al Lote 6, con énfasis en las intervenciones de los colegios San José de Usme, Ciudad Villavicencio y Guillermo Cano Isaza.

- **Colegio San José de Usme – Problemática de barandas**

Los Ing. Camilo Cárdenas y John Castañeda, inspector y residente de interventoría, informaron sobre la condición de la baranda ubicada en el corredor de circulación, indicando que aproximadamente cuatro parales presentan desprendimiento en sus puntos de apoyo y que existe deterioro por corrosión. Se precisó que el tramo afectado corresponde al costado de circulación utilizado por los estudiantes y no al acceso de la cocina. De acuerdo con la revisión realizada, no resulta conveniente efectuar una soldadura directamente sobre la lámina tipo alfajor existente debido al estado de deterioro del elemento.

Como alternativa se planteó instalar una platina de refuerzo sobre la lámina existente para permitir la fijación del paral, evitando inicialmente el reemplazo completo de la baranda. El Arq. Santiago Ángel solicitó presentar esta alternativa formalmente mediante un informe o comunicación escrita, incluyendo la condición encontrada, solución propuesta, presupuesto y tiempo requerido.

- **Colegio Ciudad de Villavicencio – Avances y entrega por etapas**

Se revisó la programación de entrega de la sede prevista para el 30 de septiembre y el estado de las actividades pendientes. Se informó sobre los trabajos relacionados con el césped sintético y el piso de caucho, indicando que el material ya fue adquirido y se encuentra en proceso de entrega. También se informó que el piso de los salones se encontraba en proceso de desmontaje y ajuste, mientras que la instalación del césped sintético se proyectaba iniciar al día siguiente y la de piso de caucho durante jueves y viernes, incluyendo la posibilidad de continuar durante el fin de semana.

Se revisó igualmente la fabricación de la baranda y las actividades pendientes correspondientes al piso tipo chip y a dos bodegas destinadas al almacenamiento. Se indicó que estas últimas actividades presentan mayor atraso debido a que aún no habían iniciado. Se planteó como alternativa realizar el 30 de septiembre la entrega de las áreas que se encuentren completamente terminadas y programar las actividades restantes después del receso escolar, dejando la respectiva justificación cuando corresponda. El contratista deberá confirmar oportunamente si logra completar la totalidad de las actividades para la fecha prevista.

- **Colegio Guillermo Cano Isaza – Filtraciones y retrasos**

Se informó que la persona encargada de los trabajos no había mantenido comunicación desde el jueves y que además conservaba las llaves de las sedes, situación que impedía garantizar la continuidad de las actividades. El apoyo a la supervisión, Arq. Santiago Ángel manifestó su preocupación debido a que la situación no había sido informada oportunamente y solicitó implementar de inmediato una nueva cuadrilla para retomar los trabajos.

Se indicó que las actividades deberán reiniciarse el jueves y que, de acuerdo con la programación expuesta, podrían extenderse hasta el fin de semana o los primeros días de la semana siguiente. El Arq. Santiago Ángel reiteró que este tipo de situaciones deben comunicarse inmediatamente, especialmente en sedes cuya programación de entrega ya ha sido modificada previamente. También se solicitó remitir evidencia fotográfica de las actividades pendientes y de los trabajos de cerramiento que se encuentran en ejecución.

4. Lote 4 - Seguimiento Sedes Educativas Activas

Durante el comité se realizó seguimiento a las actividades correspondientes al Lote 6, con énfasis en las intervenciones de los colegios Brisas del diamante y la entrega de Rural La Union

- **Arborizadora Alta – Avance de obra**

El Ing. Diego Pinzón, residente de obra informó que las instalaciones eléctricas presentan un avance aproximado del 90 % y que la conexión principal ya se encuentra realizada. Señaló que actualmente se encuentran operativas dos fases y permanece pendiente una tercera, situación que aparentemente estaría relacionada con el proveedor externo del servicio y no con la ejecución de las actividades del contrato.

El apoyo a la supervisión, Arq. Santiago Ángel solicitó al residente de obra remitir el mensaje, audio o soporte en el que se haya reportado esta situación, indicando claramente la condición identificada y la posible responsabilidad del proveedor externo. El documento será trasladado al gestor correspondiente para su verificación y seguimiento antes de la entrega de la sede.

- **Rural La Unión – Finalización de obra y entrega**

El residente de obra, Ing. Diego Pinzón informó que se encuentra pendiente el traslado de materiales y herramientas que permanecen en la sede, así como algunas actividades relacionadas con el cerramiento. Indicó que tiene previsto desplazarse a la sede durante la semana, particularmente el jueves, para completar estos trabajos y avanzar hacia la entrega programada para la semana siguiente.

El Arq. Santiago Ángel solicitó que, una vez finalizadas las actividades, se remita registro fotográfico y se confirme formalmente la terminación. También reiteró que el manual de mantenimiento deberá encontrarse previamente revisado y aprobado antes de la entrega.

- **Brisas del diamante – Área de profesores**

Se revisó la situación relacionada con el área de profesores y las condiciones para continuar con los trabajos. El Ing. Diego Pinzón informó que el aula de profesores se proyecta dejar terminada al día siguiente, indicando que solicitó a la almacenista de la institución mantener los lockers cerrados y protegidos para evitar el ingreso de los docentes al área intervenida.

El Arq. Santiago Ángel señaló que, en caso de que los docentes ingresen al área de trabajo, el contratista o subcontratista deberá suspender la actividad e informar inmediatamente la situación. Se reiteró que estas condiciones deben ser controladas para evitar afectaciones sobre la ejecución. La entrega de la sede se mantiene proyectada aproximadamente para el 13 de octubre.

COMPROMISOS					
#	**ACTIVIDAD/Tarea**	**PRIORIDAD**	**RESPONSABLE**	**FECHA EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
1	Remitir la programación actualizada de las entregas pendientes, indicando las sedes y fechas previstas, para facilitar la coordinación con las instituciones educativas.	Alta	Todos los contratistas – Lote 4,5 y 6.	Fecha límite 25/09/2026	
2	Entregar los manuales de mantenimiento a la interventoría con la anticipación requerida para su revisión, estableciéndose como referencia mínimo dos días antes de la entrega de cada sede.	Alta	Todos los contratistas – Lote 4,5 y 6.	Continuo	
3	Presentar los planos detallados de las intervenciones ejecutadas en Autocad y PDF, identificando claramente los elementos y áreas intervenidas. Inicialmente deberá remitirse un plano representativo por cada lote para validar los criterios con el personal de planoteca.	Alta	Todos los contratistas – Lote 4,5 y 6.	A la mayor brevedad	
4	Actualizar y remitir las pólizas correspondientes una vez sean aprobados los modificatorios contractuales, junto con los	Alta	Todos los contratistas – Lote 4,5 y 6.	Una vez aprobados los modificatorios	

COMPROMISOS					
#	**ACTIVIDAD/Tarea**	**PRIORIDAD**	**RESPONSABLE**	**FECHA EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
	documentos requeridos para su validación.				
5	Mantener la radicación oportuna de los informes mensuales, evitando retrasos que afecten su revisión, aprobación y trámite de pago.	Alta	Todos los contratistas – Lote 4,5 y 6.	Según cronograma de cada informe	
6	Realizar la verificación de las condiciones de entrega del Colegio Brasilia, especialmente respecto de las puertas/divisiones de los baños, determinar la causa de las afectaciones y ejecutar la reparación que corresponda, dejando registro fotográfico.	Alta	Lote 5 – Consorcio Fortaleza	A la mayor brevedad	
7	Confirmar mediante correo electrónico que Paraíso Mirador se encuentra listo para entrega y coordinar la respectiva visita con la institución educativa, una vez verificadas las condiciones finales.	Alta	Lote 5 – Consorcio Fortaleza	Por definir en la programación de entrega	
8	Presentar el reporte técnico de la baranda de San José, incluyendo el estado de los parales, alternativa de intervención, presupuesto y tiempo requerido para su ejecución.	Alta	Lote 5 – Consorcio Pais	A la mayor brevedad	
9	Remitir el soporte de la situación presentada en la instalación eléctrica de Arborizadora Alta, indicando la posible afectación asociada al proveedor externo, para su traslado al gestor y correspondiente verificación.	Alta	Lote 4 – Consorcio Arsaf	Inmediato	
10	Informar inmediatamente cualquier ingreso de docentes o usuarios a las áreas intervenidas de Brisas del Diamante y suspender las actividades en caso de que	Alta	Lote 4 – Consorcio Arsaf	Durante la ejecución	

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 43

COMPROMISOS					
#	**ACTIVIDAD/Tarea**	**PRIORIDAD**	**RESPONSABLE**	**FECHA EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
	dicha situación afecte la ejecución.				

Convocatoria próximo comité:	22-09-2026
Hora de finalización:	5:00 pm

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 44

LUGAR DE LA REUNIÓN:	Reunión virtual	**FECHA:**	29	09	2026	**HORA INICIO:**	2:30 PM
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:	Realizar seguimiento del contrato de obra: CONSORCIO ARSAF Lote 4, CONSORCIO FORTALEZA Lote 5, CONSORCIO PAIS Lote 6.						
PRESIDE:	INTERVENTORIA	**SECRETARIO DE LA REUNIÓN:**	INTERVENTORIA				
PROYECTO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMINETO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS						

NOMBRE	COMPAÑIA	CARGO	FIRMA
Santiago Ángel Uribe	DCCEE	Supervisor Contrato de Interventoría	
Héctor Villazón Gutiérrez	Consorcio Serinco Educativo	Director de Interventoría	
John Castañeda	Consorcio Serinco Educativo	Residente de Interventoría – Lote 5 y 6	JOHN CASTAÑEDA
Cesar Carvajal	Consorcio Serinco Educativo	Residente de Interventoría – Lote 4	
Camilo Cárdenas	Consorcio Serinco Educativo	Inspector de Interventoría	
Wilson Parra Robles	Consorcio País	Director de obra	
Fabio Fajardo	Consorcio País	Residente de obra	
Diego Pinzon	Consorcio ARSAF	Residente de obra	
Deiby Yecid Arias	Consorcio ARSAF	Director de obra	
Cristian Neira	Consorcio Fortaleza	Director de obra	
Jonathan Grajales	Consorcio Fortaleza	Residente de obra	

ORDEN DEL DIA	
1	Lote 4 – Seguimiento Sedes Educativas Activas
2	Lote 5 – Seguimiento Sedes Educativas Activas
3	Lote 6 – Seguimiento Sedes Educativas Activas
4	Atención de Garantías
5	Presentación de NP´s
6	Informes Semanales

DESARROLLO

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 44

1. Lote 4 - Seguimiento Sedes Educativas Activas

El avance del Lote 4 se mantiene prácticamente consolidado, con ocho (8) de las nueve (9) sedes entregadas al 100%. La IED Arborizadora Alta continúa como el único frente en ejecución del lote. El avance programado acumulado 99.88% y avance ejecutado acumulado 99.98%, con un adelanto general del 0.10%. De las nueve (9) sedes educativas del lote, ocho (8) se encuentran entregadas al 100%; únicamente la IED Arborizadora Alta continúa en ejecución, con 99.05% programado y 99.84% ejecutado.

IED Rural la Unión – Finalización y entrega
En visita realizada el 28-092026 se evidencian actividades pendientes de ejecutar tales como: 1. Re emboquillar enchape de piso, 2. cambiar la parte del cielo raso que presenta una tonalidad diferente (un tono amarillo) a la existente, 3. sellar marco de la ventana contra muro ya que presenta dilatación contra muro y 4 reparación de una fuga en la tubería que conecta al tanque de reserva, actividades De acuerdo con lo coordinado por el Arq. Santiago Ángel, apoyo a la supervisión con la IED, la entrega se realizará una vez estas actividades sean subsanadas. Así mismo se informar que el manual de mantenimiento será remitido por la SED directamente a la IED

IED Diego Montaña Cuéllar – Resane de puerta y revisión de fuga
El contratista de obra se encuentra finalizando resanes de la puerta de baño que fue instalada. La entrega se programa para el viernes 2 de octubre de 2026 de acuerdo con la disponibilidad de la IED

Se revisó una fuga reportada por el colegio, evidenciándose que no corresponde a la misma zona donde se atendió la emergencia hace unas semanas; se espera el reporte oficial por parte de la gestión territorial para su revisión.

IED Ciudad de Villavicencio, Sede A – Emergencia (Lote 4)
Se realizó recorrido verificando la intervención por el componente de emergencia atendida en este frente (demolición y reconstrucción de muro), encontrándose terminada. Queda pendiente realizar aseo en el lugar. Se programa su entrega para el viernes 2 de octubre de 2026 por disponibilidad e la rectora de la institución

IED Fanny Mickey – Recorrido e inventario de baños
De acuerdo a la solicitud presentada por la DCCEE, se realizó un recorrido conjunto con representantes del colegio, gestión territorial, Apoyo a la Supervisión y el contratista de obra y la interventoría, con el fin de realizar un inventario de los aparatos existentes en las baterías de baños versus los cambiados (sanitarios, lavamanos, llaves, orinales y push) dentro del alcance contractual atendido por mejoramientos 2025

Entregas administrativas y financieras
Se programó la entrega de los balances de todos los frentes de obra ya terminados para el jueves 1 de octubre de 2026, con sus respectivas firmas, con el fin de contar con dicha información para el documento de liquidación. Asimismo, se acordó entregar ese mismo jueves el flujo de caja de la IED José Celestino Mutis, teniendo en cuenta que el colegio suscribió la prórroga y la adición el 28 de septiembre de 2026, por lo cual dicha sede deberá incorporarse al informe semanal a partir de esta semana.

IED Arborizadora Alta – Entrega programada
Se programó la entrega de la sede para el miércoles 30 de septiembre de 2026 en horas de la mañana

2. Lote 5 - Seguimiento Sedes Educativas Activas

El Lote 5 presenta un avance programado acumulado 93.80% y avance ejecutado acumulado 94.27%, con un adelanto general del 0.46%. De las once (11) sedes educativas, ocho (8) se encuentran entregadas al 100%. Las IED Miguel de Cervantes Saavedra (adelanto de 1.78%) y Paraíso Mirador (adelanto de 1.39%) continúan en ejecución con adelanto frente a lo programado, mientras que la IED Rodrigo Lara Bonilla presenta un atraso del 1.70%.

IED Miguel de Cervantes Saavedra
En recorrido con la gestora territorial, el rector, el almacenista y el pagador de la institución, se efectuó la entrega formal del espacio destinado al comedor y cocina, identificándose la necesidad de la reubicación de un punto eléctrico (tomas). Adicionalmente, quedaron además dos observaciones menores: trasladar un punto hidráulico ubicado cerca de un tomacorriente, e instalar las luminarias del pasillo que no habían sido evidenciadas previamente por encontrarse desmontadas. Actividades que se realizarán en el transcurso de los próximos días.

IED Paraíso, Sede B y Sede D
Se corrigió la filtración identificada previamente en un sanitario de la Sede B. Se programa la entrega de las dos sedes para el 01-10-2026 haciendo entrega de los manuales y matrices de mantenimiento: Paraíso Mirador Sede D (mantenimiento) y Paraíso Sede B (emergencia).

IED Gabriel García Márquez
Continúa sin novedades la instalación del manto en el bloque No. 2. Se prevé realizar la entrega del frente el 5 de octubre de 2026, para lo cual se requiere antes el aval de la interventoría

IED Rodrigo Lara Bonilla
Se encuentra pendiente la adecuación de los desniveles en placa ubicadas en la zona de juegos, que representan un riesgo para los estudiantes, Así mismo se solicitó al contratista presentar un diagnóstico sobre el estado de la cancha deportiva, con el fin de evaluar la viabilidad de su mejora, el alcance y presupuesto

3. Lote 6 - Seguimiento Sedes Educativas Activas

El Lote 6 presenta un avance programado acumulado 98.90% y avance ejecutado acumulado 98.31%, con un atraso general del 0.59%. De las doce (12) sedes educativas, diez (10) se encuentran entregadas al 100%. La IED Guillermo Cano Isaza se encuentra prácticamente nivelada (-0.04%) y la IED Ciudad de Villavicencio presenta el mayor atraso del grupo, con -4.48% frente a lo programado.

IED Santa Librada
Se realizó recorrido con la gestora territorial y el almacenista, revisando la impermeabilización del área de materas, la impermeabilización del corredor, la instalación de césped tipo kikuyo, así como y la pintura de las islas en Adoquín, realizando la entrega de espacios. Se verificaron también los trabajos del comedor (junta de dilatación e instalación

de canal para mitigar el goteo). Se realizó la entrega formal de todas las actividades, quedando pendiente únicamente la instalación de malla angeo en algunos pasantes no contemplada dentro del alcance, pero si requerida por la IED;

Adicionalmente, se intervino un área adicional de cubierta por el componente de emergencia (sobre placa de batería de baños), cuya acta de entrega fue firmada sin observaciones.

IED Guillermo Cano Isaza
Se realizó visita con el contratista de obra para verificar el goteo que se presenta desde la batería sanitaria del piso 3 hacia la batería sanitaria de mujeres del piso 2. El contratista identificó los puntos de reparación requeridos. Queda pendiente una observación relacionada con una fisura en un accesorio hidráulico de un registro. Se programa la entrega de las baterías sanitarias del piso 2 para el 13 de octubre de 2026.

IED San José de Usme
Continúan los trabajos en las rejillas perimetrales y en las tuberías sanitarias correspondientes a los cárcamos. Se realizará visita de seguimiento el 05-10-2026 con el fin de verificar el avance y establecer la fecha de entrega

IED Ciudad de Villavicencio
Continúan los trabajos de instalación de baranda, piso chip y recubrimiento en superboard de los cuartos, así como el refuerzo de las mallas de cerramiento. El apoyo a la supervisión formuló observaciones sobre la limpieza del guardaescoba de gravilla, los remates en aula, grama y cerramiento, y el aseo de la cancha. Se programó un comité de seguimiento en sitio para el lunes 5 de octubre de 2026, dado que la sede debe entregarse a más tardar el 9 de octubre de 2026.

4. Atención de Garantías

A la fecha y según reporte de la SED, está pendiente por atender las emergencias de los colegios:

- IED Fanny Mickey: Del 5 al 12 de octubre – L4
- IED La Arabia: Del 30-09-2026 al 01-10-2026 – L5

Es necesario que la interventoría realice seguimiento constante a los requerimientos de la SED

5. Presentación de NP

El apoyo a la supervisión reitera la necesidad de presentar los NP a la entidad en tiempos que permitan su revisión y aprobación. A la fecha Lote 6 tiene pendiente subsanar NP´s presentados hace mas de un mes. Los NP presentado por Lote 4 están pendientes de revisión por parte de interventoría

Se recuerda que la fecha límite para presentar NP para cada uno de los contratistas es el **15 de noviembre de 2026**, de lo contrario dichas actividades no podrán ser revisadas, avaladas y reconocidas por le entidad

6. Informes Semanales

Teniendo en cuenta la aprobación de los modificatorios No. 3 de los lotes 4 y 6 y la posible aprobación de los Lotes 5 y 2 de interventoría antes del 5 de octubre, se recuerda que dicha información debe ser relacionada en los informes semanales a corte del 04-10-2026, en los que se debe incluir entre otros aspectos:

- Valor adición
- Tiempo de prórroga
- Nuevos frentes de obra con su cronograma y valor
- Avance de ejecución (entre el 01-10-2026 y el 04-10-2026)

Es importante señalar que con las adiciones aprobadas los valores contractuales para frentes de obra y emergencia son de:

Lote 4: $3.805´376.728 + $449´428.203 (emergencia) para un valor total de **$4.254´804.931**

Lote 5: $3.037´124.081 + $504´244.636 (emergencia) para un valor total de **$3.541´368.717**

Lote 6: $3.000´150.155 + $576´900.290 (emergencia) para un valor total de **$3.577´050.445**

Valores que deben corresponder a los balances

Así mismo se solicita a la interventoría, actualizar el consolidado de las emergencias dentro del informe semanal con los avances correspondientes

COMPROMISOS

#	ACTIVIDAD/Tarea	PRIORIDAD	RESPONSABLE	FECHA EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	Finalizar reemboquillado, cambio de cielo raso, sello de ventana y reparación de fuga en tubería en la IED Rural la Unión.	Alta	Lote 4 – Consorcio ARSAF	**29/09/2026**	
2	Finalizar resane de puerta y entregar la IED Diego Montaña Cuéllar.	Alta	Lote 4 – Consorcio ARSAF	**02/10/2026 (viernes)**	
3	Entregar la emergencia atendida en la IED Ciudad de Villavicencio, Sede A (demolición y reconstrucción de muro).	Alta	Lote 4 – Consorcio ARSAF	**02/10/2026 (viernes)**	
4	Entregar los balances de todos los frentes de obra del Lote 4 ya terminados, con sus respectivas firmas.	Alta	Lote 4 – Consorcio ARSAF	**01/10/2026**	

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 44

COMPROMISOS					
#	**ACTIVIDAD/Tarea**	**PRIORIDAD**	**RESPONSABLE**	**FECHA EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
5	Entregar el flujo de caja de la IED José Celestino Mutis.	Alta	Lote 4 – Consorcio ARSAF	**01/10/2026**	
6	Entregar la IED Arborizadora Alta.	Alta	Lote 4 – Consorcio ARSAF	**30/09/2026 9:00 a.m.**	
7	Coordinar y realizar la entrega formal de Paraíso Mirador Sede D (mantenimiento) y Paraíso Sede B (emergencia).	Alta	Lote 5 – Consorcio Fortaleza	**01/10/2026 (mañana)**	
8	Entregar la IED Gabriel García Márquez (bloque No. 2).	Media	Lote 5 – Consorcio Fortaleza	**05/10/2026**	
9	Presentar informe de diagnóstico de la cancha deportiva de la IED Rodrigo Lara Bonilla para evaluar la viabilidad de mejora de las piletas en la zona de juegos.	Alta	Lote 5 – Consorcio Fortaleza	**Por definir**	
10	Instalar la malla angeo pendiente en los pasantes de la IED Santa Librada.	Media	Lote 6 – Consorcio País	**A la brevedad**	
11	Corregir fisura en accesorio de registro y entregar las baterías sanitarias del piso 2 de la IED Guillermo Cano Isaza.	Alta	Lote 6 – Consorcio País	**13/10/2026**	
12	Entregar la emergencia de la IED San José de Usme (rejillas perimetrales y tuberías sanitarias de cárcamos).	Alta	Lote 6 – Consorcio País	**Pendiente definir fecha - sujeta al recorrido del 05-10-2026**	
13	Atender observaciones de apoyo a la supervisión (guardaescoba, remates y aseo de cancha) y realizar comité de seguimiento en sitio en la IED Ciudad de Villavicencio.	Alta	Lote 6 – Consorcio País	**Comité: 05/10/2026 / Entrega: 09/10/2026**	

Convocatoria próximo comité:	05-10-2026
Hora de finalización:	3:45 pm

ANEXO No. 09. PLANILLAS DE PAGO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1072193503	CESAR ALDEMAR CARVAJAL GONZALEZ	calle 16 #5-33	0315295794	cesar_carvajal1707@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	SIBATÉ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-09	I	14/09/2026	34552395	$851.040	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	300.000	0		0		0	0	0	0	300.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	384.000	0	0	0	0	0	0		384.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades						Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización											
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	167.040							167.040			76	167.040	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre		Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	300.000	300.000
Pensión	1	384.000	384.000
Riesgos Laborales	1	167.040	167.040
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	851.040	851.040

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
CC	1072193503	CESAR ALDEMAR CARVAJAL GONZALEZ		calle 16 #5-33	0315295794	cesar_carvajal1707@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	SIBATÉ	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					1	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2026-09	2026-09	I	14/09/2026	34552395	$851.040	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estudiante**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	1072193503	CARVAJAL GONZALEZ CESAR ALDEMAR	57	0			N																			230201	2.400.000	384.000	0	0	0	0	EPS005	2.400.000	300.000	14-4	2.450.000	5	167.040		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901219974-9	SEGA INGENIERIA SAS BIC	cra 57 17-36	3112319124	segaingenieria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94875446	09/10/2026	3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$5,252,715	$1.425.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	140.200	0		0		0	23	2.400	0	142.600	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	70.100	0		0		0	23	1.200	0	71.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	23	4.800	0	285.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	23	4.800	0	285.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	280.200	0	0	0	0	23	4.800	0	285.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	140.300				140.300	23	2.400	142.700			1.403	142.700	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	210.300	23	3.600	213.900	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	23	0	0	0
ICBF				
0	23	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	210.300	213.900
Pensión	3	840.600	855.000
Riesgos Laborales	1	140.300	142.700
CCF	1	210.300	213.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	1.401.500	1.425.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901219974-9	SEGA INGENIERIA SAS BIC	cra 57 17-36	3112319124	segaingenieria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94875446	09/10/2026	3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$5,252,715	$1.425.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1016053198	MIRANDA CAÑON VIVIANA ALEJANDRA	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 79844429	PEREZ OLMOS FRANZ ALEXANDER	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
3	CC 80793169	PARRADO ROZO GERMAN ALONSO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900208425-6	SEIING SAS	transv 52b 2-30	3115134135	seiingadmon2020@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 cot	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95750566	14/10/2026	6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-10	2026-09	E	$10,505,430	$2.254.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	140.200	0		0		0	7	800	0	141.000	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	280.400	0		0		0	7	1.500	0	281.900	4

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	7	1.500	0	281.700	1
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	7	1.500	0	281.700	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	560.400	0	0	0	0	7	2.900	0	563.300	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización	Incapacidades		Aportes Otros	Valor Neto	Días	Valor Mora	Subtotal	No. Radicado	Valor Saldo a	Fondo	Total a Pagar	No. Afiliados
			Obligatoria	No. Autorización	Valor	Sistemas	Cotización	Mora	Cotización	Cotización	Saldo a Favor	Favor	Solidaridad		
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	280.600				280.600	7	1.500	282.100			2.806	282.100	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	420.600	7	2.200	422.800	6

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	7	0	0	0
ICBF				
0	7	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	420.600	422.900
Pensión	3	1.120.800	1.126.700
Riesgos Laborales	1	280.600	282.100
CCF	1	420.600	422.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	2.242.600	2.254.500

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900208425-6	SEIING SAS		transv 52b 2-30	3115134135	seiingadmon2020@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95750566	14/10/2026	6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-10	2026-09	E	$10,505,430	$2.254.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD					RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiando	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 19307265	GUTIERREZ SEGURA HORACIO	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 24756524	GONZALEZ MEJIA MARIA LETICIA	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
3	CC 53037176	GARZON UZETA NOHORA LEONOR	1	0			S																		230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
4	CC 79207204	CANTOR RIVERA FREDY	1	0			S																		25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
5	CC 80070003	GONZALEZ CAMARGO LUIS ALEJANDRO	1	0			S																		25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
6	CC 80257171	SIERRA HERNANDEZ EDWIN FERNANDO	1	0			S																		230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	8767031	HECTOR JOSE VILLAZON GUTIERREZ	Carrera 15a1 N diag 53b - 31	3157351268	hectorvillazon@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		ATLÁNTICO	SOLEDAD		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95964314	13/10/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-09	I	$0	$537.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	235.000	0		0		0	5	900	0	235.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	300.800	0	0	0	0	5	1.100	0	301.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	5	0	0	0
ICBF				
0	5	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	235.000	235.900
Pensión	1	300.800	301.900
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	535.800	537.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	8767031	HECTOR JOSE VILLAZON GUTIERREZ	Carrera 15a1 N diag 53b - 31	3157351268	hectorvillazon@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		ATLÁNTICO	SOLEDAD		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95964314	13/10/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-09	I	$0	$537.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Excenvalo	IND	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 8767031	VILLAZON GUTIERREZ HECTOR JOSE	3	0			N																	25-14	1.880.000	30	300.800	0	0	0	0	EPS042	1.880.000	30	235.000		0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901977271-0	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	TV 52 B # 2 - 30 AP 202	6015372584	aic.gerencia.sas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94929788	18/09/2026	2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-08	Y	$1,750,905	$1.279.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	437.800	0		0		0	2	700	0	438.500	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	2	500	0	280.700	1
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	2	500	0	280.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	243.800				243.800	2	400	244.200			2.438	244.200	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	35.100	2	100	35.200	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	2	0	0	0
ICBF				
0	2	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	437.800	438.500
Pensión	2	560.400	561.400
Riesgos Laborales	1	243.800	244.200
CCF	1	35.100	35.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	1.277.100	1.279.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901977271-0	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	TV 52 B # 2 - 30 AP 202	6015372584	aic.gerencia.sas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94929788	18/09/2026	2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-08	Y	$1,750,905	$1.279.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Excepción	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1024465811	PAREDES SERRANO FABIAN ADOLFO	59	0			N																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF22	1.750.905	30	35.100	0	0	0	0	0
2	CC 1026289628	CARDENAS RODRIGUEZ CAMILO ANDRES	59	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	5	121.900		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ANEXO No. 10. CERTIFICADO PAGO PARAFISCALES

CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO
NIT: 901.977.271-0
Dirección: Calle 98 No. 70-91
Correo: serinco.educativo@gmail.com

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTÍCULO 204 DE LA LEY 100 DE 1993
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

En mi condición de representante legal del **CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO** identificado con NIT. **901.977.271-0**, me permito certificar que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia y revisados los estados financieros del consorcio, con el propósito de verificar el pago efectuado por concepto de los aportes correspondiente a los sistemas de pensiones, Riesgos Profesionales, Cajas Compensación Familiar, el consorcio se encuentra paz y salvo en los últimos 6 meses, con el personal vinculado bajo nómina y ha realizado los respectivos pagos.

Se certifica que se encuentra al día en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, así como el pago de obligaciones de todo el personal vinculado directamente, incluido el personal independiente que prestó sus servicios para la ejecución del proyecto.
En mi condición de representante legal del **CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO** identificado con NIT. **901.977.271-0**, me permito certificar que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia y revisados los estados financieros del consorcio, con el propósito de verificar el pago efectuado por concepto de los aportes correspondiente a los sistemas de pensiones, Riesgos Profesionales, Cajas Compensacion Familiar, el consorcio se encuentra paz y salvo en los últimos 6 meses, con el personal vinculado bajo nómina y ha realizado los respectivos pagos.

Respecto a los pagos correspondientes al sistema de seguridad social en salud, al instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), pensiones, riesgos laborales y caja de compensación familiar de todo el personal vinculado directamente a la ejecución del contrato, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecución del contrato.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

Se expide en Bogotá D.C. a los 20 días del mes de octubre de 2026.

JOSE DARIO CURIEUX MIRANDA.
CC. 79.768.840 DE BOGOTÁ
TP. 151.202-T
CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO

ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
CC. 79.602.923 DE BOGOTÁ
REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR
CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.768.840**

CURIEUX MIRANDA
APELLIDOS

JOSE DARIO
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-JUN-1977**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.82 ESTATURA | **A+** G.S. RH | **M** SEXO

07-JUL-1995 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1500119-42117876-M-0079768840-20031002 03871 03274B 01 150171711

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

151202-T

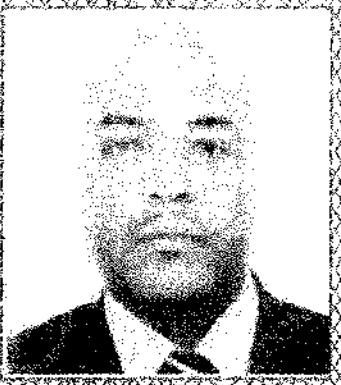

JOSE DARIO
CURIEUX MIRANDA
C.C. 79768840
RESOLUCION INSCRIPCION 204 **FECHA 01/07/2010**
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

PRESIDENTE LEONARDO SANCHEZ

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 161615

FIRMA DEL TITULAR **76162**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4E1FF25B7D8F8CD0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOSE DARIO CURIEUX MIRANDA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79768840 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 151202-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

ARQUITECTURA e INGENIERIA de CONSULTA S.A.S

NIT 901.094.289-2

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSION, ARL Y APORTES PARAFISCALES

ARTÍCULO 204 DE LA LEY 100 DE 1993 -
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 - ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007.

En mi condición de Revisora Fiscal de la sociedad ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S, identificada con NIT. 901.094.289-2, me permito certificar que de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia y revisados los estados financieros de la compañía, con el propósito de verificar el pago efectuado por concepto de los aportes correspondiente a los sistemas de pensiones, Riesgos Profesionales, Cajas de Compensación Familiar, la empresa se encuentra a paz y salvo y ha realizado los respectivos pagos.

Se certifica que se encuentra al día en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, así como el pago de obligaciones de todo el personal vinculado directamente, incluido el personal independiente que prestó sus servicios para la ejecución del proyecto “Respecto a los pagos correspondientes al Régimen Contributivo de Salud de que trata el artículo 204 de la Ley 100 de 1993, acorde con el literal 3 del artículo 8 del Decreto 0862 del 26 de abril del 2013, y para los pagos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la empresa se encuentra exonerada de acuerdo con lo señalado taxativamente en el artículo 8. “Exoneración de aportes parafiscales” del Decreto 0862 del 26 de abril del 2013.

Así mismo, respecto a los pagos laborales, por prestación de servicios y no laborales del personal vinculado, la empresa se encuentra a paz y salvo por todo concepto prestacional y salarial.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

Se expide en Bogotá D.C. a los 20 días del mes de octubre de 2026.

MARIA GLADYS RINCON HURTADO.
CC. 46.674.785 DE DUITAMA.
TP. 126815-T
Revisora Fiscal
ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO SAS

ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
CC. 79.602.923 DE BOGOTA
Representante Legal

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **46.674.785**

RINCON HURTADO

APELLIDOS

MARIA GLADYS

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **09-NOV-1978**

DUITAMA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57	**B+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

13-MAR-1997 DUITAMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0707900-00129117-F-0046674785-20081118 **00062**60471A 1 7300010240

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



126815-T

MARIA GLADYS
RINCON HURTADO
C.C. 46674785
RESOLUCION INSCRIPCION 142 FECHA 07/06/2007
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COL.

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 136938

FIRMA DEL TITULAR 48430

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

LITOFORMAS S.A. 1066 09/2005

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9B464C57D0D0C8960

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA GLADYS RINCON HURTADO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 46674785 de DUITAMA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 126815-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

ANEXO No. 12. REGISTRO CAPACITACIONES

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo		
	NIVEL 7: FORMATOS:	FT-SST-027	
	SG-SST		
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	Agosto 8 de 2025	
	Versión:	01	
	Pagina 1 de 1		

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Bogotá	Colegio Rafael Uribe Uribe	30	09	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		
Charla de seguridad		Manejo de Ruido
Reuniones de SST / Operativas		Ahorro y uso de agua
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo	X	
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	DAMIAN LIAN LEON	18.001.061	AUX DE OBRAS	D. L. L
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Edinson Forero	Edinson Forero

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo		
	NIVEL 7: FORMATOS:	FT-SST-027	
	SG-SST		
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA		Fecha:	Agosto 8 de 2025
		Versión:	01
			Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Bogotá	Colegio Eduardo Umaña	30	09	26

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		Manejo de Ruido
Charla de seguridad		Ahorro y uso de agua
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo	X	
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	JHON CARDOZO	9.135176	AYUDANTE	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Edinson Forero	Edinson Forero

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS:	FT-SST-027
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	Agosto 8 de 2025
	Versión:	01
		Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Bogota	Colegio San Jose de usme	30	09	26

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál? Manejo de residuo Ahorro uso Eficiente del agua
Reinducción		
Charla de seguridad		
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo	X	
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Clemente Rodriguez	7905744	Soldador	
2	HENRY JAramillo	1123 116 431	AUX	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Edinson Forero	Edinson Forero

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	NIVEL 7: FORMATOS: FT-SST-027
	SG-SST

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: Agosto 8 de 2025
	Versión: 01
	Página 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Bogota	Colegio Ciudad de Villavicencio	30	09	26

ACTIVIDAD REALIZADA	TEMAS TRATADOS
Inducción	Cual? Manejo de Residuo. Ahorro y uso eficiente del agua.
Reinducción	
Charla de seguridad	
Reuniones de SST / Operativas	
Seminario / Taller / Curso	
Capacitación específica al cargo	
Otra	

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Luis Marino Josse G	1205405G	oficia	
2	Jose Andres Sinisio Alvarez	1143333075	Ayudante	Jose.
3	Alberto Moreno	85201577	oficial	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Edinson Forero	Edinson Forero

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS:	FT-SST-027
	SG-SST	
		Fecha: Agosto 8 de 2025
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA		Versión: 01
		Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Bogotá	Colegio Ciudad de Villavicencio	31	08	26

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		(Cuál)
Reinducción		
Charla de seguridad	X	Uso de EPP y autocuidado
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Marcelo Zoneto V.	80.81.087	M.T.O	M.Z.V.
2	Joseph caleb Baron	60797-3331	Ayudante	
3	FREIDER CHAMORRO	1743442963	Ayudante	FREIDER
4	Wilson Panda Narvaez	1022973256	Ayudante	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Edinson Lerma	Edinson Lerma

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS:	FT-SST-027
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	Agosto 8 de 2025
	Versión:	01
		Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Bogota	Colegio Santa Librada	31	08	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál? Uso de EPP y alto cuidado
Reinducción		
Charla de seguridad	X	
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	James Daniel Chivara	80157852	maestro	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Edinson Ferro	Edinson Ferro 1072939108

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS:	FT-SST-027
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	Agosto 8 de 2025
	Versión:	01
		Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Bogotá	Colegio Eduardo Umaña	31	08	26

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		
Charla de seguridad	X	uso de EPP y acto cuidado
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Juan David Ortiz	1120863055	Aux	
2	Diego Trujillo	91363817	Oficial	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Edinson Forero	Edinson Forero

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS:	FT-SST-027
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: Agosto 8 de 2025	
	Versión: 01	
	Pagina 1 de 1	

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Bogota	colegio Eduardo umaña	08	09	26

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		Buen uso de Herramientas
Charla de seguridad		Buen uso del agua
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Diego Troslavina	91363811	oficial	
2	JHON CARDOZO	91135176	AYUDANTE	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	
Nombre	Firma
Edinson Lemus	Edinson Lemus

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS:	FT-SST-027
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	Agosto 8 de 2025
	Versión:	01
		Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Bogota	Colegio Ciudad de Villa	08	09	26

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		
Charla de seguridad	X	Buen uso de Herramientas Buen uso del agua
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	RODRIGO LEGUIZAMÓN TRUJILLO	80879232	Ayudante	
2	Jhon Caled Baran	1007973351	Ayudante	
3	Wilson Parada Narvaez	1072977256	Auxiliar	
4	Frgider Chamorro	1143442963	Ayudante	Frgider
5	Pablo Burgos V.	80.181.087	M. de Obra	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Edinson Ferro	Edinson Ferro

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS:	FT-SST-027
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	Agosto 8 de 2025
	Versión:	01
	Pagina 1 de 1	

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Bogota.	Rafael Uribe Uribe	17	09	2025

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		
Charla de seguridad	X	Uso adecuado de Herramienta
Reuniones de SST / Operativas		Buen estado saludable.
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Teovaldo A. Rodriguez	[illegible]	85.461.472	
2	DOMINGO LIÑAN LEON	18.001.061	AUX DE OBRA	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Edinson Forero	Edinson Forero

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS:	FT-SST-027
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: Agosto 8 de 2025	
	Versión: 01	
	Pagina 1 de 1	

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Bogota	Colegio Eduardo umaña mendoza	17	09	2025

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		
Charla de seguridad	X	Auto cuidado Buen uso de EPP.
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	JHON CARDOZO	911351756	AUXILIAR	
2	Diego Castaño	71367812	OPERARIO	
3	[illegible]	10 [illegible] 378	OPERARIO	[illegible]
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Edinson Lerma	Edinson Lerma

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	NIVEL 7: FORMATOS: FT-SST-027
	SG-SST
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: Agosto 8 de 2025
	Versión: 01
	Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Bogota	Cdjo owas de [illegible]	27	09	26

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		
Charla de seguridad	X	Buen uso del agua consecuencias de consumir alcohol en
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Luis Beltran	79 165 624	operario	
2	Henry Fernandez	1123 116 431	AUX	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Edwan Forero	Edwan Forero

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS:	FT-SST-027
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	Agosto 8 de 2025
	Versión:	01
		Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Bogotá	Colegio Ciudad de Silbuperco	22	09	26

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		
Charla de seguridad	X	Buen uso del agua, Cuidado del medio ambiente
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Jose Andres Silgado Alvarez	1143333075	Ayudante	Jose Silgado
2	[illegible]	85201779	Oficial	[illegible]
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	
Nombre: Edinson Forero	Firma: Edinson Forero

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	NIVEL 7: FORMATOS: FT-SST-027
	SG-SST
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: Agosto 8 de 2025
	Versión: 01
	Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Bogota	Colegio Santa Librada	22	09	26

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		
Charla de seguridad	X	Ahorro cuidado Buen uso del agua
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Arís Nelson Mogollon D	1070546591	instalador	
2	Fabian David Jara Soler	1078367125	Auxiliar	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Edinson Fororo.	Edinson Fororo

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS:	FT-SST-027
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	Agosto 8 de 2025
	Versión:	01
	Pagina 1 de 1	

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Bogotá	Colegio San Jose	22	09	26

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		
Charla de seguridad	X	Auto cuidado Buen uso del agua
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Jose Lares	1663959262	Ayte.	
2	Clemente Rodriguez	79056741	Soldador	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Edinson Forero	Edinson Forero

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS:	FT-SST-027
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: Agosto 8 de 2025	
	Versión: 01	
	Pagina 1 de 1	

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Bogotá	Colegio Eduardo Carranza	22	09	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		
Charla de seguridad	X	Alto cuidado
Reuniones de SST / Operativas		Buen uso del agua
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Diego Tinjaino	91365817	Oficial (CE)	
2	Jhon Cardozo	901351768	AYUDANTE	
3	CLUEY	10 [illegible] 358	AUXILIAR	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Edinson Forero	Edinson Forero

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo		
	NIVEL 7:	FORMATO N°:	FT-SST-025
	SG-SST		
FORMATO REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Fecha:	Agosto 8 de 2025
		Versión:	01
		Pagina 1 de 1	

REGISTRO INDUCCION - REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA: 09/09/2026 INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ]

NOMBRE: Henry Jaramillo CEDULA: 1123116431

AREA/SECCION: Operativo CARGO: Aux obra

ENCARGADO DE LA INDUCCION: Edinson Lora

OBJETIVO GENERAL

Con el propósito de dar a conocer al personal que ingresa a nuestra compañía las políticas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas y así promover y preservar la salud de los trabajadores, en la inducción al nuevo trabajador se le dan los siguientes temas:

* Bases del SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.
* Conceptos básicos de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
* Explicación del REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
* Entrega y explicación de las ESTANDARES GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la empresa.
* Divulgación factores de riesgo al interior de la empresa.

BIOLÓGICO	FÍSICO	QUÍMICO
PSICOSOCIAL	BIOMECÁNICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD
FENOMEROS NATURALES		

* Procedimientos para tareas de alto riesgo.

Yo como trabajador de la empresa estoy comprometido con las normas y procedimientos de seguridad dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor.

Duración de la inducción: 1:00 HORA

Declaro que conozco el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, así mismo los estandares, procedimientos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, me comprometo a cumplirlas e informar de inmediato cualquier condición que considere afecte mi salud y condiciones de trabajo

Henry Jaramillo
Firma del Trabajador
C.C. 1123 116 431

Responsable del SG-SST
C.C.

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo		
	NIVEL 7:	FORMATO N°:	FT-SST-025
	SG-SST		
FORMATO REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Fecha:	Agosto 8 de 2025
		Versión:	01
		Página 1 de 1	

REGISTRO INDUCCION - REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA: 17/09/2026 INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ]

NOMBRE: Giovanny Alfonso R. CEDULA: 85.461.472

AREA/SECCION: operativo CARGO: Auxiliar

ENCARGADO DE LA INDUCCION: Edinson Forero

OBJETIVO GENERAL

Con el proposito de dar a conocer al personal que ingresa a nuestra compañía las politicas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas y así promover y preservar la salud de los trabajadores, en la inducción al nuevo trabajador se le dan los siguientes temas:

* Bases del SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.
* Conceptos bàsicos de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
* Explicación del REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
* Entrega y explicación de las ESTANDARES GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la empresa.
* Divulgación factores de riesgo al interior de la empresa.

BIOLÓGICO	FÍSICO	QUÍMICO
PSICOSOCIAL	BIOMECÁNICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD
FENOMEROS NATURALES		

* Procedimientos para tareas de alto riesgo.

Yo como trabajador de la empresa estoy comprometido con las normas y procedimientos de seguridad dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor.

Duración de la inducción: 1:00 HORA

Declaro que conozco el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, así mismo los estandares, procedimientos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, me comprometo a cumplirlas e informar de inmediato cualquier condición que considere afecte mi salud y condiciones de trabajo

Firma del Trabajador
C.C. 85.461.472

Responsable del SG-SST
C.C.

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo		
	NIVEL 7:	FORMATO N°:	FT-SST-025
	SG-SST		
RATO REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Fecha:	Agosto 6 de 2025
		Versión:	01
		Página 1 de 1	

REGISTRO INDUCCION - REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA: 22/09/2026 INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ]

NOMBRE: Clemente Rodriguez CARGO: Soldador CEDULA: 7905674

AREA/SECCION: Operativo CARGO: Soldador

ENCARGADO DE LA INDUCCION: Edinson Acevedo

OBJETIVO GENERAL

Con el proposito de dar a conocer al personal que ingresa a nuestra compañía las politicas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas y así promover y preservar la salud de los trabajadores, en la inducción al nuevo trabajador se le dan los siguientes temas:

* Bases del SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.
* Conceptos bàsicos de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
* Explicación del REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
* Entrega y explicación de las ESTANDARES GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la empresa.
* Divulgación factores de riesgo al interior de la empresa.

BIOLÓGICO	FÍSICO	QUÍMICO
PSICOSOCIAL	BIOMECÁNICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD
FENOMEROS NATURALES		

* Procedimientos para tareas de alto riesgo.

Yo como trabajador de la empresa estoy comprometido con las normas y procedimientos de seguridad dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor.

Duración de la inducción: 1:00 HORA

Declaro que conozco el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, así mismo los estandares, procedimientos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, me comprometo a cumplirlas e informar de inmediato cualquier condición que considere afecte mi salud y condiciones de trabajo

Firma del Trabajador
C.C. 7905674 Bta

Responsable del SG-SST
C.C.

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo		
	NIVEL 7:	FORMATO N°:	FT-SST-025
	SG-SST		
ATO REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Fecha:	Agosto 8 de 2025
		Versión:	01
		Pagina 1 de 1	

REGISTRO INDUCCION - REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA: 26 log 2026 INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ]

NOMBRE: Esteban David Tuta Soler CEDULA: 1078367125

AREA/SECCION: Operativo CARGO: Patiov

ENCARGADO DE LA INDUCCION: Edinson Royero

OBJETIVO GENERAL

Con el proposito de dar a conocer al personal que ingresa a nuestra compañía las politicas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas y asi promover y preservar la salud de los trabajadores, en la inducción al nuevo trabajador se le dan los siguientes temas:

* Bases del SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.
* Conceptos bàsicos de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
* Explicación del REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
* Entrega y explicación de las ESTANDARES GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la empresa.
* Divulgación factores de riesgo al interior de la empresa.

BIOLÓGICO	FÍSICO	QUÍMICO
PSICOSOCIAL	BIOMECÁNICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD
FENOMEROS NATURALES		

* Procedimientos para tareas de alto riesgo.

Yo como trabajador de la empresa estoy comprometido con las normas y procedimientos de seguridad dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor.

Duración de la inducción: 1:00 HORA

Declaro que conozco el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, así mismo los estandares, procedimientos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, me comprometo a cumplirlas e informar de inmediato cualquier condición que considere afecte mi salud y condiciones de trabajo

Firma del Trabajador
C.C. 1078367125

Responsable del SG-SST
C.C.

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo		
	NIVEL 7:	FORMATO N°: FT-SST-025	
	SG-SST		
ATO REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Fecha: Agosto 8 de 2025 Versión: 01 Pagina 1 de 1	

REGISTRO INDUCCION - REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA: 29/09/2026. INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ]

NOMBRE: Luis Victor Mogollon CEDULA: 1104546541

AREA/SECCION: Operativo CARGO: Pintor.

ENCARGADO DE LA INDUCCION: Edinson Feron

OBJETIVO GENERAL

Con el proposito de dar a conocer al personal que ingresa a nuestra compañía las politicas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas y así promover y preservar la salud de los trabajadores, en la inducción al nuevo trabajador se le dan los siguientes temas:

* Bases del SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.
* Conceptos bàsicos de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
* Explicación del REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
* Entrega y explicación de las ESTANDARES GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la empresa.
* Divulgación factores de riesgo al interior de la empresa.

BIOLÓGICO
PSICOSOCIAL
FENOMEROS NATURALES

FÍSICO
BIOMECÁNICOS

QUÍMICO
CONDICIONES DE SEGURIDAD

* Procedimientos para tareas de alto riesgo.

Yo como trabajador de la empresa estoy comprometido con las normas y procedimientos de seguridad dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor.

Duración de la inducción: 1:00 HORA

Declaro que conozco el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, así mismo los estandares, procedimientos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, me comprometo a cumplirlas e informar de inmediato cualquier condición que considere afecte mi salud y condiciones de trabajo

Firma del Trabajador
C.C. 1104546541

Responsable del SG-SST
C.C.

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo		
	NIVEL 7:	FORMATO N°:	FT-SST-025
	SG-SST		
ATO REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Fecha:	Agosto 8 de 2025
		Versión:	01
		Pagina 1 de 1	

REGISTRO INDUCCION - REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA: 24/09/2025 INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ]

NOMBRE: Yuber Jaimes Diaz CEDULA: 85201579

AREA/SECCION: Operativo CARGO: Oficial

ENCARGADO DE LA INDUCCION: Edinson Cararo

OBJETIVO GENERAL

Con el proposito de dar a conocer al personal que ingresa a nuestra compañía las politicas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas y así promover y preservar la salud de los trabajadores, en la inducción al nuevo trabajador se le dan los siguientes temas:

* Bases del SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.
* Conceptos bàsicos de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
* Explicación del REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
* Entrega y explicación de las ESTANDARES GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la empresa.
* Divulgación factores de riesgo al interior de la empresa.

BIOLÓGICO	FÍSICO	QUÍMICO
PSICOSOCIAL	BIOMECÁNICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD
FENOMEROS NATURALES		

* Procedimientos para tareas de alto riesgo.

Yo como trabajador de la empresa estoy comprometido con las normas y procedimientos de seguridad dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor.

Duración de la inducción: 1:00 HORA

Declaro que conozco el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, así mismo los estandares, procedimientos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, me comprometo a cumplirlas e informar de inmediato cualquier condición que considere afecte mi salud y condiciones de trabajo

Firma del Trabajador
C.C. 85201579

Responsable del SG-SST
C.C.

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATO N°: FT-SST-025	
	SG-SST	
ATO REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: Agosto 8 de 2025	
	Versión: 01	
	Página 1 de 1	

REGISTRO INDUCCION - REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA: 22/09/2026 INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ]

NOMBRE: JOSE LARIS CEDULA: 1063928266

AREA/SECCION: OPAYO CARGO: AYUDANTE

ENCARGADO DE LA INDUCCION: EDINSON TORRES

OBJETIVO GENERAL

Con el proposito de dar a conocer al personal que ingresa a nuestra compañía las politicas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas y así promover y preservar la salud de los trabajadores, en la inducción al nuevo trabajador se le dan los siguientes temas:

* Bases del SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.
* Conceptos básicos de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
* Explicación del REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
* Entrega y explicación de las ESTANDARES GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la empresa.
* Divulgación factores de riesgo al interior de la empresa.

BIOLÓGICO	FÍSICO	QUÍMICO
PSICOSOCIAL	BIOMECÁNICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD
FENOMEROS NATURALES		

* Procedimientos para tareas de alto riesgo.

Yo como trabajador de la empresa estoy comprometido con las normas y procedimientos de seguridad dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor.

Duración de la inducción: 1:00 HORA

Declaro que conozco el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, así mismo los estandares, procedimientos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, me comprometo a cumplirlas e informar de inmediato cualquier condición que considere afecte mi salud y condiciones de trabajo

Firma del Trabajador
C.C. 1063928266

Responsable del SG-SST
C.C.

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATO N°: FT-SST-025	
	SG-SST	
ATO REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: Agosto 8 de 2025	
	Versión: 01	
	Pagina 1 de 1	

REGISTRO INDUCCION - REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA: 21/09/2026 INDUCCIÓN [1] REINDUCCIÓN [ ]

NOMBRE: Luis Alfonso Cordo Malaver CEDULA: 79165624

AREA/SECCION: Operativo CARGO: oficial

ENCARGADO DE LA INDUCCION: Edinson Ferro

OBJETIVO GENERAL

Con el proposito de dar a conocer al personal que ingresa a nuestra compañía las politicas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas y así promover y preservar la salud de los trabajadores, en la inducción al nuevo trabajador se le dan los siguientes temas:

* Bases del SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.
* Conceptos bàsicos de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
* Explicación del REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
* Entrega y explicación de las ESTANDARES GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la empresa.
* Divulgación factores de riesgo al interior de la empresa.

BIOLÓGICO	FÍSICO	QUÍMICO
PSICOSOCIAL	BIOMECÁNICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD
FENOMEROS NATURALES		

* Procedimientos para tareas de alto riesgo.

Yo como trabajador de la empresa estoy comprometido con las normas y procedimientos de seguridad dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor.

Duración de la inducción: 1:00 HORA

Declaro que conozco el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, así mismo los estandares, procedimientos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, me comprometo a cumplirlas e informar de inmediato cualquier condición que considere afecte mi salud y condiciones de trabajo

Firma del Trabajador
C.C. 79165624

Responsable del SG-SST
C.C.

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo		
	NIVEL 7:	FORMATO N°:	FT-SST-025
	SG-SST		
FORMATO REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Fecha:	Agosto 8 de 2025
		Versión:	01
		Página 1 de 1	

REGISTRO INDUCCION - REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA: 10/09/2026 INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ]

NOMBRE: Jose Andres Sierra CEDULA: 1143333075

AREA/SECCION: Operativo CARGO: Auxiliar

ENCARGADO DE LA INDUCCION: Edwin Forero

OBJETIVO GENERAL

Con el proposito de dar a conocer al personal que ingresa a nuestra compañía las políticas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas y así promover y preservar la salud de los trabajadores, en la inducción al nuevo trabajador se le dan los siguientes temas:

* Bases del SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.
* Conceptos básicos de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
* Explicación del REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
* Entrega y explicación de las ESTANDARES GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la empresa.
* Divulgación factores de riesgo al interior de la empresa.

BIOLÓGICO	FÍSICO	QUÍMICO
PSICOSOCIAL	BIOMECÁNICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD
FENOMEROS NATURALES		

* Procedimientos para tareas de alto riesgo.

Yo como trabajador de la empresa estoy comprometido con las normas y procedimientos de seguridad dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor.

Duración de la inducción: 1:00 HORA

Declaro que conozco el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, así mismo los estandares, procedimientos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, me comprometo a cumplirlas e informar de inmediato cualquier condición que considere afecte mi salud y condiciones de trabajo

Jose Andres

Firma del Trabajador
c.c. 1143333075

Responsable del SG-SST
c.c.

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo		
	NIVEL 7:	FORMATO N°:	FT-SST-025
	SG-SST		
MATO REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Fecha:	Agosto 8 de 2025
		Versión:	01
		Página 1 de 1	

REGISTRO INDUCCION - REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA: 09/09/2025 INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ]

NOMBRE: DOMINGO LIÑAN LEON CEDULA: 18.001.061

AREA/SECCION: OPERATIVO CARGO: AUX DE OBRA

ENCARGADO DE LA INDUCCION: Edinson Herrera

OBJETIVO GENERAL

Con el proposito de dar a conocer al personal que ingresa a nuestra compañía las politicas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas y así promover y preservar la salud de los trabajadores, en la inducción al nuevo trabajador se le dan los siguientes temas:

* Bases del SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.
* Conceptos bàsicos de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
* Explicación del REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
* Entrega y explicación de las ESTANDARES GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la empresa.
* Divulgación factores de riesgo al interior de la empresa.

BIOLÓGICO	FÍSICO	QUÍMICO
PSICOSOCIAL	BIOMECÁNICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD
FENOMEROS NATURALES		

* Procedimientos para tareas de alto riesgo.

Yo como trabajador de la empresa estoy comprometido con las normas y procedimientos de seguridad dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor.

Duración de la inducción: 1:00 HORA

Declaro que conozco el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, así mismo los estandares, procedimientos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, me comprometo a cumplirlas e informar de inmediato cualquier condición que considere afecte mi salud y condiciones de trabajo

Domingo Liñan Leon

Firma del Trabajador
C.C. 18.001.061. Sri

Responsable del SG-SST
C.C.

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo		
	NIVEL 7:	FORMATO N°:	FT-SST-025
	SG-SST		
MATO REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Fecha:	Agosto 8 de 2025
		Versión:	01
		Página 1 de 1	

REGISTRO INDUCCION - REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA: 17/09/2026 INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ]

NOMBRE: Ivana Liliana González Pérez CEDULA: 1022371246

AREA/SECCION: Operaria CARGO: Residente

ENCARGADO DE LA INDUCCION: Edinson Herrera

OBJETIVO GENERAL

Con el proposito de dar a conocer al personal que ingresa a nuestra compañía las politicas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas y así promover y preservar la salud de los trabajadores, en la inducción al nuevo trabajador se le dan los siguientes temas:

* Bases del SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.
* Conceptos bàsicos de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
* Explicación del REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
* Entrega y explicación de las ESTANDARES GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la empresa.
* Divulgación factores de riesgo al interior de la empresa.

BIOLÓGICO	FÍSICO	QUÍMICO
PSICOSOCIAL	BIOMECÁNICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD
FENOMEROS NATURALES		

* Procedimientos para tareas de alto riesgo.

Yo como trabajador de la empresa estoy comprometido con las normas y procedimientos de seguridad dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor.

Duración de la inducción: 1:00 HORA

Declaro que conozco el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, así mismo los estandares, procedimientos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, me comprometo a cumplirlas e informar de inmediato cualquier condición que considere afecte mi salud y condiciones de trabajo

Firma del Trabajador
C.C. 1022371246


Responsable del SG-SST
C.C.

Powered by CamScanner

ANEXO No. 13. REGISTRO FOTOGRAFICO

 	 
Fotografía No.1: Brillado divisiones en acero inoxidable	**Fotografía No.2:** Brillado divisiones en acero inoxidable, instalaciones electricas
 	 
Fotografía No.3: Brillado divisiones en acero inoxidable, instalación lavamanos de pedestal	**Fotografía No.4:** Brillado divisiones en acero inoxidable, y aseo

Tabla 18 - Registro fotográfico Colegio Guillermo Cano Isaza
Fuente: Propia

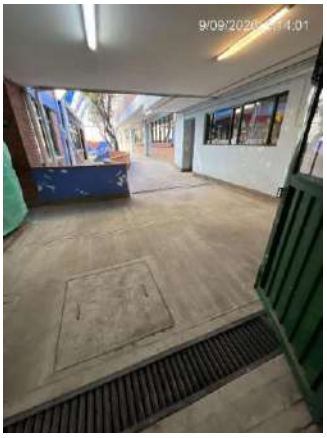



Fotografía No.5: Terminación de detalles placa en concreto






Fotografía No.6: Adecuación rampa de acceso zona parque infantil





Fotografía No.7: Pintura aula (ludoteca) y corredor principal

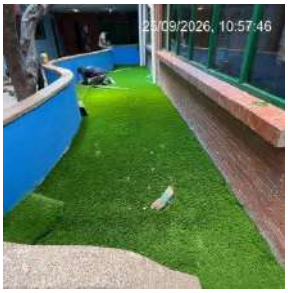



Fotografía No.8: Instalación grama, instalación piso vinilo aula (ludoteca)

Tabla 19 - Registro fotográfico Colegio Ciudad de Villavicencio
Fuente: Propia

 	 
Fotografía No.9: Instalación piso chip, zona parque.	**Fotografía No.10: Adecuación cuartos con** superboard

Tabla 20 - Registro fotográfico Colegio Ciudad de Villavicencio
Fuente: Propia





Fotografía No.11: Alistado de nivelación





Fotografía No.12: Instalación de manto en aluminio





Fotografía No.13: Alistado de nivelación, instalación de flanches





Fotografía No.14: Instalación de manto en aluminio

Tabla 21 - Registro fotográfico Colegio Ciudad de Villavicencio
Fuente: Propia


 	 
Fotografía No.15: Instalación de membrana poliurea	**Fotografía No.16:** Instalación de flanches e instalación de manto en aluminio.

Tabla 22 - Registro fotográfico Colegio Eduardo Umaña Mendoza
Fuente: Propia





Fotografía No.17: Instalación de membrana poliurea (impermeabilización)

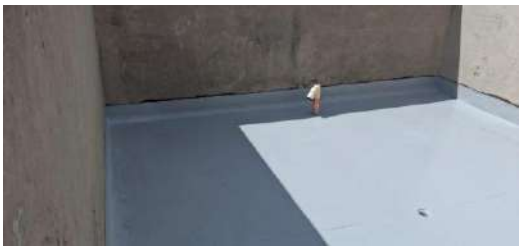



Fotografía No.18: Instalación de membrana poliurea (impermeabilización)



Fotografía No.19: Instalación de membrana poliurea (impermeabilización)



Fotografía No.20: Instalación de membrana poliurea (impermeabilización)

Tabla 23 - Registro fotográfico Colegio Santa Librada
Fuente: Propi





Fotografía No.21: Instalación poli sombra, inicio de cortes en lamina de alfajía para instalación de cárcamos.





Fotografía No.22: Instalación de carcamos





Fotografía No.23: instalación de tubería de conducción del cárcamo



Fotografía No.24: instalación de rejillas perimetrales.

Tabla 24 - Registro fotográfico Colegio San José de Usme
Fuente: Propia







Fotografía No.25: Demolición de muros divisorios – Rafael Uribe Uribe

Fotografía No.26: desmonte de aparatos sanitarios, desmonte de puertas – Rafael Uribe Uribe









Fotografía No.27: Demolición de enchapes y pañetes - Guayasamin

Fotografía No.28: Demolición de enchapes y pañetes y demolición de pisos - Guayasamin

Tabla 25 - Registro fotográfico Colegio Rafael Uribe Uribe y Oswaldo Guayasamin
Fuente: Propia

ANEXO No. 14. RELACION DE CORRESPONDENCIA

ANEXO 1	CORRESPONDENCIA ENVIADA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA SED-CM-A-DCCEE-018-2025.	
PERIODO: SEPTIEMBRE 2026		
FECHA: 05 DE OCTUBRE	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"	
VERSION: 1		

No. CONSECUTIVO	TIPO	FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	GRUPO	ASUNTO	MODO DE RADICACION	ARCHIVO	ELABORADO POR:	No. RADICADO
CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA										
SERINCO-SDE-L5-2025-001	COMUNICACIÓN	8 sep 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	REMISIÓN DE INFORMACIÓN PRELIMINAR INICIO CONTRATOS - FORMATOS LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L6-2025-002	COMUNICACIÓN	9 sep 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	REMISIÓN DE INFORMACIÓN PRELIMINAR INICIO CONTRATOS - FORMATOS LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L6-2025-003	COMUNICACIÓN	9 sep 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REMISION DE DOCUMENTOS PARA SUSCRIPCION DE ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE OBRA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L6-2025-004	COMUNICACIÓN	9 sep 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	REMISIÓN DE INFORMACIÓN PRELIMINAR INICIO CONTRATOS - FORMATOS LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L6-2025-005	COMUNICACIÓN	9 sep 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION		REMISION DE DOCUMENTOS PARA SUSCRIPCION DE ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L6-2025-006	COMUNICACIÓN	9 sep 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	REMISIÓN FORMATOS DE INFORME MENSUALE Y PRELIMINAR - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L6-2025-007	COMUNICACIÓN	9 sep 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	REMISIÓN FORMATOS DE INFORME MENSUALE Y PRELIMINAR - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L6-2025-008	COMUNICACIÓN	9 sep 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	REMISIÓN FORMATOS DE INFORME MENSUALE Y PRELIMINAR - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L6-2025-009	COMUNICACIÓN		C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	RADICACIÓN DE POLIZA EN FISICO				
SERINCO-SDE-L6-2025-010	COMUNICACIÓN		C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	REMISION DE HOJAS DE VIDA DE INTERVENTORIA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L6-2025-011	COMUNICACIÓN	1 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	REMISIÓN DE INFORMACIÓN PRELIMINAR INICIO CONTRATOS - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L6-2025-012	COMUNICACIÓN	1 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	REMISIÓN DE INFORMACIÓN PRELIMINAR INICIO CONTRATOS - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L6-2025-013	COMUNICACIÓN	1 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	REMISIÓN DE INFORMACIÓN PRELIMINAR INICIO CONTRATOS - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L6-2025-014	COMUNICACIÓN	3 oct 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	REMISION DE HOJAS DE VIDA DE INTERVENTORIA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L6-2025-015	COMUNICACIÓN		C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	REMISION DE HOJAS DE VIDA DE INTERVENTORIA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L6-2025-016	COMUNICACIÓN	6 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	REMISIÓN DE ACTA DE INICIO - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L6-2025-017	COMUNICACIÓN	6 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	REMISIÓN DE ACTA DE INICIO - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L6-2025-018	COMUNICACIÓN	6 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	REMISIÓN DE ACTA DE INICIO - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L5-2025-019	COMUNICACIÓN	6 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	REITERACIÓN SERINCO-SDE-L5-2025-001 - REMISIÓN INFORMACIÓN ACTAS DE INICIO	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L6-2025-020	COMUNICACIÓN	6 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	REITERACIÓN SERINCO-SDE-L6-2025-002 - REMISIÓN INFORMACIÓN ACTAS DE INICIO	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L4-2025-021	COMUNICACIÓN	6 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	REITERACIÓN SERINCO-SDE-L6-2025-004 - REMISIÓN INFORMACIÓN ACTAS DE INICIO	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L5-2025-022	COMUNICACIÓN	7 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	OBSERVACIONES INFORME PRELIMINAR	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L4-2025-023	COMUNICACIÓN	7 oct 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	REMISION DE HOJAS DE VIDA DE INTERVENTORIA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L4-2025-024	COMUNICACIÓN	8 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	REMISION OBSERVACIONES PRESUPUESTOS POR SEDE	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L6-2025-025	COMUNICACIÓN	8 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	REMISION DE OBSERVACIONES A PRESUPUESTO POR SEDE	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L5-2025-026	COMUNICACIÓN	8 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	SERINCO-SDE-2025-026-L5-REMISION DE OBSERVACIONES A LOS PRESUPUESTOS POR SEDE	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON	
SERINCO-SDE-L5-2025-027	COMUNICACIÓN	9 oct 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	REMISION DE HOJAS DE VIDA DE INTERVENTORIA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L5-2025-028	COMUNICACIÓN	9 oct 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	ACTUALIZACION DE POLIZAS SEGUN ACTA DE INICIO - INTERVENTORIA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L6-2025-029	COMUNICACIÓN	10 oct 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	REMISION DE HOJAS DE VIDA DE INTERVENTORIA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L6-2025-030	COMUNICACIÓN	14 oct 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	REMISION DE HOJA DE VIDA PARA CAMBIO DE RESIDENTE	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L5-2025-031	COMUNICACIÓN	15 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	TRASLADO SED-CF-L5-2025-004	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L5-2025-032	COMUNICACIÓN	15 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	REMISION DE OBSERVACIONES A HOJAS DE VIDA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L5-2025-033	COMUNICACIÓN	17 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	REMISION DE OBSERVACIONES A HOJAS DE VIDA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L5-2025-034	COMUNICACIÓN	17 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	SOLICITUD DE REMISIÓN DEL INFORME PRELIMINAR	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L5-2025-035	COMUNICACIÓN	22 oct 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION DE HOJAS DE VIDA - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L5-2025-036	COMUNICACIÓN	20 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	NO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L4-2025-037	COMUNICACIÓN	21 oct 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	REMISIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L5-2025-038	COMUNICACIÓN	22 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	REMISION DE OBSERVACIONES A HOJAS DE VIDA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L5-2025-039	COMUNICACIÓN	22 oct 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	TRASLADO SED-CF-L5-2025-005 - PMT	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L5-2025-040	COMUNICACIÓN	22 oct 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	REMISIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L5-2025-041	COMUNICACIÓN	23 oct 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L4-2025-042	COMUNICACIÓN	24 oct 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	RADICACION DE HOJAS DE VIDA - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L6-2025-043	COMUNICACIÓN	24 oct 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	RADICACION DE HOJAS DE VIDA - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L6-2025-044	COMUNICACIÓN	28 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	SOLICITUD DE REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN PENDIENTE	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L6-2025-045	COMUNICACIÓN	28 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN PARA CONTROL DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L6-2025-046	COMUNICACIÓN	28 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	CONCEPTOS TECNICO Y PROGRAMACIONES DE OBRA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L6-2025-047	COMUNICACIÓN	28 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 6	SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN PARA CONTROL DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L6-2025-048	COMUNICACIÓN	28 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN PARA CONTROL DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L6-2025-049	COMUNICACIÓN	28 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	CONCEPTOS TECNICO Y PROGRAMACIONES DE OBRA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L6-2025-050	COMUNICACIÓN	28 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	CONCEPTOS TECNICO Y PROGRAMACIONES DE OBRA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L6-2025-051	COMUNICACIÓN	29 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	CONCEPTOS TECNICO Y PROGRAMACIONES DE OBRA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L6-2025-052	COMUNICACIÓN	31 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	SOLICITUD ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y REMISIÓN FICHA SAE	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L6-2025-053	COMUNICACIÓN	31 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	SOLICITUD ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y REMISIÓN FICHA SAE	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L6-2025-054	COMUNICACIÓN	4 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	SOLICITUD AJUSTE DE APU E INFORMACION PENDIENTE POR ENTREGA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L4-2025-057	COMUNICACIÓN	7 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	APREMIO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE OBLIGACIONES - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SDE-L5-2025-058	COMUNICACIÓN	7 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	APREMIO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE OBLIGACIONES - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SDE-L6-2025-059	COMUNICACIÓN	7 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	APREMIO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE OBLIGACIONES - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SDE-L6-2025-060	COMUNICACIÓN	10 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REMISION DE DOCUMENTACION PARCIAL APROBADA DEL CONTRATISTA - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L6-2025-061	COMUNICACIÓN		C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION DE DOCUMENTACION APROBADA DEL CONTRATISTA - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L6-2025-062	COMUNICACIÓN	10 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION DE DOCUMENTACION PARCIALAPROBADA DEL CONTRATISTA - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L6-2025-063	COMUNICACIÓN	10 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	LISTADO DE PERSONAL DE OBRA E INTERVENTORIA - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L4-2025-064	COMUNICACIÓN	11 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	TRASLADO 046-ARSAF-2025 - JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DETALLADA PARA LA SELECCIÓN DE FIBROCEMENTO EN LA REPOSICIÓN DE CORNISAS (ED. DIEGO	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L6-2025-065	COMUNICACIÓN	12 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	REITERACION APREMIO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE OBLIGACIONES - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L5-2025-066	COMUNICACIÓN	12 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	REITERACION APREMIO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE OBLIGACIONES - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L5-2025-067	COMUNICACIÓN	12 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	RECOMENDACIONES LISTADO DE PERSONAL DE OBRA - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L5-2025-068	COMUNICACIÓN	12 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	AJUSTE DE PROGRAMACION Y FLUJO DE CAJA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L6-2025-069	COMUNICACIÓN	12 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	RECOMENDACIONES LISTADO DE PERSONAL DE OBRA - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L5-2025-070	COMUNICACIÓN	12 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	RECOMENDACIONES PARA APROBACIÓN DE LISTADO DE PERSONAL DE OBRA - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L5-2025-071	COMUNICACIÓN	13 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION DE PROGRAMACION DE OBRA Y PRESUPUESTO POR SEDE - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L5-2025-072	COMUNICACIÓN	13 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L5-2025-073	COMUNICACIÓN	13 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	REMISION DE PROGRAMACION DE OBRA Y PRESUPUESTO POR SEDE - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L5-2025-074	COMUNICACIÓN	13 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	REMISION DE PROGRAMACION DE OBRA Y PRESUPUESTO POR SEDE - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L5-2025-075	COMUNICACIÓN	13 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L5-2025-076		13 nov 2025		CONSORCIO PAIS	LOTE 6	ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	

SERINCO-SDE-L5-2025-077	COMUNICACIÓN	14 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	OBSERVACIONES E INGRESO DEL PERSONAL - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L5-2025-078	COMUNICACIÓN	18 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REMISION INFORME SEMANAL N°1 (10 AL 16 NOVIEMBRE 2025) - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L5-2025-079	COMUNICACIÓN	18 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION INFORME SEMANAL N°1 (10 AL 16 NOVIEMBRE 2025) - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS		
SERINCO-SDE-L5-2025-080	COMUNICACIÓN	18 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION INFORME SEMANAL N°1 (10 AL 16 NOVIEMBRE 2025) - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS		
SERINCO-SDE-L5-2025-081	COMUNICACIÓN	18 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION INFORME PRELIMINAR	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	STEFANIA CEBALLOS	
SERINCO-SDE-L5-2025-082	COMUNICACIÓN	18 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION INFORME PRELIMINAR	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	STEFANIA CEBALLOS	
SERINCO-SDE-L5-2025-083	COMUNICACIÓN	18 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REMISION INFORME PRELIMINAR	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	STEFANIA CEBALLOS	
SERINCO-SDE-L5-2025-084	COMUNICACIÓN	18 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION		REMISIÓN CUENTA No. 1 - COSTOS FIJOS	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	STEFANIA CEBALLOS	
SERINCO-SDE-L5-2025-085	COMUNICACIÓN	18 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REITERACION DE REMISION DE INFORMACION SOLICITADA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L5-2025-086	COMUNICACIÓN	19 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	SOLICITUD ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y REMISIÓN FICHA SAE	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L5-2025-087	COMUNICACIÓN	19 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION DE DOCUMENTACION APROBADA DEL CONTRATISTA - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L5-2025-088	COMUNICACIÓN	19 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	ATRASOS EN LA PRIMERA SEMANA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN OBRA - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SDE-L5-2025-089	COMUNICACIÓN	19 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	ATRASOS EN LA PRIMERA SEMANA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN OBRA - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SDE-L5-2025-090	COMUNICACIÓN	19 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	ATRASOS EN LA PRIMERA SEMANA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN OBRA - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SDE-L5-2025-091	COMUNICACIÓN	20 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	TRASLADO DE REMISION DE BALANCE Y ALCANCE - Colegio Guillermo Cano Isaza Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L5-2025-092	COMUNICACIÓN	21 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	CAMBIO DE HOJAS DE VIDA DE INSPECTORES - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L5-2025-093	COMUNICACIÓN	20 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	TRASLADO	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L5-2025-094	COMUNICACIÓN	21 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	TRASLADO DE COMUNICADO - OFI-SED-L6-041, APANTALLAMIENTO CUBIERTA BLOQUE PRE ESCOLAR COLEGIO ARBORIZADORA BAJA SEDE A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L5-2025-095	COMUNICACIÓN	24 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION		REMISIÓN CUENTA No. 2 - COSTOS FIJOS	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	STEFANIA CEBALLOS	
SERINCO-SDE-L5-2025-096	COMUNICACIÓN	24 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REMISION INFORME SEMANAL N°2 (17 AL 23 NOVIEMBRE 2025) - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L5-2025-097	COMUNICACIÓN	24 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION INFORME SEMANAL N°2 (17 AL 23 NOVIEMBRE 2025) - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L5-2025-098	COMUNICACIÓN	24 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION INFORME SEMANAL N°2 (17 AL 23 NOVIEMBRE 2025) - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L5-2025-099	COMUNICACIÓN	24 nov 2025	C SERINCO	CONTRATISTAS	LOTE 4,5 Y 6	REMISIÓN FORMATO DE INFORME MENSUAL SST	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L4-2025-100	COMUNICACIÓN	25 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	SOLICITUD EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-101	COMUNICACIÓN	25 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	SOLICITUD EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-102	COMUNICACIÓN	25 nov 2025	C SERINCO	CONSTRUCTORA PAIS	LOTE 6	SOLICITUD EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-103	COMUNICACIÓN	26 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	LLAMADO DE ATENCIÓN IMPLEMENTACIÓN EPP, INGRESO PERSONAL Y BITACORAS	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L4-2025-104	COMUNICACIÓN	26 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	TRASLADO DE PROPUESTA DE BAJANTES Y GÁRGOLAS - IED OFELIA URIBE DE ACOSTA SEDE A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L4-2025-105	COMUNICACIÓN	26 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	TRASLADO SOLICITUD DE MOVIMIENTO DE MOBILIARIO PARA INICIO DE ACTIVIDADES DE OBRA - IED LOS TEJARES SEDE A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L5-2025-106	COMUNICACIÓN	26 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Comunicado SED-CF-L5-2025-014; Solicitud de Modificatorio No. 01 Adición y Prórroga	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L6-2025-107	COMUNICACIÓN	26 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Comunicado OFI-SED-L6-045. Solicitud de Modificatorio 01 Adición y Prórroga	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L4-2025-108	COMUNICACIÓN	26 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Comunicado N° 067-ARSAF-2025. Solicitud de Modificatorio 01 Adición y Prórroga	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LX-2025-109	COMUNICACIÓN	27 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	RECOMENDACIONES SG-SST	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L6-2025-110	COMUNICACIÓN	28 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Comunicado OFI-SED-L6-050. Solicitud de Modificatorio 01 Adición y Prorroga CTO 8154780 L6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-111	COMUNICACIÓN	28 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Alcance al Comunicado SED-CF-L5-2025-014; Solicitud Modificatorio No. 01 Adición y Prórroga	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LX-2025-112	COMUNICACIÓN	28 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	OBSERVACIONES NP - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-LX-2025-113	COMUNICACIÓN	28 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	SOLICITUD ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y REMISIÓN FICHA SAE - COL MINUTO DE BUENOS AIRES	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L6-2025-114	COMUNICACIÓN	28 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Traslado de Comunicado OFI-SED-L6-047 - Alcance - Solicitud de Modificación Plazo de Ejecución Colegio Santa Librada Sede A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-115	COMUNICACIÓN	28 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Comunicado SED-CF-L5-2025-014; Solicitud Modificatorio No. 01 Adición y Prórroga	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LX-2025-116	COMUNICACIÓN	28 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	SOLICITUD ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y REMISIÓN FICHA SAE	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L6-2025-117	COMUNICACIÓN	1 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 3 - Nov 24 al 30 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-118	COMUNICACIÓN	1 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 3 - Nov 24 al 30 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-119	COMUNICACIÓN	1 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	TRASLADO DE PROPUESTA ESQUEMA CERRAMIENTO COLEGIO LA ARABIA - Col La Arabia	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L5-2025-120	COMUNICACIÓN	1 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 3 - Nov 24 al 30 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LX-2025-121	COMUNICACIÓN	1 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORÍA	Solicitud Modificatorio No. 01 Adición y Prórroga. - Cto Interventoria	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L6-2025-122	COMUNICACIÓN	2 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Reiteración por Incumplimiento Parcial de las Obligaciones Contractuales - Grupo 2 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-123	COMUNICACIÓN	4 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Aprobación de Analisis de Precios Unitarios de Items No Previstos - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-124	COMUNICACIÓN	4 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión de Presupuesto de Emergencia CEIF 1931 - IED El Minuto de Buenos Aires Sede B - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-125	COMUNICACIÓN	5 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Traslado de Comunicado con Asunto Solicitud Autorización Ingreso de Equipo - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LX-2025-126	COMUNICACIÓN	5 dic 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud de ensayos según especificaciones tecnicas - Col Jose Jaime Rojas	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-LX-2025-127	COMUNICACIÓN	5 dic 2025	C SERINCO	CONSTRUCTORA PAIS	LOTE 6	SOLICITUD ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y REMISIÓN FICHA SAE - DIRECCION LOCAL DE USME - CRE 591	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L4-2025-128	COMUNICACIÓN	9 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 4 - Dic 01 al 07 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-129	COMUNICACIÓN	9 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 4 - Dic 01 al 07 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-130	COMUNICACIÓN	9 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 4 - Dic 01 al 07 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-131	COMUNICACIÓN	11 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Traslado de Comunicado OFI-SED-L6-046 Solicitud de Modificación fecha de inicio intervención Colegios Santa Librada Sede A y Estrella del Sur Sede A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-132	COMUNICACIÓN	11 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Traslado de Comunicado Procedimiento Desmonte e Instalación Cubierta Arborizadora Baja	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-133	COMUNICACIÓN	12 dic 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Incumplimiento en la Asistencia del Director de Obra a los Comités Presenciales	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-134	COMUNICACIÓN	12 dic 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Incumplimiento en la Entrega de los Informes Mensuales - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-135	COMUNICACIÓN	12 dic 2025	C SERINCO	CONSTRUCTORA PAIS	LOTE 6	Incumplimiento en la Entrega de los Informes Mensuales - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-136	COMUNICACIÓN	12 dic 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Incumplimiento en la Entrega de los Informes Mensuales - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-137	COMUNICACIÓN	12 dic 2025	C SERINCO	CONSTRUCTORA PAIS	LOTE 6	Observaciones Informe Mensual No. 1 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA	
SERINCO-SED-L4-2025-138	COMUNICACIÓN	12 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado de Comunicados No. 073 ARSAF - 2025 y No. 080 ARSAF - 2025 - REMISIÓN DE CONCEPTO ESTRUCTURAL CUBIERTA IED LOS TEJARES SEDE A - V4 Y	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L6-2025-139	COMUNICACIÓN	15 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 5 - Dic 08 al 14 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-140	COMUNICACIÓN	15 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 5 - Dic 08 al 14 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-141	COMUNICACIÓN	15 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 5 - Dic 08 al 14 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-142	COMUNICACIÓN	16 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Traslado de Comunicado OFI-SED-L6-071. Hallazgo de Dos Capas de Piso en Cerámica Ubicado	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LX-2025-143	COMUNICACIÓN	16 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Alcance al Comunicado SERINCO-SED-L6-2025-132 - Traslado de Comunicado Procedimiento Desmonte e Instalación Cubierta Arborizadora Baja	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-144	COMUNICACIÓN	17 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Aprobación de Analisis de Precios Unitarios de Items No Previstos - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-145	COMUNICACIÓN	17 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	CAMBIO DE HOJAS DE VIDA DE INSPECTORES - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L5-2025-146	COMUNICACIÓN	18 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Traslado Comunicado SED-CF-L5-2025-013 y Aprobación Concepto Estructural Losa de Piso Don Bosco La Joya - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-147	COMUNICACIÓN	18 dic 2025	C SERINCO	CONSTRUCTORA PAIS	LOTE 6	Solicitud de Entrega e Implementación de un Plan de Contingencia para Recuperar los Atrasos a la Fecha - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-148	COMUNICACIÓN	18 dic 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud de Entrega e Implementación de un Plan de Contingencia para Recuperar los Atrasos a la Fecha - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-149	COMUNICACIÓN	18 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION INFORME TECNICO No. 2 Periodo 6-11-2025 al 5-12-2025 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L5-2025-150	COMUNICACIÓN	18 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION INFORME TECNICO No. 2 Periodo 6-11-2025 al 5-12-2025 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L6-2025-151	COMUNICACIÓN	18 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REMISION INFORME TECNICO No. 2 Periodo 6-11-2025 al 5-12-2025 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L5-2025-152	COMUNICACIÓN	19 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Acta Parcial No. 1 - Periodo (06.11.25 al 05.11.25)	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	STEFANIA CEBALLOS	
SERINCO-SED-L4-2025-153	COMUNICACIÓN	19 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Acta Parcial No. 1 - Periodo (06.11.25 al 05.11.25)	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	STEFANIA CEBALLOS	
SERINCO-SED-LX-2025-154	COMUNICACIÓN	19 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION		Remisión Acta Costos fijos y costos variables - Periodo (06.11.25 al 05.11.25) - Interventoría	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	STEFANIA CEBALLOS	
SERINCO-SED-L4-2025-155	COMUNICACIÓN	22 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 6 - Dic 15 al 21 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-156	COMUNICACIÓN	22 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 6 - Dic 15 al 21 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-157	COMUNICACIÓN	22 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 6 - Dic 15 al 21 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-158	COMUNICACIÓN	22 dic 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Actividades en Ejecución I.E.D. Estrella del Sur Sede B - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA	

SERINCO-SED-L5-2025-159	COMUNICACIÓN	22 dic 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Reiteración Solicitud de Entrega e Implementación de un Plan de Contingencia para Recuperar los Atrasos a la Fecha - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-160	COMUNICACIÓN	22 dic 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Reiteración Solicitud de Entrega e Implementación de un Plan de Contingencia para Recuperar los Atrasos a la Fecha - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-161	COMUNICACIÓN	22 dic 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	REMISION 02 INF TÉCNICO MENSUAL No. 02 DE OBRA - CONTRATO_SED-8155135 L4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS		
SERINCO-SED-L5-2025-162	COMUNICACIÓN	22 dic 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	REMISION 02 INF TÉCNICO MENSUAL No. 02 DE OBRA - CONTRATO_SED-8154895 L5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS		
SERINCO-SED-L6-2025-163	COMUNICACIÓN	22 dic 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	REMISION 02 INF TÉCNICO MENSUAL No. 02 DE OBRA - CONTRATO_SED-8154780 L6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS		
SERINCO-SED-L4-2025-164	COMUNICACIÓN	26 dic 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Respuesta a Radicado No. 091 ARSAF - 2025. Solicitud de información - Actividades no previstas (APUS)	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L4-2025-165	COMUNICACIÓN	26 dic 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Traslado comunicado Radicado N.° 092-ARSAF-2025 y solicitud de disposición de p	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L6-2025-166	COMUNICACIÓN	29 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 7- Dic 22 al 28 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LX-2025-167	COMUNICACIÓN	29 dic 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Traslado Comunicado RADICADO N° 080-ARSAF-2025 y Aprobación Concepto Estructural CUBIERTA IED LOS TEJARES SEDE A. - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L4-2025-168	COMUNICACIÓN	29 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 7- Dic 22 al 28 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-169	COMUNICACIÓN	29 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 7- Dic 22 al 28 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-170	COMUNICACIÓN	29 dic 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud de Ensayos según Especificaciones Técnicas - I.E.D. Unión Europea Sede B	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA	
SERINCO-SED-L5-2025-171	COMUNICACIÓN	29 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Traslado Diseño de cubierta Biblioteca y Aprobación Concepto Estructural IED JOSE JAIME ROJAS - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L5-2025-172	COMUNICACIÓN	29 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Traslado Diseño de cubierta Orientación y Aprobación Concepto Estructural IED JOSE JAIME ROJAS - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L6-2025-173	COMUNICACIÓN	29 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Traslado Comunicado OFI-SED-L6-079. Radicación presupuesto y esquema manejo Aguas Luvias Unión Europea Sede B	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-174	COMUNICACIÓN	29 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Traslado Comunicado OFI-SED-L6-080. Radicación presupuesto y diagnóstico Dirección Local de Educación de Usme	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-175	COMUNICACIÓN	29 dic 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud de Ensayos según Especificaciones Técnicas - I.E.D. Arborizadora Baja, Sede A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA	
SERINCO-SED-L6-2025-176	COMUNICACIÓN	29 dic 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Respuesta a Comunicado OFI-SED-L6-073 - Mejoramiento Cancha Multideportiva Norte Colegio Arborizadora Baja Sede A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA	
SERINCO-SED-L5-2025-177	COMUNICACIÓN	29 dic 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Llamado de atención SST - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L6-2025-178	COMUNICACIÓN	31 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión de APU´s Contractuales por Ajuste en la descripción de los Ítems 7.1.1, 7.1.5, 7.2.30, 7.2.31, 7.2.32, 7.2.33 y 16.1.25 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-179	COMUNICACIÓN	31 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Traslado Comunicado OFI-SED-L6-082 - Alcance OFI-SED-L6-071 Hallazgo dos Capas de Piso en Cerámica y Alistado	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-180	COMUNICACIÓN	31 dic 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud de Entrega Inmediata e Implementación de un Plan de Contingencia - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-181	COMUNICACIÓN	5 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado de Radicado No. 097 Arsaf - 2025 - Hallazgos en Red Eléctrica I.E.D Compartir Recuerdo Sede A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-182	COMUNICACIÓN	5 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 8- Dic 29 2025 a Ene 04 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-183	COMUNICACIÓN	5 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 8- Dic 29 2025 a Ene 04 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-184	COMUNICACIÓN	5 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 8- Dic 29 2025 a Ene 04 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-185	COMUNICACIÓN	5 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Respuesta a Radicado No. 096 Arsaf - 2025 - Remisión de Dosificación de Concreto Utilizado Para Placas de Baños, Pasillos y Andenes	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	CESAR CARVAJAL	
SERINCO-SED-L6-2025-186	COMUNICACIÓN	5 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Situación Presentada en el Piso del Bloque de Primera Infancia del Colegio Arborizadora Baja	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA	
SERINCO-SED-L4-2025-187	COMUNICACIÓN	5 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Solicitud de Entrega de los Informes Mensuales (7 de enero) - lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L4-2025-188	COMUNICACIÓN	5 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión de APU´s Contractuales por Ajuste en la descripción de los Ítems 7.1.1, 7.1.5, 7.2.30, 7.2.31, 7.2.32, 7.2.33 y 16.1.25 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-189	COMUNICACIÓN	5 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud de Entrega de los Informes Mensuales (7 de enero) - lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L6-2025-190	COMUNICACIÓN	5 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud de Entrega de los Informes Mensuales (7 de enero) - lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L6-2025-191	COMUNICACIÓN	7 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Acabados en la Instalación de Cubierta Colegio Arborizadora Baja - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA	
SERINCO-SED-L4-2025-192	COMUNICACIÓN	8 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION CUENTA DE OBRA No. 1	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	STEFANIA CEBALLOS	
SERINCO-SED-L5-2025-193	COMUNICACIÓN	8 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION CUENTA DE OBRA No. 1	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	STEFANIA CEBALLOS	
SERINCO-SED-L6-2025-194	COMUNICACIÓN	8 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REMISION CUENTA DE OBRA No. 1	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	STEFANIA CEBALLOS	
SERINCO-SED-INT-2025-195	COMUNICACIÓN	8 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	REMISION CUENTA DE INTERVENTORIA No. 3	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	STEFANIA CEBALLOS	
SERINCO-SED-L4-2025-196	COMUNICACIÓN	9 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Entrega de Primer Paquete de Análisis de Precios Unitarios de ítems No Previstos Conciliados con Estudios Previos (SED) - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-197	COMUNICACIÓN	9 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Entrega del Primer Paquete de Análisis de Precios Unitarios de ítems No Previstos Conciliados con Estudios Previos (SED) - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-198	COMUNICACIÓN	13 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 9 - Ene 05 al 11 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-199	COMUNICACIÓN	13 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 9 - Ene 05 al 11 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-200	COMUNICACIÓN	13 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 9 - Ene 05 al 11 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-201	COMUNICACIÓN	13 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Solicitud de Ensayos según Especificaciones Técnicas - I.E.D. Los Tejares, Sede A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	CESAR CARVAJAL	
SERINCO-SED-L4-2025-202	COMUNICACIÓN	13 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Ausencia de Personal Operativo en I.E.D. Diego Montaña Cuellar, Sede A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	CESAR CARVAJAL	
SERINCO-SED-L5-2025-203	COMUNICACIÓN	14 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	INFORME PRELIMINAR ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y REMISIÓN FICHA SAE - COL MINUTO DE BUENOS AIRES	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L5-2025-204	COMUNICACIÓN	14 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	PROPUESTAS COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L5-2025-205	COMUNICACIÓN	14 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Ausencia de Personal Operativo en cuatro (4) Instituciones Educativas Distritales, Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ANA PARDO	
SERINCO-SED-L5-2025-206	COMUNICACIÓN	14 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Observaciones en el Acabado Final de la Estructura de la Cubierta Colegio José Jaime Rojas.	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ANA PARDO	
SERINCO-SED-LX-2025-207	COMUNICACIÓN	15 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	RETIRO DE ACOPIO MATERIAL	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ANA BERMUDEZ	
SERINCO-SED-L5-2025-208	COMUNICACIÓN	15 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	ALCANCE SERINCO-SED-L5-2025-193-REMISION CUENTA DE OBRA No. 1	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L6-2025-209	COMUNICACIÓN	16 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	ALCANCE SERINCO-SED-L6-2025-194-REMISION CUENTA DE OBRA No. 1	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L6-2025-210	COMUNICACIÓN	16 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Estado Actual Frentes de Obra - Colegio Unión Europea Sede B, Colegio Estrella del Sur Sede A, Colegio Estrella del Sur Sede B, y Respuesta Sobre los	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA	
SERINCO-SED-L5-2025-211	COMUNICACIÓN	16 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión de APU´s Contractuales por Ajuste en la descripción de los Ítems 7.1.1, 7.1.5, 7.2.30, 7.2.31, 7.2.32, 7.2.33 y 16.1.25 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-212	COMUNICACIÓN	16 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION 03 INF TÉCNICO MENSUAL No. 03 - CONTRATO_SED-8155135 L4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L5-2025-213	COMUNICACIÓN	20 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION 03 INF TÉCNICO MENSUAL No. 03 - CONTRATO_SED-8154895 L5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L6-2025-214	COMUNICACIÓN	16 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REMISION 03 INF TÉCNICO MENSUAL No. 03 - CONTRATO_SED-8154780 L6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-LX-2025-215	COMUNICACIÓN	16 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	SERINCO-SED-2025-215-L4-Traslado de RADICADO No. 106 ARSAF - 2025 - NOVEDAD	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-LX-2025-216	COMUNICACIÓN	17 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	ALCANCE SERINCO-SED-L4-2025-192-REMISION CUENTA DE OBRA No. 1	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L4-2025-217	COMUNICACIÓN	19 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 10 - Ene 12 al 18 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-218	COMUNICACIÓN	19 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 10 - Ene 12 al 18 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-219	COMUNICACIÓN	19 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Reiteración Solicitud de Entrega Inmediata e Implementación Inmediata de un Plan de Contingencia - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-220	COMUNICACIÓN	19 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 10 - Ene 12 al 18 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-221	COMUNICACIÓN	19 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Solicitud de Entrega e Implementación de un Plan de Contingencia para Recuperar los Atrasos a la Fecha - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-222	COMUNICACIÓN	19 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud de Entrega e Implementación de un Plan de Contingencia para Recuperar los Atrasos a la Fecha - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-223	COMUNICACIÓN	20 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	REMISION 03 INF TÉCNICO MENSUAL No. 03 DE OBRA - CONTRATO_SED-8154895 L5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L4-2025-224	COMUNICACIÓN	20 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	TRASLADO DE RADICADO No. 116 ARSAF - 2025 - SOLICITUD DE REPROGRAMACIÓN DE INCIO FRENTE DE OBRA IED ESTRELLA DEL SUR SEDE C	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L6-2025-225	COMUNICACIÓN	20 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Incumplimiento en la Entrega del Informe Mensual No.3 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L6-2025-226	COMUNICACIÓN	20 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud para Mantener en buen Estado los Cerramientos Provisionales en los Diferentes Frentes de Obra - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA	
SERINCO-SED-L4-2025-227	COMUNICACIÓN	20 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Incumplimiento en la Entrega del Informe Mensual No.3 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L4-2025-228	COMUNICACIÓN	21 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Solicitud para Mantener en buen Estado los Cerramientos Provisionales en los Diferentes Frentes de Obra - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	CESAR CARVAJAL	
SERINCO-SED-L5-2025-229	COMUNICACIÓN	21 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Incumplimiento en la Entrega del Informe Mensual No.3 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L5-2025-230	COMUNICACIÓN	21 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud de entregables pendientes - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L6-2025-231	COMUNICACIÓN	21 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Respuesta a Comunicados OFI-SED-L6-109 y OFI-SED-L6-110	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	

SERINCO-SED-LX-2025-232	COMUNICACIÓN	21 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Solicitud de documentación requerida por la SED - Atenciones de emergencia - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L4-2025-233	COMUNICACIÓN	22 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Entrega del Segundo Paquete de Análisis de Precios Unitarios de ítems No Previstos Conciliados con Estudios Previos (SED) - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-234	COMUNICACIÓN	22 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Entrega del Segundo Paquete de Análisis de Precios Unitarios de ítems No Previstos Conciliados con Estudios Previos (SED) - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-235	COMUNICACIÓN	22 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado de Comunicado Radicado No. 104 ARSAF-2025-Remisión de Informes Avifauna y Silvicultural Atención de Emergencias de Tala y Poda	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-236	COMUNICACIÓN	23 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud de información de Pin ambiental - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L6-2025-237	COMUNICACIÓN	23 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud de información de Pin ambiental - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L4-2025-238	COMUNICACIÓN	23 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Solicitud de información de Pin ambiental - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L5-2025-239	COMUNICACIÓN	23 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Segundo llamado de atención SST - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L4-2025-240	COMUNICACIÓN	26 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 11 - Ene 19 al 25 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-241	COMUNICACIÓN	26 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 11 - Ene 19 al 25 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-242	COMUNICACIÓN	26 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 11 - Ene 19 al 25 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-243	COMUNICACIÓN	26 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud de Orden y Aseo en las Diferentes Sedes Intervenidas	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ANA PARDO	
SERINCO-SED-L4-2025-244	COMUNICACIÓN	27 ene 2026	C SERINCO	SED - CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Compromisos Adquiridos en Mesa de Trabajo IED Los Tejares - Enero-23-2026	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-245	COMUNICACIÓN	27 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Reiteración de Mantener en Buen Estado de Cerramiento Provisional IED Unión Europea	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA	
SERINCO-SED-L6-2025-246	COMUNICACIÓN	27 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Información Sobre el inicio de Actividades de Obra en la IED Guillermo Cano Isaza	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA	
SERINCO-SED-L4-2025-247	COMUNICACIÓN	27 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Segunda Solicitud de Entrega e Implementación de un Plan de Contingencia para Recuperar los Atrasos a la Fecha - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	CESAR CARVAJAL	
SERINCO-SED-L6-2025-248	COMUNICACIÓN	27 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Segunda Solicitud de Entrega e Implementación de un Plan de Contingencia para Recuperar los Atrasos a la Fecha - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA	
SERINCO-SED-L5-2025-249	COMUNICACIÓN	27 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Segunda Solicitud de Entrega e Implementación de un Plan de Contingencia para Recuperar los Atrasos a la Fecha - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-250	COMUNICACIÓN	27 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	REMISION 03 INF TÉCNICO MENSUAL No. 03 DE OBRA - CONTRATO_SED-8154780 L6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L4-2025-251	COMUNICACIÓN	28 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Estado de las Obras en IED Confederación Brisas del Diamante	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-252	COMUNICACIÓN		C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Aprobación de Analisis de Precios Unitarios de Items No Previstos - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-253	COMUNICACIÓN	29 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Estado Actual Frente de Obra y Cerramiento Provisional en I.E.D. Unión Europea Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA	
SERINCO-SED-L5-2025-254	COMUNICACIÓN	30 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Ausencia de Personal Operativo en I.E.D. Miguel De Cervantes Saavedra	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ANA PARDO	
SERINCO-SED-L5-2025-255	COMUNICACIÓN	30 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Observaciones al Acabado Final de la Reja Metálica y Fecha de Entrega del Colegio	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ANA PARDO	
SERINCO-SED-L5-2025-256	COMUNICACIÓN	2 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 12 - Ene 26 a Feb 01 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-257	COMUNICACIÓN	2 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 12 - Ene 26 a Feb 01 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-258	COMUNICACIÓN	2 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Tercera Solicitud de Entrega e Implementación de un Plan de Contingencia para Recuperar los Atrasos a la Fecha - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-259	COMUNICACIÓN	2 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Tercera Solicitud de Entrega e Implementación de un Plan de Contingencia para Recuperar los Atrasos a la Fecha - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-260	COMUNICACIÓN	2 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 12 - Ene 26 a Feb 01 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-261	COMUNICACIÓN	2 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Tercera Solicitud de Entrega e Implementación de un Plan de Contingencia para Recuperar los Atrasos a la Fecha - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-262	COMUNICACIÓN	4 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Actividad de Desmonte de Cubierta I.E.D Calasanz (Buenavista) Sede A.	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA	
SERINCO-SED-L6-2025-263	COMUNICACIÓN	5 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud de Programa de Trabajo en Alturas para Actividad Desmonte Cubierta I.E.D Calasanz (Buenavista), Sede A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	MARILYN OSPINA	
SERINCO-SED-L5-2025-264	COMUNICACIÓN	5 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	SOLICITUD DE PERSONAL CONTRACTUAL	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-LX-2025-265	COMUNICACIÓN	5 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	RADICACIÓN DE CAMBIO DE HOJAS DE VIDA DE INTERVENTORÍA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-LX-2025-266	COMUNICACIÓN	5 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	SOLICITUD DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-LX-2025-267	COMUNICACIÓN	6 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION 03 INF TÉCNICO MENSUAL No. 03 DE OBRA - CONTRATO_SED-8155135 L4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L6-2025-268	COMUNICACIÓN	6 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Información sobre el Número de Tanques Elevados a Reinstalar en la Dirección Local de Educación de Usme - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-269	COMUNICACIÓN	9 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 13 - Feb 02 al 08 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-270	COMUNICACIÓN	9 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 13 - Feb 02 al 08 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-271	COMUNICACIÓN	9 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 13 - Feb 02 al 08 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-272	COMUNICACIÓN	9 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Ausencia del Residente de Obra en los Diferentes Frentes en Ejecución - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	CESAR CARVAJAL	
SERINCO-SED-L6-2025-273	COMUNICACIÓN	9 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Reubicación Zona de Acopio de Materiales de Desecho - IED. Colegio Orlando Fals Borda	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA	
SERINCO-SED-L6-2025-274	COMUNICACIÓN	9 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Estado Actual Frentes de Obra y Solicitud de Información de las Fecha de Terminación de cada Colegio	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA	
SERINCO-SED-L6-2025-275	COMUNICACIÓN	11 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Orden de Suspensión Inmediata de Actividades y Requerimiento de Cumplimiento Normativo - Resolución 4272/2021 - IED Buenavista (Calazans)	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	MARILYN OSPINA	
SERINCO-SED-L6-2025-276	COMUNICACIÓN	11 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	SERINCO-SED-2025-276-L6-Entrega de EPP y Garantizar su uso por el Personal de Obra	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	MARILYN OSPINA	
SERINCO-SED-L4-2025-277	COMUNICACIÓN	11 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	TRASLADO DE RADICADO No. 135 ARSAF - 2025 - RESPUESTA OBSERVACIONES INFORMES SILVICULTURALES	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L6-2025-278	COMUNICACIÓN	12 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	SOLICITUD ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y REMISIÓN FICHA SAE - IED ARBORIZADORA BAJA - CPF 1904	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L4-2025-279	COMUNICACIÓN	12 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	SOLICITUD ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y REMISIÓN FICHA SAE - COL. FANNY MICKEY - CPF 1981	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L4-2025-280	COMUNICACIÓN	12 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	CAMBIO DE HOJAS DE VIDA DE INSPECTOR DE OBRA Y TECNICO SST - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L6-2025-281	COMUNICACIÓN	13 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Reiteración de Mantener en buen Estado los Cerramientos Provisionales en los Diferentes Frentes de Obra - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-282	COMUNICACIÓN	13 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud para Mantener en buen Estado los Cerramientos Provisionales en los Diferentes Frentes de Obra - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-283	COMUNICACIÓN	13 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Reiteración de Mantener en buen Estado los Cerramientos Provisionales en los Diferentes Frentes de Obra - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-284	COMUNICACIÓN	16 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 14 - Feb 09 al 15 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L-2025-285	COMUNICACIÓN	16 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 14 - Feb 09 al 15 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LX-2025-286	COMUNICACIÓN	16 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 14 - Feb 09 al 15 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-287	COMUNICACIÓN	16 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	CAMBIO DE HOJA DE VIDA DE RESIDENTE DE OBRA - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L6-2025-288	COMUNICACIÓN	16 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Reiteración de Suspensión de Actividades y Rechazo de Documentación - Oficio OFI-SED-L6-124.	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	MARILYN OSPINA	
SERINCO-SED-LX-2025-289	COMUNICACIÓN	16 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Citación al Representante Legal de Consorcio País a Recorrido de Obra - Santa Librada	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-LX-2025-290	COMUNICACIÓN	17 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Ausencia Periódica del Residente de Obra en los Diferentes Frentes en Ejecución Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	CESAR CARVAJAL	
SERINCO-SED-LX-2025-291	COMUNICACIÓN	17 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Incumplimiento Reiterado en la Asistencia del Director de Obra a los Comités y Reuniones de Seguimiento - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	CESAR CARVAJAL	
SERINCO-SED-L6-2025-292	COMUNICACIÓN	20 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	REMISION DE DOCUMENTO ANS - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-LX-2025-293	COMUNICACIÓN	20 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	EVALUACION ANS PERIODOS 6-OCT-25 AL 05-FEB-26, PARA EL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8155135. LOTE 4- CONSORCIO ADECUACIONES ARSAF 2025.	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L5-2025-294	COMUNICACIÓN	20 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	REMISION DE DOCUMENTO ANS - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L4-2025-295	COMUNICACIÓN	20 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	REMISION DE DOCUMENTO ANS - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-LX-2025-296	COMUNICACIÓN	17 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	TRASLADO RADICADO No. 143 ARSAF - 2025 - NOVEDAD EN PROTECCIÓN DE ELEMENTOS EN ESPACIOS DE INFORMATICA IED ESTRELLA DEL SUR SEDE D	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L5-2025-297	COMUNICACIÓN	18 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Ausencia del Residente de Obra en los Diferentes Frentes en Ejecución - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ANA PARDO	
SERINCO-SED-L6-2025-298	COMUNICACIÓN	18 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Respuesta a Comunicado OFI-SED-L6-129	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	MARILYN OSPINA	
SERINCO-SED-L4-2025-299	COMUNICACIÓN	18 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION INFORME TECNICO No. 4 Periodo 6-01-2026 al 5-02-2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L5-2025-300	COMUNICACIÓN	18 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION INFORME TECNICO No. 4 Periodo 6-01-2026 al 5-02-2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L6-2025-301	COMUNICACIÓN	18 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REMISION INFORME TECNICO No. 4 Periodo 6-01-2026 al 5-02-2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L6-2025-302	COMUNICACIÓN	19 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	VIABILIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE CUBIERTA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS		

SERINCO-SED-L4-2025-303	COMUNICACIÓN	19 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	RESPUESTA A RADICADO No. 141 ARSAF - 2025 - REMISIÓN DE DISEÑO PLACAS DE RECREACIÓN IED FANNY MICKEY SEDE A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-INT-2025-304	COMUNICACIÓN	20 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	Respuesta a Correo con Asunto Contrato Mejoramientos. Verificación Ítems Contractuales	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LX-2025-305	COMUNICACIÓN		C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION CUENTA DE OBRA No. 2 - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-LX-2025-306	COMUNICACIÓN		C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION CUENTA DE OBRA No. 2 - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-LX-2025-307	COMUNICACIÓN		C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REMISION CUENTA DE OBRA No. 2 - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L4-2025-308	COMUNICACIÓN	23 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 15 - Feb 16 al 22 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-309	COMUNICACIÓN	23 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 15 - Feb 16 al 22 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-310	COMUNICACIÓN	23 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 15 - Feb 16 al 22 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-311	COMUNICACIÓN	23 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Tercer Llamado de Atención por Ausencia Prolongada del Residente de Obra en los Diferentes Frentes en Ejecución - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	CESAR CARVAJAL	
SERINCO-SED-LX-2025-312	COMUNICACIÓN	23 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	REMISION CUENTA DE INTERVENTORIA No. 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	STEFANIA CEBALLOS	
SERINCO-SED-L6-2025-313	COMUNICACIÓN	24 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	CAMBIO DE HOJA DE VIDA DE RESIDENTE DE OBRA - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L5-2025-314	COMUNICACIÓN	24 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	EVALUACION ANS PERIODOS 6-OCT-25 AL 05-FEB-26, PARA EL CONTRATO DE OBRA No. CO1. PCCNTR.8154895. LOTE 5- CONSORCIO FORTALEZA.	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L6-2025-315	COMUNICACIÓN	24 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	EVALUACION ANS PERIODOS 6-OCT-25 AL 05-FEB-26, PARA EL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8154780. LOTE 6- CONSORCIO PAIS	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L5-2025-316	COMUNICACIÓN	25 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud de Información Sobre Atención de Emergencia en IED Rafael Uribe Uribe - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-317	COMUNICACIÓN	25 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Incumplimiento en la entrega de balance y reprogramacion - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-LX-2025-318	COMUNICACIÓN	25 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Incumplimiento en la entrega de balance y reprogramacion - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-INT-2025-319	COMUNICACIÓN	27 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	Listado de Actividades Criticas para Entregas de Colegios y Tareas no Incluidas en el Balance Inicial	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-320	COMUNICACIÓN	27 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Poca Presencia de Personal Operativo Durante el mes de Febrero en las Diferentes Sedes Educativas	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ANA PARDO	
SERINCO-SED-LX-2025-321	COMUNICACIÓN	27 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISIÓN DE INFORME ELÉCTRICO - IED COMPARTIR RECUERDO SEDE A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L5-2025-322	COMUNICACIÓN	27 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Demoras en la Entrega de Espacios a la Interventoría y Falta de Control `por de Consorcio Fortaleza en la Toma de Detalles	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ANA PARDO	
SERINCO-SED-LX-2025-323	COMUNICACIÓN	27 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	CAMBIO DE HOJAS DE VIDA DE INSPECTORES - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L4-2025-324	COMUNICACIÓN	2 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 16 - Feb 23 a Mar 01 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-325	COMUNICACIÓN	2 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 16 - Feb 23 a Mar 01 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-326	COMUNICACIÓN	2 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 16 - Feb 23 a Mar 01 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LX-2025-327	COMUNICACIÓN	2 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	EVALUACION ANS PERIODOS 4-SEP-25 AL 05-FEB-26, PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.8169110 - CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L4-2025-328	COMUNICACIÓN	2 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Cuarto Llamado de Atención por Ausencia Prolongada del Residente de Obra en los Diferentes Frentes en Ejecución - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LX-2025-329	COMUNICACIÓN	2 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	SOLICITUD ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y REMISIÓN FICHA SAE - COL SANTA LIBRADA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L6-2025-330	COMUNICACIÓN	2 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	CAMBIO DE HOJAS DE VIDA DE PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTO E INSPECTOR - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-LX-2025-331	COMUNICACIÓN	3 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	CAMBIO DE HOJAS DE VIDA DE INSPECTOR DE OBRA Y RESIDENTE DE OBRA - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L5-2025-332	COMUNICACIÓN	4 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Citación para Levantamiento de Actas de Vecindad a Baterías Sanitarias Biblioteca Chandui, Usme - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-333	COMUNICACIÓN	4 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	REMISION 04 INF TÉCNICO MENSUAL No. 04 DE OBRA - CONTRATO_SED-8154780 - L6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L4-2025-334	COMUNICACIÓN	5 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Informe Ejecutivo Seguimiento de Obras de Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	CESAR CARVAJAL	
SERINCO-SED-L6-2025-335	COMUNICACIÓN	5 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión de APU de NP-03 Suministro e Instalación de Cubierta Modular Tipo Sandwich (ancho=50 mm) - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LX-2025-336	COMUNICACIÓN	5 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION 04 INF TÉCNICO MENSUAL No. 04 DE OBRA - CONTRATO_SED-8155135 - L4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-LX-2025-337	COMUNICACIÓN	5 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION 04 INF TÉCNICO MENSUAL No. 04 DE OBRA - CONTRATO_SED-8154895 - L5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-LX-2025-338	COMUNICACIÓN	6 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Observación y solicitud — Incumplimiento en entrega de formatos, registros e informes del SG-SST y control de obra y subcontratistas CONSORCIO ARSAF LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L4-2025-339	COMUNICACIÓN	9 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 17 - Mar 02 al 08 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-340	COMUNICACIÓN	9 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 17 - Mar 02 al 08 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-341	COMUNICACIÓN	9 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 17 - Mar 02 al 08 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-342	COMUNICACIÓN	10 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión de APU`s de NP-01 Suministro e Instalación de Sanitario y NP-07 Demolición de Acabado y Alistado de Piso e= 0.18 Mt - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-343	COMUNICACIÓN	11 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Implementación de plan de mejoramiento - Entrega semanal de formatos SST - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L4-2025-344	COMUNICACIÓN	12 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Llamado de atención a Inspector SST de Localidad de Usme y Solicitud de Cumplimiento de Obligaciones Contractuales - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-345	COMUNICACIÓN	12 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Comunicado SED-CF-L5-2025-026 - Solicitud Modificatorio No. 2 Adición y Prorroga - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LX-2025-346	COMUNICACIÓN	12 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	SOLICITUD ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y REMISIÓN FICHA SAE - COL FABIO LOZANO SIMONELLI	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L4-2025-347	COMUNICACIÓN	16 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 18 - Mar 09 al 15 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-348	COMUNICACIÓN	16 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 18 - Mar 09 al 15 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-349	COMUNICACIÓN	16 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 18 - Mar 09 al 15 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-350	COMUNICACIÓN	16 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Llamado de Atención por Material Utilizado en Relleno de la Zona de la Tarima	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA	
SERINCO-SED-L4-2025-351	COMUNICACIÓN	16 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	TRASLADO RADICADO No. 159 ARSAF - 2025 - INFORMACIÓN DE INSTALACIÓN DE SALIDAS Y LUMINARIAS IED COMPARTIR RECUERDO SEDE A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L4-2025-352	COMUNICACIÓN	16 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	TRASLADO RADICADO No. 169 ARSAF - 2025 - REMISIÓN DE REPROGRAMACIÓN FRENTE DE OBRA IED OFELIA URIBE DE ACOSTA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L4-2025-353	COMUNICACIÓN	17 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Solicitud de Entrega de APU´s de ítems No Previstos Evidenciados a la Fecha- Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-354	COMUNICACIÓN	17 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud de Entrega de APU´s de ítems No Previstos Evidenciados a la Fecha- Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-355	COMUNICACIÓN	17 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud de Entrega de APU´s de ítems No Previstos Evidenciados a la Fecha- Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-356	COMUNICACIÓN	17 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION INFORME TECNICO No. 5 Periodo 6-02-2026 al 5-03-2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L5-2025-357	COMUNICACIÓN	17 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION INFORME TECNICO No. 5 Periodo 6-02-2026 al 5-03-2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L6-2025-358	COMUNICACIÓN	17 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REMISION INFORME TECNICO No. 5 Periodo 6-02-2026 al 5-03-2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L6-2025-359	COMUNICACIÓN	17 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Calasanz Buenavista CPF 1904	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-360	COMUNICACIÓN	18 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Tenerife Granada Sur, Sede B - CPF 564	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-361	COMUNICACIÓN	18 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión de Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 546 - IED Santa Librada, Sede A - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-362	COMUNICACIÓN	18 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión de Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 523 - IED Fabio Lozano Simonelli, Sede C - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-363	COMUNICACIÓN	19 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Nueva Esperanza, Sede A - CPF 556	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-364	COMUNICACIÓN	20 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Luis Eduardo Mora Osejo, Sede A - CPF 566	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-365	COMUNICACIÓN	20 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 1904 - IED Arborizadora Baja, Sede A - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-366	COMUNICACIÓN	20 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Traslado de Comunicado SED-CF-L5-2025-030 - Solicitud prorroga entrega Colegio Brasilia, Miguel de Cervantes Saavedra Y Bicentenario	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-367	COMUNICACIÓN	24 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 19 - Mar 16 al 22 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-368	COMUNICACIÓN	25 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado de Radicado No. 180 Arsaf - 2025 - Solicitud de Modificatorio No. 2 de Adición y Prorroga Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8155135 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-369	COMUNICACIÓN	24 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 19 - Mar 16 al 22 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-370	COMUNICACIÓN	24 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 19 - Mar 16 al 22 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-371	COMUNICACIÓN	24 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 1974 - IED Calasanz Buenavista, Sede A - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	

SERINCO-SED-L6-2025-372	COMUNICACIÓN	24 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Reiteración de la Solicitud de Entrega de los Informes Técnicos y Manuales de Mantenimientos de las IED Estrella del Sur, Sedes A y B, y Unión Europea	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-373	COMUNICACIÓN	24 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED José María Vargas Vila, Sede A - CPF 1983	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-374	COMUNICACIÓN	25 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Compartir Recuerdo, Sede A - Compartir Lucero Alto CPF 1911	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LX-2025-375	COMUNICACIÓN	26 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	REMISION CUENTA DE OBRA No. 3 - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-LX-2025-376	COMUNICACIÓN	27 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	REMISION CUENTA DE OBRA No. 3 - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-LX-2025-377	COMUNICACIÓN		C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	REMISION CUENTA DE OBRA No. 3 - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-LX-2025-378	COMUNICACIÓN	26 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	EVALUACION ANS PERIODO 6-FEB-26 AL 05-MAR-26, PARA EL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8155135. LOTE 4- CONSORCIO ADECUACIONES ARSAF 2025	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-LX-2025-379	COMUNICACIÓN	26 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	REMISION DE DOCUMENTO ANS PERIODO 6-FEB-26 AL 05-MAR-26 - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L6-2025-380	COMUNICACIÓN	30 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 20 - Mar 23 al 29 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-381	COMUNICACIÓN	30 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 20 - Mar 23 al 29 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-382	COMUNICACIÓN	30 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 20 - Mar 23 al 29 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LX-2025-383	COMUNICACIÓN	30 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión manual de mantenimiento - COL Brasilia, Luis Eduardo mora y Don Bosco	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-LX-2025-384	COMUNICACIÓN	30 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	REMISIÓN CUENTA DE COBRO INTERVENTORIA No. 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	STEFANIA CEBALLOS	
SERINCO-SED-LX-2025-385	COMUNICACIÓN	31 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	Respuesta a correo de Seguimiento y cumplimiento de obligaciones contractuales relacionadas con el Sistema de Seguridad Social en los Contratos de Obra CO1.PCCNTR. 8155135, CO1.PCCNTR. 8154895 y CO1.PCCNTR. 8154780 / Interventoria No CO1.PCCNTR.8169110. Vigencia 2025.	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	MARILYN OSPINA	
SERINCO-SED-LX-2025-386	COMUNICACIÓN	31 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	Respuesta a correo de Solicitud de revisión periódica sobre el uso adecuado de elementos de protección personal en obra de los contratos No. CO1.PCCNTR. 8155135, CO1.PCCNTR. 8154895 y CO1.PCCNTR. 8154780, pertenecientes a los Lotes No 04, 05 y 06 vigencia 2025	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	MARILYN OSPINA	
SERINCO-SED-LX-2025-387	COMUNICACIÓN	31 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION 05 INF TÉCNICO MENSUAL No. 05 DE OBRA - CONTRATO_SED-8155135 L4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-LX-2025-388	COMUNICACIÓN	31 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION 05 INF TÉCNICO MENSUAL No. 05 DE OBRA - CONTRATO_SED-8154895 L5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-LX-2025-389	COMUNICACIÓN	31 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REMISION 05 INF TÉCNICO MENSUAL No. 05 DE OBRA - CONTRATO_SED-8154780 L6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L4-2025-390	COMUNICACIÓN	1 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Relación de Fechas para la Entrega de los Informes Mensuales de Obra del Periodo 06-mar al 05-abr 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-391	COMUNICACIÓN	1 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Relación de Fechas para la Entrega de los Informes Mensuales de Obra del Periodo 06-mar al 05-abr 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-392	COMUNICACIÓN	1 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Relación de Fechas para la Entrega de los Informes Mensuales de Obra del Periodo 06-mar al 05-abr 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-393	COMUNICACIÓN	1 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED La Arabia, Sede B - CPF 1966	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-394	COMUNICACIÓN	1 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 1981 - IED Fanny Mickey, Sede A - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-395	COMUNICACIÓN	6 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 21 - Mar 30 a Abr 05 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-396	COMUNICACIÓN	6 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 21 - Mar 30 a Abr 05 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-397	COMUNICACIÓN	6 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 21 - Mar 30 a Abr 05 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-398	COMUNICACIÓN	7 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud Atención de Emergencia No. 2 y Remisión Ficha SAE - IED Calasanz Buenavista - CPF 1974	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-399	COMUNICACIÓN	7 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Respuesta de RADICADO No. 188 - ARSAF - 2025 - SOLICITUD DE PROTECCIÓN A VIDRIOS EN INTERVENCIÓN DE FACHADA - COLEGIO DIEGO MONTAÑA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-INT-2025-400	COMUNICACIÓN	8 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	Solicitud Modificatorio No. 02 Adición y Prórroga. - Cto Interventoria CO1.PCCNTR.8169110 Grupo 2	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L6-2025-401	COMUNICACIÓN	9 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Traslado de Comunicado OFI-SED-L6-160 Radicación Documentos para Prórroga 02	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-402	COMUNICACIÓN	9 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado de RADICADO No. 189 ARSAF -2025 - TRAZABILIDAD DE GESTIÓN DE CARGUE EN PLATAFORMA SDA - PIN 27920 - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L6-2025-403	COMUNICACIÓN	9 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	CAMBIO DE HOJAS DE VIDA DE RESIDENTE DE OBRA - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-LX-2025-404	COMUNICACIÓN	10 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado de RADICADO No. 191 ARSAF -2025 - PROGRAMACIÓN DE ENTREGA DE CORNISAS IED DIEGO MONTAÑA SEDE A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-LX-2025-405	COMUNICACIÓN	10 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Traslado de OFI-SED-L6-165. Solicitud de revisión de descuentos aplicados por concepto de ANS - Posible doble cobro	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L4-2025-406	COMUNICACIÓN	13 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 22 - Abr 06 al 12 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-407	COMUNICACIÓN	13 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 22 - Abr 06 al 12 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-408	COMUNICACIÓN	13 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 22 - Abr 06 al 12 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-409	COMUNICACIÓN		C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION INFORME TECNICO No. 6 Periodo 6-03-2026 al 5-04-2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L5-2025-410	COMUNICACIÓN		C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION INFORME TECNICO No. 6 Periodo 6-03-2026 al 5-04-2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L6-2025-411	COMUNICACIÓN	13 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REMISION INFORME TECNICO No. 6 Periodo 6-03-2026 al 5-04-2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-LX-2025-412	COMUNICACIÓN	13 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado de RADICADO No. 199 ARSAF -2025 - AREAS DE CUBIERTAS PARA ENTREGA IED CONFEDERACIÓN BRISAS DEL DIAMANTE SEDE A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-LX-2025-413	COMUNICACIÓN	14 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Llamado de atención por incumplimiento en la entrega del anexo de bitácoras de obra conforme a obligaciones contractuales - lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-LX-2025-414	COMUNICACIÓN	14 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Llamado de atención por incumplimiento en la entrega del anexo de bitácoras de obra conforme a obligaciones contractuales - lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L5-2025-415	COMUNICACIÓN	15 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 1966 - IED La Arabia, Sede B - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-416	COMUNICACIÓN	15 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 556 - IED Nueva Esperanza, Sede A - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-417	COMUNICACIÓN	15 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Relación de Fechas Contractuales y Según Modificatorio No. 1 para las Entregas de las Obras de las Instituciones Educativas Intervenidas - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-418	COMUNICACIÓN	15 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Relación de Fechas Contractuales y Según Modificatorio No. 1 para las Entregas de las Obras de las Instituciones Educativas Intervenidas - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-419	COMUNICACIÓN	15 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Relación de Fechas Contractuales y Según Modificatorio No. 1 para las Entregas de las Obras de las Instituciones Educativas Intervenidas - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-420	COMUNICACIÓN	15 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Solicitud Concepto de Especialista Eléctrico y Actualización Ficha SAE para Atención de Emergencia, IED. Colegio Luis Eduardo Mora Osejo, Sede A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA	
SERINCO-SED-L4-2025-421	COMUNICACIÓN	16 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Confederación Brisas del Diamante, Sede A - CPF 1912	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-422	COMUNICACIÓN	16 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión de Paquete de APU´s de Items No Previstos del NP-08 al NP-12 Aprobados por Interventoría- Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-423	COMUNICACIÓN	16 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Observaciones errores en bitácoras de obra.	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ANA PARDO	
SERINCO-SED-L4-2025-424	COMUNICACIÓN	17 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Respuesta a RADICADO No. 201 ARSAF -2025 - RESPUESTA COMUNICADO SERINCO-SED-L4-2025-413 REMISIÓN DE INFORME MENSUAL TÉCNICO, AMBIENTAL	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-425	COMUNICACIÓN	20 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 23 - Abr 13 al 19 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-426	COMUNICACIÓN	20 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 23 - Abr 13 al 19 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-427	COMUNICACIÓN	20 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 23 - Abr 13 al 19 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LX-2025-428	COMUNICACIÓN	20 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION 05 INF TÉCNICO MENSUAL No. 06 DE OBRA - CONTRATO_SED-8155135 L4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-LX-2025-429	COMUNICACIÓN	20 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION 05 INF TÉCNICO MENSUAL No. 06 DE OBRA - CONTRATO_SED-8154895 L5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L6-2025-430	COMUNICACIÓN	20 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REMISION 05 INF TÉCNICO MENSUAL No. 06 DE OBRA - CONTRATO_SED-8154780 L6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L4-2025-431	COMUNICACIÓN	21 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Falla Prematura en Bisagras de Portón Plegable - Solicitud de Solución Técnica	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	CESAR CARVAJAL	
SERINCO-SED-L5-2025-432	COMUNICACIÓN	22 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 1983 - IED José María Vargas Vila, Sede A - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-433	COMUNICACIÓN	22 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 564 - IED Tenerife Granada Sur, Sede B - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-434	COMUNICACIÓN	24 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 1912 - IED Confederación Brisas del Diamante, Sede A - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-435	COMUNICACIÓN	24 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Brasilia - CPF 508	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-436	COMUNICACIÓN	24 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Compartir Recuerdo, Sede A - CPF 1911	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-437	COMUNICACIÓN	27 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 24 - Abr 20 al 26 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-438	COMUNICACIÓN	27 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 24 - Abr 20 al 26 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-439	COMUNICACIÓN	27 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 24 - Abr 20 al 26 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	

SERINCO-SED-L4-2025-440	COMUNICACIÓN	27 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Informe Ejecutivo Técnico Solicitud de Garantía Portón IED Estrella del Sur Sede C	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	CESAR CARVAJAL	
SERINCO-SED-L5-2025-441	COMUNICACIÓN	27 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Gabriel García Márquez, Sede A, Villa Diana - CPF 579	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-INT-2025-442	COMUNICACIÓN	27 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTES 4 y 6	Solicitud para Gestionar Devolución de Dineros de Doble Cobro por Concepto de ANS	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-443	COMUNICACIÓN	27 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - Dirección Local de Usme, DILE - CPF 590	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-444	COMUNICACIÓN	27 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Informe Ejecutivo Técnico Sobre Intervención de Baterías Sanitarias en IED Compartir Recuerdo, Sede A - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	CESAR CARVAJAL	
SERINCO-SED-L6-2025-445	COMUNICACIÓN	27 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Traslado de Comunicado OFI-SED-L6-172-Atención Observaciones APUS de NP-08, NP-09, NP-10, y NP-12 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-446	COMUNICACIÓN	27 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Relación de Fechas para la Entrega de los Informes Mensuales de Obra del Período 06-abr al 05-may 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-447	COMUNICACIÓN	27 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Relación de Fechas para la Entrega de los Informes Mensuales de Obra del Período 06-abr al 05-may 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-448	COMUNICACIÓN	27 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Relación de Fechas para la Entrega de los Informes Mensuales de Obra del Período 06-abr al 05-may 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-449	COMUNICACIÓN	28 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	EVALUACION ANS PERIODO 6-FEB-26 AL 05-MAR-26, PARA EL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8155135. LOTE 4- CONSORCIO ADECUACIONES ARSAF 2025	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L4-2025-450	COMUNICACIÓN	28 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	REMISION DE DOCUMENTO ANS PERIODO 6-MAR-26 AL 05-ABR-26 - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L6-2025-451	COMUNICACIÓN	29 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Guillermo Cano Isaza, Sede A - CPF 1959	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-452	COMUNICACIÓN	29 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	EVALUACION ANS PERIODOS 6-MAR-26 AL 05-ABR-26, PARA EL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8154780. LOTE 6- CONSORCIO PAIS	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L6-2025-453	COMUNICACIÓN	29 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	REMISION DE DOCUMENTO ANS - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L6-2025-454	COMUNICACIÓN	29 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Traslado de Comunicado OFI-SED-L6-174-Atención a Observaciones - Ítems NP-13 al NP-16 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-455	COMUNICACIÓN	30 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Traslado de Comunicado SED-CF-L5-2025-033 - Reprogramación y Balances, Colegio Brasilia, Miguel de Cervantes Saavedra y Bicentenario - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-456	COMUNICACIÓN	30 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	EVALUACION ANS PERIODOS 6-MAR-26 AL 05-ABR-26, PARA EL CONTRATO DE OBRA No. CO1. PCCNTR.8154895. LOTE 5- CONSORCIO FORTALEZA.	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L6-2025-457	COMUNICACIÓN	7 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REMISION CUENTA DE OBRA No. 3 - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L4-2025-458	COMUNICACIÓN	30 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 1911 - IED Compartir Recuerdo, Sede A - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-459	COMUNICACIÓN	30 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado de Radicado No. 212 ARSAF - 2025 - Remisión de Reprogramación Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8155135, Balance de Presupuestos y	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-460	COMUNICACIÓN	4 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 25 - Abr 27 a May 03 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-461	COMUNICACIÓN	4 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 25 - Abr 27 a May 03 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-462	COMUNICACIÓN	4 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 25 - Abr 27 a May 03 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-INT-2025-463	COMUNICACIÓN	4 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	Alcance al Comunicado Solicitud Modificatorio No. 02 Adición y Prórroga. - Cto Interventoría CO1.PCCNTR.8169110 Grupo 2	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-464	COMUNICACIÓN	4 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado de Radicado No. 218 Arsaf - 2025 - Respuesta a solicitud de fechas de entrega de baterías sanitarias de primaria y espacios piso 3 bloque A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-465	COMUNICACIÓN	4 may 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Alcance a Comunicado Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Luis Eduardo Mora Osejo, Sede A - CPF 566	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-466	COMUNICACIÓN	4 may 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Traslado de RADICADO No. 222 ARSAF - 2025 - SOLICITUD DE INGRESO DE PERSONAL PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIA IED CONFEDERACIÓN BRISAS DEL	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L5-2025-467	COMUNICACIÓN	4 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	CAMBIO DE HOJA DE VIDA DE RESIDENTE DE OBRA - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L4-2025-468	COMUNICACIÓN	5 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado de Radicados N° 190-ARSAF-2025 y N° 213-ARSAF-2025 Con Anexos y Concepto Estructural de Interventoría IED Rural La Unión - Usme	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-469	COMUNICACIÓN	5 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Alcance a Comunicado SERINCO-SED-2025-415-L5-Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 1966 - IED La Arabia, Sede B -	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-470	COMUNICACIÓN	5 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION CUENTA DE OBRA No. 4 - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L5-2025-471	COMUNICACIÓN	5 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 569 - IED Gabriel García Márquez, Sede A, Villa Diana - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-472	COMUNICACIÓN	5 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION CUENTA DE OBRA No. 4 - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L4-2025-473	COMUNICACIÓN	6 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado de Radicado N° 217 - Arsaf-2025-Remisión de Grupo de Actividades No Previstas No. 2 Versión No. 3 de NP-09 a NP-16	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-474	COMUNICACIÓN	7 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado de Radicado no. 225 Arsaf - 2025 - Remisión de Evidencia de Filtración de Agua en Placa de Aula bajo Gradas IED Fanny Mikey Sede A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-475	COMUNICACIÓN	7 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 508 - IED Brasilia - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-476	COMUNICACIÓN	7 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Respuesta Solicitud de Observaciones a Actividades No Conformes - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ANA PARDO	
SERINCO-SED-L5-2025-477	COMUNICACIÓN	8 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Informe por Entrega Final IED La Arabia, Sede A - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ANA PARDO	
SERINCO-SED-L4-2025-478	COMUNICACIÓN	11 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 26 - May 04 al 10 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-479	COMUNICACIÓN	11 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 26 - May 04 al 10 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-480	COMUNICACIÓN	11 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 26 - May 04 al 10 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-481	COMUNICACIÓN	11 may 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud de Retiro de Materiales Sobrantes de Construcción IED Unión Europea, Sede B - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA	
SERINCO-SED-L4-2025-482	COMUNICACIÓN	11 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Informe Ejecutivo Técnico Solicitud de Garantía Batería Sanitaria IED Fanny Mickey Sede A - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	CESAR CARVAJAL	
SERINCO-SED-L5-2025-483	COMUNICACIÓN	11 may 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Fernando González Ochoa, Sede A Chico Sur - CPF 510	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-INT-2025-484	COMUNICACIÓN	14 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	REMISIÓN CUENTA DE COBRO INTERVENTORIA No. 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L6-2025-485	COMUNICACIÓN	15 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión de Paquete de APU`s de Items No Previstos del NP-12 a NP-16 Aprobados por Interventoría- Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-486	COMUNICACIÓN	15 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 1959 - IED Guillermo Cano Isaza - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-487	COMUNICACIÓN	15 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION INFORME TECNICO No. 7 Periodo 6-04-2026 al 5-05-2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L5-2025-488	COMUNICACIÓN	15 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION INFORME TECNICO No. 7 Periodo 6-04-2026 al 5-05-2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L6-2025-489	COMUNICACIÓN	15 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REMISION INFORME TECNICO No. 7 Periodo 6-04-2026 al 5-05-2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L6-2025-490	COMUNICACIÓN	16 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Traslado de Comunicado OFI-SED-L6-185 - Atención Observaciones Presentadas por el Área de Estudios Previos SED	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-491	COMUNICACIÓN	16 may 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Estrella del Sur, Sede D - CPF 1962	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-492	COMUNICACIÓN	16 may 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Bicentenario (El Tesoro de la Cumbre), Sede C - CPF 1986	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-493	COMUNICACIÓN	16 may 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED José Celestino Mutis, Sede A El Clavel (Mochuelo) - CPF 1985	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-494	COMUNICACIÓN	19 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 27 - May 11 al 17 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-495	COMUNICACIÓN	19 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 27 - May 11 al 17 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-496	COMUNICACIÓN	19 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 27 - May 11 al 17 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-497	COMUNICACIÓN	20 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado de Radicado No. 230 Arsaf - 2025 - Remisión de Grupo de Actividades No Previstas No. 2 Versión No. 3 de NP-09 a NP-16	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-498	COMUNICACIÓN	21 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión de APU´s de Items No Previstos NP-06 al NP-10 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-499	COMUNICACIÓN	21 may 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud de Entrega Formal en Físico de las Actas de Vecindad - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-500	COMUNICACIÓN	21 may 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Solicitud de Entrega Formal en Físico de las Actas de Vecindad - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-501	COMUNICACIÓN	21 may 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud de Entrega Formal en Físico de las Actas de Vecindad - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-502	COMUNICACIÓN	21 may 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud Atención de Emergencia No. 2 y Remisión Ficha SAE - IED José Celestino Mutis, Sede A El Clavel (Mochuelo) - CPF 1985	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-503	COMUNICACIÓN	21 may 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	REMISION 07 INF TÉCNICO MENSUAL No. 07 DE OBRA - CONTRATO_SED-8155135 L4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L5-2025-504	COMUNICACIÓN	22 may 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	REMISION DE INFORME MENSUAL DE OBRA No. 07 - CONTRATO_SED-8154895 L5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L6-2025-505	COMUNICACIÓN	22 may 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	REMISION DE INFORME MENSUAL DE OBRA No. 07 - CONTRATO_SED-8154780 L6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L5-2025-506	COMUNICACIÓN	25 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 28 - May 18 al 24 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-507	COMUNICACIÓN	25 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 28 - May 18 al 24 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-508	COMUNICACIÓN	25 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 28 - May 18 al 24 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-509	COMUNICACIÓN	25 may 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Cundinamarca, Sede A La Riviera del Sur - CPF 1980	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-510	COMUNICACIÓN	25 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Informe Ejecutivo Técnico Solicitud de Toma de Detalles Varios IED Ofelia Uribe de Acosta, Sede A - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	

SERINCO-SED-L5-2025-511	COMUNICACIÓN	25 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión de Programación de Obras para Intervención de Baterías Sanitarias IED Miguel de Cervantes, Sede B Biblioteca Marichuela - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-512	COMUNICACIÓN	25 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 533 - IED Rural La Unión, Sede A - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-513	COMUNICACIÓN	26 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 510 - IED Fernando González Ochoa, Sede A Chico Sur - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-514	COMUNICACIÓN	26 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Traslado a la SED de Primer Paquete de Manuales y Matrices de Mantenimiento - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-515	COMUNICACIÓN	26 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado a la SED de Primer Paquete de Manuales y Matrices de Mantenimiento - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-516	COMUNICACIÓN	26 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Traslado a la SED de Primer Paquete de Manuales y Matrices de Mantenimiento - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-517	COMUNICACIÓN	26 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia No. 2 CPF 1985 - IED José Celestino Mutis, Sede A El Clavel (Mochuelo) - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-518	COMUNICACIÓN	28 may 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	SOLICITUD ACTUALIZACION DE POLIZAS Y SOPORTES DE REPORTES AMBIENTALES	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L5-2025-519	COMUNICACIÓN	28 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Respuesta a Solicitud de Atención de Garantía Divisiones de Baño en Acero Inoxidable CPF 508 IED Brasilia - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ANA PARDO	
SERINCO-SED-L4-2025-520	COMUNICACIÓN	28 may 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	SOLICITUD ACTUALIZACION DE POLIZAS Y SOPORTES DE REPORTES AMBIENTALES	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L5-2025-521	COMUNICACIÓN	28 may 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	SOLICITUD ACTUALIZACION DE POLIZAS Y SOPORTES DE REPORTES AMBIENTALES	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L4-2025-522	COMUNICACIÓN	29 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado de Radicado N° 234-Arsaf-2025 - Solicitud de Información para Entrega de Espacios, Manual y Matriz de Mantenimiento del IED Confederación Brisas del Diamante Sede A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-523	COMUNICACIÓN	29 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado de Radicado N° 236-Arsaf-2025 - Remisión de Informe de Verificación de Avifauna y Ejecución de Tratamientos Silviculturales	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-524	COMUNICACIÓN	1 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 29 - May 25 al 31 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-525	COMUNICACIÓN	1 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 29 - May 25 al 31 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-526	COMUNICACIÓN	1 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 29 - May 25 al 31 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-527	COMUNICACIÓN	3 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado de RADICADO N° 244-ARSAF-2025 -REMISIÓN DE POLIZAS ACTUALIZADA CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155135 SEGÚN MODIFICATORIO No. 2	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L4-2025-528	COMUNICACIÓN	3 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado de Radicado No. 243 Arsaf - 2025 - Remisión de Atención de Observaciones Grupo No. 2 de Actividades No Previstas.	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-529	COMUNICACIÓN	4 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Traslado de Comunicado OFI-SED-L6-196 Atención Observaciones NP´s 12 15 y 16	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-530	COMUNICACIÓN	4 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Traslado de Comunicado OFI-SED-L6-195 Atención Observaciones NP´s 10 y 11	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-531	COMUNICACIÓN	4 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado de Radicado No. 242 Arsaf - 2025 - Remisión de Programación Frentes de Obra por Modificatorio No. 2 y Presupuesto IED Arborizadora Alta	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-532	COMUNICACIÓN	4 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia No. 1 y Remisión Ficha SAE - IED José Celestino Mutis, Sede A El Clavel (Mochuelo) - CPF 1985	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-533	COMUNICACIÓN	4 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión de Alcance, Presupuesto, Cronograma de Emergencia y Ficha SAE - IED Luis Eduardo Mora Osejo, Sede A - CPF 566	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-534	COMUNICACIÓN	4 jun 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Reiteración de Entrega Formal en Físico de las Actas de Vecindad - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-535	COMUNICACIÓN	4 jun 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Reiteración de Entrega Formal en Físico de las Actas de Vecindad - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-536	COMUNICACIÓN	4 jun 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Reiteración de Entrega Formal en Físico de las Actas de Vecindad - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-537	COMUNICACIÓN	4 jun 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Solicitud de Entrega de los Documentos Mínimos Requeridos de las Sedes Finalizadas para Liquidación Posterior del Contrato	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-538	COMUNICACIÓN	4 jun 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud de Entrega de los Documentos Mínimos Requeridos de las Sedes Finalizadas para Liquidación Posterior del Contrato	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-539	COMUNICACIÓN	4 jun 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud de Entrega de los Documentos Mínimos Requeridos de las Sedes Finalizadas para Liquidación Posterior del Contrato	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-540	COMUNICACIÓN	5 jun 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud Atención de Emergencia No. 3 y Remisión Ficha SAE - IED Calasanz Buenavista - CPF 1974	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-541	COMUNICACIÓN	5 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado de Radicado No. 240 Arsaf - 2025 - Respuesta Derecho de Petición por Filtración de agua IED Ofelia Uribe de Acosta Sede A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-542	COMUNICACIÓN	9 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 30 - Jun 01 al 07 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-543	COMUNICACIÓN	9 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 30 - Jun 01 al 07 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-544	COMUNICACIÓN	9 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 30 - Jun 01 al 07 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-INT-2025-545	COMUNICACIÓN	10 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	Relación de Valores de los Contratos de Obra del Grupo 2, Lotes 4, 5 y 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-546	COMUNICACIÓN	10 jun 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Solicitud Atención de Emergencia No. 2 y Remisión Ficha SAE - IED Fanny Mickey, Sede A - CPF 1981	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-547	COMUNICACIÓN	16 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 31 - Jun 08 al 14 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-548	COMUNICACIÓN	16 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 31 - Jun 08 al 14 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-549	COMUNICACIÓN	16 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 31 - Jun 08 al 14 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-550	COMUNICACIÓN	16 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Acta Parcial No. 4 - Periodo (06.04.26 al 05.06.26)- Consorcio Pais	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-551	COMUNICACIÓN	16 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Acta Parcial No. 5 - Periodo (06.04.26 al 05.06.26)- Consorcio Arsaf	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-552	COMUNICACIÓN	16 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Alcance a Comunicado SERINCO-SED-2025-513-L5-Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 510 - IED Fernando González Ochoa, Sede A Chico Sur - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-553	COMUNICACIÓN	16 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión de Programación de Obras para Intervenciones locativas en la IED Ciudad de Villavicencio, Sede B Puerta del Llano - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-554	COMUNICACIÓN	17 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Acta Parcial No. 5 - Periodo (06.04.26 al 05.06.26)- Consorcio Fortaleza	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-555	COMUNICACIÓN	17 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Traslado de Comunicado OFI-SED-L6-223- Radicación ajustes APU´s precio son previstos nO. NP-10, NP-11, NP-12, NP-15 y NP-16	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-556	COMUNICACIÓN	17 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia No. 3 - IED Calasanz Buenavista - CPF 1974	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-557	COMUNICACIÓN	17 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia - IED Cundinamarca, Sede A La Riviera del Sur - CPF 1980	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-558	COMUNICACIÓN	17 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia No. 2 - Dirección Local de Usme, DILE - CPF 590	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-559	COMUNICACIÓN	17 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia - IED Bicentenario (El Tesoro de la Cumbre), Sede C - CPF 1986	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-560	COMUNICACIÓN	17 jun 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Ciudad de Villavicencio, Sede A - CPF 577	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-561	COMUNICACIÓN	18 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado de Radicado N° 247-ARSAF-2025-Remisión de Respuesta al Requerimiento SDA E-2026-93904 y Concepto de Interventoria	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-INT-2025-562	COMUNICACIÓN	18 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	REMISIÓN CUENTA No. 7 – COSTOS FIJO Y COSTO VARIABLE	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L6-2025-563	COMUNICACIÓN	19 jun 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED San José de Usme -Sede A, San José Monteblanco (Don Bosco II) - CPF 567	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-564	COMUNICACIÓN	19 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 8 Periodo 6-05-2026 al 5-06-2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L5-2025-565	COMUNICACIÓN	19 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 8 Periodo 6-05-2026 al 5-06-2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L6-2025-566	COMUNICACIÓN	19 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REMISION INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 8 Periodo 6-05-2026 al 5-06-2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L5-2025-567	COMUNICACIÓN	20 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Informe Ejecutivo Técnico Solicitud de Garantias Emergencia IED Santa Librada, Sede A - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ANA PARDO	
SERINCO-SED-L5-2025-568	COMUNICACIÓN	20 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Informe Ejecutivo Técnico Solicitud de Garantias IED Atabanzha, Sede A - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ANA PARDO	
SERINCO-SED-L5-2025-569	COMUNICACIÓN	22 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 32 - Jun 15 al 21 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-570	COMUNICACIÓN	22 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 32 - Jun 15 al 21 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-571	COMUNICACIÓN	22 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 32 - Jun 15 al 21 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-572	COMUNICACIÓN	22 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión de Reprogramación de Obras para Finalizar Intervención de Baterías Sanitarias IED Guillermo Cano Isaza, Sede A - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-573	COMUNICACIÓN	23 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia - IED Estrella del Sur, Sede D Estrella IV - CPF 1962	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-574	COMUNICACIÓN	23 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia - IED Ofelia Uribe de Acosta, Sede A La Unión Usme - CPF 573	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LX-2025-575	COMUNICACIÓN	23 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION DE INFORME MENSUAL DE OBRA No. 08 - CONTRATO_SED-8155135 L4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-LX-2025-576	COMUNICACIÓN	24 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION DE INFORME MENSUAL DE OBRA No. 08 - CONTRATO_SED-8154895 L5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L4-2025-577	COMUNICACIÓN	24 jun 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Compartir Recuerdo, Sede B El Recuerdo - CPF 1915	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-578	COMUNICACIÓN	24 jun 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud Atención de Emergencia Remisión Ficha SAE - IED Paraiso Mirador, Sede B Paraiso Mirador Primaria - CPF 1935	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-579	COMUNICACIÓN	30 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 33 - Jun 22 al 28 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-580	COMUNICACIÓN	30 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 33 - Jun 22 al 28 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-581	COMUNICACIÓN	30 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 33 - Jun 22 al 28 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-582	COMUNICACIÓN	30 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia No. 2 CPF 1981 - IED Fanny Mickey, Sede A - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-583	COMUNICACIÓN	30 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia No. 2 CPF 577 - IED Ciudad de Villavicencio, Sede A Villa Hermosa - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	

SERINCO-SED-L6-2025-584	COMUNICACIÓN	1 jul 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REMISION DE INFORME MENSUAL DE OBRA No. 08 - CONTRATO_SED-8154780 L6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L4-2025-585	COMUNICACIÓN	6 jul 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado de Radicado No. 262 Arsaf-2025- Información de Novedad Presentada, Daños en Policarbonato y Solicitud de Cambio de Material Cubierta IED Estrella del Sur Sede D	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L4-2025-586	COMUNICACIÓN	6 jul 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Informe Ejecutivo Técnico Solicitud de Atención de Garantía IED Los Tejares, Sede A - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	CESAR CARVAJAL	
SERINCO-SED-L4-2025-587	COMUNICACIÓN	6 jul 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 34 - Jun 29 a Jul 05 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-588	COMUNICACIÓN	6 jul 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 34 - Jun 29 a Jul 05 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-589	COMUNICACIÓN	6 jul 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 34 - Jun 29 a Jul 05 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-590	COMUNICACIÓN	8 jul 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia - IED Paraiso Mirador, Sede B Paraiso Mirador Primaria - CPF 1935	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-591	COMUNICACIÓN	9 jul 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Traslado de Radicado OFI-SED-L6-229 Radicación APU´s NP-17 A 19 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LX-2025-592	COMUNICACIÓN	10 jul 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Acta Parcial No. 6 - Periodo (06.06.26 al 05.07.26)- Consorcio Arsaf	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-LX-2025-593	COMUNICACIÓN	10 jul 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Acta Parcial No. 6 - Periodo (06.06.26 al 05.07.26)- Consorcio Fortaleza	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-LX-2025-594	COMUNICACIÓN	10 jul 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Acta Parcial No. 5 - Periodo (06.06.26 al 05.07.26)- Consorcio Pais	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L4-2025-595	COMUNICACIÓN	14 jul 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 35 - Jul 06 al 12 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-596	COMUNICACIÓN	14 jul 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 35 - Jul 06 al 12 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-597	COMUNICACIÓN	14 jul 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 35 - Jul 06 al 12 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-598	COMUNICACIÓN	14 jul 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Informe Ejecutivo Técnico Solicitud de Atención de Garantía IED Fanny Mickey, Sede A - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	CESAR CARVAJAL	
SERINCO-SED-LX-2025-599	COMUNICACIÓN	14 jul 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Respuesta al derecho de petición relacionado con la intervención del muro perimetral del IED Arborizadora Alta Sede B	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L5-2025-600	COMUNICACIÓN	14 jul 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Reiteración de Solicitud de Entrega de los Documentos Mínimos Requeridos de las Sedes Finalizadas para Liquidación Posterior del Contrato	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-601	COMUNICACIÓN	14 jul 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Reiteración de Solicitud de Entrega de los Documentos Mínimos Requeridos de las Sedes Finalizadas para Liquidación Posterior del Contrato	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-602	COMUNICACIÓN	14 jul 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Reiteración de Solicitud de Entrega de los Documentos Mínimos Requeridos de las Sedes Finalizadas para Liquidación Posterior del Contrato	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-603	COMUNICACIÓN	15 jul 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia - IED Compartir Recuerdo, Sede B El Recuerdo - CPF 1915	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-604	COMUNICACIÓN	15 jul 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Certificación Cumplimiento Factor de Sostenibilidad – Suministro e Instalación de Ciclo Parqueadero	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA	
SERINCO-SED-L5-2025-605	COMUNICACIÓN	16 jul 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Informe Ejecutivo Técnico Solicitud de Atención de Garantía IED Atabanzha, Sede A Valle de Cafam - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA	
SERINCO-SED-L6-2025-606	COMUNICACIÓN	17 jul 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REMISION INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 9 Periodo 6-06-2026 al 5-07-2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-INT-2025-607	COMUNICACIÓN	17 jul 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	REMISIÓN CUENTA No. 8 – COSTOS FIJO Y COSTO VARIABLE	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L4-2025-608	COMUNICACIÓN	17 jul 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 9 Periodo 6-06-2026 al 5-07-2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L6-2025-609	COMUNICACIÓN	17 jul 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud de Caracterización de Material para Subbase en IED Colegio Ciudad de Villavicencio Sede B – CPF – 545	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA	
SERINCO-SED-L5-2025-610	COMUNICACIÓN	17 jul 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 9 Periodo 6-06-2026 al 5-07-2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L5-2025-611	COMUNICACIÓN	18 jul 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Fernando González Ochoa, Sede B, Líbano Segundo Sector - CPF 580	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-612	COMUNICACIÓN	18 jul 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Gabriel Garcia Márquez, Sede A, Villa Diana - CPF 579	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-613	COMUNICACIÓN	21 jul 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 36 - Jul 13 al 19 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-614	COMUNICACIÓN	21 jul 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 36 - Jul 13 al 19 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-615	COMUNICACIÓN	21 jul 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 36 - Jul 13 al 19 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-616	COMUNICACIÓN	21 jul 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION DE INFORME MENSUAL DE OBRA No. 09 - CONTRATO_SED-8155135 L4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L5-2025-617	COMUNICACIÓN	21 jul 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION DE INFORME MENSUAL DE OBRA No. 09 - CONTRATO_SED-8154895 L5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L6-2025-618	COMUNICACIÓN	22 jul 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REMISION DE INFORME MENSUAL DE OBRA No. 09 - CONTRATO_SED-8154780 L6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L5-2025-619	COMUNICACIÓN	22 jul 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Segunda reiteración de Entrega de los Documentos Mínimos Requeridos de las Sedes Finalizadas para Liquidación Posterior del Contrato	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L6-2025-620	COMUNICACIÓN	22 jul 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Segunda reiteración de Entrega de los Documentos Mínimos Requeridos de las Sedes Finalizadas para Liquidación Posterior del Contrato	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L4-2025-621	COMUNICACIÓN	22 jul 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Segunda reiteración de Entrega de los Documentos Mínimos Requeridos de las Sedes Finalizadas para Liquidación Posterior del Contrato	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L5-2025-622	COMUNICACIÓN	22 jul 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Informe Ejecutivo Técnico Solicitud de Atención de Garantía IED Brasilia, Sede A - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA	
SERINCO-SED-L5-2025-623	COMUNICACIÓN	22 jul 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Informe Ejecutivo Técnico Solicitud de Atención de Garantía IED José Maria Vargas Vila, Sede A - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA	
SERINCO-SED-L6-2025-624	COMUNICACIÓN	24 jul 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Entrega de Resultados de Laboratorio de acuerdo a comunicado SERINCO-SED-2025-609-L6-Solicitud de Caracterización de Material para Subbase.	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA	
SERINCO-SED-L4-2025-625	COMUNICACIÓN	24 jul 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Solicitud Atención de Emergencia Remisión Ficha SAE - IED Diego Montaña Cuellar, Sede A El Uval Nuevo - CPF 576	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-626	COMUNICACIÓN	24 jul 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud Atención de Emergencia Remisión Ficha SAE - IED Eduardo Umaña Mendoza, Sede A Villa Alemania - CPF 575	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-627	COMUNICACIÓN	24 jul 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión de Reprogramación de Obras para Finalizar Intervención de Baterías Sanitarias IED Guillermo Cano Isaza, Sede A - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-628	COMUNICACIÓN	27 jul 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 37 - Jul 20 al 26 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-629	COMUNICACIÓN	27 jul 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 37 - Jul 20 al 26 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-630	COMUNICACIÓN	27 jul 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 37 - Jul 20 al 26 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-631	COMUNICACIÓN	29 jul 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado de Radicado No. 272 Arsaf - 2025 - Novedad de Corte de Agua Emergencia IED Rural La Unión Usme	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-INT-2025-632	COMUNICACIÓN	30 jul 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Respuesta a Solicitud de Información sobre Protocolos de Retiro de Techos con Asbesto - CAS Bachillerato	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ANA BERMUDEZ	
SERINCO-SED-L4-2025-630A	COMUNICACIÓN	30 jul 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Traslado Radicado No- S-2026-238206 - Solicitud de Modificación y/o Adición Presupuestal No. 3 al Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR. 8155135 de 2025	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-628A	COMUNICACIÓN	30 jul 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 5	Traslado Radicado No- S-2026-238206 - Solicitud de Modificación y/o Adición Presupuestal No. 3 al Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR. 8154895 de 2025	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-629A	COMUNICACIÓN	30 jul 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Traslado Radicado No- S-2026-238206 - Solicitud de Modificación y/o Adición Presupuestal No. 3 al Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR. 8154780 de 2025	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-633	COMUNICACIÓN	31 jul 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión de Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 579 - IED Gabriel García Márquez, Sede A Villa Diana- Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-634	COMUNICACIÓN	31 jul 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Alcance a Comunicado SERINCO-SED-2025-590-L5-Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia - IED Paraiso Mirador, Sede B Paraiso Mirador Primaria - CPF 1935	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-635	COMUNICACIÓN	3 ago 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 38 - Jul 27 a Ago 02 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-636	COMUNICACIÓN	3 ago 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 38 - Jul 27 a Ago 02 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-637	COMUNICACIÓN	3 ago 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 38 - Jul 27 a Ago 02 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-638	COMUNICACIÓN	10 ago 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 39 - Ago 03 al 09 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-639	COMUNICACIÓN	10 ago 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 39 - Ago 03 al 09 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-640	COMUNICACIÓN	10 ago 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 39 - Ago 03 al 09 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-641	COMUNICACIÓN	10 ago 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Acta Parcial No. 7 - Periodo (06.07.26 al 05.08.26)- Consorcio Fortaleza	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L5-2025-642	COMUNICACIÓN	11 ago 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Alcance a Comunicado SERINCO-SED-2025-612-L5-Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Gabriel Garcia Márquez, Sede A, Villa Diana - CPF 579	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-643	COMUNICACIÓN	11 ago 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud Atención de Emergencia No. 2 y Remisión Ficha SAE - IED Luis Eduardo Mora Osejo, Sede A - CPF 566	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-644	COMUNICACIÓN	11 ago 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Acta Parcial No. 6 - Periodo (06.07.26 al 05.08.26)- Consorcio Pais	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-LX-2025-645	COMUNICACIÓN	12 ago 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Acta Parcial No. 7 - Periodo (06.07.26 al 05.08.26)- Consorcio Arsaf	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L5-2025-646	COMUNICACIÓN	12 ago 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Informe Ejecutivo Técnico Solicitud de Atención de Garantía IED Santa Librada, Sede A - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-647	COMUNICACIÓN	12 ago 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Informe Ejecutivo Técnico Solicitud de Atención de Garantía IED José Jaime Rojas, Sede A - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-648	COMUNICACIÓN	12 ago 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Santa Librada, Sede A - CPF 546	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-649	COMUNICACIÓN	12 ago 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Los Tejares, Sede A - CPF 539	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-650	COMUNICACIÓN	13 ago 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado de Radicado No. 276 Arsaf - 2025 - Solicitud de Cambio de Griferia Tipo Push para Lavamanos a Sistema Mariposa - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-INT-2025-651	COMUNICACIÓN	13 ago 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4; 5; 6	Solicitud Modificatorio No. 03 Adición y Prórroga. - Cto Interventoria CO1.PCCNTR.8169110 Grupo 2	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	STEFANIA CEBALLOS	

SERINCO-SED-L5-2025-652	COMUNICACIÓN	18 ago 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Traslado Comunicado SED-CF-L5-2025-043 - Solicitud Modificatorio No. 3 Adición y Prorroga - Lote 5.	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LX-2025-653	COMUNICACIÓN	14 ago 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	REMISIÓN CUENTA No. 9 - COSTOS FIJO Y COSTO VARIABLE	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS		
SERINCO-SED-L4-2025-654	COMUNICACIÓN	15 ago 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Informe Ejecutivo Técnico Solicitud de Atención de Garantía IED Estrella del Sur, Sede D - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-655	COMUNICACIÓN	15 ago 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Informe Ejecutivo Técnico Solicitud de Atención de Garantía IED Estrella del Sur, Sede C - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-656	COMUNICACIÓN	18 ago 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 40 - Ago 10 al 16 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-657	COMUNICACIÓN	18 ago 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 40 - Ago 10 al 16 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-658	COMUNICACIÓN	18 ago 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 40 - Ago 10 al 16 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-659	COMUNICACIÓN	18 ago 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia - IED San José de Usme, Sede A San José Monteblanco (Don Bosco II) - CPF 567	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-660	COMUNICACIÓN	18 ago 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia - IED Eduardo Umaña Mendoza, Sede A Villa Alemania - CPF 575	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-661	COMUNICACIÓN	21 ago 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado de Radicado No. 281 Arsaf -2025 - Solicitud de Modificatorio No. 3 Adición y Prorroga Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8155135	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-662	COMUNICACIÓN	21 ago 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 10 Periodo 6-06-2026 al 5-07-2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L5-2025-663	COMUNICACIÓN	21 ago 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 10 Periodo 6-06-2026 al 5-07-2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L6-2025-664	COMUNICACIÓN	21 ago 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REMISION INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 10 Periodo 6-06-2026 al 5-07-2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L4-2025-665	COMUNICACIÓN	21 ago 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION DE INFORME MENSUAL DE OBRA No. 10 - CONTRATO_SED-8155135 L4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L5-2025-666	COMUNICACIÓN	21 ago 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION DE INFORME MENSUAL DE OBRA No. 10 - CONTRATO_SED-8154895 L5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L6-2025-667	COMUNICACIÓN	21 ago 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REMISION DE INFORME MENSUAL DE OBRA No. 10 - CONTRATO_SED-8154780 L6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L6-2025-668	COMUNICACIÓN	21 ago 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Cumplimiento de Compromisos Adquiridos en Comités de Seguimiento No.37, 38 y 39 Celebrados en Agosto 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA	
SERINCO-SED-L5-2025-669	COMUNICACIÓN	21 ago 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Cumplimiento de Compromisos Adquiridos en Comités de Seguimiento No.37, 38 y 39 Celebrados en Agosto 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA	
SERINCO-SED-L4-2025-670	COMUNICACIÓN	21 ago 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Cumplimiento de Compromisos Adquiridos en Comités de Seguimiento No.37, 38 y 39 Celebrados en Agosto 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	CESAR CARVAJAL	
SERINCO-SED-L6-2025-671	COMUNICACIÓN	24 ago 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Traslado de Comunicado OFI-SED-L6-261 Solicitud Modificatorio No. 3 Adición y Prórroga	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-672	COMUNICACIÓN	24 ago 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 41 - Ago 17 al 23 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-673	COMUNICACIÓN	24 ago 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 41 - Ago 17 al 23 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-674	COMUNICACIÓN	24 ago 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 41 - Ago 17 al 23 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LX-2025-675	COMUNICACIÓN	24 ago 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION		Alcance al oficio SERINCO-SED-INT-2026-651 Solicitud Modificatorio No. 03 Adición y Prórroga. - Cto Interventoria CO1.PCCNTR.8169110 Grupo 2	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS		
SERINCO-SED-L6-2025-676	COMUNICACIÓN	25 ago 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia - IED Santa Librada, Sede A - CPF 546	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-677	COMUNICACIÓN	26 ago 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Traslado Comunicado OFI-SED-L6-260 - Radicación de Precios No Previstos NP-20, NP-21 y NP-22.	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-678	COMUNICACIÓN	26 ago 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Respuesta a Correo Sobre Reporte de Afectaciones en la IED CIUDAD DE VILLAVICENCIO Sede B Posterior al Evento Sismico del 10 de Agosto de 2026	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA	
SERINCO-SED-L5-2025-679	COMUNICACIÓN	31 ago 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 42 - Ago 24 al 30 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-680	COMUNICACIÓN	31 ago 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 42 - Ago 24 al 30 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-681	COMUNICACIÓN	31 ago 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 42 - Ago 24 al 30 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-682	COMUNICACIÓN	7 sep 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 43 - Ago 31 a Sep 06 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-683	COMUNICACIÓN	7 sep 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 43 - Ago 31 a Sep 06 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-684	COMUNICACIÓN	7 sep 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 43 - Ago 31 a Sep 06 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-685	COMUNICACIÓN	7 sep 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Tercera reiteración de Entrega de los Documentos Mínimos Requeridos de las Sedes Finalizadas para Liquidación Posterior del Contrato	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L5-2025-686	COMUNICACIÓN	7 sep 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Tercera reiteración de Entrega de los Documentos Mínimos Requeridos de las Sedes Finalizadas para Liquidación Posterior del Contrato	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L6-2025-687	COMUNICACIÓN	7 sep 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Tercera reiteración de Entrega de los Documentos Mínimos Requeridos de las Sedes Finalizadas para Liquidación Posterior del Contrato	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L4-2025-688	COMUNICACIÓN	14 sep 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 44 - Sep 07 al 13 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-689	COMUNICACIÓN	14 sep 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 44 - Sep 07 al 13 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-690	COMUNICACIÓN	14 sep 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 44 - Sep 07 al 13 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-691	COMUNICACIÓN	14 sep 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Acta Parcial No. 8 - Periodo (06.08.26 al 05.09.26)- Consorcio Fortaleza	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-LX-2025-692	COMUNICACIÓN	16 sep 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Acta Parcial No. 8 - Periodo (06.08.26 al 05.09.26)- Consorcio Arsaf	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L5-2025-693	COMUNICACIÓN	16 sep 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Certificación Cumplimiento Factor de Sostenibilidad – Suministro e Instalación de Ciclo parqueadero	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LX-2025-694	COMUNICACIÓN	17 sep 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Solicitud balances de emergencias y frentes de obra - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-LX-2025-695	COMUNICACIÓN	17 sep 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Solicitud balances de emergencias y frentes de obra - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L6-2025-696	COMUNICACIÓN	17 sep 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud balances de emergencias y frentes de obra - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-LX-2025-697	COMUNICACIÓN	17 sep 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 11 Periodo 6-08-2026 al 5-09-2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-LX-2025-698	COMUNICACIÓN	18 sep 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 11 Periodo 6-08-2026 al 5-09-2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-LX-2025-699	COMUNICACIÓN	18 sep 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REMISION INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 11 Periodo 6-08-2026 al 5-09-2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L6-2025-700	COMUNICACIÓN	17 sep 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Acta Parcial No. 7 - Periodo (06.08.26 al 05.09.26)- Consorcio Pais	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-LX-2025-701	COMUNICACIÓN	17 sep 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	REMISIÓN CUENTA No. 10 – COSTOS FIJO Y COSTO VARIABLE	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-LX-2025-702	COMUNICACIÓN	18 sep 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION DE INFORME MENSUAL DE OBRA No. 11 - CONTRATO_SED-8155135 L4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-LX-2025-703	COMUNICACIÓN		C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION DE INFORME MENSUAL DE OBRA No. 11 - CONTRATO_SED-8154895 L5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-LX-2025-704	COMUNICACIÓN	22 sep 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REMISION DE INFORME MENSUAL DE OBRA No. 11 - CONTRATO_SED-8154780 L6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L4-2025-705	COMUNICACIÓN	21 sep 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 45 - Sep 14 al 20 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-706	COMUNICACIÓN	21 sep 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 45 - Sep 14 al 20 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-707	COMUNICACIÓN	21 sep 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 45 - Sep 14 al 20 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-708	COMUNICACIÓN	22 sep 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - Predio Madelena - CPF 1997	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-709	COMUNICACIÓN	23 sep 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Relación de Costos de los Mejoramientos y Emergencias Vigentes a la Fecha del Contrato de Obra CO1.PCCNTR. 8154895 - Grupo 2 Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-710	COMUNICACIÓN	24 sep 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Traslado de Respuesta de la SED a Comunicado SERINCO-SED-2025-709-L5-Relación de Costos de los Mejoramientos y Emergencias Vigentes a la Fecha del Contrato de Obra CO1.PCCNTR. 8154895 - Grupo 2 Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-711	COMUNICACIÓN	25 sep 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	CAMBIO DE HOJAS DE VIDA DE RESIDENTE DE OBRA - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L6-2025-712	COMUNICACIÓN	25 sep 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Alcance a Comunicado SERINCO-SED-L6-2025-677 Traslado Comunicado OFI-SED-L6-260 - Radicación de Precios No Previstos NP-20, NP-21 y NP-22.	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-713	COMUNICACIÓN	25 sep 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia - Predio Madelena - CPF 1997	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-714	COMUNICACIÓN	27 sep 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 46 - Sep 21 al 27 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-715	COMUNICACIÓN	27 sep 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 46 - Sep 21 al 27 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-716	COMUNICACIÓN	27 sep 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 46 - Sep 21 al 27 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-717	COMUNICACIÓN	29 sep 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Informe Ejecutivo Técnico Solicitud de Atención de Garantía CPF 508 IED Brasilia, Sede A Brasilia - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-718	COMUNICACIÓN	1 oct 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Informe Ejecutivo Técnico Solicitud de Atención de Garantía CPF 576 IED Diego Montaña Cuellar, Sede A El Uval Nuevo - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-INT-2025-719	COMUNICACIÓN	2 oct 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4 5 6	REMISION DE CONCEPTO FAVORABLE AL DISCRIMINADO DE AIU LOTE 4-5-6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L4-2025-720	COMUNICACIÓN	5 oct 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 47 - Sep 28 a Oct 04 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-721	COMUNICACIÓN	5 oct 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 47 - Sep 28 a Oct 04 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-722	COMUNICACIÓN	5 oct 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 47 - Sep 28 a Oct 04 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
