SOLFISEG DE COLOMBIA SAS
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

LAVADO DE TANQUE DE AGUA POTABLE

Bucaramanga, 15 de octubre de 2026

Señores
INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES PAEZ DE SOTOMAYOR
Bucaramanga

Reciban un cordial saludo

Para SOLFISEG DE COLOMBIA SAS es de vital importancia que nuestros clientes cuenten con las condiciones ideales para su bienestar, para ello se elaboró un procedimiento ideal para realizar los trabajos de lavado y desinfección de pisos, paredes y tapas de tanques aéreos siempre cumpliendo con lo requerido en la resolución 1575 del 9 de mayo.

A continuación, presentamos el procedimiento realizado para el lavado y desinfección de tanque de agua potable

INFORME LAVADO DE TANQUE

El tanque lavado en las instalaciones se presenta a continuación:

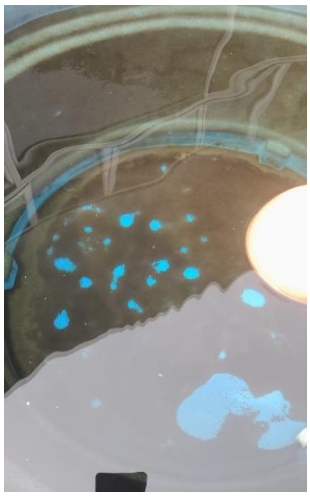
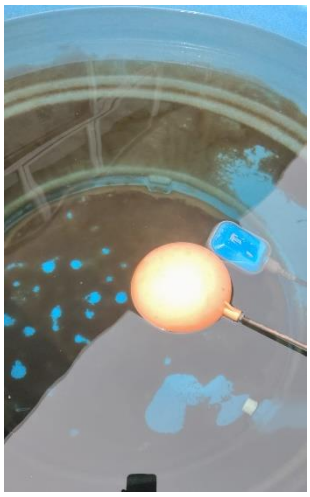
I.E. ANDRES PAEZ DE SOTOMAYOR		
No. Tanque	**TIPO**	**CAPACIDAD**
1	TANQUE AEREO	1000 LITROS
2	TANQUE AEREO	500 LITROS
3	TANQUE AEREO	500 LITROS
4	TANQUE AEREO	1000 LITROS
5	TANQUE AEREO	1000 LITROS

SOLFISEG DE COLOMBIA SAS
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

LAVADO DE TANQUE DE AGUA POTABLE

PROCEDIMIENTO

1. Revisión preliminar

TANQUE 1
ANTES
 
DESPUES
 

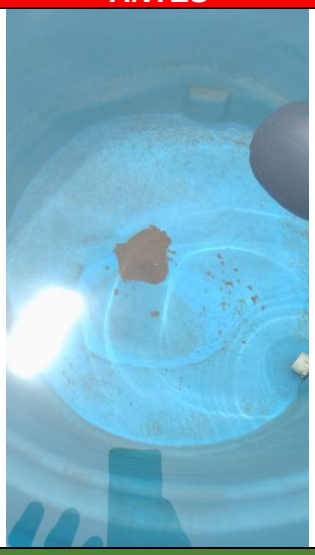
LAVADO DE TANQUE DE AGUA POTABLE

2. Revisión preliminar

TANQUE 2
ANTES

DESPUES

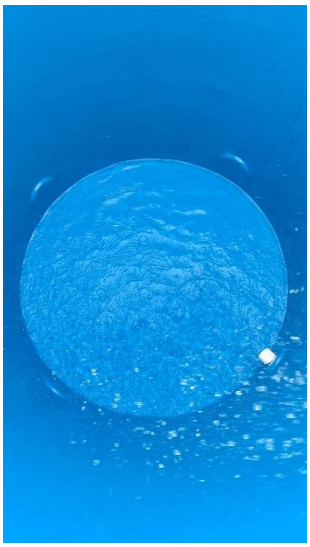

3. Revisión preliminar

TANQUE 3
ANTES

DESPUES


LAVADO DE TANQUE DE AGUA POTABLE

4. Revisión preliminar

TANQUE 4
ANTES

DESPUES


5. Revisión preliminar

TANQUE 5
ANTES

DESPUES


El tanque tres (03) se le realiza una extensión en la tubería de ventilación la cual se encontraba inferior al nivel de llenado del tanque.

Lavado y desinfección

Se realizó el proceso de lavado y desinfección de paredes, piso y techo según requisitos por el decreto 1575 de 2007, utilizado como productos base hipoclorito de sodio a una concentración del 15% para garantizar la eliminación de patógenos, bacterias y hongos así lograr que el agua cumpla con los estándares mínimos de microorganismos en el agua.

6. Recomendaciones:

*Teniendo en cuenta las condiciones en las cuales se encuentra el agua al momento del lavado de tanque, se debe realizar el proceso de lavado del tanque a un tiempo no mayor de seis meses.

*Adicional recomendamos realizar el cambio de la tapa del tanque 3 ya que se encuentra partida y el material eterboard no es el adecuado para cubrirla.

Atentamente.

CIRO ALFONSO MURILLO
Gerente General
