Bitácora de Obra

Cancha Vereda La Trinidad

Contratista = Consorcio EJR.

Interventor. Innova Proyectos

Contrato No. 2604080789.

Adecuación y Mantenimiento de los Escenarios Deportivos de los Corregimiento Agroturístico, Manantial, Panorama, Remanso y Río Blanco del Municipio de Manizales por Monto Agotable.

12-08-2026

Inicio de Actividades en el frente de obra con llegada de Mini excavadora para iniciar descapote de la cancha.

Personal en obra = 1 residente, 1 maestro, 1 siso, 1 oficial 1 ayudante, 1 operador mini excavadora.

PAF

M.F

innova s.a.s

Nit. 900 359.695-6

13-08-2026

Personal en obra = 1 residente, 1 maestro, 1 siso, 1 oficial 1 ayudante, 1 operador mini excavadora.

Se continua con descapote y rocería en la cancha.

Se recoge y acopia material para su posterior Transporte a botadero.

PAF

M.F

innova s.a.s

Nit. 900 359.695-5

14-08-2026

Personal en obra = 1 residente, 1 Siso, 1 maestro 1 oficial, 1 ayudante 1 operador de mini excavadora

Se continua con el descapote y la rocería en la cancha.

Se hace acopio de material para su Transporte a botadero.

PAF

M.F

innova s.a.s

Nit. 900 359.695-8

INDUCONTABLES

26 Día no laborable

2026 Domingo

2026 Lunes festivo

PAF

M.F
INNOVA S.A.S
Nit. 900 359 695-5

-26

al en obra = 1 residente, 1 siso, 1 maestro

ial, 1 ayudante, 1 operador mini excavadora

Trava con el descapote y la nivelación de

ncha.

ce acopio de material para Transportar a

no

PAF

M.F
INNOVA S.A.S
Nit. 900 359 695-5

-2026

al en obra = 1 residente, 1 siso, 1 maestro

al, 1 ayudante, 1 operador mini excavadora

Trava con descapote y se hace venivelacion

o en zonas donde la capa de descapote

uy alta.

e acopio de material para Transportar a

no

PAF

M.F
INNOVA S.A.S
Nit. 900 359 695-5

20-08-2026

Personal en obra = 1 residente, 1 maestro, 1 siso

1 oficial, 1 ayudante, 1 operador de mini excavadora

Se inicia el cargue de Volqueas para el sitio de

deposito,

Durante Todo el día se cargo volqueas

PAF

M.F
INNOVA S.A.S
Nit. 900 359 695-5

21-08-2026.

Personal en obra = 1 residente, 1 maestro, 1 siso

1 oficial, 1 ayudante, 1 operador de mini excavadora

Se termino el cargue de Volqueas y se continúa

con la actividad de venivelación, se encuentra en

el Tramo un Tubo de servidumbre de aguas

negras.

PAF

M.F
INNOVA S.A.S
Nit. 900 359 695-5

24-08-26

Se suspende el contrato de obra debido a las condiciones

de Insumos y Transporte de materiales por el sismo

ocurrido el 10 de agosto de 2026.

PAF

M.F
INNOVA S.A.S
Nit. 900 359 695-5

Bitacora de Obra

Cancha Verda Java.

Contratista = Consorcio Ejr.

Interventor = Innova Proyectos

Contrato No 2604080789

Adecuacion y Mantenimiento de los Escenarios Deportivos de los Corregimientos Agroturistico, Manantial, Panorama, Remanso y Rio Blanco del Municipio de Manizales Por Monto Agotable.

18-08-2026.

Personal en obra = 1 residente, 1 SISO, 1 maestro, 2 ayudantes

Se inician actividades de rocería y limpieza -

Se inicia el hidrolavado de la zona de gradenas

M.F

innova s.a.s

Nit 900 359 695-5

PAF

19-08-2026

Personal en obra = 1 residente, 1 siso, 1 maestro

2 ayudantes

Se continúa con rocería y limpieza de la cancha

Se continúa con el hidrolavado de las gradas

Se marcan los filtros en la cancha segun diseño

M.F

innova s.a.s

Nit 900 359 695-5

PAF

20-08-2026

Personal en obra = 1 residente, 1 siso, 1 maestro

1 oficial, 4 ayudantes

Se marcan los filtros para el inicio de excavaciones

Se Termina el hidrolavado de la graderia y se inicia

actividades de resane y pintura de los mismos

innova s.a.s M.F

Nit 900 359 695-5

PAF

INDUCONTABLES

21-08-2026

Personal en obra: 1 residente, 1 maestro, 1 SISO
1 oficial, 7 ayudantes

Se continúa con la pintura de las graderías
Se inicia la pintura de la malla exterior de la cancha y se inician las excavaciones para los filtros

M.F TAF

INNOVA S.A.S
NIT. 900.359.695-5

24-08-2026

Se suspende el contrato de obra por falta de suministro de materiales e insumos debido al sismo del 10-08-2026

TAF

M.F

INNOVA S.A.S
NIT. 900.359.695-5

Bitácora de Obra

Cancha Multiple Vereda La Trinidad

Contratista Consorcio EJR.

Interventor Innova Proyectos

Contrato No. 2604080789.

18-08-2026

Personal en Obra = 1 residente, 1 siso, 1 maestro 1 oficial
2 ayudantes

Se inician actividades de rocería y limpieza de la malla de la cancha Multiple.-

Se lleva polea para Tensionar y enderezar los postes de la malla que se encontraban Torcidos

PAF

19-08-2026

Personal en obra = 1 residente, 1 siso, 1 maestro
1 oficial, 2 ayudantes

Se inicia limpieza de la malla para poder pintar.

En las horas de la Tarde se inicia la pintura de la malla de la cancha multiple.

PAF

H.F

INNOVA S.A.S
Nit. 900 359 695-5

20-08-2026

Personal en obra: 1 residente, 1 maestro, 1 siso, 2 ayudante

Se continúa con la pintura de la malla y las reparaciones a la misma.

PAF

H.F

INNOVA S.A.S
Nit. 900 359 695-5

INDUCONTABLES

21-08-2026

Personal en obra = 1 residente, 1 siso, 1 maestro
2 ayudantes

Se continúa con la pintura de la malla de la cancha
Multiple.

24-08-2026

Se suspende el contrato de obra debido a la falta
de suministro de materiales e insumos por el
sismo del 10-08-2026.

M.F

innova s.a.s
Nit. 900 359 695-5

BITACORA DE OBRA

RANCHA VEREDA ESPARTILLAL

CONTRATISTA CONSORCIO EJR.

INTERVENTOR INNOVA PROYECTOS

CONTRATO No 2604080789.

22-08-2026

Personal en obra = 1 residente, 1 maestro, 1 siso
3 oficiales, 8 ayudantes.

Se hace roceria y limpieza de zona de Cancha y se retira material de la zona para su posterior transporte.

Se hace renivelación de cancha y se retira material para su posterior transporte

Se hace limpieza de mallas para su posterior pintura

Se deja la cancha limpia y pendiente de la instalación de la arena. PAT

24-08-26

Se suspende el contrato de obra por falta de suministro de materiales e insumos debido al sismo del 10-08-26

M.F PAT

INNOVA S.A.S
NIt. 900.359.695-5

INDUCONTABLES

Bitácora de Obra

Bio Saludables Vereda Bajo Arenillo

Contratista Consorcio EJR.

Interventor Innova Proyectos

Contrato 260 4080789.

3-08-2026.

Personal en obra = 1 residente, 1 maestro, 1 siso
1 oficial, 1 ayudante -
Se inician actividades de rocería y descapote de la
zona de los Biosaludables del Bajo Arenillo.

M.F
innova s.a.s
Nit. 900.359.695-5

PAF

4-08-2026.

Personal en obra = 1 Oficial, 1 ayudante, 1 residente, 1 maestro
Se retira el material de rocería y descapote
para su posterior Transporte a botadero.
Se hace renivelación del Terreno PAF

M.F
innova s.a.s
Nit. 900.359.695-5

5-08-2026

Personal en obra = 1 residente, 1 siso 1 maestro
1 oficial, 1 ayudante
Se inicia la instalación de afirmado para la zona
de Trabajo.
Se compacta el material. y se deja nivelado- PAF

M.F
innova s.a.s
Nit. 900.359.695-5

INDUCONTABLES

2026

al en obra: 1 residente, 1 siso, 1 maestro

l, 1 ayudante

ala y compacta afirmado en la zona de

o saludables PAF

M.F

innova s.a.s

Nit 900 359 695-5

-2026 - Día festivo

-2026 Día no laborable

2026 Domingo PAF

M.F

innova s.a.s

Nit 900 359 695-5

-2026

sonal llega al sitio de Trabajo pero es

lto a sus casas debido al sismo que

o en la mañana en el eje cafetero PAF

ova s.a.s M.F

359 695-5

2026

l suministro de Insumos para continuar

actividades en este frente PAF

M.F

nova s.a.s

900 359 695-5

24-08-2026

Se suspende el contrato de obra por falta de suministro de materiales e insumos debido al sismo del 10-08-26 PAF

M.F

innova s.a.s

Nit 900 359 695-5

BITÁCORA DE OBRA.

CANCHA SINTÉTICA BAJO TABLADO

CONTRATISTA: CONSORCIO EJR.

INTERVENTOR INNOVA PROYECTOS

CONTRATO No 2609080789.

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LOS CORREGIMIENTOS AGROTURISTICO, MANANTIAL, PANORAMA, REMANSO Y RIO BLANCO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES POR MODO AGOTABLE.

24-07-26.

Se inician actividades..

Personal en Obra: 1 Residente, 1 SISO, 1 maestro 1 Soldador, 2 ayudantes

Se inicia con el corte y retiro de malla en mal estado. pero se suspende la actividad por que la comunidad informa y ese fin de semana tienen programado la final de un torneo de futbol y la necesitan en buen estado.

El contratista ademas habla con la comunidad educativa del Colegio Maria Goretti por que no les habia sido informado del cierre de la cancha sintética para las actividades de mantenimiento.

MF

innova s.a.s

Nit. 900.359.695-8

PAF.

Se retomarán actividades el lunes 27-07-26.

Se instala la protección en tela verde para posterior cerramiento.

MF

innova s.a.s

Nit. 900.359.695-5

PAF

-26.
al en Obra = 1 residente, 1 SISO, 1 maestro
dor, 4 ayudantes

ia el retiro de la malla que se encuentra
l estado, se inicia el lavado de gradas
es de la cancha con hidrolavadora.
ea la limpieza de los canales, cajas y
nos perimetrales de la cancha sintética.
F PAF

-26
l en Obra: 1 residente, 1 SISO 1 maestro
dor 4 ayudantes

inúa con la labor de retiro de malla
e la zona de cancha como de la piscina
inúa con la limpieza de canales, cajas
deros.
inúa con el hidrolavado de paredes de la cancha
s. M.F PAF

29-07-26.
Personal en Obra = 1 Residente, 1 SISO, 1 maestro
1 oficial, 3 ayudantes 1 Soldador

Se inicia el armado de las mallas para la reposición
Se continúa con el hidrolavado de paredes de la
cancha y la zona de las gradas.
Se continúa con la limpieza de los canales
perimetrales de la cancha. PAF.
M.F

30-07-26
Personal en Obra = 1 Residente, 1 SISO, 1 maestro
1 oficial, 3 ayudantes, 1 Soldador.
Se comienza con la soldadura de la malla a los
postes metálicos y se utiliza grafil para que se
sostenga de manera optima.
Continúa el hidrolavado de la cancha y los sumideros
canales y cajas.
Se instala platina de refuerzo en la parte superior
de la malla. M.F PAF

innova s.a.s
Nit 900 359 695-5

)

'6

l en obra = 1 Residente, 1 Siso, 1 maestro,
l, 4 ayudantes 1 Soldador

Tinúa con la instalación de la malla con
ra y se refuerza con platinas en ángulo
tinúa con el hidro lavado de la cancha y
das. PAF.

M.F
innova s.a.s
Nit. 900 359 695-5

5-2-08-26 Día no laborable. PAF

M.F
innova s.a.s
Nit. 900 359 695-5

26.

l en obra: 1 Residente, 1 Siso, 1 maestro
l, 4 ayudantes, 1 Soldador.
Tinúa con la instalación de la malla en las
de la cancha (acceso y fondo) con refuerzo
lla de 1/4" y ángulo.
inúa con hidrolavado en la cancha en los
cajas y sumideros. PAF

.F
nova s.a.s
0 359 695-5

)

4-08-26

Personal en obra: 1 Residente, 1 Siso, 1 maestro
1 oficial, 1 Soldador 3 ayudantes.

Se continua con la instalación de la malla, el refuerzo
con varilla de 1/4" y el ángulo.

Se continúa con la limpieza y el hidrolavado de
canales, cajas y sumideros PAF

M.F
innova s.a.s
Nit. 900 359.695-5

5-08-26.

Personal en obra: 1 residente, 1 siso, 1 maestro
1 Soldador y 3 ayudantes

Se continua con la instalación de la malla, el refuerzo
con varilla de 1/4 y el ángulo.
Se avanza en la limpieza de canales, sumideros y
cajas. PAF

M.F
innova s.a.s
Nit. 900 359 695-5

6

l en Obra = 1 Residente, 1 siso, 1 maestro
ador 4 ayudantes

tinúa con la instalación de la malla, el refuerzo
rilla de 1/4" y el angulo en los bordes.
ia Trabajo de pintura en las mallas de la
sintética.
tinúa con la limpieza de los canales, cajas
deros.

M.F
innova s.a.s
Nit. 900 359 695-6

PAF

6 - día festivo 8-08-26 y 9-08-26 día no laborable.

6.

l en Obra 1 residente, 1 siso, 1 maestro
dor, 4 ayudantes
vuelve personal en obra por afectaciones
ansporte y preocupación por el sismo
rado a las 7:40 am.

1F
innova s.a.s
00 359 695-6

PAF

11-08-26

Personal en Obra = 1 residente, 1 siso, 1 maestro
1 Soldador, 3 ayudantes, 1 Oficial.

Se continúa con la pintura de la malla y la instalación
del refuerzo con el ángulo
Se hace el filete para el anclaje de la malla al
muro.

M.F
innova s.a.s
Nit. 900 359 695-6

PAF

12-08-26.

Personal en obra = 1 residente, 1 siso, 1 maestro
1 Soldador, 3 ayudantes, 1 Oficial
Se continúa con la instalación del angulo para el refuerzo
de la malla y la pintura de la misma.
Se continua con el filete para anclar la malla al
muro.

M.F
innova s.a.s
Nit. 900 359 695-6

PAF

26

l en obra = 1 residente, 1 siso, 1 maestro
al, 3 ayudantes

inúa con la pintura de la malla, se inicia
ura de los muros internos de la cancha
nstrucción de la entidad Contratante y la
ntoría.

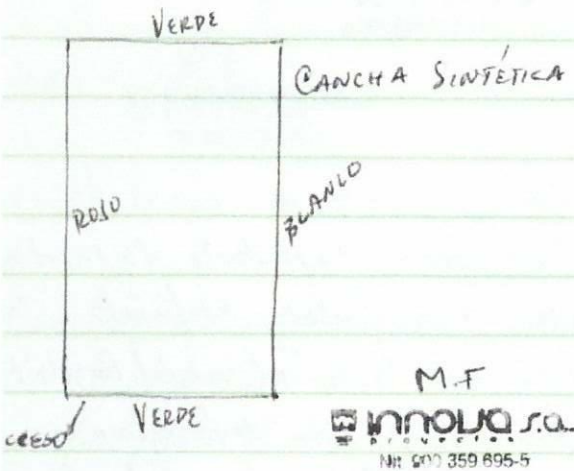

M.F
innova s.a.s
Nit 900 359 695-5

PAF

en obra = 1 maestro, 1 residente, 1 siso, 1 oficial
tes

Se continúa con la pintura de la cancha por los muros internos.
Se continúa la pintura de la malla de la cancha.

innova s.a.s MF
Nit 900 359 695-5

PAF

M.F
innova s.a.s
Nit 900 359 695-5

15-08-26. día no laborable PAF
16-08-26 Domingo PAF
17-08-26 Lunes festivo PAF

18-08-26.
Personal en obra = 1 residente, 1 siso, 1 maestro
1 oficial 3 ayudantes.
Se continúa con la pintura de la malla de la cancha y de los muros internos de la misma.

M.F
innova s.a.s
Nit 900 359 695-5

PAF.

19-08-26
Personal en obra = 1 residente, 1 siso, 1 maestro
1 Oficial, 2 ayudantes
Se continúa con la pintura de la malla de la cancha y se inicia resanes y revoques en graderías.

M.F
innova s.a.s
Nit 900 359 695-5

PAF

20-08-26

Personal en obra = 1 residente, 1 SISO, 1 maestro
1 oficial 3 ayudantes

Se continúa con pintura de malla en la cancha
y se continúa con revoques, resanes en gradas

M.F
INNOLUA S.A.S
NIT 900 359 695-5

PAF

21-08-26

Personal en obra = 1 residente, 1 SISO, 1 maestro
1 Oficial 3 ayudantes.

Se continúa con resanes de zona de graderías y
se inicia la pintura de los mismos

M.F
INNOLUA S.A.S
NIT 900 359 695-5

PAF

24-08-26

Se suspende el contrato de obra por falta de suministro
de materiales e insumos debido al sismo del 10-08-26

PAF M.F
INNOLUA S.A.S
NIT 900 359 695-5

BITÁCORA DE OBRA

CASETA BAJO TABLAZO

CONTRATISTA = CONSORCIO EJR.

INTERVENTOR INNOVA PROYECTOS

CONTRATO No. 2601880787

INDUCONTABLES

11-08-26

Personal en obra = 1 residente, 1 siso, 1 maestro
1 oficial, 2 ayudante.
Se inician Trabajos de pintura de puertas y ventanas
en la caseta comunitaria.
Se inicia el proceso de resane de muros

M.F innova s.a.s
NIt. 900.359.695-5

Par

12-08-26.

Personal en obra - 1 residente 1 siso 1 maestro
1 oficial 2 ayudantes
Se continuan Trabajos de resane de muros y se
inicia limpieza de paredes para aplicar estuco y
pintura.

M.F innova s.a.s
NIt. 900.359.695-5

Par

13-08-26

Personal en obra = 1 residente, 1 siso, 1 maestro.
1 oficial 2 ayudantes
Se continuan Trabajos de resane internos en la caseta
comunitaria.

M.F innova s.a.s
NIt. 900.359.695-5

Par

INDUCONTABLES

14-08-26

Personal en obra: 1 Residente, 1 SISO, 1 maestro
1 oficial 2 ayudantes
Se continúan actividades de estuco en la parte interna de la caseta comunitaria. M.F innova s.a.s Nit. 900.359.695-5 PAT

15-08-26. Dia no laborable 16-08-26 Domingo 17-08-26 Festivo M.F innova s.a.s Nit. 900.359.695-5 PAT

18-08-26

Personal en obra = 1 residente, 1 SISO, 1 maestro
1 oficial 1 ayudante.
Se inicia revoques en la parte externa de la caseta comunitaria y se continua estuco en la parte interna. M.F innova s.a.s Nit. 900.359.695-5 PAT

19-08-26

Personal en Obra = 1 residente, 1 SISO, 1 maestro
1 oficial y 1 ayudante

Se inician labores de estuco en la parte exterior de la caseta y se continua también en la parte interna. M.F innova s.a.s Nit. 900.359.695-5 PAT

20-08-26

Personal en obra = 1 residente, 1 SISO, 1 maestro.
1 oficial 2 ayudantes.
Se continua con estuco en parte externa de la caseta
Se inicia excavaciones para instalacion de redes de acueducto y alcantarillado. M.F innova s.a.s Nit. 900.359.695-5 PAT

21-08-26

Se continua con estuco en parte exterior de la caseta.
Se terminan excavaciones para instalaciones hidráulicas y sanitarias
Personal en obra: 1 residente, 1 SISO, 1 maestro,
1 oficial, 2 ayudantes. M.F innova s.a.s Nit. 900.359.695-5 PAT

INDUCONTABLES

24-08-26

Se suspende el contrato de obra por falta de suministro de materiales e insumos debido al sismo del 10-08-26.

M.F

TAF

innova s.a.s
Nit. 900 359.695-5

BITÁCORA DE OBRA

BIO SALUDABLES VEREDA CASECATA

CONTRATISTA: CONSORCIO EJR.

INTERVENTOR INNOVA PROYECTOS.

CONTRATO No 2604080789.

10-08-2026

Personal en obra = 1 residente, 1 siso, 1 maestro,
2 ayudantes, 1 oficial.
Se devuelve el personal por afectaciones en el
Transporte y preocupación debido al Sismo
ocurrido a las 7:40 am

M.F
INNOLVA S.A.S
Nit. 900.359.695-5

11-08-2026

Personal en obra = 1 residente, 1 siso, 1 maestro
1 oficial 2 ayudantes
Se continúa desarme de estructura en grada instalada
en la zona donde va a quedar el Bioseludable

M.F
INNOLVA S.A.S
Nit. 900 359 695-5

12-08-2026

Personal en obra = 1 residente, 1 siso, 1 maestro
1 oficial, 2 ayudantes
Se retiro la estructura desarmada de la zona de Trabajo
y se empieza la rocería y limpieza.
Se retira Todo el material de rocería y limpieza.

M.F
INNOLVA S.A.S
Nit. 900 359 695-5

INDUCONTABLES

13-08-2026

Personal en obra 1 residente, 1 siso, 1 maestro
1 oficial, 2 ayudantes

Se inicia excavaciones para retiro de material de descapote y se hace renivelación de la zona

PAF

M.F
innova s.a.s
Nit. 900.359.695-5

14-08-2026

Personal en obra = 1 residente, 1 siso, 1 maestro
1 oficial 2 ayudantes

Se continúa con la renivelación de la zona de los Biosaludables.

PAF

M.F
innova s.a.s
Nit. 900.359.695-5

15-08-2026 Día no laborable PAF

16-08-2026 - Domingo PAF

17-08-2026 Lunes festivo PAF

M.F
innova s.a.s
Nit. 900.359.695-5

18-08-2026

Personal en obra = 1 residente, 1 siso, 1 maestro
1 oficial, 2 ayudantes

Se continúa con la renivelación de la zona de trabajo y se ingresa el material granular para su extensión

PAF

M.F
innova s.a.s
Nit. 900.359.695-5

19-08-2026

Personal en obra = 1 residente, 1 siso 1 maestro
1 oficial 2 ayudantes

Se instala material granular en la zona del Bio saludable y se retira el sobrante de la renivelación para su posterior Transporte.

PAF

M.F
innova s.a.s
Nit. 900.359.695-5

20-08-2026

Personal en obra = 1 residente, 1 siso, 1 maestro
1 oficial 2 ayudantes

Se instala material granular en la zona del Biosaludable

PAF

M.F
innova s.a.s
Nit. 900.359.695-5

INDUCONTABLES

21-08-2026

Personal en obra = 1 maestro, 1 residente, 1 SISO
1 oficial.

24-08-26

Se suspende el contrato de obra por falta de suministro de materiales e insumos debido al sismo del 10-08-26

M.F
INNOVA S.A.S
NIT. 900.359.695-5

Bitácora de Obra

Cancha Vereda Caselata

Contratista: Consorcio EJR

Interventor: Innova Proyectos

Contrato No 260408 0789

Adecuación y Mantenimiento de los Escenarios Deportivos de los Corregimientos Agroturístico, Manantial, Panorama, Remanso y Río Blanco del Municipio de Manizales por Monto Agotable.

3-08-2026.

Inicio de Recorrido para revisión de zonas de Trabajo en frente Cancha Caselata.

M.F

PAF

innova s.a.s

Nit 900 359 695-5

4-08-2026

Personal en obra 1 Residente, 1 maestro, 1 siso 1 oficial, 2 ayudantes

Localización y replanteo de filtros para la cancha de la Vereda caselata.

Inicio de Rocería y limpieza, retiro de material y acopio por fuera de la cancha -

Descapote y nivelacion de Cancha caselata.

M.F

PAF

innova s.a.s

Nit 900 359 695-5

5-08-26

Personal en obra = 1 residente, 1 Siso, 1 maestro 1 oficial, 4 ayudantes

Se continúa con la localización de los filtros, la rocería. y el retiro del material sobrante.

M.F

PAF

innova s.a.s

[illegible] 359 695-5

26.

l en obra = 1 Residente, 1 SISO 1 maestro

al, 4 ayudantes

Inicia con el retiro de material de sobre.

terial de Discapote.

la excavación de filtros segun diseños.

1 F PAE

NOVA S.A.S

00 359 695-5

6 Día festivo no laborable. M.F

26 Dias no laborable. NOVA S.A.S

26 Domingo. NIT 900.359.695-5 PAE

2026

l en obra - 1 residente, 1 siso, 1 maestro

l 7 ayudantes.

retiro del personal por afectaciones en el

orte y preocupación, debido al Sismo

do a las 7:40 am.

F PAE

OVA S.A.S

0.359.695-5

11-08-2026.

Personal en obra = 1 Residente, 1 siso, 1 maestro

1 oficial, 7 ayudantes.

Se continúa con la excavación de los filtros.

Se continúa con el Trabajo de hidrolavadora en las grietas

Llegan a obra los materiales para la construcción

del pasamanos. M.F PAE

INNOVA S.A.S

NIT 900.359.695-5

12-08-2026

Personal en obra = 1 residente, 1 siso, 1 maestro

1 oficial., 7 ayudantes

Retiro del material sobrante de la cancha hacia

la zona de acopio cerca a la vía para programar

su retiro y botada a zona depósito.

Excavación de filtros. M.F PAE

INNOVA S.A.S

NIT 900.359.695-5

13-08-2026.

Personal en obra = 1 residente, 1 siso, 1 maestro

1 oficial, 7 ayudantes.

Excavación de filtros longitudinales y transversales

zona de la cancha.

de gradas y limpieza para aplicación de
x pintura.
Tubería y anclaje de platinas para
os

M.F
INNOVA S.A.S
NIT 900.359.695-5

DAF

026.
l en obra = 1 Residente, 1 Siso, 1 maestro
, 7 ayudantes, 1 Soldador.
ón para filtros en zona de cerrita.
Tubería y anclaje de platinas para
ión de pasamanos
a la espera por parte de la entidad
sta para los niveles de las cajas de inspección
zado de salida de la tubería que van a
los aguas de los filtros.

M.F
INNOVA S.A.S
NIT 900.359.695-5

DAF

Día no laborable.

M.F
INNOVA S.A.S
NIT 900.359.695-5

026 Domingo
026 Día festivo día no laborable.

DAF

18-08-2026
Personal en obra = 1 Residente, 1 maestro, 1 Siso, 1 oficial
7 ayudantes 1 Soldador
Se continúa con las excavaciones de los filtros pero
se está a la espera de la definición del trazado
de la tubería y la zona de entrega de las aguas
de los mismos
Se inicia la actividad de resanes y pintura de las
gradas
Se inicia la actividad de armado del pasamanos
Se ingresa 1 Viaje de material filtrante.

M.F
INNOVA S.A.S
NIT 900.359.695-5

DAF

19-08-2026.
Personal en obra = 1 residente, 1 maestro, 1 Siso 1 oficial
7 ayudantes 1 Soldador
Se inicia la pintura de la zona de las graderías y
el armado y anclaje del pasamanos.
Se hace excavación de Cámara de paso y Tramo de
Salida de los filtros.

M.F
INNOVA S.A.S
NIT 900.359.695-5

DAF.

20-08-2026

Personal en obra = 1 Residente, 1 maestro, 1 SISO
1 oficial, 7 ayudantes, 1 Soldador
Se continúa con la pintura de las graderías y la instalación y soldadura del pasamanos
Se está a la espera de la decisión por parte de la entidad del Trazado para la tubería y la entrega del agua de los filtros

M.F
INNOLUA S.A.S
Nit 900 359 695-5

PAF

21-08-26

Personal en obra = 1 residente, 1 maestro, 1 SISO
1 oficial, 5 ayudantes
Se continúa con la pintura de las graderías y la instalación y pintura del pasamanos
Se está a la espera de la decisión por parte de la entidad contratante para el Trazado y entrega del agua de los filtros de la cancha.

PAF

M.F
INNOLUA S.A.S
Nit 900 359 695-5

24-08-2026

Se suspende el contrato de obra por falta de suministro de materiales e insumos debido al sismo del 10-08-26

PAF

M.F
INNOLUA S.A.S
Nit 900 359 695-5

Bitácora de Obra

Cancha Vereda San Isidro Pasamanos

Contratista = Consorcio EJR.

Interventor = Innova Proyectos

Contrato No 2604080789

Adecuación y Mantenimiento de los Escenarios deportivos de los corregimientos Agroturístico, Manantial, Panorama, Remanso y Riosblanco del Municipio de Manizales por Monto Agotable.

VIE DE OBRA
PABLO ANDRÉS FRANCO O.
CIVIL PAF.

ENTOR.

21-07-26

INICIO DE ACTIVIDADES

Personal en Obra = 1 maestro, 1 oficial, 3 ayudantes
1 Soldador, 1 SISO, 1 Residente.

- Se inicia la localización del Trazado para la construcción del pasamanos, se hace adecuación de zona de bodega y se almacena el acero y la Tubería.

Se inicia excavación para la viga de cimentación del pasamanos. PAF.

M F
INNOVA S.A.S
Nit. 900.359.696-6

22-07-26

Personal en obra = 1 Residente, 1 SISO, 1 maestro, 1 oficial, 3 ayudantes

Se continua con descapote y excavación para la viga de cimentación del pasamanos.

Se inicia el figurado de los flejes para la viga de cimentación

M.F
INNOVA S.A.S
Nit. 900.359.696-6
PAF.

:26

al en obra = 1 Residente, 1 Siso, 1 maestro
al, 3 ayudantes
e vaciado de Solado
Tinva con la excavacion de la viga y la
ción del hierro para la viga de cimentacion

ra la instalacion del acero en la zona de
.

MF

PAE

innova s.a.s
Nit. 900.359.695-5

26

al en obra = 1 Residente, 1 Siso, 1 maestro
al, 3 ayudantes.
Tinva con la instalación del acero dela
de cimentación.
o el corte y la adecuación para la Tubería
samanos

PAE.

Vaciado de Solado

MF

innova s.a.s
Nit. 900.359.695-5

27-07-26

Personal en Obra - 1 residente, 1 siso, 1 maestro
1 oficial, 3 ayudantes

Se continúa con la instalación de acero para la viga
de cimentación

Se continua con el corte de la Tubería para generar
los modulos del pasamanos.

Se ingresa el material para el vaciado de la viga de
cimentación.

M F

PAE.

innova s.a.s
Nit. 900.359.695-5

28-07-26

Personal en Obra: 1 residente, 1 siso, 1 maestro
1 oficial, 3 ayudantes
Se continúa con la instalación de acero para la
viga de cimentación
Se inica la instalación de los parales del pasamanos
para no andar después con el vaciado.

PAE

M.F

innova s.a.s
Nit. 900.359.695-5

-26

l en obra = 1 Residente, 1 Siso, 1 maestro
l, 3 ayudantes, 1 Soldador.
ción de Tubería para el pasamanos, Tanto
Verticales como horizontales.
la proceso de Soldadora.

PAT

M.F
innova s.a.s
Nit. 900.359.695-5

-26.

l en obra = 1 residente, 1 Siso, 1 maestro
al, 3 ayudantes 1 Soldador.

Tinúa instalando el pasamanos y soldando los
para poder hacer el vaciado de la viga
mentación

PAT.

M.F
innova s.a.s
lt. 900.359.695-5

31-07-26.

Personal en Obra = 1 Residente, 1 Siso, 1 maestro
1 Oficial, 3 ayudantes

Se hace el vaciado de la viga de cimentación durante
Todo el día.

PAT.

M.F
innova s.a.s
Nit. 900.359.695-5

3-08-26.

Personal en Obra = 1 Residente, 1 Siso, 1 maestro
1 Oficial 3 ayudantes 1 Soldador.

Se continúa con la actividad de Soldadora del
pasamanos, y se hace limpieza de la zona de Trabajo.

PAT

M.F
innova s.a.s
Nit. 900.359.695-5

4-08-26.

Personal en Obra = 1 Residente, 1 Siso, 1 maestro
1 Soldador, 2 ayudantes.
