MULTISERVICIOS
DANISAN SAS
NIT: 900.443.528-2

INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA No. 02





CONTRATO DE INTERVENTORIA N° LP-FC-046-2026

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL CORREGIMIENTO LA SAN JUANA, MUNICIPIO DE BUCARASICA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

FIRMA INTERVENTORIA: MULTISERVICIOS DANISAN S.A.S
R/LINGRID ESPERANZA BECERRA BETTER

CONTRATO DE OBRA No. LP-FC-040-2026

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL CORREGIMIENTO LA SAN JUANA, MUNICIPIO DE BUCARASICA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER. De acuerdo con las condiciones, especificaciones, características, georreferenciación y demás elementos técnicos descritos en el proyecto con código BPIN 2026004540002. Conforme a la designación como ejecutora a la EMPRESA INDUCTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DE CATATUMBO SAS mediante el Decreto Departamental No. 001083 del 29 de mayo de 2026.

FIRMA CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL CANCHA LA SANJUANA
R/L MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ

Contenido

1. INTRODUCCION: 3
2. FICHAS TECNICAS. 4
3. GARANTIAS DEL CONTRATO 6
3.1. POLIZAS DE LEGALIZACIÓN OBRA 6
3.2. POLIZAS INTERVENTORIA 9
4. ACTOS ADMINISTRATIVOS 11
5. RESUMEN EJECUTIVO DE INTERVENTORIA 12
5.1. ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS 13
6. CANTIDADES DE OBRA EJE 15
6.1. MEMORIA DE CANTIDADES 16
7. ANEXO 18

1. INTRODUCCION:

EL presente documento corresponde al informe de interventoría No.2 al Contrato de Obra No. LP-FC-040-2026, cuyo objetivo CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL CORREGIMIENTO LA SAN JUANA, MUNICIPIO DE BUCARASICA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER. Durante el periodo comprendido entre el 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2026, de acuerdo con las condiciones, especificaciones, características, georreferenciación y demás elementos técnicos descritos en el proyecto con código BPIN 2026004540002. Conforme a la designación como ejecutora a la EMPRESA INDUCTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DE CATATUMBO SAS mediante el Decreto Departamental No. 001083 del 29 de mayo de 2026.

La interventoría es ejercida mediante contrato de interventoría No. LP-FC-046-2026 suscrito por MULTISERVICIOS DANISAN SAS, R/L INGRID ESPERANZA BECERRA BETTER, en cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas teniendo como finalidad realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, legal y contractual de la ejecución de las obras adelantadas por el contratista de Obra UNION TEMPORAL CANCHA LA SANJUANA.

Durante el periodo evaluado, la interventoría verifico el avance físico y financiero del proyecto, el cumplimiento de las especificaciones técnicas, el cronograma de actividades, las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como la validez de los documentos contractuales exigidos.

2. FICHAS TECNICAS.

FICHA TECNICA DEL CONTRATO	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. - FECHA	LP-FC-040-2026 del 04 de agosto de 2026
DEPENDENCIA CONTRATANTE	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO SAS
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL CANCHA LA SANJUANA
NIT.	902.091.314-9
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL CORREGIMIENTO LA SAN JUANA, MUNICIPIO DE BUCARASICA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER. De acuerdo con las condiciones, especificaciones, características, georreferenciación y demás elementos técnicos descritos en el proyecto con código BPIN 2026004540002. Conforme a la designación como ejecutora a la EMPRESA INDUCTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DE CATATUMBO SAS mediante el Decreto Departamental No. 001083 del 29 de mayo de 2026.
VALOR DEL CONTRATO	CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS ($5.267.227.716,00) M/CTE
PLAZO O DURACIÓN INICIAL	SEIS (6) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
SUPERVISOR	Luis Alfonso Rivera Pabón
INTERVENTOR	MULTISERVICIOS DANISAN S.A.S R/L INGRID ESPERANZA BECERRA BETTER
FECHA ACTA DE INICIO	25 DE AGOSTO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	24 DE FEBRERO DE 2027
PERIODO DEL INFORME	01 de septiembre al 30 de septiembre de 2026
DIAS TRANSCURRIDOS	37 días

FICHA TECNICA DE INTERVENTORIA	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. - FECHA	LP-FC-046-2026 del 25 de agosto de 2026
DEPENDENCIA CONTRATANTE	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO SAS
CONTRATISTA	MULTISERVICIOS DANISAN S.A.S
NIT.	900.443.528-2
REPRESENTANTE LEGAL	INGRID ESPERANZA BECERRA BETTER
C.C.	60.339.276 expedida Cúcuta
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL CORREGIMIENTO LA SAN JUANA, MUNICIPIO DE BUCARASICA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER. De acuerdo con las condiciones, especificaciones, características, georreferenciación y demás elementos técnicos descritos en el proyecto con Código BPIN 2026004540002. Conforme a la designación como ejecutora a la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO SAS mediante el Decreto Departamental No. 001083 del 29 de Mayo de 2026.
VALOR DEL CONTRATO	TRESCIENTOS CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($314.445.219,00) M/CTE.
PLAZO O DURACIÓN INICIAL	SEIS (6) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
FECHA ACTA DE INICIO	25 DE AGOSTO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	24 DE FEBRERO DE 2027
PERIODO DEL INFORME	01 de septiembre al 30 de septiembre de 2026
FECHA DE CORTE DEL INFORME	02 de octubre de 2026
DIAS TRANSCURRIDOS	37 días

3. GARANTIAS DEL CONTRATO

De acuerdo con las garantías exigidas en el contrato de obra No. LP-FC-040-2026 del 04 de agosto de 2026, se suscribe las siguientes garantías con ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A, teniendo en cuenta los amparos en valor y plazo estipulados en la minuta contractual.

3.1. POLIZAS DE LEGALIZACIÓN OBRA

A continuación, se mencionan y describen cada una de las pólizas las cuales han sido aprobadas por la Gerencia Técnica de contratación Administrativa, mediante certificación firmada por la SECRETARIA GENERAL de contratación E.I.C.E Faro del Catatumbo S.A.S. CLAUDIA YAJAIRA GALVIS MENDOZA.

RELACION DE GARANTIAS INICIALES				
Poliza de cumplimiento Entidad Estatal. No. 49-44-101039955 ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A Anexo 0 Fecha de Expedición: 05 de agosto de 2026 Fecha de Aprobación: 05 de agosto de 2026	**AMPARO**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	cumplimiento	$526.722.771.60	4/08/2026	4/06/2027
	Pago de salarios, Prestaciones sociales	$263.361.385.80	4/08/2026	4/02/2030
	Estabilidad y Calidad de la Obra	$526.722.771.60	5 años a partir del acta de entrega a satisfacción	
Poliza de responsabilidad civil extracontractual No. 49-40-101012665 ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A Anexo 0 Fecha de Expedición:	**AMPARO**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Predios Laborales y Operaciones	$700.362.000.00	4/08/2026	4/02/2027
	Contratistas y subcontratistas	$700.362.000.00	4/08/2026	4/02/2027
	Responsabilidad civil patronal	$700.362.000.00	4/08/2026	4/02/2027
	Vehículos propios y no propios	$700.362.000.00	4/08/2026	4/02/2027

05 de agosto de 2026 Fecha de Aprobación: 05 de agosto de 2026	Daño emergente y lucro cesante	$700.362.000.00	4/08/2026	4/02/2027
	Perjuicios extrapatrimoniales	$700.362.000.00	4/08/2026	4/02/2027
	Responsabilidad civil cruzada	$700.362.000.00	4/08/2026	4/02/2027
	Gastos médicos	$700.362.000.00	4/08/2026	4/02/2027

RELACION DE GARANTIAS SEGÚN ACTA DE INICIO				
Poliza de cumplimiento Entidad Estatal. No. 49-44-101039955 ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A Anexo 2 Fecha de Expedición: 28 de agosto de 2026 Fecha de Aprobación: 28 de agosto de 2026	**AMPARO**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	cumplimiento	$526.722.771.60	25/08/2026	25/06/2027
	Pago de salarios, Prestaciones sociales	$263.361.385.80	25/08/2026	25/02/2030
	Estabilidad y Calidad de la Obra	$526.722.771.60	5 años a partir del acta de entrega a satisfacción	
Poliza de responsabilidad civil extracontractual No. 49-40-101012665 ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A Anexo 0 Fecha de	**AMPARO**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Predios Laborales y Operaciones	$700.362.000.00	25/08/2026	25/02/2027
	Contratistas y subcontratistas	$700.362.000.00	25/08/2026	25/02/2027
	Responsabilidad civil patronal	$700.362.000.00	25/08/2026	25/02/2027
	Vehículos propios y no propios	$700.362.000.00	25/08/2026	25/02/2027
	Daño emergente y lucro cesante	$700.362.000.00	25/08/2026	25/02/2027

Expedición: 28 de agosto de 2026 Fecha de Aprobación: 28 de agosto de 2026	Perjuicios extrapatrimoniales	$700.362.000.00	25/08/2026	25/02/2027
	Responsabilidad civil cruzada	$700.362.000.00	25/08/2026	25/02/2027
	Gastos médicos	$700.362.000.00	25/08/2026	25/02/2027

RELACION DE GARANTIAS SEGÚN ANTICIPO				
Póliza de cumplimiento Entidad Estatal. No. 49-44-101039955 ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A Anexo 3 Fecha de Expedición: 28 de agosto de 2026 Fecha de Aprobación: 28 de agosto de 2026	**AMPARO**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	cumplimiento	$526.722.771.60	25/08/2026	25/06/2027
	Pago de salarios, Prestaciones sociales	$263.361.385.80	25/08/2026	25/02/2030
	Estabilidad y Calidad de la Obra	$526.722.771.60	5 años a partir del acta de entrega a satisfacción	
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$2.106.891.086.40	28/08/2026	28/06/2027

3.2. POLIZAS INTERVENTORIA

RELACION DE GARANTIAS INICIALES				
Poliza de cumplimiento Entidad Estatal. No. 49-44-101040037 ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A Anexo 0 Fecha de Expedición: 14 de agosto de 2026 Fecha de Aprobación: 14 de agosto de 2026	**AMPARO**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	cumplimiento	$31.444.521.90	14/08/2026	14/05/2027
	Pago de salarios, Prestaciones sociales	$15.722.260.95	14/08/2026	14/02/2030
	Estabilidad y Calidad de la Obra	$31.444.521.90	5 años a partir del acta de entrega a satisfacción	
Poliza de responsabilidad civil extracontractual No. 49-40-101012706 ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A Anexo 0 Fecha de Expedición: 14 de agosto de 2026 Fecha de Aprobación: 14 de agosto de	**AMPARO**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Predios Laborales y Operaciones	$350.181.000.00	14/08/2026	14/02/2027
	Contratistas y subcontratistas	$350.181.000.00	14/08/2026	14/02/2027
	Responsabilidad civil patronal	$350.181.000.00	14/08/2026	14/02/2027
	Vehículos propios y no propios	$350.181.000.00	14/08/2026	14/02/2027
	Daño emergente y lucro cesante	$350.181.000.00	14/08/2026	14/02/2027
	Perjuicios extrapatrimoniales	$350.181.000.00	14/08/2026	14/02/2027
	Responsabilidad civil cruzada	$350.181.000.00	14/08/2026	14/02/2027
	Gastos médicos	$350.181.000.00	14/08/2026	14/02/2027

2026				
RELACION DE GARANTIAS SEGÚN ACTA DE INICIO				
Poliza de cumplimiento Entidad Estatal. No. 49-44-101040037 ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A Anexo 2 Fecha de Expedición: 28 de agosto de 2026 Fecha de Aprobación: 28 de agosto de 2026	**AMPARO**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	cumplimiento	$31.444.521.90	25/08/2026	25/06/2027
	Pago de salarios, Prestaciones sociales	$15.722.260.95	25/08/2026	25/02/2030
	Estabilidad y Calidad de la Obra	$31.444.521.90	5 años a partir del acta de entrega a satisfacción	
Poliza de responsabilidad civil extracontractual No. 49-40-101012706 ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A Anexo 2 Fecha de Expedición: 28 de agosto de 2026 Fecha de Aprobación: 28 de agosto de 2026	**AMPARO**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Predios Laborales y Operaciones	$350.181.000.00	25/08/2026	25/02/2027
	Contratistas y subcontratistas	$350.181.000.00	25/08/2026	25/02/2027
	Responsabilidad civil patronal	$350.181.000.00	25/08/2026	25/02/2027
	Vehículos propios y no propios	$350.181.000.00	25/08/2026	25/02/2027
	Daño emergente y lucro cesante	$350.181.000.00	25/08/2026	25/02/2027
	Perjuicios extrapatrimoniales	$350.181.000.00	25/08/2026	25/02/2027
	Responsabilidad civil cruzada	$350.181.000.00	25/08/2026	25/02/2027
	Gastos médicos	$350.181.000.00	25/08/2026	25/02/2027

4. ACTOS ADMINISTRATIVOS

Durante la ejecución del contrato de obra con corte a la fecha del presente informe, se han suscrito los siguientes actos administrativos:

Actos Administrativos Contrato de OBRA No. LP-FC-040-2026.			
FECHA	**ACTO ADMINISTRATIVO**	**MOTIVO DEL ACTO ADMINISTRATIVO**	**SUSCRITA POR**
25/08/2026	Acta de inicio	Inicio del contrato de obra	MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAES R/L UNION TEMPORAL CANCHA LA SANJUANA INGRIS ESPERANZA BECERRA BETTER R/L MULTISERVICIOS DANISAN S.A.S LUIS ANFONSO RIVERA PABON Supervisor EICE FARO DEL CATATUMBO S.A.S FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS Gerente General EICE FARO DEL CATATUMBO S.A.S
Actos Administrativos Contrato de INTERVENTORIA No. LP-FC-046-2026			
FECHA	**ACTO ADMINISTRATIVO**	**MOTIVO DEL ACTO ADMINISTRATIVO**	**SUSCRITA POR**
25/08/2026	Acta de inicio	Inicio de interventoría	MULTISERVICIOS DANISAN S.A.S R/L INGRID ESPERANZA BECERRA BETTER LUIS ALFONSO RIVERA PABON Supervisor EICE FARO DEL CATATUMBO S.A.S FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS Gerente General EICE FARO DEL CATATUMBO S.A.S

5. RESUMEN EJECUTIVO DE INTERVENTORIA

El presente informe corresponde al seguimiento técnico, administrativo y financiero realizado por la firma MULTISERVICIOS DANISAN S.A.S al Contrato de Obra No. LP-FC-040-20261, cuyo objeto es la Construcción Cancha de Fútbol Corregimiento La San Juana, Municipio de Bucarasica, Norte de Santander ejecutado por la UNIÓN TEMPORAL CANCHA LA SANJUANA.

Durante el periodo comprendido entre el 01 de septiembre y el 30 de septiembre de 2026 la obra registró un avance físico ejecutado durante el periodo del 2,10% frente a un avance programado del 2,70%; a la fecha se registra un avance físico de la obra acumulado del 3.60% frente a un avance acumulado programado del 3.0% con una diferencia de ejecución de +0,6%; equivalente a una ejecución en obra de: Ciento ochenta y nueve millones seiscientos veinte mil ciento noventa y ocho pesos M/CTE ($189.620.198,00)

El valor total del contrato de obra es de $5.267.227.716,00 M/CTE (incluido A.I.U). En el Presente informe de interventoría No. 02 la ejecución es de $110.611.690,00 M/CTE, la cual equivale al 2,10% del valor contractual.

Durante el periodo de corte se realizaron las siguientes actividades:

ITEM 2.6 CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES. INCLUYE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS.

5.1. ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS

Para el periodo del presente informe comprendido entre el 01/09/2026 y el 30/09/2026, la firma contratista bajo la supervisión y control de la interventoría, ha ejecutado las siguientes actividades de los ítems del contrato, cuya ejecución se describe a continuación:


ITEM 2.6 CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES. INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS.


Durante el periodo objeto del presente informe, el contratista ejecutó actividades de cargue, transporte y retiro del material proveniente de las excavaciones realizadas en el desarrollo de las actividades constructivas del proyecto, con el propósito de mantener despejadas y en condiciones adecuadas las áreas de trabajo.

La actividad comprendió el cargue del material excedente mediante maquinaria, su traslado en vehículos tipo volqueta con capacidad de 6 m^3 y el retiro de los materiales generados durante las excavaciones. El porcentaje de ejecución en el presente mes corresponde al 45,65% que equivale a 1471,13 m3.

La interventoría realizó el seguimiento a las actividades de cargue y retiro del material, verificando que los trabajos se desarrollaran de manera organizada y que el material excedente fuera retirado de las zonas de intervención, evitando su acumulación e interferencia con el desarrollo de las actividades constructivas.

MULTISERVICIOS
DANISAN SAS
NIT: 900.443.528-2

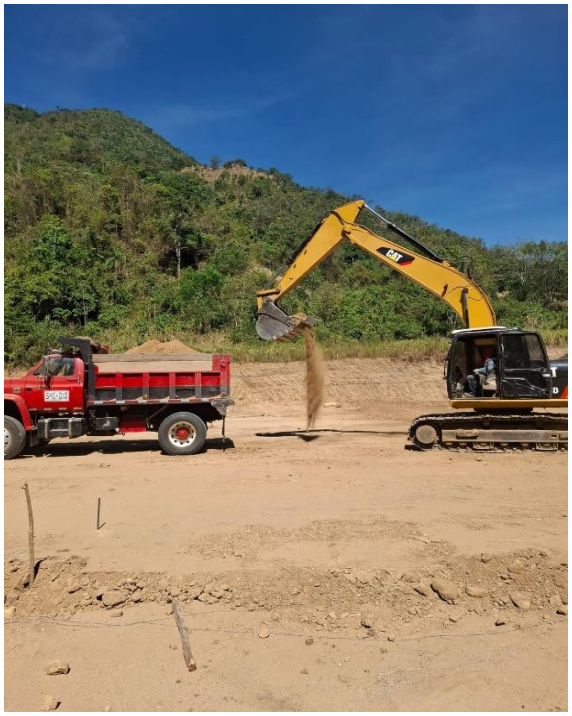

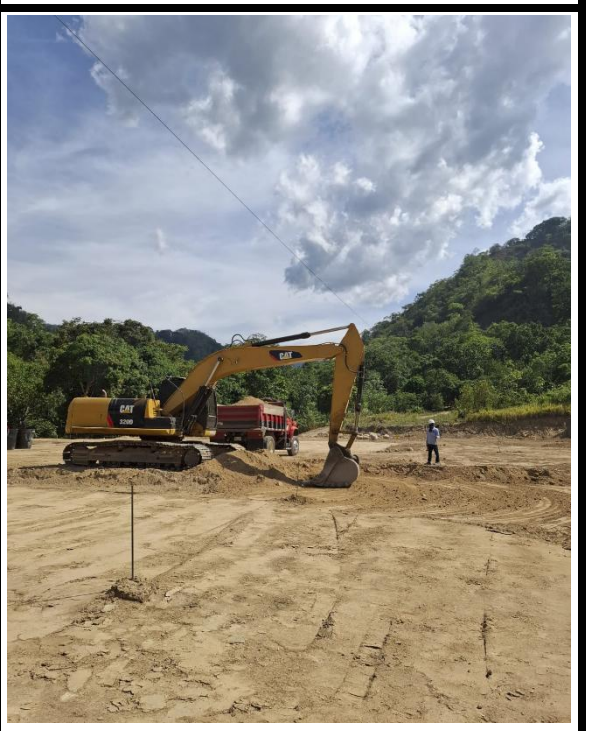CALLE 11 # 3-44 CC VENECIA OF 304 CENTRO - CUCUTA
TEL: 3103434883
email: multiserviciosdanisansas@gmail.com

MULTISERVICIOS DANISAN SAS

NIT: 900.443.528-2

6. CANTIDADES DE OBRA EJE

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL CORREGIMIENTO LA SAN JUANA, MUNICIPIO DE BUCARASICA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER. De acuerdo

INFORME INTERVENTORIA No.2

CORTE DE OBRA No. 02 DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE - FECHA DE INFORME 7 DE OCTUBRE

	CONDICIONES INICIALES					INFORME N0.1 AGOSTO		NFORME No.2 SEPTIEMBRE		ACUMULADO			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJECUCION	
1.	REALIZAR OBRAS PRELIMINARES												
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON EQUIPO DE TOPOGRÁFICO, INCLUYE LOCALIZACIÓN DEL TERRENO, NIVELES, ETC.	M2	5032,51	$ 5.325,00	$ 26.798.116,00	4869,68	$ 25.931.046,00		$ -	4869,68	$ 25.931.046,00	96,76%	
2.	MOVIMIENTOS DE TIERRAS												
2.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA DE MATERIAL COMÚN PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO DE ESTRUCTURA DE GRAMA SINTÉTICA, BAJO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD. NO INCLUYE ENTIBADO.	M3	1860	$ 18.235,00	$ 33.917.100,00	1657,70	$ 30.228.160,00			1657,70	$ 30.228.160,00	89,12%	
2.2	EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL COMÚN PARA ESTRUCTURA DE CIMENTACIÓN, BAJO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD. NO INCLUYE ENTIBADO. CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE	M3	1136,17	$ 68.340,00	$ 77.645.858,00					0,00	$ -	0,00%	
2.6	EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES. INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS.	M3	3222,62	$ 55.695,00	$ 179.483.821,00	42,47	$ 2.365.546,00	1.471,13	$ 81.934.653,00	1513,60	$ 84.300.200,00	46,97%	
	COSTO DIRECTO DE OBRA				$ 3.800.674.914,00		$ 58.524.752,00		$ 81.934.653,00	0	$ 140.459.406,00		
	ADMINISTRACIÓN			$ 0,30	$ 1.140.202.474,00		$ 17.557.426,00		$ 24.580.396,00		$ 42.137.822,00		
	IMPREVISTOS			$ -	$ -		$ -		$ -	0	$ -		
	UTILIDAD			$ 0,05	$ 190.033.746,00		$ 2.926.238,00		$ 4.096.733,00	0	$ 7.022.970,00		
	COSTO INDIRECTO			$ 0,35	$ 1.330.236.220,00		$ 20.483.664,00		$ 28.677.129,00	0	$ 49.160.792,00		
	PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA (PGIO)				$ 82.696.690,00		$ -		$ -	0	$ -		
	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO				$ 23.314.538,00		$ -		$ -	0	$ -		
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA				$ 15.138.384,00		$ -		$ -	0	$ -		
	COSTO CERTIFICACIÓN RETIE Y RETILAP				$ 10.000.000,00		$ -		$ -	0	$ -		
	LEGALIZACIÓN ELÉCTRICA ANTE CENS - EPM Y CONCESIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO				$ 7.000.000,00		$ -		$ -	0	$ -		
	COSTO TOTAL OBRA (DIRECTOS + INDIRECTOS)				$ 5.267.227.716,00		$ 79.008.416,00		$ 110.611.782,00		$ 189.620.198,00	3,60%	
	PORCENTAJ E AVANCE DE OBRA						1,50%		2,10%		3,60%		

CALLE 11 # 3-44 CC VENECIA OF 304 CENTRO - CUCUTA
TEL: 3103434883
email: multiserviciosdanisansas@gmail.com

6.1. MEMORIA DE CANTIDADES


2.	MOVIMIENTOS DE TIERRAS
2.6	CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES. INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO DE BUCARASICA
MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL CORREGIMIENTO LA SAN JUANA, MUNICIPIO DE BUCARASICA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER. De acuerdo con las condiciones, especificaciones, características, georreferenciación y demás elementos técnicos descritos en el proyecto con Código BPIN 2026004540002. Conforme a la designación como ejecutora a la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO SAS mediante el Decreto Departamental No. 001083 del 29 de Mayo de 2026.
CONTRATO No. - FECHA	LP-FC-046-2026 del 25 de agosto de 2026


MULTISERVICIOS DANISAN SAS NIT: 900.443.528-2

2.6	CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES. INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS.						M3	1.471,10
	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	EXCAVACIÓN MECÁNICA					1.131,64	1,00	1.131,64
	EXCAVACIÓN MANUAL					0,00	0,00	0,00
	RELLENOS					0,00	0,00	0,00
							1.131,64	
	INCLUIR EL FACTOR DE EXPANSION PARA QUE EN LA MEMORIA QUEDE ENUNCIADO					1,30	1.471,13	

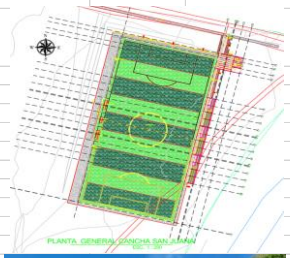



% DE AVANCE MENSUAL EJECUTADO: 2.10%
% DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO: 2.70%
% EJECUTADO ACUMULADO: 3.60 %
% PROGRAMADO ACUMULADO: 3,00%
% DE ATRASO: 0%



Interventoría
MULTISERVICIOS DANISAN S.A.S
R/L INGRID ESPERANZA BECERRA BETTER

7. ANEXO.

INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
