Consorcio

Contratista: MS Ingeniería S.A.S.

Contrato N°: 2605220836

Interventoría: Consorcio RT

Representante legal contratista: Ingeniero Ricardo Tabares.
supervisión

Objeto: "Mantenimiento y Rehabilitación de la infraestructura Vial Urbana mediante la reparación y construcción de pavimentos y peatonales, en la comuna ciudadela del Norte (Antes comuna 5), de la Ciudad de Manizales por Monto Agotable."

Representante Legal MS: Ing Mario Giraldo

Residente MS: Ing. Edigson Gutiérrez V.

Representante Legal RT: Ing. Ricardo Tabares

Residente RT: Ing. Jorge castillo.

Scanned with CamScanner

* 30 de Junio de 2026
- Personal en Obra:
  Prof Social, Ingeniero Residente.
- Actividades: Se realizan actas de vecindad en el Punto 14.

Residente Obra

* 1 de Julio de 2026
- Actividades: Se realizan planes de manejo de tránsito para los Puntos 14, 15, 22

Residente Obra

* 2 de Julio de 2026
- Actividades: Se realizan planes de manejo de tránsito de los Puntos 10, 11, 12

Residente Obra.

* 3 de Julio de 2026
- Actividades: Se realizan planes de manejo de tránsito para los Puntos 2 y 13.

Residente Obra.

* 6 de Julio de 2026
- Personal en Obra:
  Profesional Social, Ingeniero Residente
- Actividades: Se realizan actas de vecindad pto 15.

Scanned with CamScanner

* 7 de Julio de 2026.

- Actividades: A la fecha están Aprobados los PMT de los Puntos 2, 10, 11, 12, 13, 14, 17 y 22. Se realiza logística para adquisición de Materiales, herramienta y Equipo. Visita Personal Aguas de manantiales ubicación Oficinas.

Residente Obra.

* 8 de Julio de 2026

- Personal en Obra:
1 Maestro, 2 oficiales, 2 Reguladores de tránsito, 4 Ayudantes, 1 Profesional SST, 1 Profesional Social, 1 Prof Ambiental, 1 Ing. residente, 1 Ingeniero Supervisión,
- Actividades: Se realiza señalización con cinta reflectiva y Bombones plásticos, señalización en cumplimiento PMT radicado: punto 17. Inicio de las demoliciones de adoquines con liga de concreto e inicio de retiros de material Sobrante. Adecuación Pasos Peatonales.

Residente Obra

* 9 de Julio de 2026. Jueves.

- Personal en Obra:
1 Maestro, 2 oficiales, 2 Reguladores de tránsito. 4 Ayudantes, 1 Prof SST, 1 Prof Social, 1 Prof Ambiental 1 Ingeniero residente Obra, 1 Ing. Supervisión,

- Actividades: Se continúan las demoliciones en el frente adoquinado Punto 17 y retiro de material Sobrante, señalización general.

* Se realiza recorrido con Geotecnista y supervisión de la alcaldía y interventoría sobre el Punto 17 en la avenida Kevin Angel desde el conjunto Piamonte hasta la entrada a Peralonso con el fin de definir obras por tramos y evaluar su ejecución.
Se solicita bosquejo en planta de la ubicación de postes, cámaras, cunetas, rocas por parte del geotecnista definiendo 3 Tramos específicos de estudio.

* 10 de Julio de 2026. Viernes
- Personal en Obra:
1 Maestro, 2 ayudantes, 2 Reguladores de tránsito, 1 Prof Social, 1 Profesional SST, 1 Ing. Ambiental, 1 Ing. Residente, 1 Ing. Supervisión.
- Actividades: Se continuan las demoliciones y retiros de material sobrante hacia escombrera la Finca certificada, Punto 15.
Se realiza localización y replanteo de los Puntos 10, 11, 12, 13, 14, 15 los cuales cuentan con los PMT Aprobados radicados:

Inicio construcción techo empotrado y cuneta Punto 15.

Residente Obra

* 11 de Julio de 2026. Sabado
- Personal en Obra:

- Actividades: Se continúan las demoliciones y excavaciones en el punto N°15 y posterior retiro de material sobrante hacia escombrera "La Enea".
Se inician demoliciones en el punto 14 y retiros de sobrantes.
Señalización General y jornada de orden y Aseo. Se continua la construcción del techo en plásticos y guadua. Pto 15

Residente Obra.

* 14 de Julio de 2026. Martes
- Personal en Obra:

- Actividades: Se continuan las excavaciones y demoliciones en los puntos 14 y 15 barrio Peralonso y retiros de material sobrante hacia escombrera la Enea.
Señalización general y PMT.
Se continua la construcción del techo en plasticos y guadua Punto 15.
- Dia Soleado:
Comite obra Instalaciones Atlantica

Residente Obra

* 15 de Julio de 2026. Miercoles.
- Día Soleado
- Personal en Obra:

- Actividades: Se realiza ubicación de batería sanitaria por parte de la empresa mantesca según el plan de gestión Ambiental, retiros de material de excavaciones y demoliciones escombro la Enea.
Se continua la construcción del techo en plastico y guadua en el Punto 15. barrio Peralonso dirección:
Excavaciones en conglomerado para instalación de subbase. Puntos 14 y 15.
Excavaciones para construcción de escalas e instalación de barandas pto 13 en la dirección:
Señalización general y PMT.

Residente Obra

* 16 de Julio de 2026. (Jueves).
Actividades:
Frente 15:
. Se termina con la construcción del techo en plástico
. Excavación para conformación de subrasante.
. Retiro de sobrantes de excavación.
. Señalización general y PMT.
. Acarreo interno de materiales.

Frente 14:
. Excavación para conformación de subrasante.
. Retiro de sobrantes de excavación.
. Señalización en general y PMT.
. Acarreo interno de materiales.

Frente 13:
. Excavación para conformación de escalas.
. Señalización en general y PMT.
. Acarreo interno de materiales.

Frente 12:
. Localización y replanteo.
. Señalización en general y PMT.

Personal en la Obra.
1 ingeniero Residente
2 Maestros.
1 profesional en SST.
1 profesional ambiental
1 profesional Social.
4 Reguladores de transito.
3 oficiales
12 ayudantes

Equipo en la Obra.
1. mini cargador
1 Volqueta de 8 m³
1 Camioneta
Herramienta menor.

Estado del clima.
noche anterior sin presencia de lluvias
Durante el día no se presentan lluvias.

. Para la próxima semana se tiene programado iniciar en los frentes 12 y 22.
. Estamos a la espera por parte del geotecnista de las instrucciones para la valoración y construcción del pto 17 en la avenida Kevin.
. Tambien estamos esperando la visita técnica del geotecnista para definirnos en los ptos 2 y 4.

Jorge Eduardo Castillo Marín
Residente de Interventoría

* 17 de Julio de 2026 (Viernes)
Actividades
Frente 15:
. Se inicia con la conformación de la rasante de la vía con subbase granular.
. Se inicia construcción de techo en plastico y guadua para el segundo tramo de vía.
. Señalización en general y PMT.

Frente 14:
. Excavación para conformación de subrasante de vía en tramo 3.
. Por instrucción de la supervisión de la alcaldía se selecciona adoquin para ser entregado a ellos.
. Retiro de sobrantes de excavación
. Acarreo interno de escombros.
. Señalización en general y PMT.

Scanned with CamScanner

Frente 13:

Excavación para conformación de escalas
. Afirmado compactado para subrasante
. Acarreo interno de materiales.
. Retiro de sobrantes de excavación
. Señalización en general y PMT.

Personal en la Obra
. 1 ingeniero Residente
1 ingeniera auxiliar
2 maestros
3 oficiales
12 ayudantes
1 profesional en SST
1 profesional ambiental
1 profesional social
4 reguladores de transito

Equipo en la Obra
1 bodcat minicargador
1 Volqueta de 8m3
Herramienta menor.

Estado del Clima.
Noche anterior sin lluvias
Día seco.

Jorge Eduardo C.
R. Interventoría

18 de Julio de 2026 (Sabado).
Actividades frente 15:
. Se continua con la compactación de la subbase granular para la estructura del Pavimento.
. Se continua con la construcción del Ecolco en plastico y guadua en segundo tramo de vía.
. Señalización general y PMT.

Frente 14:

- Excavación para conformación de subrasante de vía en tramo 3.
- Retiro de sobrantes de excavación.
- Acarreo interno de escombros.
- Señalización en general y PMT.

Frente 13:

- Afirmado compactado para conformación de estructura de escalas.
- Señalización en general y PMT.

Personal en la Obra.

1 ingeniero Residente
1 ingeniera auxiliar
2 Maestros
3 oficiales
12 ayudantes
1 profesional SST
1 profesional ambiental
1 profesional Social
4 Reguladoras de transito.

Equipo en la obra.

1 minicargador bolcat
1 Volqueta
1 Camioneta de estacas.
Herramienta menor.

Estado del clima

- Noche anterior sin lluvias
- Todo el día seco.

Hoy estuvo en la Obra un personaje de prensa de la alcaldía de Manizales, para ir

a hacer recorrido en ptos sin intervenir, en proceso, con el objetivo de tomar registro fotográfico del antes y el durante de la obra. También realizó entrevista a varios ciudadanos al respecto de la apreciación sobre las obras.
También se hace acercamiento con líderes comunitarios de peralonso.

Jorge Eduardo Castillo M.
Presidente de interventoría.

Resident Obra

A 21 de julio de 2026 (Martes)

Se realiza segundo comité de Obra.
Se solicita al contratista la elaboración y presentación de los NPs que se están presentando hasta el momento.
- Se solicita al contratista los ensayos previos de la subbase y el afirmado que se están utilizando en la obra, además los diseños de mezcla para los concretos que se harán en obra. (MR 42 - 3000 psi).

Actividades.
Frente 15:
- Se continua con la compactación de la estructura de la subrasante para la vía
- Se termina la construcción del lecho en plástico y guadua del segundo tramo.
- Retiro de sobrantes de excavación.
- Señalización en general y PMT.
Frente 14.
Excavación para conformación de subrasante

en fase 3.
. Retiro de sobrantes de excavación.
. Acarreo interno de escombros.
. Señalización en general y PMT.

Frente 13:
. Apiramado compactado para estructura de escalas.
. Excavación para canal perimetral para escalas.
. Señalización en general y PMT.

Frente 12:
. Demolición de pavimento
. Señalización en general y PMT.

Frente 11:
. Excavación para canalización de pedestal
. Señalización en general y PMT.

Personal en la Obra.
2 maestro
7 oficiales
13 ayudantes.
1 ingeniero Residente
1 ingeniera Auxiliar
1 profesional en SST
1 profesional Social
1 profesional ambiental.

Equipo en la Obra.
2 cargadores sobre llanta.
2 Volquetas de 8 m3
1 Camioneta de estacas
Herramienta menor.

Estado del clima.
. Fuertes lluvias durante la noche anterior
. Día seco y soleado.

Jorge Eduardo Castillo M.
Residente de Interventoría

Residente Obra

* 22 Julio del 2026 (martes)
Se realizo recorrido en varios puntos de la ciudad donde no se evidencian daños en las redes de Acueducto y Alcantarillado que opera la empre. Aguas de Manizales.
Orden de Trabajo # 2624764.
Joanni Paneda. 313 759 3374.
Puntos. 9-14-15-22.

Actividades:
Frente 15:
. Excavación para cajeo de estructura de Pavimento en tramo 2.
. Retiro de Sobrantes de excavación.
. Cerramiento en yute en tramo 2.
. Señalización en general y PMT.

Frente 14:
. Cajeo para subrasante del pavimento en tramo 2.
. Cordon en suelo cemento.
. Retiro de sobrantes de excavación.
. Señalización en general y PMT.

Frente 13:
. Excavación para bordillos perimetrales de escalas

. trasado de escalon y rampas.
. inicio construcción de parcialeta en madera.
. Señalización en general y PMT.

Frente 11.
. Nivelación rampa.
. Es necesario desplazar hacia arriba el trasado de la rampa debido a la presencia de una cámara de alcantarillado.
. inicio de excavación para conformación de rampa.
. Señalización en general y PMT.

Frente 12:
. Se termina la demolición.
. Señalización en general y PMT.

Frente 22:
. Se inicia demolición de pavimentos.
. Señalización en general y PMT.
. Se le recomienda al contratista dotar protector a los postes peatonales.

Personal en la Obra.
1 maestro
1 Contramaestro.
7 operarios
13 ayudantes
4 reguladores viales
1 ingeniero residente
1 ingeniero auxiliar
1 profesional SST
1 profesional Social
1 profesional ambiental

Equipo en la Obra.
2 minicargadores bobcat.
1 Volqueta de 8m³.
1 Camioneta de estacas
Herramienta menor.

Estado del clima.
. Noche anterior sin lluvias
En la tarde se presentan lluvia fuertes a partir de las 4 pm.

Jorge Eduardo Castillo Marín
Residente de interventoría

* 23 de Julio de 2016 (Jueves)

Actividades:
Frente 15:
. Excavación para cajeo de subrasante para pavimento.
. Demoliciones para construcción de sumideros recomendados por aguas de manzales para drenar el empozamiento en la intersección de los pavimentos.
- Señalización en general y PMT.

Frente 14.
. inicia construcción de techo en plástico y guadua movible.
. Cajeo para conformación de subrasante de vía en tramo 2.
. Retiro de sobrantes de excavación.
. Señalización en general y PMT.

Frente 13:

. Debido a la pendiente grande del terreno se da la necesidad de mejorar la pendiente de las rampas y escalas por lo cual los llenos se incrementan además habra basura y escombros en el sitio.
. Señalización en general y PMT.

Frente 12:
. Retiro de sobrantes de demolición.
. Señalización en general y PMT.

Frente 11:
. Excavación para conformación de subrasante para escalas.
. Señalización en general y PMT.

Frente 22
. Demolición de pavimento.
. Retiro de sobrantes de demolición
. Señalización en general y PMT.
. Se realiza acercamiento social con la comunidad.

Personal en la Obra.
1 residente
1 Contraresidente
7 oficiales
16 ayudantes
4 Regaladoras
1 ingeniero residente
1 ingeniero auxiliar.
1 profesional en SST
1 profesional en gestión ambiental
1 profesional social.

Equipo en la obra.
2 minicargadores bobcat.
2 Volquetas de 8cm3
1 camioneta de estacas
1 Vibrocompactador
herramienta menor.

Estado del clima.
. fuertes lluvias durante la noche anterior
. lluvias fuertes entre las 11 am y las 2 pm.

Jorge Eduardo Castillo Marín
Residente de Interventoría

* 24 de Julio de 2026 (Viernes).

Frente 2. (visita del Geotecnista).
Se recomienda en el sitio
Con las coordenadas

realizar una pantalla pasiva de 0,10 m de espesor con malla de 5,5 mm y con el detalle indicado, se realizara con un ancho de 3,0 metros y una altura promedio de 2,0 metros para la pantalla. para las demas zona del todo el talud sera necesario realizar perfilado con una pendiente de 50° y luego empradizar, lo anterior debera tener una zanja de corona

para controlar la escorrentia y evitar erosion nuevame en el talud.

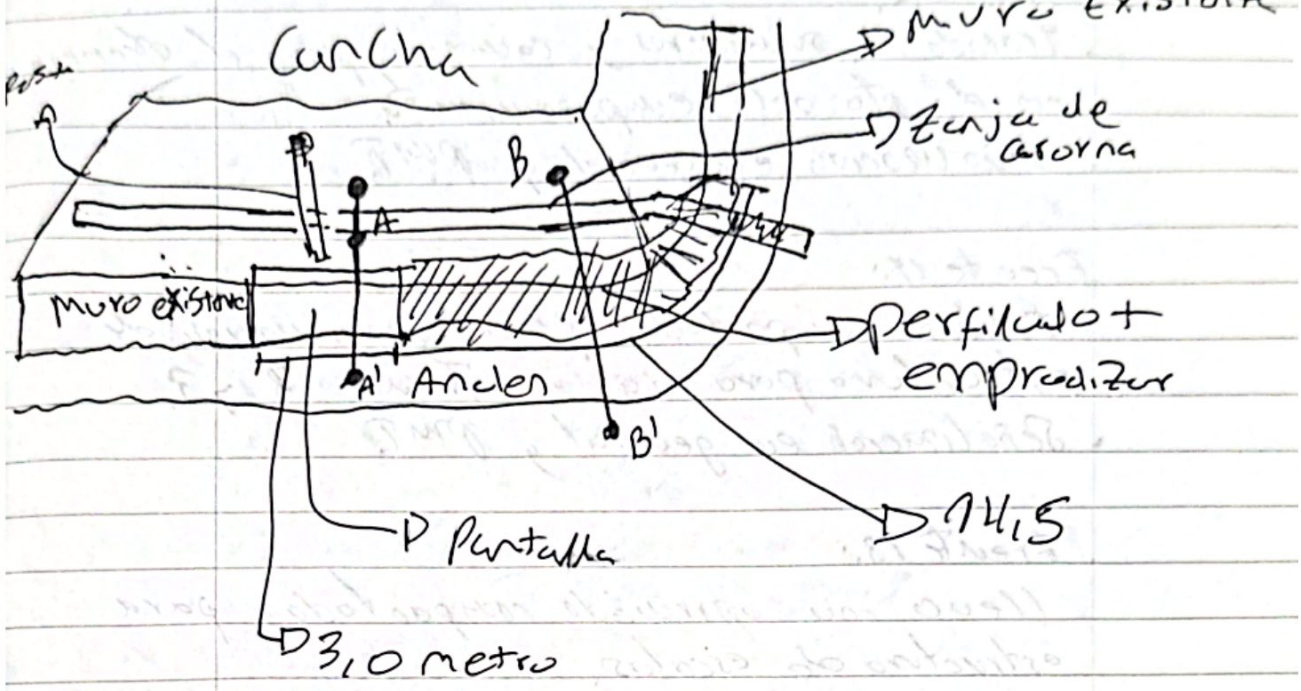

corte A – A'

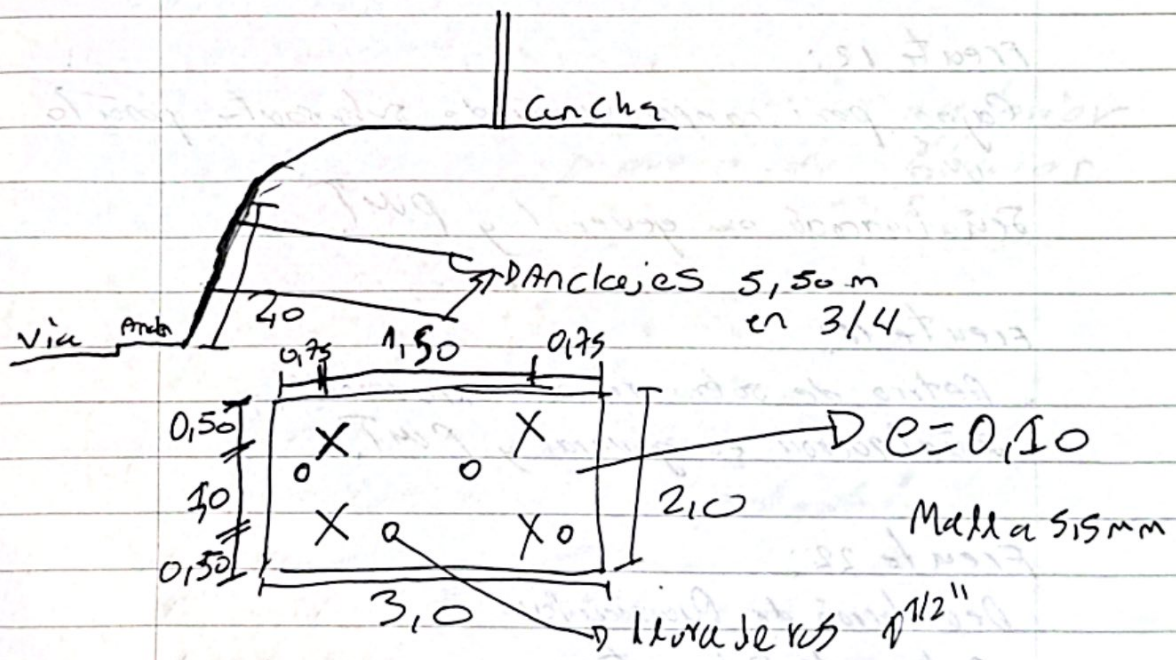

24/07/2026

Frente 15:

- Excavación para conformación de subrasante de vía en Tramo 2.
- Trazado de sumideros y cámaras para el drenaje en el pto del empozamiento.
- Señalización en general y PMT.

Frente 14:

- Subbase compactada para conformación de estructura para vía en Tramo 2 y 3.
- Señalización en general y PMT.

Frente 13:

- Lleno con afirmado compactado para estructura de escalas.
- Inicio de parcialeta para escalas.
- Señalización en general y PMT.

Frente 12:

Cajeo para conformación de subrasante para la vía.

Señalización en general y PMT.

Frente 11:

- Retiro de sobrantes de excavación.
- Señalización en general y PMT.

Frente 22:

- Demolición de Pavimentos
- Retiro de sobrantes.
- Construcción de cordón en suelo cemento
- Construcción de peatonales.
- Señalización en general y PMT.

Personal en la Obra.

Scanned with CamScanner

1 maestro
1 contramaestro
7 oficiales
16 ayudantes
4 reguladores.
1 ingeniero residente
1 ingeniera auxiliar
1 profesional en SST
1 profesional ambiental
1 profesional social

Equipo en la Obra
2 minicargadores bot cat.
1 Volqueta sencilla de 8m3
1 Camioneta de estacas
1 vibrocompactador
Herramienta menor.

Estado del clima.
. No hay lluvias en la noche anterior
. Día seco sin presencia de lluvias

Jorge Eduardo Castillo Marín
Residente de interventoría.

x 25 de julio de 2026 (sábado)

Actividades:
Frente 15:
. Excavación para conformación de subrasante de vía
Tramo 2.
. Inicio excavación cámara circular recomendada para el drenaje de la vía
- Señalización en general y PMT.

Frente 14:
- Subbase compactada con cilindro para estructura de pavimento en tramo 2 y tramo 3.
- Retiro de sobrantes de excavación.
- Señalización en general y PMT.

Frente 13.
- Se termina la parvaleta en madera para las escalas
- inicio de vaciado de las escalas.
- Señalización en general y PMT.

Frente 12:

- Se termina excavación para cajeo de conformación de subrasante de vía.
- Retiro de sobrantes de excavación.
- Señalización en general y PMT.

Frente 11:
- Señalización en general y PMT.

Frente 22:
- Retiro de sobrantes de demolición.
- Señalización en general y PMT.

Personal en la Obra.
1 ingeniero Residente
1 ingeniera Auxiliar
1 profesional en SST
1 profesional ambiental
1 profesional social.
1 maestro
1 Contramaestro
7 oficiales

16 ayudantes.
4 Reguladores de tránsito
Equipo en la obra.
2 cargadores bobcat
1 Volqueta de 8m3.
1 camioneta de estacas.
1 vibrocompactador
1 compactador de rana
1 Rana compactadora.
Herramienta menor.

Estado del clima.
Noche anterior sin lluvias
. Día seco y soleado sin presencia de lluvias.

Jorge Eduardo Castillo Marín
Residente de interventoría

* 27 de Julio de 2026 (Lunes)

Se realiza recorrido de obra con el ingeniero Víctor Ramírez y la ingeniera Paola Molina para revisar varios puntos de trabajo y verificar avances en los frentes intervenidos. El ingeniero Víctor como director de obra de la secretaría de obras, reporta instrucciones al respecto de disposiciones técnicas necesarias para el inicio de nuevos ptos de trabajo, estas disposiciones están a cargo de personal de la alcaldía.
. Se autoriza retiro de escombrera de las materas del predio 16, sin compensación alguna. También se realiza acercamiento con la junta

de acción comunal JAC, del barrio Fanny Gonzales para aclarar temas sobre las intervenciones que se vienen adelantando en el sector.

Actividades:

Frente 15:

- Se termina con las demoliciones
. Excavación para cámara circular.
. Retiro de sobrantes.
. Señalización en general y PMT.

Frente 14.

. Demolición intersección boca calle. calle 46A cruz.
. Retiro de sobrantes
. Compactación de subbase gravular para estructura de pavimento. tramo 1
- Cajeo para conformación de subrasante tramo 2
. señalización en general y PMT.

Frente 13:

. Se termina de vacíos las escalas
. inicio armado hierro de bordillas.
. Señalización en general y PMT.

Frente 12:

- Se termina cajeo para conformación de subrasante.
- Se inicia compactación de subbase gravular para estructura de pavimento
. Retiro de sobrantes.
. Señalización en general y PMT.

Frente 11:

- perforación para anclajes para cura apoyo

de rampa.
. Señalización en general y PMT.

Frente 22:
. Excavación para conformación de subrasante de vía
. Retiro de sobrantes.
. Construcción de cordón con suelocemta
. Señalización en general y PMT.

Personal en la Obra.
1 ingeniero Residente
1 ingeniero Auxiliar
1 profesional en SST
1 profesional en ambiental
1 profesional social.
1 maestro
1 contramaestro.
6 oficiales
16 ayudantes.
4 Reguladores de tránsito.
Equipo en la Obra.
2 minicargadores bot cat.
1 vibrocompactador
1 camineta de estacas.
2 Volquetas de 8m³.
1 concretadora de 1 saco
1 Rana vibrocompactadora
Herramienta menor.

Estado del Clima.
. Noche anterior seca sin presencia de lluvias
. Día seco sin presencia de lluvias.

Jorge Eduardo Castillo Marín
Residente de interventoría

* 28 de Julio de 2026 (martes).

Actividades:
Frente 15:
. Vaciado de piso para cámara circular
. cortes con disco en rampas de acceso.
. Perfilado cajeo para conformación de subrasante en tramo 2.
. Señalización en general y PMT.

Frente 14:
. Demolición de pavimento entre T2 y T3
. Compactación de subbase en tramo 1
. cajeo para conformación de subrasante en tramo 2.
. Retiro de sobrantes
. Señalización en general y PMT.

Frente 13:
. Se continua con la armada de refuerzo para el bordillo de la escala.
. Señalización en general y PMT.

Frente 12:
. Compactación de subbase granular para estructura de pavimento
. Señalización en general y PMT.

Frente 11
Señalización en general y PMT.

Frente 22:

- Excavación en general para compensación de sobrecanto de la Vía.
- Retiro de Sobrantes
- Señalización en general y PMT.
- De la necesidad de sustituir en Frente Personal en la Obra
1 Ingeniero Residente
1 Ingeniero Auxiliar
1. profesional en SST
1. profesional Social
1 profesional ambiental
1 Maestro
1 Contramaestre
6 oficiales
16 ayudantes.
4. Reguladores de trafico.
Equipo en la Obra.
2 minicargadores bobcat
1 Volqueta de 8m3
1 Vibrocompactador
1 cargamento de estacas
1 concretadora de 1saco.
1 Rana vibrocompactadora.
Herramienta menor.

Estado del clima:
Noche anterior sera sin presencia de lluvia
Dia seco sin presencia de lluvias.

Jorge Eduardo Castillo Marin
Residente de Interventoria

* 29 de Julio de 2026 (Miercoles).

Se da instrucción al contratista de elaborar referencias con correcamino para poder revisar los niveles de desplante para la subrasante, la estructura de subbase y el pavimento.
Tambien se da la instrucción de presentar a la interventoria cada nivel de desplante para dar aprovación pertinente y la continuación de la siguiente actividad.

Frente 15:
. Excavaciones para construcción de sumideros tramo 1
. cajeo para conformación de subrasante en tramo 2
. Retiro de sobrantes de excavación.
*. En tramo 1 se presenta un piltro prances que aparentemente no esta trabajando, se da instrucción al contratista de conectarlo a la camara circular que se está construyendo para que este no quede interrumpido, y por seguridad pueda drenar a la camara si es el caso.
. Señalización en general y PMT.

Frente 14:
. Cajeo para subrasante en tramo 2.
. Compactación subbase en tramo 2.
. Retiro Sobrantes
. Demolición pavimento calle 46A entre 11-12
. Señalización en general y PMT.

Frente 13:
. Se continua con repuesto y formaleta para bordillo.
Señalización en general y PMT.

Frente 12:
. Compactación de subbase granular.
. Señalización en general y PMT.

Frente 11:
. Demolición de bordillos existentes que obstaculizan la geometría de la rampa
. anclajes con epoxico para conformación de muros perimetrales de apoyo a la rampa.
. Señalización en general y PMT.

Frente 22:
. Cajeo para conformación de subrasante.
. Señalización en general y PMT.

Personal en la Obra
1 ingeniero residente.
1 ingeniera auxiliar
1 profesional SST
1 profesional social
1 profesional ambiental
1 maestro
1 contramaestro
6 oficiales
16. ayudantes.
4 Reguladores de transito
Equipo en la obra.
2 minicargadores bot cat.
1 Volqueta de 8m3.
1 Vibrocompactador.
1 Camioneta de estacas
1 Rana vibrocompactadora.
1 concretadora de 1 saco
Herramienta menor.

Estado del Clima.

. Noche anterior sin presencia de lluvias
. Día seco sin presencia de lluvias

Jorge Edgardo Castillo Martín.
Residente de Interventoría.

30 de Julio de 2026 (Jueves).

El día de hoy la alcaldía envía recursión de laboratorio de suelos para que realice sondeos y apiques en el mirador de Monte León (Frente 7) para determinar las condiciones de la subrasante para el pavimento que se va a construir, y de las condiciones de estabilidad de la ladera para poder determinar las obras que se deberán ejecutar.

Actividades:

Frente 05:

- Demolición de estructuras en concreto en la margen derecha de los sumideros a construir en el Tramo 1.
- Se da la necesidad de sustitución por presencia de material inconveniente tanto en tramo 1 como en tramo 2 del frente.
- Cajeo para conformación de subrasante en tramo 2.
- Señalización en general y PMT.

Frente 14:

- Cajeo para conformación de subrasante tramo 2.
- Compactación subbase granular tramo 1.
- Se da la necesidad de sustituir material

por presencia de material incompetente.
en Tramo 2.
Señalización en general y PMT.

Frente 13:
- Se continua con formaleta y refuerzo para bordillo de escalas.
- Señalización en general y PMT.

Frente 12:
- Se define reforzamiento para el plato donde esta ubicada la camara de alcantarillado y el de los platos irregulares.
- Señalización en general y PMT.

Frente 11:
- Formaleta y refuerzo para el muro de apoyo lateral de la rampa.
- Señalización en general y PMT.

Frente 22:
- Cajeo para conformación de subrasante.
- Compactación de subbase granular.
- Señalización en general y PMT.

Personal en la Obra.
1 ingeniero residente
1 ingeniera Auxiliar
1 profesional SST
1 profesional Social
1 profesional ambiental
1 maestro
1 Contramaestro.
6 oficiales

18 ayudantes
4. Reguladoras de transito.

Equipo en la Obra.
2 minicargadores bot cat.
1 Volqueta de 8m3
1 Vibrocompactador
1 Concretadora de 1 saco.
1 Camioneta
2 Rana
1 Planta electrica
Herramienta menor.

Estado del Clima
Noche anterior seca, sin presencia de lluvia
Dia seco sin presencia de lluvia.

Jorge Eduardo Castillo M.
Residente de interventoría.

Residente Obra

* 31 de julio 31 de 2025. (Viernes)

Actividades
Frente 15:
- Cajeo para conformación de subrasante tramo 2.
- Señalización en general y PMT.

Frente 14:
- Cajeo para conformación de subrasante en tramo 2.
- Compactación de subbase granular para estructura de vías tramo 1.
- Señalización en general y PMT.

Frente 13:
. Formaleto y acero de refuerzo para bordillo, de escala.
. Señalización en general y PMT.

Frente 12:
. Señalización en general y PMT.

Frente 11:
. vaciado de rampa peatonal
. Señalización en general y PMT.

Frente 22:
. Cajeo para conformación de subrasante.
. Colocación y compactación subbase granular para estructura de pavimento.
. Señalización en general y PMT.

Personal en la Obra
1 Ingeniero residente
1 Ingeniero auxiliar.
1 profesional en SST
1 profesional ambiental
1 profesional social
2 maestros
6 oficiales
10 ayudantes
4 reguladores de transito.

Equipo en la Obra.
1 Minicargador bobcat.
1 Volqueta de 8m3.
1 Vibrocompactador Tador
2 Planas
1 Cacerqueta.

1 concretadora de 1 saco
1 planta electrica
Herramienta menor.

Estado del clima.
Noche anterior seca, sin presencia de lluvias
Día seco sin presencia de lluvias.

Jorge Eduardo Castillo Morín
Residente de interventoria

* 01 de Agosto de 2026 (sabado)
Se labora en las mismas actividades del viernes.
* 03 de Agosto de 2026 (lunes).

Se realiza comite técnico N3. en el cual se dan instrucciones de reparamiento para el pavimento del frente No. 12: se debe dar continuidad a las juntas del pavimento existente, a las cuales se les colocaron dovelas, se reparará la cámara de alcantarillado en doble parrilla de 1/2", se repararán las platas irregulares tambien con doble parrilla de 1/2".
En la transición del pavimento en la bocacalle, se realizará reparamiento con hierro de 1/2 en doble parrilla, pero no se instalaron dovelas. Además, se da instrucción de asceleras pavimentos a 7 días para agilizar trabajos.
Actividades:
Frente 15:
- Cajeo para conformación de subrasante tramo 2.
- Demoliciones presentes en excavación para sumideros.
- Se da la necesidad de sustituir con material del sitio en tramo 1.
- Señalización en general y PMT.
