GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA

FRENTE DE TRABAJO

LÍBANO

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

JULIO DEL 2026

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

JULIO DEL 2026

OBJETO
CONTRATO NO.3034 DE 2026

"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA".

FRENTE DE TRABAJO LÍBANO

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

JULIO DEL 2026

INTEGRANTES

SUPERVISOR DE CAMPO	ING. DIANA GALLEGO
MOTONIVELADORA NUEVA #1	ENRIQUE OLIS
RETROEXCAVADORA NUEVA #5	JOSE ALED OCAMPO
RETROEXCAVADORA ORUGA #5	JHONNY SANCHEZ
VOLQUETA #06	CAMILO CAÑON
VOLQUETA #13	DUVERNEY AGUIRRE
VOLQUETA #49	JAVIER GUERRERO

FRENTE DE TRABAJO LÍBANO

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

JULIO DEL 2026

VIA INTERVENIDA

1. CONFORMACIÓN VILLAHERMOSA: PRIMAVERA BAJA-EL AGRADO

2. REMOCIÓN DE MATERIAL: VILLAHERMOSA

3. LÍBANO: SAN FERNANDO-LA AURORA-LA GUAIRA

FRENTE DE TRABAJO LÍBANO

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA


UNIÓN TEMPORAL MARV 7

INFORME

JULIO DEL 2026

MAQUINARIA EN OPERACIÓN



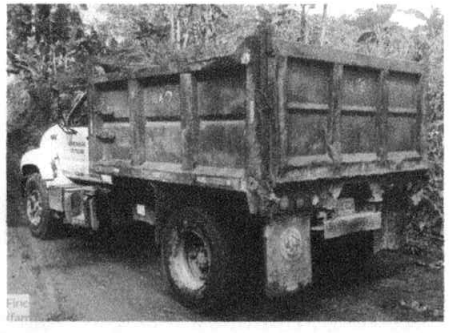









FRENTE DE TRABAJO LÍBANO

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

JULIO DEL 2026

TOTAL, ACTIVIDADES REALIZADAS VILLAHERMOSA MEJORAMIENTO DE LA VÍA

FECHA	ABSCISA		VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN
	DE	A				
01/07/2026	K0+000	K0+416	06, 13	7	4	28
02/07/2026	K0+416	K0+832	06, 13	7	5	35
03/07/2026	K0+832	K1+248	06, 13	7	4	28
06/07/2026	K1+248	K1+664	06, 13	7	6	42
07/07/2026	K1+664	K2+080	06, 13	7	6	42
08/07/2026	K2+080	K2+500	06, 13	7	4	28
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VÍA						**203**

FRENTE DE TRABAJO LÍBANO

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

JULIO DEL 2026

TOTAL, ACTIVIDADES REALIZADAS VILLAHERMOSA CONFORMACIÓN DE LA VÍA

FECHA	ABSCISA		LONGITUD	ANCHO	AREA
	DE	A			
01/07/2026	K0+000	K0+416	416	5	2.080
02/07/2026	K0+416	K0+832	416	5	2.080
03/07/2026	K0+832	K1+248	416	5	2.080
06/07/2026	K1+248	K1+664	416	5	2.080
07/07/2026	K1+664	K2+080	416	5	2.080
08/07/2026	K2+080	K2+500	420	5	2.100
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA					**12.500**

FRENTE DE TRABAJO LÍBANO

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

JULIO DEL 2026

TOTAL, ACTIVIDADES REALIZADAS VILLAHERMOSA CONFORMACIÓN DE CUNETAS

FECHA	ABSCISA		LONGITUD	N° CARRILES	LONGITUD TOTAL
	DE	A			
01/07/2026	K0+000	K0+416	416	1	416
02/07/2026	K0+416	K0+832	416	1	416
03/07/2026	K0+832	K1+248	416	1	416
06/07/2026	K1+248	K1+664	416	1	416
07/07/2026	K1+664	K2+080	416	1	416
08/07/2026	K2+080	K2+500	420	1	420
TOTAL CUNETA					**2.500**

FRENTE DE TRABAJO LÍBANO

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

JULIO DEL 2026

TOTAL, ACTIVIDADES REALIZADAS VILLAHERMOSA CON LA RETROEXCAVADOR DE ORUGA

FECHA	ABSCISA		LONG	ANCHO	ALTO	VOLUMEN
	DE	A				
01/07/2026	VEREDAS VILLAHERMOSA		20	4	1	80
02/07/2026			20	4	1	80
03/07/2026			30	3	1	90
06/07/2026			30	4	1	120
07/07/2026			30	4	1	120
08/07/2026			30	4	1	120
15/07/2026			30	3	1	90
16/07/2026			30	3	1	90
17/07/2026			30	3	1	90
21/07/2026			30	3	1	90
22/07/2026			30	3	1	90
23/07/2026			30	3	1	90
24/07/2026			30	3	1	90
27/07/2026			30	3	1	90
28/07/2026			30	3	1	90
29/07/2026			30	3	1	90
30/07/2026			30	3	1	90
REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VIA						**1.600**

FRENTE DE TRABAJO LÍBANO

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

JULIO DEL 2026

TOTAL, ACTIVIDADES REALIZADAS LÍBANO CONFORMACIÓN DE LA VÍA

FECHA	ABSCISA		LONGITUD	ANCHO	AREA
	DE	A			
01/07/2026	K0+000	K0+200	200	5	1.000
02/07/2026	K0+200	K0+400	200	5	1.000
03/07/2026	K0+400	K0+600	200	5	1.000
06/07/2026	K0+600	K0+800	200	5	1.000
07/07/2026	K0+800	K1+000	200	5	1.000
08/07/2026	K1+000	K1+200	200	5	1.000
09/07/2026	K1+200	K1+400	200	5	1.000
10/07/2026	K1+400	K1+600	200	5	1.000
15/07/2026	K1+600	K1+800	200	5	1.000
16/07/2026	K1+800	K2+000	200	5	1.000
17/07/2026	K2+000	K2+200	200	5	1.000
21/07/2026	K2+200	K2+400	200	5	1.000
22/07/2026	K2+400	K2+600	200	5	1.000
23/07/2026	K2+600	K2+800	200	5	1.000
24/07/2026	K2+800	K3+000	200	5	1.000
27/07/2026	K3+000	K3+200	200	5	1.000
28/07/2026	K3+200	K3+400	200	5	1.000
29/07/2026	K3+400	K3+600	200	5	1.000
30/07/2026	K3+600	K3+800	200	5	1.000
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA					19.000

FRENTE DE TRABAJO LÍBANO

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

JULIO DEL 2026

TOTAL, ACTIVIDADES REALIZADAS

MUNICIPIO	TOTAL (KM)	VOLUMEN (M3)
LÍBANO: SAN FERNANDO-LA AURORA-LA GUAIRA	3,8	
VILLAHERMOSA KIT: PRIMAVERA BAJA-EL AGRADO	2,5	
VILLAHERMOSA ORUGA		1600
TOTAL, KILOMETROS INTERVENIDOS Y MATERIAL REMOVIDO	**6,3 KM**	**1600 M3**

FRENTE DE TRABAJO LÍBANO

CONTRATISTA
UNIÓN TEMPORAL MARV 7

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FRENTE DE TRABAJO LÍBANO

JULIO 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

MUNICIPIO DEL LÍBANO

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE JULIO AL 30 DE JULIO DEL 2026

INFORME MENSUAL
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN....3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO....3
3. LOCALIZACIÓN....4
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO....5
5. VIAS DEL MUNICIPIO....5
5.1 SECTOR 1:....5
6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES....5
6.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN....6
7. PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO....7
7.1 PERSONAL UTILIZADO....7
7.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA....7
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO....9
8.1 ACTIVIDADES VILLAHERMOSA: PRIMAVERA BAJA-EL AGRADO....9
8.2 ACTIVIDADES LÍBANO: SAN FERNANDO-LA AURORA-LA GUAIRA....15
8.3 ACTIVIDADES RETROEXCAVADORA DE ORUGA: VILLAHERMOSA....25

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo dar a conocer los aspectos relevantes de la gestión de la maquinaria pesada y volquetas de la Gobernación del Tolima y la maquinaria de la unión nacional de gestión de riesgo de desastres, en la realización y atención de emergencias viales, puntos críticos y mantenimiento de la red vial del Municipio del Líbano – Tolima.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto a realizar consta del mantenimiento en la zona rural de los Municipios de Rovira, Roncesvalles, San Antonio exactamente en la vía Líbano – Villahermosa, con maquinaria de la Gobernación del Tolima.

La infraestructura por intervenir beneficia los municipios del Líbano y Villahermosa. Se realizará el mantenimiento a los tramos críticos autorizados por la Gobernación del Tolima y así proveer una superficie de rodamiento adecuada, con el fin de facilitar el diario vivir a la comunidad.

Cabe resaltar que las actividades solamente contemplan limpieza, ampliación de la vía, remoción de derrumbes, recuperación banca, apertura y extendido de material de mejoramiento con el apoyo de la retroexcavadora de oruga, retroexcavadora de llantas, motoniveladora y volqueta.


Esta es una obra que representa un gran aporte para la comunidad, adicionalmente, en este caso no solo se benefician los que residen cerca, sino que se favorece en general a todos los habitantes del Municipio, teniendo en cuenta que es una zona de desarrollo agrícola y de crecimiento turístico.

3. LOCALIZACIÓN

El proyecto principalmente se encuentra ubicado en el país de Colombia oficialmente República de Colombia, es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur que se encuentra constituido en un estado unitario, social y democrático de derecho cuya forma de gobierno es presidencialista. Es una república que está organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados y el Distrito capital de Bogotá, sede del gobierno nacional.

En Colombia, exactamente en el departamento del Tolima que es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, forman la República de Colombia. Su capital es Ibagué. Está ubicado en el centro-oeste del país, en la región andina, limitando al norte con Caldas, al este con Cundinamarca, al sur con Huila y Cauca, y al oeste con Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. El río Magdalena atraviesa Tolima de sur a norte.

Líbano es un municipio colombiano situado en el departamento del Tolima. Es el tercer municipio más extenso en área urbana del departamento, solo superado por su capital Ibagué y el municipio de El Espinal. Tiene una temperatura media de 20 °C. Sus actividades económicas son la agricultura, la ganadería, el turismo y la producción literaria. Su población es de 45 262 habitantes (según el censo de 2018). Limita al norte con los municipios de Villahermosa y Armero, al occidente con el municipio de Murillo, al oriente con los municipios de Lérida y Santa Isabel y al sur con el municipio de Santa Isabel.

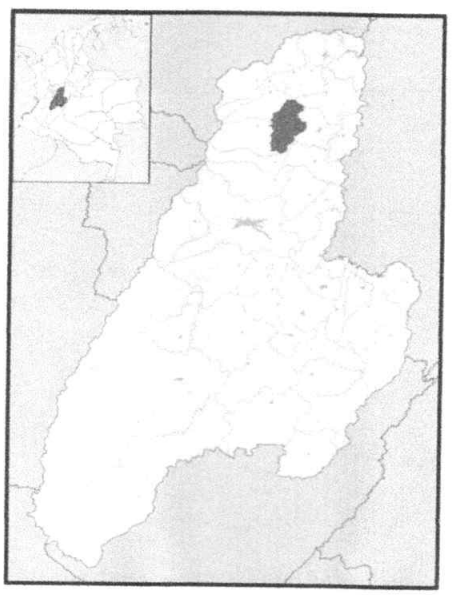

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MANTEMINIENTO VIAL
Conformación de la red vía.

5. VIAS DEL MUNICIPIO

5.1 SECTOR 1:

El sector 1, es la zona de pastales, vía ubicada en la vía Líbano – Villa Hermosa:

N°	DESCRIPCIÓN - VEREDA	KILOMETROS
1	Líbano – Villa Hermosa	31

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido se realizaron las actividades de mantenimiento, destinados primordialmente a la recuperación y conformación de la vía, limpieza mecánica y reconstrucción de cunetas; estas actividades se realizaron con un kit de maquinaria amarilla el cual está conformado por 3 volquetas, 1 motoniveladora, 1 retroexcavadora de llantas y 1 retroexcavadora de oruga.

Se realizaron las actividades de mantenimiento con la motoniveladora sobre la vía Líbano-Villahermosa en los sectores de Primavera Baja y El Agrado, al igual que con la retroexcavadora de oruga en sectores del municipio, específicamente mejoramiento y conformación de la misma para la recuperación de la banca.

Se atendieron puntos críticos en zonas afectadas del municipio, específicamente en la vereda San Fernando, La Aurora y La Guaira, del municipio del Líbano realizando actividades de limpieza y recuperación de la vía en general.

Esto permitió la solución y rehabilitación del corredor vial, ya que es importante restablecer el tránsito vehicular para beneficio de la comunidad en general y el poder transportar sus productos.

Para finalizar, en el periodo transcurrido del mes se conformaron 2,5 km de vía correspondientes a Villahermosa, 3,8 km en la vía del Líbano y en limpieza-remoción de tierra con la retroexcavadora de oruga sobre la vía Villahermosa 1600 m3; el estado del tiempo y las condiciones climáticas no fueron favorables y se registraron lluvias equivalentes a un total de 12 horas en el mes.

6.1 **CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN**

De conformidad con las actividades realizadas, se han conformado 2,5 km y 1600 m3 de remoción de tierra en la vía de Villahermosa y 3,8 km de conformación en la vía del Líbano:

FECHA	MUNICIPIO	KILOMETROS INTERVENIDOS (KM)
Del 01/07/2026 al 08/07/2026	VILLAHERMOSA: PRIMAVERA BAJA-EL AGRADO	2,5
Del 01/07/2026 al 30/07/2026	LÍBANO: SAN FERNANDO-LA AURORA-LA GUAIRA	3,8
TOTAL, KILOMETROS INTERVENIDOS		**6,3 KM**

Logrando atender puntos críticos en la vía de Villahermosa con la retroexcavadora de oruga se muestra a continuación la cantidad de tierra removida:

FECHA	MUNICIPIO	VOLUMEN (M3)
Del 01/07/2026 al 30/07/2026	VILLAHERMOSA	1600
TOTAL, LIMPIEZA Y REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VÍA		1600 M3

7. PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO

7.1 PERSONAL UTILIZADO

CARGO	PROFESION	NOMBRE
SUPERVISOR	INGENIERO CIVIL	DIANA GALLEGO
OPERARIO DE MOTONIVELADORA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	ENRIQUE OLIS
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	DUVERNEY AGUIRRE
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	JAVIER GUERRERO
OPERARIO DE RETROEXCAVADORA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JOSE ALED OCAMPO
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	CAMILO CAÑON
OPERARIO DE RETROEXCAVADORA DE ORUGA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JHONNY SANCHEZ

7.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

Para realizar las labores durante este periodo se empleó el kit de maquinaria pesada como:


UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA


MAQUINARIA	NUMERO	CANTIDAD
MOTONIVELADORA	NUEVA #1	1
RETROEXCAVADORA	NUEVA #5	1
RETRO. DE ORUGA	5	1
VOLQUETA	06, 13, 49	3

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACION DEL TOLIMA

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO


8.1 ACTIVIDADES VILLAHERMOSA: PRIMAVERA BAJA-EL AGRADO

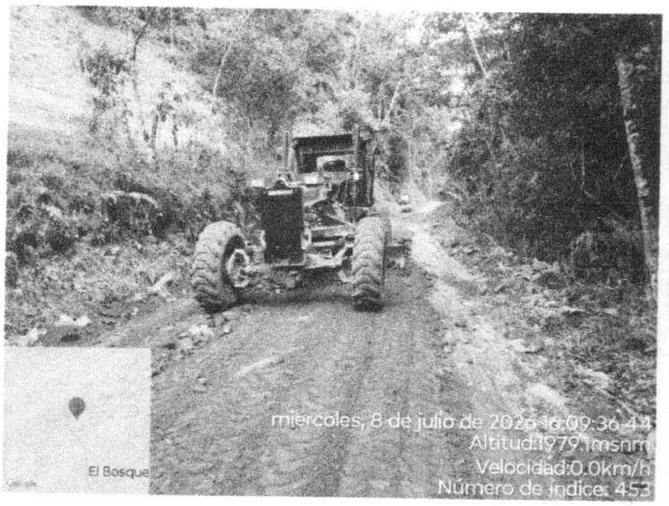

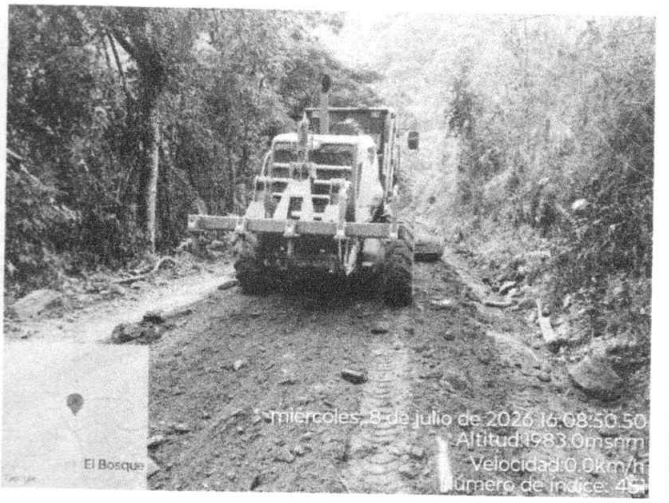

PRIMAVERA BAJA-EL AGRADO



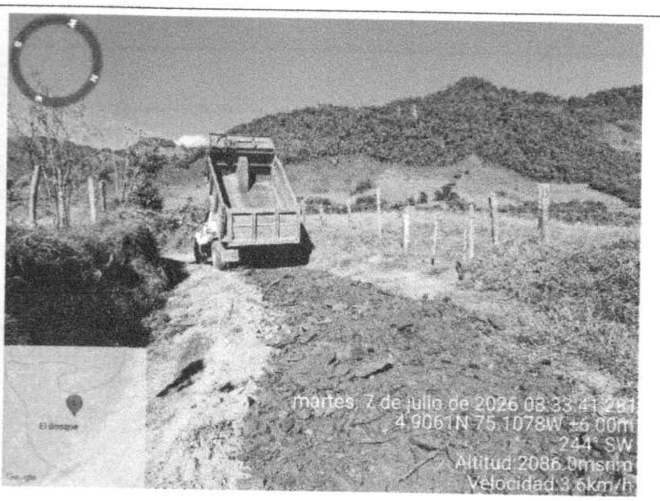


PRIMAVERA BAJA-EL AGRADO

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA





PRIMAVERA BAJA-EL AGRADO

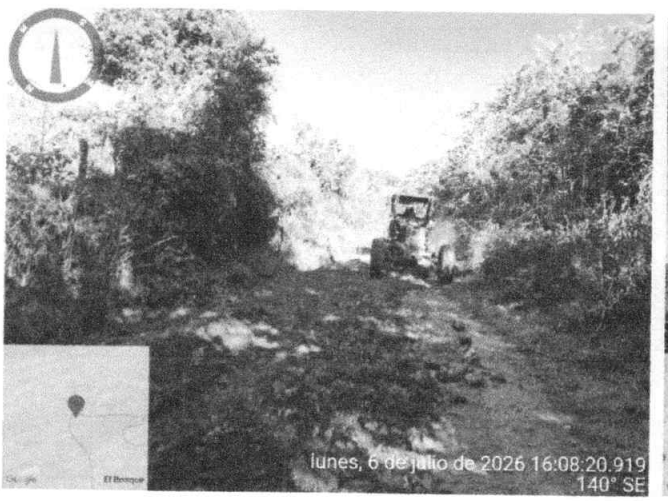





PRIMAVERA BAJA-EL AGRADO

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



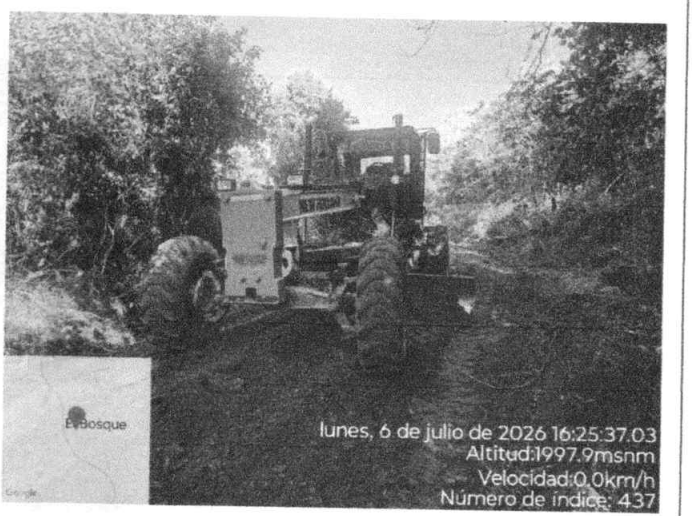

PRIMAVERA BAJA-EL AGRADO

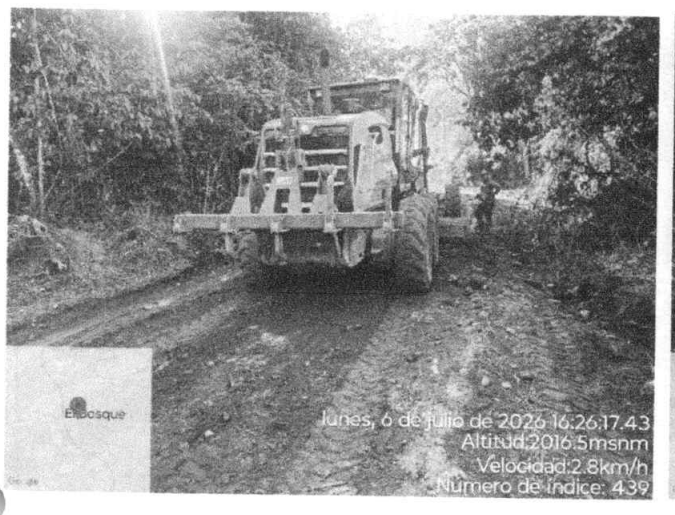



PRIMAVERA BAJA-EL AGRADO


UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA






PRIMAVERA BAJA-EL AGRADO




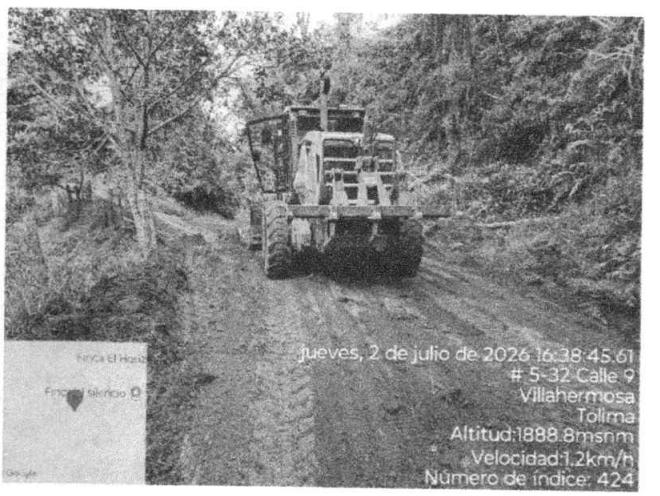


PRIMAVERA BAJA-EL AGRADO


UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

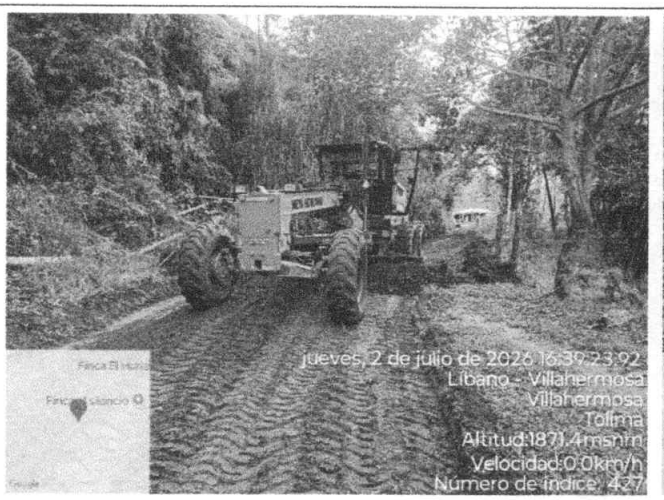

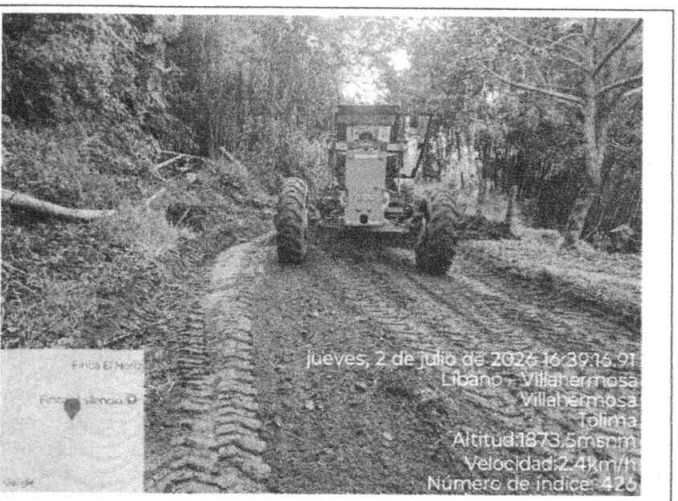


PRIMAVERA BAJA-EL AGRADO

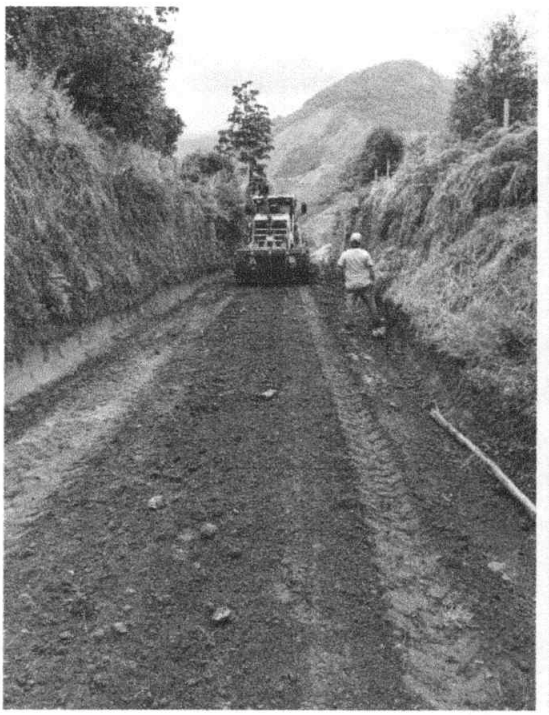


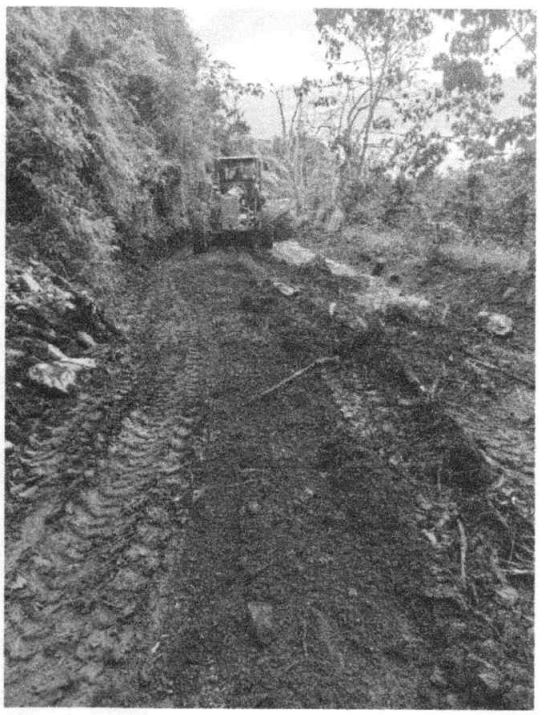

PRIMAVERA BAJA-EL AGRADO

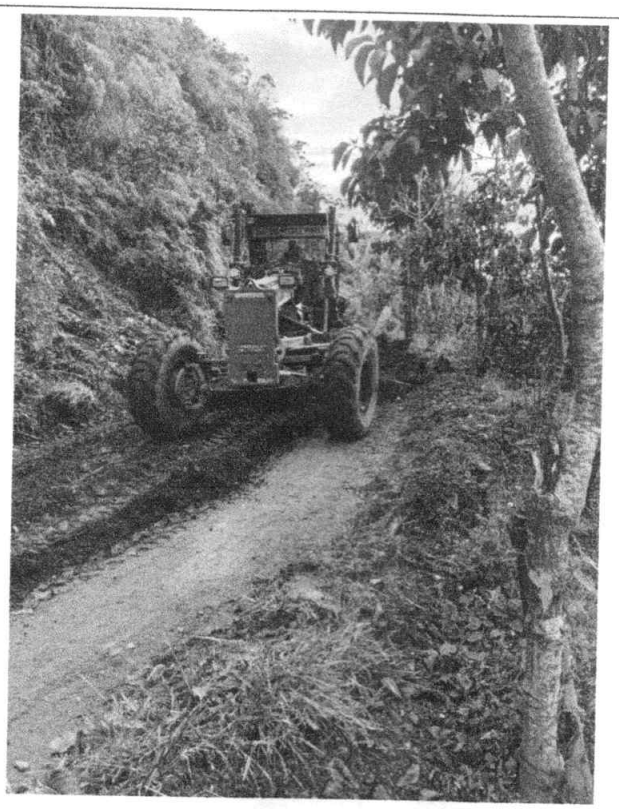



PRIMAVERA BAJA-EL AGRADO

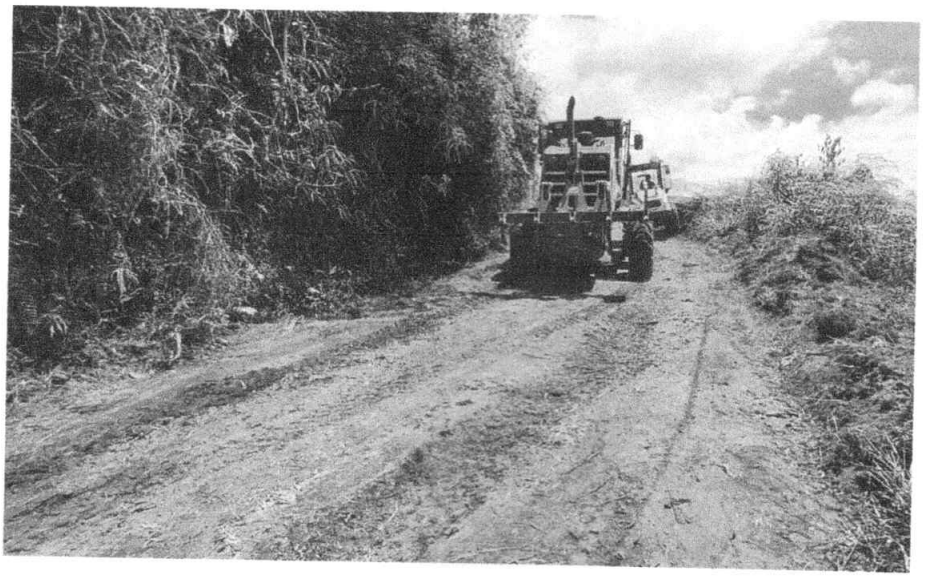

PRIMAVERA BAJA-EL AGRADO


8.2 ACTIVIDADES LÍBANO: SAN FERNANDO-LA AURORA-LA GUAIRA

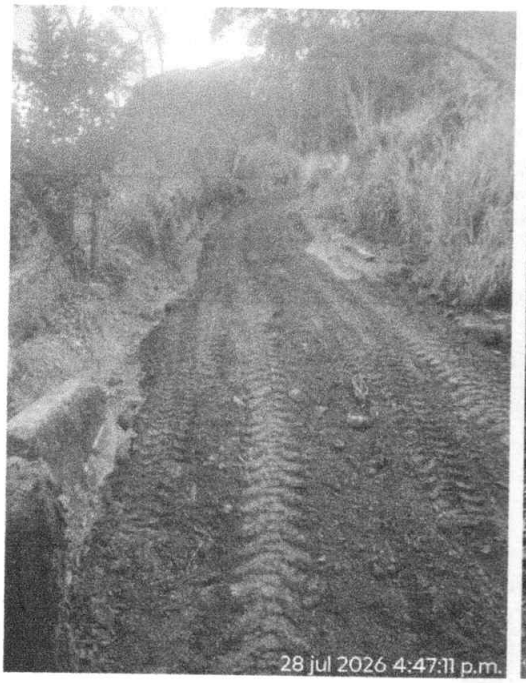

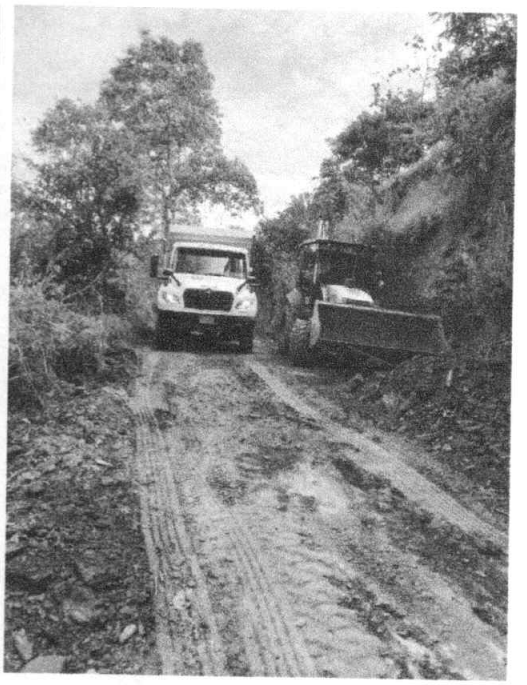

SAN FERNANDO-LA AURORA-LA GUAIRA



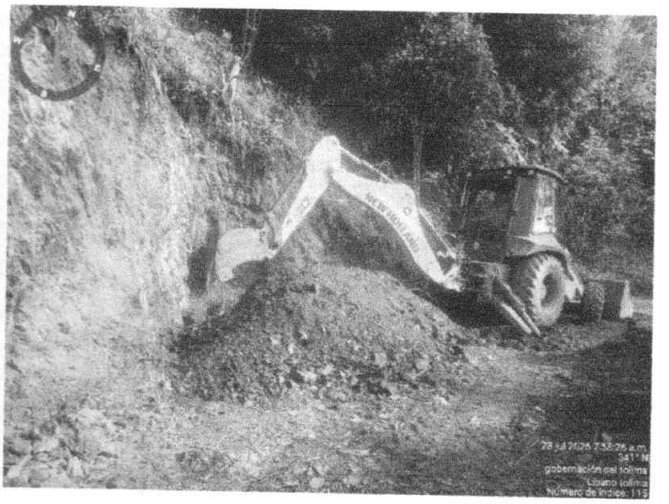

SAN FERNANDO-LA AURORA-LA GUAIRA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA






SAN FERNANDO-LA AURORA-LA GUAIRA






SAN FERNANDO-LA AURORA-LA GUAIRA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACION DEL TOLIMA

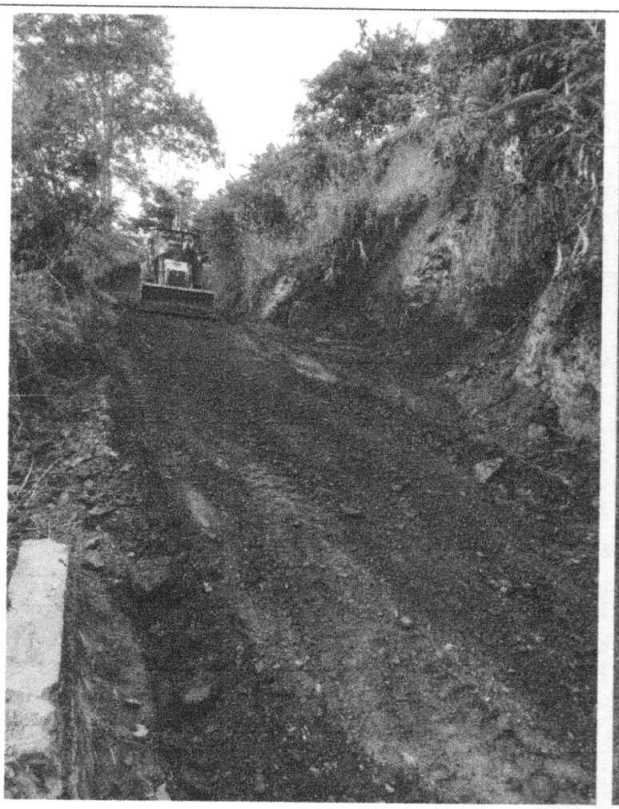

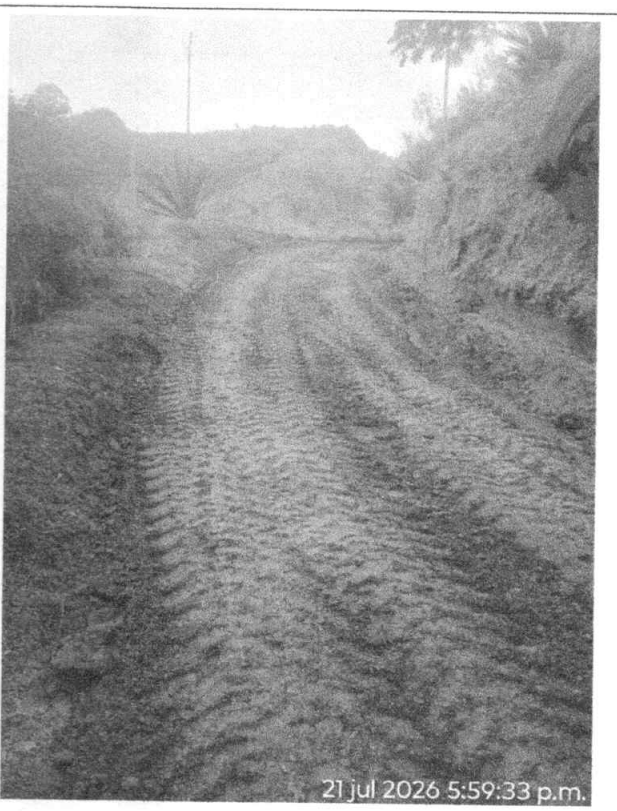


SAN FERNANDO-LA AURORA-LA GUAIRA






SAN FERNANDO-LA AURORA-LA GUAIRA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

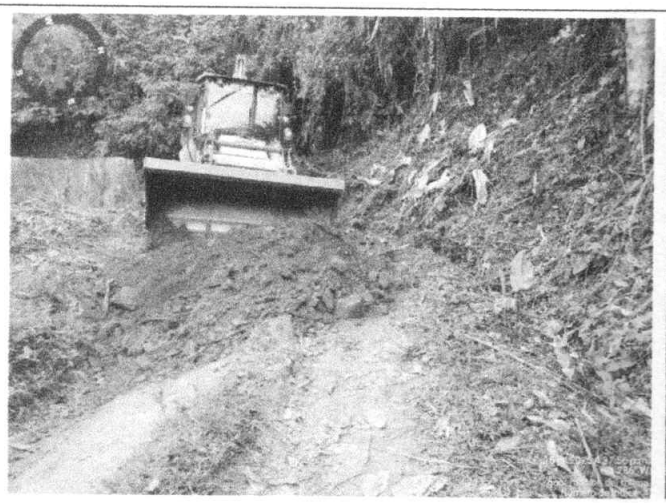

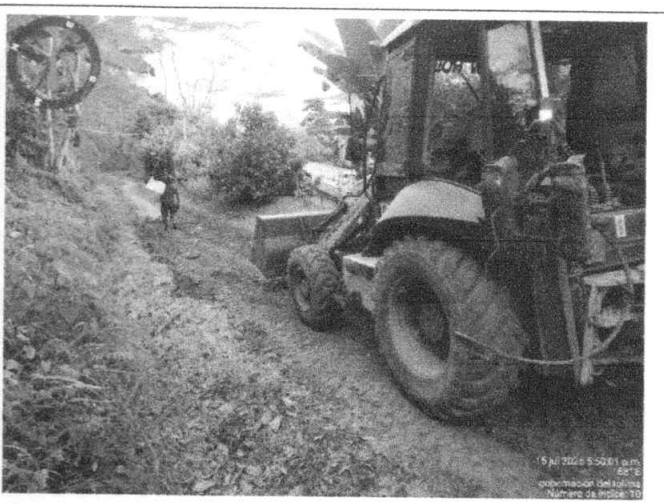


SAN FERNANDO-LA AURORA-LA GUAIRA






SAN FERNANDO-LA AURORA-LA GUAIRA


UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

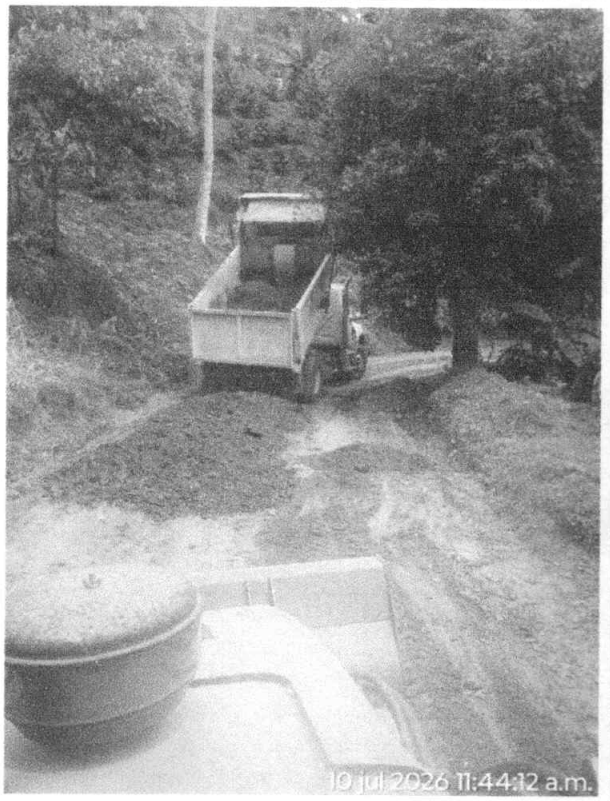

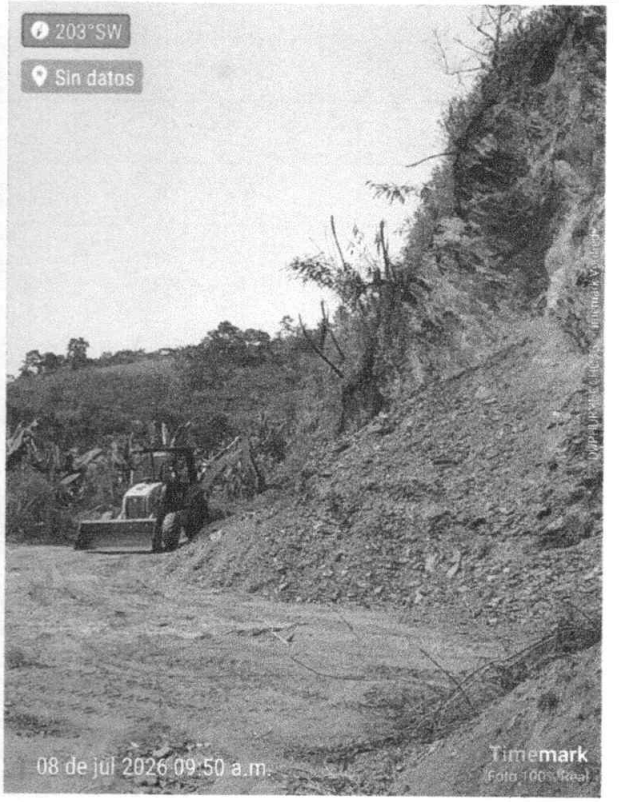

SAN FERNANDO-LA AURORA-LA GUAIRA




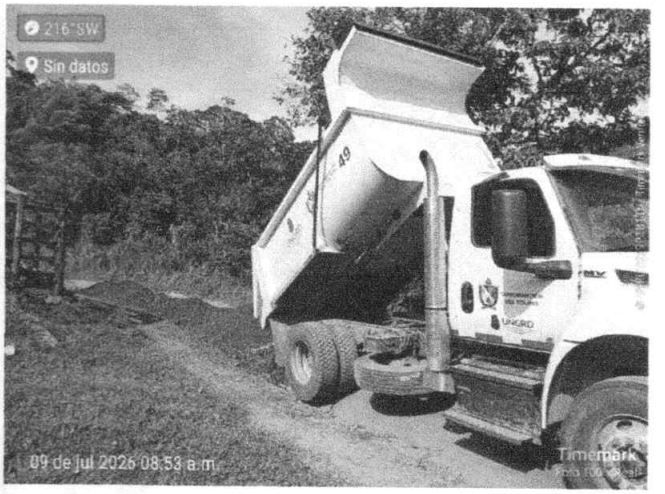

SAN FERNANDO-LA AURORA-LA GUAIRA


UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



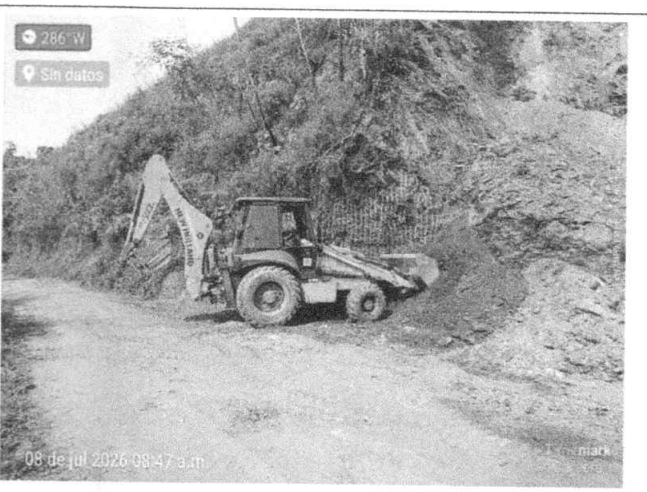


SAN FERNANDO-LA AURORA-LA GUAIRA



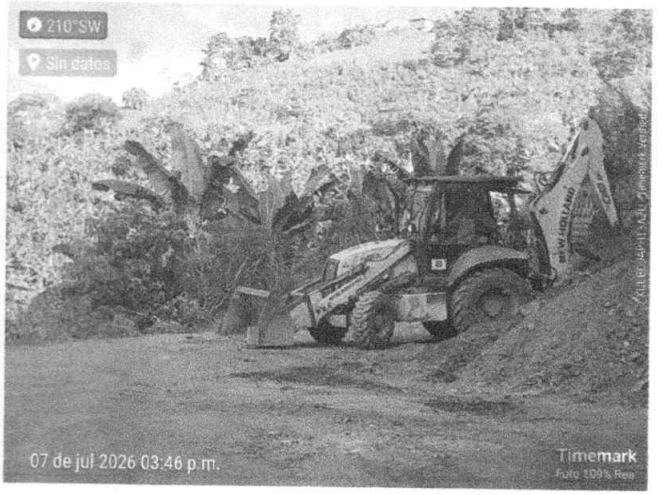

SAN FERNANDO-LA AURORA-LA GUAIRA


UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACION DEL TOLIMA

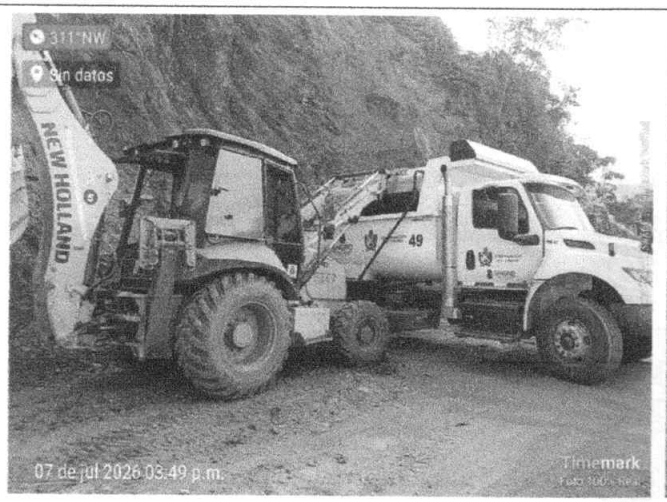




SAN FERNANDO-LA AURORA-LA GUAIRA




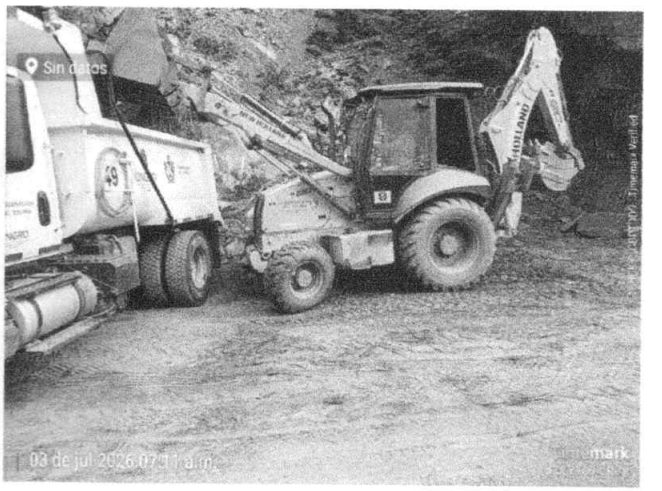

SAN FERNANDO-LA AURORA-LA GUAIRA


UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

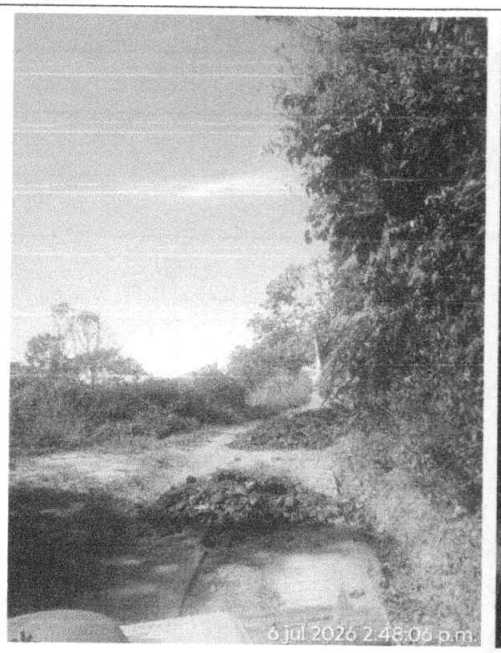

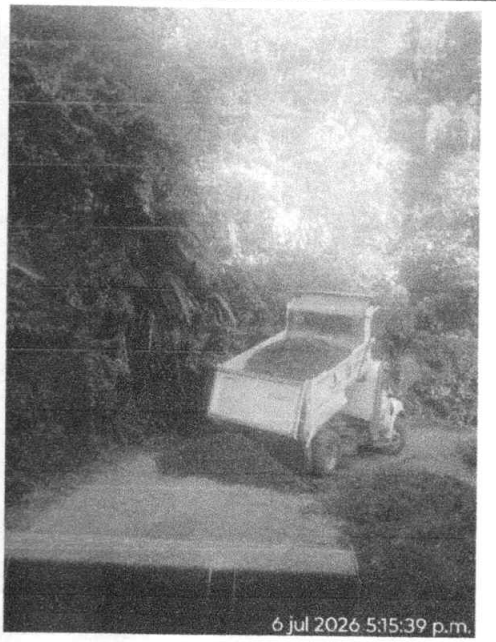


SAN FERNANDO-LA AURORA-LA GUAIRA




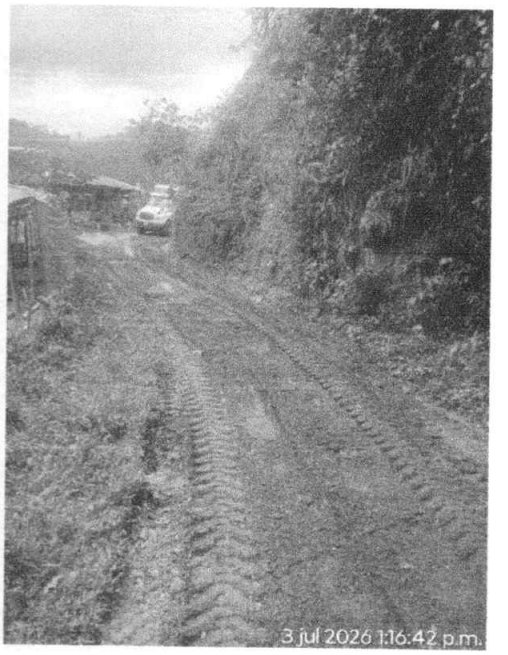

SAN FERNANDO-LA AURORA-LA GUAIRA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

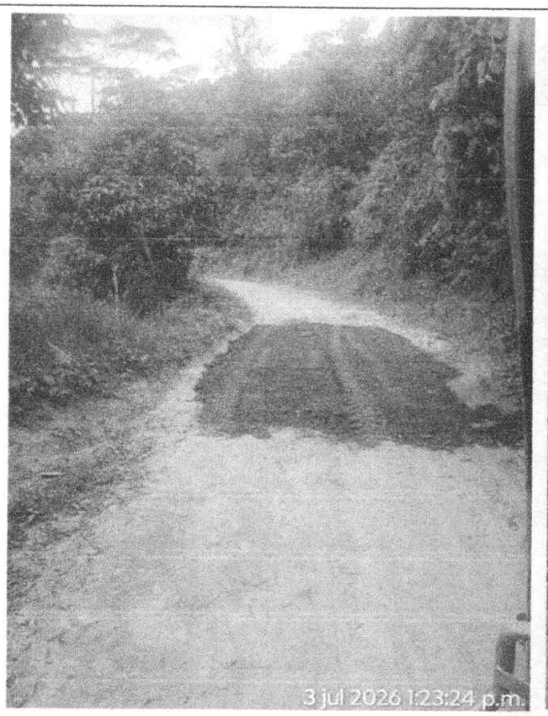

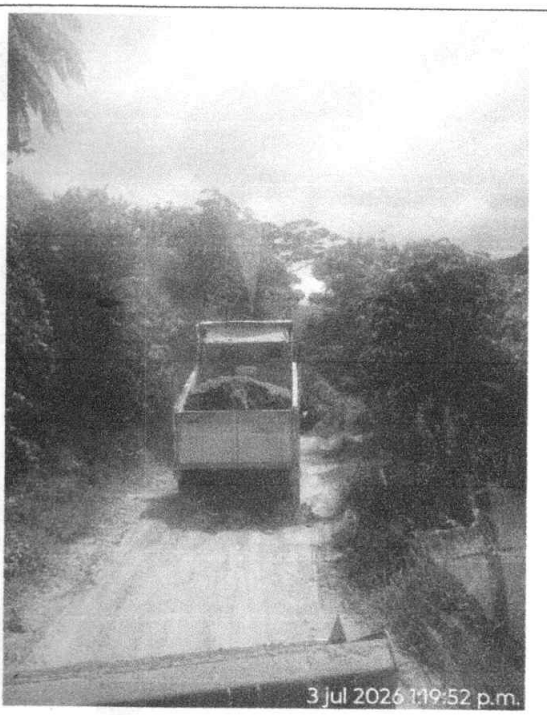


SAN FERNANDO-LA AURORA-LA GUAIRA






SAN FERNANDO-LA AURORA-LA GUAIRA


UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

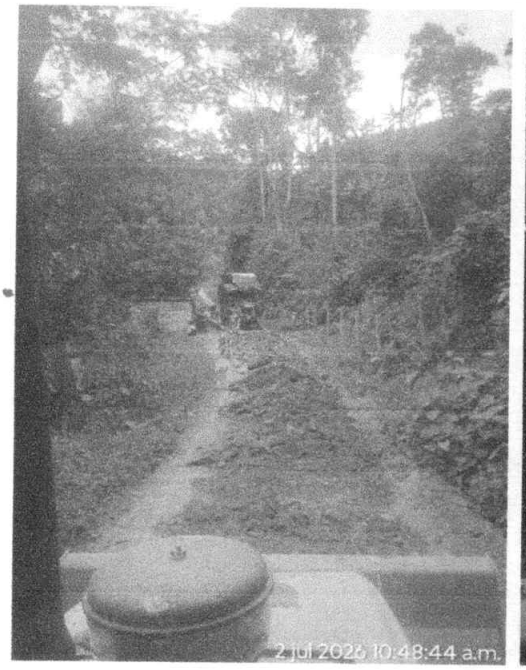

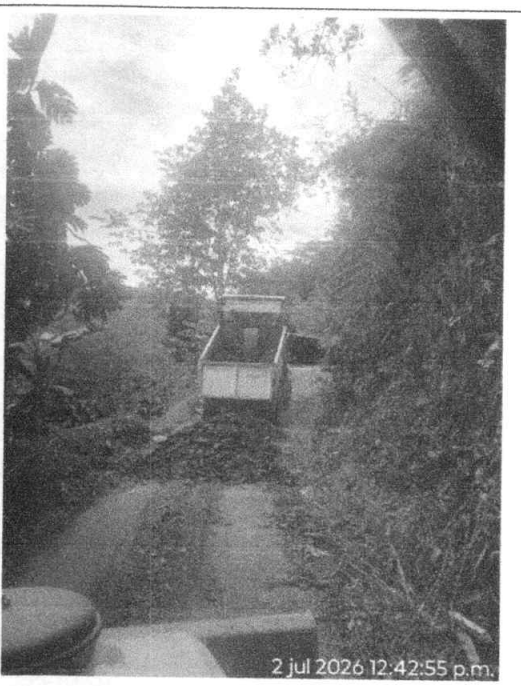



SAN FERNANDO-LA AURORA-LA GUAIRA



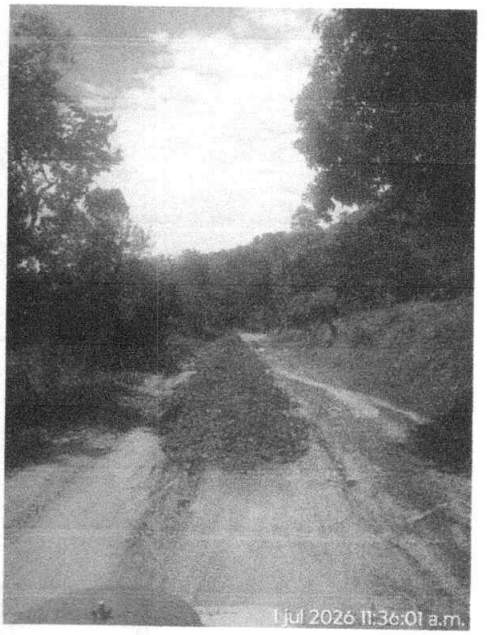


SAN FERNANDO-LA AURORA-LA GUAIRA

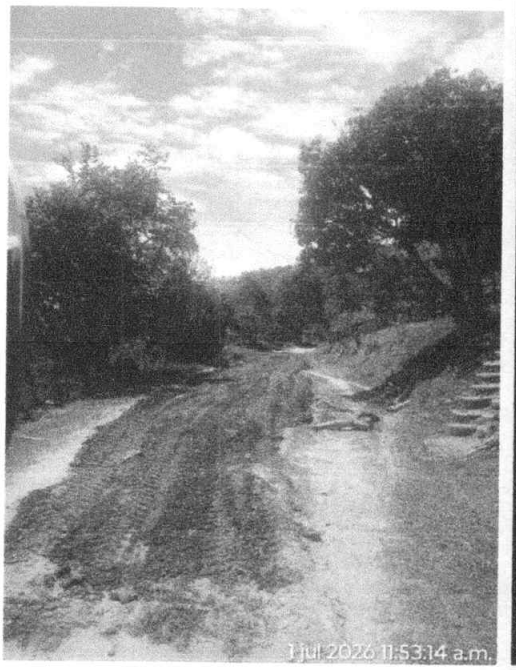


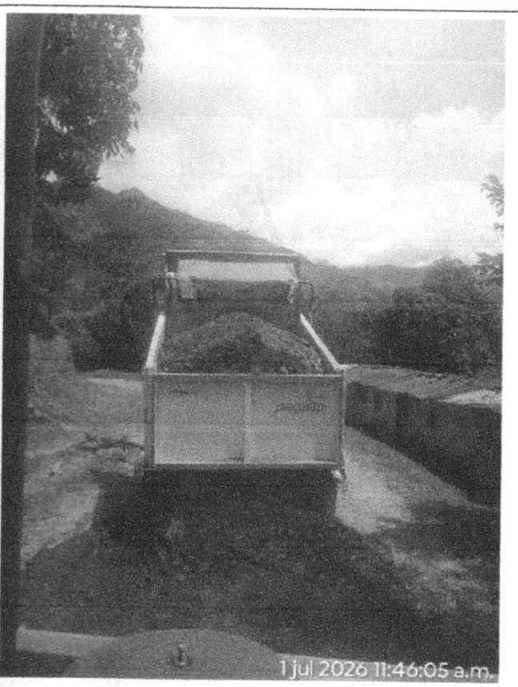

SAN FERNANDO-LA AURORA-LA GUAIRA

8.3 ACTIVIDADES RETROEXCAVADORA DE ORUGA: VILLAHERMOSA

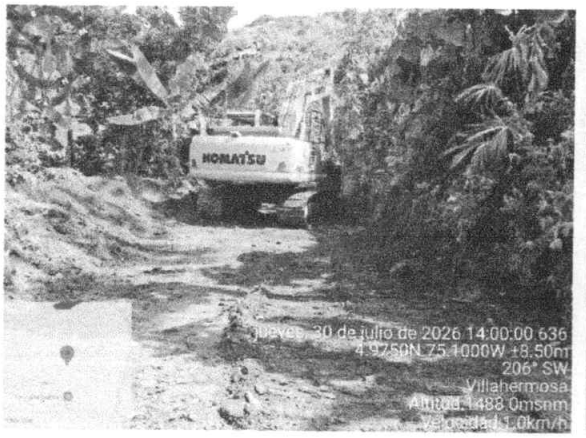

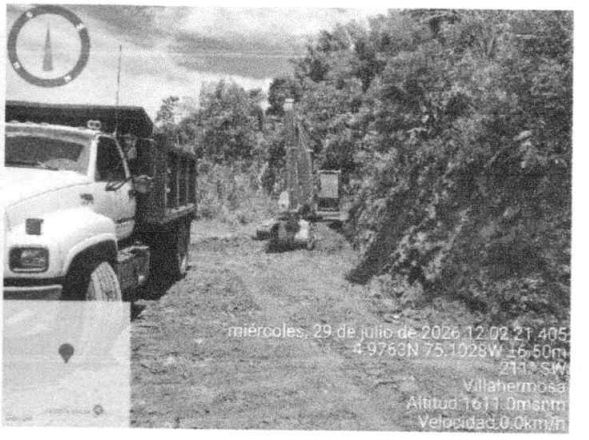

VILLAHERMOSA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA





VILLAHERMOSA





VILLAHERMOSA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA






VILLAHERMOSA





VILLAHERMOSA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

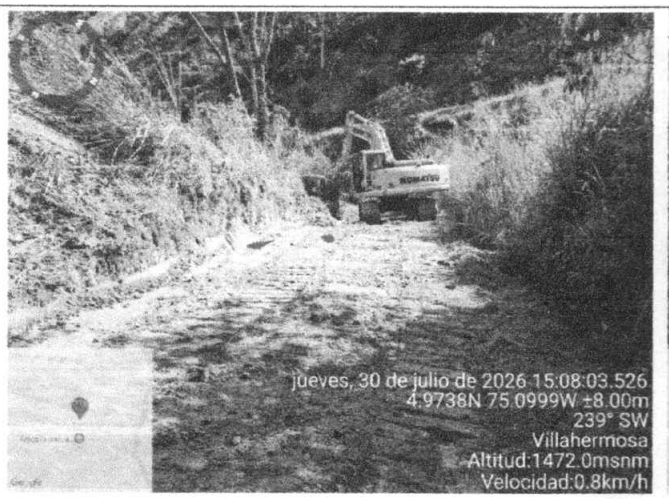




VILLAHERMOSA






VILLAHERMOSA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

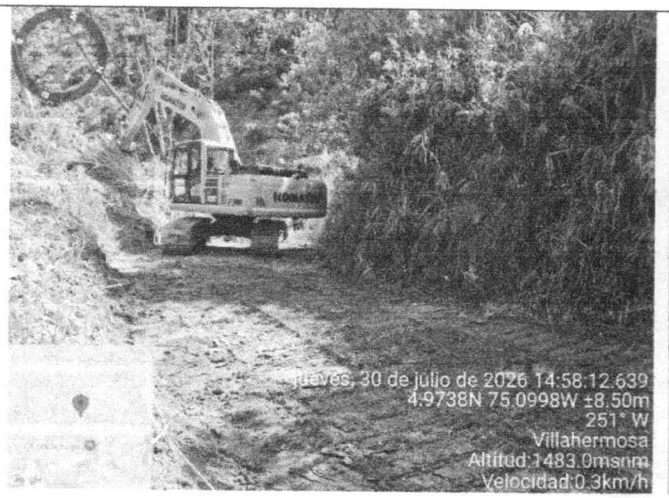



VILLAHERMOSA

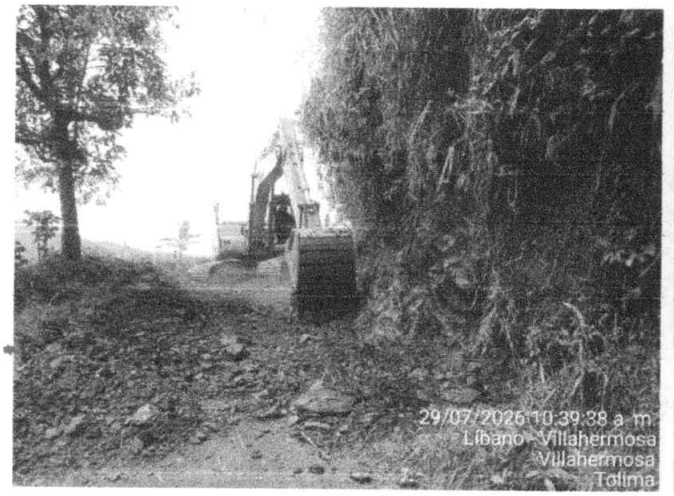




VILLAHERMOSA


UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



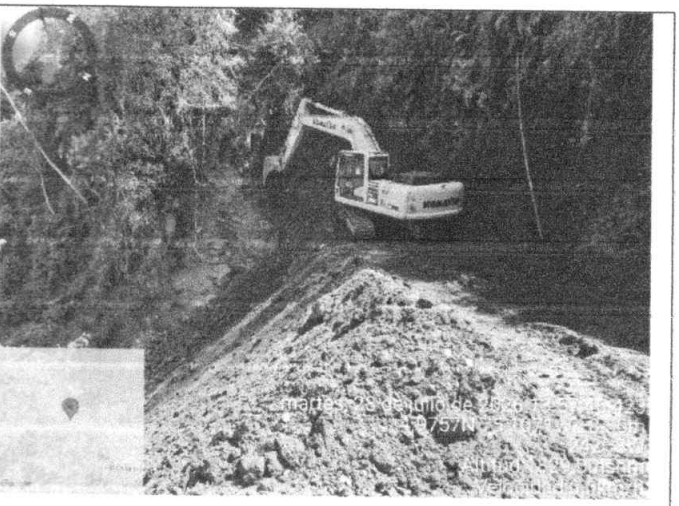

VILLAHERMOSA



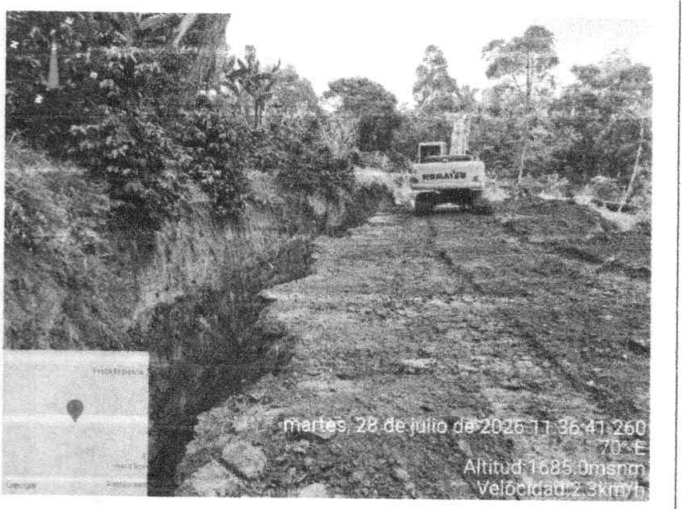

VILLAHERMOSA


UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA





VILLAHERMOSA



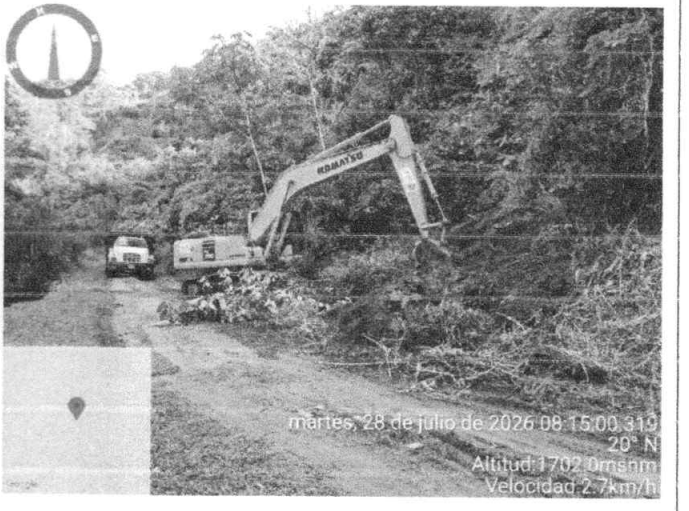

VILLAHERMOSA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA





VILLAHERMOSA






VILLAHERMOSA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



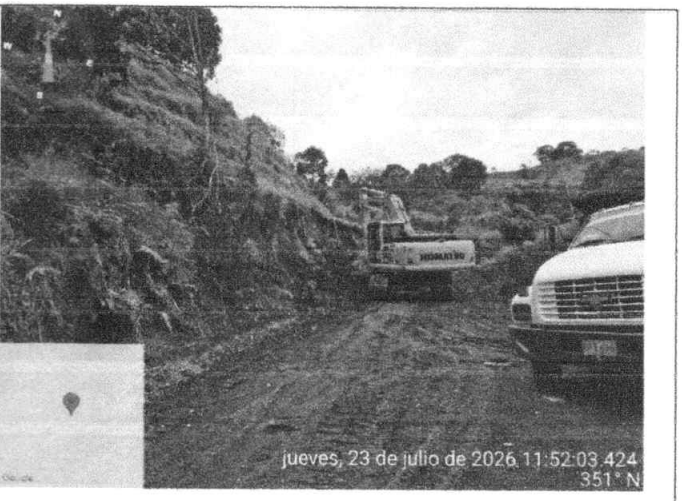

VILLAHERMOSA





VILLAHERMOSA

Diana Gallego

DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS
SUPERVISORA DE CAMPO

6898

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CARRETERA: PRIMAVERA BAJA-EL AGRADO — MUNICIPIO: VILLAHERMOSA

MEJORAMIENTO DE LA VÍA CON MATERIAL DE LA ZONA — UNIDAD: M3 — 203

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN	OBSERVACIONES
01/07/2026	K0+000	K0+416	06, 13	7	4	28	Se laboro Normalmente.
02/07/2026	K0+416	K0+832	06, 13	7	5	35	Se laboro Normalmente.
03/07/2026	K0+832	K1+248	06, 13	7	4	28	Se laboro Normalmente.
06/07/2026	K1+248	K1+664	06, 13	7	6	42	Se laboro Normalmente.
07/07/2026	K1+664	K2+080	06, 13	7	6	42	Se laboro Normalmente.
08/07/2026	K2+080	K2+500	06, 13	7	4	28	Se laboro Normalmente.
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VÍA						203	
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VÍA CON MATERIAL DE LA ZONA						203	

Vo.Bo. Supervisora contrato 3034 DE 2026

Firma: Diana Gallego

Nombre: Diana Gallego

c.c. 38.210.237

Vo.Bo. Coordinador contrato 3034 DE 2026

Firma:

Nombre: Jeison Giovanni Alvis Lozano

c.c. 1.110.512.907

6899

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACION DEL TOLIMA

CARRETERA: PRIMAVERA BAJA-EL AGRADO — **MUNICIPIO: VILLAHERMOSA**

CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR — **UNIDAD: M2** — **12.500**

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONGITUD	ANCHO	AREA	OBSERVACIONES
01/07/2026	K0+000	K0+416	416	5	2.080	Se laboro Normalmente.
02/07/2026	K0+416	K0+832	416	5	2.080	Se laboro Normalmente.
03/07/2026	K0+832	K1+248	416	5	2.080	Se laboro Normalmente.
06/07/2026	K1+248	K1+664	416	5	2.080	Se laboro Normalmente.
07/07/2026	K1+664	K2+080	416	5	2.080	Se laboro Normalmente.
08/07/2026	K2+080	K2+500	420	5	2.100	Se laboro Normalmente.
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA					**12.500**	
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR					**12.500**	

Vo.Bo. Supervisora contrato 3034 DE 2026

Firma: Diana Gallego
Nombre: Diana Gallego
c.c. 38.210.237

Vo.Bo. Coordinador contrato 3034 DE 2026

Firma:
Nombre: Jeison Giovanni Alvis Lozano
c.c. 1.110.512.907

6400

VERSION 1	GOB-M-009	
	CONTRATO NO.3034 DE 2026	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA	GOBERNACION DEL TOLIMA
	INFORME DIARIO-TURNO	

CARRETERA: PRIMAVERA BAJA-EL AGRADO — **MUNICIPIO: VILLAHERMOSA**

CONFORMACION DE CUNETAS — **UNIDAD: ML** — **2.500**

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONGITUD	N° CARRILES	LONGITUD TOTAL	OBSERVACIONES
01/07/2026	K0+000	K0+416	416	1	416	Se laboro Normalmente.
02/07/2026	K0+416	K0+832	416	1	416	Se laboro Normalmente.
03/07/2026	K0+832	K1+248	416	1	416	Se laboro Normalmente.
06/07/2026	K1+248	K1+664	416	1	416	Se laboro Normalmente.
07/07/2026	K1+664	K2+080	416	1	416	Se laboro Normalmente.
08/07/2026	K2+080	K2+500	420	1	420	Se laboro Normalmente.
TOTAL CUNETA					**2.500**	
TOTAL CONFORMACION DE CUNETAS					**2.500**	

Vo.Bo. Supervisora contrato 3034 DE 2026

Firma: Diana Gallego
Nombre: Diana Gallego
c.c. 38.210.237

Vo.Bo. Coordinador contrato 3034 DE 2026

Firma:
Nombre: Jeison Giovanni Alvis Lozano
c.c. 1.110.512.907

6901

VERSION 1	GOB-M-009	
	CONTRATO NO.3034 DE 2026	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
	INFORME DIARIO-TURNO	

CARRETERA: SAN FERNANDO-LA AURORA-LA GUAIRA — MUNICIPIO: LÍBANO

CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR — UNIDAD: M2 — 19.000

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONGITUD	ANCHO	AREA	OBSERVACIONES
01/07/2026	K0+000	K0+200	200	5	1.000	Se laboro Normalmente.
02/07/2026	K0+200	K0+400	200	5	1.000	Se laboro Normalmente.
03/07/2026	K0+400	K0+600	200	5	1.000	Se laboro Normalmente.
06/07/2026	K0+600	K0+800	200	5	1.000	Se laboro Normalmente.
07/07/2026	K0+800	K1+000	200	5	1.000	Se laboro Normalmente.
08/07/2026	K1+000	K1+200	200	5	1.000	Se laboro Normalmente.
09/07/2026	K1+200	K1+400	200	5	1.000	Se laboro Normalmente.
10/07/2026	K1+400	K1+600	200	5	1.000	Se laboro Normalmente.
15/07/2026	K1+600	K1+800	200	5	1.000	Se laboro Normalmente.
16/07/2026	K1+800	K2+000	200	5	1.000	Se laboro Normalmente.
17/07/2026	K2+000	K2+200	200	5	1.000	Se laboro Normalmente.
21/07/2026	K2+200	K2+400	200	5	1.000	Se laboro Normalmente.
22/07/2026	K2+400	K2+600	200	5	1.000	Se laboro Normalmente.
23/07/2026	K2+600	K2+800	200	5	1.000	Se laboro Normalmente.
24/07/2026	K2+800	K3+000	200	5	1.000	Se laboro Normalmente.
27/07/2026	K3+000	K3+200	200	5	1.000	Se laboro Normalmente.
28/07/2026	K3+200	K3+400	200	5	1.000	Se laboro Normalmente.
29/07/2026	K3+400	K3+600	200	5	1.000	Se laboro Normalmente.
30/07/2026	K3+600	K3+800	200	5	1.000	Se laboro Normalmente.
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA					19.000	
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR					19.000	

Vo.Bo. Supervisora contrato 3034 DE 2026

Firma: Diana Gallego
Nombre: Diana Gallego
c.c. 38.210.237

Vo.Bo. Coordinador contrato 3034 DE 2026

Firma:
Nombre: Jeison Giovanni Alvis Lozano
c.c. 1.110.512.907

6902

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CARRETERA: VEREDAS VILLAHERMOSA | **MUNICIPIO: VILLAHERMOSA**

REMOCIÓN DE MATERIAL EN LA VÍA | **UNIDAD: M3** | **1.600**

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONG	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	OBSERVACIONES
01/07/2026	VEREDAS VILLAHERMOSA		20	4	1	80	Se laboro Normalmente.
02/07/2026			20	4	1	80	Se laboro Normalmente.
03/07/2026			30	3	1	90	Se laboro Normalmente.
06/07/2026			30	4	1	120	Se laboro Normalmente.
07/07/2026			30	4	1	120	Se laboro Normalmente.
08/07/2026			30	4	1	120	Se laboro Normalmente.
15/07/2026			30	3	1	90	Se laboro Normalmente.
16/07/2026			30	3	1	90	Se laboro Normalmente.
17/07/2026			30	3	1	90	Se laboro Normalmente.
21/07/2026			30	3	1	90	Se laboro Normalmente.
22/07/2026			30	3	1	90	Se laboro Normalmente.
23/07/2026			30	3	1	90	Se laboro Normalmente.
24/07/2026			30	3	1	90	Se laboro Normalmente.
27/07/2026			30	3	1	90	Se laboro Normalmente.
28/07/2026			30	3	1	90	Se laboro Normalmente.
29/07/2026			30	3	1	90	Se laboro Normalmente.
30/07/2026			30	3	1	90	Se laboro Normalmente.
REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VIA						**1.600**	
TOTAL REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VIA						**1.600**	

Vo.Bo. Supervisora contrato 3034 DE 2026
Firma: Diana Gallego
Nombre: Diana Gallego
c.c. 38.210.237

Vo.Bo. Coordinador contrato 3034 DE 2026
Firma:
Nombre: Jeison Giovanni Alvis Lozano
c.c. 1.110.512.907

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 7

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

ACTAS DE COMUNIDAD

FRENTE DE TRABAJO LÍBANO

JULIO 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOB-M-007C
CONTRATO 3034 DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

6903

AUTORIZACIÓN PARA RESGUARDO DE LA MAQUINARIA

Yo, Eusebio Salgado, con Cédula de Ciudadanía N° 93.293.275, Por medio del presente documento, y en calidad de _____, del predio _____ de la vereda _____, del municipio Urbano autorizo al Ingeniero (a) Jeison G. Ariza L. quien en representación del contrato 3034 de Abril de 2026 la (UNIÓN TEMPORAL MARV 7), cuyo objeto es "CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA". Para estacionar y resguardar la maquinaria del mantenimiento de las vías como son:

Volqueta # 49,
Retroexcavadora # 5,
Motoniveladora _____,
Cargador _____,
Vibrocompactador _____,
Excavadora _____,

Con el compromiso de velar por el buen estado y la seguridad de los mismos durante la permanencia en el predio y no permitir el acceso o manipulación de la maquinaria a personal ajeno y/o sin autorización únicamente del Ingeniero Supervisor.

Esta autorización se expide para la Ejecución del contrato 3034 de 2026 y así mismo declaro la posesión del predio para emitir la presente autorización.

Firma Administrador o Propietario
C.C. No.

Pdte. Junta de acción Comunal (testigo)
C.C. No. 93.293.275

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 7

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

PREOPERACIONALES EQUIPO

FRENTE DE TRABAJO LÍBANO

JULIO 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

6904

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 01 DE JULIO AL 03 DE JULIO 2026			
CONTRATO	3034 DE 2026	PLACA: OTI 698	MARCA: KODIAK
EQUIPO No.	6	MODELO: 2009	FRENTE DE TRABAJO: VILLAHERMOSA
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		LOCALIZACION: VEREDAS VILLAHERMOSA
Licencia de conduccion:			Póliza de Responsabilidad Civil:
Licencia de transito No.	C2	Última Revisión Tecnicomecanica:	

	HORA INICIO OPERACIÓN					7:00		7:00		7:00						
	KILOMETRAJE INICIAL					118133		118178		118224						
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín					X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto					X		X		X						
	Caja de Herramienta					X		X		X						
	Tacos					X		X		X						
	Gato					X		X		X						
	Linterna recargable					X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina					X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor					X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible					X		X		X						
	Nivel del aceite					X		X		X						
	Soportes motor					X		X		X						
	Estado del exhosto					X		X		X						
	Estado del switche de encendido					X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras					X		X		X						
	De trabajo traseras					X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras					X		X		X						
	Stop Traseros					X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor					X		X		X						
	Espejos laterales					X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso					X		X		X						
	Pito Normal					X		X		X						
	Frenos de Servicio					X		X		X						
	Freno de emergencia					X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).					X		X		X						
	Cinturones de Seguridad					X		X		X						
	Estado de la puertas					X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.					X		X		X						
	Limpia brisas					X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco					X		X		X						
	Estado de los asientos					X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).					X		X		X						
	Velocímetro					X		X		X						
	Batería y cables					X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos					X		X		X						
	Repuesto					X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas					X		X		X						
	Estado de correas					X		X		X						
	Caja de cambios en buen estado.					X		X		X						
	Radiador					X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)					X		X		X						
	Mangueras					X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)					X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco					X		X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco					X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del volco					X		X		X						
	Estado de empaques del volco					X		X		X						
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN					5:00		5:00		5:00						
	KILOMETRAJE FINAL					118178		118224		118269						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	Firma Verificación Inspector:	Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	El Equipo esta apto para Trabajar:	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

6905

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 06 DE JULIO AL 08 DE JULIO 2026			
CONTRATO	3034 DE 2026	PLACA: OTI 698	MARCA: KODIAK
EQUIPO No.	6	MODELO: 2009	FRENTE DE TRABAJO: VILLAHERMOSA
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		LOCALIZACION: VEREDAS VILLAHERMOSA
Licencia de conduccion:			Póliza de Responsabilidad Civil:
Licencia de transito No.	C2	Última Revisión Tecnicomecanica:	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00											
	KILOMETRAJE INICIAL	118269		118314		118360											
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES	
ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M		
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X											
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X											
	Caja de Herramienta	X		X		X											
	Tacos	X		X		X											
	Gato	X		X		X											
	Lintema recargable	X		X		X											
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X											
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X											
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X											
	Nivel del aceite	X		X		X											
	Soportes motor	X		X		X											
	Estado del exhosto	X		X		X											
	Estado del switche de encendido	X		X		X											
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X											
	De trabajo traseras	X		X		X											
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X											
	Stop Traseros	X		X		X											
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X											
	Espejos laterales	X		X		X											
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X											
	Pito Normal	X		X		X											
	Frenos de Servicio	X		X		X											
	Freno de emergencia	X		X		X											
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X											
	Cinturones de Seguridad	X		X		X											
	Estado de la puertas	X		X		X											
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X											
	Limpia Brisas	X		X		X											
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X											
	Estado de los asientos	X		X		X											
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X											
	Velocímetro	X		X		X											
	Batería y cables	X		X		X											
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X											
	Repuesto	X		X		X											
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X											
	Estado de correas	X		X		X											
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X											
	Radiador	X		X		X											
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X											
	Mangueras	X		X		X											
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X											
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X											
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X											
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X											
	Estado de empaques del volco	X		X		X											
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00											
	KILOMETRAJE FINAL	118314		118360		118405											

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		Firma Verificación Inspector: Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	El Equipo esta apto para Trabajar:	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

6906

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 15 DE JULIO AL 17 DE JULIO 2026			
CONTRATO	3034 DE 2026	PLACA: OTI 698	MARCA: KODIAK
EQUIPO No.	6	MODELO: 2009	FRENTE DE TRABAJO: VILLAHERMOSA
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		LOCALIZACION: VEREDAS VILLAHERMOSA
Licencia de conduccion:			Póliza de Responsabilidad Civil:
Licencia de transito No.	C2	Última Revisión Tecnicomecanica:	

	HORA INICIO OPERACIÓN					7:00		7:00		7:00						
	KILOMETRAJE INICIAL					118405		118450		118496						
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín					X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto					X		X		X						
	Caja de Herramienta					X		X		X						
	Tacos					X		X		X						
	Gato					X		X		X						
	Linterna recargable					X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina					X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor					X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible					X		X		X						
	Nivel del aceite					X		X		X						
	Soportes motor					X		X		X						
	Estado del exhosto					X		X		X						
	Estado del switche de encendido					X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras					X		X		X						
	De trabajo traseras					X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras					X		X		X						
	Stop Traseros					X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor					X		X		X						
	Espejos laterales					X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso					X		X		X						
	Pito Normal					X		X		X						
	Frenos de Servicio					X		X		X						
	Freno de emergencia					X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).					X		X		X						
	Cinturones de Seguridad					X		X		X						
	Estado de la puertas					X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.					X		X		X						
	Limpia brisas					X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco					X		X		X						
	Estado de los asientos					X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).					X		X		X						
	Velocímetro					X		X		X						
	Batería y cables					X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos					X		X		X						
	Repuesto					X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas					X		X		X						
	Estado de correas					X		X		X						
	Caja de cambios en buen estado.					X		X		X						
	Radiador					X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)					X		X		X						
	Mangueras					X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)					X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco					X		X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco					X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del volco					X		X		X						
	Estado de empaques del volco					X		X		X						
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN					5:00		5:00		5:00						
	KILOMETRAJE FINAL					118450		118496		118541						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	Firma Verificación Inspector:	
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	El Equipo esta apto para Trabajar:	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

6907

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 21 DE JULIO AL 24 DE JULIO 2026

CONTRATO	3034 DE 2026	PLACA: OTI 698	MARCA: KODIAK
EQUIPO No.	6	MODELO: 2009	FRENTE DE TRABAJO: VILLAHERMOSA
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		LOCALIZACION: VEREDAS VILLAHERMOSA
Licencia de conduccion:			Póliza de Responsabilidad Civil:
Licencia de transito No.	C2	Última Revisión Tecnicomecanica:	

	HORA INICIO OPERACIÓN			7:00		7:00		7:00		7:00						
	KILOMETRAJE INICIAL			118541		118586		118632		118677						
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín			X		X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto			X		X		X		X						
	Caja de Herramienta			X		X		X		X						
	Tacos			X		X		X		X						
	Gato			X		X		X		X						
	Lintema recargable			X		X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina			X		X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor			X		X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible			X		X		X		X						
	Nivel del aceite			X		X		X		X						
	Soportes motor			X		X		X		X						
	Estado del exhosto			X		X		X		X						
	Estado del switche de encendido			X		X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras			X		X		X		X						
	De trabajo traseras			X		X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras			X		X		X		X						
	Stop Traseros			X		X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor			X		X		X		X						
	Espejos laterales			X		X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso			X		X		X		X						
	Pito Normal			X		X		X		X						
	Frenos de Servicio			X		X		X		X						
	Freno de emergencia			X		X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).			X		X		X		X						
	Cinturones de Seguridad			X		X		X		X						
	Estado de la puertas			X		X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.			X		X		X		X						
	Limpia brisas			X		X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco			X		X		X		X						
	Estado de los asientos			X		X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).			X		X		X		X						
	Velocímetro			X		X		X		X						
	Batería y cables			X		X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos			X		X		X		X						
	Repuesto			X		X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas			X		X		X		X						
	Estado de correas			X		X		X		X						
	Caja de cambios en buen estado.			X		X		X		X						
	Radiador			X		X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)			X		X		X		X						
	Mangueras			X		X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)			X		X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco			X		X		X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco			X		X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del volco			X		X		X		X						
	Estado de empaques del volco			X		X		X		X						
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN			5:00		5:00		5:00		5:00						
	KILOMETRAJE FINAL			118586		118632		118677		118722						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	Firma Verificación Inspector:	Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	El Equipo esta apto para Trabajar:	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

6908

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACION DEL TOLIMA

PERIODO: 27 DE JULIO AL 30 DE JULIO 2026

CONTRATO	3034 DE 2026	**PLACA:** OTI 698	**MARCA:** KODIAK
EQUIPO No.	6	**MODELO:** 2009	**FRENTE DE TRABAJO:** VILLAHERMOSA
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		**LOCALIZACION:** VEREDAS VILLAHERMOSA
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00								
	KILOMETRAJE INICIAL	118723		118768		118814		118859								
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X								
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X								
	Caja de Herramienta	X		X		X		X								
	Tacos	X		X		X		X								
	Gato	X		X		X		X								
	Linterna recargable	X		X		X		X								
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X								
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X								
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X								
	Nivel del aceite	X		X		X		X								
	Soportes motor	X		X		X		X								
	Estado del exhosto	X		X		X		X								
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X								
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X								
	De trabajo traseras	X		X		X		X								
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X								
	Stop Traseros	X		X		X		X								
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X								
	Espejos laterales	X		X		X		X								
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X								
	Pito Normal	X		X		X		X								
	Frenos de Servicio	X		X		X		X								
	Freno de emergencia	X		X		X		X								
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X								
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X								
	Estado de la puertas	X		X		X		X								
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X								
	Limpia brisas	X		X		X		X								
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X								
	Estado de los asientos	X		X		X		X								
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X								
	Velocímetro	X		X		X		X								
	Batería y cables	X		X		X		X								
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X								
	Repuesto	X		X		X		X								
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X								
	Estado de correas	X		X		X		X								
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X								
	Radiador	X		X		X		X								
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X								
	Mangueras	X		X		X		X								
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X								
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X								
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X								
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X								
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X								
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00								
	KILOMETRAJE FINAL	118768		118814		118859		118905								

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

6909

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 01 DE JULIO AL 03 DE JULIO 2026

CONTRATO	3034 DE 2026	**PLACA: OTE 026**	**MARCA:** KODIAK
EQUIPO No.	13	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: VILLAHERMOSA**
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		**LOCALIZACION: VEREDAS VILLAHERMOSA**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN					7:00		7:00		7:00						
	KILOMETRAJE INICIAL					171743		171812		171880						
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín					X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto					X		X		X						
	Caja de Herramienta					X		X		X						
	Tacos					X		X		X						
	Gato					X		X		X						
	Linterna recargable					X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina					X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor					X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible					X		X		X						
	Nivel del aceite					X		X		X						
	Soportes motor					X		X		X						
	Estado del exhosto					X		X		X						
	Estado del switche de encendido					X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras					X		X		X						
	De trabajo traseras					X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras					X		X		X						
	Stop Traseros					X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor					X		X		X						
	Espejos laterales					X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso					X		X		X						
	Pito Normal					X		X		X						
	Frenos de Servicio					X		X		X						
	Freno de emergencia					X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).					X		X		X						
	Cinturones de Seguridad					X		X		X						
	Estado de la puertas					X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.					X		X		X						
	Limpia brisas					X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco					X		X		X						
	Estado de los asientos					X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).					X		X		X						
	Velocímetro					X		X		X						
	Batería y cables					X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos					X		X		X						
	Repuesto					X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas					X		X		X						
	Estado de correas					X		X		X						
	Caja de cambios en buen estado.					X		X		X						
	Radiador					X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)					X		X		X						
	Mangueras					X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)					X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco					X		X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco					X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del volco					X		X		X						
	Estado de empaques del volco					X		X		X						
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN					5:00		5:00		5:00						
	KILOMETRAJE FINAL					171812		171880		171949						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: DUVERNEY-21	**El Equipo esta apto para Trabajar**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

6910

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 06 DE JULIO AL 08 DE JULIO 2026

CONTRATO	3034 DE 2026	**PLACA: OTE 026**	**MARCA:** KODIAK
EQUIPO No.	13	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: VILLAHERMOSA**
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		**LOCALIZACION: VEREDAS VILLAHERMOSA**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00										
	KILOMETRAJE INICIAL	171949		172018		172086										
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X										
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X										
	Caja de Herramienta	X		X		X										
	Tacos	X		X		X										
	Gato	X		X		X										
	Linterna recargable	X		X		X										
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X										
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X										
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X										
	Nivel del aceite	X		X		X										
	Soportes motor	X		X		X										
	Estado del exhosto	X		X		X										
	Estado del switche de encendido	X		X		X										
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X										
	De trabajo traseras	X		X		X										
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X										
	Stop Traseros	X		X		X										
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X										
	Espejos laterales	X		X		X										
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X										
	Pito Normal	X		X		X										
	Frenos de Servicio	X		X		X										
	Freno de emergencia	X		X		X										
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X										
	Cinturones de Seguridad	X		X		X										
	Estado de la puertas	X		X		X										
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X										
	Limpia brisas	X		X		X										
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X										
	Estado de los asientos	X		X		X										
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X										
	Velocímetro	X		X		X										
	Batería y cables	X		X		X										
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X										
	Repuesto	X		X		X										
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X										
	Estado de correas	X		X		X										
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X										
	Radiador	X		X		X										
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X										
	Mangueras	X		X		X										
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X										
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X										
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X										
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X										
	Estado de empaques del volco	X		X		X										
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00										
	KILOMETRAJE FINAL	172018		172086		172155										

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: QUINTERO A.	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

6911

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 27 DE JULIO AL 30 DE JULIO 2026

CONTRATO	3034 DE 2026	**PLACA:** OTE 026	**MARCA:** KODIAK
EQUIPO No.	13	**MODELO:** 2009	**FRENTE DE TRABAJO:** VILLAHERMOSA
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		**LOCALIZACION:** VEREDAS VILLAHERMOSA
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00								
	KILOMETRAJE INICIAL	172155		172224		172292		172361								
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X								
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X								
	Caja de Herramienta	X		X		X		X								
	Tacos	X		X		X		X								
	Gato	X		X		X		X								
	Linterna recargable	X		X		X		X								
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X								
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X								
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X								
	Nivel del aceite	X		X		X		X								
	Soportes motor	X		X		X		X								
	Estado del exhosto	X		X		X		X								
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X								
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X								
	De trabajo traseras	X		X		X		X								
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X								
	Stop Traseros	X		X		X		X								
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X								
	Espejos laterales	X		X		X		X								
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X								
	Pito Normal	X		X		X		X								
	Frenos de Servicio	X		X		X		X								
	Freno de emergencia	X		X		X		X								
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X								
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X								
	Estado de la puertas	X		X		X		X								
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X								
	Limpia brisas	X		X		X		X								
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X								
	Estado de los asientos	X		X		X		X								
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X								
	Velocímetro	X		X		X		X								
	Batería y cables	X		X		X		X								
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X								
	Repuesto	X		X		X		X								
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X								
	Estado de correas	X		X		X		X								
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X								
	Radiador	X		X		X		X								
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X								
	Mangueras	X		X		X		X								
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X								
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X								
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X								
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X								
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X								
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00								
	KILOMETRAJE FINAL	172224		172292		172361		172428								

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:** Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: J. J. VERNET. A	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

6912

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACION DEL TOLIMA

PERIODO: 01 DE JULIO AL 03 DE JULIO 2026

CONTRATO	3034 DE 2026	**PLACA: PXS 695**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	49	**MODELO: 2026**	**FRENTE DE TRABAJO: LÍBANO**
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		**LOCALIZACION: SAN FERNANDO-LA AURORA-LA GUAIRA**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN					7:00		7:00		7:00						
	KILOMETRAJE INICIAL					6736		6766		6797						
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín					X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto					X		X		X						
	Caja de Herramienta					X		X		X						
	Tacos					X		X		X						
	Gato					X		X		X						
	Linterna recargable					X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina					X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor					X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible					X		X		X						
	Nivel del aceite					X		X		X						
	Soportes motor					X		X		X						
	Estado del exhosto					X		X		X						
	Estado del switche de encendido					X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras					X		X		X						
	De trabajo traseras					X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras					X		X		X						
	Stop Traseros					X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor					X		X		X						
	Espejos laterales					X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso					X		X		X						
	Pito Normal					X		X		X						
	Frenos de Servicio					X		X		X						
	Freno de emergencia					X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).					X		X		X						
	Cinturones de Seguridad					X		X		X						
	Estado de la puertas					X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.					X		X		X						
	Limpia brisas					X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco					X		X		X						
	Estado de los asientos					X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).					X		X		X						
	Velocímetro					X		X		X						
	Batería y cables					X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos					X		X		X						
	Repuesto					X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas					X		X		X						
	Estado de correas					X		X		X						
	Caja de cambios en buen estado.					X		X		X						
	Radiador					X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)					X		X		X						
	Mangueras					X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)					X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco					X		X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco					X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del volco					X		X		X						
	Estado de empaques del volco					X		X		X						
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN					5:00		5:00		5:00						
	KILOMETRAJE FINAL					6766		6797		6827						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI (X) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

G913

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 06 DE JULIO AL 10 DE JULIO 2026			
CONTRATO	3034 DE 2026	PLACA: PXS 695	MARCA: INTERNATIONAL
EQUIPO No.	49	MODELO: 2026	FRENTE DE TRABAJO: LÍBANO
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		LOCALIZACION: SAN FERNANDO-LA AURORA-LA GUAIRA
Licencia de conduccion:			Póliza de Responsabilidad Civil:
Licencia de transito No.	C2	Última Revisión Tecnicomecanica:	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00						
	KILOMETRAJE INICIAL	6827		6857		6888		6918		6948						
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X						
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X						
	Tacos	X		X		X		X		X						
	Gato	X		X		X		X		X						
	Linterna recargable	X		X		X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X						
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X						
	Soportes motor	X		X		X		X		X						
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X						
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X						
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X						
	Stop Traseros	X		X		X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X						
	Espejos laterales	X		X		X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X						
	Pito Normal	X		X		X		X		X						
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X						
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X						
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X						
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Limpia brisas	X		X		X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X						
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X						
	Velocímetro	X		X		X		X		X						
	Batería y cables	X		X		X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X						
	Repuesto	X		X		X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X						
	Estado de correas	X		X		X		X		X						
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Radiador	X		X		X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X						
	Mangueras	X		X		X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X						
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X						
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00		5:00						
	KILOMETRAJE FINAL	6857		6888		6918		6948		6978						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	Firma Verificación Inspector:	Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	El Equipo esta apto para Trabajar:	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

6914

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACION DEL TOLIMA

PERIODO: 15 DE JULIO AL 17 DE JULIO 2026			
CONTRATO	3034 DE 2026	PLACA: PXS 695	MARCA: INTERNATIONAL
EQUIPO No.	49	MODELO: 2026	FRENTE DE TRABAJO: LÍBANO
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		LOCALIZACION: SAN FERNANDO-LA AURORA-LA GUAIRA
Licencia de conduccion:			Póliza de Responsabilidad Civil:
Licencia de transito No.	C2	Última Revisión Tecnicomecanica:	

	HORA INICIO OPERACIÓN					7:00		7:00		7:00						
	KILOMETRAJE INICIAL					6978		7008		7039						
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín					X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto					X		X		X						
	Caja de Herramienta					X		X		X						
	Tacos					X		X		X						
	Gato					X		X		X						
	Linterna recargable					X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina					X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor					X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible					X		X		X						
	Nivel del aceite					X		X		X						
	Soportes motor					X		X		X						
	Estado del exhosto					X		X		X						
	Estado del switche de encendido					X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras					X		X		X						
	De trabajo traseras					X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras					X		X		X						
	Stop Traseros					X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor					X		X		X						
	Espejos laterales					X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso					X		X		X						
	Pito Normal					X		X		X						
	Frenos de Servicio					X		X		X						
	Freno de emergencia					X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).					X		X		X						
	Cinturones de Seguridad					X		X		X						
	Estado de la puertas					X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.					X		X		X						
	Limpia brisas					X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco					X		X		X						
	Estado de los asientos					X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).					X		X		X						
	Velocímetro					X		X		X						
	Batería y cables					X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos					X		X		X						
	Repuesto					X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas					X		X		X						
	Estado de correas					X		X		X						
	Caja de cambios en buen estado.					X		X		X						
	Radiador					X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)					X		X		X						
	Mangueras					X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)					X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco					X		X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco					X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del volco					X		X		X						
	Estado de empaques del volco					X		X		X						
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN					5:00		5:00		5:00						
	KILOMETRAJE FINAL					7008		7039		7069						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	Firma Verificación Inspector:	Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	El Equipo esta apto para Trabajar:	SI (X) NO ( )
		FIRMA COORDINADOR	

6915

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 21 DE JULIO AL 24 DE JULIO 2026			
CONTRATO	3034 DE 2026	PLACA: PXS 695	MARCA: INTERNATIONAL
EQUIPO No.	49	MODELO: 2026	FRENTE DE TRABAJO: LÍBANO
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		LOCALIZACION: SAN FERNANDO-LA AURORA-LA GUAIRA
Licencia de conduccion:			Póliza de Responsabilidad Civil:
Licencia de transito No.	C2	Última Revisión Tecnicomecanica:	

	HORA INICIO OPERACIÓN			7:00		7:00		7:00		7:00						
	KILOMETRAJE INICIAL			7069		7099		7130		7160						
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín			X		X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto			X		X		X		X						
	Caja de Herramienta			X		X		X		X						
	Tacos			X		X		X		X						
	Gato			X		X		X		X						
	Linterna recargable			X		X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina			X		X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor			X		X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible			X		X		X		X						
	Nivel del aceite			X		X		X		X						
	Soportes motor			X		X		X		X						
	Estado del exhosto			X		X		X		X						
	Estado del switche de encendido			X		X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras			X		X		X		X						
	De trabajo traseras			X		X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras			X		X		X		X						
	Stop Traseros			X		X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor			X		X		X		X						
	Espejos laterales			X		X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso			X		X		X		X						
	Pito Normal			X		X		X		X						
	Frenos de Servicio			X		X		X		X						
	Freno de emergencia			X		X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).			X		X		X		X						
	Cinturones de Seguridad			X		X		X		X						
	Estado de la puertas			X		X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.			X		X		X		X						
	Limpia brisas			X		X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco			X		X		X		X						
	Estado de los asientos			X		X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).			X		X		X		X						
	Velocímetro			X		X		X		X						
	Batería y cables			X		X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos			X		X		X		X						
	Repuesto			X		X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas			X		X		X		X						
	Estado de correas			X		X		X		X						
	Caja de cambios en buen estado.			X		X		X		X						
	Radiador			X		X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)			X		X		X		X						
	Mangueras			X		X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)			X		X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco			X		X		X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco			X		X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del volco			X		X		X		X						
	Estado de empaques del volco			X		X		X		X						
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN			5:00		5:00		5:00		5:00						
	KILOMETRAJE FINAL			7099		7130		7160		7190						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	Firma Verificación Inspector:	Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	El Equipo esta apto para Trabajar:	SI ( ) NO ( )
			FIRMA COORDINADOR

6916

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 27 DE JULIO AL 30 DE JULIO 2026			
CONTRATO	3034 DE 2026	PLACA: PXS 695	MARCA: INTERNATIONAL
EQUIPO No.	49	MODELO: 2026	FRENTE DE TRABAJO: LÍBANO
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		LOCALIZACION: SAN FERNANDO-LA AURORA-LA GUAIRA
Licencia de conduccion:			Póliza de Responsabilidad Civil:
Licencia de transito No.	C2	Última Revisión Tecnicomecanica:	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00								
	KILOMETRAJE INICIAL	7190		7220		7251		7281								
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X								
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X								
	Caja de Herramienta	X		X		X		X								
	Tacos	X		X		X		X								
	Gato	X		X		X		X								
	Linterna recargable	X		X		X		X								
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X								
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X								
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X								
	Nivel del aceite	X		X		X		X								
	Soportes motor	X		X		X		X								
	Estado del exhosto	X		X		X		X								
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X								
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X								
	De trabajo traseras	X		X		X		X								
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X								
	Stop Traseros	X		X		X		X								
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X								
	Espejos laterales	X		X		X		X								
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X								
	Pito Normal	X		X		X		X								
	Frenos de Servicio	X		X		X		X								
	Freno de emergencia	X		X		X		X								
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X								
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X								
	Estado de la puertas	X		X		X		X								
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X								
	Limpia brisas	X		X		X		X								
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X								
	Estado de los asientos	X		X		X		X								
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X								
	Velocímetro	X		X		X		X								
	Batería y cables	X		X		X		X								
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X								
	Repuesto	X		X		X		X								
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X								
	Estado de correas	X		X		X		X								
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X								
	Radiador	X		X		X		X								
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X								
	Mangueras	X		X		X		X								
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X								
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X								
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X								
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X								
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X								
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00								
	KILOMETRAJE FINAL	7220		7251		7281		7311								

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS	Firma Verificación Inspector:	Diana Gallego
	Afiliación ARP		
Operador	Firma:	El Equipo esta apto para Trabajar:	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

6417

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 | MODELO: | MOTO NUEVA #1 | MARCA: | NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO | LOCALIZACION: | PRIMAVERA BAJA-EL AGRADO | FRENTE DE TRABAJO: | VILLAHERMOSA

PERIODO: 01 DE JULIO AL 03 DE JULIO 2026 | FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL					1270		1276		1283					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2					X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2					X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2					X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2					X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2					X		X		X					
	* De trabajo traseras	2					X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1					X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1					X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1					X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1					X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos					X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1					X		X		X					
	Alarma de retroceso	1					X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2					X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1					X		X		X					
	Palancas de mando	2					X		X		X					
	Pedales	Todos					X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo					X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos					X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos						X		X		X				
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2					X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1						X		X		X				
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas					X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas					X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1					X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2						X		X		X				
	Mandos de levante del brazo	2						X		X		X				
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos					X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo					X		X		X					
	Sistema de Dirección	1					X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas						X		X		X					
	* Huellas en buen estado	4					X		X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL						1276		1283		1289					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:						Diana.		Diana.		Diana.					
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

6418

VERSION 1		GSST-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA	

CONTRATO N° 3034 DE 2026 MODELO: MOTO NUEVA #1 MARCA: NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO LOCALIZACION: PRIMAVERA BAJA-EL AGRADO FRENTE DE TRABAJO: VILLAHERMOSA

PERIODO: 06 DE JULIO AL 08 DE JULIO 2026 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	1289		1295		1302									
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X									
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X									
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X									
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X									
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X									
	* De trabajo traseras	2	X		X		X									
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X									
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X									
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X									
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X									
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X									
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X									
	Alarma de retroceso	1	X		X		X									
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X									
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X									
	Palancas de mando	2	X		X		X									
	Pedales	Todos	X		X		X									
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X									
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X									
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X		X								
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X									
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X								
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X									
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X									
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X									
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X		X								
	Mandos de levante del brazo	2		X		X		X								
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X									
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X									
	Sistema de Dirección	1	X		X		X									
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X									
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X									
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		1295		1302		1308									
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

6914

SECRETARÍA DE INFRAEST TURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG140B

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG140B	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)			1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026		
	HOROMETRO			1270	1276	1283		
Cada 10 horas o diariamente	Estado fisico de neumaticos - Revisar			✓	✓	✓		
	Estado fisico de hoja y extremos - Revisar			✓	✓	✓		
	Mangueras sistema de refrigeración - Revisar			✓	✓	✓		
	Estado fisico del Tandem - Revisar			✓	✓	✓		
	Estado fisico del cirulo - Revisar			✓	✓	✓		
	Mangueras sistema hidraulico - Revisar			✓	✓	✓		
	Posibles fugas en el motor - Revisar			✓	✓	✓		
	Sistema electrico (cables y conexiones) - Revisar			✓	✓	✓		
	Componentes sueltos - Revisar			✓	✓	✓		
	Puntos de lubricación - Revisar			✓	✓	✓		
	Nivel de aceite de motor (carter) - Revisar			✓	✓	✓		
	Nivel de liquido de refrigeracion (radiador) - Revisar			✓	✓	✓		
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar			✓	✓	✓		
	Nivel de aceite hidraulico (tanque hidraulico) - Revisar			✓	✓	✓		
	Drenaje filtro de combustible (filtro separador de agua) - Revisar			✓	✓	✓		
	Rotulas del cilindro de elevación de la cuchilla - Lubricar			✓	✓	✓		
	Rotulas del cilindro de desplazamiento lateral de la cuchilla - Lubricar			✓	✓	✓		
	Rotula de la barra de tracción - Lubricar			✓	✓	✓		
	Rotulas de la articulación - Lubricar			✓	✓	✓		
	Extremidades de los cilindros de la articulación - Lubricar			✓	✓	✓		
	Sustitución de agua y lavado de radiador - Revisar			✓	✓	✓		
	Limpieza de filtro de aire / Cambiar de ser necesario (testigo panel)			✓	✓	✓		
	Verificar freno de estacionamiento			✓	✓	✓		
	Verificar tuerca del cubo del eje tandem			✓	✓	✓		
	Verificar tuercas de apriete de la rueda del eje tandem			✓	✓	✓		

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG140B

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

6920

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG140B	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)			1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026		
	HOROMETRO			1270	1276	1283		
Cada 10 horas o diariamente	Verificar presion de neumaticos			✓	✓	✓		
	Verificar y ajustar guias del circulo			✓	✓	✓		
	Verificar y ajustar tuercas de la esfera de la barra del portacirculo			✓	✓	✓		
	Vertificar y limpiar baterias lado izquierdo y derecho / Cambiar de ser necesario			✓	✓	✓		
	Verificación y ajuste de presiones (hidraulica, direccion, acumulador de freno, frenos elevacion de cuchilla			✓	✓	✓		
	Verificar y ajustar convergencia de ruedas delanteras			✓	✓	✓		
	Sistema de frenos - Revisar			✓	✓	✓		
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓		
	Alarma de reversa - Revisar			✓	✓	✓		
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓		
	Pedales - Revisar / Limpiar			✓	✓	✓		
	Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)			✓	✓	✓		
	Limpiaparabrisas - Revisar			✓	✓	✓		
	Vidrio de ventanas - Limpiar			✓	✓	✓		
	Cableado electrico - Revisar			✓	✓	✓		
	Espejos - Revisar			✓	✓	✓		
	Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)			✓	✓	✓		
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar			✓	✓	✓		
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓		

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre ENRIQUE OLIS

Diana Gallego

FIRMA SUPERVISOR
Nombre: DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

6921

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG140B

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG140B	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026				
	HOROMETRO	1289	1295	1302				
Cada 10 horas o diariamente	Estado fisico de neumaticos - Revisar	✓	✓	✓				
	Estado fisico de hoja y extremos - Revisar	✓	✓	✓				
	Mangueras sistema de refrigeración - Revisar	✓	✓	✓				
	Estado fisico del Tandem - Revisar	✓	✓	✓				
	Estado fisico del cirulo - Revisar	✓	✓	✓				
	Mangueras sistema hidraulico - Revisar	✓	✓	✓				
	Posibles fugas en el motor - Revisar	✓	✓	✓				
	Sistema electrico (cables y conexiones) - Revisar	✓	✓	✓				
	Componentes sueltos - Revisar	✓	✓	✓				
	Puntos de lubricación - Revisar	✓	✓	✓				
	Nivel de aceite de motor (carter) - Revisar	✓	✓	✓				
	Nivel de liquido de refrigeracion (radiador) - Revisar	✓	✓	✓				
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar	✓	✓	✓				
	Nivel de aceite hidraulico (tanque hidraulico) - Revisar	✓	✓	✓				
	Drenaje filtro de combustible (filtro separador de agua) - Revisar	✓	✓	✓				
	Rotulas del cilindro de elevación de la cuchilla - Lubricar	✓	✓	✓				
	Rotulas del cilindro de desplazamiento lateral de la cuchilla - Lubricar	✓	✓	✓				
	Rotula de la barra de tracción - Lubricar	✓	✓	✓				
	Rotulas de la articulación - Lubricar	✓	✓	✓				
	Extremidades de los cilindros de la articulación - Lubricar	✓	✓	✓				
	Sustitución de agua y lavado de radiador - Revisar	✓	✓	✓				
	Limpieza de filtro de aire / Cambiar de ser necesario (testigo panel)	✓	✓	✓				
	Verificar freno de estacionamiento	✓	✓	✓				
	Verificar tuerca del cubo del eje tandem	✓	✓	✓				
	Verificar tuercas de apriete de la rueda del eje tandem	✓	✓	✓				

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG140B

VERSION 1
PAGINA 1 DE 2

G922

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG140B	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026				
	HOROMETRO	1289	1295	1302				
Cada 10 horas o diariamente	Verificar presion de neumaticos	✓	✓	✓				
	Verificar y ajustar guias del circulo	✓	✓	✓				
	Verificar y ajustar tuercas de la esfera de la barra del portacirculo	✓	✓	✓				
	Vertificar y limpiar baterias lado izquierdo y derecho / Cambiar de ser necesario	✓	✓	✓				
	Verificación y ajuste de presiones (hidraulica, direccion, acumulador de freno, frenos elevacion de cuchilla	✓	✓	✓				
	Verificar y ajustar convergencia de ruedas delanteras	✓	✓	✓				
	Sistema de frenos - Revisar	✓	✓	✓				
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓				
	Alarma de reversa - Revisar	✓	✓	✓				
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓				
	Pedales - Revisar / Limpiar	✓	✓	✓				
	Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓				
	Limpiaparabrisas - Revisar	✓	✓	✓				
	Vidrio de ventanas - Limpiar	✓	✓	✓				
	Cableado electrico - Revisar	✓	✓	✓				
	Espejos - Revisar	✓	✓	✓				
	Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓				
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar	✓	✓	✓				
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓				

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre ENRIQUE OLIS

Diana Gallego

FIRMA SUPERVISOR
Nombre: DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

6923

VERSION 1 | M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 | MODELO: | RETRO NUEVA # 5 | MARCA: NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO | LOCALIZACION: SAN FERNANDO-LA AURORA-LA GUA | FRENTE DE TRABAJO: LÍBANO

PERIODO: 01 DE JULIO AL 03 DE JULIO 2026 | FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL					1480		1487		1493					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2					X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2					X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2					X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2					X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2					X		X		X					
	* De trabajo traseras	2					X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1					X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1					X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1					X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1					X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos					X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1					X		X		X					
	Alarma de retroceso	1					X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2					X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1					X		X		X					
	Palancas de mando	2					X		X		X					
	Pedales	Todos					X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo					X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos					X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos					X		X		X					
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2					X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1					X		X		X					
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas					X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas					X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1					X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2					X		X		X					
	Mandos de levante del brazo	2					X		X		X					
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos					X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo					X		X		X					
	Sistema de Dirección	1					X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas						X		X		X					
	* Huellas en buen estado	4					X		X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL						1487		1493		1499					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:						Diego		Diego		Diego					
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:						Diego		Diego		Diego					
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

6924

VERSION 1 | M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 | MODELO: RETRO NUEVA # 5 | MARCA: NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO | LOCALIZACION: SAN FERNANDO-LA AURORA-LA GUA | FRENTE DE TRABAJO: LÍBANO

PERIODO: 06 DE JULIO AL 10 DE JULIO 2026 | FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	1499		1505		1511		1518		1524					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X					
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X					
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X					
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X		X					
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X		X					
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X		X					
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X		X					
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X					
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X					
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		1505		1511		1518		1524		1530					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:		Diana		Diana		Diana		Diana		Diana					
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1 | C[illegible]M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 | MODELO: | RETRO NUEVA # 5 | MARCA: NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO | LOCALIZACION: SAN FERNANDO-LA AURORA-LA GUA | FRENTE DE TRABAJO: LÍBANO

PERIODO: 15 DE JULIO AL 17 DE JULIO 2026 | FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL			1530		1536		1542					
		DIA	LUN.	MAR.	MIER.	JUEV.	VIER.	SAB.	DOM.					
		CANTIDAD	B M	B M	B M	B M	B M	B M	B M	B M	B M	B M	B M	B M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2			X	X	X							
	* De trabajo delanteras	2			X	X	X							
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2			X	X	X							
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2			X	X	X							
	* De stop y señal trasera	2			X	X	X							
	* De trabajo traseras	2			X	X	X							
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1			X	X	X							
	* Cinturón de seguridad	1			X	X	X							
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1			X	X	X							
	Asiento (dispositivo de giro)	1			X	X	X							
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos			X	X	X							
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1			X	X	X							
	Alarma de retroceso	1			X	X	X							
	Escaleras y apoyos de acceso	2			X	X	X							
	Espejos laterales	2												
	* Espejo central convexo	1			X	X	X							
	Palancas de mando	2			X	X	X							
	Pedales	Todos			X	X	X							
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			X	X	X							
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos			X	X	X							
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos			X	X	X							
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2			X	X	X							
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1			X	X	X							
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas			X	X	X							
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas			X	X	X							
	* Freno de emergencia en buen estado	1			X	X	X							
	Estado general (desgarrador/balde)	2			X	X	X							
	Mandos de levante del brazo	2			X	X	X							
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos			X	X	X							
	Compartimiento del motor aseado	Completo			X	X	X							
	Sistema de Dirección	1			X	X	X							
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas				X	X	X							
	* Huellas en buen estado	4			X	X	X							
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL				1536	1542	1549							
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:				Diego	Diego	Diego							
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:				Diogo.	Diogo.	Diogo.							
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

G926

VERSION 1		M-002	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA		

CONTRATO N° 3034 DE 2026 MODELO: RETRO NUEVA # 5 MARCA: NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO LOCALIZACION: SAN FERNANDO-LA AURORA-LA GUA FRENTE DE TRABAJO: LÍBANO

PERIODO: 21 DE JULIO AL 24 DE JULIO 2026 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL			1549		1555		1561		1568					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2			X		X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2			X		X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2			X		X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2			X		X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2			X		X		X		X					
	* De trabajo traseras	2			X		X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1			X		X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1			X		X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1			X		X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1			X		X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos			X		X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1			X		X		X		X					
	Alarma de retroceso	1			X		X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2			X		X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1			X		X		X		X					
	Palancas de mando	2			X		X		X		X					
	Pedales	Todos			X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			X		X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos			X		X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos			X		X		X		X					
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2			X		X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1			X		X		X		X					
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas			X		X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas			X		X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1			X		X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2			X		X		X		X					
	Mandos de levante del brazo	2			X		X		X		X					
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos			X		X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo			X		X		X		X					
	Sistema de Dirección	1			X		X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas				X		X		X		X					
	* Huellas en buen estado	4			X		X		X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL				1555		1561		1568		1574					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:				Campo		Campo		Campo		Campo					
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:				Diana.		Diana.		Diana.		Diana.					
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

6927

VERSION 1		M-002	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA		

CONTRATO N° 3034 DE 2026 **MODELO:** **RETRO NUEVA # 5** **MARCA:** **NEW HOLLAND**

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO **LOCALIZACION:** **SAN FERNANDO-LA AURORA-LA GUA** **FRENTE DE TRABAJO:** **LÍBANO**

PERIODO: 27 DE JULIO AL 30 DE JULIO 2026 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	1574		1580		1586		1593							
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	*** De trabajo delanteras (altas/bajas)**	2	X		X		X		X							
	*** De trabajo delanteras**	2	X		X		X		X							
	*** Direccionales delanteras parqueo/giro**	2	X		X		X		X							
	*** Direccionales traseras de parqueo/giro**	2	X		X		X		X							
	*** De stop y señal trasera**	2	X		X		X		X							
	*** De trabajo traseras**	2	X		X		X		X							
CABINA	*** Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada**	1	X		X		X		X							
	*** Cinturón de seguridad**	1	X		X		X		X							
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X							
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X							
	*** Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite-motor)	Completos	X		X		X		X							
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X							
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X							
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X							
	Espejos laterales	2														
	*** Espejo central convexo**	1	X		X		X		X							
	Palancas de mando	2	X		X		X		X							
	Pedales	Todos	X		X		X		X							
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X							
	*** Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)**	Completos	X		X		X		X							
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X							
	*** Gatos estabilizadores en buen estado**	2	X		X		X		X							
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X							
	*** Función hidráulica en buen funcionamiento**	Completas	X		X		X		X							
	*** Freno de servicio en buen estado**	4 llantas	X		X		X		X							
	*** Freno de emergencia en buen estado**	1	X		X		X		X							
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X							
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X							
	*** Gatos hidráulicos en buen estado**	Todos	X		X		X		X							
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X							
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X							
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X							
	*** Huellas en buen estado**	4	X		X		X		X							
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		1580		1586		1593		1599							
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:		Diana.		Diana.		Diana.		Diana.							
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)			1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026		
	HOROMETRO			1480	1487	1493		
Cada 10 horas o diariamente	Freno de servicio - Revisar			✓	✓	✓		
	Frreno de estacionamiento - Revisar			✓	✓	✓		
	Fusibles y bombillas - Revisar			✓	✓	✓		
	Funcionalidad de mandos y luces - Revisar			✓	✓	✓		
	Tension de correa del ventilador / alternador - Revisar			✓	✓	✓		
	Correa de compresor de aire acondicionado - Revisar			✓	✓	✓		
	Nivel de aceite del motor - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓		
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓		
	Nivel de liquido refrigerante - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓		
	Nivel de aceite hidraulico (tanque hidraulico) - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓		
	Nivel de combustible - Revisar			✓	✓	✓		
	Indicador de obstrucción - Revisar			✓	✓	✓		
	Filtro de aire - Limpiar (De ser necesario)			✓	✓	✓		
	Puntos de engrase - Lubricar			✓	✓	✓		
	Drenaje filtro de combustible (filtro separador de agua) - Revisar			✓	✓	✓		
	Filtro de aire de motor - Revisar (Cambiar)			✓	✓	✓		
	Cartucho de seguridad - Revisar (Cambiar			✓	✓	✓		
	Presion de neumaticos - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓		
	Condensador sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓		
	Filtro de polen - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓		
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓		
	Nivel de electrolito de bateria - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓		
	Soporte del eje trasero - Revisar / Ajustar			✓	✓	✓		
	Dientes del balde - Revisar (Cambiar)			✓	✓	✓		
	Holgura del balde - Revisar (Ajustar)			✓	✓	✓		

6929

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)			1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026		
	HOROMETRO			1480	1487	1493		
Cada 10 horas o diariamente	Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)			✓	✓	✓		
	Pedales - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓		
	Sistema de frenos - Revisar			✓	✓	✓		
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓		
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓		
	Condensador de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓		
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓		
	Cinturon de seguridad - Revisar			✓	✓	✓		
	Espejos - Revisar			✓	✓	✓		
	Alarma de reversa - Revisar			✓	✓	✓		
	Vidrio de ventanas - Limpiar			✓	✓	✓		
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar			✓	✓	✓		
	Cableado electrico - Revisar			✓	✓	✓		
	Limpiaparabrisas - Revisar			✓	✓	✓		
	Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)			✓	✓	✓		

OBSERVACIONES:

Jose Aled Ocampo
FIRMA DE OPERADOR
Nombre: JOSE ALED OCAMPO

Diana Gallego
FIRMA SUPERVISOR
Nombre: DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026		
	HOROMETRO	1499	1505	1511	1518	1524		
Cada 10 horas o diariamente	Freno de servicio - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Frreno de estacionamiento - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Fusibles y bombillas - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Funcionalidad de mandos y luces - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Tension de correa del ventilador / alternador - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Correa de compresor de aire acondicionado - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite del motor - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de liquido refrigerante - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite hidraulico (tanque hidraulico) - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de combustible - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Indicador de obstrucción - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Filtro de aire - Limpiar (De ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Puntos de engrase - Lubricar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Drenaje filtro de combustible (filtro separador de agua) - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Filtro de aire de motor - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Cartucho de seguridad - Revisar (Cambiar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Presion de neumaticos - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Condensador sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Filtro de polen - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de electrolito de bateria - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Soporte del eje trasero - Revisar / Ajustar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Dientes del balde - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Holgura del balde - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓	✓		

6931

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026		
	HOROMETRO	1499	1505	1511	1518	1524		
Cada 10 horas o diariamente	Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Pedales - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Sistema de frenos - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Condensador de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Cinturon de seguridad - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Espejos - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Alarma de reversa - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Vidrio de ventanas - Limpiar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Cableado electrico - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Limpiaparabrisas - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓	✓		

OBSERVACIONES:

José Aled Ocampo
FIRMA DE OPERADOR
Nombre: JOSE ALED OCAMPO

Diana Gallego
FIRMA SUPERVISOR
Nombre: DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

G932

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)			15/07/2026	16/07/2026	17/07/2026		
	HOROMETRO			1530	1536	1542		
Cada 10 horas o diariamente	Freno de servicio - Revisar			✓	✓	✓		
	Frreno de estacionamiento - Revisar			✓	✓	✓		
	Fusibles y bombillas - Revisar			✓	✓	✓		
	Funcionalidad de mandos y luces - Revisar			✓	✓	✓		
	Tension de correa del ventilador / alternador - Revisar			✓	✓	✓		
	Correa de compresor de aire acondicionado - Revisar			✓	✓	✓		
	Nivel de aceite del motor - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓		
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓		
	Nivel de liquido refrigerante - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓		
	Nivel de aceite hidraulico (tanque hidraulico) - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓		
	Nivel de combustible - Revisar			✓	✓	✓		
	Indicador de obstrucción - Revisar			✓	✓	✓		
	Filtro de aire - Limpiar (De ser necesario)			✓	✓	✓		
	Puntos de engrase - Lubricar			✓	✓	✓		
	Drenaje filtro de combustible (filtro separador de agua) - Revisar			✓	✓	✓		
	Filtro de aire de motor - Revisar (Cambiar)			✓	✓	✓		
	Cartucho de seguridad - Revisar (Cambiar			✓	✓	✓		
	Presion de neumaticos - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓		
	Condensador sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓		
	Filtro de polen - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓		
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓		
	Nivel de electrolito de bateria - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓		
	Soporte del eje trasero - Revisar / Ajustar			✓	✓	✓		
	Dientes del balde - Revisar (Cambiar)			✓	✓	✓		
	Holgura del balde - Revisar (Ajustar)			✓	✓	✓		

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)			15/07/2026	16/07/2026	17/07/2026		
	HOROMETRO			1530	1536	1542		
Cada 10 horas o diariamente	Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)			✓	✓	✓		
	Pedales - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓		
	Sistema de frenos - Revisar			✓	✓	✓		
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓		
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓		
	Condensador de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓		
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓		
	Cinturon de seguridad - Revisar			✓	✓	✓		
	Espejos - Revisar			✓	✓	✓		
	Alarma de reversa - Revisar			✓	✓	✓		
	Vidrio de ventanas - Limpiar			✓	✓	✓		
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar			✓	✓	✓		
	Cableado electrico - Revisar			✓	✓	✓		
	Limpiaparabrisas - Revisar			✓	✓	✓		
	Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)			✓	✓	✓		

OBSERVACIONES:

José Aled Ocampo
FIRMA DE OPERADOR
Nombre: JOSE ALED OCAMPO

Diana Gallego
FIRMA SUPERVISOR
Nombre: DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

G934

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)		21/07/2026	22/07/2026	23/07/2026	24/07/2026		
	HOROMETRO		1549	1555	1561	1568		
Cada 10 horas o diariamente	Freno de servicio - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Frreno de estacionamiento - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Fusibles y bombillas - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Funcionalidad de mandos y luces - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Tension de correa del ventilador / alternador - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Correa de compresor de aire acondicionado - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite del motor - Revisar / Nivelar		✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar		✓	✓	✓	✓		
	Nivel de liquido refrigerante - Revisar / Nivelar		✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite hidraulico (tanque hidraulico) - Revisar / Nivelar		✓	✓	✓	✓		
	Nivel de combustible - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Indicador de obstrucción - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Filtro de aire - Limpiar (De ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Puntos de engrase - Lubricar		✓	✓	✓	✓		
	Drenaje filtro de combustible (filtro separador de agua) - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Filtro de aire de motor - Revisar (Cambiar)		✓	✓	✓	✓		
	Cartucho de seguridad - Revisar (Cambiar		✓	✓	✓	✓		
	Presion de neumaticos - Revisar / Nivelar		✓	✓	✓	✓		
	Condensador sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Filtro de polen - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar		✓	✓	✓	✓		
	Nivel de electrolito de bateria - Revisar / Nivelar		✓	✓	✓	✓		
	Soporte del eje trasero - Revisar / Ajustar		✓	✓	✓	✓		
	Dientes del balde - Revisar (Cambiar)		✓	✓	✓	✓		
	Holgura del balde - Revisar (Ajustar)		✓	✓	✓	✓		

6935

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)		21/07/2026	22/07/2026	23/07/2026	24/07/2026		
	HOROMETRO		1549	1555	1561	1568		
Cada 10 horas o diariamente	Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)		✓	✓	✓	✓		
	Pedales - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Sistema de frenos - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Condensador de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Cinturon de seguridad - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Espejos - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Alarma de reversa - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Vidrio de ventanas - Limpiar		✓	✓	✓	✓		
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Cableado electrico - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Limpiaparabrisas - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)		✓	✓	✓	✓		

OBSERVACIONES:

Jose Aled Ocampo
FIRMA DE OPERADOR
Nombre: JOSE ALED OCAMPO

Diana Gallego
FIRMA SUPERVISOR
Nombre: DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

6936

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	27/07/2026	28/07/2026	29/07/2026	30/07/2026			
	HOROMETRO	1574	1580	1586	1593			
Cada 10 horas o diariamente	Freno de servicio - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Frreno de estacionamiento - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Fusibles y bombillas - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Funcionalidad de mandos y luces - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Tension de correa del ventilador / alternador - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Correa de compresor de aire acondicionado - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de aceite del motor - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de liquido refrigerante - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de aceite hidraulico (tanque hidraulico) - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de combustible - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Indicador de obstrucción - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Filtro de aire - Limpiar (De ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Puntos de engrase - Lubricar	✓	✓	✓	✓			
	Drenaje filtro de combustible (filtro separador de agua) - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Filtro de aire de motor - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓	✓			
	Cartucho de seguridad - Revisar (Cambiar	✓	✓	✓	✓			
	Presion de neumaticos - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓			
	Condensador sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Filtro de polen - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de electrolito de bateria - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓			
	Soporte del eje trasero - Revisar / Ajustar	✓	✓	✓	✓			
	Dientes del balde - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓	✓			
	Holgura del balde - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	27/07/2026	28/07/2026	29/07/2026	30/07/2026			
	HOROMETRO	1574	1580	1586	1593			
Cada 10 horas o diariamente	Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓			
	Pedales - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Sistema de frenos - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Condensador de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Cinturon de seguridad - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Espejos - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Alarma de reversa - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Vidrio de ventanas - Limpiar	✓	✓	✓	✓			
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Cableado electrico - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Limpiaparabrisas - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓			

OBSERVACIONES:

José Aled Ocampo
FIRMA DE OPERADOR
Nombre: JOSE ALED OCAMPO

Diana Gallego
FIRMA SUPERVISOR
Nombre: DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 MODELO: RETRO. DE ORUGA 5 MARCA: KOMAT'SU

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO LOCALIZACION: VEREDAS VILLAHERMOSA FRENTE DE TRABAJO: VILLAHERMOSA

PERIODO: 01 DE JULIO AL 03 DE JULIO 2026 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL					1332		1339		1346					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2					X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2					X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2					X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2					X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2					X		X		X					
	* De trabajo traseras	2					X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1					X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1					X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1					X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1					X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos					X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1					X		X		X					
	Alarma de retroceso	1					X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2					X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1					X		X		X					
	Palancas de mando	2					X		X		X					
	Pedales	Todos					X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo					X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos					X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos						X		X		X				
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2					X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1						X		X		X				
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas					X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas					X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1					X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2						X		X		X				
	Mandos de levante del brazo	2						X		X		X				
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos					X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo					X		X		X					
	Sistema de Dirección	1					X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas							X		X		X				
	* Huellas en buen estado	4						X		X		X				
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL						1339		1346		1353					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:						Diana G.		Diana G.		Diana G.					
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

6934

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 MODELO: RETRO. DE ORUGA 5 MARCA: KOMAT'SU

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO LOCALIZACION: VEREDAS VILLAHERMOSA FRENTE DE TRABAJO: VILLAHERMOSA

PERIODO: 06 DE JULIO AL 08 DE JULIO 2026 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	1353		1360		1367									
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X									
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X									
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X									
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X									
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X									
	* De trabajo traseras	2	X		X		X									
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X									
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X									
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X									
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X									
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X									
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X									
	Alarma de retroceso	1	X		X		X									
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X									
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X									
	Palancas de mando	2	X		X		X									
	Pedales	Todos	X		X		X									
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X									
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X									
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X		X								
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X									
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X								
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X									
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X									
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X									
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X		X								
	Mandos de levante del brazo	2		X		X		X								
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X									
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X									
	Sistema de Dirección	1	X		X		X									
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas			X		X		X								
	* Huellas en buen estado	4		X		X		X								
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		1360		1367		1374									
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 MODELO: RETRO. DE ORUGA 5 MARCA: KOMAT'SU

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO LOCALIZACION: VEREDAS VILLAHERMOSA FRENTE DE TRABAJO: VILLAHERMOSA

PERIODO: 15 DE JULIO AL 17 DE JULIO 2026 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL					1374		1381		1388					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2					X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2					X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2					X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2					X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2					X		X		X					
	* De trabajo traseras	2					X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1					X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1					X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1					X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1					X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos					X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1					X		X		X					
	Alarma de retroceso	1					X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2					X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1					X		X		X					
	Palancas de mando	2					X		X		X					
	Pedales	Todos					X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo					X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos					X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos						X		X		X				
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2					X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1						X		X		X				
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas					X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas					X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1					X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2						X		X		X				
	Mandos de levante del brazo	2						X		X		X				
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos					X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo					X		X		X					
	Sistema de Dirección	1					X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas							X		X		X				
	* Huellas en buen estado	4						X		X		X				
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL						1381		1388		1395					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:						Diana G.		Diana G.		Diana G.					
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-002	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA	

CONTRATO N° 3034 DE 2026 MODELO: RETRO. DE ORUGA 5 MARCA: KOMAT'SU

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO LOCALIZACION: VEREDAS VILLAHERMOSA FRENTE DE TRABAJO: VILLAHERMOSA

PERIODO: 21 DE JULIO AL 24 DE JULIO 2026 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL			1395		1402		1409		1416					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2			X		X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2			X		X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2			X		X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2			X		X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2			X		X		X		X					
	* De trabajo traseras	2			X		X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1			X		X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1			X		X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1			X		X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1			X		X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos			X		X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1			X		X		X		X					
	Alarma de retroceso	1			X		X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2			X		X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1			X		X		X		X					
	Palancas de mando	2			X		X		X		X					
	Pedales	Todos			X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			X		X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos			X		X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos				X		X		X		X				
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2			X		X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1				X		X		X		X				
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas			X		X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas			X		X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1			X		X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2				X		X		X		X				
	Mandos de levante del brazo	2				X		X		X		X				
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos			X		X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo			X		X		X		X					
	Sistema de Dirección	1			X		X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas					X		X		X		X				
	* Huellas en buen estado	4				X		X		X		X				
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL				1402		1409		1416		1423					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:				Diana.		Diana.		Diana.		Diana.					
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 MODELO: RETRO. DE ORUGA 5 MARCA: KOMAT'SU

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO LOCALIZACION: VEREDAS VILLAHERMOSA FRENTE DE TRABAJO: VILLAHERMOSA

PERIODO: 27 DE JULIO AL 30 DE JULIO 2026 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	1423		1430		1437		1444							
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X							
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X							
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X							
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X							
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X							
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X							
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X							
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X							
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X							
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X							
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X							
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X							
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X							
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X							
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X							
	Palancas de mando	2	X		X		X		X							
	Pedales	Todos	X		X		X		X							
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X							
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X							
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X		X		X						
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X							
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X		X						
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X							
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X							
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X							
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X		X		X						
	Mandos de levante del brazo	2		X		X		X		X						
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X							
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X							
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X							
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas			X		X		X		X						
	* Huellas en buen estado	4		X		X		X		X						
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		1430		1437		1444		1452							
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:		Diana		Diana		Diana		Diana							
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT GOBERNACIÓN DEL TOLIMA RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA KOMATSU PC 200 - 10M0	VERSION	1
		PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA KOMATSU PC 200 - 10M0	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)			1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026		
	HOROMETRO			1332	1339	1346		
Cada 10 horas o diariamente	Daños, desgaste, holguras o grietas en cilindros, mangueras o conexiones - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Suciedad y residuos en motor, bateria y radiador - Remover			✓	✓	✓		
	Fugas de refrigerante o aceite - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Fugas de combustible - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Fugas de aceite hidraulico y de transmisión - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Daños, desgaste o fugas en el Tren de rodaje - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Estado de pasamanos y escaleras - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar			✓	✓	✓		
	Espejos, reflectores y pernos - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Terminales de la bateria - Revisar (Ajustar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Cinturon de seguridad y abrazaderas - Revisar (Ajustar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Ventana de la cabina - Revisar (Limpiar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Daños en el balde o gancho - Revisar			✓	✓	✓		
	Camara y monitor retrovisor - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Nivel de refrigerante - Revisar (Ajustar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Nivel de combustible - Revisar (Ajustar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Drenar agua y sedimento del tanque de combustible			✓	✓	✓		
	Nivel de aceite de motor - Revisar (Ajustar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Nivel de aceite hidraulico - Revisar (Ajustar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Prefiltro de combustible - Revisar (Drenar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Filtro separador de agua - Revisar (Drenar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Cableado electrico - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Bocina - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Iluminación - Revisar			✓	✓	✓		
	Seguros - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓	✓	✓		

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT GOBERNACIÓN DEL TOLIMA RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA KOMATSU PC 200 - 10M0	VERSION	1
		PAGINA	2 DE 2

6944

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA KOMATSU PC 200 - 10M0	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)			1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026		
	HOROMETRO			1332	1339	1346		
Cada 10 horas o diariamente	Sistema de frenos - Revisar			✓	✓	✓		
	Puntos de lubricación - Lubricar			✓	✓	✓		
	Limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Funcion de desempañado - Revisar (Ajustar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Sistema de refrigeración - Limpiar			✓	✓	✓		
	Filtro de aire - Revisar (Limpiar o cambiar)			✓	✓	✓		
	Valvula de evacuación - Revisar (Cambiar)			✓	✓	✓		
	Pernos de zapatas de origa - Revisar (Ajustar)			✓	✓	✓		
	Tensión de la oruga - Revisar (Ajustar)			✓	✓	✓		
	Dientes del balde - Revisar (Cambiar)			✓	✓	✓		
	Holgura del balde - Revisar (Ajustar)			✓	✓	✓		
	Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)			✓	✓	✓		
	Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)			✓	✓	✓		
	Purgar de aire el circuito hidraulico			✓	✓	✓		
	Purgar de aire los cilindros			✓	✓	✓		
	Purgar de aire el motor de giro			✓	✓	✓		
	Purgar de aire el motor de marcha			✓	✓	✓		
	Amortiguadores de gas - Revisar			✓	✓	✓		
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓		
	Condensador de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓		
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓		
	Funcionamiento del acumulador - Revisar			✓	✓	✓		
	Respiradero del tanque hidraulico - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓		
	Pedales - Limpiar			✓	✓	✓		
	Correa del compresor de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)			✓	✓	✓		
	Alarma de reversa - Revisar			✓	✓	✓		
	Filtro de aire de aire acondicionado -Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓		

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre JHONNY SÁNCHEZ

FIRMA SUPERVISOR
Nombre: DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA KOMATSU PC 200 - 10M0

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA KOMATSU PC 200 - 10M0	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026				
	HOROMETRO	1353	1360	1367				
Cada 10 horas o diariamente	Daños, desgaste, holguras o grietas en cilindros, mangueras o conexiones - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Suciedad y residuos en motor, bateria y radiador - Remover	✓	✓	✓				
	Fugas de refrigerante o aceite - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Fugas de combustible - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Fugas de aceite hidraulico y de transmisión - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Daños, desgaste o fugas en el Tren de rodaje - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Estado de pasamanos y escaleras - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar	✓	✓	✓				
	Espejos, reflectores y pernos - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Terminales de la bateria - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Cinturon de seguridad y abrazaderas - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Ventana de la cabina - Revisar (Limpiar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Daños en el balde o gancho - Revisar	✓	✓	✓				
	Camara y monitor retrovisor - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Nivel de refrigerante - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Nivel de combustible - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Drenar agua y sedimento del tanque de combustible	✓	✓	✓				
	Nivel de aceite de motor - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Nivel de aceite hidraulico - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Prefiltro de combustible - Revisar (Drenar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Filtro separador de agua - Revisar (Drenar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Cableado electrico - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Bocina - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Iluminación - Revisar	✓	✓	✓				
	Seguros - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓				

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA KOMATSU PC 200 - 10M0

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

6946

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA KOMATSU PC 200 - 10M0	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026				
	HOROMETRO	1353	1360	1367				
Cada 10 horas o diariamente	Sistema de frenos - Revisar	✓	✓	✓				
	Puntos de lubricación - Lubricar	✓	✓	✓				
	Limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Funcion de desempañado - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Sistema de refrigeración - Limpiar	✓	✓	✓				
	Filtro de aire - Revisar (Limpiar o cambiar)	✓	✓	✓				
	Valvula de evacuación - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓				
	Pernos de zapatas de origa - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓				
	Tensión de la oruga - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓				
	Dientes del balde - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓				
	Holgura del balde - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓				
	Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓				
	Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓				
	Purgar de aire el circuito hidraulico	✓	✓	✓				
	Purgar de aire los cilindros	✓	✓	✓				
	Purgar de aire el motor de giro	✓	✓	✓				
	Purgar de aire el motor de marcha	✓	✓	✓				
	Amortiguadores de gas - Revisar	✓	✓	✓				
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓				
	Condensador de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓				
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓				
	Funcionamiento del acumulador - Revisar	✓	✓	✓				
	Respiradero del tanque hidraulico - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓				
	Pedales - Limpiar	✓	✓	✓				
	Correa del compresor de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓				
	Alarma de reversa - Revisar	✓	✓	✓				
	Filtro de aire de aire acondicionado -Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓				

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre JHONNY SÁNCHEZ

Diana Gallego

FIRMA SUPERVISOR
Nombre: DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

6947

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT GOBERNACIÓN DEL TOLIMA RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA KOMATSU PC 200 - 10M0	VERSION	1
		PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA KOMATSU PC 200 - 10M0	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)			15/07/2026	16/07/2026	17/07/2026		
	HOROMETRO			1374	1381	1388		
Cada 10 horas o diariamente	Daños, desgaste, holguras o grietas en cilindros, mangueras o conexiones - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Suciedad y residuos en motor, bateria y radiador - Remover			✓	✓	✓		
	Fugas de refrigerante o aceite - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Fugas de combustible - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Fugas de aceite hidraulico y de transmisión - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Daños, desgaste o fugas en el Tren de rodaje - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Estado de pasamanos y escaleras - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar			✓	✓	✓		
	Espejos, reflectores y pernos - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Terminales de la bateria - Revisar (Ajustar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Cinturon de seguridad y abrazaderas - Revisar (Ajustar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Ventana de la cabina - Revisar (Limpiar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Daños en el balde o gancho - Revisar			✓	✓	✓		
	Camara y monitor retrovisor - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Nivel de refrigerante - Revisar (Ajustar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Nivel de combustible - Revisar (Ajustar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Drenar agua y sedimento del tanque de combustible			✓	✓	✓		
	Nivel de aceite de motor - Revisar (Ajustar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Nivel de aceite hidraulico - Revisar (Ajustar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Prefiltro de combustible - Revisar (Drenar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Filtro separador de agua - Revisar (Drenar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Cableado electrico - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Bocina - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Iluminación - Revisar			✓	✓	✓		
	Seguros - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓	✓	✓		

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT GOBERNACIÓN DEL TOLIMA RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA KOMATSU PC 200 - 10M0	VERSION	1
		PAGINA	2 DE 2

6948

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA KOMATSU PC 200 - 10M0	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)			15/07/2026	16/07/2026	17/07/2026		
	HOROMETRO			1374	1381	1388		
Cada 10 horas o diariamente	Sistema de frenos - Revisar			✓	✓	✓		
	Puntos de lubricación - Lubricar			✓	✓	✓		
	Limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Funcion de desempañado - Revisar (Ajustar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Sistema de refrigeración - Limpiar			✓	✓	✓		
	Filtro de aire - Revisar (Limpiar o cambiar)			✓	✓	✓		
	Valvula de evacuación - Revisar (Cambiar)			✓	✓	✓		
	Pernos de zapatas de origa - Revisar (Ajustar)			✓	✓	✓		
	Tensión de la oruga - Revisar (Ajustar)			✓	✓	✓		
	Dientes del balde - Revisar (Cambiar)			✓	✓	✓		
	Holgura del balde - Revisar (Ajustar)			✓	✓	✓		
	Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)			✓	✓	✓		
	Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)			✓	✓	✓		
	Purgar de aire el circuito hidraulico			✓	✓	✓		
	Purgar de aire los cilindros			✓	✓	✓		
	Purgar de aire el motor de giro			✓	✓	✓		
	Purgar de aire el motor de marcha			✓	✓	✓		
	Amortiguadores de gas - Revisar			✓	✓	✓		
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓		
	Condensador de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓		
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓		
	Funcionamiento del acumulador - Revisar			✓	✓	✓		
	Respiradero del tanque hidraulico - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓		
	Pedales - Limpiar			✓	✓	✓		
	Correa del compresor de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)			✓	✓	✓		
	Alarma de reversa - Revisar			✓	✓	✓		
	Filtro de aire de aire acondicionado -Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓		

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre JHONNY SÁNCHEZ

FIRMA SUPERVISOR
Nombre: DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

6449

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT GOBERNACIÓN DEL TOLIMA RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA KOMATSU PC 200 - 10M0	VERSION	1
		PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA KOMATSU PC 200 - 10M0	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)		21/07/2026	22/07/2026	23/07/2026	24/07/2026		
	HOROMETRO		1395	1402	1409	1416		
Cada 10 horas o diariamente	Daños, desgaste, holguras o grietas en cilindros, mangueras o conexiones - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Suciedad y residuos en motor, bateria y radiador - Remover		✓	✓	✓	✓		
	Fugas de refrigerante o aceite - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Fugas de combustible - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Fugas de aceite hidraulico y de transmisión - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Daños, desgaste o fugas en el Tren de rodaje - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Estado de pasamanos y escaleras - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Espejos, reflectores y pernos - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Terminales de la bateria - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Cinturon de seguridad y abrazaderas - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Ventana de la cabina - Revisar (Limpiar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Daños en el balde o gancho - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Camara y monitor retrovisor - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Nivel de refrigerante - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Nivel de combustible - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Drenar agua y sedimento del tanque de combustible		✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite de motor - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite hidraulico - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Prefiltro de combustible - Revisar (Drenar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Filtro separador de agua - Revisar (Drenar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Cableado electrico - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Bocina - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Iluminación - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Seguros - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT GOBERNACIÓN DEL TOLIMA RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA KOMATSU PC 200 - 10M0	VERSION	1
		PAGINA	2 DE 2

6950

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA KOMATSU PC 200 - 10M0	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)		21/07/2026	22/07/2026	23/07/2026	24/07/2026		
	HOROMETRO		1395	1402	1409	1416		
Cada 10 horas o diariamente	Sistema de frenos - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Puntos de lubricación - Lubricar		✓	✓	✓	✓		
	Limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Funcion de desempañado - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Sistema de refrigeración - Limpiar		✓	✓	✓	✓		
	Filtro de aire - Revisar (Limpiar o cambiar)		✓	✓	✓	✓		
	Valvula de evacuación - Revisar (Cambiar)		✓	✓	✓	✓		
	Pernos de zapatas de origa - Revisar (Ajustar)		✓	✓	✓	✓		
	Tensión de la oruga - Revisar (Ajustar)		✓	✓	✓	✓		
	Dientes del balde - Revisar (Cambiar)		✓	✓	✓	✓		
	Holgura del balde - Revisar (Ajustar)		✓	✓	✓	✓		
	Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)		✓	✓	✓	✓		
	Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)		✓	✓	✓	✓		
	Purgar de aire el circuito hidraulico		✓	✓	✓	✓		
	Purgar de aire los cilindros		✓	✓	✓	✓		
	Purgar de aire el motor de giro		✓	✓	✓	✓		
	Purgar de aire el motor de marcha		✓	✓	✓	✓		
	Amortiguadores de gas - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Condensador de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Funcionamiento del acumulador - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Respiradero del tanque hidraulico - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Pedales - Limpiar		✓	✓	✓	✓		
	Correa del compresor de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)		✓	✓	✓	✓		
	Alarma de reversa - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Filtro de aire de aire acondicionado -Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre JHONNY SÁNCHEZ

Diana Gallego
FIRMA SUPERVISOR
Nombre: DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

6951

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT GOBERNACIÓN DEL TOLIMA RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA KOMATSU PC 200 - 10M0	VERSION	1
		PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA KOMATSU PC 200 - 10M0	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	27/07/2026	28/07/2026	29/07/2026	30/07/2026			
	HOROMETRO	1423	1430	1437	1444			
Cada 10 horas o diariamente	Daños, desgaste, holguras o grietas en cilindros, mangueras o conexiones - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Suciedad y residuos en motor, bateria y radiador - Remover	✓	✓	✓	✓			
	Fugas de refrigerante o aceite - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Fugas de combustible - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Fugas de aceite hidraulico y de transmisión - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Daños, desgaste o fugas en el Tren de rodaje - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Estado de pasamanos y escaleras - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Espejos, reflectores y pernos - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Terminales de la bateria - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Cinturon de seguridad y abrazaderas - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Ventana de la cabina - Revisar (Limpiar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Daños en el balde o gancho - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Camara y monitor retrovisor - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de refrigerante - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de combustible - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Drenar agua y sedimento del tanque de combustible	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de aceite de motor - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de aceite hidraulico - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Prefiltro de combustible - Revisar (Drenar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Filtro separador de agua - Revisar (Drenar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Cableado electrico - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Bocina - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Iluminación - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Seguros - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT GOBERNACIÓN DEL TOLIMA RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA KOMATSU PC 200 - 10M0	VERSION	1
		PAGINA	2 DE 2

6952

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA KOMATSU PC 200 - 10M0	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	27/07/2026	28/07/2026	29/07/2026	30/07/2026			
	HOROMETRO	1423	1430	1437	1444			
Cada 10 horas o diariamente	Sistema de frenos - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Puntos de lubricación - Lubricar	✓	✓	✓	✓			
	Limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Funcion de desempañado - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Sistema de refrigeración - Limpiar	✓	✓	✓	✓			
	Filtro de aire - Revisar (Limpiar o cambiar)	✓	✓	✓	✓			
	Valvula de evacuación - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓	✓			
	Pernos de zapatas de origa - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓			
	Tensión de la oruga - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓			
	Dientes del balde - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓	✓			
	Holgura del balde - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓			
	Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓			
	Purgar de aire el circuito hidraulico	✓	✓	✓	✓			
	Purgar de aire los cilindros	✓	✓	✓	✓			
	Purgar de aire el motor de giro	✓	✓	✓	✓			
	Purgar de aire el motor de marcha	✓	✓	✓	✓			
	Amortiguadores de gas - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Condensador de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Funcionamiento del acumulador - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Respiradero del tanque hidraulico - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Pedales - Limpiar	✓	✓	✓	✓			
	Correa del compresor de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓			
	Alarma de reversa - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Filtro de aire de aire acondicionado -Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre JHONNY SÁNCHEZ

Diana Gallego

FIRMA SUPERVISOR
Nombre: DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 7

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

FRENTE DE TRABAJO LÍBANO

JULIO 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

FRENTE LIBANO								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE
5	6-jul-26	14:41:32	135351	**60,725**	$ 728.093,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#1	FRENTE LIBANO
21	14-jul-26	14:51:41	135817	**75,586**	$ 910.055,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#39	FRENTE LIBANO
22	14-jul-26	15:06:36	135818	**183,749**	$ 2.210.684,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#39	FRENTE LIBANO

TOTAL MES	320,060
REMANENTE MES ANTERIOR	35,000
TOTAL ACPM	355,060

CONSUMO MES	302,060
REMANENTE PARA AGOSTO	53,000

64 54

VERSION 1	GOB-M-014	
	CONTRATO NO.3034 DE 2026	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026

MUNICIPIO: LÍBANO VEREDA : SAN FERNANDO-LA AURORA, LA GUAIRA COORDINADOR: JEISON GIOVANNI ALVIS LOZANO

VIA: SAN FERNANDO-LA AURORA, LA GUAIRA

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES		MARTES		MIERCOLES (1)		JUEVES (2)		VIERNES (3)		SABADO (4)		DOMINGO (5)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETROEXCAVADORA	5	JOSE ALED OCAMPO															0,000
2	VOLQUETA	49	JAVIER GUERRERO									35						35,000
																		0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (6)		MARTES (7)		MIERCOLES (8)		JUEVES (9)		VIERNES (10)		SABADO (11)		DOMINGO (12)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETROEXCAVADORA	5	JOSE ALED OCAMPO	27				18										45,000
2	VOLQUETA	49	JAVIER GUERRERO					20,060										20,060
																		0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (13)		MARTES (14)		MIERCOLES (15)		JUEVES (16)		VIERNES (17)		SABADO (18)		DOMINGO (19)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETROEXCAVADORA	5	JOSE ALED OCAMPO					27				25						52,000
2	VOLQUETA	49	JAVIER GUERRERO					30										30,000
																		0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (20)		MARTES (21)		MIERCOLES (22)		JUEVES (23)		VIERNES (24)		SABADO (25)		DOMINGO (26)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETROEXCAVADORA	5	JOSE ALED OCAMPO					25				15						40,000
2	VOLQUETA	49	JAVIER GUERRERO															0,000
																		0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (27)		MARTES (28)		MIERCOLES (29)		JUEVES (30)		VIERNES (31)		SABADO		DOMINGO		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETROEXCAVADORA	5	JOSE ALED OCAMPO			25				25								50,000
2	VOLQUETA	49	JAVIER GUERRERO			30												30,000
																		0,000
																		302,060

OBSERVACIONES: Vienen 35,000 del mes de junio. Remanente 53,000 gls para el mes de agosto.

VoBo COORDINADOR:

6955

FRENTE DE TRABAJO LÍBANO					
MES JULIO 2026					
Maquina	N° Interno	Consumo Mensual ACPM (GL)	Kilometraje/ Horometro Inicial	Kilometraje/Horometro Final	Promedio Consumo (Hr/Km x GL)
RETROEXCAVADORA	5	187,000	1480	1599	1,57
VOLQUETA	49	115,060	6736	7311	0,20
		302,060			

G956

ERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOB-M-012A
CONTRATO 3034 DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Líbano
FECHA : 06/07/2026

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 4210 del 11 de Noviembre del 2025 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 3034 del 09 de Abril de 2026 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Líbano la cantidad de 60,725 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 06 de julio del 2026.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 3034 de 2026.
MARV 7

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

ING. Stephanie Lara Hernández
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

ING. Diana Marcela Gallego Campos
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 135351

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

Agentes Retenedores de IVA A

rt. 437-2 E.T.NExentos De Re

teica Art 86 Acdo 015 De 20

21

DISTRACOM [illegible] IFO

CRA [illegible]

Ibague

TEL:313743[illegible]2c

Fecha remision: 2026/07/06

Vencimiento: 2026/08/05

Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL [illegible]

Contrato: OC 154983

Nit: 800113672

Direccion: CR 3 CL 11 ED GO

Telefono: 2611616

Placa LIBANO

Kilometros: 0

Cedula: 800113672

Hora Ini: 14:41:32

Hora Fin: 14:46:21

Combustible: DIESEL

Volumen: 60.7250

Precio: $11990

Total: $728093

Panel: MFA976

Lad/Man/Pos: 1/1/7

Dispositivo: R8HAND283-04

Empleado: LUISA FERNANDA GA

Emp. Apoyo: MICHAEL ESTEBAN CR

Validado: [illegible]electronico

Entre[illegible]

LIBANO

Recibi:

Nombre:

ERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOB-M-012A
CONTRATO 3034 DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Líbano
FECHA : 14/07/2026

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 3154 del 09 de Julio del 2026 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 3034 del 09 de Abril de 2026 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Líbano la cantidad de 259,335 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 14 de julio del 2026.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 3154 de 2026
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 3034 de 2026.
MARV 7

ING. Stephanie Lara Hernández
Apoyo Supervisor del contrato 3034 de 2026. MARV 7

ING. Diana Marcela Gallego Campos
Apoyo Supervisor del contrato 3034 de 2026. MARV 7

distracom

*COPIA (1)
Remision de Venta
No. REFA 135817
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Agentes Retenedores de IVA A
rt. 437-2 E.T.NExentos De Re
teica Art 86 Acdo 015 De 20
21
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2026/07/14
Vencimiento: 2026/08/13
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: 166691
Nit: 800113672
Direccion: CR 5 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: LIBANO
Kilometros: 0
Cedula: 800113672

Hora Ini: 14:51:41
Hora Fin: 15:05:28

Combustible: DIESEL
Volumen: 75.5860
Precio: $12040
Total: $910055

Panel: MFC499
Lad/Man/Pos: 1/1/1
Dispositivo: RBHAND283-02
Empleado: FRANCY YOMARA ROD

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Libano U#39

distracom

*COPIA (1)
Remision de Venta
No. REFA 135818
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Agentes Retenedores de IVA A
rt. 437-2 E.T.NExentos De Re
teica Art 86 Acdo 015 De 20
21
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2026/07/14
Vencimiento: 2026/08/13
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: 166691
Nit: 800113672
Direccion: CR 5 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: LIBANO
Kilometros: 0
Cedula: 800113672

Hora Ini: 15:06:36
Hora Fin: 15:24:23

Combustible: DIESEL
Volumen: 183.7490
Precio: $12031
Total: $2210684

Panel: MFA976
Lad/Man/Pos: 1/1/7
Dispositivo: RBHAND283-02
Empleado: FRANCY YOMARA ROD

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:
Libano U#39

960

FRENTE VILLAHERMOSA ORUGA								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE
18	14-jul-26	15:28:59	135825	**82,226**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#39	FRENTE VILLAHERMOSA - ORUGA
19	14-jul-26	15:07:20	135821	**82,226**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#39	FRENTE VILLAHERMOSA - ORUGA
20	14-jul-26	15:09:44	135820	**82,226**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#39	FRENTE VILLAHERMOSA - ORUGA
98	25-jul-26	8:43:27	136497	**187,610**	$ 2.257.136,00	ESTACION DISTRACOM	Stephanie Lara 1.110.534.065 Coordinador Trasporto V#6	FRENTE VILLAHERMOSA - ORUGA
99	25-jul-26	8:44:29	136496	**59,660**	$ 717.769,00	ESTACION DISTRACOM	Stephanie Lara 1.110.534.065 Coordinador Trasporto V#6	FRENTE VILLAHERMOSA - ORUGA
100	25-jul-26	8:56:20	136498	**63,306**	$ 761.634,00	ESTACION DISTRACOM	Stephanie Lara 1.110.534.065 Coordinador Trasporto V#6	FRENTE VILLAHERMOSA - ORUGA

TOTAL MES	557,254
REMANENTE MES ANTERIOR	44,190
TOTAL ACPM	601,444

CONSUMO MES	240,000
REMANENTE PARA AGOSTO	361,444

VERSION 1	GOB-M-014	
	CONTRATO NO.3034 DE 2026	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA	GOBERNACION DEL TOLIMA

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026

MUNICIPIO: VILLAHERMOSA VEREDA : VEREDAS VILLAHERMOSA COORDINADOR: JEISON GIOVANNI ALVIS LOZANO

VIA: VEREDAS VILLAHERMOSA

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES		MARTES		MIERCOLES (1)		JUEVES (2)		VIERNES (3)		SABADO (4)		DOMINGO (5)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETRO. DE ORUGA	5	JHONNY SANCHEZ					60										60,000
																		0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (6)		MARTES (7)		MIERCOLES (8)		JUEVES (9)		VIERNES (10)		SABADO (11)		DOMINGO (12)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETRO. DE ORUGA	5	JHONNY SANCHEZ			60												60,000
																		0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (13)		MARTES (14)		MIERCOLES (15)		JUEVES (16)		VIERNES (17)		SABADO (18)		DOMINGO (19)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETRO. DE ORUGA	5	JHONNY SANCHEZ									60						60,000
																		0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (20)		MARTES (21)		MIERCOLES (22)		JUEVES (23)		VIERNES (24)		SABADO (25)		DOMINGO (26)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETRO. DE ORUGA	5	JHONNY SANCHEZ									60						60,000
																		0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (27)		MARTES (28)		MIERCOLES (29)		JUEVES (30)		VIERNES (31)		SABADO		DOMINGO		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETRO. DE ORUGA	5	JHONNY SANCHEZ															0,000
																		0,000
																		240,000

OBSERVACIONES: Vienen 44,190 gls del mes de junio. Remanente 361,444 gls para el mes de agosto.

VoBo COORDINADOR:

FRENTE DE TRABAJO VILLAHERMOSA					
MES JULIO 2026					
Maquina	N° Interno	Consumo Mensual ACPM (GL)	Kilometraje/ Horometro Inicial	Kilometraje/Horometro Final	Promedio Consumo (Hr/Km x GL)
RETRO. DE ORUGA	5	240,000	1332	1452	2,01
		240,000			

ERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOB-M-012A
CONTRATO 3034 DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Villahermosa (Oruga)
FECHA : 14/07/2026

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 3154 del 09 de Julio del 2026 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 3034 del 09 de Abril de 2026 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Villahermosa (Oruga) la cantidad de 246,678 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 14 de julio del 2026.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 3154 de 2026
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 3034 de 2026.
MARV 7

ING. Stephanie Lara Hernández
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

ING. Diana Marcela Gallego Campos
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

6464

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 135820
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Agentes Retenedores de IVA A
rt. 437-2 E.T.NExentos De Re
teica Art 86 Acdo 015 De 20
21
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2026/07/14
Vencimiento: 2026/08/13
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNA
Contrato:
Nit:
Direccion: CR
Telefono: 2611616
Placa: VILLAHER
Kilometros: 0
Cedula: 800113672

Hora Ini: 15:09:44
Hora Fin: 15:26:46

Combustible: DIESEL
Volumen: 82.2260
Precio: $12040
Total: $990000

Panel: MFC49
Lad/Man/Pos: 1/1/1
Dispositivo: RBHAND283-02
Empleado: FRANCY YOMARA ROD

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:
villahermosa vh39

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 135821
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Agentes Retenedores de IVA A
rt. 437-2 E.T.NExentos De Re
teica Art 86 Acdo 015 De 20
21
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2026/07/14
Vencimiento: 2026/08/13
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato:
Nit:
Direccion: CR
Telefono: 2611616
Placa: VILLAHER
Kilometros: 0
Cedula: 800113672

Hora Ini: 15:07:20
Hora Fin: 15:26:57

Combustible: DIESEL
Volumen: 82.2260
Precio: $12040
Total: $990000

Panel: MFC500
Lad/Man/Pos: 1/1/3
Dispositivo: RBHAND283-02
Empleado: FRANCY YOMARA ROD

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:
villahermosa vh39

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 135825
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Agentes Retenedores de IVA A
rt. 437-2 E.T.NExentos De Re
teica Art 86 Acdo 015 De 20
21
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2026/07/14
Vencimiento: 2026/08/13
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNAC
Contrato:
Nit:
Direccion: CR
Telefono:
Placa: VILLAHER
Kilometros: 0
Cedula: 800113672

Hora Ini: 15:28:59
Hora Fin: 15:46:53

Combustible: DIESEL
Volumen: 82.2260
Precio: $12040
Total: $990000

Panel: MFC500
Lad/Man/Pos: 1/1/3
Dispositivo: RBHAND283-02
Empleado: FRANCY YOMARA ROD

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:
villahermosa vh39

GGS

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOB-M-012A
CONTRATO 3034 DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Villahermosa (Oruga)
FECHA : 25/07/2026

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 3154 del 09 de Julio del 2026 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 3034 del 09 de Abril de 2026 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Villahermosa (Oruga) la cantidad de 310,576 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 25 de julio del 2026.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 3154 de 2026
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 3034 de 2026.
MARV 7

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 3154 de 2026
Gobernación del Tolima

ING. Stephanie Lara Hernández
Apoyo Supervisor del contrato 3034 de 2026. MARV 7

ING. Diana Marcela Gallego Campos
Apoyo Supervisor del contrato 3034 de 2026. MARV 7

6466

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 136496
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Agentes Retenedores de IVA A
rt. 437-2 E.T.NExentos De Re
teica Art 86 Acdo 015 De 20
21
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2026/07/25
Vencimiento:	2026/08/24
Naturaleza:	Credito
Cliente	GOBERNACION DEL TOL
Contrato	OC 166691
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	VILLAERM
Kilometros:	0
Hora Ini:	08:44:29
Hora Fin:	08:53:41
Combustible:	DIESEL
Volumen:	59.6600
Precio:	$12031
Total:	$717769
Panel:	MFA976
Lad/Man/Pos:	2/1/8
Dispositivo:	RBHAND283-04
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:
villahermosa vt06

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 136497
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Agentes Retenedores de IVA A
rt. 437-2 E.T.NExentos De Re
teica Art 86 Acdo 015 De 20
21
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2026/07/25
Vencimiento:	2026/08/24
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato	OC 166691
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	VILLAERM
Kilometros:	0
Hora Ini:	08:43:27
Hora Fin:	09:01:24
Combustible:	DIESEL
Volumen:	187.6100
Precio:	$12031
Total:	$2257136
Panel:	MFA976
Lad/Man/Pos:	1/1/7
Dispositivo:	RBHAND283-04
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:
villahermosa vt6
Oruga

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 136498
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Agentes Retenedores de IVA A
rt. 437-2 E.T.NExentos De Re
teica Art 86 Acdo 015 De 20
21
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2026/07/25
Vencimiento:	2026/08/24
Naturaleza:	Credito
Cliente	GOBERNACION DEL TOL
Contrato	OC 166691
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	VILLAERM
Kilometros:	0
Hora Ini:	08:56:20
Hora Fin:	09:03:00
Combustible:	DIESEL
Volumen:	63.3060
Precio:	$12031
Total:	$761634
Panel:	MFA976
Lad/Man/Pos:	2/1/8
Dispositivo:	RBHAND283-04
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:
villahermosa vt6
Oruga

FRENTE VILLAHERMOSA								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE
15	14-jul-26	15:32:33	135827	**206,965**	$ 2.490.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#39	FRENTE VILLAHERMOSA KIT
16	14-jul-26	15:48:24	135828	**18,415**	$ 221.717,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#39	FRENTE VILLAHERMOSA KIT
17	14-jul-26	15:29:47	135824	**82,226**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#39	FRENTE VILLAHERMOSA KIT
45	15-jul-26	13:52:55	135893	**122,183**	$ 1.469.984,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#15	FRENTE VILLAHERMOSA KIT
73	23-jul-26	16:37:49	136376	**18,642**	$ 224.282,00	ESTACION DISTRACOM	Duver Aguirre V#13	FRENTE VILLAHERMOSA KIT
97	25-jul-26	8:23:52	136491	**40,000**	$ 481.600,00	ESTACION DISTRACOM	Camilo Cañon V#6	FRENTE VILLAHERMOSA KIT

TOTAL MES	488,431
REMANENTE MES ANTERIOR	111,000
TOTAL ACPM	599,431

CONSUMO MES	294,431
REMANENTE PARA AGOSTO	305,000

6963

VERSION 1	GOB-M-014	
	CONTRATO NO.3034 DE 2026	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026

MUNICIPIO: VILLAHERMOSA VEREDA : PRIMAVERA BAJA-EL AGRADO COORDINADOR: JEISON GIOVANNI ALVIS LOZANO

VIA: PRIMAVERA BAJA-EL AGRADO

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES		MARTES		MIERCOLES (1)		JUEVES (2)		VIERNES (3)		SABADO (4)		DOMINGO (5)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	VOLQUETA	13	DUVERNEY AGUIRRE							20,789								20,789
2	VOLQUETA	6	CAMILO CAÑON															0,000
3	MOTONIVELADORA	1	ENRIQUE OLIS							45								45,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (6)		MARTES (7)		MIERCOLES (8)		JUEVES (9)		VIERNES (10)		SABADO (11)		DOMINGO (12)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	VOLQUETA	13	DUVERNEY AGUIRRE					30										30,000
2	VOLQUETA	6	CAMILO CAÑON					30										30,000
3	MOTONIVELADORA	1	ENRIQUE OLIS					60										60,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (13)		MARTES (14)		MIERCOLES (15)		JUEVES (16)		VIERNES (17)		SABADO (18)		DOMINGO (19)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	VOLQUETA	13	DUVERNEY AGUIRRE															0,000
2	VOLQUETA	6	CAMILO CAÑON															0,000
3	MOTONIVELADORA	1	ENRIQUE OLIS															0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (20)		MARTES (21)		MIERCOLES (22)		JUEVES (23)		VIERNES (24)		SABADO (25)		DOMINGO (26)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	VOLQUETA	13	DUVERNEY AGUIRRE							18,642								18,642
2	VOLQUETA	6	CAMILO CAÑON											40,000				40,000
3	MOTONIVELADORA	1	ENRIQUE OLIS															0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (27)		MARTES (28)		MIERCOLES (29)		JUEVES (30)		VIERNES (31)		SABADO		DOMINGO		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	VOLQUETA	13	DUVERNEY AGUIRRE							30								30,000
2	VOLQUETA	6	CAMILO CAÑON							20								20,000
3	MOTONIVELADORA	1	ENRIQUE OLIS															0,000
																		294,431

OBSERVACIONES: Vienen 111,000 gls del mes de junio. Remanente 305,000 gls para el mes de agosto.

VoBo COORDINADOR:

FRENTE DE TRABAJO VILLAHERMOSA					
MES JULIO 2026					
Maquina	N° Interno	Consumo Mensual ACPM (GL)	Kilometraje/ Horometro Inicial	Kilometraje/Horometro Final	Promedio Consumo (Hr/Km x GL)
VOLQUETA	13	99,431	171743	172428	0,15
VOLQUETA	6	90,000	118133	118905	0,12
MOTONIVELADORA	1	105,000	1270	1308	2,74
		294,431			

60PD

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOB-M-012A
CONTRATO 3034 DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Villahermosa (Kit)
FECHA : 14/0/2026

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 3154 del 09 de Julio del 2026 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 3034 del 09 de Abril de 2026 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Villahermosa (Kit) la cantidad de 307,606 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 14 de julio del 2026.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 3154 de 2026
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 3034 de 2026.
MARV 7

ING. Stephanie Lara Hernández
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

ING. Diana Marcela Gallego Campos
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 135824
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Agentes Retenedores de IVA A
rt. 437-2 E.T.NExentos De Re
teica Art 86 Acdo 015 De 20
21
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2026/07/14
Vencimiento:	2026/08/13
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 166691
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa	VILLAHER
os:	0
	800113672
Hora Ini:	15:29:47
Hora Fin:	15:46:39
Combustible:	DIESEL
Volumen:	82.2260
Precio:	$12040
Total:	$990000
Panel:	MFC499
Lad/Man/Pos:	1/1/1
Dispositivo:	RBHAND283-02
Empleado:	FRANCY YOMARA ROD
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:
villahermosa vA39

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 135827
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Agentes Retenedores de IVA A
rt. 437-2 E.T.NExentos De Re
teica Art 86 Acdo 015 De 20
21
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2026/07/14
Vencimiento:	2026/08/13
Naturaleza:	Credito
Cliente:	TOL
Contrato:	OC 166691
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	VILLAHER
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora Ini:	15:32:33
Hora Fin:	15:53:10
Combustible:	DIESEL
Volumen:	206.9650
Precio:	$12031
Total:	$2490000
Panel:	MFA976
Lad/Man/Pos:	1/1/
Dispositivo:	RBHAND283-02
Empleado:	FRANCY YOMARA ROD
Validado:	ID Electronico

Entrego

Recibi:

Nombre:
villahermosa vA39

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 135828
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Agentes Retenedores de IVA A
rt. 437-2 E.T.NExentos De Re
teica Art 86 Acdo 015 De 20
21
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2026/07/14
Vencimiento:	2026/08/13
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 166691
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	VILLAHER
Kilometros:	0
Cedula	808113672
Hora Ini:	15:48:24
Hora Fin:	15:53:50
Combustible:	DIESEL
Volumen:	18.4150
Precio:	$12040
Total:	$221717
Panel:	MFC500
Lad/Man/Pos:	1/1/3
Dispositivo:	RBHAND283-02
Empleado:	FRANCY YOMARA ROD
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:
villahermosa vA39

6972

ERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOB-M-012A
CONTRATO 3034 DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Villahermosa (Kit)
FECHA : 15/07/2026

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 3154 del 09 de Julio del 2026 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 3034 del 09 de Abril de 2026 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Villahermosa (Kit) la cantidad de 122,183 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 15 de julio del 2026.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 3154 de 2026
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 3034 de 2026.
MARV 7

ING. Stephanie Lara Hernández
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

ING. Diana Marcela Gallego Campos
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

distracom

*COP A(1)
Remision de Venta
No. REFK 35893
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Agentes Retenedores de IVA A
rt. 437-2 E.T.NExentos De Re
teica Art 86 Acdo 015 De 20
21
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2026/07/15
Vencimiento:	2026/08/14
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACIO DEL TOL
Contrato:	OC 166691
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	VULLAHER
Kilometros:	0
Cedula:	808113672
Hora Ini:	13:52:55
Hora Fin:	14:06:50
Combustible:	DIESEL
Volumen:	122.1830
Precio:	$12031
Total:	$1469984
Panel:	MFA976
Lad/Man/Pos:	1/1/7
Dispositivo:	RBHAND283-02
Empleado:	FRANCY YOMARA ROD
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

6974

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOB-M-012A
CONTRATO 3034 DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Villahermosa (Kit)
FECHA : 23/07/2026

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 3154 del 09 de Julio del 2026 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 3034 del 09 de Abril de 2026 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Villahermosa (Kit) la cantidad de 18,642 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 23 de julio del 2026.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 3154 de 2026
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 3034 de 2026.
MARV 7

ING. Stephanie Lara Hernández
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

Diana Gallego

ING. Diana Marcela Gallego Campos
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

0475

distracom

*CO
Remision de Venta
No. REFK 136376
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Agt. Retenedores de IVA A
rt. 437-2 E.T.NExentos De Re
teica Art 86 Acdo 015 De 20
21
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2026/07/23
Vencimiento: 2026/08/22
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 166691
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: OTI697
Kilometros: 172066
Cedula: 1111452021

Hora Ini: 16:37:49
Hora Fin: 16:49:06

Combustible: DIESEL
Volumen: 18.6420
Precio: $12031
Total: $224282

Panel: MFA976
Lad/Man/Pos: 2/1/8
Dispositivo: RBHAND283-04
Empleado: LUISA FERNANDA GA
Emp. Apoyo: JHONATHAN STIVE RO

Validado: ID Electronico

Entrego:
villahermosa

Recibi:
placa OTI697

Nombre: VAHS
DIVERNEY A

6976

'ERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOB-M-012A
CONTRATO 3034 DE 2026

GOBERNACION DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Villahermosa (Kit)
FECHA : 25/07/2026

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 3154 del 09 de Julio del 2026 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 3034 del 09 de Abril de 2026 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Villahermosa (Kit) la cantidad de 40,000 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 25 de julio del 2026.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 3154 de 2026
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 3034 de 2026.
MARV 7

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 3154 de 2026
Gobernación del Tolima

ING. Stephanie Lara Hernández
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

ING. Diana Marcela Gallego Campos
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

0477

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 136491
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Agentes Retenedores de IVA A
rt. 437-2 E.T.NExentos De Re
teica Art 86 Acdo 015 De 20
21
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
Tel.3137434826

Fecha remision:	2026/07/25
Vencimiento:	2026/08/24
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 166691
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	OTI698
Kilometros:	1186693
Hora Ini:	08:23:52
Hora Fin:	08:32:14
Combustible:	DIESEL
Volumen:	40.0000
Precio:	$12040
Total:	$481600
Panel:	MFC499
Lad/Man/Pos:	1/1/1
Dispositivo:	RBHAND283-04
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Camilo Cañas VH6
VH6 Nombre: 1106615000
VILLALBA MOSA
