ANEXO 8
INFORME DE TOPOGRAFIA

CONSORCIO VIAS IBAGUE
CONTRATO 3158 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA /Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2"

INFORME DE INTERVENTORIA No. 5

COMPONENTE EN TOPOGRAFIA



PERIODO DEL 21 MARZO DEL 2026 AL 20 DE ABRIL DE 2026

Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

380

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETIVO 4
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 4
3.1 Localización general del proyecto 4
3.2 Localización del proyecto 5
3.3 Descripción General 5
3.4 Antecedentes 6
6. LOTE 1 AVANCE DE OBRA 8
6.1 Recorrido De obra 8
6.2 Nivelación Inicial Lote 1 24
6.3 Verificación de niveles de Subrasante Lote 1 28
6.4 Verificación de niveles de Base Lote 1 35
7. LOTE 2 AVANCE DE OBRA 40
7.1 Recorrido De obra 40
7.2 Nivelación Inicial Lote 2 66
7.3 Verificación de niveles de Subrasante Lote 2 71
7.4 Verificación de niveles de rajón Lote 2 77
7.5 Verificación de niveles de Base Lote 2 79
CONCLUSIÓN 87

1. INTRODUCCIÓN

En el marco de ejecución del Contrato de obra N.° 3048 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025, con el objeto de **"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1"** Mediante el cual se da apertura a la Convocatoria Pública con el fin de seleccionar el contratista que ejecute el Contrato que, como resultado, es representado legalmente por el señor ANDRES EDUARDO TRUJIILO ARANGO.

Contrato de obra **N.° 3049 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025**, cuyo objeto es **"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 2"** Mediante el cual se da apertura a la Convocatoria Pública con el fin de seleccionar el contratista que ejecute el Contrato que, como resultado, es representado legalmente por el señor LUIS RICARDO ORTIGOZA GONZALES.

Con el fin de realizar las labores de interventoria del contrato celebrado, mediante convocatoria, El CONSORCIO VIAS IBAGUE mediante contrato **N° 3158 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025** suscrito con la alcaldía de IBAGUÉ, con el objeto de ***CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2"***

Dando cumplimiento a los requisitos establecidos en los términos de referencia se realiza el presente informe, en el cual se evidencia la conformidad de las labores presentadas, como su respectiva revisión, verificación y aprobación de actividades desarrolladas por el Contratista de

Obra; la metodología empleada para la elaboración del control topográfico y así mismo garantizar su óptimo desarrollo.


2. OBJETIVO

Acompañamiento y supervisión en el trabajo de campo por parte del Contratista, toda vez que se verificará y se llevará control de cada una de las actividades realizadas por este mismo, haciendo respetar todas las condiciones de diseño para su óptimo desarrollo.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.1 Localización general del proyecto

El proyecto de la referencia está localizado en los denominados tramo 1 y 2 distribuidos por todas las comunas de la ciudad de Ibagué. En la figura se presenta la localización de las diferentes comunas a intervenir.

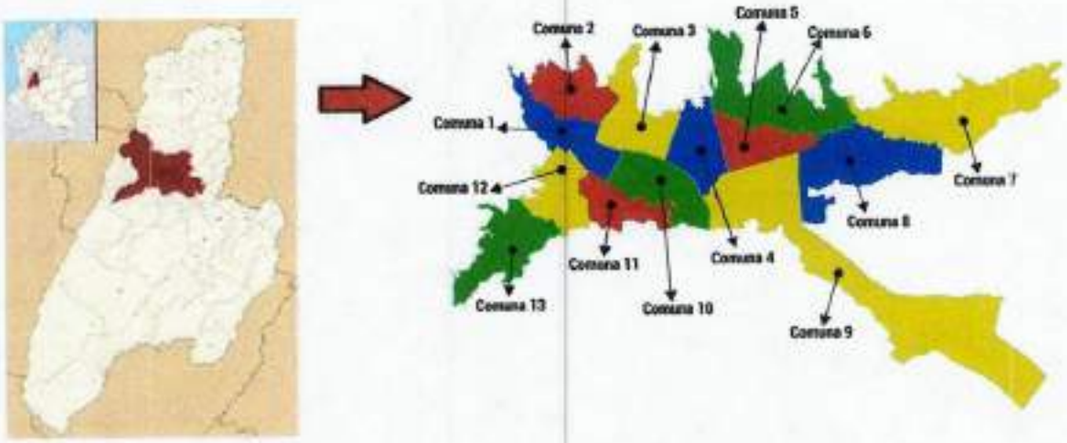

Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

383

3.2 Localización del proyecto

La intervención del proyecto se realizará con el fin de intervenir y mejorar las vías urbanas del municipio y como meta de producto específicamente la *rehabilitación de la malla vial*, enunciado lo anterior se planea la recuperación del pavimento en las diferentes comunas del casco urbano del municipio de Ibagué.



3.3 Descripción General

El desarrollo del proyecto resulta fundamental, en razón a que la infraestructura vial presenta un avanzado estado de deterioro, evidenciado por desgaste superficial, fisuración de placas, presencia de huecos y pérdida de continuidad estructural de las losas, producto de cortes y demoliciones parciales en los tramos con pavimento rígido. Asimismo, en las vías con pavimento flexible se identifican patologías tales como

envejecimiento del asfalto, bacheo recurrente y asentamientos diferenciales.

Las fallas que motivan la intervención y mejoramiento de la vía obedecen principalmente a la acción repetitiva de las cargas vehiculares, a la influencia de condiciones climáticas adversas, a las deficiencias generadas durante las intervenciones para la reposición de redes de servicios públicos ejecutadas tanto por empresas operadoras como por particulares, así como a otros factores técnicos que han incidido en la degradación progresiva de la capacidad estructural y funcional del pavimento.

3.4 Antecedentes

INFORMACIÓN BÁSICA	
ENTIDAD CONTRATANTE:	Alcaldía Municipal de Ibagué
OBJETO DE PROYECTO:	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2"
INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAS IBAGUE
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°:	3158 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA:	LISETH MARYORI NIEVES HERRERA
CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN N°:	3048 de 07 de noviembre de 2025 3049 del 07 de noviembre de 2025
PERIODO REPORTADO:	Del 21 de marzo del 2026 al 20 de abril de 2026

LOTE 1

6. LOTE 1 AVANCE DE OBRA

Durante el desarrollo del cada proceso constructivo dentro del proyecto se realiza el adecuado acompañamiento por parte de la interventoría **CONSORCIO VIAS IBAGUE** al contratista de obra, donde Las actividades diarias son controladas y verificadas por parte de la interventoría.

Conforme a las cantidades ejecutadas por el Contratista, la interventoría ha revisado las cantidades con base en los lineamientos fijados contractualmente.

Finalmente se ha realizado el correcto seguimiento al avance de las obras y se reporta en el presente informe con un avance de obra relacionado a continuación.

6.1 Recorrido De obra

En primera instancia se desarrollan las actividades de reconocimiento del proyecto, Las vías que se pretenden intervenir dentro de este lote se ubican distribuidas en las diferentes comunas del municipio de Ibagué, las cuales se encuentran asociadas al desarrollo económico del mismo y al bienestar de la comunidad.

Para esto se realiza el recorrido de obra por parte de la interventoría, recolectando información sustancial cómo parte inicial y reconocimiento del lugar de trabajo. Con el desarrollo del proyecto pretende optimizar la movilidad del casco urbano, mejorar la calidad de vida de la comunidad creando estructuras de pavimentos funcionales y seguros.

Las siguientes vías están involucradas en el desarrollo del proyecto:

BARRIO CEIBA NORTE

✓ **CALLE 138 ENTRE CARRERA 8 Y 8ª**

El proyecto se desarrolla en la comuna 7 de la ciudad de Ibagué barrio El Salado correspondiente a la Calle 138, comprendido entre las carreras 8 y 8A, cuenta con una longitud aproximada de 63 metros lineales y un ancho promedio de 6,90 metros, lo que representa un área total de intervención cercana a los 433 m², la vía está proyectada con una estructura de 30 cm de Rajón, 28 cm base y 11 cm de Carpeta asfáltica para una estructura total de 69 cm.





Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

388

✓ **CARRERA 8A ENTRE TRANSVERSAL 8 Y CALLE 141**

El tramo vial de la Carrera 8A, comprendido entre la Transversal 8 y la Calle 141, cuenta con una extensión aproximada de 296 metros lineales y un ancho promedio de 6,95 metros, distribuidos en cuatro (4) intersecciones. El área total prevista para la intervención del corredor vial es de aproximadamente 2.057 m². la vía está proyectada con una estructura de 25 cm base y 11 cm de Carpeta asfáltica para una estructura total de 36 cm.





Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

389

✓ **CARRERA 8B ENTRE TRANSVERSAL 8 Y CALLE 141**

El corredor vial correspondiente a la Carrera 8B, ubicado entre la Transversal 8 y la Calle 141, presenta una longitud aproximada de 188 metros lineales y un ancho promedio de 8,00 metros, conformado por tres (3) tramos o calles. El área total estimada de intervención para este corredor vial es de aproximadamente 1.528 m². la vía está proyectada con una estructura de 28 cm base y 11 cm de Carpeta asfáltica para una estructura total de 39 cm.





Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

390

BARRIO ARKALA

✓ **CALLE 100**

El corredor vial identificado como Manzana RR y R, correspondiente a la Carrera 13A N. N. (Calle 100, entre las carreras 9 y 10A), cuenta con una longitud aproximada de 155 metros lineales y un ancho promedio de 5,20 metros, conformado por tres (3) tramos viales. El área total estimada de intervención para este corredor es de aproximadamente 799 m².





Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

391

✓ **CARRERA 9A**

Carrera 9A entre calle 98A y calle 99 N.N (Carrera 9A entre calle 100 y diagonal 100C), con una longitud de 52.5 metros lineales y ancho promedio de 4.90 metros, con un área de intervención de 256 m²





Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

392

✓ **CARRERA 10ª ENTRE CALLES 97 Y CALLE 97ª barrio Arkala I**

Carrera 10A entre calle 97 y calle 97A con una longitud de 53 metros lineales y ancho promedio de 5.86 metros, con un área de intervención de 336.65 m². Conforme a lo establecido en los diseños entregados por la Secretaría de Infraestructura y con el acompañamiento de los profesionales especialistas, se precisa que, dadas las condiciones específicas de la subrasante, los profesionales de la Secretaría de Infraestructura aprobaron la implementación de una capa de mejoramiento de 30 cm de rajón, la cual incluye el correspondiente sello con material de base.





Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

393

✓ **CALLE 93 ENTRE LA CARRERA 14B Y LA CARRERA 14D 10° URBANIZACION LA ESPERANZA**

Calle 93 entre la carrera 14b y la carrera 14d 10° urbanización la esperanza con una longitud de 68.45 metros lineales y un ancho promedio de 6.09 aproximadamente.





Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

394

✓ **CARRERA 21 ENTRE CALLES 61C Y 60 BARRIO LOS ANGELES**

Carrera 21 entre calles 61c y 60 barrio los ángeles con una longitud de 252. la vía está proyectada con una estructura de 30 cm de Rajón, 28 cm base y 11 cm de Carpeta asfáltica para una estructura total de 69 cm.






Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

395

✓ **CALLE 12 ENTRE LA CARRERA 13 Y LA CARRERA 14 DEL BARRIO 20 DE JULIO**

Calle 12 entre carrera 13 y carrera 14 barrio 20 de julio con una longitud de 72 ML aproximadamente. La vía está proyectada para realizar la construcción en pavimento rígido la placa en concreto debe estar modulada en cuadros de 3.5 m * 3.5 m con un espesor de placa de 17.5 cm, una capa de Base Granular de 10 cm y el concreto de una resistencia de 4.000 psi.





Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

396

✓ **CALLE 1B ENTRE CARRERAS 12 Y 11ª BIS DEL BARRIO ALASKA**

Calle 1B entre carreras 12 y 11ª bis barrio Alaska con una longitud inicialmente de 85 ML aproximadamente. La vía está proyectada para realizar la construcción en pavimento rígido la placa en concreto con un espesor de placa de 20 cm, una capa de Base Granular de 15 cm.





Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

397

✓ **CARRERA 21E ENTRE CALLE 67 Y 68 DEL BARRIO CIRUELOS**

El estudio se ha desarrollado con la finalidad de rehabilitar la carrera 21E entre la calle 67 y la calle 68 del barrio los Ciruelos de la comuna 6, del casco urbano del municipio de Ibagué con una longitud aproximada de 160 ML aproximadamente.

La vía está proyectada para realizar la construcción de capa asfáltica de tipo MDC – 19, de 11cms de espesor, apoyada en una capa de base granular (bicapa) tipo C, INVIAS BG - 27, (22 cms de espesor) está se apoya en una capa de 35 cms de rajón como mejoramiento de la subrasante existente, la altura total de la estructura recomendada es de 68 cm en total.



Capa asfáltica	11 cm
Base granular	22 cm
mejoramiento en rajón	35 cm
subrasante	

398

✓ **CALLE 80 ENTRE CARRERA 11° Y AVENIDA AMBALA DEL BARRIO SAN FRANCISCO**

El estudio se ha desarrollado con la finalidad de rehabilitar la calle 80 entre la carrera 11A y la carrera 12A del barrio san francisco de la comuna 6, del casco urbano del municipio de Ibagué

La vía está dividida en dos tramos el primer tramo que corresponde a una longitud aproximada de 25.50 ml en donde se solamente se realizara la reposición de carpeta asfáltica con un espesor de 8 cm y el segundo tramo con una longitud de 161 ml aproximadamente donde se realizara la construcción de la vía con un espesor de 15 cm de base granular y 8 cm de carpeta asfáltica.





Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

399

✓ **TIERRA FIRME CALLE 115 ENTRE CARRERAS 17 Y 19B**

El estudio se ha desarrollado con la finalidad de pavimentar la calle 115 entre carreras 17 y 19B URBANIZACION TIERRA FIRME COMUNA 7 MUNICIPIO DE IBAGUE - TOLIMA, del casco urbano del municipio de Ibagué.

La vía está proyectada para realizar la construcción en pavimento rígido la placa en concreto con un espesor de placa de 20 cm, una capa de Base Granular de 15 cm.





Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE


400

✓ **BARRIO CIRUELOS 21 G ENTRE LA CALLE 67ª Y LA CALLE 68**

El estudio se ha desarrollado con la finalidad de rehabilitar la carrera 21G entre la calle 67A y la calle 68 del barrio los Ciruelos de la comuna 6, del casco urbano del municipio de Ibagué - Tolima, del casco urbano del municipio de Ibagué.

El diseño de la estructura de pavimentos sugerido para esta vía (carrera de primer orden), es el que resulto de analizar el predimensionamiento realizado con el método Aastho 93 y chequearlo con el método racional y está conformado por una capa asfáltica de tipo MDC – 19, de 11 cms de espesor, apoyada en una capa de base granular (bicapa) tipo C, INVIAS BG - 27, (22 cms de espesor) está se apoya en una capa de 35 cms de rajón como mejoramiento de la subrasante existente, la altura total de la estructura recomendada es de 68 cm.



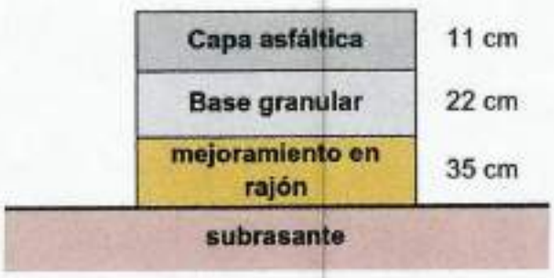

Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

401

✓ **BARRIO PRADERAS DEL NORTE CARRERA 13 ENTRE CALLES 121 Y 122**

Se estableció una estructura de pavimento rígido apropiada para el segmento vial localizado CARRERA 13A ENTRE CALLES 121 Y 122 PRADERAS DEL NORTE COMUNA 7 MUNICIPIO DE IBAGUE - TOLIMA

La vía está proyectada para realizar la construcción en pavimento rígido la placa en concreto con un espesor de placa de 20 cm, una capa de Base Granular de 15 cm.





Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

402

6.2 Nivelación Inicial Lote 1

BARRIO TIERRA FIRME

TOMA INICIAL - TIERRA FIRME				
PUNTO	V+	INST	VI	COTA INICIAL
C2	**1.020**	**1006.284**		**1005.264**
K0+170-I			1.786	1004.498
K0+170-E			1.572	1004.712
K0+170-D			1.611	1004.673
K0+175-I			1.995	1004.289
K0+175-E			1.887	1004.397
K0+175-D			1.923	1004.361
K0+180-I			2.314	1003.970
K0+180-E			2.213	1004.071
K0+180-D			2.222	1004.062
K0+185-I			2.426	1003.858
K0+185-E			2.497	1003.787
K0+185-D			2.527	1003.757
K0+190-I			2.853	1003.431
K0+190-E			2.825	1003.459
K0+190-D			2.723	1003.561
K0+195-I			3.214	1003.070
K0+195-E			3.205	1003.079
K0+195-D			3.060	1003.224
K0+200-I			3.436	1002.848
K0+200-E			3.410	1002.874
K0+200-D			3.413	1002.871
K0+205-I			3.665	1002.619
K0+205-E			3.610	1002.674
K0+205-D			3.624	1002.660
K0+210-I			3.786	1002.498
K0+210-E			3.712	1002.572
K0+210-D			3.785	1002.499

Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

403

BARRIO CIRUELOS

CARRERA 21G ENTRE CALLE 67A Y 68

NIVELACION INICIAL - CIRUELOS 21 G				
PUNTO	V+	INST	VI	COTA INICIAL
D1	0.375	1007.100		1006.725
K0+000-I			0.514	1006.586
K0+000-E			0.569	1006.531
K0+000-D			0.596	1006.504
K0+005-I			0.757	1006.343
K0+005-E			0.825	1006.275
K0+005-D			0.907	1006.193
K0+010-I			1.063	1006.037
K0+010-E			1.122	1005.978
K0+010-D			1.149	1005.951
K0+015-I			1.340	1005.760
K0+015-E			1.440	1005.660
K0+015-D			1.475	1005.625
K0+020-I			1.892	1005.208
K0+020-E			1.752	1005.348
K0+020-D			1.844	1005.256
K0+025-I			2.103	1004.997
K0+025-E			2.136	1004.964
K0+025-D			2.211	1004.889
K0+030-I			2.556	1004.544
K0+030-E			2.584	1004.516
K0+030-D			2.589	1004.511
K0+035-I			3.074	1004.026
K0+035-E			3.037	1004.063
K0+035-D			3.096	1004.004
K0+040-I			3.559	1003.541
K0+040-E			3.518	1003.582
K0+040-D			3.630	1003.470
K0+045-I			4.037	1003.063
K0+045-E			3.986	1003.114

NIVELACION INICIAL - CIRUELOS 21 G				
PUNTO	V+	INST	VI	COTA INICIAL
K0+045-D			4.136	1002.964
BM2			3.797	1003.303
BM2	0.858	1004.161		1003.303
K0+050-I			1.605	1002.556
K0+050-E			1.595	1002.566
K0+050-D			1.690	1002.471
K0+055-I			2.089	1002.072
K0+055-E			2.103	1002.058
K0+055-D			2.134	1002.027
K0+060-I			2.588	1001.573
K0+060-E			2.612	1001.549
K0+060-D			2.620	1001.541
K0+065-I			3.084	1001.077
K0+065-E			3.105	1001.056
K0+065-D			3.150	1001.011
K0+070-I			3.420	1000.741
K0+070-E			3.534	1000.627
K0+070-D			3.770	1000.391
K0+075-I			3.840	1000.321
K0+075-E			3.905	1000.256
K0+075-D			4.022	1000.139
K0+080-I			4.145	1000.016
K0+080-E			4.186	999.975
K0+080-D			4.230	999.931
K0+085-I			4.476	999.685
K0+085-E			4.469	999.692
K0+085-D			4.500	999.661
C3			3.514	1000.647

Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

NIVELACION INICIAL - CIRUELOS 21 G				
PUNTO	V+	INST	VI	COTA INICIAL
C3	0.365	1001.012		1000.647
K0+090-I			1.584	999.428
K0+090-E			1.596	999.416
K0+090-D			1.618	999.394
K0+095-I			1.865	999.147
K0+095-E			1.870	999.142
K0+095-D			1.908	999.104
K0+100-I			2.110	998.902
K0+100-E			2.124	998.888
K0+100-D			2.179	998.833
K0+105-I			2.409	998.603
K0+105-E			2.412	998.600
K0+105-D			2.403	998.609
K0+110-I			2.692	998.320
K0+110-E			2.652	998.360
K0+110-D			2.639	998.373
K0+115-I			3.012	998.000
K0+115-E			2.962	998.050
K0+115-D			2.944	998.068
K0+120-I			3.340	997.672
K0+120-E			3.332	997.680
K0+120-D			3.296	997.716
K0+125-I			3.707	997.305
K0+125-E			3.752	997.260
K0+125-D			3.706	997.306
K0+130-I			4.229	996.783
K0+130-E			4.256	996.756
K0+130-D			4.247	996.765
C4			4.224	996.788

NIVELACION INICIAL - CIRUELOS 21 G				
PUNTO	V+	INST	VI	COTA INICIAL
C4	0.94	997.728		996.788
K0+135-I			1.466	996.262
K0+135-E			1.542	996.186
K0+135-D			1.524	996.204
K0+140-I			2.199	995.529
K0+140-E			2.281	995.447
K0+140-D			2.202	995.526
K0+145-I			3.017	994.711
K0+145-E			3.054	994.674
K0+145-D			2.970	994.758
K0+150-I			3.740	993.988
K0+150-E			3.795	993.933
K0+150-D			3.740	993.988
K0+155-I			4.416	993.312
K0+155-E			4.512	993.216
K0+155-D			4.497	993.231
B5			3.461	994.267
B5	0.584	994.851		994.267
K0+160-I			2.299	992.552
K0+160-E			2.460	992.391
K0+160-D			2.467	992.384
K0+165-I			3.129	991.722
K0+165-E			2.914	991.937
K0+165-D			2.766	992.085

Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

BARRIO PRADERAS DEL NORTE

CARRERA 13A ENTRE CALLES 121 Y 122

NIVELACION INICIAL - PRADERAS DEL NORTE CRA 13 ENTRE CALLES 121 Y 122				
PUNTO	V+	INST	VI	COTA INICIAL
D1	1.414	992.414		991.000
D2			1.975	990.439
C#2			0.597	991.817
K0+000-I			0.282	992.132
K0+000-E			0.231	992.183
K0+000-D			0.204	992.210
K0+005-I			0.370	992.044
K0+005-E			0.417	991.997
K0+005-D			0.447	991.967
K0+010-I			0.660	991.754
K0+010-E			0.529	991.885
K0+010-D			0.533	991.881
K0+015-I			0.798	991.616
K0+015-E			0.711	991.703
K0+015-D			0.822	991.592
K0+020-I			1.060	991.354
K0+020-E			0.968	991.446
K0+020-D			1.010	991.404
K0+025-I			1.225	991.189
K0+025-E			1.207	991.207
K0+025-D			1.324	991.090
K0+030-I			1.585	990.829
K0+030-E			1.452	990.962
K0+030-D			1.459	990.955

NIVELACION INICIAL - PRADERAS DEL NORTE CRA 13 ENTRE CALLES 121 Y 122				
PUNTO	V+	INST	VI	COTA INICIAL
D1	1.414	992.414		991.000
K0+035-I			1.619	990.795
K0+035-E			1.790	990.624
K0+035-D			1.837	990.577
K0+040-I			2.042	990.372
K0+040-E			2.046	990.368
K0+040-D			1.930	990.484
K0+045-I			2.183	990.231
K0+045-E			2.369	990.045
K0+045-D			2.394	990.020
K0+050-I			2.749	989.665
K0+050-E			2.625	989.789
K0+050-D			2.484	989.930
K0+055-I			2.753	989.661
K0+055-E			2.905	989.509
K0+055-D			2.946	989.468
K0+060-I			3.145	989.269
K0+060-E			3.045	989.369
K0+060-D			2.968	989.446
K0+064-I			3.200	989.214
K0+064-E			3.227	989.187
K0+064-D			3.300	989.114

Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

406

6.3 Verificación de niveles de Subrasante Lote 1

Se solicita por parte del contratista la verificación de niveles de la subrasante de las vías ejecutadas durante el periodo del Lote 1 localizados en la zona urbana del municipio de Ibagué para dar veracidad al cumplimiento de la estructura del diseño, finalmente se realiza el chequeo pertinente por parte de la interventoría y se evidencia que el nivel del terreno se encuentra dentro de los límites permitidos; A Continuación, se Adjunta Las carteras correspondientes al chequeo realizado en campo.

BARRIO TIERRA FIRME

TOMA CEREO SUBRASANTE - TIERRA FIRME							
PUNTO	V+	INST	VI	COTA CAMPO	RASANTE	SUBRASANTE	DIFER +/-
D2-1	0.648	1018.076		1017.428			
K0+000-E			1.154	1016.922	1017.276	1016.926	0.004
K0+000-D			1.210	1016.866	1017.218	1016.868	0.002
K0+005-I			1.731	1016.345	1016.696	1016.346	0.001
K0+005-E			1.659	1016.417	1016.754	1016.404	-0.013
K0+005-D			1.724	1016.352	1016.696	1016.346	-0.006
K0+010-I			2.250	1015.826	1016.168	1015.818	-0.008
K0+010-E			2.210	1015.866	1016.226	1015.876	0.010
K0+010-D			2.256	1015.820	1016.168	1015.818	-0.002
C6	0.408	1017.836		1017.428			
K0+015-I			2.553	1015.283	1015.639	1015.289	0.006
K0+015-E			2.556	1015.280	1015.697	1015.347	0.067
K0+015-D			2.522	1015.314	1015.639	1015.289	-0.025
K0+020-I			3.075	1014.761	1015.111	1014.761	0.000
K0+020-E			3.066	1014.770	1015.169	1014.819	0.048
K0+020-D			3.070	1014.766	1015.111	1014.761	-0.005
C5	0.510	1016.092		1015.582			
K0+025-I			1.861	1014.231	1014.582	1014.232	0.001
K0+025-E			1.795	1014.297	1014.640	1014.290	-0.007
K0+025-D			1.858	1014.234	1014.582	1014.232	-0.002

Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

407

K0+030-I			2.385	1013.707	1014.053	1013.703	-0.004
K0+030-E			2.350	1013.742	1014.111	1013.761	0.019
K0+030-D			2.380	1013.712	1014.096	1013.746	0.034
K0+035-I			2.935	1013.157	1013.525	1013.175	0.018
K0+035-E			2.852	1013.240	1013.583	1013.233	-0.007
K0+035-D			2.825	1013.267	1013.612	1013.262	-0.005

TOMA CEREO SUBRASANTE - TIERRA FIRME							
PUNTO	V+	INST	VI	COTA CAMPO	RASANTE	SUBRASANTE	DIFER +/-
C4	1.385	1013.850		1012.465			
K0+040-I			1.203	1012.647	1012.989	1012.639	-0.008
K0+040-E			1.116	1012.734	1013.093	1012.743	0.009
K0+040-D			1.039	1012.811	1013.197	1012.847	0.036
K0+045-I			1.584	1012.266	1012.650	1012.300	0.034
K0+045-E			1.556	1012.294	1012.729	1012.379	0.085
K0+045-D			1.441	1012.409	1012.807	1012.457	0.048
K0+050-I			1.940	1011.910	1012.247	1011.897	-0.013
K0+050-E			1.878	1011.972	1012.305	1011.955	-0.017
K0+050-D			1.875	1011.975	1012.338	1011.988	0.013
K0+055-I			2.360	1011.490	1011.824	1011.474	-0.016
K0+055-E			2.326	1011.524	1011.882	1011.532	0.008
K0+055-D			2.360	1011.490	1011.869	1011.519	0.029
C4	0.353	1012.818		1012.465			
K0+060-I			1.763	1011.055	1011.400	1011.050	-0.005
K0+060-E			1.726	1011.092	1011.458	1011.108	0.016
K0+060-D			1.766	1011.052	1011.400	1011.050	-0.002
K0+065-I			2.184	1010.634	1010.975	1010.625	-0.009
K0+065-E			2.080	1010.738	1011.110	1010.760	0.022
K0+065-D			2.074	1010.744	1011.088	1010.738	-0.006
K0+070-I			2.536	1010.282	1010.660	1010.310	0.028
K0+070-E			2.407	1010.411	1010.770	1010.420	0.009
K0+070-D			2.395	1010.423	1010.776	1010.426	0.003
K0+075-I			2.822	1009.996	1010.340	1009.990	-0.006
K0+075-E			2.754	1010.064	1010.426	1010.076	0.012
K0+075-D			2.696	1010.122	1010.464	1010.114	-0.008

Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

408

TOMA CEREO SUBRASANTE - TIERRA FIRME							
PUNTO	V+	INST	VI	COTA CAMPO	RASANTE	SUBRASANTE	DIFER +/-
L1	1.312	1011.374		1010.062			
K0+080-I			1.682	1009.692	1010.060	1009.710	0.018
K0+080-E			1.611	1009.763	1010.120	1009.770	0.007
K0+080-D			1.634	1009.740	1010.080	1009.730	-0.010
K0+085-I			1.842	1009.532	1009.882	1009.532	0.000
K0+085-E			1.791	1009.583	1009.940	1009.590	0.007
K0+085-D			1.819	1009.555	1009.899	1009.549	-0.006
K0+090-I			2.223	1009.151	1009.501	1009.151	0.000
K0+090-E			2.153	1009.221	1009.561	1009.211	-0.010
K0+090-D			2.230	1009.144	1009.501	1009.151	0.007
K0+095-I			2.796	1008.578	1008.921	1008.571	-0.007
K0+095-E			2.740	1008.634	1008.981	1008.631	-0.003
K0+095-D			2.798	1008.576	1008.921	1008.571	-0.005
K0+100-I			3.350	1008.024	1008.390	1008.040	0.016
K0+100-E			3.272	1008.102	1008.450	1008.100	-0.002
K0+100-D			3.340	1008.034	1008.390	1008.040	0.006
C3	1.460	1008.596		1007.136			
K0+105-I			0.982	1007.614	1007.960	1007.610	-0.004
K0+105-E			0.914	1007.682	1008.020	1007.670	-0.012
K0+105-D			0.978	1007.618	1007.960	1007.610	-0.008
K0+110-I			1.179	1007.417	1007.759	1007.409	-0.008
K0+110-E			1.114	1007.482	1007.819	1007.469	-0.013
K0+110-D			1.188	1007.408	1007.759	1007.409	0.001
K0+115-I			1.383	1007.213	1007.557	1007.207	-0.006
K0+115-E			1.325	1007.271	1007.617	1007.267	-0.004
K0+115-D			1.384	1007.212	1007.557	1007.207	-0.005
K0+120-I			1.593	1007.003	1007.356	1007.006	0.003
K0+120-E			1.528	1007.068	1007.416	1007.066	-0.002
K0+120-D			1.582	1007.014	1007.356	1007.006	-0.008

Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

409

BARRIO CIRUELOS 21G

TOMA CEREO SUBRASANTE - LOS CIRUELOS 21G							
PUNTO	V+	INST	VI	COTA CAMPO	RASANTE	SUBRASANTE	DIFER +/-
C1	2.917	1006.220		1003.303			
K0+000-I			0.327	1005.893	1006.562	1005.882	-0.011
K0+000-E			0.359	1005.861	1006.544	1005.864	0.003
K0+000-D			0.381	1005.839	1006.526	1005.846	0.007
K0+005-I			0.576	1005.644	1006.331	1005.651	0.007
K0+005-E			0.635	1005.585	1006.262	1005.582	-0.003
K0+005-D			0.695	1005.525	1006.193	1005.513	-0.012
K0+010-I			0.861	1005.359	1006.043	1005.363	0.004
K0+010-E			0.932	1005.288	1005.973	1005.293	0.005
K0+010-D			0.984	1005.236	1005.904	1005.224	-0.012
K0+015-I			1.158	1005.062	1005.753	1005.073	0.011
K0+015-E			1.244	1004.976	1005.658	1004.978	0.002
K0+015-D			1.324	1004.896	1005.563	1004.883	-0.013
K0+020-I			1.449	1004.771	1005.461	1004.781	0.010
K0+020-E			1.561	1004.659	1005.340	1004.660	0.001
K0+020-D			1.669	1004.551	1005.219	1004.539	-0.012
K0+025-I			1.787	1004.433	1005.120	1004.440	0.007
K0+025-E			1.916	1004.304	1004.995	1004.315	0.011
K0+025-D			2.018	1004.202	1004.871	1004.191	-0.011
K0+030-I			2.304	1003.916	1004.602	1003.922	0.005
K0+030-E			2.414	1003.806	1004.508	1003.828	0.022
K0+030-D			2.474	1003.746	1004.415	1003.735	-0.011
K0+035-I			2.788	1003.432	1004.115	1003.435	0.003
K0+035-E			2.881	1003.339	1004.021	1003.341	0.002
K0+035-D			2.985	1003.235	1003.927	1003.247	0.012
K0+040-I			3.284	1002.936	1003.612	1002.932	-0.004
K0+040-E			3.367	1002.853	1003.519	1002.839	-0.014
K0+040-D			3.460	1002.760	1003.426	1002.746	-0.014

TOMA CEREO SUBRASANTE - LOS CIRUELOS 21G							
PUNTO	V+	INST	VI	COTA CAMPO	RASANTE	SUBRASANTE	DIFER +/-
BM2	0.193	1003.496		1003.303			
K0+045-I			1.059	1002.437	1003.110	1002.430	-0.007
K0+045-E			1.135	1002.361	1003.043	1002.363	0.002
K0+045-D			1.189	1002.307	1002.976	1002.296	-0.011
K0+050-I			1.554	1001.942	1002.609	1001.929	-0.013
K0+050-E			1.663	1001.833	1002.542	1001.862	0.029
K0+050-D			1.691	1001.805	1002.475	1001.795	-0.010
K0+055-I			2.063	1001.433	1002.108	1001.428	-0.005
K0+055-E			2.143	1001.353	1002.041	1001.361	0.008
K0+055-D			2.196	1001.300	1001.974	1001.294	-0.006
K0+060-I			2.562	1000.934	1001.607	1000.927	-0.007
K0+060-E			2.657	1000.839	1001.539	1000.859	0.020
K0+060-D			2.698	1000.798	1001.471	1000.791	-0.007
K0+065-I			3.074	1000.422	1001.105	1000.425	0.003
K0+065-E			3.144	1000.352	1001.036	1000.356	0.004
K0+065-D			3.197	1000.299	1000.968	1000.288	-0.011
K0+070-I			3.504	999.992	1000.676	999.996	0.004
K0+070-E			3.619	999.877	1000.563	999.883	0.006
K0+070-D			3.731	999.765	1000.450	999.770	0.005
K0+075-I			3.823	999.673	1000.357	999.677	0.004
K0+075-E			3.910	999.586	1000.268	999.588	0.002
K0+075-D			3.999	999.497	1000.179	999.499	0.002
K0+080-I			4.167	999.329	1000.014	999.334	0.005
K0+080-E			4.210	999.286	999.969	999.289	0.003
K0+080-D			4.257	999.239	999.925	999.245	0.006
K0+085-I			4.511	998.985	999.671	998.991	0.006
K0+085-E			4.500	998.996	999.671	998.991	-0.005
K0+085-D			4.509	998.987	999.671	998.991	0.004

Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

411

TOMA CEREO SUBRASANTE - LOS CIRUELOS 21G							
PUNTO	V+	INST	VI	COTA CAMPO	RASANTE	SUBRASANTE	DIFER +/-
C3	1.292	999.018		997.726			
K0+090-I			0.310	998.708	999.389	998.709	0.001
K0+090-E			0.300	998.718	999.389	998.709	-0.009
K0+090-D			0.298	998.720	999.389	998.709	-0.011
K0+095-I			0.578	998.440	999.128	998.448	0.008
K0+095-E			0.569	998.449	999.128	998.448	-0.001
K0+095-D			0.575	998.443	999.128	998.448	0.005
K0+100-I			0.827	998.191	998.876	998.196	0.005
K0+100-E			0.856	998.162	998.851	998.171	0.009
K0+100-D			0.889	998.129	998.826	998.146	0.017
K0+105-I			1.080	997.938	998.622	997.942	0.004
K0+105-E			1.090	997.928	998.622	997.942	0.014
K0+105-D			1.078	997.940	998.622	997.942	0.001
K0+110-I			1.385	997.633	998.319	997.639	0.006
K0+110-E			1.390	997.628	998.319	997.639	0.011
K0+110-D			1.372	997.646	998.319	997.639	-0.007
K0+115-I			1.673	997.345	998.015	997.335	-0.010
K0+115-E			1.690	997.328	998.015	997.335	0.007
K0+115-D			1.681	997.337	998.015	997.335	-0.002
K0+120-I			2.060	996.958	997.644	996.964	0.006
K0+120-E			2.045	996.973	997.644	996.964	-0.009
K0+120-D			2.064	996.954	997.644	996.964	0.010
K0+125-I			2.443	996.575	997.266	996.586	0.011
K0+125-E			2.415	996.603	997.291	996.611	0.008
K0+125-D			2.394	996.624	997.316	996.636	0.012
K0+130-I			2.951	996.067	996.758	996.078	0.011
K0+130-E			2.923	996.095	996.784	996.104	0.009
K0+130-D			2.880	996.138	996.810	996.130	-0.008

Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

412

TOMA CEREO SUBRASANTE - LOS CIRUELOS 21G							
PUNTO	V+	INST	VI	COTA CAMPO	RASANTE	SUBRASANTE	DIFER +/-
C4	0.554	996.684		996.130			
K0+135-I			1.129	995.555	996.240	995.560	0.005
K0+135-E			1.120	995.564	996.240	995.560	-0.004
K0+135-D			1.114	995.570	996.240	995.560	-0.010
K0+140-I			1.899	994.785	995.469	994.789	0.004
K0+140-E			1.884	994.800	995.469	994.789	-0.011
K0+140-D			1.904	994.780	995.469	994.789	0.009
K0+145-I			2.667	994.017	994.708	994.028	0.011
K0+145-E			2.649	994.035	994.708	994.028	-0.007
K0+145-D			2.659	994.025	994.708	994.028	0.003
K0+150-I			3.421	993.263	993.947	993.267	0.004
K0+150-E			3.425	993.259	993.947	993.267	0.008
K0+150-D			3.429	993.255	993.947	993.267	0.012

6.4 Verificación de niveles de Base Lote 1

Se solicita por parte del contratista la verificación de niveles de la capa de base granular de la vía correspondientes al lote 1 en zona urbana del municipio de Ibagué, para dar veracidad al cumplimiento de la estructura del diseño de la capa de base granular en donde se debe garantizar su espesor especificado en diseño, finalmente se realiza el chequeo pertinente por parte de la interventoría y se evidencia que el nivel del terreno se encuentra dentro de los límites permitidos y así proceder a la aplicación de la capa final de la pavimentación, ya sea asfalto o concreto según las especificaciones de diseño de cada vía.

BARRIO TIERRA FIRME

TOMA CEREO BASE GRANULAR - TIERRA FIRME							
PUNTO	V+	INST	VI	COTA CAMPO	RASANTE	BASE	DIFER +/-
C5	1.458	1017.040		1015.582			
K0+005-I			0.545	1016.495	1016.696	1016.496	0.001
K0+005-E			0.495	1016.545	1016.754	1016.554	0.009
K0+005-D			0.542	1016.498	1016.696	1016.496	-0.002
K0+010-I			1.064	1015.976	1016.168	1015.968	-0.008
K0+010-E			1.015	1016.025	1016.226	1016.026	0.001
K0+010-D			1.072	1015.968	1016.168	1015.968	0.000
K0+015-I			1.593	1015.447	1015.639	1015.439	-0.008
K0+015-E			1.535	1015.505	1015.697	1015.497	-0.008
K0+015-D			1.588	1015.452	1015.639	1015.439	-0.013
K0+020-I			2.121	1014.919	1015.111	1014.911	-0.009
K0+020-E			2.079	1014.961	1015.169	1014.969	0.007
K0+020-D			2.117	1014.923	1015.111	1014.911	-0.013
K0+025-I			2.655	1014.385	1014.582	1014.382	-0.003
K0+025-E			2.604	1014.436	1014.640	1014.440	0.004
K0+025-D			2.650	1014.390	1014.582	1014.382	-0.008
K0+030-I			3.180	1013.860	1014.053	1013.853	-0.007
K0+030-E			3.127	1013.913	1014.111	1013.911	-0.002
K0+030-D			3.150	1013.890	1014.096	1013.896	0.006

Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

414

K0+035-I			3.704	1013.336	1013.525	1013.325	-0.011
K0+035-E			3.644	1013.396	1013.583	1013.383	-0.013
K0+035-D			3.620	1013.420	1013.612	1013.412	-0.008
K0+040-I			4.247	1012.793	1012.989	1012.789	-0.004
K0+040-E			4.138	1012.902	1013.093	1012.893	-0.009
K0+040-D			4.048	1012.992	1013.197	1012.997	0.005

TOMA CEREO BASE GRANULAR - TIERRA FIRME							
PUNTO	V+	INST	VI	COTA CAMPO	RASANTE	BASE	DIFER +/-
C4	0.837	1013.302		1012.465			
K0+045-I			0.855	1012.447	1012.650	1012.450	0.003
K0+045-E			0.777	1012.525	1012.729	1012.529	0.004
K0+045-D			0.705	1012.597	1012.807	1012.607	0.010
K0+050-I			1.245	1012.057	1012.247	1012.047	-0.010
K0+050-E			1.188	1012.114	1012.305	1012.105	-0.009
K0+050-D			1.154	1012.148	1012.338	1012.138	-0.010
K0+055-I			1.672	1011.630	1011.824	1011.624	-0.006
K0+055-E			1.612	1011.690	1011.882	1011.682	-0.008
K0+055-D			1.629	1011.673	1011.869	1011.669	-0.004
K0+060-I			2.097	1011.205	1011.400	1011.200	-0.005
K0+060-E			2.040	1011.262	1011.458	1011.258	-0.004
K0+060-D			2.098	1011.204	1011.400	1011.200	-0.004
K0+065-I			2.517	1010.785	1010.975	1010.775	-0.010
K0+065-E			2.385	1010.917	1011.110	1010.910	-0.007
K0+065-D			2.420	1010.882	1011.088	1010.888	0.006
K0+070-I			2.831	1010.471	1010.660	1010.460	-0.011
K0+070-E			2.726	1010.576	1010.770	1010.570	-0.006
K0+070-D			2.719	1010.583	1010.776	1010.576	-0.007
K0+075-I			3.156	1010.146	1010.340	1010.140	-0.006
K0+075-E			3.071	1010.231	1010.426	1010.226	-0.005
K0+075-D			3.025	1010.277	1010.464	1010.264	-0.013
K0+080-I			3.445	1009.857	1010.060	1009.860	0.003
K0+080-E			3.395	1009.907	1010.120	1009.920	0.013
K0+080-D			3.420	1009.882	1010.080	1009.880	-0.002
K0+085-I			3.627	1009.675	1009.882	1009.682	0.007
K0+085-E			3.569	1009.733	1009.940	1009.740	0.007

Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

415

K0+085-D			3.609	1009.693	1009.899	1009.699	0.006

TOMA CEREO BASE GRANULAR - TIERRA FIRME							
PUNTO	V+	INST	VI	COTA CAMPO	RASANTE	BASE	DIFER +/-
L1	0.556	1010.618		1010.062			
K0+090-I			1.320	1009.298	1009.501	1009.301	0.003
K0+090-E			1.265	1009.353	1009.561	1009.361	0.008
K0+090-D			1.324	1009.294	1009.501	1009.301	0.007
K0+095-I			1.904	1008.714	1008.921	1008.721	0.007
K0+095-E			1.840	1008.778	1008.981	1008.781	0.003
K0+095-D			1.904	1008.714	1008.921	1008.721	0.007
K0+100-I			2.423	1008.195	1008.390	1008.190	-0.005
K0+100-E			2.370	1008.248	1008.450	1008.250	0.002
K0+100-D			2.430	1008.188	1008.390	1008.190	0.002
K0+105-I			2.866	1007.752	1007.960	1007.760	0.008
K0+105-E			2.809	1007.809	1008.020	1007.820	0.011
K0+105-D			2.867	1007.751	1007.960	1007.760	0.009
K0+110-I			3.060	1007.558	1007.759	1007.559	0.001
K0+110-E			2.990	1007.628	1007.819	1007.619	-0.009
K0+110-D			3.067	1007.551	1007.759	1007.559	0.008
K0+115-I			3.268	1007.350	1007.557	1007.357	0.007
K0+115-E			3.213	1007.405	1007.617	1007.417	0.012
K0+115-D			3.269	1007.349	1007.557	1007.357	0.008
K0+120-I			3.468	1007.150	1007.356	1007.156	0.006
K0+120-E			3.409	1007.209	1007.416	1007.216	0.007
K0+120-D			3.448	1007.170	1007.356	1007.156	-0.014

❖ **Registro Fotográfico**



Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

417

LOTE 2

7. LOTE 2 AVANCE DE OBRA

Durante el desarrollo del cada proceso constructivo dentro del proyecto se realiza el adecuado acompañamiento por parte de la interventoría **CONSORCIO VIAS IBAGUE** al contratista de obra, donde Las actividades diarias son controladas y verificadas por parte de la interventoría.

Conforme a las cantidades ejecutadas por el Contratista, la interventoría ha revisado las cantidades con base en los lineamientos fijados contractualmente.

Finalmente se ha realizado el correcto seguimiento al avance de las obras y se reporta en el presente informe con un avance de obra relacionado a continuación.

7.1 Recorrido De obra

En primera instancia se desarrollan las actividades de reconocimiento del proyecto, Las vías que se pretenden intervenir dentro de este bloque se ubican distribuidas en las diferentes comunas del municipio de Ibagué, las cuales se encuentran asociadas al desarrollo económico del mismo y al bienestar de la comunidad.

Para esto se realiza el recorrido de obra por parte de la interventoría, recolectando información sustancial cómo parte inicial y reconocimiento del lugar de trabajo. Con el desarrollo del proyecto pretende optimizar la movilidad del casco urbano, mejorar la calidad de vida de la comunidad creando estructuras de pavimentos funcionales y seguros.

Las siguientes vías están involucradas en el desarrollo del proyecto:

✓ **VILLA MARLEN**
CRA 6B O 6A

El tramo vial comprendido CARRERA 6B O 6A ENTRE CALE 45 Y 46 BARRIO VILLA MARLEN 1 COMUNA 4, cuenta con una extensión aproximada de 198 metros lineales y ancho promedio de 6 metros, con un área de intervención de 1188 m2. la vía está proyectada con una estructura de 20 cm base y 11 cm de Carpeta asfáltica para una estructura total de 31 cm.





Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

420

VILLA MARLEN CALLE 46 ENTRE CRAS 6ª Y 7

Con una longitud de 96.70 m y un ancho promedio de 6 metros, un área de intervención aproximada de 580 m2. La vía contempla un diseño estructural de 45 cm de rajón sobre el cual va instalado geotextil, continua con una capa de base de 22 cm de espesor y finalmente una capa de 11 cm de mezcla asfáltica.





Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

421

✓ **CALATAYUD**

CALLE 79BIS ENTRE CARRERA 10A y 10C Y ENTRE MZS 3 Y 4 y ENTRE MZS 5-6 Y EL PARQUE CALATAYUD, con una longitud de 110 metros lineales y ancho promedio de 6 metros, con un área de intervención de 660 m2. la vía está proyectada con una estructura de 29 cm base y 11 cm de Carpeta asfáltica para una estructura total de 40 cm.





Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

422

✓ **NUEVA CASTILLA**

CALLE 121 ENTRE LA CARRERA 4 SUR Y LA CARRERA 1 SUR DEL BARRIO NUEVA CASTILLA, con una longitud de 188.3 metros lineales y ancho promedio de 8 metros, con un área de intervención de 1506 m2. la vía está proyectada con una estructura de 15 cm base y 24 cm de Concreto para una estructura total de 39 cm.






Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

423

✓ **RICAURTE**

Ubicada en la calle 23 sur entre cras 12 y 14, la vía del Ricaurte tiene una longitud de 150 metros y un ancho promedio de 7.30 m para un área aproximada de 1100 m2, y posee una estructura de pavimento de 26 cm de rajón, 28 cm de base y 10 cm de asfalto.



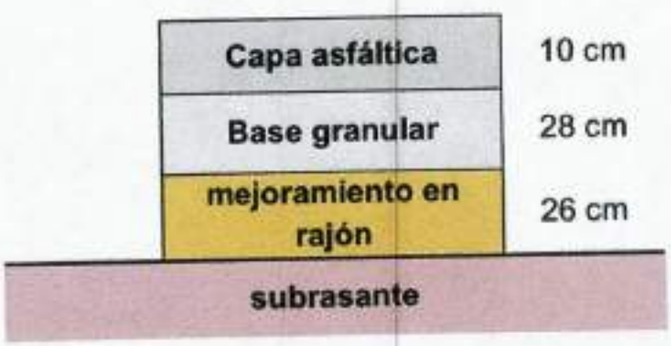

Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

424

✓ **RINCON DE PIEDRA PINTADA Y LIMONAR 5TO SECTOR**

Ubicado en la calle 49 entre cras 6ª y 7, la vía tiene una estructura de 35 cm de rajon, 23 cm de base y una carpeta asfáltica de 11 cm de espesor. Esta via tiene una longitud de 223 ml y un ancho de 6 m para un área de 1338 m2.





Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

425

✓ **RINCON DE PIEDRA PINTADA**

Ubicado en la calle 52 entre cras 7c y 8 en el barrio Rincón de Piedra Pintada, la vía tiene una estructura de 45 cm de rajón, 21 cm de base y 11 cm de carpeta asfáltica. Esta vía tiene una longitud aproximada de 68 metros, y un ancho promedio de 6 metros para un área aproximada de 408 m2.





Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

426

✓ **CASTILLA**

Ubicado en la cra 11 entre calles 44 y 46 en el barrio Castilla de la comuna 4, esta vía tiene una estructura de 15 cm de base y 20 cm de pavimento rígido. La vía para intervenir tiene una longitud de 127 m y un ancho promedio de 3.72 m, para un área aproximada de 472 m2.





Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

427

✓ **NUEVA CASTILLA**

Ubicada en la cra 4H sur entre calles 119 y 121 de la comuna 8, esta via tiene una estructura de 40 cm de rajón, 35 cm de base y 11 cm de asfalto. Tiene una longitud aproximada de 92 m y un ancho promedio de 5 m, para un área de 460 m2.





Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

428

✓ **VILLA LUCES – CALLE 23B**

Ubicada en la calle 23B sur entre carreras 12 sur - 12ª sur - 13 sur y 14 sur, de la comuna 12, esta via tiene una estructura de 32 cm, de base y 10 cm de asfalto. Esta via tiene una longitud aproximada de 140 m, y un ancho promedio de 6.30, para un área aprox de 882 m2.





Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

429

✓ **SANTA BARBARA CRA 12**

Ubicada en la Cra 12 entre calles 3 y 4 de la comuna 2. Esta vía tiene una estructura de 42 cm de espesor comprendidos en 31 cm de base y 11 cm de asfalto. La vía tiene una longitud aproximada de 66 m y un ancho promedio de 6.80 para un área aproximada de 448 m2.





Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

430

✓ **SANTA BARBARA CRA 11B**

Ubicada en la Cra 11B entre calles 3 y 4 de la comuna 2. Esta vía tiene una estructura de 41 cm de espesor comprendidos en 30 cm de base y 11 cm de asfalto. La vía tiene una longitud aproximada de 54 m y un ancho promedio de 10 m para un área aproximada de 540 m2.





Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

431

✓ **SAN CARLOS**

Ubicada en la Cra 78 bis entre calle 42 y 44 de la comuna 4. Esta vía tiene una estructura de 70 cm de espesor comprendidos en 35 cm de rajón, 15 cm de base y 20 cm de concreto. La vía tiene una longitud aproximada de 105 m y un ancho promedio de 8 m para un área aproximada de 840 m2. Inicialmente la via presenta una longitud de 112 m en el documento técnico, solo se ejecutan 105 metros lineales debido a que los otros 7 metros están sujetos a cambios de redes de acueducto y alcantarillado.





Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

432

✓ **PIEDRA PINTADA**

Ubicada en la calle 48a entre carreras 5 y 4b de la comuna 4. Esta vía tiene una estructura de 41 cm de espesor comprendidos en 30 cm de base y 11 cm de asfalto. La vía tiene una longitud aproximada de 70 m y un ancho promedio de 6 m para un área aproximada de 420 m2.





Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

433

✓ **LIMONAR**

Ubicada en la carrera 6A entre calles 49 y 50. Esta vía tiene una estructura de 69 cm de espesor comprendidos en 35 cm de rajón, 23 cm de base y 11 cm de asfalto. La vía tiene una longitud aproximada de 70 m y un ancho promedio de 6 m para un área aproximada de 420 m2.





Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

434

✓ **RINCON DE PIEDRA PINTADA (PAPA JOHN´S)**

Ubicada en la carrera 7A entre calles 57 y 60. Esta vía tiene una estructura de 26 cm de espesor comprendidos en 15 cm de base y 11 cm de asfalto. La vía tiene una longitud aproximada de 132 m y un ancho promedio de 6 m para un área aproximada de 792 m2.






Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

435

✓ **JORDAN 9 ETAPA**

Ubicada en la calle 65A entre carreras 9B y 10. Esta vía tiene una estructura de 35 cm de espesor comprendidos en 15 cm de base y 20 cm de concreto. La vía tiene una longitud aproximada de 60m y un ancho promedio de 5.4 m para un área aproximada de 324 m2.



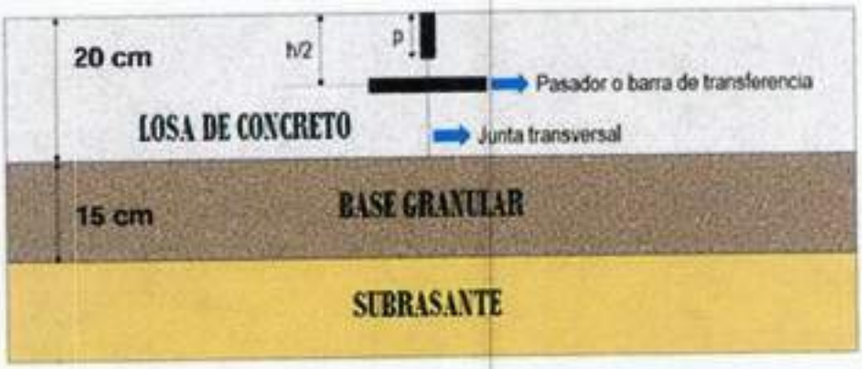

Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

436

✓ **JARDIN 1**

Ubicada en la calle 8 entre carreras 4-3B-3A. Esta vía tiene una estructura de 44 cm de espesor comprendidos en 34 cm de base y 10 cm de asfalto. La vía tiene una longitud aproximada de 96 m y un ancho promedio de 10 m para un área aproximada de 960 m2.





Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

437

✓ **APARCO**

Ubicada en la calle 115 entre avenida mirolindo y carrera 21 sur. Esta vía tiene una estructura de 35 cm de espesor comprendidos en 15 cm de base y 20 cm de concreto. La vía tiene una longitud aproximada de 100 m y un ancho promedio de 7 m para un área aproximada de 700 m2.





Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

438

✓ **JORDAN 3 ETAPA**

Ubicada en la carrera 4B entre calles 74A y 76 o entre manzanas 32-36 y parque. Esta vía tiene una estructura de 41 cm de espesor comprendidos en 30 cm de base y 11 cm de asfalto. La vía tiene una longitud aproximada de 93 m y un ancho promedio de 6 m para un área aproximada de 558 m2.





Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

439

✓ **VILLA LUCES CRA 12A SUR**

Ubicada en la carrera 12A sur entre calles 23B y 23C. Esta vía tiene una estructura de 42 cm de espesor comprendidos en 32 cm de base y 10 cm de asfalto. La vía tiene una longitud aproximada de 45 m y un ancho promedio de 6 m para un área aproximada de 270 m2.





Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

490

✓ **VILLA LUCES CRA 12 SUR**

Ubicada en la carrera 12 sur entre calles 238 y 24. Esta vía tiene una estructura de 35 cm de espesor comprendidos en 15 cm de base y 20 cm de concreto. La vía tiene una longitud aproximada de 66.5 m y un ancho promedio de 6 m para un área aproximada de 400 m2.





Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

441

✓ **NUEVO ARMERO**

Ubicada en la carrera 4B con calle 100. Esta vía tiene una estructura de 34 cm de espesor comprendidos en 15 cm de base y 19 cm de concreto. El área de ejecución esta compuesta por una vía y dos bahías. La vía tiene una longitud de 48.5 por un ancho de 5 m. la bahía grande tiene unas dimensiones de 21 m x 25 m, y la bahía pequeña tiene unas dimensiones de 31.85 m de longitud y un ancho promedio de 2.70 m.





Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

492

✓ **NOGALES**

Ubicada en la carrera 12A sur entre calles 24B y 25. Esta vía tiene una estructura de 51 cm de espesor comprendidos en mejoramiento en rajón de 15 cm, 15 cm de base y 21 cm de concreto. La via tiene una longitud de 72 m, un ancho de 6.00 m, con un área aproximada de 432 m2.





Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

443

✓ **CALARCA**

Ubicada en la carrera 8A entre calles 42 y 44. Esta vía tiene una estructura de 34 cm de espesor comprendidos en 15 cm de base y 19 cm de concreto. La vía tiene una longitud de 100 m, un ancho de 7.00 m, con un área aproximada de 700 m2.





Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

444

7.2 Nivelación Inicial Lote 2

Se ejecuta la nivelación inicial del terreno existente con el objetivo de verificar y contrastar las cotas del terreno natural frente a las cotas proyectadas en los diseños geométricos del proyecto. Esta actividad resulta fundamental para identificar posibles variaciones de nivel, detectar inconsistencias y anticipar la necesidad de realizar cortes, rellenos o ajustes en las pendientes, asegurando la correcta preparación del terreno previo al inicio de las obras sobre la estructura.

NUEVO ARMERO

TOMA TOPOGRAFIA INICIAL NUEVO ARMERO CRA 48 CALLE 100				
PUNTO	V+	ALT INST	VI	COTA
BM 1	0.566	700.566		700.000
K0+0.0	IZQ		1.044	699.522
K0+0.0	EJE		0.914	699.652
K0+0.0	DER		0.720	699.846
K0+010.0	IZQ		1.107	699.459
K0+010.0	EJE		0.994	699.572
K0+010.0	DER		0.927	699.639
K0+020.0	IZQ		1.259	699.307
K0+020.0	EJE		1.175	699.391
K0+020.0	DER		1.110	699.456
K0+030.0	IZQ		1.512	699.054
K0+030.0	EJE		1.332	699.234
K0+030.0	DER		1.282	699.284
K0+040.0	IZQ		2.182	698.384
K0+040.0	EJE		1.642	698.924
K0+040.0	DER		1.452	699.114
K0+048.5	IZQ		2.352	698.214
K0+048.5	EJE		1.699	698.867
K0+048.5	DER		1.532	699.034

Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

495

TOMA TOPOGRAFIA INICIAL BAHIA NUEVO ARMERO CRA 4B CALLE 100				
PUNTO	V+	ALT INST	VI	COTA
BM 1	1.114	701.114		700.000
0-5			1.636	699.478
0-10			1.378	699.736
0-15			1.209	699.905
0-20			0.919	700.195
0-25			0.724	700.390
5 - 5			1.630	699.484
5 - 10			1.345	699.769
5 - 15			1.155	699.959
5 - 20			0.969	700.145
5 - 25			0.799	700.315
10 - 5			1.690	699.424
10 - 10			1.375	699.739
10 - 15			1.185	699.929
10 - 20			1.014	700.100
10 - 25			0.929	700.185
15 - 5			1.800	699.314
15 - 10			1.585	699.529
15 - 15			1.285	699.829
15 - 20			1.084	700.030
15 - 25			0.924	700.190
20 - 5			1.825	699.289
20 - 10			1.605	699.509
20 - 15			1.375	699.739
20 - 20			1.154	699.960
20 - 25			1.059	700.055

Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

446

NOGALES

TOMA TOPOGRAFIA INICIAL NOGALES CRA 12A SUR ENTRE CALLES 24B Y 25				
PUNTO	**V+**	**ALT INST**	**VI**	**COTA**
BM # 7	0.811	1298.811		1298.000
K0+0.0	IZQ		1.880	1296.931
K0+0.0	EJE		1.840	1296.971
K0+0.0	DER		1.750	1297.061
K0+010.0	IZQ		2.350	1296.461
K0+010.0	EJE		2.380	1296.431
K0+010.0	DER		2.410	1296.401
K0+020.0	IZQ		2.830	1295.981
K0+020.0	EJE		2.890	1295.921
K0+020.0	DER		2.900	1295.911
K0+030.0	IZQ		3.370	1295.441
K0+030.0	EJE		3.450	1295.361
K0+030.0	DER		3.450	1295.361
TOMA TOPOGRAFIA INICIAL NOGALES CRA 12A SUR ENTRE CALLES 24B Y 25				
PUNTO	**V+**	**ALT INST**	**VI**	**COTA**
C # 10	0.256	1295.697		1295.441
K0+040.0	IZQ		0.910	1294.787
K0+040.0	EJE		0.970	1294.727
K0+040.0	DER		1.000	1294.697
K0+050.0	IZQ		1.540	1294.157
K0+050.0	EJE		1.590	1294.107
K0+050.0	DER		1.640	1294.057
K0+060.0	IZQ		2.040	1293.657
K0+060.0	EJE		2.200	1293.497
K0+060.0	DER		2.260	1293.437
K0+070.0	IZQ		2.710	1292.987
K0+070.0	EJE		2.860	1292.837
K0+070.0	DER		2.920	1292.777

Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

447

CALARCA

TOMA TOPOGRAFIA INICIAL CALARCA CRA 8A ENTRE CALLES 42 Y 44				
PUNTO	**V+**	**ALT INST**	**VI**	**COTA**
C # 2	0.155	902.736		902.581
K0+0.0	IZQ		2.935	899.801
K0+0.0	EJE		3.080	899.656
K0+0.0	DER		3.090	899.646
K0+05.0	IZQ		2.725	900.011
K0+05.0	EJE		2.640	900.096
K0+05.0	DER		2.766	899.970
K0+010.0	IZQ		2.422	900.314
K0+010.0	EJE		2.411	900.325
K0+010.0	DER		2.405	900.331
K0+015.0	IZQ		2.134	900.602
K0+015.0	EJE		2.095	900.641
K0+015.0	DER		2.159	900.577
K0+020.0	IZQ		1.818	900.918
K0+020.0	EJE		1.784	900.952
K0+020.0	DER		1.825	900.911
K0+025.0	IZQ		1.503	901.233
K0+025.0	EJE		1.466	901.270
K0+025.0	DER		1.483	901.253
K0+030.0	IZQ		1.225	901.511
K0+030.0	EJE		1.092	901.644
K0+030.0	DER		1.146	901.590
K0+035.0	IZQ		0.855	901.881
K0+035.0	EJE		0.794	901.942
K0+035.0	DER		0.848	901.888
K0+040.0	IZQ		0.619	902.117
K0+040.0	EJE		0.481	902.255
K0+040.0	DER		0.560	902.176
K0+045.0	IZQ		0.241	902.495

Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

448

K0+045.0	EJE		0.260	902.476
K0+045.0	DER		0.280	902.456

TOMA TOPOGRAFIA INICIAL CALARCA CRA 8A ENTRE CALLES 42 Y 44				
PUNTO	V+	ALT INST	VI	COTA
C # 2	2.646	905.227		902.581
K0+050.0	IZQ		2.394	902.833
K0+050.0	EJE		2.370	902.857
K0+050.0	DER		2.460	902.767
K0+055.0	IZQ		2.086	903.141
K0+055.0	EJE		2.107	903.120
K0+055.0	DER		2.232	902.995
K0+060.0	IZQ		1.857	903.370
K0+060.0	EJE		1.862	903.365
K0+060.0	DER		1.909	903.318
K0+065.0	IZQ		1.642	903.585
K0+065.0	EJE		1.649	903.578
K0+065.0	DER		1.649	903.578
K0+070.0	IZQ		1.515	903.712
K0+070.0	EJE		1.435	903.792
K0+070.0	DER		1.403	903.824
K0+075.0	IZQ		1.271	903.956
K0+075.0	EJE		1.228	903.999
K0+075.0	DER		1.192	904.035
K0+080.0	IZQ		1.175	904.052
K0+080.0	EJE		1.097	904.130
K0+080.0	DER		1.088	904.139
K0+085.0	IZQ		1.210	904.017
K0+085.0	EJE		1.074	904.153
K0+085.0	DER		1.108	904.119

TOMA TOPOGRAFIA INICIAL CALARCA CRA 8A ENTRE CALLES 42 Y 44				
PUNTO	V+	ALT INST	VI	COTA
C # 3	1.744	905.726		903.982
K0+090.0	IZQ		1.815	903.911
K0+090.0	EJE		1.767	903.959
K0+090.0	DER		1.771	903.955
K0+095.0	IZQ		1.941	903.785
K0+095.0	EJE		2.004	903.722
K0+095.0	DER		2.111	903.615
K0+099.5	IZQ		2.077	903.649
K0+099.5	EJE		2.206	903.520
K0+099.5	DER		2.353	903.373

7.3 Verificación de niveles de Subrasante Lote 2

Se solicita por parte del contratista la verificación de niveles de la subrasante de las vías ejecutadas durante el periodo del Lote 2 localizados en la zona urbana del municipio de Ibagué para dar veracidad al cumplimiento de la estructura del diseño, finalmente se realiza el chequeo pertinente por parte de la interventoría y se evidencia que el nivel del terreno se encuentra dentro de los límites permitidos; A Continuación, se Adjunta Las carteras correspondientes al chequeo realizado en campo.

LIMONAR

TOMA DE EXCAVACION LIMONAR STO SECTOR CALLE 49 ENTRE CRA 6 Y 7							
PUNTO	V+	ALT INST	VI	COTA CAMPO	RASANTE	EXCAV	DIF +/-
BM 150	1.968	1186.051		1184.083			
K0+215.0	IZQ		1.240	1184.811	1185.521	1184.831	0.020
K0+215.0	EJE		1.153	1184.898	1185.581	1184.891	-0.007
K0+220.0	IZQ		1.586	1184.465	1185.140	1184.450	-0.015
K0+220.0	EJE		1.534	1184.517	1185.200	1184.510	-0.007
K0+225.0	IZQ		2.008	1184.043	1184.730	1184.040	-0.003
K0+225.0	EJE		1.947	1184.104	1184.790	1184.100	-0.004
K0+225.0	DER		2.022	1184.029	1184.730	1184.040	0.011
K0+230.0	IZQ		2.345	1183.706	1184.390	1183.700	-0.006
K0+230.0	EJE		2.276	1183.775	1184.450	1183.760	-0.015
K0+230.0	DER		2.335	1183.716	1184.390	1183.700	-0.016
K0+235.0	IZQ		2.640	1183.411	1184.088	1183.398	-0.013
K0+235.0	EJE		2.587	1183.464	1184.148	1183.458	-0.006
K0+235.0	DER		2.646	1183.405	1184.088	1183.398	-0.007
K0+240.0	IZQ		2.940	1183.111	1183.787	1183.097	-0.014
K0+240.0	EJE		2.877	1183.174	1183.847	1183.157	-0.017
K0+240.0	DER		2.937	1183.114	1183.787	1183.097	-0.017
K0+245.0	IZQ		3.150	1182.901	1183.573	1182.883	-0.018
K0+245.0	EJE		3.120	1182.931	1183.603	1182.913	-0.018
K0+245.0	DER		3.156	1182.895	1183.573	1182.883	-0.012
K0+250.0	IZQ		3.394	1182.657	1183.358	1182.668	0.011
K0+250.0	EJE		3.339	1182.712	1183.388	1182.698	-0.014
K0+250.0	DER		3.390	1182.661	1183.358	1182.668	0.007
K0+255.0	IZQ		3.597	1182.454	1183.153	1182.463	0.009

Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

450

K0+255.0	EJE		3.543	1182.508	1183.188	1182.498	-0.010
K0+255.0	DER		3.575	1182.476	1183.153	1182.463	-0.013

NUEVO ARMERO

TOMA DE EXCAVACION NUEVO ARMERO CRA 4B CALLE 100							
PUNTO	V+	ALT INST	VI	COTA CAMPO	RASANTE	EXCAV	DIF +/-
BM 2	0.121	700.121		700			
K0+0.0	IZQ		0.950	699.171	699.522	699.182	0.011
K0+0.0	EJE		0.817	699.304	699.652	699.312	0.008
K0+0.0	DER		0.622	699.499	699.846	699.506	0.007
K0+05.0	IZQ		0.967	699.154	699.502	699.162	0.008
K0+05.0	EJE		0.833	699.288	699.617	699.277	-0.011
K0+05.0	DER		0.680	699.441	699.764	699.424	-0.017
K0+010.0	IZQ		0.977	699.144	699.482	699.142	-0.002
K0+010.0	EJE		0.888	699.233	699.582	699.242	0.009
K0+010.0	DER		0.763	699.358	699.682	699.342	-0.016
K0+015.0	IZQ		1.100	699.021	699.377	699.037	0.016
K0+015.0	EJE		0.990	699.131	699.477	699.137	0.006
K0+015.0	DER		0.872	699.249	699.577	699.237	-0.012
K0+020.0	IZQ		1.178	698.943	699.272	698.932	-0.011
K0+020.0	EJE		1.103	699.018	699.372	699.032	0.014
K0+020.0	DER		0.993	699.128	699.472	699.132	0.004
K0+025.0	IZQ		1.276	698.845	699.172	698.832	-0.013
K0+025.0	EJE		1.173	698.948	699.272	698.932	-0.016
K0+025.0	DER		1.102	699.019	699.372	699.032	0.013
K0+030.0	IZQ		1.386	698.735	699.071	698.731	-0.004
K0+030.0	EJE		1.295	698.826	699.171	698.831	0.005
K0+030.0	DER		1.183	698.938	699.271	698.931	-0.007
K0+035.0	IZQ		1.550	698.571	698.928	698.588	0.017
K0+035.0	EJE		1.452	698.669	699.028	698.688	0.019
K0+035.0	DER		1.353	698.768	699.128	698.788	0.020
K0+040.0	IZQ		1.684	698.437	698.784	698.444	0.007
K0+040.0	EJE		1.582	698.539	698.884	698.544	0.005
K0+040.0	DER		1.482	698.639	698.984	698.644	0.005
K0+048.5	IZQ		1.650	698.471	698.824	698.484	0.013
K0+048.5	EJE		1.553	698.568	698.924	698.584	0.016
K0+048.5	DER		1.428	698.693	699.024	698.684	-0.009

Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

451

TOMA DE EXCAVACION NUEVO ARMERO CRA 4B CALLE 100							
PUNTO	V+	ALT INST	VI	COTA CAMPO	RASANTE	EXCAV	DIF +/-
BM 2	1.76	701.760		700			
0-5			2.610	699.150	699.478	699.138	-0.012
0-10			2.356	699.404	699.736	699.396	-0.008
0-15			2.205	699.555	699.905	699.565	0.010
0-20			1.913	699.847	700.195	699.855	0.008
0-25			1.703	700.057	700.390	700.050	-0.007
5 - 5			2.677	699.083	699.431	699.091	0.008
5 - 10			2.415	699.345	699.680	699.340	-0.005
5 - 15			2.253	699.507	699.864	699.524	0.017
5 - 20			1.976	699.784	700.137	699.797	0.013
5 - 25			1.805	699.955	700.307	699.967	0.012
10 - 5			2.766	698.994	699.348	699.008	0.014
10 - 10			2.483	699.277	699.624	699.284	0.007
10 - 15			2.284	699.476	699.823	699.483	0.007
10 - 20			2.029	699.731	700.079	699.739	0.008
10 - 25			1.886	699.874	700.224	699.884	0.010
15 - 5			2.755	699.005	699.337	698.997	-0.008
15 - 10			2.550	699.210	699.568	699.228	0.018
15 - 15			2.308	699.452	699.782	699.442	-0.010
15 - 20			2.086	699.674	700.021	699.681	0.007
15 - 25			1.964	699.796	700.141	699.801	0.005
20 - 5			2.822	698.938	699.290	698.950	0.012
20 - 10			2.593	699.167	699.512	699.172	0.005
20 - 15			2.361	699.399	699.741	699.401	0.002
20 - 20			2.155	699.605	699.963	699.623	0.018
20 - 25			2.053	699.707	700.058	699.718	0.011

Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

452

NOGALES

TOMA DE EXCAVACION NOGALES CRA 12A SUR ENTRE CALLES 24B Y 25							
PUNTO	V+	ALT INST	VI	COTA CAMPO	RASANTE	EXCAV	DIF +/-
BM 2	0.505	1298.505		1298.00			
K0+0.0	IZQ		2.200	1296.305	1296.830	1296.320	0.015
K0+0.0	EJE		2.053	1296.452	1296.970	1296.460	0.008
K0+0.0	DER		1.946	1296.559	1297.060	1296.550	-0.009
K0+05.0	IZQ		2.421	1296.084	1296.610	1296.100	0.016
K0+05.0	EJE		2.353	1296.152	1296.670	1296.160	0.008
K0+05.0	DER		2.316	1296.189	1296.710	1296.200	0.011
K0+010.0	IZQ		2.620	1295.885	1296.400	1295.890	0.005
K0+010.0	EJE		2.605	1295.900	1296.400	1295.890	-0.010
K0+010.0	DER		2.600	1295.905	1296.400	1295.890	-0.015
K0+015.0	IZQ		2.811	1295.694	1296.190	1295.680	-0.014
K0+015.0	EJE		2.868	1295.637	1296.160	1295.650	0.013
K0+015.0	DER		2.890	1295.615	1296.140	1295.630	0.015
K0+020.0	IZQ		3.050	1295.455	1295.980	1295.470	0.015
K0+020.0	EJE		3.085	1295.420	1295.920	1295.410	-0.010
K0+020.0	DER		3.126	1295.379	1295.880	1295.370	-0.009
K0+025.0	IZQ		3.350	1295.155	1295.680	1295.170	0.015
K0+025.0	EJE		3.394	1295.111	1295.630	1295.120	0.009
K0+025.0	DER		3.418	1295.087	1295.580	1295.070	-0.017
K0+030.0	IZQ		3.628	1294.877	1295.380	1294.870	-0.007
K0+030.0	EJE		3.694	1294.811	1295.330	1294.820	0.009
K0+030.0	DER		3.746	1294.759	1295.280	1294.770	0.011
K0+035.0	IZQ		3.922	1294.583	1295.090	1294.580	-0.003
K0+035.0	EJE		3.990	1294.515	1295.030	1294.520	0.005
K0+035.0	DER		4.053	1294.452	1294.980	1294.470	0.018
K0+040.0	IZQ		4.218	1294.287	1294.790	1294.280	-0.007
K0+040.0	EJE		4.276	1294.229	1294.730	1294.220	-0.009
K0+040.0	DER		4.311	1294.194	1294.690	1294.180	-0.014
K0+045.0	IZQ		4.508	1293.997	1294.500	1293.990	-0.007
K0+045.0	EJE		4.570	1293.935	1294.450	1293.940	0.005
K0+045.0	DER		4.623	1293.882	1294.400	1293.890	0.008
K0+050.0	IZQ		4.806	1293.699	1294.220	1293.710	0.011
K0+050.0	EJE		4.854	1293.651	1294.170	1293.660	0.009

Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

453

K0+050.0	DER		4.900	1293.605	1294.120	1293.610	0.005

TOMA DE EXCAVACION NOGALES CRA 12A SUR ENTRE CALLES 24B Y 25							
PUNTO	V+	ALT INST	VI	COTA CAMPO	RASANTE	EXCAV	DIF +/-
C # 11	0.655	1294.035		1293.380			
K0+055.0	IZQ		0.613	1293.422	1293.940	1293.430	0.008
K0+055.0	EJE		0.720	1293.315	1293.840	1293.330	0.015
K0+055.0	DER		0.758	1293.277	1293.780	1293.270	-0.007
K0+060.0	IZQ		0.890	1293.145	1293.660	1293.150	0.005
K0+060.0	EJE		1.053	1292.982	1293.500	1292.990	0.008
K0+060.0	DER		1.104	1292.931	1293.440	1292.930	-0.001
K0+065.0	IZQ		1.235	1292.800	1293.330	1292.820	0.020
K0+065.0	EJE		1.311	1292.724	1293.220	1292.710	-0.014
K0+065.0	DER		1.411	1292.624	1293.120	1292.610	-0.014
K0+070.0	IZQ		1.576	1292.459	1292.990	1292.480	0.021
K0+070.0	EJE		1.666	1292.369	1292.890	1292.380	0.011
K0+070.0	DER		1.762	1292.273	1292.790	1292.280	0.007

CALARCA

TOMA DE EXCAVACION CALARCA CRA 8A ENTRE CALLES 42 Y 44							
PUNTO	V+	ALT INST	VI	COTA CAMPO	RASANTE	EXCAV	DIF +/-
C#1	2.748	902.748		900.000			
K0+0.0	IZQ		3.300	899.448	899.801	899.461	0.013
K0+0.0	EJE		3.348	899.400	899.724	899.384	-0.016
K0+0.0	DER		3.435	899.313	899.646	899.306	-0.007
K0+05.0	IZQ		3.015	899.733	900.055	899.715	-0.018
K0+05.0	EJE		3.055	899.693	900.023	899.683	-0.010
K0+05.0	DER		3.110	899.638	899.985	899.645	0.007
K0+010.0	IZQ		2.754	899.994	900.341	900.001	0.007
K0+010.0	EJE		2.780	899.968	900.323	899.983	0.015
K0+010.0	DER		1.776	900.972	900.306	899.966	-1.006
K0+015.0	IZQ		2.458	900.290	900.628	900.288	-0.002
K0+015.0	EJE		2.438	900.310	900.643	900.303	-0.007
K0+015.0	DER		2.478	900.270	900.628	900.288	0.018

Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

454

K0+020.0	IZQ		2.177	900.571	900.897	900.557	-0.014
K0+020.0	EJE		2.142	900.606	900.932	900.592	-0.014
K0+020.0	DER		2.192	900.556	900.897	900.557	0.001
K0+025.0	IZQ		1.857	900.891	901.214	900.874	-0.017
K0+025.0	EJE		1.840	900.908	901.249	900.909	0.001
K0+025.0	DER		1.865	900.883	901.214	900.874	-0.009
K0+030.0	IZQ		1.548	901.200	901.530	901.190	-0.010
K0+030.0	EJE		1.531	901.217	901.565	901.225	0.008
K0+030.0	DER		1.569	901.179	901.530	901.190	0.011

TOMA DE EXCAVACION CALARCA CRA 8A ENTRE CALLES 42 Y 44							
PUNTO	V+	ALT INST	VI	COTA CAMPO	RASANTE	EXCAV	DIF +/-
C#2	1.923	904.504		902.581			
K0+035.0	IZQ		3.005	901.499	901.843	901.503	0.004
K0+035.0	EJE		2.976	901.528	901.878	901.538	0.010
K0+035.0	DER		3.015	901.489	901.843	901.503	0.014
K0+040.0	IZQ		2.698	901.806	902.156	901.816	0.010
K0+040.0	EJE		2.672	901.832	902.191	901.851	0.019
K0+040.0	DER		2.694	901.810	902.156	901.816	0.006
K0+045.0	IZQ		2.376	902.128	902.456	902.116	-0.013
K0+045.0	EJE		2.361	902.143	902.491	902.151	0.007
K0+045.0	DER		2.377	902.127	902.456	902.116	-0.012
K0+050.0	IZQ		2.098	902.406	902.755	902.415	0.009
K0+050.0	EJE		2.060	902.444	902.790	902.450	0.006
K0+050.0	DER		2.100	902.404	902.755	902.415	0.011
K0+055.0	IZQ		1.814	902.690	903.038	902.698	0.007
K0+055.0	EJE		1.784	902.720	903.073	902.733	0.012
K0+055.0	DER		1.813	902.691	903.038	902.698	0.006
K0+060.0	IZQ		1.542	902.962	903.320	902.980	0.018
K0+060.0	EJE		1.490	903.014	903.355	903.015	0.001
K0+060.0	DER		1.537	902.967	903.320	902.980	0.013
K0+065.0	IZQ		1.300	903.204	903.550	903.210	0.006
K0+065.0	EJE		1.257	903.247	903.585	903.245	-0.002
K0+065.0	DER		1.304	903.200	903.550	903.210	0.010
K0+070.0	IZQ		1.072	903.432	903.781	903.441	0.009
K0+070.0	EJE		1.017	903.487	903.816	903.476	-0.011
K0+070.0	DER		1.058	903.446	903.781	903.441	-0.005
K0+075.0	IZQ		0.850	903.654	904.011	903.671	0.017
K0+075.0	EJE		0.784	903.720	904.046	903.706	-0.014

Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

455

K0+075.0	DER		0.854	903.650	904.011	903.671	0.021
K0+080.0	IZQ		0.734	903.770	904.111	903.771	0.001
K0+080.0	EJE		0.704	903.800	904.151	903.811	0.011
K0+080.0	DER		0.700	903.804	904.151	903.811	0.007
K0+085.0	IZQ		0.767	903.737	904.081	903.741	0.004
K0+085.0	EJE		0.751	903.753	904.101	903.761	0.008
K0+085.0	DER		0.748	903.756	904.101	903.761	0.005
K0+090.0	IZQ		0.912	903.592	903.950	903.610	0.018
K0+090.0	EJE		0.883	903.621	903.950	903.610	-0.011
K0+090.0	DER		0.884	903.620	903.950	903.610	-0.010
K0+095.0	IZQ		1.060	903.444	903.795	903.455	0.011
K0+095.0	EJE		1.118	903.386	903.735	903.395	0.009
K0+095.0	DER		1.253	903.251	903.580	903.240	-0.011

7.4 Verificación de niveles de rajón Lote 2

Se solicita por parte del contratista la verificación de niveles de la capa de rajón de la vía correspondientes al lote 2 en zona urbana del municipio de Ibagué, para dar veracidad al cumplimiento de la estructura del diseño de la capa de rajón en donde se debe garantizar su espesor especificado en diseño, finalmente se realiza el chequeo pertinente por parte de la interventoría y se evidencia que el nivel del terreno se encuentra dentro de los límites permitidos y así proceder a la aplicación de la capa de base granular.

NOGALES

TOMA DE RAION NOGALES CRA 12A SUR ENTRE CALLES 24B Y 25							
PUNTO	V+	ALT INST	VI	COTA CAMPO	RASANTE	RAION	DIF +/-
C # 10	1.947	1297.388		1295.441			
K0+0.0	IZQ		0.900	1296.488	1296.830	1296.470	-0.018
K0+0.0	EJE		0.764	1296.624	1296.970	1296.610	-0.014
K0+0.0	DER		0.690	1296.698	1297.060	1296.700	0.002
K0+05.0	IZQ		1.153	1296.235	1296.610	1296.250	0.015
K0+05.0	EJE		1.084	1296.304	1296.670	1296.310	0.006
K0+05.0	DER		1.050	1296.338	1296.710	1296.350	0.012
K0+010.0	IZQ		1.354	1296.034	1296.400	1296.040	0.006
K0+010.0	EJE		1.338	1296.050	1296.400	1296.040	-0.010
K0+010.0	DER		1.357	1296.031	1296.400	1296.040	0.009
K0+015.0	IZQ		1.564	1295.824	1296.190	1295.830	0.006
K0+015.0	EJE		1.598	1295.790	1296.160	1295.800	0.010
K0+015.0	DER		1.613	1295.775	1296.140	1295.780	0.005
K0+020.0	IZQ		1.776	1295.612	1295.980	1295.620	0.008
K0+020.0	EJE		1.825	1295.563	1295.920	1295.560	-0.003
K0+020.0	DER		1.873	1295.515	1295.880	1295.520	0.005
K0+025.0	IZQ		2.056	1295.332	1295.680	1295.320	-0.012
K0+025.0	EJE		2.111	1295.277	1295.630	1295.270	-0.007
K0+025.0	DER		2.154	1295.234	1295.580	1295.220	-0.014
K0+030.0	IZQ		2.376	1295.012	1295.380	1295.020	0.008
K0+030.0	EJE		2.408	1294.980	1295.330	1294.970	-0.010
K0+030.0	DER		2.490	1294.898	1295.280	1294.920	0.022
K0+035.0	IZQ		2.643	1294.745	1295.090	1294.730	-0.015
K0+035.0	EJE		2.702	1294.686	1295.030	1294.670	-0.016
K0+035.0	DER		2.785	1294.603	1294.980	1294.620	0.017
K0+040.0	IZQ		2.940	1294.448	1294.790	1294.430	-0.018
K0+040.0	EJE		3.023	1294.365	1294.730	1294.370	0.005
K0+040.0	DER		3.040	1294.348	1294.690	1294.330	-0.018
K0+045.0	IZQ		3.255	1294.133	1294.500	1294.140	0.007
K0+045.0	EJE		3.310	1294.078	1294.450	1294.090	0.012
K0+045.0	DER		3.328	1294.060	1294.400	1294.040	-0.020
K0+050.0	IZQ		3.518	1293.870	1294.220	1293.860	-0.010
K0+050.0	EJE		3.561	1293.827	1294.170	1293.810	-0.017
K0+050.0	DER		3.613	1293.775	1294.120	1293.760	-0.015

Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

457

TOMA DE RAJON NOGALES CRA 12A SUR ENTRE CALLES 24B Y 25							
PUNTO	V+	ALT INST	VI	COTA CAMPO	RASANTE	RAJON	DIF +/-
C # 11	1.511	1294.891		1293.380			
K0+055.0	IZQ		1.297	1293.594	1293.940	1293.580	-0.014
K0+055.0	EJE		1.406	1293.485	1293.840	1293.480	-0.005
K0+055.0	DER		1.489	1293.402	1293.780	1293.420	0.018
K0+060.0	IZQ		1.576	1293.315	1293.660	1293.300	-0.015
K0+060.0	EJE		1.762	1293.129	1293.500	1293.140	0.011
K0+060.0	DER		1.803	1293.088	1293.440	1293.080	-0.008
K0+065.0	IZQ		1.930	1292.961	1293.330	1292.970	0.009
K0+065.0	EJE		2.040	1292.851	1293.220	1292.860	0.009
K0+065.0	DER		2.150	1292.741	1293.120	1292.760	0.019
K0+070.0	IZQ		2.277	1292.614	1292.990	1292.630	0.016
K0+070.0	EJE		2.358	1292.533	1292.890	1292.530	-0.003
K0+070.0	DER		2.450	1292.441	1292.790	1292.430	-0.011

7.5 Verificación de niveles de Base Lote 2

Se solicita por parte del contratista la verificación de niveles de la capa de base granular de la vía correspondientes al lote 2 en zona urbana del municipio de Ibagué, para dar veracidad al cumplimiento de la estructura del diseño de la capa de base granular en donde se debe garantizar su espesor especificado en diseño, finalmente se realiza el chequeo pertinente por parte de la interventoría y se evidencia que el nivel del terreno se encuentra dentro de los límites permitidos y así proceder a la aplicación de la capa final de la pavimentación, ya sea asfalto o concreto según las especificaciones de diseño de cada vía.

PIEDRA PINTADA

TOMA CEREO DE BASE PIEDRA PINTADA CALLE 48A ENTRE CRA 4B Y 5							
PUNTO	V+	ALT INST	VI	COTA CAMPO	RASANTE	BASE	DIF +/-
BM 1	2.218	1302.218		1300.000			
K0+05.0	IZQ		1.860	1300.358	1300.460	1300.350	-0.008
K0+05.0	EJE		1.830	1300.388	1300.480	1300.370	-0.018
K0+05.0	DER		1.876	1300.342	1300.460	1300.350	0.008
K0+010.0	IZQ		1.950	1300.268	1300.369	1300.259	-0.009
K0+010.0	EJE		1.927	1300.291	1300.389	1300.279	-0.012
K0+010.0	DER		1.970	1300.248	1300.369	1300.259	0.011
K0+015.0	IZQ		2.035	1300.183	1300.278	1300.168	-0.015
K0+015.0	EJE		2.013	1300.205	1300.298	1300.188	-0.017
K0+015.0	DER		2.045	1300.173	1300.278	1300.168	-0.005
K0+020.0	IZQ		2.130	1300.088	1300.187	1300.077	-0.011
K0+020.0	EJE		2.113	1300.105	1300.207	1300.097	-0.008
K0+020.0	DER		2.132	1300.086	1300.187	1300.077	-0.009
K0+025.0	IZQ		2.214	1300.004	1300.096	1299.986	-0.018
K0+025.0	EJE		2.204	1300.014	1300.116	1300.006	-0.008
K0+025.0	DER		2.225	1299.993	1300.096	1299.986	-0.007
K0+030.0	IZQ		2.310	1299.908	1300.005	1299.895	-0.013
K0+030.0	EJE		2.292	1299.926	1300.025	1299.915	-0.011
K0+030.0	DER		2.332	1299.886	1300.005	1299.895	0.009
K0+035.0	IZQ		2.350	1299.868	1299.959	1299.849	-0.019
K0+035.0	EJE		2.346	1299.872	1299.979	1299.869	-0.003
K0+035.0	DER		2.388	1299.830	1299.959	1299.849	0.019
K0+040.0	IZQ		2.400	1299.818	1299.912	1299.802	-0.016
K0+040.0	EJE		2.390	1299.828	1299.932	1299.822	-0.006
K0+040.0	DER		2.430	1299.788	1299.912	1299.802	0.014
K0+045.0	IZQ		2.455	1299.763	1299.862	1299.752	-0.011
K0+045.0	EJE		2.448	1299.770	1299.882	1299.772	0.002
K0+045.0	DER		2.485	1299.733	1299.862	1299.752	0.019
K0+050.0	IZQ		2.524	1299.694	1299.819	1299.709	0.015
K0+050.0	EJE		2.522	1299.696	1299.792	1299.682	-0.015
K0+050.0	DER		2.548	1299.670	1299.764	1299.654	-0.016
K0+055.0	IZQ		2.470	1299.748	1299.871	1299.761	0.013
K0+055.0	EJE		2.467	1299.751	1299.844	1299.734	-0.017
K0+055.0	DER		2.500	1299.718	1299.816	1299.706	-0.012
K0+060.0	IZQ		2.410	1299.808	1299.923	1299.813	0.005
K0+060.0	EJE		2.418	1299.800	1299.896	1299.786	-0.014

Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

459

K0+060.0	DER		2.468	1299.750	1299.868	1299.758	0.008
K0+065.0	IZQ		2.340	1299.878	1299.975	1299.865	-0.013
K0+065.0	EJE		2.380	1299.838	1299.931	1299.821	-0.017
K0+065.0	DER		2.430	1299.788	1299.887	1299.777	-0.011
K0+070.0	IZQ		2.260	1299.958	1300.082	1299.972	0.014
K0+070.0	EJE		2.280	1299.938	1300.049	1299.939	0.001
K0+070.0	DER		2.340	1299.878	1299.972	1299.862	-0.016

NUEVO ARMERO

TOMA CEREO VIA NUEVO ARMERO CRA 4B CALLE 100							
PUNTO	V+	ALT INST	VI	COTA CAMPO	RASANTE	BASE	DIF +/-
BM 2	0.074	700.074		700.00			
K0+05.0	IZQ		0.753	699.321	699.502	699.312	-0.009
K0+05.0	EJE		0.640	699.434	699.617	699.427	-0.007
K0+05.0	DER		0.495	699.579	699.764	699.574	-0.005
K0+010.0	IZQ		0.778	699.296	699.482	699.292	-0.004
K0+010.0	EJE		0.672	699.402	699.582	699.392	-0.010
K0+010.0	DER		0.570	699.504	699.682	699.492	-0.012
K0+015.0	IZQ		0.888	699.186	699.377	699.187	0.001
K0+015.0	EJE		0.768	699.306	699.477	699.287	-0.019
K0+015.0	DER		0.690	699.384	699.577	699.387	0.003
K0+020.0	IZQ		0.996	699.078	699.272	699.082	0.004
K0+020.0	EJE		0.885	699.189	699.372	699.182	-0.007
K0+020.0	DER		0.794	699.280	699.472	699.282	0.002
K0+025.0	IZQ		1.090	698.984	699.172	698.982	-0.002
K0+025.0	EJE		0.985	699.089	699.272	699.082	-0.007
K0+025.0	DER		0.885	699.189	699.372	699.182	-0.007
K0+030.0	IZQ		1.182	698.892	699.071	698.881	-0.011
K0+030.0	EJE		1.100	698.974	699.171	698.981	0.007
K0+030.0	DER		1.003	699.071	699.271	699.081	0.010
K0+035.0	IZQ		1.344	698.730	698.928	698.738	0.008
K0+035.0	EJE		1.242	698.832	699.028	698.838	0.006
K0+035.0	DER		1.125	698.949	699.128	698.938	-0.011
K0+040.0	IZQ		1.473	698.601	698.784	698.594	-0.007
K0+040.0	EJE		1.375	698.699	698.884	698.694	-0.005
K0+040.0	DER		1.280	698.794	698.984	698.794	0.000
K0+048.5	IZQ		1.450	698.624	698.824	698.634	0.010
K0+048.5	EJE		1.349	698.725	698.924	698.734	0.009
K0+048.5	DER		1.233	698.841	699.024	698.834	-0.007

Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

460

TOMA CEREO BAHIA NUEVO ARMERO CRA 4B CALLE 100							
PUNTO	V+	ALT INST	VI	COTA CAMPO	RASANTE	BASE	DIF +/-
BM 2	0.544	700.544		700.00			
0-5			1.264	699.280	699.478	699.288	0.008
0-10			0.990	699.554	699.736	699.546	-0.008
0-15			0.817	699.727	699.905	699.715	-0.012
0-20			0.543	700.001	700.195	700.005	0.004
0-25			0.356	700.188	700.390	700.200	0.012
5 - 5			1.314	699.230	699.431	699.241	0.011
5 - 10			1.053	699.491	699.680	699.490	-0.001
5 - 15			0.880	699.664	699.864	699.674	0.010
5 - 20			0.614	699.930	700.137	699.947	0.017
5 - 25			0.435	700.109	700.307	700.117	0.008
10 - 5			1.390	699.154	699.348	699.158	0.004
10 - 10			1.126	699.418	699.624	699.434	0.016
10 - 15			0.925	699.619	699.823	699.633	0.014
10 - 20			0.660	699.884	700.079	699.889	0.005
10 - 25			0.513	700.031	700.224	700.034	0.003
15 - 5			1.400	699.144	699.337	699.147	0.003
15 - 10			1.153	699.391	699.568	699.378	-0.013
15 - 15			0.966	699.578	699.782	699.592	0.014
15 - 20			0.704	699.840	700.021	699.831	-0.009
15 - 25			0.582	699.962	700.141	699.951	-0.011
20 - 5			1.450	699.094	699.290	699.100	0.006
20 - 10			1.211	699.333	699.512	699.322	-0.011
20 - 15			0.990	699.554	699.741	699.551	-0.003
20 - 20			0.762	699.782	699.963	699.773	-0.009
20 - 25			0.680	699.864	700.058	699.868	0.004

Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

461

NOGALES

TOMA CEREO DE BASE NOGALES CRA 12A SUR ENTRE CALLES 24B Y 25							
PUNTO	V+	ALT INST	VI	COTA CAMPO	RASANTE	BASE	DIF +/-
C # 10	2.161	1297.602		1295.441			
K0+0.0	IZQ		0.967	1296.635	1296.830	1296.620	-0.015
K0+0.0	EJE		0.825	1296.777	1296.970	1296.760	-0.017
K0+0.0	DER		0.758	1296.844	1297.060	1296.850	0.006
K0+05.0	IZQ		1.200	1296.402	1296.610	1296.400	-0.002
K0+05.0	EJE		1.130	1296.472	1296.670	1296.460	-0.012
K0+05.0	DER		1.095	1296.507	1296.710	1296.500	-0.007
K0+010.0	IZQ		1.417	1296.185	1296.400	1296.190	0.005
K0+010.0	EJE		1.332	1296.270	1296.400	1296.190	-0.080
K0+010.0	DER		1.402	1296.200	1296.400	1296.190	-0.010
K0+015.0	IZQ		1.615	1295.987	1296.190	1295.980	-0.007
K0+015.0	EJE		1.634	1295.968	1296.160	1295.950	-0.018
K0+015.0	DER		1.664	1295.938	1296.140	1295.930	-0.008
K0+020.0	IZQ		1.827	1295.775	1295.980	1295.770	-0.005
K0+020.0	EJE		1.875	1295.727	1295.920	1295.710	-0.017
K0+020.0	DER		1.925	1295.677	1295.880	1295.670	-0.007
K0+025.0	IZQ		2.116	1295.486	1295.680	1295.470	-0.016
K0+025.0	EJE		2.177	1295.425	1295.630	1295.420	-0.005
K0+025.0	DER		2.230	1295.372	1295.580	1295.370	-0.002
K0+030.0	IZQ		2.420	1295.182	1295.380	1295.170	-0.012
K0+030.0	EJE		2.489	1295.113	1295.330	1295.120	0.007
K0+030.0	DER		2.528	1295.074	1295.280	1295.070	-0.004
K0+035.0	IZQ		2.730	1294.872	1295.090	1294.880	0.008
K0+035.0	EJE		2.780	1294.822	1295.030	1294.820	-0.002
K0+035.0	DER		2.822	1294.780	1294.980	1294.770	-0.010
K0+040.0	IZQ		3.015	1294.587	1294.790	1294.580	-0.007
K0+040.0	EJE		3.078	1294.524	1294.730	1294.520	-0.004
K0+040.0	DER		3.132	1294.470	1294.690	1294.480	0.010
K0+045.0	IZQ		3.308	1294.294	1294.500	1294.290	-0.004
K0+045.0	EJE		3.358	1294.244	1294.450	1294.240	-0.004
K0+045.0	DER		3.415	1294.187	1294.400	1294.190	0.003
K0+050.0	IZQ		3.587	1294.015	1294.220	1294.010	-0.005
K0+050.0	EJE		3.655	1293.947	1294.170	1293.960	0.013
K0+050.0	DER		3.700	1293.902	1294.120	1293.910	0.008

Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

462

TOMA CEREO DE BASE NOGALES CRA 12A SUR ENTRE CALLES 24B Y 25							
PUNTO	V+	ALT INST	VI	COTA CAMPO	RASANTE	BASE	DIF +/-
C # 11	1.844	1295.224		1293.380			
K0+055.0	IZQ		1.487	1293.737	1293.940	1293.730	-0.007
K0+055.0	EJE		1.597	1293.627	1293.840	1293.630	0.003
K0+055.0	DER		1.669	1293.555	1293.780	1293.570	0.015
K0+060.0	IZQ		1.794	1293.430	1293.660	1293.450	0.020
K0+060.0	EJE		1.937	1293.287	1293.500	1293.290	0.003
K0+060.0	DER		2.002	1293.222	1293.440	1293.230	0.008
K0+065.0	IZQ		2.105	1293.119	1293.330	1293.120	0.001
K0+065.0	EJE		2.224	1293.000	1293.220	1293.010	0.010
K0+065.0	DER		2.325	1292.899	1293.120	1292.910	0.011
K0+070.0	IZQ		2.452	1292.772	1292.990	1292.780	0.008
K0+070.0	EJE		2.557	1292.667	1292.890	1292.680	0.013
K0+070.0	DER		2.658	1292.566	1292.790	1292.580	0.014

CALARCA

TOMA CEREO DE BASE CALARCA CRA 8A ENTRE CALLES 42 Y 44							
PUNTO	V+	ALT INST	VI	COTA CAMPO	RASANTE	BASE	DIF +/-
C#1	0.054	902.635		902.581			
K0+05.0	IZQ		2.773	899.862	900.055	899.865	0.003
K0+05.0	EJE		2.792	899.843	900.023	899.833	-0.010
K0+05.0	DER		2.848	899.787	899.985	899.795	0.008
K0+010.0	IZQ		2.502	900.133	900.341	900.151	0.018
K0+010.0	EJE		2.497	900.138	900.323	900.133	-0.005
K0+010.0	DER		2.523	900.112	900.306	900.116	0.004
K0+015.0	IZQ		2.190	900.445	900.628	900.438	-0.007
K0+015.0	EJE		2.179	900.456	900.643	900.453	-0.003
K0+015.0	DER		2.178	900.457	900.628	900.438	-0.019
K0+020.0	IZQ		1.908	900.727	900.897	900.707	-0.020
K0+020.0	EJE		1.887	900.748	900.932	900.742	-0.006
K0+020.0	DER		1.916	900.719	900.897	900.707	-0.012
K0+025.0	IZQ		1.608	901.027	901.214	901.024	-0.003
K0+025.0	EJE		1.582	901.053	901.249	901.059	0.006
K0+025.0	DER		1.628	901.007	901.214	901.024	0.017
K0+030.0	IZQ		1.280	901.355	901.530	901.340	-0.015
K0+030.0	EJE		1.273	901.362	901.565	901.375	0.013
K0+030.0	DER		1.317	901.318	901.530	901.340	0.022

Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

463

TOMA CEREO DE BASE CALARCA CRA 8A ENTRE CALLES 42 Y 44							
PUNTO	V+	ALT INST	VI	COTA CAMPO	RASANTE	BASE	DIF +/-
C#2	2.342	904.923		902.581			
K0+035.0	IZQ		3.253	901.670	901.843	901.653	-0.017
K0+035.0	EJE		3.224	901.699	901.878	901.688	-0.011
K0+035.0	DER		3.286	901.637	901.843	901.653	0.016
K0+040.0	IZQ		2.974	901.949	902.156	901.966	0.017
K0+040.0	EJE		2.916	902.007	902.191	902.001	-0.006
K0+040.0	DER		2.959	901.964	902.156	901.966	0.002
K0+045.0	IZQ		2.644	902.279	902.456	902.266	-0.014
K0+045.0	EJE		2.619	902.304	902.491	902.301	-0.004
K0+045.0	DER		2.650	902.273	902.456	902.266	-0.008
K0+050.0	IZQ		2.363	902.560	902.755	902.565	0.005
K0+050.0	EJE		2.316	902.607	902.790	902.600	-0.007
K0+050.0	DER		2.346	902.577	902.755	902.565	-0.012
K0+055.0	IZQ		2.075	902.848	903.038	902.848	0.000
K0+055.0	EJE		2.029	902.894	903.073	902.883	-0.012
K0+055.0	DER		2.088	902.835	903.038	902.848	0.012
K0+060.0	IZQ		1.807	903.116	903.320	903.130	0.014
K0+060.0	EJE		1.768	903.155	903.355	903.165	0.010
K0+060.0	DER		1.803	903.120	903.320	903.130	0.010
K0+065.0	IZQ		1.564	903.359	903.550	903.360	0.001
K0+065.0	EJE		1.513	903.410	903.585	903.395	-0.015
K0+065.0	DER		1.559	903.364	903.550	903.360	-0.004
K0+070.0	IZQ		1.335	903.588	903.781	903.591	0.003
K0+070.0	EJE		1.284	903.639	903.816	903.626	-0.013
K0+070.0	DER		1.326	903.597	903.781	903.591	-0.006
K0+075.0	IZQ		1.120	903.803	904.011	903.821	0.018
K0+075.0	EJE		1.083	903.840	904.046	903.856	0.016
K0+075.0	DER		1.116	903.807	904.011	903.821	0.014
K0+080.0	IZQ		1.013	903.910	904.111	903.921	0.011
K0+080.0	EJE		0.970	903.953	904.151	903.961	0.008
K0+080.0	DER		0.975	903.948	904.151	903.961	0.013
K0+085.0	IZQ		1.034	903.889	904.081	903.891	0.002
K0+085.0	EJE		1.006	903.917	904.101	903.911	-0.006
K0+085.0	DER		1.006	903.917	904.101	903.911	-0.006
K0+090.0	IZQ		1.150	903.773	903.950	903.760	-0.013
K0+090.0	EJE		1.152	903.771	903.950	903.760	-0.011
K0+090.0	DER		1.169	903.754	903.950	903.760	0.006
K0+095.0	IZQ		1.334	903.589	903.795	903.605	0.016
K0+095.0	EJE		1.384	903.539	903.735	903.545	0.006
K0+095.0	DER		1.525	903.398	903.580	903.390	-0.008

Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

464

Registro fotográfico








Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

CONCLUSIÓN

Durante el periodo comprendido entre el 21 de marzo de 2026 al 20 de abril del 2026, se ejecutó satisfactoriamente el proceso de acompañamiento y supervisión al Proyecto **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA /Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2"**

Permitiendo la óptima ejecución en el desarrollo de las actividades topográficas realizadas por el consultor, así mismo se le recuerda al contratista la importancia de que cada proceso constructivo realizado correspondiente a la capa de la estructura de pavimento.

ELABORADO POR:

TOPOGRAFO: ERIKA LEONELA ZARTA

T.P : 01-15459 C.P.N.T

MIGUEL ANGEL TOBAR MARTINEZ

T.P : 01-15530 C.P.N.T

ANEXO 9
INFORME SISO

CONTRATO 3158 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025

CONSORCIO VÍAS IBAGUÉ

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA/ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ LOTE 1 Y 2"

INFORME DE INTERVENTORÍA N° 5

COMPONENTE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO





PERIODO

21 DE MARZO AL 20 ABRIL DEL 2026

Elaborado por Consorcio vias Ibagué

468

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

INTRODUCCIÓN 4
JUSTIFICACIÓN 5
OBJETIVOS 6
DESARROLLO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALID EN EL TRABAJO 6
ALCANCE DE LA INTERVENTORÍA: 6
ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA SST 7
1. ASPECTOS U OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 7
2. ASPECTOS TÉCNICOS 8
2.1 CONTROL DEL PERSONAL 8
3. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL 16
3.1 VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 16
3.2 VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN 16
3.3 VERIFICACIÓN DE EXÁMENES OCUPACIONALES 17
3.4 (ATS) ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO 18
3.5 PROGRAMA DE CAPACITACIONES Y CHARLAS DE SEGURIDAD 19
CHARLAS DE SEGURIDAD 20
3.6 PROGRAMA DE INSPECCIONES 21
3.7 ENTREGA DE EPP Y DOTACIÓN 22
3.8 SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN 23
3.9 ACCIDENTES E INCIDENTES 23
3.10 ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN 24
3.11 GESTIÓN DEL COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 25
3.12 CONTROL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 25
4. REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN DIARIA 26
5. PLAN DE EMERGENCIA 26

469

6. **SUMINISTRO DE HIDRATACIÓN** 27
7. **CONDICIONES DE HIGIENE** 27
8. **PROGRAMADE ORDEN Y ASEO** 27
9. **OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES** 34
10. **EVIDENCIA FOTOGRAFICA** 28
11. **ANEXOS** 35

INTRODUCCIÓN

Las construcciones representan uno de los ambientes más peligrosos estando clasificados en el nivel de riesgo V, debido a los procesos, tareas y actividades que se ejecutan, así como la magnitud de los riesgos a los que se encuentran expuestos los trabajadores y que pueden materializarse generando graves consecuencias tanto para el trabajador como para la organización. Es por ello por lo que juega un papel muy importante la seguridad y salud en el trabajo como estrategia de prevención, cuyo propósito y finalidad es tener un ambiente de trabajo seguro y agradable para los colaboradores.

El seguimiento al SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO que viene desarrollando el contratista, es importante ya que permite identificar los riesgos en los trabajos realizados, e implementar estrategias para mitigar y controlar los mismos. Establecido en la normatividad aplicable.

JUSTIFICACIÓN

La realización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo es de vital importancia según el Decreto 1072 del 2015 el cual establece lineamientos para la inspección, vigilancia y control de todas las empresas legalmente constituidas con el fin de unificar la normativa laboral, estableciendo obligaciones para empleadores a través de inspección, vigilancia y control.

Desde interventoría se verifica, analiza y acompaña al contratista lote 1 UNIÓN TEMPORAL URBANAS Ibagué, lote 2 CONSORCIO IBAGUÉ VIAL URBANO 2025 en el cumplimiento de la normatividad legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo. (SST), además de Resolución 0312 de 2019 que establece los estándares mínimos del SG-SST.

La interventoria junto con los contratistas cumple con las obligaciones del Decreto 723 de 2013, Capitulo 4, art, 16 "Obligaciones del contratista" en la presentación de este informe y a través de sus anexos se da cumplimiento a dicha obligación.

De esta manera se hace seguimiento a cualquier tipo de incidente, accidente y/o enfermedad laboral que pueda generar un índice de ausentismo o pérdida para la compañía. A su vez permite incrementar la productividad de la empresa generando beneficios Y estableciendo reglas claras sobre relaciones laborales y de seguridad y salud en el trabajo.

472

OBJETIVOS

Objetivo de la interventoría: El objetivo de este informe para el periodo comprendido entre el 21 de MARZO AL 20 de ABRIL es reportar a la ALCALDÍA DE IBAGUÉ, LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, el estado actual de la obra con el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y de la verificación en el cumplimiento de la normatividad legal vigente, RESOLUCIÓN 0312 del 13 de febrero de 2019, por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST, y demás normas que apliquen en la actividad.

DESARROLLO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALID EN EL TRABAJO

ALCANCE DE LA INTERVENTORÍA: Evaluar la planificación, desarrollo y y aplicación del SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG – SST), además del PLAN DE GESTIÓN SOCIAL, de los contratistas, realizar intervención cuando se amerite con el fin de salvaguardar la integridad de los trabajadores y el bienestar de la organización.

Criterios de la interventoría:

- Resolución 0312 de 2019
- Decreto 1072 de 2015.
- Plan de trabajo.
- Plan de capacitación.
- Matriz de identificación de peligros y riesgos.
- Plan de respuesta ante emergencias.
- Programa de orden y aseo.
- Plan de manejo de tránsito
- Documentación maquinaria y vehículos utilizados en la ejecución de las obras.

ASESOR SST DE LA INTERVENTORÍA: Maribel Ortega Campos

Periodo de revisión por parte de la interventoría: 21 de Marzo al 20 De Abril de 2026

ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA SST

Las siguientes son las actividades desarrolladas por la interventoria, en la supervisión al contratista en la implementación del SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, se hace el acompañamiento permanente al contratista velando por el cumplimiento de la normatividad legal vigente colombiana con respecto al personal vinculado incluyendo a subcontratistas durante el periodo.

1. ASPECTOS U OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

- Se solicita a los contratistas el cumplimiento de lo establecido en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) entregado a la interventoría por parte de ellos (Contratistas).
- Se solicita documentación requerida para ingreso a obra del contratista y subcontratista.
- Se solicita el pago de la seguridad social del personal en general, contratista y subcontratistas para verificación del cumplimiento de las obligaciones.
- De igual modo se solicita y orienta al contratista hacer implementación del SG-SST según lo contempla este con respecto al manejo de los subcontratistas vinculados en el proceso de ejecución del objeto del contrato (inducciones, verificación de seguridad social vigente, pre operacionales de maquinaria, verificación de la documentación de la maquinaria y personal, charlas de seguridad, inspecciones de las áreas y equipos a utilizar) cada actividad va soportada con registro fotográfico de parte del contratista, con el fin de dar cumplimiento al SG-SST.
- Se verifica y solicita la entrega y reposición de dotación y elementos de protección individual firmada por los trabajadores, requerida según actividad realizada.
- Revisión del plan de gestión social, y acompañamiento en la ejecución de este
- Se generan observaciones sobre hallazgos en obra tras la debida visita y supervisión del profesional en SST a los frentes de trabajo, dándolos a conocer a contratista por medio de oficio.

474

2. ASPECTOS TÉCNICOS

2.1 CONTROL DEL PERSONAL

INTERVENTORÍA CONSORCIO VÍAS IBAGUÉ, cuenta con personal capacitado y apto para la ejecución de las actividades objeto de contrato.

Personal

No	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO
1	CARDONA ÁLVAREZ TOMAS ALBERTO	10303800	Ingeniero Residente N°1
2	CHAMORRO ROJAS CAMILO ALEJANDRO	93238343	Cadenero
3	CIFUENTES TORRES LIZETH MARCELA	1110451305	Ingeniero Residente N°2
4	CORREDOR REYES NICOLLE CAMILA	1005692157	Inspectora
5	CUBILLOS HERNÁNDEZ DIANA LUCIA	65768009	Ingeniero Residente N°3
6	CUELLAR DIAZ CESAR AUGUSTO	93372186	Especialista Ambiental
7	GUTIÉRREZ ROJAS HERMINDA	65696913	Profesional SST N°2
8	HERNÁNDEZ REYES DANIEL FELIPE	1007411197	Ingeniero Residente N°5
9	MARÍN GUZMÁN HEYDY CATERINE	1234643194	Profesional SST N°1
10	SERGIO ALEJANDRO MENDOZA TINOCO	1105460201	Inspector
11	MUÑOZ ROJAS MARIAN KATERINE	1110089423	Aux SST
12	NIEVES HERRERA ANDERSON JAVIER	1121938437	Ingeniero Aux N°1
13	NIEVES HERRERA LISETH MARYORI	1121906294	Ingeniero Residente N°4
14	ORTEGA CAMPO MARIBEL	1121842452	Profesional SST N°3
15	OTALORA MURILLO ANGIE TATIANA	1234643903	Ingeniero Aux N°2

475

16	FREDY SANDOVAL MORALES	93370724	
17	TOBAR MARTÍNEZ MIGUEL ÁNGEL	1110534157	Topógrafo N°2
18	URUEÑA ZARTHA JAIME	93403029	Conductor
19	ZARTA ERIKA LEONELA	1110546744	Topógrafo N°1

Cada empleador cuenta en su grupo de trabajo personal capacitado y apto para la ejecución de las distintas actividades, para este periodo (21 Marzo – 20 Abril), cuentan con el siguiente personal

LOTE 1 - UNIÓN TEMPORAL URBANAS IBAGUÉ

Lote 1 cuenta con el siguiente personal en este periodo

- 36 colaboradores directos (Un ingreso de personal), UNION TEMPORAL URBANAS IBAGUE
- Personal de ASFALTEMOS S.A.S (17 Colaboradores)
- LOGÍSTICA Y MUDANZA (2 Colaboradores)
- CONSTRUVIAS SAS (6 Colaboradores)
- O&C INGENIERIA SAS (3 Colaboradores)

UNIÓN TEMPORAL URBANAS IBAGUÉ				
No	**NOMBRE DEL TRABAJADOR**	**CEDULA**	**CARGO**	**CUADRILLA**
1	Sofia Chipatecua Cubillos	1.005.822.372	Ingeniera Administrativa	Administrativa
2	Vidal González Romero	93.410.425	Ayudante de Obra	Operativo
3	Ever Julián Guarnizo Triana	1.105.692.748	Aux administrativo	Administrativa
4	Carlos Eduardo Vergara Vidal	14.398.695	Ayudante de Obra	Operativo
5	Jhonatan Guzmán Bravo	1.109.265.231	Ingeniero Residente	Operativo

476

6	Jair Osorio Herrera	1.121.862.849	Ayudante de Obra	Operativo
7	Darwin Sleider Pérez Lezama	1.006.127.576	Ayudante de Obra	Operativo
8	Juan Esteban Cubillos Yara	1.105.473.971	Ayudante de Obra	Operativo
9	Aldair Otavo Parra	1.007.287.708	Ayudante de Obra	Operativo
10	Carlos Eduardo Sánchez Montoya	1.110.551.210	Ayudante de Obra	Operativo
11	Didier Andrés Sandoval	1.015.995.113	Ayudante de Obra	Operativo
12	Francisco José Gualtero Pérez	10.234.997	Inspector de Obra	Operativo
13	Diana Patricia Cabezas Hormiga	38.142.489	Profesional SST	Operativo
14	Esdedier Armando Capera Mahecha	1.110.482.357	Oficial de Obra	Operativo
15	Leidy Liliana Vieda Celis	1.110.442.850	Topógrafa	Operativo
16	Mauricio Hernán Cespedes Robledo	5.820.172	Topógrafo	Operativo
17	Karla Yolima Rodrigues	1.034.276,251	Aux Administrativa	Administrativa
18	Anderson Camilo Olaya Ospina	1006117597	Ayudante de obra	Operativo
19	Jhon Sebastian Baron Urbina	1110547020	Ayudante	Operativo
20	Daniel Fernando Capera	5829253	Ayudante	Operativo
21	Tatiana Andrea Barragan Mayorga	65631328	Ayudante	Operativo
22	Yeison Stiben Torres Hoyos	1105610325	Ayudante	Operativo
23	Jose Fernando Labrador	93406754	Ayudante	Operativo
24	Edison Javier Vargas Diaz	1110497680	Ayudante	Operativo
25	Luis Angel Rojas Julio	93409284	Ayudante	Operativo

477

26	Mario Pirazan Vanegas	93384471	Ayudante	Operativo
27	Nestor Reinaldo Florez Murillo	1110578242	Topógrafo	Operativo
28	Jose Gregorio Arias	14296067	Ayudante	Operativo
29	Yonatthan Eduardo Chavez	80818958	Ayudante	Operativo
30	Hernan Mauricio Monak Villamarin	93406983	Ayudante	Operativo
31	Félix María Aldana Guzman	93363872	Ayudante	Operativo
32	José Norvey González Cubides	93384707	Ayudante	Operativo
33	Jorge Luis Hernández Duque	1110511413	Topógrafo	Operativo
34	Claudia Patricia Gaitan Borja	28979202	Profesional SST	Operativo
35	Diego Javier Morales	1005713166	Ayudante	Operativo
36	Diana Katherine Bocanegra Rodriguez	111051821	Ing, Residente	Operativo

LOTE 2 – CONSORCIO IBAGUÉ VIAL URBANO

- 64 colaboradores directamente CONSORCIO IBAGUÉ VIAL URBANO
- 6 colaboradores vinculados por subcontratista PAVETOL SAS

CONSORCIO IBAGUE VIAL URBANO				
No.	**NOMBRE TRABAJADOR**	**CEDULA**	**CARGO**	**CUADRILLA**
1	Jaime Alexander Ortigoza Giraldo	1.110.539.630	Ingeniero Director	Administrativa
2	Luis Ricardo Ortigoza González	14.225.605	Ingeniero Residente	Administrativa
3	Cesar Sandoval Páez	5.829.690	Ingeniero Residente	Administrativa
4	Jorge Alberto Ramos Salazar	79.893.182	Especialista Ambiental	Administrativa

478

5	Juan Daniel Moya Robayo	3.192.972	Especialista En Geotecnia	Administrativa
6	Diego Andrés Diaz Diaz	5.824.544	Especialista En Pavimentos	Administrativa
7	Diana Patricia Giraldo Moreno	51.724.999	Profesional Social	Administrativa
8	Gloria Astrid López Sánchez	65.753.684	Profesional SST	Administrativa
9	Yenifer Katherine Somoyar Riveros	1.110.589.809	Auxiliar SST	Operativo
10	María Fernanda Valdés Celis	1.006.128.005	Auxiliar SST	Operativo
11	Luis Esteven Téllez López	1.005.814.348	Auxiliar SST	Operativo
12	Daniel Ricardo Guzmán Guzmán	1.110.495.186	Inspector De Obra	Operativo
13	Juan Camilo Álvarez	1.110.564.539	Inspector De Obra	Operativo
14	Valeria Palomino	1.007.411.077	Inspector De Obra	Operativo
15	Orlando Mora Mora	1.110.446.536	Topógrafo	Operativo
16	Luis Fernando Villamil Grisales	14.218.381	Topógrafo	Operativo
17	Luis Enrique Garaya Moreno	14.241.018	Topógrafo	Operativo
18	Camilo Andrés Arboleda Olaya	1.110.527.000	Operario Maquinaria	Operativo
19	Sixto Lamaza Vega	2.736.167	Operario Maquinaria	Operativo
20	Juan De Jesús Arboleda	14.224.468	Operario Maquinaria	Operativo
21	Juan Camilo Sánchez	1.005.718.608	Operario Maquinaria	Operativo
22	Vladimir Gamba	5.819.326	Operario Maquinaria	Operativo
23	Jhon Edison Suarez Acosta	93.237.235	Tornillero	Operativo
24	Jairo Alonso Corredor Rios	5.821.057	Conductor De Volqueta	Operativo
25	Yovani Leal Pérez	93.393.335	Conductor De Volqueta	Operativo
26	Gustavo Capera Soto	93.386.584	Conductor De Volqueta	Operativo
27	José Ferney Franco	93.362.388	Rastrillero	Operativo
28	Enalber Leal Moreno	14.277.878	Rastrillero	Operativo
29	Rogelio Alberto Laverde	93.413.284	Ayudante De Obra	Operativo
30	Ángel Alberto Cantor Valencia	93.386.227	Ayudante De Obra	Operativo

479

31	Hernando Viedman Hurtado	76.341.553	Ayudante De Obra	Operativo
32	Ancizar Alzate Gallego	93.409.469	Ayudante De Obra	Operativo
33	Jaime Bernal Perez	93.381.630	Ayudante De Obra	Operativo
34	María Fernanda López Vergara	1.088.284.311	Ayudante De Obra	Operativo
35	Brayan Andrés Arango Arias	1.006.128.610	Ayudante De Obra	Operativo
36	Juan Carlos Corrales Naarvaez	14.281.514	Operario Maquinaria	Operativo
37	Fredy Ernesto Molano Riaño	93.437.020	Operario Maquinaria	Operativo
38	Ancizar Rocha lozano	93.083.941	Operador maquinaria	Operativo
39	Luis Alberto Lozano Rodríguez	14.239.870	Oficial De Obra	Operativo
40	Parmenio Benavidez Jiménez	18.221.491	Oficial De Obra	Operativo
41	Ronald Stick Marulanda Vaquero	1.134.643.925	Ayudante De Obra	Operativo
42	Franz De Jesús Parra Guillen	1.063.142.354	Ayudante De Obra	Operativo
43	Fabian Guillermo Ruiz Vaquiro	1.110.472.436	Ayudante De Obra	Operativo
44	Reinaldo Flores Osorio	2.474.093	Ayudante De Obra	Operativo
45	Miguel Angel Ipuz	1.110.507.241	Ayudante De Obra	Operativo
46	Carlos Andres Guerreros	1.193.044.116	Ayudante De Obra	Operativo
47	Steven Humberto Lozano	1.005.755.454	Ayudante De Obra	Operativo
48	Olibardo Medina	93.386.448	Ayudante De Obra	Operativo
49	Diego Alejandro Olmos	1.110.573.499	Ayudante De Obra	Operativo
50	Johnatan Fernan Suarez	1.005.780.451	Ayudante De Obra	Operativo
51	Jhon Faber Valencia M	1.007.303.397	Ayudante De Obra	Operativo
52	Francisco Villanueva	5994869	Ayudante De Obra	Operativo

480

53	Orlanbdis Cabezas Bustamante	93.385.154	Ayudante De Obra	Operativo
54	Aldinever Cardena	80.142.451	Ayudante De Obra	Operativo
55	Fabian Mauricio Castillo	94.463.549	Ayudante De Obra	Operativo
56	Benjamin Puentes Vanegas	14.240.101	Ayudante De Obra	Operativo
57	Mateo Quiroga Echeverry	111.204.146	Ayudante De Obra	Operativo
58	Fredy Perez	93.368.341	Ayudante De Obra	Operativo
59	Nelson Enrique Hegidio	14.279.510	Ayudante De Obra	Operativo
60	William Alexander García	1.101.596.261	Ayudante De Obra	Operativo
61	Juan David Franco	1.006.165.309	Operador Maquinaria	Operativo
62	Cristhian Alberto Santos Sanchez	100.457.849	Ayudante De Obra	Operativo
63	Andres Felipe Sosa	93.128.630	Ayudante De Obra	Operativo
64	Diego Fernando Neira	1.000.457.849	Ayudante De Obra	Operativo
65	Luis Carlos Perdomo Motta	93.359.732	Ayudante De Obra	Operativo
66	Ivan Guillermo Fernandez	2.235.389	Ayudante De Obra	Operativo
67	Juan Arnoldo Rubio Mendez	2.235.389	Ayudante De Obra	Operativo
68	Jean Carlos Brito	6.094.611	Ayudante De Obra	Operativo
69	Juan Gabriel Castro	79.875.112	Ayudante De Obra	Operativo
70	Widerlen Cedeño	1.117.499.765	Ayudante De Obra	Operativo
71	Eder Delgado Montejo	93.386.441	Ayudante De Obra	Operativo
72	Carlos Andres Hernandez	1.105.304.084	Ayudante De Obra	Operativo
73	Luis Jacinto Parra	93.371.206	Ayudante De Obra	Operativo

74	Daniel Estuben Sanchez	1.105.677.397	Ayudante De Obra	Operativo
75	Luis Queneber Rodriguez	14.271.484	Ayudante De Obra	Operativo
76	William Esteven Rojas	1.006.121.591	Ayudante De Obra	Operativo
77	Ferney Romero	5.971.712	Ayudante De Obra	Operativo
78	Carlos Daniel Saavedra	1.135.884.388	Ayudante De Obra	Operativo
79	Carlos Ospina	93.412.164	Ayudante De Obra	Operativo
80	Sebastián Camilo Castro Ospina	1.110.544.649	Ayudante	Operativo
81	Laura Alejandra Giron Sanabria	1.110.601.774	Aux sst	Operativo

PAVETOL SAS.				
No	**NOMBRE DEL TRABAJADOR**	**CEDULA**	**CARGO**	**CUADRILLA**
1	Jordan Manuel Cardenas Herazo	1.002.194.404	Ayudante de Obra	Operativa
2	Juan Carlos Cárdenas Herazo	1.127.949.376	Maestro de Obra	Operativa
3	Jhon Jairo Tovar Barrios	93.456.878	Oficial	Operativa
4	Jose Erney Arenas Enciso	1.038.818.316	Ayudante de Obra	Operativa
5	Jeferson Argumedo Taia	1.063.161.277	Ayudante de Obra	Operativa
6	Leonel de Jesús Jaramillo Restrepo	93.388.662	Ayudantes	Operativa

RETIRADOS

1	Huberley Bocanegra Capera	1.006.150.123	Ayudante De Obra	09 MARZO
2	Oscar Orlando Perez Bustamante	14.297.633	oficial	1 FEBRERO
3	Gerardo Junior Piedrahita	1.110.575.440	Operario Maquinaria	30 MARZO

482

4	José Andres Pinilla Suarique	1.193.152.082	Ayudante De Obra	15 MARZO
5	Fabian Guillermo Puentes	1.110.519.055	Ayudante De Obra	9 FEBRERO
6	Ignacio Ramírez Rubiano	14.279.510	Ayudante De Obra	17 MARZO
7	Junior Rafael Perdomo Aguilar	5.189.493	Oficial De Obra	1 FEBRERO
8	Robinson Briñez Diaz	14.136.568	Oficial De Obra	1 FEBRERO
9	Jose Alejandro Lombo Rojas	1.110.569.714	topografo	28 FEBRERO
10	Luis Carlos Perdomo Motta	93.359.732	oficial	30 MARZO
11	Jean Carlos Brito Rincon	6094611	Ayudante De Obra	17 abril
12	Juan Camilo Bustos Vargas	1.110.519.712	Ayudante De Obra	17 ABRIL
13	Cristian Felipe Campos Lopez	1.110.584.178	ayudante	5 ABRIL

3. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL

3.1 VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL

Se verifica afiliaciones a seguridad social del personal (ARL, AFP, EPS,CCF) para el personal en general, además de los nuevos ingresos

Se verifica que la planilla de seguridad social se encuentre vigente con su respectivo pago para el periodo en curso de los trabajadores vinculados directamente a los consorcios de los contratistas de lote 1 y lote 2 además de los subcontratistas personal de obra y del encargado del transporte y uso de vehículos volquetas.

Se puede observar esta obligación en los anexos (Controles de seguridad social, además de los soportes de pago. Realizados por los tres participantes de este proyecto interventoria y contratista lote 1 y lote 2).

ANEXO. 1. CONTROLES DE SEGURIDAD SOCIAL (INTERVENTORÍA Y CONTRATISTAS LOTE 1 Y 2, SOPORTE DE PAGOS).

3.2 VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

Se solicita demostrar que el personal ha realizado el proceso de inducción, dando cumplimiento a el requisito de obligatorio para cada colaborador / trabajador que ingresa

483

por primera vez y la reinducción para aquellos que regresan a la organización, dicho programa es un requisito para el inicio de las labores, esto se hace mediante un formato que debe cumplir con unas características, entre ellas dar a conocer al personal las políticas y generalidades de la empresa, reglamentos internos y en SST, riesgos a los que se encuentra expuesto entre otros aspectos.

Los contratistas evidencian el proceso a través de registro fotográfico y formatos de inducción al personal.

Para el periodo del siguiente informe se realizaron los siguientes ingresos.

Lote 1 UNION TEMPORAL URBANAS IBAGUÉ, Se vinculan 1 personas al contrato.

Lote 2 CONSORCIO IBAGUÉ VIAL URBANO 2025, se registran 1 ingresos se adjunta como anexo N° 1 las inducciones del personal. La inducción contempla un acta de compromiso y la inducción del SG-SST, además de la entrega de dotación y EPP.

INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN	
N° de personas nuevas	**Empresas**
1	CONSORCIO IBAGUÉ VIAL URBANO
0	PAVETOL
1	UNIÓN TEMPORAL URBANAS IBAGUE
0	ASFALTEMOS

ANEXO. 2. INDUCCIONES

NO APLICA EN ESTE PERIODO

3.3 VERIFICACIÓN DE EXÁMENES OCUPACIONALES

Se solicita dentro de la documentación inicial, y pagos de seguridad social, la evidencia que nos permita identificar y corroborar que el personal vinculado se le ha practicado los debidos exámenes ocupacionales en este caso los de ingreso que tienen como objetivo dar a conocer el estado de salud de los trabajadores al momento de iniciar las

484

labores, corno interventoría se hace seguimiento a las recomendaciones médicas ocupacionales otorgadas para la verificación del estado de salud y la aptitud del personal vinculado, además de intervenir con acciones encaminadas a mejorar el estado de salud de los colaboradores.

Para este periodo se vinculó personal en ambos contratistas los cuales reportan a la interventoría en el informe del periodo comprendido entre el 21 de Marzo y el 20 de Abril los cuales son anexados para el cumplimiento de las obligaciones HSQE.

ANEXO. 3. CERTIFICADO DE APTITUD MEDICA LABORAL.

NO APLICA EN ESTE PERIODO

3.4 (ATS) ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

El análisis de trabajo seguro es un proceso sistemático que consiste en la identificación peligro y evaluación de riesgos, previo al inicio de la ejecución de la labor y en la cual se establecen los controles que permitan mitigar los riesgos en la elaboración del ATS participan todos los trabajadores que ejecuten las tareas generando unas condiciones de trabajo adecuadas y un conocimiento de los riesgos a los que se puede estar expuesto para realizar las actividades de forma segura

Contratistas remite la evidencia de la divulgación y diligenciamiento del ATS en las distintas actividades realizadas en la ejecución de la obra

Para el periodo se realizaron los siguientes ATS:

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO	NUMERO
Topógrafo y cadenero	20
Operadores de Maquinaria	26
Controladora de trafico	2
Cajeo de Pavimentó Existente	13
Instalación de Base Granular o Cereo	12
Limpieza e Imprimacion de la vía	1
Conductor	13
Extendida de Mezcla Asfáltica	4
Urbanismo	34

485

Instalación de cerca de poli sombra	2
Excavación Para Instalación De tuberia	13

3.5 PROGRAMA DE CAPACITACIONES Y CHARLAS DE SEGURIDAD

Lote 1

FECHA	TEMA DE CHARLA LOTE 1
21/03/26	Importancia de la Hidratación
22/03/26	Domingo
23/03/2026	festivo
24/03/2026	Reporte de Actos y Condiciones Inseguras
25/03/2026	Riesgo Locativo
26/03/26	Autocuidado
27/03/26	Socialización Diligenciamiento de ATS
28/03/26	Calistenia
29/03/26	Domingo
30/03/2026	clasificación Residuos Solidos
31/03/2026	Riesgo Biológico (Virus, Bacterias)
01/04/26	Cerramiento Perimetral
02/04/26	Festivo
03/04/26	Festivo
04/04/26	Exposición al Ruido
05/04/26	Domingo
06/04/26	Material Particulado
07/04/26	Calistenia y Pausas Activas
08/04/26	Riesgo locativo
09/04/26	Importancia de los preoperacionales
10/04/26	Cuidados del Sol Radiaciones Uv
11/04/26	Autocuidado
12/04/26	Domingo
13/04/26	Inspecciones de Seguridad
14/04/26	Herramientas de Corte
15/04/26	Comunicación Asertiva
16/04/26	Prevención Maquinaria en Movimiento
17/04/26	Fatiga y Somnolencia
18/04/26	Importancia de Hidratación
19/04/26	Domingo

486

Lote 2

FECHA	TEMA	PERSONAL	TIEMPO DE CAPACITACIÓN
08/04/26	Excavaciones Profundas y Peligrosas	34	40 MIN
13/04/26	Primeros Auxilios manejo de Extintores	36	40 min
17/04/2026	Riesgo en Excavaciones	14	40 min

CHARLAS DE SEGURIDAD

FECHA	TEMA DE CHARLA LOTE 2
24/03/26	Manejo de Estrés
25/03/26	Pausas activas
26/03/26	Comunicación Asertiva Con los Compañeros
27/03/26	Capacitación Primeros Auxilios
28/03/26	Manejo Adecuado de Herramientas Manuales
30/03/26	Cuidado de la Piel
31/03/26	Exceso de Confianza Genera Accidentes
01/04/26	Uso Adecuado de EPPS
06/04/26	Riesgos Generales en Excavaciones Profundas
07/04/26	Prevención de caídas a Diferente Nivel
08/04/26	Comunicación y Trabajo en Equipo
09/04/26	Señalización y Delimitación de Areas de Trabajo
10/04/26	Identificación de Terrenos Inestables
11/04/26	Espacios Confinados en Excavaciones
13/04/26	Seguridad con Herramientas Manuales y Eléctricas
14/04/26	Prevención de Derrumbes y Atrapamientos
15/04/26	Operación Segura de Retroexcavadoras
16/04/26	Operación Segura de Maquinaria
17/04/26	Actos Condiciones Inseguras, Como Identificar y Reportar
18/04/26	Control de Aguas en Excavaciones.

487

En la revisión del informe el contratista soporta y anexa documentación de las capacitaciones y las charlas además del aporte fotográfico de las actividades en mención, en el periodo establecido.

3.6 PROGRAMA DE INSPECCIONES

En obra interventoría realiza seguimiento al cumplimiento del cronograma de inspecciones para el periodo (periódicos, no planeadas, continuas y especiales), según lo amerite la actividad; seguimiento a:

- Supervisión y seguimiento a inspección de dotación y EPP, verificando estado para su debido reemplazo.
- Supervisión y seguimiento a inspecciones de área de trabajo, con el fin de evidenciar si existen los controles pertinentes y adecuados propuestos por el contratista para la prevención de la aparición de accidentes y enfermedades laborales.
- Supervisión y seguimiento a inspección de equipos y herramientas: mediante la solicitud de los registros preoperacionales e inspecciones diligenciadas de acuerdo con el cronograma de inspecciones dentro del SG-SST y así mismo evidenciar el cumplimiento de este.
- Supervisión y seguimiento a inspección del estado de maquinaria: mediante la solicitud de los registros preoperacionales diarios e inspecciones diligenciadas por parte del personal encargado en SST, de acuerdo con el cronograma de inspecciones dentro del SG-SST SST y así mismo evidenciar el cumplimiento de este.
- Supervisión y seguimiento a equipo de primeros auxilios.

A continuación, se indican las inspecciones ejecutadas y la periodicidad de estas.

LOTE 1

Tipo de maquinaria / vehículo	Cantidad	Estado de mantenimiento	Fecha de inspección	Responsable
Retroexcavadora	1	Operativa	21/03/2026 al 20/04/2026	Operario.
Volquetas	10	Operativa	21/03/2026 al 20/04/2026	Inspector SST

488

Vibro compactador	3	Operativa	21/03/2026 al 20/04/2026	Operarios.
Pajarita	2	Operativa	20/03/2026	Operador.
Motoniveladora	2		20/04/2026 al 21/04/2026	Operador.
Camioneta del proyecto	1	Operativa	20/03/2026	Coordinador de obra

LOTE 2

TIPO DE INSPECCIÓN	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
Inspección preoperacional herramientas	Trabajador	Semanal
Inspección preoperacional de vehiculo y maquinas	SST	Semanal
Inspección de orden y aseo	SST	Mensuales
Inspección de EPP	SST	Mensuales
Inspección de equipos de emergencia	SST	Mensuales

En la revisión del informe el contratista soporta y anexa documentación de las inspecciones, además de la evidencia fotográfica de las actividades en mención, en el periodo establecido.

3.7 ENTREGA DE EPP Y DOTACIÓN

Se exige el suministro de dotación industrial a todo el personal en obra (Camisa, pantalón y botas de seguridad, con el color logos y tipo direccionados y determinados por la entidad).

Se exige el suministro de los elementos de protección individual (EPI), según lo demande la matriz de EPI relacionada en el SG-SST de cada contratista y lo amerite la tarea que se está ejerciendo por pare del trabajador.

ANEXO 4 ENTREGA DE EPP

489

3.8 SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN

Se expresa la importancia de tener señalización en buen estado y disponible para la instalación en los diferentes frentes de trabajo entendiendo que son el conjunto de estímulos que condicionan la actuación de quien los recibe frente a las circunstancias que se requieren resaltar hay unas características básicas que se deben tener presente para que esta señalización en las áreas sea realmente efectiva deben

- Atraer la atención de quien la observe
- Dar a conocer el mensaje previsto con suficiente anterioridad
- Informar sobre una conducta a seguir
- Ser clara y de interpretación única
- Debe ser fácil de recordar

La señalización nunca elimina un riesgo, pero si es una medida de control que debe ser implementada correctamente para no eliminar su eficacia.

Nota: Se exige a los contratistas la implementación del programa o plan de manejo de tránsito y requerimientos del contrato, donde se deben de instalar en cada frente de obra elementos de seguridad vial con el fin de garantizar la seguridad en las vías, tales como: conos, reductores de velocidad, pasa vías y señalización preventiva e informativa; señalización de peligro de áreas de riesgo como sumideros, excavaciones, alcantarillados, etc. Y el personal de control vial requerido

Demarcación: Se exige cerramiento en obra que delimite los espacios a intervenir evitando el ingreso de personal ajeno a esta, se debe de realizar en de tela verde, también se exige en cerramiento y/o demarcación de zonas que generen un alto riesgo a la comunidad y al personal dentro de obra, y la debida demarcación de vías de acceso peatonal.

3.9 ACCIDENTES E INCIDENTES

Accidente de trabajo: todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión organiza, una perturbación funcional o psiquiátrica una invalidez o la muerte

Incidente: suceso repentino no deseado que ocurre por las mismas causas que se presentan los accidentes; solo que por cuestiones del azar no desencadenan lesiones en las personas, daños a la propiedad, al proceso o ambiente.

490

En caso de presentarse un accidente de trabajo debe darse cumplimiento a lo estableció en la resolución 1401 de 2007 y la resolución 2851 del 2015.

LOTE 1

Indicador	Total	Observaciones / Acciones Correctivas y Preventivas
Accidentes de trabajo	0	No se presentaron accidentes durante el periodo.
Incidentes o cuasi accidentes	0	No se reportaron incidentes. Seguimiento preventivo constante.
Enfermedades laborales	0	No se reportaron casos. Se mantiene vigilancia médica y control de riesgos.
Medidas correctivas implementadas	N/A	No aplicable. Se mantiene la revisión y control continuo de riesgos.

NOMBRE DEL TRABAJADOR	FRENTE DE OBRA	DÍAS INCAPACIDAD
José norbey Gonzales	20 de julio	1
	TOTAL, DÍAS INCAPACIDAD	1

LOTE 2

INCIDENTES: NO SE PRESENTARON

ACCIDENTES: NO SE PRESENTARON

ANEXO. 5. REGISTRO DE AUSENTISMO Y ACCIDENTALIDAD

3.10 ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN

Son aquellas que tienen como objetivo promover la actividad física, como habito de vida saludable, adaptación física cardiovasculares, fortalecimiento muscular y mejoramiento de la flexibilidad buscando reducir problemas de salud

491

cardiovasculares musculares por sobre uso asociados al desempeño laboral de los colaboradores del proyecto

Por tanto, se recomienda a los contratistas la realización de jornadas de pausas activas e incentivar a la incorporación de hábitos saludables.

Contratistas ejecutan pausas activas durante la jornada laboral.

3.11 GESTIÓN DEL COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

Se evidencia que el personal tiene el comprobante de conformación de los grupos del comité se recalca la importancia del cumplimiento en lo establecido en la Resolución 2013 del 86, Res 1016 de 89, la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 1072 de 2015, que enmarcan las actividades que se deben cumplir para la conformación y funcionamiento del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST;

EL cumplimiento de la Ley 1010 de 2006, Ley 1562 de 2012 y la Resolución 612 de 2013 y la Resolución 1356 de 2012 para la conformación del comité de convivencia laboral.

ANEXO 6. ACTAS DE COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

3.12 CONTROL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Los contratistas contemplan los siguientes equipos durante el periodo:

- Herramienta menor (Palas, machetes, picas, etc.)
- Ayudas mecánicas para transporte de material (carretillas) que deben estar en Optimas condiciones
- Cortadores
- Saltarin rana
- Compresor
- Motobombas
- Minicargador
- Retro excavadora
- Retro oruga
- Motoniveladora
- Fresadora

492

- Asfaltadora
- Vibro compactador, rodillo liso, doble rodillo, de neumáticos
- Volquetas
- Camión irrigador.

Con respecto a la maquinaria se solicita la documentación de cada una con los soportes de propiedad, mantenimiento y certificación de idoneidad de los operadores y de los conductores su licencia de conducción vigente; con el fin de corroborar el buen estado de la maquinaria y las competencias del personal a cargo de esta.

De igual modo se verifica que cada uno cuente con extintor y botiquín dentro de la maquinaria en caso de que se presente una emergencia.

4. REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN DIARIA

Durante el proceso de ejecución de obra se solicita los soportes documentales (Formatos) diligenciados que evidencien la implementación de los programas que se encuentran em el SG-SST y de los cuales se encuentran obligados a dar cumplimiento en campo, para verificación de que se está llevando a cabo durante la ejecución de las actividades relacionadas con cada subprograma.

- Análisis de trabajo seguro.
- Permisos de trabajo.
- Control de personal.
- Preoperacional de maquinaria y equipos.
- Notificación de riesgo e inducción al personal nuevo.
- Preoperacional de vehículos (volquetas).

5. PLAN DE EMERGENCIA

Dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el Plan de Emergencias es un conjunto de procedimientos, recursos y acciones organizadas para prevenir, atender y responder ante situaciones que puedan poner en riesgo la vida, la salud, las instalaciones o el ambiente.

Son la planeación que hace una empresa para actuar frente a eventos adversos. Teniendo como objetivo proteger la vida y salud de los trabajadores, reducir daños materiales, minimizar impactos ambientales, garantizar una respuesta rápida y organizada. En el articulo 2.2.4.6.25 habla de de la prevención preparación y respuesta ante una emergencia y la Resolución 0312 de 2019 Exige: Plan de emergencias documentado, rutas de evacuación, señalización, botiquines y extintores.

Los contratistas han adaptado el plan de emergencia general de su organización a los objetos de contrato.

6. SUMINISTRO DE HIDRATACIÓN

Se busca que todo el personal activo en obra, en los diferentes frentes de trabajo cuenten con hidratación teniendo en cuenta que las actividades se realizan a campo abierto y están expuestos a las altas temperaturas que presenta la ciudad de Ibagué.

7. CONDICIONES DE HIGIENE

Se exige condiciones de higiene aptas en campamentos y unidades sanitarias adecuadas para el uso del personal, jornadas de orden y aseo en los frentes de trabajo dejando los espacios limpios y organizados al finalizar la jornada y periódicamente según sea necesario.

8. PROGRAMADE ORDEN Y ASEO

Se solicita el registro sea fotográfico o documental de la implementación del programa en las áreas de trabajo (vías intervenidas), campamentos; bien sea de manera periódica y por medio de brigadas de orden y aseo.

9. EVIDENCIA FOTOGRAFICA

PREOPERACIONALES MAQUINARIA









INSPECCIONES











CAPACITACIÓN

496







CHARLAS





ATS

497






PAUSAS ACTIVAS





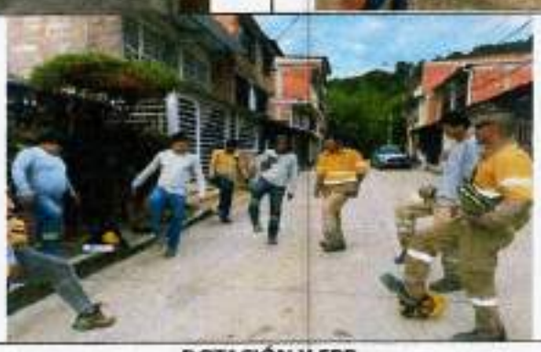

DOTACIÓN Y EPP







SEÑALIZACIÓN



HIDRATACIÓN



ORDEN Y ASEO

500





10. OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES

- Hasta el momento el contratista ha implementado o seguido las recomendaciones dadas por la interventoría
- Se prohíbe entrar a la obra bajo el estado de alicoramiento y sustancias psicoactivas
- Se reitera al contratista la empresa y reposición de los EPP de manera oportuna
- Se solicita en reiteradas ocasiones el no uso de vestimenta de otros consorcios o contratos
- Se solicita el no uso de pulidoras sin guardas de seguridad
- Se reitera al contratista jornadas de orden y aseo, acomodación del punto ecológico.
- Se solicita él envió del PMT radicado y valido, listo para la implementación e instalación en los distintos frentes de trabajo se solicita con anticipación la entrega para poder revisar e identificar si se cuenta con la señalización y personal necesario además de evitar inconvenientes con tránsito.

11. ANEXOS

ANEXOS 7. CONTROL EQUIPOS INTERVENTORÍA

ANEXOS 8. CONTROL EQUIPOS CONTRATISTAS

ANEXO 9. CONTROL PERSONAL

ANEXO 10. CONTROL DE TIEMPO

MARIBEL ORTEGA CAMPOS

CC. 1.121.842.452

PROFESIONAL SST

ANEXO 1

CONTROLES DE SEGURIDAD SOCIAL Y SOPORTE DE PAGO

(INTERVENTORÍA, LOTE 1 Y LOTE 2)

INTERVENTORÍA
CONSORCIO vías IBAGUÉ

ALCALDIA DE IBAGUE

PERSONAL DE INTERVENTORIA CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO OBRA

CONTRATO DE OBRA No: DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2020	CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS IBAGUE
OBRA 1 AÑO DEL INFORME MENSUAL NOVIEMBRE 2020	PROYECTO: CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS (OBR: 1 SUBSUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 1150 DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2020	INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS IBAGUE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

| No. | Nombres y apellidos | C.C. | Cargo | MARZO | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900307167	1	CONSORCIO VIAS IBAGUE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO VIAS IBAGUE	AV. 19 CALLE 67 A VILLA CAFE	IBAGUE-TOLIMA	3138573464	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Efectivo	Valor
2026-03	2026-04	91308440793	95030440793	E	2026/04/14	2026/04/14	BANCO DE BOGOTA	C	$21,728,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación				Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Clase	IBC	Aporte	Clase	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1006	CARDONA ALVAREZ TOMAS ALBERTO		15-14	30	$1,300,000	$156,000	CF1400	30	$4,200,000	$504,000	CCF50	30	$4,200,000	$168,000	14-11	III	$4,500,000	$213,300	III	$4,500,000	$225,000	No	$1,065,300
2	CC	1018	CHAMORRO EDGAR CAMILO ALESSANDRO		23-14	30	$2,600,000	$312,000	CF1400	30	$2,600,000	$312,000	CCF50	30	$2,600,000	$104,000	14-11	III	$2,600,000	$123,240	III	$2,600,000	$130,000	No	$869,240
3	CC	1116471	DELGADO TORRES LESTER MARCELA		03-14	30	$4,500,000	$540,000	CF1400	30	$4,500,000	$540,000	CCF50	30	$4,500,000	$180,000	14-11	III	$4,500,000	$213,300	III	$4,500,000	$225,000	No	$1,065,300
4	CC	1006	CORREDOR REYES MICHELLE CAMILA		05-14	30	$1,350,000	$162,000	CF1400	30	$1,350,000	$162,000	CCF50	30	$1,350,000	$54,000	14-11	III	$1,350,000	$63,990	III	$1,350,000	$67,500	No	$369,490
5	CC	1070	CORTES HERNANDEZ DIANA LUCIA		05-14	30	$1,600,000	$192,000	CF1400	30	$1,600,000	$192,000	CCF50	30	$1,600,000	$64,000	14-11	III	$1,600,000	$75,840	III	$1,600,000	$80,000	No	$437,840
6	CC	1013	CRUZ MEDINA CESAR AUGUSTO		28-14	28	$1,750,000	$210,000	CF1400	28	$1,750,000	$210,000	CCF50	28	$1,750,000	$70,000	14-11	III	$1,750,000	$82,950	III	$1,750,000	$87,500	No	$479,450
7	CC	1014	GUTIERREZ ROJAS ADRIANA		20-14	30	$4,000,000	$480,000	CF1400	30	$4,000,000	$480,000	CCF50	30	$4,000,000	$160,000	14-11	III	$4,000,000	$189,600	III	$4,000,000	$200,000	No	$1,096,000
8	CC	1002	HERNANDEZ REYES SAMUEL FELIPE		23/03	30	$2,600,000	$312,000	CF1400	30	$2,600,000	$312,000	CCF50	30	$2,600,000	$104,000	14-11	III	$2,600,000	$123,240	III	$2,600,000	$130,000	No	$713,240
9	CC	1234	MARIN CUBIDES HENRY CATERINE		15-14	30	$4,000,000	$480,000	CF1400	30	$4,000,000	$480,000	CCF50	30	$4,000,000	$160,000	14-11	III	$4,000,000	$189,600	III	$4,000,000	$200,000	No	$1,096,000
10	CC	1108	MENDOZA VARGAS SERGIO ALEJANDRO		23/03	28	$1,750,000	$210,000	CF1400	28	$1,750,000	$210,000	CCF50	28	$1,750,000	$70,000	14-11	III	$1,750,000	$82,950	III	$1,750,915	$87,592	No	$479,892
11	CC	1180	MUÑOZ DE LA PARRA KATERINE		23/03	30	$2,700,000	$324,000	CF1400	30	$2,700,000	$324,000	CCF50	30	$2,700,000	$108,000	14-11	III	$2,700,000	$128,010	III	$2,700,000	$135,000	No	$739,010
12	CC	1121	MENDEZ HERRERA ANDERSON JAVIER		23/03	30	$2,600,000	$312,000	CF1400	30	$2,600,000	$312,000	CCF50	30	$2,600,000	$104,000	14-11	III	$2,600,000	$123,240	III	$2,600,000	$130,000	No	$713,240
13	CC	1121	MENDEZ HERRERA JUSTO MAURICIO		23-14	30	$2,600,000	$312,000	CF1400	30	$2,600,000	$312,000	CCF50	30	$2,600,000	$104,000	14-11	III	$2,600,000	$123,240	III	$2,600,000	$130,000	No	$713,240
14	CC	1121	ORTEGA CAMPO JAVIERA		23/03	30	$4,000,000	$480,000	CF1400	30	$4,000,000	$480,000	CCF50	30	$4,000,000	$160,000	14-11	III	$4,000,000	$189,600	III	$4,000,000	$200,000	No	$1,096,000
15	CC	1234	STELLA DIAZ MURILLO ANGEL TATIANA		23-14	30	$2,600,000	$312,000	CF1400	30	$2,600,000	$312,000	CCF50	30	$2,600,000	$104,000	14-11	III	$2,600,000	$123,240	III	$2,600,000	$130,000	No	$713,240
16	CC	1116	VARGOVIC MORALES ERICH		23-14	30	$2,600,000	$312,000	CF1400	30	$2,600,000	$312,000	CCF50	30	$2,600,000	$104,000	14-11	III	$2,600,000	$123,240	III	$2,600,000	$130,000	No	$713,240
17	CC	1116	YEPES MARTINEZ MIGUEL ANGEL		23-14	30	$2,600,000	$312,000	CF1400	30	$2,600,000	$312,000	CCF50	30	$2,600,000	$104,000	14-11	III	$2,600,000	$123,240	III	$2,600,000	$130,000	No	$713,240
18	CC	1006	ZAMUDIO CORTES JAIME		23-14	30	$2,110,000	$253,200	CF1400	30	$2,110,000	$253,200	CCF50	30	$2,110,000	$84,400	14-11	III	$2,110,000	$100,026	III	$2,110,000	$105,500	No	$577,926
19	CC	1116	ZARTA VIVAS JOSHUA		28-14	30	$2,600,000	$312,000	CF1400	30	$2,600,000	$312,000	CCF50	30	$2,600,000	$104,000	14-11	III	$2,600,000	$123,240	III	$2,600,000	$130,000	No	$713,240
Total	Afiliados(19)						$51,160,715	$6,139,286			$55,310,715	$6,637,286			$53,160,715	$2,126,400			$53,160,715	$2,521,626		$53,160,715	$2,658,036		$21,728,700

2026/04/14 01:53 PM

805

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900507947	1	CONSORCIO VIAS IBAGUE	5 - MENOS DE 150 COTIZANTES	CONSORCIO VIAS IBAGUE	MZ 14 CA 8 ETA 4 VILLA CAFE	IBAGUE-TOLIMA	3118520634	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	950266710	950266710	E	2026/04/14	2026/04/14	BANCO DE BOGOTA	0	$23,726,709

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				19	$8,538,200	$0	$0	$8,538,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	$6,354,000	$0	$0	$6,354,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$1,264,000	$0	$0	$1,264,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$920,200	$0	$0	$920,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$3,714,600	$0	$0	$3,714,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	19	$3,714,600	$0	$0	$3,714,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$2,134,700	$0	$0	$2,134,700
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	19	$2,134,700	$0	$0	$2,134,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				19	$6,670,600	$0	$0	$6,670,600
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$337,500	$0	$0	$337,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$540,900	$0	$0	$540,900
SALUD TOTAL	EPS010	800,130,907	4	8	$3,014,000	$0	$0	$3,014,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$2,775,200	$0	$0	$2,775,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$1,601,100	$0	$0	$1,601,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	FAICBF	899,999,239	2	19	$1,601,100	$0	$0	$1,601,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$1,067,500	$0	$0	$1,067,500
SENA	FASENA	899,999,034	1	19	$1,067,500	$0	$0	$1,067,500
TOTAL				19	$23,726,709	$0	$0	$23,726,709

2026/04/14 01:53 PM

507

LOTE 1

UNION TEMPORAL URBANAS IBAGUE

ALCALDIA DE BAGUÉ

PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO OBRA

CONTRATO DE OBRA No. 3848 DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023 | CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIBRAMAS BAGUE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DICIEMBRE 2025 | PROYECTO: CATORTAVA A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE BAGUÉ LOTE 1.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3185 DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS IBAGUE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	MARZO	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (incluir novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, retiro virtual)
					Nº Planilla	Nombre ARL	Clase de Riesgo (I/II / III / IV)	Nombre EPS	Valor Cotizado EPS	Nombre de Administradora de Cesantías de Pensiones	Valor Cotizado Pensión	ESP	Valor Base de Cotización	Valor Tarifa	Valor ICBF	
1	RUBEN DARIO AGUIRRE ORTIZ	1.110.463.980	Ayudante		95020918351	SURA	V	Salud Total	$ 21.400,00	Colfondos	$ 61.600,00	COMFENALCO	$ 61.600,00	$	$	RETIRO
2	FELIX MARIA ALDANA CHAVARRO	93.393.512	Ayudante		95020918351	SURA	V	Nueva EPS	$ 14.100,00	Colpensiones	$ 286.100,00	COMFENALCO	$ 71.100,00	$	$	
3	JOSE GREGORIO ARIAS	14.280.002	Ayudante		95020918351	SURA	V	Nueva EPS	$ 71.400,00	Colfondos	$ 861.100,00	COMFENALCO	$ 71.400,00	$	$	
4	JHON SEBASTIAN RAMON URBINA	1.110.597.920	Ayudante		95020918351	SURA	V	Salud Total	$ 21.400,00	Porvenir	$ 305,52	COMFENALCO	$ 71.100,00	$	$	
5	TATIANA ANDREA BARRAGAN	69.031.308	Profesional SST		95020918351	SURA	V	Salud Total	$ 104.600,00	Porvenir	$ 643.100,00	COMFENALCO	$ 148.400,00	$	$	
6	DIANA KATHERINE SOKAMISSA	1.110.516.621	Ing. Residente		95020918351	SURA	V	Salud Total	$ 28.500,00	Porvenir	$ 1.100.000,00	COMFENALCO	$ 100.000,00	$	$	UNO RETIRO
7	DIANA PATRICIA CARDONA HURTADO	30.142.489	Profesional SST		95020918351	SURA	V	Salud Total	$ 21.400,00	Porvenir	$ 286.100,00	COMFENALCO	$ 71.100,00	$	$	
8	DANIEL FERNANDO SAPERA	5.928.293	Inspector		95020918351	SURA	V	Salud Total	$ 21.400,00	Colpensiones	$ 286.100,00	COMFENALCO	$ 71.100,00	$	$	
9	EDDIER ARMANDO CAPERA MAHECHA	1.116.462.397	Oficial		95020918351	SURA	V	Salud Total	$ 21.400,00	Porvenir	$ 286.100,00	COMFENALCO	$ 71.100,00	$	$	
10	MAURICIO HERNAN OSORIO ROBLEDO	5.926.112	Topografo		95020918351	SURA	V	Salud Total	$ 28.500,00	Porvenir	$ 1.100.000,00	COMFENALCO	$ 100.000,00	$	$	
11	YONATTHAN CAMILO CHAVEZ	80.810.356	Ayudante		95020918351	SURA	V	Sanitas	$ 21.400,00	Colpensiones	$ 286.100,00	COMFENALCO	$ 71.100,00	$	$	
12	SOFIA CHAPARRO CASTILLOS	1.000.803.370	Ing. Ambiental		95020918351	SURA	V	Sanitas	$ 21.400,00	Porvenir	$ 286.100,00	COMFENALCO	$ 71.100,00	$	$	
13	JUAN ESTEBAN CASTILLOS VARA	1.110.473.971	Ayudante		95020918351	SURA	V	Salud Total	$ 28.500,00	Porvenir	$ 1.100.000,00	COMFENALCO	$ 100.000,00	$	$	
14	NESTOR RONALDO FLORES MURILLO	$ 1.116.599.240	Topografo		95020918351	SURA	V	Sanitas	$ 107.400,00	Colpensiones	$ 429.500,00	COMFENALCO	$ 107.400,00	$	$	INGRESO
15	CLAUDIA CASTRO	38.678.302	Profesional SST		95020918351	SURA	V	Sanitas	$ 28.500,00	Protección	$ 286.100,00	COMFENALCO	$ 28.500,00	$	$	RETIRO
16	DANIEL GOMEZ	$ 1.110.468.871	Topografo		95020918351	SURA	V	Nueva EPS	$ 80.000,00	Porvenir	$ 2.200.300,00	COMFENALCO	$ 80.000,00	$	$	
17	JOSE NORVEY GONZALEZ GUEVARA	93.384.737	Ayudante		95020918351	SURA	V	Nueva EPS	$ 71.400,00	Porvenir	$ 1.100.700,00	COMFENALCO	$ 71.100,00	$	$	
18	YEINI GONZALEZ ROMERO	93.410.405	Ayudante		95020918351	SURA	V	Nueva EPS	$ 101.600,00	N/A	$ 0,00	COMFENALCO	$ 101.600,00	$	$	
19	FRANCISCO JOSE QUALTERO PEREZ	93.234.951	Ing. Residente		95020918351	SURA	V	Pijao Salud	$ 92.700,00	Protección	$ 356.400,00	COMFENALCO	$ 89.000,00	$	$	
20	EVER JULIAN QUIROGA TRIANA	1.110.502.749	Ing. Ambiental		95020918351	SURA	V	Salud Total	$ 143.300,00	Protección	$ 550.900,00	COMFENALCO	$ 138.400,00	$	$	
21	JONATHAN GUZMAN BRAVO	1.106.280.231	Ing. Residente		95020918351	SURA	V	Nueva EPS	$ 110.000,00	Protección	$ 2.200.300,00	COMFENALCO	$ 110.000,00	$	$	INGRESO
22	JORGE HERNANDEZ	1.116.011.431	Topografo		95020918351	SURA	V	Sanitas	$ 21.400,00	Porvenir	$ 286.100,00	COMFENALCO	$ 71.100,00	$	$	
23	JOSE FERNANDO LARRAGA	30.406.754	Ayudante		95020918351	SURA	V	Salud Total	$ 21.400,00	Colpensiones	$ 286.100,00	COMFENALCO	$ 71.100,00	$	$	
24	HERNAN MAURICIO MORAY VILLAMARIN	93.406.965	Ayudante		95020918351	SURA	V	Salud Total	$ 21.400,00	Porvenir	$ 286.100,00	COMFENALCO	$ 71.100,00	$	$	INGRESO
25	DIEGO MORALES	1.006.713.188	Ayudante		95020918351	SURA	V	Salud Total	$ 28.500,00	Porvenir	$ 1.100.700,00	COMFENALCO	$ 100.000,00	$	$	
26	MIDERSON CAMILO OLAYA OBRA	1.006.117.587	Ayudante		95020918351	SURA	V	Salud Total	$ 21.400,00	Porvenir	$ 286.100,00	COMFENALCO	$ 71.100,00	$	$	
27	JAIR OSORIO PEREIRA	1.121.882.849	Ayudante		95020918351	SURA	V	Salud Total	$ 28.500,00	Porvenir	$ 1.100.700,00	COMFENALCO	$ 100.000,00	$	$	
28	ALDAIR OTAVO PARRA	1.007.247.708	Ayudante		95020918351	SURA	V	Sanitas	$ 21.400,00	Porvenir	$ 286.100,00	COMFENALCO	$ 71.100,00	$	$	
29	DAYANA ELIZABETH PEREZ LOZANO	1.006.127.616	Ayudante		95020918351	SURA	V	Pijao Salud - Regimen de Excepcion	$ 71.100,00	Colpensiones	$ 852.500,00	COMFENALCO	$ 213.100,00	$	$	
30	MARIO FABIAN VIVIESCAS	93.384.471	Ayudante		95020918351	SURA	V	Nueva EPS	$ 21.400,00	Colfondos	$ 110.500,00	COMFENALCO	$ 21.400,00	$	$	RETIRO
31	JOSE RODRIGUEZ	93.390.798	Auxiliario		95020918351	SURA	V	Sanitas	$ 21.400,00	Colpensiones	$ 286.100,00	COMFENALCO	$ 71.100,00	$	$	
32	CARLA RODRIGUEZ	1.064.276.251	Ing Administrativa		95020918351	SURA	V	Salud Total	$ 21.400,00	Colpensiones	$ 286.100,00	COMFENALCO	$ 71.100,00	$	$	
33	LUIS ANGEL ROJAS JULIO	93.404.334	Ayudante		95020918351	SURA	V	Salud Total	$ 21.400,00	Protección	$ 286.100,00	COMFENALCO	$ 71.100,00	$	$	
34	CARLOS EDUARDO SANCHEZ MONTOYA	1.116.551.210	Ayudante		95020918351	SURA	V	Salud Total	$ 28.500,00	Porvenir	$ 286.100,00	COMFENALCO	$ 71.100,00	$	$	
35	DIDIER ANDRES GIRALDO	1.070.995.115	Ayudante		95020918351	SURA	V	Salud Total	$ 21.400,00	Porvenir	$ 286.100,00	COMFENALCO	$ 71.100,00	$	$	
36	YEISON STEVEN TORRES HOYOS	1.106.816.325	Ayudante		95020918351	SURA	V	Salud Total	$ 21.400,00	Porvenir	$ 286.100,00	COMFENALCO	$ 71.100,00	$	$	
37	JOHNSON JAIBER VARGAS DIAZ	$ 110.481.988	Ayudante		95020918351	SURA	V	Salud Total	$ 21.400,00	Colfondos	$ 286.100,00	COMFENALCO	$ 71.100,00	$	$	
38	CARLOS EDUARDO SERRANO TORAL	14.568.600	Ayudante		95020918351	SURA	V	Sanitas	$ 28.500,00	Protección	$ 400.100,00	COMFENALCO	$ 100.000,00	$	$	INGRESO
39	LEIDY LILIANA VEGA CELIS	1113445880	Topografa		95020918351	SURA	V	Sanitas	$ 28.500,00	Protección	$ 400.100,00	COMFENALCO	$ 100.000,00	$	$	

NOTAS:

1. Durante las horas de suspensión de las actividades de la obra por cualquier motivo, el personal no podrá permanecer en el sitio de trabajo.
2. Es responsabilidad de cada trabajador informar con anticipación cualquier novedad que afecte su asistencia.
3. En el evento en que el trabajador no cumpla con la duración del período contemplado en el contrato, se descontará el valor proporcional del salario devengado.
4. El contratista es responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y parafiscales establecidos en las normas vigentes.
5. Los aportes de seguridad social de los meses anteriores fueron pagados.
6. Los aportes de seguridad social de los meses de enero en adelante serán pagados por los contratistas.
7. El contratista es responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al contrato de obra, así como del cumplimiento del pago de cotizaciones de la modalidad vigente en relación con los ciclos establecidos en el mismo.
8. El contratista es responsable de realizar con sus trabajadores el protocolo de exámenes ocupacionales y periódicos de acuerdo con los riesgos a los que se encuentren expuestos.
9. El contratista es responsable de realizar con sus trabajadores el protocolo de exámenes ocupacionales y periódicos de acuerdo con los riesgos a los que se encuentren expuestos.
10. El Contratista debe suministrar a sus trabajadores los elementos de protección personal requeridos para la ejecución de las actividades.
11. El Contratista debe suministrar a sus trabajadores los elementos de protección personal requeridos para la ejecución de las actividades.
12. El Contratista debe suministrar a sus trabajadores los elementos de protección personal requeridos para la ejecución de las actividades.
13. El Contratista debe suministrar a sus trabajadores los elementos de protección personal requeridos para la ejecución de las actividades.
14. El Contratista debe suministrar a sus trabajadores los elementos de protección personal requeridos para la ejecución de las actividades.
15. El Contratista debe suministrar a sus trabajadores los elementos de protección personal requeridos para la ejecución de las actividades.
16. El Contratista debe suministrar a sus trabajadores los elementos de protección personal requeridos para la ejecución de las actividades.
17. El Contratista debe suministrar a sus trabajadores los elementos de protección personal requeridos para la ejecución de las actividades.
18. El Contratista debe suministrar a sus trabajadores los elementos de protección personal requeridos para la ejecución de las actividades.
19. El Contratista debe suministrar a sus trabajadores los elementos de protección personal requeridos para la ejecución de las actividades.
20. El Contratista debe suministrar a sus trabajadores los elementos de protección personal requeridos para la ejecución de las actividades.
21. El Contratista debe suministrar a sus trabajadores los elementos de protección personal requeridos para la ejecución de las actividades.
22. El Contratista debe suministrar a sus trabajadores los elementos de protección personal requeridos para la ejecución de las actividades.
23. El Contratista debe suministrar a sus trabajadores los elementos de protección personal requeridos para la ejecución de las actividades.
24. El Contratista debe suministrar a sus trabajadores los elementos de protección personal requeridos para la ejecución de las actividades.
25. El Contratista debe suministrar a sus trabajadores los elementos de protección personal requeridos para la ejecución de las actividades.
26. El Contratista debe suministrar a sus trabajadores los elementos de protección personal requeridos para la ejecución de las actividades.
27. El Contratista debe suministrar a sus trabajadores los elementos de protección personal requeridos para la ejecución de las actividades.
28. El Contratista debe suministrar a sus trabajadores los elementos de protección personal requeridos para la ejecución de las actividades.
29. El Contratista debe suministrar a sus trabajadores los elementos de protección personal requeridos para la ejecución de las actividades.
30. El Contratista debe suministrar a sus trabajadores los elementos de protección personal requeridos para la ejecución de las actividades.
31. El Contratista debe suministrar a sus trabajadores los elementos de protección personal requeridos para la ejecución de las actividades.
32. El Contratista debe suministrar a sus trabajadores los elementos de protección personal requeridos para la ejecución de las actividades.
33. El Contratista debe suministrar a sus trabajadores los elementos de protección personal requeridos para la ejecución de las actividades.
34. El Contratista debe suministrar a sus trabajadores los elementos de protección personal requeridos para la ejecución de las actividades.
35. El Contratista debe suministrar a sus trabajadores los elementos de protección personal requeridos para la ejecución de las actividades.
36. El Contratista debe suministrar a sus trabajadores los elementos de protección personal requeridos para la ejecución de las actividades.
37. El Contratista debe suministrar a sus trabajadores los elementos de protección personal requeridos para la ejecución de las actividades.
38. El Contratista debe suministrar a sus trabajadores los elementos de protección personal requeridos para la ejecución de las actividades.
39. El Contratista debe suministrar a sus trabajadores los elementos de protección personal requeridos para la ejecución de las actividades.

Nombre:
Interventor
Responsable obra

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900090832	4	UNION TEMPORAL SEGUROS BOGOTA	1 - APORTANTES DEPENDIENTES	PRINCIPAL	Av Ambala 69 80 CC Plazas del Bosque	BOGOTA D.C.-BOGOTA	3024441179	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clase		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-04	EMPRATIO	550269791	E	2026/04/09	2026/04/09	BANCOLOMBIA	0	$14,065,700


LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																						PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No	Identificación	Nombre																								Cotiz	Días	IBC	Aporte	Cotiz	Días	IBC	Aporte	Cotiz	Días	IBC	Aporte	Cotiz	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (39 Afiliados)																											$26,198,525	$12,309,700			$29,478,525	$3,181,300					$29,478,525	$3,540,300			$29,478,525	$3,540,300		$24,610,700
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (39 Afiliados)																											$26,198,525	$12,309,700			$29,478,525	$3,181,300					$29,478,525	$3,540,300			$29,478,525	$3,540,300		$24,610,700
Ciudad: BOGOTA Depto: CUNDINAMARCA (39 Afiliados)																											$26,198,525	$12,309,700			$29,478,525	$3,181,300					$29,478,525	$3,540,300			$29,478,525	$3,540,300		$24,610,700
1	CC	1110368665	ACUÑA MUÑOZ																							23500	1	$29,600	$3,600	EPS04	1	$29,600	$3,600	CCF04	1	$29,600	$3,600	54-11	1	$29,600	0.9600%	$284	1	$29,600	$1,100	1	$12,000
2	CC	1110368665	ACUÑA MUÑOZ																							23500	30	$889,600	$108,400	EPS04	30	$889,600	$111,000	CCF04	30	$889,600	$111,000	54-11	30	$889,600	0.9600%	$8,540	30	$889,600	$33,000	30	$372,000
3	CC	91081872	ALBAN TELLO																							25-14	30	$1,890,300	$230,300	EPS05	30	$1,859,367	$234,100	CCF02	30	$1,859,367	$234,100	54-11	30	$1,859,367	6.9600%	$129,400	30	$1,859,367	$69,000	30	$863,900
4	CC	74086867	ARIAS JOSE																							23500	30	$1,884,210	$229,500	EPS04	30	$1,884,210	$237,400	CCF02	30	$1,884,210	$237,400	54-11	30	$1,884,210	6.9600%	$131,100	30	$1,884,210	$70,500	30	$876,900
5	CC	1110347920	BARON JHON																							23500	30	$1,890,315	$230,300	EPS04	30	$1,890,315	$238,100	CCF02	30	$1,890,315	$238,100	54-11	30	$1,890,315	6.9600%	$131,600	30	$1,890,315	$70,800	30	$879,900
6	CC	43421128	BARRAGAN TATIANA																							25-14	30	$2,629,800	$319,200	EPS05	30	$2,629,800	$331,300	CCF02	30	$2,629,800	$331,300	54-11	30	$2,629,800	6.9600%	$183,000	30	$2,629,800	$98,400	30	$1,221,200
7	CC	1110518821	BOCANEGRA DIANA																							23500	7	$746,667	$119,467	EPS05	7	$746,667	$94,067	CCF02	7	$746,667	$94,067	54-11	7	$746,667	6.9600%	$51,967	7	$746,667	$32,000	7	$345,568
8	CC	39134149	CARDENAS BLAIR																							25-14	30	$2,777,000	$444,400	EPS05	30	$2,777,000	$349,900	CCF02	30	$2,777,000	$349,900	54-11	30	$2,777,000	6.9600%	$193,300	30	$2,777,000	$104,000	30	$1,291,500
9	CC	3483535	CARRERA DANIEL																							25-14	30	$2,635,400	$336,400	EPS05	30	$2,029,400	$255,600	CCF02	30	$2,629,400	$331,400	54-11	30	$2,629,400	6.9600%	$183,000	30	$2,629,400	$98,400	30	$1,221,600
10	CC	1110460207	CARVAJAL GIOVANNY																							23500	30	$2,730,810	$344,100	EPS05	30	$2,730,810	$343,800	CCF02	30	$2,730,810	$343,800	54-11	30	$2,730,810	6.9600%	$190,000	30	$2,730,810	$102,000	30	$1,268,100
11	CC	51611672	CASTRO DE AMAYUELO																							23500	30	$2,450,000	$424,000	EPS05	30	$2,450,000	$308,800	CCF02	30	$2,450,000	$308,800	54-11	30	$2,450,000	6.9600%	$170,500	30	$2,450,000	$91,500	30	$1,138,000
12	CC	80816908	CHAVES TORRES																							23500	30	$2,490,944	$289,700	EPS05	30	$2,018,394	$254,300	CCF02	30	$2,463,894	$310,500	54-11	30	$2,463,894	6.9600%	$171,500	30	$2,463,894	$92,000	30	$1,145,000
13	CC	1018433372	CHINTECUA SOFIA																							25-14	30	$2,777,000	$444,400	EPS05	30	$2,777,000	$349,900	CCF02	30	$2,777,000	$349,900	54-11	30	$2,777,000	6.9600%	$193,300	30	$2,777,000	$104,000	30	$1,291,500
14	CC	1020417777	CUBILLOS JUAN																							23500	30	$2,780,700	$335,300	EPS05	30	$2,780,700	$350,400	CCF02	30	$2,780,700	$350,400	54-11	30	$2,780,700	6.9600%	$193,600	30	$2,780,700	$104,100	30	$1,293,600
15	CC	1110519364	FLOREZ HECTOR																							23500	30	$2,100,000	$414,800	EPS05	30	$2,800,000	$106,000	CCF02	30	$2,100,000	$106,000	54-11	30	$2,100,000	6.9600%	$146,200	30	$2,100,000	$78,500	30	$976,000
16	CC	39699020	GARTNER CLAUDIA																							25-14	29	$2,684,433	$429,600	EPS05	29	$2,684,433	$337,600	CCF02	29	$2,684,433	$337,600	54-11	29	$2,684,433	6.9600%	$186,800	29	$2,684,433	$100,600	29	$1,248,600
17	CC	1110344071	GOMEZ DANIEL																							23500	15	$1,230,000	$200,000	EPS05	15	$1,230,000	$180,000	CCF02	15	$1,230,000	$180,000	54-11	15	$1,230,000	6.9600%	$85,600	15	$1,230,000	$46,000	15	$571,600
18	CC	91284707	GONZALEZ JOSE																							23500	30	$1,999,612	$324,000	EPS05	30	$1,999,612	$380,000	CCF02	30	$1,999,612	$380,000	54-11	30	$1,999,612	6.9600%	$139,200	30	$1,999,612	$74,900	30	$929,900
19	CC	79698429	GONZALEZ VIDAL																							23500	30	$1,910,877	$309,700	EPS05	30	$1,910,877	$363,400	CCF02	30	$1,910,877	$363,400	54-11	30	$1,910,877	6.9600%	$133,000	30	$1,910,877	$71,600	30	$888,900
20	CC	1024497	GUALTERO FRANCISCO																								0	$0	$0	EPS05	30	$2,160,000	$337,200	CCF02	30	$2,160,000	$337,200	54-11	30	$2,160,000	6.9600%	$150,400	30	$2,160,000	$80,400	30	$1,005,200
21	CC	1102492548	GUALTERO IVER																							23500	30	$2,300,000	$368,000	EPS05	30	$2,300,000	$292,700	CCF02	30	$2,300,000	$292,700	54-11	30	$2,300,000	6.9600%	$160,000	30	$2,300,000	$85,600	30	$1,070,000
22	CC	1049363331	GUZMAN JONATHAN																							23500	30	$2,710,000	$389,700	EPS05	30	$2,710,000	$344,800	CCF02	30	$2,710,000	$344,800	54-11	30	$2,710,000	6.9600%	$188,600	30	$2,710,000	$100,800	30	$1,260,900
23	CC	1110514413	HERNANDEZ JORGE																							23500	29	$2,800,000	$469,600	EPS05	29	$2,800,000	$356,200	CCF02	29	$2,800,000	$356,200	54-11	29	$2,800,000	6.9600%	$194,900	29	$2,800,000	$104,200	29	$1,303,700
24	CC	51636754	LARGACHA ROSA																							23500	30	$1,831,475	$245,400	EPS05	30	$1,831,475	$233,000	CCF02	30	$1,831,475	$233,000	54-11	30	$1,831,475	6.9600%	$127,500	30	$1,831,475	$68,100	30	$852,400
25	CC	51636760	MORA HERNAN																							25-14	30	$2,788,749	$285,900	EPS05	30	$2,788,749	$337,300	CCF02	30	$2,130,749	$337,300	54-11	30	$2,130,749	6.9600%	$148,300	30	$2,130,749	$79,400	30	$992,900
26	CC	1020771364	MORALES SOFIA																							23500	28	$2,683,920	$369,500	EPS05	28	$2,683,920	$367,400	CCF02	28	$2,683,920	$367,400	54-11	28	$2,683,920	6.9600%	$186,800	28	$2,683,920	$99,800	28	$1,248,600
27	CC	1026117917	OLAYA ANDERSON																							23500	30	$1,910,877	$265,700	EPS05	30	$1,910,877	$363,400	CCF02	30	$1,910,877	$363,400	54-11	30	$1,910,877	6.9600%	$133,000	30	$1,910,877	$71,600	30	$888,900

05

aportes en línea

Planilla Resumen

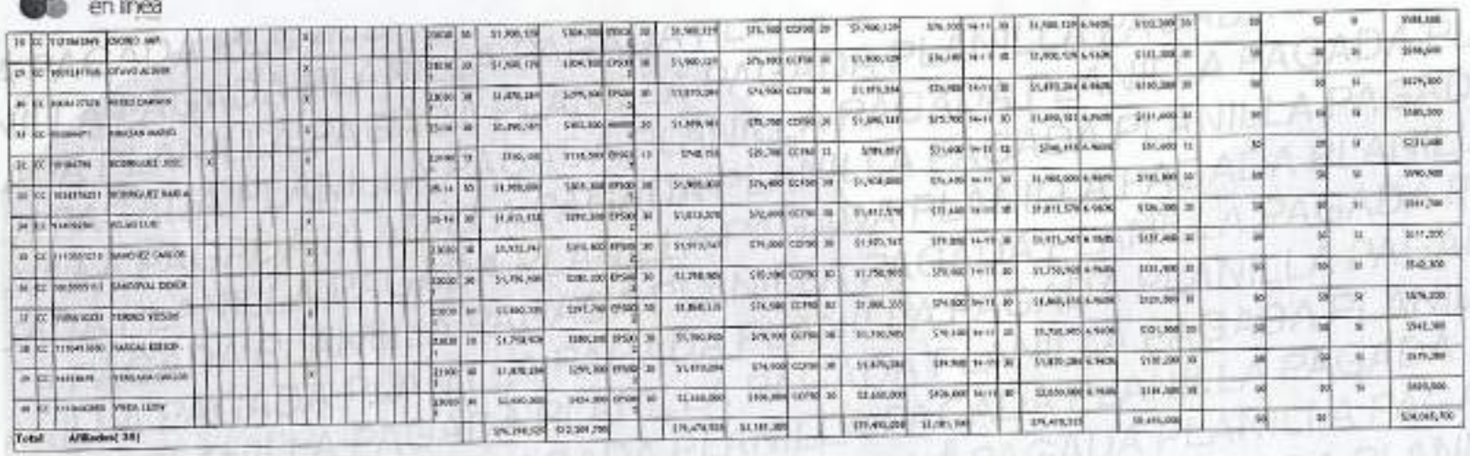

Página 2 de 3

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				36	$12,209,700	$0	$0	$12,209,700
COLFONDOS	23901	800,227,940	6	4	$822,300	$0	$0	$822,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	1	10	$3,543,100	$0	$0	$3,543,100
PORVENIR	23301	800,224,808	8	17	$5,104,600	$0	$0	$5,104,600
PROTECCION	13306	800,229,739	0	7	$2,739,700	$0	$0	$2,739,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				39	$5,493,000	$0	$0	$5,493,000
ARL SURA	14-11	830,903,793	5	39	$5,493,000	$0	$0	$5,493,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				39	$3,181,300	$0	$0	$3,181,300
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	39	$3,181,300	$0	$0	$3,181,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				39	$3,181,300	$0	$0	$3,181,300
ASMET SALUD EPS SAS	EPSC62	900,935,126	7	1	$76,100	$0	$0	$76,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$152,500	$0	$0	$152,500
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$75,700	$0	$0	$75,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$496,900	$0	$0	$496,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$75,400	$0	$0	$75,400
PLAN VITAL SAS	EPSC6	809,008,362	1	1	$92,100	$0	$0	$92,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	19	$1,504,400	$0	$0	$1,504,400
SANITAS	EPS006	800,251,440	6	8	$708,200	$0	$0	$708,200
TOTAL				39	$24,065,700	$0	$0	$24,065,700

245

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900561259	1	CONSTRUCTORA Y ASESORIAS SAS	E - MENOS DE 200 COTIZANTES	VIAS URBANAS IBAGUE	OFICINA 401 EDIFICIO FRONTERA BUSINESS	IBAGUE-TOLIMA	CONTRATOS	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clase		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
03/04/21	2021-04	2380506691	PRESENTER	E	12/04/2021	12/04/2021	BANCOLOMBIA	4	$ 14,980,400.00

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: VIAS URBANAS IBAGUE (15 Afiliados)						$15.000.000	$3.495.000			$17.333.300	$694.300			$17.333.300	$694.300			$17.333.300		$1.387.300		$0	$0		$5.000.700
Centro de Trabajo: PAVIMENTACION VIAS IBAGUE (15 Afiliados)						$15.000.000	$3.495.000			$17.333.300	$694.300			$17.333.300	$694.300			$17.333.300		$1.387.300		$0	$0		$5.000.700
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (15 Afiliados)						$15.000.000	$3.495.000			$17.333.300	$694.300			$17.333.300	$694.300			$17.333.300		$1.387.300		$0	$0		$5.000.700
1	CC	79574408	CARRANCHO LUIS PABLO ROBERTO	23030 1	30	$1.250.000	$400.000	01046 1	30	$1.250.000	$100.000	CCF040	30	$1.250.000	$75.000	14-15	30	$1.250.000	6,960%	$87.000	30	$0	$0	$0	$262.000
2	CC	1110554410	DELGADO CARDOSO JHOAN SEBASTIAN	23030 1	30	$875.000	$280.000	01046 1	30	$875.000	$70.000	CCF040	30	$875.000	$75.000	14-15	30	$875.000	6,960%	$87.000	30	$0	$0	$0	$512.000
3	CC	93241900	FONSECA PERAL OSCAR RAUL	23030 1	30	$1.750.000	$280.000	01046 1	30	$1.750.000	$70.000	CCF040	30	$1.750.000	$70.000	14-15	30	$1.750.000	6,960%	$121.800	30	$0	$0	$0	$541.800
4	CC	2000014029	GALEANO MARTINEZ ALBEIRO	23030 1	30	$1.750.000	$280.000	01046 1	30	$1.750.000	$70.000	CCF040	30	$1.750.000	$70.000	14-15	30	$1.750.000	6,960%	$121.800	30	$0	$0	$0	$541.800
5	CC	93231435	GALEANO PEÑA MEDITORIO	23030 1	30	$1.750.000	$280.000	01046 1	30	$1.750.000	$70.000	CCF040	30	$1.750.000	$70.000	14-15	30	$1.750.000	6,960%	$121.800	30	$0	$0	$0	$541.800
6	PT	4160700	GARCIA JOAN CARLOS	23030 1	15	$875.000	$140.000	01046 1	15	$875.000	$35.000	CCF040	15	$875.000	$35.000	14-15	15	$875.000	6,960%	$60.900	15	$0	$0	$0	$271.000
7	PT	5840041	GUTIERREZ TORRALBO WILLIAMS	23030 1	15	$875.000	$140.000	01046 1	15	$875.000	$35.000	CCF040	15	$875.000	$35.000	14-15	15	$875.000	6,960%	$60.900	15	$0	$0	$0	$271.000
8	CC	1117500536	JIMENEZ TAPIERO VICTOR ALFONSO	23030 1	5	$291.666	$46.700	01046 1	5	$291.666	$11.700	CCF040	5	$291.666	$11.700	14-15	5	$291.666	6,960%	$20.400	5	$0	$0	$0	$90.500
9	CC	1105754886	MEJIA RIOS MICHAEL STIVENS	23030 1	5	$291.666	$46.700	01046 1	5	$291.666	$11.700	CCF040	5	$291.666	$11.700	14-15	5	$291.666	6,960%	$20.400	5	$0	$0	$0	$90.500
10	CC	1110513554	RAMIREZ FONSECA SERGIO ALEJANDRO	23030 1	30	$1.750.000	$280.000	01046 1	30	$1.750.000	$70.000	CCF040	30	$1.750.000	$70.000	14-15	30	$1.750.000	6,960%	$121.800	30	$0	$0	$0	$541.800
11	CC	1006734871	RODRIGUEZ RAMIREZ CLAUDIA	23030 1	15	$875.000	$140.000	01046 1	15	$875.000	$35.000	CCF040	15	$875.000	$35.000	14-15	15	$875.000	6,960%	$60.900	15	$0	$0	$0	$271.000
12	CC	1110508832	RODRIGUEZ GUZMAN CRISTIAN	23030 1	30	$1.750.000	$280.000	01046 1	30	$1.750.000	$70.000	CCF040	30	$1.750.000	$70.000	14-15	30	$1.750.000	6,960%	$121.800	30	$0	$0	$0	$541.800
13	CC	1110539551	ROMERO LAGOS LEONARDO FABIO	23030 1	30	$1.750.000	$280.000	01046 1	30	$1.750.000	$70.000	CCF040	30	$1.750.000	$70.000	14-15	30	$1.750.000	6,960%	$121.800	30	$0	$0	$0	$541.800
14	CC	1110513736	RUIZ HOYOS JAPER	23030 1	15	$700.341	$112.000	01046 1	15	$700.341	$28.000	CCF040	15	$700.341	$28.000	14-15	12	$700.341	6,960%	$48.800	15	$0	$0	$0	$216.800
15	PT	5261462	VENEGAS ROJAS LUIS ALBERTO	23030 1	30	$1.750.000	$280.000	01046 1	30	$1.750.000	$70.000	CCF040	30	$1.750.000	$70.000	14-15	30	$1.750.000	6,960%	$121.800	30	$0	$0	$0	$541.800


LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ALCANTARILLADOS IBAGUE (15 Afiliados)						$20.666.666	$1.306.666			$22.411.266	$897.266			$22.411.266	$897.266			$22.411.266		$1.960.966		$0	$0		$26.661.900
Centro de Trabajo: ALCANTARILLADOS IBAGUE (15 Afiliados)						$20.666.666	$1.306.666			$22.411.266	$897.266			$22.411.266	$897.266			$22.411.266		$1.960.966		$0	$0		$26.661.900
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (15 Afiliados)						$20.666.666	$1.306.666			$22.411.266	$897.266			$22.411.266	$897.266			$22.411.266		$1.960.966		$0	$0		$26.661.900
16	CC	1077524186	ALBANIL SANCHEZ WILSON EDUARDO	23030 1	15	$750.734	$121.400	01046 1	15	$750.734	$30.000	CCF040	15	$750.734	$30.000	14-15	15	$750.734	6,960%	$52.500	15	$0	$0	$0	$233.900
17	CC	1014477168	AVILA REINA JAIME GUILLERMO	23030 1	30	$1.750.000	$280.000	01046 1	30	$1.750.000	$70.000	CCF040	30	$1.750.000	$70.000	14-15	30	$1.750.000	6,960%	$121.800	30	$0	$0	$0	$541.800
18	CC	5007041	AVILA REINA JHON ALEXANDER	23030 1	30	$1.750.000	$280.000	01046 1	30	$1.750.000	$70.000	CCF040	30	$1.750.000	$70.000	14-15	30	$1.750.000	6,960%	$121.800	30	$0	$0	$0	$541.800
19	CC	5873894	CALDERON TORRES ADELMO	23030 1	30	$1.750.000	$280.000	01046 1	30	$1.750.000	$70.000	CCF040	30	$1.750.000	$70.000	14-15	30	$1.750.000	6,960%	$121.800	30	$0	$0	$0	$541.800
20	CC	5881694	CARDOZO MONTES HOVER	23030 1	30	$1.750.000	$280.000	01046 1	30	$1.750.000	$70.000	CCF040	30	$1.750.000	$70.000	14-15	30	$1.750.000	6,960%	$121.800	30	$0	$0	$0	$541.800

543

aportes en línea

Planilla Resumen

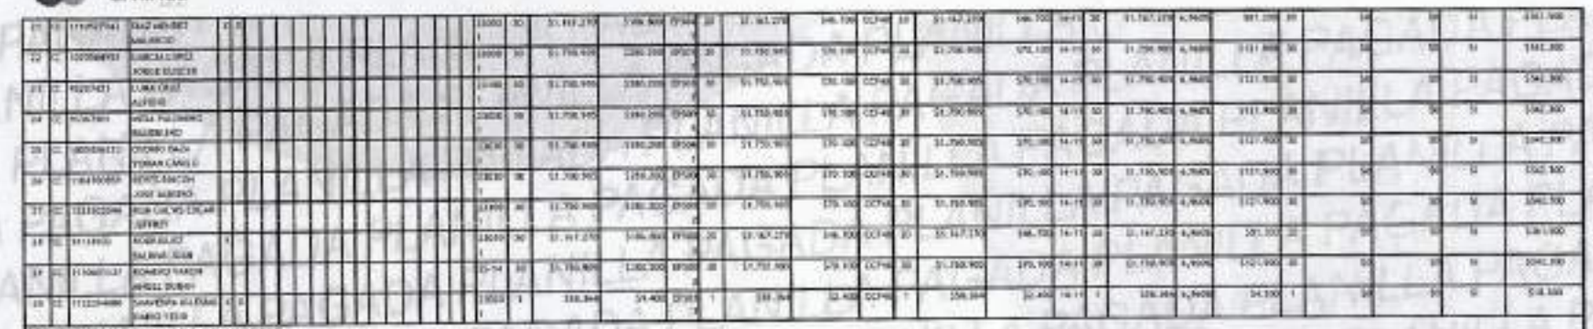

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Cotiz	Días	IBC	Aporte	Cotiz	Días	IBC	Aporte	Cotiz	Días	IBC	Aporte	Cotiz	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado Ley 1607	Total Aportes
SUCURSAL: PAVIMENTACION VALLE DE SAN JUAN (7 Afiliados)						$4.417.798	$1.193.396			$12.139.404	$466.000			$11.119.408	$446.000			$12.119.408		$445.200		$0	$0		$13.199.900
Centro de Trabajo: PAVIMENTACION VALLE DE SAN JUAN (7 Afiliados)						$4.417.798	$1.193.396			$12.139.404	$466.000			$11.119.408	$446.000			$12.119.408		$445.200		$0	$0		$13.199.900
Cedula: VALLE DE SAN JUAN Depto: TOLIMA (7 Afiliados)						$4.417.798	$1.193.396			$12.139.404	$466.000			$11.119.408	$446.000			$12.119.408		$445.200		$0	$0		$13.199.900
37	CC	5198462	GALAN RODRIGUEZ JOSE ANTONIO			$0	$0	DP045	30	$1.750.904	$70.100	CCF40	30	$1.750.904	$70.100	14-11	30	$1.750.904	6,960%	$121.900	30	$0	$0	$0	$262.100
38	CC	14276340	DIAZ JOHN FREDDY	13000	30	$1.750.904	$280.200	DP045	30	$1.750.904	$70.100	CCF40	30	$1.750.904	$70.100	14-11	30	$1.750.904	6,960%	$121.900	30	$0	$0	$0	$542.300
39	CC	14276447	CUARAN VALBUENA JOHAN	13000	30	$1.750.904	$280.200	DP045	30	$1.750.904	$70.100	CCF40	30	$1.750.904	$70.100	14-11	30	$1.750.904	6,960%	$121.900	30	$0	$0	$0	$542.300
40	CC	1007731440	LARA ROMERO FABIAN EDUARDO	13000	30	$1.750.904	$280.200	DP045	30	$1.750.904	$70.100	CCF40	30	$1.750.904	$70.100	14-11	30	$1.750.904	6,960%	$121.900	30	$0	$0	$0	$542.300
41	CC	5223039	MARTINEZ ORTIZ HECTOR JULIO			$0	$0	DP045	30	$1.750.904	$70.100	CCF40	30	$1.750.904	$70.100	14-11	30	$1.750.904	6,960%	$121.900	30	$0	$0	$0	$262.100
42	CC	5.899431	ROMERO SUAREZ LUIS ALBERTO	13000	30	$1.634.170	$261.500	DP045	28	$1.634.170	$65.400	CCF40	28	$1.634.170	$65.400	14-11	28	$1.634.170	6,960%	$113.800	28	$0	$0	$0	$506.100
43	CC	1101169918	PLATA CASTAÑEDA EUDORO	13000	30	$1.750.904	$280.200	DP045	30	$1.750.904	$70.100	CCF40	30	$1.750.904	$70.100	14-11	30	$1.750.904	6,960%	$121.900	30	$0	$0	$0	$542.300
Total Afiliados(37)						$46.881.336	$7.780.800			$131.885.136	$1.477.600			$121.885.136	$1.077.600			$131.885.136		$1.313.200		$0	$0		$144.150.700

514

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				33	$7.182.900	$18.600	$0	$7.201.100
COLFONDOS	23101	800.227.940	6	3	$872.900	$1.900	$0	$874.400
COLPENSIONES	25-14	900.336.004	7	4	$868.600	$1.900	$0	$870.600
PORVENIR	230101	800.224.808	8	23	$4.539.380	$11.900	$0	$4.551.200
PROTECCION	230201	800.229.739	0	5	$1.102.100	$2.900	$0	$1.104.900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				37	$3.613.000	$9.400	$0	$3.622.400
ARL SURA	14-11	890.903.790	5	37	$3.613.000	$9.400	$0	$3.622.400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				37	$2.077.600	$5.400	$0	$2.083.000
COMFATOLIMA	CCF48	800.211.025	1	37	$2.077.600	$5.400	$0	$2.083.000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				37	$2.068.300	$5.600	$0	$2.073.900
FAMISANAR	EPS017	830.003.564	7	1	$70.100	$200	$0	$70.300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900.156.264	2	10	$598.300	$1.600	$0	$599.900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS040	900.156.264	2	8	$385.600	$900	$0	$386.500
SALUD TOTAL	EPS002	800.130.907	4	15	$871.700	$2.500	$0	$874.200
SANITAS	EPS005	800.251.440	6	3	$142.600	$400	$0	$143.000
TOTAL				37	$14.941.400	$39.000	$0	$14.980.400

515

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 9[illegible]	6	[illegible] SAS	6 - MENOS DE 300 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 5 # 7-42 APTO 801 BARRIO SOLEX	IBAGUE-TOLIMA	3164775	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fechas		Pago		
							Banco	Dias Mora	Valor
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago			
2024-09	2024-09	218447500	93029[illegible]	E	2024-10-16	2024-09-13	BANCOLOMBIA	0	10,196,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No	EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	1	$171,891	$20,630	[illegible]	1	$171,891	$7,200	[illegible]	1	$171,891	$12,204	14-11	1	$171,891	$12,204	1	$0	$0
2	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	9	$925,371	$84,300	[illegible]	9	$925,371	$64,800	[illegible]	9	$925,371	$65,700	14-11	9	$925,371	$65,700	9	$0	$0
3	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	1	$116,727	$14,000	[illegible]	1	$116,727	$4,200	[illegible]	1	$116,727	$0	14-11	1	$116,727	$0	1	$0	$0
4	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	7	$408,545	$49,000	[illegible]	7	$408,545	$14,400	[illegible]	7	$408,545	$28,800	14-11	7	$408,545	$28,800	7	$0	$0
5	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	30	$1,750,000	$210,000	[illegible]	30	$1,750,000	$63,000	[illegible]	30	$1,750,000	$123,900	14-11	30	$1,750,000	$123,900	30	$0	$0
6	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	30	$1,750,000	$210,000	[illegible]	30	$1,750,000	$63,000	[illegible]	30	$1,750,000	$123,900	14-11	30	$1,750,000	$123,900	30	$0	$0
7	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	30	$1,750,000	$210,000	[illegible]	30	$1,750,000	$63,000	[illegible]	30	$1,750,000	$123,900	14-11	30	$1,750,000	$123,900	30	$0	$0
8	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	30	$1,750,000	$210,000	[illegible]	30	$1,750,000	$63,000	[illegible]	30	$1,750,000	$124,600	14-11	30	$1,750,000	$124,600	30	$0	$0
9	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	1	$58,364	$7,000	[illegible]	1	$58,364	$2,100	[illegible]	1	$58,364	$4,100	14-11	1	$58,364	$4,100	1	$0	$0
10	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	30	$1,750,000	$210,000	[illegible]	30	$1,750,000	$63,000	[illegible]	30	$1,750,000	$123,900	14-11	30	$1,750,000	$123,900	30	$0	$0
11	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	5	$291,818	$35,000	[illegible]	5	$291,818	$10,500	[illegible]	5	$291,818	$20,650	14-11	5	$291,818	$20,650	5	$0	$0
12	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	1	$58,364	$7,000	[illegible]	1	$58,364	$2,100	[illegible]	1	$58,364	$4,100	14-11	1	$58,364	$4,100	1	$0	$0
Total	Afiliados(11)				$10,130,141	$1,053,930			$10,388,736	$414,300			$10,388,736	$811,680			$10,388,736	$719,680		$0	$0

9 V 5

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$1,653,400	$0	$0	$1,653,400
COLFONDOS	23801	800.227.940	6	1	$46,700	$0	$0	$46,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$9,400	$0	$0	$9,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$934,100	$0	$0	$934,100
PROTECCION	230501	800,229,739	0	3	$663,200	$0	$0	$663,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$715,400	$0	$0	$715,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	$715,400	$0	$0	$715,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$411,600	$0	$0	$411,600
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,146	4	11	$411,600	$0	$0	$411,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$416,300	$0	$0	$416,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$163,700	$0	$0	$163,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$86,600	$0	$0	$86,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$95,900	$0	$0	$95,900
TOTAL				11	$3,196,700	$0	$0	$3,196,700

4 5 7

LOTE 2

CONSORCIO IBAGUÉ VIAL URBANO 2025

Dirección: Mz 14 casa 8 etapa 4 Villa café
Ciudad: Ibagué – Tolima

518

ALCALDIA DE IBAGUE

PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO OBRA

CONTRATO DE OBRA No.: 3648 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025	CONTRATISTA: CONSORCIO IBAGUE VIAL URBANO 2025
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2025	PROYECTO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ LOTE 2.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 3150 DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025	INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS IBAGUE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | MARZO | | |

ALCALDIA DE IBAGUÉ

PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO OBRA

CONTRATO DE OBRA No: 3040 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025	CONTRATISTA: CONSORCIO IBAGUÉ VIAL URBANO 2025
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2025	PROYECTO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ LOTE 2.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 3156 DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2025	INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL IBAGUÉ
	VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | IBAGUÉ | | |

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901999914
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO IBAGUE VIAL URBANO 2025
CIUDAD/MUNICIPIO:		IBAGUE DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CALLE 12 N 270 OFICINA 405 TELÉFONO:		2637743
TIPO APORTANTE:		01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:		PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de
FORMA DE PRESENTACIÓN:		ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**6014129189**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/04/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		198793891

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	12	$ 2.156.200
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	13	$ 4.049.400
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	6	$ 1.591.800
8002248088	230301	230301-PORVENIR	47	$ 13.185.700
		SUBTOTAL:	75	**$ 20.985.100**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514408	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	10	$ 711.200
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	7	$ 656.500
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	9	$ 529.000
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	41	$ 2.717.100
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	13	$ 838.300
		SUBTOTAL:	80	**$ 5.452.100**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002116251	CCF48	CCF48-CONFATOLIMA	80	$ 5.450.000
		SUBTOTAL:	80	**$ 5.450.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	80	$ 9.481.800
		SUBTOTAL:	80	**$ 9.481.800**

VALOR SIN MORA:	**$ 41.369.000**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 41.369.000**

521

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION		NIT NUMERO DE IDENTIFICACION	
NOMBRE O RAZON SOCIAL			
CODIGO/RECINTO		DEPARTAMENTO	
DIRECCION		TELEFONO	
TIPO APORTANTE		CLASE APORTANTE	
TIPO EMPRESA		ACTIVIDAD ECONOMICA	
FORMA DE PRESENTACION			
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SI/NO			

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA		68161291980	TIPO DE PLANILLA				E-MPLEADOR
PERIODO COTIZACION OTROS	MES	marzo 2023	PERIODO COTIZACION SALUD	MES	AÑO	MES	SUC
VIAS ST. MORA		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			NUMERO AUTORIZACION				

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CODIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
23001	23001-PORVENIR	57	$ 13.140.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.140.700	$ 0	$ 13.140.700
23101	23101-COLFONDOS	5	$ 1.031.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.031.500	$ 0	$ 1.031.500
23201	23201-PROTECCION	13	$ 2.716.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.716.200	$ 0	$ 2.716.200
25-11	25-11-COLPENSIONES	13	$ 3.545.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.545.600	$ 0	$ 3.545.600
SUBTOTALES										$ 20.434.000	$ 0	$ 20.434.000

TOTAL APORTES A SALUD

Administradora		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MORA		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	VALOR APORTE	COTIZACION	VALOR APORTE	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	11		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.111.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.111.100	$ 0	$ 0	$ 1.111.100
EPS041	EPS041-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 111.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 111.100	$ 0	$ 0	$ 111.100
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	10		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.111.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.111.100	$ 0	$ 0	$ 1.111.100
EPS017	EPS017-FAMISANAR	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 666.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 666.600	$ 0	$ 0	$ 666.600
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 666.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 666.600	$ 0	$ 0	$ 666.600
EPS042	EPS042-NUEVA EPS	13		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.555.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.555.500	$ 0	$ 0	$ 1.555.500
SUBTOTALES													$ 6.441.100	$ 0	$ 0	$ 6.441.100

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD EPS		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION	TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	99		$ 0		$ 0	$ 6.481.600	$ 6.481.600	$ 0	$ 0	$ 6.481.600
SUBTOTALES								$ 6.481.600	$ 0	$ 0	$ 6.481.600

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CODIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF01	1-CAJA COMPENSAR	99	$ 5.490.000	$ 0	$ 5.490.000
SUBTOTALES			$ 5.490.000	$ 0	$ 5.490.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE

No.	TIPO COTIZANTE	NUMERO IDENTIFICACION	NOMBRES	SITUACION TITULAR	SITUACION COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO SALARIO	ESTUDIANTE	APRENDIZ SENA ETAPA LECTIVA	APRENDIZ SENA ETAPA PRODUCTIVA
1	CC	1000375464	[illegible]	ACTIVO		$ 1.160.000	FIJO			N
2	CC	1000[illegible]	[illegible]	ACTIVO		$ 1.160.000	FIJO			N
3	CC	1000[illegible]	[illegible]	ACTIVO		$ 1.160.000	FIJO			N
4	CC	1000[illegible]	[illegible]	ACTIVO		$ 1.160.000	FIJO			N
5	CC	1000[illegible]	[illegible]	ACTIVO		$ 1.160.000	FIJO			N
6	CC	1000[illegible]	[illegible]	ACTIVO		$ 1.160.000	FIJO			N
7	CC	1000[illegible]	[illegible]	ACTIVO		$ 1.160.000	FIJO			N
8	CC	1000[illegible]	[illegible]	ACTIVO		$ 1.160.000	FIJO			N
9	CC	1000[illegible]	[illegible]	ACTIVO		$ 1.160.000	FIJO			N
10	CC	1000[illegible]	[illegible]	ACTIVO		$ 1.160.000	FIJO			N
11	CC	1000[illegible]	[illegible]	ACTIVO		$ 1.160.000	FIJO			N

NOVEDADES

No.	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	SUS	AVP	VCT	IRL
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																


LIQUIDACION

PENSIONES									SEGURIDAD SOCIAL												PARAFISCALES						
				FSP							SALUD				ARP						CCF		ICBF		SENA		
ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR AJUSTE	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
23001-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	P1001-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	14-11-ARL SURA	30	$ 1.160.000	1	$ 0	30	$ 1.160.000	CCF46-COMFATLANI	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23001-PORVENIR	30	$ 2.320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2.320.000	$ 0	$ 0	$ 0	14-11-ARL SURA	30	$ 2.320.000	1	$ 0	30	$ 2.320.000	CCF46-COMFATLANI	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23001-PORVENIR	30	$ 2.320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.320.000	$ 0	$ 0	$ 0	14-11-ARL SURA	30	$ 2.320.000	1	$ 0	30	$ 2.320.000	CCF46-COMFATLANI	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23001-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	14-11-ARL SURA	30	$ 1.160.000	1	$ 0	30	$ 1.160.000	CCF46-COMFATLANI	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23201-PROTECCION	30	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	14-11-ARL SURA	30	$ 1.160.000	1	$ 0	30	$ 1.160.000	CCF46-COMFATLANI	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23001-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	14-11-ARL SURA	30	$ 1.160.000	1	$ 0	30	$ 1.160.000	CCF46-COMFATLANI	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25-11-COLPENSIONES	30	$ 873.400	$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 873.400	$ 93.500	$ 0	$ 0	14-11-ARL SURA	30	$ 873.400	1	$ 0	30	$ 873.400	CCF46-COMFATLANI	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23001-PORVENIR	30	$ 1.860.900	$ 298.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.860.900	$ 74.500	$ 0	$ 0	14-11-ARL SURA	30	$ 1.860.900	1	$ 0	30	$ 1.860.900	CCF46-COMFATLANI	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23001-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 186.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	14-11-ARL SURA	30	$ 1.160.000	1	$ 0	30	$ 1.160.000	CCF46-COMFATLANI	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23101-COLFONDOS	30	$ 873.400	$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 873.400	$ 93.500	$ 0	$ 0	14-11-ARL SURA	30	$ 873.400	1	$ 0	30	$ 873.400	CCF46-COMFATLANI	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23001-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 186.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	EPS041-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	14-11-ARL SURA	30	$ 1.160.000	1	$ 0	30	$ 1.160.000	CCF46-COMFATLANI	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

522

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

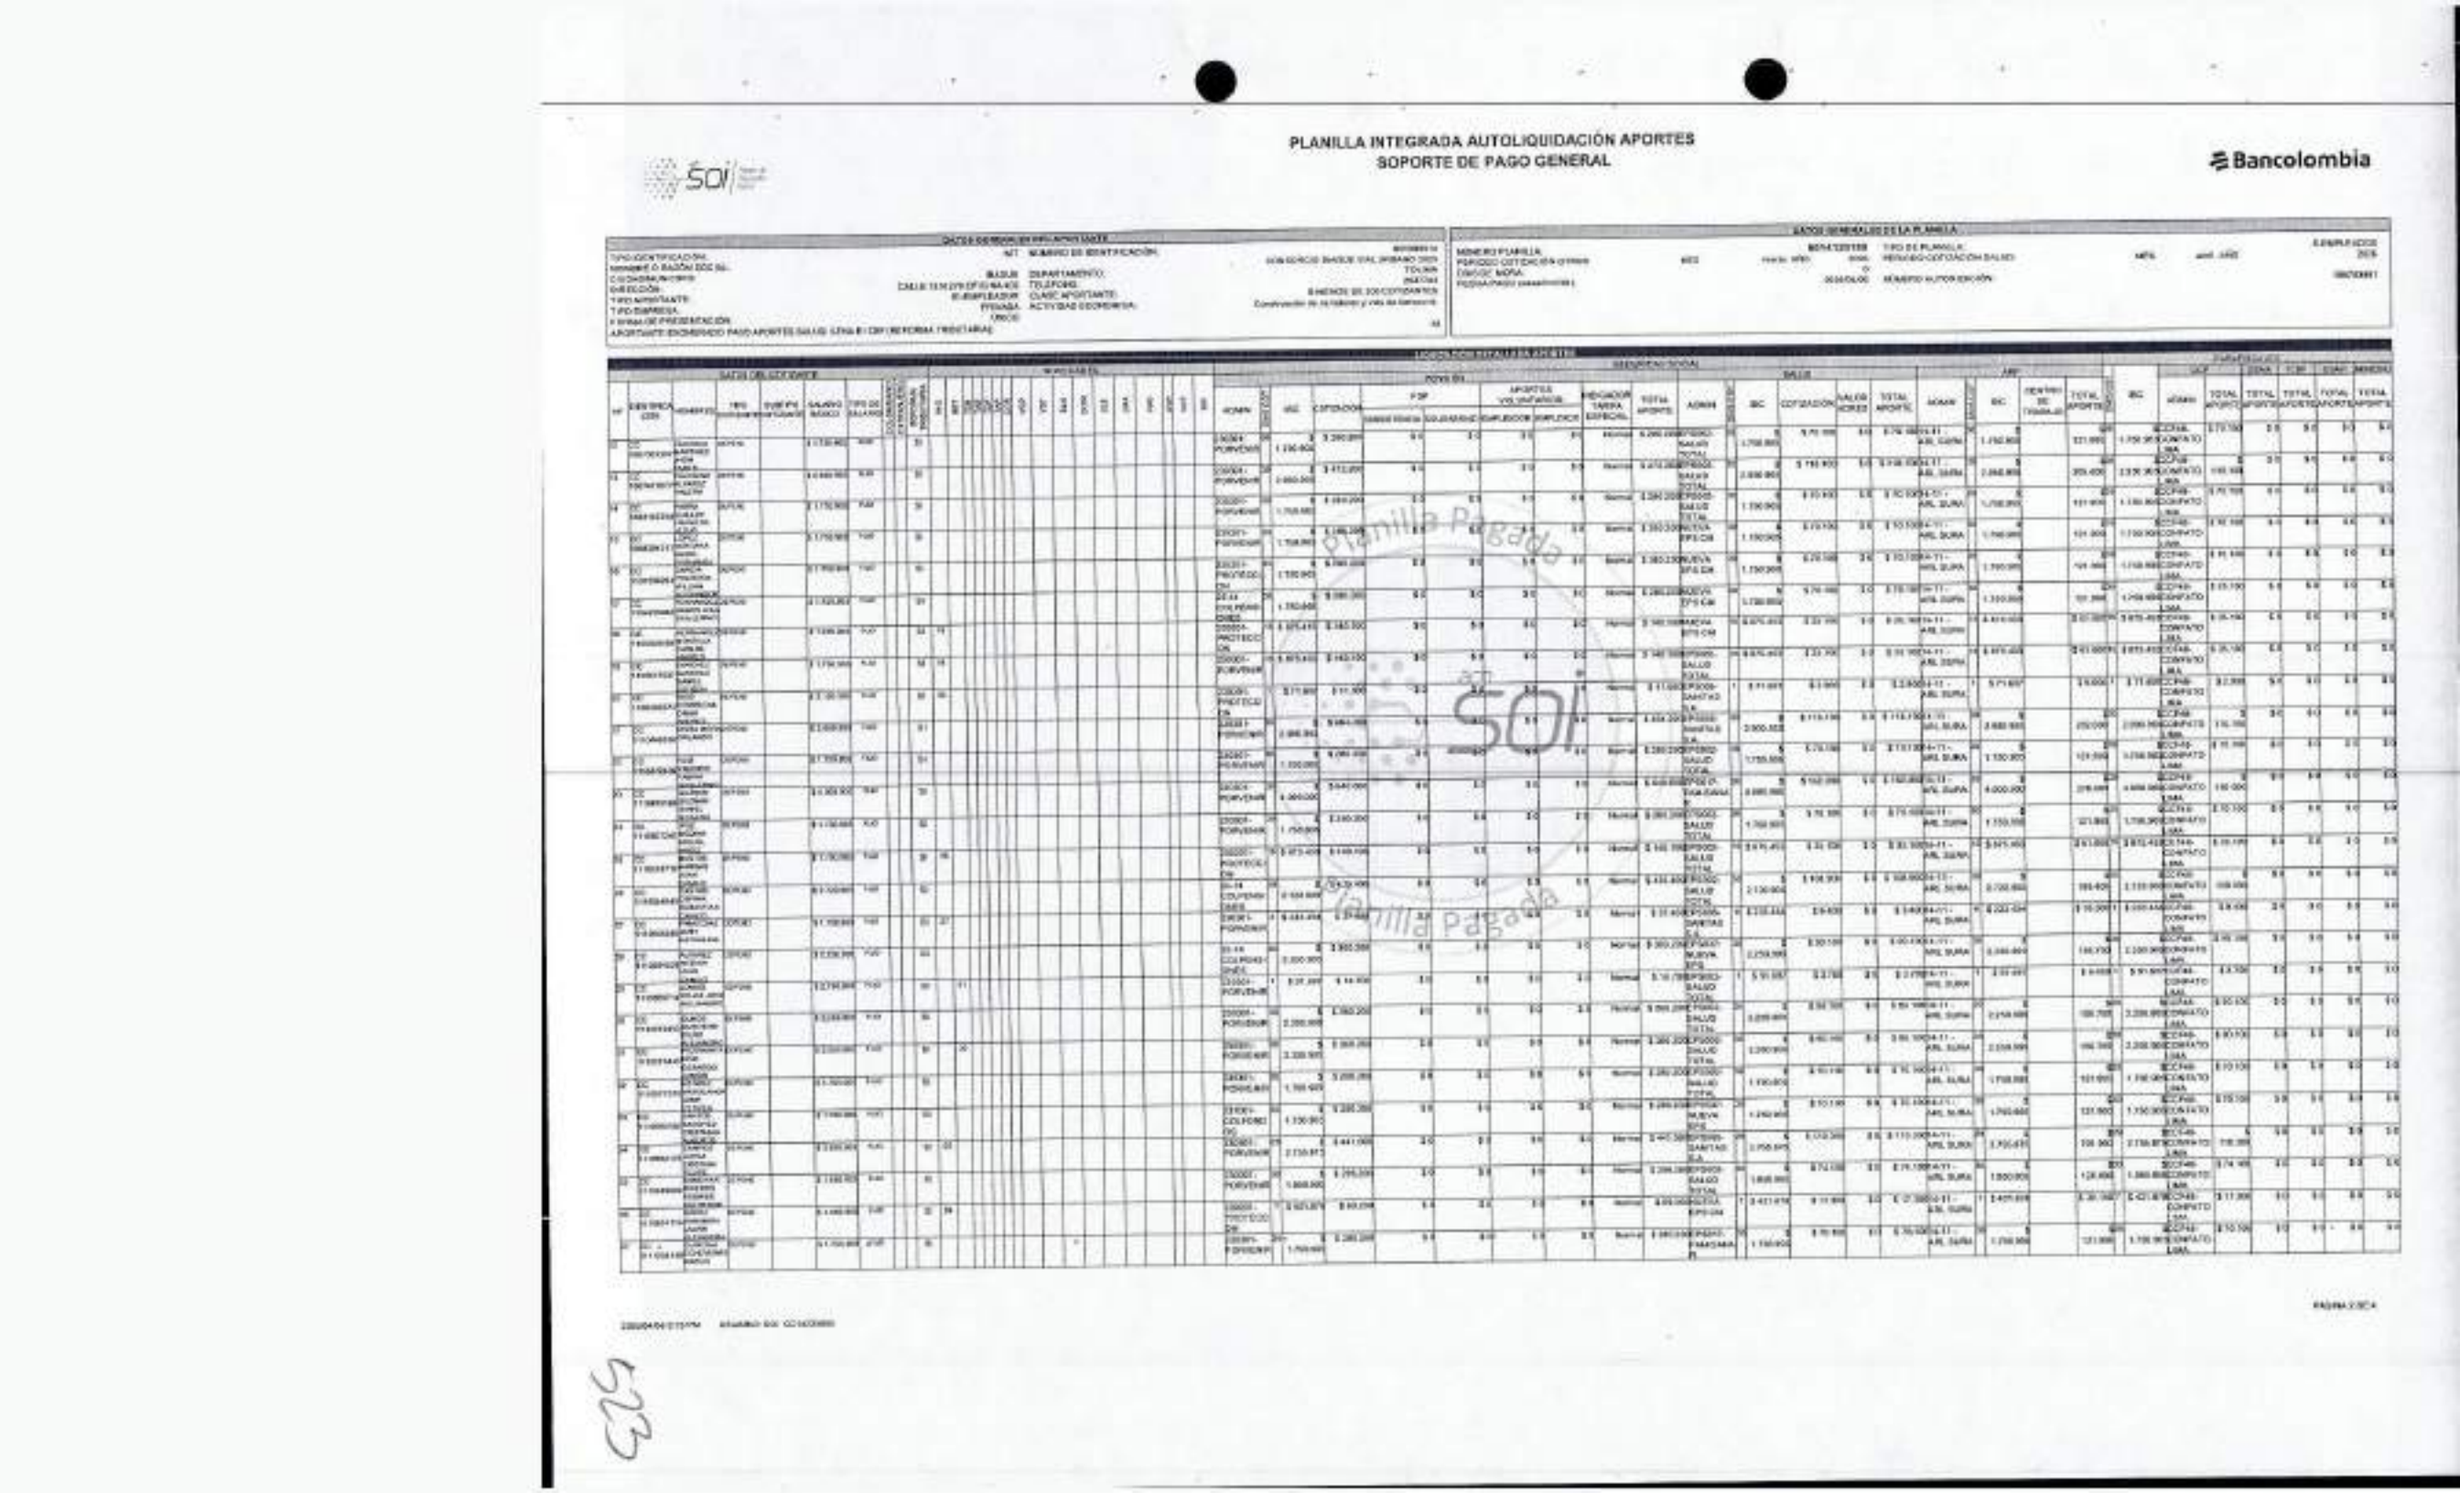

Planilla Pagada

Planilla Pagada

425

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DE APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN		901555515
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		CONSORCIO SAGSC AVA. UPRIMNU 2023	
CICDIGO MUNICIPIO:	SAGSC DEPARTAMENTO:		73LMA
DIRECCIÓN:	CALLE 13 N. 2'E OFICINA 101 TELÉFONO:		2837741
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:		
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONÓMICA:		
FORMA DE PRESENTACIÓN:	00000		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			

DATOS PLANILLA					
NÚMERO Planilla:		6011012189	TIPO DE PLANILLA:		
PERIODO COTIZACIÓN/ESTUDIO:	MES	Inicio AÑO MES	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	AÑO MES
DIAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2024/02/29	NUMERO AUTORIZACIÓN		

EMPLEADOS	
	0006

DATOS DEL COTIZANTE | NOVEDADES | LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN												SALUD						APVP					PARAFISCALES									
ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		NOVEDADES TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	SALDO ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	IBC	DEPÓSITO DE PASIVO	TOTAL APORTE	ADMIN	IBC	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
			SUBSIS FONDO	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																										
23081-FORVENIR	$ 780.000	$ 112.140	0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 112.140	EPS034 - NUEVA EPS	14	$ 780.000	$ 29.700	$ 0	$ 29.700	04-11 - ARL SURA				$ 780.000	$ 46.800	$ 31.200	$ 23.400	$ 31.200	$ 31.200	$ 31.200	$ 31.200	$ 31.200	$ 31.200	$ 31.200	$ 31.200	$ 31.200	$ 31.200
23081-FORVENIR	$ 870.400	$ 840.960	0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 840.960	EPS010 - SALUD TOTAL	14	$ 870.400	$ 29.700	$ 0	$ 29.700	04-11 - ARL SURA				$ 870.400	$ 52.200	$ 34.800	$ 26.100	$ 34.800	$ 34.800	$ 34.800	$ 34.800	$ 34.800	$ 34.800	$ 34.800	$ 34.800	$ 34.800	$ 34.800
23081-FORVENIR	$ 1.750.000	$ 1.690.800	0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.690.800	EPS010 - SALUD TOTAL	14	$ 1.750.000	$ 29.700	$ 0	$ 29.700	04-11 - ARL SURA	1.750.000			$ 1.750.000	$ 105.000	$ 70.000	$ 52.500	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000
23081-FORVENIR	$ 1.750.000	$ 1.690.800	0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.690.800	EPS010 - SALUD TOTAL	14	$ 1.750.000	$ 29.700	$ 0	$ 29.700	04-11 - ARL SURA	1.750.000			$ 1.750.000	$ 105.000	$ 70.000	$ 52.500	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000
23081-FORVENIR	$ 1.750.000	$ 1.690.800	0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.690.800	EPS010 - SALUD TOTAL	14	$ 1.750.000	$ 29.700	$ 0	$ 29.700	04-11 - ARL SURA	1.750.000			$ 1.750.000	$ 105.000	$ 70.000	$ 52.500	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000
23081-FORVENIR	$ 4.750.000	$ 4.590.000	0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 4.590.000	EPS010 - SALUD TOTAL	14	$ 4.750.000	$ 29.700	$ 0	$ 29.700	04-11 - ARL SURA	1.750.000			$ 4.750.000	$ 285.000	$ 190.000	$ 142.500	$ 190.000	$ 190.000	$ 190.000	$ 190.000	$ 190.000	$ 190.000	$ 190.000	$ 190.000	$ 190.000	$ 190.000
	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 0	EPS041 - SANITAS E.P.S.	14	$ 3.000.000	$ 29.700	$ 0	$ 29.700	04-11 - ARL SURA	3.000.000			$ 3.000.000	$ 180.000	$ 120.000	$ 90.000	$ 120.000	$ 120.000	$ 120.000	$ 120.000	$ 120.000	$ 120.000	$ 120.000	$ 120.000	$ 120.000	$ 120.000
25-14 - COLPENSIONES	$ 3.000.000	$ 2.820.000	0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 2.820.000	EPS037 - NUEVA EPS	14	$ 3.000.000	$ 29.700	$ 0	$ 29.700	04-11 - ARL SURA	3.000.000			$ 3.000.000	$ 195.000	$ 120.000	$ 90.000	$ 120.000	$ 120.000	$ 120.000	$ 120.000	$ 120.000	$ 120.000	$ 120.000	$ 120.000	$ 120.000	$ 120.000
23081-FORVENIR	$ 2.250.000	$ 2.160.000	0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 2.160.000	EPS010 - SALUD TOTAL	14	$ 2.250.000	$ 29.700	$ 0	$ 29.700	04-11 - ARL SURA	2.250.000			$ 2.250.000	$ 146.700	$ 90.000	$ 67.500	$ 90.000	$ 90.000	$ 90.000	$ 90.000	$ 90.000	$ 90.000	$ 90.000	$ 90.000	$ 90.000	$ 90.000
	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 0	EPS041 - SANITAS E.P.S.	14	$ 2.000.000	$ 29.700	$ 0	$ 29.700	04-11 - ARL SURA	2.000.000			$ 2.000.000	$ 130.000	$ 80.000	$ 60.000	$ 80.000	$ 80.000	$ 80.000	$ 80.000	$ 80.000	$ 80.000	$ 80.000	$ 80.000	$ 80.000	$ 80.000
23081-FORVENIR	$ 750.000	$ 691.200	0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 691.200	EPS010 - SALUD TOTAL	14	$ 750.000	$ 29.700	$ 0	$ 29.700	04-11 - ARL SURA	750.000			$ 750.000	$ 48.750	$ 30.000	$ 22.500	$ 30.000	$ 30.000	$ 30.000	$ 30.000	$ 30.000	$ 30.000	$ 30.000	$ 30.000	$ 30.000	$ 30.000
23081-FORVENIR	$ 2.000.000	$ 1.840.800	0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.840.800	EPS037 - NUEVA EPS	14	$ 2.000.000	$ 29.700	$ 0	$ 29.700	04-11 - ARL SURA	2.000.000			$ 2.000.000	$ 130.000	$ 80.000	$ 60.000	$ 80.000	$ 80.000	$ 80.000	$ 80.000	$ 80.000	$ 80.000	$ 80.000	$ 80.000	$ 80.000	$ 80.000
	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 0	EPS041 - SANITAS E.P.S.	14	$ 2.000.000	$ 29.700	$ 0	$ 29.700	04-11 - ARL SURA	2.000.000			$ 2.000.000	$ 130.000	$ 80.000	$ 60.000	$ 80.000	$ 80.000	$ 80.000	$ 80.000	$ 80.000	$ 80.000	$ 80.000	$ 80.000	$ 80.000	$ 80.000
23081-FORVENIR	$ 1.750.000	$ 1.690.800	0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.690.800	EPS010 - SALUD TOTAL	14	$ 1.750.000	$ 29.700	$ 0	$ 29.700	04-11 - ARL SURA	1.750.000			$ 1.750.000	$ 105.000	$ 70.000	$ 52.500	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000
23081-FORVENIR	$ 1.750.000	$ 1.690.800	0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.690.800	EPS010 - SALUD TOTAL	14	$ 1.750.000	$ 29.700	$ 0	$ 29.700	04-11 - ARL SURA	1.750.000			$ 1.750.000	$ 105.000	$ 70.000	$ 52.500	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000
23081-FORVENIR	$ 1.750.000	$ 1.690.800	0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.690.800	EPS010 - SALUD TOTAL	14	$ 1.750.000	$ 29.700	$ 0	$ 29.700	04-11 - ARL SURA	1.750.000			$ 1.750.000	$ 105.000	$ 70.000	$ 52.500	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000
25-14 - COLPENSIONES	$ 1.750.000	$ 1.690.800	0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.690.800	EPS010 - SALUD TOTAL	14	$ 1.750.000	$ 29.700	$ 0	$ 29.700	04-11 - ARL SURA	1.750.000			$ 1.750.000	$ 105.000	$ 70.000	$ 52.500	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000
23081-FORVENIR	$ 1.750.000	$ 1.690.800	0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.690.800	EPS010 - SALUD TOTAL	14	$ 1.750.000	$ 29.700	$ 0	$ 29.700	04-11 - ARL SURA	1.750.000			$ 1.750.000	$ 105.000	$ 70.000	$ 52.500	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000
25-14 - COLPENSIONES	$ 1.000.400	$ 966.480	0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 966.480	EPS010 - SALUD TOTAL	14	$ 1.000.400	$ 29.700	$ 0	$ 29.700	04-11 - ARL SURA	1.000.400			$ 1.000.400	$ 60.024	$ 40.016	$ 30.012	$ 40.016	$ 40.016	$ 40.016	$ 40.016	$ 40.016	$ 40.016	$ 40.016	$ 40.016	$ 40.016	$ 40.016
23081-FORVENIR	$ 1.750.000	$ 1.690.800	0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.690.800	EPS010 - SALUD TOTAL	14	$ 1.750.000	$ 29.700	$ 0	$ 29.700	04-11 - ARL SURA	1.750.000			$ 1.750.000	$ 105.000	$ 70.000	$ 52.500	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000
23081-FORVENIR	$ 1.750.000	$ 1.690.800	0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.690.800	EPS037 - NUEVA EPS	14	$ 1.750.000	$ 29.700	$ 0	$ 29.700	04-11 - ARL SURA	1.750.000			$ 1.750.000	$ 105.000	$ 70.000	$ 52.500	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000
23081-FORVENIR	$ 647.000	$ 622.800	0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 622.800	EPS037 - NUEVA EPS	14	$ 647.000	$ 29.700	$ 0	$ 29.700	04-11 - ARL SURA	647.000			$ 647.000	$ 38.820	$ 25.880	$ 19.410	$ 25.880	$ 25.880	$ 25.880	$ 25.880	$ 25.880	$ 25.880	$ 25.880	$ 25.880	$ 25.880	$ 25.880
23081-PROTECCION	$ 1.000.000	$ 962.400	0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 962.400	EPS010 - SALUD TOTAL	14	$ 1.000.000	$ 29.700	$ 0	$ 29.700	04-11 - ARL SURA	1.000.000			$ 1.000.000	$ 60.000	$ 40.000	$ 30.000	$ 40.000	$ 40.000	$ 40.000	$ 40.000	$ 40.000	$ 40.000	$ 40.000	$ 40.000	$ 40.000	$ 40.000
25-14 - COLPENSIONES	$ 3.600.000	$ 3.456.000	0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 3.456.000	EPS041 - SANITAS E.P.S.	14	$ 3.600.000	$ 29.700	$ 0	$ 29.700	04-11 - ARL SURA	3.600.000			$ 3.600.000	$ 234.000	$ 144.000	$ 108.000	$ 144.000	$ 144.000	$ 144.000	$ 144.000	$ 144.000	$ 144.000	$ 144.000	$ 144.000	$ 144.000	$ 144.000
25-14 - COLPENSIONES	$ 1.750.000	$ 1.690.800	0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.690.800	EPS010 - SALUD TOTAL	14	$ 1.750.000	$ 29.700	$ 0	$ 29.700	04-11 - ARL SURA	1.750.000			$ 1.750.000	$ 105.000	$ 70.000	$ 52.500	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000
23081-FORVENIR	$ 2.250.000	$ 2.160.000	0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 2.160.000	EPS010 - SALUD TOTAL	14	$ 2.250.000	$ 29.700	$ 0	$ 29.700	04-11 - ARL SURA	2.250.000			$ 2.250.000	$ 146.700	$ 90.000	$ 67.500	$ 90.000	$ 90.000	$ 90.000	$ 90.000	$ 90.000	$ 90.000	$ 90.000	$ 90.000	$ 90.000	$ 90.000

Planilla Pagada SOI

425

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			
CÓDIGO ARL/CLASE:			
DIRECCIÓN:		SUCURSAL	DEPARTAMENTO:
TIPO APORTANTE:		CALLE 12 N 1FD OFICINA 405	TELÉFONO:
TIPO EMPRESA:		PI-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:
FORMA DE PRESENTACIÓN:		PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		UNICO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		80144729155	TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	mayo AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril AÑO		2026
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/06/05	NÚMERO ACTIVACIÓN:				0001800001

DATOS COTIZANTE

Nº	DISTRITO COD	NOMBRE	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	PERIODO SALARIAL	EXTRANJERO	RESIDENTE	APORTA PENSIONES
58	CC 1020[illegible]52	[illegible]	01PAM		$ 2.[illegible]	15-30			30
59	CC 1018[illegible]	[illegible]	02PDE		$ 2.[illegible]	15-30			30
60	CC 1018[illegible]	[illegible]	01PAM		$ 1.[illegible]	15-30			30
61	CC 1036[illegible]	[illegible]	01PAM		$ 1.[illegible]	15-30			30
62	CC 1037[illegible]	[illegible]	01PAM		$ 1.[illegible]	15-30			30
63	CC 1018[illegible]	[illegible]	01PAM		$ 1.[illegible]	15-30			30
64	CC 1036[illegible]	[illegible]	01PAM		$ 1.[illegible]	15-30			30
65	CC 1037[illegible]	[illegible]	01PAM		$ 1.[illegible]	15-30			30
66	CC 1036[illegible]	[illegible]	01PAM		$ 1.[illegible]	15-30			30
67	CC 1036[illegible]	[illegible]	01PAM		$ 1.[illegible]	15-30			30
68	CC 1036[illegible]	[illegible]	01PAM		$ 1.[illegible]	15-30			30
69	CC 1036[illegible]	[illegible]	01PAM		$ 1.[illegible]	15-30			30
70	CC 1036[illegible]	[illegible]	01PAM		$ 1.[illegible]	15-30			30
71	CC 1036[illegible]	[illegible]	01PAM		$ 1.[illegible]	15-30			30
72	CC 1036[illegible]	[illegible]	01PAM		$ 1.[illegible]	15-30			30
73	CC 1036[illegible]	[illegible]	01PAM		$ 1.[illegible]	15-30			30
74	CC 1036[illegible]	[illegible]	01PAM		$ 1.[illegible]	15-30			30

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VTE	INC

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN

ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
			SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO		
23007-PORVENIR	$ 1.[illegible]	$ 1.[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ [illegible]
23-14 COLPENSIONES	$ 2.[illegible]	$ 2.[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ [illegible]
23007-PROTECCION	$ [illegible]	$ [illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ [illegible]
23-14 COLPENSIONES	$ 1.[illegible]	$ [illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ [illegible]
23007-PROTECCION	$ [illegible]	$ [illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ [illegible]
23007-PORVENIR	$ 1.[illegible]	$ [illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ [illegible]
23007-PROTECCION	$ [illegible]	$ [illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ [illegible]
23007-PORVENIR	$ [illegible]	$ [illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ [illegible]
23007-PROTECCION	$ [illegible]	$ [illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ [illegible]
23007-PORVENIR	$ [illegible]	$ [illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ [illegible]
23-14 COLPENSIONES	$ 1.[illegible]	$ [illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ [illegible]
23007-PORVENIR	$ 2.[illegible]	$ [illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ [illegible]
23-14 COLPENSIONES	$ 2.[illegible]	$ [illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ [illegible]
23007-PORVENIR	$ 1.[illegible]	$ [illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ [illegible]
23007-PORVENIR	$ [illegible]	$ [illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ [illegible]

SALUD

ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADMITIDO	TOTAL APORTE
23007-PORVENIR	$ 2.[illegible]	$ 90.[illegible]	$ 0	$ 90.[illegible]
23-14 COLPENSIONES	$ 2.[illegible]	$ 82.[illegible]	$ 0	$ 82.[illegible]
23007-PROTECCION	$ 1.[illegible]	$ 55.[illegible]	$ 0	$ 55.[illegible]
23007-PORVENIR	$ 1.[illegible]	$ 70.[illegible]	$ 0	$ 70.[illegible]
23007-PROTECCION	$ 1.[illegible]	$ 78.[illegible]	$ 0	$ 78.[illegible]
23007-PORVENIR	$ 1.[illegible]	$ 28.[illegible]	$ 0	$ 28.[illegible]
23007-PROTECCION	$ 1.[illegible]	$ 70.[illegible]	$ 0	$ 70.[illegible]
23007-PORVENIR	$ 1.[illegible]	$ 78.[illegible]	$ 0	$ 78.[illegible]
23007-PROTECCION	$ 1.[illegible]	$ 78.[illegible]	$ 0	$ 78.[illegible]
23007-PORVENIR	$ 1.[illegible]	$ 78.[illegible]	$ 0	$ 78.[illegible]
23007-PORVENIR	$ 1.[illegible]	$ 32.[illegible]	$ 0	$ 32.[illegible]
23-14 COLPENSIONES	$ 1.[illegible]	$ 78.[illegible]	$ 0	$ 78.[illegible]
23007-PORVENIR	$ 2.[illegible]	$ 89.[illegible]	$ 0	$ 89.[illegible]
23-14 COLPENSIONES	$ 2.[illegible]	$ 110.[illegible]	$ 0	$ 110.[illegible]
23007-PORVENIR	$ 1.[illegible]	$ 58.[illegible]	$ 0	$ 58.[illegible]
23007-PORVENIR	$ 1.[illegible]	$ 34.[illegible]	$ 0	$ 34.[illegible]

ARP

ADMIN	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
23007-PORVENIR	$		$
23-14 COLPENSIONES	$		$
23007-PROTECCION	$		$
23007-PORVENIR	$		$
23007-PROTECCION	$		$
23007-PORVENIR	$		$
23007-PROTECCION	$		$
23007-PORVENIR	$		$
23007-PROTECCION	$		$
23007-PORVENIR	$		$
23-14 COLPENSIONES	$		$
23007-PORVENIR	$		$
23-14 COLPENSIONES	$		$
23007-PORVENIR	$		$
23007-PORVENIR	$		$

PARAFISCALES

IBC	ADMIN	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINTIC
		TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
$ 2.[illegible]	23-[illegible] COMFATLIMA	$ 90.[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
$ 2.[illegible]	23-[illegible] COMFATLIMA	$ 82.[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
$ 1.[illegible]	23-[illegible] COMFATLIMA	$ 55.[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
$ 1.[illegible]	23-[illegible] COMFATLIMA	$ 70.[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
$ 1.[illegible]	23-[illegible] COMFATLIMA	$ 78.[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
$ 1.[illegible]	23-[illegible] COMFATLIMA	$ 28.[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
$ 1.[illegible]	23-[illegible] COMFATLIMA	$ 70.[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
$ 1.[illegible]	23-[illegible] COMFATLIMA	$ 78.[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
$ 1.[illegible]	23-[illegible] COMFATLIMA	$ 78.[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
$ 1.[illegible]	23-[illegible] COMFATLIMA	$ 32.[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
$ 1.[illegible]	23-[illegible] COMFATLIMA	$ 78.[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
$ 2.[illegible]	23-[illegible] COMFATLIMA	$ 89.[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
$ 2.[illegible]	23-[illegible] COMFATLIMA	$ 110.[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
$ 1.[illegible]	23-[illegible] COMFATLIMA	$ 58.[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
$ 1.[illegible]	23-[illegible] CONSULTOLIMA	$ 34.[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 41.369.000

Planilla Pagada

525

ANEXO 2

INDUCCIONES

NO APLICA ESTE PERIODO

ANEXO 3

CERTIFICADO DE APTITUD MEDICA LABORAL

NO APLICA ESTE PERIODO

ANEXO 4

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

UT URBANAS IBAGUÉ	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:	F-01/V02
		Versión:	01
	ACTA DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha Aprobación:	20/11/2025

Nombre: Carlos Vergara.

De acuerdo con la identificación de peligros dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y dando cumplimiento al decreto 1072 del 2015, UNION TEMPORAL URBANAS IBAGUE hace entrega de los siguientes elementos de protección personal:

Fecha de Entrega	Cantidad	Descripción EPP
13-04-26	4	Guantes Nitrilo Reposicion
15-01-26	1	Guantes plastico
13-04-26	4	tapaboca
	4	Gafas oscuras
	1	Guantes Nitrilo.

Por medio de la presente el colaborador certifica que ha recibido los elementos de protección personal (EPP) descritos en el presente documento, así como capacitación en su uso y cuidado y se compromete a lo siguiente:

1.Utilizarlos únicamente dentro del área de trabajo.
2.Cumplir siempre con las normas de seguridad y protección para los cuales fueron entregados.
3.Dar un buen uso y cuidado de los elementos recibidos, de acuerdo con las indicaciones recibidas.
4.Consultar cualquier duda sobre su correcta utilización.
5.Solicitar un nuevo EPP en caso de pérdida o deterioro de este.

En constancia lo firman:

Quien entrega,

Dana Cabezas
Nombre y Apellidos
Cargo Profesional SST.

Quien recibe,

Carlos Vergara
Nombre y Apellido Colaborador
Cargo Ayudante

Scanned with CamScanner

UT URBANAS IBAGUÉ	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:	F-01/V02
		Versión:	01
	ACTA DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha Aprobació	20/11/2025

Nombre: Vidal Gonzalez

De acuerdo con la identificación de peligros dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y dando cumplimiento al decreto 1072 del 2015, CONSORCIO VIAS JCSR hace entrega de los siguientes elementos de protección personal:

Fecha de Entrega	Cantidad	Descripción EPP
09-01-26	1	CASCO
	1	tapabocas
	1	tapones insercion

Por medio de la presente el colaborador certifica que ha recibido los elementos de protección personal (EPP) descritos en el presente documento, así como capacitación en su uso y cuidado y se compromete a lo siguiente:

1. Utilizarlos únicamente dentro del área de trabajo.
2. Cumplir siempre con las normas de seguridad y protección para los cuales fueron entregados.
3. Dar un buen uso y cuidado de los elementos recibidos, de acuerdo con las indicaciones recibidas.
4. Consultar cualquier duda sobre su correcta utilización.
5. Solicitar un nuevo EPP en caso de pérdida o deterioro de este.

En constancia lo firman:

Quien entrega,

Nombre y Apellidos: Jotion Buriaga
Cargo: Inspector SST

Quien recibe,

Nombre y Apellido Colaborador: Vidal G
Cargo

530

CONSORCIO IBAGUE VIAL URBANO 2025 NIT 901.999.914-2	CONSORCIO IBAGUE VIAL URBANO 2025 NIT:901.999.914-2 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Versión 1 Fecha: Enero/2024 FT - SST-04

OBRA:	Santa Barbara		
Nombre:	Maria Fernanda Lopez	Cedula:	
Cargo:	Controladora		

ELEMENTO DE PROTECCION ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	SUMINISTRO	REPOSICION	FIRMA DE RECIBO
CASCO					
GUANTES					
TAPABOCAS					
TAPONES AUDITIVOS					
GAFAS					
BOTAS DE MATERIAL CON PUNTA DE SEGURIDAD	1			X	
CAMISA	2			X	
CAPUCHON					
JEANS	2			X	

Me comprometo a utilizar durante la Jornada Laboral los elementos de Proteccion Personal Recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad Salud y trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicologico y social. Declaro que he recibido informacion sobre el uso adecuado de los mismos. Codigo Sustantivo del Trabajo Art, 56 y Art58 Numeral 7; Ley 9 de 1979; Art: 88. Decreto 1295 de 1994 Art.22

Firma del Trabajador: maria Fernandez Fecha:

ELABORÓ: Gloria Lopez

531

CONSORCIO IBAGUE VIAL URBANO 2025 NIT:901.999.914-2	CONSORCIO IBAGUE VIAL URBANO 2025 NIT:901.999.914-2 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PÉRSONAL	Versión 1 Fecha: Enero/2024 FT - SST-04

OBRA:	Santa Barbara		
Nombre:	Enalber leal	Cedula:	
Cargo:	Resto/llano		

ELEMENTO DE PROTECCION ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	SUMINISTRO	REPOSICION	FIRMA DE RECIBO
CASCO					
GUANTES					
TAPABOCAS					
TAPONES AUDITIVOS					
GAFAS					
BOTAS DE MATERIAL CON PUNTA DE SEGURIDAD					
CAMISA	1			X	Enalber
CAPUCHON					
JEANS	1			X	Enalber

Me comprometo a utilizar durante la Jornada Laboral los elementos de Proteccion Personal Recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad Salud y trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicologico y social. Declaro que he recibido informacion sobre el uso adecuado de los mismos. Codigo Sustantivo del Trabajo Art, 56 y Art58 Numeral 7; Ley 9 de 1979; Art; 88. Decreto 1295 de 1994 Art.22

Firma del Trabajador: _____ Fecha: _____

ELABORÓ: Gloria lopez

532

CONSORCIO IBAGUE VIAL URBANO 2025 NIT:901.999.914-2	CONSORCIO IBAGUE VIAL URBANO 2025 NIT:901.999.914-2 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Versión 1 Fecha: Enero/2024 FT - SST-04

OBRA:	Santa barbara		
Nombre:	Reinaldo Flores	Cedula:	
Cargo:	Ayudante		

ELEMENTO DE PROTECCION ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	SUMINISTRO	REPOSICION	FIRMA DE RECIBO
CASCO					
GUANTES					
TAPABOCAS					Reinaldo Flores
TAPONES AUDITIVOS					
GAFAS					
BOTAS DE MATERIAL CON PUNTA DE SEGURIDAD					
CAMISA	1			X	
CAPUCHON					
JEANS	1			X	

Me compromeso a utilizar durante la Jornada Laboral los elementos de Proteccion Personal Recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad Salud y trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicologico y social. Declaro que he recibido informacion sobre el uso adecuado de los mismos. Codigo Sustantivo del Trabajo Art, 56 y Art58 Numeral 7; Ley 9 de 1979; Art; 88. Decreto 1295 de 1994 Art.22

Firma del Trabajador: Reinaldo Flores Fecha:

ELABORÓ: Gloria Lopez

533

CONSORCIO IBAGUE VIAL URBANO 2025 NIT:901.999.914-2	CONSORCIO IBAGUE VIAL URBANO 2025 NIT:901.999.914-2 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PÉRSONAL	Versión 1 Fecha: Enero/2024 FT-SST-04

OBRA:	Picaute		
Nombre:	Miler Sanchez	Cedula:	
Cargo:	Ayudante		

ELEMENTO DE PROTECCION ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	SUMINISTRO	REPOSICION	FIRMA DE RECIBO
CASCO					
GUANTES					
TAPABOCAS					
TAPONES AUDITIVOS					
GAFAS					
BOTAS DE MATERIAL CON PUNTA DE SEGURIDAD					
CAMISA	1			9	
CAPUCHON					
JEANS	1			X	

Me comprometo a utilizar durante la Jornada Laboral los elementos de Proteccion Personal Recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad Salud y trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicologico y social. Declaro que he recibido Informacion sobre el uso adecuado de los mismos. Codigo Sustantivo del Trabajo Art, 56 y Art58 Numeral 7; Ley 9 de 1979; Art; 88. Decreto 1295 de 1994 Art.22

Firma del Trabajador: MILER S. Fecha:

ELABORÓ: Gloria Lopez

534

CONSORCIO IBAGUE VIAL URBANO 2025 NIT 901.999.914-2	CONSORCIO IBAGUE VIAL URBANO 2025 NIT:901.999.914-2 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Versión 1 Fecha: Enero/2024 FT - SST-04

OBRA:	Ricaurte		
Nombre:	Alberto laverde	Cedula:	
Cargo:	Ayudante		

ELEMENTO DE PROTECCION ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	SUMINISTRO	REPOSICION	FIRMA DE RECIBO
CASCO					
GUANTES					
TAPABOCAS					
TAPONES AUDITIVOS					
GAFAS					
BOTAS DE MATERIAL CON PUNTA DE SEGURIDAD					
CAMISA	1			X	
CAPUCHON					
JEANS	1			X	

Me comprometo a utilizar durante la Jornada Laboral los elementos de Proteccion Personal Recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad Salud y trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicologico y social. Declaro que he recibido Informacion sobre el uso adecuado de los mismos. Codigo Sustantivo del Trabajo Art, 56 y Art58 Numeral 7; Ley 9 de 1979; Art; 86. Decreto 1295 de 1994 Art.22

Firma del Trabajador: _____ Fecha:

ELABORÓ: Gloria Lopez

CONSORCIO IBAGUE VIAL URBANO 2025 NIT:901.999.914-2	CONSORCIO IBAGUE VIAL URBANO 2025 NIT:901.999.914-2 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PÉRSONAL	Versión 1 Fecha: Enero/2024 FT - SST-04

OBRA:	San Carlos		
Nombre:	Jose Arenas	Cedula:	
Cargo:	Oficial		

ELEMENTO DE PROTECCION ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	SUMINISTRO	REPOSICION	FIRMA DE RECIBO
CASCO					
GUANTES					
TAPABOCAS					
TAPONES AUDITIVOS					
GAFAS					
BOTAS DE MATERIAL CON PUNTA DE SEGURIDAD					
CAMISA	1				
CAPUCHON					
JEANS	1				

Jose Arenas

Me comprometo a utilizar durante la Jornada Laboral los elementos de Proteccion Personal Recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad Salud y trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicologico y social. Declaro que he recibido Informacion sobre el uso adecuado de los mismos. Codigo Sustantivo del Trabajo Art, 56 y Art58 Numeral 7; Ley 9 de 1979; Art; 88. Decreto 1295 de 1994 Art.22

Firma del Trabajador: Jose Arenas Fecha: _____

ELABORÓ: Gloria Lopez

536

CONSORCIO IBAGUE VIAL URBANO 2025 NIT:901.999.914-2		Versión 1
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PÉRSONAL	Fecha: Enero/2024
		FT - SST-04

OBRA:	San Carlos		
Nombre:	Jaime Bernal	Cedula:	
Cargo:	Ayudante		

ELEMENTO DE PROTECCION ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	SUMINISTRO	REPOSICION	FIRMA DE RECIBO
CASCO					
GUANTES					
TAPABOCAS					
TAPONES AUDITIVOS					
GAFAS					
BOTAS DE MATERIAL CON PUNTA DE SEGURIDAD					
CAMISA	1				
CAPUCHON					
JEANS	1				

Me comprometo a utilizar durante la Jornada Laboral los elementos de Proteccion Personal Recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad Salud y trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicologico y social. Declaro que he recibido Informacion sobre el uso adecuado de los mismos. Codigo Sustantivo del Trabajo Art. 56 y Art58 Numeral 7; Ley 9 de 1979; Art 88. Decreto 1295 de 1994 Art.22

Firma del Trabajador: Jaime Bernal Fecha:

ELABORÓ: Gloria Lopez

537

CONSORCIO IBAGUE VIAL URBANO 2025 NIT:901.999.914-2	CONSORCIO IBAGUE VIAL URBANO 2025 NIT:901.999.914-2 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PÉRSONAL	Versión 1 Fecha: Enero/2024 FT - SST-04

OBRA:	San Carlos		
Nombre:	Jhan Alexander Tasay	Cedula:	
Cargo:	Ayudante		

ELEMENTO DE PROTECCION ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	SUMINISTRO	REPOSICION	FIRMA DE RECIBO
CASCO					
GUANTES					
TAPABOCAS					
TAPONES AUDITIVOS					
GAFAS					
BOTAS DE MATERIAL CON PUNTA DE SEGURIDAD					
CAMISA	1				
CAPUCHON					
JEANS	1				

Me comprometo a utilizar durante la Jornada Laboral los elementos de Proteccion Personal Recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad Salud y trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicologico y social. Declaro que he recibido Informacion sobre el uso adecuado de los mismos. Codigo Sustantivo del Trabajo Art, 56 y Art58 Numeral 7; Ley 9 de 1979: Art; 88. Decreto 1295 de 1994 Art.22

Firma del Trabajador: _____ Fecha: _____

ELABORÓ: Gloria Lopez

538

CONSORCIO IBAGUE VIAL URBANO 2025 NIT:901.999.914-2	CONSORCIO IBAGUE VIAL URBANO 2025 NIT:901.999.914-2 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Versión 1
		Fecha: Enero/2024
		FT - SST-04

OBRA:	San Carlos		
Nombre:	Jhon Tovar	Cedula:	
Cargo:	Oficial		

ELEMENTO DE PROTECCION ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	SUMINISTRO	REPOSICION	FIRMA DE REGIBO
CASCO					
GUANTES					
TAPABOCAS					
TAPONES AUDITIVOS					JHON JAIRO TOVAR
GAFAS					
BOTAS DE MATERIAL CON PUNTA DE SEGURIDAD					
CAMISA				X	
CAPUCHON					JHON JAIRO TOVAR
JEANS				X	

Me comprometo a utilizar durante la Jornada Laboral los elementos de Proteccion Personal Recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad Salud y trabajo que contribuyan a mi bienestar fisico, psicologico y social. Declaro que he recibido Informacion sobre el uso adecuado de los mismos. Codigo Sustantivo del Trabajo Art, 56 y Art58 Numeral 7; Ley 9 de 1979; Art; 88. Decreto 1295 de 1994 Art.22

Firma del Trabajador: JHON JAIRO TOVAR Fecha:

ELABORÓ: Glana Lopez

539

CONSORCIO IBAGUE VIAL URBANO 2025 NIT 901.999.914-2	CONSORCIO IBAGUE VIAL URBANO 2025 NIT:901.999.914-2 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PÉRSONAL	Versión 1 Fecha: Enero/2024 FT - SST-04

OBRA:	Piedra Pintada		
Nombre:	Angel Alberto Cantor V.	Cedula:	93396277
Cargo:	Ayudante		

ELEMENTO DE PROTECCION ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	SUMINISTRO	REPOSICION	FIRMA DE RECIBO
CASCO					
GUANTES					
TAPABOCAS					
TAPONES AUDITIVOS					
GAFAS					
BOTAS DE MATERIAL CON PUNTA DE SEGURIDAD					
CAMISA				1	Cantor
CAPUCHON					
JEANS				1	Cantor

Me comprometo a utilizar durante la Jornada Laboral los elementos de Proteccion Personal Recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad Salud y trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicologico y social. Declaro que he recibido informacion sobre el uso adecuado de los mismos. Codigo Sustantivo del Trabajo Art, 66 y Art56 Numeral 7; Ley 9 de 1979; Art; 88. Decreto 1295 de 1994 Art.22

Firma del Trabajador: _____ Fecha: Angel Alberto Cantor

ELABORÓ: Gloria Lopez

540

CONSORCIO IBAGUE VIAL URBANO 2025 NIT 901.999.914-2	CONSORCIO IBAGUE VIAL URBANO 2025 NIT:901.999.914-2 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PÉRSONAL	Versión 1 Fecha: Enero/2024 FT - SST-04

OBRA:	Calarca		
Nombre:	Omar Rico	Cedula:	
Cargo:			

ELEMENTO DE PROTECCION ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	SUMINISTRO	REPOSICION	FIRMA DE RECIBO
CASCO	1				
GUANTES	1				
TAPABOCAS	1				
TAPONES AUDITIVOS	1				
GAFAS	1				
BOTAS DE MATERIAL CON PUNTA DE SEGURIDAD	1				
CAMISA	2				
CAPUCHON	1				
JEANS	1				

Me comprometo a utilizar durante la Jornada Laboral los elementos de Proteccion Personal Recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad Salud y trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicologico y social. Declaro que he recibido Informacion sobre el uso adecuado de los mismos. Codigo Sustantivo del Trabajo Art, 56 y Art58 Numeral 7; Ley 9 de 1979; Art; 88. Decreto 1295 de 1994 Art.22

Firma del Trabajador: Omar Rico Fecha:

ELABORÓ: Gloria Lopez

591

	CONSORCIO IBAGUE VIAL URBANO 2025 NIT:901.999.914-2 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Versión 1 Fecha: Enero/2024 FT - SST-04

OBRA:	Nápoles		
Nombre:	Luis Quiñonez R	Cedula:	14.271-484.
Cargo:	Auxiliar		

ELEMENTO DE PROTECCION ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	SUMINISTRO	REPOSICION	FIRMA DE RECIBO
CASCO					
GUANTES					
TAPABOCAS					
TAPONES AUDITIVOS					
GAFAS					
BOTAS DE MATERIAL CON PUNTA DE SEGURIDAD					
CAMISA				1	
CAPUCHON					
JEANS				1	

Me comprometo a utilizar durante la Jornada Laboral los elementos de Proteccion Personal Recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad Salud y trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicologico y social. Declaro que he recibido informacion sobre el uso adecuado de los mismos. Codigo Sustantivo del Trabajo Art, 56 y Art58 Numeral 7; Ley 9 de 1979; Art; 88. Decreto 1295 de 1994 Art.22

Firma del Trabajador: _____ Fecha: 01-04-26

ELABORÓ: Gloria

542

CONSORCIO IBAGUE VIAL URBANO 2025 NIT:901.999.914-2		Versión 1
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Fecha: Enero/2024
		FT - SST-04

OBRA:	Nogales		
Nombre:	Fabian Ruiz V.	Cedula:	1170472470
Cargo: AYU	AYU		

ELEMENTO DE PROTECCION ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	SUMINISTRO	REPOSICION	FIRMA DE RECIBO
CASCO					
GUANTES					
TAPABOCAS					
TAPONES AUDITIVOS					
GAFAS					
BOTAS DE MATERIAL CON PUNTA DE SEGURIDAD					
CAMISA				1	Fabian
CAPUCHON					
JEANS				1	Fabian V.

Me comprometo a utilizar durante la Jornada Laboral los elementos de Proteccion Personal Recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad Salud y trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicologico y social. Declaro que he recibido Informacion sobre el uso adecuado de los mismos. Codigo Sustantivo del Trabajo Art, 56 y Art58 Numeral 7; Ley 9 de 1979; Art; 88. Decreto 1295 de 1994 Art.22

Firma del Trabajador: Fabian Ruiz V. Fecha: 01-04-24

ELABORÓ: Gloria

SA3

CONSORCIO IBAGUE VIAL URBANO 2025 NIT:901.999.914-2		Versión 1
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Fecha: Enero/2024
		FT - SST-04

OBRA:	Nogales		
Nombre:	Juan Esteban Mendez	Cedula:	1116577370
Cargo:	Oficial de obra		

ELEMENTO DE PROTECCION ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	SUMINISTRO	REPOSICION	FIRMA DE RECIBO
CASCO					
GUANTES					
TAPABOCAS					
TAPONES AUDITIVOS					
GAFAS					
BOTAS DE MATERIAL CON PUNTA DE SEGURIDAD					
CAMISA				1	Juan Esteban
CAPUCHON					
JEANS				1	Juan Esteban

Me comprometo a utilizar durante la Jornada Laboral los elementos de Proteccion Personal Recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad Salud y trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicologico y social. Declaro que he recibido Informacion sobre el uso adecuado de los mismos. Codigo Sustantivo del Trabajo Art, 56 y Art58 Numeral 7; Ley 9 de 1979; Art; 88. Decreto 1295 de 1994 Art.22

Firma del Trabajador: _____ Fecha: 01-04-26

ELABORÓ: Gloria

544

CONSORCIO IBAGUE VIAL URBANO 2025 NIT:901.999.914-2	CONSORCIO IBAGUE VIAL URBANO 2025 NIT:901.999.914-2 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Versión 1 Fecha: Enero/2024 FT - SST-04

OBRA:	Nogales		
Nombre:	Edder Delgado M	Cedula:	93386491
Cargo:	Ayudante		

ELEMENTO DE PROTECCION ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	SUMINISTRO	REPOSICION	FIRMA DE RECIBO
CASCO					
GUANTES					
TAPABOCAS					
TAPONES AUDITIVOS					
GAFAS					
BOTAS DE MATERIAL CON PUNTA DE SEGURIDAD					
CAMISA			1		Edder P.
CAPUCHON					
JEANS			1		Edder D

Me comprometo a utilizar durante la Jornada Laboral los elementos de Proteccion Personal Recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad Salud y trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicologico y social. Declaro que he recibido Informacion sobre el uso adecuado de los mismos. Codigo Sustantivo del Trabajo Art, 56 y Art58 Numeral 7; Ley 9 de 1979; Art; 88. Decreto 1295 de 1994 Art.22

Firma del Trabajador: _____ Fecha: 01-04-76

ELABORÓ: Gloria

545

CONSORCIO IBAGUE VIAL URBANO 2025 NIT:901.999.914-2		Versión 1
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Fecha: Enero/2024
		FT - SST-04

OBRA:	Nogales		
Nombre:	[illegible]	Cedula:	1063192352
Cargo:	AUX		

ELEMENTO DE PROTECCION ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	SUMINISTRO	REPOSICION	FIRMA DE RECIBO
CASCO					
GUANTES					
TAPABOCAS					
TAPONES AUDITIVOS					
GAFAS					
BOTAS DE MATERIAL CON PUNTA DE SEGURIDAD					
CAMISA				1	[illegible]
CAPUCHON					
JEANS				1	[illegible]

Me comprometo a utilizar durante la Jornada Laboral los elementos de Proteccion Personal Recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad Salud y trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicologico y social. Declaro que he recibido Informacion sobre el uso adecuado de los mismos. Codigo Sustantivo del Trabajo Art, 56 y Art58 Numeral 7; Ley 9 de 1979; Art; 86. Decreto 1295 de 1994 Art.22

Firma del Trabajador: [illegible] Fecha: 01-09-26

ELABORÓ: Gloria

546

CONSORCIO IBAGUE VIAL URBANO 2025 NIT 901.995.814-2	CONTROL SUMINISTRO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONSORCIO IBAGUE VIAL URBANO 2025 NIT:901.995.814-2 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Página: De: Versión 1 - 2024

OBRA:	villa marlen, Calarca San Carlos

No.	NOMBRE Y APELLIDO	ELEMENTO ENTREGADO	FECHA DE ENTREGA	FIRMA DE RECIBO
	[illegible]	Guantes	21-04-26	[signature]
	Oldaneta Cashman	Guantes	21-04-26	[signature]
	Francisco villanueva	Guantes	21-04-26	[signature]
	Anderson Alzate	Guantes	22-04-26	[signature]
	Aime Berna	Gafas	23/04/26	[signature]
	Carlos D. Sandoval	Gafas	23/04/26	[signature] S.A.
	Parmenio Benavides	Gafas	23/04-26	[signature]
	Carlos Hernandez	Gafas	23/04/26	CARLOS HERNANDEZ

ELABORÓ: Yenifer Somoyar

CONSORCIO IBAGUE VIAL URBANO 2025 NIT 901.569.514-2	CONTROL SUMINISTRO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONSORCIO IBAGUE VIAL URBANO 2025 NIT:901.569.514-2 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Página: De: Versión 1 - 2024

OBRA:	Calerca – Piedra Pintada

No.	NOMBRE Y APELLIDO	ELEMENTO ENTREGADO	FECHA DE ENTREGA	FIRMA DE RECIBO
	Juan arnoldo rubio	Guantes	17-04-26	
	Andrés felipe Sara	Guantes	17-04-26	Andrés Sara
	Mateo Quiroga Echeverry	Guantes	17-04-26	Mateo Quiroga
	Faber Valencia	Guantes	17-04-26	
	jaime Berral	Guante	17-04-26	Jaime
	Luis Fierro	Guantes	17-04-26	Fierro
	Jhon Tovar	Guantes	17-04-26	JHON
	Jhony Tovar	Guantes	17-04-26	Jonny Tovar
	Jose Arenas	Guantes	17-04-26	José A
	Jhon Tovar	Guantes	17-04-26	TOVAR
	Hernando Vielma	Guantes	17-04-26	
	Luis Carter	Guantes	17-04-26	

ELABORÓ: Yenifer Samayoa

CONSORCIO IBAGUE VIAL URBANO 2025 NIT 901.989.914-2	CONTROL SUMINISTRO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONSORCIO IBAGUE VIAL URBANO 2026 NIT:901.989.914-2 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Página: De: Versión 1 - 2024

OBRA:	Calarca, San Carlos, Piedra Pintada

No.	NOMBRE Y APELLIDO	ELEMENTO ENTREGADO	FECHA DE ENTREGA	FIRMA DE RECIBO
	Jose Arena	Gafas tapaoidos	16-03-26	Jose A
	Brayan Cardenas	Gafas Guantes caucho	16-03-26	
	Jhon Alexander Tovar	Guantes Guantes caucho	16-03-26	
	Jordan Cardenas	Guantes negros caucho	16-03-26	
	Jhon Tovar	Guantes caucho	16-03-26	
	Camilo Alfonso	Guantes negros Guantes caucho	16-03-26	
	Jhon Valencia	Gafas, tapaoidos Guantes	16-03-26	
	Jhonny Tovar	Gafas, Guantes Tapaoidos	16-03-26	Jonny T.
	Luis Fierro	Guantes gafas	17-03-26	Fierro
	Wilmer Castellanos	Gafas guantes	17-03-26	
	Parmenio Benavidez J	guantes	18-03-26	
	CARLOS ANDRES HERNANDEZ	Guantes	18-03-26	CARLOS ANDRES
	[illegible]	Guantes	18-03-26	
	CARLOS OSPINA	Guantes	18-03-26	
	Hernando Bermeo	Guante negro	18-03-26	
	Alberto Cantor	Guantes	18-03-26	Cantor

CLADOS: Yenifer Somoyar

599

CONSORCIO VIAL URBANO 2025 Nit 901.993.514-2	CONTROL SUMINISTRO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONSORCIO IBAGUE VIAL URBANO 2025 NIT:901.993.514-2 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Página: De: Versión 1 - 2024

OBRA:	Pda. Jordan - San Carlos

No.	NOMBRE Y APELLIDO	ELEMENTO ENTREGADO	FECHA DE ENTREGA	FIRMA DE RECIBO
	Anderson Arzate	1 Pantalon 1 camisa	15-01-25	
	Wilmer castellanos	1 Guayos 1 Pantalon 1 Buso	15-01-25	
		1 Pantalon 1 camisa	15-01-26	
	Rafael quiceno	1 Pantalon 1 buso	15-01-25	Rafael Q.
	Juan Fran. Valencia	Gafas oscuras	20-01-26	

ELABORÓ: Luis Tribiño

550

CONSORCIO IBAGUE VIAL URBANO 2025 NIT 901.959.916-2	CONTROL SUMINISTRO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONSORCIO IBAGUE VIAL URBANO 2025 NIT 901.959.916-2 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Página: De: Versión 1 - 2024

OBRA:	Piedra Pintada, villa marlen, castilla

No.	NOMBRE Y APELLIDO	ELEMENTO ENTREGADO	FECHA DE ENTREGA	FIRMA DE RECIBO
	Hernando Hurtado	Guantes	13-04-26	
	jean carlos Brito	Guantes	13-04-26	JeanCarlos
	ANeizor Alzate	Guantes	13-04-26	
	Jaim Bernal	Guantes	13-04-26	Jaime
	Diego Neira	Guantes	13-04-26	
	Luis Fierro	Guantes	13-04-26	Fierro
	Miguel Angel Ipuz	Guantes	13-04-26	
	Cristian Santos Sanchez	Guantes	13-04-26	Cristian Santos S.
	Jairo alberto Varon V.	Guantes	13-04-26	Jairo V.
	Wilmer Castellanos	Guantes	13-04-26	
	Fernando Vega	Guantes	13-04-26	
	Johnatan F. Suarez M.	Guantes	13-04-26	Johnatan S.

ELABORO: Yenifer Sanabria

CONSORCIO IBAGUE VIAL URBANO 2025 NIT 901.998.514-2	CONTROL SUMINISTRO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONSORCIO IBAGUE VIAL URBANO 2025 NIT:901.998.514-2 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Página: De: Versión 1 - 2024

OBRA: Ricaurte - Noyales

No.	NOMBRE Y APELLIDO	ELEMENTO ENTREGADO	FECHA DE ENTREGA	FIRMA DE RECIBO
	William Garcia	Guantes	31-03-26	
	Steven Rojas	Guantes	01-04-26	
	Ronald Mosquera	Guantes	01-04-26	Ronald M
	Steven Rojas	Gafas	01-04-26	
	Carlos Arrastegui	Tapa oidos	07-04-26	
	Franz Parra	Guantes	07-04-26	
	Franz Parra	Guantes	15-04-26	
	Jhon Estrada	Guantes	18-04-26	
	Daniel Sanchez	Tapa oidos	18-04-26	
	Daniel Sanchez	Guantes	18-04-26	
	Edwin Vasquez	Guantes	20-04-26	

Elaboró: _____

552

CONSORCIO IBAGUE VIAL URBANO 2025 NIT 901.898.914-2	CONTROL SUMINISTRO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONSORCIO IBAGUE VIAL URBANO 2025 NIT:901.898.914-2 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Página: De: Versión 1 - 2024

OBRA: Pubenza / Pinto

No.	NOMBRE Y APELLIDO	ELEMENTO ENTREGADO	FECHA DE ENTREGA	FIRMA DE RECIBO
	Jenny Tovar	Tula ordor, Guantes nitrilo	06-01-26	Jenny T.
	Alfonso Saavedra	Guantes N.	06-01-26	
	Luis FIERRO	Guantes N. Guantes V.	06-01-26	FIERRO
	Brayan Arango	Guantes vaqueta	06-01-26	
	Shon Saire Tovar	Guantes vaqueta	06-01-26	Shon
	Reinaldo Flores	Guantes Nitrilo	07-01-26	Reinaldo
	Juan Fabian Ustariz Martinez	Guantes Nitrilo	07-01-26	
	Raquel Pineda	Guantes Nitrilo	08-01-26	Raquel Pineda
	Adelizar Amaya	Guantes Nitrilo	09-01-26	
	JUAN GABRIEL CASTRO R	Guantes Nitrilo	09-01-26	JUAN G C R
	FERNEL NOVOA	Guantes Nitrilo	09-01-26	
	Luis J. Parra P	Guantes Nitrilo	09-01-26	

ELABORO: LILY TVILLA

553

CONSORCIO IBAGUE VIAL URBANO 2025 NIT 901.899.814-2	CONTROL SUMINISTRO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONSORCIO IBAGUE VIAL URBANO 2025 NIT:901.899.814-2 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Página: De: Versión 1 - 2024

OBRA: Piedra Pintada, Calarca, Santa barbara

No.	NOMBRE Y APELLIDO	ELEMENTO ENTREGADO	FECHA DE ENTREGA	FIRMA DE RECIBO
	Alberto Cantor	Guantes	06-04-26	Cantor
	Jean Carlos Brito	Guantes	06-04-26	Jean Carlos
	Hernandez M	Guantes	06-04-26	
	Gilberto Mario M.	Guantes	06-04-26	
	Andres sosa	Guantes	06-04-26	Andy sosa
	Ivan Fernandez	Guantes	06-04-26	
	Fredy Perez	Guantes	06-04-26	
	Nelson Valencia	Guantes	06-04-26	NELSON
	Mateo quiroga	Guantes	06-04-26	Mateo Quiroga
	Juan Arnoldo Rubio	Guantes	06-04-26	
	mario fernando lopez vargas	Guantes	06-04-26	mario fernando lopez v
	Benjamin Fuentes	Guantes	06-04-26	Benjamin
	Miler Sanchez	Guantes	06-04-26	
	alberto Lavado	Guantes	06-04-26	
	Jose Fernando Franco	Guantes	06-04-26	Jose Fernando
	Camilo Andres Arboleda O.	Guantes	07-04-26	Camilo Arboleda O.
	Bladimir Garcia B	tapa oidos GAFAS	07-04-26	

ELABORÓ: Yenifer Sanabria

ANEXO 5

REGISTRO DE AUSENTISMO Y ACCIDENTALIDAD

ARL | sura

Medellín, 4 de mayo de 2026

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. - ARL SURA S.A.

HACE CONSTAR

Que la empresa CONSORCIO IBAGUE VIAL URBANO 2025, NIT N901999914, no presenta accidentes de trabajo desde el 21 de marzo de 2026 hasta el 20 de abril de 2026, para los centros de trabajo seleccionados:

Nombre Centro de Trabajo	Código Centro de Trabajo
PRINCIPAL	0000000001

La presente constancia se expide a solicitud de la empresa.

Para información adicional puede comunicarse con nuestra Línea de Atención 018000 51

Atentamente,

Dirección de Higiene, Seguridad y Ambiente

Dirección IP: 181.55.68.88, 192.230.104.14, 172.16.42.57.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

556

ANEXO 6

ACTAS DE COPASST Y CONVIVENCIA LABORAL

ACTA DE REUNION DEL COPASST CONSORCIO VIAS URBANAS	GESTION SST
Preparado por: GLORIA ASTRID LOPEZ SANCHEZ	Fecha: 23/03/2026
Cargo: SST	

Participan: TRABAJADORES CONSORCIO VIAS URBANAS	

Se reúne el **COPASST** para presentar informe a la gerencia sobre la gestión ejecutada en el mes de marzo de 2026

De acuerdo a las responsabilidades asignadas se debe tener en cuenta la importancia de las funciones y roles que cada uno de los trabajadores desempeña en la empresa frente a la SST

Orden del día

1. Verificación de Asistencia
2. Lectura del Acta Anterior
3. Objetivos de la Reunión
4. Informe de Accidentalidad
5. Proposiciones Varias

Comentarios y desarrollo

Siendo las 8am del 23 de marzo de 2026, se reúne el comité de copast con la finalidad de realizar verificación a la fecha de los formatos diligenciados por parte del personal presente en obra, además se realiza una charla con todo el personal referente a lo importante que es hacer las pausas activas durante la jornada laboral.

- **Llevar la estadistica de accidentalidad**
- **Llevar el ausentismo**

Se resuelve:

Se verifican los respectivos formatos que se aplican en campo con todos los trabajadores, y actividades a realizar.

- **Se verifica los indicadores de accidentalidad no se ha presentado para el periodo accidentalidad y ausentismo para le mes de marzo.**
- **de acuerdo a lo establecido por la norma se realizarán actividades de cardio rumba y diferentes clases de pausas activas para que el trabajador tenga una jornada laboral de eficaz sin daños en su salud.**

Compromisos:

Dar seguimiento a las reuniones mensuales con la finalidad de verificar el cumplimento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. al uso de la dotación del

Fecha y hora de la próxima reunión. El 23 de abril de 2026.

Firman los miembros del Copasst:

Luis Ricardo Ortigoza González

Gloria Astrid López S.

Angela Johana Vanegas

José Samuel Torres Gómez

UT URBANAS IBAGUÉ	ACTA DE REUNIÓN COPASST	Versión 4 Fecha [illegible]

ACTA No. 04-2026

COMITÉ: Comité paritario de la seguridad y salud en el trabajo **OBJETO: Participación y seguimiento al SG-SST Por parte de los integrantes del Copasst durante el mes de abril de 2026.**	*Lugar: oficina Ornega* *Fecha: 20/04/2026* *Hora Inicio: 7:00 a.m.* *Hora Fin 9:00 a.m.*

I. ASISTENTES:

No.	NOMBRES	EMPRESA	CARGO
01	LEIDY VIEDA	UT URBANAS IBAGUE	TOPOGRAFA
02	CARLOS SANCHEZ	UT URBANAS IBAGUE	AYUDANTE
03	CLAUDIA GAITAN	UT URBANAS IBAGUE	PROFESIONAL SST
04	TATIANA BARRAGAN	UT URBANAS IBAGUE	PROFESIONAL SS

II. AGENDA

1. Seguimiento y participación al SG-SST
2. Informe accidentes de trabajo
3. Seguimiento cronograma actividades abril de 2026
4. Seguimiento cronograma de charlas e inspecciones abril de 2026
5. Compromisos y Cierre

III. DESARROLLO DE LA REUNION

1. Durante el mes de abril de 2026, los integrantes del COPASST, Realizaron seguimiento, participación y control a las actividades programadas dentro del plan de trabajo anual del SG-SST, evidenciando el cumplimiento de su Gestión en un 100%.
2. Durante el mes de abril de 2026, no se presentaron accidentes laborales en el proyecto UT URBANAS IBAGUE.
3. Se socializó a los integrantes del COPASST, el cronograma de actividades del mes de abril de 2026
4. Se hizo entrega a los integrantes de COPASST, cronograma de charlas e inspecciones programadas para el mes de abril de 2026.

560

UT URBANAS IBAGUE	ACTA DE REUNIÓN COPASST	Versión: 0 Fecha: 15/02/2026

ACTA No. 04-2026

COMITÉ: Comité paritario de la seguridad y salud en el trabajo	**Lugar: oficina Onzaga**
OBJETO: Participación y seguimiento al SG-SST Por parte de los integrantes del Copasst durante el mes de abril de 2026.	**Fecha: 20/04/2026** **Hora inicio: 7:00 a.m.** **Hora Fin 9:00 a.m.**

5. No se presentó ninguna novedad en materia de seguridad y salud en el trabajo en el proyecto U URBANAS IBAGUE durante el mes de abril de 2026.
6. Se dan por finalizada la reunión del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.

COMPROMISOS	Responsable	Fecha Programada	Fecha Seguimiento	SI	NO
Realizar seguimiento al plan de trabajo	Profesionales sst	30/04/2026	30/04/2026		
Continuar con las inspecciones de seguridad en los frentes de obra	Profesionales sst integrantes del copasst	Mayo/2026	20/05/2026		
Entrega de residuos a empresa de reciclaje	Profesionales sst e integrantes del copasst	Mayo/2026	20/05/2026		

PROXIMA REUNIÓN		
FECHA:20 DE MAYO/2026	HORA: 07:00 A.M.	LUGAR: OFICINA UT URBANAS IBAGUE

Para las firmas:

LEIDY VIEDA
Representante Copasst empresa

Carlos Sanchez
CARLOS SANCHEZ
Representante Copasst trabajadores

CLAUDIA PATRICIA GAITAN
Presidente

Tatiana Barragán
TATIANA BARRAGAN
secretaria

561

URBANAS IBAGUÉ	ACTA DE REUNION COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL	VIGENCIA: 26-NOV-2026 VERSION: 01 PAGINA 1 DE 2

TEMA: Importancia y funciones de los integrantes del comité de convivencia		ACTA N0.
FECHA: 15 de abril de 2026		03
LUGAR: Oficina UT URBANAS IBAGUE		
HORA DE INICIO: 7:00 am	HORA DE FIN: 9:00 am	

PARTICIPANTES

N.	Nombre	Cargo	Teléfono	Firma
1	Mauricio Cespedes	topógrafo	3223587922	Mauricio C.
2	Félix María Aldana	Ayudante de obra	3207465053	Felix Aldana
3	Diana Patricia Cabezas	Prof. SST	3202831501	Diana C.
4	Karla Yolima Rodirguez	Ing. Administrativa	3024418574	Karla Rodriguez

TEMAS A TRATAR

1	Presentación de los integrantes del comité de convivencia laboral
2	Importancia y funciones de los integrantes del comité de convivencia laboral
3	Acuerdos de capacitación programadas 2026

DESARROLLO DE LA REUNION

1. Verificación del quórum: el presidente del comité de convivencia laboral da inicio a la reunión a las 7:00 Am, la secretaria llama a lista, verificando que estén los integrantes del comité de convivencia laboral para dar inicio a la reunión.
2. Lectura del orden del día.
3. Se realiza la presentación formal de los integrantes del comité.
4. Se les pregunta que entienden por comité de convivencia laboral, se sensibilizan sobre los beneficios que tiene la conformación de este comité como: mejorar las relaciones interpersonales en el ámbito laboral, al igual evitar comportamientos de acoso laboral, se socializa las funciones que deben cumplir cada uno de ellos, Las funciones del secretario y del presidente, se habla de las reuniones que ahora son mensuales y de organizar actividades para mejorar la convivencia laboral.

562

OBSERVACIONES U/O COMPROMISOS
• capacitación al comité de convivencia laboral por parte del profesional en seguridad y salud en el trabajo • Recordar los temas porque se conforma el comité, el objetivo que tiene este comité • Hablar de las competencias actitudinales y comportamentales, que deben tener los integrantes del Comité de convivencia laboral. • funciones que tiene el comité de convivencia laboral, funciones del presidente, funciones del secretario. • Normatividad que rige el comité de convivencia laboral ley 1010 de 2006, resolución 3461 de 2025. • '' Definición y modalidades de acoso laboral'', efectividad de las reuniones, que hacer en el conflicto, que es la conciliación, que hacer en caso de conflicto y la importancia de la convivencia,

CONCLUSIONES				
No	compromisos	Responsable	Periodo de cumplimiento	Observaciones
1	Capacitación al comité de convivencia laboral sobre ley 1010 de 2006, resolución 3461 de 2025	Tatiana Barragan	mensual	

563

ANEXO 7

CONTROL EQUIPOS DE INTERVENTORÍA

EQUIPOS DE INTERVENTORIA

CONSORCIO VIAS IBAGUE
NIT. 902.007.947-3

CONTROL DIARIO EQUIPOS DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 21 MAR -20 ABR **PROYECTO:** CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON: " EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHANILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COOMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 3158 DE 2025 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO VIAS IBAGUE

MAQUINARIA Y EQUIPO		MARZO 2026											ABRIL 2026																			
DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Vehiculo Placa - ELU421	Camioneta, marca Volks/Wagen AMAROK 2000 C.C. modelo 2019	A			A	A	A	A	A	A	A	A			A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A
Vehiculo Placa - JLQ541	Camioneta, marca Volks/Wagen AMAROK 2000 C.C. modelo 2020	A			A	A	A	A	A	A	A	A			A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A
Estacion Total	Marca TOPCON Modelo: GTS-239W	A			A	A	A	A	A	A	A	A			A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A
Camisas para toma de muestras de concreto	Camisas para muestras cilindros de concreto - resistencia a la compresion y flexion	A			A	A	A	A	A	A	A	A			A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A
Nivel de Topografia	Marca SOKKIA Modelo: B40 SERIAL 151697	A			A	A	A	A	A	A	A	A			A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A
Nivel de Topografia	Marca TOPCON Modelo: AT- B4A SERIAL: WP108090	A			A	A	A	A	A	A	A	A			A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	6	0	0	6	6	6			6		6	0	0	6	6	0	6	6		6	6	6	0	6	6		6	6	6	6	6
	TOTAL ACTIVO	6	0	0	6	6	6			6		6	0	0	6	6	0	6	6	6	6	6	6	0	6	6	6	6	6	6	0	6
	TOTAL EN REPARACIÓN	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL INACTIVO	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	126	100,00%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	132	104,76%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARAC	0	0,00%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	0,00%

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):
Los equipos que se encontrarón inactivos en los dias seleccionados no se utilizarón debido a actividades que no requieren de esta maquinaria.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

NOTAS:
LISETH MARYORI NIEVES HERRERA
CC. No. 1.121.906.294 DE VILLAVICENCIO
Representante legal

565

ELKIN ERICSSON DEL CASTILLO 2408

Marca: SOKKIA	MODELO: B40	
Tipo: Nivel de precisión	SERIAL: 151697	
N° Placa de calibración: 2408		
Fecha de realización: 7 de julio de 2025		
DATOS DEL COLIMADOR		
Colimador: Hilger and watts	Modelo: TA51	Serial: 151181
Precisión: 0.6 seg	Rango: 10min	Alcance ocular: 1.140seg
Lectura retículo: micrómetro	Distancia máxima 30 M o 90 Ft	

TIPO DE MANTENIMIENTO

Mantenimiento Exterior	*Condiciones*
Batería	No aplica
Chequeo del display y el teclado	No aplica
Cobertura externa	Aceptable en su func.
Lente de la plomada óptica	No aplica
Lentes (ocular – objetivo)	Aceptable en su func.
Tornillos tangenciales horizontal y vertical	Aceptable en su func.
Mantenimiento Interno	*Condiciones*
Ajuste de compensador automático	Aceptable en su func.
Ajuste de plomada óptica o laser	No aplica
Ajuste del nivel ojo de pollo	Aceptable en su func.
Ajuste del nivel tubular	Aceptable en su func.
Ajuste del retículo	Aceptable en su func.
Ajuste de sistema de enfoque	Aceptable en su func.
Colimación del instrumento	Aceptable en su func.
Comprobación /ajuste del hilo vertical y horizontal del retículo	Aceptable en su func.
Miras de puntería	Aceptable en su func.
Resolución	Aceptable en su func.
Tornillos base Nivelante	Aceptable en su func.

Condiciones de funcionamiento: buena condicion de uso

Novedades presentadas: ninguna

Observaciones:

Powered by CamScanner

566

ELKIN ERICSSON DEL CASTILLO 2408

CERTIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN

FECHA DE ENTRADA DEL EQUIPO: 7 de julio del 2025
EMPRESA:

DATOS DEL EQUIPO	
MARCA: SOKKIA	MODELO: B40
TIPO: Nivel de precisión	SERIAL: 151697

CUMPLE CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES DEL TELESCOPIO	
Aumentos	24X
Apertura	32mm
Campo de visión	1°20'

ESPECIFICACIONES DEL NIVEL	
Precisión en mm de nivelación por km. doble	± 2.0mm
Distancia mínima focal	0.3 m
Factor multiplicador de la estadía	100
Rango compensador	± 15

AJUSTES REALIZADOS

- El eje vertical perpendicular al plato del aparato (nivel) en buenas condiciones
- El nivel del equipo en sus giros de 0° 90° 180° 270° 360° grados se encontró en su centro
- La línea de nivel en sus giros 0° 90° 180° 270° 360° grados coincidió al milímetro
- Los tornillos para nivelar el equipo se encuentran óptimas condiciones de uso
- El tornillo tangencial del equipo se encuentra en optima condición de uso
- El eje de automático no presenta bloque y está en condición optima

FECHA DE CALIBRACION: 7 de julio del 2025 VENCIMIENTO: 7 de enero del 2026

Aprobado [X] Rechazado [ ]

Los equipos por fuera del laboratorio después de los ajustes no se responden por el uso indebido o transporte de este

ELKIN ERICSSON DEL CASTILLO VARGAS
TOPOGRAFO – UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

Powered by CamScanner



ELKIN ERICSSON DEL CASTILLO

PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN

Para controlar y calibrar este instrumento se contrasta con un colimador Hilger and watts con telescopio de 32x en cuyo reticulo enfocado al infinito, el grosor de sus trazos está dentro de 0.1" con el método de lectura Directa-Inversa y refrendado con un nivel automático TOPCON modelo AT-G 4 de precisión +/- 0.7 mm nivelación doble de 1 km.

El control se ejecuta en la base soporte metálica fijada en la pared ajena a influencias del clima y enfocados los reticulos al infinito

PATRÓN DE MEDICIÓN EN 0.60m	
ANGULO HZ: 00°00'00"	ANGULO HZ: 180°00'00"
DISTANCIA V: 0 mm	DISTANCIA V: 800 mm

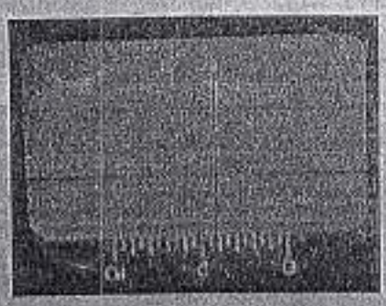VALOR LEÍDO EN INSTRUMENTO EN 00°00'00"	
DIRECTO: 00°00'00"	INVERSO: 180°00'00"
	

VALOR LEÍDO EN INSTRUMENTO EN 90°00'00"	
DISTANCIA V: 0.01mm	DISTANCIA V: 0.01 mm
PORCENTAJE DE ERROR:	+/- 0.001%



ELKIN ERICSSON DEL CASTILLO VARGAS
TOPOGRAFO – UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

Powered by CamScanner

568

ELKIN ERICSSON DEL CASTILLO

2409

Marca: Topcon	Modelo: AT –B4A	
Tipo: Nivel de precisión	Serial: WP 106090	
N° Placa de calibración: 2409		
Fecha de realización: 7 de julio del 2025		
DATOS DEL COLIMADOR		
Colimador: Hilger and watts	Modelo: TA51	Serial: 151161
Precisión: 0,5 seg	Rango: 10min	Alcance ocular: 1.140deg
Lectura reticulo: micrómetro	Distancia máxima 30M o 90 Ft	

TIPO DE MANTENIMIENTO	
Mantenimiento Exterior	*Condiciones*
Batería	No aplica
Chequeo del display y del teclado	No aplica
Cobertura externa	Aceptable en su func.
Lente de lámpara óptica	No aplica
Lentes (ocular – objetivo)	Aceptable en su func.
Tornillos tangenciales horizontal y vertical	Aceptable en su func.
Mantenimiento Interno	*Condiciones*
Ajuste de compensador automático	Aceptable en su func.
Ajuste de plomada óptica o laser	No aplica
Ajuste del nivel ojo de pollo	Aceptable en su func.
Ajuste del nivel tubular	Aceptable en su func.
Ajuste del reticulo	Aceptable en su func.
Ajuste del sistema de enfoque	Aceptable en su func.
Colimación del instrumento	Aceptable en su func.
Comprobación ajuste del hilo vertical y horizontal del reticulo	Aceptable en su func.
Miras de puntería	Aceptable en su func.
Rosca ción	Aceptable en su func.
Tornillos base Nivelante	Aceptable en su func.

Condiciones de funcionamiento: buena condición de uso

Novedades presentadas: ninguna

Observaciones:

ELKIN ERICSSON DEL CASTILLO VARGAS
TOPOGRAFO –UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

Página 2

Powered by CamScanner

569

ELKIN ERICSSON DEL CASTILLO

CERTIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN

FECHA DE ENTRADA DEL EQUIPO: 7 de julio del 2025
EMPRESA:

DATOS DEL EQUIPO	
MARCA: Topcon	MODELO: AT –B4A
TIPO: Nivel de precisión	SERIAL: WP 106090

CUMPLE CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES DEL TELESCOPIO	
Aumentos	24X
Apertura	32mm
Campo de visión	1°25 '

ESPECIFICACIONES DEL NIVEL	
Precisión en mm de nivelación por km. doble	± 2.0mm
Distancia mínima focal	0.3 m
Factor multiplicador de la estadía	100
Rango compensador	± 15

AJUSTES REALIZADOS

- El eje vertical perpendicular al plato del aparato (nivel) en buenas condiciones
- El nivel del equipo en sus giros de 0° 90° 180° 270° 360° grados se encontró en su centro
- La burbuja de nivel en sus giros 0° 90° 180° 270° 360° grados coincidió al milímetro
- Los tornillos para nivelar el equipo se encuentran óptimas condiciones de uso
- El tornillo tangencial del equipo se encuentra en optima condición de uso
- El eje de la topóptica no presenta bloque y está en condición optima

FECHA DE CALIBRACIÓN: 7 de julio del 2025 VENCIMIENTO: 7 de enero del 2026

Aprobado [X] Rechazado [ ]

Los equipos calibrados en el laboratorio de topografía llevan un sticker con fecha de calibración y vencimiento

ELKIN ERICSSON DEL CASTILLO VARGAS
TOPÓGRAFO - UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

Página 1

Powered by CamScanner

570



ELKIN ERICSSON DEL CASTILLO 2408

PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN


Para controlar y calibrar este instrumento se contrasta con un colimador **Hilger and watts** con telescopio de 32x en cuyo retículo enfocado a infinito, el grosor de sus trazos está dentro de 01" con el método de lectura Directa-Inversa y refrendado con un nivel automático TORCON modelo ATG 4 de precisión +/- 0,7 mm nivelación doble de 1 km.

El control se ejecuta en la base soporte metálica fijada en la pared ajena a influencias del clima y enfocados los reticulos al infinito

PATRÓN DE MEDICIÓN EN 0.60m	
ANGULO HZ: 00°00'00"	ANGULO HZ: 180°00'00"
DISTANCIA V: 0 mm	DISTANCIA V: 800 mm

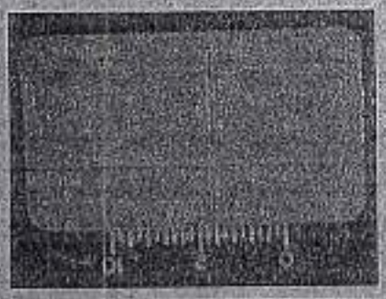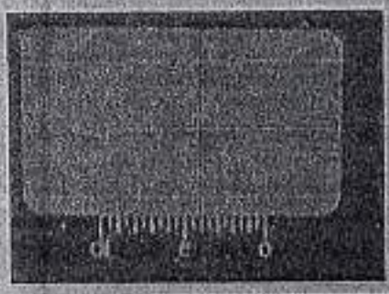VALOR LEÍDO EN INSTRUMENTO EN 00°00'00"	
DIRECTO: 00°00'00"	INVERSO: 180°00'00"
	

VALOR LEÍDO EN INSTRUMENTO EN 90°00'00"	
DISTANCIA V: 0.01mm	DISTANCIA V: 0,01 mm
PORCENTAJE DE ERROR:	+/- 0.001%



ELKIN ERICSSON DEL CASTILLO VARGAS
TOPOGRAFO - UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

Página 8

Powered by CamScanner

571

ANEXO 8

CONTROL MAQUINARIA Y EQUIPOS CONTRATISTAS

CONTROL DE EQUIPOS DEL CONTRATISTA

CONSORCIO VIAS IBAGUE
NIT. 900.857.940-3

CONTRATO OBRA: 3049 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL URBANIZA IBAGUE

OBJETO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ LOTE 1.

CONTRATO INTERVENTORIA: 3155 del 16 de noviembre de 2025

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS IBAGUE

OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON: " EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2

FRENTES/ CALLES		EQUIPO TIPO, MARCA, CAPACIDAD	(A) O (B) GEN	(B) EST ADO	MARZO 2026												ABRIL 2026																										
					23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
MAQUINARIA																																										
VARIOS	1	TURBO	A	B	X			X	X	X	X	X		X	X	X				X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X								
	2	CAMIONETA	A	B	X			X	X	X	X	X		X	X	X				X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X								
OBRA NORTE	3	PLANTA ELECTRICA	A	B	X			_	X	X	X	X		X	X	_			_	X	X	X	_	_	_		_	X	X	_	_	X		_								
	4	PULIDORA	A	B	X			_	X	X	X	X		X	X	_			_	X	X	X	_	_	_		_	X	X	_	_	X		_								
	5	RETROEXCAVADORA	A	B	_			_	X	X	_	_		_	_	_			_	_	_	_	_	_	_		_	_	_	_	_	_		_								
	5	MEZCLADORA	A	B	_			_	_	_	X	X		_	X	_			_	_	_	X	_	_	_		_	X	X	_	_	X		_								
	7	VOLQUETA	A	D	_			_	X	X	_	_		_	_	_			_	_	_	_	_	_	_		_	_	_	_	_	_		_								
ALASKA	8	MIXER	A	D	X			X	X	_	_	_		_	_	_			_	_	_	_	_	_	_		_	_	_	_	_	_		_								
	9	REGLA VIBRATORIA	A	B	X			X	X	_	_	_		_	_	_			_	_	_	_	_	_	_		_	_	_	_	_	_		_								
	10	PULIDORA	P	B	_			X	X	_	_	_		_	_	_			_	_	_	_	_	_	_		_	_	_	_	_	_		_								
	11	PLANTA ELECTRICA	P	B	_			X	X	_	_	_		_	_	_			_	_	_	_	_	_	_		_	_	_	_	_	_		_								
CIRUELOS 21 E	12	RETRO DE ORUGA	A	B	_			_	_	_	_	_		_	X	X			_	X	_	X	X	_	X		_	_	_	_	_	_		_								
	13	VOLQUETA	A	B	_			_	_	_	_	_		_	X	X			_	X	_	X	X	_	X		_	_	_	_	_	_		_								
	14	CARRO TANQUE	A	B	_			_	_	_	_	_		_	_	_			_	_	_	_	_	_	_		_	X	_	_	_	_		_								
	15	MOTONIVELADORA	A	B	_			_	_	_	_	_		X	_	X			_	X	_	X	_	_	X		X	X	_	_	_	_		_								
	16	RETROEXCAVADORA	A	B	_			X	X	X	_	_		_	X	_			_	_	_	X	X	X	_		_	_	_	_	_	_		_								
	17	VIBROCOMPACTADOR - RODILLO	A	B	X			X	X	X	X	X		X	X	X			_	X	_	X	X	_	X		_	X	_	_	_	_		_								
CIRUELOS 21 O	18	RETRO DE ORUGA	A	D	X			C	X	X	X	X		X	X	X			_	X	_	_	_	_	_		_	_	_	_	_	_		_								
	19	MOTONIVELADORA	D	B	_			_	X	X	X	X		_	X	_			_	_	_	_	_	_	_		_	_	_	_	_	_		_								
	20	CONTADORA DE CONCRETO	P	B	_			_	_	_	X	_		_	_	_			_	_	_	_	_	_	_		_	_	_	_	_	_		_								
	21	VIBRO COMPACTADOR 1 RODILLO	P	B	_			_	_	_	_	_		_	_	_			_	_	X	_	X	_	_		X	X	X	X	X	_		_								
	22	RETROEXCAVADORA	A	B	_			_	_	_	_	_		X	X	X			_	_	X	_	_	_	X		X	X	X	X	X	_		_								
	23	VOLQUETA	A	B	X			X	X	X	X	X		_	_	X			_	X	X	_	X	_	_		X	_	X	X	_	_		_								
LA ESPERANZA	24	CONTADORA DE CONCRETO	A	B	_			_	_	_	_	_		_	_	_			_	X	X	_	_	_	_		_	_	_	_	_	_		_								
	25	VOLQUETA	A	B	_			_	_	_	_	_		_	_	_			_	X	X	_	_	_	_		_	_	_	_	_	_		_								
	26	RETROEXCAVADORA	A	B	_			_	_	_	_	_		_	_	_			_	X	X	_	_	_	_		_	_	_	_	_	_		_								
LOS ANGELES	27	RETROEXCAVADORA	P	B	_			X	_	_	_	_		_	_	_			_	_	_	_	_	X	_		_	_	_	_	_	_		_								
	28	SALTARIN/APISONADOR	A	B	_			X	_	_	_	_		_	_	_			_	_	_	_	_	_	_		_	_	_	_	_	_		_								
	29	VIBROCOMPACTADOR 1 RODILLO	A	B	_			X	_	_	_	_		_	_	_			_	_	_	_	_	_	_		_	_	_	_	_	_		_								
	30	CONTADORA DE CONCRETO	A	B	_			_	_	X	X	_		_	_	_			_	_	X	_	_	X	X		_	_	_	_	_	_		_								
	31	PULIDORA	A	B	_			_	_	_	_	_		_	_	_			_	_	X	_	_	X	X		X	X	X	X	X	X		_								
	32	PLANTA ELECTRICA	A	B	_			_	_	X	X	_		_	_	_			_	_	X	X	_	X	X		X	X	X	X	X	X		_								
	33	MEZCLADORA	A	B	_			_	_	_	_	_		_	_	_			_	_	X	X	_	_	_		X	X	X	X	X	X		_								
	34	TALADRO	A	B	_			_	_	X	X	_		_	_	_			_	_	_	X	_	_	_		_	X	X	_	_	_		_								
	35	VOLQUETA	A	B	_			_	_	X	_	_		_	_	_			_	_	_	_	_	X	_		_	_	_	_	_	_		_								
	36	ESRIGADOR	A	B	_			_	_	X	_	_		_	_	_			_	_	_	_	_	_	_		_	_	_	_	_	_		_								
	37	ASFALTADORA FINISHER	A	B	_			_	X	X	_	_		_	_	_			_	_	_	_	_	_	_		_	_	_	_	_	_		_								
	38	VIBROCOMPACTADOR DOBLE RODILLO	A	B	_			_	X	X	_	_		_	_	_			_	_	_	_	_	_	_		_	_	_	_	_	_		_								
	39	VIBROCOMPACTADOR DE NEUMATICOS	A	B	_			_	X	X	_	_		_	_	_			_	_	_	_	_	_	_		_	_	_	_	_	_		_								
SAN FRANCISCO	40	RETROEXCAVADORA	A	B	_			_	X	X	_	X		X	X	X			_	_	_	X	X	_	X		X	_	_	_	_	_		X								
	41	VOLQUETA	A	B	_			_	X	_	_	X		X	_	X			_	_	_	X	X	_	X		X	_	_	_	_	_		X								
	42	VIBROCOMPACTADOR 1 RODILLO	A	B	_			_	X	X	_	X		X	X	X			_	_	X	X	X	_	X		X	_	_	_	_	_		X								
	43	MOTONIVELADORA	A	B	_			_	X	X	_	X		X	_	X			_	_	X	X	X	X	X		X	_	_	_	_	_		_								
	44	ESRIGADOR	A	B	_			_	_	_	_	_		_	_	_			_	_	_	_	_	_	_		_	X	_	X	_	_		_								
	45	BENTTY	A	B	_			_	X	_	_	_		_	X	_			_	_	_	_	_	X	_		_	_	_	_	_	_		_								
	46	ASFALTADORA FINISHER	A	B	_			_	_	_	_	X		_	_	_			_	X	_	_	_	_	_		_	_	_	X	_	_		_								
	47	VIBROCOMPACTADOR DOBLE RODILLO	A	B	_			_	_	_	_	X		_	_	_			_	X	_	_	_	_	_		_	_	_	X	_	_		_								
	48	VIBROCOMPACTADOR DE NEUMATICOS	A	B	_			_	_	_	_	X		_	_	_			_	X	_	_	_	_	_		_	_	_	X	_	_		_								

Vo Bo

OBSERVACIONES

-RETROEXCAVADORA PAJARITA DEL FRENTE CIRUELOS 21 O PRESENTA FALLAS LOS DIAS 06, 07 Y 1
-SIN NOVEDAD LLAMADO DE ATENCIÓN EN LOS DIFERENTES FRENTES POR NO USAR ALGUNA ROPA DE SEGURIDAD EN PULIDORAS
-MOTONIVELADORA FRENTE CIRUELOS 21 E PRESENTA FALLAS DESDE EL DIA 31 DE MARZ.
-15 DE MARZO SE TRASLADO TODOS LOS EQUIPOS PAR EL FRENTE SAN FRANCISCO, PERO SE PRESENTAN FALLAS MECÁNICAS EN LA FINISHER.

JUDITH MARYORI NIEVES HERRERA
CC. No. 1.121.900.284 DE VILLAVICENCIO
Representante legal

573

Ibagué

CONTROL DE EQUIPOS DEL CONTRATISTA

CONSORCIO VIAS IBAGUE
901.000.007.947-3

CONTRATO OBRA: 3048 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL URBANAS IBAGUE

OBJETO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1.

CONTRATO INTERVENTORIA: 3186 del 18 de noviembre de 2025

INTERVENTOR: CONSORCIO VIASIBAGUE

OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON: 1 EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2

| FRENTES/ CALLES | | EQUIPO TIPO, MARCA, CAPACIDAD | (A) ORIGEN | (B) ESTADO | MARZO 2026 | | |

CONTROL DE EQUIPOS DEL CONTRATISTA

CONSORCIO VIAS BAQUE

CONTRATO OBRA: 2020 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2020

CONTRATISTA: CONSORCIO BAQUE VIAL URBANO 2020

OBJETO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE BAQUE LOTE 1

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 2020 del 13 de noviembre de 2020

INTERVENTORIA: CONSORCIO VIAS BAQUE

OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE BAQUE LOTE 1 Y 2

FRENTES/ CALLES		EQUIPO TIPO, MARCA, CAPACIDAD	AÑO MODELO	DE ESTADO	MARZO 2021											ABRIL 2021																							
					6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
MAQUINARIA																																						
1. SANTA BARBARA	1	RETROEXCAVADORA	R	B	T				T		X										D																		
	1	VOLQUETA	R	B	T				D		X										D																		
	2	MOTONIVELADORA	R	B	T				D		X										D																		
	4	DILTAMIENTRADOR	P	B					D	D																													
	6	ASFALTADORA FINISHER	P	B																																			
	9	VIBROCOMPACTADOR DOBLE RODILLO	P	B																																			
	7	VIBROCOMPACTADOR DE NEUMATICOS	P	B																																			
	8	ARRASADOR	P	B																	D	X	D																
	5	COMPACTADOR 1 RODILLO	P	B	T																D																		
2. SANTA BARBARA	10	RETROEXCAVADORA	P	B	T																																		
	11	VOLQUETAS	D	B																		D	X																
	12	VIBROCOMPACTADOR 1 RODILLO	P	B																																			
	13	ASFALTADORA FINISHER	P	B																		D	X	X															
	14	VIBROCOMPACTADOR DOBLE RODILLO	P	B																		D	X	X															
	15	VIBROCOMPACTADOR DE NEUMATICOS	P	B																		D	X	X															
3. SANTA ELIAS	16	CONTADORA DE CONCRETO	P	B					T																														
	17	MEZCLADORA	P	B					T																														
4.	18	RETROEXCAVADORA	P	B	T		X		T							T					T		X	X	X	X		T		X								
	19	METRO DE OBRAS	P	B							T					T																							
	20	VIBROCOMPACTADOR 1 RODILLO	P	B							T					X					T	T	T	X		T		X										
	21	VOLQUETA	R	D	X											X					T	T		X														
5.	22	RETROEXCAVADORA	P	B						X	X																												
	23	ARRASADOR	P	B								X	X																										
	24	VIBROCOMPACTADOR DOBLE RODILLO	P	B								X																											
	25	VIBROCOMPACTADOR DE NEUMATICOS	A	B								X																											
	26	ASFALTADORA FINISHER	P	B								T																											
	27	VOLQUETA	D	B								A																											
6.	28	ASFALTADORA FINISHER	A	D																																			
	29	VIBROCOMPACTADOR DOBLE RODILLO	A	D																																			
	30	VIBROCOMPACTADOR DE NEUMATICOS	P	D																																			
	31	VOLQUETAS	A	D																																			
9. VILLA AMABLES	33	MEZCLADORA	P	B			X																																
10. CASTILLA	34	RETROEXCAVADORA	D	B			X	X		X		D		D																									
	32	VIBROCOMPACTADOR 1 RODILLO	A	B			X	X	X																														
	35	MIXER	P	B						X	X	X																											
	37	bomba/pluma de concreto	P	B						X	X	X																											
	36	CONTADORA DE CONCRETO	P	B								X																											
	39	VOLQUETA	P	B																																			
11.	40	RETROEXCAVADORA	P	B																																			
	41	VOLQUETAS	P	B																																			
12. VILLA AMABLES	43	RETROEXCAVADORA	A	B																																			
	42	MEZCLADORA	P	B				X	X																														
	44	POLIDUCTO	D	B																																			
	45	PLANTA ELECTRICA	P	B																																			
	46	VOLQUETAS	A	B																																			
14. HAPA AMAS	47	ARRASADOR	A	D																																			
	48	VIBROCOMPACTADOR DOBLE RODILLO	A	D																																			
	49	VIBROCOMPACTADOR DE NEUMATICOS	A	B																																			
	50	ASFALTADORA FINISHER	A	B																																			
	51	VOLQUETA	A	B																																			
	52	CONTADORA DE CONCRETO																																					
	53	COMPRESOR	A	B																																			
	54	MARTILLO NEUMATICO	P	B																																			
11.	55	METRO DE OBRAS	P	D																																			
	56	RETROEXCAVADORA	P	B																																			
	57	VOLQUETA	A	B																																			
13. CALETA VID	58	ASFALTADORA FINISHER	P	B																																			
	59	VIBROCOMPACTADOR DOBLE RODILLO	P	B																																			
	60	VIBROCOMPACTADOR	P	B																																			
	61	VOLQUETA	A	B																																			
	62	MEZCLADORA	A	B																																			
15. JARDIN	63	COMPACTADOR DOBLE RODILLO	P	B																																			
	64	VIBROCOMPACTADOR DE NEUMATICOS	A	B																																			
	65	ASFALTADORA FINISHER	P	B																																			
	66	VOLQUETA	P	B																																			
16. nuevo amanecer	61	METRO DE OBRAS	P	B																																			
	68	VIBROCOMPACTADOR 1 RODILLO	P	B																																			
	69	VOLQUETA	P	B																																			
17. ARMOS	70	MIXER	P	B																																			
	71	RETROEXCAVADORA	A	B																																			
	72	COMPACTADOR DOBLE RODILLO	P	D				X																															
	73	MOTONIVELADORA	P	B				X																															
18.	74	COMPACTADOR DOBLE RODILLO	P	D																																			
	75	COMPACTADOR DE NEUMATICOS	P	D																																			
	76	ASFALTADORA FINISHER	P	B																																			

575

CONTROL DE EQUIPOS DEL CONTRATISTA

CONSORCIO VIA BANDE
NIT 901267401-0

CONTRATO OBRA: 3049 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO BANDE VIAL URBANO 2023

OBJETO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE BANDÉ LOTE 5

CONTRATO INTERVENTORIA: 3139 del 15 de noviembre de 2023

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS BANDE

OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON " EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE BANDE LOTE 1 Y 3

FRENTES DE TRABAJO		EQUIPO TIPO, MARCA, CAPACIDAD	(A) CANTIDAD	(B) ESTADO	MARZO 2024												ABRIL 2024																	
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
69 RODILLO	77	RETRO DE ORUGA	P	B	X									X																					
	78	VOLQUETA	A	B	X									X																					
	79	MOTONIVELADORA	P	B										X																					
	80	RETROEXCAVADORA	P	B																															
	81	MULTIMANIPULADOR	P	B																															
	82	VIBROCOMPACTADOR 1 RODILLO	P	B										X																					
68 PAVIMENTO	84	COMPRESOR	P	B										X																					
	85	MARTILLO NEUMATICO	P	B										X																					
67	86	MEZCLADORA	P	D				X	X	X	X																								
83	66	RETRO DE ORUGA	P	D	X																														
	87	VOLQUETAS	A	D	X																														
	88	VIBROCOMPACTADOR 1 RODILLO	P	B																															
	89	MOTONIVELADORA	P	B																															
GALARZA	90	RETRO DE ORUGA	P	B						X	X	X		X	X																				
	91	VOLQUETA	A	B						X	X	X		X	X																				
	92	RETROEXCAVADORA	P	B						X	X	X		X																					
	93	MOTONIVELADORA	P	B																															
	94	VIBROCOMPACTADOR 1 RODILLO	P	B				X	X	X				X	X	X																			

Firma

CARLOS MAURICIO MONTOYA MEDINA
CC No. 1.121.911.234 DE VILLAVICENCIO

576

ANEXO 9

CONTROL DEL PERSONAL DE OBRA

Ibagué

CONTROL DE PERSONAL DEL CONTRATISTA

CONSORCIO VIAS IBAGUE
NIT: 902.007.847-3

CONTRATO OBRA: 3048 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025	**CONTRATO INTERVENTORIA:** 3158 del 18 de noviembre de 2025
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL URBANAS IBAGUE	**INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAS IBAGUE
OBJETO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ LOTE 1.	**OBJETO:** CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON: " EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHANILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA/ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2

FRENTE/ CALLE		CARGO	MARZO 2026											ABRIL 2026																				
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
CEIBA NORTE	1	ING RESIDENTE DE OBRA	1			0	1	1	1	0		1	1	0			0		1	1	1	0	0	0		0	1	0	0	0	1		0
	2	PROFESIONAL SST	1			0	1	1	1	0		1	1	0			0		1	1	1	0	0	0		0	1	0	0	0	0		0
	3	OPERADOR DE MAQUINARIA	0			0	1	1	0	0		0	0	0			0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	4	OFICIAL	1			0	0	0	1	0		1	1	0			0		1	1	1	0	0	0		0	0	1	0	0	2		0
	5	AYUDANTE	3			0	6	4	3	0		3	3	0			0		2	2	2	0	0	0		0	3	2	0	0	2		0
	6	CONDUCTOR	0			0	1	1	0	0		0	0	0			0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
20 DE JULIO	7	ING RESIENTE	0			0	0	0	0	0		1	1	1			0		0	0	1	1	0			0	0	0	0	0	0		0
	8	PROFESIONAL SST	0			0	0	0	1	0		1	1	1			0		0	0	1	1	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	9	TOPOGRAFO	0			0	0	0	0	0		0	0	1			0		0	0	1	1	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	10	MAESTRO	0			0	0	0	0	0		1	1	1			0		0	0	1	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	11	AYUDANTE	0			0	0	0	3	0		3	3	3			0		0	0	3	2	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	12	OPERADOR DE MAQUINARIA	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		0	0	0	2	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	13	RASTRILLERO	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		0	0	0	4	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	14	CONDUCTOR	0			0	0	0	0	0		1	1	1			0		0	0	1	2	0	0		0	0	0	0	0	0		0
ALASKA	15	TOPOGRAFO	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	16	PROFESIONAL SST	1			0	1	0	0	0		0	0	0			0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	17	OPERADOR DE MAQUINARIA	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	18	MAESTRO	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	19	ING RESIDENTE DE OBRA	1			0	1	0	0	0		0	0	0			0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	20	CONDUCTOR	3			0	1	0	0	0		0	0	0			0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	21	AYUDANTE	4			0	4	0	0	0		0	0	0			0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	22	OFICIAL	1			0	1	0	0	0		0	0	0			0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
LA ESPERANZA	23	ING RESIDENTE DE OBRA	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		1	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	24	OPERADOR DE MAQUINARIA	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		1	3	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	25	CONDUCTOR	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		1	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	26	OFICIAL	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	27	PROFESIONAL SST	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		1	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	28	RASTRILLERO	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		0	4	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	29	TOPOGRAFO	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	30	AYUDANTE	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		2	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
LOS ANGELES	31	ING RESIDENTE DE OBRA	0			1	1	1	0	0		0	0	0			0		0	1	1	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	32	INSPECTOR	0			0	1	1	0	0		0	0	0			0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	33	PROFESIONAL SST	0			1	1	1	0	0		0	0	0			0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	34	OPERADOR DE MAQUINARIA	0			0	3	3	0	0		0	0	0			0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	35	TOPOGRAFO	0			0	1	0	0	0		0	0	0			0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	36	RASTRILLERO	0			0	5	5	0	0		0	0	0			0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	37	OFICIAL	0			1	1	1	1	0		0	0	0			0		0	1	1	0	1	1		1	1	1	1	1	0		0
	38	AYUDANTE	0			2	2	8	2	0		0	0	0			0		0	3	3	0	3	3		3	3	3	3	3	0		0
	39	CONDUCTOR	0			0	3	2	0	0		0	0	0			0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
CIRUELOS 21 E	40	ING RESIDENTE DE OBRA	0			1	1	0	0	0		1	1	1			0		0	0	1	1	1	1		1	1	0	0	0	0		0
	41	CONDUCTOR	0			0	0	0	0	0		1	1	1			0		0	0	1	1	0	1		1	1	0	0	0	0		0
	42	OPERADOR DE MAQUINARIA	0			0	1	1	0	0		2	2	1			0		0	0	1	2	2	2		1	1	0	0	0	0		0
	43	OFICIAL	0			0	0	0	0	0		1	1	1			0		0	0	1	0	1	1		0	1	0	0	0	0		0
	44	AYUDANTE	0			1	1	3	0	0		5	3	2			0		0	0	6	3	4	3		1	2	0	0	0	0		0
	45	PROFESIONAL SST	0			0	1	1	0	0		1	1	1			0		0	0	1	1	1	1		1	1	0	0	0	0		0
	46	TOPOGRAFO	0			1	1	1	0	0		1	1	1			0		0	0	1	1	0	0		1	1	0	0	0	0		0

25
22

CONTROL DE PERSONAL DEL CONTRATISTA

CONSORCIO VIAS IBAGUE
NIT. 902.007.047-5

CONTRATO OBRA: 3048 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL URBANAS IBAGUE

OBJETO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ LOTE 1.

CONTRATO INTERVENTORIA: 3158 del 18 de noviembre de 2025

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS IBAGUE

OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON: " EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2

FRENTE/ CALLE		CARGO	MARZO 2026											ABRIL 2026																			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
CIRUELOS 21 G	47	AYUDANTE	3			3	3	2	4	5		4	4	3			0		3	5	2	3	0	1		1	1	0	3	3	3		0
	48	OFICIAL	1			1	1	1	1	1		1	1	1			0		1	1	0	1	0	1		1	1	0	0	0	0		0
	49	TOPOGRAFO	1			0	0	1	1	1		0	1	1			0		1	1	0	1	0	1		1	1	0	0	0	0		0
	50	OPERADOR DE MAQUINARIA	2			1	3	2	3	4		1	3	3			8		1	2	1	1	0	1		1	2	0	2	2	2		0
	51	CONDUCTOR	1			0	2	0	1	2		0	1	2			0		2	2	0	0	0	0		0	1	0	1	1	1		0
SAN FRANCISCO	52	ING RESIDENTE DE OBRA	0			0	1	1	0	1		1	1	1			0		1	1	1	1	1	1		0	0	0	1	0	0		1
	53	AYUDANTE	0			0	4	3	0	6		3	3	3			0		7	3	3	4	3	3		3	3	3	5	0	0		2
	54	RASTRILLERO	0			0	0	0	0	4		0	0	0			0		4	0	0	0	0	0		0	0	0	4	0	0		0
	55	CONDUCTOR	0			0	1	1	0	2		0	1	1			0		3	1	1	1	0	1		0	1	1	3	0	0		1
	56	OPERADOR DE MAQUINARIA	0			0	4	3	0	5		3	1	3			0		6	2	2	3	2	3		3	1	1	4	0	0		2
	57	TOPOGRAFO	0			0	1	1	0	1		1	1	1			0		1	1	1	1	1	0		0	0	0	1	0	0		1
	58	PROFESIONAL SST	0			0	1	1	0	1		1	1	1			0		1	1	1	1	1	1		0	0	0	1	0	0		1
TIERRA FIRME	59	INGENIERO RESEIDENTE	1			0	1	1	1	1		1	1	1			0		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		0
	60	INSPECTOR	1			0	1	1	1	1		1	1	1			0		1	1	1	1	1	1		0	0	0	1	1	1		0
	61	TOPOGRAFO	1			0	1	1	1	1		1	1	1			0		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		0
	62	AYUDANTE	3			0	3	3	9	7		5	7	5			0		7	6	6	6	5	4		10	8	8	6	8	8		0
	63	PROFESIONAL SST	1			0	1	1	1	1		1	1	1			0		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		0
	64	OPERADOR DE MAQUINARIA	0			0	2	3	3	3		2	3	3			0		2	2	2	3	3	3		3	1	2	1	1	1		0
	65	CONDUCTOR	0			0	1	1	2	1		1	1	1			0		1	1	1	1	1	1		1	3	1	3	3	3		0
PRADERAS I	66	INGENIERO RESEIDENTE	0			0	0	0	0	0		1	0	0			0		0	0	1	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	67	TOPOGRAFO	0			0	0	0	0	0		1	1	1			0		1	0	0	0	0	0		0	0	0	1	0	0		0
	68	AYUDANTE	0			0	3	0	0	0		2	2	2			0		3	0	1	0	1	0		0	0	0	2	0	0		0
	69	PROFESIONAL SST	0			0	0	0	0	0		1	1	1			0		1	0	1	0	0	0		0	0	0	1	0	0		0
	70	OPERADOR DE MAQUINARIA	0			0	1	0	0	0		0	1	1			0		3	0	1	0	1	0		0	0	0	2	0	0		0
	71	CONDUCTOR	0			0	0	0	0	0		0	0	1			0		1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
PRADERAS II	72	INGENIERO RESEIDENTE	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	1		1
	73	TOPOGRAFO	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	1		1
	74	AYUDANTE	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	3		2
	75	PROFESIONAL SST	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	1		0
	76	OPERADOR DE MAQUINARIA	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	77	CONDUCTOR	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
CRA 5 TOPACIO - SANTA ANA	78	ING RESIDENTE DE OBRA	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		0	0	0	0	1	1		1	1	1	1	1	1		1
	79	AYUDANTE	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		0	0	0	0	5	5		5	4	4	2	2	2		4
	80	RASTRILLERO	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		0	0	0	0	3	3		3	3	3	3	4	4		4
	81	CONDUCTOR	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		0	0	0	0	2	3		3	3	3	4	4	4		4
	82	OPERADOR DE MAQUINARIA	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		0	0	0	0	2	4		4	4	4	5	5	4		4
	83	CONTROLADOR VIAL	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		0	0	0	0	1	1		1	1	1	1	1	1		1
	84	TOPOGRAFO	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		0	0	0	0	1	1		1	1	1	0	0	0		0
	85	PROFESIONAL SST	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		0	0	0	0	1	1		1	1	1	1	1	1		1
SUBTOTAL			11			13	76	64	41	68		57	58				0	0	66	54	59	53	52	67	0	56	61	43	56	44	50	0	31
TOTAL PERIODO			1089																													

OBSERVACIONES

Vo.Bo.

LISETH MARYORI NIEVES HERRERA
CC. No. 1.121.906.294 DE VILLAVICENCIO
Representante legal

479

Alcaldía Municipal Ibagué

CONTROL DE PERSONAL DEL CONTRATISTA

CONSORCIO VIAS IBAGUE
Nit. 902.007.947-3

CONTRATO OBRA: 3049 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025	**CONTRATO INTERVENTORIA:** 3168 del 18 de noviembre de 2025
CONTRATISTA: CONSROCIO IBAGUE VIAL URBANO 2025	**INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAS IBAGUE
OBJETO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ LOTE 2.	**OBJETO:** CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON: " EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COOMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2

FRENTE/ CALLE		CARGO	MARZO 2026											ABRIL 2026																	
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. SANTABARBARA	1	INSPECTOR	1			1	1	1	1	1		1	1	1			0		1	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	2	TOPOGRAFO	1			1	1	1	1	1		1	1	1			0		1	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	3	PROFESIONAL SST	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1			0		1	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	4	RASTRILLERO	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		0	0	3	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	5	OPERADOR DE MAQUINARIA	2			2	2	2	2	2		2	2	2			0		3	2	4	2	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	6	OFICIAL	1			1	1	1	2	2		2	2	2			0		2	2	2	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	7	AYUDANTE	3			4	4	4	4	4		4	4	4			0		5	4	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	8	CONDUCTOR	1			1	1	1	1	1		1	1	2			0		2	2	3	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
2. SANTA BARBARA	9	INSPECTOR	1			1	1	1	1	1		1	1	1			0		1	1	2	2	2	1		0	0	0	0	0	0		0
	10	TOPOGRAFO	1			1	1	1	1	1		1	1	1			0		1	1	1	1	1	1		0	0	0	0	0	0		0
	11	PROFESIONAL SST	1			1	1	1	1	1		1	1	1			0		1	1	1	1	1	1		0	0	0	0	0	0		0
	12	RASTRILLERO	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		0	0	3	3	3	0		0	0	0	0	0	0		0
	13	OPERADOR DE MAQUINARIA	2			2	2	2	2	2		2	2	2			0		2	2	4	4	4	1		0	0	0	0	0	0		0
	14	AYUDANTE	3			3	3	3	3	3		3	3	3			0		3	3	9	9	9	1		0	0	0	0	0	0		0
	15	CONDUCTOR	2			2	2	2	2	2		2	2	2			0		2	2	3	3	2	0		0	0	0	0	0	0		0
3.	16	AYUDANTE	0			3	3	3	3	3		0	0	0			0		0	3	3	0	0	0		0	3	5	3	0	3		3
	17	OFICIAL	0			1	1	1	1	1		0	0	0			0		0	1	0	0	0	0		0	1	3	1	0	1		1
	18	OPERADOR DE MAQUINARIA	0			0	0	0	1	1		0	0	0			0		0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0		0
6.	19	INSPECTOR	0			1	1	1	1	1		0	1	1			0		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1
	20	PROFESIONAL SST	0			1	1	1	1	1		0	1	1			0		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1
	21	OFICIAL	0			1	1	1	1	1		0	1	1			0		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1
	22	TOPOGRAFO	0			1	1	1	1	1		0	1	1			0		2	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1
	23	AYUDANTE	0			3	3	3	3	3		0	3	4			0		4	3	3	3	3	3		2	3	3	2	2	2		2
	24	OPERADOR DE MAQUINARIA	0			0	0	0	0	0		0	2	1			0		1	2	2	2	2	2		2	3	3	3	2	2		1
7.	25	TOPOGRAFO	0			0	1	0	0	0		0	0	1			0		0	1	0	0	0	0		0	1	1	0	1	0		1
	26	PROFESIONAL SST	0			0	1	0	0	0		0	0	1			0		0	1	0	0	0	0		0	1	1	0	0	0		0
	27	OPERADOR DE MAQUINARIA	0			0	1	0	0	0		0	0	0			0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		1
	28	AYUDANTE	0			0	0	0	0	0		0	0	2			0		0	3	0	0	0	0		0	3	2	3	5	0		4
10. CASTILLA	29	TOPOGRAFO	0			1	1	0	1	1		1	1	1			0		1	0	0	0	0	0		0	0	0	1	0	0		0
	30	PROFESIONAL SST	0			1	1	0	1	1		1	1	1			0		1	0	0	0	0	0		0	0	0	1	0	0		0
	31	OPERADOR DE MAQUINARIA	0			1	1	0	2	1		2		1			0		1	0	0	0	0	0		0	0	0	1	0	0		0
	32	CONTROLADOR VIAL	0			0	0	0	0	0		0	0	1			0		1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	33	AYUDANTE	0			4	5	0	3	3		3	4	4			0		3	0	0	0	0	0		0	0	0	3	0	0		0
	34	OFICIAL	0			1	1	0	1	1		1	1	1			0		1	0	0	0	0	0		0	0	0	1	0	0		0
11.	35	OPERADOR DE MAQUINARIA	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		0	0	0	1	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	36	OFICIAL	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	37	PROFESIONAL SST	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	38	TOPOGRAFO	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	39	AYUDANTE	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0

580

CONTROL DE PERSONAL DEL CONTRATISTA

CONSORCIO VIAS IBAGUE
NIT: 902.007.047-8

CONTRATO OBRA: 3049 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025	CONTRATO INTERVENTORIA: 3158 del 18 de noviembre de 2025
CONTRATISTA: CONSORCIO IBAGUE VIAL URBANO 2025	INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS IBAGUE
OBJETO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ LOTE 2.	OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON " EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2

FRENTE/ CALLE		CARGO	MARZO 2026											ABRIL 2026																	
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13. VILLA MARLEN	40	INSPECTOR	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	41	PROFESIONAL SST	0			1	0	0	0	0		0	0	0			0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	42	OFICIAL	0			1	0	0	0	0		0	0	0			0		2	1	2	2	1	1		1	1	1	1	1	1		0
	43	TOPOGRAFO	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	44	AYUDANTE	0			2	0	0	0	0		0	0	0			0		2	3	4	4	4	4		4	4	3	3	3	3		0
14. PAPA JHONS	45	TORNILLERO	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		0	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	46	CONDUCTOR	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		0	3	1	1	1	2		0	1	0	0	0	0		0
	47	CONTROLADOR VIAL	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		1	1	1	1	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	48	OPERADOR DE MAQUINARIA	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		1	3	1	1	1	1		0	1	0	0	0	0		0
	49	OFICIAL	0			0	0	0	0	0		0	1	1			0		1	1	2	1	1	1		0	2	3	4	3	0		0
	50	RASTRILLERO	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		0	3	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	51	AYUDANTE	0			0	0	0	0	0		0	2	2			0		2	4	5	2	4	4		0	3	3	0	3	0		0
	52	PROFESIONAL SST	0			0	0	0	0	0		0	1	1			0		1	1	1	1	1	1		0	1	1	0	1	0		0
	53	TOPOGRAFO	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		1	1	1	1	0	0		0	0	0	0	0	0		0
17.	54	OPERADOR DE MAQUINARIA	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		0	0	0	0	0	0		2	0	0	0	0	0		0
	55	PROFESIONAL SST	0			0	0	1	1	1		1	1	1			0		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1
	56	OFICIAL	0			0	0	1	2	2		1	1	1			0		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1
	57	AYUDANTE	0			0	0	2	3	3		2	2	2			0		2	2	2	3	5	4		3	3	3	2	2	2		2
19. CALATAYUD	58	AYUDANTE	0			6	5	5	0	0		0	0	0			0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	59	OFICIAL	0			1	1	1	0	0		0	0	0			0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	60	TOPOGRAFO	0			1	1	1	0	0		0	0	0			0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
25. JARDIN	61	INSPECTOR	0			0	0	0	0	0		0	1	0			0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	62	AYUDANTE	0			0	0	0	0	0		0	4	0			0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	63	RASTRILLERO	0			0	0	0	0	0		0	3	0			0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	64	TORNILLERO	0			0	0	0	0	0		0	1	0			0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	65	CONDUCTOR	0			0	0	0	0	0		0	1	0			0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	66	OPERADOR DE MAQUINARIA	0			0	0	0	0	0		0	3	0			0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	67	TOPOGRAFO	0			0	0	0	0	0		0	1	0			0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	68	PROFESIONAL SST	0			0	0	0	0	0		0	1	0			0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
29	69	OPERADOR DE MAQUINARIA	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		0	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2
	70	AYUDANTE	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		0	3	1	3	5	5		5	3	3	5	3	3		3
	71	TOPOGRAFO	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		0	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1
32. APARCO	72	ING RESIDENTE DE OBRA	0			0	0	1	1	1		0	1	0			0		1	1	1	0	1	1		1	0	0	0	0	0		0
	73	AYUDANTE	0			0	0	3	3	3		0	4	0			0		6	4	4	0	6	6		7	3	3	2	0	0		0
	74	OFICIAL	0			0	0	0	0	0		0	1	0			0		3	2	2	0	2	2		1	1	1	1	0	0		0
	75	CONDUCTOR	0			0	0	1	1	1		0	1	0			0		1	1	1	0	2	1		2	1	1	1	0	0		0
	76	OPERADOR DE MAQUINARIA	0			0	0	1	1	1		0		0			0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	77	TOPOGRAFO	0			0	0	1	1	1		0	1	0			0		1	1	1	0	1	1		1	1	1	1	0	0		0
	78	PROFESIONAL SST	0			0	0	1	1	1		0	1	0			0		1	1	1	0	1	1		1	1	1	1	0	0		0
38.	79	AYUDANTE	0			0	0	0	0	0		0	4	0			0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	4	4		0
	80	CONTROLADOR VIAL	0			0	0	0	0	0		0	1	0			0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	81	CONDUCTOR	0			0	0	0	0	0		0	1	0			0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	82	RASTRILLERO	0			0	0	0	0	0		0	3	0			0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	83	TORNILLERO	0			0	0	0	0	0		0	1	0			0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	84	OPERADOR DE MAQUINARIA	0			0	0	0	0	0		0	3	0			0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	85	TOPOGRAFO	0			0	0	0	0	0		0	1	0			0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	1	1	1		1
	86	PROFESIONAL SST	0			0	0	0	0	0		0	1	0			0		0	0	1		0	0		0	0	0	1	1	1		1

125

Alcaldía Municipal Ibagué

CONTROL DE PERSONAL DEL CONTRATISTA

CONSORCIO VIAS IBAGUE
NIT. 902.007.947-3

CONTRATO OBRA: 3049 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATISTA: CONSROCIO IBAGUE VIAL URBANO 2025

OBJETO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ LOTE 2.

CONTRATO INTERVENTORIA: 3158 del 18 de noviembre de 2025

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS IBAGUE

OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON: " EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHANILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA/ Y OBRAS COOMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2

FRENTE/ CALLE		CARGO	MARZO 2025											ABRIL 2026																			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
49.	87	TOPOGRAFO	0			1	1	1	1	1		1	0	1			0		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	0	0		0
	88	ING RESIDENTE DE OBRA	0			1	1	1	1	1		1	0	1			0		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	0	0		0
	89	AYUDANTE	0			2	2	2	2	2		2	0	2			0		2	3	2	3	3	3		3	3	4	4	0	0		0
	90	OPERADOR DE MAQUINARIA	0			2	1	1	1	1		1	0	1			0		2	2		2	2	2		2	2	2	2	0	0		0
50. RICAURTE	91	INGENIERO RESEIDENTE	0			0	1	1	1	0		1	1	1			0		1	1	1	1	0	0		0	0	0	1	0	0		0
	92	OFICIAL	0			0	1	0	0	0		1	1	1			0		1	1	1	1	0	0		0	0	0	1	0	0		0
	93	TOPOGRAFO	0			0	1	0	0	0		1	0	0			0		1	1	1	1	0	0		0	0	0	1	0	0		0
	94	AYUDANTE	0			0	2	2	1	0		2	0	0			0		3	3	3	8	0	0		0	0	0	2	0	0		0
	95	PROFESOONAL SST	0			0	1	1	1	0		1	0	0			0		1	1	1	1	0	0		0	0	0	1	0	0		0
	96	OPERADOR DE MAQUINARIA	0			0	2	0	0	0		0	0	0			0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	97	CONDUCTOR	0			0	1	0	0	0		0	0	0			0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
51. VILLA LUCES	98	INGENIERO RESEIDENTE	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	99	OFICIAL	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	100	TOPOGRAFO	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	101	AYUDANTE	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		2	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	102	PROFESOONAL SST	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
52. VILLA LUCES	103	INGENIERO RESEIDENTE	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	1	1		0
	104	OFICIAL	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		0	0	0	0	0	0		0	0	2	0	0	1		0
	105	TOPOGRAFO	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	1	1		0
	106	AYUDANTE	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		0	0	0	0	0	0		0	0	8	0	10	4		0
	107	PROFESOONAL SST	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		0	0	0	0	0	0		0	0	1	0	1	1		0
CALARCA	108	AYUDANTE	0			0	0	3	3	0		2	0	3			0		5	2	2	2	2	2		3	4	3	3	9	4		5
	109	TOPOGRAFO	0			0	0	1	1	0		1	0	1			0		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1
	110	OFICIAL	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		0	0	0	0	0	0		0	0	2	2	1	2		2
	111	OPERADOR DE MAQUINARIA	0			0	0	0	0	0		0	0	2			0		0	2	2	1	1	1		1	1	1	1	3	1		1
SUBTOTAL			20	0	0	58	67	64	68				87	53	0	0	0	0	94	103	102	83	83	65	0	63	63	59	72	66	47	0	41
TOTAL PERIODO			1348																													

OBSERVACIONES

Vo.Bo.

LISETH MARYORI NIEVES HERRERA

ANEXO 10

CONTROL DEL TIEMPO

Alcaldía Municipal
Ibagué

CONTROL TIEMPO

CONSORCIO VIAS IBAGUE
NIT. 902.037.947-3

CONTRATO OBRA: 3048 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL URBANAS IBAGUE

OBJETO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1

CONTRATO INTERVENTORIA: 3158 del 18 de noviembre de 2025

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS IBAGUE

OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON: " EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, URBANAJ Y OBRAS COOMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2

FRENTE / CALLE	JORNADA	MARZO 2026											ABRIL 2026																		
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
CEIBA NORTE	MAÑANA	TS				TS	TS	PM			PI	TS						TS	TS	TS						TS	PM			TS		
	TARDE					TS	PM	N			N	TS						TS	TS	TS						TS	N			TS		
20 DE JULIO	MAÑANA							N			PI	TS	TS								TS										
	TARDE							PM			N	TS	TS								TS										
LOS ANGELES	MAÑANA					TS	TS	PM											TS	TS		TS	TS		PM	TS		N	TS		
	TARDE					TS	PM	N											TS	N		TS			N	TS		TS	TS		
LA ESPERANZA	MAÑANA																	TS	TS												
	TARDE																	TS	TS												
ALASKA	MAÑANA	TS									PI																				
	TARDE	TS									N																				
CIRUELOS 21 E	MAÑANA				N	TS	TS	PM			PI	TS	TS							TS	TS	TS	TS		PM	TS					
	TARDE					TS	PM				N	TS	TS							N	TS	TS			N	TS					
CIRUELOS 21 G	MAÑANA	TS			N	TS	TS		TS		PI	TS	TS					TS	TS	TS	TS		TS			TS		N	TS		
	TARDE					TS	PM				N	TS	TS					TS	TS	N	TS					TS		TS	TS		
SAN FRANCISCO	MAÑANA							PM	TS		PI	TS	TS					TS	TS	TS	TS	TS	TS		PM	TS		N			TS
	TARDE							TS			N	TS	TS					TS	N	TS	TS	TS			TS	TS		TS			TS
TIERRA FIRME	MAÑANA	TS				TS		PM	TS		PI	TS	TS					TS	TS	TS	TS	TS	TS		PM	TS	PM	N		TS	
	TARDE					TS		TS			N	TS	TS					TS	TS	TS	TS	TS			TS	TS	N	TS		TS	
PRADERAS I	MAÑANA					TS					PI	TS	TS					TS		TS		TS						N	TS		
	TARDE					TS					N	TS	TS					TS		TS		TS						TS	TS		
PRADERAS II	MAÑANA																												TS		
	TARDE																												TS		
CRA 5 TOPACIO-SANTA ANA	MAÑANA																					TS	TS		PM	TS	PM	N		TS		TS
	TARDE																					TS			TS	TS	N	TS		TS		TS

[B] ESTADO
TS(TIEMPO SECO)
PI(PRECIPITACIONES INTENSAS)
PM(PRECIPITACIONES MODERADAS)
N (NUBADO)

OBSERVACIONES

Vo.Bo.

LISETH MARYORI NIEVES HERRERA
CC. No. 1.121.906.294 DE VILLAVICENCIO
Representante legal

SRA

Alcaldía Municipal Ibagué

CONTROL TIEMPO

CONSORCIO VIAS IBAGUE
NIT. 902.037.547-3

CONTRATO OBRA: 3049 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATO INTERVENTORIA: 3158 del 19 de noviembre de 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO IBAGUE VIAL URBANO 2025

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS IBAGUE

OBJETO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ LOTE 2

OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON: " EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2

FRENTE / CALLE	JORNADA	MARZO 2026											ABRIL 2026																		
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. SANTABARBARA	MAÑANA	TS			TS	TS	TS	TS	TS		TS	TS	TS			—		TS	N	N	TS	—	—		—	—	—	—	—	—		—
	TARDE	TS			TS	TS	TS	TS	TS		TS	TS	TS			—		TS	N	N	TS	—	—		—	—	—	—	—	—		—
2.SANTA BARBARA	MAÑANA	TS			TS	TS	TS	TS	TS		TS	TS	TS			—		TS	N	N	TS	TS	TS		—	—	—	—	—	—		—
	TARDE	TS			TS	TS	TS	TS	TS		TS	TS	TS			—		TS	N	N	TS	TS	—		—	—	—	—	—	—		—
3. SAN CARLOS	MAÑANA	—			TS	TS	TS	TS	TS		—	—	—			—		—	N	TS	—	—	—		—	TS	PM	TS	TS	TS		TS
	TARDE	—			TS	TS	TS	TS	TS		—	—	—			—		—	TS	TS	—	—	—		—	TS	N	TS	TS	—		TS
6.	MAÑANA	—			—	TS	—	—	—		—	TS	TS			—		TS	TS	TS	TS	TS	TS		N	TS	PM	TS	TS	TS		TS
	TARDE	—			—	TS	—	—	—		—	TS	TS			—		TS	TS	TS	TS	TS	—		N	TS	N	TS	TS	—		TS
7	MAÑANA	—			—	—	—	TS	TS		TS	TS	TS			—		TS	TS	N	TS	TS	—		—	TS	PM	TS	TS	TS		TS
	TARDE	—			—	—	—	TS	TS		TS	TS	TS			—		TS	TS	TS	TS	TS	—		—	TS	N	TS	TS	—		TS
10. CASTILLA	MAÑANA	—			—	—	—	—	—		—	TS	TS			—		TS	—	—	—	—	—		—	—	—	—	TS	—		—
	TARDE	—			—	—	—	—	—		—	TS	—			—		TS	—	—	—	—	—		—	—	—	—	TS	—		—
11.	MAÑANA	—			—	—	—	—	—		—	—	—			—		—	—	—	TS	—	—		—	—	—	—	—	—		—
	TARDE	—			—	—	—	—	—		—	—	—			—		—	—	—	TS	—	—		—	—	—	—	—	—		—
13 VILLA MARLEN	MAÑANA	TS			TS	—	—	—	—		—	—	—			—		TS	PI	TS	TS	TS	TS		PM	N	PM	TS	TS	TS		—
	TARDE	TS			TS	—	—	—	—		—	—	—			—		TS	N	TS	TS	TS	—		N	TS	N	TS	TS	—		—
14. PAPA JHONS	MAÑANA	—			TS	TS	TS	TS	TS		—	—	—			—		TS	PI	TS	TS	TS	TS		PM	TS	PM	TS	TS	—		—
	TARDE	—			TS	TS	TS	TS	—		—	—	—			—		TS	N	TS	TS	TS	—		N	TS	N	TS	TS	—		—
17.	MAÑANA	—			—	—	TS	TS	TS		TS	TS	TS			—		TS	PI	TS	TS	TS	TS		TS	N	PM	TS	TS	TS		TS
	TARDE	—			—	—	TS	TS	—		TS	TS	—			—		TS	N	TS	TS	TS	—		TS	TS	N	TS	TS	—		TS
18. CALATAYUD	MAÑANA	—			TS	TS	TS	TS	TS		—	—	—			—		—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—		—
	TARDE	—			TS	TS	TS	TS	—		—	—	—			—		—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—		—
25. JARDIN	MAÑANA	—			—	—	—	—	—		—	TS	—			—		—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—		—
	TARDE	—			—	—	—	—	—		—	PI	—			—		—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—		—
29	MAÑANA	—			—	—	—	—	—		—	—	—			—		—	PI	TS	TS	TS	TS		TS	TS	PM	TS	TS	TS		TS
	TARDE	—			—	—	—	—	—		—	—	—			—		—	N	TS	TS	TS	—		TS	TS	N	TS	TS	—		TS
32. APARCO	MAÑANA	—			—	—	TS	TS	TS		—	TS	—			—		TS	PI	TS	TS	TS	TS		TS	N	PM	TS	—	—		—
	TARDE	—			—	—	TS	TS	—		—	TS	—			—		TS	N	TS	TS	TS	—		TS	TS	N	TS	—	—		—
36.	MAÑANA	—			—	—	—	—	—		—	TS	—			—		—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—		—
	TARDE	—			—	—	—	—	—		—	TS	—			—		—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—		—
49	MAÑANA	—			TS	TS	TS	TS	TS		TS	TS	TS			—		TS	PI	TS	TS	TS	TS		PM	TS	PM	TS	TS	—		—
	TARDE	—			TS	TS	TS	TS	TS		TS	TS	—			—		TS	N	TS	TS	TS	—		N	N	N	TS	TS	—		—
53. RICAURTE	MAÑANA	—			—	TS	TS	TS	—		TS	TS	TS			—		TS	PI	TS	TS	—	—		—	—	—	TS	TS	—		—
	TARDE	—			—	TS	TS	TS	—		TS	TS	—			—		TS	N	TS	TS	—	—		—	—	—	TS	TS	•		—
51. VILLA LUCES	MAÑANA	—			—	—	—	—	—		—	—	—			—		TS	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—		—
	TARDE	—			—	—	—	—	—		—	—	—			—		TS	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—		—
52. VILLA LUCES	MAÑANA	—			—	—	—	—	—		—	—	—			—		—	—	—	—	—	—		—	—	PM	—	TS	TS		—
	TARDE	—			—	—	—	—	—		—	—	—			—		—	—	—	—	—	—		—	—	N	—	TS	TS		—
CALARCA	MAÑANA	—			—	—	TS	TS	—		TS	TS	TS			—		TS	TS	TS	TS	TS	TS		PM	TS	PM	PM	TS	TS		TS
	TARDE	—			—	—	TS	TS	—		TS	TS				—		TS	TS	TS	TS	TS	—		N	TS	N	N	TS	TS		TS

(S) ESTADO
TS(TIEMPO SECO)
P(PRECIPITACIONES INTENSAS)
PM(PRECIPITACIONES MODERADAS)
N (NUBADO)

OBSERVACIONES

Vo.Bo.

LISETH MARYORI NIEVES HERRERA
CC. No. 1.121.906.294 DE VILLAVICENCIO
Representante legal

585

ANEXO 10
INFORME GESTIÓN SOCIAL

CONTRATO 3158 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025

CONSORCIO VÍAS IBAGUÉ

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA/ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ LOTE 1 Y 2"

INFORME DE INTERVENTORÍA N° 5

GESTIÓN SOCIAL





PERIODO

21 DE MARZO AL 20 ABRIL DEL 2026

Elaborado por consorcio vías Ibagué

587

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

INTRODUCCIÓN 4
ALCANCE 5
Caracterización del área de influencia directa del proyecto 5
LOTE 1 5
LOTE 2 7
OBLIGACIONES DE GESTIÓN SOCIAL 9
IMPACTOS SOCIALES DEL PROYECTO 10
Estructura del plan de gestión social 11
1. Manejo de la infraestructura de predios servicios públicos. 12
2. Atención a la comunidad. 12
3. Información y divulgación 12
4. Acciones divulgativas en los tramos del proyecto 12
5. Pasacalles Informativos 12
6. Cultura y participación comunitaria 12
7. Contratación y Mano de obra 12
1. MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS SERVICIOS PÚBLICOS 13
1.2. Levantamiento de actas de vecindad en las unidades de vivienda del AID. 13
CALLE 80 ENTRE CARRERAS 11 A Y 12ª – URB SAN FRANCISCO ... ¡Error! Marcador no definido.
CARRERA 18 F ENTRE CALLES 140 B Y 143- PORTAL DE LOS TUNJOS 14
CALLE 115 ENTRE CARRERAS 17 Y 19 B – TIERRA FIRME 16
1.3. Levantamiento de actas de compromiso. 20
1.4 Cierres de actas de vecindad (Finalizando el proceso constructivo) 20
2. ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 20
2.1 Instalación del punto de información y atención al ciudadano 20

588

2.2 Buzon Satélite 20
2.3 Recorridos de obra 20
3. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 22
3.1 Reunión de inicio (Previo al inicio de las actividades constructivas) 22
3.2 Reuniones de avance de Obra. 25
3.3 Reuniones de Finalización 25
3.4 Reuniones Extraordinarias 25
4. ACCIONES DIVULGATIVAS EN LOS TRAMOS DEL PROYECTO 26
4.1 Reuniones con Comité de Participación con la Comunidad 26
4.1.1 REUNIONES CON EL CPC REALIZADAS 26
5. PASACALLES INFORMATIVOS 27
6. CULTURA Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 27
7. CONTRATACIÓN Y MANO DE OBRA 27
OTRAS ACTIVIDADES 33
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES GESTIÓN SOCIAL LOTE 2 34
CONCLUSIONES 35

589

INTRODUCCIÓN

A partir de la puesta en marcha y ejecución de los contratos de obra, No 3048 del 07 de noviembre del 2025 de UNION TEMPORAL URBANAS IBAGUÉ, Y No 3049 del 07 de noviembre del 2025 CONSORCIO IBAGUÉ VIAL URBANO 2025, con la interventoria contrato No 3158 del 17 de noviembre del 2025, la **ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL** y los ejecutores del proyecto buscan mediante su ejecución, la rehabilitación y mejoramiento de la red vial de diversas zonas estratégicas de la geografía local. A partir de estas acciones constructivas que involucran un papel comunitario preponderante antes, durante y después de la ejecución del proyecto, por medio del AREA DE GESTIÓN SOCIAL se promueve la implementación del denominado PLAN DE GESTIÓN SOCIAL CONTRACTUAL, el cual es la carta de navegación para la atención integral a los diversos actores sociales que directa o indirectamente tienen relación con las acciones propias del contrato y del ente contratante; siendo este, el bastión para el fomento de la participación ciudadana y el cumplimiento de las normativas legales vigentes aplicables a la ejecución de los proyectos que fortalecen la infraestructura municipal, departamental y nacional.

590

ALCANCE

El Plan de Gestión Social está dirigido a los beneficiarios del proyecto, estableciendo los requisitos mínimos para que, a través de los mecanismos definidos en el presente documento, se logre prevenir, minimizar y compensar de manera oportuna y eficiente los impactos que generan las obras relacionadas con el mejoramiento de la malla vial del municipio de Ibagué

Caracterización del área de influencia directa del proyecto

Dentro de los barrios directamente beneficiarios del proyecto, se tienen barrios referentes a las comunas 1,2,3,4,6,8, los cuales se definieron como prioritarios para la implementación del contrato de obra y según las necesidades de tipo técnico propuestas por la entidad contratante y las respectivas secretarías.

LOTE 1

REHABILITACIÓN VIAL - MEJORAMIENTO CON EXCAVACIÓN PROFUNDA			
No.	**DIRECCIÓN**	**COMUNA**	**BARRIO**
1	CARRERA 5A ENTRE CALLE 22 Y 23	3	EL CARMEN
2	CARRERA 21G ENTRE CALLES 67A Y 68 **	6	CIRUELOS
3	CALLE 80 ENTRE CARRERAS 11A Y 12A	6	URB. SAN FRANCISCO
4	CARRERA 13 ENTRE CALLES 111 Y 113	7	URB. PACANDÉ
5	CALLE 12 ENTRE CARRERAS 13 Y 14	2	7 DE AGOSTO
6	CALLE 1B ENTRE CARRERAS 11A BIS Y 12	2	ALASKA
7	CARRERA 8A ENTRE TRANSVERSAL 8 Y CALLE 141	7	CEIBA NORTE
8	CALLE 129 ENTRE CARRERAS 9 Y 10	7	PEDRO IGNACIO VILLAMARÍN
9	CARRERA 15 ENTRE CALLES 120 Y 121	7	PRADERAS DEL NORTE
10	CARRERA 15 ENTRE CALLES 121 Y 122	7	PRADERAS DEL NORTE
11	CALLE 115 ENTRE CARRERAS 17 Y 19B	7	TIERRA FIRME
12	CARRERA 11 ENTRE CALLES 120 Y 121A	7	LA FLORESTA SALADO
13	CARRERA 10A ENTRE CALLE 97 Y 97A	6	ARKALÁ
14	CARRERA 21 ENTRE CALLES 61C Y 67	6	LOS ANGELES
15	CARRERA 21E ENTRE CALLE 67 Y 68	6	LOS CIRUELOS
16	CARRERA 17A ENTRE CALLE 64A Y 65	6	IBAGUÉ 2000

591

17	CARRERA 18A ENTRE CALLE 67 Y 69	6	AMBALÁ
18	CARRERA 18F ENTRE CALLES 140B Y 143	9	PORTAL DE LOS TUNJOS
19	CARRERA 8H ENTRE CALLE 160 Y 161	7	PROTECHO SALADO
20	CARRERA 9A ENTRE CALLE 98A Y CALLE 99 (MANZANA RR Y S)	6	ARKALÁ II
21	CALLE 100 ENTRE CARRERA 10A Y 12 (MANZANA P, Q, RR, R, S, T INCLUYE TRIANGULO DEL PARQUE)	6	ARKALÁ II
22	CARRERA 13 ENTRE CALLE 96 Y 97	6	ARKALÁ I
23	CALLE 13 ENTRE CARRERA 1 Y 1SUR	1	CENTRO
24	CALLE 123 ENTRE CARRERA 10 Y 11	7	URBANIZACIÓN SAN PABLO
25	CALLE 133 ENTRE CARRERA 8 Y 9	7	CONJUNTO CERRADO VERACRUZ
26	CARRERA 15 ENTRE CALLE 65 Y 66	6	AMBALÁ
27	CALLE 132 CON CARRERA 9 CALLEJON O CALLE 133 CON CARRERA 14 CALLEJON	7	MONTECARLO 2
28	CARRERA 16 ENTRE CALLE 60D Y 61	6	SAN ANTONIO
29	CALLE 93 ENTRE CARRERA 14B Y 14D	6	URB. LA ESPERANZA
30	CALLE 140 ENTRE TRANSVERSAL 8 Y CARRERA 8D	7	OVIEDO
31	CALLE 2 ENTRE CARRERA 13B Y 15	2	SANTA CRUZ
32	CALLE 28 ENTRE CARRERA 6 Y 7	3	BELARCAZAR
33	TRANSVERSAL 19 ENTRE CALLE 19 Y 20	2	VIÑA DE CALAMBEO
34	CARRERA 17 ENTRE CALLE 96 Y 97	6	LA GAVIOTA
35	CARRERA 8G (8F BIS) ENTRE CALLE 164B Y 164D	7	CEIBITA
36	CALLE 159 ENTRE CARRERAS 11 Y 12	7	URB. EL DORADO
37	CALLE 122 ENTRE CRA 19A Y 19B	9	BELLO HORIZONTE
38	CALLE 163 ENTRE MANZANAS A Y B	7	URB. SANTA CATALINA
39	CARRERA 10 ENTRE CALLE 3 Y 4	1	BELÉN
40	CALLE 163 ENTRE CARRERA 9 Y DIAGONAL 161A	7	PROTECHO SALADO
41	CARRERA 8J ENTRE CALLE 161 Y 161A	7	PROTECHO SALADO
42	CARRERA 13A ENTRE CALLE 121 Y 122	7	MIRADOR DE CANTABRIA Y URB. PRADERAS DEL NORTE
43	MANZANAS B, D Y C	7	URB. SANTA CATALINA
44	CALLE 9 ENTRE CARRERA 12 Y 13	2	20 DE JULIO

45	CARRERA 8B ENTRE TRANSVERSAL 8 Y 141	7	CEIBA NORTE
46	CALLE 138 ENTRE CARRERA 8 Y 8A	7	CEIBA NORTE
47	CALLE 140 ENTRE CARRERA 8A Y 8B	7	CEIBA NORTE
MEJORAMIENTO MEDIANTE ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN SUPERFICIAL			
48	CALLE 77 ENTRE PUENTE RIO CHIPALO Y AV. GUABINAL	6	SECTOR CAMPIÑA
49	CALLE 144 ENTRE CARRERA 12 Y PUENTE RIO ALVARADO	7	SECTOR SALADO
50	CARRERA 3 ENTRE CALLE 59 Y 60	9	SECTOR LA FLORESTA
51	CALLE 36 ENTRE CARRERA 5 Y 6	3	SECTOR SAN SIMÓN
	CRA 5 ENTRE CALLE 64 Y 58 – CRA 5 ENTRE CALLES 58 Y 64	9	SECTOR MULTICENTRO

LOTE 2

LOTE 2				
N°	DIRECCION	BARRIO	COMUNA	CUADRAS
1	Carrera 12 Entre Calles 3 Y 4	Santa Barbara	2	1
2	Carrera 11b Entre Calles 3 Y 4	Santa Barbara	2	1
3	Cra 7bbis Entre Calle 42-44 Placa Verde O Cra 9 Entre Calle 41-42	San Carlos	4	1
4	Calle 40 Entre La Transversal 11- Carreras 12a Y 13	Triunfo	4	2
5	Calle 46 Entre Carrera 4 Y 4b (Quinta)	Piedra Pintada	4	1
6	Calle 48a Entre Carreras 5 Y 4b	Piedra Pintada	4	1
7	Calle 49 Entre Carreras 6 Y 7	Rincón De Piedra Pintada Y Limonar 5 Sector	4	5
8	Calle 52 Entre Carrera 7c Y 8	Rincón De Piedra Pintada	4	1
9	Calles 46 Entre Carrera 6a Y 7	Villa Marlén 1	4	1
10	Carrera 11 Entre Calles 44 Y 46	Castilla	4	1
11	Carrera 6a Entre Calles 49 Y 49a	Limonar Quinto Sector	4	1
12	Carrera 6a(6b) Entre Calle 56 Y 59	Limonar	4	3
13	Carrera 6b O 6a Entre Cale 44 Y 47	Villa Marlen 1	4	2
14	Carrera 7a Entre Calles 60 Y 57	Rincón De Piedra Pintada	4	1
15	Carrera 7b Bis Entre Calle 47 Y 50	Limonar V Sector	4	1
16	Calle 57 Entre Carreras 6 Y 7	Limonar	4	2

17	Calle 65a Entre Carreras 9b Y 10a (Mz M Y N)	Jordán 9 Etapa	5	1
18	Calle 75 Entre Carrera 10 Y 10abis Y 13	Jordán 7 Etapa	5	3
19	Calle 79bis Entre Carrera 10a Y 10c Y Entre Mzs 3 Y 4 Y Entre Mzs 5-6 Y El Parque Calatayud	Calatayud	5	3
20	Carrera 10a Entre 67 Y 68	Jordán 9 Etapa	5	1
21	Carrera 6 Entre Calles 77 Y 79	Jordán 6 Etapa	5	2
22	Calle 102 Entre Carreras 2 Y 2a	Villa Del Sol Y Acacias	8	1
23	Calle 121 Entre Carrera 4 Sur Y 1 Sur	Nueva Castilla	8	7
24	Calle 84 Entre Carrera 1 Y 2	Buenaventura	8	3
25	Calle 88 Entre Carreras 4-3b-3a	Jardín I	8	2
26	Carrera 2c Entre 103 Y 104	Tolima Grande	8	1
27	Carrera 3 Sur Entre Calles 100 Y 103	La Esmeralda	8	9
28	Carrera 3b Entre Calle 96 Y 97	Villa Del Sol	8	1
N°	DIRECCION	BARRIO	COMUNA	CUADRAS
29	Carrera 4b Con Calle 100	Nuevo Armero Etapa I	8	1
30	Carrera 4h Sur Entre Calles 119 Y 121	Nueva Castilla	8	2
31	Calle 111 Entre Avenida Mirolindo Y Cra 21 Sur	Aparco	9	1
32	Calle 115 Entre Avenida Mirolindo Y Carrera 21 Sur	Aparco	9	1
33	Calle 65 Entre Carrera 4 Y Carrera 2	Jordán 1	9	2
34	Carrera 3 Entre Calles 64 Y 65	Jordán 1	9	2
35	Carrera 3a Entre Calles 70 Y 71	Jordán 2 Etapa	9	1
36	Carrera 4b Entre Calles 74a Y 76 O Entre Manzanas 32,36 Y Parque	Jordán 3 Etp	9	2
37	Calle 27a Entre Carreras 4 Y 4a	Francia	10	1
38	Calle 33 Entre 4bbis Y 4c	Francia	10	1
39	Calle 34b Entre Carrera 3 Y Carrera 3a	Departamental	10	1
40	Calle 34 Entre Carrera 4b Bis Y Carrera 4c	San Cayetano	10	1
41	Calle 34b Entre Cra 1a Y 1b	1 De Mayo	10	2
42	Carrera 3 Entre Calles 26 Y 27	Claret	10	1
43	Carrera 4abis Entre Calles 26 Y 27 Callejón	Hipódromo	10	1
44	Carrera 4d Entre Calle 39 Y 40	Las Palmas	10	2
45	Calle 26 Entre Carreras 2 Sur Y 1b Sur	Ferias	11	1
46	Calle 33a Entre Carreras 2 Y 2a	Brisas	11	1
47	Calle 25 O 26 Entre Carreras 5a Sur Y 5 Sur	Praderas Del Sur	12	1
48	Calle 27 Entre Carreras 5 Sur Y 6 Sur O Mzs I Y J	Praderas Del Sur	12	1
49	Carrera 12a Sur Entre Calles 24by 25	Nogales	12	1

594

50	Calle 23 Entre Carreras 12 Y 14	Ricaurte	12	2
51	Calle 23b Entre Carreras 12 Sur- 12a Sur-13 Sur Y 14 Sur	Villa Luces	12	2
52	Carrera 12 Entre Calles 23c Y 24	Villa Luces	12	2
53	Carrera 12a Sur Entre Calles 23b Y 23c	Villa Luces	12	1
54	Carrera 39a Entre Calle 18 Y 19	Boquerón	13	2

OBLIGACIONES DE GESTIÓN SOCIAL

1. El INTERVENTOR verificará el cumplimiento de las actividades propuestas / por el CONTRATISTA en el plan de gestión social y aprobará el contenido y presentación de los anexos relacionados a la gestión presentados por el Contratista.
2. El INTERVENTOR verificará el desarrollo de las reuniones y campañas de sensibilización, divulgación y promoción mediante volantes y medios formativos a la comunidad sobre educación y seguridad vial, cultura ciudadana, prevención de mal parqueo y accidentes de tránsito y las necesarias en el sector. De igual manera, propondrá las temáticas a tratar, mecanismos de socialización y acercamiento a la comunidad que considere pertinentes para el desarrollo armónico de las actividades en obra.
3. El INTERVENTOR realizará observaciones y recomendaciones al desarrollo del plan de gestión social en obra que considere pertinentes y dará seguimiento a los retrasos, adelantos o eventualidades que se estén presentando conforme al Plan de Gestión Social del Contratista. De dichos eventos, aprobará el documento propuesto por parte del contratista para adelantar las acciones correctivas propuestas.

Nota

En el siguiente informe se evidencia el cumplimiento de las obligaciones de gestión social de la interventoría, en su responsabilidad con los contratistas lote 1 y lote 2, mencionando cada una de las actividades ejecutadas en el periodo de dicho informe.

Desde interventoría se realiza un seguimiento continuo a las actividades y plan de gestión social de los contratistas con el fin de culminar las intervenciones productivamente a medida que, las actividades constructivas se adelanten, se realiza acompañamiento en las distintas comunas y barrios ejecutando las distintas actividades del plan de gestión social a través de este informe se consolida la información recolectada durante el periodo mencionado (21 marzo al 20 abril del 2026).

IMPACTOS SOCIALES DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta los lineamientos y procesos constructivos a lo largo del AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO – AID, los impactos sociales previo y durante la ejecución de la obra, se definen de la siguiente manera.

Positivos

- Reducción de los tiempos de desplazamiento
- Mejoramiento de las condiciones locativas
- Reducción de material particulado
- Valorización de los establecimientos
- Fortalecimiento comercial

Negativos

- Presencia de material particulado.
- Cierres de vías de acceso
- Presencia de excavaciones a baja profundidad
- Intermitencia en los servicios públicos domiciliarios
- Aumento en los tiempos de entrega del proyecto
- Inutilidad de los garajes de acceso de forma temporal
- Posibilidad de situaciones inseguras
- Posibles situaciones de orden publico
- Disminución de la actividad económica local

596

Estructura del plan de gestión social

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL		
FASE DEL PROYECTO	**PROGRAMA DE LA GESTIÓN SOCIAL**	**ACTIVIDADES**
PRE-CONSTRUCTIVO Y CONSTRUCTIVO	**MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS**	Levantamiento de ACTAS DE VECINDAD. Levantamiento de ACTAS DE COMPROMISO (aplicable a la necesidad de la obra). Cierres de ACTA DE VECINDAD (una vez las obras finalicen.
CONSTRUCTIVO	**ATENCIÓN A LA COMUNIDAD**	Recepción y trámite de las PQRS interpuestas por parte de los residentes de AID, dentro de los términos de la Ley.
PRE-CONSTRUCTIVO Y CONSTRUCTIVO	**INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN**	Reuniones de inicio Reuniones de avance Reuniones de finalización Reuniones extraordinarias Acciones divulgativas
CONSTRUCTIVO	**CULTURA Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA**	Acciones pedagógicas en los tramos viales donde existan Instituciones Educativas.
CONSTRUCTIVO	**CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA**	Vinculación de MOC Y MONC Relación mensual del personal vinculado al proyecto

1. **Manejo de la infraestructura de predios servicios públicos.**
2. **Atención a la comunidad.**
3. **Información y divulgación**

1. MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS SERVICIOS PÚBLICOS.	1.2. Levantamiento de actas de vecindad en las unidades de vivienda del AID. 1.3. Levantamiento de actas de compromiso. 1.4. Cierre de actas de vecindad (finalizando el proceso constructivo)
2. ATENCIÓN A LA COMUNIDAD	2.1. Instalacion del punto de informacion y atencion al ciudadano. 2.2. Buzon satelite 2.3. Recorridos de obra.
3. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	3.1. Reunion de inicio (Previo al inicio de las actividades constructivas). 3.2. Reuniones de avance de obra. 3.3. Reuniones de finalizacion 3.4. Reuniones extraordinarias

4. **Acciones divulgativas en los tramos del proyecto**
5. **Pasacalles Informativos**
6. **Cultura y participación comunitaria**
7. **Contratación y Mano de obra**

1. MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS SERVICIOS PÚBLICOS.

1.2. Levantamiento de actas de vecindad en las unidades de vivienda del AID.

En lo que respecta al presente informe, se realizó el diligenciamiento de las ACTAS DE VECINDAD propias de los tramos que han sido objeto de intervención; estas, se han realizado previo a la intervención del proceso constructivo con el fin de detallar mediante inspección ocular el estado de las edificaciones antes del ingreso e influencia de las obras.

Por todo lo anterior, se relaciona en el presenta informe, la relación de los tramos y sectores que han sido objeto de esta actividad.

Actas de vecindad levantadas en el periodo del presente informe

LOTE 1

CARRERA 13ª ENTRE CALLE 121 Y 122 – MIRADOR DE CANTABRIA

No	TRAMO	DIRECCIÓN	MARGEN	OBSERVACIÓN
1	CARRERA 13A ENTRE CALLE 121 Y 122	MZ B CASA 6	IZQUIERDA	
2	CARRERA 13A ENTRE CALLE 121 Y 122	MZ B CASA 1	IZQUIERDA	
3	CARRERA 13A ENTRE CALLE 121 Y 122	MZ B CASA 3	IZQUIERDA	
4	CARRERA 13A ENTRE CALLE 121 Y 122	MZ B CASA 4	IZQUIERDA	
5	CARRERA 13A ENTRE CALLE 121 Y 122	MZ B CASA 5	IZQUIERDA	
6	CARRERA 13A ENTRE CALLE 121 Y 122	MZ B CASA 7	IZQUIERDA	
7	CARRERA 13A ENTRE CALLE 121 Y 122	CRA 19 B No 18-63	IZQUIERDA	
8	CARRERA 13A ENTRE CALLE 121 Y 122	SIN NOMENCLATURA	IZQUIERDA	
9	CARRERA 13A ENTRE CALLE 121 Y 122	SIN NOMENCLATURA	IZQUIERDA	

599

10	CARRERA 13A ENTRE CALLE 121 Y 122	PARQUEADERO	DERECHA	





ACTIVIDAD	TOTAL, DE ACTAS DILIGENCIADAS
Levantamiento de AV inicial	10

CARRERA 15 ENTRE CALLES 120 Y 121 – PRADERAS DEL NORTE

No	DIRECCIÓN	TRAMO VIAL	MARGEN	OBSERVACIÓN
1	MZ I CASA 5	CARRERA 15 ENTRE CALLES 120 Y 121	IZQUIERDA	
2	MZ I CASA 12	CARRERA 15 ENTRE CALLES 120 Y 121	IZQUIERDA	
3	MZ I CASA 13	CARRERA 15 ENTRE CALLES 120 Y 121	IZQUIERDA	
4	MZ I CASA 14	CARRERA 15 ENTRE CALLES 120 Y 121	IZQUIERDA	
5	MZ I CASA 15	CARRERA 15 ENTRE CALLES 120 Y 121	IZQUIERDA	
6	MZ I CASA 16	CARRERA 15 ENTRE CALLES 120 Y 121	IZQUIERDA	
7	MZ I CASA 17	CARRERA 15 ENTRE CALLES 120 Y 121	IZQUIERDA	
8	MZ I CASA 19	CARRERA 15 ENTRE CALLES 120 Y 121	IZQUIERDA	
9	MZ I CASA 20	CARRERA 15 ENTRE CALLES 120 Y 121	IZQUIERDA	

600

10	MZ I CASA 21	CARRERA 15 ENTRE CALLES 120 Y 121	IZQUIERDA	
11	MZ I CASA 22	CARRERA 15 ENTRE CALLES 120 Y 121	IZQUIERDA	
12	MZ J CASA 6	CARRERA 15 ENTRE CALLES 120 Y 121	IZQUIERDA	
13	MZ J CASA 7	CARRERA 15 ENTRE CALLES 120 Y 121	IZQUIERDA	
14	MZ J CASA 8	CARRERA 15 ENTRE CALLES 120 Y 121	IZQUIERDA	
15	MZ J CASA 9	CARRERA 15 ENTRE CALLES 120 Y 121	IZQUIERDA	
16	MZ J CASA 10 - CRA 15 121 A	CARRERA 15 ENTRE CALLES 120 Y 121	IZQUIERDA	
17	MZ O CASA 1	CARRERA 15 ENTRE CALLES 120 Y 121	DERECHA	
18	MZ O CASA 2	CARRERA 15 ENTRE CALLES 120 Y 121	DERECHA	
19	MZ O CASA 3	CARRERA 15 ENTRE CALLES 120 Y 121	DERECHA	
20	MZ O CASA 4	CARRERA 15 ENTRE CALLES 120 Y 121	DERECHA	
21	MZ O CASA 5	CARRERA 15 ENTRE CALLES 120 Y 121	DERECHA	
22	MZ O CASA 6	CARRERA 15 ENTRE CALLES 120 Y 121	DERECHA	
23	MZ O CASA 7	CARRERA 15 ENTRE CALLES 120 Y 121	DERECHA	
24	MZ P CASA 1	CARRERA 15 ENTRE CALLES 120 Y 121	DERECHA	
25	MZ P CASA 2	CARRERA 15 ENTRE CALLES 120 Y 121	DERECHA	
26	MZ P CASA 3	CARRERA 15 ENTRE CALLES 120 Y 121	DERECHA	

27	MZ P CASA 4	CARRERA 15 ENTRE CALLES 120 Y 121	DERECHA	
28	MZ P CASA 5	CARRERA 15 ENTRE CALLES 120 Y 121	DERECHA	
29	MZ P CASA 6	CARRERA 15 ENTRE CALLES 120 Y 121	DERECHA	
30	MZ P CASA 7	CARRERA 15 ENTRE CALLES 120 Y 121	DERECHA	
31	MZ P CASA 8	CARRERA 15 ENTRE CALLES 120 Y 121	DERECHA	
32	MZ P CASA 9	CARRERA 15 ENTRE CALLES 120 Y 121	DERECHA	
33	MZ P CASA 10	CARRERA 15 ENTRE CALLES 120 Y 121	DERECHA	
34	MZ P CASA 11	CARRERA 15 ENTRE CALLES 120 Y 121	DERECHA	
35	MZ P CASA 12	CARRERA 15 ENTRE CALLES 120 Y 121	DERECHA	
36	MZ P CASA 13	CARRERA 15 ENTRE CALLES 120 Y 121	DERECHA	

ACTIVIDAD	TOTAL, DE ACTAS DILIGENCIADAS
Levantamiento de AV inicial	36





CARRERA 15 ENTRE CALLES 121 Y 122 – PRADERAS DEL NORTE.

No	DIRECCIÓN	TRAMO VIAL	MARGEN	OBSERVACIÓN

602

1	MZ K CASA 8	CARRERA 15 ENTRE CALLES 121 Y 122	IZQUIERDA	
2	MZ K CASA 9	CARRERA 15 ENTRE CALLES 121 Y 122	IZQUIERDA	
3	MZ K CASA 10	CARRERA 15 ENTRE CALLES 121 Y 122	IZQUIERDA	
4	MZ K CASA 11	CARRERA 15 ENTRE CALLES 121 Y 122	IZQUIERDA	
5	MZ K CASA 12	CARRERA 15 ENTRE CALLES 121 Y 122	IZQUIERDA	
6	MZ K CASA 13	CARRERA 15 ENTRE CALLES 121 Y 122	IZQUIERDA	
7	MZ K CASA 14 CRA 15 CALLE 121 - CASA DON LEO	CARRERA 15 ENTRE CALLES 121 Y 122	IZQUIERDA	
8	MZ L CASA 5	CARRERA 15 ENTRE CALLES 121 Y 122	IZQUIERDA	
9	MZ L CASA 6	CARRERA 15 ENTRE CALLES 121 Y 122	IZQUIERDA	
10	MZ L CASA 7	CARRERA 15 ENTRE CALLES 121 Y 122	IZQUIERDA	
11	MZ L CASA 8	CARRERA 15 ENTRE CALLES 121 Y 122	IZQUIERDA	
12	MZ Ñ CASA 1	CARRERA 15 ENTRE CALLES 121 Y 122	DERECHA	
13	MZ Ñ CASA 2	CARRERA 15 ENTRE CALLES 121 Y 122	DERECHA	
14	MZ Ñ CASA 3	CARRERA 15 ENTRE CALLES 121 Y 122	DERECHA	
15	ZONA VERDE	CARRERA 15 ENTRE CALLES 121 Y 122	DERECHA	





ACTIVIDAD	TOTAL, DE ACTAS DILIGENCIADAS
Levantamiento de AV inicial	15

CALLE 129 ENTRE CARRERAS 9 Y 10 – PEDRO IGNACIO VILLAMARIN

No	DIRECCIÓN	TRAMO VIAL	MARGEN	OBSERVACIÓN
1	14 26 TALLER DE SOLDADURA	CALLE 129 ENTRE CARRERAS 9 Y 10	IZQUIERDA	TALLER DE SOLDADURA
2	CALLE 129 9-59	CALLE 129 ENTRE CARRERAS 9 Y 10	DERECHA	
3	CALLE 129 9-65	CALLE 129 ENTRE CARRERAS 9 Y 10	IZQUIERDA	
4	CALLE 151 14-41	CALLE 129 ENTRE CARRERAS 9 Y 10	IZQUIERDA	
5	CLL 129 9-57 - BODEGA	CALLE 129 ENTRE CARRERAS 9 Y 10	DERECHA	BODEGA
6	CLL 151 14 - 34	CALLE 129 ENTRE CARRERAS 9 Y 10	DERECHA	
7	CLL 151 14-20-ESQUINERA GANA GANA	CALLE 129 ENTRE CARRERAS 9 Y 10	IZQUIERDA	GANA GANA
8	CLL 151 14-33	CALLE 129 ENTRE CARRERAS 9 Y 10	DERECHA	
9	CLL 151 14-44	CALLE 129 ENTRE CARRERAS 9 Y 10	DERECHA	
10	CLL 151-14-74- TIENDA ESQUINERA	CALLE 129 ENTRE CARRERAS 9 Y 10	IZQUIERDA	
11	CLL134 14-19	CALLE 129 ENTRE CARRERAS 9 Y 10	DERECHA	
12	LOCALES	CALLE 129 ENTRE CARRERAS 9 Y 10	DERECHA	
13	MZ 4 CASA 1 - PANADERÍA	CALLE 129 ENTRE CARRERAS 9 Y 10	DERECHA	

609

14	RESTAURANTE	CALLE 129 ENTRE CARRERAS 9 Y 10	IZQUIERDA	





ACTIVIDAD	TOTAL, DE ACTAS DILIGENCIADAS
Levantamiento de AV inicial	14

Nota: Para el periodo mencionado el lote 1 levanto en totalidad 71 actas de vecindad.

Lote 2

FECHA	CALLE	BARRIO	N° DE ACTAS
26/03/2026	Carrera 8 ENTRE CALLES 42 Y 44	CALARCÁ	27
15/03/2026	Carrera 4b con calle 100	Nuevo Armero	25
TOTAL, ACTAS			52
Fuente: Elaboración propia a partir de los recopilados en campo.			





Nota: En el periodo comprendido de este informe el lote 2 levanto en totalidad 52 actas de vecindad.

605

1.3. Levantamiento de actas de compromiso.

En el periodo no se levantan actas de compromiso en ninguno de los contratistas.

1.4 Cierres de actas de vecindad (Finalizando el proceso constructivo)

En el periodo del presente informe no se realizan actas de cierre de vecindad o paz y salvos, en ningunos de o contratistas.

2. ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

2.1 Instalación del punto de información y atención al ciudadano

En algunos frentes de obra este punto funciona en los campamentos.

2.2 Buzon Satélite

En la inspección de interventoría no se evidencia en los frentes de obra, no se cuenta en obra con una oficina, pero se realiza la atención a la comunidad de manera directa en cada vía objeto de intervención, teniendo en cuenta que en cada punto se contara con el apoyo del residente, personal de las áreas SOCIAL Y SST.

Teniendo en cuenta las condiciones y diversificación se promueve la utilización de los siguientes canales para la recepción de sus manifestaciones ciudadanas con relación al proyecto

Datos para la recepción de PQRS de forma digital

Celular: 3105704172
E. Mail. residentesocial@asfaltemos.co
Diligenciamiento en campo del formato - recepción y trámite de PQRS-UT-URB-003

2.3 Recorridos de obra

Lote 1

PQRS recepcionadas y diligenciadas:

A continuación, se relacionan las PQRS que fueron recepcionadas y atendidas por parte de la GESTIÓN SOCIAL de la UNIÓN TEMPORAL URBANAS.

Atención al caso FAUSTO CONTRERAS

Se realizó atención a reclamación del peticionario en el cual manifestó sufrir afectación debido a la instalación de la señalización de obra.

ESTADO: CERRADO.







Lote 2

PERIODO	No	FECHA	NOMBRE PETICIONARIO	DIRECCIÓN	MUNICIPIO /VEREDA /BARRIO	QUEJA O SOLICITUD	TELÉFONO	RESPUESTA	ESTADO
5	0	Marzo 2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Para este periodo no se recepcionarón manifestaciones ciudadanas por parte de la comunidad del AID.									

QUEJAS	ACUMULADAS	PRESENTE PERIODO	OBSERVACIONES
RECIBIDAS	0	0	N/A
CERRADAS	0	0	N/A
ABIERTA	0	0	N/A
EN TRAMITE	0	0	N/A
Fuente: Elaboración propia a partir de los recopilados en campo.			

Desarrollo del Indicador

Seguimiento y control en la gestión para el cierre de PQRS. Cierre PQRS = (PQRS cerradas/ PQRS presentadas) x 100 Cierre PQRS = (0/0) * 100 = 0%

607

3. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN

3.1 Reunión de inicio (Previo al inicio de las actividades constructivas).

Para el presente informe se realizaron los espacios de socialización con los diferentes actores sociales de los tramos viales que, están en proceso de intervención, los cuales se relacionan a continuación

LOTE 1

INTER	EXTER	FECHA	OBJETIVO DE LA REUNIÓN	TRAMO VIAL	COMPROMISOS Y TAREAS
	x	24-03-2026	Reunión de inicio de obra	Praderas del norte	Sin compromisos
	x	07-04-2026	Reunión de inicio de obra	Calucaima	La comunidad se compromete a organizar las secciones de andén que, no den el ancho estipulado en el diseño de vía.
	x	24-03-2026	Reunión de inicio de obra	Villamarín Montecarlo	El inicio depende de actividades técnicas del IBAL
	x	08-04-2026	Socialización inicio Topacio – Santa Ana	Topacio – Santa Ana	Sin compromisos



Ilustración 1 REUNIÓN PRADERAS DEL NORTE



Ilustración 2 REUNIÓN INICIO CALUCAIMA



Ilustración 3 REUNIÓN INICIO PEDRO VILLA MARIN



Ilustración 4 SOCIALIZACIÓN CRA 5 TOPACIO- SANTA ANA

Lote 2

Para el periodo del presente informe se llevaron a cabo reuniones de socialización de inicio de obra

SOCIALIZACIÓN INICIO DE OBRA				
No.	**FECHA**	**CALLE**	**BARRIO**	**No. ASISTENTE**
1	25/03/2026	Carrera 8 entre Calles 42 y 44	Calarcá	22
2	6/04/2026	Carrera 4b Con Calle 100	Nuevo Armero	17



Ilustración 5 REUNIÓN DE INICIO NUEVO ARMERO



Ilustración 6 REUNIÓN CALARCÁ

610

ANEXO 1. ACTAS DE REUNIONES DE INICIO

3.2 Reuniones de avance de Obra.

Para el presente informe no se realizaron los espacios de socialización de avance. En ningún frente de los respectivos contratistas.

3.3 Reuniones de Finalización

Para el presente informe, no se realizaron actividades relacionadas con reuniones de finalización de obra.

lote 2

Desarrollo del Indicador
Levantamiento de Actas de Vecindad de Cierre.
((Total de Actas De Vecindad Cerradas/Total de Actas de Vecindad levantadas) X 100 CD = (0/0) *100 = 0 %

3.4 Reuniones Extraordinarias

Para el presente informe se realizaron distintas reuniones extraordinarias en distintos frentes

Lote 1

EXTERNA	FECHA	OBJETIVO DE LE REUNIÓN	TRAMO VIAL	COMPROMISOS Y TAREAS	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
x	07 DE ABRIL DE 2026	SE REALIZÓ IAREVISIÓN EN EL SECTOR DE TIERRA FIRME, YAQUE, UN USUARIO DEL SECTOR MANIFESTÓ TENER PROBLEMAS RELACIONADOS CON APARENTE INUNDACIÓN A PARTIR DEL INICIO DE LAS OBRAS	TIERRA FIRMÉ	SE EVIDENCIÓ LA NO VINCULACIÓN CON LA SITUACIÓN MENCIONADA Y SE SOLICITÓ ACOMPAÑAMIENTO DEL VACTOR PARA SUBSANAR EL HECHO	
X	25 DE ABRIL DEL 2026	SE REALIZÓ RECORRIDO CON MIEMBROS DE LA COMUNIDAD, CON EL FIN DE REVISAR CASOS PENDIENTES PARA LA ENTREGA DE LA VÍA	CEIBA NORTE B° - BB-138 -Y 140		

611

X	14 DE ABRIL DE 2026	SE NOTIFICÓ EL RETIRO DE LOS BAJANTES DE LA VIA QUE HACEN PARTE DE LA PARROQUIA ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR	SAN FRANCISCO	LOS RESPONSABLES DE LA PARROQUIA, SE COMPROMETIERON A RETIRAR Y /O REUBICAR LOS BAJANTES DE LA IGLESIA	
X	16 DE ABRIL DE 2026	SE NOTIFICÓ EL RETIRO DE LA PROLONGACIÓN DE RAMPA Y POSTERIOR RETIRO	CEIBA NORTE	SE GENERA EL COMPROMISO DEL RETIRO DE LA PROLONGACIÓN	

4. ACCIONES DIVULGATIVAS EN LOS TRAMOS DEL PROYECTO

No se presentaron actividades de divulgación en el periodo del presente informe.

4.1 Reuniones con Comité de Participación con la Comunidad

En los procesos constructivos, donde se generan impactos sociales con su respectiva ejecución, en especial cuando se habla de la utilización de recursos públicos, se debe tener la iniciativa de que las personas beneficiarias de este tipo de proyectos conozcan más acerca de los procesos constructivos vinculados a proyectos de tipo público. En ese sentido, como incentivo a la participación ciudadana, la gestión social del proyecto acogiéndose a la normatividad legal que cobija la comunidad como gendarme de procesos constructivos, promueve la conformación del comité con participación ciudadana, como escenario multiplicador de las acciones y avances propios del proyecto.

No de CPC realizadas

4.1.1 REUNIONES CON EL CPC REALIZADAS

Durante la entrega del presente informe, no se realizaron reuniones con los miembros del CPC. Por ende, se realizará el respectivo acercamiento para el mes siguiente.

612

5. PASACALLES INFORMATIVOS

Durante la entrega del presente informe se identifica que los contratistas instalaron pasacalles informativos y vallas con información propia del contrato de obra a lo largo de las vías o tramos a intervenir.





6. CULTURA Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

N/A En el periodo

7. CONTRATACIÓN Y MANO DE OBRA

Teniendo en cuenta las características del proyecto y las Leyes aplicables a vinculación del personal definido como MOC y MONC en los proyectos de infraestructura, mediante el presente programa se busca tener la relación del personal ingresado al proyecto y a su vez, establecer un proceso de vinculación para todas aquellas personas que hagan parte del AID del proyecto. Para estas acciones el programa se fundamente de la siguiente manera. Requerimiento de la vacante

Notificación al líder comunitario y/o presidente de la JAC Publicaciones en redes sociales del contratista

Apoyo del SENA y caja de compensación para la vacante

Lote 1

Con respecto a la tabla, se puede apreciar que, existe un total de 36 colaboradores que se encuentran vinculados en el proyecto

No.	CONTRATISTA/ SUBCONTRATISTA	FECHA DE INGRESO A LA OBRA	NOMBRE	CEDULA	CARGO
1	UT URBANAS IBAGUE	20/11/2025	SOFIA CHIPATECUA CUBILLOS	1005822372	ING ADM Y DE CONTROL
2	UT URBANAS IBAGUE	21/11/2025	VIDAL GONZALEZ ROMERO	93410425	AYUDANTE DE OBRA
3	UT URBANAS IBAGUE	21/11/2025	EVER JULIAN GUARNIZO	1105692748	INGENIERO RESIDENTE ADMINISTRATIVO
4	UT URBANAS IBAGUE	21/11/2025	CARLOS EDUARDO VERGARA VIDAL	14398695	AYUDANTE DE OBRA
5	UT URBANAS IBAGUE	24/11/2025	JAIR OSORIO HERRERA	1121862849	AYUDANTE DE OBRA
6	UT URBANAS IBAGUE	24/11/2025	DARWIN SLEIDER PEREZ LEZAMA	1006127576	AYUDANTE DE OBRA
7	UT URBANAS IBAGUE	27/11/2025	JUAN ESTEBAN CUBILLOS YARA	1105473971	AYUDANTE DE OBRA
8	UT URBANAS IBAGUE	27/11/2025	ALDAIR OTAVO PARRA	1007287708	AYUDANTE DE OBRA
9	UT URBANAS IBAGUE	27/11/2025	CARLOS EDUARDO SANCHEZ MONTOYA	1110551210	AYUDANTE DE OBRA
10	UT URBANAS IBAGUE	27/11/2025	DIDIER ANDRES SANDOVAL	1015995113	AYUDANTE DE OBRA
11	UT URBANAS IBAGUE	28/11/2025	FRANCISCO JOSE GUALTERO PEREZ	10234997	INSPECTOR DE OBRA
12	UT URBANAS IBAGUE	28/11/2025	DIANA PATRICIA CABEZAS HORMIGA	38142489	PROFESIONAL SST
13	UT URBANAS IBAGUE	11/12/2025	ESDEDIER ARMANDO CAPERA	1110482357	OFICIAL DE OBRA
14	UT URBANAS IBAGUE	7/01/1900	LEIDY LILIANA VIEDA CELIS	1110442850	TOPOGRAFA
15	UT URBANAS IBAGUE	11/12/2025	MAURICIO HERNAN CESPEDES	5820172	TOPOGRAFO
16	UT URBANAS IBAGUE	19/01/2025	KARLA YOLIMA RODRIGUES	1034276251	AUXILIAR ADMINISTRATIVA
17	UT URBANAS IBAGUE	19/01/2026	TATIANA ANDREA BARRAGAN MAYORGA	65631328	PROFESIONAL SST

18	UT URBANAS IBAGUE	21/01/2026	YEISON ESTIVEN TORRES	1105610325	AYUDANTE

19	UT URBANAS IBAGUE	21/01/2026	ANDERSON CAMILO OLAYA OSPINA	1006117597	AYUDANTE
20	UT URBANAS IBAGUE	19/01/2026	DANIEL FERNANDO CAPERA	5829253	TOPOGRAFO
21	UT URBANAS IBAGUE	3/02/2026	JOSE FERNANDO LABRADOR	93406754	AYUDANTE
22	UT URBANAS IBAGUE	3/02/2026	EDISON JAVIER VARGAS DIAZ	1110497680	AYUDANTE
23	UT URBANAS IBAGUE	3/02/2026	LUIS ANGEL ROJAS JULIO	93409284	AYUDANTE
24	UT URBANAS IBAGUE	3/02/2026	MARIO PIRAZAN VANEGAS	93384471	AYUDANTE
25	UT URBANAS IBAGUE	3/02/2026	NESTOR REINALDO FLOREZ MURILLO	1110578242	TOPOGRAFO
26	UT URBANAS IBAGUE	16/02/2026	JOSE GREGORIO ARIAS	14296067	AYUDANTE
27	UT URBANAS IBAGUE	16/02/2026	YONATTHAN EDUARDO CHAVEZ	80818958	AYUDANTE
28	UT URBANAS IBAGUE	21/01/2026	JHON SEBASTIAN BARON URBINA	1110547020	AYUDANTE
29	UT URBANAS IBAGUE	18/02/2026	HERNAN MAURICIO MONAK VILLAMARIN	93406983	AYUDANTE
30	UT URBANAS IBAGUE	18/02/2026	FELIX MARIA ALDANA GUZMAN	93363872	AYUDANTE
31	UT URBANAS IBAGUE	23/02/2023	JOSE NORVEY GONZALEZ CUBIDES	93384707	AYUDANTE
32	UT URBANAS IBAGUE	2/03/2026	JORGE LUIS HERNANDEZ DUQUE	1110511413	TOPOGRAFO
33	UT URBANAS IBAGUE	2/03/2016	CLAUDIA PATRICIA GAITAN BORJA	28979202	PROFESIONAL SST
34	UT URBANAS IBAGUE	3/03/2026	DIEGO JAVIER MORALES	1005713166	AYUDANTE DE OBRA

Lote 2

El periodo del presente informe, el contratista ha empleado un total de 118 empleados, un total de 109 colaboradores directos y 9 indirectos de los cuales el 34% (37 personas) corresponden a mano de obra calificada y el 66% 72 persona en mano de obra no calificada.

Personal de Obra No Calificada en el Contrato 3049 de 2025.

CONSORCIO IBAGUE VIAL URBANO 2025						
No.	**NOMBRE TRABAJADOR**	**CEDULA**	**CARGO**	**CUADRILLA**	**PROCEDENCIA**	**NOVEDAD**
1	Jhon Édison Suarez Acosta	93.237.235	Tornillero	Operativo	Ibagué	
2	José Ferney Franco	93.362.388	Rastrillero	Operativo	Ibagué	
3	Enalber Leal Moreno	14.277.878	Rastrillero	Operativo	Ibagué	
4	Miller Sánchez	5.843.584	Imprimador	Operativo	Ibagué	
5	Hugo Gallo	14.235.078	Fontanero	Operativo	Ibagué	
6	Luis Alberto Lozano Rodríguez	14.239.870	Oficial De Obra	Operativo	Ibagué	
7	Parmenio Benavidez Jiménez	18.221.491	Oficial De Obra	Operativo	Ibagué	
8	Luis Carlos Perdomo	93.359.732	Oficial de Obra	Operativo	Ibagué	Retiri Marzo
9	Rogelio Alberto Laverde	93.413.284	Ayudante De Obra	Operativo	Ibagué	
10	Ángel Alberto Cantor Valencia	93.386.227	Ayudante De Obra	Operativo	Ibagué	
11	Hernando Viedman Hurtado	76.341.553	Ayudante De Obra	Operativo	Ibagué	
12	Carlos Julio Amórtegui Ruiz	93.366.350	Ayudante De Obra	Operativo	Ibagué	
13	María Fernanda López Vergara	1.088.284.311	Ayudante De Obra	Operativo	Ibagué	
14	Jhon Steven Méndez Marulanda	1.110.577.370	Ayudante De Obra	Operativo	Ibagué	
15	Ancizar Alzate Gallego	93.409.469	Ayudante De Obra	Operativo	Ibagué	
16	Jaime Bernal Perez	93.381.630	Ayudante De Obra	Operativo	Ibagué	
17	Huberley Bocanegra Capera	1.006.150.123	Ayudante De Obra	Operativo	Ibagué	Retiro Marzo
18	Brayan Andrés Arango Arias	1.006.128.610	Ayudante De Obra	Operativo	Ibagué	
19	Ronald Stick Marulanda Vaquero	1.134.643.925	Ayudante De Obra	Operativo	Ibagué	
20	Franz De Jesús Parra Guillen	1.063.142.354	Ayudante De Obra	Operativo	Ibagué	

No.	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	CUADRILLA	PROCEDENCIA	NOVEDAD
21	Fabian Guillermo Ruiz Vaquiro	1.110.472.436	Ayudante De Obra	Operativo	Ibagué	
22	Reinaldo Flores Osorio	2.474.093	Ayudante De Obra	Operativo	Ibagué	
23	Miguel Angel Ipuz	1.110.507.241	Ayudante De Obra	Operativo	Ibagué	
24	Carlos Andres Guerreros	1.193.044.116	Ayudante De Obra	Operativo	Ibagué	
25	Steven Humberto Lozano	1.005.755.454	Ayudante De Obra	Operativo	Ibagué	
26	Olibardo Medina	93.386.448	Ayudante De Obra	Operativo	Ibagué	
27	Diego Alejandro Olmos	1.110.573.499	Ayudante De Obra	Operativo	Ibagué	
28	Johnatan Fernan Suarez	1.005.780.451	Ayudante De Obra	Operativo	Ibagué	
29	Jhon Faber Valencia	1.007.303.397	Ayudante De Obra	Operativo	Ibagué	
30	Francisco Villanueva	5994869	Ayudante De Obra	Operativo	Ibagué	
31	Orlanbdis Cabezas Bustamante	93.385.154	Ayudante De Obra	Operativo	Ibagué	
32	Aldinever Cardena	80.142.451	Ayudante De Obra	Operativo	Ibagué	
33	Fabian Mauricio Castillo	94.463.549	Ayudante De Obra	Operativo	Ibagué	
34	José Andres Pinilla	1.193.152.082	Ayudante De Obra	Operativo	Ibagué	Retiro Marzo
35	Benjamín Puentes Vanegas	14.240.101	Ayudante De Obra	Operativo	Ibagué	Retiro Marzo
36	Mateo Quiroga Echeverry	111.204.146	Ayudante De Obra	Operativo	Ibagué	
37	Fredy Perez	93.368.341	Ayudante De Obra	Operativo	Ibagué	
38	Ignacio Ramírez	14.279.510	Ayudante De Obra	Operativo	Ibagué	Retiro Marzo
39	Nelson Enrique Hegidio	14.279.510	Ayudante De Obra	Operativo	Ibagué	
40	William Alexander García	1.101.596.261	Ayudante De Obra	Operativo	Ibagué	
41	Cristhian Alberto Santos	100.457.849	Ayudante De Obra	Operativo	Ibagué	
42	Andres Felipe Sosa	93.128.630	Ayudante De Obra	Operativo	Ibagué	
43	Diego Fernando Neira	1.000.457.849	Ayudante De Obra	Operativo	Ibagué	
44	Luis Esteven Téllez López	1.005.814.348	Ayudante De Obra	Operativo	Ibagué	
45	Ivan Guillermo Fernandez	2.235.389	Ayudante De Obra	Operativo	Ibagué	
46	Crithian Felipe Campos	1.110.584.178	Ayudante De Obra	Operativo	Ibagué	Retiro Abril
47	Juan Arnoldo Rubio	2.235.389	Ayudante De Obra	Operativo	Ibagué	
48	Jean Carlos Brito	6.094.611	Ayudante De Obra	Operativo	Ibagué	Retiro Abril
49	Juan Camilo Bustos	1.110.519.712	Ayudante De Obra	Operativo	Ibagué	Retiro Abril
50	Juan Gabriel Castro	79.875.112	Ayudante De Obra	Operativo	Ibagué	
51	Widerlen Cedeño	1.117.499.765	Ayudante De Obra	Operativo	Ibagué	
52	Eder Delgado Montejo	93.386.441	Ayudante De Obra	Operativo	Ibagué	
53	Carlos Andres Hernandez	1.105.304.084	Ayudante De Obra	Operativo	Ibagué	
54	Luis Jacinto Parra	93.371.206	Ayudante De Obra	Operativo	Ibagué	
55	Daniel Estuben Sanchez	1.105.677.397	Ayudante De Obra	Operativo	Ibagué	
56	Luis Queneber Rodriguez	14.271.484	Ayudante De Obra	Operativo	Ibagué	
57	William Esteven Rojas	1.006.121.591	Ayudante De Obra	Operativo	Ibagué	

58	Ferney Romero	5.971.712	Ayudante De Obra	Operativo	Ibagué	
59	Carlos Daniel Saavedra	1.135.884.388	Ayudante De Obra	Operativo	Ibagué	
60	Carlos Ospina	93.412.164	Ayudante De Obra	Operativo	Ibagué	

PAVETOL						
No.	**NOMBRE TRABAJADOR**	**CEDULA**	**CARGO**	**CUADRILLA**	**FECHA INGRESO**	**NOVEDAD**
65	Jhon Jairo Tovar Barrios	93.456.878	Oficial	Operativo	Ibagué	
66	Leonel De Jesús Jaramillo Restrepo	93.388.662	Ayudante De Obra	Operativo	Ibagué	
67	Jordan Manuel Cardenas Herazo	1.002.194.404	Ayudante De Obra	Operativo	Ibagué	
68	José Erney Arenas Enciso	1.038.818.316	Ayudante De Obra	Operativo	Ibagué	
69	Jeferson Argumedo Tapia	1.063.161.277	Ayudante De Obra	Operativo	Ibagué	
70	Luis Fernando Rojas	1.234.639.149	Ayudante De Obra	Operativo	Ibagué	
71	Jairo Varón	1.110.472.155	Ayudante De Obra	Operativo	Ibagué	
72	Wilmer Castellanos	1.110.588.992	Ayudante De Obra	Operativo	Ibagué	
73	Rafael Pineda	1.110.552.147	Ayudante De Obra	Operativo	Ibagué	
74	Luis Rosendo Fierro	93.238.854	Ayudante De Obra	Operativo	Ibagué	
75	Camilo Andre Sosa	1.024.474.105	Ayudante De Obra	Operativo	Ibagué	
76	Luis Alejandro Ramírez Pinzón	1.110.458.069	Ayudante De Obra	Operativo	Ibagué	

OBRA CONTRATO 3049-2025	Generación De Empleo								
	CONSORCIO IBAGUE VIAL URBANO 2025								
	MANO DE OBRA CALIFICADA			MANO DE OBRA NO CALIFICADA			Reinsertados	Desplazados	Total, Empleo
	Local	Externa	Sub Total	Local	Externa	Sub total			
	37	0	37	72	0	72	0	0	109

Relación del personal en obra

OCUPACIÓN	CANTIDAD
Ingeniero Director	1
Ingeniero Residente	2
Especialista Ambiental	1
Especialista En Geotecnia	1
Especialista En Pavimentos	1

678

Profesional Social	1
Profesional Ambiental En Campo	1
Auxiliar Social	2
Profesional SST	1
Auxiliar SST	4
Inspector De Obra	3
Topógrafo	4
Operario Maquinaria	11
Conductor De Volqueta	3
Maestro De Obra	1
Tornillero	1
Rastrillero	2
Imprimador	1
Oficial	4
Ayudante De Obra	63
Fontanero	1
TOTAL	**109**

Inclusión Social Con Perspectiva De Género Y De Transversalización.

A la fecha se cuenta con 5 madres cabeza de familia quien expresa que no tiene ninguna dificultad de laborar y dar cumplimiento al horario laboral asignado, teniendo en cuenta que tiene quien cuide de sus respectivos hijos mientras la jornada laboral.

Desarrollo del Indicador
Verificación de horarios laborales flexibles y alianzas orientadas a madres y padres cabeza de familia, madres lactantes, entre otros grupos poblacionales.
Flexibilización = (Número de padres-madres cabeza de hogar incluidos en los programas de flexibilización / Número total de padres- madres cabeza de hogar del proyecto) x 100
Flexibilización = (5/5) x 100 = 100%

OTRAS ACTIVIDADES

Capacitación y Charlas. Dentro de las actividades que se desarrollan en el área social, para el periodo del presente informe se dio cumplimiento al cronograma de charlas al personal de Obra, con el objetivo de concientizar y sensibilizar al personal

619

de obra en diversos temas de interés para el proyecto, se realizó de manera constante concientización al personal de obra en temas tales como:

Capacitación

Tabla. Capacitación Social.

TEMA	FECHA	INTENSIDAD	NO. ASISTENTES
Liderazgo	16/04/2026	20 min	14
Liderazgo	09/04/2026	20 min	21
Respeto por la Comunidad	26/04/2026	20 min	20
Liderazgo	25/03/2026	20 min	26

Anexo 2. Capacitaciones

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES GESTIÓN SOCIAL LOTE 2

Contrato de Obra No. 3049 de 2025

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL DE MUNICIPIO DE IBAGUÉ LOTE 2.

CONSORCIO IBAGUE VIAL URBANO 2025

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES GESTIÓN SOCIAL

#	ACTIVIDADES	PERIODO DE EJECUCION DEL PROYECTO (MESES)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Divulgacion del directorio telefónico de consulta permanente	X	X	X	X	X	X	X	X		
2	Información sobre recepción de hojas de vida y horarios de atención a la comunidad	X	X	X	X	X					
3	Implementación del sistema atención a la comunidad		X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Recepción de hojas de vida.	X	X	X	X	X					
5	Contratación de mano de obra	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
6	Presentación consolidada de manifestaciones ciudadanas		X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	Reunión de Inicio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	Reunión de Finalización		X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	Piezas de Divulgación		X	X	X	X	X				

620

10	Levantamiento de actas de vecindad inicio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
11	Levantamiento de actas de vecindad Cierre		X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	Levantamiento de actas de compromiso		X	X	X	X	X	X	X	X	
13	Taller pedagógico Seguridad Vial				X						
14	Capacitación al personal de obra sobre cómo proceder en una eventualidad relacionada con un hallazgo arqueológico.	X				X					
15	Aplicación de procedimientos en caso de un hallazgo fortuito.										

CONCLUSIONES

- Se evidencio la ejecución de algunas de las actividades planteadas en para la gestión social del proyecto.

- Por medio de la GESTIÓN SOCIAL del proyecto, se ha logrado el relacionamiento directo con los actores sociales y las fases propias de la ejecución.
- Se promueve la continuidad de las acciones y cumplimiento de los indicadores mensuales con relación al PLAN DE GESTIÓN SOCIAL.

- Se presenta dificultad en la transitabilidad de la gran mayoría de las vías a intervenir, debido al estado de la vía acrecentando la problemática con el paso del tiempo, en época de invierno y deficiente mantenimiento de esta.

RECOMENDACIONES Y SOLICITUDES

- Según el avance constructivo del proyecto, realizando la verificación de cumplimiento se solicita a los contratistas el cumplimiento de cada de uno de lo programas y subprogramas establecidos en el PLAN de GESTIÓN SOCIAL entregados y aprobados por la interventoria.
- Se observa que hasta el periodo comprendido entre el 21 de Marzo al 20 de Abril no se observa el cumplimiento de los programas de cultura y participación comunitaria en ninguno de los contratistas se solicita a lote 1 (3048 UNION TEMPORAL URBANA IBAGUÉ), y lote 2 (3049 CONSORCIO

621

IBAGUÉ VIAL URBANO 2025) la puesta en marcha de dichos programas, evidenciando el cumplimiento y desarrollo de este.

- Dentro de las actividades propuestas por el contratista UNION TEMPORAL URBANAS IBAGUÉ, está pendiente la realización de acciones pedagógicas puntuales con la comunidad estudiantil administrativa y profesorado de los sectores propios del AID.
- CONSORCIO IBAGUÉ VIAL URBANO 2025, planteo el llevar a cabo el taller de concientización a los participantes de la comunidad, en cuanto a que es la seguridad vial, importancia de seguridad vial, puntos a tener en cuenta como conductores y como peatones. Se solicita la ejecución.
- Conformación y reunión de los CPC Durante la entrega del presente informe, no se realizaron reuniones con los miembros del CPC. Por ende, se realizará el respectivo acercamiento para el mes siguiente. (Pendiente)
- Al contratista CONSORCIO IBAGUÉ VIAL URBANO 2025 se recomienda agilizar y adelantar los procesos de cierre de actas, paz y salvo en los frentes de obra o vías culminadas.

ANEXO 1

ACTAS DE REUNIÓN DE INICIO

LOTE 1

UNION TEMPORAL URBANAS IBAGUÉ

- PRADERAS DEL NORTE
- CALUCAIMA
- VILLA MARIN- MONTECARLO
- TOPACIO - SANTA ANA

Alcaldía de IBAGUÉ	OBJETO: *EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ*	Código: UT-URB 003
		Versión: 01
UT	ACTA DE REUNIÓN	Fecha: 10-11-2025

ACTA No					
TIPO DE REUNIÓN	**INTERNA**		**EXTERNA**	X	
ÁREA RESPONSABLE:					
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:	Reunión Inicio de obra firma viaducto de Combia - Piadero del Norte				
FECHA Y HORA	**Fecha:** 24-03-2026	**Hora Inicio:**	05:30 Pm	**Hora Fin:**	

AGENDA DE LA REUNIÓN

(lista de temas a tratar)

- Presentación
- Socialización inicio de obra
- Observaciones
- Firma del acta.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

(Descripción de cada uno de los temas tratados)

Se dio inicio a la reunión con la presentación de los contratos.

La Supervisión de la obra informó que se llevará a cabo el diligenciamiento de Actas de vecindad, por parte del contratista e interventoría del proyecto, esto, con el fin de adelantar toda la fase preconstructiva.

En ese sentido, se informó que se realizará la intervención inicial en la Cra 13 A entre Calles 121 y 122. lugar, en el cual ya se realizaron actas de vecindad iniciales, por otro lado se levantaron las actas de vecindad en la Cra 15 entre calles 120 y 122.

Se informó que es necesario tener paciencia para todas las fases del proceso constructivo, debido a las posibles afectaciones a partir del proceso constructivo.

Por otro lado, se dejó claro que, el alcance del contrato inicia la construcción de estructura de vía, igual de material asfáltico y pavimentación según sea el caso.

Powered by CamScanner

625

Se deja claro que en este sector no se permitirá el ingreso vehicular durante las actividades constructivas. Por, cada deben gestionar los parqueaderos de su automotor durante las actividades constructivas)

Por otro lado, es necesario retirar los bolardos que se encuentran distribuidos hacia la vía. Por otro lado las excavaciones localizadas se harán en concreto (la zona puntual afectada).

La construcción de vig es en asfalto-Cra 13 entre calles 12a y 12 predios del norte.

Por ningún motivo se podrán dejar puntos para peatonales o intervenciones de la vía, una vez se finalice la obra.

626

Powered by CamScanner

Alcaldía de IBAGUÉ	OBJETO: *EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ*	Código: UT-URB 003
UT		Versión: 01
	ACTA DE REUNIÓN	Fecha: 10-11-2025

COMPROMISOS Y TAREAS		
COMPROMISO	RESPONSABLE Y CARGO	FECHA ENTREGA

APROBACIÓN DEL ACTA			
NOMBRE Y APELLIDOS	ENTIDAD Y/O DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA
Jenny Adriana Aljach	Comunidad	Comunidad	Jenny Aljach
Fredy A. Pinzón	Interventoría	Director operativo	
Francisco J. Gratten	UTURBANA	ING.	
Laura M. España R.	Interventoría	Social	Laura M. España R

ASISTENTES A LA REUNIÓN.

Los asistentes a la reunión se encuentran registrados en el formato "Registro de Asistencia". UT-URB-004

627

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Asfaltemos	#SOMOS LA SUMA DE NUESTROS TALENTOS	RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL - RSE	CODIGO	RSE-002
		REGISTRO DE ASISTENCIA	VERSIÓN	001
			FECHA	28/02/2023

Fecha: Hora: Lugar:

Objeto/Tema: Citado Convoca: (Área y Cargo):

NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ENTIDAD/ EMPRESA/ DEPENDENCIA	CARGO/ ACTIVIDAD ECONOMICA	DIRECCIÓN ELECTRÓNICA - FÍSICA O SECTOR	TELÉFONO	FIRMA
Yolanda Patiño	28.632.391			Mz P casa 5 Praderas del Norte	320 8166683	
Mayra Castillon	1.110.524.031			Praderas del Norte Mz I casa 200 pvo	3204814441	
Andres Aguilar	73413874			Mz I casa 17 Praderas del Norte.	3208116334	
Ariela Cardona	52.496.053			Mz J casa 7. Praderas del Norte	3112769301	
Luz Mary Bicerra	28788035			Mz L c8 Praderas del Norte	3169365479	
Deivanyo Francisco	5831034			Mz O casa 1 Praderas	3103246792	Orlando
Roger Angulo T.	11343978			Mz I casa 9.	3124544	
Asmilly García H	65754509			Mz I casa 18	3203653985	Asmilly
Stella Perez	65700716			Mz 8 c.2 Praderas del Norte	3103234233	
Dora Moreno O.	41428268			Mz. J. casa # 10 Praderas del Norte	3118998318	

68

Powered by CamScanner

Asfaltemos	#SOMOS LA ZONA DE NUESTROS TALENTOS	RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL - RSE	CODIGO	RSE-FOR
		PROYECTO	REGISTRO DE ASISTENCIA	VERSIÓN	001
				FECHA	23/08/2023

Fecha: Hora: Lugar:

Objeto/Tema: Quién Convoca, (Área y Cargo):

NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ENTIDAD/ EMPRESA/ DEPENDENCIA	CARGO/ ACTIVIDAD ECONOMICA	DIRECCIÓN ELECTRÓNICA - FÍSICA O SECTOR	TELÉFONO	FIRMA
Maria Bachiller Castaño	23935932				3144307715	
Maria Teresa Flores	28551354				3103130158	
Olivia Hernandez M	30308739				3178208873	
Ruperto Sustaita	2874401				3212674172	
Ingrid Montañez	21950915				3114944846	
Luis Diego Orozco	28976193				3125337552	
[illegible]	5814610				3243741684	
[illegible]	5966123				3114944846	
[illegible]	1117916				3128405731	
Henry Romero G	5178452			M2 B 06 Praderas del Norte	3183954776	
[illegible]	1693199			Mza A casa 13 Praderas del Norte	3142946974	

629

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE IBAGUÉ	OBJETO: ASISTENCIA A PROCESOS LICITATORIOS DE OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ	CÓDIGO	GT-FOR-004
		VERSIÓN	001
	FORMATO: REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA	03/01/2025

Fecha: Hora: Lugar: DIRECCIÓN

Objetivo/Tema:

NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ENTIDAD/ EMPRESA/ DEPENDENCIA	CARGO/ ACTIVIDAD ECONOMICA	DIRECCIÓN	TELÉFONO/EXT.	FIRMA
Virginia Gutiérrez	5.861115			Manzana I Casa 17 Praderas del norte		
Nestor Rincon C.	93.397866			Praderas del norte. MZ I Casa 17		
Regino Cortazar S.	14205122	Gobernación del Tolima	Pensionado	Manzana P Casa 3 Praderas del Norte		
Nohemy Guitombo	38284531		Ama de casa	Manzana P Casa 3 Praderas del Norte		
Ruth Stella Galicia	28536168		Pensionada	Manzana P casa 7 Praderas del Norte	2767646	
Claudia Méndez	65501008		Ama de Casa	Manzana P casa 15 Praderas del Norte	3166947072	
Jaime Castaño C.	12.107.839			Mz P casa 12 Praderas del Norte	3183457766	
Leonicelda Bonilla	40941153			Manzana K casa 14	3133761449	
EFRAIN PACHON O	19219413		PENSIONADO	Manzana T Casa 17	3173463230	
Blanca Nelly Correa	38230498		HOGAR	M20 Casa 2	3125213412	

630

Alcaldía de IBAGUÉ	OBJETO: *EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ*	Código: UT-URB 003
UT		Versión: 01
	ACTA DE REUNIÓN	Fecha: 10-11-2025

LUGAR DE INCIDENCIA	**TRAMO Y/O SECTOR:**	Calucaima			
TIPO DE REUNIÓN	**INTERNA**		**EXTERNA**	X	
ÁREA RESPONSABLE:	Social				
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:	Reunión de Inicio de obra tramo vial Calucaima				
FECHA Y HORA	**Fecha:** 7-04-26	**Inicio:**		**Fin:**	

AGENDA DE LA REUNIÓN
(lista de temas a tratar)

x Presentación
x Reunión Inicio de Obra
x Presupuesto
x Puesta del acta.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
(Descripción de cada uno de los temas tratados)

Se dio inicio a la reunión con los asistentes a la Socialica con comunidad, contratista, Supervisión de Obra, Usuarios y comunidad en general del Tramo vial de Calucaima

En ese sentido, El Secretario de Infraestructura informó acerca de las estrategias de la Administración Municipal referente a los mejoras viales por otro lado se dio a conocer los parametros para la recuperación de zonas afectadas por las obras, las cuales se harán en concreto. Adicionalmente, se solicito el retiro de los bajantes que se encuentren dentro del area de intervención.

Por otro lado, se habló acerca de los ramps y su retiro mediante de hidrocabureo, instalación de reductores y señalización que, puedan comprometer los garantías del proyecto final.

A su vez, se solicitó la necesidad de hablar directamente con los funcionarios para no generar falsas expectativas

Powered by CamScanner

631

la Comunidad Solicita que se revisen las redes hidrosanitarias, debido a que en dicho sector se obstruyen. Por otro lado se evalúe la posibilidad de instalar algunos dispositivos para dicho manejo.

Por otro lado, se hizo énfasis en los anchos de vía y el tipo de materiales para la ejecución de la obra; esto teniendo como instalación de señalética gráfica. Por ende, se remite por parte de la entidad el documento de aval para la realización de la vía, teniendo en cuenta los perfiles viales.

Teniendo en cuenta lo descrito se informa que se llevará a cabo la actividad en la segunda y tercera semana del mes de abril.

La comunidad manifiesta que se evalúe por su parte los ajustes de sus predios con el fin de que se puedan articular los temas de rasante y pavimento vial. De igual manera que, estos deberán ser ajenos al objeto contractual.

Por su parte, se hizo lectura del acta de Perfil vial por parte del área jurídica y se procedió a diligenciar dicho documento y como medio de aceptación del mismo.

Powered by CamScanner

632

Alcaldía de IBAGUÉ	OBJETO: *EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ*	Código: UT-URB 003
UT		Versión: 01
	ACTA DE REUNIÓN	Fecha: 10-11-2025

COMPROMISOS Y TAREAS

COMPROMISO	RESPONSABLE Y CARGO	FECHA ENTREGA
los descritos en el presente documento.		
Lazvelia Murillo B	Social	N/A
Alba Libia Rocu	41101893	
Chiquinquira Alvarado	3897/021	cdi V
	2P. Ing Sol.	

APROBACIÓN DEL ACTA

NOMBRE Y APELLIDOS	ENTIDAD Y/O DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA
Tomás Cardona	Interventoría	Ingeniero	
Andrea Maria	Contratista	Director de	
[illegible]	Sec. Infraestructura	Secretario	
Paula Vaquino Sarmiento	Sec Infraestructura	Contratista	
Marian Angel	SST - Interv	SST	

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Los asistentes a la reunión se encuentran registrados en el formato "Registro de Asistencia", UT-URB-004

633

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Asfaltemos	#SOMOS L.A. DIVINA NUESTROS TALENTOS	RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL - RSE		CÓDIGO	RSE-002
				VERSIÓN	001
		FORMATO	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA	15/05/2023

Fecha:	Hora:	Lugar:
Objeto/Tema:		Quién Convoca, (Área y Cargo):

NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ENTIDAD/ EMPRESA/ DEPENDENCIA	CARGO/ ACTIVIDAD ECONOMICA	DIRECCIÓN ELECTRÓNICA - FÍSICA O SECTOR	TELÉFONO	FIRMA
William Flores S.	14296562				3022617277	
Anselmo A	1420664				3232476806	
Luis Mariano Dorado	5831710				3212778115	Luis D.
Esperanza Guzman	28556297				3108156826	Esperanza
Shirley Roo	65776998				3132026597	
Cecilia Vera	65465002				3223416616	Cecilia Vera
	3819132				3016913433	
	6576680				3038 7203	
Ruth fonseca C	51746847				3204886886	
Marta Isabel lop	51765030				3106172167	Marta Lop

63A

Powered by CamScanner

Asfaltemos	SOMOS LA CLAVE NUESTROS TALENTOS	RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL - RSE	CODIGO	FOR-RSE
		FORMATO: REGISTRO DE ASISTENCIA	VERSION	001
			FECHA	13/08/2025

Fecha:
Objetivo/Tema:
Hora:
Lugar:
Dirección (Carrera, Área y Cargo):

NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ENTIDAD/ EMPRESA/ DEPENDENCIA	CARGO/ ACTIVIDAD ECONOMICA	DIRECCIÓN ELECTRÓNICA - FÍSICA O SECTOR	TELÉFONO	FIRMA
Deiderwin Tordo	6022213					
Yuver Jose	55146 87					
Luis Abella	12133056					Abella
Maria Jimenez	65729388					
Yasmin Carmona	65736284					
Diana Bibiana	38715059					
Yancth Gonzalez	65730655				3173340757	
Yuver	65751156				3114 3726	
Diana Carmona	1110541424				3188 16951	Diana Carmona
Yorgafang Mena	38236148				3203118493	

635

Powered by CamScanner

Asfallemos	#SOMOS LA SUMA DE NUESTROS TALENTOS	RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL - RSE		CODIGO	RSE-002
				VERSION	001
		FORMATO	REGISTRO DE AUSTENCIA	FECHA	28/04/2025

Fecha: 07-04-2026 Hora: Lugar:

Objeto/Tema: Quién Convoca, (Área y Cargo):

NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ENTIDAD/ EMPRESA/ DEPENDENCIA	CARGO/ ACTIVIDAD ECONOMICA	DIRECCIÓN ELECTRÓNICA - FÍSICA O SECTOR	TELÉFONO	FIRMA
Ivet estela Becerra	65738339	Leonardo 376			3016933483	
Alba Libia Ruiz	38971021	2348653			3118568581	
Ricardo soto H	93356558	luis y duvan			3125777744	
alberto avila	6013051				317642 8431	
IVAN carrillo	6342869				3015577764	
Luis miguel Vel Tran					3205 370 69	
	6783950				32929 57880	
Alexander Alcinieg a	93393515				3116100593	
Elquidevio urrego	93340666	2235781			3219085867	
Luz mery Cortes	28937606				3105383728	

636

Powered by CamScanner

Asfaltemos	SOMOS LA DIFERENCIA NUESTROS TALENTOS	RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL - RSE	CODIGO	RSE-002
			VERSION	001
	FORMATO	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA	14/06/2023

Fecha: Hora: Lugar:

Objetivo/Tema: Quién Convoca, (Área y Cargo):

NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ENTIDAD/ EMPRESA/ DEPENDENCIA	CARGO/ ACTIVIDAD ECONOMICA	DIRECCIÓN ELECTRÓNICA - FÍSICA O SECTOR	TELÉFONO	FIRMA
Rosabel Guerra	2856589				3232477	Rosa
Albalvi Vergara	45743078				3108862	
Consuelo Lopez	51994354				3143205335	
[illegible]	31432846				3114234669	
Luz marina Imbachi	65496951				3188804	Luz marina Imbachi
Diego garcia Gra	9779533				315	Diego
Fanny Barragán	28567128				3202741285	Fanny Barragán
Luz mary Suarez	38263953				3163232985	Luz mary Suarez
Jurelvis	14.240.813				3124760	Jurelvis
Odenicho rastro	9538/205				3208394664	Odenicho rastros

637

Alcaldía de IBAGUÉ	OBJETO: *EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ*	**Código:** UT-URB 003
		Versión: 01
	ACTA DE REUNIÓN	**Fecha:** 10-11-2025

LUGAR DE INCIDENCIA	**TRAMO Y/O SECTOR:** Villacarán - Mercado				
TIPO DE REUNIÓN	**INTERNA**		**EXTERNA**	X	
ÁREA RESPONSABLE:	Técnico - Social				
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:	Reunión Inicio de Obra - Villacarán - Mercado				
FECHA Y HORA	**Fecha:** 11-04-26	**Inicio:**	04:30	**Fin:**	

AGENDA DE LA REUNIÓN
(lista de temas a tratar)

- Presentación
- Reunión Inicio
- Desarrollo,
- Firma.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
(Descripción de cada uno de los temas tratados)

Presentación.

Se dio inicio a la reunión con la presentación de los asistentes.

La Supervisión del contrato tomó la palabra e informó los avances a nivel general en lo que respecta a la infraestructura local y la distribución de las zonas que a la fecha se llevan a cabo.

Así respecto a la situación del día existente se determinó que corra un poco el tiempo de la vía para el cumplimiento de las obras. A su vez las rehabilitaciones viales, quedan como documentación durante las actividades de la intervención en la Avenida.

Las actividades constructivas se proyectan para final, de mes, iniciando la segunda y tercera semana del mes de mayo por tal motivo se solicita que durante la intervención no ingresen vehículos al área de intervención.

Powered by CamScanner

638

se iniciará coincidiendo con los redes existentes con el fin de dar manejo a los escombros.

la vía, se realizará en cuanto a la capacidad para tomar de la vía soporte vehículos pesados (carro de la basura). No obstante se evaluará la situación con el fin de contribuir al desarrollo de la vía enfocado en los alcances contractuales.

Con respecto a los ramps y cunetas de la vía se enfatiza en la no intervención ni manipulación de la vía pavimentada. A su vez para la gestión de cuevas accesibilidad, deben hacerlo previo a la V intervención.

Teniendo en cuenta el inicio de las actividades, se realizará instalación de cerramiento y reposición de escombros se harán en conjunto.

Powered by CamScanner

639

Alcaldía de IBAGUÉ	OBJETO: *EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ*	Código: UT-URB 003
		Versión: 01
	ACTA DE REUNIÓN	Fecha: 10-11-2025

COMPROMISOS Y TAREAS		
COMPROMISO	**RESPONSABLE Y CARGO**	**FECHA ENTREGA**
los descritos en el presente documento	General	General

APROBACIÓN DEL ACTA			
NOMBRE Y APELLIDOS	**ENTIDAD Y/O DEPENDENCIA**	**CARGO**	**FIRMA**
Anderson Vivas	Contratista	Director de Obra	
Fredy Andres Ramos	Interventoría	Director de Obra	
Karina Ramirez Leal	Contratista	Coordinador SST	
Tomás Cardona	Interventoría	Ingeniero	
Mariana Mora	Interventoría	SST	

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Los asistentes a la reunión se encuentran registrados en el formato "Registro de Asistencia", UT-URB-004

640

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE IBAGUÉ

OBJETO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL COMPLEMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ

FORMATO | REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO | VERSIÓN | FECHA

Fecha: | Hora: | Lugar:

Obra/Proyecto: | DIRECCIÓN:

NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ENTIDAD/ EMPRESA/ DEPENDENCIA	CARGO/ ACTIVIDAD ECONOMICA	DIRECCIÓN	TELÉFONO/EXT	FIRMA
Hayby campo	52345172		Comerciante	KR 0 casa 40 Urb Fuente Salado	3123000169	
Dora Lige Justinico	38927519		Independ.	Calle 131 #17-80	3176059180	
Helen Ros	41965331		Independ	Cl 151 #19-41	3102395205	
Astrid Castellanos	27686765		Independiente	calle 129 H 9-59	3115217900	
Edilma orquela	38222307		Independiente	calle 129 #14-19		
Edwis pelonio P	74.296.987	UNP	Escolta	KR 2 casa 37	3756768086	
Roberto	1006729514		Electricista	Cll 151 #11 - 44	3148906347	
Guimaneso.	65741562		Comunidad	calle 151 # 14-41	3196640737	
Graciela Acosta	65585650		Comunidad	Calle 151 # 14-62	3166402075	
Esperanza Oviedo	65.741675		Comunidad	calle 151 #19-44 Montecarlo	3007043180	

Powered by CamScanner

69

Alcaldía de IBAGUÉ	OBJETO: *EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ*	Código: UT-UR8 003
		Versión: 01
	ACTA DE REUNIÓN	Fecha: 10-11-2025

LUGAR DE INCIDENCIA	**TRAMO Y/O SECTOR:** Cra 5 Sector Topacio			
TIPO DE REUNIÓN	**INTERNA**		**EXTERNA**	X
ÁREA RESPONSABLE:	Técnica - Social			
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:	Socialización inicio actividades			
FECHA Y HORA	**Fecha:** 3/09/26	**Inicio:** 10:00 am	**Fin:**	

AGENDA DE LA REUNIÓN

(lista de temas a tratar)

- x Presentación
- x Socialización inicio actividades
- x Exposición PMT
- x Firma de acta.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

(Descripción de cada uno de los temas tratados)

Se hizo Socialización de inicio de las actividades de rehabilitación de la vía en la Cra 5 entre Separadora Topacio y conjunto cerrado Camino del bosque con el fin de llegar en concertación los pasos del proceso con fluidez.

Para tal fin, se presentó Plano de PMT mostrando los cierres viales y los sitios dispuestos a intervenir. Dichas actividades iniciaran el trayecto de abril del 2026 si las condiciones climáticas lo permiten. Adicionalmente, se informa que las actividades duran aprox 1 mes en los cuales se maneja tráfico a un carril utilizando señalización y control de tipo manual.

Posterior de lo expuesto se diligencia la firma de los asistentes y contacto de los cuales se hizo el proceso de socialización.

642

Powered by CamScanner

Alcaldía de IBAGUÉ	**OBJETO:** *EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ*	**Código:** UT-URB 003
UT		**Versión:** 01
	ACTA DE REUNIÓN	**Fecha:** 10-11-2025

COMPROMISOS Y TAREAS		
COMPROMISO	**RESPONSABLE Y CARGO**	**FECHA ENTREGA**
la ocupación de las comunidades con actividades recreativas.	UT URB	
El respeto por la zona hidráulica dispuesta para las actividades de obra	comunidad	
Conjunto Comercial del Bosque.		
Alba Calderón: 3184813487		

APROBACIÓN DEL ACTA			
NOMBRE Y APELLIDOS	**ENTIDAD Y/O DEPENDENCIA**	**CARGO**	**FIRMA**
Luis Esperanza Ruiz Cajicedo	Contadores y Traductores SA	Almacenista	
Yuren Wilson Melego.	Pinturas Espra	Administradora.	Yuren Wilson M. 3178601963
OMAR RIVERA	Nomun Fitness	coach	
Claudia Barrios F.	JAC	Presidenta.	
Conjunto Comercial	Conjunto Comercial del Bosque	Administración Conjunto Comercial	
Nora Isabel Gomez	JAC Tapacio	Presidenta	Nora Isabel G. 3168699
10 ABR 2026 Jhon Reyes.	DSEC14	Coor. Piso	10 ABR 2026 3202541060

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Los asistentes a la reunión se encuentran registrados en el formato "Registro de Asistencia", UT-URB-004

643

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

LOTE 2

CONSORCIO IBAGUÉ VIAL URBANO 2025

- CALARCÁ
- NUEVO ARMERO

Alcaldía de IBAGUÉ	Proceso: GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
		Versión: 01	
ONSORCIO IBAGUE IAL URBANO 2025	FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	Fecha: 2014/12/19	
		Página: Página 1 de1	

ACTA DE REUNIÓN OPERATIVA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

FECHA: 25 Marzo 2026

HORA: 5:50 pm

LUGAR: Barrio Calarca

ASISTENTES		
NOMBRE:	BARRIO / ENTIDAD:	FIRMA:
Fredy Andrey Rincon	Sec infraestructura	
Miguel Tobar	Interventoria	
Daniel Guzman	Contratista	

INVITADOS: - Comunidad general a intervenir
- Sec Infraestructura
- Contratista
- Interventoria

ORDEN DEL DÍA:
1. registro de asistencia 2. Presentacion del proyecto a intervenir 3. presentacion del contratista y su equipo profesional y tipo de pavimentacion 4. Espacio para preguntas

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

Powered by CamScanner

646

Alcaldía de IBAGUÉ	Proceso: GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
		Versión: 01	
ISORCIO IBAGUE L URBANO 2025	FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	Fecha: 2014/12/19	
		Página: Página 2 de1	

DESARROLLO:

Se dió inicio a la Socialización siendo las 5: 50 pm por parte de la Secretaria de Infraestructura del ing. Freddy Rincon director operativo, de la Cordial Saludo - Recuerda que no hay buena Comunidad ya que se da información necesaria, para que la Comunidad esté por entrada, todo el proceso que se lleva acabo. Recuerda que la vía estaban cerrada Explica que esto no se puede hacer sin algún ente Competente

Gracias a la alcaldesa en su Programa Cercanía a la vía; intervención que ayuda a reparar Nuestra Malla Vial, obra en el Cambo 3x1 que es la reposición de Acueducto, alcantarillado y pavimentación como se está haciendo Llamas en este Sector.

Teniendo en cuenta que estas barrios tienen muchos años, que las redes hidrosanitarias estan practicamente Colapsadas por el tiempo, colapsan y no dan la Capacidad por toda la duración por todas sus Etapas. Para poder cambiar toda las redes a demasiada inversión y deben ser estas gradualmente. Por eso son importantes estas estrategias.

Adicionalmente como Secretaria se ha intervenido varios tramos con sus respectivas intervenciones como la ambulancia vial con el SETP, con proyectos de inversión, siguientes e importantes para la ciudad.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

Powered by CamScanner

647

esta via ha sido previsto el contratista el ing ricardo ortegoza, toda, 2, esto se aprovechan cada contratista. y que se le deje la orden a el y a interventoria para hacer la verificacion de la ejecucion de la via, fotografia, actas de vecindad todas las documentos de estas vias estan al dia.

a partir de Mañana se haran las actas de vecindad para verificar el estado de las viviendas antes de entrar maquinaria a hacer el registro fotografico interno y externo. Cada persona estara identificada con chalecos Naranjas Contratista, verde interventoria, y los inspectores chaleco color café.

Mañana se hara el señalamiento permanente de las vehiculos hay que ser retirados.

Esta via será intervenido en concreto, unas placas que se deben fraguar en 28 dias sin total movilidad dentro de la via, para su total garantia y duracion y esto depende de la comunidad. los sumideros que estan en las vias seran retirados. los andenes seran ejecutado en concreto, ya que es espacio publico los bajantes, la comunidad debe hacer su respectiva adecuacion por parte de los propietarios, ya que esta dentro la via. para poder alumbrar con todos los clavos

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

Powered by CamScanner

Se hara demarcacion vial sera horizontal, 28 dias despues de pavimentado.

Se hace la recomendacion que en la via no se puede quemar rozar ya que estas pueden dañar la via, ningun mantenimiento de vehiculo debera. Respetar el cerramiento sobre todo los niños personas de 3 edad y mascotas, sobre todo las motos ya que esto puede hacer peligrar la obra.

Los basuros son sacados en los esquinas, se da espacio a la comunidad para preguntas, se hacen su respectiva aclaracion y se da cierre a la reunion siendo las 6:24 pm.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

Powered by CamScanner

649

COMPROMISO

TEMA	COMPROMISO ADQUIRIDO	RESPONDABLE
Cerramato Perimetral		contratista
adecuación de bajantes		Comunidad
Reposición de Andenes a Concreto		Contratista

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

Powered by CamScanner

650

Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	FOR-08-PRO-SIG-03
		Versión: 03
CONSORCIO IBAGUE VIAL URBANO 2025	FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA	Fecha: 2019/04/25
		Página: 1 de 1

TEMA DE REUNION	Socialización Inicio de obra. Cra 8a entre calles 42 y 44				SECRETARIA	Infraestructura	
FECHA	25/03/2026	HORA DE INICIO	5:50 pm	HORA FINALIZACION	6:30 pm	LUGAR	Bl Cabrera

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA Direccion	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	Martha Rodriguez	Comunidad	Cra 8ª 41-33.		3124034458	
2	Luz Elena Chacon	" "	CRA 8A. 41-32		3124145633	
3	Edna Amado Vargas	Comunidad	Cra 8ª # 41-65		3106734064	
4	Casa Cra 6 11	Comunidad	CR 8a # 41 65		3058811456	Casa 6.1
5	Diana Yoana	Comunidad.	Cra 8 Calle 42		3114750618	Diana Yoana
6	Flor Alba Salinas	Comunidad	cra 8 calle 42		3136812640	Flor Salinas
7	Alba Luz Correa	Comunidad	cra 8 Calle 42		3125330092	
8	Luz Mariny Ardila	Comunidad	Cra 10 # 41-52		3202630036	
9	Guillermo Ortiz	Comunidad	Cra 10ª # 41-52		3134063625	Guillermo
10	Jose Mendoza	Comunidad	CARRERA 10A		3132642610	Jose Mendoza
11						
12						
13	Fernando Calderón	Comunidad	Cra 8ª # 41-31 Cabrera.		3212626703	
14	William Santos	comunidad	CRA 8 # 41-81	William.Santos81@hotmail.com	3202338537	
15	Consejo Comunal	Comunidad				

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma ISOLUCION por lo tanto es responsabilidad de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

Powered by CamScanner

Ibagué NIT 800113389-7	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	FOR-08-PRO-SIG-03 Versión: 03
CONSORCIO IBAGUE VIAL URBANO 2025	FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA	Fecha: 2019/04/25 Página: 1 de 1

TEMA DE REUNION	Socialización Inicio de Obra Cra 8a entre calles 42 y 44				SECRETARIA	Infraestructura	
FECHA	25/03/2026	HORA DE INICIO	5:50pm	HORA FINALIZACION	6:30 pm	LUGAR	Calarca

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
16	Ana Maria Vasquez	Comunidad.	Secretario J.A.C.	jacocalarca@gmail.com	316 6393828	
17	Luisa Lozano P.	Aux Social	contratista			Luisa Fame.
18	Angela Vanessa	Pro. Ambiental-Soal	Contratista		3124458309	
19	Francisco Melo D.				3168249993	
20	Jose Hernan Rios	Esp Infraestructura			3158950077	
21	Yolanda Heredia	Comunidad.			3138920476	Yolanda H.
22	William Garcia.	Comunidad.			320-7734712	

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI por lo tanto la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

Powered by CamScanner

Alcaldía de IBAGUÉ	Proceso: GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
		Versión: 01	
ISORCIO IBAGUE L URBANO 2025	FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	Fecha: 2014/12/19	
		Página: Página 1 de1	

ACTA DE REUNIÓN OPERATIVA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

FECHA: 06 abril 2026

HORA: 5:00 pm

LUGAR: Nuevo Armero

ASISTENTES		
NOMBRE:	BARRIO / ENTIDAD:	FIRMA:
Fredy Andres Rincon	Sec infraestructura	
Daniel Guzman.	Contratista	
Anderson Nieves	interventoria	Anderson Nieves.

INVITADOS: - Comunidad General a intervenir
- Sec infraestructura
- Contratista
- Interventoria

ORDEN DEL DÍA:
1. Registro de asistencia 2. Presentación del proyecto sec infraestructura 3. Presentación del Contratista 4. Explicación proyectos comunidad

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

Powered by CamScanner

Alcaldía de IBAGUÉ	Proceso: GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
		Versión: 01	
NSORCIO IBAGUE AL URBANO 2025	FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	Fecha: 2014/12/19	
		Página: Página 4 de 1	

Se da inicio a la reunión siendo las 6:00pm por parte del IDC de infraestructura el director operativo ing Andy Andres Rincon, quien manifiesta su interés del contrato en los 200 barrios de la ciudad de Ibague. Handa en cordial saludo de la alcaldesa Johana Arcade y el secretario de infraestructura Harry Mathews por medio de diferentes estrategias como declarita a la via. la idea es poder dar ese reconocimiento a los lugares que lo necesitan.

este contrato establece que el Ibal hija y respectiva interventoria y esta con su identificación sin embargo se hará la reunión hija presidencia a la ing lucy y Pedro, interventoria con de Chaleco verde quienes nos harán la vereda el ing Andres nigal y la secretaria y las del Chaleco naranja por parte del contratista.

el día de mañana se realizara las actas de vecindad por parte del contratista en acompañamiento de ambas fotografías internas y externas con el fin de verificar el estado de la vivienda y si se presenta algún daño debido a la maquinaria

Esta via tiene una duración aprox. de 7 meses. iniciando en cuanto el frente clima y que la comunidad este con sus cerramientos.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

Powered by CamScanner

Esta vía será totalmente cerrada por medio de una peliscabra, empezando a anden y su respectiva fundición en concreto.

Importante respetar el fraguado del concreto que serán 28 días, ya que la vía será obstruida respetar irá las será arreglada sin hacer quemas semaforos, ligeritos cargados, porque esto puede afectar la vía.

Importante hablar con los personal encargados de chatarra y cerco blanco, que se quieren tomar la información cuadren con los ayudantes no, ya que no tienen la información pertinente.

Se solicita a la comunidad que los obstáculos puedan para que la Maquina pueda trabajar bien. Hacer la adecuación de las bajadas, ya que están dañadas las vías.

El Ing Anderson por parte de interventoría hizo intervención que es importante aclarar si la vía presenta alguna necesidad como instalaciones, daños de las viviendas debido a los trabajos para tener ya conocimiento; para darle un buen manejo

El Ing Freddy Rincon enfatizó si se presenta alguna necesidad en las entradas se hace su reposición en concreto, ya que esto es espacio público.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

Powered by CamScanner

las rampas de Acceso que estan en la via se han retirado, sin la nueva construccion su ubicacion debe ser del centro hacia afuera de la via, los reductores se tienen directamente con movilidad

Se da espacio para que la Comunidad despeje dudas, preguntas e inquietudes

Se da finalizacion a la reunion siendo las 7:30pm

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

Powered by CamScanner

COMPROMISO

TEMA	COMPROMISO ADQUIRIDO	RESPONDABLE
Cerramiento Perimetral	C	Contratista
Adecuación de los baños		Comunidad
Reposición en Andenes en Concreto		Contratista

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

Powered by CamScanner

Alcaldía Municipal Ibagué NIT 800113389-7	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	FOR-08-PRO-SIG-03 Versión: 03 Fecha: 2019/04/25 Página: 1 de 1
CONSORCIO IBAGUE VIAL URBANO 2025	FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA	

TEMA DE REUNION	Socializacion inicio de obra Bomo Nuevo Amanecer			SECRETARIA	Infraestructura		
FECHA	06 abril 2026	HORA DE INICIO	5:00 Pm	HORA FINALIZACION		LUGAR	NUEVO AMANECER

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	Jose Rafael Tellez		M-1 Casa 4	—	3112132479	
2	Claudia Murillo	Secretaria	Mz 69 Ic14.		3205647075	
3	Luz Mary Rodriguez A		Mz casa 78		3182929869	
4	Bernardo Perdomo		M-1.C10		3045573013	
5	Jermel Casco N		M-2C9		3132804113	
6	Yenny Tellez		M1C3		3212152417	
7	Omaira Quevedo A.		M2 C7		3205124786	
8	Marleny Quintero		M2 C9	mary.octubre.18@gmail.com	3205124786	
9	Jaime Ortiz P		M2-3 C9		3155933830	
10	Raul Lopez Ramirez	Vice	M2C6		3167720208	
11	Yarlla Cristina Cañizales		Mz 3 casa 6	wattana1@hotmail.com	3158839682	
12	Jesus Cuellar	"	"	"	3112515447	
13	Jhonatan Patiño S.		M4-CA 9	jhonatanpatiño96@gmail.com	3125644337	
14	Yesid Montaño M		M3 f4	Yesidmontano01	3204793734	
15	Pilar Castellanos Dena		Mz 1 Cra 12	Pilar.castellanos@gmail.com	3144259794	

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

658

Powered by CamScanner

Ibagué NIT 800113389-7	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	FOR-08-PRO-SIG-03 Versión: 03 Fecha: 2019/04/25 Página: 1 de 1
CONSORCIO IBAGUE VIAL URBANO 2025	FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA	

TEMA DE REUNION	Socialización inicio de obra Avenida Carrera 5				SECRETARIA		
FECHA	06 abril 2019	HORA DE INICIO	5:00pm	HORA FINALIZACION		LUGAR	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
16	Leonardo Cardozo	Mz3 Casa 5		Carleo79@hotmail.com	3112196188	
17	Alvaro Bohorquez				3125777704	

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

159

Powered by CamScanner

ANEXO 2

ASISTENCIA CAPACITACIONES

CONSORCIO IBAGUE VIAL URBANO 2025	REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA 16/09/2025 DURACION: 40 FACILITADOR: Angela Vanegas

TEMA (S) Energias Renovables.
Liderazgo

PROYECTO: Cto 304/2025 AREA: Ambiental - Social

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Juan Guillermo Fernandez Ramos	Ayudante	1026259460	
2	Fredy Perez Obregon	Oficial	93368341	
3	Nelson Heraldo	AyU	1399132-0	Nelson
4	Andres Felipe Sala	AY	1004157841	
5	Juan Arnoldo Ruiz	auxiliar	2235789	
6	Walter Arroyo Echeverri	Ayudante	98170146	
7	Diego Alexander Rodriguez	Operador	1110573403	
8	Steven Lozano Campos	TOPOGRAFO	1005355454	Steven Lozano
9	Yenifer Sanchez	HSE Sst	1110508784	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Capacitador:

NOMBRE: Angela Vanegas FIRMA:

Powered by CamScanner

CONSORCIO IBAGUÉ VIAL URBANO 2025	REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA 16/09/2026 DURACION: 40 min FACILITADOR: Angela Vanegas

TEMA (S) Energias Renovables

Liderazgo.

PROYECTO: Cto 3049/2025 AREA: Ambiental - Social

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Sebastian Gonzalez S	Estudiante	1152 829 398	
2	Juan Camilo Cortes Reyes	Asesor de proyectos	1105514812	
3	CARLOS OSPINA	PROFESIONAL	93697746	
4	CARLOS HANDUR	PROFESIONAL	1105340858	
5	Parmenio Benavides J.	Oficial	1822149	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Capacitador:

NOMBRE: Angela Vanegas FIRMA:

Powered by CamScanner

CONSORCIO IBAGUE VIAL URBANO 2025	REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA 9/04/2026 DURACION: 40 min FACILITADOR: Angela Venegas

TEMA (S) Energias Renovables.
Liderazgo

PROYECTO: Cto 3045/2025 AREA: Ambiental - Social

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	FERNEY CRUZ MOLANO	OPER. AL	5 971 712	
2	Luis Esteban Tellez Ruiz	NUK-SCT	1.205.814.346	Luis Tellez
3	JUAN GABRIEL CASTRO	AUXILIAR	1.098.751.175	
4	LUIS E. PARRA P.	AUXILIAR	93.371.706	
5	ETDER GUACA OLIVEROS	OPERADOR	93436141	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Capacitador:

NOMBRE: Angela Venegas FIRMA:

Powered by CamScanner

CONSORCIO IBAGUE VIAL URBANO 2025	REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA 09/04/2026 DURACION: 90 min FACILITADOR: Angela Cano

TEMA (S) Energias Renovables.
Liderazgo

PROYECTO: Cto 3649/2025 AREA: Ambiental - Social

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Orlando Mora Hoyos	Topografo	1.110[illegible]516	
2	Juan Carlos [illegible]	[illegible]	7[illegible]	
3	Angel Alberto Castro	HSE	93386222	
4	Hernando Lema		[illegible]	
5	Jean Carlos Brito	Aliadante	6094611	Jean Carlos
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Capacitador:

NOMBRE: FIRMA:

Powered by CamScanner

CONSORCIO IBAGUE VIAL URBANO 2025	REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA: 9/09/2025 DURACION: 40 min FACILITADOR: Angela Vanegas

TEMA (S): Energias Renovables
Liderazgo

PROYECTO: Cto 3048/2025 AREA: Ambiental - Social

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	maria fernanda ligaru	controladora	1.05822431	
2	Elizabeth del [illegible]	vastidora	14277873	
3	benjamin pulgarin	vastidora	14240101	
4	FRANCISCO VILLANUEVA	AY	5994869	
5	[illegible]	TOPOGRAFO		
6	[illegible]	oficial	1123997	
7	[illegible]	A. civil	93[illegible]	
8	[illegible]	operador	14722[illegible]	
9	Camilo Andres Arboleda	Operador	1105[illegible]	
10	BRAYAN	AY	1[illegible]	
11	Luis Victoria Tellez	Ayte SST	1005814[illegible]	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Capacitador:

NOMBRE: Angela Vanegas FIRMA:

Powered by CamScanner

CONSORCIO IBAGUE VIAL URBANO 2025	REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA: 26/03/2026. DURACION: 10 min FACILITADOR: Angela Vargas

TEMA (S): Prevención con los Efectos del Cambio climático Respeto por la Comunidad.

PROYECTO: Cto 304/2025 AREA: Ambiental - Social

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	JHON JAIRO TOLOZA	Of.	93456978	JHop
2	Rafael Pineda	Ofi	1110558744	Rafael P.
3	Leonidas Ramirez	AUX	93-688861	Leonidas Ramirez
4	Jonny Tovar	AUX	1005848435	Jonny T.
5	Carlos Andres Guevara	Residente	1193044176	Carlos Guevara
6	Cristian Campos	Temporero	1110884778	Cristian Campos
7	Faber Ordonez Martinez	Ayudante	1001303391	Faber
8	Camilo Alfonso	AUX	1029979	Camilo
9	Diana Alejandra Cano Sandoval	Inspector SST	1110620736	
10	Fernando Valencia	TOP	14218391	
11	Fabian M Cogollo V	OP	7714635441	
12	Julian Yesid J.	AUX	1110476406	
13	Luis Quinchoa R.		5A.271-688	
14	Edwin Delgado M	Almacenista	93.586.411.	
15	Eduardo Mora Cuervo	Ayudante	93.396.448.	Eduardo Mora C.
16	Juan Camilo Angel Medina	Inspector	1110588539	
17	Estiben Sanchez S	AUX de tte	1105672937	Estiben S
18	Jose Estiven Mendez	Operario	1106227352	
19	Steven Forero	AUX	1CDG.121 59	Steven Forero
20	Carlos Julio Angarita	AUX	93.766.756	Carlos
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Capacitador:

NOMBRE: FIRMA:

Powered by CamScanner

CONSORCIO IBAGUE VIAL URBANO 2025	REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA 25/03/2026 DURACION: 40 min. FACILITADOR: Angela Vanegas

TEMA (S) Energias Renovables
Liderazgo.

PROYECTO: Cto 3048/2025 AREA: Ambiental - Social

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Yenifer Samaya	Aux SST	1110589809	
2	Camilo Andres Arboleda O.	Operador	1110529000	
3	William Alexander Garcia	Ayudante	1013962261	
4	Frank Ramirez Guillen	Aux	1063 1923 [illegible]	
5	Ronald Stick navarrete	Ayudante	7234 [illegible]	
6	Juan Camilo Alvarez	Ing residente	1110564539	
7	Juan Camilo Sanchez	Operador	1005318608	
8	Benjamin Ramos Venegas	Zapatillero.	1121 [illegible]	
9	Alvaro Medina	Ayudante	93386448	
10	Juan Carlos Corrales	Operador	14281514	
11	Luis Fernando Villamil	Topografo	14218381	
12	Fabian Vaquiro	Ayudante	1110472486	
13	Fredy Molano	operador	93431080	
14	Yovany leal Perez	conductor	93393335	
15	Juan Carlos Sosa	conductor	12991970	
16	Anicizar Rocha	operadora	93083941	
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Capacitador:

NOMBRE: Angela Vanegas FIRMA:

Powered by CamScanner

CONSORCIO IBAGUE VIAL URBANO 2025	REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA 25/03/2025 DURACION: 40 min FACILITADOR: Angela V.

TEMA (S) Energias Renovables
Liderazgo

PROYECTO: Cto 3049/2025 AREA: Ambiental - Social

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Gerardo Bugior	Operador	1110574[illegible]	
2	Nicolo Fernando [illegible]	Ayu	93.128 630	
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	JOSE [illegible]	CONDUCTOR	93747753[illegible]	
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	Miguel Angel [illegible]	Ayu	1110503241	
7	[illegible]	Ayu	1110380103	
8	Jhon Fabri Ortencia M.	Ayu	1007303241	
9	Jairo Alberto Varon	oficial	1110472165	
10	Juan Carlos Cardenas	maestro	1127999376	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Capacitador:

NOMBRE: FIRMA:

Powered by CamScanner

ANEXO 11
ENSAYOS DE LABORATORIO

Ingeolab SAS Consultoria SUELOS-ASFALTOS-CONCRETOS	ENSAYO DENSIDAD EN EL TERRENO METODO DEL CONO Y ARENA COD. ENSAYO IC-D-049/26

PROYECTO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2"		
INTERESADO:	CONSORCIO VIAS IBAGUE	FECHA	TOMA MUESTRA MARZO 30/26
MATERIAL	BASE GRANULAR	CANTERA	TOTUMO

ENSAYO No:	1	2			
TIPO MATERIAL	BASE	BASE			
UBICACION	CARRERA 4B ENTRE CALLES 74A Y 7¶ O ENTRE MANZANAS 32,36 Y PARQUE JORDAN ETAPA 3				
ABSCISA	K:0+015	K:0+050			
LADO EN LA VIA	DER	EJE			
PESO FRASCO Y ARENA INICIAL gr.	5670	5655			
PESO FRASCO Y ARENA RESTANTE gr	1945	1870			
PESO ARENA TOTAL USADA gr.	3725	3785			
CONSTANTE DEL CONO	1600	1600			
PESO ARENA EN EL HUECO gr.	2125	2185			
DENSIDAD DE LA ARENA gr/cm^3	1,405	1,405			
VOLUMEN DEL HUECO cm^3	1512	1555			
PESO MATERIAL EXTRAIDO HUMEDO gr.	3495	3610			
% DE HUMEDAD	5,6	5,8			
PESO MATERIAL EXTRAIDO SECO gr.	3310	3412			
DENSIDAD DEL MATERIAL gr/cm^3	2,188	2,194			
DENSIDAD MAX. LABORATORIO gr/cm^3	2,224	2,224			
% DE HUMEDAD OPTIMA LABORATORIO	6,5	6,5			
% DE COMPACTACION TERRENO	98,4	98,7			
% DE COMPACTACION ESPECIFICADA					

OBSERVACIONES :

ENSAYO:	DI DIGITO:	APROBO
Ing. E.R.M	In J.C.V.	Ing. Edwin Rodriguez M.

Urbanización Onzaga Mz 12 Ca 2 Tel. 311-5135146
Ibagué - Tolima
laboratorioingeolabibague@gmail.com

670

Ingeolab SAS Consultoría SUELOS-ASFALTOS-CONCRETOS	ENSAYO DENSIDAD EN EL TERRENO METODO DEL CONO Y ARENA COD. ENSAYO IC-D-061/26

PROYECTO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMNISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2"		
INTERESADO:	CONSORCIO VIAS IBAGUE	FECHA	TOMA MUESTRA ABRIL 11/26
MATERIAL	BASE GRANULAR	CANTERA:	TOTUMO

ENSAYO No:	1	2			
TIPO MATERIAL	BASE	BASE			
UBICACION	CALLE 115 ENTRE AVENIDA MIROLINDO Y CARRERA 21 SUR APARCO				
ABSCISA	K:0+030	K:0+080			
LADO EN LA VIA	IZQ	EJE			
PESO FRASCO Y ARENA INICIAL gr.	5800	5795			
PESO FRASCO Y ARENA RESTANTE gr.	2155	2225			
PESO ARENA TOTAL USADA gr.	3645	3570			
CONSTANTE DEL CONO	1600	1600			
PESO ARENA EN EL HUECO gr.	2045	1970			
DENSIDAD DE LA ARENA gr/cm^3	1,405	1,405			
VOLUMEN DEL HUECO cm^3	1456	1402			
PESO MATERIAL EXTRAIDO HUMEDO gr.	3400	3235			
% DE HUMEDAD	5,6	4,6			
PESO MATERIAL EXTRAIDO SECO gr.	3220	3093			
DENSIDAD DEL MATERIAL gr/cm^3	2,212	2,206			
DENSIDAD MAX. LABORATORIO gr/cm^3	2,224	2,224			
% DE HUMEDAD OPTIMA LABORATORIO	6,5	6,5			
% DE COMPACTACION TERRENO	99,5	99,2			
% DE COMPACTACION ESPECIFICADA					

OBSERVACIONES :

ENSAYO:	DI DIGITO:	APROBO
Ing. E.R.M	In J.C.V.	Ing. Edwin Rodriguez M.

Urbanización Onzaga Mz 12 Ca 2 Tel. 311-5135146
Ibagué - Tolima
laboratorio.ingeolab@gmail.com

671

Ingeolab SAS
Consultoria
SUELOS-ASFALTOS-CONCRETOS

ENSAYO DENSIDAD EN EL TERRENO METODO DEL CONO Y ARENA

COD. ENSAYO IC-D-464/26

PROYECTO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2"		
INTERESADO:	CONSORCIO VIAS IBAGUE	FECHA	TOMA MUESTRA ABRIL .23/26
MATERIAL:	BASE GRANULAR	CANTERA:	TOTUMO

ENSAYO No:	1	2			
TIPO MATERIAL:	BASE	BASE			
UBICACION	CALLE 12A SUR 24B Y 25 BARRIO NOGALES				
ABSCISA	K:0+005	K:0+050			
LADO EN LA VIA	IZQ	EJE			
PESO FRASCO Y ARENA INICIAL gr.	5450	5435			
PESO FRASCO Y ARENA RESTANTE gr.	1820	1765			
PESO ARENA TOTAL USADA gr.	3630	3670			
CONSTANTE DEL CONO	1600	1600			
PESO ARENA EN EL HUECO gr.	2030	2070			
DENSIDAD DE LA ARENA gr/cm^3	1,405	1,405			
VOLUMEN DEL HUECO cm^3	1445	1473			
PESO MATERIAL EXTRAIDO HUMEDO gr.	3335	3365			
% DE HUMEDAD	4,6	4,1			
PESO MATERIAL EXTRAIDO SECO gr.	3188	3232			
DENSIDAD DEL MATERIAL gr/cm^3	2,207	2,194			
DENSIDAD MAX. LABORATORIO gr/cm^3	2,224	2,224			
% DE HUMEDAD OPTIMA LABORATORIO	6,5	6,5			
% DE COMPACTACION TERRENO	99,2	98,7			
% DE COMPACTACION ESPECIFICADA					

OBSERVACIONES :

ENSAYO:	DI DIGITO:	APROBO
Ing. E.R.M	In J.C.V.	Ing. Edun Rodriguez M.

Urbanización Onzaga Mz 12 Ca 2 Tel. 311-5135146
Ibagué - Tolima
laboratorioingeolabibague@gmail.com

672

Ingeolab SAS
Consultoria
SUELOS-ASFALTOS-CONCRETOS

RESISTENCIA A FLEXION DE ADOQUINES Y VIGUETAS
NORMA I.N.V. E - 414

OBRA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMNISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2"

INTERESADO: CONSORCIO VIAS IBAGUE

FECHA 3/04/2026

ORDEN DE ENSAYO Nº. IGL-075-26

NUMERO DE LA MUESTRA	TIPO		DESCRIPCION	FECHA DE TOMA	PROGRAMACION		DIMENSIONES		ASENTAMIENTO (in)	AREA	CARGA EN Kl.g.	MODULO DE ROTURA	OBSERVACION
	T	DESCRIP			EDAD	FECHA DE ROTURA	LARGO cms	ANCHO cms				Kg/cm²	
V-1	V	VIGUETA	CARRERA 7B BIS ENTRE CALLE 42 Y 44 MARGEN IZQUIERDA BARRIO SAN CARLOS	6-mar-26	7	13-mar-26	53,0	15,6		827	2740	40,3	
V-2	V	VIGUETA		6-mar-26	14	20-mar-26	52,7	15,6		822	3180	46,5	
V-3	V	VIGUETA		6-mar-26	28	3-abr-26	53,0	15,4		816	3540	52,7	

OBSERVACIONES

ENSAYO J.C.V. | REVISO E.R.M | APROBO: Ing. Eduin Rodriguez M

623

Ingeolab SAS
Consultoria
SUELOS-ASFALTOS-CONCRETOS

RESISTENCIA A FLEXION DE ADOQUINES Y VIGUETAS
NORMA I.N.V. E - 414

OBRA: **INTERVENTORIA TECNICA, ADMNISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2"**

INTERESADO: **CONSORCIO VIAS IBAGUE**

FECHA 2/04/2026

ORDEN DE ENSAYO N°. IGL-074-26

NUMERO DE LA MUESTRA	TIPO		DESCRIPCION	FECHA DE TOMA	PROGRAMACION		DIMENSIONES		ASENTAMIENTO pig	AREA	CARGA EN Kg.	MODULO DE ROTURA	OBSERVACION
	T	DESCRIP			EDAD	FECHA DE ROTURA	LARGO cms	ANCHO cms				Kg/cm²	
V-1	V	VIGUETA	CARRERA 78 BIS ENTRE CALLE 42 Y 44 MARGEN DERECHA BARRIO SAN CARLOS	5-mar-26	7	12-mar-26	53,0	15,5		822	2800	41,4	
V-2	V	VIGUETA		5-mar-26	14	19-mar-26	53,0	15,6		827	3210	47,2	
V-3	V	VIGUETA		5-mar-26	28	2-abr-26	52,8	15,5		818	3600	53,1	

OBSERVACIONES

ENSAYO J.C.V. | REVISO E.R.M | APROBO: Ing. Eduin Rodriguez M

42

Ingeolab SAS
Consultoría
SUELOS-ASFALTOS-CONCRETOS

RESISTENCIA A FLEXION DE ADOQUINES Y VIGUETAS
NORMA I.N.V. E - 414

OBRA: **INTERVENTORIA TECNICA, ADMNISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2"**

INTERESADO: **CONSORCIO VIAS IBAGUE** FECHA 4/04/2026

ORDEN DE ENSAYO N°. IGL-074-26

NUMERO DE LA MUESTRA	TIPO		DESCRIPCION	FECHA DE TOMA	PROGRAMACION		DIMENSIONES		ASENTAMIENTO pig	AREA	CARGA EN Kg.	MODULO DE ROTURA	OBSERVACION
	T	DESCRIP			EDAD	FECHA DE ROTURA	LARGO cms	ANCHO cms				Kg/cm²	
V-1	V	VIGUETA	CARRERA 11 ENTRE CALLES 44 Y 46 BARRIO CASTILLA	7-mar-26	7	14-mar-26	52,7	15,4		812	2610	38,7	
V-2	V	VIGUETA		7-mar-26	14	21-mar-26	53,0	15,3		811	3040	45,6	
V-3	V	VIGUETA		7-mar-26	28	4-abr-26	52,8	15,3		808	3580	53,5	

OBSERVACIONES

ENSAYO J.C.V. | REVISO E.R.M | APROBO: Ing. Eduin Rodriguez M

(415

Ingeolab SAS
Consultoría
SUELOS-ASFALTOS-CONCRETOS

ENSAYOS PARA EL CONTROL DE UNA MEZCLA ASFALTICA

COD ENSAYO IC-CMA-008/26

OBRA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2"

INTERESADO: CONSORCIO VIAS IBAGUE


TIPO DE MEZCLA:	MDC-19 M -16	PROVEEDOR: PLANTA CUNIRA	SECTOR:	CARRERA 118 ENTRE CALLES 3 Y 4 SANTA BARBARA	FECHA TOMA: MARZO 30/2026	FECHA ENSAYO: ABRIL 03/2026

EXTRACCION INV E-732
Temperatura de compactación briquetas:

PRUEBA No. 1	
PESO INICIAL gramos	1200,0
PESO RESTANTE gramos	1133,0
DIFERENCIA gramos	66,0
% ASFALTO	5,42
PRUEBA No. 2	
PESO INICIAL gramos	1200,0
PESO RESTANTE gramos	1134,7
DIFERENCIA gramos	65,3
% ASFALTO	5,44
% DE ASFALTO PROMEDIO	5,43

P_1 gr: 1130,0 P_2 gr: 1095,6

TAMIZ	PESO RETENIDO	% RETENIDO	% ACUMULADO	% PASA
1 1/2"	0,0	0,0	0,0	100,0
1"	0,0	0,0	0,0	100,0
3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0
1/2"	117,0	10,3	10,3	89,7
3/8"	64,5	5,7	16,0	84,0
#4	217,4	19,2	35,1	64,9
#10	315,6	27,8	63,0	37,0
#40	265,5	23,4	86,3	13,7
#80	67,6	6,0	92,3	7,7
#200	48,0	4,2	96,5	3,47
FONDO	39,4	3,5	100,0	0,00

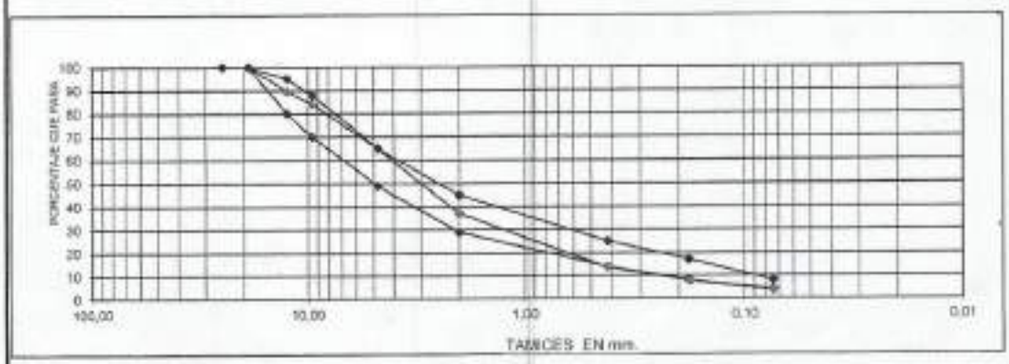

DENSIDAD ESTABILIDAD - FLUJO

BRIQUETA	1	2	3			
MATERIAL						
ESPESOR BRIQUETA mm	67,0	66,0	67,0			
PESO NUCLEO SOLA EN AIRE gr	1200,0	1201,4	1200,7			
PESO NUCLEO EN EL AGUA	658,3	660,2	656,8			
PESO SUPERFICIALMENTE SECO	1.206,8	1.208,2	1.207,3			
VOLUMEN NUCLEO cm³	548,5	548,0	547,5			
DENSIDAD gr/cm³	2,188	2,192	2,193			
FACTOR DE CORRELACION	0,93	0,89	0,93			
ESTABILIDAD MEDIDA Kgf	2056	2150	2060			
ESTABILIDAD CORREGIDA kgf	1.921	1.914	1.934			
FLUJO (1/100 pulgadas)	15,0	16,0	15,0			

PROMEDIOS

ESTABILIDAD	1.923	Kgf	18,87 KN
FLUJO	15,3	(1/100 pulg)	3,9 mm
DENSIDAD	2,191	gr/cm³	
RELACION ESTABILIDAD FLUJO:			4,8 KN/mm

OBSERVACIONES:

ENSAYO: E.R.M. | Revisó: | Aprobó: Ing. Ma. Patricia Ayala G. Esp. Ingeniería de Pavimentos U.M.N.G.

Urbanización Onzaga Mz 12 Ca 2 Tel. - 311-5135146
Ibagué - Tolima
laboratorioingeolabibague@gmail.com

676

Ingeolab SAS
Consultoría
SUELOS-ASFALTOS-CONCRETOS

ENSAYOS PARA EL CONTROL DE UNA MEZCLA ASFALTICA

COD ENSAYO IC-CMA-053/26

OBRA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2"

INTERESADO: CONSORCIO VIAS IBAGUE


TIPO DE MEZCLA:	MDC-19 M -12	PROVEEDOR: PLANTA CUMBRA	SECTOR:	CARRERA 4B ENTRE CALLES 74A Y 76 O ENTRE MANZANAS 32,34 Y PARQUE JORDAN ETAPA 3 K 0+070	FECHA TOMA: MARZO 30/2026	FECHA ENSAYO: ABRIL 06/2026

EXTRACCION: INV E-732
Temperatura de compactación briquetas

PRUEBA No. 1	
PESO INICIAL gramos	1200,0
PESO RESTANTE gramos	1135,7
DIFERENCIA gramos	64,3
% ASFALTO	5,36
PRUEBA No. 2	
PESO INICIAL gramos	1200,0
PESO RESTANTE gramos	1135,3
DIFERENCIA gramos	64,7
% ASFALTO	5,39
% DE ASFALTO PROMEDIO	5,38

P_1 gr: 1135,7 — P_2 gr: 1075,8

TAMIZ	PESO RETENIDO	% RETENIDO	% ACUMULADO	% PASA
1 1/2"	0,0	0,0	0,0	100,0
1"	0,0	0,0	0,0	100,0
3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0
1/2"	93,9	8,3	8,3	91,7
3/8"	85,8	7,6	15,8	84,2
#4	114,5	10,1	25,9	74,1
#10	264,9	23,2	49,3	50,6
#40	344,9	30,4	79,5	20,5
#80	107,5	9,4	89,0	11,0
#200	68,4	6,1	95,1	4,92
FONDO	55,9	4,9	100,0	0,00

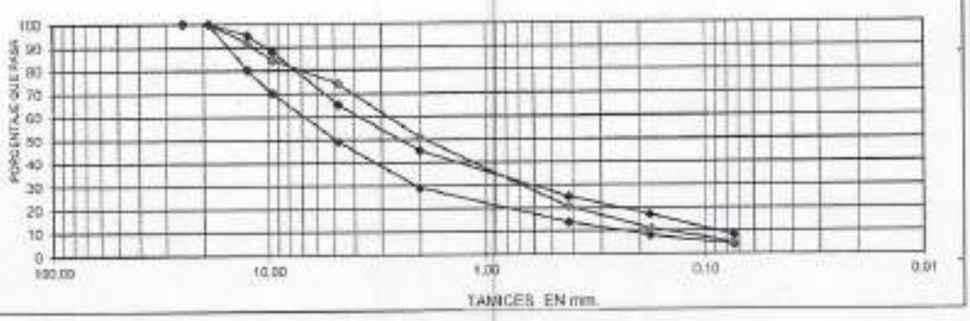

DENSIDAD ESTABILIDAD - FLUJO

BRIQUETA	1	2	3			
MATERIAL						
ESPESOR BRIQUETA mm	66,0	67,0	67,0			
PESO NUCLEO SOLA EN AIRE gr	1198,5	1195,9	1199,0			
PESO NUCLEO EN EL AGUA	656,3	657,3	656,6			
PESO SUPERFICIALMENTE SECO	1.201,3	1.198,7	1.202,4			
VOLUMEN NUCLEO cm³	543,0	541,4	543,8			
DENSIDAD gr/cm³	2,207	2,209	2,205			
FACTOR DE CORRELACION	0,89	0,93	0,93			
ESTABILIDAD MEDIDA Kgf	1965	1612	1904			
ESTABILIDAD CORREGIDA kgf	1.767	1.728	1.771			
FLUJO (1/100 pulgadas)	15,0	15,0	14,0			

PROMEDIOS

ESTABILIDAD	1.772	Kgf	17,38 KN
FLUJO	14,7	(1/100 pulg)	3,7 mm
DENSIDAD	2,207	gr/cm³	
RELACION ESTABILIDAD FLUJO:			4,7 Kn/mm

OBSERVACIONES:

ENSAYO: E.R.M	Revisó:	Aprobó: Ing. Ma. Patricia Ayala G. Esp. Ingeniería de Pavimentos U.M.N.S.

Urbanización Ozzaga Mz 12 Ca 2 Tel. - 311-5135146
Ibagué - Tolima
laboratorio.ingeolab@outlook.com

677

Ingeolab SAS
Consultoría
SUELOS-ASFALTOS-CONCRETOS

ENSAYOS PARA EL CONTROL DE UNA MEZCLA ASFALTICA

COD ENSAYO IC-CMA-064/26

OBRA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2"


INTERESADO: CONSORCIO VIAS IBAGUE

TIPO DE MEZCLA:	MDC-19 M -15	PROVEEDOR: PLANTA CUMBRA	SECTOR:	CARRERA 12 ENTRE CALLES 9 Y 4 SANTA BARBARA	FECHA TOMA: MARZO 26/2026	FECHA ENSAYO: MARZO 30/2026

EXTRACCION: INV E-732
Temperatura de compactación briquetas:

PRUEBA No. 1	
PESO INICIAL gramos	1200,0
PESO RESTANTE gramos	1132,8
DIFERENCIA gramos	67,2
% ASFALTO	5,60
PRUEBA No. 2	
PESO INICIAL gramos	1200,0
PESO RESTANTE gramos	1133,1
DIFERENCIA gramos	66,9
% ASFALTO	5,58
% DE ASFALTO PROMEDIO	**5,59**

P_1 gr:	1132,8	P_2 gr:	1096,5	
TAMIZ	PESO RETENIDO	% RETENIDO	% ACUMULADO	% PASA
1 1/2"	0,0	0,0	0,0	100,0
1"	0,0	0,0	0,0	100,0
3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0
1/2"	109,8	9,7	9,7	90,3
3/8"	53,6	4,7	14,4	85,6
#4	204,3	18,0	32,4	67,6
#10	333,9	29,5	61,9	38,1
#40	278,8	24,6	86,5	13,5
#80	67,9	6,0	92,5	7,5
#200	48,4	4,3	96,8	3,20
FONDO	36,0	3,2	100,0	0,00

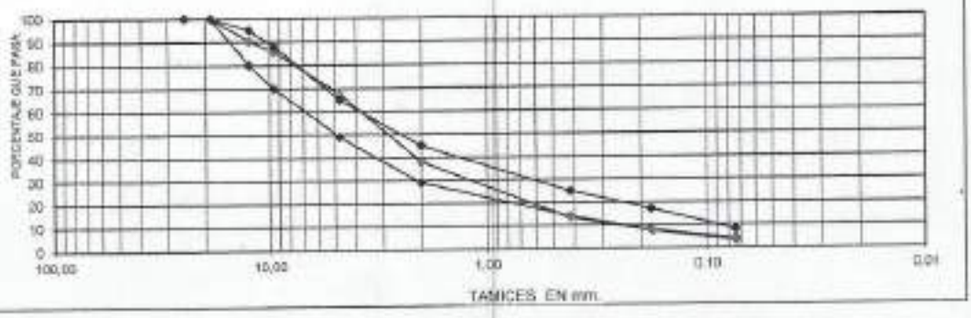

DENSIDAD ESTABILIDAD - FLUJO

BRIQUETA	1	2	3			
MATERIAL						
ESPESOR BRIQUETA mm	67,0	67,0	67,0			
PESO NUCLEO SOLA EN AIRE gr	1202,6	1200,6	1199,7			
PESO NUCLEO EN EL AGUA	660,9	659,4	661,0			
PESO SUPERFICIALMENTE SECO	1.206,5	1.205,0	1.204,2			
VOLUMEN NUCLEO cm^3	545,6	545,6	543,2			
DENSIDAD gr/cm^3	2,204	2,201	2,209			
FACTOR DE CORRELACION	0,93	0,93	0,93			
ESTABILIDAD MEDIDA Kgf	1980	1956	1973			
ESTABILIDAD CORREGIDA kgf	1.841	1.819	1.835			
FLUJO (1/100 pulgadas)	15,0	15,0	15,0			

PROMEDIOS

ESTABILIDAD:	1.832	Kgf	17,97 KN
FLUJO:	15,0	(1/100 pulg)	3,8 mm
DENSIDAD	2,205	gr/cm^3	
RELACION ESTABILIDAD FLUJO:			4,7 KN/mm

OBSERVACIONES:

ENSAYO: E.R.M	Revisó:	Aprobó: Ing. Ma. Patricia Ayala G. Esp. Ingeniera de Pavimentos U.M.N.G.

Urbanización Quzaga Mz 12 Ca 2 Tel. - 311-5135146
Ibagué - Tolima
laboratorioingeniero.ibague@gmail.com

Ingeolab SAS
Consultoría
SUELOS-ASFALTOS-CONCRETOS

ENSAYOS PARA EL CONTROL DE UNA MEZCLA ASFALTICA

COD ENSAYO IC-CMA-066/26

OBRA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMNISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2"

INTERESADO: CONSORCIO VIAS IBAGUE


TIPO DE MEZCLA:	PROVEEDOR: PLANTA	SECTOR:		FECHA TOMA:	FECHA ENSAYO:
MDC-19 M -14	CUMBRA		CALLE 40 ENTRE CARRERAS 6 Y 7 RINCON DE PIEDRA PINTADA Y LIMONARIS SECTOR K 0+075 IZQ	MARZO 05/2026	MARZO 10/2026

EXTRACCION INV E-732
Temperatura de compactación briquetas:

PRUEBA No. 1	
PESO INICIAL gramos	1200,0
PESO RESTANTE gramos	1135,2
DIFERENCIA gramos	64,8
% ASFALTO	5,40
PRUEBA No. 2	
PESO INICIAL gramos	1200,0
PESO RESTANTE gramos	1134,7
DIFERENCIA gramos	65,3
% ASFALTO	5,44
% DE ASFALTO PROMEDIO	5,42

P_1 gr: 1135,2 P_2 gr: 1077,9

TAMIZ	PESO RETENIDO	% RETENIDO	% ACUMULADO	% PASA
1 1/2"	0,0	0,0	0,0	100,0
1"	0,0	0,0	0,0	100,0
3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0
1/2"	116,1	10,2	10,2	89,8
3/8"	66,0	5,8	16,0	84,0
#4	216,2	19,0	35,1	64,9
#10	272,1	24,0	59,1	40,9
#40	261,0	23,0	82,0	18,0
#80	79,6	7,0	89,1	10,9
#200	59,7	5,3	94,5	5,55
FONDO	57,3	5,0	100,0	0,00

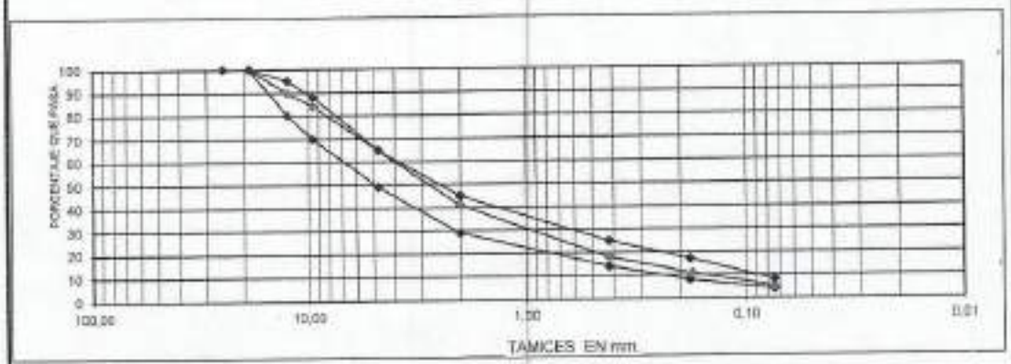

DENSIDAD ESTABILIDAD - FLUJO

BRIQUETA	1	2	3			
MATERIAL						
ESPESOR BRIQUETA mm	66,0	66,0	66,0			
PESO NUCLEO SOLA EN AIRE gr	1204,6	1199,4	1202,6			
PESO NUCLEO EN EL AGUA	676,0	671,9	671,3			
PESO SUPERFICIALMENTE SECO	1.208,6	1.202,6	1.203,6			
VOLUMEN NUCLEO cm³	533,6	531,8	532,3			
DENSIDAD gr/cm³	2,257	2,256	2,259			
FACTOR DE CORRELACION	0,93	0,93	0,93			
ESTABILIDAD MEDIDA Kgf	2089	2048	2065			
ESTABILIDAD CORREGIDA kgf	1.940	1.905	1.920			
FLUJO (1/100 pulgadas)	16,0	15,0	15,0			

PROMEDIOS

ESTABILIDAD	1.922	Kgf	18,85 KN
FLUJO	15,3	(1/100 pulg)	3,9 mm
DENSIDAD	2,257	gr/cm³	
RELACION ESTABILIDAD FLUJO			4,8 KN/mm

OBSERVACIONES:

ENSAYO: E.R.M | Revisó: | Aprobó: Ing. Ma. Patricia Ayala C. Esp. Ingeniería de Pavimentos U.M.N.G

Urbanización Ouzaga Mz 12 Cs 2 Tel. - 311-5135146
Ibagué - Tolima
ingeolabsas@gmail.com

Ingeolab SAS
Consultoría
SUELOS-ASFALTOS-CONCRETOS

ENSAYOS PARA EL CONTROL DE UNA MEZCLA ASFALTICA

COD ENSAYO IC-CNA-044/26

OBRA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2"

INTERESADO: CONSORCIO VIAS IBAGUE


TIPO DE MEZCLA:	MDC-19 MI -11	PROVEEDOR: PLANTA CUNIRA	SECTOR:	CARRERA 7A ENTRE CALLES 60 Y 57 RINCON DE PIEDRA PINTADA K.0+100 MARGEN DER	FECHA TOMA: MARZO 06/2026	FECHA ENSAYO: MARZO 10/2026

EXTRACCION INV E-732
Temperatura de compactación briquetas:

PRUEBA No. 1	
PESO INICIAL gramos	1200,0
PESO RESTANTE gramos	1131,3
DIFERENCIA gramos	68,7
% ASFALTO	5,73
PRUEBA No. 2	
PESO INICIAL gramos	1200,0
PESO RESTANTE gramos	1131,0
DIFERENCIA gramos	69,0
% ASFALTO	5,75
% DE ASFALTO PROMEDIO	**5,74**

P. gr: 1131,3 — P_3 gr: 1083,0

TAMIZ	PESO RETENIDO	% RETENIDO	% ACUMULADO	% PASA
1 1/2"	0,0	0,0	0,0	100,0
1"	0,0	0,0	0,0	100,0
3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0
1/2"	114,9	10,2	10,2	89,8
3/8"	62,7	5,5	13,7	86,3
#4	195,9	13,7	29,4	70,6
#10	269,1	23,8	53,2	46,8
#40	320,9	28,4	81,6	18,4
#80	96,3	8,7	90,3	9,7
#200	61,6	5,6	95,7	4,27
FONDO	48,3	4,3	100,0	0,00

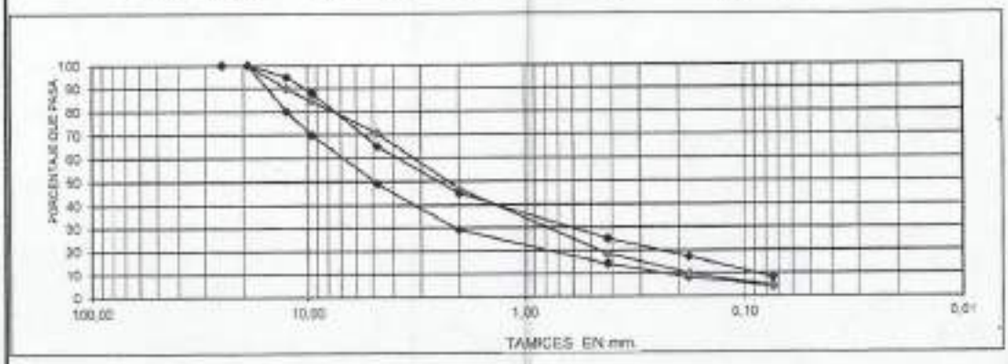

DENSIDAD ESTABILIDAD - FLUJO

BRIQUETA	1	2	3			
MATERIAL						
ESPESOR BRIQUETA mm	67,0	66,2	66,0			
PESO NUCLEO SOLA EN AIRE gr.	1199,7	1196,2	1197,8			
PESO NUCLEO EN EL AGUA	658,2	658,0	659,4			
PESO SUPERFICIALMENTE SECO	1.201,4	1.196,3	1.200,7			
VOLUMEN NUCLEO cm^3	543,2	541,3	541,3			
DENSIDAD gr/cm^3	2,209	2,210	2,213			
FACTOR DE CORRELACION	0,93	0,94	0,94			
ESTABILIDAD MEDIDA Kgf	2015	1985	1990			
ESTABILIDAD CORREGIDA kgf	1.874	1.856	1.871			
FLUJO (1/100 pulgadas)	16,0	15,0	15,0			

PROMEDIOS

ESTABILIDAD :	1.870	Kgf	18,35 kN
FLUJO :	15,3	(1/100 pulg)	3,9 mm
DENSIDAD :	2,210	gr/cm^3	
RELACION ESTABILIDAD FLUJO:			4,7 kN/mm

OBSERVACIONES:

ENSAYO: E.R.M	Reviso:	Aprobo: Ing. Ma. Patricia Avila G. Esp. Ingeniería de Pavimentos U.M.N.G.

Urbanización Onzaga Mz 12 Ca 2 Tel. - 311-5135146
Ibagué - Tolima
laboratorioingeolabibague@gmail.com

680

Ingeolab SAS
Consultoría
SUELOS-ASFALTOS-CONCRETOS

ENSAYOS PARA EL CONTROL DE UNA MEZCLA ASFALTICA

COD ENSAYO IC-CMA-038/20

OBRA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2"

INTERESADO: CONSORCIO VIAS IBAGUE


TIPO DE MEZCLA:	MDC-19 M-9	PROVEEDOR: PLANTA CUNIRA	SECTOR:	CALLE 23B ENTRE CARRERAS 12 SUR- 12A SUR-13 SUR Y 14 SUR VILLA LUCES	FECHA TOMA: FEBRERO 28/2026	FECHA ENSAYO: MARZO 04/2026

EXTRACCION INV E-732
Temperatura de compactacion briquetas

PRUEBA No. 1	
PESO INICIAL gramos	1300,0
PESO RESTANTE gramos	1134,2
DIFERENCIA gramos	65,8
% ASFALTO	5,48
PRUEBA No. 2	
PESO INICIAL gramos	1300,0
PESO RESTANTE gramos	1133,8
DIFERENCIA gramos	66,2
% ASFALTO	5,52
% DE ASFALTO PROMEDIO	5,50

P_1 gr: 1134,2 — P_2 gr: 1095,7

TAMIZ	PESO RETENIDO	% RETENIDO	% ACUMULADO	% PASA
1 1/2"	0,0	0,0	0,0	100,0
1"	0,0	0,0	0,0	100,0
3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0
1/2"	129,8	11,4	11,4	88,6
3/8"	65,6	5,8	17,2	82,8
#4	241,5	21,3	38,5	61,5
#10	285,2	25,1	63,7	36,3
#40	239,7	21,0	84,7	15,3
#80	76,6	6,8	91,5	8,5
#200	58,3	5,1	96,6	3,38
FONDO	38,5	3,4	100,0	0,00

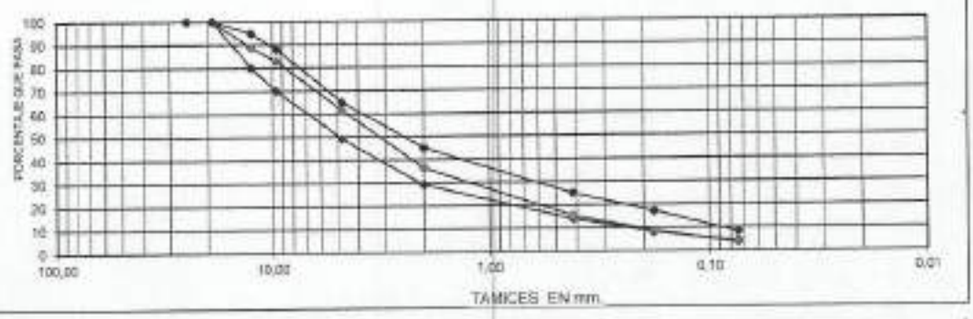

DENSIDAD ESTABILIDAD - FLUJO

BRIQUETA	1	2	3			
MATERIAL						
ESPESOR BRIQUETA mm	65,0	65,0	64,0			
PESO NUCLEO SOLA EN AIRE gr	1198,5	1197,4	1185,1			
PESO NUCLEO EN EL AGUA	670,7	669,6	663,0			
PESO SUPERFICIALMENTE SECO	1.204,3	1.201,5	1.202,4			
VOLUMEN NUCLEO cm³	533,6	531,7	533,4			
DENSIDAD gr/cm³	2,246	2,252	2,249			
FACTOR DE CORRELACION	0,96	0,96	0,96			
ESTABILIDAD MEDIDA Kgf	1866	1879	1845			
ESTABILIDAD CORREGIDA kgf	1.819	1.804	1.809			
FLUJO (1/100 pulgadas)	15,0	15,0	15,0			

PROMEDIOS

ESTABILIDAD :	1.810	Kgf	17,75 kN
FLUJO :	15,0	(1/100 pulg)	3,8 mm
DENSIDAD :	2,249	gr/cm³	
RELACION ESTABILIDAD FLUJO:			4,7 kN/mm

OBSERVACIONES

ENSAYO: E.R.M	Revisó:	Aprobó: Ing. Ma. Patricia Ayala G. Esp. Ingeniería de Pavimentos U.M.N.G

Urbanización Ouzaga Mz 12 Ca 2 Tel. - 311-5135146
Ibagué - Tolima

CONSORCIO VIAS IBAGUE (3)

681

Ingeolab SAS
Consultoría
SUELOS-ASFALTOS-CONCRETOS

ENSAYO DENSIDAD EN EL TERRENO METODO DEL CONO Y ARENA

COD. ENSAYO IC-D-072/26

PROYECTO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMNISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2"				
INTERESADO:	CONSORCIO VIAS IBAGUE		FECHA	TOMA MUESTRA ABRIL .03/26	
MATERIAL	BASE GRANULAR		CANTERA:	MARTINEZ	

ENSAYO No:	1	2	3	4	
TIPO MATERIAL	BASE	BASE	BASE	BASE	
UBICACION	CARRERA 21E ENTRE CALLES 67A Y 68 BARRIO CIRUELOS				
ABSCISA	K:0+010	K:060	K:0+105	K:0+155	
LADO EN LA VIA	IZQ	DER	IZQ	EJE	
PESO FRASCO Y ARENA INICIAL gr.	5450	5440	5425	5400	
PESO FRASCO Y ARENA RESTANTE gr.	1900	1635	1740	1500	
PESO ARENA TOTAL USADA gr.	3550	3805	3685	3900	
CONSTANTE DEL CONO	1600	1600	1600	1600	
PESO ARENA EN EL HUECO gr.	1950	2205	2085	2300	
DENSIDAD DE LA ARENA gr/cm^3	1,405	1,405	1,405	1,405	
VOLUMEN DEL HUECO cm^3	1388	1569	1484	1637	
PESO MATERIAL EXTRAIDO HUMEDO gr.	3120	3670	3460	3800	
% DE HUMEDAD	4,8	5,6	6,0	5,7	
PESO MATERIAL EXTRAIDO SECO gr.	2977	3475	3264	3595	
DENSIDAD DEL MATERIAL gr/cm^3	2,145	2,214	2,200	2,196	
DENSIDAD MAX. LABORATORIO gr/cm^3	2,148	2,229	2,229	2,229	
% DE HUMEDAD OPTIMA LABORATORIO	7,8	5,8	5,8	5,8	
% DE COMPACTACION TERRENO	99,9	99,3	98,7	98,5	
% DE COMPACTACION ESPECIFICADA					

OBSERVACIONES :

ENSAYO:	DIGITO:	APROBO
Ing. E.R.M	In J.C.V.	Ing. Edwin Rodriguez M.

Urbanización Onzaga Mz 12 Ca 2 Tel. 311-5135146
Ibagué - Tolima
laboratorioingeolabibague@gmail.com

682

Ingeolab SAS
Consultoria
SUELOS-ASFALTOS-CONCRETOS

ENSAYOS PARA EL CONTROL DE UNA MEZCLA ASFALTICA

COD ENSAYO IC-CMA-041/26

OBRA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2"


INTERESADO: CONSORCIO VIAS IBAGUE

TIPO DE MEZCLA:	MDC-19 M -12	PROVEEDOR: PLANTA ASFALTEMOS	SECTOR:	CARRERA 21 ENTRE CALLES 61C Y 67A BARRIO LOS ANGELES	FECHA TOMA: MARZO 25/2026	FECHA ENSAYO: MARZO. 30/2026

EXTRACCION INV E-732
Temperatura de compactación briquetas:

PRUEBA No. 1	
PESO INICIAL gramos	1200,0
PESO RESTANTE gramos	1133,0
DIFERENCIA gramos	67,0
% ASFALTO	5,58
PRUEBA No. 2	
PESO INICIAL gramos	1200,0
PESO RESTANTE gramos	1132,6
DIFERENCIA gramos	67,4
% ASFALTO	5,62
% DE ASFALTO PROMEDIO	5,60

P_1 gr:	1132,0	P_2 gr:	1075,4	
TAMIZ	PESO RETENIDO	% RETENIDO	% ACUMULADO	% PASA
1 1/2"	0,0	0,0	0,0	100,0
1"	0,0	0,0	0,0	100,0
3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0
1/2"	97,9	8,6	8,6	91,4
3/8"	50,9	4,5	13,1	86,9
#4	241,3	21,3	34,4	65,6
#10	250,2	22,1	56,5	43,5
#40	294,1	26,0	82,5	17,5
#80	89,0	7,9	90,3	9,7
#200	52,0	4,6	94,9	5,08
FONDO	57,8	5,1	100,0	0,00

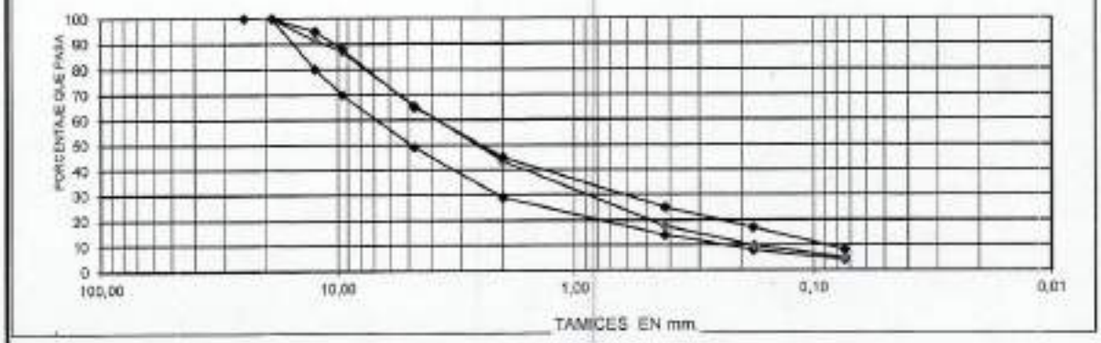

		DENSIDAD	ESTABILIDAD - FLUJO			
BRIQUETA	1	2	3			
MATERIAL						
ESPESOR BRIQUETA mm	64,0	63,0	64,0			
PESO NUCLEO SOLA EN AIRE gr	1199,6	1200,4	1201,1			
PESO NUCLEO EN EL AGUA	683,1	683,7	682,9			
PESO SUPERFICIALMENTE SECO	1.201,9	1.202,3	1.202,9			
VOLUMEN NUCLEO cm³	518,8	518,6	520,0			
DENSIDAD gr/cm³	2,312	2,315	2,310			
FACTOR DE CORRELACION	0,98	1,00	0,98			
ESTABILIDAD MEDIDA Kgf	1840	1615	1655			
ESTABILIDAD CORREGIDA kgf	1.807	1.615	1.622			
FLUJO (1/100 pulgadas)	13,0	13,0	14,0			

			PROMEDIOS
ESTABILIDAD	1.615	Kgf	15,84 kN
FLUJO	13,3	(1/100 pulg)	3,4 mm
DENSIDAD	2,312	gr/cm³	
RELACION ESTABILIDAD FLUJO:			4,7 kN/mm

OBSERVACIONES:

ENSAYO: E.R.M | Reviso: | Aprobo: Ing. Ma. Patricia Ayala G. Esp. Ingeniería de Pavimentos U.M.N.G

Urbanización Onzaga Mz 12 Ca 2 Tel. - 311-5135146
Ibagué - Tolima
laboratoriongeolab@gmail.com

683

Ingeolab SAS
Consultoría
SUELOS-ASFALTOS-CONCRETOS

ENSAYOS PARA EL CONTROL DE UNA MEZCLA ASFALTICA

COD ENSAYO IC-CMA-030/26

OBRA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2"

INTERESADO: CONSORCIO VIAS IBAGUE


TIPO DE MEZCLA:	MDC-19 M -11	PROVEEDOR: PLANTA ASFALTEMOS	SECTOR:	CARRERA 21 ENTRE CALLES 61C Y 67A BARRIO LOS ANGELES	FECHA TOMA: MARZO 11/2026	FECHA ENSAYO: MARZO. 14/2026

EXTRACCION INV E-732
Temperatura de compactación briquetas:

PRUEBA No. 1	
PESO INICIAL gramos	1200,0
PESO RESTANTE gramos	1125,8
DIFERENCIA gramos	74,2
% ASFALTO	6,18
PRUEBA No. 2	
PESO INICIAL gramos	1200,0
PESO RESTANTE gramos	1126,2
DIFERENCIA gramos	73,8
% ASFALTO	6,15
% DE ASFALTO PROMEDIO	6,17

P_1 gr: 1125,8 P_2 gr: 1071,5

TAMIZ	PESO RETENIDO	% RETENIDO	% ACUMULADO	% PASA
1 1/2"	0,0	0,0	0,0	100,0
1"	0,0	0,0	0,0	100,0
3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0
1/2"	88,3	7,8	7,8	92,2
3/8"	101,7	9,0	16,9	83,1
#4	228,3	20,3	37,2	62,8
#10	235,8	20,9	58,1	41,9
#40	275,8	24,5	82,6	17,4
#80	95,2	8,5	91,1	8,9
#200	46,4	4,1	95,2	4,82
FONDO	54,3	4,8	100,0	0,00

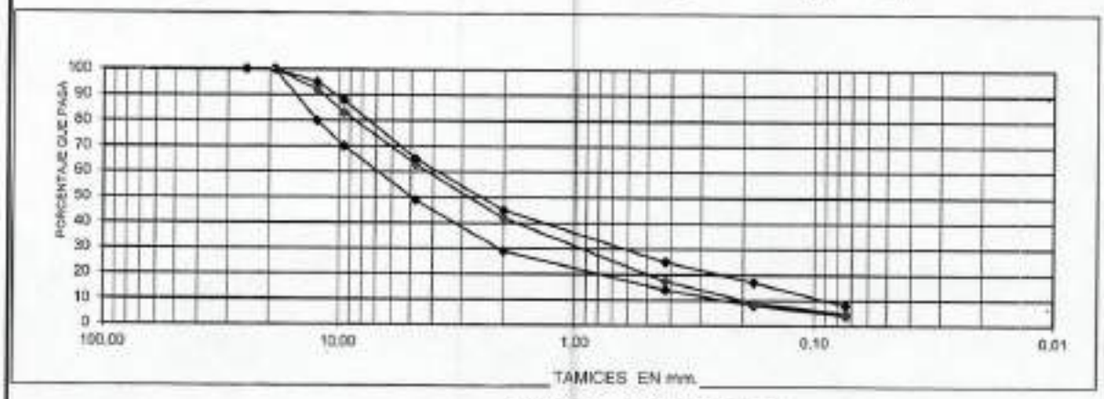

	DENSIDAD		ESTABILIDAD - FLUJO			
BRIQUETA	1	2	3			
MATERIAL						
ESPESOR BRIQUETA mm	63,0	63,0	64,0			
PESO NUCLEO SOLA EN AIRE gr.	1200,7	1203,0	1201,8			
PESO NUCLEO EN EL AGUA	686,7	686,7	687,0			
PESO SUPERFICIALMENTE SECO	1.201,5	1.204,0	1.203,0			
VOLUMEN NUCLEO cm^3	514,8	517,3	516,0			
DENSIDAD gr/cm^3	2,332	2,326	2,329			
FACTOR DE CORRELACION	1,00	1,00	0,98			
ESTABILIDAD MEDIDA Kgf	1820	1775	1840			
ESTABILIDAD CORREGIDA kgf	1.820	1.775	1.803			
FLUJO (1/100 pulgadas)	14,0	15,0	14,0			

PROMEDIOS

ESTABILIDAD :	1.799 Kgf	17,65	KN
FLUJO :	14,3 (1/100 pulg)	3,6	mm
DENSIDAD :	2,329 gr/cm^3		
RELACIÓN ESTABILIDAD FLUJO:		4,8	KN/mm

OBSERVACIONES:

ENSAYO: E.R.M | Revisó: | Aprobó: Ing. Ma. Patricia Ayala G. Esp. Ingeniería de Pavimentos U.M.N.G

Urbanización Onzaga Mz 12 Ca 2 Tel. - 311-5135146
Ibagué - Tolima
laboratorioingeolabibague@hotmail.com

684

Ingeolab SAS
Consultoría
SUELOS-ASFALTOS-CONCRETOS

ENSAYOS PARA EL CONTROL DE UNA MEZCLA ASFALTICA

COD ENSAYO IC-CMA-004/26

OBRA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2"

INTERESADO: CONSORCIO VIAS IBAGUE


TIPO DE MEZCLA:	MDC-19 M -14	PROVEEDOR: PLANTA ASFALTEMOS	SECTOR:	CARRERA 5 ENTRE CALLES 103 Y 115 SEGUNDA CAPA	FECHA TOMA: ABRIL 20/2026	FECHA ENSAYO: ABRIL. 24/2026

EXTRACCION INV E-732
Temperatura de compactación briquetas:

PRUEBA No. 1	
PESO INICIAL gramos	1200,0
PESO RESTANTE gramos	1132,9
DIFERENCIA gramos	67,1
% ASFALTO	5,59
PRUEBA No. 2	
PESO INICIAL gramos	1200,0
PESO RESTANTE gramos	1132,4
DIFERENCIA gramos	67,6
% ASFALTO	5,63
% DE ASFALTO PROMEDIO	5,61

P_1 gr: 1132,9 P_2 gr: 1082,1

TAMIZ	PESO RETENIDO	% RETENIDO	% ACUMULADO	% PASA
1 1/2"	0,0	0,0	0,0	100,0
1"	0,0	0,0	0,0	100,0
3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0
1/2"	122,3	10,8	10,8	89,2
3/8"	90,9	7,7	18,5	81,5
#4	239,1	21,1	39,6	60,4
#10	239,5	21,1	60,7	39,3
#40	265,7	23,5	84,2	15,8
#80	85,1	7,5	91,7	8,3
#200	43,5	3,8	95,5	4,48
FONDO	50,8	4,5	100,0	0,00

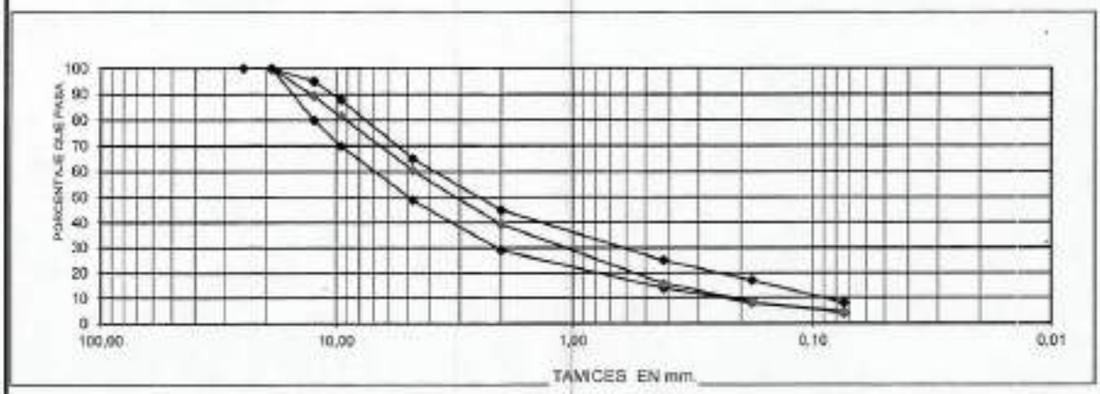

DENSIDAD ESTABILIDAD - FLUJO

BRIQUETA	1	2	3			
MATERIAL						
ESPESOR BRIQUETA mm	64,0	65,0	64,0			
PESO NUCLEO SOLA EN AIRE gr.	1202,2	1203,0	1201,8			
PESO NUCLEO EN EL AGUA	685,0	686,0	685,2			
PESO SUPERFICIALMENTE SECO	1.204,9	1.205,6	1.203,7			
VOLUMEN NUCLEO cm^3	519,9	519,6	518,5			
DENSIDAD gr/cm^3	2,312	2,315	2,318			
FACTOR DE CORRELACION	0,96	0,96	0,96			
ESTABILIDAD MEDIDA Kgf	1740	1795	1755			
ESTABILIDAD CORREGIDA kgf	1.705	1.723	1.720			
FLUJO (1/100 pulgadas)	13,0	14,0	14,0			

PROMEDIOS

ESTABILIDAD :	1.716	Kgf	16,83	KN
FLUJO :	13,7	(1/100 pulg)	3,5	mm
DENSIDAD :	2,315	gr/cm^3		
RELACION ESTABILIDAD FLUJO:			4,8	KN/mm

OBSERVACIONES:

ENSAYO: E.R.M	Revisó:	Aprobó:
		Ing. Ma. Patricia Ayala G. Esp. Ingeniería de Pavimentos U.M.N.G.

Urbanización Onzaga Mz 12 Ca 2 Tel. - 311-5135146
Ibagué - Tolima
laboratorioingeolab@gmail.com

685

Ingeolab SAS
Consultoría
SUELOS-ASFALTOS-CONCRETOS

ENSAYOS PARA EL CONTROL DE UNA MEZCLA ASFALTICA

COD ENSAYO IC-CMA-049126

OBRA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2"

INTERESADO: CONSORCIO VIAS IBAGUE

TIPO DE MEZCLA:	MDC-19 M -19	PROVEEDOR: PLANTA ASFALTEMOS	SECTOR:	CARRERA 5 ENTRE CALLES 103 Y 115 PRIMERA CAPA	FECHA TOMA: ABRIL 11/2026	FECHA ENSAYO: ABRIL. 15/2026

EXTRACCION: INV E-732


Temperatura de compactación briquetas:

PRUEBA No. 1	
PESO INICIAL gramos	1200,0
PESO RESTANTE gramos	1133,7
DIFERENCIA gramos	66,3
% ASFALTO	5,53
PRUEBA No. 2	
PESO INICIAL gramos	1200,0
PESO RESTANTE gramos	1133,5
DIFERENCIA gramos	66,5
% ASFALTO	5,54
% DE ASFALTO PROMEDIO	5,53

P_1 gr: 1133,7 P_2 gr: 1098,7

TAMIZ	PESO RETENIDO	% RETENIDO	% ACUMULADO	% PASA
1 1/2"	0,0	0,0	0,0	100,0
1"	0,0	0,0	0,0	100,0
3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0
1/2"	67,6	6,0	6,0	94,0
3/8"	62,7	5,5	11,5	88,5
#4	244,5	21,6	33,1	66,9
#10	290,0	25,6	58,6	41,4
#40	298,8	26,4	85,0	15,0
#80	83,1	7,3	92,3	7,7
#200	52,0	4,6	96,9	3,09
FONDO	35,0	3,1	100,0	0,00

1" | 1 1/2 | 3/4 | #4 | #10 | #40 | #80 | #200

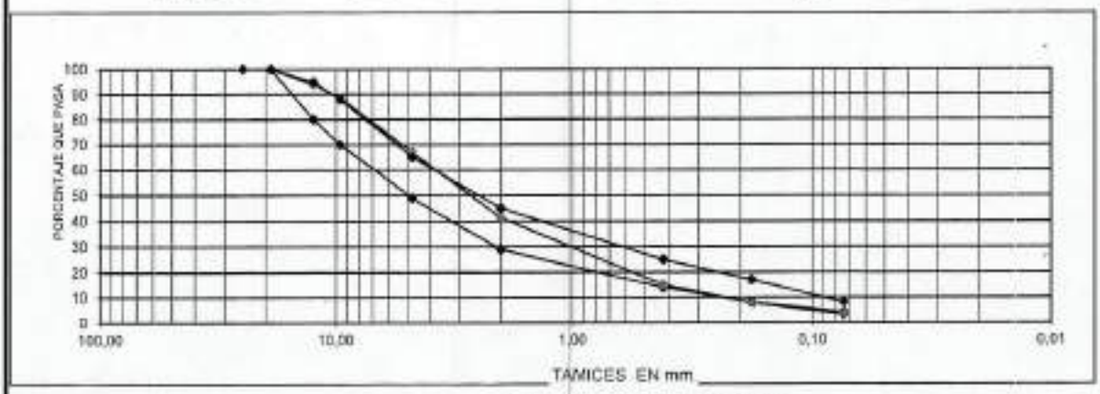

		DENSIDAD	ESTABILIDAD - FLUJO			
BRIQUETA	1	2	3			
MATERIAL						
ESPESOR BRIQUETA mm	65,0	65,0	64,0			
PESO NUCLEO SOLA EN AIRE gr.	1201,0	1201,2	1200,6			
PESO NUCLEO EN EL AGUA	676,5	675,0	676,4			
PESO SUPERFICIALMENTE SECO	1.206,3	1.205,0	1.204,8			
VOLUMEN NUCLEO cm^3	528,8	530,0	528,4			
DENSIDAD gr/cm^3	2,271	2,266	2,272			
FACTOR DE CORRELACION	0,96	0,96	0,96			
ESTABILIDAD MEDIDA Kgf	1539	1522	1520			
ESTABILIDAD CORREGIDA kgf	1.477	1.461	1.460			
FLUJO (1/100 pulgadas)	13,0	13,0	13,0			

PROMEDIOS

ESTABILIDAD :	1.476 Kgf	14,48	KN
FLUJO :	13,0 (1/100 pulg)	3,3	mm
DENSIDAD :	2,270 gr/cm^3		
RELACION ESTABILIDAD FLUJO:		4,4	KN/mm

OBSERVACIONES:

ENSAYO: E.R.M	Reviso:	Aprobo: Ing. Ma. Patricia Ayala G. Esp. Ingeniería de Pavimentos U.M.N.G.

Urbanización Onzaga Mz 12 Ca 2 Tel. - 311-5135146
Ibagué - Tolima
laboratorio.ingeolab.ibague@gmail.com

686

Ingeolab SAS
Consultoria
SUELOS-ASFALTOS-CONCRETOS

ENSAYO DENSIDAD EN EL TERRENO METODO DEL CONO Y ARENA

COD. ENSAYO IC-D-062/26

PROYECTO:	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMNISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2"**		
INTERESADO:	**CONSORCIO VIAS IBAGUE**	FECHA	TOMA MUESTRA ABRIL .02/26
MATERIAL	**BASE GRANULAR**	CANTERA:	ARENAS Y GRAVAS DE COLOMBIA

ENSAYO No:	1	2			
TIPO MATERIAL	BASE	BASE			
UBICACION	**CALLE 80 ENTRE CARRERA 11A Y AVENIDA AMBALA BARRIO SAN FRANCISCO**				
ABSCISA	K:0+210	K:0+160			
LADO EN LA VIA	EJE	IZQ			
PESO FRASCO Y ARENA INICIAL gr.	5820	5805			
PESO FRASCO Y ARENA RESTANTE gr.	2015	2110			
PESO ARENA TOTAL USADA gr.	3805	3695			
CONSTANTE DEL CONO	1600	1600			
PESO ARENA EN EL HUECO gr.	2205	2095			
DENSIDAD DE LA ARENA gr/cm^3	1,405	1,405			
VOLUMEN DEL HUECO cm^3	1569	1491			
PESO MATERIAL EXTRAIDO HUMEDO gr.	3540	3370			
% DE HUMEDAD	7,1	6,4			
PESO MATERIAL EXTRAIDO SECO gr.	3305	3167			
DENSIDAD DEL MATERIAL gr/cm^3	2,106	2,124			
DENSIDAD MAX. LABORATORIO gr/cm^3	2,148	2,148			
% DE HUMEDAD OPTIMA LABORATORIO	7,8	7,8			
% DE COMPACTACION TERRENO	98,0	98,9			
% DE COMPACTACION ESPECIFICADA					

OBSERVACIONES :

ENSAYO:	DIGITO:	APROBO
Ing. E.R.M	In J.C.V.	Ing. Eduin Rodriguez M.

Urbanización Onzaga Mz 12 Ca 2 Tel. 311-5135146
Ibagué - Tolima
laboratorioingeolabibague@gmail.com

687

Ingeolab SAS
Consultoria
SUELOS-ASFALTOS-CONCRETOS

ENSAYO DENSIDAD EN EL TERRENO METODO DEL CONO Y ARENA

COD. ENSAYO IC-D-049/26

PROYECTO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMNISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2"		
INTERESADO:	CONSORCIO VIAS IBAGUE	FECHA	TOMA MUESTRA MARZO .17/26
MATERIAL	BASE GRANULAR	CANTERA:	ARENAS Y GRAVAS DE COLOMBIA

ENSAYO No:	1	2			
TIPO MATERIAL	BASE	BASE			
UBICACION	CALLE 80 ENTRE CARRERA 11A Y AVENIDA AMBALA BARRIO SAN FRANCISCO				
ABSCISA	K:0+155	K:0+115			
LADO EN LA VIA	EJE	IZQ			
PESO FRASCO Y ARENA INICIAL gr.	6130	6130			
PESO FRASCO Y ARENA RESTANTE gr.	2125	2045			
PESO ARENA TOTAL USADA gr.	4005	4085			
CONSTANTE DEL CONO	1600	1600			
PESO ARENA EN EL HUECO gr.	2405	2485			
DENSIDAD DE LA ARENA gr/cm^3	1,405	1,405			
VOLUMEN DEL HUECO cm^3	1712	1769			
PESO MATERIAL EXTRAIDO HUMEDO gr.	3810	3965			
% DE HUMEDAD	4,7	5,3			
PESO MATERIAL EXTRAIDO SECO gr.	3639	3765			
DENSIDAD DEL MATERIAL gr/cm^3	2,126	2,129			
DENSIDAD MAX. LABORATORIO gr/cm^3	2,148	2,148			
% DE HUMEDAD OPTIMA LABORATORIO	7,8	7,8			
% DE COMPACTACION TERRENO	99,0	99,1			
% DE COMPACTACION ESPECIFICADA					

OBSERVACIONES :

ENSAYO:	DIDIGITO:	APROBO
Ing. E.R.M	In J.C.V.	Ing. Eduin Rodriguez M.

Urbanización Onzaga Mz 12 Ca 2 Tel. 311-5135146
Ibagué - Tolima
laboratorioingeolabibague@gmail.com

688
