25/MAY/2026 APERTURA DE BITACORA PARA LIBRO Nº1 DE REVISIONES DE OBRA PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL, CON EL FIN DE REGISTRAR INCIDENCIAS, EVENTUALIDADES, AVANCES DE OBRA E INCONVENIENTES EN EL DESARROLLO DE LA OBRA.

INTERVENTORIA PROCESO SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA Nº13 DE 2026 - FRR

CEL: 318-5772756

PERSONAL. REPRESENTANTE LEGAL CARLOS AUGUSTO REYES M.

RESIDENT INTERVENTORIA. RUTH ESTELLA REYES M.

RAZON SOCIAL. Unión Temporal Inter HCBR

" " " " " "

CONTRATISTA. PROCESO: SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA Nº2 DE 2026

PERSONAL: REPRESENTANTE LEGAL. ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA.

RESIDENTE DE OBRA CARLOS HUMBERTO ARAGON R

MAESTRO DE OBRA. BRAYAN STEVEN ZULETA. H.

" " " " " "

INICIAN ACTIVIDADES A LAS 8:00 AM DENTRO DEL EDIFICIO DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SANTANDER, UBICADO EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA EN LA CALLE 35 Nº 12-54 EN EL PISO 6TO PARA REALIZAR REPLANTEO DE LAS ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA.

POSTERIORMENTE SE PROCEDE LO MISMO EN EL PISO 6TO EL CUAL TAMBIEN SE ENCUENTRA DENTRO DEL ALCANCE DEL CONTRATO

TAMBIEN SE REVISAN LAS CANTIDADES DEL PISO MARQ

PARTIENDO DE LAS NECESIDADES ENCONTRADAS A PARTIR DE LO EXPUESTO POR LA COORDINADORA DE MANTENIMIENTO

EL CONTRATISTA A PARTIR DE LAS MEDIDAS TOMADAS EN SITIO QUEDO EN REALIZAR LOS AJUSTES A LOS PRESUPUESTO CON EN FIN DE DAR PRIORIDAD A LAS NECESIDADES MAS URGENTES DEL CONTRATO.

SIENDO LAS 10:30 AM TODOS NOS RETIRAMOS A REALIZAR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS


RUTH S REYES
INTERVENTORIA

JHON ALEXANDER MELA
CONTRATISTA

9 JUNIO/2026 Se inician actividades a las 7:16 Pm con la descarmada de los los muebles modulares

Se Presentan Carlos Humberto Aragon.- Jhon Alexander Mega - Juan David Esteban. Santiago Andres Olivero. - Maria Yuliet Guerrero

002

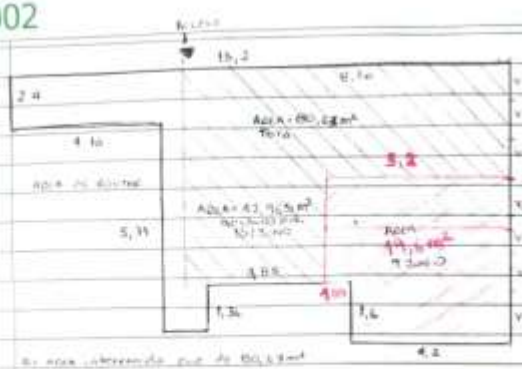


El area intervenida fue de 80,68m²
se inicio el demolido con la remocion a estructura de concreto alrededor
existe en el lugar de mantenimiento en su posicion
Simultaneamente se inicio trabajos de piso, verificando que la placa no tenga
y con seguridad apropiada de acuerdo al concepto de nivelacion
existente. El area a demoler es AREA TOTAL DE 49,6m² PARA EL PISO
y de concreto
A las 10 a.m llega Hernando Lopez Zapata
Tambien se realiza el retiro de 4 luminarias
El personal se retira de las instalaciones de la obra 5:00 pm

Firma y cargo — Juan Alexander Mejia

5/Sep/2025 A las 6 a.m se presentan en obra e inician labores Juan David Esteban y Jeferson Lopez Zapata quienes inician continuando con el ranqueo del piso desde el lugar donde dejaron el dia anterior Con la ayuda Hernan el celador

A las 8 a.m llega y se integran a las actividades Juan Alexander Mejia Ramirez y el Guarnero para iniciar el proceso de recoleccion de escombros en sacos



m³ recogidos en 100 sacos
2,8200 m³
El area total de demolicion
Piso 42,965m
Se observa que la placa tiene
dos capas que van de 0,07
Piso a los 0,14 m de profund. del

003

a Mejia Ramirez de entrega de la obra a las 5:00 a.m

11 Junio 2025 Se inician labores a 6:15 a.m con Juan David Esteban - Jeferson Lopez y Santiago Andres Olivares quien continua con el taqueo de ductos para evitar que el material particulado afecte del sistema del aire acondicionado

Se continua con la recoleccion de escombros en sacos y con la demolicion de piso en 100 sacos mas


A las 7:29 a.m llega Juan Alexander Mejia llega con 100 sacos mas

Se realizan 18,065m² de demolicion de piso y se recogio 2,820 m³ de escombros 7,029m³ en 2 cargas

Se terminan actividades a las 11 a.m

12 Junio 2025 Se inician labores a las 6:00 a.m con Juan David Esteban - Jeferson Lopez - Santiago Andres Olivares con el mantenimiento de los modulares para descargar la siguiente area

Llega 8:00 a.m llega Juan Alexander Mejia

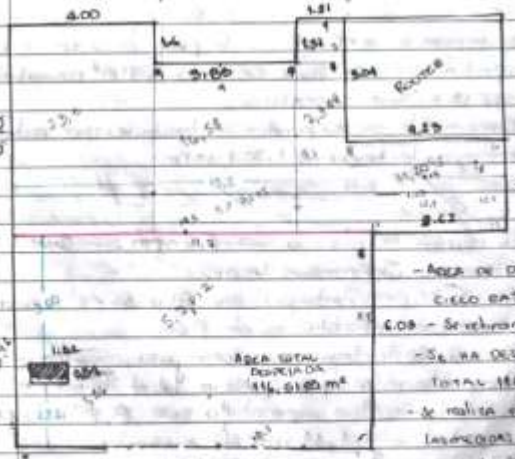

- AREA DE DEMOLER DE CIELO RASO 36,8855 m²
6:00 - Se retiran 3 luminarias
- Se ha despejado un area total 96,0180 m²
- Se realiza limpieza de escombros y se hace el aseo correspondiente

Terminan Actividades a las 5:00 pm y el personal se retira de obra.

Juan Alexander Mejia

004

16 Junio 2026 Se inician labores con Juan David Esteban y Jeferssson Lopez con la demolicion de piso a las 6:40 Pm
-Se retira 1 luminaria de la nueva zona de demolicion de piso
-En total se demolieron 9,73m² equivalentes 0,615 m³ de escombros
A las 8:14 Pm se suspenden actividades debido a un daño electrico originado por trabajos propios de la obra No fue posible solucionarlo de inmediato ya que el tablero general esta cerca a la subestacion del edificio y el acceso esta restringido unicamente al personal autorizado por la administracion quien no otorgo el permiso en el momento.

17 Junio/2026
Se informa que ya se solucionó el problema electrico y que se puede continuar con las labores
Se inician labores a las 6:20 Pm con Juan David Esteban y Jeferssson Lopez para continuar con la demolicion de piso 9,71m² equivalentes a 0,613 m³ de escombros
Nuevamente se suspenden Actividades por falta de energia electrica a las 7:19 Pm.

18 Junio/2026 Se inician labores a las 6:26 Pm con Juan David Esteban - Jeferssson Lopez
A las 6:35 Pm Santiago Andres Oliveros - se inician estos labores de demolicion de Piso.
A las 7:20 Pm llegan con Sacos para recoger escombros Jhon Alexander Mesa y Mario Yuliet Guerrero. (200 Sacos)
El total de Piso demolido fue 8,55m² para un total de 1,11 m³ de escombros
A las 8:08 Pm se suspenden Actividades por Ausencia de energia electrica en el piso 5 - Nuevamente se presenta un corto

005

19 Junio 2026 Se inician Actividades a las 6:20 Pm con Juan David Esteban Jeferssson lopez y Santiago Andres Oliveros con la recoleccion de escombros.
A las 7:10 Pm llega Jhon Alexander Mesa con 150 Sacos mas y con el motomalla para seguir demoliendo pisos.
Para un total de piso demolido 16,8856m² para un total de 1,970 m³ de escombros
Se recogieron un total de 350 sacos y en el momento ya hay 680 sacos de escombros por sacar
Se terminan actividades a las 12 Am. y el personal se retira de la obra.

22 Junio 2026 Se inician actividades Jeferssson lopez y Santiago Andres Oliveros que llegaron a las 6:36 Pm
Posteriormente llega Juan David Esteban y Jhon Alexander Mesa quienes inician pasando niveles para tener una idea de como se encuentra el piso
Se notifico a la interventoria que a las 8:00 Pm llega la bolqueta de placas JAJ-525 estibalet color verde de Propiedad de Martinez Alvarez CDS con cc 6348850942 conducido Por Jorge Vargas Forero con cc 1088749462 y con licencia de con fecha c/a vencimiento 21/07/2033 y C2 con fecha de vencimiento 21/07/2028
se terminan bajando el retador de unos 400 sacos de escombros
se terminan actividades a la 1 Am y el personal se retira de la obra

23/Junio 2026 Se inician labores a las 6:05 Pm con Juan David Esteban, Jeferssson Lopez, Kevin Manuel Guerrero, David Leonardo Quintero y Jhon Alexander Mesa quienes inician con la recoleccion de escombros faltantes.
Se retira 9,72 m³ de guarda escobas.
A las 7:00 Pm llega Santiago Andres Oliveros para ayudar con la recoleccion de escombros para ir cargando en la volqueta JAJ 525
A las 1:00 Am se terminan actividades y se retira el personal

006

24 Junio 2026 Se inician actividades 6:15 Pm con Juan David Esteban y Jeffe
lopez para quitar la concreto de alpe de la ventanas
A las 6:55 llegan Kevin Manuel Guerrero y David leonardo
quintero
A las 7:40 llega Santiago Andres guerrero
850 llega la volqueta con 6m³ de arena a la cual todo
el personal la sube en sacos (Placas JAJ-525)
tambien llega Jhon Alexander Meza a cordinar las funciones
y a supervisar la calidad de la arena traida.
se suben en sacos la arena al quinto piso.
A la 1:00 Am se terminan las actividades y el personal
se retiran del sitio de trabajo

Ruth Reyes INTERVENTORA — Jhon Alexander Meza CONTRATISTA

25 Junio 2026 6:30 Pm se inician actividades con Juan David Esteban
y Jeferson lopez tomando medidas nuevamente sobre
los parederos
A las 7:05 llega Kevin Manuel Guerrero, David leonardo Quintero
y Jhon Alexander Meza con concreto 8 bultos
de cemento con la limpieza de la zona.
A las 7:28 llega Santiago Andres guerrero.
Alistamiento de Piso 14,6735 m² y 1,913 m³
Se terminan actividades a las 12 de la noche y el personal se
retira.

Ruth Reyes INTERVENTORA — Jhon Alexander Meza CONTRATISTA

26 Junio 2026 A las 6:20 Pm inician Actividades Juan David Esteban -
Jefferson lopez - Kevin Manuel Guerrero - David leonardo
Quintero y Jhon Alexander Meza con 12 bultos de Cemento
A las 8:15 Pm llega la volqueta con Placas JAJ-525 la cual trae
arena escombros y material adecuado para llenarlo a su dejo
de con final
Se continua con el Alistamiento de piso y se hacen 16,6936 m²
y con metros lineales 1,514 tomando altura promedio de 10cm
de espesor.
Se terminan actividades a las 2:30 Am y todo el personal se retira
de obra

Ruth Reyes INTERVENTORA — Jhon Alexander Meza CONTRATISTA

007

30 Junio 2026 Se inician actividades a las 5:05 Pm con Jhon Alexander Meza
Juan David Esteban, Kevin Manuel Guerrero, David leonardo
Quintero y Maria Yiliet Guerrero quien inician con el despeje de la zona
y haciendo la mezcla para continuar haciendo maestras para alistado del piso.
A las 6:30 llega Jeffersson lopez para ayudar en las actividades
Se retiran 8,61 m² de guarda escobas
A las 8:40 Pm llega la volqueta de Placas JAJ-525 con 6m³ de arena
y el personal presente la sube en sacos.
Tambien suben 5 bultos de cemento
y hacen 9,754 m² de Alistado de piso
Terminan Actividades a las 1 am y el personal se retira del
sitio de trabajo

Ruth Reyes INTERVENTORA — Jhon Alexander Meza CONTRATISTA

1 Julio 2026 Se inician actividades a las 6:20 con Kevin Manuel Guerrero, David
Leonardo Quintero, Juan David Esteban, Jeffersson lopez con
10 bultos de Cemento
Inician hacer mezcla para continuar con el alistado de Piso.
A las 8:19 Pm llegan Maria Yiliet Guerrero y Jhon Alexander Meza
Se realizan 48,85 m² de alistado de Piso.
Terminan Actividades y el personal se retira del sitio de trabajo
a las 1:30 Am.

Ruth Reyes INTERVENTORA — Jhon Alexander Meza CONTRATISTA

2 Julio 2026 A las 6:12 Pm inician actividades Kevin Manuel Guerrero, David Leonardo Quintero
Juan David Esteban y Jeffersson lopez con la limpieza del sector a
continuar.
A las 7:50 Pm llega Jhon Alexander Meza con con 20 bultos de cemento
para continuar realizando el alistado de piso
Se hace de Alistado de Piso 50,49 m²
Se terminan Actividades a las 9 Am y el personal se retira del
sitio de trabajo

Ruth Reyes INTERVENTORA — Jhon Alexander Meza CONTRATISTA

5 Julio 2026 La interventoria se entero en el comite de obra realizado a las 3.00 Pm que el personal del contratista se encuentra laborando sin supervicion. A las 5:45 Al llegar la interventoria encuentra a Juan David Jepersson lopez, David Leonardo Guerrero y Kevin Manuel Guerrero realizando el movimiento del escombro de la registraduria y se toma la evidencia de lo encontrado A las 6:10 Pm se reta Jeperssons lopez.
Me comunican que ellos estan laborando desde la 1 Pm
Siendo las 8:28 Pm el personal se retira de obra y dan por terminada la jornada

Ruth E Reyes INTERVENTORIA — Jhon Alexander Meza CONTRATISTA

6 Julio 2026 Siendo las 5:55 Pm el maestro Jhon Alexander Meza Notifica que el dia de hoy no realizara labores por no contar con el tomamartillo.
la interventoria espera confirmacion y se retira a las 6:42 Pm y se da por terminada la jornada

Ruth E Reyes INTERVENTORIA — Jhon Alexander Meza CONTRATISTA

7 Julio 2026 Se inician Actividades a las 7:09 Pm con el Maestro Alexander Meza, Juan David Esteban, Jeferson Lopez y Kevin Manuel Guerrero quienes inician labores de demolicion y recolecion de escombros Se notifica que David Leonardo Guerrero renuncio.
Me informan que van ha seguir realizando las labores como las llevaban y que el rotomartillo no les permite solo hacer un raspado de la concreto.
Se realizo 22,1 m² de demolicion de piso.
Se retiran a las 11:10 Pm por daño en la punta del rotomartillo. el personal da por terminada la jornada

Jhon Alexander Meza contratista

8 Julio 2026 Se inician labores a las 6:20 con el Maestro Jhon Alexander Meza, Juan David Esteban, Jeferson Lopez y Kevin Manuel Guerrero quienes realizan la demolicion de piso

realizando 69,08 m² y de guarda escobas 15,86 mL
Terminan actividades a las 8:50 Am y el personal se retira del Lugar de trabajo.

Ruth Reyes INTERVENTORIA — Jhon Alexander Meza CONTRATISTA

9 Julio 2026 Se inician actividades de recolecion de escombros a las 6:35 Pm con Juan David Esteban, Jeferssons lopez y Kevin Manuel Guerrero quienes recogen los escombros en sacos 6,9934 m³ de escombros aproximadamente cargado como base promedio 0,10 m de profundidad
Durante este proceso tambien retiran 16,57 mL de guarda escobas
El personal se retira del sitio de trabajo y las 12 asi la jornada

Ruth E Reyes - INTERVENTORIA — Jhon Meza - CONTRATISTA

10 Julio 2026 Se inician labores a las 6:15 Pm con la recolecion de escombros y la preparacion de mezcla con Juan David Esteban, Jeferssons lopez y Kevin Manuel Guerrero
A las 7:40 Pm llega Santiago Andres Oliberos e inician a llenar sacos y A la espera de la volqueta para la salida de escombros.
A las 8:25 Pm llega la placa Maqueta de Placa JAJ525 para la recolencion de los escombros. se llenan al rededor de 400 sacos
A las 8:35 Pm llega el maestro Jhon Alexander Meza con 10 bultos de cemento y la perfileria para realizar el cielo raso a la armazon.
Se recogen 15,39 m² de escombros equivalente a 1,38 m³ de escombros y se realizan los maestras que equivalen a 5,8453 de alistado de piso y 12,99 mL de guarda escobas.
El personal termina labores a las 3:30 Am y se retiran de la obra por ejecucion de actividades

Ruth Reyes INTERVENTORIA — Jhon Alexander Meza CONTRATISTA

11 Julio 2026 Se inician labores a las 2:15 Pm con Jeferssons lopez Juan David Esteban y Kevin Manuel guerrero quienes inician con la desinstalacion de cielo raso
A la 1:45 se les une Santiago Andres Oliberos y les ayuda con la recolecion de los escombros pulientes y con el resto

no del armazon del cielo raso.
se recojen 6.9942 m² de escombros equivalente 0,699 m³
se retiro 81.69 m² de cielo raso con su estructura de amarre o esqueleto.
se inician labores de armado de cielo raso con la ayuda del Maestro Jhon Alexander Mesa quien llega a las 2:20 Pm. se coloca el perfil perimetral de la zona en contruccion y seis (6) listones
A las 8:40 Pm llega la volqueta de placas JAJ 525 para la recoleccion de escombros, se bajan los sacos faltantes y las laminas retiradas de cielo raso.
Terminan actividades a las 4:50 Pm y el personal se retira del lugar de trabajo.

RUTH E REYES INTERVENTORIA — JHON ALEXANDER MEJIA CONTRATISTA

12 Julio 2026 Se inician Actividades a las 8:51 Am con Jhon Alexander Mesa, Juan David Esteban, Jeferson lopez, Kevin Manuel Guerrero con formado de la estructura para soporte del cielo raso se realizaron 122.11 m² de la estructura el personal se retira a 5:55 Pm terminada la actividad y se retiran de lugar de trabajo.

RUTH E REYES INTERVENTORIA — JHON ALEXANDER MEJIA CONTRATISTA

13 Julio 2026 Se inician Actividades a las 8:28 Am con Jhon Alexander Mesa, Jeferson lopez, Kevin Manuel Guerrero, Juan David Esteban con la inspeccion de la parte electrica y la verificacion de circuitos de caja
Se nivela la estructura del cielo raso y se realiza mezcla para realizar 24,54 m² de alistado de piso.
Se espera la llegada de la volqueta de Placas JAJ 525 con un viaje de arena de 4 m de arena
1 cuñete de pintura ultra blanco tipo 1 marca topex y un cuñete de pintura estuco supermarfil y 10 bultos de cemento marca cemex
A las 4:10 Pm llega la volqueta y el personal procede a llenar costales y subir la arena
Se Terminan Actividades y el personal se retira

de dejar a las 6:00 Pm

14 Julio 2026 Se inician actividades a las 1:30 Pm Con Jhon Alexander Mejia, Juan David Esteban, Jeferson lopez, Kevin Manuel Gutierrez, quienes inician con la primera mano de estuco a las paredes posteriores 21.8 m²
Tambien se realizan 19,49 m² de alistado de piso
Se traen 6 bultos de cemento y 20 paquetes de 6 laminas de cielo raso blanco brillante.
Siendo las 11:30 Pm el personal se retira de la obra y termina su jornada

15 Julio 2026 Se inician actividades a la 1:20 Pm con el lijado de las paredes estucadas con Juan David Esteban, Jeferson lopez y Kevin Manuel Guerrero y se aplica primera mano de pintura T1 p61
A las 3:20 llega el maestro Jhon Alexander Mejia con Maria Yolet Guerrero e inician la instalacion del cielo raso
Mientras se pinta y resana la pared despues de la entrada y que conecta con el baño. 10,7 m² estuco y se Pinta primera mano 20,8 m²
Se inicia la instalacion de cielo raso y se trae cable # 12 AWG contelco para hacer los estenderos para prender las lamparas del techo
Y otro grupo realiza alistado de piso 15,81 m², se desmontan 20 luminarias y se colocan 80 m² de lamina de cielo raso. Se traen 6 bultos de cemento.
Todos se retiran a las 8:30 Pm y se da por terminada la jornada de trabajo.

16 Julio 2026 Se inician actividades a las 8:10 Am con Juan David Esteban Jeferson lopez, Kevin Manuel Guerrero y Jhon Alexander Mejia quienes continuan con el armado de cielo raso completando un area de 11.21 m² y con la colocacion de la lamina de este mismo para armar un total de 68,35 m².

012

Siendo las 5:00 Pm el personal se retira de la obra y da por terminada su jornada.

17 Julio 2026 El personal inicia labores a la 8:20 Am con Juan David Esteban, Kevin Manuel Guerrero, Jeperson Lopez para terminar el alistado de piso realizando 9,94 m² A las 10:20 Am llega el experto en electricidad el Ing. Hernan Reyes Paredes con el auxiliar Jose de Jesus Vega enviados por parte de la interventoria para realizar el Analisis electrico de los diferentes pisos a intervenir a los cuales con el Maestro Jhon Alexander Meza se revisa el recorrido y se revisan el estado de cada uno de las cajas de distribucion y las posibles soluciones para cada uno de los pisos.
① se queda de compromiso por parte del maestro realizar un bosquejo donde muestre la direccion por donde pasara cada uno de los circuitos y su distribucion.
② El ing. Hernan realizara un reporte de lo encontrado
El personal experto se retira a la 12:30Pm.
Se continua con labores de estuco de 3,62 m²
Siendo las 2:50 Pm se da por terminada las actividades y se queda a la espera de la llegada del paso a Porcelanato.
Se ingresan 8 bultos de cemento a las 9:00 am.

21 Julio 2026 Se inician labores a las 6:15Pm con Jeperson Lopez, Kevin Manuel guerrero, Juan David Esteban retirando el adhesivo de la parte de afuera y del patio de las bases del medio 6,82 m² y se realiza el armado de este mismo para fundir
Se realiza el armado de esta zona para la colocacion del Estructural del PVC A las 8:05 llega el maestro Jhon Alexander Meza
A las 8:10 Pm llegan 41 Cajas de Porcelanato de 61x61 cm equivalente a 2,23 m². por cada caja
Se colocan las laminas de PVC junto a la ventana para un total de 6,81 m² los cuales no afectan la distribucion

013

de las luminarias.
A las 10:20 Pm se terminan actividades y el personal se retira de la obra.

22 Julio 2026 Se inician actividades a las 9:29 Am llegan con 20 sacos de 20 kg de Pegante para porcelanato.
El personal en obra son Juan David Esteban, Kevin Manuel Guerrero y Jeperson Lopez con el maestro Jhon Alexander Meza: inician la instalacion del piso y se realizan 30,6 m²
A la instalacion del piso y se colocan 6 ml de guarda escobas en la Parte del lado del Bano Sedonde 11 bulto de Pegante para porcelanato y una trimestre
Se terminan actividades a las 6:30 Pm y el personal se retira de la obra

23 Julio 2026 Se inician Actividades a las 8:40 Am con la instalacion de pisos con Jhon Alexander Meza, Juan David Esteban, Kevin Manuel Guerrero, Jeperson Lopez. Se realizan 36,1 m² de piso en porcelanato y la colocacion de 10,8 ml de porcelanato para guarda escobas se hace bisel a
Se realiza la segunda mano de pintura se realizan 31,2 m²
Se terminan actividades y el personal se retira de obra a las 4:40 Pm

24 Julio 2026 Se inician actividades a las 8:15 Am con Jhon Alexander Meza Juan David Esteban, Jeperson Lopez, Kevin Manuel Guerrero los cuales llegan con 6 bultos de arena
Se realiza la mezcla para terminar de hacer el alistado de piso faltante 2,99 m²
Se pica 9,5 m² de pañete y se repara y se estuca posteriormente se le agrega la primera mano de pintura una vez seco el estuco.
Se realiza la instalacion del porcelanato unos 20,30 m² y se instalan 10,80 ml de guarda escobas - de bisel lo realizado el dia anterior
Siendo las 4:40 Pm el personal se retira de obra y da por terminada la jornada

014

25 Julio 2026 Se inician actividades a las 8:10 Am con David Esteban, Jhan Alexander Mega, Jeferson Lopez, Kevin Manuel Guerrero continuan con la terminacion de pisos con el brecatado del dia anterior y se le da la segunda mano de pintura 1,5 donde se resane a las 9:30 Am se retira el maestro para traer el material para realizar la parte electrica se traen 80 tubos de 3 mL verdes, codos 90, 8 apagadores sencillos, 8 apagadores dobles, cajas de derivacion, las 40 luminarias con sus marcos cableado para realizar la actividad.

Se instalan 24,96 m² de porcelanato y se instalan 8 luminarias con una canalizacion en tuberia de 83,4 mL y de cableado 83,4 mL para dejar para la conexion en la caja de derivacion.

Siendo las 4:15 Pm el personal se retira del lugar de trabajo y se da por terminada la jornada

26 Julio 2026 Se inician actividades a las 8:20 Am con el armado de las estructuras patentes del cielo raso, se realizan 20,8 m² con Kevin Manuel Guerrero, Alexander Mega, Jhan David Esteban y Jeferson Lopez, y Maria Juliet Guerrero.

Se colocan 16m² de cielo raso, 6 luminarias, 18,6 mL de cableado y 18,6 mL de tuberia para cableado.

El personal se retira a las 4:30 Pm y se da por terminada la jornada

27 Julio 2026 Se inician Actividades a las 8:15 Am con Jhan Alexander Mega Jeferson Lopez, Kevin Manuel Guerrero y David Esteban.

Quienes inician con el estucado de la parte baja de la pared unido una vez pase de su secado se realiza la primera mano de pintura 4,96 m².

Se lleva la tercera mano de pintura al muro de atras 16,8 m² y se inicia el pasado de los elementos de la regata dura al espacio donde ya esta terminada

A las 12:15 Pm llega Maria Juliet Guerrero para en horas de la tarde con los demas muchachos realizar el armado

015

del area faltante del salon principal. Se realizan 47,8 m² de armado de cielo raso.

28 Julio 2026. Se inician actividades a las 6:45 Am con Jhan Alexander Mega, Maria Juliet Guerrero, Kevin Manuel Guerrero, Juan David Esteban y Jeferson Lopez quienes inician con el armado de la estructura en tuberia para la culminacion de las luminarias se instalan 4 luminarias y se inicia a colar el cieloraso con 24,3 m² de lamina.

A las 8:15 llega Jerson Solano y Jose Lopez para la reparacion de la luminaria y la revision de la parte electrica se instala 38,8 mL de tuberia conduit. Pvc y 40,8 mL de cable # 12 x 2, se instalan 14 luminarias mas, se instalan 4 metros de tuberia galvanizada. 8 cajas, 8 cajas de derivacion el tablero de breaker y 4 tacos nuevos

Tambien se da la segunda y tercera mano de pintura al sector debajo de la ventanilla unico 4,95m²

se realiza 8,68 m² de estructura del cielo raso en el sector del pasillo y segunda y se arregla el cieloraso 9,68 m² patentado por retiro se retiran 2 luminarias mas

Se instalan 24,6 m² de porcelanato

Siendo las 8:00 Pm el personal se retira de la obra y da por termida la jornada

29 Julio 2026 Inician labores Maria Juliet Guerrero, Jhan Alexander Mega, Kevin Manuel Guerrero, Jeferson Lopez, Juan David Esteban quienes inician con la instalacion de cielo raso se colocan 18,99 m² se estucan 9 m², se aplican 5,93 m² de la ultima mano de pintura tipo 1 se colocan 40,05 mL de cable #12, un breaker en el tablero existente para la conexion independiente para las luminarias del paso quinto.

Se instalan 1,2 mL de tuberia galvanizada para el tramo corriente del pasillo a la terraza y se instalan 8,05 mL de tuberia Pvc conduit.

se traen 15 bultos de pega porcelanato para continuar el apronte de

016

El personal se retira a las 8:00 Pm y se da por termina la jornada

30 Julio 2026 Se inician actividades desde las 6:15 Am con Jhon Alexander Mesa, Maria Juliet Guerrero, Juan David Esteban, Kevin Manuel Guerrero, Jeperesson Lopez

Se inician con la nivelacion de piso en porcelanato las brechas del piso que se instalo el dia anterior y se nivela 26,8 m² de piso y se retira 9,81 mL de guarda escobas se quitan las ultimas 2 luminarias

Se traen al medio dia 5 bultos de pegante para porcelanato y tres cajas de boquilla

Se termina el armado de cielorraso raso de 2,7 m² se entregan las paredes del fondo 22 m² y se leda la primera mano de pintura 41,4 m²

Se instalan las luminarias del pasillo al balcon 2. Antes de la salida se le da la segunda mano de pintura a los 41,4 m²

Siendo las 6:30 Pm el personal se retira de la obra y se da por terminada la jornada

31 Julio 2026 Se inician actividades a las 6:02 Am con Jhon Alexander Mesa, Juan David Esteban, Jeperesson Lopez, Kevin Manuel Guerrero, y Maria Juliet Guerrero

Se traen 2 bultos de pega porcelanato

Se inicia con la colocacion de la boquilla del piso instalado y con la colocacion de guarda escobas la limpieza debe ductos de ventilacion - las rejillas se realizan 30,4 mL de guarda escobas

Tambien se brecha el piso ya instalado y se realiza la colocacion del cielo raso del pasillo de los baños y los tabiques al lado del router

En horas de la tarde se inicia el limpiado de pisos para quitar el material sobrante de las brechas y dejar el piso Un. poco mas.

017

A las 3:27 Pm el Personal se retira del lugar de trabajo y se da por terminada la jornada

5 Agosto 2026 Se inician actividades a las 8 Am con Kevin Manuel Guerrero y Juan David Esteban quienes llegan con un galon de estuco para terminar el resane de paredes realizando 18,8 m² de estuco y aplicando primera mano de pintura una vez seco de 18,8 m² Tambien se instalan luminarias.

Al medio dia llegan con 2 bultos de pegante para porcelanato y realizan 2,45 m² de porcelanato y 3,8 mL de guarda escobas Siendo las 4:15 Pm se da por terminada la jornada y el personal se retira de obra.

6 Agosto 2026 El personal llega a las 8:46 Am con 4,7 m de cable Ternado libre de alogeno de conal cables Fe ecbal #12 AWG CU, una caja de 40 unidades de toma corriente doble. Red equipado naranjas y 10 toma corrientes doble tipo Americano con polo a tierra los 20 son de marca Cles y 4 paquetes de 2,00 mL de canaleta blanca de 32,4 - cinta paquete 8 unidades.

El personal que llego con este material fue Jhon Alexander Mesa, Kevin Manuel Guerrero, Juan David Esteban y Maria Juliet Guerrero

A las 10:15 Am llega Jeperesson lopez

Se realizan detallado de la brecha de los pisos, segunda mano de pintura de pasillo baños 8,48 m² y se instalan 28,8 mL de canaleta y 61,8 mL del cable ternado

A las 3:40 se da por terminada la jornada y el personal se retira de la obra.

8 Agosto 2026 El personal llega a las 8:50 hoy el personal Kevin Manuel Guerrero, Juan David esteban, Maria Juliet Guerrero y Jeperesson lopez con 1 bulto de pega porcelanato

A las 9:30 llega el Maestro Jhon Alexander Mesa con el granito y 4 bultos de pega para terminar las bodegas pequeñas
