ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 04

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024	**OBJETO DEL CONTRATO:**	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO III
BARRIO:	REPARCHEO		
FECHA DE CORTE:	5/05/2026		
CAPITULO: 1	**CÓDIGO DEL ITEM:** 1,1	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	NIVELACION, REPLANTEO Y SEÑALIZACION DE VIAS



LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES					TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	DESCRIPCIÓN	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	ML	M2	M3
				BARRIO VILLA SEVILLA								
NP	CRA 18 SUR CON CALLE 45 G	0,00	6,90	BOCACALLE VIA REFORZADO HACIA SOLEDAD	6,90	4,80					33,12	
NP	CRA 18 SUR CON CALLE 45 G	0,00	255,00	BOCACALLE DE VIA RADIO DE GIRO REFORZADO LADO DERECHO	2,63	1,62		0,5			2,13	
NP	CRA 18 SUR CON CALLE 45 G	0,00	255,00	BOCACALLE DE VIA RADIO DE GIRO REFORZADO LADO IZQUIERDA	2,87	1,45		0,5			2,08	
NP	CALLE 45 G ENTRE CRA 18 SUR Y 16 SUR	0,00	21,35	TRAMO DE VIA HACIA BARRAQUILLA	21,35	4,38					93,51	
NP	CALLE 45 G ENTRE CRA 18 SUR Y 16 SUR	0,00	21,35	TRAMO REFORZADO DE VIA HACIA BARRAQUILLA	3,36	4,38					14,72	
NP	CRA 18 SUR CON CALLE 45 G	0,00	5,60	BOCACALLE RADIO DE GIRO REFORZADO LADO DERECHO	5,60	1,90		0,5			5,32	
				BARRIO ME QUEJO								
NP	CRA 27 CON CALLE 79 INTERSECCION			BOCACALLE VIA	8,33	6,05					50,40	
				BOCACALLE VIA REFORZADO RADIO DE GIRO	7,65	6,00		0,5			22,95	
				BOCACALLE VIA REFORZADO RADIO DE GIRO	4,60	1,65		0,5			3,80	
				BOCACALLE VIA REFORZADO	4,50	6,00					27,00	
NP	CALLE 79 CON CRA 26 C			BOCACALLE VIA REFORZADO	20,60	2,00					41,20	
NP	CRA 27 SUBIDA A LA LOMA			TRAMO DE VIA	38,45	5,58					214,55	
				TRAMO DE VIA	14,00	3,25					45,50	
				TRAMO DE VIA	3,70	3,20					11,84	
				TRAMO DE VIA	8,45	3,27					27,63	
				TRAMO DE VIA	26,20	6,35					166,37	
NP	CRA 27 CON CALLE 82 B ESQUINA			TRAMO DE VIA ASFALTO	18,40	5,30					97,52	
NP	CRA 27 CON CALLE 82			BOCACALLE VIA ASFALTO REFORZADO	14,87	2,83					42,08	
				TRAMO DE VIA ASFALTO	14,22	2,60					36,97	
NP	CRA 27 CON CALLE 81 B			TRAMO DE VIA ASFALTO	25,22	5,23					131,90	
NP	CRA 27 CON CALLE 82 C ESQUINA			BOCACALLE VIA ASFALTO REFORZADO	3,47	5,20					18,04	
				TRAMO DE VIA ASFALTO	26,30	2,57					67,59	
				TRAMO DE VIA ASFALTO	23,04	2,74					63,13	
NP	CRA 27 CON CALLE 82 E ESQUINA			BOCACALLE VIA ASFALTO REFORZADO	14,60	5,36					78,26	
NP	CRA 27 CON CALLE 82 E ESQUINA			BOCACALLE VIA ASFALTO REFORZADO	19,70	2,65					52,21	
NP	CRA 27 CON CALLE 82 E ESQUINA			BOCACALLE VIA ASFALTO REFORZADO	12,00	2,59					31,08	
				BARRIO EL PRADO								
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 58 Y 57			Hueco 1	10,84	6,10					66,12	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 58 Y 57			Hueco 2	10,64	3,05					32,45	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 58 Y 57			Hueco 3	16,04	2,83					45,39	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 58 Y 57			Hueco 4	9,50	2,90					27,55	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 58 Y 57			Hueco 5	46,70	3,00					140,10	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 58 Y 57			Hueco 6 REFORZADO	4,84	3,00					14,52	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 58 Y 57			Hueco 7	3,56	3,80					13,53	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 58 Y 57			Hueco 8	12,20	2,90					35,38	

55.



LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES					TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	DESCRIPCIÓN	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	ML	M2	M3
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 57 Y 56			Hueco 1	6,00	5,85					35,10	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 57 Y 56			Hueco 2	11,54	5,84					67,39	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 57 Y 56			Hueco 3	51,50	2,91					149,87	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 57 Y 56			Hueco 4	23,00	2,85					65,55	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 57 Y 56			Hueco 5	8,09	5,84					47,25	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 57 Y 56			Hueco 6	11,30	2,85					32,21	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 57 Y 56			Hueco 7	2,30	3,55					8,17	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 56 Y 55			Hueco 1 REFORZADA	5,10	3,10					15,81	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 56 Y 55			Hueco 2	33,47	3,05					102,08	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 56 Y 55			Hueco 3	7,82	5,83					45,59	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 56 Y 55			Hueco 4 REFORZADA	8,22	5,99					49,24	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 56 Y 55			Hueco 5	17,20	6,35					109,13	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 56 Y 55			Hueco 6 REFROZADA	16,58	0,68		0,5			5,66	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 56 Y 55			Hueco 7	6,22	6,63					41,24	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 56 Y 55			Hueco 8	6,08	7,02					42,68	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 56 Y 55			Hueco 9	5,27	6,80					35,84	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 56 Y 55			Hueco 10	3,90	5,90					23,01	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 56 Y 55			Hueco 11 TRAMOS SIN FLUIDO	8,20	3,00					24,60	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 56 Y 55			Hueco 12 TRAMOS SIN FLUIDO	8,20	2,90					23,78	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 54 Y 55			Hueco 13 TRAMO SIN FLUIDO	78,00	3,00					234,00	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 52 Y 53 LADO DERECHO			Hueco 1	28,00	6,00					168,00	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 52 Y 53 LADO DERECHO			Hueco 2	23,00	6,00					138,00	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 52 Y 53 LADO IZQUIERDO			Hueco 3	59,00	3,00					177,00	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 50 Y 52 LADO IZQUIERDO			Hueco 1	9,50	6,15					58,43	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 46 Y 47 LADO DERECHO			Hueco 1	64,30	6,00					385,80	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 46 Y 47 LADO IZQUIERDO			Hueco 2	64,30	6,00					385,80	
		BARRIO EL PORVENIR										
NP	CALLE 72 CON CRA 43 INTERSEPCION			Hueco 1 DOS CARRILES LADO DERECHO	18,79	18,50					347,54	
NP	CALLE 72 CON CRA 43 INTERSEPCION			Hueco 1 DOS CARRILES LADO IZQUIERDO	18,00	18,00					324,00	
NP	CALLE 72 CON CRA 44 INTERSEPCION			Hueco 1 TODA LA INTERCEPCCION	27,50	12,00					330,00	
		BARRIO CAMPO ALEGRE										
NP	CALLE 84 A ENTRE CRA 41 B Y 41			Hueco 1	24,00	6,08					145,92	
				Hueco 2	27,70	3,08					85,32	
NP	CALLE 84 CON CR 38 (IGLESIA) PARTE BAJA			Hueco 1	43,70	6,10					266,57	
NP	CALLE 84 CON CR 38 (IGLESIA) PARTE ALTA			Hueco 1	19,30	6,20					119,66	
NP	CALLE 84 CON CR 38 (IGLESIA) PARTE ALTA			Hueco 1 RADIO DE GIRO	5,00	3,00		0,5			7,50	
NP	CALLE 84 A CON CRA 39 B			Hueco 1	18,25	6,30					114,98	
				Hueco 2	8,20	6,10					50,02	
				Hueco 3 RADIO DE GIRO	4,20	2,00					8,40	
				Hueco 4 RADIO DE GIRO	1,80	1,00		0,5			0,90	
				Hueco 5 RADIO DE GIRO	2,00	1,00		0,5			1,00	
NP	CARRERA 39 C CON CALLE 84 A			RADIO DE GIRO BOCACALLE	2,80	6,00		0,5			8,40	
		BARRIO CENTRO ALCALDIA										
NP	CALLE 35 ENTRE CRA 43 Y 44			Hueco 1	10,70	2,87					30,71	
				Hueco 2	4,40	2,31					10,16	
				Hueco 3	4,00	1,57					6,28	
				Hueco 4 RAMPA	3,25	4,00					13,00	
				Hueco 5 RAMPA	4,40	4,00					17,60	
				Hueco 6 RAMPA	4,50	4,60					20,70	
				Hueco 7 RAMPA	2,80	6,10					17,08	
												6.152,89

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE:
MP.

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

NOMBRE:
MP.

Versión: V1

Fecha Aprobación: 07/05/2025

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 04	CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO III
BARRIO:	REPARCHEO				
FECHA DE CORTE:	5/05/2026				
CAPITULO:	2	CÓDIGO DEL ITEM:	2,1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DEMOLICION DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL



LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES					TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	DESCRIPCIÓN	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	ML	M2	M3
BARRIO VILLA SEVILLA												
NP	CRA 18 SUR CON CALLE 45 G	0,00	6,90	BOCACALLE VIA REFORZADO HACIA SOLEDAD	6,90	4,80					33,12	
NP	CRA 18 SUR CON CALLE 45 G	0,00	255,00	BOCACALLE DE VIA RADIO DE GIRO REFORZADO LADO DERECHO	2,63	1,62		0,5			2,13	
NP	CRA 18 SUR CON CALLE 45 G	0,00	255,00	BOCACALLE DE VIA RADIO DE GIRO REFORZADO LADO IZQUIERDA	2,87	1,45		0,5			2,08	
NP	CALLE 45 G ENTRE CRA 18 SUR Y 16 SUR	0,00	21,35	TRAMO DE VIA HACIA BARRAQUILLA	21,35	4,38					93,51	
NP	CALLE 45 G ENTRE CRA 18 SUR Y 16 SUR	0,00	21,35	TRAMO REFORZADO DE VIA HACIA BARRAQUILLA	3,36	4,38					14,72	
NP	CRA 18 SUR CON CALLE 45 G	0,00	5,60	BOCACALLE RADIO DE GIRO REFORZADO LADO DERECHO	5,60	1,90		0,5			5,32	
BARRIO ME QUEJO												
NP	CRA 27 CON CALLE 79 INTERSECCION			BOCACALLE VIA	8,33	6,05					50,40	
				BOCACALLE VIA REFORZADO RADIO DE GIRO	7,65	6,00		0,5			22,95	
				BOCACALLE VIA REFORZADO RADIO DE GIRO	4,60	1,65		0,5			3,80	
				BOCACALLE VIA REFORZADO	4,50	6,00					27,00	
NP	CALLE 79 CON CRA 26 C			BOCACALLE VIA REFORZADO	20,60	2,00					41,20	
NP	CRA 27 SUBIDA A LA LOMA			TRAMO DE VIA	38,45	5,58					214,55	
				TRAMO DE VIA	14,00	3,25					45,50	
				TRAMO DE VIA	3,70	3,20					11,84	
				TRAMO DE VIA	8,45	3,27					27,63	
				TRAMO DE VIA	26,20	6,35					166,37	
NP	CRA 27 CON CALLE 82 B ESQUINA			TRAMO DE VIA ASFALTO	18,40	5,30					97,52	
NP	CRA 27 CON CALLE 82			BOCACALLE VIA ASFALTO REFORZADO	14,87	2,83					42,08	
				TRAMO DE VIA ASFALTO	14,22	2,60					36,97	
NP	CRA 27 CON CALLE 81 B			TRAMO DE VIA ASFALTO	25,22	5,23					131,90	
NP	CRA 27 CON CALLE 82 C ESQUINA			BOCACALLE VIA ASFALTO REFORZADO	3,47	5,20					18,04	
				TRAMO DE VIA ASFALTO	26,30	2,57					67,59	
				TRAMO DE VIA ASFALTO	23,04	2,74					63,13	

65.



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
NP	CRA 27 CON CALLE 82 E ESQUINA			BOCACALLE VIA ASFALTO REFORZADO	14,60	5,36					78,26	
NP	CRA 27 CON CALLE 82 E ESQUINA			BOCACALLE VIA ASFALTO REFORZADO	19,70	2,65					52,21	
NP	CRA 27 CON CALLE 82 E ESQUINA			BOCACALLE VIA ASFALTO REFORZADO	12,00	2,59					31,08	
		BARRIO EL PRADO										
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 58 Y 57			Hueco 1	10,84	6,10					66,12	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 58 Y 57			Hueco 2	10,64	3,05					32,45	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 58 Y 57			Hueco 3	16,04	2,83					45,39	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 58 Y 57			Hueco 4	9,50	2,90					27,55	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 58 Y 57			Hueco 5	46,70	3,00					140,10	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 58 Y 57			Hueco 6 REFORZADO	4,84	3,00					14,52	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 58 Y 57			Hueco 7	3,56	3,80					13,53	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 58 Y 57			Hueco 8	12,20	2,90					35,38	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 57 Y 56			Hueco 1	6,00	5,85					35,10	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 57 Y 56			Hueco 2	11,54	5,84					67,39	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 57 Y 56			Hueco 3	51,50	2,91					149,87	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 57 Y 56			Hueco 4	23,00	2,85					65,55	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 57 Y 56			Hueco 5	8,09	5,84					47,25	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 57 Y 56			Hueco 6	11,30	2,85					32,21	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 57 Y 56			Hueco 7	2,30	3,55					8,17	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 56 Y 55			Hueco 1 REFORZADA	5,10	3,10					15,81	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 56 Y 55			Hueco 2	33,47	3,05					102,08	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 56 Y 55			Hueco 3	7,82	5,83					45,59	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 56 Y 55			Hueco 4 REFORZADA	8,22	5,99					49,24	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 56 Y 55			Hueco 5	17,20	6,35					109,13	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 56 Y 55			Hueco 6 REFROZADA	16,58	0,68		0,5			5,66	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 56 Y 55			Hueco 7	6,22	6,63					41,24	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 56 Y 55			Hueco 8	6,08	7,02					42,68	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 56 Y 55			Hueco 9	5,27	6,80					35,84	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 56 Y 55			Hueco 10	3,90	5,90					23,01	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 56 Y 55			Hueco 11 TRAMOS SIN FLUIDO	8,20	3,00					24,60	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 56 Y 55			Hueco 12 TRAMOS SIN FLUIDO	8,20	2,90					23,78	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 54 Y 55			Hueco 13 TRAMO SIN FLUIDO	78,00	3,00					234,00	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 52 Y 53 LADO DERECHO			Hueco 1	28,00	6,00					168,00	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 52 Y 53 LADO DERECHO			Hueco 2	23,00	6,00					138,00	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 52 Y 53 LADO IZQUIERDO			Hueco 3	59,00	3,00					177,00	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 50 Y 52 LADO IZQUIERDO			Hueco 1	9,50	6,15					58,43	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 46 Y 47 LADO DERECHO			Hueco 1	64,30	6,00					385,80	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 46 Y 47 LADO DERECHO			Hueco 2 PLACAS DE ESPESOR ,45 DOBLES	6,00	3,00			6,00		108,00	

55.



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 46 Y 47 LADO IZQUIERDO			Hueco 2	64,30	6,00					385,80	
			BARRIO EL PORVENIR									
NP	CALLE 72 CON CRA 43 INTERSEPCION			Hueco 1 DOS CARRILES LADO DERECHO	18,79	18,50					347,54	
NP	CALLE 72 CON CRA 43 INTERSEPCION			Hueco 2 PLACAS DE ESPESOR ,45 DOBLES	18,50	3,78					70,00	
NP	CALLE 72 CON CRA 43 INTERSEPCION			Hueco 1 DOS CARRILES LADO IZQUIERDO	18,00	18,00					324,00	
NP	CALLE 72 CON CRA 44 INTERSEPCION			Hueco 1 TODA LA INTERCEPCCION	27,50	12,00					330,00	
			BARRIO CAMPO ALEGRE									
NP	CALLE 84 A ENTRE CRA 41 B Y 41			Hueco 1	24,00	6,08					145,92	
				Hueco 2	27,70	3,08					85,32	
NP	CALLE 84 CON CR 38 (IGLESIA) PARTE BAJA			Hueco 1	43,70	6,10					266,57	
NP	CALLE 84 CON CR 38 (IGLESIA) PARTE ALTA			Hueco 1	19,30	6,20					119,66	
NP	CALLE 84 CON CR 38 (IGLESIA) PARTE ALTA			Hueco 1 RADIO DE GIRO	5,00	3,00		0,5			7,50	
NP	CALLE 84 A CON CRA 39 B			Hueco 1	18,25	6,30					114,98	
				Hueco 2	8,20	6,10					50,02	
				Hueco 3 RADIO DE GIRO	4,20	2,00					8,40	
				Hueco 4 RADIO DE GIRO	1,80	1,00		0,5			0,90	
				Hueco 5 RADIO DE GIRO	2,00	1,00		0,5			1,00	
NP	CARRERA 39 C CON CALLE 84 A			RADIO DE GIRO BOCACALLE	2,80	6,00		0,5			8,40	
			BARRIO CENTRO ALCALDIA									
NP	CALLE 35 ENTRE CRA 43 Y 44			Hueco 1	10,70	2,87					30,71	
				Hueco 2	4,40	2,31					10,16	
				Hueco 3	4,00	1,57					6,28	
				Hueco 4 RAMPA	3,25	4,00					13,00	
				Hueco 5 RAMPA	4,40	4,00					17,60	
				Hueco 6 RAMPA	4,50	4,60					20,70	
				Hueco 7 RAMPA	2,80	6,10					17,08	
												6.330,90

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE:	NOMBRE:
MP.	MP.

Versión: V1


Fecha Aprobación: 07/05/2025

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 04

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO III
BARRIO:	REPARCHEO		
FECHA DE CORTE:	5/05/2026		
CAPITULO: 2	CÓDIGO DEL ITEM: 2,2	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL

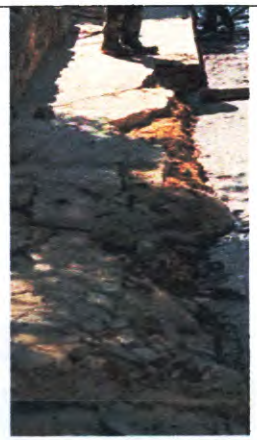

LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
NP	CRA 27 ENTRE CALLE 79 A CRA 83	0,00	200,00	ANDEN DE VIA	8,45	0,56					4,73	
				ANDEN DE VIA	20,60	0,74					15,29	
				ANDEN DE VIA	38,45	0,87					33,45	
				ANDEN DE VIA	38,45	0,85					32,68	
				ANDEN DE VIA	14,00	0,84					11,76	
				ANDEN DE VIA	8,30	0,76					6,31	
				ANDEN DE VIA	26,20	0,97					25,41	
				ANDEN DE VIA	31,00	0,84					26,04	
NP	CALLE 83 ME QUEJO			ANDEN DE VIA LADO DERECHO	9,90	1,14					11,24	
				ANDEN DE VIA LADO DERECHO	2,20	1,16					2,55	
				ANDEN DE VIA LADO DERECHO	51,40	0,95					48,83	
				ANDEN DE VIA LADO IZQUIERDO	52,50	1,04					54,43	
				ANDEN DE VIA LADO IZQUIERDO	12,00	0,88					10,56	
												283,28

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE:
MP.

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

NOMBRE:
MP.

Versión: V1

Fecha Aprobación: 07/05/2025

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 04

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO III
BARRIO:	REPARCHEO		
FECHA DE CORTE:	5/05/2026		
CAPITULO: 2	CÓDIGO DEL ITEM: 2,3	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DEMOLICION DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
BARRIO VILLA SEVILLA												
NP	CRA 18 SUR CON CALLE 45 G	0,00	15,00	BOCACALLE RADIO DE GIRO LADO BARRANQUILLA	15.00					15,00		
BARRIO ME QUEJO												
NP	CRA 27 ENTRE CALLE 79 A CRA 83	0,00	200,00	ANDEN DE VIA	8.45					8,45		
				ANDEN DE VIA	20.60					20.60		
				ANDEN DE VIA	38.45					38.45		
				ANDEN DE VIA	38.45					38.45		
				ANDEN DE VIA	14.00					14.00		
				ANDEN DE VIA	8.30					8.30		
				ANDEN DE VIA	26.20					26.20		
				ANDEN DE VIA	31.00					31.00		
NP	CALLE 83 ME QUEJO			ANDEN DE VIA LADO DERECHO	9.90					9.90		
				ANDEN DE VIA LADO DERECHO	2.20					2.20		
				ANDEN DE VIA LADO DERECHO	51.40					51.40		
				ANDEN DE VIA LADO IZQUIERDO	52.50					52.50		
				ANDEN DE VIA LADO IZQUIERDO	12.00					12.00		
												328,45

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE:	NOMBRE:
MP.	MP.

Versión: V1

Fecha Aprobación: 07/05/2025

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 04

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024	**OBJETO DEL CONTRATO:**	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO III
BARRIO:	REPARCHEO		
FECHA DE CORTE:	5/05/2026		
CAPITULO: 3	**CÓDIGO DEL ITEM:** 3,2	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL



LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES					TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	DESCRIPCIÓN	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	ML	M2	M3
BARRIO VILLA SEVILLA												
NP	CRA 18 SUR CON CALLE 45 G	0,00	6,90	BOCACALLE VIA REFORZADO HACIA SOLEDAD	6,90	4,80	0,20					6,62
NP	CRA 18 SUR CON CALLE 45 G	0,00	255,00	BOCACALLE DE VIA RADIO DE GIRO REFORZADO LADO DERECHO	2,63	1,62	0,20	0,5				0,43
NP	CRA 18 SUR CON CALLE 45 G	0,00	255,00	BOCACALLE DE VIA RADIO DE GIRO REFORZADO LADO IZQUIERDA	2,87	1,45	0,20	0,5				0,42
NP	CALLE 45 G ENTRE CRA 18 SUR Y 16 SUR	0,00	21,35	TRAMO DE VIA HACIA BARRAQUILLA	21,35	4,38	0,20					18,70
NP	CALLE 45 G ENTRE CRA 18 SUR Y 16 SUR	0,00	21,35	TRAMO REFORZADO DE VIA HACIA BARRAQUILLA	3,36	4,38	0,20					2,94
NP	CRA 18 SUR CON CALLE 45 G	0,00	5,60	BOCACALLE RADIO DE GIRO REFORZADO LADO DERECHO	5,60	1,90	0,20	0,5				1,06
BARRIO ME QUEJO												
NP	CRA 27 CON CALLE 79 INTERSECCION			BOCACALLE VIA	8,33	6,05	0,20					10,08
				BOCACALLE VIA REFORZADO RADIO DE GIRO	7,65	6,00	0,20	0,5				4,59
				BOCACALLE VIA REFORZADO RADIO DE GIRO	4,60	1,65	0,20	0,5				0,76
				BOCACALLE VIA REFORZADO	4,50	6,00	0,20					5,40
NP	CALLE 79 CON CRA 26 C			BOCACALLE VIA REFORZADO	20,60	2,00	0,20					8,24
NP	CRA 27 SUBIDA A LA LOMA			TRAMO DE VIA	38,45	5,58	0,20					42,91
				TRAMO DE VIA	14,00	3,25	0,20					9,10
				TRAMO DE VIA	3,70	3,20	0,20					2,37
				TRAMO DE VIA	8,45	3,27	0,20					5,53
				TRAMO DE VIA	26,20	6,35	0,20					33,27
NP	CRA 27 CON CALLE 82 B ESQUINA			TRAMO DE VIA ASFALTO	18,40	5,30	0,28					27,31
NP	CRA 27 CON CALLE 82			BOCACALLE VIA ASFALTO REFORZADO	14,87	2,83	0,28					11,78
				TRAMO DE VIA ASFALTO	14,22	2,60	0,28					10,35
NP	CRA 27 CON CALLE 81 B			TRAMO DE VIA ASFALTO	25,22	5,23	0,28					36,93
NP	CRA 27 CON CALLE 82 C ESQUINA			BOCACALLE VIA ASFALTO REFORZADO	3,47	5,20	0,28					5,05
				TRAMO DE VIA ASFALTO	26,30	2,57	0,28					18,93
				TRAMO DE VIA ASFALTO	23,04	2,74	0,28					17,68
NP	CRA 27 CON CALLE 82 E ESQUINA			BOCACALLE VIA ASFALTO REFORZADO	14,60	5,36	0,28					21,91
NP	CRA 27 CON CALLE 82 E ESQUINA			BOCACALLE VIA ASFALTO REFORZADO	19,70	2,65	0,28					14,62
NP	CRA 27 CON CALLE 82 E ESQUINA			BOCACALLE VIA ASFALTO REFORZADO	12,00	2,59	0,28					8,70

JD.



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
BARRIO EL PRADO												
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 58 Y 57			Hueco 1	10,84	6,10	0,20					13,22
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 58 Y 57			Hueco 2	10,64	3,05	0,20					6,49
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 58 Y 57			Hueco 3	16,04	2,83	0,20					9,08
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 58 Y 57			Hueco 4	9,50	2,90	0,20					5,51
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 58 Y 57			Hueco 5	46,70	3,00	0,20					28,02
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 58 Y 57			Hueco 6 REFORZADO	4,84	3,00	0,20					2,90
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 58 Y 57			Hueco 7	3,56	3,80	0,20					2,71
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 58 Y 57			Hueco 8	12,20	2,90	0,20					7,08
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 57 Y 56			Hueco 1	6,00	5,85	0,20					7,02
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 57 Y 56			Hueco 2	11,54	5,84	0,20					13,48
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 57 Y 56			Hueco 3	51,50	2,91	0,20					29,97
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 57 Y 56			Hueco 4	23,00	2,85	0,20					13,11
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 57 Y 56			Hueco 5	8,09	5,84	0,20					9,45
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 57 Y 56			Hueco 6	11,30	2,85	0,20					6,44
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 57 Y 56			Hueco 7	2,30	3,55	0,20					1,63
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 56 Y 55			Hueco 1 REFORZADA	5,10	3,10	0,20					3,16
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 56 Y 55			Hueco 2	33,47	3,05	0,20					20,42
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 56 Y 55			Hueco 3	7,82	5,83	0,20					9,12
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 56 Y 55			Hueco 4 REFORZADA	8,22	5,99	0,20					9,85
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 56 Y 55			Hueco 5	17,20	6,35	0,20					21,83
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 56 Y 55			Hueco 6 REFROZADA	16,58	0,68	0,20		0,50			1,13
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 56 Y 55			Hueco 7	6,22	6,63	0,20					8,25
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 56 Y 55			Hueco 8	6,08	7,02	0,20					8,54
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 56 Y 55			Hueco 9	5,27	6,80	0,20					7,17
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 56 Y 55			Hueco 10	3,90	5,90	0,20					4,60
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 56 Y 55			Hueco 11 TRAMOS SIN FLUIDO	8,20	3,00	0,05					1,23
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 56 Y 55			Hueco 12 TRAMOS SIN FLUIDO	8,20	2,90	0,05					1,19

55.



LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES					TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	DESCRIPCIÓN	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	ML	M2	M3
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 54 Y 55			Hueco 13 TRAMO SIN FLUIDO	78,00	3,00	0,05					11,70
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 52 Y 53 LADO DERECHO			Hueco 1	28,00	6,00	0,20					33,60
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 52 Y 53 LADO DERECHO			Hueco 2	23,00	6,00	0,20					27,60
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 52 Y 53 LADO IZQUIERDO			Hueco 3	59,00	3,00	0,20					35,40
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 50 Y 52 LADO IZQUIERDO			Hueco 1	9,50	6,15	0,20					11,69
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 46 Y 47 LADO DERECHO			Hueco 1	64,30	6,00	0,20					77,16
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 46 Y 47 LADO IZQUIERDO			Hueco 2	64,30	6,00	0,20					77,16
				BARRIO EL PORVENIR								
NP	CALLE 72 CON CRA 43 INTERSEPCION			Hueco 1 DOS CARRILES LADO DERECHO	18,79	18,50	0,20					69,51
NP	CALLE 72 CON CRA 43 INTERSEPCION			Hueco 1 DOS CARRILES LADO IZQUIERDO	18,00	18,00	0,20					64,80
NP	CALLE 72 CON CRA 44 INTERSEPCION			Hueco 1 TODA LA INTERCEPCCION	27,50	12,00	0,20					66,00
				BARRIO CAMPO ALEGRE								
NP	CALLE 84 A ENTRE CRA 41 B Y 41			Hueco 1	24,00	6,08	0,20					29,18
				Hueco 2	27,70	3,08	0,20					17,06
NP	CALLE 84 CON CR 38 (IGLESIA) PARTE BAJA			Hueco 1	43,70	6,10	0,20					53,31
NP	CALLE 84 CON CR 38 (IGLESIA) PARTE ALTA			Hueco 1	19,30	6,20	0,20					23,93
NP	CALLE 84 CON CR 38 (IGLESIA) PARTE ALTA			Hueco 1 RADIO DE GIRO	5,00	3,00	0,20	0,5				1,50
NP	CALLE 84 A CON CRA 39 B			Hueco 1	18,25	6,30	0,20					23,00
				Hueco 2	8,20	6,10	0,20					10,00
				Hueco 3 RADIO DE GIRO	4,20	2,00	0,20					1,68
				Hueco 4 RADIO DE GIRO	1,80	1,00	0,20	0,5				0,18
				Hueco 5 RADIO DE GIRO	2,00	1,00	0,20	0,5				0,20
NP	CARRERA 39 C CON CALLE 84 A			RADIO DE GIRO BOCACALLE	2,80	6,00	0,20	0,5				1,68
				BARRIO CENTRO ALCALDIA								
NP	CALLE 35 ENTRE CRA 43 Y 44			Hueco 1	10,70	2,87	0,20					6,14
				Hueco 2	4,40	2,31	0,20					2,03
				Hueco 3	4,00	1,57	0,20					1,26
				Hueco 4 RAMPA	3,25	4,00	0,20					2,60
				Hueco 5 RAMPA	4,40	4,00	0,20					3,52
				Hueco 6 RAMPA	4,50	4,60	0,20					4,14
				Hueco 7 RAMPA	2,80	6,10	0,20					3,42
												1.237,72

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE:
MP.

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

NOMBRE:
MP.

Versión: V1

Fecha Aprobación: 07/05/2025

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 8 0 0 1 0 2 0 1 8 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 04

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024	**OBJETO DEL CONTRATO:**	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO III
BARRIO:	REPARCHEO		
FECHA DE CORTE:	5/05/2024		
CAPITULO: 3	**CÓDIGO DEL ITEM:** 3,4	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
				BARRIO ME QUEJO								
NP	CRA 27 ENTRE CALLE 79 A CRA 83	0,00	200,00	ANDEN DE VIA	8,45	0,56	0,08				0,38	
				ANDEN DE VIA	20,60	0,74	0,08				1,22	
				ANDEN DE VIA	38,45	0,87	0,08				2,68	
				ANDEN DE VIA	38,45	0,85	0,08				2,61	
				ANDEN DE VIA	14,00	0,84	0,08				0,94	
				ANDEN DE VIA	8,30	0,76	0,08				0,50	
				ANDEN DE VIA	26,20	0,97	0,08				2,03	
				ANDEN DE VIA	31,00	0,84	0,08				2,08	
NP	CALLE 83 ME QUEJO			ANDEN DE VIA LADO DERECHO	9,90	1,14	0,08				0,90	
				ANDEN DE VIA LADO DERECHO	2,20	1,16	0,08				0,20	
				ANDEN DE VIA LADO DERECHO	51,40	0,95	0,08				3,91	
				ANDEN DE VIA LADO IZQUIERDO	52,50	1,04	0,08				4,35	
				ANDEN DE VIA LADO IZQUIERDO	12,00	0,88	0,08				0,84	
				BARRIO CAMPO ALEGRE								
NP	CALLE 84 CON CRA 38 IGLESIA			ANDEN DE VIA	21,50	6,00	0,40				51,60	
				ANDEN DE VIA	2,15	0,25	0,08				0,04	
NP	CRA 41 # 84 A - 04			ANDEN DE VIA	4,50	0,80	0,08				0,29	
NP	CALLE 84 A # 41 - 23			ANDEN DE VIA	2,90	0,60	0,08				0,14	
NP	CALLE 84 A # 41 - 29			ANDEN DE VIA	2,70	0,30	0,08				0,06	
NP	CALLE 84 A # 41 - 29 RAMPA			ANDEN DE VIA	3,50	0,60	0,08				0,17	
NP	CALLE 84 A # 41 - 35			ANDEN DE VIA	1,90	0,40	0,08				0,06	
NP	CALLE 84 A # 41 - 35			ANDEN DE VIA	2,80	0,15	0,08				0,03	
NP	CALLE 84 A # 41 - 41 RAMPA			ANDEN DE VIA	3,00	0,50	0,08				0,12	
NP	CALLE 84 A # 41 ESQ			ANDEN DE VIA	8,55	1,40	0,08				0,96	
NP	CALLE 84 A # 41 A - 14			ANDEN DE VIA	0,70	0,80	0,08				0,04	
NP	CALLE 84 A # 41 B - 32			ANDEN DE VIA	0,60	0,60	0,08				0,03	
NP	CRA 41 B # 84 A - 09			ANDEN DE VIA	2,40	0,30	0,08				0,06	
NP	CALLE 84 A # 41 B - 05			ANDEN DE VIA	4,00	2,00	0,08				0,64	
NP	CRA 41 B # 84 A - 16			ANDEN DE VIA	2,90	1,20	0,08				0,28	
												77,19

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE:
MP.

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

NOMBRE:
MP.

Versión: V1


Fecha Aprobación: 07/05/2025

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018 7

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 04

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO III
BARRIO:	REPARCHEO				
FECHA DE CORTE:	5/05/2026				
CAPITULO:	4	CÓDIGO DEL ITEM:	4,2	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	CONCRETO 1500 PSI PREMEZCLADO PARA BASE DE PAVIMENTO E=0,15

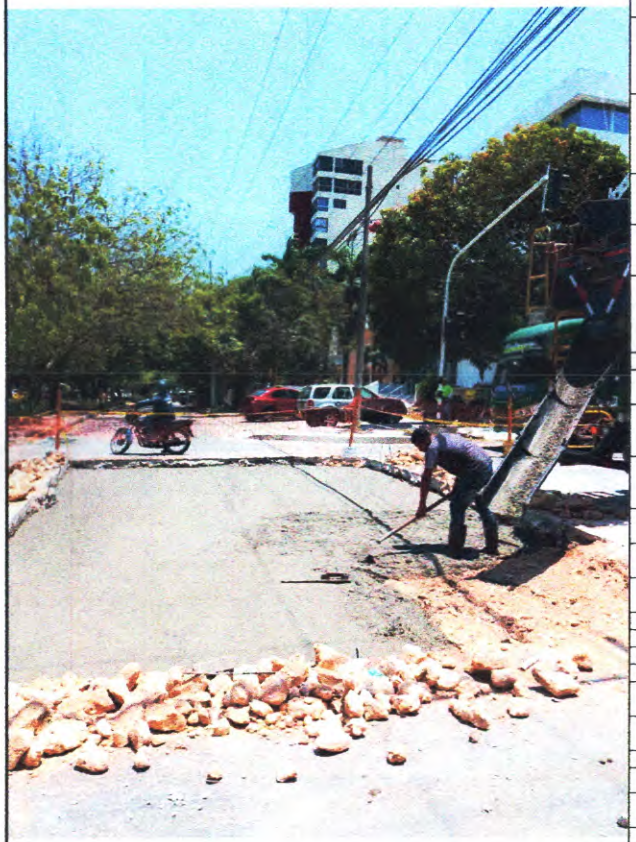

LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	ML	M2	M3
BARRIO VILLA SEVILLA												
NP	CRA 18 SUR CON CALLE 45 G	0,00	6,90	BOCACALLE VIA REFORZADO HACIA SOLEDAD	6,90	4,80					33,12	
NP	CRA 18 SUR CON CALLE 45 G	0,00	255,00	BOCACALLE DE VIA RADIO DE GIRO REFORZADO LADO DERECHO	2,63	1,62		0,5			2,13	
NP	CRA 18 SUR CON CALLE 45 G	0,00	255,00	BOCACALLE DE VIA RADIO DE GIRO REFORZADO LADO IZQUIERDA	2,87	1,45		0,5			2,08	
NP	CALLE 45 G ENTRE CRA 18 SUR Y 16 SUR	0,00	21,35	TRAMO DE VIA HACIA BARRAQUILLA	21,35	4,38					93,51	
NP	CALLE 45 G ENTRE CRA 18 SUR Y 16 SUR	0,00	21,35	TRAMO REFORZADO DE VIA HACIA BARRAQUILLA	3,36	4,38					14,72	
NP	CRA 18 SUR CON CALLE 45 G	0,00	5,60	BOCACALLE RADIO DE GIRO REFORZADO LADO DERECHO	5,60	1,90		0,5			5,32	
BARRIO ME QUEJO												
NP	CRA 27 CON CALLE 79 INTERSECCION			BOCACALLE VIA	8,33	6,05					50,40	
				BOCACALLE VIA REFORZADO RADIO DE GIRO	7,65	6,00		0,5			22,95	
				BOCACALLE VIA REFORZADO RADIO DE GIRO	4,60	1,65		0,5			3,80	
				BOCACALLE VIA REFORZADO	4,50	6,00					27,00	
NP	CALLE 79 CON CRA 26 C			BOCACALLE VIA REFORZADO	20,60	2,00					41,20	
NP	CRA 27 SUBIDA A LA LOMA			TRAMO DE VIA	38,45	5,58					214,55	
				TRAMO DE VIA	14,00	3,25					45,50	
				TRAMO DE VIA	3,70	3,20					11,84	
				TRAMO DE VIA	8,45	3,27					27,63	
				TRAMO DE VIA	26,20	6,35					166,37	
NP	CRA 27 CON CALLE 82 B ESQUINA			TRAMO DE VIA ASFALTO	18,40	5,30					97,52	
NP	CRA 27 CON CALLE 82			BOCACALLE VIA ASFALTO REFORZADO	14,87	2,83					42,08	
				TRAMO DE VIA ASFALTO	14,22	2,60					36,97	
NP	CRA 27 CON CALLE 81 B			TRAMO DE VIA ASFALTO	25,22	5,23					131,90	
NP	CRA 27 CON CALLE 82 C ESQUINA			BOCACALLE VIA ASFALTO REFORZADO	3,47	5,20					18,04	
				TRAMO DE VIA ASFALTO	26,30	2,57					67,59	
				TRAMO DE VIA ASFALTO	23,04	2,74					63,13	
NP	CRA 27 CON CALLE 82 E ESQUINA			BOCACALLE VIA ASFALTO REFORZADO	14,60	5,36					78,26	



LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES					TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	DESCRIPCIÓN	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	ML	M2	M3
NP	CRA 27 CON CALLE 82 E ESQUINA			BOCACALLE VIA ASFALTO REFORZADO	19,70	2,65					52,21	
NP	CRA 27 CON CALLE 82 E ESQUINA			BOCACALLE VIA ASFALTO REFORZADO	12,00	2,59					31,08	
			BARRIO EL PRADO									
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 58 Y 57			Hueco 1	10,84	6,10					66,12	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 58 Y 57			Hueco 2	10,64	3,05					32,45	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 58 Y 57			Hueco 3	16,04	2,83					45,39	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 58 Y 57			Hueco 4	9,50	2,90					27,55	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 58 Y 57			Hueco 5	46,70	3,00					140,10	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 58 Y 57			Hueco 6 REFORZADO	4,84	3,00					14,52	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 58 Y 57			Hueco 7	3,56	3,80					13,53	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 58 Y 57			Hueco 8	12,20	2,90					35,38	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 57 Y 56			Hueco 1	6,00	5,85					35,10	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 57 Y 56			Hueco 2	11,54	5,84					67,39	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 57 Y 56			Hueco 3	51,50	2,91					149,87	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 57 Y 56			Hueco 4	23,00	2,85					65,55	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 57 Y 56			Hueco 5	8,09	5,84					47,25	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 57 Y 56			Hueco 6	11,30	2,85					32,21	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 57 Y 56			Hueco 7	2,30	3,55					8,17	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 56 Y 55			Hueco 1 REFORZADA	5,10	3,10					15,81	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 56 Y 55			Hueco 2	33,47	3,05					102,08	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 56 Y 55			Hueco 3	7,82	5,83					45,59	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 56 Y 55			Hueco 4 REFORZADA	8,22	5,99					49,24	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 56 Y 55			Hueco 5	17,20	6,35					109,13	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 56 Y 55			Hueco 6 REFROZADA	16,58	0,68		0,5			5,66	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 56 Y 55			Hueco 7	6,22	6,63					41,24	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 56 Y 55			Hueco 8	6,08	7,02					42,68	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 56 Y 55			Hueco 9	5,27	6,80					35,84	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 56 Y 55			Hueco 10	3,90	5,90					23,01	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 52 Y 53 LADO DERECHO			Hueco 1	28,00	6,00					168,00	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 52 Y 53 LADO DERECHO			Hueco 2	23,00	6,00					138,00	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 52 Y 53 LADO IZQUIERDO			Hueco 3	59,00	3,00					177,00	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 50 Y 52 LADO IZQUIERDO			Hueco 1	9,50	6,15					58,43	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 46 Y 47 LADO DERECHO			Hueco 1	64,30	6,00					385,80	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 46 Y 47 LADO IZQUIERDO			Hueco 2	64,30	6,00					385,80	



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
				BARRIO EL PORVENIR								
NP	CALLE 72 CON CRA 43 INTERSEPCION			Hueco 1 DOS CARRILES LADO DERECHO	18,79	18,50					347,54	
NP	CALLE 72 CON CRA 43 INTERSEPCION			Hueco 1 DOS CARRILES LADO IZQUIERDO	18,00	18,00					324,00	
NP	CALLE 72 CON CRA 44 INTERSEPCION			Hueco 1 TODA LA INTERCEPCCION	27,50	12,00					330,00	
				BARRIO CAMPO ALEGRE								
NP	CALLE 84 A ENTRE CRA 41 B Y 41			Hueco 1	24,00	6,08					145,92	
				Hueco 2	27,70	3,08					85,32	
NP	CALLE 84 CON CR 38 (IGLESIA) PARTE BAJA			Hueco 1	43,70	6,10					266,57	
NP	CALLE 84 CON CR 38 (IGLESIA) PARTE ALTA			Hueco 1	19,30	6,20					119,66	
NP	CALLE 84 CON CR 38 (IGLESIA) PARTE ALTA			Hueco 1 RADIO DE GIRO	5,00	3,00		0,5			7,50	
NP	CALLE 84 A CON CRA 39 B			Hueco 1	18,25	6,30					114,98	
				Hueco 2	8,20	6,10					50,02	
				Hueco 3 RADIO DE GIRO	4,20	2,00					8,40	
				Hueco 4 RADIO DE GIRO	1,80	1,00		0,5			0,90	
				Hueco 5 RADIO DE GIRO	2,00	1,00		0,5			1,00	
NP	CARRERA 39 C CON CALLE 84 A			RADIO DE GIRO BOCACALLE	2,80	6,00		0,5			8,40	
				BARRIO CENTRO ALCALDIA								
NP	CALLE 35 ENTRE CRA 43 Y 44			Hueco 1	10,70	2,87					30,71	
				Hueco 2	4,40	2,31					10,16	
				Hueco 3	4,00	1,57					6,28	
				Hueco 4 RAMPA	3,25	4,00					13,00	
				Hueco 5 RAMPA	4,40	4,00					17,60	
				Hueco 6 RAMPA	4,50	4,60					20,70	
				Hueco 7 RAMPA	2,80	6,10					17,08	
												5.870,51

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE:	NOMBRE:
MP.	MP.

Versión: V1

Fecha Aprobación: 07/05/2025

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 04	CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO III
BARRIO:	REPARCHEO				
FECHA DE CORTE:	5/05/2024				
CAPITULO:	4	CÓDIGO DEL ITEM:	4,4	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLASTICO NEGRO



LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES					TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	DESCRIPCIÓN	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	ML	M2	M3
BARRIO VILLA SEVILLA												
NP	CRA 18 SUR CON CALLE 45 G	0,00	6,90	BOCACALLE VIA REFORZADO HACIA SOLEDAD	6,90	4,80					33,12	
NP	CRA 18 SUR CON CALLE 45 G	0,00	255,00	BOCACALLE DE VIA RADIO DE GIRO REFORZADO LADO DERECHO	2,63	1,62		0,5			2,13	
NP	CRA 18 SUR CON CALLE 45 G	0,00	255,00	BOCACALLE DE VIA RADIO DE GIRO REFORZADO LADO IZQUIERDA	2,87	1,45		0,5			2,08	
NP	CALLE 45 G ENTRE CRA 18 SUR Y 16 SUR	0,00	21,35	TRAMO DE VIA HACIA BARRAQUILLA	21,35	4,38					93,51	
NP	CALLE 45 G ENTRE CRA 18 SUR Y 16 SUR	0,00	21,35	TRAMO REFORZADO DE VIA HACIA BARRAQUILLA	3,36	4,38					14,72	
NP	CRA 18 SUR CON CALLE 45 G	0,00	5,60	BOCACALLE RADIO DE GIRO REFORZADO LADO DERECHO	5,60	1,90		0,5			5,32	
BARRIO ME QUEJO												
NP	CRA 27 CON CALLE 79 INTERSECCION			BOCACALLE VIA	8,33	6,05					50,40	
				BOCACALLE VIA REFORZADO RADIO DE GIRO	7,65	6,00		0,5			22,95	
				BOCACALLE VIA REFORZADO RADIO DE GIRO	4,60	1,65		0,5			3,80	
				BOCACALLE VIA REFORZADO	4,50	6,00					27,00	
NP	CALLE 79 CON CRA 26 C			BOCACALLE VIA REFORZADO	20,60	2,00					41,20	
NP	CRA 27 SUBIDA A LA LOMA			TRAMO DE VIA	38,45	5,58					214,55	
				TRAMO DE VIA	14,00	3,25					45,50	
				TRAMO DE VIA	3,70	3,20					11,84	
				TRAMO DE VIA	8,45	3,27					27,63	
				TRAMO DE VIA	26,20	6,35					166,37	
NP	CRA 27 CON CALLE 82 B ESQUINA			TRAMO DE VIA ASFALTO	18,40	5,30					97,52	
NP	CRA 27 CON CALLE 82			BOCACALLE VIA ASFALTO REFORZADO	14,87	2,83					42,08	
				TRAMO DE VIA ASFALTO	14,22	2,60					36,97	
NP	CRA 27 CON CALLE 81 B			TRAMO DE VIA ASFALTO	25,22	5,23					131,90	
NP	CRA 27 CON CALLE 82 C ESQUINA			BOCACALLE VIA ASFALTO REFORZADO	3,47	5,20					18,04	
				TRAMO DE VIA ASFALTO	26,30	2,57					67,59	
				TRAMO DE VIA ASFALTO	23,04	2,74					63,13	
NP	CRA 27 CON CALLE 82 E ESQUINA			BOCACALLE VIA ASFALTO REFORZADO	14,60	5,36					78,26	

05.



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
NP	CRA 27 CON CALLE 82 E ESQUINA			BOCACALLE VIA ASFALTO REFORZADO	19,70	2,65					52,21	
NP	CRA 27 CON CALLE 82 E ESQUINA			BOCACALLE VIA ASFALTO REFORZADO	12,00	2,59					31,08	
				BARRIO EL PRADO								
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 58 Y 57			Hueco 1	10,84	6,10					66,12	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 58 Y 57			Hueco 2	10,64	3,05					32,45	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 58 Y 57			Hueco 3	16,04	2,83					45,39	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 58 Y 57			Hueco 4	9,50	2,90					27,55	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 58 Y 57			Hueco 5	46,70	3,00					140,10	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 58 Y 57			Hueco 6 REFORZADO	4,84	3,00					14,52	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 58 Y 57			Hueco 7	3,56	3,80					13,53	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 58 Y 57			Hueco 8	12,20	2,90					35,38	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 57 Y 56			Hueco 1	6,00	5,85					35,10	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 57 Y 56			Hueco 2	11,54	5,84					67,39	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 57 Y 56			Hueco 3	51,50	2,91					149,87	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 57 Y 56			Hueco 4	23,00	2,85					65,55	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 57 Y 56			Hueco 5	8,09	5,84					47,25	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 57 Y 56			Hueco 6	11,30	2,85					32,21	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 57 Y 56			Hueco 7	2,30	3,55					8,17	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 56 Y 55			Hueco 1 REFORZADA	5,10	3,10					15,81	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 56 Y 55			Hueco 2	33,47	3,05					102,08	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 56 Y 55			Hueco 3	7,82	5,83					45,59	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 56 Y 55			Hueco 4 REFORZADA	8,22	5,99					49,24	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 56 Y 55			Hueco 5	17,20	6,35					109,13	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 56 Y 55			Hueco 6 REFROZADA	16,58	0,68		0,5			5,66	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 56 Y 55			Hueco 7	6,22	6,63					41,24	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 56 Y 55			Hueco 8	6,08	7,02					42,68	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 56 Y 55			Hueco 9	5,27	6,80					35,84	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 56 Y 55			Hueco 10	3,90	5,90					23,01	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 56 Y 55			Hueco 11 TRAMOS SIN FLUIDO	8,20	3,00					24,60	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 56 Y 55			Hueco 12 TRAMOS SIN FLUIDO	8,20	2,90					23,78	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 54 Y 55			Hueco 13 TRAMO SIN FLUIDO	78,00	3,00					234,00	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 52 Y 53 LADO DERECHO			Hueco 1	28,00	6,00					168,00	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 52 Y 53 LADO DERECHO			Hueco 2	23,00	6,00					138,00	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 52 Y 53 LADO IZQUIERDO			Hueco 3	59,00	3,00					177,00	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 50 Y 52 LADO IZQUIERDO			Hueco 1	9,50	6,15					58,43	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 46 Y 47 LADO DERECHO			Hueco 1	64,30	6,00					385,80	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 46 Y 47 LADO IZQUIERDO			Hueco 2	64,30	6,00					385,80	

JS.



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
BARRIO EL PORVENIR												
NP	CALLE 72 CON CRA 43 INTERSEPCION			Hueco 1 DOS CARRILES LADO DERECHO	18,79	18,50					347,54	
NP	CALLE 72 CON CRA 43 INTERSEPCION			Hueco 1 DOS CARRILES LADO IZQUIERDO	18,00	18,00					324,00	
NP	CALLE 72 CON CRA 44 INTERSEPCION			Hueco 1 TODA LA INTERCEPCCION	27,50	12,00					330,00	
BARRIO CAMPO ALEGRE												
NP	CALLE 84 A ENTRE CRA 41 B Y 41			Hueco 1	24,00	6,08					145,92	
				Hueco 2	27,70	3,08					85,32	
NP	CALLE 84 CON CR 38 (IGLESIA) PARTE BAJA			Hueco 1	43,70	6,10					266,57	
NP	CALLE 84 CON CR 38 (IGLESIA) PARTE ALTA			Hueco 1	19,30	6,20					119,66	
NP	CALLE 84 CON CR 38 (IGLESIA) PARTE ALTA			Hueco 1 RADIO DE GIRO	5,00	3,00		0,5			7,50	
NP	CALLE 84 A CON CRA 39 B			Hueco 1	18,25	6,30					114,98	
				Hueco 2	8,20	6,10					50,02	
				Hueco 3 RADIO DE GIRO	4,20	2,00					8,40	
				Hueco 4 RADIO DE GIRO	1,80	1,00		0,5			0,90	
				Hueco 5 RADIO DE GIRO	2,00	1,00		0,5			1,00	
NP	CARRERA 39 C CON CALLE 84 A			RADIO DE GIRO BOCACALLE	2,80	6,00		0,5			8,40	
BARRIO CENTRO ALCALDIA												
NP	CALLE 35 ENTRE CRA 43 Y 44			Hueco 1	10,70	2,87					30,71	
				Hueco 2	4,40	2,31					10,16	
				Hueco 3	4,00	1,57					6,28	
				Hueco 4 RAMPA	3,25	4,00					13,00	
				Hueco 5 RAMPA	4,40	4,00					17,60	
				Hueco 6 RAMPA	4,50	4,60					20,70	
				Hueco 7 RAMPA	2,80	6,10					17,08	
												6.152,89

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE:
MP.

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

NOMBRE:
MP.

Versión: V1

Fecha Aprobación: 07/05/2025

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 8 9 0 1 0 2 0 1 8 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 04

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024	**OBJETO DEL CONTRATO:**	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO III
BARRIO:	REPARCHEO		
FECHA DE CORTE:	5/05/2026		
CAPITULO: 4	**CÓDIGO DEL ITEM:** 4,7	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 39 A LA FLEXION , ESPESOR= 0.15 METROS, ACELERADO A 3 DIAS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D = 3/4" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA





LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES					TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	DESCRIPCIÓN	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	ML	M2	M3
BARRIO VILLA SEVILLA												
NP	CRA 18 SUR CON CALLE 45 G	0,00	6,90	BOCACALLE VIA REFORZADO HACIA SOLEDAD	6,90	4,80					33,12	
NP	CRA 18 SUR CON CALLE 45 G	0,00	255,00	BOCACALLE DE VIA RADIO DE GIRO REFORZADO LADO DERECHO	2,63	1,62		0,5			2,13	
NP	CRA 18 SUR CON CALLE 45 G	0,00	255,00	BOCACALLE DE VIA RADIO DE GIRO REFORZADO LADO IZQUIERDA	2,87	1,45		0,5			2,08	
NP	CALLE 45 G ENTRE CRA 18 SUR Y 16 SUR	0,00	21,35	TRAMO DE VIA HACIA BARRAQUILLA	21,35	4,38					93,51	
NP	CALLE 45 G ENTRE CRA 18 SUR Y 16 SUR	0,00	21,35	TRAMO REFORZADO DE VIA HACIA BARRAQUILLA	3,36	4,38					14,72	
NP	CRA 18 SUR CON CALLE 45 G	0,00	5,60	BOCACALLE RADIO DE GIRO REFORZADO LADO DERECHO	5,60	1,90		0,5			5,32	
BARRIO ME QUEJO												
				TRAMO DE VIA ASFALTO	26,30	2,57					67,59	
NP	CRA 27 CON CALLE 82 E ESQUINA			BOCACALLE VIA ASFALTO REFORZADO	19,70	2,65					52,21	
BARRIO CAMPO ALEGRE												
NP	CALLE 84 A ENTRE CRA 41 B Y 41			Hueco 1	24,00	6,08					145,92	
				Hueco 2	27,70	3,08					85,32	
NP	CALLE 84 A CON CRA 39 B			Hueco 1	18,25	6,30					114,98	
				Hueco 2	8,20	6,10					50,02	
				Hueco 3 RADIO DE GIRO	4,20	2,00					8,40	
				Hueco 4 RADIO DE GIRO	1,80	1,00		0,5			0,90	
				Hueco 5 RADIO DE GIRO	2,00	1,00		0,5			1,00	
NP	CARRERA 39 C CON CALLE 84 A			RADIO DE GIRO BOCACALLE	2,80	6,00		0,5			8,40	
BARRIO CENTRO ALCALDIA												
NP	CALLE 35 ENTRE CRA 43 Y 44			Hueco 4 RAMPA	3,25	4,00					13,00	
				Hueco 5 RAMPA	4,40	4,00					17,60	
				Hueco 6 RAMPA	4,50	4,60					20,70	
				Hueco 7 RAMPA	2,80	6,10					17,08	
												753,99

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE:	NOMBRE:
MP.	MP

Versión: V1

Fecha Aprobación: 07/05/2025

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 04

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024			**OBJETO DEL CONTRATO:**	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO III
BARRIO:	REPARCHEO				
FECHA DE CORTE:	5/05/2024				
CAPITULO:	4	**CÓDIGO DEL ITEM:**	4,11	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 45 A LA FLEXION ACELERADO A 3 DIAS , ESPESOR= 0.20 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL





LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES					TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	DESCRIPCIÓN	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	ML	M2	M3
BARRIO MÉ QUEJO												
NP	CRA 27 CON CALLE 79 INTERSECCION			BOCACALLE VIA	8,33	6,05					50,40	
				BOCACALLE VIA REFORZADO RADIO DE GIRO	7,65	6,00		0,5			22,95	
				BOCACALLE VIA REFORZADO RADIO DE GIRO	4,60	1,65		0,5			3,80	
				BOCACALLE VIA REFORZADO	4,50	6,00					27,00	
NP	CALLE 79 CON CRA 26 C			BOCACALLE VIA REFORZADO	20,60	2,00					41,20	
NP	CRA 27 SUBIDA A LA LOMA			TRAMO DE VIA	38,45	5,58					214,55	
				TRAMO DE VIA	14,00	3,25					45,50	
				TRAMO DE VIA	3,70	3,20					11,84	
				TRAMO DE VIA	8,45	3,27					27,63	
				TRAMO DE VIA	26,20	6,35					166,37	
NP	CRA 27 CON CALLE 82 B ESQUINA			TRAMO DE VIA ASFALTO	18,40	5,30					97,52	
NP	CRA 27 CON CALLE 82			BOCACALLE VIA ASFALTO REFORZADO	14,87	2,83					42,08	
				TRAMO DE VIA ASFALTO	14,22	2,60					36,97	
NP	CRA 27 CON CALLE 81 B			TRAMO DE VIA ASFALTO	25,22	5,23					131,90	
NP	CRA 27 CON CALLE 82 C ESQUINA			BOCACALLE VIA ASFALTO REFORZADO	3,47	5,20					18,04	
				TRAMO DE VIA ASFALTO	23,04	2,74					63,13	
NP	CRA 27 CON CALLE 82 E ESQUINA			BOCACALLE VIA ASFALTO REFORZADO	14,60	5,36					78,26	
NP	CRA 27 CON CALLE 82 E ESQUINA			BOCACALLE VIA ASFALTO REFORZADO	12,00	2,59					31,08	
BARRIO EL PRADO												
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 58 Y 57			Hueco 1	10,84	6,10					66,12	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 58 Y 57			Hueco 2	10,64	3,05					32,45	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 58 Y 57			Hueco 3	16,04	2,83					45,39	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 58 Y 57			Hueco 4	9,50	2,90					27,55	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 58 Y 57			Hueco 5	46,70	3,00					140,10	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 58 Y 57			Hueco 6 REFORZADO	4,84	3,00					14,52	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 58 Y 57			Hueco 7	3,56	3,80					13,53	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 58 Y 57			Hueco 8	12,20	2,90					35,38	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 57 Y 56			Hueco 1	6,00	5,85					35,10	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 57 Y 56			Hueco 2	11,54	5,84					67,39	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 57 Y 56			Hueco 3	51,50	2,91					149,87	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 57 Y 56			Hueco 4	23,00	2,85					65,55	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 57 Y 56			Hueco 5	8,09	5,84					47,25	

05



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 57 Y 56			Hueco 6	11,30	2,85					32,21	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 57 Y 56			Hueco 7	2,30	3,55					8,17	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 56 Y 55			Hueco 1 REFORZADA	5,10	3,10					15,81	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 56 Y 55			Hueco 2	33,47	3,05					102,08	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 56 Y 55			Hueco 3	7,82	5,83					45,59	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 56 Y 55			Hueco 4 REFORZADA	8,22	5,99					49,24	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 56 Y 55			Hueco 5	17,20	6,35					109,13	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 56 Y 55			Hueco 6 REFROZADA	16,58	0,68		0,5			5,66	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 56 Y 55			Hueco 7	6,22	6,63					41,24	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 56 Y 55			Hueco 8	6,08	7,02					42,68	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 56 Y 55			Hueco 9	5,27	6,80					35,84	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 56 Y 55			Hueco 10	3,90	5,90					23,01	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 56 Y 55			Hueco 11 TRAMOS SIN FLUIDO	8,20	3,00					24,60	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 56 Y 55			Hueco 12 TRAMOS SIN FLUIDO	8,20	2,90					23,78	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 54 Y 55			Hueco 13 TRAMO SIN FLUIDO	78,00	3,00					234,00	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 52 Y 53 LADO DERECHO			Hueco 1	28,00	6,00					168,00	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 52 Y 53 LADO DERECHO			Hueco 2	23,00	6,00					138,00	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 52 Y 53 LADO IZQUIERDO			Hueco 3	59,00	3,00					177,00	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 50 Y 52 LADO IZQUIERDO			Hueco 1	9,50	6,15					58,43	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 46 Y 47 LADO DERECHO			Hueco 1	64,30	6,00					385,80	
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 46 Y 47 LADO IZQUIERDO			Hueco 2	64,30	6,00					385,80	
BARRIO CAMPO ALEGRE												
NP	CALLE 84 CON CR 38 (IGLESIA) PARTE BAJA			Hueco 1	43,70	6,10					266,57	
NP	CALLE 84 CON CR 38 (IGLESIA) PARTE ALTA			Hueco 1	19,30	6,20					119,66	
NP	CALLE 84 CON CR 38 (IGLESIA) PARTE ALTA			Hueco 1 RADIO DE GIRO	5,00	3,00		0,5			7,50	
BARRIO EL PORVENIR												
NP	CALLE 72 CON CRA 43 INTERSEPCION			Hueco 1 DOS CARRILES LADO DERECHO	18,79	18,50					347,54	
NP	CALLE 72 CON CRA 43 INTERSEPCION			Hueco 1 DOS CARRILES LADO IZQUIERDO	18,00	18,00					324,00	
NP	CALLE 72 CON CRA 43 INTERSEPCION			Hueco 1 TODA LA INTERCEPCCION	27,50	12,00					330,00	
BARRIO CENTRO ALCALDIA												
NP	CALLE 35 ENTRE CRA 43 Y 44			Hueco 1	10,70	2,87					30,71	
				Hueco 2	4,40	2,31					10,16	
				Hueco 3	4,00	1,57					6,28	
												5.398,91

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE:
MP.

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

NOMBRE:
MP

Versión: V1


Fecha Aprobación: 07/05/2025

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 8 4 0 1 0 2 0 1 8 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 04

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	**LP-026-2024**			**OBJETO DEL CONTRATO:**	**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO III**
BARRIO:	**REPARCHEO**				
FECHA DE CORTE:	**5/05/2026**				
CAPITULO:	**4**	**CÓDIGO DEL ITEM:**	**4.13**	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	**ACERO DE REFUERZO DE 1/2" 60.000 PSI LEGITIMO PARA PLACAS DE PAVIMENTO IRREGULARES CUANTIA 8 KG/M2 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.**

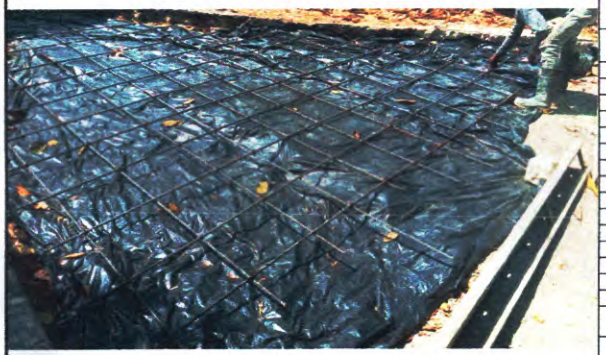

LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES					TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	DESCRIPCIÓN	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	KG/M2	ML	M2	KG
				BARRIO VILLA SEVILLA								
NP	CRA 18 SUR CON CALLE 45 G	0,00	6,90	BOCACALLE VIA REFORZADO HACIA SOLEDAD	6,90	4,80			6,66			220,58
NP	CRA 18 SUR CON CALLE 45 G	0,00	255,00	BOCACALLE DE VIA RADIO DE GIRO REFORZADO LADO DERECHO	2,63	1,62		0,5	6,66			14,19
NP	CRA 18 SUR CON CALLE 45 G	0,00	255,00	BOCACALLE DE VIA RADIO DE GIRO REFORZADO LADO IZQUIERDA	2,87	1,45		0,5	6,66			13,86
NP	CALLE 45 G ENTRE CRA 18 SUR Y 16 SUR	0,00	271,50	TRAMO REFORZADO DE VIA HACIA BARRAQUILLA	3,36	4,38			6,66			98,01
NP	CRA 18 SUR CON CALLE 45 G	0,00	271,50	BOCACALLE RADIO DE GIRO REFORZADO LADO DERECHO	5,60	1,90		0,5	6,66			35,43
				BARRIO ME QUEJO								
	CRA 27 CON CALLE 79 INTERSECCION			BOCACALLE VIA REFORZADO RADIO DE GIRO	7,65	6,00		0,5	6,66			152,85
				BOCACALLE VIA REFORZADO RADIO DE GIRO	4,60	1,65		0,5	6,66			25,27
				BOCACALLE VIA REFORZADO	4,50	6,00			6,66			179,82
NP	CALLE 79 CON CRA 26 C			BOCACALLE VIA REFORZADO	4,48	2,00			6,66			59,67
NP	CRA 27 CON CALLE 82			BOCACALLE VIA ASFALTO REFORZADO	7,00	6,35			6,66			296,04
NP	CRA 27 CON CALLE 82 C ESQUINA			BOCACALLE VIA ASFALTO REFORZADO	6,00	2,60			6,66			103,90
NP	CRA 27 CON CALLE 82 C ESQUINA			BOCACALLE VIA ASFALTO REFORZADO	3,50	5,20			6,66			121,21
NP	CRA 27 CON CALLE 82 E ESQUINA			BOCACALLE VIA ASFALTO REFORZADO	3,83	2,60			6,66			66,32
NP	CRA 27 CON CALLE 82 F ESQUINA			BOCACALLE VIA ASFALTO REFORZADO	3,13	2,65			6,66			55,24
				BARRIO EL PRADO								
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 58 Y 57			Hueco 6 REFORZADO	4,84	3,00			6,66			96,70
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 56 Y 55			Hueco 1 REFORZADA	5,10	3,10			6,66			105,29
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 56 Y 55			Hueco 4 REFORZADA	8,22	5,99			6,66			327,92
NP	CALLE 72 ENTRE CRA 56 Y 55			Hueco 6 REFROZADA	16,58	0,68		0,5	6,66			37,73
				BARRIO CAMPO ALEGRE								
NP	CALLE 84 CON CR 38 (IGLESIA) PARTE BAJA			PLACA REFORZADO	3,50	6,10			6,66			142,19
NP	CALLE 84 CON CR 38 (IGLESIA) PARTE ALTA			Hueco 1 RADIO DE GIRO REFORZADO	5,00	3,00		0,5	6,66			49,95
NP	CALLE 84 A CON CRA 39 B			PLACA REFORZADA POR MANHOLE AGUAS LLUVIA Hueco 1	3,65	6,30		2,0	6,66			306,29
				PLACA REFORZADA POR REGISTRO MOVISTAR Hueco 2	4,10	3,20			6,66			87,38
				Hueco 3 RADIO DE GIRO	4,20	2,00			6,66			55,94
				Hueco 4 RADIO DE GIRO	1,80	1,00		0,5	6,66			5,99
				Hueco 5 RADIO DE GIRO	2,00	1,00		0,5	6,66			6,66
NP	CARRERA 39 C CON CALLE 84 A			RADIO DE GIRO BOCACALLE	2,80	6,00		0,5	6,66			55,94
				BARRIO EL PORVENIR								
NP	CALLE 72 CON CRA 43 INTERSEPCION			PLACA REFORZADA POR REGISTRO MOVISTAR Hueco 1	3,86	3,06			6,66			78,67
				PLACA REFORZADA POR REGISTRO MANHOLE Hueco 2	3,86	3,06			6,66			78,67
				PLACA REFORZADA SEPARADOR CENTRAL	18,60	0,80			6,66			99,10
				PLACA REFORZADA EMPALE HACCIA LA CRA 43	12,00	2,00			6,66			159,84
												3.136,67

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	**Vo.Bo. INTERVENTORIA:**
NOMBRE:	**NOMBRE:**
MP.	**MP.**

Versión: V1

Fecha Aprobación: 07/05/2025

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 8 9 0 1 0 2 0 1 8 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 04

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024	**OBJETO DEL CONTRATO:**	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO IX
BARRIO:	REPARCHEO		
FECHA DE CORTE:	5/05/2026		

CAPITULO:	6	**CÓDIGO DEL ITEM:**	6,1	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0,15 X 0,15 M., INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60,000 PSI LEGITIMO



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
BARRIO VILLA SEVILLA												
NP	CRA 18 SUR CON CALLE 45 G	0,00	15,00	BOCACALLE RADIO DE GIRO LADO BARRANQUILLA	15,00					15,00		
BARRIO ME QUEJO												
NP	CRA 27 ENTRE CALLE 79 A CRA 83	0,00	200,00	BORDILLO DE VIA	8,45					8,45		
				BORDILLO DE VIA	20,60					20,60		
				BORDILLO DE VIA	38,45					38,45		
				BORDILLO DE VIA	38,45					38,45		
				BORDILLO DE VIA	14,00					14,00		
				BORDILLO DE VIA	8,30					8,30		
				BORDILLO DE VIA	26,20					26,20		
				BORDILLO DE VIA	31,00					31,00		
												200,45

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	**Vo.Bo. INTERVENTORIA:**
NOMBRE:	**NOMBRE:**
MP.	**MP.**

Versión: V1

Fecha Aprobación: 07/05/2025

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 8 9 0 1 0 2 0 3 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 04

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO IX
BARRIO:	REPARCHEO				
FECHA DE CORTE:	5/05/2026				
CAPITULO:	6	CÓDIGO DEL ITEM:	6,2	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P. B. O. BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0,15 X 0,20 M., INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60,000 PSI LEGITIMO



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
BARRIO ME QUEJO												
NP	CALLE 83 ME QUEJO			ANDEN DE VIA LADO DERECHO	9,90					9,90		
				ANDEN DE VIA LADO DERECHO	2,20					2,20		
				ANDEN DE VIA LADO DERECHO	51,40					51,40		
				ANDEN DE VIA LADO IZQUIERDO	52,50					52,50		
				ANDEN DE VIA LADO IZQUIERDO	12,00					12,00		
BARRIO CAMPO ALEGRE												
NP	CALLE 84 CON CRA 38 IGLESIA			BORDILLO DE VIA	21,50					21,50		
				BORDILLO DE VIA	2,15					2,15		
NP	CRA 41 # 84 A - 04			BORDILLO DE VIA	18,80					18,80		
NP	CALLE 84 A # 41 - 23			BORDILLO DE VIA	4,50					4,50		
NP	CALLE 84 A # 41 - 29			BORDILLO DE VIA	3,50					3,50		
NP	CALLE 84 A # 41 - 35			BORDILLO DE VIA	2,80					2,80		
NP	CALLE 84 A # 41 - 41			BORDILLO DE VIA	3,00					3,00		
NP	CALLE 84 A # 41 ESQ			BORDILLO DE VIA	13,50					13,50		
NP	CRA 41 B # 84 A - 09			BORDILLO DE VIA	2,40					2,40		
NP	CALLE 84 A # 41 B - 05			BORDILLO DE VIA	5,20					5,20		
NP	CRA 41 B # 84 A - 16			BORDILLO DE VIA	2,90					2,90		
												208,25

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE:	NOMBRE:
MP.	MP.

Versión: V1

Fecha Aprobación: 07/05/2025

ALCALDIA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 04

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024	**OBJETO DEL CONTRATO:**	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO IX
BARRIO:	REPARCHEO		
FECHA DE CORTE:	5/05/2024		
CAPITULO: 6	**CÓDIGO DEL ITEM:** 6,4	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	ANDEN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3,000 PSI E=0,07 M. (INCLUYE RAMPA PARA DISCAPACITADOS)



LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES					TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	DESCRIPCIÓN	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	ML	M2	M3
			BARRIO ME QUEJO									
NP	CRA 27 ENTRE CALLE 79 A CRA 83	0,00	200,00	ANDEN DE VIA	8,45	0,56					4,73	
				ANDEN DE VIA	20,60	0,74					15,29	
				ANDEN DE VIA	38,45	0,87					33,45	
				ANDEN DE VIA	38,45	0,85					32,68	
				ANDEN DE VIA	14,00	0,84					11,76	
				ANDEN DE VIA	8,30	0,76					6,31	
				ANDEN DE VIA	26,20	0,97					25,41	
				ANDEN DE VIA	31,00	0,84					26,04	
NP	CALLE 83 ME QUEJO			ANDEN DE VIA LADO DERECHO	9,90	1,14					11,24	
				ANDEN DE VIA LADO DERECHO	2,20	1,16					2,55	
				ANDEN DE VIA LADO DERECHO	51,40	0,95					48,83	
				ANDEN DE VIA LADO IZQUIERDO	52,50	1,04					54,43	
				ANDEN DE VIA LADO IZQUIERDO	12,00	0,88					10,56	
			BARRIO CAMPO ALEGRE									
NP	CALLE 84 CON CRA 38 IGLESIA			ANDEN DE VIA	21,50	0,85					18,28	
				ANDEN DE VIA	2,15	0,25					0,54	
NP	CRA 41 # 84 A - 04			ANDEN DE VIA	4,50	0,80					3,60	
NP	CALLE 84 A # 41 - 23			ANDEN DE VIA	2,90	0,60					1,74	
NP	CALLE 84 A # 41 - 29			ANDEN DE VIA	2,70	0,30					0,81	
NP	CALLE 84 A # 41 - 29 RAMPA			ANDEN DE VIA	3,50	0,60					2,10	
NP	CALLE 84 A # 41 - 35			ANDEN DE VIA	1,90	0,40					0,76	
NP	CALLE 84 A # 41 - 35			ANDEN DE VIA	2,80	0,15					0,42	
NP	CALLE 84 A # 41 - 41 RAMPA			ANDEN DE VIA	3,00	0,50					1,50	
NP	CALLE 84 A # 41 ESQ			ANDEN DE VIA	8,55	1,40					11,97	
NP	CALLE 84 A # 41 A - 14			ANDEN DE VIA	0,70	0,80					0,56	
NP	CALLE 84 A # 41 B - 32			ANDEN DE VIA	0,60	0,60					0,36	
NP	CRA 41 B # 84 A - 09			ANDEN DE VIA	2,40	0,30					0,72	
NP	CALLE 84 A # 41 B - 05			ANDEN DE VIA	4,00	2,00					8,00	
NP	CRA 41 B # 84 A - 16			ANDEN DE VIA	2,90	1,20					3,48	
												338,11

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:
NOMBRE:
MP.

Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE:
MP.


Versión: V1
Fecha Aprobación: 07/05/2025

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 04

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO IX
BARRIO:	REPARCHEO		
FECHA DE CORTE:	5/05/2026		
CAPITULO: 6	CÓDIGO DEL ITEM: 6,5	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	ANDEN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3,000 PSI E=0.10 M. (INCLUYE RAMPA PARA DISCAPACITADOS)



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
BARRIO LA PAZ												
NP	CRA 21ENTRE CALLE 100 Y 99 E			ANDEN DE VIA LADO IZQUIERDO	3.30	0.55					1.82	
				ANDEN DE VIA LADO DERECHO	11.00	0.55					6.05	
				ANDEN DE VIA LADO DERECHO	38.00	0.55					20.90	
												28,77

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE:
MP.

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

NOMBRE:
MP

Versión: V1

Fecha Aprobación: 07/05/2025

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 8901020181

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 04

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024			**OBJETO DEL CONTRATO:**	**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO III**
BARRIO:	REPARCHEO				
FECHA DE CORTE:	5/05/2026				
CAPITULO:	7	**CÓDIGO DEL ITEM:**	7,8	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA MANHOL HD T/P 24"**



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
BARRIO VILLA SEVILLA												
NP	CALLE 45 G ENTRE CRA 18 SUR Y 16 SUR	0.00	271.50	TAPA REFORZADO DE VIA HACIA BARRAQUILLA					1.00			
BARRIO ME QUEJO												
NP	CRA 27 ENTRE CALLE 79 A CRA 83	0.00	200.00	TAPA NUEVA MANHOLE					1.00			
BARRIO CAMPO ALEGRE												
NP	CALLE 84 A CON CRA 39 B			TAPA DE MANHOLE REFORZADO					1.00			
												3,00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	**Vo.Bo. INTERVENTORIA:**
NOMBRE:	**NOMBRE:**
MP.	**MP.**

Versión: V1

Fecha Aprobación: 07/05/2025

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 04

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO III
BARRIO:	REPARCHEO				
FECHA DE CORTE:	5/05/2026				
CAPITULO:	11	CÓDIGO DEL ITEM:	11,23	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	RENIVELACION Y RECONSTRUCCION DE MANHOLE EN LADRILLO H<1m e=20 cm .



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
BARRIO VILLA SEVILLA												
NP	CALLE 45 G ENTRE CRA 18 SUR Y 16 SUR	0,00	271,50	NIVELACION DE TAPA REFORZADO DE VIA HACIA BARRAQUILLA					1,00			
BARRIO CAMPO ALEGRE												
NP	CALLE 84 A CON CRA 39 B			TAPA DE MANHOLE REFORZADO AGUAS LLUVIA					1,00			
NP	CALLE 84 A CON CRA 39 B			TAPA DE MANHOLE REFORZADO REGISTRO MOVISTAR					1,00			
												3,00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE:	NOMBRE:
MP.	MP.

Versión: V1

Fecha Aprobación: 07/05/2025
