ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 04

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024	**OBJETO DEL CONTRATO:**	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO III		
BARRIO:	VILLA SEVILLA			
FECHA DE CORTE:	5/05/2026			
CAPITULO:	1	**CÓDIGO DEL ITEM:**	1,1	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:** NIVELACION, REPLANTEO Y SEÑALIZACION DE VIAS



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	0,00	271,50	TRAMO DE VIA	271,50	-5,00					-1357,50	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	0,00	3,40	TRAMO DE VIA REFORZADO	3,40	5,30					18,02	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	3,40	20,40	TRAMO DE VIA	17,00	5,30					90,10	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	20,40	271,50	TRAMO DE VIA	251,10	5,30					1330,83	
4	CRA 18 SUR CON CALLE 45	0,00	3,10	TRAMO DE VIA RADIO DE GIRO REFORZADO	3,10	2,35		0,5			3,64	
4	CRA 18 SUR CON CALLE 45 F	0,00	220,00	BOCACALLE VIA HACIA SOLEDAD	2,56	2,80					7,17	
4	CRA 18 SUR CON CALLE 45 B	0,00	90,00	BOCACALLE VIA HACIA SOLEDAD REFORZADA	6,30	2,00					12,60	
4	CRA 18 SUR CON CALLE 45 B	0,00	90,00	RADIO DE GIRO VIA HACIA SOLEDAD REFORZADA	2,00	1,00		0,5			1,00	
4	CRA 18 SUR CON CALLE 45 B	0,00	90,00	RADIO DE GIRO VIA HACIA SOLEDAD REFORZADA	2,00	1,60		0,5			1,60	
NP	CALLE 45 D ENTRE CRA 16 SUR Y 18 SUR	0,00	74,45	TRAMO DE VIA	74,45	2,75					204,74	
NP	CALLE 45 E ENTRE CRA 16 SUR Y 18 SUR	0,00	67,30	TRAMO DE VIA	67,30	2,00					134,60	
5	CALLE 45 F ENTRE CRA 16 SUR Y 18 SUR	0,00	64,76	TRAMO DE VIA	64,76	3,10					200,76	
5	CALLE 45 F ENTRE CRA 15 SUR Y 16 SUR	0,00	58,20	TRAMO DE VIA	58,20	3,00					174,60	
3	CARRERA 15 SUR CALLE 45 D Y 45 F	0,00	50,00	TRAMO DE VIA	50,00	5,80					290,00	
												1.112,15

Vo. Bo. RESPONSABLE DE CALCULOS:

NOMBRE:
MP.

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

NOMBRE:
MP.

Versión: V1

Fecha Aprobación: 07/05/2026

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 04

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024	**OBJETO DEL CONTRATO:**	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO III
BARRIO:	VILLA SEVILLA		
FECHA DE CORTE:	5/05/2026		
CAPITULO: 2	**CÓDIGO DEL ITEM:** 2,1	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	DEMOLICION DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL



LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES					TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	DESCRIPCIÓN	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	ML	M2	M3
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	0,00	271,50	TRAMO DE VIA	271,50	-5,00					-1357,50	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	0,00	3,40	TRAMO DE VIA REFORZADO	3,40	5,30					18,02	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	3,40	20,40	TRAMO DE VIA	17,00	5,30					90,10	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	20,40	271,50	TRAMO DE VIA	251,10	5,30					1330,83	
4	CRA 18 SUR CON CALLE 45	0,00	3,10	TRAMO DE VIA RADIO DE GIRO REFORZADO	3,10	2,35		0,5			3,64	
4	CRA 18 SUR CON CALLE 45 F	0,00	220,00	BOCACALLE VIA HACIA SOLEDAD	2,56	2,80					7,17	
4	CRA 18 SUR CON CALLE 45 B	0,00	90,00	BOCACALLE VIA HACIA SOLEDAD REFORZADA	6,30	2,00					12,60	
4	CRA 18 SUR CON CALLE 45 B	0,00	90,00	RADIO DE GIRO VIA HACIA SOLEDAD REFORZADA	2,00	1,00		0,5			1,00	
4	CRA 18 SUR CON CALLE 45 B	0,00	90,00	RADIO DE GIRO VIA HACIA SOLEDAD REFORZADA	2,00	1,60		0,5			1,60	
NP	CALLE 45 D ENTRE CRA 16 SUR Y 18 SUR	0,00	74,45	TRAMO DE VIA	74,45	2,75					204,74	
NP	CALLE 45 E ENTRE CRA 16 SUR Y 18 SUR	0,00	67,30	TRAMO DE VIA	67,30	2,50					168,25	
5	CALLE 45 F ENTRE CRA 16 SUR Y 18 SUR	0,00	64,76	TRAMO DE VIA	64,76	3,10					200,76	
5	CALLE 45 F ENTRE CRA 15 SUR Y 16 SUR	0,00	58,20	TRAMO DE VIA	58,20	3,00					174,60	
												855,80

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE:
MP.

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

NOMBRE:
MP

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 04

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024			**OBJETO DEL CONTRATO:**	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO III
BARRIO:	VILLA SEVILLA				
FECHA DE CORTE:	5/05/2026				
CAPITULO:	2	**CÓDIGO DEL ITEM:**	2,2	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	222,80	244,50	ANDEN DE LA VIA	21,70	1,00					21,70	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	133,00	142,30	ANDEN DE LA VIA	9,30	1,10					10,23	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	15,28	23,03	ANDEN DE LA VIA	7,75	0,60					4,65	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	15,28	23,03	ANDEN DE LA VIA ADICIONAL	1,75	0,60					1,05	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	220,50	233,00	ANDEN DE LA VIA	12,50	1,00					12,50	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	242,30	244,86	ANDEN DE LA VIA	2,56	1,20					3,07	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	160,00	165,20	ANDEN DE LA VIA	5,20	1,20					6,24	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	93,70	105,00	ANDEN DE LA VIA	11,30	0,85					9,61	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	62,00	80,00	ANDEN DE LA VIA	18,00	0,85					15,30	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	23,03	44,00	ANDEN DE LA VIA	20,97	0,85					17,82	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	23,03	44,00	ANDEN DE LA VIA ADICIONAL	2,62	1,10					2,88	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	2,35	10,65	ANDEN DE LA VIA	8,30	1,75					14,53	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	8,30	20,38	ANDEN DE LA VIA	12,08	1,50					18,12	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	20,38	24,28	ANDEN DE LA VIA	3,90	0,85					3,32	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	20,38	24,28	ANDEN DE LA VIA ADICIONAL	4,00	0,80					3,20	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	20,38	24,28	ANDEN DE LA VIA ADICIONAL RAMPA FERRETERIA	5,40	2,50					13,50	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	20,38	24,28	ANDEN DE LA VIA ADICIONAL LADO DE LA FERRETERIA	5,00	1,00					5,00	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	4,20	28,80	ANDEN DE LA VIA ADICIONAL RAMPA LA OLIMPICA	24,60	1,00					24,60	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	0,00	4,90	ANDEN DE LA VIA ADICIONAL LADO DE LA OLIMPICA	4,90	1,00					4,90	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	256,43	268,73	ANDEN DE LA VIA	12,30	0,95					11,69	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	105,00	107,15	ANDEN DE LA VIA	2,15	1,05					2,26	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	107,15	109,68	ANDEN DE LA VIA	2,53	0,80					2,02	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	109,68	111,46	ANDEN DE LA VIA	1,78	0,85					1,51	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	111,46	113,66	ANDEN DE LA VIA	2,20	0,60					1,32	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	113,66	116,96	ANDEN DE LA VIA	3,30	1,18					3,89	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	116,96	155,50	ANDEN DE LA VIA	38,54	0,70					26,98	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	116,96	155,50	ANDEN DE LA VIA ADICIONAL	1,47	0,80					1,18	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	89,00	115,13	ANDEN DE LA VIA	26,13	1,05					27,44	

75.



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	89,00	115,13	ANDEN DE LA VIA	26,13	0,85					22,21	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	89,00	115,13	ANDEN DE LA VIA ADICIONAL	2,10	0,80					1,68	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	89,00	115,13	ANDEN DE LA VIA ADICIONAL	3,13	1,50					4,70	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	115,13	145,03	ANDEN DE LA VIA	29,90	1,00					29,90	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	153,00	160,00	ANDEN DE LA VIA	7,00	1,20					8,40	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	165,20	187,95	ANDEN DE LA VIA	22,75	0,90					20,48	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	192,20	208,20	ANDEN DE LA VIA	16,00	0,95					15,20	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	208,20	214,27	ANDEN DE LA VIA	6,07	0,40					2,43	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	208,20	214,27	ANDEN DE LA VIA ADICIONAL	1,50	0,30					0,45	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	0,00	90,00	ANDEN DE LA VIA	1,70	2,50					4,25	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	0,00	90,00	ANDEN DE LA VIA	2,28	2,30					5,24	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	0,00	90,00	ANDEN DE LA VIA	0,90	0,88					0,79	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	0,00	90,00	ANDEN DE LA VIA	3,00	0,86					2,58	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	0,00	90,00	ANDEN DE LA VIA	13,20	1,40					18,48	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	0,00	90,00	ANDEN DE LA VIA	2,13	2,40					5,11	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	0,00	90,00	ANDEN DE LA VIA	4,30	0,50					2,15	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	0,00	90,00	ANDEN DE LA VIA	0,80	0,52					0,42	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	244,50	246,83	ANDEN DE LA VIA	2,33	0,87					2,03	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	244,84	248,17	ANDEN DE LA VIA	3,33	0,50					1,67	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	249,60	271,50	ANDEN DE LA VIA	21,90	0,76					16,64	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	256,35	259,20	ANDEN DE LA VIA	2,85	0,76					2,17	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	256,35	259,20	ANDEN DE LA VIA	2,90	0,85					2,47	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	256,35	259,20	ANDEN DE LA VIA	2,75	0,92					2,53	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	256,35	259,20	ANDEN DE LA VIA	5,95	0,90					5,36	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	256,35	259,20	ANDEN DE LA VIA	3,90	1,70					6,63	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	256,35	259,20	ANDEN DE LA VIA	1,16	0,90					1,04	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	256,35	259,20	ANDEN DE LA VIA	3,00	0,56					1,68	
												457,17

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE:
MP.

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

NOMBRE:
MP

Versión: V1

Fecha Aprobación: 07/05/2025

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102017 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 04

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	**LP-026-2024**			**OBJETO DEL CONTRATO:**	**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO III**
BARRIO:	**VILLA SEVILLA**				
FECHA DE CORTE:	**5/05/2026**				
CAPITULO:	**2**	**CÓDIGO DEL ITEM:**	**2,3**	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	**DEMOLICION DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL**



LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES					TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	DESCRIPCIÓN	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	ML	M2	M3
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	194,10	213,10	BORDILLO DE LA VIA	19,00					19,00		
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	155,50	194,10	BORDILLO DE LA VIA	38,60					38,60		
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	222,80	244,50	BORDILLO DE LA VIA	21,70					21,70		
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	133,00	142,30	BORDILLO DE LA VIA	9,30					9,30		
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	15,28	23,03	BORDILLO DE LA VIA	7,75					7,75		
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	220,50	233,00	BORDILLO DE LA VIA	12,50					12,50		
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	242,30	244,86	BORDILLO DE LA VIA	2,56					2,56		
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	160,00	165,20	BORDILLO DE LA VIA	5,20					5,20		
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	93,70	105,00	BORDILLO DE LA VIA	11,30					11,30		
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	62,00	80,00	BORDILLO DE LA VIA	18,00					18,00		
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	23,03	44,00	BORDILLO DE LA VIA	20,97					20,97		
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	23,03	44,00	BORDILLO DE LA VIA ADICIONAL	5,20					5,20		
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	20,38	24,28	BORDILLO DE LA VIA	3,90					3,90		
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	0,00	4,60	BORDILLO EN ANDEN LADO DE LA OLIMPICA	4,60					4,60		
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	0,00	5,00	BORDILLO EN ANDEN LADO DE LA FERRETERIA	5,00					5,00		
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	20,38	24,28	BORDILLO DE LA VIA ADICIONAL	3,00					3,00		
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	244,50	246,83	BORDILLO DE LA VIA	2,33					2,33		
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	256,43	268,73	BORDILLO DE LA VIA	12,30					12,30		
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	105,00	155,50	BORDILLO DE LA VIA	50,50					50,50		

05.



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	89,00	115,13	BORDILLO DE LA VIA	26,13					26,13		
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	44,00	55,00	BORDILLO DE LA VIA	11,00					11,00		
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	115,13	145,03	BORDILLO DE LA VIA	29,90					29,90		
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	153,00	160,00	BORDILLO DE LA VIA	7,00					7,00		
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	165,20	187,95	BORDILLO DE LA VIA	22,75					22,75		
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	192,20	208,20	BORDILLO DE LA VIA	16,00					16,00		
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	208,20	214,27	BORDILLO DE LA VIA	6,07					6,07		
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	0,00	90,00	ANDEN DE LA VIA	3,00					3,00		
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	244,84	248,17	ANDEN DE LA VIA	3,33					3,33		
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	249,60	271,50	ANDEN DE LA VIA	21,90					21,90		
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	256,35	259,20	ANDEN DE LA VIA	2,85					2,85		
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	256,35	259,20	ANDEN DE LA VIA	2,90					2,90		
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	256,35	259,20	ANDEN DE LA VIA	5,95					5,95		
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	256,35	259,20	ANDEN DE LA VIA	3,90					3,90		
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	256,35	259,20	ANDEN DE LA VIA	1,94					1,94		
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	256,35	259,20	ANDEN DE LA VIA	3,00					3,00		
												421,33

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: MP.	NOMBRE: MP.

Versión: V1

Fecha Aprobación: 07/05/2025

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 04

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024		OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO III
BARRIO:	VILLA SEVILLA			
FECHA DE CORTE:	5/05/2026			
CAPITULO:	2	CÓDIGO DEL ITEM: 2,4	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DEMOLICION DE MUROS EXISTENTES EN MAMPOSTERIA.



LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES					TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	DESCRIPCIÓN	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	ML	M2	M3
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G			DEMOLICION DE MUROS	8,60	0,25					2,15	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G			DEMOLICION DE MUROS	2,50	0,45					1,13	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G			DEMOLICION DE MUROS	5,60	0,50					2,80	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G			DEMOLICION DE MUROS	15,10	0,50					7,55	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G			DEMOLICION DE MUROS	28,20	0,70					19,74	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G			DEMOLICION DE MUROS	17,50	0,70					12,25	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G			DEMOLICION DE MUROS	10,00	0,70					7,00	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G			DEMOLICION DE MUROS	26,00	0,20					5,20	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G			DEMOLICION DE MUROS	6,50	0,50					3,25	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G			DEMOLICION DE MUROS	2,50	0,20					0,50	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G			DEMOLICION DE MUROS	13,00	0,20					2,60	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G			DEMOLICION DE MUROS	2,80	0,40					1,12	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G			DEMOLICION DE MUROS	2,20	0,40					0,88	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G			DEMOLICION DE MUROS	8,70	0,25					2,18	
NP	CALLE 45 E ENTRE CRA 18 SUR Y 16 SUR			DEMOLICION DE REGISTRO TUBERIA DE ALCANTARILLADO	1,20	1,20		22,0			31,68	
												100,02

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE:	NOMBRE:
MP.	MP

Versión: V1

Fecha Aprobación: 07/05/2025

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 04

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024			**OBJETO DEL CONTRATO:**	**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO III**
BARRIO:	VILLA SEVILLA				
FECHA DE CORTE:	5/05/2026				
CAPITULO:	3	**CÓDIGO DEL ITEM:**	3,1	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	**EXCAVACION MANUAL (INCLUYE RETIRO)**



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
NP	CALLE 45 D ENTRE CRA 16 SUR Y 18 SUR	0,00	80,00	EXCAVACION PARA REUBICAR TUBERIA DE AGUA PORTABLE	80,00	0,60	0,80					38,40
NP	CALLE 45 D ENTRE CRA 16 SUR Y 18 SUR	0,00	74,45	EXCAVACION PARA INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA PORTABLE	74,45	0,60	0,80					35,74
NP	CALLE 45 D ENTRE CRA 16 SUR Y 18 SUR	0,00	74,45	EXCAVACION PARA ACOMETIDAS DE 20 MM TUBERIA DE AGUA POTABLE A FAVOR	1,50	0,30	0,30		11,00			1,49
NP	CALLE 45 D ENTRE CRA 16 SUR Y 18 SUR	0,00	74,45	EXCAVACION PARA ACOMETIDAS DE 20 MM TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CONTRA	4,00	0,30	0,30		10,00			3,60
5	CALLE 45F ENTRE CRA 16 SUR Y 18 SUR	0,00	70,00	EXCAVACION PARA REUBICAR TUBERIA DE AGUA PORTABLE	70,00	0,60	0,80					33,60
5	CALLE 45 F ENTRE CRA 16 SUR Y 18 SUR	0,00	70,00	EXCAVACION PARA ACOMETIDAS DE 20 MM TUBERIA DE AGUA POTABLE A FAVOR	1,50	0,30	0,30		9,00			1,22
5	CALLE 45 F ENTRE CRA 16 SUR Y 18 SUR	0,00	70,00	EXCAVACION PARA ACOMETIDAS DE 20 MM TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CONTRA	4,10	0,30	0,30		17,00			6,27
5	CALLE 45F ENTRE CRA 15 SUR Y 16 SUR	0,00	55,00	EXCAVACION PARA REUBICAR TUBERIA DE AGUA PORTABLE	55,00	0,60	0,80					26,40
5	CALLE 45F ENTRE CRA 15 SUR Y 16 SUR	0,00	55,00	EXCAVACION PARA ACOMETIDAS DE 20 MM TUBERIA DE AGUA POTABLE A FAVOR	1,80	0,30	0,30		10,00			1,62
5	CALLE 45F ENTRE CRA 15 SUR Y 16 SUR	0,00	55,00	EXCAVACION PARA ACOMETIDAS DE 20 MM TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CONTRA	5,30	0,30	0,30		3,00			1,43
NP	CALLE 45 E ENTRE CRA 18 SUR Y 16 SUR	0,00	67,30	EXCAVACION PARA REUBICAR TUBERIA DE AGUA PORTABLE	67,30	0,60	0,80					32,30
NP	CALLE 45 E ENTRE CRA 18 SUR Y 16 SUR	0,00	67,30	EXCAVACION PARA ACOMETIDAS DE 20 MM TUBERIA DE AGUA POTABLE A FAVOR	1,50	0,30	0,30		8,00			1,08
NP	CALLE 45 E ENTRE CRA 18 SUR Y 16 SUR	0,00	67,30	EXCAVACION PARA ACOMETIDAS DE 20 MM TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CONTRA	9,00	0,30	0,30		3,50			2,84
												185,98

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE:	NOMBRE:
MP.	MP.


Versión: V1
Fecha Aprobación: 07/05/2025

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 04

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024	**OBJETO DEL CONTRATO:**	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO III
BARRIO:	VILLA SEVILLA		
FECHA DE CORTE:	5/05/2024		
CAPITULO: 3	**CÓDIGO DEL ITEM:** 3,2	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	**EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL**

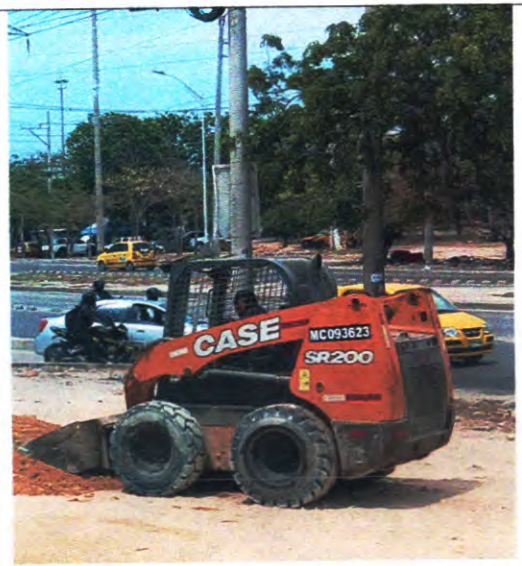

LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	0,00	271,50	TRAMO DE VIA	271,50	-5,00	0,28					-380,10
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	0,00	3,40	TRAMO DE VIA REFORZADO	3,40	5,30	0,20					3,60
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	3,40	20,40	TRAMO DE VIA	17,00	5,30	0,20					18,02
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	20,40	271,50	TRAMO DE VIA	251,10	5,30	0,28					372,63
4	CRA 18 SUR CON CALLE 45	0,00	3,10	TRAMO DE VIA RADIO DE GIRO REFORZADO	3,10	2,35	0,28	0,5				1,02
4	CRA 18 SUR CON CALLE 45 F	0,00	220,00	BOCACALLE VIA HACIA SOLEDAD	2,56	2,80	0,25					1,79
4	CRA 18 SUR CON CALLE 45 B	0,00	90,00	BOCACALLE VIA HACIA SOLEDAD REFORZADA	6,30	2,00	0,20					2,52
4	CRA 18 SUR CON CALLE 45 B	0,00	90,00	RADIO DE GIRO VIA HACIA SOLEDAD REFORZADA	2,00	1,00	0,20	0,5				0,20
4	CRA 18 SUR CON CALLE 45 B	0,00	90,00	RADIO DE GIRO VIA HACIA SOLEDAD REFORZADA	2,00	1,60	0,20	0,5				0,32
NP	CALLE 45 D ENTRE CRA 16 SUR Y 18 SUR	0,00	74,45	TRAMO DE VIA	74,45	2,75	0,20					40,95
NP	CALLE 45 E ENTRE CRA 16 SUR Y 18 SUR	0,00	67,30	TRAMO DE VIA	67,30	2,00	0,20					26,92
5	CALLE 45 F ENTRE CRA 16 SUR Y 18 SUR	0,00	64,76	TRAMO DE VIA	64,76	3,10	0,25					50,19
5	CALLE 45 F ENTRE CRA 15 SUR Y 16 SUR	0,00	68,00	TRAMO DE VIA	68,00	3,00	0,25					51,00
3	CARRERA 15 SUR CALLE 45 D Y 45 F	0,00	50,00	TRAMO DE VIA	50,00	5,80	0,20					58,00
												247,06

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE:
MP.

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

NOMBRE:
MP.

Versión: V1

Fecha Aprobación: 07/05/2025

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 04

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024	**OBJETO DEL CONTRATO:**	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO III
BARRIO:	VILLA SEVILLA		
FECHA DE CORTE:	5/05/2026		
CAPITULO: 3	**CÓDIGO DEL ITEM:** 3,3	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO (INCLUYE CORTE, TRASLADO, EXTENDIDA, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
NP	CALLE 45 D ENTRE CRA 16 SUR Y 18 SUR	0,00	74,45	EXCAVACION PARA ACOMETIDAS DE 20 MM TUBERIA DE AGUA POTABLE A FAVOR	1,50	0,30	0,30		11,00			1,49
NP	CALLE 45 D ENTRE CRA 16 SUR Y 18 SUR	0,00	74,45	EXCAVACION PARA ACOMETIDAS DE 20 MM TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CONTRA	4,00	0,30	0,30		10,00			3,60
5	CALLE 45 F ENTRE CRA 16 SUR Y 18 SUR	0,00	70,00	EXCAVACION PARA ACOMETIDAS DE 20 MM TUBERIA DE AGUA POTABLE A FAVOR	1,50	0,30	0,30		9,00			1,22
5	CALLE 45 F ENTRE CRA 16 SUR Y 18 SUR	0,00	70,00	EXCAVACION PARA ACOMETIDAS DE 20 MM TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CONTRA	4,10	0,30	0,30		17,00			6,27
5	CALLE 45F ENTRE CRA 15 SUR Y 16 SUR	0,00	55,00	EXCAVACION PARA ACOMETIDAS DE 20 MM TUBERIA DE AGUA POTABLE A FAVOR	1,80	0,30	0,30		10,00			1,62
5	CALLE 45F ENTRE CRA 15 SUR Y 16 SUR	0,00	55,00	EXCAVACION PARA ACOMETIDAS DE 20 MM TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CONTRA	5,30	0,30	0,30		3,00			1,43
NP	CALLE 45 E ENTRE CRA 18 SUR Y 16 SUR	0,00	67,30	EXCAVACION PARA ACOMETIDAS DE 20 MM TUBERIA DE AGUA POTABLE A FAVOR	1,50	0,30	0,30		8,00			1,08
NP	CALLE 45 E ENTRE CRA 18 SUR Y 16 SUR	0,00	67,30	EXCAVACION PARA ACOMETIDAS DE 20 MM TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CONTRA	9,00	0,30	0,30		3,50			2,84
												19,54

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE:	NOMBRE:
MP.	MP.

Versión: V1

Fecha Aprobación: 07/05/2025

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 04

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	**LP-026-2024**			**OBJETO DEL CONTRATO:**	**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO III**
BARRIO:	**VILLA SEVILLA**				
FECHA DE CORTE:	**5/05/2026**				
CAPITULO:	**3**	**CÓDIGO DEL ITEM:**	**3,4**	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	**RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO**



LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES					TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	DESCRIPCIÓN	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	ML	M2	M3
NP	CALLE 45 D ENTRE CRA 16 SUR Y 18 SUR	0,00	74,45	RELLENO PARA REUBICAR TUBERIA DE AGUA PORTABLE	74,45	0,60	0,80					35,74
NP	CALLE 45 D ENTRE CRA 16 SUR Y 18 SUR	0,00	74,45	RELLENO PARA INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA PORTABLE	74,45	0,60	0,80					35,74
				DESCUENTO POR TUBERIA	74,45			-0,0059				-0,443
5	CALLE 45F ENTRE CRA 16 SUR Y 18 SUR	0,00	70,00	RELLENO PARA REUBICAR TUBERIA DE AGUA PORTABLE	70,00	0,60	0,80					33,60
				DESCUENTO POR TUBERIA	70,00			-0,0059				-0,416
5	CALLE 45F ENTRE CRA 15 SUR Y 16 SUR	0,00	55,00	EXCAVACION PARA REUBICAR TUBERIA DE AGUA PORTABLE	55,00	0,60	0,80					26,40
				DESCUENTO POR TUBERIA	55,00			-0,0059				-0,327
NP	CALLE 45 E ENTRE CRA 18 SUR Y 16 SUR	0,00	67,30	EXCAVACION PARA REUBICAR TUBERIA DE AGUA PORTABLE	67,30	0,60	0,80					32,30
				DESCUENTO POR TUBERIA	67,30			-0,0059				-0,400
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	222,80	244,50	ANDEN DE LA VIA	21,70	1,00	0,07					1,52
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	133,00	142,30	ANDEN DE LA VIA	9,30	1,10	0,07					0,72
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	15,28	23,03	ANDEN DE LA VIA	7,75	0,60	0,07					0,33
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	15,28	23,03	ANDEN DE LA VIA ADICIONAL	1,75	0,60	0,07					0,07
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	220,50	233,00	ANDEN DE LA VIA	12,50	1,00	0,07					0,88
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	242,30	244,86	ANDEN DE LA VIA	2,56	1,20	0,07					0,22
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	160,00	165,20	ANDEN DE LA VIA	5,20	1,20	0,07					0,44
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	93,70	105,00	ANDEN DE LA VIA	11,30	0,85	0,07					0,67
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	62,00	80,00	ANDEN DE LA VIA	18,00	0,85	0,07					1,07
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	23,03	44,00	ANDEN DE LA VIA	20,97	0,85	0,07					1,25
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	23,03	44,00	ANDEN DE LA VIA ADICIONAL	2,62	1,10	0,07					0,20
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	2,35	10,65	ANDEN DE LA VIA	8,30	1,75	0,07					1,02
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	8,30	20,38	ANDEN DE LA VIA	12,08	1,50	0,07					1,27
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	20,38	24,28	ANDEN DE LA VIA	3,90	0,85	0,07					0,23
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	20,38	24,28	ANDEN DE LA VIA ADICIONAL	4,00	0,80	0,07					0,22
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	20,38	24,28	ANDEN DE LA VIA ADICIONAL RAMPA FERRETERIA	5,40	2,50	0,07					0,95
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	244,50	246,83	ANDEN DE LA VIA	2,33	0,90	0,07					0,15
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	256,43	268,73	ANDEN DE LA VIA	12,30	0,95	0,07					0,82
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	105,00	107,15	ANDEN DE LA VIA	2,15	1,05	0,07					0,16
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	107,15	109,68	ANDEN DE LA VIA	2,53	0,80	0,07					0,14

05.



4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	109,68	111,46	ANDEN DE LA VIA	1,78	0,85	0,07					0,11
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	111,46	113,66	ANDEN DE LA VIA	2,20	0,60	0,07					0,09
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	113,66	116,96	ANDEN DE LA VIA	3,30	1,18	0,07					0,27
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	116,96	155,50	ANDEN DE LA VIA	38,54	0,70	0,07					1,89
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	116,96	155,50	ANDEN DE LA VIA ADICIONAL	38,54	0,80	0,07					2,16
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	89,00	115,13	ANDEN DE LA VIA	26,13	1,05	0,07					1,92
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	44,00	55,00	ANDEN DE LA VIA	11,00	0,85	0,07					0,65
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	44,00	55,00	ANDEN DE LA VIA ADICIONAL	2,10	0,80	0,07					0,12
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	44,00	55,00	ANDEN DE LA VIA ADICIONAL	3,13	1,50	0,07					0,33
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	115,13	145,03	ANDEN DE LA VIA	29,90	1,00	0,07					2,09
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	153,00	160,00	ANDEN DE LA VIA	7,00	1,20	0,07					0,59
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	165,20	187,95	ANDEN DE LA VIA	22,75	0,90	0,07					1,43
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	192,20	208,20	ANDEN DE LA VIA	16,00	0,95	0,07					1,06
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	208,20	214,27	ANDEN DE LA VIA	6,07	0,40	0,07					0,17
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	208,20	214,27	ANDEN DE LA VIA ADICIONAL	6,07	0,30	0,07					0,13
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	0,00	271,00	RELLENO DE MATERIAL SELECCIONADO EN JARDINERA	135,00	0,65	0,50					43,88
												231,38

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE:
MP.

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

NOMBRE:
MP.

Versión: V1

Fecha Aprobación: 07/05/2025

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 04

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024	**OBJETO DEL CONTRATO:**	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO III
BARRIO:	VILLA SEVILLA		
FECHA DE CORTE:	5/05/2026		
CAPITULO: 4	**CÓDIGO DEL ITEM:** 4,1	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	**BASE EN SUELO-CEMENTO PROPORCIÓN 1:20 E=0.20 METROS**





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	0,00	271,50	TRAMO DE VIA	271,50	-5,00					-1357,50	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	0,00	3,40	TRAMO DE VIA REFORZADO	3,40	5,30					18,02	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	3,40	20,40	TRAMO DE VIA	17,00	5,30					90,10	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	20,40	271,50	TRAMO DE VIA	251,10	5,30					1330,83	
4	CRA 18 SUR CON CALLE 45	0,00	3,10	TRAMO DE VIA RADIO DE GIRO REFORZADO	3,10	2,35		0,5			3,64	
4	CRA 18 SUR CON CALLE 45 F	0,00	220,00	BOCACALLE VIA HACIA SOLEDAD	2,56	2,80					7,17	
4	CRA 18 SUR CON CALLE 45 B	0,00	90,00	BOCACALLE VIA HACIA SOLEDAD REFORZADA	6,30	2,00					12,60	
4	CRA 18 SUR CON CALLE 45 B	0,00	90,00	RADIO DE GIRO VIA HACIA SOLEDAD REFORZADA	2,00	1,00		0,5			1,00	
4	CRA 18 SUR CON CALLE 45 B	0,00	90,00	RADIO DE GIRO VIA HACIA SOLEDAD REFORZADA	2,00	1,60		0,5			1,60	
NP	CALLE 45 D ENTRE CRA 16 SUR Y 18 SUR	0,00	74,45	TRAMO DE VIA	74,45	2,75					204,74	
NP	CALLE 45 E ENTRE CRA 16 SUR Y 18 SUR	0,00	67,30	TRAMO DE VIA	67,30	2,00					134,60	
5	CALLE 45 F ENTRE CRA 16 SUR Y 18 SUR	0,00	64,76	TRAMO DE VIA	64,76	3,10					200,76	
5	CALLE 45 F ENTRE CRA 15 SUR Y 16 SUR	0,00	68,00	TRAMO DE VIA	68,00	3,00					204,00	
3	CARRERA 15 SUR CALLE 45 D Y 45 F	0,00	50,00	TRAMO DE VIA	50,00	5,80					290,00	
												1.141,55

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE:
MP.

Vo.Bo. INTERVENTORIA:


NOMBRE:
MP.

Versión: V1

Fecha Aprobación: 07/05/2025

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT 890102018-1	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 04	CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024		OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO III	
BARRIO:	VILLA SEVILLA				
FECHA DE CORTE:	5/05/2026				
CAPITULO:	4	CÓDIGO DEL ITEM: 4,4	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLASTICO NEGRO	

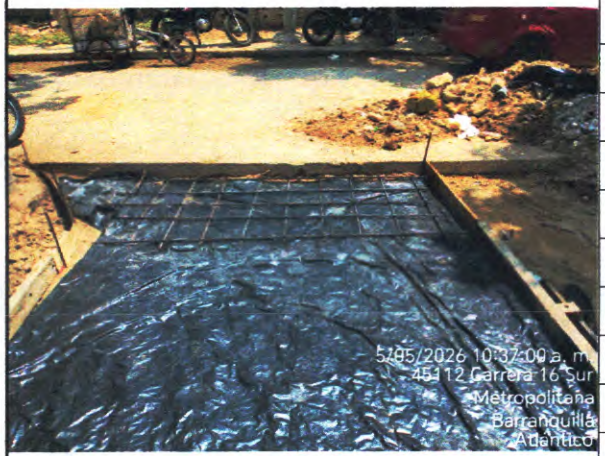

LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES					TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	DESCRIPCIÓN	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	ML	M2	M3
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	0,00	271,50	TRAMO DE VIA	271,50	-5,00					-1357,50	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	0,00	3,40	TRAMO DE VIA REFORZADO	3,40	5,30					18,02	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	3,40	20,40	TRAMO DE VIA	17,00	5,30					90,10	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	20,40	271,50	TRAMO DE VIA	251,10	5,30					1330,83	
4	CRA 18 SUR CON CALLE 45	0,00	3,10	TRAMO DE VIA RADIO DE GIRO REFORZADO	3,10	2,35		0,5			3,64	
4	CRA 18 SUR CON CALLE 45 F	0,00	220,00	BOCACALLE VIA HACIA SOLEDAD	2,56	2,80					7,17	
4	CRA 18 SUR CON CALLE 45 B	0,00	90,00	BOCACALLE VIA HACIA SOLEDAD REFORZADA	6,30	2,00					12,60	
4	CRA 18 SUR CON CALLE 45 B	0,00	90,00	RADIO DE GIRO VIA HACIA SOLEDAD REFORZADA	2,00	1,00		0,5			1,00	
4	CRA 18 SUR CON CALLE 45 B	0,00	90,00	RADIO DE GIRO VIA HACIA SOLEDAD REFORZADA	2,00	1,60		0,5			1,60	
NP	CALLE 45 D ENTRE CRA 16 SUR Y 18 SUR	0,00	74,45	TRAMO DE VIA	74,45	2,75					204,74	
NP	CALLE 45 E ENTRE CRA 16 SUR Y 18 SUR	0,00	67,30	TRAMO DE VIA	67,30	2,00					134,60	
5	CALLE 45 F ENTRE CRA 16 SUR Y 18 SUR	0,00	64,76	TRAMO DE VIA	64,76	3,10					200,76	
5	CALLE 45 F ENTRE CRA 15 SUR Y 16 SUR	0,00	68,00	TRAMO DE VIA	68,00	3,00					204,00	
3	CARRERA 15 SUR CALLE 45 D Y 45 F	0,00	50,00	TRAMO DE VIA	50,00	5,80					290,00	
												1.141,55

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: MP.	NOMBRE: MP.

Versión: V1

Fecha Aprobación: 07/05/2025

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 04

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024			**OBJETO DEL CONTRATO:** OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO III
BARRIO:	VILLA SEVILLA			
FECHA DE CORTE:	5/05/2026			
CAPITULO:	4	**CÓDIGO DEL ITEM:**	4.5	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:** PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=39, ESPESOR=0,15 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0,30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE.





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	0,00	271,50	TRAMO DE VIA	271,50	-5,00					-1357,50	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	20,40	271,50	TRAMO DE VIA	251,10	5,30					1330,83	
4	CRA 18 SUR CON CALLE 45	0,00	3,10	TRAMO DE VIA RADIO DE GIRO REFORZADO	3,10	2,35		0,5			3,64	
4	CRA 18 SUR CON CALLE 45 F	0,00	220,00	BOCACALLE VIA HACIA SOLEDAD	2,56	2,80					7,17	
4	CRA 18 SUR CON CALLE 45 B	0,00	90,00	BOCACALLE VIA HACIA SOLEDAD REFORZADA	6,30	2,00					12,60	
4	CRA 18 SUR CON CALLE 45 B	0,00	90,00	RADIO DE GIRO VIA HACIA SOLEDAD REFORZADA	2,00	1,00		0,5			1,00	
4	CRA 18 SUR CON CALLE 45 B	0,00	90,00	RADIO DE GIRO VIA HACIA SOLEDAD REFORZADA	2,00	1,60		0,5			1,60	
NP	CALLE 45 D ENTRE CRA 16 SUR Y 18 SUR	0,00	74,45	TRAMO DE VIA	74,45	2,75					204,74	
NP	CALLE 45 E ENTRE CRA 16 SUR Y 18 SUR	0,00	67,30	TRAMO DE VIA	67,30	2,00					134,60	
5	CALLE 45 F ENTRE CRA 16 SUR Y 18 SUR	0,00	64,76	TRAMO DE VIA	64,76	3,10					200,76	
5	CALLE 45 F ENTRE CRA 15 SUR Y 16 SUR	0,00	68,00	TRAMO DE VIA	68,00	3,00					204,00	
3	CARRERA 15 SUR CALLE 45 D Y 45 F	0,00	50,00	TRAMO DE VIA	50,00	5,80					290,00	
												1.033,43

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE:
MP.

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

NOMBRE:
MP.

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 8901020181

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 04

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024			**OBJETO DEL CONTRATO:**	**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO III**
BARRIO:	VILLA SEVILLA				
FECHA DE CORTE:	5/05/2026				
CAPITULO:	4	**CÓDIGO DEL ITEM:**	4,8	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	**PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 39 A LA FLEXION ACELERADO A 3 DIAS ,ESPESOR= 0.2 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D =1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" -LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL**



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	0,00	3,40	TRAMO DE VIA REFORZADO	3,40	5,30					18,02	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	3,40	20,40	TRAMO DE VIA	17,00	5,30					90,10	
												108,12

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	**Vo.Bo. INTERVENTORIA:**
NOMBRE:	**NOMBRE:**
MP.	**MP.**

Versión: V1

Fecha Aprobación: 07/05/2025

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 8 0 0 1 0 2 0 1 8 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 04

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024			**OBJETO DEL CONTRATO:**	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO III
BARRIO:	VILLA SEVILLA				
FECHA DE CORTE:	5/05/2026				
CAPITULO:	4	**CÓDIGO DEL ITEM:**	4.13	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	ACERO DE REFUERZO DE 1/2" 60.000 PSI LEGITIMO PARA PLACAS DE PAVIMENTO IRREGULARES CUANTIA 8 KG/M2 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL



LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES					TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	DESCRIPCIÓN	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	KG/M2	ML	M2	KG
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	0,00	3,40	TRAMO DE VIA REFORZADO	3,40	5,30			6,66			120,01
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 D	0,00	20,40	PLACA REFORZADA DE MANHOLE INICIAL	3,00	5,30			6,66			105,89
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 D	0,00	150,00	PLACA REFORZADA DE MANHOLE INTERMEDIO # 1	3,00	5,30			6,66			105,89
4	CRA 18 SUR CON CALLE 45 D	0,00	150,00	PLACA REFORZADA DE MANHOLE INTERMEDIO # 2	3,00	5,30			6,66			105,89
4	CRA 18 SUR CON CALLE 45 D	0,00	150,00	PLACA REFORZADA DE VIA	3,00	2,65		3,0	6,66			158,84
4	CRA 18 SUR CON CALLE 45 E	0,00	190,00	PLACA REFORZADA DE MANHOLE INTERMEDIO # 3	3,00	5,30			6,66			105,89
4	CRA 18 SUR CON CALLE 45 F	0,00	220,00	PLACA REFORZADA DE MANHOLE INTERMEDIO # 4	3,00	5,30			6,66			105,89
4	CRA 18 SUR CON CALLE 45 G	0,00	255,00	PLACA REFORZADA DE MANHOLE FINAL	3,00	5,30			6,66			105,89
4	CRA 18 SUR CON CALLE 45	0,00	3,10	TRAMO DE VIA RADIO DE GIRO REFORZADO	3,10	2,35		0,5	6,66			24,26
4	CRA 18 SUR CON CALLE 45	0,00	3,40	TRAMO DE VIA REFORZADO BOCACALLE	3,40	5,30			6,66			120,01
4	CRA 18 SUR CON CALLE 45 F	0,00	220,00	BOCACALLE VIA HACIA SOLEDAD	2,56	2,80			6,66			47,74
4	CRA 18 SUR CON CALLE 45 B	0,00	90,00	BOCACALLE VIA HACIA SOLEDAD REFORZADA	6,30	2,00			6,66			83,92
4	CRA 18 SUR CON CALLE 45 B	0,00	90,00	RADIO DE GIRO VIA HACIA SOLEDAD REFORZADA	2,00	1,00		0,5	6,66			6,66
4	CRA 18 SUR CON CALLE 45 B	0,00	90,00	RADIO DE GIRO VIA HACIA SOLEDAD REFORZADA	2,00	1,60		0,5	6,66			10,66
NP	CALLE 45 D ENTRE CRA 16 SUR Y 18 SUR	0,00	74,45	REFORZAMIENTO DE PLACA DE TAPA DE MANHOLE EXISTENTE INICAL	2,82	2,75			6,66			51,65
NP	CALLE 45 D ENTRE CRA 16 SUR Y 18 SUR	0,00	74,45	REFORZAMIENTO DE PLACA DE TAPA DE MANHOLE EXISTENTE INTERMEDIO	3,00	2,75			6,66			54,95
NP	CALLE 45 D ENTRE CRA 16 SUR Y 18 SUR	0,00	74,45	PLACA REFORZADA CENEFA	74,45	0,50			6,66			247,92
NP	CALLE 45 F ENTRE CRA 16 SUR Y 18 SUR	0,00	74,45	PLACA REFORZADA CENEFA	74,45	0,60			6,66			297,50
												1.859,48

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE:
MP.

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

NOMBRE:
MP.

Versión: V1

Fecha Aprobación: 07/05/2025

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 04

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024			**OBJETO DEL CONTRATO:**	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO III
BARRIO:	VILLA SEVILLA				
FECHA DE CORTE:	5/05/2026				
CAPITULO:	2	**CÓDIGO DEL ITEM:**	6.2	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	P. B. O. BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0,15 X 0,20 M., INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60,000 PSI LEGITIMO



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	194,10	213,10	BORDILLO DE LA VIA	19,00					19,00		
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	155,50	194,10	BORDILLO DE LA VIA	38,60					38,60		
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	222,80	244,50	BORDILLO DE LA VIA	21,70					21,70		
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	133,00	142,30	BORDILLO DE LA VIA	9,30					9,30		
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	15,28	23,03	BORDILLO DE LA VIA	7,75					7,75		
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	220,50	233,00	BORDILLO DE LA VIA	12,50					12,50		
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	242,30	244,86	BORDILLO DE LA VIA	2,56					2,56		
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	160,00	165,20	BORDILLO DE LA VIA	5,20					5,20		
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	93,70	105,00	BORDILLO DE LA VIA	11,30					11,30		
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	62,00	80,00	BORDILLO DE LA VIA	18,00					18,00		
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	23,03	44,00	BORDILLO DE LA VIA	20,97					20,97		
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	23,03	44,00	BORDILLO DE LA VIA ADICIONAL	5,20					5,20		
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	20,38	24,28	BORDILLO DE LA VIA	3,90					3,90		
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	0,00	4,60	BORDILLO EN ANDEN LADO DE LA OLIMPICA	4,60					4,60		
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	0,00	5,00	BORDILLO EN ANDEN LADO DE LA FERRETERIA	5,00					5,00		
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	20,38	24,28	BORDILLO DE LA VIA ADICIONAL	3,00					3,00		
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	244,50	246,83	BORDILLO DE LA VIA	2,33					2,33		
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	256,43	268,73	BORDILLO DE LA VIA	12,30					12,30		
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	105,00	155,50	BORDILLO DE LA VIA	50,50					50,50		

55.



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	89,00	115,13	BORDILLO DE LA VIA	26,13					26,13		
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	44,00	55,00	BORDILLO DE LA VIA	11,00					11,00		
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	115,13	145,03	BORDILLO DE LA VIA	29,90					29,90		
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	153,00	160,00	BORDILLO DE LA VIA	7,00					7,00		
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	165,20	187,95	BORDILLO DE LA VIA	22,75					22,75		
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	192,20	208,20	BORDILLO DE LA VIA	16,00					16,00		
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	208,20	214,27	BORDILLO DE LA VIA	6,07					6,07		
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	0,00	90,00	ANDEN DE LA VIA	3,00					3,00		
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	244,84	248,17	ANDEN DE LA VIA	3,33					3,33		
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	249,60	271,50	ANDEN DE LA VIA	21,90					21,90		
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	256,35	259,20	ANDEN DE LA VIA	2,85					2,85		
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	256,35	259,20	ANDEN DE LA VIA	2,90					2,90		
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	256,35	259,20	ANDEN DE LA VIA	5,95					5,95		
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	256,35	259,20	ANDEN DE LA VIA	3,90					3,90		
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	256,35	259,20	ANDEN DE LA VIA	1,94					1,94		
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	256,35	259,20	ANDEN DE LA VIA	3,00					3,00		
												421,33

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE:
MP.

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

NOMBRE:
MP.

Versión: V1

Fecha Aprobación: 07/05/2025

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 8 9 0 1 0 2 0 1 8 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 04

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024			**OBJETO DEL CONTRATO:**	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO III
BARRIO:	VILLA SEVILLA				
FECHA DE CORTE:	5/05/2026				
CAPITULO:	2	**CÓDIGO DEL ITEM:**	6,4	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	P. B. O. ANDEN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3,000 PSI E=0.07 M. (INCLUYE RAMPA PARA DISCAPACITADOS)



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	222,80	244,50	ANDEN DE LA VIA	21,70	1,00					21,70	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	133,00	142,30	ANDEN DE LA VIA	9,30	1,10					10,23	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	15,28	23,03	ANDEN DE LA VIA	7,75	0,60					4,65	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	15,28	23,03	ANDEN DE LA VIA ADICIONAL	1,75	0,60					1,05	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	220,50	233,00	ANDEN DE LA VIA	12,50	1,00					12,50	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	242,30	244,86	ANDEN DE LA VIA	2,56	1,20					3,07	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	160,00	165,20	ANDEN DE LA VIA	5,20	1,20					6,24	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	93,70	105,00	ANDEN DE LA VIA	11,30	0,85					9,61	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	62,00	80,00	ANDEN DE LA VIA	18,00	0,85					15,30	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	23,03	44,00	ANDEN DE LA VIA	20,97	0,85					17,82	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	23,03	44,00	ANDEN DE LA VIA ADICIONAL	2,62	1,10					2,88	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	20,38	24,28	ANDEN DE LA VIA ADICIONAL LADO DE LA FERRETERIA	5,00	1,00					5,00	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	4,20	28,80	ANDEN DE LA VIA ADICIONAL RAMPA LA OLIMPICA	24,60	1,00					24,60	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	0,00	4,90	ANDEN DE LA VIA ADICIONAL LADO DE LA OLIMPICA	4,90	1,00					4,90	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	256,43	268,73	ANDEN DE LA VIA	12,30	0,95					11,69	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	105,00	107,15	ANDEN DE LA VIA	2,15	1,05					2,26	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	107,15	109,68	ANDEN DE LA VIA	2,53	0,80					2,02	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	109,68	111,46	ANDEN DE LA VIA	1,78	0,85					1,51	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	111,46	113,66	ANDEN DE LA VIA	2,20	0,60					1,32	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	113,66	116,96	ANDEN DE LA VIA	3,30	1,18					3,89	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	116,96	155,50	ANDEN DE LA VIA	38,54	0,70					26,98	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	116,96	155,50	ANDEN DE LA VIA ADICIONAL	1,47	0,80					1,18	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	89,00	115,13	ANDEN DE LA VIA	26,13	1,05					27,44	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	89,00	115,13	ANDEN DE LA VIA	26,13	0,85					22,21	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	89,00	115,13	ANDEN DE LA VIA ADICIONAL	2,10	0,80					1,68	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	89,00	115,13	ANDEN DE LA VIA ADICIONAL	3,13	1,50					4,70	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	115,13	145,03	ANDEN DE LA VIA	29,90	1,00					29,90	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	153,00	160,00	ANDEN DE LA VIA	7,00	1,20					8,40	

55.



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	165,20	187,95	ANDEN DE LA VIA	22,75	0,90					20,48	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	192,20	208,20	ANDEN DE LA VIA	16,00	0,95					15,20	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	208,20	214,27	ANDEN DE LA VIA	6,07	0,40					2,43	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	208,20	214,27	ANDEN DE LA VIA ADICIONAL	1,50	0,30					0,45	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	0,00	90,00	ANDEN DE LA VIA	2,13	2,40					5,11	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	0,00	90,00	ANDEN DE LA VIA	4,30	0,50					2,15	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	0,00	90,00	ANDEN DE LA VIA	0,80	0,52					0,42	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	244,50	246,83	ANDEN DE LA VIA	2,33	0,87					2,03	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	244,84	248,17	ANDEN DE LA VIA	3,33	0,50					1,67	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	256,35	259,20	ANDEN DE LA VIA	1,16	0,90					1,04	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	256,35	259,20	ANDEN DE LA VIA	3,00	0,56					1,68	

337,37

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE:
MP.

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

NOMBRE:
MP.

Versión: V1

Fecha Aprobación: 07/05/2025

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102019-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 04

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO III
BARRIO:	VILLA SEVILLA		
FECHA DE CORTE:	5/05/2026		
CAPITULO: 6	CÓDIGO DEL ITEM: 6,5	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P. B. O. ANDEN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3,000 PSI E=0.1 M. (INCLUYE RAMPA PARA DISCAPACITADOS)



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	2,35	10,65	ANDEN DE LA VIA	8,30	1,75					14,53	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	8,30	20,38	ANDEN DE LA VIA	12,08	1,50					18,12	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	20,38	24,28	ANDEN DE LA VIA	3,90	0,85					3,32	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	20,38	24,28	ANDEN DE LA VIA ADICIONAL	4,00	0,80					3,20	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	20,38	24,28	ANDEN DE LA VIA ADICIONAL RAMPA FERRETERIA	5,40	2,50					13,50	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	20,38	24,28	ANDEN DE LA VIA ADICIONAL LADO DE LA FERRETERIA	5,00	1,00					5,00	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	4,20	28,80	ANDEN DE LA VIA ADICIONAL RAMPA LA OLIMPICA	24,60	1,00					24,60	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	0,00	4,90	ANDEN DE LA VIA ADICIONAL LADO DE LA OLIMPICA	4,90	1,00					4,90	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	0,00	90,00	ANDEN DE LA VIA	1,70	2,50					4,25	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	0,00	90,00	ANDEN DE LA VIA	2,28	2,30					5,24	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	0,00	90,00	ANDEN DE LA VIA	0,90	0,88					0,79	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	0,00	90,00	ANDEN DE LA VIA	3,00	0,86					2,58	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	0,00	90,00	ANDEN DE LA VIA	13,20	1,40					18,48	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	244,50	246,83	ANDEN DE LA VIA	2,33	0,87					2,03	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	244,84	248,17	ANDEN DE LA VIA	3,33	0,50					1,67	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	249,60	271,50	ANDEN DE LA VIA	21,90	0,76					16,64	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	256,35	259,20	ANDEN DE LA VIA	2,85	0,76					2,17	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	256,35	259,20	ANDEN DE LA VIA	2,90	0,85					2,47	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	256,35	259,20	ANDEN DE LA VIA	2,75	0,92					2,53	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	256,35	259,20	ANDEN DE LA VIA	5,95	0,90					5,36	
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G	256,35	259,20	ANDEN DE LA VIA	3,90	1,70					6,63	
												157,99

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE:
MP.

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

NOMBRE:
MP.

Versión: V1

Fecha Aprobación: 07/05/2025

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 04

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024	**OBJETO DEL CONTRATO:**	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO III
BARRIO:	VILLA SEVILLA		
FECHA DE CORTE:	5/05/2026		
CAPITULO: 7	**CÓDIGO DEL ITEM:** 7,7	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN 6" TUBERIA NOVAFORT LONGITUD HASTA 6 M., INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO



LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES					TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	DESCRIPCIÓN	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	ML	M2	M3
5	CALLE 45 F ENTRE CRA 16 SUR Y 18 SUR	0,00	70,00	Calle 45 F # 16 SUR - 52					1,00			
				Calle 45 F # 16 SUR - 49					1,00			
				Calle 45 F # 16 SUR - 46					1,00			
				Calle 45 F # 16 SUR - 43					1,00			
				Calle 45 F # 16 SUR - 39					1,00			
				Calle 45 F # 16 SUR - 35					1,00			
				Calle 45 F # 16 SUR - 40					1,00			
				Calle 45 F # 16 SUR - 29					1,00			
				Calle 45 F # 16 SUR - 32					1,00			
				Calle 45 F # 16 SUR - 24					1,00			
				Calle 45 F # 16 SUR - 23					1,00			
				Calle 45 F # 16 SUR - 20					1,00			
				Cra 16 SUR # 45 E - 07					1,00			
				Cra 16 SUR # 45 E - 20					1,00			
				Cra 16 SUR # 45 E - 27					1,00			
5	CALLE 45 F ENTRE CRA 15 SUR Y 16 SUR	0,00	68,00	CRA 15 SUR # 45 - 188					1,00			
				Calle 45 F # 15 SUR - 37					1,00			
				Calle 45 F # 15 SUR - 33 APTO 1					1,00			
				Calle 45 F # 15 SUR - 33 APTO 2					1,00			
				Calle 45 F # 15 SUR - 33 APTO 3					1,00			
				Calle 45 F # 15 SUR - 33 APTO 4					1,00			
				CRA 15 SUR # 45 - 179					1,00			
				Calle 45 F # 15 SUR - 38 APTO 1					1,00			
				Calle 45 F # 15 SUR - 38 APTO 2					1,00			
				Calle 45 F # 15 SUR - 23					1,00			
NP	CALLE 45 E ENTRE CRA 18 SUR Y 16 SUR	0,00	67,30	Calle 45 E # 16 SUR - 38					1,00			
				Calle 45 E # 16 SUR - 30 APTO 1					1,00			
				Calle 45 E # 16 SUR - 30 APTO 2					1,00			
				Calle 45 E # 16 SUR - 39					1,00			
				Calle 45 E # 16 SUR - 33					1,00			
				Calle 45 E # 16 SUR - 27					1,00			
				Calle 45 E # 16 SUR - 21					1,00			
				Calle 45 E # 16 SUR - 16					1,00			
				CRA 16 SUR # 45 E - 06					1,00			
				CRA 16 SUR # 45 E - 03					1,00			
				CRA 16 SUR # 45 E - 31					1,00			
												36,00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE:
MP.

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

NOMBRE:
MP.

Versión: V1

Fecha Aprobación: 07/05/2025

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 8 0 1 0 0 0 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 04

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE III			**OBJETO DEL CONTRATO:**	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO M3
BARRIO:	VILLA SEVILLA				
FECHA DE CORTE:	5/05/2024				
CAPITULO:	8	**CÓDIGO DEL ITEM:**	8,3	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	P. B. O. PASACALLE DE 1 MT X 6 MT, INSTALADOS



LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES					TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	DESCRIPCIÓN	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	ML	M2	M3
4	CRA 18 SUR ENTRE CALLE 45 Y 45 G			PASACALLES					2,00			
												2,00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE:
MP.

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

NOMBRE:
MP.

Versión: V1

Fecha Aprobación: 07/05/2025

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 8901020161

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 04

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE III			**OBJETO DEL CONTRATO:**	**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO M3**
BARRIO:	VILLA SEVILLA				
FECHA DE CORTE:	5/05/2026				
CAPITULO:	8	**CÓDIGO DEL ITEM:**	8.4	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	**PROVISION SOCIAL (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD DE INICIO Y/O CIERRE LONG. PROMEDIO <=30,00 M)**





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
VILLA SEVILLA	AIDETH FLOREZ CL 66A No No 23-46			ACTA DE VECINDAD				UND	1,00			
VILLA SEVILLA	ALDEMAR ZAMORA CRA 18SUR No 45-76			ACTA DE VECINDAD				UND	1,00			
VILLA SEVILLA	ANA OSORIO CL 45 No 16sur -29			ACTA DE VECINDAD				UND	1,00			
VILLA SEVILLA	ANA RAQUEL VERGARA CL 67 No 23B-68			ACTA DE VECINDAD				UND	1,00			
VILLA SEVILLA	ANGELICA ARASOLES CRA 18 SUR No 45D-12			ACTA DE VECINDAD				UND	1,00			
VILLA SEVILLA	CAMILO SIMANCA CL 45F No 16SUR- 24			ACTA DE VECINDAD				UND	1,00			
VILLA SEVILLA	CARMELO ARANZOLE CRA 18SUR No 45-104			ACTA DE VECINDAD				UND	1,00			
VILLA SEVILLA	CRISTOBAL JARAMILLO CL 45F No 16SUR			ACTA DE VECINDAD				UND	1,00			
VILLA SEVILLA	CRUZ MARIA LOPEZ CL 45F No 16SUR -40			ACTA DE VECINDAD				UND	1,00			
VILLA SEVILLA	DORA ELSA APARICIO CRA 18 No 45-66			ACTA DE VECINDAD				UND	1,00			
VILLA SEVILLA	EDGARDO GUTIERREZ CL 45G No 16SUR -51			ACTA DE VECINDAD				UND	1,00			
VILLA SEVILLA	ELISA GONZALEZ NO REGISTRA			ACTA DE VECINDAD				UND	1,00			
VILLA SEVILLA	FERMINA ARROYO CL 45G No 16SUR 57			ACTA DE VECINDAD				UND	1,00			
VILLA SEVILLA	FREDY RODRIGUEZ CL 45F 16SUR - 23			ACTA DE VECINDAD				UND	1,00			
VILLA SEVILLA	GREYSI LUNA CL 65A No 23B -63			ACTA DE VECINDAD				UND	1,00			
VILLA SEVILLA	INGRID ACOSTA CL 45F No 16SUR -39			ACTA DE VECINDAD				UND	1,00			
VILLA SEVILLA	IRMIS SILVERA NO REGISTRA			ACTA DE VECINDAD				UND	1,00			
VILLA SEVILLA	JACKELINE MURILLO CL 45 No 16SUR -52			ACTA DE VECINDAD				UND	1,00			
VILLA SEVILLA	JANIDIS BALMACEA CL 66 No 23C -55			ACTA DE VECINDAD				UND	1,00			
VILLA SEVILLA	KATERINE BUTLER CL 64A No 23B -28			ACTA DE VECINDAD				UND	1,00			
												20,00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	**Vo.Bo. INTERVENTORIA:**
NOMBRE:	**NOMBRE:**
MP.	**MP.**

Versión: V1

Fecha Aprobación: 07/05/2025

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-7

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 04

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE III			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO M3
BARRIO:	VILLA SEVILLA				
FECHA DE CORTE:	5/05/2026				
CAPITULO:	8	CÓDIGO DEL ITEM:	8.4	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	PROVISION SOCIAL (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD DE INICIO Y/O CIERRE LONG. PROMEDIO <=30,00 M)





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
VILLA SEVILLA	LEDYS OSORIO CRA 18SUR No 45E -14			ACTA DE VECINDAD				UND	1,00			
VILLA SEVILLA	MADELEIS MIRANDA CL 45F No 16SUR			ACTA DE VECINDAD				UND	1,00			
VILLA SEVILLA	MARGI ALGARIN CRA 18SUR No 45-92			ACTA DE VECINDAD				UND	1,00			
VILLA SEVILLA	MARIA CRISTINA BELTRAN CL 45D No 16SUR -56			ACTA DE VECINDAD				UND	1,00			
VILLA SEVILLA	MARIA RODRIGUEZ CRA 18SUR No 45E- 10			ACTA DE VECINDAD				UND	1,00			
VILLA SEVILLA	MARIA EUGENIA RODRIGUEZ			ACTA DE VECINDAD				UND	1,00			
VILLA SEVILLA	MARIA GOMEZ CRA 18 45G - 28			ACTA DE VECINDAD				UND	1,00			
VILLA SEVILLA	MARIA MARTINEZ CRA 18SUR 45D-22			ACTA DE VECINDAD				UND	1,00			
VILLA SEVILLA	MARTHA PACHECO CRA 18SUR No 45E -20			ACTA DE VECINDAD				UND	1,00			
VILLA SEVILLA	MIGUEL ROJANO CL 45F No 16SUR -19			ACTA DE VECINDAD				UND	1,00			
VILLA SEVILLA	NINI ALTAMAR CL 45F No 16SUR -35			ACTA DE VECINDAD				UND	1,00			
VILLA SEVILLA	OVEIDA MARTINEZ CRA 18SUR - 45G-12			ACTA DE VECINDAD				UND	1,00			
VILLA SEVILLA	RUT NAVARRO CRA 18 SUR No 45E - 06			ACTA DE VECINDAD				UND	1,00			
VILLA SEVILLA	SANDRA HERNANDEZ CRA 18SUR No 45G-12			ACTA DE VECINDAD				UND	1,00			
VILLA SEVILLA	SOFIA VILLA CRA 18SUR No 45E-12			ACTA DE VECINDAD				UND	1,00			
VILLA SEVILLA	SONIA BERRIO CRA 3SUR No 98			ACTA DE VECINDAD				UND	1,00			
VILLA SEVILLA	SUGEIDIS MACHACON CL 45 F No 16-58			ACTA DE VECINDAD				UND	1,00			
VILLA SEVILLA	URBANO HERRERA CL 66 No 23B - 64			ACTA DE VECINDAD				UND	1,00			
VILLA SEVILLA	WENDY CALDERON CRA 18SUR 45-72			ACTA DE VECINDAD				UND	1,00			
VILLA SEVILLA	WILLY PEÑARANDA CL 45 No 16SUR-43			ACTA DE VECINDAD				UND	1,00			
												20,00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE:	NOMBRE:
MP.	MP.

Versión: V1

Fecha Aprobación: 07/05/2025

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 04

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE III			**OBJETO DEL CONTRATO:**	**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO M3**
BARRIO:	VILLA SEVILLA				
FECHA DE CORTE:	5/05/2026				
CAPITULO:	8	**CÓDIGO DEL ITEM:**	8.4	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	**PROVISION SOCIAL (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD DE INICIO Y/O CIERRE LONG. PROMEDIO <=30,00 M)**



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
VILLA SEVILLA	ZOILA PACHECO CL 66A No 238 -69			ACTA DE VECINDAD				UND	1,00			
												1,00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE:
MP.

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

NOMBRE:
MP.

Versión: V1

Fecha Aprobación: 07/05/2025

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 04

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024			**OBJETO DEL CONTRATO:**	**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO III**
BARRIO:	VILLA SEVILLA				
FECHA DE CORTE:	5/05/2026				
CAPITULO:	11	**CÓDIGO DEL ITEM:**	11,4	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	**SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PEAD PE40 20MM PN10**



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
NP	CALLE 45 D ENTRE CRA 16 SUR Y 18 SUR	0,00	74,45	EXCAVACION PARA ACOMETIDAS DE 20 MM TUBERIA DE AGUA POTABLE A FAVOR	1,50				11,00	16,50		
NP	CALLE 45 D ENTRE CRA 16 SUR Y 18 SUR	0,00	74,45	EXCAVACION PARA ACOMETIDAS DE 20 MM TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CONTRA	4,00				10,00	40,00		
5	CALLE 45 F ENTRE CRA 16 SUR Y 18 SUR	0,00	70,00	EXCAVACION PARA ACOMETIDAS DE 20 MM TUBERIA DE AGUA POTABLE A FAVOR	1,50				9,00	13,50		
5	CALLE 45 F ENTRE CRA 16 SUR Y 18 SUR	0,00	70,00	EXCAVACION PARA ACOMETIDAS DE 20 MM TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CONTRA	4,10				17,00	69,70		
5	CALLE 45F ENTRE CRA 15 SUR Y 16 SUR	0,00	55,00	EXCAVACION PARA ACOMETIDAS DE 20 MM TUBERIA DE AGUA POTABLE A FAVOR	1,80				10,00	18,00		
5	CALLE 45F ENTRE CRA 15 SUR Y 16 SUR	0,00	55,00	EXCAVACION PARA ACOMETIDAS DE 20 MM TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CONTRA	5,30				3,00	15,90		
												173,60

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	**Vo.Bo. INTERVENTORIA:**
NOMBRE:	**NOMBRE:**
MP.	**MP.**

Versión: V1

Fecha Aprobación: 07/05/2025

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-7

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 04

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024	**OBJETO DEL CONTRATO:**	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO III
BARRIO:	VILLA SEVILLA		
FECHA DE CORTE:	5/05/2026		
CAPITULO: 11	**CÓDIGO DEL ITEM:** 11,9	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE NOVAFORT 200MM X 160MM



LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES					TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	DESCRIPCIÓN	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	ML	M2	M3
5	CALLE 45 F ENTRE CRA 16 SUR Y 18 SUR	0,00	70,00	Calle 45 F # 16 SUR - 52					1,00			
				Calle 45 F # 16 SUR - 49					1,00			
				Calle 45 F # 16 SUR - 46					1,00			
				Calle 45 F # 16 SUR - 43					1,00			
				Calle 45 F # 16 SUR - 39					1,00			
				Calle 45 F # 16 SUR - 35					1,00			
				Calle 45 F # 16 SUR - 40					1,00			
				Calle 45 F # 16 SUR - 29					1,00			
				Calle 45 F # 16 SUR - 32					1,00			
				Calle 45 F # 16 SUR - 24					1,00			
				Calle 45 F # 16 SUR - 23					1,00			
				Calle 45 F # 16 SUR - 20					1,00			
				Cra 16 SUR # 45 E - 07					1,00			
				Cra 16 SUR # 45 E - 20					1,00			
				Cra 16 SUR # 45 E - 27					1,00			
5	CALLE 45 F ENTRE CRA 15 SUR Y 16 SUR	0,00	68,00	CRA 15 SUR # 45 - 188					1,00			
				Calle 45 F # 15 SUR - 37					1,00			
				Calle 45 F # 15 SUR - 33 APTO 1					1,00			
				Calle 45 F # 15 SUR - 33 APTO 2					1,00			
				Calle 45 F # 15 SUR - 33 APTO 3								
				Calle 45 F # 15 SUR - 33 APTO 4								
				CRA 15 SUR # 45 - 179								
				Calle 45 F # 15 SUR - 38 APTO 1								
				Calle 45 F # 15 SUR - 38 APTO 2								
				Calle 45 F # 15 SUR - 23								
NP	CALLE 45 E ENTRE CRA 18 SUR Y 16 SUR	0,00	67,30	Calle 45 E # 16 SUR - 38					1,00			
				Calle 45 E # 16 SUR - 30 APTO 1					1,00			
				Calle 45 E # 16 SUR - 30 APTO 2					1,00			
				Calle 45 E # 16 SUR - 39					1,00			
				Calle 45 E # 16 SUR - 33					1,00			
				Calle 45 E # 16 SUR - 27					1,00			
				Calle 45 E # 16 SUR - 21					1,00			
				Calle 45 E # 16 SUR - 16					1,00			
				CRA 16 SUR # 45 E - 06					1,00			
				CRA 16 SUR # 45 E - 03					1,00			
				CRA 16 SUR # 45 E - 31					1,00			
												30,00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE:
MP.

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

NOMBRE:
MP.

Versión: V1

Fecha Aprobación: 07/05/2025

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 8 9 0 1 0 7 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 04

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024			**OBJETO DEL CONTRATO:**	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO III
BARRIO:	VILLA SEVILLA				
FECHA DE CORTE:	5/05/2026				
CAPITULO:	11	**CÓDIGO DEL ITEM:**	11,20	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	CONSTRUCCIÓN REGISTRO DE UNIÓN DOMICILIARIA 0.30 X 0.30



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
5	CALLE 45 F ENTRE CRA 16 SUR Y 18 SUR	0,00	70,00	Calle 45 F # 16 SUR - 52					1,00			
				Calle 45 F # 16 SUR - 49					1,00			
				Calle 45 F # 16 SUR - 46					1,00			
				Calle 45 F # 16 SUR - 43					1,00			
				Calle 45 F # 16 SUR - 39					1,00			
				Calle 45 F # 16 SUR - 35					1,00			
				Calle 45 F # 16 SUR - 40					1,00			
				Calle 45 F # 16 SUR - 29					1,00			
				Calle 45 F # 16 SUR - 32					1,00			
				Calle 45 F # 16 SUR - 24					1,00			
				Calle 45 F # 16 SUR - 23					1,00			
				Calle 45 F # 16 SUR - 20					1,00			
				Cra 16 SUR # 45 E - 07					1,00			
				Cra 16 SUR # 45 E - 20					1,00			
				Cra 16 SUR # 45 E - 27					1,00			
5	CALLE 45 F ENTRE CRA 15 SUR Y 16 SUR	0,00	68,00	CRA 15 SUR # 45 - 188					1,00			
				Calle 45 F # 15 SUR - 37					1,00			
				Calle 45 F # 15 SUR - 33 APTO 1					1,00			
				Calle 45 F # 15 SUR - 33 APTO 2					1,00			
				Calle 45 F # 15 SUR - 33 APTO 3					1,00			
				Calle 45 F # 15 SUR - 33 APTO 4					1,00			
				CRA 15 SUR # 45 - 179					1,00			
				Calle 45 F # 15 SUR - 38 APTO 1					1,00			
				Calle 45 F # 15 SUR - 38 APTO 2					1,00			
				Calle 45 F # 15 SUR - 23					1,00			
NP	CALLE 45 E ENTRE CRA 18 SUR Y 16 SUR	0,00	67,30	Calle 45 E # 16 SUR - 38					1,00			
				Calle 45 E # 16 SUR - 30 APTO 1					1,00			
				Calle 45 E # 16 SUR - 30 APTO 2					1,00			
				Calle 45 E # 16 SUR - 39					1,00			
				Calle 45 E # 16 SUR - 33					1,00			
				Calle 45 E # 16 SUR - 27					1,00			
				Calle 45 E # 16 SUR - 21					1,00			
				Calle 45 E # 16 SUR - 16					1,00			
				CRA 16 SUR # 45 E - 06					1,00			
				CRA 16 SUR # 45 E - 03					1,00			
				CRA 16 SUR # 45 E - 31					1,00			
												34,00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE:
MP.

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

NOMBRE:
MP

Versión: V1

Fecha Aprobación: 07/05/2025

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 04

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO III
BARRIO:	VILLA SEVILLA		
FECHA DE CORTE:	5/05/2026		

CAPITULO:	11	CÓDIGO DEL ITEM:	11,21	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PE100 90MM PN10



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
NP	CALLE 45 D ENTRE CRA 16 SUR Y 18 SUR	0.00	80.00	INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA PORTABLE	80.00					80.00		
5	CALLE 45F ENTRE CRA 16 SUR Y 18 SUR	0.00	70.00	EXCAVACION PARA REUBICAR TUBERIA DE AGUA PORTABLE	70.00					70.00		
5	CALLE 45F ENTRE CRA 15 SUR Y 16 SUR	0.00	55.00	EXCAVACION PARA REUBICAR TUBERIA DE AGUA PORTABLE	55.00					55.00		
NP	CALLE 45 E ENTRE CRA 18 SUR Y 16 SUR	0.00	67.30	EXCAVACION PARA REUBICAR TUBERIA DE AGUA PORTABLE	67.30					67.30		
												272,30

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE:	NOMBRE:
MP.	MP.

Versión: V1

Fecha Aprobación: 07/05/2025

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 04

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024	**OBJETO DEL CONTRATO:**	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO III
BARRIO:	VILLA SEVILLA		
FECHA DE CORTE:	5/05/2026		
CAPITULO: 11	**CÓDIGO DEL ITEM:** 11,22	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA ELECTROFUSION 90 X20 MM



LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES					TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	DESCRIPCIÓN	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	ML	M2	M3
NP	CALLE 45 D ENTRE CRA 16 SUR Y 18 SUR	0,00	80,00	Calle 45 D # 16 A SUR - 33 apto 3					1,00			
				Calle 45 D # 16 A SUR - 33 apto 2					1,00			
				Calle 45 D # 16 A SUR - 33 apto 1					1,00			
				Calle 45 D # 16 A SUR - 25 apto 2					1,00			
				Calle 45 D # 16 A SUR - 25 apto 1					1,00			
				Calle 45 D # 16 A SUR - 15					1,00			
				Calle 45 D # 16 A SUR - 09					1,00			
				Calle 45 D # 16 A SUR - 05 apto 3					1,00			
				Calle 45 D # 16 A SUR - 05 apto 2					1,00			
				Calle 45 D # 16 A SUR - 05 apto 1					1,00			
				Calle 45 D # 16 SUR - 09					1,00			
				Cra 16 sur # 45 D -05 apto 1					1,00			
				Cra 16 sur # 45 D -05 apto 2					1,00			
				Calle 45 D # 16 SUR - 48					1,00			
				Calle 45 D # 16 SUR - 40 apto 1					1,00			
				Calle 45 D # 16 SUR - 40 apto 2					1,00			
				Calle 45 D # 16 SUR - 32 apto 1					1,00			
				Calle 45 D # 16 SUR - 32 apto 2					1,00			
				Calle 45 D # 16 SUR - 24					1,00			
				Calle 45 D # 16 SUR - 18 apto 1					1,00			
				Calle 45 D # 16 SUR - 18 apto 2					1,00			
5	CALLE 45 F ENTRE CRA 16 SUR Y 18 SUR	0,00	70,00	Calle 45 F # 16 A SUR - 58					1,00			
				Calle 45 F # 16 SUR - 52					2,00			
				Calle 45 F # 16 SUR - 49					1,00			
				Calle 45 F # 16 SUR - 46					3,00			
				Calle 45 F # 16 SUR - 43					1,00			
				Calle 45 F # 16 SUR - 39					2,00			
				Calle 45 F # 16 SUR - 35					1,00			
				Calle 45 F # 16 SUR - 40					3,00			
				Calle 45 F # 16 SUR - 29					1,00			
				Calle 45 F # 16 SUR - 32					3,00			
				Calle 45 F # 16 SUR - 24					2,00			
				Calle 45 F # 16 SUR - 23					1,00			
				Calle 45 F # 16 SUR - 20					1,00			
				Cra 16 SUR # 45 E - 07					1,00			
				Cra 16 SUR # 45 E - 20					2,00			
				Cra 16 SUR # 45 E - 27					1,00			

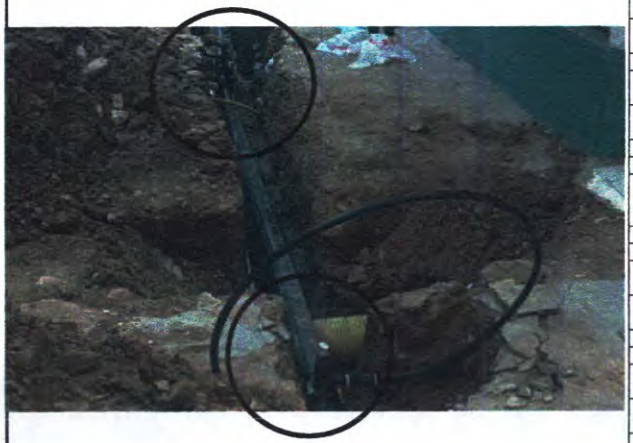

LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
5	CALLE 45 F ENTRE CRA 15 SUR Y 16 SUR	0,00	68,00	CRA 15 SUR # 45 - 188					1,00			
				Calle 45 F # 15 SUR - 37 APTO 1					1,00			
				Calle 45 F # 15 SUR - 37 APRO 2					1,00			
				Calle 45 F # 15 SUR - 33 APTO 1					1,00			
				Calle 45 F # 15 SUR - 33 APTO 2					1,00			
				Calle 45 F # 15 SUR - 33 APTO 3					1,00			
				Calle 45 F # 15 SUR - 33 APTO 4					1,00			
				Calle 45 F # 15 SUR - 33 APTO 5					1,00			
				CRA 15 SUR # 45 - 179					1,00			
				Calle 45 F # 15 SUR - 38 APTO 1					1,00			
				Calle 45 F # 15 SUR - 38 APTO 2					1,00			
				Calle 45 F # 15 SUR - 23					1,00			
				Calle 45 F # 15 SUR - 46					1,00			
NP	CALLE 45 E ENTRE CRA 18 SUR Y 16 SUR	0,00	67,30	Calle 45 E # 16 SUR - 16					1,00			
				Calle 45 E # 16 SUR - 21					1,00			
				Calle 45 E # 16 SUR - 22					1,00			
				Calle 45 E # 16 SUR - 27 CASA 1					1,00			
				Calle 45 E # 16 SUR - 27 CASA 2					1,00			
				Calle 45 E # 16 SUR - 30					1,00			
				Calle 45 E # 16 SUR - 33					1,00			
				Calle 45 E # 16 SUR - 39 CASA 1					1,00			
				Calle 45 E # 16 SUR - 39 CASA 2					1,00			
				Calle 45 E # 16 SUR - 38 CASA 1					1,00			
				Calle 45 E # 16 SUR - 38 CASA 2					1,00			
				CRA 16 SUR # 45 D - 31					1,00			
				CRA 16 SUR # 45 E - 03					1,00			
				CRA 16 SUR # 45 E - 28					1,00			
				CRA 16 SUR # 45 E - 06 CASA 1					1,00			
				CRA 16 SUR # 45 E - 06 CASA 2					1,00			
				CRA 16 SUR # 45 E - 06 CASA 3					1,00			
												77,00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: MP.	NOMBRE: MP.

Versión: V1

Fecha Aprobación: 07/05/2025

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 04

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO III
BARRIO:	VILLA SEVILLA				
FECHA DE CORTE:	5/05/2026				
CAPITULO:	11	CÓDIGO DEL ITEM:	11,23	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	RENIVELACION Y RECONSTRUCCION DE MANHOLE EN LADRILLO H<1m e=20 cm .



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
NP	CALLE 45 D ENTRE CRA 16 SUR Y 18 SUR	0.00	74.45	REFORZAMIENTO DE PLACA DE TAPA DE MANHOLE EXISTENTE INICAL					1.00			
NP	CALLE 45 D ENTRE CRA 16 SUR Y 18 SUR	0.00	74.45	REFORZAMIENTO DE PLACA DE TAPA DE MANHOLE EXISTENTE INTERMEDIO					1.00			
												2,00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE:
MP.

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

NOMBRE:
MP

Versión: V1

Fecha Aprobación: 07/05/2025
