Informe No	11	**Periodo**	1 DE MARZO al 31 DE MARZO/2026	**Proyecto**	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MODULO III".
Contrato de obra	LP-026-2024	**Contratista**	UT PAVIMENTOS 2025		

1. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



Foto 1	SEÑALIZACION FRENTE DE TRABAJO



Foto 2	SEÑALIZACION FRENTE DE TRABAJO



Foto 3	SEÑALIZACION FRENTE DE TRABAJO



Foto 4	SEÑALIZACION FRENTE DE TRABAJO



Foto 5	SEÑALIZACION FRENTE DE TRABAJO



Foto 6	CARGUE DEL MATERIAL



Foto 7	PERSONAL UTILIZANDO EPP (PROTECTOR TIPO COPA)

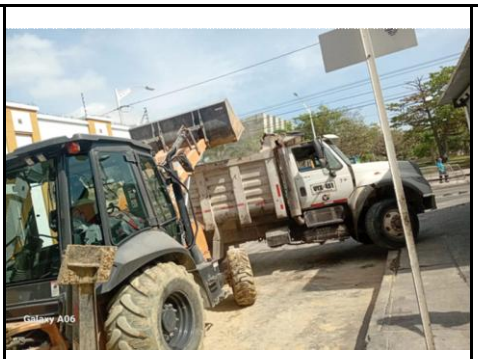


Foto 8	CARGUE DEL MATERIAL

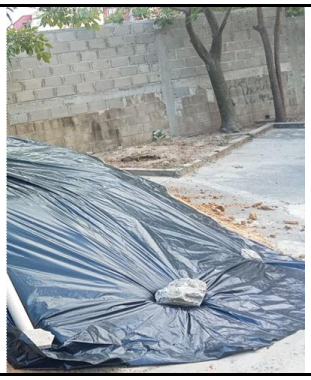


Foto 9	CUBRIMIENTO DE MATERIAL



Foto 10	SEÑALIZACION EN FRENTE DE OBRA



Foto 11	LIMPIEZA FRENTE DE TRABAJO CON APOYO DE LA TRIPLE AAA



Foto 12	SEÑALIZACIONEN FRENTE DE OBRA

Informe No	11	**Periodo**	1 DE MARZO al 31 DE MARZO/2026	**Proyecto**	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MODULO III".
Contrato de obra	LP-026-2024	**Contratista**	UT PAVIMENTOS 2025		



Foto 13	SEÑALIZACION FRENTE DE OBRA



Foto 14	SEÑALIZACION FRENTE DE TRABAJO



Foto 15	SEÑALIZACION EN FRENTE DE OBRA



Foto 16	REPOSCION DE EPP



Foto 17	SEÑALIZACION FRENTE DE TRABAJO



Foto 18	CARGUE DEL MATERIAL



Foto 19	SEÑALIZACION FRENTE DE TRABAJO



Foto 20	REPOSICION DE EPP



Foto 21	SEÑALIZACION FRENTE DE TRABAJO

2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES SST DESARROLLADAS

2.1 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

2.1.1 MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS

No	Peligros Identificados	Nivel de Riesgo	Controles Aplicados
1	Fisicos: ruido, temperaturas extremas, vibracion	150	Charlas de seguridas sobre ruido, colocar puntos de hidratacion, realizar mantenimiento preventivo a las maquinas
2	Quimicos: Material particulado (polvo)	100	Uso de Elementos de Proteccion Personal, autocuidado
3	Biologicos: Virus, baterias, picaduras y/o mordeduras de animales	80	Uso de Elementos de Proteccion Personal, autocuidado

Informe No	11	Periodo	1 DE MARZO	al	31 DE MARZO/2026	Proyecto	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MODULO III".
Contrato de obra	LP-026-2024	Contratista	UT PAVIMENTOS 2025				

4	Biomecanicos: posturas prolongadas, movimientos repetitivos, sobreesfuerzos	100	Realizar pausas activas, autocuidado, charla riesgo biomecanico
5	Psicosocial: jornadas de trabajo	40	Charla sobre riesgo psicosocial
6	Condiciones de seguridad Mecanico: manejo de herramientas manuales, operación de maquinaria pesada	40	Uso de elementos de proteccion persona, charla sobre manejo de herramientas, distanciamiento hombre-maquina, realizar preoperacionales
7	Condiciones de seguridad Publicos: robos, atracos, atentados	150	Charla sobre riesgo publico, contar con los telefonos de contacto del cuadratne de la policia
8	Condiciones de seguridad Locativo: superficies irregulares, diferente nivel	100	Uso de Elementos de Proteccion Personal, autocuidado, orden y aseo
9	Condiciones de seguridad Accidentes de trabajo (Desplazamiento Vehicular)	360	Charla sobre normas de transito, distanciamiento hombre-maquina
10	Fenomenos naturales: lluvias fuertes, tormentas electricas, vendabal	150	Resguardarse cuando halla cambio climaticos, capacitacion en primeros auxilios
Riesgo promedio dentro de la obra		**127**	Aceptable con control especifico

No	Descripción de las principales actividades realizadas dentro del plan de emergencias de la obra	Fecha		
1	Se instalo kit de emergencia en el frente del Bosque	26	5	###
2	Se instalo kit de emergencia en el frente de Las Flores	26	5	###
3	Se instalo kit de emergencia en el frente de Carlos Meisel	26	5	###
4	Se instalo kit de emergencia en el frente de Carrera 46	26	5	###
5	Se instalo kit de emergencia en el frente del Romance	26	5	###
6	Ejecucion Plan de Accion para complementar botiquin de los frentes (compra elementos faltantes)	26	6	###
7	Inspeccion de botiquin y extintor	25	6	###
8	Inspecciones de botiquin y extintor	28	7	###
11	Se instalo kit de emergencia en el frente de Campo Alegre	27	9	###
12	Se instalo kit de emergencia en el frente de Concepcion	27	9	###
13	Se instalo kit de emergencia en el frente de la CRA 44	27	9	###
12	Capacitacion de primeros auxilios - Asesor externo Arl	24	9	###
13	Capacitacion de primeros auxilios - Asesor externo Arl	29	9	###
14	Inspeccion de botiquin y extintor	30	10	###
15	Instalacion de punto de encuentro - Frente de trabajo	19	11	###
16	Inspeccion de botiquin y extintor	26	12	###
17	Se instalo botiquin en el frente de Villanueva	14	12	###
18	Inspeccion de extintor	25	2	###
19	Inspeccion de extintor	27	3	###

2.1.2 PERSONAL EN OBRA

EMPRESA	Numero de empleados al finalizar el periodo											
	2025								2026			
	15 AL 31 MAYO 2025	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26
UT PAVIMENTOS 2025	22	25	29	36	43	42	28	29	26	24	24	
CONSTRUVALEL SAS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ALEX ANGEL GONZALEZ ALEMAN	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
IDELFONSO QUIROZ BERNAVIDEZ	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
JS INGENIERIA SAS	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
JA ASOCIADOS LIMITADA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
CONSTRUCTORA Y LOGISTICA 80	26	37	44	44	52	41	50	47	29	34	31	
H&J INGENIERIA	1	1	1	5	6	5	3	3	2	2	2	
GCI PROYECTOS SAS	0	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
UT ANTIOQUIA 2025				1	1	1	1	1	1	1	1	
CFRS PROYECTOS SAS			5	6	6	7	7	7	5	5	5	
Total empleados en el proyecto	56	73	91	103	118	106	99	97	73	76	73	
Total horas hombre de exposición	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
Horas hombre acumulada	2576	3358	4186	4738	5428	4876	4554	4462	3358	3496	3358	

2.1.3. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

Fecha			Tipo de actividad		No asistentes	Responsable
4	3	2026	Charla de seguridad (VILLANUEVA)	Autocuidado	11	Loana Bonivento Cabrera
5	3	2026	Charla de seguridad (CAMPO ALEGRE)	Normas de seguridad	7	Loana Bonivento Cabrera

Informe No	11	**Periodo**	1 DE MARZO al 31 DE MARZO/2026	**Proyecto**	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MODULO III".
Contrato de obra	LP-026-2024	**Contratista**	UT PAVIMENTOS 2025		

5	3	2026	Charla de seguridad (VILLA SAN CARLOS)	Normas de seguridad	3		Loana Bonivento Cabrera
9	3	2036	Charla de seguridad (ME QUEJO)	Señalizacion	6		Loana Bonivento Cabrera
10	3	2026	Charla de seguridad (VILLANUEVA)	Manejo de residuos	14		Loana Bonivento Cabrera
12	3	2026	Charla de seguridad (VILLANUEVA)	Caidas, Resbalones	14		Loana Bonivento Cabrera
16	3	2026	Charla de seguridad (VILLA SEVILLA)	Ruido	8		Loana Bonivento Cabrera
16	3	2026	Charla de seguridad (VILLA BLANCA)	Riesgo Publico	5		Loana Bonivento Cabrera
19	3	2026	Charla de seguridad (FEDECAFE)	Autocuidado	2		Loana Bonivento Cabrera
19	3	2026	Charla de seguridad (VILLANUEVA)	Riesgo Biologico	14		Loana Bonivento Cabrera
20	3	2026	Charla de seguridad (Calle 72 con CRA 57-58)	Ruido	4		Loana Bonivento Cabrera
20	3	2026	Charla de seguridad (LA PLAYA)	Residuos de construccion y demolicion - RCD	6		Loana Bonivento Cabrera
24	3	2026	Charla de seguridad (ME QUEJO)	Residuos de construccion y demolicion - RCD	5		Loana Bonivento Cabrera
24	3	2026	Charla de seguridad (CAMPO ALEGRE)	Señalizacion	6		Loana Bonivento Cabrera
25	3	2026	Charla de seguridad (FEDECAFE)	Cuidado con el ambiente	6		Loana Bonivento Cabrera
25	3	2026	Charla de seguridad (VILLANUEVA)	Ruido	14		Loana Bonivento Cabrera
26	3	2026	Charla de seguridad (Calle 72 con CRA 57-58)	Autocuidado	4		Loana Bonivento Cabrera
					8		

2.1.4 SEGURIDAD EN OBRA

Análisis de Seguridad en el Trabajo

Fecha			Lugar	Descripción de la tarea	Responsable
2-mar.	al	8-mar.	Frente de obra	Instalacion de tuberia de alcantarillado y agua potable, Fundida de concreto	Residente- Inspector SST
2-mar.	al	8-mar.	Frente de obra	Fundida de concreto	Residente- Inspector SST
2-mar.	al	8-mar.	Frente de obra	Empalme de tuberia de agua potable	Residente- Inspector SST
9-mar.	al	15-mar.	Frente de obra	Instalacion de tuberias, Fundida de pavimento	Residente- Inspector SST
9-mar.	al	15-mar.	Frente de obra	Reparcheo	Residente- Inspector SST
16-mar.	al	22-mar.	Frente de obra	Fundidad de anden y bordillo	Residente- Inspector SST
16-mar.	al	22-mar.	Frente de obra	Instalacion de tuberia de alcantarillado	Residente- Inspector SST
16-mar.	al	22-mar.	Frente de obra	Fundida de concreto	Residente- Inspector SST
16-mar.	al	22-mar.	Frente de obra	Reparcheo	Residente- Inspector SST
16-mar.	al	22-mar.	Frente de obra	Instalacion de tuberia de alcantarillado y agua potable, Fundida de concreto	Residente- Inspector SST
16-mar.	al	22-mar.	Frente de obra	Fundidad de losa de concreto	Residente- Inspector SST
23-mar.	al	29-mar.	Frente de obra	Reparcheo	Residente- Inspector SST
23-mar.	al	29-mar.	Frente de obra	Instalacion de tuberias de alcantarillado	Residente- Inspector SST
23-mar.	al	29-mar.	Frente de obra	Instalacion de tuberias de alcantarillado y agua potable, Fundida de concreto	Residente- Inspector SST
23-mar.	al	29-mar.	Frente de obra	Reparcheo	Residente- Inspector SST

Trabajo en altura. Certificación de trabajo en altura.

Lugar	Nombre del trabajador	No de Cedula	Empresa	Vigencia	No de Registro	Recomendaciones Medicas
NA						

Permisos de trabajo de alto riesgo

Fecha	Lugar	Actividad	Tarea de Alto Riesgo	Nombre del trabajador	Inspector SST certificado
NA					

Entrega de elementos de seguridad

Elemento	Unidad	Cantidad	Observaciones
Guantes de seguridad	PAR	20	
Gafas de seguridad	UND	11	
Guantes de caucho	PAR	4	

Inspecciones y observaciones

Fecha			Lugar	Inspección Herramientas, Equipos y Maquinaria	Hallazgos
2-mar.	al	8-mar.	Frente de obra	PREOPERACIONAL MINICARGADOR CASE	
2-mar.	al	8-mar.	Frente de obra	PREOPERACIONAL DE VOLQUETA UYX 553	
2-mar.	al	8-mar.	Frente de obra	PREOPERACIONAL DE MOTONIVELADORA	
2-mar.	al	8-mar.	Frente de obra	PREOPERACIONAL DE VOLQUETA QGS 274	
2-mar.	al	8-mar.	Frente de obra	PREOPERACIONAL DE VOLQUETA QHG 673	
2-mar.	al	8-mar.	Frente de obra	PREOPERACIONAL MINICARGADOR BOBCAT	
2-mar.	al	8-mar.	Frente de obra	PREOPERACIONAL EXCAVADORA DE ORUGA	

Informe No	11	**Periodo**	1 DE MARZO al 31 DE MARZO/2026	**Proyecto**	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MODULO III".
Contrato de obra	LP-026-2024	**Contratista**	UT PAVIMENTOS 2025		

9-mar.	al	15-mar.	Frente de obra	PREOPERACIONAL PLANTA ELECTRICA	
9-mar.	al	15-mar.	Frente de obra	PREOPERACIONAL DE VOLQUETA QGS 274	
9-mar.	al	15-mar.	Frente de obra	PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CATERPILLA	
9-mar.	al	15-mar.	Frente de obra	PREOPERACIONAL DE MOTONIVELADORA	
9-mar.	al	15-mar.	Frente de obra	PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CASE	
9-mar.	al	15-mar.	Frente de obra	PREOPERACIONAL EXCAVADORA DE ORUGA	
9-mar.	al	15-mar.	Frente de obra	PREOPERACIONAL MINICARGADOR CASE	
16-mar.	al	22-mar.	Frente de obra	PREOPERACIONAL EXCAVADORA DE ORUGA	
16-mar.	al	22-mar.	Frente de obra	PREOPERCIONAL RETROEXCAVADORA CATERPILLA	
16-mar.	al	22-mar.	Frente de obra	PREOPERACIONAL DE VOLQUETA QGS 274	
16-mar.	al	22-mar.	Frente de obra	PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CASE	
16-mar.	al	22-mar.	Frente de obra	PREOPERACIONAL MINICARGADOR BOBCAT	
16-mar.	al	22-mar.	Frente de obra	PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CASE	
16-mar.	al	22-mar.	Frente de obra	PREOPERACIONAL DE VOLQUETA UYX 553	
16-mar.	al	22-mar.	Frente de obra	PREOPERACIONAL MINICARGADOR CASE	
16-mar.	al	22-mar.	Frente de obra	PREOPERACIONAL DE MOTONIVELADORA	
16-mar.	al	22-mar.	Frente de obra	PREOPERACIONAL DE VOLQUETA QHI 997	
23-mar.	al	29-mar.	Frente de obra	PREOPERACIONAL DE VOLQUETA QGS 274	
23-mar.	al	29-mar.	Frente de obra	PREOPERACIONAL DE VOLQUETA QHG 673	
23-mar.	al	29-mar.	Frente de obra	PREOPERACIONAL MINICARGADOR CASE	
23-mar.	al	29-mar.	Frente de obra	PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CATERPILLA	
23-mar.	al	29-mar.	Frente de obra	PREOPERACIONAL EXCAVADORA DE ORUGA	
23-mar.	al	29-mar.	Frente de obra	PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CASE	
23-mar.	al	29-mar.	Frente de obra	PREOPERACIONAL MINICARGADOR BOBCAT	

9. COPASST y/o Vigia

Cantidad de reuniones ejecutadas	8-31may/25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26
	1	1	1	1	1	1						

Novedades	El dia 24 de mayo del 2025 se realizo la eleccion del COPASST
Novedades	El dia 28 de junio del 2025 se realizo la reunion del COPASST, dejando unos compromisos para revisados en la proxima reunion
Novedades	El dia 29 de julio del 2025 se realizo la reunion del COPASST, dejando unos compromisos para revisarlos en la proxima reunion
Novedades	El dia 30 de agosto del 2025 se realizo la reunion del COPASST, dejando unos compromisos para revisarlos en la proxima reunion
Novedades	El dia 27 de septiembre del 2025 se realizo la reunion del COPASST, dejando unos compromisos para revisarlos en la proxima reunion
Novedades	El dia 31 de octubre del 2025 se realizo la reunion del COPASST, dejando unos compromisos para revisarlos en la proxima reunion
Novedades	El dia 29 de Noviemnbre del 2025 se realizo la reunion del COPASST, dejando unos compromisos para revisarlos en la proxima reunion
Novedades	El dia 27 de Diciembre del 2025 se realizo la reunion del COPASST, dejando unos compromisos para revisarlos en la proxima reunion
Novedades	El dia 24 de enero del 2026 se realizo la reunicon del COPASST, dejando unos compromisos para revisarlos en la proxima reunion
Novedades	El dia 28 de febrero del 2026 se realizo la reunion del COPASST, dejando unos compromisos para revisarlos en la proxima reunion
Novedades	El dia 28 de marzo del 2026 se realizo la reuniion del COPASST, dejando unos compromisos para revisarlos en la proxima reunion

2.2 MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

2.2.1 SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA

EPS		FONDO DE PENSIONES		A.R.L.		CAJA DE COMPENSACION	
Razón social	Cant. Trab	Razón social	Cant. Trab	Razón social	Cant. Trab	Razón social	Cant. Trab
MUTUAL SER	12	COLFONDOS	14	SURA	2	COMFAMILIAR	42
SALUD TOTAL	21	PORVENIR	35	COLMENA	40	CAJACOPI	31
SANITAS	3	PROTECCION	11	AXA COLPATRIA	31		
COOSALUD	3	COLPENSIONES	10				
CAJACOPI	6	NO COTIZA	3				
FAMILIAR EPS	0						
SURA	10						
NUEVA EPS	16						
FAMISANAR	1						
CAPITAL SALUD	0						
TOTAL	72	TOTAL	73	TOTAL	73	TOTAL	73

2.3 ESTADISTICAS DE ACCIDENTALIDAD

INDICADORES	TOTAL	8 AL 30 MAY	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26
# de (FAT) Fatalidad	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
# de (HiPo) Accidente Alto Potencial	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
# de (LTI) Lesiones con Tiempo perdido	**3**	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	
# de (RTA) Accidente vial/ transito	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
# de (AWPD) Accidente con	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Informe No	11	**Periodo**	1 DE MARZO al 31 DE MARZO/2026	**Proyecto**	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MODULO III".
Contrato de obra	LP-026-2024	**Contratista**	UT PAVIMENTOS 2025		

daño a la propiedad													
# de (EA) Accidente Ambiental	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
# de (NM) Incidente	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
# de Investigaciones de Incidentes	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
# de Investigaciones de Accidentes Laborales		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
# de Investigaciones de Enfermedad Laboral	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
# de dias perdidos por AT		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Frecuencia de accidentalidad	**0,0%**	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Severidad accidentalidad	**0,0%**	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Indice de Lesion Incapacitante ILI	**0,0%**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Prevalencia de Enfermedad Laboral	**0,0%**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Incidencia de la Enfermedad Laboral	**0,0%**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
# de dias por Incapacidad laboral o Enfermedad comun	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ausentismo por Causa Medica	**0,0%**	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		

2.4 SEÑALIZACIÓN PLAN MANEJO DE TRAFICO

Descripción	TOTAL	8 AL 30 MAY	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26
Señales Preventivas	**1116**	0	0	15	15	116	150	160	165	166	165	164	
Señales Informativas	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Señales Reglamentarias	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Canalizadores de Trafico	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Señales Institucionales	**293**	8	22	22	22	22	32	33	33	32	33	34	

2.5. VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Lugar	Automotor	Placa	Modelo	Marca	Serie	Vencimiento SOAT	Vencimiento Tecno-Mecanica	Recolección y Transporte RCD
Frente de obra	RETROEXCAVADORA	NO APLICA	2013	CATERPILLAR	CAT0420FCLTG1205	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Frente de obra	VIBROCOMPACTADOR	NO APLICA	2016	WACKER NEUSON	24263071	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Frente de obra	EXCAVADORA ORUGA	NO APLICA	2015	CATERPILLAR	CAT0320DVLCA00743	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Frente de obra	MINICARGADOR	NO APLICA	2013	BOBCAT	A7U711874	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Frente de obra	MINICARGADOR	NO APLICA	2010	JHON DEERE	1T0320DAPA0193078	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Frente de obra	MINICARGADOR	NO APLICA	2024	CASE	NRM453735	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Rotativo	VOLQUETA	UYX451	2017	INTENATIONAL	3HTWYATT87N554647	2026-03-07	2026-02-27	Resolucion 0724/2024
Rotativo	VOLQUETA	QHI963	2006	CHEVROLET	9GDP7H1C36B004491	2025-09-12	2025-09-14	Resolucion 0724/2025

3. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES DESARROLLADAS

3.1 CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES

3.1.1 FUENTES DE MATERIALES

No	Tipo de material	Proveedor	Acto Administrativo Ambiental	Vigencia	Título minero
1	Agregados y arenas	AGREGADOS Y CALIZAS DEL CARIBE	Comercializador y cuenta con el RUCOM	23-10-2024 al 31-07-2025	

Informe No	11	**Periodo**	1 DE MARZO al 31 DE MARZO/2026	**Proyecto**	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MODULO III".
Contrato de obra	LP-026-2024	**Contratista**	UT PAVIMENTOS 2025		

2	Materiales de construccion	CANTERA MUNARRIZ LTDA	Resolucion 000312 del 21 de Octubre de 2003 Por la cual se le otorga una licencia ambiental a la cantera Munarriz LTDA	Licencia Ambiental- Vida util TITULO MINERO 31/08/1998- 28/01/2033	GFQE-01- 21087
3	Concreto	ARGOS	Resolucion 756 del 31 de Diciembre del 2021		Corporación Autónoma Regional del Atlantico C.R.A.

3.1.2 GESTORES EXTERNOS PRESTADORES DE SERVICIOS (Gestores aseo de baños, manejo de residuos sólidos, Respel, RCD, y otros)

No	Empresa	Actividad	Acto Administrativo Ambiental	Vigencia	Entidad otorgante
1	CFRS PROYECTOS SAS	TRANSPORTADOR DE RCD	RESOLUCION 0724 DEL 21 DE JUNIO DEL 2024 Por medio de la cual se realiza una inscripcion como gestor transportador de RCD y se adelanta seguimiento a las actividades de recoleccion, transporte y descargue de residuos de construccion y demolicion RCD a la Sociedad CFRS PROYECTOS SAS	1 AÑO	B/quilla Verde
2	JS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	RECEPTOR RCD	RESOLUCION L.C. No 012-21 Por medio de la cual se concede una licencia urbanistica (en la modalidad de division en suelo urbano, loteo y construccion en la modalidad de obra nueva para vivienda (V.I.P)	2 AÑOS	Alcaldia de Sabanalarga

3.1.3 ACTOS ADMINISTRIVOS A NOMBRE DEL CONTRATISTA (Autorización de tala/poda, concesión de aguas, permiso de vertimientos y otros)

Tipo de permiso	Acto Administrativo Ambiental	Entidad otorgante	Medida compensatoria
GENERADOR RCD	RESOLUCION 3333 DEL 29 DE AGOSTO DEL 2025 Por medio de la cual se realiza una inscripcion como generador de residuos de construccion y demolicion (RCD) a la Sociedad denominada UT PAVIMENTOS 2025	B/quilla Verde	N/A

3.1.4 AUTORIZACIONES PMT

No de permiso	Vía a cerrar	Fecha de vencimiento		
SM-CVO-20250526-26401	CARRERA 46 ENTRE CALLE 76 Y 79 CALZADA OCC-ORI	26	7	2025
SM-CVO-20250522-26381	CARRERA 58 ENTRE CALLES 81 Y 79	22	7	2025
SM-CVO-20250527-26406	CALLE 64B ENTRE 14 Y 11	7	8	2025
SM-CVO-20250829-27029	CARRERA 56 Y 57 ENTRE CALLES 79 Y 84	1	11	2025
SM-CVO-20250904-27060	CALLE 99B ENTRE CARRERA 1 SUR A LA CARRERA 3 SUR Y LA CALLE 99C ENTRE CARRERA 1SUR A LA CARRERA 3 SUR	1	11	2025
SM-CVO-20250829-27028	CALLE 94 ENTRE CARRERA 55 Y 56 Y LA CARRERA 65 ENTRE CALLE 94 Y 98	1	11	2025
SM-CVO- 20250904- 27063	CALLE 84 ENTRE LA CARRERA 39 Y 41	8	11	2025
SM-CVO-20250908-27078	CALLE 72 ENTRE CRA 43 Y CRA 54 CALZADA OCCIDENTAL (SENTIDO N-S)	1	11	2025
SM-CVO-20250904-27062	CARRERAS 58 Y 59 ENTRE CALLE 79 Y 84	1	11	2025
SM-COV-20251015-27386	CALLE 77 B ENTRE CRA 70 Y 74, CRA 72 ENTRE CALLE 77B Y 77, CRA 73 ENTRE CALLE 77B Y 77	13	12	2025
SM-CVO-20251015-27385	CRA 44 ENTRE CALLE 74 Y CALLE 76	14	12	2025
SM-CVO-20251106-27515	CARRERA 26B ENTRE CALLE 76B Y CALLE 78	7	1	2026
SM-CVO-20251106-27514	CARRERA 21B ENTRE CALLE 76B Y CALLE 78	7	1	2026
SM-CVO-20260203-28663	CARRERA 23 ENTRE CALLE 14 Y CALLE 8A	5	4	2026

3.2 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, LIQUIDOS Y PELIGROSOS

TIPO DE RESIDUOS		TOTAL	8 AL 30 MAY	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26
Residuos Ordinadrios (Kg)		409	38	37	38	39	38	39	37	38	36	35	34	
Reciclables	Papel (Kg)	145	10	11	10	12	13	14	15	16	13	14	17	
	Plastico (Kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Metal (Kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Poda de Arboles (Kg)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Residuos Peligrosos RESPEL	Aceites (Kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Plastico (Kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Bolsas de Cemento (Kg)	7548	200	360	320	620	809	820	800	850	890	900	979	
Aguas Residuales Domesticas (Gal)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

3.3 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD

Factor de Expansión de Excavación		1,2						Fcator de Expansión de Demolición				1,3	
TIPO DE RESIDUOS m3	TOTAL	8 AL 30 MAY	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26
1.1 Volumen de excavación	31923,72	1697,52	1745,23	3811,78	3098,78	1322,24	4079,65	2872,91	2314,24	3343,45	5397,32	2240,59	

Informe No	11	**Periodo**	1 DE MARZO al 31 DE MARZO/2026	**Proyecto**	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MODULO III".
Contrato de obra	LP-026-2024	**Contratista**	UT PAVIMENTOS 2025		

sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros													
1.2 Volumen de cimentaciones y pilotajes: arcillas,bentonitas y demás.	**N/A**												
1.3 Volumen de Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos,pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques,cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros	**12417,98**	606,16	489,02	2196,27	1702,58	589,02	1097,84	1037,71	492,87	1615,54	2488,17	102,80	
1.4 Volumen No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros	**N/A**												
Volumen Dispuesto en sitio autorizado	**18287,65**	2142,24	1931,14	5904,42	124,66	0,00	571,34	68,53	387,,65	968,52	4233,41	2343,39	
Volumen Reutilizado	**18831,91**	161,43	303,11	103,63	4676,70	1911,26	3842,59	866,28	786,04	2528,78	3652,09		

3.4 MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y PRODUCTOS QUÍMICOS

TIPO DE MATERIAL	TOTAL	8 AL 30 MAY	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26
Concreto MR 45 (m3)	**4835,31**	384,15	225,27	1037,55	0,00	151,98	1123,45	710,00			724,15	478,76	
Concreto MR 39 (m3)	**5905,46**	108,74	205,64	1718,85	2183,03	294,19	0,00		697,,7165	882,60	512,39		
Material Seleccionado (m^3)	**7180,53**		188,20	566,82	198,34	159,55	403,92		2589,38	478,97	2119,40	475,95	
Concretro 3000 PSI	**557,74**	0,64	26,19	145,42	87,98	0,00	57,43	6,75	57,79	75,86	57,35	42,33	
Triturado 3/4	**329,00**	17,55	49,32	58,71	72,94	8,00	19,04		42,58	60,86			
Concreto fluido 1500 PSI	**4981,40**	296,18	160,88	1118,25	921,69	475,03	678,04	144,75	120,50	227,85	414,90	423,33	
Suelo Cemento (m^3)	**5004,11**	161,30	213,22	1079,69	1071,32	0,00	106,22	164,98	927,15	221,26	1058,97		
Arena	**33,10**				4,68	0,00	28,42						
Productos Quimicos							Antisol	ACPM	asolina				

3.5 MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS, VEHÍCULOS Y EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Descripción	TOTAL	8 AL 30 MAY	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26
Cantidad de puntos de acopio de materiales	**5**	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Humectación (m^3)	**60**	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0		
Cantidad de vehiculos en obra	**2**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Cantidad de Vehiculos con Tecnomecanica y SOAT	**2**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Cantidad de Maquinaria	**8,64**	4	4	4	4	15	15	14	14	9	6	6	
Cantidad de Mantenimiento a Maquinarias	**27**	2	2	3	3	4	3	2	2	2	2	2	

3.6 MANEJO ADECUADO DE VEGETACIÓN, PAISAJE Y FAUNA

Tipo de Especie	TOTAL	8 AL 30 MAY	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26
Árboles sembrados	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tala de Arboles	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Informe No	11	**Periodo**	1 DE MARZO al 31 DE MARZO/2026	**Proyecto**	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MODULO III".
Contrato de obra	LP-026-2024	**Contratista**	UT PAVIMENTOS 2025		

Tala de Arboles													
Poda de Arboles	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

3.7 MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES

Descripción	TOTAL	8 AL 30 MAY	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26
Consumo de Agua (m^3)	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Consumo de Energia Electrica (Kw)	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cantidad de baños en obra	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cantidad de Aseos a baños portatiles	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cantidad de Puntos Ecologicos	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

3.8 INDICADORES DE GESTION AMBIENTAL

INDICADORES		TOTAL		2025								2026												2027	
Programa	Fórmula X 100	Acumulado	Promedio	8 AL 30 MAY	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb
Manejo de emision de material particulado y ruido	# de vehiculos inspeccionados		**3,8**	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4											
	# de Vehiculos ingresados en los frentes de trabajo		**3,8**	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4											
	Manejo de emisiones de material particulado y ruido		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%											
Manejo de residuos de construccion y demolicion	Cantidad de RCD dispuestos con empresa gestora	**37615,7127**	**3134,6**	2142	1931	5904	4677	1911	3843	3044	2021	2430	4233	###											
	Cantidad de RCD generados	**48372,2335**	**4031,0**	2304	2234	6008	4801	1911	5177	3911	2807	4959	7886	###											
	Manejo de residuos de construccion y demolicion	78%	78%	93%	86%	98%	97%	100%	74%	78%	72%	49%	54%	100%											
Manejo de residuos solidos convencionales y peligrosos	Cantidad de residuos aprovechables generados	**158,181818**	**13,2**	10	11	10	12	13	14	15	16	13	14	17											
	Cantidad de residuos ordinarios generados	**446,181818**	**37,2**	38	37	38	39	38	39	37	38	36	35	34											
	Manejo de residuos solidos convencionales y peligrosos	35%	35%	26%	30%	26%	31%	34%	36%	41%	42%	36%	40%	50%											
Charlas y capacitaciones en temas ambientales	# de charlas realizadas	**33,8181818**	**2,8**	3	2	2	3	2	2	3	3	3	5	3											
	# charlas programadas	**49,0909091**	**4,1**	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4											
	Manejo de aguas superficiales	69%	69%	75%	50%	50%	75%	50%	50%	75%	75%	75%	100%	75%											
Manejo de materiales de construccion	M3 de material petreo utilizado			636	880		0	0	637	798	398	1560		0											
	M3 de material petreo certificado		**446,6**	597	304		1703	589	335	240	94,5	55,3		103											
	Manejo de materiales de construccion	110%	0%	106%	290%		0%	0%	190%	332%	422%	2822%		0%											
residuos liquidos, de la utilizacion de baños	# de aseo realizado a los baños portatiles			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	# de aseo programados a los baños portatiles			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											

Informe No	11	**Periodo**	1 DE MARZO al 31 DE MARZO/2026	**Proyecto**	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MODULO III".
Contrato de obra	LP-026-2024	**Contratista**	UT PAVIMENTOS 2025		

Manejo de productos	**Manejo de residuos liquidos, productos de la utilizacion de baños**			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%												
Instalacion, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos	# medidas ambientales realizadas			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	# de medidas ambientales programadas			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	Instalacion, funcionamiento y desmantelaminto de campamentos			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%												
Residuos liquidos, combustible, aceites y sustancias quimicas	# medidas ambientales realizadas			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	# medidas ambientales programadas			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	Residuos liquidos, combustible, aceite y sustancias quimicas			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%												

4. OBSERVACIONES

Para el periodo comprendido del 1 de julio al 31 de julio del 2025 se realizo la simbiosis industrial, para el proyecto de MIRADOR DE LA SABANA, el Volumen dispuesto en el proyecto esde 5904,42 m3, la generacion de este periodo fue de 6008,06 m3 con una eficiencia de aprovechamiento del 98%

Para el periodo de agosto 2025, se aprovecharon en obra 124,66 m3 de material de excavacion, se dispusieron 2974,13 m3 y 1702,58 m3 de petreos, realizando la simbiosis industrial para el proyecto MIRADOR DE LA SABANA con una eficiencia de aprovechamiento del 97%

Entre el 1 al 30 de septiembre del 2025 se realizo la simbiosis industrial, para el proyecto de MIRADOR DE LA SABANA, el volumen dispuesto en el periodo 1322,24 m3 de excavacion y 589,02 m3 de petreos

Para periodo comprendido del 1 de octubre al 31 de octubre Se aprovecharon en obra 571,34 m3 de material de excavacion y 637,26m3 de material de demolición . Se aprovecharon (simbiosis industrial) 3508,31 m3 excavación y 334,58m3 de pétreos. para el proyecto de MIRADOR DE LA SABANA

Entre el 1 al 30 de noviembre del 2025 se aprovecharon en obra 68,53 m3 de materila de excavacion y 797,75 m3 de material de demolicion. Se aprovecharon (simbiosis industrial) 2804,38 m3 excavacion y 239,96 m3 para el proyecto de MIRADOR DE LA SABANA

Para este periodo comprendido del 1 de diciembre al 31 de diciembre del 2025, se aprovecharon 387,65m3 de material de excavacion y 398,39 m3 de demolicion, se dispusieron 1926,59 m3 excavacion y 94,48 m3 demolicion realizando la simbiosis industrial para el proyecto de MIRADOR DE LA SABANA

Para el periodo de enero 2026, se aprovecharon en obra 968,52 m3 de material de excavacion y 1560,26 m3 de demolicion, se dispusieron 2374,93 m3 de excavacion y 55,,28 m3 de demolicion realizando simbiosis industrial para el proyecto de MIRADOR DE LA SABANA

Para el periodo de febrero 2026, se aprovecharon en obra 1163,92 m3 de material de excavacion y 2488,17 m3 de demolicion, se dispusieron 4233,41 m3 de excavacion realizando simbiosis industrial para el proyecto de MIRADOR DE LA SABANA

Para el periodo de Marzo 2026, se dispusieron 2240,59 m3 de excavacion y 102,80 m3 de petreo realizando simbiosis industrial para el proyecto de MIRADOR DE LA SABANA

5. ANEXOS

No	Descripción	Folios
SST-1	Matriz de identificación de peligros y riesgos	
SST-2	Registros capacitación y entrenamiento realizado	
SST-3	Registros de ATS	
SST-4	Certificados de trabajos en altura	
SST-5	Registro entrega de elementos de seguridad	
SST-6	Registro de inspecciones realizadas en el periodo	
SST-7	Registro control de aportes en seguridad social	
SST-8	Planillas de aportes a la seguridad social	
SST-9	Registro fotográfico	
SST-10	Otros anexos (Especificar cual)	

No	Descripción	Folios
AMB-1	Actas de disposición o aprovechamiento de residuos sólidos	
AMB-2	Actas de disposición y/o aprovechamiento de RCD	
AMB-3	Certificado de aseo de baños y disposición de ARD	
AMB-4	Actas de disposición y/o aprovechamiento de poda	
AMB-5	Certificado de volumenes de material de cantera utilizado en el periodo	
AMB-6	Soat y tecnomecánica de vehículos	
AMB-7	Reporte de mantenimiento de maquinaria y equipos	
AMB-8	Inventario forestal	
AMB-9	Registro de asistencia a capacitaciones	
AMB-10	Documentación ambiental proveedores petreos	

Firma	Firma	Firma	Firma Firma en original
Nombre LOANA BONIVENTO CABRERA	Nombr LOANA BONIVENTO CABRERA	Nombre ROSALIN VAJERA CERA	Nombre ROSA ELENA CARDENAS
Responsable del área ambiental Contratista	Responsable del área SST Contratista	Responsable del área ambiental Interventoría	Responsable del área SST Interventoría

UT PAVIMENTOS 2025	**FORMATO DE CERTIFICACION DE RECEPTOR DE RCD**

DATOS BASICOS DEL RECEPTOR		
Nombre o razón social	JS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	
NIT	830504499-6	
Representante Legal	JOSE JULIAN SAADE CURE	
Dirección	Carrera 27 # 4-312 Vía Cascajal	
Teléfono:	3013789801	
Correo electrónico:	recepcion@jsingc.com	
Municipio o distrito	Sabanalarga	
DATOS BASICOS DEL GENERADOR		
Número único asignado para el generador por parte de la autoridad ambiental del proyecto	En gestión	
Nombre o razón social	UT PAVIMENTOS 2025	
Documento de identificación o NIT	9 0 1 9 4 3 0 5 3-5	
Representante Legal	JOSE JULIAN SAADE CURE	
Dirección domicilio	Carrera 65 # 84-162	
Teléfono	3212446743	
Correo electrónico	utpavimentos2025@gmail.com	
Dirección de generación de RCD	Frentes de obra	
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS POR EL RECEPTOR POR TIPO		
TIPO DE RESIDUO	**Cantidad de RCD Entregados por el generador (M3)**	**Tipo de aprovechamiento**
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:		
1.1. Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros	2240,59	Relleno del terreno
1.2. Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás		
1.3. Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros	102,80	Relleno del terreno
1.4. No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros		
Total de RCD recibidos(M3)	2343,39	
Fecha de recepción de los RCD	31 Marzo del 2026	

UT PAVIMENTOS 2025	**FORMATO DE CERTIFICACION DE RECEPTOR DE RCD**

Notas:
1. La información que se suministra en el presente anexo se entenderá presentada bajo la gravedad de juramento.
2. Anexar certificado de autodeclaración bajo la gravedad de juramento en los casos en los que el gran generador y el receptor correspondan a la misma persona natural o jurídica, en este último caso, suscrita por el representante legal.
3. Anexar registro fotográfico del uso del RCD aprovechable tarjeta profesional vigente del profesional ambiental y copia de los permisos, licencias y autorizaciones a que haya lugar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad.

Cordialmente,



FIRMA ((Receptor - Representante legal)
NIT.: 830504499-6
NOMBRE: JS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS



FIRMA (Profesional Ambiental Acreditado)
C.C. 32.774.321 Bquilla
No. Tarjeta Profesional: 08236120601ATL
NOMBRE: LOANA BONIVENTO CABRERA

UT PAVIMENTOS 2025	FORMATO DE CERTIFICACION DE RECEPTOR DE RCD

UT PAVIMENTOS 2025	**FORMATO DE AUTODECLARACION DE RECEPTOR PARA EL APROVECHAMIENTO DE RCD**

Yo, **JOSE JULIAN SAADE CURE** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.001.818.920 de Barranquilla en calidad el Representante Legal de la empresa **JS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS**, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Resolución 1257 de 2021, a continuación, autodeclaro mi calidad de receptor para el aprovechamiento de los RCD con finalidad de relleno y/o adecuación de terreno, los cuales fueron generado por la empresa contratista **UT PAVIMENTOS 2025** con **NIT.** 9 0 1 9 4 3 0 5 3-5

Los RCD fueron generados en el periodo del 1 marzo al 31 de marzo del 2026 en el desarrollo del proyecto **OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MODULO III".** de la ciudad de Barranquilla (Atlántico) manifestando que los datos expuestos son reales y están debidamente diligenciados y sustentados mediante anexos fotográficos que hacen parte de la presente.

Firma Receptor:
NIT: 830504499-6
Nombre: JS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Firma Profesional Ambiental:
C.C. 32774321 Barranquilla
N° Tarjeta Profesional: 08236120601ATL
Nombre: LOANA BONIVENTO CABRERA

Ciudad: Sabanalarga **Fecha:** 31 de marzo de 2026

Dirección: Carrera 27 # 4-312 Vía Cascajal

Cantidad RCD aprovechada: 2343,39 m3
